

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCXIX**

n. **7**

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMMISSARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 86 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289, E SULL'ENTITÀ DEI LAVORI ANCORA DA ESEGUIRE, NONCHÉ RELATIVA RENDICONTAZIONE CONTABILE

(Aggiornata al 31 marzo 2017)

(Articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97)

Presentata dal Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, numero 289

(D'AMBROSIO)

Trasmessa alla Presidenza il 7 aprile 2017

PAGINA BIANCA



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02

Prot. N. 26.932 /FDA/DF/df



Roma, - 7 APR. 2017



Al Parlamento Italiano:

Presidenza della Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
Piazza Montecitorio
00186 - R O M A

Presidenza del Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 - R O M A

All'A.N.A.C.
Via Marco Minghetti, 1
00187 - R O M A

Al Ministro per le Infrastrutture e Trasporti
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto
Piazzale di Porta Pia, 1
00162 - R O M A

Oggetto: Commissario ad Acta ex L. 289/02 art. 86 e L. 97/14 .
Rapporto semestrale n. 7 al 31.3.2017: Relazione sull'attività svolta e sull'entità dei lavori ancora da eseguire e rendicontazione contabile.

E, p.c.

Senato della Repubblica
8^ Commissione LL.PP., Comunicazione e
13^ Commissione Territorio e Ambiente
Piazza Madama
00186 - R O M A

Camera dei Deputati
8^ Commissione Ambiente, Territorio e LL.PP.
Palazzo Montecitorio
Piazza Montecitorio
001868 - R O M A



Al Ministro dello Sviluppo Economico
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto
S E D E

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale Incentivi alle Imprese
S E D E

Ancor prima di riferire sulle attività svolte ed in corso, di documentarle e di segnalare le criticità più significative nell'ambito della gestione commissariale attualmente in essere, risulta indispensabile un chiarimento di carattere generale sulla nomina, sulla permanenza o meno al 31.12.17 e sulla stessa eventualità di anticipata e volontaria cessazione del sottoscritto connessa con la maturanda presentazione ufficiale delle proprie dimissioni.



Non soltanto una parte della stampa, ma anche quanto risultante da dibattiti parlamentari e politici, rendono le condizioni operative di questo Ufficio ancor più gravose ed inconciliabili con la necessità di un impegno notevolissimo ed impossibile se non profondamente motivato.

Affermazioni circa l'esistenza di un "Commissario fantasma", circa la sussistenza di ritardi storici, circa costi gestionali inaccettabili e così via colpiscono la dignità di chi lavora e soprattutto la verità dei fatti.

Ma soprattutto sono affermazioni riferite da qualche giornale circa i proibitivi costi dell'Ufficio Commissariale, circa la "sottrazione" di tali risorse a popolazioni ferite da un terremoto devastante a dare l'immagine del Commissario come di un cinico profittatore delle disgrazie altrui, ed a provocare lo sdegno – e qui mi fermo – del sottoscritto.

E' chiaro che un solo dubbio in proposito sarebbe sufficiente per le immediate dimissioni da Commissario al quale peraltro spetta anche il compito di difendere e proteggere l'immagine dei propri più stretti collaboratori.

E siccome, pur se in maniera subdola ed indiretta, come sopra detto, si sarebbe affermato in aula alcuni giorni fa qualcosa di molto simile da parte di qualche parlamentare, si era concretizzata nel sottoscritto l'ipotesi di dimissioni con richiesta di attivazione delle procedure di subentro, da formalizzare già in questa sede.

Tale volontà al momento è tuttavia venuta meno grazie al sostegno ricevuto non soltanto dal territorio più direttamente interessato all'attività Commissariale, ma anche dalle dichiarazioni pubbliche di fiducia da parte di rappresentanti qualificati delle istituzioni, pure riportate sulla stampa.

Resta tuttavia l'esigenza di provvedere per tempo alla individuazione del Soggetto¹⁾ che subentrerà a far data dall'1.1.2018 alla struttura del sottoscritto.

Si ribadisce che la complessità della materia e la mole della documentazione da trasferire non potranno consentire tempi troppo contenuti ad evitare perdite di conoscenze, per non compromettere procedure ancora in corso e soprattutto per non rallentare l'intera attività dell'Ufficio.

Si chiede pertanto con l'occasione di voler organizzare un efficace piano per il passaggio di consegne, capace di non interferire con la fase operativa.

¹ E' prevedibile che, stante la varietà e la natura delle attività Commissariali possa essere necessario individuare anche più di un soggetto. Una delle ragioni che avevano portato alla istituzione dell'Ufficio va probabilmente ricercata proprio nella necessità di concentrazione di compiti alquanto variegati.

Non si può tuttavia, in linea generale, tacere su alcune vere e proprie fantasie, quali la sostituzione dell'Ufficio con un Ufficio di Prefettura.

E' davvero sorprendente la confusione che regna sul concetto di emergenza (l'attività Commissariale non è di emergenza ma di completamento di attività nate sotto l'emergenza, abbandonate e recuperate in regime ordinario, ovvero di realizzazione di interventi solo immaginati ma mai finanziati in fase di emergenza), tra emergenza di competenza delle Prefetture (organizzazione di tempestivi soccorsi, collaborazione con la Protezione Civile ecc.) e completamento di opere pubbliche complesse che richiede valide strutture tecniche, tra Commissari straordinari e Commissari ad Acta con riferimento ai rispettivi poteri, tra costi parametrici di Uffici che operano sul Territorio in piena autonomia gestionale ed Uffici che svolgono attività da tavolino, tra stanziamenti, finanziamenti e provenienza di risorse residue ecc.

Le critiche poi sul costo di funzionamento di 100.000 €/anno, nella fattispecie che si tratta, sono risibili, essendo facilmente dimostrabile la sua assoluta insufficienza.

L'esiguità di tali risorse ad esempio impedisce l'affiancamento essenziale di un consulente giuridico diretto, la possibilità di mantenere le attrezzature informatiche acquistate con le medesime spese di funzionamento e di effettuare il necessario approvvigionamento di materiali di consumo ecc.

In altre occasioni se ne è data prova materiale contabile.



Prima di passare ad argomenti altrettanto seri, può essere utile ripetere ancora una volta delle considerazioni “inutili”.

Inutile dire che la presenza del Commissario è quotidiana in Ufficio presso il MiSE con orari desumibili dalle timbrature che effettua come ogni funzionario dipendente ministeriale, che la sua reperibilità è 24h/24h anche nei giorni festivi, che i corposissimi archivi sono testimonianza materiale di una attività intensa, che alcuni fondamentali risultati sono inconfutabili ecc.. E ciò a prescindere dai rendiconti sull’aggiornamento dell’attività che il Commissario produce con cadenza bimestrale per il MiSE, con cadenza semestrale per Parlamento, ANAC e MIT, con cadenza annuale per la Corte dei Conti ecc. ecc., a parte i monitoraggi trasmessi dalla Struttura secondo le disposizioni di legge.

Inutile dire che ritardi calcolati da qualcuno in 37 anni corrispondono ad affermazioni solo provocatorie e strumentali: per il caso della realizzazione della importante Viabilità Lioni – Grottaminarda del costo di 430 M€, oggetto delle maggiori critiche, il primo finanziamento è intervenuto solo nell’anno 2013 (70 milioni di €), e non 37 anni fa!

Inutile dire che l’Ufficio Commissariale ha completato importanti lavori realizzati solo in parte ed in modo discontinuo per miliardi di lire, ma rimasti incompiuti ed abbandonati per anni soprattutto in Basilicata, ha riprogettato e recuperato opere ormai ricoperte dalla boscaglia, gallerie e viadotti pericolanti ecc.

Inutile dire che tali ultime opere dette “completamenti infrastrutturali” (comprendenti la ricognizione di 71 progetti, il loro, a seconda dei casi, recupero, adeguamento, affidamento, messa in esercizio, chiusura contabile ecc.) siano sostanzialmente concluse con le medesime risorse risalenti all’anno 1997 senza nessuna richiesta di ulteriori finanziamenti, grazie a strategie legittime ed efficaci.

Inutile dire che il costo della gestione dell’Ufficio (spese di funzionamento), completamente autonomo anche per la fornitura di materiali ed apparecchiature, è di € 100.000/anno pure provenienti da risorse economizzate dallo stesso Commissario sulle stesse suddette dotazioni risalenti all’anno 1997.

Inutile dire che il compenso per il Commissario di € 65.000/anno sia pari a circa un terzo del compenso di un Direttore Generale pur gestendo una miriade di attività connesse al completamento e circa 550 miliardi di € in termini progettuali e finanziari.

Inutile dire che un costo di 100.000€/anno corrisponde, a fronte dei pagamenti effettuati ad esempio nell’anno 2016, a 500€ per ogni 100.000€ spesi (o se si vuole, 5 € ogni mille pagati nell’anno)

Inutile ancora dire che offendono l’impegno e la professionalità dei collaboratori più stretti del Commissario critiche a volte irresponsabilmente mosse per disinformazione o peggio, e che creano volontà di disimpegno e demotivazione.

Inutile dire che al momento non si sono verificati incidenti, contenziosi, oneri accessori, spese impreviste ecc., bensì recuperate risorse con transazioni e strategie progettuali ecc..

Inutile dire che il sottoscritto ha invocato da sempre la individuazione di una Amministrazione subentrante, sottolineando la necessità di un idoneo passaggio di consegne e quindi di un tempo congruo per definirle (di almeno qualche mese) e mai ha perorato la causa della propria permanenza.

Inutile dire che il sottoscritto si è dichiarato in ogni possibile occasione immediatamente disponibile per audizioni, convocazioni, ulteriori chiarimenti ecc. in ogni sede titolata.



Ma è sotto l'aspetto pratico ed operativo, ad evitare conseguenze negative sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico, che il sottoscritto sottolinea ancora una volta l'assoluta necessità del suddetto passaggio di consegne con idee chiare ed in tempi congrui, ritenendo gravemente rischiosi per l'Amministrazione sia un trasferimento "d'Ufficio" che perdite di tempo in dotte elucubrazioni (quali la sostituzione con un Ufficio Prefettizio), dimenticando che in proposito esiste una Legge chiara, dimenticando che si propone di passare in ordinario una materia che già è gestita di fatto in ordinario, pur se con riferimenti (solo) normativi alla L. 219/81.

Ed infine, come già segnalato in nota 1, c'è da chiedersi se davvero sia possibile il passaggio ad un Ente o se magari le attuali competenze non debbano essere trasferite a più Enti.

Nel contempo tutte le documentazioni vengono dal sottoscritto mantenute in condizioni di massimo ordine ed aggiornamento perché il subentro possa comunque avvenire senza indugi almeno da tale punto di vista.

In definitiva ove si ritenesse di provvedere anche in via anticipata rispetto al 31.12.17 al subentro da parte di altra Amministrazione o soggetto in genere, sarà solo necessario individuarlo per tempo nel rispetto della normativa specifica, al fine di consentire un corretto passaggio di consegne ed a una cessazione ragionata dell'Ufficio Commissariale.

Per concludere va ribadito che la delusione ed il disappunto per giudizi inaccettabili, provenienti da fonti disinformate e speculative, sono stati tuttavia controbilanciati dalle manifestazioni di apprezzamento da parte dei più, convincendo il sottoscritto a non dimettersi immediatamente.

Dopo l'ampia ma necessaria premessa, volta sostanzialmente a rappresentare le difficoltà soprattutto di ordine "morale" che alcuni giudizi ed affermazioni hanno determinato in termini di possibilità di proseguire serenamente nel proprio lavoro, si passa all'esame delle informazioni e degli aggiornamenti che vengono forniti semestralmente giusta L. 97 del 2.7.2014.

Ferma restando la validità di tutti i riferimenti generali forniti con le precedenti Relazioni e da ultimo con quelle al 30.9.2016 ed al 31.12.2016, si ritiene utile modificare le precedenti esposizioni, da un lato sintetizzando alcuni argomenti, dall'altro esponendoli sotto paragrafi specificamente dedicati per una lettura più rapida.

I capitoli principali vengono così elencati:

- 1) Istituzione del Commissario
- 2) Le attività Commissariali
- 3) Lo stato dell'arte
- 4) Le risorse e le spese
- 5) Le problematiche attuali
- 6) Organizzazione dell'Ufficio

1) La istituzione del Commissariato e l'incarico all'ing. Filippo D'Ambrosio

Con L. 289, art. 86, del 27.12.2002 (Finanziaria 2003), preso atto della necessità di chiudere tutte le pendenze concernenti le attività ex art. 32 L. 219/81 "Terremoto Irpinia" conferite con l'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 96 del 3.4.1993 al MICA (oggi MiSE), subentrato all'Agenzia per il Mezzogiorno, veniva istituito un Ufficio Commissariale al quale preporre un soggetto individuato dal Ministro per lo Sviluppo Economico (allora Ministro delle Attività Produttive).



In relazione a riconosciute competenze nella materia per l'esperienza dimostrata nella gestione dei LL.PP., per l'immagine positiva acquisita sul campo sotto il profilo professionale anche a livello nazionale, per la provata affidabilità sotto altri profili, veniva dal ministro nominato "Commissario ad Acta" il sottoscritto, con Decreto del 21.2.2003.

Con d.l. 83/12 convertito nella L. 134/12 veniva quindi stabilita la cessazione dell'Ufficio Commissariale al 31.12.13, prorogata poi però al 31.12.2015 con d.l. 73/14²⁾ convertito sotto l'aspetto specifico dalla L. 97/14 che prorogava al 31.12.2016 l'Ufficio medesimo.

Il Decreto Mille proroghe n. 244 del 30.12.16, convertito con la L.19 del 28.2.17, ha infine fissato al 31.12. p.v. detta cessazione.

Il sottoscritto, ove richiesto, mette comunque a disposizione le proprie dimissioni anticipando anche l'attuale scadenza, sottolinea comunque ancora una volta la necessità di provvedere per tempo al subentro in modo di consentire un regolare e ragionato passaggio di consegne delle complesse pratiche tuttora in corso (v. nota 1 che precede).

2) Le attività Commissariali

La richiamata L. 289/02 ha correttamente ritenuto di distinguere le incombenze Commissariali connesse con il completamento di lavori rimasti abbandonati per anni per contenziosi contrattuali con il Concessionario (art. 86 co.2) dai lavori che, pur comportando in più occasioni interventi costruttivi, vedevano una prevalenza delle esigenze di chiusura contabile, amministrativa, contrattuale e concessoria, espropriativa, contenziosa ecc. (art. 86 co.1). Tali interventi vanno sotto il nome di "completamenti infrastrutturali"

Al comma 1 del citato art. 86 era inoltre previsto l'incarico al Commissario di realizzare interventi prioritari già individuati ma non finanziati nell'ambito della L. 219/81, art. 32. Tali interventi che si riducono alla sola viabilità Lioni – Grottaminarda, vanno sotto il nome di "completamenti funzionali"

In Campania detta opera prioritaria di cui si dirà nello specifico paragrafo è stata individuata a seguito dei necessari Tavoli tecnici, Conferenze dei Servizi ecc. nella "Lioni – Grottaminarda", poi approvata in tutte le sedi (Consiglio Superiore LL.PP., VIA, Varianti urbanistiche ecc. ecc.).

Di seguito si riportano ad ogni buon conto le principali attività assegnate al Commissario:

- A) interventi di ripristino su opere risultate danneggiate alla data di trasferimento a questo Ufficio, ancora da consegnare agli Enti gestori (c.1 art. 86);
- B) consegna definitiva agli Enti gestori destinatari delle opere una volta collaudate (c.1 art. 86);
- C) progettazione, affidamento, direzione, esecuzione, collaudo di infrastrutture di completamento funzionale di schemi infrastrutturali già attivati ante 28.2.91 comprese tutte le incombenze connesse con le attività espropriative (c.1 art. 86);
- D) progettazione, affidamento, direzione, esecuzione, collaudo dei lavori di completamento infrastrutturale ricompresi nell'ambito di concessioni revocate dal MAP (oggi MiSE) e rimasti abbandonati da anni compresi attività espropriativa residua e contenzioso (c.2 art. 86);
- E) completamento in termini costruttivi ed amministrativi, compresa attività espropriativa incompiuta e contenzioso di tutte le restanti opere pubbliche già di competenza dell'Ufficio B5/DGSAI (v. DM 21.12.2005) con una sola eccezione

² L'incarico fu prorogato nel frattempo con d.l. 150/13 al 31.12.14, ma la legge di conversione n. 15/14 cassò il relativo articolo, determinando peraltro problematiche gestionali faticosamente recuperate.



- (prog. 6053) in quanto alla data del 21.2.2003 già in istruttoria la certificazione di collaudo presso il MiSE (c.1 e c.2 art. 86);
- F) organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Commissariale (c.3 art. 86 L. 289/02; v. anche art. 49 L. 134/12). Nell'ambito del c.3 art. 86 ricade anche l'incombenza di valutare l'onere derivante dal completamento e di informarne il CIPE.

3) Lo stato dell'arte

Si riportano in allegato gli elementi conoscitivi più significativi, aggiornando in sostanza i dati ultimi forniti.

Per non appesantire infatti la presente relazione, si rinvia agli allegati sub1 "Viabilità Lioni - Grottaminarda: intervento di completamento funzionale", sub 2A "Progetti di completamento infrastrutturale con interventi progettuali e costruttivi significativi" e sub 2B "Quadro Generale Progetti art. 86 commi 1 e 2".

Viene altresì riportata una tabella recante gli attuali impedimenti alla chiusura contabile e/o concessoria dei progetti ancora non definiti (all.. 2C).

4) Le risorse e le spese

Fonti di finanziamento

4.1) I lavori di completamento infrastrutturale di progetti già finanziati ex L. 219/81 art. 32 (n. 71) sono stati ultimati in Campania ovvero sono ultimati o in corso di ultimazione in Basilicata senza alcuna richiesta di ulteriori risorse rispetto a quelle residue, per il complesso dei medesimi progetti, all'anno 1997.

Si ritiene di poter chiudere il "pacchetto" addirittura con una economia finale.

L'importo complessivo trasferito al Commissario ammonta ad € 102.018.596,07 di cui spesi al 31.3.2017 circa 67 milioni di €.

4.2) I lavori di completamento funzionale sono finanziati in parte dallo Stato, in parte dalla Regione Campania (v. Accordo Stato/Regione 1.8.2008).

Il totale di progetto di 430M€ dovrà essere sostenuto per 150M€ dallo Stato e per 280M€ dalla Regione.

All'attualità sono stati spesi circa 20 milioni di €.

Finanziamento Regionale

A parte i primi 2,5M€ + 2,5M€ di cui appresso, le risorse vanno fatte risalire allo stanziamento di cui alla Del. CIPE 62/2011 per 220 milioni di €, all'attualità oggetto di finanziamento (a partire dal 2015) per 161.435.990 giusta D.G.R. 446 del 2.8.16.

A tutt'oggi sono stati finanziati in migliaia di €:

- 2.500 erogati sulla c.s. 3250 per avvio progettazione nella misura ridotta di 2.400K€
- 2.500 " " " per avvio espropri
- 161.435.990 finanziati per gli anni 15 ÷ 18 di cui:



- 60 M€ contrattualizzati per il 1° lotto 2° stralcio 1° costruttivo ed erogati limitatamente alla 1^ erogazione di 6.000.000€ sulla c.s. 3250 in data 16.11.17
- 101 M€ circa da contrattualizzare ma attualmente in corso di perfezionamento e comunque all'esame del Commissario per approfondimenti vari.

Pertanto restano da finanziare 53.564.010 sulla citata Del. CIPE 62/11 ed ancora da stanziare 55M€ a carico Regionale.

Finanziamento Statale

A tutt'oggi sono stati finanziati 70M€ di cui erogati 24.548.000 sulla c.s. 3250.

E' in corso di richiesta il 3° acconto.

Restano da stanziare e da finanziare da parte dello Stato 80M€.

5) Le problematiche attuali

La evidente complessità e varietà delle attività Commissariali determina la necessità di articolare sotto capitoli diversi le eventuali differenti problematiche.

5.1) Lavori di completamento infrastrutturale

I relativi 71 progetti ³⁾ ricadenti nelle regioni Campania e Basilicata di cui si dirà nel seguito (v. all. sub. 1 e sub 2A e 2B) aggiornando notizie già ampiamente oggetto delle precedenti Relazioni, sono stati sostanzialmente conclusi con esito del tutto positivo e senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato.

Si rileva tuttavia che:

- a) per 13 progetti (v. all. sub 2C), parte in Campania, parte in Basilicata, non è stato tuttavia possibile procedere alla chiusura contabile o concessoria per la sussistenza di contenziosi nei confronti del MiSE, tutti sorti ante nomina del Commissario. Trattasi tuttavia di provvedimenti essenzialmente formali, essendo tutti i lavori ultimati, collaudati, consegnati, in esercizio.
L'Ufficio è in possesso di tutti i necessari elementi per poter concludere in via definitiva non appena possibile.
- b) La situazione espropriativa trasferita al Commissario, del tutto caotica ed incompleta per le vicende che hanno portato la materia a vari passaggi istituzionali con trasferimenti "a volume" e "a peso" e non a singola pratica, ha comportato una onerosissima ricognizione da considerare forse ancora incompleta, stante il numero enorme di particelle da individuare, eventualmente frazionare, volturare ecc. e di Ditte interessate al pagamento interrotto per anni delle indennità, dei saldi ecc.
L'Ufficio Commissariale ha definito all'attualità migliaia di particelle con oltre 600 transazioni con altrettante Ditte e ne ha in istruttoria altre centinaia (v. all. 3).
E' stata tuttavia da subito impostata la procedura tecnico/amministrativa/economica che ha consentito ad oggi di avere un unico contenzioso contro il Commissario (che peraltro ha visto il ricorrente soccombere in primo grado) ⁴⁾.
I risparmi ottenuti sono risultati essenziali per consentire il completamento di lavori altrimenti impossibile.

³⁾ Come si dirà nel seguito quattro di detti progetti con significativi interventi costruttivi, sono stati articolati per ragioni tecnico/finanziarie in 9 interventi distinti.

⁴⁾ Restano fermi ovviamente ancora i contenziosi non conclusi, attivati nei confronti del MiSE (o di precedenti Amministrazioni) e comunque ante istituzione Ufficio Commissariale che, come detto, bloccano alcune attività commissariali.



Ma soprattutto va considerata la notevolissima economia ottenuta in tanti anni per aver proceduto a moltissimi frazionamenti, a registrazioni, a volture, trascrizioni a favore della P.A. senza alcun onere a carico della stessa⁵.

Sotto lo specifico aspetto ancora molto lavoro deve essere portato avanti, ma nessuna problematica operativa si intravede al momento, a parte questioni connesse con le aree demaniali, peraltro a giudizio del sottoscritto risolvibili solo con un provvedimento legislativo, provvedimento già proposto con gli Uffici della DGIAI ma a tutt'oggi non preso in considerazione dal legislatore.

Una amministrazione con personale idoneo per specifica professionalità e numero potrebbe accelerare certamente i tempi, ma presumibilmente con costi non solo burocratici ma anche amministrativi enormemente superiori a quelli Commissariali⁶.

- c) Il completamento dei lavori può considerarsi sostanzialmente avvenuto.
Come ben evidenziato nel seguito restano soltanto da completare il recupero – in corso – di un Viadotto (Farenga) con sollevamento campate “scivolate” per giunta in curva a seguito di abbandono per contenzioso ecc. ad inizio anni '90; il recupero – con gara in corso – di altro Viadotto (Ficocchia); la pannellatura Galleria (Montenuovo) con gara in corso; piccoli interventi di sistemazione idraulica e/o di viabilità per ricostruzione tratturi e simili, lavori già tuttavia affidati per cottimi; la progettazione di svincolo (Muro Lucano), pure in corso.
Tale ultimo intervento ha subito notevoli ritardi per la difficoltà di localizzazione sul territorio, essendo irrealizzabile la soluzione progettuale trasferita a suo tempo al Commissario.
Quando finalmente con (ultima) Conferenza dei Servizi ne veniva individuata l'esatta posizione, l'ANAC, appositamente interessata⁷ con riscontro non condiviso dal sottoscritto, si esprimeva contro il requisito di complementarietà di detto svincolo.
- d) Anche la consegna delle opere collaudate è intervenuta da parte dell'Ufficio in tutti i casi possibili in testa alle Amministrazioni aventi titolo all'esercizio.
Attualmente (per la parte statale) è in corso il trasferimento in via provvisoria anticipata all'ANAS dell'importante asse Nerico – Muro Lucano di cui allo specifico capitolo nel seguito.
Le preliminari operazioni di statizzazione (e di declassamento di una tratta della attuale Via Appia) sono state sollecitate da tempo dal sottoscritto e risultano attualmente pure in corso.
- e) Piccoli interventi localizzati vengono risolti di volta in volta dal personale dell'Ufficio e dai funzionari avvalsi del Provveditorato OO.PP. di Puglia e Basilicata – poi inglobato nel Provveditorato Campania e Molise, Puglia e Basilicata – che svolgono sostanzialmente tutte le funzioni operative (Direzione Lavori, certificazioni di regolare esecuzione, assistenza e sorveglianza, misura e contabilità, sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, espropriazioni, affidamento lavori con gare pubbliche e/o cottimi, incarichi

⁵ I soli risparmi ottenuti nel settore corrispondono a molte volte 100.000€/anno, ed è certo che solo una struttura Commissariale agile (ed efficiente) poteva pervenire a tale risultato.

⁶ Altra circostanza da tenere presente, almeno da parte di coloro che semplificano le cose demolendo le strutture senza avere idea alcuna di cosa ricostruire, riguarda il ritorno “in ordinario” con l'eliminazione dell'Ufficio Commissariale. Si rammenta che dovrebbe comunque restare la gestione con la “lex specialis” 219/81 (che non rende tuttavia straordinaria l'attuale gestione che ordinaria è già) a meno di non voler reintrodurre l'IVA ecc. ecc. I critici a priori dovrebbero informarsi non solo sull'attività Commissariale ma anche sulle leggi che la regolano.

⁷ Con quesito n. 21.722 del 2.7.15 il sottoscritto chiedeva all'ANAC se un'opera, prevedibile perché necessaria sotto il profilo infrastrutturale/territoriale, ma non definibile perché di non prevedibile localizzazione, una volta individuata rientrasse tra le opere complementari.

L'ANAC a giudizio del sottoscritto in modo precipitoso (anche se dopo qualche mese di tempo) rispondeva per la non complementarietà, né riscontrava successive osservazioni del sottoscritto. Ciò ha determinato e determinerà notevoli ritardi nell'esecuzione, sempre a giudizio di chi scrive, in ossequio ad un principio in base al quale il rigore di principio supera l'interesse pubblico in una visione restrittiva delle leggi, che ovviamente vanno applicate, ma “con giudizio”.



professionali specialistici, liquidazioni e pagamenti, istruttorie certificazioni e monitoraggi ecc.)⁸⁾.

Il solo costo di tali funzioni se date all'esterno avrebbe comportato ovviamente costi pari a 100.000€/anno moltiplicati per "qualcosa". Ma in questa sede interessa segnalare che questo Ufficio oltre a provvedere direttamente e senza ulteriori finanziamenti ad importanti consolidamenti di pendii, sistemazioni di frane intervenute post 1997 ed a significativi lavori idraulici pure non previsti, ha effettuato studi geognostici, indagini specialistiche, monitoraggi topografici, piezometrici ed inclinometrici che ha fornito alla Regione ed a tutti gli Enti pubblici che ne avessero fatto richiesta.

In alcune zone (vedi in particolare in località "Raicelle" di Muro Lucano) occorrono infatti importanti e non troppo differibili interventi di recupero ambientale su vasta scala, certamente al di fuori delle competenze Commissariali.

Problematiche in termini di stabilità potrebbero infatti sorgere negli anni a venire ove non si provveda per tempo. Prioritari sono a giudizio del sottoscritto gli interventi di arginatura del Torrente Malta che corre al piede del movimento franoso, interventi di competenza Regionale ove non Statale di notevole impegno. L'Ufficio Commissariale ha comunque provveduto intanto a realizzare le necessarie opere a protezione della strada.

5.2) Lavori di completamento funzionale

Unico intervento ricadente in tale fattispecie è il progetto di viabilità Lioni – Grottaminarda, pure descritto nel seguito, che nell'immaginario collettivo sembra quasi essere l'unica incombenza affidata al Commissario (v. All. 1).

Il sottoscritto viene infatti generalmente individuato come il "Commissario della Lioni-Grottaminarda", ma è evidente come tale definizione sia assai limitativa, pur trattandosi dell'opera più impegnativa finanziariamente tra quelle di competenza Commissariale.

Le gravi problematiche che attualmente riguardano tale progetto, vengono appresso suddivise tra gli stralci costruttivi in cui viene distinto il progetto esecutivo generale in base alle risorse di volta in volta disponibili.

Attualmente sono in corso di lavoro su finanziamento del MIT un primo stralcio del 1° lotto (indicato come secondo nella del. CIPE 27/12) per 70 milioni di € di progetto, e su finanziamento della Regione Campania un secondo stralcio del medesimo 1° lotto per 60 milioni di € di progetto.

Dalla medesima Regione è stato altresì finanziato un ulteriore importo per circa 101 milioni di € non ancora contrattualizzato, anche per le problematiche nel seguito indicate.

5.2.1) Primo stralcio del I° lotto – tratta funzionale Frigento – Villamaina

Le difficoltà maggiori riguardano al momento proprio tali lavori.

Ad oggi la produzione è in grave ritardo ed a fronte di 18 milioni di € realizzati su € 62.840.019 di lavori compresi oneri concessionario e sicurezza, il tempo contrattuale ha scadenza nell'agosto p.v. a seguito peraltro di una prima proroga.

⁸ E' evidente che detto personale scelto e selezionato, che opera per giunta part-time, debba avere delle motivazioni personali in termini di coscienza del proprio ruolo di dipendente pubblico, e non motivazioni economiche. I componenti della struttura Commissariale (sette funzionari MiSE part-time ed uno a tempo pieno) sono stati esclusi dall'anno 2012 anche da un Progetto Finalizzato che prevedeva compensi tra 400 e 3000€/anno, grazie proprio alla falsa ed ipocrita applicazione di un principio di spending review, già peraltro ampiamente e da tempo applicato dal sottoscritto. La riduzione da 300.000 a 100.000€/anno ha portato anche a questo e la reazione generale di fronte alle critiche riportate da alcuni giornali, ove non ridimensionate, avrebbe portato non solo alle dimissioni del sottoscritto.



5.2.2) Le Riserve. La “confusione operativa”. Il caso del Collaudatore statico

Si è inoltre innescato un pesante contraddittorio tra questa Amministrazione ed il Consorzio Infr.Av. Concessionario di committenza, recentemente sfociato nell'iscrizione da parte di quest'ultimo di riserve per 20 milioni di € circa⁹).

Pur se iscritte in maniera del tutto generica ed a giudizio del sottoscritto irrituale, le responsabilità mosse nei confronti dell'Amministrazione riguardano essenzialmente

- 1) ritardi nella misurazione e contabilizzazione dei lavori;
- 2) ritardi e contraddittorietà in materia di autorizzazioni al subappalto;
- 3) ritardi nel rilascio delle autorizzazioni sismiche per motivi diversi, tra i quali la vacatio per vari mesi della figura del Collaudatore statico.

Tutte responsabilità, a giudizio del Concessionario, attribuibili alla inefficienza gestionale dell'Amministrazione.

Per il rispetto che si deve all'autonomia del D.L. e del RUP, non viene sollevata alcuna considerazione in questa sede dal sottoscritto, che si riserva tuttavia di esprimersi una volta acquisite le relative relazioni.

E' tuttavia evidente che ove dovesse essere riconosciuta la pur minima fondatezza alle domande in questione occorrerebbe ragionare ed assumere determinazioni tempestive e concrete.

5.2.3) La richiesta di proroga

Oltre ad una assai timida richiesta di sospensione dei lavori, certamente insussistente sia in relazione alle produzioni comunque possibili, sia in relazione alla imprevedibilità della durata della vacatio del collaudatore statico che in effetti rappresenta una figura essenziale nell'economia di lavori così importanti e complessi, il Concessionario ha avanzato richiesta di proroga all'agosto 2019, poi aggiornato al dicembre 2019.

Sembra di poter dire che sussistano gli elementi per la concessione di un tempo ulteriore rispetto alla data di ultimazione attuale, fermo restando che l'esame della eventuale proroga e quello delle riserve non debbano essere collegabili e non debbano poter creare vantaggi indiretti alla controparte.

Con l'occasione va sottolineato che il sottoscritto sollecitò ripetutamente al Provveditorato con numerosa corrispondenza la soluzione della questione connessa con la nomina del collaudatore statico, in effetti molto ritardata poiché condizionata da imprevedibili circostanze contingenti e particolari.

Anche in questa circostanza non è corretto che il sottoscritto, in attesa delle valutazioni di competenza di D.L., RUP e del Provveditorato competente, esprima le proprie convinzioni, poiché potrebbero essere considerate come un tentativo di influenzare la libera espressione di ogni altro parere.

⁹ La pretestuosità della quantificazione del danno è evidente *ictu oculi*, ove si mettano a confronto la produzione effettiva ed il costo di impresa che tale produzione avrebbe comportato, per giunta in assenza di sospensioni. Ciò non toglie nonostante l'entità, che la riserva in sé non desti al momento particolare preoccupazione in sé, ma rappresenti invece un motivo di prudenza nei confronti dell'opportunità di sottoscrivere in questa fase nuovi contratti.



5.2.4) Secondo stralcio del I° lotto – Trattata (costruttiva non funzionale) tra Frigento e Grottaminarda

La situazione è nei fatti analoga alla precedente pur se di portata diversa essendo iniziati i lavori nel 2016 a seguito di consegna a fine anno 2015.

L'avanzamento dei lavori è modesto così come i rimborsi per indennità espropriative.

Anche per tale stralcio il Concessionario lamenta insufficienza gestionale dell'Amministrazione.

5.2.5) La contrattualizzazione di nuovi stralci

Come detto la Regione Campania ha finanziato ulteriori 101 milioni circa di progetto.

Sono stati definiti i relativi stralci in un 3° stralcio (per circa 94M€) del 1° lotto ed in un 1° stralcio (per circa 7M€) del 2° lotto.

Come noto l'intero primo lotto è di competenza Infr.Av., il secondo di competenza Infrasud.

Entrambi i Concessionari pressano il sottoscritto per la relativa contrattualizzazione, anche con toni a volte inadeguati.

A parte alcuni adempimenti propedeutici non del tutto perfezionati, ma essenziali per il seguito di competenza, a cura essenzialmente della Stazione Appaltante (Provveditorato) che impediscono nei fatti la contrattualizzazione¹⁰⁾, risulta evidente il rischio che correrebbero le Pubbliche Amministrazioni finanziatrici.

La sottoscrizione dei contratti in argomento potrebbe quasi certamente indurre analoghe pretese questa volta da parte di entrambi i Concessionari, e vanificare il grande sforzo pubblico per realizzare una importantissima viabilità trasformandolo in una eventuale richiesta di risarcimento di danni, veri o presunti che siano.

Il sottoscritto, predisposti tutti gli atti possibili a vantaggio di tempo, e premesso quanto sopra, non intende comunque procedere nelle attuali condizioni ad alcuna contrattualizzazione.

In caso contrario si potrebbero solo esporre Stato e Regione Campania ad un inutile ed irresponsabile esborso di denaro pubblico.

Necessitano in buona sostanza in linea più generale importanti elementi di valutazione ancora mancanti, dalle relazioni sulle attuali riserve, alla riorganizzazione della struttura operativa per la misura e contabilità dei lavori (v. Commissariale n. 26.287 del 27.1.17 all'ADS e quindi da essa all'AGS)¹¹⁾, mentre la problematica connessa all'assenza del collaudatore statico appare ormai superata.

¹⁰ Per il 3° stralcio 1° lotto il sottoscritto, che ha comunque approvato i relativi lavori ed il conseguente quadro di spesa, è tuttora in attesa di verifiche SOA, di comunicazioni su antimafia, di altri chiarimenti ripetutamente sollecitati al Provveditorato avvalso.

Per il 1° stralcio 2° lotto, mancano tuttora anche gli adempimenti ex art. 71 co.3 DPR 554/1999.

¹¹ Non si pensi tuttavia che tale riorganizzazione, con particolare riferimento alla misura e contabilità, corrisponda al riconoscimento anche indiretto di una qualche pretesa del Concessionario. Infatti le eventuali carenze in tal senso darebbero solo diritti in termini di eventuali interessi e non certamente per danni significativi alla produzione.



Nel caso di azioni da parte dei Concessionari nei confronti del sottoscritto sarà cura del sottoscritto medesimo darne tempestiva informativa anche in relazione alle eventuali determinazioni che volessero essere assunte nelle sedi titolate a farlo.

6) Organizzazione della Struttura Commissariale

La Struttura Commissariale si articola in primo luogo in un Ufficio composto dal Commissario, da sette funzionari MiSE part-time (Ufficio di Salerno, uno dei quali oltre ad importanti compiti di Direzione dei lavori svolge le funzioni di Coordinamento dell'Ufficio), più un funzionario MiSE a tempo pieno (Ufficio di Roma) per il coordinamento delle segreterie, con presenza continua e costante presso il sottoscritto e la reperibilità praticamente senza soluzioni di continuità.

Per le attività di Stazione Appaltante, tra le alternative di legge che ne prevedevano l'individuazione nel Provveditorato ovvero nella Provincia competenti per territorio, il sottoscritto operò la prima scelta oltre che per la tradizione e stabilità della struttura decentrata del Ministero e quindi di valenza nazionale, anche per evitare eventuali effetti da modificazioni di carattere politico.

Da sottolineare che tale organizzazione ha funzionato in maniera del tutto soddisfacente nella Regione Basilicata con il personale del Provveditorato Puglia e Basilicata (poi confluito nel Provveditorato Campania e Molise), dove sono stati realizzati gli importanti interventi infrastrutturali altrove descritti¹².

Problemi organizzativi sono invece sorti nella regione Campania in relazione proprio ai lavori della Viabilità Lioni – Grottaminarda, tanto da portare a rendere non facili i rapporti tra Commissario e Provveditorato.

In particolare vengono sollevati i seguenti rilievi nei confronti di tale gestione.

6.1) Particolare farraginosità della Struttura nel suo complesso

Sostanzialmente la Struttura pubblica che governa detta viabilità è composta dall'Ufficio Commissariale di cui sopra, dalla Stazione Appaltante (Provveditorato), dal RUP, dalla Direzione dei lavori.

Per la verità ognuna di tali articolazioni ha i propri precisi compiti che mai dovrebbero interferire o sovrapporsi.

Ma l'aspetto meno condivisibile di una diagnosi che concluda per una certa pesantezza e farraginosità della organizzazione gestionale, si concretizza ove fosse il Provveditorato in primis a lamentarsene, Qui va opposta l'osservazione che il sottoscritto si è avvalso con specifica Convenzione risalente all'anno 2009 dello stesso Provveditorato come Stazione Appaltante giusta art. 33 D.Lgs. 163/06 e quindi titolare di tutte le relative attività.

L'assenza della disponibilità a seguito di interpello dichiarata dal Provveditore pro-tempore per l'incarico di Direttore dei lavori, comportava necessariamente la nomina di un professionista esterno da parte del sottoscritto¹³.

¹² Va detto che anche i lavori di completamento infrastrutturale in Campania (prog. 6063 e prog. 6064) furono condotti con l'avvalimento del Provveditorato Campania e Molise in maniera assolutamente soddisfacente.

¹³ L'incarico esterno era peraltro auspicabile essendo assai improbabile trovare le necessarie competenze per i lavori in esame presso la P.A., a parte la necessità di presenza quasi fissa sui lavori e la reperibilità che ne consegue.



Anche la richiesta regionale, principale finanziatrice dei lavori, di un proprio RUP veniva accolta dal medesimo Provveditorato e decretata dalla Regione senza alcuna intromissione del sottoscritto, non avendone titolo.

In più tutto il personale prescelto per le restanti attività, inclusa la Commissione di Collaudo, è stato giustamente e liberamente individuato dal Provveditore, avendone il sottoscritto solo preso successivamente atto nel rispetto della normativa in materia.

Non sembra davvero che si possano attribuire al Commissario appunti per miopia gestionale, né sembra di poter condividere alcuna sovrapposizione o interferenza di ruoli essendo ciascuno autonomo e complementare agli altri.

Nel merito invece occorre dire che la lettura della fitta corrispondenza intercorsa sulla efficienza operativa dimostra la sentita necessità di modificare qualcosa¹⁴).

Della nomina del Collaudatore statico subentrante al precedente dimissionario si è già detto.

6.2) Mancato pagamento dell'incentivo al personale

Tale effettiva situazione, lamentata dallo stesso Provveditore, costituisce in qualche modo reale giustificazione alle demotivazioni del personale del MIT addetto ai lavori ed a varie istanze di dimissioni.

Ma anche in questo caso sono le stesse disposizioni e circolari ministeriali ad escludere, almeno nel caso in esame, tale possibilità.

Controverse e contraddittorie sono spesso anche le interpretazioni delle norme da parte di varie Sezioni della Corte dei Conti, ma alquanto paradossali sono alcune conclusioni del MIT che, a giudizio del sottoscritto, non distingue i ben diversi rapporti contrattuali tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato, creando peraltro sperequazioni ingiustificabili tra dipendenti pubblici e liberi professionisti nell'espletamento del medesimo incarico.

Tutto quanto sopra è stato sottoposto dal sottoscritto (solo dal sottoscritto!) all'ANAC (v. commissariale n. 24.658 del 28.7.16), che tuttavia pur sollecitata per l'importanza del caso nell'economia dei lavori, non ha dato riscontro a mesi di distanza.

La mancanza assoluta di un supporto giuridico¹⁵, come già segnalato, rende particolarmente gravoso il compito del sottoscritto che può basarsi solo sulla propria esperienza e sullo studio, senza però alcuna conferma nemmeno in prima approssimazione delle proprie convinzioni o interpretazioni.

6.3) Vacatio del Collaudatore statico

Il Collaudatore statico occupa una posizione fondamentale nell'ambito della stessa struttura organizzativa Commissariale e si è già accennato alle conseguenze di un lungo periodo di vacatio di tale figura.

¹⁴ Tali considerazioni non devono indurre a ritenere riconoscibile alcuna pretesa in proposito da parte del Concessionario, non essendo riconducibili ad alcun danno in termini di attività produttive, fatta salva prova contraria.

¹⁵ La riduzione delle spese di funzionamento ad € 100.000 ha comportato la cessazione di una importante consulenza legale. La superficialità e la "arroganza" di tale riduzione è stata oggetto di numerose lagnanze da parte del sottoscritto per la ridotta garanzia da poter dare all'Amministrazione in termini giuridici e legali. Ma nulla da fare e ad oggi qualcuno ritiene che anche i 100.000€/anno costituiscano un costo eccessivo nell'attuale configurazione organizzativa, dimostrando una totale incapacità di valutazione.



Ne caso specifico tra le dimissioni del precedente collaudatore e la nomina del nuovo sono intercorsi circa sei mesi, ma gli effetti negativi sotto il profilo operativo sono stati molto più estesi.

Si conferma la posizione del sottoscritto critica in relazione alle modalità delle dimissioni che si rintraccia nella fitta corrispondenza sull'argomento.

CONCLUSIONI

La vastità della materia trattata dal Commissario non consente una informativa di dettaglio ricognitiva su ogni incombenza, né la possibilità di fornire tutti i relativi commenti ad ogni Relazione.

E' la lettura integrata delle Relazioni prodotte in ogni anno che consente tuttavia di comporre pienamente il mosaico delle attività espletate e delle criticità eventuali.

Si aggiunga che Relazioni bimestrali che consentono un aggiornamento molto significativo, sono costantemente prodotte per il MiSE, mentre sotto il profilo contabile viene redatto un rendiconto annuale completo alla Corte dei Conti sulla contabilità speciale¹⁶.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Ing. Filippo D'Ambrosio)

Allegati:

- All. 1 Viabilità Lioni – Grottaminarda – Stato dell'arte, scheda pagamenti 1° stralcio, corografia schematica, elenco subappalti, elenco autorizzazioni sismiche
- All. 2A Progetti di completamento infrastrutturale con interventi progettuali e costruttivi significativi
- All. 2B Quadro Generale Progetti art. 86 commi 1 e 2
- All. 2C progetti di completamento infrastrutturale ancora non definibili per ragioni essenzialmente di contenzioso con il MiSE
- All. 3 Stralcio elenco transazioni espropriative e relative economie

¹⁶ Come ampiamente descritto in precedenti relazioni il Commissario gestisce due distinte contabilità: la speciale n. 3250 a controllo successivo e la ordinaria 2244 a controllo preventivo.

ALLEGATO 1




Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02

Ministero dello Sviluppo Economico,
Ministero delle Infrastrutture



Regione Campania

S.S.V. LIONI – GROTTAMINARDA

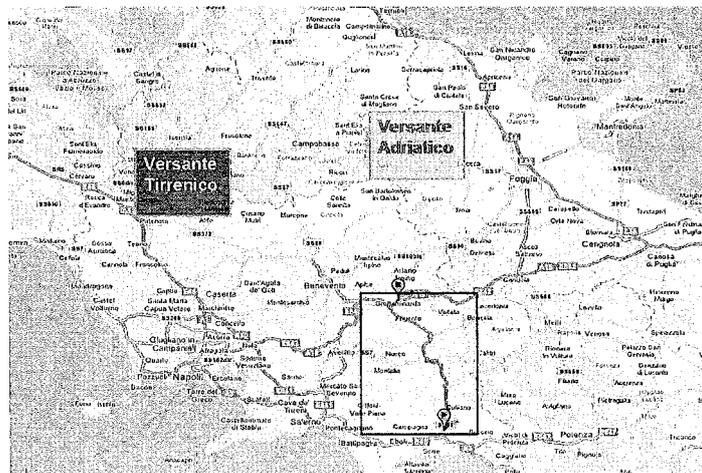



Il Commissario ad Acta art. 86 L. 289/02

**STRADA A S.V. LIONI – GROTTAMINARDA PER IL COLLEGAMENTO
DELL'AUTOSTRADA A3 SA – RC (Svincolo di Contursi) CON
L'AUTOSTRADA A16 NA – BA (Svincolo di Grottaminarda)**

Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario ad Acta ex Art.86 L. 289/02 – Ministero dello Sviluppo Economico

Importo Progetto: 430 ML €

1. Descrizione e obiettivi dell'infrastruttura Lioni – Grottaminarda (euro 430 milioni)

L'infrastruttura viaria Lioni Grottaminarda costituisce il completamento del collegamento, già in parte realizzato, tra la A16 Napoli - Bari e la A3 Salerno - Reggio Calabria e fa parte dell'itinerario più ampio Agropoli – Contursi – Grottaminarda - Termoli, che parte da Contursi Terme raggiungendo Lioni con la SS 691, nota anche come strada a scorrimento veloce Fondo Valle del Sele, prosegue fino a Grottaminarda (Strada a S.V. Lioni-Grottaminarda) e tramite la variante alla SS90, può svilupparsi fino a collegare il basso Tirreno con l'Adriatico fino a Termoli.

Detta infrastruttura viaria, finanziata solo a partire dall'anno 2013 per un primo stralcio, rientrava negli schemi territoriali post terremoto Irpinia ma mai era stata ricompresa nei relativi programmi realizzativi.

Nell'area sono stati invece realizzati, nell'ambito dell'ampio programma di sviluppo finanziato dalla legge 219/81, fin dalla metà degli anni ottanta, diversi nuclei e poli industriali:

- S. Angelo dei Lombardi;
- Grottaminarda;
- Sturno;
- Flumeri;
- Lioni;
- Nusco;
- Colliano;
- Oliveto Citra;
- Contursi;
- Valle Ufita
- Camporeale (Ariano Irpino);
- Centro ortofrutticolo della Comunità Montana Valle Ufita (località Ometa).

È inoltre in previsione la Stazione Comprensoriale "Ariano 2" ovvero l'unica fermata in Irpinia della tratta Caserta -Bari con annesso interporto per scalo merci (località Fiumarelle)

Pertanto il completamento dell'itinerario Contursi (A3) – Grottaminarda (A16) attraverso la realizzazione dei 20 km della **Lioni – Grottaminarda**, consentirà di connettere tutte le aree industriali della zona tra di loro e con le principali direttrici autostradali A16 e A3 verso il nord e verso i porti di Napoli, Salerno, Bari e Gioia Tauro e gli scali ferroviari ed intermodali.

In larga scala, l'intervento in esame costituisce la possibilità di realizzare un sistema infrastrutturale maggiormente interconnesso e gerarchizzato, attraverso il quale potenziare uno schema di collegamenti a "rete" auspicato dal Piano Generale dei Trasporti; consentirà, infatti, di inserire le aree interne dell'Irpinia negli itinerari nazionali di comunicazione e nel sistema logistico nazionale, anche grazie al collegamento dell'arteria con la stazione Irpinia della futura linea ferroviaria ad **alta capacità Napoli - Bari** e con il terminal bus dell'**Air a Grottaminarda**.

Infine rappresenterà una importante via di fuga ovvero di rapido soccorso in caso di calamità ed una certezza in termini di sicurezza e di tempi di percorribilità.


Descrizione sintetica

Al di là delle prospettive di prosecuzione dell'itinerario verso Sud-Ovest fino ad Agropoli e verso Nord-Est fino a Termoli (A14), la nuova infrastruttura consentirà nell'immediato la interconnessione dei diversi insediamenti industriali della zona ed un più agevole collegamento tra queste e le Autostrade A16 (Napoli – Canosa) ed A3 (Salerno – Reggio Calabria), oltre che un generale miglioramento della situazione trasportistica dell'area.

L'opera stradale è localizzata nella Regione Campania, interamente nel territorio della provincia di Avellino; i territori comunali direttamente interessati sono S. Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice, Villamaina, Frigento, Gesualdo e Grottaminarda.

L'intero tracciato di lunghezza circa 19,5 km (al netto degli svincoli) è previsto in nuova sede, e insiste sostanzialmente su territori destinati a "zona agricola" nelle previsioni degli strumenti di pianificazione comunali.

La fascia di intervento interessata dall'itinerario non contiene aree edificate, salvo le poche presenze marginali che sono di modesta entità anche nella zona urbana di Grottaminarda a maggiore consistenza insediativa.

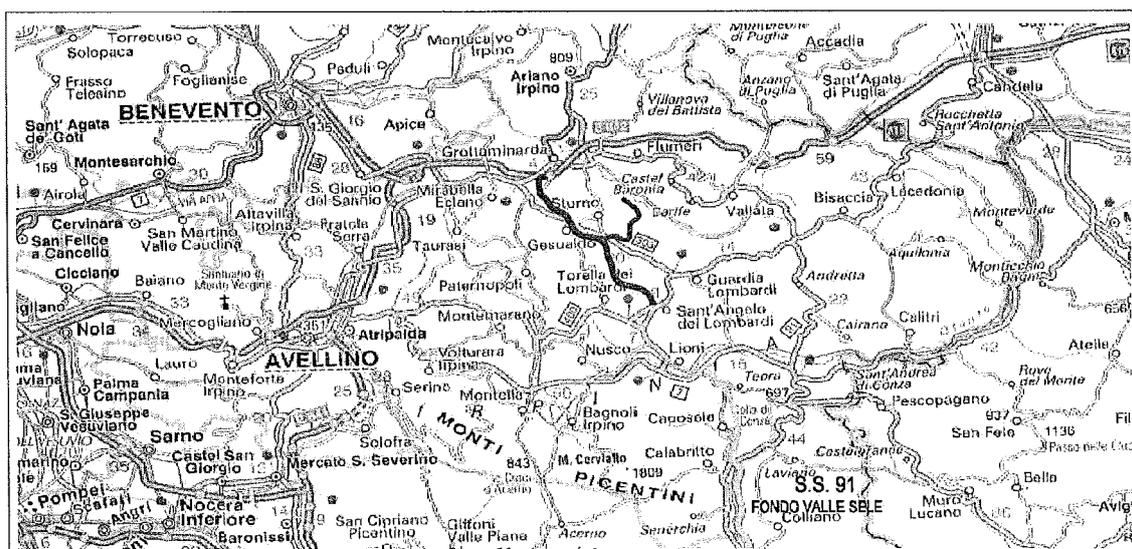

L'infrastruttura in esame è prossima ad alcune aree SIC appartenenti al Parco Regionale dei Monti Picentini, ma non le attraversa.

Dal punto di vista del vincolo archeologico la strada attraversa territori che, se pur ricadenti in comprensorio di certo interesse archeologico, non presentano emergenze di rilievo: il corridoio stradale non tocca aree vincolate né sedi di prevedibili rinvenimenti di significativa importanza.

Per quanto riguarda il rischio frana, gli studi di settore hanno evidenziato le tratte ricadenti in ambiti di attenzione e per essi sono state dimensionate "opere di risanamento e/o sostegno" compatibili con l'ambiente circostante.

Notevoli sono gli interventi al contorno, con particolare riferimento alle sistemazioni idrauliche.

Caratteristiche tecniche:

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| • Sezione | tipo C1 D.M. 05/11/2001 | |
| • Intervallo velocità di progetto | 60 - 100 Km/h | |
| • Pendenza longitudinale (corsia di arrampicamento) | max. 4,85 % | max. 6,09% tra km 17+940 e 19+050 |
| • Lunghezza max dei rettilinei | 940 m | |
| • Raggio di curvatura planimetrico minimo: | 620 m | |
| • Raggio di curvatura altimetrico minimo: | 10.000 m | |
| • Sviluppo complessivo del tracciato | 19.980 m | |
| • N. 17 gallerie artificiali | 1818.30 m | |
| • N. 3 gallerie naturali | 3265 m | |
| • N. 16 Viadotti | 4357 m | |
| • N. 6 Sottovia scatolari | | |
| • N. 24 Tombini | | |
| • Trattati in trincea 20% sviluppo complessivo | | |
| • Trattati in rilevato 30% sviluppo complessivo | | |
| • Svincoli previsti (*) | 5 : | |

- S. Angelo dei Lombardi;
- Villamaina - Terme di San Teodoro;
- Frigento;
- Gesualdo;
- di collegamento con la Variante alla S.S. 90

(*) Oltre all'innesto finale in rotatoria sulla SP 36 in prossimità del casello autostradale di Grottole della A16 Napoli - Bari

Dall'inquadramento funzionale, per la strada in oggetto risulta definito un intervallo di velocità di progetto (60+100) km/h. Per quanto riguarda la sezione trasversale, è stata prevista una sezione tipo C1 che risulta caratterizzata da un'unica carreggiata con due corsie (una per verso di marcia) pari a 3,75 m e banchine laterali pari a 1,50 m, per una larghezza complessiva della piattaforma stradale pari a 10,50 m.

Per la definizione delle tipologie progettuali delle opere d'arte maggiori, in particolare per i viadotti, sono state prese in considerazione le caratteristiche plano-altimetriche del tracciato oltre che la configurazione geometrica delle singole opere; la scelta delle tecniche costruttive adottate è passata, come accennato, anche attraverso un'attenta valutazione dell'inserimento ambientale dell'opera stessa e del suo aspetto estetico finale.

Gli interventi d'inserimento ambientale del tracciato di progetto prevedono la creazione di unità ambientali in grado di assolvere al compito di ricucitura dei margini dell'infrastruttura con le unità ambientali esistenti favorendo, nel contempo, il recupero vegetazionale dell'area interessata dai lavori, con evidenti ricadute positive sul paesaggio o su specifici aspetti di natura geomorfologica.

Nei primi 6,5 km del tracciato (individuati dall'Ufficio Commissariale come 2° Lotto - Infrasad), ricadono cinque viadotti, sul fiume Fredane e nei valloni compresi tra il sistema collinare e il bacino del Fredane stesso, mentre nella restante parte del tracciato (1° Lotto - Infrav), ricadono dieci viadotti, localizzati nelle aree di maggiore qualità ambientale, nei valloni compresi tra il sistema collinare e i due bacini del Fredane e dell'Ufta.

Gli interventi di inserimento ambientale sono, pertanto, destinati da una parte, ad assicurare una effettiva mitigazione degli impatti visuali e paesaggistici con impianti di raccordo degli elementi della struttura (pile, spalle) con le formazioni vegetali presenti ai margini; dall'altra, ad eliminare i segni del cantiere sviluppatosi nelle aree sottoviadotto.

2. Iter amministrativo

Il progetto esecutivo dell'opera, articolato in 1° Lotto (competenza Infrav) e 2° Lotto in continuità (competenza Infrasad) è stato approvato dal Commissario ad Acta ex articolo 2 legge 289/02 con apposito decreto n° **709 del 28/7/2010**.

Tale decreto riassume il precedente iter amministrativo a partire dall'originario affidamento in concessione ai Consorzi INFRASUD ed INFRAV in virtù della art. 32 della legge 219/81 e dell'art. 86 della L. 289/02.

Il suddetto decreto di approvazione all'articolo 1 recita quanto segue:

E' approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della "strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per il collegamento dell'autostrada A3 SA-RC (Svincolo di Contursi) con l'autostrada A16 NA-BA (Svincolo di Grottaminarda)" redatto dal Consorzio INFRASUD per il tratto dalla progressiva 0+450 alla progressiva 6+500 e dal Consorzio INFR.AV per il tratto dalla progressiva 6+500 alla progressiva 19+980 per l'importo complessivo di €430.000.000,00 articolato come segue :

| LAVORI IN CONCESSIONE | Tratto INFRASUD Progr. 0+450 a 6+500 | Tratto INFR.AV Progr. 6+500 a 19+980 |
|---|---|---|
| Importo netto lavori (Progetto esecutivo REV D) | 124.278.064,50 | 227.565.421,77 |
| Oneri Speciali di sicurezza (da elaborato di stima) | 5.714.684,74 | 10.092.570,89 |
| Oneri di concessione (6,00%) | 7.456.683,87 | 13.653.925,31 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| Espropriazioni (da relaz. Giustificativa delle indennità di esproprio) | 1.657.506,16 | 7.334.028,94 |
| Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), lavori in economia, consulenze e varie | 676.150,00 | 1.302.400,00 |
| Imprevisti | 15.362.841,19 | |
| Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione) | 14.073.739,45 | |
| Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 | 831.983,18 | |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | 430.000.000,00 | |

All'articolo 2 dello stesso decreto di approvazione viene stabilito che in caso di finanziamento parziale rispetto alla somma totale sopra determinata si proceda per stralci sulla base delle effettive somme rese disponibili e nei relativi tempi di assegnazione ferme restando condizioni rivolte a conservare invariato l'importo di progetto a carico dell'Amministrazione.

3. Descrizione dei lotti e degli stralci costruttivi realizzabili all'attualità

Con deliberazione n° 62 del 3/8/2011 del CIPE, pubblicata sulla Gazzetta delle Repubblica Italiana del 31/12/2011, nell'ambito dell'assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale per l'attuazione del piano nazionale per il Sud, è stato assegnato all'opera in oggetto un primo finanziamento regionale di **220 milioni di Euro** per la realizzazione di un lotto funzionale nell'ambito della tratta Lioni - Grottaminarda dell'asse nord/sud Tirreno – Adriatico.

Il Commissario con Verbale del 28.11.2011, sentiti i soggetti interessati presso il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise, individuava la tratta funzionale nella tratta Grottaminarda – Frigento per l'importo suddetto.

Con deliberazione n° 27 del 23/3/2012 del CIPE, sono stati assegnati ulteriori **70 milioni di Euro** su finanziamento statale, distribuiti sulle 5 annualità dal 2012 al 2016 e destinati specificamente al tratto tra lo Svincolo di Frigento e lo svincolo Terme di San Teodoro (Villamaina)¹.

Tale ulteriore stanziamento, unitamente al precedente ed alle risorse già trasferite di cui:

- al Decreto dirigenziale della Regione Campania n° 239 del 21 giugno 2007 di **euro 2,5 milioni**;
- al Decreto Dirigenziale dell'Area Generale di coordinamento LL.PP. della Regione Campania n° 148 del 24 luglio 2009 di **euro 2,5 milioni**.

porta l'ammontare attuale complessivo degli stanziamenti attuali a **euro 295 milioni**.

Tenuto conto delle somme così come sopra definite è stato possibile rimodulare gli stralci funzionali realizzabili come appresso:

Una tratta funzionale, di importo pari a **euro 260 milioni** (suddivisibile in stralci secondo gli effettivi finanziamenti), che prevede la realizzazione del tratto di strada compreso tra gli svincoli di Grottaminarda - Frigento- San Teodoro (Villamaina) inclusi i due svincoli di estremità e gli svincoli interni per Gesualdo, Frigento e di collegamento con la variante S.S.90. Inoltre è inclusa la riqualificazione della strada Comunale Napoletana, dallo svincolo di Terme San Teodoro fino alla S.S.428.

Tale tratta consente un agevole collegamento tra i comuni di Villamaina, Frigento, Gesualdo e Grottaminarda. Inoltre consente, sempre attraverso la strada comunale Napoletana che si innesta sullo svincolo di San Teodoro, l'interscambio della nuova arteria con la S.S.428.

Detta tratta funzionale comprende per intero lo stralcio Grottaminarda – Frigento di cui al Verbale del 28.11.2011 sopra citato.

Ai soli fini della identificazione dei finanziamenti e alla luce della intervenuta delibera CIPE n° 27 del 23.3.2012, tale tratta funzionale è suddivisa nelle seguenti sub tratte:

- da **progressiva 7+125 a progressiva 11+937** per euro 70.000.000 (finanziamento MIT) a valere sulla Delibera CIPE n° 27 del 23 marzo 2012 e definita dall'Ufficio Commissariale 1° Lotto, 1° Stralcio;
- da **progressiva 11+937 a progressiva 19+980**; per euro 190.000.000 a valere per :
 - o Euro 186.375.000 sulla Delibera CIPE 62 del 3 agosto 2011;
 - o euro 1.500.000 sul Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 239 del 21 giugno 2007;
 - o euro 2.125.000 sul Decreto Dirig. Area Generale di coordinamento LL.PP. Regione Campania n° 148.

¹ In termini di stanziamenti restano da coprire 135M€, 80 dei quali, giusta Accordo dell'1.8.08, a carico dello Stato ed i restanti 55 a carico Regionale.

Una seconda tratta funzionale (finanziamento regionale), di euro 35 milioni (completamento ai 295 milioni di euro in argomento) prevede la realizzazione dello svincolo per Sant'Angelo dei Lombardi, il completamento della strada fino al km 1+925 ed il collegamento con la S.P.217.

Proseguendo lungo la S.P.217 per circa 7.5 km si arriva sulla strada comunale Napoletana di cui si è detto, percorrendo la quale, per circa 1.5 km si arriva allo svincolo di Terme San Teodoro (Villamaina).

Tale tratta (da indicare come 2° Lotto 1° Stralcio), attraverso la realizzazione del nuovo svincolo, che consente l'immissione della strada esistente Lioni - S. Angelo dei Lombardi alla S.P. n° 78, permette di migliorare il collegamento attuale, che si presenta, allo stato, parziale e con caratteristiche geometriche non compatibili con le disposizioni della normativa vigente, ma soprattutto, consente attraverso il collegamento con la S.P.217, posto al km 1+925, di allacciarsi al 1° stralcio funzionale che parte dallo svincolo di Terme di San Teodoro (Villamaina) e termina a Grottaminarda.

Ai soli fini della identificazione dei finanziamenti dei 35 milioni di euro in argomento e alla luce della intervenuta delibera CIPE 62 del 3.8.2011, tale stralcio funzionale è così finanziato:

- Euro 33.625.000 a valere su Delibera CIPE 62 del 3 agosto 2011;
- euro 1.000.000 a valere su Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 239 del 21 giugno 2007;
- euro 375.000 a valere su Decreto Dirig. dell'Area Generale di coordinamento LL.PP. Regione Campania n° 148.

In conclusione, per rendere attuabili tratte funzionali, l'importo di **220 milioni di Euro di cui alla delibera del 3/8/2011 del CIPE** è distribuito in via definitiva come segue:

- 186.375.000 di Euro al lotto n° I (realizzando il secondo stralcio funzionale in prosecuzione con il 1° stralcio finanziato dal MIT per euro 70 milioni)
- 33.625.000 di Euro al lotto n° II (realizzando il primo stralcio di tale lotto)

Al riguardo, con Delibera della Giunta Regionale n° 650 del 15 dicembre 2014 pubblicata sul BURC n° 85 del 22 dicembre 2014, avente ad oggetto: FSC 2007 – 2013. Delibera CIPE n° 62/2011. Atto aggiuntivo all'APQ "Sistemi di mobilità". Modifica ed integrazione delle DDGGRR 200/2014 e 473/2014", la Regione Campania ha deliberato "di confermare nell'Atto Aggiuntivo all'APQ "Sistemi di mobilità" l'intervento di competenza nazionale già individuato nella delibera CIPE n. 62/11 che risulta già dotato di OGV, costituito da "Asse Nord/Sud Tirreno Adriatico: Lauria – Contursi – Grottaminarda – Termoli – Candela. Tratta Lioni – Grottaminarda. 1° lotto" del costo di 220,00 M€ (Soggetto attuatore Commissario ad Acta ex L. 289/2002).

In data 30 dicembre 2014 è stato sottoscritto tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Campania (Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Programmazione Economica e Turismo e Dipartimento delle Politiche Territoriali – Direzione Generale per la Mobilità), l'Accordo di Programma Quadro "Sistemi di mobilità" relativo alla più volte richiamata Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011.

A seguire, con Delibera della Giunta Regionale n° 47 del 9 febbraio 2015 pubblicata sul BURC n° 13 del 26 febbraio 2015, avente ad oggetto: "Approvazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015 – 2017 della Regione Campania – Approvazione bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017. Modifica n. 367 dell'8 agosto 2014", la Regione Campania ha deliberato "di iscrivere le entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché le relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), della L.R. 5 gennaio 2015, n. 1" (All. 10 alla Delibera).

Nel dettaglio, nell'Allegato 10, alla voce "FSC 2007 – 2013: Accordo di Programma QuadroTratta Lioni – Grottaminarda 1° Lotto – Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011", vengono previsti per competenza vincolata nel triennio 2015 – 2017 euro 175 milioni dei 220 milioni di euro di cui sopra, di cui euro 60 milioni per cassa nel 2015, euro 55 milioni nel 2016 ed euro 60 milioni nel 2017. La messa a disposizione della rimanente somma di euro 45 milioni di cui alla Delibera

CIPE n. 62/2011 è stata prevista dalla Regione Campania nelle annualità successive, come da Decreto Dirigenziale n° 12/2015.

A seguito della Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 446/2016 del 02 agosto 2016 concernente la rimodulazione dei flussi finanziari dell'intervento di che trattasi, sono stati resi disponibili circa euro 144 milioni oltre i 17 milioni circa già previsti per l'anno 2015, per complessivi euro 161.435.990,00, comprensivi dei 60 mln già contrattualizzati.

Tali assegnazioni (Delib. CIPE 62/2011 più Delib. CIPE 27/2012), congiuntamente alle deliberazioni regionali di cui sopra, sono rivolte, si ripete, a consentire la realizzazione delle due tratte funzionali di cui si è detto, per un ammontare complessivo di **295 milioni di Euro** così distinte:

- **260 milioni** di Euro alla **tratta funzionale I** (competenza Infrav, in costruzione per il 1° Stralcio funzionale e per il 2° Stralcio 1° Costruttivo)
- **35 milioni** di Euro alla **tratta funzionale II** (competenza Infrasad, da affidare)

Si evidenzia quindi che, con tali risorse, è possibile realizzare l'asse stradale per circa due terzi del suo sviluppo, con un significativo incremento sia di funzionalità che in termini di benefici per il territorio attraversato.

Si riporta di seguito il quadro di spesa dei due lotti funzionali in analogia con il quadro del progetto esecutivo complessivo approvato con Decreto Commissariale n° 709 del 28.07.2010.

| LAVORI IN CONCESSIONE | Tratto INFRASUD Progr. 0+450 a 1+925 | Tratto INFR.AV Progr. 7+125 a 19+980 |
|---|---|---|
| Importo netto lavori (Progetto esecutivo REV D) | 28.508.080,00 | 211.485.356,24 |
| Oneri Speciali di sicurezza (da elaborato di stima) | 1.229.237,00 | 9.575.816,51 |
| Oneri di concessione (6,00%) | 1.710.485,00 | 12.689.121,37 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| Espropriazioni (da relaz. Giustificativa delle indennità di esproprio) | 865.409,27 | 7.830.076,73 |
| Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), lavori in economia, consulenze e varie | 434.650,00 | 1.302.400 |
| Imprevisti | 9.192.810,74 | |
| Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione) | 9.599.737,25 | |
| Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 | 576.819,89 | |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | 295.000.000 | |

N.B.: Restano da stanziare da parte del CIPE € 135 milioni, di cui € 55 milioni a carico della regione Campania ed € 80 milioni a carico del MIT in base all'Accordo Stato-Regione dell'1.8.2008.

4. Descrizione delle tratte da finanziare per il completamento dell'intervento

Tenuto conto dei finanziamenti di cui al punto precedente, per il completamento dell'opera occorre un ulteriore stanziamento di **euro 135 milioni**, che consentirà:

- l'esecuzione del tratto **da progressiva 1 + 925 a progr. 6 + 500** (competenza Consorzio INFRA.SUD), per l'importo di **euro 115.000.000** circa;

- l'esecuzione del tratto **da progressiva da progr. 6 + 500 a progressiva 7 + 125** (competenza Consorzio INFR.AV.), per l'importo di **euro 19,900** circa.

La Regione Campania avrebbe richiesto un ulteriore importo per €/min 65 nell'ambito del "Piano Sud" per la parte priva ancora di copertura finanziaria nell'ambito del "Programma di Azione e Coesione 2014 – 2020. PROGRAMMA COMPLEMENTARE REGIONE CAMPANIA – Delibera 11/2016 approvato dal CIPE in data 01/05/2016 e pubblicato sulla GU Ord. n. 186 del 10/08/2016.

Alla data odierna, la Regione non ha ancora provveduto ad imputare le somme specificatamente ai progetti in corso.

Il quadro di spesa relativo alle risorse per € 135 milioni necessarie per il completamento dei lavori viene qui riportato:

| LAVORI IN CONCESSIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO | Tratto INFRASUD Progr. 1+925 a progr. 6+500 | Tratto INFR.AV Progr. 6+500 a progr. 7+125 |
|---|--|---|
| Importo netto lavori (Progetto esecutivo REV D) | 95.769.984,46 | 15.732.134,46 |
| Oneri Speciali di sicurezza (da elaborato di stima) | 4.485.447,74 | 516.754,38 |
| Oneri di concessione (6,00%) | 5.746.198,87 | 943.928,07 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| Espropriazioni (da relaz. Giustificativa delle indennità di esproprio) | 1.040.722,00 | 604.056,55 |
| Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), lavori in economia, consulenze e varie | 241.500,00 | - |
| Imprevisti | 5.204.025,18 | |
| Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione) | 4.460.084,96 | |
| Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 | 255.163,29 | |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | 135.000.000 | |

IMPORTO TRATTE FUNZIONALI (risorse stanziare)295.000.000

IMPORTO DA STANZIARE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO..... 135.000.000

TOTALE.....430.000.000

5. 1° Lotto, 1° Stralcio in esecuzione (finanziamento MIT Delib. CIPE 27/2012)

La disponibilità della somma di euro 70 milioni di cui al deliberazione CIPE n° 27 del 23/3/2012 ha portato, nell'ambito del primo lotto funzionale (Infrav) Grottaminarda – Frigento – San Teodoro, alla individuazione di un 1° Stralcio della sub – tratta San Teodoro (Villamaina) – Frigento (da progr. 7+125 a progr. 11+937) ed all'avvio, con la consegna dei lavori del 31 gennaio 2013, delle relative attività.

La tratta ha una lunghezza complessiva pari a circa 5 km.

Prevede la realizzazione dello svincolo di San Teodoro - Villamaina e lo svincolo di Frigento. Inoltre è prevista la rifunzionalizzazione della strada Comunale Napoletana, dallo svincolo di Terme San Teodoro fino alla S.S.428.

Le opere d'arte maggiori previste sono costituite da n° 4 viadotti, per uno sviluppo di circa ml. 881 e n° 6 gallerie artificiali, per uno sviluppo di circa ml. 657.

Sono inoltre previste opere minori varie (sottopassi, tombini, opere di sostegno e di rinaturalizzazione, ecc.).

La tratta consente un agevole collegamento tra i centri di Villamaina e Frigento, alternativo agli attuali collegamenti stradali costituiti dalla S.S.303 e S.S.428.

Inoltre consente, attraverso la strada comunale Napoletana, che si innesta sullo svincolo di San Teodoro, l'interscambio della nuova arteria con la S.S.428 ed il rapido collegamento del centro di Frigento con la stessa S.S.428.

Il quadro di spesa del lotto funzionale è il seguente:

| | | |
|---|----|------------|
| Importo netto lavori | € | 56.850.863 |
| oneri speciali di sicurezza | €. | 2.578.104 |
| oneri di concessione 6% | €. | 3.411.052 |
| Totale lavori | €. | 62.840.019 |
| Somme a disposizione dell'amministrazione: | | |
| Espropriazioni | €. | 2.108.098 |
| Oneri per eliminazione interferenze | €. | 350.646 |
| Imprevisti | €. | 2.290.325 |
| Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.) | €. | 2.274.035 |
| Prezzo chiuso ex art. 133 D.Lgs 163/2006 | €. | 136.877 |
| Importo totale | €. | 70.000.000 |

5.1 Avanzamento delle attività

A valle della consegna dei lavori del 31 gennaio 2013, si è dato corso:

- alle attività tese alla acquisizione dei suoli (decreti di occupazione di urgenza);
- alla immissione in possesso delle aree occorrenti alla esecuzione dei lavori, nonché alle successive attività, delegate al Concessionario, per la definizione della loro acquisizione (stime, pagamenti in conto anticipazione agli aventi diritto, ecc.);
- alle operazioni di bonifica da ordigni residuati bellici;
- ai movimenti di terra, diffusamente su tutto il lotto, ed alle bonifiche dei piani di posa.

Ottenuta la prima autorizzazione sismica, si è dato corso alla esecuzione della galleria artificiale Galleria Vallicocco.

Nel mese di marzo 2015 si è poi dato inizio ad una seconda galleria artificiale (Galleria San Pancrazio), e, nei mesi successivi, ad ulteriori n° 2 gallerie artificiali (Galleria San Marco e Galleria Casino Covone). Al 02/02/2016, con le autorizzazioni sismiche delle Gallerie Artificiali Mefite, si è dato inizio anche ai lavori di realizzazione delle ultime 2 gallerie artificiali. Alla fine del mese di Marzo si è dato inizio anche alla realizzazione del primo Viadotto (Mefite) e, successivamente anche del secondo Viadotto (S. Pancrazio) e del terzo (S. Martino). Nel mese di Marzo del 2017 si è ottenuta, l'autorizzazione sismica anche del 4° ed ultimo Viadotto presente nel lotto in questione, il Rampone per il quale sono iniziate le lavorazioni inerenti l'esecuzione dei pali di fondazione.

Alla data del 31 marzo 2017 tutte le Gallerie Artificiali sono ultimate, mentre le opere relative ai Viadotti sono in avanzata fase di realizzazione e le restanti opere sono in itinere, c/o i competenti Enti, per le approvazioni in materia sismica.

Alla data del 31 marzo 2017, sono stati redatti:

- n° 8 Stati di Avanzamento Espropri a tutto il 31/03/2017 (per rimborso di somme anticipate dal Consorzio agli aventi diritto) per un importo progressivo di circa euro 1.240.000,00; (v. prospetto allegato)
- n° 15 stati di avanzamento per lavori a tutto il 31 dicembre 2016, per un importo di circa euro 19.000.000,00. (v. prospetto allegato)

Sempre alla data del 20 ottobre 2016 è in fase di redazione il 16° Stato di Avanzamento lavori al 28/02/2017, per un importo complessivo di circa 20.500.000,00.

Alla data del 31 marzo 2017 l'impiego di personale tecnico ed operaio, diretto ed indiretto, è di circa 90 unità, mentre a regime è previsto un impiego sul 1° Lotto – 1° Stralcio di circa 120 unità, a cui va aggiunto tutto il personale relativo all'indotto.

Eventi non prevedibili stanno determinando ritardi nell'esecuzione dei lavori. Sono in corso provvedimenti per il recupero dei tempi.

Si veda in proposito il capitolo sulle attuali problematiche, inserito nel testo della Relazione semestrale alla data del 31.3.17.

6. Lavori del 1° Lotto 2° Stralcio 1° Costruttivo (Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011)

A seguito della Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 47/2015 e del Decreto Dirigenziale n° 145/2015 e del Decreto Dirigenziale n° 12/2015, che ha disposto l'impegno di euro 60 milioni per l'anno 2015, si è definito il 2° Stralcio (1° Costruttivo) e si sono avviate, con la consegna dei lavori del 16 novembre 2015, le relative attività propedeutiche.

Lo stralcio costruttivo, ricompreso all'interno della Scheda n° 2, ha una lunghezza complessiva di circa 3 km.

Prevede, in quanto individuata come lotto Costruttivo, la realizzazione puntuale di alcune opere d'arte maggiori o parti di esse, che nel dettaglio sono:

- Galleria Naturale S. Filippo e relativo Cunicolo di Servizio;
- Viadotto San Silvestro;
- Viadotto Schivito Macchie;
- Galleria Artificiale Macchie;
- Galleria Artificiale Pratola;
- Galleria Artificiale SS 90.

Il quadro di spesa del lotto costruttivo in esame, approvato con decreto commissariale n° 1419 del 14 settembre 2015, è il seguente:

| | | |
|---|----|------------|
| Importo netto lavori | € | 48.117.134 |
| oneri speciali di sicurezza | €. | 3.004.149 |
| oneri di concessione 6% | €. | 2.887.028 |
| Totale lavori | €. | 54.008.311 |
| Somme a disposizione dell'amministrazione: | | |
| Espropriazioni | €. | 1.805.086 |
| Oneri per eliminazione interferenze | €. | 317.054 |
| Imprevisti | €. | 1.829.863 |
| Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.) | €. | 1.924.686 |
| Prezzo chiuso ex art.133 D. Lgs 163/2006 | €. | 115.000 |
| Importo totale | €. | 60.000.000 |

6.1 Avanzamento delle attività

A valle della consegna per l'avvio delle attività espropriative del 17 settembre 2015, si è dato corso alle attività tese alla acquisizione dei suoli, espletando tutte le procedure previste ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/01 mediante la pubblicazione sia su quotidiani che all'Albo Pretorio dei comuni interessati; sono state, inoltre, espletate e concluse le attività previste dall'art. 17 del D.P.R. 327/01 mediante notifica ai singoli soggetti interessati con raccomandata A/R e pubblicazione all'Albo Pretorio dei comuni interessati per i soggetti sconosciuti o non reperibili.

Con l'emissione del decreto commissariale n° 1494 del 13 gennaio 2016 l'Autorità espropriante ha emesso il Decreto di occupazione di urgenza preordinata all'esproprio.

Si è dato corso quindi:

- alle attività tese alla acquisizione dei suoli (decreti di occupazione di urgenza);
- alla immissione in possesso delle aree occorrenti alla esecuzione dei lavori, nonché alle successive attività, delegate al Concessionario, per la definizione della loro acquisizione (stime, pagamenti in conto anticipazione agli aventi diritto, ecc.);
- alle operazioni di bonifica da ordigni residuati bellici;

- all'accantieramento.

Alla data del 31 marzo 2017, ottenute le prime autorizzazioni sismiche rispettivamente in data 14 marzo e 21 marzo, risultano in esecuzione dal 16 marzo le opere di sottofondazione della Galleria Artificiale Macchie e dal 23 marzo le paratie di pali degli imbocchi della Galleria Naturale San Filippo. Tutte le altre principali opere sono in itinere, c/o i competenti Enti, per le approvazioni in materia sismica.

Alla data del 31 marzo 2017, sono stati redatti:

- n° 3 Stato di Avanzamento Espropri a tutto il 31/03/2017 (per rimborso di somme anticipate dal Consorzio agli aventi diritto) per un importo progressivo di circa euro 625.000,00;
 - n° 1 stato di avanzamento per lavori a tutto il 30 giugno 2016, per un importo di circa euro 75.000,00.
- Sempre alla data del 31 marzo 2017 è in fase di redazione il 2° Stato di Avanzamento per lavori al 31/12/2016, per un importo complessivo di circa 200.000,00 .

Alla data del 31 marzo 2017 l'impiego di personale tecnico ed operaio, diretto ed indiretto, è di circa 60 unità, mentre a regime è previsto un impiego sul 1° Lotto – 1° Costruttivo di circa 120 unità, a cui va aggiunto tutto il personale relativo all'indotto.

Eventi non prevedibili hanno determinato ritardi nell'esecuzione dei lavori. Sono in corso provvedimenti per il recupero dei tempi.

In data 16.11.2016 la Regione ha versato un acconto sulla contabilità speciale commissariale 3250 per € 6.000.000

7. Nuovi stralci

E' stato quindi approntato un progetto stralcio denominato 1° lotto 3° stralcio, ricompreso all'interno della scheda n° 2 , dell'importo di euro 94.220.990,00, approvato con decreto commissariale n° 1619 del 07.02.2017.

E' stato inoltre approntato, per i rimanenti euro 7.125.000,00, un ulteriore stralcio, denominato 2° lotto 1° stralcio, il cui progetto è in fase di approvazione, e che consentirà di dare avvio anche al tratto di competenza del Consorzio INFRASUD.

Attualmente sono in corso approfondimenti finalizzati alla contrattualizzazione.

Viene unita in allegato una corografia con indicazione dei vari lotti e stralci.

8. Composizione societaria dei Consorzi concessionari

La realizzazione dell'infrastruttura è affidata in concessione a due Consorzi, con la seguente suddivisione ed attuale composizione societaria:

- il tratto da **progr. 0 + 00 (Inizio lotto) a progr. 6 + 500** al **Consorzio INFRA.SUD**, composto dalle seguenti Società:
 - CONIC 2 S.r.l.
 - S.A.F. 2 S.r.l.
- il tratto da **progr. 6 + 500 a progr. 19 + 980 (Fine lotto)** al **Consorzio INFR.AV.**, composto dalle seguenti Società:
 - Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.
 - Italiana Costruzioni S.p.A.
 - Marino Costruzioni S.r.l.
 - S.A.F. 3 S.r.l.

**COMMISSARIO AD ACTA EX ART. 86 LEGGE 289/02
ATTUAZIONE INTERVENTO AL 29/02/2016**
**Strada a scorrimento veloce Lioni Grottamarda per il collegamento dell'Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria
(Svincolo di Contursi) con l'Autostrada A16 Napoli – Bari (Svincolo di Grottamarda) – 2° stralcio funzionale (*), dallo
svincolo di Frigento allo svincolo di San Teodoro Villamaina**

(*). Così individuato dalla delibera CIPE n° 27 del 23 marzo 2012. Il Commissario ha individuato le stesse opere come 1° Lotto 1° stralcio funzionale.

Fonte legislativa finanziamento: Art. 32, comma 1, D.L. 06/07/2011, n. 98

Importo finanziamento: € 70.000.000,00

Estremi delibere CIPE: Delibera n. 27 del 23 marzo 2012

| CUP e C/G | Intervento (Oggetto, chilometriche) | Quadro economico del progetto messo a gara | Quadro economico del progetto rimodulato a seguito di gara (1) (2) | Quadro economico o perizia di variante (Ripartiri e TUTTE) | Tempo contrattuale esecuzione lavori | Consegna lavori ed estremi verbale di consegna | Data effettiva ultimazione lavori ed estremi certificato | Accenti erogati dal Ministero | Pagamenti effettuati dal soggetto aggiudicatore (€) | Importo SAL n° 15 al 31/12/2016 (€) | Avanz. lavori in % | Estremi collaudo/ CRE e dell'atto di approvazione | Nota |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|---|------|
| CUP B61B03000270005 C/G 26043086F1 | SS.V. Lioni-Grottamarda 1° Stralcio Funzionale dallo svincolo di San Teodoro (Villamaina) a Frigento. Da pk 7+125 a pk 11+937 | LAVORI: 56.850.862,91 SICUREZZA: 2.578.104,00 ONERI CONC.: 2.411.051,77 SOMMARIO: 62.840.018,68 SOMME A DISPOSIZIONE Espropri: 2.108.098,00 interferenze: 350.646,00 Imprevisti: 2.290.325,32 Spese gen.: 2.274.035,00 Prezzo chiuso: 136.877,00 SOMMARIO: 7.159.951,32 TOTALE PROGETTO € 70.000.000,00 | IDEM | // | 99 1460+ 192 | Verbale di consegna del 31/01/2013 | Lavori in corso | | Stati avanzamento Espropri SAE N° 1 272.200,00 SAE N° 2 510.100,00 SAE N° 3 79.500,00 SAE N° 4 342.500,00 SAE N° 5 76.400,00 SAE N° 6 95.300,00 SAE N° 7 41.255,00 1.217.285,00 Stati avanzamento Lavori SAL N° 1 496.125,12 SAL N° 2 402.919,21 SAL N° 3 389.299,41 SAL N° 4 411.715,27 SAL N° 5 436.347,88 SAL N° 6 1.411.745,52 SAL N° 7 2.376.720,80 SAL N° 8 1.823.859,73 SAL N° 9 1.089.946,26 SAL N° 10 2.194.230,93 SAL N° 11 767.752,11 SAL N° 12 1.271.340,49 SAL N° 13 1.578.799,40 SAL N° 14 2.553.725,02 SAL N° 15 1.620.383,84 18.834.840,79 | 19.029.862,94 | 30,283% | Lavori in corso | |

Essendo i lavori in notevole accelerazione si chiede l'erogazione di € 5.000.000 previsti per l'anno 2013 dalla Delibera CIPE n° 27/2012. Avendo utilizzato l'80% della somma erogata con le precedenti tranches per un importo di € si chiede l'erogazione di € di cui € per oneri di sicurezza, € per IVA (sui lavori), € per altre somme a disposizione assegnate dalla delibera CIPE n. 27/2012.

Si dichiara che le spese sostenute riguardano esclusivamente l'intervento dal km. 7+125 al km. 11+937.

Detti dati trovano conferma nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29/12/2011, n. 229, ai successivi decreti MEF del 26.2.2013 e del 1.8.2013 e alla circolare MEF n. 14 del 8.4.2014. Si dichiara di aver attuato, ognuno per la propria competenza, le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 ed in modo particolare dagli articoli 31, 101 e successivi.

I firmatari della presente scheda forniscono i dati in essa contenuti, consapevoli delle responsabilità di cui all'art. 76 D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i.

Data,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
firma e timbro

IL COMMISSARIO AD ACTA
Firma e timbro

IL DIRETTORE DEI LAVORI
firma e timbro

Leggenda:

- 1) Se ci sono variazioni nelle voci rispetto alla colonna precedente, inserire un'altra colonna riportante l'ultimo quadro economico approvato prima della gara e motivare tale variazioni
- 2) Indicare l'importo lordo dei lavori, il ribasso d'asta con la relativa percentuale, l'importo netto dei lavori, gli oneri per la sicurezza e le somme a disposizione

SUB-APPALTI
 Importo dei lavori affidati per il primo lotto Funzionale
 Importo dei lavori affidati per il primo lotto Costruttivo
 Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso primo lotto Funzionale
 Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso primo lotto Costruttivo

€ 56.600.662,24 (art. 2 C.S.A.) - Opere Stradali 3.4.1.6.559.24 € 30% = 10.235.567,77 €
 € 48.117.134,77 (art. 2 C.S.A.) - Opere Stradali 13.4.25.168.83 € 30% = 4.391.350,65 €
 € 2.574.104,00
 € 3.004.149,76

| CONS. | TRATTO | COMITE CONCESSORIO | DATA ARRIVO NOTA AL D.L. | IMPRESA SUB-APPALTRICE | LAVORI | IMPORTO CONTRATTO | D. CUM PER LAVORI | PER SICUREZZA | IMPORTO LAVORI COMMITTENTE | %RIBASSO APPLICATO | %CONTRATTO SUL COMPLESSIVO | NOTE D.L. | AUTORIZ. R.U.P. | AUTOREZ. C.S.F.E. (Verifica COS) | COORDINAM. CARLO VITALE (da 25/07/16) | AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRAE. TRASP. PROV. INTER. OO.PP. CAMPANIA-NOISE | AUTORIZZAZIONE OO.PP. COMMISSARIO AD ACTA | NOTE | |
|---------|-------------|---------------------------------|--------------------------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|
| Inf.Ax. | 1° STRALCIO | S.A.F.S. S.r.l. | 10-giu-13 | "A.B.C. GENERAL ENGINEERING S.R.L." | Bonifica argini bellici | € 230.000,00 | € 222.635,31 | € 6.750,00 | € 274.352,70 | 18,85% | 0,40% | nota d.l. del 17/05 con non conformità | RUP a Prov. prot. n. 27944 del 24/10/13 (Verbale del 10.10.15) | proct. n. 58520 del 10/10/13 | | Comin. Ad Acta prot. n. 18.415 del 30/09/2013 | | | |
| Inf.Ax. | 1° STRALCIO | INTERGRAZIE CHARMENTI | 03-lug-13 | | | € 305.477,19 | € 293.956,07 | € 69.884,18 | € 274.352,70 | 19,93% | 0,54% | nota d.l. del 15/07/16 con non conformità | RUP a Prov. prot. n. 27944 del 24/10/13 | proct. n. 58520 del 10/10/13 | | Comin. Ad Acta prot. n. 18.415 del 30/09/2013 | | | |
| Inf.Ax. | 1° STRALCIO | INTERGRAZIE CHARMENTI | 19-lug-13 | | | | | | | | 0,00% | | | | | | | | |
| Inf.Ax. | 1° STRALCIO | S.A.F.S. S.r.l. | 20-ago-13 | "CASTELLANO COSTRUZIONI S.P.A." | S.A.L. FINALE € 101.144,9 | | | | | | | | RUP prot. n. 30 del 20/02/14 | proct. n. 0000796 del 20/02/14 | | | | Nota INFRAV n. 701 cessione ramo di azienda | |
| Inf.Ax. | 1° STRALCIO | S.A.F.S. S.r.l. | 29-mar-10 | "CASTELLANO COSTRUZIONI S.P.A." | Movimenti massoni | € 5.437.824,81 | € 5.263.851,06 | € 224.144,76 | € 0,00 | | 0,00% | nota d.l. del 15/11, incanti del 18.11.17,12.12 - nota d.l. del 18.11.17,12.12 | RUP prot. n. 30 del 20/02/14 | proct. n. 0000796 del 20/02/14 | | | | | |
| Inf.Ax. | 1° STRALCIO | S.A.F.S. S.r.l. | 09-giu-16 | IDEM | GISSIONE FIANCO DI AZIENDA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | NN | | | | | | Richiesta integrazione con nota anal. 20/12 del 27/08/16 |
| Inf.Ax. | 2° STRALCIO | CONDOTTE | 05-mar-16 | "CASTELLANO COSTRUZIONI S.r.l." | Forma di 33 metri di materiale arido e di 30 cm di manto stabilizzato per strada di servizio | € 9.325,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| Inf.Ax. | 1° STRALCIO | S.A.F.S. S.r.l. | 22-feb-15 | "MARCHESE GROUP S.r.l." - NOTAFRAV N. 64 DEL 18/01/15 - AZIENDA "MARCHESE GROUP FONDAZIONI" | Pali grande diametro | € 1.546.050,75 | € 1.479.512,68 | € 68.578,07 | € 0,00 | | | | nota d.l. del 05.10.16 e note del 13.02.16 per verifiche 09/03/16 da congrua modifica ad integrazione - nota d.l. n. 53 del 07.11.16 | RUP prot. n. 30 del 20/02/14 | proct. n. 0000796 del 20/02/14 | | | | Nota d.l. del 05.10.16 di integrazione documenti - proct. n. 29880 del 18/10/16 PARERE FAVOREVOLE |
| Inf.Ax. | 1° STRALCIO | S.A.F.S. S.r.l. | 22-feb-15 | IDEM | Integrazione per scavi di drenaggio | € 112.880,00 | € 107.301,53 | € 5.078,07 | € 0,00 | | | | | | | | | | PARERE FAVOREVOLE |
| Inf.Ax. | 2° STRALCIO | MARINO COSTRUZIONI | 25-feb-16 e 15/02/16 | IDEM | Pali grande diametro ad aste drenanti | € 130.000,00 | € 112.800,00 | € 7.200,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | PARERE FAVOREVOLE |
| Inf.Ax. | 1° STRALCIO | S.A.F.S. S.r.l. | 05-mar-16 | "CO.E.B. S.R.L." | Pali grande diametro e urti | € 680.566,00 | € 680.178,00 | € 38.417,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | proct. n. 37775 del 02.11.16 |
| Inf.Ax. | 1° STRALCIO | INTERGRAZIE importo sub-appalto | 17-ago-13 | IDEM | Bonifica argini bulloso | € 96.324,41 | € 95.047,26 | € 4.277,13 | € 0,00 | | | | | | | | | | PARERE FAVOREVOLE |
| Inf.Ax. | 1° STRALCIO | CONDOTTE | 05-mar-14 | IDEM | | € 2.493.385,75 | | | € 0,00 | | | | | | | | | | proct. n. 0003288 del 14/02/14 |
| Inf.Ax. | 2° STRALCIO | CONDOTTE | 18-ott-16 | IDEM | | € 151.175,13 | € 144.865,20 | € 6.509,93 | € 0,00 | | | | | | | | | | proct. n. 0003288 del 14/02/14 |
| Inf.Ax. | 2° STRALCIO | MARINO | 22-feb-16 | IDEM | Bonifica argini bulloso | € 19.447,27 | € 18.869,47 | € 777,50 | € 0,00 | | | | | | | | | | proct. n. 0003288 del 14/02/14 |
| Inf.Ax. | 1° STRALCIO | S.A.F.S. S.r.l. | 17-ago-14 | "ARCO S.A.L." | posa in opera dis. cassafornelli acciaio | € 10.600,00 | € 10.300,00 | € 300,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | proct. n. 0018694 del 20/05/16 il Provveditorato prende atto del sub-appalto determinato non l'88 |
| Inf.Ax. | 1° STRALCIO | S.A.F.S. S.r.l. | 22-feb-15 | IDEM | samboreatura pali | € 391.055,56 | € 346.298,76 | € 5.386,59 | € 0,00 | | | | | | | | | | proct. n. 0018694 del 20/05/16 il Provveditorato prende atto del sub-appalto determinato non l'88 |
| Inf.Ax. | 1° STRALCIO | S.A.F.S. S.r.l. | 28-mar-16 | IDEM | posa in opera dis. cassafornelli acciaio | € 98.164,00 | € 93.716,00 | € 4.448,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | proct. n. 0018694 del 20/05/16 il Provveditorato prende atto del sub-appalto determinato non l'88 |
| Inf.Ax. | 1° STRALCIO | S.A.F.S. S.r.l. | 28-mar-16 | IDEM | Realizzazione impianto drenante | € 749.770,31 | € 717.498,43 | € 32.268,88 | € 0,00 | | | | | | | | | | proct. n. 0018694 del 20/05/16 il Provveditorato prende atto del sub-appalto determinato non l'88 |
| Inf.Ax. | 1° STRALCIO | S.A.F.S. S.r.l. | 28-mar-15 | "GENERAL SERVICE S.r.l." | Realizzazione impianto drenante | € 14.400,00 | € 13.752,00 | € 648,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | proct. n. 0018694 del 20/05/16 il Provveditorato prende atto del sub-appalto determinato non l'88 |
| Inf.Ax. | 1° STRALCIO | S.A.F.S. S.r.l. | 11-feb-15 | "CALCESTRUZZI IRPNI S.p.A." | Formatura e posa di sopraluce di allumina per ripristino opere provvisorie | € 14.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | 0,27% | NN - Cava provvisoria non contrattata il "vano nullo" | | | | | | | proct. n. 0018694 del 20/05/16 il Provveditorato prende atto del sub-appalto determinato non l'88 |

| CONS. | TRATTO | COMITE | NOTA CONGR. CONGR. O | DATA ARRIVO NOTA AL D.L. | IMPRESA SUB-APPALTATRICE | LAVORI | IMPORTO CONTRATTO | DI CUI PER LAVORI | PER SICUREZZA | IMPUNTO LAVORI COMMITTENTE | %RIBASSO APPLICATO | %CONTRATTO SUL COMPLESSIVO | NOTE DL | AUTORIZ. R.U.P. | AUTORIZ. C.S.F.F. (Verifica FOS) | COORDINATORE CARLO VITALE (da 25/07/16) | AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRAE. TRASP. PROV. INTER. OO.PP. CAMPANIA-HOUSE | AUTOCERTIFICAZIONE COMMISSARIO AD ACTA | NOTE | |
|----------|-------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---|-----------------|----------------------------------|---|--|--|------|--|
| Int. Av. | 1° STRALCIO | S.A.F.S. S.r.l. | 20.08.16 N. 1193 | 30-ago-16 | "IDEM" | Fornitura e posa di conglomerati bituminosi per la pavimentazione provvisoria | € 14.000,00 | € 13.350,00 | € 810,00 | € 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | |
| Int. Av. | 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO | ITALIANA COSTRUZIONI | 23.03.17 N. 504 | 25-mar-17 | "IDEM" | Fornitura e posa di conglomerati bituminosi per la pavimentazione provvisoria | € 19.115,00 | € 17.299,92 | € 815,18 | € 0,00 | #DIV/0! | 134,25% | | | | | | | | |
| Int. Av. | 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO | ITALIANA COSTRUZIONI | 21.01.16 N. 27 | 21-ott-16 | "B.M. SERVICE S.R.L." | Bonifica argilli ballati | € 39.000,00 | € 39.456,00 | € 2.434,00 | € 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | Nota dl. n. 19.05.16 AL 007/16 di PARERE POSITIVO Nota DL prot. n. 9/17 del 19/02/16 di PARERE POSITIVO espresso con la nota 7/16 del 19/02/16 del contratto principale | | | | | | | |
| Int. Av. | 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO | ITALIANA COSTRUZIONI | 07.02.16 N. 1896 | 07/12/2016 | "IDEM" | Bonifica argilli ballati (ATTO AGGIUNTIVO) | € 10.552,34 | € 10.550,16 | € 802,18 | € 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | |
| Int. Av. | | "OTTOEBRE GROUP S.R.L." | | | | Formazione trincee drenanti | € 606.946,79 | € 616.851,45 | € 17.085,54 | € 0,00 | #DIV/0! | 11,89% | | | | | | | | |
| Int. Av. | 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO | S.A.F.S. S.r.l. | 28.01.16 N. 47 18.02.16 N. 131 | 28-ott-16 | "AAS IMPIANTI" | Adattamento impianti elettrici locali J.F.I.C. centralizzata | € 3.953,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | |
| Int. Av. | 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO | MARINO | 26.04.16 N. 407 19.05.16 N. 543 | 26/04/2016 27/05/16 | "COSTRUZIONI LO RUSSO" | movim. opere di difesa e sistemazione argenti | € 246.000,00 | € 235.500,00 | € 12.500,00 | € 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | Indagine integrativa con nota n. 5/3 del 27.04.16; la nota n. 5/3 del 19.05.16 di modifica del 27.05.16 alla nota n. 5/3 del 19.05.16; la nota n. 5/3 del 19.05.16 del 27.05.16 per modifiche ed integrazioni, note n. 1/1 del 18.07.16 e n. 2/1 del 18.07.16 PARERE POSITIVO | | | | | | | |
| Int. Av. | 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO | CONDOTTE | 06.05.16 N. 619 31.07.16 N. 592 28.05.16 N. 592 e modifiche e integrazioni Scadenza termini x autorizzazione | 26-ago-16 | "IDEM" | movim. opere di difesa e sistemazione argenti | € 514.468,40 | € 492.150,98 | € 20.278,52 | € 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | Nota DL n. 55.16.LG del 07/05/16 per modifiche ed integrazioni alla nota n. 55 del 01/05/16 DINEGO-PARERE POSITIVO con nota prot. n. 141 del 24.11.16 Nota n. 35.16.LG del 06/08/16 parere non dovuto | | | | | | | |
| Int. Av. | 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO | CONDOTTE | 26.05.16 N. 610; 10/01/16 n. 1415 ricevuto n. 28390 Prov. | 26-mar-16 | "IDEM" | Strada di servizio cantiere di lavoro g. S. S. Filippo | € 104.726,00 | € 101.585,00 | € 3.141,00 | € 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | |
| Int. Av. | 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO | MARINO | 22.05.16 N. 772 | 22-giu-16 | "IDEM" | Opere infrastrutturali per allineamento di cantiere | € 25.000,00 | € 23.440,00 | € 1.560,00 | € 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | |
| Int. Av. | 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO | CONDOTTE | 13.01.17 N. 43 | 19-gen-17 | "LO RUSSO" | Completamento Strada imbocco nord g.n. S. Filippo | € 86.986,50 | € 84.359,50 | € 2.627,00 | € 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | |
| Int. Av. | 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO | CONDOTTE | 30.03.17 N. 535 | 30-mar-17 | "LO RUSSO" | Interventi di manutenzione ed ampliamento di base imbocco sud g.n. S. Filippo | € 86.986,50 | € 84.359,50 | € 2.627,00 | € 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | |
| Int. Av. | 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO | CONDOTTE | 23.04.17 N. 565 | 03-ago-17 | "LO RUSSO" | base imbocco sud g.n. S. Filippo e scavi per espansione della base imbocco sud g.n. S. Filippo | € 140.224,40 | € 131.810,84 | € 8.413,56 | € 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | |
| Int. Av. | 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO | CONDOTTE | 03.04.17 N. 566 | 03-ago-17 | "LO RUSSO" | Cordolo di sovraincasso per il canale di drenaggio parallelo imbocco sud g.n. S. Filippo | € 11.253,96 | € 10.978,72 | € 875,24 | € 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | |
| Int. Av. | 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO | CONDOTTE | 23.12.16 N. 11460 credite | 23-dic-16 | "DALO RUSSO A CALCESTRUZZI (BPM) | Fornitura e trasporto Trapezoidi inerti | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | |
| Int. Av. | 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO | CONDOTTE | 26.01.17 N. 105 | 26-gen-17 | "DALO RUSSO A CALCESTRUZZI (BPM) IN ITALIA GROUP S.r.l." | Trapezoidi inerti | € 72.730,70 | € 65.309,72 | € 4.423,98 | € 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | |
| | | | | | | | € 690.195,90 | | | | | | | | | | | | | |

| CONS. | TRATTO | COMITE | NOTA CONCESSIONARIA | DATA ARRIVO NOTA AL D.L. | IMPRESA SUB-APPALTATRICE | LAVORI | IMPORTO CONTRATTO | DI CUI PER LAVORI | PER SICUREZZA | IMPORTO LAVORI COMMITTENTE | %RIBASSO APPLICATO | %CONTRATTO SUL COMPLESSIVO | NOTE DL. | AUTOREZ. R.L.P. | AUTORIZ. C.S.F.E. (Verifica DS) | COOR. MAN. CARLO VITALE (da 23/07/16) | AUTORIZZAZIONE MINISTERIO OO.PP. CAMPANIA-MOLISE | AUTOCERTIFICAZIONE COMMISSARIO AD ACTA | NOTE | |
|-------|--|----------------------|---|--------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|------|--|
| IM-AN | 2° STRALCIO FUNZIONALE 1° COSTRUTTIVO | ITALIANA COSTRUZIONI | 04.05.16 N. 457 - 13.07.16 n. 391 INTERSEZIONALI | 04/05/2016-13/07/16 | "ADRENALINA S.R.L." | Pali (piccolo diametro ed aste sventagliate) | € 364.054,55 | € 346.376,55 | € 15.578,00 | | | | Incremento di ricictrificanda 1300516. Incontro studiosi il 26/07/16. Richiesta di autorizzazione del 24/05/16. In data 26/07/16 parere negativo dell'ASL. Richiesta di autorizzazione pervenuta da società di progetto. (Nota richiesta da 26/07/16 in data 26/07/16. Nota DL n.34 del 01/09/16 parere positivo) | | 27/07/16 mail Richiesta parere D.L. | FOOR MAN. CARLO VITALE (da 23/07/16) | AUTORIZZAZIONE MINISTERIO OO.PP. CAMPANIA-MOLISE 02/23/16 del 27/06/16 a seguito di richiesta di autorizzazione n. 46 del 23/05/16. Autorizzazione prot. 27555 del 10/06/16 | | | |
| IM-AN | 2° STRALCIO FUNZIONALE 1° COSTRUTTIVO | CONDOTTE | 10.05.16 N. 482; 02/08/16 n. 1079 (BENINI SCADUTI) | 10-mag-16 | "TIRE P COSTRUZIONI S.R.L." | Costituzione stampo base imbecca sud S. Filippo E SUCUNVASSE | € 237.946,00 | € 230.806,00 | € 71.40,00 | | | | n.32 del 06/09/16 richiesta modifica ad integrazione della nota n. 32 del 28/07/16 no parere società verifica in data 02/08/16 PASERRE POSITIVO | | 27/07/16 mail Richiesta parere D.L. | | Autorizzazione prot. 27557 del 10/06/16 | | | |
| IM-AN | 2° STRALCIO FUNZIONALE 1° COSTRUTTIVO | CONDOTTE | 26.05.16 N. 671 (30.06.16 N.790) 09/06/16 (dilatamenti) | 26/05/2016-13/12/16 | "MOTEDIL 2000 S.R.L." | Costituzione stampo base imbecca sud S. Filippo | € 180.335,50 | € 175.500,50 | € 5.407,00 | | | | Nota DL malpaga del 09/09/16 di integrazione della nota n. 32 del 28/07/16. Contro con mail di contro delle indicazioni di sub-appalto. Nota n. 53.16.LG approvato n. 53.16.LG dovo. Nota n. 61.15.LG del 27/08/16 richiesta parere. Nota n. 162.16.LG del 22/12/16 richiamo parere non dovuto presidente | | | | Richiesta integrazione con nota 08/27/16 del 23/06/16. Nota prot. n. 53.16.LG del 28/07/16. INTERSEZIONALI - SCOLLETO a parere di competenza del 27/08/16. INTEGRAZIONI - Nota prot. n. 1732 del 23/07/17. AUTORIZZAZIONE | | | |
| IM-AN | 2° STRALCIO FUNZIONALE 1° COSTRUTTIVO | CONDOTTE | 12.01.17 N. 21 | 12/01/2017 | "IDEM" | Coste scavo campo base imbecca Nord S. Filippo | € 93.698,00 | € 90.899,59 | € 2.898,41 | | | | | | | | | | | |
| IM-AN | 2° STRALCIO FUNZIONALE 1° COSTRUTTIVO | CONDOTTE | 20.10.16 n. 1502 | 20/10/2016 | "MOTEDIL 2000 S.R.L." sub affidamento a ICAL S.R.L. che eseguirà a credito lavori di "MOTEDIL 2000 S.R.L. IN LIQUID." E "PIEME S.R.L." | Fornitura ed esecuzione di materiali da cantiere. Cui si aggiungono Fili Nabis e FILME. S.R.L. | € 49.029,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | |
| IM-AN | 2° STRALCIO FUNZIONALE 1° COSTRUTTIVO | CONDOTTE | 20.10.16 N. 1507 | 20-ott-16 | "MOTEDIL 2000 S.R.L." sub affidamento a "CALCESTRUZZI IPERIN S.P.A." | Costituzione stampo base imbecca sud S. Filippo - Fornitura e trasporto complementari | € 15.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | |
| IM-AN | 2° STRALCIO FUNZIONALE 1° COSTRUTTIVO | CONDOTTE | 20.10.16 N. 1510 | 20-ott-16 | "MOTEDIL 2000 S.R.L." sub affidamento a "CALCESTRUZZI IPERIN S.P.A." | Costituzione stampo base imbecca sud S. Filippo - Fornitura e trasporto complementari | € 25.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | |
| IM-AN | 2° STRALCIO FUNZIONALE 1° COSTRUTTIVO | CONDOTTE | 03.11.16 N. 1580 | 03-nov-16 | "MOTEDIL 2000 S.R.L." sub affidamento a "RISING HOUSE S.R.L." | Completamento Costituzione stampo base imbecca sud S. Filippo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | |
| IM-AN | 2° STRALCIO FUNZIONALE 1° COSTRUTTIVO | CONDOTTE | 25.11.16 N. 1748 | 29-nov-16 | "MOTEDIL 2000 S.R.L." sub affidamento auto contratto | Impianto trifase ed impianto elettrico campo base imbecca nord S. Filippo | € 87.074,74 | € 84.462,74 | € 2.612,00 | | | | | | | | | | | |
| IM-AN | 2° STRALCIO FUNZIONALE 1° COSTRUTTIVO | CONDOTTE | 12.01.17 N. 21 | 12-gene-17 | "MOTEDIL 2000 S.R.L." sub affidamento auto contratto | Impianto trifase ed impianto elettrico campo base imbecca nord S. Filippo | € 55.696,00 | € 50.859,66 | € 2.989,34 | | | | | | | | | | | |
| IM-AN | 1° STRALCIO FUNZIONALE | SAF 3 | 29.05.16 N.841 - 14/10/16 n.1465 (inib. SENESE) | 29/05/2016-18/10/16 | "IDEM" | Esecuzione Terra Arata | € 126.164,76 | € 120.750,95 | € 5.433,80 | | | | | | | | | | | |

| CONS. | TRATTO | COMITE | NOTA CONCESSORARI O | DATA ARRIVO NOTA AL D.L. | IMPRESA SUB-APPALTATRICE | LAVORI | IMPORTO CONTRATTO | DI CUI PER LAVORI | PER SICUREZZA | IMPORTO LAVORI COMMITTENTE | %RIBASSO APPLICATO | %CONTRATTO SUL COMPLESSIVO | NOTE D.L. | AUTORIZ. R.U.P. | AUTORIZ. C.S.F.E. (Verifica FOS) | COORDINATORE CARLO VITALE (da 25/07/16) | AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRA. E TRASP. PROV. INTERR. COO.P.P. CAMPANIA-MOLISE | AUTORIZZAZIONE COMMISSARIO AD ACTA | NOTE |
|-------|--------|--------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|---|---|------------------------------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

art. 116 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2003) così come modificato dal terzo correttivo e dal D.Lgs. n. 182/2018.
prestazione affidata in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sempre a onere del lavoro, si riserva il diritto di richiedere la sostituzione di una o più imprese subappaltatrici con imprese appaltatrici o imprese appaltatrici o imprese subappaltatrici della stessa categoria.
11. Al fine del presente articolo è consentito subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività o servizio esplicite che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posta in opera e i lavori a caldo, singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'impresa del corpo della manutenzione o del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di affidata. Il subappalto non può essere effettuato in più fasi e deve essere autorizzato dalla stazione appaltante, in conformità con le disposizioni del presente articolo, e deve essere autorizzato dalla stazione appaltante, in conformità con le disposizioni del presente articolo, e deve essere autorizzato dalla stazione appaltante, in conformità con le disposizioni del presente articolo.
Importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidata.
Da relazione PSIC: 19) STIMA DEI COSTI DI PREVENZIONE i costi della sicurezza con i "individui", sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individualmente la parte del costo dell'opera da non assegnata a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

| AUTORIZZAZIONI SISMICHE - GENIO CIVILE DI AVELLINO | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1° LOTTO - 1° STRALCIO FUNZIONALE | | | | | |
| OPERA D'ARTE MAGGIORI | STATO DELLA CONSEGNA | UFFICIO D.L. | | CONSEGNA G.C. | AUTORIZZAZIONE SISMICA DATA N. |
| | | INGRESSO | USCITA | | |
| Galleria artificiale S.Pancrazio + imbocchi | APPROVATO DAL G.C. | | | 14/01/2015 prot.AS.20015_20 | 16/03/2015 73849 |
| Galleria artificiale S.Marco + imbocchi | APPROVATO DAL G.C. | | | 14/01/2015 prot.AS.20015_22 | 16/03/2015 73847 |
| Galleria artificiale Casino Covone (escluso imbocchi lato Grotta Minarda) | APPROVATO DAL G.C. | | | 05/06/2015 prot.n.3895845 | 01/07/2015 74155 |
| Galleria artificiale Vallicocco + imbocchi | APPROVATO DAL G.C. | | | 12/02/2014 prot.AS.2014_130 | 25/11/2014 73639 |
| Viadotto S.Pancrazio | APPROVATO DAL G.C. | 07/07/2015 | ** 28/07/2015 | 21/06/16 prot. 2016_0422657 | 22/07/2016 75168 |
| Viadotto Mefite | APPROVATO DAL G.C. | 22/06/2015 | ** 15/07/2015 | 02/03/2016 prot.AS.2016.118 | 30/03/2016 74906 |
| Viadotto Rampone | APPROVATO DAL G.C. | 22/07/2015 | ** 10/09/2015* | 24/01/2017 | 09/03/2017 75592 |
| Galleria artificiale Mefite 1* | APPROVATO DAL G.C. | 31/07/2015 | 10/09/2015 | 18/12/2015 prot.n.884128 | 02/02/2016 74806 |
| Galleria artificiale Mefite 2* | APPROVATO DAL G.C. | 22/07/2015 | 10/09/2015 | 18/12/2015 prot. n.884128 | 02/02/2016 74805 |
| Viadotto San Martino | APPROVATO DAL G.C. | 07/09/2015 | * 03/11/2015* | 01/07/16 prot.4749618 | 19/08/2016 75231 |

APPROVATO DAL G.C.
IN ATTESA FIRMA COLL.
CONSEGNATA AL G.C.
DA INOLTARE AL COLL.

* Gli elaborati integrativi richiesti dal Collaudatore, sono stati firmati in sede di riunione di collaudo il 17/12/15

* Il 17/02/16 sono stati consegnati alla D.L. gli elaborati aggiornati ed integrativi richiesti dal Collaudatore e successivamente restituiti sottoscritti il 24/02/16
* Il 16/03/2016 trasmessa alla DL gli elaborati aggiornati ed integrativi (Viadotto San Pancrazio - opera di sostegno al piede rilevato 7+514 - trincea drenante); il 20/04/2016 l'impresa consegna gli elaborati integrativi richiesti con nota della DL del 08/04/16; il 28/04/16 l'impresa ritira gli elaborati sottoscritti dalla D.L.

* Il 16/05/16 consegna di n.2 elaborati per errore grafico e restituiti all'impresa il 18/05/16

* Il 16/05/16 consegna relazione di modifica tecnica del Viadotto San Martino

* Il 07/06/16 trasmissione alla DL degli elaborati aggiornati ed integrativi e restituiti all'impresa sottoscritti in data 23.06.16

* Il 20/05/16 consegna elaborati integrativi firmati

* Il 07/12/16 sono stati consegnati alla DL gli elaborati aggiornati ed integrativi relativi alle travi e traversi dell'impalcato e consegnati al concessionario il 18/1/17

* Il 17/1/17 sono stati consegnati gli elaborati integrativi richiesti dal collaudatore e poi restituiti al concessionario il 19/1/17

| AUTORIZZAZIONI SISMICHE - GENIO CIVILE DI AVELLINO | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|------------------------|--|
| 1° LOTTO - 1° STRALCIO FUNZIONALE | | | | | | |
| OPERA D'ARTE MINORI | STATO DELLA CONSEGNA | UFFICIO D.L. | | CONSEGNA G.C. | AUTORIZZAZIONE SISMICA | |
| | | INGRESSO | USCITA | | DATA | N. |
| Atraversamento idraulico scotolare 2,00 x 2,00 alla prg.9+104,957 | APPROVATO DAL G.C. | | | 12/02/2014 | 25/11/2014 | 73639 |
| Atraversamento con sottovia alla prg.10+500 (7,50 x 8,00) | APPROVATO DAL G.C. | 07/07/2015 | 29/07/2015 | 30/09/2015 | 18/11/2015 | 74591 |
| Atraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alta prg.8+500,00 | APPROVATO DAL G.C. | 07/07/2015 | 29/07/2015 | 30/09/2015 | 18/11/2015 | 74591 |
| Atraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg.8+700,00 | APPROVATO DAL G.C. | 07/07/2015 | 29/07/2015 | 30/09/2015 | 18/11/2015 | 74591 |
| Atraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alta prg.10+159,00 | APPROVATO DAL G.C. | 07/07/2015 | 29/07/2015 | 30/09/2015 | 18/11/2015 | 74591 |
| Atraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg.10+450,00 | APPROVATO DAL G.C. | 07/07/2015 | 29/07/2015 | 30/09/2015 | 18/11/2015 | 74591 |
| Atraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg.10+525,00 | APPROVATO DAL G.C. | 07/07/2015 | 29/07/2015 | 30/09/2015 | 18/11/2015 | 74591 |
| Atraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg.10+588,506 | APPROVATO DAL G.C. | 07/07/2015 | 29/07/2015 | 30/09/2015 | 18/11/2015 | 74591 |
| Atraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg.10+850,00 | APPROVATO DAL G.C. | 07/07/2015 | 29/07/2015 | 30/09/2015 | 18/11/2015 | 74591 |
| Atraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg.11+150,00 | APPROVATO DAL G.C. | 07/07/2015 | 29/07/2015 | 30/09/2015 | 18/11/2015 | 74591 |
| Muri di sostegno su pali da prg.7+ 675 e prg.7+ 698,70 | APPROVATO DAL G.C. | 22/07/2015 | 10/09/2015 | 01/07/2016 | 19/08/2016 | 75231 (con V.S.Martino) |
| Muri di sottoscampa su pali da prg.9+ 635,02 a prg.9+ 690,88 | APPROVATO DAL G.C. | 22/07/2015* | 10/09/2015 | 02/03/2016 | 30/03/2016 | 74906 |
| Muri di sottoscampa su pali da prg.10+ 925,00 a prg.10+ 976,70 | IN ATTESA FIRMA COLL. | 22/07/2015 | 10/09/2015 | | | |
| Muri su pali da sez. A24 a sez. A33-SVINCOLO DI FRIGENTO - RAMPA A - CIGLIO SX | IN ATTESA FIRMA COLL. | 22/07/2015 | 10/09/2015 | | | |
| Muri di sostegno su pali da prg.8+ 450,00 a prg.8+ 525,00 Opere di sostegno con paratie di pali a piede rilevato da prg.8+390 a prg.8+450 ciglio sx Opere di sostegno con paratie di pali a piede rilevato da prg.8+525 a prg.8+700 ciglio sx | IN ATTESA FIRMA COLL. | 05/08/2015 | 10/09/2015 | | | |
| Opere di sostegno con paratie di pali a piede rilevato da prg.9+099 a prg.9+350 ciglio sx Opere di sostegno con paratie di pali a piede rilevato da prg.9+424 a prg.9+460 ciglio sx | IN ATTESA FIRMA COLL. | 05/08/2015 | 10/09/2015 | | | |
| Galleria Casino Covone -paratie di imbocco lato nord/Opera di sostegno da prg. Km 8+195 a prg. K 8+209 | APPROVATO DAL G.C. | 07/09/2015 | 03/11/2015* | 21/06/16 prot. 2016_0422600 | 22/07/2016 | 75164 |
| Opere di sostegno con paratie di pali rivestite Svincolo di Frigento - Rampe A-B-C | IN ATTESA FIRMA COLL. | 14/10/2015 | 04/12/2015 | | | |
| Opere di sostegno e muri di contropia vari in c.a. | IN ATTESA FIRMA COLL. | 14/10/15* | 28/01/2016 | | | |
| Opere di sostegno con paratie di pali rivestite 11+159 +11+233 e 11+447+ 11+475 | IN ATTESA FIRMA COLL. | 14/10/2015 | 04/12/2015 | | | |
| Opere di sostegno con paratie al piede del rilevato Rampe C - D Svincolo San Teodoro | IN ATTESA FIRMA COLL. | 14/10/2015 | 04/12/2015 | | | |
| Opere di sostegno con paratie di pali al piede del rilevato tra le progr.7+ 514 + 7+ 550 circa | APPROVATO DAL G.C. | 14/10/2015 | 04/12/2015 | 21/06/16 prot. 2016_0422657 | 22/07/2016 | 75168 (con V. San Pascazio) |
| Muro di contropia da progr. 9+ 856 + 9+ 871 | IN ATTESA FIRMA COLL. | 08/03/2016* | 28/04/2016 | | | |
| Muro di contropia da progr. 9+ 491 + 9+ 581 | IN ATTESA FIRMA COLL. | 08/03/2016* | 28/04/2016 | | | |
| AREA 4: Muri di contropia da 8+209 a 8+268 da 9+865 a 8+933, Opere di sostegno a piede rilevato da 8+390 a 8+496 da 8+504 a 8+700, Atraversamento idraulico 8+325, Trincee drenanti da 8+300 a 8+920 | APPROVATO DAL G.C. | 06/05/2016 | 20/05/2016 | 30/06/16 n.433 | 10/07/2016 | AS_2016_544_2 Trasmessa con nota N. 474 DEL 19/07/16* |
| AREA 1: Muri di contropia S.V.S. Teodoro rampe A,B,D-Opere al piede rilevato S.V.S. Teodoro rampe C,D - Trincee drenanti da 6+800 a 7+150 | IN ATTESA FIRMA COLL. | 09/06/2016* | 15/07/2016 | | | |
| AREA 6: Opere al piede rilevato da PK 9+099 a pk.9+351, da pk.9+425 a pk.9+460 - Atraversamento idraulico pk.9+445,24 - Trincee drenanti da 9+100 a 9+650 | IN ATTESA FIRMA COLL. | 09/06/2016* | 15/07/2016 | | | |
| AREA 9: Muri di contropia in sx da pk.9+983 a pk.10+050, in sx e dx da pk.10+145 a 10+201, in sx e dx da pk.10+245 a pk.10+314, S.V.Frigento rampe A,B e C, Muri di sottoscampa SV di Frigento rampe A, Paratie rivestite SV.Frigento rampe A, B e C - Trincee drenanti da 9+950 a 10+200 | IN ATTESA FIRMA COLL. | 09/06/2016* | 15/07/2016 | | | |
| AREA 1: Muri in terra rinforzata | IN ATTESA FIRMA COLL. | 03/02/2017 | 17/03/2017 | | | |
| AREA 4: Muri in terra rinforzata | IN ATTESA FIRMA COLL. | 03/02/2017 | 17/03/2017 | | | |
| AREA 7: Muri in terra rinforzata | IN ATTESA FIRMA COLL. | 03/02/2017 | 17/03/2017 | | | |

APPROVATO DAL G.C.
IN ATTESA FIRMA COLL.
CONSEGNA AL G.C.
DA INOLTARE AL COLL.

* Mancavano n.2 relazioni che sono state inviate il 04/12/15 ed è stato poi successivamente richiesto di eliminare una dicitura in tutte le relazioni geologiche del dott. Spagnuolo. Le copie aggiornate sono state consegnate l'11/01/16 alla D.L.

* Il 17/02/16 è stata consegnata alla D.L. la Relazione geotecnica e di calcolo richiesta dal collaudatore e successivamente restituiti sottoscritti il 24/02/16

* Il 20/04/16 sono state consegnate alla D.L. gli elaborati richiesti con nota del 08/04/2016

* Il 28/04/2016 trasmissione elaborati aggiornati ed integrativi

* Il 08/07/16 consegna quadri economici - il 08/03/2017 consegna alla DL dello studio di compatibilità idrogeologia sottoscritta dalla stessa e restituita al Consorzio in pari date

* Autorizzazione rilasciata dall'Unione Terre dell'Ultra

LOTTO FUNZIONALE DALLO SVINCOLO DI SAN TEODORO AL VIADOTTO RAMPONE da Km 7+125 a Km 12+140 - (Delibera CIPE Marzo 2012)
STATO DEI LAVORI CON AUTORIZZAZIONE SISIMICA

| SAF3 S.r.l. | | LOTTO FUNZIONALE DALLO SVINCOLO DI SAN TEODORO AL VIADOTTO RAMPONE da Km 7+125 a Km 12+140 - (Delibera CIPE Marzo 2012) | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-----|-----------|-----------|---|--|---------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| UBIC. | AREA GEOLOGICA | CATEGORIA | WBS | da PK | a PK | OPERA | APPROVAZIONI E STATO DI ESECUZIONE | IMPORTO NETTO OPERE AUTORIZZATE | ESEGUITO AL 28.02.17 | IMPORTO DA REALIZZARE | |
| ASSE PRINCIPALE | 1 | GALLERIA ARTIFICIALE | 1 | 7+148,00 | 7+370,00 | Galleria artificiale S.Pancrazio | AUT.NE N. 73849 16/03/2015; VALORE DA P.E. 1.146.656,37+2.360.941,90=3.507.298,27; | € 3.507.298,27 | € 3.342.542,48 | € 164.755,79 | |
| ASSE PRINCIPALE | 5 | GALLERIA ARTIFICIALE | 2 | 8+925,00 | 9+058,00 | Galleria artificiale Vallicocco | AUT.NE N. 73639 25/11/2014; VALORE DA P.E. 653.087,85+1.185.972,20=1.839.060,05; | € 1.839.060,05 | € 1.693.623,12 | € 145.436,93 | |
| ASSE PRINCIPALE | 10 | SOTTOVIA | 4 | 10+500,00 | 10+500,00 | Attraversamento con sottovia alla prog.10+500 (7,50x8,00) | AUT.NE N. 74591 18/11/2015; VALORE DA P.E. 0+300.210,40=300.210,40; | € 300.210,40 | € 259.201,66 | € 41.008,74 | |
| ASSE PRINCIPALE | 11 | GALLERIA ARTIFICIALE | 4 | 11+233,00 | 11+450,00 | Galleria artificiale S.Marco | AUT.NE N. 73847 16/03/2015; VALORE DA P.E. 1.241.823,27+2.329.137,09=3.570.960,36; | € 3.570.960,39 | € 3.285.302,94 | € 285.657,45 | |
| ASSE PRINCIPALE | 3b | GALLERIA ARTIFICIALE | 2 | 8+058,00 | 8+196,00 | Galleria artificiale Casino Covone | AUT.NE N. 74155 DEL 01/07/2015; VALORE DA P.E. 1.085.898,38+1.934.715,40=3.020.613,78; | € 3.020.613,78 | € 2.397.826,62 | € 622.787,16 | |
| ASSE PRINCIPALE | 8 | GALLERIA ARTIFICIALE | 3 | 9+889,00 | 10+000,00 | Galleria artificiale Mefite 1 | AUT.NE N. 74806 DEL 02/02/2016; VALORE DA P.E. 833.143,93+792.960,58=1.626.104,51; | € 1.626.104,51 | € 1.267.214,20 | € 358.890,31 | |
| ASSE PRINCIPALE | 9a | GALLERIA ARTIFICIALE | 4 | 10+200,70 | 10+245,10 | Galleria artificiale Mefite 2 | AUT.NE N. 74805 DEL 02/02/2016; VALORE DA P.E. 214.691,87+296.265,60=510.957,47; | € 510.957,47 | € 420.349,83 | € 90.607,64 | |
| ASSE PRINCIPALE | 4 | TOMBINO ARMCO | 2 | 8+500,00 | 8+500,00 | Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg. 8+500,00 | AUT.NE N. 74591 DEL 18/11/2015; VALORE DA P.E. ~75.615,00; | € 75.615,00 | € - | € 75.615,00 | |
| ASSE PRINCIPALE | 4 | TOMBINO ARMCO | 2 | 8+700,00 | 8+700,00 | Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg. 8+700,00 | AUT.NE N. 74591 DEL 18/11/2015; VALORE DA P.E. ~100.235,00; | € 100.235,00 | € - | € 100.235,00 | |
| ASSE PRINCIPALE | 6 | TOMBINO ARMCO | 3 | 9+104,96 | 9+104,96 | Attraversamento idraulico scatolare 2,00 x 2,00 alla prg. 9+104,957 | AUT.NE N. 73639 DEL 25/11/2014; VALORE DA P.E. ~100.235,00; | € 100.235,00 | € 96.785,81 | € 3.449,19 | |

| SAF3 S.r.l. | | LOTTO FUNZIONALE DALLO SVINCOLO DI SAN TEODORO AL VIADOTTO RAMPONE da Km 7+125 a Km 12+140 - (Delibera CIPE Marzo 2012) STATO DEI LAVORI CON AUTORIZZAZIONE SISIMICA | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-----|-----------|-----------|---|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| UBIC. | AREA GEOLOGICA | CATEGORIA | WBS | da PK | a PK | OPERA | APPROVAZIONI E STATO DI ESECUZIONE | IMPORTO NETTO OPERE AUTORIZZATE | ESEGUITO AL 28.02.17 | IMPORTO DA REALIZZARE | |
| ASSE PRINCIPALE | 9 | TOMBINO ARMCO | 4 | 10+159,00 | 10+159,00 | Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg. 10+159,000 | AUT.NE N. 74591 DEL 18/11/2015: VALORE DA P.E. ~191.551,00; | € 191.551,00 | € 32.300,00 | | |
| ASSE PRINCIPALE | 9 | TOMBINO ARMCO | 4 | 10+450,00 | 10+450,00 | Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg. 10+450,000 | | | € 32.300,00 | | |
| ASSE PRINCIPALE | 10 | TOMBINO ARMCO | 4 | 10+525,00 | 10+525,00 | Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg. 10+525,000 | | | € - | | |
| ASSE PRINCIPALE | 10 | TOMBINO ARMCO | 4 | 10+588,51 | 10+588,51 | Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg. 10+588,506 | | | € 32.400,00 | | |
| ASSE PRINCIPALE | 10 | TOMBINO ARMCO | 4 | 10+850,00 | 10+850,00 | Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg. 10+850,000 | | | € - | | |
| ASSE PRINCIPALE | 11 | TOMBINO ARMCO | 4 | 11+150,00 | 11+150,00 | Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 alla prg. 11+150,000 | | | € - | | |
| ASSE PRINCIPALE | 7 | MURI DI SOTTOSCARPA SU PALLI | 3 | 9+635,02 | 9+690,00 | Muro di sottoscarpa su palli - SX | | | € 440.396,59 | € 115.699,50 | € 324.697,09 |
| ASSE PRINCIPALE | 7 | TRINCEE DRENANTI | 4 | 9+670,00 | 9+825,00 | Trincee drenanti (Viadotto Mefite) | | | VEDI VALORE ULTIMA OPERA | | |
| ASSE PRINCIPALE | 7 | VIADOTTI E PONTI | 3 | 9+691,00 | 9+790,00 | Viadotto Mefite | | | € 1.949.703,36 | € 748.166,28 | € 1.201.537,08 |
| ASSE PRINCIPALE | 2 | VIADOTTI E PONTI | 1 | 7+453,00 | 7+519,00 | Viadotto S.Pancrazio | | | € 2.204.259,02 | € 988.857,02 | € 1.215.402,00 |
| ASSE PRINCIPALE | 2 | PARATIE DI PALLI | 2 | 7+515,64 | 7+550,00 | Opere di sostegno con paratie di palli a piede rilevato - ciglio SX | AUT.NE N. 75168 DEL 22/07/2016 (Viadotto San Pancrazio): VALORE DA P.E. 146.633,28+0=-146.633,28; | € 146.633,28 | € 103.955,20 | € 42.678,08 | |
| ASSE PRINCIPALE | 2 | TRINCEE DRENANTI | 2 | 7+520,00 | 7+680,00 | Trincee drenanti | VEDI VALORE ULTIMA OPERA | | | | |
| ASSE PRINCIPALE | 3.1 | VIADOTTI E PONTI | 2 | 7708 | 8028 | Viadotto S.Martino | AUT.NE N. 75231 DEL 19/08/2016: VALORE DA P.E. 2.002.972,48+7.092.670,09=9.095.642,57; | € 9.095.642,57 | € 1.148.757,61 | € 7.946.884,96 | |

| LOTTO FUNZIONALE DALLO SVINCOLO DI SAN TEODORO AL VIADOTTO RAMPONE da Km 7+125 a Km 12+140 - (Delibera CIPE Marzo 2012) | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------|---------|----------|----------|--|--|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| STATO DEI LAVORI CON AUTORIZZAZIONE SISMIICA | | | | | | | | | | |
| UBIC. | AREA GEOLOGICA | CATEGORIA | WBS | da PK | a PK | OPERA | APPROVAZIONI E STATO DI ESECUZIONE | IMPORTO NETTO OPERE AUTORIZZATE | ESEGUITO AL 28.02.17 | IMPORTO DA REALIZZARE |
| | | | | | | | | VEDI VALORE ULTIMA OPERA | | |
| ASSE PRINCIPALE | 3.1 | TRINCEE DRENANTI | 2 | 7708 | 8028 | Trincee drenanti in area Viadotto San Martino | AUT.NE N. 75231 DEL 19/08/2016: VALORE DA P.E. 113.873,17+58.908,02=172.781,19; | € 172.781,19 | € 68.340,52 | € 104.440,67 |
| ASSE PRINCIPALE | 3.1 | MURI DI SOSTEGNO SU PALI | 1 | 7675 | 7700 | Muro di sostegno su pali | AUT.NE N. 75164 DEL 22/07/2016: VALORE DA P.E. 77.890,84+44.884,98=122.775,82; PER CONTO ECONOMICO VEDERE G.A. CASINO COVONE | | | |
| ASSE PRINCIPALE | 3.2 | GALLERIA ARTIFICIALE | 2 | 8+195,00 | 8+209,00 | Imbocco lato Grotta Minarda - Galleria artificiale Casinò Covone | | | | |
| ASSE PRINCIPALE | 4 | MURI DI CONTRORIPA | 2 | 8+209,00 | 8+266,00 | Muri di controripa in c.a. - CIGLIO SX | | | | |
| ASSE PRINCIPALE | 4 | TRINCEE DRENANTI | 2 | 8+300,00 | 8+920,00 | Trincee drenanti | | | | |
| ASSE PRINCIPALE | 4 | TOMBINO ARMCO | 2 | 8+325 | 8+325 | Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 1500 alla pfg. 8+325,000 | | | € 28.155,00 | |
| ASSE PRINCIPALE | 4 | PARATIE DI PALI | 2 | 8+390,00 | 8+496,00 | Opere di sostegno con paratie di pali a piede rilevato - ciglio SX | AUT.NE N. AS_2016_544_2 DEL 10/07/2016: VALORE (ESCLUSO TRINCEE DRENANTI) DA P.E. E CONTO ECONOMICO IMPRESA= 1.091.205,34+231.780,92=1.322.986,26; | € 1.322.986,26 | € | € 336.495,29 |
| ASSE PRINCIPALE | 4 | MURI DI SOTTOSCARPA SU PALI | 2 | 8+496,00 | 8+504,00 | Muro di sottoscarpa su pali - SX | | | € 958.335,97 | |
| ASSE PRINCIPALE | 4 | PARATIE DI PALI | 2 | 8+504,00 | 8+700,00 | Opere di sostegno con paratie di pali a piede rilevato - ciglio SX | | | | |
| ASSE PRINCIPALE | 4 | MURI DI CONTRORIPA | 2 | 8+865,00 | 8+933,36 | Muri di controripa in c.a. - CIGLIO SX | | | | |
| ASSE PRINCIPALE | | TRINCEE DRENANTI | 1-2-3-4 | | | TRINCEE DRENANTI | LE TRINCEE DRENANTI PREVISTE NEL P.E. PER LE WBS 1-2-3-4 HANNO UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.765.423,73 € (114.459,15+637.494,00+499.853,25+513.617,33) E NON SONO STATE ANCORA INIZIATE SE NON PER LO SCAVO DI SBANCAMENTO DI ALCUNE AREE PER UN IMPORTO STIMATO PARI A 20.000,00 € | € 1.765.423,73 | € | € 1.765.423,73 |
| | | | | | | | SOMMANO | € 31.840.431,87 | € 17.020.113,76 | € 14.725.767,11 |

| AUTORIZZAZIONI SISMICHE - GENIO CIVILE DI AVELLINO | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|--|--|--|
| 1° LOTTO - 2° STRALCIO - 1° COSTRUTTIVO | | | | | | | | | |
| OPERA D'ARTE MAGGIORI | STATO DELLA CONSEGNA | UFFICIO D.L. | | CONSEGNA G.C. | AUTORIZZAZIONE SISMIC/ | | | | |
| | | INGRESSO | USCITA | | DATA | N. | | | |
| GA10 - GALLERIA ARTIFICIALE MACCHIE tra le pk.16+985.30 e 17+095.30 | APPROVATO DAL G.C. | 29/06/2016* | 25/07/2016 | 26/01/2017 | 14/03/2017 | AS 2017_610_1 | | | |
| GA11 - GALLERIA ARTIFICIALE PRATOLA tra le pk.17+700 e 17+780 | CONSEGNATA AL G.C. | 29/06/2016* | 25/07/2016 | 31/01/2017 | | | | | |
| GN01 - GALLERIA NATURALE S.FILIPPO tra le prog.12+140 a 14+115 ed annesso cunicolo di servizio - IMBOCCO SUD | APPROVATO DAL G.C. | 01/07/2016** | 25/07/2016 | 27/01/17 | 21/03/2017 | 75614 | | | |
| GN01 - GALLERIA NATURALE S.FILIPPO tra le prog.12+140 a 14+115 ed annesso cunicolo di servizio - IMBOCCO NORD | APPROVATO DAL G.C. | 01/07/2016** | 25/07/2016 | 24/01/17 | 21/03/2017 | 75615 | | | |
| ELABORATI ARCHITETTONICI per il deposito presso l'ente "Unione Terre dell'Ufita" | CONSEGNATA AL G.C. | 25/07/2016 | 26/07/2016 | 26/01/2017 | | | | | |
| GN01 - GALLERIA NATURALE S.FILIPPO tra le prog.12+140 a 14+115 ed annesso cunicolo di servizio | IN ATTESA FIRMA COLL. | 03/08/2016 | 12/12/2016* | | | | | | |
| V/06 - Viadotto San.Silvestro | IN ATTESA FIRMA COLL. | 05/10/2016 | 12/12/2016 | | | | | | |

APPROVATO DAL G.C.
 IN ATTESA FIRMA COLL.
 CONSEGNATA AL G.C.
 DA INOLTARE AL COLL.
 ALLA FIRMA DELLA DL

* 07/07/16 consegnata i quadri economici di raffronto - 08/07/16 consegnata la relazione sulle fondazioni - 25/07/2016 consegna delle tavole relative all'armatura dei pali delle gallerie "Pratola" e "Macchie".

* 07/07/16 consegnata la relazione di modifica tecnica ed i quadri economici di raffronto

* 11/11/17 Sono state consegnate le relazioni di compatibilità idrogeologica e restituite al consorzio il 18/1/17

* Gli elaborati sono stati sottoscritti dalla DL il 17/10/16 ma ritirati dall'impresa il 12/12/16

| AUTORIZZAZIONI SISMICHE - GENIO CIVILE DI AVELLINO | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------------------------------|
| 1° LOTTO - 2° STRALCIO - 1° COSTRUTTIVO | | | | | | |
| OPERA D'ARTE MINORI | STATO DELLA CONSEGNA | INGRESSO | UFFICIO D.L. | USCITA | CONSEGNA G.C. | AUTORIZZAZIONE SISMICA DATA N. |
| MURI DI CONTROTRIPA - tratto da pk.17+655 a pk.17+687 e tratto da pk.17+797 a pk.17+809 | DA INOLTARE AL COLL. | 29/06/2016* | | 26/07/2016 | | |
| Muri di controripa - tratto da progr.17+937.500 a progr.17+987.500 | ALLA FIRMA DELLA DL | 28/09/2016 | | | | |
| | | | | | | |

APPROVATO DAL G.C.

IN ATTESA FIRMA COLL.

CONSEGNA AL G.C.

DA INOLTARE AL COLL.

ALLA FIRMA DELLA DL

* 07/07/16 consegna relazione sulle fondazioni

ALLEGATO 2A

UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ELENCO PROGETTI EX C. 2 ART. 86 L.289/02

| N° Prog. | Descrizione | Importo lavori | Impresa e Sede Legale | Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione) | Erogazioni Effettuate | Stadio esecutivo | Ultimazione | | Collaudo | | Consegna all'Ente gestore | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|---|-----------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | Presunta | Effettiva | Statico | Tec.-Amm. | Prov. | Definit. | | | |
| 60/6057/1 | Viabilità Nerico-Muro Lucano | 2.540.780,03 | Calabria P.s.r.l. | 5.306.734,09 | 4.776.221,07 | In corso compl. | 16.7.2009 | Si | 27.5.2011 | 28/29.11.2012 | 16.12.2012 | 16.7.2014 * | | | |
| | Lavori principali | | Moliterno (PZ) | | | | | | | | | 5.12.2012 | 16.7.2014 * | | |
| | Lavori di prima somma urgenza al viadotto Ficocchia | 158.870,45 | Calabria P.s.r.l. | | | | | | | Si | 20.10.2011 | 28.11.2012 | 16.7.2014 * | | |
| | Lavori di seconda somma urgenza al viadotto Ficocchia | 98.543,78 | Moliterno (PZ) | | | | | | | | | | | 16.7.2014 * | |
| | Lavori di completamento 1° lotto | 596.461,57 | Calabria P.s.r.l. | | | | | | | | 14.5.2010 | 28.11.2012 | | 16.7.2014 * | |
| | Lavori in economia per traslazione campata viadotto Ficocchia | 19.940,00 | Basso Costr.srl Melfi (PZ) | | | | | | | | | 16.7.2014 | 28/29.11.2012 | | 16.7.2014 * |
| | Lavori in economia per traslazione spalla di monte Viadotto Ficocchia | 37.286,57 | Calabria P.s.r.l. | | | | | | | | | 16.7.2014 | 5.12.2012 | | 16.7.2014 * |
| | Lavori integrativi interventi di ripristino spalla di monte Viadotto Ficocchia | 36.797,32 | Moliterno (PZ) | | | | | | | | | | | | 16.7.2014 * |
| | Lavori ripristino blocchi e cartelli stradali agli imbocchi di viabilità chiusa al traffico | 17.631,73 | Calabria P.s.r.l. | | | | | | | | | | | | 16.7.2014 * |
| | Lavori consolidamento frana al Km.1+250 della Bretella di Pescopagano | 276.396,98 | La Castellese s.r.l. Castelfranci (AV) | | | | | | | | | 22.12.2004 | 28.11.2012 | | 16.7.2014 * |
| | Lavori in economia supporto campagne di indagini su Viadotto Ficocchia | 23.749,51 | Calabria P.s.r.l. | | | | | | | | | | | | 16.7.2014 * |
| | Lavori in economia relativi a lavori di somma urgenza Viadotto Ficocchia | 36.694,55 | Moliterno (PZ) | | | | | | | | | | | | 16.7.2014 * |
| | Nolo a caldo by-bridge per indagini Viadotto Ficocchia | 1.000,00 | Ecologia & Servizi s.r.l. Potenza | | | | | | | | | | | | |
| Nolo a caldo by-bridge per ulteriori indagini Viadotto Ficocchia | 950,00 | Ecologia & Servizi s.r.l. Potenza | | | | | | | | | | | | | |
| Lavori ripristino impianto di illuminazione svincolo per Pescopagano | 10.423,45 | Basso Costr.srl Melfi (PZ) | | | | | | | | 01.10.2013 | 28/29.11.2012 | 16.7.2014 * | | | |

Elenco progetti ex c. 2 (marzo 2017).xls

| N° Prog. | Descrizione | Importo lavori | Impresa e Sede Legale | Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione) | Erogazioni Effettuate | Stadio esecutivo | Ultimazione | | Collaudo | | Consegna all'Ente gestore | | | | |
|--------------------------|---|----------------|--|---|-----------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|--|
| | | | | | | | Presunta | Effettiva | Statico | Tec.-Anm. | Provv. | Definit. | | | |
| 60/6057/2 | Lavori principali | 15.391.561,83 | ATI Akei s.r.l. Napoli | 22.557.349,45 | 19.057.605,15 | Emesso 3° ed Ult-SAL Proced.esprop. | | 20.2.2017 | | | Parziale 1) 24.7.2014 | | | | |
| | Lavori di somma urgenza per frana in località Raicelle del Comune di Muro Lucano | 284.475,35 | ATI Akei s.r.l. Napoli | | | | | | 17.1.2012 | | | | | | |
| | Lavori di 1^ somma urgenza protezione corpo stradale e salvaguardia pubblica incolunità tratto Km. 23 circa | 423.857,90 | ATI Akei s.r.l. Napoli | | | | | | 10.8.2011 | | Si | 22.3.2012 | | | |
| | Lavori di 2^ somma urgenza protezione corpo stradale e salvaguardia pubblica incolunità tratto Km. 23 circa | 400.109,34 | ATI Akei s.r.l. Napoli | | | | | | 14.9.2011 | | Si | 22.3.2012 | | | |
| | Danni di forza maggiore dal Km.18--420 al Km.27--400 | 150.844,90 | ATI Akei s.r.l. Napoli | | | | | | | | | 24.10.2011 | | | |
| | Ritiro,trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi abbandonati | 1.900,00 | Pellicano Verde Muro Lucano (PZ) | | | | | | | 23.6.3008 | | | 14.8.2008 | | |
| | Ritiro,trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati | 9.950,00 | Ecological Systems Muro Lucano (PZ) | | | | | | | 10.7.2007 | | | 31.7.2007 | | |
| | Nolo a caldo by-bridge per indagini Viadotto Farenga | 1.000,00 | Ecologia & Servizi s.r.l. Potenza | | | | | | | 6.4.2011 | | | 28.6.2011 | | |
| | Segnaletica orizzontale e verticale svincolo di Rapone | 16.269,56 | C.G.A. s.r.l. Potenza | | | | | | | 20.12.2014 | | | 7.1.2015 | | |
| | Lavori di ripristino Viadotto Farenga | 527.701,42 | Tecnologie Stradali s.r.l. Roma | | | | | | Lavori consegnati il 30.3.2017 | 28.7.2017 | | | | | |
| 60/6057/3 1° stralcio | Svincolo Castelgrande- impianti nelle gallerie e Cavalecchia viabilità secondaria | 18.774.180,49 | ATI Troiano s.a.s. Baragiano (PZ) | 24.072.974,87 | 18.488.869,71 | Emesso 2° SAL Proced.esprop. | 6.4.2017 | | | | Parziale 2) 24.7.2014 | | | | |
| | Lavori principali | 999.340,40 | | | | | | In corso procedure di gara | | | | | | | |
| | Lavori di risanamento della galleria Montenuovo | 29.737,19 | ATI Troiano s.a.s. Baragiano (PZ) | | | | | | In corso affidamento lavori | | | | | | |

Elenco progetti ex c. 2 (marzo 2017).xls

| N° Prog. | Descrizione | Importo lavori | Impresa e Sede Legale | Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione) | Erogazioni Effettuate | Stadio esecutivo | Ultimazione | | Collaudo | | Consegna all'Ente gestore | |
|--------------------------|--|----------------|--------------------------------------|---|-----------------------|---|-------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Presunta | Effettiva | Statico | Tec.-Amm. | Provv. | Definit. |
| 60/6057/3 2° stralcio | Svincolo Muro Lucano - Lavori principali | 6.439.914,00 | | 7.415.648,67 | 28.927,33 | Appr. prog. prel. Conferito incarico progettazione | | | | | | |
| 60/6057/SF | Lavori di ripristino Viadotto Ficocchia | 1.558.924,78 | | 1.985.528,22 | 37.255,01 | Approvato progetto In corso proced. gara | | | | | | |
| 60/6062 | Viabilità Muro Lucano-Baragiano - Lavori principali | 2.276.163,25 | ATI Lopardo V. Buonabitacolo (SA) | | | In corso compl. proced. esprop. | 30.10.2007 | Si | 21.5.2008 | 28.1.2011 | 20.7.2009* | |
| | Viabilità secondaria Cavalcavia Ponte Giacoia | 689.580,26 | Silvano s.r.l. Picerno (PZ) | | | | 14.9.2010 | Si | 20.4.2011 | 28.1.2011 | 6.6.2011* | |
| | Lavori in economia allacciamento provv. alla viabilità comunale | 89.712,33 | Troiano s.a.s. Baragiano (PZ) | | | | 21.5.2009 | ===== | 1.7.2009 | | 20.7.2009* | |
| | Rotatoria Muro Lucano - Innesco SS. 7 Appia | 128.178,76 | Troiano s.a.s. Baragiano (PZ) | 5.267.107,00 | 4.328.019,82 | | 5.4.2011 | ===== | 1.7.2011 | 31.5.2011 | 18.7.2011* | |
| | Illuminazione Rotatoria Muro Lucano | 5.978,66 | Troiano s.a.s. Baragiano (PZ) | | | | 29.4.2011 | ===== | 6.7.2011 | 31.5.2011 | 18.7.2011* | |
| | Innesco SS.7 Appia | 34.881,65 | Silvano s.r.l. Picerno (PZ) | | | | 29.9.2010 | ===== | 14.10.2010 | 28.1.2011 | 6.6.2011* | |
| | Lavori in economia illuminazione svincolo S.S. 7 Appia | 22.521,69 | Silvano s.r.l. Picerno (PZ) | | | | 8.2.2011 | ===== | 22.2.2011 | 28.1.2011 | 6.6.2011* | |
| 60/6062/2 | Ripristino viadotto Platano - collegamento SS. 94 | 336.341,75 | Bochiccio N. Bella (PZ) | 472.951,99 | 368.634,34 | | 27.6.2011 | Si | 12.12.2011 | 24.8.2011 | 23.1.2012* | |
| 40/6063 | Viabilità Calitri-S.S. 401 Ofantina Lavori principali | 1.435.585,03 | I.C.M. s.r.l. S.Egidio del M.A. (SA) | | | In corso compl. procedure espropriative | 14.3.2009 | Si | 4.8.2011 | 25.8.2010 | 25.8.2010 | Com. Calitri 18.10.2011* |
| | Opere complementari | 57.182,73 | I.C.M. s.r.l. S.Egidio del M.A. (SA) | 2.661.864,38 | 1.968.157,47 | | 2.1.2010 | ===== | 23.6.2010 | 25.8.2010 | 2.7.2012* | |
| | Ripristino quadri elettrici impianto di illuminazione in galleria Gagliano | 12.500,00 | I.C.M. s.r.l. S.Egidio del M.A. (SA) | | | | 10.7.2010 | ===== | 10.8.2010 | 25.8.2010 | 18.10.2011* | |

Elenco progetti ex c. 2 (marzo 2017).xls

| N° Prog. | Descrizione | Importo lavori | Impresa e Sede Legale | Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione) | Erogazioni Effettuate | Stadio esecutivo | Ultimazione | | Collaudo | | Consegna all'Ente gestore | | | | |
|----------|--|----------------------|------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | | | Presunta | Effettiva | Statico | Tec.-Amm. | Prov. | Definit. | | | |
| 40/6064 | Svincolo sulla viabilità Caliri/Ofantina | 593.420,36 | Edil Viro | 1.336.634,70 | 956.193,41 | In corso compl. espropriative | | | Si | | 25.8.2010 | 2.9.2011 * | | | |
| | Lavori principali | 132.966,65 | Ciardello A. Avellino | | | | | | | | | | | | |
| | Opere complementari | 106.100,39 | Editteconstrade s.r.l. Quarto (NA) | | | | | | | 1.9.2011 | | | 27.4.2012 | 25.8.2010 | 14.5.2012 * |
| | Lavori ripristino viabilità svincolo Caliri/A.I.Nerico | | | | | | | | | | | 15.1.2014 * | | | |
| | TOTALI | 54.786.406,61 | | 71.076.793,37 | 50.009.883,31 | | | | | | | | | | |

* La data riportata per la consegna definitiva dell'opera è quella conclusiva nel rapporto Amministrazione centrale-Ente consegnatario

1) Tratto svincolo Pescopagano (PZ)-Svincolo Rapone (PZ)

2) Galleria artificiale in Pescopagano (PZ)

Ministero dello Sviluppo Economico
Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02

Relazione tecnica, amministrativa, contabile
progetti di completamento ex c. 2 art. 86 L. 289/02

Lavori in corso e/o in fase di chiusura contabile

I completamenti ex c. 2 art. 86 L. 289/02 riguardano la viabilità Nerico- Muro Lucano – Calitri – Baragiano la cui esecuzione fu affidata in concessione all’ATI ICLA S.p.A. in liquidazione, concessione successivamente revocata dal MiSE.

I progetti interessati come individuati dal Mise in sede di trasferimento al Commissario sono:

- n. 39/60/6057- Viabilità Nerico-Muro Lucano
- n. 39/60/6062 – Viabilità Muro Lucano-Baragiano
- n. 39/40/6063 – Viabilità Calitri-Ofantina
- n. 39/40/6064 – Svincolo strada Calitri-Ofantina

PROG. n.39/60/6057 – VIABILITA’ NERICO-MURO LUCANO

I lavori originariamente previsti in un unico progetto sono stati suddivisi, per motivi tecnico funzionali, in tre lotti, l’ultimo dei quali in ulteriori 2 stralci, ridenominati e rinumerati 39/60/COM/6057/01 – 1° lotto, 39/60/COM/6057/02 – 2° lotto, 39/60/COM/6057/03-01 – 3° lotto 1° stralcio, 39/60/COM/6057/03-02 – 3° lotto 2° stralcio e in un ulteriore progetto numerato 39/60/COM/6057/SF relativo alla sistemazione definitiva del viadotto Ficocchia.

Prog. n. 39/60/COM/6057/01

Lavori del I° lotto: (Collegamento Nerico – Pescopagano lunghezza tratta di circa 5 Km. + bretella per Pescopagano lunghezza tratta di circa 4 Km).

L’importo del progetto del I lotto ammonta a € 5.306.734,09 di cui € 2.540.780,03 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a € 94.825,99 appaltati all’Impresa Calabria Pasquale s.r.l., € 596.461,57 per lavori connessi compresi oneri di sicurezza pari a € 19.946,37 appaltati all’Impresa Basso Costruzioni s.r.l. ed € 2.169.492,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Tutti i lavori del 1° lotto sono ultimati, collaudati, consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (Provincia di Potenza, Provincia di Avellino, ANAS e Comune di Pescopagano) e regolarmente aperti al traffico.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative,
- 2) chiusura contabile progetto.

Si segnala che non sussistono riserve.

A fronte dell'importo impegnato di €. 5.306.734,09 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 530.513,02.

Prog. n. 39/60/COM/6057/02

Lavori del II lotto: (Collegamento svincolo per Pescopagano con svincolo di Muro Lucano lunghezza tratta circa 23 Km.).

L'importo del progetto del II lotto dei lavori di completamento ammonta a €. 22.557.349,45 di cui €. 15.391.561,83 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 321.750,68, €. 148.260,00 per spese di progettazione esecutiva, €. 527.701,47 compresi oneri di sicurezza pari a €. 43.300,00 per lavori di ripristino della funzionalità del viadotto Farenga (inseriti tra le somme a disposizione) ed €. 7.017.527,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione (compresi detti lavori relativi al viadotto Farenga).

I lavori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato all'A.T.I. AKEI Costruzioni Generali S.r.l. ed altri.

I lavori sono stati ultimati in data 23.12.2016, comprese le lavorazioni di rifinitura.

Sono state già collaudate staticamente tutte le opere d'arte realizzate.

Le opere relative al tratto di circa Km. 3,5 compreso tra lo svincolo di Pescopagano (Progr. Km. 5+800) e lo Svincolo di Rapone (Progr. Km. 9+450 circa) + la galleria artificiale Km. 9+100 sono state già consegnate in via anticipata e provvisoria alla Provincia di Potenza e regolarmente aperto al traffico.

Le attività residue in avanzato corso riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) collaudo tecnico amministrativo;

- 3) Realizzazione lavori di ripristino della funzionalità strutturale del Viadotto Farenga dal Km. 25+130 al Km. 25+340 aggiudicati all'Impresa Tecnologie Stradali s.r.l. per l'importo netto di €. 484.401,47 oltre oneri di sicurezza pari a €. 43.300,00, inseriti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione relativo al progetto generale unitamente alle relative somme a disposizione pari a €. 68.374,35. E' stato stipulato il contratto in data 24.2.2017 tra il Provveditorato Interregionale OO.PP. di Potenza, avvalso da questo Ufficio, e la citata Impresa;
- 4) chiusura contabile progetto.

Si sottolinea che tutte le tratte collaudate, non potendo essere trasferite in via definitiva all'ANAS nelle more dell'intera funzionalità della viabilità Nerico-Muro Lucano, vengono di norma consegnate in via provvisoria alla Provincia di Potenza.

A fronte dell'importo impegnato di €. 22.557.349,45 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 3.427.144,30.

Prog. n. 39/60/COM/6057/03-01

Lavori del III lotto 1° stralcio: (Svincolo di Muro Lucano – Svincolo di Castelgrande – n.4 cavalcavia).

L'importo del progetto del I stralcio ammonta a €.24.072.974,87 di cui €. 18.774.180,49 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 241.000,00, €. 161.292,00 per spese di progettazione, €. 999.340,40 compresi oneri di sicurezza pari a €. 2.367,55 per lavori di risanamento della galleria Montenuovo, €. 29.737,19 compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.396,71 per lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 in località Raicelle del Comune di Muro Lucano, inseriti tra le somme a disposizione del progetto e €. 5.137.502,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione (compresi detti lavori relativi alla galleria Montenuovo).

I lavori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato all'A.T.I. Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C. ed altri.

L'ultimazione è prevista per il 6.4.2017.

Le opere relative all'impianto di illuminazione galleria artificiale Progr. Km. 9+100 circa sono state già consegnate in via anticipata e provvisoria alla Provincia di Potenza.

All'attualità sono stati contabilizzati lavori per €. 17.207.368,17 (27° SAL).

In relazione ai lavori di risanamento della galleria Montenuovo sono in corso le procedure di gara e in relazione ai lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 in località Raicelle di Muro Lucano è in corso l'affidamento diretto all'ATI Troiano esecutrice dei lavori principali.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative,
- 2) completamento lavori;
- 3) realizzazione lavori di risanamento della galleria Montenuovo;
- 4) realizzazione lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 in località Raicelle di Muro Lucano;
- 5) allaccio ENEL alla galleria di Montenuovo
- 6) chiusura contabile progetto.

Per la consegna delle opere vedasi punto precedente. Sono in corso contatti con la Regione.

A fronte dell'importo impegnato di €. 24.072.974,87 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 5.584.105,16.

Prog. n. 39/60/COM/6057/03-02

Lavori del III lotto 2° stralcio: (Svincolo di Muro Lucano).

L'importo del progetto preliminare del 3° lotto 2° stralcio (approvato con decreto commissariale n. 1324 del 4.12.2014, ammonta a €.7.415.648,67 di cui €. 6.439.914,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 126.272,82 ed €. 975.734,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

All'attualità è in corso la progettazione definitiva, a seguito di conferenza dei Servizi.

Le attività residue riguardano pertanto:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) progettazione definitiva ed esecutiva;
- 3) affidamento ed esecuzione lavori;
- 4) collaudazione, consegna opere, chiusura contabile.

A fronte dell'importo impegnato di €. 7.415.648,67 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 7.371.242,43.

Prog. n. 39/60/COM/6057/SF : (Lavori di riparazione, consolidamento ed adeguamento del viadotto “Ficocchia”).

L'importo del progetto ammonta a €. 1.985.528,22 di cui €. 1.558.924,78 per lavori compresi oneri diretti ed indiretti di sicurezza pari a €. 46.862,23 ed €. 426.603,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

All'attualità sono in corso le procedure di gara per l'affidamento dei lavori da parte del Provveditorato Interregionale OO.PP. di Napoli, avvalso da questo Ufficio.

Le attività residue riguardano:

- 1) affidamento, esecuzione lavori, collaudazione;
- 2) consegna definitiva opere, attualmente in esercizio provvisorio;
- 3) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 1.985.528,22 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 1.948.273,21.

Prog. n. 39/60/COM/6062: (collegamento Muro Lucano – Baragiano lunghezza tratta di circa 5,4 Km.)

L'importo del progetto ammonta a €. 5.267.107,00 di cui €. 2.276.163,25 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 217.082,32, ed €. 2.990.943,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori principali sono stati appaltati all'ATI Lopardo ed altri.

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (Comune di Muro Lucano, Provincia di Potenza, A.N.A.S.) e sono in regolare esercizio.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative,
- 2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 5.267.107,00 risulta una somma disponibile per

dette attività residue di €. 939.087,18.

Prog. n.39/60/COM/6062/02: (ripristino viadotto Platano-collegamento SS 94)

Il ripristino di detto tratto, che collega l'asse viario Basentana-Baragiano, realizzato nell'ambito di altro progetto e consegnato all'ANAS S.p.A. in via provvisoria da questa Amministrazione in data 2.12.1993 e in via definitiva dall'Ufficio Commissariale in data 11.3.2004, costituisce collegamento necessario per la continuità dell'intero asse stradale Basentana-Muro Lucano. Detti lavori di ripristino, pertanto, si sono resi necessari ai sensi dell'art. 86 c. 1 L. 289/02 a seguito di richiesta dell'ANAS destinatario del medesimo tratto in questione.

L'importo del progetto ammonta a €. 472.951,99 di cui €. 336.341,75 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 10.000,00 ed €. 136.610,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori sono stati appaltati all'Impresa Bochicchio Nunzio.

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati all'Ente competente (A.N.A.S.) ed in regolare esercizio.

Le attività residue riguardano:

- 1) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 472.951,99 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 104.317,65.

Prog. n.39/40/COM/6063: (collegamento Calitri-Ofantina)

L'importo del progetto ammonta a €. 2.661.864,38 di cui €. 1.435.585,03 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 68.637,29 e oneri di sicurezza speciali pari a €. 30.000,00, €. 57.182,73 per opere complementari compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.754,60 e oneri di sicurezza specifici pari ad €. 1.874,98, €. 12.500,00 per lavori di ripristino quadri elettrici a servizio impianto illuminazione galleria Gagliano compresi oneri specifici di sicurezza pari a €. 247,50 ed €. 1.156.596,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori principali, le opere complementari e i lavori di ripristino quadri elettrici a servizio

impianto illuminazione galleria Gagliano sono stati appaltati all'Impresa I.C.M. s.r.l..

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (Provincia di Avellino e Comune di Calitri) e sono regolarmente aperti al traffico.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 2.661.864,38 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 693.706,91.

Prog. n.39/40/COM/6064: (Svincolo Calitri-Ofantina)

L'importo del progetto ammonta a €. 1.336.634,70 di cui €. 593.420,36 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 34.675,59, €. 132.966,65 per opere integrative e complementari compresi oneri di sicurezza pari a €. 2.983,70, €. 106.100,39 per lavori di ripristino bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'A.I. di Nerico compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.773,94, inseriti tra le somme a disposizione del progetto, ed €. 610.247,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione compresi detti lavori di ripristino bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'A.I. di Nerico.

I lavori principali sono stati appaltati all'Impresa Edil Viro, le opere integrative e complementari all'Impresa Ciardiello Antonio e i lavori di ripristino della bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'A.I. di Nerico all'Impresa Edilteconstrade s.r.l..


I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (ANAS, Provincia di Avellino, Comune di Calitri, Consorzio ASI di Avellino) e sono in regolare esercizio.


Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 1.336.634,70 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 380.441,29.

CARTINA

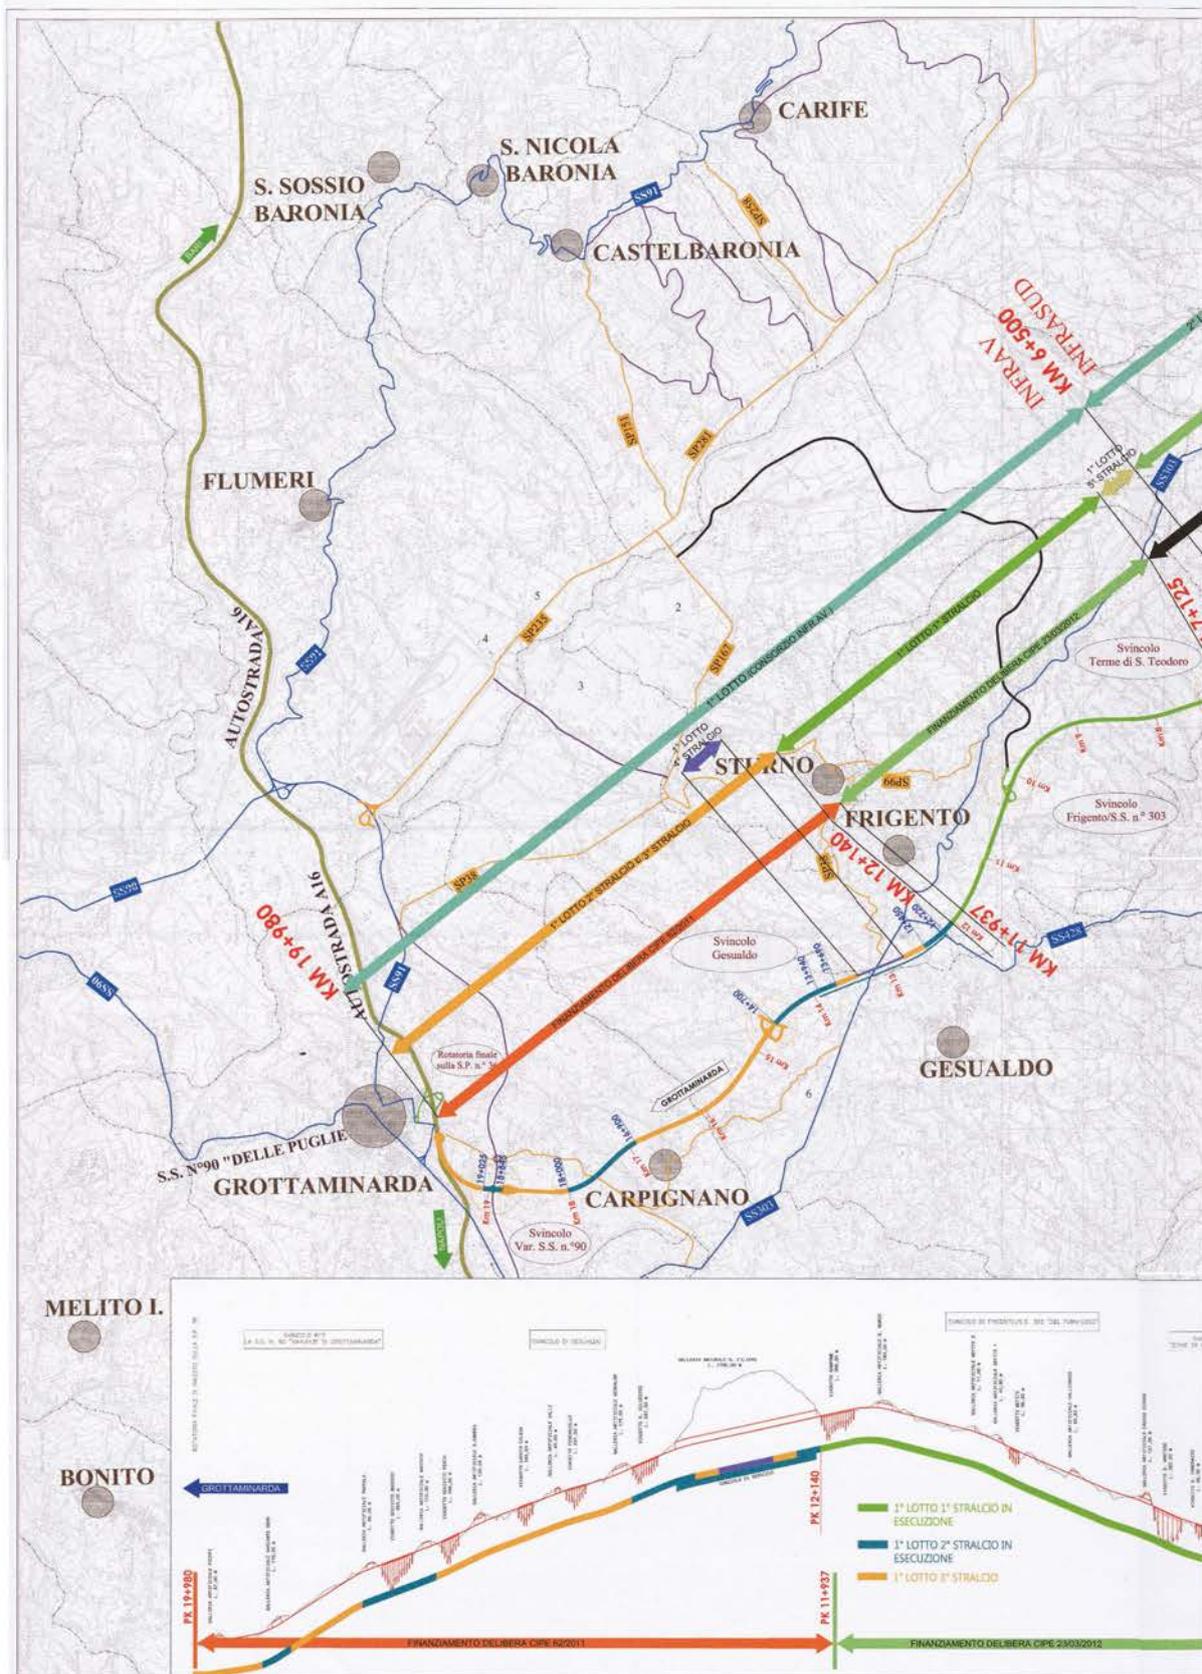

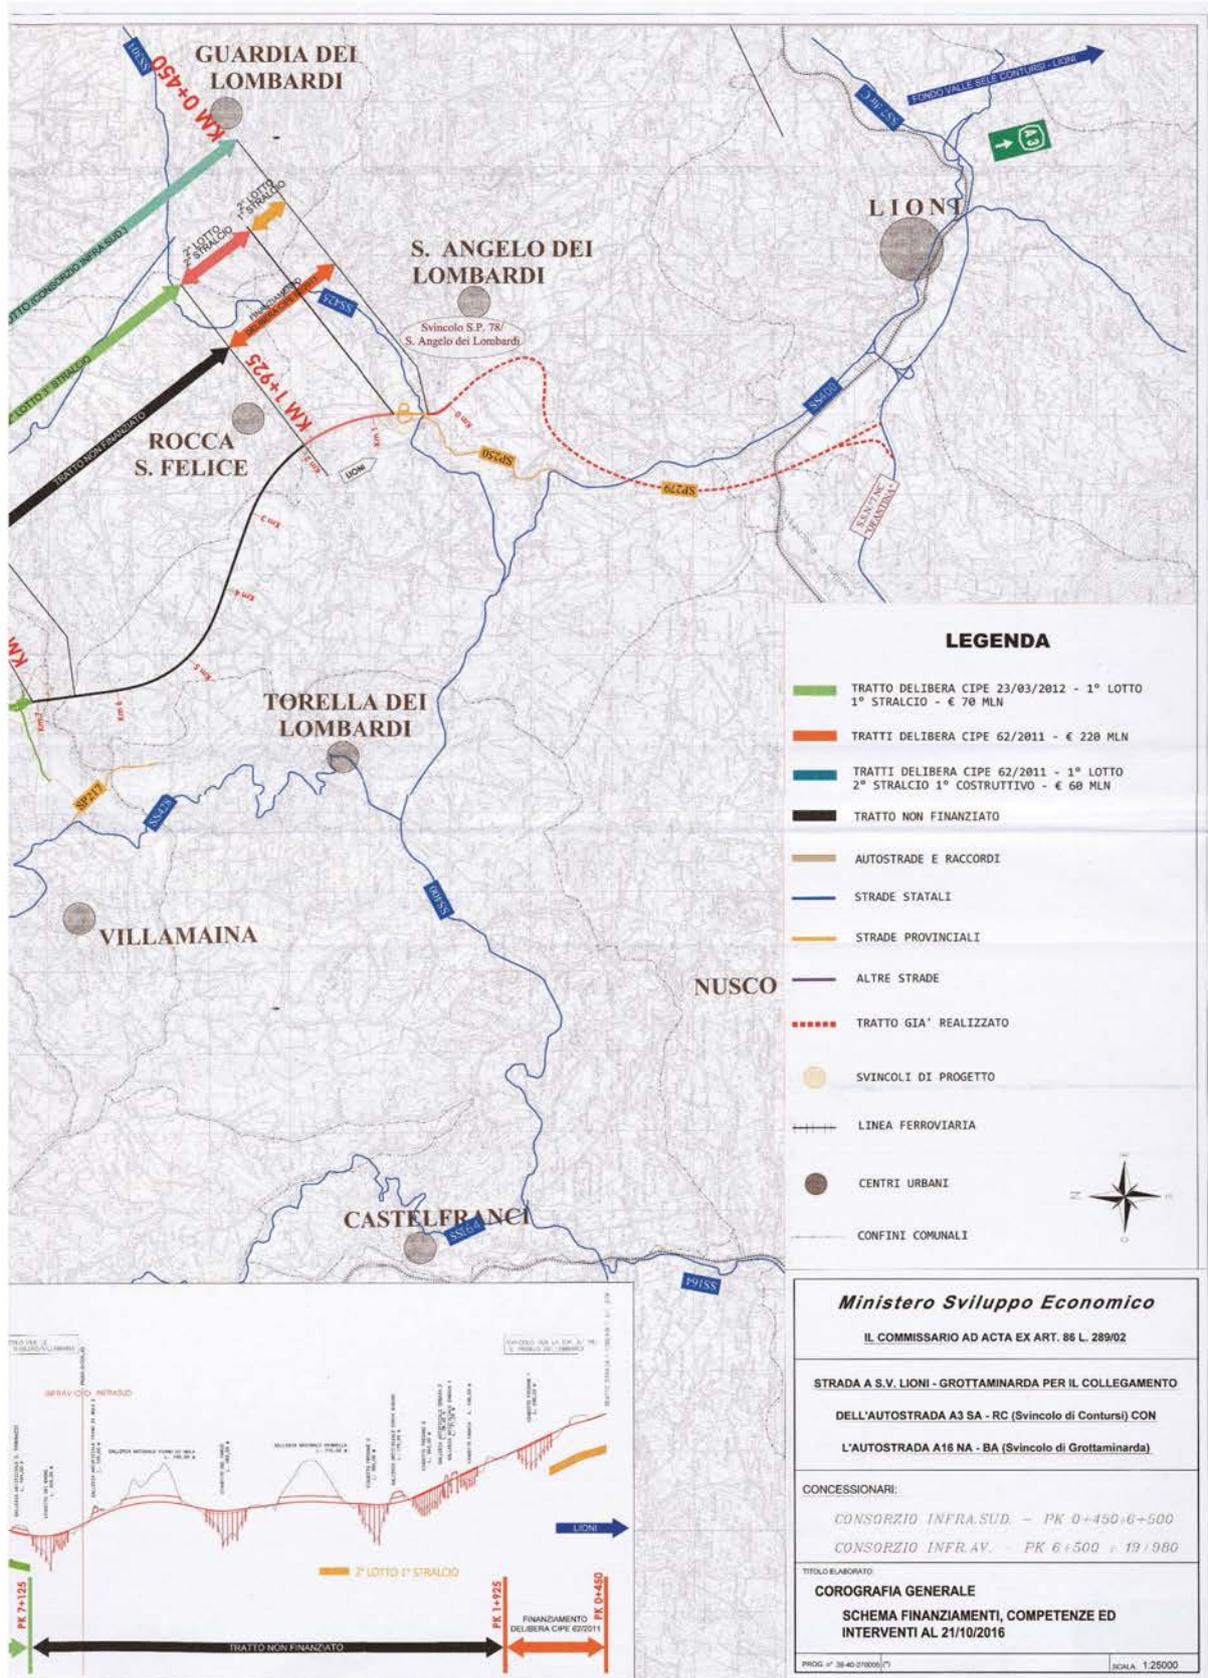

ALLEGATO 2B

| Commissario ad Acta - Legge 27.12.2002 n | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-------------|----------------|--|--|-------------------------------|----------------------|---------------|---|------|--|---|
| Progetti ex art. 32 L. 219/81 (trasferimenti da c.2 art. 85 L. 289/02 ed a seguito de | | | | | | | | | | | | | |
| Trasferimento Iniziale - A.L.A. - A.L.B. | num. progetto | PROV. | DESCRIZIONE | CONCESSIONARIO | Dotazione finanziaria | | | Chiusura concessione | | | | | |
| | | | | | Costo totale progetti revocati ex c.2 art. 85 | Eventuale suddivisione in lotti | Importo versato sulla cs 3250 | | | | | | |
| A | 39 | 60 | 6001 | PZ | Infrastrutture N.I. Balvano e Acquedotto | Consorzio per il Nucleo di Balvano | | | 190.769,06 | X | 542 | 16/06/2009 | X |
| A | 39 | 60 | 6002 | PZ | N.I. Baragiano | MALTAURO | | | 5.437,31 | X | 1449 | 09/11/2015 | X |
| A | 39 | 40 | 6003 | SA | Infrastrutture N.I. Buccino | Consorzio Infrastrutture Buccino S. Gregorio Magno | | | 15.239.426,48 | X | 1535 | 11/05/2016 | X |
| A | 39 | 40 | 6003/2 | SA | Approvvigionamento idrico A.I. Buccino - Pozzi Buccino | Consorzio Infrastrutture Buccino S. Gregorio Magno | | | 2.023.199,06 | X | 1000 | 22/12/2011 | X |
| A | 39 | 40 | 6004 | AV | Infrastrutture N.I. Calabritto | COINSUD | | | 5.479,92 | X | 547 | 30/06/2009 | X |
| A | 39 | 40 | 6005 | AV | Infrastrutture N.I. CALAGGIO | INCOMIR | | | 0,00 | X | 1454 | 18/11/2015 | X |
| B | 39 | 40 | 6006 | AV | Infrastrutture N.I. Calitri | ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione | | | 3.710.587,83 | | | Revocato | |
| A | 39 | 40 | 6007 | SA | N.I. Contursi | COINFRA | | | 192.973,31 | | | | |
| A | 39 | 40 | 6008 | AV | Infr. Nucleo Conza della Campania | GL.IT. | | | 3.649,53 | X | 633 | 19/01/2010 | X |
| A | 39 | 60 | 6009 | PZ | N.I. ISCA PANTANELLE | PIZZAROTTI | | | 0,00 | X | 324 | 20/12/2008 | X |
| A | 39 | 40 | 6010 | AV | Infr. N.I. Lioni - Nusco - S. Angelo | INFR.AV. | | | 38.009,86 | X | 307 | 01/12/2006 | X |
| A | 39 | 40 | 6011 | AV | Infr. N.I. Morra de Sanctis | GL.IT. | | | 99.952,44 | X | 633 | 19/01/2010 | X |
| B | 39 | 40 | 6012 | AV | Infrastrutture N.I. di Nerico | ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione | | | 1.138.355,19 | X | | Revocato | |
| A | 39 | 40 | 6013 | SA | Infrastrutture N.I. di Oliveto Citra | COINSUD | | | 0,00 | X | 481 | 29/10/2008 | X |
| A | 39 | 40 | 6014 | SA | Infr. N.I. PALOMONTE bretella di collegamento | COIMPA | | | 0,00 | X | 377 | 18/09/2007 | X |
| A | 39 | 40 | 6015 | AV | Infrastrutture N.I. di Porrara | INFRASUD | | | 17.132,50 | X | 630 | 08/01/2010 | X |
| A | 39 | 40 | 6016 | AV | Infrastrutture N.I. S. MANGO sul CALORE | INCOMIR | | | 0,00 | | | | |
| A | 39 | 60 | 6017 | PZ | Infr. N.I. S. Nicola di Mellì + F.Z. | PIZZAROTTI | | | 44.894,07 | X | 817 | 07/02/2011 | X |
| A | 39 | 60 | 6018 | PZ | Infrastrutture N.I. di Tito | MELANDRO - VIGGIANO | | | 0,00 | X | 1462 | 18/12/2015 | X |
| A | 39 | 60 | 6019 | PZ | Infrastrutture N.I. Valle Vitaba | PIZZAROTTI | | | 20.141,82 | X | 1326 | 22/12/2014 | X |
| A | 39 | 60 | 6020 | PZ | Infrastrutture N.I. di Viggiano | MELANDRO - VIGGIANO | | | 0,00 | | | Concessionario decaduto - D.M. 233 del 3.11.1995 | X |

| . 289 art. 86 e D. M. 21.12.2005 | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|------------------------------|---|---|--|---|---|
| D.M. 21.12.2005) + nuova opera "Viabilità Lioni - Grottaminarda" | | | | | | | | | | | |
| Chiusura progetto | Eventuali economie di progetto | Stato del progetto: Concluso - Aperto | | Attività residue (e Lavori in Corso) | Consegna opere | | | N. Transazioni sul progetto | | | |
| | | | | | Descrizione consegna | Ente destinatario | Tipologia consegna | Per espropri | Altra natura | | |
| 580 | 07/10/2009 | 190.769,06 | C | 1 | | | Consorzio ASI di Potenza | Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99 | | | |
| 1457 | 30/11/2015 | 5.437,31 | C | 1 | | | Consorzio ASI di Potenza | Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99 + 102/01 | | | |
| 1543 | 08/08/2016 | 13.897.038,82 | C | 1 | | | strada di accesso al serbatoio idrico | Comune di Buccino | Consegna provvisoria con verbale in data 19/03/1997 | | 1 |
| | | | | | | | Infrastrutture A.I. | Consorzio ASI di Salerno | Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99 | | |
| | | | | | | | Campo Pozzi | Regione Campania | Consegna definitiva in data 12/07/06 con approvazione collaudo finale-Approvato con Decreto Commissariale n.254 del 12/07/06 | | |
| | | | | | | | Condotta adidatrice, serbatoio. Condotta a gravità | Regione Campania | Consegna definitiva con Decreto Commissariale n. 1357 del 20.4.2015 - GURI n.176 del 31.7.2015 | | |
| 1503 | 13/04/2012 | 91.654,65 | C | 1 | | | Completamento approvvigionamento idrico+fratto condotta a gravità | Regione Campania | Consegna definitiva in data 08/01/10 con approvazione collaudo finale-Approvato con Decreto Commissariale n.632 del 8/1/2010 | | |
| 583 | 09/10/2009 | 5.479,92 | C | 1 | | | Consorzio ASI di Avellino | Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99 | | | |
| 1461 | 15/12/2015 | | C | 1 | | | Consorzio ASI di Avellino | Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99 | | | |
| | | | A | 1 | In corso completamento espropri | | Consorzio ASI di Avellino | Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99 | 20 | 1 | |
| | | | A | 1 | Contenzioso per esproprio (Ditta Di Menza) | | Consorzio ASI di Salerno | Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99 | | | |
| 638 | 16/02/2010 | 3.649,53 | C | 1 | | (progetto unificato al 6011) | Consorzio ASI di Avellino | Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99 | | | |
| | (unico decreto) | | C | 1 | | | Consorzio ASI di Potenza | Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99 | | | |
| 479 | 16/10/2008 | 38.009,86 | C | 1 | | | Consorzio ASI di Avellino | Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99 | | | |
| 639 | 16/02/2010 | 99.952,44 | C | 1 | | (progetto unificato al 6008) | Consorzio ASI di Avellino | Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99 | | | |
| | | | A | 1 | In corso completamento espropri | | Consorzio ASI di Avellino | Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99 | 2 | 1 | |
| | D.M. 38 del 7.4.2003 | | A | 1 | | | Consorzio ASI di Salerno | Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99 | | | |
| D.M. 20 del 24.2.2004 | | | C | 1 | | | Infrastrutture N.I. di Palomonte | Consorzio ASI di Salerno | Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99 | | |
| | | | | | | | Bretille di collegamento A.I. Palomonte e svincolo Sicignano degli Alburni | Provincia di Salerno | Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.3 del 16/9/03 - Guri n.228 dell'1/10/03 | | |
| | | | | | | | Svincolo sul raccordo autostradale di Sicignano-Potenza e impianto illuminazione | ANAS | Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.5 del 3/11/03 - GURI n.269 del 19/11/03 | | |
| 640 | 186/02/2010 | 17.132,50 | C | 1 | | | Consorzio ASI di Avellino | Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99 | | | |
| | | | A | 1 | In corso completamento espropri | | Infrastrutture N.I. S. Mango sul Calore | Consorzio ASI di Avellino | Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99 | | |
| | | | | | | | Strade di collegamento tra la SP 39 e la strada di accesso tra l'area PIP e l'A.I. di S.Mango sul Calore (loc. Piani) | Comune di S. Mango sul Calore (AV) | Consegna definitiva con verbale 5/8/09 approvato con Decreto Commissariale n.568 del 08/09/09 - GURI n.230 del 3/10/09 | | |
| 842 | 28/02/2011 | 44.894,07 | C | 1 | | | Consorzio ASI di Potenza | Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99 | | | |
| 1496 | 19/01/2016 | | C | 1 | | | Consorzio ASI di Potenza | Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99 | | | |
| 1332 | 26/01/2015 | 20.141,82 | C | 1 | | | Consorzio ASI di Potenza | Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99 - Decreto Commissariale n. 569 del 16.10.2009 (integraz.) | | | |
| 1463 | 26/01/2016 | | A | 1 | | | Consorzio ASI di Potenza | Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99 - Decreto Commissariale n. 569 del 16.10.2009 (integraz.) | | | |

| Trasferimento iniziale - AILA - A/B | num. progetto | | PROV | DESCRIZIONE | CONCESSIONARIO | Dotazione finanziaria | | | Chiusura concessione | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----|----------|-------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|------|------------|---|
| | | | | | | Costo totale progetti revocati ex c.2 art. III | Eventuale suddivisione in lotti | Importo versato sulla cs 3250 | | | | | |
| A | 39 | 40 | 6021 | AV | Infrastr. Nucleo Morra de Sanctis | GLIT. | | | 32.078,41 | X | 651 | 31/03/2010 | X |
| A | 39 | 60 | 6051 | PZ | Basentani Baragiano | MALTAURO | | | 655.073,96 | X | 1001 | 22/12/2011 | X |
| A | 39 | 40 | 6052 | SA | Contursi - Stazione FF.SS. | CONFRA | | | 559.115,16 | X | 1157 | 28/03/2012 | X |
| A | 39 | 40 | 6054 | SA | Fondo Valle Sele II* Lotto | COINSUD | | | 1.696.751,62 | X | 440 | 28/04/2008 | X |
| B | 39 | 40 | 6055 | AV | Fondo Valle Sele III* Lotto svnc. Io Materdomini | INFR.AV. | | | 6.507.310,69 | | | | |
| A | 39 | 60 | 6056 | PZ | Iscia - Tito/Brienza | PIZZAROTTI | | | 598.272,70 | X | 810 | 19/01/2011 | X |
| | 39 | 60 | 6057 | PZ | Strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina in Località Nerico | ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione | | | | | | | X |
| | 39 | 60 | 6057/1 | PZ | | | | | 5.306.734,09 | | | | |
| | 39 | 60 | 6057/2 | PZ | | | | | 22.776.273,63 | | | | |
| | 39 | 60 | 6057/3/1 | PZ | | | | | 24.072.074,87 | | | | |
| | 39 | 60 | 6057/3/2 | PZ | | | | | 7.415.648,67 | | | | |
| | 39 | 60 | 6057/S F | PZ | | | | | 1.985.528,22 | | | | |
| A | | | | | | | (importo professionisti AIL A) | | 25.073,54 | | | | |
| | | | | | | | | 61.557.159,48 | | | | | |
| | | | | | | | | importo movimentato da economie | -25.778.161,84 | | | | |
| A | 39 | 40 | 6058 | AV | Bretella N.I. Lioni Porrara (Nusco - S. Angelo) | INFRASUD | | | 1.349.655,01 | X | 1500 | 28/02/2016 | X |

| Chiusura progetto | Eventuali economie di progetto | Stato del progetto: Concluso - Aperto | Attività residue (e Lavori in Corso) | Consegna opere | | | N. Transazioni sul progetto | | | |
|-------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|---|---|---|-----|---|
| | | | | Descrizione consegna | Ente destinatario | Tipologia consegna | Per espropri | Altra natura | | |
| | | | | | | | | | | |
| 657 | 28/04/2010 | 32.078,41 | C | 1 | | Consorzio ASI di Avellino | Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/09 | | | |
| 1078 | 04/07/2012 | 155.073,96 | C | 1 | | ANAS | Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.43 dell'11/3/04 - GURI n.77 dell'1/4/04 | | | |
| 1172 | 18/06/2013 | 473.874,37 | C | 1 | | ANAS | Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.1 dell'1/8/03 - GURI n.211 dell'11/8/03 | | | |
| (unico decreto) | | 1.546.751,82 | C | 1 | | Strada Fondo Valle Sele II° Lotto | ANAS | Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.45 del 14.5.04 - G.U.R.I. n.126 del 31/5/04 | | 1 |
| | | | | | | Controstrade a valenza comunale | Comune di Calabritto | Consegna definitiva il 4/12/01 | | |
| | | | A | 1 | Contenzioso con Comune di Caposelle (AV) | Strada "Fondo Valle Sele III" Lotto + svincolo Materdomini | ANAS | Consegna definitiva con verbale 24/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.157 del 03/02/06 - GURI n.46 del 24/02/06 | | |
| | | | | | | Viabilità connessa all'asse principale | Comune di Teora | Consegna definitiva con verbale del 26/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.158 del 07/02/06 - GURI n.80 del 13/03/06 | | |
| | | | | | | Viabilità connessa all'asse principale | Comune di Caposelle | Consegna definitiva con verbale del 26/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.159 del 07/02/06 - GURI n.80 del 13/03/06 | | |
| | | | | | | Viabilità connessa all'asse principale | Comune di Lioni | Consegna definitiva con verbale del 26/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.160 del 07/02/06 - GURI n.80 del 13/03/06 | | |
| | | | | | | Viabilità connessa all'asse principale | Comune di Calabritto | Consegna definitiva con verbale del 26/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.161 del 07/02/06 - GURI n.80 del 13/03/06 | | |
| | | | | | | Viabilità ampliamento della ex S.S. 165 | Regione Campania | Consegna definitiva con verbale del 12/08/06 approvato con Decreto Commissariale n.267 del 15/08/06 - GURI n.243 del 18/10/06 | | |
| 839 | 25/02/2011 | 514.618,79 | C | 1 | | | Provincia di Potenza | Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.13 del 21/2/03 - GURI n.296 del 22/12/03 | | |
| 1047 | 21/03/2012 | 25.073,54 | C | 1 | | | | | | |
| | | | A | 1 | Attività varie amministrative | Tratta da progr. 0+00 a progr. 1+750 | Provincia di Avellino | Consegna definitiva con approvazione collaudo - Decreto Commissariale n. 1276 del 16.7.14 | 48 | |
| | | | | | | Tratta da progr. 1+750 a progr. 5+600 | Provincia di Avellino | Consegna definitiva con approvazione collaudo - Decreto Commissariale n. 1276 del 16.7.14 | | |
| | | | | | | Rotatoria per Pescopagano | ANAS | Consegna definitiva con approvazione collaudo - Decreto Commissariale n. 1276 del 16.7.14 | | |
| | | | | | | Bretella per Pescopagano | Comune di Pescopagano | Consegna definitiva con approvazione collaudo - Decreto Commissariale n. 1276 del 16.7.14 | | |
| | | | A | 1 | Lavori in corso | Tratta da progr. 5+500 Svincolo Pescopagano a progr. 9+450 Svincolo Rapone | Provincia di Potenza | Consegna anticipata con verbale in data 24.7.14 approvato con Decreto Commissariale n.1282 del 3.9.14 | 255 | |
| | | | A | 1 | Lavori in corso | Impianto di illuminazione in galleria artificiale alla progr. km. 9+100 circa | Provincia di Potenza | Consegna anticipata con verbale in data 24.7.14 approvato con Decreto Commissariale n.1282 del 3.9.14 | 64 | 1 |
| | | | A | 1 | Lavori in corso | | | | | |
| | | | A | 1 | Lavori in corso | | | | | |
| 1087 | 03/09/2012 | 1.348.655,01 | C | 1 | | Bretella N.I. Lioni Porrara (Nusco - S. Angelo) | Provincia di Avellino | Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.33 del 29/12/03 - GURI n.17 del 22/1/04 | | |
| | | | | | | Svincolo per S. Angelo dei Lombardi | Provincia di Avellino | Consegna definitiva con verbale del 15/12/03 approvato con Decreto Commissariale n.32 del 18/12/03 - GURI n.6 del 9/1/04 | | |

| Trasferimento iniziale - All. A - All. B | num. progetto | PROV | DESCRIZIONE | CONCESSIONARIO | Dotazione finanziaria | | | Chiusura concessione | | | |
|--|---------------|--------|-------------|--|--|---|----------------------------------|----------------------|---|-----|------------|
| | | | | | Costo totale progetti revocati ex c.2 art. 56 | Eventuale suddivisione in lotti | Importo versato sulla cs 3250 | | | | |
| A | 39 60 | 6059 | PZ | Melfi - Area Industriale | PIZZAROTTI | | | 1.197.629,85 | X | 659 | 28/04/2010 |
| I | 39 60 | 6062 | PZ | Viabilità Muro Lucano - Baragiano Scalo | ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione | Versamento iniziale 5.269.928,00 + 8.793,79 residuo professionisti | 5.287.107,00 | 5.278.721,79 | | | Revocata |
| A | 39 60 | 6062/2 | PZ | | | 472.951,99 | | | | | |
| | | | | | (importo professionisti All. A) | 8.793,79 | | | | | |
| | | | | | 5.740.058,99 | | | | | | |
| | | | | | importo movimentato da economie | -481.337,24 | | | | | |
| I | 39 40 | 6063 | AV | Caltri Ofantina | ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione | | 37.578,14 | 2.624.286,24 | | | Revocata |
| A | | | | | (importo professionisti All. A) | 52.557,65 | | | | | |
| | | | | | | 2.661.854,38 | | | | | |
| I | 39 40 | 6064 | AV | Caltri Ofantina (svincolo) | ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione | versamento iniziale 702.471,33 + 50.000,00 residuo professionisti | 584.163,37 | 752.471,33 | | | Revocata |
| A | | | | | (importo professionisti All. A) | 50.000,00 | | | | | |
| | | | | | | 1.336.634,70 | | | | | |
| A | 39 40 | 6066 | AV | Strada Ofantina S. Mango | INCOMIR | | | 267.449,90 | X | 808 | 10/01/2011 |
| A | 39 60 | 6067 | PZ | Valle di Vitaba - Ofantina | PIZZAROTTI | | | 2.790.718,95 | X | 880 | 24/05/2011 |

| Chiusura progetto | Eventuali economie di progetto | Stato del progetto: Concluso - Aperto | Attività residue (e Lavori in Corso) | Consegna opere | | | N. Transazioni sul progetto | | | |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|----|---|
| | | | | Descrizione consegna | Ente destinatario | Tipologia consegna | Per espropri | Altra natura | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Area in località "Selvatico" (part. le 579/a - 41/a-42/a-584) | Comune di S. Angelo del Lombardi | Consegna definitiva con verbale del 12/1/04 approvato con Decreto Commissariale n.39 del 14/1/04 - GURI n.16 del 23/1/04 | | | | |
| X | 677 | 13/07/2010 | 377.390,17 | C | 1 | | | | | |
| | | | | | | Strada N.I. Mellì - Abitato Mellì - Superstrada Candela/Potenza | Provincia di Potenza | Consegna definitiva il 15/11/2000 | | |
| | | | | | | Controstrade a valenza comunale | Comune di Mellì | Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.40 del 20/1/04 - GURI n.28 del 4/2/04 | | |
| X | 1048 | 22/03/2012 | 8.793,79 | C | 1 | Attività varie amministrative | Comune di Muro Lucano | Consegna definitiva con approvazione collaudo Decreto Commissariale n. 885 del 6.6.2011 | 53 | 1 |
| | | | | | | Viabilità secondaria | Comune di Muro Lucano | Consegna definitiva con verbale in data 20.7.2009 approvato con Decreto Commissariale n. 564 del 4.8.2009 - GURI n. 201 del 4.8.2009 | | |
| | | | | | | Opere completamento strada Baragliano-Muro Lucano e Opere ampliamento bretella svincolo di svincolo su SS.7 | Provincia di Potenza e Comune di Muro Lucano | Consegna provvisoria con verbale in data 20.7.2009 approvato con Decreto Commissariale n. 562 del 4.8.2009 | | |
| | | | | | | Rotatoria di innesto al Km. 420+900 sulla SS. 7 | ANAS | Consegna definitiva con approvazione collaudo Decreto Commissariale n. 803 del 18.7.2011 | | |
| | | | | | | Viabilità secondarie relative alla Rotatoria d'innesto al Km. 420+900 sulla SS. 7 | Comune di Muro Lucano | Consegna definitiva con approvazione collaudo Decreto Commissariale n. 893 del 18.7.2011 | | |
| | | | | A | 1 | Collegamento viario tra la strada Muro Lucano-Baragliano e la S.S. 94/Dir. | ANAS | Consegna definitiva con approvazione collaudo Decreto Commissariale n. 1016 del 23.1.2012 | | |
| X | 1412 | 27/07/2015 | | C | 1 | Strada Caltri-Ofantina | Provincia di Avellino | Consegna definitiva con approvazione collaudi Decreti Commissariali n. 938 del 18.10.2011 e n. 1077 del 2.7.2012 | 70 | 1 |
| | | | | | | Viabilità secondaria | Comune di Caltri | Consegna definitiva con verbale in data 25.8.2010 approvato con Decreto Commissariale n. 726 del 15.8.2010 - GURI n. 233 del 5.10.2010 | | |
| X | 1051 | 03/04/2012 | 24.432,85 | C | 1 | Svincolo strada collegamento abitato di Caltri con la SS. 401 Ofantina - Asse principale | ANAS | Consegna definitiva con approvazione collaudi Decreti Commissariali n. 923 del 2.9.2011 - GURI n. 43 del 21.2.2012 e n. 1058 del 14.5.2012 | 8 | 1 |
| | | | | | | Rampe di accesso opere relative allo svincolo | Provincia di Avellino | Consegna definitiva con approvazione collaudi Decreti Commissariali n. 923 del 2.9.2011 - GURI n. 43 del 21.2.2012 e n. 1058 del 14.5.2012 | | |
| | | | | | | Viabilità secondaria | Comune di Caltri | Consegna definitiva con approvazione collaudi Decreti Commissariali n. 923 del 2.9.2011 - GURI n. 43 del 21.2.2012 e n. 1058 del 14.5.2012 | | |
| | | | | | | Viabilità della bretella di collegamento tra lo svincolo per Caltri e l'Area Industriale di Nerico | Consorzio ASI di Avellino | Consegna definitiva con Decreto Commissariale n. 1258 del 15.1.2014 - GURI n. 181 del 6.8.2014 | | |
| X | 824 | 11/02/2011 | 48.396,22 | C | 1 | Strada Ofantina S. Mango | Provincia di Avellino | Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.49 del 15/7/04 - GURI n.186 del 10/8/04 | | 1 |
| | | | | | | Sovrappassi progr. 2181 - 2552 - 512 + sottopassi e viabilità secondaria | Comune di San Mango sul Calore | Consegna definitiva con verbale del 9/2/05 approvato con Decreto Commissariale n.90 del 15/2/05 - GURI n.52 del 4/3/05 | | |
| | | | | | | Sovrappassi progr. 3830 e 4146 | Comune di Castelvelere sul Calore | Consegna definitiva con verbale del 15/02/05 approvato con Decreto Commissariale n.97 del 6/4/05 - GURI n.106 del 09/05/05 | | |
| | | | | | | Viabilità secondaria progr. 0.00 + 113,40 | Comune di Chiviano San Domenico | Consegna definitiva con verbale del 7/2/05 approvato con Decreto Commissariale n.89 del 15/2/05 - GURI n.51 del 3/3/05 | | |
| | | | | | | Sovrappassi alla prog. 3530.31 e 512 + Bretella A.I. S. Mango sul Calore | Provincia di Avellino | Consegna definitiva con verbale dell'8/4/05 approvato con Decreto Commissariale n.99 dell'11/4/05 - GURI n.107 del 10/05/05 | | |
| | | | | | | Strada di collegamento tra la S.P. 39 e l'A.I. di S.Mango sul Calore | Provincia di Avellino | Consegna definitiva con verbale dell'16/10/09 approvato con Decreto Commissariale n.600 del 30/10/09 - GURI n.282 del 3/12/09 | | |
| X | 896 | 19/07/2011 | 713.360,99 | C | 1 | | Provincia di Potenza | Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.44 del 16/4/04 - GURI n.101 del 30/4/04 | | |

| Trasferimento Iniziale - A.B.A. - A.B.B. | num. progetto | | PROV. | DESCRIZIONE | CONCESSIONARIO | Dotazione finanziaria | | | Chiusura concessione | | |
|--|---------------|----|--------|-------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|---|
| | | | | | | Costo totale progetti revocati ex c.2 art. 99 | Eventuale suddivisione in lotti | Importo versato sulla cs 3250 | | | |
| A | 39 | 40 | 6068 | SA | F.V.S. - Oliveto Citra | COINFRA | | | 480.247,21 | | |
| A | 39 | 60 | 6069 | PZ | Rapone - Ofantina - Muro Lucano | ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione | | | 4.959.481,14 | | Revocato |
| A | 39 | 60 | 6070 | PZ | Rapone - Ofantina - Vialba | PIZZAROTTI | | | 56.550,12 | X | 1333 28/01/2015 |
| A | 39 | 40 | 6071 | AV | Svincolo ferroviario S. Mango sul Calore | INCOMIR | | | 101.011,85 | | |
| A | 39 | 48 | 6075 | SA | F.V.S. Ospedale Oliveto Citra | COINFRA | | | 1.132.241,72 | | |
| A | 39 | 60 | 6076 | PZ | Balvano Basentana Baragiano | MALTAURO | | | 583.567,86 | X | 652 31/03/2010 |
| A | 39 | 60 | 6076/2 | PZ | Balvano Basentana Baragiano I° lotto (L. 256/98) | MALTAURO | | | 25.914,78 | X | 1353 13/03/2015 |
| A | 39 | 60 | 6077 | PZ | Isca - Polta | PIZZAROTTI | | | 1.035.047,59 | X | 648 22/03/2010 |
| B | 39 | 60 | 6077/2 | PZ | Isca-Polta II lotto | PIZZAROTTI | | | 5.951.922,02 | | |
| A | 39 | 40 | 6080 | SA | Svincolo ferroviario N.I. di Buccino | Consorzio Infrastrutture Buccino S. Gregorio Magno | | | 636.401,58 | | |
| A | 39 | 40 | 6091 | AV | Acq. principale Alta Irpinia | SNAM PROGETTI | | | 1.916.417,53 | X | 661 10/05/2010 |
| A | 39 | 40 | 6094 | SA | Acq. Area Industriale di Buccino | COINSUD | | | 460.468,56 | X | 491 01/12/2008 |
| A | 39 | 40 | 6095 | AV | Acq. Irpinia II Valfata/Monteleone | SNAM PROGETTI | | | 208.588,07 | X | 655 28/04/2010 |
| A | 39 | 40 | 6096 | SA | Condotta Reflu Palomonte - Buccino | SNAM PROGETTI | | | 0,00 | | Decreto Ministeriale n. 3 |
| A | 39 | 40 | 6097 | SA | Condotta Reflu Calabritto Battipaglia | SNAM PROGETTI | | | 0,00 | | Decreto Ministeriale n. 4 |
| A | 39 | 60 | 6101 | SA | Impianto depurazione N.I. Balvano | Consorzio per il Nucleo di Balvano | | | 2.042,61 | X | 552 10/07/2009 |
| A | 39 | 40 | 6102 | AV | Impianto depurazione N.I. Calabritto | COINSUD | | | 0,00 | X | 541 15/06/2009 |
| A | 39 | 40 | 6103 | SA | Impianto depurazione N.I. Contursi | COINFRA | | | 0,00 | | Delibera ex Agensud n. 2350 del 17.3.1993 |
| A | 39 | 40 | 6104 | AV | Impianto depurazione N.I. Conza | GLIT. | | | 6.832,39 | | |
| A | 39 | 40 | 6105 | AV | Impianto depurazione N.I. Lioni (F1) | SNAM PROGETTI | | | 7.101,32 | X | 809 10/01/2012 |
| A | 39 | 40 | 6106 | AV | Impianto depurazione N.I. Morra | GLIT. | | | 8.664,38 | X | 1117 14/11/2012 |
| A | 39 | 40 | 6107 | SA | Impianto depurazione N.I. Palomonte | COIMPA | | | 0,00 | X | 378 18/09/2007 |
| A | 39 | 40 | 6108 | AV | Impianto depurazione N.I. Porrara | INFRASUD | | | 12.130,35 | X | 631 08/01/2010 |
| A | 39 | 60 | 6109 | PZ | Impianto depurazione N.I. Viggiano | MELANDRO - VIGGIANO | | | 64.468,79 | X | Concessionario decaduto - D.M. 233 del 30.11.95 |
| A | 39 | 99 | 6150 | | Opere di elettrificazione | ENEL SPA COMPARTIMENTO DI NAPOLI | | | 97.260,85 | X | 308 01/12/2006 |
| A | 39 | 99 | 6151 | | Eliminazione interferenze | ENEL SPA COMPARTIMENTO DI NAPOLI | | | 1.320.541,88 | X | 309 01/12/2006 |

| Chiusura progetto | Eventuali economie di progetto | Stato del progetto: Concluso - Aperto | Attività residue (e Lavori in Corso) | Consegna opere | | | N. Transazioni sul progetto | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|---|--------------|
| | | | | Descrizione consegna | Ente destinatario | Tipologie consegna | Per espropri | Altra natura |
| | | | | | | | | |
| | | A 1 | Contenzioso COINFRA | | Comune di Oliveto Citra (SA) | Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.2 del 1/8/03 - GURI n.215 del 16/9/03 | | |
| | | A 1 | In corso completamento espropri | | Provincia di Potenza | Consegna definitiva l'11/10/99 | 48 | 1 |
| X 1349 | 20/02/2015 | 56.550,12 | C 1 | | Provincia di Potenza | Consegna definitiva l'11.10.99 | | |
| | | A 1 | In corso ultimazione espropri | | Consorzio ASI di Avellino | In corso | | |
| | | A 1 | Contenzioso COINFRA - Saldo a debito del Concessionario non corrisposto | | Comune di Oliveto Citra (SA) | Consegna definitiva il 27/9/00 | | |
| X 658 | 28/04/2010 | 583.567,86 | C 1 | | Provincia di Potenza | Consegna definitiva il 24/1/96 | | |
| X 1385 | 04/05/2015 | 25.914,78 | C 1 | | Provincia di Potenza | Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.48 del 24/5/04 - GURI n.148 del 26/9/04 | | |
| X 654 | 12/04/2010 | 965.479,69 | C 1 | Contenzioso - saldo lavori sospeso | Strada Isca - Polla tratto Km.0+000 / Km.1+500 | Provincia Potenza | Consegna definitiva con verbale del 13/9/04 approvato con Decreto Commissariale n.59 del 27/9/04 - GURI n.238 del 9/10/04 | |
| | | | | | Tratto Km.1+500 / Km.5+715 | Provincia Potenza | Consegna definitiva con verbale del 27/9/04 approvato con Decreto Commissariale n. 62 del 15/10/04 - GURI n.259 del 4/11/04 | |
| | | | | | Tratto Km.5+715 / Km.6+199,50 | Provincia Salerno | Consegna definitiva con verbale del 20/9/04 approvato con Decreto Commissariale n. 63 del 15/10/04 - GURI n.259 del 4/11/04 | |
| | | | | | Controstrade a valenza comunale | Comune S. Angelo Le Fratte (PZ) | Consegna definitiva con verbale del 23/3/05 approvato con Decreto Commissariale n. 94 del 31/3/05 - GURI n.90 del 19/4/05 | |
| | | A 1 | | | Provincia di Salerno Comune di Caggiano | Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.346 del 16/04/07 - GURI n.117 del 22/5/07 | | |
| | | A 1 | Pagamento saldo lavori sospeso per inadempimento contributiva | | Consorzio ASI di Salerno | Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99 | | |
| X 1075 | 21/06/2012 | 1.859.817,53 | C 1 | | Regione Basilicata Regione Puglia Regione Campania | Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.041 del 20/2/04 - GURI n.54 del 5.3.04 | | |
| X 500 | 14/01/2009 | 480.468,56 | C 1 | | Consorzio Acquedotto Valle del Sele | Consegna definitiva il 29/10/97 | | |
| X 685 | 31/05/2010 | 208.588,07 | C 1 | | Regione Campania Regione Puglia | Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.042 del 20/2/04 - GURI n.54 del 5.3.04 | | |
| 6 del 7.4.2003 | | | C 1 | | Consorzio ASI di Salerno | Consegna definitiva il 24/1/01 | | 1 |
| 0 del 7.4.2003 | | | C 1 | | Consorzio ASI di Salerno | Consegna definitiva il 24/1/01 | | 1 |
| X 581 | 07/10/2009 | 2.042,61 | C 1 | | Consorzio ASI di Potenza | Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99 | | |
| X 553 | 10/07/2009 | | C 1 | | Consorzio ASI di Avellino | Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99 | | |
| Decreto Ministeriale n. 39 del 7.4.2003 | | | C 1 | | Consorzio ASI di Salerno | Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99 | | |
| | | A 1 | In corso verifica trasferimento suoli | | Consorzio ASI di Avellino | Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99 | | |
| X 840 | 25/02/2011 | 7.101,32 | C 1 | | Consorzio ASI di Avellino | Consegna definitiva con D.M. n.157 del 2/7/99 - Integrazione D.M. n.157 a cura MAP (part. Catastali) | | |
| X 1128 | 31/12/2012 | 8.864,38 | C 1 | | Consorzio ASI di Avellino | Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99 | | |
| Decreto Ministeriale n. 31 del 20.3.2003 | | | C 1 | | Consorzio ASI di Salerno | Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99 | | |
| X 637 | 16/02/2010 | 12.130,35 | C 1 | | Consorzio ASI di Avellino | Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99 | | |
| X 1458 | 07/12/2015 | 54.468,79 | C 1 | | Consorzio ASI di Potenza | Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99 | | |
| X 374 | 18/09/2007 | 97.260,85 | C 1 | | | | | |
| X 375 | 18/09/2007 | 1.320.541,88 | C 1 | | | | | |

| Trasferimento Iniziale - ALA - ALB | num. progetto | | | PROV | DESCRIZIONE | CONCESSIONARIO | Dotazione finanziaria | | | Chiusura concessione | | |
|------------------------------------|---------------|----|--------|---------------|---|---|---|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----|------------|
| | | | | | | | Costo totale progetti revocati ex c.2 art. 86 | Eventuale suddivisione in lotti | Importo versato sulla cs 3250 | | | |
| gestione | 39 | 60 | 6202 | PZ | INVASO PIGNOLA | CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI POTENZA | | | 0,00 | X | 678 | 13/07/2010 |
| gestione | 39 | 40 | 6203 | SA | Condotta forata Battipaglia | CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO | | | 66.154,59 | X | 361 | 09/05/2007 |
| gestione | 39 | 40 | 6205 | SA | Adeguamento depuratore di Battipaglia | CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO | | | 0,00 | X | 340 | 26/03/2007 |
| gestione | 39 | 40 | 6207 | SA | Collet. Reflu acque alte SELE/TUSC. | CONSORZIO DESTRA SELE | | | 761,97 | X | 341 | 26/03/2007 |
| A | 39 | 40 | 6208 | SA | By pass Ponte Canale | EAAP-ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE | | | 12.453,85 | X | 664 | 26/05/2010 |
| A | 39 | 60 | 6209 | PZ | Lavori idrici Melfi | CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI POTENZA | | | 0,00 | X | 817 | 07/02/2011 |
| c. 1 | 39 | 40 | 270001 | AV | Viabilità Lioni - Grottamiranda 1° lotto 1° stralcio | Concessionario INFR.AV. | | Regione Campania | 19.900.000,00 | | | |
| | | | | | | | | Regione Campania | 6.000.000,00 | | | |
| c. 1 | 39 | 40 | 310001 | AV | Viabilità Lioni - Grottamiranda 1° lotto 2° stralcio 1° costruttivo | Concessionario INFR.AV. | | Versamento MIT 25/07/2016 | 9.548.000,00 | | | |
| 75 | | | | TOTALI | | | 71.296.717,55 | 44.434.476,95 | 137.412.814,99 | Totale Econ | | |
| Sommano: | | | | | | | arrotondamento effettuato dal MAP sull'importo totale versato progetti revocati | | 76,02 | | | |
| | | | | | | | Recuperi effettuati dall'Ufficio Commissariale per totali | | 53.705,05 | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | | | | | | | 137.466.596,06 | | | |

| Chiusura progetto | | Eventuali economie di progetto | Stato del progetto: Concluso - Aperto | | Attività residue (e Lavori in Corso) | Consegna opere | | | H. Transazioni sul progetto | |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | | | | Descrizione consegna | Ente destinatario | Tipologia consegna | Per espropri | Altra natura |
| X | (unico decreto) | | C | 1 | | Consorzio ASI di Potenza | Opera già trasferita all'attuale gestore (v. comunicazione commissariale n.870 del 27/2/04) | | | |
| X | (unico decreto) | 66.154,59 | C | 1 | | Consorzio ASI di Salerno | Consegna definitiva con D.M. n.26 del 15/2/2000 | | | |
| X | (unico decreto) | | C | 1 | | Consorzio ASI di Salerno | Consegna definitiva con D.M. n.107 del 27/6/95 | | 1 | |
| X | (unico decreto) | 761,97 | C | 1 | | Consorzio Destra Sele | Consegna D. Comitato Gestione "Agenzia" n.880 del 19/12/92 | | | |
| X | (unico decreto) | 12.453,85 | C | 1 | | Ente Acquedotto Pugliese | Opera già trasferita all'attuale gestore (v. comunicazione commissariale n.866 del 28/2/04) | | | |
| X | 680 | 13/07/2010 | C | 1 | | Consorzio ASI di Potenza | Opera già trasferita all'attuale gestore (v. comunicazione commissariale n.871 del 27/2/04) | | | |
| | | | A | 1 | | | | | | |
| | | | A | 1 | | | | | | |
| Somme | | 25.435.626,90 | | | | | | 568 | 13 | |
| | | | 53 | | | | | | | |
| | | | 70,67 | % | | | | | | |
| | | | 22 | | | | | | | |
| | | | 29,33 | % | | | | | | |

ALLEGATO 2C

COMMISSARIO AD ACTA ex Art.86 L.289/02 e D.M. 21.12.2005
 Progetti trasferiti al Commissario ad Acta già con contenzioso in atto curato direttamente dalla competente Div. II^a della DGIAI/MISE

| | raggr. | regione | sigla | numero di progetto e lotto | PROV | Concessionario | LAVORI | CONTENZIOSO * SORTO ANTE GESTIONE COMMISSARIALE |
|----|--------|---------|-------|----------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 39 | 60 | | 6002 | PZ | IMPRESA MALTAURO | N.I.Baragiano e Depuratore | Venetucci c/Maltauro e Mise - CT ADS PZ 1318/13 - RG 1001/2013/CC |
| 2 | 39 | 40 | | 6005 | AV | Consorzio INCOMIR | N.I. Calaggio | lavarone c/Mise ed altri - CT ADS Napoli 16804/09 - RG 3460/2009/CC - Sentenza sfavorevole n. 3474/2016 dep.29.9.2016 |
| 3 | 39 | 40 | | 6006 | AV | I.C.L.A COSTR.GENERALI SPA | N.I. Calitri | Gervasi c/Mise - CT ADS NA 16806/2009 |
| 4 | 39 | 40 | | 6007 | SA | CONSORZIO CO.INFRA. | N.I. Contursi | Di Menza c/Mise - CT ADS Salerno 4099/05 |
| 5 | 39 | 60 | | 6017 | PZ | IMPRESA PIZZAROTTI | N.I. S.Nicola di Melfi + F.Z. | Giuliani c/Pizzarotti |
| 6 | 39 | 60 | | 6018 | PZ | CONSORZIO MELANDRO-VIGGIANO | N.I. Tito | Consorzio Melandro Viggiano in fallimento c/Mise - CT ADS Napoli 15192/03 (In attesa Sentenza Corte d'Appello di Napoli) |
| 7 | 39 | 60 | | 6020 | PZ | CONSORZIO MELANDRO-VIGGIANO | N.I. Viggiano | 1) Consorzio Melandro Viggiano in fallimento c/Mise - CT ADS Napoli 15192/03 (In attesa Sentenza Corte d'Appello di Napoli) - 2) Di Rago c/ANAS e Mise |
| 8 | 39 | 40 | | 6055 | AV | CONSORZIO IN.FR.AV. | Fondo Valle Sele 3° lotto | Comune di Caposele c/Consorzio Infrav - CT ADS Napoli 11540/15 |
| 9 | 39 | 40 | | 6068 | SA | CONSORZIO CO.INFRA. | Strada FVS-Oliveto Citra | Consorzio COINFRA c/Mise |
| 10 | 39 | 40 | | 6075 | SA | CONSORZIO CO.INFRA. | Strada FVS-Ospedale di Oliveto Citra | Consorzio COINFRA c/Mise |

| | raggr. | regione | sigla | numero di progetto e lotto | PROV | Concessionario | LAVORI | CONTENZIOSO * SORTO ANTE GESTIONE COMMISSARIALE |
|----|--------|---------|-------|----------------------------|------|--|-----------------------------------|---|
| 11 | 39 | 60 | | 6077 | 02 | IMPRESA PIZZAROTTI | Strada Isca-Polla 2° lotto | Pizzarotti c/Mise CT AGS 42056/01 |
| 12 | 39 | 60 | | 6109 | PZ | CONSORZIO MELANDRO-VIGGIANO | Impianto depurazione N.I.Viggiano | Consorzio Melandro Viggiano in fallimento c/ Mise CT ADS Napoli 100627/2000 |
| 13 | 39 | 40 | | 6006 | AV | I.C.L.A. Costr.Generali S.P.A (Concess.revocato) | N.I. Calitri | Piumelli c/Mise-Commissario ad Acta - CT ADS Napoli 010454/2012 |

L'Ufficio Commissariale offre la propria collaborazione alla trattazione di dette attività in particolare per quanto riguarda le OO.PP.. La collaborazione si estende anche a contenziosi relativi a "Opere Private", ove richiesta dal MISE, sempre risalenti ad epoca antecedente la nomina commissariale.

Tutta la documentazione è reperibile presso la citata Div.II/DGIAI del MISE.

ALLEGATO 3

| PROG | Lotto | Comune | RICHIESTE PRATICHE ASSISTITE | | | RICHIESTE PRIVATE | | TRANSAZIONI | | |
|------|-------|--------------|-------------------------------------|---|-------|---|-----------------------|--------------------|------------------|-----------|
| | | | DITTE | IMPORTI RICHIESTI €. al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione monetaria e spese tecniche | DITTE | IMPORTI RICHIESTI €. al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione monetaria | NUMERO | PRATICHE ASSISTITE | PRATICHE PRIVATE | |
| 6057 | 2 | Pescopagano | Comune di Pescopagano (PZ) | 342.508,64 | | | | 1 | 220.954,87 | |
| 6057 | 1 | Pescopagano | Di Napoli Antonia | 2.641,00 | | | | 2 | 1.690,78 | |
| 6057 | 1 | Pescopagano | Borea Pietro | 36.737,04 | | | | 3 | 15.759,47 | |
| 6057 | 1 | Pescopagano | Masini Margherita | 3.079,87 | | | | 4 | 1.737,77 | |
| 6057 | 2 | Muro Lucano | Melucci Antonio | 77.150,41 | | | | 5 | 26.076,95 | |
| 6057 | 2 | Castelgrande | Coppola Teresa | 5.797,59 | | | | 6 | 5.240,53 | |
| 6057 | 3 | Castelgrande | Federici Vito, Muro Angela Maria | 20.990,70 | | | | 7 | 10.211,38 | |
| 6057 | 1 | Pescopagano | Angiollilo Chiara | 6.928,24 | | | | 8 | 3.477,93 | |
| 6057 | 2 | Muro Lucano | Rendina Santo Giovanni | 13.563,13 | | | | 9 | 5.164,19 | |
| 6057 | 2 | Castelgrande | Coppola Vito | 10.673,86 | | | | 10 | 11.235,64 | |
| 6057 | 2 | Castelgrande | Greco Agatina | 8.324,41 | | | | 11 | 5.458,63 | |
| 6062 | | Muro Lucano | Pepe Franco, Coca Russo Rosaria | 686.635,54 | | | | 12 | 497.083,04 | |
| 6057 | 2 | Pescopagano | Pinto Giuseppina | 26.170,23 | | | | 13 | 10.673,26 | |
| 6057 | 2 | Muro Lucano | | | | Rendina Gerardo | rapporto mesi 231/96* | 14 | | 26.759,14 |
| 6057 | 2 | Muro Lucano | | | | Tarricone Mario | rapporto mesi 242/96* | 15 | | 8.749,65 |
| 6057 | 3 | Muro Lucano | Cerone Vita Maria | 59.038,04 | | | | 16 | 20.267,81 | |
| 6057 | 2 | Muro Lucano | | | | Altieri Luigi (Rosario) | rapporto mesi 239/96* | 17 | | 4.115,60 |
| 6057 | 1 | Pescopagano | Roselli Francesco P., Pinto Teresa | 9.738,62 | | | | 18 | 6.345,07 | |
| 6057 | 1 | Pescopagano | Roselli Arcadio Gerardo | 7.302,32 | | | | 19 | 2.973,41 | |
| 6057 | 1 | Pescopagano | Zarrilli Giuseppe | 6.868,94 | | | | 20 | 3.223,91 | |
| 6057 | 1 | Calitri | Metallo Michelina | 18.920,24 | | | | 21 | 18.920,64 | |
| 6063 | | Calitri | Maffucci Teresa | 30.191,55 | | | | 22 | 13.041,80 | |
| 6064 | | Calitri | Maffucci Teresa | 15.568,28 | | | | 23 | 6.715,00 | |
| 6063 | | Calitri | Pastore Antonio Raffaele | 15.909,12 | | | | 24 | 15.909,12 | |
| 6057 | 1 | Pescopagano | Errico Maria Lucia | 45.620,37 | | | | 25 | 24.553,42 | |
| 6063 | | Calitri | Zarrilli Vincenzo | 4.267,83 | | | | 26 | 1.626,45 | |
| 6063 | | Calitri | Santoro Iolanda, Capossela Giuseppe | 29.087,15 | | | | 27 | 10.617,46 | |
| 6057 | 2 | Muro Lucano | Rendina Gerardo e Magro Carmela | 10.604,04 | | | | 28 | 3.366,36 | |
| 6057 | 3 | Castelgrande | Gasparri Maria | 14.229,64 | | | | 29 | 5.951,79 | |
| 6057 | 3 | Muro Lucano | Sarcinella Annunziata Giuseppina | 27.120,20 | | | | 30 | 16.932,58 | |

| PROG | Lotto | Comune | RICHIESTE PRATICHE ASSISTITE | | RICHIESTE PRIVATE | | TRANSAZIONI | | |
|------|-------|--------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|--|-----------|
| | | | DITTE | IMPORTI RICHIESTI €. al netto delle anticipazioni, rivalutazioni monetaria e spese tecniche | DITTE | IMPORTI RICHIESTI €. al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione monetaria | NUMERO | PRATICHE ASSISTITE PRATICHE PRIVATE | |
| 6062 | | Muro Lucano | | 96.826,00 | | | | | |
| 6057 | 1 | Pescopagano | Cerone Angelina | 11.982,47 | | | | 31 | 64.327,79 |
| 6057 | 1 | Pescopagano | Ciccone Antonietta | 28.476,59 | | | | 32 | 5.823,64 |
| 6057 | 1 | Pescopagano | Roselli Giuseppe | 13.897,08 | | | | 33 | 14.670,03 |
| 6057 | 2 | Castelgrande | Di Napoli Clorinda | 12.398,56 | | | | 34 | 8.339,61 |
| 6057 | 2 | Castelgrande | Esposito Rosanna | 17.124,65 | | | | 35 | 7.956,71 |
| 6057 | 2 | Muro Lucano | Cerone Gerardo + 2 | 24.160,92 | | | | 36 | 10.156,91 |
| 6057 | 2 | Castelgrande | Cristiano Vincenzo + 7 | 7.991,17 | | Lisanti Rosa | rapporto mesi 234/96* | 37 | 4.105,77 |
| 6057 | 2 | Castelgrande | Iannuzzi Francesco | 1.390,63 | | | | 38 | 11.849,25 |
| 6057 | 2 | Muro Lucano | Cardillo Giuseppe | 55.764,04 | | | | 39 | 2.837,51 |
| 6057 | 2 | Muro Lucano | Cardillo Filomena | 15.789,19 | | | | 40 | 885,28 |
| 6057 | 2 | Muro Lucano | Cardillo Giuseppe e Cardillo Filomena | 11.941,41 | | | | 41 | 35.131,47 |
| 6057 | 2 | Castelgrande | Bologna Maria Donata | 7.470,66 | | | | 42 | 10.200,00 |
| 6057 | 3 | Muro Lucano | Sarcinella Pompea | 143.830,93 | | | | 43 | 7.907,38 |
| 6057 | 1 | Pescopagano | Di Napoli Berardino | 9.422,99 | | | | 44 | 5.751,78 |
| 6057 | 1 | Calitri | Di Milia Benedetto (1950) | 20.501,73 | | | | 45 | 59.160,88 |
| 6063 | | Calitri | Di Milia Benedetto (1950) | 20.431,33 | | | | 46 | 3.073,62 |
| 6057 | 2 | Muro Lucano | Malpede Vito | 25.188,62 | | | | 47 | 12.716,67 |
| 6063 | | Calitri | Sperduto Giovanni | 14.619,00 | | | | 48 | 7.690,06 |
| 6064 | | Calitri | Codella Vito | 14.954,53 | | | | 49 | 8.517,97 |
| 6063 | | Calitri | Cerreta Giacinta | 18.516,10 | | | | 50 | 8.655,90 |
| 6063 | | Calitri | Di Napoli Rocco | 3.182,02 | | | | 51 | 4.599,66 |
| 6063 | | Calitri | Sena Giuseppe | 43.285,20 | | | | 52 | 8.628,86 |
| 6063 | | Calitri | Cerreta Gaetana | 65.713,35 | | | | 53 | 2.078,75 |
| 6063 | | Calitri | Bozza Lucia e Galgano Vincenzo | 45.429,89 | | | | 54 | 17.849,48 |
| 6063 | | Calitri | Cianci Francesco | 21.491,81 | | | | 55 | 39.368,70 |
| 6063 | | Calitri | Cianci Francesco e Cianci Vincenza | 30.018,60 | | | | 56 | 28.047,45 |
| 6063 | | Calitri | Cianci Vincenza | 12.895,55 | | | | 57 | 14.341,73 |
| 6057 | 1 | Calitri | Di Napoli Franca Angelina | 1.199,83 | | | | 58 | 17.764,19 |
| | | | | | | | | 59 | 7.214,64 |
| | | | | | | | | 60 | 517,14 |

| PROG | Lotto | Comune | RICHIESTE PRATICHE ASSISTITE | | RICHIESTE PRIVATE | | TRANSAZIONI | | |
|------|-------|--------------|------------------------------|---|---|--|-------------|--------------------|------------------|
| | | | DITTE | IMPORTI RICHIESTI €. al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione monetaria e spese tecniche | DITTE | IMPORTI RICHIESTI €. al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione monetaria | NUMERO | PRATICHE ASSISTITE | PRATICHE PRIVATE |
| 6057 | 2 | Castelgrande | | | CRISTIANO MARIA TERESA MONTESANO ELENA | rapporto mesi 267/96* | 586 | | 7.726,41 |
| 6062 | | Muro Lucano | | | MANGONE FILOMENA | rapporto mesi 267/96* | 587 | | 3.580,65 |
| 6057 | 2 | Castelgrande | | | CRISTIANO LUCIA VALLARIO FRANCESCO | rapporto mesi 267/96* | 588 | | 5.793,30 |
| 6057 | 2 | Muro Lucano | | | TUMMILLO GERARDO | rapporto mesi 267/96* | 589 | | 12.884,18 |
| 6057 | 2 | Castelgrande | | | MASI MARIA +4 (Fiacco) | rapporto mesi 267/96* | 590 | | 1.192,20 |
| 6057 | 2 | Castelgrande | | | RACANIELLO TERESA | rapporto mesi 267/96* | 591 | | 42.229,02 |
| 6057 | 2 | Muro Lucano | | | PAOLINO GIUSEPPE SANTINO +2 | rapporto mesi 267/96* | 592 | | 19.312,53 |
| 6057 | 2 | Muro Lucano | | | RENDINA GERARDO | rapporto mesi 267/96* | 593 | | 14.568,75 |
| 6057 | 2 | Castelgrande | | | COPPOLA VITO | rapporto mesi 267/96* | 594 | | 4.431,74 |
| 6006 | | Calitri | | | RICCIARDI TERESA | rapporto mesi 267/96* | 595 | | 7.356,96 |
| 6062 | | Muro Lucano | | | LO MONACO ANTONELLA | rapporto mesi 267/96* | 596 | | 21.255,03 |
| 6003 | | Calitri | | | METALLO VITO METALLO ANTONELLA METALLO RITA | rapporto mesi 267/96* | 597 | | 2.652,00 |
| 6057 | 2 | Castelgrande | | | CIVERO MASSIMO | rapporto mesi 267/96* | 598 | | 393,34 |



172190019630
