

**Allegato 18****alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)**

alla Relazione sul Monitoraggio del Piano di Azione per il Grande Progetto Pompei (al 31 dicembre 2014)

SITUAZIONE AL 31.12.2014								
GARE IN CORSO								
SITUAZIONE ACTION PLAN							INCREMENTO/DECREMENTO	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.E.	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	
P I A N O  D E L L E  O P E R E	7	Lavori di messa in sicurezza Regio VII	In corso di aggiudicazione definitiva	€ 5.457.867,84	ago-13	lug-14	feb-16	RITARDO DI ALMENO 6 MESI SU DATA CHIUSURA DOVUTO A DATA DI AVVIO CANTIERE PREVISTA DA A.P. DA CORREGGERE. PROCEDURE DI GARA SOSPESA PER RICORSO GIURISDIZIONALE CON ORDINANZA CAUTELARE DI SOSPENSIVA.
	26	Interventi consolidamento e messa in sicurezza Casa della Fontana piccola	In corso di aggiudicazione definitiva (Aggiudicazione definitiva 01.04.2014)	€ 362.805,56	lug-13	lug-14	gen-15	PROCEDURA DI GARA RINNOVATA PER ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA STAZIONE APPALTANTATE IN DATA 04.09.2014. NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 18.09.2014. CANTIERE CONSEGNATO IL 17.11.2014. RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE DI 60 GG. RITARDO DI ALMENO 2 MESI SU DATA CHIUSURA.
	30	Restauro apparati decorativi della Casa della Venera in Conchiglia in Pompei scavi.	In corso di aggiudicazione definitiva	€ 986.341,92	lug-13	lug-14	feb-15	RITARDO DI ALMENO 7 MESI SU DATA CHIUSURA DOVUTO A DATA DI AVVIO CANTIERE PREVISTA DA A.P. DA CORREGGERE. PROCEDURE DI GARA SOSPESA PER RICORSO GIURISDIZIONALE CON ORDINANZA CAUTELARE DI SOSPENSIVA; SENTENZA NON ANCORA NOTIFICATA.
	C	Lavori di restauro dell'isola 15 della Regio VII	Aggiudicazione provvisoria (9.06.14)	€ 746.986,28	dic-13	lug-14	ago-15	CONTRATTO STIPULATO IL 20.11.2014.. RIDUZIONE TEMPI LAVORAZIONE DA 420 A 340 GG... CON PREVISTA CONCLUSIONE DEL CANTIERE NEL LUGLIO DEL 2015, ANZICHE AGOSTO 2015.
	A1	Adeguamento e revisione protezione perimetrale Scavi di Pompei	Gara in corso	€ 6.149.087,40	mag-14	set-14	mag-15	RITARDO DI ALMENO 6 MESI DOVUTO A DATA DI AVVIO CANTIERE PREVISTA DA A.P. DA CORREGGERE. L'8.10.2014 INTERVENTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MA SOTTOPOSTA A PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN AUTOTUTELA A SEGUITO DI PARERE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO.
	A2	Adeguamento e revisione dell'illuminazione perimetrale degli scavi di Pompei	Gara in corso	€ 3.186.164,86	mag-14	set-14	feb-15	RITARDO DI ALMENO 6 MESI DOVUTO A DATA DI AVVIO CANTIERE PREVISTA DA A.P. DA CORREGGERE. INTERVENTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MA SOTTOPOSTA A PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN AUTOTUTELA A SEGUITO DI PANERE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO.
TOTALE							€ 16.889.255,86	

**Allegato 18**  
**alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)**

alla Relazione sul Monitoraggio del Piano di Azione per il Grande Progetto Pompei (al 31 dicembre 2014)

SITUAZIONE AL 31.12.2014									
PROGETTAZIONE									
SITUAZIONE ACTION PLAN							INCREMENTO/	DECREMENTO	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.E.	DATA PUBBLICAZIONE BANDO STIMATA	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE		
5/9	Lavori di messa in sicurezza Regio IV - V -IX	Redazione progetto in corso	€ 11.285.357,02		set-14	gen-15	set-15	RITARDO DI OLTRE 1 MESE DOVUTO AD INTERVENTUTE MODIFICA NORMATIVE (BANDI TIPO ANAC) GARA IN CORSO. PUBBLICATA IL 07.11.2014.	
37/39	Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei + Completamento pavimentazione e piccole riprese murarie a Casina Pacifico	Redazione progetto in corso	€ 11.529.000,00		set-14	gen-15	giu-16	RITARDO DI ALMENO 6 MESI PER COMPLICAZIONI PROGETTUALI.	
F	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus delle Pareti Rosse (Regio VIII)	Appontamento atti	€ 295.100,35		lug-14	gen-15	lug-15	INTERVENTUA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 24.10.2014 .	
H	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus del Criptoportico (Regio I)	Appontamento atti	€ 828.529,75		lug-14	gen-15	mag-15	INTERVENTUA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 24.10.2014 .	
L	Lavori di restauro degli apparati decorativi della Casa dei Pignei (Regio IX)	Redazione progetto in corso	€ 418.000,00		set-14	gen-15	dic-15	PUBBLICATO AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE.	
P I A N O  D E L L E  O P E R E	23/74	Lavori di restauro apparati decorativi della Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno escluse + Lavori di consolidamento e restauro architettonico-strutturale della Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno escluse	Redazione progetto in corso	€ 5.500.000,00		set-14	gen-15	apr-16	RITARDO DI 3 MESI PER REVISIONI PROGETTUALI MOTIVATE DA ESIGENZE TUTELA ARCHEOLOGICA NONCHE' PER INTERVENTUTE MODIFICA NORMATIVE (BANDI TIPO ANAC) BANDO PUBBLICATO IL 17.12.2014.
	18	Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della Fullonica di Stephanu	Redazione progetto in corso	€ 606.754,47		set-14	gen-15	nov-15	RITARDO DI ALMENO 2 MESI DOVUTO AD INTERVENTUTE MODIFICA NORMATIVE (AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE - BANDI TIPO ANAC) ED A CONNESSE PROCEDURE DI GARA SUGGERITE DA GRUPPO DI LEGALITA'. PUBBLICATO AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE. INViate LETTERE DI INVITO IN DATA 12.12.2014.
Italia per Pompei	Valorizzazione, decoro e messa in sicurezza dei punti di accesso alle domus, sostituzione cancelli, transenne e banner illustrativi dell'area archeologica di Pompei - Regioni I, II e III	Redazione progetto in corso	€ 650.000,00		set-14	gen-15	mag-15	RITARDO DI 2 MESI PER ORGANIZZAZIONE INTERNA DI INVITALIA. PROGETTO BANDITO IL 14.11.2014.	
Italia per Pompei	"Eliminazione dei presidi temporanei esistenti (puntelli) con interventi locali sulle strutture orizzontali e verticali - Regio I, II e III"	Redazione progetto in corso	€ 600.000,00		set-14	gen-15	mag-15	RITARDO DI 2 MESI PER ORGANIZZAZIONE INTERNA DI INVITALIA. PROGETTO BANDITO IL 17.11.2014.	
Italia per Pompei	"Interventi di riqualificazione, manutenzione, regimenterazione acque meteoriche e sulle strutture delle coperture delle Domus - Regio I, II e III"	Redazione progetto in corso	€ 1.250.000,00		ott-14	feb-15	set-15	RITARDO DI 2 MESI PER UNIFICAZIONE PROGETTI (RICHIEDA A.P.) I DUE PROGETTI SONO STATI UNITI IN UN UNICO INTERVENTO. BANDO PUBBLICATO IL 21.11.2014.	
Italia per Pompei	Manutenzione straordinaria delle coperture della casa di Giulia Felice (Regio II, 4)	Redazione progetto in corso	€ 850.000,00		set-14	gen-15	set-15		
2-3 e 4	Messa in sicurezza Regiones I, II e III	Redazione progetto in corso	€ 5.000.000,00		lug-15	nov-15	nov-16 //	IMPORTO DA Q.E. DI EURO 8.000.000,00 CON INCREMENTO DI E. 3000000	
M	Lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo interni alla città antica, messa in sicurezza del fronte sud della Regio VIII e mitigazione del rischio idrogeologico delle Regiones I-III-IV-V-IX	Redazione progetto in corso	€ 3.000.000,00	in fase di definizione	da attivare con Piano di azione	in fase di definizione	//	IMPORTO DA Q.E. DI EURO 9.200.000,00 CON INCREMENTO DI E. 5.200.000,00	
N	Lavori di miglioramento dei percorsi di visita e contestuale realizzazione di percorsi per persone diversamente abili	Redazione progetto in corso	€ 2.500.000,00		ott-14	feb-15	feb-16	RITARDO DI ALMENO 1 MESE DOVUTO AD INTERVENTUTE MODIFICA NORMATIVE (BANDI TIPO ANAC). INTERVENTO BANDITO IL 17.11.2014. GARA IN CORSO.	
TOTALE							€ 44.312.741,59		

**Allegato 18**  
**alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)**

alla Relazione sul Monitoraggio del Piano di Azione per il Grande Progetto Pompei (al 31 dicembre 2014)

	PIANO DELE OPE RE	SITUAZIONE AL 31.12.2014				SITUAZIONE ATTUALE	INCREMENTO/ DECIMENTO
		NUOVE PROGETTAZIONI					
		SITUAZIONE ACTION PLAN					
E	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus dei Dioscuri (Regio VI)	Da attivare la fase di progettazione	€ 1.111.088,40			BANDITO AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE IL 28.11.2014.	IMPORTO DA Q.E. EURO 1.487.661,78 CON INCREMENTO DI E. 376573,38.
G	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus del Marinaio (Regio VII)	Da attivare la fase di progettazione	€ 486.976,27			BANDITO AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE IL 30.09.2014. LETTERE DI INVITO INVIATE IL 17.12.2014.	IMPORTO DA Q.E. EURO 630.642,03 CON INCREMENTO DI E. 143665,76.
32	Restauro degli apparati decorativi, pittorici, pavimentali nella Casa dell'Ancora Regio VI, Insula 10, civico 7	Da attivare la fase di progettazione	€ 700.000,00			BANDITO CON AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE IL 30.09.2014. LETTERE DI INVITO INVIATE IL 17.12.2014.	IMPORTO DA Q.E. EURO 587.843,98 CON DECREMENTO DI EURO 112.156,07.
33	Lavori di restauro degli apparati decorativi, pittorici e pavimentali nella Casa dell'Efebo	Da attivare la fase di progettazione.	€ 800.000,00			BANDITO CON AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE IL 28.11.2014.	IMPORTO DA QUADRO ECONOMICO CORRISPONDE AD EURO 1.219.007,81 CON INCREMENTO DI E. 101.775,37.
35	Lavori di consolidamento e restauro delle Terme Centrali	Da attivare la fase di progettazione	€ 500.000,00			ATTIVATA CENTRALE COMMITTENZA INVITALIA.	
15	Restauro del prospetto dell'Insula dei Casti Amariti	Da attivare la fase di progettazione	€ 839.500,00			ATTIVATA CENTRALE COMMITTENZA INVITALIA.	
16	Restauro della Casa di Cerere	Da attivare la fase di progettazione	€ 985.000,00			ATTIVATA CENTRALE COMMITTENZA INVITALIA.	
27	Lavori di consolidamento e restauro della Casa di Fabio Rufo e dell'Insula Occidentalis	Da attivare la fase di progettazione	€ 1.000.000,00			ATTIVATA CENTRALE COMMITTENZA INVITALIA.	
29	Restauro e consolidamento della Palestra delle Terme del Foro	Da attivare la fase di progettazione	€ 150.295,00			ATTIVATA CENTRALE COMMITTENZA INVITALIA.	
34	Attività di protezione dei reperti e dei calchi	Da attivare la fase di progettazione	€ 200.000,00			BANDITO AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE L' 11.11.2014.	IMPORTO DA QUADRO ECONOMICO CORRISPONDE AD EURO 590.222,71 CON INCREMENTO DI E. 290.222,71.
36	Riconfigurazione coperture e interventi di valorizzazione della Casa dei Vetti	Da attivare la fase di progettazione	€ 4.500.000,00			PROGETTAZIONE IN CORSO	IMPORTO STIMATO IN EURO 1.500.000,00
38	Completamento struttura depositi e sistemazione reperti presso Porta Nola	Da attivare la fase di progettazione	€ 4.500.000,00			INTERVENTO NON PROGETTABILE A MOTIVO DI PRESENTI SITUAZIONI OSTATIVE. INTERVENTO SOSTITUITO DA ALTRO PROGETTO (CASA ROSELLINA). AFFIDATO A INVITALIA QUALE CENTRALE DI COMMITTENZA	
B	Restauro della Casa delle Nozze d'Argento (Regio VI)	Da attivare la fase di progettazione	€ 4.500.000,00			ATTIVATA CENTRALE COMMITTENZA INVITALIA.	
D	Progetto di restauro e valorizzazione delle fortificazioni di Pompei	Da attivare la fase di progettazione	€ 6.000.000,00			ATTIVATA CENTRALE COMMITTENZA INVITALIA.	
I	Progetto di restauro delle Necropoli di Pompei	Da attivare la fase di progettazione				ATTIVATA CENTRALE COMMITTENZA INVITALIA.	
P	Realizzazione nuovi servizi igienici a servizio dell'area archeologica di Pompei	Da attivare la fase di progettazione				ATTIVATA CENTRALE COMMITTENZA INVITALIA.	
Q	Regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche a sud del Canale Conte di Sarno	Da attivare la fase di progettazione				INTERVENTO NON PROGETTABILE IN MANCANZA DI QUALSIVOGLIA DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTO SOSTITUITO DA ALTRO PROGETTO (RESTAURO LEGNI DI MOREGNE), AFFIDATO A INVITALIA QUALE CENTRALE DI COMMITTENZA	
TOTALE			€ 26.272.859,67				
25	Restauro degli apparati decorativi della Casa di Giulia Felice (Regio II, 4)	Non riportato in PdA	€ 1.050.071,62			PROGETTAZIONE IN CORSO	

**Allegato 18**

**A** alla Relazione sul Monitoraggio del Piano di Azione per il Grande Progetto Pompei (al 31 dicembre 2014)

PIANO DELLA CONOSCENZA	SITUAZIONE AL 31.12.2014								
	CANTIERI IN CORSO				SITUAZIONE ACTION PLAN		SITUAZIONE ATTUALE		INCREMENTO/ DECIMENTO
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.E.	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	Data Pubblicazione Bando	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	
2	Linea intervento 2: indagini diagnostiche e studi per la mitigazione del rischio idrogeologico pianeti e fronti scavi.	In corso di aggiudicazione definitiva	€ 134.257,95	€ 127.644,97	dic-13	giu-14	ago-14	CANTIERE CHIUSO.	IMPORTO DI PUBBLICAZIONE CORRISPONDE AD EURO 182.385,55. INCREMENTO DI 48.307,60.
TOTALE			€ 134.257,95						
GARE IN CORSO									
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.E.	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	Data Pubblicazione Bando	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/ DECIMENTO
1	Linea intervento 1 (affidamento in 6 lotti): rilev. indagine, diagnosi, per l'installazione analitica dei fabbisogni su tutte le insule.	GARA IN CORSO	€ 8.065.742,00	€ 5.992.142,18	MAR-14	LUG-14	01/05/2015	RITARDO DI ALMENO 6 MESI DOVUTO A DATA DI AVVIO CANTIERE PREVISTA DA A PLAN DA CORREGGERE IN CORSO VERIFICA ARTT. 38 L 48. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SEI LOTTI.	IMPORTO DA Q.E. CORRISPONDENTE A DATA DI AVVIO CANTIERE PREVISTA DA A PLAN DA CORREGGERE IN CORSO VERIFICA ARTT. 38 L 48. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SEI LOTTI.
TOTALE			€ 8.065.742,00						IMPORTO DA Q.E. CORRISPONDENTE A DATA DI AVVIO CANTIERE PREVISTA DA A PLAN DA CORREGGERE IN CORSO VERIFICA ARTT. 38 L 48. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SEI LOTTI.
PROGETTAZIONE									
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.E.	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	Data Pubblicazione Bando	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/ DECIMENTO
3	Digitalizzazione archivi	Redazione progetto in corso	€ 2.400.000,00						NUOVA PROGETTAZIONE
TOTALE			€ 2.400.000,00						

**Allegato 18****alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)**

alla Relazione sul Monitoraggio del Piano di Azione per il Grande Progetto Pompei (al 31 dicembre 2014)

SITUAZIONE AL 31.12.2014							
PIANO DELLA CAPACITÀ	CANTIERI IN CORSO						INCREMENTO/DECREMENTO
	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.L.	DATA PUBBLICAZIONE BANDO STIMATA	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE
Rafforzamento capacità	Convenzione firmata - Servizio in fase di svolgimento	€ 1.974.753,03	Stipulata convenzione (28.05.2014) tra MIBACT e Società in house del MIBACT.	gen-14	dic-15	RITARDO DI 4 MESI DOVUTO A REVISIONE GIURIDICA CONVENZIONE.	IMPORTO AGGIORNATO AD EURO 1.949.060,07 DECREMENTO DI 25.692,96
Adeguamento tecnologico (attrezzature e materiali)	Forniture acquisite	€ 372.875,16	Acquisto MEPA	giu-14	giu-14	ATTIVITA' CHIUSA.	IMPORTO DI PUBBLICAZIONE CORRISPONDE AD EURO 359.941,00 MENTRE QUELLO DI GARA AMMONTA AD EURO 387.506,16. INCREMENTO DI EURO 14.731,00.
TOTALE		€ 2.347.628,19					€ 10.961,96
GARE IN CORSO							
BUILDING	SITUAZIONE ACTION PLAN						INCREMENTO/DECREMENTO
	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.L.	DATA PUBBLICAZIONE BANDO STIMATA	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE
Sistema informativo unitario SI-GPP	Gara in corso.	€ 610.510,00	dic-13	lug-14	lug-15	RITARDO DI ALMENO 3 MESI DOVUTO A DATA DI AVVIO CANTIERE PREVISTA DA A.P. DA CORREGGERE.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AMMONTA AD EURO 443.714,00
Data Center - Disaster Recovery		€ 403.598,00				NUOVA PROGETTAZIONE	
Laser Scanner + Drone + Termografica+ Corso Pilotaggio + Plotter						NUOVA PROGETTAZIONE	
TOTALE		€ 1.014.108,00					

**Allegato 18****alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)**

alla Relazione sul Monitoraggio del Piano di Azione per il Grande Progetto Pompei (al 31 dicembre 2014)

SITUAZIONE AL 31.12.2014									
CANTIERI IN CORSO									
SITUAZIONE ACTION PLAN									
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.I.E.	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	SITUAZIONE ATTUALE	INCREMENTO/DECREMENTO	
Telecamere	Fornitura in opera n° 20 telecamere wireless 4 IPR per il monitoraggio dei cantieri di restauro finanziato con fondi del PON Sicurezza	Attività in corso	€ 129.799,69		giu-14	ago-14	CONCLUSO		
TOTALE			€ 129.799,69						
GARE IN CORSO									
SITUAZIONE ACTION PLAN									
PIANO DELLA SICUREZZA	ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	Importo progetto (Iva e spese comprese)	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/DECREMENTO
Videosorveglianza	Sistema di videosorveglianza (Intervento a valere sulle risorse del PON Sicurezza)	Gara in corso	€ 3.655.941,61	mag-14	set-14	apr-14	RITARDO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI ALMENO 4 MESI DOVUTO A DATA DI AVVIO CANTIERE DA A. P. DA CORREGGERE INTROVATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.		
TOTALE			€ 3.655.941,61						
PROGETTAZIONE									
SITUAZIONE ACTION PLAN									
wifi intero sito archeologico	Copertura wifi intera area archeologica di Pompei	Redazione progetto in corso	€ 500.000,00	set-14		gen-15	RITARDO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI ALMENO 4 MESI DOVUTO A DATA DI AVVIO CANTIERE DA A. P. DA CORREGGERE ESSEENDOSI PRIVILEGIATO LO SVILUPPO DI PROGETTO DI PIU' LUNGA REALIZZAZIONE.	IMPORTO DA QUADRO ECONOMICO CORRISPONDE AD EURO 610.000. INCREMENTO DI EURO 110.000.	
Piano monitoraggio Ambientale	Plano di monitoraggio ambientale dell'area archeologica - Interventi di censimento, mappatura e bonifica di materiale contenente amianto.	Redazione progetto in corso	€ 1.965.937,04	set-14		nov-15	RITARDO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 2 MESI DOVUTO AD INTERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE (BANDI TIPO ANAC) E A SPECIFICHE INDICAZIONI DEL GRUPPO DI LEGALITA'. INTERVENTO BANDITO IL 14.11.2014.		
TOTALE			€ 2.465.937,04						

**Allegato 18**  
**alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)**

alla Relazione sul Monitoraggio del Piano di Azione per il Grande Progetto Pompei (al 31 dicembre 2014)

SITUAZIONE AL 31.12.2014								
P A N O  D E L A  C U L I Z I O N E  E C O M M U N I C A Z I O N E	CANTIERI IN CORSO							
	SITUAZIONE ACTION PLAN				SITUAZIONE ATTUALE			INCREMENTO/DECREMENTO
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.E.	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	
1	Potenziamento del personale di vigilanza - manutenzione e miglioramento accessi alle domus.	Stipulata Convenzione tra MIBACT e società in house del MIBACT. Servizio in fase di svolgimento.	€ 1.985.562,09	Convenzione firmata il 28.05.2014	giu-14	dic-15	RITARDO DI 2 MESI DOVUTO A REVISIONE GIURIDICA CONVENZIONE. ATTIVAZIONE NEL MESE DI AGOSTO 2014.	IMPORTO AGGIORNATO AD EURO 1.976.830,38. DECREMENTO DI EURO 8.731,71
	TOTALE		€ 1.985.562,09					€ 8.731,71
PROGETTAZIONE								
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	Importo progetto (Iva e spese comprese)	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	SITUAZIONE ATTUALE	INCREMENTO/DECREMENTO
2	Adeguamento servizi al pubblico.	Redazione progetto in corso	€ 3.300.000,00	ott-14	feb-15	set-15	RITARDO DI 1 MESE NELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DOVUTO AD ESIGENZE DI COMPLETAMENTO PROGETTUALE, ESPLIAMENTO PROCEDURE PROTOCOLLO DI LEGALITA' NONCHE' INTERVENTI MODIFICHE NORMATIVE (BANDI TIPO ANAC). INTERVENTO BANDITO IL 03.12.2014.	IMPORTO DA Q.E. DI EURO 2.838.047,92 CON DECREMENTO DI EURO 461.952,08.
3	Promozione e comunicazione	Bando in preparazione	€ 2.000.000,00	set-14	gen-15	set-15	RITARDO DI 45 GG. NELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DOVUTO AD ESIGENZE DI COMPLETAMENTO PROGETTUALE, ESPLIAMENTO PROCEDURE PROTOCOLLO DI LEGALITA' NONCHE' INTERVENTI MODIFICHE NORMATIVE (BANDI TIPO ANAC). INTERVENTO BANDITO IL 14.11.2014.	IMPORTO DA Q.E. DI EURO 1.003.137,04 CON DECREMENTO DI EURO 996.862,96.
	Mostra "Pompei e l'Europa 1748-1943"	Redazione progetto in corso	1.000.000,00		mag-15	ott-15	INTERVENTO RELATIVO AL TRASPORTO BANDITO CON AVVISO DI PRE INFORMAZIONE IL 16.12.2014.	IMPORTO PARZIALE DA Q.E. DI EURO 694.180,00 (TRASPORTO) ED EURO 50.000 (ASSICURAZIONE).
	Restauro Laboratorio Ricerche Applicate	Redazione progetto in corso	2.500.000,00				INTERVENTO RELATIVO ALLA SOLA ASSICURAZIONE BANDITO CON AVVISO DI PRE INFORMAZIONE IL 23.12.2014.	
	Servizi di supporto per il miglioramento della fruizione e del decoro degli assi viari e delle aree fruibili dell'area archeologica di Pompei	Redazione progetto in corso	1.231.393,16				NUOVA PROGETTAZIONE	
	TOTALE		€ 10.031.393,16				NUOVA PROGETTAZIONE	

**Allegato 18****alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)**

alla Relazione sul Monitoraggio del Piano di Azione per il Grande Progetto Pompei (al 31 dicembre 2014)

**GRANDE PROGETTO POMPEI - MONITORAGGIO AL 31.12.2014**

PIANI	APPOSTAMENTO INIZIALE	INTERVENTI		ULTERIORI APPOSTAMENTI PREVISTI DA PDA PER RECUPERO ECONOMIE GARA	NUOVE PROGETTAZIONI (****)
		AGGIUDICATI / BANDITI / IN PROGETTAZIONE (*) INDICATI IN PIANO DI AZIONE	IMPORTI DA Q.E.		
		IMPORTI CON RIBASSO EFFETTIVO O IPOTTIZZATO (30% (**))	INTERVENTI BANDITI		
PIANO DELLE OPERE	€ 85.000.000,00	€ 76.536.802,93 € 32.500.071,62	GARE AGGIUDICATE PER GARE IN CORSO O DA BANDIRE	€ 28.867.030,21 € 47.685.203,29	€ 26.272.859,00 € 4.515.378,26 € 1.750.000,00
PIANO DELLA CONOSCENZA	€ 8.200.000,00	€ 8.199.852,40 € 2.440.000,00		€ 6.035.350,87 € 1.708.000,00	€ 2.400.000,00 € 2.400.000,00
PIANO DELLA FRUIZIONE E COMUNICAZIONE	€ 7.000.000,00	€ 6.610.595,34 € 3.731.393,16		€ 1.995.415,98 € 6.171.148,63	€ 4.600.000,00 € 3.731.393,16
PIANO DELLA C. BUILDING	€ 2.800.000,00	€ 2.936.040,20 € 503.598,00		€ 2.750.648,81 € 352.518,60	€ 100.000,00 € 503.598,00
PIANO DELLA SICUREZZA	€ 2.000.000,00	€ 1.965.937,04 € 500.000,00		€ 1.726.155,93	€ 650.000,00 € 610.000,00
<b>Totali</b>		<b>€ 96.249.227,91 € 39.675.062,78</b>		<b>€ 39.648.445,87 € 57.643.026,45</b>	<b>€ 4.515.378,26 € 8.994.991,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 105.000.000,00</b>	<b>€ 135.924.290,69</b>		<b>€ 97.291.472,32</b>	<b>€ 34.022.859,00 € 13.510.369,42</b>

(\*) Gli importi della colonna banditi/in progettazione comprendono anche quelli della colonna "Nuove Progettazioni Bandite / Da Bandire".

(\*\*) Il ribasso ipotizzato è del 30% sull'importo da Q.E.: al riguardo, con riferimento agli interventi aggiudicati definitivamente al 31 dicembre 2014, si può rilevare che il Q.E. rimodulato a seguito dei ribassi sull'importo a base d'asta è in media inferiore del 28% circa.

(\*\*\*) Gli importi indicati potrebbero essere oggetto di lievi modifiche in ragione di aggiustamenti dei Q.E. in fase di completamento attività progettuali e documentali.

(\*\*\*\*) Il PDA prevede l'attivazione di nuove progettazioni, alcune specificamente indicate, altre devolute all'autonomia decisionale della governance GPP, sino ad un importo complessivo di 34M€.

**Allegato 18<sup>ato C  
014)</sup>****alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)****IPOTESI COMPLETAMENTE***(subordinata all'effettivo rispetto della durata del cantiere / all'effettiva pubblicazione dei bandi di gara)**(la data di consegna cantiere, ove non si tratti di interventi in atto, è ipotizzata tenendo conto dei tempi per la conclusione della progettazione e relativa verifica, della effettiva o presumibile data di pubblicazione del bando / avviso di pre-information, dei tempi di ricezione delle offerte, dei tempi della commissione / seggio di gara, dei tempi di verifica dei requisiti di partecipazione)*

Interventi di prevedibile conclusione entro il 30 ottobre 2015			Consegna Cantiere (effettiva / presunta)	Durata	Prevedibile Chiusura Cantiere	Note
Piano delle Opere	1	Messa in sic. terreni demaniali confine area scavo (Reg. III-IX)	19-feb-14	360	feb-15	Intervento in atto
	6 (+22+28+0)	Lavori di messa in sicurezza Regio VI	4-giu-14	513	ott-15	Intervento in atto
	10	Restauro architettonico e strutturale della Casa di Sirico	28-giu-13	730	giu-15	Intervento in atto
	11	Restauro e consolidamento strutture Casa del Marinaio	5-agosto-13	550	feb-15	Intervento in atto
	12	Restauro architettonico e strutturale della Casa dei Dioscuri	4-feb-13	730	feb-15	Intervento in atto
	13	Restauro arch. e messa in sic.Casa delle Pareti Rosse	18-lug-13	275	apr-14	Intervento concluso
	14	Restauro arch. e strutturale della Casa del Criptoportico	1-feb-13	370	feb-14	Intervento concluso
	17	Apparati decorativi casa di D. Octavius Quartio detta di Loreio Tiburtino	31-mar-14	210	ott-14	Intervento concluso
	18	Apparati decorativi Fullonica di Stephanu	mag-15	180	ott-15	Affidamento in corso
	26	Consolidamento e messa in sic. Casa Fontana Piccola	17-nov-14	120	mar-15	Intervento in atto
	30	Restauro apparati decorativi della Casa della Venere in Conchiglia	mar-15	210	ott-15	Aggiudicato, non consegnato cantiere
	31	Messa in sic. apparati decorativi Casa Paquio Proculo	30-giu-14	380	lug-15	Intervento in atto
	32	Apparati decorativi, pittorici e pavimentali Casa dell'Ancora	mag-15	182	ott-15	Affidamento in corso
	34	Attività di protezione dei reperti e dei calchi	mag-15	120	ago-15	Affidamento in corso
	A2	Adeguamento e rev. illuminazione perimetrale Scavi Pompei	mar-15	145	ago-15	Aggiudicato, non consegnato cantiere
Piano della Conoscenza	C	Lavori di restauro dell' <i>Insula</i> 15 della <i>Regio</i> VII	9-set-14	340	ago-15	Intervento in atto
	F	Restauro apparati decorativi <i>domus</i> Pareti Rosse (Italia per Pompei)	gen-15	135	giu-15	Aggiudicato, non consegnato cantiere
Piano della Capacity Building	H	Restauro apparati decorativi <i>domus</i> Criptoportico (Italia per Pompei)	gen-15	210	ago-15	Aggiudicato, non consegnato cantiere
	ITxP	Italia per Pompei (Puntelli)	mag-15	180	ott-15	Affidamento in corso
	ITxP	Italia per Pompei (Cancelli e transenne)	mag-15	150	set-15	Affidamento in corso
	Linea 2	Indagini geognostiche e studi rischio idrogeologico	17-lug-14	60	set-14	Intervento concluso
		Sistema informativo unitario SI-GPP	31-ott-14	365	ott-15	Intervento in atto
Piano della Fruizione e Comunicazione		Data center e disaster recovery	mag-15	30	mag-15	In progettazione
		Acquisto droni e laser scanner e pc portatili	mar-15	30	apr-15	In progettazione
		Copertura Wifi - intera area sito archeologico	giu-15		2015	In progettazione
		ALES - supporto alla fruizione - assistenza visitatori (*)	31-lug-14	457	ott-15	Intervento in atto
		ALES - supporto amministrativo - informatico (*)	31-lug-14	487	nov-15	Intervento in atto
		Convegno Moenia e Urbs	6-giu-13	1	giu-13	Intervento in atto
		Promozione e comunicazione	mag-15	125	set-15	Affidamento in corso
		Mostra Pompei e l'Europa	giu-15	125	ott-15	Affidamento in corso
		ALES - supporto alla fruizione - decoro e pulizia assi viari (*) (**) (**)	mar-15		nov-15	In progettazione

(\*) Tali servizi, indipendentemente dalla data di chiusura, sono sicuramente rendicontabili, non necessitando di collaudo finale.

(\*\*) E' in corso la verifica di fattibilità della relativa convenzione.

**Allegato 18<sup>to C  
014)</sup>****alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)**

IPOTESI COMPLETAMENTO		(subordinata all'effettivo rispetto della durata del cantiere / all'effettiva pubblicazione dei bandi di gara)			
		(la data di consegna cantiere, ove non si tratti di interventi in atto, è ipotizzata tenendo conto dei tempi per la conclusione della progettazione e relativa verifica, della effettiva o presumibile data di pubblicazione del bando / avviso di pre-information, dei tempi di ricezione delle offerte, dei tempi della commissione / seggio di gara, dei tempi di verifica dei requisiti di partecipazione)			
	Interventi di prevedibile conclusione tra il 1º novembre 2015 e il 31 dicembre 2015	Consegna Cantiere (effettiva / presunta)	Durata	Prevedibile Chiusura Cantiere	Note
Piano delle Opere	5+9 (+21+0) Lavori di messa in sicurezza <i>Regiones IV - V - IX</i>	apr-15	240	nov-15	Affidamento in corso
	8 (+0) Lavori di messa in sicurezza <i>Regio VIII</i>	30-giu-14	510	nov-15	Intervento in atto
	A1 Adeguamento e revisione recinzione perimetrale Scavi Pompei	mar-15	236	nov-15	Aggiudicato, non consegnato cantiere
	G Restauro apparati decorativi della <i>domus</i> del Marinaio (Regio VII)	apr-15	240	nov-15	Affidamento in corso
	L Restauro apparati decorativi Casa dei Pigmei e civ. 8, 10	giu-15	180	nov-15	Affidamento in corso
	ITxP Italia per Pompei (Coperture)	mag-15	240	dic-15	Affidamento in corso
	Legni Restauro dei Legni di Moregine	ago-15	150	dic-15	In progettazione
Piano della Conoscenza	Linea 1 Servizi di diagnosi e monitoraggio 6 lotti	gen-15	330	dic-15	Aggiudicato, non consegnato cantiere
Piano della Fruizione e Comunicazione	Adeguamento servizi al pubblico	mag-15	210	nov-15	Affidamento in corso

Interventi di prevedibile conclusione dopo il 31 dicembre 2015		Consegna Cantiere (effettiva / presunta)	Durata	Prevedibile Chiusura Cantiere	Note
Piano delle Opere	7 (+0) Lavori di messa in sicurezza <i>Regio VII</i>	mar-15	510	lug-16	Aggiudicato, non consegnato cantiere
	2+3+4 (+19+20+21+0) Lavori di messa in sicurezza <i>Regiones I-II-III</i>	set-15		2016	In progettazione
	23+24 Apparati decorativi e consolidamento e restauro architettonico-strutturale della <i>Regio VIII</i> dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno escluse	mag-15	264	gen-16	Affidamento in corso
	25 Restauro degli apparati decorativi della Casa di Giulia Felice (Regio II, 4)	ago-15	365	lug-16	In progettazione
	33 Restauro degli apparati decorativi, pittorici e pavimentali nella Casa dell'Efebo	mag-15	270	gen-16	Affidamento in corso
	36 Riconfigurazione coperture e interventi di valorizzazione della Casa dei Vetti	ago-15	270	apr-16	In progettazione
	37+39 Adeguamento case demaniali + LOTTO 1 (Porta Stabia) - LOTTO 2 (S. Paolino)	set-15	660	giu-17	In progettazione
	E Restauro apparati decorativi della <i>domus</i> dei Dioscuri (Regio VI)	mag-15	365	apr-16	Affidamento in corso
	N Percorsi di visita e realizzazione percorsi per persone div.abili	mag-15	270	gen-16	Affidamento in corso
Piano della Conoscenza	Linea 3 Digitalizzazione archivi	lug-15	210	gen-16	In progettazione
Piano della Sicurezza	PMA Piano di Monitoraggio Ambientale dell'area archeologica - Interventi di censimento, mappatura e bonifica di materiale contenente amianto	mag-15	302	feb-16	Affidamento in corso
Piano della Fruizione e Comunicazione	Restauro laboratorio Ricerche applicate	set-15	210	mar-16	In progettazione


Interventi affidati a Invitalia quale Centrale di Committenza	
Per tali interventi, Invitalia, quale Centrale di Committenza, assicura la contrattualizzazione entro dicembre 2015	
Piano delle Opere	15 Restauro del prospetto e riconfigurazione scarpata dell' <i>Insula</i> dei Casti Amanti
	16 Restauro della Casa di Cerere
	27 Consolidamento e restauro della Casa di Fabio Rufo e dell' <i>Insula Occidentali</i>
	29 Restauro e consolidamento della Palestra delle Terme del Foro
	35 Lavori di consolidamento e restauro delle Terme Centrali
	B Restauro della Casa delle Nozze d'Argento (Regio V)
	D Progetto di restauro e valorizzazione delle fortificazioni di Pompei
	I Progetto di restauro delle Necropoli di Pompei e VILLA DI DIOMEDE
	P Servizi igienici a servizio area arch. di Pompei e sistemazione Autogrill
	Casa Rosellina Restauro Casa Rosellina

## **SECONDA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO**

### **(II / 2014)**

#### **ALLEGATO 19**


Diagramma di Gannt concernente le attività di Commissioni / Seggi di gara



**Allegato 19**

alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)

Diagramma GANTT concernente le attività di Commissioni / Seggi di gara

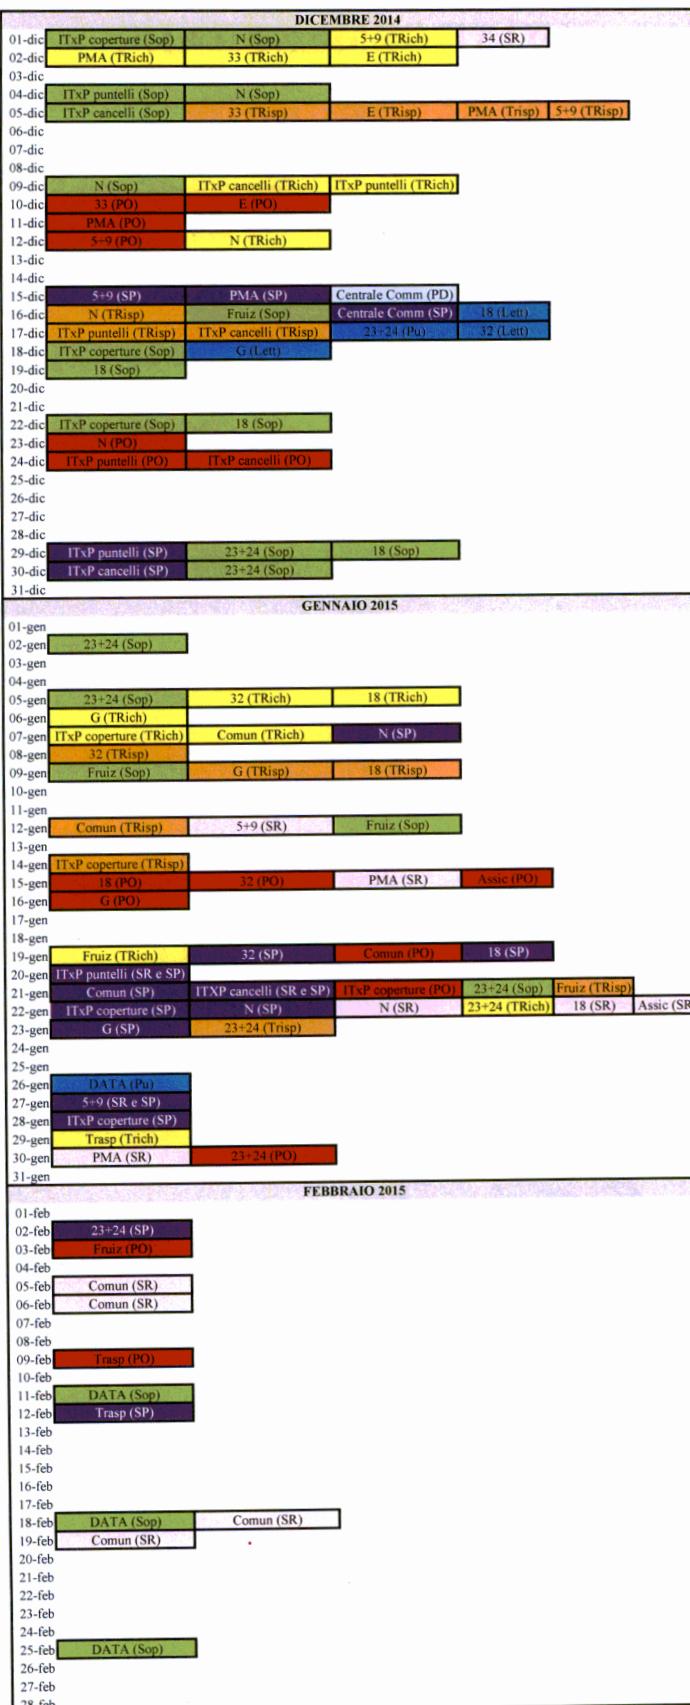


Legenda: nr intervento (tipologia attività)	
Elenco attività:	
Pu / Lett	pubblicazione GU / invio lettere invito
Sop	sopralluogo
TRich	termine richiesta chiarimenti
TRisp	termine risposta chiarimenti
PD	presentazione domande partecipazione
PO	presentazione offerte
SP	seduta pubblica
SR	seduta riservata
Elenco Interventi	
5+9	Lavori di messa in sicurezza Regione IV - V - IX
18	Restauro apparati decorativi Fullonica di Stephanu
23+24	Restauro apparati decorativi e consolidamento e restauro architettonico-strutturale della Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno (escluse)
32	Restauro apparati decorativi, pittorici e pavimentali Casa dell'Ancora
33	Restauro degli apparati decorativi, pittorici e pavimentali nella Casa dell'Efebo
34	Attività di protezione dei reperti e dei calchi
E	Restauro apparati decorativi della domus dei Dioscuri
G	Restauro apparati decorativi della domus del Marmato
N	Percorsi di visita e realizzazione percorsi per persone div. abili
ITxP puntelli	Reg. I.II.III Eliminazione presidi temporanei "puntelli"
ITxP cancelli	Reg. I.II.III Valorizzazione, decoro, messa in sicurezza "cancelli"
ITxP coperture	Regio I.II - Riqualificazione, manutenzione, regimazione acque meteoriche "coperture"
Centrale Comm	Attività Invitata quale Centrale di committenza
DATA	Realizzazione del data center e disaster recovery
PMA	Piano di Monitoraggio Ambientale dell'area archeologica - Interventi di censimento, mappatura e bonifica di materiale contenente amianto
Fruiz	Miglioramento delle modalità di visita e per il potenziamento dell'offerta culturale del Sito Archeologico di Pompei
Comun	Ideazione, realizzazione, sviluppo e gestione del Piano di Comunicazione per l'Area Archeologica di Pompei
Trasp	Mostra Pompei e l'Europa - Trasporto opere
Assic	Mostra Pompei e l'Europa - Assicurazione

## **SECONDA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO**

**(II / 2014)**

### **ALLEGATO 20**

Ipotesi di conclusione degli interventi (banditi, in fase di gara e in progettazione) del  
GPP



**Allegato 20**  
alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)

<b>IPOTESI COMPLETAMENTO INTERVENTI GPP</b> (subordinata all'effettivo rispetto della durata del cantiere / all'effettiva pubblicazione dei bandi di gara) (la data di consegna cantiere, ove non si tratti di interventi in atto, è ipotizzata tenendo conto dei tempi per la conclusione della progettazione e relativa verifica, della effettiva o presumibile data di pubblicazione del bando avviso di pre-informazione, dei tempi di ricezione delle offerte, dei tempi della commissione seggio di gara, dei tempi di verifica dei requisiti di partecipazione)						
Piano	Interventi di prevedibile conclusione entro il 30 ottobre 2015		Consegna Cantiere (effettiva / presunta)	Durata	Prevedibile Chiusura Cantiere	
Piano delle Opere	1	Messa in sic. terreni demaniali confine area scavo (Reg. III-IX)	19-feb-14	360	feb-15	Intervento in atto
	6 (+22+28+0)	Lavori di messa in sicurezza Regio VI	4-giu-14	513	ott-15	Intervento in atto
	10	Restauro architettonico e strutturale della Casa di Sirico	28-giu-13	730	giu-15	Intervento in atto
	11	Restauro e consolidamento strutture Casa del Marinaio	5-ago-13	550	feb-15	Intervento in atto
	12	Restauro architettonico e strutturale della Casa dei Dioscuri	4-feb-13	730	feb-15	Intervento in atto
	13	Restauro arch. e messa in sic. Casa delle Pareti Rosse	18-lug-13	275	apr-14	Intervento concluso
	14	Restauro arch. e strutturale della Casa del Criptoportico	1-feb-13	370	feb-14	Intervento concluso
	17	Apparati decorativi casa di <i>D. Octavius Quartio</i> detta di Loreio Tiburtino	31-mar-14	210	ott-14	Intervento concluso
	18	Apparati decorativi Fullonica di <i>Stephani</i>	mag-15	180	ott-15	Affidamento in corso
	26	Consolidamento e messa in sic. Casa Fontana Piccola	17-nov-14	120	mar-15	Intervento in atto
	30	Restauro apparati decorativi della Casa della Venere in Conchiglia	mar-15	210	ott-15	Aggiudicato, non consegnato cantiere
	31	Messa in sic. apparati decorativi Casa Paquio Procilio	30-giu-14	380	lug-15	Intervento in atto
	32	Apparati decorativi, pittorici e pavimentali Casa dell'Ancora	mag-15	182	ott-15	Affidamento in corso
	34	Attività di protezione dei reperti e dei calchi	mag-15	120	ago-15	Affidamento in corso
	A2	Adeguamento e rev. illuminazione perimetrale Scavi Pompei	mar-15	145	ago-15	Aggiudicato, non consegnato cantiere
	C	Lavori di restauro dell' <i>Insula</i> 15 della Regio VII	9-set-14	340	ago-15	Intervento in atto
	F	Restauro apparati decorativi <i>domus</i> Pareti Rosse (Italia per Pompei)	gen-15	135	giu-15	Aggiudicato, non consegnato cantiere
	H	Restauro apparati decorativi <i>domus</i> Criptoportico (Italia per Pompei)	gen-15	210	ago-15	Aggiudicato, non consegnato cantiere
	ITxP	Italia per Pompei (Puntelli)	mag-15	180	ott-15	Affidamento in corso
	ITxP	Italia per Pompei (Cancelli e transenne)	mag-15	150	set-15	Affidamento in corso
Piano della Conoscenza	Linea 2	Indagini geognostiche e studi rischio idrogeologico	17-lug-14	60	set-14	Intervento concluso
Piano della Capacity Building		Sistema informativo unitario SI-GPP	31-ott-14	365	ott-15	Intervento in atto
		Data center e disaster recovery	mag-15	30	mag-15	In progettazione
		Acquisto droni e laser scanner e pc portatili	mar-15	30	apr-15	In progettazione
		Copertura Wifi - intera area sito archeologico	giu-15		2015	In progettazione
		ALES - supporto alla fruizione - assistenza visitatori (*)	31-lug-14	457	ott-15	Intervento in atto
Piano della Fruizione e Comunicazione		ALES - supporto amministrativo - informatico (*)	31-lug-14	487	nov-15	Intervento in atto
		Convegno Moenia e Urbs	6-giu-13	1	giu-13	Intervento in atto
		Promozione e comunicazione	mag-15	125	set-15	Affidamento in corso
		Mostra Pompei e l'Europa	giu-15	125	ott-15	Affidamento in corso
		ALES - supporto alla fruizione - decoro e pulizia assi viari (*) (**)	mar-15		nov-15	In progettazione

(\*) Tali servizi, indipendentemente dalla data di chiusura, sono sicuramente rendicontabili, non necessitando di collaudo finale.

(\*\*) E' in corso la verifica di fattibilità della relativa convenzione.

**Allegato 20**  
alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)

<b>IPOTESI COMPLETAMENTO INTERVENTI GPP</b> <i>(subordinata all'effettivo rispetto della durata del cantiere / all'effettiva pubblicazione dei bandi di gara)</i>							
Piano	Interventi di prevedibile conclusione tra il 1° novembre 2015 e il 31 dicembre 2015			Consegna Cantiere (effettiva / presunta)	Durata	Prevedibile Chiusura Cantiere	Note
Piano delle Opere	5+9 (+21+O)	Lavori di messa in sicurezza <i>Regiones IV - V - IX</i>		apr-15	240	nov-15	Affidamento in corso
	8 (+O)	Lavori di messa in sicurezza <i>Regio VIII</i>		30-giu-14	510	nov-15	Intervento in atto
	A1	Adeguamento e revisione recinzione perimetrale Scavi Pompei		mar-15	236	nov-15	Aggiudicato, non consegnato cantiere
	G	Restauro apparati decorativi della <i>domus</i> del Marinaio (Regio VII)		apr-15	240	nov-15	Affidamento in corso
	L	Restauro apparati decorativi Casa dei Pigmei e civ. 8, 10		giu-15	180	nov-15	Affidamento in corso
	ITxP	Italia per Pompei (Coperture)		mag-15	240	dic-15	Affidamento in corso
	Legni	Restauro dei Legni di Moregine		ago-15	150	dic-15	In progettazione
Piano della Conoscenza	Linea 1	Servizi di diagnosi e monitoraggio 6 lotti		gen-15	330	dic-15	Aggiudicato, non consegnato cantiere
Piano della Fruizione e Comunicazione		Adeguamento servizi al pubblico		mag-15	210	nov-15	Affidamento in corso

Piano	Interventi di prevedibile conclusione dopo il 31 dicembre 2015			Consegna Cantiere (effettiva / presunta)	Durata	Prevedibile Chiusura Cantiere	Note
Piano delle Opere	7 (+O)	Lavori di messa in sicurezza <i>Regio VII</i>		mar-15	510	lug-16	Aggiudicato, non consegnato cantiere
	2+3+4 (+19+20+21+O)	Lavori di messa in sicurezza <i>Regiones I-II-III</i>		set-15		2016	In progettazione
	23+24	Apparati decorativi e consolidamento e restauro architettonico-strutturale della <i>Regio VIII</i> dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno escluse		mag-15	264	gen-16	Affidamento in corso
	25	Restauro degli apparati decorativi della Casa di Giulia Felice (Regio II, 4)		ago-15	365	lug-16	In progettazione
	33	Restauro degli apparati decorativi, pittorici e pavimentali nella Casa dell'Efebo		mag-15	270	gen-16	Affidamento in corso
	36	Riconfigurazione coperture e interventi di valorizzazione della Casa dei Vetti		ago-15	270	apr-16	In progettazione
	37+39	Adeguamento case demaniali + LOTTO 1 (Porta Stabia) - LOTTO 2 (S. Paolino)		set-15	660	giu-17	In progettazione
	E	Restauro apparati decorativi della <i>domus</i> dei Dioscuri (Regio VI)		mag-15	365	apr-16	Affidamento in corso
	N	Percorsi di visita e realizzazione percorsi per persone div. abili		mag-15	270	gen-16	Affidamento in corso
Piano della Conoscenza	Linea 3	Digitalizzazione archivi		lug-15	210	gen-16	In progettazione
Piano della Sicurezza	PMA	Piano di Monitoraggio Ambientale dell'area archeologica - Interventi di censimento, mappatura e bonifica di materiale contenente amianto		mag-15	302	feb-16	Affidamento in corso
Piano della Fruizione e Comunicazione		Restauro laboratorio Ricerche applicate		set-15	210	mar-16	In progettazione

Interventi affidati a Invitalia quale Centrale di Committenza <i>Per tali interventi, Invitalia, quale Centrale di Committenza, assicura la contrattualizzazione entro dicembre 2015</i>		
Piano delle Opere	15	Restauro del prospetto e riconfigurazione scarpata dell' <i>Insula</i> dei Casti Amanti
	16	Restauro della Casa di Cerere
	27	Consolidamento e restauro della Casa di Fabio Rufo e dell' <i>Insula Occidentalis</i>
	29	Restauro e consolidamento della Palestra delle Terme del Foro
	35	Lavori di consolidamento e restauro delle Terme Centrali
	B	Restauro della Casa delle Nozze d'Argento (Regio V)
	D	Progetto di restauro e valorizzazione delle fortificazioni di Pompei
	I	Progetto di restauro delle Necropoli di Pompei e Villa di Diomede
	P	Servizi igienici a servizio area arch. di Pompei e sistemazione Autogrill
	Casa Rosellina	Restauro Casa Rosellina

€ 12,00



\*172200004940\*
