

tempestiva acquisizione e la corretta conservazione della documentazione oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti Autorità, nell'intento di perseguire la massima riduzione dei tempi di certificazione della spesa;

- a fine febbraio, è stata fornita a RUP e DL, per ogni cantiere in corso o di prevista apertura, una tabella riepilogativa degli importi di spesa realizzabili correlata ai cronoprogrammi contrattuali, in modo da consentire loro di effettuare un riscontro "sul campo" tra risultati attesi e situazione di fatto e di segnalare eventuali scostamenti, al fine di adottare le necessarie contromisure (nessuna segnalazione è però giunta al riguardo).

Tali misure sono state accompagnate da riunioni informative sulle procedure disposte e di rinnovata sensibilizzazione sugli obiettivi da perseguire; tuttavia, le stesse sono risultate di difficile assimilazione per una parte non minimale dei destinatari, i quali in molti casi hanno prodotto risultati ben inferiori alle attese e alle possibilità.

Relativamente alla costituzione di team dedicati, va premesso che il 16 febbraio u.s., al termine delle procedure di selezione, è stata costituita la Segreteria Tecnica di progettazione della SSPES, prevista dalla L. 106/2014, i cui componenti sono stati tutti assegnati a supporto dei team di progettazione già esistenti, ovvero per la costituzione degli uffici Direzione Lavori. Nello specifico, però, la suggerita costituzione di team di lavoro dedicati non è stata considerata perseguibile, perché ciò avrebbe comportato ineludibili tempi morti derivanti dalla necessità, per i professionisti nuovi giunti, di acquisire le necessarie conoscenze, peraltro su progetti già avviati. Piuttosto, si è ritenuto che l'inserimento del personale nei team già avviati – in termini di rapidità dell'apprendimento e di efficacia dell'impiego – potrà sortire un reale effetto sinergico di potenziamento e accelerazione delle attività in corso.

Dimensionamento progettazione interventi

In questa fase di avanzamento del GPP, nella quale le progettazioni di tutti gli interventi originariamente previsti sono state sostanzialmente concluse o sono in fase avanzata di impostazione, la misura di cui trattasi appare di non più conveniente realizzazione.

Moltiplicazione dei turni di lavoro

Se si è provveduto, attraverso specifiche previsioni riguardanti i progetti di nuovo avvio, a definire il possibile incremento delle squadre operanti contemporaneamente su ogni singolo cantiere, laddove tecnicamente realizzabile e conveniente, non è ancora stato possibile prevedere sistematicamente, invece, l'estensione dei turni di lavoro dall'alba al tramonto, avuto riguardo sia ad aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla tutela del sito archeologico, sia alle difficoltà organizzative della SSPES a regolare l'apertura anticipata (e la chiusura posticipata) dei cancelli e la vigilanza delle aree interessate.

Monitoraggio cogente e costante dell'avanzamento dei lavori

E' stato avviato, anche attraverso l'istituzionalizzazione di un confronto periodico con Invitalia. Inoltre, sono stati richiesti i cronoprogrammi contrattuale e operativo di tutti i cantieri in corso, interpolando le risultanze con quelle derivanti dall'esame dei settimanali di cantiere SILeg. Dal mese corrente, sono stati avviati distinti incontri con le singole Ditte e i RUP e DL competenti, al fine di definire i possibili interventi acceleratori cantiere per cantiere, in relazione alle specifiche situazioni emergenti dalla verifica dei documenti di cui sopra.

Negoziabilità delle condizioni contrattuali

Con riguardo a uno dei principali strumenti acceleratori, ossia il "premio di accelerazione" previsto dall'art. 145, comma 9, del "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti", l'Organismo Intermedio del POIn presso il SG - MiBACT, adito in proposito, ha confermato l'opportunità di non inserire detto incentivo nei contratti, sussistendo profili di incertezza in

merito all'ammissibilità e alla certificabilità dei relativi oneri, in assenza di espresse previsioni comunitarie e/o nazionali in materia di spese rendicontabili che riconoscano tale fattispecie. Conseguentemente, anche per i nuovi appalti la negoziazione delle condizioni contrattuali appare essere una misura depotenziata e difficilmente perseguibile, se non con riferimento a una ravvicinata cadenza temporale di rilascio degli Stati di Avanzamento Lavori.

Altro

A fronte di rilevate difficoltà a reperire in ambito MiBACT personale disponibile ad assumere incarichi concernenti la fase di "Esecuzione" dei contratti (in pratica, per la costituzione dei numerosi Uffici Direzione Lavori da istituire), alla fine di febbraio u.s., è stato siglato dal DGP e dal Soprintendente SSPEs un Protocollo d'intesa con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con l'intento di fare fronte alle ulteriori carenze di qualificate nuove professionalità tecniche da dedicare principalmente alla fase esecutiva e di collaudo. Ciò consentirà, all'occorrenza, di attingere risorse dal settore pubblico e di non ricorrere al mercato, con conseguenti effetti di accelerazione in termini di individuazione e impiego del personale tecnico necessario.

Con riguardo alla Struttura di supporto al DGP, l'assegnazione, a gennaio, di una unità è stata controbilanciata dalla perdita di un'altra unità, che a richiesta ha fatto rientro all'Ufficio di originaria appartenenza. Di conseguenza, la Struttura di supporto e l'Unità "Grande Pompei" (di seguito, UGP) sono ora costituite da complessive 19 unità (rispettivamente, 13 + 6), a fronte del numero massimo di 30 (20 + 10) indicato dalla legge istitutiva. Poiché è prevista l'ulteriore uscita di due unità nel quadrimestre entrante, per raggiungimento dei limiti di età e pensionistici (una delle due ha peraltro fatto domanda di rientrare anticipatamente presso l'Ufficio di appartenenza), nel mese corrente è stato pubblicato un ulteriore avviso di selezione del personale disponibile ad essere destinato in posizione di comando presso l'UGP e presso la Struttura di supporto al DGP.

Con riferimento all'attribuzione delle funzioni di Stazione appaltante alla Dirz.GP, prevista dalla legge 112/2013, si è provveduto ad avviare – nella seconda decade del mese di febbraio u.s., sulla scorta di quanto osservato dall'Ufficio Legislativo MiBACT con lettera del 26 gennaio 2015 – una ricognizione della sussistenza delle condizioni preliminari necessarie al completo "passaggio delle consegne" con la SSPEs, in ossequio alla normativa vigente.

Nelle more della conclusione di tale ricognizione, all'inizio di marzo la Dirz.GP ha, comunque, assunto le funzioni di Stazione Appaltante per 8 interventi, due dei quali (37+39) in avanzato stato di progettazione, e i restanti sei (2+3+4; 25; 36; Restauro legni di Moregine) già banditi/preavvisati. Per tali interventi, in considerazione delle indicazioni fornite dal predetto Ufficio Legislativo e al fine di ridurre gli adempimenti burocratici, si è determinato – d'intesa con il Soprintendente – di mantenere l'attuale configurazione delle procedure di pagamento IGRUE, che prevedono l'emissione dei mandati con firma digitale del Dirigente della SSPEs.

4. La situazione al 30 aprile 2015

Alla data indicata:

- sono state bandite gare per complessivi € 117.964.045,91¹ (valore dei Q.E. iniziali): è stato cioè bandito tutto il finanziamento originario, nonché una parte, pari a circa un terzo dei 34 M€ aggiuntivi previsti dal PdA, a ripianamento delle economie di gara (l'importo corrisponde, al netto dei ribassi d'asta registrati o stimati, a circa 81M€);

¹ A tale importo vanno aggiunti 3,8 M€ concernenti la videosorveglianza, a valere su fondi PON Sicurezza, con cantiere in corso.

- sono state aggiudicate definitivamente gare per complessivi € 99.151.413,85 (sempre considerati i valori dei Q.E. iniziali): è stato cioè pienamente conseguito l'obiettivo che il PdA indica per il primo quadrimestre c.a. (l'importo corrisponde, al netto dei ribassi d'asta, a € 68.020.090,98 - valore dei Q.E. rimodulati);
- gli importi relativi a interventi già contrattualizzati (dunque, importo da contratto più IVA) o di imminente contrattualizzazione assommano a oltre 58 M€ (il dato non è preciso, dovendo ancora pervenire i Q.E. rimodulati di interventi recentemente aggiudicati, per i quali è stata dunque effettuata una stima);
- sono stati conclusi i lavori concernenti 5 cantieri (4 cantieri sul Piano delle Opere ed 1 sul Piano della Conoscenza).

Quanto alla spesa effettivamente sostenuta, l'importo raggiunto dall'insieme della documentazione rilasciata al 30 aprile ammonta a € 9.731.611,19, pari al 70% del livello di spesa fissato alla scadenza del mese di aprile 2015 (€ 13.784.185).

I motivi del mancato raggiungimento dell'obiettivo sono sostanzialmente riconducibili a:

- mancato avanzamento dei lavori dei primi cantieri avviati, banditi sin dal 2012²;
- rallentamenti subiti da varie gare, nella gran parte a motivo di riesami in autotutela ovvero di contenziosi giurisdizionali (paradigmatico il caso dell'intervento GPP 30, laddove, a fronte di una aggiudicazione definitiva risalente al 25 marzo 2014, i successivi gradi di giudizio amministrativo hanno portato a sentenza definitiva del Consiglio di Stato il 2 aprile u.s., peraltro con riforma della sentenza di I grado e conseguente conferma della determinazione originariamente assunta dalla commissione di gara³);
- l'articolazione particolarmente complessa (è il caso del Piano della Conoscenza – Linea 1) della procedura di gara a suo tempo adottata e il rilevante numero di Operatori Economici concorrenti, con conseguente dilatazione delle procedure di verifica post-aggiudicazione della documentazione;
- infine, farraginosità delle procedure di acquisizione documentale preliminare alla liquidazione, che ha ulteriormente inciso sul *timing* di taluni pagamenti.

Con riguardo alla suddetta situazione, al fine di una attendibile proiezione delle somme rendicontabili e di quelle reimpiegabili, in allegato C si presenta un prospetto relativo all'attuazione del GPP, sempre alla data del 30 aprile, ripartito per piani di intervento, riportante l'importo complessivo delle somme bandite così come emergenti dai quadri economici ante gara, successivamente epurato:

- dei ribassi di gara già noti per le gare aggiudicate;
- delle somme a base d'asta per le gare non ancora aggiudicate;
- degli importi relativi alle somme a disposizione previste nei quadri economici (oltre che alle altre voci non reimpiegabili), la cui certezza di spesa ed il relativo esatto ammontare sono verificabili solo al termine del collaudo di ogni intervento e, dunque, nella fase attuale NON sono utilizzabili, né potranno esserlo, nella massima parte, prima della fine del corrente anno

² Qualora fossero stati conclusi nei tempi previsti gli interventi 1, 11 e 12, per i quali i rispettivi RUP hanno concesso proroghe tra 60 e 120 gg. (dovute, per l'intervento 1, al rinvenimento, durante l'attività di scavo, di evenienze archeologiche, per gli interventi 11 e 12, all'attesa del rilascio delle autorizzazioni sismiche da parte dell'ufficio SSPES preposto), la spesa conseguibile sarebbe aumentata di circa 2,5 M€. Ritardi nei lavori si sono registrati anche per altre evenienze in fase esecutiva, come il rilevamento di cospicue quantità di scorie di amianto per le quali si è reso necessario lo smaltimento secondo le normative vigenti (GPP n. 31), o come la necessità di individuare differenti soluzioni statiche (GPP n. 10).

³ Conseguentemente l'intervento, la cui durata dei lavori è fissata in gg. 210, non potrà molto verosimilmente essere concluso e rendicontato nei tempi imposti dall'Autorità Europea, anche perché si è dovuto ripetere per la nuova aggiudicataria le verifiche ex art. 38 D.lgs. 163/2006 e le informazioni antimafia ex D.lgs. 159/2011, già espletate per la originaria ricorrente, risultata aggiudicataria a seguito di esecuzione della sentenza di I grado.

(in tale ambito, analogamente, si tenga peraltro presente che il 10% dei ribassi registrati non può essere reimpiegato sino ad avvenuto collaudo, il che comporta come necessaria conseguenza che le economie di gara NON saranno interamente reimpiegabili nel c.a.). Al momento, tale importo si aggira intorno ai 15,5 M€, suscettibile di modifiche in relazione alle rimodulazioni dei Q.E. di volta in volta effettuate.

E' stata altresì redatta una tabella, riportata in **allegato D** – *connessa sia allo stato della progettazione sia alla prevista tempistica di esecuzione dei vari interventi* – al fine di delimitare compiutamente quali interventi possano essere completati e rendicontati nel 2015 (al netto di ritardi conseguenti a emergenti difficoltà esecutive, ora non conosciuti né conoscibili) e quali, invece, saranno prevedibilmente conclusi nell'anno 2016 (e 2017, in casi limitatissimi di particolare complessità progettuale e/o esecutiva). In tale tabella sono stati anche specificati gli interventi che potrebbero trovare ultimazione esecutiva tra ottobre e dicembre 2015, per i quali è dunque assai probabile un loro slittamento all'annualità 2016, quantomeno per le fasi di collaudo e per la rendicontazione.

Si ritiene necessario sottolineare che le suddette due tabelle assumono valore esclusivamente previsionale e sono dunque suscettibili di modifiche in relazione a vari fattori (quali, ad esempio, i tempi di svolgimento delle procedure di gara).

5. Nuove progettazioni non comprese nel PdA

Si reputa opportuno altresì precisare che, nel corso della riunione dello *Steering Committee* del mese di aprile u.s., sono state approvate sia le modifiche apportate all'oggetto di due interventi già programmati (riportati in nota ⁴ e ⁵), a motivo di intervenute nuove valutazioni della SSPES, sia i nuovi interventi richiesti dalla SSPES per i quali la progettazione, d'intesa con il Soprintendente, è stata in parte già attivata al fine di ottemperare alle indicazioni del PdA. Si precisa che, così come a suo tempo sancito dallo *Steering Committee* stesso nella seduta di giugno 2014, le nuove progettazioni indicate (e che comunque non esauriscono le esigenze) seguono un criterio di flessibilità rispetto agli appostamenti tra piani, basato sulle reali necessità di volta in volta emergenti per dare compiuta definizione agli obiettivi del GPP, pur senza "snaturare" i contenuti dei singoli piani:

- Piano delle Opere:
 - Adeguamento dei locali di "Capodimonte", in Napoli, per Data Center e Disaster Recovery;
- Piano della Fruizione e comunicazione:
 - Itinerari tematici: risistemazione giardini pompeiani e creazione punti di sosta;
 - Convegno dal titolo "Pompei e l'Europa: memoria e riuso dell'antico dal neoclassico al post-classico";
- Piano della Sicurezza:
 - Sistema Antincendio dell'intero sito;
 - Sistemi anti-intrusione per uffici e depositi;

⁴ Modifica dell'oggetto dell'intervento M, a seguito dell'esclusione dal progetto del fronte sud Regio VIII determinata, in data 25 marzo u.s., dalla SSPES per difficoltà progettuali.

⁵ Modifica dell'oggetto dell'intervento 15 (affidato a Invitalia quale Centrale di committenza), per avvenuta inclusione nel progetto della riconfigurazione della scarpata dell'intera insula, così come indicato dalla SSPES.

- Fornitura e posa in opera di container per la conservazione e la sicurezza dei reperti archeologici;
- Piano della Fruizione e comunicazione / Piano della Capacity Building
Sempre d'intesa con il Soprintendente, è stata segnalata l'opportunità – *peraltro ancor più avvertita in caso di prolungamento dell'impegno nel 2016* – di rinnovare le convenzioni con la società in house "Ales Spa", possibilmente finanziandole su futuri PON, sia sul Piano della Fruizione e comunicazione, in relazione all'esigenza di mantenere nel 2016 l'apertura di un congruo numero di domus, anche con riguardo a quelle oggetto di intervento, sia sul Piano della Capacity Building, in considerazione dell'impegno gestionale in atto e della necessità di "scavalco" nell'anno 2016 e seguenti.

Tali interventi vanno considerati in un'ottica di programmazione esigenziale, fermo restando che la loro fattibilità pratica, in termini sia strettamente tecnici sia di compatibilità temporale con altre realizzazioni sia di disponibilità finanziaria, deve essere ancora compiutamente valutata. In particolare, al 30 aprile, le proiezioni sulle economie di gara effettivamente reimpiegabili portano a ritenere finanziabili solo alcuni dei progetti originariamente approvati, con esclusione del fondamentale intervento M - Messa in sicurezza dei fronti di scavo - e dei 10 affidati a Invitalia quale Centrale di committenza, nonché delle nuove progettazioni: più nel dettaglio, la questione viene illustrata nella nota in allegato E, di cui si suggerisce lettura integrale.

Ciò considerato, tenuto conto dell'importanza che alcuni dei suddetti interventi assumono nel quadro della complessiva funzionalità del GPP, la SSPES ne ha inseriti taluni (fra tutti, l'intervento M) nella propria programmazione triennale di bilancio. Allo scopo di agevolarne poi l'inserimento nei futuri Programmi Operativi, avuto riguardo al "passaggio" dal FESR 2007-2013 al FESR 2014-2020, le procedure di gara e i connessi adempimenti ricalcheranno integralmente le procedure degli interventi GPP, anche a maggiore garanzia della correttezza delle procedure medesime.

Da ultimo, si evidenzia che è stata istituita a livello centrale una sorta di *task force* specificatamente dedicata alle attività di rendicontazione del GPP, per supportare l'Ente Beneficiario nell'attività di raccolta e validazione della documentazione di spesa con una tempistica diversa da quella ordinaria.

6. Cronoprogramma e rendicontazione comunitaria; "scavalco" sulla programmazione "2014-2020"

L'azione fin qui svolta, congiuntamente ad una più aderente e realistica revisione del cronoprogramma fissato dal PdA, impone preliminarmente una distinzione tra interventi la cui esecuzione può ragionevolmente collocarsi entro l'ottobre 2015 (concedendosi dunque massimo 60 giorni per le operazioni di collaudo e il saldo finale) ed altri per cui vi sono procedure di gara o addirittura progettazioni in corso per i quali è ragionevole ipotizzare un completamento nel 2016.

A tal riguardo, nella citata tabella in Allegato D sono riportati gli interventi (banditi e in progettazione) dei vari Piani per i quali è ipotizzabile – considerate la durata dell'intervento nonché le misure acceleratorie che è stato possibile adottare in relazione alle modifiche normative intervenute – un completamento dei lavori: entro il mese di ottobre 2015; entro il mese di dicembre 2015; oltre il 2015. Relativamente agli interventi affidati a Invitalia quale Centrale di committenza, sono riportati in calce alla tabella, non essendo noti nemmeno in via presuntiva i tempi di esecuzione; per essi, tuttavia, l'Agenzia assicura la teorica possibilità di contrattualizzazione entro la fine del corrente anno.

In proposito, giova evidenziare come il GPP si componga di 5 Piani progettuali: ognuno di questi piani è stato avviato: con una progettazione in corso che ha già riguardato tutte le originarie previsioni (comprehensive delle modifiche di volta in volta proposte e approvate dallo *Steering Committee* nonché delle nuove progettazioni attivate, pure approvate dallo stesso); con pubblicazioni di bandi per un importo lordo che, oltre ad aver conseguito la completa saturazione nominale della disponibilità finanziaria, sta già avviando il riutilizzo delle economie di gara; con impegni contrattualizzati o di imminente contrattualizzazione pari orientativamente a circa il 56% dello stanziamento comunitario (che sale al 64% considerando le somme vincolate per legge); con avvio di cantieri / servizi / forniture, in parte già ultimati, per un importo pari al 54%; infine, con spese già sostenute pari a poco meno del 10% del finanziamento europeo.

Per rendere ancora più facilmente percettibile quanto risulta dal precedente capoverso, si ritiene utile fare anche riferimento alle *fasi* di avanzamento del GPP nei suoi cinque Piani componenti, ritenendosi di poter individuare *tre fasi funzionali*: 1) fase progettuale (dalla redazione del DPP alla pubblicazione dei bandi); 2) fase gara (termina con l'aggiudicazione definitiva); 3) fase esecuzione (termina con il collaudo/regolare esecuzione).

Tale impostazione, peraltro, richiama quella del PdA, laddove nell'allegato 3 – *Azioni per singolo intervento*, si indicano tre azioni, perfettamente riconducibili alle fasi suindicate: *in progettazione / nuove progettazioni; gare in corso; cantieri*, mentre nell'allegato 1 – *Risultati attesi*, se ne indicano due (come è logico, trattandosi di quantificazione finanziaria che non può definire la fase di progettazione), riconducibili alle fasi 2 e 3: *progetti in corso; progetti conclusi*.

La tabella in **allegato F** illustra la situazione del GPP sulla scorta di quanto precede, assumendo come riferimento l'importo lordo di € 139.022.859,00 previsto dal PdA (M€ 105 di appostamento originario + € 34.022.859,00 di nuove progettazioni), situazione che è così sintetizzabile:

- FASE PROGETTUALE: attivati progetti per un importo lordo pari al 118% (dunque, con approntamento di nuovi progetti immediatamente utilizzabili per il successivo periodo 2014 – 2020);
- FASE GARA: banditi progetti per un importo lordo pari all'85% (si ritiene possibile conseguire il 100% entro la fine del quadrimestre entrante);
- FASE ESECUZIONE: avviati cantieri / servizi / forniture per un importo lordo pari al 41% (si prevede un sensibile aumento di tale percentuale nel corso dell'anno).

Avuto riguardo ai progressi sostanziali complessivamente registratisi, sotto il profilo sia degli indicatori "numerici" sia della suddivisione in fasi funzionali, a parere della scrivente ognuno dei 5 Piani progettuali componenti il GPP può dunque essere ammesso alla prosecuzione "a scavalco" sulla programmazione FESR 2014-2020 (*bridging*), ai sensi della vigente normativa comunitaria, secondo la ripartizione finanziaria orientativamente desumibile dal citato **allegato D**, posto che la prima fase è già stata completata, la seconda lo sarà verosimilmente prima della fine del corrente anno, la terza è in corso di realizzazione.


7. *Considerazioni di sintesi*

Da tutto quanto precede, emerge che le scadenze previste sono state di massima rispettate, a meno di taluni scostamenti che hanno solo parzialmente inciso sul conseguimento degli obiettivi fissati per il 30 aprile 2015.


I ritardi più rilevanti sono riconducibili a particolari imprevisti progettuali, all'indicazione di date non compatibili con la tempistica imposta dalla normativa o con situazioni di contenzioso in atto, ovvero, ancora, con modifiche legislative/regolamentari intervenute successivamente, nonché, infine, a difficoltà esecutive emerse in corso d'opera.

La situazione evidenzia infatti che:

- l'importo complessivo dei "progetti in corso" ha conseguito appieno l'obiettivo indicato dal PdA per aprile 2015 (fissato a circa 99 M€), per come si rileva dal sottostante grafico; tale risultato, del resto, è ancora più rilevante laddove si consideri che, anche in questo secondo monitoraggio, si è inteso tener conto solo degli interventi aggiudicati definitivamente, mentre ben si sarebbe potuto fare riferimento *tout court* agli interventi banditi, trattandosi di "progetti in corso" concretamente approdati alla fase di gara;

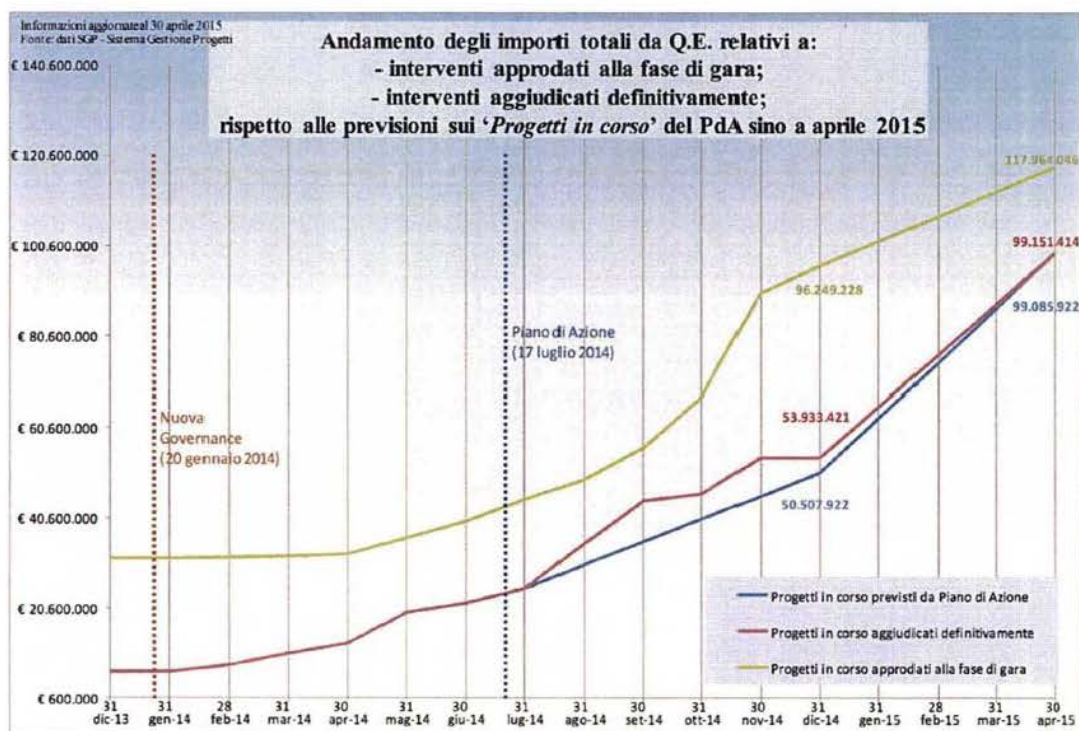

- i livelli di spesa effettivamente realizzata non hanno raggiunto l'obiettivo che il PdA imponeva per il 30 aprile u.s., pari a 13,7 M€, per come risulta dal sottostante grafico (9,7 M€ effettivamente spesi per fatture recanti data non oltre il 30 aprile 2015): i motivi ostativi sono indicati al precedente para. 4;

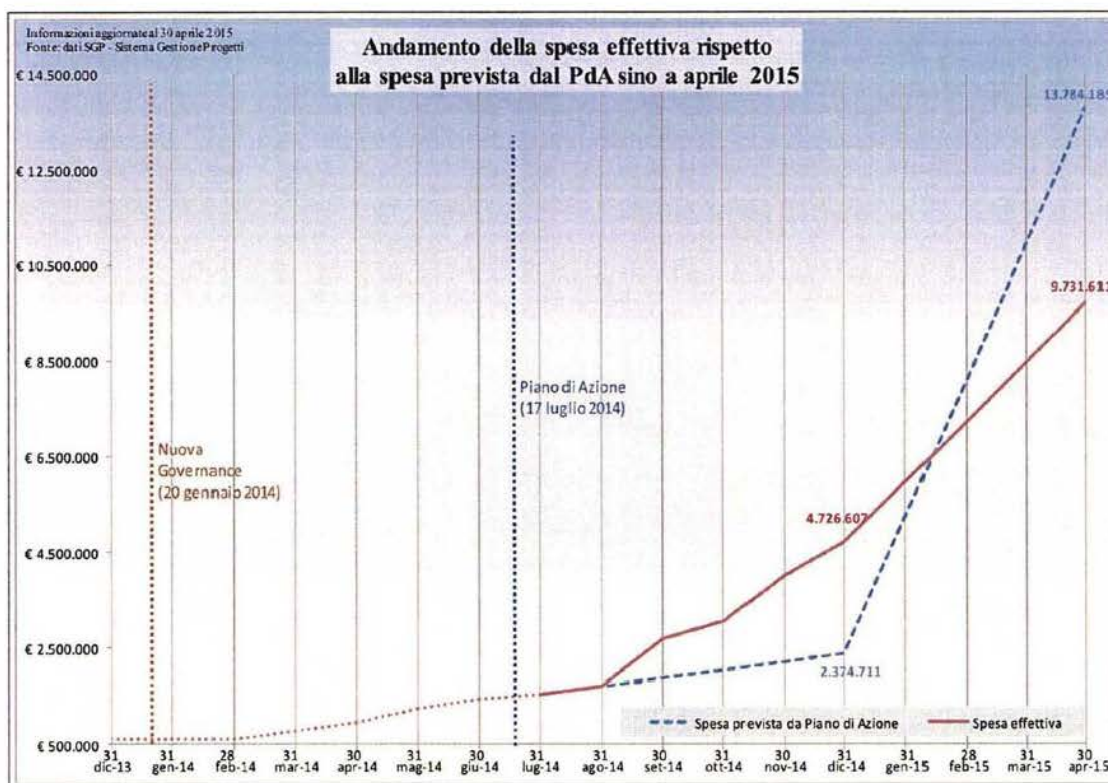

Quanto testé riportato va anzitutto interpretato tenendo conto degli scostamenti derivanti dalle previsioni iniziali del PdA, rivelatesi non aderenti alla situazione di fatto esistente nel luglio 2014, ovvero indotte da provvedimenti normativi intervenuti, ovvero, ancora, rese inattuabili dalla comparazione tra tempistica indicata e vincoli legislativi di base.

Infine, va altresì valutato alla luce di un dato assolutamente significativo, rappresentato dall'importo complessivo, al lordo dei ribassi, degli interventi banditi e cioè quasi 118 M€ (con circa 13 M€ in più rispetto ai 105 M€ di finanziamento complessivo del GPP), di cui per oltre 99 M€ è già intervenuta aggiudicazione definitiva, nonché, come già sottolineato, dal positivo sviluppo delle tre fasi funzionali dell'intero GPP.

L'insieme dei parametri sopra considerati, tutti riferiti a indicatori comunque individuati o individuabili nel PdA, e tutti univocamente indirizzati alla piena attuazione del GPP, unitamente al conseguito pieno recupero del *gap* iniziale, perseguito dalla nuova *governance*, va osservato in uno con le considerazioni espresse al precedente para. 6.

Ciò, a parere della scrivente, fa ritenere che ognuno dei Piani progettuali di cui si compone il GPP, come sopra attestato tutti già avviati, possa essere ammesso alla prosecuzione "a scavalco" sulla programmazione FESR 2014-2020, in naturale prosecuzione di quella attivata nel periodo 2007-2013, ai sensi della vigente normativa comunitaria, secondo la ripartizione finanziaria orientativamente desumibile dal citato **allegato D**.

Pompei, 25 maggio 2015

Il Direttore Generale
Gen. D. CC Giovanni Nistri

CANTIERI IN CORSO									
SITUAZIONE ACTION PLAN								SITUAZIONE AL 30.04.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.E.	IMPORTO AGGIUDICAZIONE (IVA E SPESE COMPRESSE)	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/DECREMENTO
14	Restauro architettonico strutturale della Casa del Criptoportico in Pompei scavi	Collaudo in corso	€ 853.342,02	€ 544.993,61	apr-12	feb-13	feb-14	INTERVENTO CONCLUSO E COLLAUDATO.	
10	Restauro architettonico strutturale della Casa di Sirico	Cantiere aperto	€ 1.768.149,07	€ 963.847,58	apr-12	giu-13	giu-15		
11	Restauro e consolidamento delle strutture della Casa del Marinalco in Pompei Scavi	Cantiere aperto	€ 1.499.522,99	€ 990.787,32	apr-12	ago-13	feb-15	RITARDO ULTIMAZIONE LAVORI DI ALMENO 6 MESI PER MANCANZA AUTORIZZAZIONE SISMICA	
12	Restauro architettonico e strutturale della Casa dei Dioscuri in Pompei scavi	Cantiere aperto	€ 2.050.425,91	€ 1.157.815,34	apr-12	feb-13	feb-15	RITARDO ULTIMAZIONE LAVORI DI ALMENO 6 MESI PER MANCANZA AUTORIZZAZIONE SISMICA	
13	Restauro architettonico e messa in sicurezza della Casa della Pareti Rosse	Cantiere aperto	€ 322.312,67	€ 227.823,83	apr-12	lug-13	giu-14	INTERVENTO CONCLUSO E COLLAUDATO.	
1	Lavori di messa in sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni demaniali a confine dell'area di scavo (III-IX)	Cantiere aperto	€ 2.824.213,12	€ 2.024.100,19	nov-12	feb-14	feb-15	RITARDO ULTIMAZIONE LAVORI DI ALMENO 6 MESI PER EVENIENZE ARCHEOLOGICHE	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 2.045.259,76, CON INCREMENTO DI EURO 21.159,57.
17	Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della casa di D. Octavianus Quartio detta anche di Loreio Tiburtino in Pompei scavi	Cantiere aperto	€ 691.922,56	€ 534.639,87	lug-13	mar-14	ott-14	INTERVENTO CONCLUSO E COLLAUDATO.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 536.937,66, CON INCREMENTO DI EURO 2.297,89.
6	Lavori di messa in sicurezza Regio VI	Cantiere aperto	€ 5.210.882,20	€ 3.651.484,29	lug-13	giu-14	ott-15		IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 3.779.118,81, CON INCREMENTO DI EURO 127.634,52.
8	Lavori di messa in sicurezza Regio VIII	Cantiere aperto	€ 5.469.369,00	€ 4.023.247,33	lug-13	giu-14	nov-15		IMPORTO DA Q. E. DI EURO 5.212.000,00, CON INCREMENTO DI EURO 742.631,00. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 4.079.177,33, CON INCREMENTO DI EURO 55.930,00.
31	Lavori per la messa in sicurezza degli apparati decorativi della Casa di Paquilo Proculo Regio I ins.7 civici 1,2,3,6,7,8,20	Cantiere aperto	€ 1.332.679,68	€ 985.130,92	lug-13	giu-14	lug-15	RIDUZIONE TEMPI DI LAVORAZIONE DA 497 A 380 GG CON PREVISTA CHIUSURA IL 03.08.2015.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 992.498,16, CON INCREMENTO DI EURO 7.367,24.
TOTALE			€ 22.022.819,22						

P I A N O
D E L L E
O P E R E
C A N T I E R I

Allegato A
alla Relazione sul Monitoraggio del Piano di Azione per il Grande Progetto Pompei (al 30 aprile 2015)

GARE IN CORSO								
SITUAZIONE ACTION PLAN				SITUAZIONE AL 30.04.2015				
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.E.	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/ DECREMENTO
7	Lavori di messa in sicurezza Regio VII	In corso di aggiudicazione definitiva	€ 5.457.867,84	ago-13	lug-14	feb-16	RITARDO DI ALMENO 6 MESI SU DATA CHIUSURA DOVUTO A <u>DATA DI AVVIO CANTIERE PREVISTA DA A.P. DA CORREGGERE</u> . PROCEDURE DI GARA SOSPSE PER RICORSO GIURISDIZIONALE CON ORDINANZA CAUTELARE DI SOSPENSIVA. CANTIERE CONSEGNATO IL 25.03.2015. RITARDO DI 7 MESI SU DATA DI CHIUSURA CANTIERE CON PREVISTA CHIUSURA CANTIERE IL 16.08.2016.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 3.495.814,77.
26	Interventi consolidamento e messa in sicurezza Casa della Fontana piccola	In corso di aggiudicazione definitiva (Aggiudicazione definitiva 01.04.2014)	€ 362.805,56	lug-13	lug-14	gen-15	INTERVENTO CONCLUSO E IN CORSO DI COLLAUDO	
30	Restauro apparati decorativi della Casa della Venere in Conchiglia in Pompei scavi.	In corso di aggiudicazione definitiva	€ 986.341,92	lug-13	lug-14	feb-15	PROCEDURA DI GARA SOSPESA PER RICORSO GIURISDIZIONALE CON ORDINANZA CAUTELARE DI SOSPENSIVA. SENTENZA DI MERITO NOTIFICATA AD APRILE 2015 RITARDO DI 10 MESI SU DATA APERTURA CANTIERE.	
C	Lavori di restauro dell'insula 15 della Regio VII	Aggiudicazione provvisoria (9.06.14)	€ 746.986,28	dic-13	lug-14	ago-15	CONTRATTO STIPULATO IL 20.11.2014. RIDUZIONE TEMPI LAVORAZIONE DA 420 A 340 GG. CON PREVISTA CONCLUSIONE DEL CANTIERE NEL LUGLIO DEL 2015, ANZICHE' AGOSTO 2015.	IMPORTO DA Q.E. DI EURO 740.950,41, CON DECREMENTO DI EURO 6.035,87.
A1	Adeguamento e revisione protezione perimetrale Scavi di Pompei	Gara in corso	€ 6.149.087,40	mag-14	set-14	mag-15	RITARDO DI ALMENO 6 MESI DOVUTO A <u>DATA DI AVVIO CANTIERE PREVISTA DA A.P. DA CORREGGERE</u> . L'8.10.2014 INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MA SOTTOPOSTA A PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN AUTOTUTELA A SEGUITO DI PARERE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. CANTIERE CONSEGNATO IL 26.03.2015. RITARDO DI ALMENO 6 MESI SU DATA CHIUSURA CANTIERE.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 4.914.744,20.
A2	Adeguamento e revisione dell'illuminazione perimetrale degli scavi di Pompei	Gara in corso	€ 3.186.164,86	mag-14	set-14	feb-15	RITARDO DI 7 MESI D'APERTURA CANTIERE DOVUTA A <u>DATA DI AVVIO CANTIERE PREVISTA DA A.P. DA CORREGGERE</u> . INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MA SOTTOPOSTA A PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN AUTOTUTELA A SEGUITO DI PARERE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. CANTIERE CONSEGNATO IL 27.04.2015. RITARDO DI ALMENO 7 MESI SU DATA CHIUSURA CANTIERE.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 2.500.446,37.
TOTALE			€ 16.889.253,86					

P
I
A
N
O

D
E
L
L
E

O
P
E
R
E

Allegato A
alla Relazione sul Monitoraggio del Piano di Azione per il Grande Progetto Pompei (al 30 aprile 2015)

PROGETTAZIONE							SITUAZIONE AL 30.04.2015	
SITUAZIONE AZIONI PLAN							SITUAZIONE AL 30.04.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.E.	DATA PUBBLICAZIONE BANDO STIMATA	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/DECREMENTO
5/9	Lavori di messa in sicurezza Regio IV - V - IX	Redazione progetto in corso	€ 11.285.357,02	set-14	gen-15	set-15	RITARDO PUBBLICAZIONE BANDO DI OLTRE 1 MESE DOVUTO AD INTERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE (BANDI TIPO ANAC). BANDO PUBBLICATO IL 07.11.2014. INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 01.04.2015. RITARDO DI ALMENO 4 MESI APERTURA PER PROLUNGAMENTO FASI GARA (VERIFICA OFFERTA ANOMALA)	IMPORTO DA G.E. DI EURO 11.500.250,29, CON INCREMENTO DI EURO 14.891,27 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 4.980.555,00.
37/39	Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei + Completamento pavimentazione e piccole riprese murarie a Casina Pa.Fi.co	Redazione progetto in corso	€ 11.529.000,00	set-14	gen-15	giu-16	RITARDO PUBBLICAZIONE BANDO DI ALMENO 12 MESI PER COMPLICAZIONI PROGETTUALI.	IMPORTO DA G.E. DI EURO 12.500.000,00, CON INCREMENTO DI EURO 971.000,00.
F	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus delle Pareti Rosse (Regio VII)	Apprentamento atti	€ 295.100,35	lug-14	gen-15	lug-15	INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 24.10.2014. CANTIERE CONSEGNATO IL 29.01.2015. CHIUSURA DEL CANTIERE IN LINEA CON LE PREVISIONI PREVISTA PER IL 13.06.2015.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 252.346,21.
H	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus del Criptoportico (Regio I)	Apprentamento atti	€ 828.529,75	lug-14	gen-15	mag-15	INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 24.10.2014. CANTIERE CONSEGNATO IL 16.02.2015. SULTTAMENTO DI ALMENO 2 MESI NELLA CHIUSURA DEL CANTIERE A CAUSA DEL RITARDO NELLA CHIUSURA DELL'INTERVENTO 18.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 680.641,79.
L	Lavori di restauro degli apparati decorativi della Casa dei Pigmei (Regio IX)	Redazione progetto in corso	€ 418.000,00	set-14	gen-15	dic-15	INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 01.04.2015.	IMPORTO DA G.E. DI EURO 429.810,00, CON INCREMENTO DI EURO 11.810,00 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 262.295,05.
23/24	Lavori di restauro apparati decorativi della Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno escluse + Lavori di consolidamento e restauro architettonico-strutturale della Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno escluse	Redazione progetto in corso	€ 5.500.000,00	set-14	gen-15	apr-16	RITARDO DI 3 MESI PER REVISIONI PROGETTUALI MOTIVATE DA ESIGENZE TUTELA ARCHEOLOGICA NONCHÉ PER INTERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE (BANDI TIPO ANAC). BANDO PUBBLICATO IL 17.12.2014. INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 05.03.2015.	IMPORTO DA G.E. DI EURO 5.052.940,71, CON INCREMENTO DI EURO 442.398,29 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 3.808.070,76.
18	Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della Falsonica di Stephane	Redazione progetto in corso	€ 606.754,47	set-14	gen-15	nov-15	RITARDO DI ALMENO 2 MESI DOVUTO AD INTERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE (AVVISO DI PRE INFORMAZIONE BANDO TIPO ANAC) ED A CONNESSE PROCEDURE DI GARA SUGGERITE DA GRUPPO DI LEGALITA'. CANTIERE CONSEGNATO IL 01.04.2015 CON PREVISTA CHIUSURA PER IL 14.09.2015, CON ANTICIPO DI 2 MESI SULLA DATA DI CHIUSURA PREVISTA	IMPORTO DA G.E. DI EURO 681.218,10, CON INCREMENTO DI EURO 74.463,65 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 463.367,20.
Italia per Pompei	Valorizzazione, decoro e messa in sicurezza dei punti di accesso alle domus, sostituzione cancelli, transenne e banner illustrativi dell'area archeologica di Pompei - Regione I, II, III	Redazione progetto in corso	€ 650.000,00	set-14	gen-15	mag-15	RITARDO DI 2 MESI PER ORGANIZZAZIONE INTERNA DI INVITALIA. CANTIERE CONSEGNATO IL 08.04.2015. RITARDO NELLA CHIUSURA DEL CANTIERE DI ALMENO 4 MESI.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 750.334,33.
Italia per Pompei	"Eliminazione dei presidi temporanei esistenti (punteggi) con interventi locali sulle strutture orizzontali e verticali - Regio I, II e III"	Redazione progetto in corso	€ 600.000,00	set-14	gen-15	mag-15	RITARDO DI 2 MESI PER ORGANIZZAZIONE INTERNA DI INVITALIA. BANDO PUBBLICATO IL 17.11.2014. INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 01.04.2015. RITARDO NELLA CHIUSURA DEL CANTIERE DI ALMENO 4 MESI.	IMPORTO DA G.E. DI EURO 627.061,06, CON INCREMENTO DI EURO 27.061,06 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 515.511,85.
Italia per Pompei	"Interventi di riqualificazione, manutenzione e regimentazione acque meteoriche e sulle strutture delle coperture delle Domus - Regio I, II e III"	Redazione progetto in corso	€ 1.250.000,00	ott-14	feb-15	set-15	RITARDO DI 2 MESI PER UNIFICAZIONE PROGETTI (RICHIESTA A.P.) (DUE PROGETTI SONO STATI UNITI IN UN UNICO INTERVENTO). BANDO PUBBLICATO IL 21.11.2014. INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 01.04.2015. CONSEGNATI PROGETTI ESECUTIVI DA PARTE DITTA	IMPORTO DA G.E. DI EURO 3.220.937,80, CON INCREMENTO DI EURO 1.120.937,80.
2-3 e 4	Messa in sicurezza Regiones I, II e III	Redazione progetto in corso	€ 5.000.000,00	lug-15	nov-15	nov-16	INTERVENTO BANDITO - AD APRILE 2015 CON ANTICIPO DI 3 MESI SU DATA PUBBLICAZIONE BANDO PREVISTA	IMPORTO DA G.E. DI EURO 10.608.234,84, CON INCREMENTO DI EURO 5.608.234,84
M	Lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo interni alla città antica, messa in sicurezza del fronte sud della Regio VII e mitigazione del rischio idrogeologico delle Regiones I-III-IV-V-IX	Redazione progetto in corso	€ 1.000.000,00	In fase di definizione	da attivare con Piano di azione	In fase di definizione	PROGETTO AVVIATO A VERIFICA.	IMPORTO DA G.E. DI EURO 19.361.000,00, CON INCREMENTO DI OLTRE 16 MEURO.
N	Lavori di miglioramento dei percorsi di visita e contestuale realizzazione di percorsi per persone diversamente abili	Redazione progetto in corso	€ 2.500.000,00	ott-14	feb-15	feb-16	RITARDO PUBBLICAZIONE BANDO DI ALMENO 1 MESE DOVUTO AD INTERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE (BANDO TIPO ANAC). INTERVENTO AGGIUDICATO DEFINITIVAMENTE IL 10.04.2015. RITARDO DI ALMENO 3 MESI APERTURA CANTIERE PER PROLUNGAMENTO FASI GARA (VERIFICA OFFERTA ANOMALA)	IMPORTO DA G.E. DI EURO 8.865.000,00, CON INCREMENTO DI EURO 6.365.000,00 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 4.218.136,41.
TOTALE			€ 44.312.741,55					

P
I
A
N
O
D
E
L
L
E
O
P
E
R
E

Allegato A
alla Relazione sul Monitoraggio del Piano di Azione per il Grande Progetto Pompei (al 30 aprile 2015)

ID	SITUAZIONE ACTION PLAN				SITUAZIONE AL 30/04/2015	
	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO C.L.E.		NOTE	INCEMENTO/ RISCIAMENTO
E	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus del Dioscuri (Regio VI)	Da attivare la fase di progettazione	€ 1.111.000,00		BANDO DI AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE: 01.08.2014 INTERVENTO AGGIUDICATO DEFINITIVAMENTE 01.09.2015. INTERFERENZA CON INTERVENTO L1.	IMPORTO DA C.L.E. DI EURO 1.490.561,77, CON RISCIAMENTO DI EURO 379.471,37
G	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus del Marzio (Regio VII)	Da attivare la fase di progettazione	€ 485.976,37		BANDO DI AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE 01.09.2014 LETTERE DI INVITO INVIATE 01.12.2014 INTERVENTO AGGIUDICATO DEFINITIVAMENTE 01.11.2015. INTERFERENZA CON INTERVENTO L1.	IMPORTO DA C.L.E. DI EURO 626.150,00, CON RISCIAMENTO DI EURO 139.111,30
32	Restauro degli apparati decorativi, pittorici, pavimentali nella Casa dell'Ancore Regio VI, mole 10, civico 7	Da attivare la fase di progettazione	€ 700.000,00		BANDO DI AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE 01.30.09.2014 - LETTERE DI INVITO INVIATE 01.12.11.2014. INTERVENTO AGGIUDICATO 01.11.02.2015. CONSEGNA CANTIERE AVVENUTA 01.10.04.2015.	IMPORTO DA C.L.E. DI EURO 848.512,70, CON RISCIAMENTO DI EURO 141.487,27. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 590.748,50
33	Lavori di restauro degli apparati decorativi, pittorici e pavimentali nella Casa dell'Elbo	Da attivare la fase di progettazione	€ 800.000,00		BANDO DI AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE 01.28.11.2014. INTERVENTO AGGIUDICATO 01.05.03.2015. CONSEGNA CANTIERE AVVENUTA 01.17.04.2015.	IMPORTO DA C.L.E. DI EURO 1.214.614,50, CON RISCIAMENTO DI EURO 414.614,50
35	Lavori di consolidamento e restauro delle Terme Centrali	Da attivare la fase di progettazione	€ 500.000,00		ATTIVATA CENTRALE COMMITTENZA INVITALIA. BANDITA GARA SERVIZI PROGETTAZIONE	IMPORTO DA C.L.E. DI EURO 450.000,00, CON RISCIAMENTO DI EURO 50.000,00
15	Restauro del progetto dell'Insula dei Casti Amanti	Da attivare la fase di progettazione	€ 839.500,00		ATTIVATA CENTRALE COMMITTENZA INVITALIA	
16	Restauro della Casa di Cicerone	Da attivare la fase di progettazione	€ 985.000,00		ATTIVATA CENTRALE COMMITTENZA INVITALIA. BANDITA GARA SERVIZI PROGETTAZIONE	IMPORTO DA C.L.E. DI EURO 970.000,00, CON RISCIAMENTO DI EURO 115.000,00
27	Lavori di consolidamento e restauro della Casa di Fabio Rufus e dell'Insula Occidentale	Da attivare la fase di progettazione	€ 1.000.000,00		ATTIVATA CENTRALE COMMITTENZA INVITALIA	
29	Restauro e consolidamento della Palestra delle Terme del Foro	Da attivare la fase di progettazione	€ 150.295,00		ATTIVATA CENTRALE COMMITTENZA INVITALIA. BANDITA GARA SERVIZI PROGETTAZIONE	IMPORTO DA C.L.E. DI EURO 150.000,00, CON RISCIAMENTO DI EURO 295.700,00
34	Attività di protezione dei reperti e dei calchi	Da attivare la fase di progettazione	€ 200.000,00		BANDO DI AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE 01.11.11.2014 INTERVENTO AGGIUDICATO DEFINITIVAMENTE 01.02.04.2015. CONSEGNA IL CANTIERE 01.21.04.2015.	IMPORTO DA C.L.E. DI EURO 128.570,70, CON RISCIAMENTO DI EURO 428.941,20
36	Riconfigurazione coperture e interventi di valorizzazione della Casa dei Vestri	Da attivare la fase di progettazione	€ 4.500.000,00		AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE DEL 11 APRILE 2015.	IMPORTO VERBATO IN EURO 2.300.000,00
38	Completamento struttura depositi e sistemazione reperti presso Porta Nola	Da attivare la fase di progettazione	€ 4.500.000,00		INTERVENTO NON PROGETTABILE IN AGENZIA DI PROTEZIONE SITUAZIONI CRITICHE INTERVENTO SOSTITUITO DA ALTRO PROGETTO (CASA BOSELLINO) AFFIDATO A INVITALIA OMBRE CENTRALI DI COMMITTENZA	
8	Restauro della Casa delle Nozze d'Argento (Regio V)	Da attivare la fase di progettazione	€ 4.500.000,00		ATTIVATA CENTRALE COMMITTENZA INVITALIA	
D	Progetto di restauro e valorizzazione delle fortificazioni di Pompei	Da attivare la fase di progettazione	€ 6.000.000,00		ATTIVATA CENTRALE COMMITTENZA INVITALIA	
I	Progetto di restauro delle Necropoli di Pompei	Da attivare la fase di progettazione			ATTIVATA CENTRALE COMMITTENZA INVITALIA	
F	Realizzazione nuovi servizi igienici a servizio dell'area archeologica di Pompei	Da attivare la fase di progettazione			ATTIVATA CENTRALE COMMITTENZA INVITALIA. BANDITA GARA SERVIZI PROGETTAZIONE	IMPORTO DA C.L.E. DI EURO 150.000,00
Q1	Regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche a sud del Canale Cicerone di Sarno	Da attivare la fase di progettazione			INTERVENTO NON PROGETTABILE IN AGENZIA DI PROTEZIONE SITUAZIONI CRITICHE INTERVENTO SOSTITUITO DA ALTRO PROGETTO (BOSSELLINO) AFFIDATO A INVITALIA OMBRE CENTRALI DI COMMITTENZA	
TOTALE			€ 26.272.859,67			
25	Restauro degli apparati decorativi della Casa di Giulia Felice (Regio II A)	Non riportato in PIA	€ 1.274.431,28		BANDO DI AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE 01.03.03.2015. INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 01.30.04.2015.	
LEGRI	Legge di Montepoggiore	Non riportato in PIA	€ 7.071.484,99		AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE 01.30.03.2015. AVVIATA PROCEDURA PUBBLICAZIONE	
NEW ROS	Restauro della Casa Rosolina e sistemazione delle aree a verde	Non riportato in PIA	€ 350.000,00		ATTIVATA CENTRALE COMMITTENZA INVITALIA. BANDITA GARA SERVIZI PROGETTAZIONE	
TOTALE			€ 9.876.516,27			

P
I
A
N
D
D
E
L
L
E
O
P
P
R
E

CANTIERI IN CORSO									
SITUAZIONE ACTION PLAN								SITUAZIONE AL 30.04.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.E.	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	Data Pubblicazione Bando	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/ DECREMENTO
2	Linea intervento 2: indagini diagnostiche e studi per la mitigazione del rischio idrogeologico pianori e fronti scavo.	In corso di aggiudicazione definitiva	€ 134.257,95	€ 127.644,97	dic-13	giu-14	ago-14	CANTIERE CHIUSO.	IMPORTO DA Q.E. DI EURO 182.365,55, CON INCREMENTO DI EURO 48.107,60.
TOTALE			€ 134.257,95						
GARE IN CORSO									
SITUAZIONE ACTION PLAN								SITUAZIONE AL 30.04.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.E.	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	Data Pubblicazione Bando	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/ DECREMENTO
1	Linea intervento 1 (affidamento in 6 lotti): rilievo, indagine, diagnosi, per l'individuazione analitica dei fabbisogni su tutte le insule.	GARA IN CORSO	€ 8.065.742,00	€ 5.992.142,18	mar-14	lug-14	mag-15	RITARDO DI ALMENO 6 MESI DOVUTO A DATA DI AVVIO CANTIERE PREVISTA DA A.P. DA CORREGGERE. CANTIERI (NR. 6) CONSEGNATI IL 4.3.2015.	IMPORTO DA Q.E. DI EURO 8.017.486,85, CON DECREMENTO DI EURO 48.255,15. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 5.907.705,90.
TOTALE			€ 8.065.742,00						
NUOVE PROGETTAZIONI									
SITUAZIONE ACTION PLAN								SITUAZIONE AL 30.04.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.E.	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	Data Pubblicazione Bando	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/ DECREMENTO
3	Linea intervento 3: Digitalizzazione archivi		€ 2.621.169,66					NUOVA PROGETTAZIONE. BANDO PUBBLICATO IL 13.04.2015.	
TOTALE			€ 2.621.169,66						

P
I
A
N
O

D
E
L
L
A

C
O
N
O
S
C
E
N
Z
A

CANTIERI IN CORSO							
SITUAZIONE ACTION PLAN						SITUAZIONE AL 30.04.2015	
INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO AGGIUDICAZIONE (IVA E SPESE COMPRESSE)	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA PREVISTA AVVIO ATTIVITA'	DATA PREVISTA CHIUSURA ATTIVITA'	NOTE	INCREMENTO/ DECREMENTO
Rafforzamento capacità	Convenzione firmata - Servizio in fase di svolgimento	€ 1.974.753,03	Stipulata convenzione (28.05.2014) tra MIBACT e Società in house del MIBACT.	gen-14	dic-15	RITARDO DI 4 MESI DOVUTO A REVISIONE GIURIDICA CONVENZIONE.	IMPORTO CONVENZIONE DI EURO 1.949.060,07, CON DECREMENTO DI EURO 25.692,96.
Adeguamento tecnologico (attrezzature e materiali)	Forniture acquisite	€ 372.875,16	Acquisto MEPA	giu-14	giu-14	ATTIVITA' CHIUSA.	IMPORTO DI PUBBLICAZIONE CORRISPONDE AD EURO 359.941,00 MENTRE QUELLO DI GARA AMMONTA AD EURO 387.606,16. INCREMENTO DI EURO 14.731,00.
TOTALE		€ 2.347.628,19					
GARE IN CORSO							
SITUAZIONE ACTION PLAN						SITUAZIONE AL 30.04.2015	
INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO PROGETTO (IVA E SPESE COMPRESSE)	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA PREVISTA AVVIO ATTIVITA'	DATA PREVISTA CHIUSURA ATTIVITA'	NOTE	INCREMENTO/ DECREMENTO
Sistema informativo unitario SI-GPP	Gara in corso.	€ 610.510,00	dic-13	lug-14	lug-15	RITARDO DI ALMENO 3 MESI DOVUTO A DATA DI AVVIO CANTIERE PREVISTA DA A. P. DA CORREGGERE. CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE DALL'OCTOBRE 2014. PREVISTA RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE DI 2 MESI CON CHIUSURA CANTIERE PREVISTA PER IL 31.08.2015.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 444.224,00.
TOTALE		€ 610.510,00					
NUOVE PROGETTAZIONI							
SITUAZIONE ACTION PLAN						SITUAZIONE AL 30.04.2015	
INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO STIMATO	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA PREVISTA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/ DECREMENTO
Data Center - Disaster Recovery		€ 403.598,00				INTERVENTO BANDITO IL 15.01.2015. AGGIUDICATO DEFINITIVAMENTE IL 01.04.2015.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 300.867,04.
Rafforzamento tecnologico 3		€ 119.685,56				INTERVENTO BANDITO IL 12.02.2015 CON PROROGA DELLA SCADENZA AL 12.03.2015. LA GARA, ANDATA DESERTA, VERRA' RIPROPOSTA ENTRO LA TERZA DECADE DI MAGGIO.	
Acquisto Laser scanner - Drone		€ 100.000,00				NUOVA PROGETTAZIONE	
TOTALE		€ 623.283,56					

P
I
A
N
O

D
E
L
L
A

C
A
P
A
C
I
T
A

B
U
I
L
D
I
N
G

Allegato A
alla Relazione sul Monitoraggio del Piano di Azione per il Grande Progetto Pompei (al 30 aprile 2015)

CANTIERI IN CORSO								
SITUAZIONE ACTION PLAN							SITUAZIONE AL 30.04.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO Q.E.	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/DECREMENTO
Telecamere	Fornitura in opera n° 20 telecamere wireless 4 LPR per il monitoraggio dei cantieri di restauro finanziato con fondi del PON Sicurezza	Attività in corso	€ 129.799,69		giu-14	ago-14	CONCLUSO.	
TOTALE			€ 129.799,69					
GARE IN CORSO								
SITUAZIONE ACTION PLAN							SITUAZIONE AL 30.04.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	Importo progetto (iva e spese comprese)	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/DECREMENTO
Videosorveglianza	Sistema di videosorveglianza (Intervento a valere sulle risorse del PON Sicurezza)	Gara in corso	€ 3.655.941,61	mag-14	set-14	apr-14	RITARDO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI ALMENO 4 MESI DOVUTO A DATA DI AVVIO CANTIERE DA A. P. DA CORREGGERE. INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CANTIERE CONSEGNATO IL 23.03.2015	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 2.392.299,53.
TOTALE			€ 3.655.941,61					
PROGETTAZIONE								
SITUAZIONE ACTION PLAN							SITUAZIONE AL 30.04.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	Importo progetto (iva e spese comprese)	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/DECREMENTO
wifi intero sito archeologico	Copertura wifi intera area archeologica di Pompei	Redazione progetto in corso	€ 500.000,00	set-14		gen-15	RITARDO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI ALMENO 4 MESI DOVUTO A DATA DI AVVIO CANTIERE DA A. P. DA CORREGGERE, ESSENDOSI PRIVILEGIATO LO SVILUPPO DI PROGETTO DI PRU' LUNGA REALIZZAZIONE. INTERVENTO BANDITO IL 10.04.2015.	IMPORTO DA Q.E. DI EURO 660.489,50, CON INCREMENTO DI EURO 168.498,50.
Piano monitoraggio Ambientale	Piano di monitoraggio ambientale dell'area archeologica - Interventi di censimento, mappatura e bonifica di materiale contenente amianto.	Redazione progetto in corso	€ 1.905.937,04	set-14		nov-15	RITARDO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 2 MESI DOVUTO AD INTERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE (BANDI TIPO ANAC) E A SPECIFICHE INDICAZIONI DEL GRUPPO DI LEGALITA'. INTERVENTO BANDITO IL 14.11.2014. INTERVENTO AGGIUDICATO DEFINITIVAMENTE IL 01.04.2015. RITARDO PREVISTO CHIUSURA LAVORI PER PROLUNGAMENTO PROCEDURE DI GARA E CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE ATTIVATO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 1.528.385,94.
TOTALE			€ 2.405.937,04					

P I A N O
D E L L A
S I C U R E Z Z A

Allegato A
alla Relazione sul Monitoraggio del Piano di Azione per il Grande Progetto Pompei (al 30 aprile 2015)

CANTIERI IN CORSO								
SITUAZIONE ACTION PLAN							SITUAZIONE AL 30.04.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO PROGETTO (IVA E SPESE COMPRESSE)	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/DECREMENTO
2	Potenziamento del personale di vigilanza - manutenzione e miglioramento accessi alle domus	Stipulata Convenzione tra MIBACT e società in house del MIBACT. Servizio in fase di svolgimento.	€ 1.985.562,09	Convenzione firmata il 28.05.2014	giù 14	dic-15	RITARDO DI 2 MESI DOVUTO A REVISIONE GIURIDICA CONVENZIONE. ATTIVAZIONE NEL MESE DI AGOSTO 2014.	IMPORTO CONVENZIONE DI EURO 1.976.830,38, CON DECREMENTO DI EURO 8.731,71.
TOTALE			€ 1.985.562,09					
PROGETTAZIONE								
SITUAZIONE ACTION PLAN							SITUAZIONE AL 30.04.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO STIMATO PROGETTO	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/DECREMENTO
1	Adeguamento servizi al pubblico.	Redazione progetto in corso	€ 3.300.000,00	ott-14	feb-15	set-15	RITARDO DI 3 MESI NELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DOVUTO AD ESIGENZE DI COMPLETAMENTO PROGETTUALE, ESPLETAMENTO PROCEDURE PROTOCOLLO DI LEGALITA' NONCHE' INTERVENTI MODIFICHE NORMATIVE (BANDI TIPO ANAC). INTERVENTO AGGIUDICATO DEFINITIVAMENTE IL 01.04.2015. RITARDO ALMENO 3 MESI APERTURA CANTIERE DOVUTO A PROLUNGAMENTO GARA E VERIFICHE EX LEGE	IMPORTO DA D.L. DI EURO 2.838.047,92, CON DECREMENTO DI EURO 461.952,08. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 2.219.675,77.
3	Promozione e comunicazione	Bando in preparazione	€ 2.000.000,00	set-14	gen-15	set-15	RITARDO DI 45 GG. NELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DOVUTO AD ESIGENZE DI COMPLETAMENTO PROGETTUALE, ESPLETAMENTO PROCEDURE PROTOCOLLO DI LEGALITA' NONCHE' INTERVENTI MODIFICHE NORMATIVE (BANDI TIPO ANAC). INTERVENTO BANDO IL 14.11.2014. INTERVENTO AGGIUDICATO DEFINITIVAMENTE IL 26.04.2015.	IMPORTO DA D.L. DI EURO 1.003.137,04, CON DECREMENTO DI EURO 996.862,96.
TOTALE			€ 5.300.000,00					
NUOVE PROGETTAZIONI								
SITUAZIONE ACTION PLAN							SITUAZIONE AL 30.04.2015	
ID	INTERVENTI	STATO LAVORI	IMPORTO STIMATO	DATA PUBBLICAZIONE BANDO	DATA APERTURA CANTIERE	DATA PREVISTA CHIUSURA CANTIERE	NOTE	INCREMENTO/DECREMENTO
	Mostra "Pompei e l'Europa 1748-1943"		€ 694.180,00		mag-15	ott-15	INTERVENTO RELATIVO AL TRASPORTO BANDO CON AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE IL 16.12.2014. INTERVENTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 01.04.2015.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 654.792,18.
	Mostra "Pompei e l'Europa 1748-1943"		€ 60.000,00		mag-15	ott-15	INTERVENTO RELATIVO ALLA SOLA ASSICURAZIONE BANDO CON AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE IL 15.12.2014 E GARA ANDATA DESERTA E SUCCESSIVAMENTE CON BANDO DEL 15.03.2015. INTERVENTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL 05.05.2015.	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI EURO 44.017,60
	Restauro Laboratorio Ricerche Applicative	Redazione progetto in corso	€ 2.500.000,00				NUOVA PROGETTAZIONE IN CORSO.	
	Servizi di supporto per il miglioramento della fruizione e del decoro degli assi viari e delle aree fruibili dell'area archeologica di Pompei		€ 1.731.393,16				NUOVA PROGETTAZIONE CONVENZIONE FIRMATA IL 25.03.2015. DATA PRESUNTA AVVIO SERVIZIO: 25.05.2015.	
TOTALE			€ 4.485.573,16					

P I A N O D E L L A F R U I Z I O N E E C O M U N I C A Z I O N I
