



Al Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

Codice Rendis	Beneficiario	Importo Finanziato (€)	Tipo strumento	Stato procedurale	Tipo fase	Data prevista per OGV	Grado di priorità
CS 050A/10	Comune di Fiumefreddo Bruzio	1.200.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 051A/10	Comune di Pedivigliano	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
RC 052A/10	Comune di Reggio Calabria	4.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/07/2014	1
KR 053A/10	Comune di Rocca di Neto	300.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/03/2014	1
CZ 054A/10	Comune di Catanzaro	1.200.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	15/05/2014	1
CS 055A/10	Comune di Trebisacce	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 056A/10	Comune di Villapiana	800.000,00	SAD	esecuzione lavori	In itinere	23/05/2013	1
CS 057A/10	Comune di Maierà	800.000,00	SAD	affidamento	Conclusa	25/11/2013	1
CS 058A/10	Comune di Grisolia	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 059A/10	Comune di Tortora	600.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CZ 060A/10	Comune di Curinga	600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
RC 061A/10	Comune di Cardeto	400.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
CS 062A/10	Comune di Scalea	800.000,00	SAD	esecuzione lavori	In itinere	03/05/2013	1
CS 063A/10	Comune di San Giovanni in Fiore	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
RC 064A/10	Comune di Careri	600.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	10/01/2014	1
CS 065A/10	Provincia di CS	3.000.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
CZ 066A/10	Provincia di CZ	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CZ 067A/10	Comune di Tiriolo	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/03/2014	1
RC 068A/10	Provincia di RC	4.500.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	30/03/2014	1
CS 069A/10	Provincia di CS	4.000.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
RC 070A/10	Provincia di RC	3.000.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
KR 071A/10	Provincia di KR	2.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	31/01/2014	1
VV 072A/10	Provincia di VV	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CZ 073A/10	Provincia di CZ	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
CS 074A/10	Comune di Paola	900.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
VV 075A/10	Comune di Parghelia	900.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

Codice Rendis	Beneficiario	Importo Finanziato (€)	Tipo strumento	Stato procedurale	Tipo fase	Data prevista per OGV	Grado di priorità
VV 076A/10	Comune di Tropea	700.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
VV 077A/10	Comune di Zambrone	900.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
VV 078A/10	Comune di Drapia	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CZ 079A/10	Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio	900.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	10/01/2014	1
KR 080A/10	Comune di San Nicola dell'Alto	600.000,00	SAD	esecutiva	Conclusa	30/12/2013	1
CZ 081A/10	Provincia di CZ	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CZ 082A/10	Provincia di CZ	800.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
RC 083A/10	Comune di Villa San Giovanni	500.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
RC 084A/10	Comune di Cinquefrondi	400.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
RC 085A/10	Comune di Varapodio	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CZ 086A/10	Provincia di CZ	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
RC 087A/10	Comune di San Pietro di Caridà	400.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
VV 088A/10	Comune di Dinami	400.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
RC 089B/10	Comune di Antonimina	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CS 090B/10	Comune di Santa Caterina Albanese	900.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CZ 091B/10	Comune di Martirano	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
VV 092B/10	Comune di Drapia	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 093B/10	Comune di Rota Greca	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CZ 094B/10	Provincia di CZ	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
RC 095B/10	Comune di Grotteria	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 096B/10	Comune di San Martino di Finita	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
CZ 097B/10	Comune di Badolato	400.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 098B/10	Comune di Mongrassano	1.000.000,00	SAD	esecutiva	Conclusa	30/12/2013	1
RC 099B/10	Comune di Galatro	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CZ 100B/10	Comune di Maida	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
RC 101B/10	Comune di Benestare	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

Codice Rendis	Beneficiario	Importo Finanziato (€)	Tipo strumento	Stato procedurale	Tipo fase	Data prevista per OGV	Grado di priorità
RC 102B/10	Comune di Locri	600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
CS 103B/10	Comune di San Vincenzo La Costa	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
RC 104B/10	Comune di Mammola	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 105B/10	Comune di Roggiano Gravina	500.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 106B/10	Provincia di CS	4.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CZ 107B/10	Provincia di CZ	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 108B/10	Comune di Verbicaro	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 109B/10	Comune di Longobucco	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 110B/10	Comune di Castrolibero	800.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 111B/10	Comune di Cetraro	800.000,00	SAD	esecutiva	Conclusa	30/12/2013	1
CS 112B/10	Comune di Rende	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
KR 113B/10	Comune di Petilia Policastro	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 114B/10	Comune di Carolei	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
KR 115B/10	Comune di Verzino	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 116B/10	Comune di Mendicino	800.000,00	SAD	esecutiva	Conclusa	30/12/2013	1
KR 117B/10	Comune di Mesoraca	1.000.000,00	SAD	esecutiva	Conclusa	20/01/2014	1
CS 118B/10	Comune di Trenta	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
CS 119B/10	Comune di Serra Pedace	400.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
RC 120B/10	Comune di San Luca	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
KR 121B/10	Provincia di KR	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 122B/10	Provincia di CS	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
RC 123B/10	Provincia di RC	2.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	01/05/2014	1
CS 124B/10	Provincia di CS	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 125B/10	Provincia di CS	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
KR 126B/10	Provincia di KR	600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 127B/10	Provincia di CS	700.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

Codice Rendis	Beneficiario	Importo Finanziato (€)	Tipo strumento	Stato procedurale	Tipo fase	Data prevista per OGV	Grado di priorità
RC 128B/10	Provincia di RC	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
KR 129B/10	Comune di Cotronei	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 130B/10	Comune di Pedace	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 131B/10	Comune di Parenti	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CZ 132B/10	Provincia di CZ	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CZ 133B/10	Comune di Santa Caterina dello ionio	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 134B/10	Provincia di CS	700.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
CZ 135B/10	Comune di Falerna	1.000.000,00	SAD	esecutiva	Conclusa	30/12/2013	1
CS 136B/10	Comune di Lappano	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 137B/10	Comune di Luzzi	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
RC 138B/10	Provincia di RC	600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CS 139B/10	Comune di Caloveto	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
RC 140B/10	Comune di Caraffa del Bianco	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 141B/10	Comune di Civita	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 142B/10	Comune di Laino Castello	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CS 143B/10	Comune di Malito	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 144B/10	Comune di Malvito	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 145B/10	Comune di Mendicino	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
RC 146B/10	Comune di Moloquio	600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 147B/10	Comune di Papisidero	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
CS 148B/10	Comune di San Donato di Ninea	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CZ 149B/10	Comune di San Pietro a Maida	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 150B/10	Comune di San Sosti	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 151B/10	Comune di Sant'Agata di Esaro	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CS 152B/10	Comune di Scala Coeli	600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
RC 153B/10	Comune di Siderno	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

Codice Rendis	Beneficiario	Importo Finanziato (€)	Tipo strumento	Stato procedurale	Tipo fase	Data prevista per OGV	Grado di priorità
CS 154B/10	Comune di Morano Calabro	600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CS 155B/10	Comune di San Basile	600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 156B/10	Comune di San Cosmo Albanese	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 157B/10	Comune di Castroregio	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CZ 158B/10	Comune di San Floro	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
CS 159B/10	Comune di San Pietro in Guarano	600.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 160B/10	Comune di Longobardi	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
CZ 161B/10	Comune di Squillace	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
RC 162B/10	Comune di Bagnara Calabra	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 163B/10	Provincia di CS	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
RC 164B/10	Provincia di RC	2.600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	01/05/2014	1
KR 165B/10	Provincia di KR	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 166B/10	Provincia di CS	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 167B/10	Provincia di CS	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
CS 168B/10	Provincia di CS	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
RC 169B/10	Provincia di RC	2.400.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
RC 170B/10	Provincia di RC	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
KR 171B/10	Provincia di KR	6.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
KR 172B/10	Provincia di KR	1.700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 173B/10	Provincia di CS	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
VV 174B/10	Provincia di VV	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
VV 175B/10	Provincia di VV	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
CZ 176B/10	Provincia di CZ	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CZ 177B/10	Provincia di CZ	600.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
CZ 178B/10	Provincia di CZ	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
VV 179B/10	Provincia di VV	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

Codice Rendis	Beneficiario	Importo Finanziato (€)	Tipo strumento	Stato procedurale	Tipo fase	Data prevista per OGV	Grado di priorità
RC 180B/10	Provincia di RC	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CZ 181B/10	Provincia di CZ	2.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 182B/10	Provincia di CS	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
CZ 183B/10	Provincia di CZ	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CZ 184B/10	Provincia di CZ	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CS 185B/10	Comune di Belvedere Marittimo	700.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

ALLEGATO 2

Mappe “Categorie di rischio PAI associato all’intervento”


PAGINA BIANCA



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

AP del 25/11/2010
classificazione per rischio

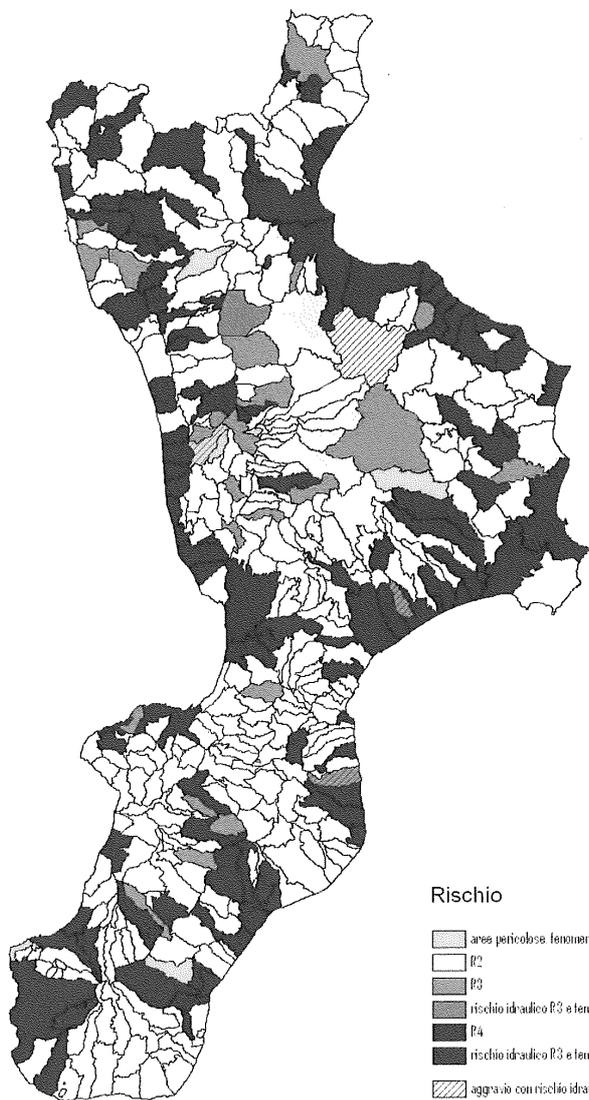

Rischio

- aree pericolose fenomeni di nuova genesi
- P2
- P3
- rischio idraulico P3 e fenomeni di nuova genesi
- P4
- rischio idraulico P3 e fenomeni di nuova genesi
- aggravio con rischio idraulico P4






Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

**AP del 25/11/2010
classificazione per tipologia di rischio**

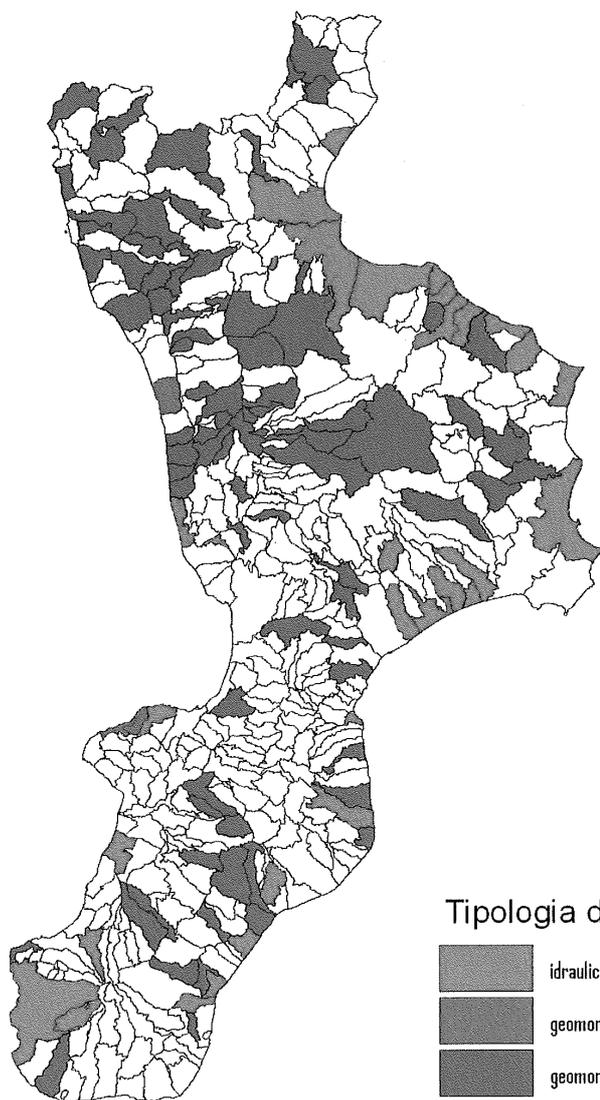

1:750000



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Relazione annuale anno 2013

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 21 gennaio 2011

20/01/2014
Commissario Straordinario Delegato
Prof. ing. Giuseppe De Martino

PAGINA BIANCA

1.1 ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA*(Compilare i campi sottostanti)*

Regione	CAMPANIA
Commissario straordinario delegato	Prof. ing. Giuseppe De Martino
Decreto nomina	D.P.C.M. 21 gennaio 2011
Data sottoscrizione Accordo	12/11/10
Data sottoscrizione Accordo Integrativo	Allegato 1 in data 26 aprile 2012
Importo complessivo assentito in Accordo	€ 220.000.000,00
Importo programmato per il periodo (anno 2013)	€ 43.730.189,00
Importo speso per il periodo (anno 2013)	€ 120.426,64

1.2 CRICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE*Descrivere il contesto in cui si inseriscono le attività commissariali a livello regionale.*

Le attività commissariali interessano interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in aree classificate a rischio 'elevato' e 'molto elevato' da frane o alluvione.

La classificazione delle aree è stata eseguita dalle Autorità di Bacino territorialmente competenti (Nazionale Liri-Garigliano e Volturno, Regionale della Campania Centrale, Regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, Regionale della Puglia e Interregionale del fiume Fortore) nell'ambito della redazione dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

Gli interventi interessano tutte e cinque le provincie della Campania ed oltre cento comuni.

1.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI*Descrivere la struttura commissariale sia dal punto di vista logistico sia come risorse umane.*

Dal punto di vista logistico, la struttura commissariale è ubicata al secondo piano dell'edificio sito in Nalpoli alla via De Gasperi 28, sede degli Assessorati ai Lavori Pubblici, dell'Ambiente e del Capo Area del Settore Difesa Suolo della Regione Campania (dott. Italo Giulivo).

L'ufficio messo a disposizione del Commissario fin dal gennaio 2011, risulta costituito da due soli vani adiacenti:

- il primo, di circa 15 mq, ubicato proprio di fronte ai servizi igienici sia femminili che maschili, è adibito a studio del Commissario;
- il secondo, attiguo al precedente, di circa 12 mq, è impegnato dal marzo 2012 (nell'anno 2011 e fino a febbraio 2012, il Commissario venne aiutato a titolo grazioso da suoi ex allievi,

attualmente docenti universitari) dai due collaboratori con contratti CO.CO.PRO.. I primi, con scadenza febbraio 2013, registrati alla Corte dei Conti Registro n. 06, Foglio 81 (CDC 14626/1012) e Foglio 82 (CDC 14627/1012); i secondi, con scadenza 20 gennaio 2014, registrati al n. 04 - Foglio n. 387 e 388 in data 24/05/2013.

Gli arredi, in entrambi i due vani, sono costituiti da scrivanie (una per lo studio del Commissario e due per lo studio dei collaboratori), armadi, computer di vecchio tipo, stampanti laser a solo colore nero e formato A4, due telefoni (uno in ogni stanza) e un fax. Nell'anno 2013 il Commissario è stato costretto ad acquistare un nuovo fax per sostituire quello precedente non più funzionante.

I due collaboratori, di adeguate capacità professionali, selezionati, a seguito di avviso pubblico, da apposita Commissione costituita da tre docenti universitari, a titolo grazioso, svolgono anche le funzioni di usciere, segretari, telefonisti, redazione decreti e ordinanze, digitazione, oltre ad essere adibiti alle funzioni per le quali furono selezionati.

Lo scrivente Commissario è stato costretto a ricorrere ai due collaboratori esterni in quanto la Regione Campania, l'ARCADIS (Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo), le Autorità di Bacino ed altri enti pubblici non hanno mai ritenuto possibile affiancare al lavoro del Commissario propri dipendenti, atteso il 'sottodimensionamento del loro personale'.

Gli incontri con gli Enti (sempre numerosi e continui) si svolgono in un terzo studio (accanto a quello dei collaboratori), quando disponibile, perchè è spesso occupato dalle strutture regionali. Pertanto, più volte, il Commissario è costretto a ricevere presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell'Università di Napoli Federico II.

Spesso, per l'esame dei vari livelli progettuali ricevuti dagli enti proponenti, il Commissario è costretto a ricorrere al proprio studio professionale!

Nonostante tutte le deficienze logistiche, il Commissario (che usa il proprio telefonino ed i mezzi pubblici a sue spese, ed acquista spesso anche la carta igienica) ritiene di avere finora svolto un ottimo lavoro, come di seguito illustrato nei successivi punti della presente nota.

Perché il Commissario accettò di fissare il proprio ufficio a via De Gasperi 28 pur se con le deficienze accennate?

Perché il suo compito prevedeva di interagire con la Regione Campania ed in particolare con il Capo Area del Settore Difesa Suolo.

Ritenne, inoltre, che i due vani assegnatigli erano solo provvisori e quindi in attesa di uffici più appropriati e dignitosi.

Purtroppo il provvisorio è diventato definitivo e il Commissario non ritiene di fissare, ora, la sua sede di ufficio presso altro Ente pubblico, perchè il trasferimento comporterebbe lavori onerosi, attesi i tanti e tanti fascicoli prodotti, le note degli enti, i progetti (originali e nelle edizioni aggiornate/integrate) e così via.

Perché il Commissario continua ad esercitare il proprio ruolo pur con le deficienze accennate?

Perché accettò la nomina solo per rendere un servizio al Paese e lo ha reso e lo rende ancora.

1.4 SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Dichiarare quanto è stato versato sulla c.s. dal Ministero dell' Ambiente, dalla Regione, o da altre fonti sia con importo corrente che cumulato, lo speso, i relativi residui.

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell' Ambiente			
Importo corrente (per l'anno 2013)	Importo cumulato (anno 2013 + precedente periodo)	Speso	Residuo
€ 36.465.532,33	€ 36.465.532,33	€ 409.508,23 *	€ 36.056.024,10

Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti (precisare: Regione Campania, importo ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico)			
Importo corrente (per l'anno 2013)	Importo cumulato (anno 2013 + precedente periodo)	Speso	Residuo
€ 5.800.735,62	€ 5.800.735,62	€ 0,00	€ 5.800.735,62

1.5 ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

Indicare per ciascuna delle attività indicate nella seguente tabella il relativo stato di rendicontazione della spesa, considerando esclusivamente quanto effettivamente pagato.

Descrizione attività	Importo speso corrente (per l'anno 2013)	Importo speso cumulato (anno 2013 + precedente periodo)
struttura commissariale	€ 120.426,64	€ 409.508,23
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	€ 0,00 *	€ 0,00 *

* Si evidenzia che non è stata finora pagata alcuna progettazione, in quanto il Commissario ha collaborato con i vari enti ed ha consentito la redazione di livelli progettuali di dettaglio (preliminare, definitivo, esecutivo) per molti degli interventi che inizialmente erano dotati di progetti ancor meno che preliminare e, in numerosi casi, carenti sia dal punto di vista tecnico che normativo.

1.6 PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

Allegare il prospetto contabile riepilogativo entrate/uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013.

Prospetto riepilogativo entrate dal 1° gennaio 2013 a 31 dicembre 2013 - Contabilità Speciale 5586
DataEntrataFonte Finanziaria22/11/13€ 5.800.735,62
Regione Campania **Totale€ 5.800.735,62**

Prospetto contabile riepilogativo uscite dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 – Contabilità speciale 5586

Data	Uscite	Casuale
27/03/13	€ 15.730,00	Ordinativi n. 1 e 2 – Pagamento compenso Commissario periodo dal 1° Dicembre 2012 – 28 Febbraio 2013 – Decreto n. 30 del 01/03/2013
27/03/13	€ 9.000,00	Ordinativi nn. 3 e 4 – Pagamento del quarto acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di lavoro a progetto approvato con decreto n. 8 del 02/03/2012, all'ing. Agostino Santillo – Liquidazione fattura n. 2/2013 relativa al periodo 1° Dicembre 2012 – 28 Febbraio 2013 - Decreto n. 29 del 01/03/2012
03/04/13	€ 7.500,00	Ordinativi nn. 5 e 6 – Pagamento del quarto acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di lavoro a progetto approvato con decreto n. 9 del 05/03/2012, Dott. Giovanni Palmiero – Liquidazione fattura n. 2/2013 relativa al periodo 1° Dicembre 2012 – 28 Febbraio 2013 - Decreto n. 39 del 27/03/2012
01/08/13	€ 9.166,65	Ordinativi nn. 7 e 8 – Pagamento del quarto acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di lavoro a progetto approvato con decreto n. 69 del 06/06/2013, Dott. Giovanni Palmiero – Liquidazione fattura n. 2/2013 relativa al periodo 22 Aprile 2013 – 21 Luglio 2013 - Decreto n. 88 del 24/07/2013
01/08/13	€ 11.000,00	Ordinativi nn. 9 e 10 – Pagamento del quarto acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di lavoro a progetto approvato con decreto n. 68 del 03/06/2013, Ing. Agostino Santillo – Liquidazione fattura n. 6/2013 relativa al periodo 22 Aprile 2013 – 21 Luglio 2013 - Decreto n. 89 del 24/07/2013
01/08/13	€ 26.216,66	Ordinativi n. 11 e 12 – Pagamento compenso Commissario periodo dal 1° marzo 2013 – 31luglio 2013 – Decreto n. 90 del 01/08/2013
20/11/13	€ 11.000,00	Ordinativi nn. 13 e 14 – Pagamento del quarto acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di lavoro a progetto approvato con decreto n. 68 del 03/06/2013, Ing. Agostino Santillo – Liquidazione fattura n. 7/2013 relativa al periodo 22 Luglio 2013 – 21 ottobre 2013 - Decreto n. 114 del 07/11/2013
20/11/13	€ 9.166,66	Ordinativi nn. 15 e 16 – Pagamento del quarto acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di lavoro a progetto approvato con decreto n. 69 del 06/06/2013, Dott. Giovanni Palmiero – Liquidazione fattura n. 7/2013 relativa al periodo 22 Luglio 2013 – 21 ottobre 2013 - Decreto n. 115 del 07/11/2013
09/12/13	€ 21.146,67	Ordinativi n. 17 e 18 – Pagamento compenso Commissario periodo dal 1° agosto 2013 – 31 novembre 2013 – Decreto n. 125 del 02/12/2013
12/12/13	€ 500,00	Ordinativo n. 19 – Fondo piccola cassa - Decreto n. 127 del 06/12/2013
Totale	€ 120.426,64	

J
