



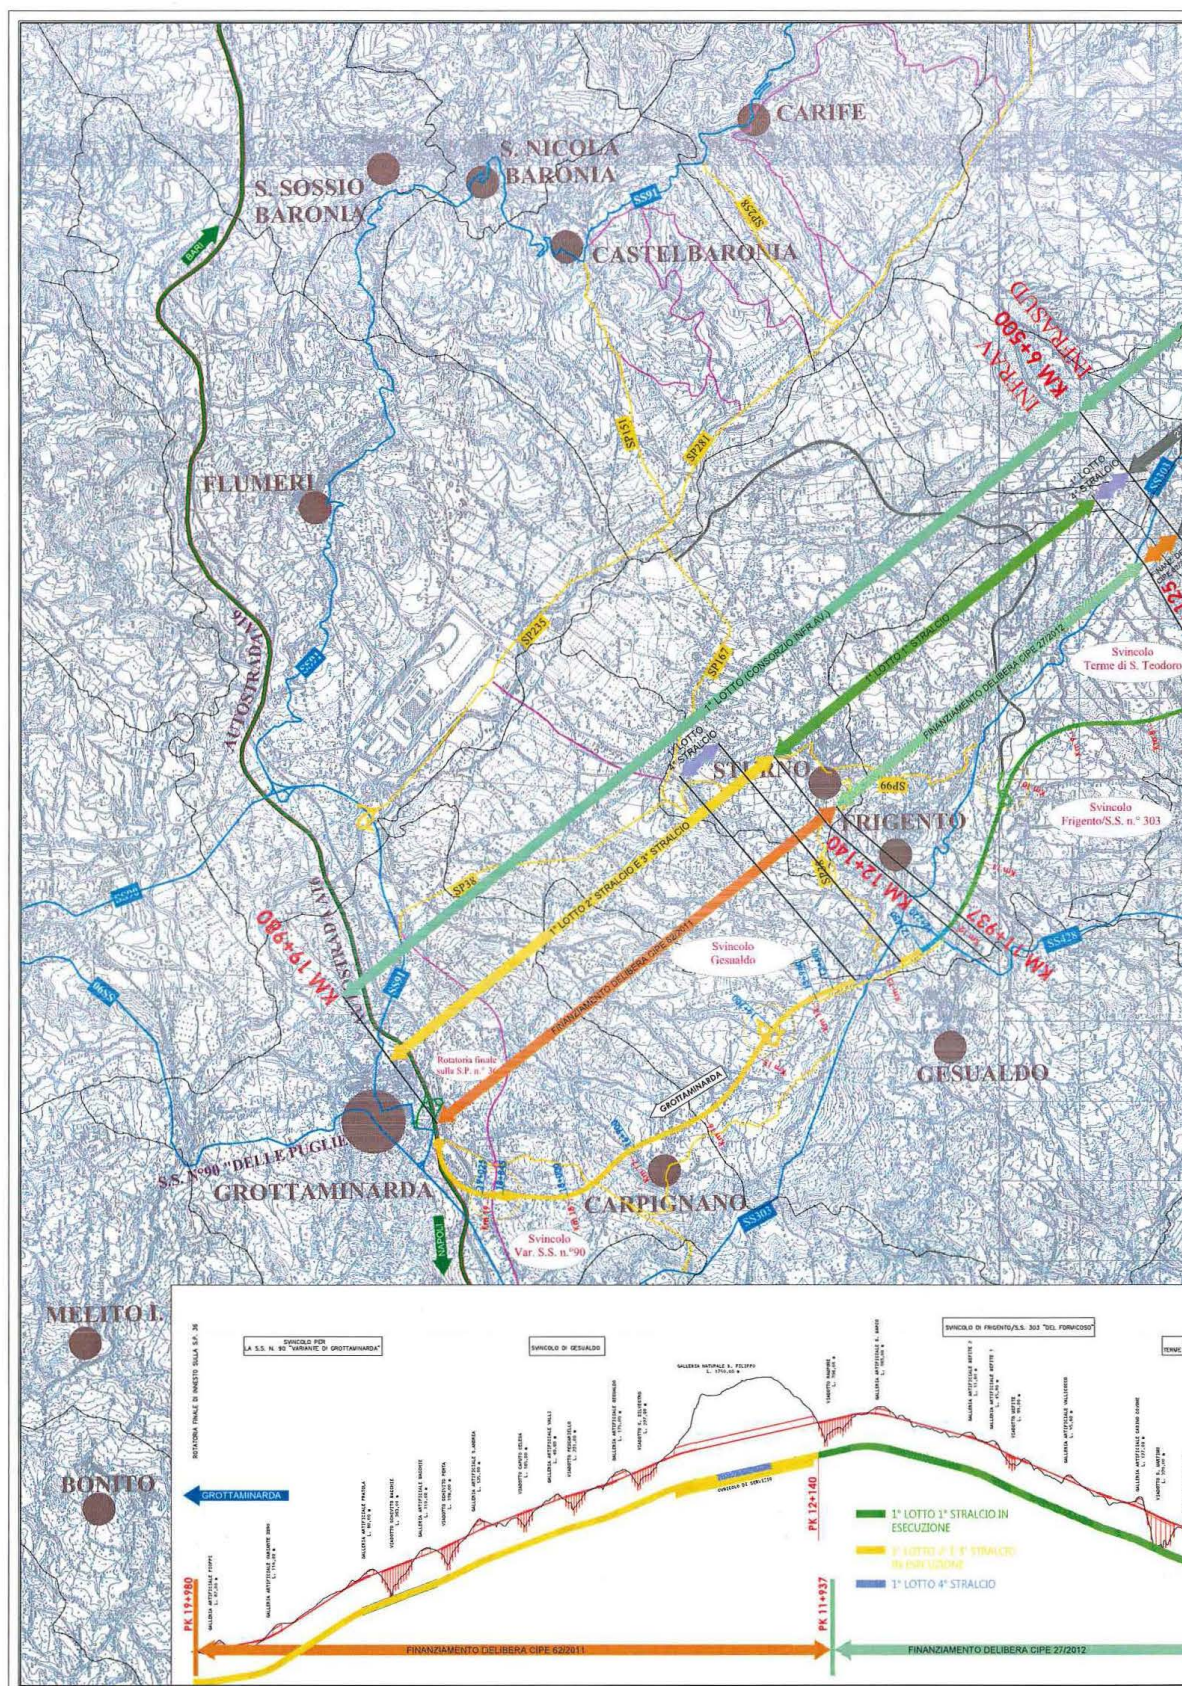

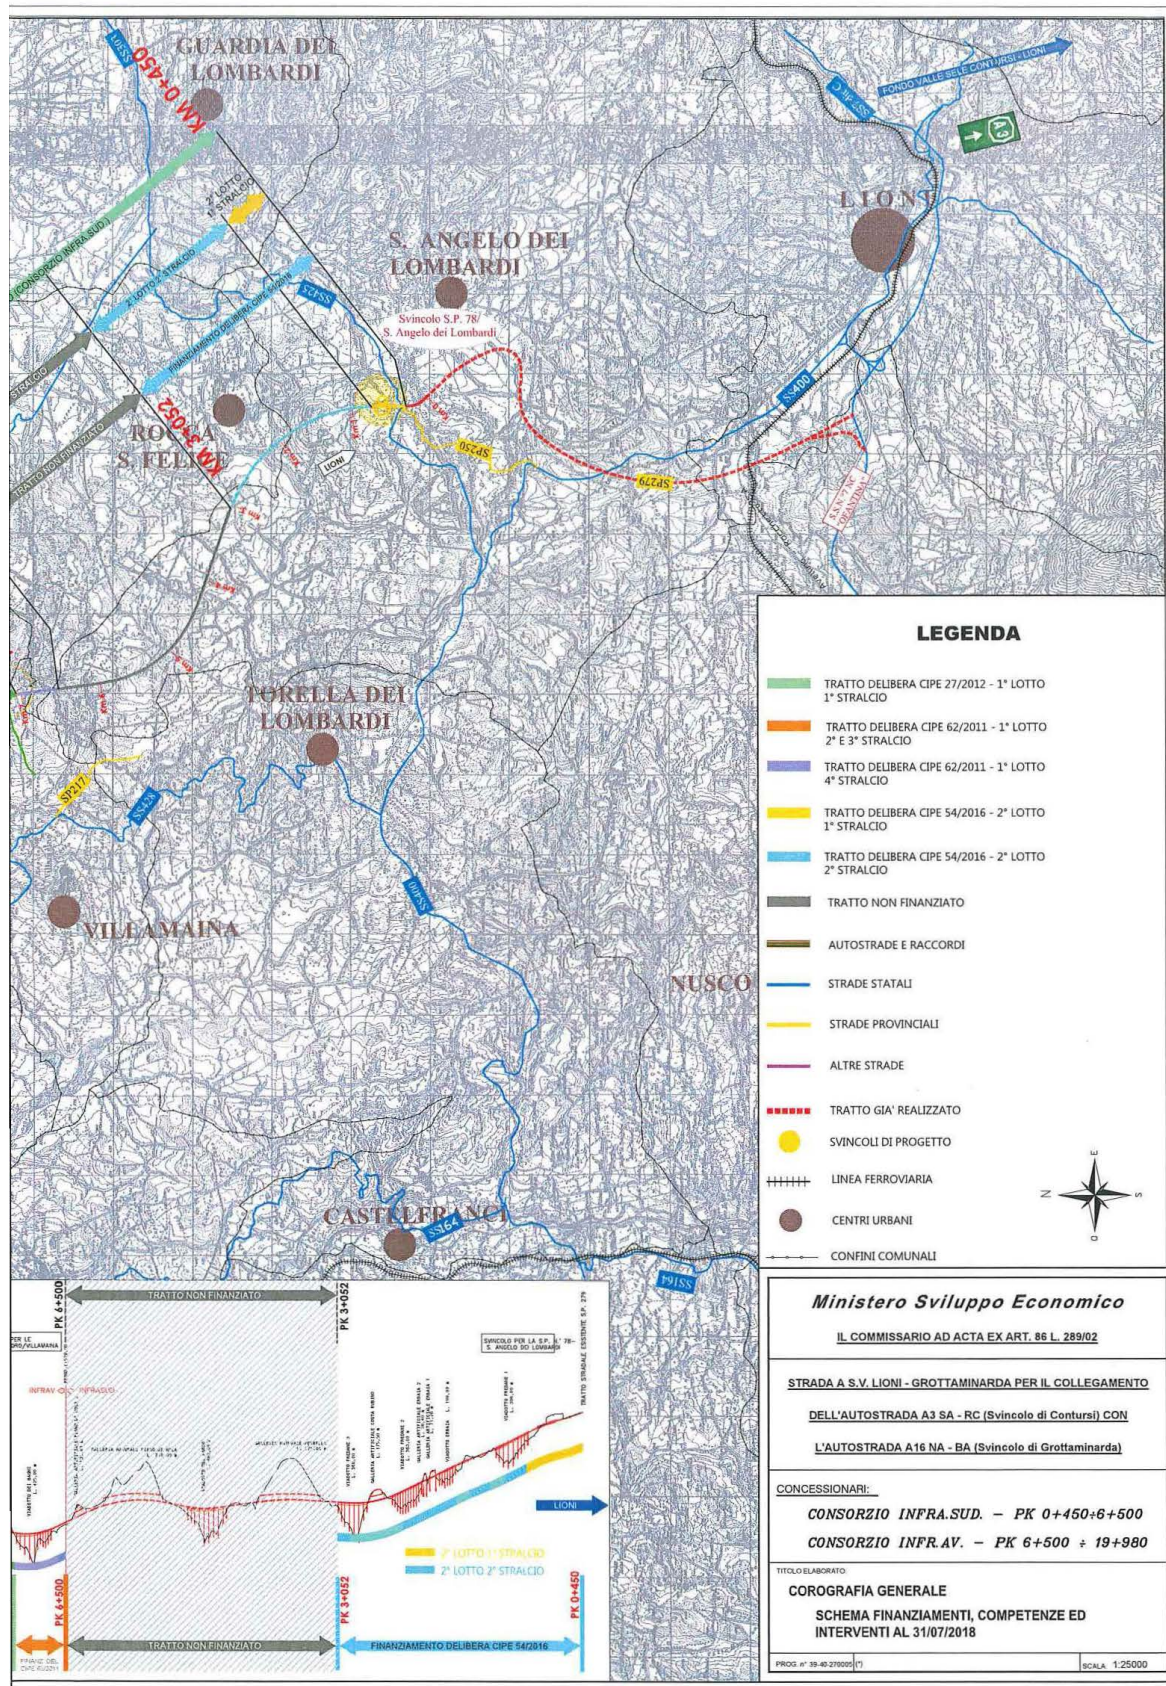

2a.1)

COMMISSARIO AD ACTA art. 86 LEGGE 289/02		
Viabilità Lioni - Grottaminarda		
VERSAMENTI SULLA C.S. 3250 SUDDIVISI PER SOGGETTO FINANZIATORE, LOTTO E STRALCIO		

MIT	1° lotto 1° stralcio	1 ^a anticipazione	17/12/12	15.000.000,00
		2° acconto	25/07/16	9.548.000,00
		3° acconto	05/07/17	20.000.000,00
		4° acconto	21/06/18	20.531.858,00
		TOTALE		65.079.858,00

Regione Campania	1° lotto 2° stralcio	1 ^a anticipazione	16/11/16	6.000.000,00
		2° acconto	20/12/17	11.337.080,00
		3° acconto	14/08/18	12.662.920,00
		Totale		30.000.000,00

Regione Campania	1° lotto 3° stralcio	1 ^a anticipazione	11/07/18	9.422.099,00
		Totale		9.422.099,00

TOTALE GENERALE	104.501.957,00
-----------------	----------------

VERSAMENTI PER PROGETTAZIONE

Regione Campania	27/07/07	250.000,00 1)
	20/10/08	1.000.000,00 1)
	15/12/09	2.500.000,00
	17/12/09	530.000,00 1)
	01/12/11	620.000,00 1)

1) Per totali M€ 2,400 su 2.500 assegnati. Residuano pertanto € 100.000,00 da accreditare.

2a.2)

COMMISSARIO AD ACTA art. 86 L. 289/02 - CONVENZIONI E CONTRATTI CON CONSORZI CONCESSIONARI DEI LAVORI

SSV. LIONI - GROTTAMINARDA

N.° Ord.	TIPO ATTO	DATA STIPULA	Concessionario	DESCRIZIONE		PARTE D'OPERA
1	Convenzione Base	14/09/1982	INFR.AV.			
2	Convenzione Base	14/09/1982	INFRASUD			
3	Atto Aggiuntivo Quadro	28/07/10	INFR.AV.	Individuazione ed esecuzione dei lavori	1° lotto	dalla progr. 6+500 alla progr. 19+980
4	Atto Aggiuntivo Quadro	28/07/10	INFRASUD	Individuazione ed esecuzione dei lavori	2° lotto	dalla progr. 0+450 alla progr. 6+500
5	Contratto	23/01/13	INFR.AV.	Affidamento lavori	1° lotto 1° stralcio funzionale	dalla progr. 7+125 alla progr. 11+937
6	Atto integrativo	14/02/2013	INFR.AV.	tracciabilità dei flussi finanziari	1° lotto 1° stralcio funzionale	
7	Atto integrativo	16/07/2015	INFR.AV.	Obblighi disciplina Protocollo Legalità	1° lotto 1° stralcio funzionale	
8	Contratto	16/09/2015	INFR.AV.	Affidamento lavori	1° lotto 2° stralcio 1° costruttivo	dalla progr. 12+140 alla progr. 19+980
9	Contratto	27/07/2017	INFR.AV.	Affidamento lavori	1° lotto 3° stralcio	"
10	Contratto	27/07/2017	INFRASUD	Affidamento lavori	2° lotto 1° stralcio	dalla progr. 0+450 alla progr. 6+500

CONSORZIO INFR.AV.[CONCESSIONE del 14/09/1982](#)[ACCORDO QUADRO del 28/07/2010](#)**CONTRATTI STRALCIO**[CONTRATTO 1° STRALCIO - 1° Lotto FUNZIONALE del 23/01/2013](#)[CONTRATTO 1° STRALCIO - Atto Integrativo N° 1](#)[CONTRATTO 1° STRALCIO - Atto Integrativo N° 2](#)

Consegna lavori	del	31/01/2013	
Tempo contrattuale	gg	1460	
Data Ultimazione		30/01/2017	
Nuova data ultimazione (Decreto Com.le N° 1618)		11/08/2017	
Nuova data ultimazione (Atto Transazione)		31/12/2018	
STATO AVANZAMENTO LAVORI	in corso	68%	SAL n° 24 al 30/06/18

[CONTRATTO 2° STRALCIO - 1° Lotto COSTRUTTIVO del 16/09/2015](#)

Consegna lavori espropri	del	17/09/2015	
Consegna lavori	del	16/11/2015	
Tempo contrattuale	gg	1096	
Data Ultimazione		16/11/2018	
Nuova data ultimazione (Atto Transazione)		30/06/2019	
STATO AVANZAMENTO LAVORI	in corso	41%	SAL n° 10 al 30/06/18

[CONTRATTO 3° STRALCIO -](#)

Consegna lavori	del	25/09/2017	
Tempo contrattuale	gg	1215	
Data Ultimazione		23/01/2021	
STATO AVANZAMENTO LAVORI	in corso	0,84%	SAL n° 3 al 30/06/18

2a.3)

COMMISSARIO AD ACTA art. 86 L. 289/02 - CONVENZIONI E CONCESSIONI IN CORSO

SSV. LIONI - GROTAMINARDA

N.° Ord.	TIPO ATTO	DATA STIPULA	ENTE	DESCRIZIONE	CONTRATTO	PARTE D'OPERA
1	Convenzione	17/09/2009	Provveditorato OO.PP. Napoli	Funzioni di Stazione Appaltante		1° e 2° lotto
2	Convenzione	24/03/2010	ing. Giancarlo d'Agostino	Direzione Lavori		1° e 2° lotto
3	Convenzione	10/09/14	Comune Villamaina	Viabilità interferita	1° Lotto funzionale	Strade Comunali
4	Convenzione	05/02/15	Comune Frigento	Viabilità interferita	"	Strade Comunali
5	Protocollo Legalità	05/03/2015	Prefettura Avellino	Prvenzione tentativi di nfiltrazione criminalità organizzata		1° e 2° lotto
6	D.D.145 - Accordo Programma Quadro	21/05/2015	Regione Campania - D.G. Mobilità	Gestione M€ 220 (Del. CIPE 62/11)	1° lotto	
7	Convenzione		MIT - Regione Campania	Gestione M€ 65 Del. CIPE 54/16	2° lotto	
8	Convenzione	03/08/2018	Regione Campania	"	"	
9	Convenzione		MIT	Gestione M€ 70	1° lotto	
10	Convenzione		MIT			
11	Servitù	02/09/16	e-Distribuzione	Risoluzione interferenze	"	Viadotti Mefite - San Pancrazio - San Marco
12	Concessione	15/02/2017	Genio Civile Avellino	Attraversamento aree demaniali	"	Torrente San Pancrazio
13	Concessione					Vallone Carpinello
14	Concessione					Vallone San Martino
15	Servitù	26/07/18	e-Distribuzione	Risoluzione interferenze	1° Lotto funzionale 1° e 2° stralcio	Napoletana - Sv. Gesualdo - GA Valli - GA S. Andrea
16	Concessione	03/08/18	Genio Civile Ariano I.	Attraversamento aree demaniali	2° stralcio costruttivo	Vallone Penta
17	Convenzione	in corso	ANAS	Viabilità interferita	"	Galleria SS90
18	Servitù	"	SNAM	Risoluzione interferenze	"	Svincolo Gesualdo
19	Convenzione	"	ASPI	Viabilità interferita	3° stralcio	Rotatoria Km. 19+954
20	Convenzione	"	Comune Grottaminarda	Viabilità interferita	2° e 3° stralcio	Strade Comunali
21	Convenzione	"	Comune Gesualdo	Viabilità interferita	"	Strade Comunali

2a.4)

CONSORZIO INFR.AV.

SSV. LIONI - GROTTAMINARDA - 1° Lotto FUNZIONALE -

DATI DI CONTRATTO**CONTRATTO DEL 23/01/2013**

Lavori	56.850.863,00
Oneri sicurezza	2.578.104,00
Oneri concessione	3.411.052,00
Totale	62.840.019,00

Somme a disposizione

Espropriazioni	2.108.098,00
Interferenze	350.646,00
Altro	4.701.237,00
Totale	7.159.981,00
Totale Progetto	70.000.000,00

PROGRESSIVO S.A.L., S.A.E., RIMBORSO INTERFERENZE, COMPETENZE PROFESSIONALI E SPESE PER MISSIONI AL 10/9/2018

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO PROGRESSIVO SAL	IMPORTO PROGRESSIVO CERTIFICATO	IMPORTO LIQUIDATO
SAL n° 24	30/06/2018	42.476.382	42.041.075	40.372.539
SAE n° 8	31/03/2017	1.234.939	1.234.939	1.234.939
Interferenze	31/08/2017	127.783	127.783	127.783
Compet. Profess.	09/07/2018	308.242	308.242	308.242
Spese per Missioni	29/08/2018	84.331	84.331	84.331
Totale		44.231.677,74	43.796.370,60	42.127.834,43

CONSORZIO INFR.AV.**SSV. LIONI - GROTAMINARDA - 1° Lotto 2° Stralcio 1° COSTRUTTIVO -****DATI DI CONTRATTO****CONTRATTO DEL 16/09/2015**

Lavori	48.117.134,17
Oneri sicurezza	3.004.148,76
Oneri concessione	2.887.028,05
Totale	54.008.310,98

Somme a disposizione

Espropriazioni	1.805.086,36
Interferenze	317.054,00
Altro	3.869.548,66
Totale	5.991.689,02
Totale Progetto	60.000.000,00

PROGRESSIVO S.A.L., S.A.E., RIMBORSO INTERFERENZE, COMPETENZE PROFESSIONALI E SPESE PER MISSIONI AL 10/9/2018

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO PROGRESSIVO SAL	IMPORTO PROGRESSIVO CERTIFICATO	IMPORTO LIQUIDATO
SAL n° 9	30/04/2018	19.932.151	19.730.992	17.120.800
SAE n° 5	31/03/2018	662.058	662.058	662.058
Interferenze	31/08/2017	168.722	168.722	168.722
Compet. Profess.	09/07/2018	132.885	132.885	132.885
Spese per Missioni	29/08/2018	9.143	9.143	9.143
Totale		20.904.958,56	20.703.798,93	18.093.607,07

CONSORZIO INFR.AV.

SSV. LIONI - GROTTAMINARDA - 1° Lotto 3° Stralcio -

DATI DI CONTRATTO	
CONTRATTO DEL 27/07/2017	
Lavori	75.997.515,06
Oneri sicurezza	3.075.667,63
Oneri concessione	4.559.850,90
Totale	83.633.033,59
Somme a disposizione	
Espropriazioni	3.916.892,37
Interferenze	634.700,00
Altro	6.036.364,04
Totale	10.587.956,41
Totale Progetto	94.220.990,00

PROGRESSIVO S.A.L., S.A.E., RIMBORSO INTERFERENZE, COMPETENZE PROFESSIONALI E SPESE PER MISSIONI AL 10/9/2018

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO PROGRESSIVO SAL	IMPORTO PROGRESSIVO CERTIFICATO	IMPORTO LIQUIDATO
SAL n° 2	28/08/2018	179.046	177.203	177.203
SAE n° -		0	0	0
Interferenze		0	0	0
Compet. Profess.		0	0	0
Spese per Missioni	29/08/2018	45	45	45
Totale		€ 179.090,29	€ 177.247,27	€ 177.247,60

CONSORZIO INFRA.SUD**SSV. LIONI - GROTTAMINARDA - II° Lotto I° STRALCIO****DATI DI CONTRATTO****CONTRATTO DEL 27/07/2017**


Lavori	5.558.890,04
Oneri sicurezza	333.460,29
Oneri concessione	333.533,40
Totale	6.225.883,73

Somme a disposizione


Espropriazioni	342.619,05
Interferenze	240.500,00
Altro	405.997,22
Totale	989.116,27
Totale Progetto	7.215.000,00

PROGRESSIVO S.A.L., S.A.E. e RIMBORSO INTERFERENZE AL 30/09/2018


DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO PROGRESSIVO SAL	IMPORTO PROGRESSIVO CERTIFICATO	IMPORTO LIQUIDATO
SAL n° -----	Non emessi	0	0	0
SAE n° -----	Non emessi	0	0	0
Interferenze ---	*****	0	0	0
Totale		0,00	0,00	0,00

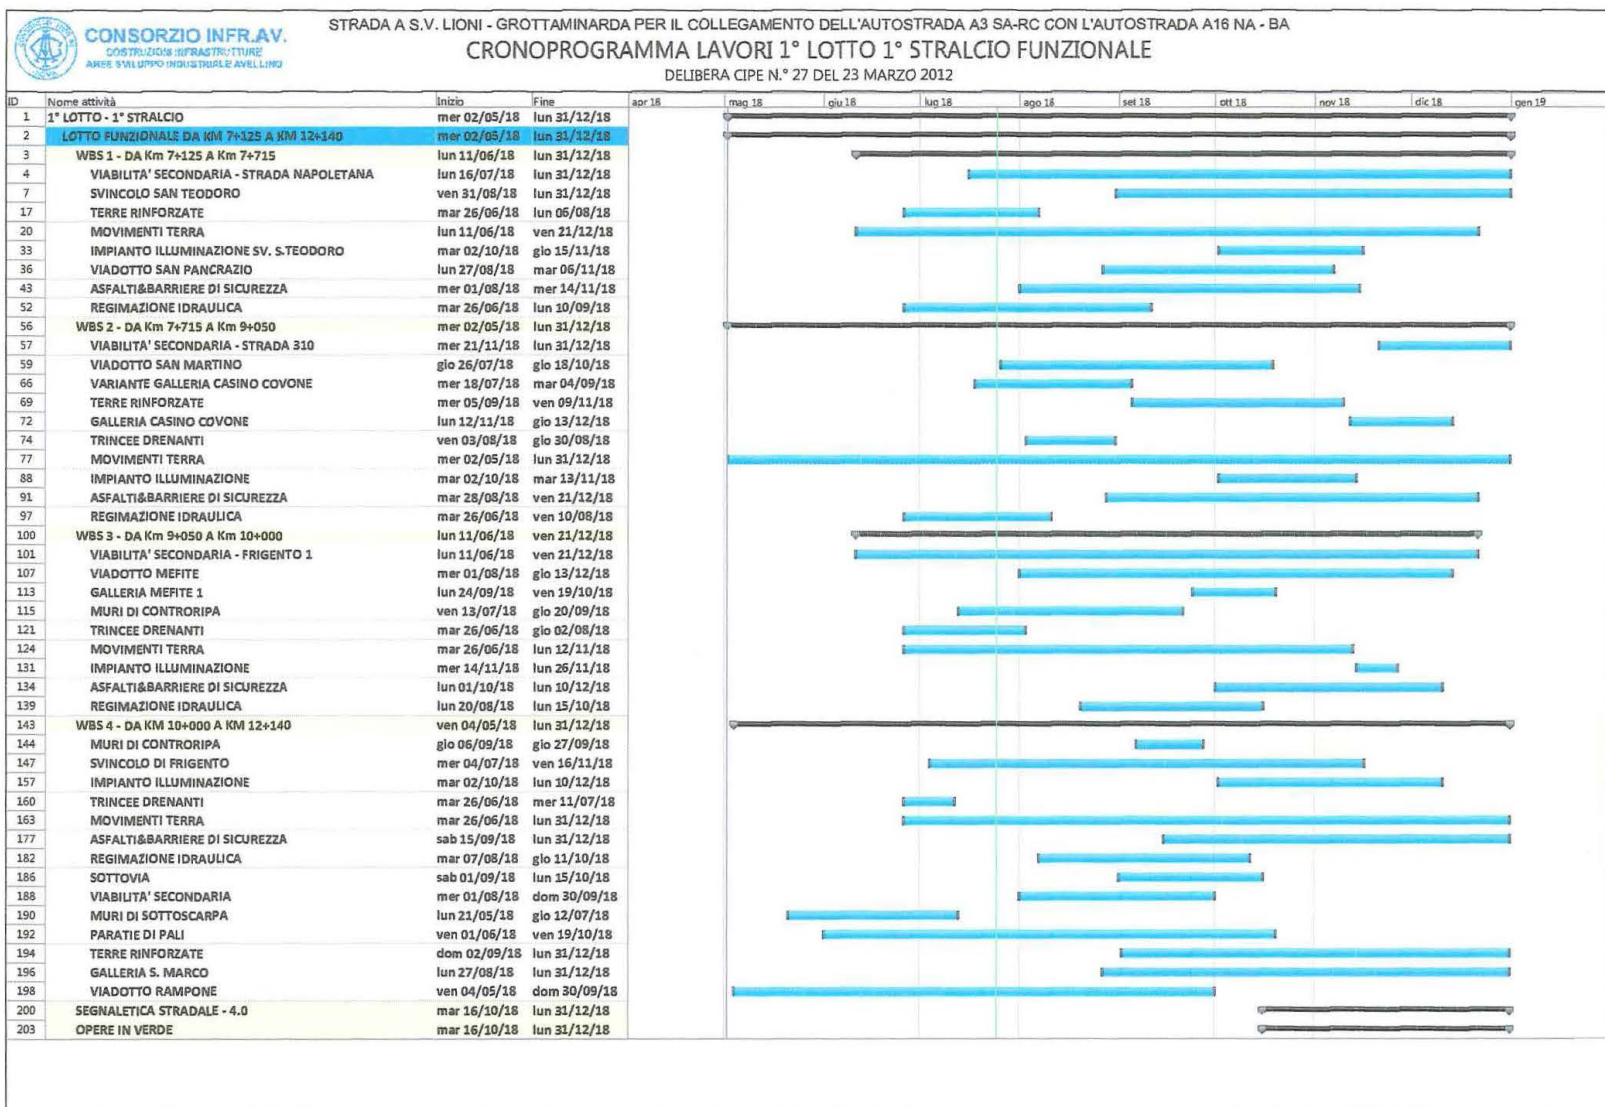


22.5)

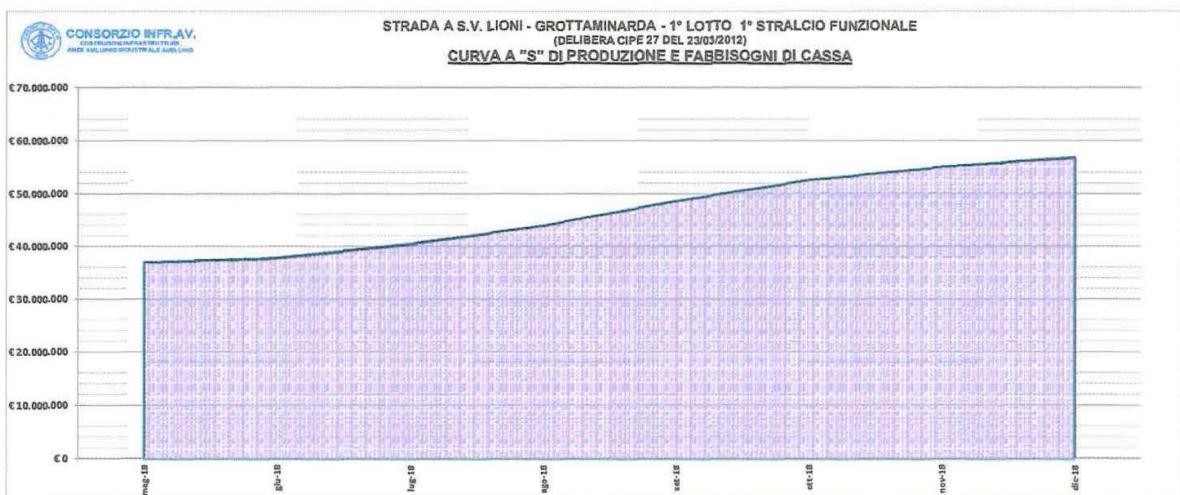

	CONSUNTIVO	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	TOTALE A FINE	TOTALE GENERALE
1	IMPORTO LAVORI	€ 35.002.922,50	€ 688.252,03	€ 10.918.897,42	€ 8.161.010,55	€ 55.859.862,50
2	ONERI SPECIALI DI SICUREZZA	€ 1.873.482,89	€ 39.373,97	€ 495.147,07	€ 370.089,97	€ 2.578.104,00
3	ONERI DI CONCESSIONE (6% DI 1)	€ 2.214.174,15	€ 62.095,12	€ 655.121,85	€ 489.660,63	€ 3.411.051,77
(A)	TOTALE LAVORI + SICUREZZA + ONERI DI CONCESSIONE	€ 49.789.569,54	€ 989.721,12	€ 12.068.966,34	€ 9.020.761,16	€ 62.840.018,27
4	ESPROPRIAZIONI	€ 1.241.144,26	€ 37.734,60	€ 474.535,02	€ 354.683,82	€ 2.108.098,00
5	ONERI PER ELIMINAZIONE INTERFERENZE	€ 127.683,13	€ 9.704,65	€ 122.040,76	€ 91.217,46	€ 350.646,00
6	IMPREVISTI	€ -	€ 89.688,37	€ 1.253.630,40	€ 937.006,55	€ 2.260.325,32
7	SPESE GENERALI (4%)	€ -	€ 98.979,32	€ 1.344.713,75	€ 930.341,03	€ 2.274.035,00
8	PREZZO CHIUSO EX ART. 133 D. L.GS. 163/2006	€ -	€ 5.557,69	€ 74.920,87	€ 55.898,44	€ 136.877,00
(B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 1.368.827,39	€ 292.654,93	€ 3.169.849,89	€ 2.369.246,20	€ 7.158.981,73
	FABBISOGNO DI CASSA TRIMESTRALE	€ 42.159.397,03	€ 1.211.786,05	€ 15.239.807,13	€ 11.389.909,36	€ 70.000.000,00
	FABBISOGNO DI CASSA PER ANNO	€ 42.159.397,03	€ 27.840.602,54			€ 70.000.000,00

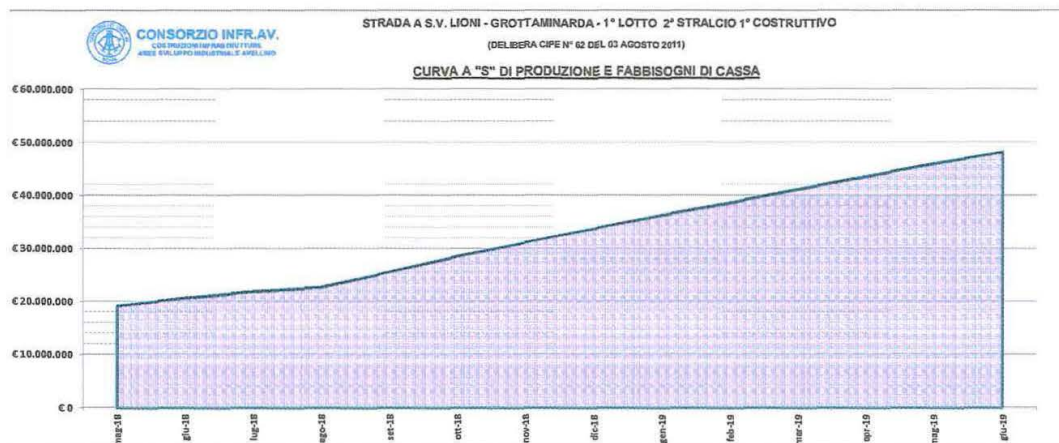

	CONSUNTIVO AD APRILE 2016	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	TOTALE A FINIRE	TOTALE GENERALE	
1	IMPORTO LAVORI	€ 17.757.970,62	€ 2.910.145,38	€ 4.544.499,45	€ 8.224.751,30	€ 7.418.212,85	€ 5.951.499,87	€ 30.359.105,86	€ 45.117.076,48
2	ONERI SPECIALI DI SICUREZZA	€ 1.108.702,47	€ 161.692,58	€ 302.462,42	€ 513.505,71	€ 463.150,14	€ 434.635,44	€ 1.895.448,29	€ 3.004.148,78
3	ONERI DI CONCESSIONE (6% DI 1)	€ 1.085.478,24	€ 174.609,07	€ 290.870,55	€ 493.499,07	€ 445.093,67	€ 417.690,65	€ 1.821.550,01	€ 2.897.026,25
(A)	TOTALE LAVORI + SICUREZZA + ONERI DI CONCESSIONE	€ 19.932.151,33	€ 3.266.447,03	€ 5.437.832,41	€ 9.231.743,83	€ 8.326.456,86	€ 7.813.822,97	€ 34.676.102,16	€ 54.008.253,49
4	ESPROPRIAZIONI	€ 665.442,31	€ 109.248,84	€ 181.865,81	€ 308.762,77	€ 278.484,77	€ 261.339,34	€ 1.139.701,53	€ 1.805.143,84
5	ONERI PER ELIMINAZIONE INTERFERENZE	€ 168.321,89	€ 14.257,08	€ 23.733,68	€ 40.393,83	€ 36.342,92	€ 34.105,03	€ 148.732,11	€ 317.054,00
6	IMPREVISTI	€ -	€ 175.405,96	€ 291.897,13	€ 495.738,27	€ 447.125,01	€ 419.596,93	€ 1.829.863,30	€ 1.829.863,30
7	SPESE GENERALI (4%)	€ -	€ 184.495,36	€ 307.126,19	€ 521.427,03	€ 470.284,67	€ 441.340,11	€ 1.924.695,37	€ 1.924.695,37
8	PREZZO CHIUSO EX ART. 133 D. L.GS. 163/2008	€ -	€ 11.023,60	€ 18.350,82	€ 31.155,28	€ 28.100,12	€ 26.370,08	€ 115.000,00	€ 115.000,00
(B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 833.784,20	€ 494.436,85	€ 823.675,78	€ 1.387.377,18	€ 1.260.347,09	€ 1.182.751,49	€ 5.157.982,31	€ 5.991.746,51
	FABBISOGNO DI CASSA TRIMESTRALE		€ 3.760.877,87	€ 6.260.705,12	€ 16.829.120,27	€ 9.586.803,75	€ 8.996.574,46	€ 39.234.084,47	€ 60.000.000,00
	FABBISOGNO DI CASSA PER ANNO		€ 20.650.706,25			€ 18.583.378,21		€ 39.234.084,47	€ 60.000.000,00
	FABBISOGNO DI CASSA PER ANNO IN CIFRA TONDA	€ 20.765.915,53	€ 21.000.000,00			€ 18.234.084,47			€ 60.000.000,00

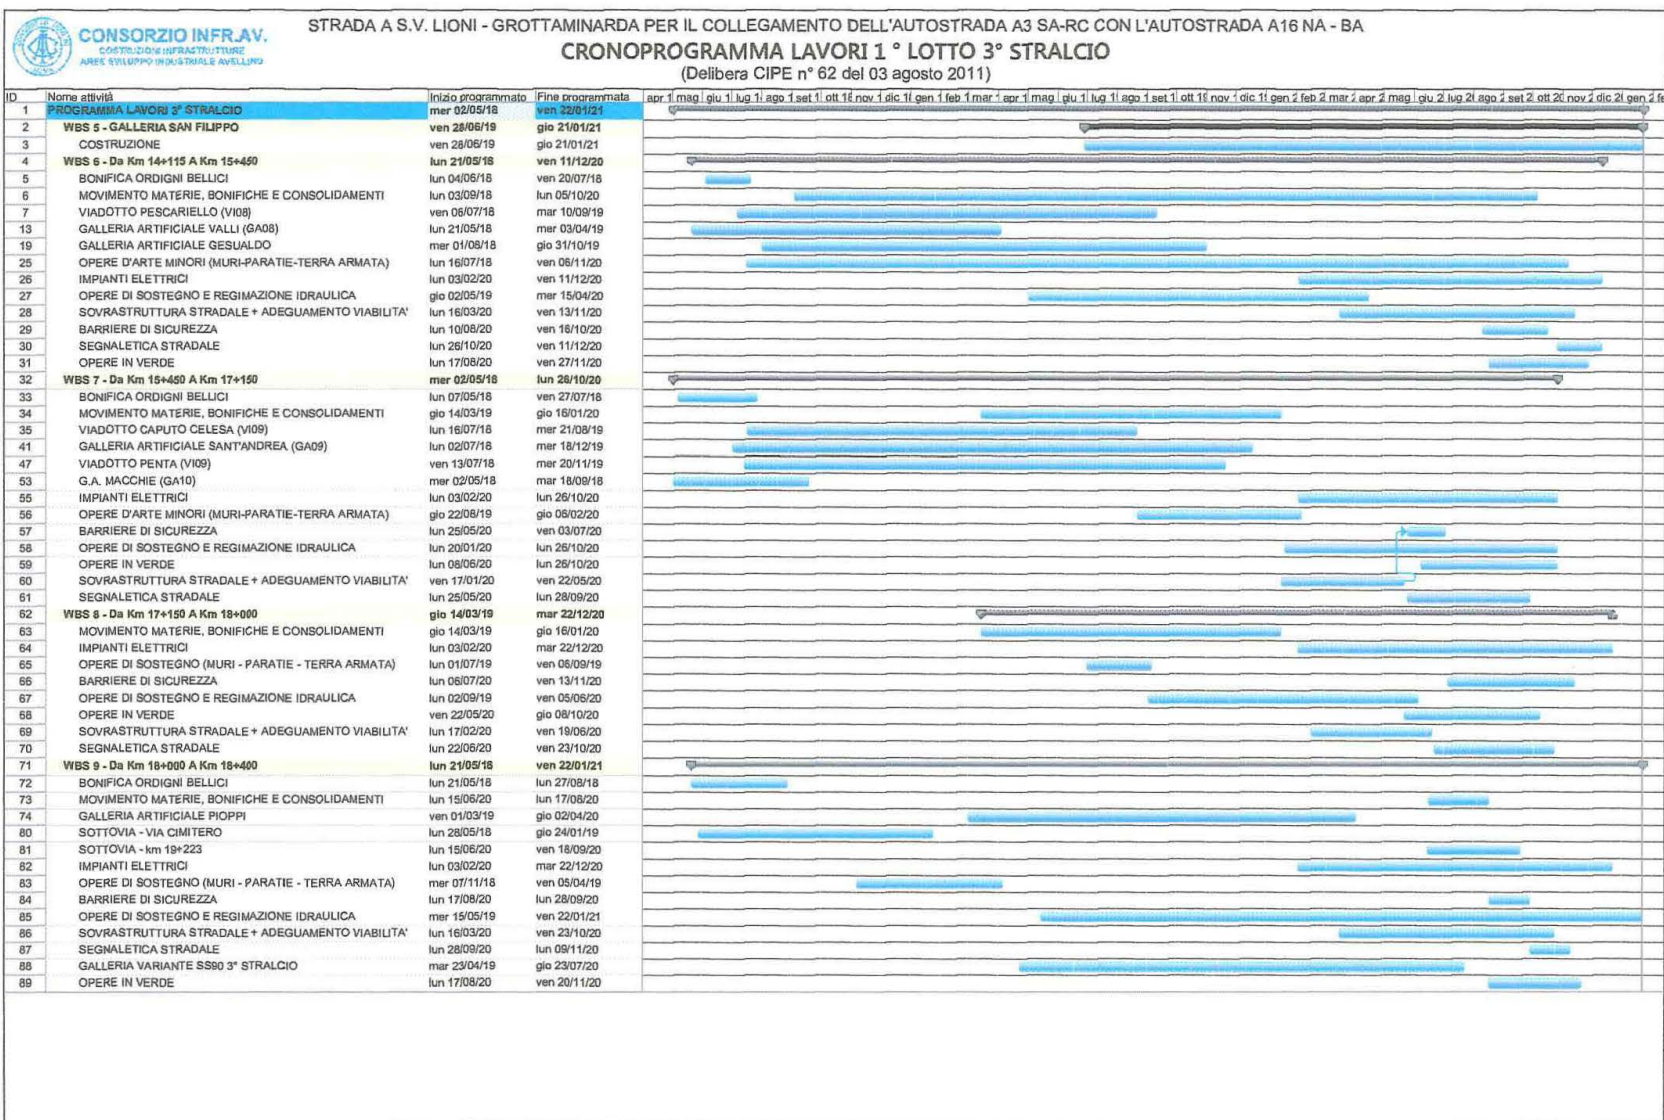



		CONSUNTIVATO	2° TRIMESTRE	1° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	1° TRIMESTRE	TOTALE A FIDURE	TOTALE GENERALE
1	IMPORTO LAVORI	€ 161.335,47	€ 988.742,43	€ 7.392.073,99	€ 7.689.254,86	€ 7.727.155,36	€ 8.949.795,81	€ 9.962.633,52	€ 7.015.375,17	€ 8.360.812,73	€ 7.072.575,24	€ 8.484.616,33	€ 4.636.272,75	€ 747.771,36	€ 75.935.179,95	€ 76.997.519,42
2	ONERI SPECIALI DI SICUREZZA	€ 6.529,33	€ 23.629,82	€ 299.161,92	€ 311.165,43	€ 313.129,86	€ 352.163,23	€ 362.723,49	€ 289.916,84	€ 297.426,13	€ 288.231,81	€ 343.395,23	€ 199.727,63	€ 30.262,81	€ 3.085.135,30	€ 3.075.687,63
3	ONERI DI CONCESSIONE (5% DI 1)	€ 9.695,11	€ 35.324,61	€ 443.524,44	€ 481.355,89	€ 484.231,12	€ 535.927,44	€ 537.759,01	€ 400.922,76	€ 391.848,76	€ 404.354,81	€ 509.665,68	€ 260.176,97	€ 44.866,32	€ 4.662.170,65	€ 4.669.850,65
(A)	TOTALE LAVORI + SICUREZZA + ONERI DI CONCESSIONE	€ 177.544,91	€ 947.696,85	€ 8.134.759,35	€ 8.481.576,18	€ 8.514.516,34	€ 9.847.881,28	€ 10.863.116,02	€ 7.726.213,77	€ 8.993.887,23	€ 7.765.161,28	€ 9.337.687,24	€ 5.102.176,74	€ 822.961,85	€ 83.682.485,90	€ 84.743.033,68
4	ESPROPRIAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ 600.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 115.892,00	€ 3.916.892,00	€ 3.916.892,00
5	ONERI PER ELIMINAZIONE INTERFERENZE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ 234.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 634.700,00	€ 634.700,00
6	IMPREVISTI	€ -	€ 22.091,20	€ 276.867,85	€ 297.999,04	€ 299.793,89	€ 336.174,19	€ 336.692,97	€ 282.758,86	€ 299.242,28	€ 294.901,12	€ 317.765,83	€ 191.141,10	€ 34.062,32	€ 2.946.463,44	€ 2.946.463,44
7	SPERE GENERALI (4%)	€ -	€ 23.548,74	€ 289.682,76	€ 297.876,59	€ 299.487,41	€ 337.981,62	€ 338.505,34	€ 289.815,17	€ 294.432,51	€ 292.903,01	€ 329.387,09	€ 193.450,91	€ 36.364,26	€ 3.028.900,60	€ 3.028.900,60
8	PREZZO CHIUSO EX ART. 133 D. L.GS. 18/3/2008	€ -	€ 1.162,03	€ 14.590,10	€ 15.176,69	€ 15.271,28	€ 17.882,68	€ 17.889,59	€ 13.946,00	€ 12.554,85	€ 13.958,49	€ 16.746,62	€ 9.545,59	€ 1.794,26	€ 150.000,00	€ 150.000,00
(B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ -	€ 48.762,97	€ 597.149,90	€ 1.010.746,31	€ 1.014.889,48	€ 1.745.899,48	€ 1.511.889,60	€ 757.226,02	€ 795.226,43	€ 791.763,62	€ 873.324,65	€ 264.137,69	€ 199.169,25	€ 18.987.936,04	€ 18.987.936,04
	FABBISOGNO DI CASSA TRIMESTRALE	€ 177.544,91	€ 994.857,83	€ 8.731.909,25	€ 9.492.556,49	€ 10.329.897,84	€ 11.593.766,76	€ 12.375.892,99	€ 8.477.459,38	€ 9.796.119,25	€ 8.564.834,97	€ 10.211.061,74	€ 5.366.313,74	€ 1.012.992,60	€ 94.843.448,98	€ 94.829.619,58
FABBISOGNO DI CASSA PER ANNO			€ 19.066.689,49				€ 41.774.399,97				€ 32.387.417,51			€ 1.912.992,60		
FABBISOGNO DI CASSA PER ANNO IN CIFRA TONDA			€ 19.100.000,00				€ 41.800.000,00				€ 32.400.000,00			€ 920.990,00		€ 94.220.990,00
