

Cavalino

Ca' Savio - Area PIP

7

Opere di urbanizzazione primarie e servizio degli insediamenti di attività produttive.

	progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati	
				7.378	
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	5.378	5.378	4.565	4.397
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	2.000	2.000	1.863	1.863
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		7.378	7.378	6.428	6.260

Terraferma

Bissuola - Deposito ACTV

8

Nuova edificazione e urbanizzazione del nuovo deposito automobilistico dell'A.C.T.V.

		progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
						6.800
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-'95-'96	6.800	6.800	6.399	6.399	
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98					
	1998					
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999					
TOTALE		6.800	6.800	6.399	6.399	

Terraferma

Piave - Via Torino, SS. 11

9

Costruzione di un nuovo ponte viario che scavalcando il Canal Selso e la rete ferroviaria congiunge la SS 11 con Via Torino.

	progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati	
			14.743		
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	13.954	10.361	592	540
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	789			
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		14.743	10.361	592	540

Terraferma **Piave - Mercato Ortofrutticolo (canal Saiso - v. Torino)**

10

Opere di urbanizzazione e messa a norma degli impianti.

		progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				1.500
Legge	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	1.500	1.500	1.410
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97			
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98			
	1998			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999			
TOTALE		1.500	1.500	1.410

Terraferma **Accessibilità e riordino urbanistico**

11

Opere di urbanizzazione asse S.S. 11 - Parco Scientifico Tecnologico - Via Torino polo nuovo insediamento Università - Forte Marghera

		progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				20.000
Legge	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96			
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97			
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98			
	1998	10.000	10.000	
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	10.000	10.000	
TOTALE		20.000	20.000	0

Terraferma **Marghera - Area PIP Cà Emiliani**

12

Ectopropri ed opere di urbanizzazione al servizio delle attività produttive.

		progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				2.472
Legge	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	2.408	2.408	2.297
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	64	64	64
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98			
	1998			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999			
TOTALE		2.472	2.472	2.361

Terraferma Marghera - Area CIPi Sartori

13

Acquisizione dell'area destinata ad insediamenti produttivi previsti dal P.R.G. di Marghera.

		progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					13.000
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	13.000	13.000	12.736	12.736
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998				
	1999				
TOTALE		13.000	13.000	12.736	12.736

Terraferma Marghera - Parco Scientifico Tecnologico

14

Acquisizione degli immobili (superficie scoperta e manufatti).

		progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					4.230
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	3.750	3.750	3.552	3.552
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	480			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998				
	1999				
TOTALE		4.230	3.750	3.552	3.552

Terraferma Marghera - Via F.lli Bandiera

15

Interventi di urbanizzazione.

		progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					2.347
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	1.557	1.500	1.434	1.434
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	790	705	585	585
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998				
	1999				
TOTALE		2.347	2.205	2.019	2.019

Terrafirma Marghera - 43 ettari
16

Acquisizione dell'area destinata ad insediamenti produttivi e realizzazione opere di urbanizzazione primaria primo stralcio.

		progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati
				2.992	2.493

Terrafirma Marghera - Porto Marghera ex Sima
17

Piano di Recupero per area ex industriale.

		progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati
			4.084		
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	124	124	124	124
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	1.960	1.960	1.960	76
	1998	2.000			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		4.084	2.084	2.084	200

Terrafirma Fusina - Stazione travaso compattazione AMAV
18

Area di interscambio acqua-gomma dei mezzi di trasporto e compattazione dei rifiuti diretti alle discariche o all'inceneritore.

		progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati
					4.000
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	4.000	4.000	4.000	4.000
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		4.000	4.000	4.000	4.000

Terrafirma - Marghera - Opere urbanizzazioni portuali

Accordo di programma: Comune - Autorità portuale

		progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati	
			10.240		
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	240	240		
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	5.000	5.000	5.000	2.802
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	5.000	5.000		
	1999				
TOTALE		10.240	10.240	5.000	2.802

Acquisizioni e urbanizzazioni varie

		progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati	
		1.814			
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	225	225	225	225
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	1.589	1.028		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998				
	1999				
TOTALE		1.814	1.253	225	225

Varie


	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati		
			2.005		
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	1.450	1.450	1.450	1.450
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	555	555	555	
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		2.005	2.005	2.005	1.450

QUADRO FINANZIARIO - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

	Annuale	Programmato	Impegnato	%	Obbligato	%	Speso	%
		A	B	B/A	C	C/A	D	D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	64.353	60.514	94,03%	48.545	75,44%	44.499	69,15%
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	6.782	6.782	100,00%	6.782	100,00%	3.383	49,88%
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	23.055	19.734	85,60%	14.455	62,70%	8.268	35,86%
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	27.100	23.078	85,16%	1.324	4,89%	155	0,57%
	1999	12.000	12.000	100,00%				
TOTALE		133.290	122.108	91,61%	71.106	53,35%	56.305	42,24%

STATO AVANZAMENTO - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
1.109	43.638	30.366	58.191
1%	8%	25%	44%

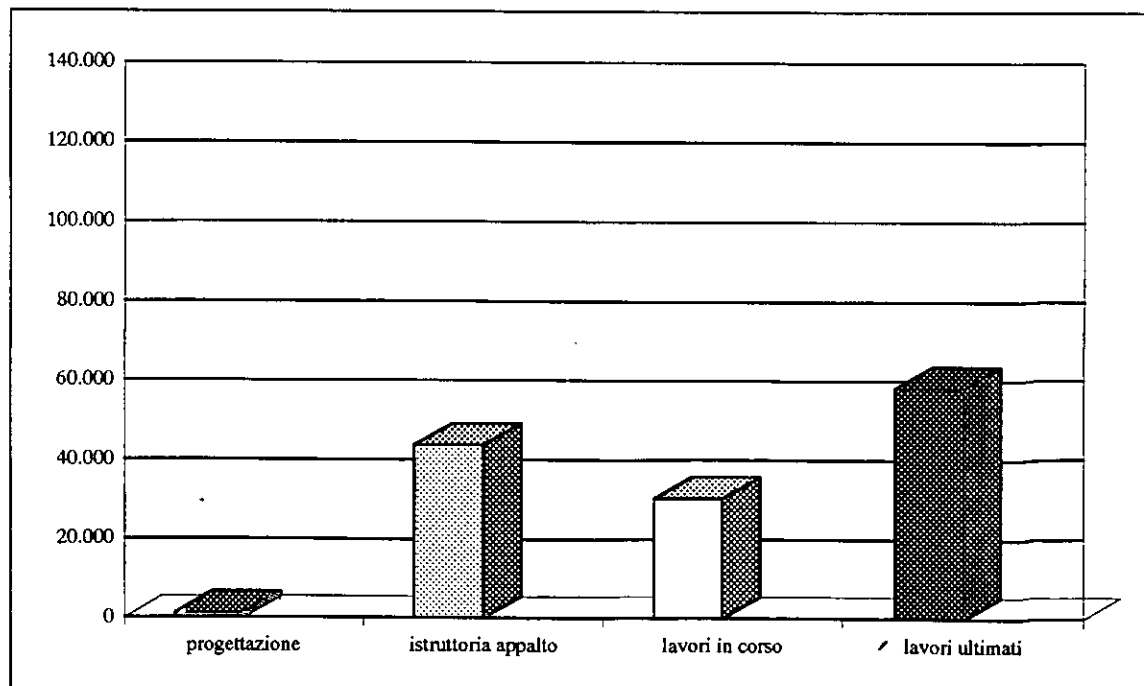

(importi in milioni)

COMUNE DI CHIOGGIA

STANZIAMENTI LEGGI: 798/84 - 910/86 - 67/88 - 360/91 - 139/92 - 539/95 - 515/96 - 345/97 - 296/98

LEGGE	ESERCIZI DI RIF.	STANZIAMENTO	EROGATO	DA EROGARE	IMPEGNATO	DISPONIBILITÀ	MANDATI EMESSI
L. 798/84	1984-1985-1986	20.250.000.000	20.250.000.000	*****	20.240.530.902	9.469.098	
L. 910/86	1987-1988-1989	25.500.000.000	25.500.000.000	*****	25.461.908.148	38.091.852	
L. 67/88	88/90/91/92/94	11.976.900.000	11.976.900.000	*****	11.122.808.341	854.091.659	
TOTALI LEX 798 - 910 - 67		57.726.900.000	57.726.900.000	*****	56.825.247.391	901.652.609	45.749.501.286
L. 960/91	1991	4.350.000.000	4.350.000.000	*****	4.349.596.092	403.908	3.608.376.932
L. 139/92 - 1°	ANNO 1992	32.497.892.295	32.497.892.295	*****	32.497.892.295	*****	22.308.277.522
L. 139/92 - 2°	ANNO 1993	12.656.329.974	12.656.329.974	*****	12.656.329.974	*****	9.699.081.682
L. 139/92 - 3°	ANNO 1995	11.945.619.875	11.945.619.875	*****	11.945.619.875	*****	1.215.163.792
L. 139/92 - 4°	ANNO 1996	12.000.000.000	2.988.993.212	9.010.006.788	12.000.000.000	*****	2.029.993.212
TOTALI LEX 139/92		68.099.842.144	60.089.835.358	9.010.006.788	69.099.842.144	*****	35.253.516.208
L. 539/95 - 1°	ANNO 1996	10.000.000.000	3.865.000.000	6.335.000.000	10.000.000.000	*****	665.000.000
L. 539/95 - 2°	ANNO 1997	18.000.000.000	213.800.784	17.786.200.000	18.000.000.000	*****	213.800.784
TOTALI LEX 539/95		28.000.000.000	3.878.800.000	24.121.200.000	28.000.000.000	*****	878.800.784
L. 515/96 - 1°	ANNO 1997	58.000.000.000	1.472.111.093	56.527.888.907	58.000.000.000	*****	1.472.111.093
L. 515/96 - 2°	ANNO 1998	32.000.000.000	*****	32.000.000.000	32.000.000.000	*****	*****
TOTALI LEX 515/96		90.000.000.000	1.472.111.093	88.527.888.907	90.000.000.000	*****	1.472.111.093
L. 345/97 - 1°	ANNO 1998	19.000.000.000	960.000.000	18.040.000.000	19.000.000.000	*****	960.000.000
L. 345/97 - 2°	ANNO 1999	27.000.000.000	*****	27.000.000.000	27.000.000.000	*****	*****
TOTALI LEX 515/98		46.000.000.000	960.000.000	45.040.000.000	46.000.000.000	*****	960.000.000
L. 296/98 - 1°	ANNO 1999	2.500.000.000	*****	2.500.000.000	2.500.000.000	*****	*****
TOTALE FINANZIAMENTI		297.678.742.144	128.477.646.449	169.199.095.695	296.774.635.627	902.056.517	87.922.306.303



UNIVERSITÀ
CA' FOSCARI
DI VENEZIA

DIVISIONE SERVIZI TECNICI
Direttore

Wolf Ferrari, 10 giugno 1999

Prot. n. 261

Ministero dei Lavori Pubblici
Magistrato alle Acque


VENEZIA

Oggetto: Richiesta dati

Facendo seguito alla Vostra nota prot. n. 118/GAB del 5 maggio 1999,
si inviano allegati i prospetti relativi a quanto richiestoci.

Distinti saluti

Il Coordinatore Generale
Direttore Divisione Servizi Tecnici
(Dott. Ing. A. Lo Cascio)



Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 139/92	34.835.929.049			
	mutuo I.M.I.	25.347.333.394			
1	Informatizzazione Ateneo e delle Biblioteche		5.219.250.912	5.219.250.912	5.219.250.912
2	S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		6.163.082.929	6.163.082.929	6.163.082.929
3	S.Giobbe fase "C" - e "B" 1° stralcio		712.476.315	712.476.315	712.476.315
4	Zattere - acquisto SCI		10.260.000.000	10.260.000.000	9.677.800.000
5	Opere varie manutenz. straordinaria		2.345.043.328	2.345.043.328	2.344.506.422
6	Ca' Zorza - acquisto 3° piano		647.479.910	647.479.910	647.479.910
	mutuo B.N.L.	9.488.595.655			
1	S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		1.780.547.066	1.780.547.066	1.780.547.066
2	Ca' Bembo - acquisto		2.905.860.880	2.905.860.880	2.905.860.880
3	Zattere - acquisto Star Gas 1		2.500.880.759	2.500.880.759	2.500.880.759
4	Zattere - acquisto Star Gas 2		2.301.306.950	2.301.306.950	2.301.306.950
	TOTALE		34.835.929.049	34.835.929.049	34.253.192.143

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 539/95	17.090.000.000			
	mutuo CREDIOP	8.728.000.000			
1	S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		5.636.912.432	5.636.912.432	4.470.093.771
2	S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		201.614.280	0	0
3	Opere di manutenzione straordinaria		719.407.959	719.407.959	719.407.959
4	S.Marta fabb. "C" 1° stralcio Compl.		367.057.539	367.057.539	367.057.539
5	Ca' Garzoni e Moro - Ristrutt. e adeg. norme sicurezza e prev. incendi		1.496.779.508	1.496.779.508	1.496.779.508
6	S.Marta fabbr. "C" - 2° str. restauro e adeguamento funzionale		306.228.282	306.228.282	0
			8.728.000.000	8.526.385.720	7.053.338.777
	mutuo INTERBANCA	8.362.000.000			
1	S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		4.056.074.595	0	0
2	S. Giobbe Poste - restauro e adeguamento funzionale		1.000.000.000	0	0
3	Opere varie manutenz. straor.		716.834.390	716.834.390	0
4	Via Torino - Facoltà di SS.MM.FF		1.874.493.236	0	0
5	Via Torino - Capannoni		691.817.094	691.817.094	0
6	S.Marta - Aula Teatro		22.780.685	22.780.685	0
	TOTALE		8.362.000.000	1.431.432.169	0

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 515/96	34.000.176.000			
mutuo MEDIO CREDITO	21.210.176.000			
1 S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		13.710.176.000		0
2 Zattere Capannone		5.000.000.000	5.000.000.000	196.134.653
3 Attuazione D.Lgs 626/94		2.500.000.000	281.658.295	85.909.800
mutuo CREDIOP	12.790.000.000			
1 S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		11.790.000.000	0	0
2 Zattere Capannone		1.000.000.000	0	0
TOTALE		34.000.176.000	5.281.658.295	282.044.453
OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 345/97	31.900.000.000			
mutuo CREDIOP	31.900.000.000			
1 S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		10.527.000.000		0
2 Ca'Foscari - restauro		10.527.000.000		
3 Acquisto edifici		8.613.000.000		
4 Manutenzione straordinaria		2.233.000.000	582.784.100	548.023.493
TOTALE		31.900.000.000	582.784.100	548.023.493

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 67/88 - Fondi Ministeriali	25.000.000.000			
1 S. Sebastiano - Restauro e adeguamento funzionale		2.500.000.000	2.343.000.000	2.195.000.000
2 S. Margherita - Restauro e adeguamento funzionale		3.000.000.000	2.975.800.000	2.556.000.000
3 Ca' Garzoni e Moro - Ristrutt. e adeg. norme sicurezza e prev. incendi		3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
4 Ca' Foscari - Ristrutturazione e adeguamento funzionale		574.000.000	574.000.000	491.000.000
5 S. Marta - Ristrutturazione e adeguam. funzionale dei laborat. chimici		5.400.000.000	5.394.448.889	5.208.000.000
6 Calle dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		4.900.000.000	4.891.173.981	2.157.000.000
7 Palazzo Nani Mocenigo - Restauro e adeguamento funzionale		1.524.000.000	1.523.920.000	144.000.000
8 Ca' Cappello - Restauro e adeguamento funzionale		500.000.000	500.000.000	485.000.000
9 Wolf Ferrari - Restauro e adeguamento funzionale		500.000.000	500.000.000	500.000.000
10 Celestia - Ristrutturazione e adeguamento funzionale		1.102.000.000	1.101.282.140	1.066.000.000
11 Restauro e adeguamento funzionale di S.Giobbe e altri edifici		2.000.000.000	2.000.000.000	1.565.000.000
TOTALE		25.000.000.000	24.803.625.010	19.367.000.000
OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 331/85 Fondi Ministeriali	12.160.000.000			
Edilizia Generale e Dipartimentale	11.330.000.000			
1 lavori noppi/c.p.i. (+rev. prezzi)		11.330.000.000	10.660.090.055	10.145.000.000
Edilizia Sportiva	830.000.000			
1 Calle dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		830.000.000	830.000.000	830.000.000
TOTALE		12.160.000.000	11.490.090.055	10.975.000.000

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 407/89 Fondi Ministeriali	10.900.000.000			
Edilizia Generale e Dipartimentale	10.000.000.000			
1 Via Torino - Manutenzione e adeguamento funzionale del capannone		5.000.000.000	4.976.978.690	4.459.000.000
2 S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Edilizia Sportiva	900.000.000			
1 Calle dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		900.000.000	900.000.000	900.000.000
TOTALE		10.900.000.000	10.876.978.690	10.359.000.000
OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 725/94 Fondi Ministeriali	2.419.000.000			
Edilizia Generale e Dipartimentale	2.338.000.000			
1 S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		2.000.000.000	2.000.000.000	0
2 S. Sebastiano - restauro		388.000.000	0	0
Edilizia Sportiva	31.000.000			
1 Calle dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		31.000.000	0	0
TOTALE		2.419.000.000	2.000.000.000	0

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 550/95 Fondi Ministeriali	3.299.000.000			
Edilizia Generale e Dipartimentale	3.131.000.000			
1 S.Marta teatro G.Poli - restauro e adeguamento funzionale		1.467.645.889	1.467.645.889	167.588.597
2 Via Torino - Manutenzione e adeguamento funzionale del capannone		518.309.448	518.309.448	
3 Via Torino - Facoltà SS.MM.FF		481.690.552	481.690.552	
4 S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		663.354.111	663.354.111	583.354.111
Edilizia Sportiva	168.000.000			
1 Via Torino -Impianti sportivi		36.726.111		0
2 Calle dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		131.273.889	131.273.889	0
TOTALE		3.299.000.000	3.131.000.000	750.942.708
OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 663/96 Fondi Ministeriali	2.357.000.000			
Edilizia Generale e Dipartimentale	2.243.000.000			
1 Attuazione D.Lgs. 626/94		1.000.000.000	447.226.248	68.482.098
2 S.Giobbe Fase "A"		1.000.000.000	1.000.000.000	122.916.709
3 Via Torino - Capannone		243.000.000	243.000.000	
Edilizia Sportiva	168.000.000			
1 Calle dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		114.000.000	114.000.000	0
TOTALE		2.357.000.000	1.804.226.248	191.398.807

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1998

LEGGE 331/85 - Fondi Ministeriali

Edilizia Generale e Dipartimentale

1) LAVORI NOPPI/C.P.I. (e revisione prezzi)

Edilizia Sportiva

1) CALLE DEI GUARDIANI - Il finanziamento è destinato alla realizzazione parziale ed al risanamento di alcuni capannoni da adibire a palestra polivalente. E' in corso il montaggio della copertura. La Direzione Lavori sta predisponendo la perizia di variante per realizzare una tribuna per spettatori all'interno del complesso sportivo.
