

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. CCV
n. 2**

RELAZIONE

**SULL'ELENCO DELLE OPERE CONNESSE AI GIOCHI
OLIMPICI INVERNALI «TORINO 2006», SULLA
DESTINAZIONE FINALE DELLE MEDESIME E SULLO
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI**

(Aggiornata al 31 dicembre 2006)

*(Articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
e successive modificazioni)*

Presentata dal Ministro delle infrastrutture

(DI PIETRO)

Trasmessa alla Presidenza il 18 luglio 2007

PAGINA BIANCA



Ministero delle Infrastrutture

*Dipartimento per le Infrastrutture Statali, l'Edilizia e per la Regolazione dei Lavori Pubblici
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali*

OGGETTO: Legge 9.10.2000 n. 285 – Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali di Torino.

PREMESSE NORMATIVE

La Legge 285/2000 e successive modificazioni ed integrazioni detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX giochi Olimpici invernali "Torino 2006".

La succitata legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei giochi Olimpici sulla base delle valutazioni di connessione dichiarate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa col Presidente della Regione Piemonte, d'intesa con gli Enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei giochi Olimpici.

L'art. 1 della Legge n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni prevede tra l'altro che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relazioni al Parlamento ogni anno "sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato d'avanzamento dei lavori".

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ESEGUITI

Con D.P.G.R. Piemonte n. 51 del 26.6.2002 sono state individuate le opere da considerarsi connesse ai Giochi Olimpici distinte in prioritarie e inseribili. I criteri per la definizione di un'opera connessa ai giochi sono stati stabiliti dalla regione Piemonte con delibera di Giunta del 25.6.2002. Sui succitati interventi proposti questo Ministero interpellato dall'allora Ministro per la Funzione Pubblica ha espresso il parere che sostanzialmente gli stessi erano in linea con i criteri di valutazione della convenzione stabilita nel D.P.G.R. Piemonte del 25.6.2002.

Premesso quanto sopra con D.P.C.M. del 18.12.2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati dichiarati i succitati interventi prioritari connessi con i giochi Olimpici Invernali per un finanziamento complessivo a carico dello Stato di 238 milioni di Euro.

Successivamente con D.P.C.M. 6.6.2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati individuati i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse.

Con D.P.C.M. del 15.9.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state ripartite le risorse per il finanziamento delle opere connesse individuate ad esclusione di quelle

contraddistinte dai numeri tra 50 e 63 compresi e relative ad interventi sul sistema fognario, acquedotti e collettori.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. del 16.1.2004 ha indicato i soggetti attuatori degli interventi sopraccitati e dichiarati *“temporalmente differibili e attuabili esclusivamente a seguito di sopravvenute disponibilità finanziarie le opere contrassegnate dai nn. 4, 5, 10, 16, 20, 22, 23 e 64 di cui agli allegati 1 del D.P.C.M. 18.12.2002 e D.P.C.M. del 6.6.2003”*.

Il D.P.C.M. del 9.4.2004 di finanziamento degli interventi sul sistema fognario acquedotti - collettori è stato predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sullo stesso è stato dato parere favorevole per quanto di competenza di questo Dicastero.

Con legge n.311 del 30.12.2004 è stato autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post-olimpico.


Le opere differite si sono poi ridotte da 8 a 1, la n. 64 Museo delle Olimpiadi.


Sono state annullate 8 opere per indisponibilità aree idonee, difficoltà progettuali, rimodulazione interventi ed altro.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE CONNESSE

Per quanto riguarda, infine, l'elenco delle opere connesse, la destinazione finale delle stesse e lo stato d'avanzamento dei lavori, si allega in dettaglio il sintetico e puntuale promemoria trasmesso dall'Agenzia Torino 2006 che svolge attività di monitoraggio sulle opere di che trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Celestino Lops)








Direzione Generale
Prot. 1880

Agenzia per lo svolgimento
dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
Cod. Fisc. 97607280019
Galleria San Federico 16
10121 Torino

Tel 011 5221212 • Fax 011 5221214
www.agenziatorino2006.it
agenzia@agenziatorino2006.it



Torino, 17 aprile 2007



Al Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti
Ing. Benedetto MERCURI

Oggetto: Legge 285/2000 Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 – Opere Connesse.

In allegato si trasmette promemoria sullo stato di attuazione delle opere in oggetto aggiornato al 31 dicembre 2006.

Cordiali saluti.

27-4-2007
Prof. Geronzi
h

Vice Direttore Generale
(Ing. Mario Piovano)

Allegati promemoria:

- monitoraggio dello stato di avanzamento al 31/12/2006
- relazione sullo stato di realizzazione aggiornamento al 31/12/2006


**OPERE CONNESSE AI XX GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI “TORINO 2006”**

***MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO
AL 31 DICEMBRE 2006***

Per la Regione Piemonte


Il Responsabile della Struttura Flessibile Torino 2006

Dott. Roberto Moiso



Il Coordinatore Operativo della Struttura Flessibile Torino 2006


Dott.ssa Giuliana Bottero



Per l'Agenzia Torino 2006

Il Direttore Generale dell'Agenzia Torino 2006

Ing. Mimmo Arcidiacono



INDICE

1 SITUAZIONE INTERVENTI SUDDIVISA PER OPERE PUNTUALI SUI SINGOLI ENTI LOCALI

- 1.1 AVIGLIANA
- 1.2 ALESSANDRIA
- 1.3 BARDONECCHIA
- 1.4 BIBIANA - LUSERNA
- 1.5 CASELLE
- 1.6 CESANA – SAN SICARIO
- 1.7 CHIOMONTE
- 1.8 CLAVIERE
- 1.9 CUNEO
- 1.10 FENESTRELLE
- 1.11 GIAVENO
- 1.12 NOVARA
- 1.13 OULX
- 1.14 ORBASSANO
- 1.15 PEROSA ARGENTINA
- 1.16 PINEROLO
- 1.17 POMARETTO
- 1.18 PORTE.
- 1.19 PRAGELATO
- 1.20 PRALI
- 1.21 RIVOLI
- 1.22 SAUZE DI CESANA
- 1.23 SAUZE D'OULX
- 1.24 SAVIGLIANO
- 1.25 SAN DIDERO

- 1.26 SAN GERMANO CHISONE
 - 1.27 SESTRIERE
 - 1.28 SUSÀ
 - 1.29 VILLAR PEROSA
 - 1.30 TORINO
 - 1.31 TORRE PELLICE
-
- 2 SITUAZIONE INTERVENTI OPERE A RETE
-
- 2.1 INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO, ACQUEDOTTI E COLLETTORI
 - 2.2 TORINO – PINEROLO: RADDOPPIO FERROVIARIO SELETTIVO
-
- 3 SINTESI ED ANALISI RELATIVE ALL'AVANZAMENTO LAVORI
-
- 3.1 Opere ultimate (% esecuzione lavori pari al 100%)
 - 3.2 Opere in corso di ultimazione (% esecuzione lavori compresa fra 80% e 99%)
 - 3.3 Opere in corso di realizzazione avanzata (% esecuzione lavori compresa fra 50% e 79%)
 - 3.4 Opere in corso di realizzazione avviate (% esecuzione lavori compresa fra 0% e 49%)
 - 3.5 Opere appaltate con lavori non ancora iniziati
 - 3.6 Opere in fase progettuale
 - 3.7 Opere temporalmente differite non riattivate
 - 3.8 Opere annullate

1 SITUAZIONE INTERVENTI SUDDIVISA PER OPERE PUNTUALI SUI SINGOLI ENTI LOCALI.

1.1 AVIGLIANA

(02.00) Variante di Avigliana ✓

L'opera, che ricade in quelle del dossier olimpico, ha una quota del finanziamento attribuita alle opere connesse e si presenta particolarmente complessa per la realizzazione di opere in galleria. I lavori sono iniziati a luglio 2004 e l'ultimazione è avvenuta il 18 dicembre 2006 e pertanto l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

(06.06) Progetto Paesaggio e arredo: ✓

L'opera prevede il restauro di due fabbricati e la realizzazione di un percorso pedonale e rotonda. I lavori iniziati nel mese di aprile 2005 sono stati terminati nel mese di gennaio 2006. L'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.2 ALESSANDRIA

(74.15) Logistica elisoccorso AO "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria: ✓

I lavori iniziati nel mese di giugno 2005 sono stati ultimati in data 7 luglio 2006 e pertanto l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.3 BARDONECCHIA .

(12.00) Ampliamento parcheggio esistente in località Biovej : il parcheggio utilizzato per l'evento olimpico è stato terminato e pertanto presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%. ✓

(14.00) Migliorie alle vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria - Viale Roma): ✓

I lavori su Viale Roma, iniziati nel mese di novembre 2004 sono stati ultimati e pertanto l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

I lavori per l'intervento su Viale Vittoria , iniziati nel mese di aprile 2005 sono stati ultimati e pertanto l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

Complessivamente l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

(16.00) Pista da fondo e percorso natura Oulx - Beaulard – Bardonecchia: opera temporalmente differita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 e del ✓

successivo DPCM del 16 gennaio 2004. L'opera è stata riattivata in data 18 aprile 2006 ed è in fase di realizzazione la progettazione definitiva.

(18.00) Realizzazione telecabina sei posti - Difensiva – Frejusia: l'impianto è entrato in funzione per la stagione invernale 2005/2006, il collaudo amministrativo è stato eseguito in data 30 agosto 2006 pertanto l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%. ✓

(41.00) Sopraelevazione argine sx e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e sistemazione Rio della Gorgia: I lavori sono stati appaltati ed inizieranno per ragioni climatiche nel mese di aprile 2007 e pertanto l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 0%. ✓

(42.00) Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico viale della Vittoria fronte Colonia Medail:

La conferenza dei servizi ha approvato il progetto definitivo in data 5 aprile 2006 ed è in corso la progettazione esecutiva che dovrebbe concludersi in data 15 gennaio 2007 con inizio lavori previsto ad aprile 2007. ✓

(43.00) Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemolles: la Conferenza dei Servizi ha approvato il progetto definitivo. Considerata la tipologia dell'opera (realizzazione di ponte alla confluenza di due torrenti) che richiede particolari tecnologie è in fase di preparazione il bando per l'appalto integrato che prevede l'aggiudicazione al 28 febbraio 2007. Inoltre la realizzazione dell'opera immediatamente prima dell'evento olimpico avrebbe comportato la chiusura dell'accesso alla cittadina di Bardonecchia per un lungo periodo non compatibile con la realizzazione dei cantieri olimpici (Villaggio Olimpico, Impianti di risalita, piste per lo Snowboard, ecc.) ✓

(44.00) Sistemazione torrente Rho: I lavori iniziati nel mese di maggio 2005 sono stati ultimati e pertanto l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%. ✓

(52.00) Realizzazione di rete fognaria, completamento impianto di depurazione: I lavori iniziati nel mese di febbraio 2005 sono stati ultimati in data 29 settembre 2006 e pertanto l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%. ✓

(74.03) Elisoccorso H 24 (riclassificato H12): l'intervento non è stato eseguito per mancanza di aree idonee e l'importo è stato assegnato all'intervento 75.07 cui era correlato. Tale modifica è stata ratificata con DPCM 20 ottobre 2005. ✓

(75.07) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: l'opera è diventata operativa al 31 dicembre 2005 e nella primavera 2006 sono state completate le finiture esterne pertanto l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%. ✓

1.4 BIBIANA - LUSERNA

(04.00) Variante fra Luserna S.G. e Bibiana - 1° LOTTO (denominato "Strada delle cave"): opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004. L'opera è stata riattivata nel suo complesso (compreso il 2° lotto non finanziato sulle opere connesse). L'intervento in oggetto è ritenuto da tutti i soggetti coinvolti di estrema importanza per i territori olimpici. Sono stati condotti numerosi incontri tra gli Enti locali della Val Pellice, la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Provincia di Torino nel corso dei quali si è registrato un comune intendimento nel ritenere fondamentale la realizzazione dell'opera.

Si riporta in sintesi per punti il percorso relativo all'opera:

- La Provincia di Torino, con deliberazione della giunta n. 354-78486/2004 del 23 marzo 2004 ha approvato il progetto preliminare generale dell'opera, composto da due lotti funzionali.
- Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte e l'Anas spa hanno stipulato, in data 11 marzo 2005 l'Accordo di Programma Quadro per il potenziamento delle infrastrutture dei Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006", tra i quali figura la variante in oggetto per l'importo di euro 9.300.000.
- La Provincia di Torino, con deliberazione della Giunta n. 292-71545/2005 del 22 marzo 2005, ha modificato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2005-2007, assegnando l'intervento al Dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione Viabilità II.
- L'intervento necessita della acquisizione della conformità urbanistica da parte dei comuni di Luserna, Lusernetta, Bibiana e Campiglione Fenile, che deve essere acquisita con le procedure accelerate di cui alla L.285/2000, in sede di Conferenza di Servizi autorizzatoria.
- Con D.G.P. n. 1661-453890 del 06/12/2005 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento.
- Con Deliberazione del Comitato di Regia per le Opere Olimpiche n. 151 del 13/12/2005 è stata disposta la riattivazione dell'intervento e si è preso atto che si sono resi nuovamente disponibili i 2.600.000 euro di finanziamenti statali.

- In data 23/01/2006 si è aperta la Conferenza di Servizi della Regione Piemonte, in tale sede è stato concordato di convocare il sopralluogo per il 03/03/2006 c/o il Comune di Lusernetta.
- La Regione Piemonte con lettera Prot.n. 1105/26.00/2006 del 26/01/2006 ha convocato per il giorno 08/02/2006, presso la sede della Direzione Regionale Trasporti, la seconda riunione della Conferenza di Servizi Definitiva, in tale sede il R.d.P. preso atto delle osservazioni emerse unanimemente conviene di sospendere la procedura al fine di consentire al proponente di predisporre le integrazioni previste dall'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i., la segreteria tecnica della Conferenza raccoglierà tutte le richieste di integrazione emerse e invierà nota al proponente per la predisposizione dei relativi atti; il proponente trasmetterà appena possibile le integrazioni richieste alla segreteria della Conferenza che provvederà a farle pervenire ai soggetti partecipanti alla Conferenza ed a inviare la convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della terza seduta di Conferenza.
- La Provincia di Torino, con D.G.P. n. 217-73714 del 14/03/2006, recependo le osservazioni della Conferenza di Servizi, ha riapprovato il progetto definitivo dell'intervento
- La Provincia di Torino con nota Prot.n. 84784 del 14/03/2006 ha trasmesso alla Regione Piemonte le integrazioni richieste dalla Conferenza chiedendo la riattivazione della stessa.
- La Regione Piemonte con lettera Prot.n. 3359/26.00/2006 del 22/03/2006 ha convocato per il giorno 07/04/2006, presso la sede della Direzione Regionale Trasporti, la terza riunione della Conferenza di Servizi Definitiva, in tale sede il R.d.P. si riserva di convocare un Organo Tecnico per valutare a seguito di ulteriori chiarimenti le determinazioni conclusive, anche in attesa dei pareri del CROP e della Commissione 91 Bis della L.R. 56/77 e s.m.i..
- La Regione Piemonte con lettera Prot.n. 5370/26.00/2006 del 12/05/2006 ha convocato per il giorno 29/05/2006, presso la sede della Direzione Regionale Trasporti, la quarta riunione della Conferenza di Servizi Definitiva, in tale sede si sospende il procedimento in attesa dei pareri che devono ancora pervenire.
- La Regione Piemonte con lettera Prot.n. 6788/26.00/2006 del 19/06/2006 ha convocato per il giorno 30/06/2006, presso la sede della Direzione Regionale Trasporti, la quinta riunione della Conferenza di Servizi Definitiva, in tale sede il R.d.P. conclude la Conferenza dichiarando che "preso atto di quanto emerso nei tempi

prescritti dalla L. 285/2000, valuterà se procedere alla richiesta della determinazione di conclusione del procedimento alla Presidente della Giunta Regionale o meno, per consentire la conclusione del procedimento previa eventuale deliberazione della Giunta Regionale, e che nel caso in cui non si ritenga di adire a tale procedura il procedimento verrà concluso in senso negativo.”

- La Provincia di Torino con Delibera del Consiglio Provinciale n.140-133756/2006 del 11/07/2006 ha approvato la terza variazione di Bilancio, che prevede il finanziamento dell’opera .
- La Regione Piemonte con D.G.R. n. 5-3526 del 01/08/2006 ha deliberato di ritenere superabile i dissensi espressi in sede di Conferenza di Servizi, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e di ritenere che sussistano le condizioni per una positiva conclusione del procedimento di approvazione del progetto definitivo.
- Il Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. 77 del 03/08/2006 ha approvato il progetto definitivo”S.P. n. 156 di Lusernetta – Realizzazione della variante tra Bibiana e Luserna S. Giovanni”.
- In data 6 dicembre 2006 sono state sottoscritte le intese tra Provincia di Torino e Regione Piemonte, tra Provincia di Torino e Provincia di Cuneo e tra Provincia di Torino e Comunità Montana Val Pellice.
- Alla data odierna è in corso di realizzazione la fase di progettazione esecutiva, si prevede l’affidamento dei lavori entro marzo 2007 e la fine dei lavori entro aprile 2009.

1.5 CASELLE

(03.00) Aeroporto di Caselle – interventi vari di miglioramento: l’intervento è stato suddiviso in due lotti funzionali: ✓

LOTTO 1 - Aeroporto: Interventi vari di miglioramento Ampliamento del corpo centrale dell’aerostazione passeggeri con nuove postazioni check-in, riconfigurazione aree interne, nuovo pontile di imbarco lato nord. Realizzazione del nuovo edificio Aviazione Generale e sistemazioni esterne.

LOTTO 2 - Aeroporto: Interventi vari di miglioramento Edificio per postazioni check-in remote, nuovo centro logistico bagagli, nuovi gate remoto sud, cunicoli per trasporto bagagli, centro servizi, collegamenti pedonali tra aerostazione e parcheggio, piazzale sosta aeromobili a servizio dell’aviazione generale, nuova sottocentrale tecnologica, sistemazioni esterne.

L'aeroporto è stato pienamente utilizzato per l'evento olimpico, nella primavera sono state ultimate alcune opere di finitura e sistemazione esterne, pertanto l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.6 CESANA – SAN SICARIO

✓ (08.00) **Collegamento SS 23 – San Sicario:** dopo la risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale con l'impresa aggiudicataria, i lavori sono stati affidati ad una nuova impresa che ha ripreso le attività su tutta la tratta ed ha ultimato le opere essenziali (asfaltatura) per rendere agibile la strada per l'evento olimpico. L'opera è conclusa e presenta un avanzamento lavori pari al 100%.

✓ (10.00) **Seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longa:** l'opera, che era stata sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158, nella seduta del 28 febbraio 2005 del Comitato di Regia ha avuto parere favorevole alla riattivazione. E' stata svolta la Conferenza dei Servizi che si è chiusa con esito positivo, è stata espletata la gara di appalto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 158/95 aggiudicata in data 4 febbraio 2006. I lavori sono iniziati in data 31 gennaio 2006 e l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 95%.

✓ (15.a) **Innevamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni:** I lavori sono iniziati in data 20 giugno 2003 e sono terminati in data 30 settembre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

✓ (17.00) **Seggiovia quadriposto Gimont/Colle Bercia:** è stata espletata la gara di appalto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 158/95 aggiudicata in data 4 febbraio 2006. I lavori sono iniziati in data 31 gennaio 2006 e l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 95%.

✓ (29.00) **Sistemazione e rifacimento paravalanghe località Sagnalonga:** l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

✓ (51.00) **Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto Comunale:** I lavori sono iniziati in data 23 novembre 2005 e l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 19%.

✓ (74.01) **Elisoccorso H 12:** l'intervento risulta annullato per indisponibilità di aree idonee.

1.7 CHIOMONTE

✓ (22.00) **Seggiovia biposto Chiomonte – Pian del Frai e sostituzione sciovia con seggiovia:**

(23.00) **Innevamento programmato e messa in sicurezza piste.**

L'intervento prevede un finanziamento unico fra i punti (22_00) e (23_00) ed è costituito dalla realizzazione di due impianti di risalita mentre le opere di innevamento programmato e messa in sicurezza piste sono parzialmente ricomprese negli altri due interventi. Le opere, che erano state sospese in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158, nella seduta del 28 febbraio 2005 del Comitato di Regia hanno avuto parere favorevole alla riattivazione.

Relativamente alla Seggiovia biposto Chiomonte – Pian del Frai è stata svolta la Conferenza dei Servizi che si è chiusa con esito positivo, è stata espletata la gara di appalto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 158/95 aggiudicata in data 9 giugno 2006. I lavori sono iniziati in data 24 agosto 2006 ed è previsto che terminino in data 15 agosto 2007. L'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 1%.

Relativamente alla sostituzione sciovia con seggiovia (denominata Frai - Sauzea) è stata svolta la Conferenza dei Servizi che si è chiusa con esito positivo, è stata espletata la gara di appalto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 158/95 aggiudicata in data 15 aprile 2006. I lavori inizieranno nella primavera 2007 per concludersi in tempo utile per la stagione invernale 2007/2008. L'opera che risulta aggiudicata presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 0%.

1.8 CLAVIERE

(30.00) **Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato:** E' conclusa positivamente la conferenza dei servizi definitiva con procedura di VIA. E' in corso la progettazione esecutiva e si prevede che i lavori inizieranno ad aprile 2007.

(31.00) **Sistemazione idraulica del Rio Gimont tratto terminale in prossimità dell'abitato e Rio Secco:** E' conclusa positivamente la conferenza dei servizi definitiva con procedura di VIA. L'opera è suddivisa in due lotti funzionali. Il 2° lotto ha richiesto anche l'autorizzazione delle autorità francesi. E' in corso la progettazione esecutiva e si prevede che i lavori inizieranno ad aprile 2007.

(54.00) **Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale:** i lavori iniziati in data 22 luglio 2005 hanno avuto un avanzamento ridotto sempre condizionati dal traffico sulla statale ove transitano i mezzi per il trasporto dello smarino della costruenda galleria (ANAS ha proibito a lungo tutti i lavori che interferiscono con la statale); l'intervento presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 17%.

(64.00) **Museo delle Olimpiadi:** opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

(74.12) **Elisoccorso H 12**: l'intervento risulta annullato per indisponibilità di aree idonee.

(75.04) **Servizio di soccorso medicalizzato terrestre**: I lavori iniziati nel mese di giugno 2005 sono stati ultimati a dicembre 2005 e pertanto l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.9 CUNEO

(74.08) **Elisoccorso H 24**: l'intervento risulta ultimato e collaudato pertanto l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.10 FENESTRELLE

(06.01) **Progetto Paesaggio e arredo (sistemazione aree esterne al Forte)**: l'intervento prevede la sistemazione delle aree esterne al Forte e la realizzazione di una scultura di luce. Le opere iniziate nei mesi di agosto e settembre 2005 sono state terminate e presentano uno stato di avanzamento lavori complessivo pari al 100%.

(46.00) **Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare dell'Assietta**: i lavori sono stati ultimati e pertanto le opere presentano uno stato di avanzamento complessivo pari a circa il 100%. Sono in corso ulteriori lavori aggiuntivi richiesti dal Parco.

(47.00) **Sistemazione parcheggio**: la Comunità Montana Val Chisone, con il DPCM del 20 ottobre 2005 è subentrata alla Provincia di Torino in qualità di stazione appaltante, ha espletato la gara di appalto che è stata aggiudicata in data 16 maggio 2006. I lavori sono iniziati in data 19 maggio 2006. Si prevede di ultimare i lavori nel mese di maggio 2007, pertanto la percentuale di avanzamento lavori è pari al 30%.

(48.00) **Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte**: I lavori, appaltati unitamente all'intervento 06.01 sono stati ultimati e pertanto le opere presentano uno stato di avanzamento complessivo pari al 100%.

1.11 GIAVENO

(66.00) **Centro sportivo polifunzionale**: I lavori sono iniziati in data 27 luglio 2004 e terminati in data 23 gennaio 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.12 NOVARA

(74.07) **Elisoccorso H 24**: I lavori sono ultimati e pertanto l'opera presenta uno stato di avanzamento pari al 100%.

1.13 OULX

- ✓ (16.00) **Pista da fondo e percorso natura Oulx - Beaulard – Bardonecchia:** opera temporalmente differita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004. L'opera è stata riattivata in data 18 aprile 2006 ed è in fase di realizzazione la progettazione definitiva.
- ✓ (32.00) **Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato e opere di ingegneria naturalistica:** la progettazione definitiva degli interventi è in corso da parte di ARPA Piemonte.
- ✓ (33.00) **Sistemazione pareti rocciose:** la progettazione definitiva degli interventi è in corso da parte di ARPA Piemonte.
- (67.00) **Stazione FS "Recupero ex-albergo Commercio- centro per i media-post olimpico Liceo della Neve:** Il Comune rinuncia alla realizzazione dell'opera trasferendo il liceo della neve e il centro media sull'intervento 68.00.
- ✓ (68.00) **Recupero ex-caserma Picco a ricettività para alberghiera (liceo neve post olimpico e centro media):** i lavori sono stati appaltati in data 3 maggio 2005 ma si è provveduto alla risoluzione del contratto con l'impresa per inadempienza. In data 4 gennaio 2007 sono stati riaffiliati i lavori.
- ✓ (69.00) **Recupero ex Municipio a ricettività para alberghiera:** I lavori sono iniziati in data 8 aprile 2005 e sono stati terminati in data 9 novembre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.
- ✓ (70.00) **Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni:** I lavori sono iniziati in data 24 ottobre 2005 e saranno terminati in data 31 marzo 2007, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 90%.
- ✓ (71.00) **Costruzione nuova palestra, progetto padiglione della neve e del ghiaccio:** l'opera è stata progettata ed ha svolto la conferenza dei servizi. Il progetto non è stato approvato poiché è entrata in vigore la nuova classificazione delle fasce fluviali della Dora Riparia che ha previsto per l'area una classificazione in fascia "A". A seguito di tale situazione sono in corso gli approfondimenti tecnici per riclassificare l'area.
- ✓ (75.05) **Servizio di soccorso medicalizzato terrestre:** le attrezzature previste sono state regolarmente acquistate ed installate. Pertanto l'opera presenta uno stato di avanzamento pari al 100%.

1.14 ORBASSANO

(74.11) **Elisoccorso H 24:** I lavori sono iniziati in data 4 aprile 2005 e sono terminati in data 12 gennaio 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

(77.00) **Centro antidoping di Orbassano:** il centro è stato utilizzato per l'evento olimpico e sono ultimate le forniture. L'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari a circa il 100%.

1.15 PEROSA ARGENTINA

(57.00) **Adeguamento depuratore:** intervento da vedersi integrato con interventi 57 -58-59-60 per i quali si rimanda al punto INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO, ACQUEDOTTI E COLLETTORI.

1.16 PINEROLO

(01.00) **SS 589 Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo-Piossasco:** i lavori sono in fase di realizzazione. La percentuale di avanzamento è di circa il 75%.

(06.02) **Progetto Paesaggio e arredo:** I lavori sono iniziati in data 31 agosto 2005 e sono in fase di realizzazione. L'opera che è stata integrata con l'intervento 49 presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 95%.

(07.00) **Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S.23 ed ampliamento parcheggi zona retro Ospedale:** I lavori sono iniziati in data 31 ottobre 2005 e sono in fase di realizzazione. L'opera che è stata utilizzata per l'evento olimpico presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 85%.

(49.00) **Parco urbano area olimpica:** tutte le opere connesse all'evento olimpico (viabilità e parcheggi) sono state completate entro dicembre 05. Il centro polifunzionale e le altre opere sono in fase avanzata di realizzazione con una percentuale di circa il 95%.

(58.00) **Adeguamento depuratore:** intervento da vedersi integrato con interventi 57 -58-59-60 per i quali si rimanda al punto INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO, ACQUEDOTTI E COLLETTORI.

(74.04) **Elisoccorso H 24:** I lavori sono iniziati in data 19 luglio 2005 e sono terminati in data 9 dicembre 2005, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.17 POMARETTO

(45.00) **SP 169 – SP 166 adeguamenti vari:** i lavori consegnati nella seconda metà del mese di dicembre 2005 sono stati sospesi per il periodo dei giochi olimpici per non interferire con la viabilità ordinaria. Sono stati ripresi ed ultimati. La percentuale di avanzamento è del 100%.

1.18 PORTE

(06.03) Progetto Paesaggio e Arredo: l'intervento è stato annullato a seguito delle difficoltà progettuali e di localizzazione dello stesso. I finanziamenti sono stati impiegati su altre opere sempre del progetto paesaggio.

1.19 PRAGELATO

(11.00) Collegamento Pragelato Sestriere con funivia vai e vieni (due cabine) Pattemouche – anfiteatro: I lavori sono iniziati in data 28 aprile 2005 e sono terminati in data 6 dicembre 2005, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

(34.00) Difese spondali, sistemazioni idrogeologiche e ricostruzione ponte degli sciatori: I lavori sono iniziati in data 30 maggio 2005 e sono terminati in data 30 dicembre 2005, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

(60.00) Collettore di valle e Depuratore Pourriers: intervento da vedersi integrato con interventi 57 - 58-59-60 per i quali si rimanda al punto INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO, ACQUEDOTTI E COLLETTORI.

(63.00) Fognature, ristrutturazione e potenziamento: sono stati frazionati in 3 piani stralcio:

- 1° lotto (tratto fognario Rua-via Trieste): é stato completato;
- 2° lotto (collettore pista da fondo): é stato completato.
- 3° lotto: (collettore tratta Granges – Ruà Via Trieste): é stato completato.
- 4° lotto:(completamento) l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 90%.

Complessivamente l'opera presenta una percentuale di avanzamento pari a circa il 96%.

(75.02) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: I lavori sono iniziati in data 9 marzo 2005 e sono terminati in data 31 dicembre 2005, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.20 PRALI

(24.00) Seggiovia biposto Malzat - Pian dell'Alpet: opera ultimata ed in esercizio. L'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

(25.00) Sciovia Baby Ghigo: I lavori sono iniziati in data 1 luglio 2004 e sono terminati in data 24 dicembre 2004, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

✓ (26.00) **Seggiovia Pian dell'Alpet - Bric Rond:** opera ultimata e in esercizio. L'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

✓ (27.00) (28.00) **Innevamento artificiale:** I lavori sono iniziati in data 24 giugno 2005 e terminati in data 25 novembre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.21 RIVOLI

✓ (74.10) **Elisoccorso H 12:** I lavori sono iniziati in data 27 ottobre 2005 e sono terminati in data 14 marzo 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.22 SAUZE DI CESANA

✓ (37.00) **Realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises, a protezione della viabilità provinciale e delle aree di parcheggio; realizzazione di vasche di accumulo di acqua potabile per garantire i momenti di crisi idrica del periodo (dic – feb):** I lavori sono iniziati in data 12 luglio 2005 e sono terminati in data 29 settembre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

✓ (38.00) **Realizzazione di sondaggi con predisposizione di verticali inclinometriche e piezometriche con sensori di controllo in continuo per il monitoraggio sulla stabilità del versante che interessa l'abitato di Grange Sises:** I lavori sono iniziati in data 26 luglio 2005 e sono terminati in data 31 dicembre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

(39.00) **Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres :**

✓ Per l'opera in questione è stata espletata la gara d'appalto ed aggiudicata in data 06.06.05, in sede di consegna dei lavori sono emersi delle difficoltà tecniche per l'effettiva esecuzione degli stessi. Al fine di superare tali difficoltà in data 02.03.2006 ed in data 05.06.2006 sono state presentate al Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico della Regione Piemonte due soluzioni alternative la cui valutazione per entrambe, da parte del predetto settore è stata negativa. Al fine di superare le difficoltà che nel tempo sono emerse, e considerata la necessità, come ribadito dallo stesso Settore Decentrato OO.PP., della sistemazione del Rio Favier nell'ottica del riordino del sottosuolo della Frazione Rollieres, è stato convenuto con i tecnici regionali di redigere un nuovo progetto ed annullare la precedente gara. A tal fine, proprio per rendere l'opera funzionale, è stato concesso dalla Regione Piemonte, con D.D. del 07.09.2006, un finanziamento di € 100.000,00 per integrare € 181.000,00 che si sono rilevati insufficienti. La comunicazione del nuovo finanziamento è pervenuta al Comune in data 20.09.2006 e lo stesso ha provveduto immediatamente alle opportune variazioni di bilancio per proseguire l'iter. Al momento è in corso la progettazione e si presume l'inizio dei lavori entro la primavera 2007, pertanto la percentuale di

esecuzione dei lavori è pari a 0%.

(56.00) **Completamento rete fognaria e acquedotto:** I lavori sono iniziati in data 21 aprile 2005 e sono terminati in data 15 dicembre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.23 SAUZE D'OULX

(09.00) **Impianto di arroccamento "Oulx - Sauze d'Oulx" 2° tronco seggiovia Jouvenceaux – Sportina:** E' stata svolta la Conferenza dei Servizi che si è chiusa con esito positivo, è stata espletata la gara di appalto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 158/95 aggiudicata in data 30 agosto 2005. I lavori sono iniziati in data 27 giugno 2006 (successivamente alla stagione invernale) ed è previsto che terminino in data 5 febbraio 2007. L'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 85%.

(13.00) **Parcheggio autorimessa interrata:** i lavori sono stati consegnati nel mese di novembre 2005, avviati e sospesi nel periodo olimpico ed ora in fase di realizzazione con la fine prevista per il 31 agosto 2007. L'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 50%.

(15.b) **Innevamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni:** I lavori sono terminati, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

(19.00) **Struttura coperta polivalente e campo di calcio** l'intervento è stato suddiviso in due parti:

a) struttura coperta polivalente: i lavori sono iniziati in data 27 ottobre 2004 e sono in fase di realizzazione, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 50%.

b) campo di calcio: i lavori sono iniziati in data 5 settembre 2005 e sono in fase di realizzazione, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 30%.

Complessivamente l'opera presenta una percentuale di avanzamento lavori pari al 45%.

(35.00) **Sistemazione movimento franoso in località Gran Villard:** I lavori sono iniziati in data 18 maggio 2005 e sono terminati in data 30 settembre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

(36.00) **Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a valle del concentrico ed area Jouvenceaux:** L'opera è in fase progettuale anche in considerazione delle interferenze con il sito olimpico del Free-style e con gli interventi legati al Campo di golf e pista di fondo (72_00) e (73_00).

(53.00) **Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore:** l'intervento è stato suddiviso in due opere:

a) adeguamento del sistema fognario ed acquedottistico: I lavori sono iniziati in data 3 agosto 2005 e sono in corso di realizzazione, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 70%.

- b) realizzazione fognatura nera da Sauze d'Oulx all'impianto di depurazione in località frazione Gad: I lavori sono iniziati in data 3 agosto 2005 e sono terminati in data 2 giugno 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

Complessivamente l'opera presenta una percentuale di avanzamento lavori pari al 76%.

- (72.00) **Campo da golf:** in data 28 dicembre 2006 è stata ultimata la Conferenza dei Servizi con procedura di VIA sul progetto definitivo. L'opera così come in progetto non è stata autorizzata e si procederà presumibilmente ad una rielaborazione progettuale. Le opere in oggetto, unitamente alla pista di fondo rappresentano il completamento e l'utilizzo post olimpico dell'impianto del Free-style.

- (73.00) **Pista di fondo:** trattata assieme al precedente 72.00

- (74.13) **Elisoccorso H 24:** L'opera inizialmente prevista in H12 è stata trasformata in H24 anche per sopperire alla mancata realizzazione di altre elisuperfici (Cfr. Cesana T.se, Claviere, Bardonecchia). I lavori sono iniziati in data 27 giugno 2005 e sono terminati in data 7 luglio 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

- (75.06) **Servizio di soccorso medicalizzato terrestre:** I lavori sono iniziati in data 11 marzo 2005 e sono terminati in data 26 luglio 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.24 SAVIGLIANO

- (74.14) **Eliporto da H12 a H24:** l'intervento risulta annullato per indisponibilità di aree idonee.

1.25 SAN DIDERO

- (65.00) **Casaforte di San Didero:** I lavori sono iniziati in data 4 novembre 2004 e sono in corso di realizzazione, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 70%.

1.26 SAN GERMANO CHISONE

- (06.08) **Progetto Paesaggio e arredo:** I lavori sono iniziati in data 14 settembre 2004 e sono terminati in data 27 maggio 2005, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.27 SESTRIERE

- (20.00) **Centro polivalente con piscina:** opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004. Il Comune cofinanzia l'opera per il 20%,

una parte dei lavori previsti dal progetto preliminare approvato sono stati comunque eseguiti con questi fondi

✓ (21.00) **Edificio foresteria ad uso ricettività sportiva con accessibilità disabili:** I lavori sono iniziati in data 11 aprile 2005 e sono terminati in data 16 ottobre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

(40.00) **Completamento sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata e sistemazioni idrauliche Torrente Chisonetto e tributari:** l'intervento è stato suddiviso in due opere:

✓ - Sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata: I lavori sono iniziati in data 1 settembre 2005 e sono terminati in data 7 settembre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

- Sistemazione idrauliche torrente Chisonetto: è terminata la progettazione esecutiva ed è prevista l'aggiudicazione dei lavori entro il 15 ottobre 2006. l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 0%.

Complessivamente l'intervento presenta una percentuale di avanzamento lavori pari al 56%.

✓ (50.00) **Completamento fognature e acquedotto Comunale:** I lavori sono iniziati in data 5 ottobre 2004 e sono terminati in data 29 settembre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

✓ (74.02) **Elisoccorso H 24:** E' stato reso disponibile per l'evento olimpico. Trattasi di un'opera interamente temporanea che è stata smantellata dopo le Olimpiadi con il ripristino dello stato ante. Pertanto l'intervento presenta una percentuale di avanzamento lavori pari al 100%.

✓ (75.01) **Servizio di soccorso medicalizzato terrestre:** I lavori sono iniziati in data 11 aprile 2005, il poliambulatorio è stato utilizzato per le olimpiadi e sono in corso di realizzazione i lavori di finitura, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 95%.

1.28 SUSÀ

✓ (06.04) **Paesaggio e arredo (parcheggio):** dopo il ritrovamento di importanti reperti archeologici (tempio romano di circa 600 mq e strade) nell'area interessata dalla realizzazione del parcheggio, sono in corso gli scavi archeologici su un'area di 2900 mq. Al termine potranno essere ripresi i lavori per la realizzazione del parcheggio. L'opera presenta uno stato di avanzamento pari al 30%

✓ (74.09) **Elisoccorso H 24:** I lavori sono iniziati in data 25 novembre 2005 e sono stati ultimati in data 30 ottobre 2006, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.29 VILLAR PEROSA

✓ (06.07) **Progetto Paesaggio e arredo:** I lavori sono iniziati in data 21 marzo 2005 e sono terminati in data 25 novembre 2005, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

1.30 TORINO

✓ (74.05) **Elisoccorso CTO H 24:** I lavori sono iniziati in data 30 giugno 2005 e sono terminati in data 31 dicembre 2005, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

✓ (74.06) **Elisoccorso H 24 G BOSCO:** l'intervento è stato annullato poiché incompatibile con la normativa vigente in merito al rumore.

✓ (74.16) **Logistica elisoccorso H24 aereo club Torino:** I lavori sono iniziati in data 10 ottobre 2005 e sono terminati in data 19 novembre 2005, l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

✓ (76.00) **Unità spinale CTO/CFR di Torino:** I lavori sono iniziati in data 31 ottobre 2003 e sono in corso di realizzazione i lavori di finitura; l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 95%.

1.31 TORRE PELLICE

✓ (06.05) **Progetto Paesaggio e arredo:** I lavori sono iniziati in data 15 giugno 2005 e sono terminati il 10 ottobre 2006; l'opera presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.

2 SITUAZIONE INTERVENTI OPERE A RETE.

2.1 INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO, ACQUEDOTTI E COLLETTORI

(55.00) Comunità Montana Bassa Val Susa, acquedotto di valle 1° stralcio: intervento stralcio per rimodulazione degli interventi relativi al sistema fognario, acquedotti e collettori con delibera del Comitato di Regia del 11 luglio 2005 e ratificata con DPCM 20 ottobre 2005. L'intervento quindi al momento non risulta finanziato.

(57.00) – (58.00) – (59.00) – (60.00) Comunità Montana Val Chisone

Le opere previste ai numeri 57-58-59-60 sono contenute in DUE progetti preliminari generali denominati: "LOTTO 1 – parte A COLLETTAMENTO FOGNARIO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELLE VALLI CHISONE GERMANASCA" e "LOTTO 1 – parte B: ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI PINEROLO – PORTE AL D.Lgs. 11.05.1999 n° 152 E SUO POTENZIAMENTO A SERVIZIO DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE GERMANASCA ". Il progetto LOTTO 1 – parte A prevede la realizzazione del collettore principale di valle Porte-Pragelato (circa 40 km), i collettori secondari di collegamento e le opere fognarie-depurative locali per i comuni e/o frazioni che non sono allacciabili al collettore principale. Il progetto LOTTO 1 – parte B prevede la realizzazione delle opere destinate all'adeguamento al D.lgs 152/99 ed al potenziamento fino a 100.000 A.E. dell'impianto di depurazione esistente di Pinerolo, che nel previsto schema diventerà il depuratore centralizzato a servizio dei Comuni di Valle. La progettazione preliminare complessiva è stata approvata in sede di Conferenza di servizi in data 7/7/04. Poiché l'Agenzia Torino 2006 ha realizzato vari lavori stradali lungo la Valle Chisone in sovrapposizione con il percorso del collettore fognario, al fine di evitare i ritardi e gli oneri aggiuntivi per la realizzazione della condotta che sarebbero derivati nel caso che i lavori stradali fossero ultimati prima, sono stati disposti i "PROGETTI STRALCIO":

- Stralcio 1 - Collettore di Valle - Tratte interferenti con le opere stradali tra Perosa A. e Pragelato: : i lavori sono iniziati in data 13 settembre 2004 e sono terminati nel mese di gennaio 2006, lo stralcio presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.
- Stralcio 2 - Collettore di Valle - Tratte interferenti con le opere stradali tra S. Germano e Perosa Argentina: i lavori sono iniziati in data 11 gennaio 2005 e sono terminati in data 12 agosto 2005, lo stralcio presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 100%.
- Stralcio 3 - Collettore di Valle - Tratta Porte / Villar P. connessa all'evento alluvionale dell'ottobre 2000 e collegamenti - Stralcio 4 - Collettore di Valle -

completamento delle tratte realizzate: i lavori sono iniziati in data 28 ottobre 2005, sono in fase di realizzazione e si prevede il termine nel mese di ottobre 2007. I due stralci presentano uno stato di avanzamento lavori pari al 18%.

- Stralcio n. 5 - Collettore di Valle – completamento: il progetto risulta attualmente in Conferenza dei servizi per la quale si prevede la chiusura nel mese di novembre 2006. Considerate le condizioni climatiche l'inizio lavori è previsto per il mese di maggio 2007 e la chiusura a aprile 2009.
- Adeguamento / potenziamento depuratore - 1° Stralcio a 75.000 A.E. : i lavori sono iniziati in data 8 marzo 2005, sono in fase avanzata di realizzazione e si prevede il termine nel mese di dicembre 2006. Lo stralcio presenta uno stato di avanzamento lavori pari al 83%.

Complessivamente le opere (57.00) – (58.00) – (59.00) – (60.00) sulla Comunità Montana Val Chisone che, secondo quanto indicato nei DPCM presentano un unico finanziamento, hanno raggiunto una percentuale di avanzamento lavori pari al 60%.

(61.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - (62.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione collegamento Torre Pellice - Villar Pellice:

Le opere previste ai punti 61 e 62 sono contenute in un progetto preliminare generale denominato: "LOTTO 2 - COLLETTAMENTO FOGNARIO E DEPURAZIONE VAL PELLICE". Tale progetto prevede la realizzazione del collettore principale di valle Garzigliana - Bobbio Pellice (circa 22 km), i collettori secondari di collegamento e le opere fognarie-depurative locali per i comuni e/o frazioni che non saranno allacciate al collettore principale e la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione centralizzato a servizio dei comuni della Val Pellice collettati dal collettore di valle a Garzigliana per una potenzialità di 30.000 A.E. Il progetto ammonta a circa 19 milioni di Euro, a fronte del finanziamento delle opere connesse di Euro 9,296 milioni. Il progetto preliminare è stato sottoposto alla Conferenza dei servizi ed approvato in data 15/7/04. L'opera è stata assoggettata alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/98. L'esecuzione dell'opera è prevista articolata in lotti. Il 1° stralcio attualmente in fase di Conferenza dei servizi definitiva è pari all'importo del finanziamento disponibile e prevede la realizzazione di un primo modulo funzionale dell'impianto di depurazione e di una prima tratta funzionale del collettore. Il completamento dell'opera complessiva sarà finanziato a valere sui proventi tariffari nell'ambito delle programmazioni dell'ATO 3 Torinese. La prossima progettazione esecutiva è prevista articolata in due lotti: uno per il depuratore e uno per il collettore. Pertanto le opere risultano in avanzata fase progettuale pur considerando la complessità che le stesse rivestono.

2.2 TORINO – PINEROLO: RADDOPPIO FERROVIARIO SELETTIVO

(05.00) Raddoppio ferroviario selettivo Torino Pinerolo.

Il raddoppio ferroviario selettivo della tratta Torino – Pinerolo ha rappresentato per l'evento olimpico uno dei sistemi cardine della mobilità poiché oltre a collegare Torino con Pinerolo (sede della gare di Curling), permetteva l'avvicinamento alla Val Chisone. Da Pinerolo partivano poi le navette per raggiungere Pragelato, Sestriere ed il sistema olimpico montano. Il raddoppio si è presentato particolarmente complesso ed al fine di armonizzare le risorse si è proceduto alla progettazione preliminare dell'intera tratta e poi alla realizzazione di quelle opere assolutamente necessarie. L'opera è stata quindi scomposta in più lotti funzionali.

- (05.01) Progettazione preliminare per raddoppio ferroviario selettivo intera linea e progettazione esecutiva delle opere da realizzare: ultimata la progettazione preliminare dell'intera tratta e la progettazione esecutiva delle sole opere utilizzate per le Olimpiadi nel 2004.
- (05_02_01) Stazione di Sangone, None, Airasca, Piscina e Pinerolo (costruzione di sottopassi e marciapiedi di stazione e realizzazione di un sottopasso ciclo e pedonale a Pinerolo): i lavori sono iniziati nel mese di marzo 2005, si è proceduto alla risoluzione del contratto per inadempienze dell'impresa, sono stati riappaltati i lavori che sono in fase di ultimazione e si prevede il termine nel mese di gennaio 2006. Le opere presentano uno stato di avanzamento lavori pari al 85%.
- (05_02_02) Stazione di Sangone, None, Airasca, Piscina e Pinerolo (Opere accessorie di armamento e tecnologie per la realizzazione dei sottopassaggi): i lavori sono iniziati nel mese di marzo 2005, e si è raggiunto uno stato di avanzamento pari al 100%.
- (05.03) informazione al pubblico: i lavori sono iniziati nel mese di gennaio 2005, e si è raggiunto uno stato di avanzamento pari al 100%.
- (05.04) Stazione di Airasca - ACEI: i lavori sono iniziati nel mese di ottobre 2004, e si è raggiunto uno stato di avanzamento pari al 100%.
- (05.05) Stazione di Airasca – telecomando dell'ACEI della stazione di None: i lavori sono iniziati nel mese di novembre 2004, e si è raggiunto uno stato di avanzamento pari al 100%.
- (05.06) Tratta bivio Sangone Airasca (blocco conta assi): i lavori sono iniziati nel mese di novembre 2004, e si è raggiunto uno stato di avanzamento pari al 100%.

Complessivamente le opere di raddoppio selettivo della tratta Torino - Pinerolo hanno raggiunto una percentuale di avanzamento lavori pari al 95%.

3 SINTESI ED ANALISI RELATIVE ALL'AVANZAMENTO LAVORI.

Le opere sulla base dello stato avanzamento al 31 dicembre 2006 si possono così ripartire:

3.1 Opere ultimate (% esecuzione lavori pari al 100%)

Alessandria

(74.15) Logistica elisoccorso AO "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria (100%)

Avigliana

(02.00) Variante di Avigliana (100%)

(06.06) Progetto Paesaggio e arredo (100%)

Bardonecchia

(12.00) Ampliamento parcheggio esistente in località Biovej (100%)

(14.00) Migliorie alle vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria – Viale Roma) (100%)

(18.00) Realizzazione telecabina sei posti difensiva – Frejusia (100%)

(44.00) Sistemazione torrente Rho (100%)

(52.00) Realizzazione rete fognaria, completamento impianto di depurazione (100%)

(75.07) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre (100%)

Caselle

(03.00) Aeroporto di Caselle: interventi vari di miglioramento (100%)

Cesana – San Sicario

(08.00) Collegamento SS 23 – San Sicario (100%)

(15.a) Inneamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni (100%)

(29.00) Sistemazione e rifacimento paravalanghe località Segnalunga (100%)

Claviere

(75.04) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre (100%)

Cuneo

(74.08) Elisoccorso H24 (100%)

Fenestrelle

(06.01) Sistemazione aree esterne al Forte (100%)

(46.00) Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare dell'Assietta (100%)

(48.00) Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte (100%)

Giaveno

(66.00) Centro sportivo polifunzionale (100%)

Novara

(74.07) Elisoccorso H24(100%)

Oulx

(69.00) Recupero ex Municipio a ricettività para alberghiera (100%)

(75.05) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre (100%)

Orbassano

(74.11) Elisoccorso H24 (100%)

(77.00) Centro antidoping di Orbassano (100%)

Pinerolo

(74.04) Elisoccorso H24 (100%)

Pomaretto

(45.00) SP 169 adeguamenti vari (100%)

Pragelato

(11.00) Collegamento Pragelato Sestriere con funivia vai e vieni Pattemouche – Anfiteatro (100%)

(34.00) Difese spondali, sistemazioni idrogeologiche e ricostruzione ponte degli sciatori (100%)

(75.02) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre (100%)

Prali

(24.00) Seggiovia biposto Malzat – pian dell'Alpet 100%)

(25.00) Sciovia Baby Ghigo (100%)

(26.00) Seggiovia pian dell'Alpet - Bric Rond 100%)

(27.00) (28.00) innevamento artificiale (100%)

Rivoli

(74.10) Elisoccorso H12 (100%)

Sauze di Cesana

(37.00) Realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises (100%)

(38.00) Realizzazione di sondaggi con predisposizioni di verticali inclinometriche e piezometriche con sensori di controllo (100%)

(56.00) Completamento rete fognaria e acquedotto (100%)

Sauze d'Oulx

(15.b) Innevamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni (100%)

(35.00) Sistemazione movimento franoso in località Gran Villard

(74.13) Elisoccorso H24 (100%)

(75.06) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre (100%)

San Germano Chisone

(06.08) Paesaggio e arredo (100%)

Sestriere

(21.00) Edificio foresteria ad uso ricettività sportiva con accessibilità disabili (100%)

(50.00) Completamento fognario e acquedotto municipale (100%)

(74.02) Elisoccorso H24 (100%)

Susa

(74.09) Elisoccorso H24 (90%)

Torre Pellice

(06.05) Progetto paesaggio e arredo (100%)

Villar Perosa

(06.07) Progetto paesaggio e arredo (100%)

Torino

(74.05) Elisoccorso CTO H24 (100%)

(74.16) Elisoccorso H24 aereo club Torino (100%)

3.2 Opere in corso di ultimazione (% esecuzione lavori compresa fra 80% e 99%)**Cesana San Sicario**

(10.00) Seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longa (95%)

(17.00) Seggiovia quadriposto Gimont/Colle Bercia(95%)

Oulx

(70.00) Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni (90%)

Pinerolo

(06.02) Progetto paesaggio e arredo (95%)

(07.00) Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S.23 ed ampliamento parcheggi zona retro Ospedale (80%)

(49.00) Parco urbano area olimpica (95%)

Pragelato

(63.00) Fognature, ristrutturazione e potenziamento (96%)

Sauze d'Oulx

(09.00) Impianto di arroccamento Oulx-Sauze d'Oulx – 2° tronco seggiovia Jovenceaux – Sportina (85%)

Sestriere

(75.01) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre (95%)

Torino

(76.00) Unità spinale CTO/CFR (95%)

(05.00) Torino – Pinerolo: raddoppio ferroviario selettivo (95%)

3.3 Opere in corso di realizzazione avanzata (% esecuzione lavori compresa fra 50% e 79%)**Pinerolo**

(01.00) SS 589 Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo-Piosasco (75%)

Sauze d'Oulx

(53.00) Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore (76%)

(13.00) Parcheggio autorimessa interrata (50%)

San Didero

(65.00) Cassaforte di San Didero (70%)

Sestriere

(40.00) Completamento sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata e sistemazioni idrauliche Torrente Chisonetto e tributari (56%)

Comunità Montana Val Chisone

(57.00) – (58.00) – (59.00) – (60.00) interventi sistema fognario, acquedotti e collettori 60%)

3.4 Opere in corso di realizzazione avviate (% esecuzione lavori compresa fra 0% e 49%)**Cesana San Sicario**

(51.00) Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto comunale (19%)

Chiomonte

(22.00) Sostituzione dell'attuale sciovvia con una seggiovia biposto

(23.00) Innevamento programmato e messa in sicurezza piste (0,5%)

Claviere

(54.00) Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale (17%)

Fenestrelle

(47.00) Sistemazione parcheggio (30%)

Oulx

(68.00) Recupero ex-caserma Picco a ricettività para alberghiera (liceo neve post olimpico e centro media)

Sauze d'Oulx

(19.00) Struttura coperta polivalente e campo di calcio (45%)

Sestriere

(20.00) Centro polivalente con piscina (10%)

Susa

(06.04) Parcheggio (30%)

3.5 Opere appaltate con lavori non ancora iniziati

Bardonecchia

(41.00) Sopraelevazione argine sx e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e sistemazione Rio della Gorgia.

3.6 Opere in fase progettuale

Bardonecchia

(42.00) Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico viale della Vittoria fronte Colonia Medail: progettazione esecutiva in corso

(43.00) Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemolles: progettazione esecutiva in corso

Bibiana - Luserna S.G.

(04.00) Variante fra Luserna S.G. e Bibiana - 1° LOTTO (denominato "Strada delle cave"): progettazione esecutiva in corso.

Claviere

(30.00) Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato: progettazione esecutiva in corso.

(31.00) Sistemazione idraulica del Rio Gimont tratto terminale in prossimità dell'abitato e Rio Secco: progettazione esecutiva in corso.

Oulx - Bardonecchia

(16.00) Pista da fondo e percorso natura Oulx - Beaulard - Bardonecchia: progettazione definitiva in corso.

Oulx

(32.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato e opere di ingegneria naturalistica: progettazione definitiva in corso.

(33.00) Sistemazione pareti rocciose: progettazione definitiva in corso.

(71.00) Costruzione nuova palestra, progetto padiglione della neve e del ghiaccio: progettazione definitiva in corso.

Sauze di Cesana

(39.00) Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres: progettazione definitiva in corso.

Sauze d'Oulx

(36.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a valle del concentrico ed area Jouvenceaux: progettazione definitiva terminata

(72.00) Campo da golf: progettazione definitiva terminata

(73.00) Pista di fondo: progettazione definitiva terminata

Comunità montana Val Pellice

(61.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato: progettazione definitiva terminata

(62.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione collegamento
Torre Pellice - Villar Pellice: progettazione definitiva terminata

3.7 Opere temporalmente differite non riattivate

(64.00) Museo delle Olimpiadi

3.8 Opere annullate

Bardonecchia

(74.03) Elisoccorso H 24

Cesana San Sicario

(74.01) Elisoccorso H 12

Claviere

(74.12) Elisoccorso H 12

Oulx

(67.00) Stazione FS" Recupero ex-albergo Commercio- centro per i media-post olimpico Liceo
della Neve

Savigliano

(74.14) Eliporto H12

Torino

(74.06) Eliporto H24 G. Bosco

Comunità Montana Bassa Val Susa

(55.00) Acquedotto di valle 1° stralcio

Porte

(06.03) Progetto Paesaggio e Arredo

**OPERE CONNESSE AI XX GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI "TORINO 2006"**

**RELAZIONE SULLO STATO DI REALIZZAZIONE
Aggiornamento al 31 dicembre 2006**

Per la Regione Piemonte

Il Responsabile della Struttura Flessibile Torino 2006

Dott. Roberto Moiso

Il Coordinatore Operativo della Struttura Flessibile Torino 2006

Dott.ssa Gianna Bottero

Per l'Agenzia Torino 2006

Il Direttore Generale dell'Agenzia Torino 2006

Ing. Mimmo Arcidiacono

INDICE

- 1 INQUADRAMENTO GENERALE
- 2 TERMINI TEMPORALI PER LA REALIZZAZIONE
- 3 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL MONITORAGGIO
- 4 SINTESI DELLO STATO DI AVANZAMENTO AL 31 DICEMBRE 2006.
 - 4.1 Sintesi ed analisi relative alla ripartizione degli importi (costo complessivo) per avanzamento lavori
 - 4.2 Sintesi ed analisi relative alla ripartizione degli importi (finanziamento Legge 285) per avanzamento lavori.
 - 4.3 Sintesi ed analisi relative al numero di opere per stato di avanzamento lavori.

1 INQUADRAMENTO GENERALE

La Legge 285/00 così come modificata dalle Legge 48/2003 e ss.mm.ii. ha disciplinato oltre alla realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" anche la realizzazione di opere connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici individuate sulla base della valutazione di connessione dichiarata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il Presidente della Regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. Inoltre sempre con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Regione Piemonte, d'intesa con gli Enti Locali interessati ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresì i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse.

All'Agenzia Torino 2006, istituita dalla predetta Legge è affidato il compito di realizzare il "Piano degli interventi" in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita dei Giochi, ad essa viene altresì affidato il compito di svolgere il monitoraggio sui tempi di realizzazione delle opere connesse.

La Legge 48/2003 e ss.mm.ii. ha istituito inoltre presso la Regione Piemonte un *Comitato di Regia dei Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006"* composto dal Presidente della Regione Piemonte, dal Sindaco di Torino, dal Presidente della Provincia di Torino, dal Presidente del CONI e da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comitato di regia indirizza e coordina le attività inerenti le finalità di cui alla legge 285/2000 e ss.mm.ii., assumendo le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi verificando inoltre i tempi ed i modi di realizzazione degli stessi.

La Regione Piemonte, considerando le competenze affidatele dalla Legge 285/2000, fra cui anche la proposta per la definizione delle opere connesse, ha costituito nel marzo del 2000 un proprio Gruppo di lavoro denominato **Coordinamento Torino 2006** poi trasformato nella **Struttura Flessibile per l'attuazione del progetto Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006**.

Il Comitato di Regia nella seduta del 3 novembre 2003 ha deliberato che l'Agenzia Torino 2006 svolgesse sulle opere connesse un monitoraggio a costo zero basato sulle dichiarazioni delle stazioni appaltanti. Pertanto la Struttura Flessibile della Regione Piemonte in pieno accordo con l'Agenzia Torino 2006 ha definito il sistema di monitoraggio e successivamente con cadenza periodica reso edotto il Comitato di Regia in merito allo stato di avanzamento delle opere connesse.

Risulta ancora fondamentale premettere che la Regione Piemonte in data 9 aprile 2001 con la DGR 45-2741 ha approvato (prima esperienza in Italia) la "Valutazione Ambientale Strategica

(VAS) del Piano degli Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006”. La VAS si articola in differenti fasi temporali, *ex ante*, intermedia ed *ex post*. Il processo di VAS considera globalmente tutte le attività e gli interventi utili allo svolgimento dei Giochi e tutte le trasformazioni indotte sul territorio e sull'ambiente e indica le iniziative e le strategie necessarie ad un utilizzo delle infrastrutture e dei servizi anche dopo l'evento olimpico affinché gli interventi realizzati possano, da un lato, minimizzare gli impatti ambientali e, dall'altro, massimizzare le positive ricadute culturali, sportive, turistiche e di sviluppo economico dell'intero Piemonte. E' in questo contesto di VAS e di governo puntuale del territorio che si sono inserite tutte le opere relative ai Giochi Olimpici.

Alla luce delle premesse sopra richiamate si evince che relativamente a tutte le opere olimpiche, connesse comprese, la sinergia fra gli enti è stata continua e costante e per tali ragioni la seguente relazione è stata realizzata congiuntamente dalla Regione Piemonte e dall'Agenzia Torino 2006.

2 TERMINI TEMPORALI PER LA REALIZZAZIONE.

L'iter per la definizione dell'elenco delle opere connesse, per la disponibilità del finanziamento, per la loro approvazione in conferenza dei servizi ove necessario si è rivelato lungo e complesso.

In particolare è necessario sottolineare che relativamente all'avanzamento delle opere si segnala che la “copertura finanziaria” delle stesse con la possibilità quindi di chiudere le conferenze dei servizi approvando il progetto definitivo si è avuta formalmente nel mese di aprile 2004. Inoltre al fine di tutelare la pubblica amministrazione si è proceduto ad autorizzare le stazioni appaltanti ad aggiudicare definitivamente le opere e ad avviare i lavori solo a seguito dell'accensione del mutuo con oneri a carico dello Stato per il finanziamento delle opere e quindi a far data dal 28 settembre 2004.

Considerando poi le situazioni climatiche delle zone montane in cui sono ubicate la maggior parte delle opere connesse per cui di fatto fino alla primavera 2005 non è stato possibile eseguire i lavori, considerata per alcune opere la pesante interferenza con le opere del Dossier olimpico in capo all'Agenzia Torino 2006 e viste inoltre le finalità delle opere connesse espresse in premessa con particolare riguardo alle ricadute post – olimpiche delle stesse, l'art. 1, comma 241 della legge 311/2004 “Finanziaria 2005” ha:

“...[omissis] autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post-olimpico.”

3 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL MONITORAGGIO.

Come precedentemente evidenziato le opere connesse come tutte le attività legate alle opere per i Giochi Olimpici invernali Torino 2006 sono state coordinate, nell'ambito delle competenze istituzionali di ciascun ente, dal Comitato di regia. Relativamente al monitoraggio delle opere connesse si è concordato che lo stesso fosse condotto a cadenza trimestrale (31 marzo – 30 giugno - 30 settembre – 31 dicembre di ogni anno) in stretta collaborazione fra la Regione Piemonte e l'Agenzia Torino 2006.

In particolare la Regione Piemonte attraverso la propria Struttura Flessibile ha inviato periodicamente una apposita scheda di raccolta dati (i cui contenuti sono stati concordati ed elaborati con l'Agenzia Torino 2006) ai Responsabili Unici del Procedimento delle stazioni appaltanti che fornivano quindi l'aggiornamento dei dati. I dati sono stati trattati a livello informatico, raccolti e trasmessi all'Agenzia Torino 2006 che ha proceduto ad ulteriori verifiche anche dirette ed ha elaborato i Promemoria trasmessi alla Presidenza del Consiglio.

L'attività di cui sopra è stata svolta parallelamente a quella dell'Osservatorio Regionale sui Lavori Pubblici che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n.109/94 e s.m., ha svolto un'attività di monitoraggio tramite le tradizionali schede dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Affiancandosi, invece, alla Struttura suddetta e in ossequio alle disposizioni della legge 285/2000, l'Osservatorio ha, altresì, svolto le funzioni di rilevazione delle informazioni inerenti al processo dei singoli interventi olimpici e delle fasi decisorie e ha garantito, tramite appositi strumenti informatici, la pubblicità di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza di servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale.

Per assicurare adeguata pubblicità ai progetti delle opere del Dossier Olimpico e delle opere connesse, è stato creato, all'interno del sito informatico dell'Osservatorio, un apposito sistema che per ogni opera, permette la selezione e la visualizzazione dei documenti più significativi allegati al progetto definitivo. Gli atti conclusivi delle singole conferenze, prescrittivi e vincolanti per la realizzazione delle opere, sono invece consultabili sul sito della Struttura Flessibile Torino 2006.

Per sperimentare l'efficacia dell'utilizzo di tecnologie alternative per la diffusione di dati ed informazioni sui lavori pubblici e garantire nel contempo la massima applicazione delle disposizioni della legge 285/2000 e s.m., è stato realizzato il DVD "Raccolta delle attività e dei progetti per Torino 2006" presentato in occasione del Convegno tenutosi in Torino il 25 Gennaio 2006.

In data 18 maggio 2001 è stato firmato un Protocollo d'Intesa per l'incremento della collaborazione istituzionale nei pubblici appalti, con diversi Enti tra cui l'Agenzia Torino 2006.

Per dare piena attuazione all'accordo, promosso dalla Prefettura di Torino e dalla Regione Piemonte e volto ad assicurare legalità e trasparenza nel settore degli appalti pubblici, l'Osservatorio ha realizzato l'applicativo denominato SOLO (Sistema Osservatorio Opere Olimpiche).

Il SOLO ha consentito di monitorare la sicurezza nei cantieri olimpici ed attuare tutta una serie di azioni volte a prevenire le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti, il contenimento del fenomeno del lavoro nero e la tutela della salute dei lavori.

L'Agenzia Torino 2006, tramite l'inserimento nei capitolati di un'apposita clausola, ha vincolato le imprese esecutrici alla trasmissione di una serie di dati tra i quali l'assetto societario della stessa impresa. I fruitori del Sistema sono stati, nell'ambito delle rispettive competenze, la Prefettura di Torino e l'Osservatorio Sanitario.

In considerazione del successo riscontrato, in futuro il SOLO molto probabilmente verrà utilizzato per monitorare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali che saranno realizzate sul territorio regionale.

4 SINTESI DELLO STATO DI AVANZAMENTO AL 31 DICEMBRE 2006.

Si illustra di seguito lo stato di avanzamento nella realizzazione delle opere connesse risultante dal monitoraggio del 31 dicembre 2006 con alcune considerazioni e analisi di carattere statistico. Le elaborazioni successive sono fatte su un numero di opere coincidenti con quelle dei DPCM di approvazione delle opere stesse e sia sugli importi complessivi delle opere (finanziamenti statali Legge 285 + cofinanziamenti) ed al netto delle opere differite e non riattivate sia relativamente ai soli finanziamenti sulla legge 285. Per tali ragioni si possono trovare leggere variazioni rispetto ai totali dei DPCM dovute ad aumenti dei cofinanziamenti. Per avere un quadro completo, la lettura dei dati aggregati di seguito riportata, dovrà essere accompagnata dal dettaglio sullo stato delle singole opere contenuto al documento di monitoraggio allegato alla presente relazione. Il quadro riassuntivo sullo stato di attuazione delle opere connesse è esplicitato alla tabella seguente, mentre nei successivi paragrafi si entra nel merito dei dati sotto riportati.

QUADRO RIASSUNTIVO ATTUAZIONE OPERE CONNESSE AGGIORNATO AL 31 DICEMBRE 2006						
descrizione	costo complessivo		finanziamento legge 285		opere	
	milioni di euro	% importi	milioni di euro	% importi	n° opere	% opere
Opere ultimate (% esecuzione lavori pari al 100%)	204,77	56,4	117,53	49,3	50	47,6
Opere in corso di ultimazione (% esecuzione lavori compresa fra 80% e 99%)	75,55	20,8	47,26	19,8	11	10,5
Opere in corso di realizzazione avanzata (% esecuzione lavori compresa fra 50% e 79%)	33,77	9,3	33,28	14,0	9	8,6
Opere in corso di realizzazione avviate (% esecuzione lavori compresa fra 0% e 49%)	15,29	4,2	12,47	5,2	9	8,6
Opere appaltate con lavori non ancora iniziati	1,19	0,3	1,19	0,5	1	1,0
Opere in fase progettuale	29,26	8,1	25,42	10,7	16	15,2
Opere temporalmente differite non riattivate	1,81	0,5	0,00	0,0	1	1,0
Opere annullate	1,23	0,3	1,23	0,5	8	7,6
TOTALI	362,85	100,0	238,387	100,0	105	100,0

4.1 Sintesi ed analisi relative alla ripartizione degli importi (costo complessivo) per avanzamento lavori.


Con riferimento al *“Quadro riassuntivo attuazione opere connesse aggiornato al 31 dicembre 2006”* si evidenzia che **analizzando il costo complessivo** delle opere risulta che:

- sono state completate opere per circa 204,77 milioni di euro di lavori pari al 56,4% dello stanziamento complessivo (circa 363 milioni di euro di cui 238 milioni di euro provenienti dallo Stato a valere sulla Legge 285/2000 ed i restanti provenienti da cofinanziamento dei soggetti attuatori);
- sono ormai oltre il 50 % di completamento opere per un importo di oltre 108 milioni di euro pari al 30,1% del costo complessivo
- sono avviate ed in fase di realizzazione opere per un ammontare di circa 15,3 milioni di euro pari a circa il 4,2% del costo complessivo.
- sono in fase progettuale opere per un ammontare complessivo di circa 29 milioni di euro pari al 8,1% del costo complessivo. Per queste ultime opere il Comitato di Regia ha autorizzato le stazioni appaltanti ad impiegare i fondi successivamente all'evento olimpico ai sensi dell'art. 1 comma 241 Legge 311/2004 (le opere appartengono per la maggior parte ai comparti dei piani strategici Interventi di assetto territoriale, Interventi sul sistema Fognario-Acquedotti-Collettori, Sanità).
- Sono state differite o annullate opere per un ammontare di circa 3 milioni di euro pari a meno dell'1% del costo complessivo.


Pertanto sono già realizzate o in fase di realizzazione opere connesse per un ammontare di circa 330 milioni di euro pari a circa il 91% del costo complessivo.

Si allegano i grafici di dettaglio relativi alle considerazioni sopra esposte.

Ripartizione importi per stato di avanzamento lavori

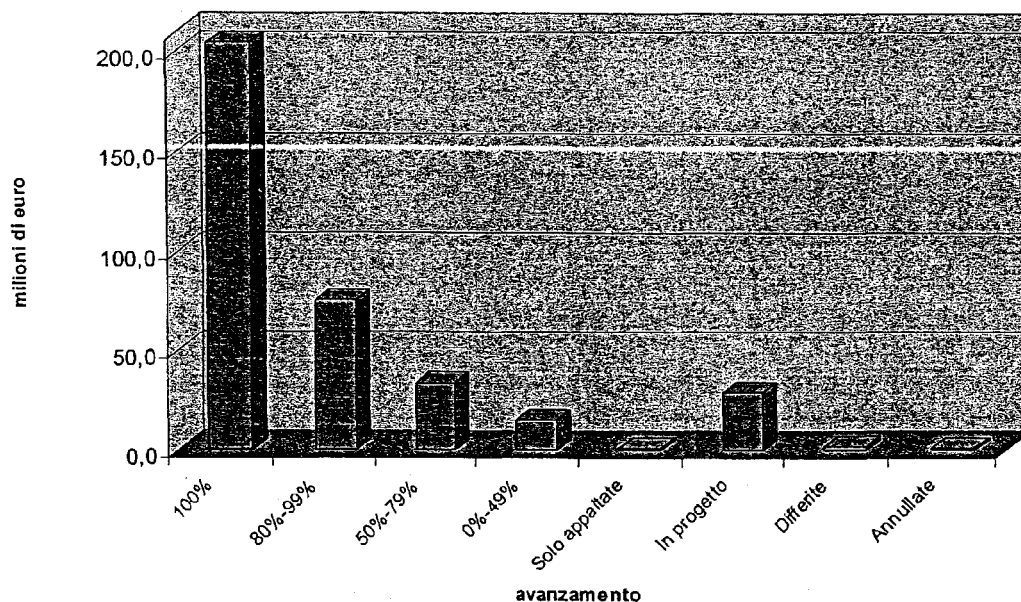

Ripartizione % importi per stato di avanzamento lavori

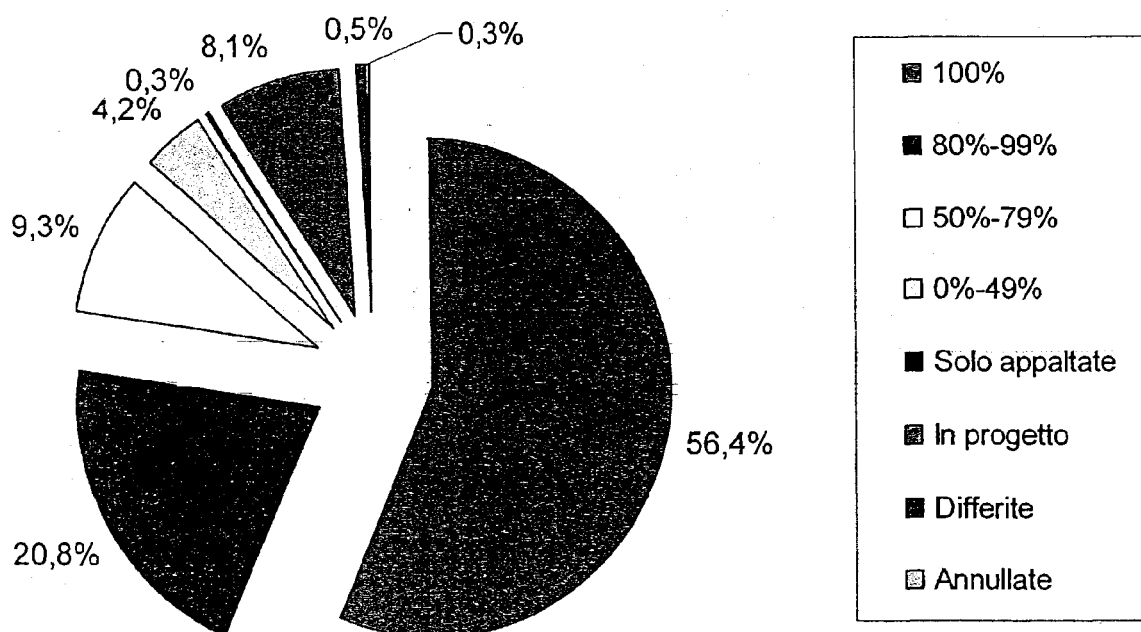

4.2 Sintesi ed analisi relative alla ripartizione degli importi (finanziamento Legge 285) per avanzamento lavori.


Con riferimento al *“Quadro riassuntivo attuazione opere connesse aggiornato al 31 dicembre 2006”* si evidenzia che analizzando la quota di finanziamento a carico della Legge 285/2000 delle opere risulta che:

- sono state completate opere per circa 117,5 milioni di euro di lavori pari al 49,3% del finanziamento complessivo (circa 238 milioni di euro)
- sono ormai oltre il 50 % di completamento opere per un importo di oltre 80 milioni di euro pari al 34 % del finanziamento complessivo.
- sono avviate ed in fase di realizzazione opere per un ammontare di circa 12 milioni di euro pari a circa il 5,2 % del finanziamento complessivo.
- sono in fase progettuale opere per un ammontare di circa 25 milioni di euro pari al 10,6 del finanziamento complessivo. Per queste ultime opere il Comitato di Regia ha autorizzato le stazioni appaltanti ad impiegare i fondi successivamente all’evento olimpico ai sensi dell’art art. 1 comma 241 Legge 311/2004 (le opere appartengono per la maggior parte ai comparti dei piani strategici Interventi di assetto territoriale, Interventi sul sistema Fognario-Acquedotti-Collettori, Sanità).
- Sono state differite o annullate opere per un ammontare di circa 1,2 milioni di euro pari allo 0,5% del finanziamento complessivo.


Pertanto anche analizzando il finanziamento a carico della Legge 285/2000 sono già realizzate o in fase di realizzazione opere connesse per un ammontare di circa 212 milioni di euro pari a circa il 90% del finanziamento complessivo.

Si allegano i grafici di dettaglio relativi alle considerazioni sopra esposte.

**Ripartizione importi (finanziamento L.285)
per stato di avanzamento lavori**

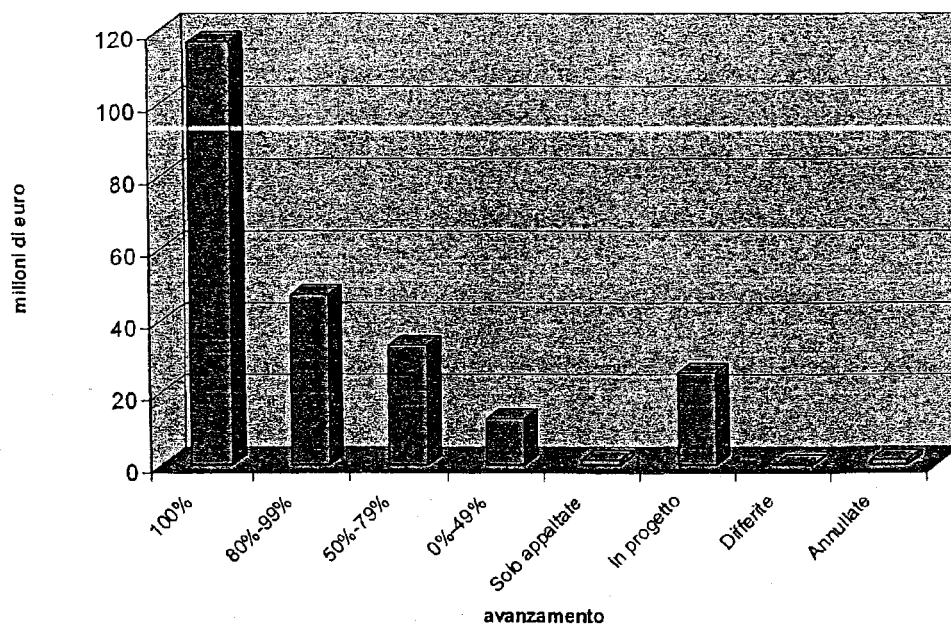

**Ripartizione % importi (finanziamento L.285)
per stato di avanzamento lavori**

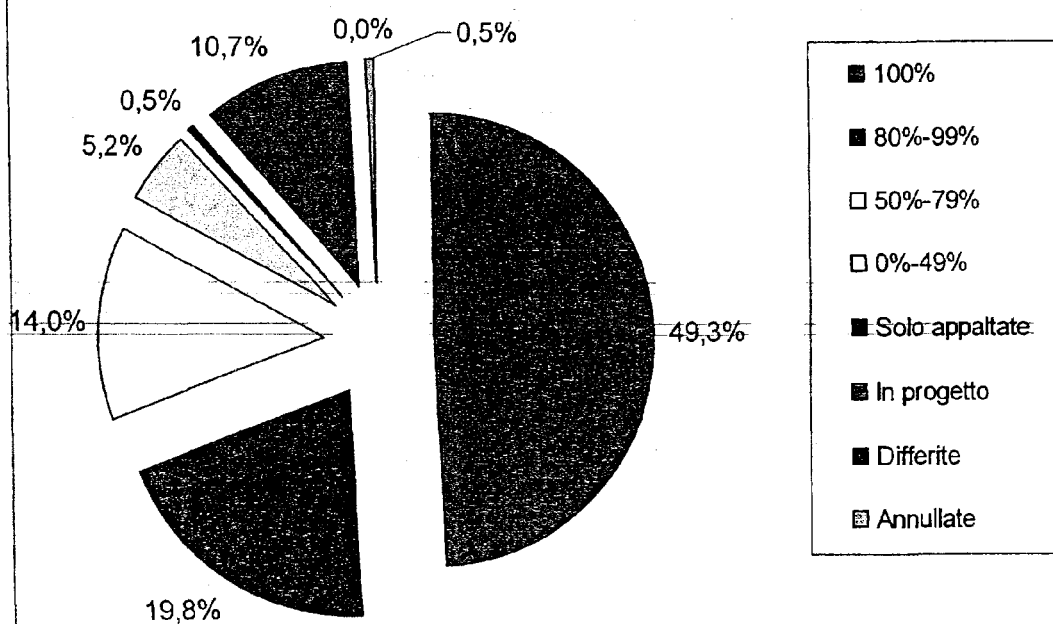

4.3 Sintesi ed analisi relative al numero di opere per stato di avanzamento lavori.


Con riferimento al “*Quadro riassuntivo attuazione opere connesse aggiornato al 31 dicembre 2006*” si evidenzia che analizzando il numero di opere risulta che:

- sono state completate 50 opere, pari al 47,6% del totale
- sono ormai oltre il 50 % 20 opere, pari al 19,1 % del totale.
- sono avviate ed in fase di realizzazione 9 opere, pari al 8,6 % del totale.
- sono in fase progettuale 16 opere, pari al 15,2 % del totale. Per queste ultime opere il Comitato di Regia ha autorizzato le stazioni appaltanti ad impiegare i fondi successivamente all'evento olimpico ai sensi dell'art. 1 comma 241 Legge 311/2004 (le opere appartengono per la maggior parte ai comparti dei piani strategici Interventi di assetto territoriale, Interventi sul sistema Fognario-Acquedotti-Collettori, Sanità).
- Sono state differite o annullate 9 opere, pari al 8,6 % del totale.

Pertanto analizzando il numero di opere sono già realizzate o in fase di realizzazione 80 opere connesse pari circa al 77 % del totale.

Si allegano i grafici di dettaglio relativi alle considerazioni sopra esposte.

Ripartizione numero di opere per stato di avanzamento lavori

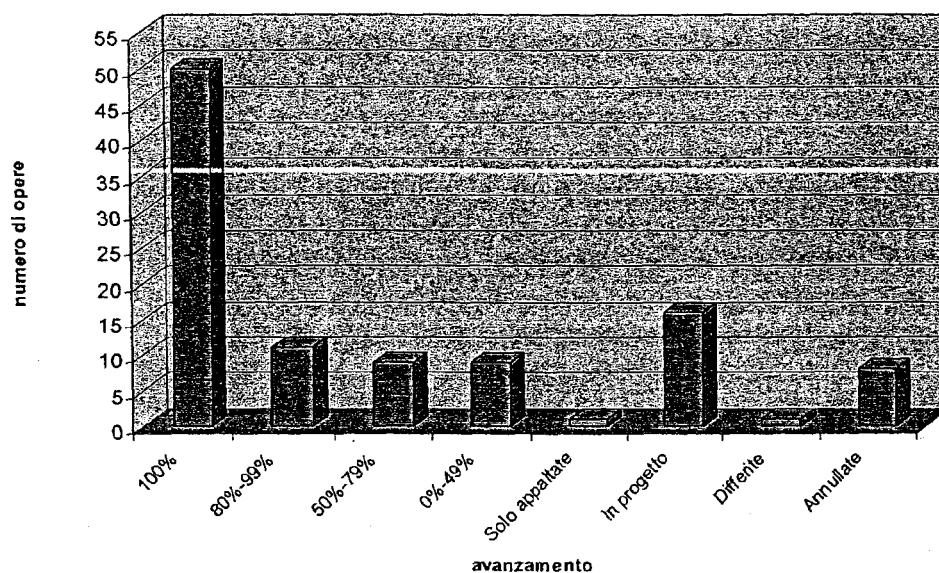

Ripartizione % opere per stato di avanzamento lavori

