



REPUBBLICA ITALIANA


Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

Si evidenzia di seguito lo stato di attuazione degli interventi B* al momento del passaggio al Commissario Straordinario.

INTERVENTI B*			
11	PROGETTAZIONE IN CORSO B *	34,68%	€ 13.705.358,39
11	ISTRUTTORIA IN CORSO B*	62,72%	€ 24.787.875,00
1	LAVORI ULTIMATI B*	2,60%	€ 1.028.981,00
23	TOTALE		€ 39.522.214,39

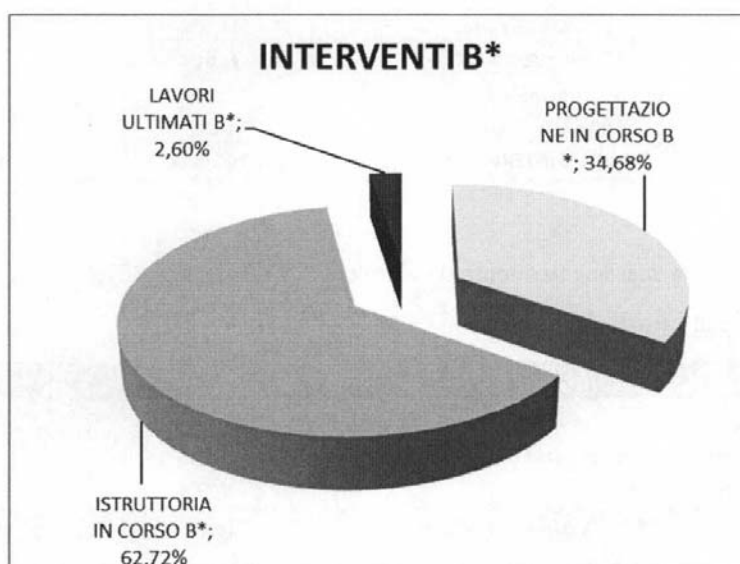

Si sottolinea che l'unico intervento che risulta ultimato (ME065 Ficarra: Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Grenne), se pur ufficialmente trasferito dalla Regione solo a giugno 2012, è stato gestito sempre dalla Struttura Commissariale in quanto inizialmente ricadente in Lettera A e transitato alla Lettera B in sede di Comitato del 24 febbraio 2011, a lavori già avviati.

Pertanto, la Struttura Commissariale ad oggi cura la realizzazione non solo degli interventi individuati nell'Accordo di Programma con la lettera A (n. 94), ma anche gli interventi trasferiti dalla Regione al Commissario quale soggetto beneficiario ed individuati dalla lettera B* (n. 23).

Si rappresenta che le informazioni ed i dati che seguiranno nei successivi paragrafi sono il frutto di comunicazioni pervenute a questo Ufficio da parte dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

In particolare, gli interventi che trovano copertura finanziaria con fondi messi a disposizione dalla regione Sicilia sono 107, ripartiti secondo i vari stati di avanzamento lavori, ed in particolare:

- n. 16 interventi che risultano in fase di istruttoria preliminare;
- n. 26 interventi che risultano in fase di progettazione;
- n. 63 interventi per i quali sono in corso le procedure di gara per l'affidamento dei lavori;
- n. 2 interventi per i quali i lavori sono stati conclusi

<i>Interventi B + B*</i>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
16	<i>Istruttoria in Corso</i>	14,46%	€ 23.169.000,00
26	<i>In fase di Progettazione</i>	26,01%	€ 41.678.331,45
63	<i>In fase di Attuazione Intervento</i>	58,26%	€ 93.350.996,83
2	<i>Interventi Ultimati</i>	1,27%	€ 2.028.657,87
107	TOTALE INTERVENTI	100,00%	€ 160.226.986,15

Analizzando le singole voci singolarmente si evince che:

Interventi in fase di istruttoria in corso

<i>Interventi in fase di Istruttoria B+B*</i>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
7	<i>Progetto ancora non pervenuto</i>	6,99%	€ 11.200.000,00
9	<i>Istruttoria Progetto</i>	7,47%	€ 11.969.000,00
16	TOTALE Istruttoria in Corso	14,46%	€ 23.169.000,00


Gli interventi che risultano in fase di istruttoria sono così suddivisi:

- n. 7 interventi per i quali non sono ancora stati acquisiti i progetti;
- n. 9 interventi per i quali si sta ancora svolgendo l'istruttoria preliminare a causa della carenza di documentazione tecnico – amministrativa reperita.

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di istruttoria:



Il Commissario Straordinario Delegato

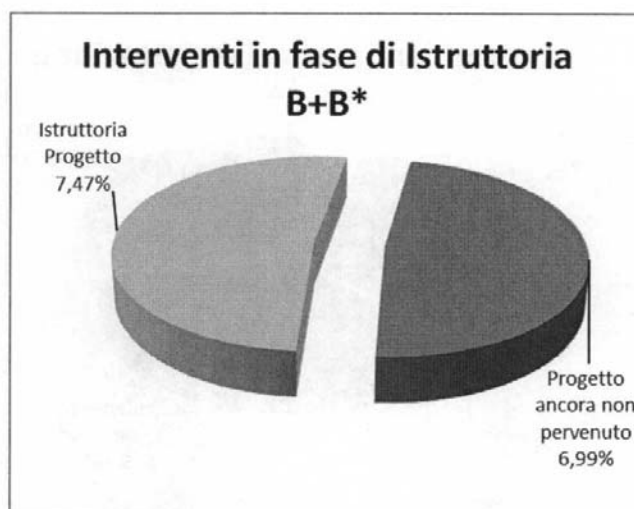

Interventi in fase di progettazione

<i>Interventi in fase di Progettazione B+B*</i>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
8	<i>Intervento finanziato</i>	9,18%	€ 14.708.973,06
10	<i>Progettazione in corso</i>	8,67%	€ 13.894.000,00
8	<i>PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</i>	8,16%	€ 13.075.358,39
26	TOTALE in fase di PROGETTAZIONE	26,01%	€ 41.678.331,45

Gli interventi che risultano in fase di progettazione sono così suddivisi:

- n. 8 interventi per i quali è stato già emesso il Decreto di Finanziamento;
- n. 10 interventi per i quali è in corso la redazione del progetto esecutivo.
- n. 8 interventi per i quali si è in attesa dei pareri sul progetto presentato.

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di progettazione:




REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

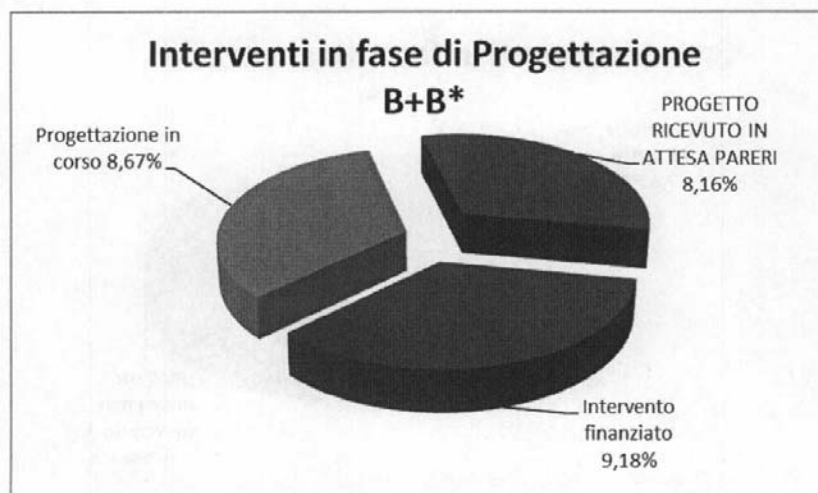

Interventi in fase di attuazione

<i>Interventi in fase di Attuazione B+B*</i>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
3	<i>Predisposizione atti di gara</i>	4,49%	€ 7.200.000,00
4	<i>Contratto stipulato</i>	3,72%	€ 5.953.161,34
27	<i>Affidamento Lavori</i>	27,34%	€ 43.809.308,23
29	<i>Avviati Lavori</i>	22,71%	€ 36.388.527,26
63	TOTALE in fase di attuazione intervento	58,26%	€ 93.350.996,83

Gli interventi che risultano in fase di attuazione sono così suddivisi:

- n. 3 interventi per i quali è in corso la predisposizione degli atti di gara;
- n. 4 interventi per i quali sono state già espletate le procedure di gara per la realizzazione degli interventi ed è già stato stipulato il relativo contratto;
- n. 27 interventi per i quali sono in corso le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere;
- n. 29 interventi per i quali i lavori sono in corso di realizzazione.

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di attuazione:




REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

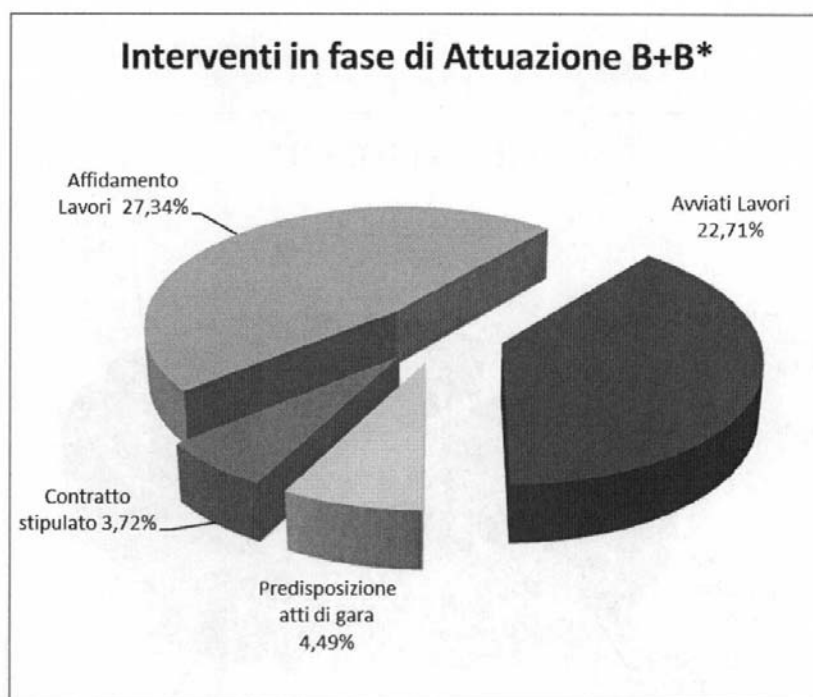

Si riporta di seguito si riporta la tabella degli interventi B suddivisa per lettera di appartenenza (B e B*):

<i>Interventi B + B*</i>			
N. Interventi	Stato	%	€
16	Istruttoria in Corso B	14,46%	€ 23.169.000,00
0	Istruttoria in Corso B*	0,00%	€ 0,00
8	In fase di Progettazione B	9,18%	€ 14.708.973,06
18	In fase di Progettazione B*	16,83%	€ 26.969.358,39
59	In fase di Attuazione Intervento B	51,07%	€ 81.827.121,83
4	In fase di Attuazione Intervento B*	7,19%	€ 11.523.875,00
1	Interventi Ultimati B	0,62%	€ 999.676,87
1	Interventi Ultimati B*	0,64%	€ 1.028.981,00
84	TOTALE Interventi B		€ 120.704.771,76
23	TOTALE Interventi B*		€ 39.522.214,39
107	TOTALE B+B*	100,00%	€ 160.226.986,15




REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

Di cui si riporta di seguito la rappresentazione grafica:

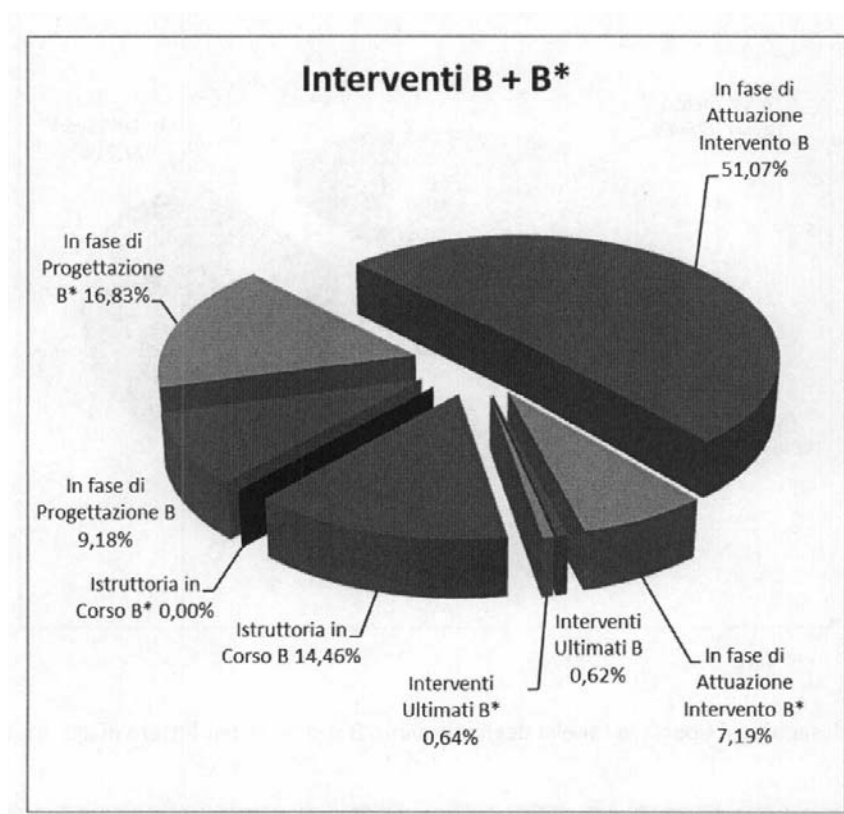

5.2.1 Interventi lettera B* (Ente beneficiario Commissario Straordinario OPCM 3886/10)

Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi ricadenti nella lettera B per i quali il Commissario Straordinario Delegato è stato individuato quale Soggetto Beneficiario, denominati con la Lettera B*.

Come riportato nel par. 4.2, gli interventi identificati con la lettera B* sono 23, ripartiti secondo i vari stati di avanzamento lavori, ed in particolare:

- n. 18 interventi che risultano in fase di progettazione;
- n. 2 interventi per i quali è in corso la predisposizione degli atti di gara per le procedure di affidamento dei lavori;
- n. 2 interventi per i quali i lavori sono in corso di realizzazione
- n. 1 intervento per il quale i lavori sono stati conclusi

Pag. 35 di 45




Il Commissario Straordinario Delegato



Interventi B*			
18	Interventi in fase di Progettazione	68,24%	€ 26.969.358,39
2	Interventi in fase di predisposizione atti di gara	15,69%	€ 6.200.000,00
2	Interventi per i quali i lavori sono avviati	13,47%	€ 5.323.875,00
1	Interventi per i quali i lavori sono ultimati	2,60%	€ 1.028.981,00
23	totale	100,00%	€ 39.522.214,39

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo dello stato di attuazione degli interventi B*:

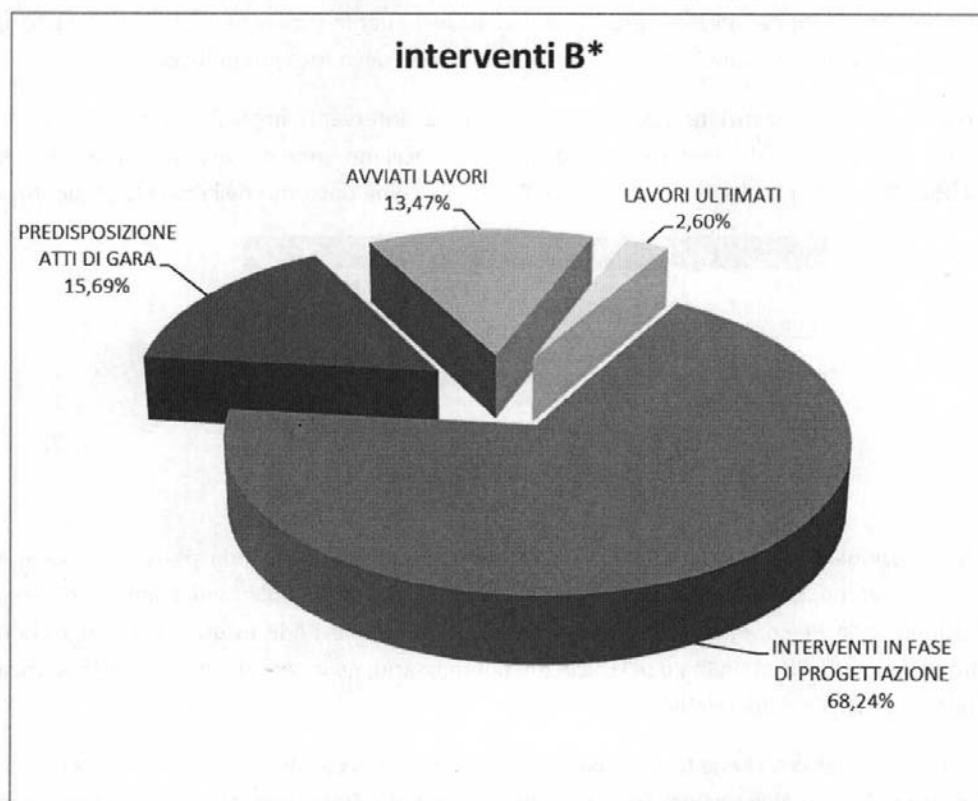

In allegato viene riportato il quadro riepilogativo degli interventi identificati con la lettera B (Allegato 5).



Il Commissario Straordinario Delegato



6 CONCLUSIONI

In questo paragrafo vengono riportate le considerazioni conclusive relative alle attività svolte dal Commissario Delegato per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Sicilia nel periodo dal 10.12.2010 al 18.12.2012.

Come già detto nei paragrafi precedenti l'Accordo di Programma stipulato in data 30.03.2010 ed il successivo Atto Integrativo hanno previsto la suddivisione degli interventi in due distinte lettere ("A" e "B") a seconda dell'origine dei finanziamenti. In entrambi i casi la regione Sicilia ha utilizzato come fonte di finanziamento i fondi provenienti dal *PO FESR 2007-2013*, linea d'intervento 2.3.1. Il Ministero dell'Ambiente ha utilizzato propri fondi di bilancio per la stipula dell'AdP del 30.03.2010 mentre ha messo a disposizione i propri fondi FAS per il successivo Atto integrativo.

Le risorse complessive stanziare per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Siciliana ammontano pertanto ad € **325.588.362,76**, ripartiti tra fondi Ministeriale e Regionale come riassunto nella tabella seguente.

Fondi Ministeriali (lettera A)	
AdP	€ 152.692.572,11
AdP integrativo	€ 12.756.002,61
Totale	€ 165.448.574,72
Fondi Regionali (lettera B)	
AdP	€ 151.644.604,81
AdP integrativo	€ 8.495.183,23
Totale	€ 160.139.788,04



Prima dell'adozione della Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011 da parte della Giunta Regionale di Governo, sancita solo nel gennaio 2012, i vincoli derivanti dai fondi comunitari messi a disposizione dalla Regione Sicilia hanno, di fatto, diviso in due l'AdP in quanto gli stessi non potevano essere nella disponibilità dell'Ufficio del Commissario, né in termini di cassa né in termini di gestione ed attuazione dei relativi interventi.

Tale distinzione ha fatto sì che la fase attuativa degli interventi di cui alla lettera "B" è stata gestita direttamente dalle Amministrazioni comunali (beneficiarie del finanziamento) esclusivamente in regime ordinario e con tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente che disciplina i contratti pubblici sia sul territorio nazionale che europeo.

Nel seguito si riportano i grafici relativi allo stato di attuazione degli interventi suddivisi in lettera A e B, tra i quali sono inclusi i B* di competenza dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato.



Il Commissario Straordinario Delegato

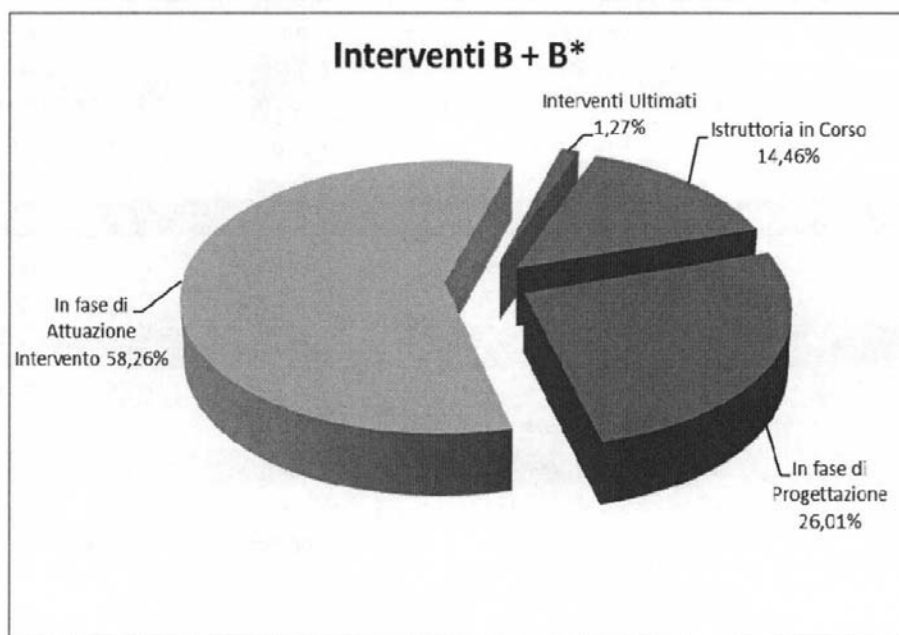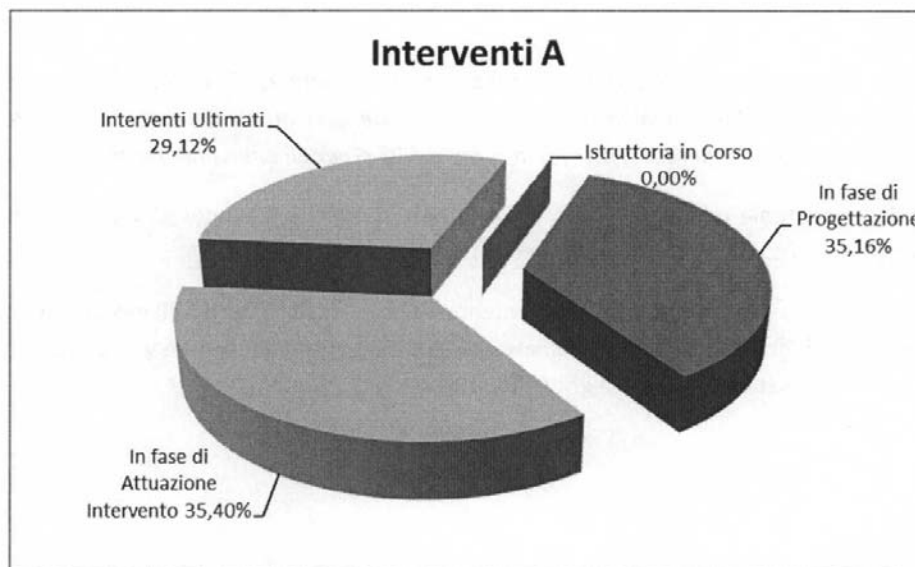



Il Commissario Straordinario Delegato



Dall'esame dei grafici sopra riportati si evince che *la percentuale dello stato d'avanzamento di spesa della fase di ultimazione delle attività raggiunge una quota del circa il 29,12% per gli interventi in lettera "A", mentre si attesta intorno al 1,27% per gli interventi in lettera "B".*


Inoltre, la percentuale relativa alla fase di istruttoria in corso è nulla per gli interventi in lettera "A", mentre si attesta intorno al 14,46% per gli interventi in lettera "B".

Il risultato complessivo dello stato d'avanzamento della spesa dell'intero AdP e del successivo Atto integrativo è quindi il frutto della combinazione dei due grafici precedenti e viene riportato qui di seguito, sia in formato tabellare che grafico:

RIEPILOGO INTERVENTI A + B			
n. interventi	Stato	%	€
0	Istruttoria in Corso A	0,00%	€ 0,00
16	Istruttoria in Corso B	7,12%	€ 23.169.000,00
16	totale interventi istruttoria in corso	7,28%	€ 23.169.000,00
39	In fase di Progettazione A	17,86%	€ 58.137.013,11
26	In fase di Progettazione B	12,80%	€ 41.678.331,45
65	Totale Interventi in fase di Progettazione	30,66%	€ 99.815.344,56
45	In fase di Attuazione Intervento A	17,98%	€ 58.538.457,31
63	In fase di Attuazione Intervento B	28,67%	€ 93.350.996,83
108	Totale Interventi in fase di attuazione	46,65%	€ 151.889.454,14
10	Interventi Ultimati A	14,79%	€ 48.160.000,00
2	Interventi Ultimati B	0,62%	€ 2.028.657,87
12	totale interventi ultimati	15,41%	€ 50.188.657,87
	Economie derivanti da revoche interventi A	0,16%	€ 525.906,19
201	TOTALE	100,00%	€ 325.588.362,76



Il Commissario Straordinario Delegato

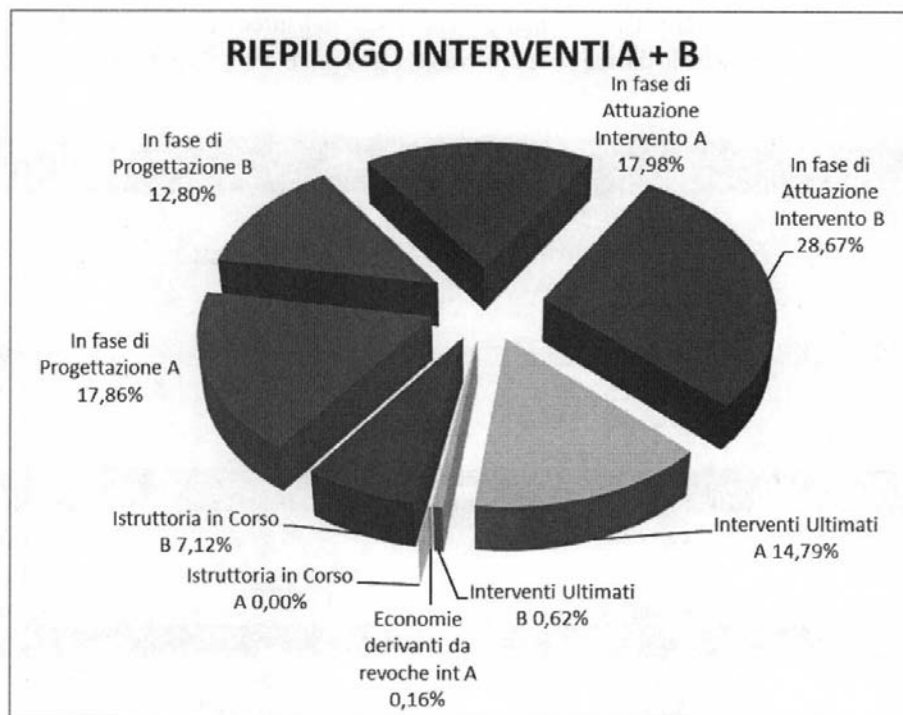



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato




REGIONE SICILIANA

Di seguito si riporta lo stato d'avanzamento della spesa dell'intero AdP e del successivo Atto integrativo operando anche la differenziazione tra gli interventi B e B*, sia in formato tabellare che grafico:

<i>Interventi A + B + B*</i>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
0	<i>Istruttoria in Corso A</i>	0,00%	€ 0,00
16	<i>Istruttoria in Corso B</i>	7,12%	€ 23.169.000,00
0	<i>Istruttoria in Corso B*</i>	0,00%	€ 0,00
16	<i>Totale interventi istruttoria in corso</i>	7,12%	€ 23.169.000,00
39	<i>In fase di Progettazione A</i>	17,86%	€ 58.137.013,11
8	<i>In fase di Progettazione B</i>	4,52%	€ 14.708.973,06
18	<i>In fase di Progettazione B*</i>	8,28%	€ 26.969.358,39
65	<i>Totale Interventi in fase di Progettazione</i>	30,66%	€ 99.815.344,56
45	<i>In fase di Attuazione Intervento A</i>	17,98%	€ 58.538.457,31
59	<i>In fase di Attuazione Intervento B</i>	25,13%	€ 81.827.121,83
4	<i>In fase di Attuazione Intervento B*</i>	3,54%	€ 11.523.875,00
108	<i>Totale Interventi in fase di attuazione</i>	46,65%	€ 151.889.454,14
10	<i>Interventi Ultimati A</i>	14,79%	€ 48.160.000,00
1	<i>Interventi Ultimati B</i>	0,31%	€ 999.676,87
1	<i>Interventi Ultimati B*</i>	0,32%	€ 1.028.981,00
12	<i>totale interventi ultimati</i>	15,41%	€ 50.188.657,87
0	<i>Economie derivanti da revoche int A</i>	0,16%	€ 525.906,19
201	<i>TOTALE</i>	100,00%	€ 325.588.362,76



Il Commissario Straordinario Delegato

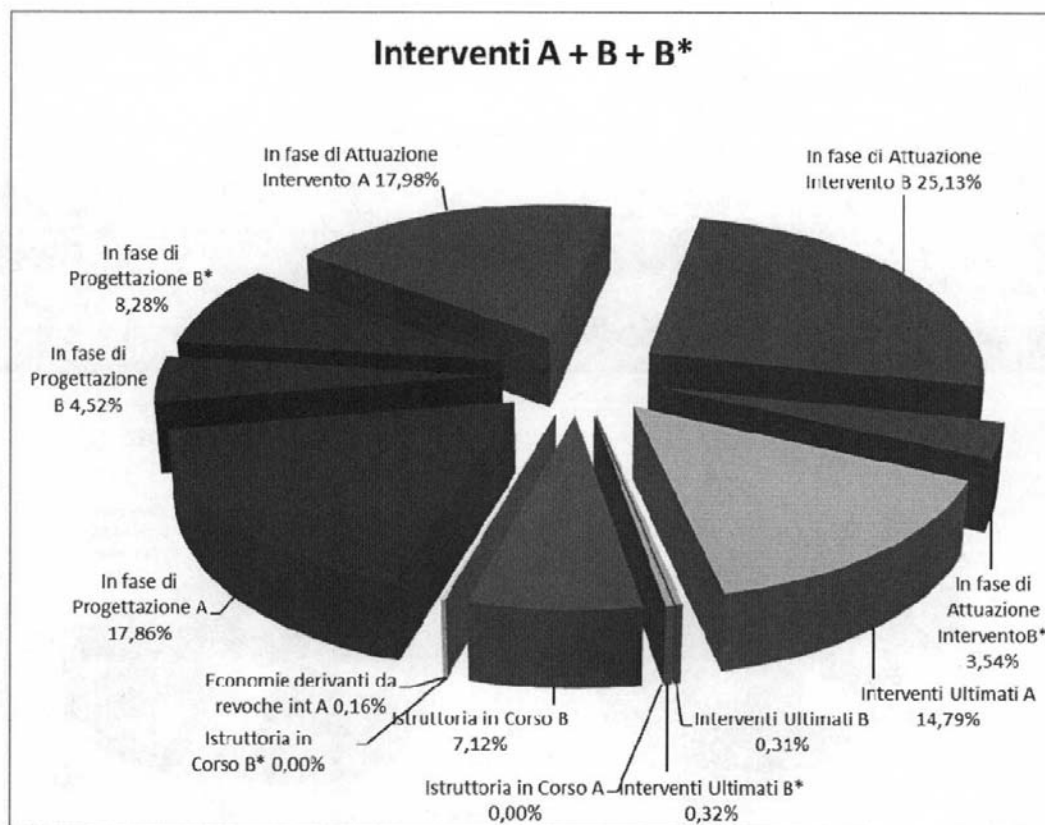

Viene infine qui di seguito riportato sia in formato tabellare e grafico tra lo stato dell'arte degli interventi, distinti in base alla copertura finanziaria, tra i dati riportati nella Relazione Annuale del Commissario Straordinario Delegato al 15.12.2011 con i dati risultati a tutt'oggi.



REPUBBLICA ITALIANA


Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

Raffronto per gli Interventi A

N. Interventi	Stato al 15 dicembre 2011	%	€	N. Interventi	Stato al 20 dicembre 2012	%	€
26	TOTALE Istruttoria in Corso	20,75%	€ 34.339.855,61	0	TOTALE economie da revoche	0,32%	€ 525.906,19
44	TOTALE in fase di Progettazione	37,71%	€ 62.400.000,00	39	TOTALE in fase di Progettazione	35,16%	€ 58.137.013,11
20	TOTALE in fase di attuazione intervento	14,03%	€ 23.221.521,00	45	TOTALE in fase di attuazione intervento	35,40%	€ 58.538.457,31
4	TOTALE interventi Ultimati	27,50%	€ 45.500.000,00	10	TOTALE interventi Ultimati	29,12%	€ 48.160.000,00

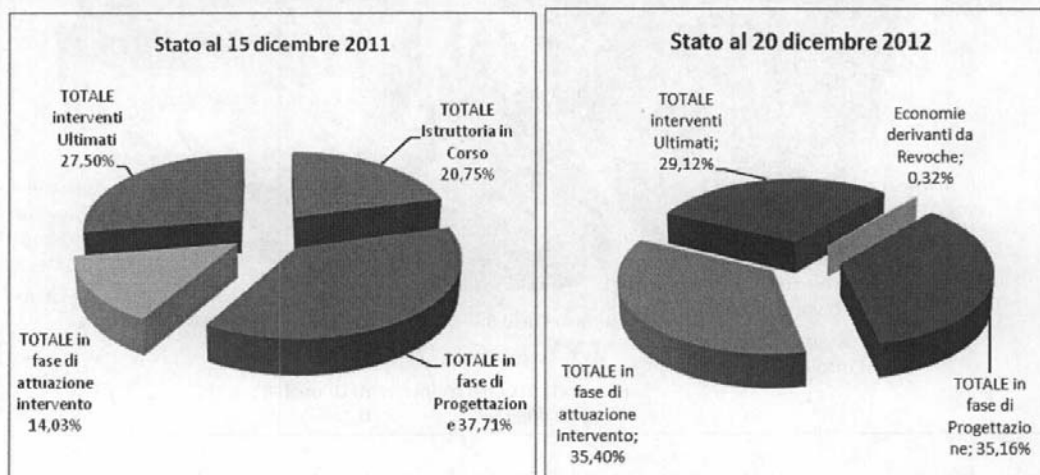



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato





REGIONE SICILIANA

Raffronto per gli Interventi B + B*

N. Interventi	Stato al 15 dicembre 2011	%	€
66	TOTALE interventi in fase di Istruttoria	67,36%	€ 107.864.785,20
4	TOTALE interventi in fase di progettazione	4,59%	€ 7.352.856,00
37	TOTALE interventi in fase di attuazione	28,05%	€ 44.909.344,95
0	Interventi Ultimati	0%	€ -

N. Interventi	Stato al 20 dicembre 2012	%	€
16	TOTALE Istruttoria in Corso	14,46%	€ 23.169.000,00
26	TOTALE in fase di Progettazione	26,01%	€ 41.678.331,45
63	TOTALE in fase di attuazione intervento	58,26%	€ 93.350.996,83
2	TOTALE interventi Ultimati	1,27%	€ 2.028.657,87

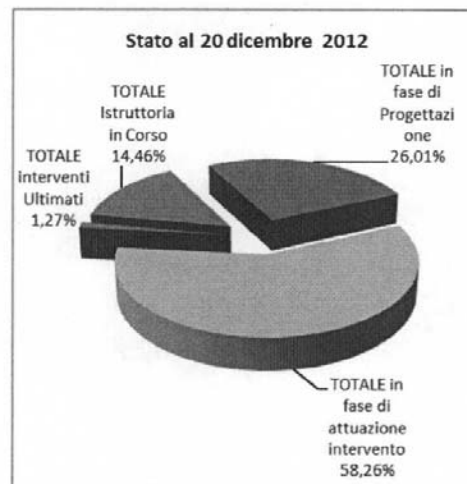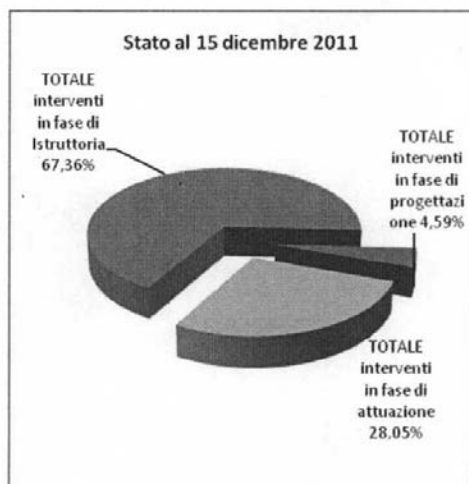

Il Commissario Straordinario Delegato

(Dott. Maurizio Croce)



Il Commissario Straordinario Delegato



Allegati:

Allegato 1 - Quadro riepilogativo degli interventi di cui alle lettere "A" e "B" dell'AdP

Allegato 2 - Quadro riepilogativo delle gare espletate per gli interventi di cui alla lettera "A" dell'AdP

Allegato 3 - Quadro riepilogativo degli interventi di cui alla lettera "A" dell'AdP

Allegato 4 - Stato dell'arte degli interventi identificati con la lettera A in fase di attuazione e relative schede lavori

Allegato 5 - Quadro riepilogativo degli interventi di cui alla lettera "B" dell'AdP.
