



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Per tali n. 20 interventi (considerato anche l'intervento in cod. AP015A/10 in comune di Force), alla data del 31/12/2013 risultava interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto.

Di questi interventi inoltre, a tale data, alcuni erano in fase di gara, alcuni risultavano già aggiudicati e, in n. 2 casi, risultava stipulato il contratto di appalto.

A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi, considerando anche l'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force, **valutato alla data del 31/12/2013.**

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso	Stato avanzamento
AP015A/10	MC	Force	Versante Ovest di Montetorre	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	369.373,38 (1.500.000)	Comune di Force (AP)	In Gara
MC038A-1/10	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	4.210.000	Comune di Porto Recanati (MC). Reg. Marche Serv. ITE	In Gara
MC037A/10	MC	CastelSang. Nera	M Rotondo-M.-Prata ESOND R4	Valanghe	300.000	Comune di CastelSang. Nera	Prog. Ultimata Gara Autorizzata
PU048A/10	PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	Contratto
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000	Comune di Montefalcone App.no	In Gara
PU051A/10	PU	S. Ippolito	Pian di Rose - F-05-0579 R4	Bonifica versante NW	300.000	Comune di Sant'Ippolito (PU). Prov. Pesaro Urbino	Lavori Aggiudicati
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F. Grotazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin. arginature	800.000	Provincia di Fermo	Lavori Aggiudicati
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	Lavori Aggiudicati
MC032A/10	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	Consolidamento centro abitato	800.000	Comune di Cingoli	Contratto
FM020A/10	FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	Completamento consolidamento parete rocciosa	300.000	Provincia di Fermo	Lavori Aggiudicati
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	AP-Marino del Tronto ESOND E4	Consolidamento briglia	1.100.000	Provincia di Ascoli Piceno	Lavori Aggiudicati
PU047A/10	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	Lavori Aggiudicati
AN004A/10	AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000	Comune di Sirolo	In Gara
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000	Comune di Civitanova Marche	Lavori Aggiudicati
AP017A/10	AP	San Benedetto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000	Comune di San Benedetto	Lavori Aggiudicati
FM022A/10	FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000	Provincia di Fermo	Lavori Aggiudicati
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000	Comune di Sassocorvaro	Prog. Ultimata Gara Autorizzata




Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011


Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso	Stato avanzamento
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	S. Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000	Provincia di Fermo	Lavori Aggiudicati
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	Palificata, trincee drenanti	180.000	Comune di Macerata Feltria	In Gara
PU045A/10	PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	Consolidamento frana	400.000	Comune di Montelabbate	Prog. Ultimata Gara Autorizzata

Di seguito si rappresenta in forma grafica lo stato di avanzamento del livello di attuazione di tali interventi, **valutato alla data del 31/12/2013** e con riferimento alle tipologie indicate in tabella:

Per numero di interventi:

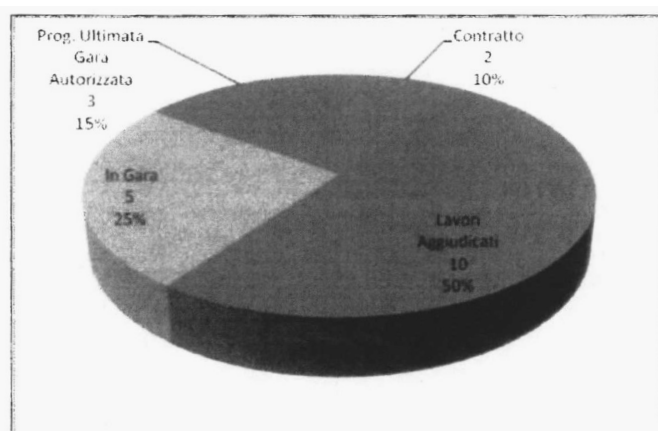

Per entità del finanziamento :

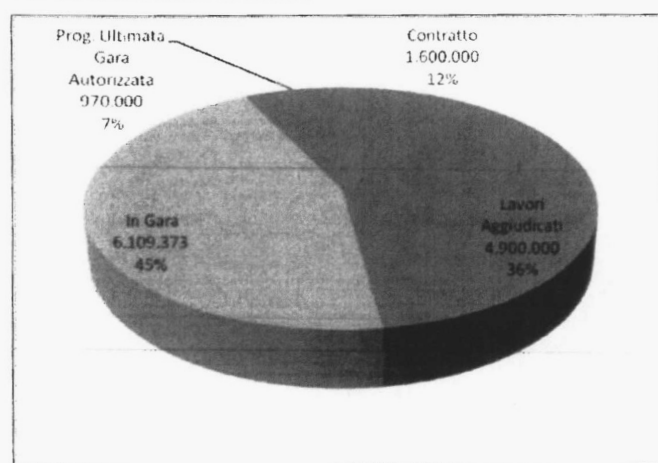

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

8. ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 111, L. 147/2013

Con la legge n. 147 del 27/12/2013 si è data indicazione ai soggetti attuatori degli Accordi di programma in essere di destinare le risorse disponibili in contabilità speciale, nonché le risorse rese disponibili dalle delibere CIPE n. 6/2012 e 8/2012, alla attuazione di interventi immediatamente cantierabili.

In particolare, al riguardo, l'art. 1, comma 111 della citata legge riporta testualmente quanto segue:

“Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. ... OMISSIS ...”

In ottemperanza al disposto della citata norma, nonché in risposta alla nota ministeriale n. 4563/TRI del 11/02/2014, il Commissario con propria nota prot. n. 099 del 14/02/2014 ha comunicato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che alla data del 31/12/2013 risultavano impegnate tutte le risorse esistenti sulla contabilità speciale vincolata n. 5621.

Parimenti si rappresentava che, in attuazione di quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica con nota del 27 novembre 2012 n. 4822 e poi dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica con nota prot. 1859 dell'11 febbraio 2013, risultavano al 31/12/2013 complessivamente impegnate risorse in misura sensibilmente superiore alle risorse a quella data disponibili.

Infatti, risultavano attivati tutti gli interventi per cui era stata possibile definire la copertura finanziaria, derivante dalle somme disponibili in contabilità speciale vincolata n. 5621, quale accredito diretto da parte del MATTM (Euro 5.130.626,62), e dalle somme stanziare dalla Delibera CIPE n. 6/2012 (Euro 13.579.373,38). **Ovvero, n. 33 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 18.710.000.**

Per tali n. 33 interventi, alla data del 31/12/2013 risultava interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto. Di questi interventi, peraltro, alcuni erano in stato di aggiudicazione, in corso di esecuzione e, in n. 6 casi, già ultimati.

Al 31/12/2013 lo stato di avanzamento di tali n. 33 interventi, sinteticamente rappresentato, era il seguente:

- N. 6 Ultimati
- N. 3 In corso di esecuzione
- N. 4 Contratti già stipulati
- N. 11 Lavori aggiudicati
- N. 5 In corso le procedure di gara
- N. 4 Progetto esecutivo approvato e gara autorizzata

Pertanto, al 31/12/2013, a fronte di un accredito complessivo in contabilità speciale vincolata n. 5621 pari a :

- Euro 5.130.626,62 quale accredito diretto da parte del MATTM
- Euro 8.476.419,07 quale quota parte delle somme stanziare dalla Delibera CIPE n. 6/2012

per un totale complessivo pari ad **Euro 13.607.045,69**, corrispondeva un impegno di spesa pari ad **Euro 18.710.000,00**, ovvero con un **disavanzo negativo** pari ad **Euro 5.102.954,31**, corrispondente al valore residuo dei fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012, ancora da accreditare.




Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

9. CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO AL 24 GIUGNO 2014

Sulla base degli atti emessi dal Commissario, nonché di comunicazioni al riguardo fornite dagli enti avvalsi circa le previsioni attuative degli interventi, è stato redatto il seguente cronoprogramma attuativo:

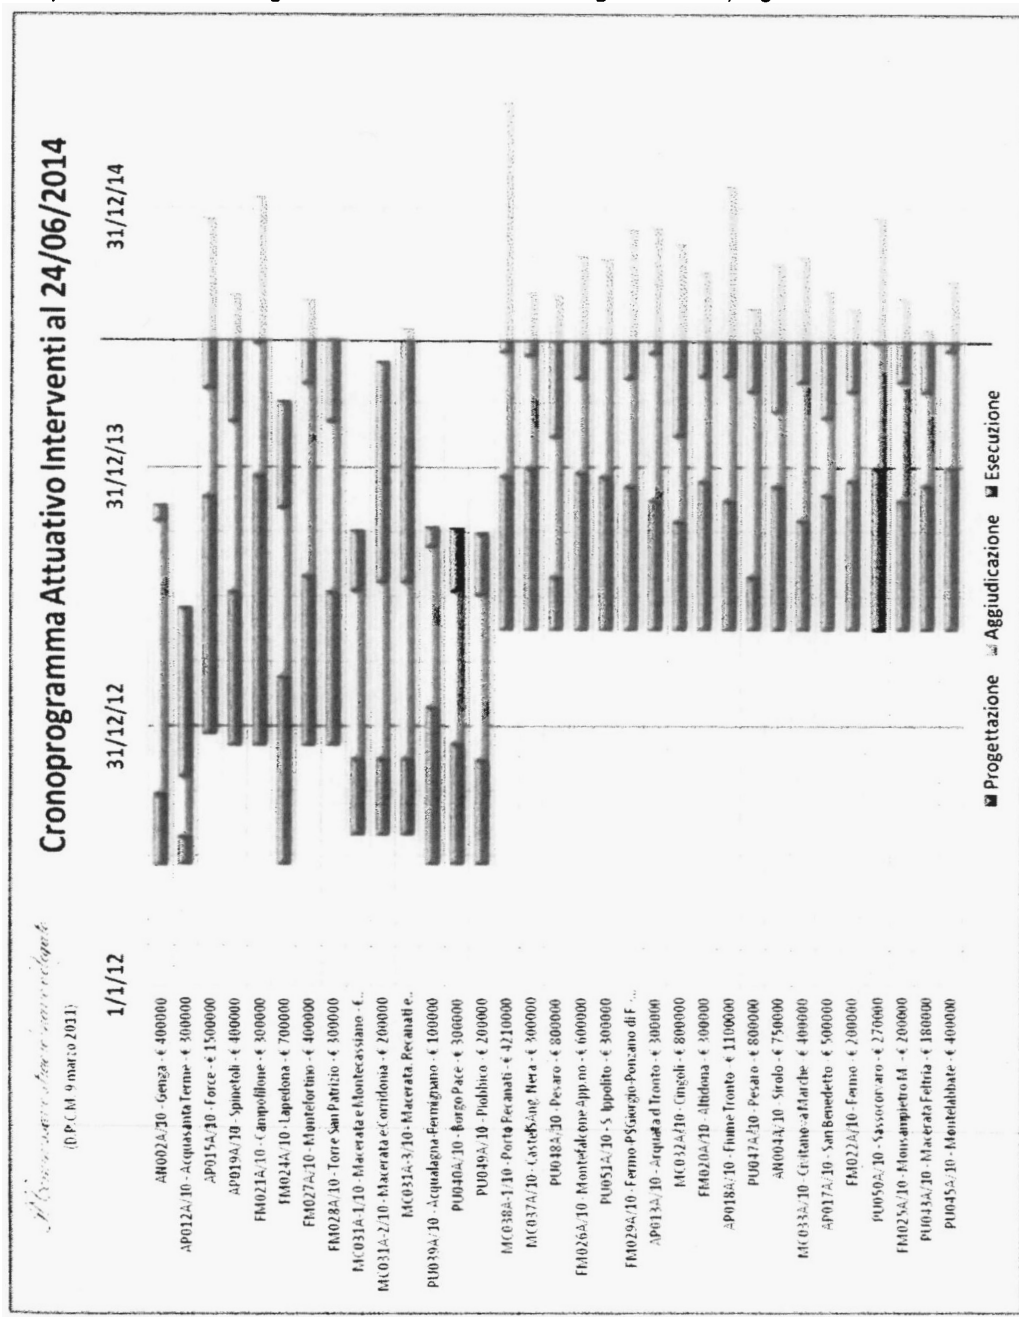



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

**10. RENDICONTO GENERALE DELLA CONTABILITA' SPECIALE E SITUAZIONE DI CASSA IN
TRASFERIMENTO**

ALLEGATO 6

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

11. CRITICITA'

Si ritiene opportuno segnalare che buona parte della attività sino ad ora svolta potrebbe essere condizionata o compromessa dal mancato accreditamento tempestivo delle rimanenti risorse previste dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Parimenti, va segnalato che non risultano ancora avviati tutti gli interventi indicati nella citata nota della Regione Marche 854/2012 quali privi di copertura finanziaria, ed ovvero :

- n. 18 interventi per Complessivi Euro 13.600.000,00 (indicate come "Risorse residue da reperire per ulteriore fase del programma");
- n. 3 + (1) interventi per Complessivi Euro 3.590.000,00 (indicate come "Risorse residue da reperire per fase programmatica (10%)");

stante la perdurante mancanza di copertura finanziaria degli stessi, protratta fino al periodo in questione, associata ad una mancanza di comunicazioni, da parte dei soggetti istituzionali sottoscrittori dell'accordo di Programma, su possibili prospettive di finanziamento futuro.

Si rappresenta la necessità che i soggetti sottoscrittori l'Accordo giungano quanto prima alla stipula dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 25 novembre 2010, come peraltro richiesto dal MATTM con propria nota n. 6824/TRI/DI del 2 marzo 2011, nonché pre-concordato in linea di massima nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012.

In particolare, va osservato che la Regione Marche nel corso del citato Comitato, ha riferito in merito alla "possibilità di traslocare, in sede di stipula dell'Atto Integrativo, alcuni interventi ricadenti nella tabella 1 dell'allegato 1 all'Accordo (quota Stato)" su altre fonti di finanziamento o in quota programmatica, in conseguenza di una eventuale rivalutazione delle priorità.

Pertanto, il Commissario ha ritenuto opportuno attendere, prima di procedere con l'attivazione dei restanti interventi, la stipula dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma ed il conseguente consolidamento del quadro degli interventi, proprio nell'intento di non creare difficoltà alla Regione Marche nel caso in cui, a seguito della rivalutazione delle priorità, fosse stato loro necessario modificare tale elenco di interventi.

Infatti, si sarebbe potuto procedere con la stipula delle relative Convenzioni, previa individuazione dell'amministrazione in avvalimento, con la condizione che le stesse si sarebbero attivate in merito alla cronotempistica di attuazione ed impegni di spesa solo a seguito della avvenuta disponibilità in contabilità speciale vincolata n. 5621 della somma necessaria alla copertura economica dell'intervento. Ma ciò avrebbe poi vincolato la Regione Marche nell'ambito delle proprie valutazioni in sede di stesura dell'atto Integrativo.

Per le motivazioni sopra esposte, a partire dalla data del Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012 il Commissario, naturalmente nell'ambito del proprio ruolo e responsabilità, ha più volte sollecitato ai rappresentanti di Regione Marche la necessità di dare corso all'Atto Integrativo all'Accordo di Programma.

Infine si osserva che l'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di programma, con il riconoscimento di urgenza e priorità per gli interventi in esso previsti, non consente alcuna motivazione nel ritardo della esecuzione delle opere. I danni verificati nel recente passato nuovamente anche nelle Marche, dovrebbero far "diversamente" valutare i costi della prevenzione rispetto quelli, spesso ingenti, connessi al ristoro dei danni conseguenti proprio alla mancata prevenzione.

Con riferimento all'Accordo di Programma, si valuti responsabilmente, da parte di chi regola le norme ed opera le scelte, il rischio collegato alla sospensione di quanto sino ad ora avviato, che potrebbe concretizzarsi qualora si verificasse ritardo nella messa a disposizione delle somme previste, oggi solo in parte accreditate alla contabilità speciale del Commissario. Ovvero, dopo aver operato, con la approvazione dei progetti e l'affidamento dei relativi lavori, sulla base di impegni formalmente assunti da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, si potrebbe ora correre il rischio di non poter onorare alcuni degli impegni assunti e soprattutto garantire la realizzazione delle relative opere.

A questa situazione, di imprevedibilità della disponibilità reale delle risorse per garantire il pagamento delle opere appaltate, ed alle criticità diacroniche precedentemente esposte, si aggiunge ora anche l'avvenuta scadenza del mandato Commissariale, tramite il decreto legge 24 giugno 2014 n. 91. a cui non ha ancora

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

fatto seguito una decisione da parte delle competenti Autorità sulla opportunità o meno di concedere una proroga alla attività in essere.

Se i ritardi nella attuazione complessiva del programma degli interventi sono universalmente riconosciuti in capo alla responsabilità del mancato accreditamento delle risorse, sembrerebbe opportuno valutare la possibilità che gli incarichi siano tempestivamente prorogati sino al compimento delle opere.

In mancanza di tale proroga, la decisione di trasferire tutte le competenze commissariali alle Regioni potrebbe comportare significative conseguenze, tra le quali si possono enucleare le seguenti:

- un periodo di isteresi e di latenza della operabilità della nascente struttura regionale che eredita le competenze;
- un blocco dei pagamenti alle imprese che hanno concluso le lavorazioni loro richieste o che stanno realizzando i lavori, imprese che, come si sa, potrebbero anche trovarsi in condizioni di sofferenza finanziaria;
- non sarà probabilmente possibile rispettare il termine di pagamento delle fatture di cui sopra entro i termini di legge, per cui è presumibile l'insorgenza di una serie di non utili contenziosi;
- potrebbe essere rallentata l'attuazione dei progetti e, di conseguenza, l'efficacia dell'intervento sul territorio.

Si dovrebbe considerare, nell'assumere decisioni, che è in gioco non soltanto il riequilibrio delle finanze dello Stato, ma anche la vita dei cittadini, la loro salute, la salvaguardia dell'ambiente, la "sopravvivenza" di alcune imprese, l'occupazione.

13. QUESTIONI RELATIVE AL SUBENTRO DEL PRESIDENTE REGIONALE

(RIFERIMENTO D.L. 91/2014, art. 10, comma 1)

Danno temuto

Si vuol rappresentare – senza per questo manifestare alcun motivo di sfiducia nella certa capacità del Commissario subentrante – la condizione di pericolo per il territorio della Regione Marche, potenzialmente derivante dalle recenti disposizioni normative che hanno determinato un passaggio di consegne istantaneo, senza possibilità di raccordo progressivo e/o accompagnamento alla nuova gestione.

La complessità del lavoro commissariale finora svolto, consistito in molteplici attività mirate all'attuazione degli interventi precedentemente ascritti dall'Accordo di Programma e dai successivi Atti Integrativi, ha prodotto un'enorme mole di materiale e di documenti (Determine, avvalimenti, corrispondenze, prese d'Atto, progettazioni, studi propedeutici e/o associati, elaborazioni di documentazioni varie, eccetera), la cui conoscenza accurata è fondamentale per la corretta prosecuzione. Conoscenza che non può ottenersi in tempi rapidi ma necessita di approfonditi studi e analisi, oltre che di confronti ormai non possibili in considerazione dello sparuto lasso di tempo (15 giorni, ormai trascorsi) che il Decreto Legge ha disposto per il passaggio di consegne.

Il delicato e fortemente compromesso territorio marchigiano, d'altro canto, sul quale già sono attivi diversi cantieri, non dovrebbe subire un rallentamento dei lavori, considerato che si

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

tratta – come da mandato – di interventi urgenti e prioritari di mitigazione del dissesto idrogeologico al fine della salvaguardia ambientale, dei beni e della sicurezza delle persone.

Per una sintetica interpretazione delle criticità ambientali e territoriali della regione marchigiana, si rappresenta quanto segue.

Uno scenario complessivo di questa natura, la cui conoscenza non può essere improvvisata né acquisita rapidamente, richiama il dovere civile, anche al di là del lavoro commissariale svolto, di segnalare il possibile rallentamento nell'esecuzione degli interventi nonché il possibile insorgere di ostacoli non prevedibili.

In termini più espliciti, si va profilando uno scenario di DANNO TEMUTO¹ che, nella veste di soggetto che conosce approfonditamente lo stato dei luoghi per avervi intensamente lavorato quale Commissario straordinario, va segnalato.

D'altro canto, va sostenuto il *principio di precauzione*, così come normato all'art. 191 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea e dall'art. 301 del Codice dell'Ambiente, secondo la logica del contrastare una previsione di possibile rischio e pericolo (Rif. Art. 2 del d.lgs. 81/2008).

Attualmente, pur avendo consapevolezza riguardo quanto sopra detto, si ritiene utile attendere un lasso di tempo moderato per verificare la più assoluta fondatezza di tali ipotesi, con la riserva di tradurre la previsione di danno temuto in rappresentazione alle autorità competenti, quale azione cautelare mirata a porre fine alla minaccia – sia essa futura o presente – che potrebbe convertirsi in danno concreto.

Tutto ciò, a difesa dell'operato e della funzione di Commissario straordinario che – com'è dimostrabile dalle attività svolte e dalle documentazioni agli atti – si è articolato secondo le più assolute legalità e celerità e onestà intellettuale (sempre in relazione alle poche deroghe ai tempi di legge, concesse ai Commissari per la mitigazione del dissesto idrogeologico), nonché (e soprattutto) a difesa del territorio marchigiano, dell'ambiente e dei beni e della vita dei cittadini.

Il Commissario straordinario

Antonio Senfi
Antonio Senfi

¹ Prevista dall'articolo 1172 del Codice Civile, la denuncia di danno temuto si basa sull'urgenza di provvedere causata dall'esistenza del cosiddetto pericolo nel ritardo. Come richiesto per ogni procedimento cautelare è inoltre necessario che sussista anche una verosimiglianza dell'esistenza del diritto. Si parla di azione di nunciazione perché la denuncia di danno temuto rappresenta un'azione cautelare il cui fine è quello di porre fine a una minaccia – sia essa futura o presente – che potrebbe convertirsi in un danno concreto. La denuncia rappresenta il prodromo a un giudizio ordinario che mira a ottenere un provvedimento di condanna. Dal punto di vista giuridico, in ogni caso, le due azioni sono indipendenti, anche se, allo stato dei fatti, risultano collegate.

AlI. 1 - ELENCO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO DAL 1/04/2014 AL 24/06/2014

Tipologia	Atto		Prot.		Codice intervento	In Comune	Descrizione	All.	Allegati
	n.	Data	n.	Data					
Decreto	033/2014	03/04/14	191	03/04/14	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Approvazione Perizia di variante n. 1	No	
Decreto	034/2014	10/04/14	210	10/04/14	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	035/2014	11/04/14	214	11/04/14	PU049A/10	Piobbico (PU)	Autorizzazione, in sanatoria, lavori in economia	No	
Decreto	036/2014	11/04/14	215	11/04/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici aggiuntivi	No	
Decreto	037/2014	14/04/14	219	14/04/14	AN002A/10	Genga (AN)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No	
Decreto	038/2014	14/04/14	220	14/04/14	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Approvazione Perizia di variante n. 1	No	
Decreto	039/2014	22/04/14	232	22/04/14	AP015A/10	Force (AP)	Autorizzazione procedure di espropri ed asservimenti	No	
Decreto	040/2014	09/05/14	258	09/05/14	AN002A/10	Genga (AN)	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL	No	
Decreto	041/2014	09/05/14	259	09/05/14	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 4 e disposizione di pagamento 4 SAL	No	
Decreto	042/2014	12/05/14	261	12/05/14	MC032A/10	Cingoli (MC)	Liquidazione quota parte spese per indagini specialistiche	No	
Decreto	043/2014	12/05/14	262	12/05/14	PU048A/10	Pesaro (PU)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No	
Decreto	044/2014	13/05/14	264	13/05/14	MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	045/2014	16/05/14	271	16/05/14	PU049A/10	Piobbico (PU)	Liquidazione spese per lavori in economia	No	
Decreto	046/2014	20/05/14	276	20/05/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	047/2014	20/05/14	277	20/05/14	FM022A/10	Fermo (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No	
Decreto	048/2014	27/05/14	285	27/05/14	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	049/2014	06/06/14	301	06/06/14	AP018A/10	Ascoli Piceno	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	050/2014	11/06/14	302	11/06/14	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No	
Decreto	051/2014	11/06/14	303	11/06/14	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo	No	
Decreto	052/2014	11/06/14	304	11/06/14	AP017A/10	San Benedetto del Tronto (AP)	Liquidazione spese per incarichi tecnici, 1a Rata	No	
Decreto	053/2014	13/06/14	321	13/06/14	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	054/2014	13/06/14	322	13/06/14	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	055/2014	13/06/14	323	13/06/14	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No	
Decreto	056/2014	13/06/14	324	13/06/14	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo	No	
Decreto	057/2014	18/06/14	332	18/06/14	MC032A/10	Cingoli (MC)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No	

Al. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

Tipologia	Atto		Prot.		Codice intervento	In Comune	Descrizione	All.	Allegati
	n.	Data	n.	Data					
Ordinanza	1/2012	18/05/12	40	18/05/12	---	---	Collaborazione Tecn. Oper. Regione Marche	No	
Decreto	1/2012	18/05/12	41	18/05/12	---	---	Approv. Linee guida e Convenzione tipo	Si	Linee guida, Conv. Tipo, Cartiglio
Ordinanza	2/2012	12/06/12	53	12/06/12	AN002A/10	Genga (AN)	Avvalimento Comune di Genga (AN)	No	
Ordinanza	3/2012	12/06/12	54	12/06/12	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno	No	
Ordinanza	4/2012	12/06/12	55	12/06/12	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Avvalimento Provincia Pesaro Urbino	No	
Ordinanza	5/2012	12/06/12	56	12/06/12	PU049A/10	Piobbico (PU)	Avvalimento Comune Piobbico (PU) + Prov. PU	No	
Ordinanza	6/2012	12/06/12	57	12/06/12	FM024A/10	Lapedona (FM)	Avvalimento Provincia Fermo	No	
Ordinanza	7/2012	12/06/12	58	12/06/12	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Avvalimento C. M. Alto e Medio Metauro + Comune	No	
Convenzione		18/06/12			AN002A/10	Genga (AN)	Commissario, Regione, Comune di Genga (AN)	No	
Convenzione		19/06/12			AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Commissario, Regione, Provincia Ascoli Piceno	No	
Convenzione		19/06/12			PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Commissario, Regione, Provincia Pesaro Urbino	No	
Convenzione		19/06/12			PU049A/10	Piobbico (PU)	Commissario, Regione, Comune Piobbico (PU), Prov. PU	No	
Convenzione		19/06/12			FM024A/10	Lapedona (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo	No	
Convenzione		19/06/12			PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Commissario, Regione, C. M. Alto e Medio Metauro + Comune	No	
Decreto	2/2012	29/06/12	73	29/06/12	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP	No	
Decreto	3/2012	09/07/12	79	09/07/12	PU049A/10	Piobbico (PU)	Approv. Prog. Definitivo con prescr. e nomina RUP	No	
Decreto	4/2012	16/07/12	91	16/07/12	FM024A/10	Lapedona (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche e nomina RUP	No	
Ordinanza	8/2012	23/07/12	97	23/07/12	MC031A/10	Vari	Avvalimento Provincia Macerata	No	
Decreto	5/2012	27/07/12	98	27/07/12	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP	No	
Decreto	6/2012	30/07/12	99	30/07/12	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP	No	
Decreto	7/2012	31/07/12	100	31/07/12	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP	No	
Convenzione		31/07/12			MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina RUP	No	
Convenzione		31/07/12			MC031A-2/10	MC, Corridonia	Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina RUP	No	
Convenzione		31/07/12			MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina RUP	No	
Decreto	8/2012	06/08/12	113	06/08/12	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	9/2012	06/08/12	114	06/08/12	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	10/2012	06/08/12	115	06/08/12	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Ordinanza	9/2012	27/09/12	133	27/09/12	AP019A/10	Spinetoli (AP)	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno	No	
Ordinanza	10/2012	27/09/12	134	27/09/12	FM021A/10	Campoflone (FM)	Avvalimento C. B. Aso-Tenna-Tronto	No	
Ordinanza	11/2012	27/09/12	135	27/09/12	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Avvalimento Provincia Fermo	No	
Decreto	11/2012	28/09/12	137	28/09/12	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	12/2012	14/11/12	155	14/11/12	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Approvazione Perizia giustificativa, verbale somma urg.	No	
Decreto	13/2012	14/11/12	156	14/11/12	PU049A/10	Piobbico (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	14/2012	16/11/12	170	16/11/12	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	15/2012	16/11/12	171	16/11/12	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	16/2012	16/11/12	172	16/11/12	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	

Al. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

Ordinanza	12/2012	29/11/12	186	29/11/12	FM027A/10	Montefortino (FM)	Avvalimento Provincia Fermo	No
Ordinanza	13/2012	29/11/12	187	29/11/12	AP015A/10	Force (AP)	Avvalimento Comune di Force (AP)	No
Decreto	17/2012	30/11/12	189	30/11/12	FM024A/10	Lapedona (FM)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Convenzione		04/12/12			AP019A/10	Spinetoli (AP)	Commissario, Regione, Provincia Ascoli Piceno, nom. RUP	No
Convenzione		04/12/12			FM021A/10	Campofione (FM)	Commissario, Regione, C. B. Aso-Tenna-Tronto, nom. RUP	No
Convenzione		04/12/12			FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP	No
Convenzione		04/12/12			FM027A/10	Montefortino (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP	No
Decreto	18/2012	07/12/12	193	07/12/12	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Ordinanza	14/2012	10/12/12	198	10/12/12	---	---	Agg. Collaborazione Tecn. Oper. Regione Marche	No
Decreto	19/2012	18/12/12	237	18/12/12	FM021A/10	Campofione (FM)	Autorizzazione affidamento integrazione geologico-geotecnica	No
Ordinanza	15/2012	20/12/12	249	20/12/12	MC032A/10	Cingoli (MC)	Avvalimento Comune di Cingoli (MC)	No
Ordinanza	16/2012	20/12/12	250	20/12/12	PU047A/10	Pesaro (PU)	Avvalimento Provincia Pesaro Urbino	No
Ordinanza	17/2012	20/12/12	253	20/12/12	PU048A/10	Pesaro (PU)	Avvalimento Provincia Pesaro Urbino	No
Ordinanza	18/2012	20/12/12	254	20/12/12	PU051A/10	S. Ippolito (PU)	Avvalimento Comune S. Ippolito (PU) + Prov. PU	No
Ordinanza	19/2012	20/12/12	255	20/12/12	MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Avvalimento Comune di Civitanova Marche (MC)	No
Convenzione		20/12/12			AP015A/10	Force (AP)	Commissario, Regione, Comune Force (AP) e nomina RUP	No
Convenzione		20/12/12			MC032A/10	Cingoli (MC)	Commissario, Regione, Comune Cingoli (MC) e nomina RUP	No
Convenzione		20/12/12			PU047A/10	Pesaro (PU)	Commissario, Regione, Provincia P.U. e nomina RUP	No
Convenzione		20/12/12			PU048A/10	Pesaro (PU)	Commissario, Regione, Provincia P.U. e nomina RUP	No
Convenzione		20/12/12			PU051A/10	S. Ippolito (PU)	Commissario, Regione, Comune S. Ippolito (PU), Prov. PU e nomina RUP	No
Convenzione		20/12/12			MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Commissario, Regione, Comune Civitanova M. (MC) e nomina RUP	No
Ordinanza	20/2012	21/12/12	257	21/12/12	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno	No
Ordinanza	21/2012	21/12/12	258	21/12/12	AP018A/10	Ascoli Piceno	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno	No
Ordinanza	22/2012	21/12/12	259	21/12/12	FM029A/10	Giorgio-Ponzano di F. Grotta	Avvalimento Provincia Fermo	No
Ordinanza	23/2012	21/12/12	260	21/12/12	FM020A/10	Altidona (FM)	Avvalimento Provincia Fermo	No
Ordinanza	24/2012	21/12/12	262	21/12/12	FM022A/10	Fermo (FM)	Avvalimento Provincia Fermo	No
Ordinanza	25/2012	21/12/12	263	21/12/12	FM025A/10	Monsampietro M.	Avvalimento Provincia Fermo	No
Ordinanza	26/2012	21/12/12	264	21/12/12	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Avvalimento Comune di Macerata Feltria (PU)	No
Ordinanza	27/2012	21/12/12	266	21/12/12	AN004A/10	Sirolo (AN)	Avvalimento Comune di Sirolo (AN)	No
Ordinanza	28/2012	21/12/12	268	21/12/12	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Avvalimento Comune di Montefalcone App.no (FM)	No
Ordinanza	29/2012	21/12/12	269	21/12/12	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Avvalimento Comune di San Benedetto del tronto (AP)	No
Ordinanza	30/2012	21/12/12	270	21/12/12	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Avvalimento Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC)	No
Ordinanza	31/2012	21/12/12	271	21/12/12	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Avvalimento Comune di Montelabbate (PU)	No
Ordinanza	32/2012	21/12/12	272	21/12/12	PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Avvalimento Comune di Sassocorvaro (PU)	No
Ordinanza	33/2012	21/12/12	273	21/12/12	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Avvalimento Comune Porto Recanati (MC) + Reg. Marche	No
Convenzione		21/12/12			AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Commissario, Regione, Provincia AP e nomina RUP	No
Convenzione		21/12/12			AP018A/10	Ascoli Piceno	Commissario, Regione, Provincia AP e nomina RUP	No
Convenzione		21/12/12			FM029A/10	Giorgio-Ponzano di F. Grotta	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP	No
Convenzione		21/12/12			FM020A/10	Altidona (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP	No

AII. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

Convenzione		21/12/12			FM022A/10	Fermo (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP	No
Convenzione		21/12/12			FM025A/10	Monsampietro M.	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP	No
Convenzione		21/12/12			PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Commissario, Regione, Comune Macerata Feltria (PU) e nomina RUP	No
Convenzione		21/12/12			AN004A/10	Sirolo (AN)	Commissario, Regione, Comune Sirolo (AN) e nomina RUP	No
Convenzione		21/12/12			FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Commissario, Regione, Comune Montefalcone App.no (FM) e nomina RUP	No
Convenzione		21/12/12			AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Commissario, Regione, Comune San Benedetto del tronto (AP) e nomina RUP	No
Convenzione		21/12/12			MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Commissario, Regione, Comune Castelsantangelo sul Nera (MC) e nomina RUP	No
Convenzione		21/12/12			PU045A/10	Montelabbate (PU)	Commissario, Regione, Comune Montelabbate (PU) e nomina RUP	No
Convenzione		21/12/12			PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Commissario, Regione, Comune Sassocorvaro (PU) e nomina RUP	No
Convenzione		21/12/12			MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Commissario, Regione, Comune Porto Recanati (MC) + Reg. Marche e nomina RUP	No
Decreto	01/2013	28/01/13	16	28/01/13	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	02/2013	07/03/13	46	07/03/13	AP015A/10	Force (AP)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici	No
Decreto	03/2013	12/03/13	49	12/03/13	FM024A/10	Lapedona (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	04/2013	26/03/13	62	26/03/13	PU048A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	05/2013	27/03/13	65	27/03/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche	No
Decreto	06/2013	27/03/13	66	27/03/13	FM027A/10	Montefortino (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche	No
Decreto	07/2013	16/05/13	109	16/05/13	MC031A-1/10	MC, Montecosiano	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	08/2013	16/05/13	110	16/05/13	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	09/2013	16/05/13	111	16/05/13	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	10/2013	05/06/13	147	05/06/13	AP012A/10	Acquanova T. (AP)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento I SAL	No
Decreto	11/2013	10/06/13	149	10/06/13	AP019A/10	Spinetoli (AP)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	12/2013	10/06/13	150	10/06/13	MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	13/2013	14/06/13	170	14/06/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	14/2013	14/06/13	171	14/06/13	PU047A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	15/2013	14/06/13	173	14/06/13	AN004A/10	Sirolo (AN)	Autorizzazione indagini specialistiche	No
Decreto	16/2013	14/06/13	174	14/06/13	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Autorizzazione indagini specialistiche	No
Decreto	17/2013	17/06/13	177	17/06/13	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	18/2013	17/06/13	178	17/06/13	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione indagini specialistiche	No
Decreto	19/2013	20/06/13	179	20/06/13	AN004A/10	Sirolo (AN)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici	No
Decreto	20/2013	20/06/13	180	20/06/13	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici	No
Decreto	21/2013	26/06/13	194	26/06/13	FM025A/10	Monsampietro M.	Autorizzazione indagini specialistiche	No
Decreto	22/2013	26/06/13	195	26/06/13	FM020A/10	Allidona (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche	No
Decreto	23/2013	26/06/13	196	26/06/13	FM022A/10	Fermo (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche	No
Decreto	24/2013	26/06/13	197	26/06/13	MC032A/10	Cingoli (MC)	Autorizzazione indagini specialistiche	No
Decreto	25/2013	28/06/13	204	28/06/13	FM029A/10	Giorgio-Ponzano di F.-Grotta	Autorizzazione indagini specialistiche	No
Decreto	26/2013	28/06/13	205	28/06/13	FM027A/10	Montefortino (FM)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	27/2013	28/06/13	206	28/06/13	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Autorizzazione indagini specialistiche	No
Decreto	28/2013	28/06/13	207	28/06/13	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici	No
Decreto	29/2013	04/07/13	211	04/07/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No

AII. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

Decreto	30/2013	05/07/13	212	05/07/13	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche	No
Decreto	31/2013	05/07/13	213	05/07/13	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici	No
Decreto	32/2013	10/07/13	230	10/07/13	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici	No
Decreto	33/2013	10/07/13	231	10/07/13	PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici	No
Decreto	34/2013	10/07/13	232	10/07/13	AP019A/10	Spinetoli (AP)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	35/2013	10/07/13	233	10/07/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	36/2013	15/07/13	234	15/07/13	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL	No
Decreto	37/2013	29/07/13	257	29/07/13	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No
Decreto	38/2013	30/07/13	258	30/07/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici	No
Decreto	39/2013	30/07/13	259	30/07/13	PU048A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	40/2013	30/07/13	260	30/07/13	PU047A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	41/2013	01/08/13	261	01/08/13	FM027A/10	Monterotondo (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	42/2013	06/08/13	272	06/08/13	MC032A/10	Cingoli (MC)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	43/2013	09/08/13	279	09/08/13	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici	No
Decreto	44/2013	09/09/13	285	09/09/13	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	45/2013	16/09/13	291	16/09/13	AP018A/10	Ascoli Piceno	Autorizzazione indagini specialistiche	No
Decreto	46/2013	25/09/13	301	25/09/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No
Decreto	47/2013	25/09/13	305	25/09/13	FM024A/10	Lapedona (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	48/2013	27/09/13	307	27/09/13	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Perizia di variante n. 1	No
Decreto	49/2013	09/10/13	317	09/10/13	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	50/2013	11/10/13	322	11/10/13	AP015A/10	Force (AP)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	51/2013	16/10/13	328	16/10/13	FM025A/10	Monsampietro M.	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	52/2013	16/10/13	331	16/10/13	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No
Decreto	53/2013	16/10/13	332	16/10/13	MC032A/10	Cingoli (MC)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	54/2013	18/10/13	336	18/10/13	MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	55/2013	18/10/13	337	18/10/13	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	56/2013	18/10/13	338	18/10/13	PU047A/10	Pesaro (PU)	Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara	No
Decreto	57/2013	22/10/13	339	22/10/13	AP018A/10	Ascoli Piceno	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	58/2013	29/10/13	358	29/10/13	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No
Decreto	59/2013	29/10/13	359	29/10/13	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	60/2013	04/11/13	360	04/11/13	FM024A/10	Lapedona (FM)	Approvazione Quadro Economico rimodulato	No
Decreto	61/2013	08/11/13	371	08/11/13	FM021A/10	Campofilone (FM)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	62/2013	12/11/13	372	12/11/13	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	63/2013	15/11/13	383	15/11/13	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	64/2013	15/11/13	388	15/11/13	AP018A/10	Ascoli Piceno	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	65/2013	15/11/13	389	15/11/13	FM025A/10	Monsampietro M.	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	66/2013	15/11/13	390	15/11/13	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo	No
Decreto	67/2013	20/11/13	391	20/11/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Presa d'atto studio e Liquidazione spese per incarichi tecnici	No
Decreto	68/2013	21/11/13	395	21/11/13	AP015A/10	Force (AP)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No

AlI. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

Decreto	69/2013	22/11/13	396	22/11/13	AP017A/10	San Benedetto del Tronto (AP)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	70/2013	22/11/13	403	22/11/13	AP015A/10	Forcc (AP)	Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara	No
Decreto	71/2013	26/11/13	408	26/11/13	AN004A/10	Sirolo (AN)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	72/2013	26/11/13	409	26/11/13	FM029A/10	Giorgio-Ponzano di F. Grotta	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	73/2013	02/12/13	424	02/12/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL	No
Decreto	74/2013	02/12/13	425	02/12/13	FM020A/10	Altidona (FM)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	75/2013	02/12/13	426	02/12/13	PU051A/10	S. Ippolito (PU)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	76/2013	02/12/13	427	02/12/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	77/2013	05/12/13	443	05/12/13	FM022A/10	Fermo (FM)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	78/2013	05/12/13	444	05/12/13	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	79/2013	05/12/13	446	05/12/13	FM029A/10	Giorgio-Ponzano di F. Grotta	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	80/2013	05/12/13	447	05/12/13	AN004A/10	Sirolo (AN)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	81/2013	06/12/13	459	06/12/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No
Decreto	82/2013	06/12/13	460	06/12/13	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	83/2013	12/12/13	475	12/12/13	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo	No
Decreto	84/2013	12/12/13	476	12/12/13	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL	No
Decreto	85/2013	12/12/13	477	12/12/13	FM020A/10	Altidona (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	86/2013	13/12/13	478	13/12/13	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo	No
Decreto	87/2013	13/12/13	487	13/12/13	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Autorizzazione incarico supporto al RUP	No
Decreto	88/2013	13/12/13	488	13/12/13	FM022A/10	Fermo (FM)	Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	89/2013	13/12/13	489	13/12/13	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006	No
Decreto	90/2013	13/12/13	490	13/12/13	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006	No
Decreto	91/2013	16/12/13	491	16/12/13	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006	No
Decreto	92/2013	18/12/13	499	18/12/13	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	93/2013	18/12/13	500	18/12/13	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	94/2013	18/12/13	501	18/12/13	PU051A/10	S. Ippolito (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	95/2013	19/12/13	506	19/12/13	PU047A/10	Pesaro (PU)	Liquidazione incarico pubblicazione bando di gara	No
Decreto	96/2013	19/12/13	507	19/12/13	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	97/2013	21/12/13	517	21/12/13	PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	98/2013	21/12/13	518	21/12/13	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Approvazione Progetto Definitivo	No
Decreto	99/2013	21/12/13	519	21/12/13	FM021A/10	Campofione (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	100/2013	24/12/13	525	24/12/13	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	101/2013	31/12/13	536	31/12/13	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	102/2013	31/12/13	537	31/12/13	PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	103/2013	31/12/13	538	31/12/13	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No
Decreto	001/2014	20/01/14	28	20/01/14	AP018A/10	Ascoli Piceno	Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara	No
Decreto	002/2014	20/01/14	29	20/01/14	AP018A/10	Ascoli Piceno	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No
Decreto	003/2014	20/01/14	30	20/01/14	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006 - Rettifica	No
Decreto	004/2014	23/01/14	33	23/01/14	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No

AlI. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

Decreto	005/2014	23/01/14	34	23/01/14	FM027A/10	Montefortino (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	006/2014	24/01/14	35	24/01/14	PU048A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	007/2014	24/01/14	36	24/01/14	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No
Decreto	008/2014	28/01/14	44	28/01/14	AP019A/10	Spinetoli (AP)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	009/2014	03/02/14	68	03/02/14	MC032A/10	Cingoli (MC)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	010/2014	03/02/14	69	03/02/14	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Autorizzazione incarico sorveglianza archeologica	No
Decreto	011/2014	03/02/14	70	03/02/14	AN002A/10	Genga (AN)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No
Decreto	012/2014	18/02/14	101	18/02/14	FM027A/10	Montefortino (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No
Decreto	013/2014	26/02/14	111	26/02/14	FM025A/10	Monsampietro M.	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	014/2014	26/02/14	112	26/02/14	AN002A/10	Genga (AN)	Autorizzazione, in sanatoria, indagini specialistiche	No
Decreto	015/2014	26/02/14	113	26/02/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione incarico sorveglianza archeologica	No
Decreto	016/2014	26/02/14	114	26/02/14	AN004A/10	Sirolo (AN)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici aggiuntivi	No
Decreto	017/2014	26/02/14	115	26/02/14	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	018/2014	03/03/14	123	03/03/14	FM020A/10	Altidona (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	019/2014	03/03/14	124	03/03/14	PU048A/10	Pesaro (PU)	Autorizzazione indagini specialistiche	No
Decreto	020/2014	03/03/14	125	03/03/14	FM020A/10	Altidona (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No
Decreto	021/2014	11/03/14	142	11/03/14	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL	No
Decreto	022/2014	13/03/14	150	13/03/14	FM022A/10	Fermo (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	023/2014	13/03/14	151	13/03/14	PU047A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	024/2014	13/03/14	152	13/03/14	FM025A/10	Monsampietro M.	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No
Decreto	025/2014	14/03/14	157	14/03/14	AN004A/10	Sirolo (AN)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	026/2014	14/03/14	158	14/03/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione incarico collaudo statico	No
Decreto	027/2014	14/03/14	159	14/03/14	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Autorizzazione incarico collaudo statico	No
Decreto	028/2014	21/03/14	169	21/03/14	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche, 1a Rata	No
Decreto	029/2014	21/03/14	170	21/03/14	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Liquidazione spese per incarichi tecnici, 1a Rata	No
Decreto	030/2014	21/03/14	172	21/03/14	FM029A/10	Giorgio-Ponzano di F. Grotta	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	031/2014	21/03/14	173	21/03/14	FM022A/10	Fermo (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No
Decreto	032/2014	27/03/14	184	27/03/14	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 3 e disposizione di pagamento 3 SAL	No
Decreto	033/2014	03/04/14	191	03/04/14	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Approvazione Perizia di variante n. 1	No
Decreto	034/2014	10/04/14	210	10/04/14	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	035/2014	11/04/14	214	11/04/14	PU049A/10	Piobbico (PU)	Autorizzazione, in sanatoria, lavori in economia	No
Decreto	036/2014	11/04/14	215	11/04/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici aggiuntivi	No
Decreto	037/2014	14/04/14	219	14/04/14	AN002A/10	Genga (AN)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No
Decreto	038/2014	14/04/14	220	14/04/14	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Approvazione Perizia di variante n. 1	No
Decreto	039/2014	22/04/14	232	22/04/14	AP015A/10	Force (AP)	Autorizzazione procedure di espropri ed asservimenti	No
Decreto	040/2014	09/05/14	258	09/05/14	AN002A/10	Genga (AN)	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL	No
Decreto	041/2014	09/05/14	259	09/05/14	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 4 e disposizione di pagamento 4 SAL	No
Decreto	042/2014	12/05/14	261	12/05/14	MC032A/10	Cingoli (MC)	Liquidazione quota parte spese per indagini specialistiche	No
Decreto	043/2014	12/05/14	262	12/05/14	PU048A/10	Pesaro (PU)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No

AII. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

Decreto	044/2014	13/05/14	264	13/05/14	MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	045/2014	16/05/14	271	16/05/14	PU049A/10	Piobbico (PU)	Liquidazione spese per lavori in economia	No
Decreto	046/2014	20/05/14	276	20/05/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	047/2014	20/05/14	277	20/05/14	FM022A/10	Fermo (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No
Decreto	048/2014	27/05/14	285	27/05/14	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	049/2014	06/06/14	301	06/06/14	AP018A/10	Ascoli Piceno	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	050/2014	11/06/14	302	11/06/14	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No
Decreto	051/2014	11/06/14	303	11/06/14	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo	No
Decreto	052/2014	11/06/14	304	11/06/14	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Liquidazione spese per incarichi tecnici, 1a Rata	No
Decreto	053/2014	13/06/14	321	13/06/14	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	054/2014	13/06/14	322	13/06/14	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No
Decreto	055/2014	13/06/14	323	13/06/14	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No
Decreto	056/2014	13/06/14	324	13/06/14	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo	No
Decreto	057/2014	18/06/14	332	18/06/14	MC032A/10	Cingoli (MC)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No
