

1.5 STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

1.5.1 Descrizione delle Attività

Considerando le attività descritte nelle precedenti relazioni relative allo stato di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, ed in particolare all'ultima relazione di avanzamento attività, ovvero la "Relazione IV Trimestre 2013 e Relazione di Sintesi Triennale", trasmessa in data 16.04.2014 con nota prot. 953/DCI, si riportano di seguito le attività svolte da questo Ufficio nel periodo 1° Gennaio – 30 Giugno 2013.

1.5.2 Progettazione interventi ed attività di supporto tecnico da parte di Invitalia Attività Produttive S.p.A.

Sulla base della Convenzione sottoscritta l'11 maggio 2012 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A., in forza di quanto previsto nel DPCM 10.12.2010, art. 4, comma 1, in data 14.12.2011, e delle successive note tecnico-operative con cui lo stesso Commissario ha trasmesso ad Invitalia Attività Produttive S.p.A. (IAP), in qualità di Soggetto Attuatore Individuato da Invitalia S.p.A., la lista delle progettazioni di competenza da implementare, la Società, nel periodo di riferimento in oggetto, ha redatto e trasmesso agli Uffici Commissariali:

- Il Progetto preliminare d'intervento e,
- le specifiche tecniche ed i computi relativi alle indagini geologiche da realizzare ai fini della progettazione definitiva o della eventuale indizione della gara di appalto integrato,

relativi a tre degli interventi "traslati", ovvero:

Cod. RENDIS	Comune	titolo intervento	Importo (€)
FG070A/10	Casalnuovo Monterotaro	Mitigazione del rischio idrog. In località "Pagliara"	2.500.000
FG005_1A/10	Volturara Appula	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Migliare - Masseria S. Gregorio	1.500.000
FG025A/10	Volturino	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano	3.290.000

Per i quali gli uffici commissariali, a valle dell'istruttoria svolta, hanno avviato le azioni conseguenti, ovvero la gara di appalto per le indagini da svolgere, come più avanti descritto.

1.5.3 Incontri e collaborazione/progettazione con i Comuni

Nel periodo Gennaio – Giugno 2014 sono proseguiti gli incontri tecnico-operativi con alcuni Comuni, finalizzati alla guida ed alla condivisione delle scelte e dei contenuti progettuali e per la realizzazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE n. 8/2012 nella Regione Puglia.

In particolare i Comuni con cui sono stati svolti incontri e riunioni tecnico- operative e/o amministrative, sia con gli uffici tecnici che, nella maggior parte dei casi, con i Sindaci e/o gli Assessori preposti, sono stati:

- Biccari, Grottaglie, Martinafranca, Motta Montecorvino, Orta Nova, Pietramontecorvino, Rignano Garganico, nell'ottica di proseguire e chiudere le attività progettuali; e procedere con le fasi di approvazione dei progetti e del successivo appalto;
- Accadia, Anzano di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, per i contenuti, le modalità e le procedure previste dal vigente codice appalti, in maniera da poter procedere con le successive fasi di realizzazione degli interventi;
- Accadia, Anzano di Puglia, Cagnano Varano, Carlantino, Castelluccio Valmaggiore, Celenza Valfortore, Fasano, Grumo Appula, Peschici, San Marco La Catola, Seclì, Serracapriola, Terlizzi, Troia, per le autorizzazioni allo svolgimento delle procedure di esproprio propedeutiche alla stipula dei contratti di appalto e/o all'avvio delle attività di cantiere (a seconda del tipo di appalto svolto).

1.5.4 Nomine RUP

I Responsabili del procedimento previsti ai sensi del D.lgs 163/06 e s.m.i. , erano già stati nominati, con specifico Decreto Commissariale, per tutti gli 84 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico indicati Accordo di programma del 25.11.2010, così come modificati dalla Delibera CIPE n. 8/2012 e dall'approvazione in sede di Comitato di Indirizzo e Coordinamento per i 5 interventi "traslati".

Nel 1° semestre 2014 si proceduto alla sostituzione di alcuni RUP, sulla base di mutati assetti di uffici comunali a cui ha fatto seguito una specifica deliberazione di Giunta con cui è stata approvata la nomina di un nuovo RUP, oppure per poter porcedere celermente con attività altrimenti in ritardo, come riassunto nella tabella seguente.

Cod. RENDIS	Comune	Titolo intervento	Decreto nomina commissariale	RUP Commissario
FG009A/10	Accadia	Sistemazione dissesto zona a rischio frane interna al centro urbano, loc. Via Oberdan Impianti Sportivi	n. 161 del 17/03/2014	geom. Giuseppe Di Paola
FG054A/10	Accadia	Sistemazione dissesto idrog. Centro urbano Via Pertini	n. 170 del 21/03/2014	geom. Giuseppe Di Paola
FG051A/10	Apricena	Realizzazione Canale scolmatore - 2° Lotto	n. 316 del 24/06/2014	Ing. Concetta Zuccherino
FG005_1A/10	Volturara Appula	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Migliare - Masseria S. Gregorio	n. 201 del 14/04/2014	Geom. Pasquale Quarato
FG025A/10	Volturino	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano	n. 317 del 24/06/2014	Geom. Giuseppe Clemente

1.5.5 Istruttorie e sopralluoghi

Parallelamente allo svolgimento degli incontri con i Comuni, come già precedentemente illustrato, nel periodo in oggetto sono proseguiti i sopralluoghi diretti del personale tecnico facente parte della struttura commissariale, sulle aree oggetto degli interventi da attuare, secondo le priorità e le disponibilità definite con gli stessi Comuni.

Sono stati quindi espletati sopralluoghi diretti per gli interventi:

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento
TA072A/10 J45D12000260003	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci
BT027A/10 J35D12000050001	Provincia BT	Progetto generale e interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell'Ofanto, dal Ponte Romano alla foce
FG037A/10 J15D12000150003	Orta Nova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova
FG081A/10	Vico del Gargano	Lavori di sistemazione e la regimentazione del Torrente Valle del Melaino

Sono inoltre state condotte le istruttorie sui progetti elaborati e trasmessi dai Comuni, ai fini della verifica della loro congruità, sia in termini di contenuti che di dimensionamenti, alle norme vigenti, sui seguenti interventi:

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento
BR017A/10 J55D12000110003	Fasano	Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano, Zona Laureto - 1° Lotto
TA048A/10 J95D12000130003	Martina Franca	Lavori messa in sicurezza muro contenimento Viale De Gasperi
FG075A/10 J95D12000140003	Orsara di Puglia	Messa in sicurezza "zona 167", consolidamento di n. 2 tratti di Via Gramsci - 2° Stralcio
FG038A/10 J35D12000210003	Peschici	Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento idraulico Canale Calena
FG005A/10 J85D12000170003	Volturara Appula	Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in loc. Sant'Antonio. Progetto di Completamento

A seguito delle istruttorie di cui sopra, una volta trasmessi gli esiti ai Comuni, sono state richieste, ove necessario, integrazioni e/o modifiche progettuali indispensabili per chiudere eventuali carenze progettuali o per adeguare gli elaborati alle norme vigenti.

A seguito di tali integrazioni, ove trasmesse, si è passati quindi alla fase di approvazione dei progetti in sede di Conferenza di Servizi o, ove possibile, direttamente alla progettazione esecutiva o alla gara di appalto (cfr. tabella di sintesi esplicativa dello Stato degli interventi – aggiornato al 27.06.2014 – di cui in Allegato 1).

In aggiunta a quanto sopra sono stati svolti incontri periodici e tavoli tecnici con Enti (Regione Puglia, Autorità di Bacino) per la condivisione di osservazioni e richieste da trasmettere ai Comuni nell'ambito delle suddette istruttorie.

1.5.6 Conferenze di Servizi

Nel periodo in oggetto sono state convocate e svolte, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del DPCM 20 luglio 2011, le Conferenze di Servizi (Cds) per l'approvazione dei progetti preliminari e/o definitivi dei seguenti interventi:

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento
FG068A/10 J45D12000220003	Anzano di Puglia	Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo
FG008A/10 J45D12000120001	Carpino	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato
FG067A/10 J65D12000120003	Faeto	Lavori di consolidamento Area depuratore
BA033A/10 J85D12000190003	Gravina in Puglia	Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e loc. Terrasanta)
FG037A/10 J15D12000150003	Orta Nova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova
FG079A/10 J65D12000130003	San Paolo di Civitate	Lavori sistemazione alveo torrente Staina

1.5.7 Progettazioni e/o attività di supporto progettuale svolti direttamente dalla struttura commissariale

Parallelamente alle attività di sopralluogo e di istruttoria prima descritte, i tecnici della struttura interna dell'ufficio del Commissario hanno proseguito le attività progettuali o di supporto progettuale, per alcuni degli interventi compresi nell'Accordo di Programma che si elencano:

Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo intervento	Tipologia progettazione
TA071A710	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci	Preliminare
FG037A/10	Orta Nova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova	Definitiva/Esecutiva
FG081A/10	Vico del Gargano	Lavori di sistemazione e la regimentazione del Torrente Valle del Melaino	Definitiva

- TA072A/10 – Grottaglie: a valle della decisione di +procedere all'indizione della gara di appalto in modalità "integrata", a valle delle indagini geognostiche appaltate e svolte, è

stata redatta la "Relazione Geologica" finalizzata a far parte della documentazione di gara, come requisito essenziale previsto dal ;

- FG037A/10 – Orta Nova: è istata revisionata completamente la documentazione progettuale a seguito di nuove simulazioni idrauliche svolte, su indicazione e dopo confronto con l'Autorità di Bacino ed il Comune, a seguito di diverse condizioni al contorno da considerare;
- FG081A/10 – Vico del Gargano: a valle del rilievo geologico-tecnico di dettaglio svolto dai tecnici della struttura commissariale, e del confronto con i progettisti in merito alle aree di approfondimento tecnico, è stata redatta la "Relazione geologica sulle indagini", in fase di chiusura.

In aggiunta a tali interventi di cui svolge direttamente la progettazione, la struttura commissariale ha avviato (F. Ofanto) e proseguito, tramite il proprio gruppo di lavoro tecnico interno, attività di supporto alla progettazione ai Comuni relativamente ai seguenti interventi:

Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo intervento	Tipologia di supporto alla progettazione
BT027A/10	Provincia BT	Progetto generale e interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell'Ofanto, dal Ponte Romano alla foce	Rel. Idraulica
FG036A/10	Motta Montecorvino	Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia	Relazione geologica + Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo)
FG074A/10	Motta Montecorvino	Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere - Progetto di completamento	Relazione geologica + Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo)
FG077A/10	Rignano Garganico	Opere di mitigazione del rischio alla confluenza dei torrenti Triolo e Candellaro	Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo)

1.5.8 Espropri

Nel periodo in oggetto, come già in parte accennato al par. 1.6.3, sono state avviate e svolte, a valle del completamento delle procedure di approvazione dei progetti e nelle more della conclusione delle gare di appalto relative, la attività di esproprio necessarie, e previste dalle vigenti norme, per poter avere la piena disponibilità, sia come occupazione temporanea che come esproprio permanente, delle aree di cantiere oggetto degli interventi.

Le attività di esproprio sono state svolte sia direttamente dai Comuni, a valle della loro richiesta esplicita e della successiva autorizzazione commissariale, per gli interventi:

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento
FG009A/10 J25D12000120003	Accadia	Sistemazione dissesto zona a rischio frane interna al centro urbano, loc. Via Oberdan Impianti Sportivi

FG054A/10 J25D12000170003	Accadia	Sistemazione dissesto idrog. Centro urbano Via Pertini
FG021A/10 J45D12000200003	Anzano di Puglia	Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico loc. Gessara
FG068A/10 J45D12000220003	Anzano di Puglia	Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo
FG050A/10 J65D12000110003	Ascoli Satriano	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle
FG055A/10 J75D12000130003	Biccari	Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, comparto Via Manzoni - Piazzale dei Caduti
FG018A/10 J85D12000120001	Bovino	Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale - 1° Lotto
FG028A/10 J95D12000070003	Cagnano Varano	Consolidamento e messa in sicurezza centro urbano loc. Costa - Fosso San Francesco - Valle S. Giovanni - Loc. Fondate
FG029A/10 J35D12000170003	Carlantino	Consolidamento frana Rione Toppo x Lotto
FG031A/10 J85D12000180003	Castelluccio Valmaggiore	Completamento Sistem. Dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura
FG007A/10 J15D12000090003	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano valle Via Regina Margherita. Progetto di completamento
FG084A/10 J15D12000160003	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via F.lli Bandiera
FG001A/10 J55D12000040001	Deliceto	Lavori di consolidamento dissesti idrog. Centro urbano zona Arena Cavata
FG057A/10 J55D12000130003	Deliceto	Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gavittelle
BA073A/10 J95D12000150003	Grumo Appula	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto
FG060A/10 J35D12000230003	Peschici	Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex Canale S. Lucia - 3° Stralcio funzionale
FG026A/10 J45D12000190003	San Marco la Catola	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano, loc. Mulino a fuoco-Via Marconi-Corso Umberto
LE045A/10 J25D12000040001	Seclì	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Seclì
FG041A/10 J95D12000120003	Serracapriola	Completamento lavori di prevenzione del rischio idrog. del centro urbano, Loc. Vallone Don Ciccio. Progetto di completamento
FG061A/10 J95D12000170003	Serracapriola	Completamento lavori prevenzione rischio idrog. centro urbano, Loc. Greppa Petronio. Progetto di completamento

che direttamente da tecnici specificatamente incaricati dal Commissario, per gli interventi:

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento
BA011A/10 J65D12000100003	Alberobello	Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrog. per gli attraversamenti stradali del canale di Via Indipendenza. Progetto di Completamento

FG051A/10 J55D12000160003	Apricena	Realizzazione Canale scolmatore - 2° Lotto
BR016A/10 J55D12000050001	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 1° Lotto
BR058A/10 J55D12000140003	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 2° Lotto
BR059A/10 J55D12000150003	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 3° Lotto
BA042A/10 J15D12000100003	Terlizzi	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere - Lotto di Completamento
FG024A/10 J55D12000090003	Troia	Consolidamento centro abitato zona Via Verdi-Via San Girolamo
FG063A/10 J55D12000180003	Troia	Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto

Sulla base di tali attività, peraltro, e dove necessarie, i RUP hanno provveduto, o stanno provvedendo, ad emettere i "Verballi di Cantierabilità", ex art. 106, comma 3, del DPR 207/10 e s.m.i.

1.5.9 Gare di appalto svolte/in corso

Nel periodo Gennaio – Giugno 2014, sono state svolte le seguenti nuove gare di appalto, sia per lavori di indagine e prove di laboratorio finalizzati al completamento o all'integrazione della progettazione definitiva e/o esecutiva di interventi, sia per opere di mitigazione del rischio idrogeologico:

Indagini e prove di laboratorio geognostico

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento
FG070A/10 J55D12000170003	Casalnuovo Monterotaro	Mitigazione del rischio idrog. in località "Pagliara"
FG025A/10 J95D12000110003	Volturino	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano
BT027A/10 J35D12000050001	Provincia BT	Progetto generale e interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell'Ofanto, dal Ponte Romano alla foce

Opere di mitigazione del rischio idrogeologico

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento	Importo Delibera CIPE n. B/2012 (€)
FG054A/10 J25D12000170003	Accadia	Sistemazione dissesto idrog. Centro urbano Via Pertini	700.000
FG068A/10 J45D12000220003	Anzano di Puglia	Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo	1.000.000

Cantieri conclusi

Nel periodo oggetto della presente relazione si è concluso il cantiere delle opere dell'intervento FG064A/10 - Comune di Volturara Appula "Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la strada comunale Amborchia" per il quale sono in fase di svolgimento le procedure di chiusura amministrativa.

Aggiudicazioni Provvisorie

Sono state disposte n. 6 aggiudicazioni provvisorie:

Località	Comune	Descrizione	Importo (Mio Euro)	Importo (Mio Euro)	Importo (Mio Euro)	Nota
FG062A/10	APRICENA	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCAFFINATORE 2° LOTTO - ADEGUAMENTO DEL CANALE SAN MARTINO NEL COMUNE DI APRICENA (FG)	39,24%	€2.428.787,43	€7.425.980,18	NOTA n. 670/14 del 19/02/2014
FG060A/10	PESCHICI	Sistemazione idraulica strada S. Lucio - ex Canale S. Lucio - 1° Strada Comunale	53,6495%	€1.218.267,35	€1.294.186,79	NOTA n. 662/14 del 11/09/2014
FG073A/10	Grumo Appula	Interventi di presidio e regolatore idraulico in loc. Madonna delle Grazie e Capparito	35,89%	€1.580.080,45	€1.634.388,53	NOTA n. 629/14 del 07/09/2014
FG076A/10	Pudignano	Opere di mitigazione dei rischi idrogeologici nell'area della Zona Industriale	29,25%	€1.685.596,04	€1.704.778,19	NOTA n. 643/14 del 11/03/2014
FG084A/10	Fasano	Progetto generale interventi di ingegnerizzazione e pres. idraulica - Interventi "Torre Clavio" e "Piazza di Grazia" - 1° Lotto	31,71%	€2.775.196,20	€2.850.863,36	NOTA n. 544/14 del 24/02/2014
FG094A/10	Corato	Lavori di adeguamento idraulico dell'abitato	33,77%	€736.117,66	€957.988,30	PROG. N. 663/14 del 11 MARZO 2014

Aggiudicazioni Definitive

Sono state disposte n. 16 aggiudicazioni definitive:

Località	Comune	Descrizione	Importo (Mio Euro)	Importo (Mio Euro)	Nota	Nota	Definito	
FG000A/10	DELICETO AREA CAVATA	COMUNE DI DELICETO (FG) - "Lavori di consolidamento idraulico idrogeologico contro erosione della "Piana Cavata" nel Comune di Deliceto (FG)	39,62%	€1.122.604,42	€1.112.166,71	NOTA n. 127/14 del 14/02/2014	NOTA n. 502/14 del 25/02/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 127/14 del 29/02/2014
FG011A/10	ALBEROBELLO	LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE DEL RICOVERO GEMOLOGICO PER GLI AFFRANCAMENTI STRADALI DEL CANALE DI SAN ROSSOPOLIGNO NEL COMUNE DI ALBEROBELLO	46,34%	€741.407,05	€741.987,26	NOTA n. 266/14 del 21/01/2014	NOTA n. 507/14 del 25/02/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 106/14 del 25/02/2014
FG011A/10	ANZANO DI PUGLIA	Lavori di sistemazione idraulica idrogeologica in Comune	30,48%	€562.582,79	€580.582,79	NOTA n. 254/14 del 12/01/2014	NOTA n. 504/14 del 25/02/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 104/14 del 25/02/2014
FG051A/10	APRICENA	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCAFFINATORE 1° LOTTO - ADEGUAMENTO DEL CANALE SAN MARTINO NEL COMUNE DI APRICENA (FG)	39,24%	€2.428.787,43	€7.425.980,18	NOTA n. 670/14 del 19/02/2014	NOTA n. 543/14 del 24/02/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 112/14 del 26/02/2014
FG029A/10	Pietramontecorvino	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - Progetto di completamento	31,64%	€1.375.878,12	€1.919.176,12	NOTA n. 260/14 del 13/02/2014	NOTA n. 504/14 del 25/02/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 117/14 del 6/03/2014
FG029A/10	Candela	Lavori di sistemazione idraulica idrogeologica nella "Piana Cavata"	33,71%	€420.122,14	€532.222,22	NOTA n. 281/14 del 13/02/2014	NOTA n. 511/14 del 26/02/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 110/14 del 25/02/2014

1	BA046A/10	Altamura	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete idrografica nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)	INTEGRATO APERTA	R.T.I. Research Consorzio Stabile - APOGEO S.R.L.	31.000%	
2	BR051A/10 BR089A/10	Fasano II e III LOTTO	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 1° lotto 3° Lotto	INTEGRATO APERTA prezzo più basso	CONS.COOP (CAPOGRUPPO) - MP LAVORI (MANDANTEI)	54,3268%	
1	FG025A/10	VOLTURRINO	INDAGINI	PER FIDUCIARIZIONE SPECIALI S.N.C.	nota 1321/14 del 4 giugno 2014	NOTA N. 1432/14 DEL 13/04/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 308/14 del 13/04/2014
2	FG070_A10	CASALNUOVO MONTEROTARO	INDAGINI	PER FIDUCIARIZIONE SPECIALI S.N.C.	nota 1320/14 del 4 giugno 2014	NOTA N. 1434/14 DEL 13/04/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 309/14 del 13/04/2014
	BT027A/10	AUT. BAC. PUGLIA (PROV. BAT)	INDAGINI	PER FIDUCIARIZIONE SPECIALI S.N.C.	nota 1322/14 del 4 giugno 2014	NOTA N. 1431/14 DEL 13/04/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 307/14 del 13/04/2014
	FG055A/10	BICCARI	LAVORI APERTA	CONS. S.	NOTA N. 814/14 DEL 01/04/2014 NOTA N. 952/14 DEL 14/04/2014	NOTA N. 976/14 DEL 17/04/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 217/14 del 14/04/2014
	BA088A/10	ALTAMURA	INTEGRATO APERTA	PER FIDUCIARIZIONE SPECIALI S.N.C.	NOTA N. 978/14 DEL 17/04/2014	PROT. N. 1465 DEL 16 GIUGNO 2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 311 del 18 giugno 2014
	FG080A/10	PESCHICI	LAVORI APERTA	CONS. S.	NOTA n. 082/14 del 11/03/2014	NOTA N. 836/14 DEL 01/04/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 189/14 del 01/04/2014
	BA014A/10	CORATO	LAVORI APERTA	PER FIDUCIARIZIONE SPECIALI S.N.C.	NOTA n. 081/14 del 11/03/2014 NOTA N. 708/14 DEL 21/03/2014	NOTA N. 974/14 DEL 17/04/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 214/14 del 14/04/2014
	BR088A/10 BR089A/10	FASANO II E III LOTTO	INTEGRATO APERTA	CONS.COOP (CAPOGRUPPO)	NOTA N. 749/14 DEL 21/03/2014 NOTA Integrativa: PROT. 1268/14 DEL 04/04/2014 NOTA PROT. 1338/14 DEL 9 MAGGIO 2014	PROT. N. 1488 DEL 18 GIUGNO 2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 315 del 18 giugno 2014

Interventi in appalto in fase di approfondimento tecnico-giuridico

CODICE	COMUNE	INTERVENTO	MODALITÀ	IMPRESA	VALORE	DATA
BA011A_10	ALBEROBELLO	lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico per gli attraversamenti stradali del canale di via indipendente nel comune di Alberobello	INTEGRATO APERTA	A.M.C. COOP.ED. ONIC S.R.L.	€ 343.997,05	DECRETO COMMISSARIALE n. 108/14 del 25/02/2014
BR016A/10	Fasano I LOTTO	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 1° lotto	INTEGRATO APERTA	VALORI S.p.A.	€2.859.803,36	DECRETO COMMISSARIALE n. 154/14 del 11/03/2014

Per il primo intervento, di Alberobello, il RUP ha richiesto la sottoscrizione del contratto condizionata alla previa sottoscrizione, da parte dell'Aggiudicataria, di specifiche tecniche integrative inderogabili, necessarie peraltro per la stesura della progettazione esecutiva prevista dall'appalto integrato, e nel rispetto dei pareri emessi dagli organi tecnici in fase di approvazione del progetto. Per il secondo intervento, di Fasano Torre Canne/Pezze di greco 1° lotto, si è in fase di verifica e procedura normativa prevista per un provvedimento impugnativo richiesto dalla seconda classificata.

Contratti stipulati

Sono stati stipulati n. 18 contratti per:

Codice	C.A.R.A.	Tipo di gara	Appalto	Importo in Euro	Data	
					Stipulazione	Registrazione
1	FG026A_10	SAN MARCO LA CATOLA (PG)	LAVORI NEGOCIATA	626.348,03	07/09/2014	Agente delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Anello n. 9063 serie 3 del 15/5/2014
2	BT012A_10	CANOSA (BT)	LAVORI RESTRETTA SEMPLIFICATA	626.963,81	07/09/2014	Agente delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Anello n. 9062 serie 3 del 28/5/2014
3	FG063A_10	TROIA VIA GIARDINETTO	LAVORI APERTA	61.420.550,35	07/09/2014	Agente delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Anello n. 9228 serie 3 del 24/5/2014
4	BR053A/10	SAN PIETRO VERNOTICO	LAVORI NEGOCIATA	6067.405,26	07/09/2014	Agente delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Anello n. 9097 serie 3 del 20/5/2014
5	FG094A/10	PANNI	LAVORI RESTRETTA SEMPLIFICATA	6046.222,75	07/09/2014	Agente delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Anello n. 9022 serie 3 del 08/09/2014
6	FG020A/10	FOGGIA	LAVORI NEGOCIATA	6397.649,09	07/09/2014	Agente delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Anello n. 9217 serie 3 del 22/5/2014
7	FG001_A/10	ANZANO DI PUGLIA	INTEGRATO APERTA	5580.582,79	14/09/2014	Agente delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 1 TRASTEVERE n. 10827 serie 3 del 09/09/2014
8	BA079A/10	PUGNANO	LAVORI APERTA	61.704.778,18	13/09/2014	Agente delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 1 SETTEMILE n. 9887 serie 3 del 08/09/2014
9	FG051A_10	APRINCINA	INTEGRATO APERTA	62.425.960,18	18/09/2014	Agente delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 1 TRASTEVERE n. 10738 serie 3 del 08/09/2014
10	FG021A/10	PIETRAMONTE CORVINO	LAVORI APERTA	61.390.878,12	18/09/2014	Agente delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Anello n. 9464 serie 3 del 28/09/2014
11	BR011_A/10	CISTERMINO	LAVORI RESTRETTA SEMPLIFICATA	6735.364,55	22/09/2014	Agente delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 1 TRASTEVERE n. 10791 serie 3 del 10/09/2014
12	LE045A/10	ANGIARANO	LAVORI NEGOCIATA	6191.486,33	04/09/2014	Agente delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Anello n. 10881 serie 3 del 24/09/2014
13	FG006A/10	CANDOLA	LAVORI APERTA	61.572.121,72	04/09/2014	Agente delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Anello n. 10888 serie 3 del 20/09/2014
14	LE045A/10	SECI*	INTEGRATO APERTA	61.708.827,61	04/09/2014	in attesa di registrazione
15	FG029A/10	CARLANTINO	LAVORI RESTRETTA SEMPLIFICATA	6327.930,91	18/09/2014	in attesa di registrazione
16	FG025A/10	VOLTURNO	INDAGINI	633.592,61	18/09/2014	in attesa di registrazione
17	FG070_A10	CASALNUOVO MONTEBOTARO AUT. BAC.	INDAGINI	625.987,78	18/09/2014	in attesa di registrazione
18	BT027A/10	PUGLIA (PROV. BAT.)	INDAGINI	645.454,42	18/09/2014	in attesa di registrazione
19	FG028A/10	CIGNANO VARANO	LAVORI NEGOCIATA	6574.825,99	30/09/2014	in attesa di registrazione

Contratti da stipulare a valle del verbale ex art. 106, comma 3 del DPR 207/10

In relazione alle procedure espropriative in corso, restano da stipulare n. 16 contratti di appalto, relative agli interventi di seguito elencati:

	Codice	GARA	TITOLO intervento	TITOLO GARA	Azienda	Ribasso
1	FG021_10	CASTELNUOVO VALMAGGIORE	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DISMISUO IDROLOGICO ALLA LOCALITA' "MONTANI" NELL'ABITATO DI CASTELNUOVO VALMAGGIORE ALLA "VIA STRETTA DELLA MINACIA" E "VIA DEGLI EMIGRANTI"	LAVORI NEGOZIATA	CARUSO COSTRUZIONI S.P.A.	33,57%
2	FG03A_10	VICO DEL GARGAND	OPERE DI CONSOLIDAMENTO E ABLISSA IN SICUREZZA TRATTI DI COSTA DISSESTATI LOC. "POGGIUME SAN MENAUC"	LAVORI NEGOZIATA	CORSORZO STABILE GRANDI OPERE S.C.A.R.L. Consorzio ECI 2000	33,53%
3	FG01A/10	SERRACAPRIOLA	Completamento lavori di prevenzione del rischio idrog. del centro urbano, loc. Vittoria Dan Carlo	LAVORI NEGOZIATA	TROMBACOSTRUZIONI S.R.L.	33,48%
4	FG018A/10	BOVINO	Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Casalini Villa Comunale Campo Sportivo, Intervento funzionale - 1° lotto	LAVORI NEGOZIATA	COSTRUZIONI MINICHILLO S.R.L.	33,32%
5	FG024A_10	TIOLA VIA VERDI	CONDIVIDAMENTO CENTRO ABITATO VIA VERDI - VIA SAN GIROLAMO	LAVORI APERTA	PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	33,43%
6	FG081A/10	SERRACAPRIOLA - PETRONIO	Completamento lavori prevenzione rischio idrog. centro urbano, Loc. Gruppo Petronio, Progetto di consolidamento	LAVORI NEGOZIATA	PECIUTO S.R.L.	36,06%
7	FG087A_10	CELERNA VALFORTORE (FG)	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano valle Regina Margherita	LAVORI APERTA	COLGEMA GROUP S.P.A.	33,55%
8	FG078A/10	Bocchette Sant'Antonio	Lavori di consolidamento idrogeologico in Loc. "Scarpelle"	LAVORI NEGOZIATA	COLGEMA GROUP S.P.A.	37,28%
9	FG087A_10	DELICETO (PG) BORGIO SAVITELLE	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano valle Regina Margherita	LAVORI APERTA	ATI ESSETEC PA SYSTEM E TONOLUCCI (GRUPPO) ESSEGREMME S.P.A. (MANDANTE)	33,5993%
10	FG094A/10	CELERNA F.BANDIERA	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano - valle Via F.B. Bandiera	LAVORI APERTA	ROSSO E TONOLUCCI S.P.A.	33,6077%
11	FG081A_10	DELICETO AREA CAVATA	OPERE DI DELICETO (PG) - "Lavori di consolidamento dissesti idrogeologici centro urbano zona "Arno Cavata" nel Comune di Deliceto (PG)"	LAVORI APERTA	M.C.C. S.P.A.	33,6235%
12	FG090A/10	PESCHICO	Strutturazione idraulica strada S. Lucia - in Com. S. Lucia - 2° Strada funzionale	LAVORI APERTA	COGEM GROUP S.P.A.	33,6495%
13	BA073A/10	Grano Appula	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Abitato della Greca e Legopeto	LAVORI APERTA	COSTRUZIONI COTTINI S.R.L.	33,6917%
14	FG026A/10	Bicari	Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, comparto Via Mendoni - Piazza dei Caduti	LAVORI APERTA	C.C.C.S.P.A.	33,7367%
15	FG088A/10	Bocchette Sant'Antonio - Locorotonda	Lavori di consolidamento e recupero di aree consuntive in ingegneria naturalistica in Via Locorotonda-Via Pioppo	LAVORI NEGOZIATA	COLGEMA GROUP S.P.A.	34,57%
16	BA074A/10	Corvito	Lavori di adeguamento struttura dell'abitato	LAVORI APERTA	EDIZIA ITALIANA EDOTO S.R.L. (MANDANTARIS) EDILRINASCITA E Pavese Salvatore & C. S.N.C. (MANDANTE)	33,77%

Bando e procedura di gara per l'aggiornamento dell'Albo dei professionisti

È stato predisposto il Bando per la costituzione dell'elenco dei professionisti cui affidare degli incarichi di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000,00, I.V.A. esclusa. Parallelamente alla predisposizione del Bando si sono attivate le procedure per consentire il corretto inserimento delle istanze di ammissione sulla piattaforma telematica, attraverso l'aggiornamento dei questionari sul sito dedicato al Commissario.

Il Bando è stato approvato con decreto Commissariale n. 215 del 17/04/2014 e pubblicato sul sito www.dissestopuglia.it in data 22 aprile 2014, nonché, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana 5a Serie speciale -n. 47 del 28-4-2014 oltre a n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura regionale (la Gazzetta del Mezzogiorno, Il Sole 24 Ore, La Repubblica e il Quotidiano di Foggia del 29/4/2014).

Al termine della scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione, fissata per le ore 24:00 del 31 maggio 2014 è stata inviata richiesta a I-Faber S.p.A. relativa all'estrazione delle nuove istanze presentate dal 22 aprile al 31 maggio 2014 e sulla base dell'elaborazione del file inviato da

I-Faber S.p.A. è stato predisposto l'Elenco dei professionisti cui affidare incarichi di cui all'art. 91, comma 2 del Codice Appalti.

È stato predisposto il Decreto Commissariale n. 325 del 25 giugno 2014 di approvazione dell'Elenco dei professionisti cui affidare incarichi di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000,00, I.V.A. esclusa.

Lo stesso è stato pubblicato sul sito www.dissestopuglia.it in pari data concedendo quale termine massimo per la presentazione di eventuali chiarimenti e/o integrazioni le ore 24:00 del 7 luglio 2014 da inviare esclusivamente via posta elettronica all'indirizzo ufficiogare@dissestopuglia.it.

Elenco Imprese

Con Decreto commissariale n. 485/13 del 27/11/2013 è stato disposto di istituire, presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, l'Elenco delle imprese per l'anno 2014 per la partecipazione alle gare a procedura ristretta semplificata da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara. Entro il termine previsto dalla normativa sono pervenute 351 istanze di ammissione all'Albo delle imprese pervenute. Al termine della scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione, fissata per le ore 24:00 del 16 dicembre 2013 è stata inviata richiesta a I-Faber S.p.A. l'estrazione delle nuove istanze presentate.

Con decreto Commissariale n. 233 del **7 maggio 2014** è stato approvato l'ELENCO IMPRESE PER GARE A PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER L'ANNO 2014, DA UTILIZZARE ANCHE PER COTTIMI FIDUCIARI E PROCEDURE NEGOZiate SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA.

Lo stesso Elenco è stato pubblicato sul sito del Commissario www.dissestopuglia.it in data 8 maggio 2014 concedendo quale termine massimo per la presentazione di eventuali chiarimenti e/o integrazioni le ore 24:00 del giorno 25 maggio 2014.

Entro il termine concesso per la presentazione di eventuali osservazioni sono pervenute richieste di integrazioni da parte di n. 5 imprese, che a causa di un inconveniente sulla piattaforma loro dedicata sono state impossibilitate alla conferma della propria istanza entro i termini previsti.

Sulla base del file inviato da I-Faber S.p.A. integrato con le 5 imprese di cui sopra, è stato elaborato e predisposto l'Elenco delle Imprese.

Con Decreto Commissariale n. 295 del 4 giugno 2014 è stato approvato l'elenco definitivo per il 2014 delle 356 imprese. Lo stesso è stato pubblicato sul sito del commissario in data 18 giugno 2014.

Tale Elenco prevede per ogni singola impresa l'indicazione dell'anagrafica e dei relativi requisiti per i quali la stessa ha presentato domanda di iscrizione.

Al fine di ottemperare a quanto disposto comma 13 dell'art.123 del D.lgs.163/2006 si sta procedendo al sorteggio pubblico, mediante strumenti informatici, come stabilito al comma 2 dell'art. 4 del citato Decreto 485/13, che determinerà automaticamente l'individuazione *random* dell'ordine di iscrizione dei soggetti aventi titolo ovvero delle imprese da invitare a procedure ristrette semplificate per l'anno 2014.

1.6 LIVELLO DI ATTUAZIONE GLOBALE DEGLI INTERVENTI

Allo stato attuale ed a seguito delle revoche e della suddivisione in più stralci di alcuni progetti, gli interventi sono 84, interamente finanziati dalla Delibera CIPE n. 8 del 2012.

Si riporta qui di seguito un esame analitico dello stato dell'arte degli interventi rientranti nell'Accordo di Programma e nel successivo Atto integrativo dettagliato come segue, che viene in ogni caso dettagliato intervento per intervento in Allegato 1 (lievi differenze nelle somme totali sono dovute alla diversa fase di attuazione, comprendendo questa sia gli interventi con contratto già stipulato ma non ancora avviati operativamente, che i cantieri in effettiva attività).

Qui di seguito si riporta lo stato di avanzamento lavori degli 84 interventi, ed in particolare:

- n. 37 interventi per i quali sono in corso le attività di progettazione, intendendo tutte le fasi propedeutiche la realizzazione degli interventi, pertanto sono inclusi quelli per i quali sono state già affidate le attività di indagini geognostiche o si è in attesa di acquisire le necessarie autorizzazioni e pareri;
- n. 45 interventi per i quali sono in corso le procedure aggiudicazione o di stipula contratto, oppure sono già stati stipulati i contratti, ma le attività operative non sono ancora state avviate in o gli interventi sono in fase di realizzazione;
- n. 2 interventi già ultimati.

Interventi			
37	In fase di Progettazione	44%	€ 93.080.000,00
45	In fase di Attuazione Intervento	54%	€ 99.510.000,00
2	Interventi Ultimati	2%	€ 2.100.000,00

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi




Analizzando le singole voci singolarmente si evince che:

Interventi in fase di progettazione

<i>Interventi in fase di Progettazione</i>			
<i>n. interventi</i>	<i>descrizione</i>	<i>percentuale</i>	<i>importo</i>
9	Progettazione esecutiva in corso	24%	€ 22.360.000,00
28	Progettazione definitiva	76%	€ 70.720.000,00
37	TOTALE in fase di Progettazione		

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di progettazione:

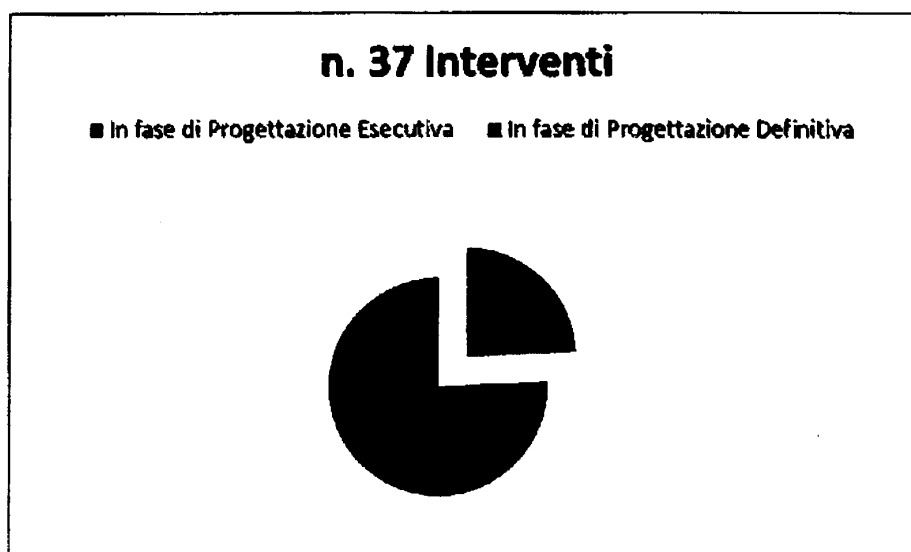


Interventi in fase di attuazione

<i>Interventi in fase di Attuazione</i>			
<i>n. interventi</i>	<i>descrizione</i>	<i>percentuale</i>	<i>importo</i>
5	Aggiudicazione Provvisoria		€ 17.590.000,00
17	Aggiudicazione Definitiva		€ 16.870.000,00
18	Contratto Stipulato/Cantiere in avvio		€ 59.240.000,00
5	Cantiere in attività		€ 5.810.000,00

Gli interventi che risultano in fase di attuazione sono così suddivisi:

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di attuazione:

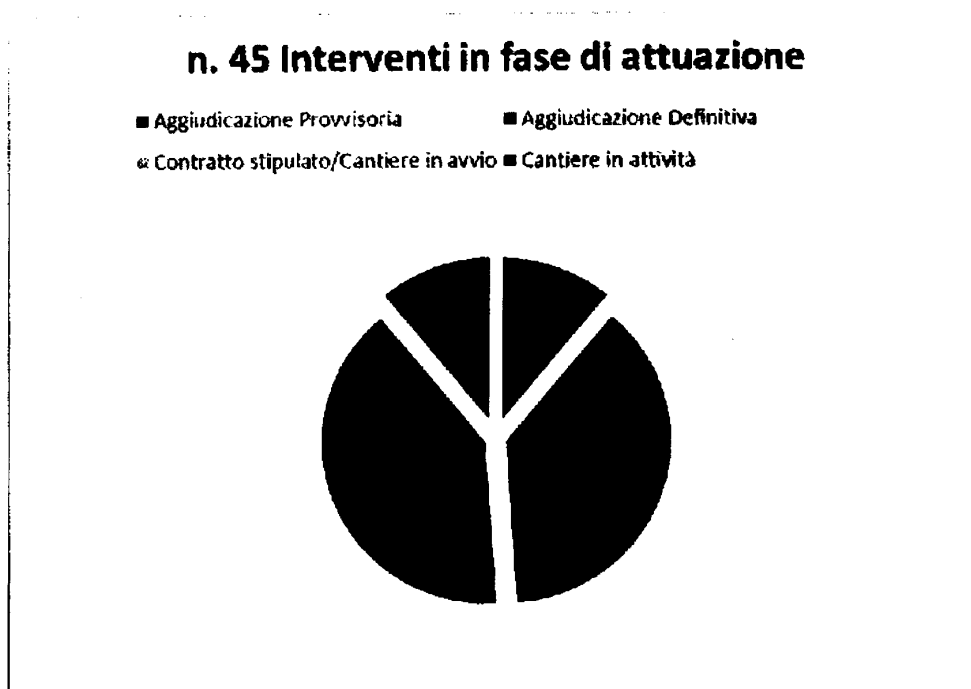

Interventi ultimati

<i>Interventi Ultimati A</i>			
1	BR 015A/10 - Fasano > Loc. Montalbano	71,4%	€ 1.500.000,00
1	FG064A10 - Volturara Appula Strada Ambarchia	28,6%	€ 600.000,00

1.7 PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2014

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	n. interventi PREVISTI al dicembre 2014
Attesa di avvio	n. 0
Esecuzione studi ed indagini	n. 0
In corso di progettazione	n. 2
Progettazione ultimata (da approvare)	n. 5
Tracce esecutive	n. 13
Lavori appalti in corso di esecuzione	n. 52
Interventi	n. 5
Interventi completati	n. 7
TOTALE	84

1.8 CRITICITA'

Nell'ambito dell'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, le criticità possono essere così sinteticamente riassunte:

- per cinque degli interventi previsti dall'Accordo di Programma (AdP) del 25.11.2010 e ribaditi dalla delibera CIPE n. 8 /2012, è stata richiesta, dai rispettivi Comuni, la traslazione del finanziamento in altra area del territorio comunale per urgenti e motivate criticità idrogeologiche occorse nel frattempo e per le quali il pronunciamento da parte del Comitato di Indirizzo e Coordinamento di cui all'AdP sopra citato è pervenuto nel Dicembre 2013. Per 3 di tali interventi sono stati redatti i progetti preliminari e sono in corso le indagini geognostiche per la progettazione definitiva/esecutiva e, probabilmente, si ricorrerà ad un appalto integrato. Per 1 intervento (Pietramontecorvino loc. San Pardo) è in corso la progettazione esecutiva, mentre per l'ultimo intervento (San Pietro Vernotico) è già stato stipulato il contratto di appalto;
- per gli interventi di mitigazione che interessano i corsi d'acqua Ofanto e Fortore, le risorse a disposizione sembrano non essere sufficienti a garantire un significativo effetto di mitigazione del rischio idrogeologico, almeno a livello di frequenza degli eventi alluvionali se non di classe di rischio. Sono comunque in corso le progettazioni degli interventi relativi ai lotti assegnati;
