

In relazione ai lavori di risanamento della galleria Montenuovo sono in corso le procedure di gara e in relazione ai lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 in località Raicelle di Muro Lucano è in corso l'affidamento diretto all'ATI Troiano esecutrice dei lavori principali.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative,
- 2) completamento lavori;
- 3) realizzazione lavori di risanamento della galleria Montenuovo;
- 4) realizzazione lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 in località Raicelle di Muro Lucano;
- 5) allaccio ENEL alla galleria di Montenuovo
- 6) chiusura contabile progetto.

Per la consegna delle opere vedasi punto precedente. Sono in corso contatti con la Regione.

A fronte dell'importo impegnato di €. 24.072.974,87 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 5.584.105,16.

Prog. n. 39/60/COM/6057/03-02

Lavori del III lotto 2° stralcio: (Svincolo di Muro Lucano).

L'importo del progetto preliminare del 3° lotto 2° stralcio (approvato con decreto commissariale n. 1324 del 4.12.2014, ammonta a €.7.415.648,67 di cui €. 6.439.914,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 126.272,82 ed €. 975.734,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

All'attualità è in corso la progettazione definitiva, a seguito di conferenza dei Servizi.

Le attività residue riguardano pertanto:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) progettazione definitiva ed esecutiva;
- 3) affidamento ed esecuzione lavori;
- 4) collaudazione, consegna opere, chiusura contabile.

A fronte dell'importo impegnato di €. 7.415.648,67 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 7.371.242,43.

Prog. n. 39/60/COM/6057/SF : (Lavori di riparazione, consolidamento ed adeguamento del viadotto “Ficocchia”).

L'importo del progetto ammonta a €. 1.985.528,22 di cui €. 1.558.924,78 per lavori compresi oneri diretti ed indiretti di sicurezza pari a €. 46.862,23 ed €. 426.603,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

All'attualità sono in corso le procedure di gara per l'affidamento dei lavori da parte del Provveditorato Interregionale OO.PP. di Napoli, avvalso da questo Ufficio.

Le attività residue riguardano:

- 1) affidamento, esecuzione lavori, collaudazione;
- 2) consegna definitiva opere, attualmente in esercizio provvisorio;
- 3) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 1.985.528,22 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 1.948.273,21.

Prog. n. 39/60/COM/6062: (collegamento Muro Lucano – Baragiano lunghezza tratta di circa 5,4 Km.)

L'importo del progetto ammonta a €. 5.267.107,00 di cui €. 2.276.163,25 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 217.082,32, ed €. 2.990.943,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori principali sono stati appaltati all'ATI Lopardo ed altri.

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (Comune di Muro Lucano, Provincia di Potenza, A.N.A.S.) e sono in regolare esercizio.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative,
- 2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 5.267.107,00 risulta una somma disponibile per

dette attività residue di €. 939.087,18.

Prog. n.39/60/COM/6062/02: (ripristino viadotto Platano-collegamento SS 94)

Il ripristino di detto tratto, che collega l'asse viario Basentana-Baragiano, realizzato nell'ambito di altro progetto e consegnato all'ANAS S.p.A. in via provvisoria da questa Amministrazione in data 2.12.1993 e in via definitiva dall'Ufficio Commissariale in data 11.3.2004, costituisce collegamento necessario per la continuità dell'intero asse stradale Basentana-Muro Lucano. Detti lavori di ripristino, pertanto, si sono resi necessari ai sensi dell'art. 86 c. 1 L. 289/02 a seguito di richiesta dell'ANAS destinatario del medesimo tratto in questione.

L'importo del progetto ammonta a €. 472.951,99 di cui €. 336.341,75 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 10.000,00 ed €. 136.610,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori sono stati appaltati all'Impresa Bochicchio Nunzio.

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati all'Ente competente (A.N.A.S.) ed in regolare esercizio.

Le attività residue riguardano:

1) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 472.951,99 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 104.317,65.

Prog. n.39/40/COM/6063: (collegamento Calitri-Ofantina)

L'importo del progetto ammonta a €. 2.661.864,38 di cui €. 1.435.585,03 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 68.637,29 e oneri di sicurezza speciali pari a €. 30.000,00, €. 57.182,73 per opere complementari compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.754,60 e oneri di sicurezza specifici pari ad €. 1.874,98, €. 12.500,00 per lavori di ripristino quadri elettrici a servizio impianto illuminazione galleria Gagliano compresi oneri specifici di sicurezza pari a €. 247,50 ed €. 1.156.596,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori principali, le opere complementari e i lavori di ripristino quadri elettrici a servizio

impianto illuminazione galleria Gagliano sono stati appaltati all'Impresa I.C.M. s.r.l..

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (Provincia di Avellino e Comune di Calitri) e sono regolarmente aperti al traffico.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 2.661.864,38 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 693.706,91.

Prog. n.39/40/COM/6064: (Svincolo Calitri-Ofantina)

L'importo del progetto ammonta a €. 1.336.634,70 di cui €. 593.420,36 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 34.675,59, €. 132.966,65 per opere integrative e complementari compresi oneri di sicurezza pari a €. 2.983,70, €. 106.100,39 per lavori di ripristino bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'A.I. di Nerico compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.773,94, inseriti tra le somme a disposizione del progetto, ed €. 610.247,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione compresi detti lavori di ripristino bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'A.I. di Nerico.

I lavori principali sono stati appaltati all'Impresa Edil Viro, le opere integrative e complementari all'Impresa Ciardiello Antonio e i lavori di ripristino della bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'A.I. di Nerico all'Impresa Ediltecnostade s.r.l..


I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (ANAS, Provincia di Avellino, Comune di Calitri, Consorzio ASI di Avellino) e sono in regolare esercizio.


Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 1.336.634,70 risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 380.441,29.

CARTINA

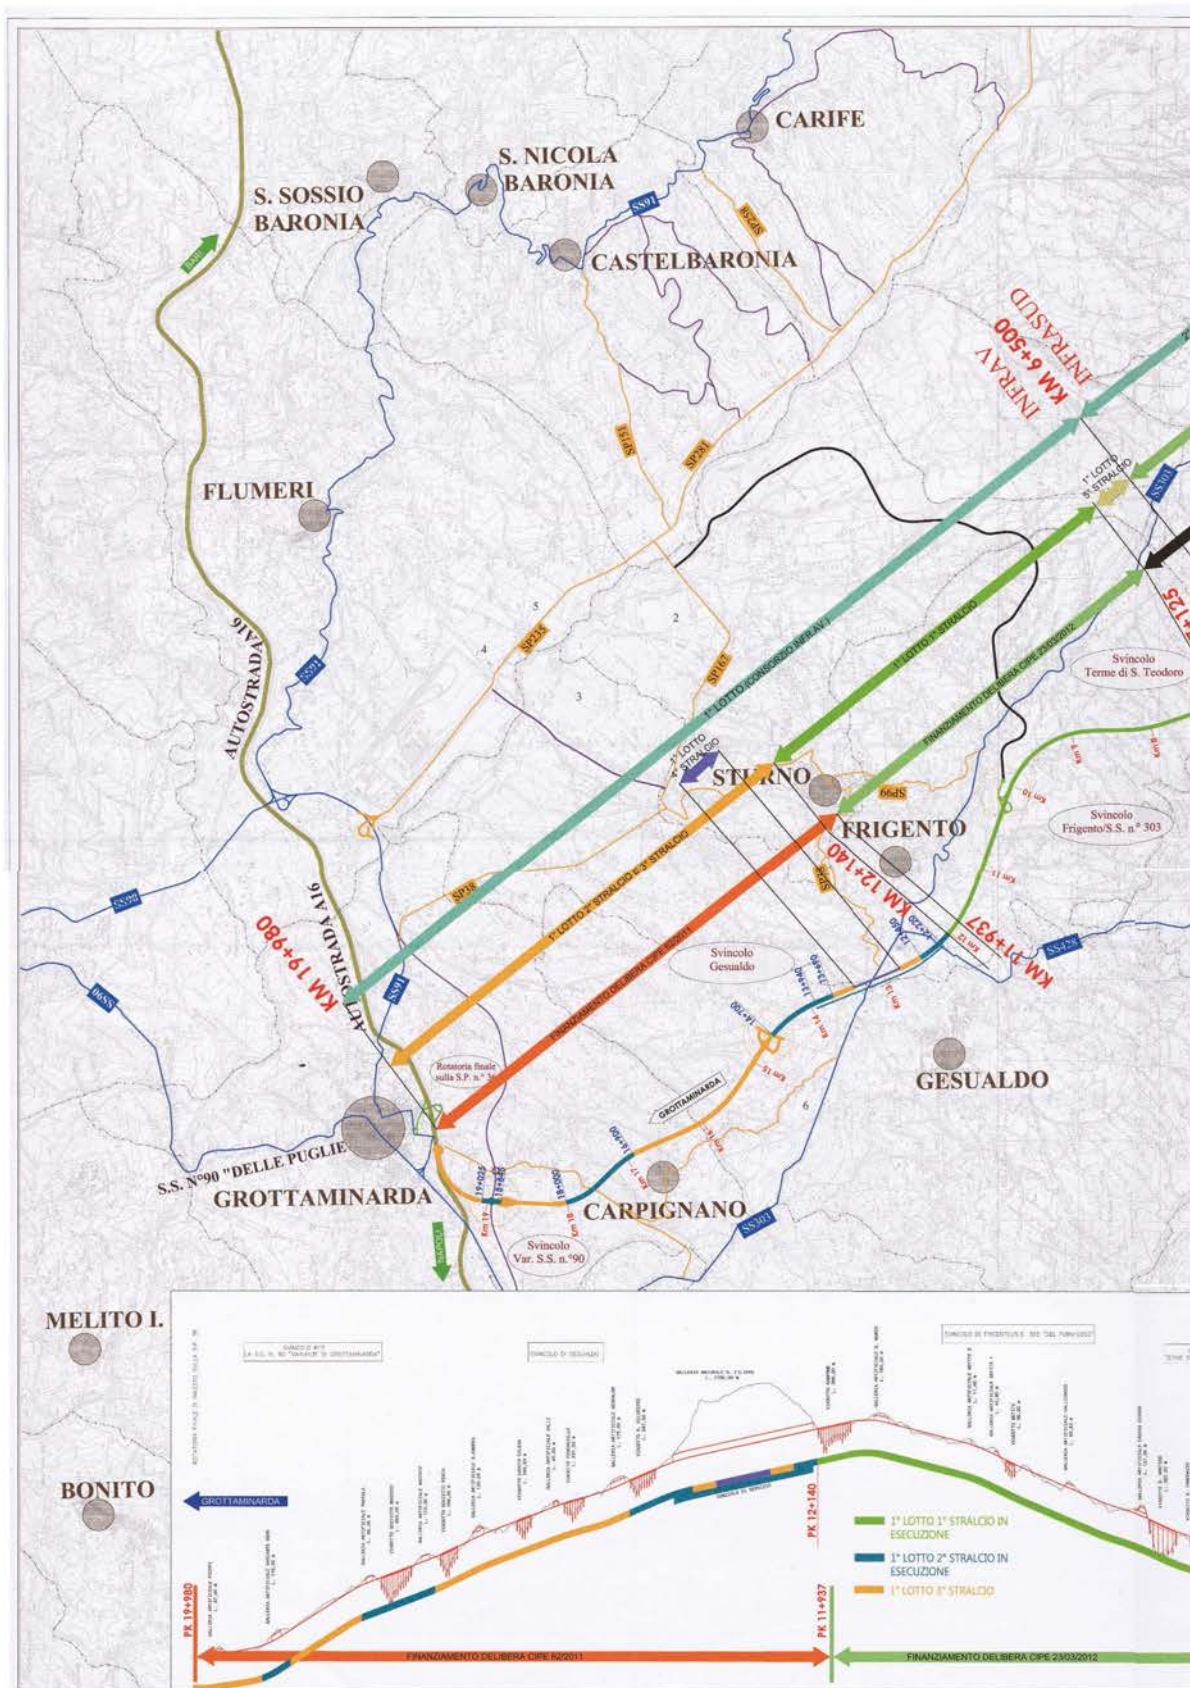

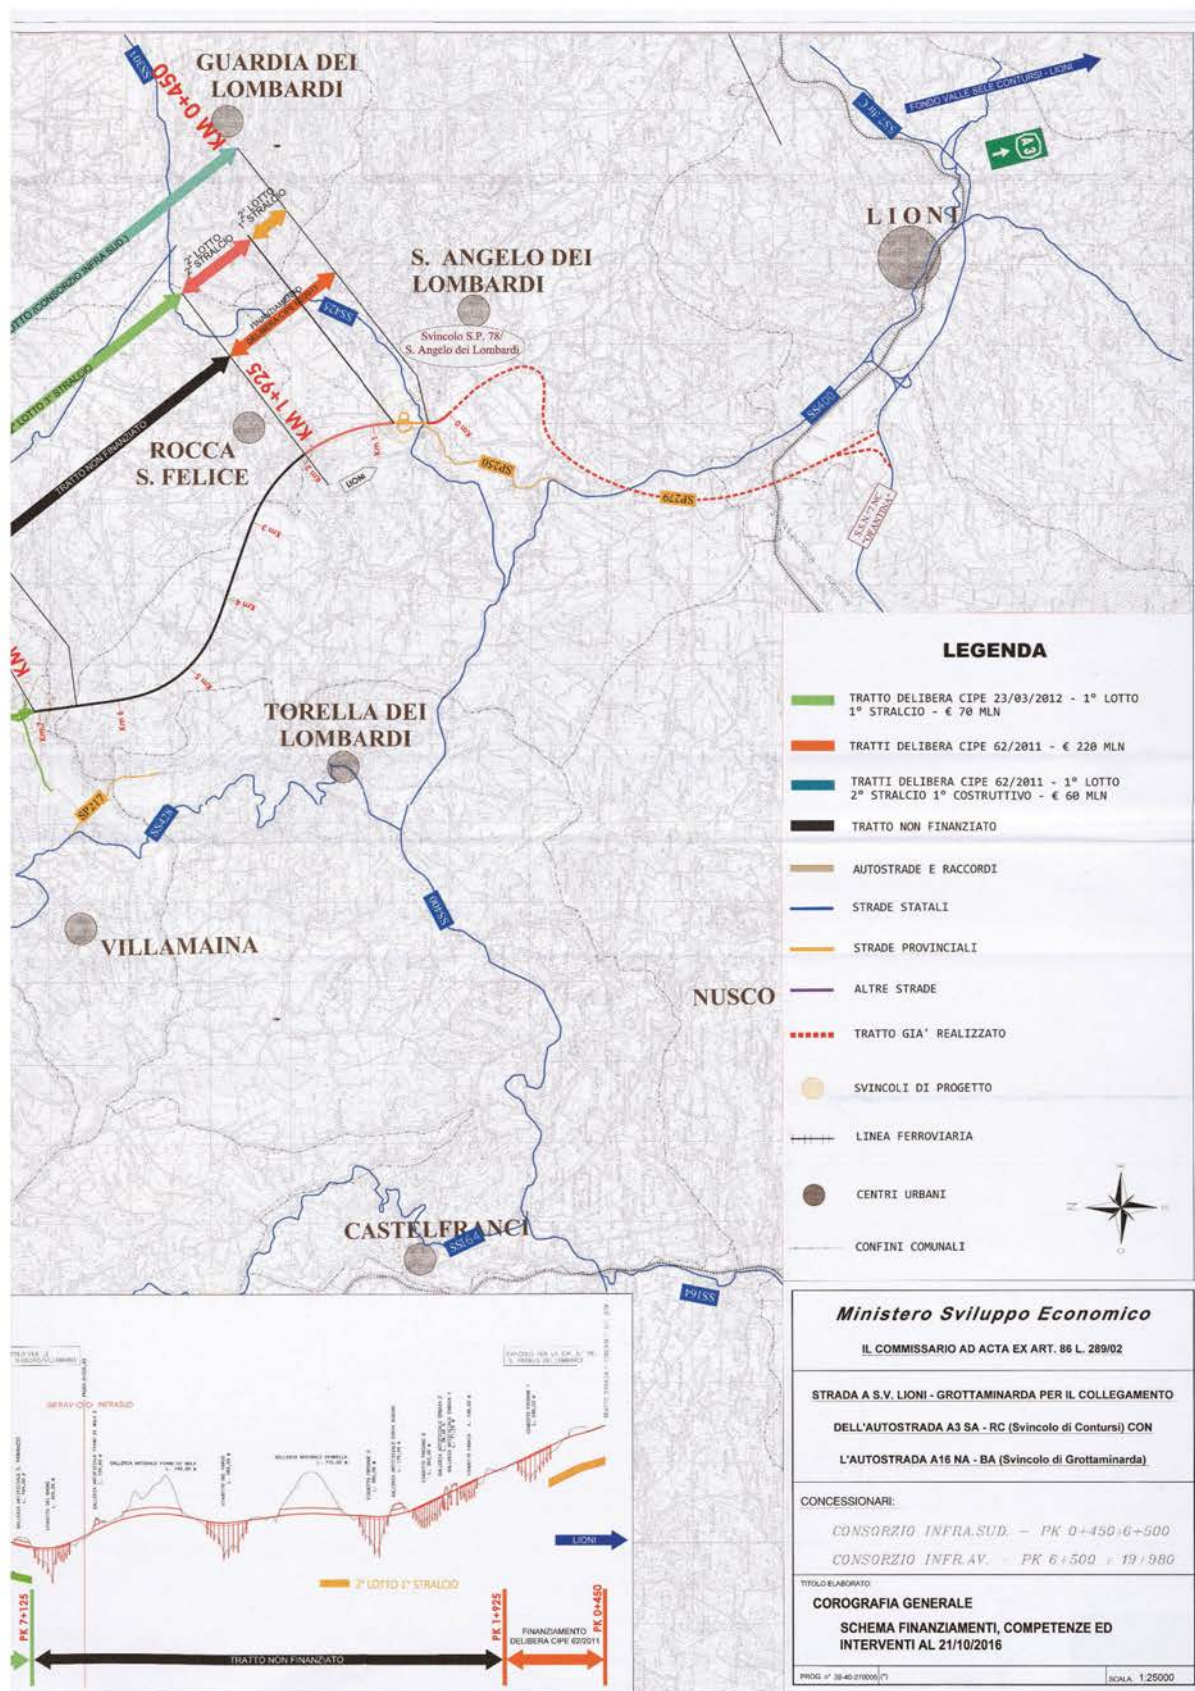

ALLEGATO 2B

Commissario ad Acta - Legge 27.12.2002 n. 2619

Progetti ex art. 32 L. 219/81 (trasferimenti da c.2 art. 86 L. 289/02 ed a seguito de

Trasferimento Iniziale - A.L.A. - A.L.B.	num. progetto			PROV.	DESCRIZIONE	CONCESSIONARIO	Dotazione finanziaria			Chiusura concessione			
							Costo totale progetti revocati ex c.2 art. 86	Eventuale suddivisione in lotti	Importo versato sulla cs 3250				
A	39	60	6001	PZ	Infrastrutture N.I. Balvano e Acquedotto	Consorzio per il Nucleo di Baltano			190.769,06	X	542	16/06/2009	X
A	39	60	6002	PZ	N.I. Baragiano	MALTAURO			5.437,31	X	1449	09/11/2015	
A	39	40	6003	SA	Infrastrutture N.I. Buccino	Consorzio Infrastrutture Buccino S. Gregorio Magno			15.239.426,48	X	1535	11/05/2016	X
A	39	40	6003/2	SA	Approvvigionamento idrico A.I. Buccino - Pozzi Buccino	Consorzio Infrastrutture Buccino S. Gregorio Magno			2.023.199,06	X	1000	22/12/2011	X
A	39	40	6004	AV	Infrastrutture N.I. Calabritto	COINSUD			5.479,92	X	547	30/06/2009	X
A	39	40	6005	AV	Infrastrutture N.I. CALAGGIO	INCOMIR			0,00	X	1454	18/11/2015	X
B	39	40	6006	AV	Infrastrutture N.I. Calitri	ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione			3.710.587,83			Revocato	
A	39	40	6007	SA	N.I. Contursi	COINFRA			192.973,31				
A	39	40	6008	AV	Infrastr. Nucleo Conza della Campania	GL.IT.			3.649,53	X	633	19/01/2010	X
A	39	60	6009	PZ	N.I. ISCA PANTANELLE	PIZZAROTTI			0,00	X	324	20/12/2006	X
A	39	40	6010	AV	Infrastr. N.I. Lioni - Nusco - S. Angelo	INFR.AV.			38.009,86	X	307	01/12/2006	X
A	39	40	6011	AV	Infrastr. N.I. Morra de Sandis	GL.IT.			99.952,44	X	633	19/01/2010	X
B	39	40	6012	AV	Infrastrutture N.I. di Nerico	ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione			1.138.355,19	X		Revocato	
A	39	40	6013	SA	Infrastrutture N.I. di Oliveto Citra	COINSUD			0,00	X	481	29/10/2008	X
A	39	40	6014	SA	Infrastr. N.I. PALOMONTE bretella di collegamento	COIMPA			0,00	X	377	18/09/2007	X
A	39	40	6015	AV	Infrastrutture N.I. di Pomara	INFRASUD			17.132,50	X	630	08/01/2010	X
A	39	40	6016	AV	Infrastrutture N.I. S. MANGO sul CALORE	INCOMIR			0,00				
A	39	60	6017	PZ	Infrastr. N.I. S. Nicola di Melfi + F.Z.	PIZZAROTTI			44.894,07	X	817	07/02/2011	X
A	39	60	6018	PZ	Infrastrutture N.I. di Tito	MELANDRO - VIGGIANO			0,00	X	1462	18/12/2015	X
A	39	60	6019	PZ	Infrastrutture N.I. Valle Vitalba	PIZZAROTTI			20.141,82	X	1326	22/12/2014	X
A	39	60	6020	PZ	Infrastrutture N.I. di Viggiano	MELANDRO - VIGGIANO			0,00			Concessionario decaduto - D.M. 233 del 3.11.1995	X

. 289 art. 86 e D. M. 21.12.2005

D.M. 21.12.2005) + nuova opera "Viabilità Lioni - Grottaminarda"

Chiusura progetto	Eventuali economie di progetto	Stato del progetto: Concluso - Aperto	Attività residue (e Lavori in Corso)	Consegna opere			N. Transazioni sul progetto	
				Descrizione consegna	Ente destinatario	Tipologia consegna	Per espropri	Altra natura
580	07/10/2009	190.769,06	C	1		Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99		
1457	30/11/2015	5.437,31	C	1		Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99 + 102/01		
1543	09/06/2016	13.897.038,82	C	1	strada di accesso al serbatoio idrico	Comune di Buccino	Consegna provvisoria con verbale in data 19/03/1997	1
					Infrastrutture A.I.	Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99	
					Campo Pozzi	Regione Campania	Consegna definitiva in data 12/07/06 con approvazione collaudo finale- Approvato con Decreto Commissariale n.254 del 12/07/06	
					Condotta adduttrice, serbatoio. Condotta a gravità	Regione Campania	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n. 1357 del 20.4.2015 - GURI n.176 del 31.7.2015	
1503	13/04/2012	91.954,65	C	1	Completamento approvvigionamento idrico+tratto condotta a gravità	Regione Campania	Consegna definitiva in data 08/01/10 con approvazione collaudo finale- Approvato con Decreto Commissariale n.632 dell'8/1/2010	
583	09/10/2009	5.479,92	C	1		Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
1461	15/12/2015		C	1		Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
		A	1	In corso completamento espropri	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		20	1
		A	1	Contenzioso per esproprio (Ditta Di Menza)	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99			
638	16/02/2010	3.649,53	C	1	(progetto unificato al 6011)	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
(unico decreto)		C	1		Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99			
479	16/10/2008	38.009,86	C	1		Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
639	16/02/2010	99.952,44	C	1	(progetto unificato al 6008)	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
		A	1	In corso completamento espropri	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		2	1
D.M. 38 del 7.4.2003		A	1		Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99			
D.M. 20 del 24.2.2004		C	1	Infrastrutture N.I. di Palomonte	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99			
				Bretella di collegamento A.I. Palomonte e vincolo Sioigrano degli Alburni	Provincia di Salerno	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.3 del 16/9/03 - Guri n.228 dell'1/10/03		
				Svincolo sul raccordo autostradale di Sioigrano-Potenza e impianto illuminazione	ANAS	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.5 del 3/11/03 - GURI n.269 del 19/11/03		
640	186/02/2010	17.132,50	C	1		Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
		A	1	In corso completamento espropri	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99			
				Infrastrutture N.I. S. Mango sul Calore	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99			
				Strada di collegamento tra la SP 39 e la strada di accesso tra l'area PIP e l'A.I. di S.Mango sul Calore (loc. Piani)	Comune di S. Mango sul Calore (AV)	Consegna definitiva con verbale 5/8/09 approvato con Decreto Commissariale n.568 del 08/09/09 - GURI n.230 del 3/10/09		
842	28/02/2011	44.894,07	C	1		Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99		
1496	19/01/2016		C	1		Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99		
1332	26/01/2015	20.141,82	C	1		Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99 - Decreto Commissariale n. 589 del 16.10.2009 (integraz.)		
1463	26/01/2016		A	1		Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99 - Decreto Commissariale n. 589 del 16.10.2009 (integraz.)		

Trasferimento iniziale - AILA - AII.B	num. progetto			PROV	DESCRIZIONE	CONCESSIONARIO	Dotazione finanziaria			Chiusura concessione				
							Costo totale progetti revocati ex c.2 art. 56	Eventuale suddivisione in lotti	Importo versato sulla cs 3250					
A	39	40	6021	AV	Infrastr. Fauleo Morra de Sandis	GL.IT.			32.078,41	X	651	31/03/2010	X	
A	39	60	6051	PZ	Basentani Baragiano	MALTAURO			655.073,96	X	1001	22/12/2011	X	
A	39	40	6052	SA	Contursi - Stazione FF.SS.	COINFRA			559.115,16	X	1157	28/03/2012	X	
A	39	40	6054	SA	Fondo Valle Sele II* Lotto	COINSUD			1.696.751,82	X	440	28/04/2008	X	
B	39	40	6055	AV	Fondo Valle Sele III* Lotto svincolo Materdomini	INFRAV.			6.507.310,89					
A	39	60	6056	PZ	Joca - Tito/Brianza	PIZZAROTTI			598.272,70	X	810	19/01/2011	X	
I	39	60	6057	PZ	Strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina in Località Nerico	ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione	Versamento iniziale 35.753.924,05 + 25.073,54 residuo professionisti		35.778.997,59	Revocata			X	
	39	60	6057/1	PZ				5.306.734,09						
	39	60	6057/2	PZ				22.776.273,63						
	39	60	6057/3/ 1	PZ				24.072.974,87						
	39	60	6057/3/ 2	PZ				7.415.648,67						
	39	60	6057/S F	PZ				1.985.528,22						
	A							(importo professionisti AII. A)						25.073,54
								61.557.159,48						
						importo movimentato da economie	-25.778.161,84							
A	39	40	6058	AV	Bretella N.I. Lioni Porrara (Nusco - S. Angelo)	INFRAVUD			1.349.655,01	X	1500	26/02/2016	X	

Chiusura progetto		Eventuali economie di progetto	Stato del progetto: Concluso - Aperto		Attività residue (e Lavori in Corso)	Consegna opere			N. Transazioni sul progetto	
						Descrizione consegna	Ente destinatario	Tipologia consegna	Per espropri	Altra natura
657	28/04/2010	32.078,41	C	1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99			
1078	04/07/2012	155.073,96	C	1		ANAS	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.43 dell'1/3/04 - GURI n.77 dell'1/4/04			
1172	18/06/2013	473.874,37	C	1		ANAS	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.1 dell'1/8/03 - GURI n. 211 dell'11/8/03			
(unico decreto)		1.546.751,82	C	1		Strada Fondo Valle Sele II° Lotto	ANAS	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.45 del 14.5.04 - G.U.R.I. n.126 del 31/5/04		1
						Controstrade a valenza comunale	Comune di Calabritto	Consegna definitiva il 4/12/01		
			A	1	Contenzioso con Comune di Caposelle (AV)	Strada "Fondo Valle Sele III" Lotto + svincolo Materdomini	ANAS	Consegna definitiva con verbale 24/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.157 del 03/02/06 - GURI n.48 del 24/02/06		
		Viabilità connessa all'asse principale				Comune di Teora	Consegna definitiva con verbale del 26/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.158 del 07/02/06 - GURI n.60 del 13/03/06			
		Viabilità connessa all'asse principale				Comune di Caposelle	Consegna definitiva con verbale del 26/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.159 del 07/02/06 - GURI n.60 del 13/03/06			
		Viabilità connessa all'asse principale				Comune di Lioni	Consegna definitiva con verbale del 26/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.160 del 07/02/06 - GURI n.60 del 13/03/06			
		Viabilità connessa all'asse principale				Comune di Calabritto	Consegna definitiva con verbale del 26/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.161 del 07/02/06 - GURI n.60 del 13/03/06			
		Viabilità ampliamento della ex S.S. 165				Regione Campania	Consegna definitiva con verbale del 12/08/06 approvato con Decreto Commissariale n.267 del 15/09/06 - GURI n.243 del 18/10/06			
839	25/02/2011	514.618,79	C	1		Provincia di Potenza	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.13 del 21/2/03 - GURI n.296 del 22/12/03			
1047	21/03/2012	25.073,54	C	1						
			A	1	Attività varie amministrative	Tratta da progr. 0+00 a progr. 1+750	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con approvazione collaudo - Decreto Commissariale n. 1276 del 16.7.14	48	
		Tratta da progr. 1+750 a progr. 5+600				Provincia di Avellino	Consegna definitiva con approvazione collaudo - Decreto Commissariale n. 1276 del 16.7.14			
		Rotatoria per Pescopagano				ANAS	Consegna definitiva con approvazione collaudo - Decreto Commissariale n. 1276 del 16.7.14			
		Bretella per Pescopagano				Comune di Pescopagano	Consegna definitiva con approvazione collaudo - Decreto Commissariale n. 1276 del 16.7.14			
			A	1	Lavori in corso	Tratta da progr. 5+500 Svincolo Pescopagano a progr. 9+450 Svincolo Rapone	Provincia di Potenza	Consegna anticipata con verbale in data 24.7.14 approvato con Decreto Commissariale n.1282 del 3.9.14	255	
			A	1	Lavori in corso	Impianto di illuminazione in galleria artificiale alla progr. km. 9+100 circa	Provincia di Potenza	Consegna anticipata con verbale in data 24.7.14 approvato con Decreto Commissariale n.1282 del 3.9.14	64	1
			A	1	Lavori in corso					
			A	1	Lavori in corso					
1087	03/09/2012	1.349.655,01	C	1		Bretella N.I. Lioni Porzana (Nusco - S. Angelo)	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.33 del 29/12/03 - GURI n.17 del 22/1/04		
						Svincolo per S. Angelo dei Lombardi	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con verbale del 15/12/03 approvato con Decreto Commissariale n.32 del 18/12/03 - GURI n.6 del 9/1/04		

Trasferimento iniziale - All. A - All. B	num. progetto			PROV.	DESCRIZIONE	CONCESSIONARIO	Dotazione finanziaria			Chiusura concessione		
							Costo totale progetti revocati ex c.2 art. 56	Eventuale suddivisione in lotti	Importo versato sulla cs 3250			
A	39	60	6059	PZ	Melfi - Area Industriale	PIZZAROTTI			1.197.629,85	X	659	28/04/2010
I	39	60	6062	PZ	Viabilità Muro Lucano - Baragiano Scalo	ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione	Versamento iniziale 5.269.928,00 + 8.793,79 residuo professionisti	5.287.107,00	5.278.721,79	Revocata		
A	39	60	6062/2	PZ				472.951,98				
								(importo professionisti All. A)				
								8.793,79				
							5.740.058,99					
							importo movimentato da economie	-481.337,28				
I	39	40	6063	AV	Calitri Ofantina	ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione		37.578,14	2.624.286,24	Revocata		
A							(importo professionisti All. A)	52.557,65				
							2.661.864,38					
I	39	40	6064	AV	Calitri Ofantina (svincolo)	ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione	versamento iniziale 702.471,33 + 50.000,00 residuo professionisti	584.163,37	752.471,33	Revocata		
A							(importo professionisti All. A)	50.000,00				
							1.356.634,70					
A	39	40	6066	AV	Strada Ofantina S. Mango	INCOMIR			267.449,90	X	808	10/01/2011
A	39	60	6067	PZ	Valle di Vitalba - Ofantina	PIZZAROTTI			2.790.718,95	X	880	24/05/2011

Chiusura progetto				Eventuali economie di progetto	Stato del progetto: Concluso - Aperto	Attività residue (e Lavori in Corso)	Consegna opere			N. Transazioni sul progetto	
							Descrizione consegna	Ente destinatario	Tipologia consegna	Per espropri	Altra natura
							Area in località "Selvatico" (part. lle 579/a - 41/a-42/a-584)	Comune di S. Angelo del Lombardi	Consegna definitiva con verbale del 12/1/04 approvato con Decreto Commissariale n.39 del 14/1/04 - GURI n.16 del 23/1/04		
X	677	13/07/2010	377.390,17	C	1		Strada H.I. Melli - Abitato Melli - Superstrada Candela/Potenza	Provincia di Potenza	Consegna definitiva il 15/11/2000		
							Controstrade a valenza comunale	Comune di Melli	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.40 del 20/1/04 - GURI n.28 del 4/2/04		
X	1048	22/03/2012	8.793,79			Attività varie amministrative	Viabilità secondarie Cavalcavia in loc. Ponte Gioia	Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collaudo Decreto Commissariale n. 885 del 6.6.2011	53	1
							Viabilità secondaria	Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con verbale in data 20.7.2009 approvato con Decreto Commissariale n. 564 del 4.8.2009 - GURI n. 201 del 4.8.2009		
							Opere completamento strada Baragiano-Muro Lucano e Opere ampliamento bretella provvisoria di svincolo su SS 7	Provincia di Potenza e Comune di Muro Lucano	Consegna provvisoria con verbale in data 20.7.2009 approvato con Decreto Commissariale n. 562 del 4.8.2009		
							Rotatoria di innesto al Km. 420+900 sulla SS. 7	ANAS	Consegna definitiva con approvazione collaudo Decreto Commissariale n. 893 del 18.7.2011		
							Viabilità secondarie relative alla Rotatoria d'innesto al Km. 420+900 sulla SS. 7	Comune di Muro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collaudo Decreto Commissariale n. 893 del 18.7.2011		
				A	1		Collegamento viario tra la strada Muro Lucano-Baragiano e la S.S. 94/Dir.	ANAS	Consegna definitiva con approvazione collaudo Decreto Commissariale n. 1016 del 23.1.2012		
X	1412	27/07/2015		C	1		Strada Calitri-Ofantina	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con approvazione collaudi Decreti Commissariali n. 938 del 18.10.2011 e n. 1077 del 2.7.2012	70	1
							Viabilità secondaria	Comune di Calitri	Consegna definitiva con verbale in data 25.8.2010 approvato con Decreto Commissariale n. 726 del 13.9.2010 - GURI n. 233 del 5.10.2010		
X	1051	03/04/2012	24.432,85				Svincolo strada collegamento abitato di Calitri con la SS. 401 Ofantina - Asse principale	ANAS	Consegna definitiva con approvazione collaudi Decreti Commissariali n. 923 del 2.9.2011 - GURI n. 43 del 21.2.2012 e n. 1058 del 14.5.2012	8	1
							Rampe di accesso opere relative allo svincolo	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con approvazione collaudi Decreti Commissariali n. 923 del 2.9.2011 - GURI n. 43 del 21.2.2012 e n. 1058 del 14.5.2012		
							Viabilità secondaria	Comune di Calitri	Consegna definitiva con approvazione collaudi Decreti Commissariali n. 923 del 2.9.2011 - GURI n. 43 del 21.2.2012 e n. 1058 del 14.5.2012		
							Viabilità della bretella di collegamento tra lo svincolo per Calitri e l'Area Industriale di Nerico	Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n. 1258 del 15.1.2014 - GURI n. 181 del 6.8.2014		
							Strada Ofantina S. Mango	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.49 del 15/7/04 - GURI n.186 del 10/8/04		1
							Sovrappassi progr. 2181 - 2552 - 512 + sottopassi e viabilità secondaria	Comune di San Mango sul Calore	Consegna definitiva con verbale del 9/2/05 approvato con Decreto Commissariale n.90 del 15/2/05 - GURI n.52 del 4/3/05		
							Sovrappassi progr. 3830 e 4148	Comune di Castelvelere sul Calore	Consegna definitiva con verbale del 15/02/05 approvato con Decreto Commissariale n.97 del 6/4/05 - GURI n.106 del 09/05/05		
X	824	11/02/2011	48.398,22	C	1		Viabilità secondaria progr. 0.00 + 113,40	Comune di Chiusano San Domenico	Consegna definitiva con verbale del 7/2/05 approvato con Decreto Commissariale n.89 del 15/2/05 - GURI n.51 del 3/3/05		
							Sovrappassi alla progr. 3530.31 e 512 + Bretella A.I. S. Mango sul Calore	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con verbale dell'8/4/05 approvato con Decreto Commissariale n.99 dell'11/4/05 - GURI n.107 del 10/05/05		
							Strada di collegamento tra la S.P. 39 e l'A.I. di S.Mango sul Calore	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con verbale del 16/10/09 approvato con Decreto Commissariale n.600 del 30/10/09 - GURI n.282 del 3/12/09		
X	896	19/07/2011	713.360,99	C	1			Provincia di Potenza	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.44 del 16/4/04 - GURI n.101 del 30/4/04		

Trasferimento Iniziale - AILA - A.B.	num. progetto		PROV.	DESCRIZIONE	CONCESSIONARIO	Dotazione finanziaria			Chiusura concessione		
						Costo totale progetti revocati ex c.2 art. 89	Eventuale suddivisione in lotti	Importo versato sulla cs 3250			
A	39	40	6068	SA	F.V.S. - Oliveto Citra	COINFRA		480.247,21			
A	39	60	6069	PZ	Rapone - Ofantina - Muro Lucano	ICLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione		4.959.481,14			Revocato
A	39	60	6070	PZ	Rapone - Ofantina - Vitalba	PIZZAROTTI		56.550,12	X	1333	26/01/2015
A	39	40	6071	AV	Svincolo ferroviario S. Mango sul Calore	INCOMIR		101.011,85			
A	39	40	6075	SA	F.V.S. Ospedale Oliveto Citra	COINFRA		1.132.241,72			
A	39	60	6076	PZ	Balvano Basentana Baragiano	MALTAURO		583.567,86	X	652	31/03/2010
A	39	60	6076/2	PZ	Balvano Basentana Baragiano II° lotto (L. 255/90)	MALTAURO		25.914,78	X	1353	13/03/2015
A	39	60	6077	PZ	Isca - Polla	PIZZAROTTI		1.035.047,59	X	648	22/03/2010
B	39	60	6077/2	PZ	Isca-Polla II lotto	PIZZAROTTI		5.951.922,02			
A	39	40	6080	SA	Svincolo ferroviario N.I. di Buccino	Consorzio Infrastrutture Buccino S. Gregorio Magno		636.401,58			
A	39	40	6091	AV	Acq. principale Alta Irinia	SNAM PROGETTI		1.916.417,53	X	661	10/05/2010
A	39	40	6094	SA	Acq. Area Industriale di Buccino	COINSUD		460.468,56	X	491	01/12/2008
A	39	40	6095	AV	Acq. Irinia II Vallata/Monteione	SNAM PROGETTI		208.588,07	X	655	28/04/2010
A	39	40	6096	SA	Condotta Refui Palomonte - Buccino	SNAM PROGETTI		0,00			Decreto Ministeriale n. 3
A	39	40	6097	SA	Condotta Refui Calabritto Battipaglia	SNAM PROGETTI		0,00			Decreto Ministeriale n. 4
A	39	60	6101	SA	Impianto depurazione N.I. Balvano	Consorzio per il Nucleo di Baltano		2.042,61	X	552	10/07/2009
A	39	40	6102	AV	Impianto depurazione N.I. Calabritto	COINSUD		0,00	X	541	15/06/2009
A	39	40	6103	SA	Impianto depurazione N.I. Contursi	COINFRA		0,00			Delibera ex Agensud n. 2350 del 17.3.1993
A	39	40	6104	AV	Impianto depurazione N.I. Conza	GI.T.		6.832,39			
A	39	40	6105	AV	Impianto depurazione N.I. Lioni (F1)	SNAM PROGETTI		7.101,32	X	809	10/01/2012
A	39	40	6106	AV	Impianto depurazione N.I. Morra	GI.T.		8.664,38	X	1117	14/11/2012
A	39	40	6107	SA	Impianto depurazione N.I. Palomonte	COIMPA		0,00	X	378	18/09/2007
A	39	40	6108	AV	Impianto depurazione N.I. Portici	INFRAUD		12.130,35	X	631	08/01/2010
A	39	60	6109	PZ	Impianto depurazione N.I. Vigliano	MELANDRO - VIGLIANO		64.468,79	X		Concessionario decaduto - D.M. 233 del 30.11.95
A	39	99	6150		Opere di elettrificazione	ENEL SPA COMPARTIMENTO DI NAPOLI		97.260,85	X	308	01/12/2006
A	39	99	6151		Eliminazione interferenze	ENEL SPA COMPARTIMENTO DI NAPOLI		1.320.541,88	X	309	01/12/2006

Chiusura progetto			Eventuali economie di progetto	Stato del progetto: Concluso - Aperto		Attività residue (e Lavori in Corso)	Consegna opere			N. Transazioni sul progetto	
							Descrizione consegna	Ente destinatario	Tipologie consegna		
										Per espropri	Altra natura
				A	1	Contenzioso COINFRA		Comune di Oliveto Citra (SA)	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.2 del 1/8/03 - GURI n.215 del 16/9/03		
				A	1	In corso completamento espropri		Provincia di Potenza	Consegna definitiva l'11/10/99	48	1
X	1349	20/02/2015	56.550,12	C	1			Provincia di Potenza	Consegna definitiva l'11.10.99		
				A	1	In corso ultimazione espropri		Consorzio ASI di Avellino	In corso		
				A	1	Contenzioso COINFRA - Saldo a debito del Concessionario non corrisposto		Comune di Oliveto Citra (SA)	Consegna definitiva il 27/9/00		
X	658	28/04/2010	583.567,86	C	1			Provincia di Potenza	Consegna definitiva il 24/1/96		
X	1385	04/05/2015	25.914,78	C	1			Provincia di Potenza	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.46 del 24/5/04 - GURI n.148 del 26/9/04		
X	654	12/04/2010	965.479,69	C	1	Contenzioso - saldo lavori sospeso	Strada Isca - Polla tratto Km.0+000 / Km.1+500	Provincia Potenza	Consegna definitiva con verbale del 13/9/04 approvato con Decreto Commissariale n.59 del 27/9/04 - GURI n. 238 del 9/10/04		
							Tratto Km.1+500 / Km.5+715	Provincia Potenza	Consegna definitiva con verbale del 27/9/04 approvato con Decreto Commissariale n. 62 del 15/10/04 - GURI n.259 del 4/11/04		
							Tratto Km.5+715 / Km.6+199,50	Provincia Salerno	Consegna definitiva con verbale del 20/9/04 approvato con Decreto Commissariale n. 63 del 15/10/04 - GURI n.259 del 4/11/04		
							Controstrade a valenza comunale	Comune S. Angelo Le Fratte (PZ)	Consegna definitiva con verbale del 23/3/05 approvato con Decreto Commissariale n. 94 del 31/3/05 - GURI n.90 del 19/4/05		
				A	1			Provincia di Salerno Comune di Caggiano	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.346 del 16/04/07 - GURI n.117 del 22/5/07		
				A	1	Pagamento saldo lavori sospeso per inadempimento contributivo		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99		
X	1075	21/06/2012	1.859.817,53	C	1			Regione Basilicata Regione Puglia Regione Campania	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.041 del 20/2/04 - GURI n.54 del 5.3.04		
X	500	14/01/2009	460.468,56	C	1			Consorzio Acquedotto Valle del Sele	Consegna definitiva il 28/10/97		
X	665	31/05/2010	208.588,07	C	1			Regione Campania Regione Puglia	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.042 del 20/2/04 - GURI n.54 del 5.3.04		
6 del 7.4.2003				C	1			Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva il 24/1/01		1
0 del 7.4.2003				C	1			Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva il 24/1/01		1
X	581	07/10/2009	2.042,61	C	1			Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99		
X	553	10/07/2009		C	1			Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
Decreto Ministeriale n. 39 del 7.4.2003				C	1			Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99		
				A	1	In corso verifica trasferimento suoli		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
X	840	25/02/2011	7.101,32	C	1			Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. n.157 del 2/7/99 - Integrazione D.M. n.157 a cura MAP (part. Catastali)		
X	1128	31/12/2012	8.664,38	C	1			Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
Decreto Ministeriale n. 31 del 20.3.2003				C	1			Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99		
X	637	16/02/2010	12.130,35	C	1			Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99		
X	1458	07/12/2015	54.468,79	C	1			Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99		
X	374	18/09/2007	97.260,85	C	1						
X	375	18/09/2007	1.320.541,88	C	1						

Trasferimento Iniziale - AIL A - AIL B	num. progetto			PROV	DESCRIZIONE	CONCESSIONARIO	Dotazione finanziaria			Chiusura concessione		
							Costo totale progetti revocati ex c.2 art. 86	Eventuale suddivisione in lotti	Importo versato sulla cs 3250			
gestione	39	60	6202	PZ	INNASO PIGNOLA	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI POTENZA			0,00	X	678	13/07/2010
gestione	39	40	6203	SA	Condotta forata Battipaglia	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO			66.154,59	X	361	09/05/2007
gestione	39	40	6205	SA	Adeguamento depuratore di Battipaglia	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO			0,00	X	340	26/03/2007
gestione	39	40	6207	SA	Collet. Refu acque alte SELE/TUSC.	CONSORZIO DESTRA SELE			761,97	X	341	26/03/2007
A	39	40	6208	SA	By pass Ponte Canale	EAAP-ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE			12.453,85	X	664	26/05/2010
A	39	60	6209	PZ	Lavori idrici Melfi	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI POTENZA			0,00	X	817	07/02/2011
c. 1	39	40	270001	AV	Viabilità Lioni - Grottaminarda 1° lotto 1° stralcio	Concessionario INFR.AV.		Regione Campania	19.900.000,00			
								Regione Campania	6.000.000,00			
c. 1	39	40	310001	AV	Viabilità Lioni - Grottaminarda 1° lotto 2° stralcio 1° costruttivo	Concessionario INFR.AV.		Versamento MIT 25/07/2016	9.548.000,00			
75				TOTALI			71.296.717,55	44.434.476,95	137.412.814,99	Totale Econ		
Sommano:						arrotondamento effettuato dal MAP sull'importo totale versato progetti revocati			76,02			
						Recuperi effettuati dall'Ufficio Commissariale per totali			53.705,05			
TOTALE COMPLESSIVO									137.466.596,06			
