2. I disciplinari d'obbligo

Il processo di attuazione degli interventi prevede una serie di passaggi procedurali, indicati nei Disciplinari/Accordi sottoscritti tra il MiBACT - Segretariato Generale e le stazioni appaltanti (strutture periferiche del MiBACT, Enti locali, altri soggetti pubblici), attraverso i quali vengono regolati i rapporti e le responsabilità derivanti ai beneficiari/stazioni appaltanti dal finanziamento degli interventi (gestione delle procedure, rispetto delle tempistiche attuative, adempimenti connessi al monitoraggio e alla rendicontazione, circuito della spesa, ecc.). L'utilizzo dei disciplinari in questo ambito è strategicamente innovativo, in una logica di uniformità e omogeneità delle procedure e degli strumenti operativi di programmazione. Il disciplinare introduce inoltre un elemento significativo nella gestione delle economie di gara che rientrano nella disponibilità della struttura centrale di gestione per essere riprogrammate a favore di nuovi interventi, con l'obiettivo di massimizzare l'utilizzo delle risorse. Un effetto positivo registrato in applicazione di questa disposizione è stata la riduzione delle riserve delle imprese e del ricorso alle varianti.

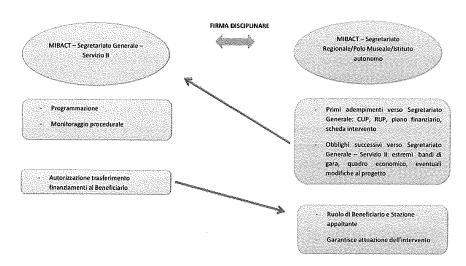


Figura 6 – Schema che rappresenta l'attuazione degli interventi quando il beneficiario è un organo del Ministero

Il disciplinare d'obbligo regola i rapporti tra il Servizio II del Segretariato Generale e gli enti beneficiari del MiBACT in qualità di stazioni appaltanti (Segretariati Regionali, Poli Museali regionali, Istituti e musei di rilevante interesse nazionali dotati di autonomia) (fig. 6). Nei casi in cui il beneficiario risulti un soggetto diverso dal MiBACT (amministrazione comunale, fondazione, ecc.), il competente Segretariato regionale del MiBACT, con cui il Segretariato Generale ha precedentemente stipulato il disciplinare d'obbligo, stipula a sua volta regolare accordo/convenzione con il soggetto beneficiario che regola i rapporti tra le parti per la realizzazione dell'intervento, con l'assunzione degli obblighi contenuti nel disciplinare (fig. 7).



Quest'ultimo definisce la modalità di erogazione delle risorse, l'elenco delle spese ammissibili e la tempistica dell'attuazione di ogni intervento, nonché il ruolo e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi. Nello specifico, il Servizio II del Segretariato Generale si occupa della programmazione, segue l'attuazione e il monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi e autorizza, per il tramite della Direzione Generale Bilancio, i trasferimenti finanziari; d'altra parte, gli enti beneficiari garantiscono l'attuazione degli interventi, la correttezza dei flussi informativi e il raccordo con il Servizio II del Segretariato Generale.

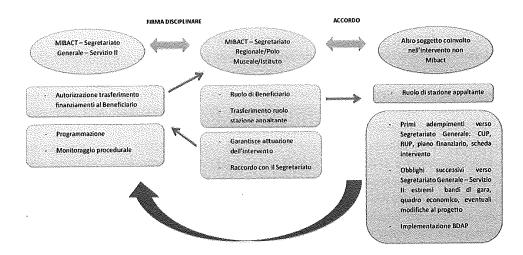


Figura 7 – Schema che rappresenta l'attuazione degli interventi quando il beneficiario è un soggetto distinto dal MiBACT

L'adozione del Disciplinare, pertanto, risponde a diverse esigenze. In primo luogo adempiere agli obblighi del D.Lgs. n. 229 del 2011, che impone alle Amministrazioni Pubbliche il monitoraggio degli interventi. In secondo luogo consentire, grazie all'operazione di stretto monitoraggio, una crescente rapidità dell'attuazione degli interventi nel rispetto della normativa, le cui novità introdotte devono essere ancora del tutto assorbite.



3. Il monitoraggio

Un aspetto importante riguarda il sistema di monitoraggio degli interventi attivato dal MiBACT per l'acquisizione e la raccolta delle informazioni e dei dati necessari a garantire la corretta osservazione dei processi attuativi e la tempestiva introduzione di misure correttive in caso di criticità gravi o permanenti. Si richiede al beneficiario di trasmettere ogni tre mesi le informazioni relative all'avanzamento delle opere alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche), garantendo coerenza ed allineamenti con le previsioni al riguardo contenute nel D.Lgs. 229/2011 e successive disposizioni attuative, nonché di inviare ogni sei mesi una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dell'intervento, corredato anche da documentazione fotografica, allo scopo di dimostrare il rispetto degli obblighi previsti.

Le erogazioni vengono disposte in favore dei Segretariati Regionali dalla Direzione Generale Bilancio del MiBACT in seguito ad autorizzazione del Servizio II del Segretariato Generale, sulla base dello stato di avanzamento degli interventi e in conformità dell'importo delle relative annualità. I Segretariati Regionali, in seguito a controlli circa lo stato di attuazione degli interventi, erogano le somme in favore delle Stazioni Appaltanti.

Per quanto riguarda il monitoraggio finanziario, in ottemperanza alle misure previste dal DLgs 229/2011, le Stazioni Appaltanti inviano trimestralmente i dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS - MEF) istituita ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2009: il monitoraggio risponde all'esigenza di trasparenza e di condivisione delle informazioni relative alle risorse destinate alle opere pubbliche, alla loro utilizzazione, allo stato di avanzamento dei lavori. La Direzione Generale Bilancio del MiBACT cura l'inoltro dei dati alla RGS — MEF in qualità di referente unico del MiBACT per il monitoraggio con funzioni di raccordo interno tra le strutture periferiche del Ministero (utenti-base), mentre i Segretariati Regionali del MiBACT, in qualità di utenti-base, raccolgono e inviano alla Direzione Generale Bilancio i dati provenienti dagli altri istituti periferici presenti nelle regioni. I Soggetti Beneficiari non appartenenti al MiBACT provvedono autonomamente ad implementare i dati di monitoraggio della BDAP.

Un aspetto importante dell'attività di monitoraggio condotta dal Servizio II consiste nell'attività di accompagnamento e di assistenza tecnica nei confronti delle Stazioni Appaltanti nell'ambito della scelta delle procedure di affidamento, della redazione dei quadri economici e, più in generale, per la risoluzione delle problematiche più ricorrenti in materia di appalti pubblici.

Le maggiori criticità riscontrate riguardano sicuramente la difficoltà delle Stazioni Appaltanti nel seguire i cronoprogrammi di progetto, elemento che incide negativamente sui tempi di attuazione degli interventi.



3. Stato di avanzamento

1. Stato di avanzamento procedurale

Sul totale degli interventi (60) molti presentano ripartizioni in lotti funzionali, come previsto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici: per l'annualità 2014 si contano n. 4 procedure totali, per l'annualità 2015-16 le procedure totali sono n. 32, per l'annualità 2017-18 sono n. 56, mentre per il 2019 n. 22 e per il 2020 n. 3. La Riprogrammazione consta di n. 3 lotti. Pertanto, il totale delle procedure collegate agli interventi decretati è di n. 120.

Nel complesso emerge che il 46% degli interventi presentano un livello avanzato di attuazione; in particolare sono in corso di espletamento le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, servizi e/o forniture a seguito del perfezionamento della progettazione o sono in fase di esecuzione le opere/lavori previsti. Il 37% degli interventi è nella fase di definizione dei contenuti della progettazione, mentre per il restante 2,5% sono in corso le azioni propedeutiche all'attivazione delle attività previste e il 13% degli interventi risulta non avviato.

La tabella di seguito riportata sintetizza l'avanzamento procedurale.

Piano Strategico Grandi Progetti BC	N. Procedure	N. Procedure non avviate	N. Procedure progettazione in corso	N. Procedure bandi di gara lavori/servizi in corso	N. Procedure opere in corso / concluse
Annualità 2014 (D.M. 06/05/2015)	4	-	1	-	3
Annualità 2015-16 (D.M. 01/09/2015)	32	2	3	-	27
Annualità 2017-18 (D.M. 02/12/2016)	56	4	23	3	26
Annualità 2019 (D.M. 29/09/2017)	22	7	15	-	-
Annualità 2020 (D.M. 20/05/2019)	3	1	2	-	-
Riprogrammazione economie (D.M. 29/01/2018)	3	2	1	-	-
TOTALE	120	16	45	3	56



2. Stato di avanzamento finanziario

Gli impegni giuridicamente vincolanti dichiarati dagli enti beneficiari sono pari a (somma del totale della colonna di cui alle tabelle sotto riportate "Importo contratto principale da parte A del QE" e "Importo totale contratti/affidamentì delle Somme a disposizione da parte B del QE"):

- € 52.603.857,52 per l'annualità 2014 e per l'annualità 2015- 2016;
- € 29.479.714,46 per l'annualità 2017-18;
- € 853.202,18 per l'annualità 2019

Per un totale di € 82.936.774,16

Per quanto riguarda i pagamenti dichiarati si registrano i seguenti dati (somma del totale della colonna di cui alle tabelle sotto riportate "Importo Speso quietanzato del contratto principale" e "Importo totale Speso quietanzato delle somme a disposizione da parte B del QE"):

- € 26.152.069,95 per l'annualità 2014 e per l'annualità 2015- 2016;
- € 13.775.003,81 per l'annualità 2017-18;
- € 266.418,52 per l'annualità 2019

Per un totale di € 40.193.492,28

Per l'annualità 2020 e riprogrammazione economie non sono stati effettuati impegni e pagamenti.

Come da comunicazione dell'Ufficio MEF-Ragioneria Generale dello Stato in BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) risultano censiti n. 47 CUP (n. 13 per l'annualità dal 2014 al 2016; n. 22 per l'annualità 2017-18; n. 12 per l'annualità 2019).

Gli impegni giuridicamente vincolanti inseriti in BDAP dalle stazioni appaltanti sono pari a:

- € 21.802.890,58 per l'annualità 2014 e per l'annualità 2015- 2016;
- € 10.487.119,61 per l'annualità 2017-18;
- € 122.840,32 per l'annualità 2019

Per un totale di € 32.412.850,51

Mentre per i pagamenti si registrano i seguenti dati:

- € 13.005.686,57 per l'annualità 2014 e per l'annualità 2015- 2016;
- € 8.297.425,79 per l'annualità 2017-18;
- € 5.709,60 per l'annualità 2019

Per un totale di € 21.308.821,96.

Le differenze che si registrano tra i dati dichiarati e i dati presenti nella BDAP sono dovuti alla scarsa tempestività nell'aggiornamento della suddetta banca dati, nonostante i ripetuti solleciti effettuati dal Servizio II del Segretariato generale MIBACT nei confronti dei beneficiari in ottemperanza con i disposti del Dlgs 229/2011 e nonostante l'obbligo di aggiornamento del monitoraggio nazionale stabilito all'art. 13 del disciplinare sottoscritto tra Servizio II e beneficiario dell'intervento.

Le tabelle che seguono riportano i dettagli, per annualità, di quanto sopra specificato circa i dati comunicati dagli Enti Beneficiari.



DISEGNI

DI

DOC.

CXI

z

S

Propose	Provincia	Comune	Beneficiario	instruito	Importo programmato	c r	Eventuali lotti/soltogragatti	Importo del Quadro Economico PRE gara	Imports del Quedro Economico POST para	Importo contrata principale de parte A del QI	Importo Speso goletanzato del contratto principale	Importo totale contratti/affidamenti dello Somme a disposizione da parte a del QE	Importo torale Spece quietanzate delle comme a dispositione da parte B del QE	State of pituations
Lazio	Roma	Roma	Segretariato Regionale del Mibac	Museo Italiano			Lavori edili e implanti	€1,368.232,61	€1.271,486,59	€ 622.743.85	€ 397.158,26			
				dell'Audiovisivo e del Cinema realizzazione museo	€2,500,000,00	FB2C15001180001	Allestimento	4.1504124,01	6 227 2400,59	C 121.015,98	€0,00	€ 292.451,66	€ 209.144,09	Opere in corso
		<u> </u>					Lavori di restauro	€1.131.767,39	C1.112.767,39	€ 171,000,00	€ 170.000,00	€ 165.201,20	€131,853,20	Opere in corso
Lombardio	Milano	Milano	Segretariato Regionale del Mibac	Museo Nazionale della Resistenza - realizzazione museo	€2.500.000,00	F47H15002070001	Letto unice	€ 2.500.000,00	€2.500,000,00	*	×	€506.381,21	€ 479.736,41	Concluso II progetto esecutivo
Abruzzo	L'Aquila	L'Aquila	Segretariato Regionale del Mibac	Palazzo Ardinghelli - Museo arte contemporanea	€ 2,000,000,00	F12C15000870001	Lotto A: Restauro e allestimenta museale Lotto B: Resaturo apparati	€ 2.000,000,00	€ 1.568.095,56	€ 959,490,02	€ 515.907,33	€218.094,60	€100.144,23	Opere in corso
							decorativi			€ 320.374,62	€310.451,48			Opere in corso
Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara	Fondazione	Museo Nazionale dell'Ebraismo a della Shoah	€7,000,000,00	F75F15000060001	Latto unica	€ 7.000,000,00	C7.000.000,50	€ 6.551,036,66	€ 1.310.217,34	€ 10.000,00	€0,00	Lavori consegnati 05 nov 2019 - quadro economico della perizia superiore al finanziamento
Friuli Venezia Gluira	Udina	Aquilela	Polo museale Mibac	Museo Archeologico Nazionale	€1.500.000.00	F32C15000580001	totto 1: guardiania o accoglienza	£1.500.000,00		€ 177.421,13	€ 176.658,12			
							Lotto 2: Implanti e allestimenti	C1.500.000,00	€ 1.312.871,24	€ 897.312,66	€ 897.289,92	€ 237.617,25	€ 226.069,68	Intervento concluso
Lazio	Roma	Roma	istitute autonomo Mibac	Arena del Colesseo	€ 16.500,000,00	F82C15000960003	totto 1: ipogel	€3.500.000,00	€ 2.888.591,00	. €1,683,969,33	€1.213.637,88	€338.219,43	€ 292.876,48	Haveri senio in como
				-	C 25.340.000,40	F87H15006710001	totto 2: arena	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00	×	×	€ 65.294,40	€ 57.388,80	in corso stesura linea guida
Lazro	Roma	Roma	Segretariato Regionale del Mibac	Arsunale Pontificio	€ 7.000.000,00	F82C15001490001,	Lotto unice	€ 7,000,000,00	€7.000,000,00	×	×	€364.995,54	€31.924,65	Progettazione esecutiva in corso
Lombardio	Pavla	Pavia	Segretariato Regionale del Mibac	Certosa			Lotto 1: Coperture	€1.350.000,00	€ 2.098.195,28	€ 918.684,33	€918.684,33			Lavori collaudati
							kotto 2: Chlastra Piccolo	€ 1.012.730,20	€836.820,27	€ 634.526,95	€ 634,526,95		ĺ	Lavori collaudati
							Latto 3: Chiostro Grande	€ 4.102.105,87	€ 4.102.105,87	×	2			Il progetto è stato verificato e fase di volidazione
					€ 7,000,000,00	F92C14000420001	Lotto 4: Cappelle	€ 419.556,81	€ 350,974,82	€ 215.624,15	C 172.527,16			Flavori sonso in corso
						7320340041001	Lotto 5: Trascrizione antichi registri	€ 75.607,12	€ 75.507,12	€75.607,12	€ 75.607,12	C 599.248,65	€ 415.758,25	Concluso
							Lotto 6: Restauro Ilbn corali	€ 40,000,00	€ 40,000,00	*	×	**		non avviato
Plemonte	Torino	Terino	istikuto autenomo Mibact	Polo Reale	€ 7.000,000,00	F12C15000910001	Lotto 1: Ufflei Reali	€ 837.360,50	€ 693.875,36	€ 278.627,07	€ 278,627,07	¢415,248,29	C 415.248,29	concluso
							Lotto 2: Accoglienza	€ 108.905,96	€ 63,723,22	€63.552,42	€ 63.552,42	€170,80	€ 170,80	concluse
							Lotto 3: Glardini	€ 1.526.983,95	€1.210.716,43	€ 939.929,64	€ 939.929,64	€ 270,786,79	C 270.786,79	concluso
							Letto 4: Sindone	€ 2.827.553,14	C2.439.507,79	€2.115.081,46	€ 2.115.081,46	€ 324.426,33	€ 324.426,33	concluso
							Lotto 5: Armeria	€ 68.121,14	€ 68,121,14	€ 46.169,68	€ 46.169,68	€21.951,46	€21,951,46	concluso
				-			Lotto 6: Galleria Sabauda	€ 1.215.433,06	€1.155.726,71	€ 414.767,60	C 414.767,60	£740.959,11	€740.959,11	concluso
							Latte 7: Palazzo Reale	€ 202.519,99	€ 202.519,99	C \$5.911,20	€ \$5.911,20	€ 146.608,79	€ 146,608,79	concluso
							Lotto 8: Museo Antichita	C 170.055,26	€ 170.055,26	C44.384,87	€ 44.384,87	€ 125,670,39	C 125.670,39	concluso
							Lotto 9: Comunicazione	- C43.066,DO	€43.085,00	€27.633,00	€ 27,633,00	€ 15.433,00	C15.433,00	conduso
										1	L.	1		

Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali - Annualità 2014-2016



DOC. CXI N. 3

XVIII	
XVIII LEGISLATURA	
1	
DISEGNI	
DI	
LEGGE	
Ħ	
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI	
1	
DOCUMENTI	

Sardegna	Onstano	Cobras	Segretarito Regionale Milbact	Museo archeologico del Giganti di Mont'e Prama	¢ 3.000.008,00	C818150U051Q602	Latto unica	¢3,000,000,00	C2.723.704.88	C1.502,212,44	€0,00	C 787,404,68	€156.317.68	Consegna Lavori disposta per mercoled 15 Gonnao 2020, per Indesponibilat della DDL. La tessa è provista entre il mesce di ponnaio 2020. La consegna pervista a Rimesce di ottobra 2019 non è stota attuata per imparaticabilità del luochi
Toscano	Firenzo	Firenze	Soprintendenza ABAP Firenze	Galleria degli Uffizi	€ 18.000.000,00	F19917000070001	Lotto unico	€ 18,000,000,00	€ 18,000,000,00	€15,960,244,42	€ 6.693.511,28	C 3.051.796,40	C 167.545,28	opere in corso
Toscana	Pisa	Pisa	Sogretariato Regionale del Mibac	Museo delle navi	€5.000.000,00	F58G16000040001	Lotto unica	€ 5.000.000,00	€ 4.308,864,83	€ 3,841,635,60	€ 3.798.354,57	€ 430,274,09	€ 36.955,12	lavoro concluso - in attesa del verbale di collaudo da parte della commissione
Umbria	Perugia	Spelio	Segretariato Regionale del Miliac	Villa Romaná	€ 1.000.000,00	F26G15001040001	Latto unico	€ 1,000,000,00	¢783.856,94	€461.132,44	€481.122,44	€ 22.680,00	C 22.680,00	LAVORD CONCLUSO ED INNAUGURATO - SITO APERTO AL PUBBLICO
Veneto	Vicenza	Bassano del Grappa	Bene Comunale	Ponte degli Alpini	€ 3.000.000,00	177H1S00D37D007	Latta unica	€ 3.000.000,00	€ 1,956,984,79	€4.332.914,81	€ 0,00	C 0,00	€0,00	Opere in corsa
				***************************************	€ 85.000.000,00	-	totale	€85,000,000,00	€79.978.237,66	€ 43.453.043.45	€ 21.751.921,12	€ 9,150,814,07	C4.400.148,83	

DISEGNI

DI

z w

Senato
della
Repubblica

	Piano Strategico Grundi Progetti Beni Culturali - Annualità 2017-2015													
	į	C	Prophesic					Johann der Goodin Konsenhalt FE. Phy	meeth en banka konsonde Paal gan	Imjenio contrata principal di para A E E S.C.	Importo Espaia (gla ramora) del contratto principali	Importantia control all decision skills Security & dispositions di control deligible (Inter di control deligible (Inter di	Imports to the Spinor quintances dother and the Spinor Spinor bearing a spinor bearing.	Plane de de la companya de la compan
							Lotto 1a : Miglieramente Implantistice Sule Espositive			60,420,34	0.00		0,60	Conclusa la gragettazione e il fotto 2a, in attesa dei riscovoriti per saldare i contratti.
Abruzzo	L'Aquila	Sulmopa	Pole museale milact	Completamento o restauro e valdruzzazione Abbazia di Sonco Spirito al Mocrone - Cappella Caldona e altri interventi	C1:001:002;00	F52C17000050001	Losto 16 : Realizzatione Area di Parcheggio	1.000.000,00	906.362,79	*	x.	40.309,76	0,00	tion utviate
							Lotto 2: cappella Caldora .			x	×		0,00	NON STHATO
Eiglija Romagna	furcas	Ferrara	latiteto ustonomo mibect	Gallerie Estensi - Trasferimento della Picacoteta Nazionate di Ferrana di Castello Estense e auguo silostimento	€ 7,6002.0000,000	175F17000000001	Latte unico	7,000,000,00	7.000 000,00			361.450,70	Su #61,36	Progetto di fattibilità Gernica ed económica
						C94H17603E30903	straino; allestiments o (notallación)	€ E-TESCOS/DD	4 6.360,000,00	€ 4.794.452,38	C246-945.80	c 1,553,302.14	<317.010,92	Progretta del mittios appriente tom 0. C. 231 det 19/7/1029. Progretto executivo apprevante con 0. G. 384 del 19/1/20/2018. Processors di gara per l'affidemento del lavon e dei svensi pubblicata i data 22/21/192, scadenta presentatione del feren 3/1/2008. Prosunto avias del Giuself metà scale 1909.
						C91817090219001	Hatreicio :gurdino del testello	C 950.000,00	£ 859,382,40	¥ 768,965,58	€768.962,15	€ 119.49€,82	€117.902,35	CONCLISO
Cyclifia Romagna	81mjan	Rimel	Sugretarioto Regionale Sel mibert	Realiszazione del Musus Feiliza	€ 9,000,000,00	091817000160001	N straigter accessa queter Sistembelo	¢ 665,000,00	C 554.584,28	C425.894,60	C 207.976.96	C 124,989,46	C64.150,86	Opere in cond. Fine lavors prevista per l'ebbralo 2020
						C91817000180001	IV stratgio : connessioni artizate	C 1.025.000,00	C 1.025.000,90		×	C340.403,00	C71922,E2	Lotto funzionale Af "Cossession Lutione"; pregente dell'influero eucutativo approvance cen Dialibiano G.C., n.273 del 12/10/2019 - apprivazi al farini la daza 17/01/2003 - soccerno i tributtorio in corno: Lotto funzionale di "Gerdino del Museon" progetto del involve- cio approvore nel mese al Cannalo 2020
Fruit Vervezia Glebia	Udine	Aquitela	Polo museale mibact	Nuovi allestimenti e nuove strutture per certici al pubblico nel Museo Antroologico Nazionale di Aquilleia (((d),iv cotto)	C 3.500,000,00	F32C17000250001	Lotte unico	€ 3,000,000,00	¢2.436.59),73	1.512.940,24	40,00	C 657.258,83	C276.757.25	censegna lavori prevista 31.02.1020
Lazio	Roma	Roma	istisute autonomo mibart	Renganizzione, silestimento e valorizzazione del Museo dello Civina (Sur)	£ 10 000 000 00	F85F17000110005	Sameorente I :Projettutione a specialione Lavori riorganizzazione e rialiostimento	C 6,000,000,000	7,738.860,10	0,00	0,00	523-042,30	0,00	progetto dell'inisso (doccubio in CONO
1						1	Componente 2: traslemmento sede MNAD	€ 2.000.000,00	1.978.641,45	1.255.187,00	1.264.889,00	734.833,00	713.752,65	Opera in sursp
						F84E13090010001	Sottopragetto 1: Destimano Massimo	< 600.000,00	€450.410,61	364.097,96	361.097,96	86.321,65	68.666,51	Concluse
	1			Parco Archeelogico de Ouisa Amilco: Museo delle		F84(17000070001	Satisprogette 7: Nueva biblioteca	C 850,000,00	£ 850.000,00	×		93.964.14	54,280,54	lavori la favo di gara
Lazio	Roma	Roma	Istituto outonomo mibara	Navi; movo sistema del parco archeologico di Ostia antita e dei porti reponali di Gaudio e	C4.000.000,00	F14E170000320001	Sottoprogeto 3: Videosorvegi ianza	C 85/0 000 00	C766-012-66	653.593,60	97.120,44	92,439.06	40.712,92	Opere la cosso
				Trakana		F34E17000010001	Sottopragetto 4: Museo delle Novi	€ 1.702.000,00	C1234.370,93	1.104.535,30	*	129.815,87	72.294,93	Opere la corsé
1						F80F34000030001	Lette 1: Spuri aggruntivi	45.000.000,00	C 5 000 000,00			152.785,79	192,091,69	studia pretiminune
Lazes	Roma	Homa	estiuto autonomo mibost	Rostauro o riesganizzamene della Biblioteca Nazionale Centrato di Roma	€ 10.000.000,00	F8201140001200001	Letto 2: Nuovi laboratori	<2.660.000.00	G'000 000 00	x	×	46.915.60	19 632,00	in corso di validazione
						FB7016401420001	Latta 3: Efficientamento energetico	62,000,000,00	C3.000.000,00	×	*	328.446,03	168,016,69	la parte residua del finanzamento e i receita nes progetto "PFEPAC"
tazio	Roma	Homa	istitute autonomo mibact	Restauro e el lestimento nuovo sede Biblioteca Nazionale di Artheolotia e Storia del l'Arte	€ 10,000,000,60	G88C36000410031	Lotto unico	20.000.000,00	SCCRETATO	SECRETATO	SECRETATO	SECRETATO	SECRETATO	SECIENTO
Latro	Fortu	Roma	Polo museale mibatt	Restaure, adequamento e altestimento Scuola del Patrimono a Palazzo Venezia	€5.000,000,00	FB4015000550001	Larne vinice	5.000.000,60	5.000,000,00	k	,	328.639,60	58.817,11	Progetto esecutivo da validaru
Lario	Reeto	Roma	Segretiziato Ragionsia dei miboti	Rectauro e valontazione del Twatro di gova n. 3 - Contro Sponenontalo Onomatografia	€8.000,000,00	F82C15001380001	Lotto uniteo	8.000,000,00	C8.000,000,00	x	*	456.137,88	100.657,31	Progettazione osetutivà la corso
Liguria	Gejtőva	Genova	Segretariato Regionale del mibad		£3.460,600,00	833038030000001	Lotta unico	3,000,000,00	£2.000.000/pg	×	g	qas	D,940	Progettazione esecutiva in corso di verifica da parte di soppetto terro
Loesbartila	Mestova	Mentova	žegrena na flagiana iz dvi mlitod	t Ressauro e velorazzazione Pelazzo Te	£2,000,400,00	162017000030001	Letto 7: Bar/bookshop	653,000,00	613.199,44	40 933,67	459-172-97	150.056,13	59.508,29	Constitute (iii ribanso 4 stato integranda per effectuare VAR,1 di euro discett,32 lond inclinati con refices (A.1.3) ar internociule sia intesection e PCC esi (PCC,5), VAR,3 di euro salosti,5 esi infrieset con PCC esi (PCC,5), VAR,3 di euro salosti,5 esi infrieset con PCC esi (POC) tra-dela (pCC,5), VAR,3 di euro salosti,5 esi infrieset con PCC esi (POC) tra-dela (pCC,5), VAR,3 di euro salosti,5 esi infriese con PCC esi (POC) (pCC,5), VAR,3 di euro salosti,5 esi infriese con PCC esi (pCC,5), VAR,5 di euro salosti,5 esi infriese con PCC (pCC,5), VAR,5 di euro salosti,5 esi infries
							Lotto 2: Fruttiere	1.350,000,00	10/9 677,29	75a,7a5,95	9,00	350.891,34	156,043,64	opieta ifi donso



XVIII	
XVIII LEGISLATURA	
1	
DISEGNI	
DI	
LEGGE	
Ħ	
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI	
1	
DOCUMENTI	

Lombardia	Рана	Pavia	Sugretenato Ragionale del mibaet	Arsenple di Pavia - Realitzazione Polo archivestico iombardo e polifunrienale	£ 10 100 000 00	F 17H 17000480001	Lorse unico	10,000,000,00	10.000.000,00	x	к	136.362,45	101.330,45	in corse di attidamento attraverso la Centrale di Committenza la progettazione
					 					223.413,54	223.413.54			Utimabone lavoit ed approvazione CRE e stato tinale divi lavon
							Lotto I - lavori di recepero e neguali licaziono	1.000.000,00	840.535,99	129,780,16	129.780,16	217.384,30	217-386,30	Ultrastione laws in approvatione CRS a state finale del tavori
				Necupara e riquiri(capione del parco "Collo						209.965,99	269,965,99			Ultimozione lavon od approvazione Citt e stato finale del lavon
Marche	Macerosa	Recensi	Segretariato Aegionale del pribact	deli/h(lesto*	C2.000.000,00	H22C17000000001	-			153.060,46	353.069,44			Uninazione lavori ed apprevazione CRE e sisto finale dei lavon
							Latte 2 - punta di accoglierva sunstica e servizi	1,000,000,00	762.343,05	141.500,06	143.589,06	217.026,17	217-096.27	Ultimations (avoit ed approvations CRCs state (insig 64+ leven
										GR. G24, 24	68,634,24			Ultimazione lavori ad approvazione CITC o stato finale del favori
							Castello Agilé - comparto 3: rectaum supelifico, serromenti e adeguzimenti implantistici	1,767,195,11	1.767.105,1)	0,00	0,00	Sacien	Signer	Importe comparto i irinodojukto novetto al projetto pre Princise per sposlamento summa revisi incochazita al comparto II. Projettajono deficibità in como. Avvio giata operas con OPP per krevis di pregistranono nel mesa di popuro 2000
							Castello Aelle - comporto 2: restauri Fontana Flume o beni mabili	590, 000,00	872,%A,61	53,631.65	0,00	63.031,44	44,351,19	Importo pere gata rimodulate quillizanno quoca porte de Javrari comparto la pari e 87.295,11 prot. \$62x ed el 30/11/2038 (c) a cetto ol economie el gare por a 67.5400,039 e quota del compario (pari a 63.740,87). Procedura de gara aporta con 10/24 Volto 33 (no porto) a attivación-se. Procedura de gara Lotto 28 e piedesta o Lavon concego al 10/10/1/2020
Promonte	Torteo	У олапа	Segre lattato Regionale del mibaci	Resturo e valorizzarione delle Residenza Sabardet castello Agrà (1,5 m) e Castello di Recoorjal (2,5 m)	¢1.500.000,00	F92C17000120001	Cosselio Agilé - comparto 3: manucenzione strpordinaria sottoletti u a coperiulir	420,000,00	247.404,59	249.551,07	278.526,16	17.72643	17.716,43	Lotto condisso à meno del 20% della quata di cui alfarc 113 c.4 O.lgc. So/101s, pun as C.1.160,00. Economio di sero pori ad C75,003,00. Altre sonno e di cupitono confute a est setto 2, Cri responde a colla 834
							Castolio Aglio - comparto d: Ali evi, extalegazione	230.000,00	110.600,00	96.058,23	96.060,23	0.00	0,00	Lotto semiconduo a meno di alfidamento atti nià comunicazione/isalorizzazione logata ggii altri lotti per la dira di 4 3.30,77. Si insensce perciato come importo pest zura C130,000
							Coutello Aglie - computo 5; alterumento collezione orientale ornitelogica, terrecotto a purcoral espasitiva	3ao,000,00	380.000,00	0,00	0,60	67,13	67,13	Progettopjone definitiva in carso
					C2.560.600,00	s49027000020001	Castella di Reccorrigi	2,500,000,00	2.500,000,00	220.470,82	0,00	303,793,52	85,474,22	Progettio dictinitive josto Serranda si constauce executivo in corne di definizione: Progettia riscuttiva josta Materia concluso con procedulfa Accidida Quideo constana.
							Lotto 7: Museo Archeologico Nurlonale - lavori di 340 geamosto dell' impianto terreleo e di condizionamento Lotto 2: Pracoteci Nazionale - adagommento impianto terreleo	ell.079,79	600.743,29	269.076.84	263.230,00	264,120,34	140.176,30	In 1912 PROFITED HIS CONTROL OF THE PROFITED HIS CONTROL O
		l					Lorro 3: Spatio Son Panciasio	39.047,05	89.047,06	жже	34.766,76	50.603,02	50,803,62	CONSTITO
Sardingha	Cagliari	Capilari	Polo mussale mibact	Hestauro e valorizzadore del Seberto Museahe di Capitani	¢2.500.000,05	r22C1+000790002	Latio 4: Lx Rúseo Regio	230,000,00	179.416,02	279,416.62	179.416,02	9,00	0,00	carticles. Il quadro economico post para na vata il recupero di tatte i le economic dispositoli timperititi, ha vedi relati notessari par copite l'imperito del lascon, imaggiore e esanosi percenditato di face al preditatositorine alla quadra comornico. Si ra refer inecopare il recupero del ritalasi di los, per qual, ha devinta apposita microsi, colore cili preditato del quadra comentico a percenti di un maggiore rimergio economico colorumico per il compili camento del rimergio.
							Casta S: San Saturnino	F003784	1-040,801,24		×	115,394,72	31804,00	progettio in casso til defendance. In Lode di Chiussira del progettio seta il mobilata i qualdo e commisso prin una riduzione delle somme destresse al Visiono. San Saturnho a risolato alimento del la somme destruggio al IV latta ex Rogrio.



DISEGNI

DΙ

LEGGE

Ħ

RELAZIONI

DOCUMENTI

DOC.

		,												
		1				F12C17000320001	Lotto 1: Chiesa e Museo di Onanoschele	C 2, 29G, 900, 50	C 2.200.009,00	x	ĸ	318.652,64	28,279,05	Esistente il progetto di Pottibilità, illi corso gare per i propetti Delinitivo ed Escottivo
Tascano	Firenze	Pieenass	Issues autonomo mibret.	Restauro e vojquazzarjene dej Museo Mareoseje dej Sargejio	C 6.000.000,00	F12C17000330001	Louis 2: Casa Murtelli	€1.600.000,00	€1.600,000,00	. *		191.071,79	9.491.91	Esistente il progetto di Futtibilità, in consegore per i progetti Definitaro ed Esecutoro
						F14E17000520001	Lotto 3: Riallestimenta sale	62.200.000,00	€2,260,660,60	×	x	223.083,76	13.096,94	Existente il progetto di Fattiblità. In corso gure per i progetti Definitivo ed Escusivo
Токале	Firenze	Servence	isitujo sutorjojno mikart	Restauro e norganiarprione della firiziosoca Nazionale Centralo di Firenza	¢ 15.000,000,60	F1911700070001 [CUP MASTER: F1916000640001) F35C17000060001	Lotte Linico	15.000.000,00	€ 15 400,000,00	н	×	748,416,73	748.416,73	Gara Perl'esecucione dell'avori bandità tramite la centrale di Commetterza invitata spa il 2012 2013 (dubr v schi (5 pcdale 160 Del 23.12 2019 - Gueta avos 2019/248-61641 del 74.12 2019), Scaucreza: 2 12020
Toncams	шеа	Pretrosanta	Segretamoto Rugionale del mitract	Realizzazione del Akaseo dalla Collezione Mitoraj, donete allo Stato	C2.000.000,00	G47H17000000005	LOTTO LINIO	2.000.000,00	C2.000.000,00	· ×		152,656,40	44.712,00	projetto dol/ese la corso
							Lotto 1: Complesso menumentale della Rocca Albarros e Museo del Ducato (2.550.001,00)	2,950,000,00	2 950 009,00	ж ,		392,526,73	156.932,00	Progetto definitive-esecutivo validato.
Umbra	Peruga	Speicto	Pala musoula m-bact	Restauto e riturito coltanzano e del Complesso manumentale della Rocca Albomos e Museo del Questo, Museo archeologico e Ponte delle Torri	64,700,000,00	E32C10003330001	Lotto 2: Museo archeologico (150.000,00)	150,000,00	150,900,00	97.139,74	0,00	24.107.20	24.107,29	Opere la cond.
							Latta 3: Ponte delle Torri (2.600.000,00)	1.600.000,06	1 800 000,00			318.000,00	116,942,76	Progetto executivo validato (All. §).
Veneto	Venezia	Venezu	Segretzmato Regionale del mibact	Fertezza Marghera - Recupere muscale nelitarea di erisi arebientale	4 7.000.000,00	F79119000220001	Laita salea	7.060,000,00	7,000,000,00	à.	x	485.000,90	54.375,00	Progettazione definitiva in cotso
							I faso: recupuro c.d. ediliscio G							lyaqvi ultimati q qolluuduti
Vaneto	Venezia	Venuzio	Serretanaco Ruelonale del mibact	Restauro e adequamento Tese dalle Vergini	67,860,000.00	D72C11033170301	it face; Comparto Bombardo	7.800.000.00	641.500.00	4,535,006,45	3.502.859,00	1.403.897.38	618,052,00	favor stijquij o oblasdate
			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ica Region,sie del milasci Restauto e udepuentento Tese dalle Vengini hql 'Amanole di Vengue			lil face: messa in signerata coperture estiticlo E							lavori ultimati e collaudati
		L.					18 fava: nouslificacione edificio E							lavori in torso 6- escaudono
Varje	Varie	Vari	Van	Roaluzzatoric di Musei della memoriat perpara rispessi di Patmanova, Museo della terga armaio a Padosa, Ospodafetti sulle Tofane	C \$00,000,00		Laπa υηίσι	500,000,00	540,900,00					disciplinare in tase di sottoscrisiene
					€ 135,000,000,00		Intele	188.047.195,12	121.001.072,04	19.013.850,00	£,902.003,70	10.455,850,46	\$500,000 A873.330,35 (\$50,000)	

XVIII
XVIII LEGISLATURA
DISEGNI
DI
LEGGE
Ħ
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
DOCUMENTI
DOC.

							the second second second second		i Propotti Boni Culturali - Annualità 201	19				
i i		2	Ammaini (Fisher) Palmasiana	partition		à	Secretarille million recognism	Impero al Desire Lecernico PAI paris	Ampanta dal Gradia i Stanoshi e Marijapia	Mariero Language production of person (a) Ex-	Amperita Spirita Majarana (M.) Samurana artinopolis	Emport with emportal deposed part of the light from the part of the part of part	ing and the second seco	undam.
Abrosso	Chrou	Chieti	Seprintendenza	l jupphi della Teate romana; gragetta shiagrata di rocupero e relenazzonere del scalro delle termo e dei condetti rempicila	€ 1.500,000,00	F71E17000560R01	_Е ОТТО UNIÇO	C 1,500,000,00	€ 1.500.000,00	н		€ 109.257,63	CE,435,97	Propolito gnellminaro in fosq di esecusianis
Emilia Homagna	Madens	Carps	Fondsklope	Conservazione e volonizzazione del Campo di Fossoli	¢ 3,560.000,00	-	×	*	x	н	×		N	Progetto di fattibilità scanica ed economica approvata - en corso di radazione progetto delinitivo
Emilia Romagna	Ravinns	Revossa	Сомине	Conservazione e valorizzazione della Rucca Brancalcone	£ 5.000.000,00	-				×		×		Progettazione in corso
rnuli Venezia Giulia	Triesse	Tricasto	utiture estanomo htibact	Restaure e valerizzazione del parco e del castello di Mirajnate e museo	C 4,000,000,00	P97C170091640991	×	£ 4.000.030,00	c4.000.000,00	×		*	x	I pireisti quottro inliveni nen sono angara stati accreditati e questo iditato in quento si devo perfetionare la procedura di assegnamene con le essegnazioni richiesto dalla 0.0.
frisil Vanasa Gluju	Uding	Falmanova	Comune	Restauro ∈ consolidomento mura urbiche di Palisationa	¢ 3.000.000,00	G67[]9000910091	iotto 3 Valenzassera della Torre pecceretraca al MA cquedicito lotto 2 Sentra e Loggia di Balvando Donato Jospo 2 Gallerie del Rivellino lotto 4 (Buminatione anglie basso del fossato.	€3,600,000,00	¢ 3,000,000,90	s	*	*		priageto di lucipinità bessica ed acconomica approvate dell'Amenimistracione consistente con declarazione gali ralle n. 152 cel 132.7.2015, in cepto la selesposicione stegli atto per d'Alexamento additicazioni tenerco la pregestatane dell'estica, menuchia e la efectione del liveti dei angoli notti
Lprio	Latina	Latera	Consulte	Casa della Musca e delle atti	€ 2.000.000,00	B29G17002300005	*	€ 2.000.000.00	€ 2.000.000,00		€ 0,00	C 0.00	€ 0,00	Assis della procedura di affidamento della progenzione in cono
							Reistauro per l'Allestimento di Spazi Coppytivi diegli Morrea Opeyathiuna e nie G.d. Grottani (Neglo I, Insula VIII)	€2,000,000,60	€ 2.4000.0000,000	×		€96,479,27	¢ 15:052.01	PROGETTAZIONE IN CORSO
							Prosecucione del Rocuparo e Ressuro degli holest tra il betermino o Viu della Fortana Annonaria – Settore Sud (Regio V _e to) de IV, Vie VII)	£ 700.000,00	€ 700,500,00	ĸ	я	C107 432,08	< 6,00	PROGETTO IN VENHICA E VALIDAZIONE
Lazio	Roma	Roma	hssiluta aetohojnio hilipuci	Perco Archanlagos di Osku, Ambaz, Misseo dalle saver rusus sistema del parto utilizaligato di Osko apiliza e del porti Imperiali di Cleudio o Trasano	C-4,640,000,00	**************************************	Internato di Manistramano Straerdinatio, Mestaero, Consolidirmento e Valorizza atone dell'Area Archeologica e dei Correntino di S. Espoisto (solo Setter - Hundino), in all'assi alla Saparture dell'Area Archeologica a all'Ampliamento dei Percezzi Moserali e di Visita	4 500.000,00	c 5400,000,000	x	¥	C94.416,77	€20,323,54	PROCETTO HIS VERIFICA E VALIDAZIONE
		The state of the s					Cofinanziamunio « coperture dell'intervento giù hisamunio ren C 000 000,00 relative ally Marine Straferfinene per la Sicurezza Articopica Programba refinale es uni 1 commi di e 101 legge 150/3024 (ciadellia 2015) per C 000,000,00 programo specciulo sicuretta — annualitat 7018	C 600 000 00	€ 500,900,0D		ж	¢.61,458,50	€0,60	PROSETTÁBIONE IN COMSO
tasjo	Roma	Roma	isubsto autonomo Mitaact	Realizzazione del collegamento sotterraneo Planetario - Terme di Diocietiano	€ s0.000,010,00	F87E190P0350001	*	C10.000,000,00	*	x	ж	€15,000,40	к	pfiela corso
Lazio	Rome	Yivok	lubruje autonomo Milbect /	Missa in signerza, conserviditoho, restauro e valenzastative del Santyarto di Espita Vincitore e	€ 13.000,000,00	F3SC17000800001	Lotto 1; Messa in sicure223, settannoscene, restauro a vakenzzaone 44i Santuario di Ercolo Vaketoro a Tivo)i	£ 6.580.000,00	¢6.502.000,00	7		C24,400,00	€0,00	affidamento lectriço di coordinamento attività areni fistrativo, con pret.n.2275 del 10/20/2019
1370	нопа	1,503	Сольки	valorizativine del Santyario di Licola Vincitore a Twell, auditorium e delcheggio	. 13.000.00(80	7,3C17(QUEUGO)1	Laita 2: Valorizzatore del Santuano di Ercole Vindipore a Tivoli Realezzatione di auditorium o parcheggio	C 6.540.000,00	C 6-250 DD0 D0	,	*	C21_379,35	C 0,00	e stata avviata la procedura per l'Africamento della propertazione con la procedura del concomo internazionale ai sendi dicilarta. 194 del D.lgs. Isi aprile 2010 n.03 d'attraverso il Compignio Nationale degli Ancietato Plansicaten e Comzenzacio
Ligura	Gentra	Genosa	Ktgrane	Case del cansauten ilguri	€ 1.509.000,00	G32F17050336001	lotto progetiavane	€ 129/090,00	€ 220.000,00	€ 120,000,00	€ 108,999,00	6 120,000,00	€ 108,010,00	progestrazione as corso
Lombada	Missen	Mulane	latituro autonomo Afribart	Bresa - Interventi di sistema obne arec esterno	€ 3.000.050.09	<u> </u>		l	<u></u>		l	<u> </u>	L	progettiazione vi corso



DISEGNI

DI

LEGGE

Ħ

RELAZIONI

DOCUMENTI

Molive	kemu	Castel San Windonso	Polo mustale Mibatt	Recuporo e valonzzatione dell'area archeologica di Sun Vincanco al Volturno	€2,000,000,00	F37E17090230001		€2.010.000,00	€2.990.000,00	€0,00	€0,00	cane	€ 0,00	Reduzione del Documento preintificare alla progettazione in fase di l'avorazione. Si è in articha del rissifiati delle redagini preventivo.
hemonito	Toese	Beuzolo	Segretanato regionale	Costalio di Brizolo	€ 2,500 000,00	E33G29000000001		€ 2,500,000,00	C 2.500,000,00	×		g.	N	Progetto di fattibilità terrepreconomica disponibile, in attesa del conferimente degli incaneti por la progettazione definitiva ed escuziva
Sardegna	Sassart	La Massfalena	Polo mujeale Milhari	Vsketzzanone del compendo garitaldino	€ 1:000:020,00	F25C19000020003	sattaprogetto A : Struttura servizi aggluntivi e area d'Ingresso al Compendio	€ 1.000.000,00	€1.000.000,00		×	€76.550,19	C 0,00	progettazible in cerso
						1	sottoprogetto ii: Ares beni immebili sottoposti a tirtela							pregatiacione in cono
Toscana	Lucca	Luco	Сотыпе	Museo del Fumetto di Lucca (expo comes museum - lotti 2 e 3)	€ 2,000,000,00		×	х.	×	*	*	*	х .	in corso richiesta preventivi per affidamento progettazione
Toscana	Piss	Cabb	Sopiletenaenza	Reslauro e vatorizzezante della Certosa (Moheimentale di Calta	£ 2,000,600,00	-	3	×	×	*	, si	ж		A seguito dell'incontro avvenuto a dicembre 2019 tra Segretarioto, holo buluciale e Soprimenonca, di estabilità che, diversamente da quatao previsto inicialmente, ai lise di svalgere un maggiore coordinamento delle inspeci, il ruolo di statutora appallante per l'intervento in accetto saria svalto dal Segretarrara Regionole.
Venetp	Venuela	Venezu	Segrutariato regionale	Resupero e volorizassione del Lesseretto Vecchio	Ç\$.000.000,00	D71E190000200D1	unics	€ 5,600,000,00	€5 000.000,00	x	*	€ 5.709,00	C 5.709,00	- progottazione definitiva in corso
•	1				€65.003.000.03	1	totale	€ 48,120,000,00	€ 88,130,009,00	£ 120,600,60	£ 10E 000,00	C 733-202,18	£258.418,52	

DOC.

Plant Statistics Grand Proposit (birt Gilberia - Amaplita 2020														
-	growingla	co	berefigies	- Committee		ě	Existratificati/somoprogent	large to del Qued a Egondardo PRE gara	Importo del Chindro Economico MOST gera	vegano contrato efectado e os paras A Sel QI	importo Specia questança o del constituto principale	imperts to self- contractly affidements differ sommer a dispersations dis- pares & del CE	priporto falco e Speso pol Principle delle Demone e disposatione da perre è en 156	Spain of Milastone
Combardie	Mileno	Milano	Sagressoriate regionata	Herejuzzatione Musero parmenanto Design italiario	C10.973.560,09	. ×	×	k	×		×	*	ĸ	Nos avidato (in como reduzione FTT)
Companio	Happ!	Napoli	isoluto aujongmo Miliaci	yalottzazione Museo Capotimente e realiztazione cabinet persellane	C 30-000-000,00	*			×	×		x	*	Progestacione in conse
Соператир	Caseria	Custria	intitute autonomo Mibusi	Boggija ih urto o giralign	€5.790.900,4D			,	*		*			Progettacióne in come
					E46,173,560,00		totale	<0.00	(0)	(6,00)	<0.00	€0,06	€0.00	

Pinto Strategory Grand Prayerth Bent Cellettal - Vision grammation a consonic														
Regions	Province	Сопила	Amministracione Merecala	Interests	te parto programmito	CUP	Processed states/participations	properto del Galadeo (goranneo PRI)	Importo del Galdro Francisco FOST gara		Importo Spero (presposato del contratto pincipoli		emperior sociale special qui escriviti delle empre a disponissione de serve il dell'il	Spiralizmense
										proceeding principals dispurps A Sel CE	entrolling projections	and a fine		
Liguria	Genova	Genevo	Sopontendonza MiBACT/Segretanaso Regionale del Mibact	Abbasis San Giuliano -Fenteuro	£1.000.000,00		×	×	* :	a.	*	×	×	Abbità da realizzare in fase di programmazione
Sartingra	Sassari	Sassan	Comune	Chrese di Santa Mana in petion-Restoure	€680,000,00	883618000040001 505877870 CON 687118075778007	x				*			PROSETTO DI FATTIBILITA: TECNICA DE ECONOMICA AFRIGUAÇO CON DELBRAZIONE CAN IN 2870 EL ROSA QUE PRODETTO PÉPRIPTIVO SECULTIVO NAVIGO ALLA SAMONTERIBIRAD, DI SASSANI E NUDIONI EL LE ZOZIO PER E NAVIDOSZO, ZUDIOR AL SINSI DEL CALGO N. 4275012
Verseto	Pedova	Padovo	Segraturato Regionala dei Mabett	Самойо до Саггазом - Возданию е чатовыходором	€ 2.000,000,00	nan etguisiko	lotto-week	,				ĸ		de settestrurie Oxcilpinare e Accordo con qui e ativatoro comun di Padova
					€ 8.680,000,00		tolest	4.7 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	



PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI

Relazione annuale sullo stato di attuazione (anno 2019)

Parte II

Approfondimenti






4. Schede progetti

4.1 Annualità 2020

- Linea di azione 4
 - Valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte Campus e realizzazione cabinet delle porcellane;
 - Ampliamento ipogeo per la realizzazione del Museo permanente del Design italiano;
 - Progetto Reggia in arte e design Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del Complesso della Reggia alla loro esclusiva destinazione culturale, educativa e museale.



Annualità 2020 LINEA DI AZIONE 4 – SISTEMA MUSEALE DELLA ARTI APPLICATE E DEL DESIGN



CAMPANIA Valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte – Campus e realizzazione cabinet delle porcellane.

CUP

Soggetto Beneficiario/Stazione appaltante: Museo e Real Bosco di Capodimonte

Importo programmato: € 30.000.000,00

Importo rideterminato: /

Strumento attuativo: Disciplinare

MODALITÀ ATTUATIVA

Sono in corso le interlocuzioni tra il Segretariato Generale – Servizio II e il Soggetto Beneficiario finalizzate alla stipula del disciplinare d'obbligo regolante i rapporti tra le parti, al fine di avviare l'attuazione dell'intervento.

OBIETTIVO

Il "Grande Progetto" riguarda il complesso del Museo e del Real Bosco di Capodimonte, localizzato in prossimità del centro della Città di Napoli, che, per l'entità e la valenza del suo patrimonio artistico, storico e ambientale, rappresenta senza dubbio un attrattore culturale e naturale di straordinaria rilevanza. Il Real sito accoglie:

la Reggia Reale, sede di un Museo nazionale che ospita, in particolare, una delle più importanti pinacoteche d'Europa sull'arte italiana dal '200 al periodo contemporaneo, cui si aggiunge una straordinaria collezione di porcellane e arti decorative;

il Bosco di Capodimonte, che rappresenta il più grande parco urbano del Paese;

17 edifici, archetipi agricoli vernacolari dal grande valore storico-architettonico, tra cui, in particolare, la "Real Fabbrica delle Porcellane".

L'intervento proposto si inserisce in un più ampio programma di interventi finalizzati a trasformare il complesso di Capodimonte in un "Campus Culturale one stop shop", vale a dire in un sistema di offerta culturale, unico in Europa, articolato in una serie integrata di componenti - arte, storia, architettura,

