

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXLVII
n. 1

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
RECANTE INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA**

(AL 31 DICEMBRE 1997)

(articolo 4, ultimo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798)

Presentata dal Ministro dei lavori pubblici
(COSTA)

Trasmessa alla Presidenza il 14 ottobre 1998

PAGINA BIANCA

INDICE

I. - Attività del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1984, n. 798	Pag. 5
II. - Quadro riepilogativo dei finanziamenti e dello stato di attuazione degli interventi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia	» 15
III. - Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato	» 19
IV. - Stato di attuazione degli interventi di competenza della regione del Veneto	» 23
V. - Stato di attuazione degli interventi di competenza della provincia di Venezia	» 27
VI. - Stato di attuazione degli interventi di competenza del comune di Venezia e del comune di Chioggia	» 29
VII. - Stato di attuazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni	» 35
ALLEGATO N. 1 - Quadro riepilogativo dei finanziamenti assegnati	» 39
ALLEGATO N. 2 - Stato di attuazione al 31 dicembre 1997 ..	» 42
ALLEGATO N. 3 - Legge n. 798 del 1984 e successivi rifinanziamenti	» 45
ALLEGATO N. 4 - Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti	» 46
ALLEGATO N. 5 - Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti	» 47
ALLEGATO N. 6 - Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti	» 48
ALLEGATO N. 7 - Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti	» 49
ALLEGATO N. 8 - Confronto dello stato di attuazione	» 50

PAGINA BIANCA

I. ATTIVITA' DEL COMITATO DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 24.11.1984, N. 798

Il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo, in conformità ai disposti della legislazione speciale per Venezia, ha esercitato le funzioni istituzionali seguendo e promuovendo le attività dei vari soggetti attivi nell'attuazione della legge speciale, funzionando come punto di riferimento e di coordinamento tra i vari Organismi che operano per la salvaguardia e che rappresentano realtà ed esigenze fortemente diversificate, nonostante perseguano l'unico obiettivo della salvaguardia di Venezia.

Si segnala che, nel corso dell'anno 1997, cioè nel periodo oggetto della presente relazione al Parlamento, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo si è riunito per altre due volte (27 febbraio 1997 – 1° agosto 1997).

Le sedute hanno consentito di sviluppare e di porre in essere alcune fondamentali tematiche riguardanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, permettendo l'assunzione di decisioni di carattere generale e di scelte operative in forma di stretto coordinamento e di cooperazione tra i diversi organismi attivi sul territorio lagunare.

In particolare, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo, attraverso le relazioni del Segretario, Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia, ha potuto svolgere la supervisione dei lavori del "**Tavolo di Consultazione e Coordinamento Istituzionale sulle problematiche ambientali della laguna di Venezia**", costituito nel 1995, nell'ambito del quale, anche nel corso del 1997, è stata svolta una efficace, continua e costante azione di programmazione e verifica delle iniziative intraprese dagli Enti attuatori dei diversi interventi in modo da assicurarne la massima compatibilità ed il massimo grado di coordinamento.

Al gruppo di lavoro, istituito su iniziativa in particolare della Regione del Veneto, partecipano i rappresentanti – a livello politico ed a livello tecnico-amministrativo – di tutte le Amministrazioni interessate:

- Regione del Veneto
- Provincia di Venezia
- Comune di Venezia
- Comune di Chioggia
- Autorità Portuale e Capitaneria di Porto di Venezia
- Magistrato alle Acque di Venezia
- Consorzio Venezia Nuova – Concessionario del Magistrato alle Acque di Venezia

- Ministero dell'Ambiente
- Genio Civile per le Opere Marittime di Venezia
- Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali

Nel corso del 1996 il Presidente della Regione del Veneto ha istituito anche un Gruppo di Lavoro tecnico-amministrativo di supporto al Tavolo Istituzionale al fine di rafforzare e dare continuità alle attività del Tavolo. All'organismo tecnico-amministrativo partecipano i rappresentanti tecnici delle amministrazioni di volta in volta interessate ed è presieduto dal Magistrato alle Acque che cura anche la segreteria del Tavolo di Coordinamento Istituzionale.

La necessità di istituire un Tavolo Istituzionale di questo tipo è sorta in relazione all'esigenza di sviluppare e applicare sistematicamente, nella maggior misura possibile e nell'ambito delle specifiche rispettive competenze, rapporti di collaborazione tra gli Enti operanti nell'ambito lagunare su argomenti specifici.

Tale esigenza era stata ravvisata da tempo, per esempio, dalla Regione del Veneto, dalle Amministrazioni Comunali di Venezia e di Chioggia e dal Magistrato alle Acque di Venezia al fine di attivare programmi tecnico-progettuali per la realizzazione di alcuni interventi che, pur riguardando competenze di più Amministrazioni, sono strettamente collegati ed interconnessi, tanto da non poter essere eseguiti puntualmente e correttamente se non mediante un'azione integrata e coordinata.

Proprio per affrontare e portare a soluzioni efficaci le riferite questioni, nel corso delle riunioni del Tavolo di Coordinamento Istituzionale è stata affermata l'opportunità di sviluppare il rapporto di collaborazione mediante la sottoscrizione di appositi "Protocolli di Intesa" volti a disciplinare l'azione comune dei diversi Enti.

A tali Protocolli sono già seguiti o seguiranno appositi Accordi di Programma da adottare ai sensi della vigente disciplina (L. 142/1990; L. 241/1990 e D.P.R. 20.4.1994 n° 367), sulla cui base possano essere realizzati interventi complessi di interesse comune.

L'attività svolta dal Tavolo di Coordinamento Istituzionale nel 1997 è stata caratterizzata dalle riunioni del Gruppo di Lavoro di supporto, in cui si è soprattutto cercato di rispondere alle questioni inerenti l'attuazione dell'Ordinanza n. 4498, emanata il 1° ottobre 1996, dal Ministro dell'Ambiente.

Sono stati esaminati i seguenti punti:

- gli obiettivi di qualità per l'ecosistema lagunare formulati dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'IRSA-CNR al Ministero dell'Ambiente e il conseguente aggiornamento dei limiti di accettabilità per gli scarichi reflui in laguna;
- la sistemazione delle discariche e dei siti inquinati da bonificare posti all'interno della conterminazione lagunare o che possono interferire con le acque e i connessi interventi sulle sponde e sui fondali dei canali di Porto Marghera avviati dal Magistrato alle Acque di Venezia;
- le proposte del Ministro dell'Ambiente per opere per la diversione a mare degli scarichi reflui depurati e le linee per l'aggiornamento del Piano Direttore regionale per il disinquinamento della laguna di Venezia e del suo bacino scolante;
- l'ipotesi operativa per permettere l'estromissione dalla laguna del traffico petrolifero di transito e di interventi di bonifica e recupero di aree asservite a questo traffico;
- gli accordi di coordinamento operativo tra Stato, Regione e Comuni e in particolare gli accordi di programma tra Magistrato alle Acque e Comune di Venezia per rii e fognature;
- l'acquedotto a servizio dell'agricoltura per la zona del Cavallino, in comune di Venezia, che attualmente si alimenta ancora con prelievi dalla falda;
- la realizzazione dei progetti predisposti dalla Capitaneria di Porto di Venezia per incrementare la sicurezza del traffico marittimo in laguna e lungo le rotte di accesso.

E' indubbio, pertanto, che dal 1995 in poi si sono ottenuti importanti risultati in termini di coordinamento e collaborazione tra i diversi Enti operanti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

E' necessario rilevare che, per garantire la funzione di coordinamento delle attività tra i vari soggetti attuatori della legislazione speciale per Venezia, era stato individuato dalla Legge n. 537/93 e dal successivo decreto legislativo n. 62/94 uno strumento valutato idoneo e costituito da una Società per Azioni "**Agenzia per Venezia**" che avrebbe dovuto tra l'altro svolgere proprio questa attività. Tale strumento non ha avuto concreta realizzazione in quanto taluni soggetti che avrebbero dovuto partecipare al capitale dell'"Agenzia per Venezia" S.p.A. non hanno ritenuto di dover dar seguito all'iniziativa. Successivamente il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ha, in molteplici occasioni, dato atto dell'esigenza di approfondire l'opportunità della costituzione dell'organismo societario in quanto molte delle attività di progettazione, studio e

sperimentazione, che la società avrebbe dovuto svolgere, erano già state di fatto realizzate.

Anche durante il 1997 è stata assicurata la prosecuzione delle attività di salvaguardia mediante l'assegnazione di un **flusso di finanziamenti** continuativo, benché inferiore al fabbisogno esposto dai vari Enti nei propri piani generali di intervento.

Infatti, come specificato nel capitolo seguente, la Legge Finanziaria per il 1997, n. 662/96, e la seguente Legge di spesa, n. 345 del 2 ottobre 1997, hanno autorizzato limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi con decorrenza dal 1998 e di lire 50 miliardi con decorrenza dal 1999 che consentono l'attivazione di ulteriori 970 miliardi circa portando a 7.900 miliardi circa i finanziamenti totali resi disponibili dallo Stato per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna a partire dal 1984.

Il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo, dopo aver operato l'attribuzione di tali finanziamenti ai diversi Enti in base alle esigenze specifiche evidenziate a valere sui piani di priorità e alla necessità di dare continuità agli interventi intrapresi, ha seguito poi, attraverso le relazioni presentate dal Segretario, l'attuazione degli interventi tramite l'analisi delle cifre impegnate e spese dai vari soggetti destinatari dei fondi.

Sotto questo profilo è stato rilevato un certo ritardo nella capacità di spesa da parte di alcuni Enti, imputabile alle complesse procedure burocratiche da osservare e che si svolgono con tempi che rallentano l'avvio dei lavori.

L'attività del Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nel corso del 1997 è stata caratterizzata dal controllo dello svolgimento dello **Studio di Impatto Ambientale del progetto di massima delle opere alle bocche di porto lagunari per la regolazione dei flussi di marea** e dalla definizione dei termini di svolgimento della successiva **procedura di Valutazione di Impatto Ambientale**.

Si ricorda che nelle sedute del 4 luglio 1995 e del 12 dicembre 1995, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ha, infatti, stabilito di sottoporre tale progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

In particolare, nella seduta del 4 luglio 1995, il Comitato ha deciso di far assoggettare il progetto di massima delle opere alle bocche di porto alla procedura per la V.I.A. nel rispetto della normativa vigente ma con ulteriori prescrizioni che sono state specificamente indicate nel testo di una apposita delibera del Comitato.

Tali prescrizioni riguardano tra l'altro:

- l'istituzione di un Collegio di Esperti di livello internazionale (formato da cinque membri nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), destinato ad affiancare la Commissione per la V.I.A. del Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda le attività di valutazione dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), da eseguirsi a cura del proponente Magistrato alle Acque di Venezia;
- il contenuto del S.I.A.;
- la definizione dei rischi derivanti dalle acque alte per le città di Venezia e di Chioggia (a cura delle rispettive Amministrazioni comunali sulla base di proprie informazioni e dati e di quelli disponibili presso il Servizio Informativo del Magistrato alle Acque).

E' opportuno ricordare che l'elenco degli ulteriori temi, essi pure oggetto del S.I.A., come indicati nella delibera del Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo, è stato formulato anche sulla base di istanze proposte dall'Amministrazione Comunale di Venezia.

In data 12 dicembre 1995 il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ha assunto ulteriori decisioni in merito alla formazione del Collegio di Esperti di livello internazionale e ai programmi aggiornati del S.I.A. e del completamento della definizione dei rischi per Venezia e Chioggia, fissando il termine entro il quale gli esiti della V.I.A. avrebbero dovuto essere consegnati al Comitato stesso.

Il Magistrato alle Acque e il concessionario Consorzio Venezia Nuova, per rispettare le scadenze di presentazione dei documenti deliberate dal Comitato nella seduta del 12 dicembre 1995, si sono attivati per dare luogo ai relativi adempimenti; le attività relative al S.I.A. sono state avviate nel mese di aprile del 1996.

Il S.I.A., controllato "in itinere" dai competenti organi tecnici del Magistrato alle Acque, è stato regolarmente consegnato dal Consorzio Venezia Nuova al Magistrato alle Acque in data 30 aprile 1997.

L'elaborato - dopo un esame sulla completezza e coerenza con la legislazione vigente in materia di V.I.A., con la legislazione speciale per Venezia e con la delibera del

Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nella seduta del 4 luglio 1995 - è stato trasmesso ai destinatari istituzionali in data 18 giugno 1997.

L'annuncio relativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale del Ministro dell'Ambiente e del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali è stato pubblicato in data 23 giugno 1997.

Il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, disciplinato dall'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, fissa in 30 giorni il tempo utile per la consultazione del pubblico e in 90 giorni il tempo per la valutazione da parte della Commissione di V.I.A. del Ministero dell'Ambiente.

Il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo, tuttavia, nell'adunanza del 1° agosto 1997, data la particolarità del progetto, ha messo a punto il programma di lavoro "ad hoc" da seguire nelle fasi in cui si articola tale peculiare procedura e ha definito le modalità e i termini di pronuncia del Collegio di Esperti di livello internazionale e della Commissione per la V.I.A. del Ministero dell'Ambiente.

Tale programma del Comitato prevede:

- la conclusione al 31 dicembre 1997 della fase di informazione e consultazione del pubblico e di formulazione delle relative osservazioni, iniziata in data 23 giugno 1997;
- che il Collegio di Esperti di livello internazionale esprima il proprio parere entro il 30 aprile 1998;
- che il Collegio di Esperti di livello internazionale, al termine del lavoro, rassegni il proprio parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Lavori Pubblici, al Ministro dell'Ambiente e a tutti gli altri componenti del Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo;
- che la Commissione di V.I.A. e il Ministro dell'Ambiente concludano la procedura comunicando al Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo il loro parere entro il 30 giugno 1998;
- che il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo esprima, infine, il proprio parere consultivo sugli esiti della procedura come sopra rappresentata.

Tale procedura è stata recepita dal D.P.R. del 7 agosto 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1997.

Attualmente sono in corso le attività della Commissione di V.I.A. del Ministero dell'Ambiente e del Collegio di Esperti di livello internazionale che hanno effettuato numerose sessioni di lavoro a Venezia e a Roma.

E' da segnalare che il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ha affrontato e indirizzato anche numerose altre diverse tematiche che si sono presentate nel corso dell'anno oggetto dell'esame della presente relazione, alcune specificamente legate alla salvaguardia, altre legate a situazioni di emergenza.

Il Segretario ha così relazionato sullo **stato di attuazione degli studi e delle sperimentazioni** effettuati e in corso di effettuazione **in risposta ai punti sollevati dal Ministro dell'Ambiente** con nota presentata nella seduta del Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo del 2 agosto 1996.

Con tale nota il Ministro dell'Ambiente aveva chiesto di conoscere lo stato di attuazione di alcuni particolari progetti di fattibilità e interventi volti al riequilibrio ambientale della laguna di Venezia quali:

- l'ipotesi di modifica della configurazione dei moli foranei esistenti in corrispondenza delle bocche di porto lagunari;
- l'ipotesi di ricalibrazione dei canali di navigazione e sovralzo dei fondali alle bocche di porto;
- l'ipotesi di riapertura del canale Fisolo in sostituzione del c.d. "canale dei petroli";
- la riapertura sperimentale delle valli da pesca;
- interventi per il disinquinamento della laguna e del bacino scolante;
- la fattibilità dell'estromissione del traffico petrolifero dalla laguna.

In particolare, riguardo a quest'ultimo punto, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nell'adunanza del 27 febbraio 1997, preso atto delle attività di approfondimento e aggiornamento svolte dal Gruppo di Lavoro costituito dal Comitato stesso nella seduta del 4 luglio 1995 per esaminare le condizioni relative alla **sostituzione del traffico petrolifero nella laguna**, con particolare riguardo alla proposta predisposta dal concessionario Consorzio Venezia Nuova e ad altre alternative che erano state formulate, ha deliberato l'avvio di una serie di attività che consentiranno di fatto la riduzione del traffico di prodotti petroliferi in laguna e il suo svolgimento in condizioni di sicurezza. Esse sostanzialmente consistono nell'avvio del progetto di fattibilità della bretella di collegamento tra Cremona e Mantova dell'oleodotto Genova -

Cremona, nell'esame e nell'adozione di tutte le iniziative idonee a un progressivo divieto di accesso in laguna alle navi non pienamente rispondenti alle norme internazionali della convenzione di Marpol e nell'ulteriore analisi della possibilità di utilizzo temporaneo dell'attracco di San Leonardo per il mantenimento dell'attività petrolifera a servizio della zona industriale di Porto Marghera fino a quando non verranno adottate soluzioni alternative per il suo funzionamento.

Il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ha seguito anche lo stato di attuazione degli adempimenti messi in atto dai diversi Organismi relativamente all'**Ordinanza del Ministro dell'Ambiente n. 4498 del 1° ottobre 1996**, con la quale il Ministro ha inteso accelerare l'attuazione dei programmi di salvaguardia ambientale della laguna.

In particolare, dalle relazioni esposte è emerso che il Magistrato alle Acque, al quale erano stati assegnati numerosi compiti di istruttoria tecnica e di avvio della fattibilità dei diversi interventi da realizzare in conseguenza degli indirizzi emanati, ha già sostanzialmente realizzato tali compiti; la Regione del Veneto ha avviato la richiesta revisione del piano per la prevenzione dell'inquinamento della laguna; anche i comuni di Venezia e di Chioggia hanno avviato i programmi indicati nell'ordinanza; molte aziende industriali hanno presentato al Magistrato alle Acque progetti di adeguamento dei processi produttivi e di riorganizzazione degli scarichi per ridurre il proprio impatto sull'ecosistema.

Sempre in tema di emergenza ambientale, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nella seduta del 27 febbraio 1997 ha esaminato gli **interventi di risanamento dell'area industriale di Marghera** indicati dal Ministro dell'Ambiente su segnalazione del Magistrato alle Acque di Venezia. Infatti, nel mese di settembre del 1996, il Magistrato alle Acque di Venezia, con la collaborazione dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Venezia, ha preparato, in accordo con il Ministero dell'Ambiente, una Scheda Tecnica per un programma di interventi, da realizzare sulle sponde e sui fondali dei canali del porto industriale e commerciale di Marghera, finalizzati alla valorizzazione delle opportunità di sviluppo dell'occupazione nell'area ed al miglioramento delle condizioni ambientali della laguna di Venezia.

La Scheda Tecnica è stata quindi presentata al CIPE dal Ministero dell'Ambiente.

Il CIPE, in data 18.12.1996, ha stabilito di assegnare al Ministero dell'Ambiente risorse per 350 miliardi sulla base del pacchetto di interventi da questo proposti.

Il Ministro dell'Ambiente ha successivamente indicato, nel corso di incontri con le Istituzioni veneziane, la possibilità di attribuire finanziamenti per 100 miliardi a questo programma.

Gli interventi previsti sono raggruppati in sei progetti funzionalmente autonomi: Canale Brentelle, Darsena della Rana/Canale Brentelle, Canale industriale Nord, Canale industriale Sud, Canale industriale Ovest interno, Porto Commerciale.

Ciascun progetto prevede la realizzazione di sistemazioni delle sponde e dragaggio dei fondali. Il Magistrato alle Acque ha già provveduto ad individuare gli interventi prioritari da realizzare ed a definire le linee del progetto preliminare.

Infine, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nella seduta del 1° agosto 1997, ha esaminato alcune tematiche specifiche quali: l'avvio della progettazione esecutiva e di una sperimentazione in scala 1:1 dell'innalzamento dei fondali alla bocca di porto di Malamocco; l'istituzione del Centro di Coordinamento dell'attività di ricerca sulla laguna di Venezia tra l'Università di Ca' Foscari di Venezia, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, l'Università di Padova e il CNR; le norme sugli scarichi dei pubblici esercizi, l'applicazione degli sgravi fiscali e l'emanazione di un regolamento unico per la disciplina del traffico acqueo, argomenti proposti dal Comune di Venezia.

PAGINA BIANCA

II. QUADRO RIEPILOGATIVO DEI FINANZIAMENTI E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA LEGISLAZIONE SPECIALE PER VENEZIA

Nell'*Allegato n. 1* è riportato il *quadro riepilogativo dei finanziamenti assegnati* complessivamente ai diversi Enti competenti in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna dalla legislazione speciale per Venezia dal 1984 a oggi (Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti; Legge n. 139/92; Legge n. 539/95; Legge n. 515/96; Legge n. 345/97).

Poiché la Legge n. 515/96 permette di attivare i finanziamenti a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997 e dal 1998 e la Legge n. 345/97 permette di attivare i finanziamenti a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998 e dal 1999, il quadro dei finanziamenti distingue gli *importi complessivamente assegnati* dagli *importi effettivamente disponibili nel corso del 1997*.

Nell'*Allegato n. 2* è riportato sinteticamente lo *stato di attuazione al 31 dicembre 1997* degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna finanziati mediante la legislazione speciale per Venezia, riportando per ciascun Ente gli *importi assegnati* e gli *importi spesi* relativamente agli interventi di propria competenza *con riferimento ai soli importi effettivamente disponibili nel corso del 1997* (Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti; Legge n. 139/92; Legge n. 539/95; Legge 515/96 per la parte a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1° gennaio 1997).

Viene riportato nelle tabelle successive il *quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti* con l'indicazione delle somme assegnate, impegnate e spese per ciascuna Legge :

- *Allegato n. 3 - Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti;*
- *Allegato n. 4 - Legge n. 139/92;*
- *Allegato n. 5 - Legge n. 539/95;*
- *Allegato n. 6 - Legge n. 515/96;*
- *Allegato n. 7 - Legge n. 345/97.*

Risulta che per tutti gli Enti competenti in materia di salvaguardia, la legislazione speciale per Venezia ha assegnato dal 1984 ad oggi circa 7.900 miliardi, di cui 6.379 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1997. Al 31.12.1997, risultano complessivamente spesi 3.074 miliardi, pari al 48% degli importi effettivamente disponibili.

Per singole Leggi:

- la Legge n. 798/84 e le successive Leggi di rifinanziamento (Leggi n. 910/86, n. 67/88, n. 360/91, n. 415/92 e n. 724/94) hanno assegnato 2.196 miliardi, tutti disponibili nel corso del 1997, di cui risultano spesi 1.711 miliardi (78%);
- la Legge n. 139/92 ha assegnato 2.423 miliardi, tutti disponibili nel corso del 1997, di cui risultano spesi 1.229 miliardi (51%);
- la Legge n. 539/95 ha assegnato 503 miliardi. La riferita somma è stata reperita mediante i contratti di finanziamento stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1996 e sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997. La maggior parte degli Enti autorizzati dalla Legge a sottoscrivere i contratti di finanziamento aveva già formalizzato nel corso del 1996 i contratti a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997. Pertanto, nel corso del 1997 sono risultati disponibili tutti i fondi reperiti a valere sui limiti di impegno finanziati dalla Legge 539/95. Di questi risultano spesi 73 miliardi (15%);
- la Legge n. 515/96 ha assegnato un importo complessivo stimato pari a 1.810 miliardi circa. Tale somma viene reperita mediante i contratti di finanziamento da stipularsi a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997 e dal 1998 di importo pari, rispettivamente, a 125 e a 60 miliardi. La maggior parte degli Enti autorizzati dalla Legge a sottoscrivere i contratti di finanziamento aveva già formalizzato nel corso del 1996 i contratti a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997.

I contratti di finanziamento a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998 potevano essere sottoscritti dai diversi Enti solo a partire dal secondo semestre del 1997.

Gli importi effettivamente disponibili nel corso del 1997, pertanto, sono quelli attivati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1° gennaio 1997 e sono pari a 1.257 miliardi circa.

Di questi risultano spesi solo 61 miliardi (5%) nel corso del 1997, cosa che si giustifica tenendo conto dei tempi necessari per destinare, impegnare e spendere le somme rese disponibili nel corso dello stesso anno da parte dei diversi Enti;

- la **Legge n. 345 del 2 ottobre 1997** (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1997) ha assegnato un importo complessivo stimato pari a 974 miliardi circa. Tale somma viene reperita mediante i contratti di finanziamento da stipularsi a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998 e dal 1999 di importo pari a 50 miliardi per ciascun anno, accantonati dalla Legge Finanziaria per il 1997, n. 662/96.

Gli Enti autorizzati dalla Legge a sottoscrivere i contratti di finanziamento potevano formalizzare i contratti a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998 già alla fine del 1997, mentre i contratti di finanziamento a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999 potranno essere sottoscritti dai diversi Enti a partire dal secondo semestre del 1998.

Ovviamente, nessun importo proveniente dalla Legge 345/97 era disponibile nel corso del 1997.

Come prima indicato, pertanto, tenendo conto anche dei fondi che saranno resi disponibili nel biennio 1998-1999 dalla Legge 345/97, la legislazione speciale per Venezia ha finanziato a partire dal 1984 circa 7.900 miliardi.

L'*Allegato n. 8* riporta il *confronto dello stato di attuazione delle somme spese* tra la situazione aggiornata al 31.12.1996 riportata nella precedente "Relazione al Parlamento" datata giugno 1997 e la situazione aggiornata al 31.12.1997 presentata in questo documento. Risulta che nel corso del 1997 vi è stato un incremento di circa l'8% delle somme complessivamente spese.

Si ricorda che la Legge Finanziaria per il 1998 prevede, per il rifinanziamento della legislazione speciale per Venezia, gli stanziamenti a copertura delle rate di ammortamento dei mutui già perfezionati dei vari Enti nonché, nella tabella B, quali limiti di impegno, 10 miliardi con decorrenza dal 1999 e 10 miliardi con decorrenza dal 2000.

La destinazione specifica dei fondi, sulla base della ripartizione che il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge 798/84 avrà proposto, **dovrà essere operata mediante una apposita legge di spesa.**

Si segnala la necessità di poter disporre urgentemente di tali fondi, per quanto insufficienti rispetto alle esigenze espresse dai diversi Enti, per assicurare, almeno in parte, continuità alle attività di salvaguardia intraprese.

La necessità di disporre di fondi adeguati è divenuta particolarmente urgente a seguito anche del verificarsi di **situazioni di emergenza ambientale** in numerosi siti all'interno della conterminazione lagunare, legate soprattutto ad alcune attività produttive di Porto Marghera svoltesi negli anni passati.

Per la bonifica o, per lo meno come primo intervento, per la messa in sicurezza di tali siti, sarebbe necessario, pertanto, lo **stanziamento di fondi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna**, in modo da consentire di fronteggiare le situazioni più urgenti e più pericolose per la salute pubblica.

III. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLO STATO

A. Interventi dello Stato in amministrazione diretta

Gli interventi dello Stato da eseguire in amministrazione diretta previsti dall'art. 3 (lettere a), b), c), e), f), g), h), i), m)) della Legge n. 798/84 riguardano: riequilibrio idrogeologico della laguna; servizio vigilanza ed antinquinamento; marginamenti lagunari; restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico-artistico destinati all'uso pubblico; recupero del complesso edilizio dell'Arsenale; consolidamento di ponti, canali e fondamenta; sistemazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali; restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico; interventi di edilizia universitaria.

Gli importi assegnati dalla Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti ammontano a 330 miliardi di cui 326 (99%) sono stati impegnati per attività relative ai suddetti interventi.

Gli importi spesi relativamente alla Legge n. 798/84 sono pari a 279 miliardi (85%).

B. Interventi in concessione al Consorzio Venezia Nuova

Gli interventi dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova riguardano i seguenti obiettivi, richiamati anche dall'art. 3 lettere a), c), d), e l) della Legge n. 798/84 e art. 2, 1° comma lettera a) della Legge n. 360/91 : riequilibrio idrogeologico della laguna e arresto ed inversione del processo di degrado del bacino lagunare; opere di regolazione delle maree; difesa dalle acque alte degli abitati insulari; rinforzo dei moli foranei alle tre bocche di porto; marginamenti lagunari; opere portuali marittime a difesa dei litorali; sostituzione del traffico petrolifero in laguna; apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree.

Il Consorzio Venezia Nuova a valere sui finanziamenti resi disponibili dalla **Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti**, ha sottoscritto dal 1985 al 1992 otto Convenzioni, sei con il Magistrato alle Acque e due con il Genio Civile Opere Marittime. Gli importi assegnati e resi disponibili dalla suddetta Legge ammontano a 778 miliardi, di cui 774 (99%) sono stati impegnati nelle suddette Convenzioni e Atti Aggiuntivi a tali Convenzioni. Tali atti sono già tutti registrati da parte della Corte dei Conti e quindi risultano operativi a tutti gli effetti.

Gli importi spesi relativamente alla Legge n. 798/84 sono pari a 770 miliardi (99%) al 31.12.1997.

Il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla Legge n. 139/92 con decorrenza dal 1993 e dal 1994, ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo che hanno reso disponibili 970 miliardi al 31.12.1997. Con tali somme sono state sottoscritte due Convenzioni e alcuni Atti Aggiuntivi alle convenzioni stesse, per un importo complessivo di 970 miliardi (100% dell'importo effettivamente disponibile). Gli ultimi due Atti Aggiuntivi alle Convenzioni, di importo complessivo pari a 94 miliardi, sono stati sottoscritti in data 23.12.1997 e sono tuttora in fase di registrazione da parte della Corte dei Conti; al 31.12.1997, pertanto, risultano impegnati 876 miliardi. Gli importi spesi relativamente alla Legge n. 139/92 sono pari a 721 miliardi (74% degli importi disponibili) al 31.12.1997.

Il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla Legge n. 539/95 con decorrenza dal 1996 e dal 1997, ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo che hanno reso disponibili 180 miliardi. Con tali somme sono state sottoscritte, nel corso del 1996, due Convenzioni con il Magistrato alle Acque, per un importo complessivo di 180 miliardi (100% dell'importo effettivamente disponibile). La seconda Convenzione è divenuta operativa nel mese di luglio del 1997 con la registrazione da parte della Corte dei Conti del relativo Decreto approvativo, per cui al 31.12.1997 risulta impegnato il 100% delle somme disponibili. Gli importi spesi al 31.12.1997 relativamente alla Legge n. 539/95 sono pari a 39 miliardi circa (22% degli importi disponibili).

A valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla Legge n. 515/96 con decorrenza dal 1997, il Consorzio Venezia Nuova ha stipulato con gli istituti finanziatori un contratto di mutuo che ha reso disponibili 500 miliardi. Con tali somme è stata sottoscritta in data 18.12.1996 con il Magistrato alle Acque una nuova Convenzione di importo pari a 500 miliardi. Tale Convenzione è divenuta operativa nel mese di luglio del 1997 con la registrazione da parte della Corte dei Conti. Inoltre, nel mese di luglio 1997, il Magistrato alle Acque ha sottoscritto con il Consorzio Venezia Nuova una ulteriore Convenzione, di importo pari a 200 miliardi, a valere sul contratto di mutuo perfezionato dal concessionario in data 1° luglio 1997 relativamente ai limiti di impegno con decorrenza dal 1998; essa è stata registrata alla Corte dei Conti in data 10.09.1997 ma è divenuta operativa a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1998.

Pertanto, al 31.12.1997 risultano sottoscritti e impegnati tutti gli importi reperiti a valere sulla Legge n. 515/96. Gli importi spesi al 31.12.1997 relativamente alla Legge n. 515/96 sono pari a 27 miliardi circa (5% degli importi disponibili).

Infine, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 345/97** con decorrenza dal 1998, il Consorzio Venezia Nuova ha stipulato con gli istituti finanziatori un contratto di mutuo che ha reso disponibili 160 miliardi. E' stata successivamente sottoscritta in data 23.12.1997 con il Magistrato alle Acque una nuova Convenzione di importo pari a 160 miliardi. La Convenzione è attualmente in fase di registrazione da parte della Corte dei Conti. Nessun importo, pertanto, risulta speso al 31.12.1997 relativamente a tale Convenzione. I finanziamenti a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999 assegnati dalla Legge n. 345/97 al Consorzio Venezia Nuova potranno essere reperiti e formalizzati solo nel corso del secondo semestre del 1998.

Pertanto, il totale degli importi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia al 31 dicembre 1997 per la realizzazione degli interventi in concessione al Consorzio Venezia Nuova è di 2.978 miliardi, di cui 2.428 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1997.

Al 31.12.1997 risulta speso il 79% degli importi effettivamente disponibili reperiti a valere sulle Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95. Gli importi spesi alla stessa data scendono al 64% se si tiene conto anche delle somme rese disponibili nel corso del 1997 dalla più recente Legge n. 515/96.

PAGINA BIANCA

IV. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA REGIONE DEL VENETO

Gli interventi della Regione del Veneto di cui alla Legge n. 798/84, Legge n. 360/91 e n. 139/92 riguardano in particolare gli interventi in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento del territorio dei comuni della gronda lagunare e del bacino scolante nella laguna di Venezia anche mediante la realizzazione di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario nonché di impianti di depurazione; opere di ristrutturazione dell'ospedale dei SS. Giovanni e Paolo; realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia secondo un progetto integrato, in accordo con il Comune di Venezia, finalizzato alla manutenzione dei rii cittadini.

Gli importi assegnati dalla **Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti** ammontano a 531 miliardi, di cui 529 (99%) sono stati impegnati per attività relative ai suddetti interventi.

Gli importi spesi relativamente alla Legge n. 798/84 sono pari a 211 miliardi (40%) al 31.12.1997.

La Regione del Veneto, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla **Legge n. 139/92** con decorrenza dal 1993, dal 1994, dal 1995 e dal 1996 (i limiti di impegno con decorrenza dal 1994, infatti, autorizzati per la Regione del Veneto, sono stati rimodulati dal Decreto Legge n. 659 del 30 novembre 1994 spostandone in parte la decorrenza al 1995 e al 1996) ha sottoscritto contratti di mutuo con gli istituti finanziatori per un importo totale pari a 670 miliardi.

Di tali somme, in base all'art. 3 della Legge n. 139/92, una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione del Veneto è stata destinata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato rii.

Pertanto, i finanziamenti attivabili per interventi della Regione del Veneto ammontano a 603 miliardi relativamente ai contratti di mutuo già stipulati.

Sono stati impegnati dalla Regione del Veneto 478 miliardi (79%) e spesi 100 miliardi (17%) al 31.12.1997.

La Regione del Veneto, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla **Legge n. 539/95** con decorrenza dal 1996 e dal 1997, ha sottoscritto due contratti di mutuo con gli istituti finanziatori che hanno assegnato 90 miliardi.

Al netto della quota destinata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato rii, in base all'art. 3 della Legge n. 139/92, i finanziamenti attivabili per interventi della Regione del Veneto ammontano a 84 miliardi relativamente ai contratti di mutuo già stipulati.

Tali finanziamenti, tutti disponibili nel corso del 1997, risultano tutti impegnati al 31.12.1997, mentre nessun importo risulta speso relativamente a tale Legge.

La Regione del Veneto, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla **Legge n. 515/96** con decorrenza dal 1997, ha sottoscritto un contratto di mutuo con gli istituti finanziatori che ha assegnato circa 200 miliardi.

Di tali somme, in base all'art. 3 della Legge n. 139/92, una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione del Veneto è stata destinata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato rii.

Pertanto, i finanziamenti attivabili per interventi della Regione del Veneto a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997, ammontano a circa 180 miliardi relativamente al contratto di mutuo già stipulato.

Tali finanziamenti risultano tutti impegnati al 31.12.1997, mentre nessun importo risulta speso relativamente a tale Legge.

E' in fase di stipula il contratto di mutuo relativo ai limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla Legge con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

La Regione del Veneto, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla **Legge n. 345/97** con decorrenza dal 1998 e dal 1999, potrà attivare due contratti di mutuo che renderanno complessivamente disponibili circa 200 miliardi.

I finanziamenti a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999 potranno essere reperiti e formalizzati solo nel corso del secondo semestre del 1998.

Pertanto, il totale degli importi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia al 31 dicembre 1997 per la realizzazione degli interventi di competenza della Regione Veneto è di 1.688 miliardi, di cui 1.395 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1997.

Al 31.12.1997 risulta speso il 26% degli importi effettivamente disponibili reperiti a valere sulle Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95. Gli importi spesi alla stessa data scendono al 22% se si tiene conto anche delle somme rese disponibili nel corso del 1997 dalla più recente Legge n. 515/96.

In particolare, relativamente alle somme attivabili a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997 nell'ambito delle Leggi n. 539/95 e n. 515/96, il Consiglio regionale ha approvato una prima tranche del programma per 30 miliardi con PCR n. 169 del 6.11.1996. Conseguentemente la Giunta Regionale ha impegnato la spesa e individuato i soggetti attuatori con deliberazione n. 553 del 25.2.1997.

La seconda tranche del programma, per 230 miliardi, è stata approvata dal Consiglio regionale con PCR n. 32 del 30.04.1997.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 2613 del 22.07.1997 ha individuato i soggetti attuatori delle opere e avviato conseguentemente le procedure per la realizzazione delle stesse.

La Regione del Veneto segnala che, per molte opere di propria competenza, si tratta di intervenire in modo coordinato e integrato con più soggetti distinti; è necessario, pertanto, concordare con il Magistrato alle Acque e gli altri soggetti competenti una serie di accordi di programma per la realizzazione congiunta delle opere.

PAGINA BIANCA

V. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Gli interventi della Provincia di Venezia riguardano il restauro e il risanamento conservativo del patrimonio di competenza della Provincia nei centri storici di Venezia e Chioggia.

Gli importi assegnati dalla **Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti** ammontano a 3,4 miliardi, tutti impegnati e spesi per attività relative ai suddetti interventi.

La Provincia di Venezia, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla **Legge n. 139/92** con decorrenza dal 1993 e dal 1994, ha sottoscritto con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo che hanno assegnato 29 miliardi circa. Di tali somme sono stati impegnati 25 miliardi (86%) e spesi 19 miliardi (65%).

La Provincia di Venezia, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla **Legge n. 539/95** con decorrenza dal 1996 e dal 1997, ha sottoscritto con gli istituti finanziatori contratti di mutuo che hanno assegnato un importo pari a 16 miliardi.

Di tali somme sono stati impegnati 13 miliardi (81%) e spesi 100 milioni circa.

Ai finanziamenti totali indicati sono da aggiungere quelli provenienti dalla **Legge n. 515/96**. Tale Legge autorizza l'accensione di contratti di mutuo a valere sui limiti di impegno quindicennali con decorrenza dal 1997 e dal 1998. I suddetti limiti di impegno, complessivamente, permetteranno di attivare circa 83 miliardi destinati agli interventi della Provincia di Venezia, di cui circa 60 miliardi già disponibili nel corso del 1997.

Nel corso del 1997 risultano impegnati tutti gli 83 miliardi assegnati dalla Legge n. 515/96, mentre risultano spesi 2 miliardi circa (3% degli importi disponibili).

Infine, la **Legge n. 345/97** autorizza l'accensione di contratti di mutuo da parte della Provincia di Venezia a valere sui limiti di impegno quindicennali con decorrenza dal 1998 e dal 1999. I suddetti limiti di impegno, complessivamente, permetteranno di attivare circa 20 miliardi.

Pertanto, il totale degli importi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia al 31 dicembre 1997 per la realizzazione degli interventi di competenza della Provincia di Venezia è di 151 miliardi, di cui 108 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1997.

Al 31.12.1997 risulta speso il 46% degli importi effettivamente disponibili reperiti a valere sulle Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95. Gli importi spesi alla stessa data scendono al 22% se si tiene conto anche delle somme rese disponibili nel corso del 1997 dalla più recente Legge n. 515/96.

VI. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VENEZIA E DEL COMUNE DI CHIOGGIA

Gli interventi del Comune di Venezia e del Comune di Chioggia di cui all'art. 6 della Legge n. 798/84 riguardano: acquisizione, restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza e ad attività sociali, culturali, produttive, artigianali e commerciali; opere di urbanizzazione primaria; sistemazione di ponti, canali e fondamenta di competenza comunale; contributi ai privati per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare; per il Comune di Venezia: acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi; interventi volti alla manutenzione dei rii cittadini e degli edifici su di essi prospicienti secondo un progetto integrato, in accordo con la Regione Veneto.

Per il Comune di Venezia gli importi assegnati dalla Legge n. 798/84 e successivi **rifinanziamenti** ammontano a 395 miliardi, di cui 395 (100%) sono stati impegnati per attività relative ai suddetti interventi.

Gli importi spesi relativamente alla Legge n. 798/84 sono pari a 316 miliardi (80%).

Il Comune di Venezia, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla Legge n. 139/92 con decorrenza dal 1993 e dal 1994, ha sottoscritto due contratti di mutuo con gli istituti finanziatori che hanno assegnato 419 miliardi circa.

I limiti di impegno con decorrenza dal 1994 autorizzati per il Comune di Venezia dalla Legge n. 139/92 sono stati rimodulati dal decreto legge n. 659 del 30.11.1994, spostandone in parte la decorrenza al 1995 e al 1996.

Nel corso del 1995 sono stati sottoscritti anche i contratti di finanziamento relativi ai limiti di impegno con decorrenza dal 1995 e dal 1996 mettendo così a disposizione ulteriori 163 miliardi circa, per un importo complessivo assegnato dalla Legge n. 139/92 pari a 582 miliardi circa.

In linea generale, gli importi dei mutui stipulati dal Comune di Venezia a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalle diverse leggi speciali (Leggi n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96 e n. 345/97), indicati dal Comune stesso, non tengono conto della "riserva", cifra prudenziale che viene accantonata nel contratto di mutuo e che verrà resa disponibile solo dopo i primi cinque anni dalla stipula di ogni singolo contratto di mutuo.

Inoltre, come già indicato nel paragrafo relativo alla Regione del Veneto, l'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione del Veneto venga destinata al Comune di Venezia per la **realizzazione del progetto integrato di manutenzione dei rii** e degli edifici su di essi prospicienti.

Pertanto, gli importi totali assegnati al Comune di Venezia dalle diverse Leggi speciali tengono conto anche di tale disponibilità e risultano di conseguenza maggiori degli importi effettivamente attivati dai contratti di mutuo.

Anche gli importi impegnati e spesi dal Comune di Venezia tengono conto di quanto impegnato e speso relativamente ai fondi destinati al Comune dalla Regione del Veneto per il progetto integrato di manutenzione dei rii.

Con tali precisazioni, risulta che complessivamente, relativamente alla Legge n. 139/92 sono stati assegnati e resi disponibili, nel corso del 1997, 657 miliardi, di cui al 31.12.1997 sono stati impegnati 636 miliardi (97%) e sono stati spesi 270 miliardi (41%).

Il Comune di Venezia, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla **Legge n. 539/95** con decorrenza dal 1996 e dal 1997, ha sottoscritto con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo che hanno attivato 138 miliardi.

Gli importi complessivamente assegnati e resi disponibili nel corso del 1997 ammontano però a 150 miliardi, tenendo conto anche delle disponibilità derivanti dalla Regione del Veneto per il progetto integrato di manutenzione dei rii.

Di questi, al 31.12.1997, risultano impegnati 143 miliardi (95%) e risultano spesi 16 miliardi circa (11%).

A valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997 resi disponibili dalla **Legge n. 515/96**, il Comune di Venezia ha sottoscritto nel corso del 1996 il relativo contratto di mutuo; gli importi complessivamente assegnati e resi effettivamente disponibili nel corso del 1997 relativamente a tale Legge ammontano a 365 miliardi, tenendo conto anche delle disponibilità derivanti dalla Regione del Veneto per il progetto integrato di manutenzione dei rii.

Di questi, al 31.12.1997, risultano impegnati 350 miliardi (96%) e risultano spesi 19 miliardi (5%).

Nel corso del 1997 è stato anche formalizzato il contratto di mutuo relativo ai limiti di impegno resi disponibili dalla stessa Legge con decorrenza dal 1998 per un importo pari a 147 miliardi. Di questi risultano impegnati, al 31.12.1997, 130 miliardi (88%). Anticipatamente rispetto alla effettiva disponibilità dei fondi, pertanto, al 31.12.1997 risultano impegnati quasi tutti gli importi reperiti a valere sulla Legge n. 515/96.

Infine, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 345/97** con decorrenza dal 1998, il Comune di Venezia ha stipulato nel corso del 1997 con gli istituti finanziatori un contratto di mutuo che ha reso disponibili 160 miliardi. Nessun importo, ovviamente, risulta impegnato e speso al 31.12.1997 relativamente a tale contratto. I finanziamenti a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999 assegnati dalla Legge n. 345/97 al Comune di Venezia potranno essere reperiti e formalizzati solo nel corso del secondo semestre del 1998, e sono stati stimati pari a 118 miliardi.

Il Comune di Venezia ha proceduto alla predisposizione del programma di spesa di tali fondi resi disponibili dalla presente Legge n. 345/97.

Pertanto, il totale degli importi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia al 31 dicembre 1997 per la realizzazione degli interventi di competenza del Comune di Venezia è di 1.992 miliardi, di cui 1.567 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1997.

Al 31.12.1997 risulta speso il 50% degli importi effettivamente disponibili reperiti a valere sulle Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95. Gli importi spesi alla stessa data scendono al 40% se si tiene conto anche delle somme rese disponibili nel corso del 1997 dalla più recente Legge n. 515/96.

Per il Comune di Chioggia gli importi assegnati dalla **Legge n. 798/84** e successivi **rifinanziamenti** ammontano a 62 miliardi, di cui 60 (97%) sono stati impegnati per attività relative ai suddetti interventi.

Gli importi spesi relativamente alla Legge n. 798/84 sono pari a 46 miliardi (74%) al 31.12.1997.

Il Comune di Chioggia, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla **Legge n. 139/92** con decorrenza dal 1993 e dal 1994, ha sottoscritto con gli istituti finanziatori contratti di mutuo che hanno reso disponibili 47 miliardi.

I limiti di impegno con decorrenza dal 1994 autorizzati per il Comune di Chioggia dalla Legge n. 139/92 sono stati rimodulati dal decreto legge n. 659 del 30.11.1994, spostandone in parte la decorrenza al 1995 e al 1996.

Pertanto sono stati sottoscritti altri due contratti di finanziamento che hanno permesso di disporre complessivamente con la Legge n. 139/92 di 69 miliardi circa.

Di tali somme, al 31.12.1997, sono stati impegnati 69 miliardi (100%) e sono stati spesi 26 miliardi (37%).

Il Comune di Chioggia, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla **Legge n. 539/95** con decorrenza dal 1996 e dal 1997, ha sottoscritto con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo che hanno assegnato 28 miliardi, tutti impegnati al 31.12.1997.

A valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997 resi disponibili dalla **Legge n. 515/96**, il Comune di Chioggia ha sottoscritto il relativo contratto di mutuo; gli importi complessivamente assegnati e resi effettivamente disponibili nel corso del 1997 relativamente a tale Legge ammontano a 58 miliardi.

Di questi, al 31.12.1997, risultano impegnati 58 miliardi (100%) e risultano spesi 306 milioni.

Nel corso del 1997 è stato anche formalizzato il contratto di mutuo relativo ai limiti di impegno resi disponibili dalla stessa Legge con decorrenza dal 1998, per un importo pari a 32 miliardi.

Infine, relativamente alla **Legge n. 345/97**, il Comune di Chioggia ha in corso di stipula con gli istituti finanziatori il contratto di mutuo a valere sui limiti di impegno quindicennali con decorrenza dal 1998.

I finanziamenti a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999 assegnati dalla Legge n. 345/97 al Comune di Chioggia potranno essere reperiti e formalizzati solo nel corso del secondo semestre del 1998.

Complessivamente, si stima che in base a tale Legge potranno essere attivati finanziamenti per un importo pari a 46 miliardi circa.

Pertanto, il totale degli importi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia al 31 dicembre 1997 per la realizzazione degli interventi di competenza del Comune di Chioggia è di 295 miliardi, di cui 217 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1997.

Al 31.12.1997 risulta speso il 45% degli importi effettivamente disponibili reperiti a valere sulle Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95. Gli importi spesi alla stessa data scendono al 33% se si tiene conto anche delle somme rese disponibili nel corso del 1997 dalla più recente Legge n. 515/96.

PAGINA BIANCA

VII. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Per gli interventi di competenza di **altre Amministrazioni** (Università degli Studi Ca' Foscari, Istituto Universitario Architettura Venezia, Ministero Università Ricerca Scientifica e Tecnologica, Procuratoria di S. Marco, Autorità Portuale già Provveditorato al Porto, Fondazione Querini Stampalia, Aeroporto Marco Polo, Ministero del Tesoro, Ministero Beni Culturali e Ambientali) **il totale degli importi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia al 31 dicembre 1997 è di 471 miliardi, di cui 333 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1997.**

Al 31.12.1997 risulta speso da tali Enti l'83% degli importi effettivamente disponibili reperiti a valere sulle Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95. Gli importi spesi alla stessa data scendono al 63% se si tiene conto anche delle somme rese disponibili per le suddette Amministrazioni nel corso del 1997 dalla più recente Legge n. 515/96.

Di seguito si evidenziano i finanziamenti e gli importi spesi di competenza di ogni singola Amministrazione:

Università degli Studi Ca' Foscari

Gli interventi di competenza dell'Università degli Studi Ca' Foscari riguardano l'acquisizione e il restauro di sedi universitarie, l'informatizzazione dell'Ateneo e la creazione di biblioteche informatiche.

Il totale dei finanziamenti assegnati all'Università degli Studi Ca' Foscari al 31.12.1997 è di 150 miliardi (Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96 e n. 345/97), di cui 98 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1997; gli importi spesi ammontano a 58 miliardi (pari cioè al 59% degli importi disponibili).

Istituto Universitario Architettura Venezia

Gli interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura riguardano l'acquisizione e il restauro di sedi per lo svolgimento delle attività dell'Istituto.

Il totale dei finanziamenti assegnati all'Istituto Universitario Architettura Venezia al 31.12.1997 è di 67 miliardi (Leggi n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96 e n. 345/97), di cui 40 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1997; gli importi spesi ammontano a 35 miliardi (pari cioè all'88% degli importi disponibili).

Ministero Università Ricerca Scientifica e Tecnologica

Gli interventi di competenza del Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica riguardano lo svolgimento del programma di ricerca e studi sul "Sistema lagunare veneziano" che coinvolge CNR, Università di Padova, Università di Venezia, Istituto di architettura di Venezia, UNESCO.

Il totale dei finanziamenti assegnati al Ministero Università Ricerca Scientifica e Tecnologica al 31.12.1997 è di 20 miliardi (Legge n. 798/84), già tutti effettivamente disponibili nel corso del 1997; gli importi già spesi sono 18 miliardi (pari cioè al 90% degli importi disponibili).

Procuratoria di S. Marco

Gli interventi di competenza della Procuratoria di S. Marco riguardano interventi sulla Basilica di San Marco e di manutenzione di altre chiese.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Procuratoria di S. Marco al 31.12.1997 è di 9 miliardi (Legge n. 798/84), tutti già disponibili e spesi prima del 31.12.1997.

Autorità Portuale già Provveditorato al Porto

Gli interventi di competenza dell'Autorità Portuale già Provveditorato al Porto riguardano il dragaggio di accosti e di canali portuali, consolidamento di banchine, sistemazione di aree portuali.

Il totale dei finanziamenti assegnati all'Autorità Portuale al 31.12.1997 è di 89 miliardi (Leggi n. 798/84 e n. 515/96), di cui 60 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1997; gli importi già spesi sono 24 miliardi (pari cioè al 40% degli importi disponibili).

Fondazione Querini Stampalia

Gli interventi di competenza della Fondazione Querini Stampalia riguardano attività per l'ampliamento e la funzionalità della sede.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Fondazione Querini Stampalia al 31.12.1997 è di 1 miliardo (Legge n. 798/84), già disponibile e speso prima del 31.12.1997.

Aeroporto Marco Polo

Gli interventi di competenza dell'Aeroporto Marco Polo riguardano l'ampliamento dell'aerostazione, la sistemazione della viabilità, la realizzazione di piste e impianti per voli notturni, di nuovi piazzali per aeromobili e di garage multipiano.

Il totale dei finanziamenti assegnati all'Aeroporto Marco Polo al 31.12.1997 è di 116 miliardi (Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96 e n. 345/97), di cui 85 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1997; gli importi già spesi sono 46 miliardi (pari cioè al 54% degli importi disponibili).

Ministero del Tesoro

Il totale dei finanziamenti assegnati al Ministero del Tesoro al 31.12.1997 è di 2 miliardi (Legge n. 798/84), già tutti disponibili e spesi prima del 1997.

Ministero Beni Culturali e Ambientali

Gli interventi di competenza del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali riguardano il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico-artistico destinati all'uso pubblico.

Il totale dei finanziamenti assegnati al Ministero Beni Culturali e Ambientali al 31.12.1997 è di 17 miliardi (Legge n. 798/84), tutti disponibili nel corso del 1997; gli importi già spesi sono 15 miliardi (pari cioè al 94% degli importi disponibili).

CON LE LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI, 139/92, 539/95, 515/96 E 345/97

«L'art. 3 della Legge 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato per i ri-

8.71(6)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue Allegato n. 1

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
QUADRO RIPILOGATIVO DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI
 CON LE LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI, 139/92, 539/95, 515/96 E 345/97

Importi in Lire milioni

CON LE LEGGI 1984 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI, 1992, 1995, 1996 E 1997

	LEGGE N. 798/84 E RIFINANZ.		LEGGE N. 139/92		LEGGE N. 539/95		LEGGE N. 515/96					LEGGE N. 345/97					TOTALE				
	IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI	(A)	IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI	(B)	IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI	(C)	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI DAL 1997	(D)	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI DAL 1998	(E)	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI DAL 1998	(F)	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI DAL 1998	(G)	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI DAL 1999	(H)	IMPORTI ASSEGNATI TOTALI	(I)-(C)+(H)	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI NEL 1997	(L) = A+B+C+D+(M) = A+B+C+F+I	IMPORTI ASSEGNATI TOTALI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	25.000		34.836		17.089		21.600		11.000		32.600		30.000		10.000		40.000		98.525		149.525
ISTITUTO UNIVERSITARIO ARCHITETTURA VENEZIA	-		20.318		8.955		11.000		7.207		18.207		10.000		10.000		20.000		40.273		67.480
MINISTERO UNIVERSITA' E RIC. SCIENTIFICA	20.000		-		-		-		-		-		-		-		-		20.000		20.000
PROCURATORIA DI SAN MARCO	9.043		-		-		-		-		-		-		-		-		9.043		9.043
AUTORITA' PORTUALE GIA' PROVVEDIMENTATO AL PORTO	21.000		-		-		39.500		28.500		68.000		-		-		-		60.500		89.000
FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA	1.000		-		-		-		-		-		-		-		-		1.000		1.000
AEROPORTO MARCO POLO	2.000		40.000		18.500		25.000		11.000		36.000		10.000		10.000		20.000		85.500		116.500
MINISTERO TESORO	2.000		-		-		-		-		-		-		-		-		2.000		2.000
MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI	16.500		-		-		-		-		-		-		-		-		16.500		16.500
TOTALE PARZIALE	96.543		95.154		44.544		97.100		57.707		154.807		50.000		30.000		80.000		333.341		471.048
TOTALE GENERALE	2.196.096		2.423.050		502.544		1.257.100		553.100		1.810.200		490.000		484.000		974.000		6.378.790		7.905.890

Importi in Lire milioni

LEGENDA ALLEGATO N. 1

LEGGE N. 798/84 e successivi rifinanziamenti: - IMPORTI ASSEGNATI : gli importi effettivamente assegnati nei diversi esercizi dalle Leggi n. 798/84, n. 910/86, n. 67/88, n. 360/91, n. 415/92, n. 724/94.

LEGGE N. 139/92: - IMPORTI ASSEGNATI : stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1993 e dal 1994.

I limiti di impegno con decorrenza dal 1994 autorizzati per la Regione Veneto, il Comune di Venezia e il Comune di Chioggia sono stati rimodulati dal Decreto Legge 659 del 30 novembre 1994, spostandone in parte la decorrenza al 1995 e/o al 1996.

LEGGE N. 539/95: - IMPORTI ASSEGNATI : stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1996 e dal 1997. Tutti gli Enti nel corso del 1996 hanno sottoscritto i contratti di mutuo a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1° gennaio 1997. Pertanto i relativi finanziamenti risultano disponibili nel corso del 1997.

LEGGE N. 515/96: - IMPORTI ASSEGNATI : stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1997 e dal 1998. Tutti gli Enti nel corso del 1996 hanno sottoscritto i contratti di mutuo a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1° gennaio 1997. Pertanto i relativi finanziamenti risultano disponibili nel corso del 1997.

LEGGE N. 345/97: - IMPORTI ASSEGNATI : stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1998 e dal 1999. Quasi tutti gli Enti nel corso del 1997 hanno sottoscritto i contratti di mutuo a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1° gennaio 1998. Pertanto, nel corso del 1997, non risultano disponibili i relativi finanziamenti assegnati dalla presente Legge.

Venezia, 23 aprile 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n. 2

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.1997

DELLE LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI, 139/92, 539/95 E 515/96

	LEGGE N. 798/84 E RIF.			LEGGE N. 139/92			LEGGE N. 539/95			LEGGE N. 515/96			TOTALE		
	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI (A)	IMPORTI SPESI (B)	% (B/A)	IMPORTI ASSEGNATI GIA' DISPONIBILI (C)	IMPORTI SPESI (D)	% (D/C)	IMPORTI ASSEGNATI GIA' DISPONIBILI (E)	IMPORTI SPESI (F)	% (F/E)	IMPORTI ASSEGNATI DISPONIBILI NEL 1997 (G)	IMPORTI SPESI (H)	% (H/G)	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI (I) = A+C+E+G	IMPORTI SPESI (L) = B+D+F+H	% (L/I)
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	329.955	278.921	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329.955	278.921	85%
Riequilibrio idrogeologico	700	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	0	0%
Antiquamento	15.055	6.637	44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.055	6.637	44%
Marginamenti lagunari	3.842	2.463	64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.842	2.463	64%
Edifici demaniali	150.981	138.244	92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.981	138.244	92%
Arenale	23.917	21.357	89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.917	21.357	89%
Ponti, canali, fondamenta	96.122	78.573	82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.122	78.573	82%
Corse d'acqua	18.226	11.971	66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.226	11.971	66%
Patrimonio mobiliare pubblico	9.026	7.638	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.026	7.638	85%
Università Architettura	12.086	12.038	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.086	12.038	100%
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	777.936	770.351	99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.936	770.351	99%
Riequilibrio idrogeologico e arresto degrado	642.462	637.830	99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.462	637.830	99%
Marginamenti lagunari	48.000	46.245	96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000	46.245	96%
Opere marittime	78.687	77.489	98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.687	77.489	98%
Estrazione petroli e apertura valli da pesca	8.787	8.787	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.787	8.787	100%
REGIONE VENETO (*)	531.300	211.272	40%	603.000	100.427	17%	84.000	0	0%	177.000	0	0%	1.395.300	311.699	22%
Disequinamento	464.300	193.270	42%	603.000	100.427	17%	77.500	0	0%	177.000	0	0%	1.321.800	293.697	22%
Ospedale SS Giovanni e Paolo	27.000	14.078	52%	-	-	-	6.500	0	0%	-	-	-	33.500	14.078	42%
Acquedotti	40.000	3.924	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	3.924	10%
PROVINCIA DI VENEZIA	3.400	3.400	100%	28.905	18.650	65%	16.000	101	1%	60.000	2.015	3%	108.305	24.166	22%
Restauro patrimonio storico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNE DI VENEZIA	394.885	316.000	80%	656.891	269.492	41%	150.000	15.848	11%	365.000	18.684	5%	1.566.776	620.034	40%
Risanamento immobili	-	-	-	319.325	167.325	52%	102.400	14.525	14%	233.286	18.269	8%	-	-	-
Urbanizzazione primaria	-	-	-	38.544	20.866	54%	14.600	428	3%	64.000	0	0%	-	-	-
Contributi a privati	-	-	-	56.000	19.820	35%	20.000	313	2%	59.632	18	0%	-	-	-
Inseadimenti produttivi	-	-	-	67.456	33.909	50%	7.000	582	8%	14.705	397	3%	-	-	-
Progetto integrato ri (*)	-	-	-	175.566	27.572	16%	6.000	3.357	0%	3.357	0	0%	-	-	-
COMUNE DI CHIOGGIA	62.077	45.931	74%	69.100	25.802	37%	28.000	0	0%	56.000	306	1%	217.177	72.039	33%
Risanamento immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urbanizzazione primaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi ai privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infrastrutture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi acquisto 1° casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PARZIALE	2.099.553	1.625.875	77%	2.327.996	1.135.790	49%	458.000	55.517	12%	1.160.000	48.350	4%	6.045.449	2.865.532	47%

(*) L'art. 3 della Legge 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato per i ri

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue Allegato n. 2

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.1997

DELLE LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI, 139/92, 539/95 e 515/96

	LEGGE N. 798/84 E RIF.			LEGGE N. 139/92			LEGGE N. 539/95			LEGGE N. 515/96			TOTALE		
	IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI (A)	IMPORTI SPESI (B)	% (B/A)	IMPORTI ASSEGNATI GIA' DISPONIBILI (C)	IMPORTI SPESI (D)	% (D/C)	IMPORTI ASSEGNATI GIA' DISPONIBILI (E)	IMPORTI SPESI (F)	% (F/E)	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI NEL 1997 (G)	IMPORTI SPESI (H)	% (H/G)	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI (I) = A+C+E+G	IMPORTI SPESI (L) = B+D+F+H	% (I/L)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	25.000	16.598	66%	34.836	33.220	95%	17.089	7.724	45%	21.600	224	1%	98.525	57.766	59%
ISTITUTO UNIVERSITARIO ARCHITETTURA VENEZIA	-	-	-	20.318	20.318	100%	8.955	6.005	67%	11.000	8.927	81%	40.773	35.250	88%
MINISTERO UNIVERSITA' E RIC. SCIENTIFICA	20.000	18.030	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	18.030	90%
PROCURATORIA DI SAN MARCO	9.043	9.043	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.043	9.043	100%
AUTORITA' PORTUALE GIA' PROVVEDITORATO	21.000	21.000	100%	-	-	-	-	-	-	39.500	3.068	8%	60.500	24.068	40%
FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA	1.000	1.000	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	100%
AEROPORTO MARCO POLO	2.000	2.000	100%	40.000	40.000	100%	18.500	4.173	23%	25.000	0	0%	85.500	46.173	54%
MINISTERO TESORO	2.000	2.000	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	100%
MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI	16.500	15.441	94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500	15.441	94%
TOTALE PARZIALE	96.543	85.112	88%	95.154	93.538	98%	44.544	17.902	40%	97.100	12.219	13%	333.341	208.771	63%
TOTALE GENERALE	2.196.096	1.710.987	78%	2.423.050	1.229.328	51%	502.544	73.419	15%	1.257.100	60.569	5%	6.378.790	3.074.303	48%

Importi in Lire milioni

LEGENDA ALLEGATO N. 2

Per ogni Legge si fa riferimento ai soli importi effettivamente disponibili nel corso del 1997, così come risultano dalla tabella riportata nell'Allegato n. 1.

Gli IMPORTI SPESI si riferiscono, per la maggior parte degli Enti, al 31.12.1997.

Venezia, 23 aprile 1998

Allegato n. 3

LEGGE N. 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI**Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti**

(importi in lire milioni)

Soggetti	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:				
Stato in amministrazione diretta - dati al 31.12.97	340.914	329.955	326.255	278.921
L. 798/84, art. 3 lett. a) Riequilibrio Idrogeologico	700	700	466	0
L. 798/84, art. 3 lett. b) Serv. Antinquinamento	21.685	15.055	13.777	6.637
L. 798/84, art. 3 lett. c) Marginamenti lagunari	6.671	3.842	3.157	2.463
L. 798/84, art. 3 lett. e) Restauro edifici demaniali	150.981	150.981	150.981	138.244
L. 798/84, art. 3 lett. f) Recupero Arsenale	23.917	23.917	23.917	21.357
L. 798/84, art. 3 lett. g) Ponti, canali, fondamenta	96.122	96.122	94.645	78.573
L. 798/84, art. 3 lett. h) Sistemaz. corsi d'acqua	19.726	18.226	18.200	11.971
L. 798/84, art. 3 lett. i) Patrimonio mobiliare pubblico	9.026	9.026	9.026	7.638
L. 798/84, art. 3 lett. m) Università Architettura	12.086	12.086	12.086	12.038
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.97	778.396	777.936	774.071	770.351
L. 798/84, art. 3 lett. a) Riequilibrio Idrogeologico	642.922	642.462	638.597	637.830
L. 798/84, art. 3 lett. c) Marginamenti lagunari	48.000	48.000	48.000	46.245
L. 798/84, art. 3 lett. d) Opere Marittime	78.687	78.687	78.687	77.489
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca	8.787	8.787	8.787	8.787
Altri Enti:	106.543	96.543	96.057	85.112
Autorità Portuale già Provveditorato al Porto	21.000	21.000	21.000	21.000
Ministero BB.CC.AA. - dati al 31.12.97	16.500	16.500	16.500	15.441
Ministero Industria	10.000	=	=	=
Ministero Ricerca Scientifica - dati al 21.02.97	20.000	20.000	20.000	18.030
Ministero del Tesoro	2.000	2.000	2.000	2.000
Procuratoria di S. Marco	9.043	9.043	9.043	9.043
Università degli Studi - dati al 31.12.97	25.000	25.000	24.514	16.598
Aeroporto Marco Polo	2.000	2.000	2.000	2.000
Fond. Querini Stampalia	1.000	1.000	1.000	1.000
Ministero Ambiente	=	=	=	=
IUAV	=	=	=	=
REGIONE VENETO - dati al 30.01.98	531.300	531.300	528.800	211.272
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b)				
Disinquinamento	464.300	464.300	461.800	193.270
L. 798/84, art. 5 lett. a) - Acquedotti	40.000	40.000	40.000	3.924
L. 798/84, art. 5 lett. b) Osp. SS. Giovanni e Paolo	27.000	27.000	27.000	14.078
PROVINCIA DI VENEZIA - dati al 18.02.98				
L. 67/88, art. 17 com.12) Restauro patrimonio storico	3.951	3.400	3.400	3.400
COMUNE DI VENEZIA - dati al 30.06.97	394.885	394.885	394.885	316.000
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili				
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria				
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati				
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi				
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture				
L. 360/91, art. 2 lett. d) Contributi acquisto 1^ casa				
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.97	62.077	62.077	60.506	45.931
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili				
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria				
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati				
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture				
L. 360/91, art. 2 lett. d) Contributi acquisto 1^ casa				
TOTALE	2.218.066	2.196.096	2.183.974	1.710.987

NOTE

1) Per i rifinanziamenti della Legge 798/84, sono stati considerati gli importi risultanti dalle successive rimodulazioni e al netto delle riduzioni di cui al D.M. Tesoro n. 114758 del 21.02.1994.

2) **IMPORTI IMPEGNATI:** - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

Venezia, 23 aprile 1998

Allegato n. 4

LEGGE N. 139/92**Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti**

(importi in lire milioni)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 139/92	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORT. SPESI
STATO:					
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.97	92.500	970.000	(1) 970.000	876.000	721.419
L. 798/84, art. 3 lett. a) Riequilibrio Idrogeologico	66.300	701.672	701.672	607.672	475.790
L. 798/84, art. 3 lett. c) Marginamenti lagunari	1.500	13.000	13.000	13.000	3.240
L. 798/84, art. 3 lett. d) Opere Marittime	24.100	250.328	250.328	250.328	239.850
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca	600	5.000	5.000	5.000	2.539
Altri Enti :	10.500	95.154	95.154	95.154	93.538
Università degli Studi - dati al 31.12.97	4.000	34.836	(1) 34.836	34.836	33.220
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.97	4.000	40.000	(1) 40.000	40.000	40.000
IUAUV - dati al 31.12.97	2.500	20.318	(1) 20.318	20.318	20.318
REGIONE VENETO - dati al 30.01.98 (*)					
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento	71.500	603.000	(1) 670.000	478.200	100.427
PROVINCIA DI VENEZIA - dati al 18.02.98					
L. 67/88, art.17 com.12) Restauro patrimonio storico	2.500	28.905	(1) 28.905	24.737	18.650
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.97	65.000	656.891	(2) 581.635	636.025	269.492
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili	33.592	319.325		315.636	167.325
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria	4.403	38.544		37.310	20.866
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati	7.345	56.000		56.000	19.820
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi	8.660	67.456		62.742	33.909
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (*)	11.000	175.566		164.337	27.572
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.97	8.000	69.100	(2) 69.100	69.100	25.302
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili	5.928				
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture					
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria	777				
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati	1.295				
TOTALE	250.000	2.423.050	2.414.794	2.179.216	1.229.328

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI : gli importi attivati a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge.
- I limiti di impegno con decorrenza dal 1994 autorizzati per la Regione Veneto, il Comune di Venezia e il Comune di Chioggia dalla Legge 139/92 e successivo D.M. n. 140503 del 21.05.1992 sono stati rimodulati dal Decreto Legge n. 659 del 30 novembre 1994 spostandone in parte la decorrenza al 1995 e/o al 1996.
- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :
 - (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1993 e dal 1994.
 - (2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1993, dal 1994, dal 1995 e dal 1996.
- IMPORTI IMPEGNATI: - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
 - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrate da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.
- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):
 - (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto non comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii, comprese, invece, nelle rispettive voci del Comune di Venezia.

Allegato n. 5

LEGGE N. 539/95**Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti**

(importi in lire milioni)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 539/95	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:					
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.97	19.185	180.000	(1) 180.000	180.000	39.568
L. 798/84, art. 3 lett. a) Riequilibrio Idrogeologico		116.325	116.325	116.325	20.716
L. 798/84, art. 3 lett. c) Marginamenti lagunari		=	=	=	=
L. 798/84, art. 3 lett. d) Opere Marittime		63.675	63.675	63.675	18.852
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca		=	=	=	=
Altri Enti :	4.856	44.544	44.544	42.545	17.902
Università degli Studi - dati al 31.12.97	1.862	17.089	(1) 17.089	15.090	7.724
Aeroporto Marco Polo - dati al 30.06.97	1.845	18.500	(1) 18.500	18.500	4.173
IUAUV - dati al 31.12.97	1.149	8.955	(1) 8.955	8.955	6.005
REGIONE VENETO - dati al 30.01.98 (*)	9.029	84.000	(1) 90.000	84.000	0
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b)					
Disinquinamento		77.500		77.500	0
L. 798/84, art. 5 lett. b) Ospedali		6.500		6.500	0
PROVINCIA DI VENEZIA - dati al 18.02.98					
L. 67/88, art. 17 com.12) Restauro patrimonio storico	1.844	16.000	(1) 16.000	12.903	101
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.97	17.675	150.000	(1) 138.000	143.129	15.848
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		102.400		99.132	14.525
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		14.600		10.997	428
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		20.000		20.000	313
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		7.000		7.000	582
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (*)		6.000		6.000	0
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.97	2.911	28.000	(1) 28.000	28.000	0
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili					
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture					
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					
TOTALE	55.500	502.544	496.544	490.577	73.419

NOTE

- **IMPORTI ASSEGNATI TOTALI** : stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1996 e dal 1997.

- **IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO**: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :
(1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1996 e dal 1997.

- **IMPORTI IMPEGNATI**: - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova già registrate da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto non comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii, comprese, invece, nelle rispettive voci del Comune di Venezia.

LEGGE N. 515/96**Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti**

(importi in lire milioni)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 515/96	IMPORTI ASSEGNATI TOTALI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI NEL 1997	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:						
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.97	69.700	700.000	(2) 700.000	500.000	700.000	27.345
L. 798/84, art. 3 lett. a) Riequilibrio Idrogeologico		458.886	458.886	338.886	458.886	15.165
L. 798/84, art. 3 lett. c) Marginamenti lagunari		=	=	=	=	=
L. 798/84, art. 3 lett. d) Opere Marittime		241.114	241.114	161.114	241.114	12.180
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca		=	=	=	=	=
Altri Enti :	14.300	154.807	143.807	97.100	118.807	12.219
Università degli Studi - dati al 31.12.97	3.550	32.600	(2) 32.600	21.600	32.600	224
Autorità Portuale - dati al 31.12.97	6.000	68.000	(2) 68.000	39.500	68.000	3.068
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.96	2.950	36.000	(1) 25.000	25.000	0	0
UAV - dati al 31.12.97	1.800	18.207	(2) 18.207	11.000	18.207	8.927
REGIONE VENETO - dati al 30.01.98 (*) L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento	30.800	270.000	(1) 200.000	177.000	177.000	0
PROVINCIA DI VENEZIA dati al 18.02.98 L. 67/88, art. 17 com 12) Restauro patrimonio storico	7.400	83.000	(2) 83.000	60.000	83.000	2.015
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.97	53.380	512.393	(2) 422.107	365.000	479.524	18.684
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		307.679		223.286	286.985	18.269
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		72.000		64.000	64.900	0
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		79.652		59.652	79.574	18
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		22.705		14.705	18.798	397
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (*)		30.357		3.357	29.267	0
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.97	9.420	90.000	(2) 90.000	58.000	58.000	306
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili						
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture						
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria						
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati						
TOTALE	185.000	1.810.200	1.638.914	1.257.100	1.616.331	60.569

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1997 e dal 1998.
Tali importi non erano, quindi, disponibili nel corso del 1996.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :

(1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997.

(2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997 e dal 1998.

- IMPORTI IMPEGNATI: - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.

- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova già registrate da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):

(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto non comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii, comprese, invece, nelle rispettive voci del Comune di Venezia.

Venezia, 23 aprile 1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n. 7

LEGGE N. 345/97

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in lire milioni)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 345/97	IMPORTI ASSEGNATI TOTALI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI NEL 1997	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:						
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.97	35.000	350.000	(1) 160.000	0	0	0
L. 798/84, art. 3 lett. a) Riequilibrio Idrogeologico		255.000	120.000	0	0	0
L. 798/84, art. 3 lett. c) Marginamenti lagunari		=	=	=	=	=
L. 798/84, art. 3 lett. d) Opere Marittime		95.000	40.000	0	0	0
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca		=	=	=	=	=
Altri Enti:	8.000	80.000	10.970	0	0	0
Università degli Studi	4.000	40.000		0	0	0
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.96	2.000	20.000		0	0	0
IUAV - dati al 31.12.97	2.000	20.000	(1) 10.970	0	0	0
REGIONE VENETO - dati al 22.07.97 (*)						
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento	20.000	200.000		0	0	0
PROVINCIA DI VENEZIA dati al 18.02.98						
L. 67/88, art. 17 com.12) Restauro patrimonio storico	2.000	20.000	(1) 13.000	0	0	0
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.97	30.400	278.000	(1) 160.000	0	0	0
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		121.700				
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		8.000				
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		45.300				
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		33.000				
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (*)		70.000				
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.97	4.600	46.000		0	0	0
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili						
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture						
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria						
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati						
TOTALE	100.000	974.000	343.970	0	0	0

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1998 e dal 1999. Tali importi non erano, quindi, disponibili nel corso del 1997.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :
(1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998

- IMPORTI IMPEGNATI: - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova già registrate da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5)

(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto non comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii, comprese, invece, nelle rispettive voci del Comune di Venezia.

Venezia, 23 aprile 1998

Allegato n. 8

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
CONFRONTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE

Importi in Lire milioni:

	IMPORTI TOTALI ASSEGNATI	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI NEL 1997	SOMME SPESE					
			Stato attuazione al 31.12.1996		Stato attuazione al 31.12.1997		Variazione in percentuale	
			Importi spesi (B)	% (B/A)	Importi spesi (C)	% (C/A)		
	v. nota 1)	v. nota 2)	(A)					
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	329.955	329.955						+3%
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	2.977.936	2.427.936						+10%
REGIONE VENETO (*)	1.688.300	1.395.300						+7%
PROVINCIA DI VENEZIA	151.305	108.305						+5%
COMUNE DI VENEZIA (*)	1.992.169	1.566.776						+5%
COMUNE DI CHIOGGIA	295.177	217.177						+5%
TOTALE PARZIALE	7.434.842	6.045.449						+8%

(*) L'art. 3 della Legge 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato per i rii.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue Allegato 8

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
CONFRONTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE

Importi in Lire milioni

	IMPORTI TOTALI GIA' ASSEGNATI	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI NEL 1997	SOMME SPESE						Variazione in percentuale
			Stato attuazione al 31.12.1996		Stato attuazione al 31.12.1997				
			Importi spesi (B)	% (B/A)	Importi spesi (C)	% (C/A)			
	v. nota 1)	v. nota 2)	(A)						
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	149.525	98.525		51%	57.766	59%		+8%	
ISTITUTO UNIVERSITARIO ARCHITETTURA VENEZIA	67.480	40.273		54%	35.250	88%		+34%	
MINISTERO UNIVERSITA' E RIC SCIENTIFICA	20.000	20.000		88%	18.030	90%		+2%	
PROCURATORIA DI SAN MARCO	9.043	9.043		100%	9.043	100%			
AUTORITA' PORTUALE	89.000	60.500		35%	24.068	40%		+5%	
FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA	1.000	1.000		100%	1.000	100%			
AEROPORTO MARCO POLO	116.500	85.500		50%	46.173	54%		+4%	
MINISTERO TESORO	2.000	2.000		100%	2.000	100%			
MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI	16.500	16.500		88%	15.441	94%		+6%	
TOTALE PARZIALE	471.048	333.341		54%	208.771	63%		+9%	
TOTALE GENERALE	7.905.890	6.378.790		41%	3.074.303	48%		+8%	

Importi in Lire milioni

NOTE

1) IMPORTI TOTALI ASSEGNATI

Sono riportati gli importi totali assegnati a valere su:

- Leggi n. 798/84 e successivi rifinanziamenti
- Legge n. 139/92
- Legge n. 539/95
- Legge n. 515/96
- Legge n. 345/97

2) IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI NEL 1997

Sono riportati gli importi totali assegnati relativamente a:

- Leggi n. 798/84 e successivi rifinanziamenti: finanziamenti tutti disponibili nel corso del 1997.
- Legge n. 139/92: finanziamenti a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1993 e dal 1994, tutti disponibili nel corso del 1997.
- Legge n. 539/95: finanziamenti a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1996 e dal 1997, tutti disponibili nel corso del 1997.
- Legge n. 515/96: finanziamenti a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997, disponibili nel 1997. Non sono compresi, pertanto, i finanziamenti attivati a valere sui limiti di impegno stanziati dalla Legge con decorrenza dal 1998.

Venezia, 23 aprile 1998

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

<i>Documento</i>	<i>A</i>	Stato di attuazione degli interventi dello stato in amministrazione diretta - Aggiornamento al 31 dicembre 1997
<i>Documento</i>	<i>B</i>	Stato di attuazione degli interventi di competenza dello stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova - Aggiornamento al 31 dicembre 1997
<i>Documento</i>	<i>C</i>	Stato di attuazione degli interventi di competenza della Regione del Veneto prospetto generale e stato degli interventi suddivisi per leggi - Aggiornato al 30 gennaio 1997
<i>Documento</i>	<i>D</i>	Stato di attuazione dei finanziamenti di competenza della Provincia di Venezia - Aggiornamento al 18 febbraio 1998
<i>Documento</i>	<i>E</i>	Interventi di competenza del Comune di Venezia: programma e stato di avanzamento degli interventi - Aggiornamento al 31 dicembre 1997
<i>Documento</i>	<i>F</i>	Stato di attuazione degli interventi di competenza del Comune di Chioggia - Aggiornamento al 31 dicembre 1997
<i>Documento</i>	<i>G</i>	Stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Università Ca' Foscari di Venezia
<i>Documento</i>	<i>H</i>	Stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia - IUAV
<i>Documento</i>	<i>I</i>	Stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia
<i>Documento</i>	<i>L</i>	Stato di attuazione degli interventi di competenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Aggiornato al 31 dicembre 1997

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLO STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Aggiornamento al 31 dicembre 1997

Importi lordi in Lire milioni

COMPETENZA	OBIETTIVI	LEGGE N. 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI (91086 - 6788 - 36091 - 41592 - 72494)					
		IMPORTI FINANZIATI (A)	IMPORTI ASSEGNATI (B)	IMPORTI IMPEGNATI (C)	% (C/B)	IMPORTI EROGATI (D)	% (D/B)
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. a) Riequilibrio idrogeologico	700	700	466	67%	0	0%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. b) Servizio vigilanza e Anti-inquinamento (*)	21.685	15.055	13.777	92%	6.637	44%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. c) Marginamenti lagunari	6.671	3.842	3.157	82%	2.463	64%
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. e) Restauro di edifici demaniali	150.981	150.981	150.981	100%	138.244	92%
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. f) Recupero dell'Arsenale	23.917	23.917	23.917	100%	21.357	89%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. g) Sistemazione di ponti, canali e fondamenta	96.122	96.122	94.645	98%	78.573	82%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. h) Sistemazione dei corsi d'acqua	19.726	18.226	18.200	100%	11.971	66%
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. i) Restauro del patrimonio mobiliare pubblico	9.026	9.026	9.026	100%	7.638	85%
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. m) Edilizia per Università Architettura	12.086	12.086	12.086	100%	12.038	100%
TOTALI		340.914	329.955	326.255	99%	278.921	85%

(*) La differenza tra l'assegnato e l'impegnato è dovuto all'accantonamento di £. 330.000.000 e al trasferimento di parte dei fondi ad altro capitolo per il pagamento dei contrattisti.

Venezia, 3 marzo 1998

PAGINA BIANCA

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

CONCESSIONARIO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova

Aggiornamento al 31 dicembre 1997

30 gennaio 1998

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
E DELLA SUA LAGUNA**

Lo stato di attuazione dei finanziamenti

Opere di regolazione delle maree

**Adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre
bocche lagunari**

Difesa dalle acque alte degli abitati insulari

Difese locali delle "insulae"

Difesa dei centri urbani lagunari

Marginamenti

Ripristino della morfologia lagunare

Arresto del processo di degrado della laguna

Difesa dei litorali

Sostituzione del traffico petrolifero in laguna

Apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree

Servizio Informativo

Interventi di ausilio alla navigazione

Allegato n. 1 Stato di attuazione dei finanziamenti assegnati al Consorzio Venezia Nuova

Allegato n. 2 Andamento degli importi impegnati rispetto agli importi effettivamente disponibili

Allegato n. 3 Andamento degli importi spesi rispetto agli importi effettivamente disponibili

Allegato n. 4 Stato di attuazione degli interventi dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova

Allegato n. 5 Stato di attuazione delle attività del Consorzio Venezia Nuova secondo le lettere a), b), c), d) ed l) dell'art. 3 della Legge n. 798/84

Lo stato di attuazione dei finanziamenti

Gli interventi dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova riguardano i seguenti obiettivi, richiamati anche dall'art. 3 lettere a), c), d) e l) della Legge n. 798/84 e dall'art. 2, 1° comma lettera a) della Legge n. 360/91 nonché dalla Legge n. 139/92:

- opere di regolazione delle maree;
- adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche di porto;
- difesa dalle acque alte degli abitati insulari;
- ripristino della morfologia lagunare;
- arresto ed inversione del processo di degrado del bacino lagunare;
- difesa dei litorali;
- sostituzione del traffico petrolifero in laguna;
- apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree;
- interventi di ausilio alla navigazione;
- costituzione e potenziamento del Servizio Informativo.

Il totale degli importi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia al 31 dicembre 1997 per la realizzazione dei suddetti interventi in concessione al Consorzio Venezia Nuova è di 2.978 miliardi, di cui 2.428 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1997.

Con riferimento all'*Allegato n. 1*, per **importi finanziati** si intendono gli importi complessivamente finanziati dalla legislazione speciale per Venezia in favore delle attività del Consorzio Venezia Nuova dal 1984 a oggi.

Per **importi effettivamente disponibili** si intendono: per la Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti, gli importi assegnati di anno in anno mediante appositi Decreti; per le altre Leggi, gli importi attivabili e spendibili nei singoli anni a valere sui limiti di impegno con decorrenza da quell'anno.

Se per **importi sottoscritti** si intendono gli importi relativi a convenzioni sottoscritte tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova, al 31.12.1997 gli importi sottoscritti per le Leggi n. 798/84, n. 139/92 e n. 539/95 sono pari agli importi finanziati ed effettivamente disponibili, mentre per le più recenti Leggi n. 515/96 e n. 345/97 sono addirittura superiori agli importi effettivamente disponibili nel 1997, in quanto nel corso del 1997 sono già stati sottoscritti due atti finanziati con le somme reperite a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998 (12^a e 13^a convenzione). In tal modo, tenendo conto dei tempi tecnici necessari per la formalizzazione degli atti stessi, l'Amministrazione Concedente ha garantito che le due nuove convenzioni potessero essere operative già dal mese di gennaio 1998, ovvero non appena le somme si fossero rese disponibili, per assicurare continuità alle attività di salvaguardia intraprese dal Concessionario.

Analogamente, anche gli **importi impegnati** al 31.12.1997 risultano maggiori degli importi effettivamente disponibili, dove per importi impegnati si intendono gli importi relativi a convenzioni il cui Decreto Presidenziale approvativo è già stato registrato da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti. Infatti, il Decreto Presidenziale della 12^a Convenzione sottoscritta nel 1997 a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998 assegnati dalla Legge n. 515/96, è stato registrato alla Corte dei Conti in data 10.09.1997, anticipatamente rispetto alla spendibilità delle somme. L'atto è risultato operativo a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1998.

Con riferimento all' *Allegato n. 2*, si può notare l'andamento degli importi impegnati dal Consorzio Venezia Nuova rispetto agli importi effettivamente disponibili anno per anno. Le somme via via rese disponibili dalle Leggi speciali sono risultate anno dopo anno pressoché totalmente impegnate mediante atti convenzionali sottoscritti con l'Amministrazione Concedente e registrati alla Corte dei Conti. **In media, dal 1985 al 1997, è risultato impegnato il 93% delle somme effettivamente disponibili.**

Per **importi spesi** al 31.12.1997 si intendono gli importi realizzati a tale data. **Al 31.12.1997 risulta speso il 79% degli importi effettivamente disponibili** (v. *Allegato n. 1*) **reperiti a valere sulle Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95**. **Gli importi spesi alla stessa data scendono al 64% se si tiene conto anche delle somme rese disponibili nel corso del 1997 dalla più recente Legge n. 515/96**, 500 miliardi, che sono risultate impegnate e quindi spendibili a tutti gli effetti solo in data 11.07.1997 pur essendo somme finanziate a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1° gennaio 1997.

L'*Allegato n. 3* riporta l'andamento degli importi spesi rispetto agli importi effettivamente disponibili anno per anno. Maggiormente significativo è l'andamento delle somme spese riferito alle singole Leggi speciali che dimostra, tra l'altro, una capacità di spesa del Consorzio Venezia Nuova particolarmente elevata a partire dal 1991 ovvero da quando il Consorzio è passato dalla fase di studio e di progettazione alla fase di realizzazione delle opere vera e propria.

Per singole Leggi:

- il Consorzio Venezia Nuova a valere sulla **Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti** (Leggi n. 910/86, n. 67/88, n. 360/91), ha ottenuto un finanziamento che ammonta complessivamente a 778,396 miliardi di cui 777,936 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1997. A valere su tali somme, il Consorzio Venezia Nuova ha sottoscritto dal 1985 al 1992 otto Convenzioni, sei con il Magistrato alle Acque e due con il Genio Civile Opere Marittime, e numerosi Atti Aggiuntivi a tali Convenzioni per un importo complessivo di 774,071 miliardi (100% delle somme effettivamente disponibili). Tali atti sono già tutti registrati alla Corte dei Conti e quindi risultano operativi a tutti gli effetti. Gli importi spesi al 31.12.1997 sono 770,351 miliardi, pari al 99% degli importi effettivamente disponibili.
- Il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 139/92** con decorrenza dal 1993 e dal 1994, ha stipulato con gli istituti

finanziatori due contratti di mutuo che hanno reso disponibili 970 miliardi al 31.12.1997. Con tali somme sono state sottoscritte due Convenzioni e alcuni Atti Aggiuntivi alle convenzioni stesse, per un importo complessivo di 970 miliardi (100% dell'importo effettivamente disponibile). Gli ultimi due Atti Aggiuntivi alle Convenzioni, di importo complessivo pari a 94 miliardi, sono stati sottoscritti in data 23.12.1997 e sono tuttora in fase di registrazione da parte della Corte dei Conti; al 31.12.1997, pertanto, risulta impegnato il 90% delle somme disponibili. Gli importi spesi relativamente alla Legge n. 139/92 sono pari a 721,419 miliardi (74% degli importi disponibili) al 31.12.1997.

- Il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 539/95** con decorrenza dal 1996 e dal 1997, ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo che hanno reso disponibili 180 miliardi. Con tali somme sono state sottoscritte due Convenzioni con il Magistrato alle Acque, per un importo complessivo di 180 miliardi (100% dell'importo effettivamente disponibile). La seconda Convenzione è divenuta operativa nel mese di luglio del 1997 con la registrazione da parte della Corte dei Conti del relativo Decreto approvativo, per cui al 31.12.1997 risulta impegnato il 100% delle somme disponibili. Gli importi spesi al 31.12.1997 relativamente alla Legge n. 539/95 sono pari a 39,568 miliardi circa (22% degli importi disponibili).
- A valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 515/96** con decorrenza dal 1997, il Consorzio Venezia Nuova ha stipulato con gli istituti finanziatori un contratto di mutuo che ha reso disponibili 500 miliardi. Con tali somme è stata sottoscritta in data 18.12.1996 con il Magistrato alle Acque una nuova Convenzione di importo pari a 500 miliardi. Tale Convenzione è divenuta operativa nel mese di luglio del 1997 con la registrazione da parte della Corte dei Conti. Inoltre, nel mese di luglio 1997, il Magistrato alle Acque ha sottoscritto con il Consorzio Venezia Nuova una ulteriore Convenzione, di importo pari a 200 miliardi, a valere sul contratto di mutuo perfezionato dal Concessionario in data 1° luglio 1997 relativamente ai limiti di

*Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera a) Legge n. 798/84***Opere di regolazione delle maree***Descrizione degli interventi*

Gli interventi previsti per la protezione di Venezia e della sua laguna dagli effetti delle alte maree eccezionali consistono nel sistema di opere mobili alle bocche di porto, in grado di isolare la laguna dal mare per il tempo necessario ad evitare gli allagamenti degli abitati lagunari.

Il progetto del dispositivo ha seguito scrupolosamente i criteri forniti dalla Legge speciale per Venezia, n. 798 del 1984, secondo la quale le opere non devono alterare lo scambio idrico tra mare e laguna, per evitare effetti ambientali negativi, non devono costituire un ostacolo alla navigazione, e quindi una penalizzazione delle importanti attività economiche ad essa collegate, e infine non devono costituire un'alterazione del paesaggio.

Secondo le direttive impartite dal Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge n. 798/84 nel voto del 20 marzo 1990, il progetto di massima delle opere alle bocche di porto è proceduto in parallelo a quelli per la difesa ad "insula" dei centri urbani lagunari; per l'allontanamento del traffico petrolifero e per la riapertura delle valli da pesca.

Le opere progettate consistono, per ciascuna bocca di porto, in una schiera di paratoie mobili incernierate sul fondo, senza strutture intermedie, che, in condizioni normali di marea, restano in posizione di riposo negli alloggiamenti sul fondale del canale di bocca.

La dimensione dei varchi attualmente esistenti viene completamente rispettata, consentendo quindi di lasciare inalterato lo scambio idrico mare-laguna e riducendo a livelli trascurabili la penalizzazione della navigazione. Le schiere di paratoie verranno, infatti, sollevate solamente in presenza di maree previste superiori a +100 cm sul caposaldo di Punta della Salute, fatto che avviene all'incirca 7/8 volte all'anno. In queste occasioni le bocche di porto resteranno chiuse per tutta la durata dell'acqua alta, ossia per circa 4 ore. Per livelli di marea uguali o inferiori a +100 la protezione dei centri abitati è assicurata da sistemi locali di difesa.

Le paratoie, quando si trovano in posizione di riposo, giacciono sul fondo per effetto del peso dell'acqua che contengono.

Per raggiungere la posizione di chiusura esse vengono svuotate dall'acqua mediante immissione di aria compressa. Il sollevamento delle paratoie avviene allora a causa della spinta di galleggiamento.

Le opere mobili sono previste in corrispondenza delle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia, con uno sviluppo rispettivamente di 820, 400 e 360 metri. Le corrispondenti quote dei fondali sono: -6 metri (Lido-Treporti); -11 metri (Lido-S. Nicolò e Chioggia); -15 metri (Malamocco).

La realizzazione delle opere alle bocche di porto può essere ultimata in 7 anni dalla consegna dei lavori, con importi lordi di spesa pari a circa 5300 miliardi di lire (IVA compresa).

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio

I finanziamenti fino a oggi disponibili per le opere alle bocche di porto sono stati impegnati e spesi per la progettazione preliminare di massima, per la successiva progettazione di massima e per una complessa e articolata serie di attività di studio e di sperimentazione propedeutiche alle suddette progettazioni.

Sono stati completati quasi tutti gli **studi** e i **monitoraggi** utili alla progettazione e le sperimentazioni su modelli matematici e fisici presso i maggiori centri nazionali e internazionali quali: Estramed (Pomezia - Roma), Centro sperimentale di Voltabarozzo (Padova), Danish Hydraulics Laboratory (Danimarca) e Delft Hydraulics Institute (Olanda).

E' stato costruito anche un prototipo in scala reale di una paratoia (**Modulo Sperimentale Elettromeccanico - MOSE**) che è rimasto operativo per circa quattro anni presso la bocca di porto di Lido, nel canale di Treporti.

Le attività eseguite con il MOSE hanno consentito la prova sul campo del comportamento di un paratoia e della affidabilità e funzionalità dei componenti meccanici e impiantistici più

significativi. Le prove hanno permesso anche di individuare i materiali e i sistemi di protezione più indicati contro la corrosione marina. Esse renderanno possibili consistenti risparmi e maggior sicurezza di esercizio per le future installazioni alle bocche di porto.

Indagini geognostiche, anche di grande rilievo, perché condotte con tecnologie affatto innovative (carotaggi a grande diametro), sono state eseguite alle tre bocche di porto, lungo i litorali e in prossimità dei moli; le attività sono state tutte completate prima del 1997.

Il **progetto preliminare di massima** (Riequilibrio e Ambiente - REA) è stato completato nel luglio del 1989 e approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nello stesso anno.

Nel 1990, il Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge n. 798/84, con il voto del 20 marzo che recepisce le osservazioni del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, ha autorizzato il Consorzio Venezia Nuova a procedere alla redazione del progetto di massima.

Il **progetto di massima** è stato ultimato nel luglio del 1992, approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nel novembre dello stesso anno e inviato, nel gennaio del 1993, ai Comuni di Venezia e di Chioggia e alla Regione Veneto. In febbraio il progetto è stato trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L'approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è avvenuta due anni dopo, il 18 ottobre 1994.

In precedenza il progetto era stato valutato positivamente da un Comitato indipendente di esperti di alcune tra le più importanti società di ingegneria e di consulenza inglesi, canadesi e americane (Monitor international limited, Acres international limited, Bechtel international inc.).

In data 4 luglio 1995 il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge 798/84 ha deciso di sottoporre alla procedura per la **Valutazione dell'Impatto Ambientale** (VIA) il progetto di massima delle opere mobili alle bocche di porto fissando i criteri da adottare nella fase di preparazione e sviluppo di tale attività.

Nelle sedute del 4 luglio 1995 e del 12 dicembre 1995 il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo, in particolare, ha deciso di dare corso alla procedura per la VIA nel rispetto della normativa vigente ma con ulteriori prescrizioni che sono state specificamente indicate in una apposita delibera. Una prescrizione prevede che la struttura del SIA recepisca i quesiti formulati dall'Amministrazione comunale di Venezia riguardo alcune tematiche quali, ad esempio, l'efficacia degli interventi diffusi come alternativa alle opere mobili. Altre prescrizioni riguardano l'istituzione di un Collegio di Esperti Internazionali destinato ad affiancare la Commissione per la VIA del Ministero dell'Ambiente, come richiesto dall'Amministrazione comunale, i contenuti e le modalità di svolgimento del SIA, formulati anche sulla base di istanze presentate dal Comune di Venezia, e la definizione dei rischi derivanti dalle acque alte per le città di Venezia e di Chioggia da elaborare a cura delle rispettive Amministrazioni comunali.

Il SIA, avviato nel febbraio del 1996 a seguito di approvazione del relativo disciplinare da parte del Magistrato alle Acque di Venezia, è terminato nel mese di aprile del 1997.

In data 18 giugno 1997, il Magistrato alle Acque ha trasmesso la documentazione del SIA agli Enti istituzionalmente preposti allo svolgimento della procedura.

L'annuncio relativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale del Ministro dell'Ambiente e del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali è stato pubblicato, in data 23 giugno 1997, su quattro quotidiani.

Il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ex art. 4 legge 798/84, nella seduta del 1° agosto 1997, ha messo a punto un programma di lavoro "ad hoc" da seguire nelle fasi in cui si articola la procedura e ha fissato le modalità e i termini di pronuncia del Collegio di Esperti Internazionali e della Commissione di VIA.

In data 31 dicembre 1997 si è completata la fase di informazione e consultazione del pubblico e di formulazione delle relative osservazioni.

Sono attualmente in corso le attività del Collegio degli Esperti Internazionali, che in base a quanto deliberato dal suddetto Comitato, dovrà esprimere il proprio parere entro il 30 aprile 1998, e della Commissione di VIA del Ministero dell'Ambiente, che dovrà comunicare il proprio parere entro il 30 giugno 1998.

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera a) Legge n. 798/84**Adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari**Descrizione degli interventi

Gli interventi hanno come obiettivo il ripristino della stabilità dei moli foranei alle tre bocche di porto lagunari, oggi gravemente compromessa. La struttura dei moli, costruiti tra il 1840 e il 1934 per consentire il transito attraverso i canali di bocca di navi di grandi dimensioni, è sottoposta a cedimenti continui dovuti all'approfondimento dei canali per l'aumentata velocità della corrente. I lavori di manutenzione ordinaria hanno fronteggiato i dissesti più immediati ma non hanno eliminato il problema.

La ricostruzione dei moli è stata supportata da analisi, ricerche, sperimentazioni con modelli matematici e fisici con le quali sono state valutate le caratteristiche del moto ondoso lungo ciascuno dei moli, l'intensità delle correnti di marea al piede delle scogliere, la natura geotecnica dei terreni di fondazione, la profondità dei fondali lungo i moli e la loro tendenza evolutiva, la stabilità della struttura e delle mantellate in roccia. La realizzazione delle opere non comporta modifiche dimensionali e fa ricorso, per le parti a vista, a materiali omogenei a quelli esistenti.

Gli interventi previsti consistono, essenzialmente, nella realizzazione di uno zoccolo di transizione, in pietrame, di misura adatta a riempire i vuoti della scogliera esistente. Lo zoccolo viene costruito a partire dalla quota attuale del fondale fino a raggiungere la quota originaria, a moli appena edificati. Questo strato di transizione viene a sua volta ricoperto con rocce dimensionate in modo da fronteggiare l'erosione del moto ondoso e delle correnti. Anche la parte superiore dei moli viene rinforzata con rocce e tetrapodi, blocchi artificiali di calcestruzzo. Il masso di coronamento viene rinforzato con impiego di calcestruzzo e rivestimento in lastre di pietra.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio

Il progetto di massima degli interventi per il rinforzo dei moli è stato approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nel luglio del 1991.

Complessivamente i lavori hanno uno sviluppo di circa 10 chilometri.

Durante il 1994 sono iniziati quasi tutti gli interventi previsti. Nel 1996 sono stati completati i lavori sul **molo nord di Malamocco** mentre sono proseguiti quelli relativi agli altri moli.

Nel 1997 sono stati completati anche i lavori relativi ai **moli nord e sud di Chioggia e sud di Lido**, mentre sono proseguiti, e termineranno nel 1998, i lavori relativi ai **moli nord di Lido e sud di Malamocco**.

Nel mese di febbraio del 1997 sono state avviate anche le opere per la messa in sicurezza e l'adeguamento dei fari sulle testate dei moli nord di Lido e di Malamocco, lavori segnalati dal Genio Civile per le Opere Marittime su indicazione del Comando zona fari di Venezia.

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera a) Legge n. 798/84**Difesa dalle acque alte degli abitati insulari**Descrizione degli interventi

L'attenzione dell'opinione pubblica sul problema di Venezia viene sollecitata soprattutto in occasione delle acque alte eccezionali che costituiscono un immediato ed evidente rischio per la città e i centri urbani lagunari. Le acque medio alte, invece, rappresentano un fenomeno sicuramente meno pericoloso ma molto più frequente e in continuo aumento. Nell'ultimo decennio, le maree superiori agli 80 centimetri* si sono verificate, mediamente, 45 volte all'anno. Piazza S. Marco viene in parte già allagata quando la marea supera i 70 centimetri. Il ripetersi degli allagamenti causa numerosi disagi per la popolazione, l'abbandono dei piani terra, una pericolosa e lenta aggressione alle strutture architettoniche ed edilizie e a pregevoli manufatti, danni alle attività economiche.

Per ridurre il numero delle volte in cui sarà necessario ricorrere alla chiusura delle bocche di porto con le opere mobili, si è previsto che gli abitati lagunari vengano difesi da interventi locali fino a una quota prestabilita, attraverso un sistema articolato di interventi. L'insieme delle attività previste consentirà di porre in esercizio le opere mobili soltanto 7-8 volte all'anno.

Le tipologie di intervento messe a punto sono essenzialmente due.

La prima riguarda i centri urbani interni alla laguna che si trovano a quote poco elevate rispetto al livello medio del mare e sono costituiti da strutture fragili e preziose. Si tratta di ampie aree del centro storico di Venezia e di Chioggia. Gli interventi, definiti ad "insula", consistono nel rialzo delle pavimentazioni e nell'adeguamento delle sponde e garantiscono la difesa fino a un metro di marea rispetto al caposaldo di Punta della Salute.

La seconda tipologia di intervento riguarda i centri urbani del cordone litoraneo che vengono circondati da una cintura continua di opere sia dal lato mare che dal lato laguna. La natura di questi insediamenti consente una difesa da livelli di marea più alti.

* N.B.: i livelli di marea sono riferiti al caposaldo di Punta della Salute

A questa tipologia di interventi è riconducibile anche una vasta e diffusa attività di ristrutturazione e di manutenzione di rive (marginamenti) interne alla laguna eseguita con metodologie analoghe a quelle cui si fa ricorso per la difesa locale dalle acque alte.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio

Difese locali delle "insulae"

Sono già stati completati e approvati dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia il progetto generale di fattibilità della difesa delle "insulae" e il progetto di massima per la difesa dell'"insula" di S. Marco. Sono già finanziate la progettazione esecutiva dell'"insula" di S. Marco, avviata nella primavera del 1997, la progettazione di massima ed esecutiva dell'"insula" di Rialto, che verrà avviata nella primavera del 1998, la progettazione di massima e la progettazione esecutiva di un primo stralcio di lavori di difesa dell'"insula" del Corso del Popolo a Chioggia, completate nel corso del 1997.

E' importante segnalare l'avvio, nel corso del 1997, degli interventi di difesa del percorso di Riva dei Tolentini, a Venezia. E' stato messo a punto un sistema di interventi che, a partire dalla necessità di difendere la zona dalle acque alte almeno fino a +100 cm rispetto al caposaldo di Punta della Salute, realizzi un programma integrato di manutenzione straordinaria dell'area. Per assicurare l'esecuzione coordinata e unitaria degli interventi che coinvolgono Magistrato alle Acque e Comune di Venezia e interessano sia il suolo pubblico che gli edifici privati, si è fatto ricorso a uno specifico Accordo di programma tra gli Enti suddetti: uno strumento operativo previsto dalla Legge n. 139/92 e indispensabile qualora, in presenza di interventi particolarmente complessi, si debba "garantire l'omogeneità tecnico progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie".

Nell'Accordo di programma, il Consorzio Venezia Nuova è individuato quale soggetto attuatore del complesso dei lavori, a eccezione delle opere che riguardano i privati la cui esecuzione è stata affidata dall'Amministrazione Comunale a una società appositamente costituita: la Insula S.p.A..

I lavori ai Tolentini sono stati avviati con primo stralcio esecutivo che comprende il campo, il campazzo e la fondamenta dei Tolentini; la fondamenta Condulmer e quella del Magazen; le calli del Clero e dei Lavadori.

Difesa dei centri urbani lagunari

Nel corso del 1997, nell'ambito delle difese locali dei centri abitati lagunari, l'attività è proseguita a **Treporti** e a **Sottomarina**, ove sono in corso i lavori che consentiranno di completare gli stralci già attuati; a **Malamocco**, con l'ultimazione di alcuni lavori complementari alle opere di difesa già realizzate e già operanti; a **Pellestrina**, con il completamento delle opere di difesa lato laguna; a **San Pietro in Volta**; nei quartieri di **S. Giovanni** e di **Tombola** a **Chioggia** e lungo la riva del canale **S. Felice** a **Treporti**.

Nel centro storico veneziano è già stato completato e consegnato alle autorità cittadine un primo tratto di riva lungo la **fondamenta delle Zattere** ove è stato completato il lavoro di consolidamento della riva, con la ricostruzione dei tratti più degradati, con la sistemazione dei condotti fognari esistenti e con il sollevamento della pavimentazione fino a quote comprese tra +1,00 metri e +1,20 metri.

I lavori sono in corso anche alla **Giudecca**, dall'estremità est della fondamenta fino a rio **S. Biagio**.

Gli stralci di completamento sulle due rive proseguiranno per tutto il 1998.

E' in corso la progettazione esecutiva di interventi di difesa locale per le zone di **Murano**, di **Lido - Alberoni**, di **Sant'Erasmo** e di **Torcello**. Le relative opere verranno consegnate nel corso del 1998.

Marginamenti

Sono stati ristrutturati, risanati e, in certi casi, ricostruiti ampi tratti degradati di rive. Complessivamente, fino a oggi, sono stati realizzati più di 5 chilometri di marginamenti a **Mazzorbo**; **S. Erasmo**; **Treporti**; **Venezia** (S. Elena, S. Alvise, Cannaregio); **Lido** (Alberoni e via Navarrino), **Chioggia** (Riva Saloni); lungo i **canali Saccagnana e dei Bari**.

*Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera a) Legge n. 798/84***Ripristino della morfologia lagunare***Descrizione degli interventi*

La Legge n. 798/84 e, particolarmente, la Legge n. 139/92 dispongono che gli interventi ambientali siano integrati e contestuali alle opere per la difesa dalle acque alte.

Condizione per la sopravvivenza della laguna di Venezia è, infatti, il suo riequilibrio ambientale.

Due fenomeni hanno contribuito al rapido degrado dell'ecosistema lagunare:

- l'erosione, che sottrae sabbia e sedimenti con una dinamica che provoca l'appiattimento e l'abbassamento dei fondali, e la scomparsa delle strutture fisiche tipiche dell'ambiente lagunare, come velme e barene;
- l'inquinamento che, divenuto imponente negli ultimi quarant'anni, ha causato il progressivo peggioramento della qualità delle acque.

La laguna è una zona umida costiera, perennemente instabile tra interrimento ed erosione.

Nei secoli passati i veneziani hanno contrastato l'interrimento con interventi di dimensioni grandiose, come la deviazione dei fiumi, portati a sfociare lontano dalla laguna, e il taglio del Po a Porto Viro.

A partire dal secolo scorso, invece, è subentrato il fenomeno dell'erosione. La costruzione dei moli alle bocche di porto, finalizzata a garantire a navi di grandi dimensioni l'accesso al porto, ha avuto la conseguenza di interrompere quasi del tutto l'ingresso in laguna di sabbia trasportata dal mare, come la deviazione dei fiumi aveva drasticamente ridotto l'apporto di materiali dall'entroterra. Altri interventi umani effettuati in questo secolo, come lo scavo del c.d. "canale dei petroli" completato alla fine degli anni '60, hanno concorso, congiuntamente al fenomeno naturale dell'abbassamento della quota dei fondali, a innescare ed esaltare il processo erosivo ormai giunto a livelli tali da configurare una rapida evoluzione della laguna in una baia marina, con conseguenze assai negative sull'ecosistema e sulle attività umane.

Oggi la fuoriuscita di sedimenti dalla laguna, derivante dai processi erosivi in atto, è di circa 1.100.000 metri cubi all'anno.

Il progetto per il recupero morfologico ha l'obiettivo principale di contrastare questa tendenza evolutiva e, dunque, di trattenere e reintrodurre in laguna i sedimenti, ricostruendo le strutture fisiche dell'ambiente lagunare, e di ricalibrare i canali lagunari per ripristinare gli scambi idrici.

Il progetto prevede quattro tipi d'intervento:

1. ricostruzione e ripristino di strutture morfologiche, velme e barene, con sedimenti compatibili provenienti dal dragaggio dei canali lagunari;
2. recupero morfologico delle isole minori;
3. piantagione di fanerogame marine nei fondali lagunari;
4. apporto artificiale di sedimenti sabbiosi dal mare.

Grande rilievo assumono i lavori per la ricostruzione di velme e barene che consentono di raggiungere fondamentali obiettivi di ordine idrodinamico, morfologico e naturalistico attraverso il reimpiego interno alla laguna di materiali provenienti da operazioni di dragaggio che in precedenza venivano depositati in mare.

Tutti gli interventi sulla morfologia mantengono nel loro insieme un carattere di innovazione e di sperimentaltà: i risultati sono apprezzabili in tempi lunghi. Un continuo monitoraggio degli effetti consentirà di ottimizzarne via via l'efficacia.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio

Il Consorzio Venezia Nuova ha predisposto un **progetto generale di massima per il ripristino della morfologia lagunare**, approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nel dicembre del 1992, che prevede la realizzazione di una serie di interventi secondo le tipologie descritte precedentemente.

Nell'ambito di questo progetto, a seguito dell'approvazione da parte dello stesso Magistrato alle Acque dei relativi progetti esecutivi, sono stati sinora realizzati o sono in via di

realizzazione oltre 300 ettari di barene e di velme ed è stata ripristinata la funzionalità idraulica di canali lagunari per più di 60 chilometri.

Il Consorzio ha realizzato, o sta realizzando, interventi di ripristino morfologico in alcune zone critiche della laguna, quali **Valle Millecampi e Lago dei Teneri; le zone a sud della cassa di colmata "D-E"; la Palude di Cona a nord di Torcello; Canale Buello, Canale S. Domenico, Canale Scirocchetto e Canale Allacciante** nella laguna sud; **canali** nella zona della **Val di Brenta**; il bacino del **Lusenzo esterno a Chioggia**. Sono, inoltre, in corso di realizzazione importanti lavori di recupero ambientale di alcune isole abbandonate della laguna che presentano gravi aspetti di degrado (isola di **Campalto**, isola di **Fisolo**, lavori già ultimati; isole di **Certosa** e dei **Laghi**, lavori avviati nella primavera del 1997; isola di **S. Servolo**, lavori avviati alla fine del 1997; isola del **Lazzaretto Nuovo**, lavori di prossima consegna).

Da segnalare gli **interventi alle "casse di colmata"** (ampie zone della laguna interrate con materiali di risulta dallo scavo del c.d. "canale dei petroli") realizzati alcuni anni orsono: essi sono costituiti nella riapertura di canali all'interno delle "casse" e nella ricostruzione di barene lungo i bordi del canale navigabile e hanno consentito di vivacizzare gli scambi idrici con le parti retrostanti alle "casse di colmata", migliorando la qualità dell'ambiente.

Nel corso del 1997 sono stati anche avviati alcuni interventi sperimentali per la **salvaguardia e la tutela delle barene esistenti e la difesa di quelle che presentano particolari fenomeni erosivi**: essi consistono nella salvaguardia delle aree umide mediante l'impiego delle tecniche tradizionali di conterminazione (palificate), la sperimentazione delle tecniche più avanzate di ingegneria naturalistica e la realizzazione di sovralti in materiale sabbioso a difesa delle barene in erosione, secondo una tipologia di intervento specificamente studiata per zone lagunari poco profonde e particolarmente esposte al moto ondoso.

Sono in corso anche numerose **attività di monitoraggio ambientale**: esse costituiscono l'indispensabile supporto ai lavori in fase di realizzazione fornendo un quadro completo e

dettagliato della situazione preesistente nelle aree in cui si opera, dei criteri e dei sistemi esecutivi adottati, degli effetti degli interventi a breve e a lungo termine e della loro congruenza con le ipotesi progettuali.

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera a) Legge n. 798/84**Arresto del processo di degrado della laguna**Descrizione degli interventi

Gli indicatori più vistosi della situazione di degrado ambientale dovuta all'accresciuto inquinamento sono: la riduzione del numero delle specie animali e vegetali; la crescita abnorme di macroalghe e l'emissione di anidride solforosa prodotta dalla loro decomposizione; le morie di pesci per scarsità di ossigeno nell'acqua; la torbidità dell'acqua e la conseguente diminuzione delle fanerogame, che con il loro apparato radicale, contrastano l'erosione dei fondali.

La scomparsa di una fascia di transizione tra terraferma e laguna, ai margini del bacino lagunare, ha aggravato la situazione in quanto tale fascia assorbiva una grande quantità di nutrienti realizzando una "depurazione" naturale.

Il progetto sviluppato dal Consorzio Venezia Nuova per l'arresto del processo di degrado ha come scopo il miglioramento della qualità dei sedimenti e dell'acqua attraverso diversi tipi di intervento quali: la creazione, ove possibile, di estese zone umide di transizione tra terra e laguna per la depurazione naturale delle acque dolci; la modifica dei fondali della laguna intorno al centro storico di Venezia (per ridurre gli effetti della eutrofizzazione e per proteggere la città dal moto ondoso); il blocco della dispersione di inquinanti dalle discariche utilizzate in passato e dalle sponde e dai fondali dei canali industriali; la raccolta stagionale di macroalghe; la trasformazione in "habitat" lagunare di una parte delle "casce di colmata"; interventi specifici di risanamento ambientale in zone particolarmente degradate della laguna; il trattamento dei sedimenti per il miglioramento della qualità dei fondali.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio

Il Consorzio Venezia Nuova ha redatto un **progetto di massima degli interventi per l'arresto del degrado** che è stato approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nel luglio del 1994.

Sulla base delle successive progettazioni esecutive, sono già completati ovvero sono in corso numerosi interventi volti al miglioramento dell'ambiente lagunare.

A partire dal 1989, il Consorzio Venezia Nuova ha svolto periodiche **campagne di raccolta delle macroalghe**, predisponendo anche un sistema di monitoraggi che indirizzano gli interventi nelle aree maggiormente a rischio. Parte del materiale raccolto è stato utilizzato, per la prima volta, nella produzione di carta. Ne è stato studiato, tra l'altro, anche il possibile uso come ammendante in agricoltura.

Nell'ambito delle attività per impedire la dispersione di inquinanti dalle discariche situate all'interno della conterminazione lagunare, utilizzate in passato e ora abbandonate, sono stati effettuati i lavori nell' **isola dell'"ex-inceneritore"** alla Giudecca e nell' **isola c.d. delle Tresse**, di fronte a Marghera. E' stata conclusa, nel corso del 1997, la progettazione esecutiva, e già approvata dall'Amministrazione Concedente, dei lavori di sistemazione ambientale della discarica situata nella zona della **barena del Passo a Campalto** e di quella di **Val da Rio** a sud del centro storico di Chioggia. I lavori verranno realizzati a partire dal 1998.

Le aree industriali di Porto Marghera sono state realizzate negli anni dal 1920 al 1960 imbonendo zone lagunari di barene con riporti di terre di dragaggio, residui di lavorazioni industriali e rifiuti solidi urbani. Oggi, in alcuni casi, lungo le sponde dei canali industriali, tali materiali sono a contatto con le acque lagunari per cui si verifica il rilascio di sostanze inquinanti per effetto del moto ondoso, della marea e del dilavamento da parte delle piogge.

Sui fondali dei canali, inoltre, si sono accumulate negli anni sostanze inquinanti provenienti dai reflui delle lavorazioni portuali e industriali.

Il Magistrato alle Acque con il Consorzio Venezia Nuova, di concerto con l'Autorità Portuale, ha messo a punto un programma mirato di interventi.

In questo ambito, sono in corso i lavori di **asporto selettivo di materiale inquinante dal fondale del canale industriale nord** e di **banchinamento del canale industriale sud a Porto Marghera**.

Infine, sono state eseguite alcune sperimentazioni di **tecniche di risanamento dei sedimenti inquinati del fondale in alcune zone particolarmente critiche** (zona di Palude della Rosa, zona Campalto-Tessera).

Da segnalare anche i lavori di ripristino ambientale in corso nel bacino del **Lusenzo interno** a Chioggia che si propongono due principali obiettivi: ristabilire l'equilibrio ambientale e morfologico di quest'area lagunare nella quale vengono immesse sostanze inquinanti, prevalentemente di origine organica, il cui accumulo è favorito dagli scarsi ricambi idrici locali; ridurre la frequenza degli allagamenti cui sono soggetto gli abitati prospicienti il bacino.

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera d) Legge n. 798/84**Difesa dei litorali**Descrizione degli interventi

Il cordone litoraneo che separa l'Adriatico dalla laguna, lungo circa 46 chilometri, rappresenta la prima e naturale difesa di Venezia e dei centri urbani lagunari dal mare. Il rinforzo dei litorali ha assunto un carattere di assoluta necessità e d'urgenza. Infatti, il cordone litoraneo si è fatto sempre più sottile e fragile a causa dell'abbassamento delle terre emerse in laguna, dei processi erosivi, delle azioni disgregatrici del moto ondoso e del vento e del degrado delle strutture storiche in pietra (i "murazzi") che sono state erette nel corso del XVIII secolo a protezione dalle mareggiate. L'insieme dei fenomeni ha determinato il generale arretramento della linea di costa e la scomparsa del cordone di dune che costituiva un'ulteriore difesa dei territori e degli abitati retrostanti. Il fenomeno è stato particolarmente evidente, fin dai secoli scorsi, nel caso dei litorali di Pellestrina e di Lido e interessa ora anche i litorali di Cavallino e di Sottomarina, investiti da importanti processi erosivi. Il sistema di opere previste persegue molteplici obiettivi: la protezione della laguna e dei suoi abitati; il restauro dei "murazzi" e la ristrutturazione delle opere di difesa degradate; il ripristino delle difese naturali mediante la creazione di nuove spiagge e l'ampliamento di quelle divenute inadeguate; la formazione, dove possibile, di un nuovo fronte di dune.

Gli interventi che il Consorzio Venezia Nuova sta realizzando sono costituiti da "ripascimenti", cioè dalla ricostruzione delle spiagge, o dall'ampliamento di quelle esistenti, mediante apporto artificiale di sabbie idonee prelevate in alto mare. L'ampiezza media prevista per la parte emersa delle nuove spiagge è di circa 50 metri.

Per contenere la sabbia versata, si costruiscono strutture di scogliera di contenimento (i cosiddetti "pennelli"), disposte in modo ortogonale rispetto alla riva e distanti le une dalle altre circa 300 metri. La realizzazione di una lunga sequenza di spiagge protette e di dune ha anche forti valenze paesaggistiche e può costituire una valorizzazione del territorio non irrilevante a fini turistici e ricreativi.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio

Sulla base della progettazione esecutiva già eseguita e approvata dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia, il Consorzio Venezia Nuova ha portato avanti importanti opere di difesa dei litorali.

Nel corso del 1990 è stato eseguito l'intervento sperimentale di difesa del litorale di Cavallino, in località Ca' Pasquali.

Nel 1991 sono iniziati i lavori per il rinforzo della scogliera nel punto più fragile del litorale di Pellestrina, l'ansa di Caroman.

Nel corso del 1992 sono stati avviati i lavori per il rinforzo di 5 chilometri di "murazzo" a Pellestrina; l'anno seguente hanno avuto inizio gli interventi per il ripascimento del litorale di Cavallino e nel 1994 quelli del litorale di Pellestrina.

A **Cavallino**, lo sviluppo complessivo degli interventi è di circa 11 chilometri. Gli interventi prevedono il rafforzamento delle spiagge già esistenti; la spiaggia ricostruita viene difesa da 31 "pennelli", 5 di nuova realizzazione e 26 ottenuti dalla ristrutturazione di parte dei 65 "pennelli" preesistenti. Di questi, la metà circa è stata demolita. A Cavallino, in relazione ai fondali esistenti e alla direzione prevalente delle onde, non è stata rilevata la necessità di realizzare la barriera sommersa, parallela alla costa, che è stata invece progettata per Pellestrina. Nel corso del 1997, è stato portato a completamento l'ampliamento della spiaggia: sono stati versati complessivamente oltre 2 milioni di m³ di sabbia prelevata in mare al largo della bocca di porto di Malamocco. I lavori di ripascimento sono stati integrati da una serie di interventi complementari: sono stati ristrutturati alcuni tratti del muro realizzato in passato per contrastare la violenza delle onde e è stato realizzato, ove necessario, un diaframma impermeabile con funzione antisifonamento e antinfiltrazione. Lungo alcuni tratti del litorale, infine, la protezione del territorio è stata completata mediante la ricostruzione del fronte di dune, assai degradato e in molti punti quasi

scomparso, provvedendo anche al loro consolidamento mediante piantumazione di tipiche specie vegetali. La conclusione delle opere a Cavallino è prevista per il 1998 con il completamento della ricostruzione morfologica e ambientale di alcune dune.

A **Pellestrina** è in corso di realizzazione una nuova spiaggia a protezione dell'abitato. Gli interventi, tutti già finanziati, consentono il ripascimento di un tratto di litorale lungo circa 9 chilometri. La formazione della spiaggia avviene con l'impiego di circa 4,6 milioni di m³ di sabbia prelevata in mare al largo della bocca di porto di Malamocco. Al fine di assicurare la stabilità della spiaggia, si costruiscono 18 "pennelli" in pietrame collegati, mediante setti di prolungamento sommersi, a una berma continua, sommersa, messa in opera a circa 300 metri dalla costa. Le "celle" così realizzate vengono riempite di sabbia. Nel corso del 1997, sono stati ricostruiti 6 tratti di nuove spiagge che, sommate ai 5 tratti precedentemente realizzati, portano a più di 5 i chilometri di spiaggia già eseguiti. Completati i lavori relativi ai primi 6 stralci, pertanto, sono attualmente in corso i lavori relativi agli ultimi due stralci, il 7° e l'8°, che verranno completati rispettivamente nel 1998 e nel 1999.

Infine, nei primi mesi del 1998 verranno avviati anche i lavori di difesa del litorale di **Sottomarina e di Isola Verde**, i cui progetti esecutivi sono già stati completati e approvati dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia, mentre verranno realizzate le progettazioni esecutive degli interventi sui litorali di **Jesolo e di Lido**.

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera l) Legge n. 798/84**Sostituzione del traffico petrolifero in laguna**Descrizione degli interventi

La Legge n. 171/73 e la Legge n. 798/84 hanno disposto l'allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna.

Nella laguna di Venezia vengono trasportati, annualmente, circa 12 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi e chimico-liquidi che vengono distribuiti e trattati negli impianti petrolchimici e di raffinazione situati a Porto Marghera.

Il traffico petrolifero costituisce un rischio potenziale gravissimo per l'ambiente lagunare. In effetti, la navigazione avviene con sufficienti margini di sicurezza, ma un alto numero di incidenti è dovuto a cause imprevedibili e indipendenti dalle condizioni di navigazione. Per la sua conformazione morfologica, inoltre, la laguna di Venezia non è in grado di tollerare alcun consistente sversamento di prodotti petroliferi, altamente inquinanti, che si diffonderebbero immediatamente nel complesso tessuto morfologico e nei bassi fondali ove è impossibile l'azione di qualsiasi mezzo di soccorso e di disinquinamento.

Nella seduta del 20 marzo 1990, il Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge n. 798/84 ha conferito lo specifico incarico di redigere "il progetto operativo per la sostituzione del traffico petrolifero in laguna che ne preveda l'estromissione garantendo l'approvvigionamento alternativo dell'attività produttiva per il funzionamento del porto".

Il Consorzio Venezia Nuova ha messo a punto un piano di interventi che dimostra la fattibilità del progetto dal punto di vista tecnico. Gli interventi proposti si basano sulla potenzialità del sistema portuale dell'alto Adriatico ad accogliere il traffico navale dirottato da Venezia e sulla costruzione di nuovi oleodotti per il rifornimento dell'area industriale di Marghera. Il progetto indica come prioritario l'allontanamento del traffico delle grandi petroliere per il trasporto del greggio (che corrisponde a 4,2 milioni di tonnellate annue). La realizzazione, che dovrebbe essere contestuale a un piano generale di ristrutturazione di Porto Marghera e di riorganizzazione della portualità dell'alto Adriatico, consentirebbe di eliminare una fonte di grave pericolo per l'ambiente lagunare.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio

Il progetto operativo, completato nel mese di settembre del 1992 e approvato nel settembre del 1994 dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia, risponde alla richiesta formulata dal Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge n. 798/84 poiché ha consentito lo sviluppo del dibattito sulle scelte da effettuare che sono attualmente all'esame degli organismi istituzionali competenti.

*Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera l) Legge n. 798/84***Apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree***Descrizione degli interventi*

Le valli da pesca sono attualmente 24 e sono da secoli utilizzate per l'allevamento di specie ittiche pregiate e per la maricoltura.

Le valli, la cui superficie è di circa 9000 ettari, costituiscono un ambiente naturale separato dalla laguna mediante argini dotati di aperture che consentono il ricambio dell'acqua al loro interno in modo regolato dagli allevatori sulla base delle esigenze della produzione.

Le valli da pesca sono state oggetto di studio da parte del Consorzio Venezia Nuova per valutare l'efficacia della loro apertura alla libera espansione della marea, ai fini della eventuale diminuzione del livello dell'acqua nella laguna di Venezia durante le alte maree eccezionali. Mediante numerose prove su modelli matematici e fisici, si è constatato in modo incontrovertibile che, da questo punto di vista, gli effetti della riapertura delle valli sarebbero del tutto ininfluenti ai fini di una riduzione dei livelli di marea a Venezia e negli altri centri abitati lagunari.

La riapertura delle valli da pesca è stata, quindi, riconsiderata in funzione di un altro obiettivo: quello del miglioramento ambientale dell'ecosistema locale.

Il Consorzio Venezia Nuova ha elaborato un progetto operativo allo scopo di definire le modalità, la durata e la frequenza dell'apertura delle aree vallive allo scopo di un miglioramento della qualità ambientale nelle aree contigue. In effetti, l'apertura delle arginature delle valli da pesca, regolata e gestita secondo criteri prestabiliti, comporta un miglioramento locale della vivacità dell'idrodinamica con benefici per ampie zone della laguna in quanto il livello qualitativo dell'acqua delle valli risulta migliore di quello lagunare.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio

Il Consorzio Venezia Nuova ha completato il progetto operativo per la riapertura delle valli da pesca nell'agosto del 1992. Nel luglio dell'anno seguente, il progetto è stato approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia.

Nel corso del 1995 il Consorzio ha redatto anche il progetto esecutivo dell'**intervento sperimentale di riapertura di una valle da pesca, Valle Figheri**; l'intervento, accompagnato dal relativo monitoraggio, è attualmente in corso.

*Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera a) Legge n. 798/84***Servizio Informativo***Descrizione degli interventi*

Il Servizio Informativo del Consorzio Venezia Nuova raccoglie, ordina e aggiorna ogni dato riguardante gli aspetti morfologici, idraulici, ecologici e socioeconomici della laguna, del bacino scolante e dell'alto Adriatico. Il Servizio Informativo coopera con tutti gli Enti e le istituzioni che hanno competenza sul territorio e che sono deputati alla raccolta di informazioni sulle condizioni dell'ambiente lagunare, in modo da consentire la definizione delle politiche d'intervento alla luce di un quadro conoscitivo complessivo. I dati raccolti vengono organizzati in funzione della geografia e dei problemi del territorio, nonché in funzione degli obiettivi delle opere previste per la salvaguardia di Venezia e per il riequilibrio della laguna.

Ciò consente di disporre del supporto di un sistema di informazioni ricco e articolato, in grado di assicurare sia il massimo di scientificità negli approcci metodologici e nelle soluzioni progettuali e operative, sia una gestione corretta e costantemente controllata del sistema lagunare e del sistema dei lavori via via eseguiti.

Il Servizio Informativo è stato istituito su disposizione del Magistrato alle Acque.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio

Nell'ambito delle Convenzioni sottoscritte tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova dal 1985 a oggi, è stata svolta con continuità una serie complessa di attività volte a realizzare una conoscenza unitaria e globale dell'ecosistema lagunare e del bacino in esso scolante.

Il piano di organizzazione delle informazioni comprende tre settori essenziali: le Biblioteche, la Banca Dati territoriali e i Sistemi informatici di supporto alle decisioni.

Le **Biblioteche** costituiscono la raccolta ordinata di tutti i documenti riguardanti l'ecosistema: pubblicazioni scientifiche, studi e progetti, mappe cartografiche e aerofotogrammetriche, nastri e dischi informatici, diapositive, immagini da satellite e così via. Fino ad ora sono stati raccolti oltre 20.000 documenti.

Le Biblioteche sono, inoltre, lo strumento di lavoro per la realizzazione del Sistema Informativo Geografico: una **Banca Dati** che raccoglie tutti i dati territoriali disponibili sull'ecosistema considerato e i programmi software per consultarli e elaborarli. Attualmente la Banca Dati, denominata C.I.R.C.E. (Centro Informatico per il Risanamento e Controllo dell'Ecosistema), consta di oltre 300.000 "oggetti territoriali" corredati da oltre un milione di "attributi".

I **Sistemi di supporto** sono sistemi informatici che utilizzano i dati raccolti e, in base a strumenti di analisi e logiche interpretative specifiche, rendono più agili alcuni dei processi decisionali relativi all'ecosistema.

Oltre allo sviluppo di tali attività di "base", il Servizio Informativo ha realizzato alcune attività specifiche.

Per citarne alcune: ha aggiornato la batimetria della laguna; ha installato presso il proprio centro di calcolo modelli matematici che simulano i processi di propagazione della marea; sta realizzando un modello per migliorare la previsione delle acque alte; ha contribuito al potenziamento informatico del Centro sperimentale di Voltabarozzo; ha eseguito studi sugli apporti inquinanti in laguna.

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera d) Legge n. 798/84**Interventi di ausilio alla navigazione**Descrizione degli interventi

Per rendere sicura la navigazione in laguna nelle ore notturne e in caso di scarsa visibilità dovuta alla nebbia, il Consorzio Venezia Nuova ha messo in opera, lungo il canale tra Malamocco e Marghera, per complessivi 15 Km, un sistema di illuminazione e una serie di strumentazioni ausiliarie. Gli interventi si sono resi necessari allo scopo di garantire alla navigazione requisiti e standard di sicurezza adeguati. Il sistema predisposto consente di ridurre i rischi di incidenti e di migliorare la capacità operativa delle aree portuali di Venezia. In futuro, inoltre, la realizzazione degli ausili alla navigazione potrà soddisfare nuove possibili esigenze: compensare i sia pur limitatissimi periodi di inagibilità delle bocche di porto dovuti alla prevista chiusura dei varchi in occasione di alte maree eccezionali e la perdita di produttività portuale qualora venisse eliminato il traffico marittimo petrolifero dalla laguna.

Su entrambi i lati del canale tra Malamocco e Marghera sono stati disposti 340 segnali luminosi, installati a 80 metri l'uno dall'altro, 111 riflettori radar, collocati sulla sommità dei pali di supporto dei segnali luminosi, e 4 "fog detectors" per rilevare le condizioni di visibilità.

I punti luce, situati a circa 8 metri sopra il livello del mare, sono costituiti da lampade a vapori di sodio a bassa pressione montate su uno stelo di acciaio inossidabile.

L'alimentazione elettrica avviene tramite allacciamento alla rete ENEL. Una stazione generatrice di emergenza è stata realizzata a S. Leonardo. Per la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica sono state predisposte 16 centraline.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio

L'intero intervento di ausilio alla navigazione notturna e con nebbia è stato completato nel 1996.

Nel corso del 1997 è stata completata l'attività di videomonitoraggio che, mediante l'impiego di telecamere equipaggiate con intensificatori di luminosità, ha consentito la ripresa del traffico marittimo lungo il canale Malamocco-Marghera sia di giorno che di notte, e la memorizzazione delle immagini del traffico in una apposita banca dati.

Si è svolta, infine, per circa sei mesi, la gestione dell'impianto per il suo avviamento.

Il "sentiero luminoso" è stato definitivamente consegnato all'Autorità Portuale nel corso del 1997.

STATO DI ATTUAZIONE DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI AL CONSORZIO VENEZIA NUOVA									
Importi lordi in Lire miliardi									
	IMPORTI FINANZIATI (A)	IMPORTI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI AL 31.12.1997 (B)	IMPORTI SOTTOSCRITTI AL 31.12.1997 (C)	% (C)/(B)	IMPORTI IMPEGNATI AL 31.12.1997 (D)	% (D)/(B)	IMPORTI SPESI AL 31.12.1997 (E)	% (E)/(B)	NOTE
LEGGE 798/84	778.398	777.938	774.071	100%	774.071	100%	770.351	99%	
LEGGE 139/92	970.000	970.000	970.000	100%	876.000	90%	721.419	74%	
LEGGE 539/95	180.000	180.000	180.000	100%	180.000	100%	39.568	22%	
TOTALE PARZIALE	1928.398	1927.938	1924.071	100%	1830.071	95%	1531.338	79%	
LEGGE 515/96	700.000	500.000	700.000	140%	700.000	140%	27.345	5%	(1)
LEGGE 345/97	350.000	0.000	160.000		0.000	0%	0.000	0%	(2)
TOTALE	2978.398	2427.938	2784.071	115%	2530.071	104%	1558.683	64%	
LEGENDA									
IMPORTI FINANZIATI: gli importi finanziati complessivamente dalla legislazione speciale per Venezia in favore del Consorzio Venezia Nuova.									
IMPORTI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI AL 31.12.1997: gli importi già assegnati a tale data dalla legge 798/84 e successivi rifinanziamenti e gli importi attivabili con limiti di impegno con decorrenza dal 1993 al 1997 per le altre leggi.									
IMPORTI SOTTOSCRITTI AL 31.12.1997: gli importi relativi a convenzioni sottoscritte a tale data tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova.									
IMPORTI IMPEGNATI AL 31.12.1997: gli importi impegnati con apposito Decreto del Presidente del Magistrato alle Acque già registrato a tale data alla Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.									
IMPORTI SPESI AL 31.12.1997: gli importi già realizzati a tale data.									
NOTE									
(1)									
Gli importi finanziati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997 (500 Lmrd.) sono stati sottoscritti in data 18.12.1996 ma sono risultati impegnati solo in data 11.07.1997.									
Gli importi finanziati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998 (200 Lmrd.) sono stati sottoscritti in data 28.07.1997 e sono risultati impegnati già in data 10.09.1997, anticipatamente rispetto alla loro effettiva disponibilità.									
(2)									
Gli importi finanziati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998 (160 Lmrd.) sono stati sottoscritti in data 23.12.1997, anticipatamente rispetto alla loro effettiva disponibilità.									

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO VENEZIA NUOVA: ANDAMENTO DEGLI IMPORTI IMPEGNATI RISPETTO AGLI IMPORTI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI																		
Importi lordi in lire miliardi																		
	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI AL 31.12.1997
IMPORTI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI																		
Legge																		
n. 718/84	100.500	74.500	47.500	50.000													272.500	272.500
n. 910/86				30.000	62.400		30.600										212.500	212.500
n. 87/88					35.400		154.800	31.415	38.400		2.254	4.850	3.817	0.460			271.396	270.936
n. 360/91							22.000										22.000	22.000
n. 139/92										582.000	227.000	67.000	84.000				970.000	970.000
n. 539/95													120.000				180.000	180.000
n. 516/96													500.000				700.000	500.000
n. 345/97														200.000			350.000	0.000
Importo totale parziale	100.500	74.500	47.500	80.000	124.800	82.400	207.400	31.415	38.400	582.000	229.254	71.850	83.817	714.000	380.480	180.000		
Importo totale progressivo	100.500	175.000	222.500	302.500	427.400	489.800	697.200	728.615	767.015	1.349.015	1.578.268	1.650.119	1.713.936	2.427.936	2.788.386	2.978.386		2.427.936
IMPORTI IMPEGNATI																	IMPORTI IMPEGNATI AL 31.12.1997	
Convenzione																		
1° conv. n. 6478	170.000			64.800		20.600	11.500										266.500	266.500
2° conv. n. 6745					93.000	62.400	3.000	15.600	17.350								191.350	191.350
3° conv. n. 7025							124.200										124.200	124.200
4° conv. n. 7138								80.000									80.000	80.000
5° conv. n. 7191									5.000								5.000	5.000
6° conv. n. 7295										52.485			1.174	5.882			59.521	59.521
7° conv. n. 7322										582.000	18.000	50.000			70.000		720.000	650.000
8° conv. n. 7395											203.000	17.000			24.000		250.000	226.000
9° conv. n. 7601																	60.000	60.000
10° conv. n. 7637																	120.000	120.000
11° conv. n. 7649																	500.000	500.000
12° conv. n. 7695																	200.000	200.000
13° conv. n. 7725																	160.000	0.000
n. 1688 OO.MM.				7.500													7.500	7.500
n. 1688 OO.MM.					40.000												40.000	40.000
Importo totale parziale	170.000	0.000	0.000	72.000	133.000	82.900	138.700	95.600	22.350	634.485	227.000	67.000	1.174	885.882	254.000			
Importo totale progressivo	0.000	170.000	170.000	242.000	375.000	457.900	598.600	692.200	714.550	1.349.015	1.578.015	1.643.015	1.844.189	2.530.071	2.784.071			2.530.071
IMPEGNO/ISPONIBILE (%)		87%	78%	80%	88%	83%	86%	85%	93%	100%	100%	100%	96%	104%	100%			104%
NOTE																		
Come anno di impegno è stato indicato l'anno in cui il Decreto Presidenziale approvato dalla Convenzione o dall'Atto Aggiuntivo è stato registrato alla Corte dei Conti.																		
Per le somme ex lege 515/98 con decorrenza dal 1° gennaio 1998 (200 miliardi), l'impegno mediante registrazione del Decreto della 12° conv. da parte della Corte dei Conti è avvenuto prima della effettiva disponibilità della somma stessa (vedi in data 10.09.97).																		

Allegato n.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n.

CONSORZIO VENEZIA NUOVA: ANDAMENTO DEGLI IMPORTI SPESI RISPETTO AGLI IMPORTI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI																
Importi lordi in lire miliardi	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
IMPORTI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI																
Legge	100.500	74.500	47.500	60.000												
n. 788/84				30.000			30.800									
n. 510/86							154.800	31.415	38.400		2.254	4.850	3.817			
n. 57/88							22.000								0.450	
n. 360/91																
totale Legge 788/84 e rifinanz. - parziale	100.500	74.500	47.500	60.000	124.500	82.400	207.400	31.415	38.400	0.000	2.254	4.850	3.817	0.000	0.450	
totale Legge 788/84 e rifinanz. - progressiva	100.500	175.000	222.500	302.500	427.400	489.800	697.200	728.615	767.015	767.015	765.269	774.119	777.936	777.936	778.396	
n. 139/92										682.000	227.000	87.000	87.000	94.000		
totale Legge 139/92 - progressiva										682.000	603.000	87.000	87.000	94.000		
n. 539/95													60.000	120.000	970.000	970.000
totale Legge 539/95 - progressiva													60.000	120.000	970.000	180.000
n. 515/96													60.000	120.000	180.000	500.000
totale Legge 515/96 - progressiva													60.000	120.000	700.000	700.000
n. 344/97															180.000	350.000
totale Legge 344/97 - progressiva															180.000	350.000
Importo totale parziale	100.500	74.500	47.500	80.000	124.500	82.400	207.400	31.415	38.400	882.000	229.254	71.850	83.817	714.000	380.450	180.000
Importo totale progressiva	101	175	222.500	302.500	427.400	489.800	697.200	728.615	767.015	1.348.015	1.578.269	1.650.119	1.713.936	2.427.936	2.788.396	2.978.396
IMPORTI SPESI																
Legge																
n. 788/84 e rifinanzament	0.000	1.873	4.280	45.760	91.625	120.276	99.820	110.734	128.631	62.462	43.719	28.948	11.449	20.773		
n. 788/84 e rifinanzament - progressivi		1.873	6.153	51.913	143.539	263.815	263.635	474.389	603.000	665.462	709.161	798.123	749.578	770.351		
Spesa/disponibile Legge n. 788/84 (%)	0%	1%	3%	17%	34%	64%	62%	66%	79%	87%	92%	95%	96%	99%		
n. 139/92 - progressivi										52.538	107.900	182.221	213.641	165.119		
Spesa/disponibile Legge n. 139/92 (%)										52.538	160.438	342.659	556.300	721.419		
n. 539/95 - progressivi													8.697	30.871		
Spesa/disponibile Legge n. 539/95 (%)													8.697	30.871		
n. 515/96 - progressivi													14%	27%		
Spesa/disponibile Legge n. 515/96 (%)													14%	27%		
n. 344/97 - progressivi														27.345		
Spesa/disponibile Legge n. 344/97 (%)														27.345		
Importo totale parziale	0.000	1.873	4.280	45.760	91.625	120.276	99.820	110.734	128.631	115.000	151.618	211.188	233.787	244.108		
Importo totale progressivo	0.000	1.873	6.153	51.813	143.539	263.815	263.635	474.389	603.000	718.000	869.618	1.080.788	1.314.575	1.558.683		
SPESA/DISPONIBILE (%)		1%	3%	17%	34%	64%	62%	66%	79%	53%	55%	65%	77%	64%		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLO STATO IN CONCESSIONE AL CONSORZIO VENEZIA NUOVA																							
Aggiornamento al 31 dicembre 1997 - Importi lordi in Lire miliardi																							
OBIETTIVI	LEGGE N. 790/94 E SUCC. RIF.				LEGGE N. 130/92				LEGGE N. 539/93				LEGGE 515/96				LEGGE 345/97				RIEPILOGO TOTALE		
	IMPORTI PRIMA DATI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI AL 31.12.1997	IMPORTI SPESA AL 31.12.1997	(C)	(D)	IMPORTI PRIMA DATI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI AL 31.12.1997	IMPORTI SPESA AL 31.12.1997	(E)	(F)	IMPORTI PRIMA DATI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI AL 31.12.1997	IMPORTI SPESA AL 31.12.1997	(G)	(H)	IMPORTI PRIMA DATI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI AL 31.12.1997	IMPORTI SPESA AL 31.12.1997	(I)	(J)	IMPORTI PRIMA DATI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI AL 31.12.1997	IMPORTI SPESA AL 31.12.1997	(K)	(L)			
OPERE DI REGOLAZIONE DELLE MARÉE	185.248	185.248	183.632	89%	36.230	36.230	33.974	93%	20.262	20.262	14.220	70%	40.846	18.846	0.527	3%	23.000	0.000	238.426	212.233	89%		
ADEGUAMENTO E RINFORZO DEI MOLI FORANEI ALLE TRE BOCCHIE LAGUNARI	30.428	30.428	29.860	89%	102.551	102.551	137.145	87%	—	—	—	—	5.000	0.000	0.412	—	—	197.878	197.417	87%			
DIFESA DALLE ACQUE ALTE DEGLI ARBILI INBAGLI INSLAE E MARCONIAMENTI	219.813	219.813	217.004	89%	204.651	204.651	100.020	49%	45.878	45.878	1.708	4%	220.770	198.520	7.138	4%	112.000	0.000	805.112	325.877	49%		
RIPRISTINO DELLA MORFOLOGIA LAGUNARE	118.798	118.798	114.228	89%	122.183	122.183	73.921	60%	7.485	7.485	1.012	14%	83.780	29.180	2.004	7%	58.000	—	307.258	181.123	89%		
ARRESTO DEL PROCESSO DI DEGRADO DELLA LAGUNA	112.087	112.087	111.377	89%	170.500	170.500	89.281	59%	40.700	40.700	3.818	8%	117.650	89.500	4.702	5%	86.000	0.000	488.937	217.856	53%		
DIFESA DEI LITORALI	88.831	88.831	86.831	100%	254.849	254.849	228.818	87%	63.675	63.675	18.841	30%	241.114	181.114	12.211	8%	85.000	0.000	721.588	344.801	83%		
SOSTITUZIONE DEL TRAFFICO PETROLIFERO IN LAGUNA	8.151	8.151	8.151	100%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.151	8.151	100%			
APERTURA DELLE VALLI DA PERCA ALL'ESPANSIONE DELLE MARÉE	1.832	1.832	1.832	100%	5.000	5.000	2.538	51%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.832	8.832	83%			
SERVIZIO INFORMATIVO	24.844	24.844	24.844	100%	17.895	17.895	14.018	78%	2.000	2.000	0.004	3%	11.000	7.000	0.331	5%	6.000	0.000	61.838	39.277	78%		
INTERVENTI DI AIDILLO ALLA NAVIGAZIONE	14.364	14.364	14.364	100%	15.031	15.031	15.031	100%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.385	20.385	100%			
TOTALI	778.396	777.838	770.361	89%	970.000	970.000	721.418	74%	180.000	180.000	38.868	22%	700.000	600.000	27.348	5%	380.000	0.000	2.578.396	1.688.603	84%		

Allegato n. 4

Allegato n. 5

STATO D'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO VENEZIA NUOVA - SECONDO LE LETTERE a), c), d) ED II DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 738/84																									
Aggiornamento al 31 dicembre 1997 - Importi lordi in Lire miliardi																									
OGGETTI SECONDO LE LETTERE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 738/84	LEGGE N. 738/84 E SUCC. RIF.				LEGGE N. 139/92				LEGGE N. 539/95				LEGGE 515/96				LEGGE 345/97				RIEPILOGO TOTALE				
	IMPORTI PAGAMENTI	IMPORTI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI AL 31.12.1997	% (C)	(C)/(B)	IMPORTI PAGAMENTI	IMPORTI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI AL 31.12.1997	% (F)	(F)/(E)	IMPORTI PAGAMENTI	IMPORTI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI AL 31.12.1997	% (G)	(G)/(F)	IMPORTI PAGAMENTI	IMPORTI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI AL 31.12.1997	% (H)	(H)/(G)	IMPORTI PAGAMENTI	IMPORTI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI AL 31.12.1997	% (I)	(I)/(H)	IMPORTI PAGAMENTI	IMPORTI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI AL 31.12.1997	% (J)	(J)/(I)	
a) e) a) Ricarico idrogeologico	642,223	642,442	99,86		701,672	701,672	100		116,325	116,325	100		20,716	18%	456,886	338,886	15,16	255,000	0	—	2174,805	1799,345	82,78	1148,801	84%
c) e) c) Maggioramenti d'argomenti	48,000	48,000	100		13,000	13,000	100		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	81,000	81,000	100	49,485	61%
d) e) d) Opere marittime	78,837	77,485	99,58		250,328	250,328	100		83,875	83,875	100		18,862	36%	241,114	181,114	12,16	95,000	0	—	728,804	553,804	76,01	348,371	83%
e) e) f) Parodi e vali de pasci	8,787	8,787	100		8,000	8,000	100		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	13,787	13,787	100	11,329	82%
TOTALE	778,386	777,538	99,77		970,000	970,000	100		180,000	180,000	100		39,578	22%	700,000	800,000	27,14	386,000	0	—	2979,396	2427,936	81,51	1688,883	84%

PAGINA BIANCA



GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

SEGRETERIA ALL'AMBIENTE

SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

PROSPETTO GENERALE
E STATO
DEGLI INTERVENTI
SUDDIVISI PER LEGGI

AGGIORNATO AL 30-01-1997

Legenda

<u>Importi finanziati:</u>	Somme messe a disposizione dallo Stato.
<u>Importi impegnati:</u>	Importi relativi ad interventi per i quali sono stati individuati i soggetti attuatori.
<u>Importi contabilizzati:</u>	Importi dei progetti già approvati dai competenti organi regionali, i cui interventi sono pertanto stati avviati o sono in fase di avvio
<u>Importi erogati:</u>	Importi già erogati ai soggetti esecutori delle opere.

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

SETTORE: DISINQUINAMENTO		IMPORTI			
LEGGE		FINANZIAMENTI	IMPEGNATI	CONTABILIZZATI	EROGATI
L. 798/84	- ESERCIZI 1984/1985/1986	58.000.000.000	58.000.000.000	58.000.000.000	38.029.742.619
L. 910/86	- ESERCIZI 1987/1988	88.000.000.000	88.000.000.000	83.000.000.000	63.488.325.672
L. 910/86	- ESERCIZIO 1989	62.000.000.000	62.000.000.000	53.200.000.000	26.058.221.273
L. 67/88	- ESERCIZIO 1988	15.500.000.000	15.500.000.000	2.500.000.000	1.491.246.665
L. 67/88	- ESERCIZIO 1990	104.500.000.000	104.500.000.000	95.500.000.000	40.216.861.603
L. 67/88	- ESERCIZIO 1991	30.600.000.000	30.600.000.000	25.100.000.000	2.091.000.000
L. 67/88	- ESERCIZIO 1992 - 1° FASE	29.700.000.000	29.700.000.000	17.200.000.000	9.289.727.389
L. 67/88	- ESERCIZIO 1992 - 2° FASE	60.000.000.000	60.000.000.000	20.000.000.000	5.790.000.000
L. 360/91		16.000.000.000	13.500.000.000	8.170.400.000	6.814.921.571
L. 139/92	- ESERCIZIO 1993	350.000.000.000	348.000.000.000	320.320.000.000	104.573.422.890
L. 139/92	- 2° FASE	320.000.000.000	197.200.000.000	-	2.761.422.850
L. 539/95	- ESERCIZIO 1996	30.000.000.000	30.000.000.000	10.150.000.000	-
L. 539/95	- ESERCIZIO 1997	53.500.000.000	53.500.000.000	2.800.000.000	-
L. 515/96	- ESERCIZIO 1997	200.000.000.000	200.000.000.000	6.606.045.980	-
TOTALE SETT. DISINQUINAMENTO		L. 1.417.800.000.000	L. 1.290.500.000.000	L. 702.546.445.980	L. 300.604.892.532
PERCENTUALI RISPETTO AL FINANZIAMENTO		===	91,02	49,55	21,20

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

SETTORE: OSPEDALI	IMPORTI			
	FINANZIAMENTI	IMPEGNATI	CONTABILIZZATI	EROGATI
LEGGE				
L. 798/84 - ESERCIZI 1984/1985/1986	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
L. 910/86 - ESERCIZI 1987/1988	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	2.077.838.206
L. 910/86 - ESERCIZIO 1989	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-
L. 539/95 - ESERCIZIO 1997	6.500.000.000	6.500.000.000	-	-
TOTALE SETT. OSPEDALI	L. 33.500.000.000	L. 33.500.000.000	L. 27.000.000.000	L. 14.077.838.206
PERCENTUALI RISPETTO AL FINANZIAMENTO	100,00	100,00	80,60	42,02

SETTORE: ACQUEDOTTI	IMPORTI			
	FINANZIAMENTI	IMPEGNATI	CONTABILIZZATI	EROGATI
LEGGE				
L. 798/84 - ESERCIZI 1984/1985/1986	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1.504.260.408
L. 910/86 - ESERCIZI 1987/1977	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	589.750.386
L. 910/86 - ESERCIZIO 1989	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	589.750.386
L. 67/88 - ESERCIZIO 1988	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	1.240.254.000

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

TOTALE SETT. ACQUEDOTTI		L.	40.000.000.000	L.	40.000.000.000	L.	40.000.000.000	L.	40.000.000.000	L.	3.924.015.180
PERCENTUALI RISPETTO AL FINANZIAMENTO		---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,81

TOTALE GENERALE PER I TRE SETTORI		L.	1.491.300.000.000	L.	1.364.000.000.000	L.	769.546.445.980	L.	318.606.745.918
PERCENTUALI RISPETTO AL FINANZIAMENTO		---	---	---	---	---	---	---	---

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

ACQUEDOTTI		IMPORTI				NOTE
N°	LEGGE 798/84 - Esercizi 1984-1985-1986	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	
1	Potenziamento servizio idrico frazioni Ca' Bianca e Valli COMUNE DI CHIOGGIA	290.000.000	290.000.000	290.000.000	285.726.106	Lavori finiti
2	Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II Stralcio COMUNE DI CHIOGGIA	1.710.000.000 8.000.000.000	1.710.000.000 8.000.000.000	1.710.000.000 8.000.000.000	1.218.534.302 -	Lavori in fase di esecuzione. L'importo complessivo è di £ 3.710.000.000 Il Comune sta elaborando un nuovo progetto.
3	Acquedotto di Venezia COMUNE DI VENEZIA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1.504.260.408	
	VALORI TOTALI					

N° LEGGE 910/86 - Esercizi 1987-1988						NOTE
N°	LEGGE 910/86 - Esercizi 1987-1988	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	
1	Adeguamento impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II Stralcio COMUNE DI CHIOGGIA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	589.750.386	Lavori in fase di esecuzione. L'importo complessivo è di £ 3.710.000.000
	VALORI TOTALI	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	589.750.386	

N° LEGGE 910/86 - Esercizio 1989						NOTE
N°	LEGGE 910/86 - Esercizio 1989	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	
1	Acquedotto di Venezia COMUNE DI VENEZIA	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000		Il Comune sta elaborando un nuovo progetto.
	VALORI TOTALI	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	589.750.386	

N° LEGGE 67/88 - Esercizio 1988						NOTE
N°	LEGGE 67/88 - Esercizio 1988	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	
1	Sistema degli acquedotti del Basso Veneto - Opere in Comune di Chioggia (Ve) DELTA P.O.S.P.A.	17.300.000.000	17.300.000.000	17.300.000.000		Le opere ricadono all'interno della concessione in essere tra Regione e la Delta Po per la progettazione del sistema degli acquedotti del Basso Veneto

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

2	Realizzazione vasche di accumulo per acqua grezza alla centrale di Cavanella d'Adige (Ve)	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	750.000.000	Importo complessivo £ 4.500.000.000
	COMUNE DI CHIOGGIA					
3	Rifacimento impianti di sollevamento a Cavanella d'Adige (acqua grezza e potabile)	800.000.000	800.000.000	800.000.000	400.000.000	Importo complessivo £ 850.000.000
	COMUNE DI CHIOGGIA					
4	Razionalizzazione reti di distribuzione interna e recupero perdite dell'acquedotto di Chioggia	400.000.000	400.000.000	400.000.000	90.254.000	Importo complessivo l stralcio £ 180.500.000
	COMUNE DI CHIOGGIA					
	VALORI TOTALI	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	1.240.254.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/93

IMPORTI					
OSPEDALI					
N°	LEGGE 798/84 - Esercizi 1984-1985-1986	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO
1	Dipartim. urgenza Ospedale SS Giovanni e Paolo - Venezia - 11° stralcio U.L.S.S. N° 12 VENEZIA	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
	VALORI TOTALI	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
NOTE					
L'importo complessivo è di 30.100 ml finanziati per 12 mld con la L. n. 798/84 es. 1984-85-86, L. 10 mld con la L. n. 910/86 es. 1987-1988, L. 5 mld con la L. n. 910/86 esercizio 1989, 3.100					
N°	LEGGE 910/86 - Esercizi 1987-1988	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO
1	Dipartim. urgenza Ospedale SS Giovanni e Paolo - Venezia - 11° stralcio U.L.S.S. N° 12 VENEZIA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	2.077.830.206
	VALORI TOTALI	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	2.077.830.206
NOTE					
L'importo complessivo è di 30.100 ml finanziati per 12 mld con la L. n. 798/84 es. 1984-85-86, L. 10 mld con la L. n. 910/86 es. 1987-1988, L. 5 mld con la L. n. 910/86 esercizio 1989, 3.100					
N°	LEGGE 910/86 - Esercizio 1989	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO
1	Dipartim. urgenza Ospedale SS Giovanni e Paolo - Venezia - 11° stralcio U.L.S.S. N° 12 VENEZIA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	
	VALORI TOTALI	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	
NOTE					
L'importo complessivo è di 30.100 ml finanziati per 12 mld con la L. n. 798/84 es. 1984-85-86, L. 10 mld con la L. n. 910/86 es. 1987-1988, L. 5 mld con la L. n. 910/86 esercizio 1989, 3.100					
N°	LEGGE 539/95 - Esercizio 1997	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO
1	Dipartim. urgenza Ospedale SS Giovanni e Paolo - Venezia - 11° stralcio U.L.S.S. N° 12 VENEZIA	6.500.000.000	6.500.000.000		
	VALORI TOTALI	6.500.000.000	6.500.000.000		
NOTE					

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

DISINQUINAMENTO				IMPORTI		
N°	LEGGE 798/84 - Esercizi 1984-1985-1986	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	NOTE
1	Ampliamento e completamento impianto di depurazione di Campalto (Ve) - Telecontrollo COMUNE DI VENEZIA	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	Con DGR n. 3183 del 22-7-96, i fondi sono stati destinati alla vasca di pioggia della Gazzera (Imp. complessivo £ 4.400.000.000 vedi n. 22 L. 139/92 esercizio 1993)
2	Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (Tv) COMUNE DI MOGLIANO VENETO	800.000.000	800.000.000	800.000.000	733.359.359	Lavori ultimati
3	Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (Ve) COMUNE DI JESOLO	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.140.984.105	Lavori ultimati. Collaudo in corso.
4	Costruzione della fognatura del Comune di Marcon Villi (Ve) COMUNE DI MARCON	600.000.000	600.000.000	600.000.000	82.233.170	Il Comune di Marcon con nota n. 3067 del 10-2-95 ha chiesto di poter presentare il progetto entro la fine dell'anno
5	Costruzione del collettore consortile da Piove di Sacco all'impianto di depurazione di Codevigo CONSORZIO VALLI PIOVESE	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.313.217.112	Lavori ultimati. Collaudo in corso
6	Costruzione della fognatura di Treporti (Ve) COMUNE DI VENEZIA	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	2.672.031.910	Lavori ultimati
7	Costruzione rete fognaria del Lido V Lotto (Ve) COMUNE DI VENEZIA	3.090.000.000	3.090.000.000	3.090.000.000	3.074.777.797	Lavori ultimati
8	Costruzione impianto idrovoro Canale Scolmatore F. Marzenego CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	2.659.880.988	Lavori ultimati. Il costo totale dell'opera è di 4.700 ml. Vedasi anche intervento relativo alle opere accessorie per £ 1.500 ml (punto 23)
9	Completamento scolmatore bacino S. Giuliano (Ve) COMUNE DI VENEZIA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.992.669.601	Lavori ultimati
10	Costruzione della fognatura del Terraglio (Ve) COMUNE DI VENEZIA	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.158.394.619	Lavori ultimati. Collaudo in corso
11	Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (Ve) II Lotto COMUNE DI VENEZIA	4.100.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000	2.887.959.819	Lavori ultimati. La somma residua di £ 1.160 ml è stata destinata ai lavori della fognatura di Carpenedo L. 910/86 es. 1989 n. 4

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

12	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (Ve) III Lotto COMUNE DI VENEZIA	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	1.124.100.837	Lavori ultimati. Collaudo in corso
13	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (Ve) I Lotto COMUNE DI VENEZIA	4.100.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000	4.023.025.949	Lavori ultimati
14	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (Ve) - XIV Lotto COMUNE DI CHIOGGIA	650.000.000	650.000.000	650.000.000	569.361.501	Lavori ultimati. Collaudo in corso
15	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (Ve) - XI Lotto COMUNE DI CHIOGGIA	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	912.083.961	Lavori ultimati- Collaudo in corso
16	Completamento delle fognature via Torino - Mestre Ve COMUNE DI VENEZIA	1.650.000.000	1.650.000.000	1.650.000.000	1.586.526.731	Lavori collaudati. Approvazione contabilità finale in corso
17	Costruzione della fognatura ed impianto di depurazione di Pelestrina S. Pietro in Volta (Ve) COMUNE DI VENEZIA	1.310.000.000	1.310.000.000	1.310.000.000	-	Con D.G.R. n. 5342 del 8-11-94, il Comune di Venezia è stato autorizzato ha elaborare un nuovo progetto non ancora presentato.
18	Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mestre-Marghera C.C.I.D.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Il finanziamento iniziale era di £ 1.000.000.000. La differenza di £ 460.000.000 è stata recuperata dal finanziamento di £ 7.000.000.000 es. 1987-1988 fognatura di Mestre
19	Fognatura frazioni di Bonisolo e Zerman in Comune di Mogliano Veneto (Tv) COMUNE DI MOGLIANO VENETO	500.000.000	500.000.000	500.000.000	452.212.485	Lavori ultimati
20	Costruzione della rete di fognatura consortile del Mirese - XIV Lotto SUB B (Ve) CONSORZIO DEL MIRESE	400.000.000	400.000.000	400.000.000	344.611.615	Lavori ultimati. Collaudo in corso
21	Completamento funzionale di opere fognarie precedentemente realizzate nel Consorzio del Mirese CONSORZIO DEL MIRESE	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.566.546.236	Lavori ultimati. L'importo complessivo dell'opera è di £ 4.608.149.680, la differenza di £ 8.149.680 è stata assunta dal Consorzio
22	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (Ve) - XVI Lotto COMUNE DI CHIOGGIA	3.650.000.000	3.650.000.000	3.650.000.000	500.000.000	L'impresa ha rescisso il contratto. Perizia approvata in C.T.R.A. voto n. 1994 del 14-7-94. In attesa di nuovo appalto

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

23	Opere accessorie relative all'impianto idrovoro del Canale Scolmatore e ristrutturazione rete di bonifica Favaro Veneto (Ve) CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.610.833.252	Lavori collaudati. Il costo totale dell'opera è di £ 4.700 ml. Vedasi anche costruzione impianto idrovoro per £ 3.200 ml (n. 8)
24	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (Ve) - Opere elettromeccaniche COMUNE DI CHIOGGIA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.459.541.098	Lavori ultimati. Collaudo in corso
25	Costruzione fognatura centro storico di Venezia - stralcio funzionale della Giudecca (Ve) REGIONE VENETO	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	165.390.474	Il Comune di Venezia deve redigere il progetto della fognatura delle aree marginali
26	Interventi di risanamento igienico ed edilizio di Pellestrina e S. Pietro in Volta COMUNE DI VENEZIA	9.500.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000	-	E' stato sottoscritto il programma degli accordi tra Regione e Comune
VALORI TOTALI		58.000.000.000	58.000.000.000	58.000.000.000	38.029.742.619	

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

DISINQUINAMENTO		IMPORTI				
N°	LEGGE 9/10/86 - ESERCIZI 1987-1988	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	NOTE
1	Lavori di costruzione dell'impianto di sollevamento e modulazione del bacino di Zelarino-Mestre (Ve) REGIONE VENETO	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.122.005.069	Lavori collaudati. La somma originaria di £ 3.000.000.000 è stata modificata con deliberazione n. 4650 del 4-10-94
2	Lavori di costruzione dello scolmatore di via del Bosso a Chirignago - Mestre (Ve) REGIONE VENETO	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	3.460.968.170	Lavori in corso. La somma originaria di £ 3.200.000.000 è stata modificata con deliberazione n. 4650 del 4-10-94
3	Lavori di ristrutturazione delle reti fognarie del Cavallino (Ve) REGIONE VENETO	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	3.733.113.914	Lavori in corso. La somma originaria di £ 4.000.000.000 è stata modificata con deliberazione n. 4650 del 4-10-94
4	Lavori di completamento dei sistemi principali di collettamento della rete fognaria di Chiggia (Ve) REGIONE VENETO	9.100.000.000	9.100.000.000	9.100.000.000	8.367.344.110	Lavori finiti
5	Lavori di costruzione rete di fognatura zona di via Martiri di Marzabotto - bacino Gazzera - Mestre (Ve) REGIONE VENETO	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	2.584.790.081	Lavori collaudati. La somma originaria di £ 2.800.000.000 è stata modificata con deliberazione n. 4650 del 4-10-94
6	Lavori di estensione delle reti fognarie secondarie di Chioggia e Sottomarina (Ve) REGIONE VENETO	5.900.000.000	5.900.000.000	5.900.000.000	5.864.952.186	Lavori in corso
7	Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a Sud di Codevigo REGIONE VENETO	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.933.656.729	Lavori finiti
8	Lavori di costruzione dei collettori fognari di collegamento all'impianto di depurazione di Musile di Piave (Ve) REGIONE VENETO	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.165.797.935	Lavori in corso
9	Lavori di costruzione del 1° Lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (Ve) COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	107.437.195	Progetto approvato
10	Lavori di costruzione nuovo impianto di sollevamento nel bacino di via Torino e collegamento bacino di S.Giuliano REGIONE VENETO	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.491.866.125	Lavori collaudati.
11	Lavori di costruzione della rete di fognatura della zona di via Asseggiano - bacino Gazzera (Ve) REGIONE VENETO	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.523.179.616	La somma originaria di £ 1.700.000.000 è stata modificata con deliberazione 4650 del 4-10-94

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

12	Lavori di completamento della fognatura nella zona Nord-Est del Comune di Campagna Lupia (Ve) REGIONE VENETO	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.996.554.950	Lavori ultimati
13	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Chirignago-Mestre (Ve) REGIONE VENETO	2.900.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000	2.481.627.518	Lavori collaudati. La somma originaria di £ 2.900.000.000 è stata modificata con deliberazione n. 4650 del 4-10-94
14	Lavori di costruzione del collettore di via Paleocopa e via Canal Marhera (Ve) COMUNE DI VENEZIA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	209.891.566	Progetto approvato. Appalto in corso. La somma originaria di £ 2.000.000.000 è stata modificata con deliberazione n. 4650 del 4-10-94
15	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Carpenedo-Mestre (Ve) REGIONE VENETO	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.883.298.993	Lavori collaudati. La somma originaria di £ 2.000.000.000 è stata modificata con deliberazione n. 4650 del 4-10-94
16	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia VI Lotto REGIONE VENETO	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	115.260.693	Capogruppo A.T.I. fallita. Contratto in corso di stipulazione con impresa mandante
17	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia VII Lotto COMUNE DI VENEZIA	3.100.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000	242.513.283	Capogruppo A.T.I. fallita. Il progetto è stato rielaborato su richiesta del Comune
18	Lavori di completamento della rete fognaria del bacino di S. Giuliano di Mestre (Ve) REGIONE VENETO	900.000.000	900.000.000	900.000.000	684.296.777	Contabilità finale approvata La somma originaria di £ 900.000.000 è stata modificata con deliberazione n. 4650 del 4-10-94
19	Costruzione della rete secondaria di fognatura di Pellestrina COMUNE DI VENEZIA	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-	Con D.G.R. n. 5342 del 8-11-94 il Comune di Venezia è stato autorizzato a elaborare un nuovo progetto non ancora presentato

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

20	Costruzione della rete di fognatura di S. Marta (Ve) COMUNE DI VENEZIA	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	89.005.091	Il progetto dell'impianto di depurazione è stato bocciato dalla Commissione per la Salvaguardia. Il Comune ha rielaborato il progetto
21	Costruzione della rete fognaria di Quarto d'Altino (Ve) COMUNE DI QUARTO D'ALTINO	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.350.000.000	Lavori in corso.
22	Interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e nere a completamento della fognatura consortile Mestre-Marghera (Ve) C.C.I.D.	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	5.761.005.698	Lavori ultimati. La somma di £460 ml è stata destinata alla copertura del supero di spesa del progetto di Mestre-Marghera (1mlid es. 1984-85-86)
23	Costruzione dell'impianto di depurazione e scarico a mare di Pellestrina (Ve) COMUNE DI VENEZIA	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	0	Con delibera n. 5342 del 8-11-94 il Comune è stato autorizzato ad elaborare un nuovo progetto, non ancora presentato.
24	Redazione del piano direttore REGIONE VENETO	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 255 del 19-12-91
25	Lavori di adeguamento delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione - Reti di Jesolo Lido (Ve) REGIONE VENETO	5.225.000.000	5.225.000.000	5.225.000.000	4.943.105.220	Lavori in corso.
26	Rilievi ed ispezioni televisive della rete fognaria del Comune di Jesolo	195.636.000	195.636.000	195.636.000	97.818.000	Lavori in corso
27	Progetto esecutivo delle opere fognarie di collegamento della zona P.I.P. all'impianto di depurazione (Ve) COMUNE DI JESOLO	310.000.000	310.000.000	310.000.000	155.000.000	Lavori in corso
28	Lavori della fognatura del Comune di Jesolo (Ve) COMUNE DI JESOLO	469.364.000	469.364.000	469.364.000	-	Progetto approvato
29	Lavori di estensione della rete interna ed il collegamento alla rete consortile - Comune di Mira REGIONE VENETO	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	6.323.875.532	Contabilità finale approvata
30	Lavori di telerregolazione e telecontrollo della fognatura di Jesolo - Philips REGIONE VENETO	1.082.814.095	1.082.814.095	1.082.814.095	82.775.316	Lavori in fase di aggiudicazione

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

31	Lavori di adeguamento reti e impianto di depurazione di Jesolo (Ve) - opere civili ed elettromeccaniche REGIONE VENETO	1.006.869.147	1.006.869.147	1.006.869.147	1.006.869.147	Lavori finiti. L'importo totale dei lavori è di 3.800 ml
32	Ispezioni televisive	293.376.629	293.376.629	293.376.629	293.376.629	Lavori finiti. L'importo totale dei lavori è di £ 3.800 ml Vedasi anche intervento opere di teleregolamentazione n. (29)
33	REGIONE VENETO Piano pilota W.R.C. REGIONE VENETO	776.940.129	776.940.129	776.940.129	776.940.129	Lavori finiti
34	Somme per ulteriori interventi COMUNE DI JESOLO	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000	Lavori finiti
	VALORI TOTALI	88.000.000.000	88.000.000.000	83.000.000.000	63.488.325.672	

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

DISINQUINAMENTO		IMPORTI				NOTE
N°		FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	
1	LEGGE 910/86 - ESERCIZIO 1989 Costruzione della rete fognaria di Campagna Lupia (Ve) CONSORZIO DEL MIRESE	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	2.700.000.000	Lavori in corso. Il progetto complessivo di £ 4.290 milioni finanziati con la L. n. 910/86 es. 1989 1 mld e 290 ml sui fondi MESPA-CEE
2	Costruzione vasca di modulazione di Favaro Veneto (Ve) COMUNE DI VENEZIA	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	1.750.000.000	Lavori appaltati.
3	Costruzione della vasca di pioggia del nodo idraulico di Ca' Emiliani - Loc. Rana (Ve) COMUNE DI VENEZIA	7.750.000.000	7.750.000.000	7.750.000.000	735.000.000	Progetto approvato. Appalto in corso
4	Costruzione fognatura di Carpenedo - Mestre (Ve) COMUNE DI VENEZIA	3.750.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000	490.000.000	Lavori appaltati. L'importo del progetto è di £ 4.900 ml cui si farà fronte per £ 3.750 ml con i fondi della L. 910/86 e per 1.160 ml con il recupero del ribasso d'asta
5	Lavori di estensione rete interna e collegamento alla rete consortile - Comune di Mira Il Parte REGIONE VENETO	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	5.803.022.572	Lavori collaudati
6	Costruzione della rete fognaria di Mira - III Fase CONSORZIO DEL MIRESE	14.500.000.000	14.500.000.000	14.500.000.000	7.383.153.150	Lavori in corso
7	Depuratore del Cavallino - Denitro COMUNE DI VENEZIA	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	-	Appalto in corso
8	Fognatura e depurazione del Lido del Cavallino (Ve) COMUNE DI VENEZIA	3.800.000.000	3.800.000.000	-	-	Progetto in redazione
9	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia - Opere elettromeccaniche COMUNE DI CHIOGGIA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1.800.000.000	Lavori in corso
10	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia - Opere civili REGIONE VENETO	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	Lavori finiti

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

11	Fognatura COMUNE DI VENEZIA	S.	Erasmus	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-	E' stato sottoscritto il programma degli accordi tra Regione e Comune
12	Costruzione della rete fognaria della Giudecca (Ve) REGIONE VENETO			3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	Il Comune di Venezia dovrà redigere entro il 1997 il progetto della fognatura delle aree marginali del centro storico
13	Costruzione della rete fognaria di Mira - III Fase Rilievi ed ispezioni televisive collettori fognari CONSORZIO DEL MIRESE			500.000.000	500.000.000	397.045.551		Lavori in corso
VALORI TOTALI				62.000.000.000	62.000.000.000	53.200.000.000	26.058.221.273	

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

DISINQUINAMENTO				IMPORTI		
N°	LEGGE 67/88 - ESERCIZIO 1988	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	NOTE
1	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (Ve)	13.000.000.000	13.000.000.000	-	241.246.665	I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 - depurazione Fusina
COMUNE DI VENEZIA						
2	Completamento dell'impianto di trattamento di Campalto - Opere accessorie	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	1.250.000.000	Lavori in corso.
COMUNE DI VENEZIA						
VALORI TOTALI		15.500.000.000	15.500.000.000	2.500.000.000	1.491.246.665	

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

DISINQUINAMENTO		IMPORTI			NOTE
N°	LEGGE 67/88 - ESERCIZIO 1990	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	
1	Progetto depuratore Fusina COMUNE DI VENEZIA	6.000.000.000	6.000.000.000	-	I fondi originariamente dati alla filtrazione di Fusina, sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 Il fase - progetto Fusina I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 - depurazione Fusina Lavori in corso.
2	Ampliamento delle fognature del Cavallino (Ve) COMUNE DI VENEZIA	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	5.006.560.379
3	Ampliamento delle fognature di Pellestrina (Ve) COMUNE DI VENEZIA	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
4	Ampliamento della rete di fognatura di Musile di Piave (Ve) COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	1.505.070.836
5	Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (Pd) COMUNE DI CODEVIGO	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	2.768.220.073
6	Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (Ve) CONSORZIO DEL MIRESE	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	762.635.986
7	Aggiornamento piano direttore - Seconda fase - Monitoraggio dei corsi d'acqua sfocianti in Laguna REGIONE VENETO	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1.816.273.373
8	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino (Ve) COMUNE DI QUARTO D'ALTINO	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	2.500.000.000
					Lavori in corso

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

9	Ampliamento delle fognature del Lido di Venezia COMUNE DI VENEZIA	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	3.000.000.000	Lavori in corso
10	Riabilitazione funzionale delle fognature del centro storico di Venezia U.L.S.S. N. 16 - VENEZIA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	Lavori in corso
11	Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (Ve) COMUNE DI CHIOGGIA	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	110.000.000	Progetto approvato. L'importo complessivo di £ 15.500 mld prevede anche il completamento fognario di Tombola e Sottomarina per £ 14.400 mld
12	Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo-Bissuola COMUNE DI VENEZIA	12.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	1.368.148.536	I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Campalto. Progettazione in corso
13	Ampliamento impianto di depurazione del Comune di Musile di Piave (Ve) REGIONE VENETO	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	Progetto approvato. Importo complessivo £ 2.400 mld (vedi L. 910/86 esercizio 1987-1988 n.9)
14	Ampliamento della rete fognaria di via Bafle in Comune di Jesolo (Ve) COMUNE DI JESOLO	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	4.972.796.286	Lavori in corso
15	Costruzione della vasca di accumulo acque meteoriche di piazzale Giannacchi Marghera (Ve) COMUNE DI VENEZIA	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	4.000.000.000	Lavori in corso
16	Razionalizzazione della rete fognaria di Marghera (Ve) COMUNE DI VENEZIA	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	3.500.000.000	Lavori in corso
17	Rilievi ed ispezioni televisive - Il stralcio COMUNE DI JESOLO	195.636.000	195.636.000	195.636.000	-	Progetto approvato

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

18	Interventi presso l'impianto di depurazione e gli sfioratori di piena COMUNE DI JESOLO	2.212.524.000	2.212.524.000	2.212.524.000	-	Progetto approvato
19	Analisi chimiche sui liquami in fognatura e nell'impianto COMUNE DI JESOLO	91.840.000	91.840.000	91.840.000	59.500.000	Il costo totale dell'intervento è di £ 119.000.000 Vedi anche schede n 14 - 17 - 18
20	Ristrutturazione collettore Acque Basse I lotto CONSORZIO DESE SILE	12.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	436.152.908	I fondi sono stati riallocati con la II fase degli interventi della L. 139/92 - progetto Campalto.
21	Completamento della rete fognaria della Tombola e Sottomarina (Ve) COMUNE DI CHIOGGIA	14.400.000.000	14.400.000.000	14.400.000.000	7.224.640.499	Lavori in corso
	VALORI TOTALI	104.500.000.000	104.500.000.000	95.500.000.000	40.216.861.603	

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

DISINQUINAMENTO		IMPORTI				NOTE
N°	LEGGE 67/88 - ESERCIZIO 1991	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	
1	Completamento della fognatura di Mestre - Area Ovest COMUNE DI VENEZIA	7.600.000.000	7.600.000.000	7.600.000.000	760.000.000	Lavori in corso
2	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia ENTE DI BACINO RSU VENEZIA 2	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	-	L'importo complessivo è di £ 78.252 ml finanziato con £ 35.331 ml con i fondi FIO, £ 6.500 ml sulla L. 360/91 (n. 1), £ 13.000 ml sulla L. 67/88 esercizio 1991, £ 1.800 ml sulla L. 139/92 (n. 43), £ 5.700 sulla L. 539/95 es 1997 (n. 1)
3	Impianto di depurazione di Pellestrina (Ve) COMUNE DI VENEZIA	500.000.000	500.000.000	-	-	Con D.G.R. n. 5342 del 8-11-94, il Comune di Venezia è stato autorizzato ha elaborare un nuovo progetto non ancora presentato
4	Fognatura di Meolo (Ve) COMUNE DI MEOLO	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	900.000.000	Lavori in corso
5	Fognatura di Chioggia (Ve) COMUNE DI CHIOGGIA	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	400.000.000	Progetto approvato
6	Sistema informativo regionale - Nodo Laguna REGIONE VENETO	500.000.000	500.000.000	500.000.000	31.000.000	In attesa individuazione soggetto attuatore
7	Impianto di Vigonza (Pd) CONSORZIO FOGNATURA ACQUEDOTTO DEL TERGOLA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	Importo complessivo £ 14.600 ml vedi L. 139/92 - esercizio 1993 (n.6)
8	Interventi nel settore della zootecnica dell'alta padovana CONSORZIO FOGNATURA ACQUEDOTTO DEL TERGOLA	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-	Vedi L. 139/92 - esercizio 1993 (n. 5)
VALORI TOTALI		30.600.000.000	30.600.000.000	25.100.000.000	2.091.000.000	

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

N°	LEGGE 67/88 - ESERCIZIO 1992 - I Fase	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	NOTE
1	Realizzazione di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature	8.000.000.000	8.000.000.000	-	-	Progettazione in corso.
CONSORZIO DEL MIRESE						
2	Realizzazione di collettori fognari e depurazione nell'area Sud del Piovese CONSORZIO VALLI PIOVESE	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	1.639.982.105	Lavori in corso
3	Fognature in Comune di Cavarzere COMUNE DI CAVARZERE	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	990.000.000	Lavori in corso
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione - III Lotto COMUNE DI CAVARZERE	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	140.000.000	Progetto approvato
5	Progetto di rifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana Fognatura di Chioggia (Ve) COMUNE DI VENEZIA	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	1.119.745.284	Lavori in corso. I fondi sono stati riallocati con PCR n. 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 - progetto Lusore.
6	Potenziamento dell'impianto di sollevamento Rana e costruzione di un modulo di sedimentazione COMUNE DI VENEZIA	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-	Progettazione in corso
7	Impianto idroforo a servizio del Canale Scolmatore - Il Stralcio CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	5.400.000.000	Lavori in corso
VALORI TOTALI		29.700.000.000	29.700.000.000	17.200.000.000	9.289.727.389	

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

N°	LEGGE 67/88 - ESERCIZIO 1992 - II Fase	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	NOTE
1	Progetto integrato depurazione Fusina REGIONE VENETO	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	I fondi originariamente destinati all'impianto del Mirese sono stati riallocati con PCR n.1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Fusina
2	Quota regionale agenzia per Venezia REGIONE VENETO	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-	In attesa costituzione Agenzia per Venezia
3	Progetto integrato depurazione Fusina REGIONE VENETO	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Fusina e progetto Lusore
4	Sistemazione del Fiume Marzenego "Ramo Beccherie" nel centro di Mestre COMUNE DI VENEZIA	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	-	Progetto approvato
5	Impianto di depurazione di Onara CONSORZIO ALTA SERVIZI - Cittadella	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	1.200.000.000	Lavori in corso.
6	Collettore fognario Ovest Fontaniva-Cittadella-Tombolo CONSORZIO ALTA SERVIZI - Cittadella	5.100.000.000	5.100.000.000	5.100.000.000	4.590.000.000	Lavori in corso
	VALORI TOTALI	60.000.000.000	60.000.000.000	20.000.000.000	5.790.000.000	

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

N° L. 360/91	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZAT	EROGATO	NOTE
1 Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia ENTE DI BACINO R.S.U.VE2	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	6.394.123.516	L'importo complessivo dell'opera è di £ 78.252 ml finanziati con 35.331 ml con i fondi FIO, 13.000 ml sulla L. 67/88 es. 1991 (3), £ 6.500 ml sulla L. 360/91, £ 18.000 sulla L. 139/92 es. 1993 (43) e 5.700 ml sulla L. 539/95 (1)
2 Progetto pilota del bacino del Marzenego	2.500.000.000	-	-	-	In attesa individuazione soggetto attuatore.
3 Bonifica della discarica di rifiuti Marghera (Ve)	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	Il Comune di Venezia doveva presentare il progetto nel 1991
COMUNE DI VENEZIA					
4 Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S.Giuliano (Ve) - Bonifica discarica di S.Giuliano	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	Il Comune di Venezia ha chiesto di integrare il finanziamento con l'ulteriore importo di £ 6.000 ml
COMUNE DI VENEZIA					
5 Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S.Giuliano (Ve) - Bosco di Mestre - Il stralcio	877.000.000	877.000.000	877.000.000	420.798.055	Lavori in corso
AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE					
6 Progetto per la realizzazione del Bosco di Mestre - Il stralcio	793.400.000	793.400.000	793.400.000	-	Progetto approvato
AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE					
6 Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S.Giuliano (Ve) - Bosco di Mestre - Il stralcio	1.329.600.000	1.329.600.000	-	-	Il Comune di Venezia deve individuare le aree per il bosco
AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE					
VALORI TOTALI	16.000.000.000	13.500.000.000	8.170.400.000	6.814.921.571	

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

N° L. 139/92 - ESERCIZIO 1993	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	NOTE
1 Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Appalto A	15.650.000.000	15.650.000.000	15.650.000.000	1.782.039.429	Lavori in corso
CONSORZIO FOGNATURA ACQUEDOTTO TERGOLA					
2 Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Appalto B	15.650.000.000	15.650.000.000	15.650.000.000	6.816.042.737	Lavori in corso
CONSORZIO FOGNATURA ACQUEDOTTO TERGOLA					
3 Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza	12.600.000.000	12.600.000.000	12.600.000.000	5.334.899.490	Lavori in corso. Importo complessivo £ 14.600 ml vedi L. 67/88 - esercizio 1991 (1)
CONSORZIO FOGNATURA ACQUEDOTTO TERGOLA					
4 Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero	8.400.000.000	8.400.000.000	8.400.000.000	270.374.020	Il Consorzio ha chiesto di modificare il progetto per realizzare un impianto polivalente per trattamento acque RSU e reflui zootecnici. Necessita di incremento finanziario vedi L. 67/88 es. 1991 (2)
CONSORZIO FOGNATURA ACQUEDOTTO TERGOLA					
5 Progetto del collettore di collegamento della rete di Loreggia al depuratore di Camposampiero XV Lotto	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.357.665.676	Lavori in corso
CONSORZIO FOGNATURA ACQUEDOTTO TERGOLA					
6 Collegamento della rete di Borgorico a Villanova di Camposampiero	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	987.920.147	Lavori in corso
CONSORZIO FOGNATURA ACQUEDOTTO TERGOLA					
7 Completamento fognatura nera in Comune di Noale	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.072.041.702	Lavori in corso
CONSORZIO DEL MIRESE					
8 Completamento fognatura nera in Comune di Salzano	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.382.777.648	Lavori finiti
CONSORZIO DEL MIRESE					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

9	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Martellago	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	1.148.047.386	Lavori in corso
	CONSORZIO DEL MIRESE					
10	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Scorzé	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	1.849.967.405	Lavori in corso
	CONSORZIO DEL MIRESE					
11	Vasca di pioggia di Noale	700.000.000	700.000.000	700.000.000	23.760.444	Progetto approvato
	CONSORZIO DEL MIRESE					
12	Ristrutturazione dei collettori di via Torino	9.200.000.000	9.200.000.000	9.200.000.000	1.020.806.481	Lavori appaltati
	COMUNE DI VENEZIA					
13	Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano	5.800.000.000	5.800.000.000	5.800.000.000	762.206.091	Lavori appaltati
	COMUNE DI VENEZIA					
14	Completamento della rete di fognatura della zona del Terraglio	5.700.000.000	5.700.000.000	5.700.000.000	1.493.109.202	Lavori in corso
	COMUNE DI VENEZIA					
15	Estensione della rete di fognatura nella zona di Marghera	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000	1.764.921.957	Lavori in corso
	COMUNE DI VENEZIA					
16	Completamento della fognatura nella zona della Gazzera-Mestre	3.900.000.000	3.900.000.000	3.900.000.000	643.474.135	Lavori in corso
	COMUNE DI VENEZIA					
17	Ristrutturazione della fognatura della zona di Cipressina-Mestre	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	158.940.306	Lavori in corso
	COMUNE DI VENEZIA					
18	Ricostruzione della fognatura di via S. Donà - bacino Carpenedo	7.200.000.000	7.200.000.000	7.200.000.000	251.998.067	Lavori in corso
	COMUNE DI VENEZIA					
19	Ricostruzione della fognatura della zona di via Silvio Trentin	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	205.316.417	Lavori in corso
	COMUNE DI VENEZIA					
20	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Veneto	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	589.370.330	Lavori in corso
	COMUNE DI VENEZIA					

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

21	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Campalto e Tessera COMUNE DI VENEZIA	3.400.000.000	3.400.000.000	-	-	Progetto in fase di redazione
22	Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto COMUNE DI VENEZIA	14.000.000.000	14.000.000.000	372.561.635	20.000 ml vedi L. 139/92 Il fase (8)	Progetto approvato. Importo complessivo £ 20.000 ml vedi L. 139/92 Il fase (8)
23	Risanamento fognario della zona di Carpenedo COMUNE DI VENEZIA	9.600.000.000	9.600.000.000	213.654.844	Lavori in corso	Lavori in corso
24	Completamento della rete di fognatura di Malcontenta COMUNE DI VENEZIA	3.500.000.000	3.500.000.000	197.756.572	Lavori in corso	Lavori in corso
25	Ricostruzione reti di fognatura nella zona del centro urbano di Mestre COMUNE DI VENEZIA	3.700.000.000	3.700.000.000	171.206.194	Lavori in corso	Lavori in corso
26	Vasca di pioggia della Gazzera COMUNE DI VENEZIA	3.400.000.000	3.400.000.000	-	Importo complessivo £ 4.400 ml vedi L. 798/84 es. 1984-1985-1986 (1). Progetto in istruttoria	Importo complessivo £ 4.400 ml vedi L. 798/84 es. 1984-1985-1986 (1). Progetto in istruttoria
27	Interventi alle fognature del Consorzio del Mirese CONSORZIO DEL MIRESE	7.880.000.000	7.880.000.000	-	Progettazione in corso	Progettazione in corso
28	Ispezione televisiva di condotte fognarie nei comuni di Dolo e Spinea CONSORZIO DEL MIRESE	620.000.000	620.000.000	-	Progetto approvato	Progetto approvato
29	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Mirano CONSORZIO DEL MIRESE	6.500.000.000	6.500.000.000	4.201.648.566	Lavori in corso	Lavori in corso
30	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di S.Maria di Sala CONSORZIO DEL MIRESE	2.500.000.000	2.500.000.000	1.659.729.504	Lavori in corso	Lavori in corso
31	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Vigonovo CONSORZIO DEL MIRESE	2.500.000.000	2.500.000.000	2.023.757.728	Lavori in corso	Lavori in corso
32	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Strà CONSORZIO DEL MIRESE	3.000.000.000	3.000.000.000	1.666.899.436	Lavori in corso	Lavori in corso

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

33	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Fiesco d'Artico CONSORZIO DEL MIRESE	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	1.986.219.743	Lavori in corso
34	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Dolo CONSORZIO DEL MIRESE	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	2.653.665.010	Lavori in corso
35	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Pianiga CONSORZIO DEL MIRESE	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.752.021.222	Lavori in corso
36	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Campolongo Maggiore CONSORZIO DEL MIRESE	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.912.957.019	Lavori in corso
37	Interventi alle fognature nel Comune di Spinea - I stralcio CONSORZIO DEL MIRESE	4.950.000.000	4.950.000.000	4.950.000.000	918.533.428	Lavori in corso
38	Interventi alle fognature nel Comune di Spinea - II stralcio CONSORZIO DEL MIRESE	6.550.000.000	6.550.000.000	6.550.000.000	4.761.140.686	Lavori in corso
39	Interventi alle fognature nel Comune di Camponogara CONSORZIO DEL MIRESE	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.367.414.205	Lavori in corso
40	Interventi alle fognature nel Comune di Fossò CONSORZIO DEL MIRESE	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.320.826.260	Lavori in corso
41	Progetto integrato escavo rii COMUNE DI VENEZIA	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	6.907.481.031	Lavori in corso
42	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia ENTE DI BACINO RSU VENEZIA 2	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	17.999.999.998	Lavori in corso
43	Interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua	2.000.000.000	-	-	-	In attesa individuazione soggetto attuatore
44	Interventi alle fognature di Quarto d'Altino COMUNE DI QUARTO D'ALTINO	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	766.715.116	Appalto in corso
45	Fognature di Pellestrina COMUNE DI VENEZIA	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-	Progettazione in corso
46	Fognature del Lido COMUNE DI VENEZIA	9.000.000.000	9.000.000.000	-	-	Progettazione in corso

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

47	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Est - Ca' di Valle COMUNE DI VENEZIA	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	633.713.013	Lavori in corso
48	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Ovest - Ca' Savio COMUNE DI VENEZIA	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	209.402.671	Lavori in corso
49	Sistemazione idraulico-ambientale di Piove di Sacco COMUNE DI PIOVE DI SACCO	3.117.332.477	3.117.332.477	3.117.332.477	1.765.095.167	Lavori in corso
50	Ampliamento rete fognaria COMUNE DI PIOVE DI SACCO	3.882.667.523	3.882.667.523	3.882.667.523	2.801.310.548	Lavori in corso
51	Sistemazione idraulico-ambientale area Brenta-Bacchiglione CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA-BACCHIGLIONE	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	1.768.205.704	Lavori in corso
52	Completamento impianto di depurazione di Codevigo CONSORZIO VALLI PIOVESE	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	2.905.366.020	Lavori in corso
53	Fognature di Chioggia COMUNE DI CHIOGGIA	8.950.000.000	8.950.000.000	8.950.000.000	1.746.153.098	Lavori in corso
54	Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acqua salata nella rete di fognatura COMUNE DI CHIOGGIA	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	277.687.867	Lavori in corso
55	Opere di completamento della fognatura comunale COMUNE DI MOGLIANO VENETO	5.719.312.000	5.719.312.000	5.719.312.000	1.051.885.858	Lavori in corso
56	Monitoraggio e telerilevamento impianti di sollevamento COMUNE DI MOGLIANO VENETO	280.688.000	280.688.000	280.688.000	130.393.605	Lavori in corso
57	Fognatura di Monselice COMUNE DI MONSELICE	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4.519.027.355	Lavori in corso
58	Fognatura nel comune di Arqua Petrarca COMUNE DI ARQUA PETRARCA	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	949.271.710	Lavori in corso

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

59	Intervento di diversione idraulica CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE	8.900.000.000	8.900.000.000	8.900.000.000	1.050.413.170	Lavori in corso
60	Lavoro di incremento degli invasi CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE	13.500.000.000	13.500.000.000	13.500.000.000	-	Progetto approvato. Appalto in corso
61	Lavori di monitoraggio e telecontrollo CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	-	Progetto approvato
62	Estensione rete agrometeorologica C.S.I.M. TEOLO - REGIONE VENETO	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	995.629.837	Lavori in fase di ultimazione
	VALORI TOTALI	350.000.000.000	348.000.000.000	320.320.000.000	104.573.422.890	

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

N° L. 139/92 - II FASE	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	NOTE
1 Progetto integrato Fusina - Ricalibratura a Est e sottopasso del Naviglio CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA	3.200.000.000	3.200.000.000	-	-	Progetto in fase di redazione
2 Progetto integrato Fusina - Ricalibratura canali di bonifica (Bastie, Foscara e Giare) e potenziamento impianto idrovoro CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	Progetto in fase di redazione
3 Progetto integrato Fusina	1.800.000.000	-	-	-	Progetto in fase di redazione
4 Progetto Fusina: Completamento della rete fognaria e relativi allacciamenti nell'area Mestre-Gazzera e Mestre-Malcontenta COMUNE DI VENEZIA	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-	Progetto in fase di redazione
5 Progetto Lusore: Ricalibratura e rinaturalizzazione della rete minore di bonifica interessata dagli apporti di acque urbane bianche CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-	Progetto in fase di redazione
6 Progetto Fusina: Invasi di laminazione e sedimentazione in aree depresse per circa Ha 30 con sistemazione a parco e con restituzione all'idrovoro di Malcontenta CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	Progetto in fase di redazione
7 Progetto Fusina: Vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3 COMUNE DI VENEZIA	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-	Progetto in fase di redazione

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

8	Progetto Fusina: Spese di gestione riferite all'intero progetto	500.000.000	-	-	-	Progetto in fase di redazione
9	Progetto Campalto: Ampliamento dell'impianto di Campalto	6.000.000.000	6.000.000.000	-	-	Progetto in fase di redazione complessivo £ 20.000ml finanziato con 14.000 ml sulla L. 139/92 I fase (18)
10	COMUNE DI VENEZIA Progetto Campalto: Adeguamento della rete principale di via Torino e interconnessione con la rete di Mestre	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-	Progetto in fase di redazione
11	COMUNE DI VENEZIA Progetto Campalto: Costruzione del I tronco del collettore Acque Basse	15.500.000.000	15.500.000.000	-	-	Progetto in fase di redazione
12	CONSORZIO DESE SILE Progetto Campalto: Costruzione tronco di interconnessione tra il collettore Acque Basse ed i bacini di via Torino e S.Giuliano	6.000.000.000	6.000.000.000	-	-	Progetto in fase di redazione
13	COMUNE DI VENEZIA Progetto Campalto: Regolazione dei flussi di piena e di trattamento acque di pioggia a S.Giuliano	8.000.000.000	8.000.000.000	-	-	Progetto in fase di redazione
14	COMUNE DI VENEZIA Progetto Campalto: Rilezionamento del canale di interconnessione tra gli impianti di Campalto e dello Scolmatore Marzenego	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-	Progetto in fase di redazione
15	CONSORZIO DESE SILE Progetto Campalto: Spese di gestione riferite all'intero progetto	500.000.000	-	-	-	Progetto in fase di redazione
16	Collettore Campretto-Loveri nel comune di S. Martino di Lupari	4.050.000.000	4.050.000.000	4.050.000.000	178.286.549	Progetto approvato
17	CONSORZIO ALTA SERVIZI Adeguamento strutture fognarie: Fognatura area Sud di S.Martino di Lupari e collegamento al depuratore di Onara	4.250.000.000	4.250.000.000	4.250.000.000	166.464.000	Progetto approvato
	CONSORZIO ALTA SERVIZI					

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

18	Adeguamento strutture fognarie: Miglioramento reti secondarie nei comuni di Legnago e S. Angelo di Piove CONSORZIO ACQUEDOTTO VALLI PIOVESE	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	299.013.660	Progetto approvato
19	Adeguamento strutture fognarie: Progetto esecutivo per il disinquinamento area Sud CONSORZIO ACQUEDOTTO VALLI PIOVESE	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	315.906.482	Lavori in corso
20	Adeguamento strutture fognarie: Lavori in località Samperi in Comune di Piove di Sacco CONSORZIO ACQUEDOTTO VALLI PIOVESE	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	97.328.542	Progetto approvato
21	Opere fognarie: Realizzazione di opere fognarie relativi a tratti secondari e terminali delle reti fognarie del Comune di Venezia COMUNE DI VENEZIA	6.700.000.000	-	-	-	Progetto in fase di redazione
22	Normativa e regolamentazioni, istituzione di incentivi	500.000.000	-	-	-	
23	Settore agricolo: Potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto C.S.I.M. TEOLO - REGIONE VENETO	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	1.204.423.617	Attività in corso
24	Settore agricolo: Potenziamento del centro agrochimico della Regione Veneto E.S.A.V.	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	500.000.000	Lavori in corso
25	Interventi strutturali: Gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole - I lotto	30.000.000.000	-	-	-	Adottata DGR per avviare le attività
26	Escavo rii nel centro storico di Venezia COMUNE DI VENEZIA	32.000.000.000	32.000.000.000	-	-	Elaborato il piano programma degli interventi
27	Protezione zootecnica: Gestione reflui zootecnici	13.000.000.000	-	-	-	Adottata DGR per avviare le attività
28	Protezione zootecnica: Interventi strutturali in zootecnica	40.000.000.000	-	-	-	Adottata DGR per avviare le attività

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

29	Monitoraggio e controllo rete: Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna	12.000.000.000	-	-	-	-	-
30	Interventi strutturali: Ricalibrazione e sostegni sui sottobacini dei fiumi Dese e Zero CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE	30.000.000.000	30.000.000.000	-	-	-	Elaborato il piano programma degli interventi
31	Interventi strutturali: Ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Marzenego CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE	15.000.000.000	15.000.000.000	-	-	-	Progetto in fase di redazione
32	Interventi strutturali: Ricalibrazione e sostegni sui rii Barbigara, Rebosola e S.Silvestro CONSORZIO DI BONICA ADIGE-BACCHIGLIONE	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-	Progetto in fase di redazione
33	Interventi strutturali: Estensione del sistema di telecontrollo a tutto il bacino scolante	7.000.000.000	-	-	-	-	-
34	Interventi strutturali: Diversione delle acque di piena del Tergola (sostegno di Torre di Burri)	4.000.000.000	-	-	-	-	-
35	Interventi strutturali: Diversione delle acque di piena del Fiumicello (idrovora Cambroso) CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE-BRENTA	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	-	Progetto in fase di redazione
36	Filodepurazione estuaria sul Canale Vela	10.500.000.000	-	-	-	-	-
37	Integrazione di rete civile e rete di bonifica - Monselice CONSORZIO DI BONICA ADIGE-BACCHIGLIONE	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-	-	Progetto in fase di redazione
38	Regolazione intramissioni da Sile, Brenta e Nodo Castelfranco	2.000.000.000	-	-	-	-	-
39	Gestione acque di magra del Brenta-Bacchiglione-Leb	1.000.000.000	-	-	-	-	-
VALORI TOTALI		320.000.000.000	197.200.000.000	-	-	2.761.422.850	-

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

N°	L. 539/95 - ESERCIZIO 1996	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZAT	EROGATO	NOTE
1	Opere fognarie: Realizzazione di opere fognarie relativi a tratti secondari del Consorzio del Tergola	3.350.000.000	3.350.000.000	-	-	Progetto in fase di redazione
2	Ampliamento rete fognaria comunale di Borgoricco	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-	Progetto approvato
3	Ampliamento rete fognaria comunale di Massanzago	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	Progetto approvato
4	Opere fognarie: Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari del Comune di Chioggia	9.500.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000	-	Progetto approvato
5	Opere fognarie: Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari del Consorzio del Mirese	4.900.000.000	4.900.000.000	-	-	Progetto in fase di redazione
6	Opere fognarie: Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari nel Consorzio del Piovese	8.600.000.000	8.600.000.000	-	-	Progetto in fase di redazione
7	Escavo dei ril del Centro Storico di Venezia	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	Elaborato il piano programma degli interventi
	COMUNE DI VENEZIA	30.000.000.000	30.000.000.000	10.150.000.000	-	
	VALORI TOTALI					

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

N. L. 539/95 - ESERCIZIO 1997	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	NOTE
1 Completamento impianto R.S.U. di Venezia	5.700.000.000	5.700.000.000	-	-	L'importo complessivo è di £ 78.252 ml finanziato con 35.331 ml con i fondi FIO, £ 6.500 ml sulla L. 360/91 (1), £ 13.000 ml sulla L. 67/88 es. 1991 (3) £ 18.000 sulla L. 139/92 (44) e 5.700 ml sulla L. 539/95 es. 1997 (1)
2 Collegamento fognario Galzignano-Battaglia Terme COMUNE DI BATTAGLIA TERME	670.000.000	670.000.000	-	-	
3 Adeguamento depuratore di Battaglia Terme COMUNE DI BATTAGLIA TERME	830.000.000	830.000.000	-	-	
4 Fognatura di Cittadella, Fontaniva, Tombolo e San Martino di Lupat CONSORZIO ALTA SERVIZI	3.200.000.000	3.200.000.000	-	-	
5 Collegamento delle fognature di Villa del Conte all'impianto di Camposampiero CONSORZIO DEL TERGOLA	4.300.000.000	4.300.000.000	-	-	
6 Progetto definitivo dell'impianto elettrico del depuratore di Val Da Rìo COMUNE DI CHIOGGIA	620.000.000	620.000.000	620.000.000	-	Progetto approvato
7 Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento ed ammodernamento della linea "Plechi" del depuratore di Val Da Rìo COMUNE DI CHIOGGIA	230.000.000	230.000.000	230.000.000	-	Progetto approvato
8 Lavori di miglioramento ed ammodernamento dell'impianto di depurazione di Val da Rìo COMUNE DI CHIOGGIA	1.950.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000	-	Progetto approvato

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

9	Progetto integrato ri- COMUNE DI VENEZIA	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	
10	Riabilitazione fognatura del Comune di Marcon COMUNE DI MARCON	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	Progetto in fase di redazione
11	Ampliamenti delle reti di fognatura potenziamento impianto di depurazione di Cadoneghe e realizzazione imp. di compostaggio CONSORZIO TERGOLA	30.000.000.000	30.000.000.000	-	-	
VALORI TOTALI		53.500.000.000	53.500.000.000	2.800.000.000	-	

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

N°	L.515/96 - ESERCIZIO 1997	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	NOTE
1	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Arquà Petrarca COMUNE DI ARQUA' PETRARCA	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-	Progetto approvato
2	Ampliamento dello schema fognario della zona del Conselvano CENTRO VENETO SERVIZI	11.500.000.000	11.500.000.000	-	-	
3	Ampliamento della rete fognaria del bacino scolante in Laguna ed appartenente al Consorzio Alta Servizi CONSORZIO ALTA SERVIZI	2.300.000.000	2.300.000.000	-	-	
4	Progetto della costruzione reti fognarie nei comuni di Cittadella e Fontaniva CONSORZIO ALTA SERVIZI	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	0	Progetto approvato
5	Ampliamento delle reti di fognatura e del sistema depurativo nel territorio del Consorzio del Piovese CONSORZIO DEL PIOVESE	15.000.000.000	15.000.000.000	-	-	
6	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Este COMUNE DI ESTE	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-	
7	Ampliamento della rete fognaria nel comune di Gaizignano COMUNE DI GALZIGNANO	1.200.000.000	1.200.000.000	-	-	
8	Ampliamento della rete fognaria nel comune di Battaglia Terme COMUNE DI BATTAGLIA TERME	1.100.000.000	1.100.000.000	-	-	
9	Ampliamento della rete fognaria in comune di Monselice COMUNE DI MONSELICE	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-	
10	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nordio in comune di Padova COMUNE DI PADOVA	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-	

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

11	Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione in comune di Castelfranco Veneto, località Salvatronda COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	2.800.000.000	2.800.000.000	-	-	-
12	Ampliamento della rete fognaria in comune di Mogliano Veneto COMUNE DI MOGLIANO VENETO	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-	-
13	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione comunale in comune di Monastier COMUNE DI MONASTIER	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	-
14	Ampliamento della rete fognaria e realizzazione l'istralcio dell'impianto di depurazione comunale in comune di San Biagio di Callalta COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	-
15	Ampliamento della rete fognaria e completamento del costuendo impianto di depurazione comunale in comune di Zero Branco COMUNE DI ZERO BRANCO	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	-
16	Ampliamento della rete fognaria in comune di Cavarzere COMUNE DI CAVARZERE	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	-
17	Ampliamento della rete fognaria e interventi sugli impianti di depurazione comunale in comune di Chioggia COMUNE DI CHIOGGIA	19.593.954.020	19.593.954.020	-	-	-
18	Progetto di riqualificazione edilizia della linea "Picchi" del Depuratore di Val Da Rio COMUNE DI CHIOGGIA	406.045.980	406.045.980	406.045.980	-	Progetto approvato
19	Miglioramento della efficienza dello scarico delle reti fognarie CONSORZIO DI BONIFICA BASSO PIAVE	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-	-

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

20	Ampliamento ed ottimizzazione delle reti fognarie del Consorzio del Mirese CONSORZIO DEL MIRESE	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-
21	Ampliamento della rete fognaria in comune di Meolo COMUNE DI MEOLO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
22	Completamento funzionale dell'impianto di depurazione comunale COMUNE DI MUSILE	400.000.000	400.000.000	-	-
23	Realizzazione di un parco ecologico - bacino di lagunaggio in comune di Noale COMUNE DI NOALE	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-
24	Ristrutturazione della rete fognaria di complessi ospedalieri (ospedale civile e G.B. Giustiniani) U.L.S.S. N° 11 VENEZIA	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
25	Ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria in comune di Venezia COMUNE DI VENEZIA	53.000.000.000	53.000.000.000	-	-
26	Bonifica siti inquinati in comune di Venezia - Zona industriale di Marghera COMUNE DI VENEZIA	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
27	Potenziamento della rete di telerilevamento agrometeorologica C.S.I.M.	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
28	Progetto scavo ri COMUNE DI VENEZIA	23.000.000.000	23.000.000.000	-	-
VALORI TOTALI		200.000.000.000	200.000.000.000	6.606.045.980	-

PAGINA BIANCA

PROVINCIA
DI VENEZIA

Mestre, 18 marzo 1998

Resp. Proc.: Ing. C. Carlon

Prot. 12036/98

OGGETTO: Stato di attuazione degli interventi finanziati ai sensi della Legge Speciale per Venezia e successive integrazioni.

Al Sig. Presidente
Magistrato alle Acque
Venezia

In riferimento alla Sua del 19.12.97, effettuati i necessari riscontri contabili, in allegato trasmetto l'elaborato che dà cognizione degli impegni e delle spese sostenute per la conservazione ed il risanamento del patrimonio monumentale di competenza di Venezia e Chioggia, attingendo ai fondi della Legge Speciale per Venezia nelle due successive edizioni.

E' da rilevare che gli impegni si riferiscono ai progetti esecutivi approvati ed in corso di esecuzione per un importo di L. 41.498.171.000.= e che questa Amministrazione ha già provveduto all'approvazione anche dei progetti preliminari di buona parte degli interventi, per una spesa preventivata di ulteriori L. 58.880.000.000.= (i relativi progetti esecutivi sono stati commissionati e sono in avanzata fase di definizione).

Gli importi ancora disponibili ammontano complessivamente a L. 38.163.317.569.=, che questa Amministrazione, conformemente alle indicazioni di bilancio, intende utilizzare: a) per L. 12.000.000.000.= relativamente al completamento delle opere di restauro e riqualificazione funzionale di S. Servolo;

b) per L. 8.000.000.000.= per il restauro e la ristrutturazione (norme di sicurezza) di Palazzo Corner, sede di Provincia e Prefettura e per l'adeguamento alle norme di sicurezza di Palazzo Ziani-Buttaro e Donà Balbi, sedi di importanti uffici pubblici;

c) per L. 8.000.000.000.= per la realizzazione di importanti infrastrutture scolastiche nella città di Chioggia;

d) per la residua somma di L. 10.163.317.000.= per gli adeguamenti alle vigenti normative funzionali e di sicurezza delle scuole trasferite dallo Stato e dai Comuni ai sensi della Legge 23/96.

Relativamente ai punti a), b) e c), i progetti preliminari sono stati commissionati e sono in fase ultimativi di redazione, mentre per il punto d) saranno redatti a breve termine, una volta concluse le procedure relative ai trasferimenti delle competenze.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	OGGETTO	FINANZIAMENTO	PROGETTI	IMPEGNATO	RESIDUO	PRO
21.4418.00	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI L. 139/92 - BENEDETTI - SARPI - ALGAROTTI - PAL. TESTA	I.M.I. (25.000.000.000)	98.000.000	20.000.000 20.000.000 20.000.000	38.000.000 0	
	ACCANTONAMENTO FONDO - BENEDETTI					
	ACCANTONAMENTO FONDO - SARPI					
	ACCANTONAMENTO FONDO - ALGAROTTI					
	RESIDUO DA ASSEGNARE					
	IMPORTI LIQUIDATI					
	RESIDUO DA LIQUIDARE				98.000.000	
21.4418.00	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI L. 139/92 - S.SERVOLLO	I.M.I. (25.000.000.000)	8.481.959.849	750.000.000 41.650.000 29.750.000 4.621.500.000 414.004.058 31.000.000 1.155.000.000 50.396.500 8.082.238		61673/95 36996/94
	ACCANTONAMENTO FONDO					
	MORETTO LUCIANO					
	MORETTO LUCIANO					
	SCHIAVINA-MORAS					54973/95
	SCHIAVINA-MORAS					24892/96
	SCHIAVINA-MORAS					24892/96
	SCHIAVINA-MORAS					24898/96
	SERVICE GRAFICO					34681/94
	SERVICE GRAFICO					32714/95
	ACCANTONAM. FONDO RIPRODUZ. MATERIALE					
	PROGETTUALE			35.000.000		12956/93
	SONDAGGI GEOGNOSTICI (PARTE)			55.000.000		12957/93
	INDAGINI PRELIMINARI PROGETTO RESTAURO			50.000.000		15679/
	ACCANTONAM. FONDO PER PROVE NON DISTRUTTIVE					
	(PARTE)			49.372.191		12958/93
	SETARO FELICE			30.353.778		26073/95
	SERVICE GRAFICO			17.219.300		12959/93
	RIASSUNZIONE ECONOMIA PER LAVORI 2°-3°-4°					
	STRALCIO			17.646.222		23/93
	ACCANTONAMENTO FONDO 4° STRALCIO			136.258.253		24892/96
	ARS IDRAULICA			713.965.814		24892/96
	R.G. IMPIANTI-SPOLADOR R.			15.600.000		49616/95
	R.G. IMPIANTI-SPOLADOR R.			218.775.933		24892/96
	MAGGIORE IVA			13.504.020		
	RESIDUO DA ASSEGNARE				27.871.542	
	IMPORTI LIQUIDATI				7.357.589.372	
	RESIDUO DA LIQUIDARE				1.124.370.477	
22.4590.00	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI L. 139/92 - PALAZZO SAVORGNA, L.S. BENEDETTI, ITC SARPI	I.M.I. (25.000.000.000)	6.200.000.000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	OGGETTO	FINANZIAMENTO	PROGETTO	IMPEGNATO	RESIDUO
	RIPRODUZIONE MATERIALE PROGETTUALE			15.000.000	12956/93
	PROVE NON DISTRUTTIVE - ACCANTONAMENTO FONDO			26.000.000	12958/93
	SONDAGGI GEOGNOSTICI - ACCANTONAMENTO FONDO			15.000.000	12957/93
	SERVICE GRAFICO - ACCANTONAMENTO FONDO			80.000.000	12959/93
	ENEL - SPOSTAMENTO MISURE			1.464.890	39854/95
	COOPCOSTRUTTORI - OPERE EDILI			727.686.471	46252/94
	ACCANTONAMENTO QUOTA PER MAGGIORAZIONE IVA			20.123.466	46252/94
	COOPCOSTRUTTORI - MAGGIORI LAVORI			187.827.305	13983/96
	CONSORZIO MARCIANO - RESTAURO AFFRESCHI			7.008.700	59392/94
	VALERIO VIO - RESTAURO AFFRESCHI			74.984.261	59392/94
	PIEVE MARISA - RESTAURO AFFRESCHI			107.298.619	59392/94
	RIZZO L. - INCARICO PROGETTAZIONE - ALGAROTTI			38.486.500	12961/93
	PAVAN REMO - INCARICO PROGETTO ESECUTIVO - ALGAROTTI			21.420.000	13983/96
	I.F.G. TETTAMANTI - OPERE EDILI			706.060.634	56326/96
	I.F.G. TETTAMANTI - ANTICIPAZIONE CORRISPONDA			296.982.460	56326/96
	RIAPPALTO LAVORI			2.636.956.906	56326/96
	BENEDETTI			50.000.000	6629/94
	SACRAMATI - OPERE EDILI			690.986.000	46263/94
	SIECI - OPERE ELETTRICHE			355.994.000	46260/94
	SIECI - ASSEGNAZIONE DIFFERENZA IVA 1%			3.915.852	39398/96
	ACCANTONAMENTO FONDO IMPIANTO ANTINTRUSIONE			46.671.800	31810/97
	RESIDUO DA ASSEGNARE				90.132.136
	IMPORTI LIQUIDATI				2.965.632.553
	RESIDUO DA LIQUIDARE				3.234.367.447
21.4418.00	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	CA.R.I.V.E. (16.000.000.000)			
L. 139/92					
	ITT ALGAROTTI - COMPLETAMENTO OPERE DI				
	RESTAURO		1.000.000.000		24904/96
	RIQUALIFICAZIONE L.S. BENEDETTI		2.100.000.000		56326/96
	CO.VE.CO. - OPERE EDILI			1.645.350.900	34970/97
	SCIBILIA ROBERTO - COLLAUDO TECNICO AMM.VO			3.600.000	4602/98
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITF CORNER		400.000.000		49783/96
	CONSCOOP - PERIZIA SUPPLETIVA			100.896.507	6002/97
	ITIS RIGHI - COMPLETAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO		600.000.000		24904/96
	ADEGUAMENTO		150.000.000		24904/96
	SPESE TECNICHE			65.000.000	54002/97
	ITC CESTARI - ADEGUAMENTO NORMATIVE DI				
	SICUREZZA		150.000.000		24904/96
	PALAZZO TESTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.000.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	OGGETTO	FINANZIAMENTO	PROGETTI	IMPEGNATO	RESIDUI	PROG.
21.4418.00	CASERME GC MURANO, BURANO E PELLESTRINA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CORNER - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE - COMPLETAMENTO SEDI SCOLASTICHE GIA' DI COMPETENZA E DI NUOVA COMPETENZA LEGGE 23/96 (PARTE) RESIDUO DA ASSEGNARE IMPORTI LIQUIDATI RESIDUO DA LIQUIDARE	CA. RI. VE. (60.000.000.000)	600.000.000 4.850.000.000 5.150.000.000	586.429.057 13.041.350 1.237.622.127 290.690.344 224.516.586 47.170.943 156.078.830 43.923.170 39.168.000 15.000.000.000 3.250.000.000 3.000.000.000	14.185.152.593 100.896.507 15.899.103.493	25373/97 49781/97 56321/96 56321/96 18263/97 26619/97 25373/97 56321/96 18583/97 49781/97 53983/97 12800/97
21.4418.00	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI L. 139/92 S. SERVULO 3° FASE - 1° LOTTO IACCANTON. FONDO INSTALLAZ. PROVVISORIE ARS IDRAULICA - OPERE DA TERMOTECNICO S. SERVULO - 2° E 3° STRALCIO SCHIAVINA - OPERE EDILI SPOLADOR RINO - IMPIANTI SPECIALI LAIMA SNC - ARREDI PER AUDITORIUM IACCANTONAM. FONDO INSTALLAZIONI PROVVISORIE RESTAURO COMPLESSO S. SERVULO ENEL ALLACCIAMENTO ELETTRICO ARS IDRAULICA - OPERE DA TERMOTECNICO S. SERVULO - 3° FASE - 2° LOTTO IPAVAN REMO - PROGETTAZIONE IMP. PREVENZIONE INCENDI RESTAURO PALAZZO CORNER S. SERVULO 3° FASE - 3° LOTTO - COMPLETAMENTO SEDI SCOLASTICHE GIA' DI COMPETENZA E DI NUOVA COMPETENZA LEGGE 23/96 (PARTE) RESIDUO DA ASSEGNARE IMPORTI LIQUIDATI RESIDUO DA LIQUIDARE	CA. RIS. BO	23.000.000.000	57.361.361.593 2.015.036.411 57.984.963.589	57995/97 PROGETTO PRELIMINARE DA AFFIDARE PROGETTO PRELIMINARE DA AFFIDARE	
21800-581	INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA - L. 408/96 UNIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE SEDI L.S. VERONESE E CINI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA PALAZZO MARTINENGO, SEDE STACCATTA DEL L.S. BENEDETTI					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C/C	OGGETTO	FINANZIAMENTO	PROGETTI	IMPEGNATO	C/C	PROGETTO PRELIMINARE DA AFFIDARE
	ACQUISIZIONE AREE E REALIZZAZIONE PALESTRE AD USO LS BENEDETTI, ITC SARPI, ITT ALGAROTTI E IPCM BARBARIGO			5.000.000.000		PROGETTO PRELIMINARE DA AFFIDARE
	ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SEDI SCOLASTICHE DI NUOVA COMPETENZA AI SENSI LEGGE 23/96			7.000.000.000		PROGETTO PRELIMINARE DA AFFIDARE
	RESIDUO DA ASSEGNARE					
	IMPORTI LIQUIDATI					
	RESIDUO DA LIQUIDARE				23.000.000.000	0
21800-704	INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA - ULTERIORI FINANZIAMENTI	CREDIOP	13.000.000.000			57995/97
						PROGETTO PRELIM. APPROVATO ED ESECUTIVO IN FASE DI REDAZIONE
	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE ITC CESTARI			1.000.000.000		PROGETTO PRELIM. APPROVATO ED ESECUTIVO IN FASE DI REDAZIONE
						21800/96
	COMPLETAMENTO OPERE ITC SARPI			1.500.000.000		PROGETTO PRELIM. APPROVATO ED ESECUTIVO IN FASE DI REDAZIONE
	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE PALESTRE AD USO LS BENEDETTI, ITC SARPI, ITT ALGAROTTI E IPCM BARBARIGO			7.000.000.000		PROGETTO PRELIMINARE DA AFFIDARE
	ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SEDI SCOLASTICHE DI NUOVA COMPETENZA AI SENSI LEGGE 23/96			3.500.000.000		PROGETTO PRELIMINARE DA AFFIDARE
	RESIDUO DA ASSEGNARE					
	IMPORTI LIQUIDATI					
	RESIDUO DA LIQUIDARE				13.000.000.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVINCIA DI VENEZIA						
SITUAZIONE CAPITOLI FINANZIATI CON LEGGE SPECIALE al 18.02.1998						
Uff. Liquidazioni Ferlaudi S. - Mejerle P. - Scaramella R.						
CAPITOLO	OGGETTO	FINANZIAMENTO	PROGETTI	IMPEGNATO	RESIDUI	PROT.
21.4320.00	RESTAURO IMMOBILI S.SERVOLLO L. 798/84 COVE.CO. - OPERE IN APPALTO ARS IDRAULICA - IMPIANTISTICA RESIDUO DA ASSEGNARE IMPORTI LIQUIDATI RESIDUO DA LIQUIDARE	MAG. ACQUE (2.780.000.000)	2.764.052.755	2.476.856.877 287.078.015	36856/89 36856/89 117.863 2.751.087.815 12.964.940	
21.4323.00	L. 798/84 INTERVENTI RESTAURO PALAZZI CA' ZIANI E BUTTARO DEL FAVERO SPA - ASSEGNAZIONE MIRANO IMPIANTI - IMP. RISCALDAMENTO MIRANO IMPIANTI - IMP. IDROSANITARIO DE SANI TECNOIMPIANTI - IMP. ELETTRICO ENEL - POSA CONTATORE COOP. BRENTILLA - SPESE DI TRASLOCO R G IMPIANTI - IMP. ELETTRICO PAL. ZIANI R G IMPIANTI - COMPLETAM. IMP. ELETTRICO RESIDUO DA ASSEGNARE IMPORTI LIQUIDATI RESIDUO DA LIQUIDARE	MAG. ACQUE	6.000.000.000	4.218.393.740 355.389.210 125.837.250 38.659.510 5.094.660 14.280.000 338.213.920 46.543.640	36609/93 17665/95 17663/95 33763/95 45245/96 48114/96 57341/95 3328/97 857.588.070 962.409.390 5.037.590.610	
21.4380.00	L. 798/84 LAVORI RESTAURO PALAZZI CORNER E CARMAGNANI - MARASCALCHI RESTAURI - OPERE EDILI MARASCALCHI RESTAURI - REV. PREZZI RESIDUO DA ASSEGNARE IMPORTI LIQUIDATI RESIDUO DA LIQUIDARE	MAG. ACQUE	460.000.000	431.505.185 28.490.725	40835/89 10353/93 4.090 456.045.235 3.954.765	
22.5307.00	L. 798/84 SALDO LAVORI PALAZZO DONA' BALBI LOTTI 1° E 2° - L. COVE.CO. - OPERE EDILI COVE.CO. - MAGGIORI LAVORI COVE.CO. - MAGGIORI LAVORI ARS IDRAULICA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RESIDUO DA ASSEGNARE IMPORTI LIQUIDATI RESIDUO DA LIQUIDARE	MAG. ACQUE	1.420.000.000	1.146.126.390 192.194.554 36.559.056 44.720.000	30385/90 15521/92 45069/95 15521/90 400.000 1.407.293.571 12.706.429	
22.5308.00	ULTERIORI INTERVENTI LEGGE 798/84 VIO VALERIO - OPERE ARTISTICHE ARS IDRAULICA - IMPIANTISTICA RESIDUO DA ASSEGNARE IMPORTI LIQUIDATI RESIDUO DA LIQUIDARE	MAG. ACQUE	230.000.000	135.200.000 94.640.000	15521/90 15521/90 160.000 206.602.910 23.397.090	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVINCIA DI VENEZIA						
SITUAZIONE CAPITOLI FINANZIATI CON LEGGE SPECIALE al 18.02.1998						
Uff. Liquidazioni Ferialdi S. - Majerle P. - Scaramella R.						
CAPITOLO	OGGETTO	FINANZIAMENTO	PROGETTI	IMPEGNATO	RESIDUI	PROT. 1998
21.4322.00	ISOLA S.SERVOLLO - INTERVENTI FINALIZZATI SALVAGUARDIA VENEZIA ANNO 1988 - L. 67/88 COOP. DI COSTRUZIONI - ABBATT. PIANTE BORDIN F. - SISTEM. PATRIMONIO ARBOREO RESIDUO DA ASSEGNARE IMPORTI LIQUIDATI RESIDUO DA LIQUIDARE	L. 67/88	500.000.000	14.479.675 114.246.080	371.274.245 128.725.755 371.274.245	22727/91 9518/94
21.4426.00	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI L. 67/88 - ANNO 1990	L. 67/88	2.400.000.000			
S. SERVOLLO	ARS IDRAULICA - ASSEGNAZIONE			100.874.800		16493/90
	CO.VE.CO. - OPERE EDILI			32.895.357		22338/87
	ARS IDRAULICA - CONVERSIONE C.T.			5.200.000		1258/91
	ARS IDRAULICA - REVISIONE PREZZI			2.985.355		30966/91
	IDROLUX - MANUT. IMP. ELETTRICO			1.047.200		19035/92
	CO.VE.CO. - REVISIONE PREZZI			5.904.545		8334/92
	VIVAI AL TAGLIAMENTO - SISTEMAZIONE AREE A VERDE			41.138.600		27947/90
	ARS IDRAULICA - OPERE DA IMPIANTISTA			96.720.000		27947/90
	CO.VE.CO.			100.880.000		27947/90
	VIO VALERIO - RESTAURO OPERE ARTISTICHE			202.800.000		27947/90
PAL. DONA. BALBI	PAVEGGIO MAURIZIO - PROGETTAZIONE			23.725.490		27947/90
	ISABEM - IMPIANTO ELEVATORE			56.888.000		27947/90
	FATME SPA - IMPIANTO TELEFONICO			78.992.330		28080/91
	CO.VE.CO. - ASSISTENZA ALLACCIAMENTO SERVIZI			12.874.104		31769/92
	CO.VE.CO. - REVISIONE PREZZI			116.355.010		36560/93
	BORDIN ROMOLO - ASSEGNAZIONE OPERE EDILI			391.000.000		8670/93
	ACCANTONAMENTO FONDO PER INDAGINI			69.000.000		2969/92
	ARS IDRAULICA - IMPIANTO TERMOIDRAULICO			64.666.596		49618/95
	R.G. IMPIANTI-SPOLADOR R. - OPERE DA ELETTRICISTA			143.077.500		49616/95
	ENEL - ALLACCIAMENTO ELETTRICO			744.325		5321/96
S. SERVOLLO	MORETTO LUCIANO - DOTAZIONI TECNOLOGICHE			66.759.000		44044/96
	IRIZZO LUIGI - RILIEVI E SERVICE GRAFICO			85.117.725		44044/96

CAPITOLO	OGGETTO	FINANZIAMENTO	PROGETTI	IMPEGNATO	RESIDUI	CAPIROLI
ALCAROTTI	BOATO SNC - OPERE EDILI			257.479.476		478992
	MIRANO IMPIANTI - OPERE DA TERMOTECNICO			64.812.280		6092/92
	SPOADOR R. - OPERE DA ELETTRICISTA			72.297.710		5475/92
	PASTRELLO G. - OPERE DA MARMISTA			13.470.080		18230/92
	VERNA - OPERE RESTAURO LIGNEO			4.191.200		18230/92
	VIO VALERIO - OPERE DA DECORATORE			15.277.600		18230/92
	VIO VALERIO - OPERE DI RESTAURO			28.580.864		32354/92
	SICUREZZA			1.428.000		32354/92
	RESIDUO DA ASSEGNARE				242.816.853	
	IMPORTI LIQUIDATI				2.091.645.089	
RESIDUO DA LIQUIDARE					308.354.911	
21.4427.00	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI					
	L. 67/88	L. 67/88	700.000.000			
	R.G. IMPIANTI - OPERE DI ARREDO FISSO			18.512.000		799/94
	ECOM - IMPIANTO PER HANDICAPPATI			21.814.000		798/94
	SPOADOR R. - IMP. AUDIOFONICI			16.725.900		797/94
	CONSORZIO MARCIANO - LAVORI DA RESTAURATORE			122.720.000		24118/94
	SCHIAVINA-MORAS - SALDO LAVORI			3.800.000		7571/96
	R.G. IMPIANTI - SPOADOR R. - OPERE DA ELETTRICISTA			344.357.950		54973/95
	ENEL - ALLACCIAMENTO ELETTRICO			156.000.000		49616/95
	RESIDUO DA ASSEGNARE			14.642.050		5321/96
	IMPORTI LIQUIDATI				1.428.100	
	RESIDUO DA LIQUIDARE				695.151.900	
					4.848.100	

PROVINCIA DI VENEZIA		SITUAZIONE CAPITOLI FINANZIATI CON LEGGE SPECIALE				al 18.02.1988	
Uff. Liquidazioni		OGGETTO				Capitolo	
Ferioli S. - Majerle P. - Scaramella R.		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO				Capitolo	
		S.SERVOLLO - L. 138/82				Capitolo	
		SCHIAVINA-MORAS - OPERE EDILI				Capitolo	
		RESIDUO DA ASSEGNARE				Capitolo	
		IMPORTI LIQUIDATI				Capitolo	
		RESIDUO DA LIQUIDARE				Capitolo	
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO				Capitolo	
		S.SERVOLLO - L. 138/82				Capitolo	
		SCHIAVINA-MORAS - OPERE EDILI				Capitolo	
		ARS IDRAULICA - IMP. TERMIDRAULICO				Capitolo	
		R.G. IMPIANTI-SPOLADOR - IMP. ELETTRICO				Capitolo	
		SCHIAVINA-MORAS - OPERE EDILI (SALDO)				Capitolo	
		ARS IDRAULICA - OPERE DA TERMOTECNICO				Capitolo	
		ACCANTONAMENTO FONDO OPERE COMPLEMENTARI				Capitolo	
		ACCANTONAMENTO FONDO 3° E 4° STRALCIO ESECUTIVO				Capitolo	
		RESIDUO DA ASSEGNARE				Capitolo	
		IMPORTI LIQUIDATI				Capitolo	
		RESIDUO DA LIQUIDARE				Capitolo	
		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI				Capitolo	
		L. 138/82 - PALAZZO CORNER				Capitolo	
		DUPLIMATIC ITALIANA				Capitolo	
		EDILMAR SRL				Capitolo	
		HIROSS NESITE				Capitolo	
		PAVAN REMO				Capitolo	
		TIOZZO G.				Capitolo	
		ACCANTONAMENTO FONDO PROVE NON DISTRUTTIVE				Capitolo	
		ACCANTONAMENTO FONDO SERVICE GRAFICO (PARTE)				Capitolo	
		ACCANTONAMENTO FONDO SERVICE GRAFICO				Capitolo	
		CREAZZA				Capitolo	
		CREAZZA				Capitolo	
		CONTE FRANCESCO				Capitolo	
		RESIDUO DA ASSEGNARE				Capitolo	
		IMPORTI LIQUIDATI				Capitolo	
		RESIDUO DA LIQUIDARE				Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	
						Capitolo	

PAGINA BIANCA

PROGRAMMA E STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI


finanziati con

legge 5 febbraio 1992 n.139

legge 20 dicembre 1995 n.539

legge 4 ottobre 1996 n.515

legge 2 ottobre 1997 n.345



pubblicazione per conto, aggiornata al 31 dicembre 1997 a cura del
Settore Coordinamento Legge Speciale

Comune di Venezia

Il presente fascicolo segnala lo stato di avanzamento degli interventi di competenza comunale finanziati con i fondi provenienti dalla legislazione speciale per Venezia e inseriti in programmi approvati con apposite deliberazioni consiliari.

Legenda

Programmato : intervento inserito in un programma approvato con deliberazione consiliare

Impegnato : importi definiti con deliberazione degli organi competenti (giunta, consiglio comunale). L'impegno può essere assunto solo dopo l'avvenuta assegnazione da parte dello Stato con apposita Legge di spesa e la stipula del mutuo contratto sulla base dei limiti di impegno della annualità relativa

Obbligato : contratti di appalto, di compravendita, graduatorie di contributi approvate, convenzioni con terzi

Speso : importi erogati - uscite di cassa

Fasi di avanzamento

Progettazione : comprende la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva

Istruttoria appello : comprende i tempi derivanti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici

lavori in corso : decorrono dalla aggiudicazione alla ditta vincitrice dell'appalto

lavori ultimati : considerati dai verbali di ultimazione lavori

Per le voci riferite alle acquisizioni la lettura delle varie fasi va intesa nel modo seguente:

Progettazione : trattativa in corso

Istruttoria appello : stima del bene

lavori in corso : deliberazione di approvazione della stima

lavori ultimati : stipula del notaio

Comune di Venezia

QUADRO FINANZIARIO

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	656.891	636.025	96,82	538.403	81,96	269.492	41,03
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996	48.000	47.007	97,93	40.469	84,31	13.341	27,79
	1997	96.000	90.122	93,88	57.350	59,74	2.507	2,61
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	365.000	349.569	95,77	277.584	76,05	18.684	5,12
	1998	147.393	129.955	88,17	27.669	18,77	-	-
TOTALE		1.313.284	1.252.678	95,39	941.475	71,69	304.024	23,15

	Annualità	Programmato A
Legge 2 ottobre 1997 n. 345(*)	1998	160.000
	1999	118.000
TOTALE		278.000


(*) Gli importi e le percentuali del quadro finanziario (impegnato - obbligato - speso) e dello stato di avanzamento degli interventi non tengono conto della Legge 2 ottobre 1997 n. 345 in quanto la disponibilità per l'Amministrazione Comunale (limitata alla annualità 1998) è potuta avvenire solo dopo la data della stipula del contratto di mutuo avvenuta il 23 dicembre 1997. Il lungo iter di approvazione della Legge di spesa non ha comunque impedito all'Amministrazione Comunale di anticipare la predisposizione del programma relativo descritto alla fine del fascicolo

importi in milioni

Comune di Venezia

STATO AVANZAMENTO - INTERVENTI

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
26.974	87.020	675.516	448.374
7%	7%	51%	34%

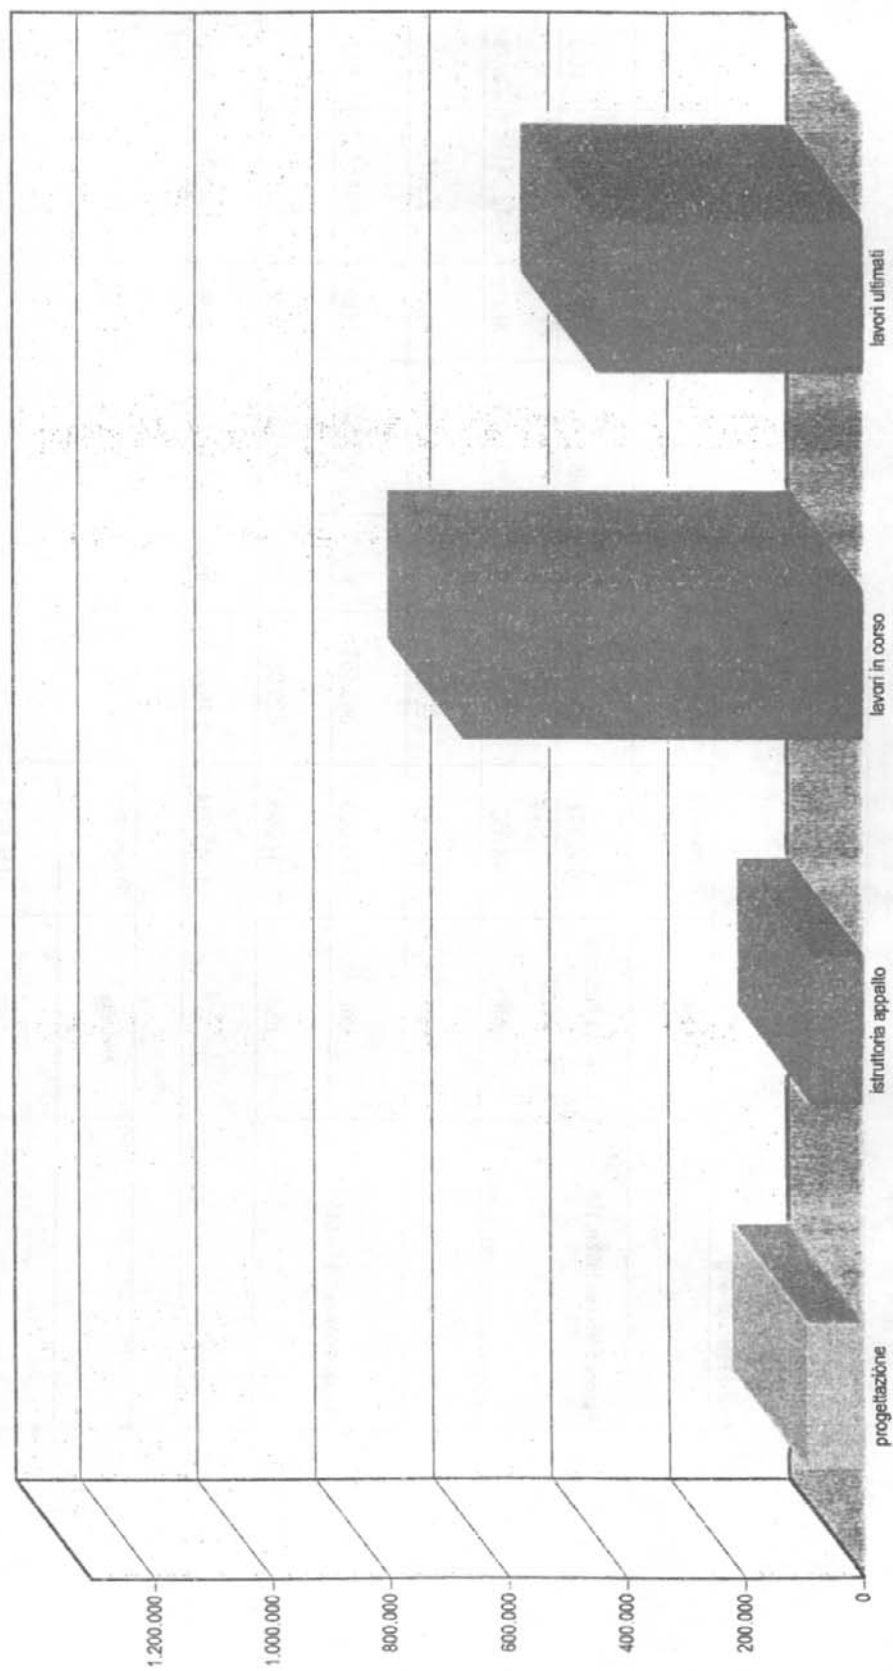

QUADRO TEMPORALE MUTUI

[illegible]

La riserva è una cifra prudenziale che viene accantonata e che potrà essere disponibile solo dopo i primi 5 anni dalla stipula di ogni singolo contratto di mutuo. L'ammontare è presunto e dipende dal tasso ufficiale di sconto vigente alla data della verifica e dai relativi piani di erogazione.

Per la sua indeterminata e la sua non immediata disponibilità non è stata conteggiata nel programma degli interventi.

importi in miliardi

Comune di Venezia

Progetto integrato rii

Il progetto integrato rii oggetto di apposito accordo di programma ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 139 prende in considerazione gli interventi di scavo e smaltimento dei fanghi, le opere di sistemazione e risanamento della rete fognaria esistente e dei sottoservizi a rete, gli interventi di consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii e le opere per la difesa delle acque alte mediante la realizzazione delle "insule" in quanto opere di manutenzione urbana.

Gli interventi fanno parte di un piano organico generale che investe tutto il centro storico e le Isole per un importo di circa 1.500 miliardi e si sviluppa nell'arco di 23 anni con inizio dal 1994.

I principali obiettivi che si intende perseguire con il piano sono:

- ricambio idraulico;
- disinquinamento delle acque (risanamento igienico-sanitario)
- consolidamento statico delle strutture;
- protezione della città dalle acque medio-alte.

Il Comune di Venezia ha recentemente assegnato tale compito ad una società per azioni denominata *Insula* in cui le partecipazioni sono così suddivise: Comune di Venezia 52%; Italgas 12%; Aspiv 12%; Telecom 12%; Ismes S.p.A. (Enel) 12%.

Con la verifica dello stato di avanzamento dei lavori si sta confermando il trend positivo della attuazione del Piano Programma.

Comune di Venezia

ALCUNI INDICATORI SIGNIFICATIVI SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Quantità totali individuate dal Piano

Fango da esportare per l'escavo dei ri	385.000 mc ca.
Muri sponda da consolidare (compresi i privati)	100.000 mc ca.
Numero ponti da risanare	200 ca.

Stato avanzamento

	Progettazione	In corso	Ultimati	Totale	% degli interventi sul totale del Piano
Fango mc	45.000	50.000	61.000	156.000	41%
Muri di sponda ml	8.500	11.500	10.500	30.500	131%
Ponti n.	50	30	22	102	51%

Il tempo previsto per l'esecuzione del Programma Generale è di 23 anni (1994 - 2017).

Gli interventi sono iniziati nel 1994 ed è trascorso il 17% del tempo preventivato per la realizzazione del Programma.

Importi in Lit. Mil. a costi costanti)

(IMPORTI IN Lit./Mil. a costi costanti)		BILANCIO 1996												TOT ANNI SUCCESSIVI				
N°	NOME PROGETTO	IMPORTO LAVORI	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TOT 1998	TOT 1999	TOT 2000	TOT ANNI SUCCESSIVI
INTERVENTI INTEGRATI (INSULAE) - AREA PUBBLICA																		
1	Santa Maria Formosa - 1° fase	9.046			1.204			1.204			1.204			1.204	4.817	3.237	0	0
2	Frari - 1° fase	8.338			1.048			1.048			1.048			1.048	4.192	2.819	0	0
3	Ghetto - 1° fase	9.381			1.481			1.481			1.481			1.481	5.846	998	0	0
4	Murano-1° fase(1° lotto Navigaro)	9.082			1.428			1.428			1.428			1.428	5.713	26	0	0
5	S. Giovanni in Bragora - 1° fase	9.264			384										1.541	4.621	3.101	0
6	Ghetto - 2° fase (Chiavera)	11.001									437	437	437	437	1.829	5.488	3.884	0
7	S. Stefano - 1° fase	8.180				50			121						202	4.203	778	0
8	S. Trovaso - 1° fase	9.827				100			282						382	4.832	4.414	0
9	S. Maria Mater Domini - 1° fase	8.913											30		50	1.687	4.163	13
10	S. Felice/S.S. Apostoli - 1° fase	9.827													0	382	5.341	3.905
11	S. Martino - 1° fase	9.827													0	382	5.341	3.905
12	S. Giacomo dell'Orto - 1° fase	2.228													0	95	2.134	0
13	Burano (Acc. Progr.)	42.241													200	1.404	7.295	33.342
14	Pellestrina - S. P. in Volta 1 - collettore	6.480				202		200					477	477	1.155	4.305	0	0
15	Pellestrina - S. P. in Volta 2	19.837													0	2.741	8.485	10.311
16	Pellestrina - Bastiere Scarpa	11.747						348							348	5.933	5.439	COLL.
17	Tolentini Studi	100													100	0	0	0
18	Tolentini-Consortio Venezia Nuova	1.200													733	467	0	0
19	Rialzo pavimentazioni - Primi Interventi	2.238													447	1.789	0	0
20	Rialzo pavimentazioni - Altri Interventi	2.256													90	2.166	0	0
21	Altre Insulae - 1° fase	14.000													0	400	2.288	11.312
22	Altre Insulae - 2° fase	14.000													0	0	802	13.198
A	TOT. INTERV. INTO. AREA PUBBL. TOTALE GENERALE	211.099	0	488	5.257	482	117	5.107	520	87	5.746	808	1.428	8.425	27.846	47.975	51.260	76.013

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRIVATI EXTRA-INSULAE E O.T.																			
	Contributi erogati	5.901	0	10	10	10	18	27	27	27	40	84	84	84	421	1.371	1.804	2.216	
	Importo lavori sul privati	8.047	0	13	13	13	26	37	37	37	55	115	115	115	574	1.869	2.582	3.021	
	Progettazioni e D. L. privati	3.301	0	5	5	5	11	15	15	15	23	47	47	47	236	767	1.059	1.240	
D	PRIVATI EXTRA-INSULAE E O.T.	11.349	0	18	18	18	37	52	52	52	78	192	192	192	810	2.636	3.642	4.261	
E	TOTALE INTERV. PUBBL. E PRIV.	284.704	173	1.850	5.534	7.812	820	7.392	1.770	1.410	7.585	3.792	4.459	9.891	45.431	75.819	70.412	80.289	
ATTIVITA' DI SUPPORTO																			
F	TOTALE ATTIVITA' DI SUPPORTO	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300	550	550	0	
SISTEMA PER LA MANUTENZIONE URBANA																			
G	TOTALE SIST. MAN. URB.	4.499	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1.384	1.384	1.384	0	
H	TOTALE ALTRE ATTIVITA' (F+G)	5.899	115	115	115	115	115	115	115	415	115	115	115	115	1.684	1.934	1.934	0	
I	TOTALE GENERALE (E+F+G)	280.603	288	1.766	5.950	880	936	7.408	1.885	1.825	7.681	3.897	4.575	18.097	47.115	77.853	72.346	80.289	
L	I.V.A.	58.121	58	353	1.180	178	187	1.580	378	385	1.538	783	815	2.891	9.423	15.571	14.469	18.058	
M	TOTALE I.V.A. COMPRESA	348.723	346	2.119	7.130	1.058	1.123	8.987	2.273	2.190	8.217	4.681	5.400	12.005	56.538	93.424	86.815	96.347	

NOTE

- 1) Tutti gli IMPORTI sono al lordo del ribasso d'asta e al netto della remunerazione da contratto
- 2) L'importo lavori è comprensivo dell'anno 1997 per le commesse di cui ai numeri 1,2,3,4 e 23,24
- 3) Gli importi totali per l'anno 2000 e per gli anni successivi, sono relativi solo alle commesse attivate nel triennio di piano.
- 4) Gli importi evidenziati in blu ed in corsivo sono slime

LEGENDA

Indagini preliminari

Progettazione

Approvazione


Appalto

Esecuzione

Collaudo



COLLAUDO

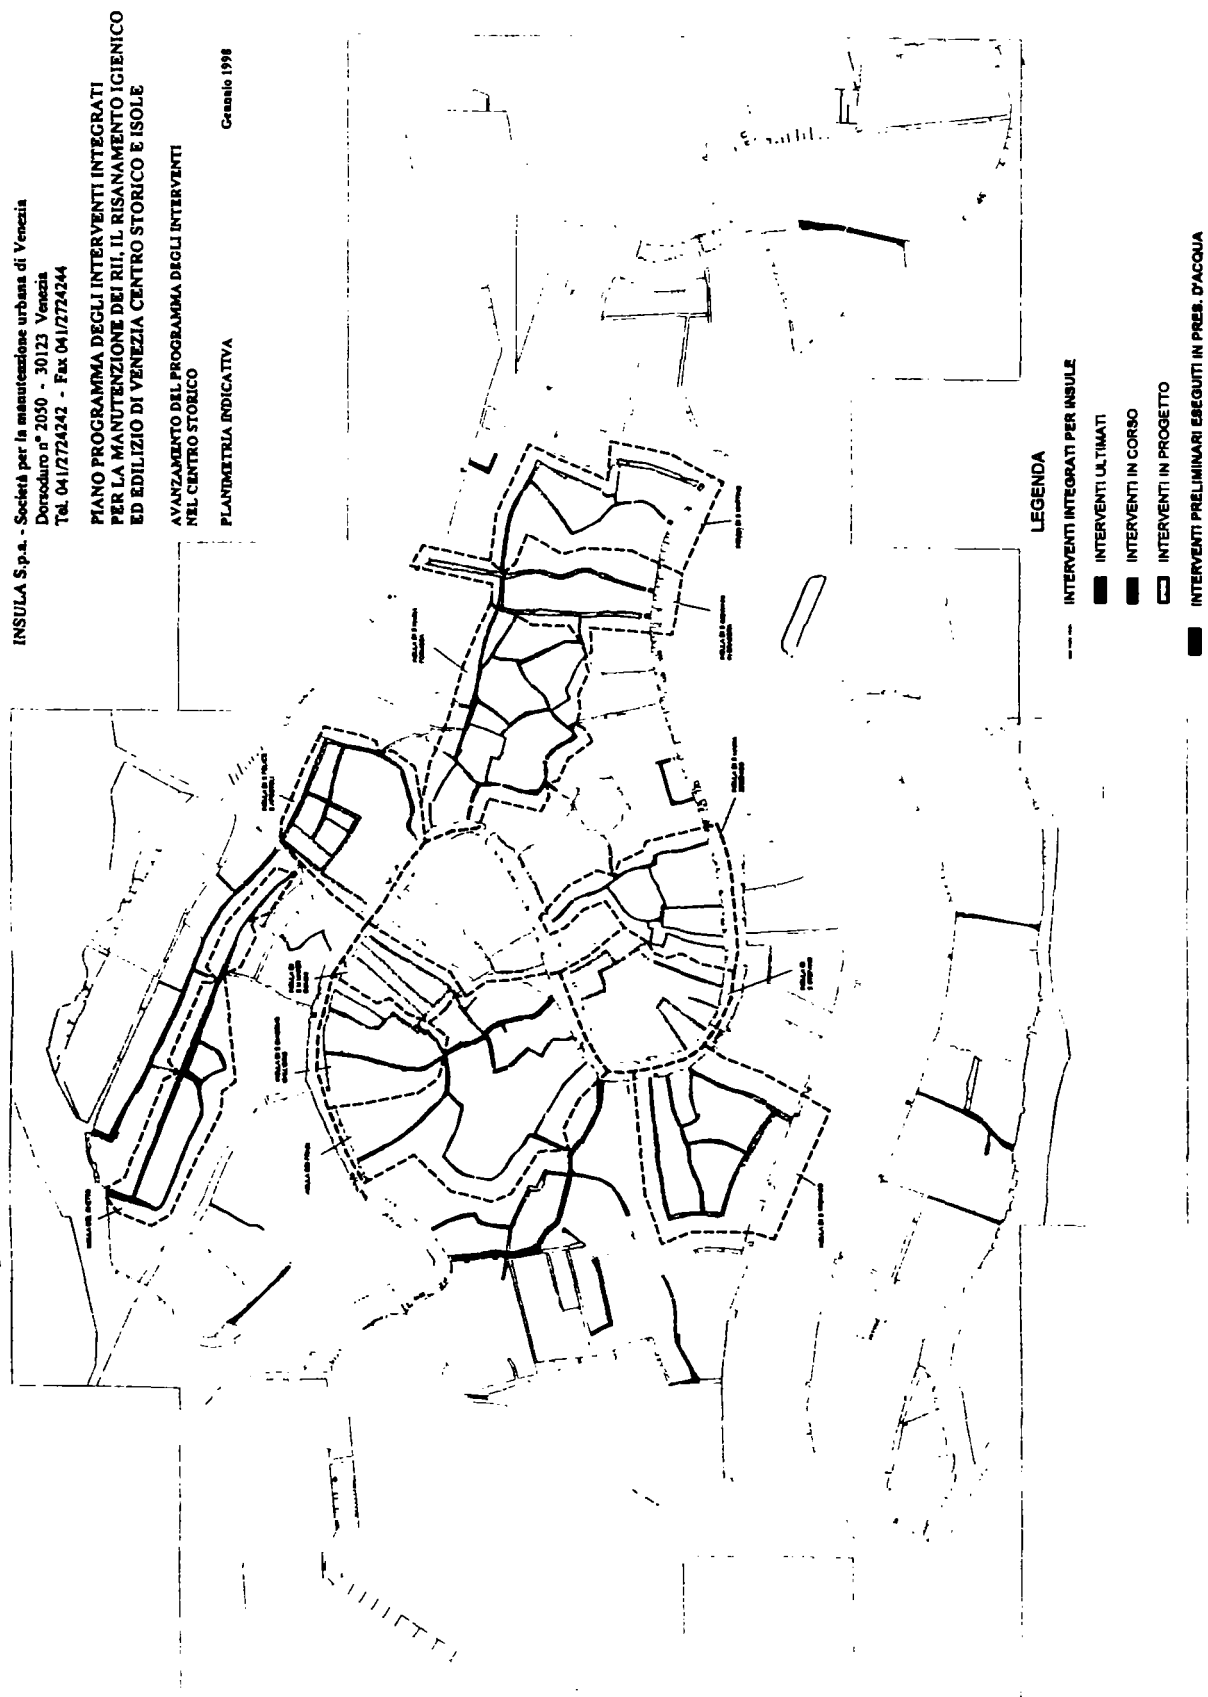

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento


	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	175.566	164.337	93,60	128.162	73,00	27.572	15,70
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996							
	1997							
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	3.357	2.747	81,83	1.172	34,91		
	1998	27.000	26.520	98,22				
TOTALE (*)		205.923	193.604	94,02	129.334	62,81	27.572	13,39

(*) - L'importo totale è comprensivo del Contributo Regionale

QUADRO FINANZIARIO - PROGETTO INTEGRATO RII

STATO AVANZAMENTO - INTERVENTI Progetto integrato ri.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
22.316 10%	10.000 5%	130.632 63%	27.572 13%

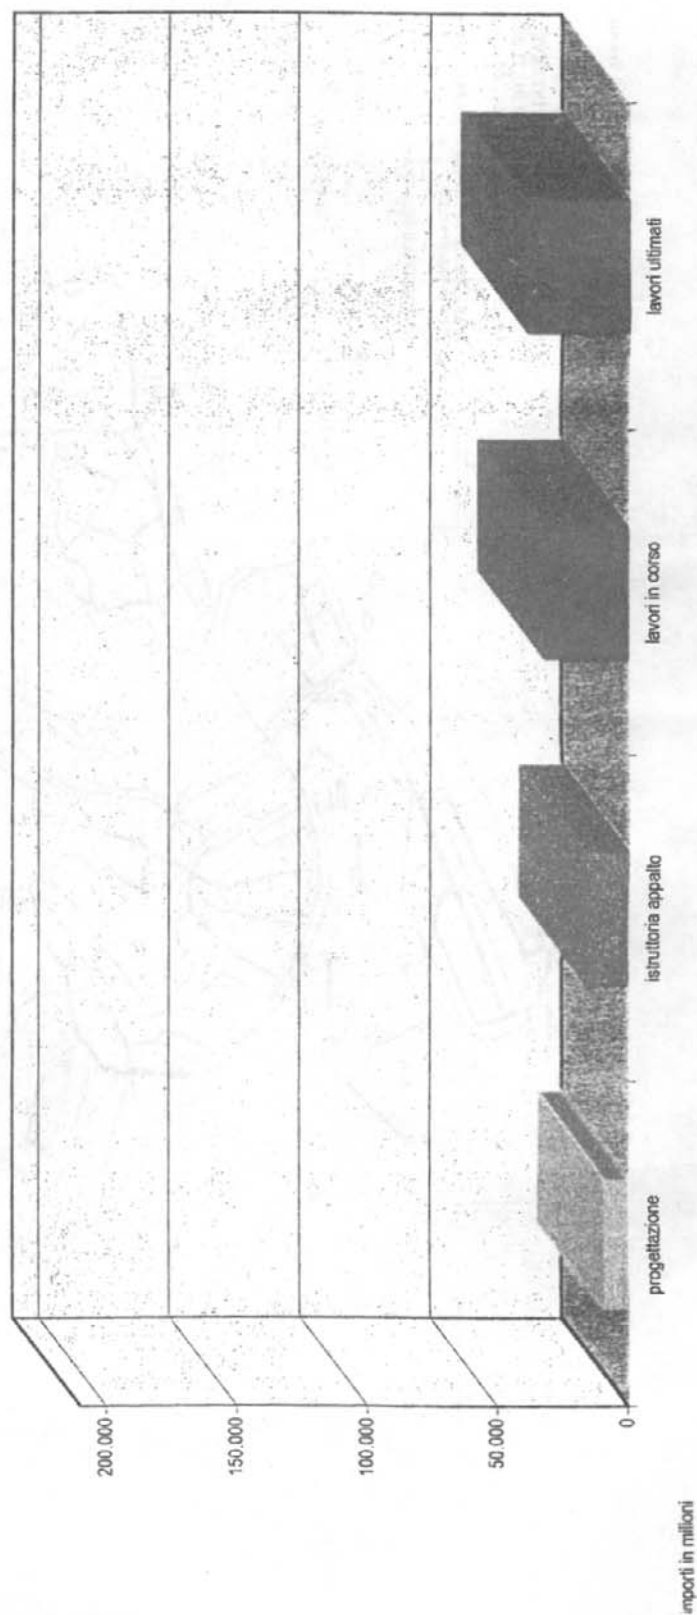


Comune di Venezia

Interventi finalizzati alla acquisizione ed al restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento.

Tra essi va rilevato il peso che assumono gli interventi relativi:

- alla residenza che, unitamente ai contributi al patrimonio immobiliare privato di cui alla successiva lettera c) della Legge 798/84 ed altri provvedimenti integrativi di carattere normativo e finanziario, si propongono di contrastare e invertire il fenomeno dell'esodo;
- alla cultura che garantiscono la riorganizzazione culturale ed economica del sistema museale della città;
- alla ricostruzione del Teatro la Fenice.

lettera a), art. 6 - Legge 29 novembre 1984 n. 798.

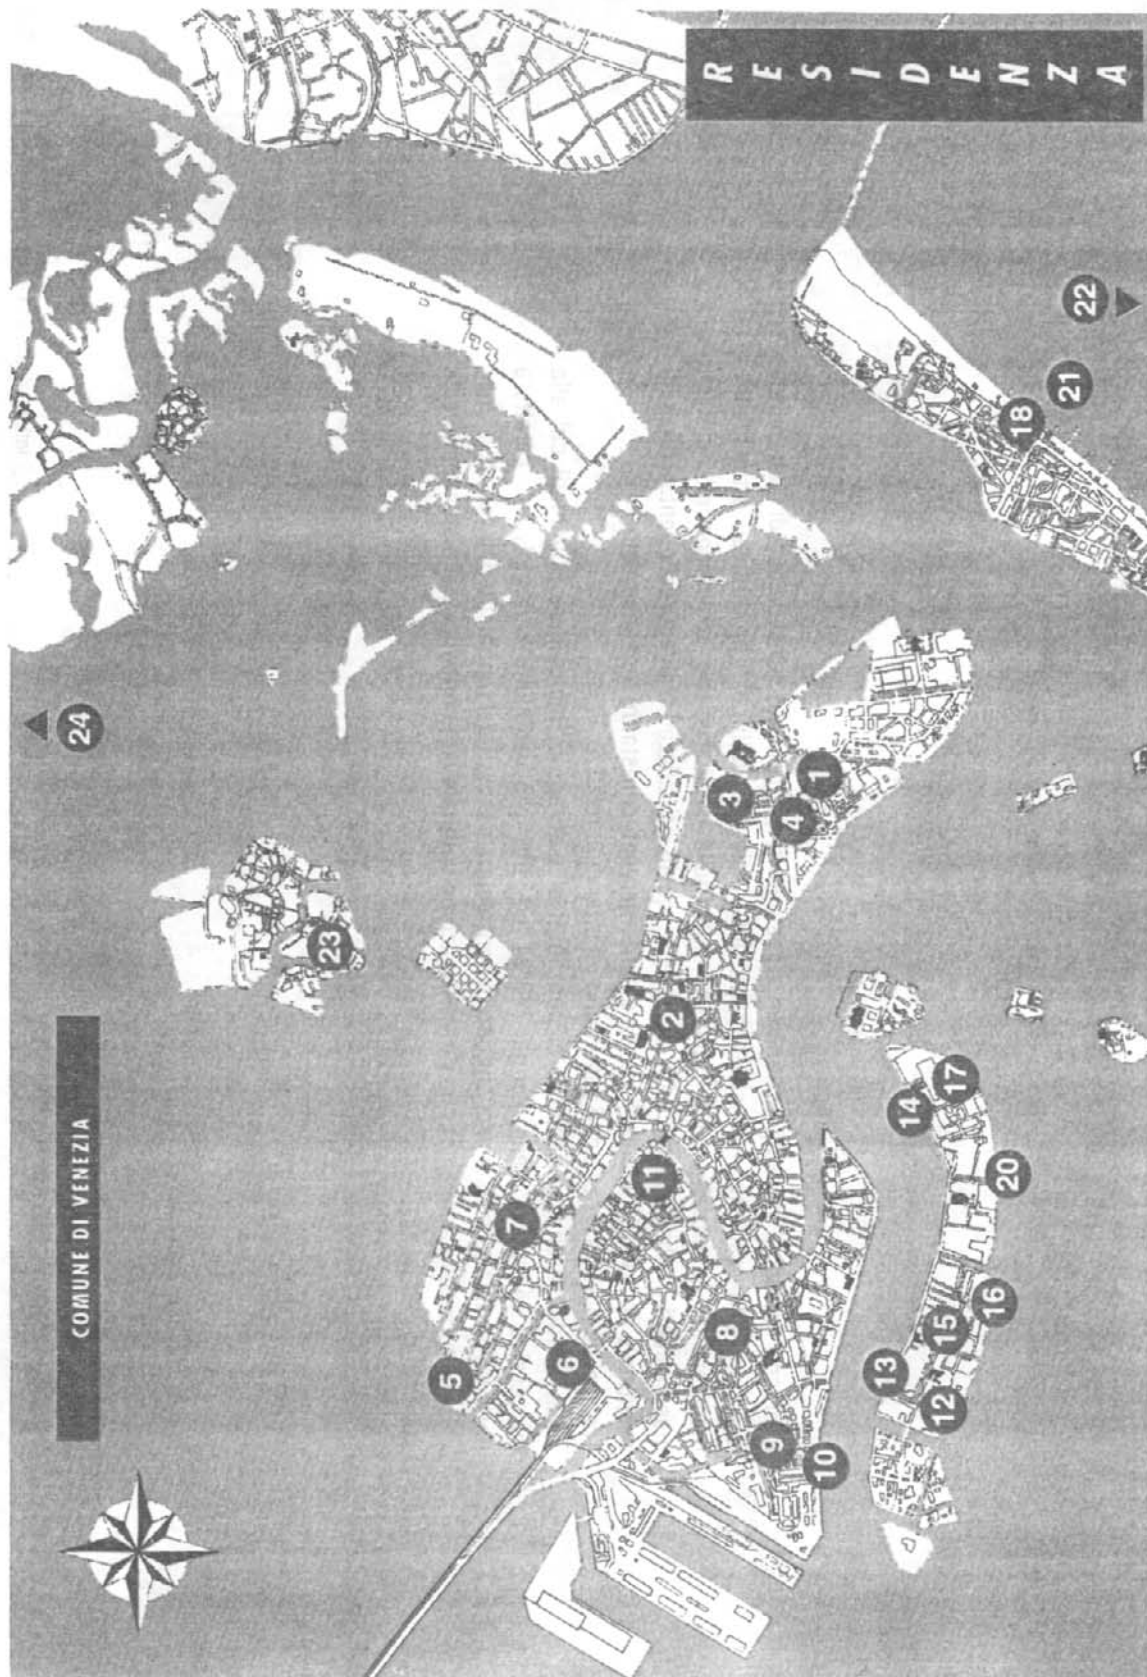

Comune di Venezia

1
Castello Ex Convento Sant'Anna

L'intervento prevede il restauro conser jivo e la ristrutturazione di un complesso di valore storico monumentale (legge 1089/39).
Si ricavano complessivamente 106 alloggi e servizi civili.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso (*)
		7.007

(*) alla cifra corrispondente ai lavori in corso vanno aggiunti circa 4 miliardi di competenza regionale

2
Castello Ex Ospedale San Lorenzo

L'intervento di ristrutturazione su un complesso di valore storico monumentale (legge 1089/39) prevede la realizzazione di residenza specializzata per anziani e servizi alla collettività (poliambulatori).

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		20.070

3
Castello Ex Caserma San Daniele

Il progetto di ristrutturazione su un complesso vincolato (legge 1089/39) all'interno dell'Arsenale prevede la realizzazione di 53 alloggi per il personale dipendente dal Ministero della Difesa.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			10.058

4
Castello Complesso Santa Maria Ausiliatrice

L'intervento di ristrutturazione prevede la realizzazione di edilizia residenziale per studenti (n. 81 alloggi) ed anziani (n. 20 alloggi). Acquisizione chiavi in mano.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		6.823

Fonti di Finanziamento

	Legge 5 febbraio 1992 n. 139	Legge 20 dicembre 1995 n. 515	Legge 4 ottobre 1996 n. 515	TOTALE
Annuale	1993-1994 1995-1996	1996	1997	1998
Programmato	4.913	594	1.500	7.007
Impegnato	4.913	580	1.500	6.993
Obbligato	4.852	222		5.074
Speso	492			492

Fonti di Finanziamento

	Legge 5 febbraio 1992 n. 139	Legge 20 dicembre 1995 n. 515	Legge 4 ottobre 1996 n. 515	TOTALE
Annuale	1993-1994 1995-1996	1996	1997	1998
Programmato	20.070			20.070
Impegnato	20.070			20.070
Obbligato	15.072			15.072
Speso	9.052			9.052

Fonti di Finanziamento

	Legge 5 febbraio 1992 n. 139	Legge 20 dicembre 1995 n. 515	Legge 4 ottobre 1996 n. 515	TOTALE
Annuale	1993-1994 1995-1996	1996	1997	1998
Programmato	9.616		442	10.058
Impegnato	9.616		442	10.058
Obbligato	9.616			9.616
Speso	6.101			6.101

Fonti di Finanziamento

	Legge 5 febbraio 1992 n. 139	Legge 20 dicembre 1995 n. 515	Legge 4 ottobre 1996 n. 515	TOTALE
Annuale	1993-1994 1995-1996	1996	1997	1998
Programmato		6.700	123	6.823
Impegnato		6.700	123	6.823
Obbligato		6.700		6.700
Speso		6.700		6.700

Comune di Venezia

Comune di Venezia **5** **Complesso ex Penitenti**

Intervento di ristrutturazione con ricavo di alloggi per anziani - studenti e servizi.
Immobile soggetto a convenzione con IPE.

progettazione
1.500

Fonti di Finanziamento		Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	Legge 20 dicembre 1995 n.	1993-1994 1995-1996				
		1996				
		1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515		1997	1.500	1.500		
TOTALE		1998				
			1.500	1.500		

Comune di Venezia **6** **Ex Area Saffa**

Intervento di nuova edificazione (n. 38 alloggi) dell'ultimo dei sei lotti di edilizia residenziale.

progettazione
11.954

Fonti di Finanziamento		Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	Legge 20 dicembre 1995 n.	1993-1994 1995-1996	8.352	8.352	8.333	1.027
		1996	2.102	2.102	2.102	
		1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515		1.500	1.500	1.500		
TOTALE		11.954	11.954	11.935	1.027	

Comune di Venezia **7** **Acquisto immobile**

Acquisto chiavi in mano di n. 7 alloggi al civico n° 747 di Cannaregio

progettazione
2.343

Fonti di Finanziamento		Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	Legge 20 dicembre 1995 n.	1993-1994 1995-1996	2.343	2.343	2.343	2.343
		1996				
		1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515		1997				
		1998				
TOTALE			2.343	2.343	2.343	2.343

Comune di Venezia **8** **Immobile Rio Novo**

Restauro e risanamento di edificio ad uso di civile abitazione e negozi (n. 7 alloggi)

progettazione
3.170

Fonti di Finanziamento		Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	Legge 20 dicembre 1995 n.	1993-1994 1995-1996	3.170	3.170	3.170	388
		1996				
		1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515		1997				
		1998				
TOTALE			3.170	3.170	3.170	388

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		11.764	11.764	11.764	2.010
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	8.000	8.000		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	2.007	2.007		
TOTALE		21.771	21.771	11.764	2.010

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		2.000	2.000	2.000	1.419
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	2.000	2.000	2.000	1.419
TOTALE		2.000	2.000	2.000	1.419

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		2.000	2.000	2.000	394
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	3.800	3.800		
TOTALE		5.800	5.800	2.000	394

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		8.150	8.150	8.150	6.977
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	8.150	8.150	8.150	6.977
TOTALE		8.150	8.150	8.150	6.977

Dorsoduro Ex Convento delle 'Terese'

Intervento di restauro e ristrutturazione su un complesso di interesse storico monumentale (legge 1089/93).
Il progetto prevede la realizzazione di edilizia speciale per studenti per un totale di 250 posti letto.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		21.771

Dorsoduro Casa 7 camini

Intervento sperimentale di restauro, risanamento e ristrutturazione di un tipico edificio vincolato di edilizia residenziale minore (n. 21 alloggi).

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		2.000

San Polo Fabbricato Calle Carpanè

Intervento di restauro e risanamento di edificio ad uso residenziale (n. 16 alloggi)

progettazione	istruttoria appalto	
	5.800	

Giudecca Area ex Fregnan

Intervento di nuova edificazione ad uso residenziale per complessivi 38 alloggi.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		8.150

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		3.808	3.808	3.808	3.808
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		3.808	3.808	3.808	3.808

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		2.104	2.104	2.104	824
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	600	600	600	364
	1997	7.000	7.000	7.000	596
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		9.704	9.704	9.704	1.784

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		2.448	2.448	2.448	1.618
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	4.166	4.166	4.166	
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		6.614	6.614	6.614	1.618

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		5.265	5.265	5.265	5.265
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		5.265	5.265	5.265	5.265

Giudecca Fabbricato ex Cipriani

Immobile da destinare a residenza (n. 23 alloggi). E' da definire l'incarico di progettazione.
L'importo si riferisce al prezzo di acquisto.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			3.808

Giudecca Ex Magazzini Granari

Intervento di restauro e ristrutturazione su un complesso di valore storico monumentale (legge 1089/39) eseguito in 2 lotti per un totale di n. 76 alloggi.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		9.704	

Giudecca SS. Cosma e Damiano

Intervento di restauro e ristrutturazione su un complesso di valore storico monumentale (legge 1089/39).
Si ricavano 26 unità abitative e botteghe artigiane.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		6.614	

Giudecca Ex pastificio Zaggia

Interventi di ristrutturazione ad uso residenziale per un totale di 32 alloggi.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			5.265

Comune di Venezia

Giudecca Ex fabbrica del ghiaccio

Interventi di ristrutturazione ad uso residenziale per un totale di 23 alloggi.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			2.038

Giudecca Interventi di recupero urbano

Interventi di recupero su alloggi di proprietà comunale ad uso residenziale.

progettazione	istruttoria appalto
	8.000

Giudecca Complesso ex Herion

Il complesso è composto da un blocco a schiera (3 alloggi), dalla villa in stile veneziano, con annesso fabbricato di servizio, parco e cavana, dall'ex edificio ubicato nella ex chiesa (vinoteca) di S. Cosmo e da un fabbricato recente adibito a servizi. L'importo si riferisce al prezzo di acquisto.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			5.950

Lido Immobili Via Dr. J. Beato

Intervento di nuova edificazione per 16 alloggi su area di proprietà comunale.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		3.547

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		2.038	2.038	2.038	2.038
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996 1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997 1998				
TOTALE		2.038	2.038	2.038	2.038

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996 1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997 1998	1.112 6.888	1.112 6.888		
TOTALE		8.000	8.000		

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996 1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997 1998	5.950 5.950	5.950 5.950		
TOTALE		5.950	5.950		

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		3.547	3.547	3.547	2.688
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996 1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997 1998				
TOTALE		3.547	3.547	3.547	2.688

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	8.227	8.227	8.195	4.507
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		8.227	8.227	8.195	4.507

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	457	457	457	457
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		457	457	457	457

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	1.576	1.576	1.576	1.576
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997	1.834	1.834	1.834	1.834
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		3.410	3.410	3.410	3.410

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	845	845	845	132
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		845	845	845	132

21

Immobile Alberoni

L'intervento di ristrutturazione prevede la realizzazione di edilizia residenziale per n. 30 alloggi. Acquisito chiavi in mano.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			8.227

22

Villa Taice

Interventi di ristrutturazione ad uso residenziale per un totale di 8 alloggi.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			457

23

Immobile Calle San Cipriano

Acquisito chiavi in mano di n. 20 alloggi. Interventi di nuova edificazione in cooperativa.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			3.410

24

Immobili oggetto di edilizia sperimentale

Intervento sperimentale (legge 94/82) di manutenzione e ristrutturazione su 8 edifici per complessivi 23 alloggi, parte dei quali (n. 20) occupati.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	
		845	

Comune di Venezia

Acquisizioni di alloggi singoli o raggruppati diffusi nella città.

Il totale programmato viene così suddiviso:

- 7.125 acquisto n. 42 alloggi, la cifra è comprensiva di locali o scoperti adibiti a servizi;

- 100 trattativa in corso;

programmazione	istruzioni appalto	lavori in corso	lavori ultimati
100			7.125

Manutenzione straordinaria e diffusa

Interventi sul patrimonio immobiliare comunale destinato a residenza.

programmazione	istruzioni appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	3.047	17.603	13.927

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996 1997	32 140	32 140	32 140	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997 1998	263 7.225	163 7.125	163 7.125	
TOTALE					6.790

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	20.928	20.928	20.304	16.318	13.906
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996 1997	3.358 5.421	3.358 5.189	3.198 3.015	21
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997 1998	1.903 3.047	1.903 3.047	425	
TOTALE		34.657	33.801	22.956	13.927

Comune di Venezia


Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	130.411	129.787	99,52	120.691	92,55	73.812	56,60
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996	18.792	18.792	100,00	18.632	99,15	8.898	47,35
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	21.155	20.909	98,84	10.377	49,05	617	2,92
	1998	8.220	8.120	98,78	2.088	25,40		
TOTALE		200.393	199.423	99,52	151.768	75,75	83.327	41,58


QUADRO FINANZIARIO - RESIDENZA

STATO AVANZAMENTO - RESIDENZA

progettazione	1.900	1%
Istruttoria appello	16.847	8%
lavori in corso	119.338	60%
lavori ultimati	62.808	31%

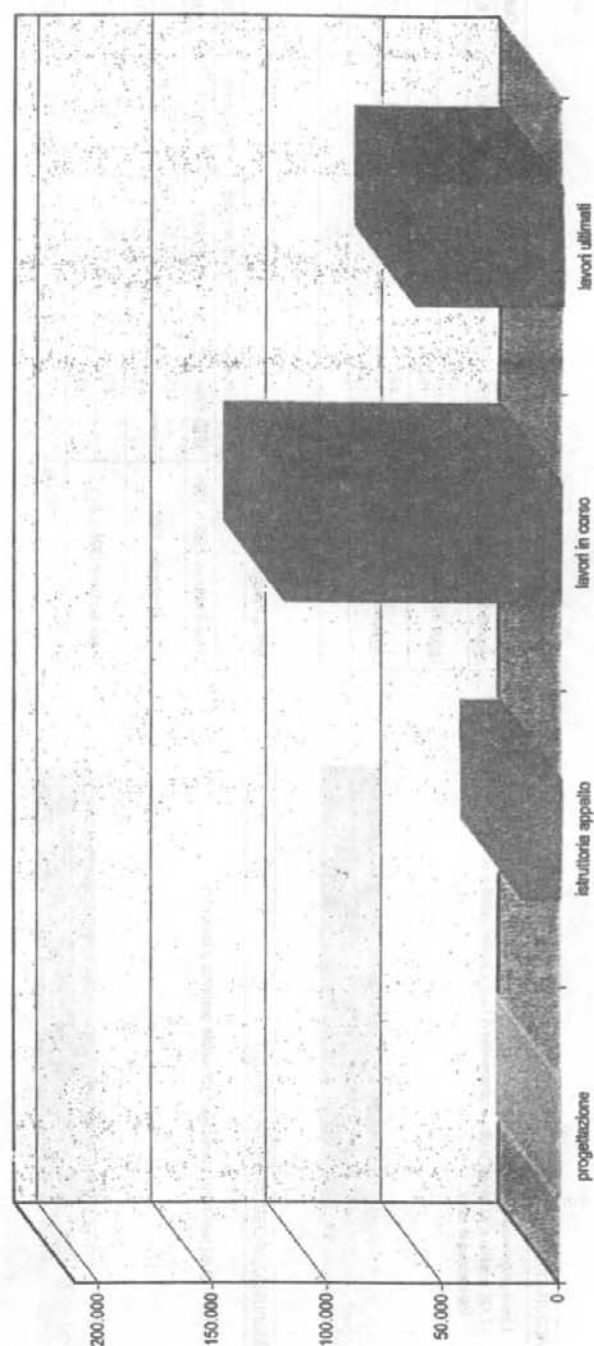

Importi in milioni

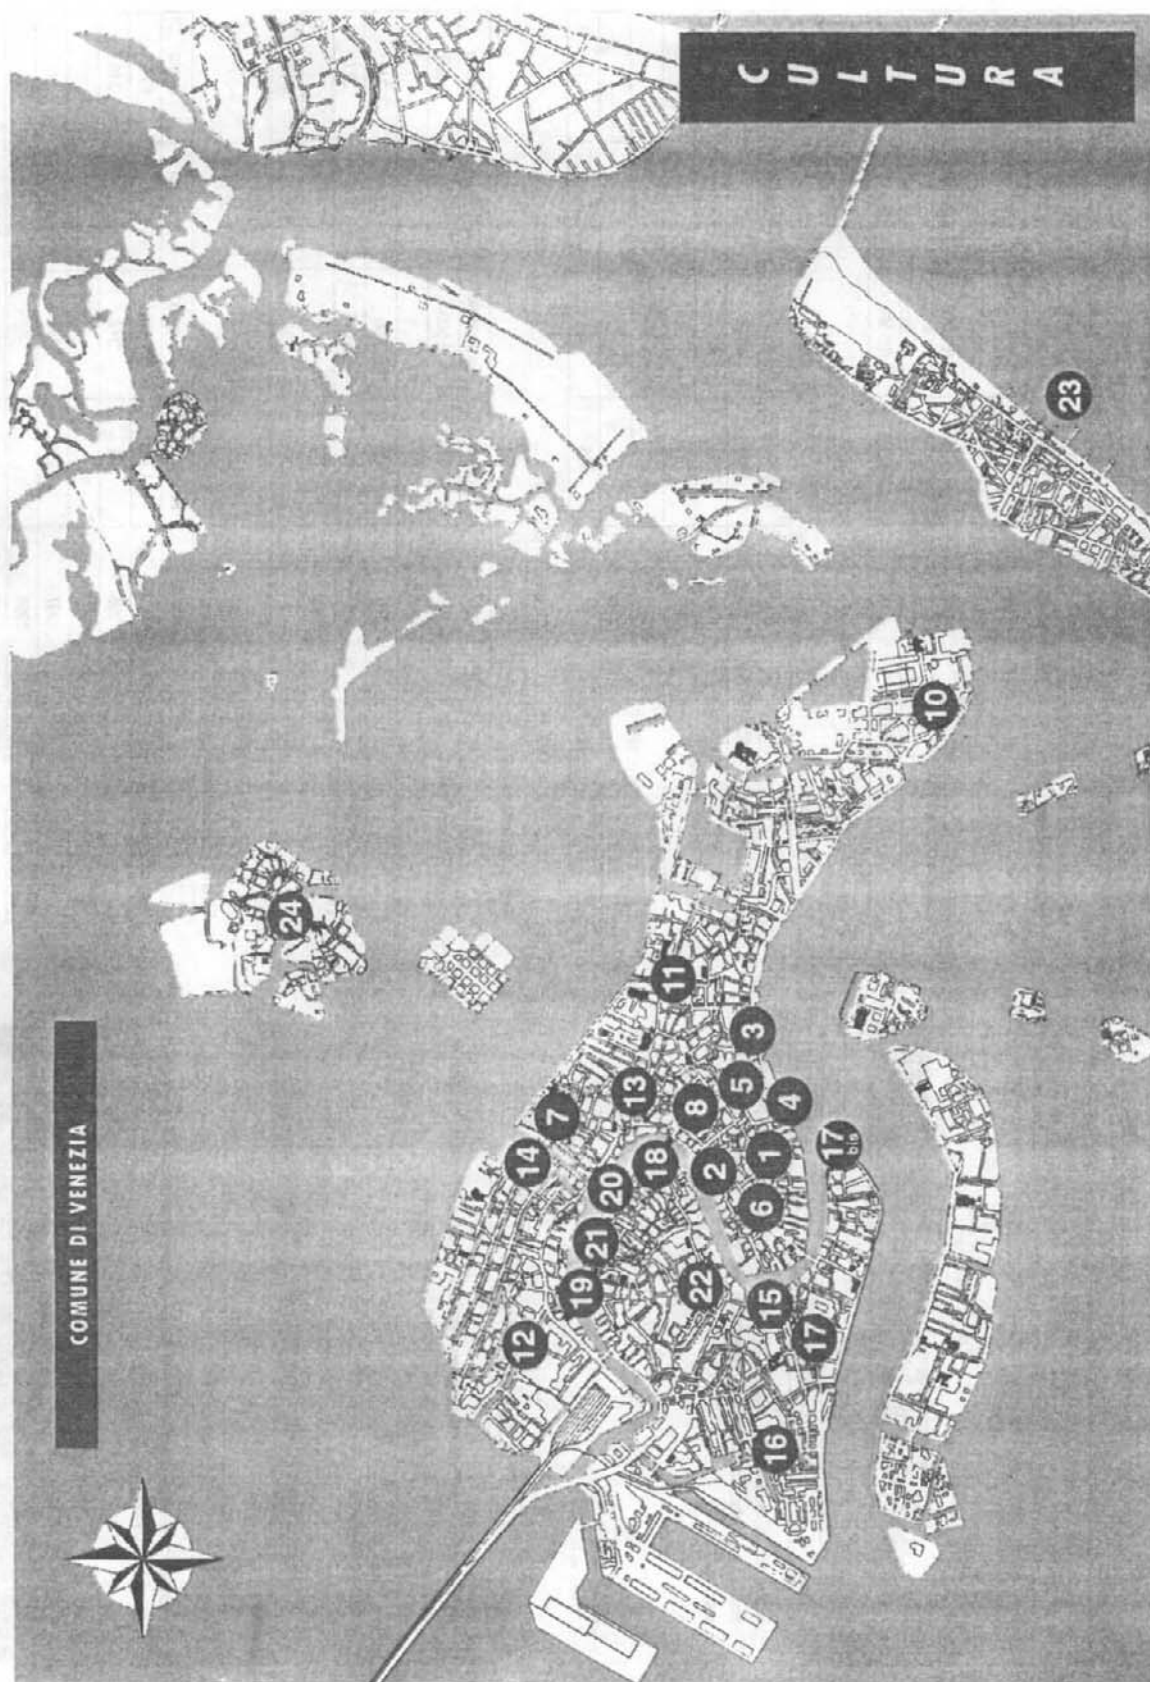

Comune di Venezia

San Marco - San Marco - Teatro La Fenice

La cifra di 1.338 milioni (legge 13/8/92) si riferisce a lavori eseguiti prima dell'incendio del 29 gennaio 1986. La cifra di 102.300 milioni (legge 5/15/96) rappresenta l'anticipazione che l'Amministrazione Comunale ha impegnato per consentire in tempi rapidi l'espletamento dell'appello lanciato per la ricostruzione del teatro (il cui costo totale è stimato in lire 152 miliardi). Come da accordi intercorsi con il governo lo Stato ha provveduto al restituito con un contributo di 5 miliardi di lire di impegno (pari a 80 miliardi) nella Legge 2 ottobre 1997 n. 345.

progettazione	istitutiva appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		102.300	3.298

San Marco - Palazzo Pesaro degli Orfei

Il progetto di restauro del palazzo, di valore storico monumentale, prevede il restauro conservativo e la razionalizzazione dei volumi ad uso museale ed espositivo.

progettazione	istitutiva appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		102.300	3.298

San Marco - Palazzo Ducale e Prigioni

Il Palazzo Ducale simbolo della millenaria storia di Venezia è interessato da lavori di restauro conservativo manufattivo e messa a norma degli impianti.

progettazione	istitutiva appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		5.169	4.131

San Marco - Museo Correr e Procuratie

Interventi di restauro conservativo e di messa a norma degli impianti su immobile di valore storico monumentale.

progettazione	istitutiva appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		2.417	2.053

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		3.298	3.298	3.012	1.786
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	102.300	102.300	102.300	
	1998				
TOTALE		105.598	105.598	105.312	1.786

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		486	486		
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		486	486		

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		3.500	3.500	3.500	3.500
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	800	800	800	244
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	5.000	5.000	5.000	387
	1998				
TOTALE		9.300	9.300	9.300	4.131

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		1.878	1.878	1.878	1.707
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	342	342	342	316
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.250	313	313	30
	1998				
TOTALE		4.470	2.533	2.533	2.053

Comune di Venezia

San Marco Torre dell'Orologio 5

Monumentale edificio costruito sul finire del XV secolo è interessato da lavori di restauro conservativo.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		1.000

San Marco Chiesa di San Maurizio - Mostra Trentennale 6

Acquisizione del diritto d'uso della Chiesa di S. Maurizio da adibire a sede della Mostra "1996 - 1998 Laboratorio Venezia. La Laguna, i fiumi, la città e il mare".

programmazione	700
----------------	-----

San Marco Palazzo "Martin-Pilsen" 7

Edificio localizzato alle spalle della P.zza S. Marco, avente una superficie di circa 7.000 mq (ex albergo ed uffici) che diventerà sede della Biblioteca Storica del Museo Correr.

L'importo si riferisce al prezzo di acquisto.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			15.073

San Marco Cinema Olimpia 8

Acquisito immobile dall'ULSS.

programmazione	1.452
----------------	-------

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996 1997	750	250	250	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997 1998	250	250	250	
TOTALE		1.000	500	500	

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996 1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997 1998	700	700		
TOTALE		700	700		

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996 1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997 1998	15.073	15.073	15.073	
TOTALE		15.073	15.073	15.073	

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		51	51		
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996 1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997 1998	94 1.307	93 1.307	93 1.307	
TOTALE		1.452	1.451	1.400	

Comune di Venezia

9

San Marco Archivio documentazione storica

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			570

10

Castello Padiglione Italia

Progetto di restauro conservativo e ristrutturazione per un utilizzo a sede museale permanente

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			3.902

11

Castello Chiesa San Lorenzo

Restauro conservativo per utilizzo pubblico, culturale, espositivo su immobile di valore storico monumentale.

Progettazione	Istruttoria appalto	
	4.060	

12

Cannaregio Teatrino Groggia

Restauro di tipo conservativo per utilizzo pubblico della struttura.

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso
		1.480

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		570	570	570	570
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		570	570	570	570

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		3.902	3.902	3.831	3.479
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		3.902	3.902	3.831	3.479

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		1.800	1.800	398	13
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.260	2.260		
	1998				
TOTALE		4.060	4.060	398	13

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		994	994	500	311
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	486	486		
	1998				
TOTALE		1.480	1.480	500	311

Comune di Venezia

13

Cannaregio Teatro Malibran

Intervento di restauro conservativo, manutentivo e di messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		25.748

14

Cannaregio Scuola Grande Misericordia

Interventi di restauro conservativo, manutentivo e di ristrutturazione su edificio di valore storico monumentale. Le cifre si riferiscono ai costi di progettazione.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		25.748

15

Dorsoduro Cà Rezzonico

Interventi di restauro conservativo e di messa a norma degli impianti su edificio di valore storico monumentale.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			9.121

16

Dorsoduro Chiesa delle "Terese"

Edificio di valore storico monumentale interessato da lavori di restauro conservativo ed adeguamento alle norme di sicurezza.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		1.787

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	2.980	2.980	2.980	827
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997	5.978	5.978	5.978	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	16.790	16.790	16.790	2.100
	1998				
TOTALE		25.748	25.748	25.748	2.927

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	317	317	256	155
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997	630	630	630	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	101	101	101	
	1998				
TOTALE		1.048	1.048	987	155

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	6.636	6.641	6.153	5.941
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997	78	78	66	66
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.407	2.407	1.747	232
	1998				
TOTALE		9.121	9.126	7.966	6.239

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	287	287	287	287
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.500	1.500	1.068	
	1998				
TOTALE		1.787	1.787	1.355	287

Comune di Venezia

17

Donoduro Chiesa Ognissanti

Intervento manutentivo e messa a norma degli impianti su edificio di valore storico monumentale.

Progettazione	Istruttoria appalto	Lavori in corso	Lavori ultimati
			350

17 bis

Donoduro Magazzini del Sale

Progettazione
320

18

Santa Croce Ca Corner della Regina

Intervento conservativo e messa a norma degli impianti su edificio di valore storico monumentale. Le cifre si riferiscono ai costi di progettazione.

Progettazione	Istruttoria appalto
	10.791

19

Santa Croce Fontego dei Turchi

Intervento manutentivo, conservativo e messa a norma degli impianti, su edificio di valore storico monumentale.

Progettazione	Istruttoria appalto	Lavori in corso
		10.432

Fonti di Finanziamento

	Legge 5 febbraio 1992 n. 139	Legge 20 dicembre 1995 n.	Legge 4 ottobre 1996 n. 515	TOTALE
Annualità 1993-1994 1995-1996				
1996				
1997				
1998				
Programmato	350			350
Impegnato	350			350
Obbligato	341			341
Speso	155			155

Fonti di Finanziamento

	Legge 5 febbraio 1992 n. 139	Legge 20 dicembre 1995 n.	Legge 4 ottobre 1996 n. 515	TOTALE
Annualità 1993-1994 1995-1996				
1996				
1997				
1998				
Programmato			320	320
Impegnato			320	320
Obbligato				
Speso				

Fonti di Finanziamento

	Legge 5 febbraio 1992 n. 139	Legge 20 dicembre 1995 n.	Legge 4 ottobre 1996 n. 515	TOTALE
Annualità 1993-1994 1995-1996				
1996				
1997				
1998				
Programmato	251	30	265	546
Impegnato	251	30	265	546
Obbligato	251	30	265	546
Speso				

Fonti di Finanziamento

	Legge 5 febbraio 1992 n. 139	Legge 20 dicembre 1995 n.	Legge 4 ottobre 1996 n. 515	TOTALE
Annualità 1993-1994 1995-1996				
1996				
1997				
1998				
Programmato	1.932		2.500	4.432
Impegnato	1.932		2.500	4.432
Obbligato	1.932		2.500	4.432
Speso	794		78	872

Comune di Venezia

Santa Croce Cà Pesaro 20

Intervento manutentivo, conservativo e messa a norma degli impianti, su edificio di valore storico monumentale.

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso
		7.878

Santa Croce Palazzo Mocenigo 21

Intervento manutentivo, conservativo e messa a norma degli impianti, su edificio di valore storico monumentale.

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			554

San Polo Casa Gondoni 22

Intervento manutentivo, conservativo e messa a norma degli impianti, su edificio di valore storico monumentale.

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso
		3.900

Lido Palazzo del Cinema 23

Intervento di manutenzione e messa a norma degli impianti.

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			1.702

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1.027		1.027	366	
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	6.851	6.851	6.791	27
	1998				
TOTALE		7.878	7.878	7.157	27

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	554		554	432	432
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		554	554	432	432

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	3.900		3.657	378	164
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		3.900	3.657	378	164

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1.056		1.056	979	979
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	309	309	309	309
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	337	337		
	1998				
TOTALE		1.702	1.702	1.288	1.288

Comune di Venezia

24

Murano Palazzo Giustiniani

Intervento manutentivo, conservativo e messa a norma degli impianti, su edificio di valore storico monumentale. - Museo Vetrario

struttura oppalto	lavori in corso
	3.421

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	921	921	482	144
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.500	2.500	433	
	1998				
TOTALE		3.421	3.421	915	144

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento


	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	36.690	36.452	99,35	28.526	77,75	21.244	57,90
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996	1.080	1.080	100,00	1.068	98,89	382	35,37
	1997	8.203	7.703	93,90	7.703	93,90	553	6,74
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	147.534	145.596	98,69	137.035	92,88	2.854	1,93
	1998	31.636	31.636	100,00	22.630	71,53		
TOTALE		225.143	222.467	98,81	196.962	87,46	25.033	11,12

(*) - tutti gli interventi sono soggetti a vincolo ai sensi della Legge 1059/09


QUADRO FINANZIARIO - CULTURA

STATO AVANZAMENTO - CULTURA (*)

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
4.006	14.851	165.532	40.754
5%	7%	74%	18%

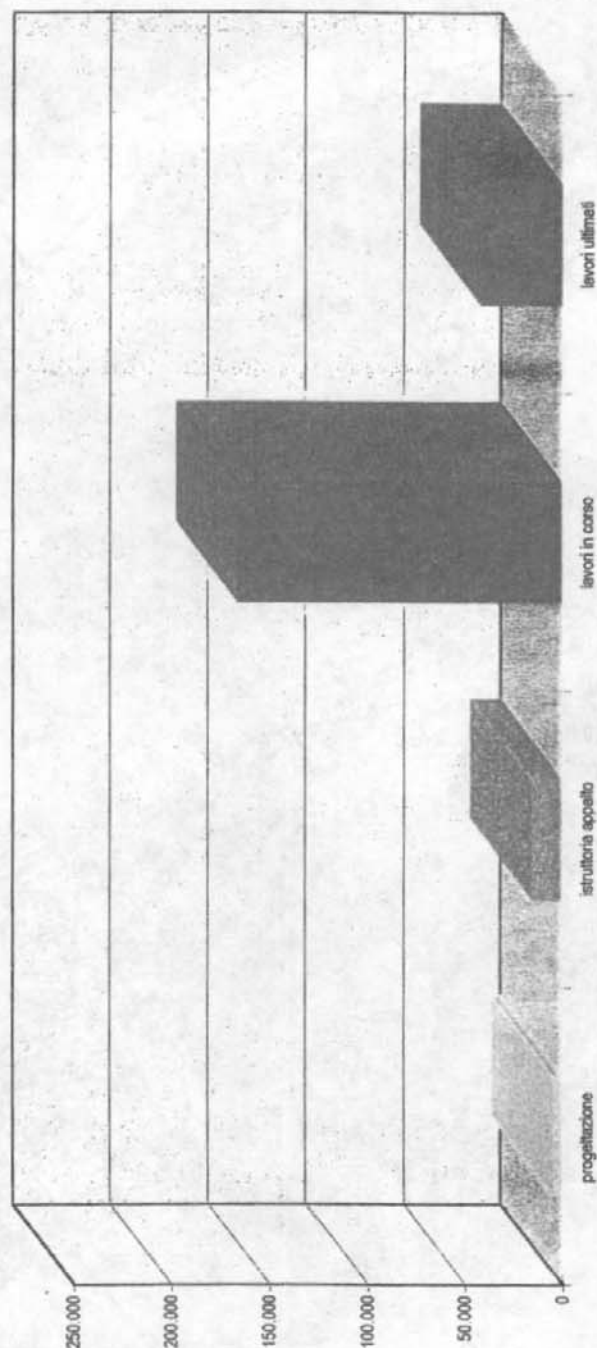

importi in milioni

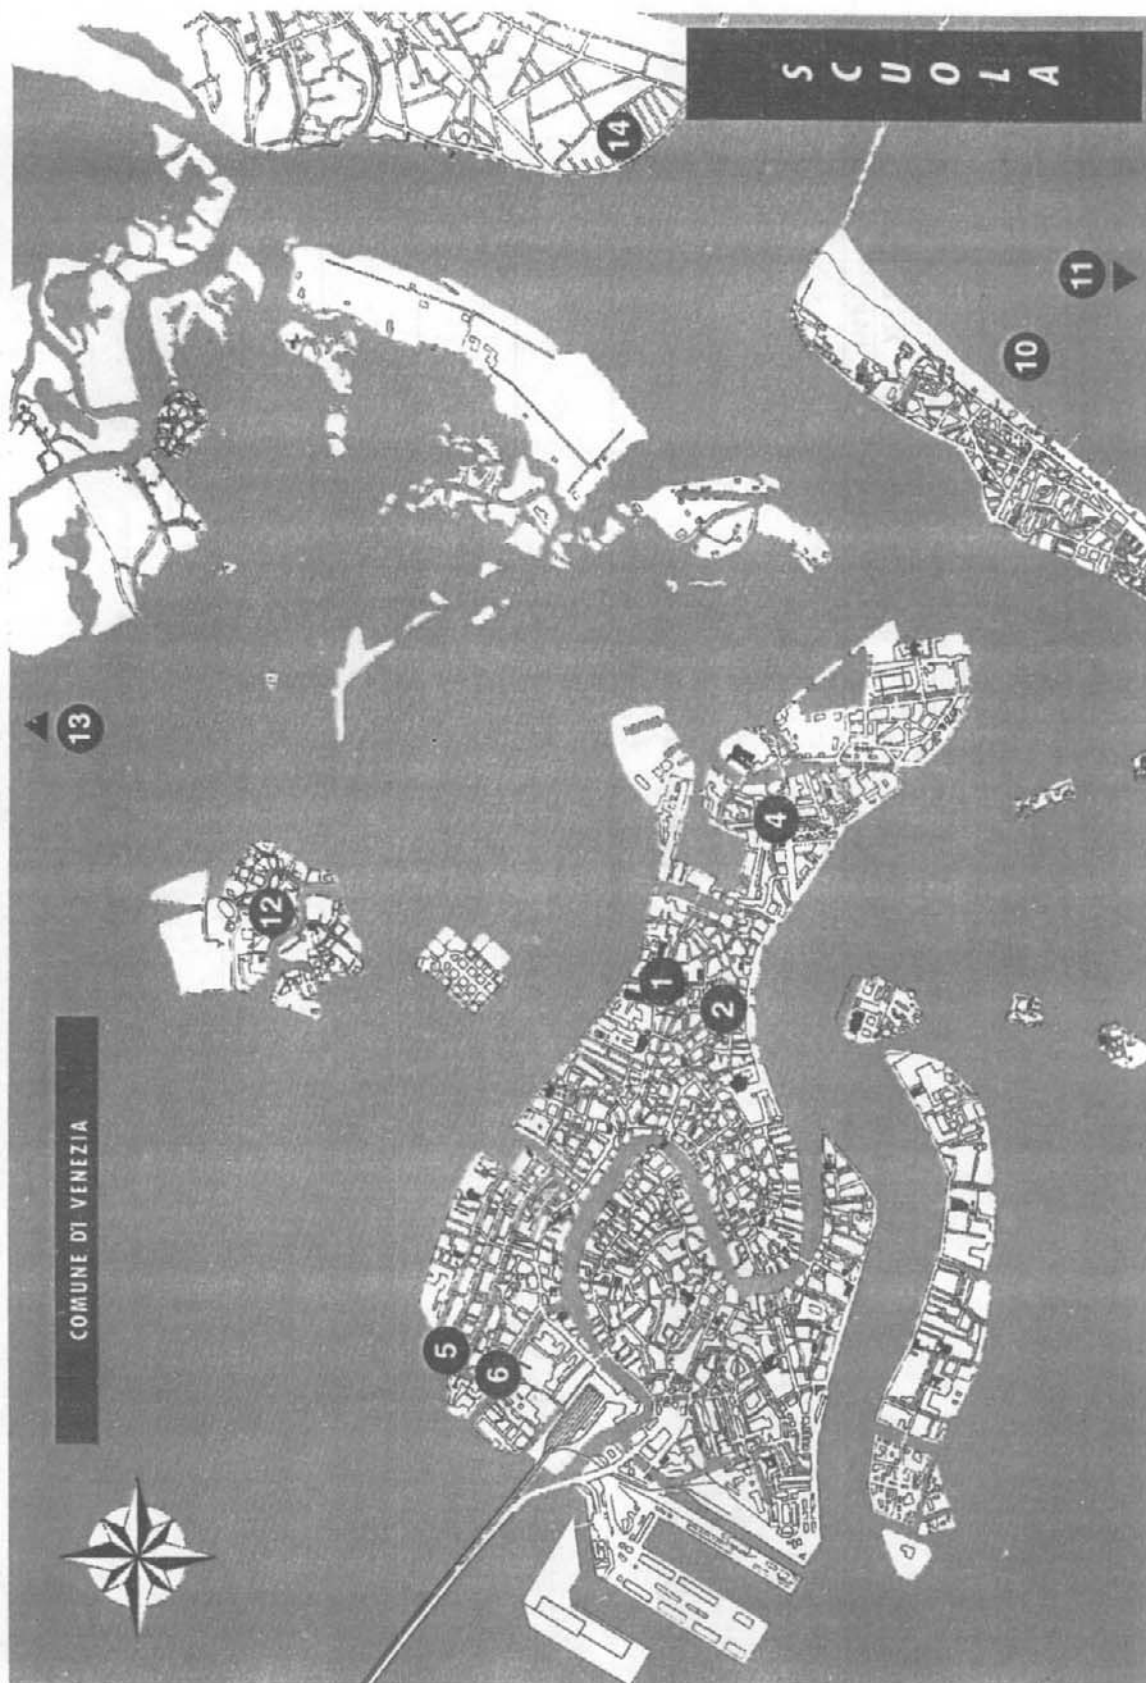

Comune di Venezia

Castello Ex Convento S. Giovanni laterano (Ist. Turistico Barbarigo) 1

Intervento manutentivo e messa a norma degli impianti su edificio di valore storico monumentale (legge 1089/39).

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		9.380

Fonti di Finanziamento	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	2.019	2.019	2.019	439
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997	570	570	570	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	6.791	6.791	6.791	
	1998				
TOTALE		9.380	9.380	9.380	439

Castello Palazzo Barbarigo (Ist. Professionale per il Commercio) 2

Intervento manutentivo e messa a norma degli impianti su edificio di valore storico monumentale (legge 1089/39).

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		2.285

Fonti di Finanziamento	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	2.285	1.581	1.026	280
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.285	1.581	1.026	280

Cannaregio San Girolamo (Istituto d'arte) 5

Intervento manutentivo e messa a norma degli impianti. (EdilVenezia)

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		400

Fonti di Finanziamento	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	400	400	249	249
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		400	400	249	249

Cannaregio Palazzo Nani (Complesso scolastico Caboto) 5

Intervento di restauro e messa a norma degli impianti su edificio di valore storico monumentale (legge 1089/39).

progettazione	istruttoria appalto	
		7.458

Fonti di Finanziamento	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	500	500	44	44
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997	3.580	3.580		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.622	2.622		
	1998	756	756		
TOTALE		7.458	7.458	44	44

Comune di Venezia

Lido San Giovanni Bosco

Interventi di manutenzione e alle cucine per pluriservizi nelle scuole.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			1.000

Pellestrina Scuola Media Loredan

Nuova edificazione nel sito della precedente scuola media.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			2.533

Murano Asilo nido Principessa M. Letizia

Restauro manufattivo e messa a norma degli impianti.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			658

Burano Scuola elementare Di Cocco

Restauro manufattivo e messa a norma degli impianti.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			774

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.000	1.000	779	446
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.000	1.000	779	446

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.555	2.555	2.555	2.533
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	111	111		
	1998				
TOTALE		2.666	2.666	2.555	2.533

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	625	625	555	555
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	33	33		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		658	658	555	555

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	774	774	774	681
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		774	774	774	681

Comune di Venezia

Punta Sabbioni
Nuova edificazione per uso multidisciplinare

14

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			1.224

Manutenzione straordinaria e diffusa (NOP, CEI)

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	4.190	6.855	5.587

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1.224	1.224	1.223	1.214	1.165
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.224	1.223	1.214	1.165

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	9.128	9.128	8.727	4.717	3.952
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	100	100	100	86
	1997	3.214	3.125	303	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	4.053	3.869	467	100
	1998	137	137		
TOTALE		16.632	15.968	5.587	4.138

Comune di Venezia


Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	20.510	19.404	94,61	13.932	67,93	10.344	50,43
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996	4.250	4.250	100,00	670	15,76	86	2,02
	1997	12.660	12.571	99,30	7.094	56,03		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	4.920	4.736	96,26	467	9,49	100	2,03
	1998	137	137	100,00				
TOTALE		42.477	41.098	96,75	22.163	52,18	10.530	24,79


QUADRO FINANZIARIO - SCUOLA

STATO AVANZAMENTO - SCUOLA

progettazione	istruttoria appello	lavori in corso	lavori ultimati
11.648	18.920	11.509	
27%	45%	28%	

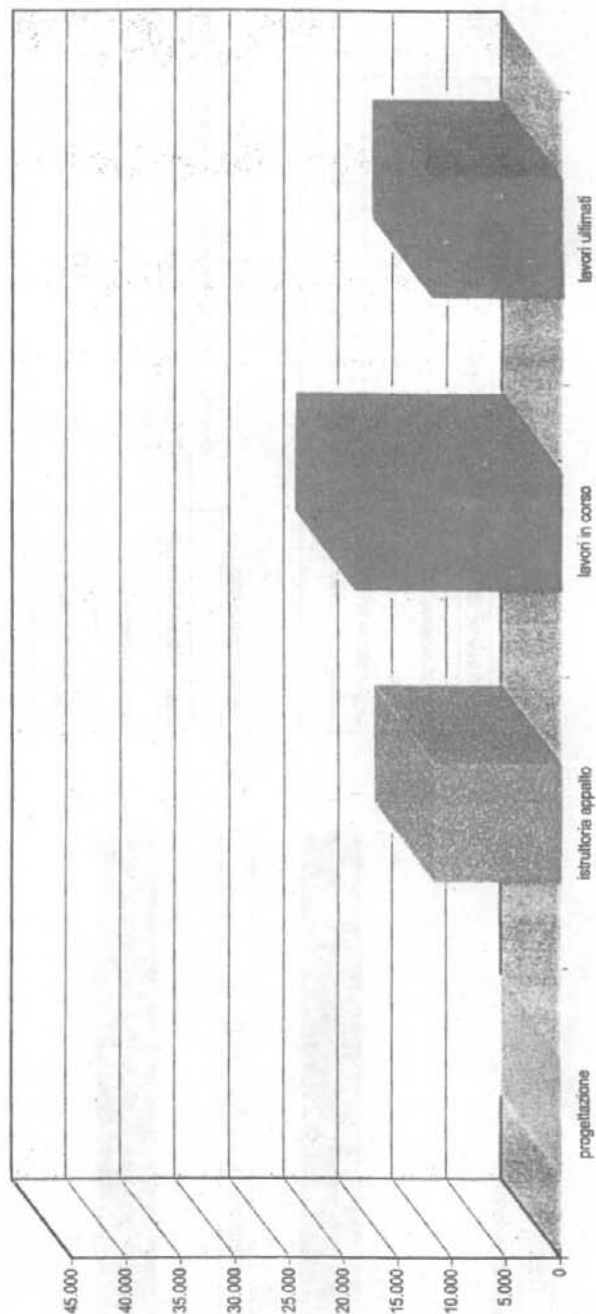

importi in milioni

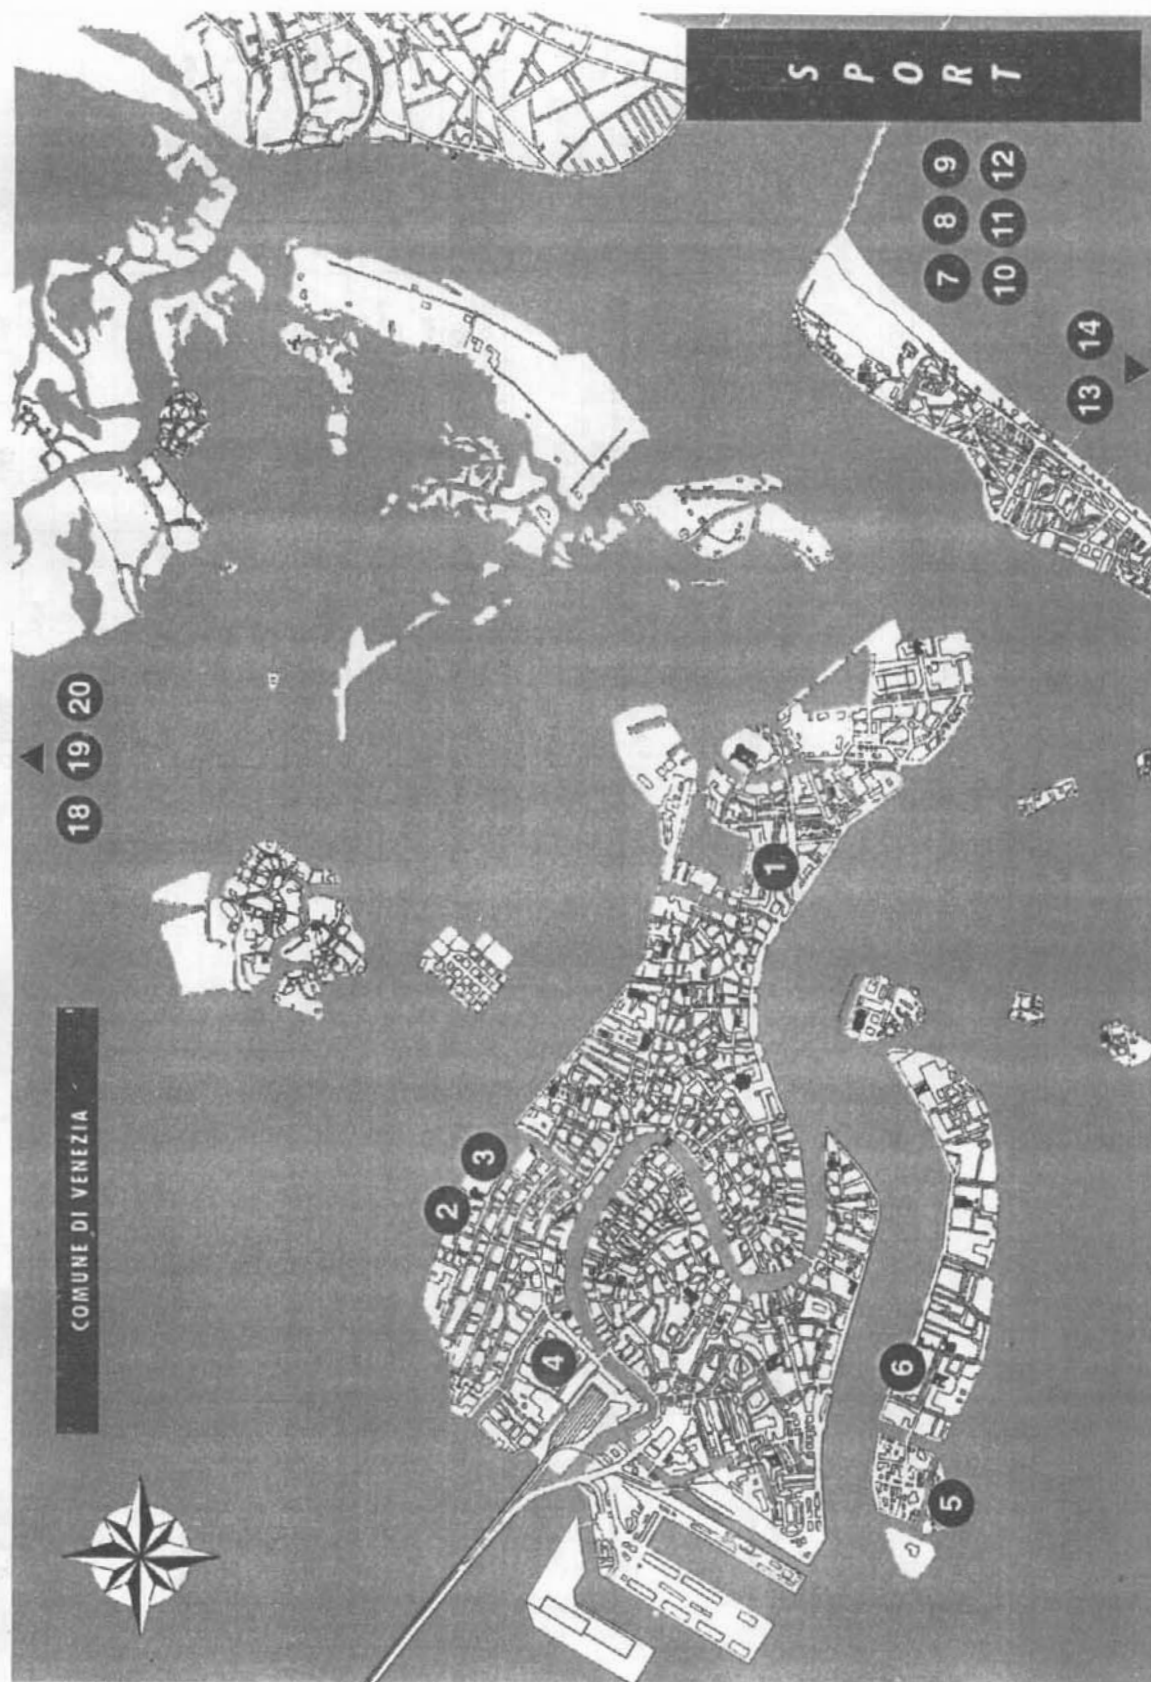

Comune di Venezia

1
Castello Palasport Arsenalè

Messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			850

2
Cannaregio Centro Sportivo Sant'Alvise

Nel rispetto delle preesistenti architetture l'intervento prevede la realizzazione di un impianto natatorio, attrezzature sportive varie e di ricreazione.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		2.770	10.126

3
Cannaregio Remiere

Nuova costruzione capannone. Ricostruzione imbarcazioni.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		3.400

4
Cannaregio Opera Pia Coletti

Ristrutturazione impianti sportivi esistenti.

progettazione
1.500

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	850	850	850	775	598
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		850	850	775	598

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	6.802	6.802	6.802	6.583	3.359
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	2.598	2.598	2.598	492
	1997	1.322	1.322		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.160	1.160	935	
	1998	1.214	1.214		
TOTALE		12.896	12.896	10.126	3.851

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	800	800	800	800	
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	2.168	2.168	1.991	60
	1997	432	432	432	200
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		3.400	3.400	3.223	260

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	1.500	1.500	1.500	
TOTALE		1.500	1.500	1.500	

Comune di Venezia

5

Giudecca Complesso Sportivo Sacca San Biagio

Il progetto prevede attrezzature per una pluralità di discipline. Oltre alla piscina già in uso sono previsti ricoveri per imbarcazioni, campi da tennis, bocciodromo e opere di urbanizzazione.

progettazione	strutturata appalto	lavori in corso
		7.917

6

Giudecca Remiere ex CNMOV

Restauro su immobile per ricovero imbarcazioni.

progettazione	strutturata appalto	lavori in corso
		2.705

7

Lido Bocciodromo

Ristrutturazione e messa a norma dell'impianto.

progettazione	
88	

8

Lido Palestra Terre Perse

Manutenzione e messa a norma dell'impianto.

progettazione	strutturata appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			837

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		5.755	5.755	4.940	311
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	1.000	1.000	1.000	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.162	1.162	1.000	
	1998				
TOTALE		7.917	7.917	6.940	311

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		1.705	1.705	1.105	81
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	1.000	1.000	429	58
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.705	2.705	1.534	139

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	88	88		
	1998				
TOTALE		88	88		

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		837	837	824	755
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		837	837	824	755

Comune di Venezia

Lido Patinodromo Quattro Fontane

Ristrutturazione e messa a norma dell'impianto.

progettazione	istruttoria appalto
	2.500

Lido Campo da calcio Quattro Fontane

Manutenzione e messa a norma dell'impianto.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			600

Lido Campo da calcio e rugby Terre Perse

Manutenzione e messa a norma dell'impianto.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		471

Lido Piscina

Nuova edificazione di impianto sportivo natatorio.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		7.894

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.500	2.500	6	6
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.500	2.500	6	6

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	600	600	600	590
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		600	600	600	590

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	471			
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		471			

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	3.506	3.506	3.506	425
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	4.388	4.388	4.388	
	1998				
TOTALE		7.894	7.894	7.894	425

Comune di Venezia

13

Pellestrina Centro Sportivo

Manutenzione degli impianti esistenti.

progettazione istruttoria appalto
1.050

Fonti di Finanziamento	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	600	600		
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997	225	225		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	225	225		
	1998				
TOTALE		1.050	1.050		

14

Pellestrina S. Pietro in Volta - Centro polisportivo

Realizzazione di un campo da calcio, tennis e palazzetto polifunzionale.

progettazione
€ 000

Fonti di Finanziamento	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997	1.000	1.000	190	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	3.000	3.000		
TOTALE		4.000	4.000	190	

15

Murano Centro Sportivo San Mattia

Intervento di ristrutturazione, manutenzione e messa a norma degli impianti.

progettazione istruttoria appalto
lavori in corso
2.826

Fonti di Finanziamento	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	2.715	2.715	2.376	110
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	111	111		
	1998				
TOTALE		2.826	2.826	2.376	110

16

Murano Palestra L. Perjano

Intervento di manutenzione e messa a norma degli impianti.

progettazione istruttoria appalto
lavori in corso
lavori ultimati
1.420

Fonti di Finanziamento	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	1.420	1.420	1.246	1.199
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.420	1.420	1.246	1.199

Comune di Venezia

17

San'Erasmo Remiere

Nuova costruzione capennone. Ricovero imbarcazioni.

Programma
1.500

18

Burano Mazzorbo - Palestra

Progetto di nuova edificazione di un palazzetto polifunzionale.

Programma
6.057

19

Burano Mazzorbo - Centro sportivo

Realizzazione di un campo da calcio e strutture polifunzionali.

Programma
1.286

20

Burano Remiere

Acquisizione immobile per ricovero imbarcazioni.

Programma
1.252

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1998	1.500			
TOTALE		1.500			

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		4.000	4.000	3.632	3.632
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	257	257	200	200
	1997				
	1997	1.800	1.800	1.593	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1998				
TOTALE		6.057	6.057	5.425	3.832

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		1.000	1.000		
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	286	266		
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1998				
TOTALE		1.286	1.266		

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	1.252	1.244	1.244	1.244
	1997				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1998				
TOTALE		1.252	1.244	1.244	1.244

Comune di Venezia

Manutenzioni straordinarie e diffuse

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		1.344	3.037

Fonti di Finanziamento

	Annuale 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		3.975	3.975	3.037	2.831
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	75			
	1997	114			
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	217			
TOTALE		4.381	3.975	3.037	2.831

Comune di Venezia


Fonti di Finanziamento

Fonti di Finanziamento	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	36.865	36.865	100,00	29.440	79,86	13.897	37,70
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996	6.350	6.267	98,69	6.033	95,01	1.996	31,43
	1997	5.850	5.245	89,66	2.051	35,06	258	4,41
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	8.934	8.934	100,00	7.916	88,61		
	1998	7.431	5.714	76,89	1.500	20,19		
TOTALE		65.430	63.025	96,32	46.940	71,74	16.151	24,68


QUADRO FINANZIARIO - SPORT

STATO AVANZAMENTO - SPORT

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
7.086	3.550	30.513	24.179
11%	5%	47%	37%

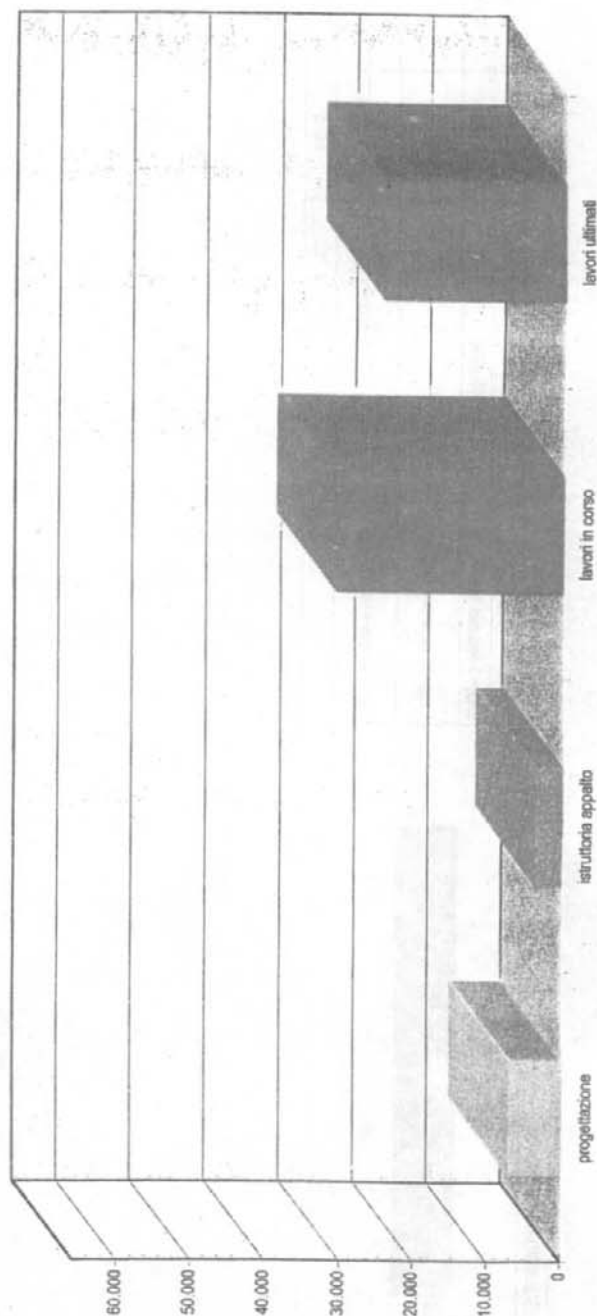

importi in milioni

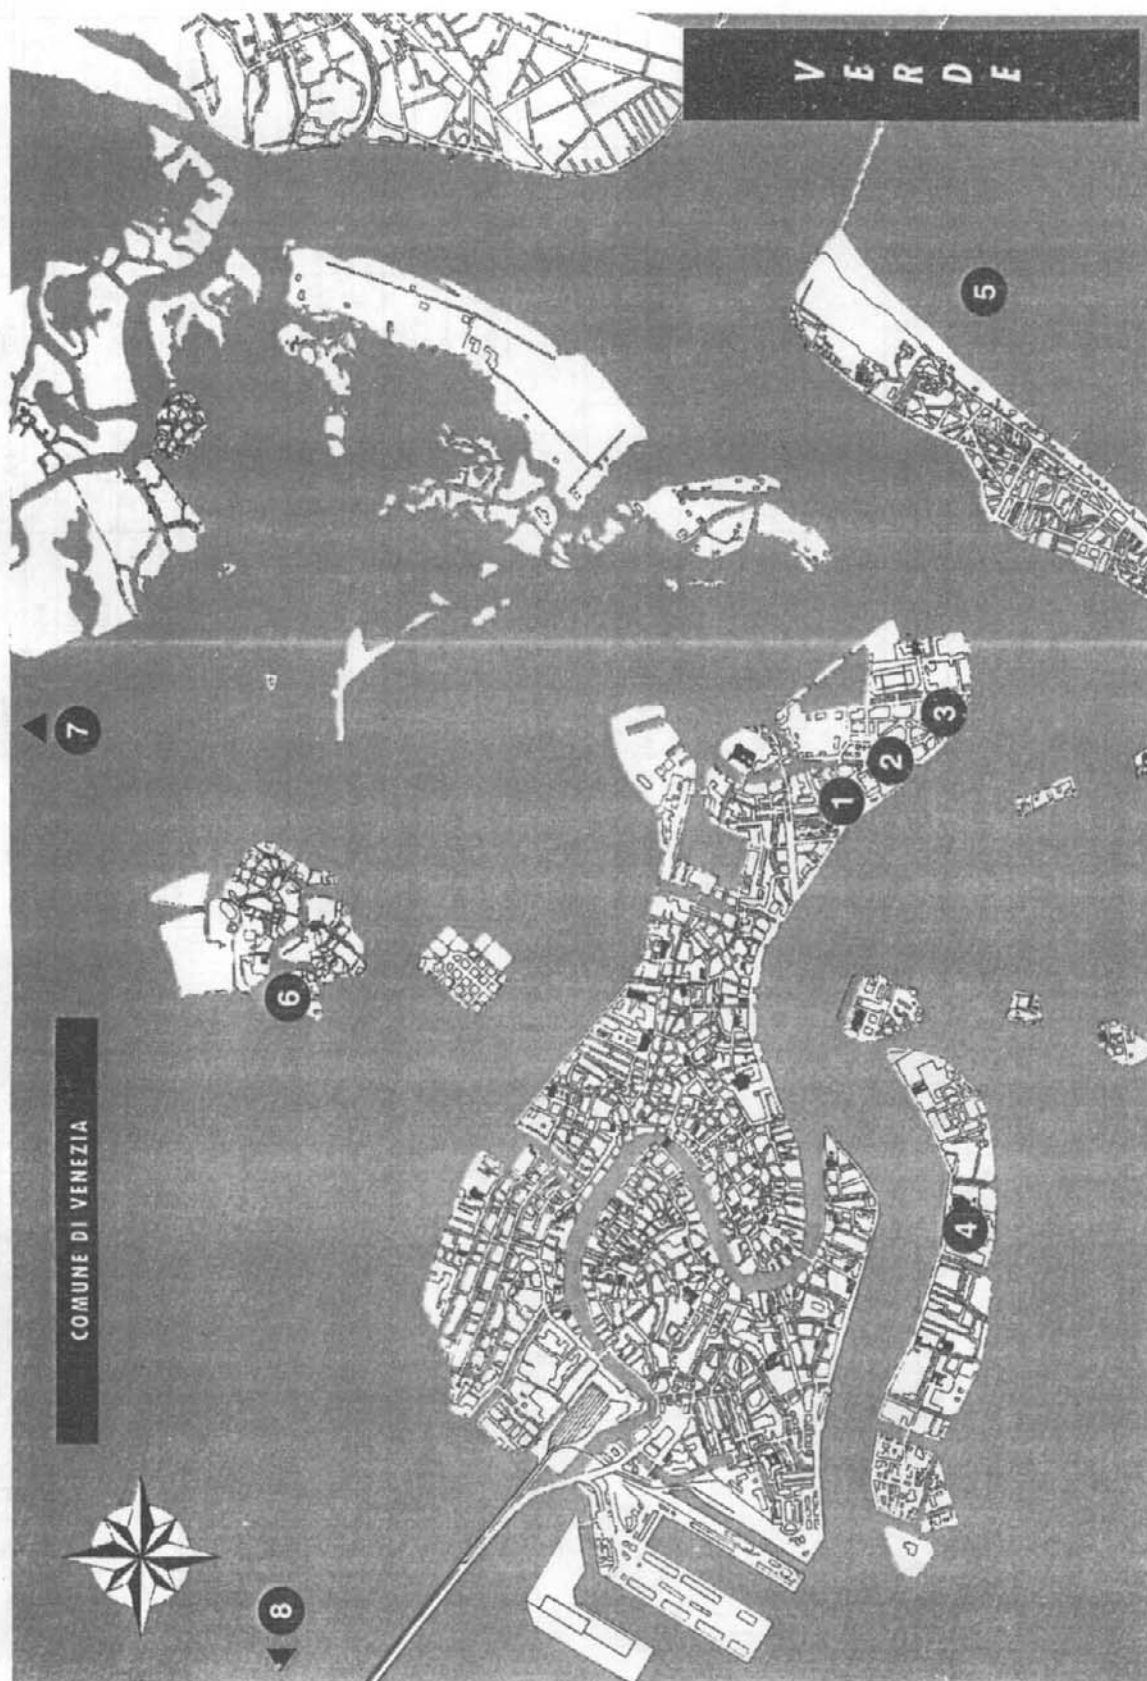

Comune di Venezia

Castello Giardini

Il progetto prevede la sistemazione della viabilità interna e delle essenze arboree.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			2.147

Castello Serra Giardini

Intervento di manutenzione e restauro del manufatto risalente alla fine dell'ottocento.

programmazione
790

Sant'Elena Sant'Elena - Pineta

Il progetto interessa la manutenzione dell'area verde e della viabilità interna.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		1.088

Giudecca Parco San Giacomo

Intervento di manutenzione e sistemazione dell'arredo.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		354

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		1.666	1.666	1.439	1.439
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	481	481	436	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.147	2.147	1.875	1.439

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		83	83		
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	280	280		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	278	278		
	1998	149	149		
TOTALE		790	790		

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	1.088	1.088	959	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.088	1.088	959	

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	354	354	310	
	1998				
TOTALE		354	354	310	

Comune di Venezia

Lido Area ex Luna Park e Planetario

Intervento di manutenzione dell'area verde e restauro dei manufatti.

Progettazione
100

Murano Area verde PEEP San Donato

Intervento di manutenzione e di arredo urbano.

Progettazione
Istruttoria appalto
500

Burano Mazzorbo - Parco

Intervento di manutenzione e di arredo urbano.

Progettazione
492

San Giuliano Realizzazione Parco San Giuliano

L'area interessata dal progetto è pari a 700 ettari.
L'articolato progetto, in parte finanziato dalla Comunità Europea (URBAN), prevede la creazione di aree verdi, ricreative, associative e infrastrutture.Progettazione
Istruttoria appalto
Lavori in corso
10.751

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	100	100	90	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		100	100	90	

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	500	499	499	
	1998				
TOTALE		500	499	499	

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	492	492		
	1998				
TOTALE		492	492		

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		1.951	1.951	1.951	474
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	5.849	5.849	5.849	
	1998	2.951	2.951	2.951	
TOTALE		10.751	10.751	10.751	474

TOTALE		1981	1982	1983	1984
Legge 4 ottobre 1980 n° 212	1988				
	1987	388	198	18	
	1986	322	322		
Legge 30 dicembre 1982 n°					
Legge 2 febbraio 1983 n° 138		834	834	532	532
Totale		1212	1020	550	550

Fonte: Bilancio 1983

Comune di Venezia

Legge 4 ottobre 1980 n° 212	Legge 30 dicembre 1982 n°	Legge 2 febbraio 1983 n° 138
1988	1987	1986

Legge 4 ottobre 1980 n° 212

QUADRO FINANZIARIO - VERDE


Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento


	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	4.524	4.524	100,00	3.685	81,45	2.208	48,81
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996							
	1997	2.304	2.204	95,66	1.485	64,45		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	7.861	7.668	97,54	6.674	84,90		
	1998	3.100	3.100	100,00	2.951	95,19		
TOTALE		17.789	17.496	98,35	14.795	83,17	2.208	12,41

STATO AVANZAMENTO - VERDE

	progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	1.382 6%	500 3%	13.449 76%	2.458 14%

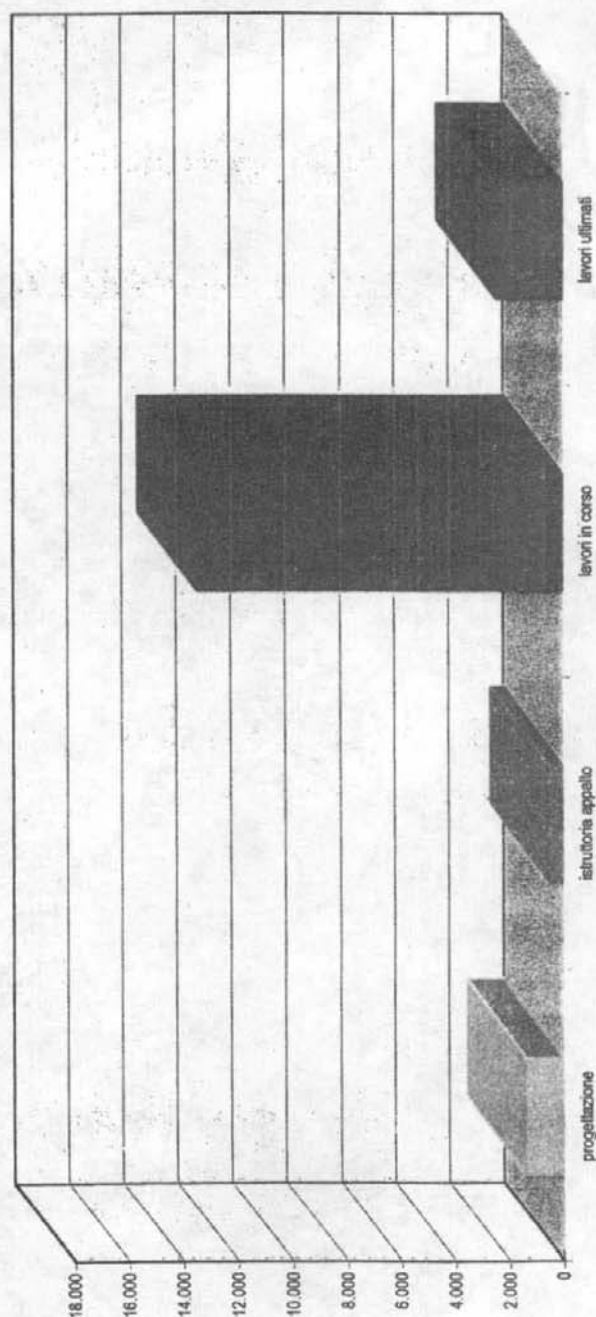

importi in milioni

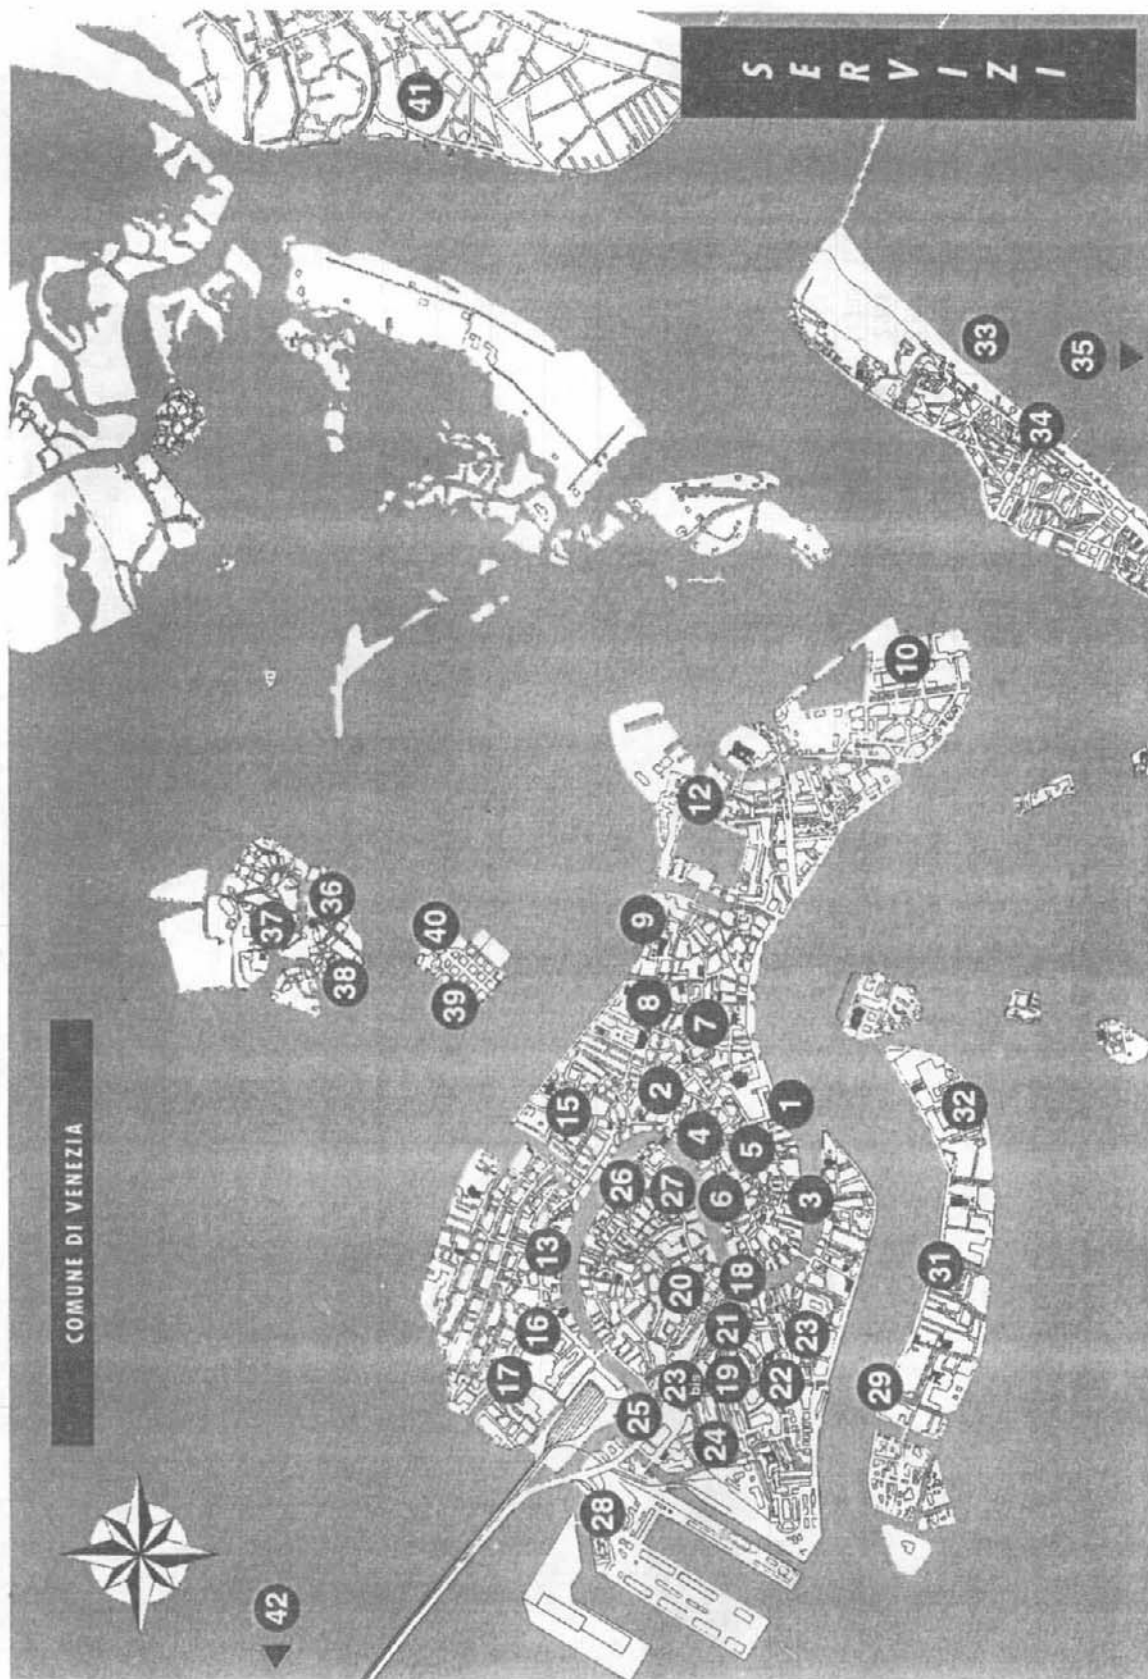

Comune di Venezia

San Marco - **Cà Giustinian**

Il progetto prevede un radicale restauro conservativo e messa a norma degli impianti dell'edificio risalente al XV secolo. (legge 1089/39).

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso
		11.882

San Marco - **Cà Loredan e Cà Farsetti**

Interventi di restauro e messa a norma degli impianti sui monumentali palazzi comunali di Cà Loredan e Cà Farsetti, sedi dell'Amministrazione Comunale.

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso
		6.175

San Marco - **Palazzo Zaguri**

Il progetto prevede interventi di restauro conservativo e messa a norma degli impianti dell'edificio risalente al XV secolo.

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso
		950

San Marco - **Casa Corner**

Uso uffici immobile vincolato a seguito esercizio diritto di prelazione. L'importo si riferisce al prezzo di acquisto.

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			4.284

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		3.383	3.383	3.239	1.248
Legge 20 dicembre 1995 n. 1996					
Legge 20 dicembre 1995 n. 1997		6.499	6.489	787	245
Legge 4 ottobre 1996 n. 515		2.000	2.000		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515					
TOTALE		11.882	11.872	4.026	1.491

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		1.777	1.777	1.572	1.572
Legge 20 dicembre 1995 n. 1996		500	500	445	
Legge 20 dicembre 1995 n. 1997		985	985		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515		2.063	2.063	550	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515		850	850		
TOTALE		6.175	6.175	2.567	1.572

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n. 1996		950	60	55	
Legge 20 dicembre 1995 n. 1997					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515					
TOTALE		950	60	55	

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		4.284	4.284	4.284	4.284
Legge 20 dicembre 1995 n. 1996					
Legge 20 dicembre 1995 n. 1997					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515					
TOTALE		4.284	4.284	4.284	4.284

Comune di Venezia

San Marco Immobile Campo Marini

Immobile di 4.562 mq. per uso uffici. L'importo si riferisce al prezzo di acquisto.

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			15.210

San Marco Immobile Campo San Beneto

Uso uffici. L'importo si riferisce al prezzo di acquisto.

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			1.750

Castello Palazzo Zorzi

Il palazzo risalente agli inizi del XVI secolo è oggetto di una convenzione tra il Comune e l'UNESCO che vi insedierà gli uffici italiani del ROSTE (Regional Office Science Technology Europe). Le cifre si riferiscono ai costi di progettazione.

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso
		600

Castello Palazzo Gradenigo

Palazzo monumentale risalente al secolo XVIII. Interessato da lavori di restauro conservativo e messa a norma degli impianti. Sede Centro Elaborazione Dati.

Progettazione	Istruttoria appalto	lavori in corso
		5.318

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	408	408	408	408
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	14.802	14.802	14.802	14.802
	1998				
TOTALE		15.210	15.210	15.210	15.210

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		1.750	1.750	1.750	1.750
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.750	1.750	1.750	1.750

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		600	600	600	
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		600	600	600	

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		4.664	4.664	4.204	582
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	654	654	617	
	1998				
TOTALE		5.318	5.318	4.821	582

Comune di Venezia

Castello Archivio storico 'Celestia'

Interventi di restauro conservativo.

9

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			1.150

Castello Convento Sant'Elena

Antico complesso conventuale risalente al XIII secolo, oggetto di restauro conservativo e razionale distribuzione dei volumi interni.

10

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		2.713

Castello Cantiere ACTV

Restauro conservativo capannoni all'Arsenale per insediamento cantiere navale.

12

progettazione
3.500

Camarego Cà Vendramin Calergi

Intervento di restauro conservativo del rinascimentale palazzo e di messa a norma degli impianti.

13

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		7.297

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	850	850	850	795	795
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	300			
	1998				
TOTALE		1.150	850	795	795

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	110	110	110	110	107
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	2.597	2.597	2.439	49
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1998	6			
TOTALE		2.713	2.707	2.549	156

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	700	700	700	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.800	2.800	2.800	
	1998				
TOTALE		3.500	3.500	3.500	

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	5.253	5.253	5.253	5.207	571
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	2.044	2.044	2.044	
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1998				
TOTALE		7.297	7.297	7.251	571

Comune di Venezia

Cannaregio ex Convento dei Crociferi 15

Il grande complesso conventuale, risalente al XVI secolo, è oggetto di restauro conservativo e di razionale distribuzione dei volumi interni che risultano alterati per fuso militare al quale furono adatti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		6.004

Cannaregio Palazzo Manfrin Venier 16

Palazzo costruito nel XVIII secolo oggetto di restauro conservativo e messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		3.375

Cannaregio Palazzo Bonfadini 17

Intervento di ristrutturazione su palazzo settecentesco vincolato (legge 1089/38). Attualmente sede ANAV. Acquisizione chiavi in mano.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			2.384

Dorsoduro Cà Foscari - Sede Università 18

Il restauro conservativo e manutentivo dell'edificio tendente a risolvere i gravi problemi statici della facciata lungo il Canal Grande ed il rio di Cà Foscari (intervento parziale).

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		5.000

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		5.454	5.454	5.454	1.550
Legge 20 dicembre 1995 n. 1996					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515		550	480	480	480
TOTALE		6.004	5.934	5.934	2.030

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		3.120	3.120	3.120	113
Legge 20 dicembre 1995 n. 1996					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515		255			
TOTALE		3.375	3.120	3.120	113

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		2.384	2.384	2.374	2.374
Legge 20 dicembre 1995 n. 1996					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515					
TOTALE		2.384	2.384	2.374	2.374

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n. 1996					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515		5.000	5.000	5.000	
TOTALE		5.000	5.000	5.000	

Comune di Venezia

Dorsoduro Immobile Santa Margherita 19

Acquisto immobile uso uffici.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			1.044

Dorsoduro Caserma Vigili del Fuoco 20

Interventi di restauro.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			950

Dorsoduro Spazio polivalente Rio Novo 21

Ristrutturazione immobile destinato ad usi civili quariferali.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	
		1.250	

Dorsoduro Palazzo Minotto 22

Restauro conservativo su immobile vincolato ai sensi della legge 1089/39.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	
		2.590	

Fonti di Finanziamento

	Annuale	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.044	1.044	1.044	
	1998				
TOTALE		1.044	1.044	1.044	

Fonti di Finanziamento

	Annuale	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	500	500	492	492
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	450	450		
	1998				
TOTALE		950	950	492	492

Fonti di Finanziamento

	Annuale	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.250	1.250	1.090	184
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.250	1.250	1.090	184

Fonti di Finanziamento

	Annuale	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	2.190	2.190	2.116	44
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	400	400	300	
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.590	2.590	2.416	44

Comune di Venezia

Dorsoduro Locali SERTE 23

Interventi di restauro.
Servizi ai tossicodipendenti gestiti dalle ULSS.

programmazione	Istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			750

Dorsoduro Cittadella della Giustizia 23 bis

programmazione
3.557

Santa Croce Sede ASPIV 24

La costruzione risale alla metà degli anni '30, è oggetto di restauro manutentivo e messa a norma degli impianti.

programmazione	Istruttoria appalto	lavori in corso
		4.000

Santa Croce Autonomessa comunale 25

La costruzione risale alla metà degli anni '30, è oggetto di restauro manutentivo e messa a norma degli impianti.

programmazione	Istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		4.000	2.528

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1983-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		750	750	750	301
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996 1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997 1998				
TOTALE		750	750	750	301

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1983-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996 1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997 1998	3.557	3.557		
TOTALE		3.557	3.557		

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1983-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		4.000	4.000	4.000	1.461
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996 1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997 1998				
TOTALE		4.000	4.000	4.000	1.461

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1983-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		2.528	2.458	2.407	2.164
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996 1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997 1998	2.000	2.000	803	
TOTALE		6.528	6.458	3.210	2.164

Comune di Venezia

San Polo Immobile Pescheria: 26

Costruzione moderna in stile gotico veneziano. E' oggetto di restauro menuttivo e messa a norma degli impianti, legato alla più generale sistemazione del mercato di Rialto.

progettazione
400

San Polo Mercato Rialto: 27

Il progetto di riordino dell'area rielina, oltre all'aspetto viario investe l'arredo urbano con l'uniformità dei punti di vendita.

progettazione
1.805

Santa Croce Immobile Mercato Ittico al Tronchetto: 28

Interventi di messa a norma.

progettazione
1.032

Giudecca Edifici ex CNMOV - Sede Carabinieri: 29

Restauro per nuovo insediamento a seguito trasferimento da Sacca Fisola. La cifra si riferisce ai costi di progettazione.

progettazione
200

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	400			
	1998				
TOTALE		400			

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		305	305	305	24
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.500	1.500		
	1998				
TOTALE		1.805	1.805	305	24

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		1.032	1.032	946	930
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.032	1.032	946	930

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	200			
	1998				
TOTALE		200			

Comune di Venezia

Ciudecca	Immobile ad uso quartierale	31
-----------------	------------------------------------	-----------

Intervento di manutenzione e messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			270

Ciudecca	Villa Herriot (Biblioteca Bettini)	32
-----------------	---	-----------

Intervento di manutenzione e di ristrutturazione.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		1.073

Lido	Centro Civico	33
-------------	----------------------	-----------

Intervento di manutenzione e di ristrutturazione.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		3.000	1.425

Lido	Piazzale Bucintoro	34
-------------	---------------------------	-----------

Costruzione di edificio ad uso pubblico, vedesi quota parte intervento "Viabilità".

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		1.119

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		270	270	194	194
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		270	270	194	194

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		229	229	229	207
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	326	326		
	1998	518	518		
TOTALE		1.073	1.073	229	207

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		1.437	1.437	1.356	208
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.988	2.988	138	
	1998				
TOTALE		4.425	4.425	1.494	208

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		1.119	1.119	1.119	
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.119	1.119	1.119	

Comune di Venezia

Pellestrina Cinema Porta 35

La struttura è attualmente inagibile.
Il restauro prevede la messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		350

Murano Scuola Maestri Vetrai 'Abate Zanetti' e stazione sperimentale del Vetro 36

Intervento di ristrutturazione.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		7.358

Murano Palazzo da Mula 37

Palazzo tardo gotico, già interessato da restauro conservativo. L'attuale progetto investe aspetti manutentivi e di messa a norma degli impianti.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			685

Murano Conterie 38

Intervento di recupero di edifici dismessi a destinazione artigianale.
Progetto comunitario obiettivo 2 aree in declino industriale

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		1.325

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		350	350		
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		350	350		

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		5.358	5.358	2.929	407
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	2.000	2.000	229	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		7.358	7.358	3.158	407

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		72	72	57	57
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	500	500	500	308
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	113	113	113	
	1998				
TOTALE		685	685	670	365

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		1.325	1.325	1.325	223
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.325	1.325	1.325	223

Comune di Venezia

Isola San Michele Convento 39

Intervento di restauro conservativo del monumentale complesso conventuale.



Isola San Michele Cimitero 40

Ampliamento dell'Isola - concorso internazionale di idee per la progettazione.



Isola Treportine Manutenzioni straordinarie su immobili convenzionali con il Comune 41



Fusina Immobile terminal 42

Intervento di ristrutturazione su immobile esistente, facente parte del terminal di accesso a Venezia.



Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	500			
	1998				
TOTALE		500			

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	485	485	485	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	1.515			
TOTALE		2.000	485	485	

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.000			
	1998				
TOTALE		1.000			

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		810	810	810	
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		810	810	810	



Comune di Venezia

Cimiteri

Manutenzione straordinaria sui cimiteri delle isole della laguna.

dotazione appalto	9.687	lavori in corso	lavori ultimati
			7.519

Manutenzione straordinaria patrimonio storico-monumentale convenzionato con ULSS

dotazione appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		3.300

Manutenzioni straordinarie e diffuse

dotazione appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	5.283	8.146

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	11.806	11.806	11.806	11.577	7.519
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997	815	337		
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1998	4.785			
TOTALE		17.406	12.143	11.577	7.519

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	3.300	3.300	3.300	3.300	2.678
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1998				
TOTALE		3.300	3.300	3.300	2.678

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	8.872	8.872	7.871	8.951	5.668
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	474	474	339	155
	1997	995	849	718	177
	1997	1.447	876	38	33
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1998	2.055	463		
TOTALE		13.843	10.533	8.046	6.033

Comune di Venezia


Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 138	1993-1994 1995-1996	81.132	80.061	98,68	74.662	92,03	37.705	46,47
Legge 20 dicembre 1995 n. 538	1996	2.824	1.934	68,48	1.639	58,04	463	16,40
	1997	17.528	16.894	96,38	7.810	44,58	879	5,01
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	40.392	37.096	91,84	26.385	65,32	15.315	37,92
	1998	15.286	7.388	48,33				
TOTALE		157.162	143.373	91,23	110.496	70,31	54.362	34,59

QUADRO FINANZIARIO - SERVIZI

STATO AVANZAMENTO - SERVIZI

progettazione	52.214	59%
istruttoria appalto	52.377	33%
lavori in corso		
lavori ultimati		

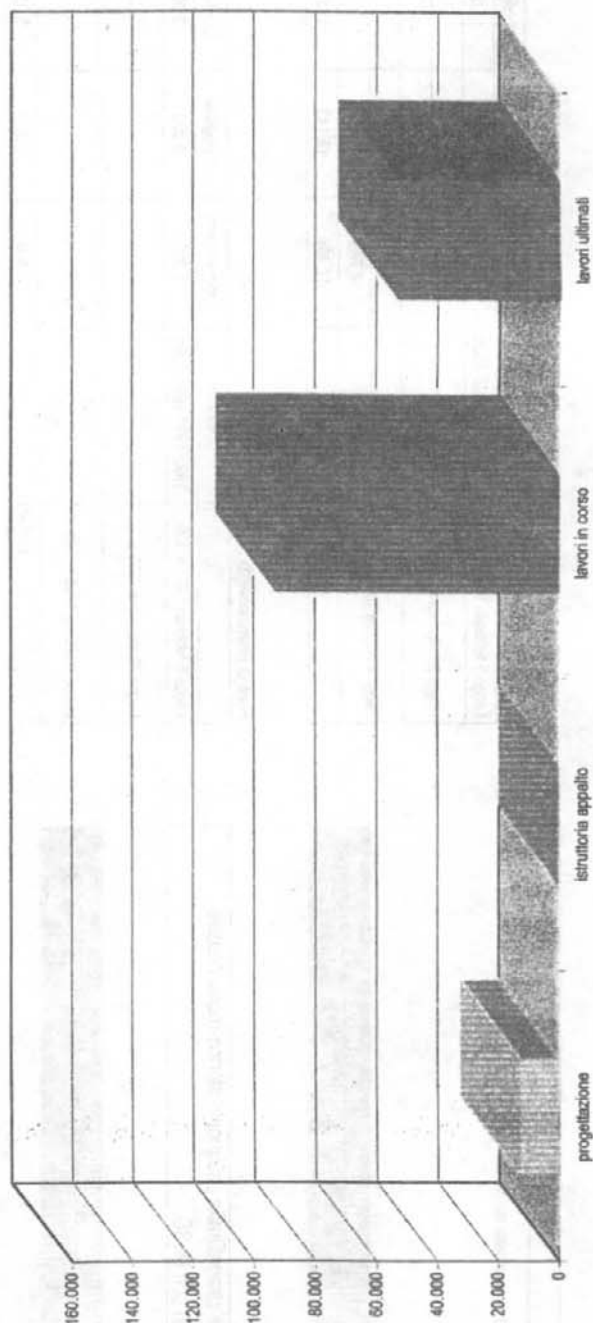

Importi in milioni

Comune di Venezia

Interventi vari per adeguamento piani di sicurezza legge 626/94



Thetis

Collaborazione dell'Amministrazione Comunale al progetto pilota "Thetis - Polo delle tecnologie del mare" all'Arsenale - cofinanziamento CEE.



Varie lett. a) art. 6 Legge 798/84 (studi e ricerche, imprevisti, ecc...)



Fonti di Finanziamento

	Legge 5 febbraio 1992 n. 139	Legge 20 dicembre 1995 n.	Legge 4 ottobre 1996 n. 515	TOTALE
Annualità	1993-1994 1995-1996	1996 1997 1997 1998		
Programmato			2.438	2.438
Impegnato				
Obbligato				
Speso				

Fonti di Finanziamento

	Legge 5 febbraio 1992 n. 139	Legge 20 dicembre 1995 n.	Legge 4 ottobre 1996 n. 515	TOTALE
Annualità	1993-1994 1995-1996	1996 1997 1997 1998		
Programmato	900			900
Impegnato	900			900
Obbligato	900			900
Speso	900			900

Fonti di Finanziamento

	Legge 5 febbraio 1992 n. 139	Legge 20 dicembre 1995 n.	Legge 4 ottobre 1996 n. 515	TOTALE
Annualità	1993-1994 1995-1996	1996 1997 1997 1998		
Programmato	8.293	704	5.425	17.672
Impegnato	7.643	704	4.548	13.971
Obbligato	7.215	583	4.548	12.988
Speso	7.215	363	30	7.608

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento


	Annuità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	319.325	315.636	98,84	279.051	87,38	167.325	52,40
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996	34.000	33.027	97,14	28.605	84,13	12.188	35,85
	1997	68.400	66.105	96,64	36.925	53,98	2.337	3,42
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	223.286	216.698	97,05	185.113	82,90	18.269	8,18
	1998	84.393	70.287	83,29	27.338	32,39		
	TOTALE	729.404	701.753	96,21	557.032	76,37	200.119	27,44

QUADRO FINANZIARIO

Totale lettera a) art 6 Legge 798/84
Residenze-Cultura-Sport-Sport-Verde-Servizi-Varie

STATO AVANZAMENTO - INTERVENTI lett. a)

progettazione	28.130	4%
istruttoria appalto	47.536	15%
lavori in corso	450.130	62%
lavori ultimati	202.743	28%

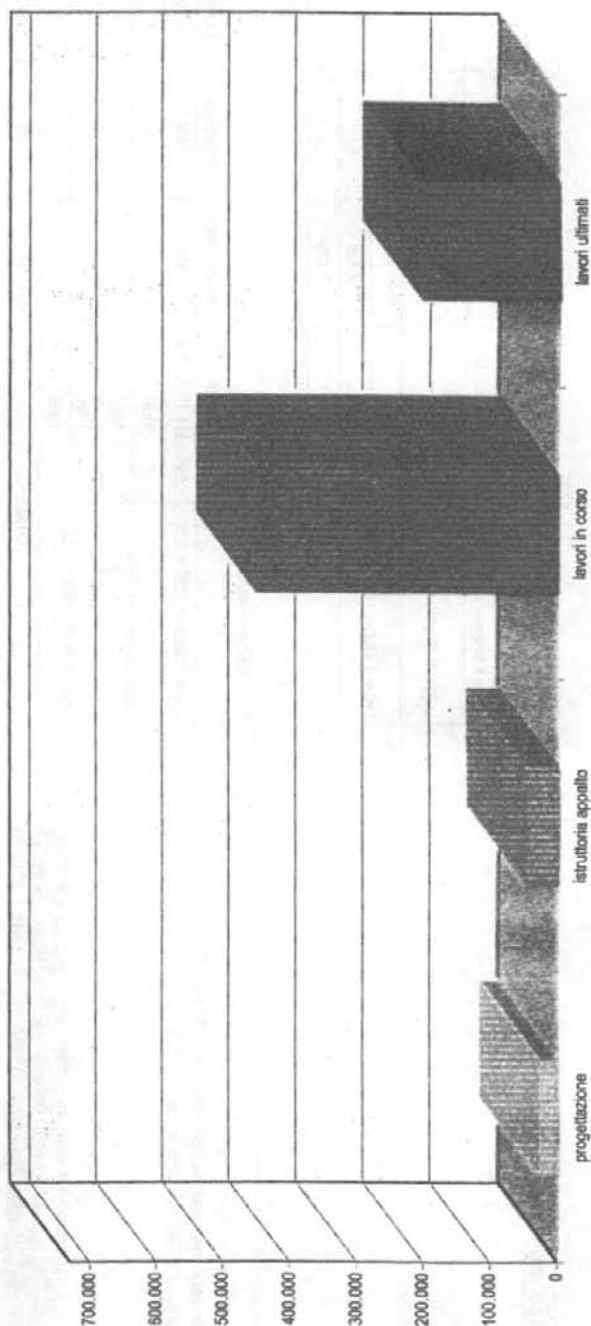


importi in milioni

Comune di Venezia

Interventi finalizzati alle opere di urbanizzazione primaria.

lettera b.) art. 6 - Legge 29 novembre 1984 n. 798

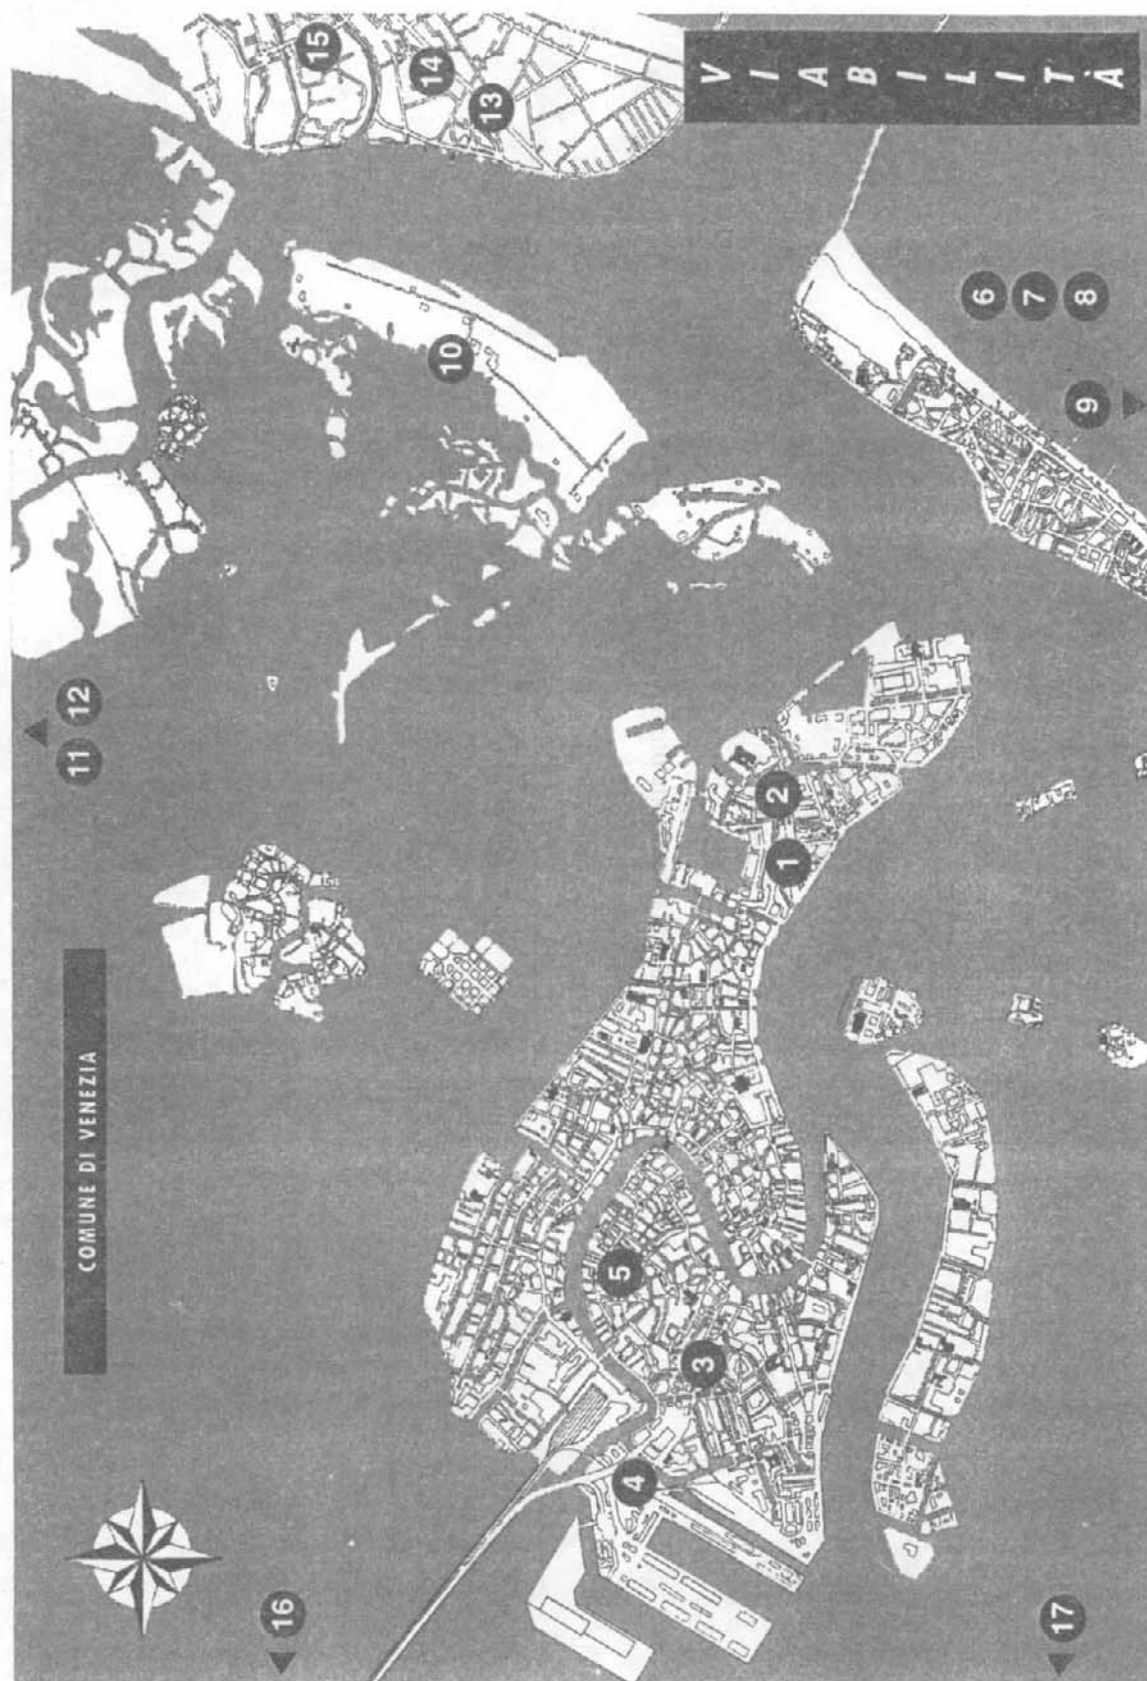

Comune di Venezia

Castello Via Garibaldi 1

Opere di nuova pavimentazione stradale e di sistemazione dell'arredo urbano.

Situazione appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		3.520

Castello Sant'Anna 2

Opere di urbanizzazioni interne all'ex Convento.

Situazione appalto	lavori in corso
	1.000

Dorsoduro Campo Santa Margherita 3

Intervento di sistemazione e manutenzione dell'arredo urbano con presenza di essenze arboree ad alto fusto.

Situazione appalto	lavori in corso
	1.420

Santa Croce Piazzale Roma - Tronchetto 4

Intervento di nuova viabilità e segnaletica stradale (cordone, marciapiedi, spartitraffico, parcheggi, ecc.).

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		3.527	3.527	3.457	3.457
Legge 20 dicembre 1995 n. 1996					
Legge 20 dicembre 1995 n. 1997		93	93	77	77
Legge 4 ottobre 1996 n. 515					
TOTALE		3.620	3.620	3.534	3.534

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		1.000	1.000	1.000	
Legge 20 dicembre 1995 n. 1996					
Legge 20 dicembre 1995 n. 1997					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515					
TOTALE		1.000	1.000	1.000	

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		1.420	1.341	1.244	63
Legge 20 dicembre 1995 n. 1996					
Legge 20 dicembre 1995 n. 1997					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515					
TOTALE		1.420	1.341	1.244	63

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		865			
Legge 20 dicembre 1995 n. 1996					
Legge 20 dicembre 1995 n. 1997					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515		868			
TOTALE		1.733			

Comune di Venezia

Santa Croce Campo San Giacomo da l'Orto 5

Intervento di sistemazione e manutenzione dell'arredo urbano con presenza di essenze arboree ad alto fusto.

struttura appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		1.100

Lido Via Lepanto 6

Intervento di sistemazione e manutenzione dell'arredo urbano con creazione isole pedonali.

struttura appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		2.763

Lido Piazzale Bucintoro 7

Intervento di sistemazione e manutenzione dell'arredo urbano e nuova rotonda sul mare.

struttura appalto	lavori in corso	
	7.568	

Lido ponti, marciapiedi, piste ciclabili, arredi urbani, marginamenti, ecc... 8

Interventi vari di manutenzione sulla viabilità ed arredo urbano.

struttura appalto	lavori in corso	lavori ultimati
5.000	9.395	2.000

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		1.100	1.100	880	83
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.100	1.100	880	83

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		2.763	2.763	2.277	842
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.763	2.763	2.277	842

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		536	536	536	
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	2.500	2.500	2.500	234
	1997	1.532	1.532	1.532	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	3.000	3.000	3.000	
	1998				
TOTALE		7.568	7.568	7.568	234

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	700	700		
	1997	4.000	1.553	323	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	11.696	8.249		
	1998	500			
TOTALE		16.896	10.502	323	

Comune di Venezia

Pellestrina	Interventi vari di urbanizzazione (pavimentazione, arredo, ecc...)	9
-------------	---	---

servizi a domicilio	1.470	lavori in corso	1.179	lavori ultimati	1.179
---------------------	-------	-----------------	-------	-----------------	-------

San'Erasmo	Ramo via delle Motte	10
------------	----------------------	----

Intervento di manutenzione e rifacimento dell'asse viario.

Burano	Piazza imbarcadere	11
--------	--------------------	----

Intervento di manutenzione e sistemazione dell'arredo urbano.

Burano	Mazzorbo - PEEP	12
--------	-----------------	----

Opere di urbanizzazione primaria.

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	1.864	1.705	1.540	1.179
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	785	785		
	1998				
TOTALE		2.649	2.490	1.540	1.179

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	250			
	1998				
TOTALE		250			

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.000			
	1998				
TOTALE		1.000			

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	750			
	1998				
TOTALE		750			

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmiello	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996				
	1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
	1997	420	420		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1998	500	500		
TOTALE		920	920		

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.150	1.150	1.055	1.055
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.150	1.150	1.055	1.055

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	14.389	14.319	10.202	9.076
	1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997	1.375	1.326	440	
	1997	3.173	3.093	2.360	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1998	1.032	1.032	138	
TOTALE		19.969	19.770	13.140	9.076

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	6.174	6.174	5.377	2.711
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	540	540	40	
	1997	595	595	53	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	2.043	2.043	1.858	
	1998	61	61		
TOTALE		9.413	9.413	7.328	2.711

Terminal sud di accesso alla città antica

Predisposizione del Concorso internazionale per la progettazione del Terminal.
Redazione del Piano Particolarizzato e della analisi propedeutiche al Piano.

Approdi traghetti pubblici gondole in Canal Grande

avanzamento lavori in corso	lavori ultimati
1.150	1.150

Manutenzione straordinaria e diffusa e opere di urbanizzaz. primaria

lavori Ulmatt	9.076
lavori in corso	10.893
struttura aperta	

Adeguamento e manutenzione impianto pubblica illuminazione

struttura apparato	lavori in corso	lavori ultimati
	6 702	2 711

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	100	100		
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997	1.000	100		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.100	200		

Realizzazione strutture a traffico acqueo

progettazione	900
istruttoria appalto	200

Comune di Venezia

Interventi su infrastrutture e opere di urbanizzazione centri urbani insulari

Accordi di programma con Stato e Regione. Quota prevista di competenza Comunale.

- Malmocco Alberoni 5 mil
- Pelicciola San Pietro in Volta 5 mil
- Sant'Erasmo 4 mil
- Burano 8,3 mil

progettazione
20.300

Parametri meteo - marini

progettazione

istruttoria appalto

lavori in corso

600

Varie (art. b) art. 6 Legge 798/84 (studi e ricerche, imprevisti, ecc...)

progettazione

istruttoria appalto

lavori in corso

lavori ultimati

2.790

1.876

Fonti di Finanziamento

Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
	1997	20.300	20.300	20.300	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1998				
TOTALE		20.300	20.300	20.300	

Fonti di Finanziamento

Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	600	600	111	111
	1997				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1998				
TOTALE		600	600	111	111

Fonti di Finanziamento

Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	2.430	2.369	1.888	1.759
	1997	260	240	220	117
	1997	187			
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.750	1.584	1.500	
	1998	39			
TOTALE		4.666	4.193	3.608	1.876

Comune di Venezia

QUADRO FINANZIARIO

lettera b) - art 6 - Legge 798/84


Viabilità-Accordi di prog. per infrast. e op. di urb. - Parametri melco/Marini-Vario

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1983-1994 1995-1996	38.544	37.310	96,80	30.097	78,08	20.866	54,14
Legge 20 dicembre 1995 n. 538	1996	5.000	4.980	99,60	2.864	57,28	351	7,02
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	9.600	6.017	62,68	2.425	25,26	77	0,80
	1998	64.000	57.439	89,75	29.114	45,49		
		8.000	7.461	93,26	138			
TOTALE		125.144	113.207	90,48	64.638	51,85	21.294	17,02

STATO AVANZAMENTO - INTERVENTI lett. b)

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
26.353 21%	10.933 9%	62.383 50%	25.475 20%

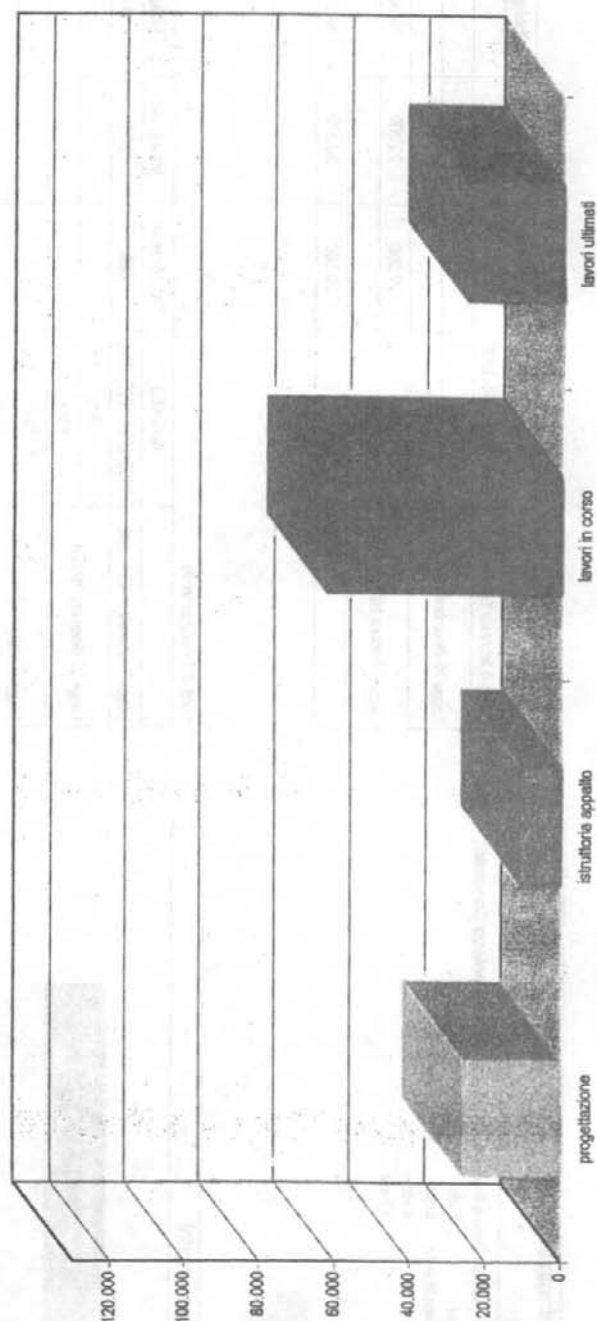

importi in milioni

Comune di Venezia

Contributi per la esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato.

Assegnazione di contributi ai privati:

- per il restauro e il risanamento conservativo di immobili da adibire a residenza (una apposita convenzione obbliga i proprietari a risiedere o ad affittare per almeno 15 anni) 106,830 miliardi
- per l'acquisto della prima casa di abitazione (giovani coppie e sfrattati); 43,030 miliardi
- per il restauro e messa a norma degli immobili adibiti ad attività produttive artigianali; 3,440 miliardi
- per il recupero di un'isola abbandonata (iniziativa sperimentale). 2 miliardi

Contributi al patrimonio immobiliare privato

preparazione del progetto : predisposizione bando

istruttoria appalto : emissione bando

lavori in corso : approvazione graduatoria provvisoria

lavori ultimati : approvazione graduatoria definitiva

Comune di Venezia

Contributi in conto interessi e in conto capitale per restauro di immobili privati. (6° bando)

Numero unità immobiliari risanate in conto interessi 159
 Numero unità edilizie risanate in conto capitale 100

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			24.200

Contributi in conto interessi e in conto capitale per restauro di immobili privati. (7° Bando).

Numero unità immobiliari risanate in conto interessi 81
 Numero unità edilizie risanate in conto capitale 231

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			27.800

Contributi al patrimonio immobiliare privato destinato alle attività artigiane produttive.

Numero utenze convenzionate in conto interessi 38
 Numero utenze convenzionate in conto capitale 47

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			3.440

Contributi per il recupero del patrimonio immobiliare privato su una isola della laguna centrale.

progettazione	istruttoria appalto
	2.006

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		24.200	24.200	24.200	9.638
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		24.200	24.200	24.200	9.638

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		27.800	27.800	27.800	6.717
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		27.800	27.800	27.800	6.717

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	2.000	2.000	2.000	
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	940	940	940	
	1998	500	500		
TOTALE		3.440	3.440	2.940	

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	2.006	2.000	2.000	
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	6	6		
TOTALE		2.006	2.006	2.000	

Comune di Venezia

Contributi ai privati per acquisto prima casa (giovani coppie e sfrattati).

Numero utenze interessate 815.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			43.030

Contributi in conto interessi e in conto capitale per restauro di immobili privati (Bando permanente).

Numero unità immobiliari risanate in conto interessi 224

Numero unità edilizie risanate in conto capitale 339

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			54.830

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		4.000	4.000	4.000	3.467
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	3.000	3.000	3.000	313
	1997	13.000	13.000	13.000	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	7.030	7.030	7.030	
	1998	16.000	16.000		
TOTALE		43.030	43.030	27.030	3.780

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	51.530	51.530	51.530	12
	1998	3.300	3.300		
TOTALE		54.830	54.830	51.530	12

Comune di Venezia

Studi e ricerche lett. c) art. 6 Legge 798/84

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997 1998	152 194	130 138	130 138	6
TOTALE		346	268	268	6

progettazione	istruttoria espulso	lavori in corso	lavori ultimati
			346

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	56.000	56.000	100	56.000	100	19.820	35,38
Legge 20 dicembre 1995 n. 538	1996	7.000	7.000	100	7.000	100	313	4,47
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	13.000	13.000	100	13.000	100		
	1998	59.852	59.630	99,96	59.630	99,96	18	0,03
		20.000	19.944	99,72	138	0,69		
	TOTALE	155.652	155.574	99,95	135.768	87,23	20.151	12,95


QUADRO FINANZIARIO

lettera c) - art 6 - Legge 798/84

Contributi ai privati - Studi e Ricerche

STATO AVANZAMENTO - INTERVENTI lett. c)

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	2.006		153.646
	1%		99%

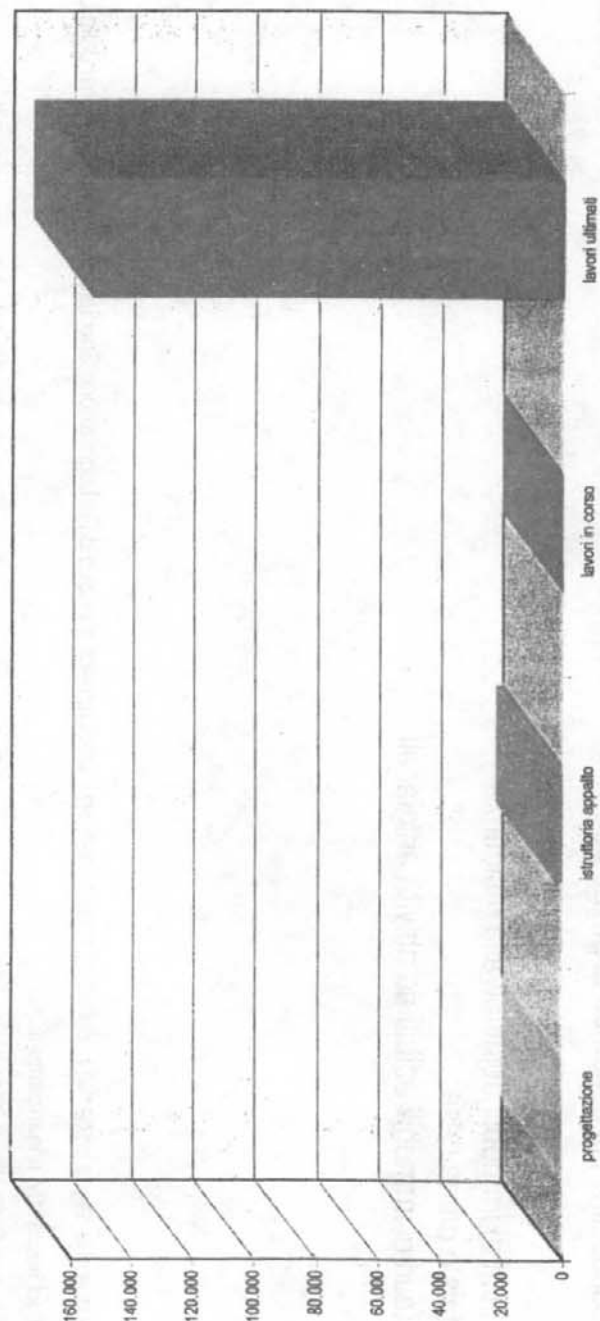

Importi in milioni

Dati conoscitivi sui contributi ai privati per:


- restauri di immobili destinati alla residenza
- acquisto prima casa
- restauri di immobili adibiti ad attività artigianali

La sezione che segue presenta i risultati ottenuti attraverso i finanziamenti stanziati dalla Legislazione Speciale per Venezia ai sensi della Legge 798 del 1994 ed ai suoi successivi rifinanziamenti.

Dal 1984 ad oggi sono dati obbligati per il restauro di immobili destinati alla residenza e per l'acquisto della prima casa di abitazione rispettivamente 168 e 49,3 miliardi.

106,8 miliardi per i restauri e 43 per l'acquisto, sono stati obbligati a partire dal 1993, essi sono quelli a cui si fa riferimento nella parte relativa al programma dello stato di avanzamento.


Contributi per il restauro del patrimonio edilizio privato

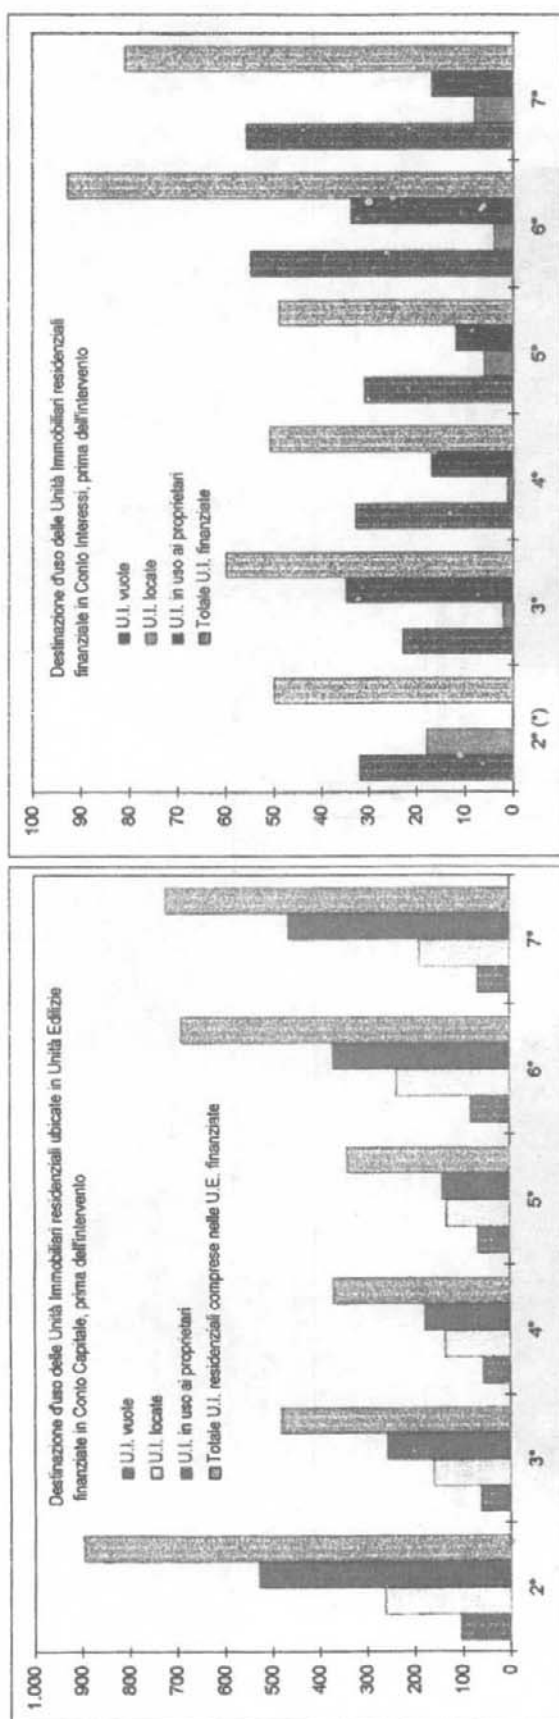

(*) Nel 2° Bando Conto Interessi non era prevista la priorità relativa alle abitazioni utilizzate dai proprietari come residenza principale.


Contributi per il restauro del patrimonio edilizio privato

Modalità d'uso delle Unità Immobiliari secondo quanto dichiarato nella Convenzione

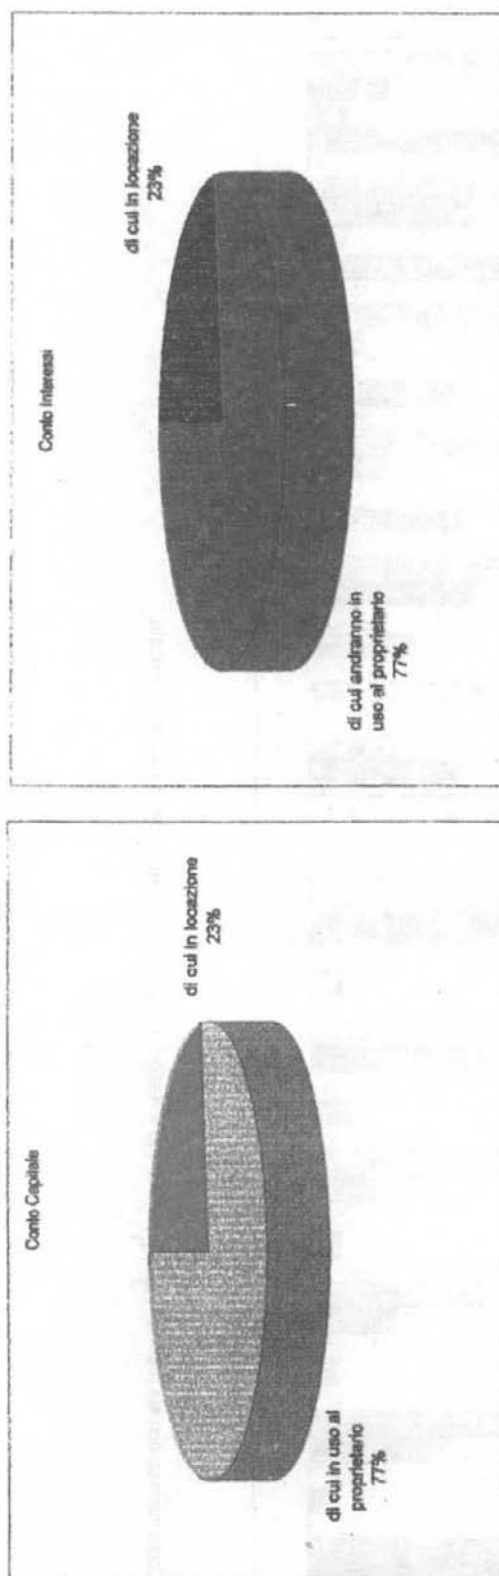

Contributi per il restauro del patrimonio edilizio privato

Totale delle unità edilizie finanziate con gli otto Bandi (1985-1996) nel Centro Storico(*)

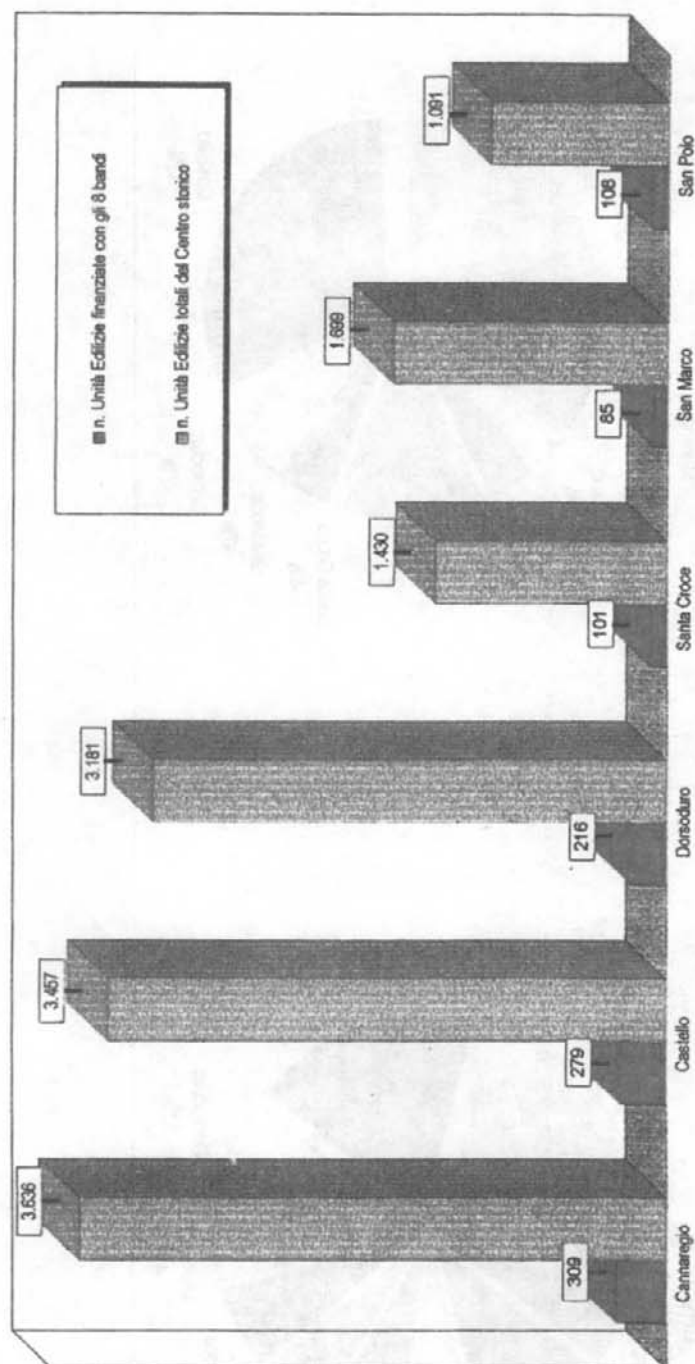


n. Unità Edilizie finanziate con i 8 bandi, centro storico	n. Unità Edilizie totali	% delle U.E. finanziate sul totale
1.091	14.494	7,53%


(*) I dati relativi al numero delle unità edilizie totali riguardanti le isole sono in corso di elaborazione.


Contributi per il restauro del patrimonio edilizio privato

Distribuzione geografica delle Unità Edilizie finanziate in Conto Capitale

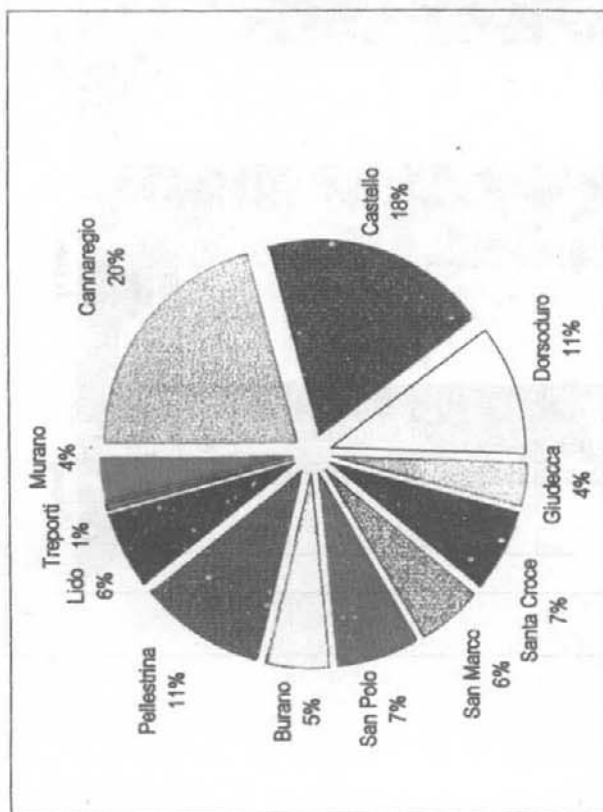

Distribuzione geografica delle Unità Immobiliari finanziate in Conto Interessi

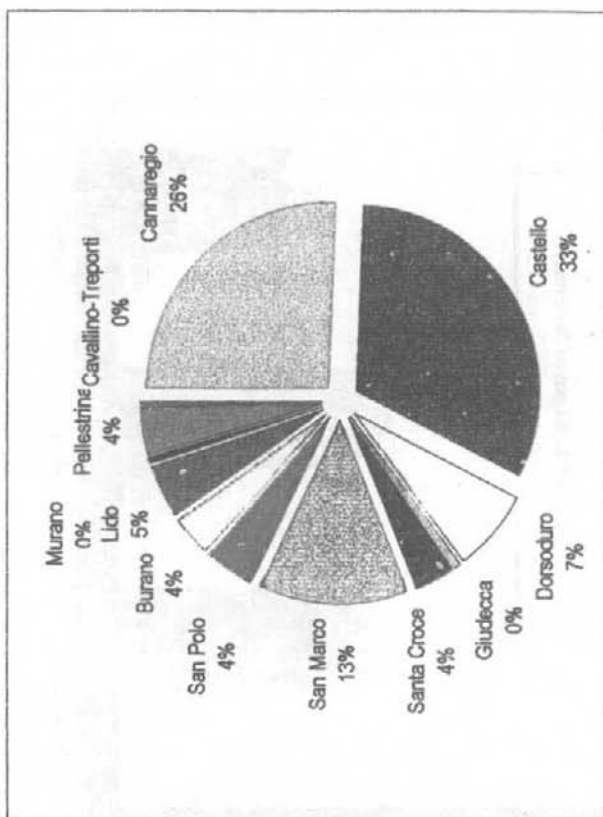


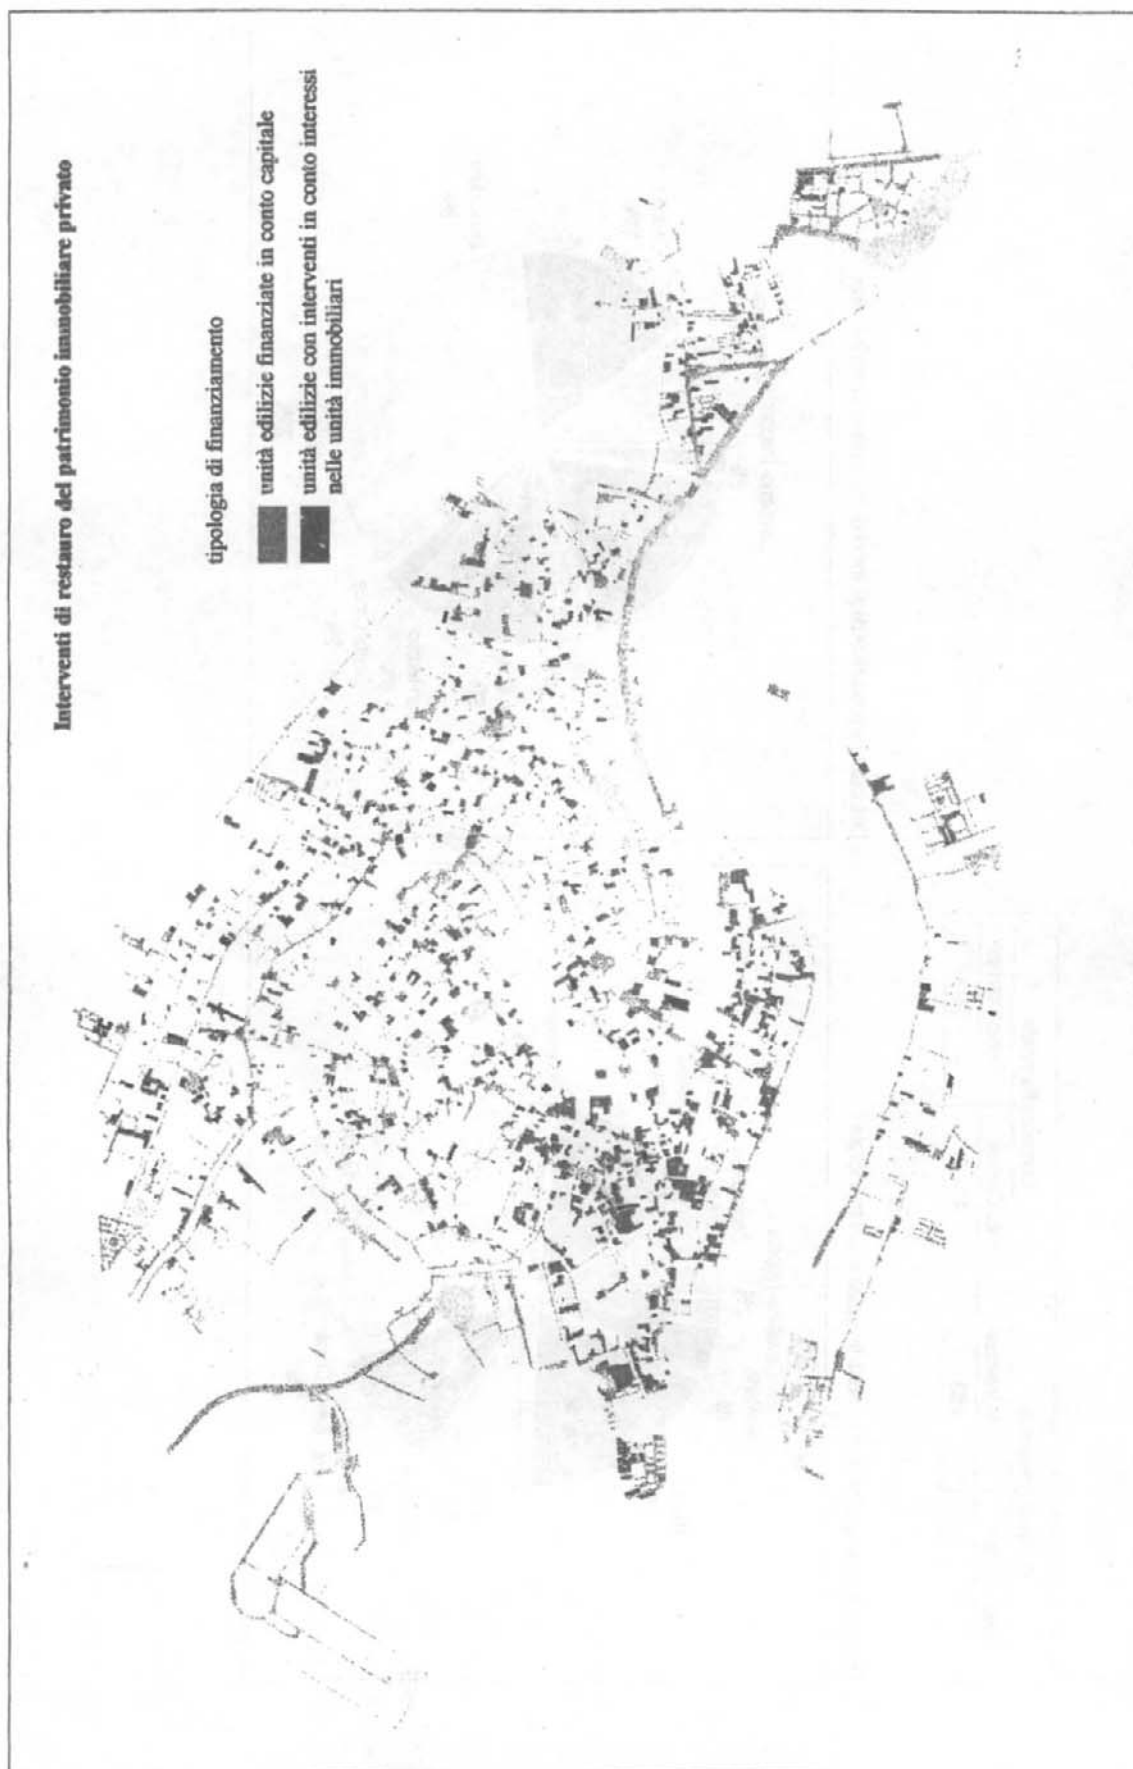


Contributi per il restauro e risanamento conservativo di immobili adibiti ad attività artigianali

Domande presentate		Domande finanziate	
Conto Capitale	Conto Interessi	Conto Capitale	Conto Interessi
50	53	47	38

Distribuzione geografica degli immobili finanziati in Conto Capitale

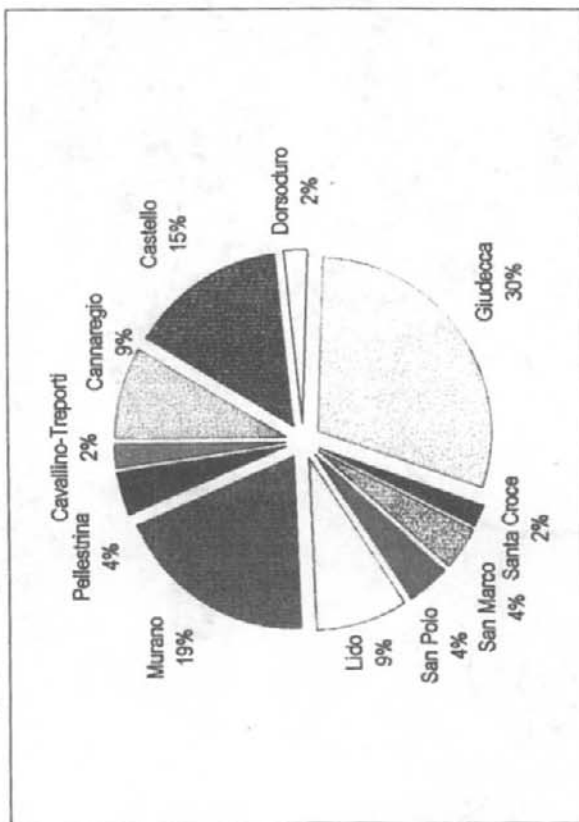

Distribuzione geografica degli immobili finanziati in Conto Interessi

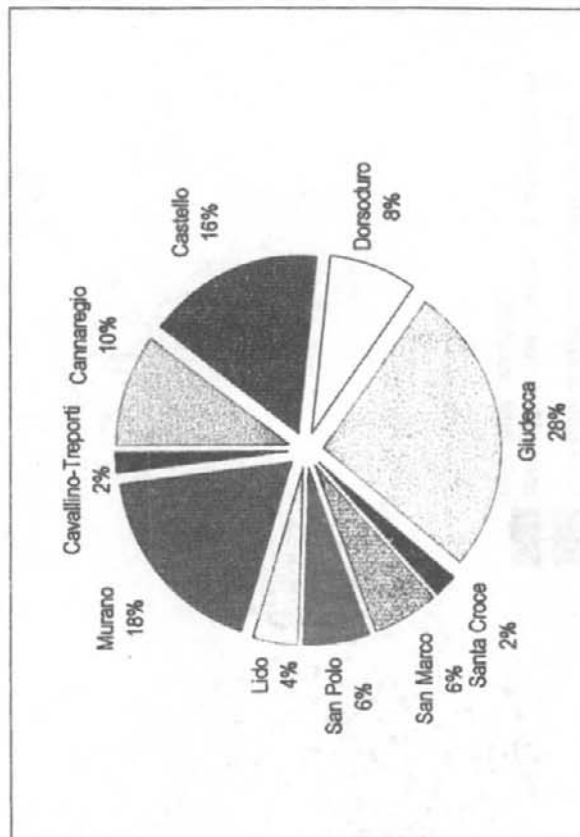

Contributi per l'acquisto della prima casa

BANDO 1992

	Domande presentate	Pratiche finanziate	di cui nel centro storico
	2.294	146	35

BANDO 1995

	Domande presentate	Pratiche finanziate	di cui nel centro storico
Fascia "A" giovani coppie	810	65	14
Fascia "B"	1.143	65	15
Totale	1.953	130	29

BANDO 1997

	Domande presentate	Pratiche finanziate	Tra quelle presentate, quante da residenti in terraferma
Fascia "A" giovani coppie	280	280	19
Fascia "B"	259	259	11
Totale	539	539	30

Il Bando del 1992 prevedeva solamente una graduatoria. Nei due seguenti bandi sono state invece distinte le domande presentate da nuove/giovani coppie o conviventi da quelle presentate dai nuclei familiari non rispondenti a questi requisiti. Nell'ultimo bando l'ambito di applicazione è stato ristretto al Centro Storico di Venezia e alle isole, escludendo le abitazioni ubicate in terraferma che invece potevano usufruire dei finanziamenti nei bandi del 1992 e 1995.

Comune di Venezia

Interventi finalizzati all'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per l'urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse.



Comune di Venezia

Castello - Arsenale - Cantiere ACTV

Opere di urbanizzazione per la nuova sede del Cantiere aeronautico dell'A.C.T.V.

progettazione
1.900

Tronchetto - Mercato Ortofrutticolo

Il progetto prevede un intervento di razionalizzazione con opere di urbanizzazione e nuova edificazione in vista del trasferimento al Tronchetto del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Rialto.

progettazione
3.170

istruttoria appalto
lavori in corso
1.730

Tronchetto - Mercato Ittico

Intervento di manutenzione, ristrutturazione e messa a norma degli impianti.

progettazione
620

istruttoria appalto
lavori in corso
500

lavori ultimati
620

Giudecca - area ex CNOMV

Opere di urbanizzazione primaria integrate con intervento di privati.

progettazione
10.925

istruttoria appalto
lavori in corso
10.925

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1.900	1.900	1.900	1.900	
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
	1997				
	1998				
TOTALE		1.900	1.900	1.900	

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
	1997	4.900	3.730	1.730	72
	1998				
TOTALE		4.900	3.730	1.730	72

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	620	620	451	319
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
	1997				
	1998	500			
TOTALE		1.120	620	451	319

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	7.177	7.178	4.425	3.227
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
	1997				
	1998	3.748	3.748		
TOTALE		10.925	10.926	4.425	3.227

Comune di Venezia

Lido PIP - Terre Perse 5

Opere di urbanizzazione per insediamenti produttivi.

progettazione
1.100

Fonti di Finanziamento		Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996					
	1997					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	1.100	1.100	1.100		
	1998					
TOTALE			1.100	1.100		

Murano Sacca Serenella 6

Interventi di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti produttivi (progetto comunitario - Obiettivo 2).

progettazione
istruttoria appalto
lavori in corso
1.918

Fonti di Finanziamento		Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996		418	418	418	218
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996		1.500	1.500	1.500	425
	1997					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997					
	1998					
TOTALE			1.918	1.918	1.918	643

Murano Contarè 7

Opere di urbanizzazione reti tecnologiche - fognature.
Progetto comunitario Obiettivo 2 - aree in declino industriale.progettazione
istruttoria appalto
lavori in corso
1.430

Fonti di Finanziamento		Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996		994	994	994	
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996		436	436	436	
	1997					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997					
	1998					
TOTALE			1.430	1.430	1.430	

Isola Certosa Opere di urbanizzazione reti tecnologiche-fognature. 8

Progetto comunitario - Obiettivo 2

progettazione
istruttoria appalto
lavori in corso
2.400

Fonti di Finanziamento		Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996		2.400	2.400	2.400	
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996					
	1997					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997					
	1998					
TOTALE			2.400	2.400	2.400	

Comune di Venezia

Ca' Savio Area PIP 9

Opere di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti di attività produttive.

POPOLAZIONE	ISTITUTO DI APPALLO	LAVORI IN CORSO	LAVORI ULTIMATI
		4.598	2.780

Favaro Area PIP Dese 10

Opere di urbanizzazione per insediamenti produttivi.

POPOLAZIONE	ISTITUTO DI APPALLO	LAVORI IN CORSO	LAVORI ULTIMATI
1.000			

Bissuola Deposito ACTV 11

Nuova edificazione e urbanizzazione del nuovo deposito automobilistico dell'A.C.T.V.

POPOLAZIONE	ISTITUTO DI APPALLO	LAVORI IN CORSO	LAVORI ULTIMATI
		3.275	3.525

Pieve Via Torino - SS. 11 12

Costituzione di un nuovo ponte viario che scavalcando il Canal Salso e la rete ferroviaria congiunge la SS 11 con Via Torino.

POPOLAZIONE	ISTITUTO DI APPALLO	LAVORI IN CORSO	LAVORI ULTIMATI
	14.745		

Fonti di Finanziamento

	Legge 5 febbraio 1992 n. 139	Legge 20 dicembre 1995 n.	Legge 4 ottobre 1996 n. 515	TOTALE
Annualità	1993-1994 1995-1996	1996	1997	1998
Programmato	5.378		2.000	7.378
Impegnato	5.378		2.000	7.378
Obbligato	4.565			4.565
Speso	2.780			2.780

Fonti di Finanziamento

	Legge 5 febbraio 1992 n. 139	Legge 20 dicembre 1995 n.	Legge 4 ottobre 1996 n. 515	TOTALE
Annualità	1993-1994 1995-1996	1996	1997	1998
Programmato			1.000	1.000
Impegnato			1.000	1.000
Obbligato				
Speso				

Fonti di Finanziamento

	Legge 5 febbraio 1992 n. 139	Legge 20 dicembre 1995 n.	Legge 4 ottobre 1996 n. 515	TOTALE
Annualità	1993-1994 1995-1996	1996	1997	1998
Programmato	6.800			6.800
Impegnato	6.800			6.800
Obbligato	3.978			3.978
Speso	3.525			3.525

Fonti di Finanziamento

	Legge 5 febbraio 1992 n. 139	Legge 20 dicembre 1995 n.	Legge 4 ottobre 1996 n. 515	TOTALE
Annualità	1993-1994 1995-1996	1996	1997	1998
Programmato	14.745			14.745
Impegnato	10.361			10.361
Obbligato	592			592
Speso	324			324

Comune di Venezia

13 **Comune di Venezia** **Mercato Ortofrutticolo (fronte canal Salco - via Torino)**

Opere di urbanizzazione e messa a norma degli impianti.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			1.500

14 **Comune di Venezia** **Area PIP Cà Emiliani**

Espropri ed opere di urbanizzazione a servizio delle attività produttive.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			2.472

15 **Comune di Venezia** **Area CIPi Sartori**

Acquisizione dell'area destinata ad insediamenti produttivi previsti dal P.R.G. di Marghera.

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			13.000

16 **Comune di Venezia** **Parco Scientifico Tecnologico**

Acquisizione degli immobili (superficie scoperta e manufatti).

programmazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			4.230

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		1.500	1.500	1.135	1.135
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		1.500	1.500	1.135	1.135

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		2.408	2.408	2.297	2.297
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	84	84	84	84
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.472	2.472	2.361	2.361

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		13.000	13.000	12.736	12.736
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		13.000	13.000	12.736	12.736

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		3.750	3.750	3.552	3.552
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	480			
	1998				
TOTALE		4.230	3.750	3.552	3.552

Comune di Venezia

Marghera Via F.lli Bandiera 17

Interventi di urbanizzazione.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			2.347

Marghera 43 ettari 18

Acquisizione dell'area destinata ad insediamenti produttivi (Integrazione).

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			2.685

Marghera Porto Marghera ex Sirma 19

Piano di Recupero per area ex industriale.

progettazione	istruttoria appalto
	1.940

Fusina Stazione travaso compattazione AMAV 20

Area di interscambio acqua-gomma dei mezzi di trasporto e compattazione dei rifiuti diretti alle discariche o all'inceneritore.

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			4.000

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1983-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		1.642	1.500	1.427	1.427
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	705	705	311	311
	1998				
TOTALE		2.347	2.205	1.738	1.738

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1983-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139		2.685	2.496	2.424	610
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		2.685	2.496	2.424	610

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1983-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998	1.940	1.940		
TOTALE		1.940	1.940		

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1983-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139					
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	4.000	4.000		
	1998				
TOTALE		4.000	4.000		

Comune di Venezia

Marghera Promozione S.p.A.

Partecipazione azionaria del Comune di Venezia nella Società di sviluppo e promozione del polo industriale

Progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			125

Opere urbanizzazioni portuali

Accordo di programmi: Comune - Autorità portuale

Progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso
		5.000

Thetis

Partecipazione azionaria del Comune di Venezia nella Società per le tecnologie del mare.

Progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			100

Acquisizioni ed urbanizzazioni varie

Progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
1.997			144

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	125	125	125	125	125
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		125	125	125	125

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996				
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997	5.000	5.000	5.000	93
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		5.000	5.000	5.000	93

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	100	100	100	100
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997				
	1998				
TOTALE		100	100	100	100

Fonti di Finanziamento

	Annualità 1993-1994 1995-1996	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1996	364	364	124	124
Legge 20 dicembre 1995 n.	1997				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	20	20	14	14
	1998	1.757			
TOTALE		2.141	384	138	138

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	1.450	1.450	1.450	1.410
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996				
	1997				
Legge 4 ottobre 1998 n. 515	1997	500	500	500	
	1998	55	55	55	
TOTALE		2.005	2.005	2.005	1.410

Varie lett. d) art. 6 Legge 790/84 (studi e ricerche, imprevisti, ecc...)

programmazione	istruzioni appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		595	1.410

Comune di Venezia

Fonti di Finanziamento

	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	67.456	62.742	93,01	45.093	66,85	33.909	50,27
Legge 20 dicembre 1995 n.	1996	2.000	2.000	100,00	2.000	100,00	489	24,45
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	5.000	5.000	100,00	5.000	100,00	93	1,86
	1998	14.705	13.055	88,78	2.555	17,36	397	2,70
	1998	8.000	5.743	71,79	55	0,69		
	TOTALE	97.161	88.540	91,13	54.703	56,30	34.888	35,91


QUADRO FINANZIARIO

lettera d) - art 6 - Legge 798/84

Investimenti produttivi - Varie

STATO AVANZAMENTO - INTERVENTI lett. d)

Intervento	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
5117	16.685	32.371	38.538
5%	17%	33%	40%

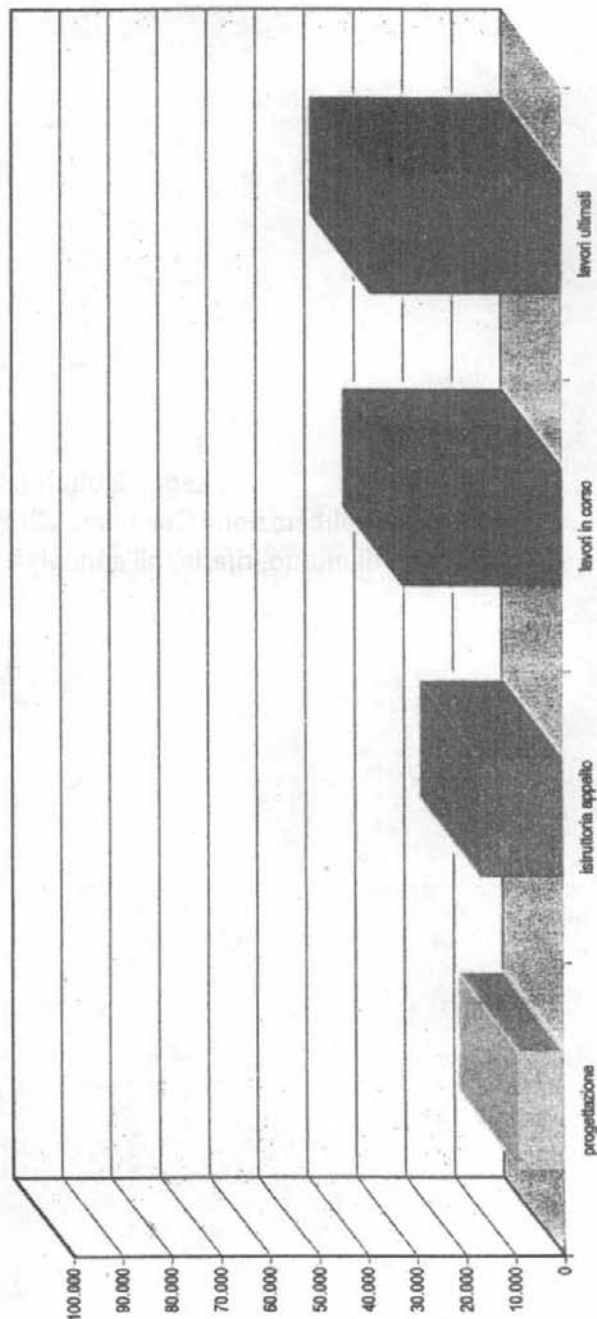

Importi in milioni

Comune di Venezia

Legge 2 ottobre 1997 n. 345

Deliberazione Consiliare del 22 settembre 1997 n. 228

Contratto di mutuo, riferito all'annualità 1998, stipulato il 23 dicembre 1997

Comune di Venezia

Interventi	Totale finanziamenti	Legge 2 ottobre 1997 n. 345			
		1998	riserva	1999	riserva
lett. a) - art. 6 L. 798/84	121.700	71.000		50.700	
lett. b) - art. 6 L. 798/84	8.000	8.000			
lett. c) - art. 6 L. 798/84	45.300	25.000		20.300	
lett. d) - art. 6 L. 798/84	33.000	21.000		12.000	
progetto integrato ri - art.5 L. 139/92	70.000	35.000		35.000	
Totale	278.000	160.000	30	118.000	15

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comune di Venezia

		Programmato	
		1998	1999
lett. c) - art. 6 L. 798/84 e lett. d) - art. 2 L. 360/91			
San Marco	Contributi al patrimonio immobiliare privato in conto capitale ed in conto interessi per il restauro, acquisto prima casa di abitazione, indirizzati a residenti, giovani coppie, sfrattati, artigiani.	25.000	20.300
lett. d) - art. 6 L. 798/84			
Murano	Sacca Serenella		2.000
Porto Marghera	Acquisito porzione area ex Sirma (progetto comunitario Obiettivo 2)	3.000	
Marghera	Urbanizzazione dei 43 ettari (progetto comunitario Obiettivo 2)	3.000	
Via Torino	Opere di urbanizz. laboratori Università asse P.S.T. (Prog. Comun. KONVER)	10.000	10.000
	Attività portuali - Opere di urbanizzazione (accordo di programma)	5.000	
	Totale	21.000	12.000
progetto integrato ri - art. 5 L. 139/92			
	Piano programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio di Venezia	35.000	35.000

		Programmato	
		1998	1999
lett. a) - art. 6 L. 798/84			
San Marco	Restauro Museo Correr e Procuratie		3.000
San Marco	Palazzo Pesaro degli Orfei (Museo Fortuny)		5.800
Cannaregio	Complesso ex Penitenti (EdiVenezia)	18.500	
Cannaregio	Scuola Grande della Misericordia		16.000
San Marco	Restauro Ca' Loredan e Ca' Farsetti		6.000
Murano	Conterle (C.E.R. Regione)	7.500	
Murano	Realizzazione Stazione Sperimentale del Vetro e Scuola Maestri Vetrai 'Abate Zanetti'		1.500
	Manutenzione straordinaria e diffusa e acquisizione di immobili patrimonio residenziale	5.000	8.700
Dorsoduro	Incarico professionale progettazione definitiva ed esecutiva per la Cittadella della Giustizia		4.700
	Acquisizioni immobili	5.000	5.000
Tronchetto	Acquisito porzione isola	35.000	
	Totale	71.000	50.700

lett. b) - art. 6 L. 798/84			
Murano	Opere di urbanizzazione Conterle (progetto comunitario RETEX)	5.000	
Murano	Opere di urbanizzazione Isola Certosa (progetto comunitario Obiettivo 2)	3.000	
	Totale	8.000	

**CITTÀ DI CHIOGGIA**

PROVINCIA DI VENEZIA

Corso del Popolo n. 1193 - 30015 CHIOGGIA

SEGRETERIA DEL SINDACO

Prot.n. 5380

li, 28/01/1998

OGGETTO: Stato di attuazione degli interventi.

All'Ing. FELICE SETARO

Presidente del Magistrato

alle Acque di

VENEZIA

In riscontro alla nota pari oggetto del 19/12/1997 si trasmette in allegato un quadro riassuntivo al 31/12/1997 relativo ai finanziamenti e del loro utilizzo attribuiti al Comune di Chioggia in forza della Legge 798/84 e dei successivi provvedimenti di rifinanziamento della medesima.



IL SINDACO

Mott. Fortunato Guarnieri


COMUNE DI CHIOGGIA

STANZIAMENTI LEGGI: 798/84 - 910/86 - 67/88 - 360/91 - 139/92 - 539/95 - 515/96 - 345/97;

LEGGE	ESERCIZI DI RIF.	STANZIAMENTO	EROGATO	DA EROGARE	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	MANDATI EMESSI
L. 798/84	1984-1986-1986	20.250.000.000	20.250.000.000	-----	20.229.774.038	20.226.962	
L. 910/86	1987-1988-1989	25.500.000.000	25.500.000.000	-----	24.939.925.969	560.074.031	
L. 67/88	88/90/91/92/94	11.976.900.000	11.976.900.000	-----	10.986.709.843	990.190.157	
TOTALI LEX 798 - 910 - 67		57.726.900.000	57.726.900.000	-----	56.156.409.850	1.570.490.150	42.799.968.124
L. 360/91	1991	4.350.000.000	4.350.000.000	-----	4.349.599.092	403.908	3.131.070.578
L. 139/92 - 1°	ANNO 1993	32.497.892.295	32.497.892.295	-----	32.497.892.295	-----	17.033.790.415
L. 139/92 - 2°	ANNO 1994	12.656.329.974	12.656.329.974	-----	12.656.329.974	-----	7.024.722.027
L. 139/92 - 3°	ANNO 1995	11.945.619.875	11.945.619.875	-----	11.945.619.875	-----	958.860.970
L. 139/92 - 4°	ANNO 1996	12.000.000.000	784.704.554	11.215.295.446	12.000.000.000	-----	784.704.554
TOTALI LEX 139/92		69.099.842.144	57.884.546.698	11.215.295.446	69.099.842.144	-----	25.802.077.966
L. 539/95 - 1°	ANNO 1996	10.000.000.000	-----	10.000.000.000	10.000.000.000	-----	-----
L. 539/95 - 2°	ANNO 1997	18.000.000.000	-----	18.000.000.000	18.000.000.000	-----	-----
TOTALI LEX 539/95		28.000.000.000	-----	28.000.000.000	28.000.000.000	-----	-----
L. 515/96 - 1°	ANNO 1997	58.000.000.000	1.397.447.093	56.602.552.907	58.000.000.000	-----	306.000.000
L. 515/96 - 2°	ANNO 1998	32.000.000.000	-----	32.000.000.000	-----	-----	-----
TOTALI LEX 515/96		90.000.000.000	1.397.447.093	88.602.552.907	58.000.000.000	-----	306.000.000
L. 345/97 - 1°	1998	19.000.000.000	-----	19.000.000.000	-----	-----	-----

UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
Divisione Servizi Tecnici
LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 67/88 - Fondi Ministeriali	25.000.000.000			
1 S. Sebastiano - Restauro e adeguamento funzionale		2.500.000.000	2.338.528.877	2.195.000.000
2 S. Margherita - Restauro e adeguamento funzionale		3.000.000.000	2.975.800.000	2.655.000.000
3 Ca' Garzoni e Moro - Ristrutt. e adegu. norme sicurezza e prev. incendi		3.000.000.000	2.717.135.000	2.883.000.000
4 Ca' Foscari - Ristrutturazione e adeguamento funzionale		574.000.000	574.000.000	491.000.000
5 S. Maria - Ristrutturazione e adeguam. funzionale dei laborat. chimici		5.400.000.000	5.394.448.889	4.896.000.000
6 Cella dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		4.900.000.000	4.891.173.981	239.000.000
7 Palazzo Nani Mocenigo - Restauro e adeguamento funzionale		1.524.000.000	1.523.920.000	144.000.000
8 'Ca' Cappello - Restauro e adeguamento funzionale		500.000.000	500.000.000	485.000.000
9 'Wolf Ferrari' - Restauro e adeguamento funzionale		500.000.000	500.000.000	500.000.000
10 Celestia - Ristrutturazione e adeguamento funzionale		1.102.000.000	1.101.282.140	1.066.000.000
11 'Restauro e adeguamento funzionale di S. Giobbe e altri edifici		2.000.000.000	2.000.000.000	1.564.000.000
TOTALE		25.000.000.000	24.614.286.887	16.598.000.000



UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
Divisione Servizi Tecnici
LEGGE SPECIALE PER VENEZIA


OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 139/92	34.835.929.049			
mutuo I.M.I.	25.347.333.394			
1 Informizzazione Ateneo e delle Biblioteche		6.931.727.227	6.931.727.227	4.899.033.919
2 S.Globbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		6.163.082.929	6.163.082.929	6.163.082.929
3 Zattere - acquisto SCI		10.260.000.000	10.260.000.000	9.877.800.000
4 Opere varie manutenz. straordinaria		2.345.043.328	2.345.043.328	2.344.508.422
5 Ca' Zorza - acquisto 3° piano		647.478.910	647.478.910	647.478.910
mutuo B.N.I.	9.488.595.855			
1 S.Globbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		1.780.547.088	1.780.547.088	1.780.547.088
2 Ca' Bembo - acquisto		2.905.860.880	2.905.860.880	2.905.860.880
3 Zattere - acquisto Star Gas 1		2.500.880.759	2.500.880.759	2.500.880.759
4 Zattere - acquisto Star Gas 2		2.301.308.950	2.301.308.950	2.301.308.950
TOTALE		34.835.929.049	34.835.929.049	33.220.498.835



IL COORDINATORE GENERALE
DIRETTORE D'OPERE
Dot. Ing. Antonio LO CASCIO


UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
Divisione Servizi Tecnici
LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 539/95	17.080.000.000			
mutuo CREDIOP	8.728.000.000			
1 S. Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		5.636.912.432	5.636.912.432	4.263.392.461
2 S. Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		306.100.832	306.100.832	
3 Via Torino - Manutenzione e adeguamento funzionale del capannone		1.566.310.330	1.566.310.330	
4 S. Maria teatro G. Polli - restauro e adeguamento funzionale		22.780.685	22.780.685	
5 Ca' Garzoni e Moro - Ristrutt. e adeg. norme sicurezza e prev. incendi		1.123.395.721	1.123.395.721	1.123.395.721
6 S. Maria fabbr. "C" - restauro e adeguamento funzionale		72.500.000	72.500.000	72.500.000
mutuo INTERBANCA	8.362.000.000			
1 S. Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		3.779.088.040	3.779.088.040	
2 S. Giobbe Poste - restauro e adeguamento funzionale		1.000.000.000		
3 Ca' Garzoni Aula - restauro e adeguamento funzionale		1.000.000.000		
4 S. Maria fabbr. "C" - restauro e adeguamento funzionale		421.500.000	421.500.000	421.500.000
5 Opere varie manutenz. strad.		2.161.411.960	2.161.411.960	1.843.000.000
TOTALE:		17.080.000.000	15.090.000.000	7.723.788.182



UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
Divisione Servizi Tecnici
LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 515/96	32.800.000.000			
MUTUO MEDIO CREDITO	21.800.000.000			
1 S. Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		14.100.000.000	14.100.000.000	
2 Zattere Capannone		6.000.000.000	6.000.000.000	186.134.853
3 Attuazione D. Lgs 626/94		2.600.000.000	2.600.000.000	37.870.621
MUTUO CREDIOP	11.000.000.000			
1 S. Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		10.000.000.000	10.000.000.000	
2 Zattere Capannone		1.000.000.000	1.000.000.000	
TOTALE		32.600.000.000	32.600.000.000	223.806.174



LEGGE 67/88 - Fondi Ministeriali

1) **SAN SEBASTIANO** - Fino ad ora sono stati realizzati vari interventi suddivisi in più stralci per il restauro della sede Universitaria, l'adeguamento del muro di confine, porzioni del I°, II°, III° e V° stralcio, acquisto di ascensori, sistemazione degli spazi esterni e della cabina Enel. I lavori sono stati tutti eseguiti.

2) **S. MARGHERITA** - Fino ad ora con questi fondi sono stati in parte eseguiti i lavori di adeguamento funzionale della sede Universitaria. I predetti lavori sono stati completati.

3) **CA' GARZONI E MORO** - Gli interventi edilizi finanziati in parte con questa legge sono stati ultimati. Si prevede di chiudere il cantiere dopo gli ultimi lavori al giardino interno entro marzo '98.

4) **CA' FOSCARI** - L'importo è servito per finanziare la progettazione (circa 200.000.000.) e con i rimanenti sono state avviate le indagini geognostiche e conoscitive del palazzo. La parte edilizia è stata eseguita.

5) **S. MARTA** - Fino ad ora sono stati eseguiti alcuni interventi di cui il principale è l'adeguamento funzionale del fabbricato "C" per il quale è stata impegnata la somma di Lire 5.020.000.000. (finanziamento parziale) il cui intervento è stato eseguito.

6) **CALLE DEI GUARDIANI** - Fino ad ora sono stati eseguiti vari interventi tra i quali parte della sistemazione della sede del custode per L. 57.000.000 circa e la sistemazione degli scoperti per un importo di L. 65.000.000 circa.

Il resto della somma è stato impegnato per realizzare il risanamento di alcuni capannoni da adibire a palestra polivalente. Quest'ultimo lavoro è stato appaltato in data 28.10.1996 e le opere sono attualmente in corso.

7) **PALAZZO NANI MOCENIGO** - Ad eccezione alcuni interventi condominiali e di riparazione del tetto per L. 144.000.000., il rimanente è stato impegnato per il restauro architettonico e funzionale del palazzo che recentemente ha avuto il benestare della Salvaguardia, ed attualmente è in corso la predisposizione dei progetti esecutivi per provvedere alle operazioni di appalto.

8) **CA' CAPPELLO** - Sono stati eseguiti due stralci esecutivi di intervento

9) **WOLF FERRARI** - L'intervento è stato completato nel 1991.

10) **CELESTIA** - L'intervento è stato completato nel 1993.

11) **S. GIOBBE ED ALTRI EDIFICI** - Il finanziamento fa parte del progetto di restauro e adeguamento funzionale relativo alla fase "A", I° stralcio del complesso universitario. Le opere che competono sono state eseguite completamente.



IL COORDINATORE GENERALE
DIRETTORE DIVISIONE SERVIZI TECNICI
Dot. Ing. Antonino LO CASCIO

LEGGE 139/92

Mutuo IMI

1) INFORMATIZZAZIONE ATENEO E BIBLIOTECHE - Fino ad ora sono stati eseguiti due grossi interventi che riguardano: il primo la conversione su nastro magnetico dei cataloghi delle biblioteche per un importo di L. 2.200.000.000. ed il secondo la realizzazione della rete informatica di Ateneo e l'acquisto delle relative apparecchiature per l'importo di L. 3.000.000.000. Si prevede di destinare la somma rimanente al il finanziamento delle opere di restauro e adeguamento funzionale della fase "A" di S. Giobbe.

2) S. GIOBBE fase "A" - Quota parte del finanziamento relativo del progetto di restauro e adeguamento funzionale relativo alla fase "A" I° stralcio. Lavori completamente eseguiti.

3) ZATTERE Acquisto Sci - E' stato effettuato un acquisto "chiavi in mano" di un edificio sito alle Zattere dove è stato insediato il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari Europei e Postcoloniali. I lavori sono stati eseguiti ed ultimati nel novembre '95. (Superficie mq 1436)

4) OPERE VARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Sono stati eseguiti vari interventi di natura manutentoria e di completamento di alcune opere di restauro e ristrutturazione già avviati e finanziati con altre leggi, con particolare riferimento ai seguenti interventi:

- parte dell'imbrigliamento della sede centrale di Ca' Foscari
- realizzazione di alcuni serramenti nella sede di S. Marta
- porzione del restauro ed adeguamento funzionale della sede di Ca' Cappello
- porzione del restauro e adeguamento funzionale del Fabbricato "C" di S. Marta.

5) CA' DALLA ZORZA Acquisto 3° piano - Acquisto di alcuni locali posizionati al terzo piano da destinare all'uso istituzionale dell'Università.


Mutuo BNL

1) S. GIOBBE fase "A" - Quota parte del progetto di restauro e adeguamento funzionale relativo alla Fase "A" I° stralcio di S. Giobbe.. Importo completamente utilizzato.

2) CA' BEMBO acquisto - E' stato acquistato un immobile che era concesso in Comodato dalla Cassa di Risparmio di Venezia. L'operazione è stata conclusa nel 1996. (Superficie mq 2107)

3) ZATTERE Acquisto Star Gas 1 - Sono stati acquistati i locali. (Superficie mq 404)

4) ZATTERE Acquisto Star Gas 2 - Sono stati acquistati i locali (Superficie mq 386)



LEGGE 539/95

Mutuo Crediop

- 1) SAN GIOBBE fase "A" - I lavori sono in corso e la loro ultimazione è prevista per il 1998
- 2) SAN GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Sono state acquisite tutte le autorizzazioni. Il progettista sta completando il progetto esecutivo e la gara d'appalto sarà espletata nel corso del 1998.
- 3) VIA TORINO Capammoni - Adeguamento funzionale del capammoni da adibire a laboratorio chimico per la facoltà di Scienze MM.FF.NN.. E' stata effettuata la gara d'appalto vinta dall'Impresa Edile Costruzioni Srl. I lavori sono iniziati lo scorso mese di luglio.
- 4) S. MARTA Teatro G. Poli - Restauro e adeguamento funzionale. E' stata effettuata la gara d'appalto vinta dall'impresa Garbuio Snc e si è in attesa dell'inizio dei lavori.
- 5) CA' GARZONI E MORO - Gli interventi edilizi finanziati in parte con questa legge sono stati ultimati. Si prevede di chiudere il cantiere dopo gli ultimi lavori al giardino interno entro marzo '98.
- 6) S. MARTA fabbricato "C" - Quota parte relativa al finanziamento delle opere di completamento del I° stralcio. I lavori sono stati ultimati.

Mutuo Interbanca

- 1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Sono state acquisite tutte le autorizzazioni. Il progettista sta completando il progetto esecutivo e la gara d'appalto sarà espletata nel corso del 1998.
- 2) S. GIOBBE Poste - E' necessario predisporre le operazioni per l'assegnazione della progettazione.
- 3) Magazzino CA' GARZONI - L'intervento è stato sospeso in attesa di una valutazione programmatica da parte dell'Università.
- 4) S. MARTA fabbricato "C" - Quota parte relativa al finanziamento delle opere di completamento del I° stralcio. I lavori sono stati ultimati.
- 5) OPERE VARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Sono stati eseguiti vari interventi di natura manutentoria e di completamento di alcune opere di restauro e ristrutturazione già avviati e finanziati con altre leggi, con particolare riferimento ai seguenti interventi:
 - Ripassatura del tetto presso la sede di Ca' Bernardo
 - Restauro degli affreschi dell'Auditorium di S. Margherita
 - Esecuzione di ulteriori interventi di imbrigliamento a Ca' Foscari
 - Restauro delle parti lapidee esterne della sede di Ca' Cappello
 - Interventi di restauro presso la sede di S. Sebastiano



COORDINATORE GENERALE
DIRETTORE DIVISIONE SERVIZI TECNICI
Ing. Antonio CASCIO

LEGGE 515/96

Mutuo Mediocredito

1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Sono state acquisite tutte le autorizzazioni. Il progettista sta completando il progetto esecutivo e la gara d'appalto sarà espletata nel corso del 1998.

2) ZATTERE Ex falegnameria - E' stato predisposto il progetto esecutivo

3) ATTUAZIONE D.LGS 626/94 - Attuazione delle condizioni per la messa a norma degli edifici secondo le disposizioni dettate dalla legge sulla prevenzione e protezione dai rischi.

Mutuo Crediop

1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Sono state acquisite tutte le autorizzazioni. Il progettista sta completando il progetto esecutivo e la gara d'appalto sarà espletata nel corso del 1998.

2) ZATTERE Ex falegnameria - E' stato predisposto il progetto esecutivo



IL COORDINATORE GENERALE
DIRETTORE DIVISIONE SERVIZI TECNICI
Dott. Ing. Antonio LO CASCIO



UNIVERSITÀ
CA' FOSCARI
DI VENEZIA

DIVISIONE SERVIZI TECNICI
Il Direttore

Ca' Foscari, 20 gennaio 1998

Prot. n. 31

Magistrato alle Acque
Provveditorato Regionale
alle OO.PP.

alla c.a. ing. Felice Setaro

Oggetto: Stato di attuazione degli interventi.

Si trasmette la documentazione relativa allo stato di attuazione degli interventi finanziati con i fondi della Legge Speciale per Venezia.

Cordiali saluti.



IL COORDINATORE GENERALE
Direttore della Divisione Servizi Tecnici
(Dott. Ing. Antonino Lo Cascio)

[Handwritten signature]

PAGINA BIANCA

Rettorato

Tolentini, Santa Croce 191, 30135 Venezia
Telefono +39 0 41 5221119-2571726
Fax +39 0 41 2571760
E-mail: rettore@iua.unive.it

Al Presidente del
Magistrato alle Acque
S.Polo 19 - Venezia

Prot.n. 3 del 23/1/'98

Oggetto: Utilizzazione fondi legge 5/2/92 n.139;


Il Rettore
prof. Marino Folin

Con riferimento ai fondi della legge 5/2/92 n.139, erogati a favore di questo Istituto, si fa presente che i medesimi sono stati utilizzati alla data odierna, per l'esecuzione di questi interventi:

- 1) Interventi di restauro sede di S.Marta (Ex Cot.Veneziano) Dorsoduro 2196 - Venezia
- 2) Acquisizione Grandi Magazzini Frigoriferi in area S.Basilio Dorsoduro 2196 - Venezia
- 3) Acquisizione edificio di proprietà ULSS 12 Campo della Lana S.Croce 601 - Venezia
- 4) Interventi di restauro sede di Palazzo Badoer - S.Polo 2554 Venezia

I prossimi programmi di utilizzazione prevedono i seguenti ulteriori interventi:

- 5) Completamento interventi di restauro sede S.Marta (Ex Cot. Veneziano) Dorsoduro 2196 - Venezia
- 6) Interventi di restauro sede Palazzo Pemma - S.Croce 1621 - Venezia
- 7) Interventi di messa a norma sedi di Palazzo Tron - S.Croce n.1957 e dei Tolentini - S.Croce 191 - Venezia
- 8) Interventi di restauro edificio Campo della Lana - S.Croce n.601 - Venezia
- 9) Interventi di restauro Magazzini Frigoriferi in area S.Basilio - Dorsoduro 2196 - Venezia
- 10) Completamento interventi di restauro sede Palazzo Badoer S.Polo 2554 - Venezia.



IL RETTORE
prof. Marino Folin



INTERVENTI EDILIZI CON LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Fondi già spesi: L. 35.250.000.000

Disponibilita':	Mutui CARISBO 1 e 2	L.	2.950.000.000
	Mutuo MEDIOCREDITO	L.	3.000.000.000
	Mutuo CREDIOP 1	L.	6.280.000.000
	Mutuo CREDIOP 2	L.	10.970.000.000

	Sommano	L.	23.200.000.000

Ripartizione:	ex Cotonificio op. esterne	L.	1.500.000.000
	ex Cotonificio bar	L.	150.000.000
	Palazzo Badoer	L.	2.000.000.000
	Palazzo Pemma	L.	4.500.000.000
	C.po della Lana, restauro	L.	4.000.000.000
	messa a norma Tolentini	L.	1.350.000.000
	messa a norma Pal. Tron	L.	1.300.000.000
	ex Magazzini Frigoriferi	L.	8.400.000.000

	Sommano	L.	23.200.000.000




Autorità Portuale di Venezia

Provveditorato al Porto

TEC/1535

Venezia,

23 GEN. 1998



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE
Segreteria del Comitato di coordinamento
e controllo
(art. 4 - legge 29.11.84, n. 798)
S. Polo, 19
30125 VENEZIA

p.c.
COMUNE DI VENEZIA
Ca' Farsetti
30124 VENEZIA

c.a. dott. Armando Danella
Capo Settore Legge speciale

Stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità portuale finanziati dalla legislazione speciale per Venezia

Con riferimento alla lettera prot. 312/GAB del 19.12.97 si precisa che la scrivente Autorità solo con l'entrata in vigore della Legge 4 ottobre 1996 n. 515 recante "interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia..." ha potuto usufruire di finanziamenti in conto legislazione speciale e precisamente (art. 1, comma 2) "... 3.500 milioni (dal 1997) e 2.500 (dal 1998) milioni per interventi di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia, da attuare nel rispetto delle competenze del Ministero dell'ambiente;..." mediante l'autorizzazione a contrarre mutui secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5.2.92 n. 139.

Sulla base di quanto enunciato, l'A.P. ha predisposto i seguenti interventi:

I° PARTE (a carico mutuo 1997-2012) 30.000 milioni per

lavori di completamento banchina Molo Sali

L. 17.000 milioni

lavori di escavo accosti e canali portuali (1° fase)

L. 13.000 milioni

II° PARTE (a carico mutuo 1998-2013) 22.000 milioni per

lavori riconfigurazione testata Molo Sali	L. 10.000 milioni
lavori di escavo accosti e canali portuali (2° fase)	L. 8.000 milioni
sistemaz. aree insula portuale e spostam. p. franco	L. 4.000 milioni

Su tali progetti ed in ottemperanza al disposto legislativo di cui alla citata L. 515/96, l'A.P. ha attivato la procedura per l'assunzione dei finanziamenti necessari e precisamente:

A) I° PARTE (mutuo 1997-2012) valore max 39.500 milioni

A fronte di un contributo di 3.500 milioni per quindici anni, la Cassa di Risparmio di Venezia ha sottoscritto con l'Autorità un mutuo quindicennale per un valore massimo di 39.500 milioni da erogarsi in tranches annuali, secondo lo stato avanzamento dei lavori, nell'arco temporale di cinque anni a partire dal 1997:

- Il Comitato Portuale ha deliberato l'impegno nella seduta del 20.11.1996 con deliberazione n. 28.
- L'aggiudicazione è stata attuata mediante "trattativa privata" per motivi di urgenza a sensi dell'art. 7 del D.L.vo 157/95, nell'ambito dei termini indicati all'art. 1 della legge 139/92.
- Il contratto quadro è stato sottoscritto in data 19 dicembre 1996 presso il notaio M.L. Semi, notaio in Venezia, con atto n. 99630 di rep. registrato il 30.12.96 al n. 846 Atti Pubblici.
- Lo stesso atto è stato notificato, a cura del notaio medesimo, al Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 13.1.1997.

B) II° PARTE (mutuo 1998-2013) valore max 28.500 milioni

A fronte di un contributo di 2.500 milioni per quindici anni, il Banco di Napoli di Venezia ha sottoscritto con l'Autorità un mutuo quindicennale per un valore massimo di 28.500 milioni da erogarsi in tranches annuali, secondo lo stato avanzamento dei lavori, nell'arco temporale di cinque anni a partire dal 1998:

- Il Comitato Portuale ha deliberato l'impegno nella seduta del 18.9.1997 con deliberazione n. 21.
- L'aggiudicazione è stata attuata mediante "bando di gara con procedura ristretta" a sensi dell'art. 7, lett.c, del D.L.vo 157/95.
- Il contratto quadro è stato sottoscritto in data 28 novembre 1997 presso l'ufficiale rogante di questa Autorità, con atto n. 29007 di rep. registrato a Venezia il 10.12.1997 al n. 3192 Atti Pubblici.

Per quanto riguarda le effettive erogazioni si fa presente che con atto del notaio M.L. Semi 101198 di rep. e registrato al n 2645 il 21.10.1997 agli *atti pubblici*, è stato sottoscritta la prima tranche di erogazione per 3.067,5 milioni relativa al mutuo 1997-2012 e riferita agli stati di avanzamento lavori di escavo con le seguenti ditte:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Coop. S. Martino per | L. 324,3 milioni |
| - Lavori Marittimi e Dragaggi per | L. 243,2 milioni |
| - AMAV per | L. 2.500.0 milioni |

Per quanto riguarda i lavori di escavo, tenuto conto che la disponibilità è la seguente:

Mutuo 1997-2012	L. 13.000.000
Mutuo 1998-2013	L. 8.000.000
Totale	L. 21.000.000

la suddivisione di spesa prevista è quella sottoriportata:

• Escavo bacino 4	L. 750.000.000
• Convenzione con AMAV per messa a dimora fanghi all'isola delle Tresse	L. 6.800.000.000
• Palancole canale Sud - primo tratto	L. 1.450.000.000
• Palancole canale Sud - secondo tratto	L. 6.250.000.000
• Escavo accosti portuale comm.li e canali ind.li	<u>L. 5.750.000.000</u>
TOTALE	L. 21.000.000.000



Autorità Portuale di Venezia

Provveditorato al Porto

Rispetto a tale suddivisione si vuole evidenziare che si sono posti a carico dei finanziamenti di cui alla legge 515/96 gli importi relativi a:

- convenzione con AMAV per la messa a dimora all'isola delle Tresse dei fanghi di risulta dall'escavo dei canali. L'importo della convenzione è stimato in L. 6.800.000.000; la disponibilità di spazi all'isola delle Tresse risulta essenziale per la realizzazione dei lavori di escavo dei canali;
- contributo al Magistrato alle acque per la realizzazione di un palancolamento in canale sud che consenta l'escavo del canale stesso con la larghezza in cunetta e la profondità previste dal vigente piano regolatore portuale.

Il contributo sarà corrisposto sulla base di un accordo di programma con il Magistrato alle acque che preveda la realizzazione, d'intesa fra le due Amministrazioni, che agiranno ognuna nel campo di propria competenza, di una serie di interventi all'interno della laguna che contemperino le esigenze di tutela ambientale con quella della navigazione.


Per i lavori di costruzione della banchina al Molo Sali (importo presunto 17.000 ML) è in corso di affidamento l'incarico per la progettazione esecutiva per la quale è stato pubblicato apposito bando di gara ai sensi del Dlgs 157/95.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Claudio Boniciolli



Autorità Portuale di Venezia



Venezia, 4 FEB. 1998

2208

Ministero dei Lavori Pubblici
Magistrato alle Acque
Segreteria del Comitato di
coordinamento e controllo
(art. 4 - legge 29/11/84, n. 798)
S.Polo, 19
30125 VENEZIA

p.c.
Comune di Venezia
Cà Farsetti
c.a. dott. Armando Danella
Capo Settore Legge Speciale
30123 Venezia

"Stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità portuale finanziati dalla legislazione speciale per Venezia"

Si fa riferimento alla lettera prot. 312/GAB del 19.12.97 per precisare che la scrivente Autorità ha in corso di attuazione, oltre agli interventi illustrati dalla ns. Tec/1535 del 23.1.98, anche due interventi finanziati tramite il Comune di Venezia (al quale la presente viene inviata per opportuna conoscenza) ai sensi dell'art. 6 lettera d) della legge 798/84.

Il finanziamento di 5000 ML è stato deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n. 253 del 13.11.95 ed è regolato dall'accordo di programma sottoscritto da Comune ed Autorità portuale il 15.10.96.

Gli interventi previsti sono i seguenti:

1. rifacimento degli impianti elettrici di potenza al porto commerciale di Venezia - sezione di Marghera - Molo B - Silo Piemonte (al netto del ribasso d'asta pari al 18,25%) L.2.354.095.072;
2. sistemazione piazzali operativi al servizio di banchina Veneto (valore soggetto al ribasso d'asta) L.2.850.000.000

Il primo intervento è in corso: la licitazione privata per l'affidamento del secondo ha avuto luogo il 3.2.98.

Le somme effettivamente erogate alla data attuale sono pari a L. 93 ML.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Claudio Boniciolli



*Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
DI VENEZIA

Al Presidente del Magistrato alle Acque
Comitato di indirizzo coordinamento e
controllo (art.4 Legge 29.11.1984, n.7989
VENEZIA

Prot. 17451 *del 29.1.98*
Risposta al foglio del *19.12.97*
all. n. 2

OGGETTO: Venezia - Finanziamenti Leggi speciali.


In relazione alla nota prot. 312/GAB del 31.12.1997 si invia in allegato lo stato di attuazione al 31.12.1997 degli interventi finanziati con le Leggi speciali per Venezia, progettati e diretti dalla Soprintendenza ai BB.AA.AA. di Venezia.

Si allega inoltre un programma di interventi da finanziarsi con le risorse rese disponibili dalla Legge Finanziaria 1998.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore precisazione o chiarimento si rendesse necessario.

IL SOPRINTENDENTE
(dott. arch. Roberto Cecchi)

MP/mr





*Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
DI VENEZIA

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI
VENEZIA

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE CON LEGISLAZIONE SPECIALE PER VENEZIA

EDIFICIO	LUOGO	PROPRIETA'	DESTINAZIONE	IMPORTO (in milioni)
Palazzo Marcello (1)	Cannaregio	Demaniale	Museo d'Arte Orientale	3.000
Palazzo Cappello (1)	S.Croce	Demaniale	Sede delle Soprintendenze ai BB.AA.AA. e AA.SS. del Veneto	6.000
Palazzo Grimani	Castello	Demaniale	Museo Archeologico	5.000
Chiesa di S.Simeon Piccolo (2)	S.Croce	Ecclesiastica	Edificio Religioso	5.000
Campanile della Chiesa di S.Martino (2)	Burano	Ecclesiastica	Edificio Religioso	4.000
Campanile della Chiesa di S.Stefano (2)	San Marco	Ecclesiastica	Edificio Religioso	4.500
Campanile di S.Giorgio dei Greci (2)	Castello	Stato Greco	Edificio Religioso	1.800
TOTALE				29.300

1)- Per effetto e nei modi dell'intesa Ministero B.C.A - Comune di Venezia di cui al verbale del 20.6.1997 per la definizione dell'area Marciana.

2)- Sulla base di quanto segnalato dalla Curia e per quanto a conoscenza di questa Soprintendenza per le particolari condizioni di instabilità e degrado.


B C - 253



*Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
DI VENEZIA

GABINETTO



Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Segretario Generale
c.a. Cons. dott. Gaetano Grimaldi
via Minghetti, 10
ROMA

e p. c.
Al Presidente del Magistrato alle
Acque - Comitato di indirizzo
coordinamento e controllo
(art. 4 legge 29.11.84. n. 7989)
VENEZIA

Prot. n. *7764* del 18 GIU. 1998


Oggetto: Venezia - Finanziamenti Leggi Speciali.

A rettifica della precedente nota prot. 17451 del 29.1.98 di questo Ufficio, avente pari oggetto, si prega di sostituire l'errato tabulato in essa allegato relativo allo "stato di attuazione degli interventi finanziati con legislazione speciale per Venezia" con quello accluso alla presente.

Rimane invariato invece il secondo allegato: quello riguardante il "Programma degli interventi da finanziare con la legislazione speciale per Venezia".

IL SOPRINTENDENTE
(dott. arch. Roberto Cecchi)

GS/dm



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI VENEZIA
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON LEGISLAZIONE SPECIALE PER VENEZIA 31/12/1997

Edificio	importo	capitolo	legge	da liquidare
Edificio				
Edificio - Gaggliandre	550.000.000	8034	1992 L. 415/91	0
Edificio - Gaggliandre	425.000.000	8034	1992 L. 415/91	1.999.708 Lavori ultimati - documentazione perenzione inviata al Ministero
Edificio - Gaggliandre	875.000.000	8034	1992 L. 415/91	204.883.045 Lavori sospesi - si prevede di concluderli entro la fine dell'anno
Edificio - Gaggliandre	400.000.000	8034	1992 L. 415/91	0
Edificio - Gaggliandre	200.000.000	8034	1992 L. 415/91	0
Edificio - Gaggliandre	300.000.000	8034	1992 L. 360/91	0
Edificio - Gaggliandre	150.000.000	8034	1992 L. 415/91	0
Edificio - Gaggliandre	1.000.000.000	8034	1992 L. 415/91	0
Edificio - Gaggliandre	500.000.000	8034	1992 L. 415/91	0
Edificio - Gaggliandre	150.000.000	8034	1992 L. 360/91	0
Edificio - Gaggliandre	1.500.000.000	8034	1992 L. 415/91	0
Edificio - Gaggliandre	350.000.000	8034	1992 L. 360/91	0
Edificio - Gaggliandre	1.000.000.000	8034	1992 L. 415/91	0
Edificio - Gaggliandre	1.000.000.000	8034	1992 L. 415/91	4.879.774 Lavori in corso - ultimazione prevista entro la fine del 1998
Edificio - Gaggliandre	240.000.000	8034	1992 L. 360/91	493.938.650 Lavori in corso - ultimazione prevista entro la fine del 1998
Edificio - Gaggliandre	400.000.000	8034	1992 L. 415/91	0
Edificio - Gaggliandre	330.000.000	8034	1992 L. 360/91	0
Edificio - Gaggliandre	150.000.000	8034	1992 L. 360/91	0
Edificio - Gaggliandre	125.000.000	8034	1992 L. 360/91	0
Edificio - Gaggliandre	500.000.000	8036	1992 L. 145/92	0
Edificio - Gaggliandre	400.000.000	8125	1992 L. 360/91	0
Edificio - Gaggliandre	330.000.000	8125	1992 L. 360/91	0
Edificio - Gaggliandre	550.000.000	8125	1992 L. 360/91	0
Edificio - Gaggliandre	300.000.000	8125	1992 L. 415/91	0
Edificio - Gaggliandre	150.000.000	8125	1992 L. 360/91	0
Edificio - Gaggliandre	400.000.000	8125	1992 L. 415/91	306.507 Lavori ultimati e collaudati
Edificio - Gaggliandre	200.000.000	8125	1992 L. 360/91	7.921.472 Lavori ultimati in attesa di collaudo
Edificio - Gaggliandre	750.000.000	8125	1992 L. 360/91	0
Edificio - Gaggliandre	205.000.000	8125	1992 L. 360/91	0
Edificio - Gaggliandre	356.000.000	8125	1992 L. 415/91	0
Edificio - Gaggliandre	144.000.000	8125	1992 L. 415/91	0
Edificio - Gaggliandre	400.000.000	8125	1992 L. 415/91	21.793.354 Lavori ultimati - documentazione perenzione inviata al Ministero
Edificio - Gaggliandre	700.000.000	8125	1992 L. 360/91	0
Edificio - Gaggliandre	950.000.000	8125	1992 L. 360/91	0
Edificio - Gaggliandre	120.000.000	8125	1992 L. 360/91	0
Edificio - Gaggliandre	400.000.000	8125	1992 L. 145/92	0

735.711.510

16.500.000.000

- E.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI VENEZIA

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON LEGISLAZIONE SPECIALE PER VENEZIA AL 31.12.1997

Edificio	importo	capitolo	legge	liquidato	da liquidare
Arsenale - Gaggiandre	550.000.000	8034	1992 L. 415/91	549.510.295	489.705
Biblioteca Marciana	425.000.000	8034	1992 L. 415/91	403.816.545	21.183.455
Biblioteca Marciana	875.000.000	8034	1992 L. 415/91	670.116.955	204.883.045
Casino Mocenigo	400.000.000	8034	1992 L. 415/91	392.407.385	7.592.615
Chiesa di S. Lorenzo	200.000.000	8034	1992 L. 415/91	184.230.315	15.769.685
Chiesa di S. Nicolò	300.000.000	8034	1992 L. 360/91	299.707.840	292.160
Ex Convento di S. Stefano	150.000.000	8034	1992 L. 415/91	148.199.350	1.800.650
Gallerie dell'Accademia	1.000.000.000	8034	1992 L. 415/91	993.140.055	6.859.945
Lazzaretto Nuovo	500.000.000	8034	1992 L. 415/91	499.016.240	983.760
Palazzo Ducale	150.000.000	8034	1992 L. 360/91	147.492.180	2.507.820
Palazzo Grimani	1.500.000.000	8034	1992 L. 415/91	1.495.813.800	4.386.200
Palazzo Marcello	350.000.000	8034	1992 L. 360/91	348.046.385	1.953.615
Palazzo Marcello	1.000.000.000	8034	1992 L. 415/91	970.936.890	29.063.110
Palazzo Michiel dalle Colonne	240.000.000	8034	1992 L. 415/91	505.061.350	493.938.650
Palazzo Pisani - decorazioni	400.000.000	8034	1992 L. 360/91	229.704.095	10.295.905
Palazzo Pisani - stucchi	330.000.000	8034	1992 L. 360/91	396.799.725	3.200.275
Palazzo Reale	150.000.000	8034	1992 L. 360/91	320.984.045	9.035.955
Palazzo Reale - arredi mobili	125.000.000	8034	1992 L. 360/91	149.533.100	466.900
Chiesa degli Scalzi	400.000.000	8125	1992 L. 360/91	119.992.620	5.007.380
Chiesa dei Frari	330.000.000	8125	1992 L. 360/91	397.974.095	2.025.905
Chiesa dei Gesuiti	550.000.000	8125	1992 L. 360/91	327.495.235	2.504.765
Chiesa di S. Antonin	300.000.000	8125	1992 L. 415/91	544.772.285	5.227.715
Chiesa di S. Antonin - campanile	150.000.000	8125	1992 L. 360/91	299.433.025	566.375
Chiesa di S. Beneto	400.000.000	8125	1992 L. 415/91	146.398.570	3.601.430
Chiesa di S. Geremia	200.000.000	8125	1992 L. 360/91	396.980.100	1.019.900
Chiesa di S. Giacomo dell'Orio	750.000.000	8125	1992 L. 360/91	119.869.195	80.130.805
Chiesa di S. Giobbe	205.000.000	8125	1992 L. 360/91	728.724.270	21.275.730
Chiesa di S. Giovanni Elemosinario	356.000.000	8125	1992 L. 360/91	200.460.045	4.539.955
Chiesa di S. Maria del Giglio - facciata	144.000.000	8125	1992 L. 415/91	348.720.490	7.273.510
Chiesa di S. Stefano	400.000.000	8125	1992 L. 415/91	143.754.640	245.360
Chiesa di S. Giovanni e Paolo	700.000.000	8125	1992 L. 415/91	374.856.675	25.143.325
Chiesa di S. Stefano	950.000.000	8125	1992 L. 360/91	693.955.585	6.044.415
Convento di S. Francesco del Deserto	120.000.000	8125	1992 L. 360/91	924.588.055	25.411.145
Sistema Informativo - S. Polo	400.000.000	8125	1992 L. 360/91	91.091.920	28.908.080
Catalogazione informatizzata isole	500.000.000	8036	1992 L. 145/92	375.085.180	24.014.820
TOTALE	16.500.000.000		1992 L. 145/92	499.800.000	200.000
				15.441.255.935	1.056.744.065
