

(62.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione collegamento
Torre Pellice - Villar Pellice: progettazione definitiva terminata

3.7 Opere temporalmente differite non riattivate

(64.00) Museo delle Olimpiadi

3.8 Opere annullate

Bardonecchia

(74.03) Elisoccorso H 24

Cesana San Sicario

(74.01) Elisoccorso H 12

Claviere

(74.12) Elisoccorso H 12

Oulx

(67.00) Stazione FS" Recupero ex-albergo Commercio- centro per i media-post olimpico Liceo
della Neve

Savigliano

(74.14) Eliporto H12

Torino

(74.06) Eliporto H24 G. Bosco

Comunità Montana Bassa Val Susa

(55.00) Acquedotto di valle 1° stralcio

Porte

(06.03) Progetto Paesaggio e Arredo


**OPERE CONNESSE AI XX GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI "TORINO 2006"**

**RELAZIONE SULLO STATO DI REALIZZAZIONE
Aggiornamento al 31 dicembre 2006**

Per la Regione Piemonte


Il Responsabile della Struttura Flessibile Torino 2006

Dott. Roberto Moiso



Il Coordinatore Operativo della Struttura Flessibile Torino 2006


Dott.ssa Giuliana Bottero



Per l'Agenzia Torino 2006

Il Direttore Generale dell'Agenzia Torino 2006

Ing. Mimmo Arcidiacono



INDICE

- 1 INQUADRAMENTO GENERALE
- 2 TERMINI TEMPORALI PER LA REALIZZAZIONE
- 3 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL MONITORAGGIO
- 4 SINTESI DELLO STATO DI AVANZAMENTO AL 31 DICEMBRE 2006.
 - 4.1 Sintesi ed analisi relative alla ripartizione degli importi (costo complessivo) per avanzamento lavori
 - 4.2 Sintesi ed analisi relative alla ripartizione degli importi (finanziamento Legge 285) per avanzamento lavori.
 - 4.3 Sintesi ed analisi relative al numero di opere per stato di avanzamento lavori.

1 INQUADRAMENTO GENERALE

La Legge 285/00 così come modificata dalle Legge 48/2003 e ss.mm.ii. ha disciplinato oltre alla realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" anche la realizzazione di opere connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici individuate sulla base della valutazione di connessione dichiarata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il Presidente della Regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. Inoltre sempre con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Regione Piemonte, d'intesa con gli Enti Locali interessati ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresì i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse.

All'Agenzia Torino 2006, istituita dalla predetta Legge è affidato il compito di realizzare il "Piano degli interventi" in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita dei Giochi, ad essa viene altresì affidato il compito di svolgere il monitoraggio sui tempi di realizzazione delle opere connesse.

La Legge 48/2003 e ss.mm.ii. ha istituito inoltre presso la Regione Piemonte un *Comitato di Regia dei Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006"* composto dal Presidente della Regione Piemonte, dal Sindaco di Torino, dal Presidente della Provincia di Torino, dal Presidente del CONI e da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comitato di regia indirizza e coordina le attività inerenti le finalità di cui alla legge 285/2000 e ss.mm.ii., assumendo le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi verificando inoltre i tempi ed i modi di realizzazione degli stessi.

La Regione Piemonte, considerando le competenze affidatele dalla Legge 285/2000, fra cui anche la proposta per la definizione delle opere connesse, ha costituito nel marzo del 2000 un proprio Gruppo di lavoro denominato **Coordinamento Torino 2006** poi trasformato nella **Struttura Flessibile per l'attuazione del progetto Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006**.

Il Comitato di Regia nella seduta del 3 novembre 2003 ha deliberato che l'Agenzia Torino 2006 svolgesse sulle opere connesse un monitoraggio a costo zero basato sulle dichiarazioni delle stazioni appaltanti. Pertanto la Struttura Flessibile della Regione Piemonte in pieno accordo con l'Agenzia Torino 2006 ha definito il sistema di monitoraggio e successivamente con cadenza periodica reso edotto il Comitato di Regia in merito allo stato di avanzamento delle opere connesse.

Risulta ancora fondamentale premettere che la Regione Piemonte in data 9 aprile 2001 con la DGR 45-2741 ha approvato (prima esperienza in Italia) la "Valutazione Ambientale Strategica

(VAS) del Piano degli Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006”. La VAS si articola in differenti fasi temporali, *ex ante*, *intermedia* ed *ex post*. Il processo di VAS considera globalmente tutte le attività e gli interventi utili allo svolgimento dei Giochi e tutte le trasformazioni indotte sul territorio e sull'ambiente e indica le iniziative e le strategie necessarie ad un utilizzo delle infrastrutture e dei servizi anche dopo l'evento olimpico affinché gli interventi realizzati possano, da un lato, minimizzare gli impatti ambientali e, dall'altro, massimizzare le positive ricadute culturali, sportive, turistiche e di sviluppo economico dell'intero Piemonte. E' in questo contesto di VAS e di governo puntuale del territorio che si sono inserite tutte le opere relative ai Giochi Olimpici.

Alla luce delle premesse sopra richiamate si evince che relativamente a tutte le opere olimpiche, connesse comprese, la sinergia fra gli enti è stata continua e costante e per tali ragioni la seguente relazione è stata realizzata congiuntamente dalla Regione Piemonte e dall'Agenzia Torino 2006.

2 TERMINI TEMPORALI PER LA REALIZZAZIONE.

L'iter per la definizione dell'elenco delle opere connesse, per la disponibilità del finanziamento, per la loro approvazione in conferenza dei servizi ove necessario si è rivelato lungo e complesso.

In particolare è necessario sottolineare che relativamente all'avanzamento delle opere si segnala che la “copertura finanziaria” delle stesse con la possibilità quindi di chiudere le conferenze dei servizi approvando il progetto definitivo si è avuta formalmente nel mese di aprile 2004. Inoltre al fine di tutelare la pubblica amministrazione si è proceduto ad autorizzare le stazioni appaltanti ad aggiudicare definitivamente le opere e ad avviare i lavori solo a seguito dell'accensione del mutuo con oneri a carico dello Stato per il finanziamento delle opere e quindi a far data dal 28 settembre 2004.

Considerando poi le situazioni climatiche delle zone montane in cui sono ubicate la maggior parte delle opere connesse per cui di fatto fino alla primavera 2005 non è stato possibile eseguire i lavori, considerata per alcune opere la pesante interferenza con le opere del Dossier olimpico in capo all'Agenzia Torino 2006 e viste inoltre le finalità delle opere connesse espresse in premessa con particolare riguardo alle ricadute post – olimpiche delle stesse, l'art. 1, comma 241 della legge 311/2004 “Finanziaria 2005” ha:

“...[omissis] autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post-olimpico.”

3 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL MONITORAGGIO.

Come precedentemente evidenziato le opere connesse come tutte le attività legate alle opere per i Giochi Olimpici invernali Torino 2006 sono state coordinate, nell'ambito delle competenze istituzionali di ciascun ente, dal Comitato di regia. Relativamente al monitoraggio delle opere connesse si è concordato che lo stesso fosse condotto a cadenza trimestrale (31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre di ogni anno) in stretta collaborazione fra la Regione Piemonte e l'Agenzia Torino 2006.

In particolare la Regione Piemonte attraverso la propria Struttura Flessibile ha inviato periodicamente una apposita scheda di raccolta dati (i cui contenuti sono stati concordati ed elaborati con l'Agenzia Torino 2006) ai Responsabili Unici del Procedimento delle stazioni appaltanti che fornivano quindi l'aggiornamento dei dati. I dati sono stati trattati a livello informatico, raccolti e trasmessi all'Agenzia Torino 2006 che ha proceduto ad ulteriori verifiche anche dirette ed ha elaborato i Promemoria trasmessi alla Presidenza del Consiglio.

L'attività di cui sopra è stata svolta parallelamente a quella dell'Osservatorio Regionale sui Lavori Pubblici che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n.109/94 e s.m., ha svolto un'attività di monitoraggio tramite le tradizionali schede dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Affiancandosi, invece, alla Struttura suddetta e in ossequio alle disposizioni della legge 285/2000, l'Osservatorio ha, altresì, svolto le funzioni di rilevazione delle informazioni inerenti al processo dei singoli interventi olimpici e delle fasi decisorie e ha garantito, tramite appositi strumenti informatici, la pubblicità di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza di servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale.

Per assicurare adeguata pubblicità ai progetti delle opere del Dossier Olimpico e delle opere connesse, è stato creato, all'interno del sito informatico dell'Osservatorio, un apposito sistema che per ogni opera, permette la selezione e la visualizzazione dei documenti più significativi allegati al progetto definitivo. Gli atti conclusivi delle singole conferenze, prescrittivi e vincolanti per la realizzazione delle opere, sono invece consultabili sul sito della Struttura Flessibile Torino 2006.

Per sperimentare l'efficacia dell'utilizzo di tecnologie alternative per la diffusione di dati ed informazioni sui lavori pubblici e garantire nel contempo la massima applicazione delle disposizioni della legge 285/2000 e s.m., è stato realizzato il DVD "Raccolta delle attività e dei progetti per Torino 2006" presentato in occasione del Convegno tenutosi in Torino il 25 Gennaio 2006.

In data 18 maggio 2001 è stato firmato un Protocollo d'Intesa per l'incremento della collaborazione istituzionale nei pubblici appalti, con diversi Enti tra cui l'Agenzia Torino 2006.

Per dare piena attuazione all'accordo, promosso dalla Prefettura di Torino e dalla Regione Piemonte e volto ad assicurare legalità e trasparenza nel settore degli appalti pubblici, l'Osservatorio ha realizzato l'applicativo denominato SOLO (Sistema Osservatorio Opere Olimpiche).

Il SOLO ha consentito di monitorare la sicurezza nei cantieri olimpici ed attuare tutta una serie di azioni volte a prevenire le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti, il contenimento del fenomeno del lavoro nero e la tutela della salute dei lavori.

L'Agenzia Torino 2006, tramite l'inserimento nei capitolati di un'apposita clausola, ha vincolato le imprese esecutrici alla trasmissione di una serie di dati tra i quali l'assetto societario della stessa impresa. I fruitori del Sistema sono stati, nell'ambito delle rispettive competenze, la Prefettura di Torino e l'Osservatorio Sanitario.

In considerazione del successo riscontrato, in futuro il SOLO molto probabilmente verrà utilizzato per monitorare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali che saranno realizzate sul territorio regionale.

4 SINTESI DELLO STATO DI AVANZAMENTO AL 31 DICEMBRE 2006.

Si illustra di seguito lo stato di avanzamento nella realizzazione delle opere connesse risultante dal monitoraggio del 31 dicembre 2006 con alcune considerazioni e analisi di carattere statistico. Le elaborazioni successive sono fatte su un numero di opere coincidenti con quelle dei DPCM di approvazione delle opere stesse e sia sugli importi complessivi delle opere (finanziamenti statali Legge 285 + cofinanziamenti) ed al netto delle opere differite e non riattivate sia relativamente ai soli finanziamenti sulla legge 285. Per tali ragioni si possono trovare leggere variazioni rispetto ai totali dei DPCM dovute ad aumenti dei cofinanziamenti. Per avere un quadro completo, la lettura dei dati aggregati di seguito riportata, dovrà essere accompagnata dal dettaglio sullo stato delle singole opere contenuto al documento di monitoraggio allegato alla presente relazione. Il quadro riassuntivo sullo stato di attuazione delle opere connesse è esplicitato alla tabella seguente, mentre nei successivi paragrafi si entra nel merito dei dati sotto riportati.

QUADRO RIASSUNTIVO ATTUAZIONE OPERE CONNESSE AGGIORNATO AL 31 DICEMBRE 2006						
descrizione	costo complessivo		finanziamento legge 285		opere	
	milioni di euro	% importi	milioni di euro	% importi	n° opere	% opere
Opere ultimate (% esecuzione lavori pari al 100%)	204,77	56,4	117,53	49,3	50	47,6
Opere in corso di ultimazione (% esecuzione lavori compresa fra 80% e 99%)	75,55	20,8	47,26	19,8	11	10,5
Opere in corso di realizzazione avanzata (% esecuzione lavori compresa fra 50% e 79%)	33,77	9,3	33,28	14,0	9	8,6
Opere in corso di realizzazione avviate (% esecuzione lavori compresa fra 0% e 49%)	15,29	4,2	12,47	5,2	9	8,6
Opere appaltate con lavori non ancora iniziati	1,19	0,3	1,19	0,5	1	1,0
Opere in fase progettuale	29,26	8,1	25,42	10,7	16	15,2
Opere temporalmente differite non riattivate	1,81	0,5	0,00	0,0	1	1,0
Opere annullate	1,23	0,3	1,23	0,5	8	7,6
TOTALI	362,85	100,0	238,387	100,0	105	100,0

4.1 Sintesi ed analisi relative alla ripartizione degli importi (costo complessivo) per avanzamento lavori.


Con riferimento al *“Quadro riassuntivo attuazione opere connesse aggiornato al 31 dicembre 2006”* si evidenzia che **analizzando il costo complessivo** delle opere risulta che:

- sono state completate opere per circa 204,77 milioni di euro di lavori pari al 56,4% dello stanziamento complessivo (circa 363 milioni di euro di cui 238 milioni di euro provenienti dallo Stato a valere sulla Legge 285/2000 ed i restanti provenienti da cofinanziamento dei soggetti attuatori);
- sono ormai oltre il 50 % di completamento opere per un importo di oltre 108 milioni di euro pari al 30,1% del costo complessivo
- sono avviate ed in fase di realizzazione opere per un ammontare di circa 15,3 milioni di euro pari a circa il 4,2% del costo complessivo.
- sono in fase progettuale opere per un ammontare complessivo di circa 29 milioni di euro pari al 8,1% del costo complessivo. Per queste ultime opere il Comitato di Regia ha autorizzato le stazioni appaltanti ad impiegare i fondi successivamente all'evento olimpico ai sensi dell'art art. 1 comma 241 Legge 311/2004 (le opere appartengono per la maggior parte ai comparti dei piani strategici Interventi di assetto territoriale, Interventi sul sistema Fognario-Acquedotti-Collettori, Sanità).
- Sono state differite o annullate opere per un ammontare di circa 3 milioni di euro pari a meno dell'1% del costo complessivo.


Pertanto sono già realizzate o in fase di realizzazione opere connesse per un ammontare di circa 330 milioni di euro pari a circa il 91% del costo complessivo.

Si allegano i grafici di dettaglio relativi alle considerazioni sopra esposte.

Ripartizione importi per stato di avanzamento lavori

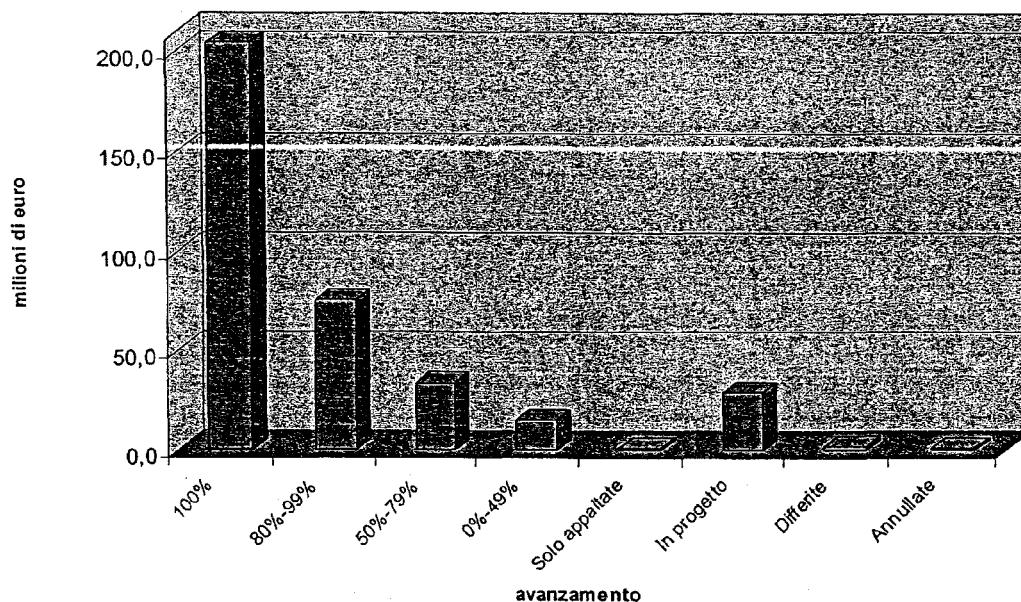

Ripartizione % importi per stato di avanzamento lavori

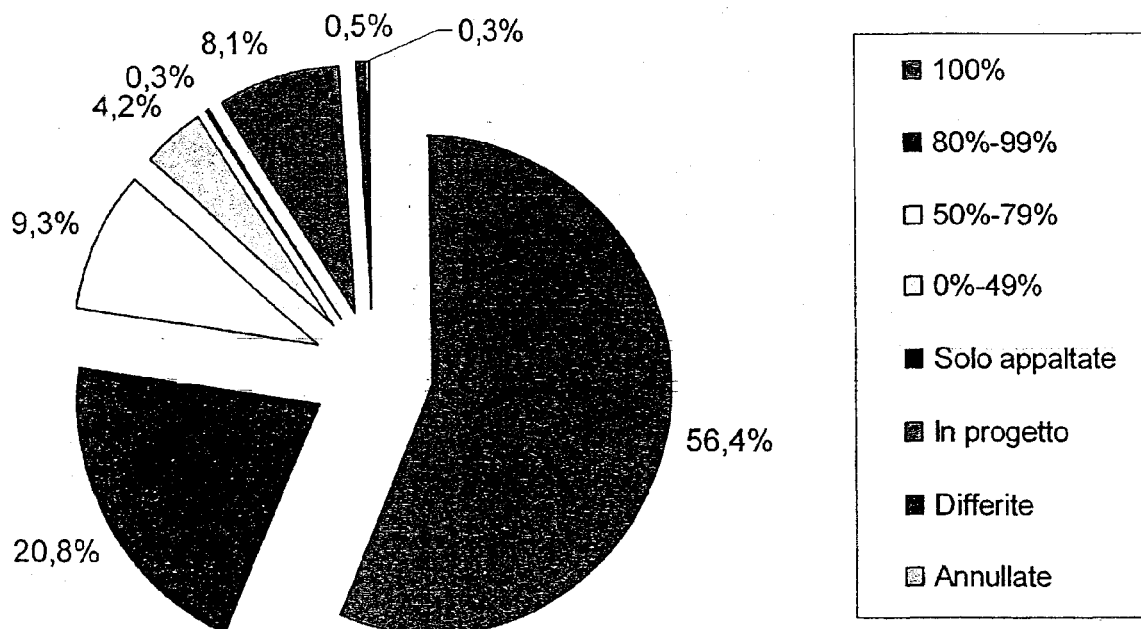

4.2 Sintesi ed analisi relative alla ripartizione degli importi (finanziamento Legge 285) per avanzamento lavori.


Con riferimento al *“Quadro riassuntivo attuazione opere connesse aggiornato al 31 dicembre 2006”* si evidenzia che analizzando la quota di finanziamento a carico della Legge 285/2000 delle opere risulta che:

- sono state completate opere per circa 117,5 milioni di euro di lavori pari al 49,3% del finanziamento complessivo (circa 238 milioni di euro)
- sono ormai oltre il 50 % di completamento opere per un importo di oltre 80 milioni di euro pari al 34 % del finanziamento complessivo.
- sono avviate ed in fase di realizzazione opere per un ammontare di circa 12 milioni di euro pari a circa il 5,2 % del finanziamento complessivo.
- sono in fase progettuale opere per un ammontare di circa 25 milioni di euro pari al 10,6 del finanziamento complessivo. Per queste ultime opere il Comitato di Regia ha autorizzato le stazioni appaltanti ad impiegare i fondi successivamente all’evento olimpico ai sensi dell’art art. 1 comma 241 Legge 311/2004 (le opere appartengono per la maggior parte ai comparti dei piani strategici Interventi di assetto territoriale, Interventi sul sistema Fognario-Acquedotti-Collettori, Sanità).
- Sono state differite o annullate opere per un ammontare di circa 1,2 milioni di euro pari allo 0,5% del finanziamento complessivo.


Pertanto anche analizzando il finanziamento a carico della Legge 285/2000 sono già realizzate o in fase di realizzazione opere connesse per un ammontare di circa 212 milioni di euro pari a circa il 90% del finanziamento complessivo.

Si allegano i grafici di dettaglio relativi alle considerazioni sopra esposte.

**Ripartizione importi (finanziamento L.285)
per stato di avanzamento lavori**

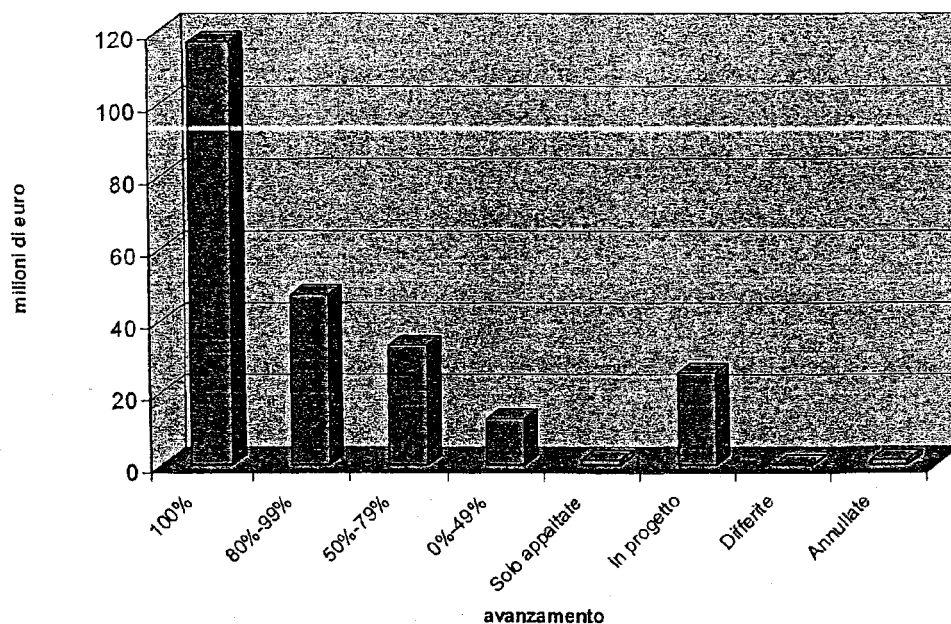

**Ripartizione % importi (finanziamento L.285)
per stato di avanzamento lavori**

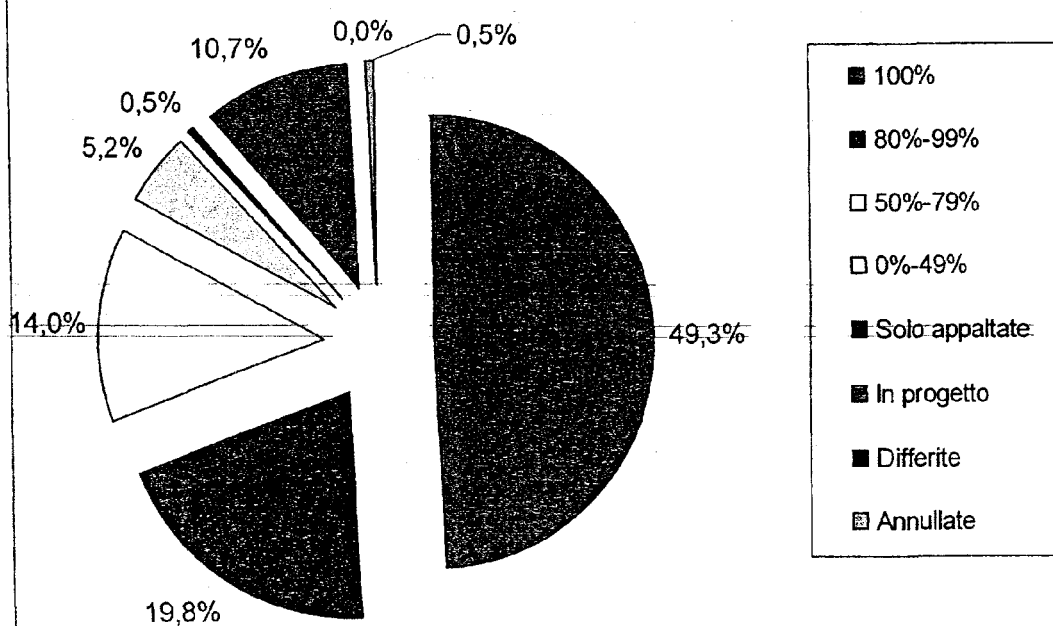

4.3 Sintesi ed analisi relative al numero di opere per stato di avanzamento lavori.


Con riferimento al “*Quadro riassuntivo attuazione opere connesse aggiornato al 31 dicembre 2006*” si evidenzia che analizzando il numero di opere risulta che:

- sono state completate 50 opere, pari al 47,6% del totale
- sono ormai oltre il 50 % 20 opere, pari al 19,1 % del totale.
- sono avviate ed in fase di realizzazione 9 opere, pari al 8,6 % del totale.
- sono in fase progettuale 16 opere, pari al 15,2 % del totale. Per queste ultime opere il Comitato di Regia ha autorizzato le stazioni appaltanti ad impiegare i fondi successivamente all'evento olimpico ai sensi dell'art art. 1 comma 241 Legge 311/2004 (le opere appartengono per la maggior parte ai comparti dei piani strategici Interventi di assetto territoriale, Interventi sul sistema Fognario-Acquedotti-Collettori, Sanità).
- Sono state differite o annullate 9 opere, pari al 8,6 % del totale.

Pertanto analizzando il numero di opere sono già realizzate o in fase di realizzazione 80 opere connesse pari circa al 77 % del totale.

Si allegano i grafici di dettaglio relativi alle considerazioni sopra esposte.

Ripartizione numero di opere per stato di avanzamento lavori

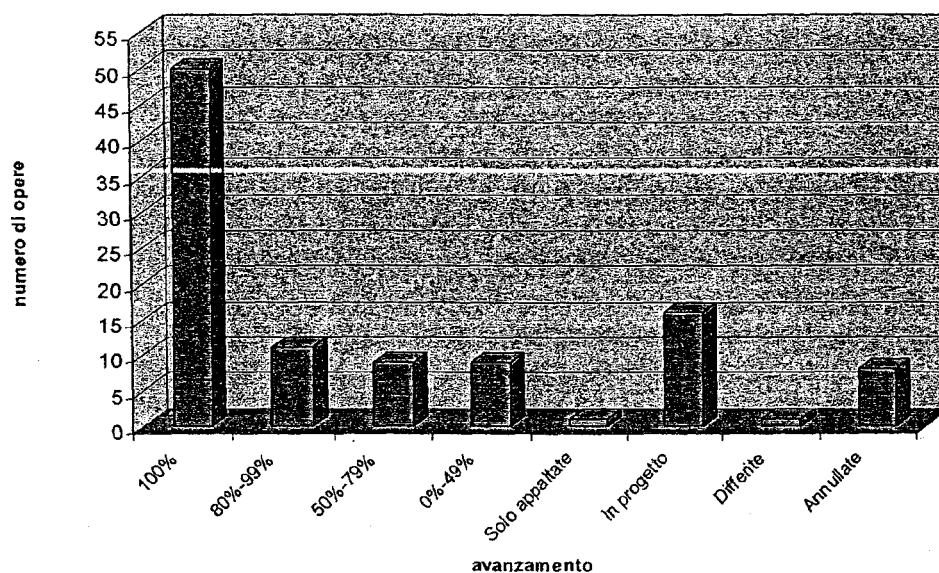

Ripartizione % opere per stato di avanzamento lavori

