

SCARICATO



**Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la
Regione Umbria**

(nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/11/2011)

Prot. n.

C.a. Ing. Luciani

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REGIONE UMBRIA	
000053	13 FEB. 2013
D. P. C. M. 07-11-2011	

Al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Ispettorato Generale
per l'emergenza idrogeologica
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA


RACCOMANDATA A/R

Oggetto: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria, sottoscritto in data 3/11/2010, modificato in data 14/07/2011. Gestione commissariale. Relazione al 31/12/2012

In ottemperanza a quanto stabilito dagli articoli 2 e 5 del DPCM di nomina del 7/11/2011, allego alla presente nota la relazione concernente lo stato di avanzamento dell'Accordo di programma in oggetto indicato alla data del 31/12/2012.

Cordiali saluti.

Il Commissario straordinario delegato
Dott. Vincenzo Santoro



**Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la
Regione Umbria**

Dott. Vincenzo Santoro

nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2011

**Oggetto: Legge 28 Febbraio 2010, n. 26, art. 17 – Attuazione Accordi di Programma per gli
interventi nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico – Situazione al 31 DICEMBRE 2012**

RELAZIONE

L'ACCORDO DI PROGRAMMA

L'Accordo di programma in oggetto indicato, previsto dall'articolo 2, comma 240 della legge n. 191/2009, è stato sottoscritto tra la Regione Umbria e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (MATTM) in data 3/11/2010 ed è stato modificato con apposito atto integrativo in data 14/07/2011.

Il costo degli interventi, elencati in dettaglio nell'Allegato 1 alla presente nota, ammonta complessivamente ad € 45.648.450,33 ed è finanziato nel modo seguente:

- € 21.600.000,00 con risorse a carico del MATTM;
- € 24.048.450,33 con risorse a carico della Regione Umbria.

Per gli interventi previsti nel citato Allegato 1 individuati come "Interventi programmati da finanziare", dell'ammontare complessivo di € 2.400.000,00, la copertura finanziaria dovrà derivare da eventuali economie provenienti dall'attuazione dell'Accordo e da ulteriori stanziamenti resi disponibili da parte dei soggetti sottoscrittori.

Le risorse del MATTM, pari ad euro 21.600.000,00, derivano:

- per € 9.507.842,95 dal proprio Bilancio;
- per € 12.092.157,05 dalla legge n. 191/2009 art. 2, comma 240 (FAS statali).

Le risorse della Regione Umbria derivano:

- per € 8.048.450,33 da economie di APQ a suo tempo sottoscritti con il Ministero dell'Ambiente (APQ anno 2001)
- per € 16.000.000,00 da fondi FAS 2007/2013 (FAS regionali).

GLI INTERVENTI PRIORITARI

L'attuazione dell'Accordo ha preso avvio con l'individuazione, nell'ambito della totalità degli interventi previsti nell'Accordo stesso, di quelli prioritari, immediatamente cantierabili.

Tale individuazione è stata effettuata anche in relazione all'assicurazione, da parte del MATTM, dell'immediato trasferimento di una prima tranches di finanziamenti dell'importo di € 9.507.842,95 derivante dal bilancio del MATTM.

2

Di seguito si riepilogano gli interventi prioritari, suddivisi in relazione alla natura del rischio, tra "rischio frane" e "rischio idraulico", i cui dettagli (costo, descrizione, localizzazione...) possono essere riscontrati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma

Rischio frane

- Mitigazione rischio idrogeologico nel Comune di Baschi;
- Mitigazione rischio idrogeologico, crolli rupe nel Comune di Fabro;
- Ripristino dei danni causati da dissesto idrogeologico nel Comune di Ferentillo;
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico eseguite nei Comuni di Todi e Orvieto.

Rischio idraulico

- Intervento di messa in sicurezza del bacino del Torrente Tresa nel Comune di Città della Pieve;
- Intervento di messa in sicurezza zona industriale La Paciana e abitati, nei comuni di Foligno e Spello;
- Intervento di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni-Narni, 3° stralcio, 1° lotto;
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua classificati e non classificati

Per quanto attiene agli interventi per la mitigazione del "*rischio frane*", tutte le situazioni ricomprese nell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sono classificate a rischio R4 e hanno subito, seppur in misura diversa, significativi aggravamenti in seguito ai fenomeni pluviometrici più importanti che hanno interessato la regione (ad esempio nei mesi di dicembre 2009 - gennaio 2010 e novembre - dicembre 2010); in due dei luoghi già individuati nell'AP con il Ministero dell'Ambiente, di seguito descritti, gli aggravamenti hanno comportato l'attivazione da parte delle competenti Amministrazioni Comunali di misure urgenti a tutela della privata e pubblica utilità.

La situazione di rischio idrogeologica connessa al rischio di crolli in **località Carnaiola in Comune di Fabro**, già nota, con DGR 202 del 08/02/2010 "Programma degli interventi per la prevenzione e mitigazione dei Rischi idraulici e idrogeologici" era stata individuata tra le situazioni a maggior rischio per le quali richiedere inserimento nel piano straordinario di intervento, ha subito nel 2011 un aggravamento a causa di ulteriori crolli parietali con la conseguente dichiarazione di inagibilità una civile abitazione.

Al riguardo, per gli interventi nei Comuni di Fabro, Ferentillo e Baschi il Commissario è Soggetto Attuatore. I lavori nel Comune di Ferentillo verranno consegnati in data 6/02/2013 e contestualmente prenderanno avvio, mentre per quelli nei Comuni di Baschi e Fabro è fissata per il giorno 13/02/2013 la Conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti.

In data 14 giugno 2012 un nuovo episodio di crollo ha interessato l'abitato dei **Cesi, in località S. Onofrio**. Il dissesto ha interessato l'area contigua al cantiere dell'intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico (VIII stralcio), ovvero l'area ove sono previsti gli interventi già ricompresi nell'Accordo di Programma (IX stralcio).

Stante la situazione di rischio con DGC n. 240 del 27.06.2012 è stata approvata la procedura di Somma Urgenza dando attuazione all'Ordinanza sindacale contingibile ed urgente prot. 94616 del 18.06.2012 e quindi sono stati affidati i lavori.

Il comune di Terni con nota prot. n. 108826 del 17.07.2012, acquisita al prot. del Commissario Straordinario n. 89 del 24.07.2012, ha richiesto di ammettere a finanziamento la somma occorrente per l'attuazione dei lavori di somma urgenza (che consistono in una anticipazione di alcuni dei lavori già previsti nell'intervento inserito nell'AP) **per un importo di € 510.000,00 come anticipazione dell'intervento globale dell'importo di € 1.500.000,00.**

Nella riunione del 12/12/2012 il Commissario Straordinario delegato ha ritenuto ammissibile la richiesta del Comune di Terni. Ne consegue che entro il mese di Febbraio 2013 verrà predisposta l'ordinanza commissariale che individua il Comune di Terni quale Ente Attuatore dell'intervento di somma urgenza nel Comune di Terni, località Cesi ed assegna allo stesso il relativo finanziamento.

3

Nella medesima riunione del 12/12/2012 il Commissario Straordinario ha individuato i **Comuni di Todi ed Orvieto** quali Enti Attuatori per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ciascuno dell'importo di € **500.000,00**. L'assegnazione di detti finanziamenti è prevista per il mese di febbraio 2013

Tutti gli interventi inseriti nell'AP sono stati selezionati in base alla necessità di intervenire in situazioni classificate a rischio R4, ovvero a rischio di perdita di vite umane, ove il prolungato ritardo nel trasferimento delle risorse e la conseguente posticipazione dell'attuazione degli interventi di mitigazione aumenta la probabilità di verificarsi di nuovi episodi di dissesto a seguito di eventi ad esempio pluviometrici ma anche sismici.

Per quanto attiene agli interventi per la mitigazione del "rischio idraulico", la priorità è derivata dalla necessità di mitigazione del rischio nelle aree del territorio regionale, dove per popolazione, infrastrutture e beni culturali, era prioritariamente necessario intervenire.

Altresi, **nel Novembre 2012** e precisamente nei giorni 11 12 e 13 si sono verificate precipitazioni intense che hanno interessato il territorio regionale, in particolare i settori sud occidentali della Regione.

Tale evento ha determinato situazioni di forte criticità nella maggior parte dei corsi d'acqua del territorio regionale ed in particolare nelle aree interessate dal Bacino del Fiume Nestore e dal Bacino del Fiume Paglia.

Per fronteggiare detta situazione è stato destinato, con l'ordinanza commissariale n. 12 del 22/11/2012, all'intervento previsto nell'Accordo, denominato "**Manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua classificati e non classificati**", l'importo di € **1.485.000,00**. L'assegnazione è stata effettuata alle Province, alle Comunità Montane, e ai Consorzi, quali Soggetti attuatori, i quali hanno proceduto all'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino dell'efficienza idraulica su alcuni bacini idrografici del territorio regionale interessato dagli eventi alluvionali sopra citati. Alla data del 31/12/2012 detti interventi risultano quasi tutti conclusi e si è nella fase del collaudo.

Il finanziamento suddetto verrà integrato con le ulteriori risorse disponibili o che si renderanno disponibili e, precisamente:

- con l'importo accreditato in Contabilità Speciale in data 10/12/2012 pari ad € **1.200.000,00** (risorse MATTM)
- con il finanziamento derivante dall'ex art. 33, comma 3, della L. 183/2011 (Piano Centro Nord) per un importo pari ad € **2.455.207,46** (risorse MATTM, Piano Centro Nord, quota parte del finanziamento di € 5.000.000,00).

Con specifico riferimento alla somma di € **5.000.000,00** richiesta dalla Regione a valere sulle risorse del Piano Centro Nord, la stessa, oltre a finanziare l'intervento sopra illustrato, verrà destinata nel modo seguente:

- € **600.000,00** per l'intervento nel Comune di S. Giustino per la messa in sicurezza dell'abitato, zona industriale ed artigianale;
- € **1.944.792,54** per l'attuazione del 1° Stralcio dell'intervento di messa in sicurezza della Città di Foligno.

IL CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Va rilevato che l'incertezza in merito ai tempi di trasferimento delle risorse da parte del MATTM, anche di quelle ritenute immediatamente disponibili, quantificate in € 9.507.842,95 (l'ultima tranche di detto finanziamento, dell'importo di € 1.246.536,23, è stata accreditata in C.S. solo in data 10/12/2012) non ha consentito il rispetto dei tempi e delle fasi di cui al cronoprogramma a suo tempo trasmesso allo stesso Ministero.

LA GESTIONE COMMISSARIALE

4

Con specifico riferimento alla gestione commissariale, l'attività ha preso avvio con la individuazione da parte della Regione Umbria (Deliberazione della Giunta regionale n. 651 del 20/06/2011, modificata ed integrata con deliberazione n. 1292 del 23/10/2012) di un pool, costituito da dirigenti e funzionari regionali, avente la funzione di supportare il Commissario nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti e, precisamente nello svolgimento delle attività tecnico amministrative, giuridiche ed economico finanziarie connesse con la progettazione e la realizzazione degli interventi ricomprendendo, le spese relative alla suddetta attività di supporto nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'articolo 92 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. e i..

La gestione commissariale è effettuata attraverso gli incontri del Commissario con gli Amministratori ed i funzionari dei Comuni interessati alla realizzazione degli interventi.

A seguito delle risultanze di tali incontri sono state emanate, alla data del 31/12/2012, le ordinanze commissariali riepilogate, con riferimento a ciascun intervento, nella Tabella B allegata alla presente relazione. Nella Tabella C, per completezza di argomento, sono riepilogati gli atti amministrativi (ordinanze commissariali, determinazioni dirigenziali e deliberazioni di Giunta regionale) emanati per organizzare l'attività commissariale.


LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Di seguito si illustra, in dettaglio e schematicamente, lo stato di attuazione degli interventi prioritari, come sopra illustrati.

L'avvio delle attività relative a ciascun intervento è stato preceduto da apposite riunioni tenute dal Commissario straordinario con gli Enti e gli Amministratori interessati, volte a definire in modo condiviso le fasi e i relativi tempi di attuazione. Con specifico riferimento alla quantificazione delle **Spese Tecniche** da finanziare, è stato concordato il "riconoscimento" delle stesse nella misura massima del 10% dell'importo assegnato all'intervento dall'A.P., onnicomprensiva di tutti gli oneri connessi alla progettazione e all'attuazione, IVA compresa (redazione progetto preliminare, redazione progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, incentivo per la progettazione, collaudo..). Si sottolinea che l'applicazione del criterio suddetto determina una riduzione, rispetto agli importi calcolati in base alla tariffe vigenti, del 30% circa e che, in relazione agli affidamenti, tale importo viene ulteriormente ribassato in sede di ogni singola gara.

Si riepilogano schematicamente, per ciascun intervento, le fasi attuate e quelle da attuare.


RISCHIO FRANE – MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI BASCHI

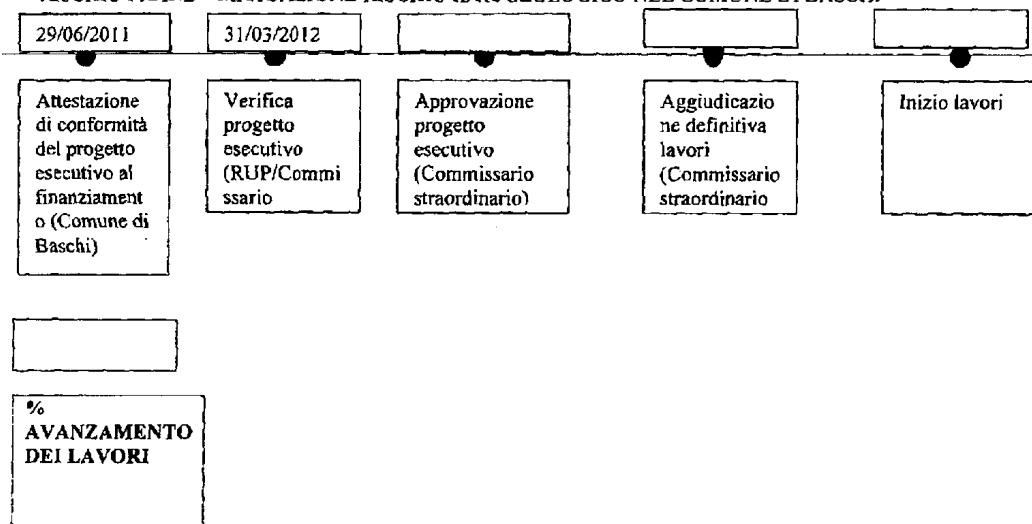


5

RISCHIO FRANE – MITIGAZIONE RISCHIO
FABRO


IDROGEOLOGICO, CROLLI RUPE NEL COMUNE DI

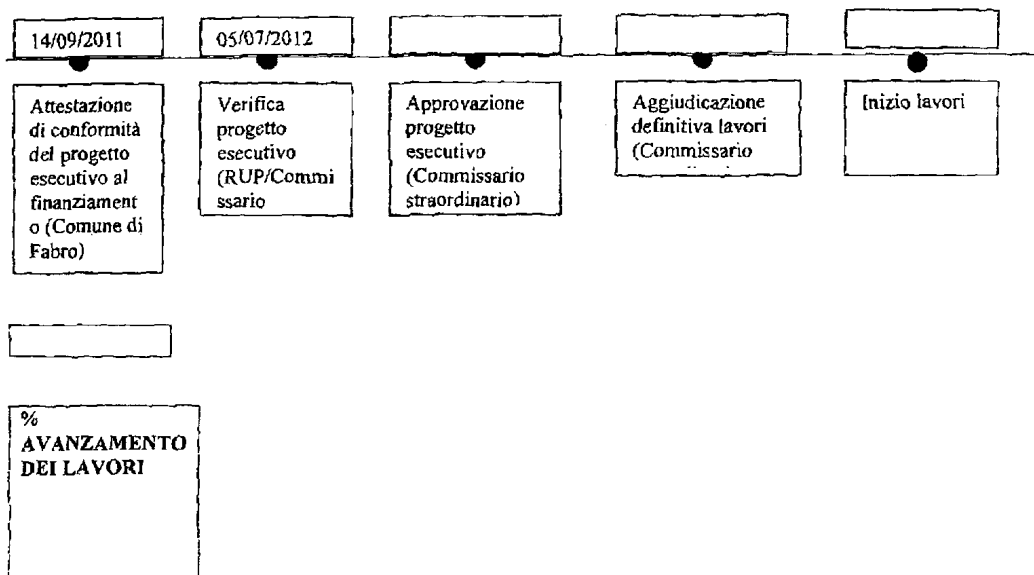


RISCHIO FRANE – RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI
FERENTILLO

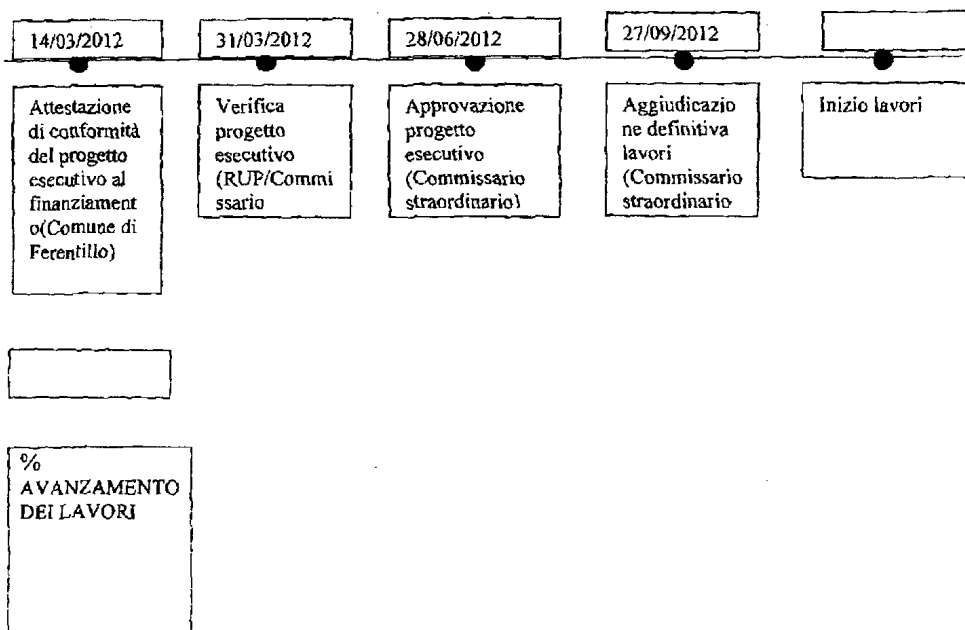


RISCHIO IDRAULICO – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO DEL TORRENTE TRESA
NEL COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE

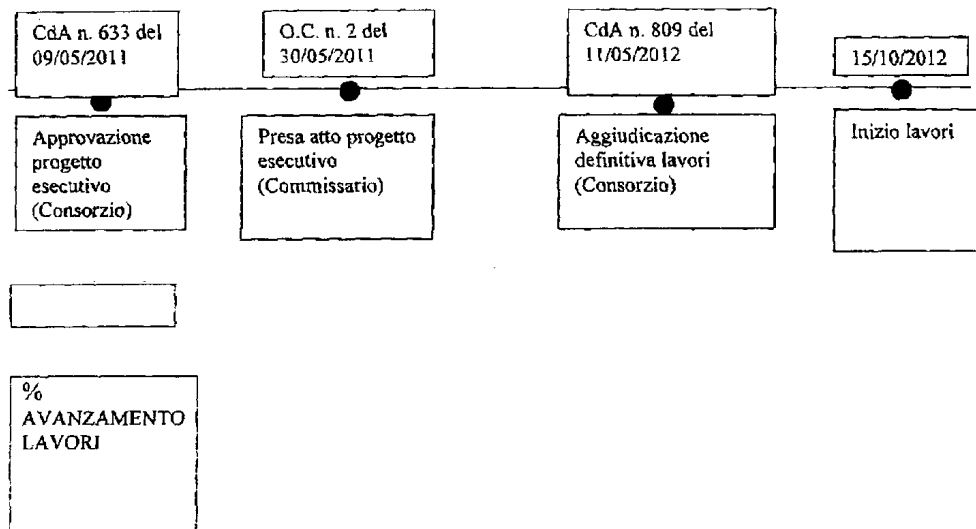


RISCHIO IDRAULICO – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA INDUSTRIALE LA PACIANA E
ABITATI, NEI COMUNI DI FOLIGNO E SPELLO

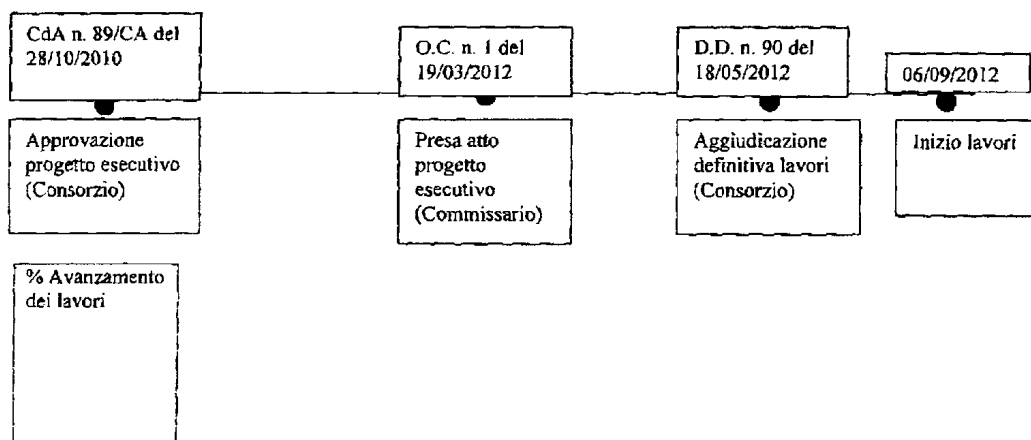

RISCHIO IDRAULICO – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CITTA' DI TERNI E ZONA INDUSTRIALE TERNI-NARNI, 3° STRALCIO, 1° LOTTO ⁷

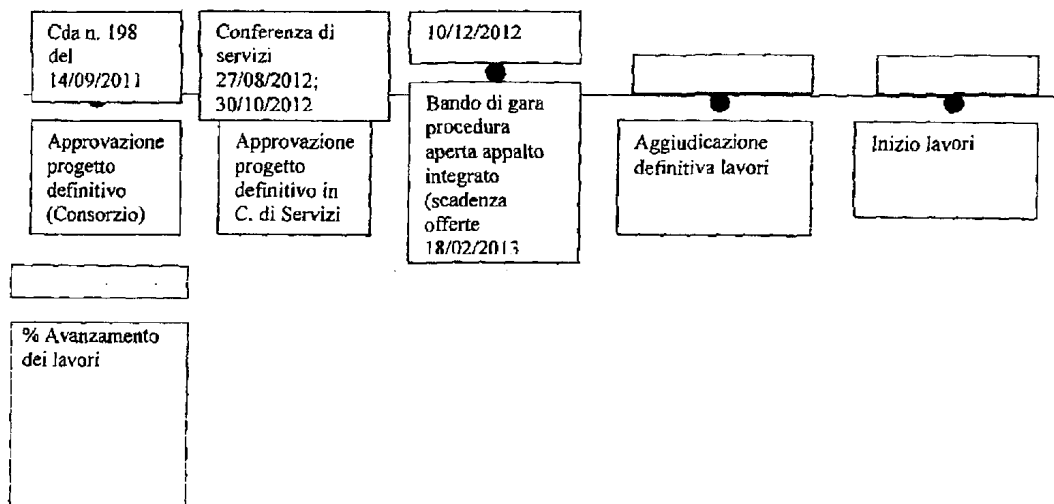


RISCHIO IDRAULICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA CLASSIFICATI E NON CLASSIFICATI (*)

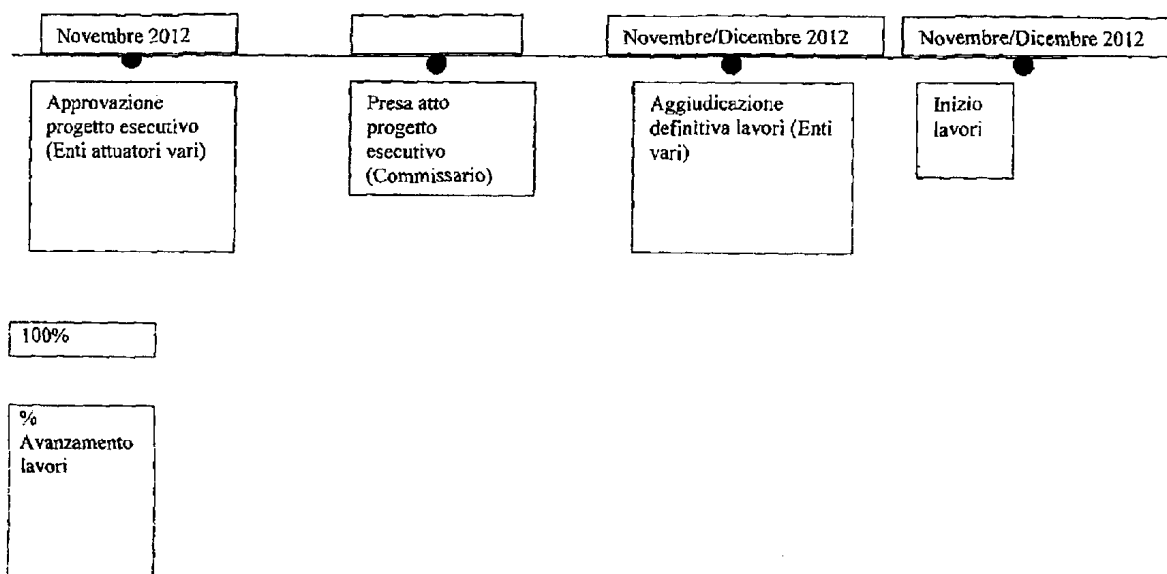

(*) Tutti i progetti risultano conclusi ed è in corso la fase di collaudo. Le liquidazioni agli Enti attuatori verranno effettuate a seguito del collaudo delle opere.

8

RISCHIO IDRAULICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ESEGUITE NEI COMUNI DI TODI E ORVIETO

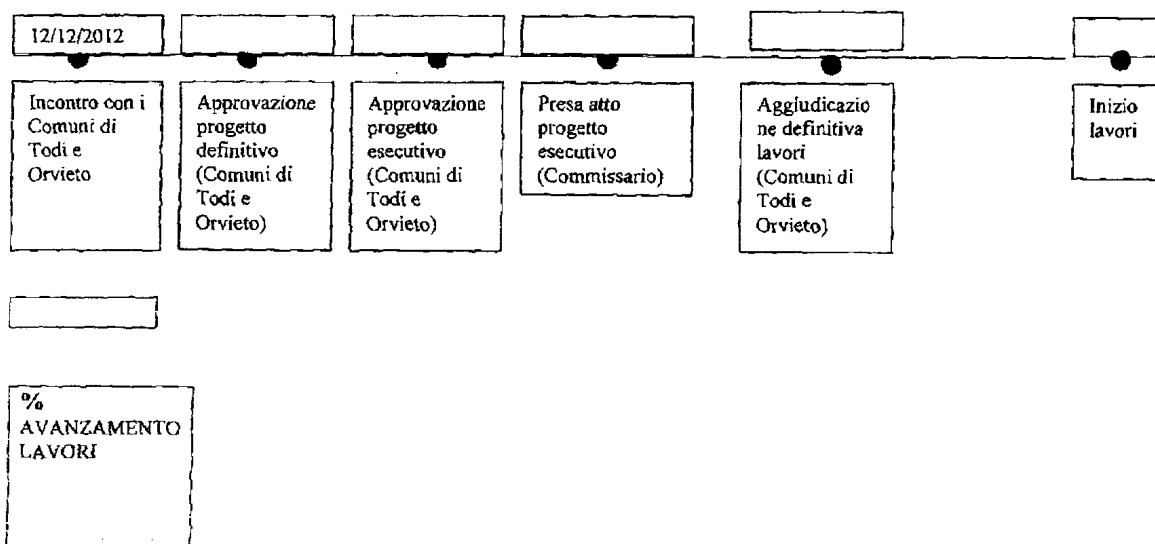

IL BILANCIO RELATIVO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE

Alla data del 31/12/2012 nella contabilità speciale intestata al Commissario (C.S. 5606 accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia) risulta accreditato l'importo complessivo di € 17.137.781,85 (€ 9.892.458,33 da parte del MATTM ed € 7.245.323,52 da parte della Regione Umbria).

Con nota del 27/11/2012 il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ha comunicato al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e al Ministero dell'Ambiente - Gabinetto del Ministro – di avere accolto le proposte delle Regioni in merito al riparto dell'importo di € 130 milioni derivante dalla legge n. 183/2011, ex art. 33, comma 3 (Piano Centro Nord). In tale riparto la Regione Umbria risulta assegnataria di € 5.000.000,00. Il Commissario non ha ricevuto alcuna comunicazione formale da parte del MATTM riguardo a detto finanziamento, ma ha comunque proceduto ad esaminare la proposta di destinazione delle risorse in argomento, come illustrato nel paragrafo relativo agli "INTERVENTI PRIORITARI" della presente relazione.

Gli "impegni" assunti dal Commissario attraverso l'emanazione delle ordinanze di destinazione delle risorse ammontano ad € 11.536.068,11, mentre gli ordinativi emessi risultano pari € 2.588.486,08 (Tabella A allegata alla presente relazione).

Si sottolinea che detti importi relativi agli "impegni assunti" e agli "ordinativi/i emessi" ricomprendono anche gli impegni e le erogazioni a suo tempo effettuate dalla Regione agli Enti attuatori (prima della stipula dell'Accordo di Programma e per anticipazioni per spese di progettazione). Tale evidenziazione si ritiene necessaria ai fini di una immediata visione dell'avanzamento finanziario di ciascun intervento.

9

Altresì, gli stessi ricomprendono anche l'ammontare destinato alle spese funzionali alla struttura commissariale.

Nella stessa Tabella A sono evidenziati anche gli importi Totali, al netto dell'anticipazione regionale, che risultano pari ad € 11.287.941,30 (Totale impegni) e ad € 2.340.359,27 (Totale ordinativi).

La Tabella D allegata alla presente nota riepiloga la situazione finanziaria relativa alla contabilità speciale n. 5606, dalla quale emerge che gli accrediti effettuati ammontano ad € 17.137.781,85, mentre gli ordinativi emessi risultano pari ad € 2.340.359,27 (al netto, ovviamente, delle anticipazioni a suo tempo effettuate dalla Regione)

La forte criticità riscontrata nella gestione dell'Accordo, rappresentata dalla incertezza sui tempi di trasferimento delle risorse da parte del MATTM non ha consentito di dare corso alla realizzazione delle opere secondo le previsioni a suo tempo effettuate.

Altresì, l'incertezza sopra evidenziata non ha permesso l'utilizzo "elastico" delle risorse del cofinanziamento regionale (€ 7.245.323,52), poiché specificatamente destinate agli interventi derivanti da APQ a suo tempo stipulati dalla Regione Umbria con il Ministero dell'Ambiente.

Va infine rilevata la problematica connessa la messa a disposizione del Commissario delle risorse del cofinanziamento regionale, rappresentate dal FAS 2007/2013, in considerazione del fatto che le disposizioni attuative del PAR FAS 2007/2013 sono in contrasto con quelle derivanti dai DPCM emanati per l'attuazione dell'Accordo di Programma (DPCM del 20/07/2011, DPCM del 7/11/2011, DPCM) e per l'istituzione della contabilità speciale.

Con nota del 18/12/2012, prot. n. 185804, è stato richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – un parere in merito alla possibilità di imputare le tipologie di spese previste dai DPCM sopra citati (spese a supporto dell'attività commissariale, spese per incentivi alla progettazione, spese per compenso al Commissario Straordinario delegato) agli interventi finanziati con le risorse del FAS regionale. A tutt'oggi il MISE non ha fornito alcuna risposta.

In relazione a quanto sopra esposto, tenuto conto che gli Accordi sottoscritti dalla maggior parte delle regioni con il MATTM prevedono, quale cofinanziamento regionale, i fondi FAS 2007/2013, si rinnova la richiesta a suo tempo formulata di definire, per l'utilizzo di dette risorse, modalità procedurali uniformi, al fine di pervenire alla semplificazione e alla velocizzazione della spesa.

Il Commissario Straordinario Delegato
F.to Dott. Vincenzo Santoro

Perugia,

Allegati alla nota: Tabelle A, B, C, D

"IMPEGNI" ASSUNTI E ORDINATIVI EMESSI DAL COMMISSARIO AL 31 DICEMBRE 2012

TABELLA A

IMPEGNI (ripartiti per fonti di finanziamento)							Estremi Ordinanze commissariali di "Impegno"	PAGAMENTI (ripartiti per fonti di finanziamento)			ESTREMI ORDINANZE/ORDINATIVI DI PAGAMENTO		
INTERVENTO	COMUNE DI UBICAZIONE DELL'INTERVENTO	Creditore	MATTM/altre fonti	APQ/risorse reg	ALTRE FONTI/risorse reg/LI83	TOTALE	Num/data	MATTM/altre fonti	APQ/risorse reg	ALTRE FONTI/risorse reg LI83	ORDINANZA Num/data	ORDINATIVO Num/data	TOTALE ORDINATIVO
Intervento di messa in sicurezza del bacino del torrente Tresa	CITTA' DELLA PIEVE	Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia	€ 1.844.792,54	€ 1.807.599,15	€ 1.347.608,31	€ 5.000.000,00	2 del 30/05/2011; DD Reg	€ 701.057,95	€ 836.808,23	€ 512.018,86	6 /2011,00 Reg; Ord n. 14/2012	ORD. N.1 /2011;Mandato reg;Ord n.5/2012	€ 2.049.864,45
Interventi di impermeabilizzazione, regolazione acque superficiali e drenaggi profondi	BASCHI	Comune di Baschi	€ 1.500.000,00	€ -	€ -	€ 1.500.000,00	Ord.n.3 /2011	€ -	€ -	€ -			€ -
Interventi di consolidamento a prefilto delle abitazioni prossime al ciglio della rupe soggetto a crolli, protezione versanti dall'erosione, regolazione acque superficiali	FABRO	Comune di Fabro	€ 1.500.000,00	€ -	€ -	€ 1.500.000,00	4 del 29/07/2011	€ -	€ -	€ -			€ -
Ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici	FERENTILLO	Comune di Ferentillo	€ 1.000.000,00	€ -	€ -	€ 1.000.000,00	Ord. N. 5 /2011	€ 375,00	€ -	€ -	11 del 23/10/2012	Ord.vo n. 3/2012	€ 375,00
Intervento di messa in sicurezza zona industriale La Paciana e abitati nei comuni di Foligno e Spello	FOLIGNO E SPELLO	Consorzio Bonificazione Umbra	€ -	€ 676.558,54	€ 304.709,57	€ 981.268,11	1 del 19/03/2012; DD Reg	€ -	€ 255.321,72	€ 233.104,93	1 del 19/03/2012; D O Reg; Ord. 13 del 14/11/2012	Ord vo 1 /2012; mandato Reg; Ord.vo n.4/2012	€ 468.426,63
Manutenzione ordinaria e straordinaria del corsi d'acqua classificati e non classificati	COMUNI VARI	Province, Comuni Montane, Consorzi	€ 1.485.000,00	€ -	€ -	€ 1.485.000,00	12 del 22/11/2012	€ -	€ -	€ -			€ -
			€ 7.329.792,54	€ 2.484.157,69	€ 1.652.317,88	€ 11.466.268,31		€ 701.432,95	€ 1.092.129,95	€ 725.123,77			€ 2.518.686,68
Commissario	DPCM 20/07/2011	SPESA FUNZIONALE (ART. 1, C.5)	€ 28.450,00	€ 24.892,10	€ 16.517,90	€ 69.860,00	9 del 19/09/2012	€ 28.450,00	€ 24.892,10	€ 16.517,90	dd 9535 del 19/11/2012		€ 69.860,00
TOTALE GENERALE			€ 7.358.242,54	€ 2.508.989,79	€ 1.668.835,78	€ 11.536.068,11		€ 729.882,95	€ 1.116.962,05	€ 741.641,67			€ 2.588.486,68
Anticipazione Regione				€ 150.000,00	€ 98.126,81				€ 150.000,00	€ 98.126,81			
TOTALE DEFINITIVO			€ 7.358.242,54	€ 2.358.989,79	€ 1.570.708,97	€ 11.287.941,30		€ 729.882,95	€ 966.962,05	€ 643.514,86			€ 2.340.359,17

ORDINANZE COMMISSARIALI (LAVORI)**TABELLA B)**

DESCRIZIONE LAVORI	SOGGETTO ATTUATORE	RIF. ORDINANZE
Intervento di messa in sicurezza della Città di Terni e Zona industriale Terni-Narni 3° Stralcio, 1° Lotto	Consorzio di Bonifica Tevere Nera	ORD n. 2 del 22/05/2012 - Individuazione Soggetto attuatore dell'intervento;
Intervento di messa in sicurezza del bacino del Torrente Tresa	Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia	- ORD n. 2 del 30/05/2011 - Individuazione Soggetto attuatore dell'intervento e approvazione progetto esecutivo. ORD n. 6 del 20/09/2011 - Liquidazione al Consorzio per la Bonifica Val di chiana Romana e Val di Paglia dell'importo di € 1.350.000,00 (1° Acconto). ORD N. 14 DEL 14/12/2012 . Liquidazione del 2° Acconto al Consorzio per la Bonifica Val di chiana Romana e Val di Paglia dell'importo di € 549.884,45
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua classificati e non classificati	Province di Perugia e Terni, Comunità Montana Alta Umbria, Comunità Montana Associazione dei Comuni Trasimeno e Medio Tevere, Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia, Consorzio bonificazione Umbra	ORD n. 12 del 22/11/2012 - Individuazione Soggetti attuatori degli interventi e assegnazione finanziamenti
Intervento di messa in sicurezza zona industriale La Paciana e abitati nei Comuni di Foligno e Spello	Consorzio della Bonificazione Umbra	ORD N. 1 del 19/03/2012 - Individuazione Soggetto attuatore dell'intervento, presa d'atto progetto esecutivo, e liquidazione a favore del Soggetto attuatore del 1° Acconto di € 196.253,62. ORD. N. 13 DEL 14/12/2012 . Liquidazione del 2° Acconto al Consorzio della Bonificazione Umbra di € 174.046,20.
Mitigazione rischio idrogeologico nel Comune di Baschi - Loc. Civitella del Lago	Comune di Baschi per progettazione, Commissario per realizzazione lavori	ORD n 3 del 29/07/2011 . Determinazioni per le fasi di realizzazione dell'intervento (Individuazione Soggetto attuatore per la progettazione definitiva ed esecutiva). ORD N. 16 DEL 28/12/2012 . Indizione procedura per l'affidamento dell'incarico di collaudatore statico e collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera.

Mitigazione del rischio idrogeologico in località Carnaiola, nel Comune di Fabro	Comune di Fabro per progettazione, Commissario per esecuzione dei lavori	ORD. n 4 del 29/07/2011. Determinazioni per le fasi di realizzazione dell'intervento (Individuazione Soggetto attuatore per la progettazione definitiva ed esecutiva). ORD. N. 15 DEL 28/12/2012. Indizione procedura per l'affidamento dell'incarico di collaudatore statico e collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera
Ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici in località Matterella nel Comune di Ferentillo	Comune di Ferentillo per progettazione, Commissario per esecuzione dei lavori.	ORD.n 5 del 29/07/2011. Determinazioni per le fasi di realizzazione dell'intervento (Individuazione Soggetto attuatore per la progettazione definitiva ed esecutiva). ORD N. 4 DEL 4/05/2012 - Indizione procedura per l'affidamento dell'incarico di collaudatore statico e collaudatore in corso d'opera. ORD N. 5 DEL 28/06/2012. Approvazione progetto esecutivo. ORD N. 7 DEL 10/07/2012. Indizione procedura negoziata e approvazione lettera d'invito. ORD N. 8 DEL 28/08/2012. Affidamento definitivo dell'incarico di collaudatore statico e collaudatore in corso d'opera. ORD N. 10 DEL 27/09/2012. Aggiudicazione definitiva dei lavori. ORD. N. 11 DEL 22/10/2012. Liquidazione contribuzione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per il quadrimestre maggio-agosto 2012. ORD N. 18 DEL 28/12/2012. Ridefinizione quadro economico dopo la gara ed erogazione di € 53.409,07 al Comune di Ferentillo
Messa in sicurezza della Città di Terni. Zona industriale Terni Nami 3° Stralcio 1° lotto.	Consorzio Tevere Nera	ORD. N. 2 DEL 22/05/2011. Individuazione Soggetto Attuatore.

ATTI VARI**TABELLA C**

DESCRIZIONE	RIF. ATTI AMMINISTRATIVI
Individuazione pool di supporto al Commissario Straordinario Delegato	DGR n. 651 del 20/06/2011
Modifica ed integrazione pool di supporto all'attività del Commissario straordinario delegato	DGR n. 1292 del 23/10/2012
Trasferimento di risorse finanziarie dal Bilancio Regionale alla Contabilità Speciale n. 5606 denominata "CS RISCHIO IDROGEOLO UMBRIA" e intestata al Commissario straordinario delegato Dott. Vincenzo Santoro.	ORD. N. 1 DEL 30/05/2011
Utilizzo della quota dell'1% delle risorse assegnate per gli interventi dell'Accordo di Programma. Autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario per il personale degli Uffici regionali che supporta l'attività commissariale.	ORD. N. 6 DEL 28/06/2012
Determinazione dell'importo dell'1% da accantonare per le spese del Commissario straordinario delegato funzionali all'espletamento dell'incarico e modalità di utilizzo.	ORD. N. 9 DEL 13/09/2012
Determinazione del compenso spettante al Commissario Straordinario delegato.	ORD N. 17 DEL 28/12/2012

SITUAZIONE FINANZIARIA C.S. 5606 : RISORSE ACCREDITATE ED ORDINATIVI EMESSI - SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012 **TABELLA D**

NUMERO	DATA	IMPORTO	TIPO DI ACCREDITO	CAPITOLO	FONTE	ANNO FINANZIARIO
1	27/05/2011	939.125,00	regolare accredito	8582	MATTM	2011
2	27/05/2011	1.498.530,00	regolare accredito	8631	MATTM	2011
5	15/12/2011	442.987,00	regolare accredito	8582	MATTM	2011
6	15/12/2011	293.621,00	regolare accredito	8631	MATTM	2011
1	18/09/2012	384.615,38	regolare accredito	8531	MATTM	2012
2	18/10/2012	4.529.559,00	regolare accredito	8551	MATTM	2012
3	18/10/2012	137.477,00	regolare accredito	8582	MATTM	2012
4	18/10/2012	420.007,72	regolare accredito	8631	MATTM	2012
5	10/12/2012	1.246.536,23	regolare accredito	8551	MATTM	2012
TOTALE		9.892.458,33				
DD 4285	15/06/2011	7.245.323,52	Somme girate dai capitoli regionali		APQ e L. 183/89	2011
TOTALE RISORSE ACCREDITATE IN CONTABILITA' SPECIALE (Regione e MATTM)		17.137.781,85				
TOTALE RISORSE LIQUIDATE (Ordinativi emessi)		2.340.359,27				
DISPONIBILITA' DI CASSA		14.797.422,58				

Sezione Economico-finanziaria: Roberta Cenci



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011

Data: 28 GEN 2013

Protocollo n. 34073/6313 Class. C.100.06

Allegati n° vari

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E T.T.M.
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle
Risorse Idriche.
Comitato d'Indirizzo e Controllo per il Veneto

Via Cristoforo Colombo 44
00100 ROMA

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E T.T.M.
Ispettorato Generale – Divisione I

Via Cristoforo Colombo 44
00100 ROMA

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO
Dott. Luca Zaia

Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
30123 Venezia

ALL'ASSESSPRE REGIONALE ALL'AMBIENTE
Arch. Maurizio Conte

Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
30123 Venezia

Anticipata via e-mail

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della regione Veneto - **Relazione annuale al Parlamento ai sensi dell'art.2 c.3 del DPCM 21/01/2011**

1. Premessa.

Parc utile fare un quadro di situazione al fine di fornire maggiori elementi di valutazione. Il piano d'interventi previsti nell'Accordo di Programma tra Ministero A.T.T.M. e Regione del Veneto, che – pur essendo stato definito nel corso del 2010 - è stato sottoposto a nuova
