




REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

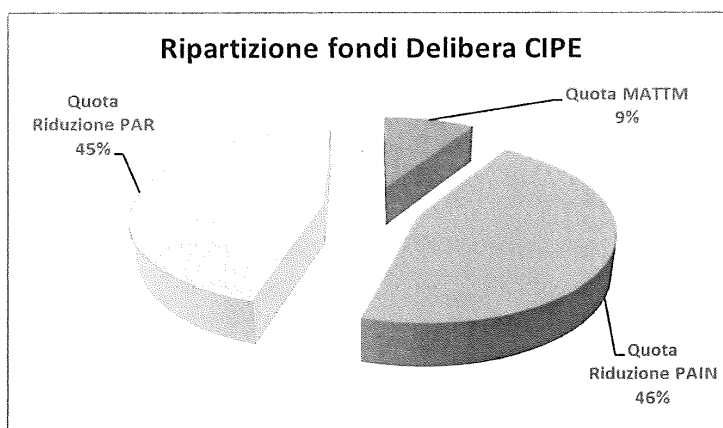

La Delibera prescrive dei tempi contenuti per la tempistica degli impegni giuridicamente rilevanti per gli interventi; stabilendo al punto 6. che:

“Coerentemente con gli obiettivi di urgenza e di accelerazione della spesa le risorse assegnate con la presente delibera non impegnate entro il termine del 31 dicembre 2013 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte delle Amministrazioni destinatarie saranno revocate [...] con delibera di questo Comitato”

Per i termini e le modalità di attuazione così stringenti, nel presente atto, gli interventi di cui alla Delibera CIPE verranno trattati separatamente rispetto a quelli inseriti nell'AdP originario.

Allo stato attuale ed a seguito delle revoche e della suddivisione in più stralci di alcuni Progetti, gli interventi finanziati dal suddetto Accordo di Programma sono 202 distinti in:

- **94 ricadenti nella lettera A (fondi Ministeriali):**
 - ❖ 83 previsti dall'AdP
 - ❖ 11 previsti dall'Atto integrativo (Delibera CIPE)
- **107 nella lettera B (fondi regionali - PO FESR 2007-2013, Linea d'intervento 2.3.1.A1)**
 - ❖ 101 previsti dall'AdP
 - ❖ 6 previsti dall'Atto integrativo

Stante l'approssimarsi della data di scadenza del Programma PO FESR, la Regione ha ritenuto opportuno avvalersi degli uffici del Commissario al fine di accelerare la realizzazione degli



Il Commissario Straordinario Delegato



interventi, prioritari e urgenti, ricadenti nella lettera B che presentavano ritardi e criticità di difficile risoluzione da parte Enti Beneficiari precedentemente individuati.

Pertanto dei 107 interventi ricadenti nella lettera B, n. 24 sono transitati sotto la gestione commissariale e il Commissario Straordinario è stato individuato quale Soggetto Beneficiario (di seguito indentificati con B*).

Gli interventi per i quali il Commissario ha la qualifica di Stazione appaltante salgono pertanto a 119.

4.5.3. GARE INTERVENTI LETTERA A

Fino al novembre 2013 sono state attivate **112** procedure di affidamento lavori e/o servizi relativi agli interventi previsti sia nell'Accordo di Programma che nell'Atto integrativo. Per i motivi già esposti in precedenza si riportano in seguito le gare distinte in quelle espletate per la realizzazione degli interventi previsti nell'AdP originario (N. 100 gare di cui 75 di lavori per un importo complessivo pari a € **137.684.459,92**) e quelle per la realizzazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE (N. 12 gare).

4.5.4 GARE INTERVENTI LETTERA A PREVISTI NELL'ADP:

Da marzo 2011 al novembre 2013 sono state attivate le seguenti procedure di affidamento lavori e/o servizi:

- **N. 55** procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara e procedura ristretta semplificata ai sensi degli artt. 122 e 123 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
- **N. 10** procedure Aperte e Ristrette ai sensi dell'art. 55 comma 6 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. di cui 2 in corso di cui 9 per l'affidamento di lavori e 1 per l'affidamento del servizio di Direzione Lavori;
- **N. 28** procedure espletate, ai sensi del comma 11 dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., attraverso consultazione di almeno cinque operatori economici ricavabili dall'elenco dei laboratori presenti sul sito www.clp.it per la realizzazione di **indagini preliminari** da espletare in situ e propedeutiche alla progettazione;
- **N. 7** procedure di **Affidamento del servizio di progettazione** definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, **Direzione lavori** a

Pag. 28 di 49




REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

professionisti esterni mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del d.lgs. 163/2006, di cui una in fase di avvio.

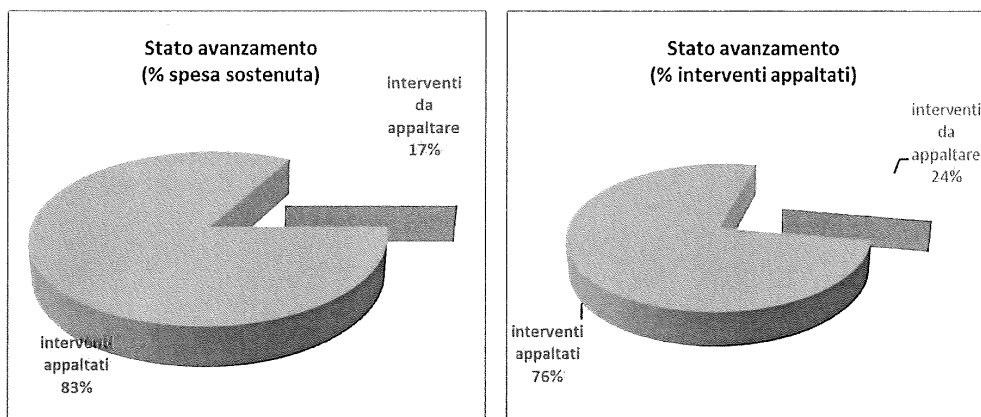

4.5.5 GARE interventi previsti nell'ATTO INTEGRATIVO ed inseriti nella Delibera CIPE:

Da marzo 2011 a novembre 2013 sono state attivate **12 procedure di affidamento lavori e/o servizi**, di cui:

- **N. 6** procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara e procedura ristretta semplificata ai sensi degli artt. 122 e 123 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
- **N. 1** procedure Aperte e Ristrette ai sensi dell'art. 55 comma 6 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., di cui 2 per l'affidamento di lavori;
- **N. 5** procedure espletate, ai sensi del comma 11 dell'art.125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., attraverso consultazione di almeno cinque operatori economici ricavabili dall'elenco dei laboratori presenti sul sito www.clp.it per la realizzazione di **indagini preliminari** da espletare in situ e propedeutiche alla progettazione.



REPUBBLICA ITALIANA


Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

PR	intervento	comune	titolo	importo atto integrativo	Stato attuazione
ME	177	Brolo	Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da Iannello Alto	€ 600.000,00	verbale inizio attività del...
ME	178	Caprileone	Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)	€ 1.000.000,00	verbale consegna lavori del 28/06/2013
PA	179	Altofonte	Aree interessate da fenomeni di dissesto	€ 600.000,00	Verbale consegna lavori 15/10/2013
PA	180	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita-	€ 90.000,00	
PA	181	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita- Proprietà Greco	€ 400.000,00	
SR	184	Avola	Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa	€ 2.000.000,00	
SR	185	Buscemi	Consolidamento costone sottostante il Santuario	€ 200.000,00	Lavori ultimati
SR	186	Porto Palo di Capo Passero	Regimazione acque e consolidamento scarpata	€ 600.000,00	verbale consegna lavori del 18/11/2013
SR	187	Rosolini	Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato	€ 1.800.000,00	aggiudicata
SR	188	Siracusa	Lavori di ripristino e consolidamento della falesia	€ 3.466.002,61	verbale inizio attività del 22/07/2013
TP	189	Mazara del Vallo	Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale	€ 2.000.000,00	

Evidenziati in rosso gli interventi appaltati.

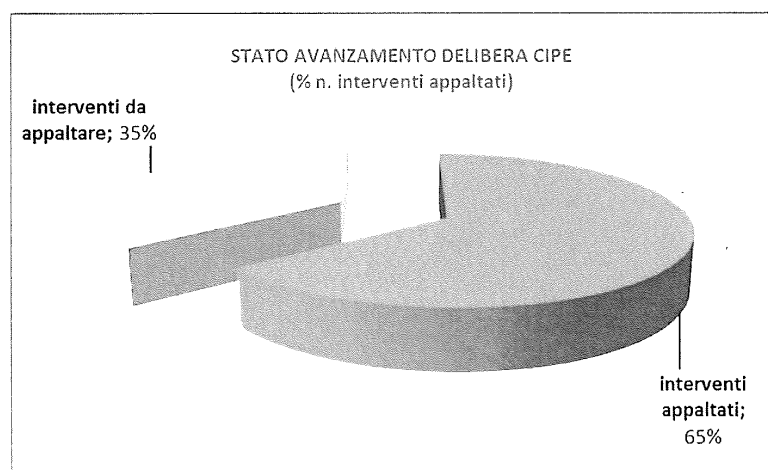



Il Commissario Straordinario Delegato




Come già riportato, per gli interventi la cui copertura finanziaria è garantita dalla Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, le risorse non impegnate mediante obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2013 saranno revocate.

È bene sottolineare quindi che dei 4 interventi non ancora appaltati solo per l'intervento TP189 Mazara del Vallo non potrà essere rispettato il termine ultimo del 31 dicembre, con la possibilità concreta di revoca delle risorse. I restanti interventi invece sono ad un iter avanzato di approvazione dei progetti definitivi, per i quali si prevede l'emanazione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2013. In particolare:

- per gli interventi ricadenti nel territorio di Cefalù (PA180 e PA181) il 20 novembre 2013 sarà acquisito l'ultimo parere;
- per l'intervento SR184 Avola è stata convocata la conferenza di Servizi per il giorno 22 novembre 2013 al fine di acquisire i pareri necessari all'approvazione del progetto.

Pertanto la situazione al 31 dicembre 2013 degli interventi dell'Atto integrativo sarà presumibilmente la seguente:

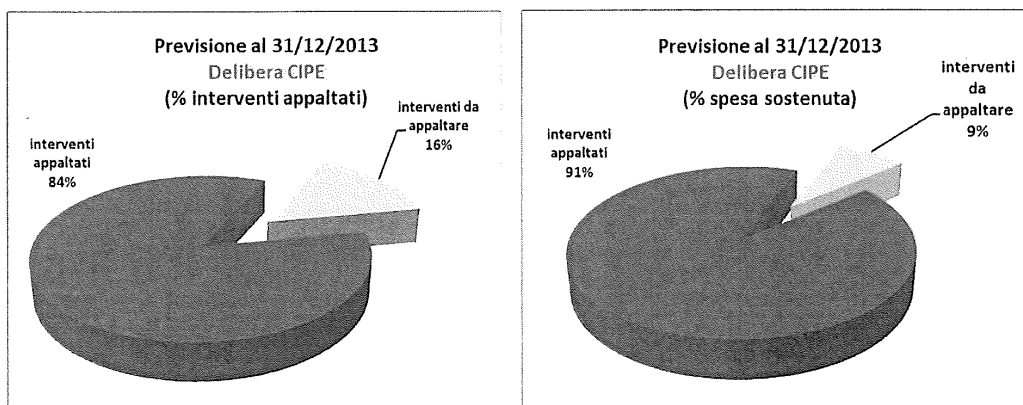



Il Commissario Straordinario Delegato



4.5.6. GARE INTERVENTI LETTERA B


Le informazioni che seguono sono state elaborate sui dati forniti dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana.

Fino al novembre 2013 sono state attivate **79** procedure di affidamento lavori relativi agli interventi previsti sia nell'Accordo di Programma che nell'Atto integrativo. Per omogeneità di esposizione si riportano in seguito le gare espletate per la realizzazione degli interventi B previsti nell'AdP originario (N. 75 gare) e le gare espletate per la realizzazione degli interventi ammessi nell'atto integrativo (N. 4 gare).

- GARE INTERVENTI LETTERA B PREVISTI NELL'ADP

Le risorse stanziare nell'Accordo di Programma per finanziare gli interventi ricadenti nella Lettera B sono pari a € 151.644.604,81 derivanti dal Programma Operativo FERS 2007/2013 per la Regione Siciliana.

Gli interventi che risultano ammessi a finanziamento sono pari a 101 dei quali n. 75 interventi risultano appaltati, per un importo complessivo pari a € 120.165.789,72.

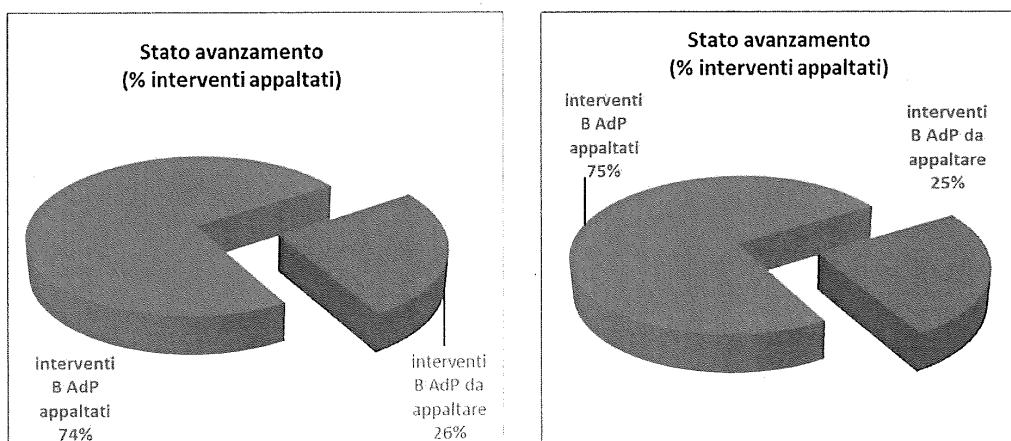

- GARE INTERVENTI LETTERA B PREVISTI NELL'ATTO INTEGRATIVO.

Le risorse stanziare nell'atto integrativo per finanziare gli interventi ricadenti nella Lettera B sono pari a € 8.495.183,23, per un totale di 6 interventi che risultano, sempre sulla base delle




REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato




REGIONE SICILIANA

informazioni fornite dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, appaltati per un numero di 4 interventi.

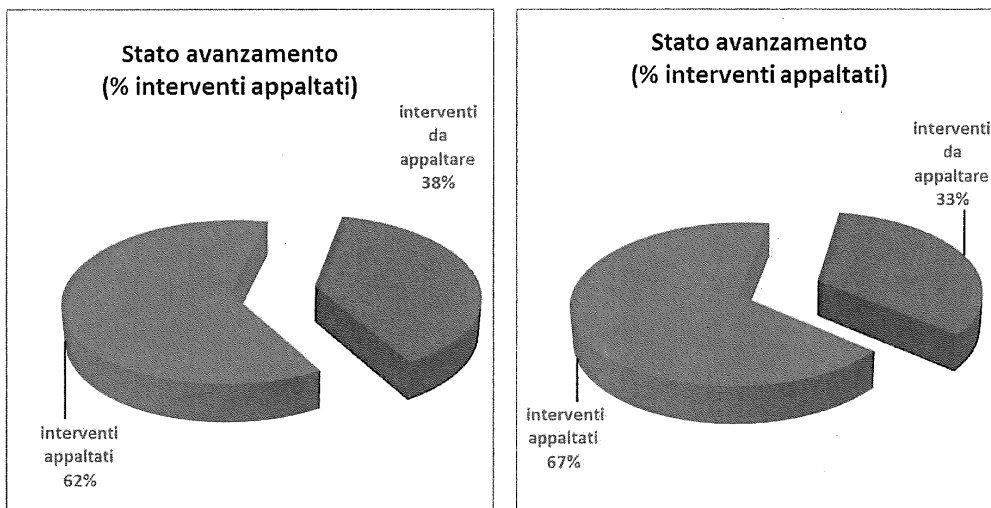

Si riporta infine il grafico relativo allo stato di avanzamento degli interventi previsti dall'AdP e atto integrativo:

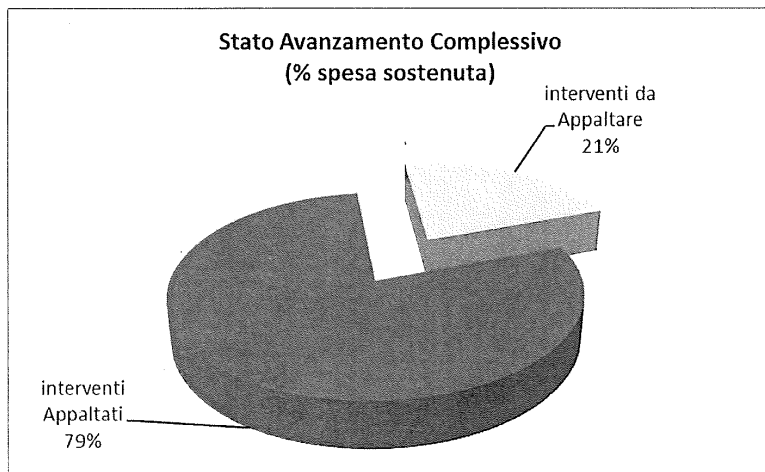




Il Commissario Straordinario Delegato



Al fine di interpretare meglio il grafico della figura precedente, si rappresenta di seguito il dettaglio delle percentuali degli interventi appaltati e da appaltare:

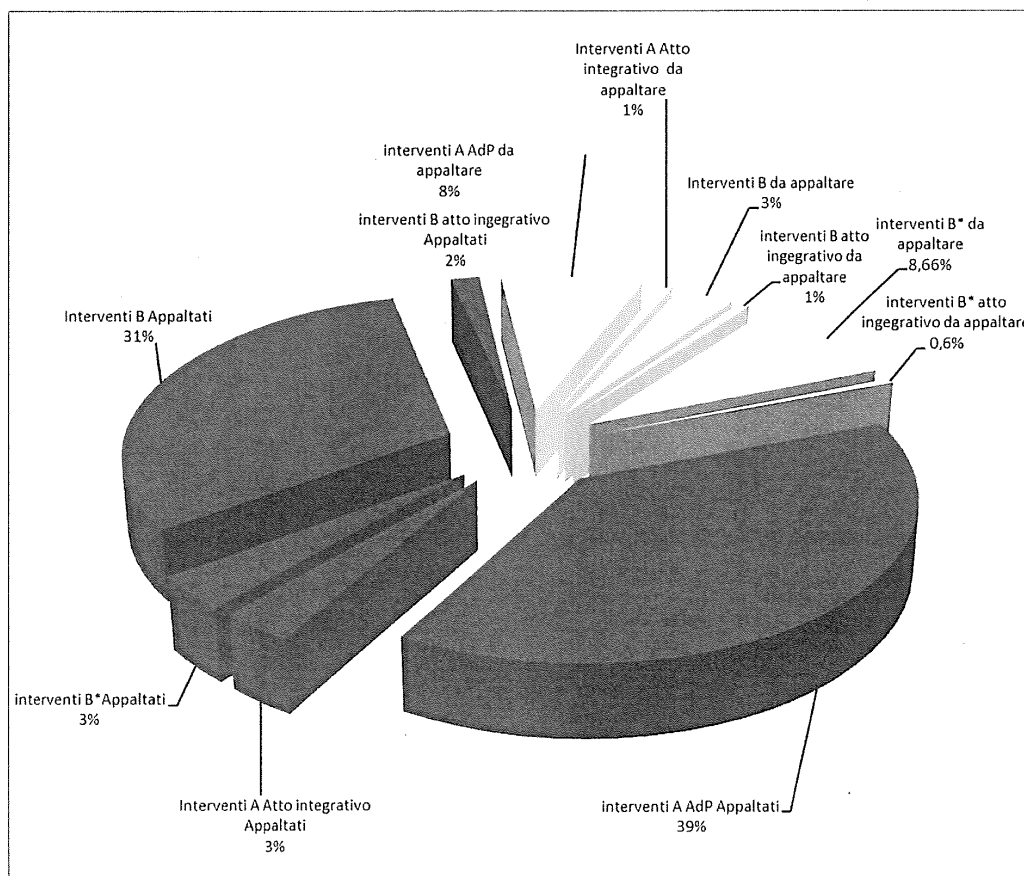

4.5.4.1 Dati statistici

Si riporta qui di seguito un grafico relativo all'andamento delle percentuali di ribasso d'asta offerto dalle imprese che hanno partecipato alle relative gare d'appalto.




REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

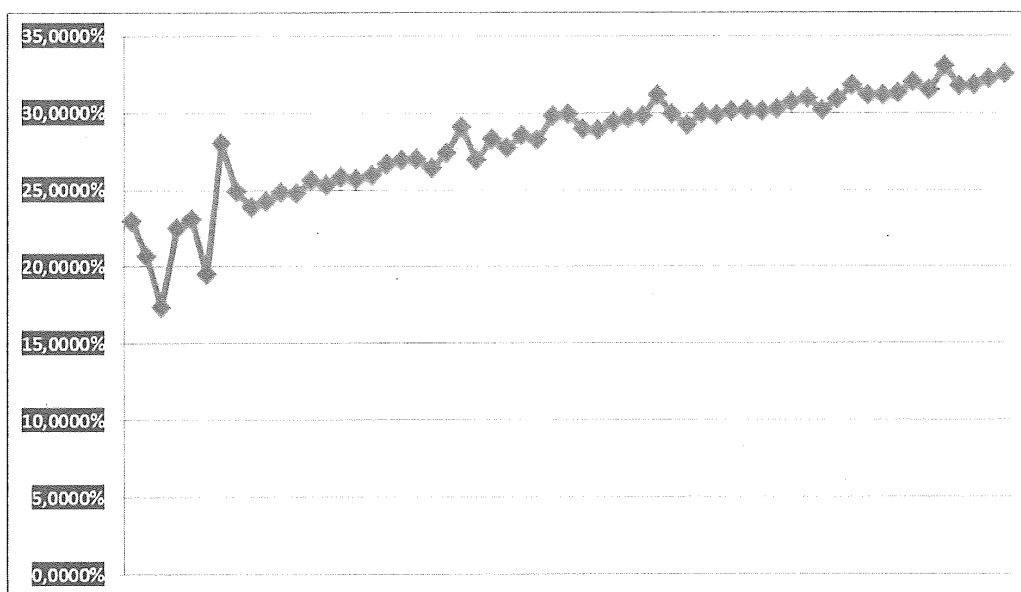

Come si può evidenziare, nel corso del 2013 si è confermato l'andamento già registrato nel corso dell'anno precedente rispetto ai valori del 2011, della percentuale di offerte presentate dalle imprese per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma.

Si riporta qui di seguito il grafico relativo alla distribuzione territoriale per Regioni delle imprese Aggiudicatrici:




REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

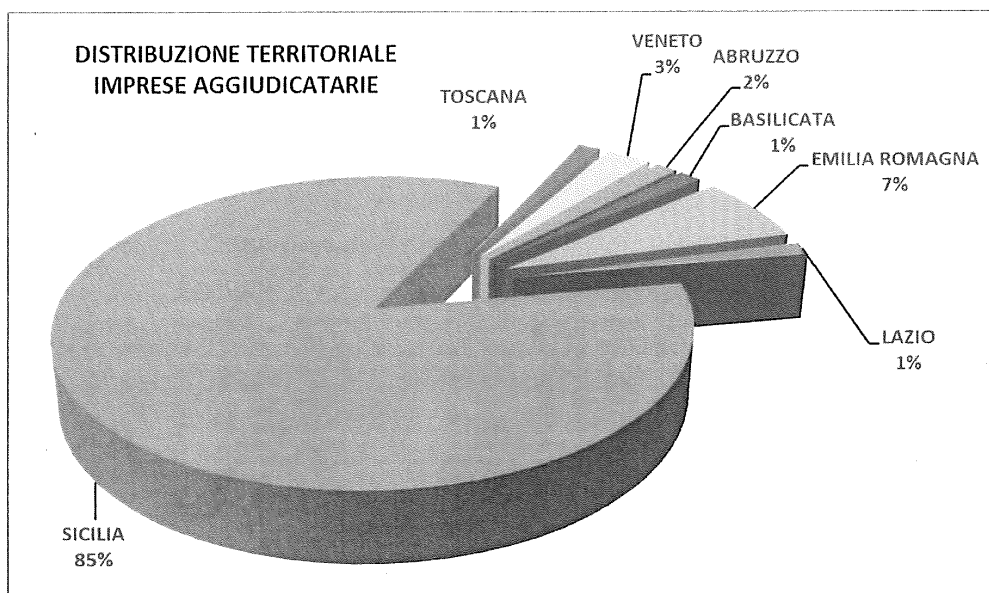

Il grafico sopra riportato mette in evidenza che l'obiettivo della mitigazione del rischio idrogeologico è stato in parte raggiunto utilizzando risorse del territorio Siciliano.

Un simile obiettivo risulta indispensabile per dare operatività alle imprese e rilancio allo sviluppo economico del territorio, mettendo a frutto le possibilità messe a disposizione dall'Europa. La strada tracciata negli ultimi anni è quella volta al miglioramento della competitività delle imprese locali, nel rispetto dei principi di economicità, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di assicurare una crescita stabile per l'intero Paese.

Particolarmente proficua risulta essere da questo punto di vista l'attività svolta da questo Commissario insieme alle Prefetture per promuovere un mercato sempre più governato dalle sole regole della libera concorrenza e per garantire il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

5 STATO DELL'ARTE

Si riporta qui di seguito un esame analitico e dettagliato dello stato dell'arte degli interventi rientranti nell'accordo di Programma e nel successivo atto integrativo dettagliato come segue:

- 1) Interventi lettera A;
- 2) Interventi lettera B.

Allo stato attuale ed a seguito delle revoche e della suddivisione in più stralci di alcuni Progetti, gli interventi sono 201 divisi in 94 ricadenti nella lettera A (fondi Ministeriali) e 107 nella lettera B (fondi regionali - PO FESR 2007-2013, Linea d'intervento 2.3.1).

5.1 INTERVENTI LETTERA A (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo)

Gli interventi che trovano copertura finanziaria con fondi ministeriali sono 94, ripartiti secondo i vari stati di avanzamento lavori, ed in particolare:

- n. 19 interventi per i quali sono in corso le attività di progettazione esecutiva, intendendo tutte le fasi propedeutiche la realizzazione degli interventi, pertanto sono inclusi quelli per i quali sono state già affidate le attività di indagini geognostiche o si è in attesa di acquisire le necessarie autorizzazioni e pareri;
- n. 53 interventi per i quali sono in corso le procedure di gara o gli interventi sono in fase di realizzazione;
- n. 22 interventi, tra cui quelli di Giampilieri e San Fratello, già ultimati.

<i>Interventi A</i>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
19	<i>In fase di Progettazione</i>	16,42%	€ 27.151.010,50
53	<i>In fase di Attuazione Intervento</i>	47,38%	€ 78.351.585,92
22	<i>Interventi Ultimati</i>	35,88%	€ 59.332.874,00
	<i>Economie</i>	0,32%	€ 525.906,19
94	TOTALE INTERVENTI	100,00%	€ 165.361.376,61

Analizzando le singole voci singolarmente si evince che:

Economie derivanti da revoche

<i>Economie derivanti da revoche A</i>		
<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
<i>Economie derivanti da Revoche</i>	0,32%	€ 525.906,19
TOTALE Economie A	0,32%	€ 525.906,19





REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

In questa categoria sono state inserite le economie residue derivanti dalla revoca dell'intervento di Serradifalco (CL 020) decisa nel corso della seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 15 settembre 2011, pari originariamente ad € 1.600.000,00, decurtate della quota parte delle economie utilizzate per l'incremento del finanziamento dell'intervento di Caronia (ME 058), pari ad € 653.083,40 e della quota parte delle economie utilizzate per l'incremento del finanziamento dell'intervento di Ali Terme (ME 051) pari ad € 421.050,50, così come deciso in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo del 18 maggio 2012.

Interventi in fase di progettazione Esecutiva

<i>Interventi in fase di Progettazione A</i>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
6	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO	5,65%	€ 9.350.000,00
1	INDAGINI PRELIMINARI IN CORSO	1,21%	€ 2.000.000,00
1	ADEGUAMENTO DEL PROGETTO IN CORSO	1,51%	€ 2.500.000,00
6	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	5,03%	€ 8.311.010,50
5	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE	3,02%	€ 4.990.000,00
19	TOTALE in fase di Progettazione	16,42%	€ 27.151.010,50

Gli interventi che risultano in fase di progettazione sono così suddivisi:


- n. 6 interventi per i quali è in corso la redazione del progetto esecutivo;
- n. 1 interventi per i quali il progetto esecutivo è già stato redatto ma, a seguito delle relative istruttorie e/o delle conferenze dei servizi, si è in attesa degli adeguamenti prescritti;
- n. 6 interventi per i quali interventi per i quali si è in attesa di pareri;
- n. 5 interventi per i quali è stata già svolta la conferenza dei servizi e sono stati acquisiti i pareri;
- n. 1 interventi per i quali le indagini preliminari sono in corso.



Il Commissario Straordinario Delegato



Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di progettazione:

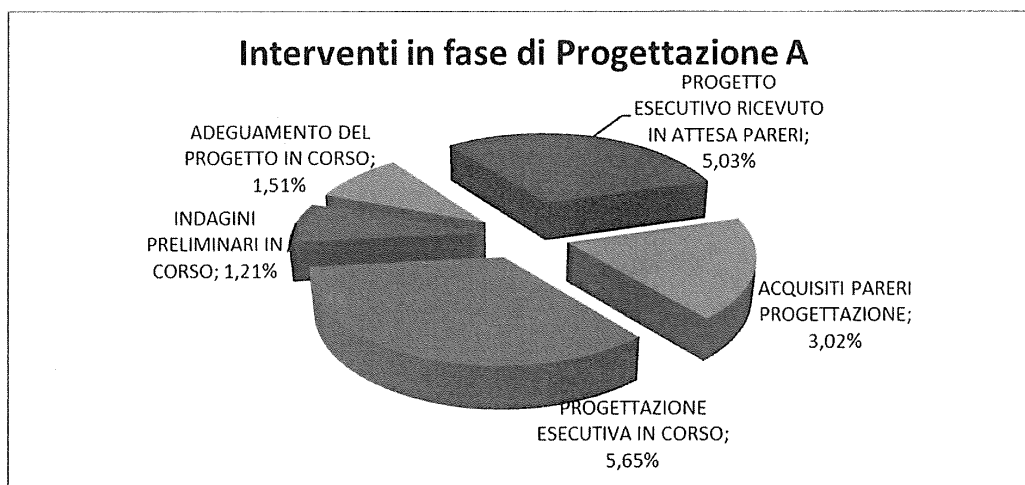


Interventi in fase di attuazione

<i>Interventi in fase di Attuazione A</i>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
5	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	5,62%	€ 9.292.500,00
13	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI	10,39%	€ 17.180.000,00
32	AVVIATI LAVORI	29,38%	€ 48.579.085,92
3	SOSPENSIONE LAVORI	2,00%	€ 3.300.000,00
53	TOTALE in fase di attuazione intervento	47,38%	€ 78.351.585,92

Gli interventi che risultano in fase di attuazione sono così suddivisi:

- n. 05 interventi per i quali sono in fase di predisposizione i relativi atti di gara;
- n. 13 interventi per i quali sono state già espletate le procedure di gara per la realizzazione, è già stato stipulato il relativo contratto e si è in attesa di consegnare i lavori;
- n. 32 interventi per i quali i lavori sono in corso di realizzazione;
- n. 3 interventi per i quali i lavori sono stati sospesi.



Pag. 39 di 49




REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di attuazione:

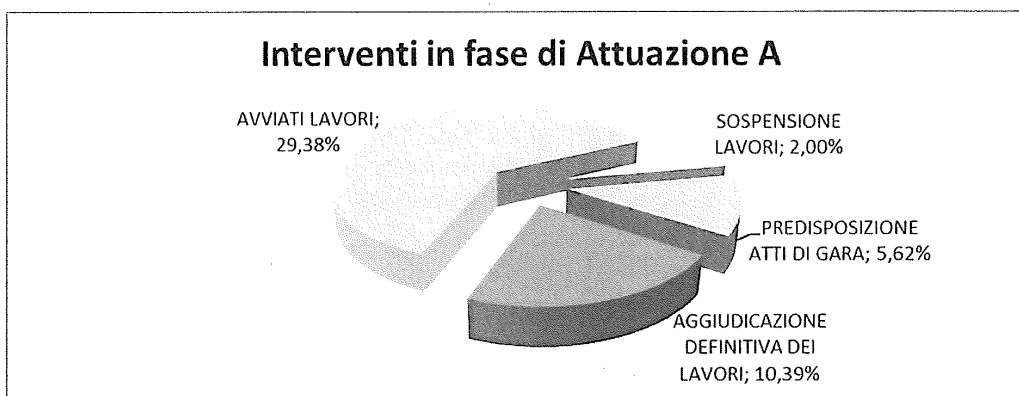

Interventi ultimati

<i>Interventi Ultimati A</i>			
N. Interventi	Stato	%	€
22	LAVORI ULTIMATI	35,88%	€ 59.332.874,00
22	TOTALE interventi ultimati	35,88%	€ 59.332.874,00

Gli interventi ultimati si riferiscono alle opere realizzate nei Comuni di Ribera ricadente nella provincia di Agrigento; alle opere realizzate nei comuni Misterbianco, Piedimonte Etneo, Ramacca e Randazzo ricadenti nella provincia di Catania; alle opere realizzate nei comuni San Fratello, Giampileri, Caprileone, Castel di Lucio, Basicò ed Alcara Li Fusi ricadenti nella provincia di Messina; alle opere ricadenti nei comuni Valledolmo, Polizzi Generosa, Termini Imerese e Blufi ricadenti nella provincia di Palermo; alle opere realizzate nei comuni di Avola e Buscemi ricadenti nella provincia di Siracusa; alle opere realizzate nel Comune di San Vito Lo Capo ricadente nella Provincia di Trapani.

5.2 INTERVENTI LETTERA B (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo)

Il complemento di Programmazione del suddetto PO FESR prevedeva che gli unici Enti beneficiari di tali risorse fossero le Amministrazioni locali che erano le uniche a fungere da stazioni appaltanti, sotto il controllo di gestione della Direzione Generale Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della regione Sicilia.

Pag. 40 di 49



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

La rimodulazione del complemento di Programmazione del suddetto PO FESR, approvata con Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011, adottata dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 20 del 19.01.2012, prevede anche quale Ente Beneficiario l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato.

In virtù di tale rimodulazione, la Regione ha indicato 24 interventi, per un importo complessivo pari a € 39.522.214,39, corrispondenti circa al 25% degli interventi di propria competenza per i quali il Commissario Straordinario è stato individuato quale soggetto beneficiario.

Stante infatti l'approssimarsi delle date di scadenza del Programma PO FESR, la Regione ha ritenuto opportuno avvalersi degli uffici del Commissario al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, prioritari e urgenti, ricadenti nella lettera B che presentavano ritardi e criticità di difficile risoluzione da parte Enti Beneficiari precedentemente individuati.

Si riportano di seguito gli interventi ricadenti nella lettera B per i quali il Commissario Straordinario Delegato è stato individuato quale Soggetto Beneficiario, che vengono pertanto individuati con la Lettera B*.

- con nota prot. N. 13607 del 02.03.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
ME	124	Terme Vigliatore	Fondi Regionali	Ripascimento scogliere – Zona Terme Marchesana	€ 3.823.875,00

- con nota prot. N. 13611 del 02.03.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
ME	130	Tusa	Fondi Regionali	Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni – Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)	€ 1.500.000,00

- con nota prot. N. 18003 del 21.03.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
ME	106	S. Alessio Sticulo	Fondi Regionali	Barriera soffolta e radente a protezione del centro abitato	€ 5.000.000

- con nota prot. N. 31329 del 29.05.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
CL	106	Caltanissetta	Fondi Regionali	Consolidamento, bonifica e canalizzazione del versante sud della colline Sant'Anna, centro storico e quartiere Saccara, con opere di ingegneria naturalistica, rimodellamento e inerbimento dei versanti dell'abitato	€ 4.160.000

- con nota prot. N. 35347 del 15.06.2012:

Pag. 41 di 49



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
AG	4	Cattolica Eraclea	Regione	Mitigazione Rischio Idrogeologico - Croli Costone Roccioso Eraclea Minoa	€ 1.480.000,00
AG	14	Santo Stefano di Quisquina	Regione	Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale	€ 2.360.195,11
AG	174	Cattolica Eraclea	Regione	Croli costone roccioso Eraclea Minoa (Loc. Zagarella)	€ 1.170.000,00
CL	17	Butera	Regione	Consolidamento centro abitato	€ 1.200.000,00
CL	18	Butera	Regione	Opere di consolidamento pendici del centro Storico	€ 800.000,00
CT	28	Licodia Eubea	Regione	Consolidamento Via Duca degli Abruzzi	€ 880.000,00
CT	38	Santa Venerina	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Badia-T. Fago	€ 1.000.000,00
CT	39	Sant'Agata Li Battiatì	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Leucatia - Via Einaudi	€ 1.000.000,00
ME	65	Ficarra	Regione	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada grenne	€ 1.028.981,00
ME	68	Forza D'Agrò	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 414.163,28
ME	105	Rometta	Regione	Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare	€ 1.000.000,00
ME	127	Tortorici	Regione	Muri e paratie montevalle e opere idrauliche - Zona S.Paolo	€ 2.300.000,00
PA	148	Mezzojuso	Regione	Opere di consolidamento - Zona Collina Brigna	€ 2.144.000,00
PA	151	Partinico	Regione	Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò-terzo stralcio	€ 950.000,00
RG	158_1	Modica	Regione	Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e Monserrato	€ 2.000.000,00
SR	166	Rosolini	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00
TP	190	San Vito Lo Capo	Regione	Consolidamento del tratto di costa	€ 1.350.000,00

Pag. 42 di 49
