



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

MIBACT-GPP
SEG_DIRG
0000515 23/06/2017
Cl. 34.16.07/20 *

Al Direttore Generale di Pompei
c.a. prof. Massimo Osanna

SEDE

All'AdG del Pon Cultura e Sviluppo 2014 -
2020
c.a. Arch. Dora di Francesco

ROMA

E, p.c.

Al Capo di Gabinetto
c.a. Prof. Giampaolo D'Andrea

ROMA

Al Segretario Generale
c.a. Arch. Antonia Pasqua Recchia

ROMA

Al Presidente dello Steering Comettee
c.a. dott. Gianfranco Marchesi

ROMA

Al Gruppo di Lavoro per la Legalità e la
Sicurezza

NAPOLI

Al Responsabile del P.G.R.P.C. della
Direzione Generale di progetto
c.a. Ten. Col. CC Raffaele Giovinazzo

SEDE

Fa seguito ai ff. 163 del 12/02/2015 e 638 del 24/04/2015 di questa Direzione Generale di Progetto.

Oggetto: Grande Progetto Pompei. Interventi:

- GPP 37 "Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei: edificio di Porta Stabia e sistemazione aree esterne"
- GPP 2-3-4 "Messa in sicurezza Regione I, II, III".
- GPP 39 "Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei: San Paolino, Casa Tramontano, Casina Pacifico e servizi annessi".

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei*

Con il f. 163 del 12 febbraio u.s. sopra richiamato, questa Direzione Generale di Progetto comunicava alla Soprintendenza di Pompei, la sua disponibilità ad assumere da subito le funzioni di Stazione Appaltante per taluni interventi, tra i quali quelli in oggetto indicati.

In particolare, l'attuale situazione degli interventi in argomento è la seguente:

- GPP "37", è stato aggiudicato, in via definitiva, all'impresa Consorzio Stabile Infratec, in data 09.05.2016, mentre le lavorazioni hanno avuto inizio, con verbale di consegna definitiva delle aree di cantiere, il 10.04.2017. I tempi di lavorazione previsti contrattualmente sono di **432 gg.**, con conclusione prevista per il 18.06.2018.
- GPP "2-3-4", è stato aggiudicato, in via definitiva, in data 03.12.2015, alla Società Lucci Salvatore S.r.l.. Tuttavia, avverso tale provvedimento sono stati proposti, innanzi al TAR Campania, due gravami che, di fatto, hanno bloccato per quasi un anno, e fino ad oggi, la stipula del contratto. Attualmente, è in corso la verifica esterna a cura di Invitalia che dovrebbe concludersi il 28 giugno p.v.. La durata dei lavori è prevista in **750 gg.** dalla consegna del cantiere. La recente Sentenza del Consiglio di Stato, favorevole all'Amministrazione, ha definitivamente sancito la correttezza delle procedure seguite dalla Stazione Appaltante, pertanto, al più presto si procederà alla stipula del contratto;
- GPP "39", è stato aggiudicato, in via definitiva, all'impresa Lattanzi S.r.l., in data 28.10.2015, mentre le lavorazioni hanno avuto inizio, con verbale di consegna definitiva delle aree di cantiere, il 22.04.2016. I tempi di lavorazione previsti contrattualmente sono di **242 gg +180 gg** dall'atto di sottomissione stipulato in data 02.12.2016. Il cantiere è ancora in corso e la sua conclusione fissata per il 19.06.2017, sarà prorogata a seguito della variante in corso d'opera resasi necessaria a seguito dell'importante rinvenimento archeologico. Al riguardo, sebbene sussistano buone speranze di chiudere l'intervento entro l'autunno del corrente anno, considerata la particolare complessità delle realizzazioni progettate non è da escludere un possibile sfioramento per l'inizio del 2018.

Appare di tutta evidenza, che la conclusione degli interventi in argomento, vada collocata oltre la data del 31 dicembre 2017, allorquando, ai sensi del DL 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge del 27 febbraio 2017, n.19, si concluderà la fase straordinaria dell'attuale struttura di *governance*, con la prevista confluenza, a far data dal 1 gennaio 2018, della Direzione Generale di progetto nel Parco Archeologico di Pompei.

Questa Direzione Generale di Progetto, pertanto, non ha più la possibilità di assolvere le funzioni di Stazione Appaltante per gli specifici progetti (GPP 37 – 39 – 2-3-4), salvo per GPP "Legni di Moregine", il quale dovrebbe concludersi entro il corrente mese. I suddetti interventi dovranno, conseguentemente, essere incamerati da codesto Parco Archeologico, così come già verbalmente concordato.

Inoltre tale valutazione trova fondamento, a fattor comune, per entrambi gli interventi, nell'esigenza di garantire, in fase di esecuzione dei lavori, l'unicità di indirizzo nelle scelte operative



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

della Stazione Appaltante, nonché nell'opportunità amministrativa che un intervento importante, quale GPP "2-3-4", venga seguito, fin dalla sua consegna, dalla stessa Stazione Appaltante¹.

A ciò, peraltro, si deve aggiungere la situazione di difficoltà in cui si trova questa Direzione Generale di progetto, nel dover procedere, a breve, alla stipula del contratto di GPP 2-3-4, atteso che l'unico dirigente, di rango non generale², di questa Dirz.GP, titolato a sottoscrivere i contratti di affidamento, è di recente rientrato nell'Amministrazione di provenienza.

Per completezza di informazione, si allega, l'indice del fascicolo del RUP dell'intervento GPP 2-3-4, arch. Bruno De Nigris, con riserva di trasmettere analogo documento per gli altri due interventi GPP 37 e GPP 39.

Nel fare riserva di trasmettere, in originale, tutti i Decreti della Direzione Generale di progetto, afferenti agli interventi GPP 37 e GPP 39, si, inviano, fin d'ora, sempre in originale, i seguenti documenti:

- Determina n. 3. Grande Progetto Pompei - Determina a contrarre. Intervento nr.2-3-4. Progetto di messa in sicurezza delle Regione I, II e III;
- Determina n. 5. Grande Progetto Pompei - Determina a contrarre. Intervento nr. 37. Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei.
- Determina n. 6. Grande Progetto Pompei – Determina a contrarre. Intervento nr. 39. Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei: San Paolino, Casa Tramontano, Casina Pacifico Aree Esterne e Servizi Annessi”
- Determina n. 7. Grande Progetto Pompei – Determina a contrarre. Intervento nr.37. Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei – Edificio di Porta Stabia ed aree esterne. Affidamento servizi di stampa e plottaggio degli elaborati progettuali a base di gara.
- Determina n. 8. Grande Progetto Pompei n. 37 - Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei: edificio di Porta Stabia e sistemazione aree esterne. CUP: F62C12000650006. Procedura di selezione di n. 2 archeologi cui affidare le attività di assistenza scientifica al cantiere ed eventuale redazione della documentazione di saggi di scavo stratigrafico.
- Determina n. 9. Grande Progetto Pompei – Determina a contrarre. Intervento nr. 37. Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei – Edificio di Porta Stabia ed aree esterne. Intervento nr. 39 Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei: San Paolino, Casa Tramontano, Casina Pacifico Aree Esterne e Servizi Annessi”. Affidamento servizi di stampa e plottaggio di elaborati progettuali.
- Determina n. 10. Grande Progetto Pompei n. 39 - Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei: San Paolino, Casa Tramontano, Casina Pacifico Aree Esterne e Servizi Annessi. CUP: F62C12000660006. Procedura di selezione di n. 2 archeologi cui affidare le attività di assistenza scientifica al cantiere ed eventuale redazione della documentazione di saggi di scavo stratigrafico.

¹ La Soprintendenza di Pompei è, inoltre, Ente Beneficiario dei finanziamenti comunitari.

² Come previsto dall'arte. 7 del DPCM del 13.02.2013.

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei*

- Determina n. 11. Grande Progetto Pompei n. 37 - Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei: edificio di Porta Stabia e sistemazione aree esterne. CIG: 629629395B CUP: F62C12000650006. Selezione di n. 2 archeologi cui affidare l'incarico professionale relativo all'attività di assistenza scientifica al cantiere e redazione della documentazione di saggi di scavo stratigrafico. Esito della procedura.
- Determina n. 12. Grande Progetto Pompei – Determina a contrarre. Intervento nr. 39. Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei: San Paolino, Casa Tramontano, Casina Pacifico Aree Esterne e Servizi Annessi”. Intervento di bonifica Casa Tramontano Cig z94189f0bf.
- Determina n. 13. Grande Progetto Pompei – “Affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara sulla base del progetto preliminare, relative l'intervento: messa in sicurezza delle Regione I, II e III – Cup: f62c13000420006 Cig: 617885479e. Adempimenti di cui all'ordinanza del Tar Napoli sul ricorso 6442/15 R.G. proposto da Iota restauro Srl contro Mibact nonché Lucci Salvatore impresa di costruzione Srl.
- Determina n. 14. Intervento nr. 39. Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei: San Paolino, Casa Tramontano, Casina Pacifico Aree Esterne e Servizi Annessi”. Intervento di bonifica casa tramontano cig 6360145dad, cup f62c12000660006.
- Determina n.15. Intervento nr.37. Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei – Edificio di Porta Stabia ed aree esterne. Affidamento servizi di stampa e plottaggio degli elaborati progettuali.
- Determina n.16. Grande Progetto Pompei – GPP37. Autorizzazione all'uso di mezzo proprio per lo svolgimento degli incarichi da parte dei componenti l'Ufficio di Direzione dei Lavori e dell'Organo di collaudo.
- Determina n.17. Grande Progetto Pompei – GPP39. Autorizzazione all'uso di mezzo proprio per lo svolgimento degli incarichi da parte dei componenti l'Ufficio di Direzione dei Lavori e dell'Organo di collaudo.
- Determina n.18. Grande Progetto Pompei – GPP37. Autorizzazione all'uso di mezzo proprio per lo svolgimento degli incarichi da parte dei componenti l'Ufficio di Direzione dei Lavori e dell'Organo di collaudo. Integrazione.
- Determina n.19. Intervento nr. 39. Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei: San Paolino, Casa Tramontano, Casina Pacifico Aree Esterne e Servizi Annessi”. Cig 6360145dad – cup f62c12000660006. Variante autorizzata con det. N.14 del 2 dicembre 2016 – sostituzione qe comparativo.
- Determina n. 20. Intervento nr.37. Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei – Edificio di Porta Stabia ed aree esterne. Rimodulazione del quadro economico. Cup: f62c12000650006 – cig: 629629395b.


Rg

Il Direttore Generale
Gen. D. CC Luigi Curatoli

SETTIMA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO (I / 2017)

ALLEGATO 2

Prospetto delle spese Dirz.GP - I semestre 2017 (*a pagina 23*)

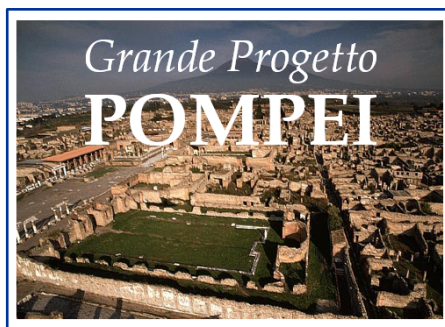

PAGINA BIANCA

Allegato 7
Alla Settima relazione semestrale (II / 2016)

Spese

Direttore Generale di progetto – Unità “Grande Pompei” – Struttura di supporto

Indennità del Direttore Generale di progetto	
Importo annuo spettante ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DL 91/2013, convertito dalla L. 112/2013 e del DPCM 23 agosto 2016.	€ 41.203,91 <i>al lordo delle ritenute a carico del lavoratore</i>

Spese di missione del Direttore Generale di progetto – anno 2017		
Nr. giorni lavorativi	124	
Nr. giorni di licenza fruiti	2	
Nr. giorni di presenza in servizio	122	
Nr. giorni in missione	63	
Importo totale anno 2017 della spesa per missioni	€ 358,10 <i>(in media: 5,6 €/ giorno)</i>	Trattasi dei soli rimborsi di vitto e alloggio (quest’ultimo, di norma, fruito, per ragioni di economicità, presso strutture militari). Non è stata corrisposta alcuna indennità di missione.

Contabilità speciale per il funzionamento dell’Unità “Grande Pompei” e della Struttura di supporto		
Finanziamento per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.L. 91/2013, convertito in L. 112/2013		€ 0,00
Importo richiesto		€ 0,00
Importo accreditato dal MiBACT – DG Archeologia per l’anno 2016		€ 0,00
Spesa al 30 giugno 2017 ripartita come segue:		€ 107.750,76
Capitolo di spesa	Tipologia	Spesa al 31 dicembre 2016
4020 “Spese di funzionamento”*	Autonoleggio 3 autovetture	311,34
	Acquisto cancelleria	31.502,82
	Carburante per autotrazione	2.528,60
	Acquisto Telemaco	1.110,00
	Telepass e ZTL	2.154,63
	IVA (Split Payment)	8.130,19
4021 “Spese per il personale”	Rimborso dell’indennità DGP e del trattamento economico accessorio eventuale del personale in comando presso il GPP, ai sensi dell’ art. 3 del DPCM 12-2-2014	79.809,31

* I contratti di lavori, servizi e forniture, a valere sui fondi della contabilità speciale sono soggetti a controllo preventivo della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del DPCM 13-02-2014.

PAGINA BIANCA

SETTIMA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO (I / 2017)

ALLEGATO 3

Eventi culturali svoltisi sito - I semestre 2017 (*a pagina 24*).



PAGINA BIANCA

**Elenco eventi organizzati dalla Direzione Generale
del Parco Archeologico di Pompei nel I semestre 2017**

- Festa del risparmio energetico - 24 febbraio 2017;
- seminario con Raffaele Cantone - "Il Codice dei Contratti Pubblici nella recente normativa" - 6 marzo 2017;
- giornata nazionale del paesaggio. Pompeii's Re-Birth. Il terzo paradiso di Michelangelo Pistoletto - Palestra Grande - 14 marzo 2017;
- inaugurazione mostra "Picasso e Napoli: Parade" - Antiquarium degli scavi - 8 aprile 2017;
- inaugurazione della Regio VII - Apertura al pubblico della casa di Sirico e della casa dell'Orso ferito - 29 marzo 2017;
- corso di aggiornamento per guide turistiche "Pompei e i Greci. La Mostra" - 5 aprile 2017;
- convegno "Restaurando Pompei" - 6-7 aprile 2017;
- inaugurazione mostra "Pompei e i Greci" - Palestra Grande - 12 aprile 2017;
- convegno "Paesaggi domestici" - 27-28 aprile 2017;
- inaugurazione baby point - 14 maggio 2017 Festa e Notte dei musei (Apertura straordinaria Casa della Fontana Grande) - 20- 21 maggio 2017;
- convegno "Extra Moenia. Abitare il territorio della regione vesuviana." - 22-23 giugno 2017.

PAGINA BIANCA

SETTIMA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO (I / 2017)

ALLEGATO 4

“Crolli”/cedimenti/distacchi parcellari - I semestre 2017 (*a pagina 24*)



PAGINA BIANCA

UFFICIO SCAVI POMPEI

Al Direttore Generale
Prof. Massimo Osanna

Oggetto: Pompei Scavi. Elenco dati relativi a crolli, furti, introduzioni o accessi abusivi, relativi al primo semestre 2017.

In riferimento a quanto richiesto dal Ten. Col. Raffaele Giovinazzo, si invia in allegato l'elenco dei dati richiesti, per quanto di competenza, desunti dal registro delle segnalazioni del personale di vigilanza (Ufficio Scavi – Casa Bacco e Sala Regia) e da altre segnalazioni del personale tecnico della Soprintendenza, per il periodo 1 gennaio – 17 giugno 2017.

Crolli e distacchi di intonaci

17 gennaio 2017 – Segnalato il distacco di una porzione di intonaco nella Casa VIII 4, 23

21 gennaio 2017 – Segnalato il distacco di una porzione di intonaco nella Casa I 4, 18

27 gennaio 2017 – Segnalato il crollo di una porzione del muro occidentale delle fauces e dell'ambiente contiguo nella Casa I 4, 22. L'area in data 31 gennaio è stata sottoposta a sequestro per indagini di polizia giudiziaria e successivamente dissequestrata alla conclusione delle stesse.

1 febbraio 2017 – Segnalato il distacco di frammenti di stucco nel tepidarium delle Terme del Foro.

9 febbraio 2017 – Segnalato il distacco di una porzione di intonaco in un ambiente della Casa di Meleagro.

11 marzo 2017 – Segnalato il distacco di una porzione di intonaco in un ambiente della zona servile della Casa del Menandro.

29 marzo 2017 – Segnalato il distacco di una porzione di intonaco nella Casa VIII 4, 4.

4 aprile 2017 – Segnalato il distacco di una porzione di intonaco nella Casa delle Pareti rosse.

13 aprile 2017 – Segnalato il distacco di una porzione di intonaco sulla facciata tra I 10, 4 e I 10,6.

13 maggio 2017 – Segnalato il distacco di una porzione di stucco nel frigidarium delle Terme Suburbane.

14 maggio 2017 – Segnalato il distacco di una porzione di stucco nella casa VIII 4, 4.

16 maggio 2017 – Segnalata la caduta di un blocco lapideo sulla tettoia moderna sulla facciata dell'edificio IX 7, 7. Effettuato sopralluogo dei carabinieri in data 17 maggio.

Danneggiamenti e furti

5 maggio 2017 – Segnalato che nella Casa del frutteto un turista, appoggiandosi alla colonna del tablinum, provocava la caduta di un frammento di mattone.

6 maggio 2017 – Segnalato che due turisti hanno danneggiato la piroga lignea esposta nella mostra Pompei e i Greci. Sono intervenuti i carabinieri.

17 maggio 2017 – Segnalata telefonicamente dal personale di vigilanza del turno notturno l'assenza di una borchia in bronzo e ferro proveniente dal Museo Nazionale della Basilicata di Matera (inv. 410003) da Torre di Satriano, esposta nella mostra "Pompei e i greci". Sono intervenuti i carabinieri nella notte del 17 e il giorno 18. Accertato il giorno 18 che il furto della medesima deve essere avvenuto nei giorni precedenti. Indagini di polizia giudiziaria ancora in corso, con sequestro del pannello in cui era inserita la borchia, insieme ad altre analoghe.

Intrusioni

11 febbraio 2017 – Durante l'orario di apertura al pubblico del sito vengono allontanati dalla Torre di Mercurio vari turisti saliti nonostante il divieto.

19 febbraio 2017 - Durante l'orario di apertura al pubblico del sito vengono allontanati dalla Torre di Mercurio vari turisti saliti nonostante il divieto.

25 febbraio 2017 - Durante l'orario di apertura al pubblico del sito vengono allontanati dalla Torre di Mercurio vari turisti saliti nonostante il divieto.

11 marzo 2017 - Durante l'orario di apertura al pubblico del sito vengono allontanati dalla Torre di Mercurio vari turisti saliti nonostante il divieto.

26 marzo 2017 - Durante l'orario di apertura al pubblico del sito vengono allontanati dalla Torre di Mercurio vari turisti saliti nonostante il divieto.

16 aprile 2017 – Durante l'orario di apertura al pubblico del sito vengono allontanati dalle gradinate dell'Anfiteatro vari turisti saliti nonostante il divieto.

Pompei 17.6.2017

IL DIRETTORE
Grete Stefani

SETTIMA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO (I / 2017)

ALLEGATO 5

Accessi abusivi/furti/danneggiamenti - I semestre 2017 (*a pagina 24*)



PAGINA BIANCA

ACCESSI ABUSIVI NEGLI SCAVI - I semestre 2017		
DATA e ORA	SINTESI	DENUNCIATI
	NEGATIVO	

FURTI E ALTRI REATI PERPETRATI - I semestre 2017		
DATA	SINTESI	DENUNCIATI/ARRESTATI
5 maggio 2017, ore 11.00 circa, Danneggiamento	All'interno del sito archeologico di Pompei (NA), nei pressi del Santuario di Venere (<i>regio VIII, insula 1, civico n.3</i>), personale della vigilanza comunicava che i mezzi meccanici pesanti, utilizzati per le operazioni di rimozione delle sculture facenti parte la mostra del maestro Igor Mitoraj (<i>in esposizione dal 14 maggio 2016 - 01 maggio 2017</i>), avevano provocato il danneggiamento di un tombino metallico (<i>moderno</i>) e di alcune piccole pietre in marmo poste successivamente ad ornamento dello stesso. Sopralluogo effettuato. Lievi danni sono stati ripristinati da personale della Soprintendenza.	
6 maggio 2017, ore 12.30 circa Danneggiamento	All'interno del sito archeologico di Pompei (NA), nella seconda stanza del "Museo dei Greci" (<i>esposizione temporanea 12 aprile - 27 novembre 2017</i>), la turista RODIGRUES SANTOS Aline (<i>nata in Brasile l' 11 giugno 1963</i>) si sporgersi per scattare una foto ad una parte di piroga in legno (<i>lunga 2 metri, di epoca preistorica - VIII sec. A.C.</i>), la sfiorava danneggiandone lievemente la base. Sopralluogo effettuato permetteva di rinvenire e sequestrare 5 piccoli frammenti in legno (<i>il più grande di 1 cm</i>).	
17 maggio 2017 Furto	LUONGO Laura (<i>classe 1980, dipendente della Soprintendenza degli Scavi</i>) denunciava che ignoti avevano asportato n. 1 borchia in bronzo (<i>ornamento per porte</i>) di forma circolare e del diametro di 12 cm circa (<i>risalente al VI secolo a.c.</i>), esposta alla mostra "Pompei e i Greci" (<i>Sito all' interno della cd. "Palestra Grande"</i>) , infissa in un pannello di legno e coperta, solo frontalmente, da un pannello in plexiglas.	

<p>5 giugno 2017, ore 14.00 circa, Furto aggravato</p>	<p>PICONE Agostino (<i>classe 1972, tecnico della ditta "Pericolo costruzioni generali" con sede a Napoli in via Gramsci n. 15</i>) presentava denuncia querela contro ignoti, per furto di materiale in rame (<i>canaline, staffe e tubi</i>) accantonato all'interno del cantiere della "Casa dei Dioscuri", situato nel sito Archeologico di Pompei (<i>regio VI, insula 9, civico VI</i>) e inserito nel Grande Progetto Pompei. Valore materiale sottratto (<i>circa 30 kg</i>) quantificato in euro 600,00 circa.</p>	
---	---	--

CROLLI NEGLI SCAVI - I semestre 2017		
DATA e ORA	SINTESI	DENUNCIATI
<p>27 gennaio 2017, ore 11.00 circa cedimento di una piccola porzione di muro di epoca romana</p>	<p>All'interno del sito archeologico degli Scavi, personale CC Posto Fisso riscontrava il cedimento di una porzione di muro (<i>cm. 100x60</i>) della domus "Casa del Pressorio di Terracotta" di epoca romana, ubicata nella via dell'Abbondanza (<i>Regio I, Insula IV Civico 22</i>). Distacco verosimilmente causato dalle escursioni termiche.</p>	
<p>17 maggio 2017 corso nottata crollo di opera moderna interno scavi archeologici</p>	<p>All'interno del sito archeologico degli Scavi, lungo via dell'Abbondanza (<i>regio IX, insula VII, civico 7</i>), si verificava il cedimento di un'asse componente un tavolato moderno, posto a protezione della parte superiore del c.d. "fronte di scavo". Nessun danno alle strutture archeologiche. Sopralluogo effettuato. Lievi danni sono stati ripristinati dalla Direzione del Parco Archeologico.</p>	
