



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso		Stato avanzamento
MC031A-2/10	MC	Macerata e Corridonia	Fiume Chienti	Manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio	200.000	Provincia di Macerata	INT	In Esecuzione
MC031A-3/10	MC	Macerata, Recanati e Montelupone	Fiume Potenza	Manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto	231.000	Provincia di Macerata	INT	In Esecuzione
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099	opere di protezione fenomeni di crollo	100.000	Provincia di Pesaro e Urbino	INT	Ultimati
PU040A/10	PU	Borgo Pace	Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3	riduzione rischio idrogeologico	300.000	C. M. Alto e Medio Metauro, Comune Borgo Pace (PU)	INT	Ultimati
PU049A/10	PU	Piobbico	M. Montiego-capol FRANA R3-R4	Consolidamento e riquilif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego	200.000	Comune di Piobbico (PU), Prov. Pesaro Urbino	INT	Ultimati
MC038A-1/10	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	4.210.000	Comune di Porto Recanati (MC), Reg. Marche Serv. ITE	INT	In Gara
MC037A/10	MC	CastelSang. Nera	M Rotondo-M.-Prata ESOND R4	Valanghe	300.000	Comune di CastelSang. Nera	EXT	Prog. Ultimata Gara Autorizzata
PU048A/10	PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	INT	Contratto
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000	Comune di Montefalcone App.no	EXT	In Gara
PU051A/10	PU	S. Ippolito	Pian di Rose - F-05-0579 R4	Bonifica versante NW	300.000	Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. Pesaro Urbino	INT	Lavori Aggiudicati
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin, arginature	800.000	Provincia di Fermo	INT	Lavori Aggiudicati
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	INT	Lavori Aggiudicati
MC032A/10	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	Consolidamento centro abitato	800.000	Comune di Cingoli	INT	Contratto
FM020A/10	FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	Completamento consolidamento parete rocciosa	300.000	Provincia di Fermo	INT	Lavori Aggiudicati
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	AP-Marino del Tronto ESOND E4	Consolidamento briglia	1.100.000	Provincia di Ascoli Piceno	INT	Lavori Aggiudicati
PU047A/10	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	INT	Lavori Aggiudicati
AN004A/10	AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000	Comune di Sirolo	EXT	In Gara
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000	Comune di Civitanova Marche	INT	Lavori Aggiudicati
AP017A/10	AP	San Benedetto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000	Comune di San Benedetto	EXT	Lavori Aggiudicati
FM022A/10	FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000	Provincia di Fermo	INT	Lavori Aggiudicati
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000	Comune di Sassocorvaro	EXT	Prog. Ultimata Gara Autorizzata



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche


Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso		Stato avanzamento
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	S. Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000	Provincia di Fermo	INT	Lavori Aggiudicati
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	Palificata, trincee drenanti	180.000	Comune di Macerata Feltria	EXT	In Gara
PU045A/10	PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	Consolidamento frana	400.000	Comune di Montelabbate	EXT	Prog. Ultimata Gara Autorizzata


Per la maggior parte di questi interventi, le amministrazioni convenzionate hanno rappresentato che le attività inerenti il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alle amministrazioni stesse, nel cui organico sono presenti idonee professionalità.

Di seguito si rappresenta in forma grafica l'incidenza sul totale riferita all'espletamento di tali attività tecnico amministrative nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163/2006.

Per numero di interventi:

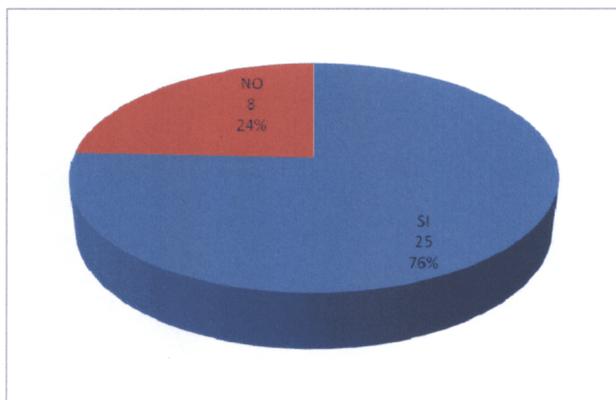

Per entità del finanziamento :

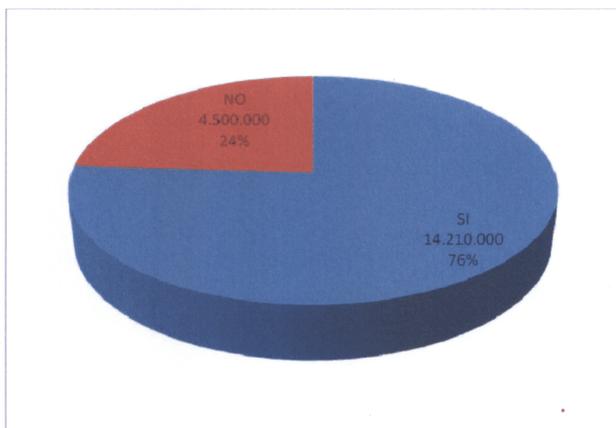


*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Parimenti, di seguito si rappresenta in forma grafica lo stato di avanzamento del livello di attuazione di tali interventi, valutato alla data del 31/12/2013 e con riferimento alle tipologie indicate in tabella:

Per numero di interventi:

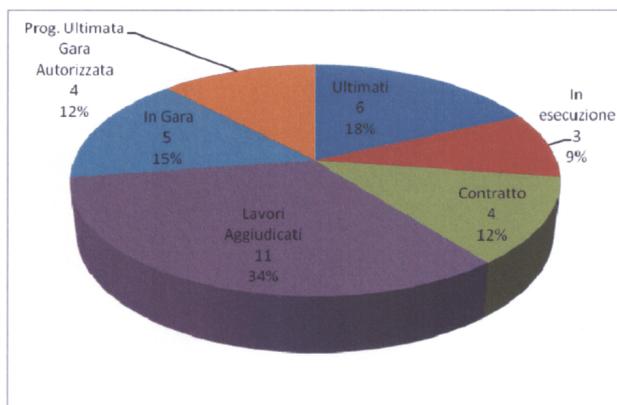

Per entità del finanziamento :

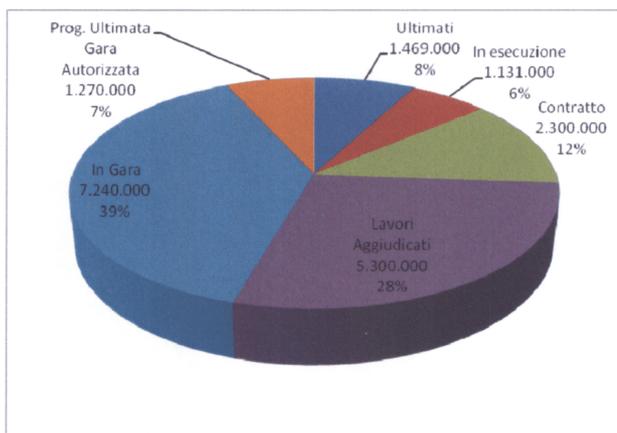



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

6.4. SITUAZIONE FINANZIARIA - IMPORTI EROGATI ED IMPORTI IMPEGNATI

Alla data del 31 dicembre 2013 risultano complessivamente attivati n. 33 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 18.710.000.

Ovvero, risultano attivati tutti gli interventi per cui è stata possibile definire la copertura finanziaria, derivante dalle somme disponibili in contabilità speciale vincolata n. 5621, quale accredito diretto da parte del MATTM, e dalle somme stanziare dalla Delibera CIPE n. 6/2012.

Per tali n. 33 interventi, alla data del 31/12/2013 risulta interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto.

Ciò equivale a dire che per tutti questi interventi risultano integralmente impegnate le somme derivanti dai rispettivi quadri economici dei progetti su cui si stanno eseguendo, o sono già state eseguite, le rispettive gare di appalto.

Ragion per cui risulta complessivamente impegnato un importo totale pari ad Euro 18.710.000,00.

Parimenti, le somme accreditate al 31 dicembre 2013 sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, sono le seguenti:

- Euro 5.130.626,62 quale accredito diretto da parte del MATTM
- Euro 8.476.419,07 quale quota parte delle somme stanziare dalla Delibera CIPE n. 6/2012

Per un totale complessivo pari ad Euro 13.607.045,69.

Pertanto, alla data del 31 dicembre 2013, a fronte di un accredito complessivo in contabilità speciale vincolata n. 5621 pari ad Euro 13.607.045,69 corrisponde un impegno di spesa pari ad Euro 18.710.000,00, ovvero con un disavanzo negativo pari ad Euro 5.102.954,31.

A seguire si descrive lo stato degli importi erogati ed impegnati per ognuno dei 33 interventi al momento attivati:

Codice	Prov.	Comune	Ente avvalso	Importo erogato fondi MATTM	Importo erogato fondi Del. CIPE 6/2012	Importo Impegnato su fondi MATTM	Importo Impegnato su fondi Del. CIPE 6/2012	Disavanzo
AN002A/10	AN	Genga	Comune di Genga	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	Provincia di Ascoli Piceno	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
AP015A/10	MC	Force	Comune di Force (AP)	1.130.626,62	369.373,38	1.130.626,62	369.373,38	0,00
AP019A/10	AP	Spinetoli	Provincia di Ascoli Piceno	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
FM021A/10	FM	Campofilone	Consorzio di Bonifica Aso-Tenna-Tronto (FM)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
FM024A/10	FM	Lapedona	Provincia di Fermo	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
FM027A/10	FM	Montefortino	Provincia di Fermo	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	Provincia di Fermo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
MC031A-1/10	MC	Macerata e Montecassiano	Provincia di Macerata	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00
MC031A-2/10	MC	Macerata e Corridonia	Provincia di Macerata	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
MC031A-3/10	MC	Macerata, Recanati e Montelupone	Provincia di Macerata	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	Provincia di Pesaro e urbino	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PU040A/10	PU	Borgo Pace	C. M. Alto e Medio Metauro, Comune Borgo Pace (PU)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PU049A/10	PU	Piobbico	Comune di Piobbico (PU), Prov. Pesaro Urbino	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
MC038A-1/10	MC	Porto Recanati	Comune di Porto Recanati (MC), Reg. Marche Serv. ITE	0,00	2.583.698,89	0,00	4.210.000,00	-1.626.301,11



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Codice	Prov.	Comune	Ente avvalso	Importo erogato fondi MATTM	Importo erogato fondi Del. CIPE 6/2012	Importo impegnato su fondi MATTM	Importo impegnato su fondi Del. CIPE 6/2012	Disavanzo
MC037A/10	MC	CastelSang. Nera	Comune di CastelSang. Nera	0,00	184.111,56	0,00	300.000,00	-115.888,44
PU048A/10	PU	Pesaro	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	0,00	490.964,16	0,00	800.000,00	-309.035,84
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	Comune di Montefalcone App.no	0,00	368.223,12	0,00	600.000,00	-231.776,88
PU051A/10	PU	S. Ippolito	Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. Pesaro Urbino	0,00	184.111,56	0,00	300.000,00	-115.888,44
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Provincia di Fermo	0,00	490.964,16	0,00	800.000,00	-309.035,84
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Provincia di Ascoli Piceno	0,00	184.111,56	0,00	300.000,00	-115.888,44
MC032A/10	MC	Cingoli	Comune di Cingoli	0,00	490.964,16	0,00	800.000,00	-309.035,84
FM020A/10	FM	Altidona	Provincia di Fermo	0,00	184.111,56	0,00	300.000,00	-115.888,44
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	Provincia di Ascoli Piceno	0,00	675.075,72	0,00	1.100.000,00	-424.924,28
PU047A/10	PU	Pesaro	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	0,00	490.964,16	0,00	800.000,00	-309.035,84
AN004A/10	AN	Sirolo	Comune di Sirolo	0,00	460.278,90	0,00	750.000,00	-289.721,10
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Comune di Civitanova Marche	0,00	245.482,08	0,00	400.000,00	-154.517,92
AP017A/10	AP	San Benedetto	Comune di San Benedetto	0,00	306.852,60	0,00	500.000,00	-193.147,40
FM022A/10	FM	Fermo	Provincia di Fermo	0,00	122.741,04	0,00	200.000,00	-77.258,96
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Comune di Sassocorvaro	0,00	165.700,40	0,00	270.000,00	-104.299,60
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	Provincia di Fermo	0,00	122.741,04	0,00	200.000,00	-77.258,96
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Comune di Macerata Feltria	0,00	110.466,94	0,00	180.000,00	-69.533,06
PU045A/10	PU	Montelabbate	Comune di Montelabbate	0,00	245.482,08	0,00	400.000,00	-154.517,92

Importo erogato : 5.130.626,62 8.476.419,07
Totale importo erogato 13.607.045,69

Importo impegnato : 5.130.626,62 13.579.373,38
Totale importo impegnato 18.710.000,00

Disavanzo : -5.102.954,31

La dimensione delle previsioni degli interventi, per lo più di modesta entità, e la stessa tipologia di opere, rendono abbastanza brevi i tempi di esecuzione dei relativi lavori. Diventa quindi importante il rispetto dei tempi di accreditamento che la delibera CIPE n. 6/2012, attraverso i suoi atti conseguenti, si è data al fine di garantire i pagamenti dei tempi contrattualmente previsti.

Effettuata la aggiudicazione degli appalti la spesa si determina in un arco di tempo abbastanza breve, prevedibile per la maggior parte di tali interventi anche in meno di sei mesi e quindi l'obbligo a "pagare" si concentra in un arco di tempo ridotto, non in "anni".

Al rischio di determinare condizioni di "debito" per l'Amministrazione, se non venisse garantito il pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori, con la necessaria tempestiva copertura con l'accreditamento preventivo delle somme si aggiungerebbe il danno, per l'economia reale del territorio, dato dall'accrescersi del "costo" delle opere per gli appaltatori in conseguenza dei ritardi nei pagamenti.

Situazione sino ad oggi scongiurata per tutti gli interventi attivati ed in corso. Rischio che potrebbe però assumere caratteri "concreti" qualora si verificassero ritardi nella erogazione delle restanti somme rispetto quanto previsto dalla Del CIPE n. 6/2012 e dagli atti ad essa conseguenti.

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

7. ADEMPIMENTI SUGLI O.G.V. DI CUI ALLA PRESA D'ATTO DEL 26 OTTOBRE 2012

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell'elenco presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi.

Dalla delibera CIPE n. 6/2012 e dalla conseguente presa d'atto degli elenchi degli interventi del 26 ottobre 2012 si rileva e/o si prende atto sostanzialmente, tra le altre, di quanto segue:

- gli interventi che trovano copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 sono i primi 14 e parzialmente il 15° (intervento cod. AP015A/10 in comune di Force -AP) per un importo complessivo di €. 5.130.626,62 tutti accreditati;
- quota parte dei restanti interventi, già programmati con copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191, trovano ora copertura sui fondi di cui all'art. 33, c. 3, Legge 183/2011 per € 13.579.373,38 parzialmente accreditati;
- detti fondi, come riportato nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica del 27 novembre 2012 n. 4822, saranno accreditati alla Contabilità speciale intestata al Commissario con le modalità e secondo il criterio dello stato di avanzamento degli interventi, in analogia con quanto previsto al punto 7.3 della Delibera n. 8/2012;
- l'intero programma costruttivo, di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 ed alla conseguente presa d'atto degli elenchi degli interventi del 26 ottobre 2012, dovrà definire obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2013, pena la revoca dei finanziamenti!

La nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica prot. n. 1859 dell'11 febbraio 2013, laddove chiarisce che: "...non è impedito ai Commissari Straordinari di procedere alla formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun intervento...", ha consentito pur in attesa del completo trasferimento delle risorse, l'approvazione dei relativi progetti anche oltre le somme effettivamente accreditate.

La dimensione delle previsioni degli interventi, per lo più di modesta entità, e la stessa tipologia di opere, rendono abbastanza brevi i tempi di esecuzione dei relativi lavori. Diventa quindi importante il rispetto dei tempi di accreditamento che la delibera CIPE n. 6/2012, attraverso i suoi atti conseguenti, si è data al fine di garantire i pagamenti dei tempi contrattualmente previsti e che le normative europee sanciscono a carico delle Amministrazioni.

Ciò premesso, preso atto di quanto disposto dalla delibera CIPE n. 6/2012 e dagli atti ad essa conseguenti, il Commissario ha posto in essere le attività connesse alla attuazione degli interventi di cui alla presa d'atto degli elenchi degli interventi del 26 ottobre 2012.

Per tali interventi sono state quindi avviate le varie fasi istruttorie e la relativa raccolta documentale che hanno poi portato alla stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di avvalimento, nonché l'individuazione dei vari Responsabili del procedimento.

Complessivamente si tratta di n. 19 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 13.210.000,00.

A questi interventi ed al loro relativo importo va inoltre sommato l'importo di Euro 369.373,38 posto quale quota parte a completamento dell'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), di cui al paragrafo precedente, il che porta il valore del finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012 a complessivi Euro 13.579.373,38.



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Per tali n. 20 interventi (considerato anche l'intervento in cod. AP015A/10 in comune di Force), alla data del 31/12/2013 risulta interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto.

Di questi interventi inoltre, alcuni sono in fase di gara, alcuni risultano già aggiudicati e, in n. 2 casi, risulta stipulato il contratto di appalto.

A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi, considerando anche l'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force, valutato alla data del 31/12/2013.

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso	Stato avanzamento
AP015A/10	MC	Force	Versante Ovest di Montetorre	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	369.373,38 (1.500.000)	Comune di Force (AP)	In Gara
MC038A-1/10	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	4.210.000	Comune di Porto Recanati (MC), Reg. Marche Serv. ITE	In Gara
MC037A/10	MC	CastelSang. Nera	M Rotondo-M.-Prata ESOND R4	Valanghe	300.000	Comune di CastelSang. Nera	Prog. Ultimata Gara Autorizzata
PU048A/10	PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	Contratto
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000	Comune di Montefalcone App.no	In Gara
PU051A/10	PU	S. Ippolito	Pian di Rose - F-05-0579 R4	Bonifica versante NW	300.000	Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. Pesaro Urbino	Lavori Aggiudicati
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin. arginature	800.000	Provincia di Fermo	Lavori Aggiudicati
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	Lavori Aggiudicati
MC032A/10	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	Consolidamento centro abitato	800.000	Comune di Cingoli	Contratto
FM020A/10	FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	Completamento consolidamento parete rocciosa	300.000	Provincia di Fermo	Lavori Aggiudicati
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	AP-Marino del Tronto ESOND E4	Consolidamento briglia	1.100.000	Provincia di Ascoli Piceno	Lavori Aggiudicati
PU047A/10	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	Lavori Aggiudicati
AN004A/10	AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000	Comune di Sirolo	In Gara
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000	Comune di Civitanova Marche	Lavori Aggiudicati
AP017A/10	AP	San Benedetto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000	Comune di San Benedetto	Lavori Aggiudicati
FM022A/10	FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000	Provincia di Fermo	Lavori Aggiudicati
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000	Comune di Sassocorvaro	Prog. Ultimata Gara Autorizzata
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000	Provincia di Fermo	Lavori Aggiudicati



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche


Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011


Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso	Stato avanzamento
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	Palificata, trincee drenanti	180.000	Comune di Macerata Feltria	In Gara
PU045A/10	PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	Consolidamento frana	400.000	Comune di Montelabbate	Prog. Ultimata Gara Autorizzata

Di seguito si rappresenta in forma grafica lo stato di avanzamento del livello di attuazione di tali interventi, valutato alla data del 31/12/2013 e con riferimento alle tipologie indicate in tabella:

Per numero di interventi:

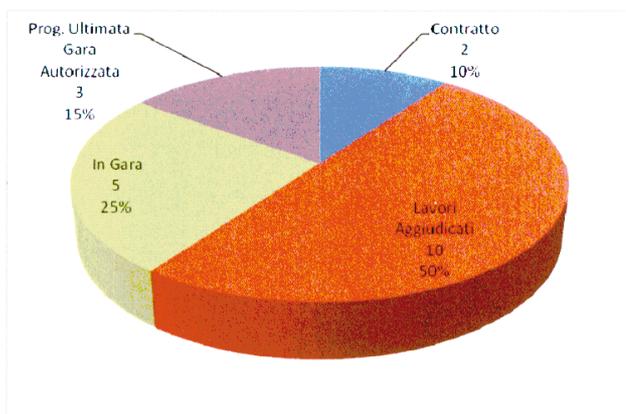

Per entità del finanziamento :

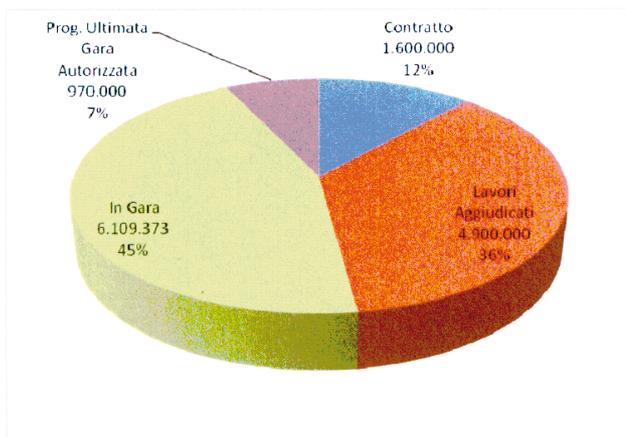

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

8. CRITICITA'

Si ritiene opportuno segnalare che buona parte della attività sino ad ora svolta potrebbe essere condizionata o compromessa dal mancato accreditamento tempestivo delle rimanenti risorse previste dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Parimenti, va segnalato che non risultano ancora avviati tutti gli interventi indicati nella citata nota della Regione Marche 854/2012 quali privi di copertura finanziaria, ed ovvero :

- n. 18 interventi per Complessivi Euro 13.600.000,00 (indicate come "Risorse residue da reperire per ulteriore fase del programma");
- n. 3 + (1) interventi per Complessivi Euro 3.590.000,00 (indicate come "Risorse residue da reperire per fase programmatica (10%)");

stante la perdurante mancanza di copertura finanziaria degli stessi, protratta fino al periodo in questione, associata ad una mancanza di comunicazioni, da parte dei soggetti istituzionali sottoscrittori dell'accordo di Programma, su possibili prospettive di finanziamento futuro.

Si rappresenta la necessità che i soggetti sottoscrittori l'Accordo giungano quanto prima alla stipula dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 25 novembre 2010, come peraltro richiesto dal MATTM con propria nota n. 6824/TRI/DI del 2 marzo 2011, nonché pre-concordato in linea di massima nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012.

In particolare, va osservato che la Regione Marche nel corso del citato Comitato, ha riferito in merito alla "possibilità di traslocare, in sede di stipula dell'Atto Integrativo, alcuni interventi ricadenti nella tabella 1 dell'allegato 1 all'Accordo (quota Stato)" su altre fonti di finanziamento o in quota programmatica, in conseguenza di una eventuale rivalutazione delle priorità.

Pertanto, il Commissario ha ritenuto opportuno attendere, prima di procedere con l'attivazione dei restanti interventi, la stipula dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma ed il conseguente consolidamento del quadro degli interventi, proprio nell'intento di non creare difficoltà alla Regione Marche nel caso in cui, a seguito della rivalutazione delle priorità, fosse stato loro necessario modificare tale elenco di interventi.

Infatti, si sarebbe potuto procedere con la stipula delle relative Convenzioni, previa individuazione dell'amministrazione in avvalimento, con la condizione che le stesse si sarebbero attivate in merito alla cronotempistica di attuazione ed impegni di spesa solo a seguito della avvenuta disponibilità in contabilità speciale vincolata n. 5621 della somma necessaria alla copertura economica dell'intervento. Ma ciò avrebbe poi vincolato la Regione Marche nell'ambito delle proprie valutazioni in sede di stesura dell'atto Integrativo.

Per le motivazioni sopra esposte, a partire dalla data del Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012 il Commissario, naturalmente nell'ambito del proprio ruolo e responsabilità, ha più volte sollecitato ai rappresentanti di Regione Marche la necessità di dare corso all'Atto Integrativo all'Accordo di Programma.

Infine si osserva che l'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di programma, con il riconoscimento di urgenza e priorità per gli interventi in esso previsti, non consente alcuna motivazione nel ritardo della esecuzione delle opere. I danni verificati nel recente passato nuovamente anche nelle Marche, dovrebbero far "diversamente" valutare i costi della prevenzione rispetto quelli, spesso ingenti, connessi al ristoro dei danni conseguenti proprio alla mancata prevenzione.

Con riferimento all'Accordo di Programma, si valuti responsabilmente, da parte di chi regola le norme ed opera le scelte, il rischio collegato alla sospensione di quanto sino ad ora avviato, che potrebbe concretizzarsi qualora si verificasse ritardo nella messa a disposizione delle somme previste, oggi solo in parte accreditate alla contabilità speciale del Commissario, che dopo aver operato, con la approvazione dei progetti e l'affidamento dei relativi lavori, sulla base di impegni formalmente assunti da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, potrebbe correre il rischio di non poter onorare alcuni degli impegni assunti e soprattutto garantire la realizzazione delle relative opere.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
D.P.C.M. del 7/11/2011
Accordo di Programma 02 maggio 2011

Prot. n. 236/CA del 06/02/2014

Indirizzi in allegato

*Il presente fax sostituisce
l'originale ai sensi dell'art.
43 C.6 DPR 445/2000*

OGGETTO: Relazione annuale - anno 2013 ai sensi del D.P.C.M. del 7.11.2011.

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. del 7.11.2011 di nomina a Commissario straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Molise, si trasmette la relazione sull'attività svolta, con riferimento all'anno 2013.

RISORSE FINANZIARIE

Rispetto al complessivo valore di euro 27.000.000,00 assegnato dall' Accordo di Programma del 02 maggio 2011, così come modificato dall' Accordo integrativo del gennaio 2012, in termini economici, ad oggi solo il Ministero dell'Ambiente, in due diversi ratei (il primo il 19/09/2012 ed il secondo il 17/12/2012), ha versato sulla contabilità speciale la somma di euro 2.440.508,26, corrispondente al 100% dello stanziamento statale previsto nel citato accordo integrativo.

Ufficio del Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico in Molise
presso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44 - (00147) ROMA
tel. 06 57223801 fax 06 57225854 mail commdelegato.molise@gmail.com

In relazione alla restante quota di cofinanziamento a carico della Regione Molise, la scrivente gestione in più occasioni ha provveduto a sollecitare la medesima Amministrazione Regionale al fine di aver certezza della disponibilità delle necessarie risorse per poter attivare gli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

A tal riguardo da ultimo con nota prot. n. 0036048 del 27/11/2013, la Regione Molise ha assicurato di disporre, a valere sul proprio bilancio regionale 2013, una quota parte di risorse finanziarie, pari ad euro 14.000.000,00.

La medesima Regione ha peraltro assicurato che tali risorse, che non è stato possibile trasferire nel corso dell'esercizio finanziario 2013 a causa dei vincoli derivanti dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, saranno trasferite nella contabilità speciale del Commissario, nell'esercizio finanziario 2014.

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Sulla base delle risorse finanziarie accreditate sulla contabilità speciale, d'intesa con la Regione Molise, è stato predisposto il crono programma di attuazione per una prima fase di interventi prioritari (importo dell'intervento sotto la soglia dei 300.000,00 euro con priorità assegnata = 1, cfr. nota prot. n. 38/COM del 11/03/2013), ed è stato curato l'inserimento dei medesimi sul Sistema Informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (RENDIS).

Nel contesto della lista prioritaria di interventi e del cronoprogramma di attuazione dei medesimi, anche attraverso il supporto tecnico scientifico di INVITALIA s.p.a. appositamente convenzionata con la gestione Commissariale, acquisito il parere tecnico operativo di Invitalia Spa (con cui lo scrivente in data 31/07/2012 ha stipulato apposito atto convenzionale quale consulente tecnico nella valutazione dei progetti da ammettere a finanziamento), si è provveduto a sottoscrivere apposite **ordinanze per l'avvalimento**, la progettazione e la realizzazione degli interventi nelle seguenti amministrazioni comunali:

n. ordinanza	Amministrazione comunale	Codice intervento	Importo
52/COM	Torella del Sannio	CB050A/10	€ 150.000,00
53/COM	Pescopennataro	IS087B/10	€ 200.000,00
54/COM	Monteroduni	IS068A/10	€250.000,00

Ufficio del Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico in Molise
presso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44 - (00147) ROMA
tel. 06 57223801 fax 06 57225854 mail commdelegato.molise@gmail.com



55/COM	Miranda	IS066A/10	€ 300.000,00
56/COM	Forlì del Sannio	IS064A/10	€ 300.000,00
57/COM	Castelbottaccio	CB079B/10	€ 400.000,00
75/COM	Bojano	CB003A/10	€ 250.000,00

In seguito, secondo quanto previsto dalle richiamate ordinanze, al fine di regolare i conseguenti rapporti di avalimento, si è provveduto a stipulare con le Amministrazioni comunali specifici **atti convenzionali**.

Ad oggi sono stati conseguentemente predisposti i **decreti di finanziamento e di impegno** delle risorse a valere sulle disponibilità nella contabilità speciale intestata alla scrivente gestione, in favore dei seguenti Comuni:

Decreto di Finanziamento	Comune Beneficiario
DEC 82/COM DEL 10/05/2013	TORELLA DEL SANNIO
DEC 83/COM DEL 10/05/2013	PESCOPENNATARO
DEC 86/COM DEL 10/05/2013	CASTELBOTTACCIO
DEC 100/COM DEL 03/06/2013	FORLI DEL SANNIO
DEC 110/COM DEL 27/06/2013	MIRANDA
DEC 112/COM DEL 18/07/2013	MONTERODUNI



DEC 118/COM DEL 22/07/2013	BOJANO
----------------------------	--------

A seguito della comunicazione delle determine di aggiudicazione definitiva dei lavori, da parte della Amministrazioni comunali e, a seguito di gare di appalto, la scrivente, dopo aver preliminarmente verificato la coerenza delle medesime con le finalità dell'intervento tramite il supporto di Invitalia S.p.a., ha provveduto alla liquidazione della competenza, così come individuata nei quadri economici dei singoli interventi, relativi alle spese tecniche connesse alle progettazioni.

Con particolare riferimento ai Comuni di Pescopennataro e Torella del Sannio, previa verifica tecnica effettuata da Invitalia S.p.a., si è inoltre provveduto ad erogare il pagamento corrispondente all' I ^ SAL.

Per quanto riguarda nuovi interventi, l'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Lavori Pubblici con nota prot. n. 0020226/13 del 17/7/2013 ha comunicato che: *"considerato il lungo tempo trascorso dalla data di accertamento dei dissesti, da parte delle Strutture regionali competenti, tutti gli interventi sono da considerarsi urgenti"*.

In tale contesto, attesa la citata comunicazione della Regione Molise sulla disponibilità della quota parte di risorse finanziarie per un importo di euro 14.000.000,00, al fine di assicurare la necessaria accelerazione delle spese, lo scrivente, nel mese di dicembre 2013, ha provveduto a predisporre nuove apposite ordinanze per l'avvalimento, la progettazione e la realizzazione degli interventi nelle seguenti Amministrazioni comunali, per i quali è stata preliminarmente verificata tramite Invitalia S.p.a. l'esecutività e la cantierabilità, condizionandone l'efficacia all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie nell'anno 2014:

n. ordinanza	Amministrazione comunale	Codice intervento	Importo
168/COM	Sant'Angelo Limosano	CB045A/10	€ 300.000,00
169/COM	Roccavivara	CB038A/10	€ 200.000,00
170/COM	Montefalcone nel	CB028A/10	€250.000,00

Ufficio del Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico in Molise
 presso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
 Via Cristoforo Colombo, 44 - (00147) ROMA
 tel. 06 57223801 fax 06 57225854 mail commdelegato.molise@gmail.com



	Sannio		
171/COM	Pizzone	IS072A/10	€ 250.000,00
172/COM	Oratino	CB032A/10	€ 200.000,00
173/COM	Campomarino	CB006A/10	€ 200.000,00
174/COM	Montenero di Bisaccia	CB029A/10	€ 300.000,00
175/COM	Ururi	CB054A/10	€ 250.000,00

Peraltro sia nelle ordinanze di avvalimento che nelle relative Convenzioni con gli Enti territoriali, in linea con le previsioni normative e delle interpretazioni del MEF e del MISE, si è provveduto ad inserire clausole di salvaguardia per la liquidazione delle somme a favore dei soggetti beneficiari ove le risorse promesse dalla Regione Molise non venissero per qualsivoglia motivazione trasferite alla contabilità speciale del Commissario delegato.

Tutte le attività hanno comportato la costante presenza sul territorio del Commissario che in accordo con le Istituzioni Regionali ha organizzato una serie di visite a Campobasso ed Isernia per la consegna degli atti Convenzionali e per formulare indirizzi e sollecitare, se del caso, i territori ad una maggiore ed intensiva azione di monitoraggio dei territori ed a presentare, ove non già fatto, i quadri economici ed altresì avviare i cantieri nel più breve tempo possibile e comunque entro il prossimo mese di maggio 2014 x concludere tutte le attività entro il prossimo 31 dicembre 2014.

L'auspicato e confermato trasferimento di risorse sulla contabilità speciale assicurerà nell'immediato un'accelerazione degli interventi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Aldo Cosentino



All'Ispettorato Generale del
Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare
c.a. Antonio Perrone
e mail: perrone.antonio@minambiente.it

Al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Tutela del Territorio
e delle Risorse Idriche
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
Fax. 06/57225194
tri-udg@minambiente.it

Al Comitato di indirizzo e controllo
per la gestione dell'Accordo presso il
Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale della Tutela del Territorio
e delle Risorse Idriche
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
Fax. 06/57225194
tri-udg@minambiente.it

PAGINA BIANCA
