



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Tipologia	Atto		Prot.		Codice intervento	In Comune	Descrizione
	n.	Data	n.	Data			
Decreto	41/2013	01/08/13	261	01/08/13	FM027A/10	Montefortino (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	42/2013	06/08/13	272	06/08/13	MC032A/10	Cingoli (MC)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	43/2013	09/08/13	279	09/08/13	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici
Decreto	44/2013	09/09/13	285	09/09/13	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	45/2013	16/09/13	291	16/09/13	AP018A/10	Ascoli Piceno	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	46/2013	25/09/13	301	25/09/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL
Decreto	47/2013	25/09/13	305	25/09/13	FM024A/10	Lapedona (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	48/2013	27/09/13	307	27/09/13	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Perizia di variante n. 1
Decreto	49/2013	09/10/13	317	09/10/13	PU039A/10	Acqualagna Fermo (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	50/2013	11/10/13	322	11/10/13	AP015A/10	Force (AP)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	51/2013	16/10/13	328	16/10/13	FM025A/10	Monsampietro M.	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	52/2013	16/10/13	331	16/10/13	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL
Decreto	53/2013	16/10/13	332	16/10/13	MC032A/10	Cingoli (MC)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	54/2013	18/10/13	336	18/10/13	MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	55/2013	18/10/13	337	18/10/13	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	56/2013	18/10/13	338	18/10/13	PU047A/10	Pesaro (PU)	Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara
Decreto	57/2013	22/10/13	339	22/10/13	AP018A/10	Ascoli Piceno	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	58/2013	29/10/13	358	29/10/13	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL
Decreto	59/2013	29/10/13	359	29/10/13	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	60/2013	04/11/13	360	04/11/13	FM024A/10	Lapedona (FM)	Approvazione Quadro Economico rimodulato
Decreto	61/2013	08/11/13	371	08/11/13	FM021A/10	Campofilone (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	62/2013	12/11/13	372	12/11/13	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	63/2013	15/11/13	383	15/11/13	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	64/2013	15/11/13	388	15/11/13	AP018A/10	Ascoli Piceno	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	65/2013	15/11/13	389	15/11/13	FM025A/10	Monsampietro M.	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	66/2013	15/11/13	390	15/11/13	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo
Decreto	67/2013	20/11/13	391	20/11/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Presa d'atto studio e Liquidazione spese per incarichi tecnici
Decreto	68/2013	21/11/13	395	21/11/13	AP015A/10	Force (AP)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	69/2013	22/11/13	396	22/11/13	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	70/2013	22/11/13	403	22/11/13	AP015A/10	Force (AP)	Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara
Decreto	71/2013	26/11/13	408	26/11/13	AN004A/10	Sirolo (AN)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	72/2013	26/11/13	409	26/11/13	FM029A/10	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	73/2013	02/12/13	424	02/12/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL
Decreto	74/2013	02/12/13	425	02/12/13	FM020A/10	Altodona (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	75/2013	02/12/13	426	02/12/13	PU051A/10	S. Ippolito (PU)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	76/2013	02/12/13	427	02/12/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	77/2013	05/12/13	443	05/12/13	FM022A/10	Fermo (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	78/2013	05/12/13	444	05/12/13	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Approvazione Progetto Definitivo



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Tipologia	Atto		Prot.		Codice intervento	in Comune	Descrizione
	n.	Data	n.	Data			
Decreto	79/2013	05/12/13	446	05/12/13	FM029A/10	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F. - Grottazzolina (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	80/2013	05/12/13	447	05/12/13	AN004A/10	Sirolo (AN)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	81/2013	06/12/13	459	06/12/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	82/2013	06/12/13	460	06/12/13	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	83/2013	12/12/13	475	12/12/13	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Approvazione Conto finale e CRE. Liquidazione rata di saldo
Decreto	84/2013	12/12/13	476	12/12/13	MC031A-1/10	MC. Montecassiano	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL
Decreto	85/2013	12/12/13	477	12/12/13	FM020A/10	Altidona (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	86/2013	13/12/13	478	13/12/13	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Approvazione Conto finale e CRE. Liquidazione rata di saldo
Decreto	87/2013	13/12/13	487	13/12/13	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Autorizzazione incarico supporto al RUP
Decreto	88/2013	13/12/13	488	13/12/13	FM022A/10	Fermo (FM)	Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo e procedure di gara
Decreto	89/2013	13/12/13	489	13/12/13	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006
Decreto	90/2013	13/12/13	490	13/12/13	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006
Decreto	91/2013	16/12/13	491	16/12/13	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006
Decreto	92/2013	18/12/13	499	18/12/13	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	93/2013	18/12/13	500	18/12/13	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	94/2013	18/12/13	501	18/12/13	PU051A/10	S. Ippolito (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	95/2013	19/12/13	506	19/12/13	PU047A/10	Pesaro (PU)	Liquidazione incarico pubblicazione bando di gara
Decreto	96/2013	19/12/13	507	19/12/13	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	97/2013	21/12/13	517	21/12/13	PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	98/2013	21/12/13	518	21/12/13	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	99/2013	21/12/13	519	21/12/13	FM021A/10	Campofione (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	100/2013	24/12/13	525	24/12/13	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	101/2013	31/12/13	536	31/12/13	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	102/2013	31/12/13	537	31/12/13	PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	103/2013	31/12/13	538	31/12/13	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	001/2014	20/01/14	28	20/01/14	AP018A/10	Ascoli Piceno	Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara
Decreto	002/2014	20/01/14	29	20/01/14	AP018A/10	Ascoli Piceno	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	003/2014	20/01/14	30	20/01/14	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006 - Rettifica
Decreto	004/2014	23/01/14	33	23/01/14	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL
Decreto	005/2014	23/01/14	34	23/01/14	FM027A/10	Montefortino (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	006/2014	24/01/14	35	24/01/14	PU048A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	007/2014	24/01/14	36	24/01/14	MC031A-2/10	MC. Corridonia	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL
Decreto	008/2014	28/01/14	44	28/01/14	AP019A/10	Spinetoli (AP)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	009/2014	03/02/14	68	03/02/14	MC032A/10	Cingoli (MC)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.



Al Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Tipologia	Atto		Prot		Codice intervento	In Comune	Descrizione
	n.	Data	n.	Data			
Decreto	010/2014	03/02/14	69	03/02/14	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Autorizzazione incarico sorveglianza archeologica
Decreto	011/2014	03/02/14	70	03/02/14	AN002A/10	Genga (AN)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL
Decreto	012/2014	18/02/14	101	18/02/14	FM027A/10	Monteforino (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	013/2014	26/02/14	111	26/02/14	FM025A/10	Monsampietro M.	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	014/2014	26/02/14	112	26/02/14	AN002A/10	Genga (AN)	Autorizzazione, in sanatoria, indagini specialistiche
Decreto	015/2014	26/02/14	113	26/02/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione incarico sorveglianza archeologica
Decreto	016/2014	26/02/14	114	26/02/14	AN004A/10	Sirolo (AN)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici aggiuntivi
Decreto	017/2014	26/02/14	115	26/02/14	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Autorizzazione incarico sorveglianza archeologica
Decreto	018/2014	03/03/14	123	03/03/14	FM020A/10	Altidona (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	019/2014	03/03/14	124	03/03/14	PU048A/10	Pesaro (PU)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	020/2014	03/03/14	125	03/03/14	FM020A/10	Altidona (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	021/2014	11/03/14	142	11/03/14	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL
Decreto	022/2014	13/03/14	150	13/03/14	FM022A/10	Fermo (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	023/2014	13/03/14	151	13/03/14	PU047A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	024/2014	13/03/14	152	13/03/14	FM025A/10	Monsampietro M.	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	025/2014	14/03/14	157	14/03/14	AN004A/10	Sirolo (AN)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	026/2014	14/03/14	158	14/03/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione incarico collaudo statico
Decreto	027/2014	14/03/14	159	14/03/14	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Autorizzazione incarico collaudo statico
Decreto	028/2014	21/03/14	169	21/03/14	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche, 1a Rata
Decreto	029/2014	21/03/14	170	21/03/14	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Liquidazione spese per incarichi tecnici, 1a Rata
Decreto	030/2014	21/03/14	172	21/03/14	FM029A/10	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	031/2014	21/03/14	173	21/03/14	FM022A/10	Fermo (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	032/2014	27/03/14	184	27/03/14	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 3 e disposizione di pagamento 3 SAL
Decreto	033/2014	03/04/14	191	03/04/14	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Approvazione Perizia di variante n. 1
Decreto	034/2014	10/04/14	210	10/04/14	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	035/2014	11/04/14	214	11/04/14	PU049A/10	Piobbico (PU)	Autorizzazione, in sanatoria, lavori in economia
Decreto	036/2014	11/04/14	215	11/04/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici aggiuntivi
Decreto	037/2014	14/04/14	219	14/04/14	AN002A/10	Genga (AN)	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	038/2014	14/04/14	220	14/04/14	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Approvazione Perizia di variante n. 1
Decreto	039/2014	22/04/14	232	22/04/14	AP015A/10	Force (AP)	Autorizzazione procedure di espropri ed asservimenti
Decreto	040/2014	09/05/14	258	09/05/14	AN002A/10	Genga (AN)	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL
Decreto	041/2014	09/05/14	259	09/05/14	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 4 e disposizione di pagamento 4 SAL
Decreto	042/2014	12/05/14	261	12/05/14	MC032A/10	Cingoli (MC)	Liquidazione quota parte spese per indagini specialistiche
Decreto	043/2014	12/05/14	262	12/05/14	PU048A/10	Pesaro (PU)	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	044/2014	13/05/14	264	13/05/14	MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	045/2014	16/05/14	271	16/05/14	PU049A/10	Piobbico (PU)	Liquidazione spese per lavori in economia
Decreto	046/2014	20/05/14	276	20/05/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	047/2014	20/05/14	277	20/05/14	FM022A/10	Fermo (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Tipologia	Atto		Prot.		Codice intervento	In Comune	Descrizione
	n.	Data	n.	Data			
Decreto	048/2014	27/05/14	285	27/05/14	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	049/2014	06/06/14	301	06/06/14	AP018A/10	Ascoli Piceno	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	050/2014	11/06/14	302	11/06/14	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL
Decreto	051/2014	11/06/14	303	11/06/14	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Conto finale e CRE. Liquidazione rata di saldo
Decreto	052/2014	11/06/14	304	11/06/14	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Liquidazione spese per incarichi tecnici, 1a Rata
Decreto	053/2014	13/06/14	321	13/06/14	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	054/2014	13/06/14	322	13/06/14	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	055/2014	13/06/14	323	13/06/14	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	056/2014	13/06/14	324	13/06/14	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Conto finale e CRE. Liquidazione rata di saldo
Decreto	057/2014	18/06/14	332	18/06/14	MC032A/10	Cingoli (MC)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

5. ACCREDITAMENTI SULLA CONTABILITA' SPECIALE AL 24 GIUGNO 2014

Come richiamato, gli importi programmati per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1 - elenco "A1" ed elenco "A2" dell'accordo di programma, ammontavano complessivamente ad €. 56.427.838,75 di cui:

- €. 35.900.000,00 con fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;
- €. 20.527.838,75 quale cofinanziamento regionale, definito con risorse derivanti da varie fonti di natura regionale;

In merito al finanziamento statale (fondi MATTM, di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191), al 24 giugno 2014 risulta accreditato solo l'importo pari ad a €. 5.130.626,62.

La più volte citata Deliberazione CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 è intervenuta a copertura di quota parte del finanziamento statale rimasto scoperto, ed ovvero per una quota complessiva pari ad Euro 13.579.373,38 al momento solo parzialmente erogata.

I primi accreditamenti da parte del MATTM sono intervenuti a partire da fine giugno del 2011, e sono avvenuti come segue:

- 1° accreditamento : di €. 569.023,88 in data 23.06.2011
- 2° accreditamento : di €. 2.544.521,71 in data 15.12.2011
- 3° accreditamento : di €. 1.046.153,85 in data 25.09.2012 (CIPE)
- 4° accreditamento : di €. 2.017.081,03 in data 18.10.2012
- 5° accreditamento : di €. 34.077,00 in data 07.10.2013 (CIPE)
- 6° accreditamento : di €. 142.938,99 in data 07.10.2013 (CIPE)
- 7° accreditamento : di €. 1.496.831,15 in data 07.10.2013 (CIPE)
- 8° accreditamento : di €. 3.400.000,00 in data 05.11.2013 (CIPE)
- 9° accreditamento : di €. 2.356.418,08 in data 05.11.2013 (CIPE)

per un totale di €. 13.607.045,69 di cui €. 5.130.626,62 quale quota parte del finanziamento programmato a carico del MATTM ed €. 8.476.419,07 derivante dalla delibera CIPE n. 6/2012.

La Regione Marche non ha ancora effettuato alcun accreditamento.

A seguire, si riporta in tabella un riepilogo delle somme accreditate al 24 giugno 2014:

N.	Data	MATTM	MATTM Su fondi Del. CIPE n. 6/2012	Regione Marche	Importo
1	23/06/2011	€ 569.023,88			€ 569.023,88
2	15/12/2011	€ 2.544.521,71			€ 2.544.521,71
3	25/09/2012		€ 1.046.153,85		€ 1.046.153,85
4	18/10/2012	€ 2.017.081,03			€ 2.017.081,03
5	07/10/2013		€ 34.077,00		€ 34.077,00
6	07/10/2013		€ 142.938,99		€ 142.938,99
7	07/10/2013		€ 1.496.831,15		€ 1.496.831,15
8	05/11/2013		€ 3.400.000,00		€ 3.400.000,00
9	05/11/2013		€ 2.356.418,08		€ 2.356.418,08
		€ 5.130.626,62	€ 8.476.419,07	€ 0,00	€ 13.607.045,69



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

In merito ai fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012, tenuto conto di quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica con nota del 27 novembre 2012 n. 4822, inerente la presa d'atto degli interventi del 26 ottobre 2012, si osserva che risultano stanziati a favore dell'Accordo di Programma MATTM - Regione Marche complessivi Euro 13.579.373,38.

Attualmente risulta accreditato in contabilità speciale vincolata n. 5621, quale quota parte di tale somma, l'importo complessivo di Euro 8.476.419,07, pari al 62,42 % di quanto stanziato con la delibera n. 6/2012.

Rimane da accreditare il valore residuo dei fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012, pari a Euro 5.102.954,31.


Resta altresì da definire, da parte dei soggetti sottoscrittori l'Accordo, modi e tempi di messa in disponibilità del Commissario della restante somma necessaria per dare attuazione alla parte restante del programma degli interventi di cui all'allegato 1, tab. A1, dell'Accordo di Programma del 25 novembre, ed ovvero:

- Euro 17.190.000,00
(stante gli attuali impegni assunti con l'Accordo di Programma del 25 novembre)
- Euro 13.600.000,00
(laddove si pervenga alla stipula dell'Atto Integrativo che recepisce la riduzione del 10% richiesta dal MATTM con propria nota n. 6824/TRI/DI del 2.03.2011)

Si evidenzia inoltre che la dinamica di erogazione dei fondi, molto lenta rispetto quanto inizialmente previsto, associata peraltro spesso ad una mancanza di informazioni sulla loro possibile tempistica, ha condizionato molto la fase di attuazione degli interventi, rallentandola sensibilmente.

Infatti il Commissario, gestore della contabilità speciale vincolata n. 5621, ha dovuto centellinare l'assunzione di impegni proprio per evitare di ritrovarsi, suo malgrado, in situazioni di mancanza di cassa a fronte di una eventuale insorgenza di impegni economici da onorare.

In tal senso, a seguire si riporta in grafico il confronto tra l'entità delle somme progressivamente accreditate sulla contabilità speciale vincolata n. 5621 ed il relativo andamento degli importi impegnati dal Commissario per l'attuazione degli interventi (quest'ultimo dato è riferito all'importo, progressivamente sommato, dei quadri economici dei progetti esecutivi approvati, su cui sono state autorizzate le conseguenti procedure di gara).

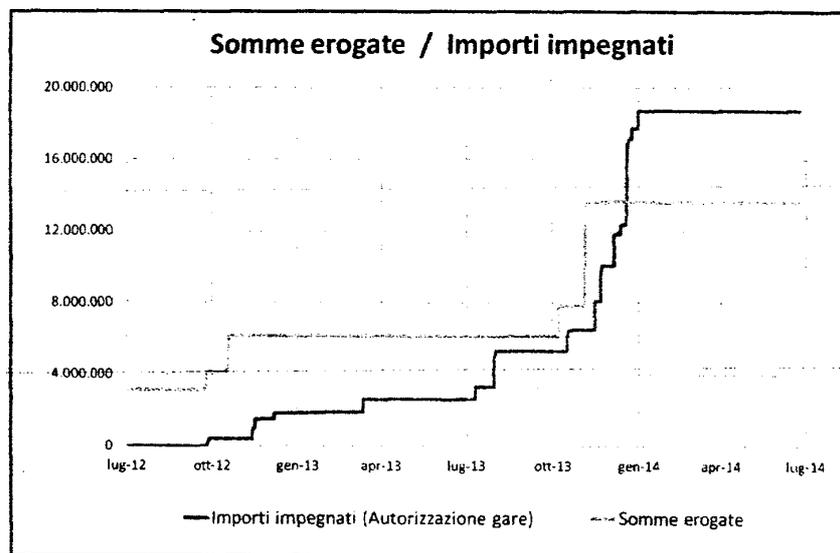



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

6. STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AL 24 GIUGNO 2014

6.1. INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI ATTIVATI SUI FONDI DISPONIBILI

Come descritto nel precedentemente paragrafo 3.2, considerando le priorità espresse con comunicazione in data 20/02/2012 dell'Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche al MATTM, in conseguenza della citata riunione del 30/01/2012, si è quindi convenuto con la regione Marche di avviare le fasi di attuazione del programma selezionando allo scopo i primi interventi in elenco fino alla concorrenza dell'importo complessivo delle somme a quel momento disponibili e/o impegnate (Euro 5.130.626,62).

Ciò di fatto ha condotto alla individuazione dei primi 12 interventi (che diventano poi 14 in conseguenza della scomposizione in tre distinti interventi dell'intervento MC031A/10), in quanto indicati dalla Regione Marche come maggiormente prioritari, per un importo complessivo pari ad Euro 5.500.000,00 (ovvero comprensivi di Euro 369.373,38 a valere su quota parte dell'intervento previsto in comune di Force, quest'ultime relative alle risorse di cui alla Del. CIPE n. 6/2012).

Al 24 giugno 2014 lo stato di avanzamento di tali n. 14 interventi, sinteticamente rappresentato, è il seguente:

- N. 8 Ultimati
- N. 6 In corso di esecuzione

A seguire si descrive in dettaglio lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi, valutato alla data del 24 giugno 2014:

Codice	Prov.	Comune	Importo	Approv. Prog. Definitivo	Approv. Prog. Esecutivo e proc. di gara	Bando di gara / Lettere invito	Aggiudicaz. Prow.	Aggiudicaz. Definitiva	Contratto	Consegna lavori	Ultimazione lavori
AN002A/10	AN	Genga	400.000	29/06/2012	28/09/2012	20/12/2012	09/05/2013	11/07/2013	26/07/2013	16/10/2013	09/11/2013
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	300.000	30/07/2012					Somma urgenza	22/10/2012	18/06/2013
AP015A/10	MC	Force	1.500.000	11/10/2013	21/11/2013	30/11/2013	11/03/2014	15/03/2014	24/06/2014	22/04/2014	
AP019A/10	AP	Spinetoli	400.000	10/06/2013	10/07/2013	18/09/2013	04/10/2013	19/11/2013	21/01/2014	06/03/2014	
FM021A/10	FM	Campofilone	300.000	08/11/2013	21/12/2013	12/02/2014	11/03/2014	08/04/2014	20/06/2014	23/06/2014	
FM024A/10	FM	Lapedona	700.000	30/11/2012	12/03/2013	09/04/2013	07/05/2013	19/06/2013	10/09/2013	04/11/2013	04/04/2014
FM027A/10	FM	Montefortino	400.000	28/06/2013	01/08/2013	16/09/2013	30/09/2013	07/11/2013	20/12/2013	28/04/2014	
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	300.000	14/06/2013	10/07/2013	31/07/2013	26/08/2013	02/10/2013	15/11/2013	06/03/2014	
MC031A-1/10	MC	Macerata e Montecassiano	169.000	06/08/2012	16/11/2012	06/12/2012	19/12/2012	28/01/2013	28/03/2013	10/07/2013	4/10/2013
MC031A-2/10	MC	Macerata e Corridonia	200.000	06/08/2012	16/11/2012	06/12/2012	19/12/2012	28/01/2013	28/03/2013	22/07/2013	29/05/2014
MC031A-3/10	MC	Macerata, Recanati e Montelupone	231.000	06/08/2012	16/11/2012	06/12/2012	19/12/2012	28/01/2013	28/03/2013	22/07/2013	
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	100.000	27/07/2012	28/01/2013	07/05/2013	10/06/2013	01/08/2013	07/10/2013	09/09/2013	09/10/2013
PU040A/10	PU	Borgo Pace	300.000	31/07/2012	07/12/2012	19/12/2012	11/02/2013	08/03/2013	21/05/2013	10/07/2013	07/10/2013
PU049A/10	PU	Piobbico	200.000	09/07/2012	14/11/2012	13/04/2013	30/04/2013	08/06/2013	20/06/2013	03/07/2013	30/09/2013



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

6.2. INTERVENTI ATTIVATI SUI FONDI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell'elenco presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi.

Per tali interventi sono state quindi avviate le varie fasi istruttorie e la relativa raccolta documentale che hanno poi portato alla stipula delle relative Ordinanze di avalimento e delle conseguenti Convenzioni di avalimento, nonché l'individuazione dei vari Responsabili del procedimento.

Complessivamente si tratta di n. 19 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 13.210.000,00.

A questi interventi ed al loro relativo importo va inoltre sommato l'importo di Euro 369.373,38 posto quale quota parte a completamento dell'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), di cui al paragrafo precedente, il che porta il valore del finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012 a complessivi Euro 13.579.373,38.

Al 24 giugno 2014 lo stato di avanzamento di tali n. 19 interventi, sinteticamente rappresentato, è il seguente:

– N. 19 In corso di esecuzione

A seguire si descrive in dettaglio lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi, valutato alla data del 24 giugno 2014:

Codice	Prov.	Comune	Importo	Approv. Prog. Definitivo	Approv. Prog. Esecutivo e proc. di gara	Bando di gara / Lettere invito	Aggiudicaz. Provv.	Aggiudicaz. Definitiva	Contratto	Consegna lavori	Ultimazione lavori
MC038A/10	MC	Porto Recanati	4.210.000	05/12/2013	19/12/2013	27/12/2013	22/01/2014	18/04/2014	11/06/2014	11/06/2014	
MC037A/10	MC	CastelSAng. Nera	300.000	21/12/2013	31/12/2013	29/01/2014	18/02/2014	13/03/2014	24/04/2014	06/06/2014	
PU048A/10	PU	Pesaro	800.000	26/03/2013	30/07/2013	08/10/2013	23/10/2013	18/11/2013	30/12/2013	12/02/2014	
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	600.000	18/12/2013	24/12/2013	28/12/2013	18/01/2014	07/02/2014	18/04/2014	05/05/2014	
PU051A/10	PU	S. Ippolito	300.000	02/12/2013	18/12/2013	20/12/2013	30/12/2013	20/02/2014	18/03/2014	24/06/2014	
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	800.000	26/11/2013	05/12/2013	13/12/2013	23/12/2013	30/12/2013	19/03/2014	05/05/2014	
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	300.000	18/10/2013	15/11/2013	29/11/2013	16/12/2013	25/03/2014	16/05/2014	09/06/2014	
MC032A/10	MC	Cingoli	800.000	06/08/2013	16/10/2013	28/10/2013	19/11/2013	25/11/2013	30/12/2013	13/02/2014	
FM020A/10	FM	Altidona	300.000	02/12/2013	12/12/2013	17/12/2013	30/12/2013	30/12/2013	14/02/2014	07/05/2014	
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	1.100.000	22/10/2013	15/11/2013	29/11/2013	19/12/2013	21/01/2014	22/05/2014	07/05/2014	
PU047A/10	PU	Pesaro	800.000	14/06/2013	30/07/2013	04/11/2013	06/12/2013	16/01/2014	06/03/2014	16/04/2014	
AN004A/10	AN	Sirolo	750.000	26/11/2013	05/12/2013	11/12/2013	10/01/2014	23/01/2014	10/03/2014	19/03/2014	
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	400.000	10/06/2013	18/10/2013	14/11/2013	02/12/2013	03/12/2013	29/04/2014	29/04/2014	



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Codice	Prov.	Comune	Importo	Approv. Prog. Definitivo	Approv. Prog. Esecutivo e proc. di gara	Bando di gara / Lettere invito	Aggiudicaz. Prov.	Aggiudicaz. Definitiva	Contratto	Consegna lavori	Ultimazione lavori
AP017A/10	AP	San Benedetto	500.000	12/11/2013	22/11/2013	26/11/2013	05/12/2013	16/12/2013	10/02/2014	10/03/2014	
FM022A/10	FM	Fermo	200.000	05/12/2013	13/12/2013	18/12/2013	30/12/2013	30/12/2013	03/03/2014	16/04/2014	
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	270.000	21/12/2013	31/12/2013	19/03/2014	28/04/2014	28/04/2014	03/06/2014	23/06/2014	
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	200.000	16/10/2013	15/11/2013	28/11/2013	10/12/2013	30/12/2013	17/02/2014	30/04/2014	
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	180.000	29/10/2013	06/12/2013	11/12/2013	16/01/2014	17/02/2014	02/04/2014	15/04/2014	
PU045A/10	PU	Montelabbate	400.000	18/12/2013	31/12/2013	24/02/2014	10/03/2014	21/03/2014	14/05/2014	12/06/2014	



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

6.3. SINTESI COMPLESSIVA SUGLI INTERVENTI ATTIVATI

Alla data del 24 giugno 2014 risultano pertanto complessivamente attivati n. 33 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 18.710.000.

Ovvero, risultano attivati tutti gli interventi per cui è stata possibile definire la copertura finanziaria, derivante dalle somme disponibili in contabilità speciale vincolata n. 5621, quale accredito diretto da parte del MATTM, e dalle somme stanziare dalla Delibera CIPE n. 6/2012.

Per tali n. 33 interventi, già alla data del 31/12/2013 risultava interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto.

Di questi interventi inoltre, alcuni sono in stato di aggiudicazione, in corso di esecuzione e, in n. 8 casi, già ultimati.

Al 24 giugno 2014 lo stato di avanzamento di tali n. 33 interventi, sinteticamente rappresentato, è il seguente:

- N. 8 Ultimati
- N. 25 In corso di esecuzione

A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi valutato alla data del 24/06/2014.

Per ognuno di tali interventi si rappresentano altresì anche le modalità di espletamento delle attività tecnico amministrative di cui agli incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163/2006, ovvero se le attività inerenti il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo sono interamente svolte da una struttura tecnica interna alle amministrazioni stesse, nel cui organico sono presenti idonee professionalità (Int.), ovvero se l'ente avvalso risulta autorizzato ad avvalersi di professionisti esterni per lo svolgimento di tali attività (Ext).

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso		Stato avanzamento
AN002A/10	AN	Genga	Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4	disgaggi e barriere paramassi	400.000	Comune di Genga	INT	Ultimati
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4	Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS)	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	INT	Ultimati
AP015A/10	MC	Forze	Versante Ovest di Montetorre	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	1.500.000	Comune di Forze (AP)	EXT	In Esecuzione
AP019A/10	AP	Spinetoli	Fiume Tronto	Riparazione argine	400.000	Provincia di Ascoli Piceno	INT	In Esecuzione
FM021A/10	FM	Campofione	Ponte Nina - Rio Canale	Messa in sicurezza idraulica foce	300.000	Consorzio di Bonifica Aso- Tenna-Tronto (FM)	INT	In Esecuzione
FM024A/10	FM	Lapedona	Centro storico - versante nord FRANA R4	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	700.000	Provincia di Fermo	INT	Ultimati
FM027A/10	FM	Montefortino	Capol. - Via Circonvallazione	Opere di sostegno, difesa spondale	400.000	Provincia di Fermo	INT	In Esecuzione
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	Cupaggio	Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	300.000	Provincia di Fermo	INT	In Esecuzione
MC031A- 1/10	MC	Macerata e Montecassiano	Fiume Potenza	Manutenzione idraulica dal pente di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza	169.000	Provincia di Macerata	INT	Ultimati
MC031A- 2/10	MC	Macerata e Corridonia	Fiume Chienti	Manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio	200.000	Provincia di Macerata	INT	Ultimati
MC031A- 3/10	MC	Macerata, Recanati e Montelupone	Fiume Potenza	Manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto	231.000	Provincia di Macerata	INT	In Esecuzione



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso		Stato avanzamento
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	Gola del Furto - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099	opere di protezione fenomeni di crollo	100.000	Provincia di Pesaro e Urbino	INT	Ultimati
PU040A/10	PU	Borgo Pace	Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3	riduzione rischio idrogeologico	300.000	C. M. Alto e Medio Metauro, Comune Borgo Pace (PU)	INT	Ultimati
PU049A/10	PU	Piobbico	M. Montiego-capoli FRANA R3-R4	Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego	200.000	Comune di Piobbico (PU), Prov. Pesaro Urbino	INT	Ultimati
MC038A-1/10	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	4.210.000	Comune di Porto Recanati (MC), Reg. Marche Serv. ITE	INT	In Esecuzione
MC037A/10	MC	CastelSang. Nera	M Rotondo-M.Prata ESOND R4	Valanghe	300.000	Comune di CastelSang. Nera	EXT	In Esecuzione
PU048A/10	PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	INT	In Esecuzione
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000	Comune di Montefalcone App.no	EXT	In Esecuzione
PU051A/10	PU	S. Ippolito	Pian di Rose - F-05-0579 R4	Bonifica versante NW	300.000	Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. Pesaro Urbino	INT	In Esecuzione
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin. arginature	800.000	Provincia di Fermo	INT	In Esecuzione
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	INT	In Esecuzione
MC032A/10	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	Consolidamento centro abitato	800.000	Comune di Cingoli	INT	In Esecuzione
FM020A/10	FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	Completamento consolidamento parete rocciosa	300.000	Provincia di Fermo	INT	In Esecuzione
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	AP-Marino del Tronto ESOND E4	Consolidamento briglia	1.100.000	Provincia di Ascoli Piceno	INT	In Esecuzione
PU047A/10	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	INT	In Esecuzione
AN004A/10	AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000	Comune di Sirolo	EXT	In Esecuzione
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000	Comune di Civitanova Marche	INT	In Esecuzione
AP017A/10	AP	San Benedetto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000	Comune di San Benedetto	EXT	In Esecuzione
FM022A/10	FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000	Provincia di Fermo	INT	In Esecuzione
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000	Comune di Sassocorvaro	EXT	In Esecuzione
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000	Provincia di Fermo	INT	In Esecuzione
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	Palificata, trincee drenanti	180.000	Comune di Macerata Feltria	EXT	In Esecuzione
PU045A/10	PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	Consolidamento frana	400.000	Comune di Montelabbate	EXT	In Esecuzione


*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011


Per la maggior parte di questi interventi, le amministrazioni convenzionate hanno rappresentato che le attività inerenti il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alle amministrazioni stesse, nel cui organico sono presenti idonee professionalità.

Di seguito si rappresenta in forma grafica l'incidenza sul totale riferita all'espletamento di tali attività tecnico amministrative nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163/2006.

Per numero di interventi:

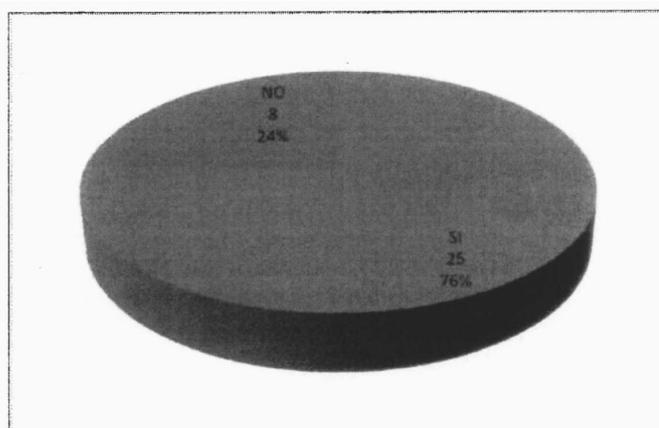

Per entità del finanziamento :

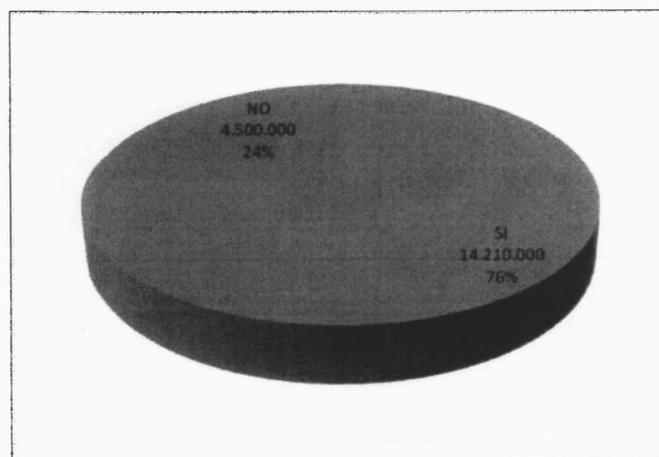




Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche


Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Parimenti, di seguito si rappresenta in forma grafica lo stato di avanzamento del livello di attuazione di tali interventi, valutato alla data del 24/06/2014 e con riferimento alle tipologie indicate in tabella:

Per numero di interventi:

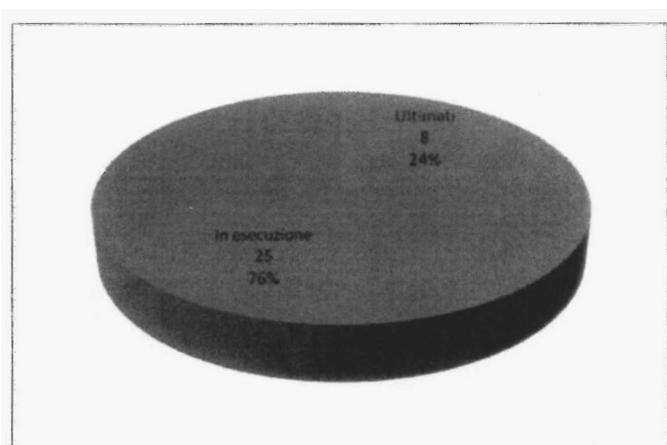

Per entità del finanziamento :

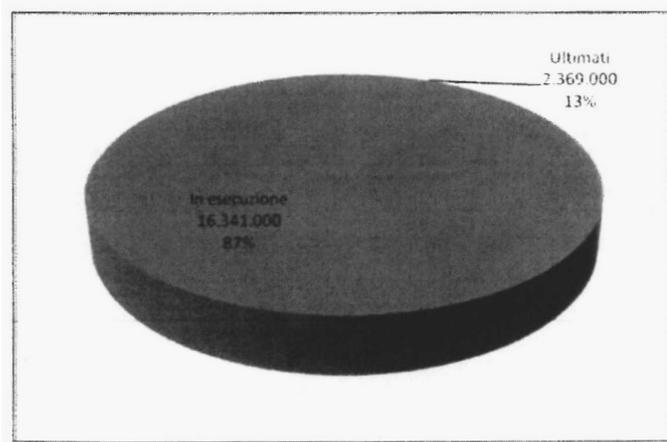



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

6.4. SITUAZIONE FINANZIARIA - IMPORTI EROGATI ED IMPORTI IMPEGNATI

Alla data del 24 giugno 2014 risultano complessivamente attivati n. 33 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 18.710.000.

Ovvero, risultano attivati tutti gli interventi per cui è stata possibile definire la copertura finanziaria, derivante dalle somme disponibili in contabilità speciale vincolata n. 5621, quale accredito diretto da parte del MATTM, e dalle somme stanziata dalla Delibera CIPE n. 6/2012.

Per tali n. 33 interventi, già alla data del 31/12/2013 risultava interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto.

Ciò equivale a dire che per tutti questi interventi risultano integralmente impegnate le somme derivanti dai rispettivi quadri economici dei progetti su cui si stanno eseguendo, o sono già state eseguite, le rispettive gare di appalto.

Ragion per cui risulta complessivamente impegnato un importo totale pari ad Euro 18.710.000,00.

Parimenti, le somme accreditate al 24 giugno 2014 sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, sono le seguenti:

- Euro 5.130.626,62 quale accredito diretto da parte del MATTM
- Euro 8.476.419,07 quale quota parte delle somme stanziata dalla Delibera CIPE n. 6/2012

Per un totale complessivo pari ad Euro 13.607.045,69.

Pertanto, alla data del 24 giugno 2014, a fronte di un accredito complessivo in contabilità speciale vincolata n. 5621 pari ad Euro 13.607.045,69 corrisponde un impegno di spesa pari ad Euro 18.710.000,00, ovvero con un disavanzo negativo pari ad Euro 5.102.954,31.

A seguire si descrive lo stato degli importi erogati ed impegnati per ognuno dei 33 interventi al momento attivati:

Codice	Prov.	Comune	Ente avvalso	Importo erogato fondi MATTM	Importo erogato fondi Del. CIPE 6/2012	Importo Impegnato su fondi MATTM	Importo Impegnato su fondi Del. CIPE 6/2012	Disavanzo
AN002A/10	AN	Genga	Comune di Genga	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	Provincia di Ascoli Piceno	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
AP015A/10	MC	Force	Comune di Force (AP)	1.130.626,62	369.373,38	1.130.626,62	369.373,38	0,00
AP019A/10	AP	Spinetoli	Provincia di Ascoli Piceno	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
FM021A/10	FM	Campofione	Consorzio di Bonifica Aso-Tenna-Tronto (FM)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
FM024A/10	FM	Lapedona	Provincia di Fermo	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
FM027A/10	FM	Montefortino	Provincia di Fermo	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	Provincia di Fermo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
MC031A-1/10	MC	Macerata e Montecassiano	Provincia di Macerata	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00
MC031A-2/10	MC	Macerata e Corridonia	Provincia di Macerata	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
MC031A-3/10	MC	Macerata, Recanati e Montelupone	Provincia di Macerata	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	Provincia di Pesaro e Urbino	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PU040A/10	PU	Borgo Pace	C. M. Alto e Medio Metauro, Comune Borgo Pace (PU)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PU049A/10	PU	Piobbico	Comune di Piobbico (PU), Prov. Pesaro Urbino	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
MC038A-1/10	MC	Porto Recanati	Comune di Porto Recanati (MC), Reg. Marche Serv. ITE	0,00	2.583.698,89	0,00	4.210.000,00	-1.626.301,11



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Codice	Prov.	Comune	Ente avvalso	Importo erogato fondi MATTM	Importo erogato fondi Del. CIPE 6/2012	Importo Impegnato su fondi MATTM	Importo Impegnato su fondi Del. CIPE 6/2012	Disavanzo
MC037A/10	MC	CastelSang. Nera	Comune di CastelSang. Nera	0,00	184.111,56	0,00	300.000,00	-115.888,44
PU048A/10	PU	Pesaro	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	0,00	490.964,16	0,00	800.000,00	-309.035,84
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	Comune di Montefalcone App.no	0,00	368.223,12	0,00	600.000,00	-231.776,88
PU051A/10	PU	S. Ippolito	Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. Pesaro Urbino	0,00	184.111,56	0,00	300.000,00	-115.888,44
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Provincia di Fermo	0,00	490.964,16	0,00	800.000,00	-309.035,84
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Provincia di Ascoli Piceno	0,00	184.111,56	0,00	300.000,00	-115.888,44
MC032A/10	MC	Cingoli	Comune di Cingoli	0,00	490.964,16	0,00	800.000,00	-309.035,84
FM020A/10	FM	Altidona	Provincia di Fermo	0,00	184.111,56	0,00	300.000,00	-115.888,44
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	Provincia di Ascoli Piceno	0,00	675.075,72	0,00	1.100.000,00	-424.924,28
PU047A/10	PU	Pesaro	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	0,00	490.964,16	0,00	800.000,00	-309.035,84
AN004A/10	AN	Sirolo	Comune di Sirolo	0,00	460.278,90	0,00	750.000,00	-289.721,10
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Comune di Civitanova Marche	0,00	245.482,08	0,00	400.000,00	-154.517,92
AP017A/10	AP	San Benedetto	Comune di San Benedetto	0,00	306.852,60	0,00	500.000,00	-193.147,40
FM022A/10	FM	Fermo	Provincia di Fermo	0,00	122.741,04	0,00	200.000,00	-77.258,96
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Comune di Sassocorvaro	0,00	165.700,40	0,00	270.000,00	-104.299,60
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	Provincia di Fermo	0,00	122.741,04	0,00	200.000,00	-77.258,96
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Comune di Macerata Feltria	0,00	110.466,94	0,00	180.000,00	-69.533,06
PU045A/10	PU	Montelabbate	Comune di Montelabbate	0,00	245.482,08	0,00	400.000,00	-154.517,92

Importo erogato : 5.130.626,62 8.476.419,07
Totale importo erogato 13.607.045,69

Importo impegnato : 5.130.626,62 13.579.373,38
Totale importo impegnato 18.710.000,00

Disavanzo : -5.102.954,31

La dimensione delle previsioni degli interventi, per lo più di modesta entità, e la stessa tipologia di opere, rendono abbastanza brevi i tempi di esecuzione dei relativi lavori. Diventa quindi importante il rispetto dei tempi di accreditamento che la delibera CIPE n. 6/2012, attraverso i suoi atti conseguenti, si è data al fine di garantire i pagamenti dei tempi contrattualmente previsti.

Effettuata la aggiudicazione degli appalti la spesa si determina in un arco di tempo abbastanza breve, prevedibile per la maggior parte di tali interventi anche in meno di sei mesi e quindi l'obbligo a "pagare" si concentra in un arco di tempo ridotto, non in "anni".

Al rischio di determinare condizioni di "debito" per l'Amministrazione, se non venisse garantito il pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori, con la necessaria tempestiva copertura con l'accreditamento preventivo delle somme si aggiungerebbe il danno, per l'economia reale del territorio, dato dall'accrescersi del "costo" delle opere per gli appaltatori in conseguenza dei ritardi nei pagamenti.

Situazione sino ad oggi scongiurata per tutti gli interventi attivati ed in corso. Rischio che potrebbe però assumere caratteri "concreti" qualora si verificassero ritardi nella erogazione delle restanti somme rispetto quanto previsto dalla Del CIPE n. 6/2012 e dagli atti ad essa conseguenti.



Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

7. ADEMPIMENTI SUGLI O.G.V. DI CUI ALLA PRESA D'ATTO DEL 26 OTTOBRE 2012 – VALUTAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2013

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell'elenco presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi.

Dalla delibera CIPE n. 6/2012 e dalla conseguente presa d'atto degli elenchi degli interventi del 26 ottobre 2012 si rileva e/o si prende atto sostanzialmente, tra le altre, di quanto segue:

- gli interventi che trovano copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 sono i primi 14 e parzialmente il 15° (intervento cod. AP015A/10 in comune di Force -AP) per un importo complessivo di €. 5.130.626,62 tutti accreditati;
- quota parte dei restanti interventi, già programmati con copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191, trovano ora copertura sui fondi di cui all'art. 33, c. 3, Legge 183/2011 per € 13.579.373,38 parzialmente accreditati;
- detti fondi, come riportato nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica del 27 novembre 2012 n. 4822, saranno accreditati alla Contabilità speciale intestata al Commissario con le modalità e secondo il criterio dello stato di avanzamento degli interventi, in analogia con quanto previsto al punto 7.3 della Delibera n. 8/2012;
- l'intero programma costruttivo, di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 ed alla conseguente presa d'atto degli elenchi degli interventi del 26 ottobre 2012, **dovrà definire obbligatoriamente giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2013**, pena la revoca dei finanziamenti!

La nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica prot. n. 1859 dell'11 febbraio 2013, laddove chiarisce che: "...non è impedito ai Commissari Straordinari di procedere alla formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun intervento...", ha consentito pur in attesa del completo trasferimento delle risorse, l'approvazione dei relativi progetti anche oltre le somme effettivamente accreditate.

La dimensione delle previsioni degli interventi, per lo più di modesta entità, e la stessa tipologia di opere, rendono abbastanza brevi i tempi di esecuzione dei relativi lavori. Diventa quindi importante il rispetto dei tempi di accreditamento che la delibera CIPE n. 6/2012, attraverso i suoi atti conseguenti, si è data al fine di garantire i pagamenti dei tempi contrattualmente previsti e che le normative europee sanciscono a carico delle Amministrazioni.

Ciò premesso, preso atto di quanto disposto dalla delibera CIPE n. 6/2012 e dagli atti ad essa conseguenti, il Commissario ha posto in essere le attività connesse alla attuazione degli interventi di cui alla presa d'atto degli elenchi degli interventi del 26 ottobre 2012.

Per tali interventi sono state quindi avviate le varie fasi istruttorie e la relativa raccolta documentale che hanno poi portato alla stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di avvalimento, nonché l'individuazione dei vari Responsabili del procedimento.

Complessivamente si tratta di n. 19 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 13.210.000,00.

A questi interventi ed al loro relativo importo va inoltre sommato l'importo di Euro 369.373,38 posto quale quota parte a completamento dell'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), di cui al paragrafo precedente, il che porta il valore del finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012 a complessivi Euro 13.579.373,38.
