

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CIX-bis
n. 6

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DELL'ANNO 2000 (al 30 settembre 1999)

(Articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 651)

*Presentata dal Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane,
Roma Capitale e Giubileo 2000*

(MICHELI)

Trasmessa alla Presidenza il 1° dicembre 1999

PAGINA BIANCA

INDICE

1.	SINTESI DELLE RELAZIONI PRECEDENTI	Pag. 7
1.1.	LA PRIMA RELAZIONE (18 SETTEMBRE 1996 – 31 MARZO 1997).....	» 7
1.2.	LA SECONDA RELAZIONE (1° APRILE – 30 GIUGNO 1997).....	» 9
1.3.	LA TERZA RELAZIONE (1° LUGLIO – 30 SETTEMBRE 1997).....	» 10
1.4.	LA QUARTA RELAZIONE (1° OTTOBRE – 31 DICEMBRE 1997).....	» 11
1.5.	LA QUINTA RELAZIONE (1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 1998).....	» 13
1.6.	LA SESTA RELAZIONE (1° GENNAIO – 31 MARZO 1999).....	» 17
1.6.1.	Lo stato di attuazione	» 18
1.6.2.	Valutazione del rischio di ritardo finale	» 19
1.6.3.	Considerazioni complessive	» 20
1.6.4.	Situazione finanziaria.....	» 21
2.	SETTIMA RELAZIONE	» 24
2.1.	LA SETTIMA RELAZIONE (1° APRILE 1999 - 30 SETTEMBRE 1999).....	» 24
2.2.	LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO	» 27
2.3.	LA SITUAZIONE FINANZIARIA.....	» 29
2.3.1.	Situazione al 30 settembre 1999.....	» 29
2.3.2.	Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie	» 31
3.	APPENDICE	» 174
3.1.	I DECRETI	» 174
	D.M. N. 199/RC del 19 maggio 1999	» 174
	D.M. N. 208/RC del 5 agosto 1999	» 224
3.2.	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	» 246

PAGINA BIANCA

***Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI***

**PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE
GIUBILEO DEL 2000**

LEGGE 23 DICEMBRE 1996, n.651

**Relazione della Commissione al Parlamento
sullo stato di attuazione degli interventi**

(Art. 1, comma 10, legge 23 dicembre 1996, n.651)

Situazione al 30 settembre 1999

Si riportano di seguito alcune abbreviazioni utilizzate nel testo :

- *Commissione – Commissione per Roma Capitale di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 396/90, integrata – ai sensi del comma 2.bis, art. 1 della legge n. 651/96 - per le questioni di specifico interesse delle rispettive province, dai presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;*
- *Piano – Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo;*
- *U.R.C.G.E. – Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi.*

1. Sintesi delle relazioni precedenti

1.1. La prima relazione (18 settembre 1996 – 31 marzo 1997)

Con la prima relazione trimestrale, la Commissione per Roma Capitale, ai sensi del comma 10, art.1, della legge 23 dicembre 1996 n. 651, ha dato conto delle decisioni e degli atti programmatori assunti in merito alla definizione del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le determinazioni e gli indirizzi comunque inerenti la gestione del Piano stesso, così come recepiti nei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000.

Con DPCM in data 18 settembre 1996, è stato adottato il Piano degli interventi, definito dalla Commissione con delibera n. 2 dell'8 luglio 1996, Piano che, come diffusamente esplicitato nella Relazione di accompagnamento, è stato articolato nei settori di seguito elencati, suddivisi, a loro volta, in sotto-settori riferiti a singoli interventi, ovvero a gruppi d'interventi fra loro tipologicamente omogenei.

- A. Sociale ed accoglienza

Centri di accoglienza, residenze protette, case famiglia, servizi di assistenza sociale, servizi di ristorazione, ecc.; nonché gli interventi attinenti la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture ricettive (centri di accoglienza, ostelli, campeggi, alberghi e "case per ferie"); n. 74 interventi per un finanziamento complessivo di Lit. 330, 8 miliardi.

- B. Beni culturali

Tutela, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e architettonico; realizzazione di nuove strutture per ospitare manifestazioni ed eventi; programmi di produzione di eventi culturali; n. 256 interventi per un finanziamento complessivo di Lit. 560,2 miliardi.

- C. Manutenzione e arredo urbano, patrimonio ambientale

Riorganizzazione urbana, risistemazione degli spazi pubblici (percorsi pedonali, restauro facciate, ecc.) arredo urbano (segnaletica, illuminazione pubblica, luoghi di attesa per mezzi pubblici, ecc.), salvaguardia e riqualificazione ambientale, tutela della salute, ottimizzazione dell'uso delle risorse (parchi, aree verdi, verde attrezzato, aree protette, energia, acqua, ecc.); programmi di informazione e educazione; n. 65 interventi per un finanziamento complessivo di Lit. 590,55 miliardi.

- D. Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana

Accessibilità e mobilità pedonale e veicolare; trasporti pubblici e privati; su ferro, su gomma, fluviale, aerea; urbana, extraurbana; abbattimento barriere architettoniche); n. 37 per un finanziamento complessivo di Lit. 1.588,05 miliardi.

- **E. Servizi speciali e formazione**

Piani straordinari di prevenzione e di interventi in casi di emergenza per l'Anno Santo del 2000 (sicurezza, protezione civile, sanità, smaltimento rifiuti, ecc.) valorizzazione e promozione delle risorse umane coinvolte nelle attività di preparazione all'evento giubilare; n. 58 interventi per un finanziamento complessivo di Lit.330 miliardi.

- **F. Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'Evento**

Programmi di gestione e di controllo dello svolgimento delle attività connesse alle manifestazioni dell'Anno Santo del 2000; programmi di informazione dei cittadini e dei visitatori (turismo, traffico, cultura, servizi pubblici e privati, servizi speciali, ecc.); n., 10 interventi per un finanziamento complessivo di Lit.90,4 miliardi.

Il numero complessivo degli interventi ricompresi nel Piano era pari a 500 a fronte di una assegnazione finanziaria, ai sensi dell'art.2, comma 1 del DL n. 455 /96, pari a 3.500 miliardi.

Con DPCM in data 5 novembre 1996, nelle more della conversione in legge del DL n.551 del 23 ottobre 1996, sono stati recepiti alcuni provvedimenti che la Commissione ha adottato fra cui:

- il definanziamento, totale o parziale, di alcuni interventi, per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie necessarie per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Galleria Principe Amedeo d'Aosta (D.08.01) e del suo collegamento con il Sottopasso di Castel Sant'Angelo ed il Parcheggio da realizzarsi sul Gianicolo in area dello Stato Città del Vaticano ;
- il mandato all'Ufficio per Roma Capitale di trasferire ai soggetti beneficiari le occorrenze finanziarie per far fronte agli oneri relativi alla progettazione degli interventi ed alle eventuali attività di indagine a questa strumentali;
- l'avvio della procedura per la definizione dei criteri di monitoraggio e delle misure di snellimento procedurale (in attuazione dell'art. 1, comma 6 bis, della legge n. 651/1996);
- la ripartizione del contributo complessivo di Lit. 40 miliardi a favore dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A., per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti in materia di accoglienza e di monitoraggio, rispettivamente in 32 miliardi (accoglienza) ed 8 miliardi (monitoraggio) e la calendarizzazione del trasferimento delle quote relative ai 32 miliardi (art. 1, comma 12, del D.L. n. 551/1996).

Con il successivo DPCM in data 11 dicembre 1996, sono state adottate alcune importanti direttive in ordine alla gestione ed al controllo sull'attuazione del Piano:

- "Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano";
- "Indirizzi circa le modalità per la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del Piano e l'informazione della pubblica opinione";
- "Criteri per il monitoraggio".

Infine, con D.M. in data 21 dicembre 1996, è stato adottato il parziale definanziamento dell'intervento relativo alla realizzazione dell'asse viario Olimpica - Pineta Sacchetti

(D.12.01), deliberato dalla Commissione al fine di fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie indispensabili per la realizzazione del Sottopasso di Castel Sant'Angelo e della Galleria Principe Amedeo d'Aosta, fissate rispettivamente in 169 e 68 miliardi. Tale definanziamento che doveva essere "momentaneo", è poi divenuto definitivo.

1.2. La seconda relazione (1° aprile – 30 giugno 1997)

La suddetta relazione, sulla scorta della precedente, ha dato atto dei provvedimenti adottati nel periodo in esame e segnatamente dei DD.MM. 18 aprile 1997 e 24 giugno 1997.

Con il primo, tra l'altro:

- è stato ridotto l'importo dello stanziamento a favore dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A., portandolo dagli originari 40 miliardi a 32 miliardi. Ciò in quanto la legge di conversione n.651/96 del citato DL n. 551/96, recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000", ha limitato il contributo in questione alle prestazioni connesse al "piano di accoglienza", eliminando, pertanto, qualsiasi riferimento a compiti nel campo del "monitoraggio";
- si è stabilito di subordinare l'effettivo trasferimento delle somme stanziare a favore di interventi presenti anche nel Programma per Roma Capitale (legge n. 396/90), alla certificazione circa l'autonomia funzionale degli interventi relativi al Giubileo, rispetto a quelli già facenti parte del Programma per Roma Capitale;
- si è precisato che con la locuzione "termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi" di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 2, della legge n. 651/1996, debba intendersi la data del verbale di aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura;
- si è, altresì, precisato che con la locuzione "sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione", di cui al comma 3 bis, dell'articolo 1, della legge n. 651/1996, debba intendersi l'aumento superiore al 20% dell'importo di aggiudicazione, se intervenuto, ovvero del solo importo del lavoro, servizio o fornitura, quale risulta dal quadro economico, nel caso di gara non ancora espletata;
- si è stabilito che la Commissione procedesse, in sede di modifica ed integrazione al Piano, ad una valutazione comparativa delle richieste di inclusione, dando priorità alla finalità perseguita dagli interventi proposti, al relativo grado di fattibilità in relazione al livello di definizione progettuale conseguito, alla complessità realizzativa ed al grado di perfezionamento degli adempimenti amministrativi;
- si è stabilito che le proposte di modifiche del Piano relative a strutture alberghiere ed extra - alberghiere fossero indirizzate direttamente alla Regione Lazio, titolare dell'intervento relativo agli incentivi previsti per questo specifico settore;
- è stato inserito nel Piano con codice F.04.02 e con apposito finanziamento, l'intervento denominato "Osservatorio sul Piano del Giubileo";
- in merito all'attività di "monitoraggio" del Piano, il cui coordinamento era già stato affidato all'U.R.C.G.E., si è demandato al Ministro dei lavori pubblici l'espletamento della gara per l'individuazione del soggetto monitore e sono stati approvati il

“Disciplinare tecnico e capitolato d’oneri” elaborati dall’Ufficio anzidetto.

Con il DM 24 giugno 1997 sono state apportate altre modifiche ed integrazioni al Piano che si sono concretizzate principalmente in :

- taluni definanziamenti, cambi di soggetti beneficiari e proroghe temporali, nonché finanziamenti di interventi relativi al prioritario settore della sicurezza delle Basiliche patriarcali, degli Aeroporti di Fiumicino e Ciampino, del porto canale di Fiumicino al fine di garantire la sicurezza dell’accesso a quest’ultimo e per consentire un migliore espletamento delle funzioni di soccorso a mare;

sono inoltre state assunte le seguenti determinazioni:

- si è stabilito di sottoporre ad ulteriore istruttoria -- per la verifica di conformità ai criteri indicati dalla LR n. 20/97 in materia di ricettività - tutti gli interventi ricompresi nel Piano, rubricati con codice A.07, ad eccezione di quelli di nuova costruzione ed ampliamento di strutture ricettive;
- si è stabilito che la prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi del Piano per il Giubileo fosse presentata direttamente dal Ministro dei lavori pubblici delegato per materia;
- si è stabilito inoltre che le risorse rivenienti da eventuali futuri definanziamenti fossero prioritariamente destinate ai settori della mobilità, della sicurezza e della protezione civile, dell’accoglienza, della ricettività e della gestione dell’evento.

1.3. La terza relazione (1° luglio – 30 settembre 1997)

L’attività di modifica ed integrazione del Piano esercitata, nel periodo in esame, dalla Commissione si è formalizzata con il D.M. del 4 agosto 1997. In particolare con tale atto:

- si è confermato l’inserimento nel Piano di tutti gli interventi già rubricati con codice A.07, sottoposti al supplemento istruttorio succitato, e concernenti il “Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella regione, al fine di potenziare l’offerta di strutture ricettive a basso costo”, vuoi in quanto conformi ai criteri della LR n. 20/97, vuoi perché contraddistinti da finalità coerenti con le celebrazioni giubilari;
- è stato disposto che i soggetti beneficiari degli interventi rubricati con codice A.07, dovessero attenersi alle disposizioni del comma 1, art. 12, della legge regionale del Lazio n. 20/1997, in merito al mantenimento della titolarità e della destinazione d’uso dell’immobile ad attività ricettiva per non meno di dieci anni dalla data dell’erogazione del contributo;
- sono state assentite modifiche di titoli e termini temporali relative ad alcuni interventi;
- si è preso atto dell’esigenza di far fronte all’onere per la realizzazione degli svincoli del parcheggio del Gianicolo, pari ad un costo stimato di Lit. 11.950.000.000, e la

Commissione si è impegnata a reperire tale somma a valere sui ribassi d'asta intervenuti a seguito dell'aggiudicazione dei lavori o forniture finanziati ai sensi della legge n. 651/96.

La Relazione oltre a fornire elementi circa lo stato di attuazione degli adempimenti amministrativi, riportava anche lo stato di avanzamento della fase realizzativa, riferendo che, in merito alla gestione finanziaria, al 30 settembre 1997, erano stati effettuati 104 mandati di pagamento per complessive Lit. 133.371.290.000, nonché trasferimenti, con variazione compensativa di bilancio, al Ministero BB.CC.AA. per Lit. 327.315.000.000 ed al Ministero degli Interni per Lit. 5.000.000.000.

Nel trimestre in esame la Commissione è stata inoltre aggiornata sull'attività svolta dall'U.R.C.G.E. in ordine a tutte le procedure relative all'appalto del "Servizio di monitoraggio del Piano". In particolare sono stati resi noti i tempi e le modalità della procedura di gara ad evidenza pubblica in ambito CEE, in relazione alla quale, in data 29 settembre si era ormai giunti alla conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice - all'uopo nominata dal Ministro dei lavori pubblici - , con l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultata essere quella presentata dall'ATI fra Italconsult, S.p.A., SIM - Società Italiana per il Monitoraggio S.p.A. e Infraplan S.A..

1.4. La quarta relazione (1° ottobre – 31 dicembre 1997)

La relazione relativa a tale periodo fa riferimento al D.M. 22 dicembre 1997 con il quale, tra l'altro:

- sono state recepite le modifiche ed integrazioni che la Commissione ha apportato al Piano, nel quadro della propria attività di programmazione ed indirizzo, ed in particolare è stato inserito nel Piano, con codice D.08.03, l'intervento avente per oggetto le "Interconnessioni tra il parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna", con un finanziamento di 11.950 milioni;
- si è stabilito l'obbligo per i soggetti beneficiari dei finanziamenti di comunicare tempestivamente alla Commissione la data relativa all'intervenuta aggiudicazione dei lavori;
- si è altresì stabilito l'obbligo, in capo al soggetto beneficiario del finanziamento, ovvero, al Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio nella qualità di stazione appaltante, di comunicare all'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, al momento dell'intervenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'importo dei lavori a base d'asta, nonché il valore assoluto e il valore percentuale del ribasso d'asta intervenuto.

La Relazione dava inoltre notizia dell'avvenuto scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, di cui al comma 13, art. 1, della legge n. 651/96, concernente le modalità di

attuazione dell'intervento relativo al parcheggio da realizzarsi sul Gianicolo in area extraterritoriale (tale argomento è comunque più diffusamente trattato al punto 1.4 della presente Relazione).

In ordine allo stato di avanzamento della fase realizzativa del Piano, la Relazione riportava il seguente prospetto relativo agli impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie aggiornato al 31 dicembre 1997:

Impegni	Lit. 534.949.437.700
Trasferimenti al Ministero BB.CC.AA.	Lit. 331.813.500.000
Trasferimenti al Ministero degli Interni	Lit. 50.000.000.000

per un totale di Lit. 916.762.937.700 di cui Lit. 646.539.703.400 trasferite anche in termini di cassa. Gli impegni assunti si riferivano a 193 interventi, vuoi per anticipi per le attività progettuali (circa 76 miliardi), vuoi per anticipazioni su lavori o forniture già appaltate (circa 358 miliardi).

Il trasferimento al Ministero per i beni Culturali e Ambientali era riferito all'avvio di tutti gli interventi di competenza ricompresi nel Piano. Il trasferimento al Ministero degli Interni era riferito agli interventi in materia di sicurezza.

Alla fine del trimestre in questione sono intervenuti altresì due fatti significativi ai fini del controllo e della gestione del Piano del Giubileo ed di tutte le attività ad esso comunque connesse.

Il primo concerne la stipula del contratto di appalto relativo al "Servizio di monitoraggio del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000", appalto affidato in data 18 dicembre 1997 alla già citata ATI fra le Soc. Italconsult, SIM - Società Italiana per il Monitoraggio e Infraplan, per un importo contrattuale di Lit. 4.019.037.400 (IVA esclusa).

Con tale atto ha preso così avvio quella importante attività di verifica e controllo dell'avanzamento del Piano prevista dalla legge n.651/96 - alla quale è dedicata una apposita sezione della presente Relazione -, che si è affiancata a quella già esercitata dalla Commissione, dal Ministro dei lavori pubblici, dalla BEI, dall'U.R.C.G.E., nonché da tutti gli altri soggetti a diverso titolo coinvolti nella realizzazione del Piano.

Il secondo riguarda la "Nomina del Sindaco di Roma a commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 nell'ambito del territorio comunale di Roma" avvenuta con DPCM in data 31 dicembre 1997.

Con tale provvedimento al Sindaco di Roma - affiancato da un Comitato di coordinamento composto di quindici membri e costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un nucleo di esperti in numero massimo di cinque - è stato affidato, con mandato fino al giugno 2001, il compito di coordinare i soggetti titolari di interventi localizzati nel Comune di Roma al fine di:

- formulare al Ministro competente per delega, proposte di rimodulazione del Piano, anche in ordine alla priorità delle iniziative da assumersi, nonché alle possibili intese con altre amministrazioni, per le attività ed i servizi di loro competenza;

- proporre misure organizzative e procedurali tese alla tempestiva realizzazione di tutti gli adempimenti per il Giubileo;
- coordinare le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi, segnatamente nelle aree delle basiliche e nel centro della città;
- assicurare il coordinamento operativo tra i cantieri inclusi nel Piano e quelli comunque realizzati benché non ricompresi nello stesso;
- armonizzare le esigenze operative dei cantieri con quelle della comunità locale, con riferimento sia ai problemi del funzionamento dei servizi a rete ed alla persona, che a quelli relativi alla sicurezza e salubrità ambientale, nonché alla informazione ed alla trasparenza delle procedure;
- coordinare le attività previste dal “piano dell’accoglienza”, anche in riferimento al programma delle manifestazioni e delle iniziative concomitanti ;
- assicurare l’attuazione delle indicazioni della Commissione mista fra lo Stato Italiano e la Santa Sede.

Per il raggiungimento dei fini anzidetti, al Commissario Straordinario è stato conferito il potere di impartire, alle amministrazioni competenti, direttive ed indicazioni operative, e di ottenere dalle stesse tutte le informazioni e la documentazioni ritenute utili all’espletamento del mandato.

Al Commissario è stato altresì attribuito il compito di promuovere la convocazione di conferenze di servizi, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127, nonché quello di riferire periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, *“sull’andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolano la proficua attuazione”*.

1.5. La quinta relazione (1° gennaio – 31 dicembre 1998)

Nel corso del 1998 la Commissione per Roma Capitale ha proceduto ad una sempre più incisiva azione di modifica ed integrazione del Piano, in modo da renderlo più aderente alle necessità emergenti dall’aggiornamento dei programmi delle varie Amministrazioni o degli altri soggetti beneficiari dei finanziamenti, in ordine all’accertamento della concreta fattibilità di talune opere anche per sopravvenute esigenze non previste in precedenza. L’attività di rimodulazione del Piano, soprattutto per ciò che concerne il finanziamento di nuove iniziative o l’integrazione finanziaria di interventi già presenti nel Piano, si è resa possibile grazie alle risorse finanziarie rese disponibili sia dai definanziamenti parziali o totali di taluni interventi, sia dai ribassi d’asta intervenuti a seguito dell’aggiudicazione dei lavori o forniture che, con frequenza sempre crescente, passavano dalla fase relativa agli adempimenti amministrativi, a quella realizzativa.

In particolare occorre innanzitutto menzionare il definanziamento, provvedimento

adottato con apposito DM in data 5 febbraio 1998, dell'intervento relativo al Sottopasso di Castel Sant'Angelo (D.07.01) e l'inserimento nel Piano di un nuovo intervento denominato "Sottovia Lungotevere in Sassia" rubricato con codice D.07.02 e dotato di un'assegnazione finanziaria pari a Lit. 43,5 miliardi.

Il definanziamento del "Sottopasso" — un'opera particolarmente significativa per la sua rilevanza strategica nell'assetto della viabilità del più importante settore della città di Roma in occasione del Giubileo — è intervenuto a seguito del mancato raggiungimento dell'unanimità dei consensi in sede di conferenza dei servizi (19.12.1997), dovuto, fra l'altro, a perplessità emerse in ordine alla realizzabilità dell'opera nei tempi prescritti, anche in relazione agli ulteriori approfondimenti archeologici ed idrogeologici richiesti.

E' però con la seduta dell'11 marzo 1998 che la Commissione ha apportato un significativo ed incisivo insieme di modifiche ed integrazioni al Piano, recepito con D.M. in data 8 maggio 1998, pubblicato sulla G.U. n.150 del 30 giugno 1998. Con detto decreto si è provveduto:

- ad accogliere le richieste di proroga dei tempi programmati - lettere c) e d) - concernenti una serie di interventi per i quali tali slittamenti temporali erano compatibili con il completamento degli interventi stessi entro l'inizio dell'anno giubilare;
- a modificare il titolo del settore E del Piano da "Servizi speciali e formazione" in "Sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione", per renderlo congruente con l'effettiva tipologia di interventi in esso attualmente ricompresi;
- a definire puntualmente, sulla base degli approfondimenti programmatici e progettuali eseguiti dai soggetti attuatori, gli interventi - di valenza strategica in relazione alle celebrazioni giubilari - concernenti le aree delle Basiliche (S. Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano, Santa Croce in Gerusalemme, Santa Maria Maggiore, San Paolo Fuori le mura) che sono stati disaggregati, peraltro senza aumento di spesa, in interventi inerenti settori specifici ed attribuiti agli effettivi soggetti attuatori con i relativi finanziamenti;
- a definanziare totalmente o parzialmente cinque interventi (A01.08, A09.01, C01.17, C03.05, D.04.01) —per i quali e per i successivi si rinvia all'apposito paragrafo - in quanto giudicati non fattibili in tempo utile, per un totale di Lit. 97.250 milioni. Fra questi va segnalato quello relativo alla linea tranviaria Archeotram ed opere connesse;
- a definanziare inoltre (al netto dei trasferimenti già operati), su proposta del rispettivo soggetto beneficiario, per far fronte al finanziamento di interventi ritenuti di importanza strategica ai fini delle celebrazioni giubilari, undici opere, ancorché valutate fattibili (B01.01, B08.06., B12.01, B16.21, B16.22, B.16.23, C.01.08, C01.09, C.19.01/a1, D.02.01, D.03.01, per un totale di Lit. 196.478 milioni.

Ancora, per effetto degli approfondimenti programmatici e progettuali condotti dai rispettivi soggetti beneficiari, sono stati definanziati i seguenti interventi, A.07.02, C01.26, C07.01, D19.02; -E04.01 -E04.04, per un totale di Lit. 51.600 milioni.

E' stato altresì revocato il finanziamento relativo all'intervento A07.02 "Campeggio da realizzare nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario Garibaldi" per

Lit.321.100.000.

Si è provveduto anche al definanziamento parziale di alcuni interventi localizzati a Castel Gandolfo: C.04.01, C.04.02/A, C.04.02/B, C.04.03, C.04.04, per un totale di 11.050 milioni.

Quest'ultima decisione è scaturita a seguito dell'accertamento, avvenuto in sede di conferenza di servizi, della sussistenza di vincoli di tutela ambientale sulle aree interessate dagli interventi suddetti e dalla conseguente impossibilità di realizzare le opere proposte.

Si è inoltre accertato in circa 71 miliardi l'ammontare, immediatamente disponibile, dei ribassi d'asta conseguenti all'espletamento delle gare d'appalto già intervenute in relazione ad interventi ricompresi nel Piano.

La Commissione ha pertanto avuto a disposizione, fra definanziamenti e ribassi d'asta, una somma di circa 550 miliardi, pari ad un settimo dell'intero ammontare finanziario del Piano, da destinare a modifiche ed integrazioni al Piano stesso.

Tale considerevole somma è stata destinata, per circa 121 miliardi ad integrazioni finanziarie di interventi già ricompresi nel Piano e per circa 428 miliardi al finanziamento di 66 nuovi interventi, scelti nell'ambito dei settori ritenuti prioritari in relazione ai criteri di selezione già precedentemente stabiliti dalla Commissione stessa. Si segnalano in particolare 140 miliardi destinati a due interventi promossi dal Comune di Roma per "Incentivi per la manutenzione ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali"; 93 miliardi circa al Ministero dell'Interno e a quello della Difesa per 18 interventi riferiti alla realizzazione di strutture o di forniture o prestazioni di servizi inerenti problemi di "pubblica sicurezza" o "servizi speciali"; 50 miliardi sono poi stati destinati alle provincie di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina per interventi finalizzati al miglioramento della viabilità provinciale. Nell'elenco figurano inoltre sei interventi concernenti le Basiliche di S. Maria Maggiore, S. Giovanni in Laterano e S. Paolo fuori le Mura, per i quali, essendo gli immobili di proprietà della Santa Sede, si è reso necessario un ulteriore scambio di note.

Con il DM in data 15 maggio 1998 le modifiche ed integrazioni al Piano sono state limitate alla sola ridefinizione degli interventi relativi al Comune di Castel Gandolfo, mentre sono state introdotte importanti modifiche agli "Indirizzi di attuazione finanziaria del Piano". Queste ultime sono state deliberate dalla Commissione, anche al fine di snellire ulteriormente le procedure amministrative di natura finanziaria e ridurre i relativi tempi, in analogia a quelle previste in relazione alla legge n. 270/97 concernente il Piano degli interventi per il Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio. In particolare l'erogazione delle risorse occorrenti per la realizzazione dei lavori o delle forniture, una volta intervenuta l'aggiudicazione della gara d'appalto, è passata dal 20 al 50% delle risorse stesse.

Con il successivo DM in data 16 luglio 1998, la Commissione ha movimentato circa 150 miliardi, ripartendo tale somma in quanto a 42 miliardi circa in integrazioni

finanziarie di interventi già ricompresi nel Piano ed in quanto a 106 miliardi circa, in finanziamenti di 23 nuovi interventi, fra i quali circa 38 miliardi per tre interventi concernenti la Stazione Termini, 24 miliardi all'ATAC per una ulteriore fornitura di mezzi pubblici, nonché altri finanziamenti nel campo dei "servizi speciali" — sicurezza e sanità — ed uno di tre miliardi destinato alla definizione progettuale ed agli studi relativi alla "Area Grandi Eventi", individuata, dopo lunghe e difficili trattative, nell'ambito di Tor Vergata.

Nel Piano, ai sensi e per gli effetti del comma 6, art. 1, della legge n. 270/1997 — quella concernente il Piano degli interventi per il Giubileo in località al di fuori del Lazio — sono inoltre stati inseriti tre interventi proposti da soggetti privati, senza oneri a carico dello Stato ed ai soli fini di poter utilizzare le procedure acceleratorie richiamate dal citato testo di legge.

Al Decreto in questione è stata inoltre allegata, sub E, la "Normativa di riferimento per l'attuazione degli interventi inclusi nel Piano del Giubileo Lazio" che la Commissione ha definito, anche in questo caso in analogia con l'operato dalla Commissione preposta alla definizione del Piano per il Giubileo al di fuori del Lazio, per dissipare alcuni dubbi interpretativi circa l'applicazione della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, in merito ad interventi finanziati ai sensi della legge n. 651/96 e realizzati da enti ecclesiastici.

Con delibera n. 6 del 1 dicembre 1998, recepita con DM in data 7 gennaio 1999, la Commissione ha movimentato circa 179 miliardi, dei quali, circa 53 assegnati al finanziamento di 11 nuovi interventi e circa 109 ad integrazioni di interventi già presenti nel Piano. La Commissione ha stabilito, inoltre, di accantonare circa 13 miliardi quale fondo per fare fronte alla eventuale corresponsione di premi di accelerazione previsti negli atti di gara e nei relativi contratti, in favore degli esecutori di interventi compresi nel Piano, che ultimino i lavori in anticipo rispetto ai tempi contrattuali. La Commissione ha altresì individuato i settori o le tipologie di intervento, elencati in ordine di priorità, da finanziarsi con le future somme rivenienti dai ribassi d'asta.

Nel periodo in esame sono altresì state emanate tre direttive del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo del 2000

Con la n. 1 del 5 maggio 1998, il Commissario Straordinario ha impartito disposizioni e richiesto informative coerentemente con i compiti di coordinamento conferitigli in materia di Giubileo, ed ha altresì delineato la suddivisione delle competenze e le rispettive titolarità in ordine alle strutture chiamate a collaborare con l'Ufficio del Commissario stesso. Quest'ultimo Ufficio ha altresì, in attuazione della Direttiva. 1, impartito alcune disposizioni per disciplinare la "anticipazione dei lavori appaltati" ed il relativo "premio di accelerazione".

Con la Direttiva n. 2 del 18 maggio 1998, il Commissario ha posta in essere la nuova organizzazione finalizzata al coordinamento dei cantieri insistenti sul territorio del Comune di Roma ed articolata nel nuovo "Ufficio Centrale Temporaneo" e del già operante "Ufficio Speciale coordinamento cantieri".

Con la Direttiva n. 3 del 29 dicembre 1998, il Commissario ha provveduto ad individuare, nell'ambito delle attività afferenti al Piano dell'accoglienza, le seguenti aree

tematiche (settori) e le rispettive amministrazioni o enti incaricati della gestione dell'anno 2000:

Settore	Responsabile Istituzionale
Sicurezza	Prefettura di Roma
Grandi Eventi	Agenzia per il Giubileo
Protezione civile	Prefettura di Roma
Igiene Urbana	AMA
Sanità	Regione Lazio
Mobilità locale	Comune di Roma
Volontariato (parte italiana)	Agenzia per il Giubileo
Ricettività	Regione Lazio
Informazione di servizio	Agenzia per il Giubileo
Comunicazione locale	Agenzia per il Giubileo
Comunicazione ed informazione nazionale ed internazionale	Dipartimento per il Turismo
Sala Situazioni	Agenzia per il Giubileo
Coordinamento attività operative	Dipartimento per il Turismo
Giubileo Lazio ed Extra Lazio	

1.6. La sesta relazione (1° gennaio – 31 marzo 1999)

Nel corso del 1° trimestre 1999 non sono state effettuate riunioni della Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre Province del Lazio, di conseguenza dal 31 dicembre 1998 (*4° trimestre '98*) al 31 marzo 1999 (*1° trimestre '99*) il Piano degli interventi per il grande Giubileo del 2000 nel Lazio non ha subito alcuna modificazione nella struttura e nell'articolazione rispetto a quelle già rappresentate nella precedente relazione al Parlamento.

Si ritiene utile, comunque, riportare in sintesi la situazione strutturale al 31 marzo 1999.

Il Piano comprende ancora n. 754 interventi per un investimento complessivo di 3.652 miliardi a fronte di un onere totale a carico della Legge 651/96 di circa 3.471 miliardi e la ripartizione degli interventi, per numero e per entità finanziaria risulta così articolata:

Per Categorie

– N. 438	Lavori	per un importo di 2050,8 miliardi
– N. 90	Forniture	per un importo di 785,8 miliardi
– N. 209	Beni Culturali	per un importo di 323,0 miliardi
– N. 17	Incentivi	per un importo di 312,7 miliardi

Per settore

— N.	85	Sociale e accoglienza	per un importo di	300,4 miliardi
— N.	352	Beni culturali	per un importo di	557,3 miliardi
— N.	136	Manutenzione e arredo urbano	per un importo di	571,2 miliardi
— N.	63	Accessibilità e mobilità	per un importo di	1372,4 miliardi
— N.	104	Servizi speciali e formazione	per un importo di	489,7 miliardi
— N.	14	Informazione e preparazione evento	per un importo di	180,4 miliardi

Per localizzazione

— N.	499	Comune di Roma	per un importo di	2578 miliardi
— N.	141	Provincia di Roma	per un importo di	540,2 miliardi
— N.	29	Provincia di Frosinone	per un importo di	40,5 miliardi
— N.	32	Provincia di Latina	per un importo di	36,4 miliardi
— N.	20	Provincia di Rieti	per un importo di	41,3 miliardi
— N.	17	Provincia di Viterbo	per un importo di	33,7 miliardi
— N.	16	Senza riferimenti territoriali	per un importo di	201,2 miliardi

Per categorie di soggetti beneficiari

— N.	257	Amministrazioni centrali	per un importo di	1034,8 miliardi
— N.	62	Amm. regionali e Provinciali	per un importo di	389,9 miliardi
— N.	278	Amministrazioni comunali	per un importo di	851,9 miliardi
— N.	157	Altri soggetti	per un importo di	1194,8 miliardi

1.6.1. Lo stato di attuazione

Migliorata risulta, invece, la situazione sullo stato di attuazione a confronto con il trimestre precedente; infatti, nel corso degli ultimi tre mesi sono giunti a completamento circa 30 ulteriori interventi facendo così crescere il numero delle ultimazioni da 70 a 100.

Anche il numero degli interventi in fase di realizzazione è cresciuto dal 31 dicembre scorso ad oggi. La crescita è di sole 31 unità, passando gli interventi in cantiere dai 432 agli attuali 463, ma va tenuto conto che, sommando anche gli interventi conclusi, il numero degli interventi in fase di realizzazione, pari a 563, raggiunge il 74,67% del totale.

L'avanzamento medio nel processo attuativo è aumentato dal 62% al 70% , ma resta un ritardo medio di 104 giorni negli affidamenti rispetto alla programmazione iniziale, leggermente superiore a quello, di 100 giorni, registrato a dicembre '98.

Rispetto all'articolazione in «categorie», quella dei «Beni Culturali» risulta in più avanzato stato di attuazione, essendo quasi tutti gli interventi già appaltati, mentre nella categoria «lavori» solo l'81,5% è in cantiere rispetto al 99,7% programmato e nelle «forniture/incentivi» la percentuale scende al 66,2% rispetto al 98,2%.

Anche l'esame dello stato di attuazione, per «settori d'intervento», registra il valore più

alto di cantierizzazione nel settore dei «Beni Culturali» (N.B. che non coincide con la categoria Beni Culturali) pari al 90,34%, con 78 interventi interamente ultimati, seguono il settore della «accessibilità e mobilità» con il 76,19% e n. 7 interventi ultimati, quello del «sociale ed accoglienza» con il 75,29%, quello della «informazione e preparazione evento» con il 64,29%, quello della «manutenzione ed arredo urbano» con il 56,62% ed infine il settore dei «servizi speciali e formazione» con il 45,19%.

Rispetto all'articolazione del Piano per ambiti di «localizzazione», gli interventi in cantiere in provincia di Frosinone raggiungono il 96,55%, seguono la provincia di Rieti con il 95,00%, la provincia di Viterbo con il 94,11%, la provincia di Roma con l'86,53%, la provincia di Latina, il Comune di Roma con il 69,94% e con 78 interventi ultimati e, da ultimo, con il 25,00% gli interventi senza riferimento territoriale.

La categoria di «soggetti beneficiari», che registra il valore più alto di cantierizzazione è quella delle «Amministrazioni centrali» con 69 interventi interamente ultimati, seguono la categoria delle «Amministrazioni regionali e Provinciali» con il 72,58 % ma con 2 soli interventi ultimati, le «Amministrazioni comunali» con il 72,31% e con 16 interventi ultimati ed infine, gli «Altri soggetti» con il 56,69% e 13 ultimazioni.

1.6.2. Valutazione del rischio di ritardo finale

Con riferimento alle date di completamento programmate, si osserva un notevole «affollamento» di interventi che si troveranno in fase di esecuzione nell'ultimo trimestre del '99. Questo fenomeno, già segnalato in precedenza, comporta che solo il 66% degli interventi, per un importo equivalente all'84% del totale del Piano terminerà, presumibilmente e secondo i programmi aggiornati, tra ottobre e dicembre '99. Ciò fa aumentare il rischio di possibile superamento, per alcuni di essi della data di inizio del Giubileo; la contemporaneità di tanti cantieri, potrebbe, infatti, avere un impatto crescente sulla città di Roma ed implicare ulteriori difficoltà operative.

La valutazione di rischio di ritardo finale¹⁾ fornisce il seguente quadro nel quale gli importi indicati sono riferiti ai finanziamenti ex Legge 651/96:

- | | | | | |
|-------------------|--------|--------------------------|---------------|-------|
| – «Alto rischio» | n. 75 | per un importo totale di | 1157 miliardi | (36%) |
| – «Medio rischio» | n. 248 | per un importo totale di | 1131 miliardi | (35%) |
| – «Basso rischio» | n. 288 | per un importo totale di | 648 miliardi | (20%) |

1) *Si ricorda che gli interventi ad alto rischio sono quelli la cui data di completamento è a ridosso delle scadenze giubilari, che hanno accumulato sensibilmente ritardo e che, tenuto conto delle problematiche d'attuazione/esecuzione, mostrano un alto rischio di non completamento entro i termini giubilari, anche alla luce di quanto realizzato negli ultimi mesi. Gli interventi a rischio nullo sono quelli la cui fase esecutiva è già stata completata.*

Gli altri interventi, valutati a medio e basso rischio, sono quelli per i quali non è individuabile, alla data attuale, un rischio particolare che ne possa impedire il completamento entro la scadenza giubilare. Tuttavia, i primi (a medio rischio) per dimensione, complessità e programmi d'esecuzione non presentano margini di sicurezza tali da permettere il recupero di ritardi dovuti ad imprevisti. Margini che invece esistono per gli interventi considerati a basso rischio.

- «Rischio nullo» n. 103 per un importo totale di 288 miliardi (9%)

Rispetto alla valutazione di dicembre '98 il numero di interventi ad alto rischio è aumentato (da 52 a 75) e così anche l'importo totale (aumentato da 978 a 1157 miliardi).

I 75 interventi giudicati ad alto rischio, sono così ripartiti tra le categorie:

	totale	lavori	beni culturali	forniture	incentivi
- non appaltati	32	25	/	6	1
- appaltati	43	37	2	2	2

1.6.3. Considerazioni complessive

Alcune considerazioni basate sui risultati emersi dal monitoraggio effettuato nel trimestre, sono esposte di seguito:

- in termini generali l'attuazione del Piano registra un discreto progresso rispetto al trimestre precedente raggiungendo il 70% dell'avanzamento globale; tuttavia, rispetto alla programmazione iniziale, che indicava la quasi totalità degli interventi in fase di esecuzione entro il 31 marzo, l'obiettivo è stato raggiunto solamente dal 64% degli interventi; quindi oltre un terzo degli interventi registra un ritardo rispetto al cronoprogramma;
- due fattori possono aver contribuito a frenare l'avanzamento del Piano:
 - a) il maltempo, che nel 1° trimestre '99 ha certamente avuto un effetto negativo su alcuni cantieri;
 - b) l'entrata in vigore di nuove procedure di affidamento degli appalti, che ha provocato di fatto un allungamento nei tempi di affidamento, anche per le necessità di adeguare bandi e capitolati alle nuove regole;
- gli interventi valutati ad «alto rischio» sono aumentati rispetto al trimestre precedente, in quanto alcuni di questi, precedentemente valutati a «medio rischio», sono passati nel livello superiore di rischio per non avere mostrato progressi significativi nel trimestre, viceversa solo un esiguo numero di interventi è progredito tanto da scendere da alto a «medio rischio». Inoltre sono entrati nel livello di «alto rischio» interventi di recente inserimento nel Piano;
- restano ad «alto rischio» alcuni degli interventi dimensionalmente più significativi sulle infrastrutture di trasporto (n.8 per un importo totale di circa 507 miliardi) in ragione della loro complessità esecutiva e/o dei ritardi di esecuzione osservati. E' opportuno però segnalare che 2 di questi:
 - a) il «Sottovia di Lungotevere in Sassia»;
 - b) le «Interconnessioni al parcheggio del Gianicolo»;hanno mostrato significativi progressi, pur dovendo ancora recuperare molto ritardo; mentre si è ulteriormente incrementato il ritardo dei lavori relativi a:
 - a) «Autostrada Roma – Fiumicino» - 2° lotto;
 - b) «Stazione Tiburtina»;

- c) «Passante ferroviario dei Laghi»;
- d) «Porto di Civitavecchia»;
 - inoltre i 2 interventi della «metropolitana “A”» hanno tempi di esecuzione molto compressi e data di completamento a ridosso delle scadenze giubilari;
 - la «Galleria P.A.S.A.», precedentemente valutata ad «alto rischio», a fronte di un notevole recupero del ritardo e del completamento delle attività di cantiere più critiche, viene ora valutata a «medio rischio»;
 - vanno anche segnalati diversi interventi di dimensione media (tra 10 e 30 miliardi) valutati ad «alto rischio», tra questi:
- a) n. 5 interventi del «Ministero dell'Interno» e dei «Carabinieri»;
- b) n. 5 strade della «Provincia di Roma»;
- c) n. 1 intervento affidato alla «STA» per la realizzazione di un «sistema automatico di controllo degli accessi al centro storico»;
- d) n. 3 interventi consistenti in «incentivi per l'edilizia», «incentivi per le attività alberghiere» ed «incentivi per le attività extra-alberghiere»;
- e) «ospedale Sant'Eugenio»;
- f) «ospedale Agostino Gemelli»;
- g) la «riqualificazione dell'Appia Antica», per il quale i lavori del 2° lotto sono stati sospesi;
 - tra gli interventi valutati ad «alto rischio» è evidente che quelli di elevato importo hanno maggiori difficoltà di recupero del ritardo rispetto a quelli, più numerosi, di importo ridotto;
 - in generale gli interventi di dimensione ridotta e quelli dei Beni Culturali procedono bene.

In conclusione, si può prendere atto che il miglioramento registrato nell'ultimo trimestre, nella realizzazione di alcuni grandi interventi strategici di «viabilità nell'area di S. Pietro» è stato ottenuto anche a seguito del rafforzamento del management dei relativi cantieri.

Analogo rafforzamento è auspicabile per altri grandi interventi ad «alto rischio», in corso di esecuzione, finalizzato ad ottenere una più alta produttività da parte delle imprese senza che ciò vada a scapito di qualità e sicurezza nell'esecuzione delle opere.

1.6.4. Situazione finanziaria

Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie

Situazione al 31 dicembre 1998:

- impegni assunti	L. 1.083.456.318.309
- variazioni di bilancio	L. 381.609.500.000

- Totale risorse attivate	L.	1.456.065.818.309
- pagamenti effettuati	L.	503.826.983.578
- variazioni di bilancio	L.	381.609.500.000
- Totale risorse trasferite	L.	884.836.483.578

Situazione al 31 marzo 1999:

- impegni assunti	L.	1.479.440.332.132
- variazioni di bilancio	L.	381.609.500.000
- Totale risorse attivate	L.	1.861.049.832.132
- pagamenti effettuati	L.	997.963.805.282
- variazioni di bilancio	L.	381.609.500.000
- Totale risorse trasferite	L.	1.379.573.305.282

in dettaglio al 31 marzo 1999:

Settore «A»

- impegni assunti	L.	184.176.165.898
- pagamenti effettuati	L.	157.160.122.968

Settore «B»

- impegni assunti	L.	125.488.521.687
- pagamenti effettuati	L.	57.954.434.675

Settore «C»

- impegni assunti	L.	260.035.921.643
- pagamenti effettuati	L.	195.280.166.635

Settore «D»

- impegni assunti	L.	709.555.487.357
- pagamenti effettuati	L.	452.234.134.763

Settore «E»

- impegni assunti	L.	118.300.538.764
- pagamenti effettuati	L.	80.751.498.920

Settore «F»

- impegni assunti	L.	81.883.696.783
- pagamenti effettuati	L.	54.583.447.321

Pertanto le variazioni sulle singole voci, rispetto al 31 dicembre 1998 sono le seguenti:

- maggiori impegni assunti	L.	395.984.013.823
----------------------------	----	-----------------

-	variazioni di bilancio	L.	0
-	Differenza sul tot. risorse attivate	L.	395.984.013.823
-	ulteriori pagamenti effettuati	L.	494.136.821.704
-	variazioni di bilancio	L.	0
-	Differenza sul tot. risorse trasf.	L.	494.136.821.704

2. SETTIMA RELAZIONE

2.1. La settima relazione (1° aprile 1999 - 30 settembre 1999)

La presente relazione prende in esame il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999. Nel corso di tale semestre la Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre province del Lazio, si è riunita due volte: il 27 aprile 1999 ed il 22 luglio 1999.

Da tali riunioni sono scaturiti i decreti del Ministro dei Lavori pubblici delegato per Roma Capitale e Giubileo del 19 maggio e del 5 agosto 1999.

Con il D.M. 19 maggio 1999 sono state apportate modifiche al Piano degli interventi per il Giubileo che si sostanziano:

nell'accertamento di maggiori disponibilità finanziarie rivenienti dall'approvazione dei quadri tecnici economici e dall'espletamento di gare d'appalto;

nel definanziamento totale dei seguenti interventi:

B.12.23 - "Completamento dei lavori di restauro e rifacimento dei prospetti, revisione dei tetti e lavori interni" del Palazzo Sciarra in via della Stamperia per un ammontare di £ 1.500.000.000;

C.02.02.2.3 - "MER: Progetto di riqualificazione ambientale di via Merulana ed aree limitrofe nell'area della Basilica di San Giovanni", per un ammontare di £ 4.943.262.000;

D.05.01/8 - "Fornitura materiale rotabile ferrovia Roma Pantano", per un ammontare di £ 12.200.000.000;

E.02.19 - "Programma di potenziamento dell'Ospedale di S. Carlo di Nancy", per un ammontare di £ 3.000.000.000;

- nel definanziamento parziale dei seguenti interventi:

A.06.02 - "Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (IPAB e IACP) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati", il cui stanziamento è ridotto da £ 20.800.000.000 a £ 14.426.364.000, con un'economia pari a £ 6.373.636.000;

C.03.06 - "Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali - 1° stralcio", il cui stanziamento è ridotto da £ 112.500.000.000 a £ 92.000.000.000, con un'economia pari a £ 20.500.000.000, che d'intesa col comune di Roma restano nelle sue disponibilità per l'intervento D.23.02;

C.1.30 - “Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche relative ai lavori ATAC e sedi stradali adiacenti”, il cui stanziamento è ridotto da £ 5.000.000.000 a £ 2.947.589.621 con un’economia pari a £ 2.052.410.379;

C.11.1/1 - “Area archeologica del Celio. Via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali - interventi di restauro e manutenzione”, il cui stanziamento è ridotto da £. 1.000.000.000 a £ 117.135.000, con un’economia immediata pari a £ 882.865.000 e fatta salva la maggior somma che potrà risultare all’esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

C.12.01 - “Villa Doria Pamphili (Roma). Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via olimpica” il cui stanziamento è ridotto da £ 4.600.000.000 a £ 3.300.000.000, con un’economia immediata pari a £ 1.300.000.000;

C.18.04 - “Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma). Interventi di riqualificazione”, il cui stanziamento è ridotto da £. 1.200.000.000 a £ 900.000.000, con un’economia immediata pari a £ 300.000.000;

C.02.01.1.1 - “BOR”: Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree limitrofe nell’area della Basilica di S. Pietro in Vaticano”, il cui stanziamento è ridotto da £ 5.347.538.000 a £ 4.005.117.306, con un’economia immediata pari a £ 1.342.420.694;

C.02.01.1.3 - “CON”: Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell’area della Basilica di S. Pietro in Vaticano”, il cui stanziamento è ridotto da £ 4.583.604.000 a £ 2.687.121.194, con un’economia immediata pari a £ 1.896.482.806;

D.14.03 - “ S.P. Laurentina (Roma) dal GRA fino al Km 19.500. Opere di adeguamento e manutenzione straordinaria”, il cui stanziamento è ridotto da £ 15.000.000.000 a £ 1.800.000.000, con un’economia immediata pari a £ 13.200.000.000 e fatta salva la maggior somma che potrà risultare all’esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

E.01.11 - “Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza”, il cui stanziamento è ridotto da £ 2.500.000.000 a £ 125.000.000, con un’economia immediata pari a £ 2.375.000.000 e fatta salva la maggior somma che potrà risultare all’esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

E.02.03 - “Complesso ospedaliero S. Eugenio /C.T.O. (Roma). Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)”, il cui stanziamento è ridotto da £ 30.000.000.000 a £ 24.000.000.000, con un’economia immediata pari a £ 6.000.000.000;

E.02.14 - “Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio). Potenziamento e informatizzazione”, il cui stanziamento è ridotto da £ 7.140.000.000 a £ 5.000.000.000, con un’economia immediata pari a £ 2.140.000.000, che d’intesa con la Regione Lazio restano nelle sue disponibilità per l’intervento E.04.03;

- nell'avvio della procedura di contestazione a fini di definanziamento per gli interventi per i quali risultano inutilmente spirati i termini temporali fissati dal Piano;
- nell'approvazione delle richieste di taluni differimenti dei termini ritenuti compatibili con le scadenze giubilari;
- nell'inclusione nel Piano di taluni interventi coerenti con le priorità già precedentemente stabilite dalla Commissione;
- in talune modifiche degli indirizzi per l'attuazione finanziaria intese a precisare gli aspetti concernenti gli oneri di progettazione ed altre procedure per il trasferimento dei fondi ai soggetti beneficiari del finanziamento.

Con il D.M. che ha recepito la deliberazione n. 2/99 del 29 luglio 1999, sono state apportate ulteriori modifiche al Piano degli interventi che si sostanziano:

- nel definanziamento totale dei seguenti interventi:

A 07.03 concernente la realizzazione del campeggio nell'area circostante l'ex ospedale psichiatrico S. Maria della Pietà, non essendo ancora intervenuto il necessario accordo di programma ai fini della realizzazione dell'opera, con recupero di L. 676.000.000;

D05.01/6, concernente la fornitura dell'equipaggiamento di chopper per motrici della linea metro A, con recupero di L. 7.891.000.000, a causa dell'impossibilità di assicurare la fornitura in tempi compatibili con le esigenze giubilari;

- nel definanziamento parziale dell'intervento A.07.07/A, relativo al Centro di accoglienza turistica del Comune di Frascati per un ammontare di L. 1.738.500.000, fatta salva la maggior somma che potrà risultare all'esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;
- nell'avvio della procedura di contestazione a fini di definanziamento per gli interventi per i quali risultano inutilmente spirati i termini temporali fissati dal Piano;
- nell'approvazione delle richieste di taluni differimenti dei termini ritenuti compatibili con le scadenze giubilari;
- nell'approvazione delle richieste di integrazione di finanziamento per taluni interventi ritenuti prioritari;
- nell'inclusione nel Piano di ulteriori interventi ritenuti prioritari sulla base di ulteriori esigenze strategiche di armonizzazione;
- in un autovincolo per la destinazione di ulteriori risorse che si rendessero disponibili sulla base di successivi definanziamenti.

2.2. Lo stato di attuazione del Piano

Al 30 settembre 1999 il Piano conta 801 interventi attivi per un costo complessivo di 3.666 miliardi di lire ed un finanziamento accordato di 3.482,4 miliardi di lire. Gli originari 831 interventi si sono ridotti all'attuale ammontare per effetto del definanziamento di 30 iniziative, delle quali solo 17 continuano a figurare nel Piano con residue assegnazioni finanziarie per un ammontare complessivo di £ 17.351 milioni.

Nell'ambito degli 801 interventi del Piano sono ricompresi anche 3 interventi di titolarità privata, senza quindi assegnazioni finanziarie e l'intervento relativo al monitoraggio che prevede uno stanziamento pari a 6 miliardi di lire. Lo stato di attuazione finanziaria ricomprende dunque tutti gli interventi attivi e non inclusi nel Piano, mentre i dati di monitoraggio sono riferiti solo a 769 interventi, con esclusione di talune iniziative di recente inclusione nel Piano medesimo - pertanto non ancora monitorate - e di tutti quegli interventi che, per loro natura, o in quanto localizzati in area extraterritoriale, non risultano monitorabili.

I principali beneficiari sono:

- | | | |
|-------------------------------|-----|----------------------------|
| - il Comune di Roma | con | 148 interventi per 706 mld |
| - l'ATAC/COTRAL | con | 11 interventi per 378 mld |
| - il Ministero dei BB.CC.AA. | con | 209 interventi per 380 mld |
| - le FS e società controllate | con | 12 interventi per 332 mld |
| - la Regione Lazio | con | 16 interventi per 209 mld |

Lo stato di attuazione, sulla base del rapporto del monitore relativo a 769 interventi attiene a:

- | | |
|-----|---|
| 467 | di Categoria Lavori per un importo totale di 2051 mld; |
| 84 | di Categoria Forniture per un importo totale di 741 mld; |
| 209 | di Categoria Beni Culturali per un importo totale di 380 mld; |
| 9 | di Categoria Incentivi per un importo totale di 253 mld. |

L'avanzamento fisico globale degli interventi risulta di circa 60%, rispetto al 68% originariamente programmato.

Sulla base del rapporto di monitoraggio 185 interventi risultano (al 30 settembre 1999) completati.

- Gli interventi di categoria lavori risultano completati limitatamente all'11%, mentre era programmato il 74%; per la categoria beni culturali sono completati il 44% contro il 45,7% programmato; per la categoria fornitura/incentivi risultano completati il 20% contro l'83% programmato.
- Risultano non ancora appaltati 45 interventi tra i quali:
 - 11 con data di completamento nell'anno 2000
 - 7 giudicati non completabili
 - 10 forniture con ridotti tempi di attuazione
 - 11 con affidamento imminente
- L'avanzamento nel processo attuativo è in media del 83%, con un ritardo medio di 106 giorni negli affidamenti e un margine medio di tempo tra il completamento previsto e inizio Giubileo di 83 giorni.
- il 24,4% degli interventi, pari al 14% dell'importo totale risulta completato;
- il 56% degli interventi (59% in valore) è giudicato completabile senza particolari difficoltà;
- il 17,5% degli interventi è giudicato completabile a condizione che vengono messe in atto azioni di accelerazione, stralci funzionali o proroghe; in valore la percentuale sale al 25,9% in quanto comprende interventi di importo elevato;
- meno del 2% degli interventi (meno dell'1% in valore) è giudicato non completabile.
- i 14 interventi giudicati non completabili ricadono tutti nella categoria lavori, eccetto uno nella categoria incentivi;
- la categoria Beni Culturali ha la più alta percentuale di interventi completati (47%) e la più bassa di interventi completabili con condizioni (12%);
- le categorie Lavori e Forniture hanno le più alte percentuali di interventi completabili (62% e 58%);

- per quanto riguarda l'analisi per beneficiari principali o settori si osserva che quelli che evidenziano una minore incidenza di interventi già completati o completabili sono la Regione Lazio, i Trasporti, la Sanità e l'AMA.

Si rileva:

- un sensibile aumento a settembre '99 del numero degli interventi appaltati, in realizzazione e completati, e di conseguenza un sensibile incremento dell'avanzamento medio;
- il numero degli interventi non appaltati si è progressivamente ridotto fino a 45.

2.3. La situazione finanziaria

2.3.1. Situazione al 30 settembre 1999.

Il Piano è stato più volte modificato ed integrato dalla Commissione per Roma Capitale che, come si è già detto, ha deliberato di aumentare o ridurre, anche per l'intero importo, le assegnazioni finanziarie destinate alla realizzazione dei singoli interventi, ovvero ha finanziato nuove iniziative. Tali determinazioni hanno prodotto nei settori di intervento individuati della legge 651/96, significative variazioni finanziarie e strutturali di cui si è già detto precedentemente.

La situazione finanziaria del Piano al 30 settembre 1999, sia in merito alla ripartizione dei finanziamenti fra i settori che per ciò che concerne impegni e pagamenti è quella riassunta nella seguente tabella:

PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000						
INDICATORI FINANZIARI						
Suddivisione per settori – Situazione al 30/09/1999						
Settori	Numero Interventi	Situazione delle Assegnazioni al 18/09/1996	Situazione delle Assegnazioni al 30/09/1999	Impegni e trasferimenti	Impegni / assegnazioni	Pagamenti
		milioni	Milioni	milioni	%	milioni
Settore A - Sociale e accoglienza	88	330.800	281.999	230.136	81,6088	191.060
Settore B - Beni culturali	359	560.200	572.350	493.068	85,35756	419.571
Settore C – Manutenzione, arredo urbano, Patrimonio ambientale	136	568.250	508.990	380.095	74,67632	292.706
Settore D – Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana	91	1.625.750	1.456.397	895.250	61,47019	612.826
Settore E - Servizi speciali e formazione	109	330.000	489.447	351.980	71,91381	283.114
Settore F – Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento	14	85.000	167.230	97.920	58,55408	71.490
Monitoraggio interventi	1	-	6.000	-	-	-
Somme accantonate	-	-	235	-	-	-
Somme erogate per interventi successivamente definanziati	17	-	17.351	-	-	-
TOTALE	818	3.500.000	3.500.000	2.448.449	69,95568	1.870.767

Le significative modifiche apportate con D.M. del 15 maggio 1998 agli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano (Allegato A del DPCM del 1 dicembre 1996) sono state, con D.M. del 19 maggio 1999, ulteriormente variate ed integrate attraverso la previsione di una puntuale indicazione della documentazione da allegare al momento della richiesta d'erogazione finanziaria dell'ulteriore 35% dell'impegno già assunto all'atto dell'inizio dei lavori a fronte del quale era già stato corrisposto il 50% dell'importo impegnato.

Sono state integrate le modalità di erogazione dell'ulteriore somma residua fino alla concorrenza dell'intero impegno assunto, attraverso la previsione di apposita certificazione del rappresentante legale con la quale dichiarare la conclusione delle procedure di collaudo o di regolare esecuzione. E' stato inoltre ribadito che le somme non utilizzate per la realizzazione dell'intervento debbono essere versate in conto entrate Capo XXX Presidenza del Consiglio dei Ministri per la conseguente riassegnazione al competente Capitolo di bilancio.

In proposito risultano già effettuati versamenti all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo complessivo di £ 28.530.614.976 ed è stata avviata la procedura per la riassegnazione al Cap. 7901 UPB 19 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come previsto dal comma 2 bis dell'art. 2 della legge n. 651 del 1996. L'importo versato si riferisce per £ 28.480.614.976 all'intervento rubricato D.07.01, relativo al sottopasso di Castel Sant'Angelo, defanziato nell'anno 1998.

2.3.2. Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie

Fino al 30 settembre 1999 sono stati:

- assunti impegni per	Lit. 1.927.623.508.749
- trasferiti al Ministero BB.CC.AA.	Lit. 331.813.500.000
- trasferiti al Ministero dell'Interno	Lit. 136.007.029.000
- trasferiti al Ministero LL. PP.	Lit. 43.210.300.000
- trasferiti al Ministero della Difesa	Lit. 3.495.000.000
- trasferiti al Ministero dei Trasporti	Lit. 6.300.000.000

- TOTALE DELLE RISORSE ATTIVATE Lit. 2.448.449.337.749

- effettuati pagamenti per	Lit. 1.364.367.812.517
- trasferiti al Ministero BB.CC.AA.	Lit. 331.813.500.000
- trasferiti al Ministero dell'Interno	Lit. 136.007.029.000
- trasferiti al Ministero LL. PP.	Lit. 43.210.300.000
- trasferiti al Ministero della Difesa	Lit. 3.495.000.000
- trasferiti al Ministero dei Trasporti	Lit. 6.300.000.000

- TOTALE DELLE RISORSE TRASFERITE Lit. 1.870.767.277.517

Le erogazioni rappresentano il 76,89% delle risorse impegnate.

Gli impegni assunti, per Lit. 1.927.623.508.749, si riferiscono al finanziamento di n. 681 interventi e più precisamente:

- risultano emessi n. 265 decreti di impegno pari al 5% dell'importo dell'assegnazione finanziaria del singolo intervento, per consentire al soggetto beneficiario di provvedere alla progettazione dell'intervento per un complessivo importo di Lit. 95.718.267.588. Contestualmente si è provveduto ad emettere le relative autorizzazioni di pagamento ed i titoli di spesa;
- sono stati emessi n. 390 Decreti di impegno per l'importo di Lit. 1.831.905.241.161 ai fini della realizzazione degli interventi, ed emessi circa n. 1.200 autorizzazioni di pagamento e relativi titoli di spesa per l'erogazione di anticipazioni nella misura iniziale del 20% o del 50% e successivamente fino alla concorrenza dell'85% degli impegni sopracitati. Delle predette anticipazioni Lit. 1.140.531.279.329 si riferiscono a lavori e Lit. 127.411.790.600 riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi;

- in unica soluzione sono state trasferite risorse alla Regione Lazio ai fini dell'accoglienza per Lit. 109.196.230.000 ed ai fini della valorizzazione delle risorse umane, emergenza sanitaria e sicurezza sul lavoro, Lit. 57.166.364.000.

Il trasferimento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pari a Lit. 331.813.500.000, si riferisce all'avvio della realizzazione di 204 interventi di competenza del Ministero compresi nel Piano.

La somma di 136 miliardi trasferita al Ministero degli Interni si riferisce a n. 24 interventi in materia di sicurezza.

Viene di seguito riportato lo stato di attuazione finanziaria del Piano aggiornato al mese di novembre 1999.

ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PIANO

Aggiornata al 30 novembre 1999

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROIEZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
codice MP ampa	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al	IMPEGNI DI SPESA
A 01 02	Centro di accoglienza per giovani tossicodipendenti (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	212.000.000	212.000.000	10.600.000		10.600.000		
A 01 03	Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravidanza (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	212.000.000	212.000.000	10.600.000		10.600.000		
A 01 04	Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili	IPAB "S. Margherita" - Roma	6.883.860.477	6.883.860.477	350.000.000		350.000.000		5.371.860.480
A 01 05	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma). nell'edificio "S. Giuseppe Doris"	IPAB "S. Francesco Romana" - Roma	1.410.572.960	1.410.572.960					1.410.572.960
A 01 06	Comunità alloggio per disabili (Roma). Ristrutturazione di un immobile a Vigne Nuove	Comune di Roma	1.100.686.824	1.100.686.824	50.000.000	10.000.000		40.000.000	1.050.686.820
A 01 07	Centro di accoglienza temporanea per extracomunitari (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di proprietà comunale.	Comune di Roma	3.769.918.699	3.769.918.699					3.769.918.696
A 01 08	Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro Massimina)	Comune di Roma		50.000.000	50.000.000	10.000.000		40.000.000	
A 01 10	Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma). Ristrutturazione di un immobile del comune di in località Passoscuro	Comune di Fiumicino	477.290.585	477.290.585	30.000.000		30.000.000		360.964.380
A 01 11	Piano di accessibilità e trasporto per disabili (Roma). Istituzione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche	ATAC	10.995.000.000	10.995.000.000					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 01 12	Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio	Provincia di Roma	1.218.535.800	1.218.535.800	30.060.000	15.030.000		15.030.000	1.188.475.800
A 01 13	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiuricino/Roma). Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	Comune di Fiuricino	2.307.591.179	2.307.591.179	125.000.000		125.000.000		
A 01 14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	1.553.221.730	1.553.221.730	30.760.000		30.760.000		1.040.357.430
A 01 15	Casa famiglia per l'infanzia abbandonata (Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente	Comune di Monterotondo	175.715.700	175.715.700					175.715.700
A 01 16	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma). Recupero ex scuola elementare in disuso	Comune di Rocca Canterano	682.393.173	682.393.173	37.500.000		37.500.000		596.093.173
A 01 17	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disagiate (Civitavecchia/Roma). Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in località Pantano	Comune di Civitavecchia	1.770.125.502	1.770.125.502	162.250.000	32.450.000		129.800.000	1.147.875.502
A 01 18	Centro di accoglienza residenziale per anziani (Anzio/Roma). Ristrutturazione dell'edificio	Comune di Anzio	160.250.000	160.250.000					121.563.028
A 01 19	Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale	Provincia di Roma	1.165.065.800	1.165.065.800	28.320.000	14.160.000		14.160.000	1.136.745.800

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
594.237.900			415.966.530						1.218.535.800
									125.000.000
520.178.720									1.071.117.430
87.857.830			61.500.495						175.715.700
119.218.630	178.827.950		208.632.610						633.593.173
573.937.750			401.756.420						1.310.125.502
60.781.510									121.563.028
568.372.900			397.861.030						1.165.065.800

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 01 21	Ospedale israelitico ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma) Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola	Comune di Roma	4.423.885.189	4.423.885.189	275.000.000	55.000.000		220.000.000	4.148.885.190
A 01 22	Segnalatori acustici per non vedenti	ATAC	3.000.000.000	3.000.000.000					
A 01 23/1	Allestimento di centri di accoglienza per bambini nei musei comunali	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000					
A 01 23/2	Ristrutturazione servizi di accoglienza e pronto soccorso clinica pediatrica	Univ. La Sapienza Policl. Umberto I	2.000.000.000	2.000.000.000	100.000.000		100.000.000		1.519.294.430
A 01 24	Sistemazione del Centro Accoglienza Italiani nel Mondo (CAIM) presso la chiesa di S. Giovanni della Pigna e locali annessi	Chiesa di S. Giovanni della Pigna	1.288.700.400	1.288.700.400					1.288.700.400
A 01 25	Riqualificazione di una struttura conventuale	Congregazione Suore Francescane dei Sacri Cuori	2.966.071.190	2.966.071.190	171.900.000		171.900.000		2.794.171.190
A 01 26/1	Progetto di ristrutturazione e completamento del complesso sito in Via delle Isole	Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida	2.349.442.000	2.349.442.000					2.349.442.000
A 01 26/2	Progetto di ristrutturazione e completamento del complesso sito in Via Cassia	Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida	1.922.090.625	1.922.090.625					1.922.090.625
A 01 27	Centro accoglienza permanente per pellegrini portatori di handicap (primo stralcio)	Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo - Opera Don Orione	13.989.886.380	13.989.886.380					10.334.886.396
A 01 28	Zona ricettiva - Casa per ferie	Direzione Generale Opere Don Bosco	3.000.000.000	3.000.000.000					
A 01 29	Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia al servizio delle famiglie disagiate	Congregazione Figlie della Madonna del Divino Amore	6.909.000.000	1.000.000.000	50.000.000		50.000.000		950.000.000
A 01 30	Complesso Abbaziale di Farfa (Fara Sabina/Rieti) Ristrutturazione e completamento funzionale	Ordine del SS. Salvatore di S. Brigida	919.200.000	919.200.000					700.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 01 31	Borgo di Monte Antuni (Castel di Toru/Rieti) - Lavori di recupero	Comune di Castel di Toru	1.000.000.000	1.000.000.000					1.000.000.000
A 01 32	Complesso conventuale di S. Maria della Quercia (Viterbo) Centro di accoglienza per pellegrini	Diocesi di Viterbo	1.000.000.000	1.000.000.000					985.153.020
A 01 33			700.000.000	700.000.000					
A 01 34			700.000.000	700.000.000					
A 04 01/1	Complesso Buon Pastore: Allestimento sede Casa Internazionale della Donna	Comune di Roma	2.200.000.000	2.200.000.000					1.657.853.640
A 04 01/2	Complesso Buon Pastore (Roma). Restauro e recupero funzionale del corpo seicentesco	Comune di Roma	6.554.691.505	6.554.691.505	446.172.730		446.172.730		6.108.518.770
A 05 01/1	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Risanamento parco)	USL RM E	1.565.930.939	1.565.930.939	100.000.000		100.000.000		1.465.930.939
A 05 01/2	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Parcheggi)	USL RM E	1.000.000.000	1.000.000.000	50.000.000		50.000.000		
A 05 01/3	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Stroord. Manutenz. Padigl. Direzione)	USL RM E	3.647.072.987	3.647.072.987	210.000.000		210.000.000		3.035.282.875
A 05 01/4	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Manutenz. ord. cappella e 3 padigl.)	USL RM E	5.911.742.409	5.911.742.409	297.000.000		297.000.000		5.184.646.009
A 05 01/5	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Ristrutturazione n. 4 padiglioni)	USL RM E	9.097.201.490	9.097.201.490	410.000.000		410.000.000		7.837.419.330
A 05 02	Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione ex colonia marina "Vittorio Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale)	Comune di Roma	8.079.166.414	8.079.166.414					6.879.166.414

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 06 01	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amministrazioni pubbliche	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma	10.000.000.000	10.000.000.000					9.543.236.000
A 06 02	Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Ipsab e Iacp) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati.	Regione Lazio	14.426.364.000	14.426.364.000					14.426.364.000
A 07 01	Centro di accoglienza turistica e convivio (Roma). Costruzione nuovo edificio annesso all'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi	Provincia di Roma	6.975.315.293	5.231.486.400	337.500.000	67.500.000		270.000.000	4.893.986.400
A 07 02	Campeggio e area di sosta per camper (Roma). Realizzazione nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi"	Provincia di Roma		16.900.000	16.900.000	3.380.000		13.520.000	
Ax 07 03	Campeggio (Roma). Realizzazione nell'area di proprietà provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà	Provincia di Roma	1.110.000.000	676.000.000	16.900.000	3.380.000		13.520.000	
A 07 04	Ostello della gioventù (Ciampino/Roma)	Comune di Ciampino	3.538.201.390	2.538.201.390	150.000.000		150.000.000		2.388.201.390
A 07 05	Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma). Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere	Comune di Albano Laziale	459.609.750	284.609.750	36.313.230		18.750.000	17.563.230	235.796.520
A 07 06	Ostello della Gioventù (Marino/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani	Comune di Marino	4.632.849.215	3.282.849.215	306.815.100		306.815.100		2.976.034.115
A 07 07/a	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Realizzazione di una struttura ricettiva	Comune di Frascati	701.500.000	91.500.000	91.500.000		91.500.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 07 07/b	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma) Ristrutturazione di un edificio da adibire a ostello	Comune di Frascati	560.000.000	420.000.000	21.000.000		21.000.000		
A 07 09	Campeggio (Fiano Romano/Roma) Completamento	Comune di Fiano Romano	889.921.540	589.921.540	45.000.000		45.000.000		544.921.540
A 07 10	Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Rutilizzazione	Comune di Castel Madama		150.000.000					150.000.000
A 07 11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle scuderie Estensi	Comune di Tivoli	1.542.790.049	842.790.049	52.500.000		52.500.000		703.290.049
A 07 12	Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	Comune di Manziana	558.000.000	433.000.000					304.709.060
A 07 13	Completamento Ostello Prataglia	Comune di Cervara	302.622.500	219.172.500					219.172.500
A 07 14	Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma) Ristrutturazione di Palazzo Carboni	Comune di Anticoli Corrado	1.007.738.900	789.238.900					639.238.900
A 07 15	Centro di accoglienza turistica (Arsoli/Roma) Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San Filippo Neri e fornitura arredi	Comune di Arsoli	964.700.000	764.700.000					435.257.110
A 07 16	Ostello della Gioventù (S. Marinella/Roma) Ristrutturazione dell'ex scuola Purgatorio	Comune di S. Marinella	854.621.780	491.915.780					491.915.780
A 07 18	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	Comune di Nettuno	372.822.610	272.822.610					82.889.930
A 07 19	Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino al Cimino/Viterbo) Restauro di un'ex colonia e allestimento	Provincia di Viterbo	1.676.901.523	1.065.901.523					1.065.901.523
A 07 20	Ostello della Gioventù (Viterbo/Viterbo) Ristrutturazione di un ex convento e allestimento (1° stralcio funzionale)	Comune di Viterbo	991.502.620	741.502.620	37.500.000		37.500.000		704.002.620

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
									21.000.000
272.460.770			190.722.540						589.921.540
					150.000.000				300.000.000
351.645.020									755.790.040
152.354.530									304.709.060
43.834.500		65.751.750	76.710.370						219.172.500
319.619.450									639.238.900
217.628.550									435.257.110
245.957.890									491.915.780
41.444.960									82.889.930
532.950.760			373.065.530						1.065.901.523
140.800.520			457.601.700						741.502.620

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 07 21	Ostello della Gioventù "Torretta" (Tuscania/Viterbo) Ristrutturazione di un immobile, allestimento, arredi	Aiuto infantile di Tuscania	500.000.000	338.000.000	16.900.000		16.900.000		317.626.977
A 07 22	Ristrutturazione di una ala del Monastero Clarisse di Santa Rosa da Viterbo per accoglienza dei pellegrini	Monastero delle Clarisse di S. Rosa di Viterbo	1.167.077.495	834.077.495	50.000.000		50.000.000		784.077.495
A 07 23	Centro di accoglienza (Contigliano/Rieti) Ristrutturazione di Villa Franceschini	Comune di Contigliano	2.272.637.919	1.722.637.919	82.500.000	16.500.000	66.000.000		1.309.000.000
A 07 24	Casa di accoglienza - ostello della gioventù in edifici storici - a) Residenze Abati di Farfa - b) ex albergo (Montopoli/Rieti)	Comune di Montopoli	728.361.129	528.361.129	30.000.000		30.000.000		443.361.128
A 07 25	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano	Comune di Fara in Sabina	6.000.000.000	4.500.000.000					
A 07 26	Casa di accoglienza - ostello della gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di un palazzetto di proprietà comunale in Piazza Mario Dottori	Comune di Poggio Mirteto	857.107.602	614.107.602	36.450.000		36.450.000		577.657.602
A 07 27	Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico	Comune di Poggio Mirteto	1.325.152.000	925.152.000	60.000.000		60.000.000		865.152.000
A 07 28	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie	Comune di Magliano Sabina	2.428.489.782	1.753.489.782	50.000.000		50.000.000		1.667.338.760
A 07 29	Area camper (Frasco Sabino/Rieti) Realizzazione della pavimentazione, dei servizi e sistemazione degli accessi	Comune di Frasco Sabino	517.539.760	392.539.760	18.750.000		18.750.000		373.789.760
A 07 30	Area camper (Montopoli/Rieti) Realizzazione della pavimentazione e dei servizi	Comune di Montopoli	497.511.680	372.511.680	18.750.000		18.750.000		353.761.680

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
158.813.490			111.169.440						334.526.977
156.815.500			509.650.370						834.077.495
					1.309.000.000				2.700.500.000
221.680.560									473.361.128
288.828.800			202.180.160						614.107.602
432.576.000			302.803.200						925.152.000
288.669.380					1.090.000.000				2.807.338.760
157.724.880			159.996.420						392.539.760
147.829.340			152.868.090						372.511.680

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 07 31	Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti)	Comune di Poggio Bustone	280.000.000	210.000.000	10.500.000		10.500.000		198.450.000
A 07 32	Ostello della Gioventù (Campodimele/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico	Comune di Campodimele	367.000.000	275.000.000					206.250.000
A 07 33	Centro di accoglienza turistica (Lenola/Latina) Completamento del complesso turistico Miracolle	Comune di Lenola	380.238.500	230.238.500					230.238.500
A 07 34	Ostello della Gioventù (Roccagorga/Latina) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphilj	Comune di Roccagorga	120.000.000	90.000.000					74.410.720
A 07 35	Ostello della Gioventù (Mazze/Latina) Aureo Palazzo Pecci e sistemazione esterna	Comune di Mazze	411.544.160	286.544.160	25.000.000		25.000.000		286.544.160
A 07 36	Ostello della Gioventù (Bassiano/Latina) Acquisto arredamento	Comune di Bassiano	200.000.000	150.000.000					150.000.000
A 07 37	Ostello della Gioventù (Sermoneta/Latina) Realizzazione	Comune di Sermoneta	1.502.010.873	1.102.010.873	60.000.000		60.000.000		882.016.873
A 07 39	Ostello della Gioventù (Aprilia/Latina) Realizzazione (1° stralcio funzionale)	Comune di Aprilia	2.302.399.610	1.635.399.610					1.635.399.610
A 07 40	Centro di accoglienza (Latina) Ristrutturazione Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	1.681.703.000	1.247.703.000					1.215.280.000
A 07 41	Centro di accoglienza (Cisterna/Latina)	Comune di Cisterna	1.067.000.000	800.000.000					
A 07 42	Centro di accoglienza turistica (Veroli/Frosinone) Adeguamento del complesso Istituto Filonardi	Comune di Veroli	1.770.388.515	1.270.388.515	75.000.000		75.000.000		1.195.388.515
A 07 43	Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle Grazie (Villa S. Lucia/Frosinone) Ristrutturazione ed adeguamento della struttura	Comune di Villa S. Lucia	336.218.865	236.218.865					236.418.865

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE:				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali)	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
99.225.000									208.950.000
			165.000.000						206.250.000
115.238.500									230.238.500
37.205.360									74.410.720
143.272.080			100.290.460						311.544.160
75.000.000									150.000.000
309.008.440			216.305.900		264.000.000				1.206.016.873
367.699.800					900.000.000				2.535.399.610
480.851.500			552.136.500						1.215.280.000
597.694.250									1.270.388.515
118.209.430			82.746.600						236.418.865

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROIEZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 07 44	Centro di accoglienza nell'ex convento S. Nicola (Alatri/Frosinone) Adeguamento della struttura	Provincia di Frosinone	1.301.160.740	916.160.740	56.250.000		56.250.000		826.274.740
A 07 45	Ostello della gioventù (San Donato Val Comino/Frosinone)	Comune di San Donato Val Comino	1.115.308.500	830.528.500					770.574.630
A 07 46	Ostello della gioventù e campeggio (Alatri/Frosinone) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschette	Comune di Alatri	2.667.000.000	2.000.000.000	100.000.000		100.000.000		
A 08 01	Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere	Regione Lazio	99.653.000.000	99.653.000.000					99.653.000.000
A 09 01	Corsia Sistina - Ospedale S. Spirito: centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di San Pietro (Roma) Lavori di restauro e allestimento	USL RM E	650.000.000	650.000.000					
A 10 01	Pavimentazione sagrato del Santuario e dei viali processionali	Parrocchia S. Maria del Divino Amore	1.379.000.000	1.379.000.000					1.309.781.010
A 10 02	Deumidificazione dei piani inferiori degli edifici del '700 e della chiesa del Santuario	Parrocchia S. Maria del Divino Amore	234.000.000	234.000.000					227.690.020
A 10 03	Eliminazione barriere architettoniche nei percorsi interni al comprensorio del Divino Amore	Parrocchia S. Maria del Divino Amore	917.000.000	917.000.000					872.221.550
TOTALE SEKT. A			305.512.621.257	282.892.256.364	4.827.191.060	227.400.000	3.826.197.830	773.593.230	233.998.673.890
B 01 01	Area del Grande Campidoglio: palazzo Senatorio (Roma). Prosecuzione dei lavori di consolidamento e restauro.	Comune di Roma		425.000.000	425.000.000		425.000.000		
B 01 02	Area del Grande Campidoglio: Musei Capitolini (Roma). Restauro, ampliamento e sistemazione del secondo lotto funzionale: completamento Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo.	Comune di Roma	7.500.000.000	7.500.000.000					7.500.000.000
B 02 01/1	Area archeologica dei Fori Imperiali. Museo dei fori Imperiali ai Mercati Traianci (Roma).	Comune di Roma	3.966.842.286	3.966.842.286	261.079.200		261.079.200		3.705.763.090

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 02 01/2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Museo dei Fori Imperiali. Allestimento dei materiali mobili restaurati.	Comune di Roma	902.952.000	902.952.000					880.152.000
B 02 01/3	Area archeologica dei Fori Imperiali - Restauro e ripristino agibilità Torre delle Milizie.	Comune di Roma	2.644.297.175	2.644.297.175	173.318.400		173.318.400		2.148.958.775
B 02 02	Area archeologica dei Fori Imperiali: Restauri e sistemazioni esterne dei Fori di Cesare, Augusto, Nerva e Traiano	Comune di Roma	2.168.122.668	2.168.122.668					2.168.122.670
B 02 03/1a	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Foro di Cesare	Comune di Roma	2.804.317.789	2.804.317.789					2.804.317.789
B 02 03/1b	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area Tempio della Pace.	Comune di Roma	3.617.168.031	3.617.168.031					3.617.168.031
B 02 03/1c	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Foro di Traiano.	Comune di Roma	5.096.479.223	5.096.479.223					5.096.479.223
B 02 03/2a	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Foro di Cesare	Comune di Roma	1.575.189.088	1.575.189.088					1.312.658.280
B 02 03/2b	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Tempio della Pace	Comune di Roma	1.360.489.961	1.360.489.961					1.360.490.209
B 02 03/2c	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Foro di Traiano	Comune di Roma	2.363.463.823	2.363.463.823					1.969.553.823
B 03 01	Mura di Roma - Restauro e valorizzazione di Porta S. Paolo.	Comune di Roma	1.197.117.850	1.197.117.850					1.197.117.850
B 03 02/1	Mura di Roma - Restauro Porta S. Sebastiano, Arco di Druso, e P.ta Latina e tratti di mura da Porta S. Sebastiano al bastione Ardeatino	Comune di Roma	1.814.554.434	1.814.554.434					1.814.554.433
B 03 02/2	Mura di Roma - Interventi di manutenzione straordinaria e restauro tratti murari tra Porta S. Sebastiano e Porta Metronia	Comune di Roma	1.762.546.966	1.762.546.966					1.762.546.966
B 03 03	Mura di Roma - Restauro di Porta S. Giovanni e tratto di mura da Porta Asinaria all'antiteatro Castrense	Comune di Roma	2.072.599.104	2.072.599.104					2.072.599.100

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 03 04/1	Mura di Roma - Restauro di Porta Maggiore, dei tratti di mura adiacenti e sepolcro di Eurisace	Comune di Roma	1.844.799.490	1.844.799.490					1.844.799.490
B 03 04/2	Mura di Roma - Interventi di manutenzione straordinaria e restauro di Porta Tiburtina e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario	Comune di Roma	1.393.736.250	1.393.736.250					1.088.736.250
B 03 05	Mura di Roma - Restauro conservativo e consolidamento del complesso monumentale di Porta Pia	Comune di Roma	1.786.034.040	1.786.034.040					1.786.034.040
B 03 06	Mura di Roma - Restauro ed adeguamento della Porta del Popolo	Comune di Roma	1.730.751.732	1.730.751.732					1.730.751.732
B 03 07	Mura di Roma. Restauro, consolidamento, musealizzazione, ed adeguamento alle normative di sicurezza dell'edificio di Porta S. Pancrazio	Comune di Roma	1.035.658.460	1.035.658.460					1.035.658.460
B 03 08	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle mura Gianicolensi nel tratto Porta S. Pancrazio - Porta Portese	Comune di Roma	1.949.163.481	1.949.163.481					1.478.663.481
B 03 09/1	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle mura Aureliane nel tratto Campo Boario - largo Lazzarini	Comune di Roma	1.567.541.428	1.567.541.428					1.567.541.428
B 03 09/2	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle mura Aureliane nel tratto largo Lazzarini - Bastione Ardeatino	Comune di Roma	1.854.340.232	1.854.340.232					1.854.340.232
B 04 01	Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro dell'edificio	Comune di Roma	1.420.974.575	1.420.974.575	98.409.600		98.409.600		1.029.646.976
B 05 01/1	Restauro di Palazzo Braschi: Interventi preliminari.	Comune di Roma	1.608.000.000	1.608.000.000					1.608.000.000
B 05 01/2	Restauro di Palazzo Braschi: Restauro - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braschi - Museo di Roma	Comune di Roma	8.894.328.040	8.894.328.040					8.894.328.040

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 08 01	Palazzo Altompe (Roma) Scavo e sistemazione cortile, allestimento e completamento del Museo antiquario	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	6.808.900.000	4.808.900.000					
B 08 02	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina, Medagliere"	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.500.000.000	1.500.000.000					
B 08 03	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione Epigrafica": restauri e allestimenti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.146.765.526	2.146.765.526					
B 08 04	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Prosecuzione dei restauri e degli allestimenti e predisposizione impianti "Grandi Aule"	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.367.818.207	2.367.818.207					
B 08 05	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione opere d'arte, riallestimento, sistemazione ingresso museo (giardino verso piazza dei Cinquecento)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	911.587.600	911.587.600					
B 08 06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture Diocleziane e aree archeologiche (adiacenti via Cernaia, via Parigi, Oleurio), completamento restauro Museo delle Cere	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	800.000.000	800.000.000					
B 08 07	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione epigrafica Sale dei Capolavori"	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.970.686.700	2.970.686.700					

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						5.000.000.000			5.000.000.000
						1.500.000.000			1.500.000.000
						2.200.000.000			2.200.000.000
						1.500.000.000			1.500.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						2.100.000.000			2.100.000.000
						3.000.000.000			3.000.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 08 08	Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiostro di Michelangelo", allestimento della Sezione Protostoria e del Museo della Certosa	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	8.700.000.000	8.700.000.000					
B 08 09	Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	28.222.533.439	8.222.533.439					
B 09 01	Restauro del complesso di Palazzo Barberini (Roma) - primo stralcio	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	15.142.888.597	5.142.888.597					
B 10 01/a	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	9.800.000.000	9.800.000.000					
B 10 01/b	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Poniatowski)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	9.800.000.000	9.800.000.000					
B 10 01/c	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Stohl Fern)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.400.000.000	3.400.000.000					
B 11 01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	24.124.859.514	9.124.858.514					
B 12 01	Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri e prospetto	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	581.696.931	581.696.931					
B 12 02	Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.103.075.537	3.103.075.537					
B 12 03	Vittoriano (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione, interventi di consolidamento o restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	9.676.423.063	9.676.423.063					
B 12 04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.000.000.000	3.000.000.000					
B 12 05	Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e sistemazione del cortile	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.401.670.060	1.401.670.060					

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						8.700.000.000			8.700.000.000
						10.000.000.000			10.000.000.000
						6.000.000.000			6.000.000.000
						9.800.000.000			9.800.000.000
						9.800.000.000			9.800.000.000
						3.400.000.000			3.400.000.000
						10.000.000.000			10.000.000.000
						600.000.000			600.000.000
						3.500.000.000			3.500.000.000
						10.000.000.000			10.000.000.000
						3.000.000.000			3.000.000.000
						1.500.000.000			1.500.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 12 06/a	Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	6.708.104.197	6.708.104.197					
B 12 06/b	Chiesa S. Biagio alla Pagnotta	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	267.073.336	267.073.336					
B 12 08	Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.654.139.863	1.654.139.863					
B 12 09	Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000	300.000.000					
B 12 10	Appia Antica - Cecilia Metella	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.560.558.753	2.560.558.753					
B 12 11	Mausoleo di S. Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, recinzione del complesso monumentale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.206.440.570	1.206.440.570					
B 12 12	Mausoleo "Berretta del Prete" e mausolei lungo la via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.264.993.182	1.264.993.182					
B 12 13	Parco archeologico della via Flaminia: Arco - Casale di Malborghetto (Roma) Scavi archeologici, restauro, protezione strutture medioevali sul lato orientale, manutenzione.	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000					
B 12 14	Tor San Michele (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	573.725.000	573.725.000					
B 12 15	Rocca di Papa: Castello di Palazzolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	923.046.914	923.046.914					
B 12 16	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'ala nord	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	5.582.254.469	5.582.254.469					
B 12 17	Antica Rocca (Civitavecchia/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.691.925.000	1.691.925.000					
B 12 18	Fort Michelangelo (Civitavecchia/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.670.383.435	2.670.383.435					
B 12 19	Castello di S. Severo (S. Marinella/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	4.965.904.900	4.965.904.900					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						2.500.000.000			2.500.000.000
						300.000.000			300.000.000
						1.800.000.000			1.800.000.000
						300.000.000			300.000.000
						2.700.000.000			2.700.000.000
						1.300.000.000			1.300.000.000
						1.400.000.000			1.400.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						600.000.000			600.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						5.000.000.000			5.000.000.000
						1.800.000.000			1.800.000.000
						2.800.000.000			2.800.000.000
						5.500.000.000			5.500.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 12 20	Castello Odescalchi (Santa Marinella/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	523.785.295	523.785.295					
B 12 21	Castello Odescalchi (Bracciano/Roma) Rifacimento coperture	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	564.329.999	564.329.999					
B 12 22	Castello di Monterose (Ladispoli/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.820.072.000	2.820.072.000					
Bx 12 23	Completamento dei lavori di restauro e di ripulitura dei prospetti, revisione dei tetti e lavori interni	Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.500.000.000	1.500.000.000					
B 12 24	Ripulitura delle facciate interne ed esterne, revisione e verniciatura dei relativi infissi e sistemazioni varie a Palazzo Chigi.	Presidenza del Consiglio dei Ministri	3.174.057.196	3.174.057.196					3.174.057.196
B 12 25	Restauro della Casa di S. Brigida in Piazza Farnese	Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida	600.000.000	600.000.000					587.625.000
B 12 26	Passetto di Borgo - Restauro conservativo tratto Piazza Pia - Via del Campanile	Ministero Beni Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000					
B 12 27	Ex Scuderie Papali al Quirinale - Restauro e risanamento conservativo	Ministero Beni Culturali	9.156.068.000	9.156.068.000					
B 12 27/2			6.377.000.000	6.377.000.000					
B 13 01/1	Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	4.000.000.000	4.000.000.000					
B 13 01/2	Chiesa S. Croce in Gerusalemme - Restauro facciata	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	927.719.669	927.719.669					
B 13 02	Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauro del complesso Laurenziano e riqualificazione dell'ambiente urbano circostante	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	384.256.001	384.256.001					
B 13 03	Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura Restauro facciata	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	500.000.000	500.000.000					
B 13 04	Basilica di San Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	500.000.000	500.000.000					

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'esultazione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						600.000.000			600.000.000
						600.000.000			600.000.000
						3.000.000.000			3.000.000.000
2.019.050.000									3.174.057.196
293.812.500			205.668.750						587.625.000
						4.000.000.000			4.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						400.000.000			400.000.000
						500.000.000			500.000.000
						500.000.000			500.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROIEZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 13 05	Chiesa SS. Quattro coronati	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	489.647.201	489.647.201					
B 13 06	S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	890.905.672	890.905.672					
B 13 07	Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.921.727.273	1.921.727.273					
B 13 08	Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	700.000.000	700.000.000					
B 13 09	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	180.830.000	180.830.000					
B 13 10	Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000					
B 13 11	Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimenti interni e paramenti (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	918.190.682	918.190.682					
B 13 12	Chiesa del Gesù (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	800.000.000	800.000.000					
B 13 13	Restauro ed intervento conservativo del prospetto della chiesa di S. Gregorio al Celio	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	444.153.774	444.153.774					
B 13 14	Chiesa S. Alessio (Roma) Restauro del chiostro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	672.536.182	672.536.182					
B 13 15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.000.000.000	2.000.000.000					
B 13 16	Santa Maria d'Arsacoli (Roma) Restauro del campanile e della facciata	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	800.000.000	800.000.000					
B 13 17	Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) Restauro architettonico	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.388.727.272	1.388.727.272					
B 13 18	Chiesa di S. Lorenzo in Lucina-protezione del consolidamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	394.948.790	394.948.790					
B 13 19	Chiesa S. Agnese in Agone	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.072.494.418	1.072.494.418					

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
10% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell' Impegno di spesa	10% all' emissione de certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						500.000.000			500.000.000
						980.000.000			980.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
						700.000.000			700.000.000
						200.000.000			200.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						800.000.000			800.000.000
						500.000.000			500.000.000
						700.000.000			700.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						800.000.000			800.000.000
						1.500.000.000			1.500.000.000
						400.000.000			400.000.000
						1.200.000.000			1.200.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cedite	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 13 20	Chiesa San Carlo ai Catinari (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.500.000.000	2.500.000.000					
B 13 21	Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma) Interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	961.300.000	961.300.000					
B 13 22	Chiesa di S. Susanna restauro prospetti int. rifacimento coperture	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	737.477.273	737.477.273					
B 13 23	Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale delle sottofondazioni ed interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	500.000.000	500.000.000					
B 13 24	Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	639.479.710	639.479.710					
B 13 25/1	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro cappella Altompe e indagini archeologiche	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	500.000.000	500.000.000					
B 13 25/2	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altompe e della cappella Avila Scavo archeologico e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000	300.000.000					
B 13 26	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	848.723.637	848.723.637					
B 13 27	Restauro, bonifica e rifacimento tetti Chiesa S. Eustachio (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	749.391.200	749.391.200					
B 13 28	Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma) Restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	600.000.000	600.000.000					
B 13 29	Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro architettonico della facciata	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	189.613.919	189.613.919					
B 13 30	Restauro e intervento conservativo della Chiesa S. Maria in Campitelli	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	778.810.000	778.810.000					
B 13 31	Oratorio del Caravita (Roma) Lavori di recupero strutturale e restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	761.914.618	761.914.618					
B 13 32/1	Oratorio del Crocifisso e del Gonfalone (Roma) Restauro della facciata e degli affreschi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	450.000.000	450.000.000					

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						2.500.000.000			2.500.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						800.000.000			800.000.000
						500.000.000			500.000.000
						800.000.000			800.000.000
						500.000.000			500.000.000
						300.000.000			300.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						800.000.000			800.000.000
						600.000.000			600.000.000
						200.000.000			200.000.000
						800.000.000			800.000.000
						800.000.000			800.000.000
						450.000.000			450.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cedire	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 13 32/2	Restauro Oratorio del SS. Crocifisso	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	416.992.500	416.992.500					
B 13 33	Oratorio dei Filippini (Roma). Restauro dei prospetti del cortile Borrominiano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	350.000.000	350.000.000					
B 13 34	Oratorio del Santissimo Sacramento (Roma). Restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	736.893.440	736.893.440					
B 13 35	Chiesa di S. Agostino (Roma). Restauro degli affreschi, stucchi e dei manufatti lignei	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	500.000.000	500.000.000					
B 13 36	Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma). Restauro degli affreschi della cupola	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.463.173.000	1.463.173.000					
B 13 38	Chiesa di S. Bartolomeo de' Insula (Roma). Restauro dei prospetti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	449.272.727	449.272.727					
B 13 39	Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in Campo Marzio. Restauro prospetti e bonifica fondale.	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	518.456.900	518.456.900					
B 13 40	Chiesa di S. Carlo alle Quattro fontane (Roma). Restauro degli interni e delle finiture	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	713.805.802	713.805.802					
B 13 41	Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	494.332.254	494.332.254					
B 13 42	Chiesa di S. Crisogono (Roma). Restauro e sistemazione museale del Battistero paleocristiano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	94.873.950	94.873.950					
B 13 43	Chiesa dei SS. Domenico e Sisto	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	700.000.000	700.000.000					
B 13 44/1	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma). Restauro degli affreschi e del muro di confine	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	640.000.000	640.000.000					
B 13 44/2	Chiesa o convento di S. Francesco a Ripa (Roma). Restauro del muro di cinta del convento	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	310.496.600	310.496.600					
B 13 45/1	Chiesa di S. Giuseppe dei falegnami (Roma). Restauro degli interni	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000	300.000.000					

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio					
						450.000.000			450.000.000
						350.000.000			350.000.000
						800.000.000			800.000.000
						500.000.000			500.000.000
						1.300.000.000			1.300.000.000
						500.000.000			500.000.000
						550.000.000			550.000.000
						800.000.000			800.000.000
						560.000.000			560.000.000
						100.000.000			100.000.000
						700.000.000			700.000.000
						640.000.000			640.000.000
						360.000.000			360.000.000
						300.000.000			300.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 13 45/2	Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma). Restauro degli interni	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	800.000.000	800.000.000					
B 13 46/1	Chiesa di S. Lucia a Gonalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	470.650.000	470.650.000					
B 13 46/2	Chiesa di S. Maria alle Fornaci. Restauro portici e facciate	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	711.335.619	711.335.619					
B 13 46/3	Chiesa di S. Maria di Monte Santo (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	700.000.000	700.000.000					
B 13 46/4	Chiesa di S. Maria dei Miracoli	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	724.740.182	724.740.182					
B 13 47/1	Chiese di S. Maria sopra Minerva. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	550.000.000	550.000.000					
B 13 47/2	Chiese di S. Maria ai Monti. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.235.000.000	1.235.000.000					
B 13 47/3	Chiese di S. Maria in Trivio. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	350.000.000	350.000.000					
B 13 47/4	Chiese di S. Silvestro al Quirinale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	220.000.000	220.000.000					
B 13 47/5	Chiese di S. Vitale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	200.000.000	200.000.000					
B 13 48/1	Chiesa di S. Maria dell'Orto. Restauro della zona absidale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	374.916.000	374.916.000					
B 13 48/2	Chiesa di S. Maria in Porta Paradiso. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	470.434.546	470.434.546					
B 13 48/3	Chiesa di S. Maria in Publicolis. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	381.127.272	381.127.272					
B 13 48/4	Chiesa di S. Mario dei Sette Dolori. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	600.000.000	600.000.000					
B 13 48/5	Chiesa di S. Maria della Scala. Restauro della facciata e del retro prospetto	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000	300.000.000					

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE:			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						400.000.000			400.000.000
						500.000.000			500.000.000
						750.000.000			750.000.000
						700.000.000			700.000.000
						800.000.000			800.000.000
						550.000.000			550.000.000
						1.235.000.000			1.235.000.000
						350.000.000			350.000.000
						220.000.000			220.000.000
						200.000.000			200.000.000
						400.000.000			400.000.000
						500.000.000			500.000.000
						400.000.000			400.000.000
						600.000.000			600.000.000
						300.000.000			300.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 13 48/6	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	550.000.000	550.000.000					
B 13 48/7	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dell'apparato decorativo delle cappelle (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	230.610.433	230.610.433					
B 13 49/1	Chiesa di S. Michele. Restauro della cripta	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	400.000.000	400.000.000					
B 13 49/2	Chiesa di S. Pantaleo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	385.915.000	385.915.000					
B 13 49/3	Chiesa di S. Pietro in Montorio. Restauro Globale (1° fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	359.282.537	359.282.537					
B 13 49/4	Chiesa di S. Prisca	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	268.344.102	268.344.102					
B 13 49/5	Chiesa di S. Salvatore in Lauro. Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	480.236.819	480.236.819					
B 13 49/6	Chiesa di S. Spirito in Sassia e Convento. Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	979.794.059	979.794.059					
B 13 50	Chiesa di S. Tommaso in Parione (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	354.100.000	354.100.000					
B 13 51	Basilica costantiniana di S. Agnese fuori mura (Roma) Scavo, restauro e recupero (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.372.432.827	1.372.432.827					
B 13 52	Chiesa della Annunziata. Consolidamento e restauro del complesso	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	687.983.480	687.983.480					
B 13 54	Restauro conservativo, consolidamento strutturale del cassettonato ligneo seicentesco murature e tetti nella Chiesa di S. Pomerancio	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	828.881.683	828.881.683					
B 13 55	Abbazia delle Tre Fontane. Restauro complessivo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	5.572.952.500	5.572.952.500					
B 13 56	Chiesa di S. Zoticò Catacombe (Roma) Scavo, restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000					
B 13 57	Convento di San Francesco (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	898.720.655	898.720.655					

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali		
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio		AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)		"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane	
						550.000.000			550.000.000
						250.000.000			250.000.000
						400.000.000			400.000.000
						400.000.000			400.000.000
						400.000.000			400.000.000
						300.000.000			300.000.000
						500.000.000			500.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						400.000.000			400.000.000
						1.500.000.000			1.500.000.000
						800.000.000			800.000.000
						900.000.000			900.000.000
						6.000.000.000			6.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 13 58	Chiesa di S. Clemente I Papa (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.296.693.377	2.296.693.377					
B 13 59	Abbazia di S. Nilo (Grottaferata/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	458.901.756	458.901.756					
B 13 60	Chiesa di S. Maria della Neve e Convento	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	877.562.470	877.562.470					
B 13 61	Convento di San Cosimato (Vicovaro/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.122.388.686	1.122.388.686					
B 13 62	Abbazia di S. Andrea in Flumina (Ponzano Romano/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.859.922.090	2.859.922.090					
B 13 63	Chiesa di S. Francesco (Anguillara/Roma) Restauro globale conservativo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	958.897.396	958.897.396					
B 13 64	Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	890.516.477	890.516.477					
B 13 65	Santuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	929.344.460	929.344.460					
B 13 66	Eremita della Trinità (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa, valorizzazione e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.890.886.900	1.890.886.900					
B 13 67	Santuario della Madonna di Cibona (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.791.998.016	1.791.998.016					
B 13 68	Chiesa del Crocifisso (Fiuggino/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	936.685.000	936.685.000					
B 13 69	Episcopio diocesano di S. Rufina (Fiuggino/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.888.045.480	1.888.045.480					
B 13 70	Restauro edicola sacre	Comune di Roma	1.396.846.660	1.396.846.660					1.396.846.660
B 13 71	Restauro	Chiesa S. Maria Maggiore	100.000.000	100.000.000					99.500.000
B 13 72	Ristrutturazione	Parrocchia S. Maria degli Angeli Roma	1.770.000.000	1.770.000.000	88.500.000		88.500.000		1.117.965.050
B 13 73	Basilica S. Maria Maggiore in Roma Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso e rampa per disabili	Patrimonio Basilica S. Maria Maggiore	110.000.000	110.000.000					110.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell' Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						2.500.000.000			2.500.000.000
						500.000.000			500.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						1.200.000.000			1.200.000.000
						3.000.000.000			3.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
698.423.330									1.396.846.660
49.750.000				49.750.000					99.500.000
558.982.520									1.206.465.050
55.000.000			44.000.000						110.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 13 74	Basilica S. Maria Maggiore in Roma. Restauro e risanamento artistico del soffitto ligneo.	Patriarcato Basilica S. Maria Maggiore	580.000.000	580.000.000					580.000.000
B 13 75	Basilica S. Maria Maggiore in Roma. Rifacimento degli impianti di illuminazione ed elettrici.	Patriarcato Basilica S. Maria Maggiore	720.000.000	720.000.000					720.000.000
B 13 76	Nuove rampe per disabili e posto di pronto soccorso	Patriarcato Basilica di S. Giovanni in Laterano.	234.000.000	234.000.000					234.000.000
B 13 77	Restauri e rinnovo impianto elettrico.	Patriarcato Basilica di S. Giovanni in Laterano.	2.057.000.000	2.057.000.000					2.057.000.000
B 13 78	Messa a norma dell'impianto elettrico e nuovo impianto per l'aeroplificazione e la diffusione.	Pontificia amministrazione Patriarcato Basilica di S. Paolo	2.000.000.000	2.000.000.000					2.000.000.000
B 13 79	Restauro dell'organo di Giovanni Corrado Verle	Ordine Cistercense SS Vincenzo e Anastasio	299.000.000	299.000.000					248.200.000
B 13 80	Cappella S. Maria del Popolo	Ministero Beni Culturali	855.000.000	855.000.000					
B 14 01	Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Calcografia Palazzo Poli, per la nuova sede dell'ist. Naz. della Grafica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	10.714.114.877	10.714.114.877					
B 14 02	Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	6.984.525.899	6.984.525.899					
B 14 03	Accademia Nazionale di S. Luca (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	747.866.855	747.866.855					
B 14 04	Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di Adriano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.305.436.014	1.305.436.014					
B 14 05	Castel S. Angelo (Roma) Allestimento museale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.500.000.000	1.500.000.000					
B 14 06	Museo delle navi romane (Nemi/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.300.000.000	1.300.000.000					
B 14 07	Museo d'Arte Sacra	Parrocchia S. Giovanni dei Fiorentini	700.000.000	700.000.000					
B 14 08	Completamento "Museo del fiume"	Comune di Nazzano	873.543.290	873.543.290					873.543.290

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 15 01	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica del Porto di Traiano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	4.000.000.000	4.000.000.000					
B 15 02	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Casale Torlonia, Casale Monte Giulio, area naturalistica)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	7.000.000.000	7.000.000.000					
B 15 03	Museo Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento degli impianti di sicurezza e predisposizione materiale illustrativo e didattico	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.000.000.000	2.000.000.000					
B 15 04	Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento della ristrutturazione e adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.000.000.000	2.000.000.000					
B 15 05	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.000.000.000	2.000.000.000					
B 15 06	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di infrastrutture di servizio e visita	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.500.000.000	1.500.000.000					
B 15 07	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (zona Acilia)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.500.000.000	1.500.000.000					
B 16 01	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	893.928.572	893.928.572					
B 16 02	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Traiano Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	4.672.784.441	4.672.784.441					
B 16 03	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Settimio Severo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.180.799.560	1.180.799.560					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE:			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						4.000.000.000			4.000.000.000
						7.000.000.000			7.000.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
						1.000.000.000			2.000.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
						1.500.000.000			1.500.000.000
						1.500.000.000			1.500.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						5.000.000.000			5.000.000.000
						1.200.000.000			1.200.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 16 04	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.339.254.745	2.339.254.745					
B 16 05	Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento strutture murarie, realizzazione impianti elettrici e di sicurezza	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.886.029.019	1.886.029.019					
B 16 06	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale Creazione di servizi per il pubblico	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	398.319.328	398.319.328					
B 16 07	Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e sistemazione di Santa Maria Antiqua, rampa di Domiziano, Oratorio dei XL Martiri e Portico Adrianeo antistante	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.117.285.925	2.117.285.925					
B 16 08	Palatino - Foro Romano (Roma) Clivo della Vittoria Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	721.892.086	721.892.086					
B 16 09	Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiberiana e terrazza sul Bastione Farnesiano Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.745.453.709	2.745.453.709					
B 16 10	Palatino - Foro Romano (Roma) Passeggiata da S. Maria Antiqua a S. Anastasia e a via di S. Gregorio Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.780.173.676	1.780.173.676					
B 16 11	Palatino - Foro Romano (Roma) Arcate Severiane e Terme Restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.815.958.548	1.815.958.548					
B 16 12	Palatino - Foro Romano (Roma) Area della Vigna Barberini Ultimazione restauri	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.183.883.190	3.183.883.190					
B 16 13	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Costantino Completamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	902.259.741	902.259.741					

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE:			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						2.500.000.000			2.500.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
						400.000.000			400.000.000
						1.300.000.000			1.300.000.000
						800.000.000			800.000.000
						3.000.000.000			3.000.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
						3.400.000.000			3.400.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 16 14	Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.698.046.294	3.698.046.294					
B 16 15	Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	893.462.689	893.462.689					
B 16 16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.243.463.530	2.243.463.530					
B 16 17	Palatino - Foro Romano (Roma) Cloaca Massima Sistemazione e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	274.975.000	274.975.000					
B 16 18/01	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Roma Giardino di Palazzo Barberini: scavo e restauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	792.577.857	792.577.857					
B 16 18/02	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Palazzo Barberini edificio antico	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	100.000.000	100.000.000					
B 16 18/03	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, scavo, valorizzazione e manutenzione - S. Cecilia, realizzazione di copertura.	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	97.922.410	97.922.410					
B 16 18/04	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area archeologica Tor Carbonc	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	139.394.913	139.394.913					

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						4.000.000.000			4.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						2.500.000.000			2.500.000.000
						300.000.000			300.000.000
						850.000.000			850.000.000
						100.000.000			100.000.000
						100.000.000			100.000.000
						150.000.000			150.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 16 18/05	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Carcere Mamertino	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	551.079.219	551.079.219					
B 16 18/06	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana località Casal Bianco	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	47.516.077	47.516.077					
B 16 18/07	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana nel giardino nomentano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	45.817.700	45.817.700					
B 16 18/08	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Mitreo di S. Stefano Rotondo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	91.596.639	91.596.639					
B 16 18/09	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Piramide di Caio Cestio	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	45.798.472	45.798.472					
B 16 18/10	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ruderi in Piazza Iside	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	92.502.439	92.502.439					
B 16 18/11	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area retrostante il Tempio di Saturno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	901.046.434	901.046.434					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						600.000.000			600.000.000
						50.000.000			50.000.000
						50.000.000			50.000.000
						100.000.000			100.000.000
						50.000.000			50.000.000
						100.000.000			100.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 16 18/12	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa dei Sette Bassi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	100.000.000	100.000.000					
B 16 18/13	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Gabii - Castiglione. Lettura integrata del territorio	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	94.536.639	94.536.639					
B 16 18/14	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Geo Archeologia	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	50.000.000	50.000.000					
B 16 18/15	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	60.000.000	60.000.000					
B 16 18/16	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Terme di Diocleziano aula ottagonale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	122.102.475	122.102.475					
B 16 18/17	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Arco di Tito	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	675.515.500	675.515.500					
B 16 18/18	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana località Casalotti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	93.184.327	93.184.327					

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali)	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						100.000.000			100.000.000
						100.000.000			100.000.000
						50.000.000			50.000.000
						60.000.000			60.000.000
						135.000.000			135.000.000
						750.000.000			750.000.000
						100.000.000			100.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 16 18/19	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ipogeo degli Ornavi	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	25.000.000	25.000.000					
B 16 18/20	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana in località Monte Colonnae	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	576.928.744	576.928.744					
B 16 18/21	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Necropoli Portuense in località Pozzo Pantaleo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	470.392.287	470.392.287					
B 16 18/22	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Crustumerium - Itinerario di visita delle città e di due necropoli	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	831.233.953	831.233.953					
B 16 18/23	Cloaca Massima - Restauro e scavo sbocco al Tevere	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	100.000.000	100.000.000					
B 16 18/24	Palazzo Baldassini - Scavi di strutture antiche nei sotterranei	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000	300.000.000					
B 16 18/25	Tempio rettangolare al Foro Boario - Restauri tetto ed esterni	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	130.000.000	130.000.000					
B 16 19	Testaccio (Roma) Scavo, restauro Porto fluviale romano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.869.967.700	1.869.967.700					
B 16 20	Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauri, scavi, valorizzazione Casale (Appia Antica)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	5.469.913.397	5.469.913.397					
B 16 22	Parco delle Tombe della via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri ed adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.659.556.200	2.659.556.200					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						25.000.000			25.000.000
						600.000.000			600.000.000
						500.000.000			500.000.000
						900.000.000			900.000.000
						100.000.000			100.000.000
						300.000.000			300.000.000
						130.000.000			130.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
						5.900.000.000			5.900.000.000
						4.580.000.000			4.580.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 16 23	Flaminia Villa di Livia, Tomba Celsa, Saxa Rubra, Grottarossa, Tor di Quinto (Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali		680.000.000					
B 16 24	Parchi, giardini e aree archeologiche a verde (Roma) Manutenzione, sistemazione e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	8.076.283.107	8.076.283.107					
B 16 25	Parco archeologico di Vejo (Roma) Sistemazione area archeologica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	600.000.000	600.000.000					
B 16 26	Antica città di Gaii (Roma) Scavo, restauro monumenti antichi, restauro dell'asiale di Castiglione e di fabbricati rustici, allestimenti adeguamenti funzionali (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	4.705.714.979	4.705.714.979					
B 16 27	Via Aurelia (Roma) Scavi archeologici e indagini paleontologiche	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.458.180.311	1.458.180.311					
B 16 28	Antro delle Sorti (Palestrina/Roma)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	560.000.000	560.000.000					
B 16 29	Villa Adriana (Tivoli/Roma) Scavo, consolidamento, recupero funzionale della Torre di Roccafranca e Centro Camerelle	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.060.000.000	1.060.000.000					
B 16 30	Recupero del "Barco Borghese" e delle sostituzioni della Villa Romana	Comune di Monte Porzio Catone	3.000.000.000	3.000.000.000					
B 18 01	Santuario della Rotonda (Albano Laziale/Roma) Restauro del campanile e del Ninfeo del Santuario	Comune di Albano Laziale	424.370.526	424.370.526	25.000.000		25.000.000		399.370.526
B 18 02	Anfiteatro romano (Albano Laziale/Roma) Sistemazione Arena e spazi circostanti	Comune di Albano Laziale	800.000.000	800.000.000	40.000.000		40.000.000		634.000.350
B 18 03	Terme di Cellornio, o chiesa di S. Pietro (Albano Laziale/Roma) Restauro delle terme e del campanile della chiesa	Comune di Albano Laziale	445.935.534	445.935.534	25.000.000		25.000.000		420.935.534
B 18 04	Cattedrale (Albano Laziale/Roma) Restauro conservativo del campanile	Comune di Albano Laziale	176.040.918	176.040.918	10.000.000		10.000.000		166.040.918

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						3.000.000.000			3.000.000.000
						8.700.000.000			8.700.000.000
						600.000.000			600.000.000
						5.000.000.000			5.000.000.000
						1.500.000.000			1.500.000.000
						560.000.000			560.000.000
						1.060.000.000			1.060.000.000
199.685.260									424.370.526
317.004.180			221.902.920						674.008.350
210.467.770			147.327.440						445.935.534
83.020.460			58.114.320	24.906.130					176.040.918

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 18 05	Tridente barocco di S. Paolo (Albano Laziale/Roma) Recupero	Comune di Albano Laziale	780.821.681	780.821.681	50.000.000		50.000.000		730.821.681
B 18 06	Palazzo e Parco Chigi (Ariccia/Roma)	Comune di Ariccia	5.215.221.571	5.215.221.571	250.000.000		250.000.000		3.865.221.571
B 18 07	Ex-tempio Gotico S. Lucia (Marino/Roma) Restauro e adeguamento funzionale	Provincia di Roma	514.043.646	514.043.646	30.000.000	6.000.000		24.000.000	484.043.646
B 18 08	Progetto di recupero antica via dei sepolcri in comune di Grottaferrata. 4° settore di intervento	XI ^a Comunità Montana (Castelli Romani e Prenestini), Sede di Rocca Priora	415.464.575	415.464.575	25.000.000		25.000.000		387.964.570
B 18 09	Villa Mondragone (Monte Porzio catone/Roma) 1° stralcio funzionale Centro studi e documentazione con annessa foresteria	Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	8.400.000.000	8.400.000.000					5.933.142.540
B 18 10	Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della cinta e del percorso pedonale	Comune di Segni	1.131.230.500	1.038.230.500					970.049.670
B 18 11	Catacombe di S. Ilario (Valmontone/Roma) Recupero area archeologica	Comune di Valmontone	392.504.757	392.504.757					392.504.757
B 18 12	Mura poligonali (Palestrina/Roma) Interventi di restauro e consolidamento e sistemazione dei percorsi	Comune di Palestrina	1.313.738.552	1.313.738.552	75.000.000		75.000.000		1.231.238.552
B 18 13	Rocca dei Colonna (Castel San Pietro/Roma) Sistemazione e ristrutturazione ai fini della fruibilità	Comune di Castel S. Pietro Romano	546.329.000	544.329.000	30.000.000		30.000.000		514.329.000
B 18 14	Museo del Santuario della Madonna del Buon Consiglio (Genazzano/Roma) Lavori di ristrutturazione	Provincia di Roma	405.771.440	405.771.440	25.000.000	5.000.000		20.000.000	380.771.440
B 18 16	Museo dell'Abbazia di S. Scolastica (Subiaco/Roma) Ristrutturazione, allestimento e valorizzazione	Provincia di Roma	2.097.302.248	2.097.302.248	54.000.000	27.000.000		27.000.000	2.043.302.250
B 18 17	Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini	Provincia di Roma	397.685.651	397.685.651	21.750.000	4.350.000		17.400.000	375.935.651

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROIETTIZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 18 18	Rocca Abbaziale - itinerario benedettino (Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per convegni e mostre	Provincia di Roma	741.881.223	741.881.223	50.000.000	10.000.000		40.000.000	691.881.223
B 18 19	Ex chiesa di S. Michele (Tivoli/Roma) Restauro e allestimento spazi per mostre e concerti	Provincia di Roma	389.792.498	389.792.498	22.500.000	4.500.000		18.000.000	367.292.498
B 18 20	Chiesa di S. Maria in Trasponte (Fiano Romano/Roma) Restauro	Comune di Fiano Romano	150.000.000	150.000.000	7.500.000		7.500.000		136.144.800
B 18 21	Chiesa di San Lorenzo (Civitella San Paolo/Roma) Restauro	Comune di Civitella S Paolo	254.200.000	254.200.000	15.000.000	3.000.000		12.000.000	233.879.107
B 18 22	Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero	Comune di Sant'Oreste	274.992.886	274.992.886	15.000.000		15.000.000		259.992.886
B 18 23	Area archeologica della Villa Neroniana (Anzio/Roma) Recupero	Comune di Anzio	1.230.000.000	1.230.000.000	70.000.000		70.000.000		1.113.806.819
B 18 24	Sistemazione area parcheggio adiacente Parco Chigi e risanamento Parco Primoli	Comune di Ariccia	1.000.000.000	1.000.000.000					
B 19 02	Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche	Regione Lazio	1.000.000.000	1.000.000.000					
B 19 03	Completamento della ristrutturazione dell'edificio e allestimento del Museo Tuscolano (primo lotto)	Comune di Frascati	4.517.000.000	4.517.000.000					4.517.000.000
B 19 04/1	Riquadrificazione Convento S. Francesco di Bellegra - I stralcio	Comune di Bellegra	995.862.486	995.862.486	60.000.000		60.000.000		917.076.559
B 19 04/2	Riquadrificazione Convento S. Francesco di Bellegra - II stralcio	Comune di Bellegra	840.000.000	840.000.000					724.849.970
B 19 05	Restauro del piano terra ex Convento degli Agostiniani da destinare a Museo Civico e restauro della Chiesa S.M. Novella	Comune di Bracciano	1.167.162.876	1.167.162.876	70.000.000		70.000.000		1.097.162.876

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori stanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 19 06	Restauri conservativi della Cappella votiva di S. Bernardino	Comune di Trevignano	402.000.000	402.000.000	20.000.000		20.000.000		377.757.075
B 19 07	Chiesa Collegiata (Anguillara/Roma) Restauro (prima fase)	Comune di Anguillara Sabazia	995.034.076	995.034.076	50.000.000		50.000.000		894.369.076
B 19 08	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi	Comune di Genazzano	5.774.000.000	5.774.000.000	300.000.000		300.000.000		4.760.583.580
B 19 09	Chiesa della Collegiata (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	601.829.313	601.829.313					548.829.313
B 19 10	Chiesa di Santa Maria Maggiore (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	134.231.098	134.231.098					
B 19 12	Centro documentazione dottrina sociale Leone XIII (Carpineto Romano/Roma)	Comune di Carpineto Romano	1.242.089.443	1.242.089.443					1.242.089.443
B 19 13	Chiesa di Santa Maria e San Mauro, Santuario Madonna degli Angeli (Canterano/Roma) Restauro e ristrutturazione	Comune di Canterano	300.000.000	300.000.000	15.000.000		15.000.000		285.000.000
B 19 14	Risanamento e consolidamento della Parrocchia di S. Michele Arcangelo	Comune di Capena	914.429.110	914.429.110					764.429.110
B 19 15	Recupero e risanamento della Chiesa di San Rocco	Comune di Galliano nel Lazio	212.890.475	172.890.475					172.890.475
B 19 16	Chiesa di Santa Liberata (Sant'Angelo Romano/Roma) Restauro	Comune di Sant'Angelo Romano	470.519.547	470.519.547					470.519.547
B 19 17	Chiesa di Sant'Egidio (Palombara Sabina/Roma)	Comune di Palombara Sabina	173.933.233	173.933.233					173.993.233
B 19 18	Adattamento del Convento di S. Cosimato al superamento delle barriere architettoniche	Comune di Vicovaro	149.999.834	149.999.834	7.500.000		7.500.000		115.763.830
B 19 19	Santuario di Vallepietra (Vallepietra/Roma) Centro di documentazione	Comune di Vallepietra	65.000.000	65.000.000					
B 19 20/1	Restauro delle Chiese di S. Rocco e S. Pietro (Capranica/ Viterbo)	Comune di Capranica	372.274.000	372.274.000	40.000.000		40.000.000		312.966.000
B 19 20/2	Restauro della Chiesa di S. Terenziano (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	627.504.000	627.504.000	70.000.000		70.000.000		539.626.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
188.878.520			132.214.970						397.757.075
447.184.540									944.369.076
952.116.720		1.428.175.070							5.060.583.580
274.414.650			192.090.260						548.829.313
577.169.720					87.750.000				1.329.839.443
142.500.000									300.000.000
382.214.550			267.550.190						764.429.110
86.445.240									172.890.475
235.259.770			164.681.840						470.519.547
86.996.620									173.993.233
			98.399.260						123.263.830
156.483.000									352.966.000
269.813.000			188.869.100						609.626.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 19 20/3	Pavimentazione del Corso Petrarca ed adeguamento impianti tecnici della Chiesa di S. Francesco (Capranica/ Viterbo)	Comune di Capranica	445.246.000	445.246.000	50.000.000		50.000.000		380.407.000
B 19 20/4	Sistemazione di Via della Mattonara (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	1.015.748.000	1.015.748.000	92.000.000		92.000.000		709.591.000
B 19 20/5	Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	453.724.000	453.724.000	52.000.000		52.000.000		388.901.000
B 19 20/6	Sistemazione dell'piazzale antistante la Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	560.327.000	560.327.000	66.000.000		66.000.000		481.249.900
B 19 21	Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesano	Diocesi di Viterbo	3.460.891.360	3.460.891.360	175.000.000		175.000.000		2.895.104.360
B 19 22	Convento di S. Francesco (Tuscania/Viterbo) Restauro conservativo	Parrocchia S. Cuore di Gesù	2.366.953.308	2.366.953.308	120.000.000		120.000.000		2.246.953.308
B 19 23	Museo della cristianità	Capitolo della Basilica Cattedrale di Viterbo	2.378.011.478	2.378.011.478	100.000.000		100.000.000		2.276.415.478
B 19 24/1	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Salvatore	Comune di Tarquinia	162.388.321	162.388.321	10.000.000	2.000.000		8.000.000	152.388.321
B 19 24/2	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Giacomo	Comune di Tarquinia	122.788.972	122.788.972	7.500.000	1.500.000		6.000.000	115.288.972
B 19 24/3	Progetto per consolidamento, restauro e recupero edificio Santuario S. Mario in Valverde	Comune di Tarquinia	2.260.000.000	2.260.000.000	120.000.000	24.000.000		96.000.000	1.967.814.106
B 19 25/1	Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Poggio Bustone	300.000.000	300.000.000	15.000.000		15.000.000		283.500.000
B 19 25/2	Sistemazione dell'Oasi francescana	Comune di Poggio Bustone	200.000.000	200.000.000	10.000.000		10.000.000		189.000.000
B 19 26	Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.450.721.814	1.450.721.814	80.000.000		80.000.000		1.324.721.810
B 19 27	Chiesa di S. Francesco (Rieti) Restauro e sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.507.273.000	1.507.273.000	92.250.000		92.250.000		1.408.023.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
190.203.000			133.142.450						430.407.000
354.795.500									801.591.000
194.450.500									440.901.000
240.624.950			168.437.460						547.249.900
1.447.558.180			1.013.286.520						3.070.104.360
449.390.660		674.085.990	786.433.660						2.366.953.308
355.762.290	120.772.800	412.870.640	1.104.266.440						2.376.415.478
			129.530.070						162.388.321
57.644.490									122.788.972
983.907.050			688.734.940						2.087.814.106
141.750.000									298.500.000
94.500.000									199.000.000
662.360.900									1.404.721.810
704.011.500			492.808.050						1.500.273.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 19 28/1	Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio. Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato. (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	763.999.650	763.999.650	40.000.000		40.000.000		738.138.650
B 19 28/2	Lavori di sistemazione della piazza del presepio vivente. (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	488.429.056	488.429.056	25.000.000		25.000.000		463.429.056
B 19 28/3	Lavori di sistemazione dell'area da destinare a parcheggio pubblico in Greccio capoluogo (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	216.075.000	201.075.000	10.000.000		10.000.000		185.386.540
B 19 29	Completamento funzionale dell'Abbazia di S. Quirico e Gualtiera	Comune di Micigliano	499.790.619	499.790.619	25.000.000		25.000.000		417.790.619
B 19 30	Complesso di S. Alessandro (Tofia/Rieti). Completamento della ristrutturazione dell'ex convento	Comune di Tofia in Sabina	1.500.000.000	1.500.000.000	75.000.000		75.000.000		1.425.000.000
B 19 31	Riqualificazione urbana del Borgo di Farfa e restauro del Monastero con riallestimento del Museo	Comune di Farfa in Sabina	4.964.000.000	4.964.000.000	275.000.000		275.000.000		4.376.844.692
B 19 32	S. Carlo (Sezze/Latina). Acquisizione, restauro ed arredo della casa natale di S. Carlo da Sezze	Comune di Sezze	400.000.000	400.000.000					370.949.280
B 19 33	Monastero delle Clarisse (Sezze/Latina). Completamento della ristrutturazione (prima fase)	Provincia di Latina	5.311.341.343	2.311.341.343					1.218.903.343
B 19 34	Lavori di consolidamento restauro Chiesa S. Maria della Pietà collegiata	Comune di Cori	1.000.000.300	1.000.000.300					985.274.998
B 19 35	Itinerario storico naturalistico P.R.U.M.O. Comune di Gaeta ambito area museale aperta della Città Vecchia di Gaeta e del promontorio di Monte Orlando	Comune di Gaeta	1.000.000.000	1.000.000.000	50.000.000		50.000.000		652.166.380

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
369.069.320			258.348.530						778.138.650
231.714.530			162.200.170						488.429.056
92.693.270			64.885.290						195.386.540
83.558.120	125.337.190		146.226.720	62.668.590					442.790.619
248.943.000	373.414.500		588.892.500						1.500.000.000
1.888.422.350	300.000.000		1.321.895.640						4.651.844.692
145.474.640					80.000.000				450.949.280
609.451.670									1.218.903.343
414.288.510			423.195.230						985.274.998
326.083.190			228.258.230						702.166.380

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 19 36	Santuario Madonna della Rocca (Fondi/Latina) Sistemazione via e parcheggio	Comune di Fondi	1.000.000.000	1.000.000.000					808.354.240
B 19 37	Castello Frangipane (Terracina/Latina) Ristrutturazione	Comune di Terracina	851.159.300	851.159.300					876.175.230
B 19 38	Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro	Comune di Castelforte	200.000.000	200.000.000					151.512.500
B 19 39	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)	Comune di Priverno	1.250.000.000	1.250.000.000					940.086.050
B 19 40	Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Sistemazione area antistante	Provincia di Latina	658.779.390	658.779.390					564.379.390
B 19 41/1	Restauro e risanamento conservativo e funzionale del convento di S. Francesco	Comune di Minturno	231.209.727	231.209.727	11.750.000		11.750.000		213.105.727
B 19 41/2	Progetto di sistemazione della Chiesa di S. Annunziata	Comune di Minturno	133.987.227	133.987.227	7.000.000	*	7.000.000		123.642.227
B 19 42	Illuminazione viabilità di accesso al Santuario della Madonna della Sorvesca	Comune di Sabaudia	105.593.680	105.593.680	6.250.000		6.250.000		99.343.680
B 19 43	Manutenzione straordinaria Chiesa S. Annunziata	Comune di Sabaudia	179.311.434	179.311.434	10.000.000		10.000.000		169.311.430
B 19 44	Chiesa di SS. Cosma e Damiano. Restauro	Comune di Santi Cosma e Damiano	120.000.000	120.000.000	5.000.000		5.000.000		104.999.996
B 19 45	Chiesa di San Marco (Latina) Restauro	Provincia di Latina	577.000.000	577.000.000	6.500.000		6.500.000		567.665.890
B 19 46	Ristrutturazione Santuario Madonna del Colle	Comune di Lenola	99.961.000	99.961.000					96.571.027
B 19 47	Recupero del Complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa	Comune di Formia	936.086.742	936.086.742	50.000.000		50.000.000		885.571.721
B 19 48	Cattedrale di Santa Maria Annunziata (Sezze/Latina) restauro	Comune di Sezze	700.000.000	700.000.000	35.000.000		35.000.000		554.378.290
B 19 49	Madonna della Civita (Itri/Latina) Adeguamento della strada di accesso	Provincia di Latina	934.704.490	934.704.490					934.704.490
B 19 50	Museo storico bonifacismo (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione	Congregazione suore Cistercensi della Carità	650.301.668	650.301.668	35.000.000		35.000.000		508.701.668

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 19 51	Itinerari di San Tommaso d'Aquino (Aquino/Frosinone) Sistemazione del borgo medievale, del castello e della chiesa di Santa Maria della Libera	Comune di Aquino	989.007.346	989.007.346	55.000.000		55.000.000		934.007.346
B 19 52	Sistemazione area attrezzata esterna al Santuario della Madonna di Canneto	Comune di Settefrati	252.424.924	252.424.924					252.424.924
B 19 53	Santa Maria Assunta (Atina/Frosinone) Restauro	Parrocchia Santa Maria Assunta	700.278.979	700.278.979					615.214.971
B 19 54	Ristrutturazione Chiesa di Santo Stefano (Settefrati/Frosinone)	Comune di Settefrati	313.880.125	313.880.125					299.999.995
B 19 55	Basilica S. Maria Salome - Scala Santa (Veroli/Frosinone) Ristrutturazione	Ente chiesa di S. Maria Salomone	240.000.000	240.000.000	7.000.000		7.000.000		232.550.000
B 19 56	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Cassino	4.176.000.000	4.176.000.000					3.146.274.890
B 19 57	Chiesa di Santa Maria (Boville Ernica/Frosinone) Restauro	Comune di Boville Ernica	256.272.400	256.272.400	30.000.000		30.000.000		226.272.400
B 19 58	Consolidamento statico e restauro conservativo Chiesa di San Pietro in Monte (S. Giovanni Campano)	Comune di Monte San Giovanni Campano	430.000.000	430.000.000	22.500.000		22.500.000		407.500.000
B 19 59	Chiesa di Santa Maria Annunziata (Fumone/Frosinone) Restauro	Comune di Fumone	470.000.000	470.000.000					458.090.415
B 19 60	Chiese S. Maria a Fiume, San Nicola, (Ceccano/Frosinone) Restauro	Comune di Ceccano	487.803.180	487.803.180	25.000.000		25.000.000		398.803.180
B 19 61	Musei del Capitolo della Cattedrale (Anagni/Frosinone)	Diocesi di Anagni-Alatri	363.475.000	363.475.000	20.000.000		20.000.000		339.875.710
B 19 63/1	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	1.309.999.279	809.999.279	41.777.850		41.777.850		768.221.429
B 19 63/2	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza - Forniture	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	150.000.000	150.000.000					150.000.000
B 19 64	Cattedrale di San Paolo (Alatri)	Comune di Alatri	757.575.900	757.575.900	40.000.000		40.000.000		643.006.900

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 19 65	Chiesa della S.S. Annunziata (Frosinone) Restauro	Comune di Frosinone	870.224.170	870.224.170	87.083.554		87.083.550		782.276.535
B 19 66	Risanamento e ristrutturazione Chiesa di S. Pietro - Santuario di San Cataldo	Comune di Supino	422.384.000	422.384.000	25.000.000		25.000.000		397.384.000
B 19 67	Convento di S. Antonio Abate (Ferentino/Frosinone) e Ristrutturazione e allestimento museale	Comune di Ferentino	2.750.000.000	2.750.000.000	300.000.000		300.000.000		2.005.922.000
B 19 68	Chiesa di S. Restituta (Sora/Frosinone) Restauro	Comune di Sora	675.357.148	675.357.148					675.357.148
B 19 69	Chiesa di San Mito	Comune di Roccasecca	243.459.040	243.459.040					243.459.040
B 19 70	Chiesa di Santa Maria Assunta (Piedimonte San Germano/Frosinone) Restauro	Ente Chiesa di S. Maria Assunta in Piedimonte Alto	100.000.000	100.000.000					85.233.700
B 19 71	Abbazia di Trisulti-Casamari (Veroli/Frosinone) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità	Provincia di Frosinone	1.110.846.077	1.110.846.077	75.000.000	75.000.000			1.035.846.077
B 19 72	Ampliamento della Chiesa in loc. Grunuolo facente parte della Parrocchia di S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	71.877.000	71.877.000					56.823.560
B 19 73	Rifacimento copertura, facciata esterna e sistemazione area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	100.000.000	100.000.000					78.655.620
B 19 74	Sistemazione copertura Chiesa di S. Lorenzo Parrocchia S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	50.557.000	50.557.000					37.726.030
B 19 75	Abbazia di Casamari	Ordine Cistercense	1.000.000.000	1.000.000.000					995.846.440
B 19 76			1.000.000.000	2.000.000.000					
B 19 77	Chiesa di S. Domenico (Rieti) - Opera di restauro	Diocesi di Rieti	1.000.000.000	1.000.000.000					923.844.420
B 19 78			200.000.000	200.000.000					
B 19 79			300.000.000	300.000.000					
B 20 01.1	Opera lirica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio	Teatro dell'Opera di Roma	15.000.000.000	15.000.000.000					15.000.000.000
B 20 01.2	Musica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio	Accademia di S. Cecilia di Roma	13.000.000.000	13.000.000.000					4.100.819.900

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROIETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
B 20 01.3	Prosa. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio	Teatro Roma	7.000.000.000	7.000.000.000					
B 20 01.4	Mostre. Programma di esposizioni d'arte da svolgersi nelle Scuderie Papali di Roma	Agenzia Romana per il Giubileo	5.000.000.000	5.000.000.000					5.000.000.000
B 20 01.5	Convegno internazionale	Agenzia Romana per il Giubileo	2.000.000.000	2.000.000.000					2.000.000.000
B 20 01.6	Concorsi finalizzati all'arricchimento del patrimonio culturale (di Comune, Provincia e Regione)	Agenzia Romana per il Giubileo	5.000.000.000	5.000.000.000					5.000.000.000
B 20 01.7	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale di Roma	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000					
B 20 01.8A	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma	Provincia di Roma	750.000.000	750.000.000					
B 20 01.8B			250.000.000	250.000.000					
B 20 01.9	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Regione Lazio	Regione Lazio	1.000.000.000	1.000.000.000					
B 20 01.10	Iniziativa e mostre d'arte contemporanea a Roma e nel Lazio	Agenzia Romana per il Giubileo	1.000.000.000	1.000.000.000					1.000.000.000
B 20 02	Centro internazionale per le arti e la cultura a Roma Via Piccolomini - Villa del Sole	Fondazione Niccolò Piccolomini	4.785.000.000	4.785.000.000					3.250.849.592
TOTALE SETT. B			624.500.556.266	574.955.056.266	4.904.168.604	162.350.000	4.473.418.600	268.400.000	200.969.335.021
C 01 01	Ponti Regina Margherita, Cavour, Umberto I, Vitt. Emanuele II.	Comune di Roma	5.841.626.450	5.841.626.450					5.841.626.450
C 01 02	Ponti Caio Cestio, Duca D'Aosta, cavalcavia del Muro Tiro (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	6.792.802.868	6.792.802.868					6.792.802.868
C 01 03	Ponti Flaminio e Testaccio	Comune di Roma	7.185.726.286	7.185.726.286					7.185.726.286
C 01 04	Ponte Risorgimento (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	2.676.966.400	2.676.966.400					2.558.365.400
C 01 05	Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Sisto	Comune di Roma	3.913.187.912	3.913.187.912	80.000.000	80.000.000			3.174.069.912
C 01 06	Ponte Fabricio (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	2.126.876.134	2.126.876.134	180.000.000	36.820.000		143.180.000	1.717.781.899

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
2.500.000.000									5.000.000.000
1.000.000.000									2.000.000.000
2.500.000.000									5.000.000.000
500.000.000									
1.625.424.790									3.250.849.591
94.839.898.848	1.500.561.330	3.746.740.760	23.277.468.540	684.139.354	244.250.000	324.845.000.000			529.038.909.205
1.168.325.290		1.752.487.930	2.044.569.260						5.841.626.450
1.358.560.570		2.037.840.860	2.377.481.000						6.792.802.868
1.437.145.250		2.155.717.880	2.515.004.200						7.185.726.286
511.673.080		767.509.620	895.427.890						2.558.365.400
1.597.034.950			1.110.924.470						3.254.069.912
323.003.850		484.505.790	652.604.970						1.897.781.899

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti con superiori al 10% Costo stimato	
C 01 07	Ponte Nomentano (Roma) Interventi di restauro conservativo su prospetti, intradossi e torre (prima fase)	Comune di Roma	2.426.138.767	2.426.138.767	70.000.000	36.500.000		33.500.000	2.356.138.827
C 01 08	Intervento urbanistico connesso alla linea S. Pietro - Venezia.	Comune di Roma		990.000.000	990.000.000		990.000.000		
C 01 09	Intervento urbanistico connesso alla linea S. Pietro - Aurelia	Comune di Roma		400.000.000	400.000.000		400.000.000		
C 01 10	P.zze S. Pietro in Vincoli, S. Prassede, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma). Riqualificazione ambientale, risagomatura strade e ripristino dei selciati	Comune di Roma	3.245.965.090	3.245.965.090	250.000.000	50.000.000		200.000.000	2.995.965.091
C 01 11	Via Ottaviano, viale Angelico, circ.ne Clodia, via Giuliano (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	2.016.574.296	2.016.574.296					2.016.574.296
C 01 12	Viale Trastevere, via Marosini, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	2.894.625.466	2.894.625.466					2.894.625.466
C 01 13/1	Lungotevere di sinistra e destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti. Interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Ristrutturazione marciapiedi, sistema fognario superficiale e arredo urbano.	Comune di Roma	4.437.267.168	4.437.267.168	340.000.000	115.000.000		225.000.000	
C 01 13/2	Manutenzione superficiale delle sedi stradali del Lungotevere di sinistra e di destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti e zone limitrofe agli itinerari degli autobus turistici.	Comune di Roma	7.000.000.000	7.000.000.000					

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 01 14	Via S Gregorio, via G Lanza, via Washington. Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici	Comune di Roma	8.205.315.736	8.205.315.736	200.000.000	135.000.000		65.000.000	8.005.315.736
C 01 15/1	Via Appia Antica. 1° lotto. Riqualificazione e adeguamento della sede stradale da piazza Numa Pompilio a Via di Cecilia Metella	Comune di Roma	3.587.522.850	3.587.522.850					2.754.312.849
C 01 15/2	Via Appia Antica. 2° lotto. Riqualificazione e adeguamento della sede stradale da Via di Cecilia Metella a G.R.A.	Comune di Roma	10.541.280.728	10.541.280.728					9.514.285.728
C 01 17	Via Pineta Sacchetti (Roma) Allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi	Comune di Roma		300.000.000	300.000.000	140.000.000		160.000.000	
C 01 18/1	Villa Borghese: Portico dei leoni, Mostra dell'Acqua Felice, Arco di Settimio Severo, propilei neoclassici, prospetti di piazza delle Canestre	Comune di Roma	1.644.535.547	1.644.535.547	100.000.000	20.000.000		80.000.000	1.325.047.550
C 01 18/2	Villa Borghese: propilei egizi, fontana del Fiacco, perimetri murari e scogliere di viale F. La Guardia e del giardino del lago, restauro degli arredi architettonici.	Comune di Roma	1.760.924.628	1.760.924.628	100.825.000	21.650.000		79.175.000	1.418.463.630
C 01 19	Villa Borghese: Giardini Segreti, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni.	Comune di Roma	915.133.850	915.133.850					915.133.850
C 01 20	Villa Borghese: Parco dei Daini (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale	Comune di Roma	1.004.455.525	1.004.455.525	36.000.000	11.900.000		24.100.000	839.455.520

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
4.002.657.870			1.801.800.510						8.205.315.736
1.377.156.420									2.754.312.849
4.757.142.860									9.514.285.728
									300.000.000
662.523.770									1.425.047.550
709.231.810			496.462.770						1.519.288.630
457.566.920			320.296.850						915.133.850
419.727.760									875.455.520

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROIEZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 01 21/1	Villa Doria Pamphilj (Roma): sistemazioni esterne ed allestimento del museo di Villa Vecchia, restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedri - illuminazione esterna.	Comune di Roma	2.265.762.144	2.265.762.144	150.000.000	30.000.000		120.000.000	2.115.762.140
C 01 21/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) recupero delle serre ottocentesche.	Comune di Roma	1.666.150.381	1.666.150.381	117.750.000	23.550.000		94.200.000	1.548.400.380
C 01 22/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e consolidamento di Casale di Giove.	Comune di Roma	1.694.479.906	1.694.479.906	114.200.000	22.840.000		91.360.000	1.580.279.906
C 01 22/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e allestimento museale della Cascina Falsetti e dell'area annessa.	Comune di Roma	1.497.997.384	1.497.997.384	100.000.000	20.000.000		80.000.000	1.397.997.380
C 01 23	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale del Giardino del Testro	Comune di Roma	1.750.958.910	1.750.958.910	63.000.000	21.420.000		41.580.000	1.487.958.909
C 01 24	Villa Pamphilj (Roma) Recupero e restauro Villino Corsini	Comune di Roma	1.789.260.680	1.789.260.680					1.789.260.680
C 01 25	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero e restauro dell'Arco dei Quattro Venti e delle aree limitrofe	Comune di Roma	1.137.773.065	1.137.773.065					897.773.060
C 01 26	Recupero urbano del Ghetto (Roma) via dei Falegnami, piazza Mattei, via dei Fusari, piazza Lovatelli, piazza Campitelli, piazza Monte Savello, via Testro Marcello, via Montanara e area del Foro Oltorio.	Comune di Roma	6.317.029.475	6.317.029.475					6.317.029.476
C 01 28	Potenziamento meccanizzazione servizio giardini	Comune di Roma	2.412.000.000	2.412.000.000					2.194.560.000
C 01 29	Lavori per l'impianto del verde nel parco S. Maria della Pietà	Comune di Roma	1.970.000.000	1.970.000.000					1.430.033.380
C 01 30	Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche	Comune di Roma	2.947.589.621	2.947.589.621					

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 02 A	Area delle Basiliche di S. Pietro in Vaticano, S. Giovanni, Santa Maria Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme e San Paolo fuori le mura. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale.	STA	2.625.700.000	2.625.700.000					
C 02 01.1.1	"BOR": Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	3.154.743.992	3.154.743.992	608.351.899		608.351.899		2.546.392.090
C 02 01.1.2	"RIS": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza Risorgimento ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	7.434.770.788	7.434.770.788	1.005.837.949		1.005.837.949		6.428.932.840
C 02 01.1.3	"CON": Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	2.129.860.914	2.129.860.914	516.288.606		516.288.606		1.613.572.310
C 02 01/2	Area della Basilica di San Pietro in Vaticano. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione	ACEA	1.869.560.000	1.869.560.000					
C 02 01/4	Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano - interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per il risanamento igienico ambientale	AMA	907.430.000	907.430.000					
C 02 01/5	Area della Basilica di San Pietro in Vaticano. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione o allestimento di strutture temporanee destinati alla sicurezza.	Ministero dell'Interno	2.805.000.000	2.805.000.000					

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
1.373.196.040									3.154.743.989
3.214.466.420			2.250.126.490						7.434.770.789
806.786.150									2.119.860.916
						2.805.000.000			2.805.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 02 01/8	Infrastrutturazione urbana area Stazione di S. Pietro	Roma 2000 S.p.A.	11.986.500.000	11.986.500.000					11.152.523.410
C 02 02/1	Demolizione rimessa ATAC via Carlo Felice tra Basiliche S. Giovanni e S. Croce.	Comune di Roma	1.732.062.489	1.732.062.489					1.732.062.489
C 02 02.2.1	Concorsi di progettazione preliminare di ponti pedonali	Comune di Roma	400.000.000	400.000.000					400.000.000
C 02 02.2.2	"GIO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Giovanni ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	6.919.341.560	6.919.341.560	1.408.362.195			1.408.362.195	5.510.984.360
Cx 02 02.2.3	"MER": Progetto di riqualificazione ambientale di via Merulana ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	4.943.262.000	4.943.262.000					
C 02 02.2.4	"MAR": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Maria Maggiore ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	3.992.080.438 *	3.992.080.438	587.621.022			587.621.022	3.404.459.420
C 02 02.2.5	"CRO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Croce in Gerusalemme ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	1.493.485.886	1.493.485.886	257.033.837			257.033.837	1.236.452.050
C 02 02.2.6	"QUA": Progetto di riqualificazione ambientale di via Santi Quattro Coronati ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	1.083.776.860	1.083.776.860	187.434.104			187.434.104	896.342.760
C 02 02/3	Recupero funzionale e valorizzazione edifici storici ospedale S. Giovanni in Roma. Comparto funzionale al Giubileo per l'accoglienza dei pellegrini.	Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni-Addolorata	14.129.000.000	14.129.000.000	706.450.000		706.450.000	706.450.000	9.497.407.760

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE:				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% e 50% Impegno di spesa	30% e 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
5.024.489.350					1.103.544.700				12.256.068.110
1.558.056.240									1.732.062.489
				400.000.000					400.000.000
2.755.492.180									6.919.346.555
1.702.229.710									3.992.080.442
618.226.020									1.493.485.887
448.171.380									1.083.776.864
4.748.703.878			3.324.092.720						10.203.857.760

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 02 02/5	Area delle Basiliche di S. Giovanni, S.M. Maggiore, S. Croce in Gerusalemme. Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per il risanamento igienico sanitario	AMA	1.456.866.000	1.456.866.000					
C 02 02/6	Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma). Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione e allestimento di strutture temporanee destinati alla sicurezza.	Ministero dell'Interno	2.385.350.000	2.385.350.000					
C 02 02/7	Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma). Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione	ACEA	3.864.003.000	3.864.003.000					
C 02 3.1.1	"PAO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazzale S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	6.988.788.336	6.988.788.336	1.003.619.394			1.003.619.394	5.985.168.940
C 02 3.1.2	"LUN": Progetto di riqualificazione ambientale di Lungotevere S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	1.379.200.551	1.379.200.551	197.196.888			197.196.888	943.807.660
C 02 3.1.3	"OST": Progetto di riqualificazione ambientale di via Ostiense ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	766.343.098	766.343.098	109.172.833			109.172.833	525.198.260
C 02 03/2	Area della Basilica di San Paolo Fuori le mura. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione.	ACEA	1.943.700.000	1.943.700.000					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 02 03/4	Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per il risanamento igienico sanitario	AMA	386.536.000	386.536.000					
C 02 03/5	Area della Basilica di San Paolo Fuori le mura. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione e allestimento di strutture temporanee destinati alla sicurezza.	Ministero dell'Interno	1.491.600.000	1.491.600.000					
C 02 03/6	Area della Basilica di San Paolo Fuori le mura. Restauro e consolidamento del transetto della Basilica di S. Paolo fuori le Mura e manutenzione del muro di cinta verso Viale S. Paolo.	P. Amm.ne Basilica di S. Paolo	1.256.320.000	1.256.320.000					1.256.320.000
C 02 04.1	Itinerari giubilari e storici. Contributi per la manutenzione e la riqualificazione delle sedi stradali e relative pertinenze	Comune di Roma	6.610.035.292	6.610.035.292					6.610.035.290
C 02 04.2	Contributo per interventi di manutenzione delle sedi stradali e relative pertinenze degli itinerari giubilari e storici, processioni e celebrazioni religiose	Comune di Roma	10.592.620.000	10.592.620.000					5.933.915.680
C 02 05	Contributo per la manutenzione delle sedi stradali e pertinenze delle strade di accesso e dei parcheggi a servizio delle zone limitrofe alle catacombe aperte al pubblico	Comune di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000					
C 02 06	Ponti pedonali temporanei nella città di Roma	Comune di Roma	7.400.000.000	7.400.000.000					697.200.000
C 02 08	Interventi speciali di illuminazione cittadina	ACEA	3.000.000.000	3.000.000.000					
C 02 09	"ATT" Fornitura e posa in opera attrezzature temporanee nelle aree delle basiliche di S. Pietro, S. Giovanni e S. Paolo	Comune di Roma	5.420.142.900	5.420.142.900	851.933.391			851.933.391	4.568.209.510

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 03 01	Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) Riqualificazione delle sedi stradali	Comune di Roma	2.400.000.000	2.400.000.000	120.000.000	24.000.000		96.000.000	2.224.858.940
C 03 02	Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali	Comune di Roma	405.668.350	405.668.350					405.668.350
C 03 03	Via delle Muratte	Comune di Roma	2.382.986.900	2.382.986.900	130.000.000		130.000.000		2.223.908.900
C 03 04	Area pedonale del Colosseo e parte della via Sacra (Roma) Ristrutturazione della sede stradale	Comune di Roma	3.257.956.147	3.257.956.147	90.000.000	46.000.000		44.000.000	3.167.956.147
C 03 05	Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotram	Comune di Roma		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000		
C 03 06	Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali - I° Stralcio	Comune di Roma	97.000.000.000	97.000.000.000					112.500.000.000
C 03 07	Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali - II° Stralcio	Comune di Roma	27.500.000.000	27.500.000.000					27.500.000.000
C 03 08	Contributi ristrutturazione bagni locali pubblici ed insegne esercizi commerciali	Comune di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000					
C 03 09	Incentivi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione	Regione Lazio	2.000.000.000	2.000.000.000					
C 04 A	Terminal bus	Comune di CastelGandolfo	1.299.599.000	1.299.599.000					998.400.400
C 04 B	Centro servizi di prima necessità	Comune di CastelGandolfo	1.499.414.000	1.499.414.000					1.141.585.930
C 04 C	Sottopasso pedonale di Via Marcemana	Comune di CastelGandolfo	299.628.000	299.628.000					223.371.860
C 04 D	Realizzazione aree e strutture di parcheggio a servizio del centro storico	Comune di CastelGandolfo	549.251.000	549.251.000					381.748.590
C 04 E	Sistemazione della viabilità urbana	Comune di CastelGandolfo	3.500.808.000	3.500.808.000					2.560.691.960
C 04 F	Sistemazione della passeggiata sul lungo lago	Comune di CastelGandolfo	2.499.407.000	2.499.407.000					1.789.592.500
C 04 H	Potenziamento struttura fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo	1.399.482.000	1.399.482.000					995.517.270

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 05 01/1	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni	Comune di Roma	3.299.321.550	3.299.321.550	105.600.000		105.600.000		2.132.931.220
C 05 01/2	Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	Comune di Roma	1.653.791.396	1.653.791.396					1.413.910.100
C 06 01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma): Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma	2.933.585.420	2.933.585.420	175.000.000		175.000.000		2.253.329.420
C 07 01	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma): Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma	1.954.457.591	1.954.457.591	224.000.000		224.000.000		1.221.273.580
C 08 01/1	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini Segreti	Comune di Roma	1.720.816.797	1.720.816.797	85.500.000		85.500.000		1.635.316.796
C 08 01/2	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini del Lago	Comune di Roma	2.973.597.648	2.973.597.648	156.000.000		156.000.000		1.989.845.440
C 08 01/3	Restauro del parco di Villa Borghese: Recinzioni lungo Via pinciana, Giardini del lago, cancelli d'ingresso, Parco dei Daini.	Comune di Roma	1.343.315.297	1.343.315.297	124.000.000		124.000.000		1.219.315.297
C 08 01/4	Restauro del parco di Villa Borghese: Impianto d'irrigazione	Comune di Roma	2.881.801.922	2.881.801.922	130.000.000		130.000.000		2.751.801.922
C 08 01/5	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000	104.500.000		104.500.000		585.569.170
C 09 01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma): Riquadrificazione del comprensorio degli Acquedotti	Comune di Roma	3.392.736.382	3.392.736.382	175.000.000		175.000.000		3.106.442.382
C 09 02/1	Riquadrificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica): Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compreso tra la cartiera Latina ed il circo di Massenzio)	Comune di Roma	3.933.379.795	3.933.379.795	198.409.090		198.409.090		3.349.643.705
C 09 02/2	Riquadrificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica): Restauro manufatti storici: Ponti, Annia Regilla, Ninfeo Egeria, S. Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Velia	Comune di Roma	5.450.000.000	5.450.000.000	326.590.910		326.590.910		4.017.581.230

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 10 01	Restauro del parco Villa Ada - Savoia: Sistemazione percorsi, verde, accessi, aree attrezzate impianto di irrigazione. Restauro conservativo di manufatti di arredo	Comune di Roma	3.007.974.787	3.007.974.787	300.000.000		300.000.000		2.682.146.449
C 11 01/1	Area archeologica del Celio via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali - interventi di restauro e manutenzione	Comune di Roma	72.135.000	72.135.000	70.135.000		70.135.000		
C 11 01/2	Area archeologica del Celio. Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili, integrazione della illuminazione esistente e/o nuovi impianti	Comune di Roma	2.534.175.054	2.534.175.054	197.717.600		197.717.600		2.338.457.450
C 11 02	Area archeologica del Celio. Casina dei Salvi consolidamento e restauro	Comune di Roma	3.123.581.551	3.123.581.551					2.627.416.601
C 11 03	Area archeologica del Celio. Sezione polizia turistica e banda nella ex palestra dei vigili.	Comune di Roma	1.357.952.531	1.357.952.531	108.446.400		108.446.400		1.172.641.130
C 11 04	Area archeologica del Celio. Restauro del Casale quattrocentesco dell'abate commendatario e sistemazione esterna delle aree limitrofe.	Comune di Roma	736.459.817	736.459.817					616.459.820
C 11 05	Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio colle del Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio ex Antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio.	Comune di Roma	3.995.428.060	3.995.428.060					2.640.779.970
C 11 06	Area archeologica del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Teresa di Calcutta. (Manutenzione)	Comune di Roma	2.498.145.408	2.498.145.408	149.083.200		149.083.200		1.730.133.210
C 11 07	Area archeologica del Celio. Recupero del pulpito di S. Domenico.	Comune di Roma	348.805.233	348.805.233					301.710.230
C 11 08	Oratori Sant'Andrea e Santa Silvia (affreschi), Cappella di Santa Barbara (prospetto), Biblioteca di Papa Agapito (portale)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	396.509.888	396.509.888					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
1.341.073.221									2.982.146.449
									70.135.000
1.169.228.730									2.536.175.050
1.313.708.290									1.627.416.601
586.320.560									1.281.087.530
308.229.910									616.459.820
1.320.389.980									2.640.779.970
865.066.605			605.546.620						1.879.216.410
150.855.110									301.710.230
						450.000.000			450.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 11 09	Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e scalinata)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	250.000.000	250.000.000					
C 11 10	Chiesa di S. Tommaso in Formis (coperture)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	272.377.273	272.377.273					
C 11 11	Torre medioevale - ISNP (consolidamento, coperture, paramenti murari)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	274.765.900	274.765.900					
C 11 12	Archi del Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	747.071.636	747.071.636					
C 11 13	Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.353.310.311	1.353.310.311					
C 11 14	Fronti laterizie sul Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	628.336.602	628.336.602					
C 11 15	Biblioteca di Papa Agapito ed insulae romane adiacenti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.044.466.371	1.044.466.371					
C 11 16	Arco di Silvano e Dolabella e soprastante Acquedotto Celimontano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	448.352.303	448.352.303					
C 11 17	Basilica SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	216.500.000	216.500.000					
C 11 18	Chiesa di S. Maria in Domnica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	190.000.000	190.000.000					
C 11 19	Chiesa di S. Tommaso in Formis	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	53.300.000	53.300.000					
C 11 20	Complesso monumentale di San Gregorio Magno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	630.700.000	630.700.000					
C 11 21	Attività di formazione	Provincia di Roma	191.500.000	191.500.000					163.500.000
C 11 22	Riscaldamento S. Gregorio e Cappella Salvati	ITALGAS	170.000.000	170.000.000					169.317.600
C 11 23			600.000.000	600.000.000					
C 12 01	Villa Doria Pamphili (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica	Comune di Roma	3.300.000.000	3.300.000.000					3.168.601.860
C 12 02	Villa Doria Pamphili (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	Comune di Roma	2.999.842.077	2.999.842.077	150.000.000		150.000.000		1.899.941.850

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 12 03	Villa Doria Pamphili (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale della Valle dei Daini	Comune di Roma	485.822.273	485.822.273	22.400.000		22.400.000		427.577.270
C 12 04/1	Villa Doria Pamphili (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del Teatro	Comune di Roma	765.498.754	765.498.754	50.000.000		50.000.000		655.453.750
C 12 04/2	Villa Doria Pamphili (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini dei Cedri di Villa Vecchia, delle Serre	Comune di Roma	536.861.039	536.861.039	35.000.000		35.000.000		461.838.040
C 13 01/1	Parco di Monte Mario (Roma): Recupero dei casali Mellini	Comune di Roma	2.577.532.996	2.577.532.996	274.376.000		274.376.000		2.135.156.996
C 13 01/2	Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi	Comune di Roma	4.300.000.000	4.300.000.000	123.000.000		123.000.000		2.743.555.750
C 14 01	Pendici del Gianicolo (Roma) Riqualificazione delle aree a verde	Comune di Roma	2.133.174.815	2.133.174.815	150.000.000		150.000.000		1.817.940.810
C 15 01	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro vegetazionale ed infrastrutturale	Comune di Roma	695.683.240	695.683.240	50.000.000		50.000.000		645.683.240
C 15 02	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle Esedre Centrali e dei nuclei minori delle Terme di Traiano	Comune di Roma	1.640.667.730	1.640.667.730	60.000.000	20.000.000		40.000.000	1.380.667.730
C 18 01	Piano straordinario di prevenzione o sicurezza	Comune di Nemi	1.000.000.000	1.000.000.000					952.897.961
C 18 02	Santuario della Mentorella (Pisoniano-Capranica/Roma) Ristrutturazione del Santuario e riqualificazione ambientale dei territori vicini	Provincia di Roma	2.318.400.662	2.318.400.662	120.000.000	24.000.000		96.000.000	2.121.140.940
C 18 03	Tutela ambientale di Torre Astura	Comune di Nettuno	4.767.410.760	4.767.410.760	300.000.000		300.000.000		4.467.410.760
C 18 04	Boato e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma) Interventi di riqualificazione	Provincia di Roma	900.000.000	900.000.000	60.000.000	12.000.000		48.000.000	
C 18 05			300.000.000	300.000.000					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
C 19 01/a2	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Quota parte sistemazione idraulica fosso Acqua Mariana.	Comune di Roma	5.965.357.820	5.965.357.820					5.965.357.820
C 19 01/b1	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	7.798.989.228	7.798.989.228					7.678.809.840
C 19 01/b2	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	2.989.573.115	2.989.573.115					3.200.000.000
C 19 01/b3	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	13.878.329.352	13.878.329.352					13.395.160.190
C 19 01/b4	Opere di difesa del litorale di Ostia e Focene	Regione Lazio	7.165.123.594	7.165.123.594					7.086.403.210
C 19 02/1	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di visita	Provincia di Roma	1.500.000.000	1.500.000.000					
C 19 02/2			3.250.000.000	3.250.000.000					
C 19 01/3			3.250.000.000	3.250.000.000					
C 20 01	Orto Botanico	Università La Sapienza	600.000.000	600.000.000					
TOTALE SECT. C			515.005.126.746	516.695.126.746	25.246.187.438	1.090.680.000	16.992.038.774	7.869.918.664	410.440.183.083
D 02 01	Linea tranviaria S. Pietro Aurelia	Comune di Roma		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000		
D 03 01	Tram Venezia - San Pietro Realizzazione della linea tranviaria.	Comune di Roma		3.550.000.000	3.550.000.000		3.550.000.000		
D 04 01	Linea tranviaria Archeotram	Comune di Roma		2.800.000.000	2.800.000.000		2.800.000.000		
D 05 01/1	Fornitura di 200 autobus urbani di tipo lungo da 12 mt.	ATAC	105.744.100.000	105.744.100.000					105.656.100.000
D 05 01/2	Fornitura di autobus urbani di media capacità	ATAC	19.807.338.000	19.807.338.000					20.021.383.310
D 05 01/3	Fornitura di 18 vetture tranviarie di grande capacità.	ATAC	78.870.016.000	78.870.016.000					78.870.016.000
D 05 01/4	Fornitura di 130 autobus extraurbani di tipo lungo da 12 mt.	COTRAL	60.695.411.000	60.695.411.000					60.645.184.600
D 05 01/5	Fornitura di 30 autobus extraurbani di media capacità	COTRAL	13.472.353.000	13.472.353.000					13.461.863.100

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
3.151.928.910									5.965.357.820
3.839.404.920									7.678.809.840
1.600.000.000									3.200.000.000
6.697.580.090									13.395.160.190
3.543.201.600									7.086.403.210
266.161.262.589	317.905.920	9.515.568.080	28.341.600.530	400.000.000	1.103.544.700	11.180.450.000			447.970.365.221
									2.500.000.000
									3.550.000.000
									2.800.000.000
	26.842.830.000		68.247.660.000						105.656.100.000
	8.402.415.400		9.405.952.640						20.021.283.310
	23.661.004.800	15.774.003.200							78.870.016.000
9.796.529.820	18.193.555.380	16.794.051.120	6.997.521.300						60.645.184.600
	4.038.558.930	5.833.474.010	5.042.652.370						13.461.863.100

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
Dx 05 01/6	Fornitura equipaggiamento "Chopper" per motrici linea metro "A"	COTRAL	7.891.000.000	7.891.000.000					7.891.000.000
D 05 01/7	Fornitura di 4 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Viterbo	COTRAL	36.190.000.000	36.190.000.000					36.190.000.000
Dx 05 01/8	Fornitura materiale rotabile Ferrovia Roma-Pantano	COTRAL	12.200.000.000	12.200.000.000					
D 05 02	Fornitura di autobus da 18 metri	ATAC	44.000.000.000	44.000.000.000					43.992.366.000
D 07 01	Sottopasso di Castel Sant'Angelo (Costruzione di un sottopasso stradale di circa 1500 metri e di una stazione di scambio-parcheggio per circa 25 posti pullman)	Comune di Roma		2.341.816.000	3.450.000.000		3.450.000.000		26.391.816.000
D 07 02	Sottovia Lungotevere in Sassia	Comune di Roma	33.946.439.545	33.946.439.545					32.518.558.745
D 08 01	Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta	Comune di Roma	57.011.650.000	57.011.650.000	3.400.000.000	680.000.000		2.720.000.000	53.611.650.000
D 08 02	Parcheggio propaganda Fide Gianicolo	Congregazione de Propaganda Fide	80.000.000.000	40.000.000.000	4.000.000.000		4.000.000.000		24.000.000.000
D 08 03	Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	16.720.300.000	16.720.300.000					
D 09 01	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	85.526.804.000	85.526.804.000	7.500.000.000		7.500.000.000		
D 10 01/a	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2°)	ANAS	77.344.981.094	73.251.470.312					73.251.470.310
D 10 01/b	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 3°)	ANAS	16.842.971.397	16.666.252.179					16.666.252.180
D 11 01	GRA tratto Pisana-Aurelia (Roma) Realizzazione della terza corsia e svincoli (Lotto 23b)	ANAS	45.950.000.000	45.950.000.000					45.946.860.256
D 13 01	Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla stazione FS (Ciampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria	Provincia di Roma	1.119.620.000	1.119.620.000	30.000.000		30.000.000		1.089.620.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
	3.945.500.000								7.891.000.000
	18.095.000.000								36.190.000.000
	9.998.265.000		29.594.864.400						43.992.366.000
26.391.816.000									29.841.816.000
16.259.279.370			11.381.495.560						32.518.558.745
11.129.752.000		16.694.628.000	18.764.077.500						57.011.650.000
24.000.000.000									28.000.000.000
						15.280.300.000			15.280.300.000
									7.500.000.000
			62.263.749.760						73.251.470.310
			14.166.314.350						16.666.252.180
8.465.572.050		10.888.857.880	16.081.401.090		3.619.000.000				49.565.860.256
394.810.000					300.000.000				1.419.620.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
D 13 02	Parcheggio a raso per nodo di scambio (Colleferrato/Roma) Realizzazione di un parcheggio e servizio del traffico locale sulla linea FM6 Roma - Cassino	Provincia di Roma	1.171.016.811	1.171.016.811	30.000.000	15.000.000		15.000.000	1.141.016.811
D 13 03	Parcheggio di scambio (Zagarolo/Roma) Realizzazione di un parcheggio di interscambio gomma-ferro presso la stazione FS	Provincia di Roma	1.061.573.765	1.061.573.765	30.000.000	15.000.000		15.000.000	1.031.573.765
D 13 04	Parcheggio di scambio gomma-gomma (Genazzano/Roma)	Comune di Genazzano	1.030.000.000	1.380.000.000	40.000.000		40.000.000		1.006.045.990
D 13 05	Parcheggio di scambio in località Bagni di Tivoli (Tivoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a raso per gli utenti della linea ferroviaria FM2 Guidonia - Tiburtina	Provincia di Roma	397.390.565	397.390.565	27.500.000	5.500.000		22.000.000	369.890.565
D 13 06	Parcheggio a raso per il nodo di scambio (Civitavecchia/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Civitavecchia	Provincia di Roma	840.960.000	840.960.000	60.000.000	12.000.000		48.000.000	780.960.000
D 13 07	Parcheggio a raso - nodo di scambio (Ladispoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Ladispoli	Provincia di Roma	688.977.442	688.977.442	14.000.000	7.000.000		7.000.000	674.977.440
D 13 08	S.P. Marino due Santi (Marino/Roma) Allargamento dal Km 0+000 al Km 3+800 dalla S.S. Appia alla S.S. via dei Laghi	Provincia di Roma	4.505.888.000	4.505.888.000	200.000.000	40.000.000		160.000.000	2.996.760.940
D 13 09	S.P. Pedemontana dei Castelli (Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Marino/Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 / Km 10+500, dalla SS Casilina alla SS via dei Laghi (collegamento Tivoli-Palestrina e Castelli Romani)	Provincia di Roma	2.052.974.954	2.052.974.954	150.000.000	30.000.000		120.000.000	1.828.634.954

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE:				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
382.508.400					376.000.000				1.547.016.811
515.786.880			361.050.820						1.061.573.765
503.022.990									1.046.045.990
73.978.110	110.967.000	129.461.000							397.390.565
390.480.000									840.960.000
224.988.720					225.000.000				913.977.440
1.498.380.470									3.196.760.940
914.317.400			640.022.230						1.978.634.954

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
D 13 10	SP Casa Romana (Zagarolo, S. Cesario/Roma) Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	Provincia di Roma	2.481.348.366	2.481.348.366	150.000.000	30.000.000		120.000.000	2.195.631.646
D 13 11	S.P. Maremmana II (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio dalla Tiburtina alla A25	Provincia di Roma	4.534.479.680	4.534.479.680	210.000.000	41.000.000		168.000.000	3.462.390.680
D 13 12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Monteotondo/Roma)	Provincia di Roma	5.951.794.000	5.951.794.000	275.000.000		275.000.000		5.669.507.930
D 14 01	SP Ardeatina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 9+600 al Km 23+100 (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	3.228.123.995	3.228.123.995	250.000.000	50.000.000		200.000.000	2.955.831.995
D 14 02	SP Laurentina (Roma) Scavi archeologici lungo il tracciato della strada provinciale (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	1.743.772.155	1.743.772.155	100.000.000	20.000.000		80.000.000	1.643.772.155
D 14 03	S.P. Laurentina dal GRA fino al Km. 19.500. Opere di adeguamento e manutenzione straordinaria	Provincia di Roma		1.800.000.000	750.000.000		750.000.000		1.050.000.000
D 14 04	S.P. Tiberina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 (Prima Porta) al km 18+000 (vincolo autostradale)	Provincia di Roma	2.908.319.999	2.908.319.999	225.000.000	45.000.000		180.000.000	2.683.320.000
D 14 05	SP Tiberina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento	Provincia di Roma	3.316.568.000	3.316.568.000	142.500.000		142.500.000		188.500.000
D 14 06	SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale	Provincia di Roma	5.641.412.000	5.641.412.000	250.000.000		250.000.000		5.391.412.000
D 14 07	SP Pratica di Mare (Roma) Allargamento della sede stradale e raddoppio di un ponte per il collegamento con l'area aeroportuale (Roma, Pomezia)	Provincia di Roma	2.341.843.672	2.341.843.672	175.000.000	35.000.000		140.000.000	2.160.091.672
D 14 08	Collegamento SP Settecamini - SP Pantano - SS 636 Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento	Provincia di Roma	10.045.318.000	10.045.318.000	375.000.000		375.000.000		9.187.710.990

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE:				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
1.097.815.820									2.345.631.646
1.731.195.340									3.672.390.680
2.834.753.960									5.944.507.930
391.166.400	1.086.749.500								3.205.831.995
328.754.430	1.068.451.900								1.743.772.155
525.000.000									1.800.000.000
536.644.000	804.996.000								2.908.320.000
					188.500.000				519.500.000
2.479.482.800					432.446.400				6.073.858.400
1.080.045.840									2.335.091.672
4.593.855.490					482.607.013				10.045.318.003

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
D 14 09	Interventi di manutenzione ed adeguamento della rete viaria provinciale interessata da itinerari turistico-religiosi (1° stralcio)	Provincia di Frosinone	9.254.218.352	9.254.218.352	625.000.000		625.000.000		12.332.146.420
D 14 09A			5.000.000.000	5.000.000.000					
D 14 09B			2.500.000.000	2.500.000.000					
D 14 10	Miglioramento viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza (1° stralcio)	Provincia di Latina	8.737.492.495	8.737.492.495	171.500.000		171.500.000		10.400.021.070
D 14 10A			2.500.000.000	2.500.000.000					
D 14 10B			5.000.000.000	5.000.000.000					
D 14 11	Sistemazione viabilità provinciale connessa con gli itinerari spirituali e religiosi (1° stralcio)	Provincia di Rieti	12.500.000.000	12.500.000.000					6.593.026.620
D 14 11A			5.500.000.000	5.500.000.000					
D 14 12	Interventi per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale provinciale (1° stralcio)	Provincia di Viterbo	15.000.000.000	15.000.000.000					11.386.709.970
D 14 12A			3.200.000.000	3.200.000.000					
D 15 01/1	Raddoppio ed elettrificazione del tratto La Storta - Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo	Ferrovia dello Stato	170.379.000.000	170.379.000.000					170.379.000.000
D 15 01/2	Potenziamento della linea Ciampino - Velletri con realizzazione nuova fermata S. Gennaro e nuovi posti di incrocio di Pavona e Lanuvio	Ferrovie dello Stato	12.439.409.000	12.439.409.000					12.439.409.000
D 16 01	Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (1° lotto)	Autorità portuale del porto di Civitavecchia	71.217.371.000	71.217.371.000	4.500.000.000	916.550.410	3.583.449.590		50.217.371.000
D 16 02	Adeguamento funzionale (II Lotto)	Ente Porto Civitavecchia	11.000.000.000	11.000.000.000					8.415.216.100
D 18 01/1	Potenziamento nodo Terracina	Comune di Roma	11.390.204.000	11.390.204.000	2.004.500.000		2.004.500.000		9.385.704.000
D 18 01/2a	Adeguamento metro A. 1° stralcio	Comune di Roma	19.646.302.043	19.646.302.043					18.292.205.040
D 18 01/2b	Adeguamento metro A. 2° stralcio	Comune di Roma	55.037.266.010	55.037.266.010					50.873.238.009
D 18 02/1a	Ferrovie concesse potenziamento linea Roma - Lido	Comune di Roma	6.381.330.834	6.381.330.834					5.872.530.835

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
D 18 02/1b	Ferrovie concesse potenziamento linea Roma - Lido. Manutenzione	COTRAL	2.000.000.000	2.000.000.000					1.321.243.480
D 18 02/2	Potenziamento Roma - Nord.	Comune di Roma	15.594.696.673	15.594.696.673	1.000.000.000		1.000.000.000		14.594.696.670
D 18 03	Sicurezza stazione Termini	Grandi Stazioni SPA	11.842.000.000	11.842.000.000					8.445.480.000
D 18 04	Ale Mazzoni - stazione Termini	Grandi Stazioni SPA	23.948.000.000	23.948.000.000					19.710.648.527
D 19 02/1	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie "Passante dei Laghi"	Ferrovie dello Stato	3.494.390.000	3.494.390.000					7.179.000.000
D 19 02/2			3.684.610.000	3.684.610.000					
D 19 03	Parcheggio di scambio con strutture mobili	STA	5.000.000.000	5.000.000.000	250.000.000		250.000.000		
D 19 04	Stralcio funzionale nodo di scambio valle Aurelia con intersezione tra via Anastasio Secondo e via A. Eino	Comune di Roma	4.951.376.946	4.951.376.946					4.951.376.946
D 20 01	Aggiornamento rete semaforica, segnaletica e uso di tecnologie per la regolazione del traffico e dell'informazione (Roma)	STA	20.650.000.000	20.650.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000		19.650.000.000
D 20 02	Rifacimento e manutenzione segnaletica	STA	8.000.000.000	8.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000		
D 20 02/1	Sistema controllo accessi alla ZTL	STA	9.000.000.000	9.000.000.000					7.931.788.230
D 20 03	Iniziativa per una mobilità sostenibile a Roma	Ministero Ambiente	3.500.000.000	3.500.000.000					
D 21 01	Riorganizzazione del nodo di scambio di largo di Torre Argentina ed interventi di riqualificazione ambientale	Comune di Roma	9.348.155.980	9.348.155.980					9.348.155.980
D 22 01/1	Coordinamento della progettazioni	Provveditorato OO.PP. Lazio	950.000.000	950.000.000					
D 22 01/2	Organizzazione delle manifestazioni	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	1.174.000.000	1.174.000.000					1.174.000.000
D 22 01/3	Progettazioni degli interventi ricadenti nell'area universitaria di Tor Vergata	Università Tor Vergata	876.000.000	876.000.000					
D 22 01			4.463.000.000	4.463.000.000					
D 22 03			16.511.000.000	16.511.000.000					
D 22 04			10.821.000.000	6.526.000.000					

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
660.621.740									1.321.243.480
7.351.848.330									15.594.696.670
4.222.740.000									8.445.480.000
9.855.324.260									19.710.649.527
3.589.500.000									7.179.000.000
									250.000.000
2.475.688.470			1.732.981.930						4.951.376.946
9.825.000.000									20.650.000.000
									1.000.000.000
3.965.894.110									
4.674.077.990									9.348.155.980
						950.000.000			950.000.000
587.000.000			410.900.000						1.174.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
D 22 5	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) Collegamento Area Universitaria - Via del Vermicino, tratto ASI Stazione FF.SS.	Provincia di Roma	4.094.000.000	4.094.000.000	204.700.000		204.700.000		
D 22 6	Area Grandi Eventi - Tor Vergata Collegamento Area Universitaria - S.P. Vermicino	Comune di Frascati	7.844.000.000	6.844.000.000					6.400.000.000
D 22 07			2.500.000.000	2.500.000.000					
D 23 01			500.000.000	500.000.000					
D 23 02			61.500.000.000	61.500.000.000					
D 23 03			3.000.000.000	3.000.000.000					
D 23 04/1			1.431.700.000	1.431.700.000					
D 23 04/2			1.568.300.000	1.568.300.000					
D 23 05/1	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici. Gregorio VII	Comune di Roma	790.300.000	790.300.000					615.135.080
D 23 05/2	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici. La Giustiniana	Comune di Roma	843.000.000	843.000.000					749.723.560
D 23 05/3	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici. Osteria del Curato	Comune di Roma	1.069.000.000	1.069.000.000					
D 23 05/4	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici. Ponte Mammolo	Comune di Roma	929.000.000	929.000.000					797.919.500
D 23 05/5	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici. Saxa Rubra	Comune di Roma	756.500.000	756.500.000					726.932.430
D 23 05/6	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici. Stadio Olimpico	Comune di Roma	993.000.000	993.000.000					854.214.810
D 23 05/7	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici. Top di Valle	Comune di Roma	947.000.000	947.000.000					
D 23 05/8	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici. Viale della Moschea	Comune di Roma	405.000.000	405.000.000					378.092.980
D 23 05/9	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici. Via G.D. Valente	Comune di Roma	362.700.000	362.700.000					333.017.010
D 23 05/10			598.500.000	598.500.000					
D 23 05/11	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici - Laurentina	Comune di Roma	1.806.000.000	1.806.000.000					1.524.229.220
D 23 06 TOTALE SETT. D.			4.000.000.000	4.000.000.000					
			1.526.703.568.773	1.439.480.184.773	47.444.000.000	1.943.050.410	41.505.949.590	3.995.000.000	1.159.877.457.031
E 01 01	Automezzi ed attrezzature per il territorio comunale (Roma). Creazione di isole Ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti	AMA	3.950.719.607	1.950.719.607	100.000.000		100.000.000		1.850.719.600
E 01 02	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Cassonetti movimentabili con automezzi Side Loader	AMA	12.095.040.000	5.795.040.000					5.795.040.000

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di fornitura beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane	per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
3.200.000.000									
307.567.540									615.135.080
374.861.780									
398.959.750									
363.466.210									
417.107.400									
189.046.490									
166.508.500									
762.114.610									
256.075.869.680	116.248.291.910	68.925.132.760	269.650.169.660		5.623.553.413	16.230.300.000			1.209.274.692.704
925.359.800									1.950.719.600
	2.897.520.000								5.795.040.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
E 01 03	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti	AMA	10.257.967.800	8.857.967.800					13.835.662.840
E 01 03a			5.200.000.000	5.200.000.000					
E 01 04	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Minicompattatori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani	AMA	1.959.900.000	1.459.900.000					1.459.900.000
E 01 05	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile.	AMA	700.000.000	600.000.000					600.000.000
E 01 06	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Spazzatrici	AMA	1.308.000.000	908.000.000					908.000.000
E 01 07	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica.	AMA	600.000.000	500.000.000					500.000.000
E 01 08	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali.	AMA	2.841.715.257	2.141.715.257	150.000.000		150.000.000		1.638.635.290
E 01 09.2	Attrezzature specifiche per il centro storico	AMA	1.944.000.000	1.844.000.000					1.844.000.000
E 01 11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza	AMA		125.000.000	125.000.000		125.000.000		
E 01 12	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona Porta Cavalleggeri.	AMA	4.564.400.247	3.508.400.247	200.000.000		200.000.000		
E 01 13	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona via Giolitti.	AMA	400.741.221	264.741.221	25.000.000		25.000.000		239.741.220
E 01 14	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Populonia.	AMA	2.337.079.744	1.124.079.744	100.000.000		100.000.000		

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
E 01 15	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona Arco di Travertino.	AMA	1.778.079.937	1.278.079.937	100.000.000		100.000.000		
E 01 16	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona vicolo Savini.	AMA	4.703.019.203	4.123.019.203	95.000.000		95.000.000		4.028.019.200
E 01 17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Bellami.	AMA	5.668.179.511	3.083.179.511	200.000.000		200.000.000		
E 01 18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto.	AMA	3.126.829.175	1.242.829.175	125.000.000		125.000.000		
E 01 19	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) Saxa Rubra. (1° lotto funzionale).	AMA		150.000.000	150.000.000		150.000.000		
E 01 20	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Zucchelli.	AMA	3.000.000.000	670.000.000	300.000.000		300.000.000		
E 01 22/1	Ristrutturazione opere civili nell'Area Intermedia Atrezzata (A.I.A.) Via Sannio.	AMA	2.509.723.636	1.654.723.636	157.500.000		157.500.000		
E 01 22/2	Fornitura attrezzatura: Compattatori su semirimorchi e motrici per raccolta rifiuti per l'area intermedia attrezzata (A.I.A.) - Via Sannio	AMA	1.033.500.864	1.033.500.864					1.033.500.860
E 01 24	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di un'area intermedia attrezzata via di Torrevecchia	AMA	5.971.974.735	1.933.974.735	150.000.000		150.000.000		
E 01 25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Maresciallo Giardino.	AMA	5.989.252.000	4.849.252.000	300.000.000		300.000.000		

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
E 01 26/1	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (ALA) via Campobonario.	AMA	666.291.296	676.291.296	10.000.000		10.000.000		676.291.730
E 01 26/2	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Fornitura di attrezzature per l'area intermedia attrezzata (ALA) via Campobonario.	AMA	516.750.432	516.750.432	15.500.000		15.500.000		516.750.430
E 01 27/1	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Arma (Roma) Potenziamento del sistema di comunicazione aziendale.	AMA	3.100.000.000	3.100.000.000					
E 01 27/2	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Arma (Roma). Processori di bordo sui mezzi di raccolta.	AMA	5.300.000.000	5.300.000.000					
E 01 27/3	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Arma (Roma). Sistema radiolocalizzazione mezzi pronto intervento.	AMA	1.600.000.000	1.600.000.000					
E 01 28	Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	10.710.000.000	2.000.000.000	100.000.000		100.000.000		
E 01 29	Nuovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	9.520.000.000	7.000.000.000	350.000.000		350.000.000		
E 01 30	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse.	AMA	5.496.098.118	5.496.098.118	280.000.000		280.000.000		
E 01 30/2			7.500.000.000	7.500.000.000					
E 01 31	Servizi igienici pubblici (Roma) Fornitura di attrezzature igieniche mobili autopulenti.	AMA	1.320.480.000	1.320.480.000					1.320.480.000
E 02 01	Ospedale Santo Spirito (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello	USL RM E	37.531.000.000	22.531.000.000	250.000.000		250.000.000		22.999.827.830

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
E 02 02	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Azienda S. Giovanni Addolorata	8.795.052.483	8.795.052.483	1.000.000.000		1.000.000.000		4.349.949.318
E 02 03	Complesso ospedaliero S. Eugenio (C.T.O.) (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM C	19.044.184.735	19.044.184.735	1.500.000.000		1.500.000.000		16.318.280.000
E 02 04	Ospedale G.B. Grassi di Ostia (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM D	5.067.346.783	5.067.346.783	300.000.000		300.000.000		
E 02 05	Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Università Cattolica del Sacro Cuore	12.184.478.000	12.184.478.000	750.000.000		750.000.000		9.454.958.900
E 02 06	Policlinico Gemelli (Roma) Realizzazione di una struttura sanitaria di ospitalità protetta	Università Cattolica del Sacro Cuore	6.031.191.000	6.031.191.000	350.000.000		350.000.000		5.681.191.061
E 02 07	Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello	Azienda Policlinico Umberto I	12.000.000.000	12.000.000.000	500.000.000		500.000.000		
E 02 08/1	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (forniture)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.632.572.000	1.632.572.000					
E 02 08/2	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (lavori)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.366.990.000	1.366.990.000					
E 02 09	Ospedale di Albano (Albano/Roma) Potenziamento del Dipartimento emergenza accettazione di primo livello	USL RM H	801.321.859	801.321.859	50.000.000		50.000.000		751.321.860

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
2.174.974.660			1.522.482.260						5.349.949.318
8.159.140.000									17.818.280.000
									300.000.000
4.727.479.450									10.204.958.900
2.840.595.530			1.988.416.870						6.031.191.061
									500.000.000
375.660.930			262.962.650						801.321.860

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
E 02 10	Ospedale Angelucci (Subiaco/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM G	1.175.000.000	1.175.000.000					824.999.000
E 02 11	Complesso ospedaliero (Bracciano/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM F	996.199.880	996.199.880					928.557.880
E 02 12	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del sistema informativo	Regione Lazio	4.500.000.000	4.500.000.000					4.500.000.000
E 02 13	Rete di diagnostica per la prevenzione e diagnosi delle malattie infettive (Roma) Realizzazione di un laboratorio nell'Ospedale Spallanzani	I.R.C.C.S. Lazzaro Spallanzani	8.219.647.000	8.219.647.000	465.000.000		465.000.000		4.588.111.062
E 02 14	Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione	Regione Lazio	7.140.000.000	7.140.000.000					7.140.000.000
E 02 15	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del servizio di emergenza	Regione Lazio	10.500.000.000	10.500.000.000					
E 02 16/a	Progettazione, sperimentazione, attivazione sistema informativo di sorveglianza epidemiologica	Regione Lazio	4.700.000.000	4.700.000.000					4.700.000.000
E 02 16/b	Ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria della sede dell'Osservatorio epidemiologico regionale	Protektorato S. Giuseppe	1.800.000.023	1.800.000.023	90.000.000		90.000.000		1.333.518.023
E 02 17	Ristrutturazione P. M. P. Via Saredo Roma	USL RM B	4.841.797.234	4.841.797.234	250.000.000		250.000.000		1.944.719.030
E 02 18	Ospedale "Fatebenefratelli" Isola Tiberina - Roma. Ampliamento della rianimazione	Casa Generalizia "Fate Bene Fratelli"	2.615.000.000	2.615.000.000					2.615.000.000
Ex 02 19	Programma di potenziamento dell'Ospedale di S. Carlo di Nancy	Istituto dermatologico dell'Immacolata	3.000.000.000	3.000.000.000					

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
E 02 20	Campus Bio-Medico	Libero Istituto Universitario o "Campus Bio-Medico"	9.073.887.000	9.073.887.000					8.225.887.000
E 02 21	Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA) di II livello per area pediatrica	IRCCS Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù"	2.470.000.000	2.470.000.000					2.330.343.690
E 02 22	Forniture nautiche di soccorso al servizio dell'aeroporto di Fiumicino (I° stralcio)	Comando Generale delle Capitanerie di Porto	3.000.000.000	3.000.000.000					
E 02 23	Acquisto mezzi soccorso a mare per la Capitaneria di porto di Fiumicino (II Lotto)	Comando Generale delle Capitanerie di Porto	3.300.000.000	3.300.000.000					
E 02 24			7.000.000.000	7.000.000.000					
E 02 25			2.000.000.000	2.000.000.000					
E 02 26	Ospedale Cristo Re (Roma) Realizzazione di nuovi servizi	Ospedale Cristo Re	2.000.000.000	2.000.000.000					1.444.290.000
E 02 27			2.000.000.000	2.000.000.000					
E 03 01	Informatizzazione dei servizi dei Vigili Urbani	STA	5.000.000.000	5.000.000.000	250.000.000		250.000.000		4.750.000.000
E 03 02/1	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio via Trastevere n° 18 Roma (ex ufficio contravvenzioni)	Comune di Roma	2.301.474.663	2.301.474.663					1.591.435.660
E 03 02/2	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio via Ferruccio n° 9 Roma (comando vigili urbani I° gruppo)	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000					528.574.740
E 03 02/3	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio viale P. Togliatti n° 987 Roma (sede 7° gruppo vigili urbani)	Comune di Roma	1.996.425.000	1.996.425.000					1.373.391.520
E 03 02/4	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento Fabbricato ex Istituto Luca Piazza Cinecittà n° 11.....	Comune di Roma	2.670.364.315	2.670.364.315					2.670.364.310

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
E 03 02/5	Lavori di rifacimento delle coperture dell'edificio via della Consolazione n°4 - Sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale	Comune di Roma	500.000.000	500.000.000					310.479.290
E 03 03	Servizi logistici e tecnologici per i Vigili Urbani (Roma)	Comune di Roma	3.699.937.367	3.699.937.367					3.699.937.370
E 03 04.1	Acquisto apparecchiature elettroniche e relativo software per le attività esterne di Polizia Municipale	Comune di Roma	1.260.837.712	1.260.837.712					1.195.674.180
E 03 04.2	Acquisto apparecchiature (elettroniche e non), materiali ed arredi per la scuola di Polizia Municipale	Comune di Roma	300.000.000	300.000.000					199.895.810
E 04 01	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per addetti della Pubblica Amministrazione. Impiego operatori in servizio civile.	Regione Lazio	16.952.000.000	16.952.000.000					16.952.000.000
E 04 02	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per attività commerciali e di servizio interessato dal Giubileo.	Regione Lazio	1.100.000.000	1.100.000.000					1.100.000.000
E 04 03	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Promozione di nuove opportunità occupazionali e avvio di nuove iniziative imprenditoriali.	Regione Lazio	12.040.000.000	8.200.000.000					5.200.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
155.239.640									310.479.290
	1.849.968.680								3.699.937.370
									1.195.674.180
									199.895.810
							16.952.000.000		16.952.000.000
							1.100.000.000		1.100.000.000
							5.200.000.000		5.200.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
E 04 04	Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio). Strumenti formativi per l'autosviluppo; riqualificazione centri di formazione professionale; progetti interregionali; pilotaggio programma.	Regione Lazio	3.958.000.000	3.148.000.000					3.148.000.000
E 05 01/1	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Acquisto rete LAN e materiale hardware	Ministero dell'Interno	1.300.000.000	1.300.000.000					
E 05 01/2	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Integrazione software	Ministero dell'Interno	3.700.000.000	3.700.000.000					
E 06 02/a	Sistemi ed impianti di telecomunicazioni per le sedi operative dei vigili del fuoco operanti nella provincia di Roma	Ministero Interno - Dipartimento di Protezione Civile	3.980.000.000	3.980.000.000					
E 05 03	Progetto sicurezza grandi basiliche	Ministero dell'Interno	12.000.000.000	12.000.000.000					
E 05 04	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'Interno	16.158.000.000	16.158.000.000					
E 05 05	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'Interno	4.030.000.000	4.030.000.000					
E 05 06	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'Interno	1.792.000.000	1.792.000.000					
E 05 07	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'Interno	15.250.000.000	15.250.000.000					
E 05 08	Adeguamento del porto-canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	Comune di Fiumicino	9.673.120.000	9.673.120.000	500.000.000		500.000.000		9.173.120.000
E 05 09	Acquisto 7 torri per illuminazione	Ministero Difesa	200.000.000	200.000.000					
E 05 11	Adeguamento, potenziamento e ripristino infrastrutture destinate alloggio operatori volontari e pellegrini militari italiani ed esteri	Ministero Difesa	4.800.000.000	4.800.000.000					
E 05 12	Potenziamento strutture logistiche Caserma "Talamo"	Ministero Difesa - Arma dei Carabinieri	1.995.000.000	1.995.000.000					

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
							3.148.000.000		3.148.000.000
						1.300.000.000			1.300.000.000
						3.700.000.000			3.700.000.000
						3.980.000.000			3.980.000.000
						12.000.000.000			12.000.000.000
						27.598.000.000			27.598.000.000
						3.380.000.000			3.380.000.000
						8.252.000.000			8.252.000.000
						650.000.000			650.000.000
4.586.560.000									9.673.120.000
						1.995.000.000			1.995.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
E 05 13	Potenziamento strutture logistiche Caserma "Tor di Quinto"	Ministero Lavori Pubblici	26.500.000.000	26.500.000.000					
E 05 14	Infrastrutture - Costruzione Caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino	Ministero Difesa	17.945.078.610	17.945.078.610					
E 05 15	Infrastrutture - Ristrutturazione Servizi Logistici Caserma "Piave"	Ministero Difesa	679.808.866	679.808.866					
E 05 16	Caserma della Polizia di Stato "Villa Tevere" sede del reparto scorte	Ministero Difesa	1.675.106.000	1.675.106.000					
E 05 17	Caserma della Polizia di Stato "Maurizio Giglio" sede del reparto volanti	Ministero Difesa	2.726.125.000	2.726.125.000					
E 05 18	Nuovo complesso Polizia di Stato (Ponte Galeria) Fiumicino	Ministero Difesa	3.664.630.149	3.664.630.149					
E 05 19	Nuovo complesso Polizia di Stato (Ponte Galeria) Fiumicino	Ministero Difesa	11.000.000.000	11.000.000.000					
E 05 20	Coordinamento Centrali operative Interforze	Ministero Difesa - Arma dei Carabinieri	1.500.000.000	1.500.000.000					
E 05 21	Iniziativa per la formazione del personale	Ministero Difesa - Dipartimento della Protezione Civile	455.000.000	455.000.000					
E 05 22	Iniziativa per la formazione del personale	Ministero Difesa - Dipartimento della Protezione Civile	539.000.000	539.000.000					
E 05 23	Realizzazione nuovo galleggiante distaccamento fluviale	Ministero Difesa - Dipartimento della Protezione Civile	500.000.000	500.000.000					
E 05 24	Ampliamento e ristrutturazione Tuscolano II	Ministero Difesa - Dipartimento della Protezione Civile	2.000.000.000	2.000.000.000					
E 05 25	Acquisto elimbalanza	Ministero Difesa - Dipartimento della Protezione Civile	11.000.000.000	11.000.000.000					
E 05 27	Adeguamento e potenziamento della centrale telefonica del Dipartimento della Protezione Civile	Presidenza del Consiglio Ministri - Dipartimento della Protezione Civile	399.000.000	399.000.000					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI		
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio		AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane	per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
						26.500.000.000			26.500.000.000
						19.000.000.000			19.000.000.000
						697.000.000			697.000.000
						1.800.000.000			1.800.000.000
						2.997.000.000			2.997.000.000
						4.046.000.000			4.046.000.000
						11.000.000.000			11.000.000.000
						1.500.000.000			1.500.000.000
						455.000.000			455.000.000
						539.000.000			539.000.000
						500.000.000			500.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
						11.000.000.000			11.000.000.000
						399.000.000			399.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
E 05 28	Adeguamento e potenziamento della funzionalità della sala operativa del Dipartimento della Protezione Civile	Presidenza del Consiglio Ministri - Dipartimento della Protezione Civile	697.000.000	697.000.000					
E 05 29	Predisposizione di circa 150 moduli containerizzati plurisecolari per le aree periferiche di supporto logistico e di accoglienza	Presidenza del Consiglio Ministri - Dipartimento della Protezione Civile	3.983.000.000	3.983.000.000					
E 05 30	Acquisto mezzi e attrezzature varie	Ministero Interno - Corpo nazionale VV. FF. - Dipartimento della Protezione Civile	5.000.000.000	5.000.000.000					
E 05 32	Ceserna CC P.zza Dante - Lavori di ristrutturazione (1° stralcio)	Ministero Interno	1.177.758.726	1.177.758.726					
E 05 33	Rete di radio comunicazioni della polizia	Ministero Interno	5.500.000.000	5.500.000.000					
E 05 34	Sede centrale del comando provinciale VV. FF. di Roma - Via Genova (Roma) - Lavori di lavorazione straordinaria	Ministero Interno - Corpo Nazionale VV. FF. - Dipartimento della Protezione Civile	2.000.000.000	2.000.000.000					
E 05 35	Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma (Roma) - Manutenzione straordinaria	Ministero Lavori Pubblici - Provveditorato OO.PP. per il Lazio	480.000.000	480.000.000					
E 06 01	Contributo a favore di imprese giovanili per la promozione di occupazione connessa alle attività giubilari.	Comune di Roma	9.000.000.000	9.000.000.000					7.000.000.000
E 07 01	Attività del Corpo della Polizia Municipale per assicurare l'apertura ed il funzionamento dei cantieri giubilari	Comune di Roma	2.700.000.000	2.700.000.000					2.700.000.000
TOTALE SETT. E			551.809.077.183	492.722.077.183	9.288.000.000		9.288.000.000		197.970.569.704
F 01 01/1	Centri informativo del Museo del Risorgimento - Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	5.675.712.000	5.675.712.000	48.000.000		48.000.000		5.627.712.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI						EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
10% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
						3.952.079.000			3.952.079.000
						5.000.000.000			5.000.000.000
						1.000.000.000			1.000.000.000
						5.500.000.000			5.500.000.000
						2.000.000.000			2.000.000.000
						480.000.000			480.000.000
				7.000.000.000					7.000.000.000
	2.053.945.750								2.700.000.000
63.240.410.875	8.838.884.430		10.796.315.910	8.753.356.880		169.520.079.000	42.740.000.000		376.776.648.704
			4.783.555.200						5.675.712.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
F 01 01/2	Centri informativo di Via della Conciliazione - Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	7.275.712.000	7.275.712.000	117.000.000		117.000.000		7.158.712.001
F 01 01/3			2.090.000.000	2.090.000.000					
F 01 02	Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	8.611.762.550	8.611.762.550	200.000.000		200.000.000		4.961.762.550
F 01 03	Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di promozione dell'informazione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	614.000.000	614.000.000	50.000.000		50.000.000		564.174.233
F 01 04	Sistema di informazione al pubblico - nodo di Roma	FS SPA	3.465.000.000	3.465.000.000					
F 04 01	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4 dell'art. 1 della legge 23 dicembre n. 651	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	84.027.496.000	84.027.496.000	12.000.000.000		12.000.000.000		29.000.000.000
F 04 02	Osservatorio sul Piano del Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000.000	6.000.000.000					
F 05 01	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	8.613.240.000	8.613.240.000	300.000.000		300.000.000		8.313.240.000
F 05 02	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità. Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	3.500.000.000	3.500.000.000	250.000.000		250.000.000		3.250.000.000
F 05 03	Sistema unitario di prenotazione. Realizzazione e gestione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	7.612.000.000	7.612.000.000	150.000.000		150.000.000		7.462.000.000
F 05 04	Sistema informativo e di comunicazione. Realizzazione e gestione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	17.993.440.000	17.993.440.000	500.000.000		500.000.000		17.493.440.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
F 05 05	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	8.152.080.000	8.152.080.000	300.000.000		300.000.000		7.852.080.000
F 05 06	Funzionamento delle strutture del Commissario straordinario di Governo	Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi	3.600.000.000	3.600.000.000					
G 01 01	Monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano per il Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000.000	6.000.000.000					322.000.000
TOTALE			173.230.442.550	173.230.442.550	13.915.000.000		13.915.000.000		92.005.120.784
TOTALE			3.696.761.392.780	3.529.975.113.887	105.624.547.102	3.423.480.410	90.000.604.794	12.906.911.894	2.195.261.339.513

Impegni di spesa 2.400.885.886.615

Variazioni di bilancio 521.775.829.000

Totale risorse attivate 2.922.661.715.615

Impegni di spesa - A 238.825.864.950

Impegni di spesa - B 205.873.503.625

Impegni di spesa - C 435.686.370.521

Impegni di spesa - D 1.207.321.457.031

Impegni di spesa - E 207.258.569.704

Impegni di spesa - F 105.920.120.784

TOTALI 2.400.885.886.615

IMPEGNI + VARIAZ. COMP.

Impegni di spesa - A 238.825.864.950

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
3.776.040.000			2.853.220.000						8.152.080.000
	254.000.000								322.000.000
25.257.446.640	254.000.000		17.308.997.060	29.000.000.000					105.920.120.784
755.136.487.762	128.641.395.830	83.721.389.270	364.515.934.805	39.031.001.294	10.724.348.113	521.775.829.000	166.362.600.000		2.911.561.601.568

Pagamenti 1.654.464.154.172

Variazioni di bilancio 521.775.829.000

Totale risorse trasferite 2.176.239.983.172

Pagamenti A 200.114.576.265

Pagamenti B 129.197.227.432

Pagamenti C 331.792.519.257

Pagamenti D 763.967.019.423

Pagamenti E 143.657.368.095

Pagamenti F 85.735.443.700

1.654.464.154.172

PAGAMENTI + VARIAZ. COMP.

Pagamenti A 200.114.576.265

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
Impegni di spesa - B				530.718.503.625					
Impegni di spesa - C				446.866.820.521					
Impegni di spesa - D				1.223.551.757.031					
Impegni di spesa - E				376.778.648.704					
Impegni di spesa - F				105.920.120.784					
TOTALI				2.922.661.715.615					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE:			IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio		AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane	
Pagamenti B					454.042.227.432			
Pagamenti C					342.972.969.257			
Pagamenti D					780.197.319.423			
Pagamenti E					313.177.447.095			
Pagamenti F					85.735.443.700			
					2.176.239.983.172			

3. APPENDICE

3.1. I decreti

D.M. N. 199/RC del 19 maggio 1999

Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 1996, afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 e concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di aree urbane, Roma capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il Sindaco di Roma è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma", (in G.U. - serie generale - n. 18 del 23/1/1998);

VISTO il decreto ministeriale dell'8 maggio 1998, pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998 e relativo all'approvazione della deliberazione n. 2 dell'11 marzo 1998, con la quale la Commissione per Roma Capitale, integrata ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis, della legge n. 651/1996, ha individuato i settori prioritari di intervento da finanziare a valere sulle future economie comunque realizzate;

VISTA la nota in data n.4370/II2.4.8.2 del 27 aprile 1999 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, delega il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000 a presiedere la riunione medesima;

VISTA la deliberazione n. 1/99 adottata dalla Commissione per Roma Capitale, ex lege n. 651/1996, in data 27 aprile 1999;

RITENUTO, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, come risultanti dalla succitata deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 7/98;

DECRETA

1. *E' approvata la Relazione della Commissione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi inseriti nel Piano ex lege 651/1996, relativa all'anno 1998 ed al primo trimestre del 1999.*
2. *A seguito dell'approvazione del quadro tecnico-economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto, sono ridotte, per accertate minori esigenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'allegato A, nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo pari a £ 147.440.413.483 nonché l'assegnazione relativa all'intervento riportato all'allegato A/1, di competenza del Ministero per le Attività e i Beni culturali, nella misura di £ 1.172.832.000.*
3. *Sono defINANZIATI totalmente, su richiesta degli rispettivi soggetti titolari, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, i seguenti interventi con recupero di complessive £ 21.643.262.000.*
 - B.12.23 - "Completamento dei lavori di restauro e rifacimento dei prospetti, revisione dei tetti e lavori interni" del Palazzo Sciarra in via della Stamperia per un ammontare di £ 1.500.000.000;*
 - C.02.02.2.3 - "MER: Progetto di riqualificazione ambientale di via Merulana ed aree limitrofe nell'area della Basilica di San Giovanni", per un ammontare di £ 4.943.262.000;*
 - D.05.01/8 - "Fornitura materiale rotabile ferrovia Roma Pantano", per un ammontare di £ 12.200.000.000;*
 - E.02.19 - "Programma di potenziamento dell'Ospedale di S. Carlo di Nancy", per un ammontare di £ 3.000.000.000.*
4. *Sono defINANZIATI parzialmente, per un ammontare complessivo di £ 58.362.814.879, su proposta dei soggetti titolari, gli interventi rubricati con codice:*
 - A.06.02 - "Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (IPAB e IACP) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati", il cui stanziamento è ridotto da £ 20.800.000.000 a £ 14.426.364.000, con un'economia pari a £ 6.373.636.000;*
 - C.03.06 - "Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali - 1° stralcio", il cui stanziamento è ridotto da £ 112.500.000.000 a £ 92.000.000.000, con un'economia pari a £ 20.500.000.000, che d'intesa col comune di Roma restano nelle sue disponibilità per l'intervento D.23.02;*
 - C.1.30 - "Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche relative ai lavori ATAC e sedi stradali adiacenti", il cui stanziamento è ridotto da £ 5.000.000.000 a £ 2.947.589.621 con un'economia pari a £ 2.052.410.379;*
 - C.11.1/1 - "Area archeologica del Celio. Via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali - interventi di restauro e manutenzione", il cui stanziamento è ridotto da £ 1.000.000.000 a £ 117.135.000, con un'economia immediata pari a £ 882.865.000 e fatta salva la maggior somma che potrà risultare all'esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;*
 - C.12.01 - "Villa Doria Pamphili (Roma). Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via olimpica" il cui stanziamento è ridotto da £ 4.600.000.000 a £ 3.300.000.000, con un'economia immediata pari a £ 1.300.000.000;*
 - C.18.04 - "Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma). Interventi di riqualificazione", il cui stanziamento è ridotto da £ 1.200.000.000 a £ 900.000.000, con un'economia immediata pari a £ 300.000.000;*
 - C.02.01.1.1 - "BOR": Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano", il cui stanziamento è ridotto da £ 5.347.538.000 a £ 4.005.117.306, con un'economia immediata pari a £ 1.342.420.694;*
 - C.02.01.1.3 - "CON": Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano", il cui stanziamento è ridotto da £ 4.583.604.000 a £ 2.687.121.194, con un'economia immediata pari a £ 1.896.482.806;*
 - D.14.03 - " S.P. Laurentina (Roma) dal GRA fino al Km 19.500. Opere di adeguamento e manutenzione straordinaria", il cui stanziamento è ridotto da £ 15.000.000.000 a £ 1.800.000.000, con un'economia immediata*

pari a £ 13.200.000.000 e fatta salva la maggior somma che potrà risultare all'esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

E.01.11 — "Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza", il cui stanziamento è ridotto da £ 2.500.000.000 a £ 125.000.000, con un'economia immediata pari a £ 2.375.000.000 e fatta salva la maggior somma che potrà risultare all'esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

E.02.03 — "Complesso ospedaliero S. Eugenio /C.T.O. (Roma). Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)", il cui stanziamento è ridotto da £ 30.000.000.000 a £ 24.000.000.000, con un'economia immediata pari a £ 6.000.000.000;

E.02.14 — "Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio). Potenziamento e informatizzazione", il cui stanziamento è ridotto da £ 7.140.000.000 a £ 5.000.000.000, con un'economia immediata pari a £ 2.140.000.000, che d'intesa con la Regione Lazio restano nelle sue disponibilità per l'intervento E.04.03;

5. L'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi è incaricato di avviare la procedura di contestazione ex art. 7 legge 241/90 nei confronti del titolare dell'intervento n. B16.30 "Recupero del Barco Borghese e delle sostruzioni della Villa Romana" nonché nei confronti dei titolari di quegli interventi che, sulla base di elementi istruttori, dovessero configurarsi altamente critici;
6. Le risorse disponibili sono, pertanto, determinate in complessive £ 247.314.770.082 pari alla somma dei seguenti importi: £ 240.171.716.216 rivenienti da:

£. 12.725.225.854	Accantonamento ex art. 10 DM 07.01.1999
£. 147.440.413.483	Risorse provenienti da ribassi d'asta e/o economie di stanziamento di cui al punto 2
£. 21.643.262.000	Risorse provenienti da definanziamenti totali di cui al punto 3
£. 58.362.814.879	Risorse provenienti da definanziamenti parziali di cui al punto 4

oltre a £ 7.143.053.866, nella disponibilità del Ministero per le Attività e i Beni culturali, rivenienti da:

£. 1.172.832.000	Risorse provenienti da definanziamenti parziali di cui al punto 2
£. 5.970.221.866	Risorse relative a ribassi d'asta, dei quali la Commissione ha preso atto con D.M. 16/7/1998 ed ancora nelle disponibilità del Ministero per le Attività e i Beni culturali

7. Sono approvati i nuovi termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1 della legge n. 651/96, i cambi titolo e di soggetto beneficiario e le disaggregazioni di interventi, come indicato nell'allegato C.
8. Sono assentite le integrazioni di finanziamento indicate nell'allegato C, per un importo complessivo di £ 93.925.452.000, di cui £ 8.531.900.000 relative ad interventi di titolarità del Ministero per le Attività e i Beni Culturali.
9. Sono inclusi nel Piano in coerenza con le priorità indicate nel D.M. n. 150 dell'8 maggio 1998 e sulla base di ulteriori esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano medesimo gli interventi indicati nell'allegato D per un importo complessivo di £ 150.685.000.000. Restano pertanto nella disponibilità della Commissione £ 2.704.318.082.

10. Come previsto dai punti 1.5 e 1.6 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano di cui all'allegato "A" del D.P.C.M. 11.12.1996, gli oneri relativi alle attività preliminari e strumentali alla realizzazione dell'intervento, quali la progettazione, ogni tipo di indagine conoscitiva (preventiva o contestuale all'esecuzione), l'espletamento dell'appalto dei lavori e la stesura dei contratti, la predisposizione dei prescritti Piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 494/96, l'esercizio delle funzioni del responsabile del procedimento, di Direttore dei Lavori, di Coordinatore della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, il collaudo ed eventuali studi di impatto ambientale, devono, di norma, essere contenuti nel limite massimo del 10% del costo complessivo dell'opera, salvo particolari situazioni opportunamente motivate. Ove tali oneri risultino superiori a detta soglia, le relative parcelle professionali, redatte nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti tariffe, devono essere vidimate dal competente Ordine Professionale.

Al fine del contenimento della spesa pubblica, ove la progettazione sia affidata dalla stazione appaltante a più professionisti riuniti in Collegio, secondo la procedura di cui all'art. 7 della Legge 2/3/1949, n. 143, viene riconosciuto il compenso per un solo incarico professionale, rimanendo a carico del soggetto beneficiario gli eventuali ulteriori compensi.

Qualora la progettazione sia stata affidata ad un progettista esterno alla stazione appaltante, ove l'Amministrazione non ritenga di svolgere la Direzione dei Lavori con proprio personale, questa deve essere affidata allo stesso progettista salvo che per oggettiva e documentata impossibilità.

Tenuto conto di quanto stabilito all'art. 1, punto 9, della legge n. 651/96, ove si dà facoltà ai soggetti beneficiari di avvalersi dei Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche in qualità di Stazioni Appaltanti "anche relativamente alla progettazione" il conferimento di incarichi a Società di Servizio per la compilazione dei progetti, per consulenze e per ogni altra attività connessa all'espletamento delle gare ed alla gestione dei lavori deve essere specificatamente ed adeguatamente motivata, ai fini del riconoscimento delle relative spese.

11. Il punto 1.10 dell'allegato D.M. 15.5.1998 viene così modificato:

"1.10. All'atto della richiesta di erogazione dell'ulteriore 35% dell'importo impegnato dovrà essere inoltrata all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario pubblico o di un suo delegato apposita certificazione dell'avvenuto utilizzo dell'80% dell'importo erogato ai sensi del precedente punto 1.9, nella quale siano elencate le spese sostenute suddivise tra lavori, forniture e somme a disposizione con riferimento al Quadro Tecnico Economico acquisito agli atti dell'Ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di spesa. In allegato alla citata certificazione, quale parte integrante, deve essere trasmessa una relazione illustrativa che in riferimento all'elencazione delle spese precisi i titoli di spesa emessi. Per i soggetti beneficiari assimilati alla categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. c, della legge n. 109/94 come integrata e modificata dalla legge n. 415/98, all'atto della richiesta di erogazione dell'ulteriore 35% dell'importo impegnato dovrà essere inoltrata all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, apposita certificazione nella quale siano elencate le spese sostenute, suddivise tra lavori, forniture e somme a disposizione con riferimento al Quadro Tecnico Economico acquisito agli atti dell'Ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di spesa, nonché dichiarazione relativa all'avvenuta verifica del versamento da parte delle Imprese dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla mano d'opera impiegata.

Con riferimento all'elencazione riportata nella citata certificazione dovrà essere allegata, in copia conforme, la seguente documentazione:

Lavori:

- certificati di pagamento intestati all'Impresa titolare dell'appalto e relative fatture quietanzate;
- fatture quietanzate relative ad eventuali prestazioni in economia certificate dal Direttore dei Lavori;
- certificati di pagamento intestati ad eventuale Impresa sub-appaltatrice e relative fatture con allegato il contratto di subappalto e la connessa autorizzazione della stazione appaltante.

Espropri:

- contratto di acquisto od altro titolo ablativo e relativa trascrizione al patrimonio del soggetto beneficiario;
- pagamenti effettuati per l'occupazione e l'indennità di esproprio intestati ai proprietari dei beni.

Forniture:

- Certificato di pagamento intestato al fornitore e relative fatture quietanzate;
- Certificato di collaudo qualora la fornitura sia stata liquidata in un'unica soluzione.

Rilievi, studi e sondaggi:

- Contratti o lettere d'incarico e relative fatture quietanzate;
- Certificato di regolare esecuzione della prestazione sottoscritto dal Responsabile del procedimento qualora sia stato effettuato il pagamento in un'unica soluzione.

Progettazione :

- Parcella professionale vistata dal competente Ordine Professionale con esclusione di quelle validate dalle Amministrazioni pubbliche qualora risulti superata la soglia del 10% di cui al punto 1;
- Convenzione d'incarico o lettera d'incarico;
- Fatture quietanzate del Professionista incaricato.

Altre spese tecniche:

- Parcella professionale sia per il Direttore dei Lavori che per il Coordinatore della Sicurezza vistata dal competente ordine professionale, con esclusione di quelle validate dalle Amministrazioni pubbliche, qualora risulti superata la soglia del 10% di cui al punto 1;
- Convenzione o lettera d'incarico del professionista;
- Fatture quietanzate del professionista;
- Fatture quietanzate relative alle spese sostenute per la Commissione di gara, per la pubblicazione del Bando, per le spese postali e per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure di aggiudicazione certificate dal responsabile del procedimento;
- Ricevute di versamenti effettuati alle Amministrazioni Comunali per il rilascio delle concessioni edilizie o autorizzazioni.

Allacciamenti:

- fatture quietanzate e versamenti effettuati alle aziende comunali o alle società di servizio per contributi o spese di allaccio.

Altro:

Fatture relative ad eventuali prestazioni o lavori specialistici ove sia chiaramente indicato in relazione all'intervento l'oggetto ed il periodo di svolgimento delle attività."

12. Il punto 1.11 del D.M. 15.05.1998 viene così modificato:

"1.11. Le ulteriori somme residue fino alla concorrenza dell'intero impegno assunto saranno erogate dall'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi su richiesta del legale rappresentante del soggetto beneficiario pubblico o di un suo delegato, documentata con apposita certificazione nella quale sia dichiarata la conclusione delle procedure di collaudo o di regolare esecuzione.

Nella certificazione debbono essere inoltre evidenziate le somme non utilizzate dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'intervento per la conseguente attivazione della procedura di versamento di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'utilizzazione per le finalità della legge n. 651/96.

Copia conforme dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione per ogni spesa sostenuta per lavori, forniture, prestazioni professionali o specialistiche ed ogni altra attività connessa all'intervento dovranno essere trasmessi all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi per la conseguente acquisizione agli atti.

Per i soggetti beneficiari assimilati alla categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. c, della legge n. 109/94 come integrata e modificata dalla legge n. 415/98, le ulteriori somme residue fino alla concorrenza dell'intero impegno assunto saranno erogate dall'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi su richiesta del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo delegato, documentata con apposita certificazione nella quale sia dichiarata la conclusione delle eventuali procedure di acquisto di immobili o aree attivate e siano elencate tutte le spese

sostenute suddivise tra lavori, forniture e somme a disposizione con riferimento al Quadro Tecnico Economico acquisito agli atti dell'Ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di spesa.

Nella certificazione debbono essere, inoltre, evidenziate le somme non utilizzate dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'intervento per la conseguente attivazione della procedura di versamento di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'utilizzazione per le finalità della legge n. 651/96.

Alla richiesta vanno inoltre allegati in copia conforme i certificati di collaudo o di regolare esecuzione per ogni spesa sostenuta per lavori, forniture, prestazioni professionali o specialistiche ed ogni altra attività connessa all'intervento. ”.

13. Ad integrazione e modifica del D.M. 16.7.1998, allegato "F", ai soggetti ecclesiastici beneficiari degli interventi inclusi nel Piano di cui alla Legge n. 651/96 assimilati alla categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. c, della Legge 109/94 come integrata e modificata dalla Legge 415/98, si applicano tutte le disposizioni della legge ad esclusione di quelle introdotte dagli artt. 7, 14, 19, comma 2 e 2bis, 27, 32, 33.

Roma, lì 19 maggio 1999

Il Ministro: Enrico Micheli

Registrato alla Corte dei Conti il 26 giugno 1999

Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 1

ALLEGATO A

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

*Riunione Commissione del 27/4/1999**Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara*

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
A.01.04	IPAB "S.Margherita" Roma	Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili	810.139.523
A.01.05	IPAB "S.Francesca Romana" - Roma	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma). nell'edificio "S. Giuseppe Doria"	489.427.040
A.01.06	Comune di Roma	Comunità alloggio per disabili (Roma) Ristrutturazione di un immobile a Vigne Nuove	399.313.176
A.01.07	Comune di Roma	Centro di accoglienza temporanea per extracomunitari (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di proprietà comunale.	585.875.665
A.01.17	Comune di Civitavecchia	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disagiate (Civitavecchia/Roma) Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in località Pantano	289.874.498
A.01.21	Comune di Roma	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola	1.076.114.811
A.01.25	Congregazione Suore Francescane dei Sacri Cuori	Riqualificazione di una struttura conventuale	471.928.810
A.01.27	Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo - Opera Don Orione	Centro accoglienza permanente per pellegrini portatori di handicap (primo stralcio)	2.010.113.620
A.04.01/2	Comune di Roma	Complesso Buon Pastore (Roma): Restauro e recupero funzionale del corpo seicentesco	3.245.308.495
A.05.01/1	USL RM E	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Risanamento parco)	434.069.061
A.05.01/3	USL RM E	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Straord. Manutenz. Padigl. Direzione)	1.438.927.013

Riunione Commissione del 27/4/1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
A.05.01/4	USL RM E	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Manutenz. ord. cappella e 3 padigl.)	1.076.257.591
A.05.01/5	USL RM E	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Ristrutturazione n. 4 padiglioni)	829.798.510
A.07.05	Comune di Albano Laziale	Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma). Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere	90.390.250
A.07.14	Comune di Anticoli Corrado	Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma). Ristrutturazione di Palazzo Carboni	16.761.100
A.07.16	Comune di S. Marinella	Ostello della Gioventù (S. Marinella - Roma). Ristrutturazione dell'ex scuola Pirus	108.084.220
A.07.24	Comune di Montopoli	Casa di accoglienza-ostello della gioventù in edifici storici - a) Residenza Abati di Farfa - b) ex albergo (Montopoli/Rieti)	71.638.871
A.07.26	Comune di Poggio Mirteto	Casa di accoglienza - ostello della gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di un palazzetto di proprietà comunale in Piazza Mario Dottori	114.892.398
A.07.27	Comune di Poggio Mirteto	Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico	274.848.000
A.07.29	Comune di Frasso Sabino	Area camper (Frasso Sabino/Rieti) Realizzazione della pavimentazione, dei servizi e sistemazione degli accessi	40.800.240
A.07.30	Comune di Montopoli	Area camper (Montopoli/Rieti) Realizzazione della pavimentazione e dei servizi	60.591.320
A.07.35	Comune di Maenza	Ostello della Gioventù (Maenza/Latina) Arredo Palazzo Pecci e sistemazione esterna.	88.455.840
A.07.42	Comune di Veroli	Centro di accoglienza turistica (Veroli/Frosinone) Adeguamento del complesso Istituto Filonardi	229.611.485

Riunione Commissione del 27/4/1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
B.02.01/1	Comune di Roma	Area archeologica dei Fori Imperiali. Museo dei fori Imperiali ai Mercati Traianei (Roma).	1.033.157.714
B.02.01/2	Comune di Roma	Area archeologica dei Fori Imperiali: Museo dei Fori Imperiali. Allestimento dei materiali mobili restaurati.	87.048.000
B.02.02	Comune di Roma	Area archeologica dei Fori Imperiali; Restauri e sistemazioni esterne dei Fori di Cesare, Augusto, Nerva e Traiano	877
B.02.03/1 a	Comune di Roma	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Foro di Cesare	474.390.211
B.02.03/1 b	Comune di Roma	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area Tempio della Pace.	666.765.969
B.02.03/1 c	Comune di Roma	Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Foro di Traiano.	747.878.777
B.02.03/2 c	Comune di Roma	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: area Foro di Traiano.	440
B.03.01	Comune di Roma	Mura di Roma - Restauro e valorizzazione di Porta S. Paolo.	402.882.150
B.03.03	Comune di Roma	Mura di Roma - Restauro di Porta S. Giovanni e tratto di mura da Porta Asinaria all'anfiteatro Castrense	927.400.896
B.03.04/1	Comune di Roma	Mura di Roma - Restauro di Porta Maggiore, dei tratti di mura adiacenti e sepolcro di Eurisace	755.200.510
B.03.07	Comune di Roma	Mura di Roma. Restauro, consolidamento, musealizzazione, ed adeguamento alle normative di sicurezza dell'edificio di Porta S. Pancrazio	207.131.692
B.03.08	Comune di Roma	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle mura Gianicolensi nel tratto Porta S. Pancrazio - Porta Portese	295.732.696
B.03.09/1	Comune di Roma	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle mura Aureliane nel tratto Campo Boario - largo Lazzarini	313.508.286

Riunione Commissione del 27/4/1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
B.03.09/2	Comune di Roma	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle mura Aureliane nel tratto largo Lazzarini - Bastione Ardeatino	370.868.046
B.05.01/2	Comune di Roma	Restauro di Palazzo Braschi : Restauro - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braschi - Museo di Roma	1.778.865.607
B.12.24	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Ripulitura delle facciate interne ed esterne, revisione e verniciatura dei relativi infissi e sistemazioni varie a Palazzo Chigi	564.942.804
B.18.01	Comune di Albano Laziale	Santuario della Rotonda (Albano Laziale/Roma) Restauro del campanile e del Ninfeo del Santuario	75.629.474
B.18.03	Comune di Albano Laziale	Terme di Cellomaio e chiesa di S. Pietro (Albano Laziale/Roma) Restauro delle terme e del campanile della chiesa	54.064.466
B.18.04	Comune di Albano Laziale	Cattedrale (Albano Laziale/Roma) Restauro conservativo del campanile	23.959.082
B.18.05	Comune di Albano Laziale	Tridente barocco di S. Paolo (Albano Laziale/Roma) Recupero	219.178.319
B.19.17	Comune di Palombara Sabina	Chiesa di Sant'Egidio (Palombara Sabina/Roma)	26.066.767
B.19.18	Comune di Vicovaro	Adattamento del Convento di S. Cosimato al superamento delle barriere architettoniche	26.736.166
B.19.26	Comune di Rieti	Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti). Sistemazione delle aree esterne	195.278.186
B.19.27	Comune di Rieti	Chiesa di S. Francesco (Rieti) Restauro e sistemazione delle aree esterne	342.727.000
B.19.28/1	Comune di Greccio	Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del Presepio. Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato (1° stralcio funzionale).	65.861.350
B.19.45	Provincia di Latina	Chiesa di San Marco (Latina). Restauro.	73.000.000

Riunione Commissione del 27/4/1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
B.19.49	Provincia di Latina	Madonna della Civita (Itri/Latina) Adeguamento della strada di accesso	365.295.510
B.19.63/2	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza - Forniture	14.443.125
C.01.01	Comune di Roma	Restauro conservativo dei Ponti Regina Margherita, Cavour, Umberto I, Vitt. Emanuele II.	1.168.325.290
C.01.02	Comune di Roma	Restauro conservativo dei Ponti Caio Cestio, Duca D'Aosta, cavalcavia del Muro Torto (Roma) Interventi di restauro conservativo	1.358.560.574
C.01.03	Comune di Roma	Restauro conservativo di Ponte Flaminio ed impermeabilizzazione di Ponte Testaccio	1.437.145.257
C.01.04	Comune di Roma	Ponte Risorgimento (Roma) Interventi di restauro conservativo	130.634.600
C.01.06	Comune di Roma	Restauro conservativo di Ponte Fabricio	11.927.624
C.01.07	Comune di Roma	Restauro conservativo di Ponte Nomentano	128.836.533
C.01.11	Comune di Roma	Via Ottaviano, viale Angelico, circ.ne Clodia, via Giuliana (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	212.247.430
C.01.13/1	Comune di Roma	Manutenzione, adeguamento e sistemazione dei marciapiedi dei Lungotevere di sinistra e di destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti.	62.732.832
C.01.18/1	Comune di Roma	Villa Borghese: Portico dei leoni, Mostra dell'Acqua Felice, Arco di Settimio Severo, propilei neoclassici, prospetti di piazza delle Canestre	574.952.453
C.01.18/2	Comune di Roma	Villa Borghese: propilei egizi, fontana del Fiocco, perimetri murari e scogliere di viale F.La Guardia, restauro degli arredi architettonici.	645.711.372
C.01.19	Comune di Roma	Villa Borghese: Giardini Segreti, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni.	183.026.770

Riunione Commissione del 27/4/1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
C.01.21/2	Comune di Roma	Villa Doria Pamphilj (Roma) recupero delle serre ottocentesche.	688.849.619
C.01.25	Comune di Roma	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero e restauro dell'Arco dei Quattro Venti e delle aree limitrofe	292.226.935
C.01.26	Comune di Roma	Riqualificazione area Teatro Marcello, piazza Monte Savello, via Catalana, via del Tempio, via S. Angelo in Pescheria, via Tribuna Campitelli.	2.682.970.525
C.02.02/1	Comune di Roma	Demolizione rimessa ATAC via Carlo Felice tra Basiliche S. Giovanni e S. Croce.	54.375.366
C.02.02.02/1	Comune di Roma	Concorso di progettazione preliminare di ponti pedonali	5.000
C.02.02.02/6	Comune di Roma	QUA: Progetto di riqualificazione ambientale di via Santi Quattro Coronati ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni.	326.976.140
C.02.03.01/2	Comune di Roma	LUN: Progetto di riqualificazione ambientale di LungoTevere San Paolo ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Paolo	341.513.449
C.02.03.01/3	Comune di Roma	OSI: Progetto di riqualificazione ambientale di via Ostiense ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Paolo	186.455.902
C.02.04/1	Comune di Roma	Itinerari giubilari storici (Roma) Contributo per la manutenzione e della riqualificazione delle sedi stradali e relative pertinenze.	7.500.000
C.02.04/2	Comune di Roma	Contributo per interventi di manutenzione delle sedi stradali e relative pertinenze degli itinerari giubilari e storici, processioni e celebrazioni religiose	7.380.000
C.04/a	Comune di CastelGandolfo	Terminal Bus	172.000.000
C.04/b	Comune di CastelGandolfo	Centro servizi di prima necessità	207.000.000
C.04/c	Comune di CastelGandolfo	Sottopasso pedonale di via Maremmmana	47.000.000

Riunione Commissione del 27/4/1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
C.04/d	Comune di CastelGandolfo	Realizzazione aree e strutture di parcheggio a servizio del centro storico	114.000.000
C.04/e	Comune di CastelGandolfo	Sistemazione della viabilità urbana	583.000.000
C.04/f	Comune di CastelGandolfo	Sistemazione della passeggiata sul lungo lago	456.000.000
C.04/h	Comune di CastelGandolfo	Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria "La Villetta"	265.000.000
C.05.01/1	Comune di Roma	Giardini di Castel Sant'Angelo: lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni	678.450
C.05.01/2	Comune di Roma	Giardini di Castel Sant'Angelo: lavori di recupero infrastrutturale del fossato	46.208.604
C.07.01	Comune di Roma	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde	45.542.409
C.08.01/2	Comune di Roma	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini del Lago	26.402.352
C.08.01/3	Comune di Roma	Restauro del parco di Villa Borghese: Recinzioni lungo Via Pinciana, Giardini del lago, cancelli d'ingresso, Parco dei Daini.	62.052.198
C.08.01/4	Comune di Roma	Restauro del parco di Villa Borghese: Impianto d'irrigazione	47.948.078
C.09.02/2	Comune di Roma	Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) :Restauro manufatti storici: Ponti, Annia Regilla, Ninfeo Egeria, S. Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Valca	50.000.000
C.11.01/2	Comune di Roma	Area archeologica del Celio. Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili, integrazione della illuminazione esistente e/o nuovi impianti	965.824.946
C.11.02	Comune di Roma	Area archeologica del Celio. Casina dei Salvi consolidamento e restauro	477.712.102

Riunione Commissione del 27/4/1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
C.11.05	Comune di Roma	Recupero dell'area a verde di S. Gregorio al Celio colle del Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio.	4.571.940
C.11.06	Comune di Roma	Area archeologica del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Teresa di Calcutta. (Manutenzione)	620.783.592
C.12.02	Comune di Roma	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	157.923
C.12.03	Comune di Roma	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale della Valle dei Daini	249.406.727
C.12.04/1	Comune di Roma	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del Teatro.	297.546.246
C.12.04/2	Comune di Roma	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini dei Cedrati, di Villa Vecchia, delle Serre	199.096.173
C.14.01	Comune di Roma	Pendici del Gianicolo (Roma) Riqualificazione delle aree a verde	1.031.337.240
C.15.01	Comune di Roma	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro vegetazionale ed infrastrutturale	300.000
C.18.02	Provincia di Roma	Santuario della Mentorella (Pisoniano-Capranica/Roma) Ristrutturazione del Santuario e riqualificazione ambientale dei territori vicini	496.954.338
C.19.01/b3	Regione Lazio	Risanamento Fosso Patatona. Ripascimento litorale/Trattamento acque di magra Focene e Ostia Litorale	2.045.123.594
C.19.01/b4	Regione Lazio	Risanamento Fosso Patatona. Ripascimento litorale/Trattamento acque di magra Focene e Ostia Litorale	1.834.876.406
C.19.1.2	Comune di Roma	Sistemazione idraulica fosso Acqua Mariana	2.034.642.180
D.09.01	F.S.	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	10.114.891.000

Riunione Commissione del 27/4/1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
D.13.06	Provincia di Roma	Parcheggio a raso per il nodo di scambio (Civitavecchia/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Civitavecchia	359.040.000
D.13.10	Provincia di Roma	SP Casa Romana (Zagarolo, S.Cesareo/Roma) Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	654.368.354
D.13.12	Provincia di Roma	Collegamento tra la S.P. Nomentana/S.P. San Martino-via Vallagati (Monterotondo/Roma)	1.153.000.000
D.14.06	Provincia di Roma	S.P. Settecamini (Guidonia/Roma). Raddoppio della sede stradale.	935.000.000
D.14.08	Provincia di Roma	Collegamento S.P. Settecamini-S.P. Pantano-S.S. 636 Maremmana (Guidonia/Roma). Realizzazione del tratto di collegamento.	2.207.000.000
D.14.10	Provincia di Latina	Miglioramento viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza (1° stralcio)	3.762.507.505
D.15.01/1	F.S.	Raddoppio ed elettrificazione del tratto La Storta - Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo	15.356.330.000
D.15.01/2	F.S.	Potenziamento della linea Ciampino - Velletri con realizzazione nuova fermata S. Gennaro e nuovi posti di incrocio di Pavona e Lanuvio	1.211.591.000
D.18.01/2 a	Comune di Roma	Linee Metropolitana. Adeguamento Metro A. 1° stralcio	5.717.079.690
D.18.02/2	Comune di Roma	Ferrovie concesse potenziamento Roma - Nord.	4.405.303.327
D.18.03	Grandi Stazioni S.p.A.	Sicurezza Stazione Termini	1.658.000.000
D.18.04	Grandi Stazioni S.p.A.	Ala Mazzoni Stazione Termini	2.052.000.000
D.19.02	F.S.	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "Passante dei Laghi"	788.475.000

Riunione Commissione del 27/4/1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
E.01.1	AMA	Automezzi ed attrezzature per il territorio comunale (Roma). Creazione di Isole Ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti.	1.353.969.393
E.01.08	AMA	Sede di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali.	858.284.743
E.01.09/2	AMA	Attrezzature specifiche per il centro storico.	656.000.000
E.01.12	AMA	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Potenziamento della sede di Porta Cavalleggeri.	444.165.505
E.01.13	AMA	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Potenziamento della sede di zona via Giolitti.	138.780.014
E.01.15	AMA	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona Arco di Travertino.	721.920.063
E.01.16	AMA	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona vicolo Savini.	1.549.819.797
E.01.17	AMA	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona via Bellami.	916.820.489
E.01.18	AMA	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto.	1.257.171.081
E.01-22/1	AMA	Ristrutturazione opere civili nell'Area Intermedia Attrezzata (A.I.A.) Via Sannio.	893.010.396
E.01-22/2	AMA	Fornitura attrezzatura: Compattatori su semirimorchi e motrici per raccolta rifiuti per l'area intermedia attrezzata (A.I.A.) - Via Sannio	40.000.000
E.01.25	AMA	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Maresciallo Giardino.	2.750.748.000
E.01.26/1	AMA	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoborio.	313.170.704

Riunione Commissione del 27/4/1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
E.01.26/2	AMA	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Fornitura di attrezzature per l'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoborio.	20.000.000
E.01.30	AMA	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse.	2.089.361.882
E.01.31	AMA	Servizi igienici pubblici (Roma) Fornitura di attrezzature igieniche mobili autopulenti.	79.520.000
E.02.02	Azienda S. Giovanni Addolorata	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	1.204.947.517
E.02.03	U.S.L. RM C	Ospedale S. Eugenio (Roma). Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di II livello (1° stralcio funzionale)	4.955.815.265
E.02.09	USL RM H	Ospedale di Albano (Albano/Roma) Potenziamento del Dipartimento emergenza accettazione di primo livello	198.678.141
E.02.11	USL RM F	Complesso ospedaliero (Bracciano/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	70.242.120
E.02.17	USL RM B	Ristrutturazione P. M. P. Via Saredo Roma	698.202.766
E.03.02/1	Comune di Roma	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio viale Trastevere n° 18 Roma (ex ufficio contravvenzioni)	4.475.000
E.03.02/3	Comune di Roma	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio viale P. Togliatti n° 987 Roma (sede 7° gruppo vigili urbani)	3.575.000
E.03.03	Comune di Roma	Servizi logistici e tecnologici per i Vigili Urbani (Roma). Acquisto autoveicoli	105.300.000
E.05.14	Min. Interno	Infrastrutture - Costruzione caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino	3.554.921.390
E.05.15	Min. Interno	Infrastrutture - Ristrutturazione Servizi Logistici caserma "Piave"	62.191.134

Riunione Commissione del 27/4/1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
E.05.16	Min. Interno	Caserma della Polizia di Stato "Villa Tevere" sede del reparto scorte	124.894.000
E.05.17	Ministero Difesa	Caserma della Polizia di Stato "Maurizio Giglio" sede del reparto volanti	270.875.000
E.05.18	Ministero Difesa	Nuovo complesso Polizia di Stato (Ponte Galeria) Fiumicino	381.369.851
E.05.32	Ministero dell'Interno	Caserma C.C. Piazza Dante - lavori di ristrutturazione (I stralcio)	123.843.530
F.01.04	F.S.	Sistema di informazione al pubblico nodo di Roma	345.000.000
F.04.01	Agenzia Romana preparazione del Giubileo	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati ai commi 4 e 8 del Decreto Legge n. 349 del 3 luglio 1996	22.134.000.000
F.05.02	Agenzia Romana preparazione del Giubileo	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità. Realizzazione e gestione (1° stralcio funzionale)	1.500.000.000
		DISPONIBILITA' TOTALI	147.440.413.483

ALLEGATO A1

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione del 27/4/1999**Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara Ministero dei Beni Culturali**

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
B.12.27	Ministero Beni Culturali ed Ambientali	Ex scuderie Papali al Quirinale-Restauro e risanamento conservativo	1.172.832.000
		DISPONIBILITA' TOTALI	1.172.832.000

ALLEGATO B

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione del 27/04/1999

Definanziamenti

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
A.06.02	Regione Lazio	Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Ipab e Iacp) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati. (definanziamento parziale)	6.373.636.000
B.12.23	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Completamento dei lavori di restauro e ripulitura dei prospetti, revisione dei tetti e lavori interni. (definanziamento totale)	1.500.000.000
C.03.06	Comune di Roma	Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali - 1° Stralcio (definanziamento parziale)	20.500.000.000
C.1.30	Comune di Roma	Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche relative a percorsi ATAC e sedi stradali adiacenti. (definanziamento parziale)	2.052.410.379
C.11.01/1	Comune di Roma	Area archeologica del Celio. Via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali - interventi di restauro e manutenzione (definanziamento parziale)	882.865.000
C.12.01	Comune di Roma	Villa Doria Pamphili (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica (definanziamento parziale).	1.300.000.000
C.18.04	Provincia di Roma	Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma) Interventi di riqualificazione (definanziamento parziale)	300.000.000
C.2.1.1.1	Comune di Roma	"BOR": Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano (definanziamento parziale)	1.342.420.694
C.2.1.1.3	Comune di Roma	"CON": Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano (definanziamento parziale)	1.896.482.806
C.2.2.2.3	Comune di Roma	"MER": Progetto di riqualificazione ambientale di via Merulana ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Giovanni (definanziamento totale)	4.943.262.000

Riunione Commissione del 27/04/1999
--

Definanziamenti

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
D.05.01/8	COTRAL	Fornitura materiale rotabile ferrovia Roma Pantano (definanziamento totale)	12.200.000.000
D.14.03	Provincia di Roma	Sp. Laurentina (Roma) dal GRA al Km 28,200 . Opere di adeguamento e manutenzione straordinaria (definanziamento parziale)	13.200.000.000
E.01.11	AMA	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza (definanziamento parziale)	2.375.000.000
E.02.03	USL RM C	Complesso ospedaliero S. Eugenio /C.T.O. (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale) (definanziamento parziale)	6.000.000.000
E.02.14	Regione Lazio	Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione (definanziamento parziale)	2.140.000.000
E.02.19	IDI	Programma di potenziamento dell'Ospedale di S. Carlo di Nancy (definanziamento totale)	3.000.000.000
		DISPONIBILITA' TOTALI	80.006.076.879

ALLEGATO C

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione della Commissione del 27 Aprile 1999 - Modifiche ed integrazioni al Piano

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
A 01 14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	1.538.000.000	1.538.000.000		set-98	set-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 150.672.000</i>						
A 01 18	Centro di accoglienza residenziale per anziani (Anzio/Roma). Ristrutturazione dell'edificio	Comune di Anzio	149.250.000	149.250.000		ott-97	mag-98
	<i>Integrazione di finanziamento di 11.000.000</i>						
A 01 21	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola	Comune di Roma	5.500.000.000	5.500.000.000		feb-99	nov-99
	<i>Proroga termini lettere c) e d)</i>					mag-99	dic-99
A 04 01/1	Complesso Buon Pastore: Allestimento sede Casa Internazionale della Donna	Comune di Roma	2.200.000.000	2.200.000.000		apr-99	nov-99
	<i>Proroga termini lettere c) e d)</i>					ago-99	dic-99
A 05 02	Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione ex colonia marina "Vittorio Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale)	Comune di Roma	6.879.166.414	6.879.166.414		lug-98	dic-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 1.200.000.000</i>						
A 07 01	Centro di accoglienza turistica e convitto (Roma) Costruzione nuovo edificio annesso all'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi	Provincia di Roma	6.975.315.293	5.231.486.400	1.743.828.893	giu-97	set-99
	<i>Proroga termini lettera d)</i>						nov-99
A 07 03	Campeggio (Roma) Realizzazione nell'area di proprietà provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà	Provincia di Roma	1.110.000.000	676.000.000	434.000.000	gen-99	nov-99
	<i>Proroga termini lettera c)</i>					giu-99	
A 07 07/a	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Realizzazione di una struttura ricettiva	Comune di Frascati	2.440.000.000	1.830.000.000	610.000.000	ott-98	nov-99
	<i>Proroga termini lettera c)</i>					mag-99	

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
A 07 07/b	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Ristrutturazione di un edificio da adibire a ostello <i>Proroga termini lettera c)</i>	Comune di Frascati	560.000.000	420.000.000	140.000.000	set-98	mar-99
A 07 11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle scuderie Estensi <i>Proroga termini lettere c) e d)</i>	Comune di Tivoli	1.750.000.000	1.050.000.000	700.000.000	dic-98	giu-99
A 07 14	Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma). Ristrutturazione di Palazzo Carboni <i>Integrazione di finanziamento di 150.000.000</i>	Comune di Anticoli Corrado	874.500.000	656.000.000	218.500.000	ott-98	nov-99
A 07 25	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Flauto <i>Proroga termine lettera c)</i>	Comune di Fara in Sabina	6.000.000.000	4.500.000.000	1.500.000.000	ott-98	nov-99
A 07 29	Area camper (Frasso Sabino/Rieti) Realizzazione della pavimentazione, dei servizi e sistemazione degli accessi <i>Integrazione di finanziamento di 58.340.000</i>	Comune di Frasso Sabino	500.000.000	375.000.000	125.000.000	mag-98	mar-99
A 07 30	Area camper (Montopoli/Rieti) Realizzazione della pavimentazione e dei servizi <i>Integrazione di finanziamento di 58.103.000</i>	Comune di Montopoli	500.000.000	375.000.000	125.000.000	giu-98	giu-99
A 07 40	Centro di accoglienza (Latina) Ristrutturazione Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto <i>Integrazione di finanziamento di 266.000.000</i>	Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	1.395.703.000	961.703.000	434.000.000	giu-98	nov-99
A 07 45	Ostello della gioventù (San Donato Val Comino) <i>Proroga termine lettera d)</i>	Comune di San Donato Val Comino	1.084.160.500	799.380.500	284.780.000	lug-97	mar-99
A 10 01	Pavimentazione sagrato del Santuario e dei viali processionali <i>Proroga termine lettera c)</i>	Parrocchia Santa Maria del Divino Amore	1.379.000.000	1.379.000.000		dic-98	dic-99
A 10 02	Deumidificazione dei piani inferiori degli edifici del '700 e della Chiesa del Santuario <i>Proroga termine lettera c)</i>	Parrocchia Santa Maria del Divino Amore	234.000.000	234.000.000		dic-98	dic-99
A 10 03	Eliminazione barriere architettoniche nei percorsi interni al comprensorio del Divino Amore	Parrocchia Santa Maria del Divino Amore	917.000.000	917.000.000		dic-98	dic-99

 Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
	<i>Proroga termine lettera c)</i>						<i>apr-99</i>	
B 02 01/1	Area archeologica dei Fori Imperiali. Museo dei Fori Imperiali ai mercati tralanei		Comune di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000		ott-98	nov-99
	<i>Proroga dei termini lettera d)</i>							<i>dic-99</i>
B 02 01/3	Area archeologica dei Fori Imperiali - Restauro e ripristino agibilità Torre delle Milizie.		Comune di Roma	2.322.277.175	2.322.277.175		set-98	nov-99
	<i>Proroga dei termini lettera d)</i>							<i>dic-99</i>
B 02 02	Area archeologica dei Fori Imperiali; Restauri e sistemazioni esterne dei Fori di Cesare, Augusto, Nerva e Traiano		Comune di Roma	2.168.123.545	2.168.123.545		set-98	nov-99
	<i>Proroga dei termini lettera d)</i>							<i>dic-99</i>
B 02 03/2a	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Foro di Cesare		Comune di Roma	1.312.658.088	1.312.658.088		lug-98	nov-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 262.331.000</i>							
B 02 03/2c	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Foro di Traiano		Comune di Roma	1.969.554.263	1.969.554.263		lug-98	nov-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 393.910.000</i>							
B 03 01	Mura di Roma. Restauro e valorizzazione di Porta S. Paolo		Comune di Roma	1.600.000.000	1.600.000.000		set-98	nov-99
	<i>Proroga dei termini lettera d)</i>							<i>dic-99</i>
B 03 02/1	Mura di Roma. Restauro P.ta S. Sebastiano, Arco di Druso, P.ta Latina, tratti di mura da Porta S. Sebastiano al Bastione Ardeatino		Comune di Roma	1.814.554.434	1.814.554.434		set-98	set-99
	<i>Proroga dei termini lettera d)</i>							<i>nov-99</i>
B 03 02/2	Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro tratti murari tra Porta S. Sebastiano e Porta Metronia		Comune di Roma	1.689.120.966	1.689.120.966		set-98	set-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 73.426.000</i>							
	<i>Proroga dei termini lettera d)</i>							<i>nov-99</i>
B 03 03	Mura di Roma - Restauro di Porta S. Giovanni e tratto di mura da Porta Asinaria all'anfiteatro Castruense		Comune di Roma	3.000.000.000	3.000.000.000		dic-98	nov-99
	<i>Proroga dei termini lettera c) e d)</i>						<i>gen-99</i>	<i>dic-99</i>
B 03 04/1	Mura di Roma - Restauro di Porta Maggiore, dei tratti di mura adiacenti e sepolcro di Eurisace		Comune di Roma	2.600.000.000	2.600.000.000		dic-98	nov-99
	<i>Proroga dei termini lettera c) e d)</i>						<i>gen-99</i>	<i>dic-99</i>

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B 03	04/2	Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro di Porta Tiburtina e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario	1.088.736.250	1.088.736.250		set-98	set-99
		<i>Integrazione di finanziamento di 305.000.000</i>					
		<i>Proroga dei termini lettera d)</i>					nov-99
B 03	05	Mura di Roma. Restauro conservativo e consolidamento del complesso monumentale di Porta Pia	1.786.034.040	1.786.034.040		ott-98	nov-99
		<i>Proroga dei termini lettera d)</i>					dic-99
B 03	06	Mura di Roma. Restauro ed adeguamento della Porta del Popolo	1.730.751.732	1.730.751.732		lug-98	ago-99
		<i>Proroga dei termini lettera d)</i>					ott-99
B 03	08	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle mura Gianicolensi nel tratto Porta S. Pancrazio - Porta Portese	1.774.396.177	1.774.396.177		giu-98	nov-99
		<i>Integrazione di finanziamento di 470.500.000</i>					
		<i>Proroga dei termini lettera d)</i>					dic-99
B 04	01	Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro dell'edificio	1.128.056.575	1.128.056.575		ott-98	set-99
		<i>Integrazione di finanziamento di 292.918.000</i>					
B 05	01/1	Restauro di Palazzo Braschi. Interventi preliminari.	1.608.000.000	1.608.000.000		ago-98	nov-99
		<i>Proroga dei termini lettera d)</i>					dic-99
B 05	01/2	Restauro di Palazzo Braschi: Restauro - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braschi - Museo di Roma	10.673.193.647	10.673.193.647		apr-98	nov-99
		<i>Proroga dei termini lettera d)</i>					dic-99
B 08	08	Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiostro di Michelangelo", allestimento della Sezione Protostoria e del Museo della Certosa	8.700.000.000	8.700.000.000		mar-98	ott-99
		<i>Proroga dei termini lettera d)</i>					dic-99
B 12	06/a	Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	2.208.104.197	2.208.104.197		gen-98	giu-99
		<i>Integrazione di finanziamento di 4.500.000.000</i>					

Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B 12 10	Applia Antica - Cecilia Metella		Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.860.558.753	1.860.558.753		mar-98	ott-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 700.000.000.</i>							
B 12 24	Ripulitura delle facciate interne ed esterne, revisione e verniciatura dei relativi infissi e sistemazioni varie a Palazzo Chigi		Presidenza del Consiglio dei Ministri	3.672.000.000	3.672.000.000		ago-98	nov-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 67.000.000.</i>							
B 12 27/1	Ex Scuderie Papali al Quirinale - Restauro e risanamento conservativo		Ministero per i Beni e le Attività Culturali	8.897.000.000	8.897.000.000		ott-98	giu-00
	<i>Integrazione di finanziamento di 1.431.900.000.</i>							dic-99
B 13 01/2	Chiesa S. Croce in Gerusalemme - Restauro facciata		Ministero per i Beni e le Attività Culturali	927.719.669	927.719.669		mag-98	dic-99
	<i>Proroga termine lettera d)</i>							feb-99
B 13 15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca		Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.000.000.000	1.000.000.000		gen-98	feb-99
	<i>Proroga termine lettera d)</i>							apr-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 1.000.000.000.</i>							
B 13 45/2	Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni		Ministero per i Beni e le Attività Culturali	400.000.000	400.000.000		nov-97	dic-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 400.000.000</i>							
B 13 48/5	Chiesa di S. Maria della scala. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)		Ministero per i Beni e le Attività Culturali	300.000.000	300.000.000		dic-97	dic-98
	<i>Proroga termine lettera d)</i>							apr-99
B 13 51	Basilica costantiniana di S. Agnese fuori le mura (Roma) Scavo, restauro e recupero (prima fase)		Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.372.432.827	1.372.432.827		gen-98	ott-99
	<i>Proroga termine lettera d)</i>							nov-99
B 13 70	Restauro delle edicole sacre del centro storico di Roma		Comune di Roma	1.700.000.000	1.700.000.000		feb-99	nov-99
	<i>Proroga dei termini lettera c) e d)</i>						apr-99	dic-99
B 14 06	Museo delle navi romane (Nemi/Roma)		Ministero per i Beni e le Attività Culturali	800.000.000	800.000.000		nov-97	gen-99

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
	<i>Integrazione di finanziamento di 500.000.000</i>						
B 14 08	Completamento "Museo del fiume"	Comune di Nazzano	900.000.000	900.000.000		gen-99	ott-99
	<i>Proroga termine lettera c)</i>					apr-99	
B 18 07	Ex-tempio Colico S. Lucia (Marino/Roma) Restauro e adeguamento funzionale	Provincia di Roma	514.043.646	514.043.646		giu-98	giu-99
	<i>Proroga termine lettera d)</i>						nov-99
B 18 08	Progetto di recupero antica via dei sepolcri in comune di Grottaferrata. 4° settore di intervento	XI ^a Comunità Montana (Castelli Romani e Prenestini), Sede di Rocca Priora	500.000.000	500.000.000		set-98	set-99
	<i>Proroga termine lettera d)</i>						dic-99
B 18 12	Mura poligonali (Palestrina/Roma) Interventi di restauro e consolidamento e sistemazione dei percorsi	Comune di Palestrina	1.313.738.552	1.313.738.552		ott-97	apr-99
	<i>Proroga termine lettera d)</i>						nov-99
B 18 16	Museo dell'Abbazia di S.Scolastica (Subiaco/Roma) Ristrutturazione, allestimento e valorizzazione	Provincia di Roma	1.959.637.248	1.959.637.248		giu-98	set-99
	<i>Proroga termine lettera d)</i>						dic-99
	<i>Ulteriore finanziamento di 137.665.000</i>						
B 18 17	Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini	Provincia di Roma	397.685.651	397.685.651		giu-98	giu-99
	<i>Proroga termine lettera d)</i>						set-99
B 18 19	Ex chiesa di S.Michele (Tivoli/Roma) Restauro e allestimento spazi per mostre e concerti	Provincia di Roma	389.792.498	389.792.498		dic-97	mar-99
	<i>Proroga termine lettera d)</i>						ott-99
B 19 18	Adattamento del Convento di S. Cosimato al superamento delle barriere architettoniche	Comuni di Vicovaro	150.000.000	150.000.000		mar-98	nov-98
	<i>Integrazione di finanziamento di 26.736.000</i>						
B 19 20/4	Sistemazione di Via della Mattinara (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	820.925.000	820.925.000		gen-98	ott-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 194.823.000</i>						
	<i>Proroga termini lettera c) e d)</i>					ago-99	nov-99

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B 19 21	Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesano	Diocesi di Viterbo	3.070.104.360	3.070.104.360		mar-98	lug-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 390.787.000</i>						
B 19 23	Museo della cristianità	Capitolo della Basilica Cattedrale di Viterbo	2.128.411.478	2.128.411.478		dic-97	dic-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 249.600.000</i>						
B 19 24/3	Progetto per consolidamento, restauro e recupero edilizio Sanmiurzio S. Maria in Valverde	Comune di Tarquinia	2.087.815.000	2.087.815.000		ago-97	mag-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 172.185.000</i>						
B 19 28/1	Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio. Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato. (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	804.000.000	804.000.000		gen-98	ago-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 25.861.000</i>						
B 19 30	Complesso di S. Alessandro (Tofia/Rieti) Completamento della ristrutturazione dell'ex convento	Comune di Tofia in Sabina	1.500.000.000	1.500.000.000		nov-97	mag-99
	<i>Proroga termini lettera c) e d)</i>					giu-99	ott-99
B 19 33	Monastero delle Clarisse (Sezze/Latina) Completamento della ristrutturazione (prima fase)	Provincia di Latina	4.998.903.343	1.998.903.343	3.000.000.000	dic-98	dic-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 312.438.000</i>						
B 19 39	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)	Comune di Priverno	1.250.000.000	1.250.000.000		set-98	dic-99
	<i>Proroga termini lettera c) e d)</i>					feb-99	ott-99
B 19 40	Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Sistemazione area annessa	Provincia di Latina	683.400.000	683.400.000		ago-98	ago-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 94.000.000</i>						
B 19 41/1	Restauro e risanamento conservativo e funzionale del convento di S. Francesco	Comune di Minturno	224.855.727	224.855.727		ago-97	gen-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 6.354.000</i>						
B 19 41/2	Progetto di sistemazione della Chiesa di S. Annunziata	Comune di Minturno	130.642.227	130.642.227		ago-97	dic-98

		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
		<i>Integrazione di finanziamento di 3.345.000</i>						
B 19	51	Itinerari di San Tommaso d'Aquino (Aquino/Frosinone) Sistemazione del borgo medievale, del castello e della chiesa di Santa Maria della Libera	Comune di Aquino	989.007.346	989.007.346		gen-98	mar-99
		<i>Proroga termini lettera d)</i>						nov-99
B 19	56	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Cassino	4.000.000.000	4.000.000.000		giu-98	ott-99
		<i>Integrazione di finanziamento di 176.000.000</i>						
B 19	57	Chiesa di Santa Maria (Boville Ernica/Frosinone) Restauro	Comune di Boville Ernica	256.272.400	256.272.400		nov-97	gen-99
		<i>Proroga termini lettera d)</i>						mar-99
B 19	59	Chiesa di Santa Maria Annunziata (Fumone/Frosinone) Restauro	Comune di Fumone	300.000.000	300.000.000		mar-98	dic-98
		<i>Integrazione di finanziamento di 170.000.000</i>						
B 19	63/1	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	1.071.006.279	571.006.279	500.000.000	giu-98	ott-98
		<i>Integrazione di finanziamento di 238.993.000</i>						
B 19	64	Cattedrale di San Paolo (Alatri)	Comune di Alatri	683.006.900	683.006.900		nov-97	dic-99
		<i>Integrazione di finanziamento di 74.569.000</i>						
B 19	69	Chiesa di San Nito	Comune di Roccasecca	300.000.000	300.000.000		set-98	dic-99
		<i>Retifica Titolo "Chiesa di San Vito"</i>						
B 19	75	Abbazia di Casamari	Ordine Cistercense	1.000.000.000	1.000.000.000		n.d.	n.d.
		<i>Comunicazione dei termini lettere c) e d)</i>					apr-99	dic-99
B 20	01.5	Convegno internazionale	Agenzia Romana per il Giubileo	2.000.000.000	2.000.000.000		ott-98	gen-01
		<i>Cambio titolo "Convegni ed iniziative artistiche culturali"</i>						

	 Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B 20	01.6	Concorsi finalizzati all'arricchimento del patrimonio culturale (di Comune, Provincia e Regione)	Agenzia Romana per il Glabito	5.000.000.000	5.000.000.000		ott-98	gen-01
		<i>Cambio titolo "Iniziativa finalizzate all'arricchimento del patrimonio culturale di Comune, Provincia, Regione"</i>						
B 20	02	Centro Internazionale per le arti e le culture a Roma in Villa Piccolomini - Villa del Sole	Fondazione Niccolò Piccolomini	2.985.000.000	2.985.000.000		nov-98	nov-99
		<i>Integrazione di finanziamento di 1.800.000.000</i>						
C 01	04	Restauro conservativo di ponte Risorgimento	Comune di Roma	2.689.000.000	2.689.000.000		dic-97	lug-99
		<i>Integrazione di finanziamento di 118.641.000</i>						
C 01	13/1	Lungotevere di sinistra e destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti. Interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Ristrutturazione marciapiedi, sistema fognario superficiale e arredo urbano.	Comune di Roma	4.500.000.000	4.500.000.000		gen-99	nov-99
		<i>Proroga dei termini lettera c) e d)</i>					ago-99	dic-00
C 01	13/2	Manutenzione superficiale delle sedi stradali del Lungotevere di sinistra e di destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti e zone limitrofe agli itinerari degli autobus turistici.	Comune di Roma	7.000.000.000	7.000.000.000		gen-99	nov-00
		<i>Proroga dei termini lettera c) e d)</i>					lug-99	dic-00
C 01	15/2	Via Appia Antica, 2° lotto. Riqualificazione e adeguamento della sede stradale da via Cecilia Metella al G.R.A.	Comune di Roma	9.681.075.728	9.681.075.728		ott-98	nov-99
		<i>Integrazione di finanziamento di 860.205.000</i>						
		<i>Proroga dei termini lettera d)</i>						dic-99
C 01	18/1	Villa Borghese: Portico dei leoni, Mostra dell'Acqua Felice, Arco di Settimo Severo, propilei neoclassici, prospetti di piazza delle Canesire	Comune di Roma	2.000.000.000	2.000.000.000		dic-98	ott-99
		<i>Integrazione di finanziamento di 219.488.000</i>						
		<i>Proroga dei termini lettera d)</i>						dic-99

Codice	C	18/2	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
	C	01	Villa Borghese: Propilici egizi. Fontana del Flosco, perimetri murari e scogliere di viale F. La Guardia, restauro degli arredi architettonici	Comune di Roma	2.165.000.000	2.165.000.000		dic-98	ott-99
			Integrazione di finanziamento di 241.636.000						
			Proroga dei termini lettera d)					dic-99	
	C	01	19	Villa Borghese: Giardini Segreti, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni.	Comune di Roma	1.098.160.620	1.098.160.620	giu-98	giu-99
			Proroga dei termini lettera d)						nov-99
	C	01	20	Villa Borghese: Parco dei Daini (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale	Comune di Roma	875.455.525	875.455.525	set-98	set-99
			Integrazione di finanziamento di 129.000.000						
			Proroga dei termini lettera d)					dic-99	
	C	01	21/1	Villa Doria Pamphilj (Roma): sistemazioni esterne ed allestimento del museo di Villa Vecchia, restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedri - Illuminazione esterna.	Comune di Roma	3.000.000.000	3.000.000.000	dic-98	ott-99
			Proroga dei termini lettera c) e d)					mar-99	dic-99
	C	01	21/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) recupero delle serre ottocentesche.	Comune di Roma	2.355.000.000	2.355.000.000	nov-98	ott-99
			Proroga dei termini lettera d)						dic-99
	C	01	22/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e consolidamento di Casale di Gioiolo.	Comune di Roma	1.694.479.906	1.694.479.906	giu-98	giu-99
			Proroga dei termini lettera d)						nov-99
	C	01	22/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e allestimento museale della Cascina Falsetti e dell'area annessa.	Comune di Roma	1.497.997.384	1.497.997.384	giu-98	giu-99
			Proroga dei termini lettera d)						set-99
	C	01	23	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale del Giardino del Teatro	Comune di Roma	1.550.958.910	1.550.958.910	ott-98	set-99

Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
	Integrazione di finanziamento di 200.000.000							
	Proroga dei termini lettera d)							dic-99
C 01	24	Villa Pamphilj (Roma) Recupero e restauro Villino Corsini	Comune di Roma	1.789.260.680	1.789.260.680		set-98	ago-99
		Proroga dei termini lettera d)						dic-99
C 01	25	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero e restauro dell'Arco del Quattro Venti e delle aree limitrofe	Comune di Roma	1.190.000.000	1.190.000.000		set-98	ott-99
		Integrazione di finanziamento di 240.000.000						
		Proroga dei termini lettera d)						dic-99
C 01	28	Potenziamento meccanizzazione Servizio Giardini	Comune di Roma	2.412.000.000	2.412.000.000		dic-98	ago-99
		Proroga dei termini lettera c)					mar-99	
C 01	29	Lavori per l'impianto del verde nel Parco S. Maria della Pietà	Comune di Roma	1.970.000.000	1.970.000.000		gen-99	nov-99
		Proroga dei termini lettera c) e d)					lug-99	dic-99
C 01	30	Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche relativi a percorsi ATAC e sedi stradali adiacenti	Comune di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000		gen-99	nov-99
		Proroga dei termini lettera c) e d)					giu-99	dic-99
C 02	01.1.1	"BOR": Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	5.347.538.000	5.347.538.000		apr-99	nov-99
		Proroga dei termini lettera c) e d)					mag-99	dic-99
C 02	01.1.2	"RIS": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza Risorgimento ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	9.425.458.000	9.425.458.000		apr-99	nov-99
		Proroga dei termini lettera c) e d)					mag-99	dic-99

C	02	Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse l. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C	02	01.1.3	"CON": Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	4.583.604.000	4.583.604.000		apr-99	nov-99
			<i>Proroga dei termini lettera c) e d)</i>					mag-99	dic-99
C	02	01/7	Infrastrutturazione urbana area Stazione di S. Pietro (I Lotto)	Roma 2000 S.p.a.	9.240.000.000	9.240.000.000		gen-98	mar-99
			<i>Integrazione di finanziamento di 1.300.000.000</i>						
C	02	02.2.2	"GIO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Giovanni ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	9.932.494.000	9.932.494.000		apr-99	nov-99
			<i>Proroga dei termini lettera c) e d)</i>					mag-99	dic-99
C	02	02.2.4	"MAR": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Maria Maggiore ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	5.213.681.000	5.213.681.000		apr-99	nov-99
			<i>Proroga dei termini lettera c) e d)</i>					mag-99	dic-99
C	02	02.2.5	"CRO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Croce in Gerusalemme ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	1.909.836.000			apr-99	nov-99
			<i>Proroga dei termini lettera c) e d)</i>					mag-99	dic-99
C	02	3.1.1	"PAO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazzale S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	8.934.648.000	8.934.648.000		apr-99	nov-99
			<i>Proroga dei termini lettera c) e d)</i>					mag-99	dic-99
C	02	3.1.2	"LU": Progetto di riqualificazione ambientale di lungotevere S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	1.482.518.000	1.482.518.000		apr-99	nov-99
			<i>Integrazione di finanziamento di 238.196.000</i>						
C	02	3.1.3	"OST": Progetto di riqualificazione ambientale di via Ostiense ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	820.827.000	820.827.000		apr-99	nov-99
			<i>Integrazione di finanziamento di 131.972.000</i>						

		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C 02	04.1	Itinerari giubilari e storici. Contributi per la manutenzione e la riqualificazione delle sedi stradali e relative pertinenze	Comune di Roma	10.000.000.000	10.000.000.000		dic-98	nov-99
		<i>Proroga dei termini lettera c) e d)</i>					mar-99	dic-99
C 02	04.2	Contributo per interventi di manutenzione delle sedi stradali e relative pertinenze degli itinerari giubilari e storici, processionali e celebrazioni religiose	Comune di Roma	10.000.000.000	10.000.000.000		gen-99	dic-00
		<i>Proroga dei termini lettera d)</i>					mar-99	
C 02	05	Contributo per la manutenzione delle sedi stradali e pertinenze delle strade di accesso e dei parcheggi a servizio delle zone limitrofe alle catacombe aperte al pubblico	Comune di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000		gen-99	dic-00
		<i>Proroga dei termini lettera c)</i>					lug-99	
C 02	06	Ponti pedonali temporanei nella città di Roma	Comune di Roma	7.400.000.000	7.400.000.000		mar-99	nov-99
		<i>Proroga dei termini lettera c) e d)</i>					giu-99	dic-99
C 02	08	Interventi speciali di illuminazione cittadina	ACEA	3.000.000.000	3.000.000.000		dic-98	nov-99
		<i>Proroga termini lettera c)</i>					apr-99	
C 02	09	"ATT" Fornitura e posa in opera attrezzature temporanee nelle aree delle basiliche di S. Pietro, S. Giovanni e S. Paolo	Comune di Roma	7.264.911.000	7.264.911.000		n.d.	n.d.
		<i>Proroga dei termini lettera c) e d)</i>					mag-99	dic-99
C 03	01	Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) Riqualificazione delle sedi stradali	Comune di Roma	2.400.000.000	2.400.000.000		gen-99	nov-99
		<i>Proroga termini lettera c) e d)</i>					giu-99	dic-99
C 03	02	Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali	Comune di Roma	405.668.350	405.668.350		set-98	mag-99
		<i>Proroga termini lettera d)</i>						lug-99
C 03	03	Via delle Muratte	Comune di Roma	2.353.908.900	2.353.908.900		mag-98	nov-99

 Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
	<i>Integrazione di finanziamento di 29.078.000</i>						
C 04 A	Terminal Bus	Comune di CastelGandolfo	1.300.000.000	1.300.000.000		ott-98	nov-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 171.599.000</i>						
C 04 B	Centro servizi di prima necessità	Comune di CastelGandolfo	1.500.000.000	1.500.000.000		ott-98	set-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 206.414.000</i>						
C 04 C	Sottopasso pedonale di via Maremmana	Comune di CastelGandolfo	300.000.000	300.000.000		ott-98	set-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 46.628.000</i>						
C 04 D	Realizzazione aree e strutture di parcheggio a servizio del centro storico	Comune di CastelGandolfo	550.000.000	550.000.000		ott-98	nov-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 113.251.000</i>						
C 04 E	Sistemazione della viabilità urbana	Comune di CastelGandolfo	3.500.000.000	3.500.000.000		ott-98	set-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 583.808.000</i>						
C 04 F	Sistemazione della passeggiata sul lungolago	Comune di CastelGandolfo	2.500.000.000	2.500.000.000		ott-98	set-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 455.407.000</i>						
C 04 H	Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo	1.400.000.000	1.400.000.000		ott-98	nov-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 264.482.000</i>						
C 05 01/1	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni	Comune di Roma	3.300.000.000	3.300.000.000		gen-99	nov-99
	<i>Proroga termini lettera c)</i>					apr-99	
C 05 01/2	Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	Comune di Roma	1.700.000.000	1.700.000.000		gen-99	nov-99
	<i>Proroga termini lettera c)</i>					mar-99	
C 06 01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma	3.500.000.000	3.500.000.000		dic-98	set-99
	<i>Proroga termini lettera c) e d)</i>					feb-99	nov-99

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C 07 01	Parco Castilino Labicano, Villa De Sanctis - Casacembe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde <i>Proroga termini lettera c) e d)</i>	Comune di Roma	2.000.000.000	2.000.000.000		dic-98	ott-99
						mar-99	nov-99
C 08 01/1	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini Segreti <i>Proroga termini lettera d)</i>	Comune di Roma	1.720.816.797	1.720.816.797		nov-97	dic-98
							ott-99
C 08 01/2	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini del Lago <i>Proroga termini lettera c) e d)</i>	Comune di Roma	3.000.000.000	3.000.000.000		dic-98	ago-99
						mar-99	nov-99
C 08 01/3	Restauro del parco di Villa Borghese: Recinzioni lungo Via Flaminia, Giardini del lago, cancelli d'ingresso, Parco dei Daini. <i>Proroga termini lettera d)</i>	Comune di Roma	1.405.367.495	1.405.367.495		nov-97	set-98
							mar-99
C 08 01/4	Restauro del parco di Villa Borghese: Impianto d'irrigazione <i>Proroga termini lettera d)</i>	Comune di Roma	2.929.750.000	1.929.750.000	1.000.000.000	gen-98	dic-98
							lug-99
C 08 01/5	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini <i>Proroga termini lettera c) e d)</i>	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000		gen-99	set-99
						mag-99	nov-99
C 09 01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riquadrificazione del comprensorio degli Acquedotti <i>Proroga termini lettera d)</i> <i>Integrazione di finanziamento di 59.414.000</i>	Comune di Roma	3.281.442.382	3.281.442.382		lug-98	lug-99
							ago-99
C 09 02/1	Riquadrificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la cartiera Latina ed il circo di Massenzio) <i>Integrazione di finanziamento di 117.409.000</i>	Comune di Roma	3.548.052.795	3.548.052.795		set-98	nov-99
C 09 02/2	Riquadrificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) :Restauro manufatti storici: Ponti, Annia Regilla, Ninfico Egeria, S. Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Valca <i>Proroga termini lettera c) e d)</i>	Comune di Roma	5.500.000.000	5.500.000.000		dic-98	nov-99
						mar-99	dic-99

 Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C 10 01	Restauro del parco Villa Ada - Savoia: Sistemazione percorsi, verde, accessi, aree attrezzate impianto di irrigazione. Restauro conservativo di manufatti di arredo		Comune di Roma	2.568.974.787	2.568.974.787		apr-98	mar-99
	Integrazione di finanziamento di 439.000.000							
	Proroga termini lettera d)							ott-99
C 11 01/2	Area archeologica del Celio. Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili, integrazione della illuminazione esistente e/o nuovi impianti		Comune di Roma	3.500.000.000	3.500.000.000		ott-98	set-99
	Proroga termini lettera d)							dic-99
C 11 02	Area archeologica del Celio. Casina dei Salvi consolidamento e restauro		Comune di Roma	2.866.272.653	2.866.272.653		mag-98	giu-99
	Integrazione di finanziamento di 257.309.000							
	Proroga termini lettera d)							set-99
C 11 03	Area archeologica del Celio. Sezione polizia turistica e banda nella ex palestra dei vigili.		Comune di Roma	1.281.087.531	1.281.087.531		set-98	ago-99
	Integrazione di finanziamento di 76.865.000							
	Proroga termini lettera d)							dic-99
C 11 04	Area archeologica del Celio. Restauro del casale quattrocentesco dell'Abate Commendatario		Comune di Roma	616.459.817	616.459.817		set-98	ott-99
	Integrazione di finanziamento di 120.000.000							
	Proroga termini lettera d)							dic-99
C 11 05	Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio - colle del Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio.		Comune di Roma	4.000.000.000	4.000.000.000		dic-98	lug-99
	Proroga termini lettera c) e d)						mar-99	ott-99
C 11 06	Area archeologica del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Teresa di Calcutta. (Manutenzione)		Comune di Roma	2.500.000.000	2.500.000.000		set-98	lug-99
	Integrazione di finanziamento di 618.929.000							
	Proroga termini lettera d)							dic-99
C 11 07	Area archeologica del Celio. Recupero del pulpito di S. Domenico.		Comune di Roma	301.710.233	301.710.233		ott-98	mar-99
	Integrazione di finanziamento di 47.095.000							
	Proroga termini lettera d)							ago-99

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C 12 01	Villa Doria Pamphili (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica	Comune di Roma	4.600.000.000	4.600.000.000		gen-99	set-99
	<i>Proroga termini lettera c) e d)</i>					mag-99	dic-99
C 12 02	Villa Doria Pamphili (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	Comune di Roma	3.000.000.000	3.000.000.000		gen-99	ago-99
	<i>Proroga termini lettera c) e d)</i>					mag-99	nov-99
C 12 03	Villa Doria Pamphili (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale della Valle dei Daini	Comune di Roma	699.384.000	699.384.000		dic-98	lug-99
	<i>Proroga termini lettera d)</i>						set-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 35.845.000</i>						
C 12 04/1	Villa Doria Pamphili (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del Teatro.	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000		nov-98	ago-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 63.045.000</i>						nov-99
	<i>Proroga termini lettera d)</i>						
C 12 04/2	Villa Doria Pamphili (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini dei Cedrai, di Villa Vecchia, delle Serre	Comune di Roma	698.934.212	698.934.212		ott-98	mag-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 37.023.000</i>						
	<i>Proroga termini lettera d)</i>						lug-99
C 13 01/1	Parco di Monte Mario (Roma): Recupero dei casali Mellini.	Comune di Roma	2.317.532.996	2.317.532.996		ott-98	nov-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 260.000.000</i>						
	<i>Proroga termini lettera d)</i>						dic-99
C 13 01/2	Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	Comune di Roma	4.300.000.000	4.300.000.000		gen-99	nov-99
	<i>Proroga termini lettera c) e d)</i>					feb-99	dic-99
C 14 01	Pendici del Gianicolo (Roma) Riqualificazione delle aree a verde	Comune di Roma	2.999.278.055	2.999.278.055		nov-98	set-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 165.234.000</i>						
	<i>Proroga termini lettera d)</i>						dic-99

 Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C 15 01	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro vegetazionale ed infrastrutturale	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000		dic-98	lug-99
	<i>Proroga termini lettera c) e d)</i>					mar-99	ott-99
C 15 02	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle Esedre Centrali e dei nuclei minori delle Terme di Traiano.	Comune di Roma	1.440.667.730	1.440.667.730		ott-98	ott-99
	<i>Proroga termini lettera d)</i>						nov-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 200.000.000</i>						
C 18 02	Santuario della Mentorella (Pisolsano-Capranica/Roma) Ristrutturazione del Santuario e riqualificazione ambientale dei territori vicini	Provincia di Roma	2.800.000.000	2.800.000.000		lug-98	lug-99
	<i>Proroga termini lettera d)</i>						ott-99
	<i>Ulteriore finanziamento di 15.355.000</i>						
C 18 04	Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma) Interventi di riqualificazione	Provincia di Roma	1.200.000.000	1.200.000.000		gen-99	ott-99
	<i>Proroga termini lettere c) e d)</i>					giu-99	dic-99
C 19 01/a2	Sistemazione idraulica del fosso dell'acqua Mariana	Comune di Roma	8.000.000.000	8.000.000.000		dic-98	nov-99
	<i>Proroga termini lettere c) e d)</i>					apr-99	dic-99
C 19 01/b2	Risanamento Fosso Patatona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	4.000.000.000	4.000.000.000		set-98	mag-99
	<i>Cambio titolo "Risanamento affluenti del fosso Patatona"</i>						
C 19 01/b3	Risanamento Fosso Patatona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	16.000.791.415	16.000.791.415		lug-98	ott-99
	<i>Cambio titolo "Trattamento acque canali di bonifica Tevere Agro Romano"</i>						
C 19 01/b4	Opere di difesa del litorale di Ostia e Focene	Regione Lazio	9.000.000.000	9.000.000.000		set-98	set-99
	<i>Cambio titolo "Ripascimento litorale di Ostia e Focene"</i>						
C 19 02	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di visita	Provincia di Roma	8.000.000.000	8.000.000.000		dic-98	nov-99

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
	<i>Proroga termini. Richiesta suddivisione in tre sub interventi corrispondenti ai lotti in corso di attuazione:</i>						
C 19 02/1	Rifiuti solidi urbani - raccolta differenziata nelle principali aree di visita - forniture e servizi per la raccolta differenziata		1.500.000.000	1.500.000.000		giu-99	dic-99
C 19 02/2	Rifiuti solidi urbani - raccolta differenziata nelle principali aree di visita - impianto di compostaggio a Velletri		3.250.000.000	3.250.000.000		lug-99	dic-99
C 19 02/3	Rifiuti solidi urbani - raccolta differenziata nelle principali aree di visita - impianto di compostaggio a Bracciano		3.250.000.000	3.250.000.000		ago-99	dic-99
D 07 02	Sottovia Lungotevere in Sassia	Comune di Roma	33.309.567.545	33.309.567.545		giu-98	nov-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 636.872.000</i>						
D 08 01	Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta (Realizzazione galleria scalolare di m. 10,50 di larghezza e m. 6,30 di altezza - lunghezza totale m. 850 - lunghezza in sotterraneo m. 676).	Comune di Roma	56.050.000.000	56.050.000.000		mag-97	giu-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 961.650.000</i>						
D 08 03	Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	15.390.000.000	15.390.000.000		ago-98	nov-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 1.330.300.000</i>						
D 09 01	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	92.491.695.000	92.491.695.000		ago-98	dic-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 1.500.000.000</i>						
D 10 01/a	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2°)	ANAS	69.867.134.712	65.773.623.930	4.093.510.782	feb-98	nov-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 3.384.336.000</i>						
D 10 01/b	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 3°)	ANAS	15.748.076.382	15.571.357.164	176.719.218	feb-98	nov-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 1.000.453.000</i>						
D 13 01	Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla stazione FS (Ciampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria	Provincia di Roma	1.500.000.000	1.500.000.000		dic-98	nov-99


		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
		<i>Proroga termini lettere c) e d)</i>					<i>mag-99</i>	<i>dic-99</i>
D 13	06	Parcheggio a raso per il nodo di scambio (Civita'vecchia/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Civita'vecchia	Provincia di Roma	1.200.000.000	1.200.000.000		lug-98	giu-99
		<i>Proroga termini lettera d)</i>						<i>set-99</i>
D 13	07	Parcheggio a raso - nodo di scambio (Ladispoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Ladispoli	Provincia di Roma	880.000.000	880.000.000		dic-98	nov-99
		<i>Proroga termini lettere c) e d)</i>					<i>mar-99</i>	<i>dic-99</i>
D 13	08	S.P. Marino due Santi (Marino/Roma) Allargamento dal Km 0+000 al Km 3+800 dalla S.S. Appia alla S.S. via dei Laghi <i>Integrazione di finanziamento di 505.888.000</i>	Provincia di Roma	4.000.000.000	4.000.000.000		ott-98	dic-99
D 13	09	S.P. Pedemontana dei Castelli (Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Marino/Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 / Km 10+500, dalla SS Casilina alla SS via dei Laghi (collegamento Tivoli-Palestrina e Castelli Romani) <i>Integrazione di finanziamento di 74.340.000</i>	Provincia di Roma	1.978.634.954	1.978.634.954		mar-98	nov-99
D 13	10	SP Casa Romana (Zagarolo, S.Cesareo/Roma) Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo <i>Integrazione di finanziamento di 62.280.000</i>	Provincia di Roma	3.000.000.000	3.000.000.000		set-98	nov-99
D 13	11	S.P. Maremmana 11 (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio dalla Tiburtina alla A24 <i>Integrazione di finanziamento di 862.089.000</i>	Provincia di Roma	3.672.390.680	3.672.390.680		giu-98	dic-99
D 13	12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Monterotondo/Roma) <i>Integrazione di finanziamento di 284.794.000</i>	Provincia di Roma	6.200.000.000	6.200.000.000		nov-98	nov-99
D 14	05	SP Tiberina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento <i>Integrazione di finanziamento di 466.568.000</i>	Provincia di Roma	2.850.000.000	2.850.000.000		set-98	dic-99
D 14	06	SP Settecanini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale <i>Integrazione di finanziamento di 366.412.000</i>	Provincia di Roma	6.210.000.000	6.210.000.000		nov-98	nov-99

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
D 14 07	SP Pratica di Mare (Roma) Allargamento della sede stradale e raddoppio di un ponte per il collegamento con l'area aeroportuale (Roma, Pomezia)	Provincia di Roma	2.335.091.672	2.335.091.672		set-98	dic-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 6.752.000</i>						
D 14 08	Collegamento SP Settecami - SP Pantano - SS 636 Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento	Provincia di Roma	11.205.000.000	11.205.000.000		nov-98	dic-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 1.047.318.000</i>						
D 14 09	Interventi di manutenzione ed adeguamento della rete viaria provinciale interessata da itinerari turistico-religiosi (primo e secondo stralcio)	Provincia di Frosinone	17.500.000.000	17.500.000.000		ott-98	ott-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 2.500.000.000</i>						
D 14 10	Miglioramento viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza (primo e secondo stralcio)	Provincia di Latina	17.500.000.000	17.500.000.000		set-98	set-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 2.500.000.000</i>						
D 14 11	Sistemazione viabilità provinciale connessa con gli itinerari spirituali e religiosi (primo e secondo stralcio)	Provincia di Rieti	17.500.000.000	17.500.000.000		ott-98	ott-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 500.000.000</i>						
D 14 12	Interventi per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale provinciale (primo e secondo stralcio)	Provincia di Viterbo	17.500.000.000	17.500.000.000		ott-98	ott-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 700.000.000</i>						
D 15 01/1	Raddoppio ed elettrificazione del tratto La Storta - Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo	Ferrovie dello Stato	170.379.000.000	170.379.000.000		feb-98	dic-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 15.356.330.000</i>						
D 15 01/2	Potenziamento della linea Ciampino - Velletri con realizzazione nuova fermata S. Gennaro e nuovi posti di accrocio di Paoana e Lanuvio	Ferrovie dello Stato	13.341.000.000	13.341.000.000		feb-98	dic-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 310.000.000</i>						
D 18 03	Sicurezza stazione Termini	Grandi Stazioni SPA	10.000.000.000	10.000.000.000		dic-98	nov-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 3.500.000.000</i>						

Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
D 18 04	Ala Mazzoni - stazione Termini		Grandi Stazioni SPA	20.000.000.000	20.000.000.000		dic-98	nov-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 3.500.000.000</i>							
D 19 04	Stralcio funzionale. Nodo di scambio Valle Aurelia con intersezione tra Via Anastasio II e Via Angelo Emo. Circostrizione XVII - XVIII.		Comune di Roma	4.099.249.946	4.099.249.946		ott-98	dic-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 852.127.000</i>							
D 20 02	Rifacimento e manutenzione segnaletica		STA	17.000.000.000	17.000.000.000		dic-98	dic-99
	<i>diseggrazione e cambio titolo</i>							
D 20 02	Segnaletica orizzontale e verticale			8.000.000.000	8.000.000.000			
D 20 02/1	Sistema controllo accessi alla ZTL			9.000.000.000	9.000.000.000			
D 20 03	Iniziativa per una mobilità sostenibile a Roma		Ministero Ambiente	3.500.000.000	3.500.000.000		dic-98	dic-99
	<i>Cambio soggetto beneficiario "STA" e cambio titolo "Utilizzo di motorini a zero impatto ambientale nella ZTL di Roma"</i>							
D 21 01	Riorganizzazione del nodo di scambio di largo di Torre Argentina ed interventi di riqualificazione ambientale		Comune di Roma	9.424.700.000	9.424.700.000		mar-99	nov-99
	<i>Proroga termini lettera c)</i>						apr-99	
E 01 03	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti		AMA	10.257.967.800	8.857.967.800	1.400.000.000	set-98	set-99
	<i>Integrazione di finanziamento di 5.200.000.000</i>							
E 01 11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Sabotino.		AMA	3.601.000.000	2.500.000.000	1.101.000.000	gen-99	nov-99
	<i>Cambio titolo "Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza"</i>							
E 01 30	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche fase.		AMA	7.585.460.000	7.585.460.000		gen-99	nov-99

Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
	<i>Integrazione di finanziamento di L. 7.500.000.000</i>							
E 02	07	Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello	Azienda Policlinico Umberto I	10.000.000.000	10.000.000.000		giu-98	nov-99
		<i>Integrazione di finanziamento di 2.000.000.000</i>						
E 02	10	Ospedale Angelucci (Subiaco/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM G	1.000.000.000	1.000.000.000		giu-98	set-98
		<i>Integrazione di finanziamento di 175.000.000</i>						
E 02	14	Servizi di prevenzione e tutela Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione	Regione Lazio	7.140.000.000	7.140.000.000		gen-99	giu-99
		<i>Proroga termini lettere c) e d)</i>					mag-99	nov-99
E 02	15	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del servizio di emergenza	Regione Lazio	10.500.000.000	10.500.000.000		giu-99	nov-99
		<i>Cambio soggetto beneficiario "Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini"</i>						
E 02	17	Ristrutturazione P. M. P. Via Sardo Roma	USL RM B	5.000.000.000	5.000.000.000		dic-97	dic-98
		<i>Integrazione di finanziamento di 540.000.000</i>						
E 02	18	Ospedale "Fatebenefratelli" Isola Tiberina - Roma. Ampliamento della riabilitazione	Casa Generalizia "Fate Bene Fratelli"	2.615.000.000	2.615.000.000		ott-98	nov-99
		<i>Proroga termini lettera c)</i>					apr-99	
E 02	20	Campus Bio.medico	Libero Istituto Universitario "Campus Bio.medico" di Roma	8.225.887.000	8.225.887.000		dic-98	nov-99
		<i>Integrazione di finanziamento di 848.000.000</i>						
E 03	02/1	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in viale Trastevere n. 18 Roma (ex Ufficio Contravvezioni)	Comune di Roma	2.500.000.000	2.500.000.000		gen-99	nov-99
		<i>Proroga termini lettere c) e d)</i>					mag-99	dic-99
E 03	02/2	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in via Ferruccio n. 9 Roma sede Comando Vigili urbani I gruppo	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000		gen-99	ott-99
		<i>Proroga termini lettere c) e d)</i>					giu-99	dic-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

 Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
E 03	02/3	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in viale Palmiro Togliatti n. 987 Roma sede del VII gruppo Vigili urbani	Comune di Roma	2.000.000.000	2.000.000.000		gen-99	ott-99
		<i>Proroga termini lettere c) e d)</i>					mag-99	dic-99
E 03	02/4	Lavori di straordinaria manutenzione, restauro ed adeguamento impianti di porzione del fabbricato "ex Istituto Luce" sito in piazza Cinecittà n. 11 Roma da destinare a sede di Scuola del personale di Polizia Municipale	Comune di Roma	4.000.000.000	4.000.000.000		gen-99	dic-99
		<i>Proroga termini lettere c)</i>					mag-99	
E 03	02/5	Lavori di rifacimento delle coperture dell'edificio di via della Consolazione n. 4 Roma sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale	Comune di Roma	500.000.000	500.000.000		gen-99	ott-99
		<i>cambio titolo "Lavori di rifacimento delle coperture e manutenzione della sala Riva dell'edificio di via della Consolazione n. 4. Roma sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale"</i>						
		<i>Proroga termini lettere c) e d)</i>					giu-99	dic-99
E 03	04.1	Acquisito apparecchiature elettroniche e relativo software per le attività esterne di Polizia Municipale	Comune di Roma	1.700.000.000	1.700.000.000		apr-99	set-99
		<i>cambio titolo "Completamento rete informatica ed acquisto apparecchiature elettroniche relative a software per le attività di Polizia Municipale"</i>						
		<i>Proroga termini lettere c) e d)</i>					giu-99	nov-99
E 04	03	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Promozione di nuove opportunità occupazionali e avvio di nuove iniziative imprenditoriali.	Regione Lazio	9.040.000.000	5.200.000.000	3.840.000.000	giu-98	dic-00
		<i>Integrazione di finanziamento di 3.000.000.000</i>						
E 05	04	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'Interno	27.598.000.000	27.598.000.000		mar-98	nov-99

 Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
	Cambio titolo e modifica dei costi: "Aeroporto di Fiumicino - sistema integrativo del BHS per il controllo di sicurezza del 100% del bagaglio in stiva", costo 16.158.000.000						
E 05 05	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'interno	3.380.000.000	3.380.000.000		giu-99	nov-99
	Cambio titolo e modifica dei costi: "Aeroporti di Fiumicino e Ciampino- Apparat Radiogeni per il controllo di sicurezza bagagli a mano - Metal detector" costo 4.030.000.000.						
E 05 06	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'interno	5.602.000.000	5.602.000.000		mar-98	nov-99
	Cambio titolo e modifica dei costi: "Aeroporto di Ciampino- Sistema nastri per il controllo di sicurezza del 100% bagaglio da stiva", costo di 1.792.000.000						
E 05 07	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'interno	650.000.000	650.000.000		giu-99	nov-99
	Cambio titolo e modifica dei costi: "Aeroporti di Fiumicino e Ciampino- Apparat Radiogeni per il controllo di sicurezza bagagli da stiva", costo di 15.250.000.000						
E 05 15	Infrastrutture - Ristrutturazione Servizi Logistici caserma "Piave"	Ministero dell'interno	697.000.000	697.000.000		feb-99	lug-99
	Integrazione di finanziamento di 45.000.000.						
E 05 32	Caserma CC P.zza Dante - Lavori di ristrutturazione (1° stralcio)	Ministero dell'interno	1.000.000.000	1.000.000.000		dic-98	set-99
	Integrazione di finanziamento di 212.000.000						
E 06 01	Contributo a favore di Imprese giovanili per la promozione di occupazione connessa alle attività giulibari	Comune di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000		giu-98	dic-00

 Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
	<i>Integrazione di finanziamento di 4.000.000.000</i>						
F 01 01/2	Centro Informativo di Via della Conciliazione - realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	7.275.712.000	7.275.712.000		set-98	feb-99
	<i>Proroga termini lettera d)</i>						lug-99
F 01 02	Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione del mass media	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	5.161.762.550	5.161.762.550		ott-98	ott-99
	<i>Integrazione di finanziamento di L. 3.450.000.000</i>						
F 05 04	Sistema informativo e di comunicazione Realizzazione e gestione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	17.993.440.000	17.993.440.000		feb-99	dic-00
	<i>Proroga termini lettera c)</i>					giu-99	
F 05 05	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia romana per la preparazione del Giubileo	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	8.152.080.000	8.152.080.000		mag-99	dic-99
	<i>Proroga termini lettera c)</i>					giu-99	
F 05 06	Funzionamento delle strutture del Commissario straordinario di Governo	Presidenza Consiglio Ministri Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi	3.300.000.000	3.300.000.000			
	<i>Integrazione di finanziamento di L. 300.000.000</i>						

ALLEGATO D

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000 - EX LEGE 23 DICEMBRE 1996 N. 651 Riunione della Commissione per Roma Capitale del 27/04/99 - Elenco dei nuovi interventi								
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse ex L. 651/96	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. e)	Stato della progettazione (1)
A.01.30	Complesso Abbaziale di Farfa (Farfa Sabina/Rieti) - Ristrutturazione e completamento funzionale	Ordine del SS. mo Salvatore di S. Brigida	700.000.000	700.000.000	-	giu '99	dic. '99	4
A.01.31	Borgo di Monte Antuni (Castel di Tora /Rieti)- Lavori di recupero (IV Stralcio)	Comune di Castel di Tora	1.000.000.000	1.000.000.000	-	giu. '99	dic. '99	5
A.01.32	Complesso Conventuale di S. Maria della Quercia (Viterbo) - Centro di accoglienza per pellegrini	Diocesi di Viterbo	1.000.000.000	1.000.000.000	-	mag. '99	dic. '99	5
B.12.27/2	Ex Scuderie Papali al Quirinale (Roma) - Attestimento museale ed impianti specialistici a salvaguardia delle opere d'arte	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	6.377.000.000	6.377.000.000	-	giu '99	dic. '99	5
B.19.76	Badia della Gloria (Anagni/Frosinone) - Restauro e riuso (I Stralcio)	Comune di Anagni	2.000.000.000	2.000.000.000	-	giu '99	dic. '99	4
B.19.77	Chiesa di S. Domenico (Rieti) - Opere di restauro	Diocesi di Rieti	1.000.000.000	1.000.000.000	-	giu. '99	dic. '99	4
B.19.78	Chiesa dei Santi Martiri Giorgio e Cristina (Bolsena /Viterbo) - Restauro dell'Altare del "Miracolo di Bolsena"	Parrocchia dei Santi Martiri Giorgio e Cristina	200.000.000	200.000.000	-	mag. '99	dic. '99	5
B.19.79	Chiesa del Gonfalone (Viterbo) - Opere di restauro	Rettoria della Chiesa del Gonfalone	300.000.000	300.000.000	-	mag. '99	dic. '99	5
B.20.01/10	Iniziative e mostre d'arte contemporanea a Roma e nel Lazio	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	1.000.000.000	1.000.000.000	-	gen '00	dic. '00	4
C.18.05	Villa Comunale di Prato Giardino (Viterbo) - Lavori di manutenzione straordinaria	Comune di Viterbo	300.000.000	300.000.000	-	giu. '99	dic. '99	5
D.22.02	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Attrezzatura impiantistica: elettrica, telefonica, idraulica ed audiovisiva (I stralcio)	ACEA	4.463.000.000	4.463.000.000	-	giu '99	dic'00	4

(1) Stato della Progettazione: 3 Preliminare; 4 Definitiva; 5 Esecutiva.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.22.03	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Fornitura e gestione di servizi igienici permanenti e mobili	AMA	16.511.000.000	16.511.000.000	-	giu '99	dic '00	4
D.22.04	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Soprapasso GRA e collegamento Via Alimena	ANAS	10.821.000.000	6.526.000.000	4.295.000.000	giu '99	apr '00	5
D.22.05	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Collegamento Area Universitaria Via del Vermicino, tratto ASI Stazione FF.SS.	Provincia di Roma	3.394.000.000	3.394.000.000	-	giu '99	apr '00	4
D.22.06	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Collegamento Area Universitaria S.P. Vermicino	Comune di Frascati	7.844.000.000	6.844.000.000	1.000.000.000	giu '99	apr '00	4
D.23.01	Realizzazione di capolinea e fermate a servizio della "Rete integrata di trasporto pubblico urbano a Roma"	Comune di Roma	500.000.000	500.000.000	-	sett. '99	dic. '99	4
D.23.02	Fornitura di autobus per la "Rete integrativa di trasporto pubblico urbano a Roma"	Comune di Roma	61.500.000.000	61.500.000.000	-	nov. '99	dic. '99	4
D.23.03	Illuminazione ponti-banchine del Tevere Isola Tiberina (Roma) - Piano generale di illuminazione ambientale	ACEA	3.000.000.000	3.000.000.000	-	giu '99	dic. '99	4
D.23.04/1	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Air Terminal di Ostiense	Metropark S.P.A.	1.431.700.000	1.431.700.000	-	lug. '99	dic. '99	4
D.23.04/2	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Stazione Tiburtina	Metropark S.P.A.	1.568.300.000	1.568.300.000	-	lug. '99	dic. '99	4
D.23.05/1	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Gregorio VII	Comune di Roma	790.300.000	790.300.000	-	lug. '99	dic. '99	5
D.23.05/2	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - La Giustiniana	Comune di Roma	843.000.000	843.000.000	-	lug. '99	dic. '99	5
D.23.05/3	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Osteria del Curato	Comune di Roma	1.069.000.000	1.069.000.000	-	lug. '99	dic. '99	5
D.23.05/4	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Ponte Mammolo	Comune di Roma	929.000.000	929.000.000	-	lug. '99	dic. '99	5
D.23.05/5	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Saxa Rubra	Comune di Roma	756.500.000	756.500.000	-	lug. '99	dic. '99	5

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D.23.05/6	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Stadio Olimpico	Comune di Roma	993.000.000	993.000.000		lug. '99	dic. '99	5
D.23.05/7	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Tor di Valle	Comune di Roma	947.000.000	947.000.000		lug. '99	dic. '99	5
D.23.05/8	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Viale della Moschea	Comune di Roma	405.000.000	405.000.000		lug. '99	dic. '99	5
D.23.05/9	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Via G. B. Valente	Comune di Roma	362.700.000	362.700.000		lug. '99	dic. '99	5
D.23.05/10	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Palasport EUR	Comune di Roma	598.500.000	598.500.000		lug. '99	dic. '99	5
D.23.05/11	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Laurentina	Comune di Roma	1.806.000.000	1.806.000.000		lug. '99	dic. '99	5
D.23.06	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici in Roma (Vittoria, Grottarossa, Tor Sapienza, Tor Pagnotta)	ATAC	4.000.000.000	4.000.000.000	-	lug. '99	dic. '99	4
E.02.24	Policlinico Umberto I (Roma) - Forniture di attrezzature tecnologiche	Azienda Policlinico Umberto I	7.000.000.000	7.000.000.000	-	giu. '99	dic. '99	5
E.02.25	Ospedali di Albano, Frascati e Marino - Forniture di attrezzature tecnologiche	ASL RM H	2.000.000.000	2.000.000.000	-	giu. '99	dic. '99	4
E.02.26	Ospedale Cristo Re (Roma) - Realizzazione di nuovi servizi ospedalieri	Ospedale Cristo Re	2.000.000.000	2.000.000.000	-	giu. '99	dic. '99	4
E.02.27	Centro unitario di prenotazione integrato (CUPi)	FARMACAP - Azienda Speciale Farnasociosanitaria Capitolina	2.000.000.000	2.000.000.000	-	giu. '99	dic. '99	4
E.05.34	Sede Centrale del Comando Provinciale VV.FF. di Roma - Via Genova (Roma) - Lavori di manutenzione straordinaria	Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale VV.FF. - Dipartimento Protezione Civile	2.000.000.000	2.000.000.000	-	mag. '99	dic. '99	5
E.05.35	Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma (Roma) - Manutenzione straordinaria	Ministero della Difesa - Arma dei Carabinieri	480.000.000	480.000.000	-	giu. '99	dic. '99	4
F.01.01/3	Ala Mazzoniana alla Stazione Termini (Roma) - Centro informativo e sala proiezioni, multivisioni e conferenze	Grandi Stazioni S.p.A.	2.090.000.000	2.090.000.000	-	ago '99	dic. '99	4
TOTALE					155.980.000.000	150.685.000.000	5.295.000.000	

D.M. N. 208/RC del 5 agosto 1999

Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.

*IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI,**DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000*

Visto la legge 23 dicembre 1996, n. 651, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000", (in G.U. - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 1996, afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 e concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di aree urbane, Roma capitale e Giubileo del 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il Sindaco di Roma è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma", (in G.U. - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1998);

Vista la nota n data 29 luglio 1999 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, delega il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le Aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000 a presiedere la seduta in data odierna;

Vista la deliberazione n. 2/99 adottata dalla Commissione per Roma Capitale, ex lege n. 651/1996, in data 29 luglio 1999;

Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge n. 651/1996, di dover procedere alla adozione delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, come risultanti dalla succitata deliberazione n. 2/99 della Commissione per Roma Capitale;

DECRETA

1. A seguito dell'approvazione del quadro tecnico-economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto, sono ridotte, per accertate minori esigenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'allegato A, nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a L. 36.889.824.757.

2. Sono defINANZIATI, su richiesta dei rispettivi soggetti titolari:

- l'intervento rubricato con codice A 07.03 concernete la realizzazione del campeggio nell'area circostante l'ex ospedale psichiatrico S. Maria della Pietà, non essendo ancora intervenuto il necessario accordo di programma ai fini della realizzazione dell'opera, con recupero di L. 676.000.000.

- l'intervento rubricato con codice D05.01/6, concernente la fornitura dell'equipaggiamento di chopper per motrici della linea metro A, con recupero di L. 7.891.000.000, a causa dell'impossibilità di assicurare la fornitura in tempi compatibili con le esigenze giubilari.

3. *E' defanziato parzialmente — per mancato rispetto del termine di cui alla lettera c), dell'art. 1, della legge n. 651/1996 — per un ammontare di L. 1.738.500.000, l'intervento rubricato con codice A 07.07/A; è fatta salva la maggior somma che potrà risultare all'esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite.*
4. *L'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi è incaricato di avviare la procedura di contestazione ex art. 7 legge n. 241/1990 nei confronti dei titolari di quegli interventi che, sulla base di elementi istruttori, dovessero configurarsi altamente critici.*
5. *Le risorse disponibili sono, pertanto determinate in complessive L. 43.929.420.973, al netto del disavanzo di L. 3.265.903.784 risultante dal riscontro contabile effettuato sulla precedente deliberazione.*
6. *Sono approvati i nuovi termini di cui alle lettere c) e d), dell'art. 1, della legge n. 651/1996, i cambi titolo e di soggetto beneficiario, le disaggregazioni e le aggregazioni di interventi, come indicato nell'allegato B.*
7. *Sono assentite le integrazioni di finanziamento indicate nell'allegato B, per un importo complessivo di L. 39.794.271.335.*
8. *Sono inclusi nel Piano, sulla base di ulteriori esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano medesimo, gli interventi indicati nell'allegato C, per un importo complessivo di L. 3.900.000.000. Restano, pertanto, nella disponibilità della Commissione L. 235.149.638.*
9. *Le eventuali ulteriori risorse che potranno rivenire da riduzioni di stanziamento e da definanziamenti saranno destinate alle ulteriori richieste di integrazione di finanziamento e di inserimento di nuovi interventi, con priorità per gli interventi attinenti il restauro di Villa Poniatoski e della Galleria nazionale d'arte moderna; l'adeguamento funzionale degli edifici scolastici individuati dalla Provincia di Roma, a fini di accoglienza in relazione alle celebrazioni giubilari che si terranno nell'area di Tor Vergata; nonché l'adeguamento della cartellonistica stradale nelle provincie del Lazio e l'interramento delle linee elettriche lungo la tratta ferroviaria Roma-Viterbo.*

Roma, li 5 agosto 1999

Il Ministro: Enrico Micheli

Registrato alla Corte dei Conti il 11 ottobre 1999

Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 98

ALLEGATO A

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione del 29 luglio 1999**Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara**

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
A 01.10	Comune di Fiumicino	Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma). Ristrutturazione di un immobile del Comune in località Passoscuro	122.709.415
A 01.13	Comune di Fiumicino	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma). Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	192.408.821
A 01.14	Provincia di Roma	Centro di Prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone /Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	135.450.270
A 01.15	Comune di Monterotondo	Casa Famiglia per l'infanzia abbandonata (Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente	84.284.300
A 01.17	Comune di Civitavecchia	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Civitavecchia/Roma). Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in località Pantano	1.185.000.000
A 07.11	Comune di Tivoli	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma). Recupero delle scuderie Estensi	294.209.951
A 07.18	Comune di Nettuno	Ostello della Gioventù (Nettuno/Troma). Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	27.177.390
A 07.28	Comune di Magliano Sabina	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti). Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie	271.510.218
A 07.39	Comune di Aprilia	Ostello della gioventù (Aprilia/Latina). Realizzazione (lavoro a stralcio funzionale)	364.600.390
B 13.70	Comune di Roma	Restauro edicole sacre del centro storico di Roma	303.153.340
B 14.08	Comune di Nazzano	Completamento "Museo del Fiume"	26.456.710
B 18.08	XI Comunità Montana (Castelli Romani e Prenestini) Sede di Rocca Priora	Parco archeologico del Tuscolo (Grottaferrata/Roma). Progetto di recupero dell'antica via dei sepolcri in Comune di Grottaferrata - 4 settore di intervento	84.535.425

Riunione Commissione del 29 luglio 1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
B 18.10	Comune di Segni	Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della cinta e del percorso pedonale	218.769.500
B 19.37	Comune di Terracina	Castello Frangipane ((Terracina/Latina). Ristrutturazione	148.840.700
B 19.40	Provincia di Latina	Casa di Santa Maria Goretti (Latina). Sistemazione area antistante.	118.620.610
B 19.69	Comune di Roccasecca	Chiesa di San Vito	56.540.960
C 01.21/1	Comune di Roma	Villa Doria Pamphilj ((Roma): sistemazioni esterne ed allestimento del museo di Villa Vecchia, restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedrati - illuminazione esterna	734.237.856
C 02.01.1.1	Comune di Roma	(BOR) Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano	850.373.314
C 02.01.1.2	Comune di Roma	(RIS) Progetto di riqualificazione ambientale di Piazza Risorgimento ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano	1.990.687.212
C 02.01.1.3	Comune di Roma	(CON) Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano	557.260.280
C 02.02.2.2	Comune di Roma	"GIO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Giovanni ed aree limitrofe nell'area della Basilica di San Giovanni	3.013.147.440
C 02.02.2.4	Comune di Roma	"MAR": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Maria Maggiore ed aree limitrofe nell'area della Basilica di San Giovanni	1.221.600.562
C 02.02.2.5	Comune di Roma	"CRO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Croce in Gerusalemme ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Giovanni	416.350.114

Riunione Commissione del 29 luglio 1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
C 02.03.1.1	Comune di Roma	"PAO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazzale S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Paolo	1.945.859.664
C 02.04.1	Comune di Roma	Itinerari giubilari e storici. Contributi per la manutenzione e la riqualificazione delle sedi stradali e relative pertinenze	3.382.464.708
C 02.09	Comune di Roma	"ATT": Fornitura e posa in opera attrezzature temporanee nelle aree delle Basiliche di S. Pietro, S. Giovanni e S. Paolo	1.844.768.100
C 06.01	Comune di Roma	Giardini di S. Giovanni e via Carlo Felice (Roma). Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	1.071.670.580
C 11.01.1	Comune di Roma	Arca archeologica del Celio. Via S. Gregorio al Celio e mura perimetrali. Interventi di restauro e manutenzione	45.000.000
C 15.01	Comune di Roma	Parco di Colle Oppio (Roma). Restauro vegetazionale ed infrastrutturale.	304.016.760
C 18.03	Comune di Nettuno	Tutela ambientale di Torre Astura	1.232.589.240
C 19.01/b1	Regione Lazio	Risanamento Fosso Patatona. Ripascimento litorale/Trattamento acqua magra Focene e Ostia Litorale	2.201.010.772
C 19.01/b2	Regione Lazio	Risanamento affluenti del Fosso Patatona	1.010.426.885
C 19.01/b3	Regione Lazio	Trattamento acque canali di bonifica Tevere Agro Romano	77.338.469
D 13.01	Provincia di Roma	Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla Stazione FS (Ciampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria	380.380.000
D 13.07	Provincia di Roma	Parcheggio a raso - nodo di scambio (Ladispoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Ladispoli	191.022.558

Riunione Commissione del 29 luglio 1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
D 14.09	Provincia di Frosinone	Interventi di manutenzione e adeguamento della rete viaria provinciale interessata da itinerari turistico-religiosi (primo e secondo stralcio)	3.245.781.648
D 19.02	Ferrovie dello Stato	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "Passante dei Laghi"	2.032.525.000
D 21.01	Comune di Roma	Realizzazione tranvia tratto l.go Argentina-via del Plebiscito	76.544.020
E 01.14	AMA	Sede di zona ed aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Populonia	875.920.256
E 01.18	AMA	Sede di zona ed aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto	488.788.744
E 01.24	AMA	Sede di zona ed aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata via di Torvecchia	1.066.025.265
E 03.02/1	Comune di Roma	Lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in viale Trastevere n. 18 Roma (ex Ufficio Contravvenzioni)	904.089.337
E 03.02/4	Comune di Roma	Lavori di straordinaria manutenzione, restauro ed adeguamento impianti di porzione del fabbricato "ex Istituto Luce" sito in piazza Cinecittà n. 11 (Roma), da destinare a sede di Scuola del personale di Polizia Municipale	1.329.635.685
E 03.04.1	Comune di Roma	Completamento rete informatica ed acquisto apparecchiature elettroniche relative a software per le attività della Polizia Municipale	439.162.288
E 05.08	Comune di Fiumicino	Adeguamento del Porto Canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	326.880.000

*Riunione Commissione del 29 luglio 1999**Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara*

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
		TOTALE	36.889.824.757

Allegato "B"

Roma Capitale
e Grandi Eventi

L.651/96 GRANDE GIUBILEO DEL 2000



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Riunione della Commissione del 29 luglio 1999 - modifiche ed integrazioni al Piano

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
A 01 04	Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili	IPAB "S. Margherita" - Roma	6.189.860.477	6.189.860.477	0	01/09/98	30/11/99	
			6.189.860.477	6.189.860.477	0			INTEGRAZIONE DI L. 31.308.000
A 01 14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	1.888.872.000	1.888.872.000	0	01/09/98	01/09/99	
					0			30/11/99 PROROGA LETT. D)
A 01 16	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma) Recupero ex scuola elementare in disuso	Comune di Rocca Canterano	650.893.173	650.893.173	0	31/12/97	30/06/99	
			650.893.173	650.893.173	0			INTEGRAZIONE DI L. 31.308.000
A 01 26/1	Progetto di ristrutturazione e completamento del complesso sito in via delle Isole	Ordine del SS. mo Salvatore di S. Brigida	2.349.442.000	2.349.442.000	0	01/09/98	01/10/99	
					0			31/12/99 PROROGA LETT. D)
A 01 30	Complesso Abbaziale di Fara (Fara Sabazia/Rieti) - Ristrutturazione e completamento funzionale	Ordine del SS. mo Salvatore di S. Brigida	700.000.000	700.000.000	0	01/09/99	01/12/99	
			700.000.000	700.000.000	0			INTEGRAZIONE DI L. 31.308.000
A 04 01/1	Complesso Buon Pastore: Allestimento sede Casa Internazionale della Donna	Comune di Roma	2.200.000.000	2.200.000.000	0	01/09/99	01/12/99	
					0			PROROGA LETT. D)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

venerdì 4 febbraio 2000

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Conto Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Terminali (Let. c)	Terminali (Let. d)	Note
A 07 07/b	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Ristrutturazione di un edificio ad adibire a ostello	Comune di Frascati	560.000.000	420.000.000	140.000.000	01/03/99	01/12/99	
			0	0	0	0	31/12/99	PRODOTTA LETT. D)
A 07 11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle scuderie Estensi	Comune di Tivoli	1.750.000.000	1.050.000.000	700.000.000	01/02/99	01/11/99	
			1.837.000.000	1.137.000.000	700.000.000			INTEGRAZIONE DI L. 651/99
A 07 12	Ostello della Gioventù (Manzanara/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	Comune di Manzanara	500.000.000	375.000.000	125.000.000	01/01/98	01/12/98	
			515.000.000	390.000.000	125.000.000			INTEGRAZIONE DI L. 651/99
A 07 18	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	Comune di Nettuno	400.000.000	300.000.000	100.000.000	01/12/98	01/11/99	
			0	0	0	0	31/12/99	PRODOTTA LETT. D)
A 07 22	Ristrutturazione di una ala del Monastero Claresse di Santa Rosa da Viterbo per accoglienza dei pellegrini	Monastero delle Claresse di S. Rosa di Viterbo	1.187.077.495	834.077.495	353.000.000	01/08/97	01/10/99	
			0	0	0	0	31/12/99	PRODOTTA LETT. D)
A 07 23	Centro di accoglienza (Contigliano/Rieti) Ristrutturazione di Villa Franciscchini	Comune di Contigliano	2.200.000.000	1.650.000.000	550.000.000	01/08/98	01/08/99	
			2.272.537.919	1.722.537.919	550.000.000			INTEGRAZIONE DI L. 651/99
A 07 32	Ostello della Gioventù (Campodimele/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico	Comune di Campodimele	298.250.000	208.250.000	90.000.000	01/08/97	01/08/99	
			317.000.000	227.000.000	90.000.000			INTEGRAZIONE DI L. 651/99
A 07 37	Ostello della Gioventù (Serraneta/Latona) Realizzazione	Comune di Serraneta	1.342.010.873	942.010.873	400.000.000	01/09/97	01/07/99	
			1.392.978.273	992.978.273	400.000.000			INTEGRAZIONE DI L. 651/99

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Venerdì 4 febbraio 2000

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
A 07 41.	Centro di accoglienza (Cisterna/Latina)	Comune di Cisterna	1.087.000.000	800.000.000	287.000.000	01/10/98	01/12/98	
						31/12/99		PROROGA LETT.O
A 07 45	Ostello della gioventù (San Donato Val Comino/Frosinone)	Comune di San Donato Val Comino	1.084.160.500	799.380.500	284.780.000	31/07/87	01/06/99	
			1.775.308.500	1.084.160.500	284.780.000			INTEGRAZIONE DI L. 31/12/99
B 02 01/3	Area archeologica dei Fori Imperiali - Restauro e ripristino agibilità Torre della Milizie.	Comune di Roma	2.322.277.175	2.322.277.175	0	01/09/98	01/12/98	
			2.442.297.175	2.442.297.175				INTEGRAZIONE DI L. 31/12/99
B 03 02/1	Mura di Roma. Restauro P.ta S. Sebastiano, Arco di Druso, P.ta Latina, tratti di mura da Porta S. Sebastiano al Bastione Ardeatino	Comune di Roma	1.614.554.434	1.614.554.434	0	01/09/98	01/11/99	
								PROROGA LETT.D)
B 03 02/2	Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro tratti murari tra Porta S. Sebastiano e Porta Metrona	Comune di Roma	1.762.546.966	1.762.546.966	0	01/09/98	01/11/99	
								PROROGA LETT.D)
B 03 04/2	Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro di Porta Tiburtina e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario	Comune di Roma	1.393.736.250	1.393.736.250	0	01/09/98	01/11/99	
								PROROGA LETT.D)
B 03 06	Mura di Roma. Restauro ed adeguamento della Porta del Popolo	Comune di Roma	1.730.751.732	1.730.751.732	0	01/07/98	01/10/99	
								PROROGA LETT.D)
B 03 07	Mura di Roma. Restauro, consolidamento, musealizzazione, ed adeguamento alle normative di sicurezza dell'edificio di Porta S. Pancrazio	Comune di Roma	1.035.658.480	1.035.658.480	0	01/06/98	30/11/99	
								PROROGA LETT.D)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

venerdì 4 febbraio 2000

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termini (Let. c)	Termini (Let. d)	Note
B 04 01	Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro dell'edificio	Comune di Roma	1.420.974.575	1.420.974.575	0	01/10/98	30/09/99	
			0	0	0		31/12/99	PROLOGA LETT. D)
B 08 02	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina, Medagliere"	Ministero per i Beni e le attività culturali	1.500.000.000	1.500.000.000	0	01/03/98	31/10/99	
			0	0	0		31/12/99	PROLOGA LETT. D)
B 08 03	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione Epigrafica": restauri e allestimenti	Ministero per i Beni e le attività culturali	2.146.765.526	2.146.765.526	0	01/03/98	31/10/99	
			0	0	0		31/12/99	PROLOGA LETT. D)
B 08 06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture Diocleziane e aree archeologiche (edificati via Cernale, via Parigi, Oleone), completamento restauro Museo delle Cere	Ministero per i Beni e le attività culturali	600.000.000	600.000.000	0	01/11/97	31/10/99	
			0	0	0		31/12/99	PROLOGA LETT. D)
B 08 07	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione epigrafica - Sala dei Capitolari"	Ministero per i Beni e le attività culturali	2.970.686.700	2.970.686.700	0	01/12/97	31/10/99	
			0	0	0		31/12/99	PROLOGA LETT. D)
B 12 09	Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni e le attività culturali	300.000.000	300.000.000	0	01/01/98	01/03/99	
			0	0	0		31/12/99	PROLOGA LETT. D)
B 13 19	Chiesa S. Agnese in Agone	Ministero per i Beni e le attività culturali	1.072.494.418	1.072.494.418	0	01/03/98	31/05/99	
			0	0	0		30/09/99	PROLOGA LETT. D)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

venerdì 4 febbraio 2000

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.									
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Terminal (Let. c)	Terminal (Let. d)	Termine (Let. d)	Note
B 13 27	Restauro, bonifica e riassetto della Chiesa S. Eustachio (Roma)	Ministero per i Beni e le attività culturali	749.391.200	749.391.200	0	0	0	01/03/98	01/07/99
									349/299 (PROLOGO LETT.D)
B 13 36	Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli affreschi della cupola	Ministero per i Beni e le attività culturali	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0	0	01/03/98	01/12/99
			1.463.171.800	1.463.171.800					INTEGRAZIONE DI L. 183.715.000
B 13 56	Chiesa di S. Zaccaria - Calacombi (Roma) Scavo, restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni e le attività culturali	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	01/03/98	01/11/99
									317/299 (PROLOGO LETT.D)
B 13 79	Restauro dell'organo di Giovanni Corrado Verdi	Ordine Cisterciense SS. Vincenzo e Anastasio	249.000.000	249.000.000	0	0	0	01/12/98	01/12/99
			399.802.000	399.802.000					INTEGRAZIONE DI L. 144.800.000
B 13 80	Cappella S. Maria del Popolo	Ministero per i Beni e le attività culturali	800.000.000	800.000.000	0	0	0	01/03/98	01/10/99
			235.802.000	235.802.000				24. 99	INTEGRAZIONE DI L. 155.000.000
B 16 16	Palazzo - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni e le attività culturali	2.243.483.530	2.243.483.530	0	0	0	01/03/98	01/10/99
									317/299 (PROLOGO LETT.D)
B 18 06	Palazzo e Parco Chiigi (Anzio/Roma)	Comune di Anzio	4.515.221.571	4.515.221.571	0	0	0	20/09/97	20/12/98
			5.215.221.571	5.215.221.571					INTEGRAZIONE DI L. 748.000.000
B 18 09	Villa Mondragone (Monte Porzio catone/Roma) 1° stralcio funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresta	Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	7.700.000.000	7.700.000.000	0	0	0	01/03/98	10/11/99
			1.748.000.000	1.748.000.000					INTEGRAZIONE DI L. 748.000.000

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Venerdì 4 febbraio 2000

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)
B 18 18	Rocca Abbaziale - itinerario benedettino (Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per convegni e mostre	Provincia di Roma	741.881.223	741.881.223	0	01/07/98	01/10/99
						art. 19	Art. 19
							PROVOCATELLE C.F.E.D.
B 19 09	Chiesa della Collegiata (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	549.829.313	549.829.313	0	01/09/98	01/04/99
			697.235.313	697.235.313	0		INTEGRAZIONE DI L. 1.000.000
B 19 10	Chiesa di Santa Maria Maggiore (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	100.000.000	100.000.000	0	01/09/98	01/04/99
			112.317.098	112.317.098	0		INTEGRAZIONE DI L. 12.317.098
B 19 14	Risanamento e consolidamento della Parrocchia di S. Michele Arcangelo	Comune di Capena	764.428.110	764.428.110	0	01/03/98	30/06/99
			912.295.118	912.295.118	0		INTEGRAZIONE DI L. 148.000.000
B 19 26	Santuario di Ponte Colambo (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.404.721.814	1.404.721.814	0	01/09/98	01/10/99
			1.458.721.814	1.458.721.814	0		INTEGRAZIONE DI L. 56.000.000
B 19 31	Riqualificazione urbana del Borgo di Fara e restauro del Monastero con riallestimento del Museo	Comune di Fara in Sabina	4.729.000.000	4.729.000.000	0	01/07/98	01/11/99
			4.942.000.000	4.942.000.000	0		INTEGRAZIONE DI L. 213.000.000
B 19 53	Santa Maria Assunta (Alatri/Frosinone) Restauro	Parrocchia Santa Maria Assunta	615.300.000	615.300.000	0	01/01/98	01/10/99
			708.371.979	708.371.979	0		INTEGRAZIONE DI L. 84.071.979
B 19 72	Ampliamento della Chiesa in loc. Grunolo facente parte della Parrocchia di S. Antonio	Comune di Santa Cosma e Damiano	60.000.000	60.000.000	0	01/01/98	01/10/99
			71.877.000	71.877.000	0		INTEGRAZIONE DI L. 11.877.000

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

venerdì 4 febbraio 2000

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Term. (Let. c)	Term. (Let. d)	Note
B 19 74	Sistemazione copertura Chiesa di S. Lorenzo. Parrocchia S. Antonio Damiano	Comune di Sanit Cosma e Damiano	40.000.000	40.000.000	0	01/01/88	01/01/89	INTEGRAZIONE DI L. 18.557.800
B 20 01.7	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale di Roma	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000	0	01/10/88	01/01/01	PROROGA LETT. C)
B 20 01.8	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma	Provincia di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000	0	01/10/89	01/01/01	DISAGGREGAZIONE DELL'INTERVENTO E CAMBIO TITOLO DISAGGREGAZIONE DELL'INTERVENTO E CAMBIO TITOLO
B 20 01.9A	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma	Provincia di Roma	758.800.000	758.800.000	0	10/8	10/8	
B 20 01.9B	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma	Provincia di Roma	258.800.000	258.800.000	0			
C 01 05	Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Sisto	Comune di Roma	3.334.069.912	3.334.069.912	0	01/11/88	01/12/89	INTEGRAZIONE DI L. 17.711.000
C 01 14	Via S. Gregorio, via G. Lanza, via Washington. Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici	Comune di Roma	6.205.315.736	6.205.315.736	0	01/07/88	01/09/89	PROROGA LETT. D)
C 01 19	Villa Borghese, Giardini Sgarbi, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni.	Comune di Roma	915.133.650	915.133.650	0	01/06/88	30/06/89	PROROGA LETT. D)
C 01 22/2	Villa Doria Pamphili (Roma) Restauro e allestimento museale della Cascina Falsetti e dell'area annessa	Comune di Roma	1.497.987.384	1.497.987.384	0	01/06/88	01/09/89	PROROGA LETT. D)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Venerdì 4 febbraio 2000

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Terminali (Let. c)	Terminali (Let. d)
C 01 30	Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche relativi a percorsi ATAC e sedi stradali adiacenti	Comune di Roma	2.947.589.621	2.947.589.621	0	01/06/99	01/12/99
C 02 01.1.	"BOR": Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	4.005.117.306	4.005.117.306	0	01/05/99	01/12/99
C 02 01.1.	"COV": Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	2.887.121.194	2.887.121.194	0	01/05/99	01/12/99
C 02 01/6	Infrastrutturazione urbana area stazione S. Pietro - Primo Lotto	Roma 2000 S.p.A.	1.448.500.000	1.448.500.000	0	01/04/99	01/11/99
C 02 01/7	Infrastrutturazione urbana area Stazione di S. Pietro (II Lotto)	Roma 2000 S.p.A.	10.540.000.000	10.540.000.000	0	01/01/98	01/03/99
C 02 01/8	Infrastrutturazione urbana area Stazione di S. Pietro	Roma 2000 S.p.A.	11.986.500.000	11.986.500.000	0	31/07/99	31/12/99
C 02 02.2.	"GIO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Giovanni ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	9.932.494.000	9.932.494.000	0	01/05/99	01/12/99

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

venedi 4 febbraio 2000

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termine Let. c)	Termine Let. d)	Note
C 02 04/2	Contributo per interventi di manutenzione delle sedi stradali e relative pertinenze degli itinerari giuliani e storici, processioni e celebrazioni religiose	Comune di Roma	9.992.620.000	9.992.620.000	0	01/03/99	01/12/00	
			12.392.626.000	18.392.626.000	0			INTEGRAZIONE DI L. 648.000.000
C 03 02	Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali	Comune di Roma	405.668.350	405.668.350	0	01/09/98	01/07/99	
			0	0	0			1/10/99 PROROGA LETT. D)
C 03 04	Area pedonale del Colosseo e parco della via Sacra (Roma) Ristrutturazione della sede stradale	Comune di Roma	3.257.956.147	3.257.956.147	0	01/09/98	01/10/99	
			0	0	0			30/1/99 PROROGA LETT. D)
C 03 06	Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali (primo stralcio)	Comune di Roma	92.000.000.000	92.000.000.000	0	01/10/98	01/12/99	
			97.998.000.000	97.998.000.000	0			INTEGRAZIONE DI L. 648.000.000
C 05 01/1	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni	Comune di Roma	3.299.321.550	3.299.321.550	0	01/04/99	01/11/99	
			0	0	0			3/1/2000 PROROGA LETT. D)
C 05 01/2	Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	Comune di Roma	1.853.791.396	1.853.791.396	0	01/01/99	01/11/99	
			0	0	0	max. 99	3/1/2000	PROROGA LETT. D)
C 06 01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma	3.500.000.000	3.500.000.000	0	01/12/98	01/06/99	
			2.995.250.000	2.995.250.000	0	max. 99	3/1/2000	INTEGRAZIONE DI L. 648.000.000 E PROROGA LETT. D)
C 06 01/1	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini Segreti	Comune di Roma	1.720.616.797	1.720.616.797	0	21/11/97	01/12/98	
			0	0	0			30/1/99 PROROGA LETT. D)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

venerdì 4 febbraio 2000

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz. Let. c)	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
C 08 01/5	Restauro del parco di Villa Borghese. Parco dei Daini	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000	0	01/05/98	01/11/98	
			0	0	0	31/03/99		PROROGA LETT. C)
C 09 01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riqualificazione degli comprensori degli Acquedotti	Comune di Roma	3.340.856.382	3.340.856.382	0	01/07/98	01/08/98	
			3.392.716.331	3.392.716.331	0			INTEGRAZIONE DI L. 31/3/2000
C 09 02/1	Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa fra la cartiera Latina ed il circo di Massenzio)	Comune di Roma	3.665.461.795	3.665.461.795	0	01/09/98	01/11/98	
			3.933.379.795	3.933.379.795	0			INTEGRAZIONE DI L. 31/3/2000
C 11 02	Area archeologica del Celio. Casina dei Savi consolidamento e restauro	Comune di Roma	2.645.869.551	2.645.869.551	0	01/05/98	01/09/98	
			3.723.381.331	3.723.381.331	0		31/12/99	INTEGRAZIONE DI L. 27/11/2000 E PROROGA LETT. D)
C 11 05	Ricupero dell'area di S. Gregorio al Celio - colle del Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Anliquarium, villa Calimontana e S. Sisto Vecchio.	Comune di Roma	3.995.428.060	3.995.428.060	0	01/03/98	01/10/98	
			0	0	0		31/12/99	PROROGA LETT. D)
C 11 13	Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni e le attività culturali	1.353.310.311	1.353.310.311	0	01/03/98	01/03/99	
			0	0	0		31/03/99	PROROGA LETT. D)
C 12 01	Vila Dora Pamphili (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica	Comune di Roma	3.300.000.000	3.300.000.000	0	01/05/98	01/12/98	
			0	0	0	31/03/99		PROROGA LETT. C)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

veneti 4 febbraio 2000

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
C 15 02	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle Esercizio Centrali e dei nuclei minori delle Terme di Tralano.	Comune di Roma	1.640.667.730	1.640.667.730	0	01/10/98	01/11/99	
C 18 03	Tutela ambientale di Torre Astura	Comune di Nettuno	6.000.000.000	6.000.000.000	0	01/12/98	01/11/99	
D 09 01	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	83.876.804.000	83.876.804.000	0	01/06/98	01/12/99	
D 10 01/a	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2°)	ANAS	73.251.470.712	68.157.659.930	4.093.510.782	01/02/98	01/11/99	
D 10 01/b	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 3°)	ANAS	16.748.528.382	16.571.810.164	176.718.218	01/02/98	01/11/99	
D 13 02	Parcheggio a rateo per nodo di scambio (Colosseo/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio del traffico locale sulla linea FVG Roma - Cassino	Provincia di Roma	1.171.018.811	1.171.018.811	0	01/07/98	31/10/99	
D 13 10	SP Casa Romana (Zagarolo, S. Cesareo/Roma) Ripristino della strada per l'accolto al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	Provincia di Roma	2.407.911.646	2.407.911.646	0	01/09/98	30/11/99	

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

venerdì 4 febbraio 2000

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
D 13 12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Montefiore/Roma)	Provincia di Roma	5.351.794.000	5.351.794.000	0	01/11/98	01/11/99	INTEGRAZIONE DI L. 23.000.000 E PROROGA TERMINI LETT. D)
D 14 01	SP Adeuna (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 8+800 al Km 23+100 (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	3.228.123.995	3.228.123.995	0	31/07/98	30/09/99	PROROGA LETT. D)
D 14 06	SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale	Provincia di Roma	5.841.412.000	5.841.412.000	0	01/11/98	01/11/99	PROROGA LETT. D)
D 18 01/1	Potenziamento nodo Termini	Comune di Roma	9.840.000.000	9.840.000.000	0	08/11/87	30/11/89	INTEGRAZIONE DI L. 758.364.000
D 18 04	Ala Mazzoni - stazione Termini	Grandi Stazioni SPA	21.448.000.000	21.448.000.000	0	01/12/88	01/11/89	INTEGRAZIONE L. 104.000.000
D 22 05	Area Grandi Eventi - (ex Vergata (Roma) - Collegamento Area Universitaria Via del Vermicino, tratto ASI Stazione FF.SS.	Provincia di Roma	3.394.000.000	3.394.000.000	0	01/08/99	01/04/00	PROROGA LETT. O INTEGRAZIONE FINANZIARIA L. 794.000.000
D 23 04/2	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Stazione Tiburtina	Metropark S.P.A.	1.588.300.000	1.588.300.000	0	01/07/99	01/12/99	CANNO SOGGETTO BENEFICIARIO A FAVORE DELLE FERROVIE DELLO STATO
E 01 08	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali	AMA	2.488.635.291	1.788.635.291	700.000.000	01/12/88	01/11/89	INTEGRAZIONE DI L. 333.071.000

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

venerdì 4 febbraio 2000

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Terminal Let. c)	Terminal Let. d)	Note
E 01 30	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle stanzette igieniche fissi.	AMA	12.986.068.116	12.986.068.116	0	01/01/99	30/11/99	
E 01 301	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle stanzette igieniche fissi.		5.464.992.778	5.464.992.778				DISAGGREGAZIONE DELL'INTERVENTO E.11.14
E 01 302	Servizi igienici permanenti. Acquisto, installazione e gestione di 128 bagni permanenti a servizio delle aree basilicali.		7.520.900.000	7.520.900.000	0			DISAGGREGAZIONE DELL'INTERVENTO E. 01.10
E 02 14	Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione	Regione Lazio	5.000.000.000	5.000.000.000	0	01/05/99	01/11/99	INTEGRAZIONE DI L. 112.000.000 E PROMOVI TERMINI LETT. C
E 03 02/1	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in viale Trastevere n. 10 Roma (ex Ufficio Contravvenzioni)	Comune di Roma	2.485.525.000	2.485.525.000	0	01/06/99	01/12/99	INTEGRAZIONE DI L. 112.000.000 E PROMOVI TERMINI LETT. C
E 03 02/5	Lavori di rifacimento delle coperture e manutenzione della sala Riva dell'edificio di via della Consolazione n. 4, Roma, sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale	Comune di Roma	500.000.000	500.000.000	0	01/06/99	01/12/99	PROMOVA LETTERA C
E 05 14	Infrastrutture - Costruzione caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino	Ministero Interno	15.445.078.610	15.445.078.610	0	01/12/98	01/12/99	INTEGRAZIONE DI L. 138.000.000
E 05 32	Caserma CC P. 22a Dante - Lavori di ristrutturazione (1° stralcio)	Ministero Interno	1.088.158.470	1.088.158.470	0	01/12/98	01/09/99	INTEGRAZIONE DI L. 132.235
E 05 35	Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma (Roma) - Manutenzione straordinaria	Ministero della Difesa - Arma dei Carabinieri	480.000.000	480.000.000	0	01/05/99	01/12/99	CAMBIO SOGGETTO BENEFICIARIO A FAVORE DEL MINISTERO LL.PP. PROV. OO.PP. PER IL LAZIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

venerdì 4 febbraio 2000

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
F 04 1	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4 dell'art. 1 della legge 23 dicembre n. 651	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	73.017.496.000	73.017.496.000	0	0	0	0
			73.017.496.000	73.017.496.000	0	0	0	0
			INTEGRAZIONE DI L. 77.000.000.000					

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

venerdì 4 febbraio 2000

ALLEGATO C

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000 - EX LEGE 23 DICEMBRE 1996 N. 651 Riunione della Commissione per Roma Capitale del 29/07/99 - Elenco dei nuovi interventi								
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato (lire)	Risorse ex L. n. 651/96 (lire)	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato della progettazione (1)
D.22.07	Realizzazione rete elettrica MT-BT per il Grande incontro della Gioventù a Tor Vergata (I stralcio)	ENEL	2.500.000.000	2.500.000.000	-	nov. '99	apr. '00	5
A.01.33	Riqualificazione del Villaggio della Solidarietà (Roma) (I stralcio)	Confraternita del SS. Sacramento ed Anime Sante	700.000.000	700.000.000	-	sett. '99	dic. '99	5
A.01.34	Riqualificazione dell'Istituto Opera Don Calabria (Roma) da adibire a centro di accoglienza per le popolazioni del Terzo Mondo (I stralcio)	Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza	700.000.000	700.000.000	-	sett. '99	dic. '99	5
TOTALE			3.900.000.000	3.900.000.000	0			

(1) Stato della Progettazione : 3 Preliminare; 4 Definitiva; 5 Esecutiva


3.2. Rappresentazione grafica dello stato di attuazione degli interventi

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI AL GIUBILEO NEL LAZIO
(LEGGE 651/96)


NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER LOCALIZZAZIONE

REGIONI	Num.	Finanz.	Costo	INTERVENTI IN FASE PRE-REALIZZATIVA				INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE				INTERVENTI COMPLETATI			
				numero	num.	finanz.	costo	numero	num.	finanz.	costo	numero	num.	finanz.	costo
		milioni	milioni		%	%	%		%	%	%		%	%	%
Comune di Roma	526	2.587.808	2.744.995	55	10,5	6,9	6,8	343	65,2	76,5	77,1	128	24,3	16,5	16,1
altri comuni in prov. Roma	143	536.585	545.479	9	6,3	2,4	2,7	107	74,8	94,1	93,8	27	18,9	3,5	3,6
Totale Provincia di Roma	669	3.124.393	3.290.473	64	9,6	6,1	6,1	450	67,3	79,5	79,9	155	23,2	14,4	14,0
Provincia di Frosinone	32	42.237	44.664	2	6,3	10,7	10,1	23	71,9	82,1	82,2	7	21,9	7,3	7,2
Provincia di Latina	34	34.966	40.181	2	5,9	16,6	15,1	22	64,7	74,7	76,8	10	29,4	8,7	8,1
Provincia di Rieti	24	43.813	47.716	1	4,2	12,6	11,5	10	75,0	82,7	83,1	5	20,0	4,7	5,4
Provincia di Viterbo	22	37.205	38.561	2	9,1	9,4	9,1	10	81,8	89,8	90,2	2	9,1	0,8	0,7
senza riferimenti territoriali	17	199.799	204.449	8	47,1	63,7	64,5	9	52,9	36,3	35,5	0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	798	3.482.414	3.686.045	79	9,9	9,7	9,6	548	67,7	77,1	77,5	179	22,4	13,2	12,8


(a) di cui 21 interventi in esecuzione nel 2000 (16 nel comune di Roma, 2 in altri comuni della provincia di Roma e 3 senza riferimenti territoriali)

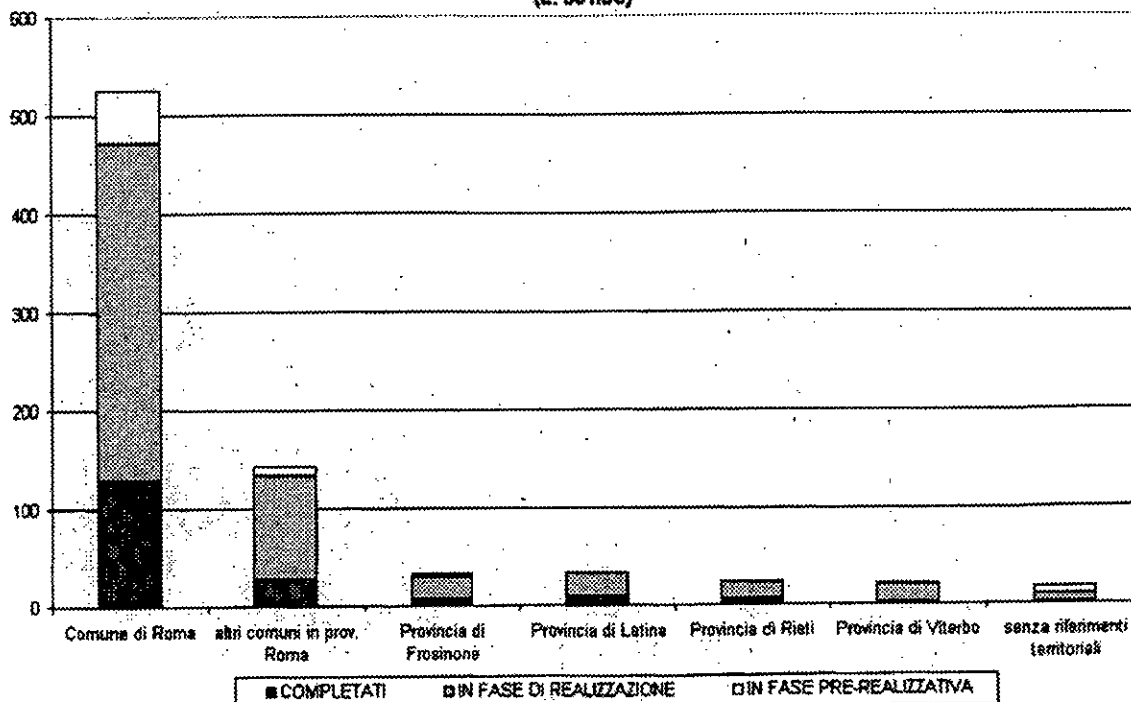NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER LOCALIZZAZIONE
(L. 651/96)

**PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER LOCALIZZAZIONE
(L. 651/96)**

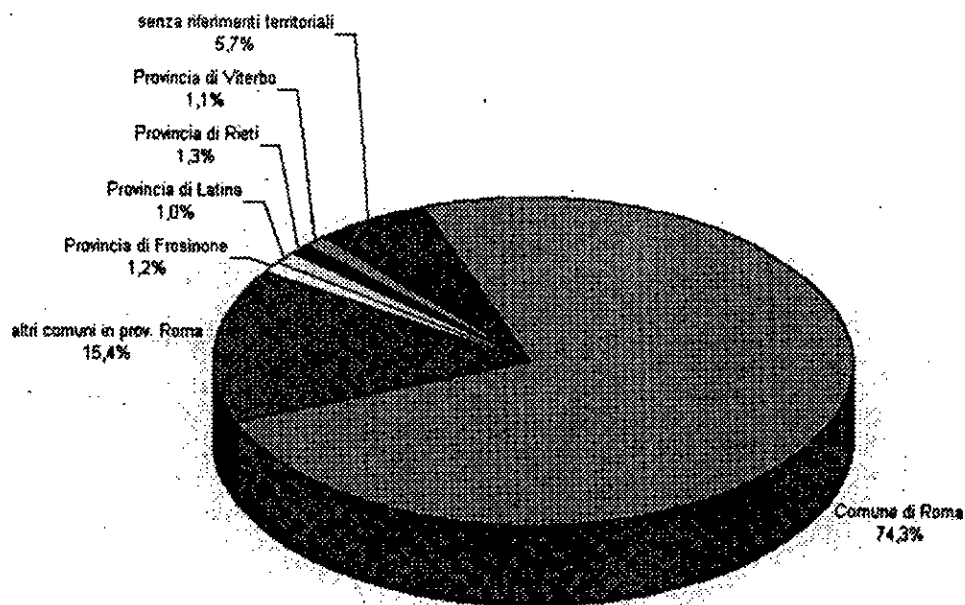

**COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER LOCALIZZAZIONE
(L. 651/96)**

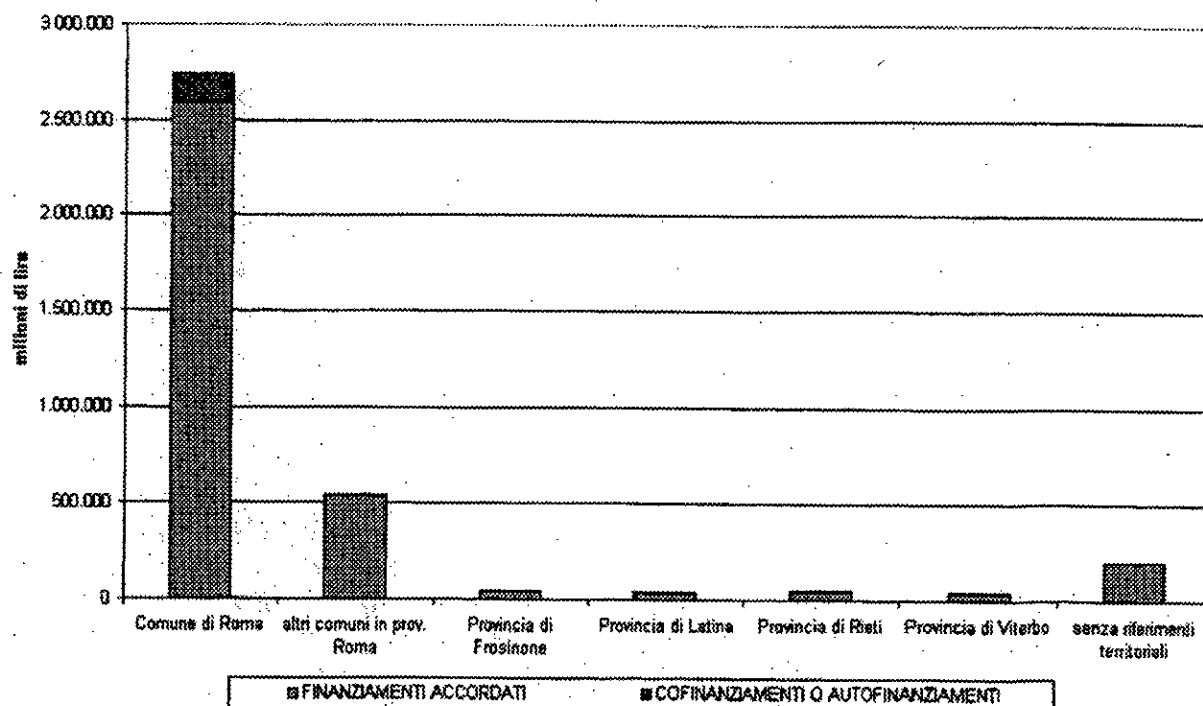


**PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI
(LEGGE 651/96)**

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER SETTORE


SETTORE	Num.	Finanz.	Costo	INTERVENTI IN FASE PRE-REALIZZATIVA				INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE				INTERVENTI COMPLETATI			
				NUMERO	NUM.	FINANZ.	COSTO	NUMERO	NUM.	FINANZ.	COSTO	NUMERO	NUM.	FINANZ.	COSTO
		milioni	milioni		%	%	%		%	%	%		%	%	%
A - SOCIALE ED ACCOGLIENZA	88	281.999	384.403	8	9,1	37,4	35,0	69	78,4	60,3	62,4	11	12,5	2,3	2,6
B - BENI CULTURALI	359	572.350	623.881	16	4,5	10,9	10,2	223	62,1	76,1	76,3	120	33,4	13,8	13,5
C - MANUTENZIONE E ARREDO URBANO	136	509.990	509.990	17	12,5	10,2	10,1	98	72,1	85,6	85,6	21	15,4	4,2	4,2
D - ACCESSIBILITA' E MOBILITA'	91	1.456.397	1.506.613	18	19,8	3,7	3,6	62	68,1	74,1	74,9	11	12,1	22,2	21,5
E - SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE	109	489.447	548.809	19	17,4	12,6	13,5	77	70,6	83,5	82,8	13	11,9	3,9	3,7
F - INFORMAZIONE, PREPARAZIONE EVENTO	14	167.230	167.230	1	7,1	1,2	1,2	10	71,4	30,6	30,6	3	21,4	8,1	8,1
G - Monitoraggio	1	6.000	6.000	0	0,0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	798	3.482.414	3.666.045	79	9,9	9,7	9,6	540	67,7	77,1	77,5	179	22,4	13,2	12,8

(*) di cui 21 interventi in esecuzione nel 2000 (11 lettera B, 3 lettera C, 4 lettera D, 3 lettera E)


**NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SETTORE
(L. 651/96)**

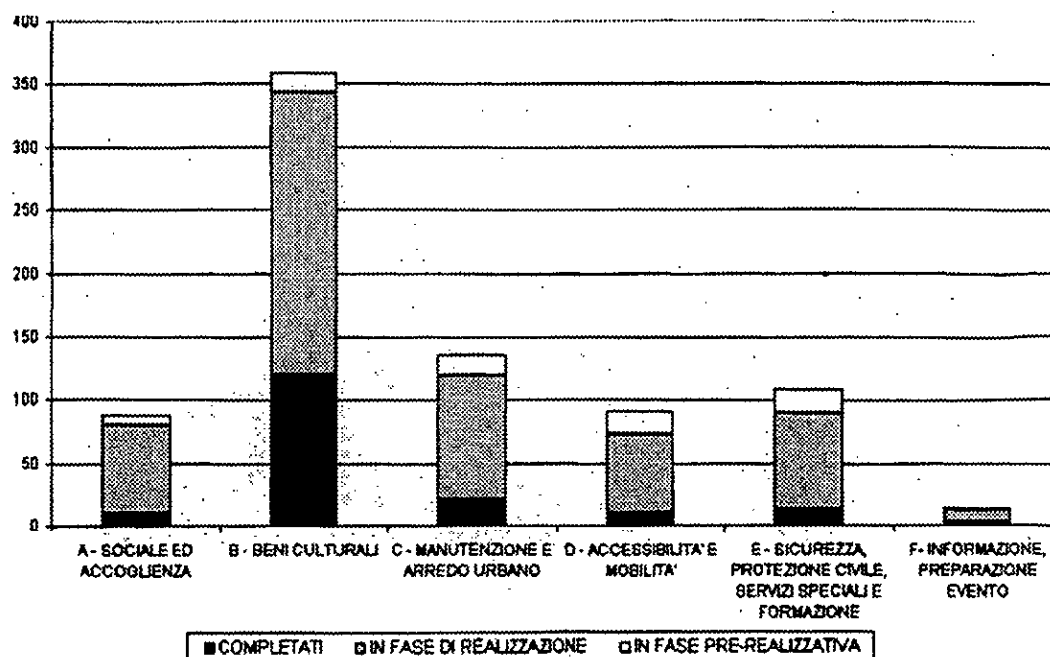

**PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER SETTORE
(L. 661/96)**

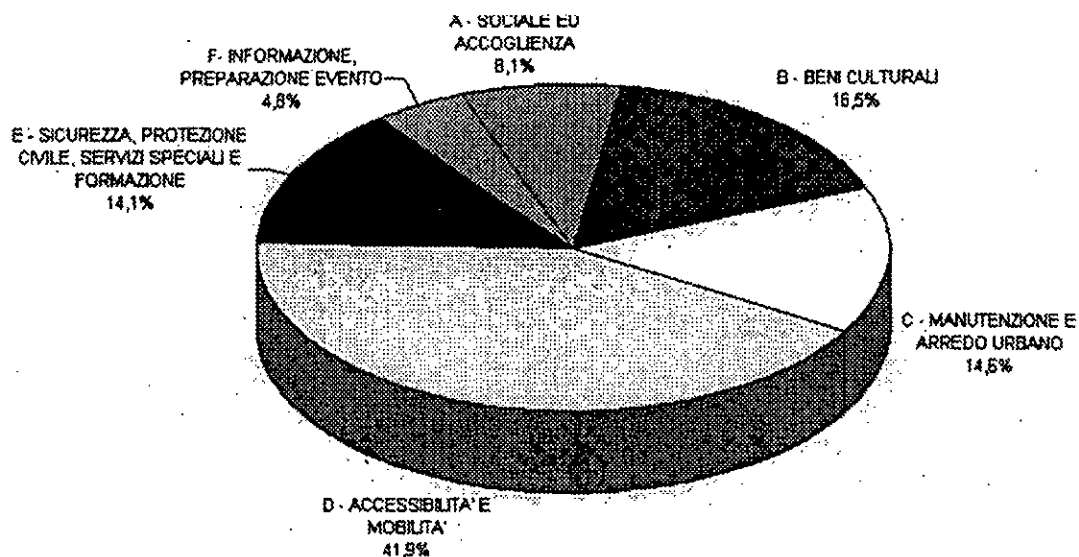

**COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SETTORE
(L. 661/96)**

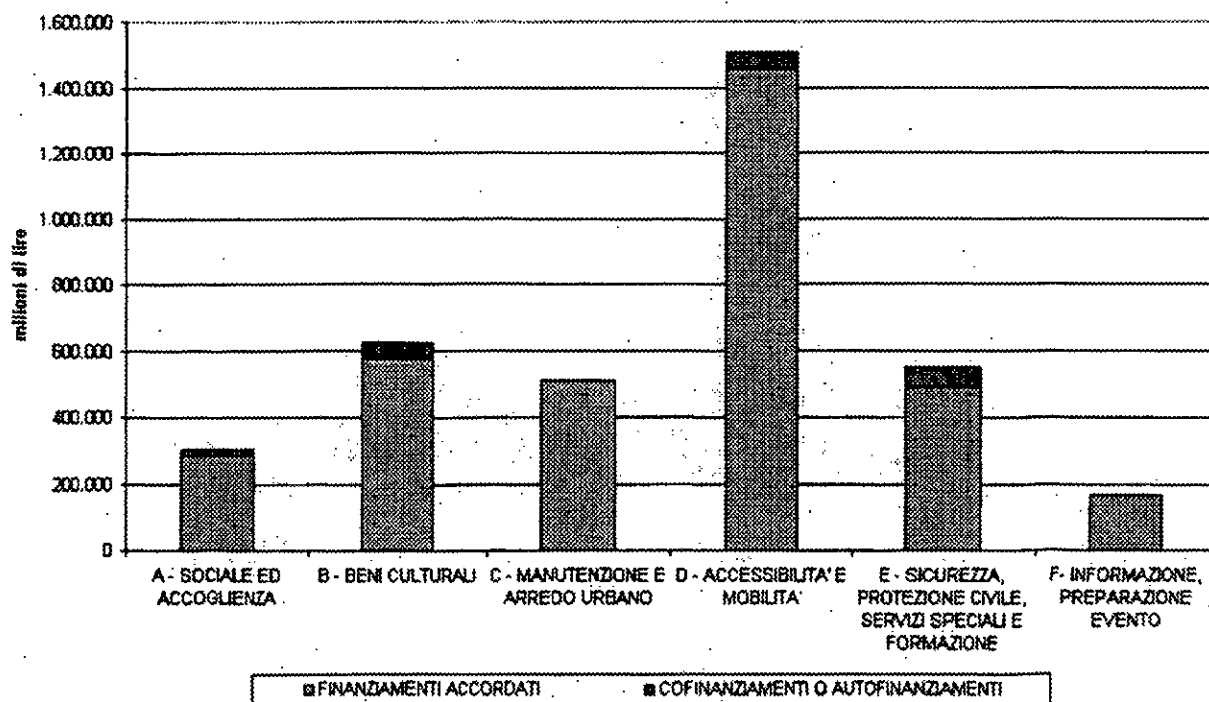

**PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI
(LEGGE 65/198)**


NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER BENEFICIARIO

REGIONI	Num.	Finanz.	Costo	INTERVENTI IN FASE PRE-REALIZZATIVA				INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE				INTERVENTI COMPLETATI			
				%				%				%			
				numero	sum.	finanz.	costo	numero	sum.	finanz.	costo	numero	sum.	finanz.	costo
		milioni	milioni												
AMMINISTRAZIONI CENTRALI															
Min. BB. CC. AA.	208	332.075	379.075	4	1,9	2,5	2,2	109	52,4	78,5	78,6	95	45,7	18,9	19,2
Min. Interni	26	130.754	130.754	1	3,8	3,8	3,8	22	84,6	92,0	92,0	3	11,5	4,2	4,2
Min. LL. PP.	2	27.450	27.450	0	0,0	0,0	0,0	2	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
altri Ministeri	12	32.828	32.828	2	16,7	15,8	15,8	8	66,7	69,9	69,9	2	16,7	14,3	14,3
ANAS	4	142.394	150.959	0	0,0	0,0	0,0	2	50,0	56,0	58,4	2	50,0	44,0	41,6
FS	7	280.558	280.558	1	14,3	0,6	0,6	5	71,4	98,2	98,2	1	14,3	1,2	1,2
Totale Amm. Centrali	258	946.058	1.001.624	8	3,1	2,1	2,0	148	57,1	83,2	83,1	103	39,0	14,7	14,9
AMM. REGIONALE E PROVINCIALE															
Regione Lazio	17	285.651	210.301	7	41,2	59,4	60,3	10	58,8	48,5	39,7	0	0,0	0,0	0,0
Provincia di Roma	37	84.250	85.994	6	16,2	15,5	15,2	27	73,0	80,0	80,4	4	10,8	4,5	4,4
Provincia di Frosinone	5	18.791	19.166	1	20,0	13,3	13,0	3	60,0	61,8	60,2	1	20,0	4,9	6,0
Provincia di Latina	7	20.719	23.719	1	14,3	24,1	21,1	6	85,7	75,9	78,9	0	0,0	0,0	0,0
Provincia di Rieti	2	18.000	18.000	1	50,0	30,6	30,6	1	50,0	69,4	69,4	0	0,0	0,0	0,0
Provincia di Viterbo	3	19.266	19.877	1	33,3	16,6	16,1	2	66,7	83,4	83,9	0	0,0	0,0	0,0
Totale Amm. Regionale e Provinc.	71	366.678	377.058	17	23,9	41,3	41,4	49	69,0	57,4	57,2	5	7,0	1,3	1,3
AMM. COMUNALI															
Roma	150	703.385	704.385	21	14,0	7,1	7,1	116	77,3	88,6	88,6	13	8,7	4,3	4,3
altri Comuni in Prov. di Roma	65	88.136	95.296	2	3,1	0,6	2,4	48	73,8	90,3	88,8	15	23,1	9,1	8,8
Comuni in Prov. di Frosinone	19	19.432	20.983	1	5,3	10,3	9,5	14	73,7	80,4	81,8	4	21,1	9,3	8,6
Comuni in Prov. di Latina	26	12.999	14.780	1	3,8	6,2	7,2	15	57,7	70,4	78,7	10	38,5	23,4	22,1
Comuni in Prov. di Rieti	20	23.894	27.797	0	0,0	0,0	0,0	15	75,0	91,3	90,7	5	25,0	8,7	9,3
Comuni in Prov. di Viterbo	11	7.062	7.312	1	9,1	4,2	4,1	8	72,7	91,7	92,0	2	18,2	4,0	3,9
Totale Amm. Comunali	291	854.907	870.543	26	8,9	6,3	6,4	216	74,2	88,4	88,2	49	16,8	5,3	5,4
ALTRI SOGGETTI															
Istituzioni sanitarie	33	182.571	197.571	3	9,1	6,0	5,6	27	81,8	91,4	92,1	3	9,1	2,5	2,3
Agenzia Romana Giubileo	15	168.249	168.249	4	26,7	7,0	7,8	8	53,3	84,0	84,0	3	20,0	8,2	8,2
AMA	37	107.795	147.507	8	21,6	33,0	29,6	24	64,9	62,9	66,8	5	13,5	4,1	3,7
STA	7	53.776	53.776	0	0,0	0,0	0,0	7	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
ACEA	6	18.140	18.140	2	33,3	41,1	41,1	4	66,7	58,9	58,9	0	0,0	0,0	0,0
ATAC-COTRAL	11	370.774	370.774	0	0,0	0,0	0,0	6	54,5	35,7	35,7	5	45,5	64,3	64,3
Istituzioni culturali	7	49.661	49.661	5	71,4	73,4	73,4	2	28,6	26,6	26,6	0	0,0	0,0	0,0
Enti religiosi	44	105.640	152.382	3	6,8	3,8	2,1	36	81,8	94,8	96,4	5	11,4	2,2	1,5
altri beneficiari	17	252.165	252.761	3	17,6	2,4	2,4	13	76,5	97,5	97,6	1	5,9	0,1	0,1
Totale altri soggetti	177	1.314.771	1.416.021	28	15,8	8,6	8,5	127	71,8	71,0	72,4	22	12,4	20,4	19,0
TOTALE	798	3.482.414	3.666.045	79	9,9	9,7	9,6	540	67,7	77,1	77,5	179	22,4	13,2	12,8


(a) di cui 21 interventi in esecuzione nel 2000


(di cui 6 dell'Amm. regionale e della Provincia di Roma, 4 del Comune di Roma, 4 dell'Agenzia romana per il giubileo)

NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SOGGETTO BENEFICIARIO
(L. 661/96)

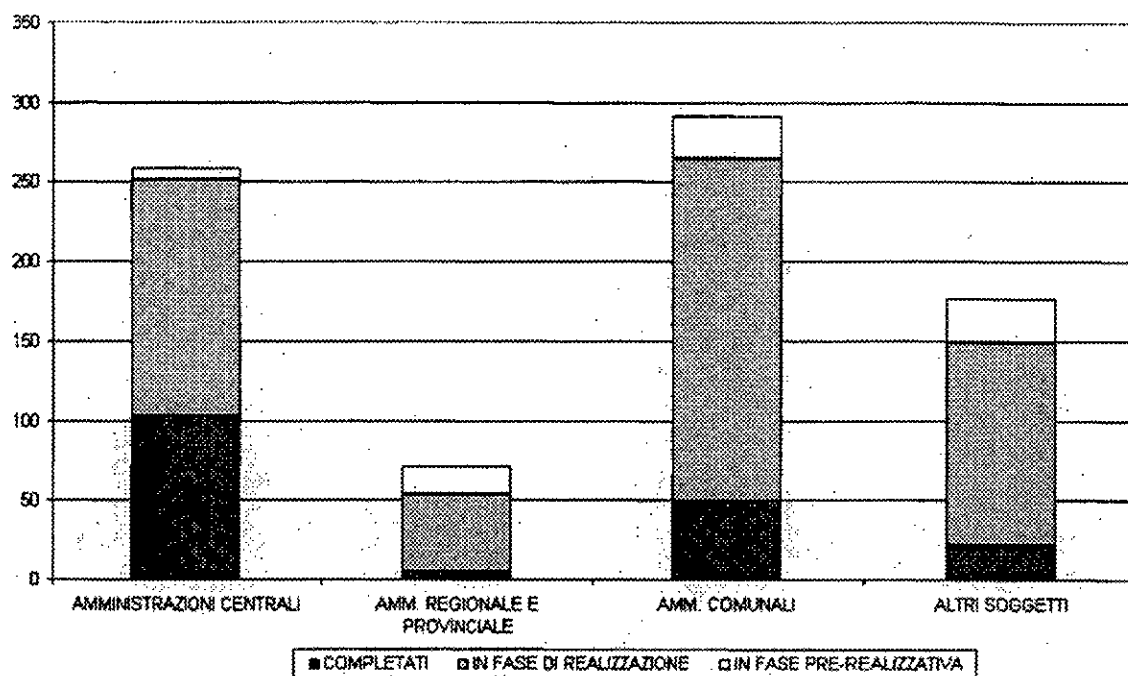

PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER SOGGETTO BENEFICIARIO (L.661/96)

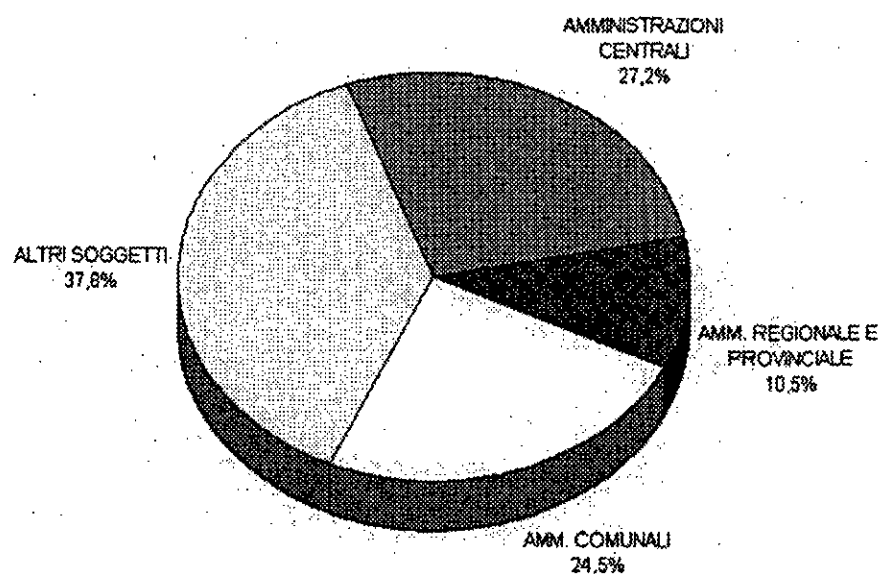

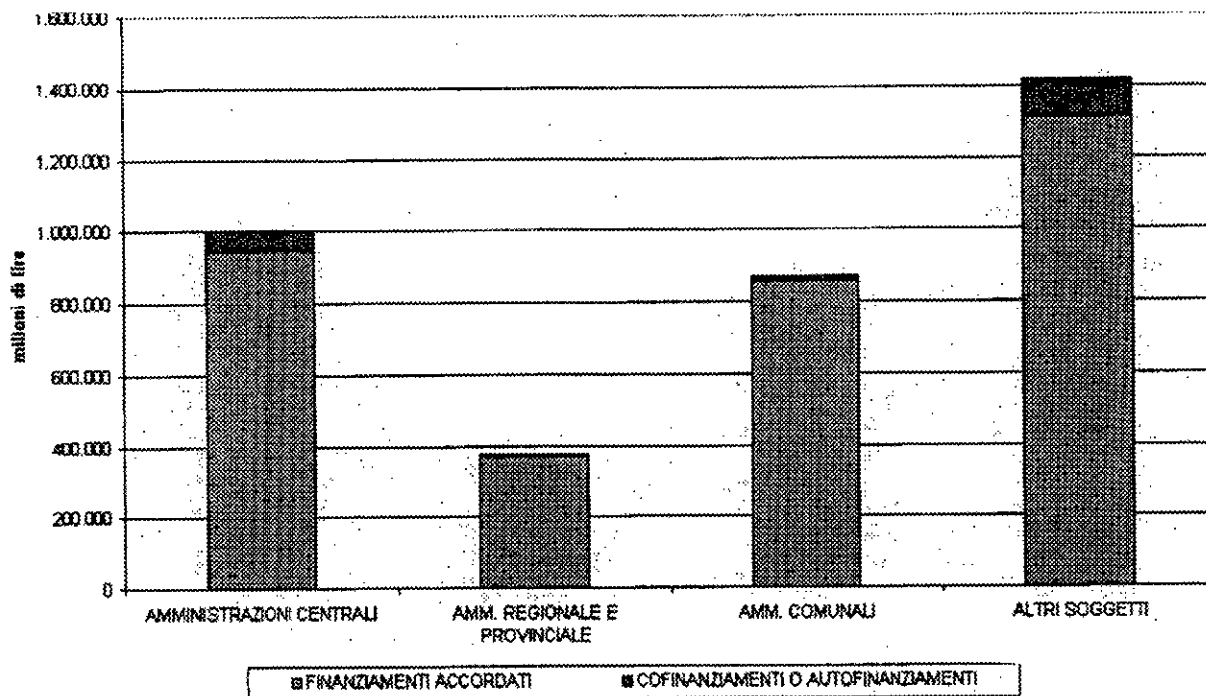**COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER SOGGETTO BENEFICIARIO
(L. 651/96)**

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000 (L. 651/96) AL 30 SETTEMBRE 1999

PRESIDENZA DEI CONSIGLIERI DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

A. 01	14	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma) Recupero ex scuola elementare in disuso	Comune di Rocca Canterano	692.393	692.393	0
A. 01	17	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disabili (Cerveteri/Roma) Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in disuso (Piazzale Pignone)	Comune di Cerveteri	1.770.129	1.770.129	0
A. 01	18	Centro di accoglienza residenziale per anziani (Anzio/Roma). Ristrutturazione dell'edificio	Comune di Anzio	180.250	180.250	0
A. 01	19	Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Rocca Canterano/Roma) Recupero ex scuola elementare in disuso	Comune di Rocca Canterano	1.166.094	1.166.094	0
A. 01	21	Capitale termale: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edificio a destinazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo affacciato	Comune di Roma - Ufficio Città Storia	4.423.865	4.423.865	0
A. 01	23	Edificio per anziani (Rocca Canterano/Roma) Ristrutturazione dell'edificio	Comune di Rocca Canterano	3.005.000	3.005.000	0
A. 01	23/1	Allestimento di centri di accoglienza per bambini nei musei comunali	Comune di Roma - Ufficio Speciale Città dei Bambini	1.000.000	1.000.000	0
A. 01	23/2	Ristrutturazione servizi di accoglienza e prima accoglienza (Rocca Canterano/Roma) Ristrutturazione dell'edificio	Comune di Rocca Canterano	2.000.000	2.000.000	0
A. 01	24	Sistemazione del Centro Accoglienza italiani nel Mondo (CAIM) presso la chiesa di S. Giovanni della Pigna e locali annessi	Chiesa di S. Giovanni della Pigna	1.288.700	1.288.700	0
A. 01	25	Ristrutturazione di una abitazione in viale	Comune di Roma - Ufficio Speciale Città dei Bambini	2.000.000	2.000.000	0
A. 01	26/1	Progetto di ristrutturazione e completamento architettonico e funzionale del complesso sito in Via delle Isole	Comune di Roma - Ufficio Speciale Città dei Bambini	2.349.442	2.349.442	0
A. 01	26/2	Progetto di ristrutturazione e completamento architettonico e funzionale del complesso sito in Via delle Isole	Comune di Roma - Ufficio Speciale Città dei Bambini	1.822.091	1.822.091	0
A. 01	27	Centro di accoglienza permanente per pellegrini portatori di handicap (primo stralzo)	Provi. Relig. Apost. - Opera Don Orione	13.909.896	13.909.896	0
A. 01	28	Zona turistica - Casa per ferie	Comune di Roma - Ufficio Speciale Città dei Bambini	3.000.000	3.000.000	0
A. 01	29	Centro attrezzato per la tutela della prima infanzia al servizio della famiglia disadattata	Comune di Roma - Ufficio Speciale Città dei Bambini	6.809.000	6.809.000	5.000.000
A. 01	30	Completamento edificio di forte (Forti Sabini/Roma) Ristrutturazione e completamento dell'edificio	Comune di Roma - Ufficio Speciale Città dei Bambini	2.112.250	2.112.250	0
A. 01	31	Borgo Monte Artusi (Castel di Torre-Rose) - Lavori di recupero (IV stralzo)	Comune di Castel di Torre	1.000.000	1.000.000	0
A. 01	32	Completamento edificio di forte (Forti Sabini/Roma) Ristrutturazione e completamento dell'edificio	Comune di Roma - Ufficio Speciale Città dei Bambini	1.000.000	1.000.000	0

[illegible]

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

A. 07	07	Centro di accoglienza bambini nel casello (Francia/Roma) Realizzazione di un edificio residenziale	Comune di Frascati	701.500	97.760	910.260
A. 07	07	Centro di accoglienza bambini nel casello (Francia/Roma) Ristrutturazione di un edificio da adibire a casello	Comune di Frascati	590.000	430.000	1.020.000
A. 07	09	Compianto (S. Maria della Vittoria) Completamento	Comune di Fiume Romano	298.325	533.522	831.847
A. 07	11	Centro di accoglienza turistica (Todi/Roma) Recupero della struttura esistente	Comune di Todi	1.842.790	642.790	2.485.580
A. 07	13	Oratorio (S. Giovanni) (Mazzano/Roma) Completamento della struttura con ampliamento dell'edificio	Comune di Mazzano	268.000	435.000	703.000
A. 07	13	Completamento Oratorio Presepio	Comune di Cervara	302.622	216.172	518.794
A. 07	14	Centro di accoglienza bambini (Anagni/Roma) Ristrutturazione di Palazzo Comunale	Comune di Anagni	1.002.778	789.230	1.792.008
A. 07	15	Centro di accoglienza turistica (Anagni/Roma) Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San Filippo Neri e famiglia anelli	Comune di Anagni	964.700	784.700	1.749.400
A. 07	16	Casello della Vittoria (S. Maria della Vittoria) Ristrutturazione dell'edificio esistente	Comune di S. Maria della Vittoria	854.622	491.910	1.346.532
A. 07	18	Casello della Vittoria (Rieti/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'edificio San Francesco e famiglia anelli	Comune di Nettuno	372.823	272.823	645.646
A. 07	19	Centro di accoglienza per turismo anziani (S. Martino al Cimino/Roma) Realizzazione di un edificio a tre piani	Provincia di Roma	1.075.502	1.503.302	2.578.804
A. 07	20	Casello della Vittoria (Viterbo/Roma) Ristrutturazione di un ex convento e affittamento (1° stralcio funzionale)	Comune di Viterbo	991.503	741.503	1.733.006
A. 07	21	Casello della Vittoria (Viterbo/Roma) Ristrutturazione di un edificio a tre piani	Comune di Viterbo	500.000	336.000	836.000
A. 07	22	Ristrutturazione di una ala del Monastero Carthusia di Santa Rosa da Viterbo per accoglienza dei pellegrini	Monastero Carthusia di Santa Rosa (VT)	1.167.977	834.077	2.002.054
A. 07	23	Casello di accoglienza (Castellano/Roma) Ristrutturazione di Villa Francese	Comune di Castellano	2.272.018	1.722.630	3.994.648
A. 07	24	Casa di accoglienza-casello della gioventù in edifici storici a) Residenza Abati di Fabbro b) ex albergo (Montepolitelli)	Comune di Montepolitelli	728.361	528.361	1.256.722
A. 07	25	Casello di accoglienza turistica (Fano in Sansepolcro) Ristrutturazione per conversione in albergo di S. Francesco e S. Paolo	Comune di Sansepolcro	8.020.000	4.530.000	12.550.000
A. 07	26	Casa di accoglienza - casello della gioventù (Poggio Mirtoso/Roma) Completamento e ristrutturazione di palazzo Strada	Comune di Poggio Mirtoso	897.106	614.106	1.511.212

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

A. 07	27	Obbligo della Gioventù (Puglia/Veneto/Roma) Realizzazione ed adeguamento del Centro Comunità di Progetto Lazio-Sabazia	1.225.153	925.452	400.000
A. 07	28	Centro di accoglienza turistica (Mugello Sabina/Roma) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie	2.425.492	1.753.480	675.000
A. 07	29	Area cimiteriale Frasso Sabot/Roma Realizzazione della provvisoria, del servizio e Comune di Frasso Sabot	917.540	302.640	135.000
A. 07	30	Area cimiteriale (Montepulciano/Roma) Realizzazione della provvisoria, del servizio e del servizio	497.512	372.512	125.000
A. 07	31	Obbligo della Gioventù (Puglia/Veneto/Roma) Realizzazione	270.000	210.000	70.000
A. 07	32	Obbligo della Gioventù (Campidoglio/Roma) Realizzazione e ricostruzione ex edificio scolastico	267.000	275.000	92.000
A. 07	33	Centro di accoglienza turistica (Lazio/Roma) Completamento del complesso turistico Realizzazione	305.220	235.220	150.000
A. 07	34	Obbligo della Gioventù (Roccapietra/Roma) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphili	120.000	90.000	30.000
A. 07	35	Obbligo della Gioventù (Napoli/Roma) Acquisto Palazzo Ricci e sistemazione esterna	417.544	258.544	125.000
A. 07	36	Obbligo della Gioventù (Basiliano/Roma) Acquisto annesso	200.000	150.000	50.000
A. 07	37	Obbligo della Gioventù (Sarno/Roma) Realizzazione	1.502.011	1.022.011	480.000
A. 07	38	Obbligo della Gioventù (Aprilia/Roma) Realizzazione (1° stralcio funzionale)	2.342.480	1.638.480	607.000
A. 07	39	Centro di accoglienza turistica (Napoli/Roma) Realizzazione di Stato per l'acquisto di Palazzo San Rocco	3.051.700	1.243.700	424.000
A. 07	40	Centro di accoglienza turistica (Napoli/Roma) Realizzazione	1.067.000	900.000	267.000
A. 07	41	Centro di accoglienza turistica (Napoli/Roma) Realizzazione	1.770.350	1.270.350	500.000
A. 07	42	Centro di accoglienza turistica (Napoli/Roma) Realizzazione (Vila S. Lucia)	338.219	238.219	100.000
A. 07	43	Centro di accoglienza turistica (Napoli/Roma) Realizzazione (Vila S. Lucia)	1.231.191	529.191	276.000
A. 07	44	Obbligo della Gioventù (San Donato Val Comino/Roma) Realizzazione	1.118.308	600.526	254.750

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

A. 97	46	Quadrato della cattedrale e campanile (MURRaffaello) Restauro e ristrutturazione ex campo antistante la Facciata	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 98	81	Incassati per la ripulitura delle strutture di accoglimento allargamento ed ampliamento	Regione Lazio	99.653.000	99.653.000	0
A. 99	47	Adattamento di un cantiere di accoglienza per pellegrini nella Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 100	48	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 101	49	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 102	50	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 103	51	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 104	52	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 105	53	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 106	54	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 107	55	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 108	56	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 109	57	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 110	58	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 111	59	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 112	60	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 113	61	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 114	62	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 115	63	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 116	64	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 117	65	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 118	66	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 119	67	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 120	68	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 121	69	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 122	70	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 123	71	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 124	72	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 125	73	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 126	74	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 127	75	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 128	76	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 129	77	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 130	78	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 131	79	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 132	80	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 133	81	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 134	82	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 135	83	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 136	84	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 137	85	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 138	86	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 139	87	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 140	88	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 141	89	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 142	90	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 143	91	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 144	92	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 145	93	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 146	94	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 147	95	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 148	96	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 149	97	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 150	98	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 151	99	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 152	100	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 153	101	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 154	102	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 155	103	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 156	104	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 157	105	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 158	106	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 159	107	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 160	108	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 161	109	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 162	110	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 163	111	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 164	112	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 165	113	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 166	114	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 167	115	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 168	116	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 169	117	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 170	118	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 171	119	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 172	120	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 173	121	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 174	122	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 175	123	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 176	124	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 177	125	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 178	126	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 179	127	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 180	128	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 181	129	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 182	130	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 183	131	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 184	132	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 185	133	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 186	134	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 187	135	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 188	136	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 189	137	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 190	138	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 191	139	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 192	140	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 193	141	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 194	142	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 195	143	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 196	144	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 197	145	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 198	146	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 199	147	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 200	148	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 201	149	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 202	150	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 203	151	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 204	152	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 205	153	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 206	154	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 207	155	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 208	156	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 209	157	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 210	158	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 211	159	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 212	160	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 213	161	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 214	162	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 215	163	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 216	164	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 217	165	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 218	166	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 219	167	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 220	168	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 221	169	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 222	170	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 223	171	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 224	172	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 225	173	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 226	174	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 227	175	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 228	176	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 229	177	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 230	178	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 231	179	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 232	180	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 233	181	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 234	182	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 235	183	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 236	184	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989
A. 237	185	Completamento della Chiesa della Madonna Santa Sofia	Comune di Albini	2.657.500	2.500.000	1987-1989

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B	02	83/78	Area dei Fort Imperiali. Nuovi scavi, operazioni scientifiche. Tempio della Pace	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	1.360.490	1.360.490	0
B	03	84/26	Area del Fort Imperiali. Nuovi scavi, operazioni scientifiche. Forto di Trionfo	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	2.355.484	2.355.484	0
10 Risanare e manutenzione del perimetro delle Mura storiche							
B	03	01	Mura di Roma. Restauro e valorizzazione di Porta S. Paolo.	Comune di Roma - Dip. XI - IV U.O.	1.197.116	1.197.116	0
B	03	02/1	Mura di Roma. Restauro di Porta S. Sebastiano. Area di Dama, Porto Leone, tratti di mura da Porta S. Sebastiano al Bastione Aragonese	Comune di Roma - Dip. XI - IV U.O.	1.813.249	1.813.249	0
B	03	02/2	Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro tratti murari tra Porta S. Sebastiano e Porta Metrona	Comune di Roma - Dip. XI - IV U.O.	1.782.547	1.782.547	0
B	03	03	Mura di Roma. Restauro di Porta S. Giovanni e tratto di mura da Porta Aurelia ad Appia Antica	Comune di Roma - Dip. XI - IV U.O.	2.072.999	2.072.999	0
B	03	04/1	Mura di Roma. Restauro di Porta Maggiore, del tratto di mura adiacenti e sepolcro di Euristeo	Comune di Roma - Dip. XI - IV U.O.	1.844.799	1.844.799	0
B	03	04/2	Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro di Porta Trionfale e tratto di mura adiacenti	Comune di Roma - Dip. XI - IV U.O.	1.331.704	1.331.704	0
B	03	05	Mura di Roma. Restauro conservativo e consolidamento del complesso monumentale di Porta Pia	Comune di Roma - Dip. XI - IV U.O.	1.789.034	1.789.034	0
B	03	06	Mura di Roma. Interventi ed adeguamento delle Mura del Popolo	Comune di Roma - Dip. XI - IV U.O.	1.790.782	1.790.782	0
B	03	07	Mura di Roma. Restauro, consolidamento, risistemazione ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio di Porta San Pancrazio	Comune di Roma - Dip. XI - IV U.O.	1.035.658	1.035.658	0
B	03	08	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle mura Gianicolensi nel tratto Porta S. Invenuto - Porta Prenestina	Comune di Roma - Dip. XI - IV U.O.	1.843.165	1.843.165	0
B	03	09/1	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle Mura Aureliane nel tratto Campo Marzio - largo Lazzarini	Comune di Roma - Dip. XI - IV U.O.	1.567.541	1.567.541	0
B	03	09/2	Mura di Roma. Interventi di restauro e consolidamento delle Mura Aureliane nel tratto Argiletum - Basilica Aemilia	Comune di Roma - Dip. XI - IV U.O.	1.854.340	1.854.340	0
11 Palazzo delle Esposizioni: Restaurare ed adeguamenti funzionali							
B	04	01	Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro dell'edificio	Comune di Roma - Dip. XI - IV U.O.	1.420.976	1.420.976	0
12 Palazzo Braschi (Museo di Boezio): Restaurare ed adeguamenti funzionali							
B	05	01/1	Restauro di Palazzo Braschi - interventi prioritari	Comune di Roma - Soprintendenza Comunale	1.853.100	1.853.100	0
B	05	01/2	Restauro di Palazzo Braschi - Ricostruzione e consolidamento ed adeguamenti impiantistici nel Palazzo Braschi - Museo di Roma	Comune di Roma - Dip. XI - IV U.O.	8.894.328	8.894.328	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B5 Museo Nazionale Romano (Museo delle Terme, Palazzo Altemps, Crypta Balbi)

B 05 01	Palazzo Altemps (Roma) Servizi sistemazione sottili, illuminazione e completamento del Museo greco-romano	BB CC AA - (2) S.B. Architet. RM	5.000.000	1.500.000	3.500.000
B 05 02	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimento del "Corpo di fabbrica Farnesini, Michelangelo"	BB CC AA - (2) S.B. Architet. RM	1.500.000	1.500.000	0
B 05 03	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Acquisto della "Statua Etrusca" rinvenuta a Ostia	BB CC AA - (2) S.B. Architet. RM	2.145.795	2.145.795	0
B 05 04	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Proseguimento dei restauri e degli allestimenti e predisposizione impianti "Grand Aule"	BB CC AA - (2) S.B. Architet. RM	2.367.816	2.367.816	0
B 05 05	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione opere d'arte (includendo, per ciascuna, i restauri e gli allestimenti) (giardini, sale, piazza del (complesso))	BB CC AA - (2) S.B. Architet. RM	911.500	911.500	0
B 05 06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture diocleziane ed aree archeologiche, completamento restauro museo delle Cere	BB CC AA - (2) S.B. Architet. RM	800.000	800.000	0
B 05 07	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimento "Capella Etrusca - Sala del Chiosco"	BB CC AA - (2) S.B. Architet. RM	2.870.857	2.870.857	0
B 05 08	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Colosseo di Michelangelo", allestimento della Sezione Preistoria e del Museo della Certosa	BB CC AA - (2) S.B. Architet. RM	8.700.000	8.700.000	0
B 05 09	Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso archeologico monumentale (prima fase)	BB CC AA - (2) S.B. Architet. RM	30.227.533	8.222.533	20.000.000

B9 Palazzo Barberini e Palazzo Cenci (Galleria Nazionale d'Arte Antica)

B 09 01	Restauri del complesso di Palazzo Barberini (Roma) - prima sezione	BB CC AA - (1) S.B. Architet. RM	15.142.899	5.142.899	10.000.000
---------	--	-------------------------------------	------------	-----------	------------

B10 Museo Nazionale di Villa Giulia (Villa Giulia e Villa Farnesina)

B 10 01a	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	BB CC AA - (6) S. Architet. Etr. Mar.	9.800.000	9.800.000	0
B 10 01b	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Farnesina)	BB CC AA - (6) S. Architet. Etr. Mar.	9.800.000	9.800.000	0
B 10 01c	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	BB CC AA - (6) S. Architet. Etr. Mar.	3.400.000	3.400.000	0

B11 Galleria Nazionale d'Arte Moderna

B 11 01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Ristrutturazione intervento e restauro dell'edificio Palazzo e dell'intera area (prima sezione)	BB CC AA - (7) Dal Nat. Arte Mod.	24.134.829	9.134.829	15.000.000
---------	--	--------------------------------------	------------	-----------	------------

B12 Interventi di restauro di edifici e complessi di interesse storico ed artistico (Roma e Lazio)

B 12 01	Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri a prospetto	BB CC AA - (1) S.B. Architet. RM	581.897	581.897	0
B 12 02	Teatro di Marcello (Roma) Consolidamento del restauro della facciata	BB CC AA - (2) S.B. Architet. RM	3.103.076	3.103.076	0

N. Inv.	Descrizione dell'opera	BB CC AA - (1)	S.B. Amb. Arch. RM	9.576.423	9.576.423	0
B 12 03	Vibrono (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione, interventi di consolidamento e restauro	BB CC AA - (1)	S.B. Amb. Arch. RM	9.576.423	9.576.423	0
B 12 04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli interni	BB CC AA - (1)	S.B. Amb. Arch. RM	8.000.000	8.000.000	0
B 12 05	Palazzo "Capitulari" (Roma) Restauro e sistemazione del cortile	BB CC AA - (1)	S.B. Amb. Arch. RM	1.401.570	1.401.570	0
B 12 06	Palazzo di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	BB CC AA - (1)	S.B. Amb. Arch. RM	3.708.104	3.708.104	0
B 12 07	Cinesse S. Biagio alla Paglietta	BB CC AA - (1)	S.B. Amb. Arch. RM	267.073	267.073	0
B 12 08	Tempio Romano del Foro Romano (Roma) Interventi di restauro	BB CC AA - (2)	S.B. Arch. RM	1.584.140	1.584.140	0
B 12 09	Domo adde sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	BB CC AA - (2)	S.B. Arch. RM	300.000	300.000	0
B 12 10	Agorà Antica - Casale Marzio	BB CC AA - (2)	S.B. Arch. RM	2.550.550	2.550.550	0
B 12 11	Museo di S. Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, ridisegno del complesso monumentale	BB CC AA - (2)	S.B. Arch. RM	1.208.441	1.208.441	0
B 12 12	Mausoleo "Tombato dei Fiumi" e mausolei lungo la Via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica	BB CC AA - (2)	S.B. Arch. RM	1.244.993	1.244.993	0
B 12 13	Parco archeologico della via Flaminia: Anco - Cassia di Mabborghetto	BB CC AA - (2)	S.B. Arch. RM	1.000.000	1.000.000	0
B 12 14	Tor San Michele (Roma) Interventi di consolidamento	BB CC AA - (1)	S.B. Amb. Arch. RM	373.725	373.725	0
B 12 15	Rocca di Papa. Castello di Palazzolo	BB CC AA - (6)	S.B. Amb. Arch. Lazio	923.047	923.047	0
B 12 16	Castello Colonna (Castelluccio/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'area portuale	BB CC AA - (5)	S.B. Amb. Arch. Lazio	5.502.254	5.502.254	0
B 12 17	Antica Rocca (Civitavecchia/Roma)	BB CC AA - (6)	S.B. Amb. Arch. Lazio	1.691.925	1.691.925	0
B 12 18	Forte Michelangelo (Civitavecchia/Roma)	BB CC AA - (6)	S.B. Amb. Arch. Lazio	2.670.383	2.670.383	0
B 12 19	Castello di S. Severo (S. Marinella/Roma)	BB CC AA - (6)	S.B. Amb. Arch. Lazio	4.965.905	4.965.905	0
B 12 20	Castello Orsini (Santa Marinella - Roma)	BB CC AA - (6)	S.B. Amb. Arch. Lazio	523.765	523.765	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B	12	31	Castello Odescalchi (Ravenna/Roma) Ripascimento coperture	BB, CC, AA, - (6) S.B. Amb. Archit. Laz	564.330	564.330	0
B	12	32	Castello di San Marino (San Marino/Roma)	BB, CC, AA, - (6) S.B. Amb. Archit. Laz	2.822.572	2.822.572	0
B	12	34	Ripulitura delle facciate interne ed esterne, revisione e verniciatura dei restati intesi e adornamenti varie a Palazzo Chigi	Presidenza Consiglio Ministri	3.174.957	3.174.957	0
B	12	35	Restauri della casa di S. Eusebio in Piazza Petrucci	Ordine dei SS. Eusebio e S. Eusebio	400.000	400.000	0
B	12	36	Passaggio di Borgo - Restauro conservativo sotto Piazza Pia - Via del Campidoglio	BB, CC, AA, - (7)	1.000.000	1.000.000	0
B	12	37/1	Ex sculture parietali in Quirinale - Riparazioni e risarcimento conservativo	BB, CC, AA, - (7)	2.164.000	2.164.000	0
B	12	37/2	Ex sculture parietali in Quirinale - allungamento murale ed impianti specializzati a salvaguardia delle opere d'arte	BB, CC, AA, - (7)	6.377.000	6.377.000	0
B	12	38	Restauri ed interventi conservativi di chiesa, battello, Monumenti, Ordini lungo gli Interni storici del Duoblo				
B	12	39/1	Restauri di S. Opilio di Capranica (Roma) Scavi archeologici - Restauri del complesso monumentale ed allungamento murale	BB, CC, AA, - (7) S.B. Archit. RM	4.000.000	4.000.000	0
B	12	39/2	Chiesa S. Croce in Genesareth - Restauro facciata	BB, CC, AA, - (7) S.B. Amb. Archit. RM	927.720	927.720	0
B	12	40	Realizza di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauri del complesso monumentale e risarcimento per ambienti urbani circostanti	BB, CC, AA, - (7) S.B. Amb. Archit. RM	254.220	254.220	0
B	12	41	Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura - Restauro facciata	BB, CC, AA, - (7) S.B. Amb. Archit. RM	500.000	500.000	0
B	12	42	Realizza di San Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro opere d'arte	BB, CC, AA, - (7) S.B. Amb. Archit. RM	500.000	500.000	0
B	12	43	Chiesa SS. Quirico e Giulitta	BB, CC, AA, - (7) S.B. Amb. Archit. RM	489.847	489.847	0
B	12	44	S. Carmine (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti adiacenti alla basilica	BB, CC, AA, - (7) S.B. Archit. RM	600.000	600.000	0
B	12	45	Chiesa di Piero in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni	BB, CC, AA, - (7) S.B. Amb. Archit. RM	1.922.727	1.922.727	0
B	12	46	Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte	BB, CC, AA, - (7) S.B. Amb. Archit. RM	700.000	700.000	0
B	12	47	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno	BB, CC, AA, - (7) S.B. Amb. Archit. RM	180.830	180.830	0
B	12	48	Chiesa di S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (tracce 1990)	BB, CC, AA, - (7) S.B. Amb. Archit. RM	1.000.000	1.000.000	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B	13	11	Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimenti intesi e perimetri (prima fase)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	918.181	918.181	0
B	13	12	Chiesa del Gesù (Roma) Restauro della cupola interna	BB. CC. AA. - (2) S.B. Amb. Archit. RM	800.000	800.000	0
B	13	13	Restauro ed intervento conservativo del prospetto della chiesa di S. Gregorio al Capo	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	444.154	444.154	0
B	13	14	Chiesa S. Maria (Roma) Restauro del soffitto	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	872.539	872.539	0
B	13	15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro delle chiese	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	2.000.000	2.000.000	0
B	13	16	Chiesa S. Maria (Roma) Restauro del campanile e della facciata	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	500.000	500.000	0
B	13	17	Chiesa S.S. Annunziata e Carlo al Corso (Roma) Restauro architettonico	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.388.727	1.388.727	0
B	13	18	Chiesa di S. Lorenzo in Lucina: promozione del restauro e restauro	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	344.943	344.943	0
B	13	19	Chiesa S. Agnese in Agone	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	1.072.494	1.072.494	0
B	13	20	Chiesa di S. Carlo ai Catinelli (Roma) Interventi di consolidamento	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	2.500.000	2.500.000	0
B	13	21	Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma) Interventi sulla copertura	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	961.300	961.300	0
B	13	22	Chiesa di S. Susanna: restauro progetto in rifacimento copertura	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	737.477	737.477	0
B	13	23	Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale delle sottofondazioni ed interventi sulla copertura	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	500.000	500.000	0
B	13	24	Chiesa S. Andrea a Quirinale (Roma)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	800.000	800.000	0
B	13	25	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro cappella Altare e indagini archeologiche	BB. CC. AA. - (3) S.B. Amb. Archit. RM	800.000	800.000	0
B	13	26	Chiesa S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro: grappi marmorei della cappella Altare e della cappella Alta Santa: restauri e consolidamenti	BB. CC. AA. - (2) S.B. Amb. Archit. RM	200.000	200.000	0
B	13	27	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	848.724	848.724	0
B	13	28	Restauro: soffitti e rifacimento dell'Chiesa S. Elisabetta (Roma)	BB. CC. AA. - (1) S.B. Amb. Archit. RM	748.291	748.291	0

B. 13	38	Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma) Restauro	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Architt. RM	600.000	000.000	0
B. 13	39	Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro e ricostruzione della facciata	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Architt. RM	189.914	189.914	0
B. 13	39	Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro e ricostruzione della facciata	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Architt. RM	189.914	189.914	0
B. 13	39	Restauro e intervento conservativo della Chiesa S. Maria in Campitelli	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Architt. RM	778.810	778.810	0
B. 13	41	Oratorio dei Caraccioli (Roma) Lavori di recupero strutturale e restauro	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Architt. RM	781.915	781.915	0
B. 13	42/1	Oratorio del Crocifisso e del Cordilione (Roma) Restauro della facciata e degli affreschi	BB CC AA - (3) S.B. Amb. Architt. RM	450.000	450.000	0
B. 13	42/2	Restauro Oratorio del SS. Crocifisso	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Architt. RM	418.142	418.142	0
B. 13	43	Oratorio dei Filippini (Roma), Restauro prospetti del cortile Barrombianico	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Architt. RM	350.000	350.000	0
B. 13	44	Oratorio del Carmine Sordani (Roma) Restauro della facciata	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Architt. RM	729.803	729.803	0
B. 13	45	Chiesa di S. Agostino (Roma) Restauro degli affreschi, stucchi e dei manufatti lignei	BB CC AA - (3) S.B. Amb. Architt. RM	500.000	500.000	0
B. 13	46	Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli affreschi nella cupola	BB CC AA - (3) S.B. Amb. Architt. RM	1.463.173	1.463.173	0
B. 13	48	Chiesa di S. Bernardino da Imola (Roma) Restauro dei prospetti	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Architt. RM	449.273	449.273	0
B. 13	49	Chiesa di S. Ruggie e S. Maria del Duomo (Roma) Restauro prospetti e facciata centrale	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Architt. RM	518.457	518.457	0
B. 13	49	Chiesa di S. Carlo alle Quattro Fontane (Roma) Restauro degli interni e delle facciate	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Architt. RM	713.505	713.505	0
B. 13	41	Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Architt. RM	494.322	494.322	0
B. 13	43	Chiesa di S. Crisogono (Roma) Restauro e abbinazione musaio del battistero paleocristiano	BB CC AA - (2) S.B. Amb. Architt. RM	94.874	94.874	0
B. 13	43	Chiesa del SS. Domenico e Sisto	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Architt. RM	700.000	700.000	0
B. 13	44/1	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	BB CC AA - (3) S.B. Amb. Architt. RM	640.000	640.000	0
B. 13	44/2	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro del muro di cinta del convento	BB CC AA - (1) S.B. Amb. Architt. RM	319.487	319.487	0

B	13	4571	Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami (Roma) Restauro degli interni	BB, CC, AA - (3) S.B. At. Stor. RM	300.000	300.000	0
B	13	4572	Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni	BB, CC, AA - (3) S.B. At. Stor. RM	800.000	800.000	0
B	13	461	Chiesa di S. Luca al Colonnaio: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	BB, CC, AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	470.660	470.650	0
B	13	462	Chiesa di S. Maria delle Formose: Restauro edifici e facciate	BB, CC, AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	711.528	711.530	0
B	13	463	Chiesa di S. Maria di Montesanto (Roma)	BB, CC, AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	700.000	700.000	0
B	13	464	Chiesa di S. Maria del Miracolo	BB, CC, AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	724.740	724.740	0
B	13	471	Croce di S. Maria sopra Minerva: Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB, CC, AA - (2) S.B. At. Stor. RM	950.000	950.000	0
B	13	472	Chiesa di S. Maria al Vomero: Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB, CC, AA - (3) S.B. At. Stor. RM	1.230.000	1.230.000	0
B	13	473	Chiesa di S. Maria in Trivio: Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB, CC, AA - (3) S.B. At. Stor. RM	350.000	350.000	0
B	13	474	Chiesa di S. Salvatore ai Quirinali: Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB, CC, AA - (2) S.B. At. Stor. RM	230.000	230.000	0
B	13	475	Chiesa di S. Vitoale: Restauro degli affreschi e degli stucchi	BB, CC, AA - (3) S.B. At. Stor. RM	200.000	200.000	0
B	13	481	Chiesa di S. Maria dell'Orto: Restauro della zona absidiale	BB, CC, AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	374.916	374.916	0
B	13	482	Chiesa di S. Maria in Porta Paradiso: Restauro del prospetto e della facciata prima fase	BB, CC, AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	470.435	470.435	0
B	13	483	Chiesa di S. Maria in Trinità: Restauro del prospetto e della facciata (prima fase)	BB, CC, AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	315.127	315.127	0
B	13	484	Chiesa di S. Maria del Sette Dolori: Restauro del prospetto e della facciata prima fase	BB, CC, AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	600.000	600.000	0
B	13	485	Chiesa di S. Ippolito all'Orto: Restauro delle coperture e dell'apparato decorativo interno alla navata centrale	BB, CC, AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	300.000	300.000	0
B	13	486	Chiesa di S. Maria in Transpontina: Restauro del prospetto e della facciata (prima fase)	BB, CC, AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	550.000	550.000	0
B	13	487	Chiesa di S. Maria in Transpontina: Restauro dell'interno decorativo nella cappella (prima fase)	BB, CC, AA - (1) S.B. Amb. Archit. RM	230.610	230.610	0

[illegible]

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

N.°	Descrizione dell'opera	BB. CC. AA. - (5)	S. S. Amb. Arch. Laz.	955.857	955.857	0
8.13.43	Chiesa di S. Francesco (Anguillara/Roma) Restauro globale conservativo	BB. CC. AA. - (5)	S. S. Amb. Arch. Laz.	955.857	955.857	0
8.13.44	Monastero del Corpuscoli (Torbiana/Roma)	BB. CC. AA. - (5)	S. S. Amb. Arch. Laz.	850.119	850.119	0
8.13.45	Santuario della Madonna della Sghiera (Torbiana/Roma)	BB. CC. AA. - (5)	S. S. Amb. Arch. Laz.	929.344	929.344	0
8.13.46	Exon. della Trinità (Alatri/Roma) Restauro della chiesa, urbanizzazione e adeguamento funzionale del convento	BB. CC. AA. - (5)	S. S. Amb. Arch. Laz.	1.350.007	1.350.007	0
8.13.47	Santuario della Madonna di Cibiana (Alatri/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento	BB. CC. AA. - (5)	S. S. Amb. Arch. Laz.	1.791.698	1.791.698	0
8.13.48	Chiesa del Crocifisso (Fregene/Roma)	BB. CC. AA. - (5)	S. S. Amb. Arch. Laz.	834.035	834.035	0
8.13.49	Episcopio diocetico di S. Rufina (Fregene/Roma)	BB. CC. AA. - (5)	S. S. Amb. Arch. Laz.	1.888.045	1.888.045	0
8.13.50	Restauro della chiesa di S. Maria Maggiore	BB. CC. AA. - (5)	S. S. Amb. Arch. Laz.	1.205.047	1.205.047	0
8.13.51	Restauro organo (Alatri)	BB. CC. AA. - (5)	S. S. Amb. Arch. Laz.	100.000	100.000	0
8.13.52	Restauro organo (Alatri)	BB. CC. AA. - (5)	S. S. Amb. Arch. Laz.	1.770.000	1.770.000	0
8.13.53	Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso, campo per disabili	BB. CC. AA. - (5)	S. S. Amb. Arch. Laz.	110.000	110.000	0
8.13.54	Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso, campo per disabili	BB. CC. AA. - (5)	S. S. Amb. Arch. Laz.	800.000	800.000	0
8.13.55	Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso, campo per disabili	BB. CC. AA. - (5)	S. S. Amb. Arch. Laz.	720.000	720.000	0
8.13.56	Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso, campo per disabili	BB. CC. AA. - (5)	S. S. Amb. Arch. Laz.	204.000	204.000	0
8.13.57	Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso, campo per disabili	BB. CC. AA. - (5)	S. S. Amb. Arch. Laz.	2.057.000	2.057.000	0
8.13.58	Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso, campo per disabili	BB. CC. AA. - (5)	S. S. Amb. Arch. Laz.	2.000.000	2.000.000	0
8.13.59	Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso, campo per disabili	BB. CC. AA. - (5)	S. S. Amb. Arch. Laz.	298.000	298.000	0
8.13.60	Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso, campo per disabili	BB. CC. AA. - (5)	S. S. Amb. Arch. Laz.	855.000	855.000	0

B14 (interventi di recupero e adeguamento funzionale di altri Musei Archeologici, Medievali, Moderni)

B	14	01	Risultato ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Catastrofica Palazzo Poli, per la nuova sede dell'As. Naz. della Grafica	BB, CC, AA, - (6) S.B. Arch. Grafica	10.714.115	10.714.115	0
B	14	02	Museo Palazzo Massimo (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno	BB, CC, AA, - (1) S.B. Arch. Arch. RM	6.964.528	6.964.528	0
B	14	03	Accademia Nazionale di S. Luca (Roma)	BB, CC, AA, - (13) S.B. Arch. Arch. RM	747.887	747.887	0
B	14	04	Castel S. Angelo (Roma) Restauri dei musei di S. Angelo	BB, CC, AA, - (7) S.B. Arch. RM	1.305.458	1.305.458	0
B	14	05	Castel S. Angelo (Roma) Allestimento museo	BB, CC, AA, - (8) As. Naz. C. S. Ang.	1.505.508	1.505.508	0
B	14	06	Museo delle arti e dei mestieri (Manifattura)	BB, CC, AA, - (8) S. Arch. RM	1.395.900	1.395.900	0
B	14	07	Museo d'Arte Sacra	Parrocchia S. Giovanni di Firenze	700.000	700.000	0
B	14	08	Completamento "Palazzo del Popolo"	Comune di Roccapietra	875.543	875.543	0
B	15	01	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica e natura8802a del Porto di Trastevere	BB, CC, AA, - (4) S.B. Arch. Ostia	4.000.000	4.000.000	0
B	15	02	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Canale Tiberina, Canale Fiume Giulio, area industriale)	BB, CC, AA, - (4) S.B. Arch. Ostia	7.000.000	7.000.000	0
B	15	03	Museo Ostiense di Cultura Antica (Roma) Completamento degli impianti di sicurezza e predisposizione materiale didattico e didattico	BB, CC, AA, - (4) S.B. Arch. Ostia	2.000.000	2.000.000	0
B	15	04	Antiquarium Ostiense di Cultura Antica (Roma) Completamento opere restaurative e adeguamento ambientale	BB, CC, AA, - (4) S.B. Arch. Ostia	2.000.000	2.000.000	0
B	15	05	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati	BB, CC, AA, - (4) S.B. Arch. Ostia	2.000.000	2.000.000	0
B	15	06	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di interventi di servizio e servizi	BB, CC, AA, - (4) S.B. Arch. Ostia	1.900.000	1.900.000	0
B	15	07	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (riva Antica)	BB, CC, AA, - (4) S.B. Arch. Ostia	1.500.000	1.500.000	0
B	15	08	Interventi di restauro e censimento di beni culturali archeologici				
B	15	09	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino (restauro e adeguamento)	BB, CC, AA, - (2) S.B. Arch. RM	980.000	980.000	0
B	15	10	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Traiano (restauro e adeguamento)	BB, CC, AA, - (2) S.B. Arch. RM	4.872.784	4.872.784	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B. 14	01	Palatino - Foro Romano (Roma) Area di S. Maria Antiqua Completamento restauro	BB. CC. AA. (2) S.B. Archael. RM	1.180.200	1.180.200	0
B. 14	04	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Vespasiano e Rione Consistentemente e restauro architettonico, interventi di adeguamento per l'apertura al pubblico	BB. CC. AA. (2) S.B. Archael. RM	2.339.258	2.339.258	0
B. 14	05	Domus Aurea (Roma) Cava, restaurom, completamento struttura, interventi di adeguamento per l'apertura al pubblico	BB. CC. AA. (2) S.B. Archael. RM	1.896.079	1.896.079	0
B. 14	06	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale Creazione di servizi per il pubblico	BB. CC. AA. (2) S.B. Archael. RM	398.319	398.319	0
B. 14	07	Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e sistemazione di S. Maria Antiqua, interventi di adeguamento per l'apertura al pubblico	BB. CC. AA. (2) S.B. Archael. RM	2.117.280	2.117.280	0
B. 14	08	Palatino - Foro Romano (Roma) Cava della Vittoria Restauro e manutenzione	BB. CC. AA. (2) S.B. Archael. RM	721.892	721.892	0
B. 14	09	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Vespasiano e Rione Consistentemente e restauro architettonico, interventi di adeguamento per l'apertura al pubblico	BB. CC. AA. (2) S.B. Archael. RM	3.748.454	3.748.454	0
B. 14	10	Palatino - Foro Romano (Roma) Praseopoli da S. Maria Antiqua a S. Anastasia e a via di S. Gregorio Restauro e manutenzione	BB. CC. AA. (2) S.B. Archael. RM	1.780.174	1.780.174	0
B. 14	11	Palatino - Foro Romano (Roma) Area S. Maria Antiqua e Tempio Restauro	BB. CC. AA. (2) S.B. Archael. RM	1.819.356	1.819.356	0
B. 14	12	Palatino - Foro Romano (Roma) Area della Vittoria Barbeti Utilizzazione restauri	BB. CC. AA. (2) S.B. Archael. RM	3.183.853	3.183.853	0
B. 14	13	Palatino - Foro Romano (Roma) Area di S. Maria Antiqua Completamento e restauro	BB. CC. AA. (2) S.B. Archael. RM	902.200	902.200	0
B. 14	14	Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio Restauro e sistemazione	BB. CC. AA. (2) S.B. Archael. RM	3.696.046	3.696.046	0
B. 14	15	Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	BB. CC. AA. (2) S.B. Archael. RM	883.403	883.403	0
B. 14	16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	BB. CC. AA. (2) S.B. Archael. RM	2.243.464	2.243.464	0
B. 14	17	Palatino - Foro Romano (Roma) Chiesa S. Maria Sotterranea e sistemazione	BB. CC. AA. (2) S.B. Archael. RM	274.975	274.975	0
B. 14	18	Restauri antichi e moderni di architetture, materiali architettonici, ad opere d'arte (Roma). Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Giardino di P. di Barberi, scavo e restauro	BB. CC. AA. (2) S.B. Archael. RM	792.578	792.578	0
B. 14	19	Restauri antichi e moderni di architetture, materiali architettonici, ad opere d'arte (Roma). Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Palazzo Barberini ed edifici annessi	BB. CC. AA. (2) S.B. Archael. RM	603.000	603.000	0
B. 14	20	Restauri antichi e moderni di architetture, materiali architettonici, ad opere d'arte (Roma). Conservazione, manutenzione e valorizzazione - S. Cecilia, restaurazione di copertura	BB. CC. AA. (2) S.B. Archael. RM	97.922	97.922	0

B	16	1894	Istanzi artistici e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Area archeologica Tor Chitrova	BB CC AA - (2) S.B. Archael RM	120.325	135.325	0
B	16	1895	Istanzi artistici e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Carcere Mamertino	BB CC AA - (2) S.B. Archael RM	551.079	551.079	0
B	16	1896	Istanzi artistici e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana Isola Casal Bianco	BB CC AA - (2) S.B. Archael RM	47.518	47.518	0
B	16	1897	Istanzi artistici e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana nel giardino nomenclario	BB CC AA - (2) S.B. Archael RM	45.618	45.618	0
B	16	1898	Istanzi artistici e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Abazia di S. Eusebio Romano	BB CC AA - (2) S.B. Archael RM	97.937	97.937	0
B	16	1899	Istanzi artistici e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Piramide di Capo Cecio	BB CC AA - (2) S.B. Archael RM	45.798	45.798	0
B	16	1900	Istanzi artistici e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Rione in Piazza del	BB CC AA - (2) S.B. Archael RM	92.502	92.502	0
B	16	1901	Istanzi artistici e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Area rettilinea il Tempio di Saturno	BB CC AA - (2) S.B. Archael RM	901.046	901.046	0
B	16	1902	Istanzi artistici e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa dei Sassi Esquilari	BB CC AA - (2) S.B. Archael RM	100.000	100.000	0
B	16	1903	Istanzi artistici e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Gabii - Castiglione. Lettera litigata del territorio	BB CC AA - (2) S.B. Archael RM	94.537	94.537	0
B	16	1904	Istanzi artistici e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Campo Archeologico	BB CC AA - (2) S.B. Archael RM	30.000	30.000	0
B	16	1905	Istanzi artistici e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico	BB CC AA - (2) S.B. Archael RM	60.000	60.000	0
B	16	1906	Istanzi artistici e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Torre di Pincelino Isola Albano	BB CC AA - (2) S.B. Archael RM	122.102	122.102	0
B	16	1907	Istanzi artistici e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Area di Tito	BB CC AA - (2) S.B. Archael RM	875.518	875.518	0
B	16	1908	Istanzi artistici e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana Isola di Caprioli	BB CC AA - (2) S.B. Archael RM	93.194	93.194	0
B	16	1909	Istanzi artistici e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana Isola di Caprioli	BB CC AA - (2) S.B. Archael RM	25.000	25.000	0
B	16	1910	Istanzi artistici e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte. Conservazione, manutenzione, scavo - Necropoli Portunense in località Pozzo Pauliano	BB CC AA - (2) S.B. Archael RM	470.592	470.592	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Benevolenti adibiti e restaurati architettonici, conservati, restaurati, gruppi ed opere d'arte			BB, CC, AA, - (2)			S.B. Architet. RM			951.254			951.254			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

8	13	45	Tribuna barocco di S. Paolo (Altare Lateranense) Restauri	Comune di Altare Lateranense	760.872	760.872	0
8	13	46	Piazza e Parco Chiigi (Atrio/Roma)	Comune di Ardea	5.215.222	5.215.222	0
8	13	47	Ex-sampio Giulio E. Lodi (Municipio/Roma) Restauri e adeguamento Urbanistica	Provincia di Roma	514.544	514.544	0
8	14	01	Progetto di recupero area via dei sepolcri in Comune di Grottiolista 4° settore di XP Comunità Montana, Sede di Rocca Priora	XP Comunità Montana, Sede di Rocca Priora	415.465	415.465	0
8	14	02	Villa Montebello (Monte Prato) restauro, Centro studi e valorizzazione del territorio (Monte Prato) "Progetto"	Università degli studi di Roma "La Sapienza"	8.400.000	8.400.000	0
8	14	10	Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della cinta e del percorso pedonale	Comune di Segni	1.131.220	1.038.230	93.000
8	14	11	Colonna di S. Lupo (Viterbo/Roma) Restauri e adeguamento Urbanistica	Comune di Viterbo	302.500	302.500	0
8	14	12	Mura poligonali (Pescina/Roma) Interventi di restauro e consolidamento e sistemazione del parco	Comune di Pescina	1.313.739	1.313.739	0
8	14	13	Rocca dei Colonna (Castel San Pietro/Roma) Sistemazione e riqualificazione di Via Comense e Casale S. Pietro Roma	Comune di Castel San Pietro Roma	548.800	544.300	2.500
8	14	14	Museo del Santuario della Madonna del Buon Consiglio (Genazzano/Roma) Lavori di ristrutturazione	Provincia di Roma	405.771	405.771	0
8	14	15	Museo dell'Abbazia di S. Scolastica (Subiaco/Roma) Ristrutturazione, sistemazione e valorizzazione	Provincia di Roma	2.097.342	2.097.342	0
8	14	16	Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini	Provincia di Roma	397.686	397.686	0
8	14	17	Rocca Albornoz (S. Maria del Monte/Roma) Restauro e recupero area per concerti e teatro	Provincia di Roma	741.325	741.325	0
8	14	18	Ex chiesa di S. Michele (Tivoli/Roma) Restauro e allestimento spazi per mostre e concerti	Provincia di Roma	305.792	305.792	0
8	14	19	Chiesa di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro	Comune di Roma	163.000	163.000	0
8	14	20	Chiesa di San Lorenzo (Chiusi San Paolo/Roma) Restauro	Comune di Chiusi San Paolo	254.200	254.200	0
8	14	21	Monastero di Santa Croce (San Onofrio/Roma) Restauri	Comune di San Onofrio	274.993	274.993	0
8	14	22	Area archeologica della Villa Merciana (Anzio/Roma) Recupero	Comune di Anzio	1.220.000	1.220.000	0

B	14	14	Salvatore 1994 area parcheggio addossato piano Chi e interrimento area Pissini	Comune di Aniene	1.000.000	1.000.000	0
B14 Valutazione del patrimonio culturale regionale (edifici abbati, santuari e annessi)							
B	14	01	Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Verna). Ristrutturazione di un immobile a collozione delle attrezzature tecniche	Regione Lazio	1.000.000	1.000.000	0
B	19	01	Completamento della ristrutturazione dell'edificio e allestimento del Museo Tuscolani (Tuscolani)	Comune di Fregene	4.817.000	4.817.000	0
B	19	041	Riquadratura Convento S. Francesco di Badagna* stralcio	Comune di Badagna	685.862	685.862	0
B	19	041	Riquadratura Convento S. Francesco di Badagna* stralcio	Comune di Badagna	841.000	841.000	0
B	19	06	Resturo del piano terra ex Convento degli Agostiniani da destinare a Museo Circo e resturo della Chiesa S.M. Novella	Comune di Bracciano	1.187.183	1.187.183	0
B	19	06	Progetto conservativo della Cappella exora di S. Stefano	Comune di Tivoli	402.000	402.000	0
B	19	07	Chiesa Collegiata (Mugellina/Roma) Resturo (primo fase)	Comune di Anguillara Sabazia	995.004	995.004	0
B	19	08	Catasto Convento (Viterbo/Viterbo) Ristrutturazione di spazi museali ed annessi	Comune di Grotte	5.774.000	5.774.000	0
B	19	09	Chiesa della Collegiata (Viterbo/Roma) Resturo	Comune di Viterbo	601.629	601.629	0
B	19	10	Chiesa di Santa Maria Maggiore (Viterbo/Roma) Resturo	Comune di Viterbo	154.261	154.261	0
B	19	11	Centro documentazione esterna sociale Leone XIII (Capriate Romano/Roma)	Comune di Capriate Romano	1.242.088	1.242.088	0
B	19	12	Chiesa di Santa Maria a San Martino, San Martino, Madonna degli Angeli (Castellana/Roma) Resturo e ristrutturazione	Comune di Castellana	300.000	300.000	0
B	19	14	Risanamento e consolidamento della Parrocchia di S. Michele Arcangelo	Comune di Capena	914.429	914.429	0
B	19	15	Progetto e ristrutturazione della Chiesa di San Rocco	Comune di San Rocco Lazio	172.390	172.390	45.000
B	19	16	Chiesa di Santa Liberata (San Angelo Romano/Roma) Resturo	Comune di San Angelo Romano	470.520	470.520	0
B	19	17	Chiesa di Sant'Andrea (Palombara Sabazia/Roma)	Comune di Palombara Sabazia	173.803	173.803	0
B	19	18	Adattamento del Convento di S. Cosimato al superamento delle barriere architettoniche	Comune di Viterbo	150.000	150.000	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 19	11	Santuario di Velabrum (Viale dell'Unità) Centro di documentazione	Comune di Velabrum	52.000	85.000	0
B 19	34/1	Restauri delle Chiese di S. Rocco e S. Pietro (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	372.274	372.274	0
B 19	34/2	Restauri della Chiesa di S. Eusebio (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	527.504	527.504	0
B 19	28/3	Provinzializzazione del corso Petrarca ed adeguamento impianti tecnici della Chiesa di S. Francesco (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	445.246	445.246	0
B 19	24/4	Edificazione di Via della Madonna (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	1.015.744	1.015.744	0
B 19	39/5	Restauri della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	453.724	453.724	0
B 19	39/4	Subordinazione del piazzale antistante la Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	540.322	540.322	0
B 19	21	Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesano	Diocesi di Viterbo	3.450.891	3.450.891	0
B 19	22	Completamento di S. Francesco (Tuscanara/Viterbo) Restauri conservativi	Parrocchia S. Carlo di Tuscanara	2.398.493	2.398.493	0
B 19	23	Museo della cristianità	Capitolo della Basilica Cattedrale di VT	2.378.011	2.378.011	0
B 19	24/1	Restauri e valorizzazione Chiesa S. Salvatore	Comune di Tinquaria	152.358	152.358	0
B 19	24/2	Restauri e valorizzazione Chiesa S. Giacomo	Comune di Tinquaria	122.789	122.789	0
B 19	24/3	Progetto per l'edificazione, restauri e recupero edifici Santuario S. Maria in Vineta	Comune di Tinquaria	2.250.000	2.250.000	0
B 19	25/1	Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Poggio Bustone	300.000	300.000	0
B 19	25/2	Sistemazione dell'area insediamento	Comune di Poggio Bustone	200.000	200.000	0
B 19	26	Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.450.722	1.450.722	0
B 19	27	Chiesa di S. Francesco (Rieti) Restauri e sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.350.273	1.350.273	0
B 19	28/1	Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del emblema. Recupero di due fabbricati per la mensa e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato (1° stadio turistico)	Comune di Grotte	764.000	764.000	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B. 18	26/3	Lavori di sistemazione della Piazza del palazzo (rimessa, 1° livello funzionale)	Comune di Grosseto	496.420	496.420	0
B. 19	26/3	Lavori di sistemazione dell'area da dedicare a parcheggio pubblico in Garoglio capoluogo (1° livello funzionale)	Comune di Grosseto	216.075	201.075	15.000
B. 19	27	Completamento strutturale dell'Abbazia di S. Giovanni Gualberto	Comune di Montepulciano	438.791	438.791	0
B. 19	36	Complesso di S. Alessandro (Tollara/Rieti) Completamento della ristrutturazione dell'ex convento	Comune di Tolfa in Sabazia	1.500.000	1.500.000	0
B. 17	31	Riquadratura opere del Borgo di Fiesse e restauco del Monastero con nell'ambito del Monastero	Comune di Fiesse Sabazia	4.964.000	4.964.000	0
B. 19	32	S. Carlo (Sarzana/Liguria) Acquedotto, restauro ed arredo della casa natale di S. Carlo	Comune di Sarzana	400.000	400.000	0
B. 17	33	Monastero delle Chianche (Sarzana/Liguria) Completamento della ristrutturazione (prima fase)	Provincia di Liguria	2.311.341	2.311.341	3.000.000
B. 19	34	Lavori di consolidamento restauro Chiesa S. Maria della Pieve collegata	Comune di Corti	1.000.000	1.000.000	0
B. 19	35	Restauco e completamento F.lli J.M.O. Comune di Gualdo Tadino area museale opere della Chiesa (Sarzana/Liguria) del monumento di Maria Crocifissa	Comune di Gualdo	1.000.000	1.000.000	0
B. 19	36	Santuario Madonna della Rocca (Fondi/Latium) Sistemazione via e parcheggio	Comune di Fondi	1.000.000	1.000.000	0
B. 19	37	Castello Frangipane (Terracina/Latium) Ristrutturazione	Comune di Terracina	651.150	561.150	0
B. 19	38	Chiesa di San Giovanni (Castellorosso/Latium) Restauro	Comune di Castellorosso	200.000	200.000	0
B. 19	39	Abbazia di Polirone (Piacenza/Liguria) Recupero del piano superiore (1° livello funzionale)	Comune di Piacenza	1.250.000	1.250.000	0
B. 19	40	Casa di Santa Maria Goretti (Liguria) Sistemazione area antistante	Provincia di Liguria	656.779	656.779	0
B. 19	41/1	Restauco e completamento dell'area del convento di S. Francesco	Comune di Merano	271.210	271.210	0
B. 19	41/2	Progetto di sistemazione della Chiesa di S. Annunziata	Comune di Merano	133.987	133.987	0
B. 19	42	Strutturazione e abilitazione di un complesso di S. Francesco	Comune di Salsomaggiore	105.544	105.544	0
B. 19	43	Manutenzione straordinaria Chiesa S. Annunziata	Comune di Fabbro	176.311	176.311	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B. 19	44	Chiesa di S. Maria e Domini - Roma	Comune di S. Maria e Domini	120.000	120.000	0
B. 19	45	Chiesa di San Marco (Lazio) - Roma	Provincia di Lazio	577.000	577.000	0
B. 19	46	Progetto per la ristrutturazione della zona edificata 3 santuario Madonna del Colle	Comune di Lazio	99.000	99.000	0
B. 19	47	Ricupero del complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa	Comune di Roma	936.000	936.000	0
B. 19	48	Comune di Santa Maria Assunta (Sacrofonia) - Roma	Comune di Lazio	100.000	100.000	0
B. 19	49	Madonna della Civiltà (M.Lazio) - Adeguamento della strada di accesso	Provincia di Lazio	924.704	924.704	0
B. 19	50	Museo storico Nazionale (Alinari-Frosinone) - Roma	Comune di Lazio	850.000	850.000	0
B. 19	51	Monumenti di San Tommaso d'Aquino (Aquino-Frosinone): Sistemazione del borgo medievale del castello e della chiesa di Santa Maria della Libera	Comune di Aquino	989.000	989.000	0
B. 19	52	Sistemazione area attrezzata intorno al Santuario della Madonna di Caravita	Comune di San Giuliano	252.425	252.425	0
B. 19	53	Santa Maria Assunta (Alinari-Frosinone) - Roma	Parrocchia Santa Maria Assunta	700.279	700.279	0
B. 19	54	Ristrutturazione Chiesa di Santa Maria (Alinari-Frosinone)	Comune di Roma	313.800	313.800	0
B. 19	55	Basilica S. Maria Salome - Santa Maria (Verdi-Frosinone) - Roma	Ente Chiesa di S. Maria Salome	240.000	240.000	0
B. 19	56	Abbazia di Montecassino (Alinari-Frosinone) - Roma	Comune di Caserta	4.176.000	4.176.000	0
B. 19	57	Chiesa di Santa Maria (Boville Ernica-Frosinone) - Roma	Comune di Boville Ernica	256.272	256.272	0
B. 19	58	Consolidamento edifici e recupero ambientale Chiesa di San Pietro la Moria (S. Giovanni Lupatone)	Comune di S. Giovanni Lupatone	439.000	439.000	0
B. 19	59	Chiesa di Santa Maria Annunziata (Frosinone-Frosinone) - Roma	Comune di Frosinone	470.000	470.000	0
B. 19	60	Chiesa di Santa Maria e Frosinone (Frosinone-Frosinone) - Roma	Comune di Frosinone	487.000	487.000	0
B. 19	61	Musei del Capitolo della Cattedrale (Anagni-Frosinone)	Diocesi di Anagni-Alatri	363.476	363.476	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

B 20	01.1	Opera festiva Programmata da svolgersi a Roma e negli altri comuni del Lazio	Teatro dell'Opera di Roma	15.000.000	15.000.000	0
B 20	01.2	Musica Programmata da svolgersi a Roma e negli altri comuni del Lazio	Accademia di Santa Cecilia	13.000.000	13.000.000	0
B 20	01.3	Festa Programmata da svolgersi a Roma e negli altri comuni del Lazio	Teatro Roma	7.000.000	7.000.000	0
B 20	01.4	Mostra Programmata di esposizione d'arte da svolgersi nelle Scuole Popolari	Agenzia Romana Prop. Clubbio	5.000.000	5.000.000	0
B 20	01.5	Convegno internazionale	Agenzia Romana Prop. Clubbio	2.000.000	2.000.000	0
B 20	01.6	Concorso finalizzati all'arricchimento del patrimonio culturale	Agenzia Romana Prop. Clubbio	5.000.000	5.000.000	0
B 20	01.7	Incidenti dell'offerta culturale di Roma	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000	0
B 20	01.8	Incidenti dell'offerta culturale nella Provincia di Roma - Espressioni artistiche ed attività di studio e ricerca storica-religiosa	Provincia di Roma	750.000	750.000	0
B 20	01.9	Incidenti di valorizzazione dell'offerta culturale nella Provincia di Roma	Provincia di Roma	200.000	200.000	0
B 20	01.10	Incidenti di valorizzazione dell'offerta culturale nella Regione Lazio	Regione Lazio	1.000.000	1.000.000	0
B 20	01.11	Incidenti di valorizzazione dell'offerta culturale nella Regione Lazio	Agenzia Romana Prop. Clubbio	1.000.000	1.000.000	0
B 20	01.12	Centro internazionale per le arti e le culture a Roma in Villa Paoletti - Villa del Sole	Fondazione Nicola Piccolomini	4.750.000	4.750.000	0

C MANUTENZIONE E ARREDO URBANO PATRIMONIO AMBIENTALE

C1 Programma di manutenzione straordinaria strade e aree verdi nelle zone soggette alle scalfite e programma di abbellimento barriere architettoniche

C 01	01	Restauri conservativi del ponte Vittorio Emanuele II - Unione I. Regione Margherita e Comune di Roma - Dip. AD - I.U.O.	5.141.000	5.141.000	0
C 01	02	Restauri conservativi di ponte Carlo Castiglione, ponte Duca D'Aosta, cavalcavia sul Muro Torto	5.782.803	5.782.803	0
C 01	03	Restauri conservativi di ponte Flaminio al monumento alla libertà di Roma - Dip. AD - I.U.O.	7.105.728	7.105.728	0
C 01	04	Restauri conservativi di ponte Flaminio al monumento alla libertà di Roma - Dip. AD - I.U.O.	2.876.866	2.876.866	0
C 01	05	Restauri conservativi di ponte Flaminio al monumento alla libertà di Roma - Dip. AD - I.U.O.	5.913.186	5.913.186	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C. 81	86	Restauri conservativi di ponte Fabricio	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.126.876	2.126.876	0
C. 81	87	Restauri conservativi di ponte Fabricio	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.026.129	2.026.129	0
C. 81	10	Piazza S. Pietro in Vincoli, S. Prassede, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma). Riquadratura, Ambienti, risistemazione strada e giardino sottesi	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	3.245.965	3.245.965	0
C. 81	11	Via Cavour, viale Angelica, piazza Cavour, via Giuliana (Roma). Interventi di manutenzione ed ampliamento dei vincoli monumentali e urbanistici (prima fase)	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.016.574	2.016.574	0
C. 81	12	Progetto per interventi di manutenzione e ampliamento dei principali fenomeni degli autobus turistici. Percorso "C": Via Trastevere, via Marmorata, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	2.894.525	2.894.525	0
C. 81	131	Interventi di manutenzione e ampliamento dei principali fenomeni degli autobus turistici. Percorso "A": Via Cavour, viale Angelica, piazza Cavour, via Giuliana (Roma). Interventi di manutenzione ed ampliamento dei vincoli monumentali e urbanistici (prima fase)	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	1.437.297	1.437.297	0
C. 81	132	Interventi di manutenzione delle sedi statali del tempio di Minerva e di piazza da ponte Sublica a ponte Milvio e zone limitrofe	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	7.000.000	7.000.000	0
C. 81	14	Via S. Gregorio, viale Giuliana, viale Washington. Interventi di manutenzione ed ampliamento dei principali fenomeni degli autobus turistici	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	5.275.316	5.275.316	0
C. 81	151	Via Apia Antica, 1° Lotto. Riquadratura e adeguamento della sede stradale da piazza Roma Portigola a via di Cecilia Metella	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	3.587.523	3.587.523	0
C. 81	152	Via Apia Antica, 2° Lotto. Riquadratura e adeguamento della sede stradale del tratto da piazza Roma Portigola a via di Cecilia Metella	Comune di Roma - Dip. XII - II U.O.	10.541.291	10.541.291	0
C. 81	161	Viale Borghese: Rinnovo del fondo, strada dell'Acqua Felice, Arco di Sant'Antonio Severo, proprietà necessitate, proprietà di piazza delle Carrozze	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.844.536	1.844.536	0
C. 81	162	Viale Borghese: proprietà della Fonderia del Fucino, proprietà di piazza delle Carrozze, F. La Guardia, restauro degli arredi architettonici	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.780.825	1.780.825	0
C. 81	19	Viale Borghese: Giardino Superiore, completamento degli interventi nel Padiglione della Meridiana, dell'Occhio e restauro degli arredi architettonici esterni	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	915.134	915.134	0
C. 81	20	Viale Borghese: Rinnovo del fondo, strada dell'Acqua Felice, Arco di Sant'Antonio Severo, proprietà necessitate, proprietà di piazza delle Carrozze	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.844.536	1.844.536	0
C. 81	211	Viale Doria Pamphili (Roma): allineamento esterno ed interno del museo di Villa Vecchia, restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Colonnati - Barriera esterna	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	2.265.762	2.265.762	0
C. 81	212	Viale Doria Pamphili (Roma): restauro delle serre architettoniche	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.666.150	1.666.150	0
C. 81	221	Viale Doria Pamphili (Roma): restauro e completamento di Casale di Giordano	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.694.495	1.694.495	0
C. 81	232	Viale Doria Pamphili (Roma): restauro e completamento museale delle Caselle Pignone e dell'area antistante	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.467.997	1.467.997	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C. 01	23	Villa Doria Pamphili (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale del Giardino del Teatro	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.750.959	1.750.959	0
C. 01	24	Villa Pamphili (Roma) Restauro e restauro Villino Curial	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.750.959	1.750.959	0
C. 01	25	Villa Doria Pamphili (Roma) Restauro e restauro dell'Arco del Quattro Venti e delle aree limitrofe	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.137.773	1.137.773	0
C. 01	26	Risistemazione Teatro Massimo (Piazza di Santa Sabina, via Cavour, 105 del Teatro, via S. Angelo di Ripetta, via Filadelfa Campitana)	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	6.317.029	6.317.029	0
C. 01	28	Potenziamento meccanizzazione servizio giardini	Comune di Roma - Dip. X	2.412.000	2.412.000	0
C. 01	29	Lavori per l'impiego del verde nel Parco S. Maria della Fede	Comune di Roma - Dip. X	1.970.000	1.970.000	0
C. 01	38	Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche relative ai percorsi ATAC e sedi stradali adiacenti	Comune di Roma - Dip. XII	2.947.590	2.947.590	0
C. 02	A	Interventi di adeguamento della struttura per l'accessibilità e dei servizi edili (principali aree di visita (Rudicella, itinerari giuliani e catacombe))	Comune di Roma - Dip. XII	3.625.700	3.625.700	0
C. 02	B1/B1	"BOCP" progetto di riqualificazione ambientale di borgo a spicchio	Comune di Roma	3.154.744	3.154.744	0
C. 02	B1/B2	"RIS" progetto riqualificazione ambientale piazza Flaminia	Comune di Roma	7.434.771	7.434.771	0
C. 02	B1/B3	"CON" progetto di riqualificazione ambientale via della Condottazione	Comune di Roma	2.129.881	2.129.881	0
C. 02	B1/B4	Area della Basilica di San Pietro in Vaticano: interventi riqualificazione pubblica edilizia e riqualificazione di nuova illuminazione	A.C.P.A.	1.984.500	1.984.500	0
C. 02	B1/B5	Area della Basilica di San Pietro in Vaticano: riqualificazione di edifici monumentali	AMA	907.430	907.430	0
C. 02	B1/B6	Area della Basilica di San Pietro in Vaticano: riqualificazione di edifici monumentali	Ministero dell'Interno	3.852.000	3.852.000	0
C. 02	B1/B7	Infrastrutture urbane area stazione di S. Pietro	Roma 2000	11.986.500	11.986.500	0
C. 02	B1/B8	Opere di riqualificazione ATAC di via Carlo Farini	Comune di Roma - Dip. XII - IV U.O.	1.750.959	1.750.959	0
C. 02	B1/B9	Concorsi di progettazione preliminare di ponti pedonali	Comune di Roma	400.000	400.000	0
C. 02	B1/B10	"GEO" progetto di riqualificazione ambientale piazza San Giovanni	Comune di Roma	6.919.342	6.919.342	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C. 91	027/4	"MART" progetto di riqualificazione ambientale piazza santa Maria Maggiore	Comune di Roma	3.992.090	3.992.090	0
C. 92	027/5	"VALTO" progetto di riqualificazione ambientale piazza santa Maria Maggiore	Comune di Roma	1.483.490	1.483.490	0
C. 93	027/6	"QUA" progetto di riqualificazione ambientale via San Sebastiano	Comune di Roma	1.083.777	1.083.777	0
C. 94	027/7	Progetto di riqualificazione ambientale e uffici studi del Comune di Roma	Comune di Roma	14.139.000	14.139.000	0
C. 95	027/8	Area delle Basiliche san Giovanni, Santa Maria Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme, interventi di riqualificazione	AMA	1.456.866	1.456.866	0
C. 96	027/9	Area delle Basiliche di S. Giovanni, S. Maria Maggiore, S. Croce in Gerusalemme, interventi di riqualificazione	AMA	7.385.350	7.385.350	0
C. 97	028/0	Area delle Basiliche di S. Giovanni, S. Maria Maggiore, S. Croce in Gerusalemme, interventi di riqualificazione	ACEA	3.864.000	3.864.000	0
C. 98	028/1	"VALTO" progetto di riqualificazione ambientale piazza San Pietro	Comune di Roma	6.858.780	6.858.780	0
C. 99	028/2	"LUN" progetto di riqualificazione ambientale lungotevere San Pietro	Comune di Roma	1.379.201	1.379.201	0
C. 100	028/3	"VALTO" progetto di riqualificazione ambientale via Condotta	Comune di Roma	796.243	796.243	0
C. 101	028/4	Area delle Basiliche di S. Pietro fuori le mura, interventi di riqualificazione pubblica	ACEA	1.943.700	1.943.700	0
C. 102	028/5	Area delle Basiliche di S. Pietro fuori le mura, interventi di riqualificazione pubblica	AMA	396.255	396.255	0
C. 103	028/6	Area delle Basiliche di S. Pietro fuori le mura, interventi di riqualificazione pubblica	Ministero dell'Interno	1.481.800	1.481.800	0
C. 104	028/7	Area delle Basiliche di S. Pietro fuori le mura, interventi di riqualificazione pubblica	P. Aree Intercomunali Basiliche di S. Pietro	1.364.350	1.364.350	0
C. 105	028/8	Area delle Basiliche di S. Pietro fuori le mura, interventi di riqualificazione pubblica	Comune di Roma	6.810.035	6.810.035	0
C. 106	028/9	Contributo interventi manutenzione sedi stradali	Comune di Roma	10.592.970	10.592.970	0
C. 107	029/0	Contributo interventi manutenzione sedi stradali	Comune di Roma - Op. XII - I.U.C.	6.000.000	6.000.000	0
C. 108	029/1	Progetti pubblici temporanei nella città di Roma	Comune di Roma - Op. XII - I.U.C.	7.490.200	7.490.200	0

[illegible]

CS Gardiner & Co (NZ) Sales Agents. Telephone 011 332 2222

[illegible]

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C. 11	53	Area archeologica del Colosseo. Sistema urbanistico e servizi nella ex pianura del Campidoglio. Comune di Roma - Dip. XI - U.O.	1.257.993	1.937.872	0
C. 11	64	Restauro del Colosseo. Quattrocentesco dell'Abate Commendatore. Comune di Roma - Dip. XI - U.O.	738.460	738.460	0
C. 11	65	Restauri dell'area di S. Gregorio al Celio, inclusa nella zona a verde di S. Gregorio al Celio, ex palazzo dei Savoia. Comune di Roma - Dip. XI - U.O.	3.595.425	3.595.425	0
C. 11	66	Area archeologica del Colosseo. Immobile in uso all'ordine di S. Tommaso di Colubio. Comune di Roma - Dip. XI - U.O.	2.468.145	2.468.145	0
C. 11	67	Area archeologica del Colosseo. Restauri del palazzo di S. Donato. Comune di Roma	343.852	343.852	0
C. 11	68	Oratori San Andrea e Santa Sofia (affreschi), Cappella di Santa Barbara (prospetto), S. B. Arch. Arch. RM	396.510	396.510	0
C. 11	69	Chiesa di San Gregorio Magno (restauri e sculture). BB. CC. AA. - (1) S. B. Arch. Arch. RM	250.000	250.000	0
C. 11	10	Chiesa di S. Tommaso in Formis (coperture). BB. CC. AA. - (1) S. B. Arch. Arch. RM	272.377	272.377	0
C. 11	11	Torre medievale: ISMIP (convento, sculture, resti di edifici). BB. CC. AA. - (1) S. B. Arch. Arch. RM	274.706	274.706	0
C. 11	12	Arco del Clivo di Scauro. BB. CC. AA. - (1) S. B. Arch. Arch. RM	747.072	747.072	0
C. 11	13	Chiesa di S. Giovanni e Paolo. BB. CC. AA. - (1) S. B. Arch. Arch. RM	1.353.315	1.353.315	0
C. 11	14	Fronti binate sul Clivo di Scauro. BB. CC. AA. - (2) S. B. Arch. Arch. RM	620.337	620.337	0
C. 11	15	Biblioteca di S. Gregorio al Celio. BB. CC. AA. - (2) S. B. Arch. Arch. RM	1.044.495	1.044.495	0
C. 11	16	Arco di Sisto e Dabaglia e soprastante Acquedotto Caelimontano. BB. CC. AA. - (2) S. B. Arch. Arch. RM	446.352	446.352	0
C. 11	17	Basilica di S. Giovanni e Paolo. BB. CC. AA. - (2) S. B. Arch. Arch. RM	274.300	274.300	0
C. 11	18	Chiesa di S. Maria in Domnica. BB. CC. AA. - (2) S. B. Arch. Arch. RM	190.000	190.000	0
C. 11	19	Chiesa di S. Tommaso in Formis. BB. CC. AA. - (2) S. B. Arch. Arch. RM	53.300	53.300	0
C. 11	20	Complesso monumentale di San Gregorio Magno. BB. CC. AA. - (2) S. B. Arch. Arch. RM	630.700	630.700	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C. 11	11	Abruzzo di Formazione	Provincia di Roma	181.500	181.500	0
C. 11	12	Ristrutturazione S. Gregorio e Cappella Salvati	ITALGAS	170.000	170.000	0
C. 11	13	Manutenzione e installazione all'ingrandimento di 1/2000 della carta topografica della zona di S. Gregorio e Cappella Salvati	SS 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	0		
C12. Ristrutturazione del Parco di Villa Doria Pamphili						
C. 12	01	Villa Doria Pamphili (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazione a verde e recupero ambientale della area prospiciente la via Olimpica	Comune di Roma - Dip. X	3.300.000	3.300.000	0
C. 12	02	Villa Doria Pamphili (Roma) Ristrutturazione dell'antico teatro del lago	Comune di Roma - Dip. X	2.899.842	2.899.842	0
C. 12	03	Villa Doria Pamphili (Roma) Ristrutturazione del giardino del lago	Comune di Roma - Dip. X	406.822	406.822	0
C. 12	04	Villa Doria Pamphili (Roma) Ristrutturazione del giardino del lago	Comune di Roma - Dip. X	703.194	703.194	0
C. 12	05	Villa Doria Pamphili (Roma) Ristrutturazione del giardino del lago	Comune di Roma - Dip. X	530.861	530.861	0
C13. Sistemazione ambientale e paesistica delle pendici di Monte Mario e Casale Mitelli						
C. 13	01/1	Parco di Monte Mario (Roma) Ristrutturazione del casale Mitelli	Comune di Roma - Dip. X RI - M.U.O.	2.877.833	2.877.833	0
C. 13	01/2	Parco di Monte Mario e casale Mitelli - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e riordinamento degli accessi	Comune di Roma - Dip. X	4.300.000	4.300.000	0
C14. Realizzazione delle pendici del Gianicolo						
C. 14	01	Parco del Gianicolo (Roma) Ristrutturazione delle pendici e delle mura	Comune di Roma - Dip. X	2.133.175	2.133.175	0
C15. Manutenzione straordinaria e restauro del Parco di Colle Oppio						
C. 15	01	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro vegetazionale ed infrastrutturale	Comune di Roma - Dip. X	695.683	695.683	0
C. 15	02	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle mura e delle mura interne delle mura	Comune di Roma - Dip. X RI - M.U.O.	1.848.853	1.848.853	0
C16. Ristrutturazione ambientale della protetta di Roma						
C. 16	01	Piano straordinario di prevenzione e sicurezza	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000	0
C. 16	02	Servizio di Roma (Roma) Ristrutturazione del servizio di Roma	Provincia di Roma	2.318.401	2.318.401	0
C. 16	03	Tutela ambientale di Roma	Comune di Roma	4.767.411	4.767.411	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

C 15 01/01	Finco e cure nel parco dei Castelli Romani (Municipio Roma I) - Interventi di manutenzione	Provincia di Roma	800.000	800.000	0
C 15 02	Villa comunale di Prato Quindici (Varese) - Lavori di manutenzione straordinaria		300.000	300.000	0
C19 Opere di riassetto igienico sanitario del bacino del Tevere e piani di raccolta differenziata dei rifiuti nei luoghi di visita dell'area metropolitana					
C 19 01/01	Substruzione (strada) del basso dell'area di Roma	Comune di Roma - Dc XII - U.O.	6.965.000	6.965.000	0
C 19 01/02	Risanamento Fosso Pabbona. Ripascimento litale/ Trattamento acque magra Fosse e Olla Litorale	Ragione Lazio	7.798.989	7.798.989	0
C 19 01/03	Risanamento Fosso Pabbona. Ripascimento litale/ Trattamento acque magra Fosse e Olla Litorale	Ragione Lazio	2.482.579	2.482.579	0
C 19 01/04	Risanamento Fosso Pabbona. Ripascimento litale/ Trattamento acque magra Fosse e Olla Litorale	Ragione Lazio	13.878.330	13.878.330	0
C 19 01/05	Opere di difesa del suolo di Olla e Fosse	Ragione Lazio	7.365.193	7.365.193	0
C 19 02/1	Rifiuti solidi urbani - Raccolta differenziata nella principale area di visita - Forniture e servizi	Provincia di Roma	1.500.000	1.500.000	0
C 19 02/2	Rifiuti solidi urbani - Raccolta differenziata nella principale area di visita - Impianto di compostaggio a Ventotene	Provincia di Roma	3.250.000	3.250.000	0
C 19 02/3	Rifiuti solidi urbani - Raccolta differenziata nella principale area di visita - Impianto di compostaggio a Bracciano	Provincia di Roma	3.250.000	3.250.000	0

C19 Opere Bazarine

C 20 01	Opere Interregionali	Università Le Sapienza	800.000	800.000	0
---------	----------------------	------------------------	---------	---------	---

D ACCESSIBILITA' E MOBILITA' NELL'AREA METROPOLITANA

D1 Adempimento del materiale stabile in dotazione e acquisto di nuovi treni, autobus urbani ed extraurbani a basso impatto ambientale

D 05 01/1	Fornitura di 240 autobus urbani di tipo lungo da 12 mt.	ATAC	105.744.100	105.744.100	0
D 05 01/2	Fornitura di autobus urbani di media capacità	ATAC	19.807.338	19.807.338	0
D 05 01/3	Fornitura di 130 autobus extraurbani di tipo lungo da 12 mt.	COTRAL	80.085.411	80.085.411	0
D 05 01/4	Fornitura di 37 autobus extraurbani di media capacità	COTRAL	13.472.353	13.472.353	0

D	95	617	Fornitura di 8 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Viareggio	COTRAL	38.190.000	38.190.000	0
D	99	61	Fornitura di 10 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Viareggio	ATAC	44.000.000	44.000.000	0
D17 Realizzazione del sottopasso Castel Sant'Angelo							
D	97	61	Sottopasso Lungotevere in Scuria	Proveditorato OO. PP. del Lazio	33.948.440	33.948.440	0
D18 Ripulitura dell'area del Circolone							
D	96	61	Adeguamento Circolone: Progetto di adeguamento della stazione di Circolone in 10.000 m. di lunghezza e in 8.500 m. di larghezza - Lungotevere Circolone in 10.000 m. di lunghezza e in 8.500 m. di larghezza - Lungotevere Circolone in 10.000 m. di lunghezza e in 8.500 m. di larghezza	Proveditorato OO. PP. del Lazio	87.911.860	87.911.860	0
D	94	62	Parapendio propaganda Fidei Giuridica	Conseguenza da Propaganda Fidei	80.000.000	40.000.000	40.000.000
D	99	03	Interventi per il parcheggio del Circolone e il Circolone adriatico	Proveditorato OO. PP. del Lazio	16.720.300	16.720.300	0
D19 Infrastruttura dell'area della Stazione Tiburtina							
D	97	01	Infrastruttura dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovia dello Stato	85.526.804	85.526.804	0
D10 Terza Carica dell'Autosole Roma-Frosinone							
D	97	01	Autosole Roma-Frosinone: Realizzazione della terza carica (1000 PZ)	ANAS	77.344.381	77.344.381	4.082.315
D	99	01	Autosole Roma-Frosinone: Realizzazione della terza carica (1000 PZ)	ANAS	16.842.871	16.842.871	178.719
D11 Adeguamento del Grande Raccordo Anulare nel tratto Roma-Aurelia							
D	99	01	GRAN RACCORDO ANULARE (Roma) Realizzazione della terza carica (1000 PZ)	ANAS	45.850.000	45.850.000	0
D12 Miglioramento della viabilità di collegamento fra le diverse aree metropolitane di Roma e di accoglienza (Castelli Romani, Littoriale e nodi ferroviari)							
D	99	01	Parapendio a rete e viabilità di accesso alla stazione FS (Ciriolo/Roma) Realizzazione del parapendio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria	Provincia di Roma	1.119.020	1.119.020	0
D	99	02	Parapendio a rete per nodo di scambio (Colosseo/Fiume) Realizzazione di un parapendio a rete per nodo di scambio (Colosseo/Fiume) Realizzazione di un parapendio a rete per nodo di scambio (Colosseo/Fiume) Realizzazione di un parapendio a rete per nodo di scambio (Colosseo/Fiume)	Provincia di Roma	1.171.037	1.171.037	0
D	99	03	Parapendio di scambio (Ciriolo/Roma) Realizzazione di un parapendio di interscambio gomma-ferro presso la stazione FS	Provincia di Roma	1.001.574	1.001.574	0
D	99	04	Parapendio di scambio gomma-ferro (Garbatuzza/Roma)	Comune di Garbatuzza	2.000.000	2.000.000	830.000
D	99	05	Parapendio di scambio in località Bagli di Tivoli (Tivoli/Roma) Realizzazione di un parapendio a rete per gli utenti della linea ferroviaria F122 (Stazione - Tiburtina)	Provincia di Roma	387.361	387.361	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

D 13	96	Parteraggio a raso per il nodo di scambio (Circoscrizione Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FNM Roma - Colonna	Provincia di Roma	841.840	841.840	0
D 13	97	Parteraggio a raso - nodo di scambio (Ladepoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FNM Roma - Ladepoli	Provincia di Roma	848.977	848.977	0
D 13	98	S.P. Murole del Sud (Mantova/Roma) Allargamento del Km 0+000 al Km 0+400 della S.S. Appia alla S.S. via dei Lupi	Provincia di Roma	1.505.388	1.505.388	0
D 13	99	S.P. Pedemontane dei Castelli (Campina, Frascati, Ostia Lido, Nettuno, Ladepoli e Castelli Romani)	Provincia di Roma	2.052.975	2.052.975	0
D 13	10	S.P. Cassa Romana (Cassia, S. Cassiano/Roma) Realizzazione della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	Provincia di Roma	2.491.348	2.491.348	0
D 13	11	S.P. Maremmana II (Tivoli/Roma) Lavori di ampliamento della Tiburtina alla A25	Provincia di Roma	4.534.480	4.534.480	0
D 13	12	Collegamento tra S.P. Tormentina - S.P. San Marino - via Volturno (Mantova/Roma)	Provincia di Roma	5.851.704	5.851.704	0
D14 Miglioramenti della viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di valle e di acceglitura ("strade radiali")						
D 14	81	SP Anagnina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 al Km 20+100 (Roma, Pomezia, Anagni)	Provincia di Roma	3.228.124	3.228.124	0
D 14	82	SP Laurentina (Roma) Sesto lotto di opere di manutenzione della strada provinciale (Roma, Pomezia, Anagni)	Provincia di Roma	1.743.772	1.743.772	0
D 14	84	S.P. Tiburtina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 (Prima Porta) al Km 10+000 (secondo lotto)	Provincia di Roma	2.908.320	2.908.320	0
D 14	90	SP Lavinia (Roma) Lavori di completamento	Provincia di Roma	3.375.902	3.375.902	0
D 14	96	SP Celatana (Caldone/Roma) Raddoppio della sede stradale	Provincia di Roma	5.641.412	5.641.412	0
D 14	97	SP Pratica di Mare (Roma) Allargamento della sede stradale e sostituzione di un ponte per il collegamento con l'area metropolitana (Roma, Pomezia)	Provincia di Roma	2.381.844	2.381.844	0
D 14	98	Collegamento SP Subacquei - SP Partitico - SS 606 Maremmana (Caldone/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento	Provincia di Roma	10.045.318	10.045.318	0
D 14	99	Interventi di manutenzione ed adeguamento della rete viaria provinciale interessata dal lotto di collegamento (primo lotto)	Provincia di Roma	3.254.218	3.254.218	0
D 14	99a	Interventi di manutenzione ed adeguamento della rete viaria provinciale interessata da lotti successivi (secondo lotto)	Provincia di Roma	5.000.000	5.000.000	0
D 14	99b	Interventi di manutenzione ed adeguamento della rete viaria provinciale interessata da lotti successivi (terzo lotto)	Provincia di Roma	2.500.000	2.500.000	0
D 14	10	Miglioramento della viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di valle e di acceglitura (primo lotto)	Provincia di Roma	8.737.492	8.737.492	0

[illegible]

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

D 14 04 Alta Mazzara - stazione Termini

Grandi Stazioni S.p.A.

23.948.000

0

D19 Area di parcheggio attrezzata nei principali nodi di scambio per le auto degli autobus turistici e delle autostrade

D 19 01 Interventi relativi ai nodi di scambio e stazioni ferroviarie. Stazione Anversa (1 lotto)

3.184.350

0

D 19 02 Interventi relativi ai nodi di scambio e stazioni ferroviarie. Stazione Anversa (2 lotto)

3.684.810

0

D 19 03 Puntuali di scambio per strutture mobili

5.000.000

0

D 19 04 Servizio funzionale. Nodi di scambio Vado Anversa con intersezione tra Via Anversa e Corso di Roma - Dip. XI

4.951.377

0

D26 Controllo e gestione del traffico

D 26 01 Aggiornamento della rete semaforica, segnalazione e luci di marcia per la regolazione del traffico e informazione (Roma)

20.950.000

0

D 26 02 Segnalazione orizzontale e verticale

8.000.000

0

D 26 03 Segnalazione verticale

9.000.000

0

D 26 04 Iniziativa per una mobilità sostenibile a Roma

3.500.000

0

D31 Riorganizzazione sede di scambio largo Torre Argentina

D 31 01 Riorganizzazione sede di scambio largo Torre Argentina

9.348.150

0

D32 Area per Grandi Eventi - Tor Vergata

D 32 01/1 Coordinamento delle progettazioni

950.000

0

D 32 01/2 Organizzazione internazionale

1.174.000

0

D 32 01/3 Progettazione interventi strutturali area Tor Vergata

878.000

0

D 32 02 Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Attrazione internazionale, servizi, strutture, trasporti, servizi (strutture)

4.400.000

0

D 32 03 Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Fornitura e gestione di servizi igienici permanenti e mobili

16.511.000

0

D 32 04 Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Servizi igienici, servizi, trasporti, servizi (strutture)

10.321.000

4.200.000

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

D 22	66	Aree Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Collegamento area Università Via del Vercellino, lotto ASI Stazione FF.SS.	Provincia di Roma	4.084.000	4.084.000	0	
D 23	66	Aree Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Collegamento area Università, lotto 2, p. Comune di Frosinone	Comune di Frosinone	7.844.000	8.844.000	1.000.000	
D 24	67	Realizzazione rete elettrica MT-BT per il Grande Incontro della Gioventù a Tor Vergata (I stralzo)	ENEL	2.500.000	2.500.000	0	
003							
D 25	67	Realizzazione di capolinei a fermate a servizio delle "Linee Integrative di Trasporto Pubblico Urbano a Roma"	Comune di Roma	500.000	500.000	0	
D 26	68	Fornitura di autobus per la "Rete Integrativa di trasporto pubblico urbano a Roma"	Comune di Roma	61.500.000	61.500.000	0	
D 27	68	Implementazione periferica del "Fasce - Roma Tiburtina (Roma) - Piano generale di ristrutturazione arteriale"	ACEA	3.000.000	3.000.000	0	
D 28	69	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Air Terminal di Ciampino	Metrapiem S. p. a.	1.431.700	1.431.700	0	
D 29	69	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Stazione Tiburtina	Ferrovie dello Stato	1.904.870	1.904.870	0	
D 30	69	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Gregorio VII	Comune di Roma	790.300	790.300	0	
D 31	69	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - La Giustiniana	Comune di Roma	843.000	843.000	0	
D 32	69	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Colata del Curato	Comune di Roma	1.069.000	1.069.000	0	
D 33	69	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Ponte Marconi	Comuni di Roma	929.000	929.000	0	
D 34	69	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - S. Soss. Roma	Comune di Roma	766.500	766.500	0	
D 35	69	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Stadio Olimpico	Comune di Roma	983.000	983.000	0	
D 36	69	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Tor di Valle	Comune di Roma	947.000	947.000	0	
D 37	69	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Viale della Maresca	Comune di Roma	405.000	405.000	0	
D 38	69	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Via G.B. Valleria	Comune di Roma	362.700	362.700	0	

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

D 1)	06/10	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Palazzina EUR	Comune di Roma	500.000	1.000.000	0
D 2)	06/11	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Laurentina	Comune di Roma	1.800.000	1.800.000	0
D 3)	06	Realizzazione di parcheggio per autobus turistici in Roma (Viale Cavour, Tor Sapienza, Tor Vergata)	ATAO	4.000.000	4.000.000	0

E SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE

E) Contribuire al piano di ricerca, trasporto, assistenza e rifugi della rete di maggior affluenza di visitatori nel territorio urbano e sottopopolato

E 01	01	Autorevoli ed attrezzature per il territorio comunale (Roma). Creazione di Sala Emergenza per la raccolta e soccorso dei rifugi	AMA	2.350.720	1.850.720	2.000.000
E 01	02	Autorevoli ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Casorini	AMA	12.096.040	5.785.040	6.300.000
E 01	03	Autorevoli ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compagnoni Sile Loader per la raccolta dei rifiuti (prima fase)	AMA	10.237.960	6.857.960	1.400.000
E 01	03a	Autorevoli ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compagnoni Sile Loader per la raccolta dei rifiuti (seconda fase)	AMA	5.200.000	5.200.000	0
E 01	04	Autorevoli ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compagnoni Sile Loader per la raccolta dei rifiuti (terza fase)	AMA	1.900.000	1.450.000	500.000
E 01	05	Autorevoli ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile	AMA	700.000	600.000	100.000
E 01	06	Autorevoli ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Sanzani	AMA	1.300.000	800.000	400.000
E 01	07	Autorevoli ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica	AMA	800.000	500.000	100.000
E 01	08	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona nel parco ex Mercati (Rione)	AMA	2.841.715	2.441.715	700.000
E 01	09	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Adeguamento locali della sede di zona via dei Cappellari	AMA	375.000	0	375.000
E 01	10	Realizzazione di 11.000 casetti speciali	AMA	1.344.000	1.644.000	100.000
E 01	12	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona Porta Cavalleggeri	AMA	4.584.400	3.508.400	1.050.000
E 01	13	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona via Clotilde	AMA	430.741	354.741	100.000
E 01	14	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Popolare	AMA	2.337.000	1.124.000	1.213.000

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

E. 01	13	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona (via di Torvecochie)	AMA	1.776.000	1.378.000	598.000
E. 01	14	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona vicino Savio.	AMA	4.703.018	4.123.018	580.000
E. 01	17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona (via Baloni).	AMA	5.995.180	3.025.180	2.970.000
E. 01	18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto.	AMA	3.128.829	1.242.829	1.886.000
E. 01	20	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AMA) via Zucchi.	AMA	3.000.000	578.000	2.422.000
E. 01	22/1	Ristrutturazione opere civili nell'area intermedia attrezzata (A.I.A.) Via Salaria.	AMA	2.509.724	1.854.724	655.000
E. 01	22/2	Fontana attrezzata. Completamento di interventi e lavori nel sottosuolo (via di zona intermedia attrezzata (A.I.A.) Via Salaria.	AMA	1.833.351	713.351	0
E. 01	24	Sedi di zona ed aree intermedie attrezzate (via di Torvecochie)	AMA	5.971.876	1.933.876	4.038.000
E. 01	25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AMA) via di Torvecochie.	AMA	5.890.263	2.843.263	3.047.000
E. 01	26/1	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AMA) via Campobasso.	AMA	808.201	678.201	130.000
E. 01	26/2	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AMA) via Campobasso.	AMA	512.720	512.720	0
E. 01	27/1	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Area (Roma). Potenziamento del sistema di comunicazione attuale.	AMA	3.100.000	3.100.000	0
E. 01	27/2	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Area (Roma). Realizzazione di lavoro sul mezzo di raccolta.	AMA	6.370.000	5.250.000	0
E. 01	27/3	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Area (Roma). Sistema radioselezione mezzi pronto intervento.	AMA	1.800.000	1.800.000	0
E. 01	28	NUOVO stabilimento AMA 3 Roma sud (Roma) Realizzazione per primo lotto iniziale.	AMA	12.718.000	2.000.000	8.718.000
E. 01	29	NUOVO stabilimento AMA 3 Roma sud (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	9.520.000	7.000.000	2.520.000
E. 01	30	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e manutenzione delle attrezzature igieniche base.	AMA	5.496.008	5.496.008	0
E. 01	30a	Servizi igienici pubblici (Roma) Acquisto, installazione e gestione di 120 bagni permanenti a servizio degli aree basilicali.	AMA	7.500.000	7.500.000	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Ruma Capitale e Grandi Eventi

N.	Codice	Descrizione dell'attività	Unità di misura	Importo unitario (L. 104/98)	Importo totale (L. 104/98)
E 01	31	Servizi igienici pubblici (Riforma di ampiezza igienica negli asili nido)	A.M.A.	1.220.660	1.220.660
E 02	01	Ospedale Carlo Poma (Pavia) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Acute di primo livello	L.S.L. RM B	27.235.000	27.235.000
E 03	01	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Acute di secondo livello (1° stadio funzionale)	Azienda S. Giovanni Addolorata	8.796.002	8.796.002
E 04	01	Ospedale Sant'Eugenio (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Acute di secondo livello (1° stadio funzionale)	L.S.L. RM C	19.644.165	19.644.165
E 05	01	Ospedale G.B. Grassi di Ostia (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Acute di primo livello (1° stadio funzionale)	L.S.L. RM D	5.067.347	5.067.347
E 06	01	Fondazione Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Acute di secondo livello (1° stadio funzionale)	Università Cattolica del Sacro Cuore	12.194.478	12.194.478
E 07	01	Policlinico Gemelli (Roma) Realizzazione di una struttura sanitaria di ospedalizzazione	Università Cattolica del Sacro Cuore	5.031.191	5.031.191
E 08	01	Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Acute di primo livello	Azienda Policlinica Umberto I	12.000.000	12.000.000
E 09	01	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.632.572	1.632.572
E 10	01	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.264.590	1.264.590
E 11	01	Ospedale di Albano (Albano/Roma) Potenziamento del Dipartimento emergenza accettazione di primo livello	L.S.L. RM H	801.322	801.322
E 12	01	Ospedale Agostino (Substanz/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	L.S.L. RM G	1.178.009	1.178.009
E 13	01	Complesso ospedaliero (Basiliano/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	L.S.L. RM F	998.200	998.200
E 14	01	Sistema regionale di emergenza sanitaria (1° stadio) Completamento, integrazione e potenziamento del sistema informativo	Regione Lazio	4.800.000	4.800.000
E 15	01	Rete di diagnostica per la prevenzione e diagnosi delle malattie infettive (Roma) Realizzazione di un laboratorio nell'Ospedale Spallanzani	I.R.C.C.S. Lazzaro Spallanzani	9.219.947	9.219.947
E 16	01	Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione	Regione Lazio	7.440.000	7.440.000
E 17	01	Sistema regionale di emergenza sanitaria (1° stadio) Completamento, integrazione e potenziamento dei servizi di emergenza	Az. Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	10.500.000	10.500.000
E 18	01	Progettazione, implementazione, attivazione sistemi informativi di sorveglianza epidemiologica	Regione Lazio	4.700.000	4.700.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

N.°	Descrizione	Comune di Roma - V.U.U.	1.260.839	1.260.839	0	
E. 83	Acquisto apparecchiature elettroniche per attività esterne					
E. 83	Acquisto apparecchiature elettroniche per attività esterne	Comune di Roma - V.U.U.	350.000	350.000	0	
E4 Piano di valorizzazione delle risorse umane						
E. 84	Piano di valorizzazione risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale addetti Pubbliche Amministrazioni. Impiego operatori in servizio civile.	Regione Lazio	16.952.000	16.952.000	0	
E. 84	Piano di valorizzazione risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale addetti Pubbliche Amministrazioni. Impiego operatori in servizio civile.	Regione Lazio	1.700.000	1.700.000	0	
E. 84	Piano di valorizzazione risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale addetti Pubbliche Amministrazioni. Impiego operatori in servizio civile.	Regione Lazio	12.040.000	12.040.000	3.840.000	
E. 84	Piano di valorizzazione risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale addetti Pubbliche Amministrazioni. Impiego operatori in servizio civile.	Regione Lazio	3.558.000	3.558.000	510.000	
E5 Sicurezza pubblica e protezione civile						
E. 85	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giuliano 2000 - Acquisto delle LAM e materiali hardware	Ministero dell'Interno	1.810.000	1.810.000	0	
E. 85	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giuliano 2000 - Acquisto delle LAM e materiali hardware	Ministero dell'Interno	3.700.000	3.700.000	0	
E. 85	Adempimenti del progetto di sicurezza Giuliano 2000 - Acquisto delle LAM e materiali hardware	Ministero dell'Interno	3.084.000	3.084.000	0	
E. 85	Progetto sicurezza grandi basiliche	Ministero dell'Interno	12.000.000	12.000.000	0	
E. 85	Controllo sicurezza bagagli da aereo (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'Interno	15.194.000	15.194.000	0	
E. 85	Controllo sicurezza bagagli da aereo (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'Interno	4.030.000	4.030.000	0	
E. 85	Controllo sicurezza bagagli da aereo (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'Interno	1.792.000	1.792.000	0	
E. 85	Controllo sicurezza bagagli da aereo (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'Interno	15.250.000	15.250.000	0	
E. 85	Adempimenti del progetto di sicurezza Giuliano 2000 - Acquisto delle LAM e materiali hardware	Comune di Fiumicino	8.873.000	8.873.000	0	
E. 85	Acquisto di 7 ton per illuminazione	Ministero Difesa	200.000	200.000	0	
E. 85	Adempimenti del progetto di sicurezza Giuliano 2000 - Acquisto delle LAM e materiali hardware	Ministero Difesa	4.800.000	4.800.000	0	

E. 05	11	Pulveramento strutture logistiche Caserma "Galasso"	Ministero Difesa - Arme Carabinieri	1.995.000	0
E. 05	12	Prestazioni strutture logistiche Caserma "Trifoglio"	Ministero Difesa	35.800.000	0
E. 05	13	Infrastrutture - Costruzione caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino	Ministero dell'Interno	17.845.079	0
E. 05	14	Infrastrutture - Ristrutturazione Servizi Logistici caserma "Favara"	Ministero dell'Interno	671.500	0
E. 05	15	Caserna della polizia di Stato "Vito Tevere" sede del reparto scorta	Ministero dell'Interno	1.875.106	0
E. 05	16	Caserna della polizia di Stato "Maurizio Ciglioli" sede del reparto scorta	Ministero dell'Interno	2.726.125	0
E. 05	17	Nuovo complesso polizia di Stato (Ponte Galasso) Fiumicino	Ministero dell'Interno	3.984.830	0
E. 05	18	Nuovo complesso polizia di Stato (Ponte Galasso) Fiumicino	Ministero dell'Interno	11.000.000	0
E. 05	19	Coordinamento Centri operativi Interforze	Ministero Difesa - Arme Carabinieri	1.500.000	0
E. 05	20	Trasferimento per la formazione del personale	Ministero dell'Interno - Dip. Prof. Ch. - VV.FF.	455.000	0
E. 05	21	Trasferimento per la formazione del personale	Ministero dell'Interno - Dip. Prof. Ch. - VV.FF.	539.000	0
E. 05	22	Realizzazione nuovo pannello di comando	Ministero dell'Interno - Dip. Prof. Ch. - VV.FF.	2.000.000	0
E. 05	23	Realizzazione nuovo pannello di comando	Ministero dell'Interno - Dip. Prof. Ch. - VV.FF.	1.000.000	0
E. 05	24	Ampliamento e ristrutturazione sede Tucidide II	Ministero dell'Interno - Dip. Prof. Ch. - VV.FF.	11.000.000	0
E. 05	25	Acquisto attrezzature	Ministero dell'Interno - Dip. Prof. Ch. - VV.FF.	399.000	0
E. 05	26	Addebiatamento e potenziamento della centrale telefonica del dipartimento della protezione civile	Ministero dell'Interno - Dip. Prof. Ch. - VV.FF.	887.000	0
E. 05	27	Addebiatamento e potenziamento della centrale telefonica del dipartimento della protezione civile	Ministero dell'Interno - Dip. Prof. Ch. - VV.FF.	3.983.000	0
E. 05	28	Acquisto attrezzature varie	Ministero dell'Interno - Dip. Prof. Ch. - VV.FF.	3.000.000	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

E 05	33	Caserna CC P za Dante - Lavori di ristrutturazione (1° stralcio)	Ministero dell'Interno	1.177.759	1.177.759	0
E 05	33	Palae di viale circoscrizioni dello Stato	Ministero dell'Interno	5.000.000	5.000.000	0
E 05	34	Sede centrale del Comando provinciale VV. FF. di Roma - Via Genova - Lavori di manutenzione straordinaria	Min. Interno - Dip. Prot. Civ. - VV. FF.	2.000.000	2.000.000	0
E 05	35	Barra Lirica Carabinieri di Roma - Manutenzione straordinaria	Min. Lavori Pubblici	480.000	480.000	0
E 05	01	Contributo a lavoro di imprese per la promozione di occupazione connessa alle attività pubbliche	Comune di Roma - Uff. Spec. Politiche del Lavoro	9.000.000	9.000.000	0
E 05	01	Contributo attività straordinaria opere Pubbliche Municipali	Comune di Roma	2.700.000	2.700.000	0

F - INFORMAZIONE COMUNICAZIONE PREPARAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO

F 01	01	Centro informativo, sala stampa e laboratorio per l'informazione	Agencia Romana Prop. Giubbileo	5.075.712	5.075.712	0
F 01	01	Centro informativo del museo "Risorgimento" Realizzazione e gestione di un centro di informazione per studenti, visitatori e pubblica opinione	Agencia Romana Prop. Giubbileo	2.000.000	2.000.000	0
F 01	01	Centro informativo di Via della Conciliazione. Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agencia Romana Prop. Giubbileo	7.275.712	7.275.712	0
F 01	01	Alto Monumento alla Resistenza (Roma) - Centro informativo a sala proiezioni, multimediali e audiovisiva	Agencia Romana Prop. Giubbileo	2.000.000	2.000.000	0
F 01	01	Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione del mese medio	Agencia Romana Prop. Giubbileo	8.611.763	8.611.763	0
F 01	01	Informazioni ai delegati ed ai tecnici in sede municipale, provinciale e nazionale (Roma, Lazio) Progetto generale di informazione dall'informazione	Agencia Romana Prop. Giubbileo	814.000	814.000	0
F 01	01	Sistema di informazione al pubblico - nodo di Roma	Ferrovie dello Stato	3.465.000	3.465.000	0
F 04	01	Contributo per attività organizzativa al vertice del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1994	Agencia Romana Prop. Giubbileo	64.027.480	64.027.480	0
F 04	01	Contributo assicurativo danni i rischi sismici 4. legge 651	Uff. Progr. Roma Capitale	8.000.000	8.000.000	0
F 04	01	Contributo assicurativo danni i rischi sismici 4. legge 651	Uff. Progr. Roma Capitale	8.000.000	8.000.000	0
F 04	01	Sistema informativo e telematico per la gestione e la preparazione del Giubbileo	Uff. Progr. Roma Capitale	2.513.240	2.513.240	0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

F	05	01	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	3.500.000	3.500.000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
---	----	----	--	-----------	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

G. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

G1 Monitoraggio

G	01	01	Monitoraggio interventi			
TOTALE				num.		
				001F		
				3.487.414.001	183.830.995	
				3.487.414.001	183.830.995	
	A			281.999.358	22.403.265	
	B			572.350.053	50.650.500	
	C			508.989.731	1.000.000	
	D			1.458.397.336	50.215.290	
	E			499.442.078	59.352.000	
	F			187.230.443	0	
	G			6.800.000	0	
