

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CIX-ter
n. 2

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI
GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITÀ AL DI
FUORI DEL LAZIO**

(al 30 Settembre 1999)

(Articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270)

**Presentata dal Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane,
Roma capitale e Giubileo del 2000
(MICHELI)**

Trasmessa alla Presidenza il 17 novembre 1999

PAGINA BIANCA



***Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI***



***PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE
RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI
E PELLEGRINAGGI IN LOCALITA'
AL DI FUORI DEL LAZIO***

**Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione
degli interventi**

(art. 3, comma 14 legge 7 agosto 1997, n. 270)

**Il Ministro dei Lavori Pubblici delegato per
Roma Capitale e Giubileo 2000
Presidente della Commissione
(art. 2, comma 1, legge 7 agosto 1997, n. 270)**

Situazione al 30 settembre 1999



PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	Pag.	7
1. <i>Parte prima – La gestione amministrativa</i>	»	11
1.1. <i>La relazione precedente</i>	»	11
1.2. <i>La riprogrammazione del piano nei primi tre trimestri del 1999</i>	»	12
1.3. <i>Gli interventi definanziati</i>	»	12
1.4. <i>I lavori della Commissione</i>	»	15
1.4.1. <i>Seduta del 27 gennaio 1999</i>	»	15
1.4.2. <i>Seduta del 21 aprile 1999 e del 4 maggio 1999</i> ..	»	15
1.4.3. <i>Seduta del 19 maggio 1999</i>	»	15
1.4.4. <i>Seduta del 28 luglio 1999</i>	»	18
2. <i>Parte seconda – La gestione finanziaria</i>	»	19
2.1. <i>Situazione finanziaria del piano aggiornata al 30 settembre 1999</i>	»	19
3. <i>Parte terza – Il piano per regioni – Stato di attuazione degli interventi al 30 settembre 1999</i>	»	95
3.1. <i>Il quadro riepilogativo</i>	»	95
3.1.1. <i>Tabelle relative al 1° trimestre 1999</i>	»	96
3.1.2. <i>Tabelle relative al 2° trimestre 1999</i>	»	99
3.1.3. <i>Tabelle relative al 3° trimestre 1999</i>	»	102
3.2. <i>Il piano per regioni – stato di attuazione al 30 settembre 1999</i>	»	105
3.2.1. <i>Regione Abruzzo</i>	»	105
3.2.2. <i>Regione Basilicata</i>	»	106
3.2.3. <i>Regione Calabria</i>	»	108
3.2.4. <i>Regione Campania</i>	»	109
3.2.5. <i>Regione Emilia Romagna</i>	»	111
3.2.6. <i>Regione Friuli</i>	»	112
3.2.7. <i>Regione Liguria</i>	»	114
3.2.8. <i>Regione Lombardia</i>	»	115
3.2.9. <i>Regione Marche</i>	»	117
3.2.10. <i>Regione Molise</i>	»	118
3.2.11. <i>Regione Piemonte</i>	»	120
3.2.12. <i>Regione Puglia</i>	»	121

3.2.13. <i>Regione Sardegna</i>	Pag. 123
3.2.14. <i>Regione Sicilia</i>	» 124
3.2.15. <i>Regione Toscana</i>	» 126
3.2.16. <i>Regione Trentino Alto Adige</i>	» 127
3.2.17. <i>Regione Umbria</i>	» 129
3.2.18. <i>Regione Valle d'Aosta</i>	» 130
3.2.19. <i>Regione Veneto</i>	» 132
3.3. Totale regioni d'Italia al 1° trimestre 1999	» 133
3.4. Totale regioni d'Italia al 2° trimestre 1999	» 136
3.5. Totale regioni d'Italia al 30 settembre 1999	» 138
3.6. Lo stato di attuazione per singolo intervento (Istogrammi)	» 141
4. <i>Parte quarta - La vigilanza</i>	» 235
4.1. Il monitoraggio	» 235
4.2. Le relazioni del soggetto monitore	» 237
4.2.1. <i>Sintesi del primo rapporto trimestrale</i>	» 237
4.2.2. <i>Sintesi del secondo rapporto trimestrale</i>	» 249
5. <i>Parte quinta - Il piano Enit e la Task Force per la comunicazione presso la Presidenza del Consiglio</i>	» 261
5.1. Il piano Enit e la Task Force per la comunicazione presso la Presidenza del Consiglio	» 261
5.2. Aggiornamento lavori svolti dalla Task Force per il coordinamento delle iniziative per la comunicazione e la promozione del Giubileo 2000	» 263
5.3. Incontro di coordinamento tra soggetti beneficiari settore "Gestione dei flussi di visitatori" del 14 aprile 1999	» 265
6. <i>Appendice</i>	» 267
I Decreti	» 267
Rep. N. 187/RC del 9 febbraio 1999	» 267
Rep. N. 202/RC del 30 luglio 1999	» 299
Rep. N. 209/RC dell'11 ottobre 1999	» 344
Rep. N. 210/RC del 22 ottobre 1999	» 360
Le Delibere	» 387
Deliberazione n. 9 del 27 gennaio 1999	» 387
Deliberazione n. 10 del 21 aprile e del 4 maggio 1999	» 390
Deliberazione n. 11 del 19 gennaio 1999	» 396
Deliberazione n. 12 del 28 luglio 1999	» 400

Premessa

Il presente documento costituisce la seconda delle relazioni trimestrali che il Ministro delegato per le Aree Urbane, in ossequio alle disposizioni dell'art. 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997 n. 270, presenta allo scopo di informare il Parlamento Italiano sullo stato di attuazione degli interventi del *"Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio"*

Il lasso di tempo intercorso a far data dall'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio, avvenuta con D.M. in data 21 aprile 1998, ha consentito alla Commissione di modificare ed integrare il Piano stesso al fine di renderlo sempre più congruente con le finalità e con le esigenze emergenti in relazione alla celebrazione del Giubileo del 2000.

Si è ritenuto di strutturare il presente documento in cinque sezioni ed un'Appendice nella quale sono raccolti i principali provvedimenti assunti in attuazione della legge stessa.

La prima parte - dopo una breve sintesi della Relazione precedente - è dedicata ai lavori della Commissione ed alle diverse sedute attraverso le quali sono state deliberate le successive riprogrammazioni del Piano.

Un capitolo a sé stante è stato dedicato alla gestione finanziaria del Piano, fotografando la situazione alla scadenza dei primi tre trimestri del 1999. La terza parte è dedicata allo stato di attuazione degli interventi al 30 settembre 1999, attraverso una serie di grafici e tabelle suddivisi per Regioni e per singoli interventi. La quarta parte riguarda gli strumenti di controllo del Piano ed i soggetti ad esso deputati; l'ultima sezione è dedicata all'aggiornamento dei lavori della "task force" per la comunicazione presso la Presidenza del Consiglio.

Al termine di una complessa procedura di affidamento, il Servizio di monitoraggio è stato affidato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi (URCGE) - alla Associazione Temporanea di Imprese costituita tra Sovis S.p.A. e T.E.C.N.I.C. S.p.A. (ATI) con contratto del 24 febbraio 1999, approvato e reso esecutivo con Decreto del 15 marzo 1999.

A partire da tale data il Monitore ha prodotto Rapporti di monitoraggio per il periodo marzo/maggio 1999 e giugno/agosto 1999.

La necessità di riferire al Parlamento sulla base di dati certificati dallo specifico servizio di monitoraggio ha suggerito di riunire le prime tre Relazioni Trimestrali per il 1999 nel presente Rapporto al fine di una più completa visione dello stato di avanzamento del Piano.

La Relazione fornisce un quadro complessivo della gestione di forte impegno per amministrazioni, enti ed organismi coinvolti nella realizzazione dei programmi inseriti nel Piano.

Gli elementi di sintesi vengono riportati nella tav. 1 mentre nei successivi paragrafi sono esposti gli elementi analitici e di dettaglio.

Per quanto riguarda l'impiego delle risorse pubbliche rese disponibili dalla legge 270/97 pari a 2.000 miliardi, al 3° trimestre risultano attivati programmi per 1.446,1 miliardi di lire pari al 72,3%, mentre le risorse trasferite rappresentano, con 937,8 miliardi di lire, il 46,9% del fondo disponibile.

In termini di opere fisiche e servizi al 30 settembre 1999 risulta in fase di realizzazione o completato complessivamente l'82,3% degli interventi (96 ultimati e 843 in fase di realizzazione su 1.128). In termini di finanziamento pubblico l'ammontare reso operativo è pari al 94,3%, mentre sull'investimento totale la quota attivata è dell'85,3%.

In poco più di un anno, pertanto, ben 939 interventi su 1.128 si avviano alla conclusione.

Si riportano di seguito alcune abbreviazioni utilizzate nel testo :

- *Commissione – Commissione ex art. 2 legge 7 agosto 1997 n. 270;*
- *Piano – Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio;*
- *U.R.C.G.E. – Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi.*

Tav. 1 - Sintesi sullo stato di attuazione del Piano per il Giubileo fuori dal Lazio (Legge 7 agosto 1997 n. 270)

A) UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI

	Risorse attivate		Risorse trasferite	
	miliardi di lire	% sulle disponibilità	miliardi di lire	% sulle disponibilità
Al 31 marzo 1999	857,4	42,9	542,2	27,1
Al 30 giugno 1999	1.282,0	64,1	785,0	39,2
Al 30 settembre 1999	1.446,1	72,3	937,8	46,9
Variazione % 1°-3° trimestre 1999	+68,7	-	+73,0	-

B) STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO (AL 30 SETTEMBRE 1999)

Programmi:	Interventi		Finanziamenti pubblici	Investimenti complessivi
	N°	%	%	%
Completati	96	8,5	3,7	5,5
In fase di realizzazione	843	74,7	90,6	79,8
In fase pre-realizzativa	189	16,8	5,7	14,7
Totale	1.128	100,0	100,0	100,0

C) INTERVENTI PER TIPOLOGIA D'INTERVENTO

	Completati		In fase di realizzazione	In fase pre-realizzativa	Totale
	N°	%	%	%	%
Accoglienza	311	6,1	69,1	24,8	100,0
Ricettività	496	8,0	72,6	19,4	100,0
Beni culturali	320	11,6	83,4	5,0	100,0

PAGINA BIANCA

1. PARTE PRIMA - LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

1.1. La relazione precedente

Con la Prima Relazione al Parlamento, si è dato conto, in ossequio alle disposizioni dell'art. 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997 n. 270, delle attività svolte al 31.12.1998 dalle istituzioni di governo, dall'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, dagli enti regionali e locali. Tali organismi hanno partecipato, nei termini e nei modi indicati dalla Legge 270, ad una efficace realizzazione del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio e delle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le determinazioni e gli indirizzi inerenti la gestione del Piano stesso, così come recepiti nei relativi decreti del Ministro delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000.

In particolare nella prima parte della Relazione sono stati riportati i contenuti e gli aspetti giuridici della Legge 7 agosto 1997 n° 270, le modalità attraverso cui sono stati individuati i criteri di selezione degli interventi da inserire nel Piano (Decreto Ministeriale n. 115 del 17 settembre 1997), nonché la strumentazione approntata da parte dell'Ufficio di Roma Capitale e Grandi Eventi per quanto attiene la modulistica, il sistema informativo, il sistema di proiezione territoriale degli interventi, gli strumenti di comunicazione ed il sistema di monitoraggio.

Nella seconda parte della Relazione sono state invece poste in evidenza procedure e metodologie adottate per l'elaborazione del Piano, di cui vengono presentate dettagliatamente le caratteristiche.

Infine nell'ultimo paragrafo della Relazione è stato riportato lo stato di avanzamento degli interventi inseriti nel Piano e la situazione dei flussi finanziari al 31.12.1998.

La prima Relazione al Parlamento ha dato conto in maniera completa e diffusa, delle diverse attività svolte sia per la attuazione della Legge n. 270 che per l'avvio operativo degli interventi.

Il Piano fu, infatti, adottato dalla Commissione il 28 marzo 1998 e definitivamente approvato con D.M. 21 aprile 1998. In soli sette mesi (dall'agosto 1997 al marzo 1998) sono state approntate le procedure per la selezione delle richieste di finanziamento, diffuse le strumentazioni necessarie alla presentazione delle domande, effettuata l'istruttoria sulle circa 7.000 richieste pervenute e definito il Piano.

La precedente Relazione fornisce al Parlamento lo stato di avanzamento degli interventi compresi a quella data: 1.115 interventi per un investimento complessivo di 3.673 miliardi di lire di cui 1.955 miliardi di lire finanziati dallo Stato.

Il ritardo nell'avvio delle impegnative operazioni di monitoraggio non ha privato, tuttavia, la Prima Relazione al Parlamento di un quadro complessivo e per singolo intervento dello stato di attuazione, effettuato direttamente dall'Ufficio che ha surrogato funzioni previste per il soggetto monitore, il cui incarico è stato definitivamente approvato successivamente al periodo di riferimento.

1.2. La riprogrammazione del Piano nei primi tre trimestri del 1999

Nel corso del 1999 la Commissione ex art. 2 legge 270/1997 ha proceduto ad una sempre più incisiva azione di modifica ed integrazione del Piano, in modo da renderlo più aderente alle necessità emergenti dall'aggiornamento dei programmi delle varie Amministrazioni o degli altri soggetti beneficiari dei finanziamenti, in ordine all'accertamento della concreta fattibilità di talune opere, anche per sopravvenute esigenze, non previste in precedenza. L'attività di rimodulazione del Piano, soprattutto per ciò che concerne il finanziamento di nuove iniziative o l'integrazione finanziaria di interventi già presenti nel Piano, è stata possibile grazie alle risorse finanziarie rese disponibili sia dai definanziamenti parziali o totali di taluni interventi, sia dai ribassi d'asta intervenuti a seguito dell'aggiudicazione dei lavori o forniture che, con frequenza crescente, passavano dalla fase degli adempimenti amministrativi, a quella realizzativa.

1.3. Gli interventi definanziati

Nel corso dell'attività di modifica ed integrazione al Piano attuata dalla Commissione a tutto il giugno 1999, sono stati definanziati, totalmente, o parzialmente, 26 interventi per complessivi 37,3 miliardi di lire.

Tab. 1 - Interventi definanziati (giugno 1999)

	N. interventi	Importi in milioni di lire
- definanziamento totale	16	28.676
- definanziamento parziale	10	8.645
Totale	26	37.321

Vengono di seguito riportati gli interventi definanziati identificati dal titolo, localizzazione e soggetto beneficiario.

In linea di massima i definanziamenti di taluni interventi sono stati deliberati dalla Commissione vuoi per l'imprevisto manifestarsi di cause ostative alla realizzazione totale o parziale degli stessi, vuoi per l'impossibilità di completare le opere di interventi, ancorché fattibili, entro i tempi programmati.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cod. URCGE	Comune di localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Estremi del provvedimento	Importo del definanziamento
198	Napoli	"Costruzione nuovo parcheggio bus turistici"	Min. Trasporti e della Navigazione	D.M. del 05.08.1999	5.600.000.000 (definanziamento totale)
510	Napoli	"Scambiatore intermodale Catacombe di San Gennaro"	Arcidiocesi di Napoli	D.M. del 22.10.1999	4.500.000.000 (definanziamento totale)
897	Vicenza	"Restauro e riorganizzazione funzionale del Chiostro monumentale del convento da adibire a ricettività in comunità religiosa e relativi servizi"	Comunità ordine francescani minori conventuali	D.M. del 09.02.1999	1.620.000.000 (definanziamento parziale)
928	Venosa (Potenza)	"Ristrutturazione ed adeguamento Chiesa Convento di S. Maria in Montalto"	Curia Vescovile	D.M. del 22.10.1999	2.550.000.000 (definanziamento parziale)
1313	Montoro Superiore (Avellino)	"Opere di restauro ed adeguamento funzionale del Convento S. Maria degli Angeli"	Comunità Montana Serinese Solofrana	D.M. del 05.08.1999	200.000.000 (definanziamento totale)
1676	Udine	"Parcheggio collegato alla stazione FF.SS. e parcheggio fra via Medici e via del Vascello e relativi servizi"	Comune di Udine	D.M. del 05.08.1999	1.400.000.000 (definanziamento totale)
1678	Udine	"Ostello per la gioventù"	Comune di Udine	D.M. del 22.10.1999	840.000.000 (definanziamento totale)
1681	Udine	"Risanamento conservativo corpo est aule scolastiche, trasformazione in camere per ricettività a basso costo con relativi servizi"	Istituto Mons. F. Tomadini I.P.A.B.	D.M. del 09.02.1999	960.000.000 (definanziamento totale)
2803	Venezia	"Realizzazione servizi igienici"	A.M.A.V. Azienda multiservizi ambientali veneziana	D.M. del 01.06.1999	176.000.000 (definanziamento totale)
3018	Verbania (Verbano)	"Accoglienza ai pellegrini diretti ai sacri monti al santuario ed ai luoghi di culto tradizionali"	Opera Diocesana della preservazione della fede	D.M. del 05.08.1999	965.000.000 (definanziamento parziale)
3133	Ventimiglia (Imperia)	"Progetto di restauro delle coperture, rifacimento impermeabilizzazioni e impianti nel complesso della Cattedrale" di Ventimiglia	Parrocchia Nostra Signora Assunta Cattedrale	D.M. del 01.06.1999	1.010.000.000 (definanziamento parziale)
3173	Loreto (Ancona)	"Centro Casa del Carmelo"	Delegazione Pontificia per il Santuario della S. Casa	D.M. del 09.02.1999	2.100.000.000 (definanziamento totale)
3224	Pitigliano (Grosseto)	"Ristrutturazione e completamento funzionale dell'ex asilo di Pitigliano ad uso residenze ricettive a basso costo per bisognosi e scopi sociali"	Diocesi di Pitigliano Sovana Orbetello	D.M. del 22.10.1999	196.410.000 (definanziamento parziale)
3362	Venezia	"Opere relative al restauro dell'antico complesso architettonico"	Congregazione Armena Mechitarista	D.M. del 05.08.1999	2.663.000.000 (definanziamento totale)
3638	Napoli	"Infopoint passepartout 2000 - Sistema di nodi informativi dedicati ai disabili"	Comune di Napoli	D.M. del 01.06.1999	177.680.000 (definanziamento parziale)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3958	Brescia	"Restauro e riorganizzazione funzionale dei 4 chiostri monumentali del tempio convento di S. Francesco d'Assisi da adibire a ricettività"	Ordine Frati Minori Conventuali di S. Francesco	D.M. del 05.08.1999	3.804.000.00 (definanziame totale)
3997	Padova	"Casa di accoglienza pellegrini disabili Breda"	Pia Fondazione V.S. Breda	D.M. del 05.08.1999	1.000.000.00 (definanziame parziale)
4530	Padova	"Recupero della cripta medievale per l'accoglienza dei pellegrini"	Monastero S. Giustina	D.M. del 09.02.1999	561.000.000 (definanziame parziale)
4732	Catania	"Restauro ed adeguamento funzionale della Cattedrale di Catania"	Basilica Cattedrale S. Agata	D.M. del 22.10.1999	2.342.000.00 (definanziame totale)
4741	Massa (Massa Carrara)	"Sistemazione percorsi pedonali di congiunzione tra cattedrale Chiesa di S. Sebastiano e punto informazioni multimediale situato nel Palazzo Comunale"	Comune di Massa	D.M. del 05.08.1999	1.120.000.00 (definanziame totale)
5406	San Giovanni Rotondo (Foggia)	"Centro di accoglienza presso il Santuario di S. Maria delle Grazie"	Ente Monastico Provincia dei Frati minori Cappuccini	D.M. del 22.10.1999	600.000.000 (definanziame totale)
5556	Serrahunga di Crea (Alessandria)	"Riqualificazione del complesso edilizio e monastico Santuario di Crea"	Santuario Diocesano Madonna di Crea	D.M. del 01.06.1999	340.000.000 (definanziame totale)
5645	Vicenza	"Ristrutturazione dei servizi igienici per il pubblico nel contesto del complesso di Monte Berico, con la realizzazione di un servizio per disabili compresa la realizzazione di un impianto di servoscala"	Provincia veneta dell'Ordine dei Servi di Maria	D.M. del 09.02.1999	131.000.000 (definanziame totale)
6405	Ancona	"Copertura in tensostrutture per aree di sosta veicoli leggeri in attesa di imbarco"	Autorità portuale di Ancona	D.M. del 22.10.1999	245.111.441 (definanziame parziale)
6523	Fabriano (Ancona)	"Trasformazione distributiva dell'immobile - struttura ricettiva a basso costo"	Seminario Vescovile	D.M. del 05.08.1999	1.900.000.00 (definanziame totale)
6681	Loreto (Ancona)	"Ammodernamento della casa di S. Francesco"	Prov. Picena S. Giacomo della Marca - Frati Minori	D.M. del 01.06.1999	320.000.000 (definanziame parziale)

1.4. I lavori della Commissione

A far data dalla precedente Relazione trimestrale al Parlamento, e cioè a partire dal gennaio 1999, si sono tenute 4 sedute della Commissione prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 270, rispettivamente in data 27 gennaio, 21 aprile, 4 maggio e 19 maggio 1999. Tali riunioni hanno dato luogo a 3 delibere (nn. 9, 10 e 11), il cui contenuto è stato recepito in due D.P.C.M. del 4 e del 19 maggio 1999.

1.4.1. Seduta del 27 gennaio 1999

La Commissione ex Lege 270/1997 si è riunita in data 27 gennaio 1999 per discutere principalmente due ordini di problemi: il primo inerente alle richieste di riesame di istanze di inserimento nel Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 al di fuori del Lazio ubicate nella Regione Toscana; il secondo inerente ad eventuali modifiche ed integrazioni al Piano in parola. Nel corso della riunione si è preso atto delle economie derivanti da ribassi d'asta per un importo complessivo di £ 31.069.730.000 e si è dato luogo al defianziamento totale o parziale di alcuni interventi su richiesta dei rispettivi soggetti titolari. Si è inoltre proceduto alla rettifica di taluni errori materiali ed all'approvazione di proroghe ai termini lettera c) e d) dell'art. 1, comma 4 della legge 270/97 nonché a cambi titolo e di soggetto beneficiario. Sono state inoltre assentite aggregazioni e disaggregazioni di interventi ed alcune richieste di integrazione di finanziamento. Sono stati infine inclusi nel Piano - in coerenza con le finalità della legge e sulla base di esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano - una serie di interventi, per un importo complessivo di £ 41.732.000.000, ubicati nella Regione Toscana. Questi ultimi erano stati stralciati dal D.M. del 27 gennaio 1999 di approvazione della deliberazione della Commissione del 16 dicembre 1998, a seguito delle richieste alternative formulate dal Presidente di quella Regione e fatte proprie dalla Conferenza Stato Regioni. Su proposta del presidente Micheli, la Commissione ha accolto l'istanza della Regione in parola, essendo questa improntata a criteri di trasparenza ed avendo i requisiti richiesti.

Le suindicate decisioni della Commissione sono contenute nella delibera n. 9/99 del 27 gennaio 1999 recepita nel decreto ministeriale n. 187/RC del 9 febbraio 1999, riportato in allegato alla presente Relazione.

1.4.2. Seduta del 21 aprile 1999 e del 4 maggio 1999

In data 21 aprile 1999, la Commissione ex Lege n. 270/97 è tornata a riunirsi per discutere alcune varianti ed integrazioni al Piano, nonché in merito all'approvazione di indirizzi omogenei per l'attuazione finanziaria del Piano extra Lazio.

Il Segretario della Commissione ha informato preliminarmente i presenti in merito ad una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei LL.PP. da Vannino Chiti, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome, relativa alla questione della gestione dei servizi pubblici di base durante il Giubileo che comporterà rilevanti costi aggiuntivi per le Amministrazioni centrali e locali

maggiormente interessate dal flusso straordinario di visitatori. La Conferenza in parola ha esaminato tale problematica nella riunione del 4 marzo 1999 ed ha ravvisato l'opportunità di chiedere al Governo di adottare un provvedimento urgente per il finanziamento delle spese di gestione dei servizi pubblici di base e dei servizi speciali organizzati per l'accoglienza dei flussi giubilari. Tra le ipotesi di finanziamento del provvedimento di che trattasi è stata considerata quella di impiegare somme non utilizzate ai sensi della legge n. 270/1997 per interventi revocati o per riduzioni degli investimenti.

Nel corso della riunione è stato illustrato e discusso il succitato stralcio di delibera contenente indirizzi e criteri atti a regolare diverse questioni, in particolare quella legata all'aumento complessivo del costo degli interventi, all'incremento superiore al 10% degli oneri derivanti da spese di progettazione, appalto, Direzione Lavori e collaudo. L'approvazione dello stralcio di delibera in parola è avvenuta nella successiva riunione del 4 maggio 1999. A quest'ultima seduta è stato anche rinviato l'esame delle richieste di modificazioni ed integrazioni al Piano già all'ordine del giorno nella riunione del 21 aprile, attesa la necessità sottolineata dal Ministro Micheli, di disaggregare le stesse in richieste ammissibili, dubbie e senz'altro assentibili, per una più agevole consultazione delle stesse da parte della Commissione.

Nella riunione del 4 maggio, il segretario della Commissione ha anche riferito in merito all'interrogazione a risposta scritta n. 4-13849 del Senatore Antonio di Pietro, presentata in data 28 gennaio 1999 e contenente una serie di censure per presunti vizi di illegittimità inerenti a interventi di titolarità del Comune di S. Giovanni Rotondo. Al riguardo, la dott.ssa Barbato ha riferito che, a seguito di un supplemento istruttorio compiuto dall'Ufficio e dell'acquisizione di ulteriore documentazione richiesta al Comune in parola, l'U.R.C.G.E., con il supporto dell'esperto Franco Bianchi, ha escluso - nel formulare elementi di risposta all'interrogazione di che trattasi - la fondatezza delle censure mosse. Il segretario stesso della Commissione ha fornito al riguardo una esposizione puntuale delle controdeduzioni alle censure di che trattasi. Il Presidente Micheli ha puntualizzato, al riguardo, che la Commissione non può surrogarsi all'Autorità Giudiziaria e, pertanto, le controdeduzioni di cui sopra non debbono essere intese come una memoria difensiva a favore del Comune di S. Giovanni Rotondo.

Nel corso della medesima riunione, preso atto delle risorse nella disponibilità della Commissione derivanti dai ribassi d'asta comunicati dai singoli soggetti beneficiari, alle quali vanno aggiunte risorse residue pari a £ 530.172.360 per un totale di £ 23.298.172.360, sono state approvate una serie di richieste di integrazione finanziaria giudicate "necessarie" a seguito di istruttoria dell'Ufficio e di approfondito esame da parte della Commissione. E' stato dato inoltre mandato all'Ufficio per attivare la procedura di messa in mora anche ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, nei confronti di soggetti titolari di interventi che presentino problematiche tali da pregiudicare il regolare compimento. La Commissione ha infine deliberato due definanziamenti totali (uno per la persistente indisponibilità dell'area ed uno per completamento dei lavori precedente all'inserimento nel Piano) e cinque definanziamenti parziali (per riduzione dei costi stimati o aumento della quota di cofinanziamento) nonché la cancellazione di un intervento dal Piano a seguito di rinuncia del soggetto privato titolare dello stesso.

Le deliberazioni della commissione di cui alla delibera n. 10/99 sono state quindi raccolte in un unico allegato "B" che comprende tutte le modificazioni al Piano assentite, nonché le integrazioni finanziarie per un ammontare complessivo di £ 26.219.874.193. Il contenuto della succitata delibera n. 10/99 è stato recepito nel decreto ministeriale n. 202/RC del 30 luglio 1999, riportato in allegato alla presente Relazione.

1.4.3. Seduta del 19 maggio 1999

Nella riunione del 19 maggio 1999 la Commissione ex L. n. 270/1997 ha deliberato – sulla scorta dell'esito della procedura di contestazione ex art. 7 della legge n. 241/90, avviata nei confronti dei titolari degli interventi individuati nella precedente riunione del 4 maggio 1999 – il definanziamento totale di cinque interventi. Mentre, in relazione a quegli interventi i cui titolari non hanno dato riscontro alla messa in mora dell'ufficio, la Commissione – su proposta del Presidente Micheli – ha deciso di concedere, stante il possibile intempestivo recapito della comunicazione, un ulteriore termine di 10 giorni a carattere ultimativo, decorso il quale, la Commissione procederà al definanziamento degli stessi.

Nella stessa seduta la Commissione ha deliberato il definanziamento parziale di tre interventi, ha assentito alcune richieste di proroga dei termini lettera c) e la rettifica di un importo di finanziamento. Il Segretario della Commissione dott.ssa Barbato ha comunicato in questa sede i risultati del supplemento di istruttoria richiesto dalla Commissione nella precedente seduta del 4 maggio 1999 nei confronti di tre interventi localizzati nei Comuni di San Marco in Lamis e Fontanellato ed Assisi. In relazione al primo degli interventi citati, la Commissione ha deliberato di riconoscere un'integrazione finanziaria nell'ambito della variante per opere impreviste e imprevedibili, escludendo la restante porzione ascrivibile a migliorie non necessitate. Per quanto riguarda il secondo intervento, la dott.ssa Barbato ha comunicato che i lavori sono stati già appaltati e che proseguono nel rispetto del cronoprogramma dichiarato. In merito al terzo degli interventi sopra citati, il Segretario della Commissione ha riferito che la relazione tecnica pervenuta, pur non contenendo la richiesta dichiarazione del progettista in ordine alla impossibilità di prevedere i lavori in questione in sede di progettazione originaria, ha fornito un quadro tecnico dettagliato per suffragare la richiesta del finanziamento del consolidamento statico della zona interessata.

La Commissione quindi, preso atto delle risorse nella propria disponibilità per un ammontare complessivo di £ 30.029.058.167, ha proceduto ad esaminare alcune ipotesi di inserimento nel Piano di nuovi interventi tenendo conto della situazione di alcune Regioni che, anche a causa della minore connotazione giubilare, hanno beneficiato sino ad ora di minori quote di finanziamento, quali la Basilicata, la Calabria, la Lombardia, il Molise, la Sicilia e la Sardegna. Dopo aver esaminato un complesso di interventi presentati prevalentemente nell'ambito delle regioni di che trattasi, la Commissione ha approvato all'unanimità un elenco di nuovi interventi da inserire nel Piano, per un importo totale pari a £ 24.827.000.000.

Al termine della riunione il Segretario della Commissione ha reso noto che si è concluso l'iter parlamentare relativo all'approvazione del "Collegato ordinamentale" alla finanziaria 1999 che, fornendo l'interpretazione autentica della legge 270/1997 ed integrando le precedenti disposizioni, ha ripristinato – tra l'altro – lo stanziamento del programma degli interventi INAIL per un ammontare pari a £ 651 miliardi. Ha comunicato inoltre che l'INAIL ha presentato il proprio programma definitivo rimodulato a seguito delle valutazioni di congruità formulate dalla Commissione tecnica dell'Ente di che trattasi, proponendo altresì la sostituzione di alcuni interventi ormai impossibili da realizzare nel rispetto dei termini giubilari con altri indicati dall'Ente medesimo. La Commissione ha approvato all'unanimità la sostituzione in parola escludendo dal Piano gli interventi indicati dall'INAIL.

Le suindicate decisioni della Commissione sono contenute nella delibera n. 11/99 del 19 maggio 1999 recepita nel decreto ministeriale n. 209/RC del 5 agosto 1999 riportato in

allegato alla presente Relazione.

1.4.4. Seduta del 28 luglio 1999

In data 28 luglio 1999, la Commissione ex L. n. 270/1997, ha discusso preliminarmente in merito ad un'indagine giudiziaria che riguarda incidentalmente un intervento INAIL incluso nel Piano con la precedente delibera della Commissione. Su proposta del Ministro, la Commissione ha approvato all'unanimità - in via di autotutela - una sospensiva dell'efficacia della precedente delibera nella parte in cui inserisce nel Piano i tre nuovi interventi INAIL proposti dall'Ente medesimo.

Nel corso della riunione è stato anche affrontato un altro aspetto di ordine generale attinente ai ritardi nelle erogazioni finanziarie. Il Presidente Micheli ha reso noto di aver inoltrato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro lamentando le citate difficoltà nonché di aver preso contatti con il Ragioniere Generale dello Stato il quale ha attribuito il problema di che trattasi all'insufficienza del personale della Ragioneria della Presidenza del Consiglio. Su sollecitazione del Ministro Micheli, il Ragioniere Generale ha garantito che avrebbe provveduto ad integrare il personale esistente. La Commissione prende ufficialmente posizione a sostegno di tale sollecitazione fatta dal Ministro Micheli alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato.

In relazione all'intervento riguardante i "Lavori di riqualificazione funzionale delle aree di sosta e della accessibilità al centro storico ed al Complesso monumentale della Cattedrale di San Cerbone a Massa Marittima" (prot. U.R.C.G.E. n. 4739), la Commissione ha ritenuto opportuno sospendere la decisione sull'intervento di che trattasi, in attesa che il Comune interessato produca la documentazione indicata nel parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Un'altra questione di ordine generale discussa dalla Commissione riguarda l'intervento dell'Arca di Padova in relazione al quale è stata chiesta un'autorizzazione a procedere all'affidamento a trattativa privata di uno stralcio dell'importo di 7 miliardi e 150 milioni di lire in presenza di una somma urgenza causata dal pericolo di crollo e cedimento delle torri campanarie, dei minareti e della parte della biblioteca antoniana. La Commissione ha ritenuto che, in presenza di un reale pericolo, il titolare potesse intervenire dandone comunicazione a consuntivo, senza necessità di un'autorizzazione preventiva.

Il Segretario della Commissione ha altresì informato i presenti sui problemi inerenti il monitoraggio degli interventi. Il soggetto monitore (l'Associazione Temporanea di Imprese SOVIS S.p.a. e T.E.C.N.I.C. S.p.a.) doveva consegnare il primo Rapporto al 30 giugno 1999. La società di che trattasi ha presentato una prima documentazione che alla luce delle verifiche fatte dall'Ufficio risultava in parte contraddittoria. Pertanto l'U.R.C.G.E. ha messo in mora l'ATI accordandole 15 giorni di tempo. In questo periodo il Monitore ha elaborato un esauriente dossier dal quale è risultato che, a quella data, il 75% circa degli interventi risultava partito ed in fase avanzata e non emergevano particolari segnali di sofferenza.

Di seguito, una volta riepilogate le somme disponibili derivanti da rinunce, riduzioni di stanziamento, definanze, pari a complessive lire 24.108.769.608, la Commissione ha proceduto ad esaminare gli interventi contenuti nell'allegato "B", deliberando una serie di modifiche e integrazioni al Piano reputate necessarie.

Le suindicate decisioni della Commissione sono contenute nella delibera n. 12/99 del 28 luglio 1999 recepita nel decreto n. 210/RC del 22 ottobre 1999, riportato in allegato.

2. PARTE SECONDA - LA GESTIONE FINANZIARIA

2.1. Situazione finanziaria del Piano aggiornata al 30 settembre 1999

Le occorrenze finanziarie per la copertura degli oneri recati dalla legge 270/97, valutate in complessive £. 2.000 miliardi, sono state direttamente stanziati in Bilancio sul capitolo 7902 dello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del successivo trasferimento ai singoli soggetti beneficiari.

Gli stanziamenti statali hanno consentito, attraverso la priorità accordata agli interventi che esprimevano una quota di cofinanziamento, la mobilitazione di ulteriori fonti finanziarie per £. 1.702 miliardi, permettendo l'inserimento nel Piano, ai fini della realizzazione, di opere per un importo complessivo pari a £. 3.566 miliardi.

Di tale stanziamento, £. 1.200 miliardi sono stati stanziati nell'esercizio finanziario 1998, 600 miliardi nell'esercizio finanziario 1999 e 200 miliardi sul bilancio annuale di competenza relativo all'anno 2000.

Come già ricordato, il Piano è stato soggetto ad alcune rimodulazioni a seguito delle quali sono state ridotte le assegnazioni finanziarie degli interventi attivati per un importo corrispondente al ribasso d'asta registrato all'atto dell'aggiudicazione. Con le somme resesi così disponibili sono stati finanziati altri interventi originariamente non inclusi nel Piano. Sono stati inoltre inseriti nel Piano, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della legge n. 270/1997, gli interventi relativi alla costruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, con le corrispondenti assegnazioni finanziarie.

La Commissione di cui al 1° comma dell'art. 2 della citata legge 270/97, ha, quindi, provveduto ad emanare gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano con modalità già definite per l'attuazione del Piano per il Giubileo ex lege n. 651/96 dalla competente Commissione.

Tra i suddetti indirizzi assume particolare rilievo la norma che prevede l'anticipazione del 10% per le progettazioni, gli studi e le indagini, e quella che consente, in presenza del verbale di aggiudicazione delle gare di appalto e del verbale di consegna dei lavori o il contratto, nel caso di appalto di forniture, l'assunzione dell'impegno di spesa, al netto delle quote cofinanziate nonché l'erogazione del 50% dell'ammontare dell'impegno suindicato. Tali indirizzi finanziari sono stati meglio specificati con il successivo D.M. n. 2 Pres. /278 del 30.07.1999.

Seguendo le procedure indicate nei cennati indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano, nonostante le note carenze di organico, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi ha istruito tutte le pratiche pervenute entro il 31.08.1999, attivando finanziamenti relativi a n. 711 interventi, attraverso l'emanazione a favore dei relativi soggetti beneficiari di n. 798 decreti di impegno per £. 1.242,8 miliardi e di n. 882 titoli di pagamento per complessive £. 734,5 miliardi.

Sono state inoltre trasferite, con variazioni compensative di bilancio, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge del 7 agosto 1997, n. 270, risorse finanziarie ammontanti a £. 204,2 miliardi nello Stato di previsione dei seguenti Ministeri:

Ministero per le Attività Culturali: 189 miliardi di lire

Ministero degli Interni: 11,6 miliardi di lire

Ministero delle Finanze: 1,1 miliardi di lire

Ministero dei Trasporti: 0,8 miliardi di lire

Ministero di Grazia e Giustizia: 1,5 miliardi di lire

TOTALE: 204,2 miliardi di lire

Vengono di seguito riportate le tabelle relative alla situazione finanziaria del Piano aggiornata al 31.03.1999, al 30.06.1999 ed al 30.09.1999.

TAV. I (situazione finanziaria al 31 marzo 1999)

(importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	677.439.078.398
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	857.399.078.398
Pagamenti	362.190.046.665
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	542.150.049.665

TAV. II (situazione finanziaria al 30 giugno 1999)

(importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.079.380.955.691
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.281.977.955.691
Pagamenti	582.397.763.915
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	784.994.763.915

TAV. III (situazione finanziaria al 30 settembre 1999)

(importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.242.888.278.632
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.446.125.278.632
Pagamenti	734.533.939.986
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	937.770.939.986

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. Impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura ulteriore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
11028	Padova	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SORPOSTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE INCHIESE COPERTURE DEI TRANSEPTI E TORRI CAMPANARE	VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO	37.844.000.000	37.844.000.000	0	3.784.400.000	3.784.400.000	19.230.700.000	9.615.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	Cesena	RESTAURO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO DEI PADRI DOMENICANI IN CAVALLINO PER USO RICETTIVO	COMUNE DI CAVALLINO	2.715.300.000	2.586.300.000	148.000.000	154.000.000	154.000.000	2.412.304.994	1.206.152.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1098	Lecco	RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI ALTRI DELLE NAVATE LATERALI DEL CONTROSFORTO LIGNEO LACINIALE DELLE SALE A PLAN TERRENO E DELLE COPERTURE DELLA BASILICA DI S. CROCE	PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA' IN S. CROCE	3.411.530.000	1.083.530.000	2.328.000.000	0	0	1.083.529.084	541.764.540	0	0	0	0	0	0	0	0
1056	Conegliano	LAVORI DI RESTAURO ED ADATTAMENTO DELL'EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO PERI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVA A BASSO COSTO DEI PELLEGRINI	COMUNE DI CONEGLIANO	5.000.000.000	5.000.000.000	0	500.000.000	500.000.000	3.433.049.747	1.716.524.870	0	0	0	0	0	0	0	0
10484	Torino	RICOSTRUZIONE E FINISSIMA IN PIASTRE DEL DUOMO E DEL PALAZZO REALE DI TORINO	SOPRINTENDENZA REGIONALE DEL PIEMONTE	90.048.000.000	90.048.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.048.000.000
1023	Benevento	CONTRUSSO BASILICA MADONNA DELLE GRACE RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO CON ALLESTIMENTO SALLA DEL PELLEGRINO E MUSEO DELL'OPERA	COMUNE DI BENEVENTO	3.499.000.000	3.499.000.000	0	349.900.000	349.900.000	2.519.623.802	1.259.811.900	0	0	0	0	0	0	0	0
1018	Benevento	RESTAURO DEL CONVENTO DI S. PASQUALE CON RELATIVA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA	COMUNE DI BENEVENTO	7.715.000.000	7.715.000.000	0	771.500.000	771.500.000	4.863.956.814	2.431.978.410	0	0	0	0	0	0	0	0
0003/A	Arezzo Nazionale	PROMOZIONE DELL'IMMAGINE ITALIA E AZIONI TRASVERSALI DI PROMOZIONE	ENIT	13.450.000.000	12.700.000.000	750.000.000	0	0	1.628.864.325	914.432.160	0	0	0	0	0	0	0	0
0003/A	Arezzo Nazionale	PROMOZIONE DELL'IMMAGINE ITALIA E AZIONI TRASVERSALI DI PROMOZIONE	ENIT	13.450.000.000	12.700.000.000	750.000.000	0	0	10.700.000.000	5.350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Arezzo Nazionale	INFORMAZIONE PER INTERMEDIARI ITALIANI ALL'ESTERO	ENIT	1.500.000.000	1.300.000.000	200.000.000	0	0	940.000.000	470.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

TAV 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. Impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura ulteriore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
11080	Concordia Sagittaria	SISTEMAZIONE E ABBEVERO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CATEDRALE DI CONCORDIA SAGITTARIA AREA SUD	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	7 576 000 000	6 776 000 000	800 000 000	0	0	5 848 215 962	2 924 107 980	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000 000
11111	Pastene	CENTRO ACCOGLIENZA VISITATORI DI P. PIO DI ROMA ROMA PIETRELLA	PROV. FOGGIA FRATELLI CAPPUCCINI	3 600 000 000	3 400 000 000	500 000 000	0	0	3 296 963 380	1 648 481 680	0	0	0	0	0	0	0	0
1124	Acquafredda	CENTRO ACCOGLIENZA TORRE	COMUNE DI ACQUAFREDDA	529 000 000	529 000 000	0	52 900 000	52 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11243	Lagone	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL CONTERESSO DEL SANTUARIO MADONNA DEGLI ANGELI	PARROCCHIA S. NICOLA DI SANI	5 799 832 000	5 799 832 000	0	0	0	5 339 831 968	2 669 915 980	0	0	0	0	0	0	0	0
1125	Acquafredda	CENTRO ACCOGLIENZA S. AGOSTINO	COMUNE DI ACQUAFREDDA	473 000 000	473 000 000	0	47 300 000	47 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1133	Campagna	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL SANTUARIO MARIA SS. DI BELVEDERE ED AMPLIAMENTO CON NUOVA STRUTTURA PRETTIVA	PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO	1 380 000 000	1 380 000 000	0	138 000 000	138 000 000	1 242 000 000	621 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1136	Bonassola	RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI MONTAMENTO	COMUNE DI BONASSOLA	219 000 000	197 000 000	22 000 000	0	0	188 328 012	94 164 010	0	0	0	0	0	0	0	0
1138	Nepesina	ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUZIONE DELLA CASA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMUNITA' DI OGGIO DEI PADRI DESUZZI	CASA RELIGIOSA DELLA COMUNITA' DI OGGIO	3 341 000 000	3 341 000 000	0	367 300 000	367 300 000	2 972 653 942	1 486 476 970	0	0	0	0	0	0	0	0
1139	Capua	RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE E ALTERNATIVE ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUZIONE DEL COMPLESSO EPISCOPALE SEMINARIO	SEMINARIO ARCHIEPISCOPALE E CAMPANO	3 538 000 000	3 184 000 000	354 000 000	318 400 000	318 400 000	2 830 678 417	1 415 339 208	0	0	0	0	0	0	0	0
1143	Sarlat-la-Macedoine	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E VALORIZZAZIONE DEL MONASTERO DI ALCUNI LOCALI DEL CONVENTO DI MADONNA DELL'ARCO	PROVINCIA SAN DOMINGO	5 282 000 000	4 782 000 000	500 000 000	0	0	4 581 257 788	2 290 628 880	1 832 503 110	0	0	0	0	0	0	0

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. Impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura uterore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
1149	Foggia	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO DEGLI APPARTI ELIMINAZIONE DELLE BARRERE ARCHITETTONICHE E ADATTAMENTI DI EDIFICI SOCIALI DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA POVERA E SERVIZI OPERA DON ORIONE BASILICA	PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO OP.	1.025.000.000	1.025.000.000	0	0	0	987.375.900	498.687.950	0	0	0	0	0	0	0	0
1162	Capriate	COMPLETAMENTO DELL'ANTICA BASILICA	ENTE PROV. MACOLETANA CONGREGAZIONE	2.904.930.000	2.540.530.000	364.000.000	0	0	2.540.768.392	1.270.384.200	0	0	0	0	0	0	0	0
11622	Vercelli	PALAZZO ARCONESCONI E DI VERCELLI RESTAURO CONSERVATIVO PER IL RECUPERO DEGLI AMBIENTI DESTINATI ALL'ARCHIVO CAPITOLARE E BIBLIOTECA E AL MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO	ARCIDIOCESI DI VERCELLI	6.927.000.000	3.707.500.000	3.220.000.000	0	0	3.706.471.645	1.853.235.820	0	0	0	0	0	0	0	0
1187	Bardone	RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E ARREDO DELLA SALA CONGREGAZIONE NEL COMPLESSO RELIGIOSO DON BOSCO	ISTITUTO DON BOSCO	1.454.064.000	1.454.064.000	0	166.700.000	166.700.000	1.284.364.251	642.182.120	0	0	0	0	0	0	0	0
1195	Pompei	BASILICA DELLA BEATA VERGINE DI POMPEI PROGETTO DI MANUTENZIONE E RESTAURO	SANTUARIO DELLA BEATA S.M. VERGINE	21.319.000.000	21.319.000.000	0	2.131.900.000	2.131.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1198	Pompei	ABBATTIMENTO DELLE BARRERE ARCHITETTONICHE	COMUNE DI POMPEI	1.082.000.000	1.082.000.000	0	0	0	1.071.672.060	535.838.530	0	0	0	0	0	0	0	0
1199	Pompei	TRASFORMAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE IN OSTELLO	COMUNE DI POMPEI	1.540.000.000	1.540.000.000	0	0	0	1.275.400.000	637.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1201	Pompei	RESTAURO E RISANAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO E DEGLI AMBIENTI FABBRICATI DELL'EX STALONE	SANTUARIO DELLA BEATA S.M. VERGINE	8.996.000.000	8.996.000.000	0	899.600.000	899.600.000	6.048.909.731	3.024.454.870	0	0	0	0	0	0	0	0
1208	Comiso	ACCESSIBILITA' SERVIZI RESTAURI ALL'ABBZIA DI POMPOSA	SOPRINTENDENZA REGIONALE DI RAVENNA	795.000.000	500.000.000	295.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000
1208	Ferrara	BASILICA DI SANTA MARIA IN VAPO COMPLETAMENTO RESTAURO	SOPRINTENDENZA REGIONALE DI RAVENNA	1.750.000.000	1.000.000.000	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1257	1256	1247	1224	1221	1218	1217	1214	1213	1212	Protocollo
Enedesa	Montepi	San'Angelo Del Lione	Treviso	Aquileia	Messagne	Messagne	Nepes	Nepes	Nepes	Comune localizzazione
RESTAURO DI EDIFICIO ESISTENTE PER LA CREAZIONE POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI DOCTOR	RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO AL BORGO DI MONTONE	RICETTIVITA' DIOCESANA IN ALTA RIPA	SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA DIREZIONE DI FILIALE DI PIAZZA VITTORIO VENETO 1	SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'ADENZA DI AQUILEIA	RESTAURO E RECUPERO CHIESA E CONVENTO DEI CAPPUCCINI DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINI CENTRO INFORMAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE	RESTAURO E RECUPERO DEL SANTUARIO DELLA MISERICORDIA	RESTAURO E RECUPERO DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO ALENTO	RESTAURO DEI DIPINTI MURALI DEL CHIOSO DI SAN GREGORIO ALENTO	RESTAURO DEI MAGGIORI BENI ARTISTICI DELLA BASILICA DI SAN DOMENICO MAGGIORE	Titolo intervento
COMUNE DI ETROBLES	PARANCOCCA NATIVITA' DI MADAMA VERNAINE	CURIA ARCHEVESCOVILE E DI S. ANGELO DELL.	POSTE ITALIANE E P.E. SEDE PROVINCIALE DI	POSTE ITALIANE E P.E. SEDE PROVINCIALE DI	COMUNE DI MESSAGNE	COMUNE DI MESSAGNE	FONDO EDIFICI DI CULTO	FONDO EDIFICI DI CULTO	FONDO EDIFICI DI CULTO	Soggetto beneficiario
413.683.000	800.000.000	2.084.680.000	132.000.000	30.000.000	3.208.000.000	1.099.000.000	2.800.000.000	3.222.000.000	750.000.000	Costo Stimato
180.683.000	500.000.000	1.965.740.000	132.000.000	30.000.000	2.850.000.000	848.000.000	2.800.000.000	3.222.000.000	750.000.000	Finanziamento attribuito
223.000.000	100.000.000	128.950.000	0	0	358.000.000	250.000.000	0	0	0	Altre fonti
0	0	0	13.200.000	3.000.000	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	13.200.000	3.000.000	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
150.682.745	482.950.000	1.862.985.234	112.167.889	0	1.736.120.000	608.051.000	0	0	0	Impegni di spesa
75.341.370	241.475.000	831.482.617	56.063.945	0	868.080.000	304.025.500	0	0	0	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	694.448.000	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	2.800.000.000	2.822.000.000	750.000.000	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1353	1352	1348	1344	1337	1325	1292	1274	1268	1264	Protocollo
Livorno	Livorno	Livorno	Cometola	Maa	Alessandria	Marabotto	Napoli	Asi	Perignano	Comune localizzazione
SODDIOPIRO MARIANO ISTITUTO LA MADONNA	SODDIOPIRO MARIANO MONTEROSO	REALIZZAZIONE DI AREA COPERTA DI ACCOGLIENZA PER LA SOSTA E IL RISTORO DEI PELLEGRINI E RELATIVI SERVIZI	RECUPERO CELLERAMA BENEDETTINA DI COMEZZOLA	PROGETTO DI RESTAURO E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DISMESSE DI GIARE DA DESTINARE AD OSTELLO	REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DI ACCOGLIENZA DI S. MARIA DI CASTELLO	REALIZZAZIONE DELLA SEDE E DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA DI PACE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE TRAMITE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO COLONICO IN LOCALITA' S. MARTINO	TRINITARIO FRANCESCANO BONAVENTURANO ADEGUAMENTO ED ALLESTIMENTO DEGLI AMBIENTI DELLE ATTEZZATURE RICETTIVE CULTURALI E SPIRITUALI DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI S. LORENZO MAGGIORE	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX VILLA BADOGLIO	ACCOGLIENZA CULTURALE E RELIGIOSA NEL COLLEGGIO MARCONI	TITOLO intervento
CONGR. VALLOMBROSA NA ORD. S. BENEDETTO	CONGR. VALLOMBROSA NA ORD. S. BENEDETTO	CONGR. VALLOMBROSA NA ORD. S. BENEDETTO	COMUNE DI COMEZZOLA	COMUNE DI MAIA	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA	PROV. DI NAPOLI DEI FRATI MINORI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	FOUNDAZIONE COLLEGGIO MARCONI	Soggetto beneficiario
678.000.000	262.000.000	7.814.510.000	2.363.000.000	917.000.000	4.570.000.000	1.861.713.000	2.313.000.000	5.329.328.000	3.850.100.188	Costo Stimato
558.000.000	200.000.000	5.965.510.000	1.643.000.000	917.000.000	2.770.000.000	1.861.713.000	2.313.000.000	5.293.328.000	2.830.100.188	Finanziamento attribuito
120.000.000	62.000.000	1.848.000.000	720.000.000	0	1.800.000.000	0	0	36.000.000	1.020.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
482.200.000	175.600.000	5.853.515.000	1.399.112.908	837.902.091	2.406.791.823	1.566.713.000	1.615.624.650	4.893.327.391	2.241.224.811	Impegni di spesa
241.100.000	87.800.000	2.926.757.500	699.556.450	418.951.045	1.204.395.910	783.356.500	807.812.325	2.446.663.880	1.120.612.410	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. Impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura ulteriore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
1408	Parma	RISTRUTTURAZIONE DI UN COMPLESSO RICETTIVO ESISTENTE NELLA MANICATA ANTICA SAN SEVERINO DI PESCARA	SEMINARIO ARCIVESCOVILE	4.475.160.000	3.685.682.000	789.478.000	0	0	2.353.610.140	1.176.805.070	0	0	0	0	0	0	0	0
1421	Parma Val Tevere	RESTAURO DELLA ROCCA MUNICIPALE E DI PIAZZA UMBERTO I'	COMUNE DI PAVELLO VAL TIBONE	1.420.492.192	1.205.492.192	215.000.000	0	0	957.058.835	478.529.470	0	0	0	0	0	0	0	0
1432	Padova	COSTRUZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO PER LA SIAZIONE FERROVIARIA E LA BASILICA DEL SANTO CON ABBATTIMENTO INTEGRALMENTE DELLE BARBIERE ANTICHE E DELLE SENSORIALI	COMUNE DI PADOVA	2.857.000.000	2.857.000.000	0	0	0	1.692.144.750	846.072.375	0	0	0	0	0	0	0	0
1463	Alzano	RECUPERO DEI COMPLESSI MONASTICALI NELLA CHIESA DI SAN DOMENICO DEL MONASTERO DELL'EX CISTERCENSE A SPALTO MUSEALE LEGATO ALLA RICETTIVITA'	MINISTERO DELLE FINANZE DEL TERRITORIO	1.100.000.000	1.100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000.000
1485	Bobbio	RECUPERO DI AMBIENTI DELL'ANTICA ADAMITA DI S. COLONIANO PER IL COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA CITTA'	COMUNE DI BOBBIO	1.778.966.000	1.383.966.000	395.000.000	0	0	1.250.658.156	630.329.580	0	0	0	0	0	0	0	0
1496	Padua	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER L'ACCOLTAZIONE DEI PELLEGRI	COMUNE DI PADUA	2.958.624.000	2.958.624.000	0	0	0	2.808.623.366	1.404.311.680	0	0	0	0	0	0	0	0
1499	Ferrara	SISTEMAZIONE DEL MUSEO DELLA CATEDRALE NELLE CHIESA DI S. ROMANO	COMUNE DI FERRARA	2.938.000.000	2.938.000.000	0	0	0	2.375.314.447	1.187.657.220	0	0	0	0	0	0	0	0
1512	Chivari	AMPLIAMENTO DEL MUSEO DIOCESANO	DIOCESI DI CHIVARI	195.000.000	195.000.000	0	0	0	194.953.285	87.476.640	0	0	0	0	0	0	0	0
1513	Chivari	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA CHIESA DEL SANTUARIO DI S. SIGNORE DELL'ORTO	DIOCESI DI CHIVARI	817.000.000	817.000.000	0	0	0	817.000.000	308.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1514	Cogorno	RESTAURO CONSERVATIVO DI UN COMPLESSO RICETTIVO ESISTENTE NELLA MANICATA ANTICA SAN SEVERINO DI PESCARA	DIOCESI DI CHIVARI	8.001.000.000	8.001.000.000	0	0	0	5.345.458.877	2.672.729.440	0	0	0	0	0	0	0	0

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. Impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura ulteriore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
1534	Trasse	RESTAURO DEL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE DI SAN GIUSTO MARTIRE	SOPRINTENDENZA REGIONALE DEL FRIULIO V.G.	850.000.000	850.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000
1535	Piacenza	RECUPERO DEI COMPLESSI MONUMENTALI POSITUO LA VIA FRANCESCO IN LOCALITÀ CARMANALE OTTA COLOMBA TRUSSO DELL'ANTICO PALAZZO DELLA COMMENDAZIONE	AZIENDA URS DI PIACENZA	4.808.948.000	4.561.948.000	247.000.000	278.300.000	278.300.000	3.967.878.176	1.983.939.080	1.587.151.270	0	0	0	0	0	0	0
1537	Fucecchio	RECUPERO DEL PONTE FORTIFICATO DI CAPPANO PER REALIZZAZIONE OSTELLO	COMUNE DI FUCECCHIO	3.328.670.000	2.928.670.000	400.000.000	0	0	1.909.670.662	954.835.330	0	0	0	0	0	0	0	0
1576	Modena	RIQUALIFICAZIONE DI PARTI EDILIZIE DI VECCHIA STRUTTURA GIÀ ATTIVA	CONSORZIO NE FEMME SERVE DEI POVERI	3.614.000.000	3.514.000.000	100.000.000	263.000.000	263.000.000	3.217.703.328	1.606.851.665	0	0	0	0	0	0	0	0
1589	Torino	RECUPERO E SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA BASILICA DI SUPERBA	CITTA' DI TORINO	4.320.000.000	4.320.000.000	0	0	0	2.612.447.120	1.306.223.560	0	0	0	0	0	0	0	0
1663	Città Di Pavia	RISTRUTTURAZIONE RESTAURO DELL'ANTICA ABBAZIA E DEL CHIOSTRO ANNESSO	ISTITUTO MASS DI MARIA SS CONSOLATA	393.000.000	343.000.000	50.000.000	0	0	343.000.000	171.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1670	Quivara In Puglia	RI-CURETO TECNICO FUNZIONALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. SEBASTIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INFORMATIVO E DI COMUNICAZIONE A SERVIZIO DEI TURISTI	COMUNE DI GRAVINA	3.057.111.842	3.000.111.842	57.000.000	0	0	2.363.888.158	1.181.944.080	0	0	0	0	0	0	0	0
1683	Udine	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO A DELLA SEDE DELL'ITP A B CASA DELL'IMMACOLATA	I P.A.B. CASA DELL'IMMACOLATA	1.721.210.000	1.341.210.000	380.000.000	0	0	1.341.214.400	670.607.200	536.485.760	0	0	0	0	0	0	0
1684	Udine	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO ATTA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	CONSORZIO NE SILORE COLLEGGIO DINESSE	579.680.000	379.680.000	200.000.000	0	0	371.000.000	185.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1685	Udine	PARETI DELLO SCALONE DEL PALAZZO PATRIARCALE ORA MUSEO DIOCESANO E DELLA FACCIATA E BALAUSTRATA CON STALVE CHE CHIUDE IL SAGRARIO DELL'ANNESSA CHIESA DI S. ANTONIO A.B.	ARCIDIOCESI DI UDINE	253.000.000	215.000.000	38.000.000	0	0	209.500.000	104.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1779	1742	1739	1736	1732	1729	1728	1720	1716	1709	Protocollo
Padova	Venezia	Venezia	Venezia	Venezia	Venezia	Venezia	Palmanova	Comune del Friuli	Torvisco	Comune localizzazione
RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA DELLA FORESTERIA PER ACCOGLIENZA NOTTURNA DEI PELLEGRINI	RESTAURO DELLA CHIESA DEI SANTI AMBROGIO E BELLINO	ARREDAMENTO DEL NUOVO OSTELLO DELLA GIOVENTU'	REALIZZAZIONE AREA DI ACCOGLIENZA NELLE ADIACENZE DEL PARCO STORICO DI VILLA GIACCIOLI	SISTEMAZIONE DEL PERCORSO DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO	REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DELLE SCALLETTE DI MONTE BERICO	REALIZZAZIONE DEL VIALE D'ACCESSO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO CON INTERVENTI ATTIVI A GARANTIRE LA SICUREZZA	REALIZZAZIONE DI POSTILETTO A BASSO COSTO CON ANNESSI SERVIZI GENERALI RISTORO E SOSTA	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER FERIE FORESTIERA	RECUPERO STATICO E FUNZIONALE E DI FABBRICATI ESISTENTI E DI PROPRIETA' DELL'ENTE NICHEDENTE	TITOLO intervento
CHIESA PARROCCHIALE DI S. GIUSTINA V. M.	COMUNE DI VICENZA	COMUNE DI VICENZA	COMUNE DI VICENZA	COMUNE DI VICENZA	COMUNE DI VICENZA	COMUNE DI VICENZA	PARROCCHIA DI S. RENDITORE	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	PARROCCHIA DI S. GIUDIO	Soggetto beneficiario
354.000.000	913.000.000	399.000.000	620.000.000	618.000.000	321.000.000	2.589.000.000	1.365.612.000	550.000.000	3.385.000.000	Costo Stimato
350.000.000	613.000.000	399.000.000	620.000.000	618.000.000	321.000.000	2.562.000.000	1.115.612.000	412.000.000	3.025.000.000	Finanziamento attribuito
4.000.000	300.000.000	0	0	0	0	27.000.000	250.000.000	138.000.000	360.000.000	Altre fonti
31.000.000	0	0	70.000.000	68.700.000	32.100.000	274.500.000	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
31.000.000	0	0	70.000.000	68.700.000	32.100.000	274.500.000	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
302.947.444	580.968.000	365.310.000	549.119.200	542.716.021	279.746.055	0	1.010.812.355	293.048.015	2.774.298.000	Impegni di spesa
151.473.720	290.484.000	0	274.559.600	271.358.010	139.873.025	0	505.305.180	146.524.005	1.387.149.000	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	365.310.000	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1949	1912	1898	1875	1873	186	1857	1852	1820	1798	Protocollo
Mazza Dal Vado	San Marco in Livenza	Carroto Quira	Porto Sant' Martin	Saevusa	Nepesina	Cheggio	Ponte Torrens	Maseno	Empoli	Comune localizzazione
RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO DELLA FORESTERIA ANNESSA AL MONASTERO	CONSERVAMENTO DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL CONVENTO DI SAN MATTEO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	RESTAURO DELL'ANTICO ORATORIO DI SANTA LIBERATA	SISTEMAZIONE DELL'ANTICA VIA ROMA	RIQUALIFICAZIONE INGRESSI ALLA CATTOLICA DI S. GIOVANNI E ALLA CROCE DI S. MARZANO	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CENTRO ACCOGLIENZA SALESIANA 2001 TURISMO GIOVANE	RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE ANTICHE CUBBESIAS DELLA BASILICA DI SAN GAVINO	CHIAVAVALLE 2000-LAVORI DI RECUPERO	RESTAURO E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA IN VIA SALIZADA E DELL'ANTISTANTE PAZZALE	Titolo intervento
MONASTERO BENEDETTO S. MICHELE	PROV. S. MICHELE ARCANGELO DEL PRATTO	PARROCCHIA DI SAN LEONARDO	COMUNE DI PORTO SANTO MARTIN	ARCIDIOCESI DI BIRACUSA	MIN. TRAS. NAVIGAZIONE D. D. A. C.	ISTITUTO SALESIANO S. MARCO	COMUNE DI PONTO TORRENTIS	MONASTERO CISTERCENSE CHIAVAVALLE	COMUNE DI EMPOLI	Soggetto beneficiario
1.205.930.000	5.085.000.000	471.000.000	572.000.000	475.000.000	1.075.000.000	538.000.000	5.340.000.000	2.491.240.000	642.000.000	Costo Stimato
1.155.930.000	4.155.000.000	251.000.000	572.000.000	475.000.000	860.000.000	488.000.000	5.340.000.000	2.491.240.000	492.000.000	Finanziamento attribuito
50.000.000	930.000.000	220.000.000	0	0	215.000.000	50.000.000	0	0	150.000.000	Altre fonti
74.000.000	415.500.000	0	57.200.000	0	0	0	534.000.000	253.700.000	0	O.N.T. Impegni di spesa
74.000.000	415.500.000	0	57.200.000	0	0	0	534.000.000	253.700.000	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
981.930.800	2.878.437.020	239.725.000	437.078.492	474.905.750	0	482.582.500	0	1.837.540.000	491.478.000	Impegni di spesa
480.985.450	1.439.718.510	119.862.500	218.539.245	237.452.875	0	241.291.250	0	968.770.000	245.739.000	Lavori acconto 50%
0	0	95.890.000	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	860.000.000	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2011	2006	2005	200	1984	1971	1968	1965	1960	1951	Protocollo
Seccia	Monza San Angelo	Monza San Angelo	Orate	Mea	Malme	Torone	Aberdele	Marpa Del Vale	Levano	Comune localizzazione
MANIPOLAMENTO DEI SERVIZI NELLA STRUTTURA RICETTIVA	LA CASA DEL PELLEGRINO RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PER OSPITALITÀ POVERA	IL PERCORSO DEL PELLEGRINO RISTRUTTURAZIONE SCALINATA ANDREA E SISTEMAZIONE ACCESSI	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FUNZIONALE AL PERCORSO GIUBILARE IN OTTOBRE	ISTRUTTURAZIONE DI DUE EDIFICI E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ URBANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO E DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA	L'ACCOGLIENZA FRANCESE CANE NEGLI INTERI ANTONI E MODERNI PER IL GRANDE QUARTO DEL 2000 - OPERA SAN FRANCESCO	RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO E ARTISTICO DELL'ABBAZIA CISTERCIENSE DI S. MASSIMO DI RIVALLA SCRIVA	PROTEZIONE DEL SEMINARIO VESCOVILE DI ALBERGOLO	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO DI S. VENERANDA	CENTRO STINZI INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA RECUPERO EX CONVENTO DEI DOMINICANI	Titolo intervento
ARCHIDOCESI DI BRACCA	BASILICA SANTUARIO SANTO MICHELE A.P.C.	BASILICA SANTUARIO SANTO MICHELE A.P.C.	COMUNE DI OTTOBRE	ISTITUTO MSS SAN ESTE O CARONNA CALENTO	PROV L'ABBAZIA DEI FRATRI MONI CAPUCCINI	PARROCCHIA S. MASSIMO CISTERCIENSE	SEMINARIO VESCOVILE DI CONVERSA	DOCESI DI MAZZINI DEL VALTO	COMUNE DI LEVANTO	Soggetto beneficiario
380.000.000	3.000.000.000	3.578.950.000	800.950.000	5.580.000.000	3.072.000.000	3.410.000.000	1.403.000.000	1.781.000.000	4.035.000.000	Costo Stimato
345.000.000	3.000.000.000	2.928.950.000	800.950.000	5.530.000.000	1.575.000.000	2.780.000.000	1.373.000.000	1.731.000.000	3.255.000.000	Finanziamento attribuito
45.000.000	0	650.000.000	0	60.000.000	1.497.000.000	630.000.000	30.000.000	50.000.000	780.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
344.828.212	2.680.000.000	2.728.549.000	800.949.194	4.328.379.200	1.575.000.000	2.407.136.215	1.372.488.250	1.550.260.400	2.814.970.000	Impegni di spesa
172.464.105	1.345.000.000	1.384.274.500	300.474.580	2.164.689.800	787.500.000	1.203.568.110	686.244.120	775.130.200	1.407.485.000	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	630.000.000	952.654.485	548.995.300	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2181	2163	2146	2125	2111	2107/B	2107/A	2055	2013	2012	Protocollo
Nab	Calabria	Venezia	Sanera	Confine	Mano	Mano	Cinila	Sant-Marca	Aole	Comune localizzazione
RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL'EX ORFANOTRODO DON ORIONE DELLA PINEIA E DEGLI SPAZI ANNESSI AL FINE DI REALIZZARE UN OSTELLO ED UN CAMPING STAGIONALE	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA VILLA S. BARTOLOMEO	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TELEFONICA INFORMATICA E SISTEMA INFORMATICO ALTA ALTA ADRIATICO PER UN TURISMO AFFIDABILE	RICOSTRUZIONE CASA DEL PELLEGRINO SISTEMAZIONE PAZZALE DELLA BASILICA	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	CERTOSA COMPLESSO MONUMENTALE IN VIA GAREGGIANO	ORATORIO PARROCCHIALE DI VIA PARETO	VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLE PRESENZE ARCHITETTONICHE DEL CRISTIANESIMO DELLE ORIGINI A NAPOLI E PROVINCIA - COMPLESSO MONUMENTALE DELLE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIVITILE	CASA DI ACCOGLIENZA	CASA ACCOGLIENZA BAPILIER	Titolo intervento
DIOCESI DI NOTO	SEMINARIO VESCOVILE	COMUNE DI VENEZIA	PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE	COMUNE DI CONFINI	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CERTOSA	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CERTOSA	SOPRINTENDENZA REGIONALE DI NAPOLI E PROV.	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO	ENTE MOR. ASILO PRINC. AMEDEO EDOE. MAITINELLE	Soggetto beneficiario
2.100.000.000	890.292.000	14.760.000.000	500.000.000	616.000.000	9.163.000.000	1.974.000.000	5.600.000.000	1.430.000.000	2.495.000.000	Costo Stimato
2.075.000.000	790.292.000	14.760.000.000	500.000.000	500.000.000	9.063.000.000	1.974.000.000	3.900.000.000	982.000.000	900.000.000	Finanziamento attribuito
25.000.000	100.000.000	0	0	116.000.000	100.000.000	0	1.700.000.000	448.000.000	1.595.000.000	Altre fonti
182.500.000	0	1.476.000.000	50.000.000	0	0	1.211.100.000	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
182.500.000	0	1.476.000.000	50.000.000	0	0	1.211.100.000	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.384.225.354	670.291.900	13.284.000.000	448.080.000	385.156.713	8.076.423.383	1.746.561.232	0	802.958.750	648.400.000	Impegni di spesa
797.112.875	335.145.950	6.642.000.000	224.040.000	182.578.356	4.038.211.690	874.280.620	0	401.479.375	324.200.000	Lavori acconto 50%
0	268.116.760	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	3.400.000.000	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2337	233	2329	2315/A	2308	2296	2284	2220	2216	2197	Protocollo
San Sebastiano	Padova	Frosinone	Arese Po X	Isola D'Ogliastro	Isola D'Ogliastro	Venezia	Venezia	Lombardia	Venezia	Comune localizzazione
RECUPERO FABBRICATO DEI PILASTRI CON SOSTITUZIONE DELLE ARCHE ADIACENTI E DI PERIZIA DEL SANTUARIO	RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI PADOVA	MANTENIMENTO STRAORDINARIO E RESTAURO DELLE COPERTURE E DELLA FACCATA PROSPICIENTE LA PIAZZA DI SAN DOMENICO	CONSERVATIVO DELLA BASILICA ZONDI PER IL RICAMO DI RICETTIVA A BASSO COSTO E RECUPERO DI BENE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER LA REALIZZAZIONE DI AREE LAVORI DI LA TRAZIONE BANCHESSA ZONDI E MANTENIMENTO	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE RELIGIOSO VERSO IL SANTUARIO DI SAN GABRIELE LUNGO LA VALLE DEL MAYONE RESTAURO DEL MONASTERO DELL'ABBAZIA DI SAN GIOVANNI AD INTELAMI E REALIZZAZIONE DI AREE DI MANTENIMENTO	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE RELIGIOSO VERSO IL SANTUARIO DI SAN GABRIELE LUNGO LA VALLE DEL MAYONE RESTAURO DEL MONASTERO DELL'ABBAZIA DI SAN GIOVANNI AD INTELAMI E REALIZZAZIONE DI AREE DI MANTENIMENTO	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO INCENTIVO	ADEGUAMENTO LOCALI PARROCCHIA S. DONATO A MURANO	RESTAURO SANTUARIO MADONNA D'OGGIATRA	CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE DELLE ANTICHE CATTEDRALI DI VENEZIA	Titolo intervento
DOC. DI SAN MARCO ARGENTANO	DOCCE DI PADOVA	CONVENTO DOMINICANO DI DOMENICO	CONLINE DI RIBE PO X	CONLINE DI CASTELLI	CONLINE DI RIBLA DEL GRAN BASO D'ITALIA	ISTITUTO SALIZADA SAN MARCO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA E DONATO	DOCCE DI LANUSSE	SOPRINTENDENZA ZONA A DELLA BASILICA	Soggetto beneficiario
2.500.000.000	5.828.000.000	1.753.000.000	3.210.000.000	586.715.000	9.882.000.000	3.822.785.000	1.864.000.000	1.011.313.000	4.110.000.000	Costo Stimato
2.500.000.000	4.344.000.000	570.000.000	1.910.000.000	586.715.000	9.882.000.000	2.892.785.000	1.100.000.000	1.011.313.000	2.000.000.000	Finanziamento attribuito
0	1.282.000.000	1.183.000.000	1.300.000.000	0	0	1.230.000.000	564.000.000	0	2.110.000.000	Altre fonti
250.000.000	0	0	0	0	1.157.800.000	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
250.000.000	0	0	0	0	1.157.800.000	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.818.236.710	4.343.130.473	400.000.000	1.764.862.952	586.715.000	8.435.339.271	2.242.784.700	1.074.370.000	1.011.313.123	0	Impegni di spesa
858.119.350	2.171.565.240	200.000.000	862.441.475	293.357.500	4.217.688.640	1.121.382.350	537.185.000	505.656.650	0	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2436	2416/B	2416/A	2407	2406	2405	2397	2393	237	2357	Protocollo
Palermo	Ancona	Ancona	Runo	Runo	Runo	Romagnolo	Bari	Genova	Piazza Ancona	Comune localizzazione
RIQUALIFICAZIONE DI PARTI EDILIZIE DI VECCHIA STRUTTURA, QUATTRO PER ACCOGLIENZA GIORNALE	CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RESTAURO DI VILLA CAMERATA - EDIFICI D-E ed f parco - II LOTTO	CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RESTAURO DI VILLA CAMERATA - EDIFICI A B ed f - I LOTTO	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIGONE SULLA ROTTA GIBELARE DELLA VIA FRANCOGEMINA RECUPERO DELL'EX CANONICA DELLA PARROCCHIA DI RUINO	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIGONE SULLA ROTTA GIBELARE DELLA VIA FRANCOGEMINA RECUPERO DELL'EX CANONICA DELLA PARROCCHIA DI RUINO	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIGONE SULLA ROTTA GIBELARE DELLA VIA FRANCOGEMINA RECUPERO DELL'EX CANONICA DELLA PARROCCHIA DI RUINO	RECUPERO E RIPRESTINO ANTICA VIA FRANCOGEMINA	RECUPERO DEL MONASTERO DI S. SCOLASTICA	RECUPERO DI UNA CHIESA SEICENTESCA QUALE CENTRO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI TURISTICI	RIUTILIZZO DI UN'ALTA DISMESSA DELL'EX MONASTERO BENEDETTINO DI SAN GIOVANNI DA ADIBIRE CASA PER FERIE CON ANNESSA SALA	Titolo intervento
CONGREGAZIONE DI SAN DOMENICANE SAN BISTO VECCHIO	ARCHIDIOCESI ANCONA OSIMO	ARCHIDIOCESI ANCONA OSIMO	PARROCCHIA DEL SS. NOME DI MARIA	PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO	COMUNE DI ROMAGNOLI	MONASTERO S. SCOLASTICA	CONGREGAZIONE OPERAI EVANGELICI FRANCONIANI	OPERA PIA CAMERATA TRIGONA DI GERACI	Soggetto beneficiario
1.476.000.000	633.129.584	4.990.317.141	308.000.000	396.000.000	508.000.000	1.639.000.000	2.725.574.000	4.476.000.000	953.000.000	Costo Stimato
1.466.000.000	383.000.000	2.027.000.000	308.000.000	396.000.000	508.000.000	1.639.000.000	2.575.574.000	2.996.000.000	933.000.000	Finanziamento attribuito
10.000.000	250.129.584	2.963.317.141	0	0	0	0	150.000.000	1.480.000.000	20.000.000	Altre fonti
136.800.000	0	0	30.800.000	0	0	163.800.000	115.200.000	0	73.300.000	O.N.T. Impegni di spesa
136.800.000	0	0	30.800.000	0	0	163.800.000	115.200.000	0	73.300.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.237.854.280	300.303.374	1.752.364.845	246.976.000	365.548.000	453.452.500	1.444.584.000	2.370.088.800	2.986.600.000	734.700.000	Impegni di spesa
818.927.140	150.151.690	876.182.420	123.488.000	182.774.000	226.726.250	722.292.000	1.185.044.400	1.483.300.000	387.350.000	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	948.035.520	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2543	2533	2520	2516	2502	2468	2460	245	2440	2437	Protocollo
Cesena Madrignano	San Giovanni Paderno	Venezia	Venezia	Giuliana	Tagliacozzo	Falerno	Padova	Castell'Azzara	Caserta	Comune localizzazione
CONFERIMENTO INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO EREDO DELLA CABELLA DEDICATO A SAN FRANCESCO	RECUPERO TRAMITE RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA ABRESCI	ILUOIR DELLO SPIRITO E DELLA NATURA PARCO EDICODICO ATTREZZATO	RESTAURO CONSERVATIVO DEL CONPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CHIANA	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	RESTAURO CONSERVATIVO E CONFERIMENTO DEL SANTUARIO MARIA SS DELL'ORIENTE E SUO MUSEO ORIENTALE	OAS S GIOVANNI BATTISTA RESTAURO MASSETTA OTTAVIA	MUSEO DIOCESANO D'ARTE SACRA	RECUPERO DI VILLA BRONZESCA	RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DELLA DONNA PACIS	Titolo intervento
PARTICOLARE DI S. MARIA E S. MICHELE	FONDO CASA SCOLASTICO BOFFENHOF	CURIA VESCOVALE NEL R. RAPOLLA VENOSA	DIOCE PATRIMONIO DI VENEZIA	COMUNE DI GALATINA	PROV. ABRUZZO FRATTAMAGGIORE BERGAMO	PARRICCIA MATERE S GIOVANNI BATTISTA	DIOCESI DI PADOVA	COMUNE DI CASTELL'AZZARA	ARCIDIOCESI DI CATANIA	Soggetto beneficiario
208.400.000	2.811.921.000	1.660.000.000	4.200.000.000	450.000.000	2.405.940.000	1.009.726.000	5.643.000.000	5.935.510.000	867.364.000	Costo Stimato
158.400.000	2.811.921.000	1.660.000.000	2.000.000.000	435.000.000	2.405.940.000	889.726.000	4.455.000.000	5.435.510.000	834.364.000	Finanziamento attribuito
50.000.000	0	0	2.200.000.000	15.000.000	0	120.000.000	1.188.000.000	500.000.000	53.000.000	Altre fonti
0	0	166.000.000	0	28.500.000	275.000.000	0	0	50.000.000	43.000.000	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	166.000.000	0	28.500.000	275.000.000	0	0	50.000.000	43.000.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
158.400.000	2.463.921.040	0	1.768.040.186	383.467.112	2.008.534.000	778.726.400	4.454.964.791	4.765.510.000	791.363.040	Impegni di spesa
79.200.000	1.231.980.520	0	884.020.063	196.733.556	1.004.267.000	389.863.200	2.227.482.380	2.362.755.000	385.681.520	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	1.908.204.000	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2611	2609	260	2581	2578	2570	2569	2558	2552/B	2552/A	Protocollo
Perugia	San Giovanni Robbio	Magliengo	Cinisello	Aquino	Nepesina	San Giovanni Vulturno	One Lupa	Bolognina	Bolognina	Comune localizzazione
RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DEL SEMINARIO VESCOVILE	CENTRO DI ACCOGLIENZA GLI ANGELI DI PADRE PIO	CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI FORMAZIONE	RECUPERO FUNZIONALE DEL CASTELLO DI ROSSIGNA PER L'ACCOGLIENZA BASSO COSTO	RISACCIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DEGLI SCAVI DELLA ALTA SETTEPONTINALE DELLA BASILICA PATRIARCALE	INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA BETANA	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CONPLESSO DI SANTA MARIA IN MAMA AD USO OSTELLO E SERVIZI	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX CASERMA S. PIETRO VIA GIUNTA DEI MONACI BENEDETTINI DI S. PIETRO	RESTAURO DELLA CAPPELLA DELL'ANNUNZIATIONE (MISTERO) E DELL'ARCO DEL MICHELLO	RESTAURO DEL TRATTO URBANO DI PORTICO, ARCHI DA 1 a 68 e da 214 a 299	Titolo intervento
SEMINARIO VESCOVILE	PROV. FOGGIA FRATELLI LANCINI CAPPUCCINI	SANTUARIO NOBILITA SIGNORA DELLA VITTORIA	PIA' UOMO DOTTINIA CRISTIANA	ARCIDIOCESI DI GORITIA	ARCIDIOCESI DI NAPOLI	PARROCCHIA DI SANTA TERESA D'AVOLA	COMUNE DI OROLITA	SANTI DELLA B V DI SANLUCA	SANTI DELLA B V DI SANLUCA	Soggetto beneficiario
1.500.000.000	13.541.000.000	2.500.000.000	4.450.000.000	3.053.659.000	2.884.000.000	941.000.000	1.726.000.000	798.100.000	2.068.000.000	Costo Stimato
800.000.000	11.041.000.000	1.500.000.000	3.950.000.000	3.053.659.000	2.884.000.000	845.000.000	1.526.000.000	648.100.000	1.718.000.000	Finanziamento attribuito
700.000.000	2.500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	0	0	296.000.000	200.000.000	150.000.000	350.000.000	Altre fonti
0	1.357.300.000	0	0	332.400.000	288.400.000	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	1.357.300.000	0	0	332.400.000	288.400.000	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
550.000.000	9.563.208.865	1.482.680.000	3.580.295.000	2.721.258.474	2.018.655.195	552.600.000	1.509.111.091	648.100.000	1.500.782.886	Impegni di spesa
275.000.000	4.781.604.430	741.330.000	1.795.147.500	1.380.629.240	1.009.327.587	276.300.000	754.555.540	324.050.000	750.381.450	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	221.040.000	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazione dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. Impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura ulteriore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
2617	Massena	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA FABBRICA DEL DUOMO DI MESSANA E DEGLI EDIFICI ANNESSI	ARCIDIOCESI DI MESSANA (L'AVANTI)	3.509.348.000	3.364.348.000	145.000.000	0	0	2.880.447.885	1.430.223.940	0	0	0	0	0	0	0	0
2624	Pesaro	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL COLLEGIO PER LE MANSIONI ALL'ESTERNO DEI FRATELLI MINORI CAPPUCCINI FINALIZZATA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COLLEGIO MANSIONI ESTERNE FRATELLI MINORI	4.470.505.000	4.470.505.000	0	463.000.000	463.000.000	4.007.511.681	2.003.756.840	0	0	0	0	0	0	0	0
2667	Correggio	RECUPERO FABBRICATO LA ROCCHETTA DA DESTINARE A STRUTTURAZIONE RICETTIVA OSTELLO	COMUNE DI CORREGGIO	960.000.000	550.000.000	400.000.000	0	0	536.599.700	268.299.850	0	0	0	0	0	0	0	0
2668	Rubbiera	RECUPERO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO LA CORTE ORIENTALE E PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI RUBBIERA	3.307.126.000	3.307.126.000	500.000.000	0	0	3.287.838.995	1.643.819.485	0	0	0	0	0	0	0	0
2683	Chiusi	CENTRO CONSORTILE DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL FLUSSO TURISTICO RELIGIOSO E CULTURALE	CONSORZIO CELESTINIANO SOC. COOP. A R.L.P.A.	1.806.000.000	1.806.000.000	0	780.600.000	180.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2695	Casaleone Ne Monti	RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO ANNESSO ALL'EREMO DI BISANTINOVA PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO	PARROCCHIA DI S. APOLLINARE VESCOVO	700.000.000	350.000.000	350.000.000	0	0	350.000.000	175.000.000	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2719	Piave	RECUPERO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALI E DELL'EDIFICIO RELIGIOSO MADONNA DELLA TENEREZZA	PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLE CARCERI	2.100.000.000	965.000.000	1.135.000.000	0	0	965.000.000	482.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Matteia	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI SPIRITUALITA' S. ANNA	ARCIDIOCESI DI MATERA RISMA	5.358.970.000	4.858.970.000	500.000.000	450.000.000	450.000.000	3.411.580.000	1.705.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2739	Sarzana	OPERAZIONE DI SAN GEROGLAMO	PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA	721.000.000	577.000.000	144.000.000	0	0	380.083.500	180.046.750	0	0	0	0	0	0	0	0
2751	Anguillara Sabazia	RESTAURO CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL'OPRATORIO PER ESSERE ADIBITI A CASA PER FEMME	DOCEBI DI ANGELO CONTINUA SANSEPOLCRO	900.000.000	550.000.000	350.000.000	0	0	395.868.000	197.984.000	0	0	0	0	0	0	0	0

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2647/C	2647/B	2647/A	2639	2611	2761	2777	2770	2763	2754	Protocollo
Cagliari	Cagliari	Cagliari	Cagliari	Ferrara	Bergamo	La Spezia	Napoli	Sannio	Brescia	Comune localizzazione
RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VIA DUOMO	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VIA FOSSARO	RESTAURO CATTEDRALE E LOCALI ADIACENTI	ANFITEATRO ROMANO - OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO CONSERVATIVO EX CONVENTO DEI GESUITI	RECUPERO STRUTTURE EDIFICIO QU. SEDE VESCOVILE IN BRUGNATO DA DESTINARE A SPAZIO CULTURALE E RELIGIOSO POLIFUNZIONALE	MUSEO DIOCESANO DELLA SPEZIA	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' ARENELLA	RESTAURO CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CONVENTO DEI SERVI DI MARIA PER ESSERE UTILIZZATO A CASA DI ACCOGLIENZA	CITTADELLA MARINA CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI RICESSIONE	Titolo intervento
SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI CAGLIARI	ENTE PARROCCHIA DI S. CECILIA	ENTE DIOCESANO CATTEDRALE E DI CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	SEMINARIO VESCOVILE DI COMACINO	CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA	CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA	PROV. NAPOLETANA PADOVA SCOTI	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA	PROV. DI NAPOLI ORDINE DEI CARMELITANI	Soggetto beneficiario
955.000.000	2.539.000.000	4.493.000.000	5.650.000.000	4.067.000.000	1.304.000.000	4.578.000.000	6.340.000.000	1.250.000.000	2.238.498.000	Costo Stimato
955.000.000	2.539.000.000	4.493.000.000	2.150.000.000	3.597.000.000	1.304.000.000	4.578.000.000	1.330.000.000	875.000.000	1.988.498.000	Finanziamento attribuito
0	0	0	3.500.000.000	470.000.000	0	0	5.010.000.000	375.000.000	250.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	135.000.000	457.800.000	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	135.000.000	457.800.000	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
888.251.200	2.362.003.200	4.184.505.600	1.827.787.000	3.540.268.336	1.168.384.000	0	1.229.500.000	891.130.000	1.688.497.857	Impegni di spesa
444.125.600	1.181.001.600	2.082.252.600	913.883.500	1.770.134.170	584.182.000	0	614.750.000	345.565.000	844.248.830	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	875.399.140	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2915	2913	2908	2897	2893	2875	2864	286	2853	2848	Protocollo
Frosinone	Frosinone	Benevento	Monza	Ferrara	Venezia	San Marino	Napoli	Lecce	Cagliari	Comune localizzazione
RESTAURO DELLA FACCIATA LATERALE E DELLA CATTEDRALE DI S. ROMOLO	RISTRUTTURAZIONE DI CASA CARROZZA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA ROCCA VERGATA E DI BERTINORO A FINI DI RESIDENZE QUADRILARI	RECUPERO A FINE RICETTIVE E CREAZIONE INFRASTRUTTURE PER ACCOGLIENZA NELL'AREA DEL SANTUARIO DEI SANT'AMICI COSMA E DAMIANO	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'ALMONDO PER COMPLETAMENTO EX CONVENTO DI S. SPIRITO	RICETTIVITA' E SERVIZI PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI NELL'AMBITO DELLA STRUTTURAZIONE PER ANZIANI CASA DI RIPOSO AL SS. GIOVANNI E PAOLO A VENEZIA	COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DEL CONVENTO DELLA CHIESA E DEL BOSCO DI MARIA SS. DI S. ROMOLO CON CENTRO DI ACCOGLIENZA PER I PELLEGRINI	SISTEMAZIONE AREA PERTINENZA E VIABILITA' DI ACCESSO CHIESA S. ELIA	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONASTICALE DEL MONASTERO EUCARISTICO ACCESSIBILITA' TOTALE IN UN PERCORSO PLURIENSCALARE	RESTAURO DELL'AUTONOMA PIAZZA DETTORI	Titolo intervento
CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI FROSINONE	COMUNE DI FROSINONE	DIOCESI FORL' BERTINORO	DIOCESI DI VERONA	COMUNE DI FERRARA	I.R.E. ISTITUZIONE DI RIPOSO E DI EDUCAZIONE	PROV. DI S. MARINO	PROVINCIA DI CAGLIARI	PROV. DI LECCE	COMUNE DI CAGLIARI	Soggetto beneficiario
529.683.000	1.894.340.000	5.483.044.000	11.009.800.000	2.071.287.000	3.280.000.000	5.890.000.000	300.000.000	5.037.588.000	1.740.000.000	Costo Stimato
383.782.000	1.484.340.000	3.633.044.000	9.728.800.000	2.071.287.000	3.280.000.000	5.290.000.000	300.000.000	5.037.588.000	1.740.000.000	Finanziamento attribuito
145.921.000	430.000.000	1.850.000.000	1.283.000.000	0	0	600.000.000	0	0	0	Altre fonti
0	0	0	0	0	326.000.000	529.000.000	30.000.000	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	326.000.000	529.000.000	30.000.000	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
249.442.800	1.338.339.730	2.454.544.000	9.728.160.900	1.901.415.370	2.539.277.900	3.365.299.975	0	5.037.588.098	1.704.557.820	Impegni di spesa
124.721.450	689.689.870	1.227.272.000	4.863.080.250	950.707.690	1.289.638.950	1.692.649.980	0	2.518.794.050	852.278.910	Lavori acconto 50%
0	0	981.817.600	3.890.464.200	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazione dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3030	3008	2986	2989	2982	2981	2972	2949	2949	2918	Protocollo
Verona	Padova	Mogliano Veneto	Ferrite	Carnaro	Capua	Sare	Mogliano Veneto	Mogliano Veneto	Milano	Comune localizzazione
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO PASTORALE MONS CARPANO	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. CROCE CENTRICA DELLA BASILICA DI S. GIUSTINA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE AL FINE DI ACCOGLIERE A BASSO COSTO E ASSISTENZA	CONTROLLO IN TEMPO REALE DEI TRANSITI DEI BUS TURISTICI	RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO E DI ACCOGLIENZA ISTITUTO S. EUFEMIA	RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO MONACALE S. CATERINA	REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA ED IL RISTORO SERVIZI UFFICI E PACCO TA PER IL RECUPERO A FINE DI OSPITALITÀ CON RELATIVI SERVIZI DEL CONVENTO	COMPLESSO SCOLASTICO E DI ACCOGLIENZA PER IL RISTORO E LA SOSTA DEI BUS TURISTICI	COMPLESSO SCOLASTICO E DI ACCOGLIENZA PER IL RISTORO E LA SOSTA DEI BUS TURISTICI	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI IN CONCA	Titolo intervento
CENTRO MONS CARPANO FONDI DI RELIGIONE	MONASTERO SANTA GIUSTINA	CASA REL. COLLEGGIO SALESIANO AUSTONI	COMUNE DI FERRITE	CONGR. GIUSEPPE FRANCESCO SACRI CUORI	CONGR. GIUSEPPE FRANCESCO SACRI CUORI	SEMINARIO ARCIVESCOVILE E DI S. MARIA	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	SOPRINTENDENZA A. DELLA LOMBARDIA	Soggetto beneficiario
2.918.810.000	808.000.000	534.000.000	848.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	2.386.810.000	2.325.000.000	2.325.000.000	700.000.000	Costo Stimato
2.818.810.000	800.000.000	444.000.000	719.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	1.856.810.000	2.325.000.000	2.325.000.000	700.000.000	Finanziamento attribuito
300.000.000	8.000.000	90.000.000	127.000.000	0	0	510.000.000	0	0	0	Altre fonti
0	74.000.000	0	0	100.000.000	150.000.000	190.300.000	0	232.500.000	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	74.000.000	0	0	120.000.000	150.000.000	190.300.000	0	232.500.000	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
2.187.810.000	653.562.227	441.511.105	706.820.972	881.634.459	1.249.389.680	1.418.510.000	480.000.000	1.432.865.369	0	Impegni di spesa
1.080.805.000	326.781.113	220.755.550	353.410.490	430.817.230	624.694.840	708.255.000	0	726.332.684	0	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	344.653.780	499.755.870	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	480.000.000	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000.000	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3151	3135	3130	3080	3066	3085	3063	3060	3048/B	3034	Protocollo
Milano	Casaleino	Capua	Saazera	Seno	Seno	Seno	Seno	Verona	Fiume	Comune localizzazione
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. EUSTORIO	RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA DI S. PIETRO ALTA - PRESSO IL SANTUARIO DI LAMPEDUSA	CENTRO DI ACCOGLIENZA PRESSO LA CASA CANONICA DELLA BASILICA BENEDETTINA DI S. ANGELO IN FORMIS	TERRENCA QU'INTERNA DELLA FIDE	RISULTA BALDASSARE PERUZZI CENTRO STORICO	POSTEGGIO BALDASSARE PERUZZI	POSTEGGIO PIAZZALE ROSSELLI	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI SPAZI LITURGICI PER LA FRUIZIONE DEI PELLEGRINI CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA SACERDOTA VECCHIA SANTA CATERINA DELLA NOTTE CAPPELLA DEL MANTO	AMPLIAMENTO DEL CASTELLO DELLA GIOVENTU' NELLA FORESTERIA DI VILLA FRANCESCO ALTI - FORESTERIE ALA EST - CORPO PRINCIPAL E ALA OVEST - SERRE SCALINATA BAROCCA	AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO BUS TURISTICA A FRENZE SUD	Titolo intervento
PARRICCIA DI S. EUSTORIO	PARRICCIA DI S. PIETRO ALTA - PRESSO IL SANTUARIO DI LAMPEDUSA	COMUNE DI CAPUA	COMUNE DI STAZZERA	COMUNE DI SENO	COMUNE DI SENO	COMUNE DI SENO	COMUNE DI SENO	DIOCESI DI VERONA	COMUNE DI FRENZE	Soggetto beneficiario
2.093.036.000	802.000.000	2.800.000.000	354.000.000	4.500.026.000	8.019.933.000	18.172.000.000	8.080.808.000	3.247.000.000	3.411.000.000	Costo Stimato
1.251.036.000	500.000.000	1.300.000.000	248.800.000	4.500.026.000	8.019.933.000	14.322.000.000	4.880.808.000	3.247.000.000	2.855.000.000	Finanziamento attribuito
842.000.000	102.000.000	1.300.000.000	108.000.000	0	0	3.850.000.000	1.400.000.000	0	556.000.000	Altre fonti
0	0	130.000.000	0	400.000.000	700.000.000	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	130.000.000	0	400.000.000	700.000.000	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.251.036.000	429.962.500	0	210.287.375	3.341.025.900	5.319.833.000	12.540.240.000	1.383.666.270	2.942.044.036	1.247.214.800	Impegni di spesa
625.518.000	214.981.250	0	105.143.885	1.670.512.950	2.659.986.500	6.270.120.000	696.833.120	1.471.022.020	623.607.400	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

327	3253	320	3194	3185	3175	3174	3172	3163	3152	Protocollo
Canali	Venezia	Genova	Firenze	Canali	Livorno	Livorno	Livorno	L'Aquila	Matera	Comune localizzazione
OSTELLO PER L'ACCOLLENZA A BASSO COSTO DEL PELLEGRINO	OPERE RELATIVE AL RESTAURO DELL'ANTICO OSTELLO DEI PELLEGRINI E DELLE COBERTURE DELL'INTERNO COMPLESSO ARCHITETTONICO	SISTEMA REGIONALE LIGURE DI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TURISTICHE S.I.R.I.P.T.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO OTTICO TURIA E PARNASSO	RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO S. PASQUALE	CENTRO DI ACCOGLIENZA GIOVANNI PAOLO II PER GIOVANI PELLEGRINI D'ITALIA E D'EUROPA	CENTRO PER GIOVANI CASA BELVEDERE	PARCHETTO SCALA SANTA	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA BASILICA DI S. MARIA DI COLLEMAIO	RISTRUTTURAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL CORTE INTERNO ED EDIFICI LIMITROFI	Titolo intervento
SEMINARIO ARCV. DI ROSSANO CARALI	CONGREGAZIONE ANIMATA MECHITARISTA	REGIONE LIGURIA	COMUNE DI FIRENZE	COMUN. SUONE SERVE DEI FOVERI	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDENZA B.A.A. S. PER L'ABRUZZO	SANTUARIO SANTA MARIA DI PICCIANO	Soggetto beneficiario
2.345.530.000	6.480.600.000	1.130.000.000	2.000.000.000	316.000.000	10.748.000.000	4.832.000.000	640.000.000	5.000.000.000	4.224.000.000	Costo Stimato
2.345.530.000	5.580.600.000	780.000.000	1.760.000.000	292.000.000	10.748.000.000	4.752.000.000	640.000.000	5.000.000.000	4.194.000.000	Finanziamento attribuito
0	900.000.000	350.000.000	231.000.000	24.000.000	0	80.000.000	0	0	30.000.000	Altre fonti
244.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	440.700.000	O.N.T. Impegni di spesa
244.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	440.700.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
2.003.026.877	5.580.600.000	780.000.000	1.768.918.317	225.586.907	0	0	0	0	3.463.300.000	Impegni di spesa
1.007.513.440	2.790.300.000	390.000.000	884.459.660	112.793.453	0	0	0	0	1.731.650.000	Lavori acconto 50%
801.210.750	0	0	0	0	0	0	0	0	1.385.320.000	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	10.748.000.000	4.752.000.000	640.000.000	5.000.000.000	0	Amministrazioni dello Stato

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 10 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. Impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura ulteriore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
3276	Ravenna	REALIZZAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE LA BASILICA DI S. APOLLINARE IN CLASSE COME LA REALIZZAZIONE DI VARI SERVIZI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA ALLA SOSTA E IL RISTORO	COMUNE DI RAVENNA	4.699.188.000	3.899.188.000	1.000.000.000	0	0	3.699.187.981	1.849.583.940	0	0	0	0	0	0	0	0
3277/A	Ravenna	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL PERCORSO FRA GLI 8 MONUMENTI RAVENNATI INSERITI NELLA MOLA DI IERITAGE DELL'UNESCO (1° LOTTO) - PERCORSO X	COMUNE DI RAVENNA	1.306.133.649	534.133.649	852.000.000	0	0	525.753.716	262.876.860	0	0	0	0	0	0	0	0
3277/B	Ravenna	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL PERCORSO FRA GLI 8 MONUMENTI RAVENNATI INSERITI NELLA MOLA DI IERITAGE DELL'UNESCO (2° LOTTO) - PERCORSI "B", "C", "D", "E" E "F"	COMUNE DI RAVENNA	1.371.485.287	1.371.485.287	0	0	0	1.363.049.975	681.524.990	0	0	0	0	0	0	0	0
3278/A	Ravenna	REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (1° LOTTO) - "PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE A SCALVACCO DELLA FERRACIA"	COMUNE DI RAVENNA	1.083.000.000	929.000.000	154.000.000	0	0	864.451.436	432.225.718	0	0	0	0	0	0	0	0
3278/B	Ravenna	REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (2° LOTTO) - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE - "SALA INGLESE"	COMUNE DI RAVENNA	372.000.000	356.000.000	16.000.000	0	0	342.501.475	171.250.740	0	0	0	0	0	0	0	0
3278/C	Ravenna	REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (3° LOTTO) - "PARCHING ABILITATO PEDONALE E CICLABILE - PK - EDIFICIO IN SERVIZIO"	COMUNE DI RAVENNA	5.126.002.504	2.078.002.504	3.050.000.000	0	0	1.686.464.329	843.232.160	0	0	0	0	0	0	0	0
3279	Ravenna	SISTEMAZIONE DI PIAZZA DELLA RESISTENZA PER TERMINAL BUS TURISTICI E SPAZIO DI SOSTA	COMUNE DI RAVENNA	1.721.607.000	1.121.607.000	600.000.000	0	0	1.083.767.282	546.883.640	0	0	0	0	0	0	0	0
3285	Ravenna	ADEGUAMENTO DELL'ACCESSO ALLA CANTIERA DI S. VITALE CON OPERE DI SISTEMAZIONE DI PIAZZETTA DELL'ESARCATO E VIA FIANDRINI	SOPRINTENDENZA S. A. A. DI RAVENNA	980.000.000	980.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980.000.000
3286	Ravenna	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA BASILICA DI S. VITALE E IL MAUSOLEO DI GALLA PLACIDA ED IL MUSEO NAZIONALE	SOPRINTENDENZA S. A. A. DI RAVENNA	700.000.000	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000.000
3289	Ravenna	COMPLESSO DELLA BASILICA DI S. APOLLINARE NUOVO RECUPERO DEL CINEMA CORSO COME SALA POLIVALENTE CENTRO DI ACCOGLIENZA E RISTORO MUSEO DEI MONACI DEL PALAZZO DI TEODORICO RESTAURI DELLA BASILICA	ARCIDIOCESI DI RAVENNA	6.330.450.000	5.030.450.000	1.300.000.000	0	0	5.030.450.500	2.515.225.250	0	0	0	0	0	0	0	0

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura ulteriore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
329	Capaccio	RESTAURO MONUMENTO NAZIONALE SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO	SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO	3 037.000.000	3 037.000.000	0	239 700 000	239 700 000	1 729 791.016	864 895 505	0	0	0	0	0	0	0	0
3291	Ravenna	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX ORFANOTROFIO SOSTITUITO OGGI IN ABBOSSI FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UNO SPAZIO DI ACCOGLIENZA CON SERVIZI INTERNI PER UN TOTALE DI 70 POSTI LETTO	ARCHIDIOCESI DI RAVENNA CERNIA	8.164 700 000	4 164 700 000	2 000 000 000	0	0	4 164 703 000	2 082 357 500	0	0	0	0	0	0	0	0
330	Isola Del Gran Sasso d'Italia	RISTRUTTURAZIONE INTERNA E RIFACIMENTO DEL TETTO DELL'ALA EST DEL CONVENTO DI SAN GABRIELE DELL'ADOLFORAIA	PROVINCIA DI MACRASS DELLA PIA' DEL PADRI PASS	3 351 000.000	3 351.000.000	0	335 100 000	335 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3314	Firenze	SERVIZIO DI VISITA GUIDATA AI MUSEI DI FIRENZE CON I BAMBINI	COMUNE DI FIRENZE	1 080 000 000	961 000 000	119 000 000	0	0	630 760 000	315 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3315	Firenze	CHIESA DI S. M. NOVELLA E CRISTOFORI COMPTON ETABIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTIRISURSIONE TVCC RIVELAZIONE INCENDIO E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RILEVAMENTO E PROTEZIONE DALLE RICHIEDE E RESTAURO	COMUNE DI FIRENZE	1 641 000 000	1 171 000 000	470 000 000	0	0	1 169 566.380	584 783 180	0	0	0	0	0	0	0	0
3318	Castiglion Del Capo	CONSERVATIVO DELLA BASILICA DEL SANTUARIO DI SANTA MARIA DI LECUA MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORME DEGLI EDIFICI MARIUS STELLA E PENSIONE SANTUARIO	ENTE SANT. S. M. DI LECUA E PARROCCHIA	4.050.035.000	3 510.035 000	540 000 000	0	0	3 510 004 540	1 755 017 270	1 404 013 815	0	0	0	0	0	0	0
3338	Montorio Inferiore	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL CONVENTO DI S. LEO DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA E SERVIZI	COMUNE DI MONTORIO INFERIORE	2 442.300 000	2.142.300 000	300 000.000	0	0	1 642 300 000	921 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3339	Venezia	RESTAURO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI LATERALI DELLA CHIESA E DEL CAMPANELLO E CONSOLIDAMENTO PULITURA E RESTAURO DEGLI AFFRESCHI NELL'AREA PRESBITERALE	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO	2 217 429 000	1 817 429 000	400.000.000	0	0	1 817 428.561	908 714 280	726 871 425	0	0	0	0	0	0	0
334	Pesca	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CANONICA DELLA CHIESA DI S. MARCONIA PER FORMAZIONE DI STRUTTURAZIONE DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	DIOCESI DI PESCA	870 000 000	268 000 000	402 000.000	0	0	221 000 000	115 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3360	Palermo	RIQUALIFICAZIONE DI COMPLESSO EDIZIO AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DEGLI IMPIANTI E ADEGUAMENTO DELL'AGIBILITA' DELLE AREE ESTERNE	OPERA DIOG PRESERV. DIFF DELLA FEDE	1 500 000.000	1 450 000 000	50.000.000	95 000 000	95 000 000	1 146 828 000	573 414 000	0	0	0	0	0	0	0	0

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 10 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. Impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura ulteriore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
3451	Montechiaro D'Alb	CONSEGNA E RESTAURO CHIESA ROMANICA SS. MAZARIO E CELSO MONTECHIARO D'ALB	PARROCCHIA DEI SS. BARTOLOMEO E CATERINA REG. P.O.	800.000.000	800.000.000	0	0	0	799.356.500	399.678.250	0	0	0	0	0	0	0	0
3432	Cervara	PRODIGAZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL SANTUARIO S. DELLA GUARDIA PROROMO E SISTEMAZIONE DELLE PERICOLOSE PEDONALI REALIZZAZIONE DI SISTEMA ANTINCENDIO BOSCHIVO OPERE DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE	COMUNITA' MONTANA ALTA VAL POLCEVERA	951.000.000	851.000.000	100.000.000	0	0	851.781.600	425.880.800	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Cortina	SISTEMAZIONE AREA RICETTIVA A SACCARIA	COMUNE DI CORTINA	5.205.000.000	3.805.000.000	1.400.000.000	0	0	452.078.160	0	0	0	0	0	0	452.078.160	0	0
342	Cortina	SISTEMAZIONE AREA RICETTIVA A SACCARIA	COMUNE DI CORTINA	5.205.000.000	3.805.000.000	1.400.000.000	0	0	2.420.430.000	1.210.215.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3417	Varate	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MODERNIZZAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA VILLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	CONGR. S. MARISSA DI DESUS ETERNO	2.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	0	0	1.393.888.500	696.944.250	0	0	0	0	0	0	0	0
3412	Fuente	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI	COMUNE DI FIRENZE	998.000.000	898.000.000	110.000.000	0	0	865.591.200	432.795.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3400	Montepoli	RESTAURO DELLA CHIESA E DELL'INTERNO DELLA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA ASSUNTINA	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTINA	1.500.000.000	1.500.000.000	0	150.000.000	150.000.000	1.350.000.000	675.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3398	Osse di Cella	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA E DEL CONVENTO DELLA PIAZZA S. TERESA IN COLLE COME CENTRO ACCOGLIENZA POVERA	COMUNITA' MONT. MURCIA SUD ORIENTALE	2.840.978.000	2.540.978.000	0	339.900.000	339.900.000	2.601.077.275	1.300.538.640	1.040.430.910	0	0	0	0	0	0	0
3371	Nova Ponente	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO AD OSTELLO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELEGRINI	CONVENTO DI PIETRALBA	5.033.000.000	3.355.000.000	1.678.000.000	0	0	2.457.524.200	1.228.762.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3370	Nova Ponente	RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO AD OSTELLO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELEGRINI	CONVENTO DI PIETRALBA	7.508.000.000	5.006.000.000	2.503.000.000	0	0	3.981.382.186	1.990.691.093	0	0	0	0	0	0	0	0

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3564	3524	352	351	3506	3505	3494	3474	3472	347	Protocollo
Firenze	San Marco in Leno	Torres	Morres	Arezzo	Macerata	Napoli	Macerata	Genova	Benevento	Comune localizzazione
PARCHEGGIO SCAMBIAZIONE E SVINCOLO DI ACCORDO IN LOCALITÀ SAN LORENZO A GREVE	AREE URBANE ED EXTRAURBANE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO NAVETTE	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL CONFINAMENTO DI SANT'ANTONIO MARTELLA, DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E APERTURE PER ATTIVITÀ DI NUOVE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI, RESTAURO DELLA CASA DEL PELLEGRINO, RESTAURO DI ALTRO EDIFICIO ESISTENTE E CREAZIONE DI UN SERVIZIO DI RISTORO CON ANNESSA AREA ATTIVITÀ	RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX CONVENTO DI SAN PIER PICCOLO	POTENZIAMENTO FUNZIONALE DEI BENI CULTURALI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DEL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO DI IMMOBILI DESTINATE AD ATTIVITÀ RICETTIVA A BASSO COSTO CON RELATIVI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO INISIDA FUTURO PIAZZA	RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO DI IMMOBILI DESTINATE AD ATTIVITÀ RICETTIVA A BASSO COSTO CON RELATIVI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO INISIDA FUTURO PIAZZA	RESTAURO RISTRUTTURAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CONFINAMENTO COSTITUITO DALLA CATTEDRALE E DAL CROSTO DI SAN LORENZO	CENTRO GIUBILARE LA PACE COMPLETAMENTO STRUTTURE ESISTENTI	Titolo intervento
COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI SAN MARCO IN LENO	COMUNE DI TORRES	COMUNE DI MORRES	PROCESO DI AREZZO CONTINUA SANSEPOLCRO	SOPRINTENDENZA A.A.S. DI SALENTO	MIN. GIUSTIZIA	DIOCESI DI MONTEVERGINE	DIOCESI DI GENOVA	DIOCESI DI BENEVENTO	Soggetto beneficiario
18.948.815.000	2.620.000.000	741.000.000	1.323.000.000	1.211.000.000	2.540.600.000	1.577.000.000	3.300.000.000	4.473.475.000	3.930.000.000	Costo Stimato
14.680.815.000	2.220.000.000	741.000.000	1.323.000.000	1.093.000.000	2.540.600.000	1.577.000.000	3.300.000.000	3.473.475.000	3.930.000.000	Finanziamento attribuito
4.268.000.000	400.000.000	0	0	118.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	Altre fonti
0	0	83.900.000	154.700.000	0	0	0	330.000.000	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	83.900.000	154.700.000	0	0	0	330.000.000	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
13.480.814.467	1.819.882.000	606.600.879	1.078.243.756	892.880.000	0	0	2.432.600.359	2.235.474.181	3.144.000.000	Impegni di spesa
6.740.407.230	809.941.000	303.300.440	539.121.880	446.440.000	0	0	1.216.300.180	1.117.737.090	1.572.000.000	Lavori acconto 50%
0	0	121.320.176	0	0	0	0	0	894.189.672	1.257.600.000	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura utenze acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	1.981.000.000	1.577.000.000	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3697	3696	3690	3673	3663	3630	3627	3605	3595	3572	Protocollo
Campania 0	Puglia Matera	Matera	Venezia	Puglia	Basilicata	Umbria	Umbria	Campania Lupat	Emilia Romagna	Comune localizzazione
RECUPERO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO AL NOCE	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER L'ACCOGLIENZA NEL CONVENTO DELLA BASILICA DELLA MADONNA DELLA CHIARA	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUIARE ED AUMENTARE LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO ESISTENTE	RISTRUTTURAZIONE DOMUS CAVANIS	LAVORI DI COMPLETAMENTO OSTELLO	RECUPERO DELLE POTENZIALITA' RICETTIVE E RELATIVI SERVIZI DEL SANTUARIO DI MONTE SAN GIOVANNI. RISTRUTTURAZIONE DEI FABBRICATI CASA NUOVA E DELLA GALLERIA DEL TEMPIO	RESTAURO CONSERVATIVO A FINI DI RIUTILIZZO DELLA CHIESA E CONVENTO MARIA SS. DEL MONTE CARMELO	RECUPERO EX EDIFICIO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IL TURISMO RELIGIOSO E CULTURALE	RESTAURO CONSERVATIVO RIUTILIZZO FUNZIONALE CHIESA DI LUCA	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DIOCESANO NEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAVONA	Titolo intervento
	COLLEGIO ANTONIANO DELLE MISSIONI ESTERE DEI FRATI	ISTITUTO RIPARTIZIONE SACRO CUORE	CONGR. S. DI CARITA' IST. CAVANIS	COMUNE DI MOTTACASALE	ENTE DI CULTO SANTI N. S. DI ORIPA	PARROCCHIA MARIA SS. DEL MONTE CARMELO	COMUNE DI S. MARINO	COMUNE DI CAMPANOVA LUPA	DIOCESI DI SAVONA NOVI	Soggetto beneficiario
580.000.000	4.994.014.000	1.000.000.000	1.898.000.000	626.746.000	3.020.000.000	2.422.976.000	1.705.268.000	1.156.000.000	530.000.000	Costo Stimato
410.000.000	3.394.014.000	500.000.000	1.398.000.000	596.746.000	3.020.000.000	2.362.976.000	1.705.268.000	712.000.000	530.000.000	Finanziamento attribuito
170.000.000	1.600.000.000	500.000.000	300.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	444.000.000	0	Altre fonti
0	0	0	0	0	302.000.000	252.600.000	180.200.000	0	53.000.000	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	302.000.000	252.600.000	180.200.000	0	53.000.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
356.780.280	3.013.415.219	465.700.496	1.322.989.000	496.295.088	2.291.207.667	2.140.375.400	905.067.200	638.609.574	452.157.014	Impegni di spesa
178.385.140	1.506.707.610	232.850.250	661.494.500	248.147.540	1.145.603.830	1.070.187.700	452.532.600	319.804.790	226.078.510	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	856.150.160	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3792	3773	3771	3761	3751	3719	3714	3703	3700	370	Protocollo
Bonifazi	Triperio	Ferraro	Sola	Chenonville	Campanini	Vecchi	Pera	Pedone	San Gennaro	Comune localizzazione
OSTELLO DI ACCOGLIENZA PER TURISMO SOCIALE	RESTAURO E SISTEMAZIONE DI PARTE DEI LOCALI DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA E SALE D'INCONTRO	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI	INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE CHIESA CROSTI DI S. FRANCESCO	RESTAURO DEL SANTUARIO MADONNA DELLE NEVI E AMPLIAMENTO DELL'ATTIGIO OSTELLO DEL LAGO MISERIN	RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO ANZIO RICETTIVITA'	OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA	RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA LEONA PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO PER PELLEGRINI	PARCHI E GIOCHI AUTO E BUS ABBANDONATI BARBIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI PERCORSO DI ACCESSIBILITA' ALLA CELLA DEL SANTO CON ADEGUAMENTO DELLA ZONA PRESBITERALE	RISTRUTTURAZIONE DI ECCELSA ESISTENTE PER IL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OSPITALITA' A BASSO COSTO	Titolo intervento
COMUNE DI BONIFAZI COSENZA	DIOCESI DI TRAPANI	COMUNE DI FIRENZE	PROV. LIGURIE REGIONE EMILIA ROMAGNA	PARROCCHIA DI SAN NICOLA DI GIAMPOCCHETTI	COLL. ANTONINO MISSORI ESTERRE PRATI	COMUNE DI VERONA	COMUNE DI PAVIA	PARROCCHIA REG. S. ANTONIO D'ARCELLA	MONASTERO BENEDETTO MALOMBRUSA NE	Soggetto beneficiario
2 765 000 000	834 750 000	994 000 000	970 000 000	1 000 000 000	4 100 000 000	4 104 300 000	1 688 800 000	1 100 000 000	893 627 000	Costo Stimato
2 265 000 000	784 750 000	884 000 000	820 000 000	1 000 000 000	2 000 000 000	4 104 000 000	1 688 000 000	1 100 000 000	843 627 000	Finanziamento attribuito
500 000 000	50 000 000	110 000 000	150 000 000	0	2 100 000 000	0	0	0	50 000 000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	168 800 000	110 000 000	38 500 000	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	168 800 000	110 000 000	38 500 000	O.N.T. Anticipazioni 10%
2 264 272 659	779 225 000	882 990 960	820 000 000	993 517 500	1 796 497 600	4 091 661 572	0	989 480 000	755 127 151	Impegni di spesa
1 132 136 329	389 612 500	441 495 480	410 000 000	496 756 750	896 246 800	2 345 830 790	0	494 730 000	377 563 570	Lavori acconto 50%
905 709 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3940	394	3914	3902	3885	3885	3868/C	3868/B	3868/A	3868	Protocollo
Macopiano	Forano Moderne	Marmondo	Genosa	Sarna	Sarna	Arzignano	Arzignano	Arzignano	Arzignano	Comune localizzazione
RECUPERO DEI SENTIERI STORICI RELIGIOSI TRADIZIONALMENTE UTILIZZATI NEL PELLEGRINAGGIO VERSO IL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASA DEL PELLEGRINO A SERVIZIO DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE NEL CASTELLO	RECUPERO AI FINI RICETTIVI DI ALCUNI EDIFICI STORICI DISMESSI	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI RISTORAZIONE PRESIDIO SANTUARIO	STRUTTURA RICETTIVA EXTRA ALBERGHIERA CASA PER FIERE	STRUTTURA RICETTIVA EXTRA ALBERGHIERA CASA PER FIERE	LOGGIA DEL VICARIO DELLA SERENISSIMA	EX CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE	EX CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE	RECUPERO DELLA ROCCA SCALIGERA E DEGLI IMMOBILI ADIACENTI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA E DELL'EX CONVENTO FRANCESCO DI S. MARIA DELLE GRAZIE DI PROPRIETA' PRIVATA PER LA CREAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO NEL COMUNITA' DEL MONTEVERGINE	Titolo intervento
DIOCESI DI MONTEVERGINE	ENTE DIC. SALUTE E EDUCAZIONE	COMUNE DI MORMONDO	COMUNE DI GENOSA	SEMINARIO ARCIVESCOVILE E DI SIENA	SEMINARIO ARCIVESCOVILE E DI SIENA	PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA V. MARIA	PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA V. MARIA	PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA V. MARIA	PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA V. MARIA	Soggetto beneficiario
1.439.000.000	1.499.000.000	8.204.000.000	303.965.000	1.063.770.000	1.063.770.000	447.515.308	2.410.170.000	3.622.094.692	6.895.430.000	Costo Stimato
1.439.000.000	800.000.000	4.900.000.000	203.965.000	823.770.000	823.770.000	244.010.502	2.196.000.000	3.222.769.498	6.068.430.000	Finanziamento attribuito
0	699.000.000	3.304.000.000	100.000.000	240.000.000	240.000.000	203.504.806	214.170.000	399.325.194	817.000.000	Altre fonti
150.000.000	0	0	0	0	84.600.000	0	0	0	616.900.000	O.N.T. Impegni di spesa
150.000.000	0	0	0	0	84.600.000	0	0	0	616.900.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.288.010.206	800.000.000	3.980.610.018	203.964.388	195.200.000	538.170.000	219.325.032	1.972.682.200	2.895.195.594	0	Impegni di spesa
644.005.100	400.000.000	1.995.305.010	101.982.190	0	269.585.000	109.682.516	986.341.100	1.447.597.797	0	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	215.668.000	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	175.680.000	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV 4 - Struttura finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4019	4015/B	4015/A	400	3992	3990	397	396	3946	3943	Protocollo
Avellino	Arezzo	Arezzo	Modena	Acerra	Stabia	Nonantola	Modena	San Nazario Sauro	Perugia	Comune localizzazione
OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 3° ED ULTIMO LOTTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI ROBERTO FACENTE PARTE DEL COMPLESSO RELIGIOSO ROBERTO	REALIZZAZIONE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI S. MARIA DELL'ALTAZZA	REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO DELLA GIOVENTÙ	CENTRO DELL'UMANITA' ACCOGLIENZA RECUPERO LOCALITÀ MONASTERO SS ANNUNZIATA	RESTAURO CONSERVATIVO BASILICA S. MARCELLO CONSOLIDAMENTO IDROLOGICO E RECUPERO AMBIENTALE	OPERE DI MANUTENZIONE COMPLESSO ABBAZIALE	REALIZZAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO DI MODENA	ISTRUTTURAZIONE AL 1° PIANO DELL'ALA EST E SUD DEL CHIOSTRO BENEDETTINO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INFORMATIVO E DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AI PERICOLI GRIEVIABILI	Titolo intervento
PROVINCIA NAPOLETANA DEI FRATI CAPPUCCINI	CURIA VESCOVILE DI MANDORLIONE	CURIA VESCOVILE DI MANDORLIONE	ISTITUTO PROV. S. FILIPPO E S. BERNARDINO	DIOCESI DI ACERRA	COMUNE DI STRADELLA	ARCIDIOCESI DI MODENA E NONANTOLA	BASILICA METROPOLITANA	ABBAZIA BENEDETTINA S. NAZARIO E CELSO	AMM. PROVINCIALE DI PERUGIA	Soggetto beneficiario
5.264.688.068	2.722.000.000	1.180.000.000	2.330.000.000	6.196.000.000	494.000.000	5.584.000.000	2.630.000.000	500.000.000	2.000.000.000	Costo Stimato
1.993.000.000	2.722.000.000	1.180.000.000	1.550.000.000	5.896.000.000	398.000.000	3.584.000.000	1.200.000.000	450.000.000	1.950.000.000	Finanziamento attribuito
3.271.688.068	0	0	780.000.000	500.000.000	96.000.000	2.000.000.000	830.000.000	50.000.000	50.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	612.800.000	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	612.800.000	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.993.000.000	2.721.523.650	1.179.726.310	1.389.999.240	4.740.541.500	390.535.400	3.084.000.000	643.359.000	450.000.000	1.626.447.000	Impegni di spesa
996.500.000	1.360.761.825	589.863.155	694.999.620	3.120.270.750	195.267.700	1.542.000.000	321.679.500	225.000.000	813.223.500	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

										Protocollo
										Comune localizzazione
										Titolo intervento
										Soggetto beneficiario
										Costo Stimato
										Finanziamento attribuito
										Altre fonti
										O.N.T. Impegni di spesa
										O.N.T. Anticipazioni 10%
										Impegni di spesa
										Lavori acconto 50%
										Lavori acconto 90%
										Lavori saldo
										Fornitura acconto 50%
										Fornitura ulteriore acconto
										Fornitura saldo
										Acquisizione aree e immobili
										O.N.T. Uffici tecnici
										Amministrazioni dello Stato
4194	415	4111	4110	4105/B	4104	4083	4082	4081	4027	
Fuente	Manoppo	Chiusi della Verna	Chiusi della Verna	Castell'Arquato	L'Anguila	Venezia	Fuente	Ora	San Nazario Sena	
RIEQUILIBRIO CUCINA CENTRALE UFFIZIA DELLA CENTRALE TERAPIA E RELATIVE ALTRE ATTIVITÀ MEDICHE SERVIZIO SANITARIO E SPOLIATO DI VIA DEI BRUNI	STRUTTURALE DI ACCOGLIENZA E DI INFORNAZIONE	AMMODERNAMENTO DELLA CASA PER FINE POSTA ALL'INTERNO DEL SANTUARIO DELLA VERNA	AMMODERNAMENTO DELLA CASA PER FINE POSTA DI 8 FRANCESCO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ INTERNA	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTÀ (VIA LOTTIO)	RESTAURO DEL COMPLESSO MONASTICO DI S. MARIA DI COLLEMANO DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE E POLIFUNZIONALE	RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DELLA BASILICA DELLA SALUTE	POTENZIAMENTO DELLA POSSIBILITÀ RICETTIVA E DI ACCOGLIENZA DEL CONVENTO DELLA CALZA	RESTAURO E RILUTTO DEL RITIRO MARIA ASSUNTA DA ADIBIRE A RITORNO PER IL CENTRO DOCUMENTAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN VIA BARAVIA (EX FORNO)	COMUNE DI S. NAZZARIO SESIA
1 175 000.000	410 990 000	1 115 000 000	946 000.000	595 000 000	2 152.000.000	1 608 314 000	4 388.231.000	1.544 400 000	550 000.000	
1 034 000 000	340 990 000	715 000.000	546 000.000	195 000 000	2 152.000 000	1 408 314 000	2.330.231.000	1.344.400 000	500 000 000	
141.000 000	70 000 000	400 000.000	400 000.000	400 000 000	0	501 000 000	2 058 000.000	200 000.000	50.000 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
773 785 580	252 993 700	610 000 000	452 400 000	180 119 770	2 152.000.000	1 408.313 412	2 330 231 000	1 367 400.000	443.000 000	
386 892 790	126 496 850	305 000 000	226 200 000	80 056 885	1 076 000 000	704 156 710	1 185 115 500	653 700 000	221 500 000	
0	101 197 200	0	0	0	0	563 325 364	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

T.A.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4271	4262	4254	4252	4248	4247	4246	4245	4203	4198	Protocollo
Macina	Modena	Calitri	Monreale	Vitruva	Avignone	Calina	Capri	Orvieto	Firenze	Comune localizzazione
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI LITURGICI ED ARREDI DEL PRESBITERIO E DEL TRANSISTO DELLA CATTEDRALE	RIPISTINO E CONSERVAZIONE DELLA VILLA TEDESCHI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER GIOVANI ED ANZIANI	CENTRO DI ACCOGLIENZA PER LA FORMAZIONE MONALE E RELIGIOSA	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA CASA DEL CLERO DI MONREALE FINALIZZATA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	RIQUALIFICAZIONE SALE RIUNIONE E ACCORRIENZA PER PELLEGRINI	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIADATTAMENTO DELLA CATTEDRALE DI AGRIGENTO E LOCALI ANNESSI	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA STRUTTURA RICETTIVA COLONIA DON BOSCO	AMPLIAMENTO DEL PENSIONATO FEMMINILE ISTITUTO G. PASCALE DI CURI	CENTRO DI ACCOGLIENZA DI SCAMBIO CULTURALE DI PROMOZIONE E FORMAZIONE	AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO TURISTICO A FIRENZE CASTELLO	Titolo intervento
CATTEDRALE S. NICOLA DI BARI	PARROCCHIA DI S. GIORGIO	SEM. VESCOVILE DI CALITRI	ARCIDIOCESI DI MONREALE	PARROCCHIA MADONNA DELLA SALUTE	PARROCCHIA S. GERARDO	OPERA S. GIOVANNI BOSCO	CONGREGAZIONE S. FRANCESCO SACR. CUORI	ARCIDIOCESI DI ORVETO	COMUNE DI FIRENZE	Soggetto beneficiario
1 120 000 000	1 674 291 000	4 665 000 000	1 627 501 000	1 150 000 000	1 463 300 000	933 000 000	1 000 000 000	3 294 748 000	1 460 000 000	Costo Stimato
1 070 000 000	1 649 291 000	3 821 000 000	1 627 501 000	1 000 000 000	1 463 300 000	653 000 000	1 000 000 000	3 144 748 000	1 241 000 000	Finanziamento attribuito
50 000 000	25 000 000	844 000 000	0	150 000 000	0	280 000 000	0	150 000 000	219 000 000	Altre fonti
0	142 500 000	0	167 500 000	0	150 000 000	0	100 000 000	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	142 500 000	0	167 500 000	0	150 000 000	0	100 000 000	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1 019 025 832	1 506 790 340	2 633 416 744	1 239 249 932	982 824 800	945 900 000	653 116 867	862 599 430	2 944 747 965	1 125 731 117	Impegni di spesa
508 512 920	753 395 170	1 318 708 370	619 624 970	491 412 300	472 550 000	326 558 430	431 299 710	1 472 373 990	562 865 560	Lavori acconto 50%
0	602 716 140	0	0	0	0	0	345 039 772	1 177 899 190	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura uterore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazione dello Stato

TAV 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4382	4383	4377	4376	4310	4304	4303	4298	4279	4275	Protocollo
Montemaro Terme	Napoli	Urbino	Urbino	Firenze	Angiano	Angiano	San Gennaro	Cava D' Tirreni	Venezia	Comune localizzazione
SEZIONE DI MUSEO DI ARTE SACRA E RELIGIOSA. POPOLARE CON ESPOSIZIONE DI EX VOTO	RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIALE E SAN CARLO ALL'ARENIA COMPRESO NELL'INTERMEDIO L'APPARATO ANTICA CAMMINO DI FEDE E CULTURA	RIPIRESTINO E CONSOLIDAMENTO ALLO SCOPO DI RENDERE AGIBILE LA CATTEDRALE	CONSOLIDAMENTO CAMPANE DELLA CATTEDRALE	PARCHETTO ATTREZZATO DI SCAMBIO SERVIZI DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA STRADA AUTOLINEE EXTRAURBANE	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER BOSTA E RISTORO IN LOCALITA' MONTE CAMMINE A SERVIZIO DEL SANTUARIO	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO RICETTIVITA' PER OSTELLO	CONSTRUZIONE DI UN PARCHETTO CON RIORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DEI VISITATORI DELLA CITTA'	OSTELLO DI ACCOGLIENZA PER IL TURISMO SOCIALE E RISTORO E RECUPERO DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI S. MARIA AL RIFUGIO	RESTAURO CONSERVATIVO DELL'INTERNO DELLA CHIESA DEL SS. REDENTORE	TITOLO intervento
COMUNE DI MONTESAMANO TERME	PROV. MARITIMA PADOVA S. DOMENICO	ENTE CHIESA CATTEDRALE DI URBINO	ENTE CHIESA CATTEDRALE DI URBINO	COMUNE DI FIRENZE	PARROCCHIA S. MARIA DEL CAMMINE	PARROCCHIA S. MARIA DEL CAMMINE	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	COMUNE DI CAVA D' TIRRENI	PARROCCHIA DEL SS. REDENTORE	Soggetto beneficiario
500.000.000	893.000.000	1.331.000.000	879.000.000	21.702.339.998	908.000.000	2.095.000.000	4.000.000.000	4.442.856.000	2.586.758.000	Costo Stimato
330.000.000	580.000.000	1.331.000.000	879.000.000	18.044.339.998	650.000.000	1.970.000.000	3.500.000.000	3.442.856.000	2.136.758.000	Finanziamento attribuito
170.000.000	313.000.000	0	0	3.658.000.000	258.000.000	125.000.000	500.000.000	1.000.000.000	450.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
263.987.800	477.800.000	1.297.443.776	718.902.600	9.112.998.222	588.800.000	1.817.100.000	2.711.253.910	3.442.855.963	1.833.758.099	Impegni di spesa
141.983.800	238.800.000	648.721.888	358.451.300	4.556.499.110	294.400.000	808.550.000	1.355.626.750	1.721.427.980	916.879.050	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	733.503.240	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4592	4591	4559	4539	4530	450	4442/B	4442/A	4423	440	Protocollo
Mant	Levico	Firenze	Foggia	Padova	Macomeri	Bologna	Bologna	Piacenza	Piacenza	Comune localizzazione
LAVORI DI RECUPERO DELL'EX SEMINARIO DELLE AREE DELL'EPISCOPATO A FINE RICETTIVE DISTRIBUZIONE E MANUTENZIONE STRADOMURARIA DELLA CATTEDRALE	SISTEMAZIONE DI UN'AREA ADIACENTE AL SANTUARIO MADONNA DELL'AMMO	SISTEMA INFORNATICO SULLO STADIO DELL'ACCESSIBILITA' DELLA CITTA'	AMPLIAMENTO DELL'OPERA PIA LORENZO SCALITANI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DELLA STRUTTURA PER FAVORIRE GLI ACCESSI E LA MOBILITA' DEI DISABILI	RECUPERO DELLA CRIPTA MEDIOEVALE PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI	RESTAURO CONSERVATIVO PROGETTI DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E DI EDIFICI RELIGIOSI DELLA FONTANADUNA DE NOVA	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA BASILICA DI S. PETRONIO (I LOTTO)	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA BASILICA DI S. PETRONIO (I LOTTO)	RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO AL MONIALE E REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO OSTELLO LUNGO IL TRACCIATO PRINCIPALE DELLA VIA ROMA	PALAZZO VESCOVI E DI BOBBIO CAMPUS RAME	Titolo intervento
DIOCESI DI MANTOVA	COMUNE DI LAURIA	COMUNE DI FIRENZE	OPERA PIA LORENZO SCALITANI	MONASTERO SANTA GIUSTINA	COMUNE DI MACOMERI	SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOTONICI EMILIA	SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOTONICI EMILIA	PARROCCHIA S. LAZZARO E S. VINCENZO DE PAOLI	ENTE CATTOLICO DI BOBBIO	Soggetto beneficiario
2.296.975.000	649.000.000	300.000.000	2.096.224.000	59.000.000	211.000.000	2.800.000.000	1.000.000.000	383.000.000	180.000.000	Costo Stimato
2.296.975.000	649.000.000	267.000.000	2.096.224.000	59.000.000	191.000.000	2.800.000.000	1.000.000.000	350.000.000	170.000.000	Finanziamento attribuito
0	0	33.000.000	0	0	20.000.000	0	0	33.000.000	10.000.000	Altre fonti
259.900.000	0	0	0	59.000.000	0	0	0	0	7.000.000	O.N.T. Impegni di spesa
259.900.000	0	0	0	59.000.000	0	0	0	0	7.000.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.872.815.909	630.407.695	157.000.000	2.096.223.524	0	155.362.680	0	0	349.500.000	141.322.000	Impegni di spesa
936.407.950	315.203.847	78.500.000	1.048.111.760	0	77.681.340	0	0	174.750.000	70.861.000	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	2.800.000.000	1.000.000.000	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

											Protocollo
											Comune localizzazione
											Titolo intervento
											Soggetto beneficiario
											Costo Stimato
											Finanziamento attribuito
											Altre fonti
											O.N.T. Impegni di spesa
											O.N.T. Anticipazioni 10%
											Impegni di spesa
											Lavori acconto 50%
											Lavori acconto 90%
											Lavori saldo
											Fornitura acconto 50%
											Fornitura ulteriore acconto
											Fornitura saldo
											Acquisizione aree e immobili
											O.N.T. Uffici tecnici
											Amministrazioni dello Stato
4668	4680	4684/B	4632	462	4619	461	4609	4584	4583		
Macogiano	Lucca	Varallo	Treviso	Varallo	Aosta	Varallo	Friente	Mala	Venosa		
REALIZZAZIONE DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO	SISTEMA MUSEALE DI ARTE SACRA DELLA DIOCESI DI LUCCA EX REAL COLLEGIO REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO NEL COMPLESSO DELL'EX REAL COLLEGIO	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO STRUTTURALE COMPLESSO MONUMENTALE DELLA MADONNA DELLE OPERAZIONI (2° LOTTO)	INTERPARADISE E RELIGIOSITA' NEL TRIUNFO VENETA GIULIA	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'AREA ANTICANTE LA STAZIONE FERROVIARIA ATTUALMENTE ADIBITA A BUS TERMINAL	RESTAURO DEL PRINCIPATO DI S. ORSO	COMPLETAMENTO DEL COSTRUIENDO OSTELLO PER LA GIOVENTU'	CASA DI ACCOGLIENZA NELLA PIRAGNOLI	RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO	RECUPERO DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI MADONNA DELLE OPERAZIONI A BASSO COSTO		
DIOCESI DI MONTIVERTONE	COMUNE DI LUCCA	COMUNE DI VARALLO SESIA	SOPRINTENDENZA REGIONALE TRIUNFO	COMUNE DI VARALLO SESIA	FONDAZIONE S. ORSO AOSTA	COMUNE DI VARALLO SESIA	ENTE ARDIOCESI DI FRIENTE	COMUNE DI MELFI	COMUNE DI VENOSA		
446.000.000	8.054.000.000	600.000.000	1.367.000.000	450.000.000	2.800.000.000	1.456.000.000	2.270.000.000	3.637.279.000	2.916.031.000		
446.000.000	7.000.000.000	800.000.000	1.307.000.000	450.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	2.050.000.000	3.637.279.000	2.916.031.000		
0	1.054.000.000	0	60.000.000	0	800.000.000	456.000.000	220.000.000	0	0		
46.500.000	0	0	0	45.000.000	0	0	0	423.400.000	339.500.000		
46.500.000	0	0	0	45.000.000	0	0	0	423.400.000	339.500.000		
398.500.000	5.132.448.000	586.649.300	0	0	1.283.402.000	792.320.000	1.872.880.000	2.713.878.979	2.578.530.739		
199.750.000	2.566.224.000	293.324.650	0	0	646.701.000	396.160.000	938.440.000	1.356.939.490	1.288.285.370		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	1.307.000.000	0	0	0	0	0	0		

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. Impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura uterore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
470	Catania	OSPEDALE SOAVE CENTRO POLICLINICO MUSEALE OPERE DI CONSERVAZIONE ARCHITETTONICHE E TECNOLOGICHE	COMUNE DI CATANIA	1.255.000.000	1.255.000.000	0	144.500.000	144.500.000	1.192.096.723	586.048.380	0	0	0	0	0	0	0	0
4707	Firenze	IL PALAZZO RITORNA ALLA CITA' - RECUPERO DELLA CHIESA E DEI LOCALI ANNESSI	I.P.A. B. EDUC. S.B. CONCESSIONE	2.596.528.000	2.396.528.000	200.000.000	0	0	2.196.528.000	1.096.264.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4708	San Giovanni Lupatoto	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA NECTIVA A BASSO COSTO NELL'EDIFICIO DENOMINATO CONGREGAZIONE DELLE SIORE TENZIANE FRANCESCHINE IMMACOLATINE	CONGR. SIORE TERZARIE FRANCESCHINE	5.709.200.000	5.509.200.000	200.000.000	0	0	4.503.141.000	2.251.570.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4734	Monforte Imagna	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL RESIDENCE DOMUS MARIA E CASA ALBERGO GIA. SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE DOHA BIANCO PER PAGAZZI DISADATTATI	CONGR. P. OPERAI CATEC. RURALI MISS	1.692.000.000	1.442.000.000	250.000.000	0	0	1.442.000.000	721.000.000	576.630.000	0	0	0	0	0	0	0
4756	Sarna	ADEGUAMENTO STRUTTURE PER ACCOGLIENZA SOSTA E PASTORO PELLEGRINI	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	197.000.000	167.000.000	30.000.000	0	0	135.618.137	67.809.068	0	0	0	0	0	0	0	0
476	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ALTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL NUOVO CENTRO VISITE DELLA SOBRIANDEZZA	COMUNE DI AQUILEIA	681.000.000	681.000.000	10.000.000	58.100.000	58.100.000	573.948.898	338.834.449	0	0	0	0	0	0	0	0
4767	Bari	OSTELLO DEL LEVANTE	ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE	13.116.346.000	12.616.346.000	500.000.000	0	0	9.847.980.031	4.823.990.010	0	0	0	0	0	0	0	0
478	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ALTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO LUNGO LA VIA A GRANDI	COMUNE DI AQUILEIA	280.000.000	270.000.000	10.000.000	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
479	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MOBILITA' DEI DISABILI E L'ACCESSIBILITA' ALLA BASILICA ED ALLE PRINCIPALI METE RELIGIOSE ARCHEOLOGICHE E TURISTICHE	COMUNE DI AQUILEIA	1.059.000.000	1.049.000.000	10.000.000	0	0	829.537.888	414.768.940	0	0	0	0	0	0	0	0
4817	Catania	MUSEO DELL'ARCIVESCO E DEL TESORO DI AQUILEIA	COMUNE DI CATANIA	4.470.000.000	4.470.000.000	0	447.000.000	447.000.000	3.547.842.630	1.773.921.315	0	0	0	0	0	0	0	0

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4882	488	4878	4877	4872	4869	4853	4847	484	4838/A	Protocollo
San Giuliano Materale	Codogno	Milano	Casa Di Val D'Elia	Nardo'	Brindisi	Ospedaletto D'Ayudro	Macerapiano	Agdema	Verona	Comune localizzazione
RESTAURO E AMPLIAMENTO DELLE CAMPATE DI ACCOGLIENZA DI UNA ANTICA TORRENTIA MONASTICA	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELL'EX MATTALINO COMPALE AD AREA ATTREZZATA PER L'ACCOGLIENZA	RISANAMENTO DELLE FACCE	STRUTTURALE DI ACCOGLIENZA	OASI TABOR COME ESSO DI ACCOGLIENZA IN MARCHIO - CONTRADA CENATE	OPERE DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI PARAMENTI MURARI E DEL PROTORIO E RISANAMENTO GENERALE	POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' PER GIOVANI AL CENTRO NIDO DELLE ACQUE E DEL SANTUARIO DI MONTEVERONE	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA USCITA CASTELLO AUTOSTRADALE E AVVICINO OVEST DA DESTINARE A PARCHINGIO A SERVIZIO DEL FLUSSO DEI PELLEGRINI	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE RICETTIVITA' A BASSO COSTO RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDAZIONE SBBAL	RECUPERO PER L'UTILIZZO DELLE AREE LIBERE E DEGLI EDIFICI DA RISTRUTTURARE DELL'EX MACELLO ZONA FILIPPINI - P. LOTTO	Titolo intervento
MONASTERO BENEDETTE SS. PIETRO E PAOLO	COMUNE DI CODOGNO	PARROCCHIA DI S. LORENZO MAGGIORE	SEMINARIO ARCIVESCOVILI E DI SIENA	DIOCESI DI MARCHIO DALL'OPOLI	ARCIDIOCESI BRINDISI - OSTUNI	COMUNITA' BENEDETTE DI MONTEVERONE	COMUNE DI MACERAPIANO	COMUNE DI AGDEMA	COMUNE DI VERONA	Soggetto beneficiario
2.471.717.000	1.099.000.000	962.000.000	4.319.752.000	2.608.000.000	2.002.000.000	1.074.000.000	225.000.000	1.564.000.000	2.038.000.000	Costo Stimato
1.381.717.000	1.099.000.000	664.000.000	3.002.752.000	2.000.000.000	1.352.000.000	1.074.000.000	225.000.000	1.354.000.000	2.036.000.000	Finanziamento attribuito
1.090.000.000	0	298.000.000	1.317.000.000	608.000.000	650.000.000	0	0	10.000.000	0	Altre fonti
0	114.000.000	0	316.900.000	0	0	0	22.500.000	159.000.000	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	114.000.000	0	316.900.000	0	0	0	22.500.000	159.000.000	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.203.333.057	1.004.142.881	664.000.000	2.222.851.096	1.996.886.123	1.346.352.050	1.065.602.682	0	1.380.600.072	2.007.998.758	Impegni di spesa
607.686.530	502.071.440	332.000.000	1.111.425.548	998.433.080	673.176.020	532.801.340	0	690.300.040	1.003.998.880	Lavori acconto 50%
487.333.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV.4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4950	4949	4943	4924	4910	4899	4897	4892	489	4884	Protocollo
Salerno	Venezia	Viterbo	Lecco	Cagliari	Mantova Cercia	Rimini	Gianrico	Pisa	Salerno	Comune localizzazione
RESTAURO ED AMPLIAMENTO DEL MUSEO DI SAN PIO X	ADEGUAMENTO A NORMA DEI LOCALI	RESTAURO BASTIONE MEDICEO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI AREE DI SOSTA E SERVIZI DI ACCOGLIENZA	RESTAURO DEL MONASTERO DELL'E BENEDETTE CON ANNESSA CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA DA DESTINATE AD USO RICETTIVO	SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI	RECUPERO DELLA FORESTERIA DEL SANTUARIO	RESTAURO DELLA CHIESA DI S FORTUNATO	RIPIRISTINO DI EDIFICIO NEL COMPLESSO DI ONFERMO	CONVENTO DI SANTA CROCE IN FOSCARA INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO AD USO RICETTIVO ALBERGHIERO E AD USO PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI	RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTO FUNZIONALE	Titolo intervento
PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO AP	PARROCCHIA S CRISTOFORO	COMUNE DI VOLTERRA	MONASTERO DELLE BENEDETTE	AMMINISTRAZIO NE PROVINCIALE CAGLIARI	DIOCESI DI RIMINI	PARROCCHIA DI SAN FORTUNATO	COMUNE DI GEMANO	COMUNE DI PISA	COMUNE DI SALUDICIO	Soggetto beneficiario
536.517.000	236.000.000	372.000.000	3.398.408.000	3.890.000.000	1.470.000.000	1.221.000.000	752.000.000	9.860.256.000	390.000.000	Costo Stimato
429.517.000	206.000.000	222.000.000	2.848.408.000	3.200.000.000	1.470.000.000	915.000.000	752.000.000	6.680.256.000	390.000.000	Finanziamento attribuito
110.000.000	30.000.000	150.000.000	550.000.000	690.000.000	0	306.000.000	0	3.200.000.000	0	Altre fonti
0	0	0	0	320.000.000	147.000.000	0	75.200.000	0	39.000.000	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	320.000.000	147.000.000	0	75.200.000	0	39.000.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
324.516.400	206.000.000	214.002.929	2.848.407.508	0	1.234.035.854	907.436.673	642.227.994	4.549.090.948	317.788.509	Impegni di spesa
182.258.200	103.000.000	107.001.485	1.424.203.750	0	617.017.830	453.718.335	321.114.000	2.274.545.470	158.884.255	Lavori acconto 50%
129.806.560	0	0	0	0	0	0	0	0	127.107.400	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5000	4998	4995	4994	4990	4989	4978	4973	4961	4955	Protocollo
Sant'Angeles Di Torno	Albenga	Albenga	Albenga	Verona	Castellana Grotte	Grosseto	Pala	Parabara	Oliva	Comune localizzazione
OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL SEMINARIO VESCOVALE DELLA DIOCESI DI ALBENGA	CONCLUSIONE DEL RESTAURO DEL BATTELLINO PALAZZO DI ALBENGA ABBANDONATO DELLE BARBIE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CATTEDRALE DI SAN MICHELE E RECUPERO DELLA PIAZZETTA DELLE PROSPICIENTI L'ABSIDE	ADATTABILITA' E RISTRUTTURAZIONE LOCALI DELLA FORESTERIA DELL'EREMO	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO IN DISUSO	OPERE DI MODIFICHE INTERNE AL FABBRICATO DETTO SEMINARIO VESCOVALE	COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SACRA FAMIGLIA DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI E RICETTIVITA' A BASSO COSTO	STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E RELATIVI SERVIZI LUNGO IL CAMMINO DEL MONASTERO DI PADOVA PRO	RESTAURO CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL SEMINARIO DI S. ORONZO E DELL'AMENSA VILLA ESTIVA ELIMINARE PER FINI RICETTIVI	Titolo intervento
PROV. ITALIANA S. MAURIZIO	SEMI VESCOVALE DI ALBENGA IMPERIA	DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA	DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA	PARROCCHIA S. TOMMASO APOSTOLO	COMUNE DI CASTELLON TIMO	SEMINARIO VESCOVALE	DIOCESI DI PALLI	COMUNE DI PIETRELLA	ENTE SEMINARIO VESCOVALE	Soggetto beneficiario
3.250.000.000	1.248.216.000	338.438.000	867.408.000	270.000.000	2.498.000.000	585.800.000	4.296.922.000	6.212.680.000	2.175.000.000	Costo Stimato
3.200.000.000	1.148.216.000	298.438.000	707.408.000	200.000.000	2.198.000.000	490.900.000	4.246.922.000	6.212.680.000	2.175.000.000	Finanziamento attribuito
50.000.000	100.000.000	40.000.000	180.000.000	70.000.000	300.000.000	75.000.000	50.000.000	0	0	Altre fonti
270.000.000	0	0	0	0	0	0	440.000.000	780.000.000	219.600.000	O.N.T. Impegni di spesa
270.000.000	0	0	0	0	0	0	440.000.000	780.000.000	219.600.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
0	1.148.216.000	298.438.400	707.408.000	177.666.189	1.918.021.395	440.900.000	2.961.541.414	4.941.165.155	1.954.440.800	Impegni di spesa
0	574.108.000	149.219.200	353.704.600	68.833.090	958.015.695	220.450.000	1.480.770.710	2.470.582.080	977.220.400	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5033	5027	5025	5024	5023	5006	5002	5000/C	5000/B	5000/A	Protocollo
Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Montebello	Serra	San' Ambrogio Di Torino	San' Ambrogio Di Torino	San' Ambrogio Di Torino	Comune localizzazione
MANUTENZIONE E RESTAURO DEGLI ARCI DI PASSAGGIO VIARIO DEL PORTICO DI S. LUCA TRATTO DI PIANURA	PENICORSI PERI NON VEDENTI	PARCHEDIO FOSCOLO PORTA SARAGOZZA	PARCHEDIO PUBBLICO OHSELLO	PARCHEDIO SCAMBIATORI CERIOSA VIA LANAI ANISIAIO MANIFATTURA VIA MICHELINO FIERA SUD PARCO NOVO CARBACCI GIURICO ARCOVEDIGIO	DELEGAZIONE INTERCOMUNITARIA PER LA SOSTA ED IL RISTORNO IN ACCOGLIENZA E LOCALI DEDICATI ALA PIU' QHENA PARCHEDIO PUBBLICO ALIBREZZA CON SERVIZI LIGENIE	INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO CASA DI SANTA CATERINA ABBATTIMENTO BARRIERE ANTICHIETONICHE E SENSORIALI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI SULLA SICUREZZA DELEGAZIONE INTERCOMUNITARIA PER LA SOSTA ED IL RISTORNO IN ACCOGLIENZA E LOCALI DEDICATI ALA PIU' QHENA PARCHEDIO PUBBLICO ALIBREZZA CON SERVIZI LIGENIE	OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - STRADA PERIME TRALE	OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - FORESTIERA PICCOLA	OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - MONASTERO NUOVO	TITOLO intervento
COMUNE DI BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	PARROCCHIA DI S. RAIPPO E GIACOMO	ARC DI SIENA COLTIVA D'ETIS A MONTICINO	PROV. ITALIANA S. MAURIZIO	PROV. ITALIANA S. MAURIZIO	PROV. ITALIANA S. MAURIZIO	Soggetto beneficiario
571.930.000	1.550.000.000	3.135.690.000	1.843.000.000	1.855.560.000	2.089.298.000	2.358.496.000	793.577.351	367.920.000	2.267.452.510	Costo Stimato
571.930.000	1.550.000.000	2.735.690.000	1.643.000.000	1.855.560.000	1.754.298.000	2.248.496.000	743.577.351	367.920.000	2.267.452.510	Finanziamento attribuito
0	0	400.000.000	0	0	335.000.000	110.000.000	50.000.000	0	0	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	121.200.000	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	121.200.000	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
571.930.000	1.550.000.000	2.767.588.428	1.642.181.044	1.855.548.939	1.629.328.400	1.923.296.000	728.578.952	338.482.000	1.904.436.082	Impegni di spesa
285.965.000	775.000.000	1.383.794.215	821.090.520	927.774.470	814.664.200	961.648.000	364.289.476	169.241.000	952.218.030	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV 4 - Simulazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5063	5065	5064	5062	5060	5046	5042	5039	5038	5036	Protocollo
Ortore	Ortore	Ortore	Ortore	Ortore	Bobbio	Bobbio	Bologna	Bologna	Bologna	Comune localizzazione
RESTAURO DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MONTE ALFEO	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. BARTOLOMEO	RECUPERO DI EDIFICIO MUNICIPALE PER UFFICI E MUSEO DI ARTE SACRA	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. PIETRO IN OREZZOLI	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. GIACOMO DI BERTRONE	CENTRO DI ACCOGLIENZA LE GRAZIE	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA CANONICA DI MEZZANO	OSTELLO DELLA GIOVENTU'	ALBERGO POPOLARE VIA DEL PALLONE	EX SCUOLA ADA NEGRI	Titolo intervento
PARROCCHIA DI BARCHI	CHIESA DI S. MARTINO DI OTTONE	COMUNE DI OTTONE	CHIESA DI S. PIETRO IN OREZZOLI	CHIESA DI S. ANDREA DI BARCHI	PARROCCHIA DEL DUOMO	PARROCCHIA S. PAOLO	COMUNE DI BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	Soggetto beneficiario
170.347.000	276.883.000	800.000.000	350.000.000	127.000.000	200.000.000	483.000.000	1.190.680.000	3.000.000.000	3.082.180.000	Costo Stimato
110.347.000	176.883.000	720.000.000	350.000.000	83.000.000	130.000.000	439.000.000	246.680.000	1.500.000.000	2.282.180.000	Finanziamento attribuito
80.000.000	100.000.000	80.000.000	0	44.000.000	70.000.000	44.000.000	944.000.000	1.500.000.000	800.000.000	Altre fonti
0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
110.346.720	176.882.800	677.744.526	281.868.132	76.354.800	103.260.000	414.235.935	246.655.780	1.499.970.200	1.982.156.750	Impegni di spesa
35.173.360	88.441.400	338.872.260	140.934.070	38.177.400	51.630.000	207.117.970	123.327.890	748.985.100	881.078.370	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5215	5214	5200	5146	5106	5103	5094	5091	5087	507	Protocollo
Genova	Genova	Carraro	Milano	Mantova	Venezia	Aquila	Aquila	Catanzaro	Ancona	Comune localizzazione
RESTAURO DELLA COMPLESSIVITA' DI GIOVANNI DI PRE	RESTAURO RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO COSTITUITO DALLA CATTEDRALE E DAL CROSTO DI SAN LORENZO	PROGETTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ED ALIMENTAZIONE	PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE E RESTAURO PIAZZA DUOMO E AREE ADIACENTI	ISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA SALA DEL PELLEGRINO E RELATIVI SERVIZI	RESTAURO E ISTRUTTURAZIONE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEL PENSIERO DI MARIA IMMACOLATA A DOSSODUPO	IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO E SPEGNIMENTO AUTOMATICO DELLA BASILICA	RESTAURO VALORIZZAZIONE E RIUSO DEL BATTISTERO CHIESA DEI PIOMBI ANNESSI AL COMPLESSO DELLA BASILICA	RESTAURO DEL SEMINARIO REGIONALE S. PIO XI E REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI	ISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DELL'ISTITUTO DON ORIONE PROQUA RELIGIOSA DEL SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE DELLA COMPLESSIVITA' DELLA PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	TITOLO INTERVENTO
SOPRINTENDENZA REGIONALE LIGURIA	SOPRINTENDENZA REGIONALE LIGURIA	CHIESA S. EUSEBIO CARRARO	COMUNE DI MILANO	DIOCESI DI MONTEVERGINE	CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL'ISTITUTO F.D.C.	SOPRINTENDENZA REGIONALE A.A.A.S. DEL FRIULI V.G.	SOPRINTENDENZA REGIONALE A.A.A.S. DEL FRIULI V.G.	CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA	PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	Soggetto beneficiario
1.847.000.000	3.429.000.000	1.600.000.000	16.952.000.000	147.000.000	16.807.000.000	2.185.000.000	650.000.000	4.699.475.000	6.684.000.000	Costo Stimato
1.247.000.000	3.179.000.000	1.600.000.000	7.878.000.000	147.000.000	3.687.000.000	1.645.000.000	650.000.000	2.199.475.000	5.984.000.000	Finanziamento attribuito
600.000.000	250.000.000	0	9.076.000.000	0	13.120.000.000	540.000.000	0	2.500.000.000	700.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
0	0	1.378.224.112	4.435.000.000	145.500.000	1.723.759.468	0	0	2.199.475.000	5.984.369.440	Impegni di spesa
0	0	689.112.060	2.217.500.000	72.750.000	661.879.730	0	0	1.099.737.500	2.992.184.720	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura utenze acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
989.000.000	2.864.000.000	0	0	0	0	1.645.000.000	850.000.000	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5322/D	5322/B	5322/A	5321	5311	5301	5257	5256	5229	5219	Protocollo
Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Reggio	Sassuolo	Quindici	Quindici	San Marino	Napoli	Comune localizzazione
CATTEDRALE DI S. PIETRO A BOLOGNA - RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANINA - IV LOTTO	CATTEDRALE DI S. PIETRO A BOLOGNA - MUSEO DEL TESORO DELLA CATTEDRALE - II LOTTO	CATTEDRALE DI S. PIETRO A BOLOGNA - SOPRINTENDENZA DELLE BARRE ARCHITETTONICHE - I LOTTO	MANTENIMENTO E RESTAURO DELL'OPERAIO E DEI LOCALI DELLA CATTEDRALE DI S. MARIA DELLA VITA CITTADINA E DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA CHIESA DI BOLOGNA	ABBAZIA DI VALCAMPORA LAVORI DI CONSERVAMENTO E RESTAURO E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ELETTRICHE ATMOSFERICHE	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO	AREA DI BOSTA PER AUTOBUS ED AUTOVETTURE SERVIZI IGIENICI E FIDUCIA ACCOLLENTA	ACCOLLENTA A BASSO COSTO	CONSERVAMENTO E RESTAURO	INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI RIUSO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE ANCHE ALLO SCOPPO DI INCREMENTARE LA RICETTIVITA' E RELATIVI SERVIZI A BASSO COSTO	Titolo intervento
CATTEDRALE METROPOLITANA DI S. PIETRO	CATTEDRALE METROPOLITANA DI S. PIETRO	CATTEDRALE METROPOLITANA DI S. PIETRO	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	SOPRINTENDENZA DIRETTORIALE DI BOLOGNA	SANTUARIO MADONNA DELLE LACRIME	PARROCCHIA S. MARIA DI ASSUNTA DI MONTEFALCONE	PARROCCHIA S. MARIA DI ASSUNTA DI MONTEFALCONE	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA	DIOCESI DI NAPOLI	Soggetto beneficiario
2.267.000.000	1.877.000.000	1.972.000.000	4.548.000.000	3.141.000.000	4.748.300.000	439.000.000	633.000.000	520.257.000	9.203.000.000	Costo Stimato
2.067.000.000	1.781.000.000	1.792.000.000	3.448.000.000	2.941.000.000	4.598.300.000	307.000.000	443.000.000	309.257.000	8.203.000.000	Finanziamento attribuito
180.000.000	116.000.000	180.000.000	1.501.000.000	200.000.000	150.000.000	132.000.000	190.000.000	211.000.000	1.000.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	429.600.000	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	429.600.000	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.646.728.457	1.271.544.454	1.780.651.190	3.347.329.212	0	4.166.628.390	280.860.000	442.920.472	308.256.335	7.598.546.360	Impegni di spesa
823.384.230	635.772.230	890.325.595	1.673.664.610	0	2.083.314.190	140.430.000	221.460.240	154.628.170	3.799.273.160	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	1.666.651.355	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	2.941.000.000	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5349	5343	5342	5340	5335	5333	5331	5330	5326	5324	Protocollo
Fidenza	Compieno	Formello	Bareto	Molassaro	Parma	Ferrone Di Taro	Parma	Parma	Parma	Comune localizzazione
MUSEO DEL DUOMO DI FIDENZA	FORESTERIA DEL CASTELLO A BASSO COSTO E SERVIZI CATECHISTICI	RECUPERO DI PARTE DI ROCCA SANNALE E MUSEO DI BENI CULTURALI A CARATTERE RELIGIOSO AD INTEGRAZIONE FUNZIONALE DELL'ESISTENTE MUSEO ROCCA SANNALE	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE SEMINARIO VESCOVILE	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER RICETTIVITA' POVERA, IN TERRITORIO PARMAENSE	FORESTERIA DEL CENTRO CIVICO CINQUE	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX FORO BOARIO	OSPEDALE DI PARMA: INTERVENTO DELL'ACCESSIBILITA' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCH. PARCHEGGIO RIFACIMENTO DEI SERVIZI IDRICI PUBBLICI NELL'AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FUNZIONALE DELLA CHIESA	RESTAURO ADEGUAMENTO PER DEPOSITO E PASSAGGIO BENI CULTURALI DELLA DIOCESI DI PARMA	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE ANTICO EDIFICIO CONVENTUALE	TITOLO Intervento
ENTE DIOCESI DI FIDENZA	COMUNE DI COMPIENO	COMUNE DI FONTANELLO	SEMINARIO VESCOVILE DI PARMA	PARROCCHIA DI SAN PAOLO	COMUNE DI PARMA	COMUNE DI FERRONE DI TARO	AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA	DIOCESI DI PARMA	COMUNE DI PELLERINO PARMAENSE	Soggetto beneficiario
991.678.000	2.352.000.000	1.031.000.000	1.237.000.000	1.407.000.000	401.000.000	3.277.000.000	3.174.457.000	2.470.868.000	2.106.520.000	Costo Stimato
991.678.000	1.002.000.000	781.000.000	1.157.000.000	832.000.000	263.000.000	2.264.000.000	2.634.457.000	1.010.868.000	1.496.520.000	Finanziamento attribuito
0	1.350.000.000	250.000.000	80.000.000	575.000.000	138.000.000	983.000.000	540.000.000	1.460.000.000	610.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
991.677.812	596.872.122	756.075.000	1.048.426.096	606.000.000	232.279.000	1.907.454.149	2.634.457.000	1.010.868.000	1.212.290.400	Impegni di spesa
495.838.905	298.436.060	378.037.500	524.213.050	300.000.000	116.139.500	953.727.070	1.317.228.500	505.434.000	606.145.200	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura utenza acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Stimazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5488	5487	5486	5485	5484	5451	5405	5400/B	5400/A	5375	Protocollo
Trieste	Trieste	Trieste	Trieste	Trieste	Bari	Vibo Valentia	Belluno	Belluno	Incarico in Val d'Aosta	Comune localizzazione
CASA PAULIQUA ORATORIO SAN ESPASIO S. O. BOSCO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI SERVIZI INTERIORI CON ALIMENTAZIONE DELLA RICETTIVITA'	ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CONVITTO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA PROGETTO DI RICOSTRUZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COLLE DI MADONNA VECCHIA E DEL SUO SANTUARIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	LOCALI DI ACCOGLIENZA PER RISTORO CON ANNESSI SERVIZI RIPARATIVI E PERCORSI ATTREZZATI INTERNO ED ESTERNO CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER DISABILI	RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO DELL'ABBAZIA DI S. MARIA DI BIANZI	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL CONVENTO SANT'ANTONIO DEI FRATTI MINORI CAPPUCCINI AI FINI DELLA ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI ANCHE DISABILI	REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA E SALA DILETTURA, ESECUZIONE DI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO ED ADEGUAMENTO PERCORSI DISABILI II LOTTO	OPERE DI RESTAURO EDIFICI MONUMENTALI: CHIOSTRO RINASCIMENTALE, CHIOSTRO GOTICO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. PIETRO - I LOTTO	POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E ESPERIENZE LOCALI DI OPPIO ALTORE CARRETTI	TITOLO INTERVENTO
OPATORIO S. O. BOSCO S. G. SALESIANO S. O. BOSCO	OPERA SAN GIUSEPPE	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA	OPERA VALLAGGIO DEL FANCIULLO	PARROCCHIA MARIA MADRE E REGINA	COMUNE DI BIANZI	PROV. CALABRIA FRATTI MINORI CAPPUCCINI	SEMINARIO GREGORIANO DI BELLUNO	SEMINARIO GREGORIANO DI BELLUNO	P.A.M. O.M. P.A. ASSOCIAZIONE MASCHIE OPERA MARIA M.	Soggetto beneficiario
625.000.000	78.000.000	1.073.000.000	702.000.000	1.382.000.000	1.907.000.000	3.211.434.000	780.000.000	2.314.000.000	572.000.000	Costo Stimato
495.000.000	76.000.000	732.000.000	702.000.000	1.382.000.000	1.207.000.000	2.911.434.000	658.000.000	2.314.000.000	272.000.000	Finanziamento attribuito
130.000.000	0	341.000.000	0	0	700.000.000	300.000.000	122.000.000	0	300.000.000	Altre fonti
0	7.600.000	0	70.200.000	145.000.000	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	7.600.000	0	70.200.000	145.000.000	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
484.304.000	60.895.480	723.449.329	582.080.684	1.229.480.800	1.083.418.705	2.911.440.000	600.473.687	2.172.611.154	272.000.000	Impegni di spesa
242.152.000	30.447.740	361.724.619	291.040.340	614.730.400	532.709.350	1.455.720.000	300.236.680	1.086.305.580	136.000.000	Lavori acconto 50%
0	24.358.195	0	0	0	0	1.164.576.000	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. Impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura utenore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
5489	Trieste	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI	CASA FAMIGLIA DELLA GIOVANE MATER DEI	308.000.000	308.000.000	0	30.800.000	30.800.000	256.506.292	128.253.150	0	0	0	0	0	0	0	0
5492	Trieste	CENTRO ACCOGLIENZA PELLEGRINI	COMUNE DI TRIESTE	850.000.000	730.000.000	120.000.000	0	0	629.315.182	314.657.590	0	0	0	0	0	0	0	0
5493	Trieste	FORESTERIA PERI PELLEGRINI	COMUNE DI TRIESTE	1.620.000.000	1.620.300.000	0	180.000.000	180.000.000	1.437.971.227	718.985.615	0	0	0	0	0	0	0	0
5497	Pesova	RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI S. CATERINA	IRPEA IST. RIUN. PADOVANI DI EDUCAZIONE	3.750.000.000	2.000.000.000	1.750.000.000	0	0	1.610.085.180	805.042.590	0	0	0	0	0	0	0	0
5498	Casua	RECUPERO DEL COMPLESSO DI SBAZANO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' E DELLA ACCOGLIENZA TURISTICA CANONICA DELLA EX CHIESA PARROCCHIALE	COMUNE DI CASUA	560.000.000	218.000.000	342.000.000	0	0	213.750.000	106.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5502	Onesto	ESPERIENZA FRANCESCA NEL GIUBILEO	FAMIGLIA DEI DISCEPOLI IST. REL.	3.606.000.000	2.972.000.000	634.000.000	0	0	2.066.478.000	1.033.239.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5512	Sepino	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'ACCOGLIENZA	COMUNE DI SEPINO	1.169.000.000	1.169.000.000	0	116.900.000	116.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5514	Sepino	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA S. ANTONIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA CONFERENZE ESPOSITIVA E PRIMA ACCOGLIENZA	COMUNE DI SEPINO	1.054.601.000	1.054.601.000	0	109.600.000	109.600.000	735.000.013	367.500.005	0	0	0	0	0	0	0	0
5523	Monterosso Al Mare	RESTAURO CONSERVATIVO DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI PER UNA RIFUNZIONALIZZAZIONE QUALE STRUTTURA RICETTIVA RELIGIOSA CON ADEGUAMENTO DELLA ACCESSIBILITA' E DELLE AREE DI PERTINENZA	PROV. GENOVA FRATI MINORI CAPPUCCINI	1.759.470.000	1.280.470.000	479.000.000	0	0	1.067.968.661	533.984.330	0	0	0	0	0	0	0	0
5530	Maroggiano	RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA FORESTERIA DI MONTEVERGINE CON I RELATIVI SERVIZI ED IL PRELUDIO MEDICO	DIOCESI DI MONTEVERGINE	632.000.000	632.000.000	0	0	0	627.048.232	313.524.115	0	0	0	0	0	0	0	0

TAV. 4 - Sintesi finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5648	5643	5638	5599	5598	5583	558	5564	5561	5559	Protocollo
Venezia	Venezia	Aosta	Venezia	Venezia	Pavia	Bergamo	Bosco Marengo	Torino	Torino	Comune localizzazione
NUOVO SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DELLE CAMPANE DEL CAMPANILE DELLA BASILICA DI MONTE BERNICO OPERE DI RESTAURO INTERNO AL CAMPANILE E RESTAURO DELLA CUPOLA IN MATE CON CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA LATERALE	PARCHEGGIO VERDE RISTRUTTURAZIONE TOTALE E AMPLIAMENTO DELL'ANNESSO RUSTICO IN DIBUO PER L'ACCOGLIENZA DEL PELLEGRINO DEL SANTUARIO DI MONTE BERNICO	VALORIZZAZIONE DEL TRACCATO DELLA VIA FRANCOISA E DEI PERCORSI PERIFERICI PERI TRATTI COMPRESI NEL TERRITORIO COMUNALE	ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI E RECUPERO DI LOCALI DISMESSI	RECUPERO DI PORZIONE DI SPAZI DISMESSI DEL MONASTERO DA DESTINARE A OSPITALITÀ E ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA SUGLI IMPIANTI DELLA PARTE GIÀ FUNZIONANTE	NUOVA AREA DI SOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DEL MONUMENTO	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO SAN FRANCESCO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO	RECUPERO FUNZIONALE DEL CONVENTO ESSE CONVENTUALE E DI SANTA CROCE	REALIZZAZIONE DI UN POLO INTEGRATO ATTREZZATO PER L'ACCOGLIENZA E LA SOSTA IN PROSPETTIVA DELL'ABBAZIA CISTERCENSE DI RIVALLA SCRIVIA	OPERE INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELLA BASILICA SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA GUARDIA	TITOLO INTERVENTO
PROV. VENEZIA DEL SERVO DI MARIA	PROV. VENEZIA DEL SERVO DI MARIA	COMUNITA' MONTANA GRANDI COMBINI	COMUNITA' PADRI BENEDETTINI	COMUNITA' PADRI BENEDETTINI	COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA	COMUNE DI BARNABAVALL O	COMUNE DI BOSCO MARCONO	COMUNE DI TORINO	PROV. REL. DI S. MARZANO DON ORIONE	Soggetto beneficiario
614.000.000	3.328.836.000	1.938.240.000	402.979.000	1.972.404.000	1.074.000.000	6.346.820.000	2.500.000.000	500.000.000	1.927.911.000	Costo Stimato
410.000.000	2.115.836.000	1.279.240.000	402.979.000	1.772.404.000	1.074.000.000	5.346.820.000	2.500.000.000	250.000.000	1.727.911.000	Finanziamento attribuito
204.000.000	1.213.000.000	659.000.000	0	200.000.000	0	1.000.000.000	0	250.000.000	200.000.000	Altre fonti
0	0	0	41.600.000	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	41.600.000	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
382.370.000	1.944.718.720	1.227.688.000	361.378.100	1.637.403.800	750.198.499	5.013.820.000	1.613.487.043	188.992.135	1.508.511.743	Impegni di spesa
181.185.000	922.359.360	613.644.000	180.688.050	818.701.900	375.099.250	2.506.910.000	806.743.520	94.486.070	754.255.870	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	654.961.520	0	2.005.528.000	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5753	5748/B	5748/A	5721	5718	5688	5673	566	566	5658	Protocollo
Genova	Catanzaro	Catanzaro	Lecce	Venezia	Aulla	Bagno A Ripoli	Matera	Matera	La Spezia	Comune localizzazione
CREAZIONE DI SERVIZIO DI RISTORAZIONE A BASSO COSTO NELL'AMBITO DEL COMPLESSO DELLA CONMENDA DI PIRE.	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA. OPERE CIVILI ED IMPIANTISTICHE.	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA. OPERE DI ACCESSO E SERVIZI. OPERE DI CONSOLIDAMENTO.	RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA NATIA DEL BEATO DOMENICO LENTINI DELLA CASA DEL PELLEGRINO.	ISTITUZIONE EDIFICIO DI PARTI VOLUME COMPRENDENTE RILCAZIONE FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO DI MENSA CUCINA DISPENSA E LOCALI LAVAGN. AZIONE SERVIZI PER ASSISTENZA IGIENICA E SANITARIA. ADEGUAMENTO SALE DI RICONTRO ED.	COMPLETAMENTO RESTAURO E REALIZZAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA FORNITURA DELLA BRUNETTA.	OSPEDALE DEL BIGATTO PER ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI STRUTTURA RICETTIVA E DIDATTICO MUSEALE.	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORME DEL MONASTERO S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE.	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORME DEL MONASTERO S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE.	IL MONASTERO DEL TERZO MILLENNIO E L'OSTINITA' BENEDETTINA.	TITOLO intervento
ORGAN. PROPRIO DI GENOVA E LUG.	ARCIDIOCESI DI CATTOLICO BOIANO	ARCIDIOCESI DI CATTOLICO BOIANO	COMUNITA' MONTANA LADINESE	PROV. VENEZIA FRATELLI MINORI CARPUCCI	COMUNE DI AULLA	COMUNE DI BAGNO A RIPOI	MONASTERO S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE	MONASTERO S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE	MONASTERO S. MARIA DEL MARE	Soggetto beneficiario
933.000.000	2.663.000.000	1.623.000.000	1.241.280.000	1.100.000.000	612.600.000	1.447.000.000	871.790.000	871.790.000	11.196.000.000	Costo Stimato
933.000.000	2.663.000.000	1.623.000.000	1.241.280.000	600.000.000	462.600.000	815.000.000	871.790.000	871.790.000	7.291.000.000	Finanziamento attribuito
0	0	0	0	500.000.000	150.000.000	632.000.000	0	0	3.905.000.000	Altre fonti
93.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
93.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
657.457.883	2.557.517.975	1.547.332.100	1.141.259.211	587.270.900	461.941.440	814.612.646	18.270.000	856.566.259	7.066.265.517	Impegni di spesa
328.728.940	1.278.758.985	773.666.050	570.629.605	298.635.450	230.970.720	407.306.320	0	428.263.130	3.533.132.750	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	342.626.500	2.826.506.210	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	18.270.000	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5868	5853	5848	5806	5797	5793	579	5768	5764	5763	Protocollo
Biagno Di Ronnagna	Compio	Facca	Macogiano	Biadene	Quindici	Taglio Di Calabria	Montevecchio	Montevecchio	Savone	Comune localizzazione
RESTAURAZIONE DI EDIFICIO CASA PER FERIE	RESTAURAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'ALMO DEL CASTELLO DI CORNIGLIO E RECUPERO FUNZIONALE PER RICEVIMENTO A BASSO COSTO	CONSOLIDAMENTO RISANAMENTO RESTAURAZIONE DELLA CHIESA DI S. MARIA NOVA ED ANNESSO CONVENTO	ACCOLIENZA PRESSO IL SANTUARIO DI MONTEVEIONE POTENZIAMENTO DELL'OSPIZIO VECCHIO	LAVORI DI RESTAURAZIONE E DI CONSOLIDAMENTO DEL PORTICO DI S. LUCA	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO DI PALLA AI FINI DELL'ACCOLIENZA DI PELLEGRINI ANCHE DISABILI	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO OPERA ANTONIANA DELLE CALABRIE	OSTELLO S. GIACOMO	CENTRO DI OSPITALITA' PERI PELLEGRINI	CENTRO DI ACCOLIENZA E FORMAZIONE	Titolo intervento
187 CLARISSE SACRAMENTO	COMUNE DI CORNIGLIO	PARRICCIA SAN GIORDIO MARTINE	COMUNITA' BENEDITTINA DI MONTEVEIONE	SOPRINTENDENZA Z.A.A. DI BOLOGNA	PROV. S. FRANCESCO DI PALLA	PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	PROV. FRATELLI MARCONI S. FRANCESCO	COMUNE DI MONTEVEIONE	SEMINARIO VESCOVILE DI SAVONA	Soggetto beneficiario
1.488.000.000	940.238.000	1.687.021.000	466.000.000	5.000.000.000	2.167.000.000	6.968.058.000	280.000.000	5.500.000.000	961.000.000	Costo Stimato
1.288.000.000	940.238.000	1.687.021.000	466.000.000	5.000.000.000	1.967.000.000	6.188.058.000	250.000.000	3.850.000.000	681.000.000	Finanziamento attribuito
200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	780.000.000	30.000.000	1.650.000.000	280.000.000	Altre fonti
0	0	0	46.600.000	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	46.600.000	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.287.260.000	840.237.503	1.687.020.944	405.402.313	0	1.357.000.000	6.188.058.237	221.641.395	3.399.686.310	627.485.168	Impegni di spesa
643.630.000	420.118.750	843.510.470	202.701.155	0	678.500.000	3.084.029.620	110.820.700	1.699.843.150	313.742.580	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	542.800.000	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	5.000.000.000	0	0	0	0	0	Amministrazione dello Stato

T.V.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5963	5954	5951	5950	590	5885	5873	5869/C	5869/B	5869/A	Protocollo
Nocera	Brescia	Brescia	Bergamo	Chianova	Imole	Napoli	Cernusco	Cernusco	Cernusco	Comune localizzazione
RESTAURO DELLA ROCCA E PARCO DELLA ROCCA D'INOCENZO	RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICIE ESTERNE ED INTERNE DELLA CHIESA CATTEDRALE	SISTEMAZIONE AREA ALL'INTERNO DEL CENTRO PASTORALE PADLOVI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IM CENTRO STORICO	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DI EDIFICIO "CASA DELLA GIOVANE"	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO ALIATERNI PER ADIBIRLO AD OPERE DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	SISTEMA A CARTELLI A MESSAGGIO VARIABILE	INQUADRI E ACCOGLIENZA LA RICETTIVITA' DEI PELLEGRINI NELLA MROPOLIS SACRA	AUDITORIUM, PIAZZE E SOSTA AUTOMEZZI	OSPEDALE VECCHIO - ACCOGLIENZA PELLEGRINI	OSPEDALE NUOVO - ACCOGLIENZA PELLEGRINI E SERVIZI	Titolo intervento
COMUNE DI INOCENZO	CATTEDRALE DI BRESCIA	FONDO CENTRO PASTORALE PADLOVI	DIOCESI DI BERGAMO	DIOCESI DI OPRIDO - PALMI	COMUNE DI JESOLO	ISTITUTO FEMMINILE S. GIOVANNI BOSCO CASA DELLO ST	SANTUARIO S. DELLA GUARDIA	SANTUARIO S. DELLA GUARDIA	SANTUARIO S. DELLA GUARDIA	Soggetto beneficiario
570 000 000	2 595 000 000	300 000 000	3 583 541 000	4 317 930 000	183 070 000	3 205 000 000	2 456 000 000	1 535 000 000	6 241 000 000	Costo Stimato
320 000 000	425 000 000	150 000 000	2 583 541 000	4 167 930 000	143 070 000	2 421 000 000	1 881 000 000	1 050 000 000	4 270 000 000	Finanziamento attribuito
250 000 000	2 170 000 000	150 000 000	1 000 000 000	150 000 000	50 000 000	784 000 000	775 000 000	485 030 000	1 971 000 000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
296 820 466	425 000 000	149 975 304	2 537 844 240	2 284 036 961	141 842 844	2 420 703 208	1 419 660 837	874 882 734	3 305 528 553	Impegni di spesa
148 480 230	212 500 000	0	1 268 922 120	1 642 018 480	70 921 470	1 210 351 600	708 830 420	437 441 365	1 652 764 280	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	149 975 300	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6104/B	6062	6012	6003	599	5987	5980	5976	5972	5964	Protocollo
Parasema	Caravaggio	Matera	Portofino	Matera	Bologna	Bologna	Teramo	Fidenza	Fonterivo	Comune localizzazione
RESTAURO E RISANAMENTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL DUOMO DI S. MARTINO IN PIETRASANTA. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DUOMO	RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL SANTUARIO	INTERNO DEGLI HABITAT RUPESTRI CIRCUITO URBANO DELLE CHIESE RUPESTRI DI MATERA	COMPLETAMENTO RESTAURO E REALIZZAZIONE FONESTERIA CASTELLO DEL PIAGNARO	CASA DEL PELLEGRINO FORESTIERA OSTELLO DELLE MONACHELLE	RESTAURO CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE DEL CERCHIO DI S. VITTORE AD USO DI ACCOGLIENZA RISTORO E LUOGO DI CULTO	RESTAURO DELL'ORGANO STORICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETA'	RESTAURO DELLA PIEVE DI BARONE E RECUPERO FINI MOBILI DI LOCALI ACCESSORI	RESTAURO DELLA CASA CREMONINI E DELLA TORRE MEDIEVALE LA PORTA DELLA VIA FRANCOISIA NELLA PROVINCIA DI PARMA	RESTAURO DELL'EX COLLEGIO MARIA LUIGIA D'ABAZIA CISTERCENSE CON REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICETTIVI/A BASO COSTO	Titolo intervento
PARROCCHIA S. MARTINO	COMUNE DI CARAVAGGIO	ARCIDIOCESI DI MATERA-RISNA	COMUNE DI PONTEROCCO	I.P.A.B. ISTITUTO FEMMINILE SAN GIUSEPPE	COMUNE DI S. VITTORE	PARROCCHIA S. MARIA DELLA PIETA'	PARROCCHIA ASSUNZIONE B.V. MARIA	COMUNE DI FIDENZA	COMUNE DI FONTERIVO PARMA	Soggetto beneficiario
2.666.000.000	3.075.000.000	8.387.340.000	686.000.000	4.441.651.000	3.670.000.000	150.000.000	1.282.000.000	890.000.000	2.683.070.000	Costo Stimato
1.981.000.000	2.075.000.000	2.887.340.000	531.000.000	3.496.651.000	3.670.000.000	100.000.000	977.000.000	890.000.000	2.505.070.000	Finanziamento attribuito
685.000.000	1.000.000.000	5.500.000.000	135.000.000	945.000.000	0	50.000.000	305.000.000	0	178.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	411.400.000	418.600.000	0	77.700.000	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	411.400.000	418.600.000	0	77.700.000	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.986.819.999	1.774.873.850	2.845.000.000	482.950.840	2.513.251.915	3.013.984.649	100.000.000	0	675.330.956	2.383.666.667	Impegni di spesa
983.410.000	887.437.925	1.422.500.000	241.475.420	1.257.625.960	1.506.992.320	50.000.000	0	337.665.480	1.191.833.330	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	1.006.100.766	0	0	0	270.132.380	953.466.670	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura utenze acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6173	616	6159	6156	6153	6122	6121	611	6109	6104/C	Protocollo
Santa Sofia	Masone	Pavia	Mailbox	Lodi Vecchio	Fuente	Fuente	Fuente	Pede	Preasente	Comune localizzazione
COMPLETAMENTO DI STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA OSTELLO CON RUSO OTTE DIVERNEMENTE DI PALAZZO GIORGI	REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO DON ORIONE APPARTENENTE ALLA PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	CONSERVAZIONE RESTAURO E ADEGUAMENTO AD USO LITURGICO CULTURALE DELLA CHIESA DI S. LUCA A PAVIA	CATTEDRALE DI S. PIETRO IN MANTOVA PROGETTO PER IL RECUPERO DELL'IMMAGINE STORICA E LA CORRETTA ACCOGLIENZA LA NAVATA CENTRALE E LA CUPOLA ABSIDE ED I TRANSETTI	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	SISTEMAZIONE SPAZIO URBANO ESTERNO DELL'AREA EX OASOMETRO	REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PRIVI DI OSTACOLI E BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO STORICO DI FIRENZE	BASILICA DI S. GIORGIO A FIRENZE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA	RISTRUTTURAZIONE RECUPERO ED AMPLIAMENTO DEL SANTUARIO DI S. FRANCESCO DI PAOLA IN FINE DELLA ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI ANCHE DISABILI	RESTAURO E RISANAMENTO DEL COMPLESSO MONASTICALE DEL DUOMO DI S. MARTINO IN PIETASANTA RESTAURO DI AFFRESCCHI	Titolo intervento
COMUNE DI SANTA SOFIA	PROV. DI S. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	PARROCCHIA S. PIETRO E FELICIANO	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO IN CATTEDRALE	BASILICA DEI XII APOSTOLI	COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	FONDO EDIFICI DI CULTO	PROV. DI S. PAOLA DEI MINIMI	PARROCCHIA S. MARTINO	Soggetto beneficiario
2.143.077.000	7.963.532.000	2.133.000.000	2.100.000.000	120.000.000	4.013.000.000	5.000.000.000	5.860.274.727	7.851.600.000	547.000.000	Costo Stimato
762.077.000	7.118.532.000	1.248.000.000	1.890.000.000	80.000.000	3.336.000.000	4.450.000.000	5.260.274.727	6.351.600.000	547.000.000	Finanziamento attribuito
1.381.000.000	845.000.000	885.000.000	210.000.000	40.000.000	677.000.000	550.000.000	600.000.000	1.500.000.000	0	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
467.076.580	6.368.532.000	1.246.991.753	1.782.670.400	80.000.000	2.868.013.748	4.252.674.814	0	6.351.600.000	543.793.611	Impegni di spesa
233.538.290	3.184.266.000	620.495.875	891.335.200	40.000.000	1.444.006.874	2.126.337.410	0	3.175.800.000	271.896.805	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	2.540.640.000	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	4.598.000.000	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6230	6229	6227	6222	6220	6219	6201	6193	6192	6191	Protocollo
Caserta	Chieti	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Caserta	Pescaia	Pescaia	Pescaia	Comune localizzazione
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER LA MISTOZZIONE	MUSEO DI ARTE SACRA PALAZZO VESCOVILE CHIOGGIA	CHIESA DI S. MARIA NOVELLA INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E PULITURA DEGLI INTERNI SUPERFICI INTONACATE COLONNE ELEMENTI ARCHITETTONICI LAPIDEI E INFRESCHI	SEGNALETICA E ARREDO QUADRANTE E DEI PERICOLI SPECIALI	VIDEO SQUADRA PER I MONUMENTI FONTENTINI	CENTRO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA NEI LOCALI DELL'ANTICO CONVENTO DI S. MARIA NOVELLA CON ACCESSO DA PIAZZA STAZIONE	SISTEMAZIONE URBANISTICA ARCHITETTONICA ED ARCHEOLOGICA DELLA PIAZZA VESCOVADA	SEMINARIO VESCOVILE DI PISTOIA RECUPERO DELLA FORESTERIA COME RESIDENZA A BASSO COSTO TRAMITE ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE	ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE DI VILLA HOSPITALIOSI	RESTAURO DELLA FACCIATA E DEL PORTICO DELLA CATTEDRALE	Titolo intervento
MONASTERO DI S. MARIA DEL MONTE	ENTE DIOCESI DI CHIOGGIA	COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI CAOPLE	SEMINARIO VESCOVILE E LEOBARDI DI PISTOIA	DIOCESI DI PISTOIA	CATTEDRALE DIOCESI DI PISTOIA	Soggetto beneficiario
1.515.000.000	3.500.000.000	4.291.000.000	1.500.000.000	946.000.000	1.386.000.000	3.580.000.000	775.521.000	824.000.000	880.696.000	Costo Stimato
1.515.000.000	3.109.000.000	3.175.000.000	1.325.000.000	544.000.000	1.180.000.000	1.580.000.000	475.521.000	422.000.000	580.696.000	Finanziamento attribuito
0	381.000.000	1.116.000.000	165.000.000	402.000.000	226.000.000	2.000.000.000	300.000.000	362.000.000	200.000.000	Altre fonti
153.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
153.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.310.881.977	3.085.926.400	2.908.184.000	977.741.833	543.606.000	1.049.581.150	1.543.677.000	395.520.300	421.613.835	632.900.000	Impegni di spesa
655.440.988	1.542.963.200	1.454.062.000	486.870.920	271.803.000	524.790.575	771.838.500	197.760.150	215.806.915	326.450.000	Lavori acconto 50%
524.352.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6279	6274	6272	625	6246	6245	6240	6239	6233	6231	Protocollo
Beneiz	Ained	Padova	Lendinara	Bologna	Bologna	Bologna	Bologna	Ciena	Cono	Comune localizzazione
RECUPERO DEL FABBRICATO LA BATISE AD USO OSTELLO	CASA PARROCCHIALE DI ACCOGLIENZA	CENTRO PER IL RECUPERO SOCIO EDUCATIVO DEI GIOCHI PLEISTOCENI	CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO CONSERVATIVO DEL MONASTERO DI LENDINARA	INQUADRATURA LOCALI CONVENTO SAN SALVATORE DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINI	RIQUALIFICAZIONE LOCALI CONVENTO SAN DOMENICO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINI	VILLA QUASTAVILLAN UNA RESIDENZA RINASCIMENTALE IMMERSA NEL VERDE COLLINE RESTITUITA A NUOVA VITA CIVILE E DI ACCOGLIENZA	REALIZZAZIONE DI CASA ALBERGO PER ANZIANI	CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL PELLEGRINO SANTUARIO S. MARIA DELLA CROCE	RESTAURO FACCEATE DELLA BASILICA DI S. ABRONIO	Titolo intervento
COMUNE DI BENEIZ	IST. DIOCESANO SOSTENTIMENTO CLERO	IST. CONFRAIACHI PER MINORI	CONGREGAZIONE BENEDETTINA DI VETIANA	PREFETTURA DI BOLOGNA	PREFETTURA DI BOLOGNA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA	OPERA DIA DEI POVERI VERODOMOSI	PARROCCHIA DI S. MARIA AD NIVES	SEMINARIO VESCOVILE DI S. ABRONIO	Soggetto beneficiario
2 094 912.000	1.575 000 000	4 350 917 000	2 177 000 000	350 000 000	365 000 000	14 898 000 000	2.873 000 000	2 118 000 000	1 218.000 000	Costo Stimato
1 461 912 000	1 000 000 000	3 150 917 000	1 627 000 000	350 000 000	365 000 000	4 898 000 000	748 000 000	1 518 000.000	568 000.000	Finanziamento attribuito
633 000 000	575.000 000	1 200 000 000	550 000 000	0	0	10 000 000 000	2 125 000 000	600 000 000	650 000 000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1 212 516 445	929 000 000	3 010 916 750	1 461 997 000	0	0	815 839 834	622 185 117	1 475 808 980	567 378 145	Impegni di spesa
608 258 220	464 500 000	1 505 458 380	730 998 500	0	0	407 919 970	311 092 560	739 904 490	283 689 070	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6295	6294	6293	6292	6291	6290	6289	6288	6287	6283	Protocollo
Lease	Lease	Lease	Lease	Lease	Lease	Lease	Lease	Lease	Lease	Comune localizzazione
CONFERIMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA E DI VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE SOTTOSTANTE LA NAVAZIA CENTRALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI OLTRO	CONFERIMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA E DI VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE SOTTOSTANTE LA NAVAZIA CENTRALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI OLTRO	CONFERIMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA E DI VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE SOTTOSTANTE LA NAVAZIA CENTRALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI OLTRO	CONFERIMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA E DI VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE SOTTOSTANTE LA NAVAZIA CENTRALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI OLTRO	CONFERIMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA E DI VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE SOTTOSTANTE LA NAVAZIA CENTRALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI OLTRO	CONFERIMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA E DI VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE SOTTOSTANTE LA NAVAZIA CENTRALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI OLTRO	CONFERIMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA E DI VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE SOTTOSTANTE LA NAVAZIA CENTRALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI OLTRO	CONFERIMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA E DI VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE SOTTOSTANTE LA NAVAZIA CENTRALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI OLTRO	CONFERIMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA E DI VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE SOTTOSTANTE LA NAVAZIA CENTRALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI OLTRO	CONFERIMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA E DI VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE SOTTOSTANTE LA NAVAZIA CENTRALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI OLTRO	Titolo intervento
SOPRINTENDENTE ZA B.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDENTE ZA B.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDENTE ZA B.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDENTE ZA B.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDENTE ZA B.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDENTE ZA B.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDENTE ZA B.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDENTE ZA B.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDENTE ZA B.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDENTE ZA B.A. PER LE MARCHE	Soggetto beneficiario
1 150 000 000	750 000 000	1 500 000 000	1 200 000 000	800 000 000	1 000 000 000	2 850 000 000	1 200 000 000	1 900 000 000	1 150 000 000	Costo Stimato
1 150 000 000	750 000 000	1 500 000 000	1 200 000 000	800 000 000	1 000 000 000	2 850 000 000	1 200 000 000	1 900 000 000	1 150 000 000	Finanziamento attribuito
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
1 150 000 000	750 000 000	1 500 000 000	1 200 000 000	800 000 000	1 000 000 000	2 850 000 000	1 200 000 000	1 900 000 000	1 150 000 000	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6325	6316	6314	6308	6302	6301	6300	6299	6297	6296	Protocollo
Loro	Cingh	Felgro	Loro	Loro	Loro	Loro	Loro	Loro	Loro	Comune localizzazione
RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI DEL SOTTOTETTO DEL CORPO CENTRALE DEL PALAZZO ULTIMO DA DESTINARSI AD ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA	ADeguamento funzionale e consolidamento e restauro del monastero di S. Benedetto all'Ani della Rocchetta a basso costo	RIstrutturazione adeguamento funzionale e consolidamento e restauro ai fini della ricezione di due porzioni attualmente non utilizzate del monastero di S. Anna	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE DELLE NAVATE DELLA BASILICA	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA ED OPERE DI FINITURA PIETRA DEI FASCELLI ALL'INTERNO DELLA BASILICA	LAVORI DI BONIFICA E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI AL PRIMO SOTTOTETTO DELLA ZONA LATERALE DESTRA DELLA BASILICA DA DESTINARSI AD ATTIVITÀ DI CULTO	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEI FINESTRI STORICI SULLE ABSIDI DELLA BASILICA DELLA S. CASA DI LORETO	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA ZONA DEL POMABANCO SOFFITTO LIONE E COPERTURA E SUO RECUPERO FUNZIONALE	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RESTAURO DEI PICCHI DELLA CUPOLA DELLA BASILICA DELLA S. CASA	BONIFICA VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEGLI AMBIENTI DEL SOTTOTETTO E COPERTURA DELL'ABSIDI DELLA BASILICA	Titolo intervento
SOPRINTENDEN- ZA B.A. PER LE MARCHE	IST. TERAPIE FRANCISCANE	IST. TERAPIE FRANCISCANE	SOPRINTENDEN- ZA B.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDEN- ZA B.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDEN- ZA B.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDEN- ZA B.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDEN- ZA B.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDEN- ZA B.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDEN- ZA B.A. PER LE MARCHE	Soggetto beneficiario
1 900 000 000	4 387 000 000	3.586 000 000	1 200 000 000	750 000 000	1 900 000 000	1 200 000 000	1 150 000 000	1.100 000 000	1.200.000.000	Costo Stimato
1 900 000 000	4 167 000 000	3.388 000 000	1 200 000 000	750 000 000	1 900 000 000	1 200 030 000	1 150 000 000	1.100 000 000	1.200.000.000	Finanziamento attribuito
0	220 000 000	178.000 000	0	0	0	0	0	0	0	Altre fonti
0	196 700 000	160 800 000	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	196 700 000	160 800 000	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
0	3.656.300 000	3 085 519 400	0	0	0	0	0	0	0	Impegni di spesa
0	1 828 150 000	1 542 759 700	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 50%
0	1 462 520 000	1.234 207 760	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
1 900 000 000	0	0	1 200 000 000	750 000 000	1 900 000 000	1 200 000 000	1 150 000 000	1 100 000 000	1 200 000 000	Amministrazioni dello Stato

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6389	6376	6386	6352	6344	6337	6329	6328	6327	6326	Protocollo
Onore	Loreo	Parole	Assi	Assi	Assi	Loreo	Loreo	Loreo	Loreo	Comune localizzazione
RECUPERO DEL CONVENTO DI SAN CRISPINO DA INTERNO IN CONFINO ACCOGLIENZA POVERA	COMPLETAMENTO EDIFICIO EX F.A.F.	CONGOLAMENTO E RESTAURO SANTUARIO DI MONDOVINO	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO MECCANIZZATO COMPOSTO DA TRATTI PEDONALI E COPPIE DI ASCENSORI DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DI PIAZZA MATTEOTTI	RIQUALIFICAZIONE DEGLI ITINERARI STORICI DI ACCESSO AD ASSISI	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN LOCALITÀ PONTE SAN VETTURINO	COMPLETAMENTO DELLA PLATTURA E CONGOLAMENTO DEGLI ELEMENTI DELLE FACCIATE INTERNE RELATIVE ALLA STRUTTURA DI BASE DELLA CUPOLA DELLA BASILICA	LAVORI DI CONGOLAMENTO E RESTAURO DELLE COPERTURE NELLA ZONA DEL POMAIANO (DESTINATA AD ACCOGLIENZA) AL SECONDO LIVELLO DEL PALAZZO APOSTOLICO	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI RESTAURI DELLE FACCIATE NELLA ZONA ABSIDALE DELLA BASILICA	LAVORI DI BONIFICA E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI AL PIANO SEMINTEGRATO DELLA ZONA ABSIDALE SINISTRA DELLA BASILICA DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI CULTO	Titolo intervento
PROV. ROMANA TRATTI MONTI CARPACCINI	COMUNE DI LORETO	SOPRINTENDENZA B.A.A.S. DELL'UMBRIA	COMUNE DI ASSISI	COMUNE DI ASSISI	COMUNE DI ASSISI	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	Soggetto beneficiario
800 000 000	5.074 000 000	4 332 000 000	1 944 000 000	1 282 000 000	839 000 000	1 000 000 000	1 200 000 000	1 100 000 000	2 250 000 000	Costo Stimato
800 000 000	5 074 000 000	4 322 000 000	1 944 000 000	1 282 000 000	839 000 000	1 000 000 000	1 200 000 000	1 100 000 000	2 250 000 000	Finanziamento attribuito
0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Altre fonti
0	0	0	184 400 000	128 200 000	83 900 000	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	184 400 000	128 200 000	83 900 000	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
701 856 000	4 348 409 574	0	0	949 418 547	0	0	0	0	0	Impegni di spesa
351 928 000	2 174 704 787	0	0	474 709 275	0	0	0	0	0	Lavori acconto 50%
281 542 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	3 600 000 000	0	0	0	1 000 000 000	1 200 000 000	1 100 000 000	2 250 000 000	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 10 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6476	6453	6446	6442/C	6442/B	643	6424	642	6409/B	6380	Protocollo
San Venero	Asuni	Portico	Nocera	Nocera	Montebello Al Mare	Macerata	Napoli	Nocera	Lecce	Comune localizzazione
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO ABITATO FINDE COLLELUNGO	PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO L'ADEGUAMENTO E LA CATEGORIA DELLA STRUTTURA INETTIVA CASA DI S. BRIGIDA	SISTEMAZIONE FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO E DEL PIAZZALE ANTISTANTE	SISTEMA STRUTTURALE E ANTERTATO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E MOLIPICAZIONE DELLA CINTA MARIANA E VARIABILI AL PIAZZO DEL CENTRO STORICO - VARIABILI DEL CAPOLOGICO E DELLE FRAZIONI	SISTEMA STRUTTURALE INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E MOLIPICAZIONE DELLA CINTA MARIANA E VARIABILI AL PIAZZO DEL CENTRO STORICO - VARIABILI DEL CAPOLOGICO E DELLE FRAZIONI	CONARLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI BOVONE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO PER FUNZIONI DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	PELLEGRINI DURABILI E ASSISTENZA RELIGIOSA CON RISTORAZIONE E RICEZIONE NOTTURNA CENTRO STUDI RICORDO	DUOMO DI NAPOLI	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO (IN LOTTO)	ISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI IN VIA SOLARI CENTRO STORICO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NELLE ZONE DI SOSTA E RISTORO ED ALTRE ALLIGATO PIANO GENERALE PER L'ACCOGLIENZA	Titolo intervento
COMUNE DI SAN VENERO	ORDINE DEL SS MO S. SALVATORE DI S. BRIGIDA	COMUNE DI PORTICO	COMUNE DI NOCERA	COMUNE DI NOCERA	SANTUARIO DI S. DI BOVONE	SEM MISS DIOCE REDEMPTORIS MATER	SOPRINTENDENTI ZA BIA DI NAPOLI E PROV	COMUNE DI NOCERA	COMUNE DI LECCE	Soggetto beneficiario
200.000.000	950.000.000	575.000.000	6.257.000.000	2.337.000.000	4.329.000.000	17.535.000.000	5.298.000.000	4.807.000.000	375.000.000	Costo Stimato
185.000.000	950.000.000	350.000.000	6.257.000.000	1.717.000.000	4.059.000.000	12.729.000.000	5.298.000.000	4.807.000.000	375.000.000	Finanziamento attribuito
15.000.000	0	225.000.000	0	620.000.000	270.000.000	4.806.000.000	0	0	0	Altre fonti
0	95.000.000	0	0	0	135.900.000	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	95.000.000	0	0	0	135.900.000	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
159.860.835	855.000.000	322.713.642	5.667.758.764	2.035.424.062	3.495.101.640	10.648.283.165	0	3.885.085.040	339.415.410	Impegni di spesa
0	427.500.000	161.356.820	2.833.879.380	1.017.712.030	1.747.550.800	5.324.141.580	0	1.942.542.000	169.707.705	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	4.259.313.270	0	0	0	Lavori acconto 90%
159.860.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	4.298.000.000	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6537	6528	6526	650	6498	6495	6490	6488	6481	6480	Protocollo
Parano	Genoa	Fabiano	Lucca	Fabiano	Basiglio	Sera De' Conti	Castellano	Montebello	Acqui Terme	Comune localizzazione
ACCOGLIENZA POVERA E RICETTIVA A BASSO COSTO NELL'EDIFICIO DISMESSO DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE	CENTRO DI ACCOGLIENZA TURISTICA ED OSTELLO RISTRUTTURAZIONE PALAZZO FIDUS SEPIATTEI	CASA ALBERGO PER ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	FABBRICA DEL PALAZZO RESTAURO PER RIAPERTURA AL PUBBLICO DI INTERI ED ESTERI AL PALAZZO DUCALE STRUTTURAZIONE DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RESTAURO E RIUSO DELL'ABAZIA DI S. DIADO IN CAPITALE (25 P.L.)	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RIUSO DEL PALAZZO DEGLI SCALZI	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LA CHIESA DI SAN MICHELE	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'ABAZIA DI SAN BENEDETTO IN CASTELPIANO PER LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IN LAPIDE E REALIZZAZIONE DI PICCOLO CENTRO DI ACCOGLIENZA PERI PELLEGRINI	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO GENERALE E DELLA CHIESA CATTEDRALE DI S. EMILIO	Titolo intervento
SEMINARIO VESCOVILE	COMUNE DI GENOVA	PROV. ITAL. COM. FRATELLI DI S. GIOVANNI	PROV. LUCCA	COMUNE DI FABIANO	COMUNE DI SASSOFERRATO	COMUNE DI SERA DE' CONTI	DIOCESI DI JESI	PARROCCHIA S. MARIA IN LAPIDE	CHIESA CATTEDRALE DI S. EMILIO	Soggetto beneficiario
4.468.024.000	1.882.581.000	7.892.000.000	12.424.872.000	2.300.000.000	8.777.126.000	7.140.000.000	2.343.000.000	812.400.000	1.210.000.000	Costo Stimato
4.269.024.000	1.782.581.000	3.630.000.000	8.724.872.000	1.750.000.000	7.222.126.000	6.140.000.000	1.968.000.000	812.400.000	870.000.000	Finanziamento attribuito
200.000.000	100.000.000	4.262.000.000	3.700.000.000	550.000.000	1.555.000.000	100.000.000	375.000.000	0	340.000.000	Altre fonti
287.000.000	90.000.000	0	0	0	0	0	0	83.900.000	0	O.N.T. Impegni di spesa
287.000.000	90.000.000	0	0	0	0	0	0	83.900.000	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
3.901.023.832	1.550.080.975	2.850.803.606	8.724.871.347	1.163.538.950	6.479.764.724	422.714.981	1.818.000.000	708.450.000	799.803.000	Impegni di spesa
1.950.511.820	775.040.480	1.475.401.800	4.362.435.670	581.769.475	3.236.882.360	211.357.490	908.000.000	354.225.500	399.901.500	Lavori acconto 50%
1.560.409.532	0	0	0	0	0	0	727.200.000	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

										Protocollo
										Comune localizzazione
										Titolo intervento
										Soggetto beneficiario
										Costo Stimato
										Finanziamento attribuito
										Altre fonti
										O.N.T. Impegni di spesa
										O.N.T. Anticipazioni 10%
										Impegni di spesa
										Lavori acconto 50%
										Lavori acconto 90%
										Lavori saldo
										Fornitura acconto 50%
										Fornitura ulteriore acconto
										Fornitura saldo
										Acquisizione aree e immobili
										O.N.T. Uffici tecnici
										Amministrazioni dello Stato
6656	6652	6628	6615	6603	6598	6589	6565	6558	6538	
Città Di Castello	Storione	Perugia	Perugia	Perugia	Campano	Parabombiani	Sale	Foligno	Perano	
MUSEO DIOCESANO ADEGUAMENTI ED ADATTAMENTO BARRIERE	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOLGENZA A BASSO COSTO PRESSO IL CONVENTO DI S. FRANCESCO	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI PER IL ACCOLGENZA PROGETTO UMBRIA 2000	OSTELLO PIAN DI MASSANO E ANNESSO PARCO PUBBLICO	AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORNO	RECUPERO STATICO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO	RECUPERO DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI ISOLA	RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA CIMITERIALE DI ADOLLA	OSTELLO DELLA GIOVENTÙ IN PALAZZO PERBANTONI	RECUPERO FUNZIONALE E AL FINE CENTRO DI SOSTE RISTORNO INFORMAZIONE DI UN'ALA DELL'EX CONVENTO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI	
DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO	PROV. SERVIZIO DI S. FRANCESCO	REGIONE DELL'UMBRIA	COMUNE DI PERUGIA	COMUNE DI PERUGIA	CATTEDRALE DI SAN FILIPPO	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA	COMUNE DI SESTO	COMUNE DI FOLIGNO	COMUNE DI PERANO	
848.791.000	412.000.000	19.404.000.000	4.811.000.000	800.000.000	1.800.000.000	400.000.000	491.430.000	5.787.000.000	5.440.450.000	
755.791.000	400.000.000	12.877.000.000	2.611.000.000	300.000.000	1.800.000.000	400.000.000	476.430.000	3.400.000.000	4.325.450.000	
93.000.000	12.000.000	6.527.000.000	2.000.000.000	300.000.000	0	0	15.000.000	2.387.000.000	1.115.000.000	
0	40.000.000	0	0	0	180.000.000	40.000.000	0	0	0	
0	40.000.000	0	0	0	180.000.000	40.000.000	0	0	0	
240.580.000	337.759.328	12.877.000.000	2.361.000.000	289.444.360	1.573.248.000	345.372.202	472.428.829	2.581.405.608	3.706.948.969	
0	168.879.660	6.438.500.000	1.180.500.000	144.722.180	786.623.000	172.686.100	236.214.410	1.290.702.800	1.853.474.480	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120.295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TAV 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6706	6705	6663	6669	6668	6664	6663	6659	6658	6656	Protocollo
Foligno	Montelido	Casano	San Benedetto Del Tronto	Santa Viteusa in Maremme	San Giuliano	Città Di Castello	Umbertide	Todi	Città Di Castello	Comune localizzazione
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SANITARIO DI PRIMO INTERVENTO PER PELLEGRINI E O TURISTI PREVIA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI	AREA EX IMPIANTI SPORTIVI DEL CARPILODOO RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER L'ACCESSO ALLA SOSTA E LA MOBILITÀ	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DESTINATA ALLA RICEZIONE A BASSO COSTO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DI EDIFICIO QU. EX STUDENTATO EUCARISTICO DEI PADRI SACRAMENTINI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE AUTONOME	RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX CHIESA DELLA RESURREZIONE E ADIACENTE PARCO DELLE RIMEBRANZE	CHIESA DI S. SILVESTRO IN CORROSANO	RISTRUTTURAZIONE EX CASA DEI CANONICI CITTA DELLA SAN FLORIDO	NESTUARO DELL'ABBADIA DI MONTECORONA	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO AOSTINIANO DI S. PRASIDE AI FINI DELL'ACCOGLIENZA PER LA DISABILE E DEI SERVIZI SOCIALI CULTURALI E INFORMATIVI	MUSEO DIOCESANO ADEGUAMENTI ED ABBATTIMENTO BARRIERE	TITOLO Intervento
AZIENDA U.S.L. N. 3	COMUNE DI MONTEFALCO	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	PROV. ITAL. ISTITUTO DEI PRETIDI DEL SS	COMUNE DI S. VITTORIA IN MARTEMANO	PARROCCHIA SAN GIUSTINO	DIOCESI DI CITTÀ DI CASTELLO	PARROCCHIA DI SAN SALVATORE	ISTITUTO ARTIGIANELLI CRISTOFOLI	DIOCESI DI CITTÀ DI CASTELLO	Soggetto beneficiario
3.584.000.000	1.800.000.000	1.000.000.000	1.214.858.000	1.317.000.000	314.000.000	1.700.245.000	850.000.000	5.464.000.000	848.791.000	Costo Stimato
3.584.000.000	1.280.000.000	900.000.000	807.656.000	967.000.000	100.000.000	1.444.245.000	730.000.000	5.394.000.000	755.791.000	Finanziamento attribuito
0	320.000.000	100.000.000	407.000.000	350.000.000	214.000.000	256.000.000	120.000.000	70.000.000	93.000.000	Altre fonti
400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	469.400.000	0	O.N.T. Impegni di spesa
400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	469.400.000	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
2.258.213.827	1.127.565.267	899.152.835	621.000.000	837.371.418	80.883.200	1.354.745.500	729.326.960	4.011.032.807	510.790.500	Impegni di spesa
1.129.106.910	563.782.635	448.578.420	310.500.000	418.685.710	30.441.600	677.372.750	384.863.480	2.005.516.400	255.395.250	Lavori acconto 50%
0	0	359.661.130	0	334.948.570	0	0	291.730.785	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6808	6804	6800	6790	6782	6775	6767	6734	6717	6712	Protocollo
Cornalba	Nocera	Quindici Tedero	Spazio	Quindici	Jesi	Jesi	Spazio	Asse	Chier di Castello	Comune localizzazione
ACCOGLIENZA E RESIDENZA SANTA MARIA GONNETTI	RESTAURO RECUPERO E RIUTILIZZO DEL COMPLESSO MONASTICALI E DI SAN BENEDETTO	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MARIA DI GAVIANA	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI S. VENTURA DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA POVERA	RECUPERO DELL'EREMO DI S. AMBROGIO	RESTAURO DELLE COBERTURE DELLA CATTEDRALE DI S. SETTIMO DUOMO DI JESI	REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO PER GIOVANI	CONSOLIDAMENTO RESTAURO E RISANAMENTO DI EDIFICI DELLA COLONNATA DI S. MARIA MAGGIORE	ADEGUAMENTO URBANICO E FUNZIONALE DELLA BASILICA	MUSEO DIOCESANO AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO	Titolo intervento
COMUNE DI CORNOLDO	ARCIDIOCESI DI SPOLITO	PARROCCHIA DI S. NICOLA VESCOVO	PARROCCHIA DI S. MARIA MAGGIORE	CANONICI REGOLARI LATERANENSIS	ENTE DIOCESI DI JESI	COMUNE DI JESI	PARROCCHIA DI S. MARIA MAGGIORE	PROTONASTI ERO DI S. CHIARA ASSISI	DIOCESI DI CITTA DI CASTELLO	Soggetto beneficiario
2.204.330.000	3.830.103.000	524.000.000	478.000.000	2.000.000.000	650.000.000	3.500.000.000	2.537.000.000	2.000.000.000	248.337.000	Costo Stimato
1.904.330.000	3.840.057.651	400.000.000	442.000.000	700.000.000	455.000.000	2.450.000.000	1.090.000.000	2.000.000.000	227.337.000	Finanziamento attribuito
300.000.000	190.045.349	124.000.000	36.000.000	1.300.000.000	195.000.000	1.050.000.000	1.447.000.000	0	21.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.904.332.142	3.630.102.202	326.264.262	431.650.000	700.000.000	455.000.000	1.985.360.344	1.075.592.500	1.964.647.381	208.338.100	Impegni di spesa
952.166.070	1.815.051.100	163.132.130	215.825.000	350.000.000	227.500.000	992.680.170	537.796.250	982.323.690	104.668.050	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6989	6989/C	6989/B	6989/A	6981	6906	6905	6908	6888	6884	Protocollo
Spoleto	Orano	Orano	Orano	Città di Castello	Assisi	Assisi	Caserta	Monterotondo	Spoleto	Comune localizzazione
PIANO GENERALE E PROGETTO PER L'ABBANDONAMENTO DELLE BARRENE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI LUNGO I PERCORSI E LE RETE GABRIEL NEL CENTRO STORICO DI SPOLETO	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO SANTUARIO DI S. GIUSEPPE DA COPERTINO IN OSIMO - 1° LOTTO - CHIOSTRO E RESTAURO BASILICA	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO SANTUARIO DI S. GIUSEPPE DA COPERTINO IN OSIMO - 1° LOTTO - CHIOSTRO E RESTAURO BASILICA	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO SANTUARIO DI S. GIUSEPPE DA COPERTINO IN OSIMO - 1° LOTTO - NUOVO NESTITTO E GARAGE	REALIZZAZIONE DI UN AREA DI RISTORO E OPERE PER IL MIGLIORAMENTO VEICOLARE E PEDONALE PER L'ACCESSO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI CAROCCIO DALLE FRAZIONI DI FABBRECCIA E BRUZZOLANNO	REALIZZAZIONE DELLA SALA CONGREGAZIONE E SALA POLIVALENTE DI S. MARIA DELLE ROSE	RISTRUTTURAZIONE CON ELIMINAZIONE DELLE BARRENE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	SISTEMAZIONE DI AREA URBANA DI SOSTA E RISTORO TERMINAL BUS E VERDE ATTREZZATO DEL PIAZZALE E DEI SAGGIATI DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA CASA DIODORA	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONASTICALE DI SAN NICOLO' SPOLETO	Titolo intervento
COMUNE DI SPOLETO	PROVINCIA MARCHE E M. CONVENTUALI	PROVINCIA MARCHE E M. CONVENTUALI	PROVINCIA MARCHE E M. CONVENTUALI	COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO	CATTEDRALE DI S. RUFO	ISTITUTTO FRATELLI ALCANTARANE	COMUNE DI CASERTA	PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO IN FERPA	PROVINCIA DI PERUGIA	Soggetto beneficiario
796.000.000	2.117.000.000	1.563.000.000	1.771.000.000	885.000.000	1.058.380.000	3.207.430.000	5.840.000.000	1.255.000.000	2.432.000.000	Costo Stimato
605.000.000	1.917.000.000	1.363.000.000	1.571.000.000	796.000.000	637.996.667	1.642.975.000	5.840.000.000	1.000.000.000	2.207.000.000	Finanziamento attribuito
190.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	89.000.000	420.383.333	1.564.455.000	0	255.000.000	225.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
604.775.000	1.812.422.068	1.303.690.415	1.570.568.485	767.069.250	633.371.735	1.500.560.393	5.839.032.000	830.000.000	2.136.307.791	Impegni di spesa
302.387.500	806.211.030	651.845.200	785.284.740	383.534.625	316.685.865	750.280.200	2.918.516.500	465.000.000	1.068.153.880	Lavori acconto 50%
0	724.968.825	521.476.165	628.227.795	0	0	0	2.335.613.200	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7014	6997	6989	6986	6984	6980	6975	6974	6971	6970	Protocollo
Montecassino	Pienci	Lugnano In Teverina	Loreto	Terni	Todi	Castiglione Del Lago	Castiglione Del Lago	Spello	Spello	Comune localizzazione
TORRE AMERINA	RISTRUTTURAZIONE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO DELL'ABBAZIA DI SAN'EUTICIO E SISTEMAZIONE DELL'ANFITEATRO A SERVIZIO DEI PELLEGRINI	RESTAURO E RECUPERO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI	AREA URBANA PREDISPOSTA PER LA SOSTA ED IL RISTORNO	RESTAURO E RISANAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO EDILIZIO SANT'AGATA SITO A COLLESCOPOLI DI TERNI DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA	CENTRO DI INFORMAZIONE E COORDINAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E ZONA DI PARCHING	RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CASTELLO DI ISOLA POLVERE	ISOLA POLVERE SUI LAGHI TRASIMENO REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO PER LA GIOVENTU'	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA EX CUMONIA PER SERVIZI TURISTICI E CULTURALI	RECUPERO DEL MONASTERO DI S. PONTIANO TRASFORMAZIONE PARTIZIO IN CASA RELIGIOSA DI OSPITALITA' E RESTAURO DEL MONASTERO ESISTENTE	TITOLO intervento
COMUNE DI MONTICASSINO	COMUNE DI PIENCI	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	COMUNE DI LORETO	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'AMORE MISERICORDIA	PROVINCIA DI PERUGIA	PROVINCIA DI PERUGIA	PROVINCIA DI PERUGIA	MONASTERO DI S. PONTIANO	Soggetto beneficiario
122 000 000	4 077 264 000	4 971 452 000	478 000 000	1 077 000 000	2 800 000 000	1 849 000 000	2 375 000 000	822 000 000	3 908 000 000	Costo Stimato
110 000 000	4 077 264 000	2 880 452 000	478 000 000	877 000 000	2 600 000 000	1 349 000 000	1 575 000 000	200 000 000	3 406 000 000	Finanziamento attribuito
12 000 000	0	2 091 000 000	0	200 000 000	0	500 000 000	800 000 000	622 000 000	500 000 000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
93 517 554	3 867 263 044	2 523 352 088	434 160 000	787 349 187	2 525 659 987	1 268 075 789	1 344 020 540	111 454 316	2 838 596 263	Impegni di spesa
46 758 780	1 933 631 520	1 261 676 040	217 080 000	393 674 580	1 262 629 990	634 038 395	672 010 270	55 727 160	1 419 299 130	Lavori acconto 50%
0	0	1 009 340 835	0	0	0	0	0	0	567 719 652	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7084	7084	7081	7077	7074	7068	7067	7065	7052	7041	Protocollo
Vallo D'Nera	Vallo D'Nera	Amelia	Todi	Urbino	Urbino	Urbino	Cagli	Assisi	Montecassini	Comune localizzazione
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN LOCALITÀ CASALI DI VALLO	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN LOCALITÀ CASALI DI VALLO	RESTAURO E RECUPERO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA VILLA VESCOVILE IN LOC. PODERE ANGELETTI	RESTAURO ED AMPLIAMENTO PER UN CENTRO DI ACCOGLIENZA NELLA LOCALITÀ COLLEVALENZA	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MONASTERO DI S. CATERINA	PALAZZO DEL COLLEGO BISTIAZZONI ANEA MUSEO E COPERTURA	PALAZZO ROMANVENTURA DONASI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL MONASTERO BENEDETTO DI SAN PIETRO	PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IN TERMINI DI ARTE E URBANO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRE ARCHITETTONICHE DELL'AREA CIRCOSTANTE LA CHIESA DI SAN BERNARDINO	PALAZZO MASSI PENSIONE	Titolo intervento
COMUNE DI VALLO D'NERA	COMUNE DI VALLO D'NERA	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	MONASTERO APOSTOLICO DI S. CATERINA	COMUNE DI URBINO	COMUNE DI URBINO	MONASTERO BENEDETTO DI SAN PIETRO	PREBENDA PAR. DI SAN BERNARDINO	COMUNE DI MONTECASSINI	Soggetto beneficiario
2.056.470.000	2.056.470.000	1.222.000.000	6.907.000.000	1.930.000.000	1.100.000.000	2.400.000.000	3.500.990.000	174.000.000	330.000.000	Costo Stimato
1.956.470.000	1.956.470.000	922.000.000	3.307.000.000	1.645.000.000	1.100.000.000	1.800.000.000	3.282.990.000	174.000.000	294.000.000	Finanziamento attribuito
100.000.000	100.000.000	300.000.000	3.600.000.000	285.000.000	0	600.000.000	218.000.000	0	36.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	170.400.000	0	0	127.500.000	17.400.000	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	170.400.000	0	0	127.500.000	17.400.000	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.316.470.000	100.000.000	813.000.000	2.752.328.294	1.329.307.013	816.000.000	1.445.000.000	2.787.486.283	110.218.798	293.052.290	Impegni di spesa
658.235.000	0	406.500.000	1.378.164.150	664.653.510	408.000.000	722.500.000	1.383.743.140	55.109.400	146.526.145	Lavori acconto 50%
526.598.000	0	325.200.000	0	0	0	0	1.106.594.510	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV.4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7227	7201	7176	7171	7167	7166/B	7143	713	7102	7088	Protocollo
Assisi	Guibio	Foligno	Guibio	S. Maria della Misericordia	Foligno	Porto Recanati	Todi	Assisi	Assisi	Comune localizzazione
RESTAURO DELLA FACCIATA DELLA CATTEDRALE DI S. RUFINO	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CORPO ESISTENTE DEL PALAZZO DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO E CONVENTO	REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA A BASSO COSTO A COLFORITO LUNGO LA VIA CHE COLLEGA ASSISI A LONERO	RESTAURO DEL PALAZZO DEL CAPITULO DEI CANONICI ANNESSO ALLA CATTEDRALE DI GUIBIO MUSEO DIOCESANO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CASA RELIGIOSA DI ACCOGLIENZA POVERI IN SAN FELICE	RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO TRINCI ED ALLESTIMENTO MUSEALE LAVORI DA ESEGUIRE	PISTA CICLABILE PORTO RECANATI LONERO	PARCHEGGIO DELL'ABBAZIA DI PRADIVA	PATRIARCALE E BASILICA DI S. FRANCESCO DI ASSISI PALAZZO PAPALE MUSEO PALAZZO NUOVO PALAZZO CIVICO RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ACCOGLIENZA	CASA MADRE IN VIA SAN FRANCESCO	Titolo intervento
SOPRINTENDENZA REGIONALE DELL'UMBRIA	CHIESA DI S. FRANCESCO GUIBIO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	CAPITULO DEI CANONICI DELLA CATTEDRALE	ARCIDIOCESI DI S. MARIA DELLA MISERICORDIA	COMUNE DI FOLIGNO	COMUNE DI PORTO RECANATI	COMUNE DI TODI	PATRIARCALE E BASILICA DI S. FRANCESCO	ISTITUTO FRANCESE MISSIONARIO	Soggetto beneficiario
750 000 000	3 041 895 000	619 000 000	5 017 000 000	1.909 397.000	4 320 000 000	300 000 000	1 572 670 000	19 583 063 000	388 000 000	Costo Stimato
400 000 000	2 955 340 753	589 000 000	4 079 000 000	1 770 147 087	1 744 000 000	300 000 000	1.220 670 000	18 583 063 000	300.000 000	Finanziamento attribuito
350 000 000	86 554 247	50 000 000	938 000 000	139 249 913	2 578 000 000	0	352 000 000	1 000 000 000	86 000 000	Altre fonti
0	203 500 000	6 900 000	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	203 500 000	6 900 000	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
0	2 643 394 746	518 021 417	4 074 000 213	1 599 396 415	1 307 324 278	265 207 000	1 230 662 700	17 807 562 490	244 000 000	Impegni di spesa
0	1 321 697 370	259 010 710	2 037 000 110	799 698 210	653 662 140	132 603 500	615 321 350	8 903 781 240	122 000 000	Lavori acconto 50%
0	0	0	1 629 600 085	0	0	0	0	7 820 974 996	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7278	7271	7268	7266	7265	7258	7257	7245	7241/AB	7235	Protocollo
Assisi	San Severino Marche	Spoleto	Terni	Terni	Quindici	Montelupone	Fossombrone	Assisi	Assisi	Comune localizzazione
RESTAURO CONSERVATIVO ESTETICO E FUNZIONALE DELLA BASILICA DI S. MARIA DEGLI ANGELI IN PORTINICIA A	RESTAURO DELLA BASILICA DI S. LORENZO IN DOLIOLO	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL PALAZZO COLLECIALE IN SPOLETO, QUALE CENTRO DEL SISTEMA MUSEALE CITTADINO E SPAZI PER LA GESTIONE DELL'EVENTO QUADRIENNALE E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE CONNESSE, RIFORMAZIONE E	PER IL COMPLEANNO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO COSTITUITO DALL'EX CHIESA DI S. ANGELO E SUE DIPENDENZE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO CONTICIONI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICETTIVITÀ A BASSO COSTO E NELL'AMBITO DEI SERVIZI	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO CONTICIONI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICETTIVITÀ A BASSO COSTO E NELL'AMBITO DEI SERVIZI	RESTAURO DELLA CHIESA MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO	CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA CATTEDRALE E DI FOSSOMBRONE	VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO PACHIS COME CASA RELIGIOSA DI OSPITALITÀ E DELLA FORESTERIA DEL CONVENTO, MODIFICHE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DEI PELLEGRINI ALL'INTERNO DEL SANTUARIO BASILICA	RECUPERO DEL COMPLESSO ENITZO UBICATO NEL SOTTOBOSSO DI S. MARCO, QUALE CENTRO DEL SISTEMA MUSEALE CITTADINO E SPAZI PER LA GESTIONE DELL'EVENTO QUADRIENNALE E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE CONNESSE, RIFORMAZIONE E	TITOLO intervento
PROV. SEPARATA DI S. FRANCESCO	PARROCCHIA DI S. LORENZO	COMUNE DI SPOLETO	COMUNE DI TERNI	COMUNE DI TERNI	COMUNE DI QUINDICI	COMUNE DI MONTELUPONE	PARROCCHIA S. ALDOBRANDINO E AGOSTINO	PROV. SEPARATA DI S. FRANCESCO	PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO	Soggetto beneficiario
13.579.571.000	311.673.000	5.257.654.000	920.000.000	1.850.000.000	2.453.000.000	2.690.596.000	1.300.000.000	22.765.193.000	1.531.770.000	Costo Stimato
4.587.897.302	311.673.000	4.392.785.074	920.000.000	1.850.000.000	2.453.000.000	2.690.596.000	1.040.000.000	22.765.193.000	836.384.538	Finanziamento attribuito
8.991.673.698	0	864.868.926	0	0	0	0	260.000.000	0	695.385.462	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	2.738.900.000	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	2.738.900.000	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1.895.571.000	311.070.000	4.257.654.000	882.000.000	1.590.000.000	2.452.199.987	2.690.595.400	1.007.000.000	18.263.292.880	779.770.000	Impegni di spesa
947.785.500	155.535.000	2.129.827.000	441.000.000	795.000.000	1.337.099.983	1.345.297.700	503.500.000	5.131.646.440	389.885.000	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	636.000.000	0	0	0	8.830.373.036	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7367	7356/B	7352	7351	7335	7334	7323	7306	7301	7297	Protocollo
Perugia	Terni	Assisi	Loreto	Macerata	Sangallo	Casca	Monte Cavallo	Pieve Torina	Fermo	Comune localizzazione
RIPISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA CATEDRALE DI SAN LORENZO	RIQUALIFICAZIONE DEL COLLE DI SAN VALENTINO	PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI UNO STABILE DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA E PRIMO SOCCORSO NONOCC: RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA E STOR CAMPIONER NEL COMUNE DI ASSISI	CASA DI ACCOGLIENZA PER GIOVANE PELLEGRINI VILLA PIO XII	RESTAURO RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI ANCHE MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EX ASILO RICCI PER REALIZZAZIONE DI CISTELLO	RECUPERO PIAZZA E PALAZZO DEL DUCA PER LIDIAZIONE CENTRO LOGISTICO E PER ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTEGRATI PER LA LOGISTICA AL ACCOGLIENZA E LA GESTIONE DEI FLUSSI DEI VISITATORI PER L'ACCESSO ALLA BASILICA DI S. RITA DA CASCA	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SAN BENEDETTO	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA PIEVE DI SANTA MARIA ASSUNTA	RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO CASA DI SPIRITUALITÀ ED ACCOGLIENZA VILLA NAZARETH	TITOLO intervento
SOPRINTENDENZA ZABAIAS DELL'UMBRIA	COMUNE DI TERNI	CONFRATERNITÀ A DEL SANTISSIMO SACRAMENTO E SAN BERN	PROV. ITALIANA CONGR. MISSIONARI	COMUNE DI MACERATA	COMUNE DI SEMONIA	COMUNE DI CASCA	PARROCCHIA DI SAN BENEDETTO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	SEMINARIO ARCIVESCOV. E	Soggetto beneficiario
5.887.000.000	3.161.000.000	462.000.000	3.402.245.000	5.877.372.000	6.832.000.000	12.077.198.000	450.000.000	370.000.000	1.639.435.000	Costo Stimato
5.457.000.000	3.161.000.000	462.000.000	2.802.245.000	4.677.372.000	6.832.000.000	5.953.198.000	390.000.000	330.000.000	1.439.435.000	Finanziamento attribuito
430.000.000	0	0	800.000.000	1.200.000.000	0	6.124.000.000	60.000.000	40.000.000	200.000.000	Altre fonti
0	0	46.200.000	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	46.200.000	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
0	2.656.231.235	0	2.290.249.310	3.977.656.204	6.126.425.127	5.952.698.000	380.120.000	321.580.581	1.269.435.000	Impegni di spesa
0	1.328.115.620	0	1.145.124.655	1.988.828.100	3.063.212.560	2.276.349.000	180.050.000	180.790.280	634.717.500	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	2.281.079.200	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
5.457.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7503	7502	7465	7454	7420	7416	7401	7394	7377	7374	Protocollo
Tolentino	Tolentino	Ancona	Comana	Sara Sani/Abbondio	Cassa	Perugia	Narni	Perugia	Spello	Comune localizzazione
RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER REALIZZARE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI RICETTIVITA' POVERA	SOSTA PULMAN BANCHINA PORTUALE	COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO DENOMINATO SAN CLAUDIO PER DESTINARLO A RESIDENZE A BASSO COSTO	REALIZZAZIONE DI ZONE DI SOSTA E PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL MONASTERO DI FONTE AVELLANA ED ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI BUS NAVETTE	CASA DEL PRILEGGIO PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO IN TROCENORENA	RECUPERO FUNZIONALE DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO ED ARCHITETTONICO DA DESTINARE A ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'ABBAZIA DI S. CASSIANO AL FINE DI CONSENTIRE L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRIANI	RECUPERO FUNZIONALE DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DA DESTINARE AD OSTELLO DELLA GIOVENTU' VIA BONTempi 13	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ALBERGO OSPEDALE S. CARLO DORRONEO IN OSTELLO	TITOLO intervento
COMUNE DI TOLENTINO	COMUNE DI TOLENTINO	COMUNE DI ANCONA	IST. DIOCE. SOSTENIMENTO CLERO	CONFERMAZIONE DEL MONASTERO DI FONTE AVELLANA (CASSANO) ORDINE DI SAN	CHIESA SANTUARIO DI S. RITA	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI PERUGIA	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	OPERA PIA M. PROLETTI	IST. CIV. RIUNITI DI BENEFICENZA I.C. 18	Soggetto beneficiario
607.564.000	847.575.000	1.731.860.000	2.794.000.000	750.000.000	4.279.306.476	1.191.230.000	961.000.000	2.188.000.000	6.383.850.000	Costo Stimato
607.564.000	847.575.000	1.231.860.000	1.764.000.000	700.000.000	3.899.844.500	1.129.230.000	961.000.000	1.936.000.000	4.163.850.000	Finanziamento attribuito
0	0	500.000.000	1.000.000.000	50.000.000	579.461.976	62.000.000	0	230.000.000	2.220.000.000	Altre fonti
69.000.000	92.800.000	0	0	0	0	0	96.100.000	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
69.000.000	92.800.000	0	0	0	0	0	96.100.000	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
538.564.000	754.775.000	1.231.860.000	1.565.800.000	694.354.960	3.172.263.268	871.953.000	804.900.000	1.501.125.000	3.587.084.201	Impegni di spesa
269.282.000	377.387.500	615.630.000	782.900.000	347.177.480	1.586.141.630	435.976.500	402.450.000	750.562.500	1.796.542.100	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	1.268.913.310	0	0	0	1.438.833.680	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

757	7560	7528	7516	7514	7513	7509	7507	7506	7505	Protocollo
Venezia	Campagna Salentina	Spoleto	Foggia	Foggia	Trapani	Trapani	Trapani	Trapani	Trapani	Comune localizzazione
RESTAURO CONSERVATIVO	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E PISCINO IN LOCALITA' PINNOTTA	VILLA REDENTIA, EX FRATELLA ED EX SCUDERIA DEL COMPLESSO PATRIMONIALE CREAZIONE DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO E PIANO DI INFORMAZIONI TURISTICO	RESTAURO DEL COMPLESSO CATTEDRALE E PALAZZO DELLE CANTONICHE	ACCOGLIENZA E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO E SANTUARIO DELLA BEATA ANGELA	COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DEL PARCHEGGIO DEL FORO BOARIO	REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO FACILITATO DAL PARCHEGGIO DI OSMANI FELIZIA ALLA CHIESA SANTA MARIA NUOVA	CONSERVAZIONE E RESTAURO FETTO ED INIZI DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	RESTAURO COLONNATO CROSTINO DEL COMPLESSO MONUMENTALE E DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	RESTAURO AFRESCHI CROSTINO DEL COMPLESSO MONUMENTALE E DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	TITOLO intervento
FONDAZIONE DI CULTO OPERA FIDES INTERPRETA	CASA RELIQUOSA DEI CENICI REDOLANI	PROVINCIA DI PERUGIA	DIOCESI FOGGIA CATTEDRALE DI S. FELICIANO	PROV. LOMBRIA DI SAN FRANCESCO	COMUNE DI TOLINTINO	COMUNE DI TOLINTINO	COMUNE DI TOLINTINO	COMUNE DI TOLINTINO	COMUNE DI TOLINTINO	Soggetto beneficiario
1 058.000.000	2 764.000.000	2 382.000.000	11 078 087 989	5 927 800.000	1 100.000.000	800.000.000	321.000.000	377.281.000	717.521.000	Costo Stimato
686.000.000	750.000.000	1 882.000.000	6.840.610.420	5 927 800.000	400.000.000	800.000.000	321.000.000	377.281.000	717.521.000	Finanziamento attribuito
370.000.000	2 014.000.000	500.000.000	4 237.457.569	0	700.000.000	0	0	0	0	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	32.100.000	39.200.000	74.000.000	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	32.100.000	39.200.000	74.000.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
686.000.000	695.000.000	1 705.476.629	5 678.067.989	5 927 798.227	398.599.515	577.568.504	286.018.054	338.060.454	643.521.000	Impegni di spesa
0	347.500.000	832.736.310	2 839.033.990	2 963.899.110	199.299.760	288.784.250	143.009.030	189.030.230	321.760.500	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

431	791	7903	7902	7663	7622	7606	7581	7581	7570	Protocollo
Torino	Levico	Aquino	Aquino	Caserta al Terno	Aquila	Voghera	Asina	Asina	Reverga	Comune localizzazione
RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA BASILICA DI SUPERNA	RECUPERO DI UN FABBRICATO DA DESTINARSI AD OSTELLO	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO MURATURE DELLA BASILICA	RESTAURO DELLA CASCINA LIONEA DELLA BASILICA	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO ED ARTISTICO DEI COMUNI DELLA FASCIA LITORANEA OCCIDENTALE DEL TIRRENO SULLA ANTICA VIA DEI PELLEGRINI	INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DI PARTE DEL SEMINARIO ESTIVO ADIBITO A CENTRO STUDI	RECUPERO DELL'ANTICO CONVENTO DI SANTA MARIA DEL GESU' A FINI DI ACCOGLIMENTO E RICETTIVITA' A BASSO COSTO	RESTAURO PIAZZA INTERIORE SAN FRANCESCO	RESTAURO PIAZZA INTERIORE SAN FRANCESCO	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DELL'EX CONVENTO DEL SA' DOMENICO E GIARDINO MURATO DA ADIBIRSI A RICETTIVITA' POVERA	Titolo intervento
PROV. PIEMONTE REGIONE BERNI DI MAPPA	COMUNE DI LANUSEI	SOPRINTENDENZA REGIONALE DEL FRIULI V.G.	SOPRINTENDENZA REGIONALE DEL FRIULI V.G.	COMUNE DI CARBONARA AL TIRRENO	SEMINARIO VESCOVOLE AGRICOLA	COMUNE DI VIGGIANO	PATRIMONIALE BASILICA DI SAN FRANCESCO	PATRIMONIALE BASILICA DI SAN FRANCESCO	COMUNE DI BEVONA	Soggetto beneficiario
2.802.000.000	1.224.685.000	900.000.000	1.490.000.000	555.772.000	1.059.799.000	3.000.000.000	8.306.110.000	8.306.110.000	2.225.984.000	Costo Stimato
2.802.000.000	1.104.685.000	900.000.000	1.490.000.000	505.772.000	559.799.000	1.500.000.000	7.806.110.000	7.806.110.000	1.805.043.459	Finanziamento attribuito
0	120.000.000	0	0	50.000.000	100.000.000	1.500.000.000	500.000.000	500.000.000	420.940.541	Altre fonti
335.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
335.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
2.565.572.985	966.684.685	0	0	428.246.390	509.799.146	1.149.062.627	6.418.697.500	1.148.339.903	1.624.918.969	Impegni di spesa
1.262.786.490	483.342.340	0	0	214.123.195	299.899.070	574.531.310	3.209.348.750	0	812.458.430	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	239.919.258	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	1.148.339.903	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	900.000.000	900.000.000	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

953	951	93R	905	904	899	8976	897	896/B	896/A	Protocollo
Codigno	Codigno	Napoli	San Giovanni Rotondo	San Giovanni Rotondo	San Giovanni Rotondo	Assisi	Vicenza	Vicenza	Vicenza	Comune localizzazione
LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PARCHEGGI E DELLA VIABILITÀ DI RACCORDO A SERVIZIO DI POMPOSA	IL RECUPERO AMBIENTALE DEL COMPLESSO ABBAZIA DI POMPOSA	CONVENTO DI S. LUCIA A MONTE PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO A CENTRO DI ACCOGLIENZA PER I PELLEGRINI	ARREDO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIALE CAPPUCINI	PARCHEGGIO MULTIPLO NONO OVEST	STRUTTURA ACCOGLIENZA POZZO CAVO	CASTELLO DI PORTIANO RECUPERO PARZIALE	RESTAURO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL CHIOSTRO MONASTICALE DEL CONVENTO DA ADIBIRE A RICETTIVA IN COMUNITÀ RELIGIOSA E RELATIVI SERVIZI	STABILIMENTO CNIE E ANTENNITOI CARATTERE TECNOLOGICO	PARTI MONUMENTALI COSTITUITE DA CHIESA, ORATORIO E CHIOSTRO DI S. CHIARA	Titolo intervento
COMUNE DI CODIGNO	COMUNE DI CODIGNO	PROVINCIA DI S. GIOVANNI DELLA GROCE	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	PARROCCHIA SANT'ANDREA E ANNA	COMUNITÀ FRANCESCANE MINORI CONVENT.	ISTITUTO PALAZZO IN S. CHIARA DELLE POVERE	ISTITUTO PALAZZO IN S. CHIARA DELLE POVERE	Soggetto beneficiario
4 197.070 000	560 000 000	1 395 800 000	1 601.000 000	9 613.310 000	4 573 000 000	530 000 000	180 000 000	4 044 140.000	1 436.000 000	Costo Stimato
3.277 070 000	444 000 000	1 295 800 000	1 601.000 000	9 613 310 000	4 573 000 000	690 000 000	180 000 000	3 879 140 000	1 251 000 000	Finanziamento attribuito
920 000 000	116 000 000	100 000 000	0	0	0	250 000 000	0	165 000 000	185 000 000	Altre fonti
0	0	0	199 800 000	1 388 700 000	570 000 000	0	180 000 000	438 600 000	125 100 000	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	199 800 000	1 388 700 000	570 000 000	0	180 000 000	438 600 000	125 100 000	O.N.T. Anticipazioni 10%
3 277 070 845	443 867 151	1 238 348 888	1 400 972 000	8 224 610 000	4 002.779 960	632 400 000	0	3 440 535 500	1 111 116 865	Impegni di spesa
1 638 535 420	221 933 570	619 674 440	700 486 000	4 112 305 000	2 001 389 980	316 200 000	0	1 720 267 500	555 558 430	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

981	Protocollo
Venezia	Comune localizzazione
CENTRO D'ACCOGLIENZA PELLEGRINI PER GIOVANI E ANZIANI	Titolo intervento
IST. PROV. PER L'INFANZIA S. MARIA	Soggetto beneficiario
2.500.000.000	Costo Stimato
2.500.000.000	Finanziamento attribuito
0	Altre fonti
250.000.000	O.N.T. Impegni di spesa
250.000.000	O.N.T. Anticipazioni 10%
2.204.891.386	Impegni di spesa
1.102.445.680	Lavori acconto 50%
0	Lavori acconto 90%
0	Lavori saldo
0	Fornitura acconto 50%
0	Fornitura ulteriore acconto
0	Fornitura saldo
0	Acquisizione aree e immobili
0	O.N.T. Uffici tecnici
0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

PAGINA BIANCA

3. PARTE TERZA – IL PIANO PER REGIONI – STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AL 30 SETTEMBRE 1999

3.3. Il quadro riepilogativo

Sulla base della Relazione di monitoraggio relativa al III trimestre del 1999 è possibile definire lo stato di avanzamento dei diversi interventi che compongono il Piano per il Giubileo al di fuori del Lazio.

Per effetto delle rimodulazioni avvenute il Piano consiste al 30 settembre 1999 di 1.128 interventi per un costo complessivo di 3.519,3 miliardi di lire di cui 1.988,6 a carico dello Stato.

La situazione rispetto all'inizio dell'anno risulta variata in termini non significativi a seguito di definanziamenti e rinunce (al 31 marzo gli interventi erano 1.165 per un costo complessivo di 3.716,8 miliardi di lire).

Gli interventi ultimati o in corso di realizzazione risultano pari a 939, quelli in fase pre-realizzativa 189.

In particolare, gli *interventi ultimati* al III trimestre '99 risultano 96 pari al 3,7% del finanziamento ed al 5,5% degli investimenti complessivi.

Il completamento degli interventi ha subito un'accelerazione nel corso dell'anno: gli interventi ultimati erano 12 nel I trimestre e sono saliti a 28 nel II trimestre (tab. 5).

Tab. 5 - Avanzamento degli interventi in fase di realizzazione o completati (al I, II, III trimestre 1999)

Trimestre riferimento	di	Interventi in fase di realizzazione			Interventi completati		
		N.	% sul totale interventi	% sul totale finanzia- menti	N.	% sul totale interventi	% sul totale finanzia- menti
al 31 marzo 1999		455	39,1	46,6	12	1,0	0,2
al 30 giugno 1999		856	75,6	86,8	28	2,5	0,5
al 30 settembre 1999		843	74,7	90,6	96	8,5	3,7

Gli *interventi in fase di realizzazione* pari a 843 costituiscono in termini di risorse finanziarie il 74,7% del finanziamento pubblico disponibile ed il 90,6% dell'investimento complessivo.

Infine, gli *interventi in fase pre-realizzativa* costituiscono il 16,8% del totale in numero ma solo il 5,7% sul finanziamento pubblico. Si tratta di 189 iniziative prevalentemente localizzate in Campania, Puglia, Toscana, Veneto dove il Piano prevede una maggiore diffusione di programmi.

Dal punto di vista territoriale, le regioni che registrano un valore più elevato della media per quanto attiene alla quota di interventi ultimati o in fase di realizzazione (83,2% sul complesso delle iniziative) sono: l'Emilia Romagna con il 99,2%, la Sicilia con il 96,4%, la Basilicata con il 95,0%, la Liguria con il 93,0%, il Piemonte con il 92,5%, l'Umbria con il 91,2%, le Marche con il 90,6%, la Lombardia con l'89,4%, la Valle d'Aosta con l'85,7% (tab. 6).

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER REGIONE

REGIONI	Num.	Finanz. milioni	Costo milioni	INTERVENTI IN FASE PRE-REALIZZATIVA			INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE			INTERVENTI COMPLETATI					
				numero	% num.	% finanz.	costo	% num.	% finanz.	costo	numero	% num.	% finanz.	costo	
VALLE D'AOSTA	14	12.163	18.491	6	42,9	40,1	39,3	8	57,1	59,9	60,7	0	0,0	0,0	0,0
PIEMONTE	40	159.836	201.413	27	67,5	87,2	86,3	10	25,0	11,7	11,3	3	7,5	1,1	2,4
LIGURIA	42	65.858	106.197	25	59,5	57,6	67,1	16	38,1	41,8	32,5	1	2,4	0,6	0,4
LOMBARDIA	48	85.170	259.273	31	64,6	68,0	69,6	16	33,3	31,7	29,9	1	2,1	0,3	0,6
FRULLI-VENEZIA GIULIA	44	46.258	57.451	33	75,0	76,4	79,0	11	25,0	23,6	21,0	0	0,0	0,0	0,0
TRENTINO-ALTO ADIGE	5	17.473	23.968	2	40,0	35,6	28,5	3	60,0	64,4	71,5	0	0,0	0,0	0,0
VERNETO	104	200.089	373.966	61	58,7	52,3	54,5	42	40,4	47,5	45,4	1	1,0	0,2	0,1
EMILIA-ROMAGNA	123	161.165	374.886	58	47,2	42,5	64,0	63	51,2	57,0	35,7	2	1,6	0,5	0,3
TOSCANA	133	209.761	392.036	78	58,6	46,8	60,5	53	39,8	53,0	39,3	2	1,5	0,2	0,2
UMBRIA	135	239.202	404.555	74	54,8	41,0	55,0	60	44,4	58,9	44,3	1	0,7	0,1	0,7
MARCHE	112	177.424	265.285	46	41,1	33,8	38,8	65	58,0	66,0	60,9	1	0,9	0,2	0,3
ABRUZZO	21	45.782	109.965	14	66,7	56,7	67,0	7	33,3	43,3	33,0	0	0,0	0,0	0,0
MOLISE	6	17.886	19.369	3	50,0	36,8	36,7	3	50,0	63,2	63,3	0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	126	190.361	397.581	101	80,2	60,4	76,6	25	19,8	39,6	23,4	0	0,0	0,0	0,0
PUGLIA	112	152.160	292.790	76	67,9	55,5	61,1	36	32,1	44,5	38,9	0	0,0	0,0	0,0
BASILICATA	19	43.256	57.324	10	52,6	48,2	49,0	9	47,4	51,8	51,0	0	0,0	0,0	0,0
CALABRIA	22	39.965	74.078	17	77,3	72,9	82,0	5	22,7	27,1	18,0	0	0,0	0,0	0,0
SICILIA	30	55.350	59.576	16	53,3	49,0	49,0	14	46,7	51,0	51,0	0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	23	46.732	120.157	19	82,6	83,0	92,0	4	17,4	17,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0
Ambito nazionale	6	24.867	28.434	1	16,7	0,0	8,3	5	83,3	100,0	91,7	0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	1.165	1.990.758	3.716.795	698	59,9	53,2	62,7	455	39,1	46,6	36,9	12	1,0	0,2	0,4

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GILBILARI E PELLEGRINAGGI
TAVOLA 2
NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER SOGGETTO BENEFICIARIO E REGIONE

7 - Doc. CIX-ter, n. 2

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI
TAVOLA 3

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER TIPOLOGIA D'INTERVENTO E REGIONE

REGIONE	N. int.	Finanz. millioni	Costo millioni	INTERVENTI IN FASE DI PRE-REALIZZAZIONE				INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE				INTERVENTI COMPLETATI			
				numero	% num.	% finanz.	% costo	numero	% num.	% finanz.	% costo	numero	% num.	% finanz.	% costo
ABRUZZO	3	3.763	5.409	3	100,0	100,0	100,0	2	40,0	34,5	31,5	0	0,0	0,0	0,0
VALLE D'AOSTA	5	14.405	17.405	0	0,0	0,0	0,0	1	11,1	10,2	10,2	0	0,0	0,0	0,0
PIEMONTE	10	15.280	19.822	8	80,0	81,4	81,4	2	20,0	18,6	18,6	0	0,0	0,0	0,0
LIGURIA	15	15.051	72.506	8	53,3	85,4	80,1	2	13,3	14,6	19,0	0	0,0	0,0	0,0
LAZIO	20	18.877	27.091	18	90,0	92,7	94,2	2	10,0	7,3	5,8	0	0,0	0,0	0,0
TRENTINO-ALTO ADIGE	1	1.111	1.133	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
VENETO	38	46.771	69.300	31	81,6	70,8	72,9	7	18,4	29,2	27,1	0	0,0	0,0	0,0
EMILIA-ROMAGNA	20	36.118	48.531	17	85,0	98,6	98,0	3	15,0	1,4	1,2	0	0,0	0,0	0,0
TOSCANA	57	116.306	150.224	42	73,7	95,2	71,9	15	26,3	4,8	27,8	1	1,8	1,0	0,1
UMBRIA	51	67.816	94.765	37	72,5	56,4	56,0	14	27,5	43,6	42,0	0	0,0	0,0	0,0
MARCHE	29	28.941	51.690	25	86,2	79,1	85,3	4	13,8	20,9	14,6	1	3,4	1,1	2,1
ABRUZZO	10	17.157	27.053	7	70,0	70,0	68,1	3	30,0	30,0	31,9	0	0,0	0,0	0,0
MOLISE	1	3.973	4.073	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	16	60.922	15.317	12	75,0	72,8	71,1	4	25,0	27,2	28,9	0	0,0	0,0	0,0
PUGLIA	28	3.186	3.186	21	75,0	91,1	93,5	7	25,0	8,9	11,5	0	0,0	0,0	0,0
PASO D'ARCA	1	1.500	3.316	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
SICILIA	1	1.011	1.011	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	5	10.818	17.551	4	80,0	81,1	81,3	1	20,0	18,9	15,7	0	0,0	0,0	0,0
AMMONTARE TOTALE	375	17.487	20.941	1	20,0	0,0	11,3	37	60,0	100,0	89,7	3	0,0	0,0	0,2
TOTALE		550.682	900.888	295	78,7	69,7	75,3	77	20,5	30,1	24,4	3	0,8	0,2	0,2
VALLE D'AOSTA	4	3.159	4.763	1	25,0	19,6	17,9	3	75,0	80,1	82,1	0	0,0	0,0	0,0
PIEMONTE	11	23.951	52.370	6	54,5	18,5	71,5	5	45,5	17,9	28,6	1	9,1	3,6	5,5
LIGURIA	15	26.435	49.709	9	60,0	91,1	49,9	6	40,0	39,7	50,1	0	0,0	0,0	0,0
LAZIO	12	14.319	136.406	7	58,3	57,7	67,4	5	41,7	42,3	32,6	0	0,0	0,0	0,0
TRENTINO-ALTO ADIGE	4	12.401	14.930	3	75,0	92,0	93,1	1	25,0	8,0	30,9	0	0,0	0,0	0,0
VENETO	31	16.310	22.835	1	3,2	3,1	2,9	30	96,8	96,9	97,0	0	0,0	0,0	0,0
EMILIA-ROMAGNA	31	73.106	216.301	19	61,3	31,3	46,4	12	38,7	68,7	53,6	1	3,2	0,1	0,2
TOSCANA	51	74.195	251.833	20	39,2	34,3	70,8	30	58,8	65,7	29,9	1	2,0	0,1	0,2
UMBRIA	55	52.412	135.976	22	40,0	47,9	60,6	33	60,0	51,6	31,3	1	1,8	0,1	0,2
MARCHE	30	67.881	128.016	10	33,3	33,3	33,3	20	66,7	66,7	66,7	0	0,0	0,0	0,0
ABRUZZO	7	16.482	70.469	6	85,7	68,7	76,2	1	14,3	31,3	23,8	0	0,0	0,0	0,0
MOLISE	1	11.911	15.298	0	0,0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	66	73.301	192.693	52	78,8	70,0	69,4	14	21,2	29,9	30,6	0	0,0	0,0	0,0
PUGLIA	80	88.749	111.581	41	51,0	47,8	54,6	39	48,8	52,2	52,2	0	0,0	0,0	0,0
PASO D'ARCA	12	10.968	31.981	9	75,0	75,0	75,0	3	25,0	25,0	25,0	0	0,0	0,0	0,0
SICILIA	22	45.433	37.282	9	40,9	46,2	44,2	13	59,1	53,8	55,8	0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	7	5.667	38.097	5	71,4	67,7	66,9	2	28,6	32,3	33,2	0	0,0	0,0	0,0
AMMONTARE TOTALE	619	753.398	1.915.981	271	43,8	43,8	61,1	216	34,9	56,1	38,3	5	0,8	0,3	0,2
VALLE D'AOSTA	5	4.939	8.259	2	40,0	39,4	26,3	3	60,0	60,6	73,7	0	0,0	0,0	0,0
PIEMONTE	17	12.1740	131.438	11	64,7	84,4	82,3	6	35,3	15,6	23,7	2	11,8	0,7	1,5
LIGURIA	17	24.341	57.166	9	52,9	52,1	58,9	8	47,1	47,9	40,4	1	5,9	2,5	1,1
LAZIO	17	27.290	46.219	9	52,9	47,5	50,3	8	47,1	51,0	44,4	1	5,9	1,5	1,1
TRENTINO-ALTO ADIGE	11	14.780	15.410	7	63,6	61,1	61,4	4	36,4	38,7	38,9	0	0,0	0,0	0,0
VENETO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
EMILIA-ROMAGNA	22	77.912	98.483	11	50,0	52,2	53,4	11	50,0	47,8	49,6	0	0,0	0,0	0,0
TOSCANA	11	50.852	71.422	21	47,7	41,0	42,7	23	52,3	58,2	57,3	0	0,0	0,0	0,0
UMBRIA	29	40.113	65.816	14	48,3	40,6	47,8	15	51,7	59,4	52,2	0	0,0	0,0	0,0
MARCHE	29	81.406	119.974	14	48,3	16,5	23,3	15	51,7	83,5	76,7	0	0,0	0,0	0,0
ABRUZZO	3	80.600	85.570	11	20,8	18,7	18,6	18	79,2	81,3	81,3	0	0,0	0,0	0,0
MOLISE	1	12.113	12.113	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
PUGLIA	11	10.178	31.341	7	63,6	42,9	43,1	4	36,4	57,1	56,9	0	0,0	0,0	0,0
PASO D'ARCA	13	10.968	31.981	9	69,2	69,2	69,2	4	30,8	30,8	30,8	0	0,0	0,0	0,0
SICILIA	2	10.968	10.968	2	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	5	8.709	8.709	3	60,0	58,4	58,4	2	40,0	41,6	41,6	0	0,0	0,0	0,0
AMMONTARE TOTALE	297	679.177	872.426	132	44,4	50,8	52,7	165	55,6	49,1	46,7	4	1,3	0,3	0,4

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.1.2. Tabelle relative al II° trimestre

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI
TAVOLA 1

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER REGIONE

REGIONI	Nim.	Finanz. millioni	Costo millioni	INTERVENTI IN FASE PRE-REALIZZATIVA						INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE						INTERVENTI COMPLETATI					
				numero	%	finanz.	%	costo	%	numero	%	finanz.	%	costo	%	numero	%	finanz.	%	costo	%
VALLE D'AOSTA	14	12.339	18.667	2	14,3	14,7		14,1		11	78,6	81,2		82,6		1	7,1			4,1	3,2
PIEMONTE	40	159.652	178.394	7	17,5	66,3		60,1		27	67,5	31,6		34,4		6	15,0			2,1	5,5
LIGURIA	43	66.278	94.617	4	9,3	2,7		14,9		37	86,0	96,0		84,2		2	4,7			1,2	0,9
LOMBARDIA	47	80.645	214.571	5	10,6	15,6		8,5		40	85,1	83,7		90,2		2	4,3			0,7	1,3
FRIULI-VENEZIA GIULIA	42	45.053	55.891	5	11,9	18,6		27,4		37	88,1	81,4		72,6		0	0,0			0,0	0,0
TRENTINO-ALTO ADIGE	5	16.144	23.968	1	20,0	7,0		4,7		4	80,0	93,0		95,3		0	0,0			0,0	0,0
VENETO	107	195.814	406.786	22	20,6	4,7		18,2		82	76,6	94,8		81,5		3	2,8			0,5	0,3
EMILIA-ROMAGNA	122	160.397	399.475	11	9,0	2,4		42,9		106	86,9	96,4		56,4		5	4,1			1,2	0,7
TOSCANA	130	211.035	394.970	30	23,1	4,1		29,0		96	73,8	95,4		70,6		4	3,1			0,5	0,4
UMBRIA	123	243.966	485.259	20	16,3	3,5		24,3		100	81,3	96,3		73,8		3	2,4			0,2	2,0
MARCHE	106	177.255	257.746	13	12,3	7,0		11,5		91	85,8	92,5		87,8		2	1,9			0,5	0,7
ABRUZZO	21	43.656	100.878	6	28,6	2,6		22,9		15	71,4	97,4		77,1		0	0,0			0,0	0,0
MOLISE	8	19.886	21.369	4	50,0	24,2		23,5		4	50,0	75,8		76,5		0	0,0			0,0	0,0
CAMPANIA	117	184.725	372.551	65	55,6	15,0		48,0		52	44,4	85,0		52,0		0	0,0			0,0	0,0
PUGLIA	106	150.305	290.905	30	28,3	4,9		17,3		76	71,7	95,1		82,7		0	0,0			0,0	0,0
BASILICATA	20	47.055	61.123	4	20,0	15,4		15,0		16	80,0	84,6		85,0		0	0,0			0,0	0,0
CALABRIA	21	42.880	75.361	7	29,2	14,1		39,8		17	70,8	85,9		60,2		0	0,0			0,0	0,0
SICILIA	29	58.508	63.074	1	3,4	3,4		3,7		28	96,6	96,6		96,3		0	0,0			0,0	0,0
SARDEGNA	23	44.758	110.378	11	47,8	46,7		73,8		12	52,2	53,3		26,2		0	0,0			0,0	0,0
Ambito nazionale	6	24.867	28.434	1	16,7	0,0		8,3		5	83,3	100,0		91,7		0	0,0			0,0	0,0
TOTALE	1.133	1.985.219	3.654.417	249	22,0	12,7		28,7		856	75,6	86,8		70,5		28	2,5			0,5	0,9

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO

TAVOLA 2

PER SOGGETTO

REGIONI	Numb.	Finanz. miliard.	Costo miliard.	INTERVENTI IN FASE PRE-REALIZZAZIONE				INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE				INTERVENTI COMPLETATI			
				numero	% finanz.	% costo	numero	numero	% finanz.	% costo	numero	numero	% finanz.	% costo	% costo
REGIONI															
VALLE D'AOSTA	0	5.957	6.767	2	25,0	30,1	0	75,0	99,0	99,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Piemonte	21	117.018	127.263	5	23,6	79,2	13	61,9	100,0	100,0	3	13	13,3	1,1	2,3
Liguria	11	13.851	16.110	1	7,7	2,1	11	81,6	96,3	96,3	1	1	7,7	1,4	1,3
Lombardia	22	50.180	89.337	3	18,2	25,1	18	81,6	74,3	74,3	0	0	0,0	0,0	0,0
Friuli Venezia Giulia	21	11.387	40.318	4	14,1	25,7	17	81,6	96,3	96,3	0	0	0,0	0,0	0,0
Trentino-Alto Adige	1	1.750	3.900	0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emilia-Romagna	10	18.249	32.215	3	20,0	30,1	7	70,0	90,0	90,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toscana	7	10.219	23.717	3	42,9	39,6	4	57,1	60,4	60,4	0	0	0,0	0,0	0,0
Marche	5	10.046	13.191	9	18,0	1,9	21	82,0	97,1	97,1	2	2	3,1	1,8	1,9
Abruzzo	6	11.712	13.121	5	8,6	4,8	11	82,0	97,1	97,1	2	2	3,1	0,4	5,3
Molise	0	20.586	26.686	1	12,5	10,1	55	87,5	89,9	89,9	1	1	1,5	0,2	5,3
Campania	32	76.610	82.325	4	12,5	10,1	28	87,5	89,9	89,9	0	0	0,0	0,0	0,0
Puglia	17	51.575	55.191	15	46,0	36,2	2	11,9	17,3	17,3	0	0	0,0	0,0	0,0
Basilicata	10	19.217	26.395	1	5,9	4,3	9	84,1	95,7	95,7	0	0	0,0	0,0	0,0
Calabria	10	9.921	13.255	2	20,0	13,5	8	80,0	66,5	66,5	0	0	0,0	0,0	0,0
Sardegna	1	2.779	1.779	0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Sardegna	1	11.160	13.600	7	46,7	55,3	5	50,0	11,6	11,6	0	0	0,0	0,0	0,0
Ambito nazionale	3	21.067	26.072	0	0,0	0,0	3	100,0	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	300	1.048.390	1.347.354	98	17,6	19,0	200	75,2	79,7	79,7	10	10	3,2	0,5	1,3
REGIONI															
VALLE D'AOSTA	0	6.102	3.900	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Piemonte	19	41.734	51.111	2	10,5	23,6	17	89,5	76,4	76,4	1	1	16,7	7,8	15,8
Liguria	29	32.127	60.210	2	6,9	2,1	27	93,1	97,9	97,9	1	1	3,3	1,2	1,4
Lombardia	21	10.406	12.213	0	0,0	0,0	21	100,0	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Friuli Venezia Giulia	1	11.101	20.011	1	20,0	5,7	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Trentino-Alto Adige	5	11.294	15.181	5	8,8	0,7	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emilia-Romagna	41	55.848	72.114	1	2,4	0,2	40	97,6	99,8	99,8	0	0	0,0	0,0	0,0
Lombardia	51	47.806	76.217	11	20,4	11,6	40	78,4	88,4	88,4	0	0	0,0	0,0	0,0
Marche	35	125.880	156.318	3	6,7	2,2	32	91,3	97,8	97,8	0	0	0,0	0,0	0,0
Campania	7	23.070	21.719	1	14,3	3,5	6	85,7	96,5	96,5	0	0	0,0	0,0	0,0
Molise	3	14.013	15.206	0	0,0	0,0	3	100,0	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Puglia	32	108.115	129.593	0	0,0	0,0	32	100,0	100,0	100,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Basilicata	10	27.818	34.731	2	20,0	5,2	8	80,0	93,2	93,2	0	0	0,0	0,0	0,0
Calabria	13	32.956	39.128	2	15,4	10,2	11	84,6	89,8	89,8	0	0	0,0	0,0	0,0
Sardegna	20	56.229	59.795	1	5,0	3,6	19	95,0	96,4	96,4	0	0	0,0	0,0	0,0
Sardegna	1	11.390	11.099	1	20,0	21,1	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ambito nazionale	400	226.929	1.192.295	37	9,0	4,7	411	99,3	94,7	94,7	12	12	2,6	0,6	1,0
REGIONI															
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Piemonte	0	0	0	1	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Liguria	4	12.147	82.960	1	25,0	4,8	3	75,0	93,2	93,2	0	0	0,0	0,0	0,0
Lombardia	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Friuli Venezia Giulia	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emilia-Romagna	10	149.110	149.110	8	80,0	40,5	2	20,0	59,5	59,5	0	0	0,0	0,0	0,0
Lombardia	6	167.875	167.875	6	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toscana	11	105.006	105.006	10	90,9	95,4	1	9,1	4,6	4,6	0	0	0,0	0,0	0,0
Marche	20	155.719	155.719	17	85,0	60,2	3	15,0	39,8	39,8	0	0	0,0	0,0	0,0
Campania	4	12.652	12.652	1	25,0	20,4	3	75,0	79,6	79,6	0	0	0,0	0,0	0,0
Marche	6	55.171	55.171	4	66,7	30,3	2	33,3	69,7	69,7	0	0	0,0	0,0	0,0
Molise	5	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Campania	53	109.633	109.633	50	94,3	93,2	3	5,7	6,8	6,8	0	0	0,0	0,0	0,0
Basilicata	0	0	0	20	49,1	31,6	27	50,9	68,4	68,4	0	0	0,0	0,0	0,0
Calabria	0	0	0	1	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Sardegna	3	51.800	51.800	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ambito nazionale	173	2.362	1.113.660	124	71,7	67,6	49	28,3	32,4	32,4	0	0	0,0	0,0	0,0

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO

REGIONI	N.°	Finanz. miliardi	Costo miliardi	INTERVENTI IN FASE PRE-REALIZZATIVA				INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE				INTERVENTI COMPLETATI			
				numero	%	finanz.	%	numero	%	finanz.	%	numero	%	finanz.	%
VALLE D'AOSTA	5	3.785	5.459	2	40,0	10,2	18,3	3	60,0	81,9	31,7	0	0,0	0,0	0,0
VALLE D'AOSTA	5	3.785	5.459	3	60,0	27,7	25,6	1	20,0	13,8	7,4	0	0,0	0,0	0,0
PIEMONTE	11	12.311	18.376	0	0,0	0,0	0,0	11	100,0	123,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
PIEMONTE	11	12.311	18.376	0	0,0	0,0	0,0	11	100,0	123,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
LOMBARDIA	18	17.054	25.113	3	16,7	37,4	27,9	10	55,6	55,7	42,7	1	5,6	0,0	0,0
LOMBARDIA	18	17.054	25.113	4	22,2	44,3	34,3	14	77,8	77,8	59,7	0	0,0	0,0	0,0
FRIGIA-VE NEZIA GIULIA	1	1.133	1.133	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
FRIGIA-VE NEZIA GIULIA	1	1.133	1.133	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
TRENTINO-ALTO ADIGE	32	43.971	66.367	12	37,5	15,5	22,7	19	59,4	81,2	72,0	0	0,0	0,0	0,0
TRENTINO-ALTO ADIGE	32	43.971	66.367	12	37,5	15,5	22,7	19	59,4	81,2	72,0	0	0,0	0,0	0,0
VENETO	45	33.431	45.704	3	6,7	2,8	2,7	22	48,9	36,5	36,5	1	2,2	0,1	0,1
VENETO	45	33.431	45.704	3	6,7	2,8	2,7	22	48,9	36,5	36,5	1	2,2	0,1	0,1
EMILIA-ROMAGNA	50	115.513	186.521	10	20,0	2,4	20,7	19	38,0	79,0	79,0	0	0,0	0,0	0,0
EMILIA-ROMAGNA	50	115.513	186.521	10	20,0	2,4	20,7	19	38,0	79,0	79,0	0	0,0	0,0	0,0
TOSCANA	36	68.829	91.757	8	22,2	11,4	13,5	21	58,3	88,6	88,6	0	0,0	0,0	0,0
TOSCANA	36	68.829	91.757	8	22,2	11,4	13,5	21	58,3	88,6	88,6	0	0,0	0,0	0,0
MARCHE	19	25.016	36.373	11	57,9	43,8	55,2	7	36,1	52,6	43,8	0	0,0	0,0	0,0
MARCHE	19	25.016	36.373	11	57,9	43,8	55,2	7	36,1	52,6	43,8	0	0,0	0,0	0,0
ABRUZZO	9	15.443	18.423	4	44,4	7,4	22,0	5	55,6	78,0	78,0	0	0,0	0,0	0,0
ABRUZZO	9	15.443	18.423	4	44,4	7,4	22,0	5	55,6	78,0	78,0	0	0,0	0,0	0,0
MOLISE	5	6.071	6.071	1	20,0	82,0	82,0	4	80,0	18,0	18,0	0	0,0	0,0	0,0
MOLISE	5	6.071	6.071	1	20,0	82,0	82,0	4	80,0	18,0	18,0	0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	18	55.650	91.012	20	111,1	11,7	64,0	19	105,6	58,3	15,1	0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	18	55.650	91.012	20	111,1	11,7	64,0	19	105,6	58,3	15,1	0	0,0	0,0	0,0
PUGLIA	21	40.802	60.218	8	38,1	1,5	24,8	13	61,9	98,5	75,2	0	0,0	0,0	0,0
PUGLIA	21	40.802	60.218	8	38,1	1,5	24,8	13	61,9	98,5	75,2	0	0,0	0,0	0,0
MARIGLIATA	2	5.540	6.908	2	100,0	51,2	60,0	3	150,0	45,0	40,0	0	0,0	0,0	0,0
MARIGLIATA	2	5.540	6.908	2	100,0	51,2	60,0	3	150,0	45,0	40,0	0	0,0	0,0	0,0
CALABRIA	1	1.500	1.516	0	0,0	0,0	0,0	2	200,0	66,7	65,1	0	0,0	0,0	0,0
CALABRIA	1	1.500	1.516	0	0,0	0,0	0,0	2	200,0	66,7	65,1	0	0,0	0,0	0,0
SICILIA	1	1.000	1.040	0	0,0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
SICILIA	1	1.000	1.040	0	0,0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	4	7.205	12.005	2	50,0	13,7	50,0	2	50,0	50,0	13,4	0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	4	7.205	12.005	2	50,0	13,7	50,0	2	50,0	50,0	13,4	0	0,0	0,0	0,0
Amplio nazionale	5	7.167	20.914	1	20,0	0,0	11,3	1	20,0	100,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Amplio nazionale	5	7.167	20.914	1	20,0	0,0	11,3	1	20,0	100,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	312	509.989	774.123	98	31,7	17,5	27,7	208	66,7	82,3	72,0	5	1,6	0,3	0,3
VALLE D'AOSTA	5	3.785	5.459	0	0,0	0,0	0,0	5	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
VALLE D'AOSTA	5	3.785	5.459	0	0,0	0,0	0,0	5	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
PIEMONTE	12	27.186	27.915	1	8,3	1,1	1,8	9	75,0	91,2	77,6	2	16,7	7,7	20,0
PIEMONTE	12	27.186	27.915	1	8,3	1,1	1,8	9	75,0	91,2	77,6	2	16,7	7,7	20,0
LOMBARDIA	15	20.340	40.783	3	20,0	19,1	31,7	11	73,3	91,7	65,8	1	6,7	1,0	0,0
LOMBARDIA	15	20.340	40.783	3	20,0	19,1	31,7	11	73,3	91,7	65,8	1	6,7	1,0	0,0
FRIGIA-VE NEZIA GIULIA	13	16.440	103.892	4	30,8	18,9	4,5	11	84,6	91,1	95,5	0	0,0	0,0	0,0
FRIGIA-VE NEZIA GIULIA	13	16.440	103.892	4	30,8	18,9	4,5	11	84,6	91,1	95,5	0	0,0	0,0	0,0
TRENTINO-ALTO ADIGE	3	12.270	14.108	1	33,3	7,7	8,3	12	97,1	93,2	111,7	0	0,0	0,0	0,0
TRENTINO-ALTO ADIGE	3	12.270	14.108	1	33,3	7,7	8,3	12	97,1	93,2	111,7	0	0,0	0,0	0,0
VENETO	51	15.011	22.835	0	0,0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
VENETO	51	15.011	22.835	0	0,0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
EMILIA-ROMAGNA	32	70.907	257.021	9	28,1	3,1	23,0	11	34,4	46,1	70,0	2	6,2	0,5	0,1
EMILIA-ROMAGNA	32	70.907	257.021	9	28,1	3,1	23,0	11	34,4	46,1	70,0	2	6,2	0,5	0,1
TOSCANA	48	53.291	139.845	14	29,2	7,8	46,5	12	25,0	91,5	53,2	2	4,2	0,4	0,3
TOSCANA	48	53.291	139.845	14	29,2	7,8	46,5	12	25,0	91,5	53,2	2	4,2	0,4	0,3
ABRUZZO	33	86.674	268.590	12	36,4	1,4	34,6	40	121,2	100,0	60,3	1	3,0	0,0	0,0
ABRUZZO	33	86.674	268.590	12	36,4	1,4	34,6	40	121,2	100,0	60,3	1	3,0	0,0	0,0
MARCHE	29	63.493	120.971	1	3,4	0,0	6,8	28	96,6	100,0	93,2	0	0,0	0,0	0,0
MARCHE	29	63.493	120.971	1	3,4	0,0	6,8	28	96,6	100,0	93,2	0	0,0	0,0	0,0
ABRUZZO	8	15.173	95.283	2	25,0	0,0	27,3	6	75,0	100,0	72,6	0	0,0	0,0	0,0
ABRUZZO	8	15.173	95.283	2	25,0	0,0	27,3	6	75,0	100,0	72,6	0	0,0	0,0	0,0
MOLISE	7	14.013	23.396	0	0,0	0,0	0,0	7	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
MOLISE	7	14.013	23.396	0	0,0	0,0	0,0	7	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	66	63.405	212.407	13	19,7	0,0	32,0	21	31,8	31,8	31,0	0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	66	63.405	212.407	13	19,7	0,0	32,0	21	31,8	31,8	31,0	0	0,0	0,0	0,0
PUGLIA	29	29.629	123.751	19	65,5	1,2	3,4	10	34,5	95,3	90,3	0	0,0	0,0	0,0
PUGLIA	29	29.629	123.751	19	65,5	1,2	3,4	10	34,5	95,3	90,3	0	0,0	0,0	0,0
BASILICATA	17	16.336	44.793	3	17,6	4,2	19,0	14	82,4	95,2	94,4	0	0,0	0,0	0,0
BASILICATA	17	16.336	44.793	3	17,6	4,2	19,0	14	82,4	95,2	94,4	0	0,0	0,0	0,0
CALABRIA	23	40.793	53.014	1	4,3	4,1	4,4	22	95,7	95,9	94,4	0	0,0	0,0	0,0
CALABRIA	23	40.793	53.014	1	4,3	4,1	4,4	22	95,7	95,9	94,4	0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	7	5.589	40.989	1	14,3	43,1	24,9	3	42,9	56,9	5,3	0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	7	5.589	40.989	1	14,3	43,1	24,9	3	42,9	56,9	5,3	0	0,0	0,0	0,0
Amplio nazionale	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Amplio nazionale	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	189	730.869	1.977.787	121	64,0	3,4	34,5	300	23,3	94,1	95,0	9	4,8	0,5	0,1
VALLE D'AOSTA	4	1.930	4.604	0	0,0	0,0	0,0	3	75,0	87,3	91,0	1	25,0	12,7	9,0
VALLE D'AOSTA	4	1.930	4.604	0	0,0	0,0	0,0	3	75,0	87,3	91,0	1	25,0	12,7	9,0
PIEMONTE	21	124.030	135.116	2	9,5	82,1	70,1	11	52,4	16,6	20,2	4	19,0	1,4	1,0
PIEMONTE	21	124.030	135.116	2	9,5	82,1	70,1	11	52,4	16,6	20,2	4	19,0	1,4	1,0
LOMBARDIA	17	30.114	35.550	1	5,9	1,1	1,0	15	88,2	96,9	97,2	1	5,9	7,0	1,0
LOMBARDIA	17	30.114	35.550	1	5,9	1,1	1,0	15	88,2	96,9	97,2	1	5,9	7,0	1,0
FRIGIA-VE NEZIA GIULIA	20	10.964	60.743	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	95,7	1	5,0	1,1	1,1
FRIGIA-VE NEZIA GIULIA	20	10.964	60.743	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	95,7	1	5,0	1,1	1,1
TRENTINO-ALTO ADIGE	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
TRENTINO-ALTO ADIGE	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
VENETO	24	14.310	82.979	1	4,2	0,1	0,1	22	91,7	99,3	99,3	1	4,2	0,0	0,0
VENETO	24	14.310	82.979	1	4,2	0,1	0,1	22	91,7	99,3	99,3	1	4,2	0,0	0,0
EMILIA-ROMAGNA	14	25.180	78.750	2	14,3	1,3	3,9	40	286,4	92,9	94,2	2	14,3	1,8	1,0
EMILIA-ROMAGNA	14	25.180	78.750	2	14,3	1,3	3,9	40	286,4	92,9	94,2	2	14,3	1,8	1,0
TOSCANA	12	32.240	60.903	6	50,0	1,4	16,0	7	58,3	51,8	63,3	1	8,3	0,0	0,

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI
(LEGGE 270/97)

TAVOLA 1

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER REGIONE

REGIONI	Num.	Finanz. millioni	Costo millioni	INTERVENTI IN FASE PRE-REALIZZATIVA				INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE				INTERVENTI COMPLETATI			
				numero	%	num.	finanz.	numero	%	num.	finanz.	numero	%	num.	finanz.
VALLE D'AOSTA	14	12.339	18.667	2	14,3	14,7	14,1	9	61,3	75,1	77,4	3	21,4	10,2	8,5
PIEMONTE	40	157.714	176.503	3	7,5	2,5	2,4	29	72,5	94,7	91,4	8	20,0	2,8	6,1
LIGURIA	43	66.703	95.042	3	7,0	2,0	14,2	34	79,1	92,9	81,6	6	14,0	5,1	4,3
LOMBARDIA	47	80.586	214.624	5	10,6	15,6	8,5	34	72,3	80,5	88,5	8	17,0	3,8	3,0
FRIULI-VENEZIA GIULIA	42	46.220	57.911	4	9,5	5,3	5,3	36	85,7	92,4	92,8	2	4,8	2,3	1,9
TRENTINO-ALTO ADIGE	5	16.144	23.968	1	20,0	7,0	4,7	4	80,0	93,0	95,3	0	0,0	0,0	0,0
VENETO	108	195.618	366.871	19	17,6	11,7	12,4	77	71,3	83,3	82,9	12	11,1	5,0	4,6
EMILIA-ROMAGNA	121	160.481	348.997	1	0,8	0,0	3,4	96	79,3	90,1	91,0	24	19,8	9,9	5,6
TOSCANA	129	210.799	344.901	20	15,5	2,0	16,9	100	77,5	96,4	81,7	9	7,0	1,6	1,4
UMBRIA	123	252.212	493.505	12	9,8	2,1	12,6	104	84,6	94,2	73,3	7	5,7	3,7	11,1
MARCHE	106	177.729	259.013	10	9,4	6,1	8,9	92	86,8	92,6	89,8	4	3,8	1,3	1,4
ABRUZZO	21	45.559	102.781	5	23,8	2,5	19,4	16	76,2	97,5	80,6	0	0,0	0,0	0,0
MOLISE	8	19.886	21.369	2	25,0	12,1	12,2	6	75,0	87,9	87,8	0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	116	181.300	369.125	64	55,2	15,3	44,5	47	40,5	81,2	53,7	5	4,3	3,5	1,8
PUGLIA	104	151.798	292.259	25	24,0	0,1	16,2	76	73,1	94,0	77,0	3	2,9	5,9	6,8
BASILICATA	20	45.593	59.661	1	5,0	1,0	0,8	19	95,0	99,0	99,2	0	0,0	0,0	0,0
CALABRIA	24	42.766	75.247	4	16,7	10,2	6,3	18	75,0	86,5	60,9	2	8,3	3,4	32,8
SICILIA	28	55.902	60.468	1	3,6	3,6	3,9	24	85,7	90,4	90,0	3	10,7	6,0	6,1
SARDEGNA	23	41.381	110.001	6	26,1	18,0	27,5	17	73,9	82,0	72,5	0	0,0	0,0	0,0
Ambito nazionale	6	24.867	28.434	1	16,7	0,0	8,3	5	83,3	100,0	91,7	0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	1.128	1.988.596	3.519.345	189	16,8	5,7	14,7	843	74,7	90,6	79,8	96	8,5	3,7	5,5

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI
(LEGGE 270/67)

TAVOLA 2

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO
PER SOGGETTO BENEFICIARIO E REGIONE

REGIONI	Num.	Finanz. millioni	Costo millioni	INTERVENTI IN FASE PRE REALIZZATIVA				INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE				INTERVENTI COMPLETATI			
				numero	%	Finanz.	%	numero	%	Finanz.	%	numero	%	Finanz.	%
REGIONI															
VALLE D'AOSTA	0	5.937	0.737	2	25,0	30,5	10,1	4	50,0	50,7	50,7	2	2,0	17,0	11,2
Piemonte	21	110.001	123.365	2	9,5	1,3	1,2	13	71,3	97,2	95,5	1	5,0	1,6	1,3
Liguria	1	14.171	16.705	1	100,0	100,0	100,0	1	100,0	100,0	100,0	1	100,0	100,0	100,0
Lombardia	22	9.170	9.170	1	4,5	2,1	7,3	1	4,5	4,5	4,5	1	4,5	4,5	4,5
Friuli Venezia Giulia	20	15.150	15.150	0	0,0	0,0	0,0	22	78,2	84,0	84,0	2	9,0	9,0	9,0
Trentino-Alto Adige	10	78.474	102.418	0	0,0	0,0	0,0	1	10,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
Emilia-Romagna	75	104.714	100.629	0	0,0	0,0	0,0	27	36,0	36,0	36,0	0	0,0	0,0	0,0
Toscana	65	182.910	214.978	0	0,0	0,0	0,0	59	90,8	90,8	90,8	6	9,2	9,2	9,2
Umbria	99	118.807	174.048	2	2,0	2,1	1,3	51	51,4	51,4	51,4	1	2,0	2,0	2,0
Marche	97	118.804	135.541	0	0,0	0,0	0,0	50	51,4	51,4	51,4	2	2,0	2,0	2,0
Abruzzo	5	21.942	22.042	1	20,0	14,6	14,6	7	140,0	140,0	140,0	0	0,0	0,0	0,0
Molise	5	9.874	6.074	2	40,0	10,0	4,6	1	20,0	20,0	20,0	0	0,0	0,0	0,0
Campania	12	76.610	92.345	15	125,0	38,2	38,2	15	125,0	125,0	125,0	0	0,0	0,0	0,0
Puglia	17	51.090	55.000	0	0,0	0,0	0,0	10	58,8	58,8	58,8	1	5,9	5,9	5,9
Basilicata	10	19.187	20.642	0	0,0	0,0	0,0	10	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
Calabria	10	6.010	11.151	2	20,0	10,2	7,6	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sicilia	15	2.051	43.303	0	0,0	0,0	0,0	11	73,3	73,3	73,3	0	0,0	0,0	0,0
Sardegna	15	2.051	43.303	0	0,0	0,0	0,0	11	73,3	73,3	73,3	0	0,0	0,0	0,0
ANNO INIZIALE	301	1.010.782	1.331.842	91	12,2	7,7	7,9	325	100,0	100,0	100,0	13	3,3	2,7	3,3
REGIONI															
VALLE D'AOSTA	0	0.382	0.382	0	0,0	0,0	0,0	5	61,3	61,3	61,3	1	12,5	12,5	12,5
Piemonte	19	41.709	51.124	1	5,3	0,0	0,0	14	73,7	73,7	73,7	4	21,1	21,1	21,1
Liguria	20	52.330	60.145	1	5,3	1,3	1,3	23	115,0	115,0	115,0	5	23,8	23,8	23,8
Lombardia	21	30.146	42.358	0	0,0	0,0	0,0	11	52,4	52,4	52,4	0	0,0	0,0	0,0
Friuli Venezia Giulia	11	13.276	15.338	0	0,0	0,0	0,0	11	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
Trentino-Alto Adige	59	12.361	20.019	1	25,0	9,1	5,7	3	75,0	75,0	75,0	0	0,0	0,0	0,0
Emilia-Romagna	41	117.043	155.759	5	11,9	13,2	10,6	40	97,6	97,6	97,6	0	0,0	0,0	0,0
Toscana	54	55.747	76.117	0	0,0	0,0	0,0	13	24,1	24,1	24,1	0	0,0	0,0	0,0
Umbria	15	13.105	16.373	3	20,0	18,8	18,8	10	66,7	66,7	66,7	2	13,3	13,3	13,3
Marche	35	60.705	60.705	0	0,0	0,0	0,0	31	88,6	88,6	88,6	2	5,7	5,7	5,7
Abruzzo	7	23.917	25.204	1	14,3	2,4	3,6	9	128,6	128,6	128,6	0	0,0	0,0	0,0
Molise	11	11.071	19.200	0	0,0	0,0	0,0	1	9,1	9,1	9,1	0	0,0	0,0	0,0
Campania	14	104.600	149.000	0	0,0	0,0	0,0	22	157,1	157,1	157,1	3	21,4	21,4	21,4
Puglia	18	30.100	33.010	1	5,6	0,0	0,0	2	11,1	11,1	11,1	0	0,0	0,0	0,0
Basilicata	10	32.100	33.120	1	10,0	1,2	1,2	10	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
Calabria	10	32.100	33.120	1	10,0	1,2	1,2	10	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
Sicilia	27	11.308	37.418	1	3,7	3,7	4,1	23	85,2	85,2	85,2	1	3,7	3,7	3,7
Sardegna	5	11.308	37.418	0	0,0	0,0	0,0	5	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
ANNO INIZIALE	450	937.814	1.190.201	22	4,9	3,4	3,3	300	100,0	100,0	100,0	10	2,2	1,9	2,2
REGIONI															
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Piemonte	1	12.117	12.117	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Liguria	1	82.100	82.100	1	25,0	1,0	1,0	3	75,0	75,0	75,0	0	0,0	0,0	0,0
Lombardia	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Friuli Venezia Giulia	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Emilia-Romagna	10	105.453	105.453	7	77,8	18,1	18,1	3	30,0	30,0	30,0	0	0,0	0,0	0,0
Venezia	1	115.605	115.605	1	100,0	100,0	100,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
Toscana	10	58.206	58.206	9	90,0	91,3	91,3	1	10,0	10,0	10,0	0	0,0	0,0	0,0
Umbria	20	135.719	135.719	7	35,0	36,6	36,6	13	65,0	65,0	65,0	2	10,0	10,0	10,0
Marche	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	75,0	75,0	75,0	0	0,0	0,0	0,0
Abruzzo	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	75,0	75,0	75,0	0	0,0	0,0	0,0
Molise	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Campania	51	100.533	100.533	49	96,1	91,1	91,1	2	3,9	3,9	3,9	0	0,0	0,0	0,0
Puglia	52	102.483	102.483	24	46,2	45,3	45,3	28	53,8	53,8	53,8	0	0,0	0,0	0,0
Basilicata	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Calabria	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sicilia	1	22.000	22.000	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0
Sardegna	1	50.100	50.100	2	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ANNO INIZIALE	159	6.362	6.362	100	100,0	100,0	100,0	60	100,0	100,0	100,0	1	1,0	0,0	0,0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI
11 EGGE 270651

NUMERO, COSTO DEGLI INTERVENTI ED AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO
PER TIPOLOGIA D'INTERVENTO E REGIONE

REGIONI	Numi.	Finanz. miliardi	Costo miliardi	INTERVENTI IN FASE PRE-REALIZZATIVA				INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE				INTERVENTI COMPLETATI			
				numero	%	finanz.	%	numero	%	finanz.	%	numero	%	finanz.	%
ABRUZZO	5	1.453	5.304	2	40,0	10,2	18,3	2	40,0	36,6	72,3	1	20,0	15,2	30,5
VALLE D'AOSTA	2	3.036	2.036	2	100,0	100,0	100,0	2	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
PIEMONTE	7	10.574	3.036	2	28,6	0,0	0,0	3	42,9	93,2	93,2	2	28,6	6,8	6,8
LIGURIA	11	10.574	3.036	3	27,3	0,0	0,0	10	90,9	93,2	93,2	2	18,2	6,8	6,8
LAZIO	14	25.314	49.905	3	21,4	37,5	27,0	10	71,4	62,0	72,4	1	7,1	0,6	0,6
TRENTINUM-SOUTH	19	10.554	27.300	4	21,1	13,1	11,2	14	73,7	62,0	60,7	1	5,1	0,2	0,1
TRENTINUM-NORTH	1	1.133	1.133	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
VENETO	32	43.374	66.406	10	31,3	13,3	19,2	17	53,1	79,5	74,6	5	15,6	7,1	5,2
EMILIA-ROMAGNA	26	11.111	46.336	0	0,0	0,0	0,0	23	88,5	91,6	91,6	3	11,5	0,4	0,4
TOSCANA	16	11.404	106.472	7	43,8	1,3	19,0	41	256,3	50,1	50,1	2	12,5	0,6	0,6
LAZIO	19	66.953	91.923	5	26,3	6,5	0,2	30	158,0	93,2	93,2	3	15,8	0,6	0,6
MARCHE	19	25.365	36.057	5	26,3	10,9	42,9	3	15,8	37,4	43,3	1	5,3	0,2	0,2
ABRUZZO	9	15.443	10.423	3	33,3	7,4	4,8	3	33,3	32,0	32,0	1	11,1	0,3	0,3
CAMPANIA	17	61.106	99.972	20	58,8	15,1	11,9	16	47,1	54,5	57,2	0	0,0	0,0	0,0
CALABRIA	22	39.262	67.636	4	18,2	0,0	0,0	16	72,7	100,0	100,0	1	4,5	0,1	0,1
BASILICATA	5	5.540	4.000	0	0,0	0,0	0,0	5	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
CALABRIA	3	1.306	1.502	1	33,3	36,1	33,3	2	66,7	63,1	63,1	0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	1	1.000	1.000	0	0,0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	4	6.501	11.901	2	50,0	48,9	60,3	2	50,0	51,1	51,1	0	0,0	0,0	0,0
Abruzzo nazionale	5	17.467	20.314	1	20,0	0,0	11,3	1	20,0	100,0	89,7	0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	311	501.797	771.067	77	24,8	13,5	21,5	215	69,1	63,5	76,8	13	4,2	2,9	1,7
ABRUZZO	5	1.635	6.314	0	0,0	0,0	0,0	4	80,0	95,4	95,4	1	20,0	4,1	4,1
VALLE D'AOSTA	17	22.073	27.830	0	0,0	0,0	0,0	11	64,7	87,3	87,3	1	5,9	1,1	1,1
PIEMONTE	16	10.543	10.543	2	12,5	18,2	3,3	8	50,0	51,1	51,1	2	12,5	7,1	7,1
LIGURIA	12	11.305	22.013	0	0,0	0,0	0,0	12	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
TRENTINUM-SOUTH	1	1.011	1.011	0	0,0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
EMILIA-ROMAGNA	57	76.742	217.427	7	12,3	2,8	9,3	10	17,5	99,5	86,3	5	8,8	5,4	5,4
TOSCANA	37	52.015	88.515	8	21,6	7,5	17,5	16	43,2	95,5	95,5	1	2,7	0,5	0,5
LAZIO	29	62.166	267.190	7	24,1	1,1	20,5	43	148,3	98,1	97,2	4	13,8	0,5	0,5
MARCHE	9	12.100	70.312	2	22,2	0,0	2,8	7	77,8	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
ABRUZZO	3	14.013	15.296	0	0,0	0,0	0,0	3	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	66	61.867	215.004	41	60,6	0,0	0,0	13	19,7	100,0	100,0	2	3,0	0,1	0,1
CALABRIA	68	98.078	185.075	0	0,0	0,0	0,0	48	70,6	92,8	92,8	2	2,9	0,1	0,1
BASILICATA	17	15.130	43.765	0	0,0	0,0	0,0	14	82,4	100,0	100,0	3	17,6	0,0	0,0
SARDEGNA	23	48.529	52.750	1	4,3	4,1	0,8	20	87,0	91,2	90,7	2	8,7	0,0	0,0
SARDEGNA	7	5.569	60.980	2	28,6	0,0	28,9	5	71,4	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	316	710.037	1.837.802	96	30,4	2,1	17,0	360	72,6	93,5	76,3	40	12,6	3,4	3,4
ABRUZZO	1	3.939	6.684	0	0,0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
VALLE D'AOSTA	21	124.979	135.187	1	4,8	3,0	2,0	14	66,7	96,2	96,2	1	4,8	1,7	1,7
PIEMONTE	17	30.895	33.430	0	0,0	0,0	0,0	14	82,4	96,2	96,2	3	17,6	0,0	0,0
LIGURIA	20	15.723	16.541	0	0,0	0,0	0,0	16	80,0	93,3	93,3	4	20,0	6,7	6,7
TRENTINUM-SOUTH	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	1	100,0	0,0	0,0
EMILIA-ROMAGNA	21	74.915	82.938	2	9,5	10,9	17,0	20	95,2	79,0	80,7	2	9,5	1,1	1,1
TOSCANA	11	55.325	78.895	0	0,0	0,0	0,0	32	72,7	93,2	93,2	12	27,3	16,8	16,8
LAZIO	32	43.320	69.893	5	15,6	3,1	11,7	23	71,9	93,1	93,1	1	3,1	0,0	0,0
MARCHE	31	98.051	131.393	0	0,0	0,0	0,0	31	100,0	91,1	90,3	2	6,4	0,0	0,0
ABRUZZO	1	11.016	11.016	0	0,0	0,0	0,0	4	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
CALABRIA	14	60.177	63.180	1	7,1	0,0	0,0	12	85,7	96,2	96,2	1	7,1	0,0	0,0
BASILICATA	1	1.971	1.971	0	0,0	0,0	0,0	1	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	1	6.373	6.373	0	0,0	0,0	0,0	3	300,0	41,6	58,1	0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	12	32.311	37.111	0	0,0	0,0	0,0	10	83,3	85,1	85,1	2	16,7	0,0	0,0
TOTALE	320	730.385	1.602.977	86	26,9	3,5	1,4	267	83,1	91,6	89,2	37	11,6	1,3	1,3

3.2. Il Piano per Regioni - Stato di attuazione al 30 settembre 1999

3.2.1. Regione Abruzzo

Grafico A1a - REGIONE ABRUZZO
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

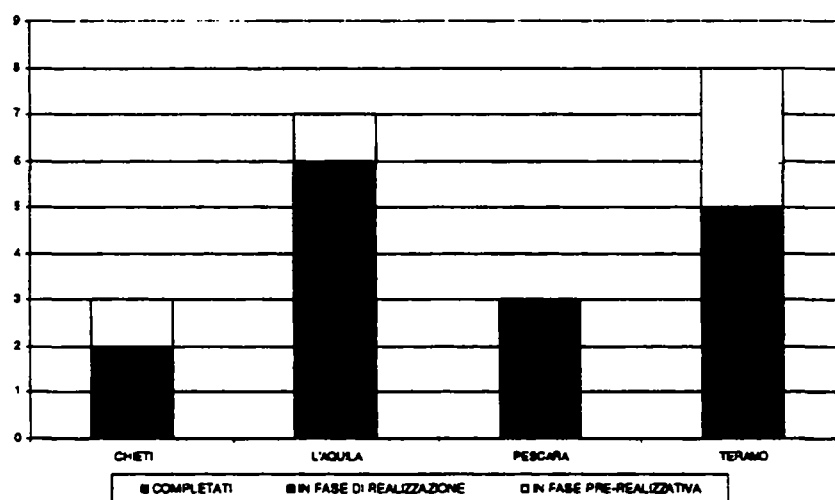


Grafico A 2a - REGIONE ABRUZZO
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


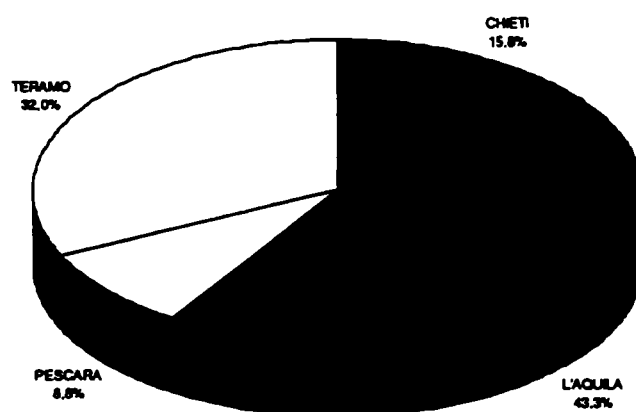


Grafico A 3 - REGIONE ABRUZZO
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

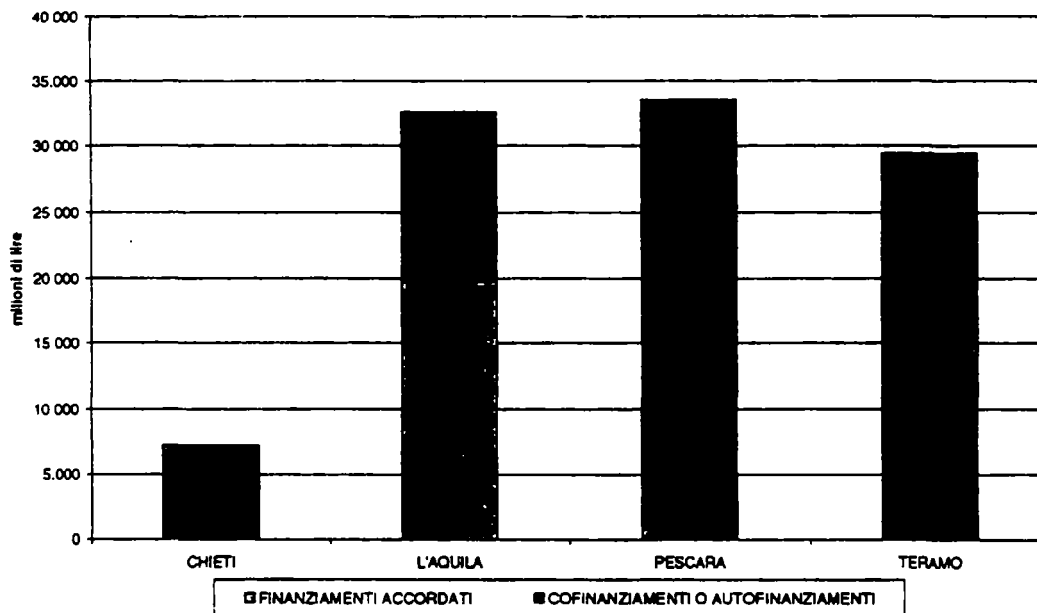

3.2.2. Regione Basilicata

Grafico A1a - REGIONE BASILICATA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

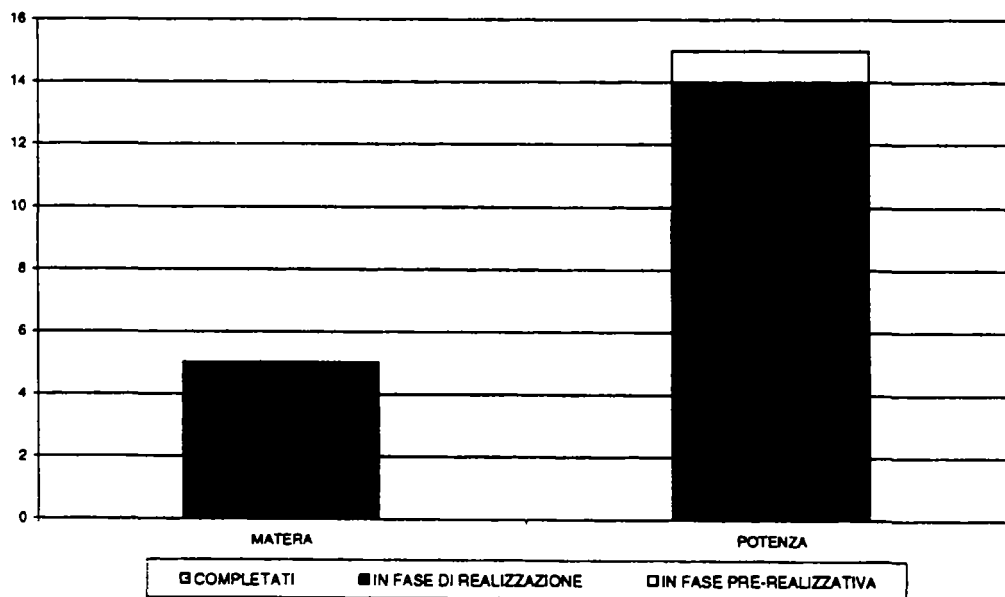


Grafico A 2b - REGIONE BASILICATA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA





Grafico A 3 - REGIONE BASILICATA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

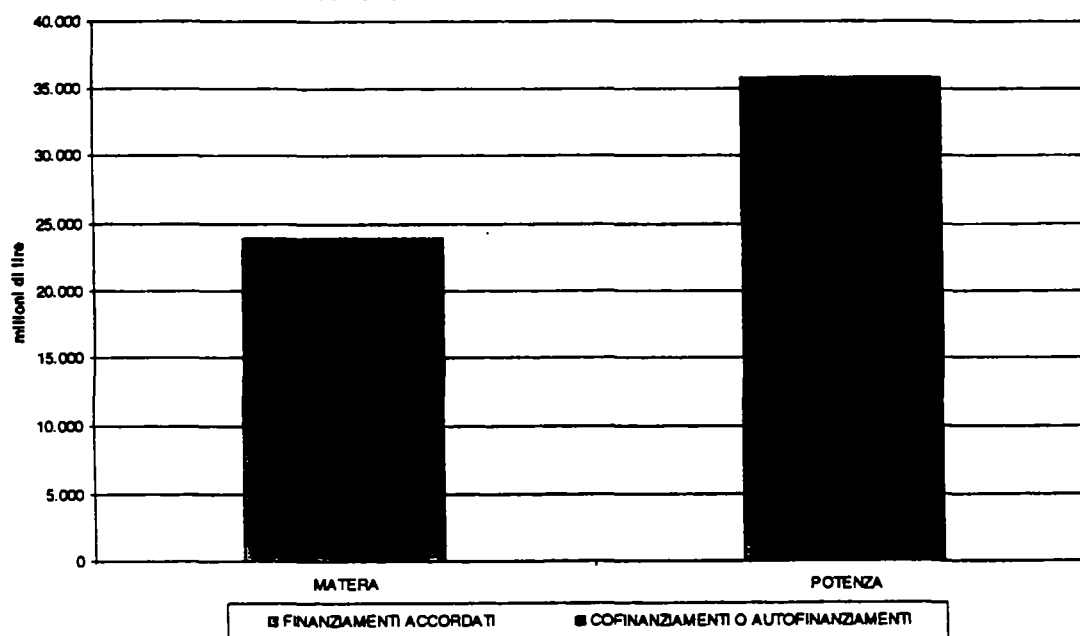

3.2.3. Regione Calabria

Grafico A1a - REGIONE CALABRIA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

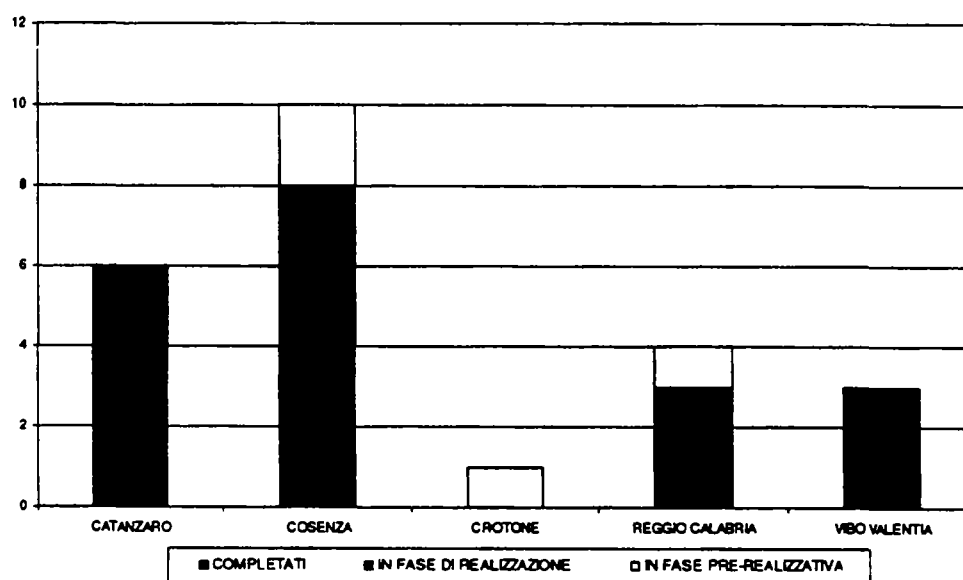


Grafico A 2b - REGIONE CALABRIA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


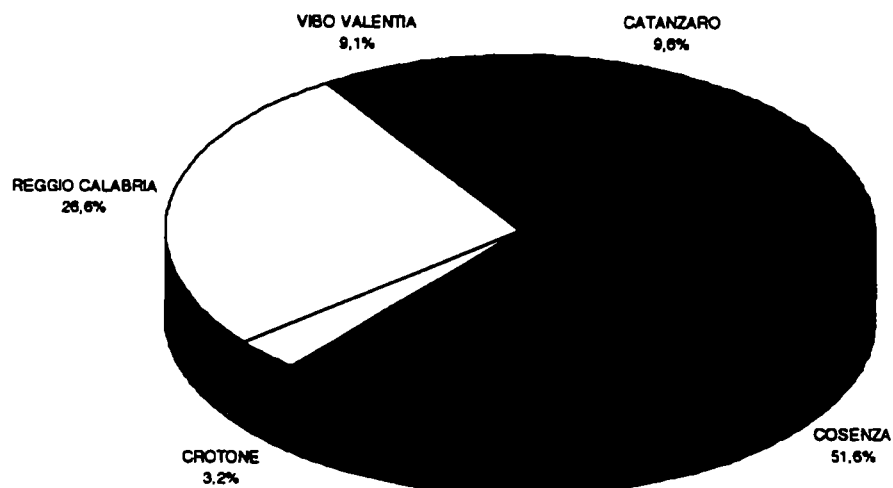


Grafico A 3 - REGIONE CALABRIA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

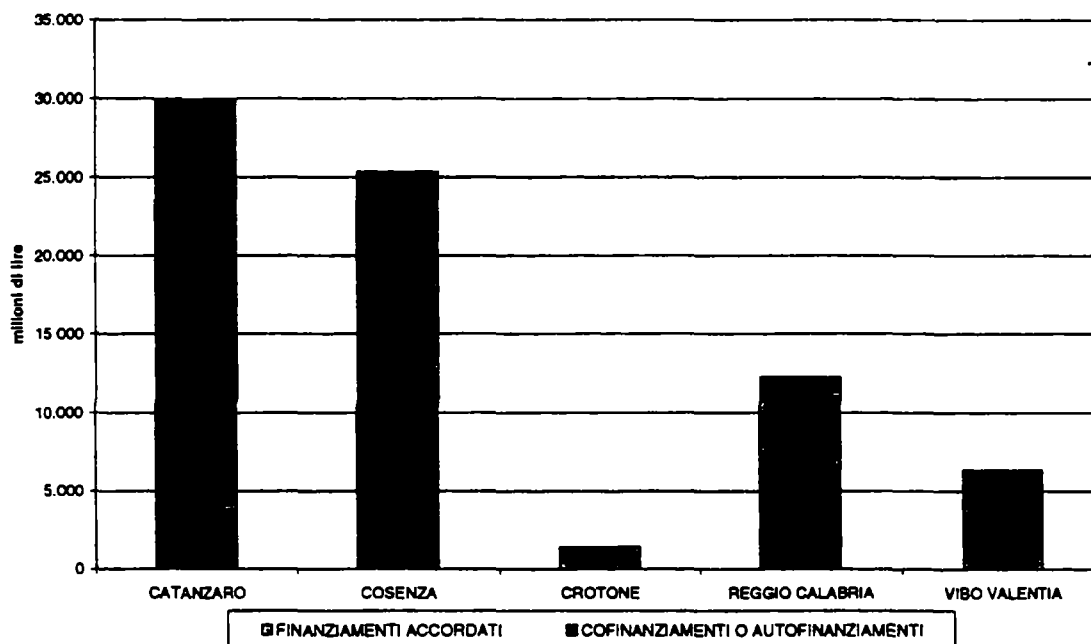

3.2.4. Regione Campania

Grafico A1a - REGIONE CAMPANIA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

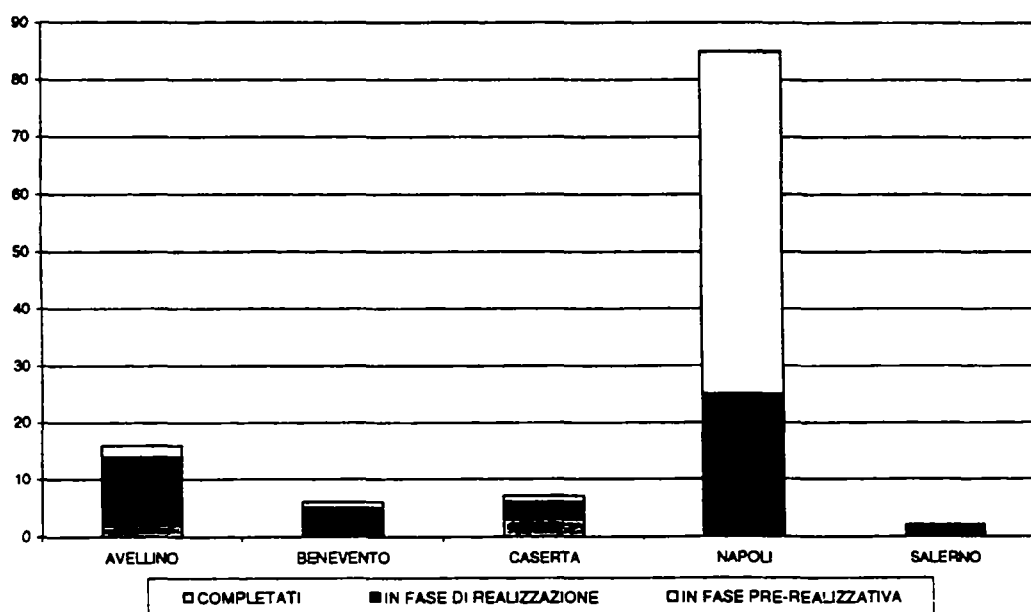


Grafico A 2b - REGIONE CAMPANIA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


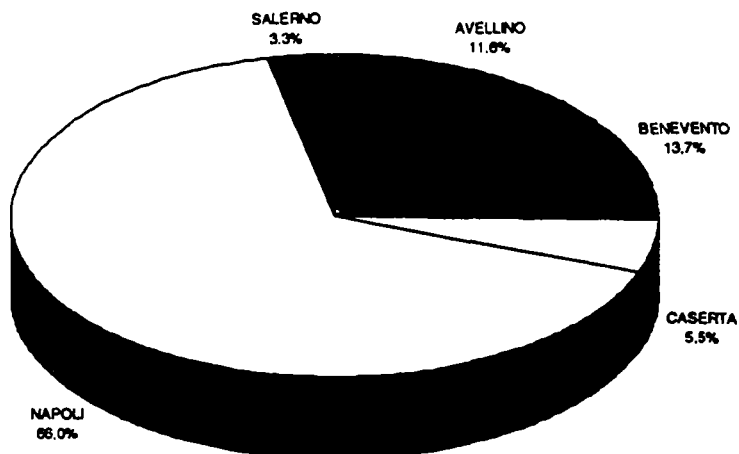


Grafico A 3 - REGIONE CAMPANIA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

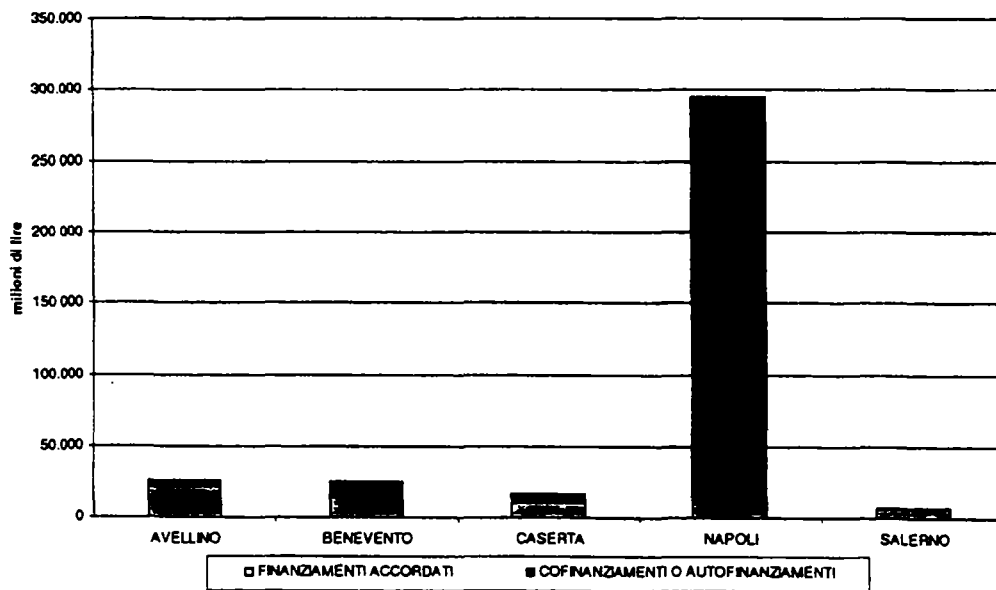

3.2.5. Regione Emilia Romagna

Grafico A1a - REGIONE EMILIA-ROMAGNA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

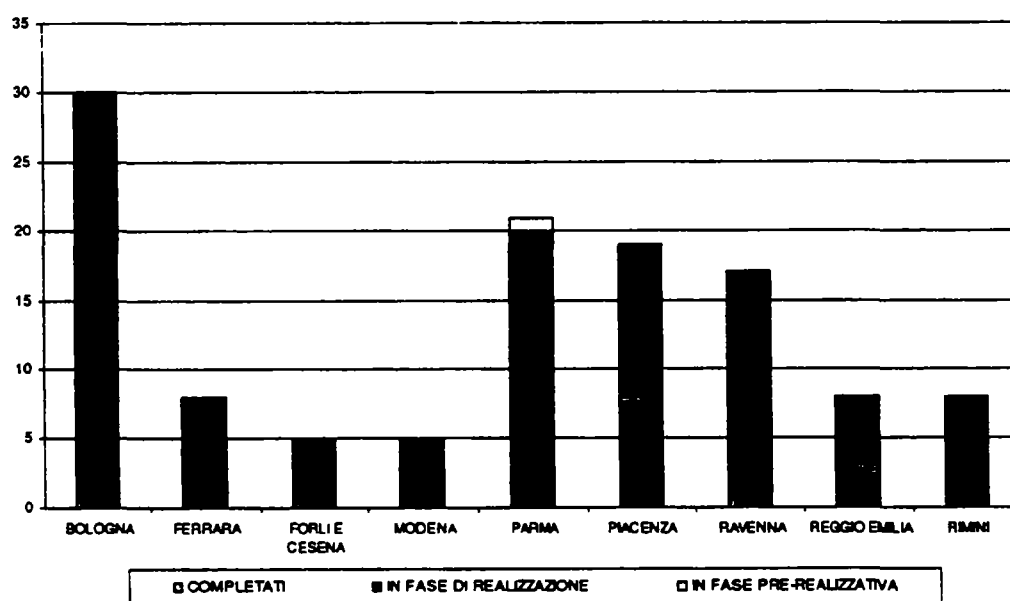


Grafico A 2b - REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


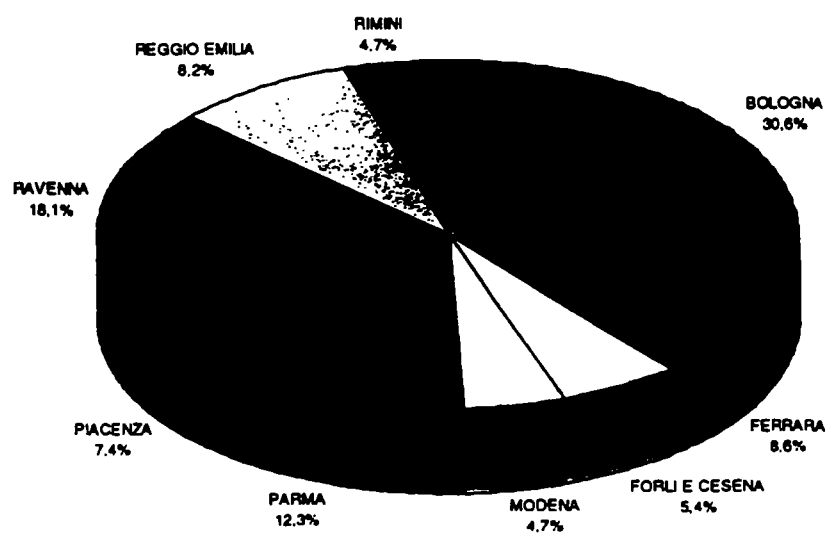


Grafico A 3 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

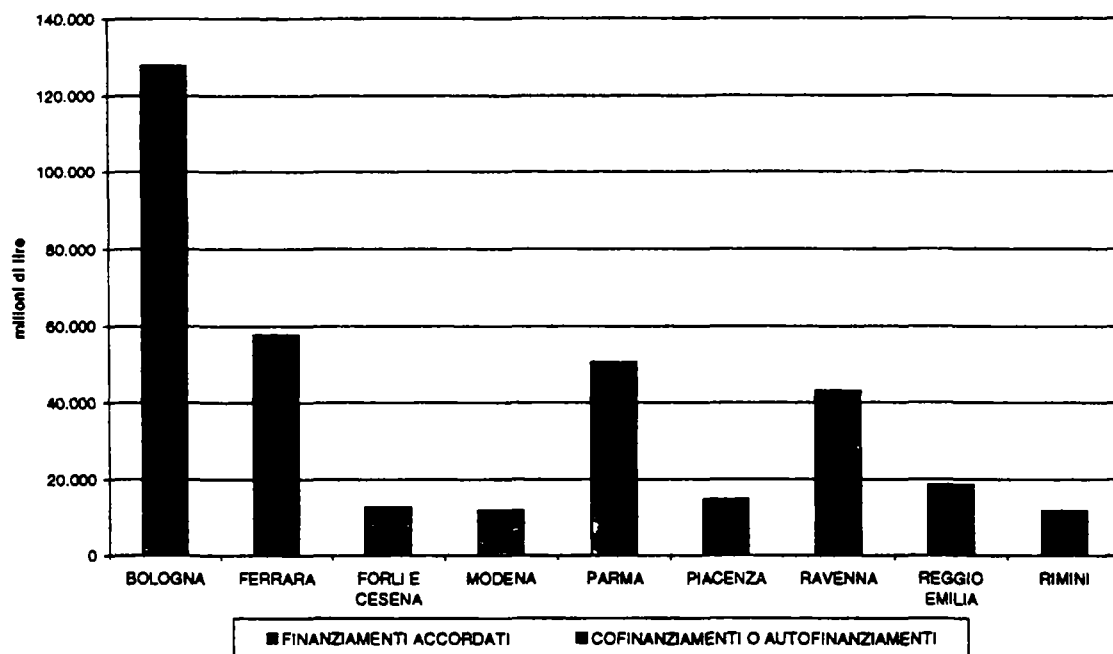

3.2.6. Regione Friuli

Grafico A1a - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

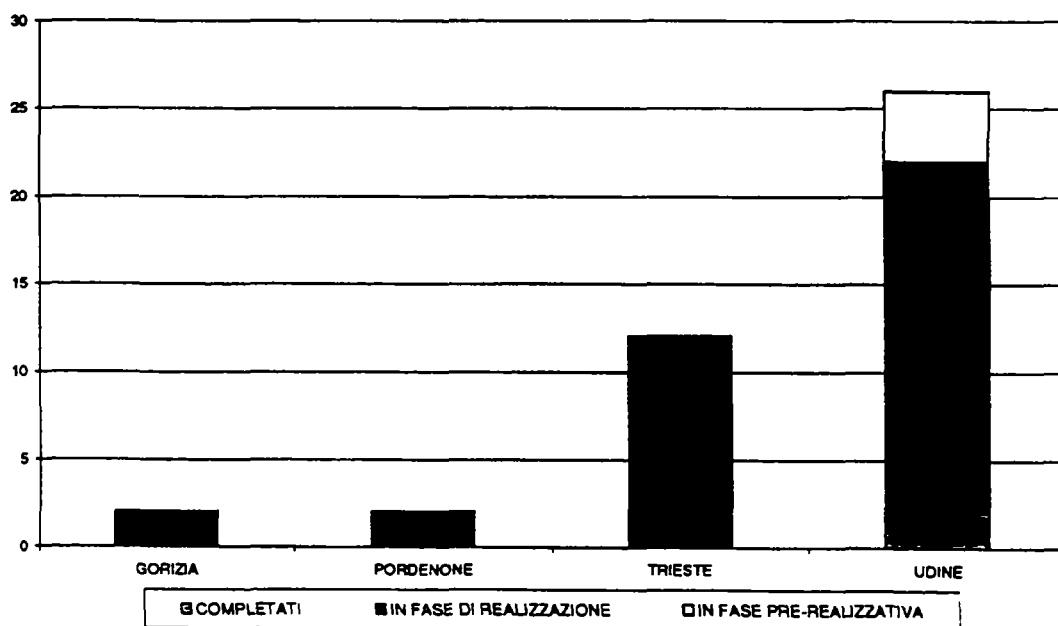


Grafico A 2b - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


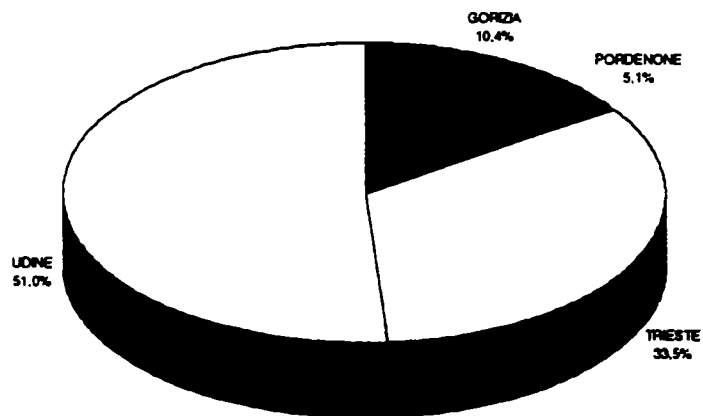


Grafico A 3 - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

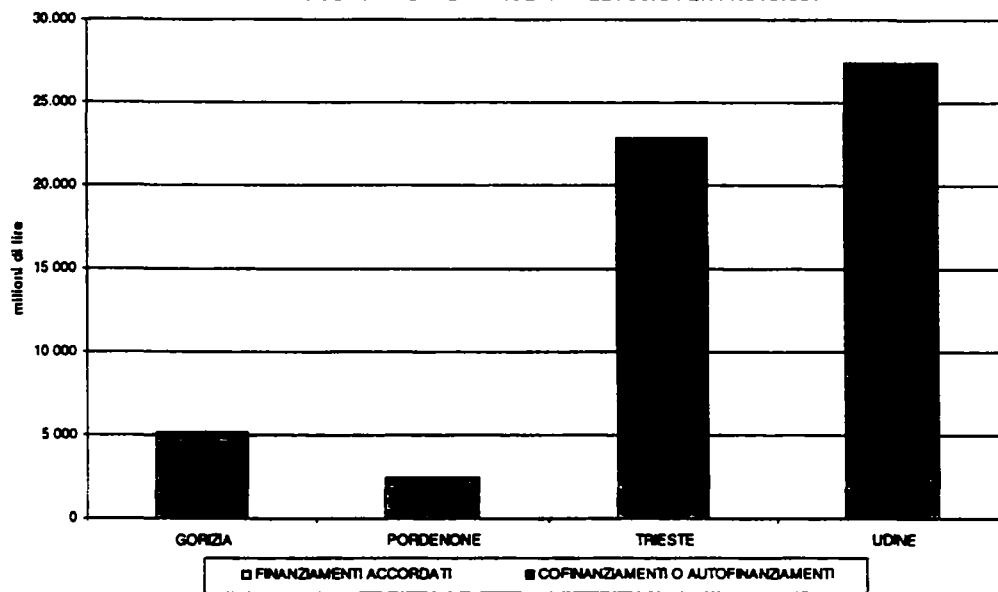

3.2.7. Regione Liguria

Grafico A1a - REGIONE LIGURIA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

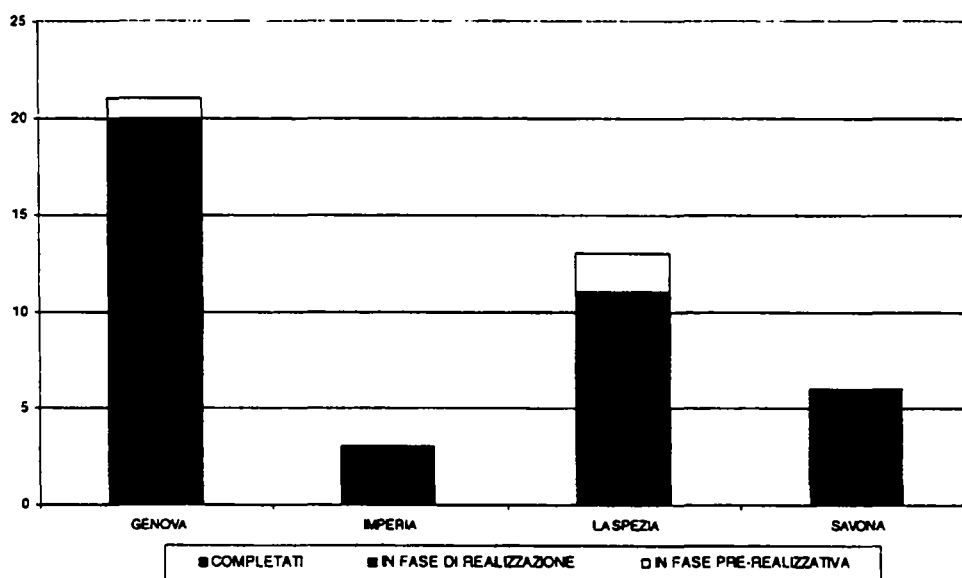


Grafico A 2b - REGIONE LIGURIA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


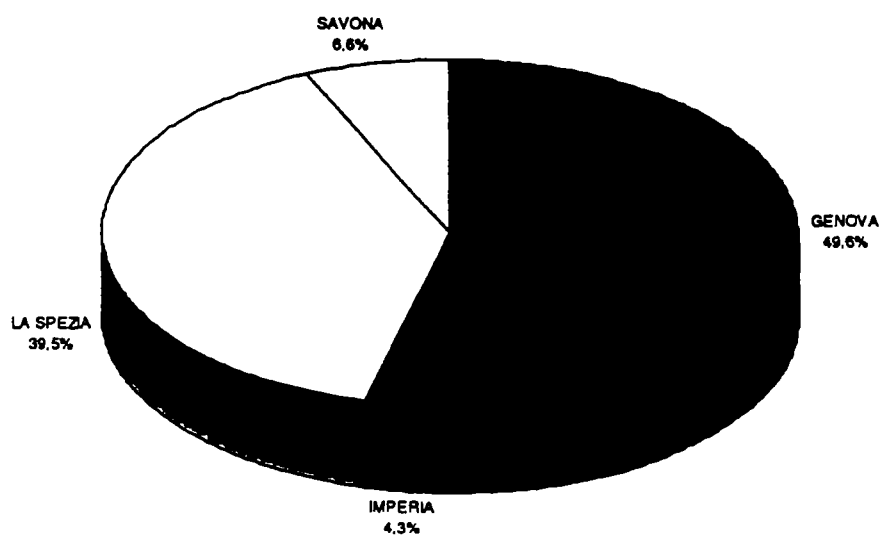


Grafico A 3 - REGIONE LIGURIA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

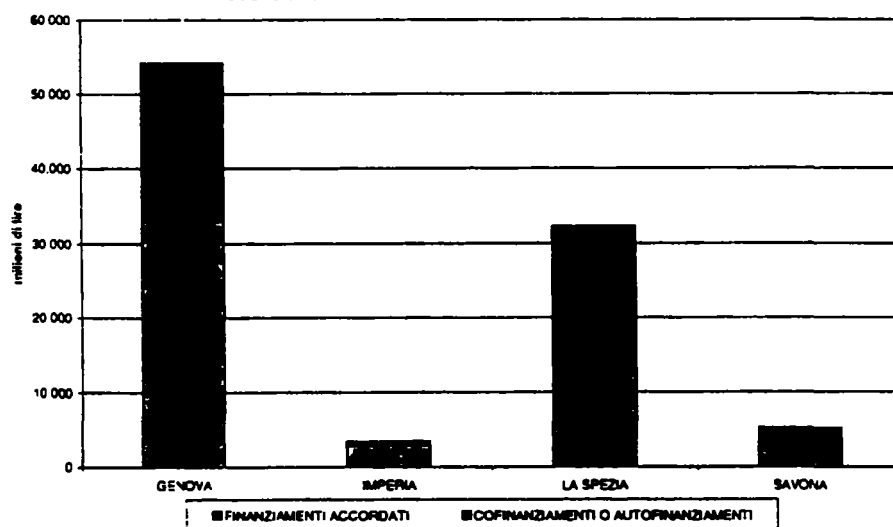

3.2.8. Regione Lombardia

Grafico A1a - REGIONE LOMBARDIA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

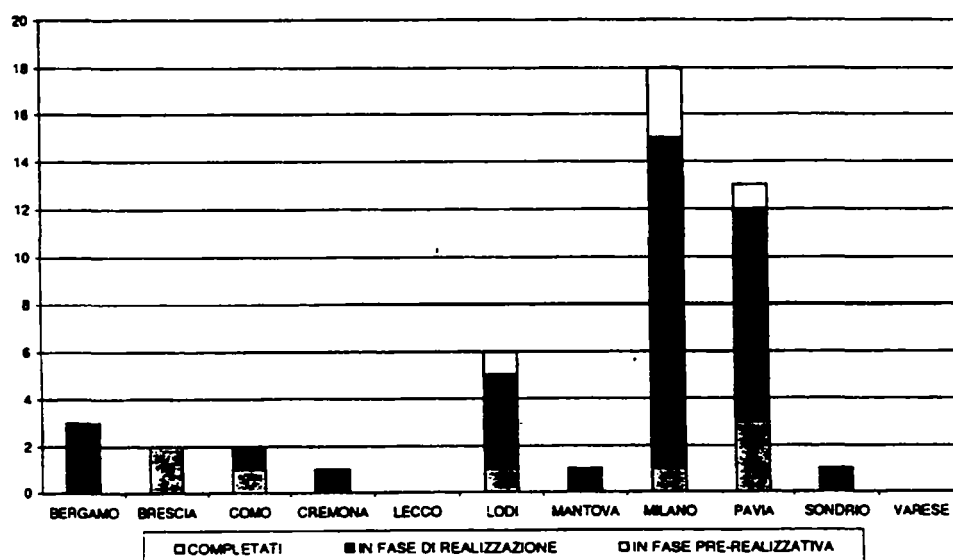


Grafico A 2b - REGIONE LOMBARDIA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


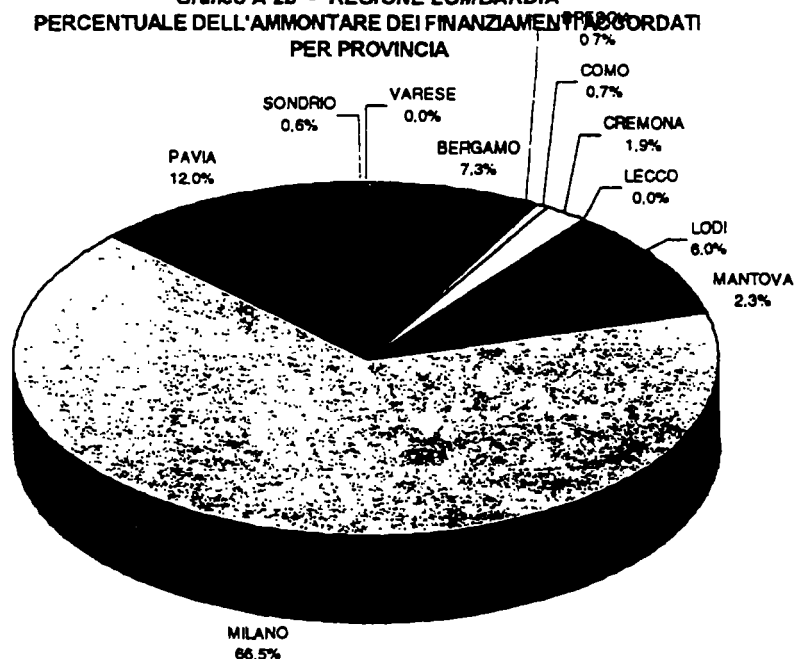


Grafico A 3 - REGIONE LOMBARDIA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

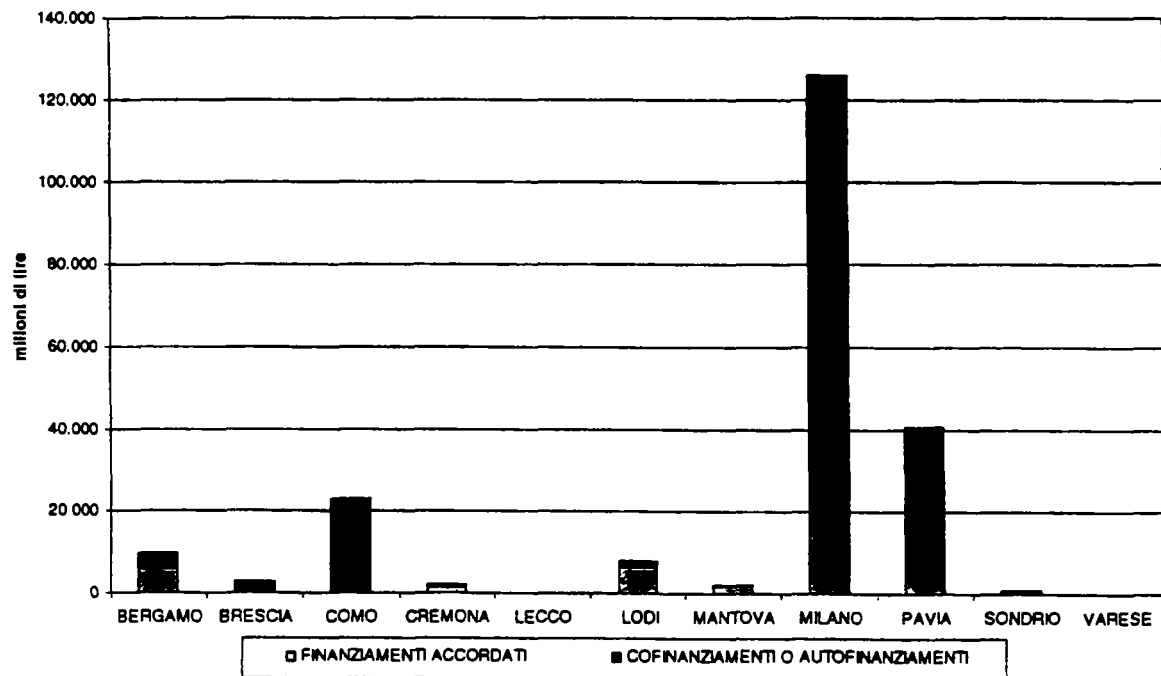

3.2.9. Regione Marche

Grafico A1a - REGIONE MARCHE
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

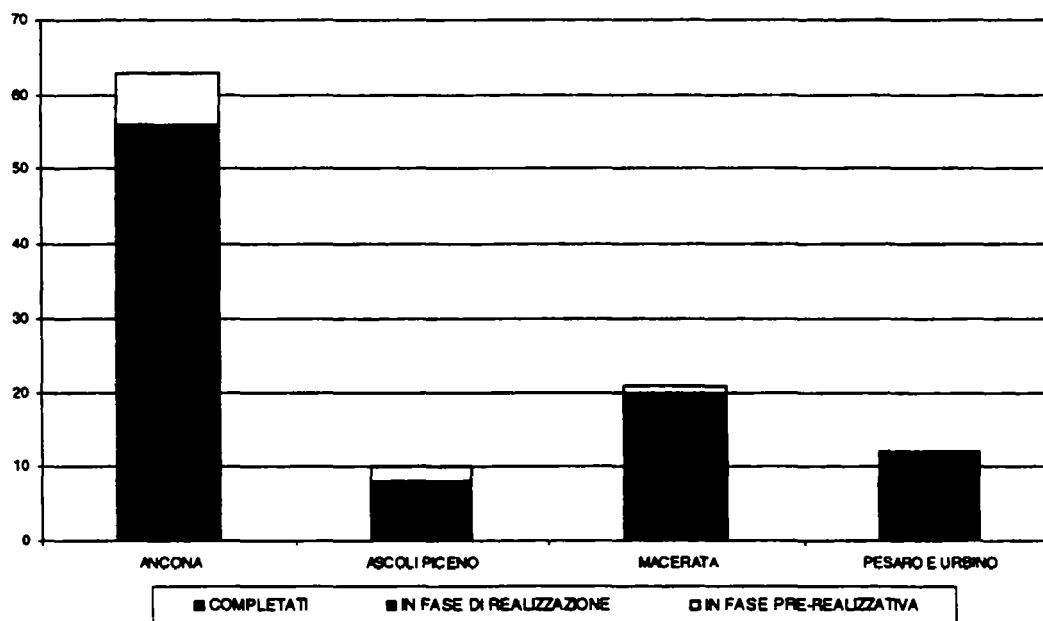


Grafico A2b - REGIONE MARCHE
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER PROVINCIA


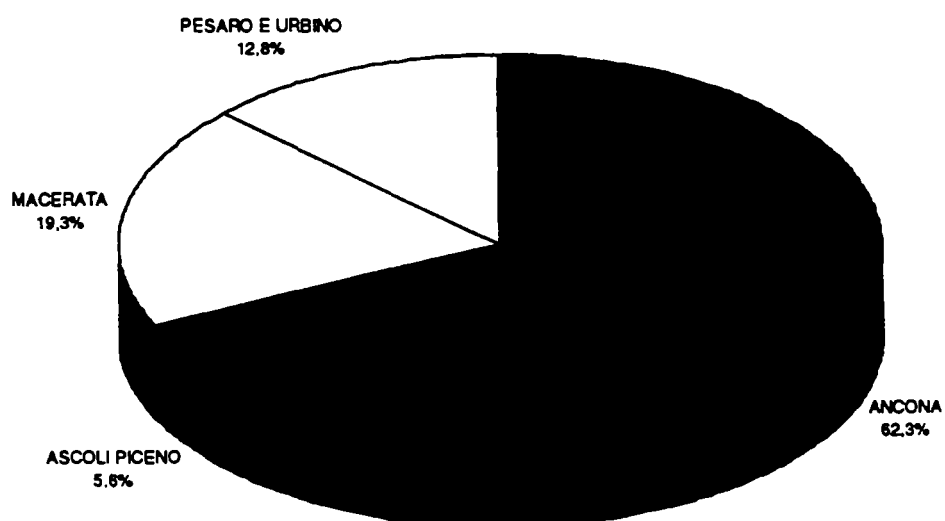


Grafico A 3 - REGIONE MARCHE
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

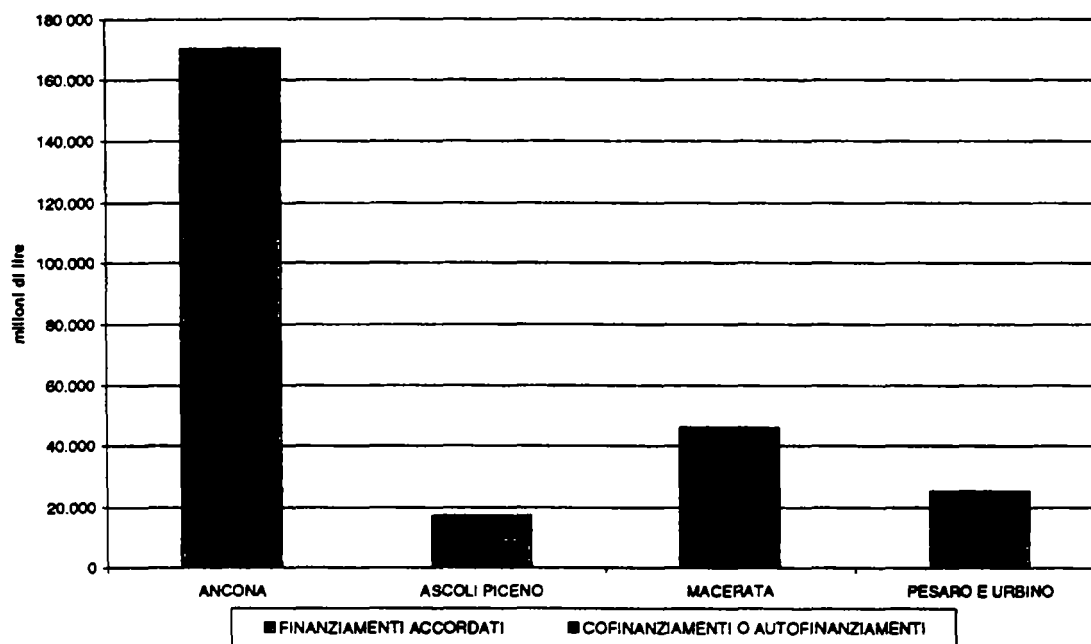

3.2.10. Regione Molise

Grafico A1a - REGIONE MOLISE
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

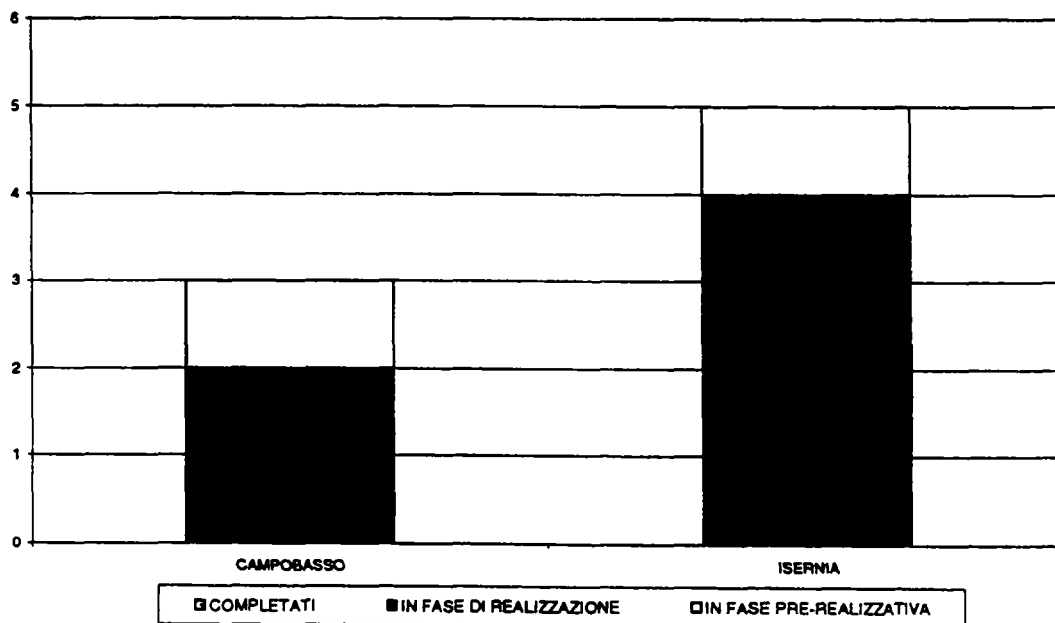


Grafico A 2b - REGIONE MOLISE
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


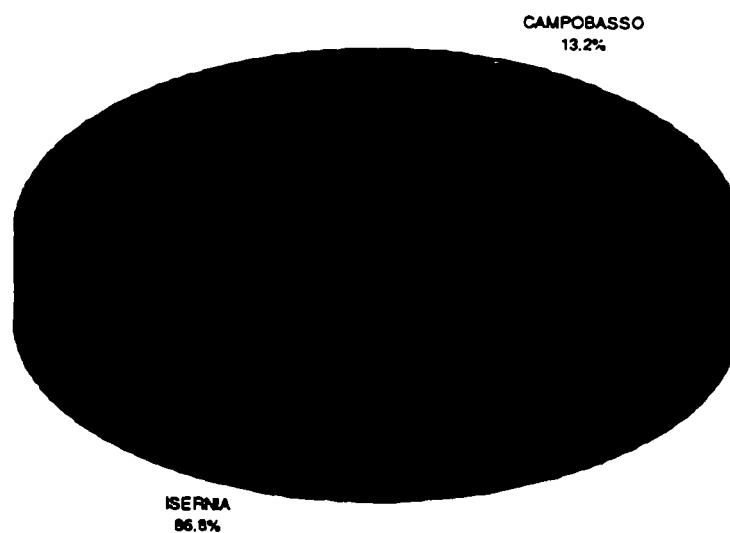


Grafico A 3 - REGIONE MOLISE
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

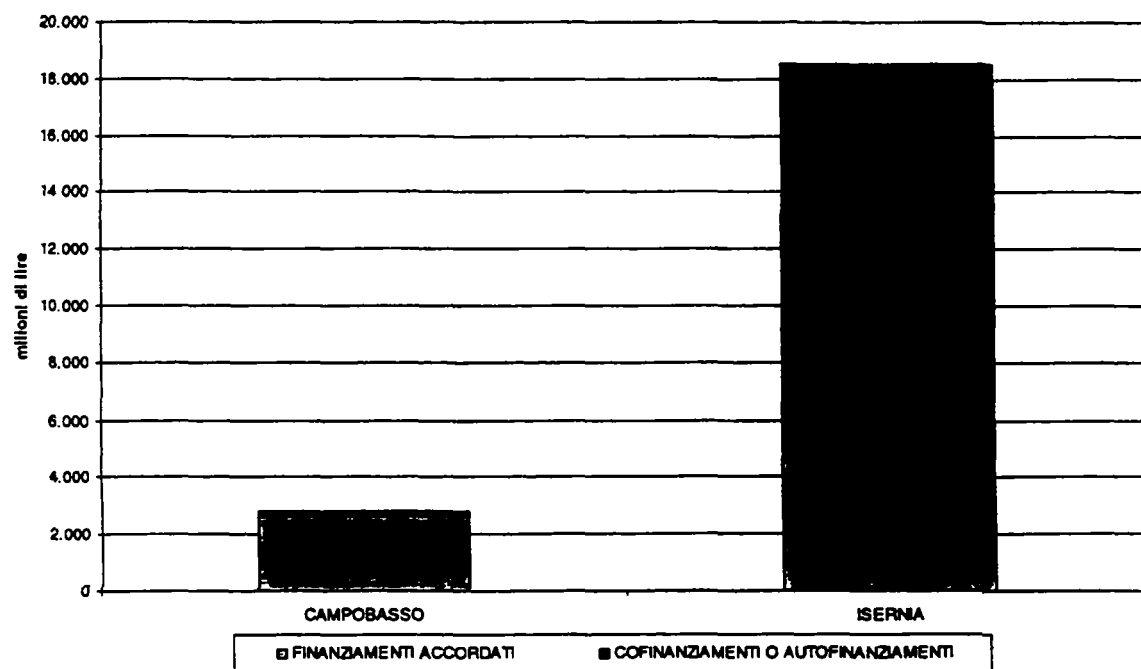

3.2.11. Regione Piemonte

Grafico A1a - REGIONE PIEMONTE
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

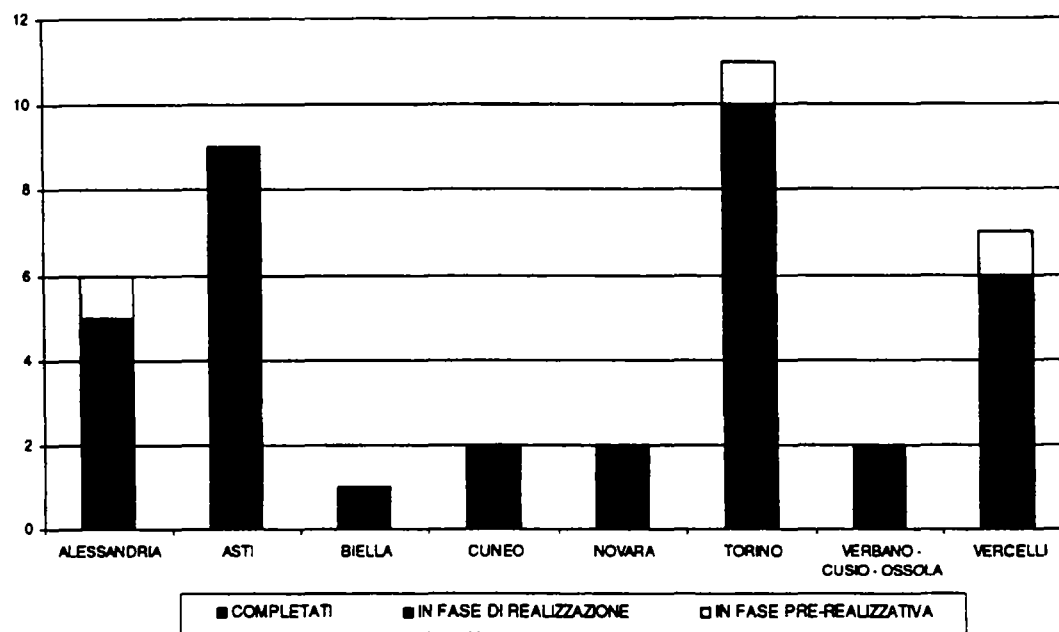


Grafico A 2b - REGIONE PIEMONTE
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


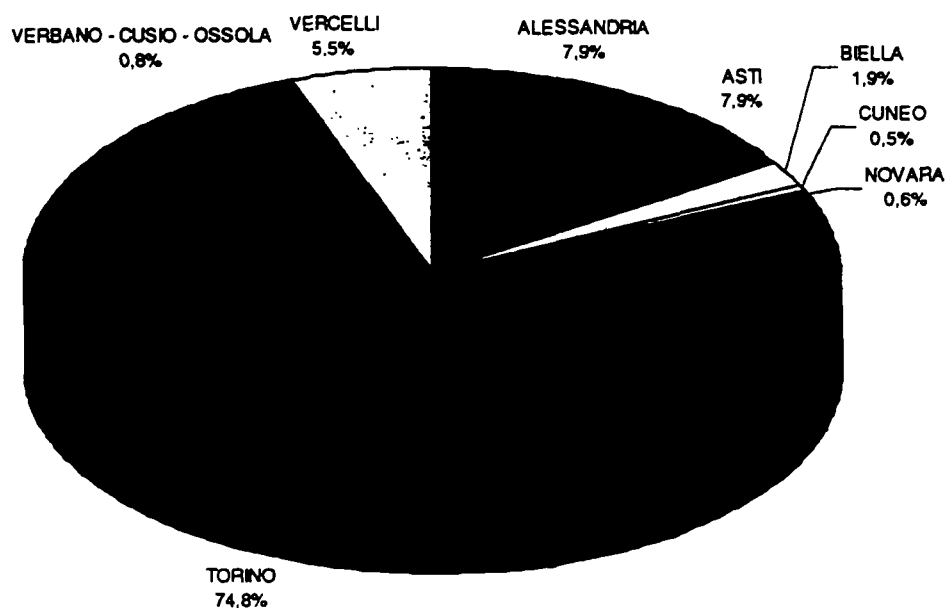


Grafico A 3 - REGIONE PIEMONTE
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

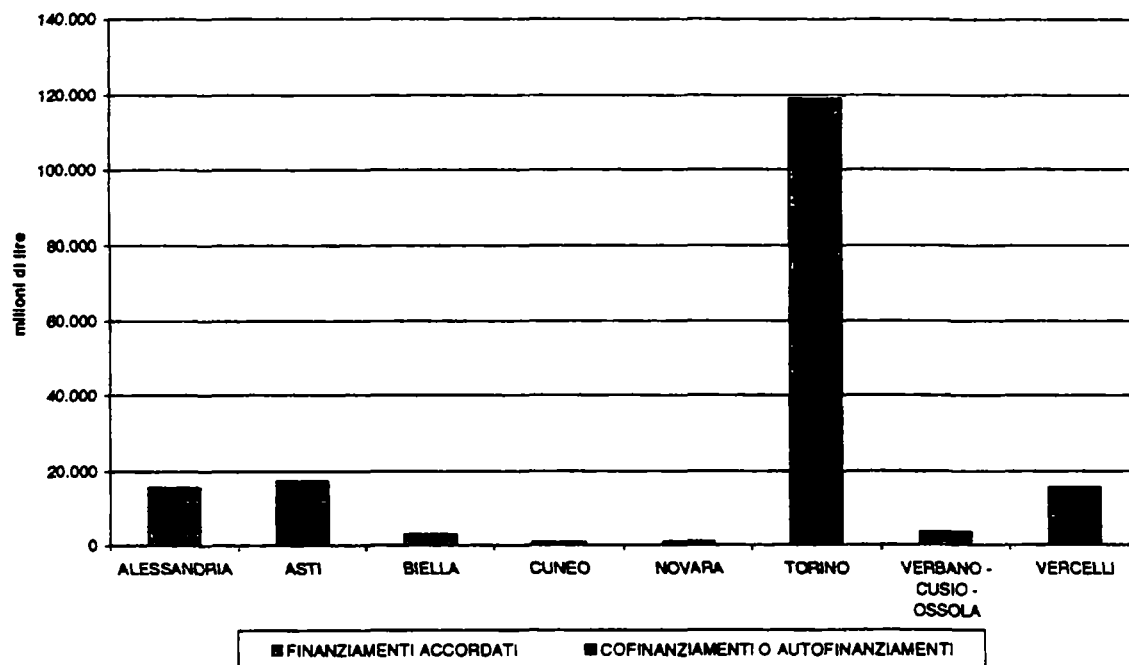

3.2.12. Regione Puglia

Grafico A1a - REGIONE PUGLIA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

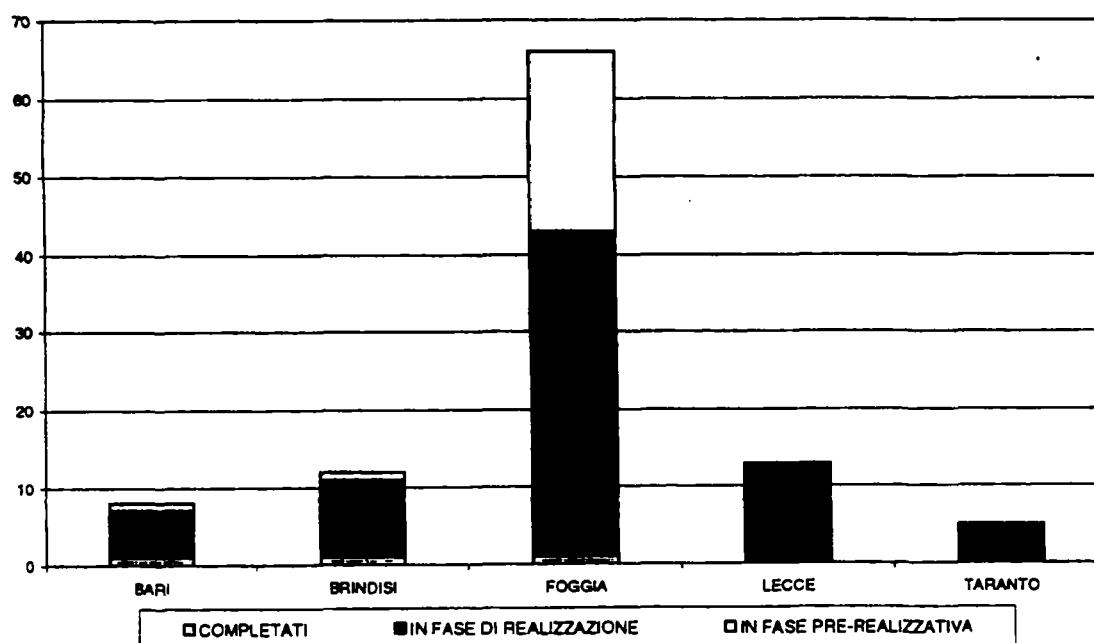


Grafico A 2b - REGIONE PUGLIA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


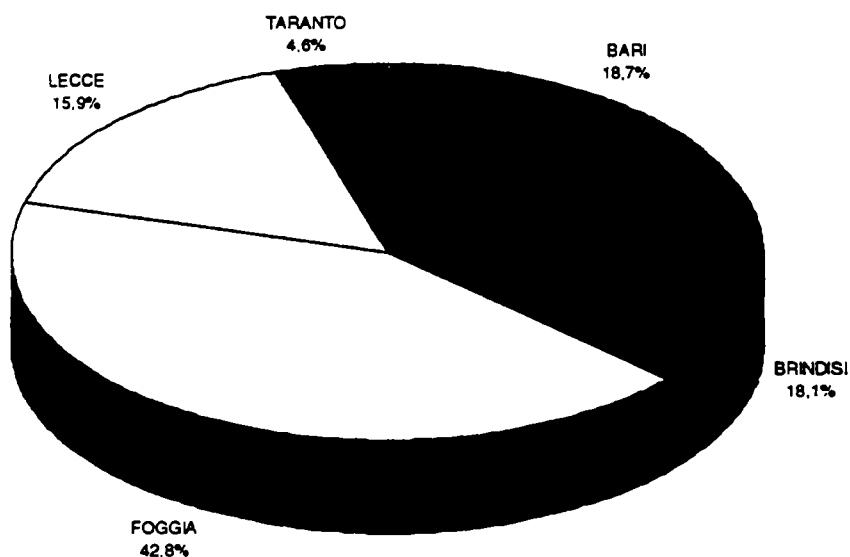


Grafico A 3 - REGIONE PUGLIA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

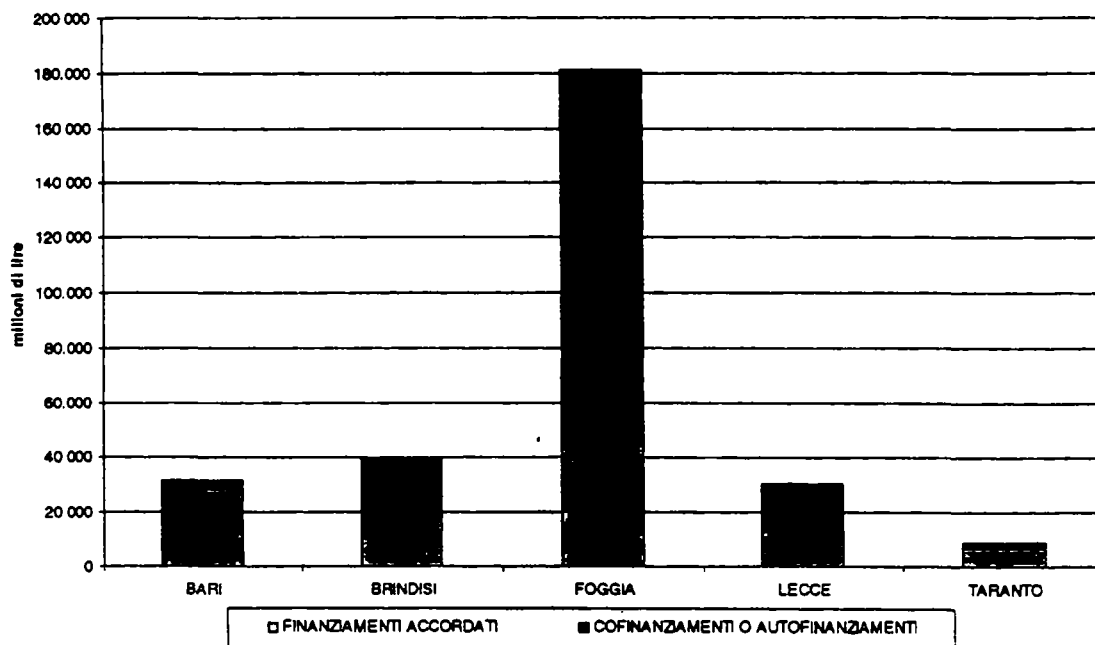

3.2.13. Regione Sardegna

Grafico A1a - REGIONE SARDEGNA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

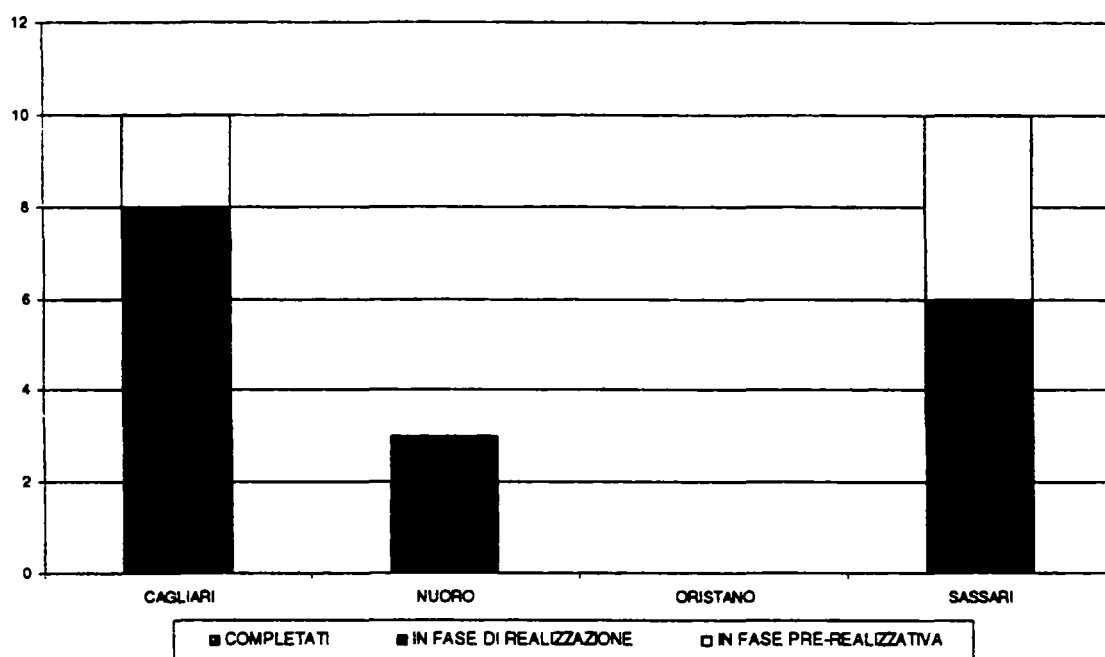


Grafico A 2b - REGIONE SARDEGNA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


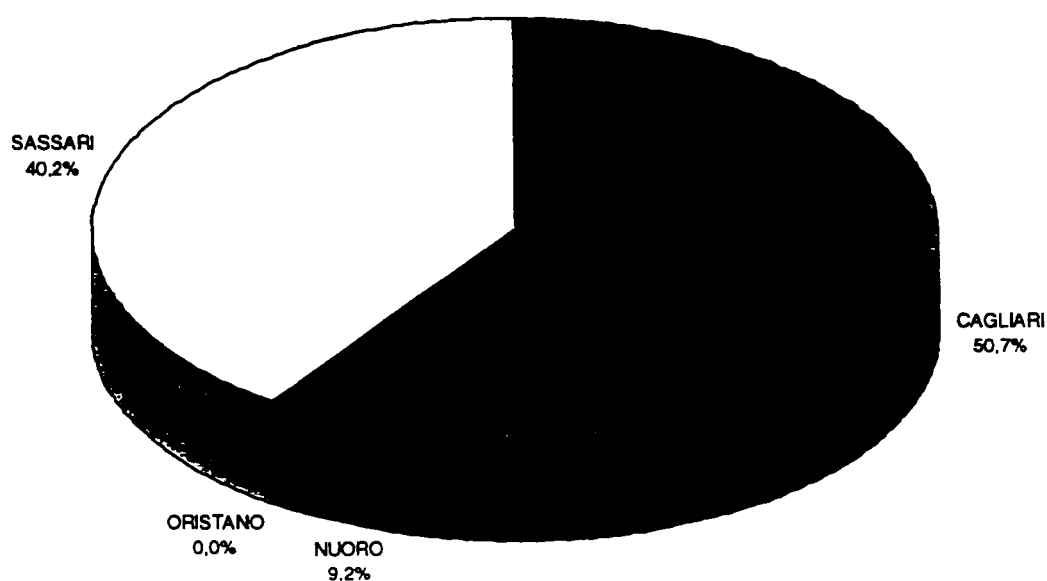


Grafico A 3 - REGIONE SARDEGNA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

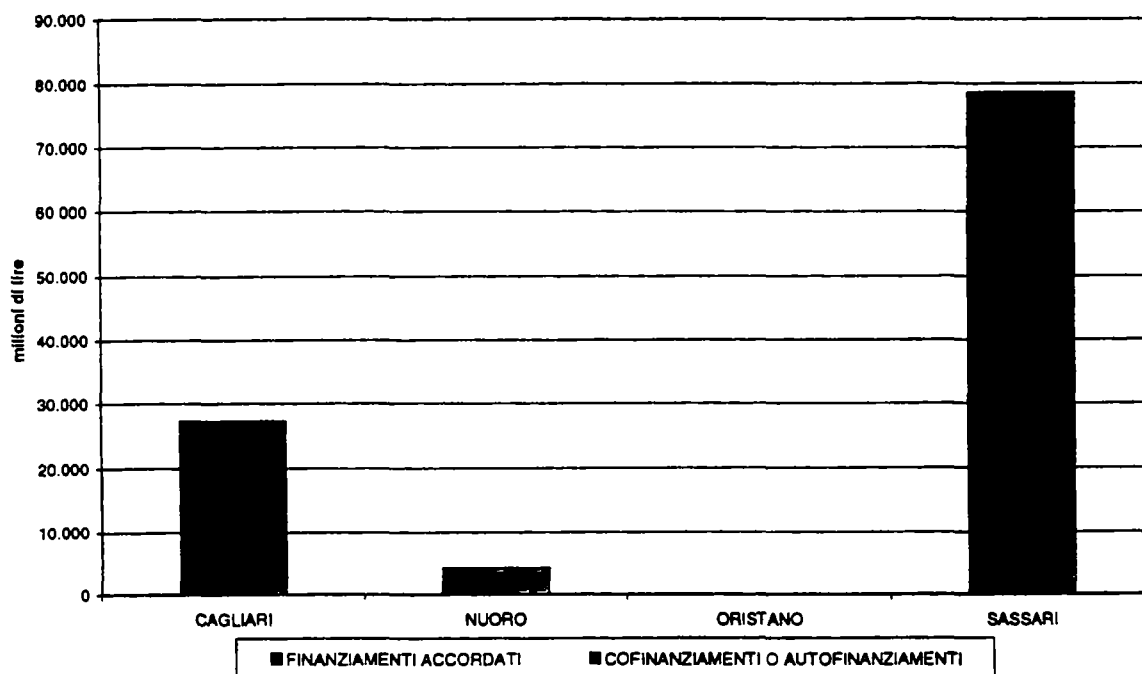

3.2.14. Regione Sicilia

Grafico A1a - REGIONE SICILIA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

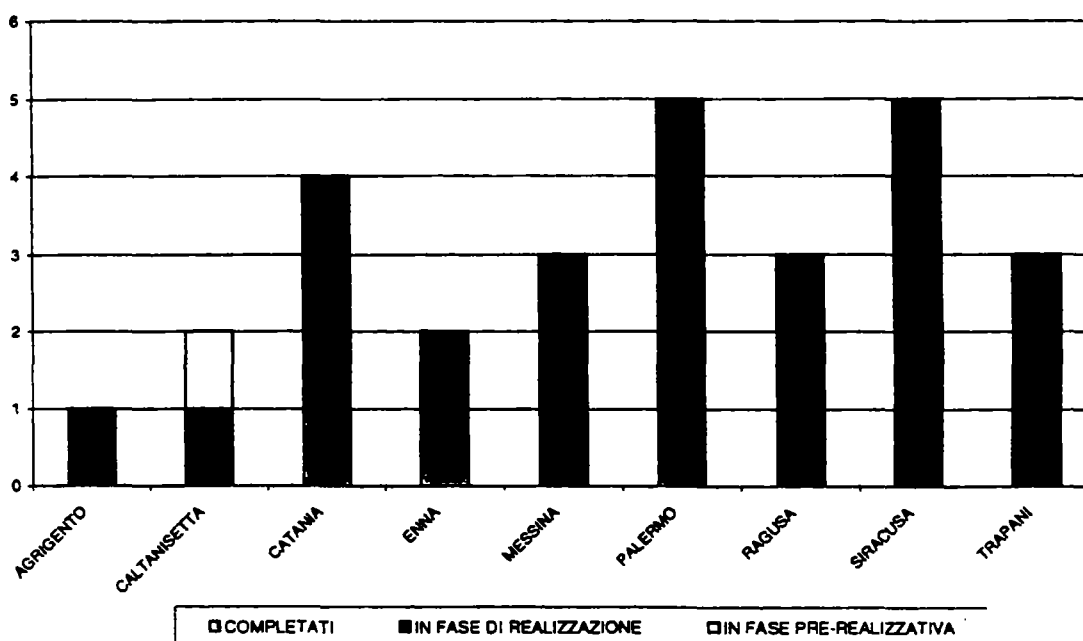


Grafico A 2b - REGIONE SICILIA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


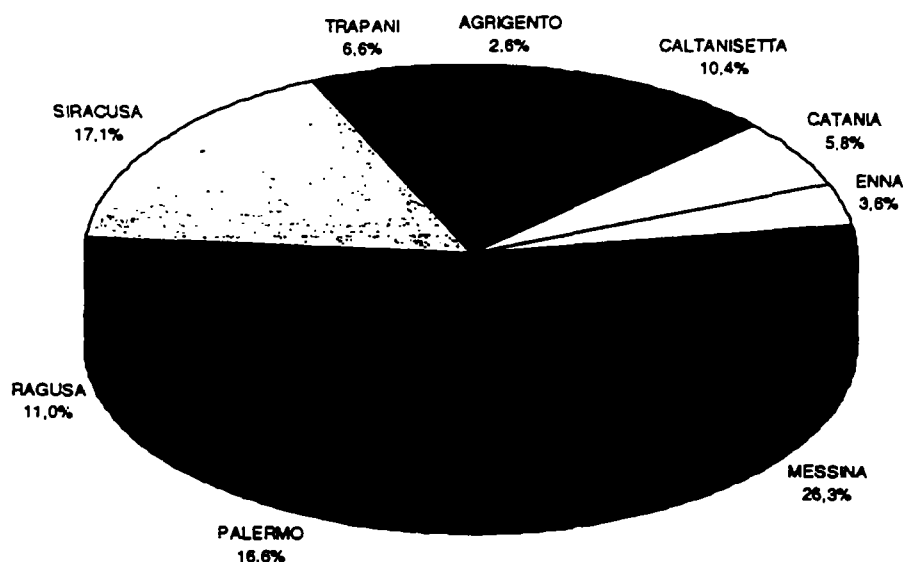


Grafico A 3 - REGIONE SICILIA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

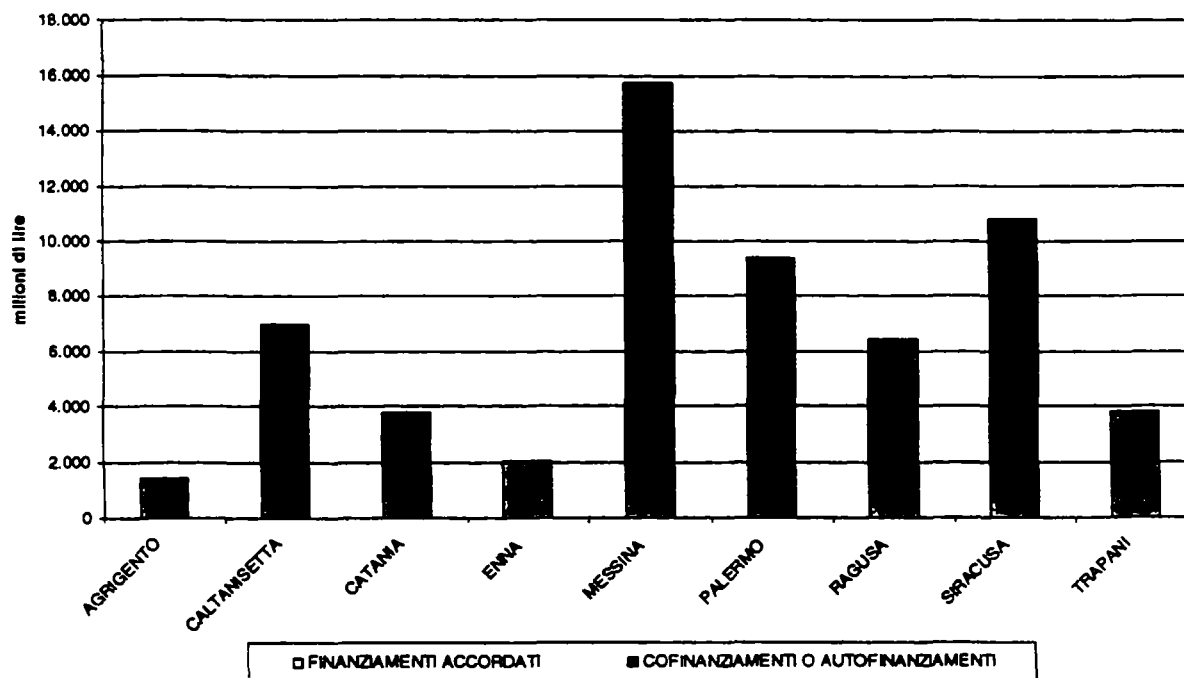

3.2.15. Regione Toscana

Grafico A1a - REGIONE TOSCANA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

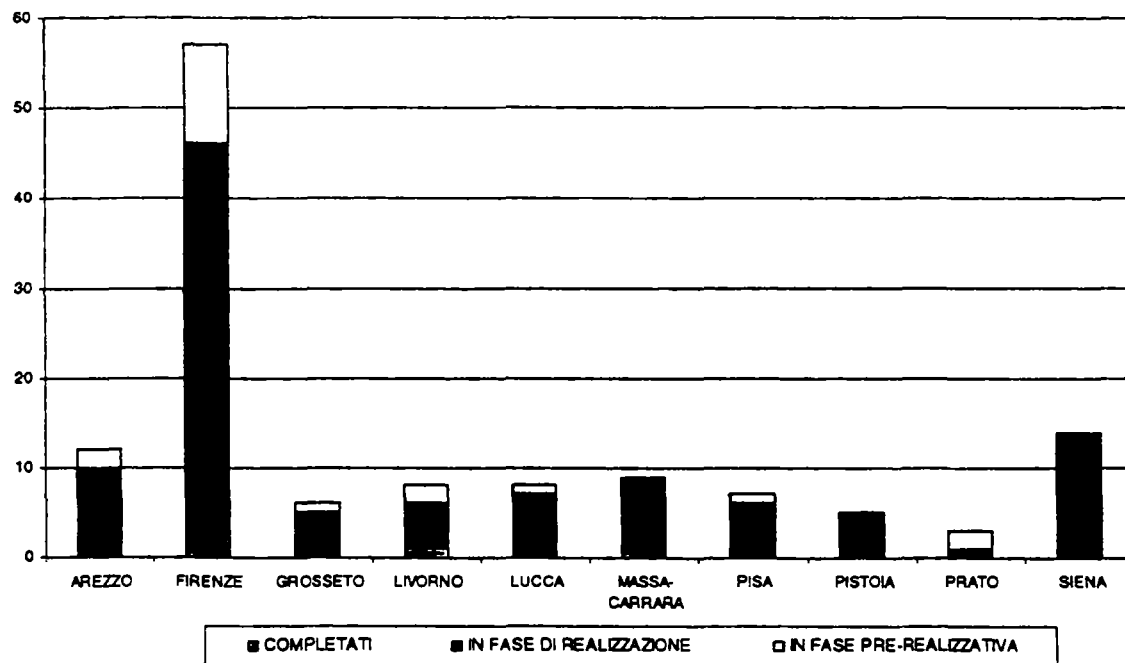


Grafico A2b - REGIONE TOSCANA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


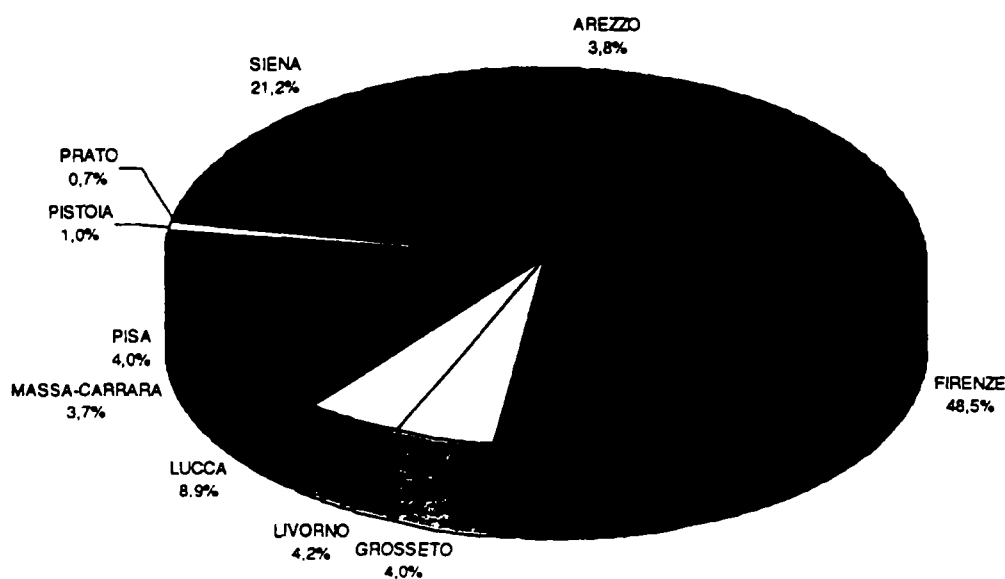


Grafico A 3 - REGIONE TOSCANA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

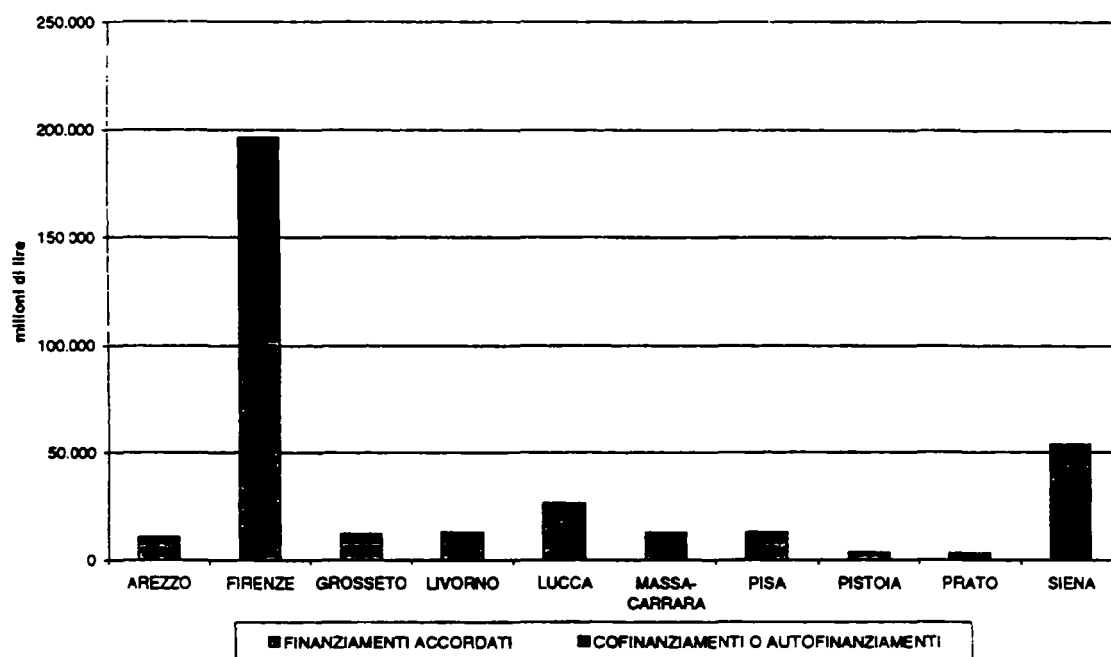

3.2.16. Regione Trentino Alto Adige

Grafico A1a - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

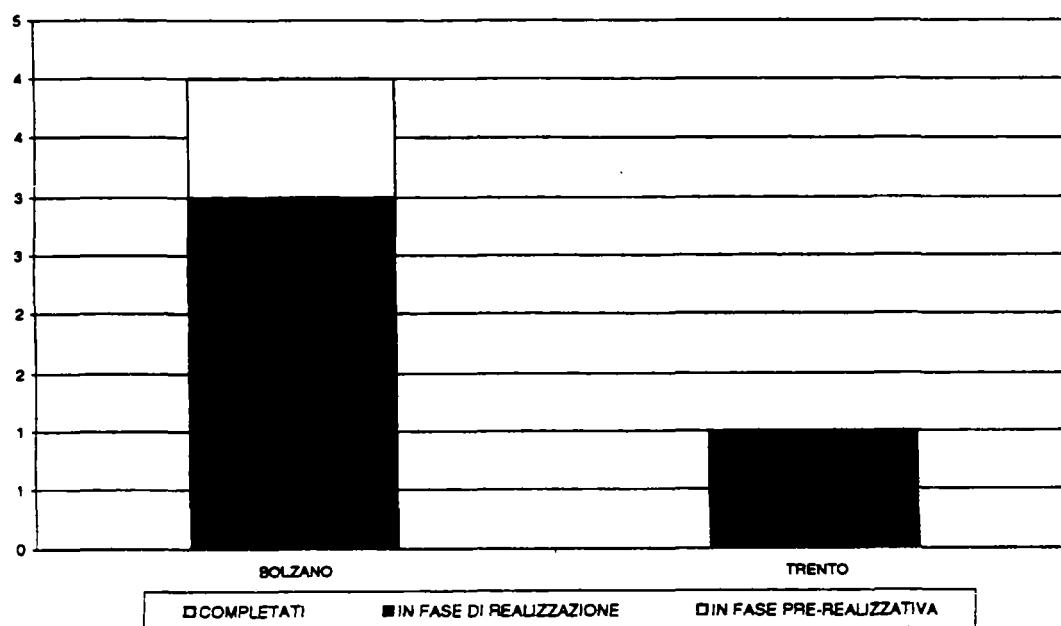


Grafico A 2b - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA





Grafico A 3 - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

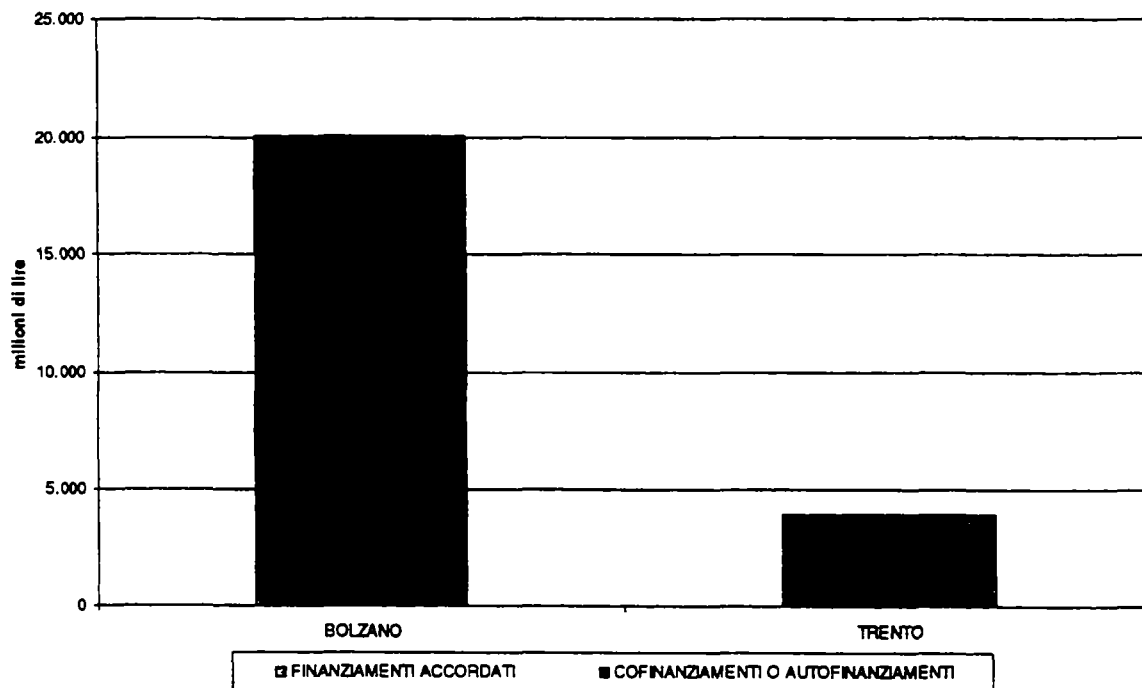

3.2.17. Regione Umbria

Grafico A1a - REGIONE UMBRIA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

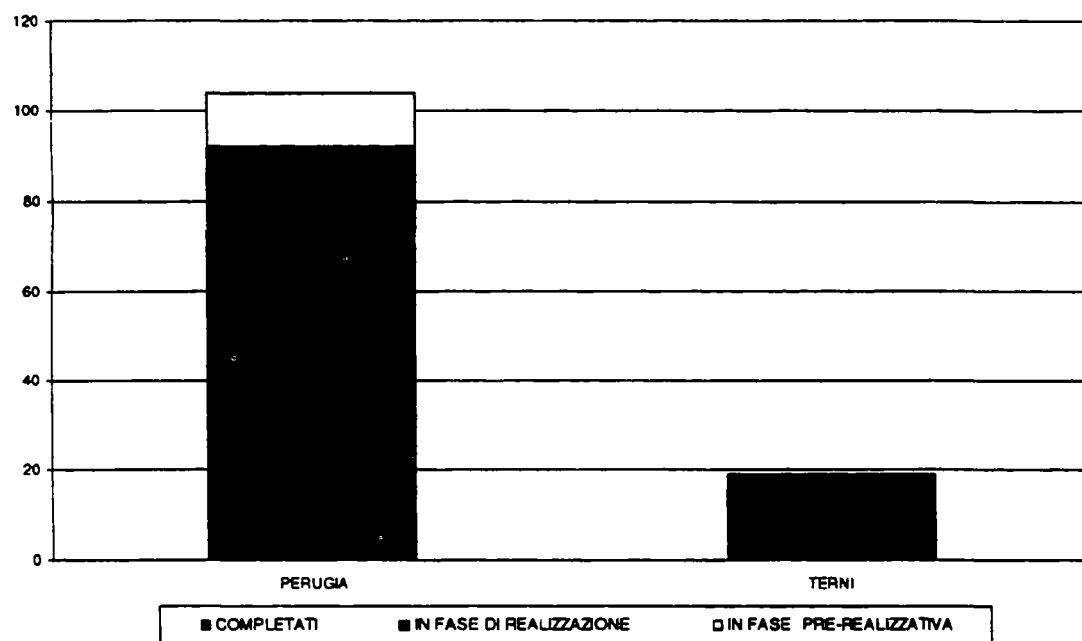


Grafico A 2b - REGIONE UMBRIA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA


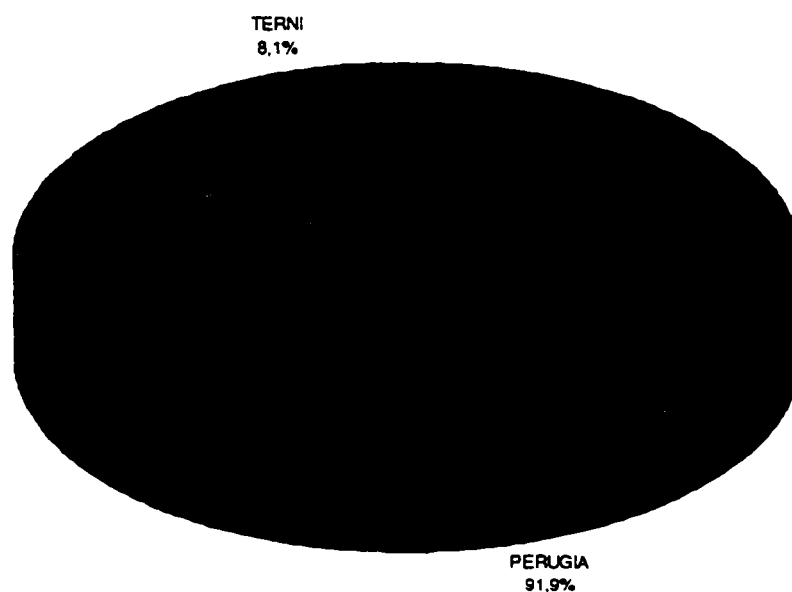


Grafico A 3 - REGIONE UMBRIA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

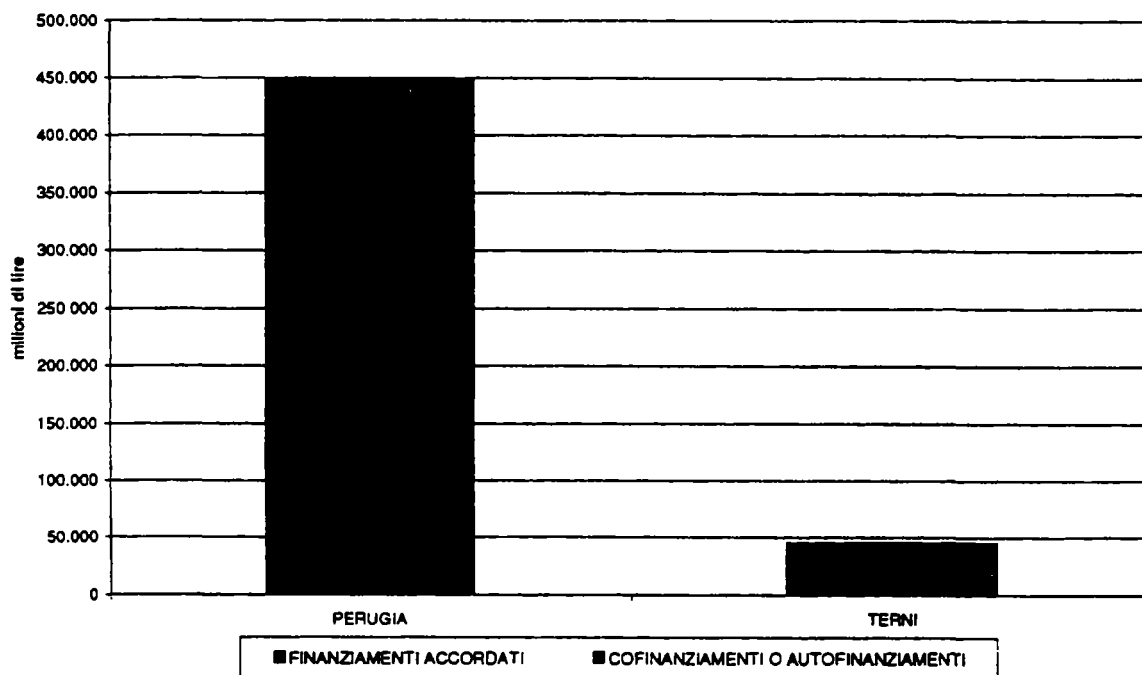

3.2.18. Regione Valle d'Aosta

Grafico A1a - REGIONE VALLE D'AOSTA
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

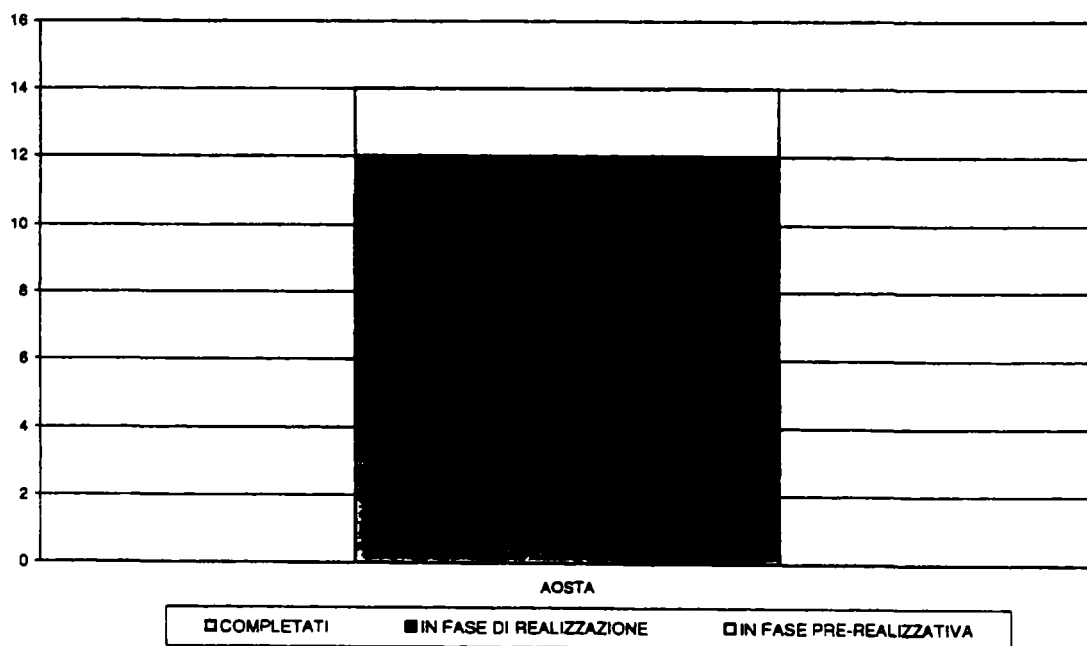


Grafico A 2b - REGIONE VALLE D'AOSTA
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA





Grafico A 3 - REGIONE VALLE D'AOSTA
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

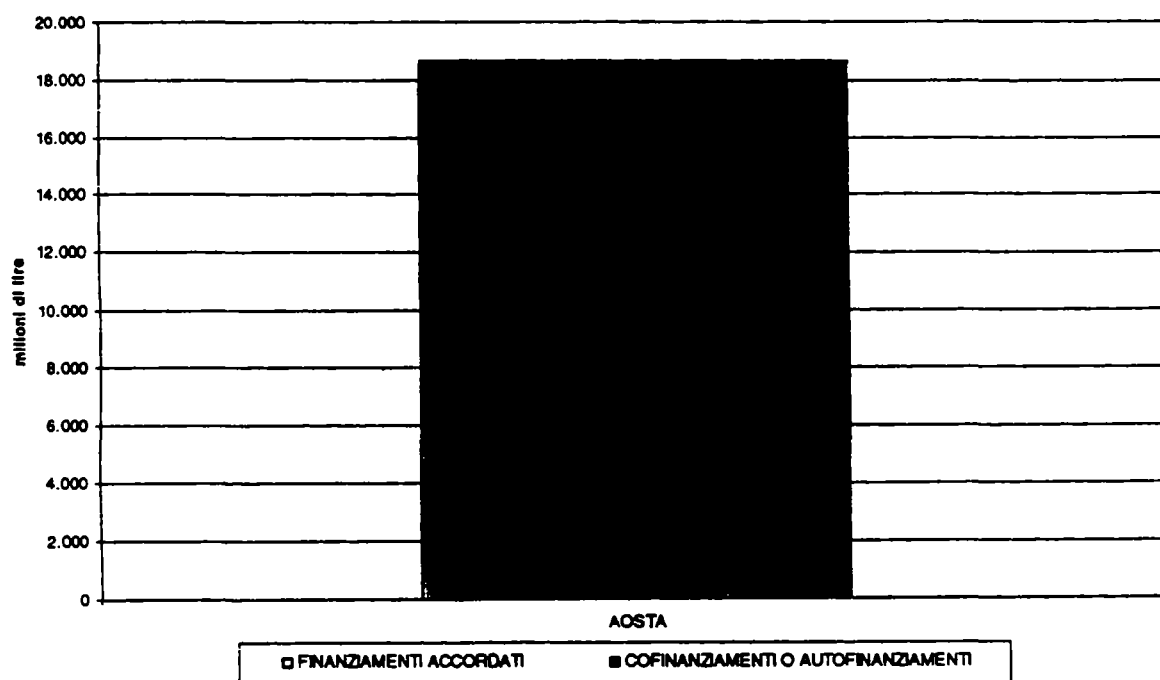

3.2.19. Regione Veneto

Grafico A1a - REGIONE VENETO
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

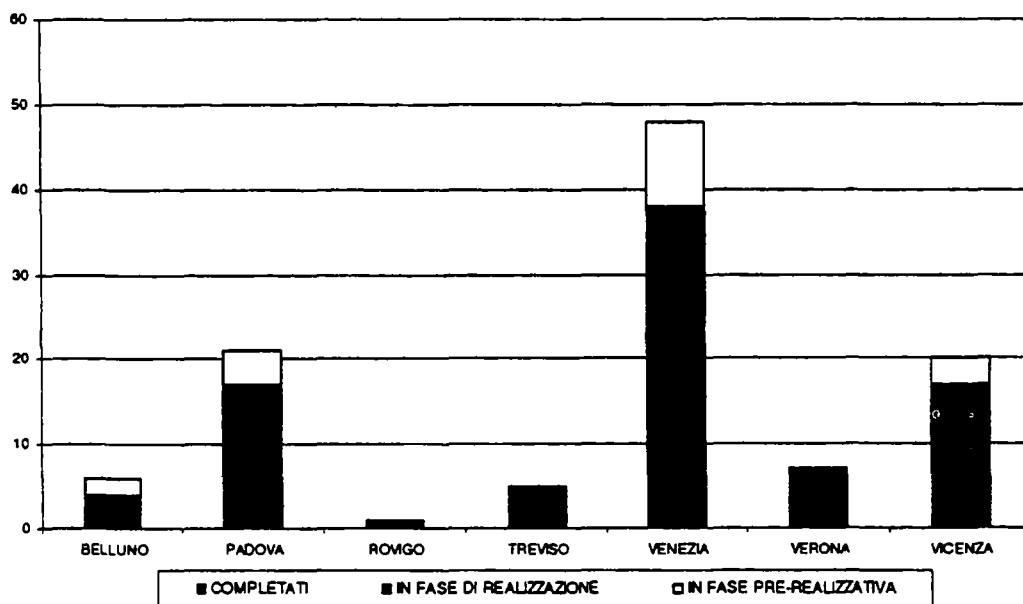


Grafico A 2b - REGIONE VENETO
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI
PER PROVINCIA



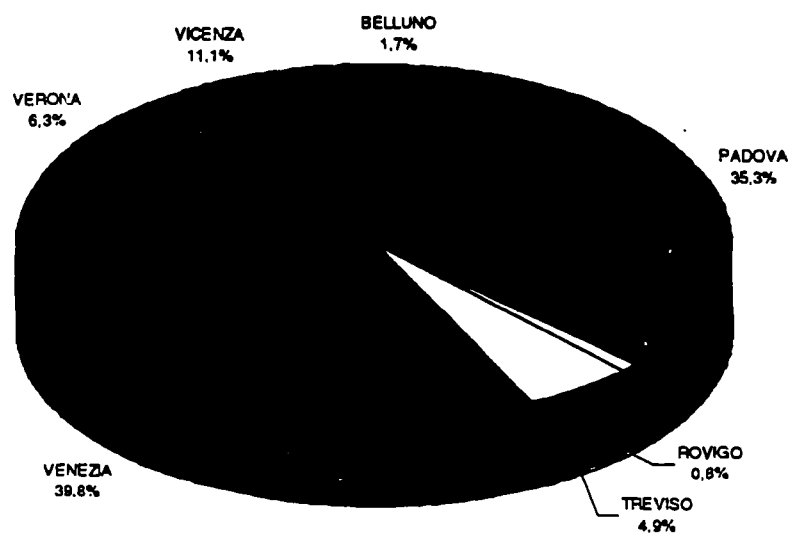


Grafico A 3 - REGIONE VENETO
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER PROVINCIA

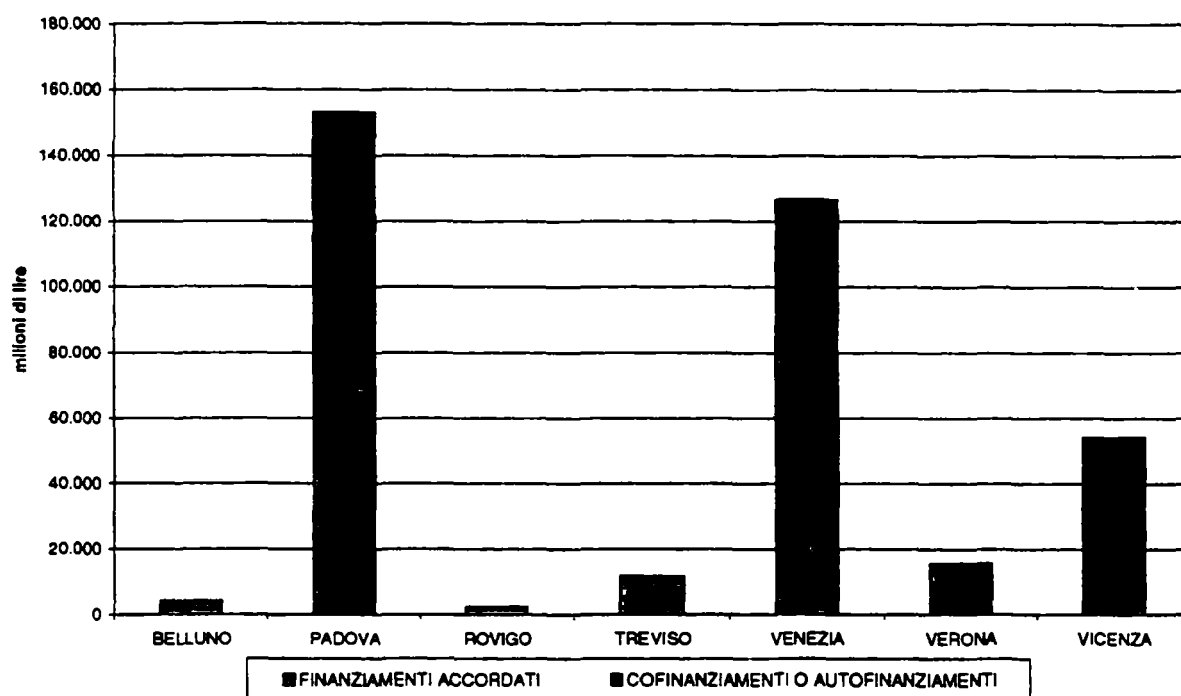

3.3. Totali regioni d'Italia al I° trimestre 1999

Grafico A 1a
NUMERO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER REGIONE (L. 270/97)

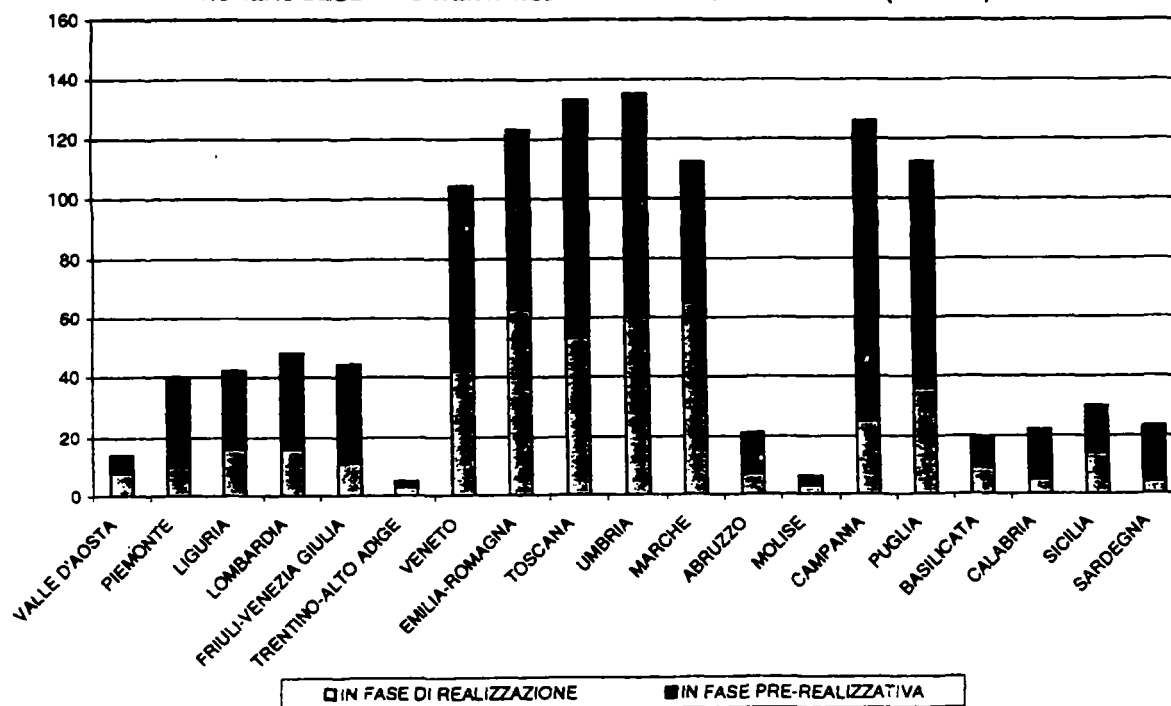

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

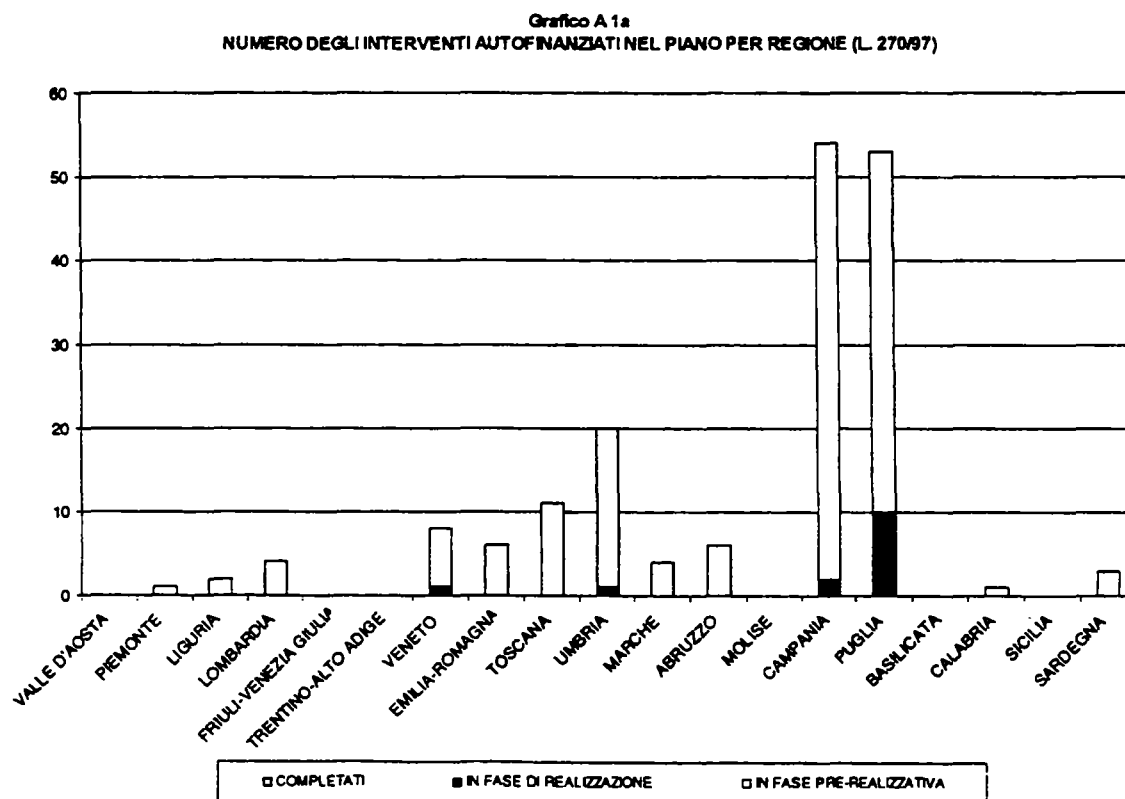
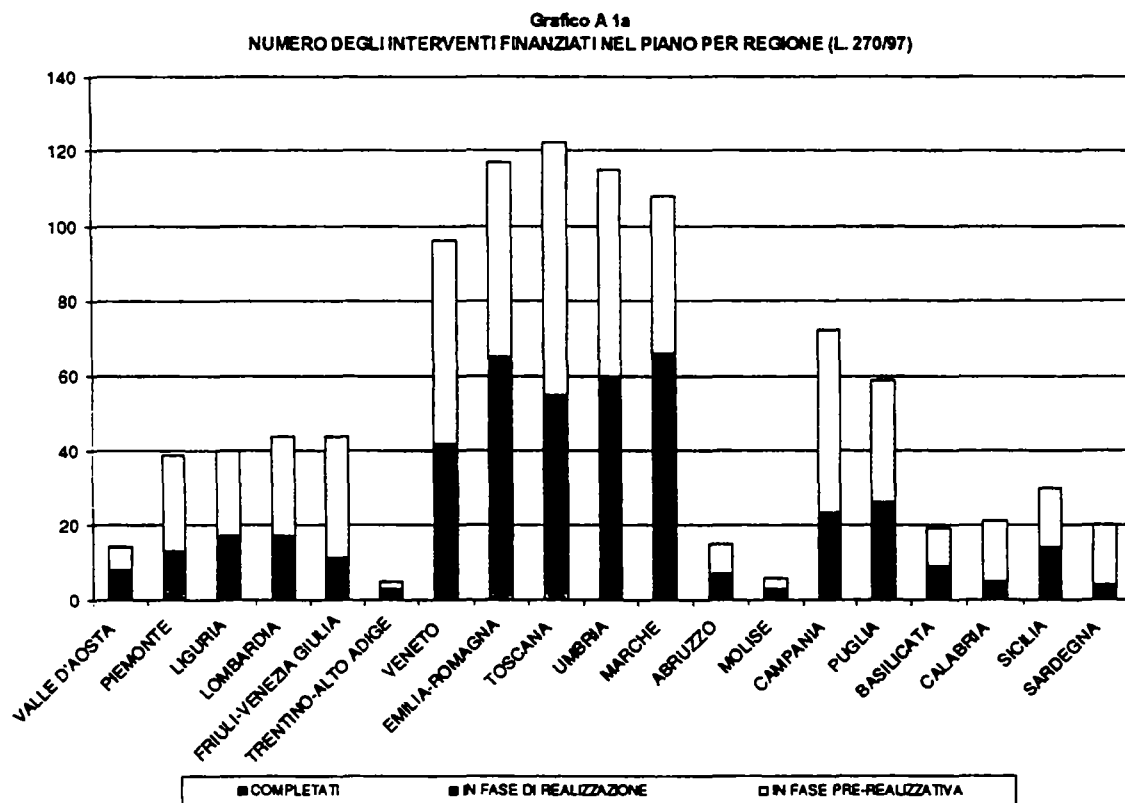


Grafico A 2b
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER REGIONE (L. 270/97)




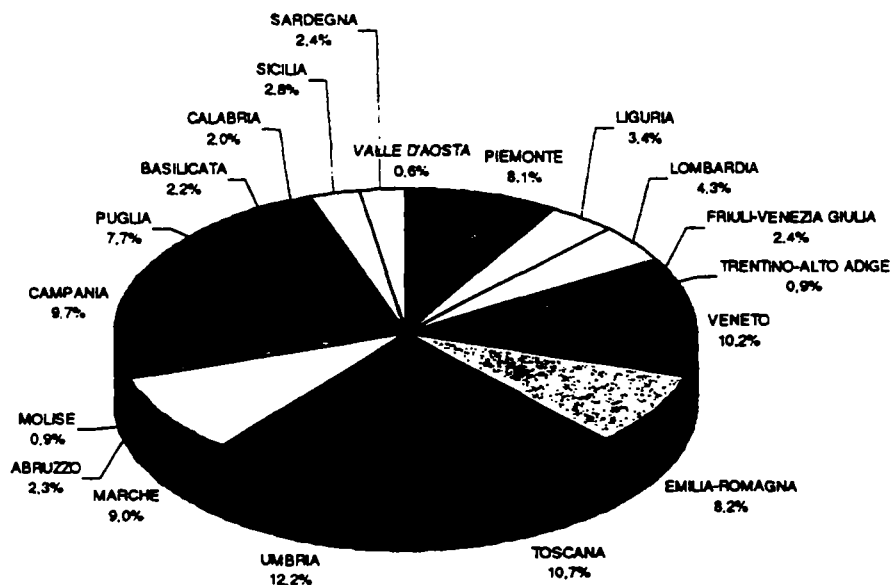


Grafico A 3
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER REGIONE (L. 270/97)

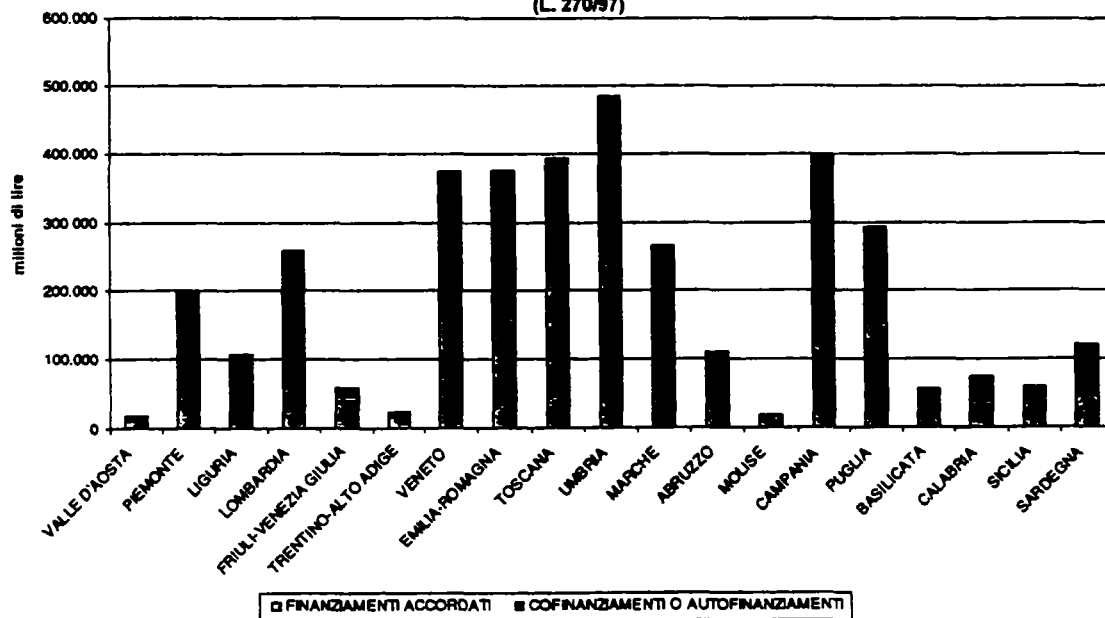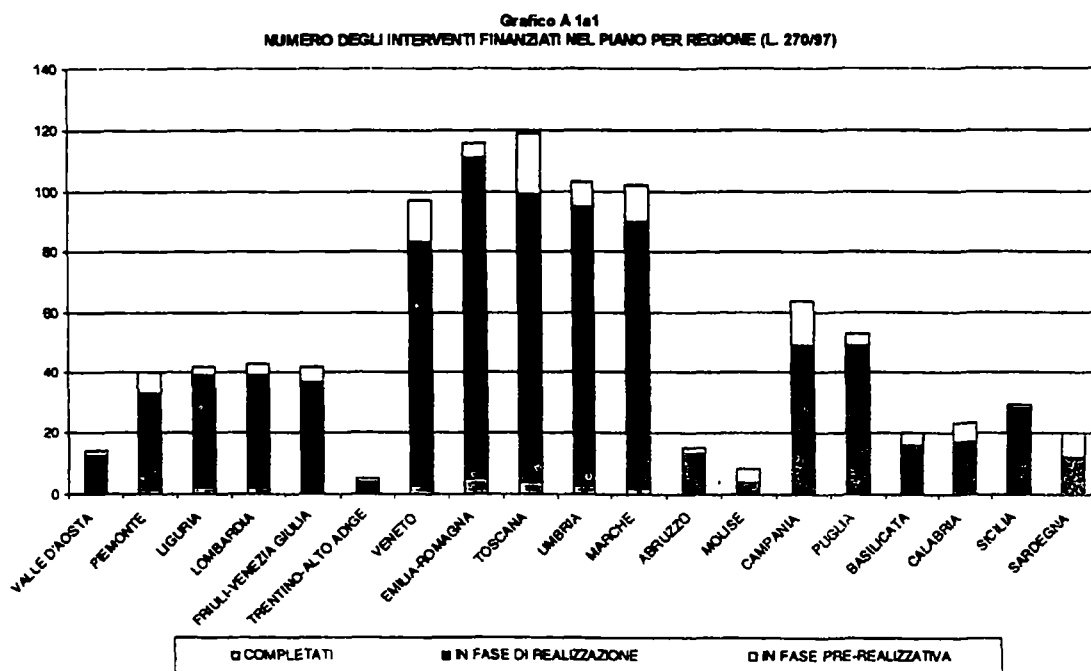

3.4. Totali regioni d'Italia al II° trimestre 1999

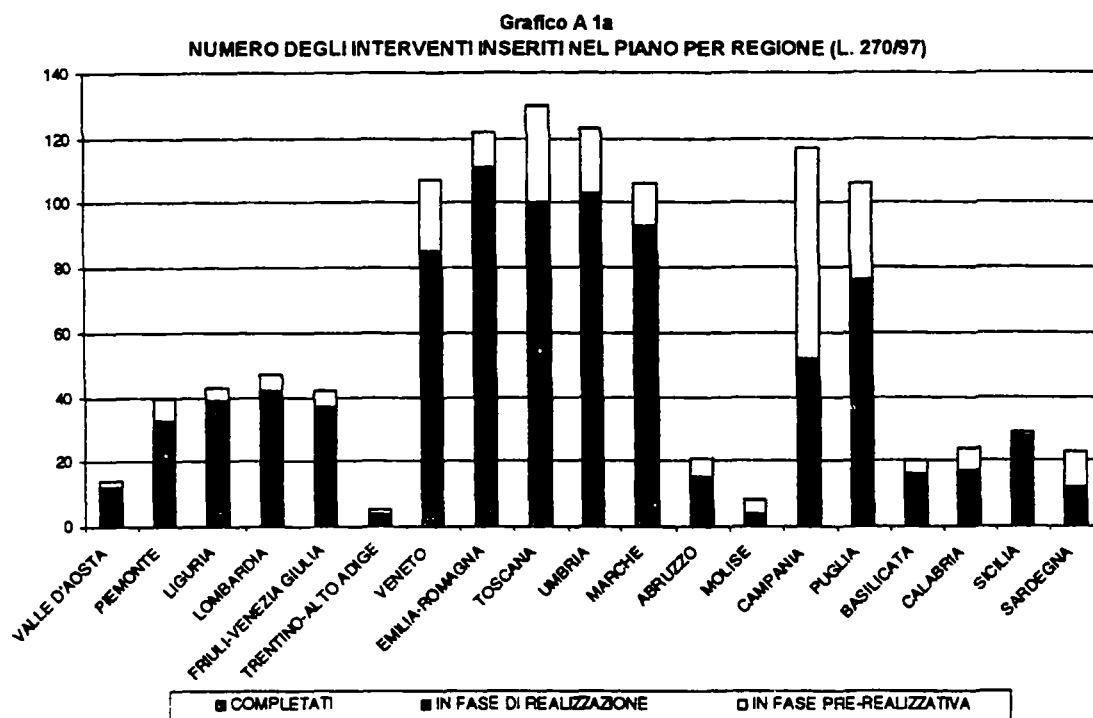

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



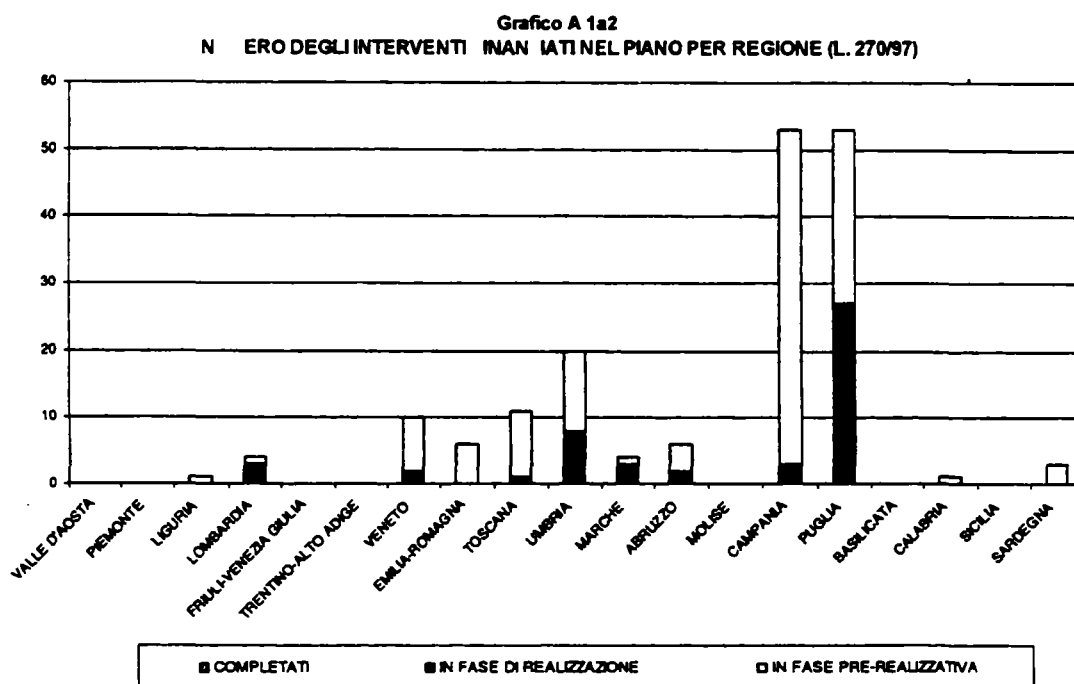


Grafico A 2b
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER REGIONE (L. 270/97)

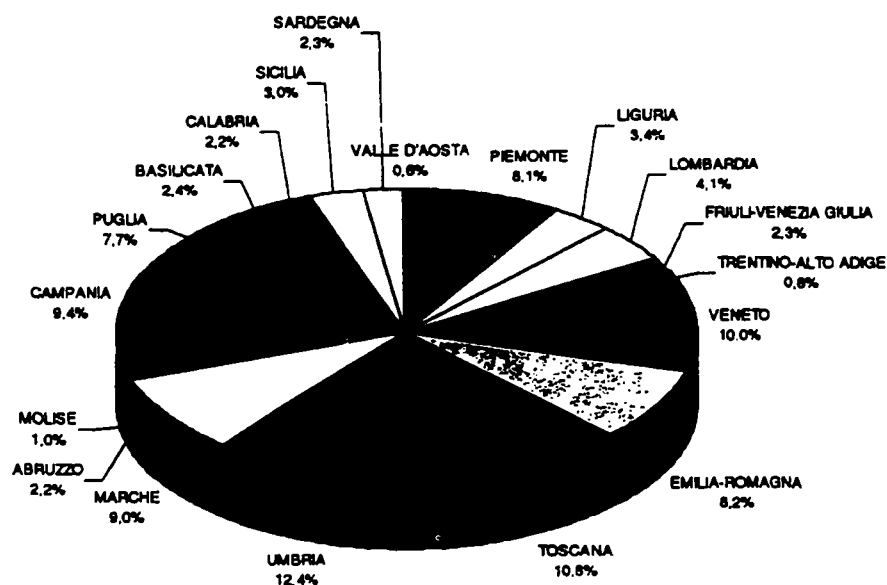

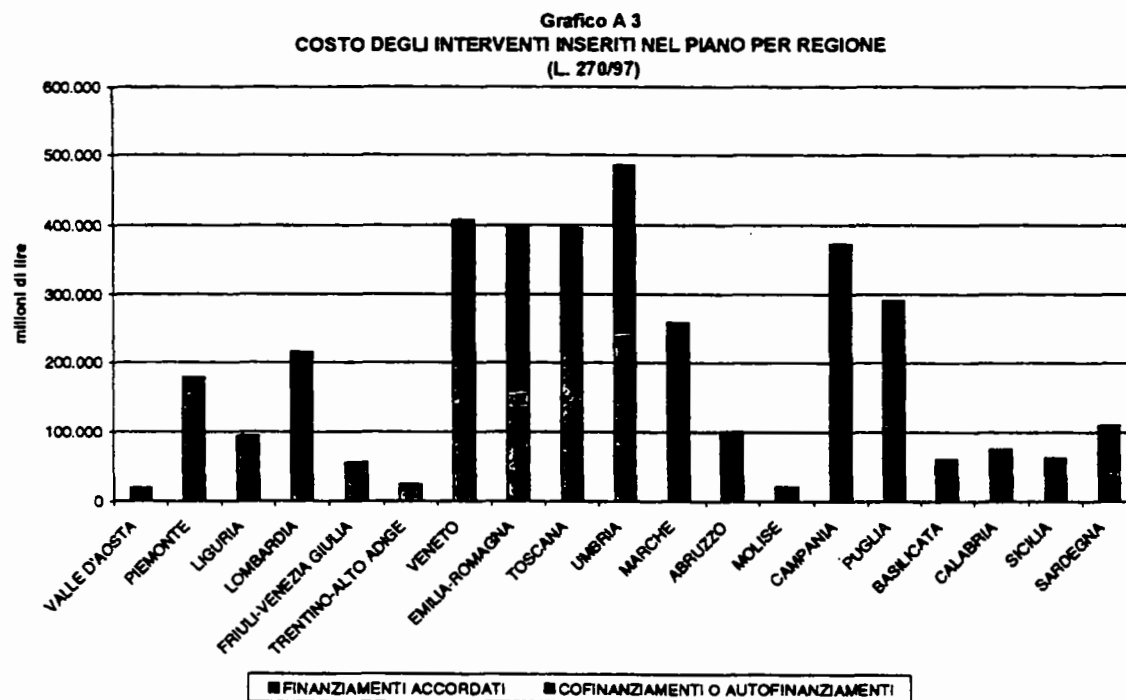

3.5. Totali regioni d'Italia al 30 settembre 1999

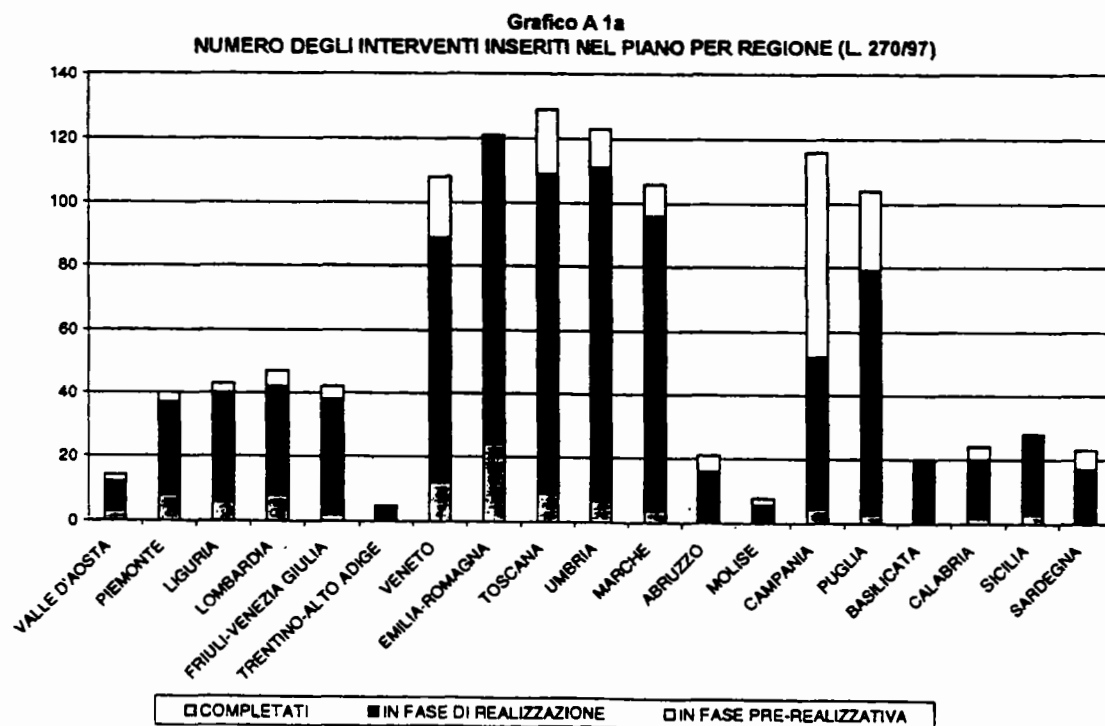


Grafico A 2b
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER REGIONE (L. 270/97)


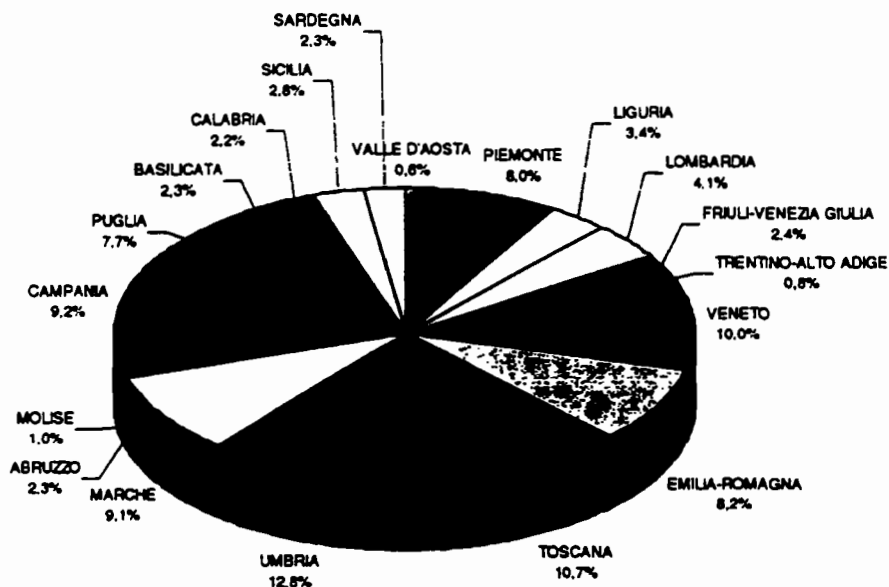


Grafico A 3
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER REGIONE (L. 270/97)

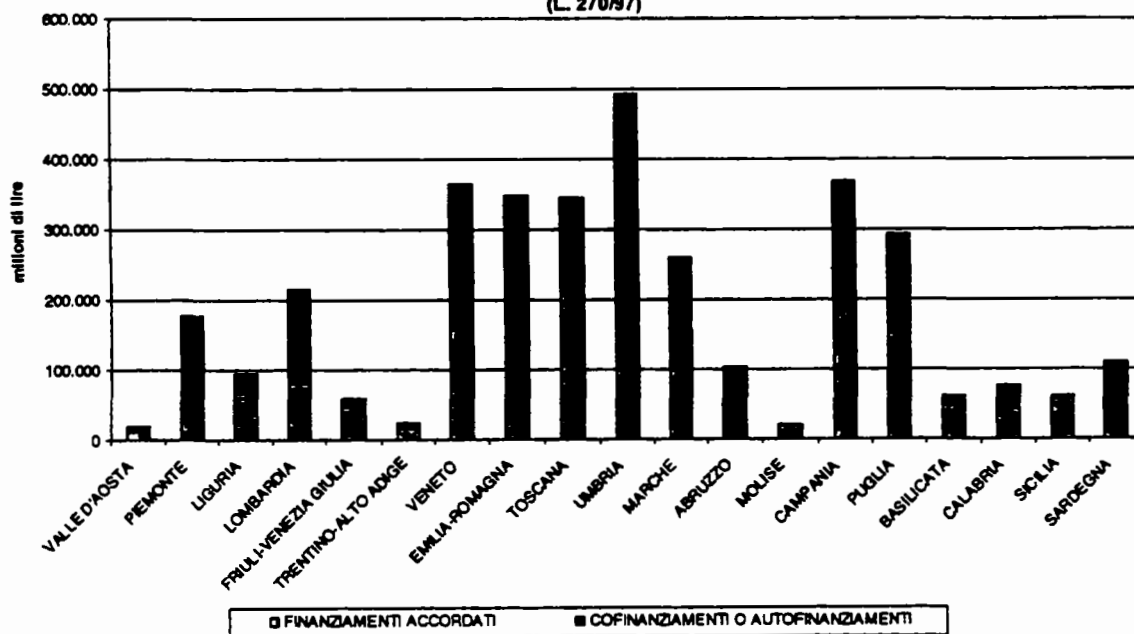

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Grafico A 2b
PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI PER REGIONE (L. 270/97)


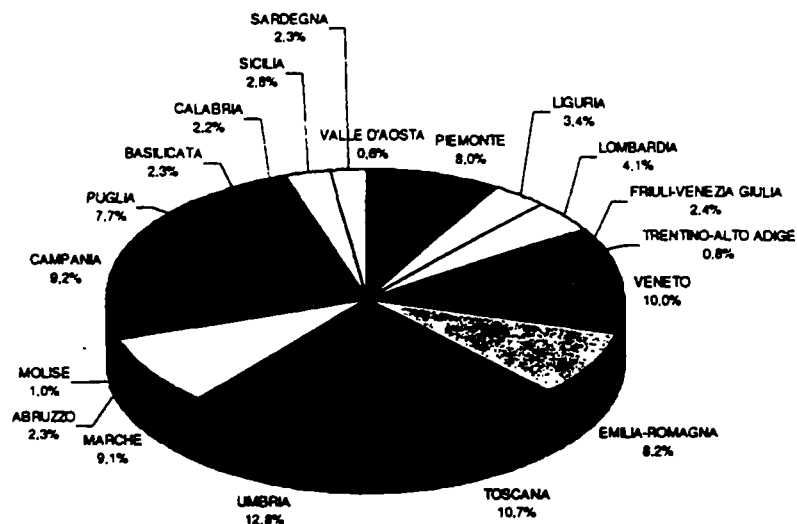


Grafico A 3
COSTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO PER REGIONE
(L. 270/97)

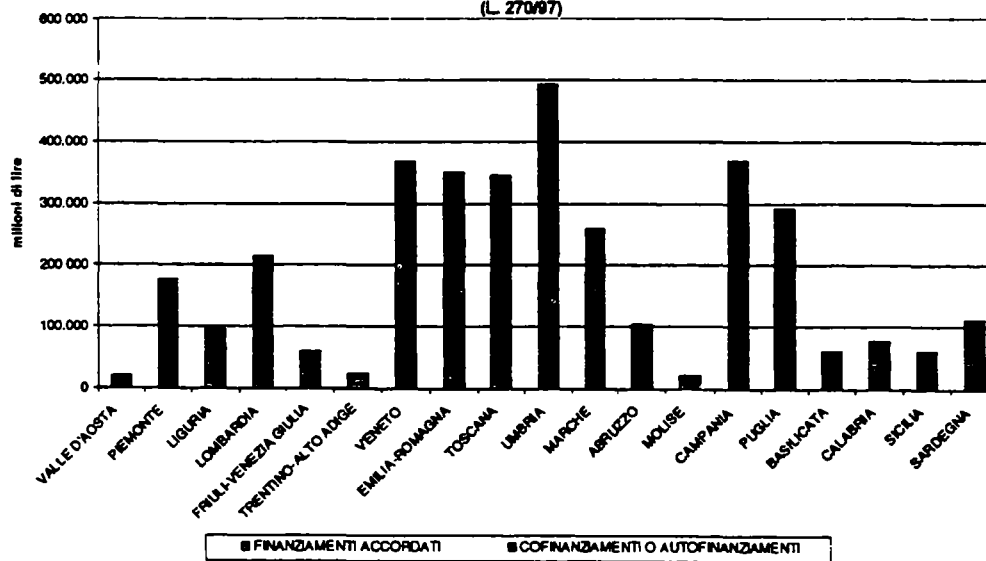

3.6. Lo stato di attuazione per singolo intervento (istogrammi)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi[illegible]

[illegible]

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codice	Regione	Prov.	Comune di appartenenza	Titolo dell'intervento	Rilevanti finanziarie (in milioni)			Pos. dell'opera									
					Costo stimato	Finanze Attribuite	Altre fonti	Intervento	Problema	Problema	Problema	Problema	Problema	Problema	Problema	Problema	Problema
B	LAZIO	RM	Comune di Roma	restauro e recupero funzionale palazzo del podestà (1° lotto)	455	0	455	2000/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99
B	LAZIO	RM	Comune di Roma	restauro e recupero funzionale palazzo del podestà (2° lotto)	595	195	400	2000/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99
B	LAZIO	RM	Comune di Roma	restauro della chiesa di San Pietro al Monte e restaurazione di una cappella in stile rinascimentale e barocco (1° lotto)	305	150	155	2000/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99
B	LAZIO	RM	Comune di Roma	Lavori di restauro e consolidamento della facciata di S. Pietro (1° lotto)	2000	2000	0	2000/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99
B	LAZIO	RM	Comune di Roma	Lavori di restauro e consolidamento della facciata di S. Pietro (2° lotto)	1000	1000	0	2000/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99
B	LAZIO	RM	Comune di Roma	restauro conservativo e consolidamento strutturali facciata	355	355	0	2000/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99
B	LAZIO	RM	Comune di Roma	restauro delle mura del castello di San Sisto	800	500	300	2000/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99
B	LAZIO	RM	Comune di Roma	restauro delle mura del castello di San Sisto	752	752	0	2000/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99
B	LAZIO	RM	Comune di Roma	restauro della chiesa di S. Francesco	1221	915	306	2000/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99
B	LAZIO	RM	Comune di Roma	restauro delle facciate del palazzo	1430	1430	0	2000/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99
A	LAZIO	RM	Comune di Roma	restauro e consolidamento strutturali e rifiniture interne del palazzo	1050	1050	0	2000/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99
A	LAZIO	RM	Comune di Roma	restauro e consolidamento strutturali e rifiniture interne del palazzo	1643	1643	0	2000/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99
A	LAZIO	RM	Comune di Roma	restauro e consolidamento strutturali e rifiniture interne del palazzo	2796	2796	412	2000/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99	1100/99

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

FASI PRELIMINARI DELL'ATTUAZIONE									
LAVORI									
FASI FINALI DELL'ATTUAZIONE									
SITUAZIONE INIZIALE									
Settore	Regione	Comune	Provincia	Comune di riferimento	Titolo dell'intervento	Supporto beneficiario	Costo stimato	Finanziamento	Altre fonti finanziarie
A	14881	414	AA/04/AT	148	Asquid	Interventi riguardanti il sistema di grandi parcheggi anti a Grandi Eventi l'accesso dei pedonali ed asquid ad alta velocità parcheggio di dimensioni lungo la strada n. 322	300	290	10
A	14881	075	AA/04/AT	148	Asquid	Interventi riguardanti il sistema di grandi parcheggi anti a Grandi Eventi l'accesso dei pedonali ed asquid ad alta velocità parcheggio di dimensioni lungo la strada n. 322	400	400	10
A	14881	476	AA/04/AT	148	Asquid	Interventi riguardanti il sistema di grandi parcheggi anti a Grandi Eventi l'accesso dei pedonali ed asquid ad alta velocità parcheggio di dimensioni lungo la strada n. 322	642	632	10
A	14881	477	AA/04/AT	148	Asquid	Interventi riguardanti il sistema di grandi parcheggi anti a Grandi Eventi l'accesso dei pedonali ed asquid ad alta velocità parcheggio di dimensioni lungo la strada n. 322	760	750	10
A	14881	478	AA/04/AT	148	Asquid	Interventi riguardanti il sistema di grandi parcheggi anti a Grandi Eventi l'accesso dei pedonali ed asquid ad alta velocità parcheggio di dimensioni lungo la strada n. 322	279	269	10
A	14881	479	AA/04/AT	148	Asquid	Interventi riguardanti il sistema di grandi parcheggi anti a Grandi Eventi l'accesso dei pedonali ed asquid ad alta velocità parcheggio di dimensioni lungo la strada n. 322	1025	1015	10
R	14881	484	AA/04/AT	148	Asquid	Interventi riguardanti il sistema di grandi parcheggi anti a Grandi Eventi l'accesso dei pedonali ed asquid ad alta velocità parcheggio di dimensioni lungo la strada n. 322	1659	1554	105
A	14881	1544	AA/04/AT	148	Asquid	Interventi riguardanti il sistema di grandi parcheggi anti a Grandi Eventi l'accesso dei pedonali ed asquid ad alta velocità parcheggio di dimensioni lungo la strada n. 322	549	539	10
R	14881	1544	AA/04/AT	148	Asquid	Interventi riguardanti il sistema di grandi parcheggi anti a Grandi Eventi l'accesso dei pedonali ed asquid ad alta velocità parcheggio di dimensioni lungo la strada n. 322	850	830	0
A	14881	1676	AA/04/AT	148	Asquid	Interventi riguardanti il sistema di grandi parcheggi anti a Grandi Eventi l'accesso dei pedonali ed asquid ad alta velocità parcheggio di dimensioni lungo la strada n. 322	2180	1980	200
A	14881	1677	AA/04/AT	148	Asquid	Interventi riguardanti il sistema di grandi parcheggi anti a Grandi Eventi l'accesso dei pedonali ed asquid ad alta velocità parcheggio di dimensioni lungo la strada n. 322	977	680	247
R	14881	1683	AA/04/AT	148	Asquid	Interventi riguardanti il sistema di grandi parcheggi anti a Grandi Eventi l'accesso dei pedonali ed asquid ad alta velocità parcheggio di dimensioni lungo la strada n. 322	1721	1540	180
R	14881	1683	AA/04/AT	148	Asquid	Interventi riguardanti il sistema di grandi parcheggi anti a Grandi Eventi l'accesso dei pedonali ed asquid ad alta velocità parcheggio di dimensioni lungo la strada n. 322	580	560	200

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codice	Regione	Prov.	L.R. n.	Comune di localizzazione	Titolo dell'intervento	Il Parlamento esprime il suo giudizio sull'intervento				Riassunto statistico (in milioni)		Fasi dell'attuazione											
N	LOMBIA	3472	AC/1140	GE	Genova	restauri massicci a valorizzazione del complesso costituito dalla cattedrale e dal chiostro di San Lorenzo	Scoperta del sito	4472	3472	1000	2400000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	LOMBIA	2572	AC/2614M	SV	Biadene	realizzazione del nuovo dissenso nel complesso monumentale della cattedrale di Biadene	Scoperta del sito	508	508	0	2400000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	LOMBIA	5683	AA/1301F	SP	Carrara	restauri di un tratto dell'area urbana che si trova compresa tra la cattedrale e la chiesa di San Lorenzo	Scoperta del sito	308	258	50	2400000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R	LOMBIA	5683	AC/1310F	SP	Carrara	restauri del fabbricato del chiostro e dei resti dell'area urbana che si trova compresa tra la cattedrale e la chiesa di San Lorenzo	Scoperta del sito	1108	1008	0	2400000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	LOMBIA	2993	AC/2614M	NV	Albenga	restauri e riqualificazione della cattedrale di San Michele e recupero del palazzo dei conti di Albenga	Scoperta del sito	867	767	100	2400000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S	LOMBIA	4995	AC/2614M	SV	Albenga	confezionamento del restauro del fabbricato polveristico di Albenga abbandonato dalle barriere	Scoperta del sito	138	298	40	2400000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R	LOMBIA	4997	AC/2614M	SV	Cervate	restauri e riqualificazione della casa di "quindici" e della casa di "quindici" e della casa di "quindici"	Scoperta del sito	1380	1080	250	2400000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R	LOMBIA	4998	AC/2614M	SV	Albenga	restauri e riqualificazione del complesso monumentale della cattedrale di Albenga	Scoperta del sito	1248	1148	100	2400000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	LOMBIA	5214	AA/1140	GE	Genova	restauri e riqualificazione del complesso monumentale della cattedrale e del chiostro di San Lorenzo	Scoperta del sito	1429	1329	250	2400000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	LOMBIA	5215	AA/1140	GE	Genova	restauri e riqualificazione del complesso monumentale della cattedrale e del chiostro di San Lorenzo	Scoperta del sito	1847	1747	400	2400000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R	LOMBIA	5323	AC/121000	NV	Montebelluna	restauri e riqualificazione del complesso monumentale della cattedrale e del chiostro di San Lorenzo	Scoperta del sito	1759	1659	470	2400000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	LOMBIA	5656	AC/121000	SV	La Spezia	restauri e riqualificazione del complesso monumentale della cattedrale e del chiostro di San Lorenzo	Scoperta del sito	11196	10196	2915	2400000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	LOMBIA	5311	AC/121000	SV	Genova	restauri e riqualificazione del complesso monumentale della cattedrale e del chiostro di San Lorenzo	Scoperta del sito	933	833	0	2400000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Fiumi

[illegible]

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

[illegible]

Ufficio Rivista Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

União Rumos Capital e Cidadania

INSTRUMENTAZIONE E ATTIVAZIONE										INSTRUMENTAZIONE E ATTIVAZIONE										INSTRUMENTAZIONE E ATTIVAZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Codice	Regione	Prov.	V. CODE	P. CODICE	Comune di riferimento	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Bilancio di previsione (in milioni)		Posti dell'istituzione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								Comune di riferimento	Titolo dell'intervento	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione	Posti dell'istituzione

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

[illegible]

Offick, Roma Capitale e Grandi Eventi[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Regione	Codice	Prov.	Titolo dell'interrogazione	Soggetto Interpellato	Conte Altomare	Data	Periodo di consultazione									
							Altre Interpellanze	Interpellanze	Interpellanze	Interpellanze	Interpellanze	Interpellanze	Interpellanze	Interpellanze	Interpellanze	Interpellanze
LA	MARCHE	6509	ACT14AD	MAC	Persepolis/Intesa	requiere di un governo europeo di unità	interpellato di A. Giovanni	400	400	0	21/06/99	09/07/99	27	01	30	60
LA	MARCHE	6508	ACT14AD	MAC	Comitato	requiere un'idea e i termini della riforma di un progetto	interpellato di A. Giovanni	1000	1000	0	21/06/99	09/07/99	30	01	30	60
LA	MARCHE	6600	AA20AD	AP	Santa Maria in	interpellato Regionale della ex chiesa delle monache e dell'area per la rinascita	interpellato di A. Giovanni	1317	987	30	18/06/99	09/07/99	63	01	30	60
LA	MARCHE	6609	ACT14AD	AP	San Benedetto del	monastero monastico e l'istituzione di un museo di arte e di storia	interpellato di A. Giovanni	1315	300	400	18/06/99	09/07/99	30	01	30	60
LA	MARCHE	6601	ACT14AD	AN	Lazio	monastero delle ex monache	interpellato di A. Giovanni	600	80	600	18/06/99	09/07/99	30	01	30	60
LA	MARCHE	6602	ACT14AD	AN	San Benedetto del	interpellato Regionale dell'istituto e Giovanni per la creazione di un museo di arte e di storia	interpellato di A. Giovanni	1317	700	700	18/06/99	09/07/99	30	01	30	60
LA	MARCHE	6603	ACT14AD	AN	Comitato	interpellato di A. Giovanni	interpellato di A. Giovanni	1317	700	700	18/06/99	09/07/99	30	01	30	60
LA	MARCHE	6707	ACT14AD	AN	Lazio	interpellato di A. Giovanni	interpellato di A. Giovanni	1317	700	700	18/06/99	09/07/99	30	01	30	60
LA	MARCHE	6775	ACT14AD	AN	Lazio	interpellato di A. Giovanni	interpellato di A. Giovanni	1317	700	700	18/06/99	09/07/99	30	01	30	60
LA	MARCHE	6808	AA13AD	AN	Lazio	interpellato di A. Giovanni	interpellato di A. Giovanni	1317	700	700	18/06/99	09/07/99	30	01	30	60
LA	MARCHE	6821	AA20AD	AN	Lazio	interpellato di A. Giovanni	interpellato di A. Giovanni	1317	700	700	18/06/99	09/07/99	30	01	30	60
LA	MARCHE	6828	AA20AD	AN	Lazio	interpellato di A. Giovanni	interpellato di A. Giovanni	1317	700	700	18/06/99	09/07/99	30	01	30	60
LA	MARCHE	6908	AA20AD	AN	Lazio	interpellato di A. Giovanni	interpellato di A. Giovanni	1317	700	700	18/06/99	09/07/99	30	01	30	60
LA	MARCHE	6909	AA20AD	AN	Lazio	interpellato di A. Giovanni	interpellato di A. Giovanni	1317	700	700	18/06/99	09/07/99	30	01	30	60

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi[illegible]

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

FASI PROGRAMMATE DELL'ATTUAZIONE										FASI REALIZZATE DELL'ATTUAZIONE										SITUAZIONE PRESENTALE									
Regioni	Pro	URGE	Previsione	Umanità di Iniziativa	Titolo dell'intervento	Supporto beneficiario	Finanziaria Attribuita	Area Beni Finanziari	Data	Indicatore	Programma	Progetto	Conferenza	Progetto	Indicatore	Verbale	Indicatore	Verbale	Indicatore	Verbale									
A	19481A	200	AA11EAM	11	Credito	realizzazione di interventi di recupero ambientale al percorso guidato in estate	centro di credito	681	0	21/06/99																			
B	19481A	200	AD11LAM	10	Finanziaria	realizzazione e ristrutturazione della chiesa di S. Michele della strada più per attività culturale	parrocchia visit. governo locale	1061	846	23/06/99																			
B	19481A	200	AD11LAM	11	Finanziaria	realizzazione e ristrutturazione e rinnovo del ministero a livello della commissione	ministero e ministero della commissione	872	872	0	21/06/99																		
B	19481A	574	BA25/AM	14	San Giovanni retinale	ampliamento di un albergo esistente per la ricettività a lungo corso	hotel villa edon s.r.l.	1828	0	1828	28/06/99																		
A	19481A	876	BA25/AL	14	San Giovanni retinale	in via dell'ortica per più alloggi e servizio di servizio a livello con il servizio medico con	funzionamento senza rete	9940	0	9940	7/06/99																		
B	19481A	870	AC25/AL	14	San Giovanni retinale	corso di accoglienza per il coro	provincia di Reggio Emilia e provincia di Reggio Emilia	15918	5134	10784	21/06/99																		
A	19481A	899	AA25/AM	13	San Giovanni retinale	servizio di accoglienza per la cura	centro di san Giovanni retinale	4573	0	4573	7/06/99																		
A	19481A	981	AA25/AM	14	San Giovanni retinale	protezione e ristrutturazione del coro	centro di san Giovanni retinale	9813	0	9813	28/06/99																		
A	19481A	985	AA25/AM	14	San Giovanni retinale	servizio di accoglienza per la cura	centro di san Giovanni retinale	1601	0	1601	28/06/99																		
B	19481A	930	BA25/AL	14	San Giovanni retinale	completamento e ristrutturazione di un albergo	d'albergo giuseppe	1263	0	1263	7/06/99																		
B	19481A	973	BA25/AM	14	San Giovanni retinale	albergo esistente	albergo nuova	904	0	904	28/06/99																		

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codice	Regione	Prov.	L. R. G. C.	Prestazioni	Titolo dell'intervento		Importi (Miliardi di lire)		Periodo di attuazione	
					Comune di destinazione	Titolo dell'intervento	Costo minimo	Costo massimo	Periodo di attuazione	Periodo di attuazione
R	SRV. LA	2623	AT. 2413/81	PA	Palermo	clandestinità e addebiatamento del collegio per le elezioni del 1981 (art. 10 del D.L. 15/1/81)	4471	4171	11	29/06/81
R	SRV. LA	3105	AT. 2613/81	PA	Catania	clandestinità e addebiatamento del collegio per le elezioni del 1981 (art. 10 del D.L. 15/1/81)	278	254	24	29/06/81
R	SRV. LA	4716	AT. 2613/81	CT	Catania	clandestinità e addebiatamento del collegio per le elezioni del 1981 (art. 10 del D.L. 15/1/81)	2350	2081	350	29/06/81
R	SRV. LA	1461	AT. 2413/81	PA	Palermo	clandestinità e addebiatamento del collegio per le elezioni del 1981 (art. 10 del D.L. 15/1/81)	1300	1450	50	29/06/81
R	SRV. LA	3313	AT. 2613/81	TP	Trapani	clandestinità e addebiatamento del collegio per le elezioni del 1981 (art. 10 del D.L. 15/1/81)	845	705	51	29/06/81
R	SRV. LA	4346	AT. 2613/81	CT	Catania	clandestinità e addebiatamento del collegio per le elezioni del 1981 (art. 10 del D.L. 15/1/81)	933	653	280	29/06/81
R	SRV. LA	4247	AT. 2613/81	AG	Agrigento	clandestinità e addebiatamento del collegio per le elezioni del 1981 (art. 10 del D.L. 15/1/81)	1463	1463	0	29/06/81
A	SRV. LA	4248	AT. 2613/81	RG	Ragusa	clandestinità e addebiatamento del collegio per le elezioni del 1981 (art. 10 del D.L. 15/1/81)	1150	1000	150	29/06/81
R	SRV. LA	4742	AT. 2613/81	PA	Palermo	clandestinità e addebiatamento del collegio per le elezioni del 1981 (art. 10 del D.L. 15/1/81)	1628	1628	0	29/06/81
R	SRV. LA	4254	AT. 2613/81	CT	Catania	clandestinità e addebiatamento del collegio per le elezioni del 1981 (art. 10 del D.L. 15/1/81)	4605	3821	844	21/06/81
R	SRV. LA	4747	AT. 2613/81	EN	Enna	clandestinità e addebiatamento del collegio per le elezioni del 1981 (art. 10 del D.L. 15/1/81)	1624	1619	25	29/06/81
R	SRV. LA	4973	AT. 2613/81	ME	Messina	clandestinità e addebiatamento del collegio per le elezioni del 1981 (art. 10 del D.L. 15/1/81)	1170	1070	50	22/06/81

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

[illegible]

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

[illegible]

Candidati			Riferimenti legislativi per segnalazioni dell'interlocutore			Riferimenti legislativi per la legge			Riferimenti legislativi per la legge			Riferimenti legislativi per la legge			Riferimenti legislativi per la legge			Riferimenti legislativi per la legge		
Nome	Partito	Indirizzo	Comune di appartenenza	Titolo dell'intervento	Argomento dell'intervento	Argomento dell'intervento	Argomento dell'intervento	Argomento dell'intervento	Argomento dell'intervento	Argomento dell'intervento	Argomento dell'intervento	Argomento dell'intervento	Argomento dell'intervento	Argomento dell'intervento	Argomento dell'intervento	Argomento dell'intervento	Argomento dell'intervento	Argomento dell'intervento	Argomento dell'intervento	Argomento dell'intervento
1	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
2	1982	1982	1982	1982	1982	1982	1982	1982	1982	1982	1982	1982	1982	1982	1982	1982	1982	1982	1982	1982
3	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
4	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
5	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985
6	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986
7	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987
8	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988
9	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989
10	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990
11	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991
12	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992
13	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
14	1994	1994	1994	1994	1994	1994	1994	1994	1994	1994	1994	1994	1994	1994	1994	1994	1994	1994	1994	1994
15	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
16	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
17	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997
18	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998
19	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999

[illegible]

Codice		Riferimenti progettuali ed oggetto dell'intervento			Bilancio (prevedibile per anno)			Per quest'anno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Regione	Prov.	Progetto	Comune di appartenenza	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo diretto	Importo Anticipato	Altre fonti	Data	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo</

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codice	Regione	Prov.	L. n.º	Titolo dell'intervento	Rilevanti (spese in milioni di lire)			Costi (in milioni di lire)											
					Spese per la ricerca	Spese per la progettazione	Spese per l'esecuzione	Costo di gestione	Costo di manutenzione	Costo di ammortamento	Costo di personale	Costo di materiali	Costo di energia	Costo di acqua	Costo di gas	Costo di rifiuti	Costo di trasporti	Costo di altri servizi	Costo di altri
R	TIROS/ANA	4978	AC/12/AM	CE	Quanto														
					Spese di ricerca	Spese per la progettazione	Spese per l'esecuzione	Costo di gestione	Costo di manutenzione	Costo di ammortamento	Costo di personale	Costo di materiali	Costo di energia	Costo di acqua	Costo di gas	Costo di rifiuti	Costo di trasporti	Costo di altri servizi	Costo di altri
R	TIROS/ANA	4979	BA/11/AM	PI	Finanze														
					Spese di ricerca	Spese per la progettazione	Spese per l'esecuzione	Costo di gestione	Costo di manutenzione	Costo di ammortamento	Costo di personale	Costo di materiali	Costo di energia	Costo di acqua	Costo di gas	Costo di rifiuti	Costo di trasporti	Costo di altri servizi	Costo di altri
R	TIROS/ANA	4999	AA/12/AM	VI	Caratteristiche														
					Spese di ricerca	Spese per la progettazione	Spese per l'esecuzione	Costo di gestione	Costo di manutenzione	Costo di ammortamento	Costo di personale	Costo di materiali	Costo di energia	Costo di acqua	Costo di gas	Costo di rifiuti	Costo di trasporti	Costo di altri servizi	Costo di altri
R	TIROS/ANA	4999	AC/12/AM	LI	Verifica														
					Spese di ricerca	Spese per la progettazione	Spese per l'esecuzione	Costo di gestione	Costo di manutenzione	Costo di ammortamento	Costo di personale	Costo di materiali	Costo di energia	Costo di acqua	Costo di gas	Costo di rifiuti	Costo di trasporti	Costo di altri servizi	Costo di altri
B	TIROS/ANA	5002	AC/12/AM	VI	Siena														
					Spese di ricerca	Spese per la progettazione	Spese per l'esecuzione	Costo di gestione	Costo di manutenzione	Costo di ammortamento	Costo di personale	Costo di materiali	Costo di energia	Costo di acqua	Costo di gas	Costo di rifiuti	Costo di trasporti	Costo di altri servizi	Costo di altri
A	TIROS/ANA	5005	AC/12/AM	VI	Montebelluna														
					Spese di ricerca	Spese per la progettazione	Spese per l'esecuzione	Costo di gestione	Costo di manutenzione	Costo di ammortamento	Costo di personale	Costo di materiali	Costo di energia	Costo di acqua	Costo di gas	Costo di rifiuti	Costo di trasporti	Costo di altri servizi	Costo di altri
A	TIROS/ANA	5016	BA/11/AM	LI	Finanze														
					Spese di ricerca	Spese per la progettazione	Spese per l'esecuzione	Costo di gestione	Costo di manutenzione	Costo di ammortamento	Costo di personale	Costo di materiali	Costo di energia	Costo di acqua	Costo di gas	Costo di rifiuti	Costo di trasporti	Costo di altri servizi	Costo di altri
A	TIROS/ANA	5172	AA/12/AM	LI	Finanze														
					Spese di ricerca	Spese per la progettazione	Spese per l'esecuzione	Costo di gestione	Costo di manutenzione	Costo di ammortamento	Costo di personale	Costo di materiali	Costo di energia	Costo di acqua	Costo di gas	Costo di rifiuti	Costo di trasporti	Costo di altri servizi	Costo di altri
A	TIROS/ANA	5174	AA/12/AM	LI	Finanze														
					Spese di ricerca	Spese per la progettazione	Spese per l'esecuzione	Costo di gestione	Costo di manutenzione	Costo di ammortamento	Costo di personale	Costo di materiali	Costo di energia	Costo di acqua	Costo di gas	Costo di rifiuti	Costo di trasporti	Costo di altri servizi	Costo di altri
A	TIROS/ANA	5175	AA/12/AM	LI	Finanze														
					Spese di ricerca	Spese per la progettazione	Spese per l'esecuzione	Costo di gestione	Costo di manutenzione	Costo di ammortamento	Costo di personale	Costo di materiali	Costo di energia	Costo di acqua	Costo di gas	Costo di rifiuti	Costo di trasporti	Costo di altri servizi	Costo di altri
A	TIROS/ANA	5176	AA/12/AM	LI	Finanze														
					Spese di ricerca	Spese per la progettazione	Spese per l'esecuzione	Costo di gestione	Costo di manutenzione	Costo di ammortamento	Costo di personale	Costo di materiali	Costo di energia	Costo di acqua	Costo di gas	Costo di rifiuti	Costo di trasporti	Costo di altri servizi	Costo di altri
B	TIROS/ANA	5179	AC/12/AM	PI	San Marino														
					Spese di ricerca	Spese per la progettazione	Spese per l'esecuzione	Costo di gestione	Costo di manutenzione	Costo di ammortamento	Costo di personale	Costo di materiali	Costo di energia	Costo di acqua	Costo di gas	Costo di rifiuti	Costo di trasporti	Costo di altri servizi	Costo di altri
B	TIROS/ANA	5172	AC/12/AM	PI	San Marino														
					Spese di ricerca	Spese per la progettazione	Spese per l'esecuzione	Costo di gestione	Costo di manutenzione	Costo di ammortamento	Costo di personale	Costo di materiali	Costo di energia	Costo di acqua	Costo di gas	Costo di rifiuti	Costo di trasporti	Costo di altri servizi	Costo di altri

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Rassegna Critica e Cinema Giovani[illegible]

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codice	Provincia	Comune	C.A.P.	Codice	Descrizione dell'intervento	Soggetto beneficiario	Stato economico (in euro)		Data	Per ogni intervento
							Importo	Importo		
01	13000000	6717	41-21140	PI	Assedi	aliquotamente barrique e barrique della barrique	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6724	41-21140	PI	Spazio	completamento sistemazione e rifinitura di edifici della collezione di s. maria maggiore	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6729	41-21140	PI	Assedi	recupero di vecchi edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6732	41-21140	PI	Chiesa	recupero degli edifici di s. maria maggiore	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6741	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6801	41-21140	PI	Chiesa	recupero degli edifici di s. maria maggiore	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6804	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6805	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6806	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6807	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6808	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6809	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6810	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6811	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6812	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6813	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6814	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6815	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6816	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6817	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6818	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6819	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6820	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6821	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000
01	13000000	6822	41-21140	PI	Spazio	intervento di completamento sistemazione di edifici industriali per abitazioni	2000	0	21-0000	21-0000

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Rassegne Capitali e Crediti Finanziari

[illegible]

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi[illegible]

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

[illegible]

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codice	Regione	Prov.	L'UDCE	Titolo dell'intervento	Il bilancio sintetico dei risultati dell'intervento (in milioni di lire)																
					Costo totale	Costo medio	Finanziamento	Altre risorse	Data	Prodotto netto	Prodotto lordo	Prodotto netto	Prodotto lordo	Prodotto netto	Prodotto lordo						
R	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201	1981	7201
A	VIAREGGIO	2997	AB1112P	VII	Venezia	realizzazione di un centro di accoglienza per la popolazione a basso costo	2201	1981	7201	1981											

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Comuni	Regione	Prov.	CRICOS	Prin. mod.	Comune di bacino di riferimento	Totale dell' intervento	Supporto locale (da parte del Comune di riferimento)	Altre fonti finanziarie	Data approvazione	Programma	Progetto	Intervento	Realizzazione	Stato dell' intervento
N	VINCENTO	VI	VI00013	VI	Asigara	servizi e attrezzature	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00016	VI	Asigara	ed. costruzioni di nuova edificazione	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	214	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00018	VI	Asigara	recupero della vecchia chiesa e dell'intero complesso di s. maria della grazia di proprietà privata per la costruzione di abitazioni religiose e scuola	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	399	31/08/77					
A	VINCENTO	PD	PD00017	PD	Peschiera	case di accoglienza per gli studenti della parrocchia	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
B	VINCENTO	VI	VI00019	VI	Venezia	restauro conservativo del complesso della chiesa della salute	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	301	31/08/77					
B	VINCENTO	VI	VI00020	VI	Venezia	restauro conservativo dell'intero complesso della chiesa della salute	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	450	31/08/77					
N	VINCENTO	PD	PD00021	PD	Peschiera	recupero della chiesa per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00022	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00023	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00024	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00025	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00026	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00027	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00028	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00029	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00030	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00031	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00032	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00033	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00034	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00035	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00036	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00037	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00038	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00039	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00040	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00041	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					
N	VINCENTO	VI	VI00042	VI	Venezia	realizzazione di un complesso di abitazioni per la costruzione di un complesso di abitazioni	parrocchia, videolaboratorio, biblioteca	0	31/08/77					

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi[illegible]

[illegible]

Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Codici			Informazioni aggiuntive ed aggiuntive dell'azienda										Informazioni aggiuntive ed aggiuntive dell'azienda										
Regione	Prov.	Località	Comune di appartenenza	Tutti i dati della sede										Tutti i dati della sede									
Regione	Prov.	Località	Comune di appartenenza	Indirizzo	Codice postale	Telefono	Telex	Fax	Internet	Altre informazioni	Indirizzo	Codice postale	Telefono	Telex	Fax	Internet	Altre informazioni						
VALLE D'AOSTA	AO	ALTI	AO	Indirizzo	Codice postale	Telefono	Telex	Fax	Internet	Altre informazioni	Indirizzo	Codice postale	Telefono	Telex	Fax	Internet	Altre informazioni						
VALLE D'AOSTA	AO	ALTI	AO	Indirizzo	Codice postale	Telefono	Telex	Fax	Internet	Altre informazioni	Indirizzo	Codice postale	Telefono	Telex	Fax	Internet	Altre informazioni						

PAGINA BIANCA

5. PARTE QUARTA - LA VIGILANZA

4.1. Il monitoraggio

L'articolo 2, comma 13, della legge 7 agosto 1998 n. 270, "*Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio*" pubblicata sulla G.U.R.I. del 12 agosto 1998 affida al Ministro delegato per le aree urbane il compito di provvedere al monitoraggio degli interventi ricompresi nel piano.

In applicazione della suddetta disposizione legislativa l'articolo 6, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 17 settembre 1997, concernente i *criteri per la formazione del piano*, ha stabilito che la individuazione del soggetto monitore dovesse essere effettuata mediante gara ad evidenza pubblica e che gli oneri per il servizio di monitoraggio dovessero essere contenuti nel cinque per cento delle risorse disponibili.

Sulla base di tali disposizioni l'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi (U.R.C.G.E) ha provveduto preliminarmente a specificare la natura e l'articolazione del servizio da richiedere al soggetto monitore, partendo dall'assunto che per monitoraggio debba intendersi l'organizzazione di una serie di operazioni intese a massimizzare la probabilità che un progetto di qualsiasi natura, venga realizzato. L'attività di monitoraggio contempla, dunque, anche adeguati meccanismi di retroazione che permettano una possibile revisione degli obiettivi in base alle risultanze del processo di monitoraggio stesso.

L'aspetto fondamentale dell'attività di monitoraggio è, pertanto, la verifica dell'avanzamento di un intervento. Questa può essere effettuata attraverso la determinazione di specifici indicatori attraverso i quali misurare gli scarti tra quanto previsto e quanto realizzato. Il principale problema da definire nella fase di progettazione di un sistema di monitoraggio è, quindi, lo studio e la specificazione degli indicatori più adatti al tipo di intervento da sottoporre a controllo.

In base a tali considerazioni si è ritenuto che la attività di monitoraggio di norma riguardi:

- la fase ex ante: messa a punto del progetto e la selezione e ammissione al finanziamento;
- la fase on going: implementazione e controllo sulla gestione dei fondi;
- la fase ex post: verifica e collaudo dei risultati.

All'interno di un processo di monitoraggio si possono, pertanto, distinguere tre livelli:

- quello della raccolta dei dati di avanzamento degli interventi e di organizzazione di un sistema informativo;
- quello del controllo e della certificazione, intesi come aspetto formale dell'attuazione degli interventi;
- quello della diagnostica e delle raccomandazioni, intesi come aspetti propriamente valutativi dell'intervento.

L'U.R.C.G.E. ha ritenuto che nel caso in esame i servizi dovessero essere:

- l'acquisizione, al fine di preconstituire un quadro di riferimento rispetto al quale riportare i successivi riscontri, di informazioni relative alle caratteristiche strutturali degli interventi

contenuti nel piano;

- il rilevamento dei dati consuntivi degli adempimenti in relazione alle diverse fasi attuative degli interventi (progettazione, affidamento dei lavori, stipula contrattuale, inizio dei lavori, esecuzione dei lavori e collaudo dei lavori);
- confronto dei dati consuntivi con quelli del quadro di riferimento iniziale in modo da rilevare gli scostamenti e da permettere le opportune decisioni e azioni;
- analisi ed organizzazione dei dati rilevati in un sistema informativo unificato in grado da renderli disponibili ai soggetti competenti;
- elaborazioni di grafici e tabelle con l'impiego di procedure informatizzate, compatibili con il sistema informativo unificato utilizzato dall'U.R.C.G.E. sulla scorta dei dati del singolo intervento e delle eventuali interconnessioni spazio - temporali con altri interventi del contesto;
- elaborazione trimestrale di indicatori sintetici attinenti ai costi, ai tempi, ai fabbisogni e gli aspetti ambientali, tecnologici e procedurali, di competenza del Ministro delegato per le aree urbane, della Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 270/97.

Per quanto riguarda la specificazione degli indicatori in base ai quali valutare l'andamento degli interventi, l'U.R.C.G.E. ha ritenuto necessario preliminarmente individuare, per ogni intervento, oltre ai normali indici fisici, amministrativi e finanziari, anche un indice, definito indice di criticità, che permettesse di misurare quale fosse il rischio dell'intervento di non essere realizzato nei tempi programmati.

L'U.R.C.G.E. ha individuato quali elementi di criticità degli interventi: lo stato della progettazione; il rapporto tra la durata degli adempimenti amministrativi e la durata complessiva dell'intervento; il rapporto tra il tempo residuo ed il tempo di esecuzione; il rapporto tra il costo dell'intervento e la durata dello stesso; la complessità di realizzazione in relazione alla priorità dell'obiettivo; la necessità di fare ricorso a procedure di variante urbanistica; la disponibilità dell'area; la dimensione sopra/sotto soglia comunitaria dell'appalto; ed ha determinato il loro contributo al suddetto indice impiegando il metodo del confronto a coppie.

Tale indice ha permesso di graduare quale dovesse essere, durante il monitoraggio, la cadenza temporale e il contenuto delle verifiche da effettuare. E' stato, inoltre, programmato il ricalcolo di tale indice durante l'attività di monitoraggio. Qualora l'indice aumenta è previsto di incrementare i momenti di verifica e, se è possibile, di prendere delle decisioni correttive.

L'U.R.C.G.E. successivamente alla definizione dei contenuti del servizio di monitoraggio ha provveduto a predisporre gli elaborati necessari per indire la gara ad evidenza pubblica finalizzata alla individuazione del soggetto monitore stabilendo, fra l'altro, che il compenso relativo alle prestazioni del servizio fosse previsto parte a corpo (a forfait) e parte a misura.

Sono stati predisposti:

- il disciplinare tecnico contenente la descrizione e le prescrizioni delle diverse attività da affidare;
- un elaborato contenente i criteri per la determinazione della parte del compenso da corrispondere a corpo (tariffa);
- l'elenco dei prezzi unitari per la determinazione della parte del compenso da corrispondere a misura;
- il bando di gara;
- disciplinare di gara;

- schema di contratto.

Si è proceduto ad indire una gara a procedura aperta in ambito Europeo in quanto l'importo presunto dei servizi è stato stimato in lire 6.320.557.000.

Il bando di gara è stato predisposto nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 157/95.

Va sottolineato che il tempo intercorrente fra la pubblicazione del citato decreto 17 settembre 1997 concernente i *criteri per la formazione del piano* e l'invio del relativo bando alla GUCE (circa tre mesi) si è reso necessario per poter disporre se non del piano definitivo almeno di una base certa sulla quale dimensionare l'importo da porre a base di gara. Va ricordato che il termine ultimo per le richieste di inserimento nel piano fu prorogato dal 21 novembre al 22 dicembre 1998. Solo dopo tale data è stato così possibile per l'U.R.C.G.E. dimensionare in via definitiva il numero delle richieste pervenute, la loro tipologia e la ripartizione geografica delle stesse.

Per l'individuazione dell'importo presunto da porre a base di gara si è fatto riferimento alla gara già conclusa per il servizio di monitoraggio del piano del Giubileo nella regione Lazio. In particolare per determinare la durata del servizio ed i relativi costi si è ipotizzato che il soggetto monitore avrebbe dovuto produrre, per la maggior parte degli interventi, sei rapporti trimestrali, l'ultimo dei quali a gennaio dell'anno 2000 e ciò in quanto per legge tutti gli interventi dovranno essere ultimati entro il 31 ottobre 1999.

Il termine per il ritiro della documentazione era fissato al 24 febbraio 1998 ed a tale data risultavano 37 richieste di acquisizione della documentazione.

4.2. Le Relazioni del soggetto monitore

A conclusione della gara di cui sopra, il Servizio di monitoraggio è stato affidato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi (URCGE) - alla Associazione Temporanea di Imprese costituita tra Sovis - Società Vesuviana d'investimenti e servizi S.p.A. e T.E.C.N.I.C. - Tecniche e Consulenze nell'Ingegneria Civile S.p.A. (ATT) con contratto del 24 febbraio 1999, approvato e reso esecutivo con Decreto del 15 marzo 1999.

Per consentire una lettura dell'evoluzione dello stato di attuazione del Piano, così come emergente dall'attività di "monitoraggio", si allega di seguito una sintesi della Relazione prodotta dal Soggetto Monitore. Il documento di che trattasi costituisce il **1° Rapporto Trimestrale** elaborato nell'ambito del Servizio di Monitoraggio del Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio (il Piano) approvato ai sensi della Legge 7 agosto 1997, n. 270.

4.2.1. Sintesi del primo rapporto trimestrale

Il primo Rapporto fa riferimento al periodo marzo/maggio 1999 e, in base alle direttive dell'URCGE, prende in considerazione tutti gli interventi che alla data del 19 marzo 1999 risultavano inclusi nel Piano in base a Decreti Ministeriali, anche se non ancora registrati dalla Corte dei Conti né pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Come da istruzioni ricevute dall'URCGE, restano esclusi dal servizio di monitoraggio:

gli interventi di competenza dell'ENTT;

l'intervento relativo al monitoraggio del Piano;

gli interventi di cui all'articolo 2, comma 8, della Legge 270/97 (ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino);

l'intervento prot. n° 249 (codice URCGE BA 41 ED F) che si riferisce alla realizzazione di un circuito nazionale di comunicazione ed informazione relativo ai luoghi ed eventi particolari (proponente Factory S.r.l.).

In base a questo criterio, pertanto, il Rapporto fa riferimento a n. 1.157 interventi, come da tabella che segue:

Descrizione	Protocollo	Num. Int.
Interventi ricompresi nel Piano al 19.3.1999		1.164
Interventi ENT	0001-0002-0003A	3
Intervento Ambito Nazionale	249	1
Interventi ex articolo 2, comma 8, Legge 270/97	10484-10484/A	2
Monitoraggio interventi	9700	1
Interventi soggetti a monitoraggio		1.157

Il periodo cui si riferisce il primo Rapporto ha rappresentato una fase particolarmente delicata ed impegnativa sotto il profilo gestionale ed organizzativo, avendo dovuto essere dedicato contemporaneamente, oltre che all'impostazione iniziale dell'attività, anche all'avvio delle operazioni "ordinarie" di monitoraggio e nello stesso tempo alla stesura di un non previsto "Rapporto Intermedio" che, secondo le indicazioni dell'URCGE, fosse di supporto all'azione dell'Ufficio per la stesura del Rapporto al Parlamento.

Nel corso di tale periodo, un considerevole impegno è stato profuso dalla struttura nella messa a punto delle metodologie da utilizzare nello svolgimento del servizio di monitoraggio e delle relative procedure informatiche di supporto.

Ancorché, infatti, il Disciplinare Tecnico di gara prevedesse l'utilizzo di procedure operative già individuate e di una modulistica unificata predisposta sulla base dei modelli allegati allo stesso Disciplinare, l'URCGE ha invece ritenuto opportuno coinvolgere anche gli esperti del Monitor in un approfondito processo di revisione/re-impostazione delle procedure.

Tale processo si è reso necessario in quanto una buona parte delle indicazioni contenute nel Disciplinare Tecnico si sono rivelate non perfettamente compatibili con il Servizio richiesto, in quanto:

il Disciplinare fu sviluppato in analogia con il servizio di monitoraggio in corso di esecuzione per gli interventi situati nella Regione Lazio, che si è constatato avere caratteristiche, anche organizzative, considerevolmente diverse da quelle applicabili nel caso specifico, anche in relazione al più elevato numero di interventi, alla loro vasta diffusione territoriale ed alla loro diversificazione tipologica;

il Disciplinare fu sviluppato sulla base del presupposto che il servizio di monitoraggio potesse essere avviato pressoché contemporaneamente all'avvio del Piano e, quindi, potesse seguire un ordinato svolgersi del processo attuativo degli interventi. Il prolungarsi delle procedure di affidamento dell'incarico ha comportato, invece, che il servizio di monitoraggio sia venuto ad innestarsi in una situazione di avanzata fase di attuazione del Piano stesso, caratterizzata, inoltre,

da una situazione di avvio degli interventi estremamente disomogenea.

Occorre inoltre sottolineare che, d'intesa con l'URCGE, nel periodo cui il Rapporto si riferisce, anziché procedere a rilevazioni cadenzate in base alle "fasi programmatiche" degli interventi ed alla loro criticità teorica iniziale, si è provveduto ad effettuare una "rilevazione generale", che ha comportato la ricognizione dello stato di attuazione di tutti gli interventi inseriti nel Piano, provvedendo, nel contempo, alla raccolta di tutte le informazioni relative a tutte le fasi che risultavano concluse alla data di rilevazione, oltre a quelle relative alla fase in corso.

Nel Disciplinare Tecnico era previsto che, per poter disporre della base di partenza cui rapportare le successive rilevazioni, il Monitore compilasse, per ciascun intervento, un modello di rilevazione (modello A, Quadro 1) relativo ai "dati programmatici" così come dichiarati dal Soggetto Beneficiario del finanziamento e trasferisse poi all'URCGE i dati così acquisiti su supporto magnetico.

Nelle more dell'assegnazione dell'incarico, l'URCGE ha invece provveduto autonomamente ad acquisire i dati "anagrafici" ed i "dati programmatici" degli interventi, sulla base dei modelli MM e dei modelli A ritornati dai Soggetti Beneficiari.

- Elaborazione dei cronogrammi degli interventi

Il processo di attuazione degli interventi è stato suddiviso, come da Disciplinare, in una sequenza di fasi corrispondenti agli adempimenti via via occorrenti per portare a completa definizione le azioni programmate, a ciascuna delle quali è associato un evento conclusivo che consente di predeterminare il momento di passaggio alla fase successiva secondo i seguenti schemi:

LAVORI			
Fasi del processo di attuazione		Eventi conclusivi della fase	
1	Programmazione esecutiva	T1	Definizione programma esecutivo (delibera)
2	Progettazione preliminare	T2	Approvazione progetto preliminare (delibera)
3	Progettazione definitiva	T3	Approvazione progetto definitivo/Confer.za di servizi
4	Progettazione esecutiva	T4	Approvazione progetto esecutivo (delibera)
5	Appalto	T5	Affidamento dell'appalto (verbale)
6	Contratto d'appalto	T6	Stipula del contratto di appalto
7	Consegna cantiere	T7	Verbale di inizio lavori
8	Esecuzione lavori	T8.1-T8.F	Verbale di ultimazione lavori
9	Collaudo tecnico-amministrativo	T9	Emissione certificato di collaudo
10	Messa in esercizio	TF	Piena funzionalità delle opere

FORNITURE			
Fasi del processo di attuazione		Eventi conclusivi della fase	
1	Programmazione esecutiva	T1	Definizione programma esecutivo (delibera)
2	Definizione dell'oggetto	T3	Approvazione progetto definitivo (delibera)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3	Predisposizione della Commessa	T5	Affidamento della Commessa (verbale)
4	Contratto di fornitura	T6	Stipula del contratto di fornitura
5	Avvio della fornitura	T7	Constatazione d'inizio della fornitura
6	Erogazione della fornitura	T8.1-T8.F	Constatazione di compimento della fornitura
7	Collaudo tecnico-amministrativo	T9	Emissione certificato liberatorio
8	Utilizzazione del bene/servizio	TF	Piena funzionalità delle opere

INTERVENTI ESEGUITI DAL MINISTERO BB.CC.AA.			
Fasi del processo di attuazione		Eventi conclusivi della fase	
1	Programmazione esecutiva	T1	Definizione programma esecutivo (delibera)
2	Progettazione definitiva	T3	Approvazione progetto definitivo (delibera)
3	Appalto	T5	Affidamento dell'appalto (verbale)
4	Contratto d'appalto	T6	Stipula del contratto di appalto
5	Consegna cantiere	T7	Verbale di inizio lavori
6	Esecuzione lavori	T8.1-T8.F	Verbale di ultimazione lavori
7	Collaudo tecnico-amministrativo	T9	Emissione certificato di collaudo
8	Messa in esercizio	TF	Piena funzionalità delle opere

D'intesa con l'URCGE e tenendo conto del fac-simile allegato al Disciplinare Tecnico, è stato altresì predisposto il modello di cronogramma da utilizzare nel corso dell'attività di monitoraggio.

I cronogrammi vengono presentati sotto forma di Diagramma di Gantt in cui a ciascuna fase del processo di attuazione corrispondono tre barre di colore diverso, con riferimento a tre scenari temporali:

- la previsione programmatica (colore nero)
- la previsione rimodulata al precedente momento di rilevazione (colore verde)
- la previsione rimodulata all'attuale momento di rilevazione (colore rosso)

Sul diagramma vengono anche indicate le date sulla base delle quali il cronogramma è stato costruito, evidenziando con un asterisco quelle calcolate secondo le procedure sopra descritte.

Sul diagramma viene inoltre sempre evidenziata la data del 31.10.1999.

Nella "Documentazione degli interventi per Regioni" che viene presentata insieme al Rapporto di che trattasi, sono rappresentati - oltre ai diagrammi di criticità ed ai modelli di rilevazione - i cronogrammi di attuazione del processo di ogni intervento per le diverse categorie (ad eccezione dei Privati).

Essi, ovviamente, presentano le sole due barre relative alla previsione programmatica (colore

nero) ed alla previsione rimodulata all'attuale momento di rilevazione (colore rosso), con le date programmatiche e le date effettive relative alle fasi risultate concluse alla data di rilevazione, oltre alle date di previsione rimodulate, elaborate ipotizzando uno slittamento di tutte le successive fasi dell'intervento di un tempo pari al ritardo di esecuzione accumulato fino all'ultima fase conclusa; ciò a prescindere da eventuali possibili "recuperi" nelle fasi successive dichiarati dal titolare dell'intervento, recuperi che si intende registrare nel modello soltanto allorquando se ne sia riscontrata l'avvenuta effettività.

Si fa notare, peraltro, che in taluni casi l'inesattezza di alcune date programmatiche potrebbe rendere incongruente anche la determinazione delle nuove date di attuazione previste calcolate secondo i criteri sopra illustrati. Questo tipo di eventuale anomalia che qui si evidenzia sarà rimosso con le successive rilevazioni ed elaborazioni.

Con le successive rilevazioni ed elaborazioni si provvederà inoltre ad aggiornare i cronogrammi ad ogni momento conclusivo di ciascuna fase, trasmettendoli all'URCGE insieme al modello A o B relativo alla fase stessa.

- Elaborazione dei coefficienti di criticità e definizione delle "classi di monitoraggio"

All'interno di ciascuna delle categorie d'intervento, ad eccezione di quella riferita ai Privati, sono state individuate tre "classi di monitoraggio", definite in funzione di un "coefficiente di criticità" attribuito ad ogni singolo intervento in relazione al valore risultante dalla somma ponderale di parametri significativi.

I coefficienti di criticità sono stati calcolati sulla base delle modifiche proposte dall'URCGE per adeguarli a criteri simili a quelli adottati per gli interventi situati nel Lazio; tali modifiche hanno portato a variare parzialmente le procedure di calcolo indicate nel Disciplinare Tecnico.

In funzione del rapporto tra il valore massimo teoricamente possibile in ciascuna fase ed il valore effettivo raggiunto dal coefficiente di criticità nella fase stessa, agli interventi sono state attribuite le seguenti "classi" di monitoraggio:

Coefficiente di criticità (in % rispetto al massimo)		Classe di monitoraggio
Da	A	
0,000	0,250	1 - BASSA
0,251	0,500	2 - MEDIA
0,501	1,000	3 - ALTA

Occorre peraltro segnalare che l'indice di criticità determina soltanto la necessità di un controllo più frequente sullo stato di attuazione dell'intervento, non implicando, di per sé, un giudizio tecnico sulla "fattibilità" dell'intervento, per formulare il quale è necessario prendere in

considerazione anche altri elementi, quali, ad esempio, la possibilità di eventuali “recuperi” o, al contrario, i rischi di un blocco duraturo dovuto a circostanze esterne, elementi che, tempestivamente segnalati dal Monitor all'URCGE, daranno luogo alla determinazione dell'indicatore “livello di rischio di mancata esecuzione”.

Complessivamente, i 984 interventi, con esclusione dei Privati, presentano i seguenti livelli di criticità:

Criticità	Interventi privati e pubblici	
	Numero	Pct.
ALTA	444	46
MEDIA	132	14
BASSA	380	40
Totale	956	100.0
Non calcolabile	28	

Diagrammi di criticità

D'intesa con l'URCGE e tenendo conto del fac-simile allegato al Disciplinare Tecnico, è stato predisposto il diagramma di criticità che riporta, per ciascun intervento, una tabella con i valori puntuali assunti dal coefficiente di criticità con riferimento a tre scenari temporali:

- la programmazione iniziale;
- il precedente periodo di rilevazione;
- l'attuale momento di rilevazione;

nonché la rappresentazione grafica delle relative curve di criticità, che sono di tre colori:

- colore nero, per la programmazione iniziale;
- colore verde, per il precedente periodo di rilevazione;
- colore rosso, per l'attuale momento di rilevazione.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VALORI MASSIMI DEI COEFFICIENTI DI CRITICITA'

PARAM.	PESO	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8.n
A	5,12%	1	0,7	0,4	0	0	0	0	0
B	2,57%	1	1	1	1	0	0	0	0
C	17,95%	1	1	1	1	1	1	1	1
D	5,12%	1	1	1	1	1	1	1	1
E	17,95%	1	1	1	1	1	1	1	1
F	17,95%	1	1	0	0	0	0	0	0
G	15,39%	1	1	1	1	1	1	0	0
H	17,95%	1	1	1	1	0	0	0	0
	100,00%	1,00000	0,98464	0,78978	0,76930	0,56410	0,56410	0,41020	0,41020
soglia criticità alta		0,50000	0,49232	0,39489	0,38465	0,28205	0,28205	0,20510	0,20510
soglia criticità media		0,25000	0,24616	0,19745	0,19233	0,14103	0,14103	0,10255	0,10255

PARAM.	PESO	T1	T3	T5	T6	T7	T8.n
A	2,90%	1	0	0	0	0	0
B	5,80%	1	1	0	0	0	0
C	11,59%	1	1	1	1	1	1
D	14,49%	1	1	1	1	1	1
E	17,39%	1	1	1	1	1	1
F	0,00%						
G	0,00%						
H	14,49%	1	1	0	0	0	0
	66,66%	0,66660	0,63760	0,43470	0,43470	0,43470	0,43470
soglia criticità alta		0,33330	0,31880	0,21735	0,21735	0,21735	0,21735
soglia criticità media		0,16665	0,15940	0,10868	0,10868	0,10868	0,10868

PARAM.	PESO	T1	T3	T5	T6	T7	T8.n
A	2,90%	1	0	0	0	0	0
B	5,80%	1	1	0	0	0	0
C	11,59%	1	1	1	1	1	1
D	14,49%	1	1	1	1	1	1
E	17,39%	1	1	1	1	1	1
F	0,00%						
G	0,00%						
H	14,49%	1	1	0	0	0	0
	66,66%	0,66660	0,63760	0,43470	0,43470	0,43470	0,43470
soglia criticità alta		0,33330	0,31880	0,21735	0,21735	0,21735	0,21735
soglia criticità media		0,16665	0,15940	0,10868	0,10868	0,10868	0,10868

Rilevazioni

In questo primo periodo di attività si è proceduto alla "rilevazione generale", per ciascuno degli interventi di categoria L, BC ed F, di tutte le informazioni relative alla fase in corso ed a quelle relative alle fasi precedenti già concluse. Sono state altresì acquisite informazioni anche su alcuni interventi di pertinenza dei Privati, in attesa di ricevere dall'URCGE istruzioni in merito alle scadenze ed alle metodologie di rilevazione da applicare a questa categoria di interventi che, si ricorda, non godono di finanziamenti pubblici ma solo di facilitazioni procedurali.

L'attività di raccolta delle informazioni presso i Beneficiari ha presentato non poche problematiche, tra cui le più ricorrenti sono state:

irreperibilità e/o indisponibilità dei referenti;

cambiamento dei referenti, con conseguente ricerca dei nuovi referenti ufficiali e, non infrequentemente di quelli "di fatto", specie per le comunità ecclesiastiche;

indirizzi dei titolari/referenti errati o cambiati, etc.

difficoltà nel reperire da parte dei Soggetti Beneficiari la documentazione richiesta o nel renderla disponibile;

referenti con scarsa dimestichezza con le operazioni connesse con le attività giubilari;

suddivisione degli interventi in lotti, non identificati nella Banca dati URCGE, con conseguente "moltiplicazione" degli atti formali necessari.

Su tutto, la problematica più rilevante riscontrata nel corso delle rilevazioni è stata proprio la suddivisione in lotti degli interventi, conseguente all'affidamento, per uno stesso intervento, di più appalti in relazione alla tipologia delle opere da eseguire o alla semplice suddivisione dell'intervento in più cantieri.

- Stato di attuazione del Piano

Come già evidenziato in precedenza, il Rapporto ha per oggetto n. 1.157 interventi che, in forma tabellare ed in forma grafica, sono stati raggruppati per Regioni e per Categoria.

I dati degli interventi per Regioni suddivisi per fasi, sono riportati in forma grafica negli allegati riportati in calce al presente paragrafo.

In sintesi di seguito si riporta la ripartizione degli interventi (Privati esclusi) in funzione della fase in corso di attuazione:

Fase	Lavori		Riconfiture		Beni culturali		Totale	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%
T1/nd	39	4.5	10	14.2	2	3.6	51	5.2
T2	5	0.6					5	0.5
T3	23	2.7	13	18.6	1	1.8	37	3.8
T4	21	2.4					21	2.1
T5	85	9.9	16	22.9	2	3.6	103	10.5
T6	14	1.6	10	14.2	0	-	24	2.4
T7	20	2.4	4	5.7	0	-	24	2.4
T8	639	74.4	15	21.4	49	89.2	703	71.5
T9	5	0.6	1	1.5	1	1.8	7	0.7
TF	1	0.1	0	-	0	-	1	0.1
Comp l.	7	0.8	1	1.5	0	-	8	0.8
Totale	859	100.0	70	100.0	55	100.0	984	100.0

Per ciascuno degli interventi (Privati esclusi) si è proceduto alla raccolta - attraverso l'azione di rilevazione - ed alla successiva elaborazione di tutte le informazioni che si riferiscono alla fase in corso alla data di rilevazione ed alle fasi precedenti già concluse.

Il livello di rischio



L'indicatore di rischio - frutto delle valutazioni effettuate dai rilevatori sulla base degli elementi conoscitivi in loro possesso, inizialmente non previsto, è stato introdotto per poter segnalare con immediatezza gli interventi che, per qualche motivo, presentano situazioni che possono determinare un ritardato completamento rispetto alla data del 31 ottobre 1999, termine entro il quale, ai sensi della Legge 270/97, dovranno essere completati gli interventi del Piano.

Nei parametri elaborati sulla base delle disposizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, è stata riscontrata la non immediata possibilità di evidenziazione di un eventuale allarme in relazione soprattutto all'eventualità di mancato completamento dell'intervento nel termine ultimo legalmente possibile (31/10/99). Ciò ha indotto il Monitor ad elaborare questo indicatore **sintetico** denominato "**Livello di Rischio di mancata esecuzione**", che è conseguenza diretta del sopralluogo (controllo fisico dello stato di attuazione dell'intervento) e della valutazione tecnico-professionale (quindi autonoma ed indipendente) della effettiva probabilità che l'intervento stesso sia completato entro le scadenze di legge (tenuto anche conto della complessità delle attività da realizzare, del tempo mediamente necessario per l'attuazione di attività simili, dell'entità delle risorse necessarie, di quelle impiegate e di quelle oggettivamente impiegabili, etc.).



Si intende così segnalare con immediatezza all'attenzione dell'URCGE gli interventi con particolari problematicità. Da parte del Monitor tali interventi sono sottoposti ad ulteriori più frequenti controlli al fine di tenere informato l'URCGE sulla loro evoluzione nel tempo.

ALLEGATI AL PRIMO RAPPORTO TRIMESTRALE (ESTRATTO)

Numero interventi con categoria "BC" suddivisi per fase del processo di attuazione in corso

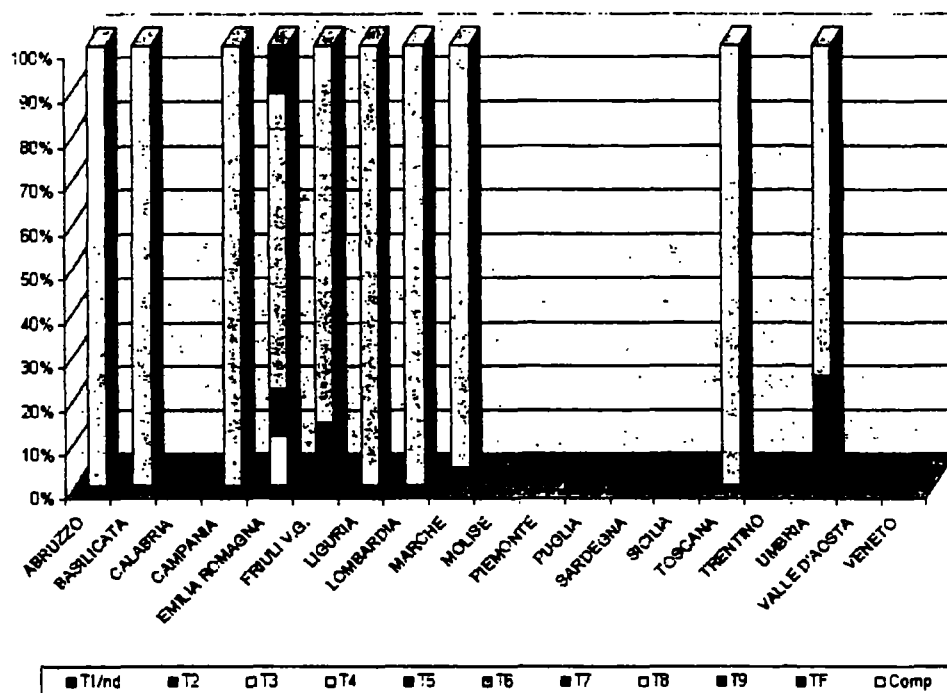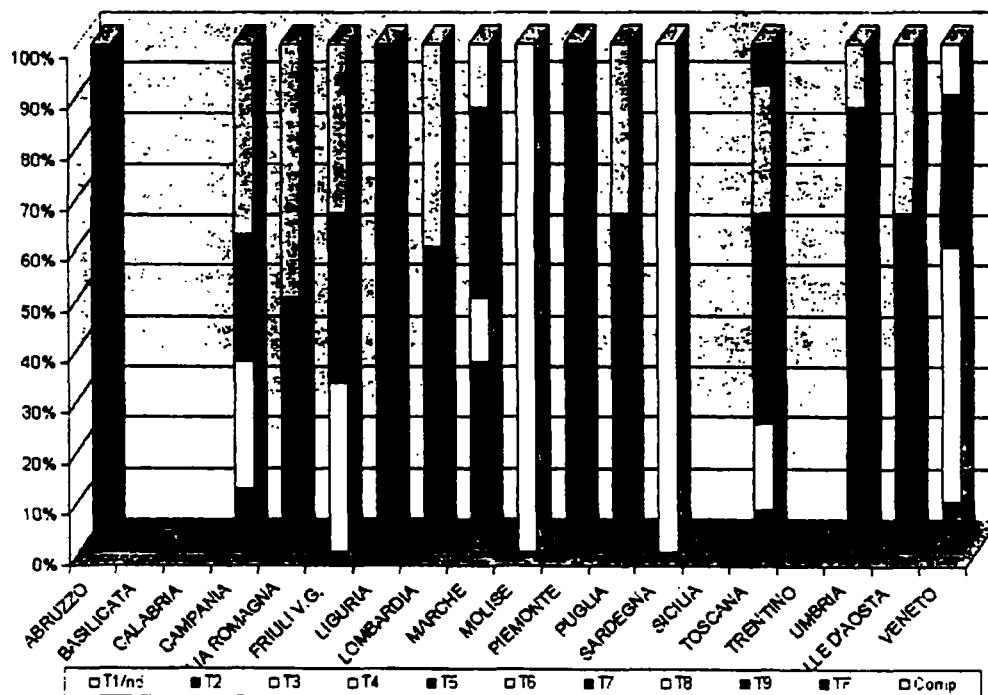
**Numero interventi con categoria "F" suddivisi per fase del processo di attuazione in corso**

Numero interventi con categoria "L" suddivisi per fase del processo di attuazione in corso

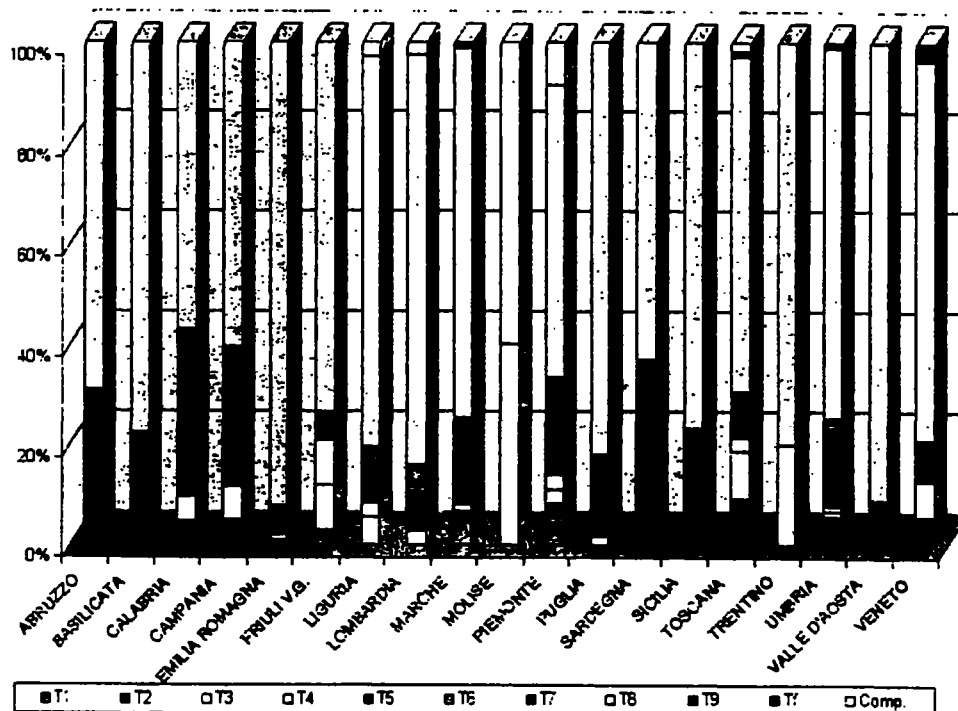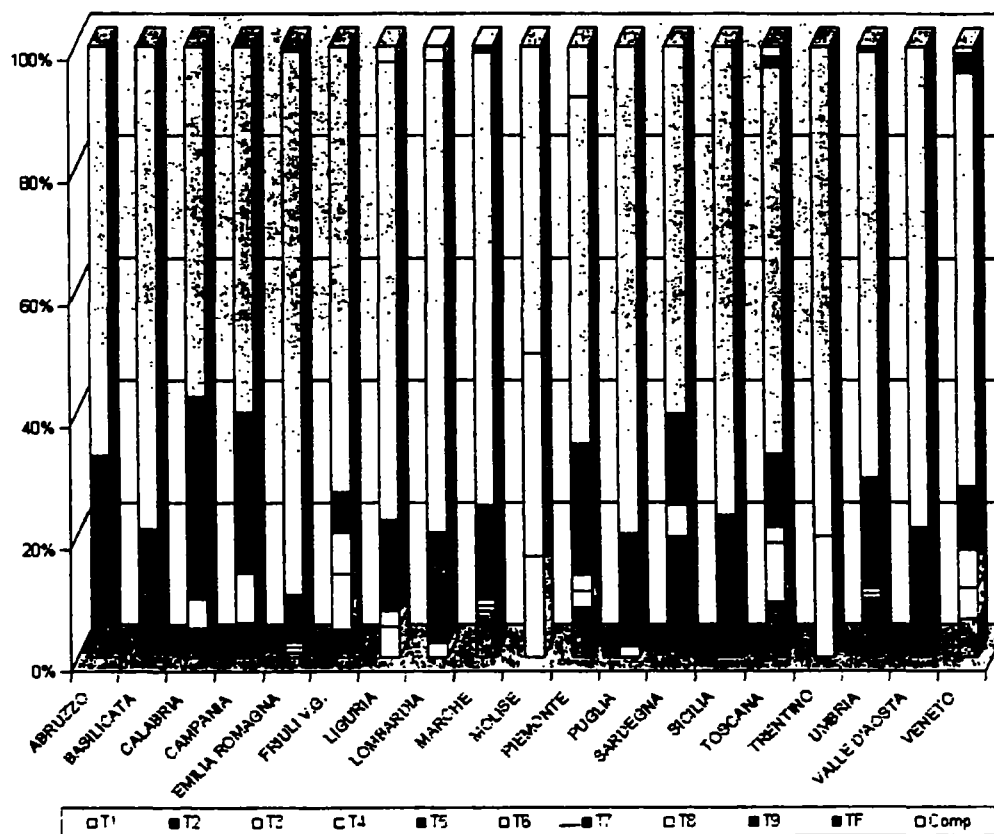**Numero degli interventi suddivisi per fase del processo di attuazione in corso**

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero degli interventi, per Regione, suddivisi in base al livello della criticità calcolata all'ultima fase del processo di attuazione conclusa

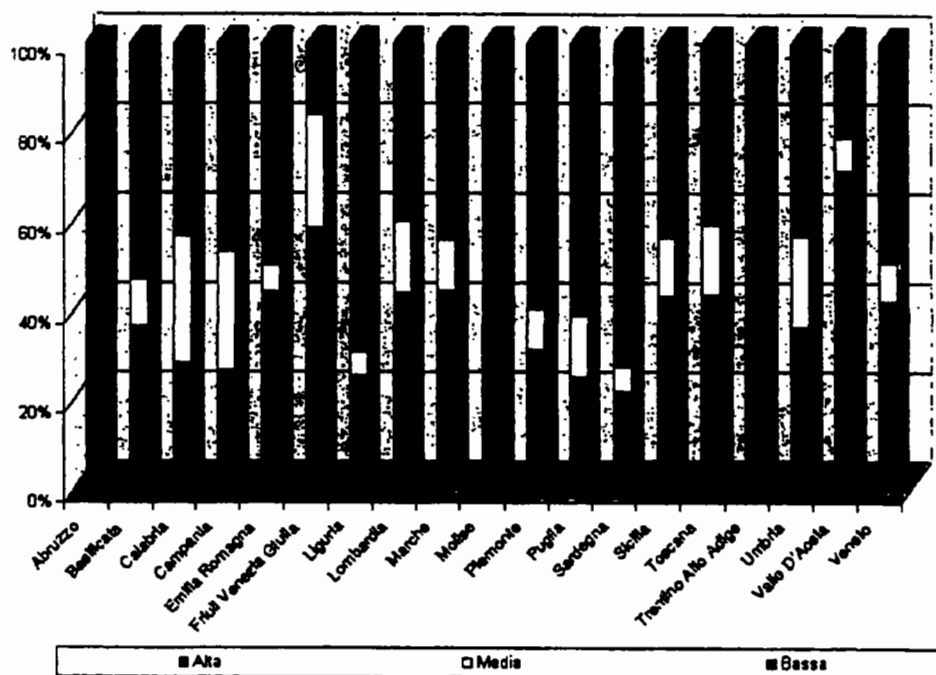

4.2.2. Sintesi del secondo rapporto trimestrale

In data 15.09.1999 l'associazione temporanea di imprese SOVIS - e T.E.C.N.I.C. ha presentato il 2° Rapporto trimestrale elaborato nell'ambito del Servizio di Monitoraggio del Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio. Tale Rapporto fa riferimento al periodo 1 giugno / 31 agosto 1999 e tiene conto di tutte le variazioni/rimodulazioni del Piano intervenute sino alla data del 28 luglio 1999, come da tabella riepilogativa che segue:

Estremi dei provvedimenti di modificazione ed integrazione del Piano

Delibera Commissione			Decreto Min.			Rapp. Cons. Nazionali		Gazz. Ufficiale	
Num.	Del.	Del.	Num.	Del.	Num.	Del.	Num.	Del.	
3/98	28/03/98	21/04/98	1 Pres./258	20/05/98	122	28/05/98			
4/98	13/05/98	02/06/98	2 Pres./274	03/07/98	171	24/07/98			
5/98	16/07/98	06/08/98	3 Pres./ 27	10/10/98	252	28/10/98			
6/98	08/10/98	20/11/98	3 Pres./173	23/12/98	31	08/02/99			
7/98	10/12/98	27/01/99	1 Pres./115	12/03/99	76	01/04/99			
8/98	16/12/98	27/01/99	1 Pres./116	12/03/99	77	02/04/99			
9/99	27/01/99	09/02/99	1 Pres./142	31/03/99	91	20/04/99			
10/99	04/05/99	01/06/99	2 Pres./278	30/07/99	191	16/08/99			
11/99	19/05/99								
12/99	28/07/99								

Andando al di là di quanto originariamente previsto, peraltro, è parso opportuno al Soggetto Monitore, d'intesa con l'URCGE, avviare le attività di monitoraggio anche per i nuovi interventi inseriti nel Piano con le ultime due deliberazioni, ancorché queste non abbiano ancora trovato formalizzazione in un Decreto Ministeriale, anche in considerazione dell'ormai prossima scadenza del termine ultimo concesso per la realizzazione delle opere (31/10/1999) e della conseguente necessità di fornire con tempestività all'URCGE informazioni su tutti gli interventi interessati.

In base ai provvedimenti elencati nella tabella precedente, risultano inclusi nel Piano n. 1.131 interventi, come da dettaglio che segue:

Numero degli interventi

Decreto	Inser.	Elimin.	Accorpamenti		Disaggregazioni		Num. Progr.
	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	
21/04/98	1.050						1.050
02/06/98	1						1.051
06/08/98	10	4	2	1	8	20	1.068
20/11/98	4	6	11	5	7	17	1.070
27/01/99	1	2					1.069
27/01/99	59	25	2	1	11	28	1.119
09/02/99	47	4			1	3	1.164
01/06/99	1	3	51	1	6	16	1.122
19/05/99*	22	11					1.133
28/07/99*	1	5			2	4	1.131

* (sola delibera Commissione)

Come da istruzioni ricevute dall'URCGE, sono stati esclusi dal servizio di monitoraggio anche nel secondo Rapporto:

gli interventi di competenza dell'ENIT;

l'intervento prot. n° 249 (codice URCGE BA 41 ED F) che si riferisce alla realizzazione di un circuito nazionale di comunicazione ed informazione relativo ai luoghi ed eventi particolari (proponente Factory S.r.l.).

gli interventi di cui all'articolo 2, comma 8, della Legge 270/97 (ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino);

l'intervento relativo al monitoraggio del Piano;

Risultano inclusi, invece, i n. 51 interventi dell'Ente Poste distribuiti su tutto il territorio nazionale che, per motivi amministrativi, sono stati accorpati in un unico intervento con Delibera n. 10/99 ma che, ai fini del monitoraggio, devono continuare ad essere considerati separatamente.

In base a questo criterio, pertanto, il Rapporto fa riferimento a n. 1.174 interventi, come da tabella che segue:

Descrizione	Protocollo	Num.
Interventi ricompresi nel Piano al 31.08.99		1.131
Interventi ENIT	0001-0002-0003A	-3
Intervento Ambito Nazionale	249	-1
Interventi ex articolo 2, comma 8, Legge 270/97	10484-10484/A	-2
Monitoraggio interventi	9700	-1
Intervento Ente Poste unico ex Delibera 10/99	17729	-1
Interventi Ente Poste accorpati nel prot. 17729		+51
Interventi soggetti a monitoraggio		1.174

Nel corso del trimestre, al fine di rimuovere talune anomalie riscontrate nella Banca Dati dell'URCGE, il soggetto Monitore ha acquisito presso l'URCGE stesso copia della documentazione (modelli A, modelli MM, altra documentazione) relativa a tutti gli interventi inseriti nel Piano al fine di verificare, in particolare:

la coerenza dei termini di cui alla lettere c) (data prevista per l'affidamento dell'appalto) ed alla lettera d) (data prevista per la piena funzionalità delle opere) con le altre date programmatiche inserite nel Data Base;

la corrispondenza tra il costo dell'intervento/finanziamento risultante dal Data Base e quella indicata nella relativa documentazione di cui sopra.

I controlli e le relative correzioni si sono potuti effettuare, anche attraverso una azione correlata presso i beneficiari, per la quasi totalità degli interventi, salvo alcuni casi "atipici" che hanno richiesto e/o richiederanno ulteriori approfondimenti presso i rispettivi Beneficiari.

- Rilevazioni

E' proseguita durante il trimestre l'attività di raccolta delle informazioni presso i Beneficiari, secondo i criteri e le modalità illustrate nel precedente 1° Rapporto trimestrale.

Le verifiche riferite agli adempimenti amministrativi (fasi da T2 a T7 e fase T9) sono state effettuate a ridosso delle scadenze previste per ciascuna fase, al fine di accertare che l'evento conclusivo previsto per quella fase si fosse effettivamente verificato.

I controlli effettuati hanno portato alla segnalazione di n. 124 "mancati adempimenti"; di questi, n. 80 comporteranno, salvo recuperi nelle fasi successive, uno slittamento del termine di realizzazione dell'intervento oltre il 31.10.1999.

Per gli interventi già cantierizzati, invece, le verifiche hanno avuto cadenze differenziate in relazione alla categoria di appartenenza del singolo intervento ed alla "classe di monitoraggio" dello stesso, come da tabella che segue:

CATEGORIA INTERVENTI	CRITICITA'/CLASSE DI MONITORAGGIO		
	ALTA	MEDIA	BASSA
Lavori	Mensile	Bimestrale	Trimestrale
Forniture di beni	Stipula del contratto/Completamento fornitura		
Prestazioni di servizi	Stipula del contratto/Completamento fornitura		

Superate, nella maggior parte dei casi, quelle difficoltà iniziali legate alla errata indicazione e/o cambiamento dei nominativi e/o degli indirizzi dei titolari/referenti/rappresentanti, etc., con conseguente ricerca dei nuovi referenti/indirizzi, sono state ribadite invece le considerazioni già svolte nel precedente rapporto in ordine alle problematiche riscontrate nel corso dell'attività di rilevazione, tra cui le più ricorrenti sono state:

difficoltà nel reperire da parte dei Soggetti Beneficiari la documentazione richiesta o scarsa disponibilità a renderla disponibile;

referenti con scarsa dimestichezza con le operazioni connesse con le attività giubilari;

suddivisione degli interventi in lotti, non identificati nella Banca Dati URCGE, con conseguente "moltiplicazione" degli atti formali necessari.

Inoltre, per quanto riguarda gli interventi già cantierizzati, sono state riscontrate non poche difficoltà nell'acquisizione del Programma Lavori; molto spesso, infatti, quello contenuto nel progetto esecutivo posto a base dell'appalto è molto generico ed anche quello predisposto dall'impresa è alquanto sommario. Il Soggetto Monitore ha dovuto quindi effettuare la valutazione dell'avanzamento fisico dei lavori sulla base di informazioni non del tutto esaurienti e quasi sempre conducendo ripetuti approfondimenti da condurre con la Direzione Lavori.

- Elaborazione dei cronogrammi degli interventi

Per gli interventi per i quali mancano, a livello programmatico, le date di ultimazione di una o più

fasi intermedie rispetto alle fasi T5 (affidamento dell'appalto - termine lettera c) e TF (piena funzionalità delle opere - termine lettera d), si è provveduto a calcolare convenzionalmente le date programmatiche mancanti utilizzando la seguente procedura:

Fasi precedenti la T5 (affidamento dell'appalto)

la prima data disponibile di ultimazione di una fase viene considerata come data di ultimazione anche per le fasi precedenti;

qualora manchi la data di ultimazione di uno o più fasi intermedie (ad esempio la T2 e la T3 avendo disponibili le date relative alla T1 ed alla T4), queste vengono calcolate mediando la data immediatamente precedente con quella immediatamente successiva (la differenza in giorni calcolata tra la prima fase precedente e la prima fase successiva viene divisa per il numero delle fasi per le quali manca la data di ultimazione);

Fasi intermedie tra la T5 (affidamento dell'appalto) e la TF (piena funzionalità delle opere)

le date mancanti vengono calcolate mediando la data immediatamente precedente con quella immediatamente successiva (la differenza in giorni calcolata tra la prima fase precedente e la prima fase successiva viene divisa per il numero delle fasi per le quali manca la data di ultimazione).

I cronogrammi sono stati presentati sotto forma di Diagramma di Gantt in cui a ciascuna fase del processo di attuazione corrispondono tre barre di colore diverso, con riferimento a tre scenari temporali:

la previsione programmatica (colore nero)

la previsione rimodulata al precedente momento di rilevazione (colore verde)

la previsione rimodulata all'attuale momento di rilevazione (colore rosso)

Sul diagramma sono state anche indicate le date sulla base delle quali il cronogramma è stato costruito, evidenziando con un asterisco quelle calcolate secondo le procedure sopra descritte.

Sul diagramma è stato inoltre sempre evidenziata la data del 31.10.1999.

- Elaborazione dei coefficienti di criticità

Nel trimestre di riferimento è stata apportata una modifica alla metodologia di calcolo già approfonditamente illustrata nel Rapporto precedente. Al fine di rendere più significativo l'indice di criticità per gli interventi che si trovano in fase di esecuzione dei lavori, infatti, è apparso opportuno adottare un criterio per la valutazione della durata residua dei lavori che tiene conto di 2 distinti elementi:

la proiezione a fine lavori del ritmo di avanzamento effettivamente rilevato a partire dall'inizio lavori, sintetizzabile nella formula

$Tr = Ttr * (1-X) / X$ dove

Tr = tempo residuo previsto;

Ttr = tempo trascorso dall'inizio lavori fino alla rilevazione;

X = indice di avanzamento, compreso tra 0 e 1 (valore percentuale / 100).

Secondo questo criterio, molto semplicemente, se per il 25% dei lavori si sono impiegati 2 mesi, per il restante 75% se ne prevedono altri 6.

Il problema di questo criterio, da solo, è che fornisce indicazioni tanto meno significative, quanto più piccolo è l'avanzamento, sia perchè il campione è esiguo, sia perchè l'andamento nelle fasi iniziali può avere aspetti particolari, sia perchè la previsione può risentire fortemente di piccoli errori di valutazione (un errore nella stima dell'avanzamento dal 15% al 10% aumenta la durata residua prevista del 59%). Inoltre il modello non è in grado di fornire indicazioni per avanzamento pari a 0 (la durata tende all'infinito e l'applicazione della formula produrrebbe un errore di divisione per 0).

Si è pertanto introdotto un secondo criterio, parallelo al primo, basato sulla quota residua della durata totale programmata

$Tr = Tpg * (1-X)$ dove

Tpg = tempo totale programmato (gli altri simboli conservano il significato visto sopra).

In definitiva, la previsione è ottenuta dalla media ponderale dei due criteri, utilizzando come pesi, rispettivamente, lo stesso indice di avanzamento dei lavori ed il suo complemento a 1, corrispondente alla quota parte residua. Si ottiene così di rendere poco influente il primo criterio quando l'avanzamento è piccolo e, viceversa, di rendere poco influente il secondo quando la storia del già fatto risulta maggiormente significativa. La formula completa pertanto è la seguente:

$$Tr = Tr1 * X + Tr2 * (1-X) = Ttr * (1-X) + Tpg * (1-X)^2$$

- Stato di attuazione complessivo

Come già evidenziato in precedenza, dei n. 1.174 interventi cui il secondo Rapporto si riferisce, n. 23 interventi sono di competenza INAIL e n. 51 sono di competenza dell'ENTE POSTE e raggruppati a livello nazionale. In ambito "regionale", pertanto, sono stati considerati n. 1.100 interventi, per un importo di finanziamenti concessi pari a L./Mil. 1.861,6.

Detti interventi, in forma tabellare ed in forma grafica, sono stati raggruppati per Regioni e per Categoria. Nel complesso, la ripartizione per categoria è la seguente:

	Interventi		Importo	
	n.	%	L./Mil.	%
Lavori	826	75,1%	1619,7	87,0%
Forniture	70	6,4%	126,8	6,8%
Beni Culturali	56	5,1%	115,1	6,2%
Privati	148	13,5%	0	0,0%
Totale	1.100	100,0%	1.861,6	100,0%

Nel complesso, la ripartizione degli interventi (Privati esclusi) in funzione della fase in corso di attuazione è la seguente:

T1/nd	36	4,4%	5	7,1%	1	1,8%	42	4,4%
T2	0	0,0%					0	0,0%
T3	2	0,2%	1	1,4%	0	0,0%	3	0,3%
T4	5	0,6%					6	0,6%
T5	15	1,8%	5	7,1%	0	0,0%	20	2,1%
T6	15	1,8%	7	10,0%	0	0,0%	22	2,3%
T7	5	0,6%	4	5,7%	0	0,0%	9	0,9%
T8	678	82,1%	43	61,4%	53	94,6%	774	81,3%
T9	51	6,2%	2	2,9%	2	3,6%	55	5,8%
TF	4	0,5%	2	2,9%	0	0,0%	6	0,6%
Compl.	15	1,8%		0,0%	0	0,0%	15	1,6%
Totale	826	100,0%	70	100,0%	56	100,0%	952	100,0%

Nel complesso, dunque, l'81,3% degli interventi si trova in fase di esecuzione dei lavori (rispetto al 72% della rilevazione al 31.5.1999) e l'8% risulta in una fase successiva o completato (rispetto al 2% della rilevazione al 31.5.1999).

Nel complesso, la ripartizione degli interventi (Privati esclusi) in funzione del livello di criticità è la seguente:

Criticità	Interventi (privati esclusi)	
	Numero	%
ALTA	506	66
MEDIA	38	5
BASSA	218	29
Totale	762	100.0
Non calcolabile	190	

Per completezza di informazione, infine, sono state altresì presentate le informazioni relative a:

Interventi completati

Interventi di competenza INAIL;

Interventi di competenza ENTE POSTE accorpati.

- Stato di attuazione per categoria

Categoria lavori

Il Piano comprende 826 interventi della categoria Lavori, per un costo totale stimato di L./Mld.

2.114,9 e Finanziamenti per L./Mld. 1619,7

Nella tabella che segue è riportato lo stato di attuazione rispetto a quanto programmato:

Fase di attuazione	Programmata		Al 15.9.99	
	Num.	%	Num.	%
T1/nd	3	0.4%	56	6.8%
T2	0	0.0%	1	0.1%
T3	0	0.0%	5	0.6%
T4	0	0.0%	10	1.2%
T5	0	0.0%	21	2.5%
T6	2	0.2%	12	1.5%
T7	4	0.5%	7	0.8%
T8	375	45.4%	650	78.7%
T9	216	26.2%	45	5.4%
TF	123	14.9%	4	0.5%
Compl.	103	12.5%	15	1.8%
Totale	826	100.0%	826	100.0%

Complessivamente, gli interventi in esame presentano i seguenti livelli di criticità:

Criticità	Interventi	
	Numero	%
ALTA	431	64
MEDIA	37	6
BASSA	204	30
Totale	672	100.0
Non calcolabile	154	

Categoria forniture

Il Piano comprende 70 interventi della categoria Forniture, per un costo totale stimato di L./Mld. 177,0 e Finanziamenti per L./Mld. 126,8

Nella tabella che segue è riportato lo stato di attuazione rispetto a quanto programmato:

Fase di attuazione	Programmata		Al 15.9.99	
	Num.	%	Num.	%
T1/nd	0	0.0%	5	7.1%
T3	0	0.0%	1	1.4%
T5	2	2.9%	6	8.6%
T6	0	0.0%	7	10.0%
T7	0	0.0%	4	5.7%
T8	25	35.7%	43	61.4%
T9	12	17.1%	2	2.9%
TF	19	27.1%	0	0.0%
Compl.	12	17.1%	2	2.9%
Totale	70	100.0%	70	100.0%

Complessivamente, gli interventi in esame presentano i seguenti livelli di criticità:

Criticità	Interventi	
	Numero	%
ALTA	46	92
MEDIA	1	2
BASSA	3	6
Totale	50	100.0
Non calcolabile	20	

Categoria beni culturali

Il Piano comprende 56 interventi della categoria Beni culturali, per un costo totale stimato di L./Mld. 124,1 e Finanziamenti richiesti per L./Mld. 115,1.

Nella tabella che segue è riportato lo stato di attuazione rispetto a quanto programmato:


Fase di attuazione	Programmata		Al 15.9.99	
	Num.	%	Num.	%
T1/nd	0	0.0%	1	1.8%
T3	0	0.0%	0	0.0%
T5	0	0.0%	0	0.0%
T6	0	0.0%	0	0.0%
T7	0	0.0%	0	0.0%
T8	17	30.4%	53	94.6%
T9	30	53.6%	2	3.6%
TF	5	8.9%	0	0.0%
Compl.	4	7.1%	0	0.0%
Totale	56	100.0%	56	100.0%

Complessivamente, gli interventi in esame presentano i seguenti livelli di criticità:


Criticità	Interventi	
	Numero	%
ALTA	29	72
MEDIA	0	0
BASSA	11	28
Totale	40	100.0
Non calcolabile	16	



ALLEGATI AL SECONDO RAPPORTO TRIMESTRALE (ESTRATTO)

Numero interventi con categoria "BC" suddivisi per fase del processo di attuazione in corso

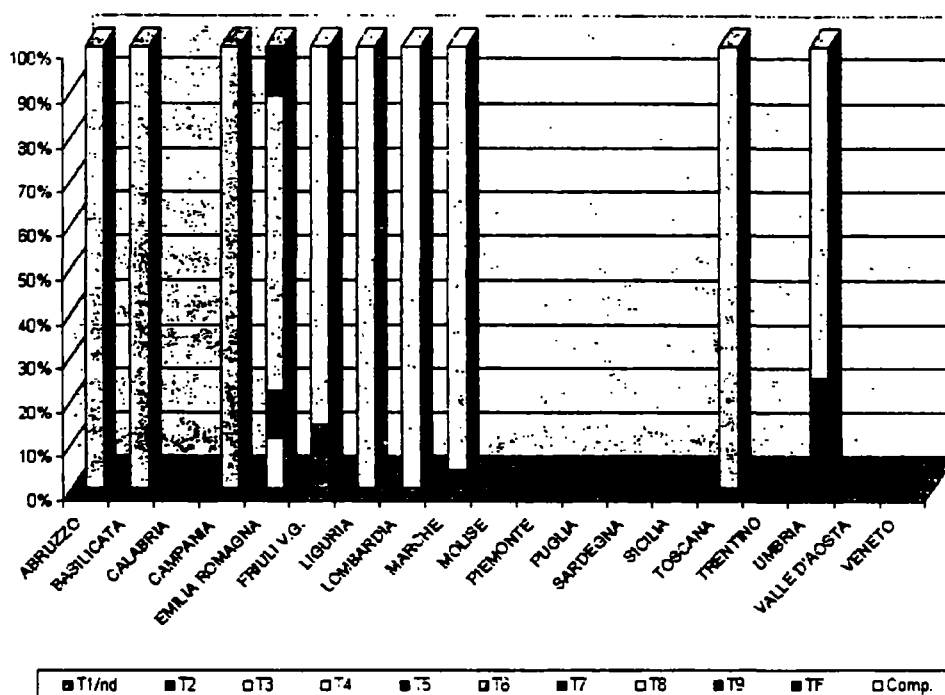


Numero interventi con categoria "F" suddivisi per fase del processo di attuazione in corso

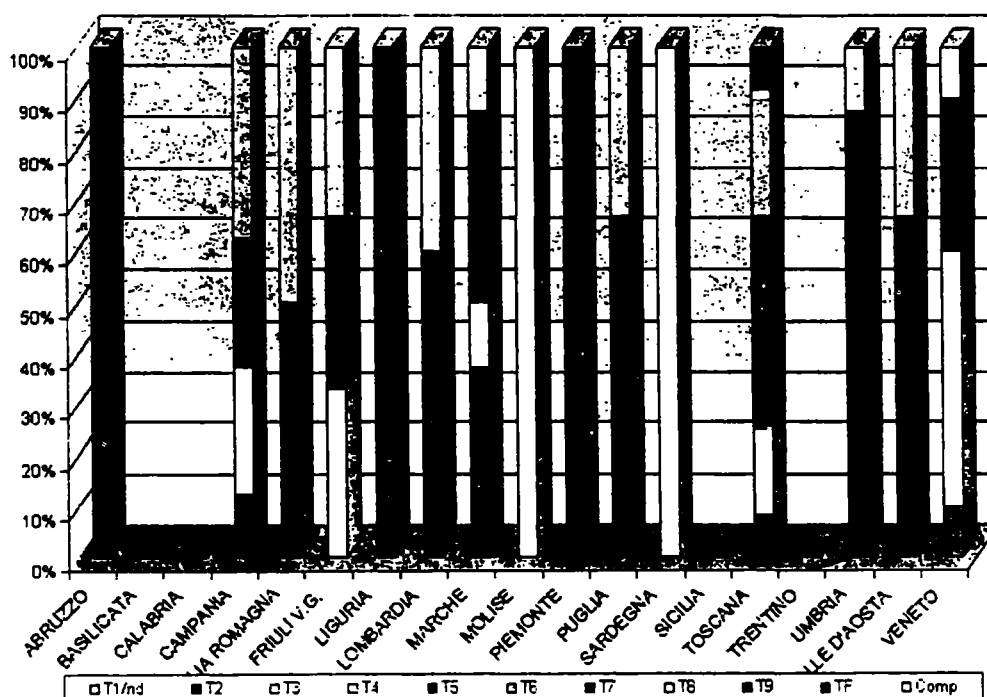

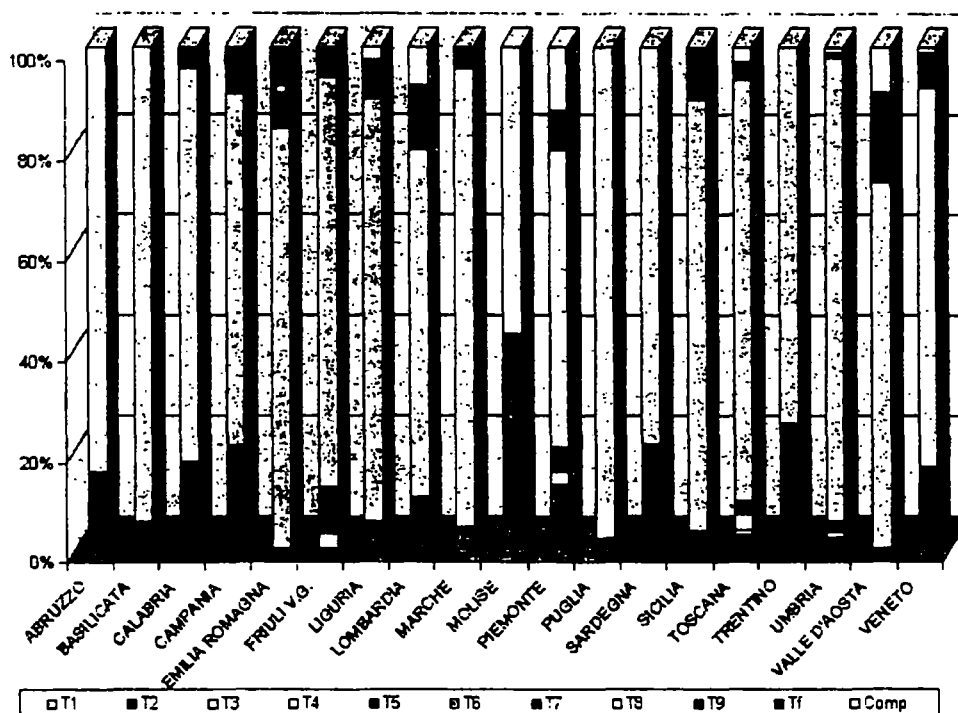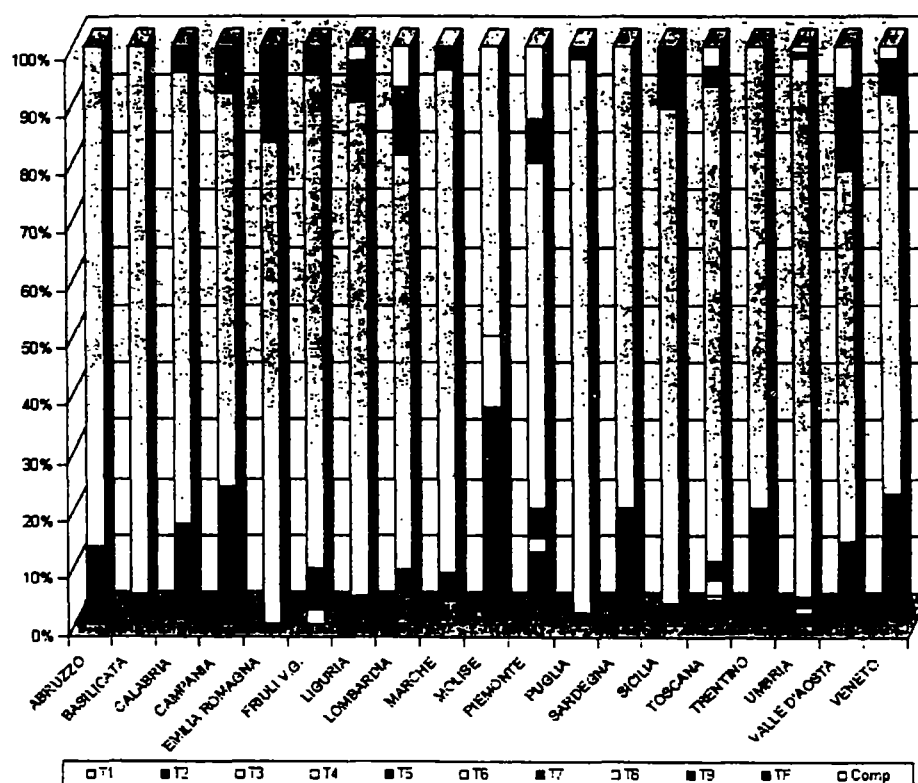Numero interventi con categoria "L" suddivisi per fase del processo di attuazione in corso**Numero degli interventi suddivisi per fase del processo di attuazione in corso**

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero degli interventi, per Regione, suddivisi in base al livello della criticità calcolata all'ultima fase del processo di attuazione conclusa

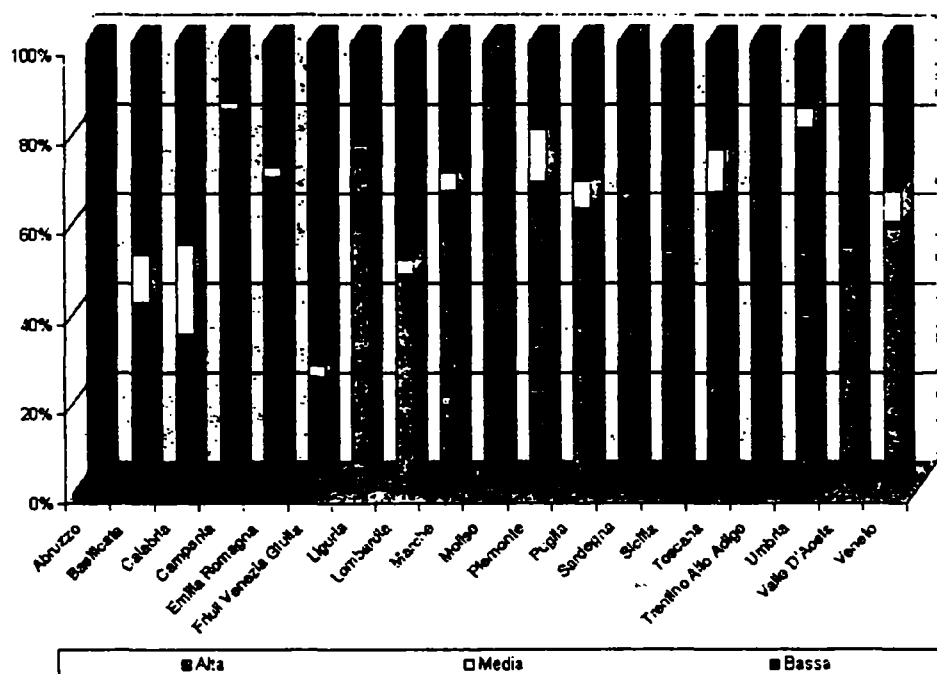

PAGINA BIANCA

5. PARTE QUINTA - IL PIANO ENIT E LA TASK FORCE PER LA COMUNICAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

5.1. Il Piano ENIT e la Task Force per la Comunicazione presso la Presidenza del Consiglio.

La legge 270/97 affidava all'ENIT il compito di effettuare la comunicazione e la promozione nell'ambito delle sue attività istituzionali.

Successivamente, il Decreto del Ministro Costa, di fissazione delle procedure di costruzione del Piano degli Interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio, ha previsto la presentazione da parte del Ministro delegato per Roma Capitale e Giubileo 2000 di un Programma dettagliato di iniziative di comunicazione e di promozione mirato anche a garantire la compatibilità non solo con il Piano stesso ma anche con il Piano "Roma e Lazio".

Le attività dell'ENIT diventano così complementari alle altre iniziative inerenti al Giubileo finanziate dallo Stato italiano.

Tutte le iniziative dell'ENIT si inseriscono in due filoni distinti ma collegati: il primo intende contribuire alla gestione ottimale dei flussi turistici nell'Anno Santo a livello nazionale, regionale e locale, e il secondo intende favorire la valorizzazione del prodotto turistico nazionale.

A prescindere dai contenuti del Programma, esso deve rispondere ed in effetti risponde ad alcune esigenze di tipo generale.

La prima esigenza è che tutte le iniziative di comunicazione e di promozione siano basate su uno scenario unico e condivisibile: l'evento del Grande Giubileo. Questo scenario è quello utilizzato dalla Commissione e descritto altrove. Gli input per questo scenario sono - da un lato - il quadro regionalizzato del flusso turistico previsto per il 2000 e - dall'altro - la realizzazione di nuove offerte, strutture ricettive, eventi e itinerari turistico - religiosi prevista dai Piani.

La seconda esigenza è che le iniziative di comunicazione e di promozione siano concertate e coordinate con quelle programmate dagli altri soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell'organizzazione del Giubileo (ad esempio il Dipartimento per il Turismo, il Vaticano, il TCI, Regioni, Province, Comuni, l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo, le Associazioni di Imprese, i gestori di importanti nodi di trasporto - come FS, Società Autostrade, Aeroporti e Porti - e le Amministrazioni Locali), anche per utilizzare al meglio le risorse finanziarie disponibili. In particolare si deve curare il rapporto tra comunicazione e promozione all'estero, oggetto di questo Programma, e in Italia e, ancora più specificamente, quello tra le stesse iniziative per il pacchetto Roma e Lazio e quelle che riguardano il resto d'Italia.

La terza esigenza di fondo riguarda le intese che dovranno essere cercate anche con altri attori non direttamente coinvolti dal Piano, come ad esempio gli enti ecclesiastici all'estero (usufruendo della rete gestita dalla Santa Sede in questo momento), i tour operators specializzati nei viaggi a sfondo religioso nei paesi dove la partecipazione dei fedeli cattolici risulta essere più attiva ed il Comitato degli Italiani all'Estero (COMITES).

Oltre a rispondere alle finalità generali suindicate, il Programma delle Iniziative di Comunicazione e di Promozione contiene anche una serie di indicazioni circa il contenuto dei messaggi da diffondere, i segmenti di mercato ai quali questi messaggi vanno indirizzati ed i canali più

appropriati di diffusione.

Il primo elemento che connota il programma è quello di essere di respiro nazionale per promuovere un unico marchio italiano ed escludere destinazioni particolari. Un secondo aspetto rilevante è che il Programma si propone di essere non solo strumento di promozione ma soprattutto uno strumento di orientamento e di gestione dei flussi di visitatori, sia a livello nazionale che a livello locale.

Molti, ed in particolare gli operatori turistici, temono infatti che il Giubileo provochi una ricaduta negativa sul turismo abituale che interessa l'Italia poiché questo fenomeno si è verificato frequentemente nel passato in occasione di altri grandi eventi.

Un altro messaggio forte che verrà lanciato è quello di un paese che si sta organizzando seriamente ad accogliere un flusso di visitatori di eccezionali dimensioni e che questi sforzi non solo permettono a chi verrà in Italia in quell'anno di non risentire di questo improvviso aumento della domanda, ma anzi consentono che la qualità complessiva dell'offerta turistica italiana risulti migliorata strutturalmente e a beneficio di tutti i visitatori.

Ciò che è sembrato essenziale trasmettere a tutti i potenziali visitatori di quell'anno è il senso dell'evento, non solo in termini religiosi, ma anche in termini culturali, sociali ecc. Verranno inoltre comunicati tempestivamente i tempi (giornate particolari, break estivo) e le modalità degli eventi (eventi speciali e quelli ricorrenti), sulla base del calendario pastorale approvato dalla Santa Sede e dei programmi culturali adottati dai singoli soggetti istituzionalmente competenti (Teatro dell'Opera, Conservatorio di Santa Cecilia ecc.).

Mentre il Piano per il Giubileo Fuori Lazio ha cercato di concentrare i finanziamenti in alcuni progetti di primaria importanza per l'evento stesso, il Programma di Comunicazione e di Promozione offre innanzitutto un'opportunità di valorizzazione dei prodotti e delle destinazioni complementari a quelle per le quali si prevede attualmente un massiccio interesse turistico - religioso.

La promozione dell'alternativo diventa così la possibilità di canalizzare parte della pressione turistica su luoghi che a priori sono considerati meno frequentati, e contemporaneamente offre l'opportunità di promuovere località meno conosciute. Si fondono così in maniera naturale gli obiettivi di gestione e di promozione del Programma.

Particolare attenzione meriteranno le regioni Marche ed Umbria. Queste regioni, colpite dal terremoto, hanno visto calare drasticamente la domanda turistica. Siccome le loro economie dipendono fortemente dalle attività turistiche, il calo della domanda comprometterebbe la loro base economica, pertanto nel Programma di Comunicazione e di Promozione uno spazio maggiore verrà dedicato proprio a queste regioni, pur tutelando l'immagine unitaria e nazionale che tutta la operazione dovrà mantenere.

Ultimo aspetto rilevante del Programma è quello della calendarizzazione delle attività articolate in iniziative da svolgere da subito fino al 2000, iniziative da porre in essere nel corso dello stesso Anno Santo ed in quelle di follow - up da sviluppare nei primi anni dopo il Giubileo.

Il messaggio predominante nella fase pre - Giubileo dovrà essere rassicurante verso i segmenti tradizionali ed informativo verso i potenziali turisti religiosi. Invece durante il Giubileo, il messaggio che dominerà è quello di orientamento, informando in tempo reale i visitatori che stanno per arrivare sulla disponibilità di strutture e infrastrutture, collegandosi anche ai sistemi finanziati di prenotazione e di gestione dei flussi locali e regionali.

Innovativo del Programma ENIT non è soltanto l'approccio generale, ma anche il fatto che si prevede la costituzione di una specifica Task Force per la Comunicazione inerente al Giubileo presso la Presidenza del Consiglio. Membri della Task Force sono rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici, Dipartimento per il Turismo, Vaticano, Agenzia romana per la preparazione del

Giubileo, ENIT e delle Regioni. Questa Task Force, operativa da settembre 1998, avrà il compito di coordinare alcune importanti iniziative di comunicazione, di assicurarne l'omogeneità, e – infine – di monitorare le iniziative di comunicazione che sono state finanziate dallo Stato.

Il Gruppo di Lavoro per il coordinamento delle iniziative di comunicazione e di promozione del Giubileo affidate all'ENIT dalla legge 270/1997 si è riunito sei volte nel corso del 1998. Le prime tre riunioni sono state dedicate esclusivamente alla messa a punto del Piano di Comunicazione e di Promozione proposto dal Ministro dei Lavori Pubblici, approvato dalla Commissione e incluso nel Piano per il "Giubileo Fuori Lazio". Infatti questo Piano implicava ingenti cofinanziamenti a carico dell'ENIT che, viceversa non era in grado di garantire.

Sulla base delle proposte del citato Gruppo di Lavoro, per effetto delle sinergie generate dalla collaborazione tra gli attori rappresentati (sito Internet, raccolta informazioni sulle manifestazioni, ecc.), l'ENIT ha richiesto la riprogrammazione con l'eliminazione di alcuni interventi ritenuti *meno significativi* e l'accorpamento di altri, per garantire la fattibilità oltre che la funzionalità dell'intero pacchetto di iniziative.

Il Gruppo di Lavoro ha presieduto alla preparazione dei Bandi di Gara per le diverse iniziative dell'ENIT ed alcuni componenti hanno fatto parte delle commissioni aggiudicatrici dei due appalti di servizi.

Attualmente l'attività del Gruppo è focalizzata sui contenuti della comunicazione e della promozione, sui messaggi comuni diretti a guidare, ove possibile, i flussi di pellegrini e di turisti in Italia nel 2000 e negli anni successivi al mega-evento.

5.2. Aggiornamento Lavori Svolti dalla Task Force per il Coordinamento delle Iniziative per la Comunicazione e la Promozione del Giubileo 2000

Già dalla prima riunione del Gruppo di Lavoro per il Coordinamento delle Iniziative per la Comunicazione e la Promozione del Giubileo 2000 è emersa la necessità di chiarire quali possano essere i principali elementi della strategia di comunicazione che poi determineranno i contenuti delle Iniziative di Comunicazione e di Promozione da sottoporre alla Commissione e da affidare quindi all'ENIT.

Alcuni di questi elementi potevano essere trovati nel Programma di Iniziative predisposto il 21 Novembre 1998 dall'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi che parla di due obiettivi strategici distinti ma collegati, cioè quello di contribuire alla gestione ottimale dei flussi turistici nell'Anno Santo a livello nazionale, regionale e locale, e quello di favorire la valorizzazione del prodotto turistico nazionale. Tutte le iniziative di comunicazione e di promozione devono basarsi su uno scenario unico e condivisibile di quello che sarà l'Evento del Grande Giubileo, uno scenario che parte da una conoscenza della domanda, dell'offerta e delle combinazioni di prodotti/mercati che ne seguiranno. La consapevolezza che la comunicazione è un elemento fondamentale del Piano Giubileo e l'esigenza di coordinare le diverse iniziative ha portato all'istituzione di un apposito Gruppo di Lavoro presso l'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi che raccoglie i principali attori giubilari.

Oltre ad essere coordinato, il Programma delle Iniziative di Comunicazione e di Promozione contiene una serie di elementi precisi che determineranno il contenuto dei messaggi da diffondere, i segmenti di mercato ai quali questi messaggi vanno comunicati e i canali più appropriati di diffusione. Il programma ha respiro nazionale, promuovendo un unico marchio italiano ed

escludendo attenzioni per destinazioni particolari. Si propone di essere non solo uno strumento di promozione ma soprattutto uno strumento di orientamento e di gestione dei flussi di visitatori, sia a livello nazionale che a livello locale. Il messaggio principale che la campagna divulga è quello di un paese, l'Italia, che si sta organizzando seriamente a questo evento. La promozione dell'alternativo diventa, da una parte, la possibilità di dirottare una fetta della pressione turistica su luoghi che a priori possono essere meno frequentati quell'anno e, contemporaneamente, l'opportunità di promuovere località meno conosciute. Si fondono così in maniera naturale gli obiettivi di gestione con quelli di promozione del Programma.

Le sedute della Task Force si sono sempre tenute seguendo questo spirito, un approccio questo che rende valutabile e verificabile ogni singola azione proposta e presa. Più concretamente, nelle diverse sedute della Task Force che si sono svolte nel periodo a cui si riferisce questa relazione sono state portate modifiche significative al modo di allestire il sito Internet dedicato al Giubileo, allo house style di tutta la campagna di comunicazione "Più Italia che Mai", al cosiddetto piano media e agli interventi proposti dalle delegazioni ENIT all'estero. Inoltre, sono nate spontaneamente alcune iniziative di collaborazione - connesse sì alla comunicazione e all'informazione verso i cittadini ed i pellegrini ma non strettamente legate al Piano ENIT - tra gli enti rappresentati nel gruppo di Lavoro, iniziative che si auspica migliorino lo svolgimento del mega-evento. Infine, alcuni componenti del Task Force hanno rappresentato lo Stato Italiano nei diversi momenti di presentazione del Piano ENIT, suscitando non solo un forte interesse ma anche consenso riguardo l'impostazione dell'iniziativa.

5.3. Incontro di Coordinamento tra Soggetti Beneficiari Settore 'Gestione dei Flussi di Visitatori' del 14 aprile 1999

Per far fronte all'ingente numero di pellegrini che visiterà il nostro Paese ed evitare l'emergere di situazioni di disagio per visitatori ed abitanti, è stata selezionata e finanziata una serie di iniziative che mirano a sviluppare sistemi di gestione dei flussi in diverse parti d'Italia. Proprio per la procedura 'bottom-up' con cui è stato costruito il Piano Giubileo gli interventi finanziati si caratterizzano per una eterogeneità progettuale di tipo quantitativo e qualitativo.

Per rendere più omogenee e compatibili tra di loro le diverse proposte e, di conseguenza, per cercare di utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dallo Stato per la loro realizzazione, è stato deciso di avviare un processo di coordinamento tra i soggetti che stanno realizzando sistemi di gestione dei flussi di visitatori in diverse parti d'Italia. Questo processo è stato avviato con un seminario che si è tenuto il 23 giugno 1998 a Roma. Obiettivo del seminario era proprio quello di porsi come momento di confronto e riflessione sul tema della gestione dei flussi, per innescare un processo di cooperazione e coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nella costruzione di tali sistemi.

A nove mesi dal seminario, l'Ufficio ha deciso di organizzare un secondo incontro di tipo tecnico, tenutosi il 14 aprile 1999, per verificare alcuni punti: se il coordinamento auspicato dal Ministro dei Lavori Pubblici nel giugno del 98 sia stato effettivamente avviato, se ai suggerimenti forniti dall'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi per l'integrazione delle proposte sia stato dato seguito e - infine - se si possano identificare insieme, a lavori avanzati, nuove opportunità di collaborazione.

L'analisi trasversale, da una parte, di una serie di schede-progetto uniformi contenenti le principali caratteristiche strutturali degli interventi finanziati e, dall'altra, di alcuni significativi esempi di best-practice dei progetti - che era alla base della discussione del seminario del giugno del 1998 - ha evidenziato una estrema eterogeneità degli interventi proposti, sia per la varietà dei sistemi di gestione sviluppati, sia per il diverso peso attribuito, da ciascun progetto, ad ognuna delle componenti del sistema. In generale, a parte l'intervento onnicomprensivo proposto dall'Agenzia Romana per la Preparazione del Giubileo, le altre iniziative possono essere raccolte in due categorie principali:

Iniziative incentrate sull'informazione e la comunicazione, dove si presume che la gestione dei flussi avviene automaticamente una volta fornite le informazioni sui percorsi da seguire, sulla disponibilità ricettiva, sul traffico e la mobilità, ecc.

Iniziative incentrate sulla gestione e la logistica dove la necessità di gestire i flussi in loco è prioritaria, trascurando, tuttavia, la possibilità di regolamentare i visitatori già prima della partenza o durante il viaggio.

In particolare, le componenti più "forti", ossia quelle che risultano maggiormente sviluppate e dove si concentra la maggior parte degli interventi, sono la raccolta e l'erogazione delle informazioni. Meno sviluppate, o comunque meno dettagliate dal punto di vista organizzativo e gestionale, sono invece l'analisi e la previsione dei flussi, il monitoraggio, la logistica e le prenotazioni. Si ha la netta impressione che i progetti confidino troppo nelle capacità autogestionali dei visitatori, un eccesso di fiducia che alla fine potrebbe compromettere la funzionalità dei sistemi realizzati.

L'analisi indicava anche una serie di esempi di best practice, cioè alcune componenti delle proposte con caratteristiche interessanti, che possano essere seguite dagli altri soggetti titolari di finanziamenti in questo ambito.

Infatti, per quanto riguarda i sistemi di teleprenotazione, che possono essere considerati come uno degli elementi fondamentali per la logistica dei flussi, va sottolineato come in alcuni casi essi tendano ad essere limitati alla sola ricettività, trascurando altri servizi rilevanti, come il trasporto, il parcheggio, le visite ai luoghi di culto e gli eventi, nonché la prenotazione di pacchetti "all inclusive". A parte la tipologia di servizi prenotabili, l'efficacia di tali sistemi, in termini gestionali, è diversa a seconda che la prenotazione sia obbligatoria, cioè sia una condizione indispensabile per l'accesso alla città, oppure facoltativa, cioè si configuri come un servizio aggiuntivo offerto all'utente, di cui egli può usufruire o meno.

Tuttavia, lo sviluppo sinergico di tutte le componenti considerate ha notevoli effetti positivi sulla gestione complessiva. La previsione dei flussi, la raccolta, gestione ed erogazione delle informazioni rilevanti ai fini del Giubileo (trasporti, ricettività, eventi, servizi, ecc.) e, soprattutto, i tempi ed i modi in cui le comunicazioni devono essere effettuate (prima della partenza del pellegrino, durante il viaggio e in loco) necessitano, per essere efficaci, di un supporto dal punto di vista del monitoraggio e della logistica. Viceversa, l'implementazione di metodologie adeguate per il controllo e la redistribuzione dei flussi, e quindi l'ottimizzazione delle politiche di governo

della domanda, presuppone la conoscenza delle caratteristiche e delle dinamiche del mercato ed un'accurata organizzazione delle informazioni raccolte e veicolate agli utenti finali.

La necessità di controllare ed organizzare i consistenti volumi di visitatori che transiteranno su tutto il territorio italiano richiede, quindi, la realizzazione di interventi che seguano logiche omogenee e che si basino su standard comuni di azione, pur nel rispetto delle specifiche esigenze locali e delle particolarità territoriali. L'individuazione di questi standard può avvenire su due livelli.

Il primo concerne le singole componenti del sistema di gestione, e consiste nel definire gli elementi indispensabili per un'efficace progettazione del sistema e la sua messa in rete. Da questo punto di vista, l'analisi trasversale evidenziava, per ciascuna componente, alcuni elementi da non sottovalutare, come: l'adozione di metodi di previsione dei flussi sia in fase preparatoria che di monitoraggio del fenomeno; l'utilizzo di architetture aperte basate su piattaforme Internet/Intranet per la raccolta e l'erogazione di informazioni in tempo reale ed a basso costo e l'agile collegamento con tutti gli attori del sistema; l'implementazione di sistemi automatizzati, informatici e telematici, per il monitoraggio e la logistica dei flussi ed, in particolare, la distribuzione di carte multiservizi (le cosiddette smart card) e la teleprenotazione dell'alloggio e dei servizi complementari, per favorire un controllo anticipato dei flussi di domanda.

A parità di componente considerata, un secondo livello comune di azione dovrebbe svilupparsi a livello territoriale. Si tratta, in pratica, di favorire forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti che interessino parti diverse di uno stesso territorio (ad esempio una stessa regione), oppure di azioni che interessino vari territori ma lungo uno stesso itinerario (per esempio la Via Francigena, la Via Romea). In questo caso, le sinergie che si verrebbero a creare porterebbero indubbi vantaggi sia dal punto di vista informativo che gestionale.

Si auspica ovviamente che anche dopo il Giubileo i sistemi di gestione dei flussi possano contribuire ad una più efficace gestione del turismo in alcune parti del paese. Un ulteriore sforzo di coordinamento tra i singoli sistemi potrebbe eventualmente portare ad un unico sistema nazionale di informazione turistica e di gestione dei flussi. Anche se troppi tentativi di questo tipo sono falliti in passato è forse presto per avere concrete speranze. Tuttavia, solo nel corso di realizzazione dei progetti si sono dovute affrontare scelte più precise di metodi di lavoro e di tecnologie adottate e quindi si possono presentare ulteriori momenti di coordinamento e di collaborazione che rendono più efficace ed efficiente questo settore del Piano Giubileo Lazio e Fuori Lazio.

L'incontro del 14 aprile 1999, dove erano presenti tutti i rappresentanti dei progetti di gestione dei flussi in molti casi accompagnati da loro tecnici, ha di fatto potuto dare un nuovo impulso agli scambi di idee e di know-how tra soggetti e, quindi, si auspica che renderà ancora più efficiente ed efficace l'investimento pubblico in questi sistemi.

APPENDICE**I Decreti**

Rep. N. 187/RC del 9 febbraio 1999

Legge 7 agosto 1997, n. 270. Approvazione di ulteriori modificazioni ed integrazioni al Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, di cui alla deliberazione n. 9 del 27 gennaio 1999 della Commissione ex art. 2 stessa legge.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario n. 218 alla G. U. n. 247 del 22 ottobre 1997;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 122 del 28 maggio 1998 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 9/99, adottata in data 27 gennaio 1999 dalla Commissione ex lege n. 270/97;

CONSIDERATO che a seguito dell'intervenuta approvazione del quadro tecnico-economico di progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto degli interventi di cui all "A" sono risultate necessarie, per la relativa realizzazione minori occorrenze finanziarie pari ad un ammontare di £ 31.069.730.000;

RITENUTO di prendere atto della rinuncia al finanziamento, formulata dai soggetti titolari degli interventi sotto indicati:

- n. 1681 "Risanamento conservativo corpo est aule scolastiche, trasformazione in camere per ricettività a basso costo con relativi servizi" £. 960.000.000

- n. 3173 "Centro Casa del Carmelo" £. 2.100.000.000

che vengono, pertanto, cancellati dal Piano;

RITENUTO di disporre il definanziamento totale, con il conseguente recupero di £ 131.000.000, dell'intervento rubricato:

n. 5645 "Ristrutturazione dei servizi igienici per il pubblico nel contesto del complesso di Monte Berico, con la realizzazione di un servizio per disabili compresa la realizzazione di un impianto servoscala",

per l'intervenuta realizzazione dei lavori a totale carico del soggetto proponente;

RITENUTO di prendere atto della rinuncia al finanziamento formulata dal titolare dell'intervento rubricato:

n. 4530 "Recupero della Cripta medioevale per accoglienza dei pellegrini",

il cui stanziamento è ridotto da £ 620.000.000 a £ 59.000.000, con una economia immediata pari a £ 561.000.000, fatta salva la maggior somma che risulterà all'esito della procedura contabile di recupero delle somme già trasferite e non utilizzate;

RITENUTO di assentire alle richieste di riduzione delle quote di cofinanziamento, conseguenti alla riduzione del costo degli interventi, in quanto tali da non precludere la piena funzionalità degli interventi stessi, nella loro originaria configurazione;

RITENUTO di prendere atto dell'incremento delle quote di cofinanziamento proposte da taluni soggetti beneficiari e del conseguente aumento del costo stimato dell'intervento, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

RITENUTO di accogliere la ulteriore richiesta di disaggregazione dell'intervento rubricato con n. 6104, disposto con D. M. del 6 agosto 1998, pubblicato su G.U. n. 252 del 28 10 1998, al fine di razionalizzare le procedure realizzative con conseguente modifica del titolo e della ripartizione della quota di finanziamento e di cofinanziamento;

RITENUTO di accogliere le richieste di differimento dei termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97, concernenti rispettivamente il perfezionamento degli adempimenti amministrativi ed il completamento degli interventi, in quanto compatibili con la realizzazione degli stessi nel rispetto del termine finale indicato dalla legge;

RITENUTO di accogliere la richiesta formulata dall'Ente Arcidiocesi di Firenze, soggetto beneficiario dell'intervento rubricato con n. 4062, in ordine al subentro nella titolarità dell'intervento medesimo, da parte del Convitto Ecclesiastico della Calza, quale usuario dell'immobile oggetto dei lavori;

RITENUTO di dover rettificare il D.M. n. 183/RC del 27 gennaio 1999, approvativo della delibera della Commissione n. 8/98 del 16 dicembre 1998, nella parte in cui dispone il definanziamento totale per £ 1.800.000.000 dell'intervento rubricato con n. 897 "Recupero e riorganizzazione funzionale del Chiostro monumentale del Convento di San Lorenzo da adibire a ricettività in comunità religiose e i relativi servizi", anziché il definanziamento parziale per £ 1.620.000.000, avendo l'U.R.C.G.E. già provveduto a trasferire al soggetto beneficiario £ 180.000.000, a titolo di anticipazione per gli oneri di progettazione;

RITENUTO, sulla base della documentata richiesta dei soggetti titolari, di accogliere il cambio del titolo di taluni interventi in conseguenza della diversa localizzazione o tipologia realizzativa;

RITENUTO di dover correggere alcuni errori materiali segnalati dai soggetti interessati ed attinenti la localizzazione o l'individuazione del soggetto beneficiario relativo;

RITENUTO di includere nel Piano nuovi interventi, in quanto coerenti con i criteri di cui al D.M. 17 settembre 1997 ed anche in conformità al parere n. 582 espresso dalla Conferenza Stato-Regioni in data 29 dicembre 1998, relativamente agli interventi localizzati nella regione Toscana ed afferenti la proposta di modificazione del Piano, approvata dalla Commissione con deliberazione n. 8 del 16 dicembre 1998, le cui statuizioni, in parte de qua, sono state stralciate con relativo D.M. di approvazione n. 183/RC del 27 gennaio 1999;

VISTO il parere favorevole n. 609, reso dalla Conferenza Stato-Regioni in data 4 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997 sulla deliberazione n. 9 del 28 gennaio 1999 della Commissione di cui all'art. 2 della stessa legge;

All'unanimità

DECRETA

- 1. A seguito dell'approvazione del quadro tecnico-economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'allegato A, nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £. 31.069.730.000.*
- 2. Sono totalmente definanziati, su richiesta dei rispettivi soggetti titolari, gli interventi sottoindicati, per un ammontare complessivo di £ 3.060.000.000:*

- n. 1681 "Risanamento conservativo corpo est aule scolastiche, trasformazione in camere per ricettività a basso costo con relativi servizi" £. 960.000.000

- n. 3173 "Centro Casa del Carmelo" £. 2.100.000.000

3. E' totalmente defanziato, per un ammontare di £. 131.000.000, le conseguentemente cancellato dal Piano l'intervento rubricato:

n. 5645 "Ristrutturazione dei servizi igienici per il pubblico nel contesto del complesso di Monte Berico, con la realizzazione di un servizio per disabili compresa la realizzazione di un impianto servoscala", avendo il titolare provveduto a realizzare i lavori a proprio totale carico.

4. E' parzialmente defanziato l'intervento rubricato con n. 4530 "Recupero della Cripta medioevale per accoglienza dei pellegrini", il cui stanziamento è ridotto da £ 620.000.000 a £ 59.000.000, con una economia immediata pari a £ 561.000.000, e fatta salva la maggior somma che risulterà all'esito della procedura contabile di recupero delle somme non utilizzate.

5. A rettifica del D. M. n. 183/RC del 27 gennaio 1999, in ordine al defanziamento totale di £ 1.800.000.000 dell'intervento rubricato con n. 897, è disposto il defanziamento parziale di £ 1.620.000.000, avendo l'URCGE già trasferito al titolare dell'intervento la somma di £ 180.000.000 per oneri di progettazione, fino all'esito del procedimento di recupero delle somme non utilizzate, previsto dall'art. 4, comma 3, della Legge n. 270/97.

6. Le risorse disponibili sono, pertanto determinate in complessive £ 44.512.172.360, pari alla somma dei seguenti importi:

- 9.690.442.360 Risorse resesi disponibili e non riassegnate con D.M. del 27 gennaio 1999, decurtate dei 180 milioni di cui al punto 5;

- 31.069.730.000 Risorse rivenienti da ribassi d'asta di cui al punto 1;

- 3.191.000.000 Risorse rivenienti da defanziamenti totali di cui ai punti 2 e 3;

- 561.000.000 Risorse rivenienti dal defanziamento parziale di cui al punto 4.

7. Sono approvati i nuovi termini di cui alle lettere c) e d), dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97, i cambi titolo e di soggetto beneficiario, le aggregazioni e disaggregazioni di interventi, come indicato nell'allegato B;

8. Sono assentite le integrazioni di finanziamento indicate nell'allegato B, per un ammontare complessivo di £ 2.430.000.000.

9. Sono inclusi nel Piano, in coerenza con le finalità della legge e sulla base di esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano medesimo gli interventi indicati nell'allegato C, per un importo complessivo di £ 41.732.000.000, restando nella disponibilità della Commissione £ 530.172.360

Roma, li 9 febbraio 1999

Il Ministro

Registrato alla Corte dei Conti il 31 marzo 1999

Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 142

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 27 gennaio 1999

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
370	San Gimignano	SI	RISTRUTTURAZIONE DI FORESTERIA ESISTENTE PER IL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OSPITALITA' A BASSO COSTO	MONASTERO DELLE MONACHE BENEDET. VALLOMBROSIANE	41.373.000
397	Nonantola	MO	OPERE DI MANUTENZIONE COMPLESSO ABBAZIALE	ARCIDIOCESI DI MODENA E NONANTOLA	916.000.000
507	Avezzano	AQ	RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO DON ORIONE PROVINCIA RELIGIOSA DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE DELLA CONGREGAZIONE DELLA PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	PROV. RELIGIOSA DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	1.322.000.000
558	Bagnacavallo	RA	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO SAN FRANCESCO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO	COMUNE DI BAGNACAVALLO	253.180.000
579	Reggio di Calabria	RC	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO OPERA ANTONIANA DELLE CALABRIE	PROV. RELIGIOSA SS. APOSTOLI	806.941.000
599	Matera	MT	CASA DEL PELLEGRINO FORESTERIA OSTELLO DELLE MONACELLE	I.P.A.B. ISTITUTO FEMMINILE SAN GIUSEPPE	617.349.000
616	Messina	ME	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO DON ORIONE APPARTENENTE ALLA PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	1.198.468.000
650	Lucca	LU	FABBRICA DEL PALAZZO RESTAURO PER RIAPERTURA AL PUBBLICO DI ITINERARI INTERNI ED ESTERNI AL PALAZZO DUCALE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	PROVINCIA DI LUCCA	514.128.000
904	San Giovanni Rotondo	FG	PARCHEGGIO MULTIPIANO NORD	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	4.273.690.000

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
1098	Lecce	LE	RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI ALTARI DELLE NAVATE LATERALI DEL CONTROSOFFITTO LIGNEO LACUNARI DELLE SALE A PIAN TERRENO E DELLE COPERTURE DELLA BASILICA DI S. CROCE	PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA' IN S. CROCE	33.470.000
1187	Brindisi	BR	RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E ARREDO DELLA SALA CONVEGNI NEL COMPLESSO RELIGIOSO DON BOSCO	ISTITUTO DON BOSCO	242.936.000
1268	Asti	AT	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX VILLA BADOGLIO	PROVINCIA DI ASTI	706.672.000
1292	Marzabotto	BO	REALIZZAZIONE DELLA SEDE E DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA DI PACE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE TRAMITE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO COLONICO IN LOCALITA' S. MARTINO	PROVINCIA DI BOLOGNA	238.287.000
1485	Bobbio	PC	RECUPERO DI AMBIENTI DELL'ANTICA ABBZIA DI S. COLOMBANO PER IL COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA CITTA'	COMUNE DI BOBBIO	153.034.000
1496	Paola	CS	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI PAOLA	341.376.000
1537	Fucecchio	FI	RECUPERO DEL PONTE FORTIFICATO DI CAPPIANO PER REALIZZAZIONE OSTELLO	COMUNE DI FUCECCHIO	373.330.000
1820	Milano	MI	CHIARAVALLE 2000-LAVORI DI RECUPERO	MONASTERO COMUNITA' CISTERCENSE CHIARAVALLE	45.760.000
2013	Saint-Marcel	AO	CASA DI ACCOGLIENZA	ISTITUTO DIOCESIANO SOSTENTAMENTO CLERO	18.000.000
2437	Catania	CT	RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE DELL' EDIFICIO DELLA DOMUS PACIS	ARCIDIOCESI DI CATANIA	125.636.000

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del

PROT. COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
2543 Caprese Michelangelo	AR	COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO EREMO DELLA CASELLA DEDICATO A SAN FRANCESCO	PARROCCHIA DI SANTA MARIA E SAN MICHELE IN CAPRESE	41.600.000
2552/b Bologna	BO	RESTAURO DELLA CAPPELLA DELL'ANNUNCIAZIONE (1° MISTERO) E DELL'ARCO DEL MELONCELLO	SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI SAN LUCA	133.900.000
2578 Aquileia	UD	RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DEGLI SCAVI DELL'AULA SETTENTRIONALE DELLA BASILICA PATRIARCALE	ARCIDIOCESI DI GORIZIA	270.341.000
2617 Messina	ME	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA FABBRICA DEL DUOMO DI MESSINA E DEGLI EDIFICI ANNESSI	ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA	635.652.000
2897 Isernia	IS	RECUPERO A FINI RICETTIVI E CREAZIONE INFRASTRUTTURE PER ACCOGLIENZA NELL'AREA DEL SANTUARIO DEI SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO	DIOCESI DI ISERNIA VENAFRO	1.816.200.000
2913 Fiesole	FI	RISTRUTTURAZIONE DI CASA CARROZZA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI	COMUNE DI FIESOLE	255.660.000
3151 Milano	MI	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. EUSTORGIO	PARROCCHIA DI S. EUSTORGIO	38.964.000
3253 Venezia	VE	OPERE RELATIVE AL RESTAURO DELL'ANTICO OSPEDALE DEI PELLEGRINI E DELLE COPERTURE DELL'INTERO COMPLESSO ARCHITETTONICO	CONGREGAZION E ARMENA MECHITARISTA	353.400.000
3627 Grottaglie	TA	RESTAURO CONSERVATIVO A FINI DI RIUTILIZZO DELLA CHIESA E CONVENTO MARIA SS. DEL MONTE CARMELO	PARROCCHIA MARIA SS. DEL MONTE	433.024.000

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
3696	Reggio Nell'Emilia	RE	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER L'ACCOGLIENZA NEL CONVENTO DELLA BASILICA DELLA MADONNA	COMUNE DI REGGIO EMILIA	205.986.000
3714	Verona	VR	OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA	COMUNE DI VERONA	525.000.000
3902	Ginosa	TA	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI RISTORAZIONE PRESIDIO SANTARIO	COMUNE DI GINOSA	96.035.000
4061	Oria	BR	RESTAURO E RIUTILIZZO DEL RITIRO MARIA IMMACOLATA DA ADIBIRE A RISTORO PELLEGRINI CENTRO DOCUMENTAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE	SEMINARIO VESCOVILE S.CARLO BORROMEO	140.000.000
4062	Firenze	FI	POTENZIAMENTO DELLA POSSIBILITA' RICETTIVA E DI ACCOGLIENZA DEL CONVENTO DELLA CALZA	ARCIDIOCESI DI FIRENZE	656.769.000
4110	Chiusi Della Verna	AR	AMMODERNAMENTO DELLA CASA PER FERIE OASI DI S. FRANCESCO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' INTERNA	ASSOCIAZIONE FEMMINILE SACRO CUORE	65.000.000
4111	Chiusi Della Verna	AR	AMMODERNAMENTO DELLA CASA PER FERIE POSTA ALL'INTERNO DEL SANTUARIO DELLA VERNA	PROVINCIA TOSCANA DEI FRATI MINORI DI S.FRANCESCO	62.000.000
4252	Monreale	PA	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA CASA DEL CLERO DI MONREALE FINALIZZATA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	ARCIDIOCESI DI MONREALE	47.499.000
4668	Mercogliano	AV	REALIZZAZIONE DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO	DIOCESI DI MONTEVERGINE	19.000.000

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del

PROT. COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
4707 Firenze	FI	IL FULIGNO RITORNA ALLA CITTA' - RECUPERO DELLA CHIESA E DEI LOCALI ANNESSI	I. P. A. B. EDUCATORIO DELLA SS. CONCEZIONE	363.472.000
4767 Bari	BA	OSTELLO DEL LEVANTE	ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE	1.883.654.000
4961 Pietrelcina	BN	STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E RELATIVI SERVIZI LUNGO IL CAMMINO DEL ROSARIO DI PADRE PIO	COMUNE DI PIETRELcina	1.587.320.000
4994 Albenga	SV	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CATTEDRALE DI SAN MICHELE E RECUPERO DELLA PIAZZETTA DEI LEONI PROSPICIENTE L'ABSIDE	DIOCESI DI ALBENGA IMPERIA	32.592.000
4995 Albenga	SV	CONCLUSIONE DEL RESTAURO DEL BATTISTERO PALEOCRISTIANO DI ALBENGA ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO	DIOCESI DI ALBENGA IMPERIA	11.562.000
4998 Albenga	SV	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL SEMINARIO VESCOVILE DELLA DIOCESI DI ALBENGA	SEMINARIO VESCOVILE DI ALBENGA IMPERIA	171.784.000
5006 Montalcino	SI	REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A SERVIZIO DELL'ABBZIA DI S. ANTIMO PER LA SOSTA ED IL RISTORO COSTITUITA DA SPAZI PER L'ACCOGLIENZA E LOCALI DEDICATI ALLA PREGHIERA PARCHEGGIO PUBBLICO ATTREZZATO CON SERVIZI IGIENICI E RACCOLTA RIFIUTI	PARROCCHIA DI SS. FILIPPO E GIACOMO	24.702.000
5023 Bologna	BO	PARCHEGGI SCAMBIATORI CERTOSA VIA TANARI ANTISTADIO MANIFATTURA VIA MICHELINO FIERA SUD PARCO NORD CARRACCI GIURIOLO ARCOVEGGIO	COMUNE DI BOLOGNA	144.440.000
5025 Bologna	BO	PARCHEGGIO FOSCOLO PORTA SARAGOZZA	COMUNE DI BOLOGNA	364.310.000

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
5033	Bologna	BO	MANUTENZIONE E RESTAURO DEGLI ARCHI DI PASSAGGIO VIARIO DEL PORTICO DI S. LUCA TRATTO DI PIANURA	COMUNE DI BOLOGNA	128.070.000
5036	Bologna	BO	EX SCUOLA ADA NEGRI	COMUNE DI BOLOGNA	417.840.000
5039	Bologna	BO	OSTELLO DELLA GIOVENTU'	COMUNE DI BOLOGNA	269.320.000
5083	Catanzaro	CZ	RESTAURO DEL SEMINARIO REGIONALE S. PIO XI E REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI	CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA	837.525.000
5301	Siracusa	SR	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO	ENTE CHIESA SANTUARIO MADONNA DELLE LACRIME	1.199.700.000
5326	Parma	PR	RESTAURO ADEGUAMENTO PER DEPOSITO E RASSEGNA BENI CULTURALI DELLA DIOCESI DI PARMA	DIOCESI DI PARMA	89.132.000
5330	Parma	PR	OSPEDALE DI PARMA MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCH. PARCHEGGI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NELL'AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FUNZIONALE DELLA CHIESA S. FRANCESCO	AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA	565.543.000
5514	Sepino	CB	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA SANTO STEFANO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA CONFERENZE ESPOSITIVA E PRIMA ACCOGLIENZA	COMUNE DI SEPINO	41.399.000
5559	Tortona	AL	OPERE INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELLA BASILICA SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA GUARDIA	PROVINCIA RELIGIOSA DI S. MARZIANO DI DON ORIONE	72.089.000

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
5638	Aosta	AO	VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA FRANCIGENA E DEI PERCORSI PERIFERICI PER I TRATTI COMPRESI NEL TERRITORIO COMUNITARIO	COMUNITA' MONTANA GRAND COMBIN	257.760.000
5688	Aulla	MS	COMPLETAMENTO RESTAURO E REALIZZAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA FORTEZZA DELLA BRUNELLA	COMUNE DI AULLA	59.400.000
5721	Lauria	PZ	RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA NATIA DEL BEATO DOMENICO LENTINI E DELLA CASA DEL PELLEGRINO	COMUNITA' MONTANA LAGONEGRESE	58.740.000
5853	Corniglio	PR	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'ALA NORD DEL CASTELLO DI CORNIGLIO E RECUPERO FUNZIONALE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI CORNIGLIO	97.762.000
5950	Bergamo	BG	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DI EDIFICIO "CASA DELLA GIOVANE"	DIOCESI DI BERGAMO	416.459.000
6012	Matera	MT	ITINERARIO DEGLI HABITAT RUPESTRI CIRCUITO URBANO DELLE CHIESE RUPESTRI DI MATERA	ARCIDIOCESI DI MATERA IRSINA	418.660.000
6481	Montegallo	AP	COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IN LAPIDE E REALIZZAZIONE DI PICCOLO CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI	PARROCCHIA DI S. MARIA IN LAPIDE DI MONTEGALLO	26.600.000
6490	Serra De' Conti	AN	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LA CHIESA DI SAN MICHELE	COMUNE DI SERRA DE' CONTI	20.000.000
6537	Pesaro	PS	ACCOGLIENZA POVERA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO NELL'EDIFICIO DISMESSO DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE	SEMINARIO VESCOVILE	681.976.000
6656	Citta' Di Castello	PG	MUSEO DIOCESANO ADEGUAMENTI ED ABBATTIMENTO BARRIERE	DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO	51.209.000
6663	Citta' Di Castello	PG	RISTRUTTURAZIONE EX CASA DEI CANONICI CITTADELLA SAN FLORIDO	DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO	153.755.000

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
6712	Citta' Di Castello	PG	MUSEO DIOCESANO AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO	DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO	22.663.000
6989	Lugnano In Teverina	TR	RESTAURO E RECUPERO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL CONVENTO DEI CAPPUCINI	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	419.548.000
7167	Sant'Anatolia Di Narco	PG	CASA RELIGIOSA DI ACCOGLIENZA POVERA IN SAN FELICE	ARCIDIOCESI DI SPOLETO	321.603.000
7351	Loreto	AN	CASA DI ACCOGLIENZA PER GIOVANI E PELLEGRINI VILLA PIO XII	PROV. ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI	138.100.000
7465	Ancona	AN	SOSTA PULLMAN BANCHINA PORTUALE	COMUNE DI ANCONA	286.140.000
7502	Tolentino	MC	RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI RICETTIVITA' POVERA	COMUNE DI TOLENTINO	80.425.000
7503	Tolentino	MC	RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER REALIZZARE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	COMUNE DI TOLENTINO	82.436.000
7505	Tolentino	MC	RESTAURO AFFRESCHI CHIOSTRO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	COMUNE DI TOLENTINO	22.479.000
7506	Tolentino	MC	RESTAURO COLONNATO CHIOSTRO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	COMUNE DI TOLENTINO	14.739.000
7570	Bevagna	PG	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'EX CONVENTO DEI SS. DOMENICO E GIACOMO IN BEVAGNA DA ADIBIRSI A RICETTIVITA' POVERA	COMUNE DI BEVAGNA	234.016.000

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
7663	Carbonara Al Ticino	PV	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO ED ARTISTICO DEI COMUNI DELLA FASCIA LITORANEA OCCIDENTALE DEL TICINO SULLA ANTICA VIA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI CARBONARA AL TICINO	82.978.000
11243	Lagonegro	PZ	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO MADONNA DEGLI ANGELI	PARROCCHIA S. NICOLA DI BARI	900.168.000
Numero interventi		78		Totale	31.069.730.000

Allegato "B"

Riunione commissione ex lege n. 270/97 del 27 gennaio 1999

modifiche (*) degli interventi inclusi nel Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio

Y° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Lett. C)	Note Lett. D)
227	AA - 12 - ED - M	CALENDASCO	IL GIUOCO DI SIERICO APPRODO VIABILITÀ E OPERE ACCESSORIE	COMUNE DI CALENDASCO	270	270	0	03/02/99	31/10/99 PROROGA TERMINE LETT. C) - D)
237	AC - 28 - ED - B	GENOVA	RECUPERO DI UNA CHIESA SEICENTESCA QUALE CENTRO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI TURISTICI	CONGREGAZIONE OPERAI EVANG. FRANCONIANI	4.478	2.998	1.480		
394	AC - 14 - GA - L	FIORANO MODENESE	RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASA DEL PELLEGRINO A SERVIZIO DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE NEL CASTELLO	ENTE DIOC. SALVEZZA E EDUCAZIONE	1.399	700	699	31/01/99	30/10/99 PROROGA TERMINE LETT. C) - D)
459	AA - 12 - ED - M	LAVAGNA	RESTAURO CONSERVATIVO TORRE DEI FIESCHI STRUTTURE E SERVIZI INFORMATIVI	COMUNE DI LAVAGNA	987	980	107		
643	AC - 12 - GA - M	MONTEROSSO AL MARE	COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SOVIORE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO PER FUNZIONI DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO (REFEZIONE ED OSPITALITÀ)	SANTUARIO DI N.S. DI SOVIORE	4.328	4.058	270	28/02/99	PROROGA TERMINE LETT. C)
								23/01/99	PROROGA TERMINE LETT. C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 1 di 11

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

№ Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. C)	Termini Let. D)	Note
742	AB-26-HA-M	CAGLIARI	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - V. R.	ENTE POSTE ITALIANE	22	17	5			
								28/01/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
897	AC-31-GA-L	VICENZA	RESTAURO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL CHOSTRO MONUMENTALE DEL CONVENTO DA ADIBIRE A RICETTIVITA' IN COMUNITA' RELIGIOSA E RELATIVI SERVIZI	COMUNITA' FRANCESCANI MINORI CONVENT.	2.182	1.800	382			ASSEGNAZIONE FINANZIARIA DI L. 188.000.000 PER DEFINIZIONE PARZIALE IL LUOGO DEL DEFINIZIONE TOTALE DISPOSTO CON DELIBERA DEL 16/12/98
1133	AC-11-FD-L	CAROVIGNO	RESTAURO RECUPERO DEL SANTUARIO DI MARIA SANTISSIMA DI BELVEDERE E DEGLI IMMOBILI ADJACENTI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL SANTUARIO MARIA S.S. DI BELVEDERE ED AMPLIAMENTO CON NUOVA STRUTTURA RICETTIVA	PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO	1.390	1.380	0			MODIFICA TITOLO
1183	BA-26-FD-M	S. GIOVANNI ROTONDO MANFREDONIA	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA'	IMMOBILIARE FRANCESCO CAOCARO SRL	4.700	0	4.700			MODIFICA LOCALIZZAZIONE
1681	AA-26-FD-L	UDINE	RISANAMENTO CONSERVATIVO CORPO EST EX ALLE SCOLASTICHE RICETTIVITA' A BASSO COSTO CON RELATIVI SERVIZI	ISTITUTO MONS. F. TOMADINI I.P.A.B.	1.200	960	240			DEFINIZIONE TOTALE DI L. 960.000.000
1857	AC-12-GA-M	CHIOGGIA	CENTRO ACCOGLIENZA SALESIANA 2001 TURISMO GIOVANILE	ISTITUTO SALESIANO S. MARCO	538	488	50			PROROGA TERMINE LETT. C)
								8/2/99		PROROGA TERMINE LETT. C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 2 di 11

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urgo	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Lezz. C)	Termini Lezz. D)	Note
1912	AC-12-1A-L	SAN MARCO IN LAMIS	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL CONVENTO DI SAN MATTEO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	PROV. S. MICHELE ARCANGELO DEI FRATI M.	5.085	4.166	930			
								28/2/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
1988	AC-12-1A-B	TORTONA	RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO E ARTISTICO DELL'ABBAZIA CISTERCENSE DI S.M. ASSUNTA DI RIVALLTA SCRIVA	PARROCCHIA S. M. ASSUNTA ABBAZIA CISTERCENSE	3.410	2.760	650			
								30/11/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
2012	AD-12-1A-M	AOSTA	CASA ACCOGLIENZA BARILLIER	ENTE MOR. ASILO PRINC. AMEDEO ECOLE MATERNELLE	2.485	900	1.585			
								12/10/98	30/10/99	PROROGA TERMINE LETT. C) - D)
2055	AA-41-1A-B	CIMITILE	VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLE PRESENZE ARCHITETTONICHE DEL CRISTIANESIMO DELLE ORIGINI A NAPOLI E PROVINCIA - COMPLESSO MONUMENTALE DELLE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITILE	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI NAPOLI E PROV.	5.100	3.400	1.700			
										INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 508.000.000
2357	AC-26-CB-M	PIAZZA ARMERINA	RIUTILIZZO DI UN'ALA DISMESSA DELL'EX MONASTERO BENEDETTINO DI SAN GIOVANNI DA ADIBIRE CASA PER FERIE CON ANNESSA SALA	OPERA PIA CARMELA TRIGONA DI GERAGI	963	933	20			
								17/12/98	15/7/99	PROROGA TERMINE LETT. C) - D)
2358	AC-26-FB-L	UDINE	OSTELLO PER LA GIOVENTU'	PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE SPOSO B.V.M.	301	200	101			
								15/02/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
2405	AC-14-CB-M	RUINO	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIUBILARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELL'EX CANONICA DELLA PARROCCHIA DI RUINO	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO	508	508	0			
								26/10/98		PROROGA TERMINE LETT. C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 3 di 11

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Uрге	Codice	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Lett. C)	Termini Lett. D)	Note
2440	AA - 12 - FD - M	CASTELL'AZZARA	RECUPERO DI VILLA SFORZESCA	COMUNE DI CASTELL'AZZARA	6.000	6.500	500			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 620.000.000
2443	BA - 25 - FD - M	SAN GIOVANNI ROTONDO	AFFITTACAMERE SCARALE	SCARALE FILOMENA	287	0	287			
2552/A	AC - 53 - IA - B	BOLOGNA	RESTAURO DEL TRATTO URBANO DEL PORTICO DI S. LUCA, ARCHI DA 1 A 68 E DA 214 A 299	SANT. DELLA B. V. DI SAN LUCA	2.086	1.716	350			MODIFICA SOGGETTO BENEFICIARIO
2552/B	AC - 53 - IA - B	BOLOGNA	RESTAURO DELLA CAPPELLA DELL'ANNUNCIAZIONE (I MISTERO) E DELL'ARCO DEL MELONCELLO	SANT. DELLA B. V. DI SAN LUCA	932	782	150	21/12/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
2617	AC - 26 - IA - B	MESSINA	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA FABBRICA DEL DUOMO DI MESSINA E DEGLI EDIFICI ANNESSI	ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI	4.145	4.000	145	21/12/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
2839	AA - 26 - IA - B	CAGLIARI	ANFITEATRO ROMANO - OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE	COMUNE DI CAGLIARI	6.500	3.000	3.500	07/11/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
2847/A	AA - 26 - IA - B	CAGLIARI	RESTAURO CATTEDRALE E LOCALI ADIACENTI	ENTE DIOCESI CATTEDRALE DI CAGLIARI	5.126	5.126	0	31/10/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
2847/B	AA - 26 - IA - B	CAGLIARI	RESTAURO LOCALI ADIACENTI AL CATTEDRALE IN VIA FOSSARIO	ENTE PARROCCHIA DI S. CECILIA	2.900	2.900	0	31/12/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
2847/C	AA - 26 - IA - B	CAGLIARI	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VICO DUOMO	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI CAGLIARI	1.090	1.090	0	31/12/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
								31/12/98		PROROGA TERMINE LETT. C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 4 di 11

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

V° Prot. Urge	Codice Urg	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Terminal Let. c)	Terminal Let. d)	Note
3034	AA - 41 - EA - L	FIRENZE	AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SOSTANZIAMENTO BUS TURISTICI A FIRENZE SUO	COMUNE DI FIRENZE	3.710	3.154	556			
								16/01/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
3173	AD - 22 - FD - M	LORETO	CENTRO CASA DEL CARMELO	DEL. PONTIFICIA SANT. DELLA SANTA CASA	2.100	2.100	0			
										DEFINANZIAMENTO TOTALE DI L. 2.100.000.000
3194	AA - 41 - EL - M	FIRENZE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO ORTICOLTURA E PARNASO	COMUNE DI FIRENZE	2.100	1.889	231			
								10/02/99	30/10/99	PROROGA TERMINE LETT. C) - D)
3315	AA - 41 - LC - B	FIRENZE	CHIESA DI S. M. NOVELLA E CHIOSTRI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE TVCC RIVELAZIONE INCENDIO E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE	COMUNE DI FIRENZE	1.931	1.481	470			
								12/01/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
3508	AC - 12 - GA - M	AREZZO	RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX CONVENTO DI SAN PIER PICCOLO	DIOCESI DI AREZZO CORTONA SANSEPOLCRO	1.318	1.200	118			
								19/11/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
3510	AA - 41 - FB - L	FIRENZE	RECUPERO LOCALI NEL COMPLESSO DEL CARMINE PER OSTELLO	COMUNE DI FIRENZE	2.847	2.250	397			
								30/01/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
3572	AC - 28 - LA - M	SAVONA	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DIOCESANO NEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAVONA	DIOCESI DI SAVONA NOU	530	530	0			
								26/09/98	31/10/99	PROROGA TERMINE LETT. C) - D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

№ Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Term. Lett. C)	Termini Term. Lett. D)	Note
3683	AA-12-EE-L	CARRODANO	RIPRISTINO DI UN TRATTO DELL' ANTICA VIA ROMEA CHE A PIEDI CONDUCEVA DA CARRODANO AL SANTUARIO DI S. DI ROVERANO AL PASSO DEL BRACCO CON RESTAURO DEL PONTE MEDIOEVALE A DUE ARCHI	COMUNE DI CARRODANO	308	258	50			
4015/A	AC-14-FD-M	ALEZIO	COMPLESSO DI ACCOGLIENZA S. MARIA DELL' ALIZZA (1° LOTTO) - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI S. MARIA DELL' ALIZZA	CURIA VESCOVILE DI NARDO - GALLIPOLI	1.340	1.340	0	30/01/99		PROROGA TERMINE LETT. Q)
4082	AC-41-GA-B	FIRENZE	POTENZIAMENTO DELLA POSSIBILITA' RICETTIVA E DI ACCOGLIENZA DEL CONVENTO DELLA CALZA	ENTE ARCIDIOSI DI FIRENZE	5.045	2.987	2.058	15/01/99		PROROGA TERMINE LETT. Q)
4104	AA-41-EF-M	FIRENZE	RIFACIMENTO CUCINA CENTRALIZZATA DELLA CENTRALE TERMICA E RELATIVE ATTREZZATURE NUOVI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI DI VIA DEI BRUNI	COMUNE DI FIRENZE	1.285	1.144	141		15/2/99	PROROGA TERMINE LETT. Q)
4108	AA-41-EA-L	FIRENZE	AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO BUS TURISTICI A FIRENZE CASTELLO	COMUNE DI FIRENZE	1.480	1.241	219		9/2/99	PROROGA TERMINE LETT. Q)
4254	AC-28-GD	CALTANISSETTA	CENTRO DI ACCOGLIENZA PER LA FORMAZIONE MORALE E RELIGIOSA	SEMINARIO VESCOVILE DI CALTANISSETTA	4.885	3.821	844	21/10/98		PROROGA TERMINE LETT. Q)
4310	AA-41-EA-M	FIRENZE	PARCHEGGIO ATTREZZATO DI SCAMBIO SERVIZI DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA STAZIONE AUTOLINEE EXTRAURBANE	COMUNE DI FIRENZE	20.320	18.862	3.858		15/01/99	PROROGA TERMINE LETT. Q)
(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto				Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi				Pagina 6 di 11		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Lett. C)	Termini Lett. D)	Note
4530	AC-23-GA-M	PADOVA	RECUPERO DELLA CRIPTA MEDIOEVALE PER ACCOGLIENZA DI PELEGRINI	MONASTERO SANTA GIUSTINA	823	820	3			
					59	59	0			DEFINANZIAMENTO PARZIALE DI L. 561.000.000
4559	AA-41-ED-M	FIRENZE	SISTEMA INFORMATICO SULLO STATO DELL'ACCESSIBILITA' DELLA CITTA'	COMUNE DI FIRENZE	300	287	33	2/01/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
4739	AA-28-EA-M	MASSA MARITTIMA	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE DI SOSTA E DELLA ACCESSIBILITA' AL CENTRO STORICO ED AL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAN CERBONE E MASSA MARITTIMA	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	5.272	1.700	3.572			
4986	BA-23-FA-M	PADOVA	RIQUALIFICAZIONE DI AREA INDUSTRIALE DISMESSA	VIBROCEMENTO VENETA S.P.A.	8.000	0	8.000			RIDUZIONE DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO E DEL COSTO TOTALE
5027	AA-53-HC-M	BOLOGNA	PERCORSI PER NON VEDENTI	COMUNE DI BOLOGNA	1.550	1.550	0	2/09/98		CANCELLAZIONE DAL PIANO PROROGA TERMINE LETT. C)
5052	AC-12-LA-B	OTTONE	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. PIETRO IN OREZZOLI	CHIESA DI S. PIETRO IN OREZZOLI	350	350	0	18/09/98	31/10/99	PROROGA TERMINE LETT. C) - D)
5083	AC-14-LA-B	CATANZARO	RESTAURO DEL SEMINARIO REGIONALE S. PIO XI E REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI/POLIVALENTI	CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA	5.537	3.037	2.500			PROROGA TERMINE LETT. C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 7 di 11

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Y° Prot. Uрге	Codice Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. C) Lett. D)	Note
5330	AA - 12 - EH - M	PARMA	OSPEDALE DI PARMA MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCH. PARCHEGGI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NELL'AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FUNZIONALE DELLA CHIESA S. FRANCESCO	3.740	3.200	540		
5523	AC - 12 - GB - B	MONTEROSSO AL MARE	RESTAURO CONSERVATIVO DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI PER UNA RIFUNZIONALIZZAZIONE QUALE STRUTTURA RICETTIVA RELIGIOSA CON ADEGUAMENTO DELLA ACCESSIBILITA' E DELLE AREE DI PERTINENZA	1.020	1.147	479	30/11/98	PROROGA TERMINE LETT. C)
5645	AC - 31 - HA - L	VICENZA	RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO NEL CONTESTO DEL COMPLESSO DI MONTE BERICO CON LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO PER DISABILI COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SERVO SCALA	190	131	65	5/11/98	PROROGA TERMINE LETT. C)
5988	AC - 12 - GA - M	FONTANELLATO	MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA ACCESSIBILITA' RISTORO RICETTIVITA' POVERA RESTAURO DI LUOGHI DI IMPORTANZA RELIGIOSA E CULTURALE	528	528	0		DEFINANZIAMENTO DI L. 131.000.000
6104	AC - 12 - LA - B	PIETRASANTA	RESTAURO E RISANAMENTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL DUOMO DI S. MARTINO IN PIETRASANTA	4.887	2.528	2.159	31/12/98	PROROGA TERMINE LETT. C)
6104-A			RESTAURO DEL CAMPANILE	1.887	0	1.887	30/6/98	ULTERIORE DISAGGREGAZIONE E RIDISTRIBUZIONE QUOTE DI FINANZIAMENTO E COFINANZIAMENTO - PROROGA TERMINI LETT. C)
6104-B			RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DUOMO	2.666	1.981	685	30/6/98	INCREMENTO DEL COFINANZIAMENTO PER LIRE 513.000.000
6104-C			RESTAURO DI AFFRESCHI	547	547	0	30/6/98	

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 8 di 11

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Urcge	Codice	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. C)	Termini Let. D)	Note
6121	AA - 41 - HA - L	FIRENZE	REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PRIVI DI OSTACOLI E BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO STORICO DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	5.000	4.460	560	15/2/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
6122	AA - 41 - EA - L	FIRENZE	SISTEMAZIONE SPAZIO URBANO ESTERNO DELL'AREA EX GASOMETRO	COMUNE DI FIRENZE	4.513	3.836	877	30/1/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
6219	AA - 41 - IC - M	FIRENZE	CENTRO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA NEI LOCALI DELL'ANTICO CONVENTO DI S. M. NOVELLA CON ACCESSO DA PIAZZA STAZIONE.	COMUNE DI FIRENZE	1.504	1.276	228	7/01/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
6220	AA - 41 - EB - M	FIRENZE	VIDEO SICUREZZA PER I MONUMENTI FIORENTINI	COMUNE DI FIRENZE	1.176	774	402	10/3/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
6227	AA - 41 - LA - B	FIRENZE	CHIESA DI S. MARIA NOVELLA INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E PULITURA DEGLI INTERNI SUPERFICI INTONACATE COLONNE ELEMENTI ARCHITETTONICI LAPIDEI ED INFISSI	COMUNE DI FIRENZE	4.291	3.175	1.116	23/12/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
6389	AC - 41 - GA - M	ORVIETO	RECUPERO DEL CONVENTO DI SAN CRISPINO DA VITERBO IN ORVIETO ACCOGLIENZA POVERA	PROV. ROMANA FRATI MINORI CAPPUCCHINI	1.040	800	240			AZZERAMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO
6664	AC - 14 - LA - M	SAN GIUSTINO	CHIESA DI S. SILVESTRO IN CORPOSANO	PARROCCHIA SAN GIUSTINO	314	100	214	10/11/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
6681	AC - 22 - FA - L	LORETO	AMMODERNAMENTO DELLA CASA SAN FRANCESCO	PROV. PICENA S. GIACOMO DELLA MARCA	1.000	400	600	20/02/99		PROROGA TERMINE LETT. C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 9 di 11

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Uрге	Codice Uрге	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
8782	AB - 28 - LA - 1 AB - 36 - GA - 1	GURBIO	RECUPERO DELL' EREMO DI S. AMBROGIO	CANONICI REGOLARI LATERANENSI	2.000	700	1.300			MODIFICA DELL'UTILIZZO POST-GIURILANE DA "RICETTIVITA' ALBERGHIERA 1-3 STELLE - IN "CONVENTI - CASE IN COMUNITA' RELIGIOSE"
8800	AC - 13 - LA - B	GUALDO TADINO	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MARIA DI GAIFANA	PARROCCHIA DI S. NICOLA VESCOVO	524	400	124	15/07/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
7168	AA - 13 - IA - B	FOLIGNO	RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO TRINCI ED ALLESTIMENTO MUSEALE	COMUNE DI FOLIGNO	13.320	1.744	11.576			
7168/A	AA - 13 - IA - B		RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO TRINCI ED ALLESTIMENTO MUSEALE - LAVORI ESEGUITI		9.013	0	9.013			DISAGGREGAZIONE E RIDISTRIBUZIONE QUOTA DI FINANZIAMENTO E DI COFINANZIAMENTO INCREMENTATO DI 6.13.000.000
7168/B	AA - 13 - IA - B		RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO TRINCI ED ALLESTIMENTO MUSEALE - LAVORI DA ESEGUIRE		4.320	1.744	2.576			
7176	AC - 21 - FD - M	FOLIGNO	REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA A BASSO COSTO A COLFIORITO LUNGO LA VIA CHE COLLEGA ASSISI A LORETO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	819	589	50	07/10/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
7285	AA - 13 - IA - B	TERNI	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO CONTELLORI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO E RELATIVI SERVIZI	COMUNE DI TERNI	1.590	1.590	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 30.000.000

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Urcge	Codice AA - 13 - EF - M	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Terminali Letto. C)	Terminali Letto. D)	Note
7358	AA - 13 - EF - M	TERNI	SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COLLE DI S. VALENTINO E AREE LIMITROFE SISTEMAZIONE VIA PAPA ZACCARIA ED OPERE INFRASTRUTTURALI PER L'ACCOGLIENZA LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO E RELATIVI SERVIZI SULL'AREA A VALLE DEL COLLE DI SAN VALENTINO	COMUNE DI TERNI	13.900	2.891	11.009			
7418	AC - 14 - FD - L	CASCA	CASA DEL PELLEGRINO PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO IN ROCCAPORENA	CHIESA SANTUARIO DI S. RITA	3.975	3.543	432	24/11/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
7509	AA - 14 - HA - B	TOLENTINO	REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO FACILITATO DAL PARCHEGGIO DI OSMANI FILZI ALLA CHIESA SANTA MARIA NUOVA	COMUNE DI TOLENTINO	800	800	0	04/08/98	03/10/99	INCREMENTO DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO DI L. 147.461.976 E PROROGA TERMINE LETT. C) - D)
7516	AC - 13 - IA - B	FOLIGNO	RESTAURO DEL COMPLESSO CATTEDRALE E PALAZZO DELLE CANONICHE	DIOC. FOLIGNO CATTEDRALE DI S. FELICIANO	10.078	6.678	4.400	25/10/98		PROROGA TERMINE LETT. C)
7605	AA - 14 - FD - B	VIGGIANO	RECUPERO DELL'ANTICO CONVENTO DI SANTA MARIA DEL GESU' A FINI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI VIGGIANO	3.000	1.500	1.500	21/01/99		PROROGA TERMINE LETT. C)
										INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 1.000.000.000

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 11 di 11

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

(legge 7 agosto 1997, n. 270)

ALLEGATO C - NUOVI INTERVENTI

						Riferimenti soggettivi ed obiettivi dell'intervento			Risorse finanziarie (lire/milioni)	Termini			
3750	AA 26	IA	M	Amantea	CS	COMPLETAMENTO RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CONVENTO DI S. BERNARDINO	COMUNE DI AMANTEA	Ricettività in comunità religiose	1800	1200	600	01-feb-99	31-ott-99
6404	AB 51	EL	F	Ancona	AN	ARREDO SALA DI ATTESA	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	Infrastrutture portuali, porti o approdi, trasporto marittimo	50	50	0	18-gen-99	31-ott-99
6407	AB 51	EA	L	Ancona	AN	PERCORSI PEDONALI PROTETTI	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	Strutture e/o servizi assistenza portuali di handicap, accessibilità, abbattimento barriere archit.	600	600	0	15-feb-98	31-ott-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8408	AB	51	ED	F	Ancona	AN	SISTEMA INFORMAZIONE PASSEGGERI	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	Strutture e/o centri di servizi informativi, di comunicazione, telematici e servizi di gestione	80	80	0	15-feb-99	31-ott-99
7801	AA	31	IA	B	Aquila	UD	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AL FOLADOR DEL PALAZZO BRUNNER DI AQUILEIA	SOPRINTENDENZA PER I BENI A.A.S. FRIULI VENEZIA	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	1150	1150	0	18-feb-98	31-ott-99
1124	AA	28	EA	L	Arcugnano	VI	CENTRO ACCOGLIENZA TORRI	COMUNE DI ARCUGNANO	Sedi municipali, centro civici	529	529	0	06-mar-99	31-ott-99
1125	AA	28	EA	L	Arcugnano	VI	CENTRO ACCOGLIENZA S. AGOSTINO	COMUNE DI ARCUGNANO	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	473	473	0	20-feb-99	31-ott-99
7404	AA	14	EE	M	Ascoli Piceno	AP	PROGETTO PER UN SISTEMA INFORMATIVO DI SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI BENI DI CARATTERE RELIGIOSO E CULTURALE FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA ED ALL'ORIENTAMENTO DEI VISITATORI PREVISTI IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DEL 2000	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	Segnaletica stradale e/o turistica	571	529	42	31-gen-99	31-ott-99
2086	AA	12	FA	L	Barga	LU	ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PALAZZO GHERARDI	COMUNE DI BARGA	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	112	56	56	15-giu-99	31-ott-99
5973	AC	12	GA	M	Bore	PR	RISTRUTTURAZIONE CANONICA DI POZZOLO USO ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA E RELATIVI SERVIZI	PARROCCHIA DI S. MAURIZIO DI POZZOLO	Ricettività in comunità religiose	507	370	137	02-feb-99	31-ott-99
2732	AC	12	LA	L	Carrara	MS	PROGETTO PER IL RECUPERO DELLA CHIESA DEL SUFFRAGIO IN CARRARA	DIOCESI DI MASSA CARRARA CHIESA DEL SUFFRAGIO	Luoghi o edifici di culto e/o di uso religioso e relativi servizi	781	511	270	15-feb-99	31-ott-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3157	AA 12	GA	L	Castelfranc o Di Sotto	PI	RESTAURO CONVENTO SAN MATTEO CON ADEGUAMENTO PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN PROSSIMITA' DI TRACCIATO ORIGINALE DELLA VIA FRANCIGENA	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	Ricettività in comunità religiose	400	280	120	15-mar-99	31-ott-99
4997	AC 26	GA	M	Ceriale	SV	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI SPIRITUALITA' SANTA MARIA BELFIORE MEDIANTE IL POTENZIAMENTO E RIAMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	DIOCESI DI ALBENGA IMPERIA	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	1300	1050	250	10-feb-99	31-ott-99
2693	AE 14	ED	F	Chieti	CH	CENTRO CONSORTILE DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL FLUSSO TURISTICO RELIGIOSO E CULTURALE	CONSORZIO CELESTINIANO SOC. COOP. A.R.L.P.A.	Servizi di visita guidata ed accompagnamen to turistico - turismo sociale	1806	1806	0	20-gen-99	31-ott-99
4108	AC 31	GB	M	Chiusi Della Verna	AR	RECUPERO DELLA PARTE DISMESSA DELL'ANTICO OSPIZIO FRANCESCANO DELLA BECCIA PROGETTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA E ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	PROVINCIA TOSCANA DEI FRATI MINORI DI S.FRANCESCO	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	468	348	120	17-mar-99	31-ott-99
3480	AC 26	GA	M	Cortona	AR	RICETTIVITA' SORELLE DEI POVERI	CONGREGAZIONE SORELLE DEI POVERI DI S. CATERINA DA	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	879	829	50	03-feb-99	31-ott-99
3534	AC 28	GA	M	Cortona	AR	RICETTIVITA' OASI S. MARGHERITA	PROVINCIA TOSCANA DI S. FRANCESCO STIMMATIZZATO	Ricettività in comunità religiose	1500	1000	500	30-gen-99	31-ott-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4574	AC	12	LA	M	Filattiera	MS	CONSOLIDAMENTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA PIEVE DI S. STEFANO DI SORANO	PARROCCHIA DI S. STEFANO DI FILATTIERA	Luoghi o edifici di culto e/o di uso religioso e relativi servizi	2616	2298	320	31-gen-99	31-ott-99
3565	AA	41	ED	F	Firenze	FI	MATERIALE DI INFORMAZIONE TURISTICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ITINERARI GIUBILARI	COMUNE DI FIRENZE	Strutture e/o servizi di informazione e organizzazione turistica, agenzie, chioschi	714	635	79	01-mar-99	31-ott-99
1425	AA	14	FA	L	Fivizzano	MS	CENTRO RICETTIVO NELLEX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI	COMUNE DI FIVIZZANO	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	800	500	300	13-feb-99	27-ott-99
1149	AC	25	GD	M	Foggia	FG	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E AMPLIAMENTI DI EDIFICI SOCIALI DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA POVERA E SERVIZI OPERA DON ORIONE BASILICA SANTUARIO MADRE DIO INCORONATA FOGGIA	PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO OP	Ricettività per giovani e/o casa dello studente	1025	1025	0	15-gen-99	31-ott-99
5256	AC	14	FD	M	Grosseto	GR	ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI NOMADELFIA	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	633	443	190	28-feb-99	31-ott-99
5257	AC	14	EA	M	Grosseto	GR	AREA DI SOSTA PER AUTOBUS ED AUTOVETTURE SERVIZI IGIENICI UFFICIO ACCOGLIENZA	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI NOMADELFIA	Strutture e/o servizi di informazione e organizzazione turistica, agenzie, chioschi	439	307	132	31-mar-99	31-ott-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5375	AC	41	GA	L	Inclisa in Val D'Arno	FI	POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ED ESPERIENZE SOCIALI DI LOPPIANO ALLOGGI CASETTE	P.A.M.O.M. PIA ASSOCIAZIONE MASCHILE OPERA MARIA IM	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	572	272	300	01-mar-99	30-set-99
5172	AA	26	HA	L	Livorno	LI	ITINERARIO MARIANO LA PIAZZA DEL SANTUARIO LE SUPERFICI E L'ARREDO	COMUNE DI LIVORNO	Itinerari turistici, storici, religiosi	860	460	400	15-feb-99	31-ott-99
5174	AA	28	EA	L	Livorno	LI	ITINERARIO MARIANO MONTENERO ALTO TRASFERIMENTO ATTIVITA' COMMERCIALI	COMUNE DI LIVORNO	Aree urbane o extraurbane attrezzate con servizi	350	250	100	15-feb-99	31-ott-99
5176	AA	26	EA	L	Livorno	LI	ITINERARIO MARIANO MONTENERO ALTO REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO CON ATTREZZATURE PER IL TRASFERIMENTO DELLA SOSTA	COMUNE DI LIVORNO	Aree di sosta o parcheggio auto e/o bus	300	150	150	15-lug-99	30-set-99
8821	AA	22	EC	M	Loreto	AN	COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO POLIVALENTE (ALLEGATO PIANO GENERALE ACCOGLIENZA)	COMUNE DI LORETO	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	2500	2100	400	31-gen-99	30-ott-99
6156	AC	41	LA	M	Mantova	MN	CATTEDRALE DI S. PIETRO IN MANTOVA PROGETTO PER IL RECUPERO DELL'IMMAGINE STORICA E LA CORRETTA ACCOGLIENZA LA NAVATA CENTRALE LA CUPOLA L'ABSIDE ED I TRANSETTI	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO IN CATTEDRALE	Luoghi o edifici di culto e/o di uso religioso e relativi servizi	2100	1890	210	10-feb-99	30-set-99
2006	AC	31	FA	L	Monte Sant'Angelo	FG	LA CASA DEL PELLEGRINO RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PER OSPITALITA' POVERA	BASILICA SANTUARIO SAN MICHELE ARCANGELO	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	3000	3000	0	30-gen-99	30-ott-99
5873	AD	41	GA	B	Napoli	NA	RIQUALIFICAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA LA RICETTIVITA' DEI PELLEGRINI NELLA NAPOLI SACRA	ISTITUTO FEMMINILE S. GIOVANNI BOSCO	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	3809	3025	784	30-gen-99	30-set-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3372	AC 31	EL	M	Nova Ponente	BZ	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE ED AUTOBUS	CONVENTO DI PIETRALBA	Area di sosta o parcheggio auto e/o bus	1133	1133	0	14-feb-99	30-ott-98
1806	AA 28	LA	B	Nuoro	NU	RISTRUTTURAZIONE CATTEDRALE	COMUNE DI NUORO	Beni monumentali, di carattere culturale, ambientale o religioso e relativi servizi - recupero	1950	1950	0	31-gen-99	30-giu-99
2436	AC 41	GA	M	Palermo	PA	RIQUALIFICAZIONE DI PARTI EDILIZIE DI VECCHIA STRUTTURA GIA' ATTIVA PER ACCOGLIENZA GIUBILARE	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE SAN SISTO VECCHIO	Ricettività in comunità religiose	1476	1486	10	21-feb-99	30-ott-99
5862	AA 12	IA	B	Parma	PR	PROGETTO COORDINATO DI RESTAURO DELLA ROCCA E PARCO DI NOCETO E DI UNA EX SCUOLA DI CASTAMEZZANA CON LA REALIZZAZIONE DI CENTRO DI ACCOGLIENZA DISCOGRAFICO MUSICALE E OSTELLO	COMUNE DI NOCETO	Centri musicali, sale concerti, auditorium e relativi servizi	370	340	30	30-mar-99	30-set-99
3224	AC 14	FD	L	Piugiano	GR	RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'EX ASILO DI PITIGLIANO AD USO RESIDENZE RICETTIVE A BASSO COSTO PER BISOGNOSI E SCOPI SOCIALI	DIOCESI DI PITIGLIANO SOVANA ORBETELLO	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	1164	815	349	20-feb-99	30-giu-99
6000	AA 12	EL	L	Pontremoli	MS	CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI VIA FRANCIGENA LUNGO IL CENTRO STORICO DI PONTREMOLI PONTE C. BATTISTI SUL FIUME MAGRA	COMUNE DI PONTREMOLI	Area attrezzata di scambio intermodale, caplinea	1010	930	80	20-feb-99	30-ott-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3284	AC 12	HA	B	Ravenna	RA	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE AGLI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA PER LA DIDATTICA RELIGIOSA PER LE ATTIVITA' CULTURALI PER I SERVIZI E PER L'ACCESSIBILITA' ALLA CHIESA DI SANTA MARIA IN PORTO	ARCHIDIOCESI DI RAVENNA CERVIA	Sistemazioni esterne e/o di arredo urbano, illuminazione etc.	150	130	20	24-mar-99	30-set-99
5232	AC 12	LA	M	San Miniato	PI	RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CAPPELLA DEI SEPOICRETO DI S. URBANO E DI PIETRO NEL COMPLESSO DI S. DOMENICO A S. MINIATO CON RISANAMENTO E RESTAURO DELLA ANTICA VIA ANGELICA META DI PELLEGRINAGGI MEDIOEVALI	PARROCCHIA DELLA SS. ANNUNZIATA E S. DOMENICO	Luoghi o edifici di culto e/o di uso religioso e relativi servizi	906	489	417	10-mar-99	30-ott-99
3080	AA 26	IA	L	Sassari	SS	REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DELL'ARTE SACRA NEL NORD SARDEGNA	PROVINCIA DI SASSARI	Centri e/o strutture di prima accoglienza e relativi servizi	6000	2000	4000	30-gen-99	30-ott-99
5512	AA 14	EA	M	Sepino	CB	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'ACCOGLIENZA	COMUNE DI SEPINO	Centri e/o strutture di prima accoglienza e relativi servizi	1169	1169	0	05-feb-99	30-ott-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6928	AC 13	FD	L		Temi	TR	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA SITO IN TERNI VIA MOZZONI	PARROCCHIA S. GABRIELE DELL'ADDOLORATA	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	1200	1000	200	15-feb-99	20-ott-99
7286	AA 13	IA	B		Temi	TR	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO COSTITUITO DALL'EX CHIESA DI S. ANGELO E SUE DIPENDENZE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA LA DOCUMENTAZIONE E L'INFORMAZIONE	COMUNE DI TERNI	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	920	920	0	20-feb-99	30-ott-99
1563	AA 12	IA	L		Torino	TO	AREA CAVALLERIZZA RESTAURO CONSERVATIVO E DI FUNZIONALIZZAZIONE PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DEL QUARTIERE DELLE GUARDIE DEL CORPO DI S.M.	COMUNE DI TORINO	Centri e/o strutture di prima accoglienza e relativi servizi	1000	1000	0	10-feb-99	31-ott-99
2803	AB 41	EG	M		Venezia	VE	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI	A.M.A.V. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI VENEZIANA	Servizi igienici pubblici	352	176	176	15-mar-99	30-ott-99
4248	AC 26	LA	L		Vittoria	RG	RIQUALIFICAZIONE SALE PLURIUSO E ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI	PARROCCHIA MADONNA DELLA SALUTE	Centri sociali e di accoglienza	1150	1000	150	21-gen-99	31-ott-99

PAGINA BIANCA

Rep. N. 202/RC del 30 luglio 1999

Legge 7 agosto 1997, n. 270. Approvazione di ulteriori modificazioni ed integrazioni al Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, di cui alla deliberazione n. 10 del 4 maggio 1999 della Commissione ex art. 2 stessa legge.

**IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA
CAPITALE, GIUBILEO 2000**

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario n. 218 alla G. U. n. 247 del 22 ottobre 1997;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 122 del 28 maggio 1998 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 10/99, adottata in data 4 maggio 1999 dalla Commissione ex articolo 2 della legge n. 270/97;

Visto il parere favorevole n. 663, reso in data 13 maggio 1999, dalla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997 sulla deliberazione n. 10/99 della Commissione di cui all'art. 2 della medesima legge;

DECRETA

- 1. A seguito dell'approvazione del quadro tecnico economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'all. "A", nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £ 22.768.000.000.*
- 2. L'intervento "Tecnologie ambientali e mobilità - Proposta per un nuovo parco archeologico a Pompei", rubricato col n. 2143, incluso nel Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 6, della legge n. 270/97, è cancellato dal Piano, a seguito di rinuncia del soggetto privato titolare dello stesso.*
- 3. E' totalmente defanziato, per un ammontare di £. 176.000.000 l'intervento rubricato con n. 2803 "Realizzazione servizi igienici" localizzato a Venezia, a causa della persistente indisponibilità dell'area che ne compromette la realizzabilità in tempo utile per le finalità giubilari.*
- 4. E' totalmente defanziato, per un ammontare di £ 340.000.000, l'intervento rubricato n. 5556, "Riqualificazione del complesso edilizio e monastico Santuario di Crea", in quanto, sulla base della documentazione acquisita in atti i relativi lavori erano già ultimati all'atto dell'inclusione nel Piano, venendo con ciò meno il presupposto del disposto finanziamento a valere sulle risorse della legge n. 270/97.*
- 5. L'intervento rubricato con il n. 3133, "Progetto di restauro delle coperture, rifacimento impermeabilizzazioni e impianti nel complesso della Cattedrale" di Ventimiglia, è parzialmente defanziato, a seguito della riduzione del costo stimato da £ 2.610.000.000 a £ 1.600.000.000 ed il relativo stanziamento è ridotto da £ 2.4000.000.000 a £ 1.390.000.000, con un'economia pari a £ 1.010.000.000.*
- 6. L'intervento rubricato con il n. 3638, "Infopoint passepartout 2000 - Sistema di nodi informativi dedicati ai disabili" localizzato a Napoli, è parzialmente defanziato, a seguito della riduzione del costo stimato da £*

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.881.000.000 a £ 1.703.320.000 ed il relativo stanziamento è ridotto da £ 1.781.000.000 a £ 1.603.320.000, con un'economia pari a £ 177.680.000.

7. L'intervento rubricato con il n. 6681, "Ammodernamento della casa di S. Francesco" localizzato a Loreto, è parzialmente defanziato, a seguito della riduzione del costo stimato da £ 1.000.000.000 a £ 680.000.000 ed il relativo stanziamento è ridotto da £ 400.000.000 a £ 80.000.000, con un'economia pari a £ 320.000.000.
8. E' assentita la richiesta di incremento della quota di cofinanziamento, proposto dal titolare dell'intervento n. 3373, "Ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio destinato all'accoglienza dei pellegrini" localizzato a Nova Ponente, a parità di costo, con equivalente riduzione della quota di finanziamento ex lege n. 270/97, per un importo di £ 1.329.000.000.
9. E' assentita la richiesta di incremento della quota di cofinanziamento, proposto dal titolare dell'intervento rubricato con n. 5954, "Restauro conservativo delle superfici esterne ed interne della chiesa cattedrale" di Brescia, e del conseguente aumento del costo dell'intervento, ed è disposta la riduzione della assegnazione finanziaria ex lege n. 270/97 nella misura di £ 67.080.000, quale importo differenziale dell'intervenuto ribasso d'asta.
10. Le risorse disponibili sono, pertanto, determinate in complessive £ 26.717.932.360, pari alla somma dei seguenti importi:

£ 530.172.360	Risorse nella disponibilità della Commissione di cui al D. M. 9 febbraio 1999;
£ 22.768.000.000	Risorse provenienti da ribassi d'asta e/o economie di stanziamento, di cui al punto 1;
£ 516.000.000	Risorse provenienti da definanziamenti totali, di cui ai punti 3 e 4;
£ 1.507.680.000	Risorse provenienti da definanziamenti parziali, di cui ai punti 5, 6 e 7;
£ 1.396.080.000	Risorse provenienti da definanziamenti parziali, di cui ai punti 8 e 9 ;

11. L'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi è incaricato di avviare la procedura di contestazione e messa in mora, ai fini dell'eventuale definanziamento ed anche ai sensi dell'art. 7 legge 241/1990, nei confronti dei titolari di interventi per i quali risultino scaduti i termini di cui all'art. 1, co. 4, lettera c) della legge n. 270/97, senza che sia stato comunicato l'intervenuto affidamento dei lavori né sia stata richiesta l'eventuale proroga di detto termine, nonché nei confronti dei titolari degli interventi sottoelencati, per le motivazioni a latere indicate:
nn. 1172, 1375, 1378, 5147, in quanto hanno comunicato una consistente riduzione della quota di cofinanziamento;
nn. 1589, 3731, per aver richiesto un differimento del termine di cui all'art. 1, co. 4, lettera c) della legge 270/97, tale da ridurre considerevolmente l'originaria previsione dei giorni di lavorazione;
n. 3958, per aver proposto una modifica della tipologia dell'intervento da ricettività a restauro di beni culturali, implicando la mancata realizzazione dei previsti posti letto;
n. 4741, in quanto dalla documentazione in atti si evince che i lavori oggetto dell'intervento sono stati appaltati ed in larga misura ultimati prima della inclusione nel Piano di cui alla legge n. 270/97 e che negli atti deliberativi di approvazione delle aggiudicazioni e dei contratti non si fa alcun riferimento alle risorse di cui alla citata legge;
n. 4739, in quanto, da notizie apparse sulla stampa, la realizzazione di tale intervento potrebbe confliggere con la salvaguardia dei Beni culturali e compromettere la stabilità dei monumenti circostanti.
12. E' assentita la richiesta del soggetto beneficiario dell'intervento "Ristrutturazione ed ampliamento dell'abbazia di S. Cassiano al fine di consentire l'accoglienza dei pellegrini" rubricato col n. 7394, volta a realizzare 59 posti letto, in luogo dei 71 originariamente previsti, a causa delle sopravvenute prescrizioni della competente Soprintendenza.
13. E' reinserito nel Piano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 270/97, l'intervento rubricato col n. 4966 "Riqualificazione di area industriale dismessa" di titolarità di un soggetto privato, a seguito della pronuncia resa dal TAR competente in sede cautelare e volta a riaprire il procedimento amministrativo per l'acquisizione dei necessari atti autorizzativi.
14. Sono assentite le richieste di integrazione finanziaria connesse a varianti in corso d'opera, dovute a fatti imprevisi e imprevedibili relative agli interventi indicati nell'allegato "B", per un importo complessivo pari a £ 26.219.874.193, restando, pertanto nella disponibilità della Commissione £ 498.058.167.
15. Sono accorpati in un unico intervento che viene incluso nel Piano col n. 17.729, i 51 interventi indicati nell'allegato "B", di titolarità dell'Ente Poste Italiane, al fine di agevolarne le procedure realizzative.

16. Sono assentite, altresì, le richieste di disaggregazione relative ad alcuni interventi già inclusi nel Piano, quelle di cambio titolo, di cambio di soggetto beneficiario e quelle attinenti le proroghe di termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97 e sono corretti meri errori materiali relativi alla diversa imputazione delle quote di finanziamento e di cofinanziamento, come indicato nell'allegato "B".
17. Come previsto dal punto 3 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano di cui all'allegato "A" del D.M. 2.6.1998, gli oneri relativi alle attività preliminari e strumentali alla realizzazione dell'intervento, quali la progettazione, ogni tipo di indagine conoscitiva (preventiva o contestuale all'esecuzione), l'espletamento dell'appalto dei lavori e la stesura dei contratti, la predisposizione dei prescritti Piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 494/96, l'esercizio delle funzioni del responsabile del procedimento, di Direttore dei Lavori, di Coordinatore della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, il collaudo ed eventuali studi di impatto ambientale, devono, di norma, essere contenuti nel limite massimo del 10% del costo complessivo dell'opera, salvo particolari situazioni opportunamente motivate. Ove tali oneri risultino superiori a detta soglia, le relative parcelle Professionali, redatte nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti tariffe, devono essere vidimate dal competente Ordine Professionale. Al fine del contenimento della spesa pubblica, ove la progettazione sia affidata dalla stazione appaltante a più professionisti riuniti in Collegio, secondo la procedura di cui all'art. 7 della Legge 2.3.1949, n. 143, viene riconosciuto il compenso per un solo incarico professionale, rimanendo a carico del soggetto beneficiario gli eventuali, ulteriori compensi. Qualora la progettazione sia stata affidata ad un progettista esterno alla stazione appaltante, ove l'Amministrazione non ritenga di svolgere la Direzione dei Lavori con proprio personale, questa deve essere affidata allo stesso progettista, salvo che per oggettiva e documentata impossibilità. Tenuto conto di quanto stabilito all'art. 4, comma 1, della legge n. 270/97, ove si dà facoltà ai soggetti beneficiari di avvalersi dei Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche in qualità di Stazioni Appaltanti "anche relativamente alla progettazione", il conferimento di incarichi a Società di Servizio per la compilazione dei progetti, per consulenze e per ogni altra attività connessa all'espletamento delle gare ed alla gestione dei lavori deve essere specificatamente ed adeguatamente motivata, ai fini del riconoscimento delle relative spese.
18. Il punto 10 dell'allegato "A" al D.M. 2.6.1998 viene così modificato:
- "10. All'atto della richiesta di erogazione dell'ulteriore somma sino alla concorrenza del 90% dell'importo impegnato dovrà essere inoltrata all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario pubblico o di un suo delegato apposita certificazione dell'avvenuta utilizzazione dell'80% dell'importo erogato ai sensi del punto 8 nella quale siano elencate le spese sostenute suddivise tra lavori, forniture e somme a disposizione con riferimento al Quadro Tecnico Economico acquisito agli atti dell'Ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di spesa. In allegato alla citata certificazione, quale parte integrante, deve essere trasmessa una relazione illustrativa che in riferimento all'elencazione delle spese precisi i titoli di spesa emessi. Per i soggetti beneficiari assimilati alla categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) della legge n. 109/94, come integrata e modificata dalla legge n. 415/98, all'atto della richiesta di erogazione dell'ulteriore somma sino alla concorrenza del 90% dell'importo impegnato dovrà essere inoltrata all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, apposita certificazione dell'avvenuta utilizzazione dell'80% dell'importo erogato, ai sensi del punto 8, nella quale siano elencate le spese sostenute suddivise tra lavori, forniture e somme a disposizione con riferimento al Quadro Tecnico Economico acquisito agli atti dell'Ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di spesa, nonché dichiarazione relativa all'avvenuta verifica del versamento da parte delle Imprese dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla mano d'opera impiegata. Con riferimento all'elencazione riportata nella citata certificazione dovrà essere allegata, in copia conforme, la seguente documentazione:
- Lavori:**
- certificati di pagamento intestati all'Impresa titolare dell'appalto e relative fatture quietanzate;
 - fatture quietanzate relative ad eventuali prestazioni in economia certificate dal Direttore dei Lavori;
 - certificati di pagamento intestati ad eventuale impresa sub-appaltatrice e relative fatture con allegato il contratto di subappalto e la connessa autorizzazione della stazione appaltante.
- Espropri:**
- contratto di acquisto od altro titolo ablativo e relativa trascrizione al patrimonio del soggetto beneficiario;
 - pagamenti effettuati per l'occupazione e l'indennità di esproprio intestati ai proprietari dei beni.
- Forniture:**
- Certificato di pagamento intestato al fornitore e relative fatture quietanzate;
 - Certificato di collaudo qualora la fornitura sia stata liquidata in un'unica soluzione.
- Rilievi, studi e sondaggi:**
- Contratti o lettere d'incarico e relative fatture quietanzate;
 - Certificato di regolare esecuzione della prestazione sottoscritto dal Responsabile del procedimento qualora sia stato effettuato il pagamento in un'unica soluzione.
- Progettazione:**
- Parcella professionale vistata dal competente Ordine Professionale, con esclusione di quelle validate dalle Amministrazioni pubbliche, qualora risulti superata la soglia del 10% di cui al punto 1;

- Convenzione d'incarico o lettera d'incarico;

Fatture quietanzate del Professionista incaricato.

Altre spese tecniche:

- Parcella professionale sia per il Direttore dei Lavori che per il Coordinatore della Sicurezza vista dal competente ordine professionale, con esclusione di quelle validate dalle Amministrazioni pubbliche, qualora risulti superata la soglia del 10% di cui al punto 1;

- Convenzione o lettera d'incarico del professionista;

- Fatture quietanzate del Professionista;

- Fatture quietanzate relative alle spese sostenute per la Commissione di gara, per la pubblicazione del Bando, per le spese postali e per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure di aggiudicazione certificate dal responsabile del procedimento;

- Ricevute di versamenti effettuati alle Amministrazioni Comunali per il rilascio delle concessioni edilizie o autorizzazioni.

Allacciamenti:

- fatture quietanzate e versamenti effettuati alle aziende comunali o alle società di servizio per contributi o spese di allaccio.

Altro:

Fatture relative ad eventuali prestazioni o lavori specialistici ove sia chiaramente indicato in relazione all'intervento l'oggetto ed il periodo di svolgimento delle attività."

19. Il punto 11 dell'allegato "A" al D.M. 2.6.1998 viene così modificato:

"11. Le ulteriori somme residue, fino alla concorrenza dell'intero impegno assunto, saranno erogate dall'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi su richiesta del legale rappresentante del soggetto beneficiario pubblico o di un suo delegato, documentata con apposita certificazione nella quale sia dichiarata la conclusione delle procedure di collaudo o di regolare esecuzione. Nella certificazione debbono essere, inoltre, evidenziate le somme non utilizzate dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'intervento, per la conseguente attivazione della procedura di versamento di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'eventuale successiva utilizzazione per le finalità della legge 270/97. Copia conforme dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione per ogni spesa sostenuta per lavori, forniture, prestazioni professionali o specialistiche ed ogni altra attività connessa all'intervento dovranno essere trasmessi all'ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi per la conseguente acquisizione agli atti. Per i soggetti beneficiari assimilati alla categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) della legge n. 109/94, come integrata e modificata dalla Legge n. 415/98, le ulteriori somme residue fino alla concorrenza dell'intero impegno assunto saranno erogate dall'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi su richiesta del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo delegato, documentata con apposita certificazione nella quale sia dichiarata la conclusione delle eventuali procedure di acquisto di immobili o aree attivate e siano elencate tutte le spese sostenute, suddivise tra lavori, forniture e somme a disposizione, con riferimento al Quadro tecnico Economico acquisito agli atti dell'Ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di spesa. Nella certificazione debbono essere, inoltre, evidenziate le somme non utilizzate dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'intervento per la conseguente attivazione della procedura di versamento di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'eventuale successiva utilizzazione per le finalità della legge 270/97. Alla richiesta vanno, inoltre, allegati in copia conforme i certificati di collaudo o di regolare esecuzione per ogni spesa sostenuta per lavori, forniture, prestazioni professionali o specialistiche ed ogni altra attività connessa all'intervento.

20. Il punto 6 dell'allegato "A" al D.M. 2 giugno 1998 è sostituito dal seguente:

"6. Sono consentite variate distribuzioni di spesa tra le categorie di lavoro corrispondenti a opere civili, opere impiantistiche, arredi, attrezzature ed altre, nel rispetto del totale complessivo dichiarato, qualora non comportino modifiche sostanziali all'intervento finanziato."

21. Ad integrazione e modifica del D.M. 2.6.1998 all. "B" ai soggetti ecclesiastici beneficiari degli interventi inclusi nel Piano di cui alla Legge n. 270/97 assimilati alla categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) della Legge n. 109/94, come integrata e modificata dalla Legge 415/98, si applicano tutte le disposizioni della legge ad esclusione di quelle introdotte dagli artt. 7, 14, 19, comma 2 e 2 bis, 27, 32, 33.

Roma, lì 1 giugno 1999

Registrato alla Corte dei Conti il 30 luglio 1999

Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 278

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 21 aprile 1999

Allegato A

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
233	Padova	PD	RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI PADOVA	DIOCESI DI PADOVA	800.000.000
245	Padova	PD	MUSEO DIOCESANO D'ARTE SACRA	DIOCESI DI PADOVA	293.000.000
352	Torralba	SS	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO DI SANT'ANTONIO ABATE, DOTAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI E REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	COMUNE DI TORRALBA	98.000.000
400	Modena	MO	REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO DELLA GIOVENTU'	ISTITUTO PROV. S. FILIPPO E S. BENARDINO	334.000.000
470	Codogno	LO	OSPEDALE SOAVE CENTRO POLICULTURALE MUSEALE OPERE DI CONSERVAZIONE ARCHITETTONICHE E TECNOLOGICHE	COMUNE DI CODOGNO	190.000.000
488	Codogno	LO	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELL'EX MATTATOIO COMUNALE AD AREA ATTREZZATA PER L'ACCOGLIENZA	COMUNE DI CODOGNO	41.000.000
831	Torino	TO	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA BASILICA DI SUPERGA	PROV. PIEMONTESE ORDINE SERVI DI MARIA	454.000.000
899	San Giovanni Rotondo	FG	STRUTTURA ACCOGLIENZA POZZO CAVO	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	1.127.000.000
905	San Giovanni Rotondo	FG	ARREDO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIALE CAPPUCCINI	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	397.000.000
951	Codigoro	FE	IL RECUPERO AMBIENTALE DEL COMPLESSO ABBAZIA DI POMPOSA	COMUNE DI CODIGORO	20.000.000
1111	Foggia	FG	"CENTRO ACCOGLIENZA VISITATORI DI P. PIO DI PIANA ROMANA PIETRALCINA"	PROVINCIA FOGGIA FRATI MINORI CAPPUCCINI	1.100.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1138	Napoli	NA	ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUTIVI DELLA CASA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMPAGNIA DI GESU' DEI PADRI GESUITI	CASA RELIGIOSA DELLA COMP. DI GESU'	332.000.000
1143	Sant'Anastasia	NA	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E VALORIZZAZIONE DEL CHIOSTRO E DI ALCUNI LOCALI DEL CONVENTO DI MADONNA DELL'ARCO	PROVINCIA SAN TOMMASO D'AQUINO	1.299.000.000
1198	Pompei	NA	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	COMUNE DI POMPEI	405.000.000
1199	Pompei	NA	TRASFORMAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE IN OSTELLO	COMUNE DI POMPEI	475.000.000
1217	Mesagne	BR	RESTAURO E RECUPERO DEL SANTUARIO DELLA MISERICORDIA	COMUNE DI MESAGNE	51.000.000
1337	Mira	VE	PROGETTO DI RESTAURO E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DISMESSE DI GIARE DA DESTINARE AD OSTELLO	COMUNE DI MIRA	83.000.000
1344	Correzzola	PD	RECUPERO CELLERARIA BENEDETTINA DI CORREZZOLA	COMUNE DI CORREZZOLA	81.000.000
1421	Pianello Val Tidone	PC	RESTAURO DELLA ROCCA MUNICIPALE E DI PIAZZA UMBERTO I°	COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE	78.000.000
1499	Ferrara	FE	SISTEMAZIONE DEL MUSEO DELLA CATTEDRALE NELL'EX CHIESA DI S. ROMANO	COMUNE DI FERRARA	250.000.000
1576	Modica	RG	RIQUALIFICAZIONE DI PARTI EDILIZIE DI VECCHIA STRUTTURA GIA' ATTIVA	CONGREGAZIONE FEMM. SERVE DEI POVERI	116.000.000
1670	Gravina In Puglia	BA	RECUPERO TECNICO FUNZIONALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. SEBASTIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INFORMATIVO E DI COMUNICAZIONE A SERVIZIO DEI TURISTI	COMUNE DI GRAVINA	539.000.000
1709	Tarvisio	UD	RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DI FABBRICATI ESISTENTI E DI PROPRIETA' DELL'ENTE RICHIEDENTE	PARROCCHIA DI S. EGIDIO	215.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1728	Vicenza	VC	RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE D'ACCESSO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO CON INTERVENTI ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA	COMUNE DI VICENZA	183.000.000
1732	Vicenza	VI	SISTEMAZIONE DEL PERCORSO DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO	COMUNE DI VICENZA	71.000.000
1736	Vicenza	VI	REALIZZAZIONE AREA DI ACCOGLIENZA NELLE ADIACENZE DEL PARCO STORICO DI VILLA GUICCIOLI	COMUNE DI VICENZA	80.000.000
1742	Vicenza	VI	RESTAURO DELLA CHIESA DEI SANTI AMBROGIO E BELLINO	COMUNE DI VICENZA	115.000.000
1798	Empoli	FI	RESTAURO E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA IN VIA SALAIOLA E DELL'ANTISTANTE PIAZZALE	COMUNE DI EMPOLI	93.000.000
1873	Siracusa	SR	RIQUALIFICAZIONE INGRESSI ALLA CATACOMBA DI S. GIOVANNI E ALLA CRIPTA DI S. MARZIANO	ARCIDIOCESI DI SIRACUSA	34.000.000
1951	Levanto	SP	CENTRO SERVIZI INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA-RECUPERO EX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI	COMUNE DI LEVANTO	417.000.000
1965	Alberobello	BA	RICETTIVITA' DEL SEMINARIO VESCOVILE DI ALBEROBELLO	SEMINARIO VESCOVILE DI CONVERSANO	127.000.000
2011	Siracusa	SR	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI NELLA STRUTTURA RICETTIVA	ARCIDIOCESI DI SIRACUSA	76.000.000
2107/A	Milano	MI	ORATORIO PARROCCHIALE DI VIA PARETO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CERTOSA	278.000.000
2107/B	Milano	MI	CERTOSA COMPLESSO MONUMENTALE IN VIA GAREGNANO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CERTOSA	1.796.000.000
2296	Isola Del Gran Sasso d'Italia	TE	SAN GABRIELE 2000 RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' NELL'AMBITO DELL'AREA URBANA DEL SANTUARIO DI SAN GABRIELE	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	1.714.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2770	Napoli	NA	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' ARENELLA	PROV. NAPOLETANA PADRI SCOLOPI	170.000.000
2781	Brugnato	SP	RECUPERO STRUTTURE EDIFICIO GIA' SEDE VESCOVILE IN BRUGNATO DA DESTINARE A SPAZIO CULTURALE RELIGIOSO POLIFUNZIONALE	CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA	46.000.000
2843	Cagliari	CA	RISTRUTTURAZIONE EX LAZZARETTO BORGO S. ELIA	COMUNE DI CAGLIARI	800.000.000
3034	Firenze	FI	"AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO BUS TIRUSTICI A FIRENZE SUD"	COMUNE DI FIRENZE	299.000.000
3506	Arezzo	AR	RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX CONVENTO DI SAN PIER PICCOLO	DIOCESI DI AREZZO CORTONA SANSEPOLCRO	107.000.000
3524	San Marco In Lamis	FG	AREE URBANE ED EXTRAURBANE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO NAVETTE	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	489.000.000
3595	Campagna Lupia	VE	RESTAURO CONSERVATIVO RIUTILIZZO FUNZIONALE CHIESA DI LUGO	COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA	88.000.000
3792	Bonifati	CS	OSTELLO DI ACCOGLIENZA PER TURISMO SOCIALE	COMUNE DI BONIFATI COSENZA	435.000.000
3940	Mercogliano	AV	RECUPERO DEI SENTIERI STORICO RELIGIOSI TRADIZIONALMENTE UTILIZZATI NEI PELLEGRINAGGI VERSO IL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	DIOCESI DI MONTEVERGINE	61.000.000
3992	Acerra	NA	CENTRO DELL'UMANA ACCOGLIENZA RECUPERO LOCALI EX MONASTERO SS. ANNUNZIATA	DIOCESI DI ACERRA	774.000.000
4015/A	Alezio	LE	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI S. MARIA DELL'ALIZZA	CURIA VESCOVILE DI NARDO' - GALLIPOLI	160.000.000
4015/B	Alezio	LE	REALIZZAZIONE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA	CURIA VESCOVILE DI NARDO' - GALLIPOLI	448.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5024	Bologna	BO	PARCHEGGIO PUBBLICO GHISELLO	COMUNE DI BOLOGNA	257.000.000
5321	Bologna	BO	MANUTENZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DELL'ORATORIO E DEI LOCALI DELL'EX OSPEDALE DI S.MARIA DELLA VITA CREAZIONE DEL MUSEO DELLA SANITA' CITTADINA E DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA CHIESA DI BOLOGNA	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	552.000.000
5322/A	Bologna	BO	CATTEDRALE DI S.PIETRO A BOLOGNA - SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 1° LOTTO	CATTEDRALE METROP. DI S.PIETRO	260.000.000
5333	Parma	PR	FORESTERIA DEL CENTRO CIVICO CINGHIO	COMUNE DI PARMA	59.000.000
5451	Banzi	PZ	RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO DELL'ABBZIA DI S. MARIA DI BANZI	COMUNE DI BANZI	199.000.000
5656	La Spezia	SP	IL MONASTERO DEL TERZO MILLENNIO E L'OSPITALITA' BENEDETTINA	MONASTERO S. MARIA DEL MARE	331.000.000
5673	Bagno A Ripoli	FI	OSPEDALE DEL BIGALLO PER ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI STRUTTURA RICETTIVA E DIDATTICO MUSEALE	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	185.000.000
5873	Comune di Napoli	NA	RIQUALIFICAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER LA RICETTIVITA' DEI PELLEGRINI NELLA NAPOLI SACRA	ISTITUTO FEMMINILE S. GIOVANNI BOSCO CASA DELLO ST	604.000.000
6092	Caravaggio	BG	RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL SANTUARIO	COMUNE DI CARAVAGGIO	425.000.000
6192	Pistoia	PT	ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE DI VILLA ROSPIGLIOSI	DIOCESI DI PISTOIA	68.000.000
6201	Caorle	VE	"SISTEMAZIONE URBANISTICA ARCHITETTONICA ED ARCHEOLOGICA DELLA PIAZZA VESCOVADO"	COMUNE DI CAORLE	320.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6219	Firenze	FI	*INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA NEI LOCALI DELL'ANTICO CONVENTO DI S. M. NOVELLA CON ACCESSO DA PIAZZA STAZIONE	COMUNE DI FIRENZE	228.000.000
6230	Cesena	FO	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER LA RISTORAZIONE	MONASTERO DI S.MARIA DEL MONTE	21.000.000
6231	Como	CO	RESTAURO FACCIAE DELLA BASILICA DI S. ABBONDIO	SEMINARIO VESCOVILE DI S. ABBONDIO	132.000.000
6706	Foligno	PG	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SANITARIO DI PRIMO INTERVENTO PER PELLEGRINI E O TURISTI PREVIA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI	AZIENDA U.S.L. N. 3	416.000.000
6884	Spoletto	PG	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN NICOLÒ SPOLETO	PROVINCIA DI PERUGIA	288.000.000
6960/A	Osimo	AN	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO SANTUARIO DI S. GIUSEPPE DA COPERTINO IN OSIMO - I° LOTTO - NUOVO REFETTORIO E GARAGE	PROVINCIA MARCHE F.M. CONVENTUALI.	59.000.000
6960/B	Osimo	AN	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO SANTUARIO DI S. GIUSEPPE DA COPERTINO IN OSIMO - II° LOTTO - CHIOSTRO E RESTAURO BASILICA	PROVINCIA MARCHE F.M. CONVENTUALI.	52.000.000
6960/C	Osimo	AN	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO SANTUARIO DI S. GIUSEPPE DA COPERTINO IN OSIMO - III° LOTTO - LATO OVEST - RISTRUTTURAZIONE PER L'ACCOGLIENZA	PROVINCIA MARCHE F.M. CONVENTUALI.	84.000.000
6974	Castiglione Del Lago	PG	ISOLA POLVESE SUL LAGO TRASIMENO REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO PER LA GIOVENTU'	PROVINCIA DI PERUGIA	125.000.000
6975	Castiglione Del Lago	PG	RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CASTELLO DI ISOLA POLVESE	PROVINCIA DI PERUGIA	151.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7041	Montecastrilli	TR	PALAZZO MASSI PENSIONE	COMUNE DI MONTECASTRILLI	33.000.000
7074	Urbino	PS	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MONASTERO DI S. CATERINA	MONASTERO AGOSTINIANE DI S. CATERINA	59.000.000
7077	Todi	PG	RESTAURO ED AMPLIAMENTO PER UN CENTRO DI ACCOGLIENZA NELLA LOCALITA' COLLEVALENZA	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	39.000.000
7377	Perugia	PG	RECUPERO FUNZIONALE DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DA DESTINARE AD OSTELLO DELLA GIOVENTU' VIA BONTEMPI 13	OPERA PIA M. PAOLETTI	64.000.000
7528	Spoletto	PG	VILLA REDENTA EX FRATERIA ED EX SCUDERIA DEL COMPLESSO PATRIMONIALE CREAZIONE DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO E PUNTO DI INFORMAZIONI TURISTICO	PROVINCIA DI PERUGIA	118.000.000

Tot. Interventi

Tot. Disponibilità

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato "B"

Riunione commissione ex lege n. 270/97 del 21 Aprile 1999

modifiche (*) degli interventi inclusi nel Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
272	AC - 11 - GA - L	Matera	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI SPIRITUALITA' S. ANNA	ARCIDIOCESI DI MATERA IRSINA	4.361.560.000	3.861.560.000	500.000.000			
329	AC - 14 - LA - B	Cepiccio	RESTAURO MONUMENTO NAZIONALE SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO	SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO	2.397.000.000	2.397.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.992.410.000
330	AC - 31 - GA - M	Isola Del Gran Sasso d'Italia	RISTRUTTURAZIONE INTERNA E RIFACIMENTO DEL TETTO DELL'ALA EST DEL CONVENTO DI SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA	PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA' DEI PADRI PASSIONISTI	3.351.000.000	3.351.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.640.000.000
346	AC - 31 - FG - L	Isola Del Gran Sasso d'Italia	OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE GLI INGRESSI AL SANTUARIO CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA' DEI PADRI PASSIONISTI	959.000.000	800.000.000	159.000.000	22/04/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
397	AC - 12 - LA - L	Nonantola	OPERE DI MANUTENZIONE COMPLESSO ABBAZIALE	ARCIDIOCESI DI MODENA E NONANTOLA	5.064.000.000	3.064.000.000	2.000.000.000	22/04/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
					5.554.000.000	3.554.000.000	2.000.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 500.000.000

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto corsivo

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 1 di 34

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
450	AA - 12 - FD - M	Moconesi	RESTAURO CONSERVATIVO PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E DI EDIFICI RELIGIOSI DELLA FONTANA BUONA GENOVA	COMUNE DI MOCONESI	185.000.000	175.000.000	20.000.000			
461	AA - 31 - FB - L	Varallo	COMPLETAMENTO DEL COSTRUIENDO OSTELLO PER LA GIOVENTU'	COMUNE DI VARALLO SESIA	1.458.000.000	1.000.000.000	458.000.000	09/02/1999	31/03/1999	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.14.000.000 MODIFICA TERMINI LETTERA C)
462	AA - 31 - EA - L	Varallo	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA ATTUALMENTE ADIBITA A BUS TERMINAL	COMUNE DI VARALLO SESIA	450.000.000	450.000.000	0	31/03/1999	31/03/1999	MODIFICA TERMINI LETTERA C)
475	AA - 26 - EC - L	Aquileia	SISTEMA DI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI E PARCHEGGIO DI DISSUAZIONE LUNGO LA STATALE N. 352 A SUD DELL'ABITATO	COMUNE DI AQUILEIA	480.000.000	450.000.000	10.000.000	03/07/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
484	AA - 26 - FD - L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDAZIONE SISSUL	COMUNE DI AQUILEIA	1.760.000.000	1.690.000.000	10.000.000	30/04/1999	30/04/1999	MODIFICA TERMINI LETTERA C)
489	AA - 26 - FA - M	Pisa	CONVENTO DI SANTA CROCE IN FOSSABANDA INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO AD USO RICETTIVO ALBERGHIERO E AD USO PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI	COMUNE DI PISA	10.470.000.000	7.270.000.000	3.200.000.000	30/03/1998	31/10/1998	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
					18.658.256.000	7.438.256.000	3.200.000.000	15/02/1999	15/02/1999	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 188.256.000 E MODIFICA TERMINI LETTERA C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 2 di 34

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
611	AA - 41 - IA - B	Firenze	BASILICA DI S. CROCE IN FIRENZE: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA	FONDO EDIFICI DI CULTO	5.198.000.000	4.598.000.000	600.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 662.374.727
616	AC - 51 - GA - M	Messina	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO DON ORIONE APPARTENENTE ALLA PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	7.213.532.000	6.368.532.000	845.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 1.028.000.000
642	AA - 41 - LA - M	Napoli	DUOMO DI NAPOLI	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI NAPOLI E PROV.	4.298.000.000	4.298.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 1.008.000.000
658	AB - 11 - HA - M	Bari	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Succ. 1	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
662	AB - 26 - HA - M	NORCIA	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
663	AB - 21 - HA - M	Assisi	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
664	AB - 26 - HA - M	Orvieto	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
665	AB - 21 - HA - M	Assisi	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
667	AB - 28 - HA - M	Perugia	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
669	AB - 11 - HA - M	Napoli	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
670	AB - 28 - HA - M	Gubbio	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
671	AB - 41 - HA - M	Siena	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Succ. 4	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
672	AB - 13 - HA - M	Passaro	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
674	AB - 41 - HA - M	Lucca	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI LOCALIZZATE LUNGO I PERCORSI GIUBILARI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
678	AB - 11 - HA - M	Cepus	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
683	AB - 41 - HA - M	Perugia	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
685	AB - 13 - HA - M	Perugia	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
689	AB - 24 - HA - M	Pompei	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
697	AB - 31 - HA - M	Casale	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI LOCALIZZATE LUNGO I PERCORSI GIUBILARI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
699	AB - 11 - HA - M	Napoli	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Succ. 9	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
737	AB - 13 - HA - M	Ancona	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - PIAZZA XXIV MAGGIO	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
740	AB - 22 - HA - M	Loreto	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - VIA PORTA ROMANA 2	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
742	AB - 26 - HA - M	Cagliari	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - V. R.	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
750	AB - 41 - HA - M	Mezzera	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
801	AB - 41 - HA - M	Arezzo	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Centro	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
802	AB - 41 - HA - M	Spoleto	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
803	AB - 28 - HA - M	Terni	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - V. R.	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
804	AB - 41 - HA - M	Todi	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
807	AB - 41 - HA - M	Venezia	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
809	AB - 41 - HA - M	Palermo	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Filiale	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
811	AB - 12 - HA - M	Pavia	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI-VIA PARTIGIANI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
812	AB - 41 - HA - M	Agrigento	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Filiale	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
813	AB - 41 - HA - M	Firenze	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Succ. 7	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
814	AB - 41 - HA - M	Firenze	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Centro	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
816	AB - 26 - HA - M	Spello	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
817	AB - 25 - HA - M	San Giovanni Rotondo	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - PIAZZA ROMA 8	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
818	AB - 11 - HA - M	Orario	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - VIA TENENTE EULA	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
819	AB - 26 - HA - M	Monte Sant'Angelo	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
858	AB - 26 - HA - M	Venezia	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
859	AB - 11 - HA - M	Bari	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Succ. 5	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
860	AB - 26 - HA - M	Belluno	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
981	AB - 41 - FD - M	Venezia	CENTRO D'ACCOGLIENZA PELLEGRINI PER GIOVANI E ANZIANI	IST. PROV. PER L'INFANZIA S. MARIA	2.500.000.000	2.500.000.000	0	08/10/1998		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
1096	AB - 12 - HA - M	Vicenza	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Finale	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
1102 8	AD - 23 - LA - M	Padova	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE NONCHE COPERTURE DEI TRANSSETTI E TORRI CAMPANARIE	VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO	37.844.000.000	37.844.000.000	0			
1102B/A			RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE NONCHE COPERTURE DEI TRANSSETTI E TORRI CAMPANARIE - LAVORI URGENTI ED INDIFERIBILI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO		23.015.000.000	23.015.000.000	0	31/10/1999		FRAZIONAMENTO E MODIFICA TERMINI LETTERA D)
1102B/B			RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE NONCHE COPERTURE DEI TRANSSETTI E TORRI CAMPANARIE - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RESTAURO ARTISTICO E STRUTTURALE		14.829.000.000	14.829.000.000		31/10/1999		FRAZIONAMENTO E MODIFICA TERMINI LETTERA D)
1121	AA - 13 - FD - L	Cattolica	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI	COMUNE DI CATTOLICA	3.428.000.000	2.000.000.000	1.428.000.000			PARZIALE MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
1133	AC - 11 - FD - L	Carovigno	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL SANTUARIO MARIA SS. DI BELVEDERE ED AMPLIAMENTO CON NUOVA STRUTTURA RICETTIVA	PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO	1.380.000.000	1.380.000.000	0			
1143	AC - 31 - EC - M	Sant'Anastasia	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E VALORIZZAZIONE DEL CHIOSTRO E DI ALCUNI LOCALI DEL CONVENTO DI MADONNA DELL'ARCO	PROVINCIA SAN TOMMASO D'AQUINO	9.681.000.000	9.681.000.000	500.000.000	10/11/98		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
1149	AC - 25 - GD - M	Foggia	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E AMPLIAMENTI DI EDIFICI SOCIALI DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA POVERA E SERVIZI OPERA DON ORIONE BASILICA SANTUARIO MADRE DIO INCORONATA FOGGIA	PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO OP	1.025.000.000	1.025.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 200.000.000
1213	AA - 41 - LA - B	Napoli	RESTAURO DEI DIPINTI MURALI DEL CHIOSTRO MANICATO DI S. CHIARA	FONDO EDIFICI DI CULTO	2.822.000.000	2.822.000.000	0	30/04/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
1217	AA - 11 - LA - M	Mesagne	RESTAURO E RECUPERO DEL SANTUARIO DELLA MISERICORDIA	COMUNE DI MESAGNE	1.150.000.000	900.000.000	250.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.400.000.000
1218	AA - 11 - FD - M	Mesagne	RESTAURO E RECUPERO CHIESA E CONVENTO DEI CAPPUCCINI DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINI CENTRO DOCUMENTAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE	COMUNE DI MESAGNE	3.208.000.000	2.850.000.000	358.000.000	09/12/1998		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
1237	AA - 14 - LA - B	Portacomaro	RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA ROMANICA CIMITERIALE DI SAN PIETRO CON REALIZZAZIONE DELLE VIE DI ACCESSO	COMUNE DI PORTACOMARO	750.000.000	750.000.000	0	09/12/1998		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
11/05/1999 31/10/1999 MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)										

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
1247	AC - 14 - GA - B	Sant'Angelo Del Lomb	RICETTIVITA' DIOCESANA IN ALTA IRPINIA	CURIA ARCIVESCOVILE DI S. ANGELO DEL L.	1.998.240.000 2.094.698.000	1.878.240.000 1.951.748.000	120.000.000 126.950.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 89.500.000 ED AUMENTO DEL COPFINANZIAMENTO DI L. 8.958.000
1284	AC - 26 - FD - M	Portogruaro	ACCOGLIENZA CULTURALE RELIGIOSA NEL COLLEGIO MARCONI	FONDAZIONE COLLEGIO MARCONI	3.261.325.000 3.856.162.189	2.241.325.000 2.836.162.189	1.020.000.000 1.020.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 588.771.189
1274	AC - 31 - LA - M	Napoli	ITINERARIO FRANCESCO BONAVENTURIANO ADEGUAMENTO ED ALLESTIMENTO DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE RICETTIVE CULTURALI E SPIRITUALI DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI S. LORENZO MAGGIORE	PROV. DI NAPOLI DEI FRATI MINORI	1.983.000.000	1.983.000.000	0			
1337	AA - 12 - FB - L	Mira	PROGETTO DI RESTAURO E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DISMESSE DI GIARE DA DESTINARE AD OSTELLO	COMUNE DI MIRA	1.000.000.000 2.313.000.000	1.000.000.000 2.313.000.000	0 0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 358.000.000
1339	AA - 26 - FB - B	Noto	RECUPERO DELL'EX CARCERE MANDAMENTALE (GIÀ CARCERE REALE) AD USO DI OSTELLO	COMUNE DI NOTO	3.278.000.000	2.278.000.000	1.000.000.000	05/1/1998		MODIFICA TERMINE LETTERA C)
1344	AA - 26 - LA - B	Correzzola	RECUPERO CELLERARIA BENEDETTINA DI CORREZZOLA	COMUNE DI CORREZZOLA	2.400.000.000 2.444.000.000	1.880.000.000 1.724.000.000	720.000.000 720.000.000	17/04/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
1408	AC - 26 - FA - M	Pescara	RISTRUTTURAZIONE DI UN COMPLESSO RICETTIVO ESISTENTE VILLA IMMACOLATA IN LOCALITA' SAN SILVESTRO DI PESCARA	SEMINARIO ARCIVESCOVILE	4.300.000.000 4.891.160.000	3.750.000.000 4.185.682.000	550.000.000 705.478.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 44.000.000
1421	AA - 12 - FB - B	Pianello Val Tidone	RESTAURO DELLA ROCCA MUNICIPALE E DI PIAZZA UMBERTO I°	COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE	1.359.000.000 1.498.492.192	1.144.000.000 1.283.492.192	215.000.000 215.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 355.482.000 ED AUMENTO DEL COPFINANZIAMENTO DI L. 359.478.000
										INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 139.492.192

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
1478	AB - 23 - HA - L	Padova	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
1534	AA - 14 - LA - B	Trieste	RESTAURO DEL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE DI SAN GIUSTO MARTIRE	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DEL FRIULI V.G.	500.000.000	500.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 350.000.000
1537	AA - 12 - FB - L	Fucecchio	RECUPERO DEL PONTE FORTIFICATO DI CAPPIANO PER REALIZZAZIONE OSTELLO	COMUNE DI FUCECCHIO	2.428.870.000	2.028.870.000	400.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 990.000.000
1543	AB - 28 - HA - M	Napoli	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
1544	AB - 24 - HA - M	Pompei	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
1545	AB - 31 - HA - M	Pietracedra	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
1550	AB - 14 - HA - M	Lecca	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Succ. 2	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO
1555	AB - 41 - HA - M	Pisa	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Succ. 1	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORPAMENTO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
1557	AB - 13 - HA - M	Urbino	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - VIA BRAMANTE 28	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
1558	AB - 41 - HA - M	Ascoli Piceno	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - VIA CRISPI 4	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
1559	AB - 12 - HA - M	Pavia	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Centro	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
1560	AB - 28 - HA - M	Ravenna	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
1561	AB - 41 - HA - M	Trieste	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Succ. 5	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
1562	AB - 41 - HA - M	Torino	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - Succ. 12	ENTE POSTE ITALIANE	22.000.000	17.000.000	5.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER ACCORDAMENTO
1670	AA - 11 - ED - L	Gravina in Puglia	RECUPERO TECNICO FUNZIONALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. SEBASTIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INFORMATIVO E DI COMUNICAZIONE A SERVIZIO DEI TURISTI	COMUNE DI GRAVINA	2.060.000.000	2.903.000.000	57.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 614.111.842

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 12 di 34

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
1684	AC - 26 - GA - L	Udine	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAGORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO ATTA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	CONGREGAZIONE SUORE COLLEGIO DIMESSE	571.000.000	371.000.000	200.000.000			
1772 9	AB28HAM	AMBITO NAZIONALE	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI IN AGENZIE SITUATE LUNGO PERCORSI GIUBILARI	ENTE POSTE ITALIANE	1.122.000.000	867.000.000	255.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £ 2.688.000
1806	AA - 26 - LA - B	Nuoro	RISTRUTTURAZIONE CATTEDRALE	COMUNE DI NUORO CURIA VESCOVILE DI NUORO- CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI NUORO	1.950.000.000	1.950.000.000	0			ACCOMPAGNAMENTO E MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
1873	AC - 41 - LA - B	Siracusa	RIQUALIFICAZIONE INGRESSI ALLA CATACOMBA DI S. GIOVANNI E ALLA CRIPTA DI S. MARZIANO	ARCIDIOCESI DI SIRACUSA	509.000.000	509.000.000	0			MODIFICA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
1960	AC - 26 - GA - L	Mazara Del Vallo	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO DI S.VENERANDA	DIOCESI DI MAZARA DEL VALLO	1.800.000.000	1.750.000.000	50.000.000	15/01/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
2006	AC - 31 - FA - L	Monte Sant'Angelo	LA CASA DEL PELLEGRINO RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PER OSPITALITA' POVERA	BASILICA SANTUARIO SAN MICHELE ARC.	3.000.000.000	3.000.000.000	0	24/03/1999	30/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
2107/ A	AC - 12 - GB - B	Milano	ORATORIO PARROCCHIALE DI VIA PARETO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CERTOSA	2.252.000.000	2.252.000.000	0	30/04/1999	30/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
2111	AA - 26 - EL - L	Conflenti	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	COMUNE DI CONFLENTI	616.000.000	500.000.000	116.000.000	10/11/1998		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
								02/06/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
2120	AA - 28 - EL - M	San Luca	RIQUALIFICAZIONE DEL SANTUARIO DI POLSI E CON AREE DI PERTINENZA E RELATIVO ACCESSO	COMUNE DI SAN LUCA	500.000.000	500.000.000	0			
2125	AC - 28 - FD - L	Seminara	RICOSTRUZIONE CASA DEL PELLEGRINO SISTEMAZIONE PIAZZALE DELLA BASILICA	PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE	500.000.000	500.000.000	0	14/05/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C E D)
2132	AA - 28 - FD - M	Vallelonga	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA E RELATIVI SERVIZI COMPRESSE LE AREE ACCESSORIE E DI PERTINENZA	COMUNE DI VALLELONGA VV	500.000.000	500.000.000	0	15/05/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C E D)
2143	BA - 24 - EL - B	Pompei	TECNOLOGIE AMBIENTALI E MOBILITA' PROPOSTA PER UN NUOVO PARCO ARCHEOLOGICO A POMPEI	LONGOBARDI MARILICIA	24.714.000.000	0	24.714.000.000	20/05/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C E D)
2163	AC - 28 - GA - L	Catagione	RISTRUTTURAZ. E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA VILLA S. BARTOLOMEO	SEMINARIO VESCOVILE	870.292.000	770.292.000	100.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER RINUNCIA ALL'INTERVENTO
2278	AD - 41 - GS - B	Venezia	RECUPERO AMBIENTI E MESSA A NORMA LOCALI E PERCORSI PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI DI SOSTA RISTORO E INFORMAZIONE	IST. SALES SAN GIORGIO DELL'ISPETTORIA	876.392.000	796.392.000	100.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 20.000.000
2279	AD - 41 - EF - B	Venezia	RECUPERO AMBIENTI E MESSA A NORMA LOCALI E PERCORSI PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI DI SOSTA RISTORO E INFORMAZIONE	IST. SALES. SAN GIORGIO DELL'ISPETTORIA	845.000.000	455.000.000	90.000.000	31/03/1999	31/10/1999	PROROGA TERMINI LETTERE C E D)
								31/03/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C E D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
2329	AC - 41 - GA - M	Fiesole	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLE COPERTURE E DELLA FACCIAIA PROSPICIENTI LA PIAZZA DI SAN DOMENICO	CONVENTO DOMENICANI DI S. DOMENICO	1.583.000.000	400.000.000	1.183.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.178.000.000
2416/ A	AC - 26 - GB - M	Ancona	CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RESTAURO DI VILLA CAMERATA- EDIFICI A-B ed F-1 LOTTO	ARCIDIOCESI ANCONA OSIMO	3.994.000.000	1.205.000.000	2.789.000.000			MODIFICA DELLA DISTRIBUZIONE FINANZIARIA PER ERRORE MATERIALE ED AUMENTO COFINANZIAMENTO
2416/ B	AC - 26 - GB - M	Ancona	CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RESTAURO DI VILLA CAMERATA - EDIFICI D-E-G ed il parco - IL LOTTO	ARCIDIOCESI ANCONA OSIMO	1.628.000.000	1.205.000.000	423.000.000			MODIFICA DELLA DISTRIBUZIONE FINANZIARIA ED AUMENTO COFINANZIAMENTO
2436	AC - 41 - GA - M	Palermo	RIQUALIFICAZIONE DI PARTI EDILIZIE DI VECCHIA STRUTTURA GIA' ATTIVA PER ACCOGLIENZA GRUBILARE	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE SAN SISTO VECCHIO	1.476.000.000	1.468.000.000	10.000.000			MODIFICA DELLA DISTRIBUZIONE FINANZIARIA ED AUMENTO COFINANZIAMENTO
2533	AC - 25 - FA - L	San Giovanni Rotondo	RECUPERO TRAMITE RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA ABRESCH	FOND. CASA SOLLIEVO SOFFERENZA	2.676.921.000	2.676.921.000	0	30/03/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
2558	AA - 12 - IA - L	Orio Litta	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX CASCINA S. PIETRO GIA' GRANGIA DEI MONACI BENEDETTINI DI S.PIETRO	COMUNE DI ORIO LITTA	1.900.000.000	1.700.000.000	200.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.135.000.000
2581	AC - 14 - FB - L	Canossa	RECUPERO FUNZIONALE DEL CASTELLO DI ROSSENA PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	PIA UNIONE DOTTRINA CRISTIANA	4.450.000.000	3.950.000.000	500.000.000	31.10.1999		PROROGA TERMINI LETTERA D)
								1/20/2/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
2609	AC - 25 - FA - L	San Giovanni Rotondo	CENTRO DI ACCOGLIENZA GLI ANGELI DI PADRE PIO	PROV. FOGGIA FRATTI MINORI CAPPUCCINI	13.421.000.000	10.921.000.000	2.500.000.000			
2693	AE - 14 - ED - F	Chieti	CENTRO CONSORTILE DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL FLUSSO TURISTICO RELIGIOSO E CULTURALE	CONSORZIO CELESTINIANO SOC. COOP. A R.L.P.A.	1.806.000.000	1.806.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £ 126.000.000
2739	AC - 12 - IA - B	Sarzana	ORATORIO DI SAN GEROLAMO	PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA	538.000.000	394.000.000	144.000.000	1/9/5/1999	1/5/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
2763	AC - 12 - GA - M	Sansepolcro	RESTAURO CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CONVENTO DEI SERVI DI MARIA PER ESSERE UTILIZZATO A CASA DI ACCOGLIENZA	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA	1.066.130.000	691.130.000	375.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £ 183.000.000
2764	AC - 41 - FD - L	Napoli	ADATTAMENTO DELL'ISTITUTO SCUOLE PIE ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO COMPRESO NELL'ITINERARIO L'APIA ANTICA CAMMINO DI FEDE E CULTURA	PROV. NAPOLETANA PADRI SCOLAPI	10.635.000.000	7.800.000.000	2.835.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £ 183.878.000
2797	AB - 41 - FH - F	Venezia	STRUTTURE PREFABBRICATE PER IL PERNOTTAMENTO A BASSO COSTO	A.M.A.V. AZIENDA MULTIS. AMBIENT. VENEZIANA	1.801.000.000	1.081.000.000	720.000.000			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI £ 3.517.000.000
2803	AB - 41 - EG - M	Venezia	STRUTTURE PREFABBRICATE E RIPRISTINO DI STRUTTURE IN MURATURA PER IL PERNOTTAMENTO A BASSO COSTO	A.M.A.V. AZIENDA MULTIS. AMBIENT. VENEZIANA	2.701.000.000	1.391.000.000	710.000.000			MODIFICA TITOLO ED INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £ 900.000.000
			REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI		352.000.000	176.000.000	176.000.000			DEFINANZIAMENTO TOTALE PER RINUNCIA ALL'INTERVENTO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
2915	AC - 41 - LA - L	Fiesole	RESTAURO DELLA FACCIA TERNALE DELLA CATTEDRALE DI S. ROMOLO	CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI FIESOLE	418.000.000	300.000.000	118.000.000			
2996	AC - 26 - EA - M	Mogliano Veneto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE AL FINE DI ACCOGLIENZE A BASSO COSTO E ASSISTENZA	CASA REL. COLLEGIO SALESIANO ASTORI	534.000.000	444.000.000	90.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 11.762.000 ED AUMENTO COFINANZIAMENTO DI € 12.931.000
3018	AC - 31 - FD - L	Verbania	ACCOGLIENZA AI PELLEGRINI DIRETTI AI SACRI MONTI AI SANTUARI ED AI LUOGHI DI CULTO TRADIZIONALI	OPERA DIOCESANA DELLA PRESERVAZIONE DELLA FEDE	3.827.000.000	1.600.000.000	2.227.000.000	31/01/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
3048	AC - 14 - FB - B	Verona	AMPLIAMENTO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELLA FORESTERIA DI VILLA FRANCESCATI	DIOCESI DI VERONA	4.094.000.000	3.596.000.000	498.000.000	30/01/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA D)
3048/A			AMPLIAMENTO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELLA FORESTERIA DI VILLA FRANCESCATI - FORESTERIA ALLA OVEST		498.000.000	0	498.000.000			FRAZIONAMENTO
3048/B			AMPLIAMENTO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELLA FORESTERIA DI VILLA FRANCESCATI - FORESTERIE ALLA EST - CORPO PRINCIPALE ALLA OVEST - SEGRE - SCALINATA BAROCCA OPERE DI RESTAURO AD ALTA SPECIALIZZAZIONE		3.217.000.000	3.217.000.000	0			FRAZIONAMENTO
3048/C					3.49.000.000	3.49.000.000	0	15/04/99		FRAZIONAMENTO E MODIFICA TERMINI LETTERA C)
3066	AA - 12 - EA - L	Siena	RISALITA BALDASSARRE PERUZZI CENTRO STORICO	COMUNE DI SIENA	3.741.028.000	3.741.028.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 759.000.000
3133	AC - 14 - IA - L	Venimiglia	PROGETTO DI RESTAURO DELLE COPERTURE RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI E IMPIANTI NEL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE	PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA ASSUNTA CATTEDRALE	2.810.000.000	2.400.000.000	210.000.000	30/04/99	30/10/99	RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO DI € 1.010.000 E MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
3144	AA - 41 - EE - F	Firenze	ITINERARI DELLA VIA FRANCIGENA E DEI LUOGHI DELLA FEDE IN TOSCANA	REGIONE TOSCANA	6.279.000.000	3.257.000.000	3.022.000.000			
3144/A			ITINERARI DELLA VIA FRANCIGENA E DEI LUOGHI DELLA FEDE IN TOSCANA - SEGNALETICA		1.237.000.000	1.237.000.000	0			FRAZIONAMENTO
3144/B			ITINERARI DELLA VIA FRANCIGENA E DEI LUOGHI DELLA FEDE IN TOSCANA - PROGETTO EDITORIALE		1.032.000.000		1.032.000.000			FRAZIONAMENTO
3194	AA - 41 - EL - M	Firenze	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO ORTICOLTURA E PARNASO	COMUNE DI FIRENZE	2.100.000.000	1.868.000.000	231.000.000	18/02/1999		MODIFICA DEI TERMINI DELLA LETTERA C)
3195	AA - 41 - EL - F	Firenze	SERVIZIO DI ARREDO E ADOBBIO URBANO CON MATERIALE VEGETALE	COMUNE DI FIRENZE	1.200.000.000	1.066.000.000	132.000.000			MODIFICA TERMINI LETTERA C)
3278/ C	AA - 12 - EA - M	Ravenna	REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (3° LOTTO) - PARCOVIABILITA' PEDONALE E CICLABILE - PK - EDIFICIO DI SERVIZIO	COMUNE DI RAVENNA	4.626.002.504	1.728.002.504	2.900.000.000	15/03/1999		
3294	AC - 12 - HA - B	Ravenna	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE AGLI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA PER LA DIDATTICA RELIGIOSA PER LE ATTIVITA' CULTURALI PER I SERVIZI E PER L'ACCESSIBILITA' ALLA CHIESA DI SANTA MARIA IN PORTO	ARCHIDIOCESI DI RAVENNA CERVIA	150.000.000	130.000.000	20.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.318.000.000 ED AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.138.000.000.
3372	AC - 31 - EL - M	Nova Ponente	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE ED AUTOBUS	CONVENTO DI PIETRALBA	1.133.000.000	1.133.000.000	0	31/10/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA D)
								30/05/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
3373	AC - 31 - FA - M	Nova Ponente	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DESTINATO ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI CON LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA TAVOLA CALDA SELF SERVICE	CONVENTO DI PIETRALBA	8.343.000.000	4.229.000.000	2.114.000.000			
3417	AC - 31 - GB - L	Varallo	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELLA STRUTTURA RICETTIVA VILLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	CONGR. SUORE MISS. DI GESU' ETERNO	2.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L. 129.000.000 ED EQUIVALENTE RIDUZIONE DI FINANZIAMENTO
3505	AA - 11 - ED - B	Mercogliano	POTENZIAMENTO FUNZIONALE DEI BENI CULTURALI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DEL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	SOPRINTENDENZA B.A.A.S. DI SALERNO ED AVELLINO	1.961.000.000	1.961.000.000	0	3/5/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA Q
3638	AA - 41 - HD - M	Napoli	INFOPOINT PASSEPARTOUT 2000 - SISTEMA DI NODI INFORMATIVI DEDICATI AI DISABILI PER L'ACCOGLIENZA, LA GUIDA AL TERRITORIO E LA CONOSCENZA DEI SUOI BENI CULTURALI	COMUNE DI NAPOLI	1.881.000.000	1.781.000.000	100.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 579.606.000
3690	AC - 11 - GA - L	Matera	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUARE ED AUMENTARE LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO ESISTENTE	IST. SUORE RIPARATRICI SACRO CUORE	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000			RIDUZIONE FINANZIAMENTO DI L. 177.688.000
3697	AD - 23 - LA - M	Camposampiero	RECUPERO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO AL NOCE	COLLEGIO ANTONIANO DELLE MISSIONI ESTERE DEI FRATI	580.000.000	410.000.000	170.000.000	30/09/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA D)
3761	AC - 12 - LA - B	Susa	INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE CHIESA CHIOSTRI DI S. FRANCESCO	PROV. LIGURE PIEMONTESE FRATI MINORI	970.000.000	820.000.000	150.000.000	20/02/1999	30/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE Q E D)
(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi										
Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi										
								24/10/1998		MODIFICA TERMINE PER ERRORE MATERIALE

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fondi Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note	
3868	AC - 31 - GA - L	Arzignano	RECUPERO DELLA ROCCA SCALIGERA E DEGLI IMMOBILI ADIACENTI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA E DELL'EX CONVENTO FRANCESCO DI S. MARIA DELLE GRAZIE DI PROPRIETA' PRIVATA PER LA CREAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA	PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA V. MARIA	6.985.430.000	6.068.430.000	917.000.000				
3868/A			RECUPERO DELLA ROCCA SCALIGERA E DELLE MURA DELLA PARROCCHIA E DELL'EX CONVENTO FRANCESCO DI S. MARIA DELLE GRAZIE DI PROPRIETA' PRIVATA PER LA CREAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA -		3.632.894.692	3.222.769.498	399.325.194			FRAZIONAMENTO	
3868/B			EX CONVENTO DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE		2.418.178.000	2.196.000.000	214.178.000				
3868/C			LOGGIA DEL VICARIO DELLA SERENISSIMA		447.515.388	244.818.582	203.596.806				
3868/D			ARREDI E ATTREZZATURE		465.656.000	465.656.000					
3992	AC - 11 - GA - M	Acerra	CENTRO DELL'UMANA ACCOGLIENZA RECUPERO LOCALI EX MONASTERO SS. ANNUNZIATA	DIOCESI DI ACERRA	8.628.000.000	8.128.000.000	500.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.342.000.000	
4019	AC - 14 - GA - L	AVELLINO	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 3° ED ULTIMO LOTTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI ROSETO	PROVINCIA NAPOLETANA DEI FRATI CAPPUCCINI	3.986.000.000	1.993.000.000	1.993.000.000			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.1.378.688.048	
4061	AC - 11 - ED - M	Oria	RESTAURO E RIUTILIZZO DEL RITIRO MARIA IMMACOLATA DA ADIBIRE A RISTORO PELLEGRINI, CENTRO DOCUMENTAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE	SEM. VESCOVILE S.CARLO BORRONEO	1.460.000.000	1.260.000.000	200.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.84.000.000	
4104	AA - 26 - GA - M	L'Aquila	RESTAURO DEL COMPLESSO MONASTICO DI S. MARIA DI COLLEMAGGIO	PROVINCIA DI L'AQUILA	2.500.000.000	2.500.000.000	0			1904/1999 31/10/1999 MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)	
(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi										Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi	Pagina 20 di 34

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
4194	AA - 41 - EF - M	Firenze	RIFACIMENTO CUCINA CENTRALIZZATA DELLA CENTRALE TERMICA E RELATIVE ATTREZZATURE NUOVI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI DI VIA DEI BRUNI	COMUNE DI FIRENZE	1.285.000.000	1.144.000.000	141.000.000			
4196	AA - 41 - EG - L	Firenze	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	COMUNE DI FIRENZE	1.507.000.000	1.395.000.000	172.000.000	16/03/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA Q
4247	AC - 20 - LA - B	Agrigento	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIADATTAMENTO DELLA CATTEDRALE DI AGRIGENTO E LOCALI ANNESSI	PARROCCHIA S. GERLANDO	1.095.900.000	1.095.900.000	0	10/05/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA Q
4248	AC - 20 - LA - L	VITTORIA	RIQUALIFICAZIONE SALE PLURIUSO E ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI	PARROCCHIA MADONNA DELLA SALUTE	1.150.000.000	1.000.000.000	150.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 307.400.000
4275	AC - 41 - LA - B	Venezia	RESTAURO CONSERVATIVO DELL'INTERNO DELLA CHIESA DEL SS. REDENTORE	PARROCCHIA DEL SS REDENTORE	2.283.759.000	1.633.759.000	450.000.000	15/06/99		MODIFICA TERMINI LETTERA C
4310	AA - 41 - EA - M	Firenze	PARCHEGGIO ATTREZZATO DI SCAMBIO SERVIZI DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA STAZIONE AUTOLINEE EXTRAURBANE	COMUNE DI FIRENZE	20.320.000.000	18.662.000.000	3.658.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 301.000.000
4381	AC - 14 - IA - B	Urbino	RECUPERO AMBIENTALE E RIPRISTINO DI LOCALI DI ALTO VALORE STORICO E RELIGIOSO DA INSERIRE NEL TOUR GIUBILARE DEGLI AVVENIMENTI LITURGICI LEGATI AL GIRO DELLE GROTTE E DEGLI ORATORI	ENTE CHIESA CATTEDRALE DI URBINO	21.702.339.998	18.044.339.998	3.658.000.000	15/03/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C E D
4632	AA - 41 - ED - M	Trieste	ITINERARI D'ARTE E RELIGIOSITA' NEL FRIULI VENEZIA GIULIA	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. FRIULI V.G.	1.307.000.000	1.307.000.000	60.000.000		30/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERA D

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
484/	AA - 28 - IA - L	Varallo	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO STRUTTURALE COMPLESSO MONUMENTALE DELLA "MADONNA DELLE GRAZIE (2° LOTTO)	COMUNE DI VARALLO SESIA	600.000.000	600.000.000	0			
4814	AA - 14 - EC - M	GORIZIA	LA REALIZZAZIONE DELLA PORTA INFORMATICA PRESSO LA STAZIONE CONFINARIA INTERNAZIONALE DI SANT'ANDREA	COMUNE DI GORIZIA	450.000.000	350.000.000	100.000.000		19/02/1999 31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
4882	AC - 52 - GB - M	San Giuliano Milanese	RESTAURO E AMPLIAMENTO DELLE CAPACITA' DI ACCOGLIENZA DI UNA ANTICA FORESTERIA MONASTICA	MONASTERO BENEDETTINE SS. PIETRO E PAOLO	2.284.117.000	1.204.117.000	1.080.000.000			INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO DI L. 358.000.000
4915	AA - 14 - IA - M	Cagliari	RESTAURO ARCHITETTONICO DEL PALAZZO VICEREGIO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CAGLIARI	2.471.712.000	1.381.712.000	1.090.000.000			INTEGRAZIONE DI FINANZIAMENTO DI L. 177.000.000
4968	BA-23-FA-M	LIMEVA	RIQUALIFICAZIONE DI AREA INDUSTRIALE DISMESSA	VIBROCEMENTO VENETA S.P.A.	8.000.000.000	8.000.000.000			31/08/1999 30/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
4997	AC - 28 - GA - M	Cortina	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI SPIRITUALITA' SANTA MARIA BELFIORE MEDIANTE IL POTENZIAMENTO E RIMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA	1.300.000.000	1.050.000.000	250.000.000			REINSENERIMENTO NEL PIANO
									15/04/1999 31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
5000	AC - 12 - HA - M	San'Ambrogio Di Torino	OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE	PROV. ITALIANA S. MAURIZIO	3.250.000.000	3.200.000.000	50.000.000			
5000/A			OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - MONASTERO NUOVO		2.267.452.510	2.267.452.510	0	11.09.98		FRAZIONAMENTO E PROROGA TERMINI LETTERA Q
5000/B			OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - FORESTERIA PICCOLA		367.920.000	367.920.000	0	08.10.98		FRAZIONAMENTO E MODIFICA TERMINI LETTERA Q
5000/C			OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - STRADA PERIMETRALE		793.377.351	742.577.351	50.000.000	21.10.98		FRAZIONAMENTO E MODIFICA TERMINI LETTERA Q) - INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.178.949.861
5091	AA - 31 - IA - B	Aquila	RESTAURO VALORIZZAZIONE E RIUSO DEL BATTISTERO CHIESA DEI PAGANI ANNESI AL COMPLESSO DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B A.A.A.S. DEL FRIULI V G	650.000.000	650.000.000	0		30/10/1999	MODIFICA TERMINE LETTERA D)
5214	AA - 41 - LA - B	Genova	RESTAURO RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO COSTITUITO DALLA CATTEDRALE E DAL CHIOSTRO DI SAN LORENZO	SOPRINTENDENZA B. A. A. DI GENOVA	3.114.000.000	2.864.000.000	250.000.000			
5215	AA - 41 - LA - B	Genova	RESTAURO DELLA COMMENDA DI S. GIOVANNI DI PRE'	SOPRINTENDENZA B. A. A. DI GENOVA	3.429.000.000	3.179.000.000	250.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.315.000.000
5232	AC - 12 - LA - M	San Miniato	RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CAPPELLA DEI SEPOICRETO DI S. URBANO E DI PIETRO NEL COMPLESSO DI S. DOMENICO A S. MINIATO CON RISANAMENTO E RESTAURO DELLA ANTICA VIA ANGELICA META DI PELLEGRINAGGI MEDIOEVALI	PARROCCHIA DELLA SS. ANNUNZIATA E S. DOMENICO	908.000.000	489.000.000	417.000.000	10/03/99	12/04/1999	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £ 358.000.000 E MODIFICA TERMINI LETTERA Q

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Terminj Let. c)	Terminj Let. d)	Note
5324	AA - 12 - FB - L	PELLEGRINO PARMENSE	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE ANTICO EDIFICIO CONVENTUALE	COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE	2.036.520.000	1.426.520.000	610.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 78.000.000
5335	AC - 12 - FB - L	MEDESANO	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER RICEVITA' POVERA IN TERRITORIO PARMENSE	PARROCCHIA DI SAN PANTALEONE	1.000.000.000	800.000.000	400.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 332.000.000 E COFINANZIAMENTO DI L. 175.000.000
5343	AA - 12 - FH - M	COMPIANO	FORESTERIA DEL CASTELLO A BASSO COSTO E SERVIZI CATEGORIA L/F	COMUNE DI COMPIANO	1.952.000.000	602.000.000	1.350.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 406.000.000
5375	AC - 41 - GA - L	Indas in Val D'Amo	POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ED ESPERIENZE SOCIALI DI LORPIANO ALLOGGI CASETTE	P.A.M.O.M. PIA ASSOCIAZIONE MASCHILE OPERA MARIA M	572.000.000	272.000.000	300.000.000			
5427	AC - 26 - FD - M	Ginigliano	CASA DI SPIRITUALITA' E DI ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	AMMINISTRAZIONE SANTUARIO MADONNA DI PORTO	782.000.000	500.000.000	282.000.000	01/05/1999	30/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
5464	AC - 14 - GB - L	Pisa	RECUPERO DI LOCALI SOTTOTETTO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA	CONGR. REL. ISTIT. SUORE FRANCESCA	450.000.000	250.000.000	200.000.000	31/03/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
5492	AA - 51 - EL - L	Trieste	CENTRO ACCOGLIENZA PELLEGRINI	COMUNE DI TRIESTE	920.000.000	800.000.000	120.000.000	30/03/1999	01/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
5493	AA - 51 - FA - L	Trieste	FORESTERIA PER I PELLEGRINI	COMUNE DI TRIESTE	1.800.000.000	1.800.000.000	0	21/10/1998	30/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
5502	AC - 14 - FD - L	ORVIETO	ESPERIENZA FRANCESCANI NEL GIUBILEO	FAMIGLIA DEI DISCEPOLI IST. REL.	3.159.000.000	2.590.000.000	569.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.382.000.000 ED AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI £.63.000.000
5512	AA - 14 - EA - M	Sepino	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'ACCOGLIENZA	COMUNE DI SEPINO	1.169.000.000	1.169.000.000	0			
5523	AC - 12 - GB - B	MONTEROSSO AL MARE	RESTAURO CONSERVATIVO DEL CONVENTO DEI CAPPUCINI PER UNA RIFUNZIONALIZZAZIONE QUALE STRUTTURA RICETTIVA RELIGIOSA CON ADEGUAMENTO DELLA ACCESSIBILITÀ E DELLE AREE DI PERTINENZA	PROV. GENOVA FRATI MINORI CAPPUCINI	1.548.970.000	1.087.970.000	479.000.000	30/05/1999	30/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE Q E D)
5556	AC - 12 - FD - L	Serralunga Di Crea	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EDILIZIO E MONASTICO SANTUARIO DI CREA	SANTUARIO DIOC MADONNA DI CREA	1.255.470.000	1.286.470.000	479.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.212.500.000
5593	AA - 26 - EA - L	Pavia	NUOVA AREA DI SOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DEL MONUMENTO	COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA	1.074.000.000	1.074.000.000	0			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER DEFINANZIAMENTO TOTALE
5748	AC - 26 - GA - L	Castelpetroso	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA	ARCIDIOCESI DI CAMPOBASSO BOIANO	4.286.000.000	4.286.000.000	0	17/03/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE Q E D)
5748/A			RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA - VIABILITÀ DI ACCESSO E SERVIZI - OPERE DI CONSOLIDAMENTO		1.623.000.000	1.623.000.000	0			FRAZIONAMENTO
5748/B			RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA - OPERE CIVILI ED IMPIANTISTICHE		2.663.000.000	2.663.000.000	0			FRAZIONAMENTO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
5793	AC - 11 - GA - M	Grottaglie	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA AI FINI DELL' ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI ANCHE DISABILI	PROV. S. FRANCESCO DI PAOLA	1.557.000.000	1.357.000.000	200.000.000			
5797	AA - 53 - IA - B	Bologna	LAVORI DI RESTAURO E DI CONSOLIDAMENTO DEL PORTICO DI S. LUCA	SOPRINTENDENZA B A A. DI BOLOGNA	5.000.000.000	5.000.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 618.000.000
5799	AA - 12 - LA - L	Asti	CHIESA DI S. GIUSEPPE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO	COMUNE DI ASTI	2.650.000.000	1.500.000.000	1.150.000.000	14/12/1998		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
5954	AC - 41 - LA - B	Brescia	RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI ESTERNE ED INTERNE DELLA CHIESA CATTEDRALE	CATTEDRALE DI BRESCIA	1.902.080.000	492.080.000	1.500.000.000	31/12/1998	30/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
5962	AA - 12 - IA - B	NOCETO	PROGETTO COORDINATO DI RESTAURO DELLA ROCCA E PARCO DI NOCETO E DI UNA EX SCUOLA DI CASTAMEZZANA CON LA REALIZZAZIONE DI CENTRO DI ACCOGLIENZA DISCOPRIFICO MUSICALE E OSTELLO REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO NELLA EX SCUOLA DI COSTA MEZZANA	COMUNE DI NOCETO	370.000.000	340.000.000	30.000.000			AUMENTO COFINANZIAMENTO DI L. 678.000.000 RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO DI L. 67.000.000
5973	AC - 12 - GA - M	Bone	RISTRUTTURAZIONE CANONICA DI POZZOLO USO ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA E RELATIVI SERVIZI	PARROCCHIA DI S. MAURIZIO DI POZZOLO	507.000.000	370.000.000	137.000.000			VARIAZIONE DEL TITOLO DELL'INTERVENTO
5976	AC - 12 - IA - B	TERENZO	RESTAURO DELLA PIEVE DI BARDONE E RECUPERO A FINI MUSEALI DI LOCALI ACCESSORI	PARROCCHIA ASSUNZIONE B.V MARIA	1.082.000.000	777.000.000	305.000.000	14/04/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
					1.322.000.000	977.000.000	345.000.000	01/02/99		INTEGRAZIONE FINANZIARIA PER L. 208.000.000 E MODIFICA TERMINI LETTERA C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenta del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
6000	AA - 12 - EL - L	Pontremoli	CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI VIA FRANCIGENA LUNGO IL CENTRO STORICO DI PONTREMOLI PONTE C BATTISTI SUL FIUME MAGRA	COMUNE DI PONTREMOLI	1.010.000.000	930.000.000	80.000.000			2004/1999 31/10/1999 MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
6121	AA - 41 - HA - L	Firenze	REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PRIMI DI OSTACOLI E BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO STORICO DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	5.000.000.000	4.450.000.000	550.000.000			2004/1999 31/10/1999 MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
6156	AC - 41 - LA - M	Manitova	CATTEDRALE DI S. PIETRO IN MANTOVA PROGETTO PER IL RECUPERO DELL'IMMAGINE STORICA E LA CORRETTA ACCOGLIENZA LA NAVATA CENTRALE LA CUPOLA L'ABSIDE ED I TRANSETTI	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO IN CATTEDRALE	2.100.000.000	1.890.000.000	210.000.000			02/03/1999 MODIFICA TERMINI LETTERA C)
6219	AA - 41 - IC - M	Firenze	CENTRO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA NEI LOCALI DELL'ANTICO CONVENTO DI S. M. NOVELLA CON ACCESSO DA PIAZZA STAZIONE.	COMUNE DI FIRENZE	1.504.000.000	1.279.000.000	229.000.000			22/04/1999 31/10/1999 MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
6239	AB - 53 - FD - L	Bologna	REALIZZAZIONE DI CASA ALBERGO PER ANZIANI	OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI	3.125.000.000	1.000.000.000	2.125.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.118.000.000
6244	AC - 53 - FD - L	Bologna	MAISON D'ACCUEIL DAL MONTE	FONDAZIONE GESU' DIVINO OPERAIO	850.000.000	850.000.000	200.000.000	10/12/1998		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
6245	AA - 53 - GA - L	Bologna	RIQUALIFICAZIONE LOCALI CONVENTO SAN DOMENICO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINI	PREFETTURA DI BOLOGNA	350.000.000	350.000.000	0	26/11/1998		AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI £. 731.000.000 E MODIFICA TERMINI LETTERA C)
					365.000.000	365.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.113.000.000

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
6279	AA - 12 - FB - M	BIONAZ	RECUPERO DEL FABBRICATO LA BATISE AD USO OSTELLO	COMUNE DI BIONAZ	1.919.516.000	1.286.516.000	633.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 1.753.396.000
6333	AA - 21 - EA - M	Assisi	PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN LOCALITA' MOJANO	COMUNE DI ASSISI	2.325.000.000	2.325.000.000	0			MODIFICA TERMINI LETTERE Q E D) 15/06/1999 31/10/1999
6366	AA - 26 - LA - B	Periciale	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SANTUARIO DI MONGIOVINO	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DELL'UMBRIA	3.610.000.000	3.600.000.000	10.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 732.000.000
6387	AA - 31 - LA - B	Cascia	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI S. AGOSTINO	FONDO EDIFICI DI CULTO	1.100.000.000	1.100.000.000	0			MODIFICA TERMINI LETTERA Q 08/02/1999
6442/ C	AB - 13 - EA - M	Norcia	SISTEMA STRUTTURALE INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E RIQUALIFICAZIONE DELLA CINTA MURARIA E VIARIA AL RIOSO DEL CENTRO STORICO - REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA	COMUNE DI NORCIA	5.757.000.000	5.757.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 506.000.000
6453	AC - 21 - GB - L	Assisi	PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO IL MIGLIORAMENTO L'ADEGUAMENTO E LA CRESCITA DELLA STRUTTURA RICETTIVA CASA DI S. BRIGIDA	ORDINE DEL SS.MO SALVATORE DI S. BRIGIDA	950.000.000	950.000.000	0			MODIFICA TERMINI LETTERE Q E D) 15/02/1999 31/10/1999
6495	AA - 14 - IA - M	Sassoterrato	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RISUSO DEL PALAZZO DEGLI SCALZI	COMUNE DI SASSOTERRATO	7.222.126.000	5.667.126.000	1.555.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 1.555.000.000
6537	AC - 12 - FD - M	PESARO	ACCOGLIENZA POVERA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO NELL'EDIFICIO DISMESSO DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE	SEMINARIO VESCOVILE	4.366.024.000	4.186.024.000	200.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 81.000.000

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 28 di 34

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urghe	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
6538	AA - 12 - EA - M	PESARO	RECUPERO FUNZIONALE AI FINI CENTRO DI SOSTE RISTORO INFORMAZIONE DI UN'VALA DELL'EX CONVENTO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI	COMUNE DI PESARO	8.071.950.000	3.956.950.000	1.115.000.000			
6681	AC - 22 - FA - L	Loreto	AMMODERNAMENTO DELLA CASA SAN FRANCESCO	PROV. PICENA S. GIACOMO DELLA MARCA	5.448.458.000	4.325.458.000	1.115.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.368.500.000
6706	AB - 13 - EH - M	Foligno	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SANITARIO DI PRIMO INTERVENTO PER PELLEGRINI E O TURISTI PREVIA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI	AZIENDA U.S.L. N. 3	4.000.000.000	4.000.000.000	0			RIDUZIONE FINANZIAMENTO DI L. 378.800.000
6717	AC - 21 - IA - B	Ascoli	ADEGUAMENTO LITURGICO E FUNZIONALE DELLA BASILICA	PROTOMONASTERO DI S. CHIARA ASSISI	2.000.000.000	2.000.000.000	0	18/12/1998		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
6800	AC - 13 - LA - B	Guastallo	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MARIA DI GAIFANA	PARROCCHIA DI S. NICOLA VESCOVO	524.000.000	400.000.000	124.000.000	18/02/1999	29/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
6804	AC - 13 - LA - B	Nordia	RESTAURO RECUPERO E RIUTILIZZO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN BENEDETTO	ARCIDIOCESI DI SPOLETO NORCIA	3.830.103.000	3.630.103.000	200.000.000	04/11/1998		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
6821	AA - 22 - EC - M	Loreto	COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO POLIVALENTE (ALLEGATO PIANO GENERALE ACCOGLIENZA)	COMUNE DI LORETO	2.500.000.000	2.100.000.000	400.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.954.631 E CORRISPONDENTE DIMINUIZIONE DI COFINANZIAMENTO
6888	AC - 14 - GB - M	Montemonaco	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA CASA GIOIOSA	PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO IN FERRA'	1.255.000.000	1.000.000.000	255.000.000	28/05/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
								22/02/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
6905	AD - 21 - HA - L	Asti	RISTRUTTURAZIONE CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	IST TERZIARIE FRANCISCANE ALCANTARINE	3 207.430.000	1.609.430.000	1.598.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 33.545.000 E CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL COFINANZIAMENTO
6906	AC - 21 - LC - B	Asti	REALIZZAZIONE DELLA SALA CONVEGNI E SALA POLIVALENTE DI S. MARIA DELLE ROSE	CATTEDRALE DI S. RUFINO	1.058.380.000	633.380.000	425.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 4.616.667 E CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL COFINANZIAMENTO
6970	AC - 13 - GA - M	Spoleto	RECUPERO DEL MONASTERO DI S. PONZIANO TRASFORMAZIONE PARZIALE IN CASA RELIGIOSA DI OSPITALITÀ E RESTAURO DEL MONASTERO ESISTENTE	MONASTERO DI S. PONZIANO	3.024.000.000	3.124.000.000	500.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 282.000.000
6980	AC - 26 - GC - M	Todi	CENTRO DI INFORMAZIONE E COORDINAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E ZONA DI PARCHEGGI	CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'AMORE MISERICORDIOSO	2.600.000.000	2.600.000.000	0	04/05/1999	30/09/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
6986	AA - 22 - EA - L	Loreto	AREA URBANA PREDISPOSTA PER LA SOSTA ED IL RISTORO	COMUNE DI LORETO	440.000.000	440.000.000	0	16/02/1999		INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 36.000.000 MODIFICA TERMINI LETTERA Q)
7014	AA - 13 - LA - B	Montecassini	TORRE AMERINA	COMUNE DI MONTECASTRILLI	122.000.000	110.000.000	12.000.000	15/04/1999	30/09/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
7031	AA - 13 - FB - M	Anania	OSTELLO DI PALAZZO GIUSTINIANI	COMUNE DI AMELIA	2.653.000.000	2.308.000.000	265.000.000	02/05/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
7036	AA - 13 - FD - M	Giove	LA TORRE DEL BORGO	COMUNE DI GIOVE	569.000.000	569.000.000	0	22/04/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
7065	AC - 13 - GA - M	Cagli	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL MONASTERO BENEDETTINO DI SAN PIETRO	MONASTERO BENEDETTINE DI SAN PIETRO	3.308.990.000	3.088.990.000	218.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.194.000.000
7084	AA - 28 - FB - M	VALLO DI NERA	SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN LOCALITA' CASALI DI VALLO	COMUNE DI VALLO DI NERA	1.491.470.000	1.491.470.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.451.000.000 ED AUMENTO COFINANZIAMENTO DI £.100.000.000
7167	AC - 13 - GA - M	San'Anatolio Di Narco	CASA RELIGIOSA DI ACCOGLIENZA POVERA IN SAN FELICE	ARCIDIOCESI DI SPOLETO NORCIA	1.909.397.000	1.709.397.000	200.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.448.759.087 E CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL COFINANZIAMENTO
7201	AC - 13 - LA - B	Gubbio	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO FRANCESCANO DI GUBBIO CHIESA DI S. FRANCESCO E CONVENTO	CHIESA DI S. FRANCESCO GUBBIO	3.041.895.000	2.946.895.000	95.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.8.445.731 E CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL COFINANZIAMENTO
7235	AC - 21 - GB - L	Assisi	RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO UBICATO NEL BORGO MEDIEVALE DI S. GREGORIO DA DESTINARE A STRUTTURA RICETTIVA	PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO	1.531.770.000	619.770.000	712.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.18.612.338 E CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL COFINANZIAMENTO
7265	AA - 13 - IA - B	TERNI	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO CONTELLORI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO E RELATIVI SERVIZI	COMUNE DI TERNI	1.620.000.000	1.620.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI £.10.000.000

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
7266	AA - 13 - IA - B	Terni	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO COSTITUITO DALL'EX CHIESA DI S. ANGELO E SUE DIPENDENZE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA LA DOCUMENTAZIONE E L'INFORMAZIONE	COMUNE DI TERNI	920 000.000	920 000 000	0			
7268	AA - 13 - IA - M	SPOLETO	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL PALAZZO COLLICOLA IN SPOLETO QUALE CENTRO DEL SISTEMA MUSEALE CITTADINO E SPAZI PER LA GESTIONE DELL'EVENTO GIBILARE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI ED ARTISTICHE CONNESSE INFORMAZIONE E PROGRAMMAZIONE	COMUNE DI SPOLETO	5 257 654.000	4 257 654.000	1 000 000.000	1000/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C
7278	AC - 21 - LA - M	Assisi	RESTAURO CONSERVATIVO ESTETICO E FUNZIONALE DELLA BASILICA DI S. MARIA DEGLI ANGELI IN PORZUNCOLA	PROV. SERAFICA DI S. FRANCESCO	13 579 571.000	2 807 571.000	10 772 000 000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 133.131.074 E CORRISPONDENTE DIMINUIZIONE DEL COFINANZIAMENTO
7351	AC - 22 - FD - M	LORETO	CASA DI ACCOGLIENZA PER GIOVANI E PELLEGRINI VILLA PIO XII	PROV. ITALIANA CONGR. MISSIONARI	3 381 900.000	2 761 900.000	600.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 1.766.126.382 E CORRISPONDENTE DIMINUIZIONE DEL COFINANZIAMENTO
7356/ B	AA - 13 - EF - M	Terni	RIQUALIFICAZIONE DEL COLLE DI SAN VALENTINO	COMUNE DI TERNI	2 081 000.000	2 081.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 48.345.000
					3 161.000.000	3 161.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA € 178.000.000

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 32 di 34

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
7377	AC - 14 - FB - L	Perugia	RECUPERO FUNZIONALE DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DA DESTINARE AD OSTELLO DELLA GIOVENTU' VIA BONTEMPI 13	OPERA PIA M. PAOLETTI	2.230.000.000	2.000.000.000	230.000.000			
7416	AC - 14 - FD - L	Casale	CASA DEL PELLEGRINO PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO IN ROCCAPORENA	CHIESA SANTUARIO DI S RITA	4.121.813.054	3.542.351.078	579.461.976	31/01/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
7464	AA - 51 - LA - B	Ancona	RESTAURO FACCIATA CHIESA SAN DOMENICO	COMUNE DI ANCONA	344.000.000	344.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 137.493.422
7516	AC - 13 - IA - B	Foligno	RESTAURO DEL COMPLESSO CATTEDRALE E PALAZZO DELLE CANONICHE	DIOC. FOLIGNO CATTEDRALE DI S FELICIANO	11.078.047.989	6.678.047.989	4.400.000.000	1/05/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
7570	AC - 14 - FD - B	Bevagna	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL EX CONVENTO DEI SS. DOMENICO E GIACOMO IN BEVAGNA DA ADIBIRSI A RICETTIVITA' POVERA	COMUNE DI BEVAGNA	2.225.984.000	1.725.984.000	500.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 162.542.431 E CORRISPONDENTE DIMINUIZIONE DEL COFINANZIAMENTO
7622	AC - 26 - GA - M	ACIREALE	INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DI PARTE DEL SEMINARIO ESTIVO ADIBITO A CENTRO STUDI	SEMINARIO VESCOVILE ACIREALE	759.789.000	659.789.000	100.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 79.639.439 E CORRISPONDENTE DIMINUIZIONE DEL COFINANZIAMENTO
7663	AA - 12 - EC - L	Carbonara Al Ticino	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO ED ARTISTICO DEI COMUNI DELLA FASCIA LITORANEA OCCIDENTALE DEL TICINO SULLA ANTICA VIA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI CARBONARA AL TICINO	517.022.000	497.022.000	50.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 36.000.000
					555.772.000	505.772.000	50.000.000	02/06/1998	30/04/1999	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 36.750.000 MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
7901	AA - 31 - IA - B	Aquileia	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AL FOLADOR DEL PALAZZO BRUNNER DI AQUILEIA	SOPRINTENDENZA PER I BENI A.A.S. FRIULI VENEZIA	1.150.000.000	1.150.000.000	0	10/05/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA Q
7902	AA - 26 - LA - B	Aquileia	RESTAURO DELLA CARENA LIGNEA DELLA BASILICA	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DEL FRIULI V.G.	900.000.000	900.000.000	0			MODIFICA TERMINI LETTERA Q
8976	AC - 21 - GB - M	ASSISI	CASTELLO DI PORZIANO RECUPERO PARZIALE	PARROCCHIA SANTI LORENZO E ANNA	1.498.000.000 930.000.000	1.498.000.000 680.000.000	0 250.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI € 598.000.000
								15/03/99	31/10/99	MODIFICA TERMINI LETTERE Q E D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 34 di 34

Rep. N. 209/RC dell'11 ottobre 1999

Legge 7 agosto 1997, n. 270. Approvazione di ulteriori modificazioni ed integrazioni al Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, di cui alla deliberazione n. 11 del 19 maggio 1999 della Commissione ex art. 2 stessa legge.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario n. 218 alla G. U. n. 247 del 22 ottobre 1997;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario n. 101 alla G. U. n. 122 del 28 maggio 1998, e successive modificazioni;

VISTA la nota del 12 maggio 1999, con la quale l'INAIL ha comunicato l'elenco degli interventi da cancellare dal Piano, motivando tale scelta, per quelli rubricati con nn. 6016, 7659 e 6030, con l'impossibilità di rispettare i termini giubilari e per quello rubricato con n. 6015, con la rinuncia dell'offerente alla vendita;

VISTA la stessa nota in data 12 maggio 1999 con la quale l'INAIL medesimo ha chiesto di includere nel Piano degli interventi, in sostituzione delle sopra accennate esclusioni, gli interventi rubricati con i nn. 6024, 6032 e 6038, già comunicati a questo Ufficio in sede di originaria formulazione della proposta di Piano, per i rispettivi nuovi importi indicati dallo stesso INAIL;

CONSIDERATO che la Commissione, nella seduta del 19 maggio c. a., nell'esercizio del potere ad essa affidato dall'art. 1, comma 7 della legge n. 270/97, ha ritenuto meritevole di approvazione la proposta di modifica del Piano degli interventi INAIL, risultando comprovata, per i nuovi tre interventi, l'intervenuta intesa con i Comuni nel cui ambito sono localizzati, nonché la loro coerenza e rilevanza rispetto alle finalità giubilari di cui alla legge n. 270/97, ed all'uso post-giubilare ed ha, conseguentemente, recepito la proposta di inserimento nel Piano dei predetti interventi, negli importi espressamente indicati dall'INAIL, sulla base di autonomi criteri di investimento e di gestione delle proprie risorse;

VISTA la deliberazione n. 11/99, adottata in data 19 maggio 1999 dalla Commissione ex articolo 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il parere favorevole n. 713, reso in data 25 giugno 1999, dalla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997 sulla deliberazione n. 11/99 della Commissione di cui all'art. 2 della medesima legge;

CONSIDERATO che, nelle more dell'emanazione del decreto di approvazione della delibera in esame, a seguito della sopravvenuta indagine giudiziaria relativa all'impegno di fondi pubblici, la Commissione ha ritenuto di riesaminare la propria delibera n. 11/99 nella parte in cui sono stati incclusi nel piano gli interventi proposti dal soggetto titolare INAIL;

CONSIDERATO che, a seguito di tale riesame, effettuato nella seduta del 28 Luglio 1999, la Commissione è pervenuta alla determinazione di sospendere, in via provvisoria e cautelativa, la statuizione di cui sopra, informandone la competente Procura della Repubblica al fine di acquisire indicazioni utili per le proprie definitive determinazioni;

DECRETA

1. *A seguito dell'approvazione del quadro tecnico economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'all. "A", nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £ 9.709.000.000;*

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Sono totalmente defINANZIATI, a seguito dell'esito negativo del relativo procedimento di contestazione e messa in mora per un ammontare complessivo pari a £ 13.824.000.000, e per l'importo a fianco di ciascuno evidenziato gli interventi sotto indicati:
- n. 198 - "Costruzione nuovo parcheggio bus turistici" localizzato a Napoli - £ 5.600.000.000;
- n. 1676 - "Parcheggio collegato alla stazione FF.SS. e parcheggio fra via Medici e via del Vascello e relativi servizi" localizzato a Udine - £ 1.400.000.000;
- n. 3958 - "Restauro e riorganizzazione funzionale dei 4 chiostri monumentali del tempio convento di S. Francesco d'Assisi da adibire a ricettività" localizzato a Brescia - £ 3.804.000.000;
- n. 4741 - "Sistemazione percorsi pedonali di congiunzione tra cattedrale Chiesa di S. Sebastiano e punto informazioni multimediale situato nel Palazzo Comunale" localizzato a Massa - £ 1.120.000.000;
- n. 6523 - "Trasformazione distributiva dell'immobile - struttura ricettiva a basso costo" localizzato a Fabriano. - £ 1.900.000.000.
3. Sono concessi ulteriori 10 giorni, a carattere ultimativo, ai destinatari della procedura di contestazione e messa in mora, di cui al comma 11 del decreto n. 202/RC del 1 giugno 1999, che non abbiano ancora inviato le proprie controdeduzioni all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi.
4. Sono defINANZIATI totalmente, a seguito della rinuncia al finanziamento espresso dai soggetti titolari e per un ammontare complessivo pari a £ 2.863.000.000, e per l'importo a fianco di ciascuno indicato i sotto indicati interventi:
- n. 1313 "Opere di restauro ed adeguamento funzionale del Convento S. Maria degli Angeli", localizzato a Montoro Superiore - £ 200.000.000;
- n. 3362, "Opere relative al restauro dell'antico complesso architettonico" localizzato a Venezia - £ 2.663.000.000.
5. E' assentita la riduzione da £ 8.800.000.000 a £ 7.000.000.000 del costo dell'intervento localizzato a Milano e rubricato col n. 5147 - "Itinerari religiosi nella Città - riqualificazione del sagrato della Basilica giubilare di S. Lorenzo Maggiore" e della relativa quota di cofinanziamento che passa da £ 4.400.000.000 a £ 3.500.000.000 ed è, conseguentemente, disposta la riduzione del finanziamento a carico della legge n. 270/97 da £ 4.400.000.000 a £ 3.500.000.000 con un'economia pari a £ 900.000.000;
6. Sono parzialmente defINANZIATI, a seguito di riprogrammazione dei rispettivi soggetti titolari, per un ammontare complessivo pari a £ 1.965.000.000, e per l'importo a fianco di ciascuno indicato i sotto indicati interventi:
- n. 3018, "Accoglienza ai pellegrini diretti ai sacri monti al santuario ed ai luoghi di culto tradizionali" a Verbania, la cui assegnazione finanziaria è ridotta da £ 1.600.000.000 a £ 635.000.000, con un'economia pari a £ 965.000.000;
- n. 3997, "Casa di accoglienza pellegrini disabili Breda" a Padova, la cui assegnazione finanziaria è ridotta da £ 4 miliardi a £ 3 miliardi, con un'economia pari a £ 1 miliardo.
7. E' corretto l'errore materiale attinente all'importo dell'assegnazione finanziaria ex lege n. 270/97 afferente l'intervento "Riqualificazione della struttura Istituto Don Orione appartenente alla Provincia religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo dell'Opera di Don Orione" a Messina, rubricato col n. 616, per la cui realizzazione sono assentite £ 7.118.532.000 anziché £ 7.388.532.000, con una economia pari a £. 270.000.000;
8. Le risorse disponibili sono, pertanto rideterminate in complessive £ 30.029.058.167, pari alla somma dei seguenti importi:

£ 498.058.167	Risorse residue nella disponibilità della Commissione
£ 9.709.000.000	Risorse provenienti da ribassi d'asta e/o economie di stanziamento di cui al punto 1 del presente decreto
£ 16.687.000.000	Risorse provenienti da defINANZIAMENTI totali di cui al punto 2 e 4 del presente decreto
£ 3.135.000.000	Risorse provenienti da defINANZIAMENTI parziali di cui ai punti 5, 6 e 7 del presente decreto

9. Sono cancellati dal Piano, su richiesta del soggetto titolare e per l'importo a fianco di ciascuno indicato, i seguenti interventi, meglio indicato nell'allegato "B"

n. 6015- INAIL - Torino

n. 6016- INAIL - Sarzana

n. 7659 INAIL- Firenze

n. 6030 INAIL -San Benedetto Val di Sambro

10. E' sospesa, in via temporanea e cautelativa, la statuizione di cui al punto 10 della deliberazione n. 11/99, nella parte in cui dispone l'inclusione nel Piano dei seguenti interventi proposti dall'INAIL:

n. 6032 "Soc. Rover s.r.l. ora Pizzarotti Immobiliare s.r.l. - Bologna - £ 51.360.000.000;

n. 6024 "Soc. Sparaco Spartaco Spa - Verona" - £ 40.866.000.000;

n. 6038 "Soc. Grandi Lavori Fincosit Spa - Pisa" - £ 49.800.000.000;

11. Sono approvati i nuovi termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97, come indicato nell'allegato "B".

12. Sono inclusi nel Piano, sulla base di ulteriori esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano medesimo gli interventi indicati nell'allegato "C" per un importo complessivo di £ 24.827.000.000.

13. Restano pertanto nella disponibilità della Commissione £ 5.201.358.167.

Roma, li 5 agosto 1999

Registrato alla Corte dei Conti l'11 ottobre 1999

Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 99

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 19 maggio 1999

Allegato A

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
459	Lavagna	GE	RESTAURO CONSERVATIVO TORRE DEI FIESCHI STRUTTURE E SERVIZI INFORMATIVI	COMUNE DI LAVAGNA	80.000.000
484	Aquileia	UD	INTERVENTI RIGUARDANTI LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDAZIONE SISSUL	COMUNE DI AQUILEIA	136.000.000
489	Pisa	PI	CONVENTO DI SANTA CROCE IN FOSSABANDA INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO AD USO RICETTIVO ALBERGHIERO E AD USO PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI	COMUNE DI PISA	798.000.000
1408	Pescara	PE	RISTRUTTURAZIONE DI UN COMPLESSO RICETTIVO ESISTENTE VILLA IMMACOLATA IN LOCALITA' SAN SILVESTRO DI PESCARA	SEMINARIO ARCIVESCOVILE	420.000.000
1432	Padova	PD	COSTRUZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA BASILICA DEL SANTO CON ABBATTIMENTO INTEGRALE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	COMUNE DI PADOVA	143.000.000
1960	Mazara del Vallo	TP	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO DI S.VENERANDA	DIOCESI DI MAZARA DEL VALLO	19.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2315/A	Riese Pio X	TV	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BARCHESSA ZORZI PER IL RICAPO DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO E RECUPERO DI BENE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER LA REALIZZ. DI AREA. LAVORI DI ULTIMAZIONE BARCHESSA ZORZI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	COMUNE DI RIESE PIO X	290.000.
2558	Orio Litta	LO	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX CASCINA S. PIETRO GIA' GRANGIA DEI MONACI BENEDETTINI DI S.PIETRO	COMUNE DI ORIO LITTA	174.000.
2839	Cagliari	CA	ANFITEATRO ROMANO - OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE	COMUNE DI CAGLIARI	850.000.
2847/A	Cagliari	CA	RESTAURO CATTEDRALE E LOCALI ADIACENTI	ENTE DIOCESI CATTEDRALE DI CAGLIARI	633.000.
2847/B	Cagliari	CA	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VIA FOSSARIO	ENTE PARROCCHIA DI S. CECILIA	361.000.
2847/C	Cagliari	CA	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VICO DUOMO	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI CAGLIARI	135.000.
2848	Cagliari	CA	RESTAURO DELL'AUDITORIUM PIAZZA DETTORI	COMUNE DI CAGLIARI	260.000.
3194	Firenze	FI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO ORTICOLTURA E PARNASO	COMUNE DI FIRENZE	100.000.
3315	Firenze	FI	CHIESA DI S. M. NOVELLA E CHIOSTRI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE TVCC RIVELAZIONE INCENDIO E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE	COMUNE DI FIRENZE	290.000.
4104	L'Aquila	AQ	RESTAURO DEL COMPLESSO MONASTICO DI S. MARIA DI COLLEMAGGIO DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE	PROVINCIA DI L'AQUILA	348.000.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4194	Firenze	FI	RIFACIMENTO CUCINA CENTRALIZZATA DELLA CENTRALE TERMICA E RELATIVE ATTREZZATURE NUOVI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI DI VIA DEI BRUNI	COMUNE DI FIRENZE	110.000.000
4739	Massa Marittima	GR	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE DI SOSTA E DELLA ACCESSIBILITA' AL CENTRO STORICO ED AL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAN CERBONE E MASSA MARITTIMA	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	473.000.000
5484	Trieste	TS	LOCALI DI ACCOGLIENZA PER RISTORO CON ANNESSI SERVIZI IMPIANTISTICA E PERCORSI ATTREZZATI INTERNI ED ESTERNI CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER DISABILI	PARROCCHIA MARIA MADRE E REGINA	68.000.000
5486	Trieste	TS	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COLLE DI MUGGIA VECCHIA E DEL SUO SANTUARIO	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA	68.000.000
5492	Trieste	TS	CENTRO ACCOGLIENZA PELLEGRINI	COMUNE DI TRIESTE	70.000.000
5493	Trieste	TS	FORESTERIA PER I PELLEGRINI	COMUNE DI TRIESTE	180.000.000
5868	Bagno Di Romagna	FO	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO CASA PER FERIE	IST. CLARISSE SS SACRAMENTO	58.000.000
5987	Bologna	BO	RESTAURO CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE DEL CENOBIO DI S. VITTORE AD USO DI ACCOGLIENZA RISTORO E LUOGO DI CULTO	CONGR. ORATORIO DI S. FILIPPO NERI	516.000.000
6122	Firenze	FI	SISTEMAZIONE SPAZIO URBANO ESTERNO DELL'AREA EX GASOMETRO	COMUNE DI FIRENZE	500.000.000
6220	Firenze	FI	VIDEO SICUREZZA PER I MONUMENTI FIORENTINI	COMUNE DI FIRENZE	230.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6239	Bologna	BO	REALIZZAZIONE DI CASA ALBERGO PER ANZIANI	OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI	252.000.
6413	Ascoli Piceno	AP	RECUPERO DEL COMPLESSO DI VILLA SGARIGLIA COME ALBERGO PENSIONE 1/2 STELLE	COMUNE DI ASCOLI PICENO	500.000.
6526	Fabiano	AN	CASA ALBERGO PER ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	PROV. ITAL. CONGR. FRATELLI DI N. SIGNORA	370.000.
6969	Spoletto	PG	PIANO GENERALE E PROGETTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI LUNGO I PERCORSI E LE METE GIUBILARI NEL CENTRO STORICO DI SPOLETO	COMUNE DI SPOLETO	105.000.
7258	Gubbio	PG	RITORNO ALL'ACROPOLI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE A SCALA URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE DA VIA XX SETTEMBRE AGLI ORTI DELLA CATTEDRALE	COMUNE DI GUBBIO	85.000.
11622	Vercelli	VC	PALAZZO ARCIVESCOVILE DI VERCELLI RESTAURO CONSERVATIVO PER IL RECUPERO DEGLI AMBITI DESTINATI ALL'ARCHIVIO CAPITOLARE E BIBLIOTECA E AL MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO	ARCIDIOCESI DI VERCELLI	567.000.
13058	Alessandria	AL	REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DI ACCOGLIENZA DI S.MARIA DI CASTELLO	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	520.000.

Tot. Interventi

Tot. Disponibi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato "B"

Riunione commissione ex lege n. 270/97 del 19 Maggio 1999

modifiche (*) degli interventi inclusi nel Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio

o. Codice rot. Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
198	AA - 52 - EL - M	Napoli	COSTRUZIONE NUOVO PARCHEGGIO BUS TURISTICI	MIN. TRASP. - NAVIGAZIONE D.G.A.C.	7.000.000.000	5.600.000.000	1.400.000.000		
206	AD - 11 - LA - M	Bivona	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA DI S. MICHELE DETTA DELLE SCUOLE PIE PER ATTIVITA' CULTURALI	PARROCCHIA VISIT. GIOVANNI BATTISTA	1.061.000.000	195.000.000	866.000.000		CANCELLAZIONE DAL PIANO PER DEFINANZIAMENTO TOTALE
343	AC - 26 - FA - L	Pioggie	SISTEMAZIONE STRUTTURA PER OSPITARE A BASSO COSTO PORTATORI DI HANDICAP	FONDAZIONE OPERA S. GIOVANNI BATTISTA	2.900.000.000	2.400.000.000	500.000.000	31.07.99	MODIFICA TERMINI LETTERA C)
474	AC - 26 - EC - L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO DI DISSUAZIONE LUNGO LA STATALE N 352	COMUNE DI AQUILEIA	300.000.000	290.000.000	10.000.000	31.06.99	MODIFICA TERMINI LETTERA C)
476	AA - 26 - EC - L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL NUOVO CENTRO VISITE DELLA SOPRINTENDENZA	COMUNE DI AQUILEIA	661.000.000	661.000.000	10.000.000	15.07.99	MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)
								31.05.99	MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 1 di 6

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice rot. Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini		Note
							Let. c)	Let. d)	
177	AA - 26 - EC - L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTENTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL MUSEO NAZIONALE IN VIA CURIEL ANGOLO VIA JULIA AUGUSTA	300 000 000	280 000 000	10 000 000			
178	AA - 26 - EC - L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTENTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO LUNGO LA VIA A. GRANDI	280 000 000	270 000 000	10 000 000	24.07.99	30.10.99	MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)
816	AC - 51 - GA - M	Messina	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO DON ORIONE APPARTENENTE ALLA PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	8.233.532.000	7.388.532.000	845.000.000	10.6.1999	30.10.1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)
951	AA - 12 - EA - L	Codigoro	IL RECUPERO AMBIENTALE DEL COMPLESSO ABBAZIA DI POMPOSA	580.000.000	444.000.000	116.000.000			
1221	AB - 26 - HA - L	Aquileia	SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AGENZIA DI AQUILEIA	30.000.000	30.000.000	0	03.05.1999	20.10.1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)
1313	AA - 26 - LA - B	Montoro Superiore	RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CONVENTO DI S. MARIA DEGLI ANGELI	550.000.000	200.000.000	350.000.000	06.05.1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
1457	AA - 14 - IA - B	Montemagno	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO CONSERVATIVO DEI RESTI DELLA CHIESA ROMANICA DEI SS. VITTORE E CORONA	317.000.000	260.000.000	57.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER RINUNCIA ALL'INTERVENTO
									31/10/99 MODIFICA TERMINI LETTERA D)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

• Codice rot. Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fond. Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
589	AA - 12 - EA - L	Torino	RECUPERO E SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA BASILICA DI SUPERGA	4.320.000.000	4.320.000.000	0			
676	AA - 26 - EA - L	Udine	PARCHEGGIO COLLEGATO ALLA STAZIONE FF. SS. E PARCHEGGIO FRA VIA MEDICI E VIA DEL VASCHELLO E RELATIVI SERVIZI	2.000.000.000	1.400.000.000	600.000.000	18.03.1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
677	AC - 26 - EF - L	Udine	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON AMPLIAMENTO	927.000.000	880.000.000	247.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER DEFINANZIAMENTO TOTALE
716	AA - 26 - FH - L	Cervignano Del Friuli	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER FERIE FORESTIERA	550.000.000	412.000.000	138.000.000	19.03.99	31/10/99	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
1128	AA - 26 - FD - M	Serra San Bruno	COMPLETAMENTO IMMOBILE DA ADIBIRE ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	2.825.000.000	500.000.000	2.125.000.000	19.03.1999	14.09.1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)
1280	AA - 26 - EA - L	Prato	INSTALLAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NEL CENTRO STORICO	175.000.000	75.000.000	100.000.000	20.03.1999		MODIFICA DEI TERMINI LETTERA C)
1559/ B	AA - 12 - IA - M	Castell'Arquato	SISTEMAZIONE DELLA PARTE ESTERNA DELL'EDIFICIO	312.000.000	172.000.000	140.000.000	31.07.1999	30.11.1999	MODIFICA DEI TERMINI LETTERE C) E D)
1662	AA - 12 - FD - L	Rocchetta Tanaro	RECUPERO E RIUSO DELLA EX FATTORIA MARCHESI INCISA DELLA ROCCETTA	1.500.000.000	1.500.000.000	0	30.12.1999		MODIFICA DEI TERMINI LETTERA D)
1918	AA - 41 - IA - B	Milano	RESTAURO DELLA CRIPTA DI S. GIOVANNI IN CONCA	700.000.000	700.000.000	0	31/10/99		MODIFICA TERMINI LETTERA D)
							14.03.99		MODIFICA TERMINI LETTERA C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 3 di 6

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice rot. Uрге	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
1018 AC-31-FD-L	Verbania	ACCOGLIENZA AI PELLEGRINI DIRETTI AI SACRI MONTI AI SANTUARI ED AI LUOGHI DI CULTO TRADIZIONALI	OPERA DIOCESANA DELLA PRESERVAZIONE DELLA FEDE	3 827.000.000	1.800.000.000	2.227.000.000			
1172 AD-22-EA-L	Loreto	PARCHEGGIO SCALA SANTA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	2.862.000.000	615.000.000	2.227.000.000			RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO DI L. 965.000.000
1362 AC-41-LA-B	Venezia	OPERE RELATIVE AL RESTAURO DELL'ANTICO COMPLESSO ARCHITETTONICO	CONGREGAZIONE ARMENA MECHITARISTA	5 313.000.000	2 863.000.000	2 850.000.000	20.05.1999	10.10.1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)
1731 AA-11-LA-B	Taranto	CENTRO COMUNALE DI ACCOGLIENZA ED OSPITALITÀ NELL'EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI	COMUNE DI TARANTO	3.787.000.000	2 198.000.000	1.569.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER RINUNCIA ALL'INTERVENTO
1768 AC-20-GB-M	Domodossola	RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI SPIRITUALITÀ ROSMINIANA	PROV. ITALIANA DI S. MAURIZIO DELL'ISTITUTO DELLA CARITÀ	723.000.000	623.000.000	100.000.000	10.05.1999	10.10.1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)
1902 AA-11-EE-L	Grosio	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI RISTORAZIONE PRESIDIO SANITARIO	COMUNE DI GROSIO	303.965.000	203.965.000	100.000.000	14.06.1999	11/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)
1958 AC-41-GA-B	Brescia	RESTAURO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEI 4 CHIOSTRI MONUMENTALI DEL TEMPIO CONVENTO DI S. FRANCESCO D'ASSISI DA ADIBIRE A RICETTIVITÀ	COMUNITÀ FRATI MINORI CONVENTUALI	4.304.000.000	3.804.000.000	500.000.000	31/10/99		MODIFICA TERMINI LETTERA D)
1997 AA-23-HC-M	Padova	CASA DI ACCOGLIENZA PELLEGRINI DISABILI BREDA	PIA FONDAZIONE V. S. BREDA	10 000.000.000	4 000.000.000	6.000.000.000			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER DEFINANZIAMENTO TOTALE
4198 AA-41-EG-L	Firenze	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	COMUNE DI FIRENZE	1.547.000.000	1.395.000.000	172.000.000	22.05/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no Codice Urga	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
4739	AA - 28 - EA - M	Massa Marittima	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE DI SOSTA E DELLA ACCESSIBILITA' AL CENTRO STORICO ED AL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAN CERBONE E MASSA MARITTIMA	4.219.000.000	1.700.000.000	2.519.000.000			
4741	AA - 12 - EE - M	Massa	SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI DI CONGIUNZIONE TRA CATTEDRALE CHIESA DI SAN SEBASTIANO E PUNTO INFORMAZIONI MULTIMEDIALE SITUATO NEL PALAZZO COMUNALE	2.800.000.000	1.120.000.000	1.680.000.000	14/04/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
4817	AA - 14 - IA - M	Gorizia	MUSEO DELL'ARCIDIOCESI E DEL TESORO DI AQUILEIA	0	0	0			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER DEFINANZIAMENTO TOTALE
4847	AA - 11 - EA - M	Mercogliano	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA USCITA CASELLO AUTOSTRADALE AVELLINO OVEST DA DESTINARE A PARCHeggio A SERVIZIO DEL FLUSSO DEI PELLEGRINI	225.000.000	225.000.000	0	31/05/99		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
4886	AA - 13 - IA - M	Monte Colombo	RECUPERO DELLE MURA DEL CASTELLO DI SAN SAVINO	800.000.000	598.000.000	212.000.000	08/03/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
4949	AC - 41 - GA - B	Venezia	ADEGUAMENTO A NORMA DEI LOCALI PARROCCHIA S. CRISTOFORO	236.000.000	206.000.000	30.000.000		31/10/99	MODIFICA TERMINI LETTERA D)
4976	AA - 14 - EH - L	Viggiano	REALIZZAZIONE DI UN PRONTO SOCCORSO E DI UN'AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA DENOMINATA ORTO DELLA MADONNA	2.540.000.000	1.340.000.000	1.200.000.000	18/02/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)
5147	AA - 41 - IA - B	Milano	ITINERARI RELIGIOSI NELLA CITTA' - RIQUALIFICAZIONE DEL SAGRATO DELLA BASILICA GIUBILARE DI S. LORENZO MAGGIORE	8.800.000.000	4.400.000.000	4.400.000.000	04/05/1999	31/10/1999	MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)
(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi				7.900.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000			RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO E RIDUZIONE DEL COFINANZIAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
5167	AA - 41 - EA - L	Milano	RISTRUTTURAZIONE P LE CADORNA	COMUNE DI MILANO	6 400 000 000	3 099 000 000	3 301 000 000	29/6/99		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
5768	AC - 23 - FB - L	Monseice	OSTELLO S. GIACOMO	PROV. FRATI MINORI S. FRANCESCO	280 000 000	250 000 000	30 000 000			
5868	AD - 12 - GB - B	Bagno Di Romagna	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO CASA PER FERIE	IST. CLARISSE SS SACRAMENTO	1 546 000 000	1 346 000 000	200 000 000		31/10/99	MODIFICA TERMINI LETTERA D)
5869/ C	AC - 26 - FD - B	Ceranesi	AUDITORIUM - PIAZZALE SOSTA AUTOMEZZI	SANTUARIO N. S. DELLA GUARDA	2 456 000 000	1 661 000 000	775 000 000	26/9/99		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
6015	CA - 12 - NC - M	Torino	INAIL 2000 PROT. 7590	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI	23 000 000 000	0	23 000 000 000	15/05/1999		MODIFICA TERMINI LETTERA C)
6016	CA - 12 - NC - M	Sarzana	INAIL 2000 PROT. 7483	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI	0	0	0			CANCELLAZIONE DAL PIANO SU PROPOSTA DELL'ENTE TITOLARE
6030	CA - 14 - ND - M	San Benedetto Val Di Sambro	INAIL 2000 PROT. 7718	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI	25 000 000 000	0	25 000 000 000			CANCELLAZIONE DAL PIANO SU PROPOSTA DELL'ENTE TITOLARE
6523	AC - 14 - FD - M	Fabrizio	TRASFORMAZIONE DISTRIBUTIVA DELL'IMMOBILE - STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO	SEMINARIO VESCOVILE	2 400 000 000	1 900 000 000	500 000 000			CANCELLAZIONE DAL PIANO SU PROPOSTA DELL'ENTE TITOLARE
7659	CA - 41 - NC - M	Firenze	INAIL 2000 PROT. 7760	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI	0	0	0			CANCELLAZIONE DAL PIANO PER DEFINANZIAMENTO TOTALE
					0	0	0			CANCELLAZIONE DAL PIANO SU PROPOSTA DELL'ENTE TITOLARE

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato C

203	AA	26	IA	B	LO	RECUPERO DEL NOVIZIATO COME OSTELLO FABBRICATO DEL 1152 CITATO GIA' ECCLESIA IPSIUS HOSPITALIS	COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO	Suole, centri studi, ricerche e documentazione, strutture universitarie e relativi servizi	2750	2000	750	24-apr-99	27-ott-99
876	AA	12	LA	L	SP	LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO DELL'ORATORIO DI SAN ROCCO IN MONTARETTO COMUNE DI BONASSOLA	COMUNE DI BONASSOLA	Are di visita culturale e/o parchi archeologici	320	320	0	15-giu-99	30-ott-99
928	AC	11	GA	L	PZ	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CHIESA CONVENTO DI S. MARIA IN MONTALTO	CURIA VESCOVILE		3000	3000	0	01-lug-99	30-ott-99
2388	AC	14	GA	M	CS	CONSOLIDAMENTO RECUPERO E RESTAURO DELL'IMPIANTO CONVENTUALE DEL BEATO UMILE E SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO ANTISTANTE	ORDINI FRATI MINORI BEATO UMILE DI BISIGNANO	Centri sociali e di accoglienza	2400	2000	400	01-lug-99	30-ott-99
2396	AA	14	FD	M	PV	ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE IN LOCALITA' CASA CASARINI DI ROMAGNESE	COMUNE DI ROMAGNESE	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	1950	1100	850	01-lug-99	30-ott-99
2771	AC	12	GA	L	AR	RECUPERO E ADEGUAMENTO DI VECCHIO FABBRICATO GIA' DESTINATO AD ALBERGO IN CASA FRANCESCA PER L'ACCOGLIENZA	PROVINCIA TOSCANA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI		400	400	0	30-giu-99	31-ott-99
2832	AC	12	GA	B	AR	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE NEL SACRO EREMO DI CAMALDOLI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA	CASA GENERALIZIA CONGR. DEGLI EREMITI CAMALDOLESI	Ricettività in comunità religiose	937	787	150	30-giu-99	20-ott-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

2842	AA 26	HA	L	Cagliari	CA	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	COMUNE DI CAGLIARI	Ricettività per disabili e categorie disagiate	1180	0	01-lug-99	30-ott-99
3131	AA 26	FD	M	Venafro	IS	RECUPERO DELL'EX CONVENTO SAN FRANCESCO PER PRESIDIO TURISTICO RELIGIOSO E CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IL GIUBILEO DEL 2000	COMUNE DI VENAFRO	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	2000	0	01-lug-99	31-ott-99
3258	AC 26	GD	B	Caltanissetta	CL	DA HOTEL A CASA ALBERGO PER ANZIANI E SACERDOTI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO FINALE FONDAZIONE MAZZONE	FONDAZIONE CARLO MAZZONE	Ricettività in comunità religiose	2350	350	01-lug-99	31-ott-99
3387	AC 26	GA	B	Prato	PO	RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI PORZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE FRANCESCO DEL XIII SECOLO	PARROCCHIA DI S. DONATO IN S. FRANCESCO	Ricettività in comunità religiose	742	392	30-mar-99	30-ott-99
3684	AC 12	FB	L	Carrodano	SP	RIADATTAMENTO DEL FABBRICATO DEL DISMESSO C. D. U. E TRASFORMAZIONE IN RICETTIVITA' ESCLUSIVAMENTE PER PERSONE CON RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA O SENSORIALE	ENTE PARROCCHIA S. FELICITA	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	1000	0	30-giu-99	31-ott-99
3998	AC 14	GC	M	Santa Giustina	BL	SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DEL CENTRO PAPA LUCIANI CON L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA PAPA LUCIANI	Arce verdi attrezzate e/o parchi pubblici, visite naturalistiche	330	150	20-giu-99	31-ott-99
4334	AE 12	EL	M	Santa Giustina	BL	ADEGUATAMENTO DELLE DUE SALE CONFERENZE ALLE NORMATIVE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI PUBBLICI SPETTACOLI	CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA PAPA LUCIANI	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	230	50	20-giu-99	31-ott-99
4808	AA 11	EA	M	Mercogliano	AV	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA A VALLE DEL VIALE DI SAN MODESTINO PER REALIZZARE UN'AREA DI INTERSCAMBIO TRA TRASPORTO PRIVATO E NAVETTE PUBBLICHE DI COLLEGAMENTO AL SANTUARIO DI MONTEVERGINE ED	COMUNE DI MERCOGLIANO	Servizi di trasporto pubblico, navette	2080	0	01-lug-99	31-ott-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

ANNESSO PARCHEGGIO PUBBLICO													
4862	AC 14	LA	L	Crotone	KR	COMPLETAMENTO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA BASILICA MINORE SANTUARIO BEATA VERGINE DI CAPO COLONNA	ENTE DIOCESI CROTONE SANTA SEVERINA	Beni monumentali, di carattere culturale, ambientale o religioso e relativi servizi - recupero	1350	1350	0	30-giu-99	31-ott-99
5552	AD 12	LA	B	Cremolino	AL	RESTAURO DEL PAVIMENTO DEL SANTUARIO DELLA BRUCETA	PARROCCHIA DI N.S. DEL CARMINE CREMOLINO	Luoghi o edifici di culto e/o di uso religioso e relativi servizi	2820	2500	320	26-apr-99	31-ott-99
6024	CA 41	NC	M	Verona	VR	INAIL 2000 PROT. 7538 OFFERENTE SPARACO SPARTACO SPA VERONA	I.N.A.I.L. ISTIT. NAZ. PER L'ASSIC. CONTRO GLI INF	Ricettività per giovani e/o casa dello studente	40866	0	40866	30-set-97	31-ott-99
6032	CA 53	NB	M	Bologna	BO	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7681 OFFERENTE ROVER EST SRL BOLOGNA	I.N.A.I.L. ISTIT. NAZ. PER L'ASSIC. CONTRO GLI INF	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	51360	0	51360	01-apr-98	31-ago-99
6038	CA 12	NC	M	Pisa	PI	INAIL 2000 PROT. 7554 OFFERENTE GRANDI LAVORI FINCOSIT PISA	I.N.A.I.L. ISTIT. NAZ. PER L'ASSIC. CONTRO GLI INF	Ricettività per giovani e/o casa dello studente	49800	0	49800	30-apr-98	30-set-99
6306	AA 22	LA	B	Loreto	AN	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI NEL SOTTOTETTO DEL CORPO LATERALE DEL PALAZZO ILLIRICO DA DESTINARSI AD ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTON	Beni monumentali, di carattere culturale, ambientale o religioso e relativi servizi - recupero	1000	1000	0	30-giu-99	27-ott-99
6553	AC 21	ED	M	Assisi	PG	G.AUDI.U.M. GIUBILEO ALL'AUDITORIO DELLA CITTADELLA PER L'UNIVERSALITA' DELLE ARTI DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	PRO CIVITA' CHRISTIANA	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	1400	1400	0	30-apr-99	18-ott-99

Rep. N 210/RC del 22 ottobre 1999

Legge 7 agosto 1997, n. 270. Approvazione di ulteriori modificazioni ed integrazioni al Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, di cui alla deliberazione n. 12 del 28 luglio 1999 della Commissione ex art. 2 stessa legge.

**IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA
CAPITALE, GIUBILEO 2000**

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario n. 218 alla G. U. n. 247 del 22 ottobre 1997;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario n. 101 alla G.U. n. 122 del 28 maggio 1998, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 12/99, adottata in data 28 luglio 1999 dalla Commissione ex articolo n. 270/97;

VISTO il parere favorevole n. 749, reso in data 5 agosto 1999, dalla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997 sulla deliberazione n. 12/99 della Commissione di cui all'art. 2 della medesima legge;

VISTO il proprio decreto in data 5 agosto 1999 che, al punto 10 del dispositivo, ha già recepito quanto stabilito al punto 6 della deliberazione n. 12/99 del 28 luglio 1999, in ordine alla sospensione dell'inclusione nel Piano di taluni interventi proposti dall'INAIL;

RITENUTO, pertanto, di non riportare del dispositivo del presente provvedimento la suddetta sospensione;

DECRETA

1. A seguito dell'approvazione del quadro tecnico economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'all. "A", nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £ 9.482.353.356.
2. Sono totalmente defINANZIATI, a seguito dell'esito negativo del relativo procedimento di contestazione e messa in mora, per un ammontare complessivo di £ 7.682.000.000, e per l'importo a fianco di ciascuno indicato, gli interventi:

n. 1678 - "Ostello per la Gioventù"	£	840.000.000
n. 510 - "Scambiatore intermodale Catacombe di San Gennaro"	£	4.500.000.000
n. 4732 - "Restauro ed adeguamento funzionale della Cattedrale di Catania"	£	2.342.000.000

3. E' defINANZIATO totalmente, a seguito della rinuncia al finanziamento espressa dal soggetto titolare e per un ammontare pari a £ 600.000.000, l'intervento n. 5406 "Centro di accoglienza presso il Santuario di S. Maria delle Grazie".

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Sono parzialmente defianziati a seguito di riprogrammazione dei rispettivi soggetti titolari e su loro richiesta, i sottoindicati interventi, per un ammontare complessivo pari a £ 2.991.521.441:

n. 928 "Ristrutturazione ed adeguamento Chiesa Convento di S. Maria in Montalto", localizzato in Venosa, il cui stanziamento è ridotto da £ 3.000.000.000 a £ 450.000.000 con un'economia pari a £ 2.550.000.000;

n. 3224 "Ristrutturazione e completamento funzionale dell'ex asilo di Pitigliano ad uso residenze ricettive a basso costo per bisogni e scopi sociali", localizzato in Pitigliano, il cui costo è ridotto da £ 1.164.000.000 a £ 883.700.000, ed il cui stanziamento è ridotto da £ 815.000.000 a £ 618.590.000, con economia pari a £ 196.410.000;

n. 6405 "Copertura in tensostrutture per aree di sosta veicoli leggeri in attesa di imbarco" localizzato in Ancona, il cui costo stimato e lo stanziamento sono ridotti da £ 800.000.000 a £ 554.888.559, con un'economia pari a £ 245.111.441.

5. Le risorse disponibili sono, pertanto rideterminate in complessive £ 25.957.232.964, pari alla somma dei seguenti importi:

£ 5.201.358.167	Risorse residue nella disponibilità della Commissione
£ 9.482.353.356	Risorse provenienti da ribassi d'asta e/o economie di stanziamento di cui al punto 1 del presente decreto
£ 7.682.000.000	Risorse provenienti da definanziamenti totali di cui al punto 2 del presente decreto
£ 600.000.000	Risorse provenienti da rinuncia di cui al punto 3 del presente decreto
£ 2.991.521.441	Risorse provenienti da definanziamenti parziali di cui al punto 4 del presente decreto

6. Sono assentite le richieste di integrazione finanziaria connesse a varianti in corso d'opera, dovute a fatti imprevisti e imprevedibili o comunque necessarie per la piena funzionalità degli interventi indicati nell'allegato "B", per un importo complessivo pari a £ 24.131.636.300, restando, pertanto, nella disponibilità della Commissione £ 1.825.596.664.
7. Sono assentite a taluni interventi localizzati nella Regione Umbria e meglio specificati nell'allegato "B", le integrazioni di finanziamento a latere di ciascuno indicate, a titolo di reintegrazione di quota parte dei ribassi d'asta già erroneamente acquisiti alla disponibilità di questa Commissione, per garantire la piena realizzabilità degli interventi.
8. Sono assentite le modifiche al Piano concernenti le riduzioni del costo degli interventi, l'incremento delle quote di cofinanziamento e le disaggregazioni, le cancellazioni, le rettifiche per errore materiale, i nuovi termini di cui alle lettere c) e d) dell'art.1, co. 4, della legge n. 270/1997, come specificato nell'allegato "B".
9. A parziale modifica del punto 2 della deliberazione n. 11/99 del 19 maggio 1999, è confermata l'inclusione nel Piano dell'intervento proposto dal comune di Udine, contraddistinto con il prot. 1676 - "Parcheggio collegato alla stazione FF.SS. e Parcheggio tra via Medici e via del Vascello e relativi servizi", con l'originaria assegnazione finanziaria di £ 1.400 milioni e con i seguenti nuovi termini: lett. c) 1° luglio 1999; lett. d) 31 ottobre 1999.
10. Al punto 5, ultima parte, degli Indirizzi per l'attuazione finanziaria, di cui all'allegato A del DM 2 giugno 1998, le parole: "avvenuto trasferimento della proprietà" sono sostituite con le seguenti: "l'acquisita disponibilità del bene".

Roma, li 13 settembre 1999

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 luglio 1999

Allegato A

PROT	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILI LITA' (minori occorrenze finanziarie)
329	Capaccio	SA	RESTAURO MONUMENTO NAZIONALE SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO	SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO	427.000.000
342	Codrongianos	SS	SISTEMAZIONE AREA RICETTIVA A SACCARGIA	COMUNE DI CODRONGIANOS	784.000.000
450	Moconesi	GE	RESTAURO CONSERVATIVO PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E DI EDIFICI RELIGIOSI DELLA FONTANABUONA GENOVA	COMUNE DI MOCONESI	19.000.000
461	Varallo	VC	COMPLETAMENTO DEL COSTRUENDO OSTELLO PER LA GIOVENTU'	COMUNE DI VARALLO SESA	207.000.000
643	Monterosso Al Mare	SP	COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SOVIORE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO PER FUNZIONI DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	SANTUARIO DI N.S. DI SOVIORE	259.000.000
1339	Noto	SR	RECUPERO DELL'EX CARCERE MANDAMENTALE (GIA' CARCERE REALE) AD USO DI OSTELLO	COMUNE DI NOTO	226.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1504	Sesto al Reghena	PN	PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEL CENTRO STORICO CREAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI VICINI ALL'AREA PARCHEGGIO ESISTENTE	COMUNE DI SESTO AL REGHENA	21.000.000
1589	Torino	TO	RECUPERO E SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA BASILICA DI SUPERGA	CITTA' DI TORINO	1.707.000.000
1912	S. Marco in Lamis	FG	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL CONVENTO DI SAN MATTEO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	PROV. S. MICHELE ARCANGELO DEI FRATI M.	750.000.000
2111	Conflenti	CZ	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	COMUNE DI CONFLENTI	114.000.000
2397	Romagnese	PV	RECUPERO E RIPRISTINO ANTICA VIA FRANCIGENA	COMUNE DI ROMAGNESE	30.000.000
2570	Napoli	NA	INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA BETANIA	ARCIDIOCESI DI NAPOLI	320.000.000
2581	Canossa	RE	RECUPERO FUNZIONALE DEL CASTELLO DI ROSSENA PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	PIA UNIONE DOTTRINA CRISTIANA	81.000.000
2775	Sarzana	SP	MUSEO DIOCESANO DI SARZANA NELL'ORATORIO DELLA MISERICORDIA	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	83.000.000
2777	La Spezia	SP	MUSEO DIOCESANO DELLA SPEZIA	CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA	827.000.000
3008	Padova	PD	RESTAURO DELLA CRIPTA CINQUECENTESCA DELLA BASILICA DI S. GIUSTINA	MONASTERO DI S. GIUSTINA	22.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3057	Genova	GE	OPERE DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN VINCENZO DE' PAOLI	FONDAZIONE BRIGNOLE SALE NEGRONI	36.000.000
3058	Genova	GE	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER OSPITALITA' IN COMUNITA' RELIGIOSA	FONDAZIONE BRIGNOLE SALE NEGRONI	68.000.000
3185	Cefalu'	PA	RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO S. PASQUALE	CONGR. SUORE SERVE DEI POVERI	38.000.000
3417	Varallo	VC	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELLA STRUTTURA RICETTIVA VILLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	CONGR. SUORE MISS. DI GESU' ETERNO	106.000.000
3572	Savona	SV	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DIOCESANO NEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAVONA	DIOCESI DI SAVONA	24.000.000
3697	Camposampiero	PD	RECUPERO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO AL NOCE	COLLEGIO ANTONIANO DELLE MISSIONI ESTERE DEI FRATI	53.000.000
3719	Camposampiero	PD	RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO AD USO RICETTIVITA'	COLLEGIO ANTONIANO DELLE MISSIONI ESTERE DEI FRATI	203.000.000
4660	Lucca	LU	SISTEMA MUSEALE DI ARTE SACRA DELLA DIOCESI DI LUCCA EX REAL COLLEGIO REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO NEL COMPLESSO DELL'EX REAL COLLEGIO	COMUNE DI LUCCA	917.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4884	Saludecio	RN	RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO FUNZIONALE	COMUNE DI SALUDECIO	33.000.000
4989	Castelfiorentino	FI	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO IN DISUSO	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	253.000.000
5054	Ottone	PC	RECUPERO DI EDIFICIO MUNICIPALE PER UFFICI E MUSEO DI ARTE SACRA	COMUNE DI OTTONE	22.000.000
5949	Sotto Il Monte Giovanni XXIII	BG	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL' ABBAZIA DI S. EGIDIO, DEI LOCALI ANNESSI E SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI	PARROC. S. CUORE DI GESU' E S. EGIDIO	294.000.000
6121	Firenze	FI	REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PRIVI DI OSTACOLI E BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO STORICO DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	197.000.000
6156	Mantova	MN	CATTEDRALE DI S. PIETRO IN MANTOVA PROGETTO PER IL RECUPERO DELL'IMMAGINE STORICA E LA CORRETTA ACCOGLIENZA LA NAVATA CENTRALE LA CUPOLA L'ABSIDE ED I TRANSETTI	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO IN CATTEDRALE	66.000.000
6222	Firenze	FI	SEGNALETICA E ARREDO GIUBILARE E DEI PERCORSI SPECIALI	COMUNE DI FIRENZE	152.000.000
6376	Loreto	AN	COMPLETAMENTO EDIFICIO EX F.A.F	COMUNE DI LORETO	724.000.000
6389	Orvieto	TR	RECUPERO DEL CONVENTO DI SAN CRISPINO DA VITERBO IN ORVIETO ACCOGLIENZA POVERA	PROV. ROMANA FRATI MINORI CAPPUCINI	56.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6390	Loreto	AN	RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI IN VIA SOLARI CENTRO STORICO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NELLE ZONE DI SOSTA E RISTORO ED ALTRE ALLEGATO PIANO GENERALE PER L'ACCOGLIENZA	COMUNE DI LORETO	35.000.000
6602	Perugia	PG	MOBILITA' PER DISABILI	COMUNE DI PERUGIA	47.000.000
6905	Assisi	PG	RISTRUTTURAZIONE CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	IST. TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	1.130.393
6986	Loreto	AN	AREA URBANA PREDISPOSTA PER LA SOSTA ED IL RISTORO	COMUNE DI LORETO	21.000.000
7014	Montecastrilli	TR	TORRE AMERINA	COMUNE DI MONTECASTRILLI	16.000.000
7201	Gubbio	PG	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO, RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO FRANCESCANO DI GUBBIO CHIESA DI SAN FRANCESCO E CONVENTO	CHIESA DI SAN FRANCESCO GUBBIO	8.445.753
7235	Assisi	PG	RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO UBICATO NEL BORGO MEDIEVALE DI SAN GREGORIO DA DESTINARE A STRUTTURA RICETTIVA	PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO	586.677
7245	Fossombrone	PS	CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA CATTEDRALE DI FOSSOMBRONE	PARROCCHIA S. ALDEBRANDO E AGOSTINO	20.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7268	Spoletto	PG	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL PALAZZO COLLICOLA IN SPOLETO QUALE CENTRO DEL SISTEMA MUSEALE CITTADINO E SPAZI PER LA GESTIONE DELL'EVENTO GIUBILARE E DELL'ATTIVITA' CULTURALI ED ARTISTICHE CONNESSE, INFORMAZIONE E PROGRAMMAZIONE	COMUNE DI SPOLETO	135.131.074
7570	Bevagna	PG	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL' EX CONVENTO DEI SS. DOMENICO E GIACOMO IN BEVAGNA DA ADIBIRSI A RICETTIVITA' POVERA	MONASTERO SUORE CLAUSTRALI DOMENICANE SAN GIUSEPPE	79.059.459

Tot. Interventi

43

Tot.

Disponibilità
9.482.353.356

Allegato "B"

Riunione commissione ex lege n. 270/97 del 28 LUGLIO 1999

modifiche (*) degli interventi inclusi nel Piano degli Interventi di Interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
415	AA - 26 - ED - M	Manoppello	STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI INFORMAZIONE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MANOPPELLO	410.993.700	340.993.700	70.000.000			
459	AA - 12 - ED - M	Lavagna	RESTAURO CONSERVATIVO TORRE DEI FIESCHI STRUTTURE E SERVIZI INFORMATIVI	COMUNE DI LAVAGNA	617.000.000	510.000.000	107.000.000	2/10/98		PROROGA TERMINI LETT. C
474	AC - 26 - EC - L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO DI DISSUAZIONE LUNGO LA STATALE N° 352	COMUNE DI AQUILEIA	783.338.955	596.338.955	187.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA L.86.338.955
475	AA - 26 - EC - L	Aquileia	SISTEMA DI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI E PARCHEGGIO DI DISSUAZIONE LUNGO LA STATALE N° 352 A SUD DELL'ABITATO	COMUNE DI AQUILEIA	460.000.000	450.000.000	10.000.000	06/09/99		MODIFICA LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE
										RICHIESTA PROROGA TERMINI LETT. C

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 1 di 10

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

o. rel.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
477	AA - 26 - EC - L	Aquila	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTIA FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL MUSEO NAZIONALE IN VIA CURIEL ANGOLO VIA JULIA AUGUSTA	COMUNE DI AQUILEIA	300.000.000	280.000.000	10.000.000			RICHIESTA PROROGA TERMINI LETT. C
479	AA - 26 - HA - L	Aquila	INTERVENTI RIGUARDANTI L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MOBILITA' DEI DISABILI E L'ACCESSIBILITA' ALLA BASILICA ED ALLE PRINCIPALI METE RELIGIOSE ARCHEOLOGICHE E TURISTICHE	COMUNE DI AQUILEIA	1.059.000.000	1.049.000.000	10.000.000	10/09/99	30/10/1999	PROROGA TERMINI LETT. C e LETT. D
484	AA - 26 - FD - L	Aquila	INTERVENTI RIGUARDANTI LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDAZIONE SISSUL	COMUNE DI AQUILEIA	1.564.000.000	1.554.000.000	10.000.000			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L. 91.000.000
507	ACI - 26 - GA - M	Avezzano	RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO DON ORIONE PROVINCIA RELIGIOSA DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE DELLA CONGREGAZIONE DELLA PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	6.684.000.000	5.984.000.000	700.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 347.158.000
510	AC - 41 - EA - L	Napoli	SCAMBIATORE INTERMODALE CATACOMBE DI SAN GENNARO	ARCIDIOCESI DI NAPOLI	4.500.000.000	4.500.000.000	0			DEFINANZIATO E CANCELLATO DAL PIANO
599	AB - 11 - FB - L	Matera	CASA DEL PELLEGRINO FORESTIERA OSTELLO DELLE MONACELLE	I.P.A.B. ISTITUTO FEMMINILE SAN GIUSEPPE	4.441.851.000	3.486.851.000	945.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 256.000.000

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 2 di 19

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi										
N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
825	AC - 26 - FB - M	Lendinara	CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO CONSERVATIVO DEL MONASTERO DI LENDINARA	CONGREGAZIONE BENEDETTINA OLIVETANA	2.176.997.000	1.626.997.000	550.000.000			
643	AC - 12 - GA - M	Monterosso Al Mare	RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SOVIORE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO PER FUNZIONI DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	SANTUARIO DI N. S. DI SOVIORE	4.329.000.000	4.059.000.000	270.000.000		31/10/99	PROROGA TERMINI LETT. D
650	AA - 12 - IA - M	Lucca	FABBRICA DEL PALAZZO RESTAURO PER RIAPERTURA AL PUBBLICO DI ITINERARI INTERNI ED ESTERNI AL PALAZZO DUCALE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	PROVINCIA DI LUCCA	12.424.872.000	8.724.872.000	3.700.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.900.000.000
713	MA - 23 - LC - L	Teclo	PARCHEGGIO DELL'ABBZIA DI PRAGUA	COMUNE DI TEOLO	1.572.662.700	1.220.662.700	352.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 758.000.000
890	AC - 25 - GA - L	San Giovanni Rotondo	CASA DI ACCOGLIENZA PER IL CLERO	PROVINCIA DI FOGGIA DEI F.F.M.M. CAPPUCCINI	15.418.000.000	4.634.000.000	10.784.000.000		31/10/99	INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.34.344.700 E PROROGA TERMINI LETTERA D)
928	AC - 11 - GA - L	Vercosa	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CHIESA CONVENTO DI S. MARIA IN MONTALTO	CURIA VESCOVILE	3.000.000.000	3.000.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.500.000.000
1098	AC - 14 - LA - L	Lecco	RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI ALTARI DELLE NAVATE LATERALI DEL CONTRORFITTITO LIGNEO LACUNARI DELLE SALE A PIAN TERRENO E DELLE COPERTURE DELLA BASILICA DI S. CROCE	PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA' IN S. CROCE	3.411.530.000	1.083.530.000	2.328.000.000			RIDUZIONE DEL COSTO DELL'INTERVENTO DI L. 2.558.000.000
					3.445.232.503	1.117.232.503	2.328.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.33.792.503

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 3 di 19

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi										
N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Finanz. Let. c)	Termini Let. d)	Note
1100	AA - 14 - GA - L	Cavallino	RESTAURO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO DEI PADRI DOMINICANI IN CAVALLINO PER USO RICETTIVO	COMUNE DI CAVALLINO	2.715.304.994	2.506.304.994	149.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.314.895.000
1121	AA - 13 - FD - L	Catolica	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI	COMUNE DI CATTOLICA	3.428.000.000	2.000.000.000	1.428.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.278.000.000
1124	AA - 28 - EA - L	Arcugnano	CENTRO ACCOGLIENZA TORRI	COMUNE DI ARCUGNANO	529.000.000 642.000.000	529.000.000 529.000.000	0 119.000.000		31/10/1999	AUMENTO DEL COSTO DELL'INTERVENTO E DEL COFINANZIAMENTO DI L. 119.000.000 - MODIFICA TERMINE LETTERA D)
1124 3	AC - 14 - GA - B	Lagonegro	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO MADONNA DEGLI ANGELI	PARROCCHIA S. NICOLA DI BARI	5.789.832.000	5.789.832.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.600.000.000
1132	AC - 26 - EA - L	Certosa Di Pavia	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E RISTORO	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO	480.000.000 561.347.334	400.000.000 496.000.000	80.000.000 161.347.334			INTEGRAZIONE DEL COFINANZIAMENTO PER L.31.347.334
1138	AC - 41 - GA - M	Napoli	ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUTIVI DELLA CASA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMPAGNIA DI GESU' DEI PADRI GESUITI	CASA RELIGIOSA DELLA COMP. DI GESU'	3.341.000.000	3.341.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.531.532.572
1504	AA - 14 - EA - M	Sesto Al Reghena	PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEL CENTRO STORICO CREAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI VICINI ALL'AREA PARCHEGGIO ESISTENTE	COMUNE DI SESTO AL REGHENA	530.000.000	420.000.000	110.000.000			
1512	AC - 31 - LC - M	Chivari	AMPLIAMENTO DEL MUSEO DIOCESANO	DIOCESI DI CHIAVARI	195.000.000	195.000.000	0		30/10/99	PROROGA TERMINI LETT.D
									15/10/99	PROROGA TERMINI LETT.D

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 4 di 19

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n° 'rot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanz. attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini		Note
								Let. c)	Let. d)	
1514	AC - 31 - LA - L	Cogorno	RESTAURO CONSERVATIVO RIASSETTO E RECUPERO DI STABILI DISMESSI NEL COMPLESSO STORICO MONUMENTALE DI SAN SALVATORE CREAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA AD ESSO COLLEGATO	DIOCESI DI CHIAVARI	8.001.000.000	8.001.000.000	0			
1676	AA - 26 - EA - L	UDINE	PARCHEGGIO COLLEGATO ALLA STAZIONE FF.SS. E PARCHEGGIO FRA VIA MEDICI E VIA DEL VASCHELLO E RELATIVI SERVIZI	COMUNE DI UDINE	2.000.000.000	1.400.000.000	800.000.000	15/10/99	15/10/99	PROROGA TERMINI LETT.D
1678	AA - 26 - FA - L	Udine	OSTELLO PER LA GIOVENTU'	COMUNE DI UDINE	2.000.000.000	1.400.000.000	600.000.000			REINSEMENTO NEL PIANO
1692	AA - 26 - IC - M	Gemona Del Friuli	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI PALAZZO ELTI PER MOSTRE ESPOSIZIONI PINACOTECA BIBLIOTECA ED ARCHIVO STORICO	COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI	310.000.000	248.000.000	62.000.000			DEFINANZIATO
1820	AC - 41 - LA - L	Milano	CHIARAVALLE 2000-LAVORI DI RECUPERO	MONASTERO COMUNITA' CISTERCENSE CHIARAVALLE	2.491.240.000	2.491.240.000	0			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.178.000.000
1912	AC - 12 - IA - L	San Marco In Lamis	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL CONVENTO DI SAN MATTEO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	PROV. S. MICHELE ARCANGELO DEI FRATELLI	5.085.000.000	4.155.000.000	930.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.338.500.000
1951	AA - 12 - EC - M	Levanto	CENTRO SERVIZI INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA-RECUPERO EX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI	COMUNE DI LEVANTO	4.035.000.000	3.255.000.000	780.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.338.000.000
					4.589.715.378	3.809.715.378	780.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA L.554.715.378

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 5 di 19

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi										
N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
2005	AC - 31 - LA - M	Monte SanAngelo	IL PERCORSO DEL PELLEGRINO RESTAURO SCALINATA ANGIORNA E SISTEMAZIONE ACCESSI	BASILICA SANTUARIO SAN MICHELE ARC.	3.578.949.000	2.928.949.000	650.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.558.000.000
2094	AA - 11 - EC - M	Mottola	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA	COMUNE DI MOTTOLA	431.000.000	211.000.000	220.000.000	04/12/98		PROROGA TERMINI LETT.C
2123	AA - 28 - EA - M	San Sost	AREA URBANA ATTREZZATA PER SOSTA PARCHEGGIO E SERVIZIO NAVETTE PER E DAL SANTUARIO	COMUNE DI SAN SOSTI	500.000.000	500.000.000	0			
2358	AC - 26 - FB - L	Udine	OSTELLO PER LA GIOVENTU'	PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE SPOSO B.V.M	301.000.000	200.000.000	101.000.000	14/05/99	30/10/99	PROROGA TERMINI LETT. C E LETT.D
2443	BA - 25 - FD - M	San Giovanni Rolando	AFFITTACAMERE SCARALE	SCARALE GIUSEPPE	287.000.000	0	287.000.000	07/10/98		AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.194.571.594
2515	AC - 41 - FB - L	Venezia	ADEGUAMENTO CASA STUDENTESCA S. FOSCA CANNAREGIO ED AUMENTO CAPACITA' RICETTIVA	DIOC. PATRIARCATO DI VENEZIA	3.555.000.000	2.825.000.000	730.000.000			PROROGA TERMINI LETT. C
2515/A			RESTAURO CASA STUDENTESCA S. FOSCA E AUMENTO CAPACITA' RICETTIVA		2.315.000.000	1.775.000.000	440.000.000	1/1/00		FRAZIONAMENTO E MODIFICA TERMINI LETT. Q
2515/B			ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI IMPIANTI DELLA CASA STUDENTESCA S. FOSCA		1.378.000.000	1.058.000.000	370.000.000	4/12/98	8/1/00	FRAZIONAMENTO E MODIFICA TERMINI LETT. Q e D)
2517	AC - 41 - GB - L	Venezia	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDILIZIO ISTITUTO MARIA ASSUNTA	DIOC. PATRIARCATO DI VENEZIA	5.200.000.000	2.500.000.000	2.700.000.000			
2570	AC - 41 - FA - M	Napoli	INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA BETANIA	ARCIDIOCESI DI NAPOLI	6.277.885.000	2.596.000.000	3.777.885.000			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.1.027.885.000
					2.884.000.000	0		05/05/99		PROROGA TERMINI LETT.C

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 6 di 19

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi									
N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamen- to attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Termini Let. c) Let. d)	Note
2624	AC - 41 - FD - L	Palermo	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL COLLEGIO PER LE MISSIONI ALL'ESTERO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI FINALIZZATA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COLLEGIO MISSIONI ESTERE FRATI MINORI CAPPUCCINI	4.470.505.167	4.470.505.167	0		
2630	AA - 14 - FB - M	Carpinelli	RECUPERO E RIUSO DELLA MATILDICA PIEVE DI S. VITALE DELL'ANNESSE CANONICA	COMUNE DI CARPINETTI	1.868.000.000	900.000.000	968.000.000	31/10/99	PROROGA TERMINI LETTERA D)
2781	AC - 12 - IA - M	Brugnato	RECUPERO STRUTTURE EDIFICIO GIA' SEDE VESCOVILE IN BRUGNATO DA DESTINARE A SPAZIO CULTURALE RELIGIOSO POLIFUNZIONALE	CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA	2.631.616.668	900.000.000	1.731.616.668		AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L. 165.616.668
2839	AA - 28 - IA - B	Cagliari	ANFITEATRO ROMANO - OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE	COMUNE DI CAGLIARI	1.564.000.000	1.564.000.000	0		INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 200.000.000
2864	AC - 12 - GA - B	San Marco In Lemit	COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DEL CONVENTO DELLA CHIESA E DEL BOSCO DI MARIA SS. DI STIGNANO CON CENTRO DI ACCOGLIENZA PER I PELLEGRINI	PROV. DI S. MICHELE ARCANGELO FRATI MINORI	5.850.000.000	2.150.000.000	3.500.000.000		INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 497.000.000
3008	AC - 23 - LA - B	Padova	RESTAURO DELLA CRIPTA CINQUECENTESCA DELLA BASILICA DI S. GIUSTINA	MONASTERO SANTA GIUSTINA	4.171.000.000	5.375.000.000	600.000.000		INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 285.000.000
3048/ C	AC - 14 - FB - B	Verona	AMPLIAMENTO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELLA FORESTERIA DI VILLA FRANCESCATI - OPERE DI RESTAURO AD ALTA SPECIALIZZAZIONE	DIOCESI DI VERONA	349.000.000	349.000.000	0	09/02/1999	MODIFICA TERMINE LETTERA C)
								15/07/99	PROROGA TERMINI LETT.C

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 7 di 19

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Pagina 8 di 19

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
3592	AC - 28 - 1A - L	Casale	RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA CANONICA DELLA PARROCCHIA S. STEFANO	PARROCCHIA S. STEFANO PROTONARTIRE DI CAORLE	400.000.000	200.000.000	200.000.000			
3768	AC - 28 - GB - M	Domodossola	RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI SPIRITUALITA' ROSMINIANA	PROV. ITALIANA DI S. MAURIZIO DELL'ISTITUTO DELLA CARITA'	723.000.000	623.000.000	100.000.000	12/10/1998		MODIFICA TERMINE LETTERA Q
4104	AA - 28 - GA - M	L'Aquila	RESTAURO DEL COMPLESSO MONASTICO DI S. MARIA DI COLLEMAGGIO	PROVINCIA DI L'AQUILA	2.152.000.000	2.152.000.000	0			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.47.699.339
4463	AC - 14 - 1A - M	Chiverna	ALLESTIMENTO MUSEO DEL TESORO	PARROCCHIA SAN LORENZO	990.000.000	490.000.000	500.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.388.000.000
4732	AC - 28 - 1A - M	Catania	RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CATTEDRALE DI CATANIA	BASILICA CATTEDRALE S. AGATA	1.012.355.685	498.000.000	514.355.685			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.28.355.485
4817	AA - 14 - 1A - M	Gorizia	MUSEO DELL'ARCIDIOCESI E DEL TESORO DI AQUILEIA	COMUNE DI GORIZIA	4.470.000.000	4.470.000.000	0	31/7/99		DEFINANZIATO E CANCELLATO DAL PIANO
4882	AC - 52 - GB - M	San Giuliano Milanese	RESTAURO E AMPLIAMENTO DELLE CAPACITA' DI ACCOGLIENZA DI UNA ANTICA FORESTERIA MONASTICA	MONASTERO BENEDETTINE SS. PIETRO E PAOLO	2.471.716.057	1.381.716.057	1.090.000.000	31/7/99		PROROGA TERMINI LETT. C
4943	AA - 12 - EE - M	Volterra	RESTAURO BASTIONE MEDICEO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI AREE DI SOSTA E SERVIZI DI ACCOGLIENZA	COMUNE DI VOLTERRA	372.000.000	222.000.000	150.000.000	31/10/99		PROROGA TERMINI LETT.D
								31/10/99		PROROGA TERMINI LETT.C

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
4990	AC - 12 - FD - M	Vergemoli	ADATTABILITA' E RISTRUTTURAZIONE LOCALI DELLA FORESTERIA DELL'EREMO	PARROCCHIA S. TOMMASO APOSTOLO IN CALOMINI	270.000.000	200.000.000	70.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 1.000.000.000
5000/ A	AC - 12 - HA - M	Sant'Antonio di Torino	OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - MONASTERO NUOVO	PROV. ITALIANA S. MAURIZIO DELL'ISTITUTO DELLA CARITA'	2.267.452.510	2.267.452.510	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 81.391.337
5025	AA - 53 - EA - L	Bologna	PARCHEGGIO FOSCOLO PORTA SARAGOZZA	COMUNE DI BOLOGNA	3.135.890.000	2.735.890.000	400.000.000			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L. 32.000.000
5046	AC - 12 - LA - L	Bobbio	CENTRO DI ACCOGLIENZA LE GRAZIE	PARROCCHIA DEL DUOMO	200.000.000	130.000.000	70.000.000	1/09/99	28/10/99	MODIFICA DEI TERMINI LETTERA C e D
5083	AC - 14 - LA - B	Caltanissetta	RESTAURO DEL SEMINARIO REGIONALE S. PIO XI E REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI	CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA	4.699.475.000	2.199.475.000	2.500.000.000			CAMBIO TITOLO
5103	AC - 41 - GB - B	Venezia	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEL PENSIONATO MARIA IMMACOLATA A DORSODURO	CASA PRIMARIA IN TREVISIO DELL'IST. DELLE F.D.C	18.807.000.000	3.887.000.000	13.120.000.000			FRAZIONAMENTO
5103/A			RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEL PENSIONATO MARIA IMMACOLATA A DORSODURO - 1° STRALCIO		9.341.632.479	3.687.000.000	5.654.632.479			FRAZIONAMENTO
5103/B			RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEL PENSIONATO MARIA IMMACOLATA A DORSODURO - 2° STRALCIO		7.465.371.510	0	7.465.371.510			FRAZIONAMENTO
5200	AC - 11 - GA - L	Catania	PROGETTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE	CHIESA S. EUFEMIA	1.900.000.000	1.600.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 1.000.000.000

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 10 di 19

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi										
o rot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Lett. c)	Termini Lett. d)	Note
5219	AC - 14 - IA - B	Napoli	INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI RIUSO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE ANCHE ALLO SCOPO D'INCREMENTARE LA RICETTIVITA' E RELATIVI SERVIZI A BASSO COSTO	DIOCESI DI NAPOLI	9 203 000 000	8 203 000 000	1 000 000 000			
5311	AA - 20 - IA - B	Reggio	ABBAZIA DI VALLOMBROSA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ELETTRICHE ATMOSFERICHE	SOPRINTENDENZA B A A DI FIRENZE	10 201.000.000	9 203.000.000	1 000.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 1.000.000.000
5342	AA - 12 - IC - M	Fontanello	RECUPERO DI PARTE DI ROCCA SANVITALE A MUSEO DI BENI CULTURALI A CARATTERE RELIGIOSO AD INTEGRAZIONE FUNZIONALE DELL'ESISTENTE MUSEO ROCCA SANVITALE	COMUNE DI FONTANELLO	1 471.000.000	1 271.000.000	200.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 330.000.000
5371	BA - 25 - FD - L	San Giovanni Rotondo	RISTRUTTURAZIONE MURARIA EDIFICIO PREESISTENTE E DESTINAZIONE AD AFFITTA CAMERE	INTOURIST RESIDENZA TURISTICA	139.000.000	0	139.000.000		30/10/99	PROROGA TERMINI LETT. D
5406	AC - 25 - LA - M	San Giovanni Rotondo	CENTRO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL SANTUARIO DI S. MARIA DELLE GRAZIE	ENTE MONASTICO PROVINCIA FRATI MINORI CAPPUCCINI	600.000.000	600.000.000	0			RINUNCIA ALL'INTERVENTO
5464	AC - 14 - GB - L	Pisa	RECUPERO DI LOCALI SOTTOTETTO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA	CONGR. REL. ISTIT. SUORE FRANCESCANE	450.000.000	250.000.000	200.000.000			RINUNCIA ALL'INTERVENTO
5469	AA - 12 - EL - M	Firenze	CHIESE DI TOSCANA IMPIANTI ILLUMINOTECNICI E INFORMATIVI LUMINA. CITTÀ DI TOSCANA.	REGIONE TOSCANA	7 708.000.000	3 820.000.000	3 888.000.000			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO E DEL COSTO DELL'INTERVENTO DI L. 50.300.000
5487	AC - 51 - GB - L	Trieste	ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CONVITTO	OPERA SAN GIUSEPPE	76.000.000	76.000.000	0			CAMBIO TITOLO
(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi										
Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi										
								30/07/99	PROROGA TERMINI LETT. D	Pagina 11 di 19

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi										
N° Prot.	Codice Urgo	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamen-to attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
5492	AA - 51 - EL - L	Trieste	CENTRO ACCOGLIENZA PELLEGRINI	COMUNE DI TRIESTE	850.000.000 1.137.658.000	730.000.000 891.138.000	120.000.000 246.500.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 161.158.000 E AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.126.308.000
5493	AA - 51 - FA - L	Trieste	FORESTERIA PER I PELLEGRINI	COMUNE DI TRIESTE	1.820.000.000 2.113.888.000	1.820.000.000 2.086.388.000	0 27.500.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.408.388.000 E DI COFINANZIAMENTO DI L. 37.500.000
5738	AB - 14 - ED - M	Ternio	ITINERARI RELIGIOSI ITALIANI E SVILUPPO SERVIZI DI SUPPORTO PER IL 2000	ACI AUTOMOBILE CLUB DT ITALIA	311.000.000	140.000.000	171.000.000		31/10/99	RICHIESTA PROROGA TERMINI LETT. D
5768	AC - 23 - FB - L	Monza	OSTELLO S. GIACOMO	PROVINCIA FRANCESCANA FRATI MINORI S. FRANCESCO	280.000.000 307.869.699	250.000.000 277.859.699	30.000.000 30.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.27.869.699
5848	AC - 14 - LA - B	Racine	CONSOLIDAMENTO RISANAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. M. LA NOVA ED ANNESSO CONVENTO	PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE	1.887.020.944 1.797.828.944	1.887.020.944 1.797.828.944	0 0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.118.000.000
6012	AC - 11 - LA - L	Matera	ITINERARIO DEGLI HABITAT RUPESTRI CIRCUITO URBANO DELLE CHIESE RUPESTRI DI MATERA	ARCIDIOCESI DI MATERA IRSINA	8.387.340.000 8.634.574.442	2.887.340.000 3.124.574.442	5.500.000.000 5.500.000.000		31/10/99	PROROGA TERMINI LETT. C E LETT. D ED INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER L. 317.314.442
6018	CA - 14 - NC - M	Como	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7528	IL BORGHETTO S.A.S. DI LUCIANO GILARDONE & C. - COMO	32.000.000.000 21.608.000.000	0 0	32.000.000.000 21.608.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
6020	CA - 14 - NC - M	Milano	INAIL 2000 PROT. 7508	ANDUMOR S.R.L.	92.000.000.000 28.741.000.000	0 0	92.000.000.000 28.741.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
6022	CA - 12 - NC - M	Pavia	INAIL 2000 PROT. 7610	LA MADONNINA S.R.L.	26.000.000.000 28.678.000.000	0 0	26.000.000.000 28.678.000.000			AUMENTO COSTO DELL'INTERVENTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi										
(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi										
Pagina 12 di 19										

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
6031	CA - 12 - NB - M	Parma	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7650	ALFA INGEGNERIA S.R.L. - PARMA	12.000.000.000	0	12.000.000.000			
					11.256.000.000	0	11.256.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
6035	CA - 14 - NA - M	Ferrara	INAIL 2000 PROT. 7586	COOPERATIVA CONSTRUTTORI - FERRARA	42.000.000.000	0	42.000.000.000			
					41.478.000.000	0	41.478.000.000			RIDUZIONE DEL COSTO DELL'INTERVENTO
6036	CA - 41 - NB - M	Bologna	INAIL 2000 PROT. 7530	GALOTTI S.P.A. - BOLOGNA	36.000.000.000	0	36.000.000.000			
					35.612.000.000	0	35.612.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
6046	CA - 26 - NB - M	Perugia	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7702	EDILPIMA - PERUGIA	33.000.000.000	0	33.000.000.000			
					32.998.000.000	0	32.998.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
6048	CA - 14 - NC - M	Perugia	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7503	MARINELLI S.P.A. - PERUGIA	11.000.000.000	0	11.000.000.000			
					11.502.000.000	0	11.502.000.000			AUMENTO COSTO DELL'INTERVENTO
6049	CA - 14 - NC - M	Terni	INAIL 2000 PROT. 7764	COMUNE DI TERNI	10.200.000.000	0	10.200.000.000			
					9.998.000.000	0	9.998.000.000			RIDUZIONE DEL COSTO DELL'INTERVENTO
6050	CA - 22 - ND - M	Loreto	INAIL 2000 PROT. 7732	IMAR SRL - LORETO	25.000.000.000	0	25.000.000.000			
					24.998.000.000	0	24.998.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
6051	CA - 14 - NA - M	Ancona	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7659	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI	10.000.000.000	0	10.000.000.000			
					9.578.000.000	0	9.578.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
6052	CA - 14 - PD - M	Montemarciano	INAIL 2000 PROT. 7512	EDILRIVERA S.R.L. - MONTEMARCIANO	11.000.000.000	0	11.000.000.000			
					2.682.000.000	0	2.682.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
6058	CA - 14 - NC - M	Montesilvano	INAIL 2000 PROT. 7487 ARTEL SOCIETA' IMMOBILIARE S.R.L. MONTESILVANO -MONTESILVANO	ARTEL SOCIETA' IMMOBILIARE S.R.L. -MONTESILVANO	34.000.000.000	0	34.000.000.000			
					21.682.000.000	0	21.682.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi										
N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Terminali Let. c)	Terminali Let. d)	Note
6060	CA - 14 - NC - M	L'Aquila	INAIL 2000 PROT. 7669	AGUGLIA S.R.L.	14.000.000.000 12.176.000.000	0 0	14.000.000.000 12.176.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
6066	CA - 28 - ND - M	Giustizia	INAIL 2000 PROT. 7499	TOURISTRAD S R.L.	25.000.000.000 22.968.000.000	0 0	25.000.000.000 22.968.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
6068	CA - 51 - NB - M	Orbassano	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7689	TRAMONTANA S.R.L. - OLBIA	45.000.000.000 37.206.000.000	0 0	45.000.000.000 37.206.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
6220	AA - 41 - EB - M	Firenze	VIDEO SICUREZZA PER I MONUMENTI FIORENTINI	COMUNE DI FIRENZE	946.000.000 1.246.000.000	544.000.000 846.000.000	402.000.000 402.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.398.000.000
6376	AA - 22 - FB - M	Loreto	COMPLETAMENTO EDIFICIO EX F.A.F.	COMUNE DI LORETO	5.074.000.000	5.074.000.000	0	1000/99		PROROGA TERMINI LETT. C
6390	AA - 22 - EG - B	Loreto	RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI IN VIA SOLARI CENTRO STORICO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NELLE ZONE DI SOSTA E RISTORO ED ALTRE ALLEGATO PIANO GENERALE PER L'ACCOGLIENZA	COMUNE DI LORETO	375.000.000	375.000.000	0			
6404	AB - 51 - EL - F	Ancona	ARREDO SALA DI ATTESA	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	80.000.000	80.000.000	0	1200/99		PROROGA TERMINI LETT. C
6405	AB - 51 - EL - L	Ancona	COPERTURA IN TENSOSTRUTTURE PER AREE DI SOSTA VEICOLI LEGGERI IN ATTESA DI IMBARCO	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	800.000.000 554.882.539	800.000.000 554.882.539	0 0	1500/99		PROROGA TERMINI LETT. C - RIDUZIONE DEL COSTO DELL'INTERVENTO DI L.245.111.441
6407	AB - 51 - EA - L	Ancona	PERCORSI PEDONALI PROTETTI	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	800.000.000 773.000.000	800.000.000 600.000.000	0 173.000.000	3000/99		PROROGA TERMINI LETT. C ED AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.173.000.000

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 14 di 19

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi										
N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
6408	AB - 51 - ED - F	Ancona	SISTEMA INFORMAZIONE PASSEGGERI	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	80.000.000	80.000.000	0	10/09/99		PROROGA TERMINI LETT. C
6526	AC - 14 - GA - L	Fabriano	CASA ALBERGO PER ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	PROV. ITAL. CONGR. FRATELLI DI N. SIGNORA	7.892.000.000	3.630.000.000	4.262.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.241.785.765
6528	AA - 14 - FB - L	Genga	CENTRO DI ACCOGLIENZA TURISTICA ED OSTELLO RISTRUTTURAZIONE PALAZZO FIUMI SERMATTEI	COMUNE DI GENGA	1.882.580.975	1.782.580.975	100.000.000			
6692	AC - 14 - GA - M	San Benedetto Del Tronto	RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO S. GIOVANNI B. PER LA CREAZIONE DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA	IST. S. GIOVANNI BATTISTA	930.000.000	730.000.000	200.000.000		30/10/99	PROROGA TERMINI LETT. D
6705	AA - 13 - EA - L	Montefalco	AREA EX IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER L'ACCESSO LA SOSTA E LA MOBILITA'	COMUNE DI MONTEFALCO	1.600.000.000	1.280.000.000	320.000.000			AUMENTO COFINANZIAMENTO PER L.347.765.064
6775	AC - 26 - LA - B	Jesi	RESTAURO DELLE COPERTURE DELLA CATTEDRALE DI S. SETTIMIO DUOMO DI JESI	ENTE DIOCESI DI JESI	650.000.000	455.000.000	195.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.96.000.000
6804	AC - 13 - LA - B	Norda	RESTAURO RECUPERO E RIUTILIZZO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN BENEDETTO	ARCIDIOCESI DI SPOLETO NORCIA	3.830.102.202	3.640.056.853	190.045.349			INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO PER L.70.895.036
					718.895.036	455.000.000	263.895.036			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.72.000.000 MENO L.9.954.631 PER RECUPERO SOMME REGUMBRIA E AUMENTO COFINANZIAMENTO PER L.9.954.631
					3.902.102.202	3.702.102.202	200.000.000			

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi										
N° Prot.	Codice Urg.	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
6905	AD - 21 - HA - L	Assisi	RISTRUTTURAZIONE CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	IST.TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	3.207.430.000	1.642.975.000	1.564.455.000			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.1.044.311 PER RECUPERO SOMME DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
6906	AC - 21 - LC - B	Assisi	REALIZZAZIONE DELLA SALA CONVEGNI E SALA POLIVALENTE DI S. MARIA DELLE ROSE	CATTEDRALE DI S. RUFINO	1.056.360.000	637.998.867	420.383.333			AUMENTO DEL FINANZIAMENTO DI L.72.663 E CORRISPONDENTE DIMINUIZIONE DEL COFINANZIAMENTO PER RECUPERO RIBASSI
7102	AD - 21 - IA - M	Assisi	PATRIARCALE BASILICA DI S. FRANCESCO DI ASSISI PALAZZO PAPALE MUSEO PALAZZO NORD PALAZZO OVEST RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ACCOGLIENZA	PATRIARCALE BASILICA DI SAN FRANCESCO	19.563.063.000	18.563.063.000	1.000.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 1.000.000.000
7143	AA - 22 - EA - L	Porto Recanati	PISTA CICLABILE PORTO RECANATI LORETO	COMUNE DI PORTO RECANATI	300.000.000	300.000.000	0	2.606,99		PROROGA TERMINI LETT. C
7167	AC - 13 - GA - M	San'Anastasia Di Narco	CASA RELIGIOSA DI ACCOGLIENZA POVERA IN SAN FELICE	ARCIDIOCESI DI SPOLETO NORCIA	1.909.367.000	1.770.147.067	139.249.913			INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI L.139.249.913 E DEL COFINANZIAMENTO DI L. 68.759.817 PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
7201	AC - 13 - LA - B	Gubbio	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO FRANCESCANO DI GUBBIO CHIESA DI S. FRANCESCO E CONVENTO	CHIESA DI S. FRANCESCO	3.041.894.748	2.955.340.499	86.554.247			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.86.554.247 PER RECUPERO SOMME DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 16 di 19

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi										
no Prot.	Codice Urtge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
7235	AC - 21 - GB - L	Assisi	RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO UBICATO NEL BORGO MEDIOEVALE DI S. GREGORIO DA DESTINARE A STRUTTURA RICETTIVA	PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO	1.531.770.000	836.384.538	695.385.462			AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.384.677 PER RECUPERO SOMME DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
7258	AA - 13 - HA - L	Gubbio	RITORNO ALL'ACROPOLI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE A SCALA URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE DA VIA XX SETTEMBRE AGLI ORTI DELLA CATTEDRALE	COMUNE DI GUBBIO	2.453.000.000	2.453.000.000	0			
7268	AA - 13 - IA - M	Spoleto	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL PALAZZO COLLECOLA IN SPOLETO QUALE CENTRO DEL SISTEMA MUSEALE CITTADINO E SPAZI PER LA GESTIONE DELL'EVENTO GIUBILARE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI ED ARTISTICHE CONNESSE INFORMAZIONE E PROGRAMMAZIONE	COMUNE DI SPOLETO	5.257.654.000	4.392.765.074	864.868.926			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.851.866.000
7278	AC - 21 - LA - M	Assisi	RESTAURO CONSERVATIVO ESTETICO E FUNZIONALE DELLA BASILICA DI S. MARIA DEGLI ANGELI IN PORZIUNCOLA	PROV. SERAFICA DI S. FRANCESCO ORDINE DEI FRATI MINORI	13.579.571.000	4.587.697.302	8.991.873.698			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.458.446.515 ED AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.135.131.874 PER RECUPERO SOMME DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
7352	AC - 21 - EA - M	Assisi	PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI UNO STABILE DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA E PRIMO SOCCORSO NONCHE' RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA CAMPER.	CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO E SAN BERNARDINO	482.000.000	482.000.000	0			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI 63,5 MIL + 309 MIL COF INANZIAMENTO+ L.491.873.698 PER REC. SOMME PER ERRORE MATERIALE E DIMINUZIONE DEL COFINANZIAMENTO
								150899	25/10/99	PROROGA TERMINI LETT. C E D
(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi										
Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi										
Pagina 17 di 19										

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 17 di 19

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi									
Codice rot. Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
'374 AB - 13 - FB - M	Spello	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ALA SUD DELL'EX OSPEDALE S. CARLO BORROMEO IN OSTELLO	IST. CIV. RIUNITI DI BENEFICENZA	6.383.846.760	4.163.846.760	2.220.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.287.535.660
'465 AA - 51 - EA - M	Ancona	SOSTA PULLMAN BANCHINA PORTUALE	COMUNE DI ANCONA	1.731.880.000	1.231.880.000	500.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.656.000.000
'516 AC - 13 - IA - B	Foligno	RESTAURO DEL COMPLESSO CATTEDRALE E PALAZZO DELLE CANONICHE	DIOC. FOLIGNO CATTEDRALE DI S. FELICIANO	11.078.087.989	8.840.810.420	4.237.457.509			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.179.397 PER RECUPERO RINASSO A CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE E CORRISPONDENTE DIMINUIZIONE DEL COFINANZIAMENTO
'570 AC - 14 - FD - B	Bevegna	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'EX CONVENTO DEI SS. DOMENICO E GIACOMO IN BEVAGNA DA ADIBIRSI A RICETTIVITA' POVERA	COMUNE DI BEVAGNA	2.225.984.000	1.805.043.459	420.940.541			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.200.000.000 ED AUMENTO DEL COFINANZIAMENTO DI L.79.859.459 PER RECUPERO SOMME DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA
'581 AD - 21 - IA - B	Assisi	RESTAURO PIAZZA INFERIORE SAN FRANCESCO	PATRIARCALE BASILICA DI SAN FRANCESCO ASSISI	8.308.108.123	7.808.108.123	500.000.000			INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L.275.000.000
7654 CA - 28 - NA - L	Vicenza	INAIL 2000 PROT. 7536	SOCIETA' PARCO CITTA' S.P.A.	38.000.000.000	0	38.000.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
7656 CA - 23 - NB - M	Padova	INAIL 2000 PROT. 7559	ASS. IMPR. MANTOVANI - PO E COOP. IL PROGRESSO - FE	60.000.000.000	0	60.000.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Pagina 18 di 19

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° Prot. Urege	Codice Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi					Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
			Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Let. c)			
7658	CA - 41 - NB - M	Bologna	INA I L 2000 PROT. 7773	SOCIETA' COSTRUZIONI EDILI ZUCCHINI S.P.A.	16.000.000.000	0	16.000.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
					15.600.000.000	0	15.600.000.000			
7660	CA - 21 - ND - M	Perugia	INA I L 2000 PROT. 7766	SOCIETA' ARMIN S.R.L.	11.000.000.000	0	11.000.000.000			RIDUZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
					10.846.000.000	0	10.846.000.000			

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Pagina 19 di 19

Le delibere

Deliberazione n. 9 del 27 gennaio 1999

COMMISSIONE EX LEGE n. 270/1997

La Commissione ex lege n. 270/1997

VISTO la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, in ordine alle richieste di modifica inoltrate da taluni soggetti titolari di interventi inclusi nel Piano;

CONSIDERATO che a seguito dell'intervenuta approvazione del quadro tecnico-economico di progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto degli interventi di cui all "A" sono risultate necessarie, per la relativa realizzazione minori occorrenze finanziarie pari ad un ammontare di £ 31.069.730.000;

RITENUTO di prendere atto della rinuncia al finanziamento, formulata dai soggetti titolari degli interventi sotto indicati:

- n. 1681 "Risanamento conservativo corpo est aule scolastiche, trasformazione in camere per ricettività a basso costo con relativi servizi" £. 960.000.000

- n. 3173 "Centro Casa del Carmelo" £. 2.100.000.000

che vengono, pertanto, cancellati dal Piano;

RITENUTO di disporre il definanziamento totale, con il conseguente recupero di £ 131.000.000, dell'intervento rubricato:

n. 5645 "Ristrutturazione dei servizi igienici per il pubblico nel contesto del complesso di Monte Berico, con la realizzazione di un servizio per disabili compresa la realizzazione di un impianto servoscala",

per l'intervenuta realizzazione dei lavori a totale carico del soggetto proponente;

RITENUTO di prendere atto della rinuncia al finanziamento formulata dal titolare dell'intervento rubricato:

n. 4530 "Recupero della Cripta medioevale per accoglienza dei pellegrini",

il cui stanziamento è ridotto da £ 620.000.000 a £ 59.000.000, con una economia immediata pari a £ 561.000.000, fatta salva la maggior somma che risulterà all'esito della procedura contabile di recupero delle somme non utilizzate;

RITENUTO di assentire alle richieste di riduzione delle quote di cofinanziamento, conseguenti alla riduzione del costo degli interventi, in quanto tali da non precludere la piena funzionalità degli interventi stessi, nella loro originaria configurazione;

RITENUTO di prendere atto dell'incremento delle quote di cofinanziamento proposte da taluni soggetti beneficiari e del conseguente aumento del costo stimato dell'intervento, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

RITENUTO di accogliere la ulteriore richiesta di disaggregazione dell'intervento rubricato con n. 6104, disposto con D. M del 6 agosto 1998, pubblicato su G.U n. 252 del 28 10 1998, al fine di razionalizzare le procedure realizzative con conseguente modifica del titolo e della ripartizione della quota di finanziamento e di cofinanziamento;

RITENUTO di accogliere le richieste di differimento dei termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97, concernenti rispettivamente il perfezionamento degli adempimenti amministrativi ed il completamento degli interventi, in quanto compatibili con la realizzazione degli stessi nel rispetto del termine finale indicato dalla legge;

RITENUTO di accogliere la richiesta formulata dall'Ente Arcidiocesi di Firenze, soggetto beneficiario dell'intervento rubricato con n. 4062, in ordine al subentro nella titolarità dell'intervento medesimo, da parte del Convitto Ecclesiastico della Calza, quale usuario dell'immobile oggetto dei lavori;

RITENUTO di dover rettificare il D.M. n. 183/RC del 27 gennaio 1999, approvativo della delibera della Commissione n. 8/98 del 16 dicembre 1998, nella parte in cui dispone il definanziamento totale per £ 1.800.000.000 dell'intervento rubricato con n. 897 "Recupero e riorganizzazione funzionale del Chiostro monumentale del Convento di San Lorenzo da adibire a ricettività in comunità religiose e i relativi servizi", anziché il definanziamento parziale per £ 1.620.000.000, avendo l'U.R.C.G.E. già provveduto a trasferire al soggetto beneficiario £ 180.000.000, a titolo di anticipazione per gli oneri di progettazione;

RITENUTO, sulla base della documentata richiesta dei soggetti titolari, di accogliere il cambio del titolo di taluni interventi in conseguenza della diversa localizzazione o tipologia realizzativa;

RITENUTO di dover correggere alcuni errori materiali segnalati dai soggetti interessati ed attinenti la localizzazione o l'individuazione del soggetto beneficiario relativo;

RITENUTO di includere nel Piano nuovi interventi, in quanto coerenti con i criteri di cui al D.M. 17 settembre 1997 ed anche in conformità al parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, relativamente agli interventi localizzati nella regione Toscana ed afferenti la proposta di modificazione del Piano, approvata dalla Commissione con deliberazione n. 8 del 16 dicembre 1998, le cui statuizioni, in parte de qua, sono state stralciate con relativo D.M. di approvazione n. 183/RC del 27 gennaio 1999;

All'unanimità

DELIBERA

A seguito dell'approvazione del quadro tecnico-economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'allegato A, nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £. 31.069.730.000.

Sono totalmente defINANZIATI, su richiesta dei rispettivi soggetti titolari, gli interventi sottoindicati, per un ammontare complessivo di £ 3.060.000.000:

- n. 1681 "Risanamento conservativo corpo est aule scolastiche, trasformazione in camere per ricettività a basso costo con relativi servizi" £. 960.000.000
- n. 3173 "Centro Casa del Carmelo" £. 2.100.000.000

E' totalmente defINANZIATO, per un ammontare di £. 131.000.000, le conseguentemente cancellato dal Piano l'intervento rubricato:

n. 5645 "Ristrutturazione dei servizi igienici per il pubblico nel contesto del complesso di Monte Berico, con la realizzazione di un servizio per disabili compresa la realizzazione di un impianto servoscala",

avendo il titolare provveduto a realizzare i lavori a proprio totale carico.

E' parzialmente defINANZIATO l'intervento rubricato con n. 4530 "Recupero della Cripta medioevale per accoglienza dei pellegrini", il cui stanziamento è ridotto da £ 620.000.000 a £ 59.000.000, con una economia immediata pari a £ 561.000.000, e fatta salva la maggior somma che risulterà all'esito della procedura contabile di recupero delle somme non utilizzate.

A rettifica del D. M. n. 183/RC del 27 gennaio 1999, in ordine al defINANZIAMENTO totale di £ 1.800.000.000 dell'intervento rubricato con n. 897, è disposto il defINANZIAMENTO parziale di £ 1.620.000.000, avendo l'URCGE già trasferito al titolare dell'intervento la somma di £ 180.000.000 per oneri di progettazione, fino all'esito del procedimento di recupero delle somme non utilizzate, previsto dall'art. 4, comma 3, della Legge n. 270/97.

Le risorse disponibili sono, pertanto determinate in complessive £ 44.512.172.360, pari alla somma dei seguenti importi:

- 9.690.442.360	Risorse rese disponibili e non riassegnate con D.M. del 27 gennaio 1999;
- 31.069.730.000	Risorse rivenienti da ribassi d'asta di cui al punto 1;
- 3.191.000.000	Risorse rivenienti da defINANZIAMENTI totali di cui ai punti 2 e 3;
- 561.000.000	Risorse rivenienti dal defINANZIAMENTO parziale di cui al punto 4.

Sono approvati i nuovi termini di cui alle lettere c) e d), dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97, i cambi titolo e di soggetto beneficiario, le aggregazioni e disaggregazioni di interventi, come indicato nell'allegato B;

Sono assentite le integrazioni di finanziamento indicate nell'allegato B, per un ammontare complessivo di £ 2.430.000.000.

Sono inclusi nel Piano, in coerenza con le finalità della legge e sulla base di esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano medesimo gli interventi indicati nell'allegato C, per un importo complessivo di £ 41.732.000.000, restando nella disponibilità della Commissione £ 350.172.360

Il Segretario
f.to BARBATO

Il Presidente
f.to MICHELI

Deliberazione n. 10 del 21 aprile e del 4 maggio 1999

COMMISSIONE EX LEGE n. 270/1997

Sedute del 21 aprile e 4 maggio 1999

La Commissione ex lege n. 270/1997

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, in ordine alle richieste di modifica inoltrate da taluni soggetti titolari di interventi inclusi nel Piano;

CONSIDERATO che a seguito dell'intervenuta approvazione del quadro tecnico economico di progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto degli interventi di cui all'all. "A" sono risultate necessarie, per la relativa realizzazione, minori occorrenze finanziarie pari ad un ammontare di £ 22.768.000.000;

RITENUTO di prendere atto della rinuncia alla realizzazione dell'intervento rubricato con n. 2143, "Tecnologie ambientali e mobilità - Proposta per un nuovo parco archeologico a Pompei", comunicata dal soggetto privato titolare dello stesso per motivi afferenti il finanziamento e le procedure amministrative di attuazione;

RITENUTO di disporre il definanziamento totale dell'intervento rubricato con n. 2803, "Realizzazione servizi igienici" localizzato a Venezia, a causa della persistente indisponibilità dell'area che ne compromette la realizzabilità in tempo utile per le finalità giubilari;

RITENUTO di disporre il definanziamento totale dell'intervento rubricato con n. 5556, "Riqualificazione complesso edilizio e monastico Santuario di Crea", in quanto, sulla base della documentazione acquisita in atti è emerso che i lavori erano già ultimati all'atto dell'inclusione nel Piano venendo con ciò meno il presupposto del disposto finanziamento a carico dei fondi di cui alla legge n. 270/97;

RITENUTO di prendere atto della riduzione del costo stimato, con conseguente definanziamento parziale, formulata dai rispettivi soggetti beneficiari, relativamente ai seguenti interventi

n. 3133, "Progetto di restauro delle coperture, rifacimento impermeabilizzazioni e impianti nel complesso della Cattedrale" di Ventimiglia, la cui assegnazione finanziaria è, pertanto, ridotta di £ 1.010.000.000;

n. 3638, "Infopoint passepartout 2000 - Sistema di nodi informativi dedicati ai disabili" di Napoli, la cui assegnazione finanziaria è, pertanto, ridotta di £ 177.680.000;

n. 6681, "Ammodernamento della casa di S. Francesco" di Loreto, la cui assegnazione finanziaria è, pertanto, ridotta di £ 320.000.000;

RITENUTO di prendere atto dell'incremento della quota di cofinanziamento proposto dal titolare dell'intervento n. 3373, "Ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio destinato all'accoglienza dei pellegrini" di Nova Ponente, a parità di costo, con equivalente riduzione della quota di finanziamento ex lege n. 270/97, per un importo di £ 1.329.000.000;

RITENUTO di prendere atto, altresì, dell'incremento della quota di cofinanziamento proposto dal titolare dell'intervento n. 5954, "Restauro conservativo delle superfici esterne ed interne della chiesa cattedrale" di Brescia, e del conseguente aumento del costo dell'intervento, disponendo la riduzione della assegnazione finanziaria ex lege n. 270/97 nella misura di £ 67.080.000, quale importo differenziale dell'intervenuto ribasso d'asta;

RITENUTO di disporre la cancellazione dal Piano dei 51 interventi indicati nell'allegato "B", di titolarità dell'Ente Poste Italiane, accogliendo la contestuale richiesta di accorpamento degli stessi in un unico intervento, rubricato col n. 17.729, al fine di agevolare le procedure realizzative;

RITENUTO di dare mandato all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi di avviare la procedura di contestazione e messa in mora, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, ai fini dell'eventuale definanziamento, nei confronti dei titolari degli interventi rubricati con i nn. 1172, 1375, 1378, 1589, 3731, 3958, 4739, 4741, 5147, nonché nei confronti dei titolari di quegli interventi per i quali risultino scaduti i termini di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), della legge n. 270/97, senza che sia stato comunicato l'intervenuto affidamento dei lavori né sia stata richiesta l'eventuale proroga di detto termine;

RITENUTO di assentire le richieste di integrazione finanziaria connesse a varianti in corso d'opera dovute a fatti imprevisti e imprevedibili, formulate dai titolari di taluni interventi;

RITENUTO di accogliere le richieste di disaggregazione di alcuni interventi inclusi nel Piano con la contestuale modifica del titolo, al fine di razionalizzarne le procedure realizzative;

RITENUTO di assentire la richiesta di riduzione del numero dei posti letto relativi all'intervento, "Ristrutturazione ed ampliamento dell'abbazia di S. Cassiano, al fine di consentire l'accoglienza dei pellegrini" rubricato col n. 7394, in quanto connessa a sopravvenute prescrizioni della competente Soprintendenza;

RITENUTO di accogliere le richieste di differimento dei termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97, concernenti rispettivamente il perfezionamento degli adempimenti amministrativi ed il completamento degli interventi, in quanto compatibili con le prescrizioni temporali indicate dalla legge;

RITENUTO di accogliere la richiesta formulata dal Comune di Nuoro, soggetto beneficiario dell'intervento rubricato con n. 1806, "Ristrutturazione Cattedrale" di Nuoro, in ordine al subentro nella titolarità dell'intervento medesimo, della Curia Vescovile di Nuoro - Capitolo della Cattedrale di Nuoro, in quanto proprietaria dell'immobile oggetto dell'intervento;

RITENUTO di reinserire nel Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 6, della legge n. 270/97, l'intervento di un soggetto privato rubricato col n. 4966, "Riqualificazione di area industriale dismessa", a seguito della pronuncia resa dal TAR competente in sede cautelare, volta a riaprire il procedimento amministrativo per l'acquisizione dei necessari atti autorizzativi;

RITENUTO di dover correggere alcuni errori materiali relativi all'imputazione delle quote di finanziamento e di cofinanziamento, in ordine a taluni interventi e derivanti da disaggregazioni disposte con precedenti decreti;

CONSIDERATO che per numerosi interventi inclusi nel Piano di cui alla legge n. 270/97 si registrano incrementi anche superiori al 10% del costo complessivo dell'opera, con riferimento agli oneri per spese di progettazione, appalto, direzione dei lavori a collaudo;

CONSIDERATO che molti interventi inclusi nel Piano sono in avanzata fase di esecuzione e che si rende, pertanto, necessario fornire ai soggetti beneficiari chiarimenti e precisazioni in ordine alle modalità della richiesta sia per l'erogazione dell'ulteriore quota di finanziamento del 35% dell'importo impegnato, che per il trasferimento della residua somma fino al 100% del finanziamento attribuito;

CONSIDERATO che la legge n. 109/94 è stata modificata ed integrata dalla legge 415/98, con la conseguente estensione ai soggetti privati di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), dell'applicazione di ulteriori articoli della legge stessa e che pertanto occorre procedere all'aggiornamento di quanto indicato nel D.M. 2 giugno 1998, all. "A", relativo agli "Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.";

All'unanimità

DELIBERA

A seguito dell'approvazione del quadro tecnico economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'all. "A", nella misura a fianco di ciascuna indicata e per un importo complessivo pari a £ 22.768.000.000.

L'intervento "Tecnologie ambientali e mobilità - Proposta per un nuovo parco archeologico a Pompei", rubricato col n. 2143, incluso nel Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 6, della legge n. 270/97, è cancellato dal Piano, a seguito di rinuncia del soggetto privato titolare dello stesso.

E' totalmente defanziato, per un ammontare di £. 176.000.000 l'intervento rubricato con n. 2803 "Realizzazione servizi igienici" localizzato a Venezia, a causa della persistente indisponibilità dell'area che ne compromette la realizzabilità in tempo utile per le finalità giubilari.

E' totalmente defanziato, per un ammontare di £ 340.000.000, l'intervento rubricato n. 5556, "Riqualficazione del complesso edilizio e monastico Santuario di Crea", in quanto, sulla base della documentazione acquisita in atti i relativi lavori erano già ultimati all'atto dell'inclusione nel Piano, venendo con ciò meno il presupposto del disposto finanziamento a valere sulle risorse della legge n. 270/97.

L'intervento rubricato con il n. 3133, "Progetto di restauro delle coperture, rifacimento impermeabilizzazioni e impianti nel complesso della Cattedrale" di Ventimiglia, è parzialmente defanziato, a seguito della riduzione del costo stimato da £ 2.610.000.000 a £ 1.600.000.000 ed il relativo stanziamento è ridotto da £ 2.400.000.000 a £ 1.390.000.000, con un'economia pari a £ 1.010.000.000.

L'intervento rubricato con il n. 3638, "Infopoint passepartout 2000 - Sistema di nodi informativi dedicati ai disabili" localizzato nell'area di Napoli, è parzialmente defanziato, a seguito della riduzione del costo stimato da £ 1.881.000.000 a £ 1.703.320.000 ed il relativo stanziamento è ridotto da £ 1.781.000.000 a £ 1.603.320.000, con un'economia pari a £ 177.680.000.

L'intervento rubricato con il n. 6681, "Ammodernamento della casa di S. Francesco" localizzato a Loreto, è parzialmente defanziato, a seguito della riduzione del costo stimato da £ 1.000.000.000 a £ 680.000.000 ed il relativo stanziamento è ridotto da £ 400.000.000 a £ 80.000.000, con un'economia pari a £ 320.000.000.

E' assentita la richiesta di incremento della quota di cofinanziamento, proposto dal titolare dell'intervento n. 3373, "Ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio destinato all'accoglienza dei pellegrini" localizzato a Nova Ponente, a parità di costo, con equivalente riduzione della quota di finanziamento ex lege n. 270/97, per un importo di £ 1.329.000.000

E' assentita la richiesta di incremento della quota di cofinanziamento, proposto dal titolare dell'intervento rubricato con n. 5954, "Restauro conservativo delle superfici esterne ed interne della chiesa cattedrale" di Brescia, e del conseguente aumento del costo dell'intervento, ed è disposta la riduzione della assegnazione finanziaria ex lege n. 270/97 nella misura di £ 67.080.000, quale importo differenziale dell'intervenuto ribasso d'asta;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le risorse disponibili sono, pertanto, determinate in complessive £ 26.717.932.360, pari alla somma dei seguenti importi:

£ 530.172.360	Risorse nella disponibilità della Commissione di cui al D. M. 9 febbraio 1999
£ 22.768.000.000	Risorse provenienti da ribassi d'asta e/o economie di stanziamento, di cui al punto 1 della presente deliberazione
£ 516.000.000	Risorse provenienti da definanziamenti totali, di cui ai punti 3 e 4 della presente deliberazione
£ 1.507.680.000	Risorse provenienti da definanziamenti parziali, di cui ai punti 5, 6 e 7 della presente deliberazione
£ 1.396.080.000	Risorse provenienti da definanziamenti parziali, di cui ai punti 8 e 9 della presente deliberazione

L'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi è incaricato di avviare la procedura di contestazione e messa in mora, ai fini dell'eventuale definanziamento ed anche ai sensi dell'art. 7 legge 241/1990, nei confronti dei titolari di interventi per i quali risultano scaduti i termini di cui all'art. 1, co. 4, lettera c) della legge n. 270/97, senza che sia stato comunicato

l'intervenuto affidamento dei lavori né sia stata richiesta l'eventuale proroga di detto termine, nonché nei confronti dei titolari degli interventi sottoelencati, per le motivazioni a latere indicate:

nn. 1172, 1375, 1378, 5147, in quanto hanno comunicato una consistente riduzione della quota di cofinanziamento;

nn. 1589, 3731, per aver richiesto un differimento del termine di cui all'art. 1, co. 4, lettera c) della legge 270/97, tale da ridurre considerevolmente l'originaria previsione dei giorni di lavorazione;

n. 3958, per aver proposto una modifica della tipologia dell'intervento da ricettività a restauro di beni culturali, implicando la mancata realizzazione dei previsti posti letto;

n. 4741, in quanto dalla documentazione in atti si evince che i lavori oggetto dell'intervento sono stati appaltati ed in larga misura ultimati prima della inclusione nel Piano di cui alla legge n. 270/97 e che negli atti deliberativi di approvazione delle aggiudicazioni e dei contratti non si fa alcun riferimento alle risorse di cui alla citata legge;

n. 4739, in quanto, da notizie apparse sulla stampa, la realizzazione di tale intervento potrebbe confliggere con la salvaguardia dei Beni culturali e compromettere la stabilità dei monumenti circostanti.

E' assentita la richiesta del soggetto beneficiario dell'intervento "Ristrutturazione ed ampliamento dell'abbazia di S. Cassiano al fine di consentire l'accoglienza dei pellegrini" rubricato col n. 7394, volta a realizzare 59 posti letto, in luogo dei 71 originariamente previsti, a causa delle sopravvenute prescrizioni della competente Soprintendenza;

E' reinserito nel Piano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 270/97, l'intervento rubricato col n. 4966 "Riqualificazione di area industriale dismessa", di titolarità di un soggetto privato a seguito della pronuncia resa dal TAR competente in sede cautelare e volta a riaprire il procedimento amministrativo per l'acquisizione dei necessari atti autorizzativi;

Sono assentite le richieste di integrazione finanziaria connesse a varianti in corso d'opera, dovute a fatti imprevedibili e imprevedibili relative agli interventi indicati nell'allegato "B", per un importo complessivo pari a £ 26.219.874.193, restando, pertanto, nella disponibilità della Commissione £ 498.058.167.

Sono accorpate in un unico intervento che viene incluso nel Piano col n. 17.729, i 51 interventi indicati nell'allegato "B", di titolarità dell'Ente Poste Italiane, al fine di agevolarne le procedure realizzative.

Sono assentite, altresì, le richieste di disaggregazione relative ad alcuni interventi già inclusi nel Piano, quelle di cambio titolo, di cambio di soggetto beneficiario e quelle attinenti le proroghe di termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97 e sono corretti meri errori materiali relativi alla diversa imputazione delle quote di finanziamento e di cofinanziamento, come indicato nell'allegato "B",

Come previsto dal punto 3 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano di cui all'allegato "A" del D.M. 2. 6. 1998, gli oneri relativi alle attività preliminari e strumentali alla realizzazione dell'intervento, quali la progettazione, ogni tipo di indagine conoscitiva (preventiva o contestuale all'esecuzione), l'espletamento dell'appalto dei lavori e la stesura dei contratti, la predisposizione dei prescritti Piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 494/96, l'esercizio delle funzioni del responsabile del procedimento, di Direttore dei Lavori, di Coordinatore della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, il collaudo ed eventuali studi di impatto ambientale, devono, di norma, essere contenuti nel limite massimo del 10% del costo complessivo dell'opera, salvo particolari situazioni opportunamente

motivate. Ove tali oneri risultino superiori a detta soglia, le relative parcelle Professionali, redatte nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti tariffe, devono essere vidimate dal competente Ordine Professionale. Al fine del contenimento della spesa pubblica, ove la progettazione sia affidata dalla stazione appaltante a più professionisti riuniti in Collegio, secondo la procedura di cui all'art. 7 della Legge 2.3.1949, n. 143, viene riconosciuto il compenso per un solo incarico professionale, rimanendo a carico del soggetto beneficiario gli eventuali, ulteriori compensi. Qualora la progettazione sia stata affidata ad un progettista esterno alla stazione appaltante, ove l'Amministrazione non ritenga di svolgere la Direzione dei Lavori con proprio personale, questa deve essere affidata allo stesso progettista, salvo che per oggettiva e documentata impossibilità. Tenuto conto di quanto stabilito all'art. 4, comma 1, della legge n. 270/97, ove si dà facoltà ai soggetti beneficiari di avvalersi dei Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche in qualità di Stazioni Appaltanti "anche relativamente alla progettazione", il conferimento di incarichi a Società di Servizio per la compilazione dei progetti, per consulenze e per ogni altra attività connessa all'espletamento delle gare ed alla gestione dei lavori deve essere specificatamente ed adeguatamente motivata, ai fini del riconoscimento delle relative spese.

Il punto 10 dell'allegato "A" al D.M. 2.6.1998 viene così modificato:

"10. All'atto della richiesta di erogazione dell'ulteriore somma sino alla concorrenza del 90% dell'importo impegnato dovrà essere inoltrata all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario pubblico o di un suo delegato apposita certificazione dell'avvenuta utilizzazione dell'80% dell'importo erogato ai sensi del punto 8 nella quale siano elencate le spese sostenute suddivise tra lavori, forniture e somme a disposizione con riferimento al Quadro Tecnico Economico acquisito agli atti dell'Ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di spesa. In allegato alla citata certificazione, quale parte integrante, deve essere trasmessa una relazione illustrativa che in riferimento all'elencazione delle spese precisi i titoli di spesa emessi. Per i soggetti beneficiari assimilati alla categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) della legge n. 109/94, come integrata e modificata dalla legge n. 415/98, all'atto della richiesta di erogazione dell'ulteriore somma sino alla concorrenza del 90% dell'importo impegnato dovrà essere inoltrata all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, apposita certificazione dell'avvenuta utilizzazione dell'80% dell'importo erogato, ai sensi del punto 8, nella quale siano elencate le spese sostenute suddivise tra lavori, forniture e somme a disposizione con riferimento al Quadro Tecnico Economico acquisito agli atti dell'Ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di spesa, nonché dichiarazione relativa all'avvenuta verifica del versamento da parte delle Imprese dei

contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla mano d'opera impiegata. Con riferimento all'elencazione riportata nella citata certificazione dovrà essere allegata, in copia conforme, la seguente documentazione:

Lavori:

- certificati di pagamento intestati all'Impresa titolare dell'appalto e relative fatture quietanzate;
- fatture quietanzate relative ad eventuali prestazioni in economia certificate dal Direttore dei Lavori;
- certificati di pagamento intestati ad eventuale impresa sub-appaltatrice e relative fatture con allegato il contratto di subappalto e la connessa autorizzazione della stazione appaltante;

Espropri:

- contratto di acquisto od altro titolo ablativo e relativa trascrizione al patrimonio del soggetto beneficiario;
- pagamenti effettuati per l'occupazione e l'indennità di esproprio intestati ai proprietari dei beni;

Forniture:

- Certificato di pagamento intestato al fornitore e relative fatture quietanzate;
- Certificato di collaudo qualora la fornitura sia stata liquidata in un'unica soluzione;

Rilievi, studi e sondaggi:

- Contratti o lettere d'incarico e relative fatture quietanzate;
- Certificato di regolare esecuzione della prestazione sottoscritto dal Responsabile del procedimento qualora sia stato effettuato il pagamento in un'unica soluzione.

Progettazione :

- Parcella professionale vistata dal competente Ordine Professionale, con esclusione di quelle validate dalle Amministrazioni pubbliche, qualora risulti superata la soglia del 10% di cui al punto 1;
- Convenzione d'incarico o lettera d'incarico;
- Fatture quietanzate del Professionista incaricato.

Altre spese tecniche:

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Parcella professionale sia per il Direttore dei Lavori che per il Coordinatore della Sicurezza vistata dal competente ordine professionale, con esclusione di quelle validate dalle Amministrazioni pubbliche, qualora risulti superata la soglia del 10% di cui al punto 1;

- Convenzione o lettera d'incarico del professionista;

- Fatture quietanzate del Professionista;

- Fatture quietanzate relative alle spese sostenute per la Commissione di gara, per la pubblicazione del Bando, per le spese postali e per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure di aggiudicazione certificate dal responsabile del procedimento;

Ricevute di versamenti effettuati alle Amministrazioni Comunali per il rilascio delle concessioni edilizie o autorizzazioni;

Allacciamenti:

- fatture quietanzate e versamenti effettuati alle aziende comunali o alle società di servizio per contributi o spese di allaccio;

Altro:

Fatture relative ad eventuali prestazioni o lavori specialistici ove sia chiaramente indicato in relazione all'intervento l'oggetto ed il periodo di svolgimento delle attività."

Il punto 11 dell'allegato "A" al D.M. 2.6.1998 viene così modificato:

"11. Le ulteriori somme residue, fino alla concorrenza dell'intero impegno assunto, saranno erogate dall'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi su richiesta del legale rappresentante del soggetto beneficiario pubblico o di un suo delegato, documentata con apposita certificazione nella quale sia dichiarata la conclusione delle procedure di collaudo o di regolare esecuzione. Nella certificazione debbono essere, inoltre, evidenziate le somme non utilizzate dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'intervento, per la conseguente attivazione della procedura di versamento di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'eventuale successiva utilizzazione per le finalità della legge 270/97. Copia conforme dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione per ogni spesa sostenuta per lavori, forniture, prestazioni professionali o specialistiche ed ogni altra attività connessa all'intervento dovranno essere trasmessi all'ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi per la conseguente acquisizione agli atti. Per i soggetti beneficiari assimilati alla categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) della legge n. 109/94, come integrata e modificata dalla Legge n. 415/98, le ulteriori somme residue fino alla concorrenza dell'intero impegno assunto saranno erogate dall'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi su richiesta del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo delegato, documentata con apposita certificazione nella quale sia dichiarata la conclusione delle eventuali procedure di acquisto di immobili o aree attivate e siano elencate tutte le spese sostenute, suddivise tra lavori, forniture e somme a disposizione, con riferimento al Quadro tecnico Economico acquisito agli

atti dell'Ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di spesa. Nella certificazione debbono essere, inoltre, evidenziate le somme non utilizzate dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'intervento per la conseguente attivazione della procedura di versamento di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'eventuale successiva utilizzazione per le finalità della legge 270/97. Alla richiesta vanno, inoltre, allegati in copia conforme i certificati di collaudo o di regolare esecuzione per ogni spesa sostenuta per lavori, forniture, prestazioni professionali o specialistiche ed ogni altra attività connessa all'intervento.

Il punto 6 dell'allegato "A" al D.M. 2 giugno 1998 è sostituito dal seguente:

"6. Sono consentite variate distribuzioni di spesa tra le categorie di lavoro corrispondenti a opere civili, opere impiantistiche, arredi, attrezzature ed altre, nel rispetto del totale complessivo dichiarato, qualora non comportino modifiche sostanziali all'intervento finanziato."

Ad integrazione e modifica del D.M. 2.6.1998 all. "B" ai soggetti ecclesiastici beneficiari degli interventi inclusi nel Piano di cui alla Legge n. 270/97 assimilati alla categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) della Legge n. 109/94, come integrata e modificata dalla Legge 415/98, si applicano tutte le disposizioni della legge ad esclusione di quelle introdotte dagli artt. 7, 14, 19, comma 2 e 2 bis, 27, 32, 33.

Il Segretario
f.to BARBATO

Il Presidente
f.to MICHELI

Deliberazione n. 11 del 19 maggio 1999

COMMISSIONE EX LEGE n. 270/1997

Seduta del 19 maggio 1999

La Commissione ex lege n. 270/1997

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'intervenuta approvazione del quadro tecnico economico di progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto degli interventi di cui all'all. "A" sono risultate necessarie, per la relativa realizzazione, minori occorrenze finanziarie pari ad un ammontare di £ 9.709.000.000;

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi sull'esito della procedura di contestazione e messa in mora anche ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, ai fini dell'eventuale definanziamento degli interventi individuati nella precedente riunione del 4 maggio 1999;

RITENUTO, sulla base delle controdeduzioni acquisite in esito alla procedura di contestazione e messa in mora, di disporre il definanziamento totale per complessive £ 13.824.000.000 degli interventi sottoindicati:

n. 198 - "Costruzione nuovo parcheggio bus turistici" localizzato a Napoli;

n. 1676 - "Parcheggio collegato alla stazione FF.SS. e parcheggio fra via Medici e via del Vascello e relativi servizi" localizzato a Udine;

n. 3958 - "Restauro e riorganizzazione funzionale dei 4 chiostri monumentali del tempio convento di S. Francesco d'Assisi da adibire a ricettività" localizzato a Brescia;

n. 4741 - "Sistemazione percorsi pedonali di congiunzione tra cattedrale Chiesa di S. Sebastiano e punto informazioni multimediale situato nel Palazzo Comunale" localizzato a Massa Marittima;

n. 6523 - "Trasformazione distributiva dell'immobile - struttura ricettiva a basso costo" localizzato a Fabriano.

RITENUTO di concedere ai destinatari della procedura di contestazione e messa in mora, che non abbiano ancora inviato le proprie controdeduzioni, una proroga del termine, a carattere ultimativo, di 10 giorni, per fornire all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi i riscontri richiesti;

RITENUTO di prendere atto delle rinunce a realizzare gli interventi rubricati con i nn. 3362 "Opere relative al restauro dell'antico complesso architettonico" localizzato a Venezia, e 1313, "Opere di restauro ed adeguamento

funzionale del Convento S. Maria degli Angeli" localizzato a Montoro Superiore, comunicate dai soggetti titolari degli interventi medesimi, con un complessivo recupero di risorse finanziarie pari a £ 2.863.000.000;

RITENUTO di prendere atto della riduzione del costo dell'intervento rubricato con n. 5147 - "Itinerari religiosi nella Città - riqualificazione del sagrato della Basilica giubilare di S. Lorenzo Maggiore" localizzato a Milano e della relativa diminuzione

della quota di cofinanziamento, e di disporre, altresì, la riduzione dell'assegnazione finanziaria ex lege 270/97 nella misura di £ 900.000.000.

RITENUTO di prendere atto della riduzione del costo stimato, con conseguente definanziamento parziale, degli interventi sottoindicati e con un complessivo recupero di risorse finanziarie pari a £ 1.965.000.000:

n. 3018, "Accoglienza ai pellegrini diretti ai sacri monti al santuario ed ai luoghi di culto tradizionali" a Verbania, la cui assegnazione finanziaria ex lege 270/97 è ridotta da £ 1600 milioni a £ 635 milioni, con un'economia pari a £ 965 milioni;

n. 3997, "Casa di accoglienza pellegrini disabili Breda" a Padova, la cui assegnazione finanziaria ex lege 270/97 è ridotta da £ 4 miliardi a £ 3 miliardi, con un'economia pari a £ 1 miliardo;

RITENUTO di dover correggere un mero errore materiale attinente all'importo dell'assegnazione finanziaria ex Legge n. 270/97 dell'intervento "Riqualificazione della struttura Istituto Don Orione appartenente alla Provincia religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo dell'Opera di Don Orione" a Messina, rubricato col n. 616, per la cui realizzazione sono assentite assegnazione £ 7.118.532.000 anziché £ 7.388.532.000, con una economia pari a £. 270 milioni;

RITENUTO di accogliere le richieste di differimento dei termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97, concernenti rispettivamente il perfezionamento degli adempimenti amministrativi ed il completamento degli interventi, in quanto compatibili con la realizzazione degli stessi nel rispetto del termine finale indicato dalla legge;

RITENUTO di cancellare dal Piano su richiesta del soggetto titolare i seguenti interventi, a causa di accertati problemi legati alla realizzazione degli stessi:

n. 6015 - INAIL - Torino

n. 6016 - INAIL - Sarzana

n. 6030 - INAIL - San Benedetto Val di Sambro

n. 7659 - INAIL - Firenze

RITENUTO di includere nel Piano, sulla base delle esigenze strategiche segnalate dall'INAIL, i seguenti interventi:

6024, "Soc. Sparaco Spartaco s.p.a. - Verona;

6032, "Soc. Rover Est s.r.l. ora Pizzarotti Immobiliare s.r.l. - Bologna

6038, "Soc. Grandi Lavori Fincosit s.p.a. - Pisa

RITENUTO di includere nel Piano, sulla base di ulteriori esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano medesimo, gli interventi indicati nell'allegato "C" per un importo complessivo di £ 24.827.000.000;

All'unanimità

DELIBERA

A seguito dell'approvazione del quadro tecnico economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'all. "A", nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £ 9.709.000.000;

Sono totalmente definanziati, per un ammontare complessivo pari a £ 13.824.000.000, gli interventi sottoindicati e per l'importo a fianco di ciascuno evidenziato:

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- n. 198 - "Costruzione nuovo parcheggio bus turistici" localizzato a Napoli - £ 5.600 milioni;
- n. 1676 - "Parcheggio collegato alla stazione FF.SS. e parcheggio fra via Medici e via del Vascello e relativi servizi" localizzato a Udine - £ 1.400 milioni;
- n. 3958 - "Restauro e riorganizzazione funzionale dei 4 chiostri monumentali del tempio convento di S. Francesco d'Assisi da adibire a ricettività" localizzato a Brescia - £ 3.804 milioni;
- n. 4741 - "Sistemazione percorsi pedonali di congiunzione tra cattedrale Chiesa di S. Sebastiano e punto informazioni multimediale situato nel Palazzo Comunale" localizzato a Massa Marittima - £ 1.120 milioni;
- n. 6523 - "Trasformazione distributiva dell'immobile - struttura ricettiva a basso costo" localizzato a Fabriano. - 1.900 milioni.

Sono concessi ulteriori 10 giorni, a carattere ultimativo, ai destinatari della procedura di contestazione e messa in mora che non abbiano ancora inviato le proprie controdeduzioni all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi.

Sono defINANZIATI totalmente, a seguito della rinuncia al finanziamento espresso dai soggetti titolari e per un ammontare complessivo pari a £ 2.863.000.000, i sottoindicati interventi e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

- n. 1313 "Opere di restauro ed adeguamento funzionale del Convento S. Maria degli Angeli", localizzato a Montoro Superiore - £ 200 milioni
- n. 3362, "Opere relative al restauro dell'antico complesso architettonico" localizzato a Venezia - £ 2.663 milioni.

E' assentita la riduzione del costo dell'intervento rubricato con n. 5147 - "Itinerari religiosi nella Città - riqualificazione del sagrato della Basilica giubilare di S. Lorenzo Maggiore" localizzato a Milano e la relativa diminuzione della quota di cofinanziamento ed è disposto, altresì, il defINANZIAMENTO parziale nella misura di £. 900.000.000 milioni.

Sono parzialmente defINANZIATI, per un ammontare complessivo pari a £ 1.965.000.000, i sottoindicati interventi e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

- n. 3018, "Accoglienza ai pellegrini diretti ai sacri monti al santuario ed ai luoghi di culto tradizionali" a Verbania, la cui assegnazione finanziaria è ridotta da £ 1.600 milioni a £ 635 milioni, con un'economia pari a £ 965 milioni;
- n. 3997, "Casa di accoglienza pellegrini disabili Breda" a Padova, la cui assegnazione finanziaria è ridotta da £ 4 miliardi a £ 3 miliardi, con un'economia pari a £ 1 miliardo.

E' corretto l'errore materiale attinente all'importo dell'assegnazione finanziaria ex Lege n. 270/97 dell'intervento "Riqualificazione della struttura Istituto Don Orione appartenente alla Provincia religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo dell'Opera di Don Orione" a Messina, rubricato col n. 616, per la cui realizzazione sono assentite £ 7.118.532.000 anziché £ 7.388.532.000, con una economia pari a £. 270 milioni;

Le risorse disponibili sono, pertanto rideterminate in complessive £ 30.029.058.167, pari alla somma dei seguenti importi:

£ 498.058.167	Risorse residue nella disponibilità della Commissione
£ 9.709.000.000	Risorse provenienti da ribassi d'asta e/o economie di stanziamento di cui al punto 1 della deliberazione
£ 16.687.000.000	Risorse provenienti da defINANZIAMENTI totali di cui al punto 2 e 4 della presente deliberazione
£ 3.135.000.000	Risorse provenienti da defINANZIAMENTI parziali di cui ai punti 5, 6 e 7 della presente deliberazione

Sono cancellati dal Piano, su richiesta del soggetto titolare e per l'importo a fianco di ciascuno indicato, i seguenti interventi, come indicato nell'allegato "B"

<i>n. 6015- INAIL - Torino</i>	<i>£ 23 miliardi</i>	
<i>n. 6016- INAIL - Sarzana</i>	<i>£ 12 miliardi</i>	
<i>n. 7659 INAIL- Firenze</i>	<i>£ 47 miliardi</i>	
<i>n. 6030 INAIL -San Benedetto Val di Sambro</i>		<i>£ 25 miliardi</i>

Sono inclusi nel Piano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 7, della legge n. 270/97 e sulla base delle esigenze strategiche segnalate dal soggetto titolare l'INAIL, i seguenti interventi, come indicato nell'allegato "B":

- n. 6024, "Soc. Sparaco Spartaco s.p.a. - Verona - £ 40.866 milioni;*
- n. 6032, "soc. Rover Est s.r.l. ora Pizzarotti Immobiliare s.r.l. - Bologna - £ 51.360 milioni;*
- n. 6038, "soc. Grandi Lavori Fincosit s.p.a. - Pisa - £ 49.800 milioni.*

Sono approvati i nuovi termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97, come indicato nell'allegato "B".

Sono inclusi nel Piano, sulla base di ulteriori esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano medesimo gli interventi indicati nell'allegato "C" per un importo complessivo di £ 24.827.000.000; restano pertanto nella disponibilità della Commissione £ 5.201.358.167

*Il Segretario
f.to BARBATO*

*Il Presidente
f.to MICHELI*

Deliberazione n. 12 del 28 luglio 1999

COMMISSIONE EX LEGE n. 270/1997

Seduta del 28 luglio 1999

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel p.i. degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religio-tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;

VISTA la propria deliberazione n. 11/99 del 19 maggio 1999 ed avuto specifico riguardo al punto 12 della stessa nel quale si atto che restano nella disponibilità della Commissione £ 5.201.358.167;

CONSIDERATO che a seguito dell'intervenuta approvazione del quadro tecnico economico di progetto esecutivo e dell'espletamento della gara di appalto degli interventi di cui all'allegato "A" sono risultate necessarie, per la realizzazione, minori occorrenze finanziarie pari ad un ammontare di £ 9.482.353.356

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi sulle procedure di contestazione e messa in mora attivate ai fini dell'eventuale definanziamento di interventi ricompresi nel Piano;

VALUTATE le controdeduzioni del soggetto titolare dell'intervento n. 1678 "Ostello per la gioventù" localizzato a Udine, esito alla contestazione e messa in mora ed all'avviso di avvio di procedimento di definanziamento, anche ai sensi dell'art. 241 della legge 241/1990, e ritenutele insufficienti a superare le ragioni giuridiche e fattuali poste a fondamento della contestazione addebito;

RITENUTO di provvedere al definanziamento degli interventi n. 510 "Scambiatore intermodale catacombe di San Gennaro" e 4732 "Restauro ed adeguamento funzionale della Cattedrale di Catania" per i quali, i rispettivi soggetti titolari nonostante l'ulteriore termine di 10 giorni assegnato dalla Commissione per corrispondere alle contestazioni in ordine al mancato rispetto del termine di cui alla lett. c) art. 1 c.4, della legge n.270/91, non hanno ancora fatto pervenire le relative controdeduzioni, richiesta motivata di proroga del detto termine;

RITENUTO di prendere atto della rinuncia a realizzare l'intervento rubricato con n. 5406 "Centro di accoglienza presso Santuario di S. Maria delle Grazie", localizzato in S. Giovanni Rotondo, comunicata dal soggetto titolare dell'intervento medesimo, con il conseguente recupero di risorse finanziarie pari a £ 600.000.000;

RITENUTO di accogliere le richieste di riduzione del costo di taluni interventi formulata dai rispettivi soggetti titolari a seguito riprogrammazione e di disporre conseguentemente il definanziamento parziale ;

RITENUTO di dover sospendere temporaneamente in via cautelativa, a seguito della recente indagine giudiziaria avviata sull'impiego di fondi pubblici, la statuizione contenuta nella delibera n. 11/99 del 19/5/99, al punto sub 10, nella parte in cui

include nel Piano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 7, della legge n. 270/1997, gli interventi indicati dall'INAIL e rispettivamente rubricati con n. 6032 "Soc. Rover s.r.l. ora Pizzarotti Immobiliare s.r.l.- Bologna" - costo stimato £ 51.360.000.000; n. 6024 "Soc. Sparaco Spartaco Spa - Verona" costo stimato £ 40.866.000.000; n. 6038 "Soc. Grandi Lavori Fincosit Spa - Pisa" costo stimato £ 49.800.000.000 e di darne debita informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, al fine di acquisire indicazioni utili per le proprie definitive determinazioni;

RITENUTO di accogliere la richiesta, in data 12 maggio 1999, con la quale l'INAIL, relativamente agli interventi già ricompresi nel Piano - sulla base di proprie esigenze strategiche - ha comunicato il definitivo importo dei costi di singoli interventi, accertato all'esito delle relative procedure contrattuali, nella misura risultante dall'allegato B;

CONSIDERATO che con la richiamata deliberazione n. 11/99 è stato disposto il definanziamento totale dell'intervento rubricato con n. 1676 concernente "Parcheggio collegato alla stazione FF.SS. e Parcheggio tra via Medici e via del Vascello e relativi servizi", localizzato nel comune di Udine e finanziato con fondi ex lege n. 270/97 per £ 1.400 milioni;

CONSIDERATO che, nelle more del perfezionamento dell'anzidetta statuizione, con successive comunicazioni in atti, il Comune di Udine, soggetto beneficiario dell'intervento succitato, ha rappresentato la possibilità di "modificare le mere modalità costruttive della struttura individuata all'epoca della presentazione della domanda di finanziamento che avevano portato alla redazione del primo cronoprogramma" e pertanto ha proposto un nuovo cronoprogramma rispettoso dei tempi di realizzazione sanciti dalla legge n. 270/1997;

RITENUTO di accogliere il nuovo cronoprogramma proposto dal Comune di Udine per la realizzazione dell'intervento in questione e, pertanto, di reinserire tale intervento nel Piano con l'originario finanziamento di £ 1.400 milioni;

CONSIDERATO che taluni interventi inclusi nel piano e localizzati nella Regione Umbria, espongono a titolo di cofinanziamento risorse finanziarie assentite dalla detta Regione a valere sui fondi ex lege 30 marzo 1998 n. 61;

CONSIDERATO altresì che, a seguito dell'intervenuto espletamento della gara di appalto, sia la Commissione ex lege n. 270/97, che la Regione Umbria hanno acquisito alla propria disponibilità, per intero, le economie rivenienti dalle dette gare, così compromettendo la realizzazione dei relativi interventi;

RITENUTO opportuno riconoscere proporzionalmente alla quota di finanziamento pubblico la corrispettiva quota di recupero delle economie di gara da parte della Regione Umbria e di questa Commissione;

RITENUTO di assentire le richieste di integrazione finanziaria formulate dai titolari di taluni interventi e connesse a varianti in corso d'opera dovute a fatti imprevisi e imprevedibili, o comunque necessarie per la piena funzionalità degli interventi medesimi;

RITENUTO di accogliere le richieste di disaggregazione di alcuni interventi inclusi nel Piano con la contestuale modifica del titolo, al fine di razionalizzarne le procedure realizzative;

RITENUTO di accogliere le richieste di incremento delle quote di cofinanziamento, di cambio di titolo, di riduzione del costo di taluni interventi, di differimento dei termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/97, concernenti rispettivamente il perfezionamento degli adempimenti amministrativi ed il completamento degli interventi, in quanto compatibili con la realizzazione degli stessi nel rispetto del termine finale indicato dalla legge;

RITENUTO di dover procedere alla modifica del punto 5 degli "Indirizzi per l'attuazione finanziaria" di cui all'all. A al D.M. 2 giugno 1998, nella parte relativa al trasferimento delle risorse concernenti l'acquisizione dell'immobile oggetto dell'intervento, in ragione della complessità anche temporale, della conclusione della procedura di trasferimento di proprietà;

All'unanimità

DELIBERA

A seguito dell'approvazione del quadro tecnico economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, si ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'allegato "A", nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £ 9.482.353.356;

Sono totalmente definanziati, a seguito dell'esito negativo del relativo procedimento di contestazione e messa in mora, per ammontare complessivo di £ 7.682.000.000, e per l'importo a fianco di ciascuno indicato, gli interventi:

n. 1678 - "Ostello per la Gioventù"	£	840.000.000
n. 510 - "Scambiatore intermodale Catacombe di San Gennaro"	£	4.500.000.000
n. 4732 - "Restauro ed adeguamento funzionale della Cattedrale di Catania"	£	2.342.000.000

E' definanziato totalmente, a seguito della rinuncia al finanziamento espressa dal soggetto titolare e per un ammontare pari a 600.000.000, l'intervento n. 5406 "Centro di accoglienza presso il Santuario di S. Maria delle Grazie";.

Sono parzialmente definanziati a seguito di riprogrammazione dei rispettivi soggetti titolari e su loro richiesta, i sottoindici interventi, per un ammontare complessivo pari a £ 2.991.521.441:

- n. 928 "Ristrutturazione ed adeguamento Chiesa Convento di S. Maria in Montalto", localizzato a Venosa, il cui stanziamento è ridotto da £ 3.000.000.000 a £ 450.000.000 con un'economia pari a £ 2.550.000.000;
- n. 3224 "Ristrutturazione e completamento funzionale dell'ex asilo di Pitigliano ad uso residenze ricettive a basso costo per bisognosi e scopi sociali", localizzato in Pitigliano, il cui costo è ridotto da £ 1.164.000.000 a £ 883.700.000, ed il cui stanziamento è ridotto da £ 815.000.000 a £ 618.590.000, con economia pari a £ 196.410.000;
- n. 6405 "Copertura in tensostrutture per aree di sosta veicoli leggeri in attesa di imbarco" localizzato in Ancona, il cui costo stimato e stanziamento sono ridotti da £ 800.000.000 a £ 554.888.559, con un'economia pari a £ 245.111.441;

Le risorse disponibili sono, pertanto, rideterminate in complessive £. 25.957.232.964, pari alla somma dei seguenti importi:

£ 5.201.358.167	Risorse residue nella disponibilità della Commissione
£ 9.482.353.356	Risorse provenienti da ribassi d'asta e/o economie di stanziamento di cui al punto 1 della presente deliberazione
£ 7.682.000.000	Risorse provenienti da definanziamenti totali di cui al punto 2 della presente deliberazione
£ 600.000.000	Risorse provenienti da rinunce di cui al punto 3 della presente deliberazione
£ 2.991.521.441	Risorse provenienti da definanziamenti parziali di cui al punto 4 della presente deliberazione

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E' sospesa, in via temporanea e cautelativa, la statuizione di cui al punto 10 della deliberazione n. 11/99, nella parte in cui dispone l'inclusione nel Piano dei seguenti interventi proposti dall'INAIL:

n. 6032, "soc. Rover Est s.r.l. ora Pizzarotti Immobiliare s.r.l. - Bologna -
£ 51.360.000.000;

n. 6024 "Soc. Sparaco Spartaco Spa - Verona" £ 40.866.000.000;

n. 6038 "Soc. Grandi Lavori Fincosit Spa - Pisa" £ 49.800.000.000;

Sono assentite le richieste di integrazione finanziaria connesse a varianti in corso d'opera, dovute a fatti imprevisi e imprevedibili o comunque necessarie per la piena funzionalità degli interventi indicati nell'allegato "B", per un importo complessivo pari a £ 24.131.636.300, restando, pertanto, nella disponibilità della Commissione £ 1.825.596.664;

Sono assentite a taluni interventi localizzati nella Regione Umbria e meglio specificati nell'allegato "B", le integrazioni di finanziamento a latere di ciascuno indicate, a titolo di reintegrazione di quota parte dei ribassi d'asta già erroneamente acquisiti alla disponibilità di questa Commissione, per garantire la piena realizzabilità degli interventi;

Sono assentite le modifiche al Piano concernenti le riduzioni del costo degli interventi, l'incremento delle quote di cofinanziamento e le disaggregazioni, le cancellazioni, le rettifiche per errore materiale, i nuovi termini di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, co. 4, della legge n. 270/1997, come specificato nell'allegato "B".

A parziale modifica del punto 2 della deliberazione n. 11/99 del 19 maggio 1999, è confermata l'inclusione nel Piano dell'intervento proposto dal comune di Udine, contraddistinto con il : prot. 1676 - "Parcheggio collegato alla stazione FF.SS. e Parcheggio tra via Medici e via del Vascello e relativi servizi", con l'originaria assegnazione finanziaria di £ 1.400 milioni e con i seguenti nuovi termini: lett. c) 1° luglio 1999; lett. d) 31 ottobre 1999;

Al punto 5, ultima parte, degli Indirizzi per l'attuazione finanziaria, di cui all'allegato A del DM 2 giugno 1998, le parole: "avvenuto trasferimento della proprietà" sono sostituite con le seguenti: "l'acquisita disponibilità del bene"

*Il Segretario
f.to BARBATO*

*Il Presidente
f.to MICHELI*
