

Il Segretario della Commissione ha affermato inoltre che vi era un margine di incertezza in quei casi in cui la conclusione dell'accordo bonario aveva evidenziato una inefficienza, una irritualità progettuale, un'emergenza, per cui l'opera veniva a costare di più dell'importo originariamente previsto.

Ulteriore problema di ordine generale concerne gli indirizzi attuativi. Nel ringraziare i componenti dell'Ufficio che hanno dato la massima collaborazione con il loro lavoro, ha sottolineato le difficoltà determinate dalla carenza di personale. Ha segnalato, inoltre, che oltre trecento procedure istruttorie di pagamento erano ancora in corso di definizione con la spada di Damocle del 25.11.1999, data in cui la Ragioneria Generale dello Stato chiude i lavori e non registra più i titoli.

Pertanto ha chiesto alla Commissione — anche in considerazione della complessità delle istruttorie per l'erogazione dei fondi — di prevedere che “di norma” il termine entro cui l'Ufficio corrisponde alle istanze è di 30 giorni, in modo da cautelarsi da eventuali richieste di interessi.

Ultima questione di affari generali trattata è stata quella inerente la gestione di ostelli, case per ferie, ecc. La legge n. 270/1997 ha previsto solo la ricettività a basso costo. La Commissione si è pronunciata, all'atto dell'approvazione del decreto sui criteri, riconoscendo la tipologia del basso costo agli alberghi a due stelle, così come sono individuati a livello locale. Si è posto il problema di alcuni soggetti religiosi che hanno realizzato Case per ferie e hanno chiesto di poter attivare una gestione per il tramite di cooperative, senza dare garanzie sull'entità della tariffa applicata da questi soggetti. Il Segretario della Commissione ha proposto di ancorare in ogni caso tali tariffe a quelle degli alberghi a due stelle a livello locale.

Passando alle richieste di modifiche ed integrazioni al Piano, la dott.ssa Barbato preliminarmente ha fatto presente che la Commissione nella sua seconda delibera — nel definire le mete religiose — aveva preso a riferimento le aree dei territori Comunali nelle quali figuravano Santuari o Chiese Cattedrali. Ci si è resi conto che in Umbria, nell'area di Assisi e di Perugia — data anche la significatività della zona legata a S. Francesco e S. Chiara — erano state finanziate anche più di una Chiesa Cattedrale. Invece né a Terni né a Narni era stata finanziata la relativa Chiesa Cattedrale. E' perciò pervenuta all'Ufficio una richiesta della locale Diocesi che chiedeva di finanziare con 300 milioni di lire il completamento dei lavori eseguiti con fondi propri nel Santuario di San Valentino, con speciale riferimento ai lavori di pulitura della facciata della chiesa stessa. La Commissione ha approvato all'unanimità l'inserimento nel Piano di tale intervento di completamento.

Il Segretario della Commissione ha comunicato, quindi, che le risorse complessive nella disponibilità della Commissione erano pari a £. 22.897.000.000.

Le richieste di integrazione di finanziamento ammontano complessivamente a £. 85.000.000.000. L'Ufficio ha ritenuto di dare priorità alle varianti ed ai vincoli di Sopraintendenza ed ha pertanto estrapolato gli interventi contenuti nell'allegato B, che è stato quindi sottoposto all'attenzione della Commissione. Quest'ultima, esaminato l'allegato in parola, ha ritenuto assentibili le integrazioni di che trattasi previa verifica della piena copertura finanziaria delle stesse.

Sulla base delle considerazioni sviluppate dai presenti in riferimento all'illustrazione suddetta, la Commissione ha approvato all'unanimità la deliberazione ed i relativi allegati.

2.3.2. Il D.P.C.M. n. 234/RC del 19.01.2000

Con la legge 16 dicembre 1999, n. 494 sono state varate una serie di "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000".

In particolare, tale legge ha previsto, all'art. 7, co. 4, che il termine della lettera d), dell'art. 1, co. 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270 è prorogato al 31.12.1999.

In ossequio a tale disposizione ed in coerenza con la volontà espressa dalla Commissione che, nella deliberazione 13/99 del 28.10.1999, ha inteso assicurare la realizzazione del maggior numero di interventi compresi nel Piano stabilendone il differimento al 31.12.1999 *sub condizione* dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge di cui sopra, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 19.01.2000, ha approvato il D.P.C.M. n. 234/RC con il quale è stato decretato che: "I termini di cui alla lett. d), dell'art. 1, co. 4, della legge n. 270/1997 relativi agli interventi inclusi nel Piano di cui alla medesima legge, sono differiti al 31 dicembre 1999.

3. LA GESTIONE FINANZIARIA

3.1. Situazione finanziaria del Piano aggiornata al 31 dicembre 1999

Le occorrenze finanziarie per la copertura degli oneri recati dalla legge 270/97, valutate in complessive £. 2.000 miliardi, sono state direttamente stanziare in Bilancio sul capitolo 7902 dello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del successivo trasferimento ai singoli soggetti beneficiari.

Gli stanziamenti statali hanno consentito, attraverso la priorità accordata agli interventi che esprimevano una quota di cofinanziamento, la mobilitazione di ulteriori fonti finanziarie per £. 1.702 miliardi, permettendo l'inserimento nel Piano, ai fini della realizzazione, di opere per un importo complessivo pari a £. 3.566 miliardi.

Di tale stanziamento, £. 1.200 miliardi sono stati stanziati nell'esercizio finanziario 1998, 600 miliardi nell'esercizio finanziario 1999 e 200 miliardi sul bilancio annuale di competenza relativo all'anno 2000.

Come già ricordato, il Piano è stato soggetto ad alcune rimodulazioni a seguito delle quali sono state ridotte le assegnazioni finanziarie degli interventi attivati per un importo corrispondente al ribasso d'asta registrato all'atto dell'aggiudicazione. Con le somme resesi così disponibili sono stati finanziati altri interventi originariamente non inclusi nel Piano. Sono stati inoltre inseriti nel Piano, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della legge n. 270/1997, gli interventi relativi alla costruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, con le corrispondenti assegnazioni finanziarie.


La Commissione di cui al 1° comma dell'art. 2 della citata legge 270/97, ha, quindi, provveduto ad emanare gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano con modalità già definite per l'attuazione del Piano per il Giubileo ex lege n. 651/96 dalla competente Commissione.

I suddetti indirizzi disciplinano i pagamenti così suddivisi:

- anticipazione del 10% per la progettazione, gli studi e le indagini;
- anticipazione del 50% dell'ammontare dell'impegno;
- anticipazione fino alla concorrenza del 90% dell'impegno;
- saldo.

Inoltre, con DM dell'1.6.1999 la Commissione ha modificato ed integrato gli Indirizzi di attuazione finanziaria individuando e meglio specificando la documentazione da allegare alle istanze di erogazione finanziaria, con particolare riferimento alla erogazione fino alla concorrenza del 90% dell'importo impegnato ed alla liquidazione del saldo.

Al fine di poter evadere il gran numero di richieste di erogazione finanziaria pervenute e meglio rappresentate dal grafico di seguito riportato:

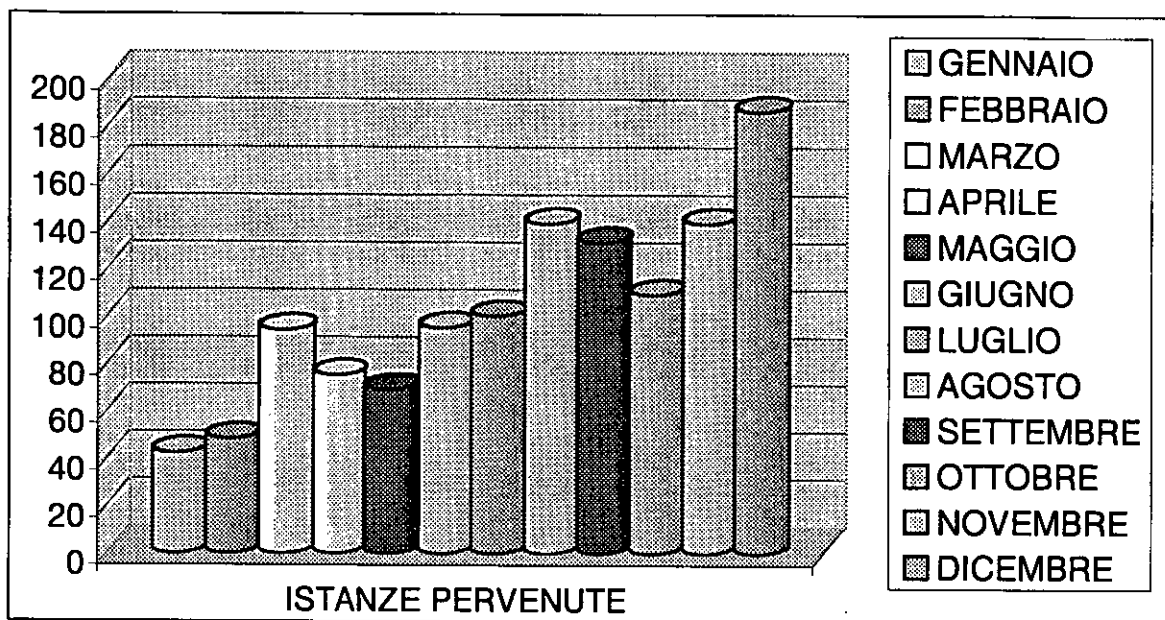

L'Ufficio ha istituito una procedura che prevede le seguenti principali fasi lavorative:

A) Esame preliminare delle istanze pervenute : una volta pervenute al Servizio Finanziario, dopo essere state protocollate, le richieste di erogazione vengono esaminate e classificate. Tale controllo tende soprattutto ad accertare la congruità degli importi richiesti in relazione ai dati economici del Piano evidenziando eventuali anomalie e provvedendo, ove necessario, a comunicare le stesse ai Soggetti beneficiari;

B) Inserimento delle istanze nella banca dati: una volta esaminate e classificate le istanze vengono registrate in una banca dati appositamente predisposta al fine di consentire il controllo delle pratiche lungo tutte le fasi di lavorazione. Dai tabulati infatti è possibile rilevare, tra l'altro, la data di arrivo dell'istanza, il nome del funzionario tecnico al quale è stato assegnato l'intervento, la relativa data di assegnazione e così via fino alla data di trasmissione del decreto all'Ufficio Centrale di Bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questo sistema di analisi e successivo inserimento in banca dati ha permesso di:

- tenere sotto controllo mese per mese la totalità delle istanze pervenute;
- individuare al momento dell'arrivo eventuali anomalie, carenze e urgenze al fine di un tempestivo intervento;

- poter fornire notizie in tempo reale circa lo stato della pratica ai Soggetti beneficiari;
- ottimizzare i tempi di lavorazione.

C) Istruttoria tecnica amministrativa : l'Ufficio, nonostante le note carenze di organico, ha istituito un gruppo di lavoro costituito dai funzionari tecnici in servizio, che, pur mantenendo le funzioni di loro normale competenza, hanno esaminato le varie istanze e redatto le apposite istruttorie tecniche amministrative propedeutiche alla stesura dei decreti di pagamento.

Dette istruttorie consistono:

- 1) nell'esaminare le richieste di erogazione finanziaria unitamente alla congruità e completezza della documentazione prevista dagli indirizzi di attuazione finanziaria. Detto esame non può prescindere da un'analisi dell'intervento nel suo complesso che consideri tutte le eventuali varianti apportate assentite o assentibili dall'Ufficio e le rimodulazioni di Piano che lo riguardano;
- 2) nel comunicare ai soggetti beneficiari eventuali carenze ed anomalie e guidare gli stessi nella risoluzione di eventuali problematiche;
- 3) nel fornire tutti i dati necessari alla successiva fase di decretazione del pagamento.

D) Decretazione: redazione del decreto di impegno e/o pagamento in base alle istruttorie tecniche amministrative ed alla necessaria ricostruzione storica dell'intervento dall'inserimento nel Piano, individuando nel percorso eventuali peculiarità delle quali tener conto nella stesura del decreto. Compito dei funzionari amministrativi addetti a questa fase lavorativa è inoltre quello di interpretazione delle istruttorie e traduzione delle stesse in decreti redatti secondo la normativa di riferimento;

E) Registrazione degli impegni e delle erogazioni : una volta trasmesso il Decreto all'Ufficio Centrale di Bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i relativi importi vengono registrati in un apposito tabulato finanziario che consente di avere l'esatta situazione sia relativa ad ogni singolo intervento che nella sua globalità;


Ad appesantire e rallentare il lavoro dell'Ufficio hanno concorso vari fattori:

- 1) la difficile applicazione della normativa di attuazione finanziaria che, come già evidenziato, è stata più volte integrata e modificata;
- 2) la presenza di molti soggetti beneficiari privati o pubblici di piccole dimensioni, non abituati ad affrontare problematiche inerenti le procedure tecniche amministrative pubbliche (parrocchie, piccoli comuni ecc.). Questo ha comportato soprattutto una notevole difficoltà nel completare la documentazione necessaria che ha costretto i funzionari tecnici a contattare più volte ogni soggetto beneficiario sia telefonicamente che a mezzo fax e dare loro continue ed approfondite spiegazioni;

- 3) l'istituzione del mandato informatico che attualmente consente una maggiore velocità di erogazione dei pagamenti ma che nel corso dell'anno ha comportato un rallentamento dovuto ai normali tempi di perfezionamento della nuova procedura;
- 4) la concentrazione delle richieste di erogazione per tutto l'arco dell'anno da parte della totalità dei soggetti beneficiari;
- 5) le perizie di variante con le conseguenti modifiche dei quadri tecnici economici che hanno comportato la necessità di una verifica di congruità rispetto ai precedenti;
- 6) le modifiche di piano quali per esempio le integrazioni finanziarie e le disaggregazioni. Le prime hanno comportato la necessità di provvedere ad ulteriori pagamenti o, in alcuni casi, hanno reso l'istruttoria più complessa;
- 7) l'avvicinarsi della scadenza dei termini prorogati con la legge n. 494/99 al 31.12.1999 che ha reso necessaria un supplemento di istruttoria atta a verificare la credibile ultimazione degli interventi oggetto di erogazione finanziaria entro i termini suddetti.

Seguendo le procedure indicate nei cennati indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano nel corso dell'anno, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi ha attivato finanziamenti attraverso l'emanazione a favore dei relativi soggetti beneficiari di n. 980 decreti di impegno per £. 1.437,6 miliardi e di n. 1288 titoli di pagamento per complessive £. 1.021,8 miliardi.

Per meglio rappresentare quanto sopra indicato, si è predisposto un apposito grafico di seguito riportato:

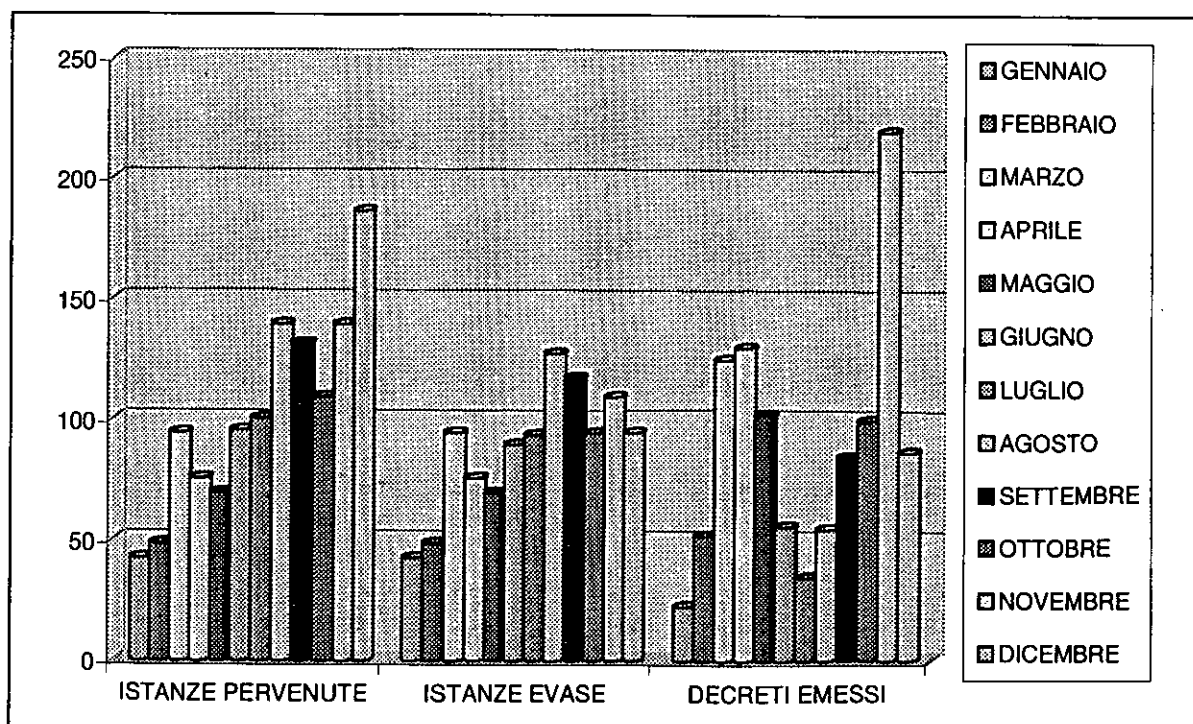

Sono state inoltre trasferite, con variazioni compensative di bilancio, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge del 7 agosto 1997, n. 270, risorse finanziarie ammontanti a £. 204,2 miliardi nello Stato di previsione dei seguenti Ministeri:

Ministero per le Attività Culturali:	189 miliardi di lire
Ministero degli Interni:	11,6 miliardi di lire
Ministero delle Finanze:	1,1 miliardi di lire
Ministero dei Trasporti:	0,8 miliardi di lire
Ministero di Grazia e Giustizia:	1,5 miliardi di lire
TOTALE:	204,2 miliardi di lire

Vengono di seguito riportate le tabelle relative alla situazione finanziaria del Piano aggiornata al 31.03.1999, al 30.06.1999, al 30.09.1999 ed al 31.12.1999.

TAV. I (situazione finanziaria al 31 marzo 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	677.439.078.398
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	857.399.078.398
Pagamenti	362.190.046.665
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	542.150.049.665

TAV. II (situazione finanziaria al 30 giugno 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.079.380.955.691
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.281.977.955.691
Pagamenti	582.397.763.915
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	784.994.763.915

TAV. III (situazione finanziaria al 30 settembre 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.242.888.278.632
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.446.125.278.632
Pagamenti	734.533.939.986
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	937.770.939.986

TAV. IV (situazione finanziaria al 31 dicembre 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.242.888.278.632
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.447.125.278.632
Pagamenti	1.021.868.392.042
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.226.105.392.042

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



Data Inizio: 06/02/97

Data Finale: 31/12/99

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Legge 7 agosto 1997, n. 270 - PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE

Situazione

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
0001	DA - 81 - ED - F	Ambito Nazionale	INFORMAZIONE PER INTERMEDIARI ITALIANI ALL'ESTERO	ENIT	1.500.000.000	1.300.000.000	200.000.000	31/01/99	31/12/00	
0002	DA - 81 - ED - F	Ambito Nazionale	ORIENTAMENTO E PROMOZIONE	ENIT	2.500.000.000	2.500.000.000	0	31/01/99	31/12/00	
0003/ A	DA - 61 - ED - F	Ambito Nazionale	PROMOZIONE DELL'IMMAGINE ITALIA E AZIONI TRASVERSALI DI PROMOZIONE	ENIT	13.450.000.000	12.700.000.000	750.000.000	31/01/99	31/12/00	1° Stralcio
0003/ A	DA - 81 - ED - F	Ambito Nazionale	PROMOZIONE DELL'IMMAGINE ITALIA E AZIONI TRASVERSALI DI PROMOZIONE	ENIT	13.450.000.000	12.700.000.000	750.000.000	31/01/99	31/12/00	1° Stralcio
TOTALE PER L'INTERVENTO										
1018	AA - 11 - GA - M	Benevento	RESTAURO DEL CONVENTO DI S. PASQUALE CON RELATIVA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA	COMUNE DI BENEVENTO	7.715.000.000	7.715.000.000	0	20/08/98	31/10/99	Unica soluzione
1023	AA - 11 - LA - B	Benevento	COMPLESSO BASILICA MADONNA DELLE GRAZIE RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO CON ALLESTIMENTO SALA DEL PELLEGRINO E MUSEO DELL'OPERA	COMUNE DI BENEVENTO	3.499.000.000	3.499.000.000	0	20/08/98	31/10/99	Unica soluzione
10484	AC - 12 - LA - B	Torino	RICOSTRUZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DEL DUOMO E DEL PALAZZO REALE DI TORINO	SOPRINTENDENZA BB AA DEL PIEMONTE	90.048.000.000	90.048.000.000	0			Unica soluzione
1059	AA - 28 - FD - L	Conegliano	LAVORI DI RESTAURO ED ADATTAMENTO DELL'EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEI PELLEGRINI	COMUNE DI CONEGLIANO	5.000.000.000	5.000.000.000	0	03/11/98	31/10/99	Unica soluzione
1088	AE - 25 - EC - F	San Giovanni Rotondo	PREVISIONE PRENOTAZIONE GESTIONE E MONITORAGGIO DEI FLUSSI DEI VISITATORI	SOCIETA' CONS. P. A. VIA SACRA DEL GARGANO	3.133.000.000	2.833.000.000	300.000.000	30/05/99	30/10/99	Unica soluzione
1098	AC - 14 - LA - L	Lecce	RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI ALTARI DELLE NAVATE LATERALI DEL CONTROSOFFITTO LIGNEO LACUNARI DELLE SALE A PIAN TERRENO E DELLE COPERTURE DELLA BASILICA DI S. CROCE	PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA' IN S. CROCE	3.445.232.503	1.117.232.503	2.328.000.000	06/11/98	30/09/99	Unica soluzione
1100	AA - 14 - GA - L	Cavallino	RESTAURO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO DEI PADRI DOMENICANI IN CAVALLINO PER USO RICETTIVO	COMUNE DI CAVALLINO	3.185.823.137	3.036.823.137	149.000.000	02/09/98	29/10/99	Unica soluzione
1028	AD - 23 - LA - M	Padova	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE NONCHE COPERTURE DEI TRANSSETTI E TORRI CAMPANARIE	VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO	37.844.000.000	37.844.000.000	0	15/07/98	08/08/99	1° Stralcio
1028/ A	AD - 23 - LA - M	Padova	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE NONCHE COPERTURE DEI TRANSSETTI E TORRI CAMPANARIE: LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO	VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO	23.015.000.000	23.015.000.000	0	15/07/98	31/10/99	
1028/ B	AD - 23 - LA - M	Padova	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE NONCHE COPERTURE DEI TRANSSETTI E TORRI CAMPANARIE: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RESTAURO ARTISTICO E STRUTTURALE.	VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO	14.829.000.000	14.829.000.000	0	15/07/98	31/10/99	1° Stralcio



RELATIVO A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITA' AL DI FUORI FUORI DEL LAZIO

finanziaria												
ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE	
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC.90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO.50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		AMM. STATO	
0	0	0	940.000.000	470.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.242.590.024	1.121.295.012	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.828.864.325	914.432.160	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	10.700.000.000	5.350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	12.528.864.325	6.264.432.160	0	0	0	0	0	0	0	0
771.500.000	0	771.500.000	4.863.956.814	2.431.978.410	0	0	0	0	0	0	0	0
349.900.000	0	349.900.000	2.519.623.802	1.259.811.900	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.048.000.000	0
0	0	500.000.000	3.433.049.747	1.716.524.870	1.373.219.899	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.927.027.840	963.513.920	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.083.529.084	541.764.540	433.411.633	0	0	0	0	0	0	0
154.000.000	0	154.000.000	2.412.304.894	1.206.152.500	964.921.995	0	0	0	0	0	0	0
3.784.400.000	0	3.784.400.000	19.230.700.000	9.615.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	7.692.280.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	9.111.495.000	4.555.747.500	0	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urgce	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
11028/ B	AD - 23 - LA - M	Padova	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE NONCHÉ COPERTURE DEI TRANSETTI E TORRI CAMPANARIE; COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RESTAURO ARTISTICO E STRUTTURALE.	VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO	14.829.000.000	14.829.000.000	0	15/07/98	31/10/99	1° Stralcio
TOTALE PER L'INTERVENTO										
11080	AA - 26 - IC - M	Concordia Sagittana	SISTEMAZIONE E ARREDO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CATTEDRALE DI CONCORDIA SAGITTARIA AREA SUD	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	7.950.000.000	7.150.000.000	800.000.000	05/12/98	31/10/99	Unica soluzione
1111	AC - 25 - EA - L	Pietrelcina	CENTRO ACCOGLIENZA VISITATORI DI P. PIO DI PIANA ROMANA PIETRELcina	PROV. FOGGIA FRATI MINORI CAPPUCINI	4.400.000.000	3.900.000.000	500.000.000	01/08/98	15/10/99	Unica soluzione
1121	AA - 13 - FD - L	Cattolica	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI	COMUNE DI CATTOLICA	3.353.000.000	1.925.000.000	1.428.000.000	01/12/98	31/10/99	Unica soluzione
1124	AA - 26 - EA - L	Arcugnano	CENTRO ACCOGLIENZA TORRI	COMUNE DI ARCUGNANO	648.000.000	529.000.000	119.000.000	08/06/99	31/10/99	
11243	AC - 14 - GA - B	Lagonero	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO MADONNA DEGLI ANGELI	PARROCCHIA S. NICOLA DI BARI	6.399.832.000	6.399.832.000	0	23/10/98	15/12/99	Unica soluzione
1125	AA - 26 - EA - L	Arcugnano	CENTRO ACCOGLIENZA S. AGOSTINO	COMUNE DI ARCUGNANO	524.000.000	473.000.000	51.000.000	08/06/99	31/10/99	
1132	AC - 26 - EA - L	Cerlone Di Pavia	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E RISTORO	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO	561.347.534	400.000.000	161.347.534	28/10/98	23/10/99	Unica soluzione
1133	AC - 11 - FD - L	Carovigno	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL SANTUARIO MARIA SS. DI BELVEDERE ED AMPLIAMENTO CON NUOVA STRUTTURA RICETTIVA	PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO	1.380.000.000	1.380.000.000	0	10/11/98	30/03/99	Unica soluzione
1136	AA - 14 - FB - L	Bonassola	RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI MONTARETTO	COMUNE DI BONASSOLA	219.000.000	197.000.000	22.000.000	20/10/98	01/09/99	Unica soluzione
1138	AC - 41 - GA - M	Napoli	ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUTIVI DELLA CASA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMPAGNIA DI GESU' DEI PADRI GESUITI	CASA RELIGIOSA DELLA COMP. DI GESU'	3.862.532.572	3.862.532.572	0	08/09/98	30/10/99	Unica soluzione
1139	AC - 11 - GA - M	Capua	RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE ATTRAVERSO ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUTIVI DEL COMPLESSO EPISCOPIO SEMINARIO	SEMINARIO ARCIVESCOVILE CAMPANO	3.668.933.144	3.514.933.144	354.000.000	08/09/98	23/10/99	Unica soluzione
1143	AC - 31 - EC - M	Sant'Anastasia	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E VALORIZZAZIONE DEL CHIOSTRO E DI ALCUNI LOCALI DEL CONVENTO DI MADONNA DELL'ARCO	PROVINCIA SAN TOMMASO D'AQUINO	5.282.000.000	4.782.000.000	500.000.000	10/09/98	30/10/99	Unica soluzione
1149	AC - 25 - GD - M	Foggia	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E AMPLIAMENTI DI EDIFICI SOCIALI DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA POVERA E SERVIZI OPERA DON ORIONE BASILICA SANTUARIO MADRE DIO INCORONATA FOGGIA	PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO OP	998.000.000	998.000.000	0	30/04/99	31/10/99	
1162	AC - 31 - FD - B	Cepesole	COMPLETAMENTO DELL'ANTICA BASILICA	ENTE PROV. NAPOLETANA CONGREGAZIONE	2.904.930.000	2.540.930.000	364.000.000	01/09/98	30/10/99	Unica soluzione
1622	AC - 12 - LA - L	Vercelli	PALAZZO ARCIVESCOVILE DI VERCELLI RESTAURO CONSERVATIVO PER IL RECUPERO DEGLI AMBIENTI DESTINATI ALL'ARCHIVIO CAPITOLARE E BIBLIOTECA E AL MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO	ARCIDIOCESI DI VERCELLI	7.299.256.000	3.979.820.000	33.194.360.001	10/05/97	31/10/99	Unica soluzione
1172	AC - 51 - IA - M	Ancona	LAVORI DI RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI SAN CIRIACO	ARCIDIOCESI ANCONA OSIMO	1.880.000.000	980.000.000	900.000.000	24/03/99	30/10/99	
1177	AA - 31 - EE - M	Napoli	CAMPANIA ANNO SANTO 2000 SEGNALETICA E ITINERARI	REGIONE CAMPANIA	1.180.000.000	1.180.000.000	0	30/09/98	01/10/99	Unica soluzione
1187	AD - 11 - LC - M	Brindisi	RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E ARREDO DELLA SALA CONVEGNI NEL COMPLESSO RELIGIOSO DON BOSCO	ISTITUTO DON BOSCO	1.454.064.000	1.454.064.000	0	30/07/98	25/10/99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE IN UNICA SOLUZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 50%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 50%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
0	0	0	6.534.000.000	3.267.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	15.645.495.000	7.822.747.500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.848.215.982	2.924.107.990	0	0	0	0	0	0	1.100.000.000
0	0	0	3.296.963.390	1.648.481.690	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.703.982.248	851.991.120	0	0	0	0	0	0	0
52.900.000	0	52.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.339.831.969	2.669.915.980	0	0	0	0	0	0	0
47.300.000	0	47.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	397.445.992	198.722.996	0	0	0	0	0	0	0
138.000.000	0	138.000.000	1.242.000.000	621.000.000	496.800.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	188.328.012	94.164.010	0	0	0	0	0	0	0
367.300.000	0	367.300.000	2.972.953.942	1.486.476.970	1.189.181.576	0	0	0	0	0	0
318.400.000	0	318.400.000	2.830.678.417	1.415.339.208	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4.581.257.788	2.290.628.890	1.832.503.110	0	0	0	0	0	0
0	0	0	997.375.900	498.687.950	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.540.768.392	1.270.384.200	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.706.471.645	1.853.235.820	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	979.964.375	489.982.190	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	990.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
169.700.000	0	169.700.000	1.284.364.251	642.182.120	513.745.700	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
1195	AC - 24 - LA - B	Pompei	BASILICA DELLA BEATA VERGINE DI POMPEI PROGETTO DI MANUTENZIONE E RESTAURO	SANTUARIO DELLA BEATA S. M. VERGINE	19.251.000.000	19.251.000.000	0	26/09/98	30/10/99	Unica soluzione
1198	AA - 24 - HA - L	Pompei	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	COMUNE DI POMPEI	1.082.000.000	1.082.000.000	0	11/09/98	30/10/99	
1199	AA - 24 - FB - M	Pompei	TRASFORMAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE IN OSTELLO	COMUNE DI POMPEI	1.540.000.000	1.540.000.000	0	11/09/98	30/10/99	Unica soluzione
1201	AC - 24 - FB - M	Pompei	RESTAURO E RISANAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO E DEGLI ANNESSI FABBRICATI DELL'EX STALLONE	SANTUARIO DELLA BEATA S.M. VERGINE	8.996.000.000	8.996.000.000	0	29/08/98	30/10/99	Unica soluzione
1208	AA - 12 - EA - B	Codigoro	ACCESSIBILITA' SERVIZI RESTAURI ALL'ABBAZIA DI POMPOSA	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI RAVENNA	795.000.000	500.000.000	295.000.000	20/10/98	31/10/99	Unica soluzione
1209	AA - 14 - LA - B	Ferrara	BASILICA DI SANTA MARIA IN VADO COMPLETAMENTO RESTAURO	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI RAVENNA	1.750.000.000	1.000.000.000	750.000.000	01/10/98	31/10/99	Unica soluzione
1211	AA - 26 - LA - B	Rimini	RESTAURI AL TEMPIO MALATESTUANO	SOPRINTENDENZA B.A.A.A. DI RAVENNA	1.300.000.000	1.000.000.000	300.000.000	20/10/98	31/10/99	Unica soluzione
1212	AA - 41 - LA - B	Napoli	RESTAURO DEI MAGGIORI BENI ARTISTICI DELLA BASILICA DI SAN DOMENICO MAGGIORE	FONDO EDIFICI DI CULTO	750.000.000	750.000.000	0	12/11/98	31/10/99	Unica soluzione
1213	AA - 41 - LA - B	Napoli	RESTAURO DEI DIPINTI MURALI DEL CROSTRO MAIOLICATO DI S. CHIARA	FONDO EDIFICI DI CULTO	3.222.000.000	3.222.000.000	0	30/09/98	31/10/99	Unica soluzione
1214	AA - 41 - LA - B	Napoli	RESTAURO E RECUPERO DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO ARMINO	FONDO EDIFICI DI CULTO	2.800.000.000	2.800.000.000	0	30/09/98	31/10/99	Unica soluzione
1217	AA - 11 - LA - M	Mesagne	RESTAURO E RECUPERO DEL SANTUARIO DELLA MISERICORDIA	COMUNE DI MESAGNE	1.099.000.000	849.000.000	250.000.000	09/12/98	30/10/99	Unica soluzione
1218	AA - 11 - FD - M	Mesagne	RESTAURO E RECUPERO CHIESA E CONVENTO DEI CAPPUCINI DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINI CENTRO DOCUMENTAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE	COMUNE DI MESAGNE	3.209.000.000	2.850.000.000	359.000.000	09/12/98	30/10/99	Unica soluzione
1221	AB - 26 - HA - L	Aquileia	SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AGENZIA DI AQUILEIA	POSTE ITALIANE E. P.E. SEDE FRIULI V. G.	30.000.000	30.000.000	0	06/05/99	15/06/99	Unica soluzione
1224	AB - 26 - HA - L	Trieste	SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA DIREZIONE DI FILIALE DI PIAZZA VITTORIO VENETO 1	POSTE ITALIANE E.P.E. SEDE FRIULI V. G.	132.000.000	132.000.000	0	05/12/98	31/10/99	Unica soluzione
1237	AA - 14 - LA - B	Portacomaro	RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA ROMANICA CIMITERIALE DI SAN PIETRO CON REALIZZAZIONE DELLE VIE DI ACCESSO	COMUNE DI PORTACOMARO	731.000.000	731.000.000	0	11/05/99	31/10/99	
1247	AC - 14 - QA - B	Sant'Angelo Dei Lomb.	RICETTIVITA' DIOCESANA IN ALTA IRPINIA	CURIA ARCIVESCOVILE DI S. ANGELO DEI L.	2.094.890.000	1.965.740.000	128.950.000	07/09/98	24/09/99	Unica soluzione
1256	AC - 12 - LA - M	Montjovent	RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO AL BOURG DI MONTJOVET	PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE	600.000.000	500.000.000	100.000.000	20/09/98	20/06/99	Unica soluzione
1257	AA - 12 - FD - L	Etroubles	RESTAURO DI EDIFICIO ESISTENTE PER LA CREAZIONE POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI DORTOIR	COMUNE DI ETROUBLES	413.683.000	190.683.000	223.000.000	12/08/98	15/08/99	Unica soluzione
1264	AC - 26 - FD - M	Portogruaro	ACCOGLIENZA CULTURALE RELIGIOSA NEL COLLEGIO MARCONI	FONDAZIONE COLLEGIO MARCONI	3.850.100.189	2.830.100.189	1.020.000.000	07/07/98	31/10/99	Unica soluzione
1268	AA - 12 - FD - L	Asti	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EXVILLA BADOGLIO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	5.329.328.000	5.293.328.000	36.000.000			
1268	AA - 12 - FD - L	Asti	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EXVILLA BADOGLIO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	5.329.328.000	5.293.328.000	36.000.000			Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
1274	AC - 31 - LA - M	Napoli	ITINERARIO FRANCESCANO BONAVENTURANO ADEGUAMENTO ED ALLESTIMENTO DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE RICETTIVE CULTURALI E SPIRITUALI DEL COMPLESSO CONVENUALE DI S. LORENZO MAGGIORE	PROV. DI NAPOLI DEI FRATI MINORI	2.313.000.000	2.313.000.000	0	30/09/98	25/10/99	Unica soluzione

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DI NATURA TECNICA (PROGETTAZIONI, RILIEVI, ECC)			IMPEGNI DI SPESA	LAVORI O PRESTAZIONI DI SERVIZI			FORNITURA DI BENI			ACQUISIZIONE	EROGAZIONI EFFETTUATE IN UNICA SOLUZIONE AMMI. STATO
ONT IMPEGNI DI SPESA	ONT UFFICI TECNICI	ONT ANTICIP. 10%		LAVORI ACC. 60%	LAVORI ACC. 90%	LAVORI SALDO	FORNITURA ACCO. 60%	FORNITURA ULTERIORE ACCONTO	FORNITURA SALDO		
2.131.900.000	0	2.131.900.000	16.545.411.701	8.272.705.850	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.071.673.060	535.836.530	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.275.400.000	637.700.000	510.160.000	0	0	0	0	0	0
899.600.000	0	899.600.000	6.048.909.731	3.024.454.870	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.822.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000.000
0	0	0	608.051.000	304.025.500	243.220.400	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.736.120.000	868.060.000	694.448.000	0	0	0	0	0	0
3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.200.000	0	13.200.000	112.167.889	56.083.945	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	730.045.276	365.022.635	292.018.110	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.862.985.234	931.492.617	745.194.093	0	0	0	0	0	0
0	0	0	482.950.000	241.475.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	150.682.745	75.341.370	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.241.224.811	1.120.612.410	896.489.924	0	0	0	0	0	0
0	0	0	369.000.000	0	0	0	0	332.100.000	0	0	0
0	0	0	4.893.327.391	2.446.663.690	1.957.330.956	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.262.327.391	2.446.663.690	1.957.330.956	0	0	332.100.000	0	0	0
0	0	0	1.615.624.650	807.812.325	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Prot.	Codice Urge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
1292	AA - 26 - EL - M	Marzabotto	REALIZZAZIONE DELLA SEDE E DELLA FORESTIERIA DELLA SCUOLA DI PACE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE TRAMITE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO COLONICO IN LOCALITA' S. MARTINO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA	1.861.713.000	1.861.713.000	0	10/09/98	31/10/99	Unica soluzione
13058	AA - 14 - EC - L	Alessandria	REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DI ACCOGLIENZA DI S. MARIA DI CASTELLO	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	4.878.884.402	3.078.884.402	1.800.000.000	24/09/98	30/10/99	
13058	AA - 14 - EC - L	Alessandria	REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DI ACCOGLIENZA DI S. MARIA DI CASTELLO	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	4.878.884.402	3.078.884.402	1.800.000.000	24/09/98	30/10/99	
TOTALE PER L'INTERVENTO										
1337	AA - 12 - FB - L	Mira	PROGETTO DI RESTAURO E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DISMESSE DI GIARE DA DESTINARE AD OSTELLO	COMUNE DI MIRA	917.000.000	917.000.000	0	05/11/98	31/10/99	
1337	AA - 12 - FB - L	Mira	PROGETTO DI RESTAURO E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DISMESSE DI GIARE DA DESTINARE AD OSTELLO	COMUNE DI MIRA	917.000.000	917.000.000	0	05/11/98	31/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
1339	AA - 26 - FB - B	Noto	RECUPERO DELL'EX CARCERE MANDAMENTALE (GIA' CARCERE REALE) AD USO DI OSTELLO	COMUNE DI NOTO	3.053.000.000	2.053.000.000	1.000.000.000	17/04/99	31/10/99	
1344	AA - 26 - LA - B	Correzzola	RECUPERO CELLERARIA BENEDETTINA DI CORREZZOLA	COMUNE DI CORREZZOLA	2.363.000.000	1.643.000.000	720.000.000	10/10/98	31/10/99	Unica soluzione
1348	AC - 26 - EA - M	Livorno	REALIZZAZIONE DI AREA COPERTA DI ACCOGLIENZA PER LA SOSTA E RISTORO DEI PELLEGRINI E RELATIVI SERVIZI	CONGR. VALLOMBROSANA ORD. S. BENEDETTO	7.814.510.000	5.965.510.000	1.849.000.000	10/07/98	25/10/99	Unica soluzione
1352	AC - 26 - GB - M	Livorno	SOGGIORNO MARIANO MONTEROSO	CONGR. VALLOMBROSANA ORD. S. BENEDETTO	262.000.000	200.000.000	62.000.000	20/01/98	30/11/98	Unica soluzione
1353	AC - 26 - GB - M	Livorno	SOGGIORNO MARIANO ISTITUTO LA MADONNA	CONGR. VALLOMBROSANA ORD. S. BENEDETTO	678.000.000	558.000.000	120.000.000	20/07/98	30/04/99	Unica soluzione
1408	AC - 26 - FA - M	Pescara	RISTRUTTURAZIONE DI UN COMPLESSO RICETTIVO ESISTENTE VILLA IMMACOLATA IN LOCALITA' SAN SILVESTRO DI PESCARA	SEMINARIO ARCIVESCOVILE	4.475.160.000	3.685.682.000	789.478.000	02/10/98	09/10/99	Unica soluzione
1421	AA - 12 - FB - B	Pianello Val Tidone	RESTAURO DELLA ROCCA MUNICIPALE E DI PIAZZA UMBERTO I°	COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE	1.420.492.192	1.205.492.192	215.000.000	29/11/98	30/09/99	Unica soluzione
1432	AA - 23 - HA - M	Padova	COSTRUZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA BASILICA DEL SANTO CON ABBATTIMENTO INTEGRALE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	COMUNE DI PADOVA	2.857.000.000	2.857.000.000	0	30/10/98	30/09/99	
1463	AA - 12 - LA - B	Alzano	RECUPERO DEI COMPLESSI MONUMENTALI IN LOC. CHIARAVALLE DELLA COLOMBA RIUSO DELL'EX DORMITORIO DEI MONACI DELL'ABBAZIA CISTERCENSE A SPAZIO MUSEALE LEGATO ALLA RICETTIVITA'	MINISTERO DELLE FINANZE DIP. TERRITORIO	1.100.000.000	1.100.000.000	0	19/08/98	30/10/99	Unica soluzione
1485	AB - 12 - EL - B	Bobbio	RECUPERO DI AMBIENTI DELL'ANTICA ABBAZIA DI S. COLOMBANO PER IL COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA CITTA'	COMUNE DI BOBBIO	1.778.968.000	1.383.968.000	395.000.000	27/10/98	31/10/99	
1485	AB - 12 - EL - B	Bobbio	RECUPERO DI AMBIENTI DELL'ANTICA ABBAZIA DI S. COLOMBANO PER IL COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA CITTA'	COMUNE DI BOBBIO	1.778.968.000	1.383.968.000	395.000.000	27/10/98	31/10/99	Unica soluzione
TOTALE PER L'INTERVENTO										
1496	AA - 26 - FB - M	Paola	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI PAOLA	2.958.624.000	2.958.624.000	0	26/07/98	31/10/99	Unica soluzione
1499	AA - 14 - IA - B	Ferrara	SISTEMAZIONE DEL MUSEO DELLA CATTEDRALE NELL'EX CHIESA DI S. ROMANO	COMUNE DI FERRARA	2.910.000.000	2.910.000.000	0	31/10/98	31/10/99	Unica soluzione
