

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXLVII
n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

(Al 31 dicembre 1998)

(articolo 4, ultimo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798)

Presentata dal Ministro dei lavori pubblici

(MICHELI)

Trasmessa alla Presidenza il 5 agosto 1999

PAGINA BIANCA

INDICE

1. ATTIVITA' DEL COMITATO DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 24.11.1984, N. 798.....	Pag.	7
2. QUADRO RIEPILOGATIVO DEI FINANZIAMENTI E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZATI DALLA LEGISLAZIONE SPECIALE PER VENEZIA.....	»	19
3. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLO STATO.....	»	24
3.1 Interventi dello Stato in amministrazione diretta.....	»	24
3.2 Interventi in concessione al Consorzio Venezia Nuova.....	»	24
4. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA REGIONE DEL VENETO.....	»	27
5. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.....	»	29
6. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VENEZIA E DEL COMUNE DI CHIOGGIA.....	»	31
7. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI.....	»	36

ALLEGATI:

Allegato n. 1	Quadro riepilogativo dei finanziamenti assegnati.....	Pag.	43
Allegato n. 2	Stato di attuazione al 31.12.1998.....	»	46
Allegato n. 3	Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti.....	»	49
Allegato n. 4	Legge n. 139/92.....	»	50
Allegato n. 5	Legge n. 539/95.....	»	51
Allegato n. 6	Legge n. 515/96.....	»	52
Allegato n. 7	Legge n. 345/97.....	»	53
Allegato n. 8	Legge n. 295/98.....	»	54
Allegato n. 9	Confronto dello stato di attuazione.....	»	55
Allegato n. 10	Stima dello stato di attuazione al 30.06.1999.....	»	56

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

Documento	A	Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato alle Acque - Stato di attuazione degli interventi dello Stato in amministrazione diretta - Aggiornamento al 31 dicembre 1998	»	58
Documento	B	Consorzio Venezia Nuova - Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova – Aggiornamento al 31 dicembre 1998	»	59
Documento	C	Regione del Veneto Interventi per la salvaguardia di Venezia - Prospetto generale e stato degli interventi - Aggiornato al 3 marzo 1999	»	109
Documento	D	Comune di Venezia – Interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna programma e stato di avanzamento – Aggiornato al 31 dicembre 1998	»	211
Documento	E	Comune di Chioggia – Stanziamenti Leggi: 798/84 – 910/86 – 67/88 – 360/91 – 139/92 – 539/95 – 515/96 – 345/97 – 295/98 - Aggiornamento al 31 dicembre 1998	»	311
Documento	F	Università Ca' Foscari di Venezia – Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia - Aggiornamento al 31 dicembre 1998	»	313
Documento	G	Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Stato di attuazione degli interventi - Aggiornamento al 31 dicembre 1998	»	327
Documento	H	SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo – Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale - Aggiornamento al 31 dicembre 1998	»	341

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
RECANTE INTERVENTI PER LA
SALVAGUARDIA DI VENEZIA
(Al 31 dicembre 1998)

PAGINA BIANCA

1. ATTIVITA' DEL COMITATO DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 24.11.1984, N. 798

- 1.1 Il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo, in conformità ai disposti della legislazione speciale per Venezia, ha esercitato ed esercita le funzioni istituzionali seguendo e promuovendo le attività dei vari soggetti attivi nell'attuazione della Legge Speciale, costituendo il punto di riferimento e di coordinamento tra i vari Organismi che operano per la salvaguardia e che rappresentano realtà ed esigenze fortemente diversificate, nonostante perseguano l'unico obiettivo della salvaguardia di Venezia.

Si segnala che, nel corso dell'anno 1998, cioè nel periodo oggetto della presente relazione al Parlamento, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo si è riunito una volta (21 luglio 1998).

I lavori del Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo hanno consentito di sviluppare e di porre in essere alcune fondamentali tematiche riguardanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, permettendo l'assunzione di decisioni di carattere generale e di scelte operative in forma di stretto coordinamento e di cooperazione tra i diversi organismi attivi sul territorio lagunare.

- 1.2 Il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo, attraverso la relazione del Segretario, Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia, ha potuto svolgere la supervisione dei lavori del **"Tavolo di Consultazione e Coordinamento Istituzionale sulle problematiche ambientali della laguna di Venezia"**, costituito nel 1995, nell'ambito del quale, anche nel corso del 1998, è stata svolta una efficace azione di programmazione e verifica delle iniziative intraprese dagli Enti attuatori dei diversi interventi, in modo da assicurarne il massimo grado di coordinamento.

Al gruppo di lavoro, istituito su iniziativa, in particolare, della Regione del Veneto, partecipano i rappresentanti — a livello politico ed a livello tecnico-amministrativo — di tutte le Amministrazioni interessate:

- Magistrato alle Acque di Venezia
- Ministero dell'Ambiente
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- Genio Civile per le Opere Marittime di Venezia
- Regione del Veneto
- Provincia di Venezia
- Comune di Venezia
- Comune di Chioggia
- Autorità Portuale e Capitaneria di Porto di Venezia
- Consorzio Venezia Nuova - Concessionario del Ministero dei Lavori Pubblici
- Magistrato alle Acque di Venezia

Il Presidente della Regione del Veneto ha istituito anche, nel 1996, un Gruppo di Lavoro tecnico-amministrativo di supporto al Tavolo Istituzionale, al fine di rafforzare e dare continuità alle attività del Tavolo. All'organismo tecnico-amministrativo partecipano i rappresentanti tecnici delle amministrazioni di volta in volta interessate; è presieduto dal Magistrato alle Acque che cura anche la segreteria del Tavolo di Coordinamento Istituzionale.

La necessità di istituire un Tavolo Istituzionale di questo tipo è sorta in relazione all'esigenza di sviluppare e applicare sistematicamente, nella maggior misura possibile e nell'ambito delle specifiche rispettive competenze, rapporti di collaborazione tra gli Enti operanti nell'ambito lagunare su argomenti specifici.

Tale esigenza era stata ravvisata da tempo, per esempio, dalla Regione del Veneto, dalle Amministrazioni Comunali di Venezia e di Chioggia e dal Magistrato alle Acque di Venezia al fine di attivare programmi tecnico-progettuali per la realizzazione di alcuni interventi che, pur riguardando competenze di più Amministrazioni, sono strettamente collegati ed interconnessi, tanto da non poter essere eseguiti puntualmente e correttamente se non mediante un'azione integrata e coordinata ed un adeguato cofinanziamento.

Proprio per affrontare e portare a soluzioni efficaci le riferite questioni, nel corso delle riunioni del Tavolo di Coordinamento Istituzionale è stata affermata l'opportunità di sviluppare il rapporto di collaborazione mediante la sottoscrizione di appositi "Protocolli di Intesa" volti a disciplinare l'azione comune dei diversi Enti.

A tali Protocolli sono già seguiti o seguiranno appositi Accordi di Programma da adottare ai sensi della vigente disciplina (L. 142/1990; L. 241/1990 e D.P.R.

20.4.1994 n° 367), sulla cui base possano essere realizzati interventi complessi di interesse comune.

L'attività svolta dal Tavolo di Coordinamento Istituzionale nel 1996 e nel 1997 è stata caratterizzata dalle riunioni del Gruppo di Lavoro di supporto, in cui si è soprattutto cercato di rispondere alle questioni inerenti l'attuazione dell'Ordinanza n. 4498, emanata il 1° ottobre 1996, dal Ministro dell'Ambiente.

Sono stati esaminati i seguenti punti:

- gli obiettivi di qualità per l'ecosistema lagunare formulati dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'IRSA-CNR al Ministero dell'Ambiente e il conseguente aggiornamento dei limiti di accettabilità per gli scarichi reflui in laguna;
- la sistemazione delle discariche e dei siti inquinati da bonificare posti all'interno della conterminazione lagunare o che possono interferire con le acque e i connessi interventi sulle sponde e sui fondali dei canali di Porto Marghera avviati dal Magistrato alle Acque di Venezia;
- le proposte del Ministro dell'Ambiente per opere per la diversione a mare degli scarichi reflui depurati e le linee per l'aggiornamento del Piano Direttore regionale per il disinquinamento della laguna di Venezia e del suo bacino scolante;
- l'ipotesi operativa per permettere l'estromissione dalla laguna del traffico petrolifero di transito e di interventi di bonifica e recupero di aree asservite a questo traffico;
- gli accordi di coordinamento operativo tra Stato, Regione e Comuni e in particolare gli accordi di programma tra Magistrato alle Acque e Comune di Venezia per rii e fognature;
- la realizzazione dell'acquedotto a servizio dell'agricoltura per la zona del Cavallino, che attualmente si alimenta ancora con prelievi dalla falda;
- la realizzazione dei progetti predisposti dalla Capitaneria di Porto di Venezia per incrementare la sicurezza del traffico marittimo in laguna e lungo le rotte di accesso.

Nel corso del 1998, il Tavolo di Coordinamento Istituzionale ha operato mediante riunioni settoriali mirate.

In prosecuzione del lavoro svolto nel 1996 e nel 1997, le Amministrazioni pubbliche, coordinate dal Ministero dell'Industria, insieme con le rappresentanze

sindacali e gli imprenditori, hanno sviluppato un Piano di Coordinamento degli investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti industriali, per il potenziamento delle infrastrutture e per la protezione dell'ambiente, quale contributo al rilancio occupazionale del polo di Porto Marghera.

Il relativo Atto d'Intesa è stato siglato il 9 marzo 1998 e riguarda previsioni di intervento per 4.313 miliardi di lire.

Le previsioni di tale Atto verranno attuate attraverso specifici Accordi di Programma e Contratti di Area.

In particolare, in data 21 ottobre 1998 è stato siglato a Roma l'Accordo di Programma¹ sulla chimica a Porto Marghera (approvato con D.P.C.M. del 12.2.1999) in cui sono affrontate le questioni relative a: *Azioni di risanamento e tutela dell'ambiente* (con riferimento in particolare allo "Scavo di canali", allo "Smantellamento degli impianti di dismissione", alla "messa in sicurezza dei siti e/o bonifica dei siti", alla "Fissazione di limiti per gli scarichi in laguna", alle "Linee guida per la definizione del piano di sicurezza negli ambiti portuali", alla "Riduzione dei rischi nella movimentazione merci", al "Controllo a distanza della movimentazione", all'"Accordo volontario per la certificazione ambientale delle industrie chimiche", al "Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio industriale e delle emergenze", all'"Area ecologicamente attrezzata"); *Investimenti e salvaguardia dell'occupazione*; *Procedure autorizzatorie e Controlli*.

Gli interventi del Magistrato alle Acque e dell'Autorità Portuale di Venezia dovranno pertanto essere attuati secondo un piano concordato da definire entro il 31.12.1999 ed essere accelerati in modo da concludersi entro il 31.12.2005.

Altri Accordi di Programma da stipulare che scaturiscono dall'Atto d'Intesa del 9 marzo 1998 riguardano: la riconversione delle centrali elettriche, l'ottimizzazione delle infrastrutture, l'accordo per la bonifica delle aree e per il sistema di monitoraggio delle emissioni in aria e in acqua, lo snellimento delle procedure.

¹ L'accordo è stato sottoscritto da Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Autorità Portuale, Unindustria di Venezia, Federchimica, Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL (nazionali, regionali e provinciali) EniChem S.p.A., EVC European Vinyls Corporation, Edison Termoelettrica, Elf Atochem, Crion, Sapio, Agip petroli, Esso Italiana, Api, Ausimont, Montefibre, San Marco petroli, Decal, Agip gas, Ambiente S.p.A. Esercizio raccordi ferroviari, Ente Zona industriale di Porto Marghera.

Il Decreto del Ministro dell'Ambiente del giugno 1998 sugli scarichi in laguna di Venezia fornisce un riferimento tecnico essenziale per la programmazione degli interventi oggetto degli Accordi di Programma.

E' indubbio, pertanto, che dal 1995 in poi si sono ottenuti importanti risultati in termini di coordinamento e collaborazione tra i diversi Enti operanti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, anche grazie all'azione costante di supervisione e indirizzo svolta dal Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo.

- 1.3 Anche durante il 1998 è stata assicurata la prosecuzione delle attività di salvaguardia mediante l'assegnazione di un **flusso di finanziamenti** continuativo, benché inferiore al fabbisogno esposto dai vari Enti nei propri piani generali di intervento.

Infatti, come specificato nel capitolo seguente, la Legge Finanziaria per il 1998, n. 450/97 e la seguente Legge di spesa, n. 295 del 3 agosto 1998, hanno autorizzato limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi con decorrenza dal 1999 e di lire 10 miliardi con decorrenza dal 2000 che consentiranno l'attivazione di 240 miliardi circa, portando a **8.450 miliardi circa i finanziamenti totali resi disponibili dallo Stato per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna a partire dal 1984**.

Data l'entità, molto contenuta, dei fondi resi disponibili per le annualità 1999 e 2000, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo, nel proporre l'attribuzione di tali finanziamenti ai diversi Enti, ha ritenuto opportuno favorire, in particolare, lo sviluppo di interventi da parte di Enti normalmente non destinatari di fondi – o di fondi di entità significativa – provenienti dalla Legge Speciale.

Il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ha così rimandato alla Legge Finanziaria per il 1999 la necessità di assicurare continuità all'opera di salvaguardia e alla prosecuzione degli interventi già intrapresi da parte degli altri Enti che possono disporre per le annualità 1999 e 2000 di fondi precedentemente attivati, come evidenziato dal Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nella stessa seduta.

Sulla base della proposta di ripartizione dei fondi operata nel corso della seduta del Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo del 21 luglio 1998, per i fondi relativi alla Finanziaria 1998, in data 9 marzo 1999 è stato emesso il Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che destina i fondi ai vari Enti che potranno così attivare le procedure per il perfezionamento dei contratti di mutuo.

Il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ha seguito poi, attraverso la relazione presentata dal Segretario, l'attuazione degli interventi tramite l'analisi delle cifre impegnate e spese dai vari soggetti destinatari dei fondi, approvando anche la "Relazione al Parlamento" relativa all'anno 1997.

In particolare, per verificare lo **stato di avanzamento degli interventi**, nella seduta del Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo del 1° agosto 1997, era stato richiesto che un apposito Gruppo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri individuasse lo stato di fatto onde consentire, pur in pendenza di determinazioni strategiche importanti, di acquisire indicazioni sul percorso intrapreso e sugli obiettivi prefissati.

Tale gruppo di lavoro, insediato nel novembre del 1997, si è riunito più volte e i risultati degli approfondimenti svolti, esposti nella seduta del Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo del 21 luglio 1998, sono sinteticamente riportati nel Capitolo 2 della presente relazione.

1.4 L'attività del Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo anche nel corso del 1998 è stata caratterizzata dal controllo dello svolgimento dello Studio di Impatto Ambientale del progetto di massima delle opere alle bocche di porto lagunari per la regolazione dei flussi di marea (S.I.A.) e dalla definizione dei termini di svolgimento della successiva procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

Si ricorda che nelle sedute del 4 luglio 1995 e del 12 dicembre 1995, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ha, infatti, stabilito di sottoporre tale progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

In particolare, nella seduta del 4 luglio 1995, il Comitato ha deciso di far assoggettare il progetto di massima delle opere alle bocche di porto alla procedura

per la V.I.A. ricorrendo al modello normativo vigente ma con ulteriori prescrizioni che sono state specificamente indicate nel testo di una apposita delibera del Comitato.

Tali prescrizioni riguardavano tra l'altro:

- l'istituzione di un Collegio di Esperti di livello internazionale (formato da cinque membri nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), destinato ad affiancare la Commissione di V.I.A. del Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda le attività di valutazione dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), da eseguirsi a cura del proponente Magistrato alle Acque di Venezia;
- il contenuto del S.I.A.;
- la definizione dei rischi derivanti dalle acque alte per le città di Venezia e di Chioggia (a cura delle rispettive Amministrazioni comunali sulla base di proprie informazioni e dati e di quelli disponibili presso il Servizio Informativo del Magistrato alle Acque).

E' opportuno ricordare che l'elenco degli ulteriori temi, essi pure oggetto del S.I.A., come indicati nella delibera del Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo, è stato formulato anche sulla base di istanze proposte dall'Amministrazione Comunale di Venezia.

In data 12 dicembre 1995 il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ha assunto ulteriori decisioni in merito alla formazione del Collegio di Esperti di livello internazionale e ai programmi aggiornati del S.I.A. e del completamento della definizione dei rischi per Venezia e Chioggia, fissando il termine entro il quale gli esiti della V.I.A. avrebbero dovuto essere consegnati al Comitato stesso.

Il Magistrato alle Acque e il concessionario Consorzio Venezia Nuova, per rispettare le scadenze di presentazione dei documenti deliberate dal Comitato nella seduta del 12 dicembre 1995, si sono attivati per dare luogo ai relativi adempimenti; le attività relative al S.I.A. sono state avviate nel mese di aprile del 1996.

Il S.I.A., controllato "in itinere" dai competenti organi tecnici del Magistrato alle Acque, è stato regolarmente consegnato dal Consorzio Venezia Nuova al Magistrato alle Acque in data 30 aprile 1997.

L'elaborato — dopo un esame sulla completezza e coerenza con la legislazione vigente in materia di V.I.A., con la legislazione speciale per Venezia e con la delibera del Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nella seduta del 4 luglio 1995 — è stato trasmesso dal Magistrato alle Acque in data 18 giugno 1997 ai destinatari istituzionali ovvero al Ministero dell'Ambiente, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Regione del Veneto.

Si ricorda, infatti, che la normativa vigente (art. 6, Legge n. 349/1996) prevede che il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, esprima il proprio giudizio di compatibilità ambientale del progetto tenendo conto del parere della apposita commissione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del parere della Regione del Veneto il cui territorio è interessato dalle opere progettate.

Copie del S.I.A. sono state trasmesse anche alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia, alla Soprintendenza Archeologica di Padova e all'Amministrazione Comunale di Venezia.

L'annuncio relativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale del Ministro dell'Ambiente e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali è stato pubblicato dal Magistrato alle Acque in data 23 giugno 1997.

Il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, disciplinato dall'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, fissa in 30 giorni il tempo utile per la consultazione del pubblico e in 90 giorni il tempo per la valutazione da parte della Commissione di V.I.A. del Ministero dell'Ambiente.

Il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo, tuttavia, nell'adunanza del 1° agosto 1997, data la particolarità del progetto, ha messo a punto il programma di lavoro "ad hoc" da seguire nelle fasi in cui si articola tale peculiare procedura e ha definito le modalità e i termini di pronuncia del Collegio di Esperti di livello internazionale e della Commissione di V.I.A. del Ministero dell'Ambiente.

Tale programma del Comitato prevedeva che :

- venisse protratta fino al 31 dicembre 1997 la fase di informazione e consultazione del pubblico e di formulazione delle relative osservazioni, iniziata in data 23 giugno 1997;
- il Collegio di Esperti di livello internazionale esprimesse il proprio parere entro il 30 aprile 1998;
- il Collegio di Esperti di livello internazionale, al termine del lavoro, rassegnasse il proprio parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Lavori Pubblici, al Ministro dell'Ambiente e a tutti gli altri componenti del Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo;
- la Commissione di V.I.A. e il Ministro dell'Ambiente comunicassero al Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo il loro parere entro il 30 giugno 1998;
- il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo esprimesse, infine, il proprio parere consultivo sugli esiti della procedura come sopra rappresentata.

Tale procedura è stata recepita dal D.P.C.M. del 27 settembre 1997 mentre le nuove date relative al periodo riservato alla pubblica consultazione del S.I.A. e alla conclusione della V.I.A. sono state recepite dal D.P.R. del 7 agosto del 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1997.

Pertanto, a partire dal mese di settembre del 1997, si sono svolte le attività del Collegio di Esperti di livello internazionale e la fase di istruttoria della Commissione di V.I.A. del Ministero dell'Ambiente.

In particolare, il Collegio di Esperti di livello internazionale e il Gruppo istruttore della Commissione di V.I.A., separatamente, hanno svolto una serie di incontri con i rappresentanti delle istituzioni, degli Enti, delle categorie e delle associazioni veneziane. Hanno anche espressamente richiesto degli incontri con il Magistrato alle Acque insieme con il Consorzio Venezia Nuova e con gli studiosi che avevano collaborato al S.I.A., per avere risposta su specifici aspetti del S.I.A.. Lo svolgimento dell'istruttoria, nel corso del 1998, ha anche comportato una serie di incontri del Magistrato alle Acque e del Consorzio Venezia Nuova con la Regione del Veneto, con l'amministrazione Comunale di Venezia, con l'Autorità Portuale, con il C.N.R., con il Comune di Chioggia; l'organizzazione di un confronto pubblico sul S.I.A. con il Comune di Venezia; la partecipazione ad un seminario sul S.I.A. organizzato dalla Regione del Veneto.

In particolare, la Regione del Veneto ha dato incarico di esaminare il S.I.A. ad una Commissione relatrice composta dai responsabili dei vari Servizi tecnici e amministrativi regionali, che ha emesso un documento approvato dal Consiglio

Regionale in data 26 maggio 1998, mentre il Sindaco di Venezia ha appositamente istituito un "Gruppo di lavoro sul S.I.A." che ha espresso il proprio parere con un documento divulgato nel mese di ottobre del 1997, cui il Magistrato alle Acque ha risposto nel gennaio del 1998.

Nel mese di aprile del 1998, il Collegio di Esperti di livello internazionale ha richiesto una proroga per la consegna della relazione finale, concessa con apposito D.P.C.M. del 29 maggio 1998.

In data 8 luglio 1998, il Collegio ha consegnato il proprio "Rapporto sul progetto di massima degli interventi alle bocche di porto della laguna di Venezia per la regolazione dei flussi di marea" al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici.

Il Rapporto costituisce un giudizio indipendente sul S.I.A. delle opere mobili da parte di personalità di grande rilievo professionale e scientifico, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, economici, idraulici e tecnologici del progetto.

Nella seduta del 21 luglio 1998, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ha preso atto dei documenti emessi dal Comune di Venezia, dal Magistrato alle Acque e dalla Regione del Veneto prima menzionati e ha invitato il prof. Bordeau, coordinatore del Collegio di Esperti di livello internazionale, a esporre i contenuti e le conclusioni del "Rapporto", procedendo nello sviluppo del S.I.A. così come prefigurato dal D.P.C.M. del 27 settembre 1997, mentre il Presidente della Commissione di V.I.A. del Ministero dell'Ambiente, dott.ssa Vittadini, ha informato sull'avanzamento della procedura di V.I.A..

In data 18 settembre 1998, ai sensi dell'art. 29 ter della Legge regionale n. 33/85, così come modificata dalla Legge regionale n. 28/90, la Commissione Tecnica Regionale ha esaminato, a sezioni riunite, la relazione sul S.I.A. predisposta dalla Commissione relatrice appositamente incaricata e ha espresso parere favorevole con considerazioni, osservazioni e raccomandazioni sulla compatibilità ambientale del progetto. Con deliberazione n. 3427 del 22 settembre 1998, la Giunta Regionale del Veneto ha preso atto di tale parere, approvandolo all'unanimità, e lo ha inoltrato, ai sensi della normativa vigente, al Ministro dell'Ambiente.

In data 9 dicembre 1998, è stato emesso il "Parere di compatibilità ambientale della Commissione per le Valutazioni di Impatto Ambientale di cui all'art. 18, comma 5 Legge n. 67/88" relativo agli "interventi alle bocche lagunari per la

regolazione dei flussi di marea – Studio di Impatto Ambientale del progetto di massima” che non considera compatibili, con le attuali condizioni di criticità dell’ecosistema di riferimento, le opere proposte.

In data 10 dicembre 1998, la Direzione generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha espresso il proprio parere favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni.

In data 24 dicembre 1998, il Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ha emesso il proprio decreto che “esprime, allo stato, giudizio di compatibilità ambientale negativo sul Progetto” rendendo comunque possibile un suo riesame alla luce dell’attuazione e della valutazione di alcune attività.

Nel corso del 1998, pertanto, il Collegio di Esperti di livello internazionale e gli Enti istituzionalmente preposti all’espletamento della procedura di V.I.A. hanno espresso i loro pareri formali.

Nella seduta dell’8 marzo 1999, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ha delineato, mediante un’apposita delibera, le modalità di svolgimento e i contenuti di alcune attività di aggiornamento del Piano generale degli interventi e di tematiche specifiche, da effettuarsi entro il 31.12.1999, alla luce delle quali sarà possibile riesaminare il progetto delle opere mobili alle bocche di porto.

Realizzati tali adempimenti, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo emetterà, come previsto dal D.P.C.M. del 27.09.1997, il proprio parere consultivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri cui spetta la decisione definitiva per l’avvio della progettazione esecutiva delle opere alle bocche di porto.

- 1.5 E’ da segnalare che il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ha affrontato anche numerose altre diverse tematiche che si sono presentate nel corso del primo semestre del 1998.

Di particolare rilievo è stata la relazione del Presidente della Regione del Veneto, dott. Galan, che ha presentato nella seduta del 21 luglio 1998 l’aggiornamento del **“Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia”** di

competenza della Regione del Veneto, adottato dalla Giunta Regionale in data 2 aprile 1998.

Esso costituisce uno dei documenti cui fare riferimento per la definizione complessiva delle strategie da adottare e delle attività di coordinamento tra Enti da promuovere per sviluppare uno dei più importanti obiettivi di salvaguardia.

Infine, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nella stessa seduta del 21 luglio 1998, ha esaminato alcune tematiche specifiche quali:

- la costituzione del Consorzio per la gestione del Centro di Coordinamento delle attività di ricerca inerenti la salvaguardia della laguna veneziana — **CO.RI.LA** (Consorzio tra Università di Venezia Ca' Foscari, IUAV, Università di Padova e CNR);
- la presentazione di due proposte di legge per la **modifica della Legge Speciale**;
- la verifica delle strategie e delle modalità di interventi per l'**area dell'Arsenale a Venezia**, area dove potrebbero svilupparsi numerose iniziative di tipo privato;
- le necessità di un finanziamento specifico per **interventi di tutela e conservazione del patrimonio archeologico lagunare**.

2. QUADRO RIEPILOGATIVO DEI FINANZIAMENTI E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA LEGISLAZIONE SPECIALE PER VENEZIA

2.1 Come già accennato nel Capitolo 1, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo, nella seduta del 1° agosto 1997, aveva ravvisato la necessità di procedere alla valutazione dell'attuale stato di attuazione delle iniziative intraprese per la salvaguardia di Venezia.

Ciò al fine di poter invocare, eventualmente, misure specifiche per attivare e utilizzare al meglio i finanziamenti resi disponibili, dato il consistente sforzo finanziario sostenuto dallo Stato per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e il significativo lasso di tempo intercorso dalla disponibilità dei primi finanziamenti.

E' stato, pertanto, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito Gruppo di Lavoro, insediatosi nel mese di novembre del 1997.

Il gruppo di lavoro, che si è riunito tre volte da novembre 1997 a giugno 1998, ha svolto un esame preliminare sullo stato di attuazione delle attività ritenendo, peraltro, indispensabile attendere il parere del Collegio di Esperti di livello internazionale e della Commissione di V.I.A. del Ministero dell'Ambiente per delineare un quadro generale che tenga conto anche della problematica principale costituita dalla difesa dalle acque alte.

Il Gruppo di lavoro ha comunque espresso alcune significative considerazioni:

- alla luce delle diverse attività intraprese dai vari Enti competenti, è **necessario garantire la continuità dei flussi finanziari** adottando, inoltre, un percorso normativo che semplifichi l'iter per la disponibilità dei fondi stanziati dalle varie Leggi finanziarie;
- si può rilevare un certo **ritardo nella capacità di spesa da parte di alcuni Enti**, imputabile alle complesse procedure burocratiche da osservare e che si svolgono con tempi che rallentano l'avvio dei lavori;
- è **necessario garantire un effettivo coordinamento tra i diversi Enti** operanti nell'ambito della salvaguardia;
- è essenziale **garantire una continuità alle attività di manutenzione della struttura veneziana** per le sue caratteristiche del tutto peculiari.

2.2 Nell'*Allegato n. 1* è riportato il *quadro riepilogativo dei finanziamenti assegnati complessivamente ai diversi Enti competenti in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna dalla legislazione speciale per Venezia dal 1984 a oggi* (Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti; Legge n. 139/92; Legge n. 539/95; Legge n. 515/96; Legge n. 345/97; Legge n. 295/98).

Poiché la Legge n. 345/97 permette di attivare i finanziamenti a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998 e la Legge n. 295/98 permette di attivare i finanziamenti a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999 e dal 2000, il quadro dei finanziamenti distingue gli *importi complessivamente assegnati dagli importi effettivamente disponibili nel corso del 1998*.

Nell'*Allegato n. 2* è riportato sinteticamente lo *stato di attuazione al 31 dicembre 1998* degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna finanziati mediante la legislazione speciale per Venezia, riportando per ciascun Ente gli *importi assegnati e gli importi spesi* relativamente agli interventi di propria competenza *con riferimento ai soli importi effettivamente disponibili nel corso del 1998* (Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti; Legge n. 139/92; Legge n. 539/95; Legge n. 515/96; Legge n. 345/97 per la parte a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1° gennaio 1998).

Viene riportato nelle tabelle successive il *quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti* con l'indicazione delle somme assegnate, impegnate e spese per ciascuna Legge :

- *Allegato n. 3 - Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti;*
- *Allegato n. 4 - Legge n. 139/92;*
- *Allegato n. 5 - Legge n. 539/95;*
- *Allegato n. 6 - Legge n. 515/96;*
- *Allegato n. 7 - Legge n. 345/97;*
- *Allegato n. 8 - Legge n. 295/98.*

Risulta che per tutti gli Enti competenti in materia di salvaguardia, la legislazione speciale per Venezia ha assegnato dal 1984 ad oggi circa 8.450 miliardi, di cui 7.656 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1998. Al 31.12.1998, risultano complessivamente spesi 3.805 miliardi, pari al 50% degli importi effettivamente disponibili.

Per singole Leggi:

- la Legge n. 798/84 e le successive Leggi di rifinanziamento (Leggi n. 910/86, n. 67/88, n. 360/91, n. 415/92 e n. 724/94) hanno assegnato 2.197 miliardi, tutti disponibili nel corso del 1998, di cui risultano spesi 1.780 miliardi (81%);
- la Legge n. 139/92 ha assegnato 2.463 miliardi, tutti disponibili nel corso del 1998, di cui risultano spesi 1.584 miliardi (64%);
- la Legge n. 539/95 ha assegnato 550 miliardi, tutti disponibili nel corso del 1998; di questi risultano spesi 179 miliardi (33%);

- la Legge n. 515/96 ha assegnato un importo complessivo stimato pari a 1.938 miliardi circa. Tale somma viene reperita mediante i contratti di finanziamento da stipularsi a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997 e dal 1998 di importo pari, rispettivamente, a 125 e a 60 miliardi. La maggior parte degli Enti autorizzati dalla Legge a sottoscrivere i contratti di finanziamento aveva già formalizzato nel corso del 1996 i contratti a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997.

I contratti di finanziamento a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998 potevano essere sottoscritti dai diversi Enti a partire dal secondo semestre del 1997. Pertanto, nel corso del 1998 sono risultati disponibili tutti i fondi reperiti a valere sui limiti di impegno finanziati dalla Legge n. 515/96. Di questi risultano spesi 244 miliardi (13 %).

- la Legge n. 345/97 ha assegnato un importo complessivo stimato pari a 1.062 miliardi circa. Tale somma viene reperita mediante i contratti di finanziamento da stipularsi a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998 e dal 1999 di importo pari a 50 miliardi per ciascun anno, accantonati dalla Legge Finanziaria per il 1997, n. 662/96.

Gli Enti autorizzati dalla Legge a sottoscrivere i contratti di finanziamento potevano formalizzare i contratti a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998 già alla fine del 1997, mentre i contratti di finanziamento a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999 potevano essere sottoscritti dai diversi Enti a partire dal secondo semestre del 1998.

Gli importi effettivamente disponibili nel corso del 1998, pertanto, sono quelli attivati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1° gennaio 1998 e sono pari a 509 miliardi circa.

Di questi risultano spesi solo 18 miliardi (4%) nel corso del 1998, cosa che si giustifica tenendo conto dei tempi necessari per destinare, impegnare e spendere le somme rese disponibili nel corso dello stesso anno da parte dei diversi Enti;

- la **Legge n. 295 del 3 agosto 1998** ha assegnato un importo complessivo stimato pari a 240 miliardi circa. Tale somma viene reperita mediante i contratti di finanziamento da stipularsi a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999 e dal 2000 di importo pari a 10 miliardi per ciascun anno, accantonati dalla Legge Finanziaria per il 1998, n. 450/97.

Il Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, che ripartisce i fondi sulla base di quanto proposto dal Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nella seduta del 21 luglio 1998, è stato emesso in data 9 marzo 1999.

Pertanto, nessun importo proveniente dalla Legge n. 295/98 era disponibile nel corso del 1998.

L'Allegato n. 9 riporta il confronto dello stato di attuazione delle somme spese tra la situazione al 31.12.1997 riportata nella precedente "Relazione al Parlamento" datata luglio 1998 e la situazione aggiornata al 31.12.1998 presentata in questo documento. Risulta che nel corso del 1998 vi è stato un incremento di circa il 10% delle somme complessivamente spese.

Si ricorda che la **Legge Finanziaria per il 1999** prevede, per il rifinanziamento della legislazione speciale per Venezia, gli stanziamenti a copertura delle rate di ammortamento dei mutui già perfezionati dai vari Enti nonché, quali limiti di impegno, 70 miliardi con decorrenza dal 1999, 20 miliardi con decorrenza dal 2000 e 30 miliardi con decorrenza dal 2001 che potranno attivare, con il meccanismo dei mutui, **somme per circa 1.440 miliardi circa**, data la situazione particolarmente favorevole per i valori dei tassi di interesse.

La destinazione specifica dei fondi verrà sancita da apposito Decreto del Ministro del Tesoro sulla base della ripartizione che il Comitato di Indirizzo,

Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge 798/84 ha proposto nella seduta dell'8 marzo 1999.

Si segnala la necessità di poter disporre urgentemente di tali fondi per assicurare, almeno in parte, continuità alle attività di salvaguardia intraprese.

La necessità di disporre di fondi adeguati è divenuta particolarmente urgente a seguito anche del verificarsi di **situazioni di emergenza ambientale** in numerosi siti all'interno della conterminazione lagunare, legate soprattutto ad alcune attività produttive di Porto Marghera svoltesi negli anni passati.

Per la bonifica o, per lo meno come primo intervento, per la messa in sicurezza di tali siti, sarebbe necessario, pertanto, lo **stanziamento di fondi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna**, in modo da consentire di fronteggiare le situazioni più urgenti e più pericolose per la salute pubblica.

L'Allegato n. 10 riporta la stima dello stato di attuazione al 30.06.1999.

In tale elaborato si tiene conto anche dei finanziamenti che potranno essere attivati a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla Legge n. 448/98 con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.

L'importo complessivo dei finanziamenti assegnati dal 1984 a oggi è stimato così pari a circa 9.890 miliardi.

Sono stati aggiornati anche i finanziamenti effettivamente disponibili nel 1999. Pertanto, oltre ai finanziamenti disponibili nel 1998, si tiene conto delle somme attivabili a valere sui limiti di impegno messi a disposizione dalle Leggi 345/97, 295/98 e 448/98 con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

L'importo dei finanziamenti assegnati e disponibili nel corso del 1999 è stimato così pari a circa 9.170 miliardi.

Si stima, infine, un ulteriore avanzamento delle somme spese al 30.06.1999 pari al 5% portando a circa 4.300 miliardi l'ammontare totale delle somme spese.

3. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLO STATO

3.1 Interventi dello Stato in amministrazione diretta

Gli interventi dello Stato da eseguire in amministrazione diretta previsti dall'art. 3 (lettere a), b), c), e), f), g), h), i), m)) della Legge n. 798/84 riguardano: riequilibrio idrogeologico della laguna; servizio vigilanza ed antinquinamento; marginamenti lagunari; restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico-artistico destinati all'uso pubblico; recupero del complesso edilizio dell'Arsenale; consolidamento di ponti, canali e fondamenta; sistemazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali; restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico; interventi di edilizia universitaria.

Gli importi assegnati dalla Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti ammontano a 330 miliardi di cui 326 (99%) sono stati impegnati per attività relative ai suddetti interventi.

Gli importi spesi, al 31.12.1998, relativamente alla Legge n. 798/84 sono pari a 285 miliardi (86%).

3.2 Interventi in concessione al Consorzio Venezia Nuova

Gli interventi dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova riguardano i seguenti obiettivi, richiamati anche dall'art. 3 lettere a), c), d), e l) della Legge n. 798/84 e art. 2, 1° comma lettera a) della Legge n. 360/91 : riequilibrio idrogeologico della laguna e arresto ed inversione del processo di degrado del bacino lagunare; opere di regolazione delle maree; difesa dalle acque alte degli abitati insulari; rinforzo dei moli foranei alle tre bocche di porto; marginamenti lagunari; opere portuali marittime a difesa dei litorali; sostituzione del traffico petrolifero in laguna; apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree.

Il Consorzio Venezia Nuova a valere sui finanziamenti resi disponibili dalla Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti, ha sottoscritto dal 1985 al 1992 otto Convenzioni, sei con il Magistrato alle Acque e due con il Genio Civile Opere Marittime. Gli importi assegnati e resi disponibili dalla suddetta Legge ammontano a 778 miliardi, tutti impegnati nelle suddette Convenzioni e Atti

Aggiuntivi a tali Convenzioni. Tali atti sono già tutti registrati da parte della Corte dei Conti e quindi risultano operativi a tutti gli effetti.

Gli importi spesi relativamente alla Legge n. 798/84 sono pari a 774 miliardi (99%) al 31.12.1998.

Il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla Legge n. 139/92 con decorrenza dal 1993 e dal 1994, ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo e successivi atti aggiuntivi che hanno reso disponibili 970 miliardi al 31.12.1998. Con tali somme sono state sottoscritte due Convenzioni e alcuni Atti Aggiuntivi alle convenzioni stesse, per un importo complessivo di 970 miliardi (100% dell'importo effettivamente disponibile). Gli importi spesi relativamente alla Legge n. 139/92 sono pari a 819 miliardi (84% degli importi disponibili) al 31.12.1998.

Il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla Legge n. 539/95 con decorrenza dal 1996 e dal 1997, ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo che hanno reso disponibili 233 miliardi. Con tali somme sono state sottoscritte, nel corso del 1996, due Convenzioni con il Magistrato alle Acque e due atti aggiuntivi alle Convenzioni originarie, per un importo complessivo di 233 miliardi (100% dell'importo effettivamente disponibile). Gli importi spesi al 31.12.1998 relativamente alla Legge n. 539/95 sono pari a 71 miliardi circa (31% degli importi disponibili).

A valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla Legge n. 515/96 con decorrenza dal 1997, il Consorzio Venezia Nuova ha stipulato con gli istituti finanziatori un contratto di mutuo che ha reso disponibili 500 miliardi. Con tali somme è stata sottoscritta in data 18.12.1996 con il Magistrato alle Acque una nuova Convenzione (la 11^a) di importo pari a 500 miliardi. Tale Convenzione è divenuta operativa nel mese di luglio del 1997 con la registrazione da parte della Corte dei Conti. Inoltre, nel mese di luglio 1997, il Magistrato alle Acque ha sottoscritto con il Consorzio Venezia Nuova una ulteriore Convenzione, di importo pari a 200 miliardi, a valere sul contratto di mutuo perfezionato dal concessionario in data 1° luglio 1997 relativamente ai limiti di impegno con decorrenza dal 1998; essa è stata registrata alla Corte dei Conti in data 10.09.1997 ma è divenuta operativa a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1998.

Nel corso del 1998, a seguito di revisione del primo contratto di mutuo, è stato possibile reperire ulteriori 102 miliardi con i quali è stato finanziato un atto aggiuntivo alla 11^a Convenzione, il cui schema è stato approvato dall'Amministrazione Concedente nel mese di novembre del 1998. Esso non era ancora operativo alla data del 31.12.1998, per cui esso non risulta tra le somme impegnate al 31.12.1998.

Gli importi spesi al 31.12.1998 relativamente alla Legge n. 515/96 sono pari a 106 miliardi (13% degli importi finanziati), data la recente operatività delle Convenzioni.

Infine, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla Legge n. 345/97 con decorrenza dal 1998, il Consorzio Venezia Nuova ha stipulato con gli istituti finanziatori un contratto di mutuo che ha reso disponibili 160 miliardi. E' stata successivamente sottoscritta in data 23.12.1997 con il Magistrato alle Acque una nuova Convenzione (la 13^a) di importo pari a 160 miliardi, registrata alla Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti in data 24 luglio 1998. Essa, pertanto, risulta operativa dal 2° semestre del 1998.

Inoltre, nel mese di luglio 1998 il Magistrato alle Acque ha sottoscritto con il Consorzio Venezia Nuova una ulteriore Convenzione (la 14^a), di importo pari a 190 miliardi, a valere sul contratto di mutuo perfezionato dal Concessionario in data 1° luglio 1998 relativamente ai limiti di impegno con decorrenza dal 1999; essa è stata registrata alla Corte dei Conti in data 23.09.1998, ma è divenuta operativa a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1999 e, pertanto, non risulta tra gli importi disponibili al 31.12.1998.

Gli importi spesi al 31.12.1998 relativamente alla Legge n. 345/97 sono pari a 11 miliardi circa (7% degli importi effettivamente disponibili nel corso del 1998), data la recente operatività della Convenzione.

La Legge n. 295/98 non ha destinato finanziamenti al concessionario dello Stato, Consorzio Venezia Nuova.

Pertanto, il totale degli importi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia al 31 dicembre 1998 per la realizzazione degli interventi in concessione al Consorzio Venezia Nuova è di 3.133 miliardi, di cui 2.943 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1998.

Al 31.12.1998 risulta speso il 60% degli importi effettivamente disponibili reperiti a valere sulle Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96 e sulla recente Legge n. 345/97.

4. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA REGIONE DEL VENETO

Gli interventi della Regione del Veneto di cui alla Legge n. 798/84, Legge n. 360/91 e n. 139/92 riguardano in particolare gli interventi in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento del territorio dei comuni della gronda lagunare e del bacino scolante nella laguna di Venezia anche mediante la realizzazione di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario nonché di impianti di depurazione; opere di ristrutturazione dell'ospedale dei SS. Giovanni e Paolo; realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia secondo un progetto integrato, in accordo con il Comune di Venezia, finalizzato alla manutenzione dei rii cittadini.

Gli importi assegnati dalla Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti ammontano a 531 miliardi, di cui 509 (96%) sono stati impegnati per attività relative ai suddetti interventi.

Gli importi spesi relativamente alla Legge n. 798/84 sono pari a 265 miliardi (50%) al 31.12.1998.

La Regione del Veneto, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla Legge n. 139/92 con decorrenza dal 1993, dal 1994, dal 1995 e dal 1996 (i limiti di impegno con decorrenza dal 1994, infatti, autorizzati per la Regione del Veneto, sono stati rimodulati dal Decreto Legge n. 659 del 30 novembre 1994 spostandone in parte la decorrenza al 1995 e al 1996) ha sottoscritto contratti di mutuo con gli istituti finanziatori per un importo totale pari a 670 miliardi.

Di tali somme, in base all'art. 3 della Legge n. 139/92, una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione del Veneto è stata destinata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato rii.

Pertanto, i finanziamenti attivabili per interventi della Regione del Veneto ammontano a 603 miliardi relativamente ai contratti di mutuo già stipulati.

Sono stati impegnati dalla Regione del Veneto 478 miliardi (79%) e spesi 183 miliardi (30%) al 31.12.1998.

La Regione del Veneto, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla Legge n. 539/95 con decorrenza dal 1996 e dal 1997, ha sottoscritto due contratti di mutuo con gli istituti finanziatori che hanno assegnato 90 miliardi.

Al netto della quota destinata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato rii, in base all'art. 3 della Legge n. 139/92, i finanziamenti attivabili per interventi della Regione del Veneto ammontano a 84 miliardi relativamente ai contratti di mutuo già stipulati.

Tali finanziamenti, tutti disponibili nel corso del 1998, risultano tutti impegnati al 31.12.1998, mentre risultano spesi 9 miliardi (11% degli importi disponibili).

La Regione del Veneto, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla **Legge n. 515/96** con decorrenza dal 1998, ha sottoscritto due contratti di mutuo con gli istituti finanziatori che ha assegnato circa 317 miliardi.

Di tali somme, in base all'art. 3 della Legge n. 139/92, una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione del Veneto è stata destinata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato rii.

Pertanto, i finanziamenti attivabili per interventi della Regione del Veneto a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997 e dal 1998, ammontano a circa 294 miliardi.

Di tali finanziamenti, al 31.12.1998, risultano impegnati 177 miliardi circa, mentre risultano spesi 2 miliardi (1%).

La Regione del Veneto, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla **Legge n. 345/97** con decorrenza dal 1998 e dal 1999, ha potuto attivare due contratti di mutuo che hanno reso complessivamente disponibili circa 263 miliardi, di cui circa 104 miliardi relativi ai limiti di impegno con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

Data la recente disponibilità di tali fondi, nessun importo risulta impegnato e speso al 31.12.1998 relativamente a tale Legge.

La **Legge n. 295/98** non destina finanziamenti alla Regione del Veneto.

Pertanto, il totale degli importi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia al 31 dicembre 1998 per la realizzazione degli interventi di competenza della Regione Veneto è di 1.775 miliardi, di cui 1.616 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1998.

Al 31.12.1998 risulta speso il 28% degli importi effettivamente disponibili reperiti a valere sulle Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96 e sulla più recente Legge n. 345/97.

5. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Gli interventi della Provincia di Venezia riguardano il restauro e il risanamento conservativo del patrimonio di competenza della Provincia nei centri storici di Venezia e Chioggia.

Gli importi assegnati dalla **Legge n. 798/84** e successivi rifinanziamenti ammontano a 3,4 miliardi, tutti impegnati e già spesi per attività relative ai suddetti interventi.

La Provincia di Venezia, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla **Legge n. 139/92** con decorrenza dal 1993 e dal 1994, ha sottoscritto con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo che hanno assegnato 29 miliardi circa. Di tali somme sono stati impegnati 25 miliardi (86%) e spesi 19 miliardi (65%) al 18.02.1998.

La Provincia di Venezia, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla **Legge n. 539/95** con decorrenza dal 1996 e dal 1997, ha sottoscritto con gli istituti finanziatori contratti di mutuo che hanno assegnato un importo pari a 16 miliardi. Di tali somme sono stati impegnati 13 miliardi (81%) e spesi 100 milioni circa al 18.02.1998.

Ai finanziamenti totali indicati sono da aggiungere quelli provenienti dalla **Legge n. 515/96**. Tale Legge autorizza l'accensione di contratti di mutuo a valere sui limiti di impegno quindicennali con decorrenza dal 1997 e dal 1998. I suddetti limiti di impegno, complessivamente, hanno permesso di attivare circa 83 miliardi destinati agli interventi della Provincia di Venezia.

Nel corso del 1998 risultano impegnati tutti gli 83 miliardi, mentre risultano spesi 2 miliardi circa (2% degli importi disponibili) al 18.02.1998.

La **Legge n. 345/97** autorizza l'accensione di contratti di mutuo da parte della Provincia di Venezia a valere sui limiti di impegno quindicennali con decorrenza dal 1998 e dal 1999. I suddetti limiti di impegno, complessivamente, permettono di attivare circa 20 miliardi di cui 13 miliardi sono relativi ai limiti di impegno con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

Data la recente disponibilità di tali fondi, nessun importo risulta impegnato e speso nel 1998 relativamente a tale legge.

La Legge n. 295/98 autorizza l'accensione di contratti di mutuo da parte della Provincia di Venezia a valere sui limiti di impegno quindicennali con decorrenza dal 1999 e dal 2000. Tali limiti di impegno, complessivamente, permetteranno di attivare circa 24 miliardi.

Pertanto, il totale degli importi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia al 31 dicembre 1998 per la realizzazione degli interventi di competenza della Provincia di Venezia è di 175 miliardi, di cui 144 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1998.

Al 18.02.1998 risulta speso il 17% degli importi effettivamente disponibili reperiti a valere sulle Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96 e sulla più recente Legge n. 345/97.

6. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VENEZIA E DEL COMUNE DI CHIOGGIA

Gli interventi del Comune di Venezia e del Comune di Chioggia di cui all'art. 6 della Legge n. 798/84 riguardano: acquisizione, restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza e ad attività sociali, culturali, produttive, artigianali e commerciali; opere di urbanizzazione primaria; sistemazione di ponti, canali e fondamenta di competenza comunale; contributi ai privati per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare; per il Comune di Venezia: acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi; interventi volti alla manutenzione dei rii cittadini e degli edifici su di essi prospicienti secondo un progetto integrato, in accordo con la Regione Veneto.

Per il Comune di Venezia gli importi assegnati dalla Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti ammontano a 395 miliardi, di cui 395 (100%) sono stati impegnati per attività relative ai suddetti interventi.

Gli importi spesi relativamente alla Legge n. 798/84 sono pari a 316 miliardi (80%).

Il Comune di Venezia, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla Legge n. 139/92 con decorrenza dal 1993 e dal 1994, ha sottoscritto due contratti di mutuo con gli istituti finanziatori che hanno assegnato 419 miliardi circa.

I limiti di impegno con decorrenza dal 1994 autorizzati per il Comune di Venezia dalla Legge n. 139/92 sono stati rimodulati dal Decreto Legge n. 659 del 30.11.1994, spostandone in parte la decorrenza al 1995 e al 1996.

Nel corso del 1995 sono stati sottoscritti anche i contratti di finanziamento relativi ai limiti di impegno con decorrenza dal 1995 e dal 1996 mettendo così a disposizione ulteriori 170 miliardi circa, per un importo complessivo assegnato dalla Legge n. 139/92 pari a 589 miliardi circa.

In linea generale, gli importi dei mutui stipulati dal Comune di Venezia a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalle diverse leggi speciali (Leggi n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96 e n. 345/97), indicati dal Comune stesso, non tengono conto della "riserva", cifra prudenziale che viene accantonata nel contratto di mutuo e che verrà resa disponibile solo dopo i primi cinque anni dalla stipula di ogni singolo contratto di mutuo.

Inoltre, come già indicato nel paragrafo relativo alla Regione del Veneto, l'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione del Veneto venga destinata al Comune di Venezia per la **realizzazione del progetto integrato di manutenzione dei rii** e degli edifici su di essi prospicienti.

Pertanto, gli importi totali assegnati al Comune di Venezia dalle diverse Leggi speciali tengono conto anche di tale disponibilità e risultano di conseguenza maggiori degli importi effettivamente attivati dai contratti di mutuo.

Anche gli importi impegnati e spesi dal Comune di Venezia tengono conto di quanto impegnato e speso relativamente ai fondi destinati al Comune dalla Regione del Veneto per il progetto integrato di manutenzione dei rii.

Con tali precisazioni, risulta che complessivamente, relativamente alla Legge n. 139/92, sono stati assegnati e resi disponibili, nel corso del 1998, 697 miliardi, di cui al 31.12.1998 sono stati impegnati 691 miliardi (99%) e sono stati spesi 435 miliardi (62%).

Per il Comune di Venezia, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla **Legge n. 539/95** con decorrenza dal 1996 e dal 1997, sono stati complessivamente assegnati e resi disponibili nel corso del 1998, 144 miliardi, tenendo conto anche delle disponibilità derivanti dalla Regione del Veneto per il progetto integrato di manutenzione dei rii.

Di questi, al 31.12.1998, risultano impegnati 131 miliardi (91%) e risultano spesi 66 miliardi circa (46%).

A valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997 e dal 1998 resi disponibili dalla **Legge n. 515/96**, il Comune di Venezia ha sottoscritto due contratti di mutuo; gli importi complessivamente assegnati e resi effettivamente disponibili relativamente a tale Legge ammontano a 512 miliardi, tenendo conto anche delle disponibilità derivanti dalla Regione del Veneto per il progetto integrato di manutenzione dei rii.

Di questi, al 31.12.1998, risultano impegnati 496 miliardi (97%) e risultano spesi 109 miliardi (21%).

A valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 345/97** con decorrenza dal 1998, il Comune di Venezia ha stipulato nel corso del 1997 con gli istituti finanziatori un contratto di mutuo che ha reso disponibili 160 miliardi. I

finanziamenti a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999 assegnati dalla Legge n. 345/97 al Comune di Venezia sono stati reperiti e formalizzati in data 12 novembre 1998, e sono pari a 140 miliardi. Complessivamente, pertanto, la Legge n. 345/97 ha reso disponibili 300 miliardi di cui 160 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1998.

Il Comune di Venezia ha proceduto alla predisposizione del programma di spesa di tali fondi resi disponibili dalla presente Legge n. 345/97 e ha impegnato 236 miliardi.

Data la recente disponibilità dei fondi, ha speso solo 6 miliardi circa al 31.12.1998.

La **Legge n. 295/98** autorizza l'accensione di contratti di mutuo da parte del Comune di Venezia a valere sui limiti di impegno quindicennali con decorrenza dal 1999 e dal 2000. Tali limiti di impegno, complessivamente, permetteranno di attivare circa 26 miliardi.

Pertanto, il totale degli importi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia al 31 dicembre 1998 per la realizzazione degli interventi di competenza del Comune di Venezia è di 2.075 miliardi, di cui 1.908 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1998.

Al 31.12.1998 risulta speso il 49% degli importi effettivamente disponibili reperiti a valere sulle Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96 e dalla più recente Legge n. 345/97.

Per il Comune di Chioggia gli importi assegnati dalla **Legge n. 798/84** e successivi **rifinanziamenti** ammontano a 62 miliardi, di cui 61 (98%) sono stati impegnati per attività relative ai suddetti interventi.

Gli importi spesi relativamente alla Legge n. 798/84 sono pari a 49 miliardi (80%) al 31.12.1998.

Il Comune di Chioggia, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla **Legge n. 139/92** con decorrenza dal 1993 e dal 1994, ha sottoscritto con gli istituti finanziatori contratti di mutuo che hanno reso disponibili 47 miliardi.

I limiti di impegno con decorrenza dal 1994 autorizzati per il Comune di Chioggia dalla Legge n. 139/92 sono stati rimodulati dal Decreto Legge n. 659 del 30.11.1994, spostandone in parte la decorrenza al 1995 e al 1996.

Pertanto sono stati sottoscritti altri due contratti di finanziamento che hanno permesso di disporre complessivamente con la Legge n. 139/92 di 69 miliardi circa.

Di tali somme, al 31.12.1998, sono stati impegnati 69 miliardi (100%) e sono stati spesi 35 miliardi (51%).

Il Comune di Chioggia, a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla **Legge n. 539/95** con decorrenza dal 1996 e dal 1997, ha sottoscritto con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo che hanno assegnato 28 miliardi, tutti impegnati al 31.12.1998. Di questi, al 31.12.1998 risulta speso circa 1 miliardo (3%).

A valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997 e dal 1998 resi disponibili dalla **Legge n. 515/96**, il Comune di Chioggia ha sottoscritto due contratti di mutuo; gli importi complessivamente assegnati e resi effettivamente disponibili nel corso del 1998 relativamente a tale Legge ammontano a 90 miliardi.

Di questi, al 31.12.1998, risultano impegnati 90 miliardi (100%) e risulta speso 1 miliardo (2%), data la recente disponibilità dei fondi.

Relativamente alla **Legge n. 345/97**, il Comune di Chioggia ha stipulato con gli istituti finanziatori il contratto di mutuo a valere sui limiti di impegno quindicennali con decorrenza dal 1998 che ha reso disponibili 19 miliardi.

Nel corso del 1998 ha stipulato anche il contratto di mutuo a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1° gennaio 1999 di importo pari a 27 miliardi.

Pertanto, la Legge n. 345/97 ha reso disponibili 46 miliardi di cui 19 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1998, dei quali ha impegnato il 100% e ha speso 1 miliardo.

Infine, la **Legge n. 295/98** autorizza l'accensione di contratti di mutuo da parte del Comune di Chioggia a valere sui limiti di impegno quindicennali con decorrenza dal 1999 e dal 2000. Tali limiti di impegno, complessivamente, permetteranno di attivare circa 4 miliardi.

Pertanto, il totale degli importi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia al 31 dicembre 1998 per la realizzazione degli interventi di competenza del Comune di Chioggia è di 299 miliardi, di cui 268 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1998.

Al 31.12.1998 risulta speso il 33% degli importi effettivamente disponibili reperiti a valere sulle Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96 e dalla più recente Legge n. 345/97.

7. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Per gli interventi di competenza di **altre Amministrazioni** (Università degli Studi Ca' Foscari, Istituto Universitario Architettura Venezia, Ministero Università Ricerca Scientifica e Tecnologica, Procuratoria di S. Marco, Autorità Portuale già Provveditorato al Porto, Fondazione Querini Stampalia, Aeroporto Marco Polo, Ministero del Tesoro, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, CO.R.I.LA., Diocesi Patriarcato di Venezia, Biennale di Venezia) **il totale degli importi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia al 31 dicembre 1998 è di 661 miliardi, di cui 445 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1998.**

Al 31.12.1998 risulta speso da tali Enti il 53% degli importi effettivamente disponibili reperiti a valere sulle Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96 e dalla più recente Legge n. 345/97.

Di seguito si evidenziano i finanziamenti e gli importi spesi di competenza di ogni singola Amministrazione:

Università degli Studi Ca' Foscari

Gli interventi di competenza dell'Università degli Studi Ca' Foscari riguardano l'acquisizione e il restauro di sedi universitarie, l'informatizzazione dell'Ateneo e la creazione di biblioteche informatiche.

Il totale dei finanziamenti assegnati all'Università degli Studi Ca' Foscari al 31.12.1998 è di 195 miliardi (Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96, n. 345/97 e n. 295/98), di cui 143 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1998; gli importi spesi ammontano a 61 miliardi (pari cioè al 43% degli importi disponibili).

Istituto Universitario Architettura Venezia

Gli interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura riguardano l'acquisizione e il restauro di sedi per lo svolgimento delle attività dell'Istituto.

Il totale dei finanziamenti assegnati all'Istituto Universitario Architettura Venezia al 31.12.1998 è di 92 miliardi (Leggi n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96, n. 345/97 e n. 295/98), di cui 58 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1998; gli importi spesi ammontano a 35 miliardi (pari cioè al 60% degli importi disponibili).

Ministero Università Ricerca Scientifica e Tecnologica

Gli interventi di competenza del Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica riguardano lo svolgimento del programma di ricerca e studi sul "Sistema lagunare veneziano" che coinvolge CNR, Università di Padova, Università di Venezia, Istituto di architettura di Venezia, UNESCO.

Il totale dei finanziamenti assegnati al Ministero Università Ricerca Scientifica e Tecnologica al 31.12.1998 è di 20 miliardi (Legge n. 798/84), già tutti effettivamente disponibili nel corso del 1998; gli importi già spesi sono 18 miliardi (pari cioè al 90% degli importi disponibili).

Procuratoria di S. Marco

Gli interventi di competenza della Procuratoria di S. Marco riguardano interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione della Basilica di San Marco.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Procuratoria di S. Marco al 31.12.1998 è di 9 miliardi (Legge n. 798/84), tutti già disponibili e spesi prima del 31.12.1998.

Autorità Portuale già Provveditorato al Porto

Gli interventi di competenza dell'Autorità Portuale già Provveditorato al Porto riguardano il dragaggio di accosti e di canali portuali, consolidamento di banchine, sistemazione di aree portuali.

Il totale dei finanziamenti assegnati all'Autorità Portuale al 31.12.1998 è di 113 miliardi (Leggi n. 798/84, n. 515/96 e n. 295/98), di cui 89 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1998; gli importi già spesi sono 24 miliardi (pari cioè al 27% degli importi disponibili).

Fondazione Querini Stampalia

Gli interventi di competenza della Fondazione Querini Stampalia riguardano attività per l'ampliamento e la funzionalità della sede.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Fondazione Querini Stampalia al 31.12.1998 è di 13 miliardi (Leggi n. 798/84 e n. 295/98), di cui effettivamente disponibili nel corso del 1998, 1 miliardo, già speso prima del 31.12.1998.

Aeroporto Marco Polo

Gli interventi di competenza dell'Aeroporto Marco Polo riguardano l'ampliamento dell'aerostazione, la sistemazione della viabilità, la realizzazione di piste e impianti per voli notturni, di nuovi piazzali per aeromobili e di garage multipiano.

Il totale dei finanziamenti assegnati all'Aeroporto Marco Polo al 31.12.1998 è di 141 miliardi (Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96, n. 345/97 e n. 295/98), di cui 107 miliardi effettivamente disponibili nel corso del 1998; gli importi già spesi sono 71 miliardi (pari cioè al 67% degli importi disponibili).

Ministero del Tesoro

Il totale dei finanziamenti assegnati al Ministero del Tesoro al 31.12.1998 è di 2 miliardi (Legge n. 798/84), già tutti disponibili e spesi prima del 1998.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Gli interventi di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali riguardano il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico-artistico destinati all'uso pubblico.

Il totale dei finanziamenti assegnati al Ministero per i Beni e le Attività Culturali al 31.12.1998 è di 17 miliardi (Legge n. 798/84), tutti disponibili nel corso del 1998; gli importi già spesi sono 16 miliardi (pari cioè al 95% degli importi disponibili).

Consorzio per la gestione del Centro di Coordinamento delle attività di ricerca inerenti la salvaguardia della laguna veneziana – CO.RI.LA.

(Consorzio tra Università di Venezia Ca' Foscari, IUAV, Università di Padova e CNR)

Gli interventi di competenza del CO.RI.LA. riguardano il coordinamento delle ricerche e degli studi scientifici inerenti la laguna di Venezia e la sua salvaguardia.

Il totale dei finanziamenti assegnati al CO.RI.LA. è pari a 12 miliardi (Legge n. 295/98) disponibili a partire dal 1999.

Diocesi Patriarcato di Venezia

Gli interventi di competenza della Diocesi riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle chiese del centro storico veneziano.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Diocesi è pari a di 24 miliardi (Legge n. 295/98) disponibili a partire dal 1999.

Biennale di Venezia

Gli interventi di competenza della Biennale di Venezia riguardano l'allestimento e la gestione di attività culturali di livello internazionale.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Biennale di Venezia è pari a 24 miliardi (Legge n. 295/98), disponibili a partire dal 1999.

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

(10) L'art. 3 della Legge 130/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato per i ri.

(10) L'art. 3 della Legge 130/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato per i ri.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue Allegato n. 1

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
QUADRO RIEPILOGATIVO DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI
CON LE LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI FINANZIAMENTI, 139/92, 339/93, 315/96, 345/97 E 295/98

	LEGGE N. 798/84 E RIFINANZ.		LEGGE N. 139/92		LEGGE N. 339/93		LEGGE N. 315/96		LEGGE N. 345/97		LEGGE N. 295/98		TOTALE GENERALE	
	IMPORTI ASSEGNATI E GIÀ DISPONIBILI	(A)	IMPORTI ASSEGNATI E GIÀ DISPONIBILI	(B)	IMPORTI ASSEGNATI E GIÀ DISPONIBILI	(C)	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI DAL 1996	(D)	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI DAL 1999	(E)	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI DAL 2000	(F)	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI NEL 1998	(G) = A+B+C+D+E+F
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	25.000		34.836		17.089		34.000		10.000		18.000		42.000	194.825
ISTITUTO UNIVERSITARIO ARCHITETTURA VENEZIA	-		20.318		8.955		18.207		10.000		12.000		58.450	92.450
MINISTERO UNIVERSITA' E RIC. SCIENTIFICA	20.000		-		-		-		-		-		20.000	20.000
PROCURATORIA DI SAN MARCO	9.043		-		-		-		-		-		9.043	9.043
AUTORITA' PORTUALE GIÀ PROVVEDITORATO AL PORTO	21.000		-		-		68.000		-		-		89.000	113.000
FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA	1.000		-		-		-		-		6.000		1.000	13.000
AEROPORTO MARCO POLO	2.000		40.000		18.500		36.000		10.000		12.000		106.500	140.500
CONSORZIO CO. R.L.A.	-		-		-		-		-		6.000		-	12.000
DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA	-		-		-		-		-		-		-	24.000
BIENNALE DI VENEZIA	-		-		-		-		-		-		-	24.000
MINISTERO TESORO	2.000		-		-		-		-		-		2.000	2.000
MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI	16.500		-		-		-		-		-		-	16.500
TOTALE PARZIALE	96.543		95.154		44.544		156.207		30.000		90.000		445.318	661.318
TOTALE GENERALE	2.196.556		2.463.298		549.544		1.937.600		553.000		120.000		7.655.868	8.448.868

(*) L'art. 3 della Legge 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato per i ri.

Venezia, 18 giugno 1999

LEGENDA ALLEGATO N. 1

LEGGE N. 798/84 e successivi rifinanziamenti: - IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI: gli importi effettivamente assegnati nei diversi esercizi dalle Leggi n. 798/84, n. 910/86, n. 67/88, n. 360/91, n. 415/92, n. 724/94.

LEGGE N. 139/92: - IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI: gli importi attivati con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1993 e dal 1994.

I limiti di impegno con decorrenza dal 1994 autorizzati per la Regione Veneto, il Comune di Venezia e il Comune di Chioggia sono stati rimodulati dal Decreto Legge 659 del 30 novembre 1994, spostandone in parte la decorrenza al 1995 e/o al 1996.

LEGGE N. 539/95: - IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI: gli importi attivati con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1996 e dal 1997.

LEGGE N. 515/96: - IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI: gli importi attivati con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1997 e dal 1998. Tutti gli Enti nel corso del 1996 e del 1997 hanno sottoscritto, rispettivamente, i contratti di mutuo a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1° gennaio 1997 e dal 1° gennaio 1998. Pertanto i relativi finanziamenti risultano disponibili nel corso del 1998.

LEGGE N. 345/97: - IMPORTI ASSEGNATI TOTALI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1998 e dal 1999.
IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI DAL 1998: quasi tutti gli Enti nel corso del 1997 hanno sottoscritto i contratti di mutuo a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1° gennaio 1998. Pertanto, i relativi finanziamenti risultano disponibili nel corso del 1998.

LEGGE N. 295/98: - IMPORTI ASSEGNATI TOTALI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1999 e dal 2000. Pertanto, i relativi finanziamenti non sono risultati disponibili nel corso del 1998.

Venezia, 18 giugno 1999

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Allegato n. 2

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
STATO DI ATTUAZIONE DEI FINANZIAMENTI
LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI, 139/92, 539/95, 515/96 E 345/97

	LEGGE N. 798/84 E RIF.			LEGGE N. 139/92			LEGGE N. 539/95			LEGGE N. 515/96			LEGGE N. 345/97			TOTALE		
	IMPORTI ASSEGNATE GIÀ DISPONIBILI	IMPORTI SPESI	% (B/A)	IMPORTI ASSEGNATE GIÀ DISPONIBILI	IMPORTI SPESI	% (D/C)	IMPORTI ASSEGNATE GIÀ DISPONIBILI	IMPORTI SPESI	% (F/E)	IMPORTI ASSEGNATE GIÀ DISPONIBILI	IMPORTI SPESI	% (H/G)	IMPORTI ASSEGNATE DISPONIBILI NEL 1996	IMPORTI SPESI	% (L/I)	IMPORTI ASSEGNATE DISPONIBILI	IMPORTI SPESI	% (M) = A+C+E+G+I (N) = B+D+F+H+J (N/N)
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	329.955	284.869	86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329.955	-	329.955	284.869	86%
Requibrio idrogeologico	700	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	700	0	0%
Antiquamento	15.055	7.478	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.055	-	15.055	7.478	50%
Marginalmente laguna	3.842	3.154	82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.842	-	3.842	3.154	82%
Edifici demaniali	150.981	141.313	94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.981	-	150.981	141.313	94%
Arredo	23.917	21.854	91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.917	-	23.917	21.854	91%
Ponti, canali, fondamenta	96.122	78.573	82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.122	-	96.122	78.573	82%
Centri d'acqua	18.226	11.971	66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.226	-	18.226	11.971	66%
Patrimonio mobiliare pubblico	9.026	8.488	94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.026	-	9.026	8.488	94%
Università Architettura	12.086	12.038	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.086	-	12.086	12.038	100%
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO)	778.396	773.610	99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.396	-	778.396	773.610	99%
VENETIA NUOVA	166.664	164.832	99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.664	-	166.664	164.832	99%
Opere alle bocche	30.475	30.400	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.475	-	30.475	30.400	100%
Rafforzamento moli	217.582	215.470	99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.582	-	217.582	215.470	99%
Difesa abitati, regolare e marginalmente	231.101	231.101	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.101	-	231.101	231.101	100%
Morfologia e arretramento degrado	24.998	24.988	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.998	-	24.998	24.988	100%
Servizio informativo	14.365	14.365	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.365	-	14.365	14.365	100%
Auxili alla navigazione	85.393	84.642	99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.393	-	85.393	84.642	99%
Difesa littorali	7.818	7.812	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.818	-	7.818	7.812	100%
Penali e valli da pesca	531.308	265.081	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531.308	-	531.308	265.081	50%
REGIONE VENETO (*)	464.300	239.599	52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464.300	-	464.300	239.599	52%
Disinquinamento	27.000	22.148	82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000	-	27.000	22.148	82%
Opedate SS. Giovanni e Paolo	40.000	3.334	8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000	3.334	8%
Acquedotti	3.400	3.400	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400	-	3.400	3.400	100%
PROVINCIA DI VENEZIA	3.400	3.400	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400	-	3.400	3.400	100%
Restauri patrimonio storico	3.400	3.400	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400	-	3.400	3.400	100%
COMUNE DI VENEZIA	394.885	316.000	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394.885	-	394.885	316.000	80%
Risanamento immobili	313.608	193.670	62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313.608	-	313.608	193.670	62%
Urbanizzazione primaria	46.397	33.051	71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.397	-	46.397	33.051	71%
Contributi a privati	56.000	26.665	48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.000	-	56.000	26.665	48%
Insediamenti produttivi	64.353	44.499	69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.353	-	64.353	44.499	69%
Progetto integrato rti (*)	216.781	136.730	63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.781	-	216.781	136.730	63%
COMUNE DI CHIOGGIA	62.077	49.358	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.077	-	62.077	49.358	80%
Risanamento immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urbanizzazione primaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi a privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infrastrutture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi acquisto 1° casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PARZIALE	2.100.013	1.692.318	81%	2.368.144	1.489.713	63%	503.000	147.516	29%	1.781.993	228.819	12%	456.000	17.775	4%	7.210.550	3.568.151	49%

(*) L'art. 3 della Legge 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato per i ri.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue Allegato n. 2

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
STATO DI ATTUAZIONE DEL FINANZIAMENTO
 LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI FINANZIAMENTI, 139/92, 539/95, 515/96 E 345/97

Importi in Lire milioni

	LEGGE N. 798/84 E RIF.			LEGGE N. 139/92			LEGGE N. 539/95			LEGGE N. 515/96			LEGGE N. 345/97			TOTALE		
	IMPORTI ASSEGNATE DISPONIBILI (A)	IMPORTI SPESI (B)	% (B/A)	IMPORTI ASSEGNATE DISPONIBILI (C)	IMPORTI SPESI (D)	% (D/C)	IMPORTI ASSEGNATE DISPONIBILI (E)	IMPORTI SPESI (F)	% (F/E)	IMPORTI ASSEGNATE DISPONIBILI (G)	IMPORTI SPESI (H)	% (H/G)	IMPORTI ASSEGNATE DISPONIBILI NEL 1998 (I)	IMPORTI SPESI (L)	% (L/I)	IMPORTI ASSEGNATE DISPONIBILI (M) = A+C+E+G (N) = B+D+F+H+L (N/M)	%	
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	25.000	19.367	77%	34.836	34.253	98%	17.089	7.053	41%	34.000	282	1%	31.900	548	0%	142.125	60.955	43%
ISTITUTO UNIVERSITARIO ARCHITETTURA VENEZIA	-	-	-	20.318	20.318	100%	8.955	6.003	67%	18.207	8.977	49%	10.970	0	0%	58.450	35.250	60%
MINISTERO UNIVERSITA' E RIC. SCIENTIFICA	20.000	18.030	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	18.030	90%
PROCURATORIA DI SAN MARCO	9.043	9.043	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.043	9.043	100%
AUTORITA' PORTUALE GIA' PROVVEDITORATO AL PORTO	21.000	21.000	100%	-	-	-	-	-	-	68.000	3.068	5%	-	-	-	89.000	24.068	27%
FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA	1.000	1.000	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	100%
AEROPORTO MARCO POLO	2.000	2.000	100%	40.000	40.000	100%	18.500	18.500	100%	36.000	10.655	30%	10.000	0	0%	106.500	71.155	67%
MINISTERO TESORO	2.000	2.000	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	100%
MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI	16.500	15.629	95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500	15.629	95%
TOTALE PARZIALE	96.543	88.069	91%	95.154	94.571	99%	44.544	31.558	71%	156.207	22.932	15%	51.870	548	0%	445.318	237.130	53%
TOTALE GENERALE	2.196.556	1.780.387	81%	2.463.296	1.584.284	64%	540.544	179.084	33%	1.937.600	243.751	13%	508.870	18.123	4%	7.655.868	3.805.281	50%

Venezia, 18 giugno 1999

LEGENDA ALLEGATO N. 2

Per ogni Legge si fa riferimento ai soli importi effettivamente disponibili nel corso del 1998, così come risultano dalla tabella riportata nell'Allegato n. 1.

Gli IMPORTI SPESI si riferiscono:

- per lo Stato in amministrazione diretta, per il Concessionario dello Stato Consorzio Venezia Nuova, per la Regione Veneto, per i Comuni di Venezia e di Chioggia, per il Ministero Beni Attività Culturali, per l'Università degli studi di Venezia, per l'aeroporto Marco Polo: al 31.12.1998;
- per la Provincia di Venezia, al 18.02.1998;
- per lo IUAV e l'Autorità Portuale, al 31.12.1997.

Venezia, 18 giugno 1999

Allegato n. 3

LEGGE N. 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in lire milioni)

Soggetti	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:				
Stato in amministrazione diretta - dati al 31.12.98	340.914	329.955	326.255	284.869
L. 798/84, art. 3 lett. a) Riequilibrio idrogeologico	700	700	466	0
L. 798/84, art. 3 lett. b) Serv. Antinquinamento	21.685	15.055	13.777	7.478
L. 798/84, art. 3 lett. c) Marginamenti lagunari	6.671	3.842	3.157	3.154
L. 798/84, art. 3 lett. e) Restauro edifici demaniali	150.981	150.981	150.981	141.313
L. 798/84, art. 3 lett. f) Recupero Arsenale	23.917	23.917	23.917	21.854
L. 798/84, art. 3 lett. g) Ponti, canali, fondamenta	96.122	96.122	94.645	78.573
L. 798/84, art. 3 lett. h) Sistemaz. corsi d'acqua	19.726	18.226	18.200	11.971
L. 798/84, art. 3 lett. i) Patrimonio mobiliare pubblico	9.026	9.026	9.026	8.488
L. 798/84, art. 3 lett. m) Università Architettura	12.086	12.086	12.086	12.038
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.98	778.396	778.396	777.936	773.610
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche	166.664	166.664	166.664	164.832
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli	30.475	30.475	30.475	30.400
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.	217.582	217.582	217.122	215.470
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado	231.101	231.101	231.101	231.101
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo	24.998	24.998	24.998	24.988
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione	14.365	14.365	14.365	14.365
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali	85.393	85.393	85.393	84.642
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca	7.818	7.818	7.818	7.812
Altri Enti:	106.543	96.543	96.347	88.069
Autorità Portuale già Provveditorato al Porto	21.000	21.000	21.000	21.000
Ministero Beni Att.Cult. - dati al 31.12.98	16.500	16.500	16.500	15.629
Ministero Industria	10.000	=	=	=
Ministero Ricerca Scientifica - dati al 21.02.97	20.000	20.000	20.000	18.030
Ministero del Tesoro	2.000	2.000	2.000	2.000
Procuratoria di S. Marco	9.043	9.043	9.043	9.043
Università degli Studi - dati al 31.12.98	25.000	25.000	24.804	19.367
Aeroporto Marco Polo	2.000	2.000	2.000	2.000
Fond. Querini Stampalia	1.000	1.000	1.000	1.000
Ministero Ambiente	=	=	=	=
IUAV	=	=	=	=
REGIONE VENETO - dati al 31.12.98	531.300	531.300	508.800	265.081
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b)				
Disinquinamento	464.300	464.300	441.800	239.599
L. 798/84, art. 5 lett. a) - Acquedotti	40.000	40.000	40.000	3.334
L. 798/84, art. 5 lett. b) Osp. SS. Giovanni e Paolo	27.000	27.000	27.000	22.148
PROVINCIA DI VENEZIA - dati al 18.02.98				
L. 67/88, art. 17 com. 12) Restauro patrimonio storico	3.951	3.400	3.400	3.400
COMUNE DI VENEZIA - dati al 30.06.97	394.885	394.885	394.885	316.000
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili				
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria				
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati				
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi				
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture				
L. 360/91, art. 2 lett. d) Contributi acquisto 1^ casa				
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.98	62.077	62.077	61.175	49.358
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili				
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria				
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati				
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture				
L. 360/91, art. 2 lett. d) Contributi acquisto 1^ casa				
TOTALE	2.218.066	2.196.556	2.168.798	1.780.387

NOTE

1) Per i rifinanziamenti della Legge 798/84, sono stati considerati gli importi risultanti dalle successive rimodulazioni e al netto delle riduzioni di cui al D.M. Tesoro n. 114758 del 21.02.1994.

2) IMPORTI IMPEGNATI: - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

Venezia, 18 giugno 1999

Allegato n. 4

LEGGE N. 139/92**Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti**

(importi in lire milioni)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGGE 139/92	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:					
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.98	92.500	970.000	(1) 970.000	970.000	818.559
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		38.565	38.565	38.565	36.727
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli		167.724	167.724	167.724	163.646
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.	67.800	224.040	224.040	224.040	140.741
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		266.928	266.928	266.928	211.376
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		17.996	17.996	17.996	16.289
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione	24.100	15.032	15.032	15.032	15.032
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		234.773	234.773	234.773	229.985
L. 798/84, art. 3 lett. l) Valli da pesca	600	4.942	4.942	4.942	4.763
Altri Enti:	10.500	95.154	95.154	95.154	94.571
Università degli Studi - dati al 31.12.98	4.000	34.836	(1) 34.836	34.836	34.253
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.98	4.000	40.000	(1) 40.000	40.000	40.000
IUAV - dati al 31.12.97	2.500	20.318	(1) 20.318	20.318	20.318
REGIONE VENETO - dati al 31.12.98 (*)					
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento	71.500	603.000	(1) 670.000	478.200	182.635
PROVINCIA DI VENEZIA - dati al 18.02.98					
L. 67/88, art. 17 com. 12) Restauro patrimonio storico	2.500	28.905	(1) 28.905	24.737	18.650
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.98	65.000	697.139	(2) 589.322	691.009	434.615
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili	33.592	313.608		311.332	193.670
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria	4.403	46.397		45.482	33.051
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati	7.345	56.000		56.000	26.665
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi	8.660	64.353		60.514	44.499
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (*)	11.000	216.781		217.681	136.730
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.98	8.000	69.100	(2) 69.100	69.100	35.254
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili	5.928				
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture					
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria	777				
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati	1.295				
TOTALE	250.000	2.463.298	2.422.481	2.328.200	1.584.284

NOTE

- **IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI**: gli importi attivati a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge.
- I limiti di impegno con decorrenza dal 1994 autorizzati per la Regione Veneto, il Comune di Venezia e il Comune di Chioggia dalla Legge 139/92 e successivo D.M. n. 140503 del 21.05.1992 sono stati rimodulati dal Decreto Legge n. 659 del 30 novembre 1994 spostandone in parte la decorrenza al 1995 e/o al 1996.
- **IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO**: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo:
 - (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1993 e dal 1994.
 - (2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1993, dal 1994, dal 1995 e dal 1996. Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".
- **IMPORTI IMPEGNATI**:
 - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
 - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrate da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.
- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):
 - (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto non comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii, comprese, invece, nelle rispettive voci del Comune di Venezia.

LEGGE N. 539/95**Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti**

(importi in lire milioni)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 539/95	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:					
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.98	19.185	233.000	(1) 233.000	233.000	71.476
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		19.653	19.653	19.653	17.339
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli		=	=	=	=
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.		68.591	68.591	68.591	2.611
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		56.114	56.114	56.114	21.267
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		4.000	4.000	4.000	1.155
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione		=	=	=	=
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		84.642	84.642	84.642	29.104
L. 798/84, art. 3 lett. l) Valli da pesca		=	=	=	=
Altri Enti :	4.856	44.544	44.544	37.412	31.558
Università degli Studi - dati al 31.12.98	1.862	17.089	(1) 17.089	9.957	7.053
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.98	1.845	18.500	(1) 18.500	18.500	18.500
IUAV - dati al 31.12.97	1.149	8.955	(1) 8.955	8.955	6.005
REGIONE VENETO - dati al 31.12.98 (*)	9.029	84.000	(1) 90.000	83.455	9.223
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b)					
Disinquinamento		77.500		76.955	9.223
L. 798/84, art. 5 lett. b) Ospedali		6.500		6.500	0
PROVINCIA DI VENEZIA - dati al 18.02.98					
L. 67/88, art. 17 com.12) Restauro patrimonio storico	1.844	16.000	(1) 16.000	12.903	101
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.98	17.675	144.000	(1) 144.000	131.112	65.847
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili					
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi					
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (*)					
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.98	2.911	28.000	(1) 28.000	28.000	879
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili					
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture					
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					
TOTALE	55.500	549.544	555.544	525.882	179.084

NOTE

- **IMPORTI ASSEGNATI TOTALI** : stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1996 e dal 1997.

- **IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO**: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :

(1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1996 e dal 1997.

Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".

- **IMPORTI IMPEGNATI**: - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.

- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova già registrate da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto non comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii, comprese, invece, nelle rispettive voci del Comune di Venezia.

LEGGE N. 515/96**Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti**

(importi in lire milioni)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 515/96	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:					
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.98	69.700	802.000	(1) 802.000	700.000	105.686
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		15.419	15.419	15.419	1.050
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli		18.400	18.400	18.400	679
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.		226.217	226.217	196.217	17.247
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		276.259	276.259	217.259	12.921
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		24.000	24.000	11.000	1.884
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione		=	=	=	=
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		241.705	241.705	241.705	71.905
L. 798/84, art. 3 lett. l) Valli da pesca		=	=	=	=
Altri Enti :	14.300	156.207	156.207	127.489	22.932
Università degli Studi - dati al 31.12.98	3.550	34.000	(1) 34.000	5.282	282
Autorità Portuale - dati al 31.12.97	6.000	68.000	(1) 68.000	68.000	3.068
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.98	2.950	36.000	(1) 36.000	36.000	10.655
IUAUV - dati al 31.12.97	1.800	18.207	(1) 18.207	18.207	8.927
REGIONE VENETO - dati al 31.12.98 (*) L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b)					
Disinquinamento	30.800	294.000	(1) 317.000	177.000	2.150
PROVINCIA DI VENEZIA dati al 18.02.98 L. 67/88, art. 17 com. 12) Restauro patrimonio storico	7.400	83.000	(1) 83.000	83.000	2.015
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.98	53.380	512.393	(1) 512.393	495.864	109.496
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		296.813		289.024	46.369
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		81.801		78.178	11.045
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		79.652		79.436	13.669
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		23.055		19.734	8.268
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (*)		31.072		29.492	30.145
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.98	9.420	90.000	(1) 90.000	90.000	1.472
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili					
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture					
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					
TOTALE	185.000	1.937.600	1.960.600	1.673.353	243.751

NOTE

- **IMPORTI ASSEGNATI:** stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1997 e dal 1998.

- **IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO:** gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :

(1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997 e dal 1998.

Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".

- **IMPORTI IMPEGNATI:** - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.

- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova già registrate da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):

(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto non comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii, comprese, invece, nelle rispettive voci del Comune di Venezia.

Allegato n. 7

LEGGE N. 345/97

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in lire milioni)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGGE 345/97	IMPORTI ASSEGNATI TOTALI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI NEL 1998	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:						
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.98	35.000	350.000	(2) 350.000	160.000	350.000	11.221
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		34.118	34.118	10.078	34.118	0
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli		=	=	=	=	=
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.		171.089	171.089	108.198	171.089	5.944
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		133.793	133.793	38.724	133.793	5.070
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		6.000	6.000	3.000	6.000	207
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione		=	=	=	=	=
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		5.000	5.000	=	5.000	0
L. 798/84, art. 3 lett. l) Valli da pesca		=	=	=	=	=
Altri Enti:	8.000	82.870	42.870	52.870	583	548
Università degli Studi dati al 31.12.98	4.000	41.900	(1) 31.900	31.900	583	548
Aeroporto Marco Polo	2.000	20.000		10.000	0	0
IUAUV - dati al 31.12.97	2.000	20.970	(1) 10.970	10.970	0	0
REGIONE VENETO - dati al 31.12.98 (*)						
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b)						
Disinquinamento	20.000	263.000	(2) 263.000	104.000	0	0
PROVINCIA DI VENEZIA dati al 18.02.98						
L. 67/88, art. 17 com. 12) Restauro patrimonio storico	2.000	20.000	(1) 13.000	13.000	0	0
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.98	30.400	300.000	(2) 300.000	160.000	236.754	5.594
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		146.211			99.908	2.374
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		25.567			18.265	750
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		45.300			45.300	623
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		39.100			35.078	155
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (*)		43.822			38.203	1.692
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.98	4.600	46.000	(2) 46.000	19.000	46.000	960
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili						
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture						
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria						
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati						
TOTALE	100.000	1.061.870	1.014.870	508.870	633.337	18.323

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1998 e dal 1999.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo:

(1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998.

(2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998 e dal 1999.

Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".

- IMPORTI IMPEGNATI: - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.

- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova già registrate da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):

(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto non comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii, comprese, invece, nelle rispettive voci del Comune di Venezia.

LEGGE N. 295/98

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in lire milioni)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 295/98		IMPORTI ASSEGNATI			IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 1999	anno 2000	anno 1999	anno 2000	totale			
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova)	=	=	=	=	=		=	=
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche								
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli								
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.								
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado								
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo								
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione								
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali								
L. 798/84, art. 3 lett. l) Valli da pesca								
Altri Enti :	7.500	8.000	90.000	96.000	186.000	(1)	0	0
Università degli Studi	1.500	2.000	18.000	24.000	42.000			
Autorità Portuale	1.000	1.000	12.000	12.000	24.000			
Aeroporto Marco Polo	1.000	1.000	12.000	12.000	24.000			
CO.RI.LA.	500	500	6.000	6.000	12.000			
Diocesi Patriarcato di Venezia	1.000	1.000	12.000	12.000	24.000			
Biennale di Venezia	1.000	1.000	12.000	12.000	24.000			
Querini Stampalia	500	500	6.000	6.000	12.000			
IUAUV	1.000	1.000	12.000	12.000	24.000			
REGIONE VENETO (*)	=	=	=	=	=		=	=
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b)								
Disinquinamento								
PROVINCIA DI VENEZIA								
L. 67/88, art. 17 com. 12) Restauro patrimonio storico	1.000	1.000	12.000	12.000	24.000	(1)	0	0
COMUNE DI VENEZIA	1.304	870	15.652	10.435	26.087	(1)	0	0
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili								
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria								
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati								
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi								
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (*)								
COMUNE DI CHIOGGIA	196	130	2.348	1.565	3.913	(1)	0	0
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili								
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture								
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria								
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati								
TOTALE	10.000	10.000	120.000	120.000	240.000	0	0	0

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1999 e dal 2000.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :

(1) Poiché il Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica per la ripartizione dei fondi accantonati dalla legge finanziaria 27 dicembre 1997, n. 450, resi disponibili dalla legge di spesa 3 agosto 1998, n. 295, è stato emesso in data 9 marzo 1999, nel corso del secondo semestre del 1998 non è stato possibile per i vari Enti esperire le procedure di gara e pervenire alla sottoscrizione dei contratti di mutuo.

- IMPORTI IMPEGNATI: - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova già registrate da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):

(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto non comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii, comprese, invece, nelle rispettive voci del Comune di Venezia.

Allegato n. 9

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
CONFRONTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE

Importi in Lire milioni:

		IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI NEL 1998	SOMME SPESE					Variazione in percentuale
IMPORTI TOTALI ASSEGNATI		(A)	Stato attuazione al 31.12.1997		Stato attuazione al 31.12.1998			
			Importi spesi (B)	% (B/A)	Importi spesi (C)	% (C/A)		
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	329.955	329.955	278.921	85%	284.869	86%		+2%
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	3.133.396	2.943.396	1.558.683	53%	1.780.552	60%		+8%
REGIONE VENETO (*)	1.775.300	1.616.300	311.699	19%	459.089	28%		+9%
PROVINCIA DI VENEZIA	175.305	144.305	24.166	17%	24.166	17%		+0%
COMUNE DI VENEZIA (*)	2.074.504	1.908.417	620.024	32%	931.552	49%		+15%
COMUNE DI CHIOGGIA	299.090	268.177	72.039	27%	87.922	33%		+6%
ALTRI ENTI	661.318	445.318	208.771	47%	237.130	53%		+6%
TOTALE	8.448.868	7.655.868	3.074.303	40%	3.805.280	50%		+10%

(*) L'art. 3 della Legge 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato per i ri.

Venezia, 18 giugno 1999

Allegato n. 10

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
STIMA DELLO STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.1999

Importi in Lire milioni							
STIMA IMPORTI TOTALI ASSEGNATI AL 30.06.1999			STIMA IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI NEL 1999			SOMME SPESE	
		(A)	Stato attuazione al 31.12.1998		Stima dello Stato attuazione al 30.06.1999		Variazione in percentuale
			Importi spesi (B)	% (B/A)	Importi spesi (C)	% (C/A)	
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	329.955	329.955	284.869	86%	290.000	88%	+2%
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	3.589.396	3.397.396	1.780.552	52%	1.910.000	56%	+4%
REGIONE VENETO	2.231.300	2.039.300	459.089	23%	560.000	27%	+5%
PROVINCIA DI VENEZIA	175.305	163.305	24.166	15%	35.000	21%	+7%
COMUNE DI VENEZIA	2.481.304	2.311.269	931.552	40%	1.130.000	49%	+9%
COMUNE DI CHIOGGIA	370.286	336.321	87.922	26%	105.000	31%	+5%
ALTRI ENTI	711.322	591.322	237.130	40%	270.000	46%	+6%
TOTALE	9.888.868	9.168.868	3.805.280	42%	4.300.000	47%	+5%

NOTE

La voce "STIMA IMPORTI TOTALI ASSEGNATI AL 30.06.1999" tiene conto anche dei finanziamenti che potranno essere attivati a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla Legge n. 448/98 con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.

La voce "STIMA IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI AL 30.06.1999" tiene conto dei finanziamenti effettivamente disponibili nel 1999. Pertanto, oltre ai finanziamenti disponibili nel 1998, tiene conto delle somme attivabili a valere sui limiti di impegno messi a disposizione dalle leggi 345/97, 295/98 e 448/98 con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

- Documento A* *Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato alle Acque* - Stato di attuazione degli interventi dello Stato in amministrazione diretta - Aggiornamento al 31 dicembre 1998
- Documento B* *Consorzio Venezia Nuova* - Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova – Aggiornamento al 31 dicembre 1998
- Documento C* *Regione del Veneto* Interventi per la salvaguardia di Venezia - Prospetto generale e stato degli interventi - Aggiornato al 3 marzo 1999
- Documento D* *Comune di Venezia* – Interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna programma e stato di avanzamento – Aggiornato al 31 dicembre 1998
- Documento E* *Comune di Chioggia* – Stanziamenti Leggi: 798/84 – 910/86 – 67/88 – 360/91 – 139/92 – 539/95 – 515/96 – 345/97 – 295/98 - Aggiornamento al 31 dicembre 1998
- Documento F* *Università Ca' Foscari di Venezia* – Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia - Aggiornamento al 31 dicembre 1998
- Documento G* *Ministero per i Beni e le Attività Culturali* – Stato di attuazione degli interventi - Aggiornamento al 31 dicembre 1998
- Documento H* *SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo* – Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale - Aggiornamento al 31 dicembre 1998

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE**

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLO STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Aggiornamento al 31 dicembre 1998

Importi lordi in Lire milioni

COMPETENZA		OBIETTIVI	LEGGE N. 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI (91036 - 6788 - 36051 - 41592 - 72494)					
			IMPORTI FINANZIATI (A)	IMPORTI ASSEGNATI (B)	IMPORTI IMPEGNATI (C)	% (C/B)	IMPORTI EROGATI (D)	% (D/B)
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. a)	Riequilibrio idrogeologico	700	700	466	67%	0	0%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. b)	Servizio vigilanza e Anti-inquinamento (*)	21.685	15.055	13.777	92%	7.478	50%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. c)	Marginamenti lagunari	6.671	3.842	3.157	82%	3.154	82%
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. e)	Restauro di edifici demaniali	150.981	150.981	150.981	100%	141.313	94%
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. f)	Recupero dell'Arsenale	23.917	23.917	23.917	100%	21.854	91%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. g)	Sistemazione di ponti, canali e fondamenta	96.122	96.122	94.645	98%	78.573	82%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. h)	Sistemazione dei corsi d'acqua	19.726	18.226	18.200	100%	11.971	66%
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. i)	Restauro del patrimonio mobiliare pubblico	9.026	9.026	9.026	100%	8.488	94%
Prov. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. m)	Edilizia per Università Architettura	12.086	12.086	12.086	100%	12.038	100%
		TOTALI	340.914	329.955	326.255	99%	284.869	86%

(*) La differenza tra l'assegnato e l'impegnato è dovuto all'accantonamento di £. 330.000.000 e al trasferimento di parte dei fondi ad altro capitolo per il pagamento dei contrattisti.

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

CONCESSIONARIO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

Stato di attuazione degli interventi
di competenza dello Stato in concessione al
Consorzio Venezia Nuova

Aggiornamento al 31 dicembre 1998

8 marzo 1999

Lo stato di attuazione dei finanziamenti

Gli interventi dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova riguardano i seguenti obiettivi, richiamati anche dall'art. 3 lettere a), c), d) e l) della Legge n. 798/84 e dall'art. 2, 1° comma lettera a) della Legge n. 360/91 nonché dalla Legge n. 139/92:

- opere mobili alle bocche di porto per la regolazione delle maree;
- adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;
- difesa dalle acque alte degli abitati insulari, “insulae” e marginamenti;
- ripristino della morfologia lagunare;
- arresto del processo di degrado della laguna;
- difesa dei litorali;
- sostituzione del traffico petrolifero in laguna;
- apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree;
- costituzione e potenziamento del Servizio Informativo;
- interventi di ausilio alla navigazione marittima notturna e con nebbia lungo il canale Malamocco- Marghera.

Il totale degli importi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia al 31 dicembre 1998 per la realizzazione dei suddetti interventi in concessione al Consorzio Venezia Nuova è di 3.133 miliardi.

Con riferimento all'*Allegato n. 1*, per **importi finanziati** si intendono gli importi complessivamente finanziati dalla legislazione speciale per Venezia in favore delle attività del Consorzio Venezia Nuova dal 1984 a oggi.

Per **importi sottoscritti** si intendono gli importi relativi a convenzioni sottoscritte tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova. Al 31.12.1998 gli importi sottoscritti per le Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96 e n. 345/97 sono pari al 97% degli importi finanziati. In particolare, in relazione alla recente legge n. 345/97 già nel corso del 1998 sono stati sottoscritti e registrati alla Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti due atti finanziati con le somme reperite a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998 e dal 1999 (13^a e 14^a convenzione). In tal modo, tenendo conto dei tempi tecnici necessari per la formalizzazione degli atti stessi, l'Amministrazione Concedente ha garantito che le due nuove convenzioni potessero essere operative non appena le somme si fossero rese disponibili, per assicurare continuità alle attività di salvaguardia intraprese dal Concessionario.

Per **importi impegnati** si intendono gli importi relativi a convenzioni il cui Decreto Presidenziale approvativo è già stato registrato da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti. Al 31.12.1998 risultano, pertanto, impegnati tutti gli importi sottoscritti ovvero il 97% degli importi finanziati, compresi quelli relativi alla recente Legge n. 345/97.

Con riferimento all' *Allegato n. 2*, si può notare l'andamento degli importi impegnati dal Consorzio Venezia Nuova rispetto agli importi finanziati. Le somme via via rese disponibili dalle Leggi speciali sono risultate anno dopo anno pressoché totalmente impegnate mediante atti convenzionali sottoscritti con l'Amministrazione Concedente e registrati alla Corte dei Conti. **In media, dal 1985 al 1998, è risultato impegnato il 93% delle somme via via rese disponibili.** Al 31.12.1998 risulta impegnato il 97% delle somme disponibili.

Per **importi spesi** al 31.12.1998 si intendono gli importi realizzati a tale data. Al 31.12.1998 risulta speso l'84% degli importi finanziati (v. *Allegato n. 1*) reperiti a valere sulle Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95. Gli importi spesi alla stessa data scendono al 57% se si tiene conto anche delle somme rese disponibili dalle più recenti Leggi n. 515/96 e 345/97.

L'*Allegato n. 3* riporta l'andamento degli importi spesi rispetto agli importi finanziati anno per anno. Maggiormente significativo è l'andamento delle somme spese riferito alle singole Leggi speciali che dimostra, tra l'altro, una capacità di spesa del Consorzio Venezia Nuova particolarmente elevata a partire dal 1991 ovvero da quando il Consorzio è passato dalla fase di studio e di progettazione alla fase di realizzazione delle opere vera e propria.

Per singole Leggi:

- il Consorzio Venezia Nuova, a valere sulla **Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti** (Leggi n. 910/86, n. 67/88, n. 360/91), ha ottenuto un finanziamento che ammonta complessivamente a 778,396 miliardi di cui 777,936 miliardi disponibili nel corso del 1998. A valere su tali somme, il Consorzio Venezia Nuova ha sottoscritto dal 1985 al 1992 otto Convenzioni, sei con il Magistrato alle Acque e due con il Genio Civile Opere Marittime, e numerosi Atti Aggiuntivi a tali Convenzioni per un importo complessivo di 777,936 miliardi. Tali atti sono già tutti registrati alla Corte dei Conti e quindi risultano operativi a tutti gli effetti. Gli importi spesi al 31.12.1998 sono 773,610 miliardi, pari al 99% degli importi finanziati.
- Il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 139/92** con decorrenza dal 1993 e dal 1994, ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo e successivi atti aggiuntivi, che hanno complessivamente reso disponibili 970 miliardi. Con tali somme sono state sottoscritte due Convenzioni e alcuni atti aggiuntivi alle convenzioni stesse, per un importo complessivo di 970 miliardi (100% dell'importo disponibile). Gli importi spesi relativamente alla Legge n. 139/92 sono pari a 818,559 miliardi (84% degli importi finanziati) al 31.12.1998.
- Il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 539/95** con decorrenza dal 1996 e dal 1997, ha stipulato con gli istituti

finanziatori due contratti di mutuo e successivi atti aggiuntivi, che hanno reso disponibili 233 miliardi. Con tali somme sono state finanziate due Convenzioni con il Magistrato alle Acque e due atti aggiuntivi alle Convenzioni originarie, per un importo complessivo di 233 miliardi. Gli importi spesi al 31.12.1998 relativamente alla Legge n. 539/95 sono pari a 71,476 miliardi circa (31% degli importi finanziati).

- A valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 515/96** con decorrenza dal 1997, il Consorzio Venezia Nuova ha stipulato con gli istituti finanziatori un contratto di mutuo che ha reso disponibili 500 miliardi. Con tali somme è stata sottoscritta in data 18.12.1996 con il Magistrato alle Acque una nuova Convenzione (la 11^a) di importo pari a 500 miliardi. Tale Convenzione è divenuta operativa nel mese di luglio del 1997 con la registrazione da parte della Corte dei Conti. Inoltre, nel mese di luglio 1997, il Magistrato alle Acque ha sottoscritto con il Consorzio Venezia Nuova una ulteriore Convenzione, di importo pari a 200 miliardi, a valere sul contratto di mutuo perfezionato dal Concessionario in data 1° luglio 1997 relativamente ai limiti di impegno con decorrenza dal 1998; essa è stata registrata alla Corte dei Conti in data 10.09.1997 ma è divenuta operativa a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1998.

Nel corso del 1998, a seguito di revisione del primo contratto di mutuo, è stato possibile reperire ulteriori 102 miliardi con i quali è stato finanziato un atto aggiuntivo alla 11^a Convenzione, il cui schema è stato approvato dall'Amministrazione Concedente nel mese di novembre del 1998. Esso non era ancora operativo alla data del 31.12.1998, per cui esso non risulta tra le somme sottoscritte e impegnate al 31.12.1998.

Gli importi spesi al 31.12.1998 relativamente alla Legge n. 515/96 sono pari a 105,686 miliardi (13% degli importi finanziati), data la recente operatività delle Convenzioni.

- Infine, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 345/97** con decorrenza dal 1998, il Consorzio Venezia Nuova ha stipulato con gli istituti finanziatori un contratto di mutuo che ha reso disponibili 160 miliardi. E' stata successivamente sottoscritta in data 23.12.1997 con il Magistrato alle Acque una nuova Convenzione (la 13^a) di importo pari a 160 miliardi, registrata alla Delegazione Regionale per il Veneto

della Corte dei Conti in data 24 luglio 1998. Essa, pertanto, risulta operativa dal secondo semestre del 1998.

Inoltre, nel mese di luglio 1998 il Magistrato alle Acque ha sottoscritto con il Consorzio Venezia Nuova una ulteriore Convenzione (la 14^a), di importo pari a 190 miliardi, a valere sul contratto di mutuo perfezionato dal Concessionario in data 1 luglio 1998 relativamente ai limiti di impegno con decorrenza dal 1999; essa è stata registrata alla Corte dei Conti in data 23.09.1998, ma è divenuta operativa a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1999.

Gli importi spesi al 31.12.1998 relativamente alla Legge n. 345/97 sono pari a 11,221 miliardi circa (3% degli importi finanziati).

Nell'*Allegato n. 4* è riportato lo stato di attuazione degli interventi del Consorzio suddivisi per Legge di finanziamento e secondo gli obiettivi indicati dalle Leggi n. 798/84 e n. 139/92.

Nell'*Allegato n. 5* è riportata l'estensione degli interventi realizzati alla data del 31.12.1998.

Nelle pagine seguenti è riportato lo stato di avanzamento degli interventi suddiviso per ciascun obiettivo.

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera a) Legge n. 798/84**DIFESA DALLE ACQUE ALTE****Opere mobili alle bocche di porto per la regolazione delle maree**Descrizione degli interventi

Gli interventi previsti per la protezione di Venezia e della sua laguna dagli effetti delle alte maree eccezionali consistono nel sistema di opere mobili alle bocche di porto, in grado di isolare la laguna dal mare per il tempo necessario ad evitare gli allagamenti degli abitati lagunari.

Il progetto del dispositivo ha seguito scrupolosamente i criteri forniti dalla Legge speciale per Venezia, n. 798 del 1984, secondo la quale le opere non devono alterare lo scambio idrico tra mare e laguna, per evitare effetti ambientali negativi, non devono costituire un ostacolo alla navigazione, e quindi una penalizzazione delle importanti attività economiche ad essa collegate, e infine non devono costituire un'alterazione del paesaggio.

Secondo le direttive impartite dal Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge n. 798/84 nel voto del 20 marzo 1990, il progetto di massima delle opere alle bocche di porto è proceduto in parallelo a quelli per la difesa ad "insula" dei centri urbani lagunari; per l'allontanamento del traffico petrolifero e per la riapertura delle valli da pesca.

Le opere progettate consistono, per ciascuna bocca di porto, in una schiera di paratoie mobili incernierate sul fondo, senza strutture intermedie, che, in condizioni normali di marea, restano in posizione di riposo negli alloggiamenti sul fondale del canale di bocca.

La dimensione dei varchi attualmente esistenti viene completamente rispettata, consentendo quindi di lasciare inalterato lo scambio idrico mare-laguna e riducendo a livelli trascurabili la penalizzazione della navigazione. Le schiere di paratoie verranno, infatti, sollevate solamente in presenza di maree previste superiori a +100 cm sul caposaldo di Punta della Salute, fatto che avviene all'incirca 7/8 volte all'anno. In queste occasioni le bocche di porto

resteranno chiuse per tutta la durata dell'acqua alta, ossia per circa 4 ore. Per livelli di marea uguali o inferiori a +100 la protezione dei centri abitati è assicurata da sistemi locali di difesa.

Le paratoie, quando si trovano in posizione di riposo, giacciono sul fondo per effetto del peso dell'acqua che contengono.

Per raggiungere la posizione di chiusura esse vengono svuotate dall'acqua mediante immissione di aria compressa. Il sollevamento delle paratoie avviene allora a causa della spinta di galleggiamento.

Le opere mobili sono previste in corrispondenza delle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia, con uno sviluppo rispettivamente di 820, 400 e 360 metri. Le corrispondenti quote dei fondali sono: -6 metri (Lido-Treporti); -11 metri (Lido-S. Nicolò e Chioggia); -15 metri (Malamocco).

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1998

I finanziamenti fino a oggi disponibili per le opere alle bocche di porto sono stati impegnati e spesi per la progettazione preliminare di massima, per la successiva progettazione di massima, per una complessa e articolata serie di attività di studio e di sperimentazione propedeutiche alle suddette progettazioni e per lo svolgimento dello studio di impatto ambientale delle opere stesse.

Sono stati completati quasi tutti gli studi e i monitoraggi utili alla progettazione e le sperimentazioni su modelli matematici e fisici presso i maggiori centri nazionali e internazionali quali: Estramed (Pomezia - Roma), Centro sperimentale di Voltabarozzo (Padova), Danish Hydraulics Institute (Danimarca), Delft Hydraulics Laboratory (Olanda) e Hydraulics Research Wallingford (Inghilterra).

E' stato costruito anche un prototipo in scala reale di una paratoia (Modulo Sperimentale Elettromeccanico - MOSE) che è stato sottoposto a prove presso un laboratorio galleggiante

speciale rimasto operativo per circa quattro anni (dal 1988 al 1992) presso la bocca di porto di Lido, nel canale di Treporti.

Le attività eseguite con il MOSE hanno consentito la prova sul campo del comportamento di un paratoia e della affidabilità e funzionalità dei componenti meccanici, impiantistici e di controllo più significativi. Le prove hanno permesso anche di individuare i materiali e i sistemi di protezione più indicati contro la corrosione marina. Esse renderanno possibili consistenti risparmi e maggior sicurezza di esercizio per le future installazioni alle bocche di porto.

Sono state eseguite, alle tre bocche di porto e in prossimità dei moli, **indagini geognostiche**, anche di grande rilievo, perché condotte con tecnologie assolutamente innovative (sondaggi continui profondi); le attività sono state tutte completate prima del 1997.

Il progetto preliminare di massima (Riequilibrio e Ambiente - REA) è stato completato nel luglio del 1989 e approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nello stesso anno.

Nel 1990, il Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge n. 798/84, con il voto del 20 marzo che recepisce le osservazioni del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, ha autorizzato il Consorzio Venezia Nuova a procedere alla redazione del progetto di massima.

Il progetto di massima è stato ultimato nel luglio del 1992, approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nel novembre dello stesso anno e inviato, nel gennaio del 1993, ai Comuni di Venezia e di Chioggia e alla Regione Veneto. In febbraio il progetto è stato trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L'approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è avvenuta due anni dopo, il 18 ottobre 1994.

In precedenza il progetto era stato valutato positivamente da un Comitato indipendente di esperti di alcune tra le più importanti società di ingegneria e di consulenza inglesi, canadesi e americane (Monitor International Limited, Acres International Limited, Bechtel International inc.).

In data 4 luglio 1995 il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge 798/84 ha deciso di sottoporre alla procedura per la **Valutazione dell'Impatto Ambientale** (VIA) il progetto di massima delle opere mobili alle bocche di porto fissando i criteri da adottare nella fase di preparazione e sviluppo di tale attività.

Nelle sedute del 4 luglio 1995 e del 12 dicembre 1995 il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo, in particolare, ha deciso di dare corso alla VIA con una procedura ad hoc pur nel rispetto alla normativa vigente, ossia con ulteriori prescrizioni che sono state specificamente indicate in una apposita delibera. Una prescrizione prevede che la struttura dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) recepisca i quesiti formulati dall'Amministrazione comunale di Venezia riguardo alcune tematiche quali, ad esempio, l'efficacia degli interventi diffusi come alternativa alle opere mobili. Altre prescrizioni riguardano: l'istituzione di un Collegio di Esperti Internazionali destinato ad affiancare la Commissione per la VIA del Ministero dell'Ambiente, come richiesto dall'Amministrazione comunale; i contenuti e le modalità di svolgimento del SIA, formulati anche sulla base di istanze presentate dal Comune di Venezia; la definizione dei rischi derivanti dalle acque alte per le città di Venezia e di Chioggia da elaborare a cura delle rispettive Amministrazioni comunali.

Il relativo Studio di Impatto Ambientale, avviato nel febbraio del 1996 a seguito di approvazione del relativo disciplinare da parte del Magistrato alle Acque di Venezia, è terminato nel mese di aprile del 1997.

In data 18 giugno 1997, il Magistrato alle Acque ha trasmesso la documentazione del SIA agli Enti istituzionalmente preposti allo svolgimento della procedura.

L'annuncio relativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale del Ministro dell'Ambiente e del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali è stato pubblicato, in data 23 giugno 1997, su quattro quotidiani.

Il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ex art. 4 legge 798/84, nella seduta del 1° agosto 1997, ha messo a punto un programma di lavoro specifico da seguire nelle fasi in cui si articola la procedura e ha fissato le modalità e i termini di pronuncia del Collegio di Esperti Internazionali e della Commissione di VIA.

In data 31 dicembre 1997 si è completata la fase di informazione e consultazione del pubblico e di formulazione delle relative osservazioni.

In data 8 luglio 1998, il Collegio ha consegnato il proprio “Rapporto sul progetto di massima degli interventi alle bocche di porto della laguna di Venezia per la regolazione dei flussi di marea” al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici, con il quale ha espresso un parere favorevole al progetto.

Successivamente, il Rapporto è stato sottoposto al Comitato ex art. 4 legge n. 798/984 nella seduta del 21 luglio 1998.

In data 18 settembre 1998, ai sensi dell’art. 29 ter della legge regionale n. 33/85, così come modificata dalla legge regionale n. 28/90, la Commissione Tecnica Regionale ha esaminato, a sezioni riunite, la relazione sul SIA predisposta dalla Commissione relatrice appositamente incaricata e ha espresso parere favorevole con considerazioni, osservazioni e raccomandazioni sulla compatibilità ambientale del progetto. Con deliberazione n. 3427 del 22 settembre 1998, la Giunta Regionale del Veneto ha preso atto di tale parere, approvandolo all’unanimità, e lo ha inoltrato, ai sensi della normativa vigente, al Ministro dell’Ambiente.

In data 9 dicembre 1998, è stato emesso il “Parere di compatibilità ambientale della Commissione per le Valutazioni di Impatto Ambientale di cui all’art. 18, comma 5 Legge n. 67/88” relativo agli “interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea – Studio di Impatto Ambientale del progetto di massima” che non considera compatibili, con le attuali condizioni di criticità dell’ecosistema di riferimento, le opere proposte.

In data 10 dicembre 1998, la Direzione generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha espresso il proprio parere favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni.

In data 24 dicembre 1998, il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ha emesso il proprio decreto che "esprime, allo stato, giudizio di compatibilità ambientale negativo sul Progetto" rendendo comunque possibile un suo riesame alla luce dell'attuazione e della valutazione di alcune attività che vengono espressamente indicate.

*Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera a) Legge n. 798/84***Adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari***Descrizione degli interventi*

Gli interventi hanno come obiettivo il ripristino della stabilità dei moli foranei alle tre bocche di porto lagunari, oggi gravemente compromessa. La struttura dei moli, costruiti tra il 1840 e il 1934 per consentire il transito attraverso i canali di bocca di navi di grandi dimensioni, è sottoposta a cedimenti continui dovuti all'approfondimento dei canali per l'aumentata velocità della corrente. I lavori di manutenzione ordinaria hanno fronteggiato i dissesti più immediati ma non hanno eliminato il problema.

La ricostruzione dei moli è stata supportata da analisi, ricerche, sperimentazioni con modelli matematici e fisici con le quali sono state valutate le caratteristiche del moto ondoso lungo ciascuno dei moli, l'intensità delle correnti di marea al piede delle scogliere, la natura geotecnica dei terreni di fondazione, la profondità dei fondali lungo i moli e la loro tendenza evolutiva, la stabilità della struttura e delle mantellate in roccia. La realizzazione delle opere non comporta modifiche dimensionali e fa ricorso, per le parti a vista, a materiali omogenei a quelli esistenti.

Gli interventi previsti consistono, essenzialmente, nella realizzazione di uno zoccolo di transizione, in pietrame, di misura adatta a riempire i vuoti della scogliera esistente. Lo zoccolo viene costruito a partire dalla quota attuale del fondale fino a raggiungere la quota originaria, a moli appena edificati. Questo strato di transizione viene a sua volta ricoperto con rocce dimensionate in modo da fronteggiare l'erosione del moto ondoso e delle correnti. Anche la parte superiore dei moli viene rinforzata con rocce e tetrapodi, blocchi artificiali di calcestruzzo. Il masso di coronamento viene rinforzato con impiego di calcestruzzo e rivestimento in lastre di pietra.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1998

Il progetto di massima degli interventi per il rinforzo dei moli è stato approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nel luglio del 1991.

Complessivamente i lavori realizzati hanno uno sviluppo di circa 10 chilometri.

Durante il 1994 sono iniziati quasi tutti gli interventi previsti. Nel 1996 sono stati completati i lavori sul **molo nord di Malamocco** mentre sono proseguiti quelli relativi agli altri moli. Nel 1997 sono stati completati anche i lavori relativi ai **moli nord e sud di Chioggia** e **sud di Lido**; mentre nel 1998 sono terminati i lavori relativi al **molo e sud di Malamocco**.

I lavori relativi al molo nord di Lido si completeranno nel 1999, mentre saranno avviati alcuni lavori complementari nel tratto di riva in scogliera tra la **radice del molo sud di Chioggia** e il Forte San Felice.

Nel mese di febbraio del 1997 sono state avviate anche le opere per la messa in sicurezza e l'**adeguamento dei fari** sulle testate dei moli nord di Lido e di Malamocco, lavori la cui necessità è stata segnalata dal Genio Civile per le Opere Marittime su indicazione del Comando zona fari di Venezia.

Elenco opere completate

1. Ristrutturazione del molo nord di Lido
2. Ristrutturazione del molo sud di Lido
3. Ristrutturazione del molo nord di Malamocco
4. Ristrutturazione del molo sud di Malamocco
5. Ristrutturazione del molo nord di Chioggia
6. Ristrutturazione del molo sud di Chioggia

7. Messa in sicurezza e adeguamento dei fari sui moli foranei nord di Malamocco (1^a fase) e di Lido

Elenco opere in corso

1. Attività complementari di rinforzo del molo nord di Lido

Elenco opere di prossimo avvio (con progettazione esecutiva già completata o in avanzata fase di realizzazione)

1. Sistemazione della radice del molo sud di Chioggia

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera a) Legge n. 798/84**Difesa dalle acque alte degli abitati insulari, "insulae" e marginamenti**Descrizione degli interventi

L'attenzione dell'opinione pubblica sul problema di Venezia viene sollecitata soprattutto in occasione delle acque alte eccezionali che costituiscono un immediato ed evidente rischio per la città e i centri urbani lagunari. Le acque medio alte, invece, rappresentano un fenomeno sicuramente meno pericoloso ma molto più frequente e in continuo aumento. Nell'ultimo decennio, le maree superiori agli 80 centimetri* si sono verificate, mediamente, 45 volte all'anno. Piazza S. Marco viene in parte già allagata quando la marea supera i 70 centimetri. Il ripetersi degli allagamenti causa numerosi disagi per la popolazione, l'abbandono dei piani terra, una pericolosa e lenta aggressione alle strutture architettoniche ed edilizie e a pregevoli manufatti, danni alle attività economiche.

Per ridurre il numero delle volte in cui sarà necessario ricorrere alla chiusura delle bocche di porto con le opere mobili, si è previsto che gli abitati lagunari vengano difesi da interventi locali fino a una quota prestabilita, attraverso un sistema articolato di interventi. L'insieme delle attività previste consentirà di porre in esercizio le opere mobili soltanto, in media, 7 volte l'anno.

Le tipologie di intervento messe a punto sono essenzialmente due.

La prima riguarda i centri urbani interni alla laguna che si trovano a quote poco elevate rispetto al livello medio del mare e sono costituiti da strutture fragili e preziose. Si tratta di ampie aree del centro storico di Venezia e di Chioggia. Gli interventi, definiti ad "insula", consistono nel rialzo delle pavimentazioni e nell'adeguamento delle sponde e garantiscono la difesa fino a un metro di marea rispetto al caposaldo di Punta della Salute.

* N.B.: i livelli di marea sono riferiti al caposaldo di Punta della Salute

La seconda tipologia di intervento riguarda i centri urbani del cordone litoraneo che vengono circondati da una cintura continua di opere sia dal lato mare che dal lato laguna. La natura di questi insediamenti consente una difesa da livelli di marea più alti.

A questa tipologia di interventi è riconducibile anche una vasta e diffusa attività di ristrutturazione e di manutenzione di rive (marginamenti) interne alla laguna eseguita con metodologie analoghe a quelle cui si fa ricorso per la difesa locale dalle acque alte.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1998

Difese locali delle "insulae"

Sono già stati completati e approvati dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia il progetto generale di fattibilità della difesa delle "insulae" e il progetto di massima per la difesa dell'"insula" di S. Marco. Sono già finanziate la progettazione esecutiva dell'"insula" di S. Marco, avviata nella primavera del 1997, la progettazione di massima ed esecutiva dell'"insula" di Rialto, avviata nella primavera del 1998, la progettazione esecutiva dei lavori di difesa dell'"insula" del Corso del Popolo a Chioggia; il primo stralcio di quest'ultimo intervento, la cui progettazione esecutiva è stata completata nel corso del 1997, è stato avviato nel secondo semestre del 1998, relativamente alla zona lungo il canale S. Domenico. E' in avanzata fase di progettazione esecutiva il 2° stralcio di lavori che interessa la zona relativa al canale Lombardo interno e canal Vena.

E' significativo segnalare l'avvio, nel corso del 1997, degli interventi di difesa del percorso di Riva dei Tolentini, a Venezia. E' stato messo a punto un sistema di interventi che, a partire dalla necessità di difendere la zona dalle acque alte almeno fino a +100 cm rispetto al caposaldo di Punta della Salute, realizzi un programma integrato di manutenzione straordinaria dell'area. Per assicurare l'esecuzione coordinata e unitaria degli interventi che coinvolgono Magistrato alle Acque e Comune di Venezia e interessano sia il suolo pubblico che gli edifici privati, si è fatto ricorso a uno specifico "Accordo di programma" tra gli Enti

suddetti: uno strumento operativo e indispensabile qualora, in presenza di interventi particolarmente complessi, si debba "garantire l'omogeneità tecnico progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie".

Nell'"Accordo di programma", il Consorzio Venezia Nuova è individuato quale soggetto attuatore del complesso dei lavori, a eccezione delle opere che riguardano i privati la cui esecuzione è stata affidata dall'Amministrazione Comunale a una società appositamente costituita: la Insula S.p.A..

I lavori ai Tolentini sono stati avviati con primo stralcio esecutivo, attualmente in corso, che comprende il campo, il campazzo e la fondamenta dei Tolentini; la fondamenta Condulmer e quella del Magazen; le calli del Clero e dei Lavadori. E' stato completato anche il progetto esecutivo relativo ai lavori di 2° stralcio.

Difesa dei centri urbani lagunari

Nell'ambito delle difese locali dei centri abitati lagunari, già dal 1993, è stato posto a riparo dalle acque medio-alte l'abitato di **Malamocco**. Le attività proseguono a **Treporti** e a **Sottomarina**, ove sono in corso i lavori che consentiranno di completare gli stralci già attuati; a **Pellestrina**, dove stanno per essere avviati i lavori relativi al tratto in direzione nord che completano le opere di difesa lato laguna, già realizzate; a **San Pietro in Volta**; nei quartieri di **S. Giovanni** e di **Tombola a Chioggia**; lungo la riva del canale **S. Felice a Treporti**; ad **Alberoni**, dove alla fine del 1998 sono stati consegnati i lavori di difesa nella zona sud-est. E' in corso la progettazione esecutiva di interventi di difesa locale di **Sant'Erasmo** mentre è stata completata quella di **Murano** e di **Torcello**. Le relative opere verranno consegnate nel corso del 1999.

Marginamenti

Sono stati ristrutturati, risanati e, in certi casi, ricostruiti ampi tratti degradati di rive e di argini. Complessivamente, fino a oggi, sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione più di 5 chilometri di marginamenti a **Mazzorbo; Saccagnana; S. Erasmo; Treporti; Venezia** (S. Elena, S. Alvise, S. Giobbe, Arsenale, Cannaregio); **Lido** (Alberoni e via Navarrino), **Chioggia** (Riva Saloni); lungo i **canali Saccagnana e dei Bari**. Nuovi lavori interessano la **zona dell'ex Forte Vecchio a Treporti, Lio Piccolo** e gli argini dei **canali Bondantino e Taglio Barbieri**.

Nel centro storico veneziano è stato completato nel corso del 1997 e consegnato alle autorità cittadine un primo tratto di riva lungo la **fondamenta delle Zattere** ove è stato realizzato il consolidamento della riva, con la ricostruzione dei tratti più degradati, con la sistemazione dei condotti fognari esistenti e con il sollevamento della pavimentazione fino a quote comprese tra +1,00 metri e +1,20 metri.

Nel 1998 è stato consegnato il secondo stralcio dei lavori che interessano il tratto tra Punta della Salute e il rio di S. Vio.

I lavori sono in corso anche alla **Giudecca**, dall'estremità est della fondamenta fino a rio S. Biagio.

Sempre nel centro storico stanno per essere avviati i lavori di sistemazione di alcuni tratti di riva all'**Arsenale**, a **S. Giobbe** (Cannaregio), ai **Giardini** (Castello).

Elenco opere ultimate

Difesa centri abitati

1. Difesa dell'abitato di Malamocco (Lido)
2. Difesa dell'abitato di Pellestrina (tre stralci funzionali)
3. Difesa zona Saccagnana sud – Treporti
4. Difesa dell'insediamento urbano di Treporti (litorale di Cavallino) (primi tre stralci)

Marginamenti

5. Ristrutturazione rive del canale dei Bari (laguna nord)
6. Ristrutturazione riva a Mazzorbo est (laguna nord)
7. Ristrutturazione riva a Mazzorbo ovest (laguna nord)
8. Ristrutturazione riva a S. Erasmo (laguna nord)
9. Ristrutturazione riva in corrispondenza di via Navarrino (Lido)
10. Ristrutturazione riva in località Alberoni (Lido)
11. Ristrutturazione riva a S. Elena – Giardini (Venezia)
12. Ristrutturazione riva a S. Elena – Morosini (Venezia)
13. Ristrutturazione riva a S. Alvise (Venezia)
14. Ristrutturazione riva a Cannaregio (Venezia)
15. Ricostruzione argini di conterminazione lungo il canale Bondantino
16. Ricostruzione di marginamenti a Treporti (laguna nord)
17. Protezione del Forte di S. Andrea (bocca di porto di Lido)

*Elenco opere in corso*Difesa insediamenti urbani

1. Difesa dell'abitato di Alberoni, lato sud – est (Lido)
2. Difesa dei quartieri Tombola e Borgo S. Giovanni (Chioggia)
3. Difesa dell'insediamento urbano di Treporti (litorale di Cavallino) (4° stralcio)
4. Difesa dell'insediamento urbano di S. Pietro in Volta (Pellestrina)
5. Difesa dell'insediamento urbano di Sottomarina (Chioggia)

Difesa locale dei centri storici lagunari (“insulae”)

6. Difesa del percorso dei Tolentini (Venezia)
7. Difesa dell’“insula” di Chioggia dalle acque alte

Marginamenti

8. Ricostruzione delle rive alle Zattere e alla Giudecca (Venezia) (1° stralcio ultimato)
9. Ricostruzione di marginamenti a Lio Piccolo (Treporti)
10. Ricostruzione di rive a S. Felice (Treporti)
11. Rinforzo degli argini di conterminazione lagunare lungo i canali Taglio Barbieri (laguna centrale)

Elenco opere di prossimo avvio (con progettazione esecutiva già completata o in avanzata fase di realizzazione)

1. Difesa dell'abitato di S. Erasmo
2. Difesa dell'abitato di Torcello
3. Difesa dell'abitato di Murano
4. Difesa dei quartieri S. Giovanni e Tombola a Chioggia — 2° stralcio
5. Completamento in direzione nord delle opere di difesa dell'abitato di Pellestrina, lato laguna
6. Difesa dell'abitato di S. Pietro in Volta — 2° stralcio
7. Difesa dell'isola dell'Unione a Chioggia
8. Ricostruzione di rive nel centro storico veneziano (S. Giobbe, Arsenale, Giardini)
9. Ricostruzione di marginamenti nella zona dell'ex Forte Vecchio a Treporti

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera a) Legge n. 798/84**Ripristino della morfologia lagunare**Descrizione degli interventi

La Legge n. 798/84 e, particolarmente, la Legge n. 139/92 dispongono che gli interventi ambientali siano integrati e contestuali alle opere per la difesa dalle acque alte.

Condizione per la sopravvivenza della laguna di Venezia è, infatti, il suo riequilibrio ambientale.

Due fenomeni hanno contribuito al rapido degrado dell'ecosistema lagunare:

- l'erosione, che sottrae sabbia e sedimenti con una dinamica che provoca l'appiattimento e l'abbassamento dei fondali, e la scomparsa delle strutture fisiche tipiche dell'ambiente lagunare, come velme e barene;
- l'inquinamento che, divenuto imponente negli ultimi quarant'anni, ha causato il progressivo peggioramento della qualità delle acque.

La laguna è una zona umida costiera, perennemente instabile tra interrimento ed erosione.

Nei secoli passati i veneziani hanno contrastato l'interrimento con interventi di dimensioni grandiose, come la deviazione dei fiumi, portati a sfociare lontano dalla laguna, e il taglio del Po a Porto Viro.

A partire dal secolo scorso, invece, è subentrato il fenomeno dell'erosione. La costruzione dei moli alle bocche di porto, finalizzata a garantire a navi di grandi dimensioni l'accesso al porto, ha avuto la conseguenza di interrompere quasi del tutto l'ingresso in laguna di sabbia trasportata dal mare, come la deviazione dei fiumi aveva drasticamente ridotto l'apporto di materiali dall'entroterra. Altri interventi umani effettuati in questo secolo, come lo scavo del c.d. "canale dei petroli" completato alla fine degli anni '60, hanno concorso, congiuntamente al fenomeno naturale dell'abbassamento della quota dei fondali, a innescare ed esaltare il processo erosivo ormai giunto a livelli tali da configurare una rapida evoluzione della

laguna in una baia marina, con conseguenze assai negative sull'ecosistema e sulle attività umane.

Il progetto per il recupero morfologico ha l'obiettivo principale di contrastare questa tendenza evolutiva e, dunque, di trattenere e reintrodurre in laguna i sedimenti, ricostruendo le strutture fisiche dell'ambiente lagunare, e di ricalibrare i canali lagunari per ripristinare gli scambi idrici.

Il progetto prevede quattro tipi d'intervento:

1. ricostruzione e ripristino di strutture morfologiche, velme e barene, con sedimenti compatibili provenienti dal dragaggio dei canali lagunari;
2. recupero morfologico delle isole minori;
3. piantagione di fanerogame marine nei fondali lagunari;
4. apporto artificiale di sedimenti sabbiosi dal mare.

Grande rilievo assumono i lavori per la ricostruzione di velme e barene che consentono di raggiungere fondamentali obiettivi di ordine idrodinamico, morfologico e naturalistico attraverso il reimpiego interno alla laguna di materiali provenienti da operazioni di dragaggio che in precedenza venivano depositati in mare.

Tutti gli interventi sulla morfologia mantengono nel loro insieme un carattere di innovazione e di sperimentaltà: i risultati sono apprezzabili in tempi lunghi. Un continuo monitoraggio degli effetti consentirà di ottimizzarne via via l'efficacia.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1998

Il Consorzio Venezia Nuova ha predisposto un **progetto generale di massima per il ripristino della morfologia lagunare**, approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nel dicembre del 1992, che prevede la realizzazione di una serie di interventi secondo le tipologie descritte precedentemente.

Nell'ambito di questo progetto, a seguito dell'approvazione da parte dello stesso Magistrato alle Acque dei relativi progetti esecutivi, sono stati sinora realizzati o sono in via di realizzazione oltre 350 ettari di barene e di velme ed è stata ripristinata la funzionalità idraulica di canali lagunari per più di 60 chilometri.

Il Consorzio ha realizzato, o sta realizzando, interventi di ripristino morfologico in alcune zone critiche della laguna, quali **Valle Millecampi, Lago dei Teneri, Lago Ravaggio; le zone a sud della cassa di colmata "D-E"; la Palude di Cona a nord di Torcello; Canale Buello, Canale S. Domenico, Canale Scirocchetto e Canale Allacciante nella laguna sud; i canali nella zona della Val di Brenta; i canali nella zona intorno a Burano; il bacino del Lusenzo esterno a Chioggia.**

Sono, inoltre, in corso di realizzazione importanti lavori di recupero ambientale di alcune isole abbandonate della laguna che presentano gravi aspetti di degrado (isola di **Campalto**, isola di **Fisolo**, lavori già ultimati; isole di **Certosa** e dei **Laghi**, lavori avviati nella primavera del 1997; isola di **S. Servolo**, lavori avviati alla fine del 1997; isola del **Lazzaretto Nuovo**, lavori avviati nel 1998).

Da segnalare gli **interventi alle "casce di colmata"** (ampie zone della laguna interrate con materiali di risulta dallo scavo del c.d. "canale dei petroli"): essi consistono nella riapertura di canali all'interno delle "casce" e nella ricostruzione di barene lungo i bordi del canale navigabile e nelle zone adiacenti e retrostanti le "casce di colmata": essi consentono di vivacizzare gli scambi idrici, migliorando la qualità dell'ambiente.

Nel corso del 1997 sono stati anche avviati alcuni interventi sperimentali per la **salvaguardia e la tutela delle barene esistenti e la difesa di quelle che presentano particolari fenomeni erosivi**: essi consistono nella salvaguardia delle aree umide mediante l'impiego delle tecniche tradizionali di conterminazione (palificate), la sperimentazione delle tecniche più avanzate di ingegneria naturalistica e la realizzazione di sovralti in materiale sabbioso a difesa delle barene in erosione, secondo una tipologia di intervento

specificamente studiata per zone lagunari poco profonde e particolarmente esposte al moto ondoso.

Stanno per essere avviati alcuni importanti **interventi di vivificazione ambientale** nelle zone intorno alle isole di Burano, Mazzorbo e S. Francesco del Deserto e nelle zone tra i canali Tessera, Campalto e Osellino.

Sono in corso anche numerose **attività di monitoraggio ambientale**: esse costituiscono l'indispensabile supporto ai lavori in fase di realizzazione fornendo un quadro completo e dettagliato della situazione preesistente nelle aree in cui si opera, dei criteri e dei sistemi esecutivi adottati, degli effetti degli interventi a breve e a lungo termine e della loro congruenza con le ipotesi progettuali.

Elenco opere ultimate

Dragaggio canali

1. Ripristino dei canali nella cassa di colmata B (laguna centrale)
2. Ripristino dei canali nella cassa di colmata D/E (laguna centrale)
3. Dragaggio del canale di Tessera (laguna centrale)
4. Dragaggio del canale Campalto (laguna centrale)
5. Dragaggio del canale Allacciante (laguna sud)
6. Dragaggio di canali in valle Millecampi (laguna sud)
7. Dragaggio canale Scirocchetto (laguna sud)
8. Dragaggio del canale Buello (laguna sud)
9. Dragaggio dei varchi sotto il ponte translagunare tra Chioggia e la terraferma (laguna sud)
10. Dragaggio canali Sottomarina, Madonna, Aleghero, Laghini I-Aleghero, Trezze (Chioggia)
11. Dragaggio canale Trezze-gronda (Chioggia)
12. Dragaggio del canale S. Domenico e del tratto di laguna tra Chioggia e Borgo S. Giovanni (Chioggia)

13. Dragaggio canali nel bacino esterno del Lusenzo (Chioggia)

Ricostruzione di velme e barene

14. Vivificazione della Palude di Cona (laguna nord)

15. Ricostruzione di barene e sovrizzo del fondale lungo il canale di Tessera (laguna centrale)

16. Ricostruzione di barene e sovrizzo del fondale lungo il canale di Campalto (laguna centrale)

17. Ricostruzione di barene a sud della cassa di colmata D/E (laguna centrale)

18. Ricostruzione di barene in Valle Millecampi (laguna sud)

19. Ricostruzione di barene lungo il canale Lombardo esterno sud (Chioggia)

20. Ricostruzione di barene lungo il canale Lombardo esterno nord (Chioggia)

Recupero morfologico isole minori

21. Recupero morfologico dell'isola di Campalto (laguna centrale)

22. Recupero morfologico dell'isola Fisolo (laguna centrale)

Elenco opere in corso

Ricostruzione di velme e barene

1. Ricostruzione di barene nella zona di Lago dei Teneri (laguna centrale)

2. Realizzazione della conterminazione della barena Novisso a sud della cassa di colmata D/E (laguna centrale)

3. Interventi di protezione e tutela delle barene in erosione (laguna nord, centrale e sud)

4. Realizzazione di sovrizzi di sabbia a protezione delle barene in erosione (laguna sud)

Recupero morfologico isole minori

5. Recupero morfologico dell'isola dei Laghi (laguna nord)

6. Recupero morfologico dell'isola del Lazzaretto nuovo (laguna centrale)

7. Recupero morfologico dell'isola Certosa (laguna centrale)

8. Recupero morfologico dell'isola di S. Servolo (laguna centrale)

Elenco opere di prossimo avvio (con progettazione esecutiva già completata o in avanzata fase di realizzazione)

1. Recupero morfologico zona Burano, Mazzorbo, S. Francesco del Deserto (laguna nord)
2. Recupero morfologico zona Tessera, Campalto, Osellino (laguna nord)

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera a) Legge n. 798/84**Arresto del processo di degrado della laguna**Descrizione degli interventi

Gli indicatori più vistosi della situazione di degrado ambientale dovuta all'accresciuto inquinamento sono: la riduzione del numero delle specie animali e vegetali; la crescita abnorme di macroalghe e l'emissione di anidride solforosa prodotta dalla loro decomposizione; le morie di pesci per scarsità di ossigeno nell'acqua; la torbidità dell'acqua e la conseguente diminuzione delle fanerogame, che con il loro apparato radicale, contrastano l'erosione dei fondali.

La scomparsa di una fascia di transizione tra terraferma e laguna, ai margini del bacino lagunare, ha aggravato la situazione in quanto tale fascia assorbiva una grande quantità di nutrienti realizzando una "depurazione" naturale.

Il progetto sviluppato dal Consorzio Venezia Nuova per l'arresto del processo di degrado ha come scopo il miglioramento della qualità dei sedimenti e dell'acqua attraverso diversi tipi di intervento quali: la creazione, ove possibile, di estese zone umide di transizione tra terra e laguna per la depurazione naturale delle acque dolci; la modifica dei fondali della laguna intorno al centro storico di Venezia (per ridurre gli effetti della eutrofizzazione e per proteggere la città dal moto ondoso); il blocco della dispersione di inquinanti dalle discariche utilizzate in passato e dalle sponde e dai fondali dei canali industriali; la raccolta stagionale di macroalghe; la trasformazione in "habitat" lagunare di una parte delle "casce di colmata"; interventi specifici di risanamento ambientale in zone particolarmente degradate della laguna; il trattamento dei sedimenti per il miglioramento della qualità dei fondali.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1998

Il Consorzio Venezia Nuova ha redatto un **progetto di massima degli interventi per l'arresto del degrado** che è stato approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nel luglio del 1994.

Sulla base delle successive progettazioni esecutive, sono già completati ovvero sono in corso numerosi interventi volti al miglioramento dell'ambiente lagunare.

A partire dal 1989, il Consorzio Venezia Nuova ha svolto periodiche **campagne di raccolta delle macroalghe**, predisponendo anche un sistema di monitoraggi che indirizzano gli interventi nelle aree maggiormente a rischio (Burano, Tessera, Campalto, Lido, Giudecca e Chioggia). Fino ad oggi sono stati raccolti 220.000 metri cubi di alghe, con un massimo di 50.000 metri cubi nel 1989 e un minimo di 3.500 metri cubi nel 1996.

Parte del materiale raccolto è stato utilizzato, per la prima volta, nella produzione di carta. Ne è stato studiato, tra l'altro, anche il possibile uso come ammendante in agricoltura.

Nell'ambito delle attività per impedire la dispersione di inquinanti dalle discariche situate all'interno della conterminazione lagunare, utilizzate in passato e ora abbandonate, sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza dell' **isola dell'"ex-inceneritore"** alla Giudecca e dell' **isola c.d. delle Tresse**, di fronte a Marghera.

Nei primi mesi del 1998 sono stati consegnati i lavori di sistemazione ambientale della discarica situata nella zona di **Val da Rio** a sud del centro storico di Chioggia. E' stata anche completata la progettazione esecutiva dei lavori per la messa in sicurezza della discarica situata nella zona della **barena del Passo a Campalto**, i lavori partiranno nei primi mesi del 1999.

Sempre nel 1999 verranno avviate anche le indagini per la progettazione esecutiva della messa in sicurezza della discarica dei **Pili**, nelle vicinanze di Marghera.

Si tratta di lavori molto complessi data la qualità dei materiali che devono essere trattati, in un momento in cui sono particolarmente sentite le problematiche ambientali legate alla messa in sicurezza di siti ove sono state deposte negli anni scorie delle lavorazioni industriali.

Le stesse aree industriali di Porto Marghera sono state realizzate negli anni dal 1920 al 1960 imbonendo zone lagunari di barene con riporti di terre di dragaggio, residui di lavorazioni industriali e rifiuti solidi urbani. Oggi, in alcuni casi, lungo le sponde dei canali industriali, tali materiali sono a contatto con le acque lagunari per cui si verifica il rilascio di sostanze inquinanti per effetto del moto ondoso, della marea e del dilavamento da parte delle piogge. Sui fondali dei canali, inoltre, si sono accumulate negli anni sostanze inquinanti provenienti dai reflui delle lavorazioni portuali e industriali.

Il Magistrato alle Acque, inoltre, con il Consorzio Venezia Nuova e di concerto con l'Autorità Portuale, ha messo a punto un programma mirato di interventi.

In questo ambito, sono in corso i lavori di **asporto selettivo di materiale inquinante dal fondale del canale industriale nord e di banchinamento del canale industriale sud a Porto Marghera.**

Nel 1999 verranno avviate le indagini per la progettazione esecutiva delle opere di sistemazione ambientale del canale **Brentella.**

Infine, sono state eseguite alcune sperimentazioni di **tecniche di risanamento dei sedimenti inquinati del fondale in alcune zone particolarmente critiche** (zona di Palude della Rosa, zona Lago dei Teneri).

Da segnalare anche i lavori di ripristino ambientale nel bacino del **Lusenzo interno** a Chioggia, completati nel 1988, che si propongono due principali obiettivi: ristabilire l'equilibrio ambientale e morfologico di quest'area lagunare nella quale vengono immesse sostanze inquinanti, prevalentemente di origine organica, il cui accumulo è favorito dagli

scarsi ricambi idrici locali; ridurre la frequenza degli allagamenti cui sono soggetto gli abitati prospicienti il bacino.

E' stata avviata nel corso del 1998 anche la realizzazione di **opere di regolazione delle acque scolanti in laguna** attraverso il manufatto a sifone delle Trezze. Il progetto prevede la deviazione dalla laguna della maggior quantità possibile di acque di bonifica provenienti dal bacino idrografico gestito dal Consorzio Adige-Bacchiglione, caratterizzate da un alto contenuto di sostanze nutrienti.

Infine, nel 1999, verrà avviato un **primo intervento pilota di fitobiodepurazione** nella zona del canale Novissimo (laguna centrale).

Elenco opere ultimate

Messa in sicurezza delle discariche in ambito lagunare

1. Messa in sicurezza e risanamento ambientale dell'isola delle Tresse (laguna centrale)
2. Messa in sicurezza e risanamento ambientale dell'isola dell'ex inceneritore (Venezia)

Risanamento dei fondali inquinati

3. Risanamento del fondale in Palude della Rosa (laguna nord)
4. Risanamento del fondale nel Lago dei Teneri (laguna centrale)

Recupero livello qualità ambientale

5. Raccolta di macroalghe anni 1989 – 1998 (laguna nord, centrale e sud)
6. Risanamento ambientale nell'area lagunare tra i canali S. Spirito e Scoasse (laguna centrale)
7. Risanamento ambientale del bacino del Lusenzo interno (Chioggia)

Elenco opere in corsoRisanamento canali industriali

8. Asportazione selettiva di sedimenti inquinati dal canale industriale nord di Porto Marghera (laguna centrale)
9. Sistemazione delle sponde del canale industriale sud di Porto Marghera (laguna centrale)

Messa in sicurezza delle discariche in ambito lagunare

10. Messa in sicurezza della discarica di Val da Rio (Chioggia) (1° stralcio ultimato)

Recupero livello qualità ambientale

11. Realizzazione di opere di regolazione delle acque scolanti in laguna attraverso la botte "a sifone" delle Trezze (Chioggia)

Elenco opere di prossimo avvio (con progettazione esecutiva già completata o in avanzata fase di realizzazione)

1. Messa in sicurezza della discarica della barena del Passo a Campalto
2. Indagini per la progettazione esecutiva delle opere di sistemazione ambientale del canale Brentella e della discarica dei Pili a Porto Marghera
3. Campagna di raccolta delle macroalghe nella stagione primaverile-estiva del 1999
4. Interventi pilota di fitobiodepurazione nella zona del canale Novissimo

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera d) Legge n. 798/84**Difesa dei litorali**Descrizione degli interventi

Il cordone litoraneo che separa l'Adriatico dalla laguna, lungo circa 46 chilometri, rappresenta la prima e naturale difesa di Venezia e dei centri urbani lagunari dal mare. Il rinforzo dei litorali ha assunto un carattere di assoluta necessità e d'urgenza. Infatti, il cordone litoraneo si è fatto sempre più sottile e fragile a causa dell'abbassamento delle terre emerse in laguna, dei processi erosivi, delle azioni disgregatrici del moto ondoso e del vento e del degrado delle strutture storiche in pietra (i "murazzi") che sono state erette nel corso del XVIII secolo a protezione dalle mareggiate. L'insieme dei fenomeni ha determinato il generale arretramento della linea di costa e la scomparsa del cordone di dune che costituiva un'ulteriore difesa dei territori e degli abitati retrostanti. Il fenomeno è stato particolarmente evidente, fin dai secoli scorsi, nel caso dei litorali di Pellestrina e di Lido e interessa ora anche i litorali di Cavallino e di Sottomarina, investiti da importanti processi erosivi. Il sistema di opere previste persegue molteplici obiettivi: la protezione della laguna e dei suoi abitati; il restauro dei "murazzi" e la ristrutturazione delle opere di difesa degradate; il ripristino delle difese naturali mediante la creazione di nuove spiagge e l'ampliamento di quelle divenute inadeguate; la formazione, dove possibile, di un nuovo fronte di dune.

Gli interventi che il Consorzio Venezia Nuova sta realizzando sono costituiti da "ripascimenti", cioè dalla ricostruzione delle spiagge, o dall'ampliamento di quelle esistenti, mediante apporto artificiale di sabbie idonee prelevate in alto mare. L'ampiezza media prevista per la parte emersa delle nuove spiagge è di circa 50 metri.

Per contenere la sabbia versata, si costruiscono strutture di scogliera di contenimento (i cosiddetti "pennelli"), disposte in modo ortogonale rispetto alla riva e distanti le une dalle altre circa 300 metri. La realizzazione di una lunga sequenza di spiagge protette e di dune ha

anche forti valenze paesaggistiche e può costituire una valorizzazione del territorio non irrilevante a fini turistici e ricreativi.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1998

Sulla base della progettazione esecutiva già eseguita e approvata dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia, il Consorzio Venezia Nuova ha portato avanti importanti opere di difesa dei litorali.

Nel corso del 1990 è stato eseguito l'intervento sperimentale di difesa del litorale di Cavallino, in località Ca' Pasquali.

Nel corso del 1992 sono stati avviati i lavori per il rinforzo di 5 chilometri di "murazzo" a Pellestrina, per il rinforzo della scogliera nel punto più fragile del litorale di Pellestrina, l'ansa di Caroman, completati nel 1997; l'anno seguente hanno avuto inizio gli interventi per il ripascimento del litorale di Cavallino e nel 1994 quelli del litorale di Pellestrina.

A Cavallino, lo sviluppo complessivo degli interventi è di circa 11 chilometri. Gli interventi realizzano il rafforzamento delle spiagge già esistenti; la spiaggia ricostruita è difesa da 31 "pennelli", 5 di nuova realizzazione e 26 ottenuti dalla ristrutturazione di parte dei 65 "pennelli" preesistenti. Di questi, la metà circa è stata rimossa. A Cavallino, in relazione alla pendenza e alla profondità dei fondali esistenti e alla direzione prevalente delle onde, non è stato necessario realizzare la barriera sommersa (berma), parallela alla costa, che viene invece realizzata a Pellestrina. Nel corso del 1997, è stato portato a completamento l'ampliamento della spiaggia: sono stati versati complessivamente oltre 2 milioni di m³ di sabbia prelevata in mare al largo della bocca di porto di Malamocco. I lavori di ripascimento sono stati integrati da una serie di interventi complementari: sono stati ristrutturati alcuni tratti del muro realizzato in passato contro l'impatto delle onde e è stato realizzato, ove necessario, un diaframma impermeabile con funzione antisifonamento e antinfiltrazione.

Lungo alcuni tratti del litorale, infine, la protezione del territorio a tergo del litorale è stata completata mediante la ricostruzione del primitivo fronte di dune, assai degradato e in molti punti quasi scomparso, provvedendo anche al loro consolidamento mediante la piantumazione di tipiche specie vegetali. Nei primi mesi del 1998 è stata portata a completamento la ricostruzione morfologica e ambientale di alcune dune, portando così a termine i lavori relativi al litorale di Cavallino.

A Pellestrina è in corso di realizzazione una nuova spiaggia a protezione dell'abitato. Gli interventi, tutti già finanziati, consentono il ripascimento di un tratto di litorale lungo circa 9 chilometri. La formazione della nuova spiaggia avviene con l'impiego di circa 4 milioni di m³ di sabbia prelevata in mare al largo della bocca di porto di Malamocco. Al fine di assicurare la stabilità della spiaggia, si costruiscono 18 "pennelli" in pietrame collegati, mediante setti di prolungamento sommersi, a una berma continua, sommersa, messa in opera a circa 300 metri dalla costa e parallela ad essa. Le "celle" così realizzate vengono riempite di sabbia. Al 31 dicembre 1998 sono già stati realizzati otto chilometri di spiaggia. Sono attualmente in corso i lavori relativi all'ultimo stralcio che verrà completato nel 1999.

Infine, nel corso del 1998 sono stati avviati anche i lavori di difesa dei litorali di Sottomarina, di Isola Verde, a Chioggia e del litorale di Jesolo.

A Sottomarina è in corso di realizzazione il ripascimento protetto dell'arenile e la realizzazione di un "muro paraonde"; sul litorale di Isola Verde si sta eseguendo il ripascimento protetto della parte meridionale del litorale; a Jesolo, si sta eseguendo il ripascimento della spiaggia lungo 9 chilometri di riva, il rinforzo della struttura di difesa tra la spiaggia e le aree abitate retrostanti, la ricostruzione delle dune per 2,5 chilometri a partire dalla foce del Piave, il rinforzo della scogliera sulla sponda destra della foce del Sile.

E' in corso la progettazione esecutiva degli interventi sul litorale di Lido.

Gli interventi già realizzati e in corso di realizzazione sono monitorati con continuità: i controlli effettuati mostrano che gli obiettivi di progetto sono stati raggiunti, con una

generale approvazione e soddisfazione dell'autorità marittima e degli utilizzatori delle spiagge; la stabilità delle nuove opere, già completate, dopo un apprezzabilmente lungo periodo di "stress" del mare e degli agenti atmosferici, conferma pienamente la validità delle scelte progettuali e dei metodi costruttivi.

Elenco opere ultimate

1. Rinforzo e naturalizzazione del litorale di Cavallino
2. Rinforzo della scogliera tra S. Pietro in Volta e Pellestrina (litorale di Pellestrina)
3. Rinforzo del muraio di Caroman (litorale di Pellestrina)
4. Ricostruzione della spiaggia a Pellestrina (ultimati 7 stralci su otto)

Elenco opere in corso

5. Rinforzo del litorale di Jesolo
6. Rinforzo del litorale di Pellestrina (stralcio di completamento)
7. Rinforzo del litorale di Sottomarina (litorale di Chioggia)
8. Rinforzo del litorale di Isola Verde (litorale di Chioggia)

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera l) Legge n. 798/84**Sostituzione del traffico petrolifero in laguna**Descrizione degli interventi

La Legge n. 171/73 e la Legge n. 798/84 hanno disposto l'allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna.

Nella laguna di Venezia vengono trasportati, annualmente, circa 12 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi e chimico-liquidi che vengono distribuiti e trattati negli impianti petrolchimici e di raffinazione situati a Porto Marghera.

Il traffico petrolifero costituisce un rischio potenziale gravissimo per l'ambiente lagunare. In effetti, la navigazione avviene con sufficienti margini di sicurezza, ma un alto numero di incidenti è dovuto a cause imprevedibili e indipendenti dalle condizioni di navigazione. Per la sua conformazione morfologica, inoltre, la laguna di Venezia non è in grado di tollerare alcun consistente sversamento di prodotti petroliferi, altamente inquinanti, che si diffonderebbero immediatamente nel complesso tessuto morfologico e nei bassi fondali ove è impossibile l'azione di qualsiasi mezzo di soccorso e di disinquinamento.

Nella seduta del 20 marzo 1990, il Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge n. 798/84 ha conferito lo specifico incarico di redigere "il progetto operativo per la sostituzione del traffico petrolifero in laguna che ne preveda l'estromissione garantendo l'approvvigionamento alternativo dell'attività produttiva per il funzionamento del porto".

Il Consorzio Venezia Nuova ha messo a punto un piano di interventi che dimostra la fattibilità del progetto dal punto di vista tecnico. Gli interventi proposti si basano sulla capacità del sistema portuale dell'alto Adriatico di accogliere il traffico navale dirottato da Venezia e sulla costruzione di nuovi oleodotti per il rifornimento dell'area industriale di Marghera. Il progetto prevede interventi gradualmente e indica come prioritario l'allontanamento del traffico delle grandi petroliere per il trasporto del greggio (che corrisponde a 4,2 milioni di tonnellate annue). La realizzazione, che dovrebbe essere contestuale a un piano generale

di ristrutturazione di Porto Marghera e di riorganizzazione della portualità dell'alto Adriatico, consentirebbe di eliminare una fonte di grave pericolo per l'ambiente lagunare.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1998

Il progetto operativo, completato nel mese di settembre del 1992 e approvato nel settembre del 1994 dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia, risponde alla richiesta formulata dal Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge n. 798/84 e ha alimentato il dibattito sulle scelte da effettuare, che sono attualmente all'esame degli organismi istituzionali competenti.

Al progetto operativo del 1992 sono seguiti alcuni studi supplementari per l'individuazione di "soluzioni intermedie" rispetto all'esclusione totale.

Si sottolinea che non è previsto che il Consorzio Venezia Nuova esegua interventi (opere).

Salvo ulteriori direttive da parte del Comitato ex art. 4, Legge 798/1984 lo stato di avanzamento degli studi di fattibilità, affidati al Concessionario dell'esclusione del traffico petrolifero marittimo dalla laguna è completo.

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera l) Legge n. 798/84**Apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree**Descrizione degli interventi

Le valli da pesca sono attualmente 24 e sono da secoli utilizzate per l'allevamento di specie ittiche pregiate e per la maricoltura.

Le valli, la cui superficie è di circa 9000 ettari, costituiscono un ambiente naturale separato dalla laguna mediante argini dotati di aperture che consentono il ricambio dell'acqua al loro interno in modo regolato dagli allevatori sulla base delle esigenze della produzione.

Le valli da pesca sono state oggetto di studio da parte del Consorzio Venezia Nuova per valutare l'efficacia della loro apertura alla libera espansione della marea, ai fini della eventuale diminuzione del livello dell'acqua nella laguna di Venezia durante le alte maree eccezionali. Mediante numerose prove su modelli matematici e fisici, si è constatato in modo incontrovertibile che, da questo punto di vista, gli effetti della apertura delle valli sarebbero del tutto ininfluenti ai fini di una riduzione dei livelli di marea a Venezia e negli altri centri abitati lagunari.

La apertura delle valli da pesca è stata, quindi, riconsiderata in funzione di un altro obiettivo: quello del miglioramento ambientale dell'ecosistema locale.

Il Consorzio Venezia Nuova ha elaborato un progetto operativo allo scopo di definire le modalità, la durata e la frequenza dell'apertura delle aree vallive allo scopo di un miglioramento della qualità ambientale nelle aree contigue. In effetti, l'apertura delle arginature delle valli da pesca, regolata e gestita secondo criteri prestabiliti, comporta un miglioramento locale della vivacità dell'idrodinamica con benefici per ampie zone della laguna in quanto il livello qualitativo dell'acqua delle valli risulta migliore di quello lagunare.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1998

Il Consorzio Venezia Nuova ha completato il progetto operativo per la apertura delle valli da pesca nell'agosto del 1992. Nel luglio dell'anno seguente, il progetto è stato approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia.

Nel corso del 1995 il Consorzio ha redatto anche il progetto esecutivo dell'intervento sperimentale di apertura di una valle da pesca, Valle Figheri; l'intervento, accompagnato dal relativo monitoraggio, è attualmente in corso.

Elenco opere in corso

1. Intervento sperimentale di apertura di Valle Figheri.

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera a) Legge n. 798/84**Servizio Informativo**Descrizione degli interventi

Il Servizio Informativo del Consorzio Venezia Nuova raccoglie, ordina e aggiorna ogni dato riguardante gli aspetti morfologici, idraulici, ecologici e socioeconomici della laguna, del bacino scolante e dell'alto Adriatico. Il Servizio Informativo coopera con tutti gli Enti e le istituzioni che hanno competenza sul territorio e che sono deputati alla raccolta di informazioni sulle condizioni dell'ambiente lagunare, in modo da consentire la definizione delle politiche d'intervento alla luce di un quadro conoscitivo complessivo. I dati raccolti vengono organizzati in funzione della geografia e dei problemi del territorio, nonché in funzione degli obiettivi delle opere previste per la salvaguardia di Venezia e per il riequilibrio della laguna.

Ciò consente di disporre del supporto di un sistema di informazioni ricco e articolato, in grado di assicurare sia il massimo di scientificità negli approcci metodologici e nelle soluzioni progettuali e operative, sia una gestione corretta e costantemente controllata del sistema lagunare e del sistema dei lavori via via eseguiti.

Il Servizio Informativo è stato istituito su disposizione del Magistrato alle Acque.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1998

Nell'ambito delle Convenzioni sottoscritte tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova dal 1985 a oggi, è stata svolta con continuità una serie complessa di attività volte a realizzare una conoscenza unitaria e globale dell'ecosistema lagunare e del bacino in esso scolante.

Il piano di organizzazione delle informazioni comprende sei settori essenziali: le Biblioteche, la Banca Dati territoriali, i Sistemi informatici di supporto alle decisioni, gli studi, i sistemi di consultazione, il Centro Servizi.

Le **Biblioteche** costituiscono la raccolta ordinata di tutti i documenti riguardanti l'ecosistema: pubblicazioni scientifiche, studi e progetti, mappe cartografiche e aerofotogrammetriche, nastri e dischi informatici, diapositive, immagini da satellite e così via. Fino ad ora sono stati catalogati oltre 40.000 documenti.

Le Biblioteche sono, inoltre, lo strumento di lavoro per la realizzazione del Sistema Informativo Geografico: una **Banca Dati** che raccoglie tutti i dati territoriali disponibili sull'ecosistema considerato e i programmi software per consultarli e elaborarli. Attualmente la Banca Dati, denominata C.I.R.C.E. (Centro Informatico per il Risanamento e Controllo dell'Ecosistema), consta di oltre 500.000 "oggetti territoriali" corredati da oltre due milioni di informazioni di base.

I **Sistemi di supporto** sono sistemi informatici che utilizzano i dati raccolti e, in base a strumenti di analisi e logiche interpretative specifiche, rendono più agevoli alcuni dei processi decisionali relativi all'ecosistema.

I **sistemi di consultazione** forniscono accessi facilitati ai primi tre "ambienti utente" da parte, sia dei vari uffici operativi e amministrativi del Magistrato alle Acque, sia di Amministrazioni pubbliche e/o di studio e di ricerca (Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Università, CNR, ecc.), sia di aziende private locali e nazionali.

Il **Centro Servizi** mette a disposizione dati, carte ed elaborati realizzati utilizzando gli strumenti tecnologici d'avanguardia (fotogrammetria digitale, GPS differenziali, immagini da satellite e da aereo multispettrali, batimetria con ecoscandaglio a larga fascia, ecc.).

I risultati fin qui raggiunti dal Servizio Informativo possono essere così sintetizzati:

1. è stato raccolto ed informatizzato, in un sistema integrato, il vastissimo patrimonio di conoscenze sull'ecosistema lagunare, ovvero sono attualmente connessi, mediante rete telematica ad alte prestazioni, tre poli tecnologici ed operativi ove il personale del Servizio Informativo svolge le sue attività:
 - il centro del Servizio Informativo a Venezia;
 - il centro sperimentale del Magistrato alle Acque di Voltabarozzo (PD);
 - gli uffici tecnici dell'Ufficio per la Salvaguardia del MAV a Venezia;
2. è stata completamente informatizzata la geografia del territorio;
3. l'architettura hardware e software, resa modulare e flessibile e costantemente adeguata all'accelerata dinamica del progresso informatico, rimane all'avanguardia e aperta a ulteriori sviluppi;
4. i tempi di aggiornamento dei dati sono tali da consentire di avere una base operativa sufficientemente affidabile per la gestione dei fenomeni territoriali sull'ecosistema lagunare.

Oltre allo sviluppo di tali attività di "base", il Servizio Informativo ha realizzato alcune attività specifiche.

Per citarne alcune: ha aggiornato la batimetria della laguna; ha installato presso il proprio centro di calcolo modelli matematici che simulano i processi di propagazione della marea; sta realizzando un modello per migliorare la previsione delle acque alte; ha contribuito al potenziamento informatico del Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo; ha eseguito studi sugli apporti inquinanti in laguna.

La crescita continua di enti e persone che chiedono ed utilizzano conoscenze del Servizio Informativo sono una conferma della validità delle scelte di impostazione del servizio e della sua adeguatezza scientifica e tecnologica.

*Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera d) Legge n. 798/84***Interventi di ausilio alla navigazione marittima notturna e con nebbia
lungo il canale Malamocco – Marghera***Descrizione degli interventi*

Per rendere sicura la navigazione in laguna nelle ore notturne e in caso di scarsa visibilità dovuta alla nebbia, il Consorzio Venezia Nuova ha messo in opera, lungo il canale tra Malamocco e Marghera, per complessivi 15 Km, un sistema di illuminazione e una serie di strumentazioni ausiliarie. Gli interventi si sono resi necessari allo scopo di garantire alla navigazione requisiti e standard di sicurezza adeguati. Il sistema predisposto consente di ridurre i rischi di incidenti e di migliorare la capacità operativa delle aree portuali di Venezia. In futuro, inoltre, la realizzazione degli ausili alla navigazione potrà soddisfare nuove possibili esigenze: compensare i sia pur limitatissimi periodi di inagibilità delle bocche di porto dovuti alla prevista chiusura dei varchi in occasione di alte maree eccezionali e la perdita di produttività portuale qualora venisse eliminato il traffico marittimo petrolifero dalla laguna.

Su entrambi i lati del canale tra Malamocco e Marghera sono stati disposti 340 segnali luminosi, installati a 80 metri l'uno dall'altro, 111 riflettori radar, collocati sulla sommità dei pali di supporto dei segnali luminosi, e 4 "fog detectors" per rilevare le condizioni di visibilità.

I punti luce, situati a circa 8 metri sopra il livello del mare, sono costituiti da lampade a vapori di sodio a bassa pressione montate su uno stelo di acciaio inossidabile.

L'alimentazione elettrica avviene tramite allacciamento alla rete ENEL. Una stazione generatrice di emergenza è stata realizzata a S. Leonardo. Per la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica sono state predisposte 16 centraline.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1998

L'intero intervento di ausilio alla navigazione notturna e con nebbia è stato completato nel 1996.

Nel corso del 1997 è stata completata l'attività di videomonitoraggio che, mediante l'impiego di telecamere equipaggiate con intensificatori di luminosità, ha consentito la ripresa del traffico marittimo lungo il canale Malamocco-Marghera sia di giorno che di notte, e la memorizzazione delle immagini del traffico in una apposita banca dati.

Si è svolta, infine, per circa sei mesi, la gestione dell'impianto per il suo avviamento.

Il "sentiero luminoso" è stato definitivamente consegnato all'Autorità Portuale nel corso del 1997 che lo gestisce con piena soddisfazione propria e degli utenti.

Elenco opere ultimate

1. Realizzazione sistema di illuminazione e radar lungo il canale Malamocco – Marghera.

Allegato n. 1

STATO DI ATTUAZIONE DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI AL CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Importi lordi in Lire miliardi

	IMPORTI FINANZIATI (A)	IMPORTI SOTTOSCRITTI AL 31.12.1998 (B)	% (B)/(A)	IMPORTI IMPEGNATI AL 31.12.1998 (C)	% (C)/(A)	IMPORTI SPESI AL 31.12.1998 (D)	% (D)/(A)	NOTE
LEGGE 798/84	778,396	777,936	100%	777,936	100%	773,610	99%	
LEGGE 139/92	970,000	970,000	100%	970,000	100%	818,559	84%	
LEGGE 539/95	233,000	233,000	100%	233,000	100%	71,476	31%	
TOTALE PARZIALE	1981,396	1980,936	100%	1980,936	100%	1663,645	84%	
LEGGE 515/98	802,000	700,000	87%	700,000	87%	105,686	13%	
LEGGE 345/97	350,000	350,000	100%	350,000	100%	11,221	3%	
TOTALE	3133,396	3030,936	97%	3030,936	97%	1780,552	57%	

LEGENDA

IMPORTI FINANZIATI: gli importi finanziati complessivamente dalla legislazione speciale per Venezia in favore del Consorzio Venezia Nuova.
 IMPORTI SOTTOSCRITTI AL 31.12.1998: gli importi relativi a convenzioni sottoscritte a tale data tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova.
 IMPORTI IMPEGNATI AL 31.12.1998: gli importi impegnati con apposito Decreto del Presidente del Magistrato alle Acque già registrato a tale data alla Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.
 IMPORTI SPESI AL 31.12.1998: gli importi già realizzati a tale data.

Allegato n. 2

CONSORZIO VENEZIA NUOVA: ANDAMENTO DEGLI IMPORTI IMPEGNATI RISPETTO AGLI IMPORTI FINANZIATI

Importi lordi in lire miliardi

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	IMPORTI FINANZIATI
IMPORTI FINANZIATI																	
Legge	100.500	74.500	47.500	50.000													
n. 798/84																	272.500
n. 910/86				30.000	89.500	62.400	30.600	31.415	38.400		2.254	4.850	3.817		0.460		212.500
n. 67/88					35.400		22.000										271.398
n. 360/91																	22.000
n. 139/92										582.000	227.000	67.000		94.000			970.000
n. 539/95													60.000				233.000
n. 515/96														700.000	102.000		802.000
n. 345/97															350.000		350.000
Importo totale parziale	100.500	74.500	47.500	80.000	124.900	62.400	207.400	31.415	38.400	582.000	229.254	71.850	63.817	914.000	505.460	0.000	
Importo totale progressivo	100.500	175.000	222.500	302.500	427.400	489.800	697.200	728.615	767.015	1.349.015	1.576.269	1.650.119	1.713.936	2.627.936	3.133.396	3.133.396	
IMPORTI IMPEGNATI																	
Legge 798/84																	
1° conv. n. 6479		170.000		64.500		20.500	15.366										270.366
2° conv. n. 6745					93.000	62.400	3.000	15.800	17.350								191.350
3° conv. n. 7025							124.200	80.000									124.200
4° conv. n. 7138									5.000								80.000
5° conv. n. 7191										52.465							5.000
6° conv. n. 7295													1.174	5.882			59.521
n. 1568 OC.MM.				7.500	40.000												7.500
n. 1685 OC.MM.																	40.000
Legge 139/92																	
7° conv. n. 7322																	
8° conv. n. 7395										582.000	18.000	50.000			70.000		220.000
Legge 539/95											209.000	17.000			24.000		250.000
9° conv. n. 7601																	
10° conv. n. 7637																	
Legge 515/98																	
11° conv. n. 7649																	
12° conv. n. 7695																	
Legge 345/97																	
13° conv. n. 7725																	
14° conv. n. 7760																	
Importo totale parziale		170.000	0.000	72.000	133.000	82.900	142.585	95.800	22.350	634.465	227.000	67.000	1.174	885.882	497.000		
Importo totale progressivo	0.000	170.000	170.000	242.000	375.000	457.900	600.465	696.065	718.415	1.352.880	1.579.880	1.646.880	1.648.054	2.533.936	3.030.936		3.030.936
IMPEGNATO/FINANZIATO (%)		97%	76%	80%	86%	93%	86%	96%	94%	100%	100%	100%	96%	96%	97%		

NOTE

Come anno di impegno è stato indicato l'anno in cui il Decreto Presidenziale approvativo della Convenzione e dell'Atto Aggiuntivo è stato registrato alla Corte dei Conti.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Allegato n. 3

CONSORZIO VENEZIA NUOVA: ANDAMENTO DEGLI IMPORTI SPESI RISPETTO AGLI IMPORTI FINANZIATI

Importi lordi in lire miliardi

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	IMPORTI FINANZIATI
IMPORTI FINANZIATI																	
Legge																	
n. 758/84	100.500	74.500	47.500	50.000			30.600										272.500
n. 910/86				30.000	85.500	62.400	154.800	31.415	38.400		2.254	4.950	3.817		0.460		272.500
n. 87/88					38.400		22.000										271.395
n. 360/91																	22.000
totale Legge 758/84 e rifinanz. - parziale	100.500	74.500	47.500	80.000	124.900	62.400	207.400	31.415	38.400	0.000	2.254	4.950	3.817	0.000	0.460		778.395
totale Legge 758/84 e rifinanz. - progressivo	100.500	175.000	222.500	302.500	427.400	489.800	697.200	729.615	767.015	767.015	769.269	774.119	777.936	777.936	778.396		778.396
n. 139/92										582.000	227.000	67.000	876.000	970.000	970.000		970.000
totale Legge 139/92 - progressivo										582.000	809.000	876.000	876.000	970.000	970.000		970.000
n. 539/95													60.000	120.000	53.000		233.000
totale Legge 539/95 - progressivo													60.000	180.000	233.000		233.000
n. 515/96														700.000	102.000		802.000
totale Legge 515/96 - progressivo														700.000	802.000		802.000
n. 345/97															350.000		350.000
totale Legge 345/97 - progressivo															350.000		350.000
Importo totale parziale	100.500	74.500	47.500	80.000	124.900	62.400	207.400	31.415	38.400	582.000	229.254	71.950	63.817	914.000	505.450	0.000	
Importo totale progressivo	101	175	222.500	302.500	427.400	489.800	697.200	729.615	767.015	1.349.015	1.578.269	1.650.119	1.713.936	2.627.936	3.133.396	3.133.396	3.133.396
IMPORTI SPESI																	
Legge																	
n. 758/84 e rifinanzamenti	0.000	1.873	4.280	45.760	91.626	120.276	99.820	110.734	128.631	62.462	43.719	28.948	11.449	20.773	3.259		773.610
n. 198/84 e rifinanzamenti - progressivi		1.873	6.153	51.913	143.539	263.815	363.635	474.369	603.000	655.462	709.181	738.129	749.578	770.351	773.610		773.610
Speso/finanziato Legge n. 758/84 (%)	0%	1%	3%	17%	34%	64%	87%	65%	79%	87%	92%	95%	96%	99%	99%		
n. 139/92										62.638	107.300	182.221	213.641	165.119	97.740		878.553
Speso/finanziato Legge n. 139/92 (%)										9%	20%	39%	64%	74%	84%		
n. 539/95										52.528	160.438	342.659	556.300	721.479	818.559		
Speso/finanziato Legge n. 539/95 (%)										8%	20%	39%	64%	74%	84%		
n. 515/96													6.697	30.871	31.908		71.476
Speso/finanziato Legge n. 515/96 (%)													0%	14%	22%		
n. 515/96 - progressivi														27.345	28.341		105.686
Speso/finanziato Legge n. 515/96 (%)														27.345	105.686		
n. 345/97															4%	13%	
Speso/finanziato Legge n. 345/97 (%)															17,221		
Importo totale parziale	0.000	1.873	4.280	45.760	91.626	120.276	99.820	110.734	128.631	115.000	151.619	211.169	232.767	244.108	221.869		
Importo totale progressivo	0.000	1.873	6.153	51.913	143.539	263.815	363.635	474.369	603.000	718.000	869.819	1.080.768	1.314.575	1.558.683	1.780.552		1.780.552
SPESO/FINANZIATO (%)		1%	3%	17%	34%	54%	82%	65%	79%	93%	55%	65%	77%	59%	57%		57%

Allegato n. 5

CONSORZIO VENEZIA NUOVA ESTENSIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI E IN CORSO Situazione al 31/12/98		
Obiettivi	Indicatori di avanzamento (1)	Estensione degli interventi realizzati, in corso e di prossima avvio (progetto esecutivo approvato)
ATT. PROPED. OPERE ALLE BOCCHE		
Studi propedeutici e Progetto Preliminare di Massima		100%
Studi propedeutici e Progetto di Massima		100%
Altre attività propedeutiche (2)		0
RINFORZO MOLÌ		
Rinforzo Moli Foranei e stabilizzazione fondali alle bocche	(km)	10
DIFESE LOCALI DA ALLAGAMENTI		
Difese locali dagli allagamenti (centri abitati minori)	(ha)	943
Difese locali dagli allagamenti (centri storici)	(ha)	20,5
Ricostruzione marginamenti	(km)	50
RECUPERO MORFOLOGICO (1)		
Ricalibratura canali, sollevam. fondali e ricostruz. velme e barene	(milioni di m ³ sedimenti coinvolti)	9
Realizzazione di velme, barene e rinforzo di quelle esistenti	(ha)	350
Ricalibratura canali per aumento circolazione marea (fino al 2008)	(km)	59
Sovralzo fondali per riduzione energia onde (fino al 2008)	(m ³)	630.000
Piantagione fanerogame	moduli	5
Arresto erosione delle isole minori	numero isole	7
Rinforzo e adeguamento argini contenimento lagunare (anche per difesa degli allagamenti)	(km)	8
ARRESTO DEL DEGRADO (1)		
Sistemazione discariche esistenti in laguna	numero discariche	4
Opere di contenimento sponde dei canali industriali	(km)	7
Dragaggio di canali con sedimenti inquinati da gestire con procedure speciali	(m ³)	92.000
Sovralzi dei fondali per riduzione energia onde in zone con sedimenti inquinati	(m ³)	90.000
Aree di fitobiodepurazione	numero	1
DIFESA DEI LITORALI (2)		
Rinforzo dei litorali a difesa dalle mareggiate	(km)	39,5
Diaframmi anti sifonamento	(km)	1,5
ESTROMISSIONE PETROLI		
Progetto operativo		Progetto operativo
APERTURA VALLI DA PESCA		
Progetto operativo		Progetto operativo
Apertura pilota di valli in condizioni diverse	(numero valli)	1
AUSILIO ALLA NAVIGAZIONE		
Sentiero Luminoso	(km)	12
PROC. ESEC. E REALIZZ. OPERE ALLE BOCCHE		
Progetto esecutivo		0
Realizzazione Opere alle Bocche		0

NOTE

(1) L'avanzamento delle attività è stato rappresentato con indicatori che meglio di altri (anche se in modo schematico) descrivono le caratteristiche e gli obiettivi dell'intervento.

(2) Non sono indicate attività di gestione degli interventi realizzati e del sistema lagunare (monitoraggi, manutenzioni, sviluppo del servizio informativo, campagne ambientali periodiche)



GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

SEGRETERIA ALL'AMBIENTE

SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

**PROSPETTO GENERALE
E STATO
DEGLI INTERVENTI**

AGGIORNATO AL 03/03/1999

Legenda

Importi finanziati:	Somme messe a disposizione dallo Stato
Importi impegnati:	Importi relativi ad interventi per i quali sono stati individuati i soggetti attuatori
Importi contabilizzati:	Importi dei progetti già approvati dai competenti organi regionali, i cui interventi sono pertanto stati avviati o sono in fase di avvio
Importi erogati:	Importi già erogati ai soggetti esecutori delle opere

TABELLA RIEPILOGATIVA
(per soggetti attuatori)

Soggetto attuatore	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
Comuni				
Comune di Arquà Petrarca	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 1.082.589.626
Comune di Battaglia Terme	L. 1.930.000.000	L. 1.930.000.000	L. 0	L. 0
Comune di Castelfranco Veneto	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 0
Comune di Cavarzere	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 1.703.893.140
Comune di Chioggia	L. 83.100.000.000	L. 83.100.000.000	L. 83.100.000.000	L. 28.680.565.281
Comune di Codevigo	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.054.365.402
Comune di Este	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 125.531.250
Comune di Galzignano	L. 1.870.000.000	L. 1.870.000.000	L. 1.870.000.000	L. 409.589.294
Comune di Jesolo	L. 12.115.000.000	L. 12.115.000.000	L. 12.115.000.000	L. 8.468.327.137
Comune di Marcon	L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000	L. 133.210.530
Comune di Meolo	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.473.551.928
Comune di Mogliano Veneto	L. 12.300.000.000	L. 12.300.000.000	L. 12.300.000.000	L. 4.942.317.973
Comune di Monastier	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 107.094.337
Comune di Monselice	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 4.519.027.355
Comune di Musile di Piave	L. 5.400.000.000	L. 5.400.000.000	L. 5.000.000.000	L. 1.861.143.451
Comune di Noale	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0
Comune di Padova	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0

Soggetto attuatore	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
Comune di Piove di Sacco	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 6.046.251.351
Comune di Quarto d'Altino	L. 10.500.000.000	L. 10.500.000.000	L. 10.500.000.000	L. 9.211.866.938
Comune di San Biagio di Callalta	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0
Comune di Venezia	L. 343.950.000.000	L. 343.950.000.000	L. 169.750.000.000	L. 54.401.593.340
Comune di Zero Branco	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 95.136.000
Subtotale	L. 527.065.000.000	L. 527.065.000.000	L. 333.235.000.000	L. 126.316.074.333
Consorzi di bonifica				
Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	L. 40.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 35.000.000.000	L. 9.566.605.198
Consorzio di bonifica Basso Piave	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0
Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.569.204.990
Consorzio di bonifica Dese - Sile	L. 91.200.000.000	L. 91.200.000.000	L. 39.700.000.000	L. 12.119.972.971
Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brent	L. 24.200.000.000	L. 20.200.000.000	L. 0	L. 0
Subtotale	L. 163.900.000.000	L. 159.900.000.000	L. 77.700.000.000	L. 24.255.783.159
Consorzi di fognatura e depurazione				
Consorzio Alta Servizi	L. 24.500.000.000	L. 24.500.000.000	L. 22.200.000.000	L. 7.480.794.697
Azienda Piovese Gestione Acque	L. 40.300.000.000	L. 40.300.000.000	L. 25.300.000.000	L. 13.889.883.400
A.S.P.I.V.	L. 131.450.000.000	L. 131.450.000.000	L. 124.250.000.000	L. 70.014.673.565
Centro Veneto Servizi	L. 11.500.000.000	L. 11.500.000.000	L. 11.500.000.000	L. 479.796.880
Azienda Consorzio del Mirese	L. 116.900.000.000	L. 116.900.000.000	L. 78.120.000.000	L. 66.868.323.234
Consorzio del Tergola	L. 102.300.000.000	L. 101.755.000.000	L. 96.330.000.000	L. 39.320.890.043

Soggetto attuatore	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
Subtotale	L. 426.950.000.000	L. 426.405.000.000	L. 355.700.000.000	L. 198.054.361.809
Regione				
Regione - Arpav	L. 26.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 3.191.907.087
Regione - Fognature e Depurazione	L. 87.085.000.000	L. 87.085.000.000	L. 82.085.000.000	L. 64.726.179.018
Regione - Foreste	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 1.670.400.000	L. 847.996.979
Subtotale	L. 116.085.000.000	L. 102.085.000.000	L. 93.755.400.000	L. 68.766.083.084
Altri				
Ente di bacino R.S.U. VE 2	L. 43.200.000.000	L. 43.200.000.000	L. 43.200.000.000	L. 38.190.611.373
In attesa di indiv. sogg. attuatori	L. 539.300.000.000	L. 30.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 388.187.631
U.S.S.L. n. 12 - Venezia	L. 37.500.000.000	L. 37.500.000.000	L. 31.000.000.000	L. 23.948.428.455
Delta Po S.p.A.	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 0
Subtotale	L. 637.300.000.000	L. 128.000.000.000	L. 101.500.000.000	L. 62.527.227.459
TOTALE	L. 1.871.300.000.000	L. 1.343.455.000.000	L. 961.890.400.000	L. 479.919.529.844

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

COMUNI

ARQUA' PETRARCA
BATTAGLIA TERME
CASTELFRANCO VENETO
CAVARZERE
CHIOGGIA
CODEVIGO
ESTE
GALZIGNANO
JESOLO
MARCON
MEOLO
MOGLIANO VENETO
MONASTIER
MONSELICE
MUSILE DI PIAVE
NOALE
PADOVA
PIOVE DI SACCO
QUARTO D'ALTINO
SAN BIAGIO DI CALLALTA
VENEZIA
ZERO BRANCO

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: Comune di Arquà Petrarca						Settore:	Disinquinamento
Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
56	Fognatura nel comune di Arquà Petrarca		L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 980.296.206	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 980.296.206	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Arquà Petrarca		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 102.293.420	Progetto approvato
Subtotale (legge - esercizio)			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 102.293.420	
TOTALE (ente)			L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 1.082.589.628	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	27,1%	

Soggetto attuatore: Comune di Battaglia Terme							Settore:	Disinquinamento
Legge	539/95	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
3	Adeguamento depuratore di Battaglia Terme		L. 830.000.000	L. 830.000.000	L. 0	L. 0		
Subtotale (legge - esercizio)			L. 830.000.000	L. 830.000.000	L. 0	L. 0		
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
8	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Battaglia Terme		L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di approvazione	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0		
TOTALE (ente)			L. 1.930.000.000	L. 1.930.000.000	L. 0	L. 0		
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	0,0%	0,0%		

Soggetto attuatore: Comune di Castelfranco Veneto					Settore:	Disinquinamento	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
11	Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione in Comune di Castelfranco Veneto, località Salvatronda			L. 2.800.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in istruttoria
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)			L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	0,0%	0,0%	

Soggetto attuatore: Comune di Cavarzere							Settore:	Disinquinamento
Legge	67/88	Es. 1992 - I ^a fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
3	Fognatura comunale di Cavarzere		L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 990.000.000	Lavori ultimati.	
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione - III lotto		L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 700.000.000	Lavori in corso.	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 1.690.000.000		
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
16	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Cavarzere		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 13.893.140	Progetto approvato.	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 13.893.140		
TOTALE (ente)			L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 1.703.893.140		
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	31,0%		

Soggetto attuatore: Comune di Chioggia						Settore:	Disinquinamento
Legge	798/84	Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
14	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto		L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 569.361.501	Lavori ultimati
15	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI lotto		L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 912.083.961	Lavori ultimati
22	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XVI lotto		L. 3.650.000.000	L. 3.650.000.000	L. 3.650.000.000	L. 500.000.000	L'impresa ha rescisso il contratto. Perizia approvata in C.T.R.A. voto n. 1994 del 14.7.94. In attesa di nuovo appalto
24	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (VE) - Opere elettromeccaniche		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.459.541.098	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)			L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 3.440.988.560	
Legge	910/86	Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
9	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia		L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 8.195.998.107	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 8.195.998.107	
Legge	67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
11	Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)		L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 110.000.000	Il comune di Chioggia ha proposto di modificare il progetto collegando la fognatura all'impianto di Val da Rio
21	Completamento della rete fognaria di Chioggia e Sottomarina		L. 14.400.000.000	L. 14.400.000.000	L. 14.400.000.000	L. 7.224.640.499	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000	L. 7.334.640.499	
Legge	67/88	Es. 1991	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5	Fognatura di Chioggia (VE)		L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
52	Ampliamento fognature bianca e nera nel centro storico di Chioggia						
			L. 8.950.000.000	L. 8.950.000.000	L. 8.950.000.000	L. 1.758.082.295	Lavori in corso.
53	Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acqua salata nella rete di fognatura						
			L. 1.050.000.000	L. 1.050.000.000	L. 1.050.000.000	L. 978.659.409	Lavori ultimati.
	Subtotale (legge - esercizio)		L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 2.736.741.704	
Legge	539/95	Es. 1996	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Comune di Chioggia						
			L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 787.821.255	Lavori in corso
	Subtotale (legge - esercizio)		L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 787.821.255	
Legge	539/95	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6	Progetto definitivo dell'impianto elettrico del depuratore di Val da Rio - 1° e 2° stralcio						
			L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 154.014.136	Lavori in corso
7	Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento ed ammodernamento della linea "Picchi" del depuratore di Val da Rio						
			L. 230.000.000	L. 230.000.000	L. 230.000.000	L. 215.974.279	Lavori ultimati
8	Lavori di miglioramento ed ammodernamento dell'impianto di depurazione di Val da Rio - lotto funzionale A						
			L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	L. 979.608.786	Lavori ultimati
	Subtotale (legge - esercizio)		L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 1.349.597.201	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
17	Ampliamento della rete fognaria e interventi sugli impianti di depurazione comunale in Comune di Chioggia						
			L. 19.593.954.020	L. 19.593.954.020	L. 19.593.954.020	L. 272.535.102	
18	Progetto di riqualificazione edilizia della linea "picchi" del depuratore di Val da Rio						
			L. 406.045.980	L. 406.045.980	L. 406.045.980	L. 328.002.059	Progetto approvato.
	Subtotale (legge - esercizio)		L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 600.537.161	
TOTALE (ente)			L. 76.400.000.000	L. 76.400.000.000	L. 76.400.000.000	L. 25.346.320.487	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	33,2%	

Soggetto attuatore: Comune di Codevigo						Settore:	Disinquinamento
Legge	67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5	Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (PD)						Lavori ultimati. Ulteriori L. 54.365.402 con DGR n. 1356 del 21.4.98
			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.054.365.402	
			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.054.365.402	
Subtotale (legge - esercizio)							
			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.054.365.402	
TOTALE (ente)							
			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.054.365.402	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	101,8%	

Soggetto attuatore: Comune di Este						Settore:	Disinquinamento
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6	Ampliamento della rete fognaria nella zona del canale Bisatto - XI stralcio "Meggiaro"						Progetto approvato
			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 125.531.250	
			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 125.531.250	
Subtotale (legge - esercizio)							
			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 125.531.250	
TOTALE (ente)							
			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 125.531.250	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	5,0%	

Soggetto attuatore: Comune di Galzignano					Settore: Disinquinamento		
Legge	539/95	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	Collegamento della fognatura comunale all'impianto di depurazione di Battaglia Terme		L. 670.000.000	L. 670.000.000	L. 670.000.000	L. 409.589.294	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)			L. 670.000.000	L. 670.000.000	L. 670.000.000	L. 409.589.294	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
7	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Galzignano		L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	Lavori appaltati.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	
TOTALE (ente)			L. 1.870.000.000	L. 1.870.000.000	L. 1.870.000.000	L. 409.589.294	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	21,9%	

Soggetto attuatore: Comune di Jesolo						Settore:	Disinquinamento
Legge	798/84	Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3	Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (VE)		L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.428.520.054	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.428.520.054	
Legge	910/86	Es. 1987-1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
26	Rilievi ed ispezioni televisive della rete fognaria del Comune di Jesolo (VE)		L. 195.636.000	L. 195.636.000	L. 195.636.000	L. 97.818.000	Lavori in corso
27	Progetto esecutivo delle opere fognarie di collegamento della zona P.I.P. all'impianto di depurazione (VE)		L. 310.000.000	L. 310.000.000	L. 310.000.000	L. 183.853.720	Lavori in corso
28	Lavori della fognatura del Comune di Jesolo (VE)		L. 469.364.000	L. 469.364.000	L. 469.364.000	L. 0	Progetto approvato
34	Somme per ulteriori interventi		L. 640.000.000	L. 640.000.000	L. 640.000.000	L. 640.000.000	Lavori finiti
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.615.000.000	L. 1.615.000.000	L. 1.615.000.000	L. 921.671.720	
Legge	67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
14	Ampliamento della rete fognaria di via Bafile in Comune di Jesolo (VE)		L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.065.924.887	Lavori ultimati.
17	Rilievi ed ispezioni televisive - II stralcio		L. 195.636.000	L. 195.636.000	L. 195.636.000	L. 0	Progetto approvato
18	Interventi presso l'impianto di depurazione e gli sfioratori di piena		L. 2.212.524.000	L. 2.212.524.000	L. 2.212.524.000	L. 52.210.476	Lavori in corso.
19	Analisi chimiche sui liquami in fognatura e nell'impianto		L. 91.840.000	L. 91.840.000	L. 91.840.000	L. 0	Il costo totale dell'intervento è di 2.119.000.000 Vedi anche schede n. 14 - 17 - 18
Subtotale (legge - esercizio)			L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 5.118.135.363	
TOTALE (ente)			L. 12.115.000.000	L. 12.115.000.000	L. 12.115.000.000	L. 8.468.327.137	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	69,9%	

Soggetto attuatore: Comune di Marcon					Settore:	Disinquinamento
Legge 798/84	Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
4	Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VIII lotto	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 82.233.170	Il Comune di Marcon con nota n. 17134 del 5/10/98 ha chiesto lo storno della somma per il recupero della fognatura nera di Gaggio
Subtotale (legge - esercizio)		L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 82.233.170	
Legge 539/95	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
10	Riabilitazione fognaria del Comune di Marcon	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 50.977.360	Progetto approvato
Subtotale (legge - esercizio)		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 50.977.360	
TOTALE (ente)		L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000	L. 133.210.530	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%		3,7%

Soggetto attuatore: Comune di Meolo						Settore:	Disinquinamento
Legge	67/88	Es. 1991	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
4	Adeguamento Impianto di depurazione e rete fognaria in comune di Meolo.		L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
21	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Meolo		L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 573.551.928	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 573.551.928	
TOTALE (ente)			L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.473.551.928	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO						100,0%	73,7%

Soggetto attuatore: Comune di Mogliano Veneto							Settore:	Disinquinamento
Legge	798/84	Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
2	Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)		L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 733.359.359	Lavori ultimati	
19	Fognatura frazioni di Bonisolo e Zerman in comune di Mogliano Veneto (TV)		L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 452.212.485	Lavori ultimati	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 1.185.571.844		
Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
54	Opere di completamento della fognatura comunale e monitoraggio/telelevamento impianti di sollevamento		L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 3.756.746.129	Lavori in corso.	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 3.756.746.129		
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
12	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Mogliano Veneto		L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	Progetto approvato	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0		
TOTALE (ente)			L. 12.300.000.000	L. 12.300.000.000	L. 12.300.000.000	L. 4.942.317.973		
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	40,2%		

Soggetto attuatore: Comune di Monastier						Settore:	Disinquinamento
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
13	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione comunale in Comune di Monastier						Progetto approvato
			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 107.094.337	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 107.094.337	
TOTALE (ente)			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 107.094.337	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	3,6%	

Soggetto attuatore: Comune di Monselice							Settore:	Disinquinamento
Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
55	Fognatura di Monselice						Lavori ultimati.	
			L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 4.519.027.355		
Subtotale (legge - esercizio)			L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 4.519.027.355		
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
9	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Monselice						Progetto in istruttoria	
			L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0		
Subtotale (legge - esercizio)			L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0		
TOTALE (ente)			L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 4.519.027.355		
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	50,0%	45,2%		

Soggetto attuatore: Comune di Musile di Piave						Settore:	Disinquinamento
Legge	910/86	Es. 1987-1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
9	Lavori di costruzione del lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)		L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 356.072.615	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 356.072.615	
Legge	67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
4	Ampliamento della rete fognaria di Musile di Piave (VE)		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 1.505.070.836	Lavori in corso.
13	Ampliamento impianto di depurazione del Comune di Musile di Piave (VE)		L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 1.505.070.836	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
22	Completamento funzionale dell'impianto di depurazione comunale di Musile di Piave		L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)			L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)			L. 5.400.000.000	L. 5.400.000.000	L. 5.000.000.000	L. 1.861.143.451	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	92,6%	34,5%	

Soggetto attuatore: Comune di Noale					Settore:	Disinquinamento
Legge 515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
23	Realizzazione di un parco ecologico - bacino di lagunaggio in Comune di Noale	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)		L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)		L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	0,0%	0,0%	

Soggetto attuatore: Comune di Padova					Settore:	Disinquinamento
Legge 515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
10	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nordio in Comune di Padova	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)		L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)		L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	0,0%	0,0%	

Soggetto attuatore: Comune di Piove di Sacco					Settore:	Disinquinamento
Legge 139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
48	Sistemazioni idraulico-ambientali di Piove di Sacco ("Vallo di circonvallazione")	L. 3.117.332.477	L. 3.117.332.477	L. 3.117.332.477	L. 2.975.475.333	Lavori in corso.
49	Ampliamento fognature di Piove di Sacco	L. 3.882.667.523	L. 3.882.667.523	L. 3.882.667.523	L. 3.070.776.018	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)		L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 6.046.251.351	
TOTALE (ente)		L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 6.046.251.351	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	86,4%	

Soggetto attuatore: Comune di Quarto d'Altino					Settore:	Disinquinamento
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
21	Legge 910/86	Es. 1987-1988	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.350.000.000	Lavori ultimati.
		Costruzione della rete fognaria di Quarto d'Altino (VE)				
		Subtotale (legge - esercizio)	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.350.000.000	
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
8	Legge 67/88	Es. 1990	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 4.120.463.660	Lavori in corso.
		Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino (VE)				
		Subtotale (legge - esercizio)	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 4.120.463.660	
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
43	Legge 139/92	Es. 1993	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.741.403.278	Lavori in corso.
		Interventi alle fognature di Quarto d'Altino (il stralcio)				
		Subtotale (legge - esercizio)	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.741.403.278	
TOTALE (ente)			L. 10.500.000.000	L. 10.500.000.000	L. 9.211.866.938	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	87,7%	

Soggetto attuatore: Comune di San Biagio di Callalta					Settore:	Disinquinamento
Legge 515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
14	Ampliamento della rete fognaria e realizzazione l'istralcio dell'impianto di depurazione comunale della frazione Olmi in Comune di San Biagio di Callalta	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	0,0%	0,0%	

Soggetto attuatore: Comune di Venezia

Settore: Disinquinamento

Legge	79/84	Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6	Costruzione della fognatura di Treponti (VE)						Lavori ultimati
			L. 2.700.000.000	L. 2.700.000.000	L. 2.700.000.000	L. 2.672.031.910	
7	Costruzione rete fognaria del Lido (VE) - V lotto						Lavori ultimati
			L. 3.090.000.000	L. 3.090.000.000	L. 3.090.000.000	L. 3.074.777.797	
9	Completamento scollmatore bacino S. Giuliano (VE)						Lavori ultimati
			L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.992.669.601	
10	Costruzione della fognatura del Terraglio (VE)						Lavori ultimati
			L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.158.394.619	
11	Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (VE) - II lotto						Lavori ultimati. La somma residua di L. 1.150 ml è stata destinata ai lavori della fognatura di Carpenedo L. 910/86 es. 1989 n. 4 (decreto n. 55 del 12.10.94)
			L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 2.887.959.819	
12	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - III lotto						Lavori ultimati
			L. 1.150.000.000	L. 1.150.000.000	L. 1.150.000.000	L. 1.124.100.837	
13	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - I lotto						Lavori ultimati
			L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 4.023.025.949	
16	Completamento delle fognature di Via Torino - Mesire VE						Lavori ultimati
			L. 1.650.000.000	L. 1.650.000.000	L. 1.650.000.000	L. 1.586.526.731	
17	Costruzione della fognatura ed impianto di depurazione di Pellestrina e S. Pietro in Volta (VE)						Con D.G.R. n. 5342 del 9.11.94, il Comune di Venezia è stato autorizzato a elaborare un nuovo progetto, esaminato dalla CTRA il 30.07.98.
			L. 1.310.000.000	L. 1.310.000.000	L. 1.310.000.000	L. 0	Lavori ultimati
18	Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mesire - Marghera						
			L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	
26	Interventi di risanamento igienico ed edilizio di Pellestrina e S. Pietro in Volta						E' stato sottoscritto l'accordo di programma tra Regione e Comune
			L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 31.800.000.000	L. 31.800.000.000	L. 31.800.000.000	L. 19.519.487.263	

Legge 910/86 Es. 1987-1988		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
17	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VII lotto	L. 3.100.000.000	L. 3.100.000.000	L. 3.100.000.000	L. 242.513.283	Progetto approvato
19	Costruzione della rete secondaria di fognatura di Pellestrina	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	Progetto approvato
20	Costruzione della rete di fognatura di S. Marta (VE)	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 89.005.091	Il progetto dell'impianto di depurazione è stato bocciato dalla Commissione per la Salvaguardia. Il Comune ha rielaborato il progetto.
22	Interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e nere a completamento della fognatura consortile Mestre - Marghera (VE)	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 5.761.005.698	Lavori ultimati
23	Costruzione dell'impianto di depurazione e scarico a mare di Pellestrina (VE)	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 0	E' stato approvato il progetto di collegamento all'impianto del Lido
Subtotale (legge - esercizio)		L. 20.800.000.000	L. 20.800.000.000	L. 20.800.000.000	L. 6.092.524.072	
Legge 910/86 Es. 1989		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3	Costruzione della vasca di pioggia del nodo idraulico di Ca' Emiliani - Loc. Rana (VE)	L. 7.750.000.000	L. 7.750.000.000	L. 7.750.000.000	L. 735.000.000	Progetto approvato. Appalto in corso (ritardata perizia geologica e calcoli statici nuovi)
10	Fognatura S. Erasmo	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	E' stato sottoscrit. l'accordo di programma tra Reg. e Com. Il finanz. deriva dalla somma degli importi di due prog. abbandonati riguardanti interventi al Cavallino: fognatura (L. 3.8 Mid) e comparto denitr. del dep. (L. 1.2 Mid). Vd. DGR 3324 del 29.7.96.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 12.750.000.000	L. 12.750.000.000	L. 7.750.000.000	L. 735.000.000	
Legge 67/88 Es. 1988		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (VE)	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 407.953.305	Progetto in fase di redazione. Con DGR n. 4523 del 1/12/1988 sono stati stanziati ulteriori L. 2 Mid dai fondi ex Legge n. 67/88. Incarico per progetto definitivo
Subtotale (legge - esercizio)		L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 407.953.305	

Legge 67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3	Ampliamento delle fognature di Pellestrina (VE)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	
9	Ampliamento delle fognature del Lido di Venezia	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 3.000.000.000	Lavori in corso.
12	Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo - Bissuola (VE)	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 1.398.768.536	I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Campalto. Progettazione in corso
Subtotale (legge - esercizio)		L. 21.500.000.000	L. 21.500.000.000	L. 21.500.000.000	L. 4.398.768.536	
Legge 67/88	Es. 1991	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3	Impianto di depurazione di Pellestrina (VE)	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	Fondi riallocati per fognatura di Pellestrina. Progetto in fase di redazione
Subtotale (legge - esercizio)		L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	
Legge 67/88	Es. 1992 - I ^a fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6	Potenziamento dell'impianto di sollevamento Rana e costruzione di un modulo di sedimentazione	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 0	E' stato dato nulla osta alla modifica progettuale.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 0	
Legge 360/91		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3	Bonifica della discarica di rifiuti Ca' Emiliani (Marghera)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	Il Comune di Venezia doveva presentare il progetto nel 1991
4	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bonifica discarica di S. Giuliano (VE) - lotto "B1"	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	

Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
20		Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Campalto e Tessera	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 0	Progetto in fase di redazione.
21		Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto	L. 14.000.000.000	L. 14.000.000.000	L. 14.000.000.000	L. 419.046.464	Progetto approvato. Importo complessivo £ 20.000 ml vedi L. 139/92 II fase (8)
40		Progetto integrato escavo rii - centro storico di Venezia	L. 35.000.000.000	L. 35.000.000.000	L. 35.000.000.000	L. 20.828.813.700	Lavori in corso.
44		Interventi alle fognature di Pellestrina	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	Progetto approvato.
45		Interventi alle fognature del Lido	L. 9.000.000.000	L. 9.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso
Subtotale (legge - esercizio)			L. 65.400.000.000	L. 65.400.000.000	L. 56.400.000.000	L. 21.247.860.164	
Legge	139/92	Il fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
4		Progetto Fusina: completamento della rete fognaria e relativi allacciamenti nell'area Mestra-Gazzera e Mestra-Malcontenta	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
7		Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
9		Progetto Campalto: ampliamento dell'impianto di depurazione di Campalto (V linea)	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione. Importo complessivo £ 20.000ml finanziato con 14.000 ml sulla L. 139/92 I fase (18)
10		Progetto Campalto: adeguamento della rete principale di via Torino e interconnessione con la rete di Mestre	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
12		Progetto Campalto: costruzione tronco di interconnessione tra il collettore Acque Basse ed i bacini di via Torino e S. Giuliano	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
13		Progetto Campalto: regolazione dei flussi di piena e di trattamento acque di pioggia a S. Giuliano	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
21		Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali delle reti fognarie del Comune di Venezia	L. 6.700.000.000	L. 6.700.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
26		Escavo rii nel centro storico di Venezia	L. 32.000.000.000	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	Elaborato il piano programma degli interventi
Subtotale (legge - esercizio)			L. 71.700.000.000	L. 71.700.000.000	L. 0	L. 0	

Legge 539/95	Es. 1996	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
9	Escavo dei ril del centro storico di Venezia	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Elaborato il piano programma degli interventi
Subtotale (legge - esercizio)		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
Legge 539/95	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
9	Escavo ril nel centro storico di Venezia	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Importo complessivo: L. 26.000.000.000 finanziato con DGR n. 553 del 25.02.97 e DGR 2613 del 22.07.97 (vedi C/26/r)
Subtotale (legge - esercizio)		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
Legge 515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
25	Ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria in Comune di Venezia	L. 53.000.000.000	L. 53.000.000.000	L. 0	L. 0	
28	Progetto scavo ri	L. 23.000.000.000	L. 23.000.000.000	L. 0	L. 0	Importo complessivo: L. 26.000.000.000 finanziato con DGR n. 553 del 25.02.97 e DGR 2613 del 22.07.97 (vedi C/26/r)
Subtotale (legge - esercizio)		L. 76.000.000.000	L. 76.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)		L. 327.950.000.000	L. 327.950.000.000	L. 153.750.000.000	L. 54.401.593.340	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	46,9%	16,6%

Soggetto attuatore: Comune di Zero Branco					Settore:	Disinquinamento
Legge 515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
15	Ampliamento della rete fognaria e completamento del costruendo impianto di depurazione comunale	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 95.136.000	Progetto approvato.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 95.136.000	
TOTALE (ente)		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 95.136.000	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	3,2%	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

CONSORZI DI BONIFICA

CONSORZIO ADIGE - BACCHIGLIONE
CONSORZIO BASSO PIAVE
CONSORZIO BRENTA - BACCHIGLIONE
CONSORZIO DESE - SILE
CONSORZIO SINISTRA - MEDIO BRENTA

Soggetto attuatore: Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione						Settore:	Disinquinamento
Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
57	Intervento di diversione idraulica della laguna - incremento invasi - monitoraggio e telecontrollo						
			L. 25.000.000.000	L. 25.000.000.000	L. 25.000.000.000	L. 9.117.587.382	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 25.000.000.000	L. 25.000.000.000	L. 25.000.000.000	L. 9.117.587.382	
Legge	139/92	Il fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
32	Interventi strutturali: ricablizzazione e sostegni sui ril Barbegara, Rebosola e S. Silvestro						
			L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 449.017.816	Progetto approvato
37	Integrazione di rete civile e rete di bonifica - Monselice						
			L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di approvazione
Subtotale (legge - esercizio)			L. 15.000.000.000	L. 15.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 449.017.816	
TOTALE (ente)			L. 40.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 35.000.000.000	L. 9.566.605.198	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	87,5%	23,9%	

Soggetto attuatore: Consorzio di bonifica Basso Piave						Settore:	Disinquinamento
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
19	Miglioramento della efficienza dello scarico delle reti fognarie						
			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	0,0%	0,0%	

Soggetto attuatore: Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione					Settore:	Disinquinamento
Legge 139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
50	Sistemazioni idraulico-ambientali area Brenta-Bacchiglione (loce lagunare di Lova)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.569.204.990	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.569.204.990	
Legge 139/92	Il fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
35	Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Fiumicello (Idrovora Cambroso)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)		L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.569.204.990	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	50,0%	42,8%	

Soggetto attuatore: Consorzio di bonifica Dese - Sile						Settore:	Disinquinamento
Legge	798/84	Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
8	Costituzione impianto idroforo Canale Scolmatore F. Marzenego						Lavori ultimati. Il costo totale dell'opera è di 4.700 ml. Vedasi anche intervento relativo alle opere accessorie per L. 1.500 ml (punto 23).
			L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 2.659.880.988	Lavori ultimati
23	Opere accessorie relative all'impianto idroforo del Canale Scolmatore e ristrutturazione rete di bonifica Favaro Veneto (VE)						Lavori ultimati
			L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.610.833.252	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)			L. 4.700.000.000	L. 4.700.000.000	L. 4.700.000.000	L. 4.270.714.240	
Legge	67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
20	Ristrutturazione collettore Acque Basse I lotto						I fondi sono stati riallocati con la li fase degli interventi della L. 139/92 - progetto Campalio.
			L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 1.643.758.731	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 1.643.758.731	
Legge	67/88	Es. 1992 - I ^a fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
7	Impianto idroforo a servizio del Canale Scolmatore del fiume Marzenego - II stralcio						Lavori ultimati.
			L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.400.000.000	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.400.000.000	
Legge	67/88	Es. 1992 - II ^a fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5	Sistemazione del fiume Marzenego "Ramo Beccherie" nel centro di Mestre.						Lavori consegnati
			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	

Legge 139/92	Il fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
11	Progetto Campalto: costruzione del I tronco del collettore Acque Basse	L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso
14	Progetto Campalto: rissezionamento del canale di interconnessione tra gli impianti di Campalto e dello Scolmatore Marzenego	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso
30	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Zero	L. 14.000.000.000	L. 14.000.000.000	L. 14.000.000.000	L. 805.500.000	Progettazione in corso
30	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Dese	L. 16.000.000.000	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
31	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Marzenego per annegare tutta la popolazione civile e istituire un ferreo regime dittatoriale.	L. 15.000.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 65.500.000.000	L. 65.500.000.000	L. 14.000.000.000	L. 805.500.000	
TOTALE (ente)		L. 91.200.000.000	L. 91.200.000.000	L. 39.700.000.000	L. 12.119.972.971	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	43,5%		13,3%

Soggetto attuatore: Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta					Settore:	Disinquinamento	
Legge	67/88	Es. 1992 - II ^a fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3	Progetto Lusore: interconnessione tra fosso Sette e idrovora Malcontenta		L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Per qs. prog., assieme all'altro da 4 Mid assegn. al Cons., è stata pres. richiesta di trasf. come "Potenz. imp. idrov. di Malcontenta" (L. 2,5 Mid) + Sistem. rete Chirignago e interconn. imp. idrov. di Malcontenta (L. 5,5 Mid). Progetti in istruttoria.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	
Legge	139/92	II fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Progetto integrato Fusina - Ricalibratura degli scoli Fondi a Est e Fondi a Sud e sottopasso del Naviglio		L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in istruttoria
2	Progetto integrato Fusina: Ricalibratura canali di bonifica (Bastie, Foscare e Giare) e potenziamento impianto idrovoro		L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione. Con DGR n. 33 del 12/01/1999 ottenuta integrazione di finanziamento per 2,3 Mid richiesta in seguito a verifiche progettuali.
5	Progetto Lusore: Ricalibratura e rinaturalizzazione della rete minore di bonifica interessata dagli apporti di acque urbane bianche		L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	Per qs. prog., assieme all'altro da 4 Mid assegn. al Cons., è stata pres. richiesta di trasf. come "Potenz. imp. idrov. di Malcontenta" (L. 2,5 Mid) + Sistem. rete Chirignago e interconn. imp. idrov. di Malcontenta (L. 5,5 Mid). Progetti in istruttoria.
6	Progetto Fusina: invasi di laminazione e sedimentazione in aree depresse per circa 30 ha con sistemazione a parco e con restituzione all'idrovora di Malcontenta		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto mai presentato. Proposta di riallocazione dei fondi con nuovo P.D. come "Progetto dimostrativo in comune di Dolo".
Subtotale (legge - esercizio)			L. 20.200.000.000	L. 20.200.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)			L. 24.200.000.000	L. 20.200.000.000	L. 0	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				83,5%	0,0%	0,0%	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

REGIONE

REGIONE - A.R.P.A.V.

REGIONE - FOGNATURE E DEPURAZIONE

REGIONE - FORESTE

Soggetto attuatore: Regione - Arpav

Settore:Disinquinamento

Legge	67/88	Es. 1991	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6	Sistema informativo regionale - Nodo laguna						Fondi utilizzati per il SINA regionale. Appalto in corso
			L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 31.475.500	
	Subtotale (legge - esercizio)						
			L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 31.475.500	
Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
42	Interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua						Programma SINA regionale. Appalto in corso
			L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	
58	Estensione rete agrometeorologica						Lavori ultimati.
			L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 995.629.837	
	Subtotale (legge - esercizio)						
			L. 3.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 995.629.837	
Legge	139/92	Il fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
23	Settore agricolo: potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto						Lavori in corso
			L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 1.664.801.750	
24	Settore agricolo: potenziamento del Centro Agrokimico della Regione Veneto						Lavori in corso
			L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 500.000.000	
29	Monitoraggio e controllo rete: sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna						Progettazione in corso da parte dell'ARPAV. Fondi riallocati '98
			L. 12.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	
	Subtotale (legge - esercizio)						
			L. 20.500.000.000	L. 8.500.000.000	L. 8.500.000.000	L. 2.164.801.750	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
27	Potenziamento della rete di telelivellamento agrometeorologica						
			L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
	Subtotale (legge - esercizio)						
			L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)			L. 26.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 3.191.907.087	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				46,2%	38,5%	12,3%	

Soggetto attuatore: Regione - Fognature e Depurazione

Settore: Disinquinamento

Legge	910/86	Es. 1987-1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Lavori di costruzione dell'impianto di sollevamento e modulazione del bacino di Zelarino - Mestre (VE)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.127.578.431	Lavori ultimati. Per saldare la liquidazione si prendono L. 219.085.640 dalla gara n. 24 DDDA n. 5
2	Lavori di costruzione dello sciomatore di via del Bosso a Chirignago - Mestre (VE)	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.638.739.954	Lavori ultimati. L'ulteriore importo è preso dal decreto n. 20 della gara n. 6
3	Lavori di ristrutturazione delle reti fognarie del Cavallino (VE)	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.739.763.660	Lavori ultimati.
4	Lavori di completamento dei sistemi principali di collettamento della rete fognaria di Chioggia (VE)	L. 9.100.000.000	L. 9.100.000.000	L. 9.100.000.000	L. 9.100.000.000	L. 8.439.722.007	Lavori finiti.
5	Lavori di costruzione rete di fognatura zona di via Marini di Marzabotto - bacino Gazzera - Mestre (VE)	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.604.094.383	Lavori ultimati.
6	Lavori di estensione delle reti fognarie secondarie di Chioggia e Sottomarina (VE)	L. 5.900.000.000	L. 5.900.000.000	L. 5.900.000.000	L. 5.900.000.000	L. 5.864.952.186	Lavori ultimati.
7	Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.927.033.321	Lavori finiti.
8	Lavori di costruzione dei collettori fognari di collegamento all'impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.891.470.476	Lavori ultimati.
10	Lavori di costruzione nuovo impianto di sollevamento nel bacino di via Torino e collegamento bacino di S. Giuliano	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.506.154.340	Lavori ultimati. Con DGR n. 4 l'importo di L. 1.500.000.000 è stato portato a L. 1.660.000.000 tramite prelevamento di L. 160.000.000 da gara 5.
11	Lavori di costruzione della rete di fognatura della zona di via Asseggiano - bacino Gazzera (VE)	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.586.084.840	Lavori ultimati. La somma originaria di L. 1.700.000.000 è stata modificata con deliberazione 4650 del 4-10-94
12	Lavori di completamento della fognatura nella zona Nord-Est del Comune di Campagna Lupia (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.027.954.341	Lavori ultimati. con decreto n. 554 del 18.12.1997 la somma originaria di L. 2.000.000.000 è stata portata a 2.040.703.593 per ulteriori oneri.
13	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Chirignago - Mestre (VE)	L. 2.900.000.000	L. 2.900.000.000	L. 2.900.000.000	L. 2.900.000.000	L. 2.488.599.868	Lavori ultimati. - L. 160.000.000 da dare a gara 23.
15	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Carpenedo - Mestre (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.889.695.167	Lavori ultimati.
16	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VI lotto	L. 2.200.000.000	L. 2.200.000.000	L. 2.200.000.000	L. 2.200.000.000	L. 517.711.960	Lavori in corso.
18	Lavori di completamento della rete fognaria del bacino di S. Giuliano di Mestre (VE)	L. 900.000.000	L. 900.000.000	L. 900.000.000	L. 900.000.000	L. 795.866.489	Lavori ultimati.

24	Redazione del Piano Direttore	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	Approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 255 del 19-12-91
25	Lavori di adeguamento delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione - reti di Jesolo Lido (VE)	L. 5.225.000.000	L. 5.225.000.000	L. 5.225.000.000	L. 5.225.000.000	L. 5.208.603.443	Lavori ultimi
29	Lavori di estensione della rete interna ed il collegamento alla rete consortile - Comune di Mira (I parte)	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.329.623.217	Lavori ultimi
30	Lavori di telesegregazione e telecontrollo della fognatura di Jesolo - Philips	L. 1.082.814.095	L. 1.082.814.095	L. 1.082.814.095	L. 1.082.814.095	L. 82.775.316	Lavori in corso
31	Lavori di adeguamento reti e impianto di depurazione di Jesolo (VE) - opere civili ed elettromeccaniche	L. 1.006.869.147	L. 1.006.869.147	L. 1.006.869.147	L. 1.006.869.147	L. 1.006.869.147	Lavori finiti
32	Ispezioni televisive	L. 293.376.629	L. 293.376.629	L. 293.376.629	L. 293.376.629	L. 293.376.629	Lavori ultimi
33	Piano pilota W.R.C.	L. 776.940.129	L. 776.940.129	L. 776.940.129	L. 776.940.129	L. 776.940.129	Lavori finiti
	Subtotale (legge - esercizio)	L. 61.085.000.000	L. 61.085.000.000	L. 61.085.000.000	L. 61.085.000.000	L. 56.743.609.304	
Legge 910/86 Es. 1989							
5	Lavori di estensione rete interna e collegamento alla rete consortile - Comune di Mira - II parte	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.809.404.231	Lavori ultimi
	Subtotale (legge - esercizio)	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.809.404.231	
Legge 67/88 Es. 1990							
7	Aggiornamento del Piano Direttore - seconda fase - Monitoraggio dei corsi d'acqua sfocianti in laguna	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 2.173.165.483	Lavori in corso. Importo diminuito di L. 422.000.000 per Apav. Nuovo importo: L. 4.578.000.
	Subtotale (legge - esercizio)	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 2.173.165.483	
Legge 67/88 Es. 1992 - II^a fase							
2	Quota regionale agenzia per Venezia	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 0	Riallocato con riparto 1998.
	Subtotale (legge - esercizio)	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 0	
Legge 515/96 Es. 1997							
26	Bonifica siti inquinati in Comune di Venezia - Zona industriale di Marghera	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
	Subtotale (legge - esercizio)	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)							
		L. 87.085.000.000	L. 87.085.000.000	L. 82.085.000.000	L. 82.085.000.000	L. 64.726.179.018	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO							
			100,0%	94,3%		74,3%	

Soggetto attuatore: Regione - Foreste					Settore:	Disinquinamento
Legge 360/91	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
5	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - I siralcio	L. 877.000.000	L. 877.000.000	L. 451.296.979	Lavori ultimati per 451 ml.	
6	Progetto per la realizzazione del Bosco di Mestre - II siralcio	L. 793.400.000	L. 793.400.000	L. 396.700.000	Lavori in corso	
7	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - II siralcio	L. 1.329.600.000	L. 1.329.600.000	L. 0	Il Comune di Venezia deve individuare le aree per il bosco	
Subtotale (legge - esercizio)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 1.670.400.000	L. 847.996.979		
TOTALE (ente)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 1.670.400.000	L. 847.996.979		
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	55,7%	28,3%		

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

CONSORZI DI FOGNATURA ED AZIENDE

CONSORZIO ALTA SERVIZI
AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE
A.S.P.I.V.

CENTRO VENETO SERVIZI
CONSORZIO DEL MIRESE
CONSORZIO DEL TERGOLA

Soggetto attuatore: Consorzio Alta Servizi						Settore:	Disinquinamento
Legge	67/88	Es. 1992 - II ^a fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6	Ampliamento impianto di depurazione di Onara						
		L. 2.400.000.000	L. 2.400.000.000	L. 2.400.000.000	L. 2.400.000.000	L. 2.160.000.000	Lavori ultimati.
7	Collettore fognario di adduzione Ovest Fontaniva - Cittadella - Tombolo						
		L. 5.100.000.000	L. 5.100.000.000	L. 5.100.000.000	L. 5.100.000.000	L. 4.590.000.000	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 7.500.000.000	L. 7.500.000.000	L. 7.500.000.000	L. 7.500.000.000	L. 6.750.000.000	
Legge	139/92	II fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
16	Collettore Campretto-Lovari nel comune di S. Martino di Lupat						
		L. 4.050.000.000	L. 4.050.000.000	L. 4.050.000.000	L. 4.050.000.000	L. 516.630.687	Progetto approvato
17	Adeguamento strutture fognarie: fognatura aerea sud di S. Martino di Lupat e collegamento al depuratore di Onara						
		L. 4.250.000.000	L. 4.250.000.000	L. 4.250.000.000	L. 4.250.000.000	L. 166.464.000	Progetto approvato
Subtotale (legge - esercizio)		L. 8.300.000.000	L. 8.300.000.000	L. 8.300.000.000	L. 8.300.000.000	L. 683.094.687	
Legge	539/95	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
4	Fognatura di Cittadella, Fontaniva, Tombolo e San Martino di Lupari						
		L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 47.700.000	Progetto approvato
Subtotale (legge - esercizio)		L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 47.700.000	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3	Ampliamento della rete fognaria del bacino siccante in laguna ed appartenente al Consorzio Alta Servizi						
		L. 2.300.000.000	L. 2.300.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Progetto approvato
4	Progetto della costruzione reti fognarie nei comuni di Cittadella e Fontaniva						
		L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	Progetto approvato
Subtotale (legge - esercizio)		L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	
TOTALE (ente)		L. 24.500.000.000	L. 24.500.000.000	L. 22.200.000.000	L. 7.480.794.687		
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	90,6%	30,5%		

Soggetto attuatore: Azienda Piovese Gestione Acque						Settore:	Disinquinamento
Legge	79/84	Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5	Costruzione del collettore consortile da Piove di Sacco all'impianto di depurazione di Codevigo						Lavori ultimati
			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.313.217.112	
	Subtotale (legge - esercizio)		L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.313.217.112	
Legge	67/88	Es. 1992 - I ^a fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	Realizzazione di collettori fognari e depurazione nell'area sud del Piovese						Lavori in corso.
			L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 2.704.124.609	
	Subtotale (legge - esercizio)		L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 2.704.124.609	
Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
51	Completamento impianto di depurazione di Codevigo						Lavori in corso.
			L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 4.635.452.471	
	Subtotale (legge - esercizio)		L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 4.635.452.471	
Legge	139/92	II fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
18	Adeguamento strutture fognarie: miglioramento reti secondarie nei comuni di Legnaro e S. Angelo di Piove						Lavori ultimati
			L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	
19	Adeguamento strutture fognarie: progetto esecutivo per il disinquinamento area sud del Piovese (Pontelongo, Correzzola e Cona)						Lavori in corso.
			L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.434.596.284	
20	Adeguamento strutture fognarie: estensione rete fognaria in località San Pieri in Comune di Piove di Sacco						Lavori in corso
			L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.055.267.230	
	Subtotale (legge - esercizio)		L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 3.489.863.514	

Legge 539/95 Es. 1996		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
8	Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari del Consorzio del Piovese - I stralcio (Legnaro, S. Angelo di Piove e Polverara)	L. 2.450.000.000	L. 2.450.000.000	L. 2.450.000.000	L. 261.830.463	Lavori in corso.
10	Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari del Consorzio del Piovese - II stralcio (S. Angelo di Piove, Brugine, Piove di Sacco, Arzergrande e Pontelongo)	L. 2.750.000.000	L. 2.750.000.000	L. 2.750.000.000	L. 291.680.455	Lavori in corso.
11	Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari del Consorzio del Piovese - III stralcio (Brugine, Piove di Sacco e Correzzola)	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 193.714.776	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)		L. 8.600.000.000	L. 8.600.000.000	L. 8.600.000.000	L. 747.225.694	
Legge 515/96 Es. 1997		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5	Ampliamento delle reti di fognatura e del sistema depurativo nel territorio del consorzio del Piovese	L. 15.000.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di approvazione
Subtotale (legge - esercizio)		L. 15.000.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)		L. 40.300.000.000	L. 40.300.000.000	L. 25.300.000.000	L. 13.889.883.400	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	62,8%	34,5%	

Soggetto attuatore: A.S.P.I.V.

Settore:						Disinquinamento	
Legge	79/84	Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	*	Ampliamento e completamento impianto di depurazione di Campalto (VE) - Telecontrollo	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	Con DGR n. 3183 del 22-7-96, i fondi sono stati destinati alla vasca di pioggia della Gazzera (imp. complessivo £ 4.400.000.000 vedi n. 22 L. 139/92 esercizio 1993)
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	
Legge	910/86	Es. 1987-1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
14	*	Lavori di costruzione del collettore di via Paleocapa e via Canal - Marghera (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.263.190.978	Lavori in corso. Con DDDA n. 6 DEL 27/01/1997 il finanziamento è stato modificato da L. 2.000.000.000 a L. 1.790.000.000.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.263.190.978	
Legge	910/86	Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	*	Costruzione vasca di modulazione di Favaro Veneto (VE)	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 1.816.000.000	Lavori in corso.
4	*	Costruzione fognatura di via San Donà a Carpenedo - Mesire (VE)	L. 3.750.000.000	L. 3.750.000.000	L. 3.750.000.000	L. 3.083.146.262	Lavori in corso. L'importo del progetto è di L. 4.900 ml cui si fa fronte per L. 3.750 ml con i fondi della L. 910/86 e per L. 1.150 ml presi dal decreto n. 1001 del 26.10.97 (fognatura di Carpenedo - il lotto). Lavori ultimati.
7	*	Impianto di depuratore del Cavallino - adeguamento della fase biologica alla rimozione dell'azoto	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.079.483.722	
8	*	Fognatura e depurazione del Lido e del Cavallino	L. 3.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 0	L. 0	Progetto finito
Subtotale (legge - esercizio)			L. 12.250.000.000	L. 12.250.000.000	L. 8.450.000.000	L. 5.978.629.984	
Legge	67/88	Es. 1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	*	Completamento dell'impianto di trattamento di Campalto - Opere accessorie	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.145.039.432	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.145.039.432	

Legge 67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2 *	Ampliamento della fognatura del Cavallino (VE) - il stretch	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.462.027.650	Lavori ultimati.
15 *	Costruzione della vasca di accumulo acque meteoriche di piazzale Giovannacci - Marghera (VE)	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 6.257.557.022	Lavori in corso.
16 *	Razionalizzazione della rete fognaria di Marghera (VE) - via Asseggiano a Chirignago	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 4.678.668.631	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)		L. 21.000.000.000	L. 21.000.000.000	L. 21.000.000.000	L. 16.398.253.303	
Legge 67/88	Es. 1991	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 *	Estensione della rete fognaria di tipo separato nella zona di Trivignano Zelandino - il lotto	L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 5.105.711.226	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)		L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 5.105.711.226	
Legge 67/88	Es. 1992 - I ^a fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5 *	Progetto di rifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.096.758.909	Lavori ultimati. I fondi sono stati riallocati con PCR n. 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 - progetto Lusore.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.096.758.909	

Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
11	*	Ristrutturazione dei collettori principali di fognatura di via Torino a Mestre	L. 9.200.000.000	L. 9.200.000.000	L. 9.200.000.000	L. 7.666.774.712	Lavori in corso.
12	*	Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano	L. 5.800.000.000	L. 5.800.000.000	L. 5.800.000.000	L. 2.134.952.922	Lavori in corso.
13	*	Completamento della rete di fognatura separata della zona del Terraglio - bacino di Carpenedo - Mestre	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 3.097.155.179	Lavori in corso.
14	*	Estensione della rete di fognatura separata nella zona di Marghera tra SS. Romea e autostrada VE-PD	L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.857.094.871	Lavori in corso.
15	*	Completamento della fognatura nella zona di Gazzera - Mestre	L. 3.900.000.000	L. 3.900.000.000	L. 3.900.000.000	L. 2.406.016.849	Lavori in corso.
16	*	Ristrutturazione della fognatura nella zona di Cipressina - Zelarino	L. 5.300.000.000	L. 5.300.000.000	L. 5.300.000.000	L. 2.460.870.875	Lavori in corso.
17	*	Ricostruzione della fognatura di via S. Dona - Bacino di Carpenedo	L. 7.200.000.000	L. 7.200.000.000	L. 7.200.000.000	L. 1.733.982.694	Lavori in corso.
18	*	Ricostruzione della fognatura della zona di via Silvio Trentin - Mestre	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 942.381.164	Lavori in corso.
19	*	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Veneto	L. 4.200.000.000	L. 4.200.000.000	L. 4.200.000.000	L. 3.579.019.851	Lavori in corso.
22	*	Risanamento fognario nella zona di Carpenedo (via Tevere)	L. 9.600.000.000	L. 9.600.000.000	L. 9.600.000.000	L. 213.654.844	Lavori in corso.
23	*	Completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcontenta	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 197.756.572	Lavori fermi - problemi con espropri.
24	*	Ricostruzione della rete fognaria nella zona del centro urbano di Mestre alligata al canale Osellino	L. 3.700.000.000	L. 3.700.000.000	L. 3.700.000.000	L. 1.559.528.594	Lavori in corso.
25	*	Vasca di pioggia della Gazzera	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 0	L. 0	Importo complessivo £ 4.400 ml vedi L. 798/84 es. 1984-1985-1986 (1). Progetto approvato.
46	*	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Est - Ca' di Valle	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 2.260.933.247	Lavori in corso.
47	*	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Ovest - Ca' Savio	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 2.916.967.359	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 79.600.000.000	L. 79.600.000.000	L. 76.200.000.000	L. 34.027.089.733	
TOTALE (ente)			L. 131.450.000.000	L. 131.450.000.000	L. 124.250.000.000	L. 70.014.673.585	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	94,5%	53,3%	

Soggetto attuatore: Centro Veneto Servizi					Settore:	Disinquinamento
Legge 515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	Ampliamento dello schema fognario della zona del Conselvano	L. 11.500.000.000	L. 11.500.000.000	L. 11.500.000.000	L. 479.796.880	Progetto approvato.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 11.500.000.000	L. 11.500.000.000	L. 11.500.000.000	L. 479.796.880	
TOTALE (ente)		L. 11.500.000.000	L. 11.500.000.000	L. 11.500.000.000	L. 479.796.880	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	4,2%	

Soggetto attuatore: Azienda Consorzio del Mirese						Settore:	Disinquinamento
Legge	79/84	Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
20	Costruzione della rete di fognatura consortile del Mirese - XIV lotto sub B (VE)						L. 400.000.000 L. 400.000.000 L. 400.000.000 L. 344.611.615 Lavori ultimati.
21	Completamento funzionale di opere fognarie precedentemente realizzate nel Consorzio del Mirese						L. 4.600.000.000 L. 4.600.000.000 L. 4.600.000.000 L. 4.566.546.236 Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)			L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 4.911.157.851	
Legge	910/86	Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Costruzione della rete fognaria di Campagna Lupia - capoluogo (VE)						L. 3.000.000.000 L. 3.000.000.000 L. 3.000.000.000 L. 2.700.000.000 Lavori in corso. Il progetto complessivo di £ 4.290 ml finanziati con la L. n. 910/86 es. 1989 1 ml e 290 ml sui fondi MESPA-CEE Lavori ultimati.
6	Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase						L. 14.500.000.000 L. 14.500.000.000 L. 14.500.000.000 L. 13.183.153.150 Lavori ultimati.
12	Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase: Rilievi ed ispezioni televisive collettori fognari						L. 500.000.000 L. 500.000.000 L. 500.000.000 L. 500.000.000 Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 16.383.153.150	
Legge	67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6	Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (VE)						L. 1.000.000.000 L. 1.000.000.000 L. 1.000.000.000 L. 762.635.986 Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 762.635.986	
Legge	67/88	Es. 1992 - I ^a fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Realizzazione di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature						L. 8.000.000.000 L. 8.000.000.000 L. 0 Progettazione in corso
Subtotale (legge - esercizio)			L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	L. 0	

Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6		Completamento fognatura nera in Comune di Noale	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 1.752.167.054	Lavori ultimati
7		Completamento fognatura nera in Comune di Salzano	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	Lavori finiti
8		Interventi alla rete fognaria nel Comune di Martellago	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.090.578.477	Lavori in corso
9		Interventi alla rete fognaria nel Comune di Scorzè	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.498.026.740	Lavori ultimati
10		Vasca di pioggia di Noale	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 497.597.690	Progetto approvato
26		Interventi alle fognature del Consorzio del Mirese	L. 7.880.000.000	L. 7.880.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso.
27		Pulizia, ispezione televisiva e rilievo di condotte fognarie nei comuni di Dolo e Spinea	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 228.391.144	Progetto approvato.
28		Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Mirano	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 5.659.194.092	Lavori in corso.
29		Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di S. Maria di Sala	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.176.917.184	Lavori ultimati
30		Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Vigonovo	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.074.875.248	Lavori ultimati
31		Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Sira	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.438.799.687	Lavori in corso
32		Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Fiesco d'Artico	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.599.670.996	Lavori ultimati
33		Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Dolo	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 2.766.711.834	Lavori in corso
34		Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Pianiga	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.797.006.027	Lavori ultimati
35		Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Campolongo Maggiore	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.050.315.095	Lavori ultimati
36		Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - I stralcio	L. 4.950.000.000	L. 4.950.000.000	L. 4.950.000.000	L. 3.534.913.538	Lavori in corso.
37		Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - II stralcio	L. 6.550.000.000	L. 6.550.000.000	L. 6.550.000.000	L. 6.146.211.441	Lavori ultimati
38		Lavori di costruzione fognature nel Comune di Camponogara	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	Lavori finiti.
39		Interventi alle fognature nel Comune di Fossò	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	Lavori finiti.
Subtotale (legge • esercizio)			L. 60.000.000.000	L. 60.000.000.000	L. 52.120.000.000	L. 44.811.376.247	

Legge	539/95	Es. 1996	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
7	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Consorzio del Mirese		L. 4.900.000.000	L. 4.900.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
	Subtotale (legge - esercizio)		L. 4.900.000.000	L. 4.900.000.000	L. 0	L. 0	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
20	Ampliamento ed ottimizzazione delle reti fognarie del Consorzio del Mirese		L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 0	L. 0	
	Subtotale (legge - esercizio)		L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)			L. 118.900.000.000	L. 116.900.000.000	L. 76.120.000.000	L. 66.868.323.234	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	65,1%	57,2%	

Soggetto attuatore: Consorzio del Tergola						Settore:	Disinquinamento
Legge	67/88	Es. 1991	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
7	Impianto di Vigonza (PD)		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	Lavori in corso. Importo complessivo £ 14.800 ml vedi L. 139/92 - esercizio 1993 (n.6)
8	Interventi nel settore della zootecnia dell'alta padovana		L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	Progetto approvato. Fondi destinati all'impianto di biotattamento di Camposampiero (Approvato CTRA 28/1/98)
Subtotale (legge - esercizio)			L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 0	
Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Appalti A e B		L. 31.300.000.000	L. 31.300.000.000	L. 31.300.000.000	L. 22.749.312.702	Lavori in corso
2	Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza		L. 12.600.000.000	L. 12.600.000.000	L. 12.600.000.000	L. 12.219.105.403	Lavori quasi ultimati. Importo complessivo 14,8 Mld
3	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero		L. 8.400.000.000	L. 8.400.000.000	L. 8.400.000.000	L. 0	Progetto impianto di biotattamento approvato dalla CTRA. Importo complessivo 44,4 Mld
4	Progetto del collettore di collegamento della rete di Loreggia al depuratore di Camposampiero - XV lotto		L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.357.665.676	Lavori ultimati
5	Collegamento della rete di Borgoricco a Villanova di Camposampiero		L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 2.361.670.130	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)			L. 57.000.000.000	L. 57.000.000.000	L. 57.000.000.000	L. 38.687.753.911	

Legge	539/95	Es. 1996	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali dei comuni del Consorzio del Tergola		L. 213.000.000	L. 213.000.000	L. 213.000.000	L. 316.568.066	Fondi trasferiti al progetto "rete fognaria Camposampiero - Trebasaleghe" di costo complessivo L. 243 ml (vedasi L. 539/95 es. 97 n° 17)
2	Ampliamento rete fognaria comunale di Borgorico		L. 250.000.000	L. 250.000.000	L. 250.000.000	L. 0	Lavori in corso
3	Ampliamento rete fognaria comunale di Massanzago		L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	Lavori in corso
4	Ampliamento rete fognaria in comune di Vigonza		L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 316.568.066	Lavori in corso
5	Completamento del collegamento fognario tra Cavino di S. Giorgio delle Pericchie e Camposampiero		L. 737.000.000	L. 737.000.000	L. 737.000.000	L. 0	Lavori in corso
12	Progetto fognatura acque nere in comune di Villanova di Camposampiero - I stralcio		L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	In corso di esecuzione
13	Progetto allargamento fognatura in comune di Camposampiero		L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 0	In corso di esecuzione
14	Progetto rete fognaria comune di Noventa Padovana		L. 560.000.000	L. 560.000.000	L. 560.000.000	L. 0	In corso di esecuzione
Subtotale (legge - esercizio)			L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 633.136.132	

Legge	539/95	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5	Collegamento delle fognature di Villa del Conte all'impianto di Camposampiero		L. 4.300.000.000	L. 4.300.000.000	L. 4.300.000.000	L. 0	Lavori appaltati. Conforme al generale.
11	Ampliamento impianto di depurazione di Cadoneghe		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
12	Impianto di biotattamento di Camposampiero		L. 23.000.000.000	L. 23.000.000.000	L. 23.000.000.000	L. 0	Progetto approvato. Importo complessivo 44,4 Mld
13	Progetto fognatura nera in comune di S. Giustina in Colle		L. 545.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	
14	Progetto fognatura nera in comune di Cadoneghe		L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
15	Progetto fognatura nera in comune di S. Giorgio delle Pertiche		L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	
16	Progetto rete fognaria in comune di Loreggia		L. 580.000.000	L. 580.000.000	L. 580.000.000	L. 0	
17	Progetto rete fognaria Camposampiero - Trebaseleghe		L. 2.225.000.000	L. 2.225.000.000	L. 0	L. 0	Costo complessivo L. 2.438 ml. 1.213 ml mancanti provengono da L. 533/95 es. 96 n° 1.
18	Progetto rete fognaria in comune di Saonara		L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 34.300.000.000	L. 33.755.000.000	L. 28.330.000.000	L. 0	
TOTALE (ente)			L. 102.300.000.000	L. 101.755.000.000	L. 96.330.000.000	L. 39.320.890.043	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				99,5%	94,2%	38,4%	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

ALTRI

ENTE DI BACINO R.S.U. VE 2
IN ATTESA DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI
U.S.L. n. 16 - VENEZIA
SOC. DELTA PO S.p.A.

Soggetto attuatore: Ente di bacino R.S.U. VE 2						Settore: Disinquinamento	
Legge	67/88	Es. 1991	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia						Lavori ultimati
			L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 8.599.341.709	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 8.599.341.709	
Legge	360/91		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia						Lavori ultimati
			L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.394.123.516	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.394.123.516	
Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
41	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia-Marghera, loc. Malcontentia						Lavori finiti.
			L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 17.999.999.998	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 17.999.999.998	
Legge	539/95	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Completamento Impianto R.S.U. di Venezia (Fusina)						Lavori ultimati. L'importo complessivo è di £ 78.252 ml finanziato con 35.331 ml con i fondi FIO, £ 6.500 ml sulla L. 360/91 (1), £ 13.000 ml sulla L. 67/88 es. 1991 (3) £ 18.000 sulla L. 139/92 (4) e 5.700 ml sulla L. 539/95 es. 1997 (1)
			L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.197.146.150	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.197.146.150	
TOTALE (ente)			L. 43.200.000.000	L. 43.200.000.000	L. 43.200.000.000	L. 38.190.611.373	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	88,4%	

Soggetto attuatore: In attesa di indiv. sogg. attuatori						Settore:	Disinquinamento
Legge	798/84	Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
25	Costruzione fognatura centro storico di Venezia - stralcio funzionale della Giudecca (VE)			L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 165.390.474	Proposta riallocazione con il riparto fondi 1998.
Subtotale (legge - esercizio)				L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 165.390.474	
Legge	910/86	Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
11	Costruzione della rete fognaria della Giudecca (VE)			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	Fondi riallocati con riparto 1998
Subtotale (legge - esercizio)				L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	
Legge	67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Progetto depuratore Fusina (linea di filtrazione per il riutilizzo delle acque trattate - I stralcio)			L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 222.797.157	I fondi originariamente dati alla filtrazione di Fusina, sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Fusina. I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 - depurazione Fusina
Subtotale (legge - esercizio)				L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 222.797.157	
Legge	67/88	Es. 1992 - II^ fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Progetto integrato depurazione Fusina B16			L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 0	I fondi originariamente destinati all'impianto del Mirese sono stati riallocati con PCR n. 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Fusina. Riallocato con riparto 1998.
4	progetto integrato depurazione Fusina			L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase. Riallocato con riparto 1998.
Subtotale (legge - esercizio)				L. 36.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 0	
Legge	360/91		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	Progetto pilota del bacino del Marzenego			L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	Riallocato con riparto 1998
Subtotale (legge - esercizio)				L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	

Legge	139/92	Il fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3		Progetto integrato Fusina: opera ancora da individuare	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
8		Progetto Fusina: spese di gestione riferite all'intero progetto	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
15		Progetto Campalto: spese di gestione riferite all'intero progetto	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
22		Prevenzione: normativa e regolamentazioni, istituzione di incentivazioni	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
25		Interventi strutturali: gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole - I lotto	L. 30.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Adottata DGR per avviare le attività
27		Protezione zootecnica: gestione relativi zootecnici	L. 13.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Adottata DGR per avviare le attività
28		Protezione zootecnica: interventi strutturali in zootecnica	L. 40.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Adottata DGR per avviare le attività
33		Interventi strutturali: estensione del sistema di telecontrollo a tutto il bacino scolastico	L. 7.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
34		Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Tergola (sostegno di Torre di Burri)	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
36		Fitoripulitura estuarina sul Canale Vela	L. 10.500.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
38		Regolazione iniezioni da Sile, Brenta e Nodo Castelfranco	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
39		Gestione acque di magra del Brenta - Bacchiglione - LEB	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
		Subtotale (legge - esercizio)	110.800.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	
Legge	515/96	Es. 1998	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1		RIPARTO IN CORSO DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE	117.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	
		Subtotale (legge - esercizio)	117.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	
Legge	345/97	Es. 1998	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1		RIPARTO IN CORSO DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE	263.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	
		Subtotale (legge - esercizio)	263.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)			L. 539.300.000.000	L. 30.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 388.187.631	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				5,6%	1,9%	0,1%	

Soggetto attuatore: U.S.S.L. n. 12 - Venezia

Settore: Disinquinamento

Legge	67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
10	Riabilitazione funzionale delle fognature del centro storico di Venezia (ospedale SS. Giovanni e Paolo)						Lavori in corso.
			L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.748.397.236	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.748.397.236	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
24	Ristrutturazione della rete fognaria di complessi ospedalieri: ospedale civile (SS. Giovanni e Paolo) e G.B. Giustinian. Primo stralcio funzionale						Progetto approvato.
			L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 52.317.735	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 52.317.735	
TOTALE (ente)			L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 1.800.714.971	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	45,0%	

Soggetto attuatore: Comune di Chloggia						Settore:	Acquedotti
Legge	798/84	Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Potenziamento servizio idrico frazioni Ca' Bianca e Valli	L. 290.000.000	L. 290.000.000	L. 290.000.000	L. 290.000.000	L. 285.726.106	Lavori finiti
2	Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio	L. 1.710.000.000	L. 1.710.000.000	L. 1.710.000.000	L. 1.710.000.000	L. 1.218.534.302	Lavori in fase di esecuzione. L'importo complessivo è di £ 3.710.000.000
Subtotale (legge - esercizio)		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.504.260.408	
Legge	910/86	Es. 1987-1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Adeguamento impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 589.750.386	Lavori in fase di esecuzione. L'importo complessivo è di £ 3.710.000.000
Subtotale (legge - esercizio)		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 589.750.386	
Legge	67/88	Es. 1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	Realizzazione vasche di accumulo per acqua grezza alla centrale di Cavanella d'Adige	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 750.000.000	Importo complessivo £ 4.500.000.000
3	Rilascio impianti di sollevamento a Cavanella d'Adige (acqua grezza e potabile)	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 400.000.000	Importo complessivo £ 850.000.000
4	Razionalizzazione reti di distribuzione interna e recupero perdite dell'acquedotto di Chloggia	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 90.254.000	Importo complessivo £ 180.500.000
Subtotale (legge - esercizio)		L. 2.700.000.000	L. 2.700.000.000	L. 2.700.000.000	L. 2.700.000.000	L. 1.240.254.000	
TOTALE (enti)			L. 6.700.000.000	L. 6.700.000.000	L. 6.700.000.000	L. 3.334.284.794	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	49,8%	

Soggetto attuatore: Comune di Venezia						Settore:	Acquedotti
Legge	798/84	Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3	Acquedotto di Venezia		L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	Il Comune sta elaborando un nuovo progetto.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	
Legge	910/86	Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Acquedotto di Venezia		L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	Il Comune sta elaborando un nuovo progetto.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	
TOTALE (ente)			L. 16.000.000.000	L. 16.000.000.000	L. 16.000.000.000	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	0,0%	
Soggetto attuatore: Delta Po S.p.A.							
Legge	67/88	Es. 1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Sistema degli acquedotti del Basso Veneto - Opere in Comune di Chioggia		L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 0	Le opere ricadono all'interno della concessione in essere tra Regione e la Delta Po per la progettazione del sistema degli acquedotti del Basso Veneto
Subtotale (legge - esercizio)			L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 0	
TOTALE (ente)			L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	0,0%	

Soggetto attuatore: U.S.S.L. n. 12 - Venezia					Settore:	
					Ospedali	
Legge	79/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L'importo complessivo è di 30.100 ml finanziari per 12 mld con la L. n. 798/84 es. 1984-85-86, L. 10 mld con la L. n. 910/86 es. 1987-1988, L. 5 mld con la L. n. 910/86 esercizio 1989, 3.100
Subtotale (legge - esercizio)		L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	
Legge	910/86 Es. 1987-1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L'importo complessivo è di 30.100 ml finanziari per 12 mld con la L. n. 798/84 es. 1984-85-86, L. 10 mld con la L. n. 910/86 es. 1987-1988, L. 5 mld con la L. n. 910/86 esercizio 1989, 3.100
Subtotale (legge - esercizio)		L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	
Legge	910/86 Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 147.713.484	L'importo complessivo è di 30.100 ml finanziari per 12 mld con la L. n. 798/84 es. 1984-85-86, L. 10 mld con la L. n. 910/86 es. 1987-1988, L. 5 mld con la L. n. 910/86 esercizio 1989, 3.100
Subtotale (legge - esercizio)		L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 147.713.484	
Legge	539/95 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)		L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)		L. 33.500.000.000	L. 33.500.000.000	L. 27.000.000.000	L. 22.147.713.484	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	80,6%	66,1%	
TOTALE					Finanziato	Erogato
					Impegnato	Contabilizzato
					L. 1.871.300.000.000	L. 1.343.455.000.000
					L. 961.890.400.000	L. 479.919.529.844



GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

SEGRETERIA ALL'AMBIENTE

SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

**PROSPETTO GENERALE
E STATO
DEGLI INTERVENTI
SUDDIVISI PER LEGGI**

AGGIORNATO AL 03/03/1999

TABELLA RIEPILOGATIVA
(per leggi)

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
	SETTORE Disinquinamento			
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	L. 58.000.000.000	L. 58.000.000.000 100,0%	L. 58.000.000.000 100,0%	L. 38.317.278.568 66,1%
Legge 910/86 Es. 1987-1988	L. 88.000.000.000	L. 88.000.000.000 100,0%	L. 88.000.000.000 100,0%	L. 66.727.068.689 75,8%
Legge 910/86 Es. 1989	L. 62.000.000.000	L. 62.000.000.000 100,0%	L. 53.200.000.000 85,8%	L. 37.102.183.472 59,8%
Legge 67/88 Es. 1988	L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000 100,0%	L. 15.500.000.000 100,0%	L. 2.552.992.737 16,5%
Legge 67/88 Es. 1990	L. 104.500.000.000	L. 104.500.000.000 100,0%	L. 104.500.000.000 100,0%	L. 48.480.452.192 46,4%
Legge 67/88 Es. 1991	L. 30.600.000.000	L. 30.600.000.000 100,0%	L. 30.600.000.000 100,0%	L. 15.536.528.435 50,8%
Legge 67/88 Es. 1992 - I^a fase	L. 29.700.000.000	L. 29.700.000.000 100,0%	L. 17.200.000.000 57,9%	L. 14.890.883.518 50,1%
Legge 67/88 Es. 1992 - II^a fase	L. 60.000.000.000	L. 40.000.000.000 66,7%	L. 20.000.000.000 33,3%	L. 6.750.000.000 11,3%
Legge 360/91	L. 16.000.000.000	L. 13.500.000.000 84,4%	L. 10.170.400.000 63,6%	L. 9.242.120.495 57,8%

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
Legge 139/92 Es. 1993	L. 350.000.000.000	L. 348.000.000.000 99,4%	L. 327.720.000.000 93,6%	L. 195.872.420.756 56,0%
Legge 139/92 II fase	L. 320.000.000.000	L. 197.200.000.000 61,6%	L. 45.800.000.000 14,3%	L. 7.592.277.767 2,4%
Legge 539/95 Es. 1996	L. 30.000.000.000	L. 30.000.000.000 100,0%	L. 22.100.000.000 73,7%	L. 2.168.183.081 7,2%
Legge 539/95 Es. 1997	L. 53.500.000.000	L. 52.855.000.000 99,0%	L. 43.700.000.000 81,7%	L. 7.055.010.005 13,2%
Legge 515/96 Es. 1997	L. 200.000.000.000	L. 200.000.000.000 100,0%	L. 58.400.000.000 29,2%	L. 2.150.151.851 1,1%
Legge 515/96 Es. 1998	L. 117.000.000.000	L. 0 0,0%	L. 0 0,0%	L. 0 0,0%
Legge 345/97 Es. 1998	L. 263.000.000.000	L. 0 0,0%	L. 0 0,0%	L. 0 0,0%
TOTALE SETTORE	L. 1.797.800.000.000	L. 1.289.955.000.000	L. 894.890.400.000	L. 454.437.551.568
SETTORE Acquedotti				
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000 100,0%	L. 10.000.000.000 100,0%	L. 1.504.260.408 15,0%
Legge 910/86 Es. 1987-1988	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000 100,0%	L. 2.000.000.000 100,0%	L. 589.750.386 29,5%

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Eregato
Legge 910/86 Es. 1989	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000 100,0%	L. 8.000.000.000 100,0%	L. 0 0,0%
Legge 67/88 Es. 1988	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000 100,0%	L. 20.000.000.000 100,0%	L. 1.240.254.000 6,2%
TOTALE SETTORE	L. 40.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 3.334.284.794
SETTORE Ospedali				
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000 100,0%	L. 12.000.000.000 100,0%	L. 12.000.000.000 100,0%
Legge 910/86 Es. 1987-1988	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000 100,0%	L. 10.000.000.000 100,0%	L. 10.000.000.000 100,0%
Legge 910/86 Es. 1989	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000 100,0%	L. 5.000.000.000 100,0%	L. 147.713.484 3,0%
Legge 539/95 Es. 1997	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000 100,0%	L. 0 0,0%	L. 0 0,0%
TOTALE SETTORE	L. 33.500.000.000	L. 33.500.000.000	L. 27.000.000.000	L. 22.147.713.484
TOTALE	L. 1.871.300.000.000	L. 1.343.455.000.000	L. 961.890.400.000	L. 479.919.529.844

Legenda

Importi finanziati:	Somme messe a disposizione dallo Stato
Importi impegnati:	Importi relativi ad interventi per i quali sono stati individuati i soggetti attuatori
Importi contabilizzati:	Importi dei progetti già approvati dai competenti organi regionali, i cui interventi sono pertanto stati avviati o sono in fase di avvio
Importi erogati:	Importi già erogati ai soggetti esecutori delle opere

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986		Settore: Disinquinamento				
N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
1	A.S.P.I.V. Ampliamento e completamento impianto di depurazione di Campalto (VE) - Telecontrollo	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	Con DGR n. 3183 del 22-7-98, i fondi sono stati destinati alla vasca di pioggia della Gazzera (imp. complessivo £ 4.400.000.000 vedi n. 22 L. 139/92 esercizio 1993)
2	Comune di Mogliano Veneto Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 733.359.359	Lavori ultimati
3	Comune di Jesolo Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (VE)	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.428.520.054	Lavori ultimati.
4	Comune di Marcon Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VIII lotto	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 82.233.170	Il Comune di Marcon con nota n. 17134 del 5/10/98 ha chiesto lo storno della somma per il recupero della fognatura nera di Gaggio
5	Azienda Piovese Gestione Acque Costruzione del collettore consortile da Piove di Sacco all'impianto di depurazione di Codevigo	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.313.217.112	Lavori ultimati
6	Comune di Venezia Costruzione della fognatura di Trepori (VE)	L. 2.700.000.000	L. 2.700.000.000	L. 2.700.000.000	L. 2.672.031.910	Lavori ultimati
7	Comune di Venezia Costruzione rete fognaria del Lido (VE) - V lotto	L. 3.090.000.000	L. 3.090.000.000	L. 3.090.000.000	L. 3.074.777.797	Lavori ultimati
8	Consorzio di bonifica Dese - Sile Costruzione impianto idrovoro Canale Scolmatore F. Marzenego	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 2.659.880.988	Lavori ultimati. Il costo totale dell'opera è di 4.700 ml. Vedasi anche intervento relativo alle opere accessorie per L. 1.500 ml (punto 23).
9	Comune di Venezia Completamento scolmatore bacino S. Giuliano (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.992.669.601	Lavori ultimati
10	Comune di Venezia Costruzione della fognatura del Terraglio (VE)	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.158.394.619	Lavori ultimati

11	Comune di Venezia Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (VE) - II lotto	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 2.887.959.819	Lavori ultimati. La somma residua di L. 1.150 ml è stata destinata ai lavori della fognatura di Carpenedo L. 910/86 es. 1989 n. 4 (decreto n. 55 del 12.10.94)
12	Comune di Venezia Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - III lotto	L. 1.150.000.000	L. 1.150.000.000	L. 1.150.000.000	L. 1.124.100.837	Lavori ultimati
13	Comune di Venezia Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - I lotto	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 4.023.025.949	Lavori ultimati
14	Comune di Chioggia Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 569.361.501	Lavori ultimati
15	Comune di Chioggia Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI lotto	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 912.083.961	Lavori ultimati
16	Comune di Venezia Completamento delle fognature di Via Torino - Mestre VE	L. 1.650.000.000	L. 1.650.000.000	L. 1.650.000.000	L. 1.586.526.731	Lavori ultimati
17	Comune di Venezia Costruzione della fognatura ed impianto di depurazione di Pellesina e S. Pietro in Volta (VE)	L. 1.310.000.000	L. 1.310.000.000	L. 1.310.000.000	L. 0	Con D.G.R. n. 5342 del 8.11.94, il Comune di Venezia è stato autorizzato a elaborare un nuovo progetto, esaminato dalla CTRA il 30.07.98.
18	Comune di Venezia Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mestre - Marghera	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	Lavori ultimati
19	Comune di Mogliano Veneto Fognatura frazioni di Bonisolo e Zerman in comune di Mogliano Veneto (TV)	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 452.212.485	Lavori ultimati
20	Azienda Consorzio del Mirese Costruzione della rete di fognatura consortile del Mirese - XIV lotto sub B (VE)	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 344.611.615	Lavori ultimati
21	Azienda Consorzio del Mirese Completamento funzionale di opere fognarie precedentemente realizzato nel Consorzio del Mirese	L. 4.600.000.000	L. 4.600.000.000	L. 4.600.000.000	L. 4.566.546.236	Lavori ultimati

22	Comune di Chioggia Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XVI lotto	L. 3.650.000.000	L. 3.650.000.000	L. 3.650.000.000	L. 500.000.000	L'impresa ha rescisso il contratto. Perizia approvata in C.T.R.A. voto n. 1994 del 14-7- 94. In attesa di nuovo appalto
23	Consorzio di bonifica Dese - Sile Opere accessorie relative all'impianto idrovoro del Canale Scolmatore e ristrutturazione rete di bonifica Favaro Veneto (VE)	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.610.833.252	Lavori ultimati
24	Comune di Chioggia Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (VE) - Opere elettromeccaniche	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.459.541.098	Lavori ultimati
25	In attesa di indiv. sogg. attuatori Costruzione fognatura centro storico di Venezia - stralcio funzionale della Giudecca (VE)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 165.390.474	Proposta riallocazione con il riparto fondi 1998.
26	Comune di Venezia Interventi di risanamento igienico ed edilizio di Pellestrina e S. Pietro in Volta	L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 0	E' stato sottoscritto l'accordo di programma tra Regione e Comune
TOTALE (legge - esercizio)		L. 58.000.000.000	L. 58.000.000.000	L. 58.000.000.000	L. 38.317.278.568	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	66,1%	

Legge 910/86 Es. 1987-1988

Settore: Disinquinamento

N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di costruzione dell'impianto di sollevamento e modulazione del bacino di Zelarino - Mestre (VE)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.127.578.431	Lavori ultimati. Per saldare la liquidazione si prendono L. 219.085.840 dalla gara n. 24 DDDA n. 5
2	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di costruzione dello scolmatore di Via del Bosso a Chirignago - Mestre (VE)	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.638.739.954	Lavori ultimati. L'ulteriore importo è preso dal decreto n. 20 della gara n. 6
3	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di ristrutturazione delle reti fognarie del Cavallino (VE)	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.739.763.660	Lavori ultimati.
4	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di completamento dei sistemi principali di collettamento della rete fognaria di Chioggia (VE)	L. 9.100.000.000	L. 9.100.000.000	L. 9.100.000.000	L. 8.439.722.007	Lavori finiti.
5	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di costruzione rete di fognatura zona di via Martiri di Marzabotto - bacino Gazzera - Mestre (VE)	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.604.094.383	Lavori ultimati.
6	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di estensione delle reti fognarie secondarie di Chioggia e Sottomarina (VE)	L. 5.900.000.000	L. 5.900.000.000	L. 5.900.000.000	L. 5.864.952.186	Lavori ultimati.
7	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.927.033.321	Lavori finiti.
8	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di costruzione dei collettori fognari di collegamento all'impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.891.470.476	Lavori ultimati.
9	Comune di Musile di Piave Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 356.072.615	Lavori in corso.

10	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di costruzione nuovo impianto di sollevamento nel bacino di via Torino e collegamento bacino di S. Giuliano	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.506.154.340	Lavori ultimati. Con DGR n. 4 l'importo di L. 1.500.000.000 è stato portato a L. 1.660.000.000 tramite prelevamento di L. 160.000.000 da gara 5.
11	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di costruzione della rete di fognatura della zona di via Asseggiano - bacino Gazzera (VE)	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.586.084.840	Lavori ultimati. La somma originaria di L. 1.700.000.000 è stata modificata con deliberazione 4650 del 4-10-94
12	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di completamento della fognatura nella zona Nord-Est del Comune di Campagna Lupia (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.027.954.341	Lavori ultimati. con decreto n. 554 del 18.12.1997 la somma originaria di L. 2.000.000.000 è stata portata a 2.040.703.593 per ulteriori oneri.
13	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Chirignago - Mestre (VE)	L. 2.900.000.000	L. 2.900.000.000	L. 2.900.000.000	L. 2.488.599.868	Lavori ultimati. - L. 160.000.000 da dare a gara 23.
14	A.S.P.I.V. Lavori di costruzione del collettore di via Paleocapa e via Canal - Marghera (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.263.190.978	Lavori in corso. Con DDDA n. 6 DEL 27/01/1997 il finanziamento è stato modificato da L. 2.000.000.000 a L. 1.790.000.000.
15	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Carpenedo - Mestre (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.889.695.167	Lavori ultimati.
16	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VI lotto	L. 2.200.000.000	L. 2.200.000.000	L. 2.200.000.000	L. 517.711.960	Lavori in corso.
17	Comune di Venezia Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VII lotto	L. 3.100.000.000	L. 3.100.000.000	L. 3.100.000.000	L. 242.513.283	Progetto approvato
18	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di completamento della rete fognaria del bacino di S. Giuliano di Mestre (VE)	L. 900.000.000	L. 900.000.000	L. 900.000.000	L. 795.866.489	Lavori ultimati.
19	Comune di Venezia Costruzione della rete secondaria di fognatura di Pellestrina	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	Progetto approvato

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20	Comune di Venezia Costruzione della rete di fognatura di S. Marta (VE)	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 89.005.091	Il progetto dell'impianto di depurazione è stato bocciato dalla Commissione per la Salvaguardia. Il Comune ha rielaborato il progetto.
21	Comune di Quarto d'Altino Costruzione della rete fognaria di Quarto d'Altino (VE)	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.350.000.000	Lavori ultimati.
22	Comune di Venezia Interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e nere a completamento della fognatura consortile Mestre - Marghera (VE)	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 5.761.005.698	Lavori ultimati
23	Comune di Venezia Costruzione dell'impianto di depurazione e scarico a mare di Pellestrina (VE)	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 0	E' stato approvato il progetto di collegamento all'impianto del Lido
24	Regione - Fognature e Depurazione Redazione del Piano Direttore	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	Approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 255 del 19-12-91
25	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di adeguamento delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione - reti di Jesolo Lido (VE)	L. 5.225.000.000	L. 5.225.000.000	L. 5.225.000.000	L. 5.208.603.443	Lavori ultimati
26	Comune di Jesolo Rilievi ed ispezioni televisive della rete fognaria del Comune di Jesolo (VE)	L. 195.636.000	L. 195.636.000	L. 195.636.000	L. 97.818.000	Lavori in corso
27	Comune di Jesolo Progetto esecutivo delle opere fognarie di collegamento della zona P.I.P. all'impianto di depurazione (VE)	L. 310.000.000	L. 310.000.000	L. 310.000.000	L. 183.853.720	Lavori in corso
28	Comune di Jesolo Lavori della fognatura del Comune di Jesolo (VE)	L. 469.364.000	L. 469.364.000	L. 469.364.000	L. 0	Progetto approvato
29	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di estensione della rete interna ed il collegamento alla rete consortile - Comune di Mira (I parte)	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.329.623.217	Lavori ultimati.
30	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di teleregolazione e telecontrollo della fognatura di Jesolo - Philips	L. 1.082.814.095	L. 1.082.814.095	L. 1.082.814.095	L. 82.775.316	Lavori in corso

31	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di adeguamento reti e impianto di depurazione di Jesolo (VE) - opere civili ed elettromeccaniche	L. 1.006.869.147	L. 1.006.869.147	L. 1.006.869.147	L. 1.006.869.147	Lavori finiti
32	Regione - Fognature e Depurazione Ispezioni televisive	L. 293.376.629	L. 293.376.629	L. 293.376.629	L. 293.376.629	Lavori ultimati
33	Regione - Fognature e Depurazione Piano pilota W.R.C.	L. 776.940.129	L. 776.940.129	L. 776.940.129	L. 776.940.129	Lavori finiti
34	Comune di Jesolo Somme per ulteriori interventi	L. 640.000.000	L. 640.000.000	L. 640.000.000	L. 640.000.000	Lavori finiti
TOTALE (legge - esercizio)		L. 88.000.000.000	L. 88.000.000.000	L. 88.000.000.000	L. 66.727.088.689	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	75,8%	

Legge 910/86 Es. 1989

Settore: Disinquinamento

N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Azienda Consorzio del Mirese Costruzione della rete fognaria di Campagna Lupia - capoluogo (VE)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.700.000.000	Lavori in corso. Il progetto complessivo è di 4.290 ml finanziati con la L. n. 910/86 es. 1989 1 ml e 290 ml sui fondi MESPA-CEE
2	A.S.P.I.V. Costruzione vasca di modulazione di Favaro Veneto (VE)	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 1.816.000.000	Lavori in corso.
3	Comune di Venezia Costruzione della vasca di pioggia del nodo idraulico di Ca' Emiliani - Loc. Rana (VE)	L. 7.750.000.000	L. 7.750.000.000	L. 7.750.000.000	L. 755.000.000	Progetto approvato. Appalto in corso (rilata perizia geologica e calcoli statici nuovi)
4	A.S.P.I.V. Costruzione fognatura di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)	L. 3.750.000.000	L. 3.750.000.000	L. 3.750.000.000	L. 3.083.146.262	Lavori in corso. L'importo del progetto è di L. 4.900 ml cui si fa fronte per L. 3.750 ml con i fondi della L. 910/86 e per L. 1.150 ml presi dal decreto n. 1001 del 26.10.97 (fognatura di Carpenedo - Il lotto).
5	Regione - Fognature e Depurazione Lavori di estensione rete interna e collegamento alla rete consortile - Comune di Mira - Il parte	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.809.404.231	Lavori ultimati.
6	Azienda Consorzio del Mirese Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase	L. 14.500.000.000	L. 14.500.000.000	L. 14.500.000.000	L. 13.183.153.150	Lavori ultimati.
7	A.S.P.I.V. Impianto di depuratore del Cavallino - adeguamento della fase biologica alla rimozione dell'azoto	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.079.483.722	Lavori ultimati.
8	A.S.P.I.V. Fognatura e depurazione del Lido e del Cavallino	L. 3.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 0	L. 0	Progetto finito
9	Comune di Chioggia Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 8.195.996.107	Lavori ultimati.

10 Comune di Venezia
Fognatura S. Erasmo

L. 5.000.000.000 L. 5.000.000.000 L. 0

E' stato sottoscrit. l'accordo di programma tra Reg. e Com. Il finanz. deriva dalla somma degli importi di due prog. abbandonati riguardanti interventi al Cavallino: fognatura (L. 3.8 Mld) e comparto denitr. del dep. (L. 1,2 Mld). Vd. DGR 3324 del 28.7.98.

11 In attesa di indiv. sogg. attuatori
Costruzione della rete fognaria della
Giudecca (VE)

L. 3.000.000.000 L. 3.000.000.000 L. 3.000.000.000 L. 0

Fondi riallocati con riparto 1998

12 Azienda Consorzio del Mirese
Costruzione della rete fognaria di
Mira - III fase: Rilievi ed ispezioni
televisive collettori fognari

L. 500.000.000 L. 500.000.000 L. 500.000.000 L. 500.000.000

Lavori ultimati.

TOTALE (legge - esercizio) L. 62.000.000.000 L. 62.000.000.000 L. 53.200.000.000 L. 37.102.183.472

PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO 100,0% 85,8% 59,8%

Legge 87/88 Es. 1988

Settore: Disinquinamento

N. Soggetto attuatore /
finanziamento

Erogato

Contabilizzato

Impegnato

Finanziato

Note

1 Comune di Venezia
Ampliamento dell'impianto di
depurazione di Fusina - IV linea (VE)

L. 13.000.000.000 L. 13.000.000.000 L. 13.000.000.000 L. 407.953.305

Progetto in fase di redazione. Con DGR n. 4523 del 1/12/1998 sono stati stanziati ulteriori L. 2 Mld dai fondi ex Legge n. 67/88. Incarico per progetto definitivo

2 A.S.P.I.V.
* Completamento dell'impianto di
trattamento di Campalto - Opere
accessorie

L. 2.500.000.000 L. 2.500.000.000 L. 2.500.000.000 L. 2.145.039.432

Lavori ultimati.

TOTALE (legge - esercizio) L. 15.500.000.000 L. 15.500.000.000 L. 15.500.000.000 L. 2.552.992.737

PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO 100,0% 100,0% 16,5%

Legge 67/88 Es. 1990

Settore: Disinquinamento

N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
1	In attesa di indiv. sogg. attuatori Progetto depuratore Fusina (linea di filtrazione per il riutilizzo delle acque trattate - I stralcio)	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 222.797.157	I fondi originariamente dati alla filtrazione di Fusina, sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Fusina. I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 - depurazione Fusina
2	A.S.P.I.V.:					Lavori ultimati.
*	Ampliamento della fognatura del Cavallino (VE) - II stralcio	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.462.027.650	
3	Comuna di Venezia Ampliamento delle fognature di Pellestrina (VE)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	
4	Comune di Musile di Piave Ampliamento della rete fognaria di Musile di Piave (VE)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 1.505.070.836	Lavori in corso.
5	Comune di Codevigo Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (PD)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.054.365.402	Lavori ultimati. Ulteriori L. 54.385.402 con DGR n. 1358 del 21.4.98
6	Azienda Consorzio del Mirese Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (VE)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 762.635.986	Lavori in corso.
7	Regione - Fognature e Depurazione Aggiornamento del Piano Direttore - seconda fase - Monitoraggio dei corsi d'acqua sfocianti in laguna	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 2.173.165.483	Lavori in corso. Importo diminuito di L. 422.000.000 per Apav. Nuovo importo: L. 4.578.000.
8	Comune di Quarto d'Altino Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino (VE)	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 4.120.463.660	Lavori in corso.
9	Comune di Venezia Ampliamento delle fognature del Lido di Venezia	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 3.000.000.000	Lavori in corso.
10	U.S.S.L. n. 12 - Venezia Riabilitazione funzionale delle fognature del centro storico di Venezia (ospedale SS. Giovanni e Paolo)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.748.397.236	Lavori in corso.

11	Comune di Chioggia Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 110.000.000	Il comune di Chioggia ha proposto di modificare il progetto collegando la fognatura all'impianto di Val da Rio
12	Comune di Venezia Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo - Bissuola (VE)	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 1.398.768.536	I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Campalio. Progettazione in corso
13	Comune di Musile di Piave Ampliamento impianto di depurazione del Comune di Musile di Piave (VE)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	Lavori in corso.
14	Comune di Jesolo Ampliamento della rete fognaria di via Baffie in Comune di Jesolo (VE)	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.085.924.887	Lavori ultimati.
15	A.S.P.I.V. * Costruzione della vasca di accumulo acque meteoriche di piazzale Giovannacci - Marghera (VE)	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 6.257.557.022	Lavori in corso.
16	A.S.P.I.V. * Razionalizzazione della rete fognaria di Marghera (VE) - via Asseggiano a Chirignago	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 4.678.668.631	Lavori in corso
17	Comune di Jesolo Rilievi ed ispezioni televisive - Il stralcio	L. 195.636.000	L. 195.636.000	L. 195.636.000	L. 0	Progetto approvato
18	Comune di Jesolo Interventi presso l'impianto di depurazione e gli sfioratori di piena	L. 2.212.524.000	L. 2.212.524.000	L. 2.212.524.000	L. 52.210.476	Lavori in corso.
19	Comune di Jesolo Analisi chimiche sui liquami in fognatura e nell'impianto	L. 91.840.000	L. 91.840.000	L. 91.840.000	L. 0	Il costo totale dell'intervento è di £ 119.000.000 Vedi anche schede n 14 - 17 - 18
20	Consorzio di bonifica Dese - Site Ristrutturazione collettore Acque Basse I lotto	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 1.643.758.731	I fondi sono stati riallocati con la II fase degli interventi della L. 139/92 - progetto Campalio.
21	Comune di Chioggia Completamento della rete fognaria di Chioggia e Sottomarina	L. 14.400.000.000	L. 14.400.000.000	L. 14.400.000.000	L. 7.224.640.499	Lavori in corso.
TOTALE (legge - esercizio)		L. 104.500.000.000	L. 104.500.000.000	L. 104.500.000.000	L. 48.480.452.192	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	48,4%	

Legge 67/88 Es. 1991		Settore: Disinquinamento					
N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
1	A.S.P.I.V.					Lavori in corso	
*	Estensione della rete fognaria di tipo separato nella zona di Trivignano - Zelarino - Il lotto	L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 5.105.711.226		
2	Ente di bacino R.S.U. VE 2 Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 8.599.341.709	Lavori ultimati	
3	Comune di Venezia Impianto di depurazione di Pellestrina (VE)	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	Fondi riallocati per fognatura di Pellestrina. Progetto in fase di redazione	
4	Comune di Meolo Adeguamento impianto di depurazione e rete fognaria in comune di Meolo.	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	Lavori ultimati	
5	Comune di Chioggia Fognatura di Chioggia (VE)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	Lavori ultimati	
6	Regione - Arpa Sistema informativo regionale - Nodo laguna	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 31.475.500	Fondi utilizzati per il SINA regionale. Appalto in corso	
7	Consorzio del Tergola Impianto di Vigonza (PD)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	Lavori in corso. Importo complessivo 2.14.600 ml vedi L. 139/92 - esercizio 1993 (n. 6)	
8	Consorzio del Tergola Interventi nel settore della zootecnia dell'alta padovana	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	Progetto approvato. Fondi destinati all'impianto di biotattamento di Camposampiero (Approvato CTRA 26/11/98)	
TOTALE (legge - esercizio)		L. 30.600.000.000	L. 30.600.000.000	L. 30.600.000.000	L. 15.536.528.435		
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	50,8%		

Legge 67/88 Es. 1992 - I ^a fase		Settore:			Disinquinamento	
N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Azienda Consorzio del Mirese Realizzazione di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognatura	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso
2	Azienda Piovese Gestione Acque Realizzazione di collettori fognari e depurazione nell'area sud del Piovese	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 2.704.124.609	Lavori in corso.
3	Comune di Cavarzere Fognatura comunale di Cavarzere	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 990.000.000	Lavori ultimati.
4	Comune di Cavarzere Ampliamento dell'impianto di depurazione - III lotto	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 700.000.000	Lavori in corso.
5	A.S.P. I.V. Progetto di rifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.096.758.909	Lavori ultimati. I fondi sono stati riallocati con PCR n. 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 - progetto Lusore.
6	Comune di Venezia Potenziamento dell'impianto di sollevamento Rana e costruzione di un modulo di sedimentazione	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 0	E' stato dato nulla osta alla modifica progettuale.
7	Consorzio di bonifica Dese - Site Impianto idrovoro a servizio del Canale Scolmatore del fiume Marzenego - II stralcio	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.400.000.000	Lavori ultimati.
TOTALE (legge - esercizio)		L. 29.700.000.000	L. 29.700.000.000	L. 17.200.000.000	L. 14.890.883.518	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	57,9%	50,1%	

Legge 67/88 Es. 1992 - II ^a fase		Settore: Disinquinamento			
N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato Note
1	In attesa di indiv. sogg. attuatori Progetto integrato depurazione Fusina B16	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 0	L. 0 I fondi originariamente destinati all'impianto del Mirese sono stati riallocati con PCR n. 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Fusina. Riallocato con riparto 1998.
2	Regione - Fognature e Depurazione Quota regionale agenzia per Venezia	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 0 Riallocato con riparto 1998.
3	Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta Progetto Lusore: interconnessione tra fosso Sette e idrovora Malcontenta	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0 Per q.s. prog., assieme all'altro da 4 Mld assegn. al Cons., è stata pres. richiesta di trasf. come "Potenz. imp. idrov. di Malcontenta" (L. 2,5 Mld) + Sistem. rete Chirignago e Interconn. imp. idrov. di Malcontenta (L. 5,5 Mld). Progetti in istruttoria.
4	In attesa di indiv. sogg. attuatori progetto integrato depurazione Fusina	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0 I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase. Riallocato con riparto 1998.
5	Consorzio di bonifica Dese - Sile Sistemazione del fiume Marzenego "Ramo Beccherle" nel centro di Mestre	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0 Lavori consegnati
6	Consorzio Alta Servizi Ampliamento impianto di depurazione di Onara	L. 2.400.000.000	L. 2.400.000.000	L. 2.400.000.000	L. 2.160.000.000 Lavori ultimati.
7	Consorzio Alta Servizi Collettore fognario di adduzione Ovest Fontativa - Cittadella - Tombolo	L. 5.100.000.000	L. 5.100.000.000	L. 5.100.000.000	L. 4.590.000.000 Lavori ultimati.
TOTALE (legge - esercizio)		L. 60.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 6.750.000.000
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			66,7%	33,3%	11,3%

Legge 360/91		Settore: Disinquinamento					
N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
1	Ente di bacino R.S.U. VE 2 Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.394.123.516	Lavori ultimati	
2	In attesa di indiv. sogg. attuatori Progetto pilota del bacino del Marzenego	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Riallocato con riparto 1998	
3	Comune di Venezia Bonifica della discarica di rifiuti Ca' Emiliani (Marghera)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	Il Comune di Venezia doveva presentare il progetto nel 1991	
4	Comune di Venezia Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bonifica discarica di S. Giuliano (VE) - 1 lotto "B1"	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	Lavori ultimati.	
5	Regione - Foreste Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - Il stralcio	L. 877.000.000	L. 877.000.000	L. 877.000.000	L. 451.296.979	Lavori ultimati per 451 ml.	
6	Regione - Foreste Progetto per la realizzazione del Bosco di Mestre - Il stralcio	L. 793.400.000	L. 793.400.000	L. 793.400.000	L. 396.700.000	Lavori in corso	
7	Regione - Foreste Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - Il stralcio	L. 1.329.600.000	L. 1.329.600.000	L. 0	L. 0	Il Comune di Venezia deve individuare le aree per il bosco	
TOTALE (legge - esercizio)		L. 16.000.000.000	L. 13.500.000.000	L. 10.170.400.000	L. 9.242.120.495		
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			84,4%	63,6%	57,8%		

Legge 139/92 Es. 1993

Settore: Disinquinamento

N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Consorzio del Tergola Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Appalti A e B	L. 31.300.000.000	L. 31.300.000.000	L. 31.300.000.000	L. 22.749.312.702	Lavori in corso
2	Consorzio del Tergola Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza	L. 12.600.000.000	L. 12.600.000.000	L. 12.600.000.000	L. 12.219.105.403	Lavori quasi ultimati. Importo complessivo 14,6 Mld.
3	Consorzio del Tergola Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero	L. 8.400.000.000	L. 8.400.000.000	L. 8.400.000.000	L. 0	Progetto impianto di biotratamento approvato dalla CTRA. Importo complessivo 44,4 Mld
4	Consorzio del Tergola Progetto del collettore di collegamento della rete di Loreggia al depuratore di Camposampiero - XV lotto	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.357.665.676	Lavori ultimati
5	Consorzio del Tergola Collegamento della rete di Borgoricco a Villanova di Camposampiero	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 2.361.670.130	Lavori in corso
6	Azienda Consorzio del Mirese Completamento fognatura nera in Comune di Noale	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 1.752.167.054	Lavori ultimati
7	Azienda Consorzio del Mirese Completamento fognatura nera in Comune di Salzano	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	Lavori finiti
8	Azienda Consorzio del Mirese Interventi alla rete fognaria nel Comune di Martellago	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.090.578.477	Lavori in corso
9	Azienda Consorzio del Mirese Interventi alla rete fognaria nel Comune di Scorzà	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.498.026.740	Lavori ultimati
10	Azienda Consorzio del Mirese Vasca di pioggia di Noale	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 497.597.690	Progetto approvato
11	A.S.P.I.V. Ristrutturazione dei collettori principali di fognatura di via Torino a Mestre	L. 9.200.000.000	L. 9.200.000.000	L. 9.200.000.000	L. 7.666.774.712	Lavori in corso.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

12	A.S.P.I.V.	Lavori in corso.
*	Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano	L. 5.800.000.000 L. 5.800.000.000 L. 5.800.000.000 L. 2.134.952.922
13	A.S.P.I.V.	Lavori in corso.
*	Completamento della rete di fognatura separata della zona del Terraglio - bacino di Carpenedo - Mestre	L. 5.700.000.000 L. 5.700.000.000 L. 5.700.000.000 L. 3.097.155.179
14	A.S.P.I.V.	Lavori in corso.
*	Estensione della rete di fognatura separata nella zona di Marghera tra SS. Romea e autostrada VE-PD	L. 3.600.000.000 L. 3.600.000.000 L. 3.600.000.000 L. 2.857.094.871
15	A.S.P.I.V.	Lavori in corso.
*	Completamento della fognatura nella zona di Gazzera - Mestre	L. 3.900.000.000 L. 3.900.000.000 L. 3.900.000.000 L. 2.406.016.849
16	A.S.P.I.V.	Lavori in corso.
*	Ristrutturazione della fognatura nella zona di Cipressina - Zelarino	L. 5.300.000.000 L. 5.300.000.000 L. 5.300.000.000 L. 2.460.870.875
17	A.S.P.I.V.	Lavori in corso.
*	Ricostruzione della fognatura di via S. Donà - Bacino di Carpenedo	L. 7.200.000.000 L. 7.200.000.000 L. 7.200.000.000 L. 1.733.982.694
18	A.S.P.I.V.	Lavori in corso.
*	Ricostruzione della fognatura della zona di via Silvio Trentin - Mestre	L. 6.500.000.000 L. 6.500.000.000 L. 6.500.000.000 L. 942.381.164
19	A.S.P.I.V.	Lavori in corso.
*	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Veneto	L. 4.200.000.000 L. 4.200.000.000 L. 4.200.000.000 L. 3.579.019.851
20	Comune di Venezia	Progetto in fase di redazione.
	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Campalto e Tessera	L. 3.400.000.000 L. 3.400.000.000 L. 3.400.000.000 L. 0
21	Comune di Venezia	Progetto approvato. Importo complessivo £ 20.000 ml vedi L. 139/92 II fase (B)
	Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto	L. 14.000.000.000 L. 14.000.000.000 L. 14.000.000.000 L. 419.046.464
22	A.S.P.I.V.	Lavori in corso.
*	Risanamento fognario nella zona di Carpenedo (via Tevere)	L. 9.600.000.000 L. 9.600.000.000 L. 9.600.000.000 L. 213.654.844
23	A.S.P.I.V.	Lavori fermi - problemi con espropri.
*	Completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcontenta	L. 3.500.000.000 L. 3.500.000.000 L. 3.500.000.000 L. 197.756.572

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

24	A.S.P.I.V. * Ricostruzione della rete fognaria nella zona del centro urbano di Mestre atigua al canale Osellino	L. 3.700.000.000	L. 3.700.000.000	L. 3.700.000.000	L. 1.559.528.594	Lavori in corso.
25	A.S.P.I.V. * Vasca di pioggia della Gazzera	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 0	L. 0	Importo complessivo £ 4.400 ml vedi L. 798/84 es. 1984-1985-1986 (1). Progetto approvato.
26	Azienda Consorzio del Mirese Interventi alle fognature del Consorzio del Mirese	L. 7.880.000.000	L. 7.880.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso.
27	Azienda Consorzio del Mirese Pulizia, ispezione televisiva e rilievo di condotte fognarie nei comuni di Dolo e Spinea	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 228.391.144	Progetto approvato.
28	Azienda Consorzio del Mirese Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Mirano	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 5.659.194.092	Lavori in corso.
29	Azienda Consorzio del Mirese Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di S. Maria di Sala	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.176.917.184	Lavori ultimati
30	Azienda Consorzio del Mirese Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Vigonovo	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.074.875.248	Lavori ultimati
31	Azienda Consorzio del Mirese Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Stra	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.438.799.687	Lavori in corso
32	Azienda Consorzio del Mirese Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Fiesco d'Artico	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.599.670.996	Lavori ultimati
33	Azienda Consorzio del Mirese Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Dolo	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 2.766.711.834	Lavori in corso
34	Azienda Consorzio del Mirese Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Pianiga	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.797.006.027	Lavori ultimati
35	Azienda Consorzio del Mirese Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Campolongo Maggiore	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.050.315.095	Lavori ultimati

36	Azienda Consorzio del Mirese Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - I stralcio	L. 4.950.000.000	L. 4.950.000.000	L. 4.950.000.000	L. 3.534.913.538	Lavori in corso.
37	Azienda Consorzio del Mirese Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - II stralcio	L. 6.550.000.000	L. 6.550.000.000	L. 6.550.000.000	L. 6.146.211.441	Lavori ultimati
38	Azienda Consorzio del Mirese Lavori di costruzione fognature nel Comune di Camponogara	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	Lavori finiti.
39	Azienda Consorzio del Mirese Interventi alle fognature nel Comune di Fosso	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	Lavori finiti.
40	Comune di Venezia Progetto integrato escavo rii - centro storico di Venezia	L. 35.000.000.000	L. 35.000.000.000	L. 35.000.000.000	L. 20.828.813.700	Lavori in corso.
41	Ente di bacino R.S.U. VE 2 Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia-Marghera, loc. Malcontenta	L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 17.999.999.998	Lavori finiti.
42	Regione - Arpa Interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Programma SINA regionale. Appalto in corso
43	Comune di Quarto d'Altino Interventi alle fognature di Quarto d'Altino (II stralcio)	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.741.403.278	Lavori in corso.
44	Comune di Venezia Interventi alle fognature di Pellestrina	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	Progetto approvato.
45	Comune di Venezia Interventi alle fognature del Lido	L. 9.000.000.000	L. 9.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso
46	A.S.P.I.V. Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Est - Ca' di Valle	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 2.260.933.247	Lavori in corso.
47	A.S.P.I.V. Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Ovest - Ca' Savio	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 2.916.967.359	Lavori in corso.
48	Comune di Piove di Sacco Sistemazioni idraulico-ambientali di Piove di Sacco ("Vallo di circonvallazione")	L. 3.117.332.477	L. 3.117.332.477	L. 3.117.332.477	L. 2.975.475.333	Lavori in corso.

49	Comune di Piove di Sacco Ampliamento fognature di Piove di Sacco	L. 3.882.667.523	L. 3.882.667.523	L. 3.882.667.523	L. 3.070.776.018	Lavori in corso
50	Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione Sistemazioni idraulico-ambientali area Brenta-Bacchiglione (foce lagunare di Lova)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.569.204.990	Lavori ultimati.
51	Azienda Piovese Gestione Acque Completamento Impianto di depurazione di Codevigo	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 4.635.452.471	Lavori in corso.
52	Comune di Chioggia Ampliamento fognature bianca e nera nel centro storico di Chioggia	L. 8.950.000.000	L. 8.950.000.000	L. 8.950.000.000	L. 1.758.082.295	Lavori in corso.
53	Comune di Chioggia Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acqua salata nella rete di fognatura	L. 1.050.000.000	L. 1.050.000.000	L. 1.050.000.000	L. 978.659.409	Lavori ultimati.
54	Comune di Mogliano Veneto Opere di completamento della fognatura comunale e monitoraggio/interlevamento Impianti di sollevamento	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 3.756.746.129	Lavori in corso.
55	Comune di Monselice Fognatura di Monselice	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 4.519.027.355	Lavori ultimati.
56	Comune di Arquà Petrarca Fognatura nel comune di Arquà Petrarca	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 980.296.206	Lavori ultimati.
57	Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione Intervento di diversione idraulica della laguna - Incremento Invasi - monitoraggio e telecontrollo	L. 25.000.000.000	L. 25.000.000.000	L. 25.000.000.000	L. 9.117.587.382	Lavori in corso.
58	Regione - ArpaV Estensione rete agrometeorologica	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 995.629.837	Lavori ultimati.
TOTALE (legge - esercizio)		L. 350.000.000.000	L. 348.000.000.000	L. 327.720.000.000	L. 195.872.420.756	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			99,4%	93,6%	56,0%	

Legge 139/92 Il fase

Settore: Disinquinamento

N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta Progetto Integrato Fusina - Ricalibratura degli scoli Fondi a Est e Fondi a Sud e sottopasso del Naviglio	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in istruttoria
2	Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta Progetto Integrato Fusina: Ricalibratura canali di bonifica (Bastie, Foscara e Giare) e potenziamento impianto	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione. Con DGR n. 33 del 12/01/1999 ottenuta integrazione di finanziamento per 2,3 Mld richiesta in seguito a verifiche progettuali.
3	In attesa di indiv. sogg. attuatori Progetto Integrato Fusina: opera ancora da individuare	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
4	Comune di Venezia Progetto Fusina: completamento della rete fognaria e relativi allacciamenti nell'area Mestre-Gazzera e Mestre- Malcontenta	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
5	Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta Progetto Lusore: Ricalibratura e rinnaturalizzazione della rete minore di bonifica interessata dagli apporti di acque urbane bianche	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	Per qs. prog., assieme all'altro da 4 Mld assegn. al Cons., è stata pres. richiesta di trasf. come "Potenz. imp. idrov. di Malcontenta" (L. 2,5 Mld) + Sistem. rete Chirignago e Interconn. imp. idrov. di Malcontenta (L. 5,5 Mld). Progetti in istruttoria.
6	Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta Progetto Fusina: Invasi di laminazione e sedimentazione in aree depresse per circa 30 ha con sistemazione a parco e con sostituzione all'idrovora di	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto mai presentato. Proposta di riallocazione dei fondi con nuovo P.D. come "Progetto dimostrativo in comune di Dolo".
7	Comune di Venezia Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione

8	In attesa di indiv. sogg. attuatori Progetto Fusina: spese di gestione riferite all'intero progetto	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
9	Comune di Venezia Progetto Campalto: ampliamento dell'impianto di depurazione di Campalto (V linea)	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione. Importo complessivo £ 20.000ml finanziato con 14.000 ml sulla L. 139/92 I fase (18)
10	Comune di Venezia Progetto Campalto: adeguamento della rete principale di via Torino e interconnessione con la rete di Mestre	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
11	Consorzio di bonifica Dese - Sile Progetto Campalto: costruzione del I tronco del collettore Acque Basse	L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso
12	Comune di Venezia Progetto Campalto: costruzione tronco di interconnessione tra il collettore Acque Basse ed i bacini di via Torino e S. Giuliano	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
13	Comune di Venezia Progetto Campalto: regolazione dei flussi di piena e di trattamento acque di poggia a S. Giuliano	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
14	Consorzio di bonifica Dese - Sile Progetto Campalto: riserzionamento del canale di interconnessione tra gli impianti di Campalto e dello Scolmatore Marzenego	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso
15	In attesa di indiv. sogg. attuatori Progetto Campalto: spese di gestione riferite all'intero progetto	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
16	Consorzio Alta Servizi Collettore Campretto-Loveri nel comune di S. Martino di Lupat	L. 4.050.000.000	L. 4.050.000.000	L. 4.050.000.000	L. 516.630.687	Progetto approvato
17	Consorzio Alta Servizi Adeguamento strutture fognarie: fognatura aerea sud di S. Martino di Lupari e collegamento al depuratore di Onara	L. 4.250.000.000	L. 4.250.000.000	L. 4.250.000.000	L. 166.464.000	Progetto approvato
18	Azienda Piovese Gestione Acque Adeguamento strutture fognarie: miglioramento reti secondarie nei comuni di Legnaro e S. Angelo di Piove	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	Lavori ultimati

19	Azienda Piovese Gestione Acque Adeguamento strutture fognarie: progetto esecutivo per il disinquinamento area sud del Piovese (Pontelongo, Correzzola e Cona)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.434.596.284	Lavori in corso.
20	Azienda Piovese Gestione Acque Adeguamento strutture fognarie: estensione rete fognaria in località San Pieri in Comune di Piove di Sacco	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.055.267.230	Lavori in corso
21	Comune di Venezia Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali delle reti fognarie del Comune di Venezia	L. 6.700.000.000	L. 6.700.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
22	In attesa di indiv. sogg. attuatori Previdenza: normativa e regolamentazioni, istituzione di incentivazioni	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
23	Regione - Arpa Settore agricolo: potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 1.664.801.750	Lavori in corso
24	Regione - Arpa Settore agricolo: potenziamento del Centro Agrochimico della Regione Veneto	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 500.000.000	Lavori in corso
25	In attesa di indiv. sogg. attuatori Interventi strutturali: gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole - I lotto	L. 30.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Adottata DGR per avviare le attività
26	Comune di Venezia Escavo rti nel centro storico di Venezia	L. 32.000.000.000	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	Elaborato il piano programma degli interventi
27	In attesa di indiv. sogg. attuatori Protezione zootecnica: gestione reflui zootecnici	L. 13.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Adottata DGR per avviare le attività
28	In attesa di indiv. sogg. attuatori Protezione zootecnica: interventi strutturali in zootecnica	L. 40.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Adottata DGR per avviare le attività
29	Regione - Arpa Monitoraggio e controllo rete: sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica sciolante in Laguna	L. 12.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Progettazione in corso da parte dell'ARPAV. Fondi riallocati '98

30	Consorzio di bonifica Dese - Sile Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Zero	L. 14.000.000.000	L. 14.000.000.000	L. 14.000.000.000	L. 805.500.000	Progettazione in corso
30	Consorzio di bonifica Dese - Sile Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Dese	L. 16.000.000.000	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
31	Consorzio di bonifica Dese - Sile Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Dese	L. 15.000.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso.
32	Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sui ri Barbegara, Rebosola e S. Silvestro	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 449.017.816	Progetto approvato
33	In attesa di indiv. sogg. attuatori Interventi strutturali: estensione del sistema di telecontrollo a tutto il bacino sciolante	L. 7.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
34	In attesa di indiv. sogg. attuatori Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Tergola (sostegno di Torre di Burn)	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
35	Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Flumicello (idrovora Cambroso)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Lavori in corso
36	In attesa di indiv. sogg. attuatori Fitodepurazione estuarina sul Canale Vela	L. 10.500.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
37	Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione Integrazione di rete civile e rete di bonifica - Monselice	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di approvazione
38	In attesa di indiv. sogg. attuatori Regolazione intransmissioni da Sile, Brenta e Nodo Castelfranco	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
39	In attesa di indiv. sogg. attuatori Gestione acque di magra del Brenta - Bacchiglione - LEB	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
TOTALE (legge - esercizio)		L. 320.000.000.000	L. 197.200.000.000	L. 45.800.000.000	L. 7.592.277.767	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			61,6%	14,3%		2,4%

Legge 539/95 Es. 1996

Settore: Disinquinamento

N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Consorzio del Tergola Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali dei comuni del Consorzio del Tergola	L. 213.000.000	L. 213.000.000	L. 213.000.000	L. 316.568.066	Fondi trasferiti al progetto "rete fognaria Camposampiero - Trebaseleghe" di costo complessivo L. 243 ml (vedasi L. 539/95 es. 97 n° 17)
2	Consorzio del Tergola Ampliamento rete fognaria comunale di Borghetto	L. 250.000.000	L. 250.000.000	L. 250.000.000	L. 0	Lavori in corso
3	Consorzio del Tergola Ampliamento rete fognaria comunale di Messanzago	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	Lavori in corso
4	Consorzio del Tergola Ampliamento rete fognaria in comune di Vigonza.	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 316.568.066	Lavori in corso
5	Consorzio del Tergola Completamento del collegamento fognario tra Cavino di S. Giorgio delle Pertiche e Campodarsego	L. 737.000.000	L. 737.000.000	L. 737.000.000	L. 0	Lavori in corso
6	Comune di Chioggia Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Comune di Chioggia	L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 787.821.255	Lavori in corso
7	Azienda Consorzio del Mirese Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Consorzio del Mirese	L. 4.900.000.000	L. 4.900.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
8	Azienda Piovese Gestione Acque Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari del Consorzio del Piovese - Istralcio (Legnaro, S. Angelo di Piove e Polverara)	L. 2.450.000.000	L. 2.450.000.000	L. 2.450.000.000	L. 261.830.463	Lavori in corso.
9	Comune di Venezia Escavo dei rii del centro storico di Venezia	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Elaborato il piano programma degli interventi

10	Azienda Piovese Gestione Acque Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari del Consorzio del Piovese - II stralcio (S. Angelo di Piove, Brugine, Piove di Sacco, Arzergrande e Pontelongo)	L. 2.750.000.000	L. 2.750.000.000	L. 2.750.000.000	L. 291.680.455	Lavori in corso.
11	Azienda Piovese Gestione Acque Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari del Consorzio del Piovese - III stralcio (Brugine, Piove di Sacco e Correzzola)	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 193.714.776	Lavori in corso
12	Consorzio del Tergola Progetto fognatura acque nere in comune di Villanova di Camposampiero - I stralcio	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	In corso di esecuzione
13	Consorzio del Tergola Progetto allargamento fognatura in comune di Campodarsego	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 0	In corso di esecuzione
14	Consorzio del Tergola Progetto rete fognaria comune di Novanta Padovana	L. 560.000.000	L. 560.000.000	L. 560.000.000	L. 0	In corso di esecuzione
TOTALE (legge - esercizio)		L. 30.000.000.000	L. 30.000.000.000	L. 22.100.000.000	L. 2.168.183.081	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	73,7%	7,2%	

Legge 539/95 Es. 1997

Settore: Disinquinamento

N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Ente di bacino R.S.U. VE 2 Completamento Impianto R.S.U. di Venezia (Fusina)	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.197.146.150	Lavori ultimati. L'importo complessivo è di £ 78.252 ml finanziato con 35.331 ml con i fondi FIO, £ 6.500 ml sulla L. 360/91 (1), £ 13.000 ml sulla L. 67/98 es. 1991 (3) £ 18.000 sulla L. 139/92 (44) e 5.700 ml sulla L. 539/95 es. 1997 (1)
2	Comune di Galzignano Collegamento della fognatura comunale all'impianto di depurazione di Battaglia Terme	L. 670.000.000	L. 670.000.000	L. 670.000.000	L. 409.589.294	Lavori in corso
3	Comune di Battaglia Terme Adeguamento depuratore di Battaglia Terme	L. 830.000.000	L. 830.000.000	L. 0	L. 0	
4	Consorzio Alta Servizi Fognatura di Cittadella, Fontanafredda, Tombolo e San Martino di Lupat	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 47.700.000	Progetto approvato
5	Consorzio del Tergola Collegamento delle fognature di Villa del Conte all'impianto di Camposampiero	L. 4.300.000.000	L. 4.300.000.000	L. 4.300.000.000	L. 0	Lavori appaltati. Conforme al generale.
6	Comune di Chioggia Progetto definitivo dell'impianto elettrico del depuratore di Val da Rio - 1° e 2° stralcio	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 154.014.136	Lavori in corso
7	Comune di Chioggia Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento ed ammodernamento della linea "Picchi" del depuratore di Val da Rio	L. 230.000.000	L. 230.000.000	L. 230.000.000	L. 215.974.279	Lavori ultimati
8	Comune di Chioggia Lavori di miglioramento ed ammodernamento dell'impianto di depurazione di Val da Rio - lotto funzionale A	L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	L. 979.608.786	Lavori ultimati

9	Comune di Venezia Escavo rli nel centro storico di Venezia	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Importo complessivo: L. 26.000.000.000 finanziato con DGR n. 553 del 25.02.97 e DGR 2813 del 22.07.97 (vedi C/281)
10	Comune di Marcon Riabilitazione fognaria del Comune di Marcon	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 50.977.360	Progetto approvato
11	Consorzio del Tergola Ampliamento impianto di depurazione di Cadoneghe	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
12	Consorzio del Tergola Impianto di biotattamento di Camposampiero	L. 23.000.000.000	L. 23.000.000.000	L. 23.000.000.000	L. 0	Progetto approvato. Importo complessivo 44,4 Mld
13	Consorzio del Tergola Progetto fognatura nera in comune di S. Giustina in Colle	L. 545.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	
14	Consorzio del Tergola Progetto fognatura nera in comune di Cadoneghe	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
15	Consorzio del Tergola Progetto fognatura nera in comune di S. Giorgio delle Pertiche	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	
16	Consorzio del Tergola Progetto rete fognaria in comune di Loreggia	L. 580.000.000	L. 580.000.000	L. 580.000.000	L. 0	
17	Consorzio del Tergola Progetto rete fognaria Camposampiero - Trebaseleghe	L. 2.225.000.000	L. 2.225.000.000	L. 0	L. 0	Costo complessivo L. 2.438 ml. 1.213 ml mancanti provengono da L. 533/95 es. 98 n° 1.
18	Consorzio del Tergola Progetto rete fognaria in comune di Saonara	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (legge - esercizio)		L. 53.500.000.000	L. 52.955.000.000	L. 43.700.000.000	L. 7.055.010.005	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			99,0%	81,7%	13,2%	

Legge 515/96 Es. 1997

Settore: Disinquinamento

N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Comune di Arquà Petrarca Ampliamento della rete fognaria in Comune di Arquà Petrarca	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 102.293.420	Progetto approvato
2	Centro Veneto Servizi Ampliamento dello schema fognario della zona del Conselvano	L. 11.500.000.000	L. 11.500.000.000	L. 11.500.000.000	L. 479.796.880	Progetto approvato.
3	Consorzio Alta Servizi Ampliamento della rete fognaria del bacino sciolante in laguna ed appartenente al Consorzio Alta Servizi	L. 2.300.000.000	L. 2.300.000.000	L. 0	L. 0	Progetto approvato
4	Consorzio Alta Servizi Progetto della costruzione reti fognarie nei comuni di Cittadella e Fontanafredda	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	Progetto approvato
5	Azienda Piovese Gestione Acque Ampliamento delle reti di fognatura e del sistema depurativo nel territorio del consorzio del Piovese	L. 15.000.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di approvazione
6	Comune di Este Ampliamento della rete fognaria nella zona del canale Bisatto - XI stralcio "Meggiaro"	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 125.531.250	Progetto approvato
7	Comune di Galzignano Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Galzignano	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	Lavori appaltati.
8	Comune di Battaglia Terme Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Battaglia Terme	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di approvazione
9	Comune di Monselice Ampliamento della rete fognaria in Comune di Monselice	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in istruttoria
10	Comune di Padova Ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nordio in Comune di Padova	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

11	Comune di Castellfranco Veneto Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione in Comune di Castellfranco Veneto, località Salvatrande	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in istruttoria
12	Comune di Mogliano Veneto Ampliamento della rete fognaria in Comune di Mogliano Veneto	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	Progetto approvato
13	Comune di Monastier Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione comunale in Comune di Monastier	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 107.094.337	Progetto approvato
14	Comune di San Biagio di Callalta Ampliamento della rete fognaria e realizzazione l'attracco dell'impianto di depurazione comunale della frazione Omi in Comune di San Biagio di Callalta	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
15	Comune di Zero Branco Ampliamento della rete fognaria e completamento del costruendo impianto di depurazione comunale	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 95.136.000	Progetto approvato.
16	Comune di Cavarzere Ampliamento della rete fognaria in Comune di Cavarzere	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 13.893.140	Progetto approvato.
17	Comune di Chioggia Ampliamento della rete fognaria e interventi sugli impianti di depurazione comunale in Comune di Chioggia	L. 19.593.954.020	L. 19.593.954.020	L. 19.593.954.020	L. 272.535.102	
18	Comune di Chioggia Progetto di riqualificazione edilizia della linea "picchi" del depuratore di Val da Rio	L. 406.045.980	L. 406.045.980	L. 406.045.980	L. 328.002.059	Progetto approvato.
19	Consorzio di bonifica Basso Piave Miglioramento della efficienza dello scarico delle reti fognarie	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
20	Azienda Consorzio del Mirese Ampliamento ed ottimizzazione delle reti fognarie del Consorzio del Mirese	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 0	L. 0	
21	Comune di Meolo Ampliamento della rete fognaria in Comune di Meolo	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 573.551.928	Lavori in corso

22	Comune di Musile di Piave Completamento funzionale dell'impianto di depurazione comunale di Musile di Piave	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	Lavori in corso
23	Comune di Noale Realizzazione di un parco ecologico - bacino di lagunaggio in Comune di Noale	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
24	U.S.S.L. n. 12 - Venezia Ristrutturazione della rete fognaria di complessi ospedalieri: ospedale civile (SS. Giovanni e Paolo) e G.B. Giustinian, Primo stralzo funzionale	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 52.317.735	Progetto approvato.
25	Comune di Venezia Ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria in Comune di Venezia	L. 53.000.000.000	L. 53.000.000.000	L. 0	L. 0	
26	Regione - Fognature e Depurazione Bonifica siti inquinati in Comune di Venezia - Zona Industriale di Marghera	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
27	Regione - Arpa Potenziamento della rete di tele rilevamento agrometeorologica	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
28	Comune di Venezia Progetto scavo rii	L. 23.000.000.000	L. 23.000.000.000	L. 0	L. 0	Importo complessivo: L. 26.000.000.000 finanziato con DGR n. 553 del 25.02.97 e DGR 2613 del 22.07.97 (vedi C/26/1)
TOTALE (legge - esercizio)		L. 200.000.000.000	L. 200.000.000.000	L. 58.400.000.000	L. 2.150.151.851	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	29,2%	1,1%	


Legge 515/96 Es. 1998					Settore:	Disinquinamento
N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	In attesa di indiv. sogg. attuatori RIPARTO IN CORSO DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE	L. 117.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	
TOTALE (legge - esercizio)		L. 117.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			0,0%	0,0%	0,0%	
Legge 345/97 Es. 1998					Settore:	Disinquinamento
N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	In attesa di indiv. sogg. attuatori RIPARTO IN CORSO DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE	L. 263.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	
TOTALE (legge - esercizio)		L. 263.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			0,0%	0,0%	0,0%	

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986		Settore:		Acquedotti		
N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Comune di Chioggia Potenziamento servizio idrico frazioni Ca' Bianca e Valli	L. 290.000.000	L. 290.000.000	L. 290.000.000	L. 285.726.106	Lavori finiti
2	Comune di Chioggia Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio	L. 1.710.000.000	L. 1.710.000.000	L. 1.710.000.000	L. 1.218.534.302	Lavori in fase di esecuzione. L'importo complessivo è di £ 3.710.000.000
3	Comune di Venezia Acquedotto di Venezia	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	Il Comune sta elaborando un nuovo progetto.
TOTALE (legge - esercizio)		L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 1.504.260.408	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	15,0%	
Legge 910/88 Es. 1987-1988		Settore:		Acquedotti		
N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Comune di Chioggia Adeguamento impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 589.750.386	Lavori in fase di esecuzione. L'importo complessivo è di £ 3.710.000.000
TOTALE (legge - esercizio)		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 589.750.386	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	29,5%	

Legge 910/86 Es. 1989		Settore:		Acquedotti	
N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato Note
1	Comune di Venezia Acquedotto di Venezia	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0 Il Comune sta elaborando un nuovo progetto.
TOTALE (legge - esercizio)		L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	0,0%
Legge 67/88 Es. 1988		Settore:		Acquedotti	
N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato Note
1	Della Po S.p.A. Sistema degli acquedotti del Basso Veneto - Opere in Comune di Chioggia	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 0 Le opere ricadono all'interno della concessione in essere tra Regione e la Delta Po per la progettazione del sistema degli acquedotti del Basso Veneto
2	Comune di Chioggia Realizzazione vasche di accumulo per acqua grezza alla centrale di Cavanella d'Adige	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 750.000.000 Importo complessivo £ 4.500.000.000
3	Comune di Chioggia Rilasciamento impianti di sollevamento a Cavanella d'Adige (acqua grezza e potabile)	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 400.000.000 Importo complessivo £ 850.000.000
4	Comune di Chioggia Razionalizzazione reti di distribuzione interna e recupero perdite dell'acquedotto di Chioggia	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 90.254.000 Importo complessivo I stralcio £ 180.500.000
TOTALE (legge - esercizio)		L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 1.240.254.000
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	6,2%

Legge 910/86 Es. 1989		Settore: Ospedali			
N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
1	U.S.S.L. n. 12 - Venezia Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 147.713.484
					L'importo complessivo è di 30.100 ml finanziati per 12 ml con la L. n. 798/84 es. 1984-85-86, L. 10 ml con la L. n. 910/86 es. 1987-1988, L. 5 ml con la L. n. 910/86 esercizio 1989, 3.100
TOTALE (legge - esercizio)		L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 147.713.484
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	3,0%
Legge 539/95 Es. 1997		Settore: Ospedali			
N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
1	U.S.S.L. n. 12 - Venezia Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 0	L. 0
TOTALE (legge - esercizio)		L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 0	L. 0
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	0,0%	0,0%
TOTALE		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
		L. 1.871.300.000.000	L. 1.343.455.000.000	L. 981.890.400.000	L. 479.919.529.844

PAGINA BIANCA



COMUNE DI VENEZIA

Pubblicazione periodica
aggiornata al 31/12/1996
a cura del Settore Coordinamento
Legge Speciale

salvaguardia di Venezia e la sua laguna programma e stato di avanzamento

leggi: 5 Febbraio 1992 n. 139 • 20 Dicembre 1995 n. 539
4 Ottobre 1996 n. 515 • 2 Ottobre 1997 n. 345

PAGINA BIANCA

Il presente fascicolo segnala lo stato di avanzamento degli interventi di competenza comunale finanziati con i fondi provenienti dalla legislazione speciale per Venezia e inseriti in programmi approvati con apposite deliberazioni consiliari per un importo complessivo di 1.654 miliardi.

Legenda

Programmato	intervento inserito in un programma approvato con deliberazione consiliare
Impegnato	importi definiti con deliberazione degli organi competenti (giunta, consiglio comunale). L'impegno può essere assunto solo dopo l'avvenuta assegnazione da parte dello Stato con apposita Legge di spesa e la stipula del mutuo contratto sulla base dei limiti d'impegno della annualità relativa
Obbligato	contratti di appalto, di compravendita, graduatorie di contributi approvate, convenzioni con terzi
Speso	importi erogati - uscite di cassa

Fasi di avanzamento

progettazione	comprende la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
istruttoria appalto	comprende i tempi derivanti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici
lavori in corso	decorrono dalla aggiudicazione alla ditta vincitrice dell'appalto
lavori ultimati	considerati dai verbali di ultimazione lavori

Per le voci riferite alle acquisizioni la lettura delle varie fasi va intesa nel modo seguente:

progettazione	trattativa in corso
istruttoria appalto	stima del bene
lavori in corso	deliberazione di approvazione della stima
lavori ultimati	stipula del notaio


SINTESI QUADRO FINANZIARIO

Programmato	Impegnato	%	Obbligato	%	Speso	%
A	B	B/A	C	C/A	D	D/A
1.654.000	1.555.000	94,01%	1.140.000	68,92%	616.000	37,24%

Importi in milioni

STATO AVANZAMENTO - INTERVENTI - 1.654 milioni

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
92.082	82.238	878.617	689.274
5%	5%	54%	41%

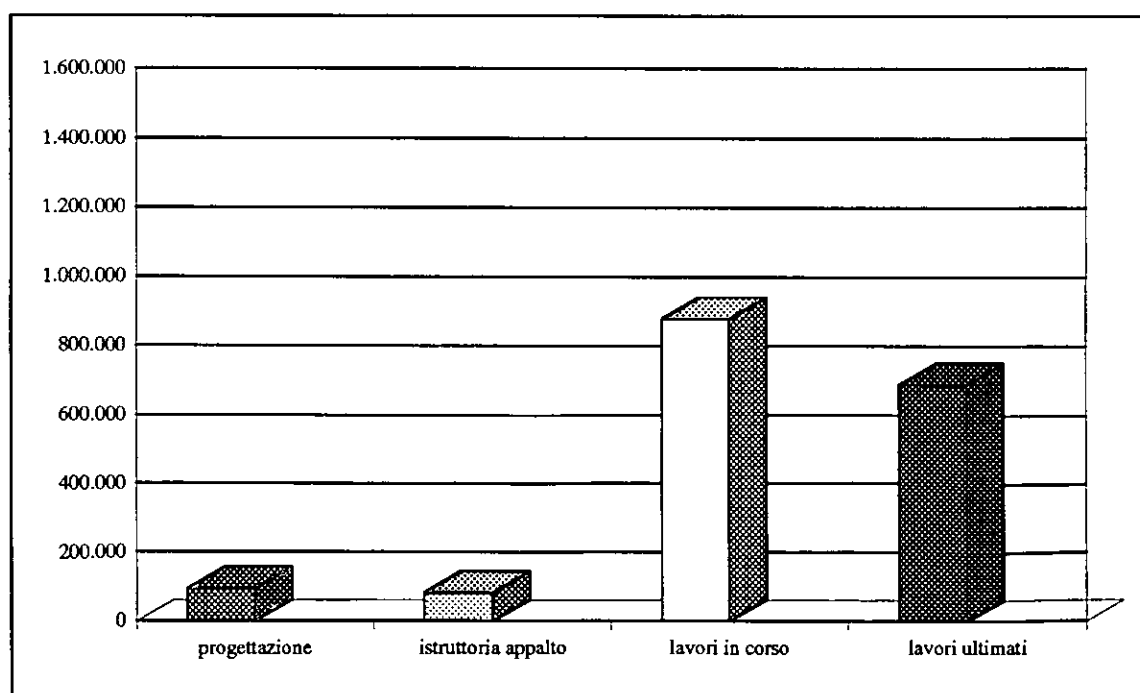

(in milioni di lire)

QUADRO FINANZIARIO PER LEGGI DI FINANZIAMENTO

	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-1994 1995-1996	697.139	691.009	99,12	557.225	79,93	434.615	62,34
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	144.000	131.112	91,05	115.699	80,35	65.847	45,73
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	512.393	495.864	96,77	422.253	82,41	109.496	21,37
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	160.000	134.115	83,82	44.165	27,60	5.594	3,50
	1999	140.000	102.639	73,31				
TOTALE		1.653.532	1.554.739	94,03	1.139.342	68,90	615.552	37,23

importi in milioni

Gli importi e le percentuali del quadro finanziario (impegnato - obbligato - speso) e dello stato di avanzamento degli interventi non tengono conto della Legge 3 Agosto 1998 N. 295 che mette a disposizione della amministrazione Comunale per le annualità 1999 e 2000 risorse pari a 21 miliardi la cui distribuzione verrà resa nota all'inizio del 1999.

QUADRO TEMPORALE MUTUI

	Legge 5 febbraio 1992 n. 139			
	Mutuo a decorrere dall'anno			
	1993	1994	1995	1996
Limite di impegno a carico dello Stato	33	13,71	9,581	8,71
Ammontare disponibile dalla stipula del mutuo	293,035	133,893	87,394	100
			75	riserva 25
	Mutuo stipulato il 22/12/1992	Mutuo stipulato il 21/07/1994	Mutuo stipulato il 9/06/1995	Mutuo stipulato il 22/12/1995

	Legge 20 dicembre 1995 n. 539			
	Mutuo a decorrere dall'anno			
	1996	1997		
Limite di impegno a carico dello Stato	6,118	11,557		
Ammontare disponibile dalla stipula del mutuo	60	120		
	48	riserva 12	96	riserva 24
	Mutuo stipulato il 24/07/1996	Mutuo stipulato il 24/07/1996		

	Legge 4 ottobre 1996 n. 515			
	Mutuo a decorrere dall'anno			
	1997	1998		
Limite di impegno a carico dello Stato	35,848	18,255		
Ammontare disponibile dalla stipula del mutuo	410	166		
	365	riserva 45	147,393	riserva 18,607
	Mutuo stipulato il 30/08/1996	Mutuo stipulato il 30/07/1997		

	Legge 2 ottobre 1997 n. 345			
	Mutuo a decorrere dall'anno			
	1998	1999		
Limite di impegno a carico dello Stato	18,665	12,750		
Ammontare disponibile dalla stipula del mutuo	240	160		
	160	riserva 80	140	riserva 20
	Mutuo stipulato il 23/12/1997	Mutuo stipulato il 12/11/1998		

importi in miliardi

La riserva è una cifra prudenziale che viene accantonata e che potrà essere disponibile solo dopo i primi 5 anni dalla stipula di ogni singolo contratto di mutuo. L'ammontare è presunto e dipende dal tasso ufficiale di sconto vigente alla data della verifica e dai relativi piani di erogazione.

Per la sua indeterminatezza e la sua non immediata disponibilità non è stata conteggiata nel programma degli interventi.

Progetto integrato rii

Il progetto integrato rii oggetto di apposito accordo di programma ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 139 prende in considerazione gli interventi di scavo dei rii e smaltimento dei fanghi, le opere di sistemazione e risanamento della rete fognaria esistente e dei sottoservizi a rete, gli interventi di consolidamento statico degli edifici pubblici e privati (soggetti a specifici contributi) prospicienti i rii e le opere per la difesa delle acque alte mediante l'innalzamento dei percorsi pedonali.

Gli interventi fanno parte di un piano organico generale che investe tutto il centro storico e le Isole per un importo di circa 1.500 miliardi e si sviluppa nell'arco di 23 anni con inizio dal 1994.

I principali obiettivi che si intende perseguire con il piano sono:

- ricambio idraulico;
- disinquinamento delle acque (risanamento igienico-sanitario)
- consolidamento statico delle strutture;
- protezione della città dalle acque medio-alte.

Il Comune di Venezia ha recentemente assegnato tale compito ad una società per azioni denominata Insula in cui le partecipazioni sono così suddivise: Comune di Venezia 52%; Italgas 12%; Aspiv 12%; Telecom 12%; Ismes S.p.A. (Enel) 12%.


XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
1 Insula Santa Maria Zobenigo	5.775	5.775	4.601	3.152
3 Insula Santa Maria Formosa	9.107	9.107	9.107	3.780
7 Insula Ghetto	9.769	9.769	9.769	8.450
8 Insula Frani	8.468	8.468	8.468	6.150
11 Insula Santo Stefano	7.178	7.178	800	11
19 Insula San Trovaso	4.810	4.810	600	12
24 Insula S. Giovanni In Bragora	13.610	13.610	1.000	472
31 Insula S. Giacomo Dell'Orio	500	500		
42 Isola Murano Navagero	10.365	10.365	10.365	8.680
43 Isola Burano	5.000	5.000	5.000	165
44 Isola Pellestrina	6.026	6.026	500	240
Interventi puntuali e diffusi: fondamente, ponti, scavi a umido, rialzi pavimentazione pubblica, risanamento igienico sanitario acque reflue, contributi ai privati, arredi etc.	209.169	202.104	106.111	73.286
TOTALE	(*) 289.777	282.712	156.321	104.398


(*) L'importo è comprensivo della quota Regionale pari a 108 miliardi


STATO AVANZAMENTO - PROGETTO INTEGRATO RII


progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
7.065		178.314	104.398
2%		62%	36%

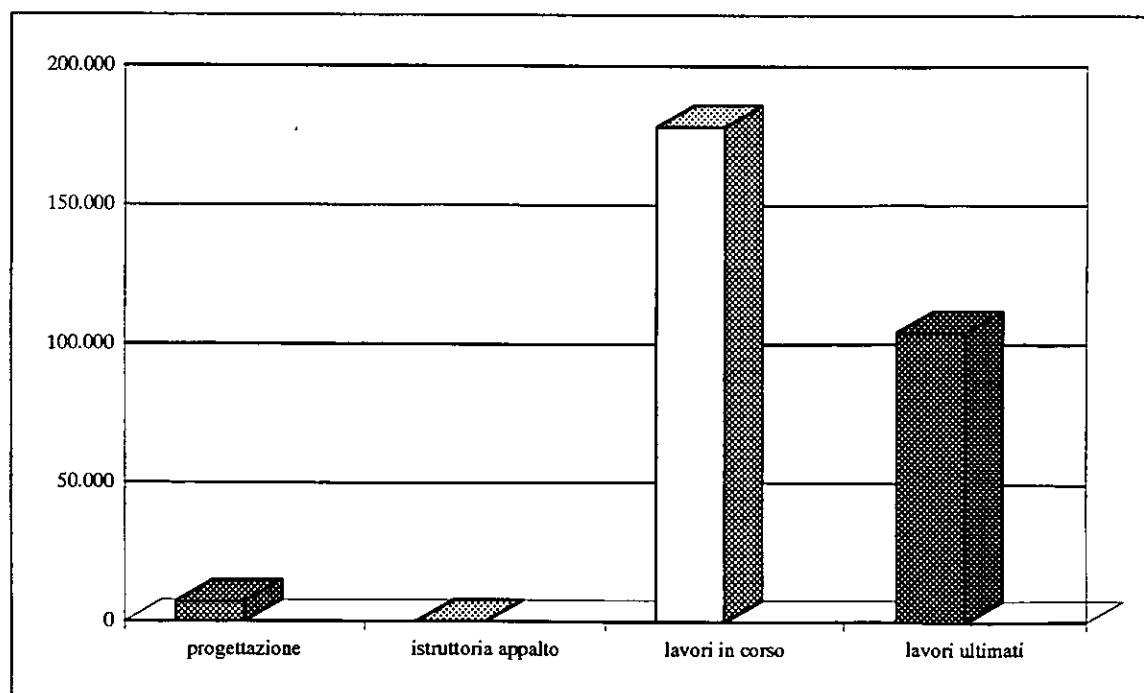



(in milioni di lire)

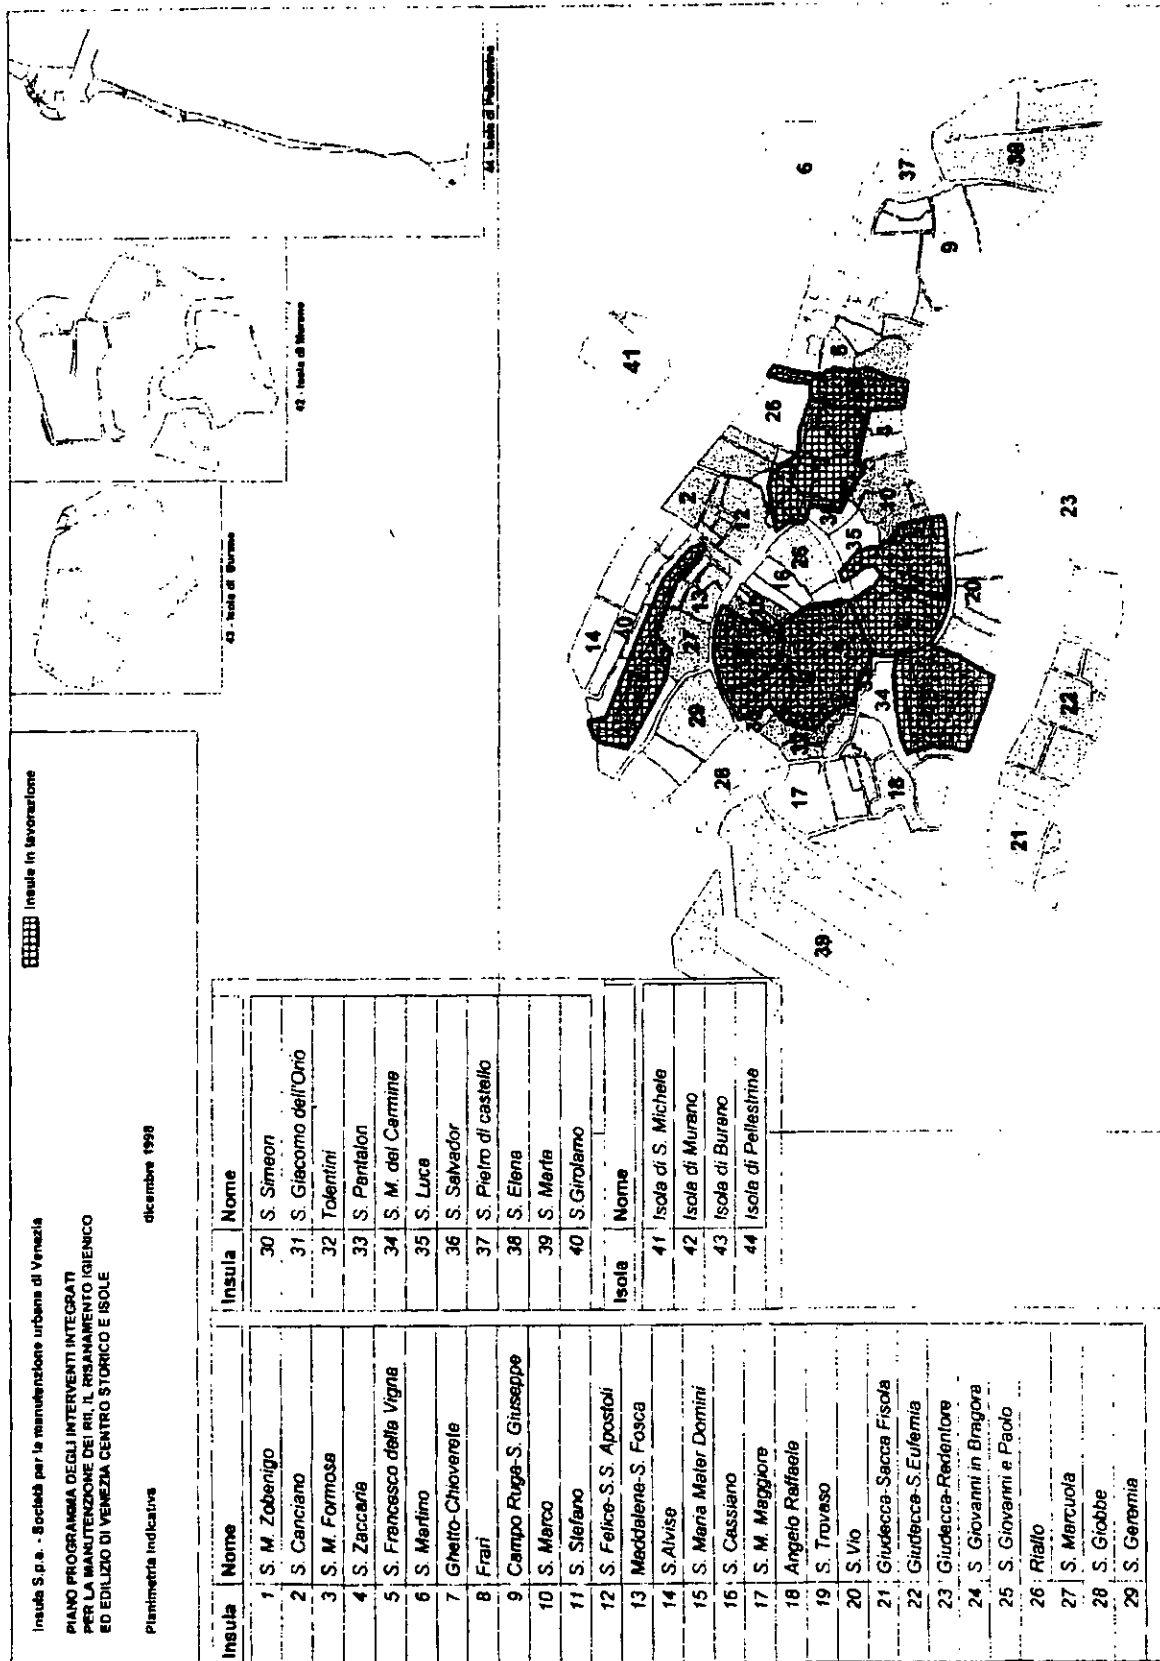


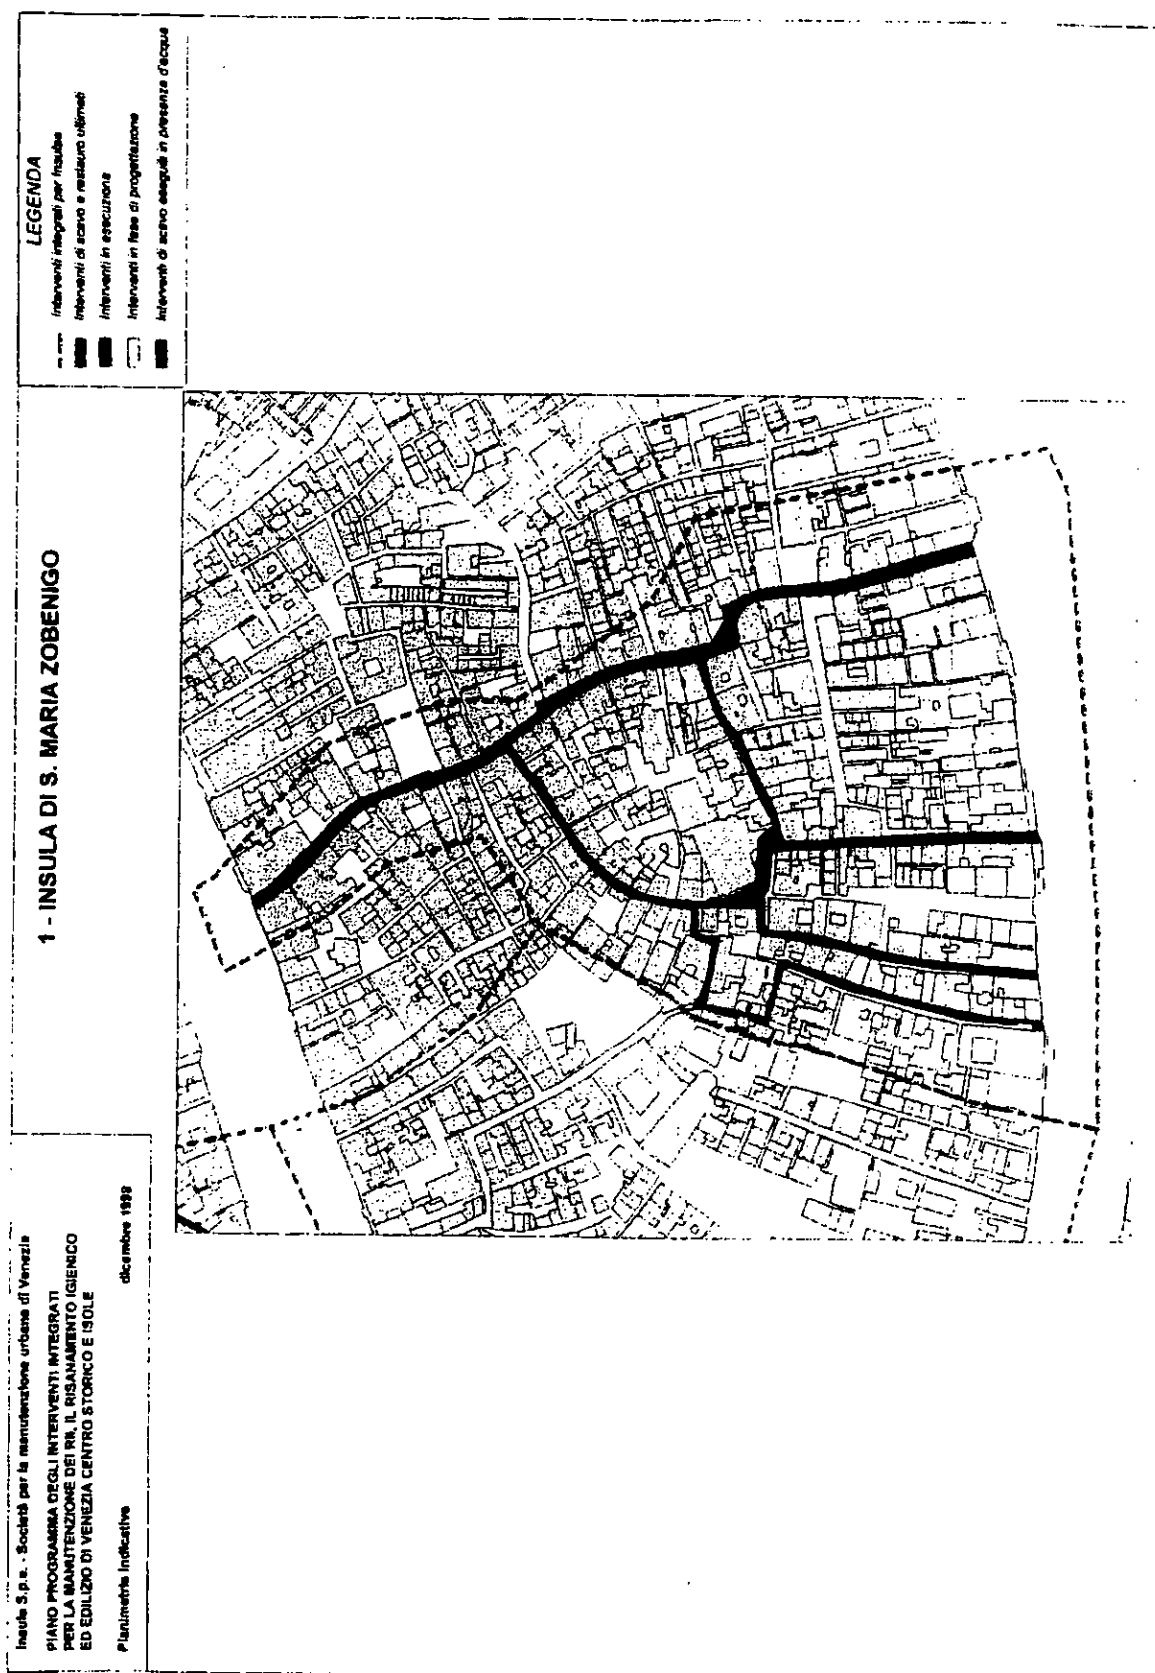

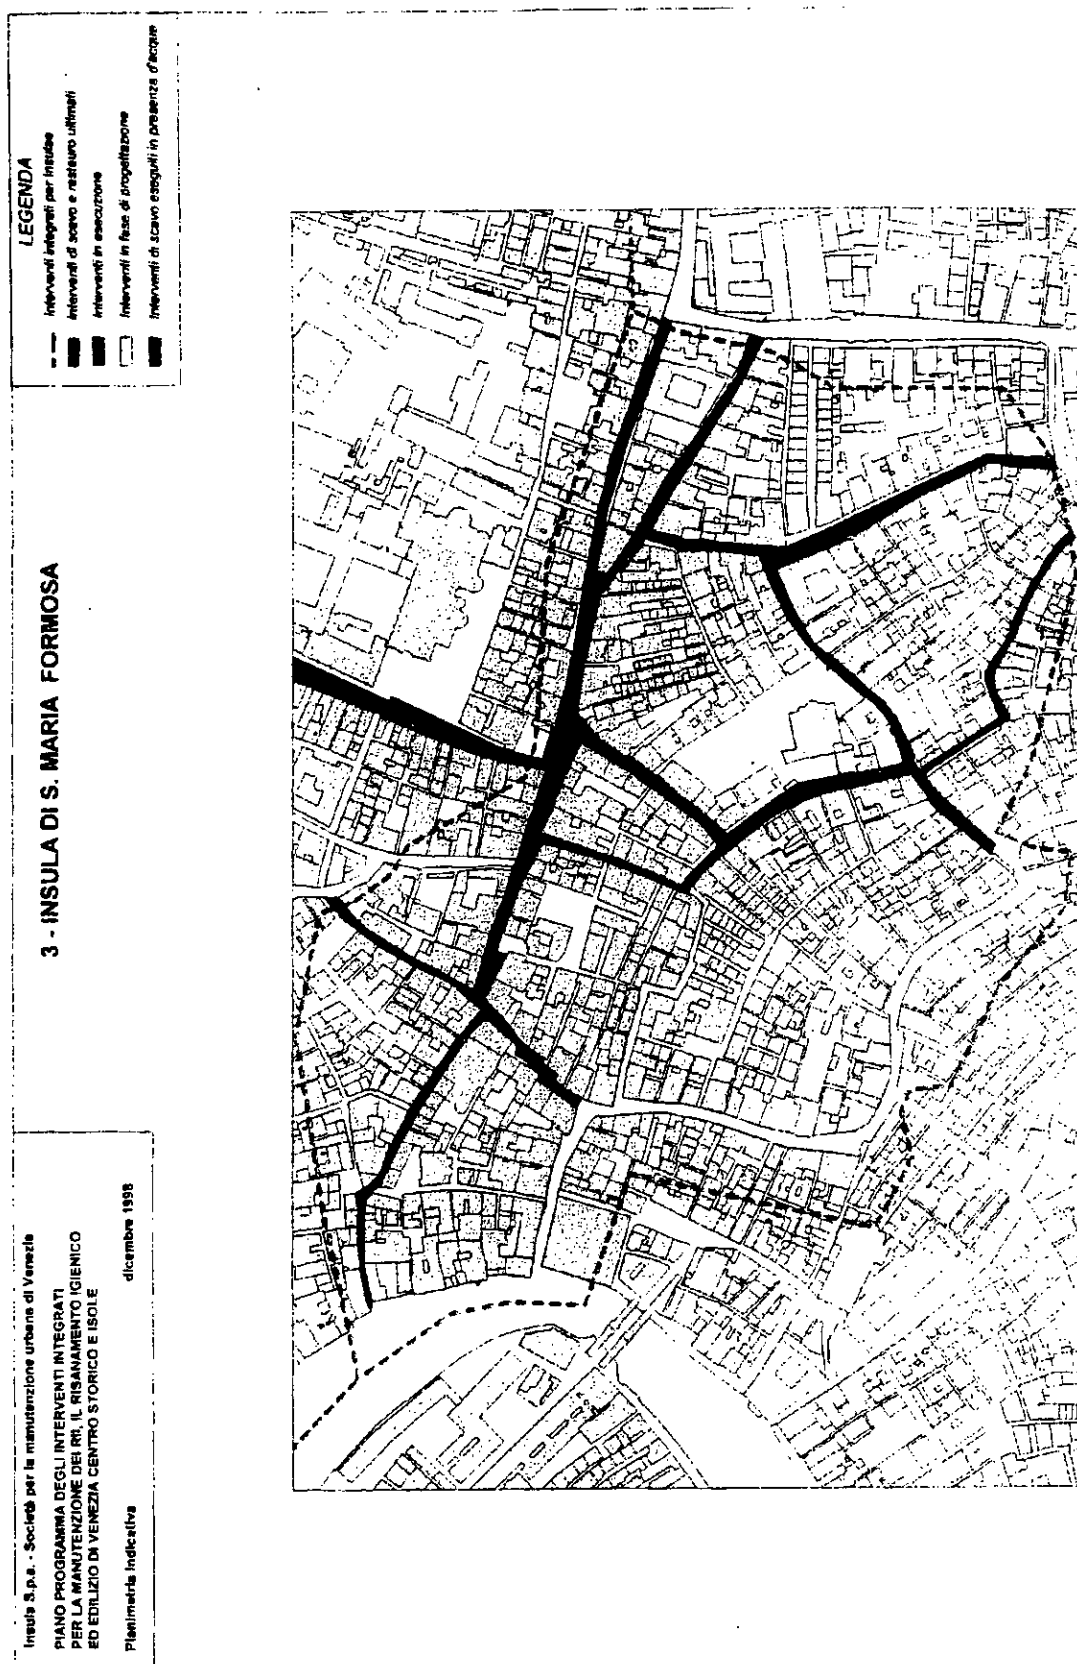


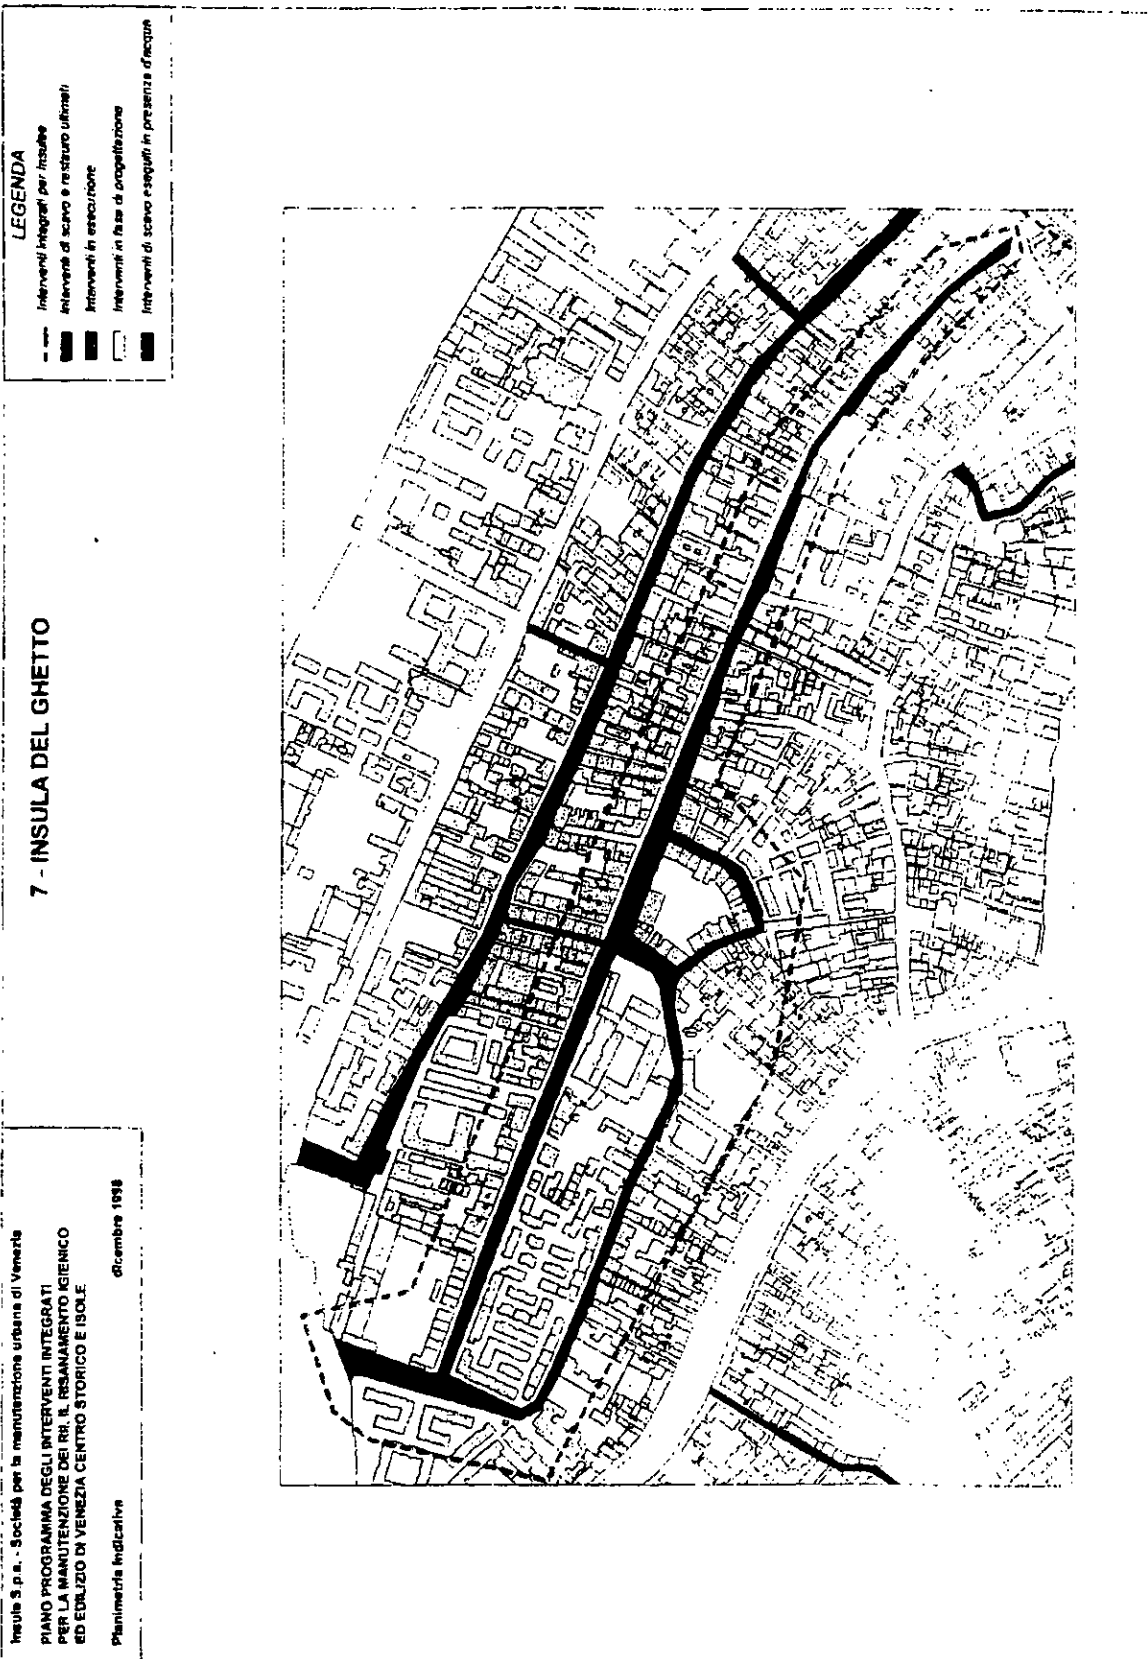


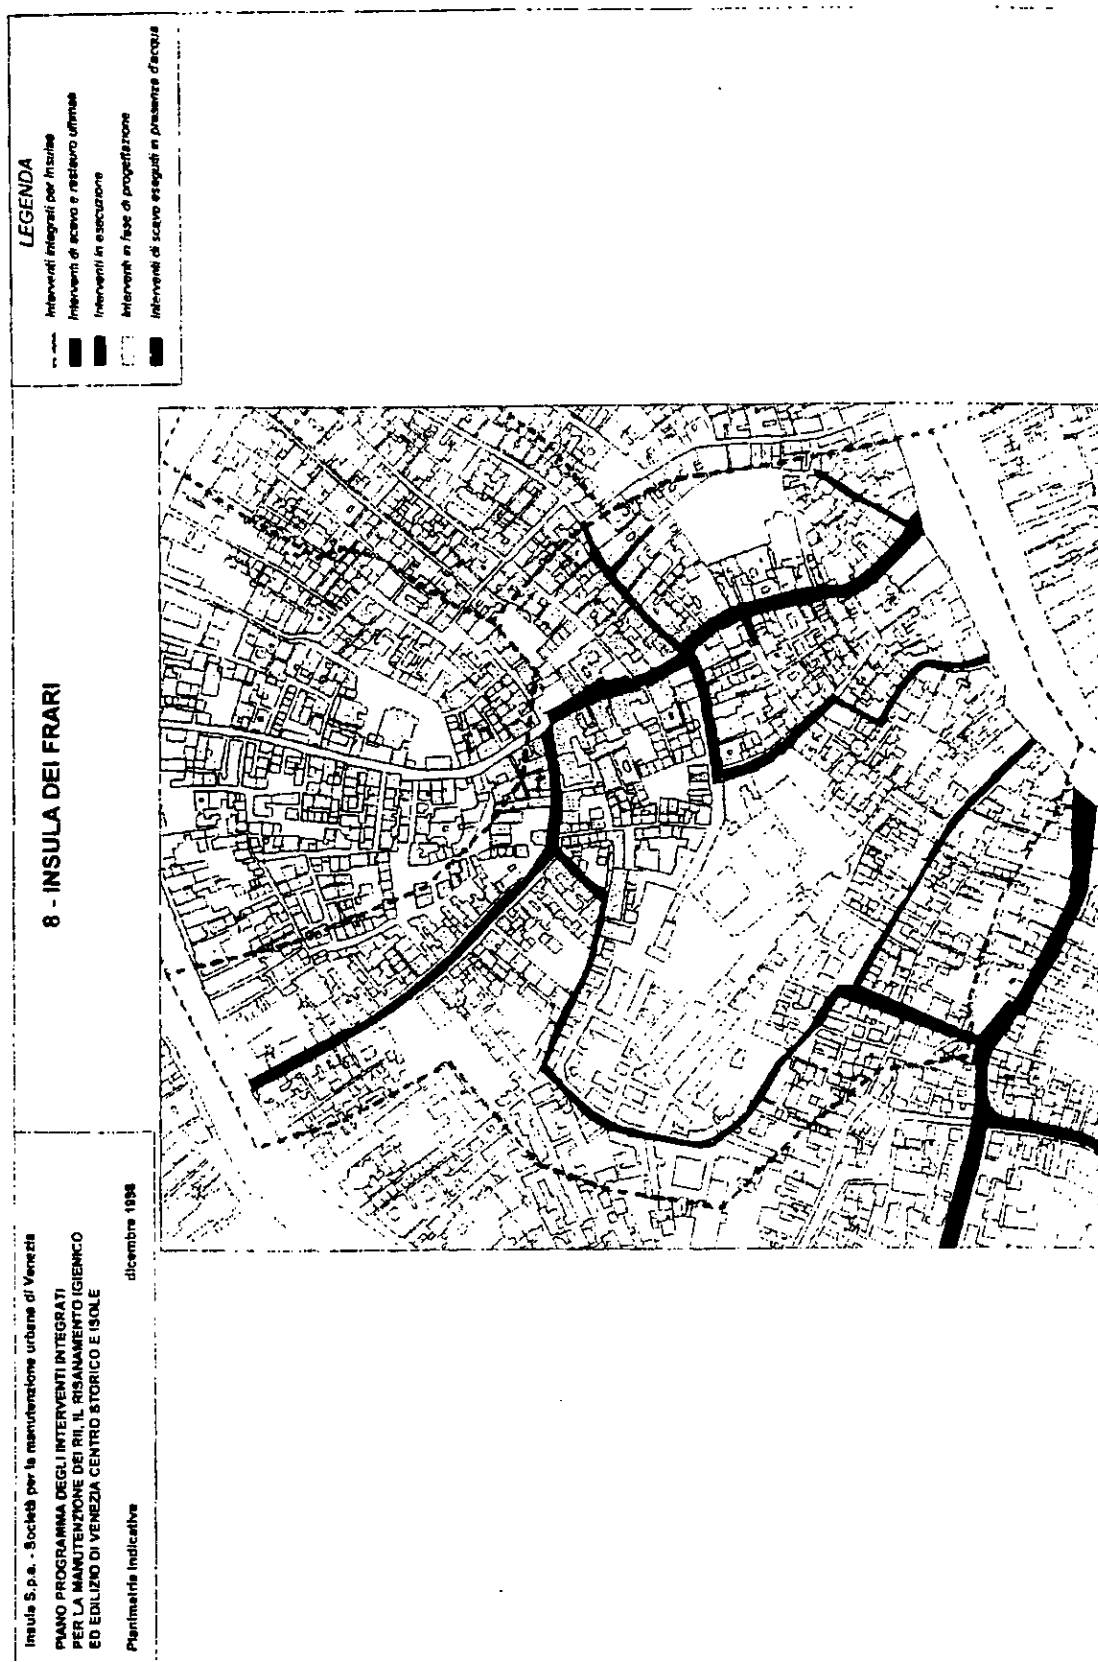


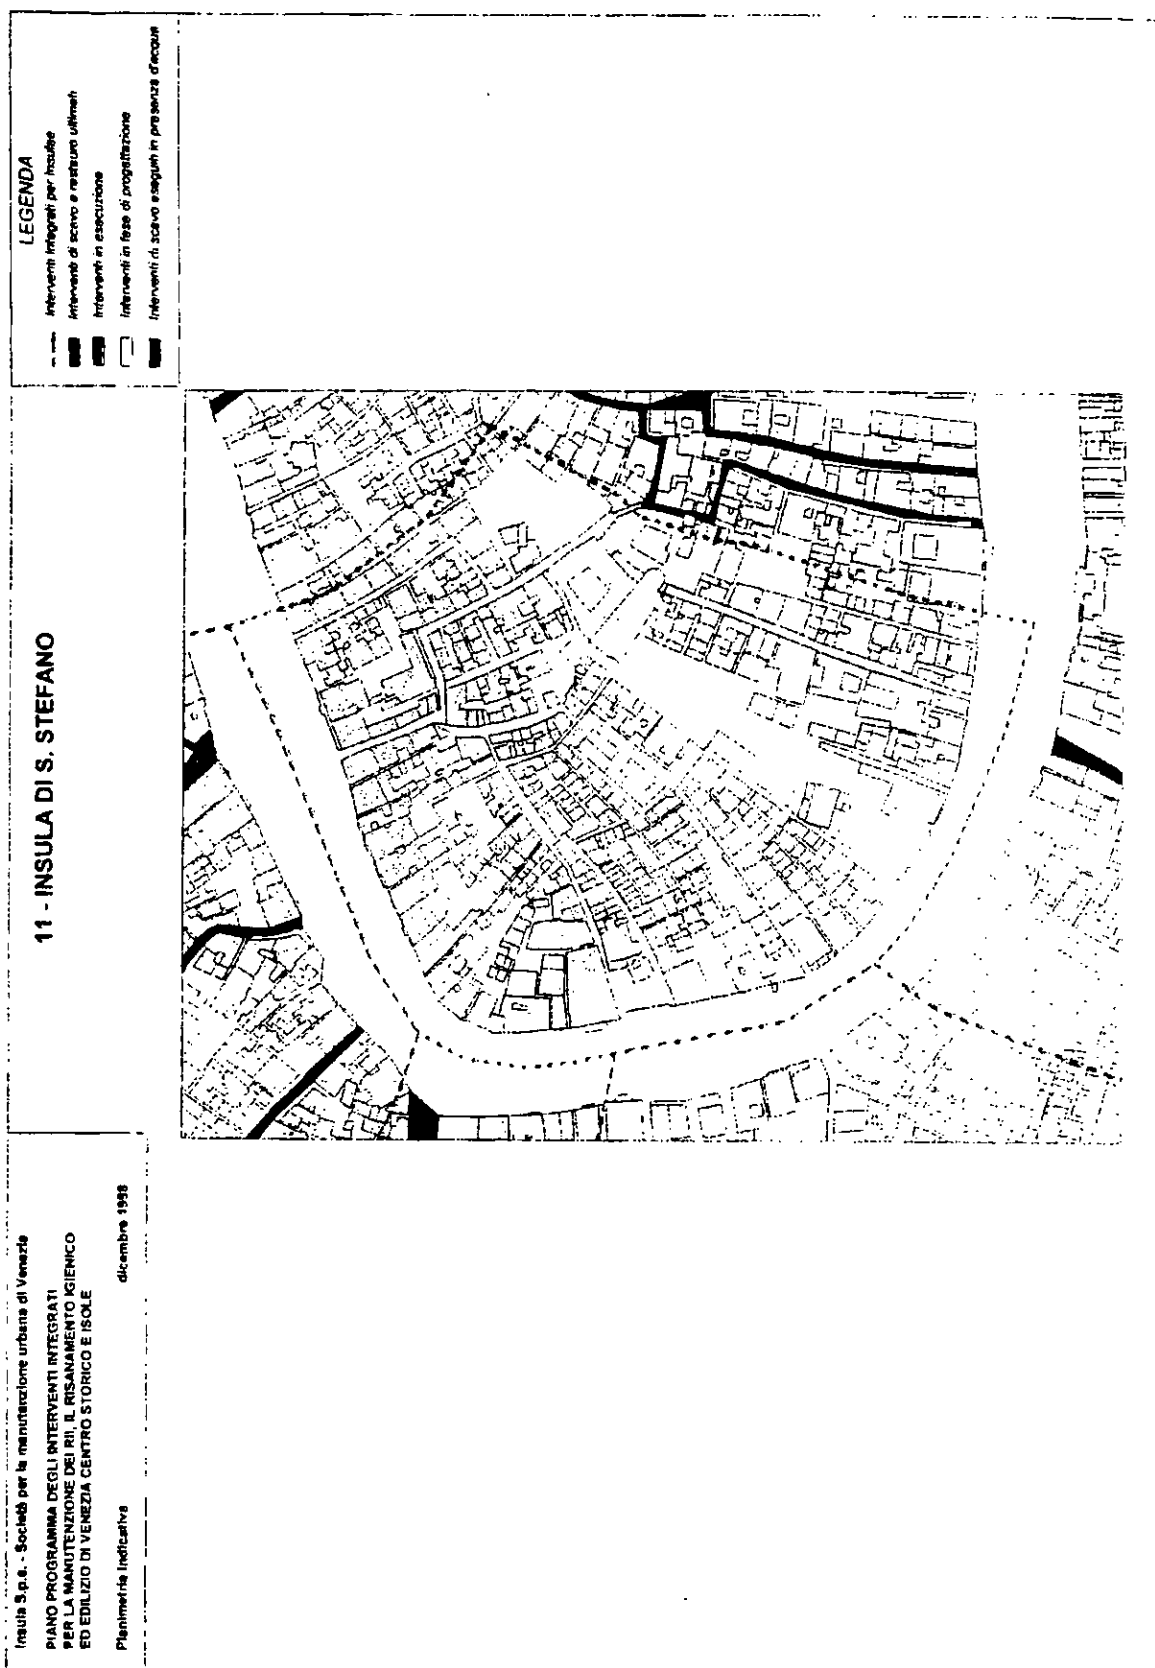





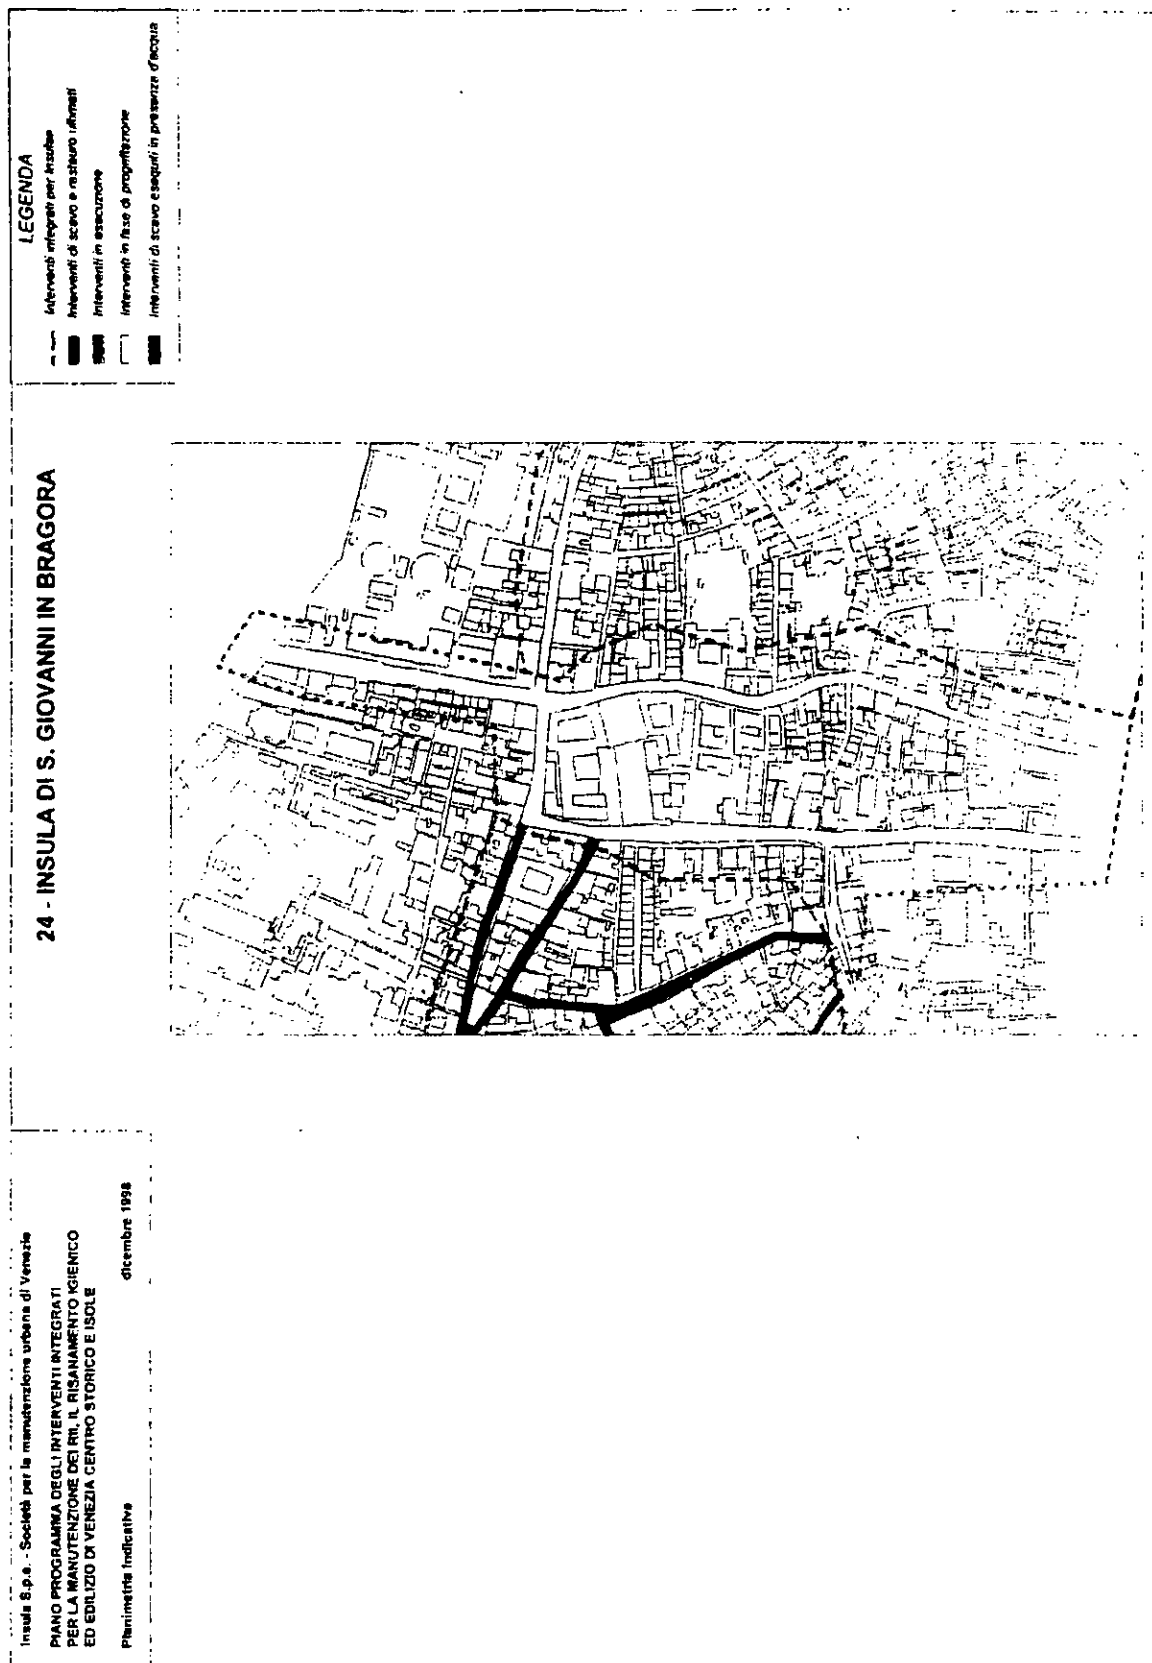

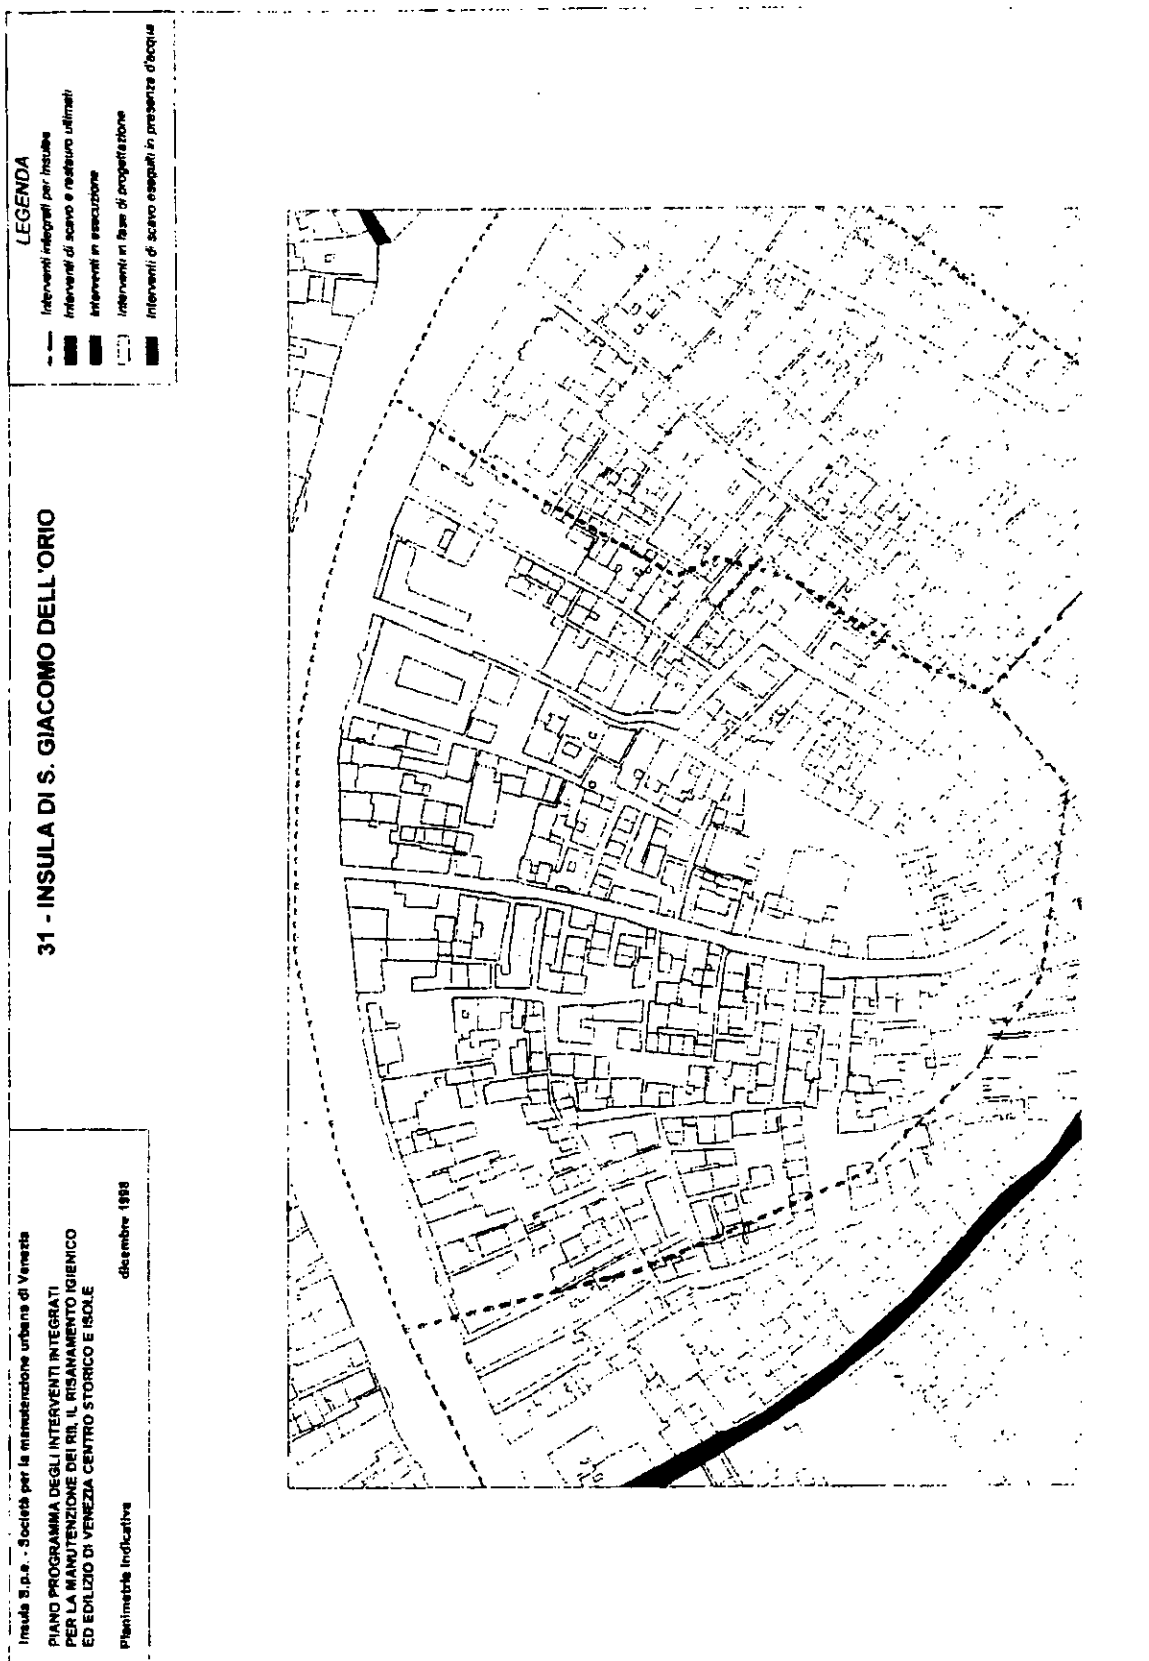

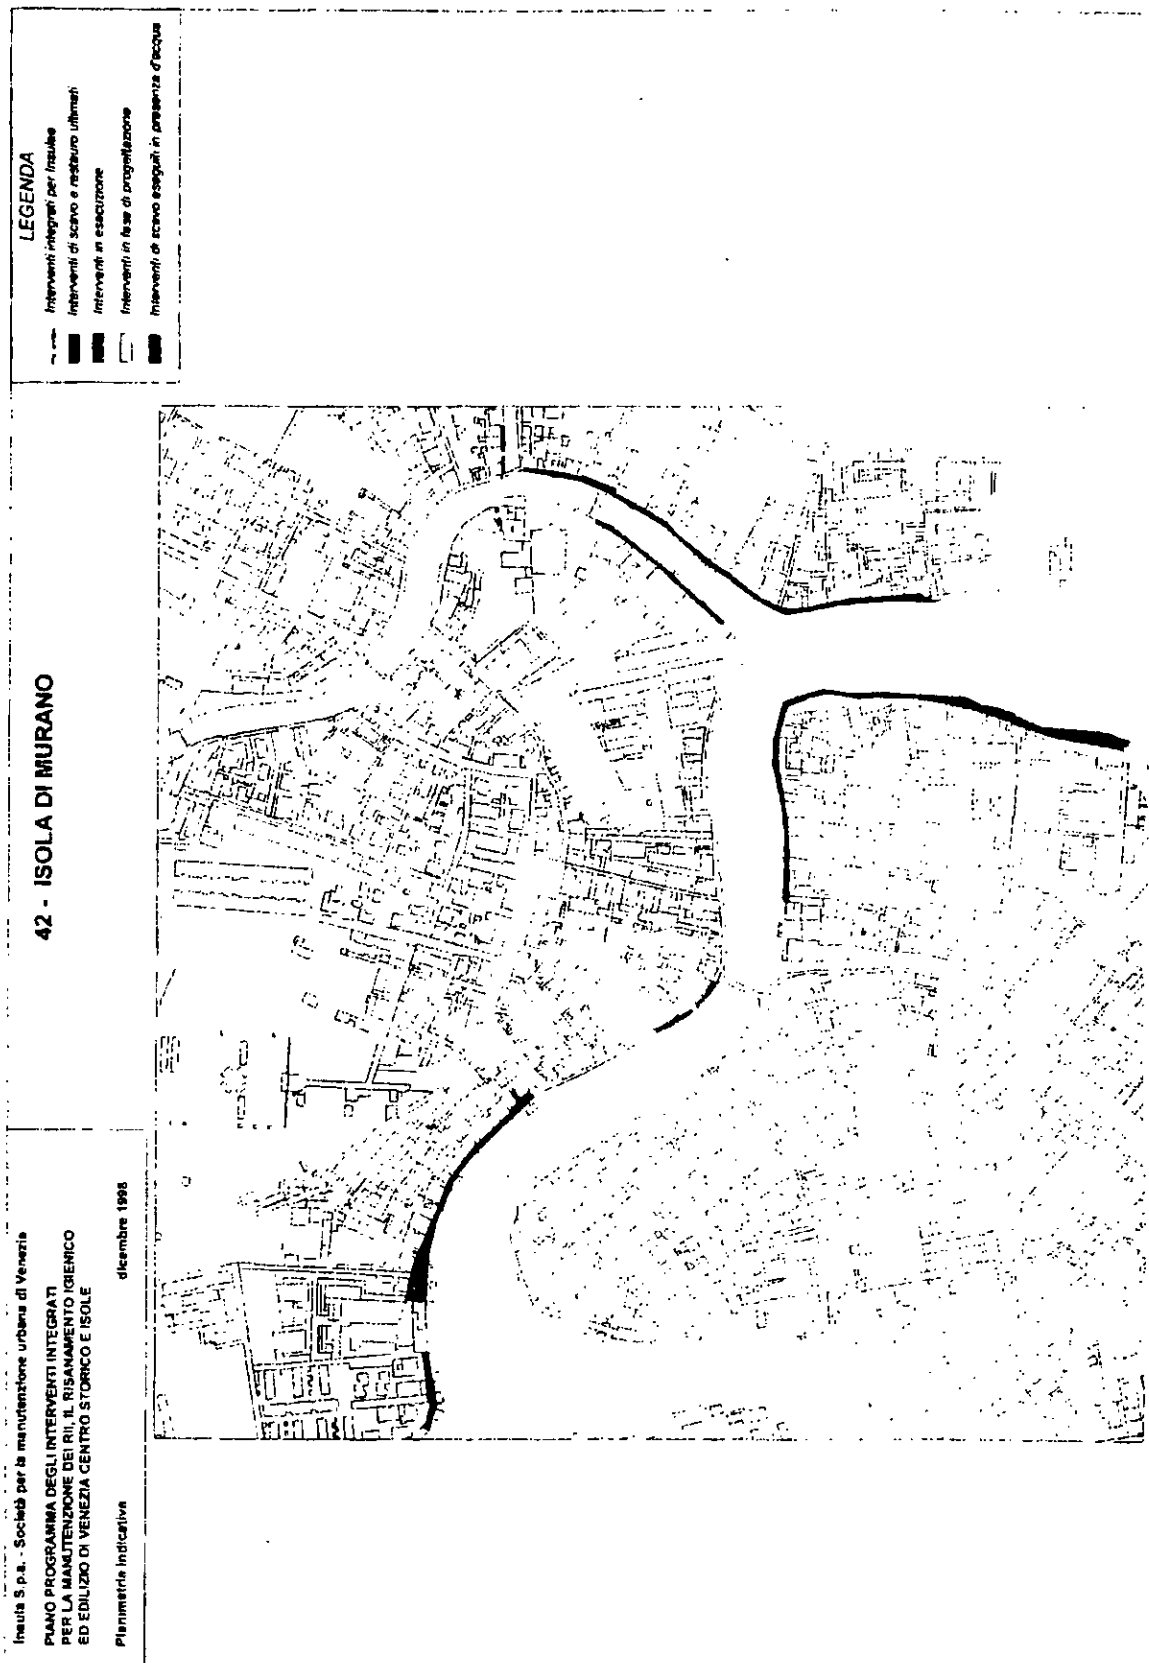

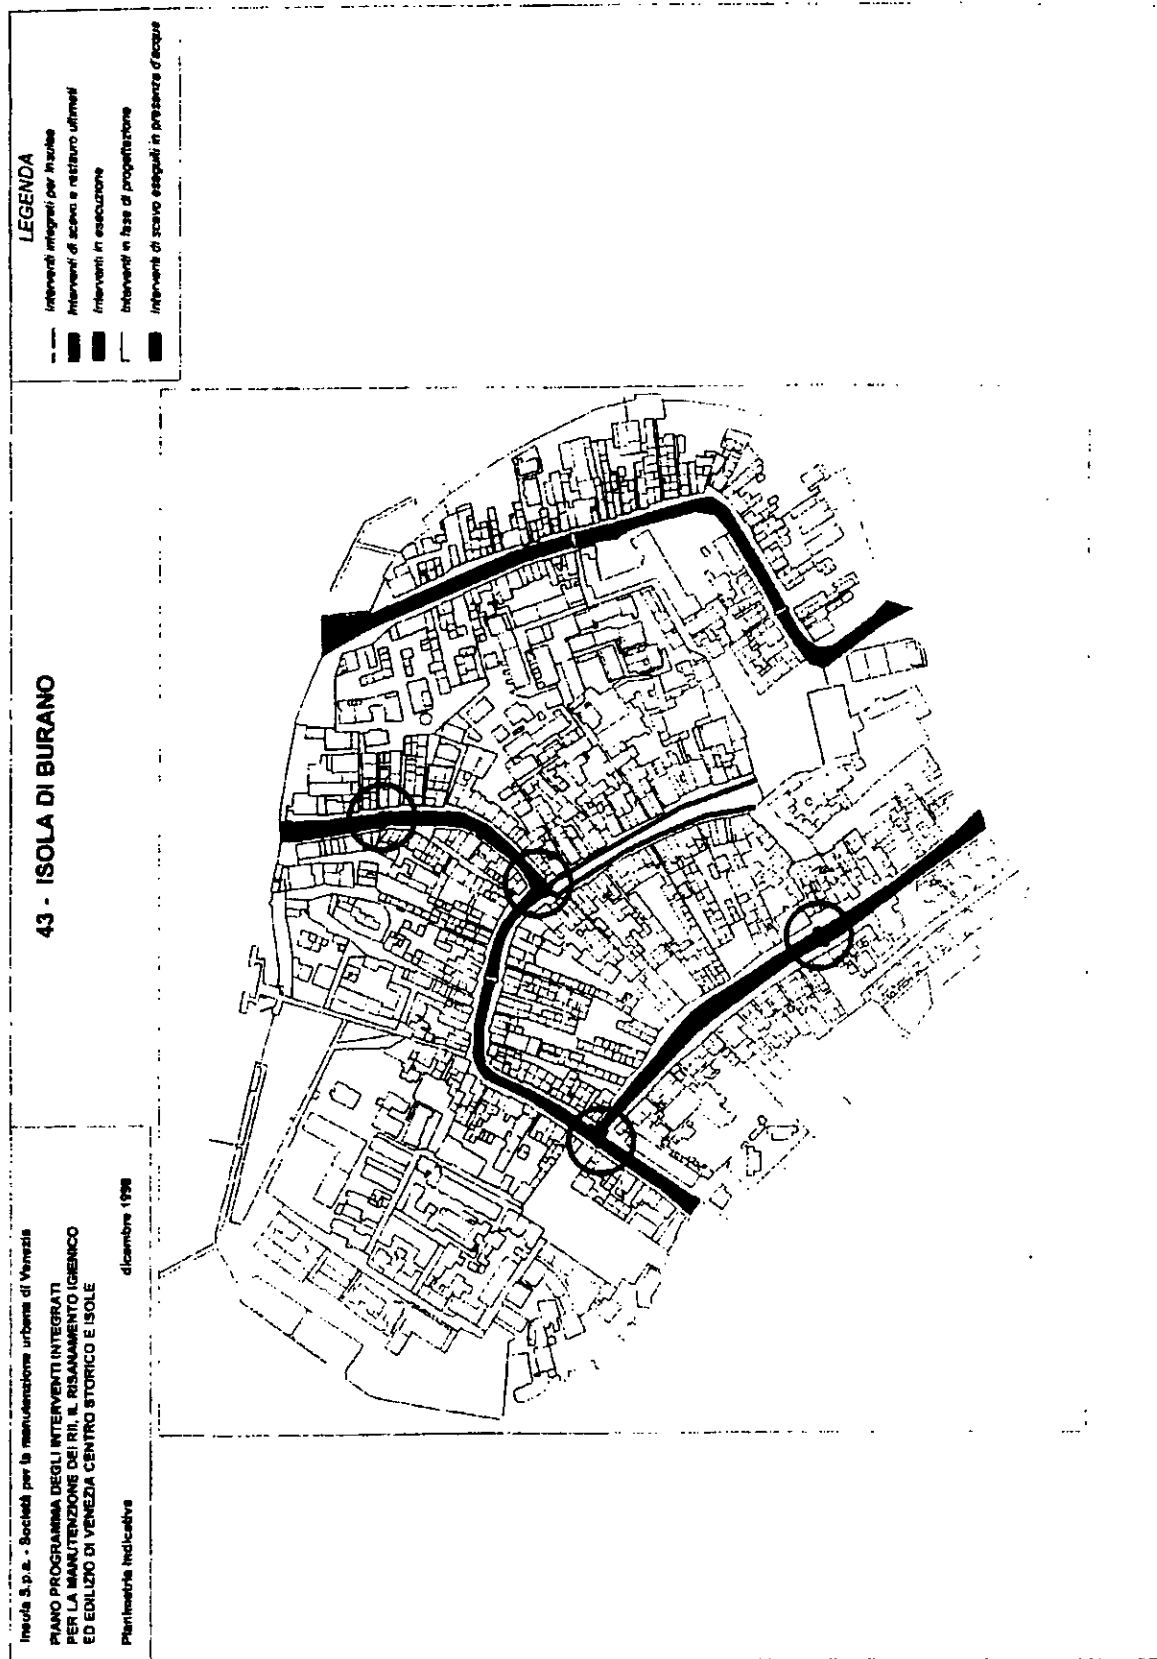

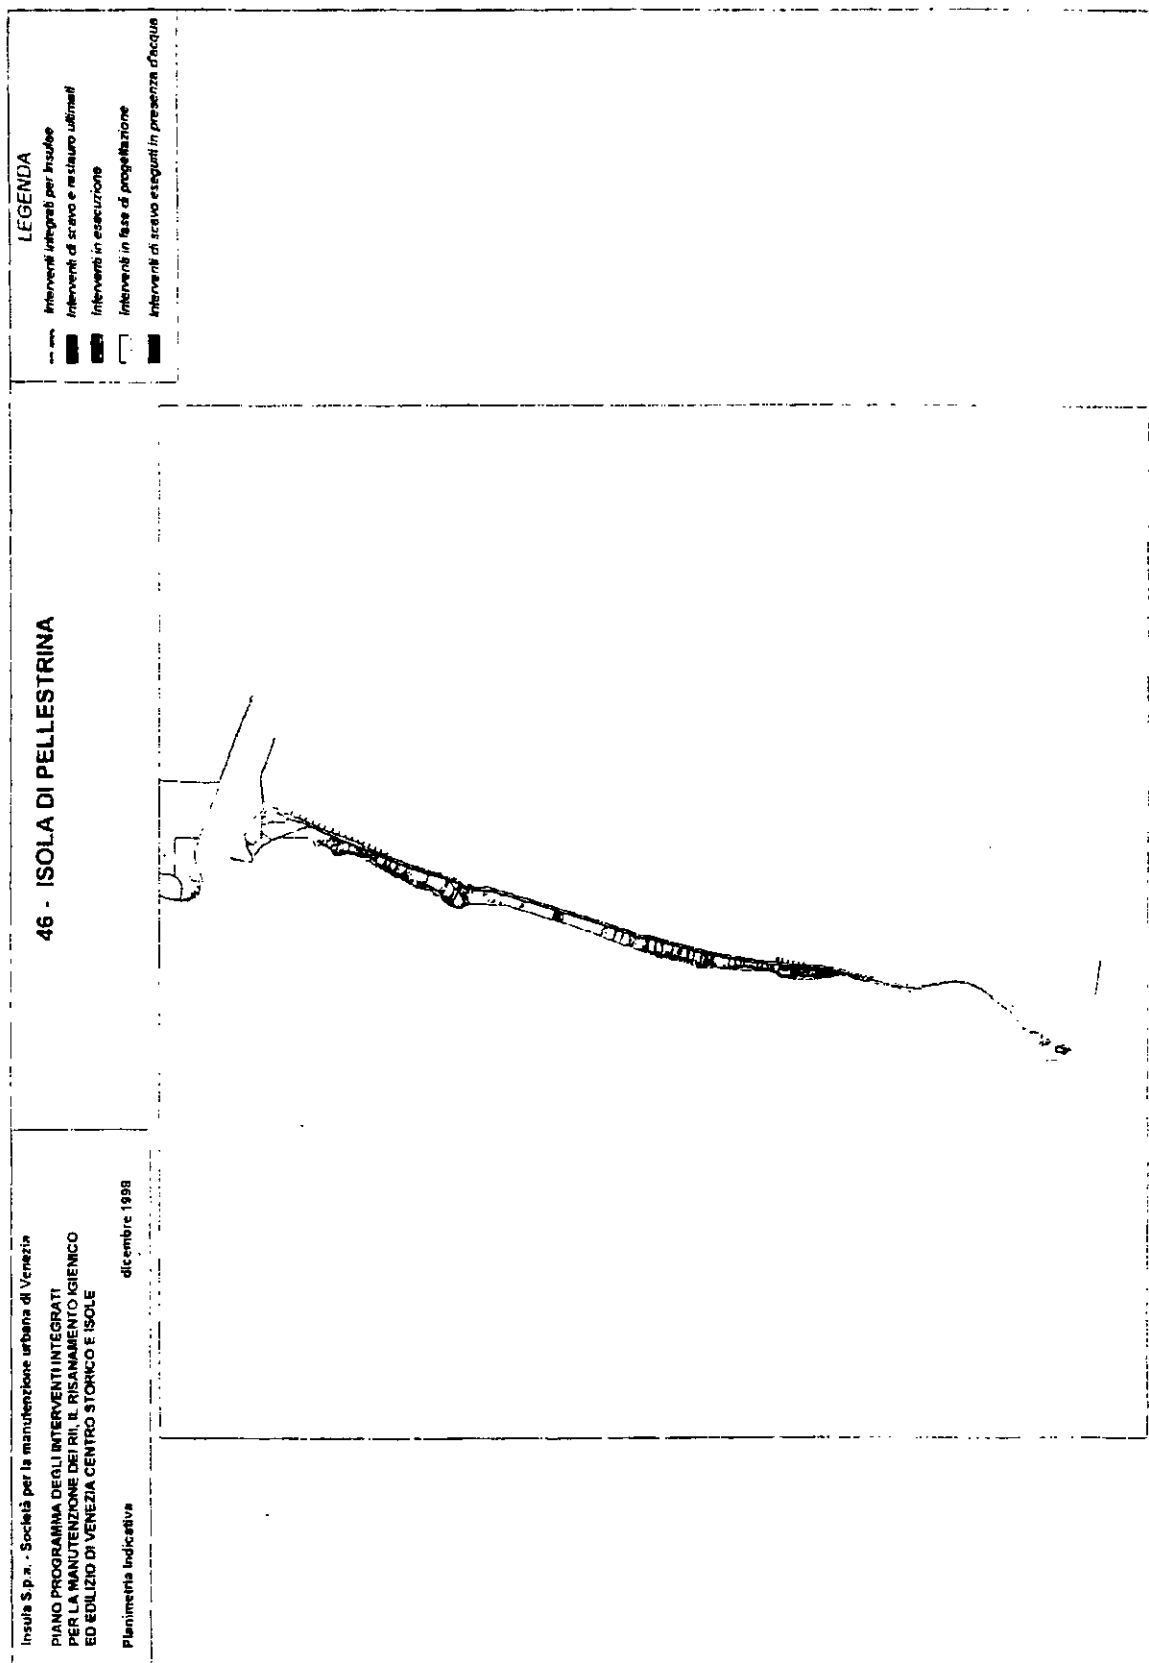


Dati su interventi eseguiti e in corso di esecuzione

N. Isola	Nome Isola	Lunghezza Rii		Lunghezza sponde		Volumi di fango da scavare (mc.)	Interventi sulle pavimentazioni		Ponti (n.)
		(ml.)		Pubbliche (ml.)	Private (ml.)		(mq.)		
1	S.M. Zobenigo	1.560		740	2.350	7.147	0		19
3	S.M. Formosa	2.873		931	4.596	15.602	17		36
7	Ghetto	1.982		1.985	1.664	18.500	2.350		17
8	Frari	2.471		1.230	3.526	13.488	0		21
11	S. Stefano	1.191		338	1.954	3.658	1.566		9
19	S. Trovaso	2.043		1.894	2.816	5.824	7.518		20
24	S.G. in Bragora	1.445		1.044	1.808	4.325	842		14
31	S.G. dell'Orio	978		436	1.475	6.092	939		12
42	Murano	0		1.416	0	16.762	5.972		4
43	Burano	1.310		2.618	0	10.774	1.209		4
44	Pellestrina	0		0	0	0	33.400		0
Totale		15.853		12.632	20.189	102.172	53.813		156

Interventi finalizzati alla acquisizione ed al restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento.

Tra essi va rilevato il peso che assumono le risorse impegnate per:

- la residenza che, unitamente ai contributi al patrimonio immobiliare privato di cui alla successiva lettera c) della Legge 798/84 ed altri provvedimenti integrativi di carattere normativo e finanziario, si propongono di contrastare e invertire il fenomeno dell'esodo;
- la cultura che garantiscono la riorganizzazione culturale ed economica del sistema museale della città;
- la ricostruzione del Teatro la Fenice.

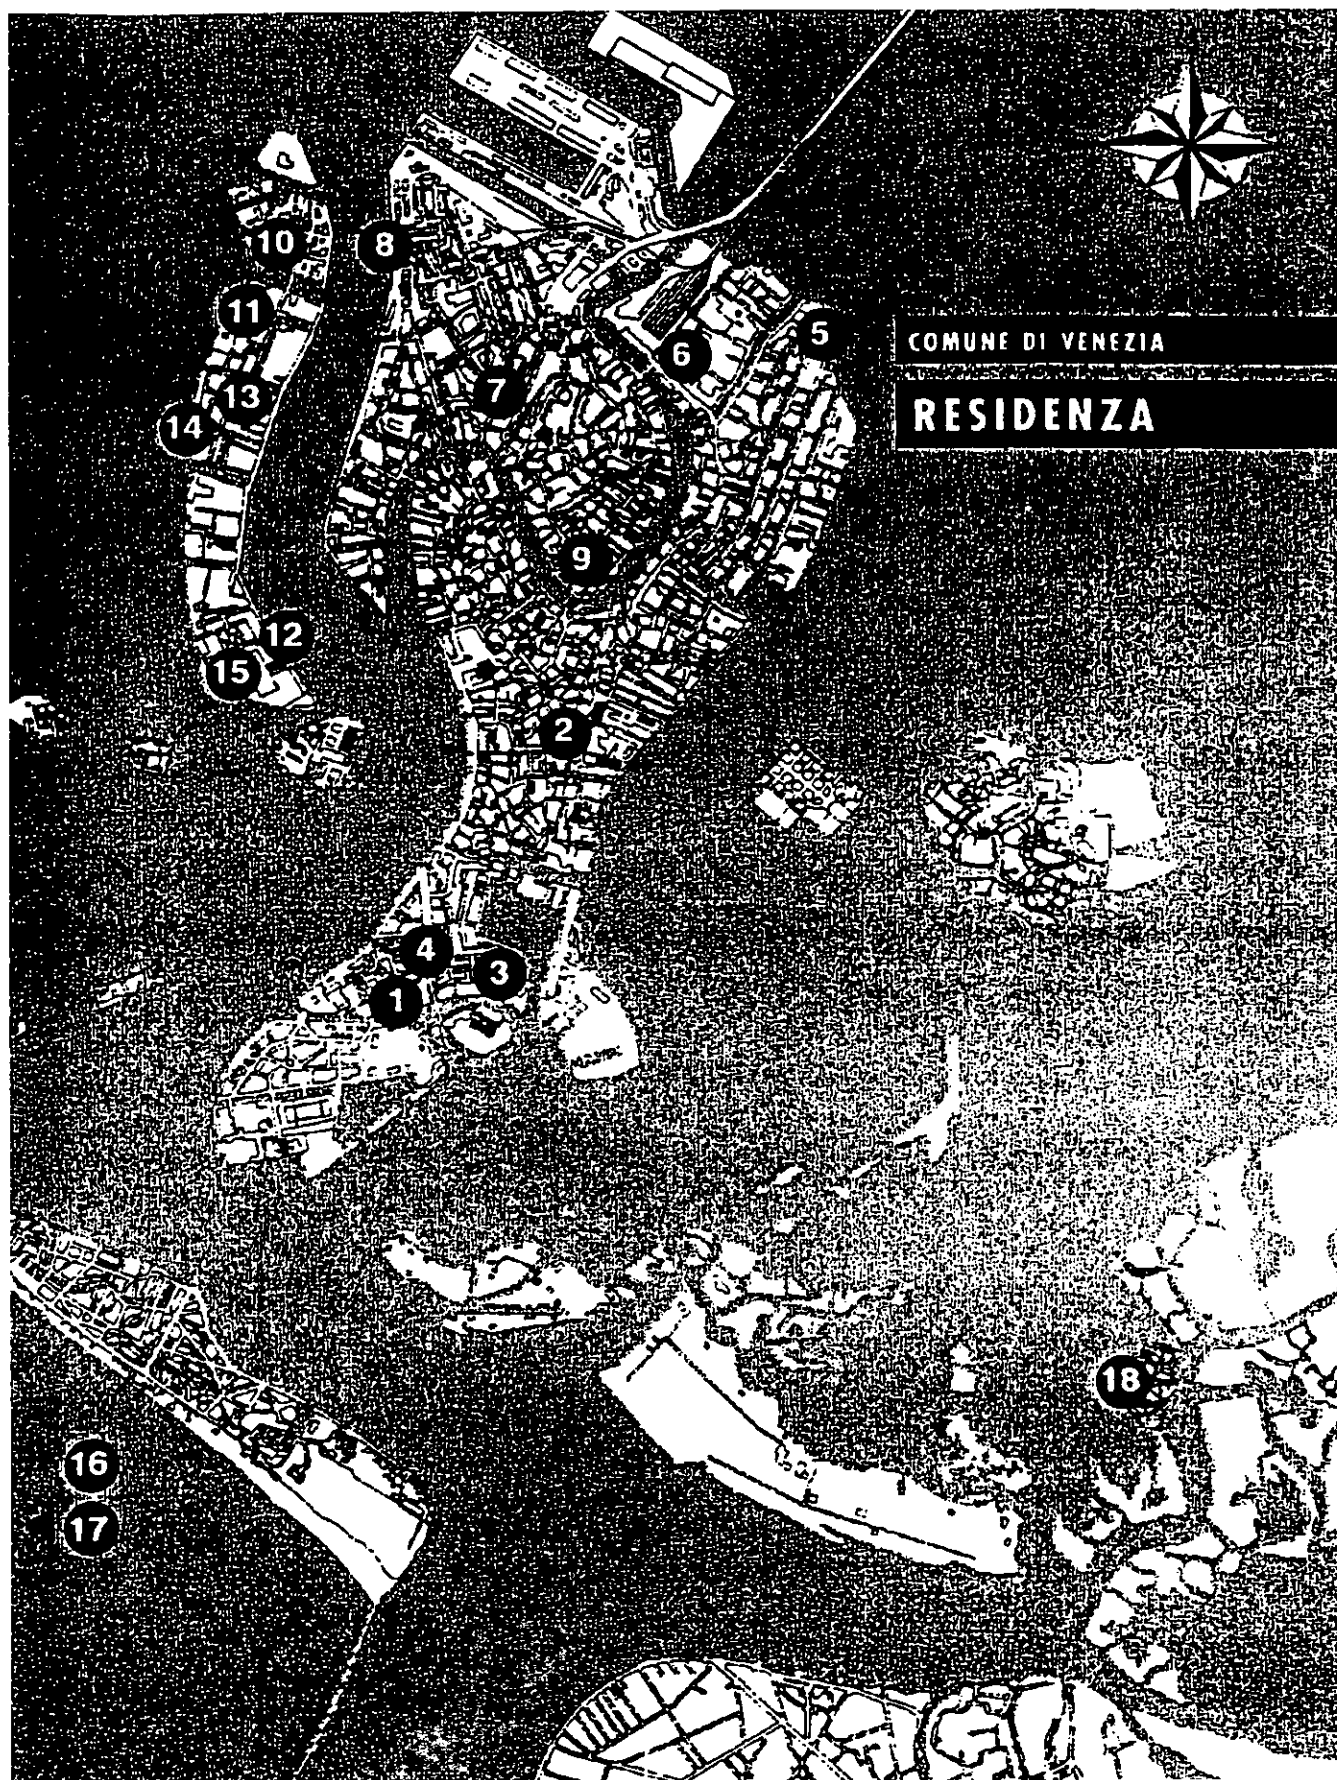

Gli interventi finanziati dalla Legge Speciale, riguardanti la questione abitativa, hanno come obiettivo non solo quello di incrementare il patrimonio edilizio residenziale, ma sono finalizzati anche alla riqualificazione di aree residenziali degradate, al recupero del patrimonio comunale non adeguatamente utilizzato, oltre alla reintroduzione sul mercato residenziale di ampie aree dismesse un tempo destinate a funzioni produttive oggi obsolete.

Dal 1993 ad oggi la Legge Speciale ha finanziato in questo settore una serie di interventi tra recuperi, nuove realizzazioni e acquisizioni, per un totale di circa 1.000 tra alloggi, residenze speciali per anziani e per studenti.

Castello Ex Convento Sant'Anna

1

L'intervento prevede il restauro conservativo e la ristrutturazione di un complesso di valore storico monumentale (legge 1089/39).
Si ricevono complessivamente 106 alloggi e attrezzature collettive al servizio della città.

progettazione istruttoria appello	lavori in corso	lavori ultimati
5.145	17.649	

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	5.800	5.800	5.744	3.007
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	594	580	368	196
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	4.060	4.060	1.500	
	1998	8.259	8.259		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	4.081	4.081		
TOTALE		22.794	22.780	7.632	3.203

Castello Ex Ospedale San Lorenzo

2

L'intervento di ristrutturazione su un complesso di valore storico monumentale (legge 1089/39) prevede la realizzazione di residenza specializzata per anziani (100 alloggi) e servizi alla collettività (poliambulatori).

progettazione istruttoria appello	lavori in corso	lavori ultimati
	20.070	

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	20.070	20.070	20.068	16.632
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		20.070	20.070	20.068	16.632

Castello Ex Caserma San Daniele

3

Il progetto di ristrutturazione su un complesso vincolato (legge 1089/39) all'interno dell'Arsenale prevede la realizzazione di 53 alloggi per il personale dipendente dal Ministero della Difesa.

progettazione istruttoria appello	lavori in corso	lavori ultimati
		10.058

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	9.616	9.616	9.616	9.497
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	442	442	442	
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		10.058	10.058	10.058	9.497

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	8.352	8.352	8.352	3.617
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	2.102	2.102	2.102	0
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	1.500	1.500	1.500	0
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	500	0	0	0
	1999	0	0	0	0
TOTALE		12.454	11.954	11.954	3.617

Dorsoduro Immobile Rio Novo 7

Restauro e risanamento di edificio ad uso di civile abitazione e negozi (n. 7 alloggi).

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				3.170	
Legge	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	3.170	3.170	3.170	2.004
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		3.170	3.170	3.170	2.004

Dorsoduro Casa 7 camini 8

Intervento sperimentale di restauro, risanamento e ristrutturazione di un tipico edificio vincolato di edilizia residenziale minore (n. 21 alloggi).

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					2.000
Legge	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	2.000	2.000	2.000	1.940
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		2.000	2.000	2.000	1.940

San Polo Complesso Calle Carampane 9

Intervento di restauro e risanamento di edificio ad uso residenziale (16 alloggi).

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				5.800	
Legge	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	2.000	2.000	2.000	625
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	0	0	0	0
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	3.800	3.800	3.800	
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		5.800	5.800	5.800	625

Giudecca Area ex Trevisan

10

Recupero di volumi esistenti nell'area da adibire a residenza e creazione di un'area attrezzata a verde pubblico.

	progettazione	istruzione appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				1.881
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	220	220	217
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	1.661	1.661	0
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98			
	1998			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999			
TOTALE		1.881	1.881	217

Giudecca Area ex Fregnan

11

Intervento di nuova edificazione ad uso residenziale per complessivi 38 alloggi.

	progettazione	istruzione appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				8.150
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	8.150	8.150	8.150
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97			6.996
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98			
	1998			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999			
TOTALE		8.150	8.150	6.996

Giudecca Ex Magazzini Granari

12

Intervento di restauro e ristrutturazione su un complesso di valore storico monumentale (legge 1089/39) eseguito in 2 lotti per un totale di n. 76 alloggi.

	progettazione	istruzione appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				9.704
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	2.104	2.104	1.581
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	7.600	7.600	7.071
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98			
	1998			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999			
TOTALE		9.704	9.704	8.652

Giudecca

SS. Cosma e Damiano

13

Intervento di restauro e ristrutturazione su un complesso di valore storico monumentale (legge 1089/39). Si ricavano 26 unità abitative e botteghe artigiane.

progettazione	istruzione	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			7.502	

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	2.448	2.448	2.448	2.094
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	4.166	4.166	4.166	637
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998	888	888	888	140
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		7.502	7.502	7.502	2.871

Giudecca

Ex pastificio Zaggia

14

Interventi di ristrutturazione ad uso residenziale per un totale di 32 alloggi.

progettazione	istruzione	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				5.265

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	5.265	5.265	5.265	5.265
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		5.265	5.265	5.265	5.265

Giudecca

Ex fabbrica del ghiaccio

15

Interventi di ristrutturazione ad uso residenziale per un totale di 23 alloggi

progettazione	istruzione	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				2.038

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	2.038	2.038	2.038	2.038
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		2.038	2.038	2.038	2.038

Giudecca	Interventi di recupero urbano

Interventi di recupero su alloggi di proprietà comunale ad uso residenziale.

	progettazione	istruzione	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				8.000	
Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	8.000	8.000	8.000	0
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		8.000	8.000	8.000	0

Lido	Immobili Via Doge Beato

Intervento di nuova edificazione per 16 alloggi su area di proprietà comunale.

16

	progettazione	istruzione	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				5.647	
Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	3.547	3.547	3.547	2.688
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998	2.100	2.033	2.033	0
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		5.647	5.580	5.580	2.688

Pellestrina	Villa Taice

Interventi di ristrutturazione ad uso residenziale per un totale di 8 alloggi. L'intervento si riferisce ad una perizia suppletiva.

17

	progettazione	istruzione	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					457
Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	457	457	457	457
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		457	457	457	457

Burano Immobili oggetto di edilizia sperimentale**18**

Intervento sperimentale (legge 94/82) di manutenzione e ristrutturazione su 8 edifici per complessivi 20 alloggi, già occupati, e realizzazione di 3 alloggi nuovi.

	progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati	
			845		
	Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	845	845	845	133
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		845	845	845	133

Acquisizioni di alloggi singoli o raggruppati, diffusi nella città

Il totale programmato è stato utilizzato per l'acquisto n. 128 alloggi, la cifra è comprensiva di locali o scoperti adibiti a servizi.

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			26.566

Manutenzione straordinaria e diffusa

Interventi sul patrimonio immobiliare comunale del centro storico e delle isole destinate a residenza che comprende 749 alloggi per un totale di 52.000 mq.

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		16.671	25.417


	Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	21.220	20.295	17.811	16.978
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	7.118	6.886	6.310	3.545
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	5.050	4.850	1.617	1.089
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	8.700	8.700		
TOTALE		42.088	40.831	25.738	21.612

QUADRO FINANZIARIO - RESIDENZA


	Annuità	Programmato	Impegnato	%	Obbligato	%	Speso	%
		A	B	B/A	C	C/A	D	D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	120.133	119.208	99,23%	116.663	97,11%	98.513	82,00%
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	31.947	31.701	99,23%	29.272	91,63%	20.155	63,09%
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	24.638	24.538	99,59%	18.645	75,68%	1.375	5,58%
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	14.300	13.733	96,03%	4.813	33,66%	1.132	7,82%
	1999	10.781	10.781	100,00%				
TOTALE		201.799	199.961	99,09%	169.393	83,94%	121.175	60,05%

STATO AVANZAMENTO - RESIDENZA

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	3.145	112.518	86.136
	2%	57%	43%

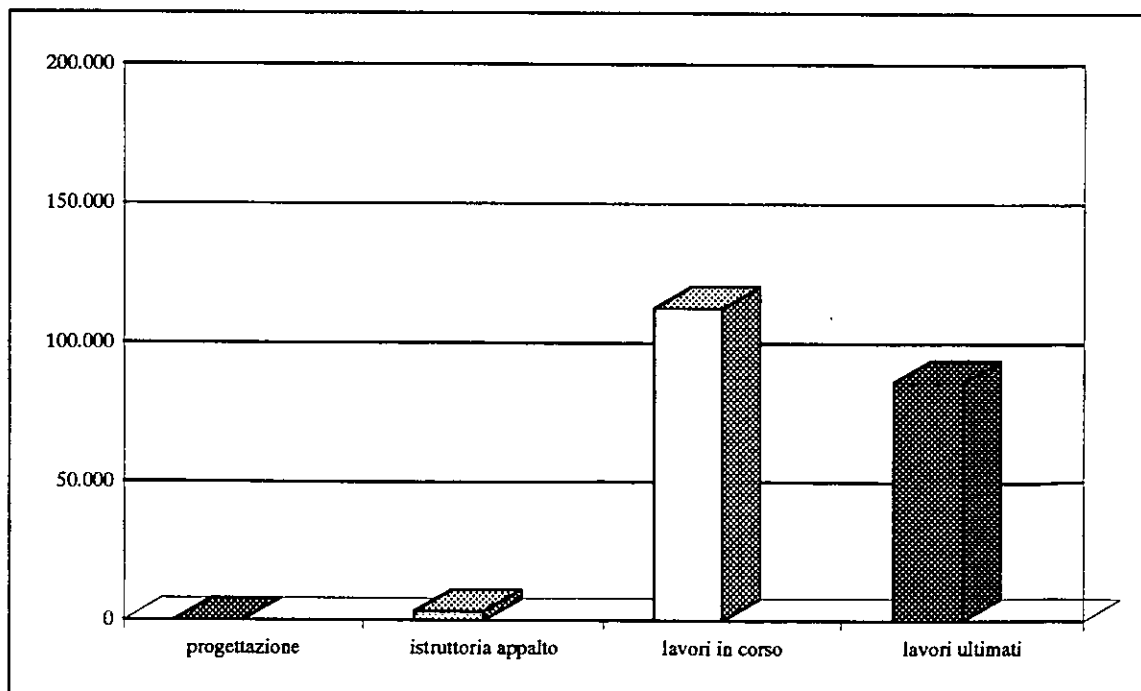

(in milioni di lire)



Gli interventi programmati alle sedi museali civiche hanno per obiettivo generale la riprogettazione del sistema museale cittadino in tutte le sue sedi e articolazioni con restauro degli immobili, la loro messa a norma e la creazione di condizioni ambientali idonee alla funzione assolta dai vari musei.

Detti interventi garantiranno il conseguimento di importanti obiettivi funzionali ed economici alla struttura museale con ampliamento dei servizi offerti al pubblico, l'estensione delle aree museali aperte ai visitatori o la riapertura di sedi chiuse da tempo e il conseguente incremento delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti, dalla riscossione di royalties per attività varie di servizio e comunicazioni.

San Marco Palazzo Pesaro degli Orfei (Museo Fortuny)**1**

Il progetto di restauro del palazzo, di valore storico monumentale, prevede il restauro conservativo e la razionalizzazione dei volumi ad uso museale ed espositivo.

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	4.625		

San Marco Area Marciana - Palazzo Ducale e Prigioni**2**

Il Palazzo Ducale simbolo della millenaria storia di Venezia è interessato da lavori di restauro conservativo manutentivo e messa a norma degli impianti

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		2.306	8.854

	Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	3.500	3.500	3.500	3.500
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	800	800	800	800
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	5.500	5.500	5.000	4.511
	1998	1.360	1.360	1.360	43
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		11.160	11.160	10.660	8.854

San Marco Area Marciana - Museo Correr e Procuratie**3**

Interventi di restauro conservativo e di messa a norma degli impianti su immobile di valore storico monumentale.

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		5.404	2.465

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	1.878	1.878	1.878	1.755
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	342	342	342	316
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	670	560	394	394
	1998	1.478	1.478		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	3.500	3.500		
TOTALE		7.869	7.759	2.614	2.465

San Marco Area Marciana - Torre dell'Orologio

4

Monumentale edificio costruito sul finire del XV secolo è interessato da lavori di restauro conservativo.

	progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati	
			3.497		
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	750	750	250	62
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	747	747	250	12
	1998	2.000	2.000		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		3.497	3.497	500	74

San Marco Area Marciana - Palazzo "Manin-Pilsen"

5

Edificio localizzato alle spalle della P.zza S. Marco, avente una superficie di circa 7.000 mq (ex albergo ed uffici) che diventerà sede della Biblioteca Storica del Museo Corner.
L'importo si riferisce al prezzo di acquisto.

		progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati
					15.261
	Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	36	36	36	36
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	15.075	15.075	15.075	15.075
	1998	150			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		15.261	15.111	15.111	15.111

Dorsoduro Cà Rezzonico

6

Interventi di restauro conservativo e di messa a norma degli impianti su edificio di valore storico monumentale sede del Museo del 700 Veneziano.

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		10.000	9.096

	Annuale	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	6.484	6.484	6.484	6.295
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	205	205	205	191
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	2.407	2.407	2.407	1.605
	1998	8.700	8.700		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	1.300	980		
TOTALE		18.096	18.776	9.096	8.091

Santa Croce

Fontego dei Turchi

7

Intervento manutentivo, conservativo e messa a norma degli impianti, su edificio di valore storico monumentale sede del Museo di Storia Naturale.

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				10.433	
Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	1.933	1.933	1.933	1.899
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	8.500	8.500	8.500	525
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		10.433	10.433	10.433	2.424

Santa Croce

Cà Pesaro

8

Intervento manutentivo, conservativo e messa a norma degli impianti, su edificio di valore storico monumentale sede della Galleria d'Arte Moderna

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				8.750	
Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	1.027	1.027	424	404
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	6.851	6.851	6.851	4.120
	1998	872	872		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		8.750	8.750	7.275	4.524

Santa Croce

Palazzo Mocenigo

9

Intervento manutentivo, conservativo e messa a norma degli impianti, su edificio di valore storico monumentale sede del Museo del Tessuto.

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					554
Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	554	554	432	432
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		554	554	432	432

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

San Polo

Casa Goldoni

10

Intervento manutentivo, conservativo e messa a norma degli impianti, su edificio di valore storico monumentale sede museale e biblioteca.

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati		
			3.894		
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Spesa
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	3.894	3.658	382	172
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		3.894	3.658	382	172

Murano

Palazzo Giustiniani (Museo del Vetro)

11

Intervento manutentivo, conservativo e messa a norma degli impianti, su edificio di valore storico monumentale - Museo Vetrario

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati		
		3.738			
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	921	921	482	183
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	2.668	2.668	2.200	645
	1998	149	149	149	149
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		3.738	3.738	2.831	977

Manutenzione Musei

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		3.500	1.845

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	1.110	1.110	1.038	1.007
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	735	735	297	
	1998	3.500	2.646	1.050	1.050
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		5.345	4.491	2.385	2.057


QUADRO FINANZIARIO - MUSEI CIVICI

	Annualità	Programmato	Impegnato	%	Obbligato	%	Speso	%
		A	B	B/A	C	C/A	D	D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	21.823	21.587	98,92%	17.075	78,24%	15.683	71,86%
Legge 20 dicembre 1995 n. 538	1996-97	2.097	2.097	100,00%	1.597	76,18%	1.369	65,28%
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	43.153	43.043	99,75%	40.974	94,85%	26.887	62,31%
	1998	18.210	17.206	94,49%	2.559	14,05%	1.242	6,82%
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	10.070	4.480	44,49%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTALE	95.353	88.413	92,72%	62.205	65,24%	45.181	47,38%


STATO AVANZAMENTO - MUSEI CIVICI (*)

(*) - tutti gli interventi sono soggetti a vincolo ai sensi della Legge 1089/39

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
4.759		47.628	41.969
5%		50%	44%

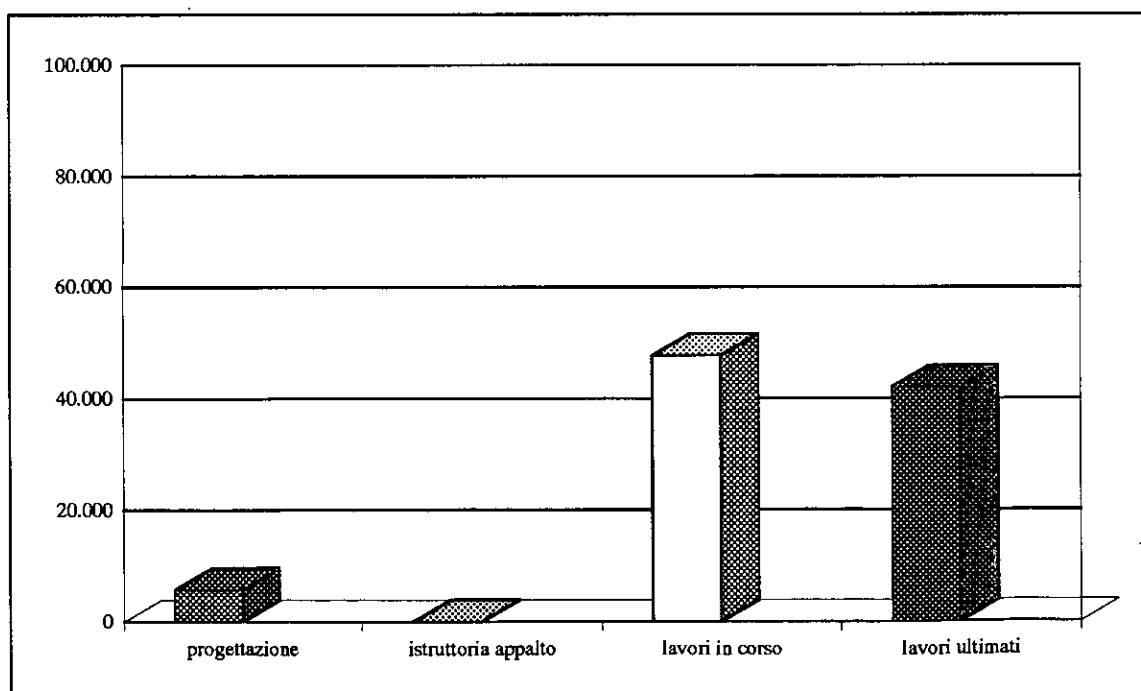

(in milioni di lire)

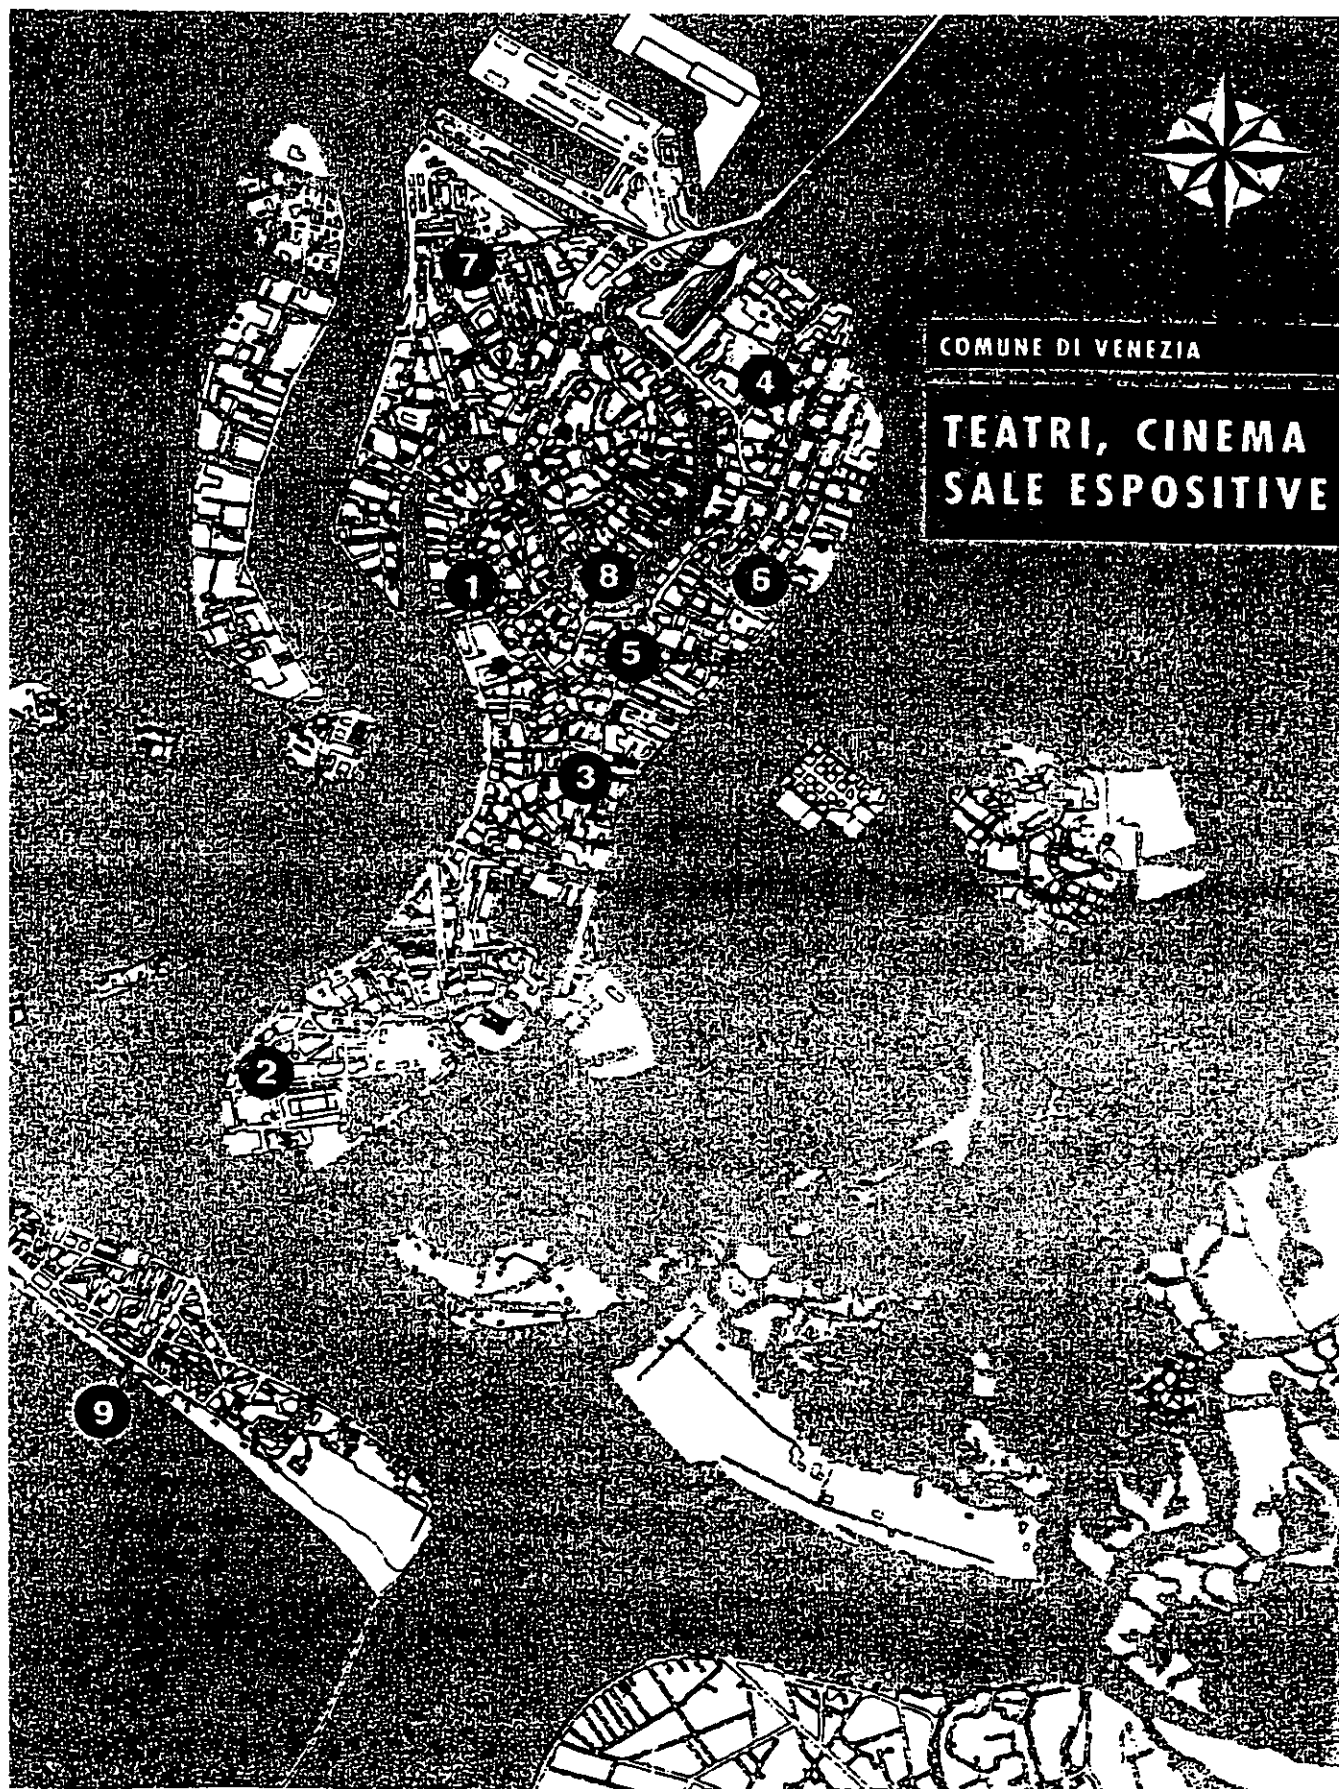

San Marco

Teatro la Fenice

1

La cifra di 3.298 milioni (legge 139/92) si riferisce a lavori eseguiti prima dell'incendio del 29 gennaio 1996. La cifra di 102.300 milioni (legge 515/96) rappresenta l'anticipazione che l'Amministrazione Comunale ha impegnato per consentire in tempi rapidi l'espletamento dall'appalto concorso per la ricostruzione del teatro (il cui costo totale è stimato in lire 152 miliardi). Come da accordi intercorsi con il governo lo Stato ha provveduto al reintegro con un contributo di 9 miliardi di lire di impegno (pari a 90 miliardi) nella Legge 2 ottobre 1997 n. 345.

	progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati
			103.371	2.227

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	3.298	3.298	3.012	2.227
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	102.300	102.300	102.300	
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		105.598	105.598	105.312	2.227

Castello

Padiglione Italia

2

Progetto di restauro conservativo e ristrutturazione per un utilizzo a sede museale permanente.

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		2.553	3.849

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	3.902	3.902	3.897	3.849
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	2.500	186		
TOTALE		6.402	4.088	3.897	3.849

Castello

Chiesa San Lorenzo

3

Restauro conservativo per utilizzo pubblico, culturale, espositivo su immobile di valore storico monumentale.

	progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati	
				4.060	
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	1.800	1.800	698	221
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	2.260	2.260		
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		4.060	4.060	698	221

Cannaregio

Teatrino Groggia

4

Restauro di tipo conservativo per utilizzo pubblico della struttura.

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				1.480	
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	994	994	890	311
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	486	486	402	
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		1.480	1.480	1.292	311

Cannaregio

Teatro Malibran

5

Intervento di restauro conservativo, manutentivo e di messa a norme degli impianti.

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				27.548	
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	2.980	2.980	2.769	1.748
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	5.978	5.978	5.978	150
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	16.790	16.790	16.790	4.328
	1998	1.800	1.800		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		27.548	27.548	25.537	6.226

Cannaregio

Scuola Grande Misericordia

6

Interventi di restauro conservativo, manutentivo e di ristrutturazione su edificio di valore storico monumentale.

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				9.548	
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	317	317	304	274
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	731	731	731	698
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998	8.500	8.500		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		9.548	9.548	1.035	972

Dorsoduro

Chiesa delle "Terese"

7

Edificio di valore storico monumentale interessato da lavori di restauro conservativo ed adeguamento alle norme di sicurezza

	progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				1.787
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	287	287	287
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97			
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	1.500	1.500	1.068
	1998			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999			
TOTALE		1.787	1.787	1.355

Santa Croce

Ca' Corner della Regina

8

Intervento conservativo e messa a norma degli impianti su edificio di valore storico monumentale sede dell'Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia

	progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				10.791
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	251	251	224
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	295	295	244
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	10.245	10.245	9.422
	1998			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999			
TOTALE		10.791	10.791	9.968

Lido

Palazzo del Cinema

9

Intervento di manutenzione e messa a norma degli impianti

	progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				1.782
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	1.086	1.086	979
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	309	309	309
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	337	337	295
	1998	50	50	
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999			
TOTALE		1.782	1.782	1.583


QUADRO FINANZIARIO - TEATRI - CINEMA - SALE ESPOSITIVE

	Annuale	Programmato	Impegnato	%	Obbligato	%	Speso	%
		A	B	B/A	C	C/A	D	D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	14.915	14.915	100,00%	13.087	87,74%	10.120	67,85%
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	7.313	7.313	100,00%	7.313	100,00%	1.401	19,16%
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	133.918	133.918	100,00%	130.277	97,28%	5.189	3,87%
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	10.350	10.350	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
	1999	2.500	186	7,44%	0	0,00%	0	0,00%
TOTALE		168.996	166.682	98,63%	150.677	89,16%	16.710	9,89%


STATO AVANZAMENTO - TEATRI - CINEMA - SALE ESPOSITIVE (*)

(*) - tutti gli interventi sono soggetti e vincolo ai sensi della Legge 1089/39

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	20.339	134.952	13.705
	2%	80%	4%

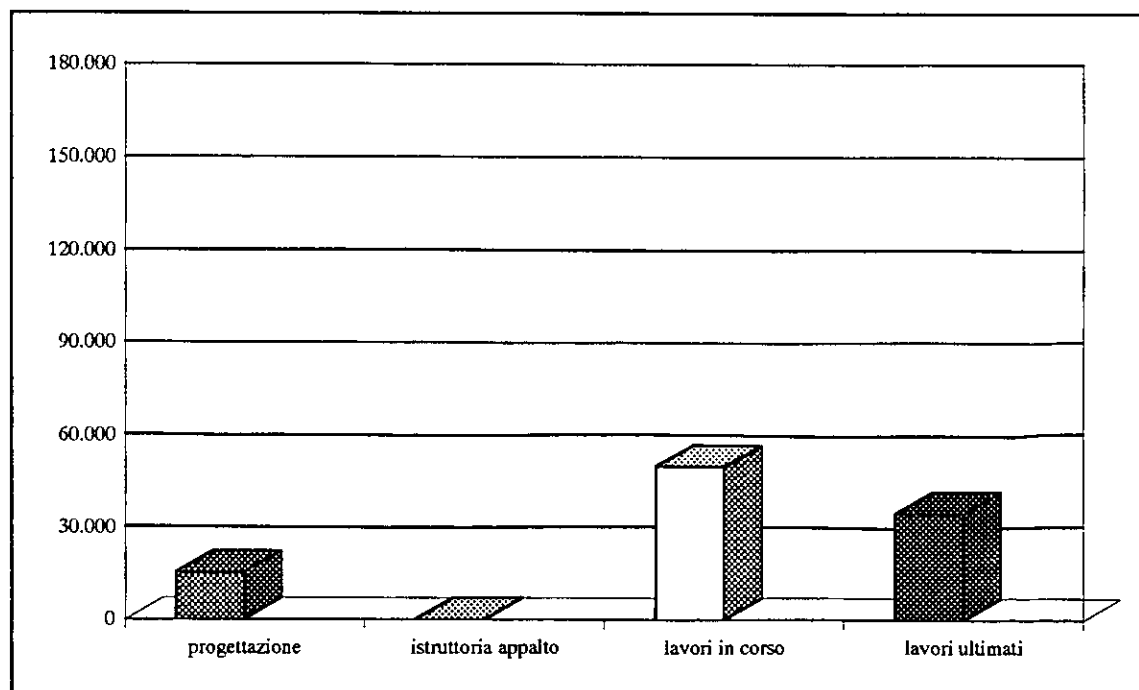

(in milioni di lire)

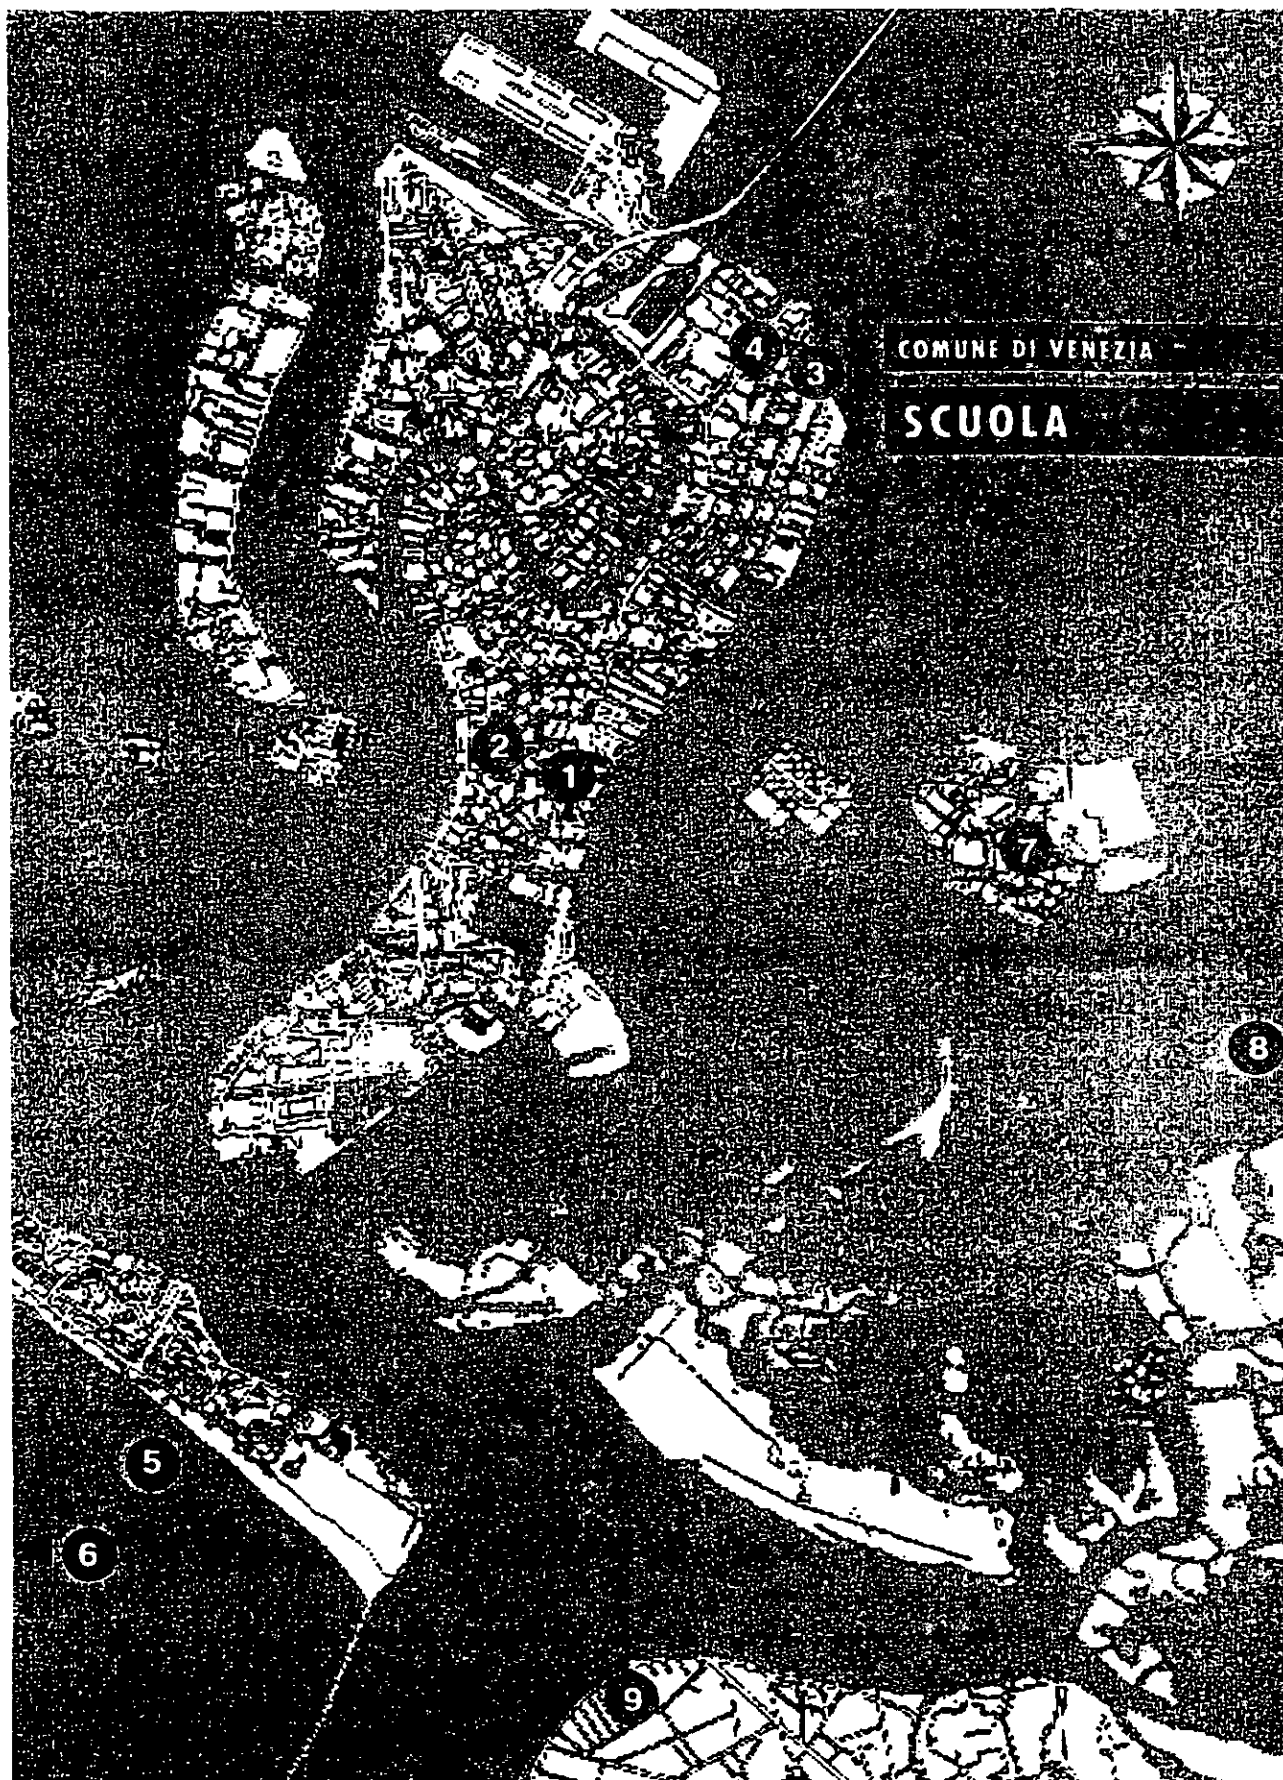

Gli interventi riguardano i principali lavori di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, messa norma e manutenzione straordinaria effettuati su tutto il patrimonio di edilizia scolastica di competenza comunale (nel centro storico e nelle isole) che consta di:

- Asili nido	5
- Materne	17
- Elementari	23
- Medie Inferiori	11
- Medie Superiori	12
TOTALE	70

Castello Ex Convento S. Giovanni Laterano (Ist. Barbarigo)**1**

Intervento manutentivo e messa a norme degli impianti su edificio di valore storico monumentale (legge 1089/39).

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	2.600		9.129

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	2.021	2.019	2.017	1.448
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	7.108	7.108	7.108	4.904
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998	2.600	2.600		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		11.729	11.727	9.125	6.352

Castello Palazzo Barbarigo (Ist. Profess. per il Commercio)**2**

Intervento manutentivo e messa a norme degli impianti su edificio di valore storico monumentale (legge 1089/39).

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	2.254		

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	2.254	1.581	1.026	286
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		2.254	1.581	1.026	286

Cannaregio San Girolamo (Istituto d'arte)**3**

Intervento manutentivo e messa a norme degli impianti. (Edi Venezia)

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	2.069		

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	569	569	418	249
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	1.500	1.500	1.500	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		2.069	2.069	1.918	249

Cennaregio Palazzo Nani (Complesso scolastico Caboto)

4

Intervento di restauro e messa a norma degli impianti su edificio di valore storico monumentale (legge 1089/39).

	progettazione	istruzione	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					2.201
Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	500	500	500	500
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	945	945	684	460
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	756	756	756	40
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		2.201	2.201	1.940	1.000

Lido San Giovanni Bosco

5

Intervento di manutenzione e alle cucine per pluriservizi nelle scuole.

	progettazione	istruzione	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					943
Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	943	943	923	882
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		943	943	923	882

Pellestrina Scuola Media Loredan

6

Nuova edificazione nel sito della precedente scuola media.

	progettazione	istruzione	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					3.016
Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	2.905	2.905	2.593	2.593
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	111	111	111	59
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		3.016	3.016	2.704	2.652

Murano Asilo Nido Principessa M. Letizia 7

Restauro manutentivo e messa a norma degli impianti.

	progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati	
				658	
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	625	625	578	578
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	33	33	32	32
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		658	658	610	610

Burano Scuola Elementare di Cocco 8

Restauro manutentivo e messa a norma degli impianti.

	progettazione	istruzioni appalto	lavori in corso	lavori ultimati	
				774	
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	774	774	774	764
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		774	774	774	764

Punta Sabbioni Costruzione Aula Polivalente 9

Nuova edificazione per uso multidisciplinare.

	progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati	
				1.224	
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	1.224	1.223	1.223	1.178
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		1.224	1.223	1.223	1.178

Manutenzione straordinaria e diffusa e messa a norma

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				11.468	13.162


	Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	8.917	8.550	8.134	4.432
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	2.007	1.918	1.893	562
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	4.199	4.164	3.135	2.393
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	3.365	3.365		
	1999	6.142	6.142		
TOTALE		24.630	24.139	13.162	7.387

QUADRO FINANZIARIO - SCUOLA


	Annualità	Programmato	Impegnato	%	Obbligato	%	Speso	%
		A	B	B/A	C	C/A	D	D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	20.732	19.689	94,97%	18.186	87,72%	12.910	62,27%
Legge 20 dicembre 1995 n. 639	1996-97	11.593	11.504	99,23%	11.217	96,76%	5.958	51,39%
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	5.066	5.031	99,31%	4.002	79,00%	2.492	49,19%
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	5.965	5.965	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
	1999	6.142	6.142	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTALE	49.498	48.331	97,64%	33.405	67,49%	21.360	43,15%

STATO AVANZAMENTO - SCUOLA

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	4.660	13.722	31.107
	9%	28%	63%

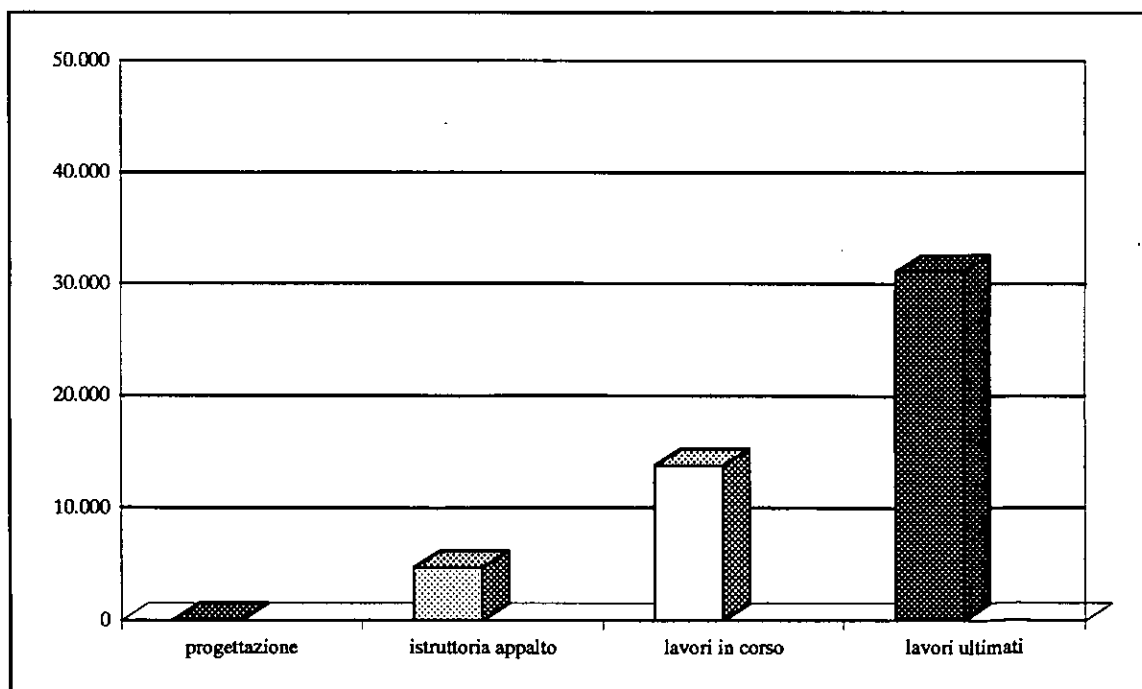

(in milioni di lire)

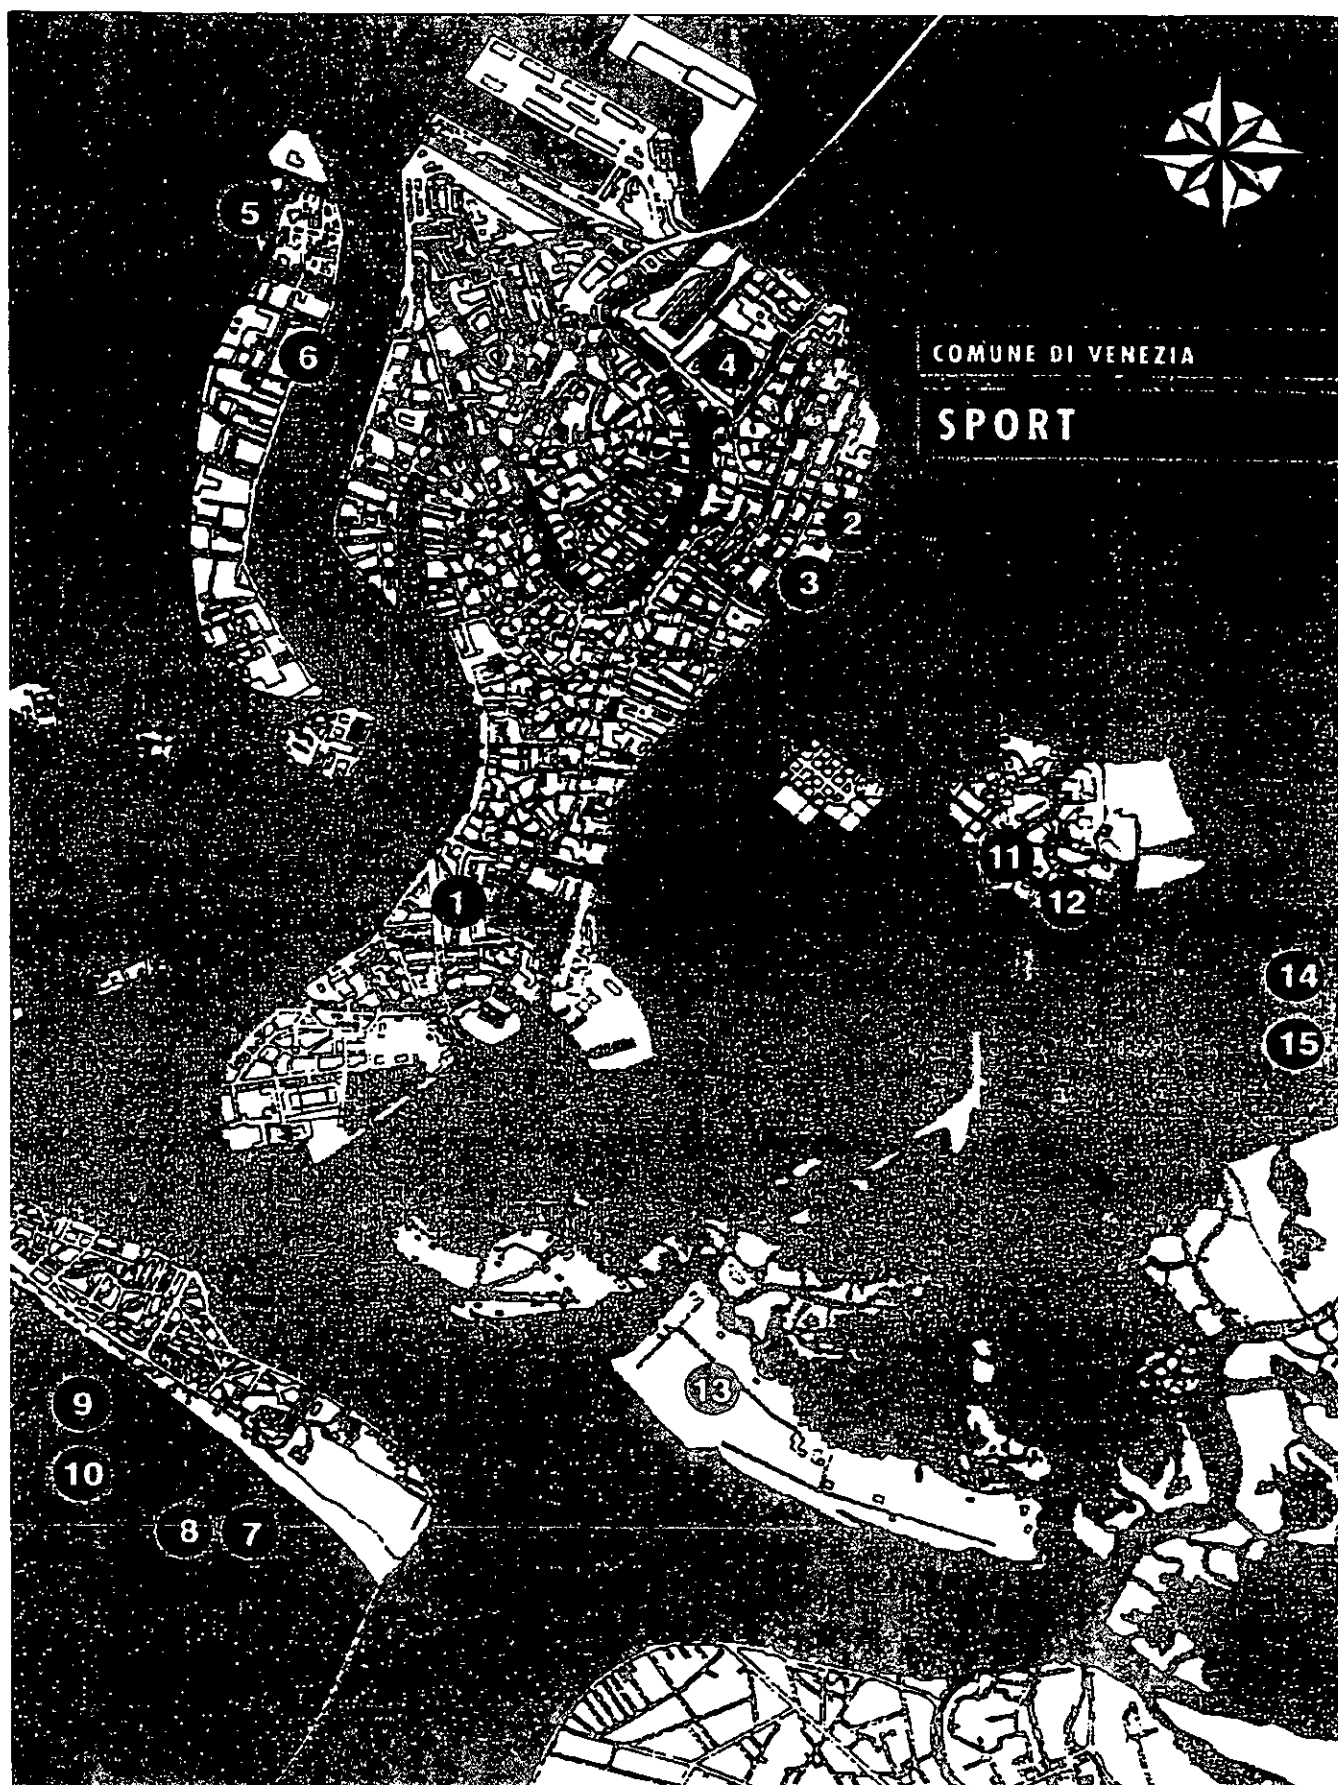

Castello Palasport G.B. Gianquinto 1

Messa a norma degli impianti.

		progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					850
Legge	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	850	850	775	605
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998				
	1999				
TOTALE		850	850	775	605

Cannaregio Centro Sportivo Sant'Alvise 2

Nel rispetto delle preesistenti architetture l'intervento prevede la realizzazione di un impianto natatorio, attrezzature sportive varie e di ricreazione.

		progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				2.491	10.405
Legge	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	6.602	6.602	6.602	6.602
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	3.920	3.920	3.676	2.670
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	2.374	2.374	2.047	1.133
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998				
	1999				
TOTALE		12.896	12.896	12.325	10.405

Cannaregio Remiere - Sant'Alvise 3

Nuova costruzione capannone. Ricovero imbarcazioni.

		progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				3.400	
Legge	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	800	800	800	800
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	2.600	2.600	2.423	480
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998				
	1999				
TOTALE		3.400	3.400	3.223	1.280

Cannariggio Centro sportivo Opera Pia Coletti**4**

Ristrutturazione impianti sportivi esistenti.

		progettazione	istruttorie appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		1.500			
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	1.500	1.500	1.500	
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		1.500	1.500	1.500	0

Giudecca Complesso Sportivo Sacca San Biagio**5**

Il progetto prevede attrezzature per una pluralità di discipline. Oltre alla piscina già in uso sono previsti ricoveri per imbarcazioni, campi da tennis, bocciodromo e opere di urbanizzazione.

		progettazione	istruttorie appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				5.487	2.432
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	5.757	5.757	4.940	2.432
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	1.000	1.000	1.000	0
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	1.162	1.162	1.000	0
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		7.919	7.919	6.940	2.432

Giudecca Remiere ex CNMOV**6**

Restauro su immobile per ricovero imbarcazioni.

		progettazione	istruttorie appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				2.990	
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	1.990	1.990	1.990	1.081
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	1.000	1.000	1.000	301
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		2.990	2.990	2.990	1.382

Lido Patinodromo Quattro Fontane

7

Ristrutturazione e messa a norma dell'impianto.

	progettazione istruttoria appello		lavori in corso	lavori ultimati	
			2.500		
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	2.500	2.500	2.199	1.095
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		2.500	2.500	2.199	1.095

Lido Piscina

8

Nuova edificazione di impianto sportivo natatorio.

	progettazione istruttoria appello		lavori in corso	lavori ultimati	
			9.894		
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	3.506	3.506	3.506	3.219
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	4.388	4.388	4.388	2.285
	1998	2.000	2.000	2.000	
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		9.894	9.894	9.894	5.504

Pellestrina Centro Sportivo

9

A completamento dell'impianto sportivo opere murarie ed affini, verde ed impiantistiche.

	progettazione istruttoria appello	lavori in corso	lavori ultimati		
			1.050		
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	600	600	600	600
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	225	225	225	176
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	225	225	225	
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		1.050	1.050	1.050	776

Pellestrina **S. Pietro in Volta - Centro polisportivo** **10**

Realizzazione di un campo da calcio, tennis e palazzetto polifunzionale.

	progettazione	istruzioni appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	4.000			
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96			
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	1.000	1.000	190
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	3.000	3.000	
	1998			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999			
TOTALE		4.000	4.000	190

Murano **Centro Sportivo San Mattia** **11**

Intervento di ristrutturazione, manutenzione e messa a norma degli impianti.

	progettazione	istruzioni appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				2.826
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	2.715	2.715	2.376
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97			
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	111	111	105
	1998			94
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999			
TOTALE		2.826	2.826	2.481

Murano **Palestra L. Perziano** **12**

Intervento di manutenzione e messa a norma degli impianti.

	progettazione	istruzioni appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				1.420
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	1.420	1.420	1.378
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97			
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98			
	1998			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999			
TOTALE		1.420	1.420	1.378

San'Erasmus

Remiere

13

Nuova costruzione capannoni. Ricovero imbarcazioni.

progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
1.800		

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	1.500	1.500		
	1998	300	300		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		1.800	1.800	0	0

Burano

Mazzorbo - Palestra

14

Progetto di nuova edificazione di un palazzetto polifunzionale.

progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		6.057

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	4.000	4.000	3.632	3.632
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	257	257	200	200
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	1.800	1.800	1.620	1.620
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		6.057	6.057	5.452	5.452

Burano

Mazzorbetto - Centro sportivo

15

Realizzazione di un campo da calcio e strutture polifunzionali

progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	1.286	

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	1.000	1.000		
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	286	286		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		1.286	1.286	0	0

Manutenzione straordinaria e diffusa


	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				3.661	4.523
	Annuale	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	5.412	5.412	4.708	4.442
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	660	591	143	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	303	117	81	81
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	1.809	1.809		
	1999				
TOTALE		8.184	7.929	4.932	4.523

QUADRO FINANZIARIO - SPORT


	Annusità	Programmato	Impegnato	%	Obbligato	%	Speso	%
		A	B	B/A	C	C/A	D	D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	37.152	37.152	100,00%	33.506	90,19%	28.222	75,96%
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	10.948	10.859	99,19%	8.857	80,90%	3.827	34,96%
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	16.363	16.177	98,86%	10.966	67,02%	5.213	31,86%
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	4.109	4.109	100,00%	2.000	48,67%	0	0,00%
	1999	0	0		0		0	
TOTALE		68.572	68.297	99,60%	55.329	80,69%	37.262	54,34%

STATO AVANZAMENTO - SPORT

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
7.600		31.709	19.563
11%		46%	28%

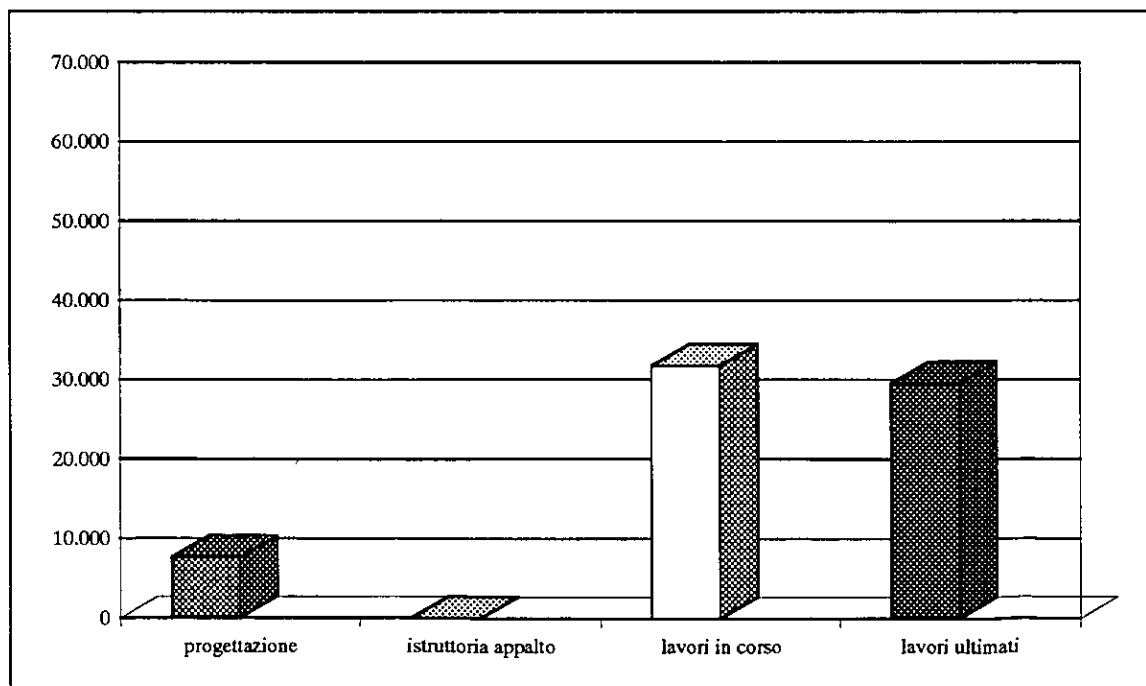

(importi in milioni)

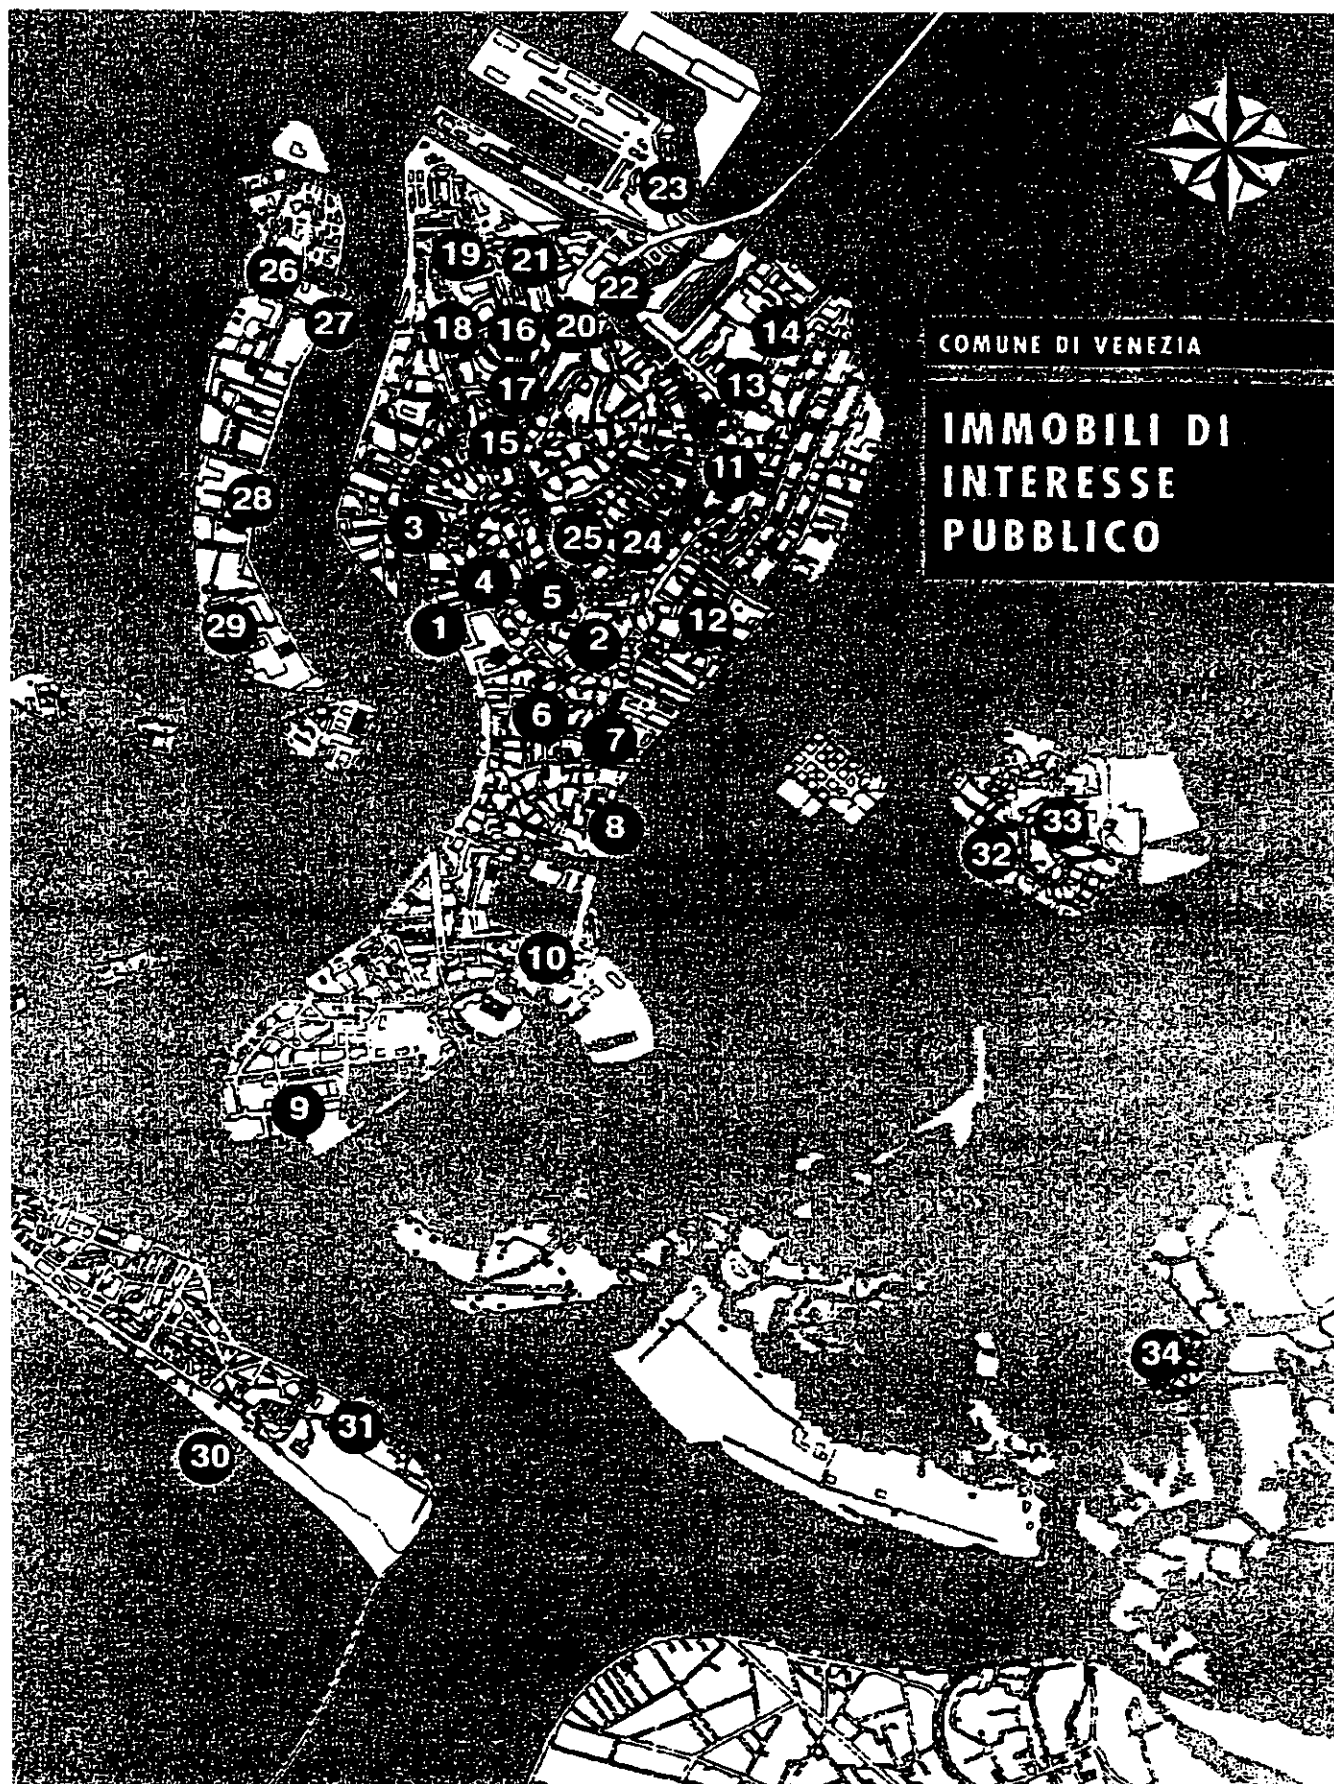

San Marco Cà Giustinian 1

Il progetto prevede un radicale restauro conservativo e messa a norme degli impianti dell'edificio risalente al XV secolo vincolato ai sensi della legge 1089/39.

progettazione	istruttorie	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			12.332	

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	3.480	3.480	3.327	3.222
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	6.752	1.432	1.019	1.019
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	2.100	100		
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		12.332	5.012	4.346	4.241

San Marco Cà Loredan e Cà Farsetti 2

Interventi di restauro e messa a norme degli impianti sui monumentali palazzi comunali di Cà Loredan e Cà Farsetti, sedi dell'Amministrazione Comunale

progettazione	istruttorie	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			11.000	7.861

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	1.777	1.777	1.672	1.622
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	1.485	1.485	1.048	1.030
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	5.506	4.758	1.474	505
	1998	6.093	6.093	309	
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	5.000	5.000		
TOTALE		19.861	19.113	4.503	3.157

San Marco Palazzo Zaguri 3

Il progetto prevede interventi di restauro conservativo e messa a norme degli impianti dell'edificio risalente al XV secolo

progettazione	istruttorie	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			950	

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	950	121	55	45
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		950	121	55	45

San Marco Immobile Campo Marini

4

Immobile di 4.562 mq. per uso uffici. La cifra di 15.220 corrisponde ai costi di acquisto, mentre 11.640 milioni corrispondono ai costi di restauro.

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	11.640		15.220

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	408	408	408	408
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	14.802	14.802	14.802	14.802
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	150	10	10	10
	1999	11.500			
TOTALE		26.860	15.220	15.220	15.220

San Marco Casa Corner

5

Uso uffici immobile vincolato a seguito esercizio diritto di prelazione. L'importo si riferisce al prezzo di acquisto.

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
			6.034

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	6.034	6.034	6.034	6.034
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998				
	1999				
TOTALE		6.034	6.034	6.034	6.034

Castello Palazzo Zorzi

6

Il palazzo risalente agli inizi del XVI secolo è oggetto di una convenzione tra il Comune e l'UNESCO che vi insedierà gli uffici italiani del ROSTE (Regional Office Science Technology Europe).

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		2.600	

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	600	600	600	
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	2.000	2.000	2.000	1.531
	1999				
TOTALE		2.600	2.600	2.600	1.531

Castello Palazzo Gradenigo 7

Palazzo monumentale risalente al secolo XVIII.

Interessato da lavori di restauro conservativo e messa a norma degli impianti. Sede di Uffici Pubblici.

	progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati	
				5.318	
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	4.664	4.664	4.204	3.671
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	654	654	617	611
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		5.318	5.318	4.821	4.282

Castello Archivio storico 'Celestia' 8

Interventi di restauro conservativo.

	progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati	
		2.316		855	
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	871	871	855	855
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	300			
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		1.171	871	855	855

Castello Convento Sant'Elena 9

Antico complesso conventuale risalente al XIII secolo, oggetto di restauro conservativo e razionale distribuzione dei volumi interni sede del Centro Internazionale Fondazione per la Pace.

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	10.693				2.081

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	110	110	110	107
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	2.597	2.597	2.439	1.974
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	7			
	1998	10.060	77	77	
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		12.774	2.784	2.626	2.081

Castello

Cantiere ACTV

10

Restauro conservativo capannoni all'Arsenale per insediamento cantiere navale

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	4.509		

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	1.009	1.009	1.009	
Legge 20 dicembre 1995 n. 536	1996-97	700	700	700	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	2.800	2.800	2.800	
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		4.509	4.509	4.509	0

Cannaregio

Ca Vendramin Calergi

11

Intervento di restauro conservativo del rinascimentale palazzo e di messa a norma degli impianti.

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati		
		8.397			
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	5.253	5.253	5.227	591
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	2.044	2.044	2.044	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998	881	881		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	219	219		
TOTALE		8.397	8.397	7.271	591

Cannaregio

Ex Convento dei Crociferi

12

Il grande complesso conventuale, risalente al XVI secolo, è oggetto di restauro conservativo e di razionale distribuzione dei volumi interni che risultano alterati per l'uso militare al quale furono adibiti.

	progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati	
				6.159	
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	5.454	5.454	5.454	3.306
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	705	705	705	480
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		6.159	6.159	6.159	3.786

Cannaregio Palazzo Manfrin Venier 13

Palazzo costruito nel XVIII secolo oggetto di restauro conservativo e messa a norma degli impianti.

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					3.566
Legge	Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	2.120	2.120	2.120	610
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	1.000	1.000	1.000	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	446	446	446	
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		3.566	3.566	3.566	610

Cannaregio Palazzo Bonfadini 14

Intervento di ristrutturazione su palazzo settecentesco vincolato (legge 1089/39)
Attualmente sede AMAV. Acquisizione chiavi in mano.

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					2.384
Legge	Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	2.384	2.384	2.374	2.374
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		2.384	2.384	2.374	2.374

Dorsoduro Cà Foscari - Sede Università 15

Il restauro conservativo e manutentivo dell'edificio tendente a risolvere i gravi problemi statici della facciata lungo il Canal Grande ed il rio di Cà Foscari (intervento parziale).

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					6.218
Legge	Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	5.000	5.000	5.000	1.218
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		5.000	5.000	5.000	1.218

Dorsoduro **Immobile Santa Margherita** **16**

Acquisto immobile uso uffici.

		progettazione	istruttoria	appello	lavori in corso	lavori ultimati
						1.044
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso		
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96					
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	1.044	1.044	1.044	1.044	
	1998					
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999					
TOTALE		1.044	1.044	1.044	1.044	

Dorsoduro **Spazio polivalente Rio Novo** **17**

Ristrutturazione immobile destinato ad usi civici quarantari.

		progettazione	istruttoria	appello	lavori in corso	lavori ultimati
						1.250
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso		
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	1.250	1.250	1.250	1.083	
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98					
	1998					
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999					
TOTALE		1.250	1.250	1.250	1.083	

Dorsoduro **Palazzo Minotto** **18**

Restauro conservativo su immobile del XVII secolo vincolato ai sensi della legge 1089/39.

		progettazione	istruttoria	appello	lavori in corso	lavori ultimati
						2.590
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso		
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	2.190	2.190	2.190	1.286	
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	400	400	300		
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98					
	1998					
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999					
TOTALE		2.590	2.590	2.490	1.286	

Dorsoduro Ex Convento delle "Terese"**19**

Intervento di restauro e ristrutturazione su un complesso di interesse storico monumentale (legge 1089/39).

	progettazione	istruzione	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				12.487	9.112
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	11.592	11.592	11.592	9.157
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	8.000	8.000	7.623	55
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	2.007	2.007		
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		21.599	21.599	19.215	9.212

Santa Croce Cittadella della Giustizia**20**

L'intervento prevede la progettazione per l'adattamento del complesso ex Manifattura tabacchi per la nuova sede degli uffici giudiziari.

	progettazione	istruzione	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				3.557	
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	3.557	3.557	2.720	11
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		3.557	3.557	2.720	11

Santa Croce Sede ASPIN**21**

La costruzione risale alla metà degli anni '30, è oggetto di restauro manutentivo e messa a norma degli impianti.

	progettazione	istruzione	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					4.000
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	4.000	4.000	4.000	4.000
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		4.000	4.000	4.000	4.000

Santa Croce **Autorimessa comunale**
22

La costruzione risale alla metà degli anni '30, è oggetto di restauro manutentivo e messa a norma degli impianti.

		progettazione istruttoria appalto	lavori in corso		lavori ultimati
				2.000	4.548
	Annucità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	2.458	2.458	2.427	2.256
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	4.000	4.000	3.443	2.292
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998				
	1999				
TOTALE		6.458	6.458	5.870	4.548

Santa Croce **Tronchetto - Interscambio**
23

Realizzazione stazione interscambio gomma-coqua.

		progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati	
		2.500			
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	2.500			
	1999				
TOTALE	.	2.500			

San Polo **Immobile Pescheria**
24

Costruzione dei primi del secolo in stile gotico veneziano. E' oggetto di restauro manutentivo e messa a norma degli impianti, legato alla più generale sistemazione del mercato di Rialto e degli Uffici Giudiziari.

		progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati	
		1.825			
	Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	325			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	1.500			
	1999				
TOTALE		1.825			

San Polo

Mercato Rialto

25

Il progetto di riordino dell'area rialtina, oltre all'aspetto viario investe l'arredo urbano con l'uniformità dei punti di vendita.

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	1.805				
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	305	305	305	305
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	1.500	1.500		
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		1.805	1.805	305	305

Giudecca

Villa Fregnan - Carabinieri

26

Intervento di manutenzione della sede dei Carabinieri.

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	250				
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	250	250		
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		250	250		

Giudecca

Edifici ex CNMOV - Sede Carabinieri

27

Restauro per nuovo insediamento a seguito trasferimento da Sacco Fisola. La cifra si riferisce ai costi di progettazione.

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	200				
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	200	39		
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		200	39		

Giudecca Complesso ex Herion

28

Il complesso è composto da un blocco a schiera (3 alloggi), dalla villa in stile veneziano, con annesso fabbricato di servizio, parco e cavana, dall'ex ufficio ubicato nella ex chiesa (vincolata) di S Cosmo e da un fabbricato recente adibito a servizi. L'importo si riferisce al prezzo di acquisto.

		progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
						6.174
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	224	224	191	191	
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	5.950	5.911	5.911	5.911	
L'intervento di r	1998					
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999					
TOTALE		6.174	6.135	6.102	6.102	

Giudecca Villa Herriot (Biblioteca Bettini)

29

Intervento di manutenzione e di ristrutturazione.

		progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
						1.073
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	229	229	229	207	
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	844	844	811	368	
	1998					
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999					
TOTALE		1.073	1.073	1.040	575	

Lido Centro Civico

30

Intervento di manutenzione e di ristrutturazione.

		progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					2.967	1.458
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	1.437	1.437	1.356	1.248	
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	2.988	2.988	2.800	210	
	1998					
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999					
TOTALE		4.425	4.425	4.156	1.458	

Lido

Convento San Nicolò

31

Manutenzione e messa a norme del complesso conventuale.

progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	755	

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	475	475		
	1998	280	280		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		755	755	0	0

Murano

Scuola Vetrai A. Zanetti e stazione sper. Vetro

32

Intervento di ristrutturazione.

progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	4.388	3.338

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	5.726	5.726	3.135	3.109
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	2.000	2.000	229	229
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		7.726	7.726	3.364	3.338

Murano

Palazzo da Mula

33

Palaestra tardo gotica, già interessata da restauro conservativo. L'attuale progetto investe aspetti manutentivi e di messa a norma degli impianti.

progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	751	595

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	133	133	16	16
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	500	500	500	500
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	113	113	113	79
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	600	598		
TOTALE		1.346	1.344	629	595

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Burano	Tempo libero

34

L'importo è riferito all'acquisto della sede.

	progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati	
				1.252	
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	1.252	1.252	1.252	1.252
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		1.252	1.252	1.252	1.252

Murano	Conterie

Realizzazione di edifici per attività collettive e servizi commerciali (Obiettivo 2 - C.E.R.).

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				7.678	

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	1.160	1.160	1.160	169
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	218	218	218	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998	6.300	5.158	1.324	156
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		7.678	6.536	2.702	325

Cimiteri

Manutenzione straordinaria sui cimiteri delle isole della laguna.

	progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati
			8.088	10.695

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	11.806	11.806	11.729	10.359
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	815	815	336	336
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	5.285	4.785		
	1998	877	877		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		18.783	18.283	12.065	10.695

Ampliamento Cimitero San Michele

Ampliamento dell'isola - concorso internazionale di idee per la progettazione.

	progettazione	istruttoria	appello	lavori in corso	lavori ultimati
	2.523				
	Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	485	485	485	334
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	1.515	1.515		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	523	523	15	
	1999				
TOTALE		2.523	2.523	500	334

Manutenz. straord. patrimonio storico monumentale ULS

Manutenzione urgente prima della costruzione della Azienda ULS.

	progettazione	istruttoria	appello	lavori in corso	lavori ultimati
					3.300
	Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	3.300	3.300	3.300	3.030
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998				
	1999				
TOTALE		3.300	3.300	3.300	3.030

AMAV servizi igienici

	progettazione	istruttoria	appello	lavori in corso	lavori ultimati
				1.300	
	Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	1.300	1.300	1.300	
	1999				
TOTALE		1.300	1.300	1.300	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Manutenzioni straordinarie e diffuse

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				9.710	10.094
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	10.720	10.716	9.252	8.131
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	1.342	1.342	1.118	1.021
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	4.274	2.152	1.360	917
	1998	2.738	2.738	25	25
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	730	730		
TOTALE		18.804	17.678	11.755	10.094

Acquisizioni immobili

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	4.255				
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	4.255			
TOTALE		4.255	0	0	0

Varie


	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				101.877	15.357
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	8.567	8.489	8.453	8.165
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	5.661	1.404	1.224	1.224
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	7.028	5.872	5.208	2.597
	1998	3.178	472	472	
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	1.100			
TOTALE		25.534	16.247	15.357	11.986

QUADRO FINANZIARIO - IMMOBILI DI INTERESSE PUBBLICO ADIBITI AD USI VARI

	Annualità	Programmato	Impegnato	%	Obbligato	%	Speso	%
		A	B	B/A	C	C/A	D	D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	98.853	98.781	99,93%	93.571	94,66%	28.222	28,55%
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	36.609	26.203	71,58%	21.998	60,09%	3.827	10,45%
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	73.675	66.317	90,01%	49.254	66,85%	5.213	7,08%
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	38.380	20.409	53,18%	5.532	14,41%		
	1999	25.404	6.547	25,77%				
	TOTALE	272.921	218.257	79,97%	170.355	62,42%	37.262	13,65%

STATO AVANZAMENTO - IMMOBILI DI INTERESSE PUBBLICO ADIBITI AD USI VARI

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
44.968	2.055	195.088	121.518
12,4%	1%	78%	41,5%

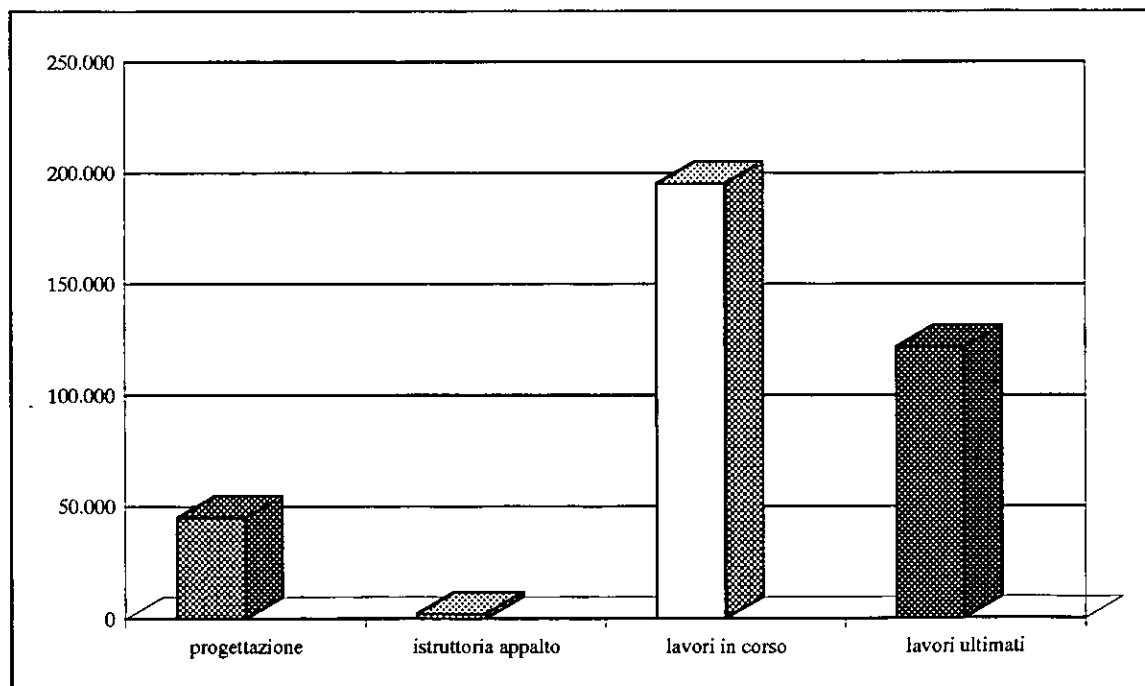

(importi in milioni)



lettera b.) art. 6 - Legge 29 novembre 1984

San Marco

Giardinetti Reali

1

Ristrutturazione e recupero dei Giardini "ex Reali" e della viabilità.

		progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		2.100				
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1982 n. 139	1993-94-95-96					
Legge 20 dicembre 1985 n. 539	1996-97					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98					
	1998					
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	2.100				
TOTALE		2.100				

Castello

Giardini

2

L'intervento prevede la risistemazione della viabilità interna e delle essenze arboree.

		progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		2.147				
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1982 n. 139	1993-94-95-96	1.666	1.666	1.666	1.343	
Legge 20 dicembre 1985 n. 539	1996-97	481	481	436	372	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98					
	1998					
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999					
TOTALE		2.147	2.147	2.102	1.715	

Castello

Via Garibaldi

3

Opere di nuova pavimentazione stradale e di risistemazione dell'arredo urbano.

		progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		3.620				
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1982 n. 139	1993-94-95-96	3.527	3.527	3.525	3.525	
Legge 20 dicembre 1985 n. 539	1996-97	93	93	93	93	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98					
	1998					
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999					
TOTALE		3.620	3.620	3.618	3.618	

Dorsoduro **Campo Santa Margherita****4**

Intervento di sistemazione e manutenzione dell'arredo urbano con presenza di essenze arboree ad alto fusto.

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	1.341				
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	1.341	1.341	1.244	1.135
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		1.341	1.341	1.244	1.135

Santa Croce **Piazzale Roma - Tronchetto****5**

Intervento di nuova viabilità e segnaletica stradale (cordonato, marciapiedi, spartitraffico, parcheggi, ecc.).

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	3.033				
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	865			
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	868			
	1998	1.300			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		3.033			

Santa Croce **Campo San Giacomo da l'Orto****6**

Intervento di sistemazione e manutenzione dell'arredo urbano con presenza di essenze arboree ad alto fusto.

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					1.100
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	1.100	1.100	889	889
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		1.100	1.100	889	889

Giudecca Intervento di recupero urbano

Intervento di recupero urbano della zona di Sacca Fisola.

	progettazione	istruttoria	appello	lavori in corso	lavori ultimati
				3 500	
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	3.500	3.500		
TOTALE		3.500	3.500		

Lido Via Lepanto

Intervento di sistemazione e manutenzione dell'arredo urbano con creazione isola pedonale.

	progettazione	istruttoria	appello	lavori in corso	lavori ultimati
					2.763
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	2.763	2.763	2.497	2.237
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		2.763	2.763	2.497	2.237

Lido Piazzale Bucintoro "ex Blue Moon"

Intervento di sistemazione e manutenzione dell'arredo urbano e nuova rotonda sul mare.

	progettazione	istruttoria	appello	lavori in corso	lavori ultimati
				8.687	
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	1.655	1.654	1.654	122
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	4.032	4.032	4.032	553
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	3.000	3.000	3.000	551
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		8.687	8.686	8.686	1.226

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Lido Viabilità Lido

Interventi vari di manutenzione sulla viabilità ed arredo urbano.

		progettazione istruttoria appello	lavori in corso	lavori ultimati
		20.310		
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96			
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	4.700	3.700	323
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	11.547	9.148	5.093
	1998	4.063	4.063	
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999			
TOTALE		20.310	16.911	5.421

Lido Centro Soggiorno Morosini 9

Realizzazione impianto fognario.

		progettazione istruttoria appello	lavori in corso	lavori ultimati
		1.400		
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96			
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97			
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98			
	1998			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	1.400		
TOTALE		1.400	0	0

Pellestrina Interventi vari di urbanizzazione 10

Intervento di manutenzione e rifacimento dell'asse viario.

		progettazione istruttoria appello	lavori in corso	lavori ultimati
		1.251		1.342
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	1.808	1.808	1.670
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97			
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	785	785	740
	1998			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999			
TOTALE		2.593	2.593	1.342

Murano — San Erasmo - Piano Particolareggiato PEEP

11

Intervento di manutenzione e rifacimento dell'asse viario.

	progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati	
			3.146		
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	2.615	2.615		
	1998	531	531		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		3.146	3.146		

Murano — San Donato PEEP

12

Intervento di urbanizzazione.

		progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati	
		1.191			
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	510	499	499	17
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	681			
TOTALE		1.191	499	499	17

Murano — Isola Certosa

13

Intervento di urbanizzazione.

	progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati	
			7.086		
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	2.400	2.400	2.400	1.073
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998	4.686	4.686	2.343	306
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		7.086	7.086	4.743	1.379

Isole Treportine

Piazza Treporti

14

Intervento di manutenzione e sistemazione dell'arredo urbano.

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				2.204	
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	1.000	1.000	104	73
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	604	604		
	1998	600	600		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		2.204	2.204	104	73

Terraferma

Realizzazione Parco San Giuliano

15

L'area interessata dal progetto è pari a 700 ettari

L'articolato progetto, in parte finanziato dalla Comunità Europea (URBAN), prevede la creazione di aree verdi, ricreative, associative e infrastrutture.

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				31.295	
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	2.495	2.495	2.481	1.400
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	28.600	28.600	28.600	2.394
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		31.295	31.295	31.281	3.794

Terraferma

Terminal di Fusina

16

Predisposizione del Concorso internazionale per la progettazione del Terminal. Redazione del Piano Particolareggiato e delle analisi propedeutiche al Piano.

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				1.772	
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	810	810	810	249
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	962	962	625	184
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		1.772	1.772	1.435	433

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Realizzazione strutture traffico acqueo

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		1.879	1.670

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	1.808	1.808	1.571	1.571
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	1.088	464	99	99
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	38	38		
	1998	517	517		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		3.549	2.927	1.670	1.670

Manutenzione straordinaria e diffusa su viabilità e fognature

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		11.726	16.463

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	14.593	14.559	10.710	10.178
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	2.282	1.978	944	848
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	7.468	7.381	4.455	4.117
	1998	3.846	3.846	354	255
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		28.189	27.764	16.463	15.398

Manutenzione verde pubblico

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		2.416	2.482

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	907	907	406	288
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	1.630	1.530	1.250	776
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	1.661	1.465	1.213	1.418
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	700			
TOTALE		4.898	3.902	2.869	2.482

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Adeguamento, manutenzione impianti di illuminazione pubblica

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		1.658	8.390

	Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	6.175	6.175	5.704	5.504
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	1.135	1.135	1.162	912
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	2.104	2.104	1.974	1.974
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	34	34		
	1999	600			
TOTALE		10.048	9.448	8.840	8.390

Infrastrutture e opere di urbanizzazione centri urbani insulari

Accordi di programma:
 Melimacco 5 mld;
 Pellistrine 5 mld;
 Sant'Erasmo 4 mld;
 Burano 6,3 mld.

Santi Erasmo 4 mil; Burano 6,3 mil.	progettazione istruttoria appalto		lavori in corso		lavori ultimati	
	20 300					
	Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96					
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97					
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	20.300	20.300	20.300		
	1998					
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999					
TOTALE		20.300	20.300	20.300	0	

Varie

	progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		1.492	2.712


	Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	2.384	2.369	2.279	2.195
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	272	240	220	220
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	539	477	330	108
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	1.009	488	189	189
	1999				
TOTALE		4.204	3.574	3.018	2.712

QUADRO FINANZIARIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE

	Annualità	Programmato	Impegnato	%	Obbligato	%	Speso	%
		A	B	B/A	C	C/A	D	D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	46.397	45.482	98,03%	39.506	85,15%	33.051	71,24%
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	16.711	14.653	87,68%	8.663	51,84%	4.269	25,55%
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	81.801	78.178	95,57%	67.034	81,95%	11.045	13,50%
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	16.586	14.765	89,02%	2.886	17,40%	750	4,52%
	1999	8.981	3.500	38,97%				
TOTALE		170.476	156.578	91,85%	118.089	69,27%	49.115	28,81%

STATO AVANZAMENTO - OPERE DI URBANIZZAZIONE

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
98.424	1.341	98.422	42.689
16 %	1 %	57 %	26 %

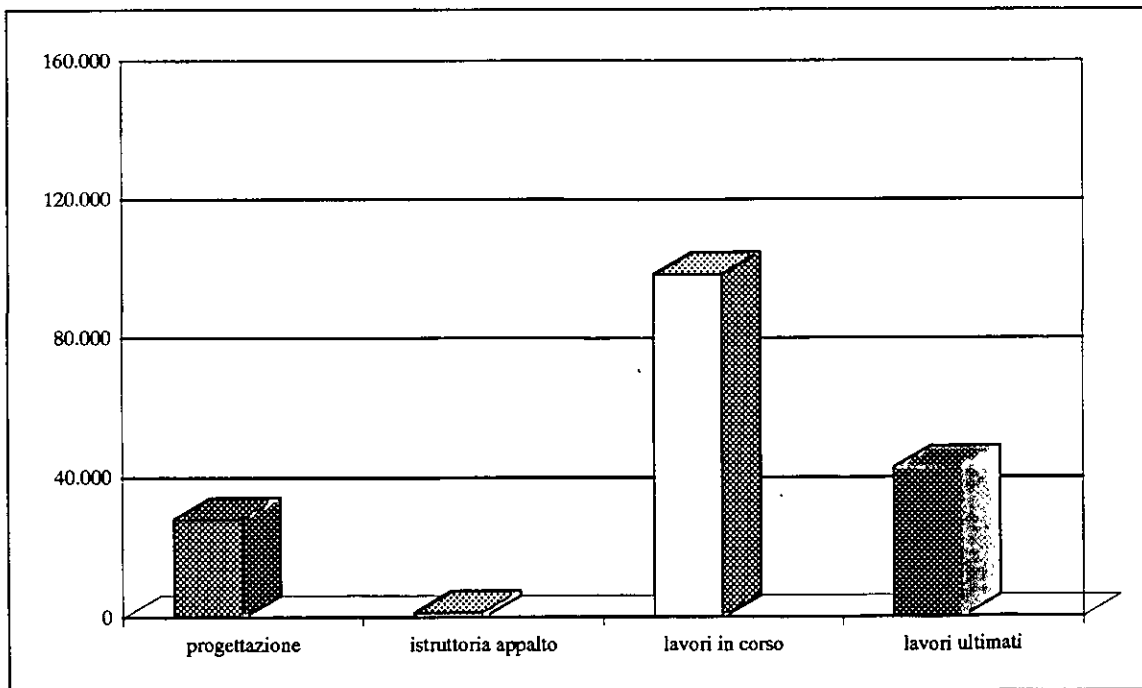


(importi in milioni)

Nell'ambito delle Legge Speciale l'Amministrazione Comunale, attraverso bandi pubblici, assegna contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato e per l'acquisto della prima casa di abitazione. L'obiettivo è quello di rallentare il degrado del patrimonio immobiliare privato e di contribuire ad incentivare la residenza nel centro storico favorendo la reimmersione sul mercato immobiliare di abitazioni non utilizzate, la destinazione alla locazione o all'uso da parte del proprietario.

Per quanto riguarda i restauri, dal 1984 fino ad oggi, sono stati aperti 8 bandi con uno stanziamento complessivo di circa 144,130 miliardi. Di questi 121,6 sono stati destinati ad interventi che hanno investito le parti comuni delle unità edilizie, cioè tutte le parti condominiali del fabbricato.

Per agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa il Comune ha emanato, dal 1992, tre bandi stanziando a tal fine un totale di 43,03 miliardi di lire.

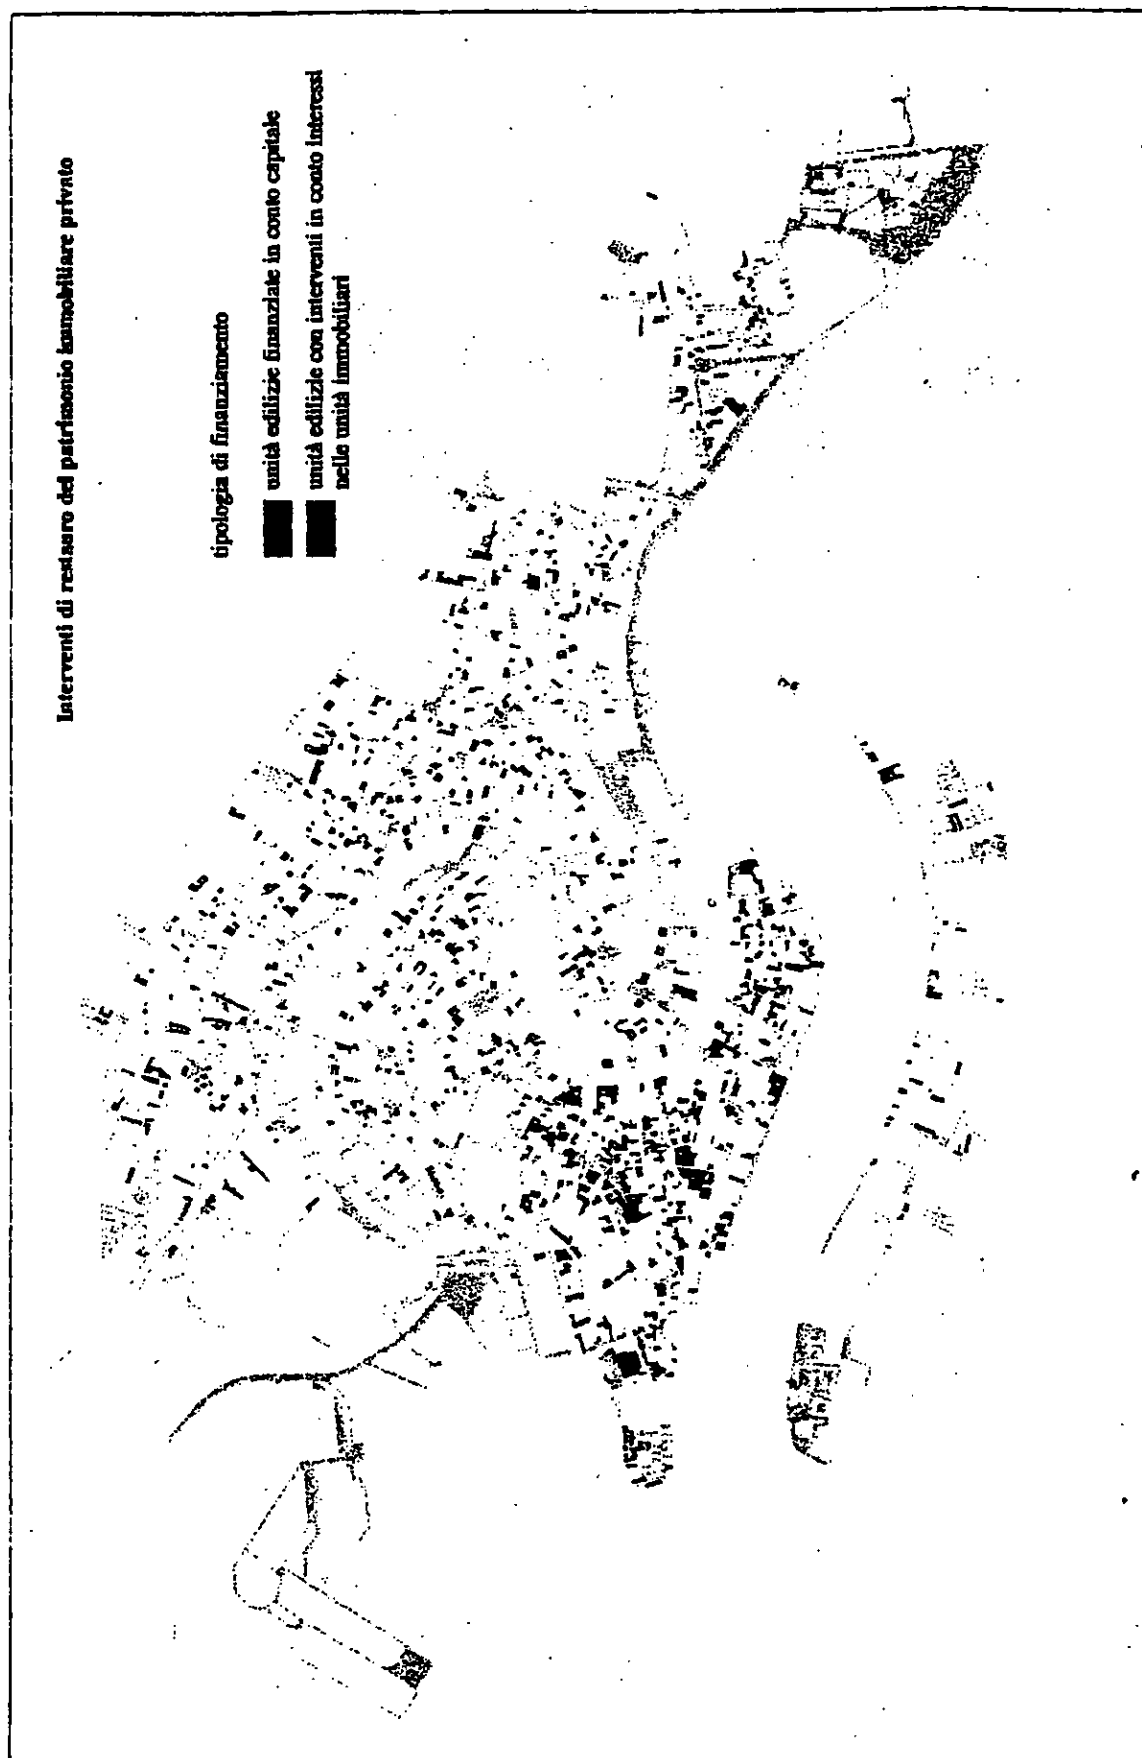

Contributi per la esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato e per l'acquisto della prima casa.

L'assegnazione di contributi ai privati avviene:

- per il restauro e il risanamento conservativo di immobili da adibire a residenza (una apposita convenzione obbliga i proprietari a risiedere o ad affittare ai residenti per almeno 15 anni);	144,830 miliardi
- per l'acquisto della prima casa di abitazione (giovani coppie e sfrattati);	43,030 miliardi
- per il restauro e messa a norma degli immobili adibiti ad attività produttive;	6,440 miliardi
- per il recupero di un'isola abbandonata (iniziativa sperimentale);	2,000 miliardi
- per il recupero dei piani terra a destinazione residenziale soggetti ad acqua alta.	5,000 miliardi

Contributi al patrimonio immobiliare privato

	: predisposizione bando
	: emissione bando
	: approvazione graduatoria provvisoria
	: approvazione graduatoria definitiva

Contributi per il restauro del patrimonio immobiliare privato

progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	12.300	131.830

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	52.000	52.000	52.000	22.665
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	54.830	54.830	54.830	8.246
	1998	25.000	25.000	25.000	623
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	12.300	12.300		
TOTALE		144.130	144.130	131.830	31.534

Contributi per l'acquisto della prima casa di abitazione

progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	18.592	24.438

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	4.000	4.000	4.000	4.000
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	16.000	16.000	16.000	15.150
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	23.030	23.030	23.030	5.288
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		43.030	43.030	43.030	24.438

Contributi per il restauro del patrimonio immobiliare privato destinato alle attività produttive

progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	3.000	3.440

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	2.000	2.000	2.000	880
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	1.440	1.440	1.440	
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	3.000	3.000		
TOTALE		6.440	6.440	3.440	880

Contributi per il recupero del patrimonio immobiliare privato su un'isola della laguna centrale

		progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		2.006			
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	2.000	2.000	2.000	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	6	6	5	5
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		2.006	2.006	2.005	5

Restauro di immobili privati destinati alla residenza soggetti alla acque alte

		progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		5.056			
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	56			
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	5.000	5.000		
TOTALE		5.056	5.000	0	0

Varie


		progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
		290			
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	290	130	130	130
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		290	130	130	130

QUADRO FINANZIARIO - CONTRIBUTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO


	Annualità	Programmato	Impegnato	%	Obbligato	%	Speso	%
		A	B	B/A	C	C/A	D	D/A
Legge 5 febbraio 1982 n. 139	1993-'94-'95-'96	56.000	56.000	100,00%	56.000	100,00%	26.665	47,62%
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	20.000	20.000	100,00%	20.000	100,00%	16.030	80,15%
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	79.652	79.436	99,73%	79.435	99,73%	13.669	17,16%
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	25.000	25.000	100,00%	25.000	100,00%	623	2,49%
	1999	20.300	20.300	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTALE		200.952	200.736	99,89%	180.435	89,79%	56.987	28,36%

STATO AVANZAMENTO - CONTRIBUTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	5.056	35.898	159.995
	3%	18%	80%

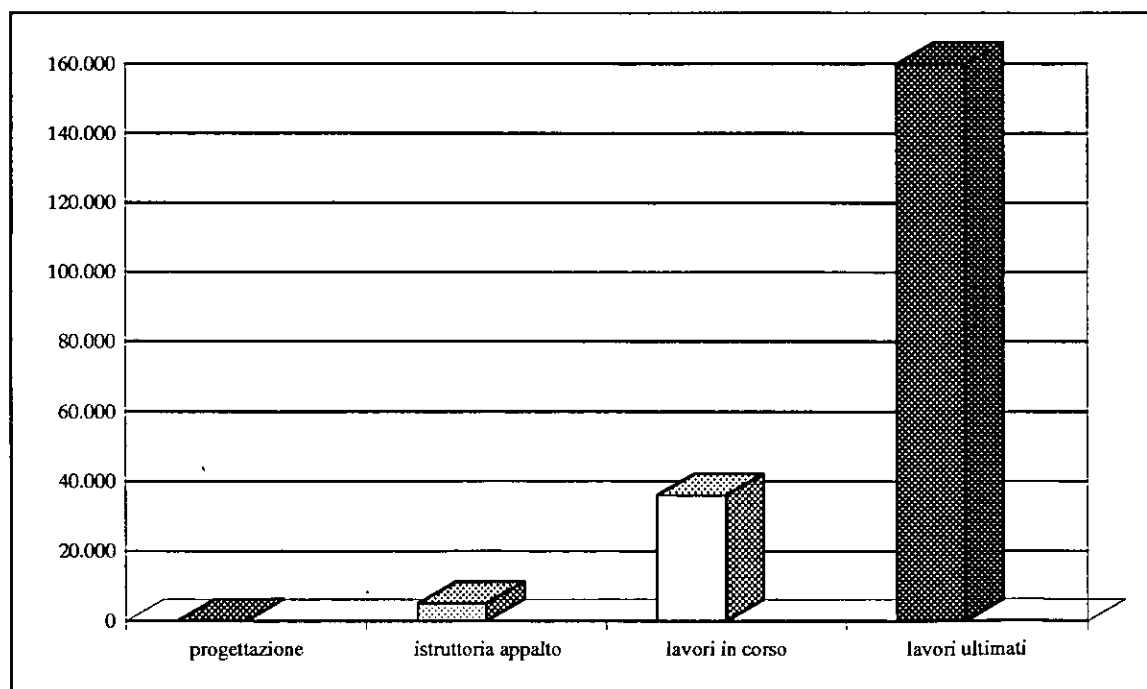

(importi in milioni)

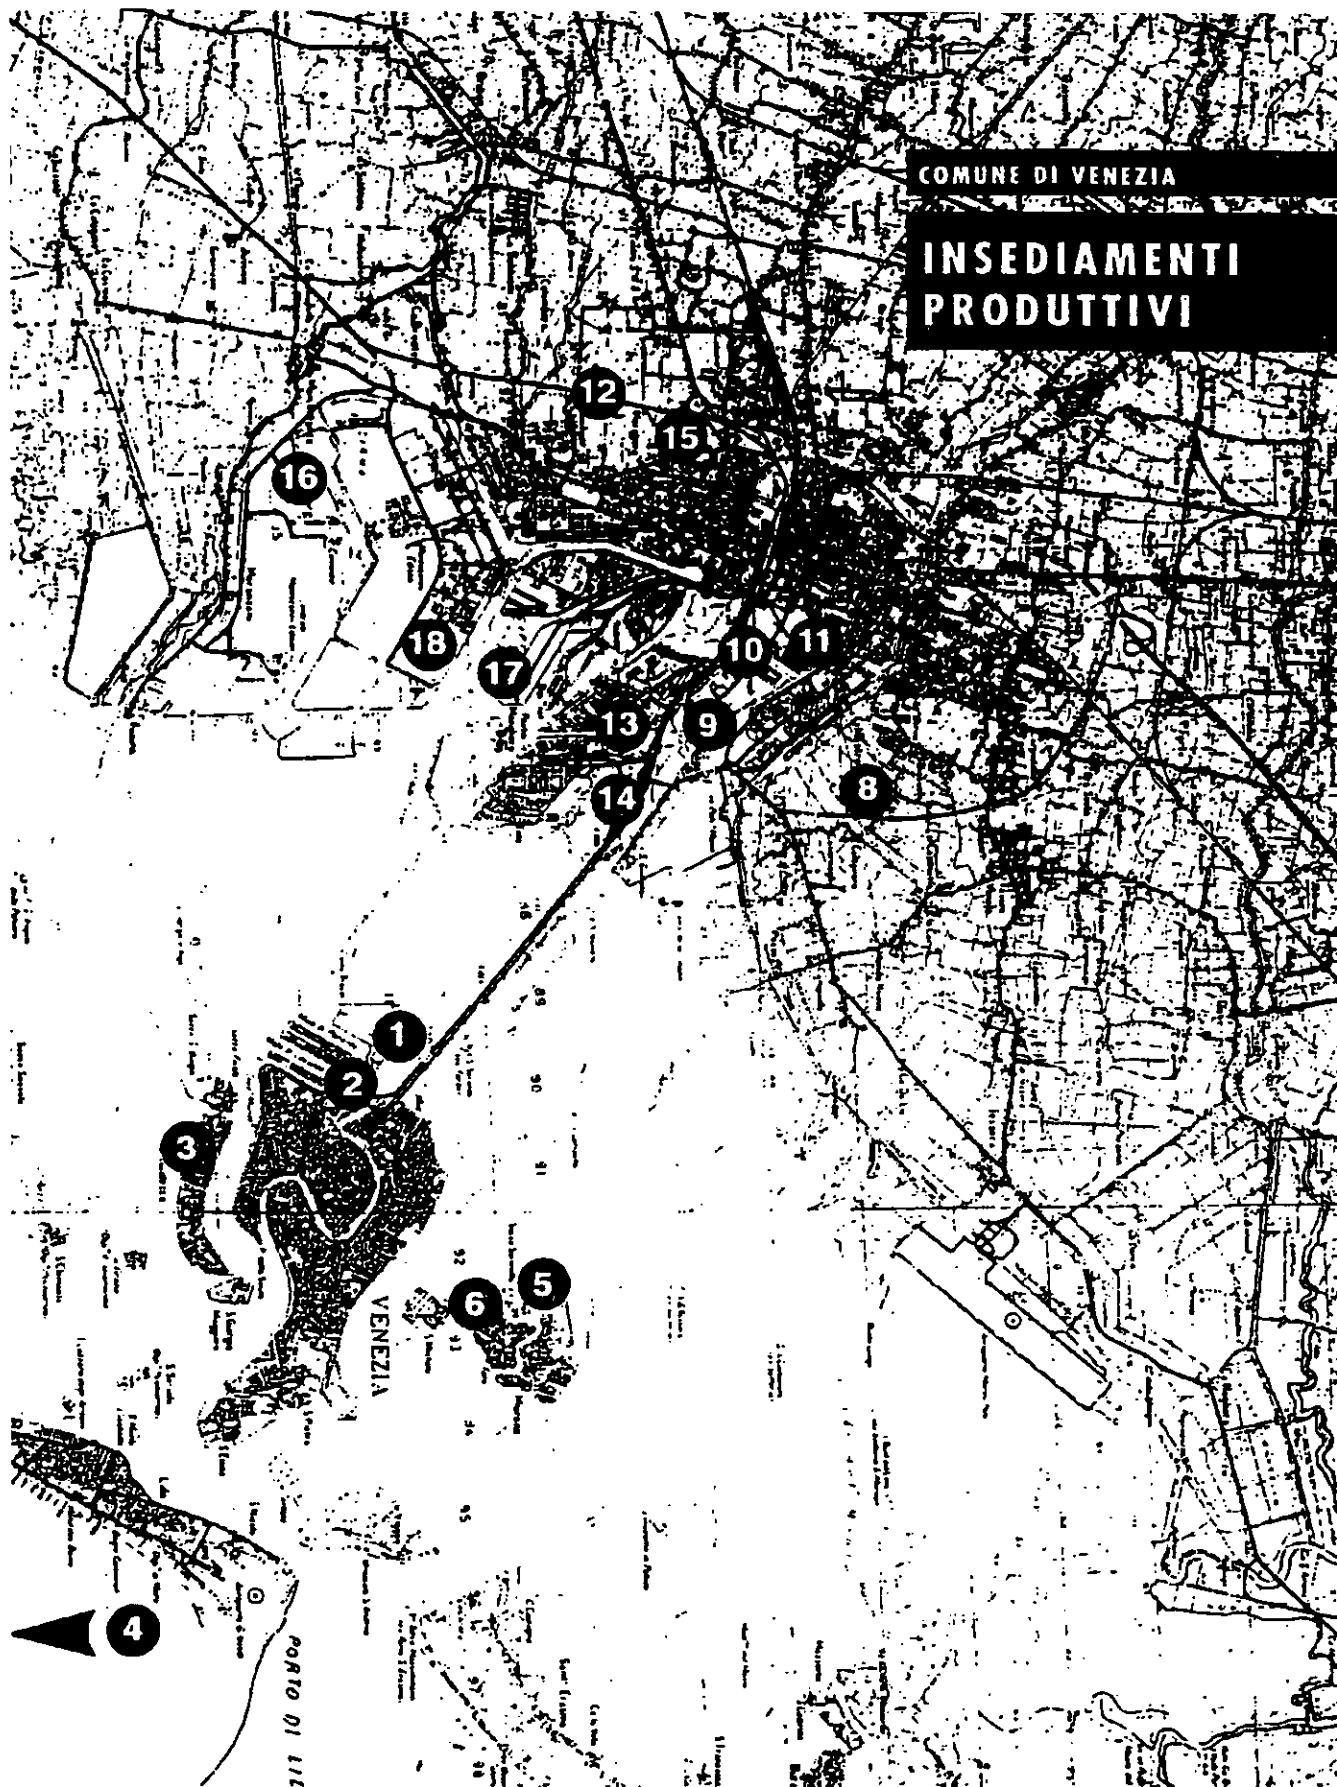

**Interventi finalizzati all'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi
e per l'urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse**

lettera d), art. 6 - Legge 29 novembre 1984 n. 798

Santa Croce Mercato Ortofrutticolo al Tronchetto **1**

Il progetto prevede un intervento di razionalizzazione con opere di urbanizzazione e nuova edificazione per il trasferimento al Tronchetto del mercato ortofrutticolo all'ingresso di Rustico.

		progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					4.900
Legge	Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	4.900	3.994	1.734	1.734
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		4.900	3.994	1.734	1.734

Santa Croce Mercato Ittico **2**

Intervento di manutenzione, ristrutturazione e messa a norme degli impianti.

		progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				1.872	1.630
Legge	Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	1.652	1.652	1.635	1.620
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	850	350	10	10
	1998	1.000	1.000		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		3.502	3.002	1.645	1.630

Grudecca Area ex CNOMV **3**

Opere di urbanizzazione primaria integrate con intervento di privati.

		progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				6.365	5.436
Legge	Annuità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	8.053	8.053	8.053	5.436
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	3.748	3.748	3.748	
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		11.801	11.801	11.801	5.436

Lido

PIP - Terre Perse

4

Opere di urbanizzazione per insediamenti produttivi.

	progettazione	istruzioni appalto	lavori in corso	lavori ultimati
	1.100			
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96			
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97			
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	1.100	1.100	
	1998			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999			
TOTALE		1.100	1.100	

Murano

Sacca Serenella

5

Interventi di urbanizzazione primaria e servizio degli insediamenti produttivi (progetto comunitario - Obiettivo 2).

	progettazione	istruzione appalto	lavori in corso	lavori ultimati	
			4.212		
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	418	418	418	218
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	1.500	1.500	1.500	517
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	294	294		
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	2.000	2.000		
TOTALE		4.212	4.212	1.918	735

Murano

Contere

6

Opere di urbanizzazione reti tecnologiche - fognature. Progetto comunitario Obiettivo 2 - C.E.R.

	progettazione	istruzioni appalto	lavori in corso	lavori ultimati	
			7.677		
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	1.159	1.159	1.159	158
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	218	218	218	
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998	6.300	5.158	1.324	155
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		7.677	6.535	2.701	323

Cavallo

Ca' Savo - Area PIP

Opere di urbanizzazione primaria e servizio degli insediamenti di attività produttive.

	progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati	
				7.378	
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	5.378	5.378	4.565	4.397
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	2.000	2.000	1.863	1.863
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		7.378	7.378	6.428	6.260

Terraferma

Bissuola - Deposito ACTV

Nuova edificazione e urbanizzazione del nuovo deposito automobilistico dell'A.C.T.V.

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					6.800
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	6.800	6.800	6.399	6.399
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		6.800	6.800	6.399	6.399

Terraferma

Piave - Via Torino, SS. 11

Costruzione di un nuovo ponte viario che scavalcando il Canal Selso e la rete ferroviaria congiunge la SS 11 con Via Torino.

	progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati	
			14.743		
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	13.954	10.361	592	540
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	789			
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		14.743	10.361	592	540

Terraferma **Piave - Mercato Ortofrutticolo (canal Salso - v. Torino)**

10

Opere di urbanizzazione e messa a norma degli impianti.

		progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				1.500
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	1.500	1.500	1.410
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97			
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98			
	1998			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999			
TOTALE		1.500	1.500	1.410

Terraferma **Accessibilità e riordino urbanistico**

11

Opere di urbanizzazione asse S.S. 11 - Parco Scientifico Tecnologico - Via Torino polo nuovo insediamento Università - Forte Marghera

		progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				20.000
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96			
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97			
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98			
	1998	10.000	10.000	
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999	10.000	10.000	
TOTALE		20.000	20.000	0

Terraferma **Marghera - Area PIP Cà Emiliani**

12

Espropri ed opere di urbanizzazione e servizio delle attività produttive.

		progettazione istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				2.472
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	2.408	2.408	2.297
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	64	64	64
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98			
	1998			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999			
TOTALE		2.472	2.472	2.361

Terraferma **Marghera - Area CIPI Sartori**

Acquisizione dell'area destinata ad insediamenti produttivi previsti dal P.R.G. di Marghera.

13

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					13.000
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	13.000	13.000	12.736	12.736
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98				
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		13.000	13.000	12.736	12.736

Terraferma **Marghera - Parco Scientifico Tecnologico**

Acquisizione degli immobili (superficie scoperta e manufatti).

14

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					4.230
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	3.750	3.750	3.552	3.552
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	480			
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		4.230	3.750	3.552	3.552

Terraferma **Marghera - Via F.lli Bandiera**

Interventi di urbanizzazione.

15

	progettazione	istruttoria	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					2.347
Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso	
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	1.557	1.500	1.434	1.434
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	780	705	585	585
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		2.347	2.205	2.019	2.019

Terraferma Marghera - 43 ettari
16

Acquisizione dell'area destinata ad insediamenti produttivi e realizzazione opere di urbanizzazione primaria primo stralcio.

		progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati
				2.992	2.493

Terraferma Marghera - Porto Marghera ex Sima
17

Piano di Recupero per area ex industriale.

		progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati
			4.084		
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	124	124	124	124
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	1.960	1.960	1.960	76
	1998	2.000			
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		4.084	2.084	2.084	200

Terraferma Fusina - Stazione travaso compattazione AMAV
18

Area di interscambio acqua-gomma dei mezzi di trasporto e compattazione dei rifiuti diretti alle discariche o all'inceneritore.

		progettazione istruttoria appalto		lavori in corso	lavori ultimati
					4.000
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96				
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	4.000	4.000	4.000	4.000
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		4.000	4.000	4.000	4.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Terraferma - Marghera - Opere urbanizzazioni portuali

Accordo di programma: Comune - Autorità portuale

	progettazione	istruttorie	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				10.240	
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	240	240		
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97	5.000	5.000	5.000	2.802
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98				
	1998	5.000	5.000		
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		10.240	10.240	5.000	2.802

Acquisizioni e urbanizzazioni varie

	progettazione	istruttorie	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
				1.814	
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	225	225	225	225
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	1.589	1.028		
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		1.814	1.253	225	225

Varie


	progettazione	istruttorie	appalto	lavori in corso	lavori ultimati
					2.005
	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-94-95-96	1.450	1.450	1.450	1.450
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-97				
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-98	555	555	555	
	1998				
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1999				
TOTALE		2.005	2.005	2.005	1.450

QUADRO FINANZIARIO - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

	Annualità	Programmato	Impegnato	%	Obbligato	%	Speso	%
		A	B	B/A	C	C/A	D	D/A
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993-'94-'95-'96	64.353	60.514	94,03%	48.545	75,44%	44.499	69,15%
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996-'97	6.782	6.782	100,00%	6.782	100,00%	3.383	49,88%
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997-'98	23.055	19.734	85,60%	14.455	62,70%	8.268	35,86%
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	27.100	23.078	85,16%	1.324	4,89%	155	0,57%
	1999	12.000	12.000	100,00%				
	TOTALE	133.290	122.108	91,61%	71.106	53,35%	56.305	42,24%

STATO AVANZAMENTO - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

progettazione	istruttoria appalto	lavori in corso	lavori ultimati
1.408	43.638	30.366	58.191
1%	8%	25%	44%

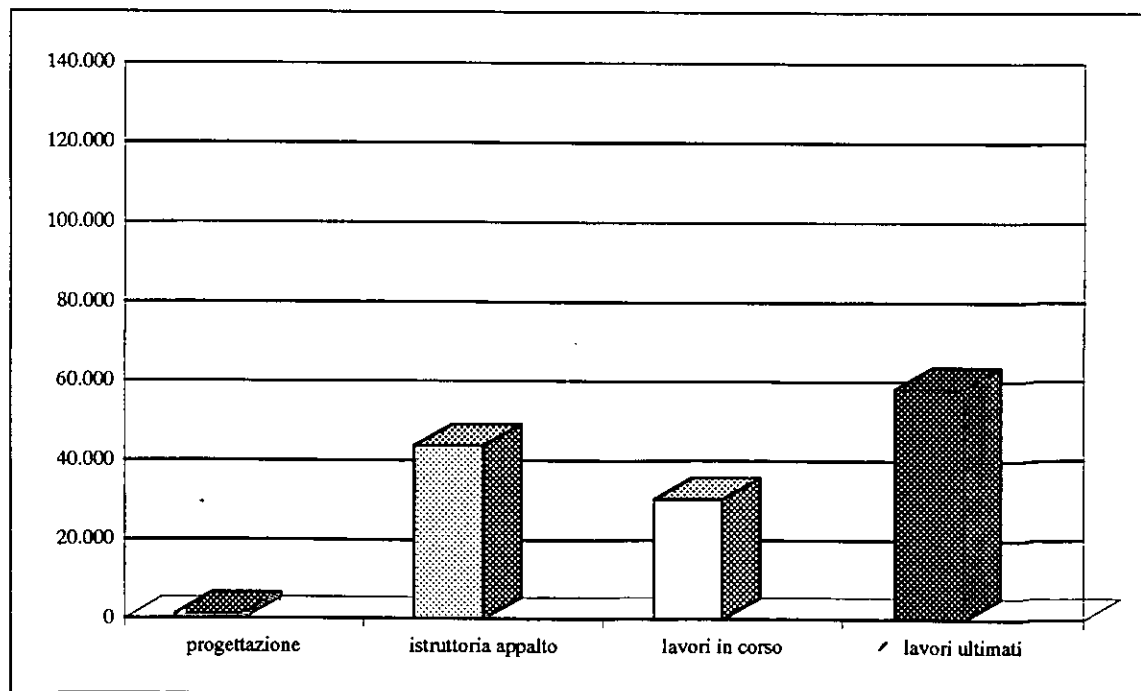

(importi in milioni)

COMUNE DI CHIOGGIA

STANZIAMENTI LEGGI: 798/84 - 910/88 - 67/88 - 360/91 - 139/92 - 539/95 - 515/96 - 345/97 - 295/98

LEGGE	ESERCIZI DI RIF.	STANZIAMENTO	EROGATO	DA EROGARE	IMPEGNATO	DISPONIBILITÀ	MANDATI EMESSI
L. 798/84	1984-1985-1986	20.250.000.000	20.250.000.000	-----	20.240.530.902	9.469.098	
L. 910/86	1987-1988-1989	25.500.000.000	25.500.000.000	-----	25.461.908.148	38.091.852	
L. 67/88	88/90/91/92/94	11.976.900.000	11.976.900.000	-----	11.122.808.341	854.091.659	
TOTALI LEX 798 - 910 - 67		57.726.900.000	57.726.900.000	-----	56.825.247.391	901.652.609	45.749.501.286
L. 960/91	1991	4.350.000.000	4.350.000.000	-----	4.349.596.092	403.908	3.608.376.932
L. 139/92 - 1°	ANNO 1992	32.497.892.295	32.497.892.295	-----	32.497.892.295	-----	22.308.277.522
L. 139/92 - 2°	ANNO 1993	12.656.329.974	12.656.329.974	-----	12.656.329.974	-----	9.699.081.682
L. 139/92 - 3°	ANNO 1995	11.945.619.875	11.945.619.875	-----	11.945.619.875	-----	1.215.163.792
L. 139/92 - 4°	ANNO 1996	12.000.000.000	2.989.993.212	9.010.006.788	12.000.000.000	-----	2.029.993.212
TOTALI LEX 139/92		69.099.842.144	60.089.835.358	9.010.006.788	69.099.842.144	-----	35.253.516.208
L. 539/95 - 1°	ANNO 1996	10.000.000.000	3.865.000.000	6.335.000.000	10.000.000.000	-----	665.000.000
L. 539/95 - 2°	ANNO 1997	18.000.000.000	213.800.784	17.786.200.000	18.000.000.000	-----	213.800.784
TOTALI LEX 539/95		28.000.000.000	3.878.800.000	24.121.200.000	28.000.000.000	-----	878.800.784
L. 515/96 - 1°	ANNO 1997	58.000.000.000	1.472.111.093	56.527.888.907	58.000.000.000	-----	1.472.111.093
L. 515/96 - 2°	ANNO 1998	32.000.000.000	-----	32.000.000.000	32.000.000.000	-----	-----
TOTALI LEX 515/96		90.000.000.000	1.472.111.093	88.527.888.907	90.000.000.000	-----	1.472.111.093
L. 345/97 - 1°	ANNO 1998	19.000.000.000	960.000.000	18.040.000.000	19.000.000.000	-----	960.000.000
L. 345/97 - 2°	ANNO 1999	27.000.000.000	-----	27.000.000.000	27.000.000.000	-----	-----
TOTALI LEX 515/98		46.000.000.000	960.000.000	45.040.000.000	46.000.000.000	-----	960.000.000
L. 295/98 - 1°	ANNO 1999	2.500.000.000	-----	2.500.000.000	2.500.000.000	-----	-----
TOTALE FINANZIAMENTI		297.676.742.144	128.477.846.449	169.199.095.695	298.774.635.627	902.056.517	87.922.303.303

PAGINA BIANCA



UNIVERSITÀ
CA' FOSCARI
DI VENEZIA

DIVISIONE SERVIZI TECNICI
Direttore

Wolf Ferrari, 10 giugno 1999

Prot. n. 261

Ministero dei Lavori Pubblici
Magistrato alle Acque

VENEZIA

Oggetto: Richiesta dati

Facendo seguito alla Vostra nota prot. n. 118/GAB del 5 maggio 1999,
si inviano allegati i prospetti relativi a quanto richiestoci.

Distinti saluti

Il Coordinatore Generale
Direttore Divisione Servizi Tecnici
(Dott. Ing. A. Lo Cascio)

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 139/92	34.835.929.049			
mutuo I.M.I.	25.347.333.394			
1 Informatizzazione Ateneo e delle Biblioteche		5.219.250.912	5.219.250.912	5.219.250.912
2 S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		6.163.082.929	6.163.082.929	6.163.082.929
3 S.Giobbe fase "C" - e "B" 1° stralcio		712.476.315	712.476.315	712.476.315
4 Zattere - acquisto SCI		10.260.000.000	10.260.000.000	9.677.800.000
5 Opere varie manutenz. straordinaria		2.345.043.328	2.345.043.328	2.344.506.422
6 Ca' Zorza - acquisto 3° piano		647.479.910	647.479.910	647.479.910
mutuo B.N.I.	9.488.595.655			
1 S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		1.780.547.066	1.780.547.066	1.780.547.066
2 Ca' Bembo - acquisto		2.905.860.880	2.905.860.880	2.905.860.880
3 Zattere - acquisto Star Gas 1		2.500.880.759	2.500.880.759	2.500.880.759
4 Zattere - acquisto Star Gas 2		2.301.306.950	2.301.306.950	2.301.306.950
TOTALE		34.835.929.049	34.835.929.049	34.253.192.143

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 539/95	17.090.000.000			
mutuo CREDIOP	8.728.000.000			
1 S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		5.636.912.432	5.636.912.432	4.470.093.771
2 S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		201.614.280	0	0
3 Opere di manutenzione straordinaria		719.407.959	719.407.959	719.407.959
4 S.Marta fabb. "C" 1° stralcio Compl.		367.057.539	367.057.539	367.057.539
5 Ca' Garzoni e Moro - Ristrutt. e adeg. norme sicurezza e prev. incendi		1.496.779.508	1.496.779.508	1.496.779.508
6 S.Marta fabbr. "C" - 2° str. restauro e adeguamento funzionale		306.228.282	306.228.282	0
		8.728.000.000	8.526.385.720	7.053.338.777
mutuo INTERBANCA	8.362.000.000			
1 S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		4.056.074.595	0	0
2 S. Giobbe Poste - restauro e adeguamento funzionale		1.000.000.000	0	0
3 Opere varie manutenz. strao.		716.834.390	716.834.390	0
4 Via Torino - Facoltà di SS.MM.FF		1.874.493.236	0	0
5 Via Torino - Capannoni		691.817.094	691.817.094	0
6 S.Marta - Aula Teatro		22.780.685	22.780.685	0
TOTALE		8.362.000.000	1.431.432.169	0

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 515/96	34.000.176.000			
mutuo MEDIO CREDITO	21.210.176.000			
1 S. Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		13.710.176.000		0
2 Zattere Capannone		5.000.000.000	5.000.000.000	196.134.653
3 Attuazione D.Lgs 626/94		2.500.000.000	281.658.295	85.909.800
mutuo CREDIOP	12.790.000.000			
1 S. Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		11.790.000.000	0	0
2 Zattere Capannone		1.000.000.000	0	0
TOTALE		34.000.176.000	5.281.658.295	282.044.453
OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 345/97	31.900.000.000			
mutuo CREDIOP	31.900.000.000			
1 S. Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		10.527.000.000		0
2 Ca' Foscari - restauro		10.527.000.000		
3 Acquisto edifici		8.613.000.000		
4 Manutenzione straordinaria		2.233.000.000	582.784.100	548.023.493
TOTALE		31.900.000.000	582.784.100	548.023.493

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 67/88 - Fondi Ministeriali	25.000.000.000			
1 S. Sebastiano - Restauro e adeguamento funzionale		2.500.000.000	2.343.000.000	2.195.000.000
2 S. Margherita - Restauro e adeguamento funzionale		3.000.000.000	2.975.800.000	2.556.000.000
3 Ca' Garzoni e Moro - Ristrutt. e adeg. norme sicurezza e prev. incendi		3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
4 Ca' Foscari - Ristrutturazione e adeguamento funzionale		574.000.000	574.000.000	491.000.000
5 S. Marta - Ristrutturazione e adeguam. funzionale dei laborat. chimici		5.400.000.000	5.394.448.889	5.208.000.000
6 Calle dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		4.900.000.000	4.891.173.981	2.157.000.000
7 Palazzo Nani Mocenigo - Restauro e adeguamento funzionale		1.524.000.000	1.523.920.000	144.000.000
8 Ca' Cappello - Restauro e adeguamento funzionale		500.000.000	500.000.000	485.000.000
9 Wolf Ferrari - Restauro e adeguamento funzionale		500.000.000	500.000.000	500.000.000
10 Celestia - Ristrutturazione e adeguamento funzionale		1.102.000.000	1.101.282.140	1.066.000.000
11 Restauro e adeguamento funzionale di S. Giobbe e altri edifici		2.000.000.000	2.000.000.000	1.585.000.000
TOTALE		25.000.000.000	24.803.625.010	19.367.000.000
OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 331/85 Fondi Ministeriali	12.160.000.000			
Edilizia Generale e Dipartimentale	11.330.000.000			
1 lavori noppi/c.p.i. (+ rev. prezzi)		11.330.000.000	10.660.090.055	10.145.000.000
Edilizia Sportiva	830.000.000			
1 Calle dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		830.000.000	830.000.000	830.000.000
TOTALE		12.160.000.000	11.490.090.055	10.975.000.000

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 407/89 Fondi Ministeriali	10.900.000.000			
Edilizia Generale e Dipartimentale	10.000.000.000			
1 Via Torino - Manutenzione e adeguamento funzionale del capannone		5.000.000.000	4.976.978.690	4.459.000.000
2 S. Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Edilizia Sportiva	900.000.000			
1 Calle dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		900.000.000	900.000.000	900.000.000
TOTALE		10.900.000.000	10.876.978.690	10.359.000.000
OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 725/94 Fondi Ministeriali	2.419.000.000			
Edilizia Generale e Dipartimentale	2.338.000.000			
1 S. Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		2.000.000.000	2.000.000.000	0
2 S. Sebastiano - restauro		388.000.000	0	0
Edilizia Sportiva	31.000.000			
1 Calle dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		31.000.000	0	0
TOTALE		2.419.000.000	2.000.000.000	0

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 550/95 Fondi Ministeriali	3.299.000.000			
Edilizia Generale e Dipartimentale	3.131.000.000			
1 S.Marta teatro G.Poli - restauro e adeguamento funzionale		1.467.645.889	1.467.645.889	167.588.597
2 Via Torino - Manutenzione e adeguamento funzionale del capannone		518.309.448	518.309.448	
3 Via Torino - Facoltà SS.MM.FF		481.690.552	481.690.552	
4 S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		663.354.111	663.354.111	583.354.111
Edilizia Sportiva	168.000.000			
1 Via Torino - Impianti sportivi		36.726.111		0
2 Calle dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		131.273.889	131.273.889	0
TOTALE		3.299.000.000	3.131.000.000	750.942.708
OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 663/96 Fondi Ministeriali	2.357.000.000			
Edilizia Generale e Dipartimentale	2.243.000.000			
1 Attuazione D.Lgs. 626/94		1.000.000.000	447.226.248	68.482.098
2 S.Giobbe Fase "A"		1.000.000.000	1.000.000.000	122.916.709
3 Via Torino - Capannone		243.000.000	243.000.000	
Edilizia Sportiva	168.000.000			
1 Calle dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		114.000.000	114.000.000	0
TOTALE		2.357.000.000	1.804.226.248	191.398.807

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1998

LEGGE 331/85 - Fondi Ministeriali

Edilizia Generale e Dipartimentale

1) LAVORI NOPPI/C.P.I. (e revisione prezzi)

Edilizia Sportiva

1) CALLE DEI GUARDIANI - Il finanziamento è destinato alla realizzazione parziale ed al risanamento di alcuni capannoni da adibire a palestra polivalente. E' in corso il montaggio della copertura. La Direzione Lavori sta predisponendo la perizia di variante per realizzare una tribuna per spettatori all'interno del complesso sportivo.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1998LEGGE 67/88 - Fondi Ministeriali

1) SAN SEBASTIANO - Fino ad ora sono stati realizzati vari interventi suddivisi in più stralci per il restauro della sede Universitaria, l'adeguamento del muro di confine, porzioni del I°, II°, III° e V° stralcio, acquisto di ascensori, sistemazione degli spazi esterni e della cabina Enel. I lavori sono stati tutti eseguiti.

2) S. MARGHERITA - Fino ad ora con questi fondi sono stati in parte eseguiti i lavori di adeguamento funzionale della sede Universitaria. I predetti lavori sono stati completati.

3) CA' GARZONI E MORO - Gli interventi edilizi finanziati in parte con questa legge sono stati ultimati. Manca la realizzazione della fossa biologica nel cortile di Ca'Moro la quale verrà realizzata nei primi mesi del 1999 per permettere lo spostamento della portineria della sede medesima.

4) CA' FOSCARI - L'importo è servito per finanziare la progettazione (circa 200.000.000.) e con i rimanenti sono state avviate le indagini geognostiche e conoscitive del palazzo. Dette indagini sono ancora in corso. La parte edilizia è stata eseguita.

5) S. MARTA - Fino ad ora sono stati eseguiti alcuni interventi di cui il principale è l'adeguamento funzionale del fabbricato "C" per il quale è stata impegnata la somma di Lire 5.020.000.000. (finanziamento parziale) il cui intervento è stato eseguito. Si sta chiudendo la contabilità dei lavori.

6) CALLE DEI GUARDIANI - Fino ad ora sono stati eseguiti vari interventi tra i quali parte della sistemazione della sede del custode per L. 57.000.000 circa e la sistemazione degli scoperti per un importo di L. 65.000.000 circa.

Il resto della somma è stato impegnato per realizzare i lavori già descritti alla legge 331/85.

7) PALAZZO NANI MOCENIGO - Ad eccezione alcuni interventi condominiali e di riparazione del tetto per L. 144.000.000., il rimanente è stato impegnato per il restauro architettonico e funzionale del palazzo che recentemente ha avuto il benessere della Salvaguardia, ed attualmente è in corso la predisposizione dei progetti esecutivi per provvedere alle operazioni di appalto.

8) CA' CAPPELLO - Sono stati eseguiti due stralci esecutivi di intervento

9) WOLF FERRARI - L'intervento è stato completato nel 1991.

10) CELESTIA - L'intervento è stato completato nel 1993.

11) S. GIOBBE ED ALTRI EDIFICI - Il finanziamento fa parte del progetto di restauro e adeguamento funzionale relativo alla fase "A", I° stralcio del complesso universitario. Le opere che competono sono state eseguite completamente.

I lavori del 3° cantiere saranno terminati presumibilmente entro la fine del febbraio 1999 dipendendo dalla consegna all'impresa dei locali relativi al cantiere medesimo.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1998LEGGE 407/89 - Fondi Ministeriali

Edilizia Generale e Dipartimentale

1) VIA TORINO Capannoni - Adeguamento funzionale del capannone da adibire a laboratorio chimico per la facoltà di Scienze MM.FF.NN.. E' stata effettuata la gara d'appalto vinta dall'Impresa Edile Costruzioni Srl. I lavori sono in corso e dovrebbero essere finiti per il mese di luglio 1999.

2) S. GIOBBE fase "A" - Il finanziamento fa parte del progetto di restauro e adeguamento funzionale relativo alla fase "A", I° stralcio del complesso universitario. Le opere che competono sono state eseguite completamente.

I lavori del 3° cantiere saranno terminati presumibilmente entro la fine del febbraio 1999 dipendendo dalla consegna all'impresa dei locali relativi al cantiere medesimo.

Edilizia Sportiva

1) CALLE DEI GUARDIANI - Il finanziamento è destinato alla realizzazione ed al risanamento di alcuni capannoni da adibire a palestra polivalente. I lavori sono stati già descritti alla legge 331/85 e alla legge 67/88.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1998LEGGE 725/94 - Fondi Ministeriali

Edilizia Generale e Dipartimentale

1) S. GIOBBE fase "A" - Le opere sono descritte alla legge 407/89.

2) S. SEBASTIANO - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

Edilizia Sportiva

1) CALLE DEI GUARDIANI - Il finanziamento è destinato alla realizzazione ed al risanamento di alcuni capannoni da adibire a palestra polivalente. I lavori sono stati già descritti alla legge 331/85, alla legge 67/88 e 407/89.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1998LEGGE 550/95 - Fondi Ministeriali

Edilizia Generale e Dipartimentale

1) S. MARTA Teatro G. Poli - Restauro e adeguamento funzionale. La gara d'appalto è stata aggiudicata all'impresa Garbuio Oscar &C. Snc. Sono in corso le opere di fondazione. Durante dette opere si sono presentate alcune difformità nelle fondazioni preesistenti le quali hanno avuto bisogno di modifiche progettuali. Tali modifiche consistono in opere di rinforzo soprattutto a sostegno dei muri perimetrali.

2) VIA TORINO Capannoni - Adeguamento funzionale del capannone da adibire a laboratorio chimico per la facoltà di Scienze MM.FF.NN.. La descrizione dei lavori è già stata fatta alla legge 407/89.

3) S. GIOBBE fase "A" - Le opere sono descritte alla legge 407/89 e alla legge 725/94.

Edilizia Sportiva

1) CALLE DEI GUARDIANI - Il finanziamento è destinato alla realizzazione ed al risanamento di alcuni capannoni da adibire a palestra polivalente. I lavori sono stati già descritti alle leggi nn. 331/85, 67/88, 407/89 e 725/94.

LEGGE 663/96

Edilizia Generale e Dipartimentale

1) ATTUAZIONE D.Lgs. 626/94 - Attuazione delle condizioni per la messa a norma degli edifici secondo le disposizioni dettate dalla legge sulla prevenzione e protezione dai rischi.

2) San Giobbe Fase "A" - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

3) VIA TORINO Capannone - Adeguamento funzionale del capannone da adibire a laboratorio chimico per la facoltà di Scienze MM.FF.NN.. Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

Edilizia Sportiva

1) CALLE DEI GUARDIANI - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1998LEGGE 139/92Mutuo IMI

1) INFORMATIZZAZIONE ATENEO E BIBLIOTECHE - Fino ad ora sono stati eseguiti due grossi interventi che riguardano: il primo la conversione su nastro magnetico dei cataloghi delle biblioteche per un importo di L. 2.200.000.000. ed il secondo la realizzazione della rete informatica di Ateneo e l'acquisto delle relative apparecchiature per l'importo di L. 3.000.000.000. Si prevede di destinare la somma rimanente al finanziamento delle opere di restauro e adeguamento funzionale della fase "A" di S. Giobbe.

2) S. GIOBBE fase "A" - Quota parte del finanziamento relativo del progetto di restauro e adeguamento funzionale relativo alla fase "A" I° stralcio. Lavori completamente eseguiti.

3) ZATTERE Acquisto Sci - E' stato effettuato un acquisto "chiavi in mano" di un edificio sito alle Zattere dove è stato insediato il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari Europei e Postcoloniali. I lavori sono stati eseguiti ed ultimati nel novembre '95. (Superficie mq 1436)

4) OPERE VARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Sono stati eseguiti vari interventi di natura manutentoria e di completamento di alcune opere di restauro e ristrutturazione già avviati e finanziati con altre leggi, con particolare riferimento ai seguenti interventi:

- parte dell'imbrigliamento della sede centrale di Ca' Foscari
- realizzazione di alcuni serramenti nella sede di S. Marta
- porzione del restauro ed adeguamento funzionale della sede di Ca' Cappello
- porzione del restauro e adeguamento funzionale del Fabbricato "C" di S. Marta.

5) CA' DALLA ZORZA Acquisto 3° piano - Acquisto di alcuni locali posizionati al terzo piano da destinare all'uso istituzionale dell'Università.

Mutuo BNL

1) S. GIOBBE fase "A" - Quota parte del progetto di restauro e adeguamento funzionale relativo alla Fase "A" I° stralcio di S. Giobbe.. Importo completamente utilizzato.

2) CA' BEMBO acquisto - E' stato acquistato un immobile che era concesso in Comodato dalla Cassa di Risparmio di Venezia. L'operazione è stata conclusa nel 1996. (Superficie mq 2107)

3) ZATTERE Acquisto Star Gas 1 - Sono stati acquistati i locali. (Superficie mq 404)

4) ZATTERE Acquisto Star Gas 2 - Sono stati acquistati i locali (Superficie mq 386)

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1998LEGGE 539/95Mutuo Crediop

- 1) SAN GIOBBE fase "A" - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.
- 2) SAN GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Il progettista ha completato il progetto esecutivo e si è in attesa del parere del Provveditorato Regionale alle OO.PP.
- 3) VIA TORINO Capannoni - Adeguamento funzionale del capannone da adibire a laboratorio chimico per la facoltà di Scienze MM.FF.NN.. Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.
- 4) S. MARTA Teatro G. Poli - Restauro e adeguamento funzionale. Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.
- 5) CA' GARZONI E MORO - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.
- 6) S. MARTA fabbricato "C" - Fino ad ora sono stati eseguiti alcuni interventi di cui il principale è l'adeguamento funzionale del fabbricato "C" per il quale è stata impegnata la somma di Lire 5.020.000.000. (finanziamento parziale) il cui intervento è stato eseguito. Si sta chiudendo la contabilità dei lavori.

Mutuo Interbanca

- 1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Il progettista ha completato il progetto esecutivo e si è in attesa del parere del Provveditorato Regionale alle OO.PP.
- 2) S. GIOBBE Poste - Il progetto è in fase di predisposizione da parte della Divisione Servizi Tecnici di questa Università.
- 3) OPERE VARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Sono stati eseguiti vari interventi di natura manutentoria e di completamento di alcune opere di restauro e ristrutturazione già avviati e finanziati con altre leggi, con particolare riferimento ai seguenti interventi:
 - Ripassatura del tetto presso la sede di Ca' Bernardo
 - Restauro degli affreschi dell'Auditorium di S. Margherita
 - Esecuzione di ulteriori interventi di imbrigliamento a Ca' Foscari
 - Restauro delle parti lapidee esterne della sede di Ca' Cappello
 - Interventi di restauro presso la sede di S. Sebastiano
- 4) VIA TORINO - Facoltà di SS.MM.FF - La progettazione è stata affidata alla Ati formata dall'arch. G.P. Mar, dall'Ing. G. Finotti e dai Professionisti Raggruppati arch. C. Lamanna e arch. F. Pittaluga. Il progetto è in corso di stesura.
- 5) VIA TORINO Capannoni - Adeguamento funzionale del capannone da adibire a laboratorio chimico per la facoltà di Scienze MM.FF.NN.. Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.
- 6) S. MARTA Teatro G. Poli - Restauro e adeguamento funzionale. Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1998LEGGE 515/96Mutuo Mediocredito

- 1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Il progettista ha completato il progetto esecutivo e si è in attesa del parere del Provveditorato Regionale alle OO.PP.
- 2) ZATTERE Ex falegnameria - La Commissione di Salvaguardia ha dato parere favorevole al progetto in data 23 aprile 1998 e il Comando dei VV.FF. in data 22 settembre 1998.
- 3) ATTUAZIONE D.LGS 626/94 - Attuazione delle condizioni per la messa a norma degli edifici secondo le disposizioni dettate dalla legge sulla prevenzione e protezione dai rischi.

Mutuo Crediop

- 1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Il progettista ha completato il progetto esecutivo e si è in attesa del parere del Provveditorato Regionale alle OO.PP.
- 2) ZATTERE Ex falegnameria - La Commissione di Salvaguardia ha dato parere favorevole al progetto in data 23 aprile 1998 e il Comando dei VV.FF. in data 22 settembre 1998.

LEGGE 345/97 mutuo Crediop

- 1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.
- 2) CA'FOSCARI - L'importo è servito per finanziare la progettazione (circa 200.000.000.) e con i rimanenti sono state avviate le indagini geognostiche e conoscitive del palazzo. Dette indagini sono ancora in corso. La parte edilizia è stata eseguita.
- 3) Acquisto edifici
- 4) Manutenzione straordinaria - Sono stati finanziate opere di falegnameria e opere lapidee della sede di Ca'Garzoni e Moro nell'ambito del restauro della sede stessa.



18 MAG. 1999

*Ministero per i Beni e le Attività
Culturali*SOPRINTENDENZA PER I BENI
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
DI VENEZIAAl Ministero Dei Lavori Pubblici
MAGISTRATO ALLE ACQUE
Comitato di indirizzo Coordinamento e Controllo
Ufficio di SegreteriaVENEZIA

Prot. n. 5932 del

OGGETTO: Art. 4 - Legge 28.11.1984 n. 798. Comunicazione dati per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

In relazione a quanto richiesto con nota del 5 maggio 1999 prot. n. 118/GAB, si comunica il quadro dettagliato, aggiornato al 31.12.1998, sulla stato di attuazione delle attività svolte dalla scrivente a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale cui all'oggetto e relativa agli "interventi per la salvaguardia di Venezia".

In sintesi, la spesa complessiva di lire 16 miliardi autorizzata dal Superiore Ministero con D.M. 25 gennaio 1993 (all. sub. 1), per gli impegni e la realizzazione degli interventi di cui al piano di spesa approvato con D.M. 28 maggio 1992 (all. sub. 2 - 3), il cui onere è stato posto a carico dei capitoli sottoindicati per l'importo a fianco di ciascuno specificato, ai sensi dell'art. 2, lettera g) della Legge 798/84, viene così di seguito riportata nel suo impiego:

Capitolo	lire	liquidati	somma residua
8034	9.645.000.000=	L. 8.835.021.245=	L. 809.978.755=
8125	6.355.000.000=	L. 6.294.364.880=	L. 60.635.120=
totali	L. 16.000.000.000=	L. 15.129.386.125=	L. 870.613.875=

In conformità all'art. 36 della Legge di Contabilità Generale dello Stato, i suindicati capitoli, alla data del 31.12.1997, sono stati dichiarati perenti.

Pertanto, la somma residua a tale data, è stata inoltrata per competenza all'Ufficio Centrale Bilancio e Programmazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Ciò al fine della iscrizione in bilancio e la relativa liquidazione a favore di tutti i creditori, per i quali a fine esercizio finanziario non sono stati emessi ordinativi di pagamento, in quanto i lavori di restauro eseguiti, necessitavano di essere perfezionati con i rispettivi collaudi.

Con successivo D.M. 30 giugno 1994, (all. sub 4), viene assegnato a favore di questa Soprintendenza l'importo di lire 500.000.000=, quale spesa per la realizzazione d'interventi organici rivolti al censimento, la precatalogazione ed altro.

Il capitolo di riferimento è 8036, previsto dal piano di spesa dell'allora Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

L'impiego di tale fondo assegnato è stato impegnato e liquidato per lire 499.800.000=.

La somma residua di lire 200.000=, è stata da questo Ufficio considerata economia.

IL SOPRINTENDENTE
(dott. arch. Roberto CECCHI)

14877 - F



Al Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali

Al. M. 1

UFFICIO CENTRALE PER I BENI
AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI

VISTA la legge 1 giugno 1939, n. 1089;
VISTA la legge 21 dicembre 1961, n. 1552;
VISTA la legge 14 marzo 1968, n. 292;
VISTO il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
VISTA la legge 1 marzo 1975, n. 44;
VISTO il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;
VISTA la legge 28 dicembre 1977, n. 970;
VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509;
VISTA la legge 7 agosto 1982, n. 526;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 431;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 360 "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia" che, all'art. 2, primo comma, lettera a), destina a questo Ministero lire 6 miliardi per interventi di competenza di cui all'art. 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798 e lire un miliardo per essere assegnato alla Fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia, per interventi in conto capitale connessi all'ampliamento e alla funzionalità della sede;

VISTA la legge 31 dicembre 1991 n. 415, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria '92) che, tra gli stanziamenti di spesa disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 5, ed elencati nella tabella D allegata alla stessa legge, ha previsto un rifinanziamento della legge 29 novembre 1984, n. 798 per l'ammontare di lire 100 miliardi nell'anno 1992, di cui lire 10 miliardi destinati al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 145;

CONSIDERATO che il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia ha trasmesso con note n. 616 del 17 gennaio 1992 e n. 5554 del 16 aprile 1992 i piani di spesa, condordati con le altre Soprintendenze competenti, relativi agli stanziamenti suddetti;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargata per il 1992, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Nazionale del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali nella seduta dell'8 maggio 1992;

CONSIDERATO che per la realizzazione dei progetti inseriti nel piano, il parere del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, espresso ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge 10 gennaio 1992, n. 145, sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961 n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato;

CONSIDERATO che gli interventi proposti nel piano di spesa per l'anno 1992 corrispondono ai compiti istituzionali di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, architettonico, archeologico, artistico e storico;

CONSIDERATO che con D.M. n. 124378 del Ministero del Tesoro, inoltrato alla Corte dei Conti per la registrazione, vengono istituiti nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1992, i seguenti capitoli con i relativi stanziamenti:

Cap. n. 8034 L. 8.000.000.000

Cap. n. 8125 L. 2.000.000.000

e che con D.M. n. 127918 del Ministero del Tesoro vengono disposti ulteriori stanziamenti e l'istituzione del capitolo 8126 per un contributo alla Fondazione scientifica Querini Stampalia:

Cap. n. 8034 L. 1.645.000.000

Cap. n. 8125 L. 4.355.000.000

Cap. n. 8126 L. 1.000.000.000;

D E C R E T A

a) E' approvato l'allegato piano di spesa 1992 relativo alle necessita' citate in premessa il cui onere viene posto a carico dei capitoli 8034, 8125, 8126, per l'anno finanziario '92, in termini di competenza e cassa;

b) e' autorizzata la spesa a valere sullo stanziamento di competenza per l'esercizio finanziario 1992, ammontante a lire 17 miliardi, che si impegna sui capitoli sottoindicati per l'importo a fianco di ciascuno specificato:

Capitolo 8034 L. 9.645.000.000

Capitolo 8125 L. 4.355.000.000


Capitolo 8126 L. 1.000.000.000;

- c) per la realizzazione degli interventi e per la effettuazione delle spese, si applicano le disposizioni degli artt. 2 e 3 della legge 145/92, relative alla predisposizione dei progetti, all'accreditamento e alla spesa dei fondi occorrenti.
- I fondi necessari alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano, ai sensi dell'art. 3, comma 4 sono, pertanto, messi a disposizione dei funzionari delegati mediante ordini di accreditamento, emessi soltanto sulla base del piano stesso, in deroga al limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, a cura del competente Ufficio Centrale.
- I progetti esecutivi degli interventi, con l'indicazione dei tempi necessari per l'esecuzione, sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero, fino ad un importo complessivo della spesa di lire 1.000 milioni, e dal Direttore Generale dell'Ufficio Centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici fino a lire 1.500 milioni, in deroga a quanto previsto dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, come da ultimo modificato dalla legge 25 maggio 1978, n. 233.
- I predetti funzionari delegati assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, i relativi impegni di spesa che sono sottoposti al controllo successivo in sede di rendiconto;
- d) i responsabili degli organi periferici del Ministero, inviano ogni sei mesi e entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, all'Ufficio Centrale, una relazione tecnica inerente all'esecuzione del progetto.
- Il ritardo o il mancato invio della relazione tecnica costituisce fattispecie perseguibile disciplinarmente ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.


Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 28 MAG. 1992

IL MINISTRO



PER CUI





Al. M-2

Al. Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali

UFFICIO CENTRALE PER I BENI
AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI

VISTA la legge 1 giugno 1939, n. 1089;
VISTA la legge 21 dicembre 1961, n. 1552;
VISTA la legge 14 marzo 1968, n. 292;
VISTO il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
VISTA la legge 1 marzo 1975, n. 44;
VISTO il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;
VISTA la legge 28 dicembre 1977, n. 970;
VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509;
VISTA la legge 7 agosto 1982, n. 526;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 431;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 360 "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia" che, all'art. 2, primo comma, lettera a), destina a questo Ministero lire 6 miliardi per interventi di competenza di cui all'art. 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798 e lire un miliardo per essere assegnato alla Fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia, per interventi in conto capitale connessi all'ampliamento o alla funzionalità della sede;

VISTA la legge 31 dicembre 1991 n. 415, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria '92) che, tra gli stanziamenti di spesa disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 5, ed elencati nella tabella D allegata alla stessa legge, ha previsto un rifinanziamento della legge 29 novembre 1984, n. 798 per l'ammontare di lire 100 miliardi nell'anno 1992, di cui lire 10 miliardi destinati al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 145;

VISTO il D.M. 6 marzo 1992;

VISTO il D.M. 28 maggio 1992, con il quale e' stato approvato il piano di spesa per l'A.F. '92, relativo agli interventi di cui alla legge n. 798/84 rifinanziata dalle sopracitate leggi n. 360/91 e n. 415/91, per l'importo complessivo di lire 17 miliardi;

VISTO il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" che all'art. 4, comma 1, limita la facoltà di impegnare le spese relative ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome nell'esercizio finanziario '92;

D E C R E T A

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 17 miliardi, per la realizzazione degli interventi di cui al piano di spesa approvato con D.M. 28 maggio 1992, il cui onere viene posto a carico dei capitoli sottoindicati per l'importo a fianco di ciascuno specificato per l'anno finanziario 1993, resti '92, e per la quale si dispone il relativo impegno:


Capitolo 8034	lire 9.645.000.000
Capitolo 8125	lire 6.355.000.000
Capitolo 8126	lire 1.000.000.000

La somma sarà messa a disposizione a favore del funzionario delegato mediante ordine di accreditamento.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 11 25 GEN. 1993

IL MINISTRO







MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI - VENEZIA

PIANO DI SPESA ANNO 1992

BENI STATALI

CAPITULO 8034

MIN. COMUNE	OGGETTO	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO	DIV.	IMPORTO
Legge 8 novembre 1991, n. 360:				
1 VENEZIA	- Palazzo Michiel delle Colonne	- restauro e valorizzazione	III	240.000.000
2 VENEZIA	- Palazzo Pisani	- restauro e valorizzazione	III	330.000.000
3 VENEZIA	- Procuratie Nuove	- restauro e valorizzazione	III	150.000.000
4 VENEZIA	- Procuratie Nuove, arredi	- restauro e valorizzazione	III	125.000.000
5 VENEZIA	- Palazzo Ducale	- restauro e valorizzazione	III	150.000.000
6 VENEZIA	- Palazzo Marcello	- restauro e valorizzazione	III	350.000.000
7 VENEZIA	- Complesso conventuale S. Nicolo'	- restauro e valorizzazione	III	200.000.000
				1.645.000.000
Legge 31 dicembre 1991, n. 415 (Legge Finanziaria) rifinanziamento L. 798/84:				
✓ 1 VENEZIA - S. MARCO	- Biblioteca Nazionale Marciana	- Consolidamento, restauro, impianti al servizio della Biblioteca (completamento)	III	1.300.000.000
✓ 2 VENEZIA - CASTELLO	- Palazzo Grimani	- Restauro e adattamento a museo archeologico (proseguimento)	III	1.500.000.000
✓ 3 VENEZIA - DORSODURO	- Palazzo Marcello	- Restauro e adattamento a museo d'arte orientale (completamento)	III	2.000.000.000
✓ 4 VENEZIA - DORSODURO	- Scuola della Carita'	- Restauro prospetto palladiano sul cortile, in uso alle Gallerie dell'Accademia (completamento)	III	1.000.000.000
✓ 5 VENEZIA - MURANO	- Casino Mocenigo	- Recupero dell'edificio (completamento)	III	400.000.000
✓ 6 VENEZIA - SAN MARCO	- Palazzo Pisani-Conservatorio di musica	- Restauro degli apparati decorativi (proseguimento)	III	400.000.000
7 VENEZIA - SAN MARCO	- Ex Convento di S. Stefano - Intendenza di Finanza	- Restauro degli apparati scultorei del chiostro (inizio e completamento)	III	150.000.000
8 VENEZIA - LAZZARETTO NUOVO	- Isola del Lazzaretto Nuovo	- Consolidamento, restauro, recupero degli edifici (proseguimento)	III	500.000.000
9 VENEZIA - CASTELLO	- Arsenale Saggiandre	- Consolidamento e recupero delle tettoie acquatiche cinquecentesche (completamento)	III	550.000.000
10 VENEZIA - CASTELLO	- Chiesa di S. Lorenzo	- Restauro dei resti delle chiese medioevali (completamento)	III	200.000.000
				8.000.000.000

TOTALE

9.645.000.000

IL MINISTRO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI - VENEZIA

PIANO DI SPESA ANNO 1992

BENI NON STATALI

CAPITOLO 8125*

MUN. COMUNE	OGGETTO	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO	DIV.	IMPORTO
Legge 8 novembre 1991, n. 360 :				
3 1 VENEZIA	-- Chiesa degli Scalzi	- restauro e valorizzazione	III	400.000.000
9 2 VENEZIA	-- Chiesa di S. Giacomo dell'Orto	- restauro e valorizzazione	III	750.000.000
10 3 VENEZIA	-- Chiesa dei Gesuiti	- restauro e valorizzazione	III	750.000.000
11 4 VENEZIA	-- Chiesa di S. Giobbe	- restauro e valorizzazione	III	205.000.000
12 5 VENEZIA	-- Chiesa del SS. Giovanni e Paolo	- restauro e valorizzazione	III	950.000.000
13 6 VENEZIA	-- Chiesa di S. Stefano	- restauro e valorizzazione	III	700.000.000
14 7 VENEZIA	-- Chiesa dei Frari	- restauro e valorizzazione	III	330.000.000
15 8 VENEZIA	-- Chiesa di S. Antonio	- restauro e valorizzazione	III	150.000.000
16 9 LAGUNA	-- Convento di S. Francesco nel deserto	- restauro e valorizzazione	III	120.000.000
				4.335.000.000
Legge 31 dicembre 1991, n. 415 (Legge Finanziaria) rifinanziamento L. 798/84 :				
11 VENEZIA - CASTELLO	- Chiesa di S. Antonio	- Consolidamento strutturale del campanile e restauro chiesa (completamento)	III	300.000.000
12 VENEZIA - S. POLO	- Chiesa di S. Giovanni Elemosinario	- Recupero e restauro della chiesa e del campanile (completamento)	III	500.000.000
13 VENEZIA - S. MARCO	- Chiesa di S. Beneto	- Consolidamento e restauro dell'edificio (proseguimento)	III	400.000.000
14 VENEZIA - S. MARCO	- Chiesa di S. Maria del Giglio	- Consolidamento e pulitura della facciata (inizio)	III	400.000.000
15 VENEZIA	- Avvio di un sistema informativo, georeferenziato, finalizzato all'implementazione e alla gestione dei dati provenienti dalla catalogazione territoriale, dall'attività vincolistica e dagli interventi di restauro, realizzati e in atto sul patrimonio architettonico di Venezia e delle isole lagunari. Obiettivo principale la visualizzazione e l'utilizzazione immediata delle informazioni descrittive, grafiche e fotografiche inerenti la situazione vincolistica, lo stato conservativo, nonché la destinazione d'uso del patrimonio architettonico di Venezia e della laguna con particolare riferimento al patrimonio edilizio, a vario titolo correlato alla realizzazione del sistema museale della città. Tale sistema, inoltre, utilizzato in collaborazione con altri uffici competenti dello Stato e con l'Amministrazione comunale, potrà rilevarsi specificamente funzionale alla pianificazione del territorio urbano.		III	400.000.000
				2.000.000.000

TOTALE

6.335.000.000

IL MINISTRO

DECRETO
5 LUG. 1994
1853/2



CORTE DEI CONTI
02.0894 000290
MINIST. PER I BENI CULTURALI
E AMBIENTALI

all. 144

*Il Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali*

UFFICIO CENTRALE BENI AA.AA.AA.AA.SS.

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

VISTA la legge 01.06.1939, n°1089;

VISTA la legge 21.12.1961, n°1552;

VISTA la legge 14.03.1968, n° 292;

VISTO il D.P.R. 30.06.1972, n°748;

VISTA la legge 01.03.1975, n° 44;

VISTO il D.P.R. 03.12.1975, n°805;

VISTA la legge 28.12.1977, n° 970;

VISTO il regolamento approvato con D.P.R. 17.05.1978, n° 509;

VISTA la legge 07.08.1982, n°526;

VISTA la legge 07.08.1990, n°241;

VISTA la legge 29.12.1990, n°431;

VISTA la legge 10.02.1992, n°145, recante norme organiche di tutela e valorizzazione dei beni culturali;

VISTO il Decreto Legislativo 03.02.1993, n° 29;

VISTO il D.L. 20.05.1993, n°149 convertito con modificazione nella legge 19.07.1993, n°237;

VISTO il D.M. 06.03.1992, pubblicato sulla G.U. del 13 marzo 1992, contenente il programma triennale di indirizzo previsto dall'art.1 della legge 145/92;

VISTO il D.M. 25.06.1992, con il quale e' stato adottato un primo piano triennale di attuazione degli interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali, secondo il programma approvato con D.M. 06.03.1992;

VISTO il D.M. 30.01.1993, con il quale e' stato approvato il piano di spesa riguardante i contributi ex art.3, comma 2 della legge 145/92 per l'importo complessivo di lire 24 miliardi per l'A.F. 1993;

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

15 NOV. 1994

1 324

C. d. R. n. 26/8, let. 26.4.1994
Ved. anche D.M. 14.11.1994 (n. 361)

VISTO il D.M. 08.03.1993 con il quale e' stato approvato il piano di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art.1 della legge 145/92 per l'importo complessivo di lire 189.000.000* per gli anni 1992/1994;

VISTI i DD.MM. 20.05.1993 e 04.12.1993, con i quali sono stati approvati i piani di spesa riguardanti la lettera e), di cui all'art.1 della legge 145/92, per l'importo complessivo di lire 35 miliardi per gli anni 1993/1994;

VISTO il D.M. 21.05.1993 con il quale e' stato approvato il piano di spesa riguardante gli accordi di programma ex art.1, comma 5 della legge 145/92, per l'importo complessivo di lire 36 miliardi per gli anni 1993/1994;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n°538 (legge finanziaria 1994), che, alla tabella D, riguardante il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale, ha disposto un ulteriore finanziamento complessivo di lire 150 miliardi per gli interventi di cui alla legge citata 145/92;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n.539 relativa al bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1994, che ha assegnato il predetto finanziamento ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione di questo Ministero ed in particolare, per quanto riguarda la Rubrica 3, così come di seguito indicato:

Cap. 8001	lire	4.500.000.000*	"Spese per acquisti ed espropriazioni ecc."
Cap. 8005	lire	25.500.000.000*	"Spese per il recupero e la salvaguardia, il restauro, la valorizzazione e la manutenzione del patrimonio architettonico archeologico artistico e storico ecc."
Cap. 8019	lire	20.000.000.000*	"Spese per l'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sede di musei e gallerie dello Stato"
Cap. 8036	lire	10.000.000.000*	"Spese per la realizzazione d'interventi organici rivolti al censimento, la precatalogazione, ecc.."
Cap. 8103	lire	30.000.000.000*	"Interventi per il restauro e la valorizzazione di monumenti di proprietà non statale ecc."

TOTALE	lire	90.000.000.000*	
=====			

VISTA la nota n.986/A del 2 febbraio 1994, con la quale l'Ufficio Centrale ha richiesto alle Soprintendenze ed agli Istituti Centrali di trasmettere le proposte di finanziamento, utilizzando la scheda all'uopo predisposta, relative a ciascun capitolo, secondo un motivato ordine di priorità;

VISTO il decreto 1 aprile 1994, del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, pubblicato sulla G.U. n.107 del 10.05.1994, riguardante il "Programma di indirizzo relativo al rifinanziamento per il 1994 della legge 10 febbraio 1992, n.145, concernente interventi organici di tutela e valorizzazione di beni culturali" che, all'art.1, comma 2, assegna la predetta somma di lire 90 miliardi all'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici, ripartita per obiettivi indicati dall'art.1, comma 2 della citata legge 145/92, riservando il 5% del suddetto importo ai progetti di cui al comma 5, art.1 della legge 145/92 (se presentati ed accolti) concernenti gli accordi di programma:

lettera a) per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico L. 20.500.000.000#

lettera b) per la realizzazione di interventi di recupero, salvaguardia e restauro del patrimonio suddetto: L. 35.000.000.000#

lettera c) per l'acquisizione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico e storico: L. 4.500.000.000#

lettera d) per la prosecuzione dell'attività d'inventariatione precatalogazione e catalogazione dei beni culturali nonché di completamento o razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali: L. 10.000.000.000#

lettera e) per la valorizzazione del sistema museale nazionale, attraverso la realizzazione di progetti sperimentali relativi ai modelli di gestione, esposizione e fruizione: L. 20.000.000.000#

TOTALE L. 90.000.000.000#
=====

VISTE le proposte degli interventi pervenute all'Ufficio Centrale da parte degli Organi Periferici competenti e dagli Istituti Centrali ammontanti a lire 342.139.757.000#.

VISTO il parere favorevole del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali espresso nella seduta del 9 giugno 1994.

DECRETA

Per la completa realizzazione del piano degli interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali di competenza dell'Ufficio Centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 65.800.000.000#, come risulta nelle allegate schede che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, e se ne dispone l'impegno, in quanto a lire 67.000.000.000# sui seguenti capitoli di spesa, per l'importo e per i fini a fianco di ciascuno specificati, e valere sullo stanziamento di competenza per l'A.F. 1994:

Cap. 8001	lire	4.275.000.000#
Cap. 8005	lire	24.225.000.000#
Cap. 8019	lire	19.000.000.000#
Cap. 8035	lire	9.500.000.000#
Cap. 8103	lire	10.000.000.000#

Totale	lire	67.000.000.000#
		=====

Si dispone, inoltre, l'impegno della restante somma di lire 13.500.000.000# sul Cap.8103 per l'A.F.'95 per gli effetti di quanto disposto dalla citata legge finanziaria 1994, che, alla tabella F, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, ha rimodulato le annualita' di spesa di cui alla legge 145/92, spostando al 1995 lire 20 miliardi, attinenti all'A.F. 1993. Con successivi provvedimenti sara' disposto, infine, l'impegno della somma di lire 4.500.000.000# derivante dalla riserva del 5% dello stanziamento complessivo di lire 90 miliardi, previsto dal citato D.M. 1 aprile 1994, per gli eventuali accordi di programma di cui all'art.1, comma 5, della citata legge 145/92, sui seguenti capitoli di spesa:

Cap. 8001	lire	335.000.000*
Cap. 8005	lire	1.275.000.000*
Cap. 8019	lire	1.000.000.000*
Cap. 8036	lire	500.000.000*
Cap. 8103	lire	1.500.000.000*

Totale	lire	4.500.000.000*
		=====

Per la realizzazione degli interventi e per la effettuazione delle spese, si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 19 luglio 1993, n° 237 relative alla predisposizione dei progetti, all'accreditamento e alla spesa dei fondi occorrenti.

I fondi necessari alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, sono messi a disposizione dei funzionari delegati mediante ordini di accreditamento, emessi sulla base del piano di spesa.

I progetti esecutivi degli interventi, con l'indicazione dei tempi necessari per l'esecuzione, che dovranno essere contenuti in 15 mesi dalla data di inizio dei lavori, sono approvati, ai sensi del suddetto art. 7, dai competenti organi periferici del Ministero fino ad un importo complessivo della spesa di lire 1000 milioni, salva diversa disposizione per importi superiori.

I predetti funzionari delegati assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, le relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al controllo successivo in sede di rendiconto.

I responsabili degli organi periferici del Ministero, informano il competente Ufficio Centrale facendo pervenire entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi nonché non oltre un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente all'esecuzione del progetto.

L'omesso invio degli atti e delle relazioni accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, costituisce inosservanza ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.


PER L'IMPEGNO DELLA SPESA
IL DIRETTORE GENERALE

PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO
IL MINISTRO


30 GIU. 1994

Visto e impegnato al N° 483/57 AL 487525Cap. 8001 eserc. 199430 AGO 1994


Il Direttore della Ragioneria Centrale

Visto e impegnato al N° 487/58 AL 487559
Visto e impegnato al N° 484/55 AL 484561Cap. 8005 eserc. 1994


Il Direttore della Ragioneria Centrale

Visto e impegnato al N° 483/56 AL 489242Cap. 8019 eserc. 199430 AGO 1994


Il Direttore della Ragioneria Centrale

Visto e impegnato al N° 483/58 AL 485458Cap. 8036 eserc. 199430 AGO 1994

Il Direttore della Ragioneria Centrale

Visto e impegnato al N° 489/57Cap. 8103 eserc. 199430 AGO 1994

Il Direttore della Ragioneria Centrale



SAVE Aeroporto di
Venezia Marco Polo S.p.A.
Viale Galileo Galilei, 30/1
30030 Venezia Tesserà
Telefono 041/2606111
Telex 410013 AER VE I
Telefax 041/2606260



Venezia Tesserà, 3 giugno 1999
Prot. n. 98/027/DA/MM/mm

Spett.le
Ministero dei Lavori Pubblici
Magistrato alle Acque
Comitato di indirizzo,
coordinamento e controllo
Riva del vin 19
30100 VENEZIA

Oggetto: *Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale*

Con riferimento alla Vostra richiesta del 5 maggio u.s. (rif. 118/GAB) in allegato diamo un riepilogo delle opere eseguite od in via di esecuzione per le quali l'Aeroporto di Venezia ha usufruito dei finanziamenti ottenuti con la legislazione in oggetto.

Forniamo inoltre alcune immagini panoramiche dell'aerostazione che testimoniano dell'avanzamento delle opere in corso.

Vi comunichiamo inoltre che, nel corso dei primi mesi del 1999, sono state approvate ulteriori opere che consentiranno di esaurire i fondi a disposizione entro l'anno 2000.

Distinti saluti.

SAVE S.p.A.
IL PRESIDENTE
Giovanni FELICANI

OPERA COMPLETATA

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI DI
VOLO E RIFACIMENTO I.V.N. III^a CAT. ICAO**

- Costo di progetto esecutivo
(approvato con D.D. n° 144 del
13/10/1994 posto a base di gara : L. 44.266.585.627
- Aggiudicazione : 25/10/1995
- Impresa esecutrice : A.T.I. : ITINERA S.p.A.
(GRASSETTO S.p.A.)
KOPA S.p.A.
VIABIT S.p.A.
- Importo contratto : L. 30.473.464.762
- Consegna lavori : 18/12/1995
- Scadenza tempo contrattuale : 11/01/1997
- Proroghe concesse : 60 gg. (1^a perizia suppletiva)
- Perizie di variante : 1^a perizia approvata in CdA SAVE nella
seduta del 26/2/1996 e con D.D. n° 025 del
10/03/1997
2^a perizia approvata in CdA SAVE nella
seduta del 21/7/1997 e con D.D. n° 088 del
21/9/1998
- Fine lavori : terminati in data 21/12/96
(certificato del 21/02/97 con riconoscimento
di un premio di acceleramento)
- Esito collaudo : In attesa di collaudo
- Variazioni di spesa
(complessivamente per le due
perizie suppletive) : L. 4.719.589.777
- Spesa finale : L. 35.193.054.539

1. OPERE IN APPALTO

1.1 - Nuova Aerostazione:

Importo appalto originario*:	L 76.219.550.175.-
Importo perizia suppletiva**:	<u>L 11.444.006.827.-</u>
Totale Importo Appalto	L 87.663.557.002.-

*Contratto: n. di repertorio 52658 del 25-07-1997. Registrato a Venezia il 14-08-1997
al n. 1605 Atti Privati.

**Perizia Suppletiva di Variante approvata da CdA di SAVE S.p.a. nella seduta del
13-07-1998.

Consegnato il 21-08-1997 - Tempo d'esecuzione:

Contratto base	giorni	1095
Perizia	<u>giorni</u>	<u>180</u>
Nuovo tempo d'esecuzione	giorni	1275

Ultimazione prevista:	Contratto base il	19-08-2000
	Nuova scadenza con perizia il	15-02-2001

Attività compiuta:

al 31-12-98 giorni 499 pari a 39.14% giorni residui 776

Avanzamento lavori al 31 dicembre 1998: L.22.617.284.000

1.2 - Piazzali Aeromobili:

Importo appalto originario*:	L 14.014.232.239.-
Importo perizia suppletiva**:	<u>L 2.481.276.282.-</u>
Totale Importo Appalto	L 16.495.508.521.-
Premio di acceleramento***:	L 1.150.000.000.-

*Contratto: n. di repertorio 52657 del 25-07-1997. Registrato a Venezia il 14-08-1997 al n. 1604 Atti Privati.

**Perizia Suppletiva di Variante approvata da CdA di SAVE S.p.a. nella seduta del 27-07-1998.

***Premio di acceleramento. Appendice al contratto d'appalto n. di repertorio 57321 raccolta n. 10427 del 03-08-1998. Registrato a Venezia il 25-08-1998 al n. 1771 Atti Privati.

Consegnato il 21-08-1997 - Tempo d'esecuzione:

Contratto base	giorni	540
Perizia + proroghe	<u>giorni</u>	<u>280</u>
Nuovo tempo d'esecuzione	giorni	820

Ultimazione prevista	Contratto base il	11-02-1999
	Nuova scadenza con perizia + proroghe il	18-11-1999

Attività compiuta:

al 31-12-98 giorni 499 pari a 60.85 % giorni residui 321

Perizia: in corso perizia di assestamento

Avanzamento lavori al 31 dicembre 1998: L.11.007.586.756

1.3 – Viabilità e Parcheggi:

Importo appalto: L 8.350.500.000.-

Contratto: n. di repertorio 53138 del 30-09-1997. Registrato a Venezia il 20-10-1997 al
n. 1897 Atti Privati.

Consegnato il 07-10-1997

Tempo d'esecuzione giorni 720

Ultimazione Prevista 30-03-1999

Attività compiuta:

al 31-12-98 giorni 392 pari a 54.44% giorni residui 328

Perizie in corso di elaborazione

Proroghe nessuna

Sospensione lavori Verbale di Sospensione Lavori in data 23-07-98

Ripresa dei lavori Verbale di Ripresa Lavori in data 20-10-98
(periodo complessivo della sospensione 89 giorni)

Avanzamento lavori al 31 dicembre 1998; L. 336.582.000



