

Prospetto 1: Risorse finanziarie complessive per fonte, destinazione e utilizzi

FONTE			DESTINAZIONE	RISORSE FINANZIARIE (milioni di euro)					
N. voce	Provenienza	Riferim. normativi (D.L. 39/2009 quando non diversamente specificato)		Stanziamenti	Tipo di assegnazione	Importo assegnato	Trasferimenti ai sogg. att.(*)	Progr. e Impegni	Erogazioni(*)
19	Bilancio dello Stato (FAS risorse nazionali)	Art. 10, c. 1/bis Art. 70, D.L. 1/2012	Regime di aiuto "de minimis" (45,0 meuro da FSC e 43,4 meuro altre fonti). Per il celere sostegno al tessuto imprenditoriale, le risorse, originariamente stanziare per la Zona Franca Urbana saranno destinate a favore di interventi per le piccole e micro imprese attraverso il sostegno "de minimis". NB: I trattati europei sanciscono l'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione Europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune. Tale adempimento di notifica non è richiesto nel caso di agevolazioni che non superano la soglia dei 200.000 euro per singolo soggetto beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari (<i>de minimis</i>).	88,4	Interventi per lo sviluppo del territorio	88,4	nd	nd	nd
20	Bilancio dello Stato	Art. 2, c. 250, voce 9, Legge 191/2009	Riequilibrio bilanci Enti Locali danneggiati dal sisma - successivi contributi sono stati riconosciuti con OPCM a carico dell'art. 14, co. 5	30,0	Riequilibrio bilanci enti locali	30,0	30,0	30,0	30,0
21	Bilancio dello Stato	Art. 14, co. 14-ter, ex D.L. 78/2010	Contributo ai Comuni della Provincia di L'Aquila in dissesto finanziario - vedi riga precedente per successivi contributi	2,0	Riequilibrio bilanci enti locali	2,0	2,0	2,0	2,0
22	Bilancio dello Stato	Art. 39, co. 4 ex D.L. 78/2010	Contributo al Comune di L'Aquila per disavanzo pregresso bilancio 2009 (minori entrate causa sisma) - vedi riga precedente per successivi contributi	10,0	Riequilibrio bilanci enti locali	10,0	10,0	10,0	10,0
23	Bilancio dello Stato	Art. 39, c. 4-quater ex D.L. 78/2010	Proroga programma cassa integrazione straordinaria Finmek. Si tratta della proroga del periodo di cassa integrazione straordinaria per i 400 lavoratori dell'area aquilana della Finmek Solution.	3,5	Proroga C.I.G.	3,5	3,5	3,5	3,5
24	Bilancio dello Stato	Art. 2, co. 3-sexies, D.L. 225/2010	Autorizzazione contratti di lavoro a tempo determinato Comune di L'Aquila (lineare) e comuni inontani	6,0	Funzionamento strutture	6,0	6,0	6,0	6,0
25	Enti previdenza	Art. 14, c. 3	Investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse	600,0	Opere pubbliche, investimenti immobiliari	600,0	0,0	0,0	0,0
26	Bilancio dello Stato	D.L. 43/2013, art. 7-bis	Ricostruzione di edifici privati e interventi per lo sviluppo del territorio. La delibera CIPE 50/2013 ha effettuato una ripartizione delle risorse complessive di 1.183,2 meuro, pari a 197,2 meuro annui dal 2014 al 2019, fra interventi per la ricostruzione degli edifici privati e interventi per lo sviluppo del territorio.	1.183,2	Ricostruzione edifici privati	1.124,0	0,0	78,0	0,0
					Interventi per lo sviluppo del territorio	59,2	0,0	0,0	0,0
27	Bilancio dello Stato	Legge di stabilità per il 2014	Ricostruzione di edifici privati. Complessivi 600 meuro in due anni 2014-2015	600,0	Ricostruzione edifici privati	600,0	0,0	0,0	0,0
Totale risorse "ricostruzione"				9.413,0		9.413,0	5.269,3	4.761,1	1.021,3
TOTALE RISORSE PUBBLICHE				12.272,3		12.272,3	8.128,5	7.598,1	3.850,7

Prospetto 1: Risorse finanziarie complessive per fonte, destinazione e utilizzi

FONTE			DESTINAZIONE	RISORSE FINANZIARIE (milioni di euro)					
N. voce	Provenienza	Riferim. normativi (D.L. 39/2009 quando non diversamente specificato)		Stanziamenti	Tipo di assegnazione	Importo assegnato	Trasferimenti ai sogg. att.(*)	Progr. e Impegni	Erogazioni(*)
ALTRE FONTI									
28	Donazioni di privati, di Istituzioni pubbliche e di Stati esteri	L'informazione sull'importo complessivo delle donazioni proviene dal Dipartimento della Protezione Civile che ha gestito o trasferito gran parte delle risorse rivenienti da donazioni. Poiché una quota delle donazioni non è stata raccolta su conti correnti intestati alla Protezione Civile o al Commissario delegato per la ricostruzione, una è stata versata direttamente agli Enti Locali, e poiché le informazioni relative ai flussi finanziari rivenienti da donazioni non sono mai state accertate, l'importo accertato delle stesse è da ritenersi una quota parte del totale.	Per l'utilizzo delle somme rivenienti da donazioni, si è in grado di seguire esclusivamente gli impegni e le spese soggetti a monitoraggio ai sensi del D.L. 83/2012, art. 67-ter, e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, del 29 ottobre 2012, art. 4, ovvero quelle utilizzate per la ricostruzione/realizzazione di opere pubbliche, segnalate dai soggetti attuatori. Dato l'importo limitato delle opere cofinanziate da donazioni segnalate fra i dati di monitoraggio dai soggetti attuatori, è probabile che taluni progetti interamente finanziati da donazioni non siano stati segnalati dalle stazioni appaltanti e questo spiega perché per la maggior parte delle somme donate non si sia in grado di seguire la finalizzazione e l'utilizzo, in base al monitoraggio disposto dal DM MEF. Tutti gli utilizzi non segnalati nel monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi sono stati riportati a saldo nella categoria "Altro"	87,0	Opere pubbliche monitorate ai sensi del DM MEF del 29 ottobre 2012, art. 4	16,4	16,4	16,4	7,6
				Altro	70,6	70,6	nd	nd	
TOTALE ALTRE RISORSE				87,0		87,0	87,0	16,4	7,6
TOTALE GENERALE				12.359,3		12.359,3	8.215,5	7.614,5	3.858,4

(*) Per trasferimenti di intendono le risorse trasferite dai capitoli del Bilancio dello Stato a altri Enti/soggetti attuatori delle misure di intervento. Per erogazioni si fa riferimento alle risorse effettivamente spese per l'acquisto di beni o servizi oppure erogate ai beneficiari finali.

(1) Applicare riduzioni bilancio anno 2012 - FINTECNA è designata dal D.L. 39/2009 per istruire le richieste di privati relativi a finanziamenti finalizzati a fronteggiare i danni subiti su abitazioni private. In particolare FINTECNA può a richiesta subentrare nella proprietà di immobili andati distrutti gravati da mutui ipotecari preesistenti al sisma, con accollo del debito residuo fino a 150.000 euro.

(2) Riguardo ai trasferimenti ai soggetti attuatori, a valore sugli importi assegnati a finalità diverse da ricostruzione edilizia privata, opere pubbliche e sviluppo del territorio, si è in grado di seguire i flussi finanziari complessivi al netto delle seguenti assegnazioni:

- D.L. 225/2010, art. 2, comma 3-otties (L. n. 10/2011): bonifica del sito di Bussi sul Tirino, per 50,0 meuro;
- D.L. 225/2010, art. 2, comma 3-quinquies (L. n. 10/2011): proroga dei termini per i gruppi industriali, per 2,5 meuro;
- D.L. 5/2012, art. 31-bis: istituzione del Gran Sasso Science Institute, per 18,0 meuro;
- D.L. 95/2012, art. 23, comma 12-suppl. (L. 135/2012): smaltimento dei rifiuti nei comuni di L'Aquila, del cratere abruzzese e fuori cratere, per 35,0 meuro;
- L. 228/2012 (LS 2013), comma 417: proroga dei contratti a tempo determinato, per 1,5 meuro.

NB: Il monitoraggio, disposto ai sensi del DM MEF del 29 ottobre 2012, sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione degli immobili pubblici e degli immobili privati ha finora riguardato le seguenti voci del presente prospetto, evidenziate in giallo (opere pubbliche) e in turchese (edilizia privata): 1, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 28.

Le voci nn. 15 e 25 saranno sottoposte a monitoraggio in un secondo momento.

**Prospetto 2: OO.PP. - fonti di finanziamento, programmazione risorse / impegni,
erogazioni**
Migliaia di euro

Fonti di finanziamento	Stanziano / assegnato	Programmato / Impegnato	Trasferito ai sogg. att.	Erogato
DL 39/2009, art. 2, comma 13	700.000,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000
DL 39/2009, art. 8, comma 2	3.100,000	3.100,000	3.100,000	2.034,844
<i>Fondi propri degli enti attuatori</i>	8.369,940	8.369,940	8.369,940	2.766,233
DL 39/2009, art. 7, comma 1	229.986,032	223.486,000	229.986,032	222.806,800
DL 39/2009, art. 14, comma 5	6.681,253	2.766,052	6.624,519	2.168,692
<i>Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri</i>	16.379,350	16.379,350	16.379,350	7.644,261
<i>Fondo Europeo di Solidarietà</i>	226.201,700	226.201,700	226.201,700	221.315,000
DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE	814.339,681	376.998,700	263.975,822	82.390,760
DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT	408.500,000	383.843,800	240.590,984	73.327,410
DL 39/2009, art. 4, comma 4	226.421,450	126.311,600	226.421,450	51.609,320
DL 39/2009, art. 10, comma 5	3.000,000	0,000	3.000,000	0,000
Totale	2.642.979,406	2.067.457,142	1.924.649,797	1.366.063,320
<i>Di cui: a carico del bilancio dello Stato, stanziato per la ricostruzione</i>	<i>2.392.028,416</i>	<i>1.816.506,152</i>	<i>1.673.698,807</i>	<i>1.134.337,826</i>

Nota: segnalati in turchese le fonti di finanziamento non a carico del bilancio dello Stato, D.L. 39/2009

Prospetto 3a: Risorse stanziare per l'edilizia privata - stanziamenti pluriennali complessivi

Stanziamenti complessivi milioni di euro			Comune di L'Aquila		Altri comuni cratere		Comuni fuori cratere		Ass./Trasf. non risultanti da monitoraggio (*)	TOTALE	
			Assegnazioni	Trasferimenti	Assegnazioni	Trasferimenti	Assegnazioni	Trasferimenti		Assegnazioni(**)	Trasferimenti
D.L. 39/2009	art. 14, c.1, F.do Strat.	Del CIPE 95/2009	133,9	133,9	75	75	16	16	-	224,9	224,9
	art. 14, c.1, F.do Strat.	Del CIPE 43/2012	211	211	124	124	10	10	-	345	345
	art. 14, c.1, F.do Strat.	Del CIPE 135/2012	985	555,9	460	261	55	30	-	1.600	846,9
	art. 3, c. 3	Disponibilità attraverso C.DD.PP. (*)	1.623,2	1.623,2	154,2	154,2	70,8	70,8	151,8	2.000	2.000
D.L. 43/2013(§)	art. 7-bis	Del CIPE 50/2013	686,9	0	403,4	0	33,7	0	-	1.124	0
TOTALE (**)			3.640	2.524,0	1.218,6	614,2	185,5	126,8	151,8	5.194	3.417

(*) Il meccanismo di finanziamento attraverso Cassa DD.PP. prevede il trasferimento dell'intero importo del contributo da Cassa DD.PP. su c/c vincolati usufruibili dai privati presso le banche convenzionate. Le risorse sono successivamente erogate dalla banche ai beneficiari finali a fronte di presentazione di S.A.L. sui progetti di ristrutturazione edilizia approvati. A fronte di un plafond complessivo di 2 miliardi di euro le assegnazioni ai vari comuni sono determinate dalla concessione dei contributi da parte di questi ultimi o dal trasferimento delle risorse sui c/vincolati dei beneficiari.

I dati di monitoraggio hanno appurato un totale concesso dai comuni a valere su tale canale di finanziamento inferiore rispetto al plafond di 2 miliardi, sono in corso accantonamenti.

(**) Tiene conto degli arrotondamenti al milione di euro.

(*) Al netto dei contributi concessi con credito d'imposta.

(§) La legge di stabilità per il 2014 (L. 147/2013) rinfanzia gli interventi a valere sull'art. 7-bis del D.L. 43/2013 per 600 meuro (risp. 300 meuro per competenza e cassa nel 2014 e nel 2015). Poiché tali importi non sono ancora stati assegnati dal CIPE al territorio, essi non appaiono nel prospetto 3a. Inoltre, la citata legge stabilisce che "Il CIPE ... può destinare una quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie".

Prospetto 3b: Risorse stanziare per l'edilizia privata - risorse impegnabili entro il 2013 (succ. delibera CIPE n. 50/2013)

Stanziamenti complessivi milioni di euro			Comune di L'Aquila		Altri comuni cratere		Comuni fuori cratere		Ass./Trasf. non risultanti da monitoraggio (*)	TOTALE	
			Assegnazioni	Trasferimenti	Assegnazioni	Trasferimenti	Assegnazioni	Trasferimenti		Assegnazioni(**)	Trasferimenti
D.L. 39/2009	art. 14, c.1, F.do Strat.	Del CIPE 95/2009	133,9	133,9	75	75	16	16	-	224,9	224,9
	art. 14, c.1, F.do Strat.	Del CIPE 43/2012	211	211	124	124	10	10	-	345	345
	art. 14, c.1, F.do Strat.	Del CIPE 135/2012	827	555,9	270	261	40	30	-	1.137	846,9
	art. 3, c. 3	Disponibilità attraverso C.DD.PP. (*)	1.623,2	1.623,2	154,2	154,2	70,8	70,8	151,8	2.000	2.000
D.L. 43/2013	art. 7-bis	Del CIPE 50/2013	114,4	0	0	0	0	0	-	114,4	0
TOTALE (**)			2.909,5	2.624,0	623,2	614,2	136,6	126,8	151,8	3.821	3.417

Prospetto 4: Interventi sulle OO.PP.
Aprile 2009 - Ottobre 2013

	Risorse assegnate complessive D.L. 39/2009 e altre fonti (*)	Costo interventi programmati (CUP aperti)	Finanziamento opere programmate a carico delle risorse statali	Trasferimenti ai soggetti attuatori, da bil. Stato	Erogazioni	N. Interventi (CUP)	N. Interventi conclusi (coltando/chiusi)	% compl.to opere (**)
A) Interventi complessivi di costruzione/ricostruzione	2.642.979.406	2.067.457.142	1.816.506.152	1.673.698.807	1.366.063.320	707	375	68,6
A.1) di cui: Interventi del Dipartimento della protezione civile	1.138.768.100	1.138.768.100	917.453.100	917.453.100	1.138.768.100	3	3	100,0
A.2) di cui: al netto degli interventi del Dipartimento della protezione civile	1.504.211.306	928.689.042	899.053.052	756.245.707	227.295.220	704	372	30,2
B) Interventi di messa in sicurezza (stima)	320.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000	317	317	100

(*) Non comprendono le risorse assegnate ad ANAS e RFI per le infrastrutture di trasporto (300 meuro) e per gli investimenti immobiliari con finalità solidaristiche degli Enti previdenziali.

(**) Il completamento complessivo delle opere (%) è ponderato al costo dei singoli interventi.

Prospetto 5: Interventi sull'edilizia privata
Aprile 2009 - Ottobre 2013

	Risorse Impegnabili complessive(*)	Importo contributi concessi	Trasferimenti a soggetti attuatori	Erogazioni	N. interventi (CUP)	N. interventi conclusi
A.1) Comune di L'Aquila - canale C.DD.PP. (*)	1.623.175.000	1.623.175.000	1.623.175.000	nd	-	-
A.2) Comune di L'Aquila - canale diretto (**)	<u>1.285.381.734</u>	<u>1.405.763.000</u>	900.798.261	608.247.900	-	-
A.3) Comune di L'Aquila - credito d'imposta	1.426.139	1.426.139	-	-	-	-
A) Totale L'Aquila	2.910.982.873	3.030.364.139	2.523.973.261	nd	22.828	11.694
B.1) Altri comuni del cratere - canale C.DD.PP. (*)	154.182.500	154.182.500	154.182.500	nd	-	-
B.2) Altri comuni del cratere - canale diretto	468.400.000	262.610.600	460.000.000	129.542.000	-	-
B.3) Altri comuni del cratere - credito d'imposta	59.329	59.329	-	-	-	-
B) Totale altri comuni del cratere	622.641.829	417.449.600	614.182.500	nd	12.950	10.771
B.1) Comuni fuori cratere - canale C.DD.PP. (*)	70.827.400	70.827.400	70.827.400	nd	-	-
B.2) Comuni fuori cratere - canale diretto (***)	<u>66.000.000</u>	<u>76.261.210</u>	56.000.000	24.666.290	-	-
B.3) Comuni fuori cratere - credito d'imposta	199.908	199.908	-	-	-	-
B) Totale altri comuni del cratere (***)	137.027.308	147.288.518	126.827.400	nd	3.328	1.802
TOTALE(*)	3.670.652.010	3.595.102.157	3.264.983.161	762.456.190	39.101	24.267
Contributi concessi con canale C.DD.PP. non segnalati nel monitoraggio	151.815.100	151.815.100	151.815.100			
TOTALE comprensivo della differenza non segnalata sul canale C.DD.PP.	3.822.467.110	3.746.917.257	3.416.798.261			

(*) Non sono stati segnalati, nei dati di monitoraggio fra L'Aquila, altri comuni del cratere e comuni fuori cratere, circa 151 milioni di euro di contributi concessi sul canale C.DD.PP., che pure risultano concessi e accreditati nei c/c vincolati dei beneficiari, dalle segnalazioni degli Istituti di credito. Sono in corso accertamenti tramite documentata richiesta di informazioni alle banche convenzionate, per determinare a quali beneficiari si riferiscono i contributi non segnalati dagli USR. In quali comuni e con quale importo erogato.

(**) Il Comune di L'Aquila ha segnalato un importo di contributi su canale "diretto" superiore al totale delle assegnazioni ricevute e impegnabili nel 2013 per la ricostruzione privata (circa 1.286 meuro): la differenza è data da contributi "essenziali" dal Comune (istruttoria conclusa) e finanziabili a valere sulla competenza delle successive annualità.

(***) I comuni fuori cratere hanno concesso contributi per l'intera competenza impegnabile (66meuro), e hanno valutato positivamente (istruttoria conclusa) ulteriori 10,3meuro di contributi.

(*) Stanziamenti impegnabili dai comuni a seguito della delibera CIPE n. 50/2013, pubblicata in novembre.

**Tab. 1: Opere pubbliche, interventi programmati per fonte finanziaria
e soggetto attuatore**
Migliaia di euro

Fonti di finanziamento	Importo programmato	N. interventi	Di cui: soggetti attuatori	Di cui: programmato dai sogg. att.	Di cui: n. int.
DL 39/2009, art. 2, comma 13	700.000,000	1	DPC	700.000,000	1
DL 39/2009, art. 8, comma 2	3.100,000	1	Provveditorato OO.PP.	3.100,000	1
Fondi propri dell'ente	8.369,940	29	ATER	30,170	3
			Comuni Cratere	2.808,227	7
			Provveditorato OO.PP.	3.459,690	3
			Provincia L'Aquila	2.005,283	14
			REGIONE ABRUZZO	66,570	2
DL 39/2009, art. 7, comma 1	223.486,000	22	Comuni Cratere	6.032,907	20
			DPC	217.453,100	2
DL 39/2009, art. 14, comma 5	2.766,052	18	Comune di L'Aquila	120,135	1
			Comuni Cratere	1.311,022	13
			MiBAC	30,863	1
			Provveditorato OO.PP.	1.300,000	2
			Provincia L'Aquila	4,032	1
Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri	16.379,350	17	Comuni Cratere	123,927	3
			MiBAC	12.031,970	8
			Provveditorato OO.PP.	2.640,000	3
			Provincia L'Aquila	1.583,453	3
Fondo Europeo di Solidarietà	226.201,700	4	DPC	221.315,000	3
			Provincia L'Aquila	4.886,675	1

Fonti di finanziamento	Importo programmato	N. interventi	Di cui: soggetti attuatori	Di cui: programmato dai sogg. att.	Di cui: n. int.
DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE	376.977,300	469	ATER	66.133,931	254
			Commissario Fiume Aterno	4.800,000	1
			Comune di L'Aquila	4.385,650	7
			Comuni Cratere	17.016,360	42
			GSA SpA	80.052,780	1
			MIBAC	86.312,400	119
			Provveditorato OO.PP.	91.266,680	36
			Provincia L'Aquila	11.013,330	3
			Provincia Pescara	2.217,585	5
			REGIONE ABRUZZO	13.800,000	2
DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT	383.843,800	65	ATER	13,640	1
			Comuni Cratere	60,800	4
			Provveditorato OO.PP.	375.769,400	58
			Provincia L'Aquila	2.000,000	1
			REGIONE ABRUZZO	6.000,000	1
DL 39/2009, art. 4, comma 4	126.311,600	115	Comune di L'Aquila	11.127,680	4
			Comuni Cratere	31.299,440	31
			Provveditorato OO.PP.	30.673,000	65
			Provincia L'Aquila	53.211,510	15
Totale	2.067.457,000				

Tab 2: Statistiche di spesa per ente attuatore
Migliaia di euro

Ente attuatore	Costo interventi	Finanziato a carico bil. Stato	Erogato	Erogato/Costo (%)	(**)Completamento fisico (%)	N. interventi	N. int. completati
REGIONE ABRUZZO	19.866,570	19.800,000	14,994	0,1	0,1	3	1
Provincia L'Aquila	74.704,277	66.228,670	23.357,053	31,3	60,5	31	21
Provincia Pescara	2.217,585	2.217,585	0,000	0,0	0,0	5	0
Comune di L'Aquila	15.633,462	15.633,460	104,176	0,7	0,8	12	1
Comuni Cratere	58.652,679	55.720,530	11.350,868	19,4	18,9	110	38
DPC(*)	1.138.768,100	917.453,100	1.138.768,100	100,0	100,0	3	3
Provveditorato OO.PP.	508.208,780	502.109,100	145.098,420	28,6	32,9	158	57
MIBAC	98.375,236	86.343,260	22.669,954	23,0	23,6	128	71
GSA SpA	80.052,780	80.052,780	273,100	0,3	0,0	1	0
ATER	66.177,746	66.147,580	21.155,346	32,0	44,0	255	183
Commissario Aterno	4.800,000	4.800,000	3.271,301	68,2	85,0	1	0
Totale	2.067.457,215	1.816.506,265	1.366.063,312	66,1	68,6	707	375

(*) Dipartimento della protezione civile.

(**) Media ponderata per il costo degli interventi.

Tab 3: Statistiche complessive di spesa per stato di attuazione degli interventi
Migliaia di euro

Stato attuazione	Costo interventi	Finanziato a carico bil. Stato	Erogato	Erogato/Costo (%)	N. interventi
Programmazione	102.431,100	101.759,100	136,357	0,1	45
Progettazione	435.148,300	420.322,200	6.865,910	1,6	131
Attuazione	246.270,400	241.978,900	105.321,500	42,8	156
Collaudo	417.450,200	309.280,600	394.118,900	94,4	76
Intervento concluso	866.157,200	743.165,500	859.620,600	99,2	299
Totale	2.067.457,200	1.816.506,300	1.366.063,267	66,1	707

Comune di L'Aquila

Tab 4: Ricostruzione privata, dati di sintesi - Comune di L'Aquila
Importi in migliaia di euro

	Dati al 31 ott 2013	Dati al 30 giu 2013	Differenza(*)
N. contributi concessi	22.826	22.066	760
di cui: n. interventi conclusi	11.694	11.243	451
Contributi concessi	3.030.364,000	2.448.010,388	582.353,632
di cui: canale diretto	1.405.763,000	820.604,209	585.158,791
di cui: canale C.D.P.	1.623.175,000	1.624.372,845	-1.197,845
di cui: credito d'imposta	1.426,139	3.033,304	-1.607,165
Erogato su canale diretto	608.247,900	228.367,613	379.880,287

(*) Importi negativi evidenziano una revisione al ribasso dei dati complessivi segnalati da USRA.

Tab 5: Ricostruzione privata - Comune di L'Aquila
Importi in migliaia di euro

Stato avanzamento	Contributi concessi	di cui: canale diretto	di cui: canale C.D.P.	di cui: credito d'imposta	Erogato su canale diretto	N. contributi
Interventi in corso	2.645.721,000	1.231.724,000	1.412.571,000	1.426,139	441.218,500	11.132
Interventi conclusi	384.643,600	174.039,500	210.604,200	0,000	167.029,500	11.694
Totale	3.030.364,000	1.405.763,000	1.623.175,000	1.426,139	608.247,900	22.826


Tab 6: Interventi complessivi, analisi per tipologia di danno
Importi in migliaia di euro

Esito agibilità	Concesso	Concesso "diretto"	Erogato "diretto"	N. contributi (**)	Costo unitario
A	69.575,110	69.575,110	65.502,420	7.353	9,462
B	481.102,400	76.761,360	59.620,050	8.541	56,329
C	72.460,690	12.683,520	8.279,050	1.073	67,531
E	2.347.822,000	1.188.519,000	462.837,000	5.775	406,549
Z(*)	8.420,289	8.317,000	8.410,068	73	115,346
Totale (**)	2.979.380,000	1.355.856,000	604.648,600	22.816	130,589

(*) Il codice "Z" sta per immobili privati in corso di costruzione alla data del sisma.

(**) Per 11 interventi, l'USRA non ha valorizzato l'esito di agibilità, per cui il totale risulta al netto di tali importi.

Fig. 2: Contributi per la ricostruzione privata nel Comune de L'Aquila
Dati cumulati nel tempo

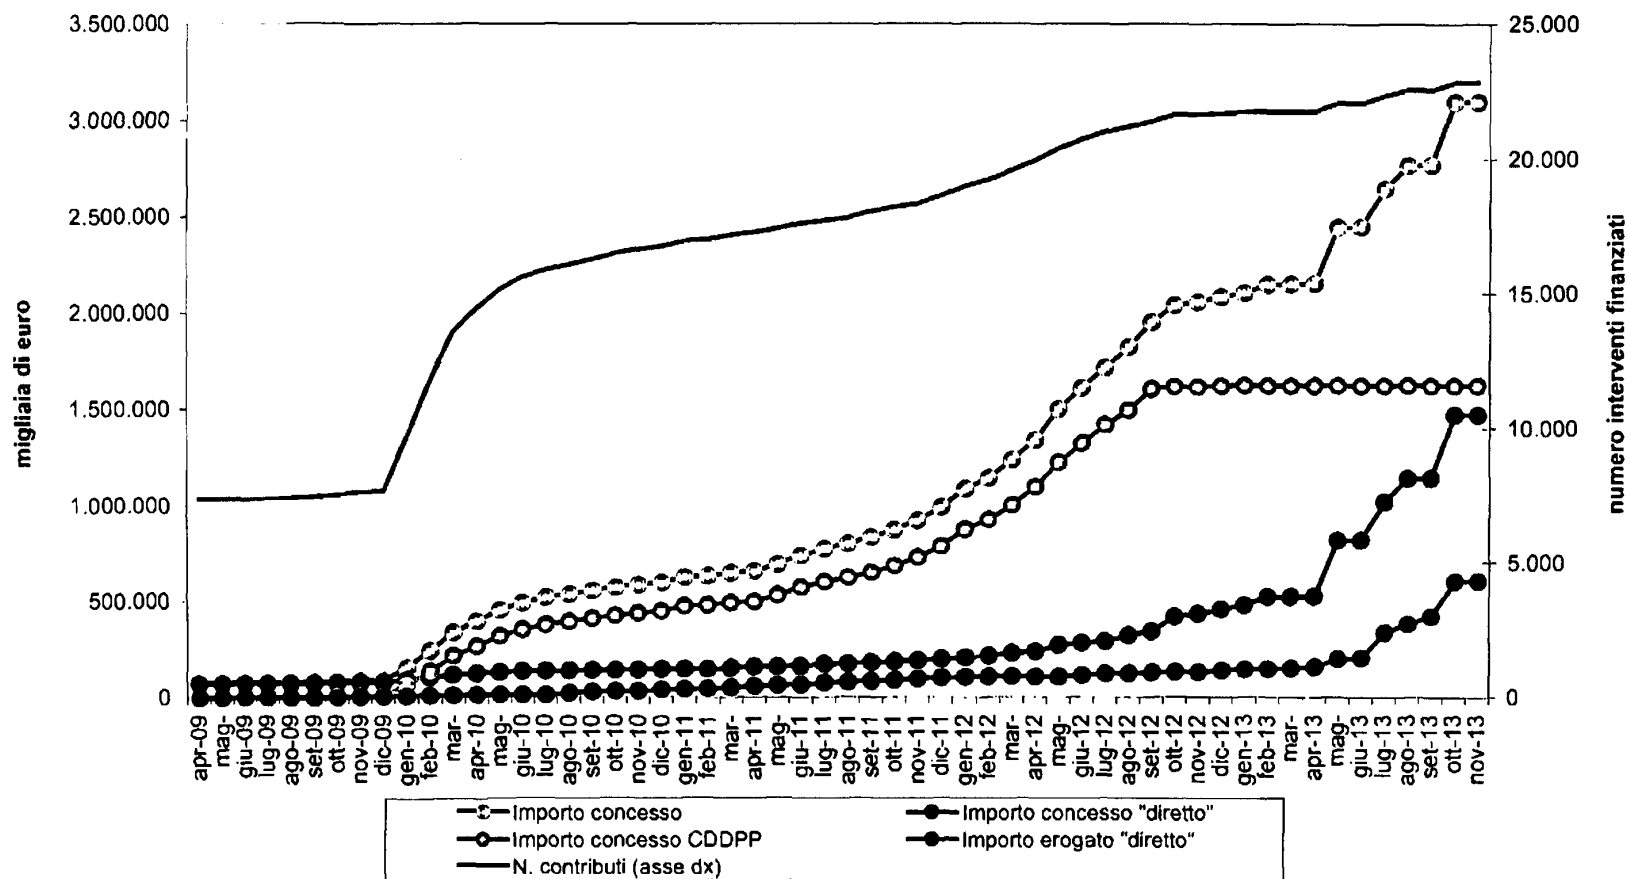

Comune di L'Aquila

Tab 7a: Interventi non ancora conclusi, analisi per tipologia di danno
Importi in migliaia di euro

Esito agibilità	Concesso	Concesso "diretto"	Erogato "diretto"	N. contributi	Costo unitario
A	4.367,881	4.367,881	477,488	406	10,758
B	324.279,200	39.720,280	22.910,330	5.100	63,584
C	49.840,670	7.065,452	2.678,347	633	78,737
E	2.216.249,000	1.130.683,000	411.553,000	4.982	444,851
Totale	2.594.736,000	1.181.817,000	437.819,100	11.121	233,319

(*) Il codice "Z" sta per immobili privati in corso di costruzione alla data del sisma.

(**) Per 11 interventi, l'USRA non ha valorizzato l'esito di agibilità, per cui il totale risulta al netto di tali importi.

Tab 7b: Interventi conclusi, analisi per tipologia di danno
Importi in migliaia di euro

Esito agibilità	Concesso	Concesso "diretto"	Erogato "diretto"	N. contributi	Costo unitario
A	65.207,230	65.207,230	65.024,930	6.947	9,386
B	156.823,200	37.041,080	36.709,730	3.441	45,575
C	22.620,020	5.818,070	5.600,703	440	51,409
E	131.572,900	57.856,110	51.284,030	793	165,918
Z(*)	8.420,289	8.317,000	8.410,088	73	115,346
Totale	384.643,600	174.839,500	167.029,500	11.694	32,892

(*) Il codice "Z" sta per immobili privati in corso di costruzione alla data del sisma.

(**) Per 11 interventi, l'USRA non ha valorizzato l'esito di agibilità, per cui il totale risulta al netto di tali importi.

Tab 8: Interventi su immobili "E", costo unitario interventi per anno
Importi in migliaia di euro

Anno concessione contributo	Unità immobiliari abitazioni principali			Parti comuni e pratiche ex DPCM 04/02/2013		
	Concesso	N. contributi	Costo unitario	Concesso	N. contributi	Costo unitario
2009	-	-	-	1.836,645	1	1.836,645
2010	17.369,750	329	52,796	17.044,150	41	415,711
2011	92.407,030	1.036	89,196	247.785,200	227	1.091,565
2012	189.296,500	1.915	98,849	869.868,000	550	1.581,215
2013	82.670,550	565	146,674	799.436,000	349	2.290,648
Totale	381.943,800	3.845	99,335	1.936.770,000	1.168	1.657,337

Tab 9: Durata interventi conclusi
Data ultima erogazione (segnalata, canale diretto) - Data concessione contributo

Esito agibilità	Durata interventi conclusi (gg)	N. interventi (campione)
A	119	15
B	639	1.318
C	669	191
E	353	338
Z	65	73
Totale	437	1.935

Nota: non si è tenuto conto dei contributi con data di concessione "fittizia" 06-04-2009, per cui il numero di interventi conclusi è inferiore al totale

Nota: sono stati, perimenti, esclusi, gli interventi segnalati come conclusi, ma con un importo erogato con "canale diretto" pari a 0.

Altri comuni del cratere e fuori cratere

Tab 10: Ricostruzione privata, dati di sintesi

Altri comuni del cratere e fuori cratere

Importi in migliaia di euro

	Altri comuni del cratere	Comuni fuori cratere(*)	Totale
N. contributi concessi	12.950	3.325	16.275
di cui: n. interventi conclusi	10.771	1.802	12.573
Contributi concessi	417.449,500	147.288,500	564.738,000
di cui: canale diretto	262.610,600	76.261,210	338.871,810
di cui: canale C.D.P.	154.182,500	70.827,400	225.009,900
di cui: credito d'imposta	59,329	199,908	259,237
Erogato su canale diretto	129.542,000	24.666,290	154.208,290

(*) L'USRC ha effettuato talune segnalazioni non coerenti fra totale concesso e somma dei singoli canali di finanziamento: complessivamente la differenza meno di 1 meuro in meno a carico della somma dei dati parziali, rispetto al totale concesso nei comuni del cratere.

Tab 11: Altri comuni del cratere - interventi conclusi/in corso


Importi in migliaia di euro

Stato avanzamento	Contributi concessi	di cui: canale diretto	di cui: canale C.D.P.	Erogato su canale diretto	N. contributi
Interventi in corso	252.630,200	163.034,600	99.406,920	23.357,240	2.179
Interventi conclusi	164.819,300	109.575,900	54.775,810	108.184,800	10.771
Totale	417.449,500	262.610,600	154.182,500	129.542,000	12.950

Tab 12: Altri comuni del cratere - analisi per tipologia di danno

Importi in migliaia di euro

Esito agibilità	Concesso	di cui: canale diretto	Erogato su canale diretto	N. contributi	Costo unitario
A	84.178,070	84.178,170	78.914,650	9.813	8,578
B	104.658,700	47.468,090	23.866,970	1.926	54,340
C	20.502,400	8.518,425	5.342,438	359	57,110
E	208.110,400	122.447,900	21.417,980	852	244,261
Totale	417.449,500	262.610,600	129.542,000	12.950	32,235

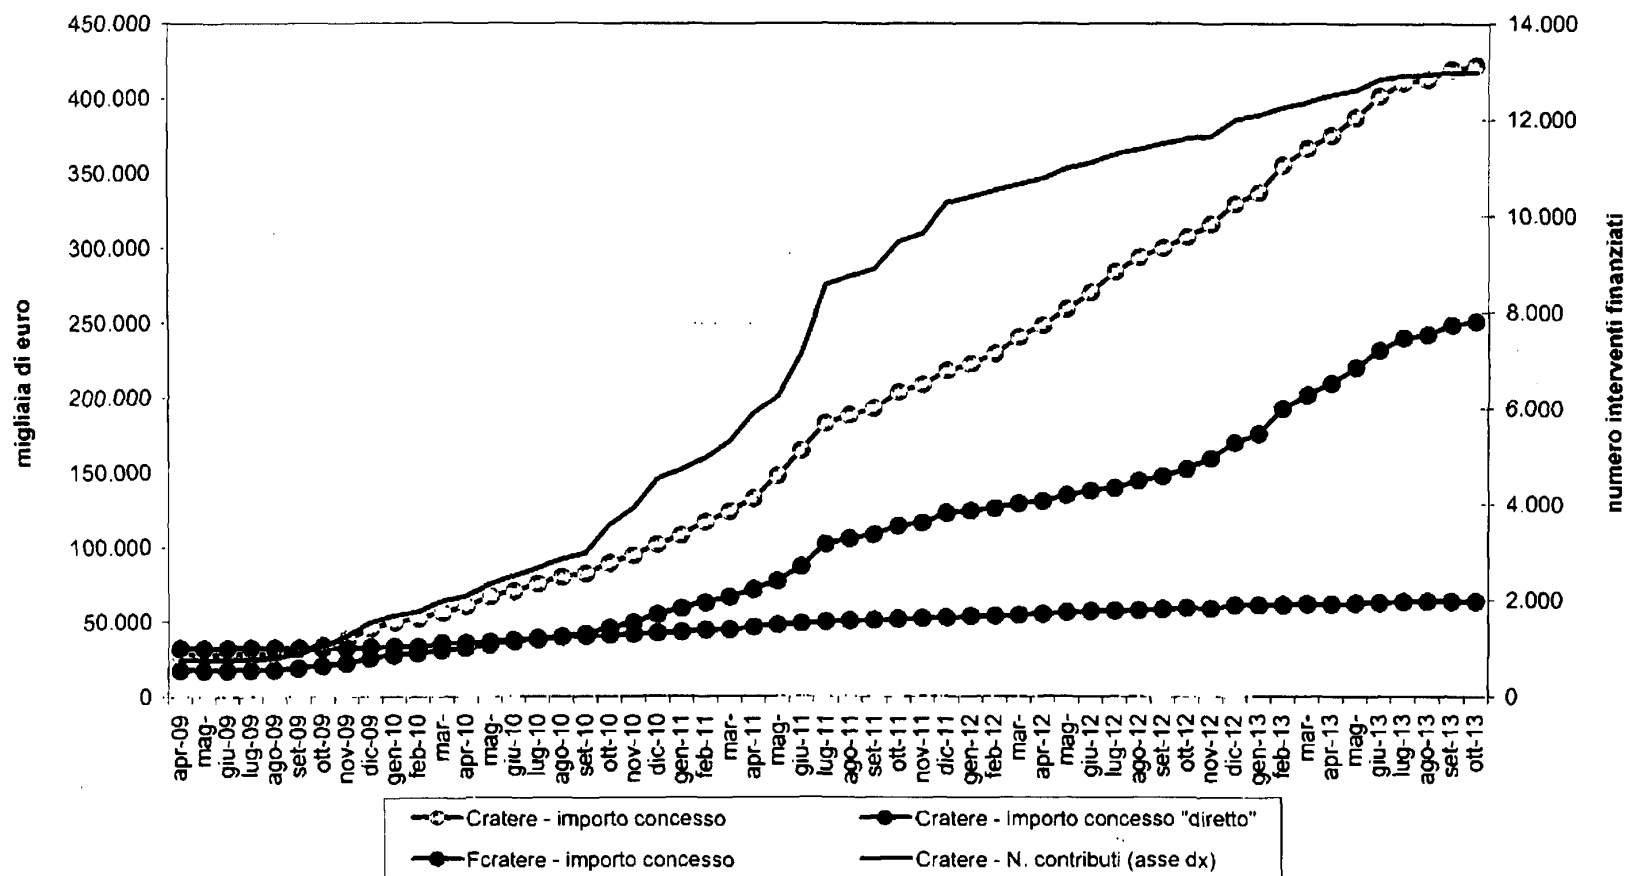Fig. 3: Contributi per la ricostruzione privata negli altri comuni del cratere e fuori cratere*Dati cumulati nel tempo*

Altri comuni del cratere**Tab 13a: Interventi non ancora conclusi, analisi per tipologia di danno***Importi in migliaia di euro*

Esito agibilità	Concesso	Concesso "diretto"	Erogato "diretto"	N. contributi	Costo unitario
A	5.117,340	5.117,340	199,687	572	8,946
B	48.037,590	25.458,900	4.303,348	747	64,307
C	8.070,983	3.328,426	619,611	132	61,144
E	191.404,300	119.130,000	18.234,600	728	262,918
Totale	252.630,200	153.034,600	23.357,240	2.179	115,939

Tab 13b: Interventi conclusi, analisi per tipologia di danno*Importi in migliaia di euro*

Esito agibilità	Concesso	Concesso "diretto"	Erogato "diretto"	N. contributi	Costo unitario
A	79.060,730	79.058,830	78.714,970	9.241	8,555
B	56.621,070	22.009,200	19.563,630	1.179	48,025
C	12.431,420	5.189,999	4.722,827	227	54,764
E	16.706,110	3.317,886	3.183,383	124	134,727
Totale	164.819,300	109.575,900	106.184,800	10.771	15,302

Tab 14: Interventi su immobili "E", costo unitario interventi per anno*Importi in migliaia di euro*

Anno concessione contributo	Concesso	N. contributi	Costo unitario
2009	790,848	8	98,856
2010	7.764,803	65	119,459
2011	35.342,190	158	223,685
2012	80.938,660	291	278,140
2013	72.410,840	306	236,637
Totale	197.247,300	828	238,221

Nota: in 69 casi l'USRC non ha segnalato la data di concessione del contributo. Il Totale risulta al netto di tali contributi.

Fig. 1: Interventi sulle OO.PP. finanziati per la ricostruzione del "cratere abruzzese"*Dati cumulati nel tempo*
