

- ✓ **22.01.2018 riunione istituzionale presso Reg. Lazio** Capo di Gabinetto per coordinare le attività dei siti Laziali (presenti: ViceD. Arpa Cintoli, Assessore Reg. Lazio, Capo di Gab. Reg. Lazio, Comm.rio Straordinario, Cap. Fusco, Funzionario Reg. Lazio Monaco)
- ✓ **31.01.2018 Riunione con Reg. Lazio** per sviluppo tematica relativa ai fondi e alle azioni da intraprendere
- ✓ **31.01.2018 Riscontri di laboratorio ARPA** “*destinazione d’uso zona agricola – le concentrazioni riscontrate sono oltre i limiti normativi (idrocarburi)*” + “*destinazione d’uso zona commerciale ed industriale in linea generale non sono state riscontrate concentrazioni significative, solamente per il campione NRG 17315 mostra concentrazioni oltre i limiti per il parametro C<12*”
- ✓ **01.02.2018** risposta ARPA sui superamenti e sollecito Ditta sulle analisi;
- ✓ **20.02.2018** lettera di sollecito ditta SETIN su risultanze analisi dei campionamenti;
- ✓ **15.03.2018** Roma - riunione per studio, in contraddittorio, operativo-pratico sulle analisi dei campioni prelevati in data 14 e 15 nov. (tavolo congiunto Arpa-Comune-Regione- Cnr-Ditta Setin), da cui è mersa la necessità di ulteriore analisi da parte di ARPA delle risultanze alla luce della destinazione d’uso corretta del sito (D1 industriale). Si è inoltre deciso di ampliare gli scavi (oltre a quelli già eseguiti che coprono un 50% dell’area) per avere un quadro più completo dei rifiuti interrati nella discarica. Si stabilito di dare mandato alla ditta di avviare a smaltimento il rifiuto emerso e di iniziare i nuovi lavori di scavo. Si è rimodulato il Quadro Economico alla luce delle nuove lavorazioni.
- ✓ **29.03.2018** riunione operativa per l’analisi, in contraddittorio, delle risultanze dello studio di ARPA Lazio sugli esiti ottenuti dalla ditta Setin sui campioni prelevati.
- ✓ **30.03.2018** Roma - si stabilisce, in sede di conferenza dei servizi, di procedere con ulteriori campionamenti (*A- area a sx del sito, in prossimità del lato sx del perimetro, alla base del muro (per un area larga circa 3x6); B- in un area centrale intorno piezometro (già precedentemente installato), lasciando comunque 2mt di raggio intorno ad esso; D – all’ingresso del sito di discarica, ma solo dopo aver effettuato i precedenti, in modo tale da permettere ai veicoli di poter entrare-effettuare (rinnovare) il campionamento tramite il piezometro centrale, in modo da poter determinare se vi siano superamenti in falda.*) Si concorda di, già rimossi gli eventuali rifiuti portati in evidenza, rinterrare le buche che non hanno presentato superamenti. Si ingiunge al Comune di dare l’avvio alla ricopertura degli scavi e predisporre il cronoprogramma delle attività che tassativamente disciplinerà, entro il mercoledì 25 aprile, l’esecuzione dei campionamenti concordati.
- ✓ **16.04.2018 Roma** - si autorizzano i lavori di scavo e campionamento precedentemente concordati: il cronoprogramma delle attività stima la chiusura e rinterramento delle buche a partire dal giorno 23 aprile e la realizzazione delle nuove trincee a partire dal giorno 27 aprile.
- ✓ **28.05.2018** Roma – Incontro con il Prefetto per uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti, rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche da porre in essere.
- ✓ **26.04.2018 e 02.05.2018** in sito - Effettuati prelievi sulle nuove buche scavate per comprendere meglio la “geofisica” e lo stato del sito, come disposizioni suggerite da arpa (in riunione del 16.04 u.s.)
- ✓ **09.05.2018 e 15.05.2018 Roma** - Effettuata in contraddittorio apertura dei campioni prelevati al fine di verificarne le composizioni per uno studio dettagliato della caratterizzazione del sito. (si resta in attesa dei risultati sollecitati **entro metà giugno**).
- ✓ **19.06.2018 Roma** - convocata riunione tecnica al fine di discutere delle risultanze delle analisi sui campioni prelevati.

## SHEDA GEOGRAFICA

### RIANO (RM) Località Cava Piana Perina



## Riano

Comune italiano



Riano è un comune italiano di 10.587 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale nel Lazio. Gli storici non sono tutti d'accordo sull'origine del nome Riano: alcuni ritengono che derivi dal latino "rivus" per via dei numerosi ruscelli che scorrevano nel suo territorio, ma il Ricci nella " *Storia di Castelnuovo e Paesi Vicini*" scrive che nelle bolle imperiali e cassinesi, Riano è chiamata Raianum e Ragianum, in quelle portuensi Rascianum. Infatti Ruscia era l'antico nome della Serbia, e la regione di Rasciano (una parte anche nel territorio di Riano) era stata una colonia delle regioni illiriche o dalmate. Il nome rasciano può anche essere la corruzione del nome Raianum.


**Provincia:** Roma

**Coordinate:** 42°05'28"N 12°31'22"E **Area:** collinare urbana **Altitudine:** 125 m s.l.m. **Superficie:** 25,43 km2

**Densità ab.:** 416,32 ab./km2 **Frazioni:** Belvedere, Colle delle Rose, Colle Romano, La Rosta

**Classificazione sismica:** zona 3° (rischio basso) **Aree Naturali limitrofe:** Parco Regionale di Veio.

**Territorio:** Riano è situato su un rialzo tufaceo, a 125 m s.l.m. di altezza. Il territorio, con i suoi 25,35 km², comprende anche una parte del Parco Regionale di Veio. Il comune ha una buona visuale del fiume Tevere, che per un breve tratto ne segna il confine. Confina con Castelnuovo di Porto a Nord, con Monterotondo ad Est, a Sud con Roma, e con Sacrofano ad ovest. I colli di Riano si sono formati per le eruzioni della era vulcanica durata trentamila anni ed iniziata alla fine del quaternario inferiore: il cratere del vulcano estinto forma il Prato di Santa Pace. Nel territorio di Riano sono presenti alcuni minerali di poco pregio: il più abbondante è il tufo, ci sono due miniere di pomice e una di caolino.

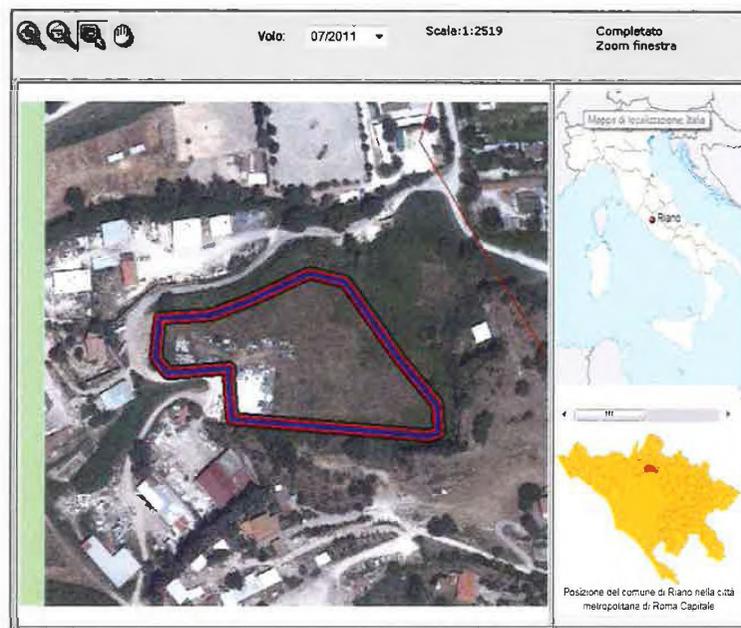

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti

<b>Progressivo oggetto:</b>	4612		
<b>Regione :</b>	LAZIO	<b>Provincia :</b>	ROMA
<b>Comune :</b>	RIANO	<b>Località :</b>	Piana Perina
<b>Coordinate UTM Est :</b>	297502	<b>Coordinate UTM Nord :</b>	4662840

Dati primari del sito

**Tipologia di sito :** Discarica (secondo normativa vigente)

**Data dei sopralluoghi :** 13/09/2017, 14/11/2017, 12/01/2018.

**Come raggiungere il sito:** Dalla S.P. 6/C al Km 7,350 si svolta su via di Piana Perina, percorsi 200 m si svolta a sinistra, dopo 100 m si va a destra ed infine dopo 300 m ci si trova di fronte al sito recintato.

**SCHEDA OPERATIVA****Regione: LAZIO****Titolo intervento: Trevi nel Lazio (FR) – località Carpineto**

1	Titolo e tipologia discarica	Trevi nel Lazio (FR) Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU)
2	Copertura finanziaria	Copertura finanziaria Regione Lazio
3	Oggetto dell'intervento	Messa in sicurezza Permanente
4	Localizzazione intervento	Località Carpineto
5	Stato dell'intervento	Effettuata Analisi di rischio Effettuata Caratterizzazione Effettuata MISE con Capping
6	Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)	Progetto di messa in sicurezza - bonifica: da redigere
7	Risultati attesi	MISP
8	Indicatori di realizzazione e risultato	/
9	Modalità previste per l'attivazione del cantiere (procedure di affidamento lavori/servizi)	<input type="checkbox"/> Affidamento dell'esecuzione intervento allo studio geologo Mancini di Roma
10	Progettazione disponibile per l'avvio dell'affidamento	Progetto di caratterizzazione
11	Soggetto attuatore	Comune di Trevi
12	Responsabile del procedimento (RUP)	Ing Domenico Saviotti
13	Supporto tecnico richiesto	Consulenza tecnica, giuridica e finanziaria
	<b>ESPUNZIONE PREVISTA</b>	<b>VIII semestralità - Dicembre 2018</b>

**CRONOSTORIA ATTIVITA':**

- ✓ **05.09.2017** proposta in espunzione dal MATTM ma respinta dalla Commissione UE con questa motivazione: *“La documentazione d'appoggio (determinazione del Comune n. 130/48 del 31.05.2017) descrive una serie di interventi attuati per mettere in sicurezza il sito e consistenti nell'installazione di una copertura definitiva, nella recinzione dell'area, nella creazione di un sistema di raccolta dell'acqua piovana e nella costruzione di un pozzo di raccolta del percolato periodicamente controllato e svuotato. Tuttavia fin dalle premesse non è chiaro se siano state effettuate analisi allo scopo di accertare se il sito sia stato contaminato dai rifiuti, di quale natura sia tale contaminazione e quali misure Sarebbero necessarie ed appropriate dato il tipo di contaminazione accertata. Anche il monitoraggio successivo agli interventi realizzati dovrebbe essere adeguato al tipo di contaminazione riscontrata nel sito. Nel caso di specie, tale monitoraggio, non risulta essere completamente affidabile, in quanto prende in esame solo una matrice (acqua) e non considera la contaminazione del suolo che dovrebbe comunque essere presa in considerazione data la presenza dei rifiuti nel sito. Pertanto la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento de requisito iii). La penalità è dunque dovuta per questo sito.”*
- ✓ **18.09.2017** Squadra sopralluoghi: effettuati rilievi fotografici al fine di redigere il fascicolo informativo della discarica, intrapresi contatti info-investigativi ed eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Filettino (FR).
- ✓ **11.01.2018** Effettuata riunione (conferenza dei servizi) per Approvare il PIANO DI CARATTERIZZAZIONE)
- ✓ **20.01.2018** In attesa delle note di correzione da parte di ARPA LAZIO al piano di caratterizzazione proposto
- ✓ **22.01.2018** riunione istituzionale presso Reg. Lazio Capo di Gabinetto dott. Baldanza per coordinare le attività dei siti Laziali (presenti: ViceD. Arpa Cintoli, Assessore Reg.Lazio, Capo di Gab. Reg. Lazio, Comm.rio Straordinario, Cap. Fusco, Funzionario Reg. Lazio Monaco)
- ✓ **22.01.2018** trasmissione *“note tecniche di perfezionamento”* presentate da Arpa, al fine di poter formulare da parte del COMUNE la relativa istanza finanziaria agli appositi uffici della Regione Lazio **per dar avvio, quanto prima, alle attività di caratterizzazione dei siti. (f.n. 4/7-21 del 22.01.2018)**
- ✓ **09.02.2018** acquisita documentazione per analisi info-investigativa del contesto operativo
- ✓ **21.02.2018** sollecito al comune di TREVÌ di quanto richiesto f.n. 4/7-21 del 22.01.2018
- ✓ **13.03.2018** Roma - riunione operativa ai fini di accelerare le tempistiche dell'esecuzione del PDC – si sono stabilite le tempistiche operative e visionato il progetto da porre a base di gara (procedura accelerata ristretta superiore a € 75.000 per singola discarica comprensiva di analisi dei campioni e lavorazioni)
- ✓ **14.03.2018** riunione operativa per determinare la copertura finanziaria (Reg. Lazio) al fine di procedere a gara del PDC
- ✓ **19.03.2018** sopralluogo operativo sulle discariche al fine di verificare lo stato dell'arte.
- ✓ **27.03.2018** Roma - riunione con Comune e Regione Lazio per analisi e approvazione Quadro Economico.
- ✓ **10.04.2018** il Comune sta espletando la gara per dare l'affidamento a ditta che esegua ulteriori campionamenti anche verificando la falda, così come concordato in conferenza dei servizi del 14.03 us.

- ✓ **28.05.2018** richiesta di approvazione del Quadro Tecnico Economico (QTE) formulato dai tecnici del comune al fine di effettuare le lavorazioni sulle discariche (Carpinetto e Casette) sulle prescrizioni fornite da Arpa Lazio.
- ✓ **29.05.2018 Roma – riunione tecnica** al fine di valutare le condotte operative alla luce dei risultati degli ulteriori campionamenti effettuati. La riunione vuole indirizzare, in senso collegiale, le attività al fine di portare, entro la prossima semestralità (dicembre 2018), il sito in espunzione. Vengono verificati i risultati delle analisi sui campioni, da cui si evince un leggero superamento (riferito al parametro piombo), si ritiene, collettivamente, che tale superamento sia ininfluenza visti i limiti dei parametri di riferimento. Vengono consegnati, da parte di Arpa al Comune, per le vie brevi, i rapporti di prova relativi alle aliquote dei campioni: P6 C2/A (NRG 9011) - P5 C2/A (NRG 912) - S6 C3/A (NRG 905) - S6 C2/A (NRG 904) - Si è disposto che Arpa rediga, **entro fine giugno, la relativa analisi di rischio (ADR) al fine di discuterne in conferenza dei servizi nella riunione fissata per il 03 luglio p.v.** Da tale conferenza potrebbe emergere la conclusione dei procedimenti di bonifica/messa in sicurezza del sito, in relazione ai lievi superamenti ottenuti, con la conseguente richiesta di espunzione del sito stesso dalla procedura di infrazione Europea.

## SCHEMA GEOGRAFICA

TREVI NEL LAZIO (FR)  
Località Carpineto

## Trevi nel Lazio

Comune italiano




Trevi nel Lazio è un comune italiano di 1 790 abitanti nella "ciociara" laziale.

**Provincia:** Frosinone

**Coordinate:** 41°51' 50"N 13°15'E **Altitudine:** 821 m s.l.m. **Superficie:** 54,13 km<sup>2</sup> **area:** altipiano appenninico, **Densità ab.:** 32,59 ab./km<sup>2</sup> **Frazioni:** altipiani di Arcinazzo **Classificazione sismica:** zona 2 B (rischio medio) **Aree Naturali limitrofe:** parco dei Monti Simbruini e parte della comunità montana dei Monti Ernici

**Territorio:** Si trova nell'alta valle del fiume Aniene che qui forma le caratteristiche Cascate di Trevi. Il territorio comunale si trova a cavallo tra i monti Simbruini a nord ed i monti Ernici a sud. Nel riordino amministrativo di papa Pio VII nel 1816, entrò a far parte della delegazione di Frosinone e all'interno di questa fu sottoposto al governatore di Guarcino. Dopo la scomparsa dello Stato Pontificio nel 1870 entrò a far parte del Regno d'Italia, nel circondario di Frosinone della provincia di Roma. Nel 1872 il consiglio comunale decise per la denominazione di Trevi nel Lazio. Nel 1927 entrò a far parte della allora istituita provincia di Frosinone. La città fu colpita nel 1915 dal terremoto della Marsica

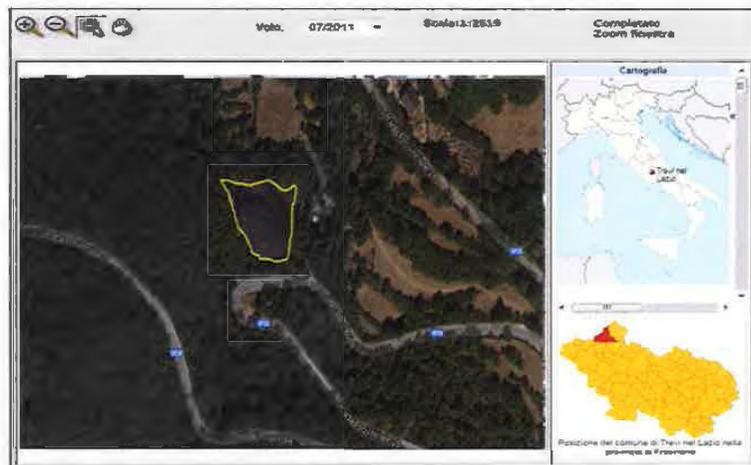

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti

<b>Progressivo oggetto:</b>	461	<b>Provincia :</b>	ROMA
<b>Regione :</b>	LAZIO	<b>Località :</b>	Carpineto
<b>Comune :</b>	Trevi	<b>Coordinate UTM Nord :</b>	41 854040
<b>Coordinate UTM Est :</b>	13 223547		

Dati primari del sito

**Tipologia di sito :** Discarica (secondo normativa vigente)

**Data dei sopralluoghi:** 18.09.2017

**Come raggiungere il sito:** Dall'altipiano di Arcinazzo, procedere in direzione ovest e prendere la SP 28 verso via delle stelle alpine, percorrerla per circa 3,5 KM il sito si trova sulla destra.

**SCHEMA OPERATIVA****Regione: LAZIO****Titolo intervento: Trevi nel Lazio (FR) – località Casette Caponi****CUP: /**

<b>1</b>	Titolo e tipologia discarica	<b>Trevi nel Lazio (FR)</b> <b>Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU)</b>
<b>2</b>	Copertura finanziaria	<b>Copertura finanziaria Regione Lazio</b>
<b>3</b>	Oggetto dell'intervento	<b>Messa in sicurezza Permanente</b>
<b>4</b>	Localizzazione intervento	<b>Località Casette Caponi</b>
<b>5</b>	Stato dell'intervento	Effettuata Analisi di rischio Effettuata Caratterizzazione Effettuata MISE con Capping In itinere ulteriori campionamento su proposta ARPA
<b>6</b>	Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)	Ulteriori campionamenti per escludere contaminazioni anche della falda
<b>7</b>	Risultati attesi	<b>MISP</b>
<b>8</b>	Indicatori di realizzazione e risultato	/
<b>9</b>	Modalità previste per l'attivazione del cantiere (procedure di affidamento lavori/servizi)	<b>Affidamento dell'esecuzione intervento allo studio geologo Mancini di Roma</b>
<b>10</b>	Progettazione disponibile per l'avvio dell'affidamento	<b>Progetto di caratterizzazione</b>
<b>11</b>	Soggetto attuatore	<b>Comune di Trevi</b>
<b>12</b>	Responsabile del procedimento (RUP)	<b>Ing Domenico Saviotti</b>
<b>13</b>	Supporto tecnico richiesto	<b>Consulenza tecnica, giuridica e finanziaria</b>
	<b>ESPUNZIONE PREVISTA</b>	<b>VIII semestralità - DICEMBRE 2018</b>

**CRONOSTORIA ATTIVITA':**

- ✓ **18.09.2017** Squadra sopralluoghi: effettuati rilievi fotografici al fine di redigere il fascicolo informativo della discarica, intrapresi contatti info-investigativi ed eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Filettino (FR).
- ✓ **11.01.2018** Effettuata riunione (conferenza dei servizi) per Approvare il PIANO DI CARATTERIZZAZIONE dello studio Geom. )
- ✓ **20.01.2018** In attesa delle note di correzione da parte di ARPA LAZIO al piano di caratterizzazione proposto
- ✓ **22.01.2018** riunione istituzionale presso Reg. Lazio Capo di Gabinetto dott. Baldanza per coordinare le attività dei siti Laziali (presenti: ViceD. Arpa Cintoli, Assessore Reg. Lazio, Capo di Gab. Reg. Lazio, Comm.rio Straordinario, Cap. Fusco, Funzionario Reg. Lazio Monaco)
- ✓ **22.01.2018** trasmissione "note tecniche di perfezionamento" presentate da Arpa, al fine di poter formulare da parte del COMUNE la relativa istanza finanziaria agli appositi uffici della Regione Lazio per dar avvio, quanto prima, alle attività di caratterizzazione dei siti. (f.n. 4/7-21 del 22.01.2018)
- ✓ **09.02.2018** acquisita documentazione per analisi info-investigativa del contesto operativo
- ✓ **21.02.2018** sollecito al comune di TREVI di quanto richiesto f.n. 4/7-21 del 22.01.2018
- ✓ **13.03.2018** riunione operativa ai fini di accelerare le tempistiche dell'esecuzione del PDC – si sono stabilite le tempistiche operative e visionato il progetto da porre a base di gara (procedura accelerata ristretta superiore a € 75.000 per singola discarica comprensiva di analisi dei campioni e lavorazioni)
- ✓ **14.03.2018** riunione operativa per determinare la copertura finanziaria (Reg. Lazio) al fine di procedere a gara del PDC
- ✓ **19.03.2018** sopralluogo operativo sulle discariche al fine di verificare lo stato dell'arte.
- ✓ **27.03.2018** Roma - riunione con Comune e Regione Lazio per analisi e approvazione Quadro Economico.
- ✓ **10.04.2018** il Comune sta espletando le formalità per la gara di affidamento al fine di eseguire ulteriori campionamenti nonché verifica della falda acquifera ( come concordato in conferenza dei servizi del 14.03 us)
- ✓ **28.05.2018** richiesta di approvazione del Quadro Tecnico Economico (QTE) formulato dai tecnici del comune al fine di effettuare le lavorazioni sulle discariche (Carpineto e Casette) sulle prescrizioni fornite da Arpa Lazio.
- ✓ **29.05.2018 Roma – riunione tecnica** al fine di valutare le condotte operative alla luce dei risultati degli ulteriori campionamenti effettuati La riunione vuole indirizzare, in senso collegiale, le attività al fine di portare, entro la prossima semestralità (dicembre 2018), il sito in espunzione. Vengono verificati i risultati delle analisi sui campioni, da cui si evince un leggero superamento (riferito al parametro piombo), si ritiene, collettivamente, che tale superamento sia ininfluente visti i limiti dei parametri di riferimento. Vengono consegnati, da parte di Arpa al

Comune, per le vie brevi, i rapporti di prova relativi alle aliquote dei campioni: P6 C2/A (NRG 9011) - P5 C2/A (NRG 912) - S6 C3/A (NRG 905) - S6 C2/A (NRG 904) - Si è disposto che Arpa rediga, **entro fine giugno, la relativa analisi di rischio (ADR) al fine di discuterne in conferenza dei servizi nella riunione fissata per il 03 luglio p.v.** Da tale conferenza potrebbe emergere la conclusione dei procedimenti di bonifica/messa in sicurezza del sito, in relazione ai lievi superamenti ottenuti, con la conseguente richiesta di espunzione del sito stesso dalla procedura di infrazione Europea.

## SCHEDA GEOGRAFICA TERRITORIALE

### TREVI NEL LAZIO (FR) Località Casette Caponi



## Trevi nel Lazio

Comune italiano

Trevi nel Lazio è un comune italiano di 1.790 abitanti nella "ciociara" laziale.

**Provincia:** Frosinone

**Coordinate:** 41°51' 50"N 13°15'E **Altitudine:** 821 m s.l.m. **Superficie:** 54,13 km<sup>2</sup>

**Densità ab.:** 32,59 ab./km<sup>2</sup> **Frazioni:** altipiani di Arcinazzo **Classificazione sismica:** zona 2 B (rischio medio)

**Aree Naturali limitrofe:** parco dei Monti Simbruini e parte della comunità montana dei Monti Ernici.

**Territorio:** Si trova nell'alta valle del fiume Aniene che qui forma le caratteristiche Cascate di Trevi  
Il territorio comunale si trova a cavallo tra i monti Simbruini a nord ed i monti Ernici a sud.



Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti

<b>Progressivo oggetto:</b>	1456		
<b>Regione :</b>	LAZIO	<b>Provincia :</b>	ROMA
<b>Comune :</b>	Trevi	<b>Località :</b>	Casette Caponi
<b>Coordinate UTM Est :</b>	13.224004	<b>Coordinate UTM Nord :</b>	41.859524

Dati primari del sito

**Tipologia di sito :** Discarica (secondo normativa vigente)

**Data dei sopralluoghi :** 18.09.2017

**Come raggiungere il sito:** Dall'altipiano di Arcinazzo, procedere in direzione ovest e prendere la SP 28 verso via delle stelle alpine, percorrerla per circa 5,6 KM, poi svoltare a sinistra e prendere la SP 193 percorrerla per circa 500 metri e il sito si trova sulla destra

**SCHEDA OPERATIVA****Regione: LAZIO****Titolo intervento: Comune di Villa Latina (FR), località Camponi**

<b>1</b>	Titolo e tipologia discarica	<b>Comune di Villa Latina (FR) Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU)</b>
<b>2</b>	Copertura finanziaria	<b>Fondi Regionali</b>
<b>3</b>	Oggetto dell'intervento	<b>Messa in sicurezza</b>
<b>4</b>	Localizzazione intervento	<b>località Camponi</b>
<b>5</b>	Stato dell'intervento	Approvato prog. Definitivo Messa in sicurezza e caratterizzazione in data 29/05/2009 con ditta <i>ri.la.co.srl di Torrecuso (BN)</i>
<b>6</b>	Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)	<b>Avviati i lavori per il ripristino ed adeguamento del capping (apr. 2018)</b>
<b>7</b>	Risultati attesi	<b>MISP</b>
<b>8</b>	Indicatori di realizzazione e risultato	/
<b>9</b>	Modalità previste per l'attivazione del cantiere (procedure di affidamento lavori/servizi)	<b>Affidamento dell'esecuzione intervento</b>
<b>10</b>	Progettazione disponibile per l'avvio dell'affidamento	<b>Progetto di caratterizzazione</b>
<b>11</b>	Soggetto attuatore	Comune e Commissario Viceprefetto (FR)
<b>12</b>	Responsabile del procedimento (RUP)	Ufficio tecnico comunale – Marcello Cristini
<b>13</b>	Supporto tecnico richiesto	<b>Consulenza tecnica, giuridica e finanziaria</b>
<b>14</b>	<b>ESPUZIONE PREVISTA</b>	<b>VIII semestre - 02 Dicembre 2018</b>

**CRONOSTORIA ATTIVITA':**

- ✓ **11.10.2017** - Squadra sopraluoghi: effettuati rilievi fotografici al fine di redigere il fascicolo informativo della discarica, intrapresi contatti info-investigativi ed eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Atina (FR).
- ✓ **22.11.2017** Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.
- ✓ **19.01.2018** Squadra sopraluoghi: recupero documentazione amministrativa e contabile dal Comune sul sito di discarica, analisi degli stessi da parte della squadra info-investigativa.
- ✓ **22.01.2018** riunione istituzionale presso Reg. Lazio Capo di Gabinetto per coordinare le attività dei siti Laziali (presenti: ViceD. Arpa Cintoli, Assessore Reg.Lazio, Capo di Gab. Reg. Lazio, Comm.rio Straordinario, Cap. Fusco, Funzionario Reg. Lazio Monaco)
- ✓ **08.02.2018** Comunicato al comune che il sito è stato commissariato con decisione in data 22.11.2017.
- ✓ **14.02.2018** recupero ulteriore documentazione amministrativa dal Comune
- ✓ **14.03.2018** riunione conoscitiva ed operativa delle attività svolte e per avviare le operazioni da eseguire al fine di porre in sicurezza la discarica.
- ✓ **19.03.2018** trasmissione di Arpa della relazione tecnica del campionamento effettuato in data 24-25/10/2016 da cui emergono superamenti CSC (idrocarburi C>12 nei campioni denominati SIC1 e S1topsoil ma per destinazione urbanistica "sito ad uso verde pubblico, privato e residenziale").
- ✓ **20.03.2018** Roma riunione esecutiva sulle opere da eseguire. Presenti: comune Villa Latina (uff. tecnico) e Regione Lazio – Ambiente.
- ✓ **28.03.2018** Roma riunione analitica sulla caratterizzazione eseguita e connesso studio dell'operatività esecutiva delle attività da svolgere (soggetti: commissario comunale – ufficio tecnico – Regione Lazio – Arpa Frosinone).
- ✓ **17.04.2018** Roma – riunione (Arpa- Regione-Comune) per confermare ed analizzare il report dei risultati della caratterizzazione e organizzare le attività al fine di avviare ulteriori indagini integrative per l'unico superamento di CSC rilevato. Si è dato mandato al comune di avvalersi di un professionista per effettuare il piano delle aggressive esplorazioni che, saranno per le v.b. e in un'ottica di fattiva collaborazione, validate e verificate da Arpa, inoltre si è stabilito che i campionamenti (cronoprogramma attività) dovranno essere posti in essere dal giorno **19 giugno p.v.**
- ✓ **17.05.2018** Roma riunione da cui emerge la necessità di effettuare dei nuovi campionamenti affinché si possa conferire l'incarico per l'effettuazione degli stessi ad un altro tecnico. Si conferma al Comune la necessità di effettuare dei nuovi campionamenti sul sito, con modalità che verranno indicate dal nuovo tecnico incaricato, che provvederà a riportare in planimetria i nuovi punti di indagine, individuati nell'area interessata dal superamento; altresì ARPA verificherà il nuovo cronoprogramma delle attività in modo che possa essere condiviso e stabilita quindi la tempistica dei prelievi
- ✓ **11.06.2018** ricevuto il cronoprogramma attività redatto da professionista incaricato al comune al fine di effettuare ulteriori campionamenti. Inviato ad Arpa tale progetto per ricevere un parere di merito in modo da poter dare pronto avvio agli ulteriori campionamenti. Si sottolinea che è interesse di questa Struttura Commissariale operare in costante sinergia con tutti i soggetti pubblici coinvolti al fine di portare in espunzione, dalla procedura di infrazione Europea, il sito in oggetto nella prossima VIII semestralità.

## SCHEDA GEOGRAFICA TERRITORIALE

VILLA LATINA (FR)  
Località Camponi

Villa Latina è un comune italiano di 1 215 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio. Il nome ufficiale fino al 1862 era 'Agnone'. Il nome attuale, Villa latina, lo si deve alla presenza di un'antica villa termale meta di villeggiatura per i Romani.

**Provincia:** Frosinone

**Coordinate:** 41°37'N 13°50'E **Altitudine:** 415 m s.l.m. **Superficie:** 17,03 km2 **area:** submontana

**Densità ab.:** 71,39 ab./km2 **Frazioni:** Vallegrande, Colozzi, Pelino, Panetta, Pacitti, Tosti, Valenti

**Classificazione sismica:** zona 1 (rischio alto) **Aree Naturali limitrofe:** parco del Monte Bianco

**Territorio:** Nel territorio comunale si trova il monte Bianco che raggiunge i 1.167 metri sul livello del mare. Fa parte della comunità montana Valle di Comino. Il territorio comunale è luogo di produzione di alcuni vini regolamentati dal disciplinare Atina DOC.



Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti

<b>Progressivo oggetto:</b>	4600	<b>Provincia :</b>	Frosinone
<b>Regione :</b>	LAZIO	<b>Località :</b>	Camponi
<b>Comune :</b>	Villa Latina	<b>Coordinate UTM Nord :</b>	41 613087
<b>Coordinate UTM Est :</b>	13 853615		

Dati primari del sito

**Tipologia di sito :** Discarica (secondo normativa vigente)

**Data dei sopralluoghi:**

**Come raggiungere il sito:** girare a sinistra alla prima SP, poi svoltare a dx al bivio con la SS.

**APPENDICE****Schede delle singole discariche:**

- **Geografiche**
- **Fossir**
- **Operative**

**Campania****Regione Campania**

Elenco 14 siti di discarica, divisi per provincia, affidati al Commissario:

- |  |   |
|--|---|
| ➤ Avellino – Andretta                    | <b>ESPUNTA – VII sem. 02 giugno 2018</b>  |
| ➤ Avellino – Rotondi                     | <b>ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017</b> |
| ➤ Benevento                              | <b>ESPUNTA – VII sem. 02 giugno 2018</b>  |
| ➤ Benevento – Castelpagano               | <b>ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017</b> |
| ➤ Benevento – Castelvetere di Valfortore | <b>ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017</b> |
| ➤ Benevento – Cusano Mutri               | <b>ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017</b> |
| ➤ Benevento – Durazzano                  | <b>ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017</b> |
| ➤ Benevento - Pescosannita               |   |
| ➤ Benevento – Puglianello                |   |
| ➤ Benevento – Sant’ Arcangelo Trimonte   |   |
| ➤ Benevento – San Lupo                   |   |
| ➤ Benevento – Tocco Caudio               |   |
| ➤ Salerno – Pagani                       |   |
| ➤ Salerno – S. Arsenio                   |   |

**SCHEDA OPERATIVA****Regione: CAMPANIA****Titolo intervento: Comune di ANDRETTA – località Frascineto**

<b>1</b>	Titolo e tipologia discarica	<b>Comune di ANDRETTA (AV) Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU)</b>
<b>2</b>	Copertura finanziaria	<b>Fondi nazionali €</b>
<b>3</b>	Oggetto dell'intervento	<b>MISP</b>
<b>4</b>	Localizzazione intervento	<b>Località Frascineto</b>
<b>5</b>	Stato dell'intervento	<b>concluso</b>
<b>6</b>	Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>MISP conclusa</b></li> <li>➤ <b>Pagamento dell'ultimo SAL</b></li> </ul>
<b>7</b>	Risultati attesi	-
<b>8</b>	Indicatori di realizzazione e risultato	-
<b>9</b>	Modalità previste per l'attivazione del cantiere (procedure di affidamento lavori/servizi)	-
<b>10</b>	Progettazione disponibile per l'avvio dell'affidamento	Progetto esecutivo
<b>11</b>	Soggetto attuatore	Comune
<b>12</b>	Responsabile del procedimento (RUP)	RUP - Geom. Scanzano Luigi DL - Ing. Corvino Angelo
<b>13</b>	Supporto tecnico richiesto	-
<b>14</b>	<b>ESPUNZIONE PREVISTA</b>	<b>VII semestralità - 02 giugno 2018</b>

**CRONOSTORIA ATTIVITA':**

- ✓ **22.11.2017** Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.
- ✓ **04.02.2018** Finito intervento di MISP, pagato ultimo SAL, il DL sostiene che i lavori finiranno (mancano solo rifiniture) a fine febbraio.
- ✓ **04.02.2018** Da fissare riunione con Arpac, Provincia di Avellino, Regione e Comune.
- ✓ **12.04.2018** Squadra sopralluoghi effettuate foto e rilievi per fascicolo informativo e fotografico del sito e delle aree limitrofe alla discarica. Inoltre presso l'ufficio Tecnico Comunale per ritirare la documentazione amministrativa al fine di ricostruire la "storia" della discarica.
- ✓ **15.05.2018** Avellino – Incontro con il Prefetto per uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti, rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche da porre in essere.
- ✓ **17.05.2018** Roma – riunione presso il Ministero dell'Ambiente al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di espunzione del sito.
- ✓ **21.05.2018** Roma – riunione con il Comune e la Regione presso il Ministero dell'Ambiente per verificare l'incartamento da produrre.
- ✓ **29.05.2018** Roma - riunione presso il Ministero dell'Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per la redazione del dossier di regolarizzazione del sito.
- ✓ **31.05.2018** Roma - determina commissariale n.39 del 31.05.2018.
- ✓ **31.05.2018** Roma avvio dell'iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di sottoporla alla valutazione della Commissione Europea.

## SCHEDA TERRITORIALE

### ANDRETTA (AV) Località Frascineto



## Andretta

Comune italiano



Andretta è un comune italiano di 1.884 abitanti della provincia di Avellino in Campania. L'etimologia si collega con i cognomi Andretta, Andrietta o Andrietti che derivano a loro volta dal nome greco Andrea. Secondo altri invece il nome deriverebbe dal greco andrea, ἀνδρεία, ossia fermezza, forza.


**Provincia:** Avellino

**Superficie:** 43 km2 **densità abitativa:** 43 ab/km2 **coordinate:** 40°56' 18" N 15°19' 33" E

**Altitudine:** 850 m **Area:** montana **classe sismica:** zona I (sismicità alta)

**Aree naturali di rilievo:** appennino campano ed Irpinia, fiume Ofanto **Frazioni:** Mattinella

**Territorio:** Si estende su una superficie di 43,61 km<sup>2</sup>, il paese ha subito notevoli danni materiali a causa del terremoto dell'Irpinia del 1980. La piccola città, sorge su un'alta collina che domina l'Appennino. Nelle vicinanze scorre il fiume Ofanto.

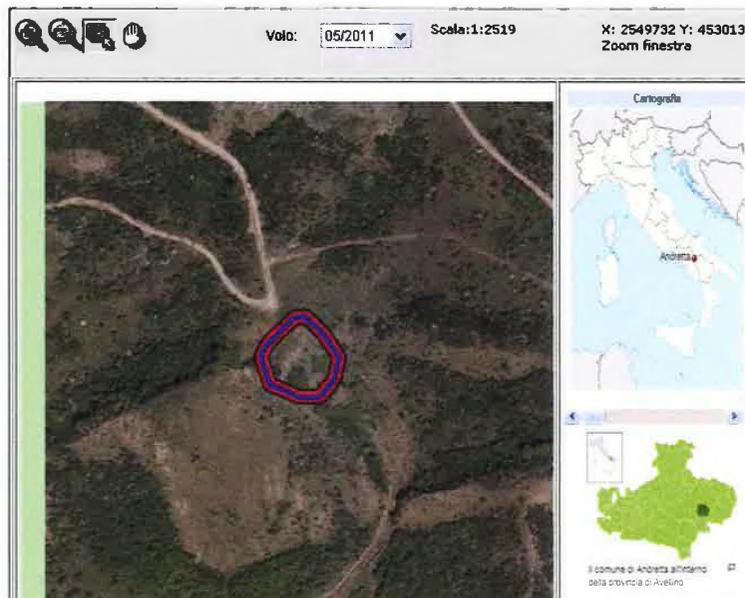

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti

<b>Progressivo oggetto:</b>	4773		
<b>Regione :</b>	CAMPANIA	<b>Provincia :</b>	AVELLINO
<b>Comune :</b>	ANDRETTA	<b>Località :</b>	Frascineto
<b>Coordinate UTM Est :</b>	529633.09	<b>Coordinate UTM Nord :</b>	4530183.4
<b>T:</b>	33		

Dati primari del sito

**Tipologia di sito :** Discarica (secondo normativa vigente)

**Data del sopralluogo :** 12.04.2018 -

Informazioni utili per raggiungere il sito

**Come raggiungere il sito :** Dalla SS 91 deviare in c/da Frascineto di Andretta e giunti in prossimità di una sbarra attraverso una strada comunale proseguire per circa 400 mt.

**SCHEDA OPERATIVA****Regione: CAMPANIA****Titolo intervento: Benevento (BN), località Ponte Valentino**

<b>1</b>	Titolo e tipologia discarica	<b>Benevento (BN), località Ponte Valentino</b> <b>Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU)</b>
<b>2</b>	Copertura finanziaria	<b>POR Cipe FSC 2007-2013</b> <b>DGR 343/2016</b> <b>€ 4.000.000</b>
<b>3</b>	Oggetto dell'intervento	<b>Messa in sicurezza Permanente</b>
<b>4</b>	Localizzazione intervento	<b>località Ponte Valentino</b>
<b>5</b>	Stato dell'intervento	<b>In corso lavori MISP con capping</b> <b>Approvato progetto MISP</b> <b>Effettuata Analisi di rischio</b> <b>Effettuata Caratterizzazione</b>
<b>6</b>	Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)	-
<b>7</b>	Risultati attesi	<b>MISP con capping</b>
<b>8</b>	Indicatori di realizzazione e risultato	/
<b>9</b>	Modalità previste per l'attivazione del cantiere (procedure di affidamento lavori/servizi)	/
<b>10</b>	Progettazione disponibile per l'avvio dell'affidamento	<b>Progetto Esecutivo di Misp</b>
<b>11</b>	Soggetto attuatore	/
<b>12</b>	Responsabile del procedimento (RUP)	<b>RUP: ing. Antonio Soreca</b> <b>Direttore Lavori (DL) : ing. Roberto La Peccerella</b>
<b>13</b>	Supporto tecnico richiesto	<b>Consulenza tecnica, giuridica e finanziaria</b>
<b>14</b>	<b>ESPUNZIONE PREVISTA</b>	<b>VII semestralità ( 02 giugno 2018)</b>

**CRONOSTORIA ATTIVITA':**

- ✓ **05.10.2017** squadra sopralluoghi effettuate fotografie delle condizioni della discarica sito e delle aree circostanti. Preso contatti con il Comando Carabinieri del luogo e sopralluogo svolto congiuntamente a personale del N.I.P.A.F (Nucleo Investigativo Polizia Ambientale e Forestale).
- ✓ **25.01.2018** squadra sopralluoghi effettuato rilievo fotografico per fascicolo documentale del sito e prelievo documentazione amministrativa, ambientale e contabile presso il Comune..
- ✓ **21.01.2018** **Consegna Relazione Procura di Benevento.** "La discarica di Via Ponte Valentino è divisa in due lotti separati da una strada. Con finanziamento POR 2000-2006 è stato realizzato MISP del 1° lotto. Nel 2° lotto sono in corso i lavori di MISP con Capping, paratie e Diaframma interrato per eventuale percolato. Al di là del contenzioso amministrativo, chiarito a novembre 2017, il cronoprogramma prevede la fine lavori dopo 180 dal momento della consegna avvenuta il 31/08/2017. Quindi la conclusione dell'intervento è prevista per 27/02/2018. Il 2° lotto è durato più di quanto era previsto a causa dell'alluvione, tutto questo ha causato lo spostamento dei finanziamenti previsti dal POR 2007-2013 al POR 2014-2020."
- ✓ **05.04.2018** riunione presso UOD Benevento con Comune, Arpac, Provincia. L'intero intervento di MISP è stato diviso in due lotti, il primo lotto è stato già ultimato con collaudo tecnico, mentre il secondo lotto è in via di ultimazione ma la fine lavori non è più prevista al 20 aprile ma al 2 maggio, a causa delle condizioni meteo avverse. Il Comune ha rappresentato, con specifica cronistoria, come la procedura amministrativa della bonifica del sito è iniziata prima che il d.lgs. 152/2006 fosse in vigore. La Provincia e l'Arpac sono stati coinvolti nella fase del monitoraggio sia del primo che del secondo lotto al fine di verificare che si siano raggiunti gli obiettivi di bonifica.
- ✓ **17.05.2018** Roma – riunione presso il Ministero dell'Ambiente al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di espunzione del sito.
- ✓ **21.05.2018** Roma – riunione con il Comune e la Regione presso il Ministero dell'Ambiente per verificare l'incartamento da produrre.
- ✓ **29.05.2018** Roma - riunione presso il Ministero dell'Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per la redazione del dossier di regolarizzazione del sito.
- ✓ **31.05.2018** Roma - determina commissariale n.47 del 31.05.2018.
- ✓ **31.05.2018** Roma avvio dell'iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di sottoporla alla valutazione della Commissione Europea.

## SCHEDA TERRITORIALE

### BENEVENTO (BN) Località Ponte Valentino



## Benevento

Comune italiano



Benevento (Beneviénte in dialetto beneventano, Beneventum in latino), è un comune italiano di 60.027 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Campania. Secondo le stime dell'OCSE, attorno a Benevento gravita un'area urbana con 109 815 abitanti.

**Provincia:** Benevento


**Superficie:** 129 km2 **densità abitativa:** 465,95 ab/km2 **coordinate:** 41°08'N 14°47'E

**Altitudine:** 135 m **Area:** submontana **classe sismica:** zona 1 (sismicità alta) **Frazioni:** /

**Aree naturali di rilievo:** Appennino Campano, regione del Sannio, Valle Vitulanese e massiccio del Taburno Camposauro.

**Territorio:** La città si trova nell'entroterra appenninico della Campania, nella parte meridionale della regione storica del Sannio, in una posizione quasi equidistante dai mari Tirreno e Adriatico.

È posta in una conca circondata da colline: ad ovest in particolare, oltre la Valle Vitulanese, si trova il massiccio del Taburno Camposauro: le sue cime, viste dalla città, disegnano la sagoma di una donna distesa, detta la "Dormiente del Sannio". Dalla parte più alta della città si possono scorgere le cime del Monte Mutria del Matese a nord-ovest, l'alta cortina del Partenio con il monte Avella a sud, il brullo Trimunzio montecalvese a sud-est e le appendici dei monti Dauni a est. La città è attraversata da due fiumi: il Calore, affluente del Volturno, e il Sabato, che confluisce nel Calore in contrada Pantano, poco ad ovest del centro cittadino. Il territorio su cui si estende la città è piuttosto ondulato. Il suo centro infatti si eleva su una collina nel mezzo della vallata, ed alcune contrade sorgono su altre colline circostanti. L'altezza media sul livello del mare è pari a 135 m, con una minima di 80 m ed una massima di 495 m, pari ad un'escursione di 415 m.

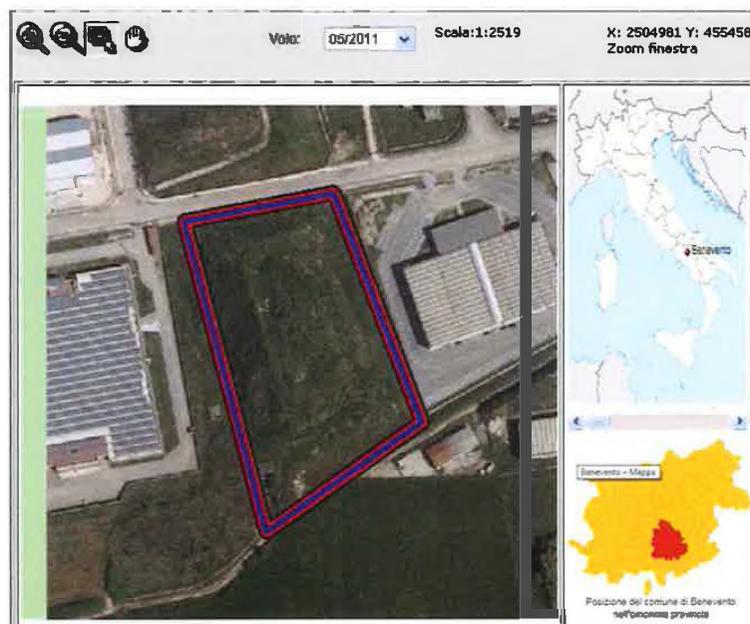

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti

<b>Progressivo oggetto:</b>	9143		
<b>Regione :</b>	CAMPANIA	<b>Provincia :</b>	BENEVENTO
<b>Comune :</b>	BENEVENTO	<b>Località :</b>	PONTE VALENTINO
<b>Coordinate UTM Est :</b>	485005	<b>Coordinate UTM Nord :</b>	4554561

**Dati primari del sito**

**Tipologia di sito :** Discarica (secondo normativa vigente)

**Data del sopralluogo:** 05.10.2017 – 25.01.2018

**Come raggiungere il sito** Strada Statale 90 bis e accesso alla zona industriale di Ponte Valentino

**SCHEDA OPERATIVA****Regione: CAMPANIA****Titolo intervento: Castelvetere in Valfortore (BN) – località Lama Grande****ESPUNTA : VI SEMESTRE 2017 (dicembre 2017) – con f.n. dpe 0002396 p. del 12.03.2018 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip- Pol. Europee**

<b>1</b>	Titolo e tipologia discarica	<b>Comune di Castelvetere in Valfortore (BN) Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU)</b>
<b>2</b>	Copertura finanziaria	<b>POR FESR 2014/2020 DGR 343/2016 € 1.455.638,00</b>
<b>3</b>	Oggetto dell'intervento	<b>Messa in sicurezza Permanente</b>
<b>4</b>	Localizzazione intervento	<b>Località Lama Grande Coordinate UTM Est : 495870 Coordinate UTM Nord : 4588538</b>
<b>5</b>	Stato dell'intervento	<b>Campionamenti fondo scavo in contraddittorio con ARPAC effettuati Lavori di svuotamento conclusi Apposizione "telo" isolante Effettuata Analisi di rischio Effettuata Caratterizzazione</b>
<b>6</b>	Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)	/
<b>7</b>	Risultati attesi	<b>BONIFICA CONCLUSA</b>
<b>8</b>	Indicatori di realizzazione e risultato	/
<b>9</b>	Modalità previste per l'attivazione del cantiere (procedure di affidamento lavori/servizi)	/
<b>10</b>	Progettazione disponibile per l'avvio dell'affidamento	/
<b>11</b>	Soggetto attuatore	<b>comune</b>
<b>12</b>	Responsabile del procedimento (RUP)	<b>RUP - Arch. EMMA Giancarlo</b>
<b>13</b>	Supporto tecnico richiesto	/
<b>14</b>	<b>Espunzione</b>	<b>ESPUNTA VI SEMESTRE (02 DICEMBRE 2017)</b>

**CRONOSTORIA ATTIVITA':**

- ✓ **18.09.2017** squadra sopralluoghi foto sito ed aree limitrofe non che contatti con Comando Stazione Carabinieri Forestali.
- ✓ **05.12.2017** squadra sopralluoghi, rilievi fotografici dello stato delle lavorazioni eseguite sul sito e aggiornamento del fascicolo fotografico alla luce della prossima espunzione.
- ✓ **10.10.2017** Comune - recupero documentazione contabile-amministrativa propedeutica per l'espunzione in VI semestralità.
- ✓ **08.11.2017** Roma - riunione con struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di operare sinergicamente per la compilazione del dossier di bonifica della discarica.
- ✓ **14.11.2017** Roma - riunione presso il Ministero dell'Ambiente al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di espunzione del sito.
- ✓ **22.11.2017** Roma - riunione con il Comune e la Regione Calabria presso il Ministero dell'Ambiente per verificare l'incartamento da produrre.
- ✓ **23.11.2017** Roma - riunione presso il Ministero dell'Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per la redazione del dossier di regolarizzazione del sito.
- ✓ **28.11.2017** Roma - Determina Commissariale n. 15 del 28.11.2017.
- ✓ **08.12.2017** Roma avvio dell'iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VI semestralità (Dicembre 2017).
- ✓ **08.12.2017** proposta in **espunzione (determina n.15)** inviata alla VI Semestralità con fn 12/3-9 del 28.11.2017.
- ✓ **12.03.2018** – f.n. DPE 0002396 -P-12.03.2018 con cui è stata comunicata dalla *Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche Europee* l'**Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la motivazione: "la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 15 del 24.11.2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione fissate nella legislazione italiana (D.Lgs. 152/2006), indicando una possibile contaminazione della matrice ambientale suolo (per i parametri tricloro etilene, cadmio e tallio). Nella successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica tali valori sono risultati al di sotto delle concentrazioni soglia di rischio, cioè dei valori di accettabilità del rischio. Viceversa, per quanto riguarda le acque sotterranee è stato rilevato un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per il parametro manganese, con tutta probabilità ricollegabile alla presenza dei rifiuti. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la bonifica/messa in sicurezza del sito, che ha comportato la totale rimozione dei rifiuti, smaltiti in impianti autorizzati a riceverli e l'attuazione di interventi volti ad impedire la migrazione degli inquinanti all'esterno del sito oggetto dell'intervento. Le prove di collaudo del fondo scavo effettuate al termine dei lavori hanno confermato che non vi sono superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione, attestando il risultato positivo degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente realizzati. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata".**
