ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXLVII
n. 3

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

(AL 31 DICEMBRE 1999)

(articolo 4, ultimo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798)

Presentata dal Ministro dei lavori pubblici
(NESI)

Trasmessa alla Presidenza il 16 marzo 2001

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA . . . . . *Pag.* 5

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI

DOCUMENTO A – *Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato delle acque* - Stato di attuazione degli interventi dello Stato in amministrazione diretta - Aggiornamento al 31 dicembre 1999 » 27

DOCUMENTO B – *Consorzio Venezia Nuova* – Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova - Aggiornamento al 31 dicembre 1999 . . . . . » 31

DOCUMENTO C – *Regione del Veneto* – Interventi per la salvaguardia di Venezia - Prospetto generale e stato degli interventi - Aggiornamento al 20 dicembre 1999 . . . . . » 83

DOCUMENTO D – *Comune di Venezia* – Interventi pe la salvaguardia di Venezia e la sua laguna - programma e stato di avanzamento - Aggiornamento al 31 dicembre 1999 . . . . » 203

DOCUMENTO E – *Comune di Chioggia* – Interventi per la salvaguardia di Venezia - Prospetto riepilogativo stanziamenti Legge n. 798/84 e successive modificazioni - Aggiornamento al 31 dicembre 1999 . . . . . » 323

DOCUMENTO F – *Università Ca' Foscari di Venezia* – Relazione sullo stato di attuazione per la salvaguardia di Venezia - Aggiornamento al 30 ottobre 1999 . . . . . » 327

DOCUMENTO G – *Autorità Portuale di Venezia* – Stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità Portuale finanziati dalla Legislazione Speciale per Venezia - Aggiornamento al 31 dicembre 1999 . . . . . » 349

DOCUMENTO H – *SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo* – Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale - Aggiornamento al 31 dicembre 1999 . . . . . *Pag.* 357

DOCUMENTO I – *Consorzio per la gestione del Centro di Coordinamento delle attività di ricerca inerenti al sistema lagunare di Venezia - CO.RI.LA.* - Stato di attuazione attività svolte con fondi di legislazione speciale - Aggiornamento al 31 dicembre 1999 . . » 385

DOCUMENTO L – *Istituto Universitario di Architettura di Venezia - I.U.A.V.* - Utilizzazione fondi legge n. 139/92 e seguenti . . . . . » 389

DOCUMENTO M – *Diocesi di Chioggia* – Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale - Aggiornamento al 31 dicembre 1999 . . . . . » 395

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

La presente relazione costituisce l'aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna che, in base all'art. 4 della Legge n. 798/84, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo è tenuto a trasmettere annualmente al Parlamento.

I dati tengono conto degli aggiornamenti trasmessi dai diversi Enti a seguito di specifica richiesta da parte del Segretario del Comitato ex art. 4, Legge n. 798/84 e, per la maggior parte, riproducono la **situazione al 31 dicembre 1999.**

Dal quadro riepilogativo dei finanziamenti finora assegnati (*Allegato n. 1*), risulta che **la legislazione speciale per Venezia ha finanziato 10.074 miliardi, di cui 9.358 miliardi effettivamente disponibili** (importo progressivo all'anno 1999 [1]).

Nell'*Allegato n. 2* è riportato sinteticamente lo *stato di attuazione dei finanziamenti* per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, riportando per ciascun Ente gli *importi assegnati, con riferimento ai soli importi effettivamente disponibili,* e gli *importi spesi* relativamente agli interventi di propria competenza.

Al 31 dicembre 1999 risultano complessivamente impegnati 7.974 miliardi pari all'85% e spesi 4.341 miliardi pari al 46% degli importi disponibili.

Viene riportato nelle tabelle successive il *quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti* con l'indicazione delle somme assegnate, impegnate e spese per ciascuna Legge:

---

[1] La differenza tra i due importi è data dai finanziamenti già assegnati ma che potranno essere attivati a valere su limiti di impegno con decorrenza dal 2000 e dal 2001.

- *Allegato n. 3 – Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti;*
- *Allegato n. 4 – Legge n. 139/92;*
- *Allegato n. 5 – Legge n. 539/95;*
- *Allegato n. 6 – Legge n. 515/96;*
- *Allegato n. 7 – Legge n. 345/97;*
- *Allegato n. 8 – Legge n. 295/98;*
- *Allegato n. 9 – Legge n. 448/98.*

L'*Allegato n. 10* riepiloga sinteticamente gli importi assegnati, disponibili, impegnati e spesi da parte degli Enti principali.

Con riferimento ai singoli Allegati, relativamente agli importi finanziati, impegnati e spesi per singole Leggi si ha:

- la **Legge n. 798/84** e le successive Leggi di rifinanziamento (Leggi n. 910/86, n. 67/88, n. 360/91, n. 415/92 e n. 724/94) hanno resi disponibili **2.197 miliardi,** di cui risultano **impegnati** 2.117 miliardi **(96%)** e **spesi** 1.821 miliardi **(83%);**

- la **Legge n. 139/92** ha reso disponibili **2.563 miliardi,** di cui risultano **impegnati** 2.356 miliardi **(92%)** e **spesi** 1.749 miliardi **(68%);**

- la **Legge n. 539/95** ha reso disponibili **553 miliardi,** di cui risultano impegnati 534 miliardi **(97%)** e **spesi** 269 miliardi **(49%);**

- la **Legge n. 515/96** ha reso disponibili **1.984 miliardi,** di cui risultano **impegnati** 1.681 miliardi **(97%)** e **spesi** 451 miliardi **(23%);**

- la **Legge n. 345/97** ha assegnato un importo complessivo stimato pari a **1.108 miliardi.** Tale somma viene reperita mediante contratti di finanziamento stipulati e da stipularsi a valere sui limiti di impegno **con decorrenza dal 1998 e dal 1999.**

Di questi fondi risultano **impegnati** 775 miliardi (**70%**) ma **spesi** solo 51 miliardi (**5%**), cosa che si giustifica tenendo conto dei tempi necessari ai diversi Enti per destinare, impegnare e spendere le somme rese così recentemente disponibili;

– la **Legge n. 295** del 3 agosto 1998 ha assegnato un importo complessivo stimato pari a 236 miliardi, di cui **117 miliardi** disponibili nel corso del 1999. Tali somme, infatti, vengono reperite mediante contratti di finanziamento stipulati e da stipularsi a valere sui limiti di impegno **con decorrenza dal 1999 e dal 2000** di importo pari a 10 miliardi per ciascun anno, accantonati dalla Legge Finanziaria per il 1998, n. 450/97.
Il Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, che ha ripartito i fondi sulla base di quanto proposto dal Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nella seduta del 21 luglio 1998, è stato emesso in data 9 marzo 1999.
Tenendo conto dei tempi necessari per sottoscrivere i contratti di mutuo con gli Enti finanziatori e, poi, per destinare, impegnare e spendere le somme rese disponibili al 31 dicembre 1999, da parte dei diversi Enti, risultano **impegnati** solo 20 miliardi (**17%**) mentre **non risulta spesa alcuna somma** relativamente a tale Legge;

– la **Legge n. 448 del 23 dicembre 1998** ha assegnato un importo complessivo stimato pari a 1.434 miliardi, di cui **837 miliardi** disponibili nel corso del 1999. Tali somme, infatti, vengono reperite mediante contratti di finanziamento stipulati e da stipularsi a valere sui limiti di impegno **con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001** di importo pari, rispettivamente, a 70 miliardi, 20 miliardi e 30 miliardi.
Il Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica n. 150214, che ripartisce i fondi sulla base di quanto proposto dal Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nella seduta dell'8 marzo 1999, è stato emesso in data 8 giugno 1999.

Tenendo conto dei tempi necessari per sottoscrivere i contratti di mutuo con gli Enti finanziatori e, poi, per destinare, impegnare e spendere le somme rese disponibili al 31 dicembre 1999, da parte dei diversi Enti, risultano **impegnati** 490 miliardi (**59%**) mentre **non risultano spese somme significative** relativamente a tale Legge.

Si ricorda che la **Legge Finanziaria per il 2000 (Legge n. 488 del 23 dicembre 1999)** prevede, per il rifinanziamento della legislazione speciale per Venezia, gli stanziamenti a copertura delle rate di ammortamento dei mutui già perfezionati dai vari Enti nonché, quali limiti di impegno, 50 miliardi con decorrenza dal 2001 e 50 miliardi con decorrenza dal 2002 che potranno attivare, con il meccanismo dei mutui, **ulteriori somme per circa 1.200 miliardi**, data la situazione favorevole per i valori dei tassi di interesse.

La destinazione specifica dei fondi verrà sancita da apposito Decreto del Ministro del Tesoro sulla base della ripartizione che il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge 798/84 vorrà proporre.

Si segnala la necessità di poter disporre di ulteriori fondi da allocare quali limiti di impegno nella **Legge Finanziaria per il 2001** per assicurare continuità alle attività di salvaguardia intraprese dai diversi Enti.

Relativamente allo sviluppo dell'attuazione dei finanziamenti da parte dei singoli Enti, si segnala in particolare:

- per lo Stato in Amministrazione diretta – **Magistrato alle Acque di Venezia**, le somme complessivamente assegnate sono pari a 330 miliardi, tutte relativamente alla Legge n. 798/84. Al 31 dicembre 1999, il Magistrato alle Acque ha **impegnato il 99% e speso il 91%** delle somme disponibili.

- per il concessionario dello Stato **Consorzio Venezia Nuova**, le somme complessivamente assegnate sono pari a 3.820 miliardi di cui 3.612 miliardi disponibili al 31 dicembre 1999. Il Consorzio Venezia Nuova ha **impegnato** il **100%** e **speso** il **56%** delle somme disponibili che tengono conto anche della recente Legge n. 448/98.

- Per la **Regione del Veneto**, le somme complessivamente assegnate sono pari a 2.193 miliardi, di cui 2.001 miliardi disponibili al 31 dicembre 1999. La Regione del Veneto ha **impegnato** il **51%** e ha **speso** il **27%** delle somme disponibili che tengono conto anche della recente Legge n. 448/98.

  Si ricorda che le somme indicate sono al netto della quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno destinati alla Regione Veneto, quota assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato rii in base all'art. 3 della Legge n. 139/92.

- Per il **Comune di Venezia**, le somme complessivamente assegnate sono pari a 2.465 miliardi di cui 2.316 miliardi disponibili al 31 dicembre 1999. Il Comune di Venezia ha **impegnato** il **98%** e ha **speso** il **47%** delle somme disponibili che tengono conto anche delle recenti Leggi n. 295/98 e n. 448/98.

  Si ricorda che le somme indicate comprendono la quota di finanziamento pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno destinati alla Regione del Veneto, quota assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato rii in base all'art. 3 della Legge n. 139/92.

- Per il **Comune di Chioggia**, le somme complessivamente assegnate sono pari a 371 miliardi di cui 337 miliardi disponibili al 31 dicembre 1999. Il Comune di Chioggia ha **impegnato** l'**88%** e **speso** il **31%** delle somme disponibili che tengono conto anche delle recenti Leggi n. 295/98 e n. 448/98.

- Per la **Provincia di Venezia,** le somme complessivamente assegnate sono pari a 175 miliardi di cui 163 miliardi disponibili al 31 dicembre 1999. La Provincia di Venezia ha **impegnato** il **76%** e **speso** il **15%** delle somme disponibili che tengono conto anche della recente Legge n. 295/98.

- Per gli **altri Enti**[1)], le somme complessivamente assegnate sono pari a 719 miliardi di cui 599 miliardi disponibili al 31 dicembre 1999. Tali Enti hanno **complessivamente impegnato** il **55%** e hanno **speso** il **44%** delle somme disponibili che tengono conto anche delle recenti Leggi n. 295/98 e n. 448/98.

[1)] Università degli Studi Ca' Foscari; Istituto Universitario Architettura Venezia; Ministero Università Ricerca Scientifica e Tecnologica; Procuratoria di S. Marco; Autorità Portuale di Venezia già Provveditorato al Porto; Fondazione Querini Stampalia; SAVE Aeroporto Marco Polo; Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; Ministero per i Beni e le Attività Culturali; CO.RI.LA.; Diocesi Patriarcato di Venezia; Diocesi di Chioggia; Biennale di Venezia; Azienda Speciale Porto Chioggia.

Allegato n. 1

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI

CON LE LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI, 139/92, 539/95, 515/96, 345/97, 295/98 E 448/98

Importi in Lire milioni

	LEGGE N. 798/84 E RIFINANZ.	LEGGE N. 139/92	LEGGE N. 539/95	LEGGE N. 515/96	LEGGE N. 345/97	LEGGE N. 295/98		LEGGE 448/98		TOTALE	
	IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI (A)	IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI (B)	IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI (C)	IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI (D)	IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI (E)	IMPORTI TOTALI ASSEGNATI (F)	DI CUI DISPONIBILI NEL 1999 (G)	IMPORTI TOTALI ASSEGNATI (H)	DI CUI DISPONIBILI NEL 1999 (I)	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI NEL 1999 (L) = A+B+C+D+E+G+I	IMPORTI ASSEGNATI TOTALI (M) = A+B+C+D+E+F+H
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	329.955									329.955	329.955
Riequilibrio idrogeologico	700									700	700
Anticquirimento	15.055									15.055	15.055
Marginamenti isolani	3.842									3.842	3.842
Edifici demaniali	150.981									150.981	150.981
Arsenale	23.917									23.917	23.917
Ponti, canali, fondamenta	96.122									96.122	96.122
Corsi d'acqua	18.226									18.226	18.226
Patrimonio mobiliare pubblico	9.026									9.026	9.026
Università Architettura	12.086									12.086	12.086
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	778.396	1.035.000	233.000	847.000	432.000			495.000	287.000	3.612.396	3.820.396
Opere alle bocche	166.664	40 439	19.566	6.833	12.815			12.941	5.441	251.758	259.258
Riforma moli	30.407	165.665		13 400				20 000	20.000	229.472	229.472
Difesa abitati, insulae e marginamenti	216.586	251.139	61.882	323.589	155.916			120.500	66.000	1.075.112	1.129.612
Morfologia e arresto degrado	232.165	307.826	60.336	320.892	245.270			306.000	177.000	1.343.489	1.472 489
Servizio Informativo	24 999	17.996	4.000	24.000	6.000			12.000	7.000	83.994	88.994
Ausilii alla navigazione	14.365	15.032						0	0	29.397	29.397
Difesa litorali	85.395	231.085	87.216	158.284	12.000			15.559	11.559	585.541	589.541
Porti e valli da pesca	7 815	5.815						8 000	0	13.633	21.633
REGIONE VENETO (*)	531.300	603.000	84.000	294.000	225.000			456.000	264.000	2.001.300	2.193.300
Disinquinamento	464.300	603.000	77.500	294.000	156.200			456.000	264.000	1.859.000	2.051.000
Ospedale SS. Giovanni e Paolo	27.000		6.500							33.500	33.500
Acquedotti	40.000				68.800					108.800	108.800
PROVINCIA DI VENEZIA	3.480	28.905	16.000	83.000	28.000	24.000	12.000			163.385	175.385
Restauro patrimonio storico											
COMUNE DI VENEZIA	394.885	731.576	144.000	512.393	308.000	21.250	12.750	361.000	220.000	2.315.604	2.465.104
Risanamento immobili		305.795	98.659	299.224	154.978				148.854		
Urbanizzazione primaria		57.346	18.341	80.640	25.802				28.899		
Contributi a privati		56.000	20.000	79.652	47.300				31.200		
Insediamenti produttivi		66.710	7.000	22.520	28.920				11.047		
Progetto integrato rii (*)		245.725		30.357	43 000						
COMUNE DI CHIOGGIA	62.077	69.100	28.000	90.000	46.000	4.300	2.500	71.196	38.796	336.473	370.673
Risanamento immobili											
Urbanizzazione primaria											
Contributi ai privati											
Infrastrutture											
Contributi acquisto 1^ casa											
TOTALE PARZIALE	2.100.013	2.467.581	805.000	1.826.393	1.013.000	49.550	27.250	1.383.196	809.796	8.799.033	9.354.733

(*) L'art.) della Legge 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dei limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato per i rii.

segue Allegato n. 1

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI

CON LE LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI, 139/92, 539/95, 515/96, 345/97, 295/98 E 448/98

Importi in Lire milioni

	LEGGE N. 798/84 E RIFINANZ.	LEGGE N. 139/92	LEGGE N. 539/95	LEGGE N. 515/96	LEGGE N. 345/97	LEGGE N. 295/98		LEGGE N. 448/98		TOTALE	
	IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI (A)	IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI (B)	IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI (C)	IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI (D)	IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI (E)	IMPORTI TOTALI ASSEGNATI (F)	DI CUI DISPONIBILI NEL 1999 (G)	IMPORTI TOTALI ASSEGNATI (H)	DI CUI DISPONIBILI NEL 1999 (I)	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI NEL 1999 (L) = A+B+C+D+E+G+I	IMPORTI ASSEGNATI TOTALI (M) = A+B+C+D+E+F+H
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	25 000	34.836	17 089	34 000	41.900	42.189	18 189			171 014	195 014
ISTITUTO UNIVERSITARIO ARCHITETTURA VENEZIA		20.318	12.093	19.134	23.339	24 000	12.000			86 884	98 884
MINISTERO UNIVERSITA' E RIC. SCIENTIFICA	20 000									20 000	20 000
PROCURATORIA DI SAN MARCO	9 043									9.043	9 043
AUTORITA' PORTUALE GIA' PROVVEDITORATO AL PORTO	21.000			68 000		24.000	12.000			101.000	113 000
FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA	1.000					12.000	6.000			7.000	13 000
AEROPORTO MARCO POLO	2.000	40 000	18.500	36 000	20.000	24 000	12.000	42 000	18 000	146.500	182.500
CONSORZIO UNIVERSITARIO (CO.RI.LA.)						12 000	6 000			6.000	12 000
DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA						24.000	12.000			12.000	24 000
DIOCESI DI CHIOGGIA								6 000	6.000	6 000	6 000
BIENNALE DI VENEZIA						24 000	12.000			12.000	24 000
AZIENDA SPECIALE PORTO CHIOGGIA								3.000	3 000	3 000	3 000
MINISTERO TESORO	2 000									2.000	2 000
MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI	16.500									16.500	16 500
TOTALE PARZIALE	96.543	95.154	47.682	157.134	85.239	186.189	90.189	51.000	27.000	598.941	718.941
TOTALE GENERALE	2.196.556	2.562.735	552.682	1.983.527	1.108.239	235.739	117.439	1.434.196	836.796	9.357.974	10.073.674

LEGENDA ALLEGATO N. 1

LEGGE N. 798/84 e successivi rifinanziamenti: - IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI : gli importi effettivamente assegnati nei diversi esercizi dalle Leggi n. 798/84, n. 910/86, n. 67/88, n. 360/91, n. 415/92, n. 724/94.

LEGGE N. 139/92: - IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI : gli importi attivati con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1993 e dal 1994.
I limiti di impegno con decorrenza dal 1994 autorizzati per la Regione Veneto, il Comune di Venezia e il Comune di Chioggia sono stati rimodulati dal Decreto Legge 659 del 30 novembre 1994, spostandone in parte la decorrenza al 1995 e/o al 1996.

LEGGE N. 539/95: - IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI: gli importi attivati con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1996 e dal 1997.

LEGGE N. 515/96: - IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI : gli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1997 e dal 1998.

LEGGE N. 345/97: - IMPORTI ASSEGNATI E GIA' DISPONIBILI : gli importi attivati e attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1998 e dal 1999.

LEGGE N. 295/98: - IMPORTI TOTALI ASSEGNATI : stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1999 e dal 2000.
DI CUI DISPONIBILI NEL 1999 : stima degli importi attivati o in corso di attivazione da parte dei diversi Enti che hanno già sottoscritto i contratti di mutuo a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

LEGGE N. 448/98: - IMPORTI TOTALI ASSEGNATI : stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.
DI CUI DISPONIBILI NEL 1999 : stima degli importi attivati o in corso di attivazione da parte dei diversi Enti che hanno già sottoscritto i contratti di mutuo a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

Allegato n. 2

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

STATO DI ATTUAZIONE DEL FINANZIAMENTO

LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI REFINANZIAMENTI, 139/92, 360/95, 206/97, 209/98 E 448/98

Importi in Mila di lire

	LEGGE N. 798/84 E SUP.		LEGGE N. 139/92			LEGGE N. 206/97			LEGGE N. 209/98			LEGGE N. 448/98			TOTALE		
	IMPORTI ASSEGNATI E CAP. RISPONDENTI	IMPORTI SPESI	%	IMPORTI ASSEGNATI E CAP. RISPONDENTI	IMPORTI SPESI	%	IMPORTI ASSEGNATI E CAP. RISPONDENTI	IMPORTI SPESI	%	IMPORTI ASSEGNATI E CAP. RISPONDENTI	IMPORTI SPESI	%	IMPORTI ASSEGNATI E CAP. RISPONDENTI	IMPORTI SPESI	%	IMPORTI ASSEGNATI E CAP. RISPONDENTI	IMPORTI SPESI	%
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(d)	(d/c)	(e)	(f)	(f/e)	(g)	(h)	(h/g)	(i)	(l)	(l/i)	(m) = (a+c+e+g+i)	(n) = (b+d+f+h+l)	(n/m)
STATO DI AMMINISTRAZIONE DIRETTA	329.900	304.400	91%													329.900	304.400	91%
Presidenza Consiglio	700	0	0%													700	0	0%
Interni	13.943	13.700	98%													13.943	13.700	98%
Affari esteri	3.542	3.154	89%													3.542	3.154	89%
Difesa	158.901	141.313	89%													158.901	141.313	89%
Grazia e giustizia	23.917	23.917	100%													23.917	23.917	100%
Beni culturali	92.132	82.394	89%													92.132	82.394	89%
Ente Fiera	15.329	15.095	98%													15.329	15.095	98%
Protezione civile	9.000	9.000	100%													9.000	9.000	100%
Università	11.000	11.000	100%													11.000	11.000	100%
STATO DI CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	778.500	509.000	65%	1.656.000	978.300	59%							647.000	336.000	52%	3.081.500	1.823.300	59%
Agricoltura	165.000	165.000	100%	48.470	39.450	81%							6.513	3.660	56%	219.983	208.110	95%
Beni culturali	30.000	30.000	100%	142.000	141.000	99%							17.000	3.133	18%	189.000	174.133	92%
Difesa difesa, bonifica e completamenti	314.000	314.000	100%	253.130	125.495	50%							322.500	51.000	16%	889.630	490.495	55%
Interventi in centro storico Venezia	222.500	222.500	100%	307.524	222.519	72%							328.000	43.309	13%	858.024	488.328	57%
Lavori di completamento	34.000	34.000	100%	17.876	17.876	100%							5.000	5.917	118%	56.876	57.793	102%
Lavori di manutenzione	34.000	34.000	100%	11.000	11.000	100%							3.000	2.100	70%	48.000	47.100	98%
Opere marittime	11.000	11.000	100%	11.000	11.000	100%							4.000	0	0%	26.000	22.000	85%
Porti, canali di grandi	93.000	93.000	100%	224.000	220.300	98%							97.215	41.020	42%	414.215	354.320	86%
Ricerca scientifica	7.000	7.000	100%	2.000	1.300	65%							1.772	1.000	56%	10.772	9.300	86%
REGIONE VENETO (*)	253.300	200.400	79%	484.000	336.037	69%							294.000	34.871	12%	1.031.300	571.308	55%
Disinquinamento	46.300	39.676	86%	77.000	28.037	36%							294.000	34.871	12%	417.300	102.584	25%
Ospedale SS. Giovanni e Paolo	27.000	22.100	82%	5.000	0	0%							0	0	0%	32.000	22.100	69%
Ospedali	40.000	11.320	28%	0	0	0%							0	0	0%	40.000	11.320	28%
PROVINCIA DI VENEZIA	3.400	3.400	100%	16.000	16.000	100%							11.000	0	0%	30.400	19.400	64%
Edilizia giudiziaria varia																		
COMUNE DI VENEZIA	294.000	294.000	100%	721.870	493.500	68%							144.000	88.700	62%	1.159.870	876.200	76%
Risanamento idraulico				300.370	254.065	85%							99.000	26.997	27%	399.370	281.062	70%
Risanamento ambientale				37.500	34.571	92%							10.000	3.637	36%	47.500	38.208	80%
Consolidamento statico				34.000	28.000	82%							10.000	14.649	146%	44.000	42.649	97%
Risanamento ambientale				44.000	47.849	109%							25.000	6.431	26%	69.000	54.280	79%
Progetto integrato ed altri (*)				243.000	128.971	53%										243.000	128.971	53%
COMUNE DI CHIOGGIA	62.477	35.045	56%	64.000	45.477	71%							36.000	3.816	11%	162.477	84.338	52%
Risanamento idraulico																		
Risanamento ambientale																		
Consolidamento di grandi																		
Consolidamento																		
TOTALE PARZIALE	1.769.513	1.376.731	82%	3.407.281	2.004.426	47%	294.000	231.801	41%	1.656.500	612.815	37%	1.233.500	26.331	2%	8.779.033	4.979.301	47%

(*) Art. 3 della Legge 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dal fondo di bacino nazionale per la Regione Veneto venga integrata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto Integrato per i rii.

Allegato n. 3

LEGGE N. 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in lire milioni)

Soggetti	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:				
Stato in amministrazione diretta - dati al 31.12.99	340.914	329 955	326.255	301.558
L. 798/84, art. 3 lett. a) Riequilibrio Idrogeologico	700	700	466	0
L. 798/84, art. 3 lett. b) Serv. Antinquinamento	21 685	15.055	13.777	13.769
L. 798/84, art. 3 lett. c) Marginamenti lagunari	6.671	3.842	3.157	3.154
L. 798/84, art. 3 lett. e) Restauro edifici demaniali	150.981	150.981	150.981	141.313
L. 798/84, art. 3 lett. f) Recupero Arsenale	23.917	23.917	23.917	23.917
L. 798/84, art. 3 lett. g) Ponti, canali, fondamenta	96.122	96.122	94.645	82.394
L. 798/84, art. 3 lett. h) Sistemaz. corsi d'acqua	19.726	18.226	18.200	15.899
L. 798/84, art. 3 lett. i) Patrimonio mobiliare pubblico	9.026	9.026	9.026	9.026
L. 798/84, art. 3 lett. m) Università Architettura	12.086	12 086	12.086	12.086
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.99	778.396	778 396	777.936	775.348
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche	166.664	166.664	166.664	165.018
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli	30.407	30.407	30.407	30.395
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.	216.586	216.586	216.586	216.504
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado	232.165	232.165	231.705	231.626
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo	24.998	24.998	24.998	24.986
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione	14.365	14.365	14.365	14.365
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali	85.393	85.393	85.393	84.642
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca	7 818	7.818	7.818	7.812
Altri Enti :	106.543	96.543	96.347	89.880
Autorità Portuale già Provveditorato al Porto	21.000	21.000	21.000	21.000
Ministero BB.CC.AA. - dati al 31.12.98	16.500	16.500	16.500	15.629
Ministero Industria	10.000	-	-	-
Ministero Ricerca Scientifica - dati al 21.02.97	20.000	20.000	20.000	18.030
Ministero del Tesoro	2.000	2.000	2.000	2.000
Procuratoria di S. Marco	9.043	9.043	9.043	9.043
Università degli Studi - dati al 30.10.99	25.000	25.000	24.804	21.178
Aeroporto Marco Polo	2.000	2.000	2.000	2.000
Fond. Querini Stampalia	1.000	1.000	1.000	1.000
Ministero Ambiente	-	-	-	-
IUAV	-	-	-	-
REGIONE VENETO - dati al 20.12.99	531.300	531.300	456.411	283.652
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento	464.300	464.300	389.411	249.674
L. 798/84, art. 5 lett. a) - Acquedotti	40.000	40.000	40.000	11.830
L. 798/84, art. 5 lett. b) Osp. SS. Giovanni e Paolo	27.000	27.000	27.000	22.148
PROVINCIA DI VENEZIA - dati al 18.02.98				
L. 67/88, art. 17 com.12) Restauro patrimonio storico	3.951	3.400	3.400	3.400
COMUNE DI VENEZIA - dati al 30.06.97	394.885	394.885	394.885	316.000
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili				
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria				
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati				
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi				
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture				
L. 360/91, art. 2 lett. d) Contributi acquisto 1^ casa				
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.99	62.077	62.077	61.885	50.966
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili				
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria				
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati				
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture				
L. 360/91, art. 2 lett. d) Contributi acquisto 1^ casa				
TOTALE	2.218.066	2.196.556	2.117.119	1.820.804

NOTE

1) Per i rifinanziamenti della Legge 798/84, sono stati considerati gli importi risultanti dalle successive rimodulazioni e al netto delle riduzioni di cui al D.M. Tesoro n. 114758 del 21.02.1994.

2) IMPORTI IMPEGNATI: - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

Allegato n. 4

LEGGE N. 139/92

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in lire milioni)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 139/92	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:						
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.99	92.500	1.035.000	(1)	1.035.000	1.035.000	870.359
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		40.439		40.439	40.439	39.438
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli		165.665		165.665	165.665	164.608
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.	67.800	251.139		251.139	251.139	175.495
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		307.826		307.826	307.826	222.816
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		17.996		17.996	17.996	17.078
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione	24.100	15.032		15.032	15.032	15.032
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		231.089		231.089	231.089	230.303
L. 798/84, art. 3 lett. l) Valli da pesca	600	5.815		5.815	5.815	5.589
Altri Enti :	10.500	95.154		95.154	95.154	94.571
Università degli Studi - dati al 30.10.99	4.000	34.836	(1)	34.836	34.836	34.253
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.98	4.000	40.000	(1)	40.000	40.000	40.000
IUAV - dati al 31.12.99	2.500	20.318	(1)	20.318	20.318	20.318
REGIONE VENETO - dati al 20.12.99 (*)						
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento	71.500	603.000	(1)	670.000	409.098	226.037
PROVINCIA DI VENEZIA - dati al 18.02.98						
L. 67/88, art.17 com.12) Restauro patrimonio storico	2.500	28.905	(1)	28.905	24.737	18.650
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.99	65.000	731.576	(2)	596.378	723.108	493.903
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		305.795			305.075	254.862
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		57.346			55.534	36.571
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		56.000			56.000	28.900
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		66.710			66.108	47.849
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (*)		245.725			240.391	125.721
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.99	8.000	69.100	(2)	69.100	69.100	45.487
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili	5.928					
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture						
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria	777					
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati	1.295					
TOTALE	250.000	2.562.735		2.494.537	2.356.197	1.749.007

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI : gli importi attivati a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge.
- *I limiti di impegno con decorrenza dal 1994 autorizzati per la Regione Veneto, il Comune di Venezia e il Comune di Chioggia* dalla Legge 139/92 e successivo D.M. n. 140503 del 21.05.1992 sono stati rimodulati dal Decreto Legge n. 659 del 30 novembre 1994 spostandone in parte la decorrenza al 1995 e/o al 1996.
- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :
  (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1993 e dal 1994.
  (2) *Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1993, dal 1994, dal 1995 e dal 1996.*
  Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".
- IMPORTI IMPEGNATI: - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrate da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.
- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):
  (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto non comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii, comprese, invece, nelle rispettive voci del Comune di Venezia.

Allegato n. 5

LEGGE N. 539/95

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in lire milioni)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 539/95	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:						
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.99	19.185	233.000	(1)	233.000	233.000	119.108
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		19.566		19.566	19.566	17.552
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli		-		-	-	-
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.		61.882		61.882	61.882	21.251
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		60.336		60.336	60.336	30.729
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		4.000		4.000	4.000	2.120
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione		-		-	-	-
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		87.216		87.216	87.216	47.455
L. 798/84, art. 3 lett. l) Valli da pesca		-		-	-	-
Altri Enti :	4.856	47.682		47.682	41.446	38.035
Università degli Studi - dati al 30.10.99	1.862	17.089	(1)	17.089	12.034	8.623
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.98	1.845	18.500	(1)	18.500	18.500	18.500
IUAV - dati al 31.12.99	1.149	12.093	(1)	12.093	10.912	10.912
REGIONE VENETO - dati al 20.12.99 (*)	9.029	84.000	(1)	90.000	81.775	24.074
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento		77.500		83.500	75.275	23.363
L. 798/84, art. 5 lett. b) Ospedali		6.500		6.500	6.500	711
PROVINCIA DI VENEZIA dati al 18.02.98						
L. 67/88, art. 17 com.12) Restauro patrimonio storico	1.844	16.000	(1)	16.000	12.903	101
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.99	17.675	144.000	(1)	144.000	136.772	85.704
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		98.659			91.865	56.997
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		18.341			17.907	5.637
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		20.000			20.000	16.649
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		7.000			7.000	6.421
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (*)						
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.99	2.911	28.000	(1)	28.000	28.000	2.015
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili						
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture						
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria						
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati						
TOTALE	55.500	552.682		558.682	533.896	269.037

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI TOTALI : stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1996 e dal 1997.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :
  (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1996 e dal 1997.
  Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".

- IMPORTI IMPEGNATI: - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova già registrate da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto non comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii, comprese, invece, nelle rispettive voci del Comune di Venezia.

Allegato n. 6

LEGGE N. 515/96

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in lire milioni)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 515/96	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:						
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.99	69.700	847.000	(1)	847.000	847.000	230.684
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		6.833		6.833	6.833	2.668
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli		13.400		13.400	13.400	8.123
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.		323.589		323.589	323.589	55.898
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		320.892		320.892	320.892	63.209
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		24.000		24.000	24.000	5.914
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione		-		-	-	-
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		158.284		158.284	158.284	94.872
L. 798/84, art. 3 lett. l) Valli da pesca		-		-	-	-
Altri Enti :	14.300	157.134		157.134	91.867	38.604
Università degli Studi - dati al 30.10.99	3.550	34.000	(1)	34.000	6.282	338
Autorità Portuale - dati al 31.12.99	6.000	68.000	(1)	68.000	39.188	17.214
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.98	2.950	36.000	(1)	36.000	36.000	10.655
IUAV - dati al 31.12.99	1.800	19.134	(1)	19.134	10.397	10.397
REGIONE VENETO - dati al 20.12.99 (*)						
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento	30.800	294.000	(1)	317.000	65.744	8.027
PROVINCIA DI VENEZIA dati al 18.02.98						
L. 67/88, art. 17 com.12) Restauro patrimonio storico	7.400	83.000	(1)	83.000	83.000	2.015
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.99	54.103	512.393	(1)	512.393	503.736	168.440
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		299.224			295.997	102.472
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		80.640			76.203	14.516
L. 798/84, art. 6 lett. c) *Contributi a privati*		79.652			79.593	29.946
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		22.520			21.872	11.160
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (*)		30.357			30.071	10.346
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.99	8.697	90.000	(1)	90.000	90.000	2.849
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili						
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture						
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria						
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati						
TOTALE	185.000	1.983.527		2.006.527	1.681.347	450.619

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: *stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1997 e dal 1998.*

- *IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :*
  (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997 e dal 1998.
  Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".

- IMPORTI IMPEGNATI: - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova già registrate da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):
  (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto non comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii, comprese, invece, nelle rispettive voci del Comune di Venezia.

Allegato n. 7

LEGGE N. 345/97

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in lire milioni)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 345/97	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:					
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.99	35.000	432.000	(2) 432.000	432.000	23.317
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		12.815	12.815	12.815	5.729
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli		-	-	-	-
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.		155.916	155.916	155.916	5.231
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		245.270	245.270	245.270	11.767
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		6.000	6.000	6.000	191
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione		-	-	-	-
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		12.000	12.000	12.000	399
L. 798/84, art. 3 lett. l) Valli da pesca		-	-	-	-
Altri Enti :	8.000	85.239	65.239	2.579	548
Università degli Studi - dati al 30.10.99	4.000	41.900	(2) 41.900	2.579	548
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.98	2.000	20.000		0	0
IUAV - dati al 31.12.99	2.000	23.339	(2) 23.339	0	0
REGIONE VENETO - dati al 20.12.99 (*)	20.000	225.000	(2) 263.000	0	0
L. 798/84, art. 5 lett. a) Acquedotti		68.800	68.800	0	0
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento		156.200	194.200	0	0
PROVINCIA DI VENEZIA dati al 18.02.98 L. 67/88, art. 17 com.12) Restauro patrimonio storico	2.000	20.000	(1) 13.000	0	0
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.99	31.415	300.000	(2) 300.000	294.635	24.773
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		154.978		150.218	19.481
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		25.802		25.206	3.530
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		47.300		47.300	846
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		28.920		28.920	355
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (*)		43.000		42.991	561
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.99	3.585	46.000	(2) 46.000	46.000	2.233
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					
TOTALE	100.000	1.108.239	1.119.239	775.214	50.871

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1998 e dal 1999.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :
  (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998.
  (2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998 e dal 1999.
  Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".

- IMPORTI IMPEGNATI: - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova già registrate da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):
  (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto non comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii, comprese, invece, nelle rispettive voci del Comune di Venezia.

Allegato n. 8

LEGGE N. 295/98

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in lire milioni)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 295/98		IMPORTI ASSEGNATI			IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 1999	anno 2000	anno 1999	anno 2000	totale				
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova)	-	-	-	-	-	-		-	-
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin. L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali L. 798/84, art. 3 lett. l) Valli da pesca									
Altri Enti :	7.500	8.000	90.189	96.000	186.189			1.910	0
Università degli Studi - dati al 30.10.99	1.500	2.000	18.189	24.000	42.189	(1)	18.189	1.910	0
Autorità Portuale di Venezia - dati al 31.12.99	1.000	1.000	12.000	12.000	24.000	(1)	12.000	0	0
Aeroporto Marco Polo	1.000	1.000	12.000	12.000	24.000				
CO.RI.LA. - dati al 31.10.99	500	500	6.000	6.000	12.000	(1) dato non pervenuto		0	0
Diocesi Patriarcato di Venezia	1.000	1.000	12.000	12.000	24.000	(1)			
Biennale di Venezia	1.000	1.000	12.000	12.000	24.000	(1)			
Querini Stampalia	500	500	6.000	6.000	12.000				
IUAV	1.000	1.000	12.000	12.000	24.000		0	0	0
REGIONE VENETO (*) L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento	-	-	-	-	-	-		-	-
PROVINCIA DI VENEZIA L. 67/88, art. 17 com.12) Restauro patrimonio storico	1.000	1.000	12.000	12.000	24.000				
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.99	1.275	850	12.750	8.500	21.250	(2)	21.250	15.700	0
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili			12.750	8.500	21.250			15.700	0
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria			-	-	-			-	-
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati			-	-	-			-	-
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi			-	-	-			-	-
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (*)			-	-	-			-	-
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.99	225	150	2.500	1.800	4.300	(1)	2.500	2.500	0
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati									
TOTALE	10.000	10.000	117.439	118.300	235.739			20.110	0

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1999 e dal 2000.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo.
  (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999.
  (2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999 e dal 2000.

- IMPORTI IMPEGNATI: - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova registrate da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):
  (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto non comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii, comprese, invece, nelle rispettive voci del Comune di Venezia.

Venezia, giugno 2000

Allegato n. 9

LEGGE N. 448/98

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in lire milioni)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 448/98			IMPORTI ASSEGNATI				IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 1999	anno 2000	anno 2001	anno 1999	anno 2000	anno 2001	totale			
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31 12.99	22 000	6 000	10.000	287.000	78 000	130 000	495 000	(2) 365.000	287 000	303
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche				5.441	0	7.500	12.941			34
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli				20.000	0	0	20.000			
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.				66.000	20.000	34.500	120.500			
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado				177.000	55.000	74 000	306.000			153
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio informativo				7.000	3.000	2.000	12.000			
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione				0	0	0	0			
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali				11.559	0	4.000	15.559			116
L. 798/84, art. 3 lett. l) Valli da pesca				0	0	8.000	8.000			
Altri Enti :	2.167	1.000	1.000	27.000	12 000	12.000	51.000		0	0
Azienda speciale porto Chioggia	250			3.000	0	0	3.000			
Aeroporto Marco Polo	1.500	1.000	1.000	18 000	12.000	12.000	42.000			
Diocesi di Chioggia - dati al 31.12.99	417			6.000	0	0	6.000	(1) 6.000	0	0
REGIONE VENETO (*) L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento	22.000	6.000	10.000	264.000	72.000	120 000	456.000			
PROVINCIA DI VENEZIA L. 67/88, art. 17 com.12) Restauro patrimonio storico										
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.99	20 600	5.800	7.500	220.000	61 000	80 000	361.000	(1) 220 000	202.758	0
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili				148.854					135.000	0
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria				28.899					27.061	0
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati				31.200					30.200	0
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi				11.047					10.497	0
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (*)				-					-	-
COMUNE DI CHIOGGIA	3 233	1.200	1.500	38 796	14.400	18 000	71.196	dato non pervenuto	0	0
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati										
TOTALE	70 000	20.000	30.000	836.796	237.400	360.000	1 434.196		489.758	303

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :
(1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999.
2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999 e dal 2000.

- IMPORTI IMPEGNATI: - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova registrate da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):
(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto non comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii, comprese, invece, nelle rispettive voci del Comune di Venezia.

Venezia, giugno 2000

Allegato n. 10

RELAZIONE AL PARLAMENTO SUGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

Aggiornamento al 31 dicembre 1999

TABELLA DI SINTESI DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI, IMPEGNATI E SPESI

CON LE LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI, 139/92, 539/95, 515/96, 345/97, 295/98 E 448/98

Importi in Lire milioni

	IMPORTI ASSEGNATI (A)	Importi assegnati rispetto al totale generale (%)	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI (B)	IMPORTI IMPEGNATI (C)	Importi impegnati rispetto importi disponibili (%) (C/B)	IMPORTI SPESI (D)	Importi spesi rispetto importi disponibili (%) (D/B)
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	329.955	3%	329.955	326.255	99%	301.558	91%
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	3.820.396	38%	3 612.396	3.611 936	100%	2 019 118	56%
REGIONE VENETO (*)	2.193 300	22%	2 001.300	1 013 028	51%	541 790	27%
PROVINCIA DI VENEZIA	175.305	2%	163.305	124 040	76%	24.166	15%
COMUNE DI VENEZIA (*)	2.465.104	25%	2 315.604	2.271.594	98%	1.088.820	47%
COMUNE DI CHIOGGIA	370.673	4%	336.473	297.485	88%	103.550	31%
ALTRI ENTI	718.941	7%	598.941	329.303	55%	261.638	44%
TOTALE GENERALE	10.073.674	100%	9.357.974	7.973.641	85%	4.340.640	46%

(*) L'art. 3 della Legge 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato per i rii.

NOTA BENE: La differenza tra gli importi assegnati (colonna A) e gli importi disponibili (colonna B) è data dai finanziamenti già assegnati ma che potranno essere attivati a valere su limiti di impegno con decorrenza dal 2000 e dal 2001.

Venezia, giugno 2000

PAGINA BIANCA

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

Documento A *Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato alle Acque* - Stato di attuazione degli interventi dello Stato in amministrazione diretta - Aggiornamento al 31 dicembre 1999

Documento B *Consorzio Venezia Nuova* - Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova – Aggiornamento al 31 dicembre 1999

Documento C *Regione del Veneto* Interventi per la salvaguardia di Venezia - Prospetto generale e stato degli interventi - Aggiornato al 20 dicembre 1999

Documento D *Comune di Venezia* – Interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna programma e stato di avanzamento – Aggiornato al 31 dicembre 1999

Documento E *Comune di Chioggia* – Interventi per la salvaguardia di Venezia – Prospetto riepilogativo stanziamenti Legge n. 798/84 e successive - Aggiornamento al 31 dicembre 1999

Documento F *Università Ca' Foscari di Venezia* – Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia - Aggiornamento al 30 ottobre 1999

Documento G *Autorità Portuale di Venezia* – Stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità Portuale finanziati dalla Legislazione Speciale per Venezia - Aggiornamento al 31 dicembre 1999

Documento H *SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo* – Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale - Aggiornamento al 31 dicembre 1999

Documento I *Consorzio per la gestione del Centro di Coordinamento delle attività di ricerca inerenti al sistema lagunare di Venezia – CO.RI.LA* Stato di attuazione attività svolte con fondi legislazione speciale - Aggiornamento al 31 dicembre 1999

Documento L *Istituto Universitario di Architettura di Venezia - I.U.A.V.* – Utilizzazione fondi Legge n. 139/92 e seguenti

Documento M *Diocesi di Chioggia* – Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale - Aggiornamento al 31 dicembre 1999

PAGINA BIANCA

Documento A ***Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato alle Acque***

Stato di attuazione degli interventi dello Stato in amministrazione diretta - Aggiornamento al 31 dicembre 1999

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLO STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Aggiornamento al 31 dicembre 1999

Importi lordi in Lire milioni

COMPETENZA	OBIETTIVI		LEGGE N. 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI (910/86 - 67/88 - 360/91 - 415/92 - 724/94)					
			IMPORTI FINANZIATI (A)	IMPORTI ASSEGNATI (B)	IMPORTI IMPEGNATI (C)	% (C/B)	IMPORTI EROGATI (D)	% (D/B)
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. a)	Riequilibrio idrogeologico	700	700	466	67%	0	0%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. b)	Servizio vigilanza e Anti-inquinamento (*)	21.685	15.055	13.777	92%	13.769	91%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. c)	Marginamenti lagunari	6.671	3.842	3.157	82%	3.154	82%
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. e)	Restauro di edifici demaniali	150.981	150.981	150.981	100%	141.313	94%
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. f)	Recupero dell'Arsenale	23.917	23.917	23.917	100%	23.917	100%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. g)	Sistemazione di ponti, canali e fondamenta	96.122	96.122	94.645	98%	82.394	86%
Ufficio Salvaguardia	L. 798/84, art. 3 lett. h)	Sistemazione dei corsi d'acqua	19.726	18.226	18.200	100%	15.899	87%
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. i)	Restauro del patrimonio mobiliare pubblico	9.026	9.026	9.026	100%	9.026	100%
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. m)	Edilizia per Università Architettura	12.086	12.086	12.086	100%	12.086	100%
		TOTALI	**340.914**	**329.955**	**326.255**	**99%**	**301.558**	**91%**

(*) La differenza tra l'assegnato e l'impegnato è dovuto all'accantonamento di £. 330.000.000 e al trasferimento di parte dei fondi ad altro capitolo per il pagamento dei contrattisti.

Venezia, giugno 2000

PAGINA BIANCA

Documento B ***Consorzio Venezia Nuova***

Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova – Aggiornamento al 31 dicembre 1999

PAGINA BIANCA

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

CONCESSIONARIO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova

Aggiornamento al 31 dicembre 1999

giugno 2000

PAGINA BIANCA

Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova

Aggiornamento al 31 dicembre 1999

PAGINA BIANCA

Lo stato di attuazione dei finanziamenti

Gli interventi dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova riguardano i seguenti obiettivi, richiamati anche dall'art. 3 lettere a), c), d) e l) della Legge n. 798/84 e dall'art. 2, 1° comma lettera a) della Legge n. 360/91 nonché dalla Legge n. 139/92:

- opere mobili alle bocche di porto per la regolazione delle maree;
- adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;
- difesa dalle acque alte degli abitati insulari, "insulae" e marginamenti;
- ripristino della morfologia lagunare;
- arresto del processo di degrado della laguna;
- difesa dei litorali;
- sostituzione del traffico petrolifero in laguna;
- apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree;
- costituzione e potenziamento del Servizio Informativo;
- interventi di ausilio alla navigazione marittima notturna e con nebbia lungo il canale Malamocco- Marghera.

La Legge n. 139/92 prevede, in particolare, che gli interventi affidati in concessione siano realizzati secondo uno specifico strumento programmatorio ovvero secondo il Piano generale degli interventi allegato alla Convenzione Generale tra il Ministero dei Lavori Pubblici e il concessionario, approvato dal Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 nell'adunanza del 19 giugno 1991.

Il totale degli importi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia al 31 dicembre 1999 per la realizzazione dei suddetti interventi in concessione al Consorzio Venezia Nuova è pari a 3.820 miliardi di lire.

Con riferimento all'*Allegato n. 1*, per **importi finanziati** si intendono gli importi complessivamente finanziati dalla legislazione speciale per Venezia in favore delle attività del Consorzio Venezia Nuova dal 1984 a oggi.
Sono inclusi anche gli importi che sono già stati o saranno attivati a valere sui limiti di impegno resi disponibili dalla recente Legge n. 448/98 con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.

Per **importi sottoscritti** si intendono gli importi relativi a convenzioni sottoscritte tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova (v. *Allegato n. 1*). Al 31.12.1999 gli importi sottoscritti per le Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96 e n. 345/97, 448/98 sono pari al 95% degli importi finanziati. In particolare, in relazione alla recente Legge n. 448/98, già nel corso del 1999 è stato sottoscritto un atto finanziato con le somme reperite a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999 (15^ Convenzione). L'elenco delle Convenzioni sottoscritte e il loro avanzamento è riportato nell'*Allegato n. 2*.

Per **importi impegnati** si intendono gli importi relativi a convenzioni il cui Decreto Presidenziale approvativo è già stato registrato da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti. Al 31.12.1999 risultano, pertanto, impegnati tutti gli importi sottoscritti (v. *Allegato n. 1*), ad eccezione di quelli relativi alla Convenzione sottoscritta in base alla recente Legge n. 448/98.

Per **importi spesi** al 31.12.1999 si intendono gli importi prodotti a tale data. **Al 31.12.1999 risulta speso il 61% degli importi finanziati** (v. *Allegato n. 1*) **reperiti a valere sulle Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, 515/96 e 345/97. Gli importi spesi alla stessa data scendono al 53% tenendo conto anche delle somme rese disponibili dalla più recente Legge n. 448/98.**

Per singole Leggi:

- il Consorzio Venezia Nuova, a valere sulla **Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti** (Leggi n. 910/86, n. 67/88, n. 360/91), ha ottenuto un finanziamento che ammonta complessivamente a 778 miliardi, tutti effettivamente disponibili al 31.12.1999. A valere su tali somme, il Consorzio Venezia Nuova ha sottoscritto dal 1985 al 1992 otto Convenzioni, sei con il Magistrato alle Acque e due con il Genio Civile Opere Marittime, e numerosi Atti Aggiuntivi a tali Convenzioni per un importo complessivo di 778 miliardi circa. Tali atti sono già tutti registrati alla Corte dei Conti e quindi risultano operativi a tutti gli effetti. Gli importi spesi al 31.12.1999 sono 775 miliardi, pari a quasi il 100% degli importi finanziati.

- Il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 139/92** con decorrenza dal 1993 e dal 1994, ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo e successivi atti aggiuntivi, che hanno complessivamente reso disponibili 1.035 miliardi. Con tali somme sono state sottoscritte due Convenzioni e alcuni atti aggiuntivi alle convenzioni stesse, per un importo complessivo di 1.035 miliardi (100% dell'importo disponibile). Gli importi spesi relativamente alla Legge n. 139/92 sono pari a 870 miliardi (84% degli importi finanziati) al 31.12.1999.

- Il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 539/95** con decorrenza dal 1996 e dal 1997, ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo e successivi atti aggiuntivi, che hanno reso disponibili 233 miliardi. Con tali somme sono state finanziate due Convenzioni con il Magistrato alle Acque e due atti aggiuntivi alle Convenzioni originarie, per un importo complessivo di 233 miliardi. Gli importi spesi al 31.12.1999 relativamente alla Legge n. 539/95 sono pari a 119 miliardi circa (51% degli importi finanziati).

- A valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 515/96** con decorrenza dal 1997 e dal 1998, il Consorzio Venezia Nuova ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo e successivi atti aggiuntivi che hanno reso disponibili 847 miliardi. Con tali somme sono state sottoscritte due convenzioni (la 11^ e la 12^) e alcuni atti aggiuntivi con il Magistrato alle Acque per un importo complessivo pari a 847 miliardi, tutti disponibili al 31.12.1999.
  Gli importi spesi al 31.12.1999 relativamente alla Legge n. 515/96 sono pari a 231 miliardi (27% degli importi finanziati).

- A valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 345/97** con decorrenza dal 1998, il Consorzio Venezia Nuova ha stipulato con gli istituti finanziatori un contratto di mutuo che ha reso disponibili 160 miliardi. E' stata successivamente sottoscritta in data 23.12.1997 con il Magistrato alle Acque una nuova Convenzione (la 13^) di importo pari a 160 miliardi, registrata alla Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti in data 24 luglio 1998. Essa, pertanto, risulta operativa dal secondo semestre del 1998.
  Inoltre, nel mese di luglio 1998 il Magistrato alle Acque ha sottoscritto con il Consorzio Venezia Nuova una ulteriore Convenzione (la 14^), di importo pari a 190 miliardi, a valere sul contratto di mutuo perfezionato dal Concessionario in data 1° luglio 1998 relativamente ai limiti di impegno con decorrenza dal 1999; essa è stata registrata alla Corte dei Conti in data 23.09.1998, ma è divenuta operativa a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1999.
  A seguito di revisione dei contratti di mutuo, nel corso del 1999, è stato possibile sottoscrivere con il Magistrato alle Acque due atti aggiuntivi alle Convenzioni originarie. L'importo complessivo reso disponibile dalla Legge in esame è pari a 432 miliardi.
  Gli importi spesi al 31.12.1999 relativamente alla Legge n. 345/97 sono pari a 23 miliardi (5% degli importi finanziati), data la recente operatività delle Convenzioni e degli Atti aggiuntivi.

- Infine, il provvedimento collegato alla Legge Finanziaria per il 1999 (**Legge n. 448 del 23 dicembre 1998**) ha previsto, per il rifinanziamento della legislazione speciale per Venezia, gli stanziamenti a copertura delle rate di ammortamento dei mutui già perfezionati dai vari Enti destinatari dei finanziamenti per la salvaguardia di Venezia in forza del disposto della Legge n. 139/92 nonchè, quali "limiti di impegno", 70 miliardi con decorrenza dal 1999, ulteriori 20 miliardi con decorrenza dal 2000 e ulteriori 30 miliardi con decorrenza dal 2001 complessivamente destinati alla salvaguardia di Venezia. La ripartizione tra i vari Enti e la destinazione specifica dei fondi per la realizzazione degli interventi per Venezia è stata operata mediante Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica n. 150214 in data 8 giugno 1999 che ha recepito la proposta del Comitato ex art. 4, Legge n. 798/84 nella seduta dell'8 marzo 1999.

  In base a tale Decreto sono stati destinati al Consorzio Venezia Nuova limiti di impegno pari a 22 miliardi con decorrenza dal 1999, pari a 6 miliardi con decorrenza dal 2000 e pari a 10 miliardi con decorrenza dal 2001.

  A valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999, il Consorzio Venezia Nuova ha stipulato con gli istituti finanziatori un contratto di mutuo che ha reso disponibili 290 miliardi. Con tali somme è stata sottoscritta in data 1.12.1999 con il Magistrato alle Acque una nuova Convenzione (la 15^) di importo pari a 287 miliardi, registrata alla Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti in data 10.02.2000.

  Si stima che l'importo complessivo reso disponibile dalla legge in esame possa essere pari a 495 miliardi. Gli ulteriori 208 miliardi non sono stati impiegati o impegnati nel corso del 1999 in quanto i finanziamenti dovranno essere attivati a valere sui "limiti di impegno" resi disponibili dalla legge con decorrenza dal 2000 e dal 2001.

Nell'*Allegato n. 3* è riportato lo stato di attuazione degli interventi del Consorzio suddivisi per Legge di finanziamento e secondo gli obiettivi indicati dalle Leggi n. 798/84 e n. 139/92; nelle pagine seguenti è riportato, in modo descrittivo, lo stato di avanzamento degli interventi suddiviso per ciascun obiettivo.

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera a) Legge n. 798/84

DIFESA DALLE ACQUE ALTE

Opere mobili alle bocche di porto per la regolazione delle maree

Descrizione degli interventi

Gli interventi previsti per la protezione di Venezia e della sua laguna dagli effetti delle alte maree eccezionali consistono nel sistema di opere mobili alle bocche di porto, in grado di isolare la laguna dal mare per il tempo necessario ad evitare gli allagamenti degli abitati lagunari.

Il progetto del dispositivo ha seguito scrupolosamente i criteri forniti dal Consiglio Superiore del Ministero dei Lavori Pubblici n. 209 del 1982 secondo i quali le opere non devono alterare lo scambio idrico tra mare e laguna, per evitare effetti ambientali negativi, non devono costituire un ostacolo alla navigazione, e quindi una penalizzazione delle importanti attività economiche ad essa collegate, e infine non devono costituire un'alterazione del paesaggio.

Secondo le direttive impartite dal Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge n. 798/84 nel voto del 20 marzo 1990, il progetto di massima delle opere alle bocche di porto è proceduto in parallelo a quelli per la difesa ad "insula" dei centri urbani lagunari; per l'allontanamento del traffico petrolifero, per la riapertura delle valli da pesca, per il riequilibrio idrogeologico della laguna.

Le opere progettate consistono, per ciascuna bocca di porto, in una schiera di paratoie mobili incernierate sul fondo, senza strutture intermedie, che, in condizioni normali di marea, restano in posizione di riposo negli alloggiamenti sul fondale del canale di bocca.

Le paratoie, quando si trovano in posizione di riposo, giacciono sul fondo per effetto del peso dell'acqua che contengono.

Per raggiungere la posizione di chiusura esse vengono svuotate dall'acqua mediante immissione di aria compressa. Il sollevamento delle paratoie avviene allora a causa della spinta di galleggiamento.

Le opere mobili sono previste in corrispondenza delle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia, con uno sviluppo rispettivamente di 820, 400 e 360 metri.

La dimensione delle sezioni attuali viene rispettata, consentendo quindi di lasciare inalterato lo scambio idrico mare-laguna. Le schiere di paratoie verranno sollevate solamente in presenza di maree previste superiori a +100 cm sul caposaldo di Punta della Salute, fatto che avviene all'incirca 7/8 volte all'anno. In queste occasioni le bocche di porto resteranno chiuse per tutta la durata dell'acqua alta, ossia per circa 4 ore rendendo ininfluente l'interferenza con la navigazione. Per livelli di marea uguali o inferiori a +100 la protezione dei centri abitati è assicurata da sistemi locali di difesa.

La flessibilità di gestione, anche in presenza di crescita del livello del mare, di questo sistema integrato di interventi di difesa dalle acque alte, è stata uno dei punti qualificanti rilevati anche dal "Collegio di esperti di livello internazionale" nel loro Parere di Valutazione di Impatto Ambientale.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1999

I finanziamenti fino a oggi disponibili per le opere alle bocche di porto sono stati impegnati e spesi per la progettazione preliminare di massima, per la successiva progettazione di massima, per una complessa e articolata serie di attività di studio e di sperimentazione propedeutiche alle suddette progettazioni, per lo svolgimento dello studio di impatto ambientale (S.I.A.) delle opere stesse e, infine, per le attività di approfondimento del progetto di massima richieste dal Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nella seduta dell'8 marzo 1999.

Sono stati completati gli studi e i monitoraggi utili alla progettazione e le sperimentazioni su modelli matematici e fisici presso i maggiori centri nazionali e internazionali quali:

Estramed (Pomezia - Roma), Centro sperimentale di Voltabarozzo (Padova), Danish Hydraulics Laboratory (Danimarca), Delft Hydraulics Institute (Olanda) e Hydraulics Research di Wallingford (Inghilterra).

E' stato costruito anche un prototipo in scala reale di una paratoia (Modulo Sperimentale Elettromeccanico - mose) costituito dalla paratoia stessa e da una struttura perimetrale, presente solo in questa fase di sperimentazione per il sostegno della paratoia e per il posizionamento degli uffici e dei laboratori con le strumentazioni di controllo.
Il mose è rimasto operativo per circa quattro anni (dal 1988 al 1992) presso la bocca di porto di Lido, nel canale di Treporti.
Le attività eseguite con il mose hanno consentito la prova sul campo del comportamento di un paratoia e della affidabilità e funzionalità dei componenti meccanici e impiantistici più significativi. Le prove hanno permesso anche di individuare i materiali e i sistemi di protezione più indicati contro la corrosione marina. Esse renderanno possibili consistenti risparmi e maggior sicurezza di esercizio per le future installazioni alle bocche di porto.

Sono state eseguite, alle tre bocche di porto e in prossimità dei moli, indagini geognostiche, anche di grande rilievo, condotte con tecnologie assolutamente innovative (carotaggi a grande diametro); le attività sono state tutte completate.

Il progetto preliminare di massima (Riequilibrio e Ambiente - REA) è stato completato nel luglio del 1989 e approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nello stesso anno.
Nel 1990, il Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge n. 798/84, con il voto del 20 marzo che recepisce le osservazioni del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, ha autorizzato il Consorzio Venezia Nuova a procedere alla redazione del progetto di massima.

Il **progetto di massima** è stato ultimato nel luglio del 1992, approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nel novembre dello stesso anno e inviato, nel gennaio

del 1993, ai Comuni di Venezia e di Chioggia e alla Regione del Veneto. Nel febbraio del 1993 il progetto è stato trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L'approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è avvenuta il 18 ottobre 1994.
In precedenza, il progetto era stato valutato positivamente da un Comitato indipendente di esperti di alcune tra le più importanti società di ingegneria e di consulenza inglesi, canadesi e americane (Monitor international limited, Acres international limited, Bechtel international inc.).

In data 4 luglio 1995 il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge 798/84 ha deciso di sottoporre alla procedura per la **Valutazione dell'Impatto Ambientale** (V.I.A.) il progetto di massima delle opere mobili alle bocche di porto fissando i criteri da adottare nella fase di preparazione e sviluppo di tale attività.

Nelle sedute del 4 luglio 1995 e del 12 dicembre 1995 il Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84, in particolare, ha deciso di dare corso alla procedura per la V.I.A. in adesione al modello normativo vigente, ma con ulteriori prescrizioni che sono state specificamente indicate nella stessa delibera del Comitato. Una prescrizione in particolare prevedeva che la struttura dello **Studio di Impatto Ambientale** (S.I.A.), propedeutico al processo valutativo, recepisse i quesiti formulati dall'Amministrazione Comunale di Venezia riguardo ad alcune tematiche quali, ad esempio, l'efficacia degli interventi diffusi come alternativa alle opere mobili. Questa istanza è stata recepita e le risposte ai quesiti sono contenute in appositi allegati al S.I.A..

Tra le altre prescrizioni una riguardava l'istituzione di un "Collegio di esperti di livello internazionale" (nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).
Il loro giudizio, considerato super partes, veniva indicato come parte integrante della Valutazione di Impatto Ambientale.

Ulteriori indicazioni attenevano alla definizione dei rischi derivanti dalle acque alte per le città di Venezia e di Chioggia, da elaborarsi a cura delle rispettive Amministrazioni

Comunali con il supporto del Servizio Informativo del Concessionario e dell'Istituto COSES.

Il Magistrato alle Acque e il Consorzio Venezia Nuova, per rispettare le scadenze di presentazione dei documenti deliberate dal Comitato nella seduta del 12 dicembre 1995, si sono attivati per dare luogo ai relativi adempimenti.

Il relativo Studio di Impatto Ambientale, avviato nel febbraio del 1996 a seguito di approvazione del relativo disciplinare da parte del Magistrato alle Acque di Venezia, è terminato nel mese di aprile del 1997.

In data 18 giugno 1997, il Magistrato alle Acque ha trasmesso la documentazione del S.I.A. ai destinatari istituzionali, ovvero al Ministero dell'Ambiente, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Regione del Veneto preposti allo svolgimento della procedura.
L'annuncio relativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale del Ministro dell'Ambiente e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali è stato pubblicato, su iniziativa del Magistrato alle Acque di Venezia in data 23 giugno 1997, su quattro quotidiani.

Il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge 798/84, nella seduta del 1° agosto 1997, ha messo a punto un programma di lavoro "ad hoc" da seguire nelle fasi in cui si articola la procedura e ha fissato le modalità e i termini di pronuncia del Collegio di esperti di livello internazionali e della Commissione di V.I.A.

Tale procedura è stata recepita dal D.P.C.M. del 27 settembre 1997 mentre le nuove scadenze relative al periodo riservato alla pubblica consultazione del S.I.A. e alla conclusione della V.I.A. sono state recepite dal D.P.R. del 7 agosto 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1997.

Pertanto, a partire dal mese di settembre del 1997, si sono svolte le attività del "Collegio di esperti di livello internazionale" e la fase di istruttoria della Commissione di V.I.A. del Ministero dell'Ambiente.

In data 31 dicembre 1997 si è completata la fase di informazione e consultazione del pubblico (durata 160 giorni) e di formulazione delle relative osservazioni.

Nel mese di aprile del 1998, il "Collegio di esperti di livello internazionale" ha richiesto una proroga per la consegna della relazione finale, concessa con apposito D.P.C.M. del 29 maggio 1998.

In data 8 luglio 1998, il Collegio ha consegnato il proprio "Rapporto sul progetto di massima degli interventi alle bocche di porto della laguna di Venezia per la regolazione dei flussi di marea" al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, con il quale ha espresso un parere favorevole sul progetto.

Il Rapporto costituisce un giudizio indipendente sul S.I.A. delle opere mobili da parte di personalità di grande rilievo professionale e scientifico, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, economici, idraulici e tecnologici del progetto. Si ricorda anche che il parere del "Collegio di esperti di livello internazionale", come definito dal D.P.C.M. del 27 settembre 1997, concorre alla valutazione complessiva del progetto.

Successivamente, il Rapporto è stato presentato al Comitato ex art. 4 Legge n. 798/984 nella seduta del 21 luglio 1998.

In data 18 settembre 1998, ai sensi dell'art. 29 ter della legge regionale n. 33/85, così come modificata dalla legge regionale n. 28/90, la Commissione Tecnica Regionale ha esaminato, a sezioni riunite, la relazione sul S.I.A. predisposta dalla Commissione relatrice appositamente incaricata e ha espresso parere favorevole con considerazioni, osservazioni e raccomandazioni sulla compatibilità ambientale del progetto. Con deliberazione n. 3427

del 22 settembre 1998, la Giunta Regionale del Veneto ha preso atto di tale parere, approvandolo all'unanimità, e lo ha inoltrato, ai sensi della normativa vigente, al Ministro dell'Ambiente.

In data 9 dicembre 1998, è stato emesso il "Parere di compatibilità ambientale della Commissione per le Valutazioni di Impatto Ambientale di cui all'art. 18, comma 5 Legge n. 67/88" relativo agli "interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea – Studio di Impatto Ambientale del progetto di massima" che non considera compatibili, con le attuali condizioni di criticità dell'ecosistema di riferimento, le opere proposte.

In data 10 dicembre 1998, la Direzione generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha espresso il proprio parere favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni.

In data 24 dicembre 1998, il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ha emesso il proprio decreto che "esprime, allo stato, giudizio di compatibilità ambientale negativo sul Progetto" rendendo comunque possibile un suo riesame alla luce dell'attuazione e della valutazione di alcune specifiche attività.

In data 3 febbraio 1999, il Consiglio Comunale di Chioggia ha espresso il proprio parere sul progetto, auspicandone l'approfondimento in una fase progettuale più avanzata.

In data 22 febbraio 1999, anche il Consiglio Comunale di Venezia ha espresso il proprio articolato parere sul progetto delle opere mobili alle bocche di porto della laguna di Venezia per la regolazione dei flussi di marea ed anch'esso ha auspicato approfondimenti.

In data 26 febbraio 1999, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha presentato in Assemblea Generale il proprio parere sul S.I.A. delle opere mobili. Il voto n. 19 riconferma il parere favorevole già espresso nel 1994 sul progetto di massima e in particolare, sostiene che "*sulla base delle conoscenze tecnico scientifiche e degli studi ormai ampiamente*

sviluppati e nella ribadita inscindibilità dell'attuazione degli interventi di salvaguardia, può affermarsi che la difesa dalle acque alte della città di Venezia non può che essere assicurata dalla regolazione delle bocche lagunari con il sistema delle paratoie mobili; e che pertanto non sussistono motivi ostativi allo sviluppo del progetto esecutivo di tale sistema, anche per poter apportare i miglioramenti e le innovazioni conseguenti allo sviluppo della scienza e della tecnica degli ultimi sei anni".

In data 8 marzo 1999, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ha delineato, mediante un'apposita delibera, le modalità di svolgimento e i contenuti da approfondire di alcune tematiche specifiche, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1999, alla luce delle quali il Comitato stesso avrebbe potuto pronunciarsi sull'avvio della progettazione esecutiva delle opere mobili alle bocche di porto lagunari.

La delibera raccomanda anche l'istituzione di un "Ufficio di Piano", in tempi sufficientemente rapidi e comunque tali da consentire una sua partecipazione alla revisione del Piano generale degli interventi, alla luce dei risultati acquisiti con gli approfondimenti citati.

A seguito di quanto deliberato dal Comitato ex art. 4, Legge n. 798/84 nella seduta dell'8 marzo 1999, il Ministro dei Lavori Pubblici, con lettera del 22 marzo 1999, prot. n. 2597/34/19, ha istituito un Gruppo di Lavoro per lo svolgimento delle attività del costituendo "Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia".

Il Gruppo di Lavoro è composto dai rappresentanti dei seguenti Enti: Ministero dei Lavori Pubblici; Ministero dell'Ambiente; Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Ministero dei Trasporti e Navigazione; Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica; Regione del Veneto; Comune di Venezia; Comune di Chioggia; Magistrato alle Acque (coordinatore).

A partire dal 21 aprile 1999, si sono svolte presso il Magistrato alle Acque di Venezia numerose riunioni del Gruppo di Lavoro (dieci riunioni generali e ventiquattro riunioni su temi tecnici specifici alla data del 24 novembre 1999), per la definizione delle linee guida secondo le quali impostare e svolgere il lavoro e, nella fase finale, per l'esame dei risultati degli approfondimenti condotti.

Nel mese di aprile del 1999, con lettera trasmessa al Concessionario, il Magistrato alle Acque dettagliava le attività di propria competenza nell'ambito di quelle previste dalla delibera dell'8 marzo 1999 e chiedeva al Concessionario stesso di mobilitarsi per realizzare gli approfondimenti richiesti.

Il Consorzio Venezia Nuova, per ottemperare a quanto indicato, nel corso del 1999 ha, pertanto, avviato e sviluppato le attività richieste, regolamentate da tre disciplinari tecnici approvati dal Comitato Tecnico di Magistratura del Magistrato alle Acque.

Queste attività hanno coinvolto studiosi, ricercatori, professionisti, centri di ricerca e istituzioni.

Nel corso della riunione del 24 novembre 1999, il Presidente del Magistrato alle Acque ha illustrato al Gruppo di Lavoro e consegnato una relazione generale su cui i singoli rappresentanti potessero esprimersi entro l'8 dicembre 1999.

Il Presidente del Magistrato alle Acque ha messo a disposizione del Gruppo di Lavoro, presso la sua stessa sede come anche presso il Servizio Informativo, gli elaborati di dettaglio, i rilievi eseguiti e i dati di base.

Entro il 31 dicembre 1999, tutte le osservazioni e i rapporti delle singole Amministrazioni che fanno parte del Gruppo di Lavoro sono pervenuti al Presidente del Magistrato alle Acque che ne ha tenuto conto nella elaborazione della sua relazione conclusiva.

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera a) Legge n. 798/84

Adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari

Descrizione degli interventi

I moli foranei alle bocche di porto, che costituiscono un fattore di sicurezza per la navigazione, necessitavano di importanti lavori di ristrutturazione.

I moli sono stati costruiti tra il 1840 e il 1934 in modo da creare un aumento della profondità dei fondali dei canali di bocca (a causa dell'aumento della velocità della corrente) per adeguarli alla stazza sempre maggiore delle navi moderne.

Tuttavia i moli sono stati realizzati ricorrendo a pietrame di grande dimensione che ha subìto, per l'azione delle correnti e del moto ondoso, continui sprofondamenti nel tempo. Questi fenomeni sono tuttora in atto e hanno finito per compromettere la stabilità dell'intera struttura. I lavori di manutenzione ordinaria hanno fronteggiato i dissesti più immediati ma non hanno eliminato il problema.

La ricostruzione dei moli è stata supportata da analisi, ricerche, sperimentazioni con modelli matematici e fisici con le quali sono state valutate le caratteristiche del moto ondoso lungo ciascuno dei moli, l'intensità delle correnti di marea al piede delle scogliere, la natura geotecnica dei terreni di fondazione, la profondità dei fondali lungo i moli e la loro tendenza evolutiva, la stabilità della struttura e delle mantellate in roccia. La realizzazione delle opere non ha comportato modifiche dimensionali e fa ricorso, per le parti a vista, a materiali omogenei a quelli esistenti.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1999

Il progetto di massima degli interventi per il rinforzo dei moli è stato approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nel luglio del 1991.

Complessivamente i lavori realizzati hanno uno sviluppo di circa 10 chilometri.

Durante il 1994 sono iniziati quasi tutti gli interventi previsti. Nel 1996 sono stati completati i lavori sul **molo nord di Malamocco** mentre sono proseguiti quelli relativi agli altri moli.
Nel 1997 sono stati completati anche i lavori relativi ai **moli nord e sud di Chioggia** e **sud di Lido**; mentre nel 1998 sono terminati i lavori relativi al **molo sud di Malamocco**.

I lavori relativi al **molo nord di Lido** si sono completati nel 1999. Nel corso del 1999 sono stati avviati i lavori riguardanti la sistemazione delle **radici dei moli sud di Chioggia** e nord di Malamocco; qui i lavori si collocano in interventi più ampi che interessano l'intera zona e comprendono anche la difesa delle acque medio-alte dell'abitato di Alberoni sud retrostante e si raccordano con le opere di rinforzo del molo già realizzato. Alla radice del molo di Chioggia sud, invece i lavori interessano il rinforzo della scogliera posta a protezione di Forte San Felice e delle rive tra il Forte e la parte iniziale del molo.
La verifica effettuata una volta completate le opere, in merito al comportamento strutturale e funzionale dei moli dopo le ristrutturazioni, conferma il soddisfacimento degli obiettivi e la validità delle soluzioni prescelte.

Nel 1998 sono state completate anche le opere per la messa in sicurezza e l'**adeguamento dei fari** sulle testate dei moli nord di Lido e di Malamocco, lavori segnalati dal Genio Civile per le Opere Marittime su indicazione del Comando zona fari di Venezia.

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera a) Legge n. 798/84

Difesa dalle acque alte degli abitati insulari, "insulae" e marginamenti

Descrizione degli interventi

Negli ultimi decenni, le maree superiori a +80 centimetri sul livello medio del mare misurato a Punta della Salute (che, d'ora in avanti, nella relazione è assunto come riferimento) si sono verificate, in media, 45 volte all'anno rispetto alle 7-8 volte dell'inizio del secolo. Piazza San Marco viene in parte già allagata quando la marea supera +60 centimetri. Il ripetersi degli allagamenti causa numerosissimi disagi per la popolazione, l'abbandono dei piani terra, una pericolosa e lenta aggressione alle strutture architettoniche ed edilizie e impedimenti alle attività economiche.

Le opere mobili alle bocche di porto sono in grado di difendere Venezia da qualunque alta marea. Una limitazione della frequenza di chiusura delle bocche può, tuttavia, consentire di ridurre la penalizzazione della navigazione e dello scambio idrico mare-laguna. Per questo motivo è stato progettato un insieme di interventi di **difesa locale dei centri abitati lagunari**. Essi consentono la difesa da alte maree fino a quote compatibili con la struttura degli abitati (generalmente uguali o superiori a +100 centimetri) attraverso **il rinforzo e il rialzo delle sponde, talvolta della quota delle pavimentazioni,** e mediante **la realizzazione di barriere antinfiltrazione.**

Nel caso di Venezia e Chioggia questo tipo di soluzione non è proponibile su vasta scala perché implicherebbe alterazioni inaccettabili delle delicate strutture architettoniche e urbanistiche che si sono formate nei secoli. Ci si limita, quindi, alla difesa delle "insulae" di Venezia fino a quota +1,00 metro e a quella delle "insulae" di Chioggia fino a quota +1,10 metri, con il rialzo delle sponde e delle pavimentazioni fino a queste quote adottando particolari accorgimenti per evitare fenomeni di sifonamento e infiltrazione.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1999

Il Magistrato alle Acque e il Consorzio Venezia Nuova, fin dal 1988, hanno sviluppato specifici progetti generali di intervento per la difesa sia dei centri storici di Venezia e di Chioggia sia dei centri abitati lagunari.

In tempi più recenti, in base a quanto previsto dalla Legge n. 139/92, questi interventi hanno avuto particolare sviluppo tramite gli "Accordi di programma": strumenti operativi che assicurano l'esecuzione coordinata e unitaria di interventi che coinvolgono Enti e istituzioni diversi.

Tale strumento si è rivelato indispensabile qualora, in presenza di interventi particolarmente complessi, si debba "garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie".

In questo ambito, è significativo segnalare l'avvio, nel corso del 1997, degli interventi di difesa del percorso di **Riva dei Tolentini,** a Venezia. E' stato messo a punto un sistema di interventi che, a partire dalla necessità di difendere la zona dalle acque alte almeno fino a quota +100 centimetri, realizzi un programma integrato di manutenzione straordinaria dell'area anche mediante uno specifico "Accordo di programma" tra Magistrato alle Acque e Comune di Venezia.

I lavori ai Tolentini sono stati avviati con un primo stralcio esecutivo, attualmente in corso e in avanzata fase di realizzazione.

Sempre nel centro storico veneziano, è in pieno sviluppo l'intervento di risanamento delle rive lungo le fondamenta delle Zattere e della Giudecca: è stato completato nel corso del 1997 e consegnato alle autorità cittadine un primo tratto di riva lungo la fondamenta delle Zattere, nel 1998 è stata avviata l'esecuzione del 2° stralcio dei lavori mentre nel 1999, sono stati avviati anche i lavori relativi al 3° e 4° stralcio e dei lavori di completamento del 1° stralcio; è in fase di progettazione esecutiva il 5° stralcio.

Sono già stati completati e approvati dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia il progetto generale di fattibilità della difesa delle "insulae" e i progetti di massima ed esecutivo per la difesa dell'"insula" di S. Marco, mentre è in corso la progettazione esecutiva dell'"insula" di Rialto, avviata nella primavera del 1998.

Per quanto riguarda la difesa dalle acque medio-alte dei centri abitati lagunari, si ricorda che, nella seconda metà degli anni '80, il Consorzio Venezia Nuova apriva a Mazzorbo il primo cantiere per la realizzazione di questo tipo di lavori. Da allora a oggi molto è stato fatto, intervenendo, in pratica, in ogni località lagunare, mettendola in condizioni di sicurezza, ciascuna a una quota di salvaguardia compatibile con il particolare contesto urbanistico e architettonico che la caratterizza.
In particolare, già dal 1993, l'abitato di **Malamocco** sull'isola di Lido, è stato posto al riparo dalle acque medio-alte. Sempre nell'isola di Lido, ad **Alberoni**, è in corso un'opera che rientra in un piano globale e unitario di interventi: mentre, in passato, Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova sono intervenuti nella parte nord del centro urbano, ricostruendo e rialzando oltre 700 metri di rive lungo laguna, ora i lavori riguardano la parte sud dell'abitato e vengono realizzati anche mediante "Accordo di programma" tra Magistrato alle Acque e Comune di Venezia.

Dalla fine degli anni '80 è in corso un programma di interventi per la difesa del **comprensorio di Treporti** dalle alte maree. I lavori consistono nella ricostruzione e nel rialzo delle rive lungo i canali Saccagnana, Portosecco e Pordelio che dividono il territorio in tre isole: nord, centro e sud. A oggi sono stati realizzati oltre 15 chilometri di nuove rive cui vanno aggiunti circa 5 chilometri di opere complementari di marginamento.
Parte integrante del sistema di difesa del comprensorio di Treporti sono gli interventi che hanno come obiettivo primario la protezione del territorio di Lio Piccolo dagli allagamenti.
Nell'isola di **Pellestrina**, Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova hanno ultimato la difesa dell'abitato dagli allagamenti, lato laguna, mediante il rialzo e la ricostruzione di 2,8 chilometri di rive e marginamenti.
Con i nuovi interventi in corso si realizza un ulteriore tratto di riva a nord dell'abitato, in

corrispondenza del cantiere navale De Poli.

Anche a **San Pietro in Volta** sono in corso i lavori di difesa che riguardano, con il 1° stralcio, la ricostruzione di 1,4 chilometri di riva lato laguna.

E' in corso la progettazione esecutiva di interventi di difesa locale di **S. Erasmo** mentre è stata completata quella relativa a **Murano** e a **Torcello**. Le opere relative a queste due isole sono state consegnate nel corso del 1999.

Sono stati ristrutturati, risanati e, in certi casi, ricostruiti ampi tratti degradati di rive e di argini. Complessivamente, fino a oggi, sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione quasi 50 chilometri di **marginamenti**; oltre alle zone già citate, gli interventi riguardano: Mazzorbo; S. Erasmo; Venezia S. Elena, S. Alvise, S. Giobbe, Arsenale, Cannaregio a Venezia; via Navarrino al Lido.

A **Chioggia**, Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova, anche mediante "Accordi di Programma", con il Comune di Chioggia, hanno in corso importanti lavori di difesa dalle acque medio alte e di riqualificazione urbana.

Gli interventi riguardano l'abitato di *Sottomarina* dove nel 1999 è stato completato il 4° e ultimo stralcio attuativo, e, nel centro storico di Chioggia, le zone del *Lusenzo interno*, dei *quartieri di S. Giovanni* e *di Tombola*, dell'*isola dell'Unione e del Buon Castello*.

E' già in avanzata fase di progettazione la difesa dell'*"insula" di Corso del Popolo* mentre un primo stralcio sperimentale attuativo è già in corso e riguarda le zone comprese tra i *canali S. Domenico, Lombardo interno e Canal Vena.*

Lo sviluppo di questo tipo di interventi è molto avanzato: non soltanto per il numero di lavori eseguiti o che sono in corso di esecuzione, quanto per il fatto di avere definito provvedimenti sistematici, riguardanti tutti i centri abitati della laguna, destinati ad evitare allagamenti fino ai livelli di salvaguardia, o di sicurezza, compatibili con la loro struttura edilizia e urbana, e all'eliminazione totale degli allagamenti di qualsiasi entità in concorso con la protezione offerta, in futuro, dalle opere mobili.

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera a) Legge n. 798/84

Ripristino della morfologia lagunare

Descrizione degli interventi

La Legge n. 798/84 e, particolarmente, la Legge n. 139/92 dispongono che gli interventi ambientali siano integrati e contestuali alle opere per la difesa dalle acque alte.

Condizione per la sopravvivenza della laguna di Venezia è, infatti, il suo riequilibrio ambientale.

Due fenomeni hanno contribuito al rapido degrado dell'ecosistema lagunare:

- l'erosione, che sottrae sabbia e sedimenti con una dinamica che provoca l'appiattimento dei fondali e la scomparsa delle strutture fisiche proprie dell'ambiente lagunare, come velme e barene;
- l'inquinamento che, divenuto imponente negli ultimi quarant'anni, ha causato il progressivo decadimento della qualità delle acque.

La laguna è una zona umida costiera, perennemente instabile tra interrimento ed erosione.

Nei secoli passati i veneziani hanno contrastato l'interrimento con interventi di dimensioni grandiose, come la deviazione dei fiumi, portati a sfociare lontano dalla laguna, e il taglio del Po a Porto Viro.

A partire dal secolo scorso, invece, è subentrato il fenomeno dell'erosione. La costruzione dei moli alle bocche di porto, finalizzata a garantire a navi di grandi dimensioni l'accesso al porto, ha avuto la conseguenza di interrompere quasi del tutto l'ingresso in laguna di sabbia trasportata dal mare, come la deviazione dei fiumi aveva drasticamente ridotto l'apporto di materiali dall'entroterra. Altri interventi umani effettuati in questo secolo, come lo scavo del c.d. "canale dei petroli" completato alla fine degli anni '60, hanno concorso, congiuntamente al fenomeno naturale dell'abbassamento della quota dei fondali, a innescare ed esaltare il processo erosivo ormai giunto a livelli tali da configurare una rapida evoluzione della laguna in una baia marina, con conseguenze assai negative sull'ecosistema e sulle attività umane.

Il progetto per il recupero morfologico ha l'obiettivo principale di contrastare questa tendenza evolutiva e, dunque, di trattenere e reintrodurre in laguna i sedimenti, ricostruendo le strutture fisiche dell'ambiente lagunare, e di ricalibrare i canali lagunari per ripristinare gli scambi idrici.

Il progetto prevede quattro tipi d'intervento:

1. ricostruzione e ripristino di strutture morfologiche, velme e barene, con materiali compatibili provenienti dal dragaggio dei canali lagunari;
2. recupero morfologico delle isole minori con materiale di risulta;
3. piantagione di fanerogame marine sui fondali lagunari;
4. apporto artificiale di sedimenti sabbiosi dal mare.

Grande rilievo assumono i lavori per la ricostruzione di velme e barene che consentono di raggiungere fondamentali obiettivi di ordine idrodinamico, morfologico e naturalistico, tramite il reimpiego interno alla laguna dei materiali provenienti da operazioni di dragaggio che in precedenza venivano depositati in mare.

Tutti gli interventi sulla morfologia mantengono nel loro insieme un carattere di innovazione e di sperimentalità: i risultati sono apprezzabili in tempi lunghi. Un continuo monitoraggio degli effetti consente di ottimizzarne via via l'efficacia.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1999

Il Consorzio Venezia Nuova ha predisposto un **progetto generale di massima per il ripristino della morfologia lagunare**, approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nel dicembre del 1992, che prevede la realizzazione di una serie di interventi secondo le tipologie descritte precedentemente.

Nell'ambito di questo progetto, a seguito dell'approvazione da parte dello stesso Magistrato alle Acque dei relativi progetti esecutivi, sono stati sinora realizzati o sono in via di

realizzazione oltre 350 ettari di barene e di velme ed è stata ripristinata la funzionalità idraulica di canali lagunari per circa 60 chilometri.

Il Consorzio ha realizzato, o sta realizzando, interventi di ripristino morfologico e di vivificazione ambientale in alcune zone critiche della laguna, quali **Valle Millecampi, Lago dei Teneri, Lago Ravaggio; le zone a sud della cassa di colmata "D-E"**; la **Palude di Cona** a nord di Torcello; **Canale Buello, Canale S. Domenico, Canale Scirocchetto e Canale Allacciante** nella laguna sud; i **canali** nella zona della **Val di Brenta**; i **canali** nella zona intorno a **Burano** e quelli di Campalto, Tessera, Osellino; il bacino del **Lusenzo esterno e Val di Brenta a Chioggia**.

Lo sforzo che il Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova stanno compiendo per il **recupero morfologico e ambientale delle isole lagunari** che si trovano in stato di abbandono è significativo.

Sono già stati eseguiti negli anni precedenti interventi di sistemazione delle isole di *Campalto* e di *Fisolo*.

Nel corso del 1999, sono stati completati gli interventi riguardanti l'isola dei Laghi, di San Servolo, della Certosa e del Lazzaretto Nuovo.

L'*isola dei Laghi* si trova in laguna nord, a poca distanza da Burano e Mazzorbo. Gli interventi realizzati hanno come obiettivo il recupero dell'isola dal punto di vista strettamente morfologico e consistono, essenzialmente, nel ripristino delle sponde e nella predisposizione di una darsena.

L'*isola di San Servolo*, situata tra Venezia e il Lido, è una delle principali isole della laguna per il valore storico – architettonico degli edifici in essa situati. Attualmente l'isola è di proprietà della Provincia di Venezia che ha avviato un piano di ristrutturazione degli edifici, realizzando anche la sede della Venice International University e ha richiesto

l'intervento del Magistrato alle Acque – Consorzio Venezia Nuova per il restauro del muro perimetrale.

L'*isola della Certosa* è situata in laguna centrale tra la Bocca di Lido e Venezia, lungo il canale S. Nicolò. E' stato dragato il canale di accesso che corre lungo il bordo settentrionale dell'isola; si sono realizzati un approdo e il marginamento del tratto prospiciente il lato nord dell'isola, in coerenza con il progetto di riuso dell'isola predisposto dall'Amministrazione comunale di Venezia.

L'*isola del Lazzaretto Nuovo* si trova in laguna nord, a lato dell'isola di S. Erasmo. L'isola è del demanio dello Stato ed è affidata in concessione all'Archeoclub e all'Ekos club. Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova hanno ricostruito le sponde dell'isola, sui lati sud ed est; dove il margine dell'isola è costituito da un fronte di barene soggette a erosione, si è provveduto a ricostruime il bordo mediante l'infissione di una palificata continua dietro la quale sono stati refluiti sedimenti idonei provenienti da lavori di dragaggio. E' stato anche realizzato un impianto sperimentale di fitodepurazione che abbatte carichi inquinanti e nutrienti contenuti nelle acque reflue prima di scaricarle in laguna.

Da segnalare che sono anche in corso altri numerosi progetti per la riqualificazione delle isole di Poveglia, di San Giacomo in Paludo, del Lazzaretto Vecchio, di San Lazzaro degli Armeni, di San Francesco del Deserto.

Da segnalare gli **interventi alle "casse di colmata"** (ampie zone della laguna interrate con materiali di risulta dallo scavo del c.d. "canale dei petroli") realizzati alcuni anni orsono: essi consistono nella riapertura di canali all'interno delle "casse" e nella ricostruzione di barene lungo i bordi del canale navigabile e hanno consentito di vivacizzare gli scambi idrici con le parti retrostanti alle "casse di colmata", migliorando la qualità dell'ambiente.

Nel corso del 1997 sono stati anche avviati alcuni interventi sperimentali per la **salvaguardia e la tutela delle barene esistenti e la difesa di quelle che presentano particolari fenomeni erosivi**: essi consistono nella salvaguardia delle aree umide mediante l'impiego delle tecniche tradizionali di conterminazione (palificate), la sperimentazione delle tecniche più avanzate di ingegneria naturalistica e la realizzazione di sovralzi in materiale sabbioso a difesa delle barene in erosione, secondo una tipologia di intervento specificamente studiata per zone lagunari poco profonde e particolarmente esposte al moto ondoso.

Sono in corso anche numerose **attività di monitoraggio ambientale**: esse costituiscono l'indispensabile supporto ai lavori in fase di realizzazione fornendo un quadro completo e dettagliato della situazione preesistente nelle aree in cui si opera, dei criteri e dei sistemi esecutivi adottati, degli effetti degli interventi a breve e a lungo termine e della loro congruenza con le ipotesi progettuali.

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera a) Legge n. 798/84

Arresto del processo di degrado della laguna

Descrizione degli interventi

Gli indicatori più vistosi della situazione di degrado ambientale dovuta all'accresciuto inquinamento sono: la riduzione del numero delle specie animali e vegetali; la crescita abnorme di macroalghe e l'emissione di anidride solforosa prodotta dalla loro decomposizione; le morie di pesci per scarsità di ossigeno nell'acqua; la torbidità dell'acqua e la conseguente diminuzione delle fanerogame, che con il loro apparato radicale, contrastano l'erosione dei fondali.

La scomparsa di una fascia di transizione tra terraferma e laguna, ai margini del bacino lagunare, ha aggravato la situazione in quanto tale fascia assorbiva una grande quantità di nutrienti realizzando una "depurazione" naturale.

Il progetto sviluppato dal Consorzio Venezia Nuova per l'arresto del processo di degrado ha come scopo il miglioramento della qualità dei sedimenti e dell'acqua attraverso diversi tipi di intervento quali: la creazione, ove possibile, di estese zone umide di transizione tra terra e laguna per la depurazione naturale delle acque dolci; la modifica dei fondali della laguna intorno al centro storico di Venezia (per ridurre gli effetti della eutrofizzazione e per proteggere la città dal moto ondoso); il blocco della dispersione di inquinanti dalle discariche utilizzate in passato e dalle sponde e dai fondali dei canali industriali; la raccolta stagionale di macroalghe; la trasformazione in "habitat" lagunare di una parte delle "casse di colmata"; interventi specifici di risanamento ambientale in zone particolarmente degradate della laguna; il trattamento dei sedimenti per il miglioramento della qualità dei fondali.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1999

Il Consorzio Venezia Nuova ha redatto un **progetto di massima degli interventi per l'arresto del degrado** che è stato approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nel luglio del 1994.

Gli interventi sperimentali di riequilibrio ambientale sono stati realizzati al **Lago dei Teneri,** un tratto di laguna retrostante le "casse di colmata", e in **Palude della Rosa,** vicino all'isola di Torcello. In entrambi i casi si è potuta verificare la risposta locale dell'ecosistema ai trattamenti compiuti per il miglioramento della qualità dei sedimenti del fondale.

Sulla base delle successive progettazioni esecutive, sono già stati completati, ovvero sono in corso, numerosi interventi volti al miglioramento dell'ambiente lagunare.

A partire dal 1989, il Consorzio Venezia Nuova ha svolto periodiche **campagne di raccolta delle macroalghe,** predisponendo anche un sistema di monitoraggi che indirizzano gli interventi nelle aree maggiormente a rischio (Burano, Tessera, Campalto, Lido, Giudecca e Chioggia). Fino ad oggi sono stati raccolti 220.000 metri cubi di alghe, con un massimo di 50.000 metri cubi nel 1989 e un minimo di 3.500 metri cubi nel 1996. Parte del materiale raccolto è stato utilizzato, per la prima volta, nella produzione di carta. Ne è stato studiato, tra l'altro, anche il possibile uso come ammendante in agricoltura.

Nell'ambito delle attività per impedire la dispersione di inquinanti dalle discariche situate all'interno della conterminazione lagunare, utilizzate in passato e ora abbandonate, sono già stati effettuati i lavori di messa in sicurezza dell' **isola dell'"ex-inceneritore"** alla Giudecca e dell' **isola c.d. delle Tresse,** di fronte a Marghera.

Nei primi mesi del 1998 sono stati consegnati i lavori di sistemazione ambientale della discarica situata nella zona di **Val da Rio** a sud del centro storico di Chioggia, mentre nel mese di marzo del 1999 sono stati avviati i lavori per la messa in sicurezza della discarica situata nella zona della **barena del Passo a Campalto.**
Nel corso del 1999 è stata anche completata la campagna di indagini sul sito dei Pili a San Giuliano dove si prevede di realizzare un intervento progettato sullo schema di quello in corso per la barena del Passo a Campalto.

Si tratta di lavori molto complessi e delicati data la qualità dei materiali che devono essere trattati, in un momento in cui sono particolarmente sentite le problematiche ambientali legate alla messa in sicurezza di siti ove sono state deposte negli anni scorie delle lavorazioni industriali.

Le stesse aree industriali di Porto Marghera sono state realizzate negli anni dal 1920 al 1960 imbonendo zone lagunari di barene con riporti di terre di dragaggio, residui di lavorazioni industriali e rifiuti solidi urbani. Oggi, in alcuni casi, lungo le sponde dei canali industriali, tali materiali sono a contatto con le acque lagunari per cui si verifica il rilascio di sostanze inquinanti per effetto del moto ondoso, della marea e del dilavamento da parte delle piogge. Sui fondali dei canali, inoltre, si sono accumulate negli anni sostanze inquinanti provenienti dai reflui delle lavorazioni portuali e industriali.

Il Magistrato alle Acque con il Consorzio Venezia Nuova e di concerto con l'Autorità Portuale, ha messo a punto un programma mirato di interventi nella zona di Porto Marghera.

In particolare, si ricorda che in data 21 ottobre 1998, anche alla luce del Decreto del Ministro dell'Ambiente del giugno 1998 sugli scarichi in laguna di Venezia, è stato siglato l'Accordo di Programma sulla chimica a Porto Marghera (approvato con D.P.C.M. del 12.2.1999) in cui sono affrontate le questioni relative a: *Azioni di risanamento e tutela*

dell'ambiente e Investimenti e salvaguardia dell'occupazione; Procedure autorizzatorie e Controlli.

Per quanto riguarda il primo punto, gli interventi del Magistrato alle Acque e dell'Autorità Portuale di Venezia vengono attuati secondo un piano concordato e mediante specifici atti d'intesa e riguardano principalmente la realizzazione di opere di conterminazione e di dragaggi dei sedimenti inquinati depositati sul fondale e sulle rive dei canali industriali.

In questo ambito, il Magistrato alle Acque ha incaricato il proprio Concessionario di predisporre un inquadramento tecnico generale degli interventi di propria competenza nonché di svolgere la progettazione esecutiva e di realizzare gli interventi considerati prioritari negli atti d'intesa con l'Autorità Portuale.

Sono, pertanto, in corso i lavori di **asporto selettivo di materiale inquinante dal fondale del canale industriale nord** e di **banchinamento del canale industriale sud a Porto Marghera** nonché le progettazioni esecutive di interventi di sistemazione delle sponde di altri canali o zone di Porto Marghera che necessitano di opere di conterminazione in modo particolarmente urgente.

Il soddisfacimento degli obiettivi è completo per quanto si riferisce agli interventi già realizzati: esemplari sono da questo punto di vista le isole c.d. delle Tresse e dell'"ex Inceneritore".

La conformità degli interventi con il complesso sistema di regole ambientali, vigenti e in divenire, ne assicura inoltre la piena validità funzionale.

Lo stato di avanzamento di questo tipo di interventi è assicurato non soltanto dalla natura, straordinariamente impegnativa, delle realizzazioni, quanto dal fatto di poter disporre di vaste conoscenze specifiche e, quindi, di un progetto generale "certificato" dal successo degli interventi già portati a termine.

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera d) Legge n. 798/84

Difesa dei litorali

Descrizione degli interventi

Il cordone litoraneo che separa l'Adriatico dalla laguna, lungo circa 46 chilometri, rappresenta la prima e naturale difesa di Venezia e dei centri urbani lagunari dal mare. Il rinforzo dei litorali ha assunto un carattere di assoluta necessità e d'urgenza. Infatti, il cordone litoraneo si è fatto sempre più sottile e fragile a causa dell'abbassamento delle terre emerse in laguna, dei processi erosivi, delle azioni disgregatrici del moto ondoso e del vento e del degrado delle strutture storiche in pietra (i "murazzi") che sono state erette nel corso del XVIII secolo a protezione dalle mareggiate. L'insieme dei fenomeni ha determinato il generale arretramento della linea di costa e la scomparsa del cordone di dune che costituiva un'ulteriore difesa dei territori e degli abitati retrostanti. Il fenomeno è stato particolarmente evidente, fin dai secoli scorsi, nel caso dei litorali di Pellestrina e di Lido e interessa ora anche i litorali di Cavallino e di Sottomarina, investiti da importanti processi erosivi. Il sistema di opere previste persegue molteplici obiettivi: la protezione della laguna e dei suoi abitati; il restauro dei "murazzi" e la ristrutturazione delle opere di difesa degradate; il ripristino delle difese naturali mediante la creazione di nuove spiagge e l'ampliamento di quelle divenute inadeguate; la formazione, dove possibile, di un nuovo fronte di dune.

Gli interventi che il Consorzio Venezia Nuova sta realizzando sono costituiti da "ripascimenti", cioè dalla ricostruzione delle spiagge, o dall'ampliamento di quelle esistenti, mediante apporto artificiale di sabbie idonee prelevate in alto mare. L'ampiezza media prevista per la parte emersa delle nuove spiagge è di circa 50 metri.

Per contenere la sabbia versata, si costruiscono strutture di scogliera di contenimento (i cosiddetti "pennelli"), disposte in modo ortogonale rispetto alla riva e distanti le une dalle altre circa 300 metri. La realizzazione di una lunga sequenza di spiagge protette e di dune

ha anche forti valenze paesaggistiche e può costituire una valorizzazione del territorio non irrilevante a fini turistici e ricreativi.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1999

Sulla base della progettazione esecutiva già eseguita e approvata dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia, il Consorzio Venezia Nuova ha portato avanti importanti opere di difesa dei litorali.

Nel corso del 1990 è stato eseguito l'intervento sperimentale di difesa del litorale di Cavallino, in località Ca' Pasquali.

Nel 1991 sono iniziati i lavori per il rinforzo della scogliera nel punto più fragile del litorale di Pellestrina, l'ansa di Caroman, dove solo pochi metri separano il mare dalla laguna.

Nel corso del 1992 sono stati avviati i lavori per il rinforzo di 5 chilometri di "murazzo" a Pellestrina, per il rinforzo della scogliera nel punto più fragile del litorale di Pellestrina, l'ansa di Caroman, completati nel 1997; l'anno seguente hanno avuto inizio gli interventi per il ripascimento del litorale di Cavallino e nel 1994 quelli del litorale di Pellestrina.

A **Cavallino,** lo sviluppo complessivo degli interventi è di circa 11 chilometri. Gli interventi realizzano il rafforzamento delle spiagge già esistenti; la spiaggia ricostruita è difesa da 31 "pennelli", 5 di nuova realizzazione e 26 ottenuti dalla ristrutturazione di parte dei 65 "pennelli" preesistenti; di questi, la metà circa è stata demolita. A Cavallino, in relazione ai fondali esistenti e alla direzione prevalente delle onde, non è stata rilevata la necessità di realizzare la barriera sommersa (berma), parallela alla costa, che è stata invece realizzata a Pellestrina. Nel corso del 1997, è stato portato a completamento l'ampliamento della spiaggia: sono stati versati complessivamente circa 2 milioni di m^3 di sabbia prelevata

in mare al largo della bocca di porto di Malamocco. I lavori di ripascimento sono stati integrati da una serie di interventi complementari: sono stati ristrutturati alcuni tratti del muro realizzato in passato per contrastare la violenza delle onde ed è stato realizzato, ove necessario, un diaframma impermeabile con funzione antisifonamento e antinfiltrazione. Lungo alcuni tratti del litorale, infine, la protezione del territorio è stata completata mediante la ricostruzione del fronte di dune, assai degradato e in molti punti quasi scomparso, provvedendo anche al loro consolidamento mediante la piantumazione di tipiche specie vegetali. Nei primi mesi del 1998 è stata portata a completamento la ricostruzione morfologica e ambientale di alcune dune, portando così a termine i lavori relativi al litorale di Cavallino.

Nel corso del 1999 sono state avviate alcune attività finalizzate a garantire la manutenzione delle specie vegetative messe a dimora sulle dune di Ca' Savio, Ca' Ballarin e valle Dolce, esercitate mediante controllo periodico, ed eventuali sostituzioni e/o trattamenti delle piante sofferenti.

A **Pellestrina** è stata completata nel corso del 1999 una nuova spiaggia a protezione dell'abitato. Gli interventi realizzati hanno consentito il ripascimento di un tratto di litorale lungo circa 9 chilometri. La formazione della spiaggia è avvenuta con l'impiego di circa 4 milioni di m^3 di sabbia prelevata in mare al largo della bocca di porto di Malamocco. Al fine di assicurare la stabilità della spiaggia, si sono costituiti 18 "pennelli" in pietrame collegati, mediante setti di prolungamento sommersi, a una berma continua sommersa, messa in opera a circa 300 metri dalla costa. Le "celle" così realizzate sono state riempite di sabbia.

Attualmente stanno per essere realizzate delle opere complementari che consentiranno agli abitanti l'accesso alla spiaggia mediante superamento attrezzato del "murazzo" preesistente.

Nel corso del 1998 sono stati avviati anche i lavori di difesa dei litorali di **Sottomarina e di Isola Verde**, a Chioggia e del **litorale di Jesolo** che, nel corso del 1999, hanno avuto pieno sviluppo.

A Sottomarina è in corso di realizzazione il ripascimento protetto dell'arenile e la realizzazione di un "muro paraonde"; sul litorale di Isola Verde si sta eseguendo il ripascimento protetto della parte meridionale del litorale; a Jesolo, si sta eseguendo il ripascimento della spiaggia lungo 9 chilometri di riva, il rinforzo della struttura di difesa tra la spiaggia e le aree abitate retrostanti, la ricostruzione delle dune per 2,5 chilometri a partire dalla foce del Piave, il rinforzo della scogliera sulla sponda destra della foce del Sile.

E' in corso la progettazione esecutiva degli interventi sul litorale di **Lido.**

Gli interventi già realizzati e in corso di realizzazione sono monitorati con continuità: i controlli effettuati mostrano che gli obiettivi di progetto sono stati raggiunti, con una generale approvazione e soddisfazione dell'autorità marittima e degli utilizzatori delle spiagge; la stabilità delle nuove opere, già completate, dopo un apprezzabilmente lungo periodo di "stress" del mare e degli agenti atmosferici, conferma pienamente la validità delle scelte progettuali e dei metodi costruttivi.

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera l) Legge n. 798/84

Sostituzione del traffico petrolifero in laguna

Descrizione degli interventi

La Legge n. 171/73 e la Legge n. 798/84 hanno disposto l'allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna.

Nella laguna di Venezia transitano mediamente, ogni anno, circa 12 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi e chimico-liquidi. Oltre 1200 navi, di diverso tonnellaggio, sono interessate da questo traffico.

Il traffico petrolifero costituisce un rischio potenziale gravissimo per l'ambiente lagunare. Se è vero che la navigazione può avvenire avviene con sufficienti margini di sicurezza, è altrettanto vero che un alto numero di incidenti è dovuto a cause imprevedibili e indipendenti dalle condizioni di navigazione. Per la sua conformazione morfologica, inoltre, la laguna di Venezia non è in grado di tollerare alcun consistente sversamento di sostanze inquinanti che immediatamente si diffonderebbero nel fitto tessuto delle barene e nei bassi fondali ove è impossibile l'azione dei mezzi di soccorso. I centri abitati lagunari e Venezia subirebbero danni irreversibili.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1999

Nella seduta del 20 marzo 1990, il Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge n. 798/84 ha conferito lo specifico incarico di redigere "il progetto operativo per la sostituzione del traffico petrolifero in laguna che ne preveda l'estromissione garantendo l'approvvigionamento alternativo dell'attività produttiva per il funzionamento del porto".

Il Consorzio Venezia Nuova ha messo a punto un piano di interventi che dimostra la fattibilità del progetto dal punto di vista tecnico. Gli interventi proposti si basano sulla potenzialità del sistema portuale dell'alto Adriatico ad accogliere il traffico navale dirottato

da Venezia e sulla costruzione di nuovi oleodotti per il rifornimento dell'area industriale di Marghera. Il progetto indica come prioritario l'allontanamento del traffico delle grandi petroliere per il trasporto del greggio (che corrisponde a 4,2 milioni di tonnellate annue). La realizzazione, che dovrebbe essere contestuale a un piano generale di ristrutturazione di Porto Marghera e di riorganizzazione della portualità dell'alto Adriatico, consentirebbe di eliminare una fonte di grave pericolo per l'ambiente lagunare.

Il progetto operativo approvato nel settembre del 1994 dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia, risponde alla richiesta formulata dal Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo ex art. 4 Legge n. 798/84 e ha alimentato il dibattito sulle scelte da effettuare, che sono attualmente all'esame degli organismi istituzionali competenti.

Al progetto operativo del 1992 sono seguiti alcuni studi supplementari per l'individuazione di "soluzioni intermedie" rispetto all'esclusione totale.

In particolare, è stata completata, nel 1998, una seconda fase dello studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare i rischi del trasporto nella laguna di prodotti petroliferi e derivati e ad allontanare il traffico petrolifero di transito.

In base alle analisi disponibili e alle alternative esaminate (il progetto operativo per la sostituzione del traffico petrolifero nella laguna di Venezia del Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova; il programma intermedio per la riduzione dei rischi elaborato dal Ministero dell'Ambiente; l'ipotesi dell'Ente Zona industriale di Porto Marghera per la concentrazione a S. Leonardo delle operazioni di scarico di alcuni prodotti petroliferi), il Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84, nell'adunanza del 27 febbraio 1997, ha indicato la necessità prioritaria di procedere con l'allontanamento dalla laguna del greggio destinato alle raffinerie di Mantova. Ciò significa l'attivazione di un sistema di rifornimento alternativo degli impianti petrolchimici di Mantova che prevede di spostare la corrispondente parte di traffico verso il porto di Genova e di utilizzare l'oleodotto Genova

– Cremona, da prolungare. Il Comitato, inoltre, ha stabilito che siano approfonditi i problemi relativi all'estromissione dalla laguna di ulteriori 2 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi diretti al Friuli e all'Emilia Romagna che verrebbero deviati su altri porti dell'Adriatico.

Salvo ulteriori direttive da parte del Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84, gli studi di fattibilità affidati al Concessionario sono completati.

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera l) Legge n. 798/84

Apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree

Descrizione degli interventi

Le valli da pesca sono ambienti naturali, da secoli utilizzati per l'allevamento di specie ittiche pregiate e per la maricoltura. Le valli sono separate dalla "laguna viva" mediante argini dotati di aperture che consentono il ricambio dell'acqua al loro interno in modo regolato dagli allevatori sulla base delle esigenze della produzione. Attualmente le aree vallive sono 23 per una superficie complessiva di quasi 9000 ettari: un sesto dell'intero bacino lagunare.

Negli anni passati le valli da pesca sono state oggetto di studio per valutare l'efficacia della loro riapertura, durante le alte maree eccezionali, ai fini della diminuzione del livello dell'acqua in laguna. La questione è stata affrontata fin dal 1981 nel corso dello studio di fattibilità delle opere di difesa dalle acque alte e successivamente, con ulteriori approfondimenti, nell'ambito del progetto preliminare di massima delle opere mobili alle bocche di porto (progetto REA). In entrambi i casi è risultato che gli effetti della riapertura sono del tutto ininfluenti.

Anche le simulazioni realizzate nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) del progetto di massima delle opere mobili hanno portato alle medesime conclusioni. Le prove del S.I.A., eseguite mediante un modello idrodinamico bidimensionale agli elementi finiti, supportato da un modello bidimensionale alle differenze finite e da un modello unidimensionale e considerando maree con gradienti diversi, hanno indicato che la riapertura delle valli produrrebbe, in media, una riduzione media della marea pari a 1,3 cm a Venezia, mentre per una marea con caratteristiche simili a quella del novembre 1966 la riduzione sarebbe trascurabile.

Negli ultimi anni, quindi, la riapertura delle valli da pesca è studiata in relazione all'obiettivo del miglioramento ambientale dell'ecosistema in quanto può produrre effetti positivi sulle condizioni idrodinamiche locali con benefici per ampie zone lagunari.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1999

Il Consorzio Venezia Nuova ha elaborato un **progetto operativo** allo scopo di definire le modalità, la durata e la frequenza dell'apertura delle aree vallive allo scopo di un miglioramento della qualità ambientale nelle aree contigue. In effetti, l'apertura delle arginature delle valli da pesca, regolata e gestita secondo criteri prestabiliti, comporta un miglioramento locale della vivacità dell'idrodinamica con benefici per ampie zone della laguna in quanto il livello qualitativo dell'acqua delle valli risulta migliore di quello lagunare.

In seguito a indicazione del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 (riunione del 20 marzo 1990) Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova hanno dedicato a questo aspetto del problema uno specifico progetto operativo generale, approvato dal Comitato tecnico del Magistrato alle Acque nel luglio del 1993, che ha definito criteri, modalità, durata e frequenza dell'apertura delle valli.

Le analisi e le verifiche eseguite nel corso della progettazione hanno confermato l'efficacia dell'intervento rispetto al nuovo obiettivo di carattere ambientale indicando, tuttavia, come l'apertura indiscriminata delle valli, con l'attuale grado di inquinamento, potrebbe compromettere l'equilibrio di questi ecosistemi delicati e protetti e le attività che vi si svolgono. Inoltre, vista anche la complessità realizzativa e gestionale delle soluzioni di apertura proposte, il progetto operativo suggerisce la necessità di procedere a un intervento sperimentale.

Nel corso del 1995 il Consorzio ha redatto anche il progetto esecutivo dell'**intervento sperimentale di apertura di una valle da pesca, Valle Figheri**; l'intervento è stato completato nell'estate del 1999, mentre il relativo monitoraggio è terminato alcuni mesi dopo.

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera a) Legge n. 798/84

Servizio Informativo

Descrizione degli interventi

Il Servizio Informativo ha il compito di acquisire, ordinare e aggiornare tutte le informazioni sull'ambiente lagunare, cooperando con gli altri Enti che operano sul territorio, in modo da facilitare la definizione delle politiche di intervento in un quadro conoscitivo generale.

Il Servizio Informativo, nel suo impegno di organizzare l'enorme mole di dati territoriali in continua crescita, ha classificato e gestito i dati in sei "ambienti utente" che raggruppano 60 sezioni di lavoro:

1. le *Biblioteche* che costituiscono un ordinamento fisico dei documenti;
2. la *Banca Dati territoriale* che realizza un sistema informativo geografico;
3. i *Sistemi informatici di supporto alle decisioni* che introducono nei dati un criterio di ordinamento funzionale, ovvero i dati e gli strumenti informatici per la loro gestione sono funzionali a specifici obiettivi;
4. gli *Studi* che vengono considerati propedeutici alle evoluzioni delle scelte tecniche e gestionali dei tre ambienti precedenti;
5. i *Sistemi di consultazione* che forniscono accessi facilitati ai primi tre "ambienti utente" da parte sia dei vari uffici operativi e amministrativi del Magistrato alle Acque, sia di Amministrazioni pubbliche e/o di studio e di ricerca (Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Università , CNR, ecc.), sia di aziende private locali e nazionali;
6. il *Centro servizi* che mette a disposizione dati, carte ed elaborati realizzati utilizzando gli strumenti tecnologici d'avanguardia (fotogrammetria digitale, GPS differenziali,

immagini da satellite e da aereo multispettrali, batimetria con ecoscandaglio a larga fascia, ecc.).

Le *Biblioteche* costituiscono la raccolta ordinata di tutti i documenti riguardanti l'ecosistema: studi, progetti, pubblicazioni scientifiche, carte geografiche, immagini da satellite, nastri e dischi informatici, diapositive ecc.. Fino ad ora sono stati catalogati quasi 30.000 documenti.

Le Biblioteche sono gli strumenti di lavoro per la realizzazione del Sistema Informativo Geografico, una Banca Dati che raccoglie i dati territoriali disponibili relativamente all'ecosistema lagunare e i programmi software per consultarli ed elaborarli.

Attualmente la *Banca Dati*, che è stata denominata C.I.R.C.E. (Centro Informatico per il Risanamento e Controllo dell'Ecosistema), consta di quasi 500.000 "oggetti territoriali" corredati da oltre due milioni di informazioni di base.

E', inoltre, attivo l'utilizzo di alcuni sistemi informatici denominati "sistemi di supporto" che utilizzano i dati raccolti e, mediante strumenti di analisi e logiche interpretative specifiche, rendono più agevoli alcuni processi decisionali relativi all'ecosistema.

I dati raccolti costituiscono la base per eseguire studi e progetti fondati su conoscenze multidisciplinari aggiornate, affidabili e confrontabili con serie storiche, costruite anche mediante collaborazioni e scambi con altri Enti e istituzioni.

I *sistemi di consultazione* forniscono accessi facilitati ai primi tre "ambiente utente" da parte sia dei vari uffici operativi e amministrativi del Magistrato alle Acque, sia di Amministrazioni pubbliche e/o di studio e di ricerca (Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Università, CNR, ecc.) , sia di aziende private locali e nazionali.

Il *Centro servizi* mette a disposizione dati, carte ed elaborati realizzati utilizzando gli strumenti tecnologici d'avanguardia (fotogrammetria digitale, GPS differenziali, immagini da satellite e da aereo multispettrali, batimetria con ecoscandaglio a larga fascia, ecc.).

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1999

I risultati fin qui raggiunti dal Servizio Informativo possono essere così sintetizzati:

1. è stato raccolto ed informatizzato, in un sistema integrato, il vastissimo patrimonio di conoscenze sull'ecosistema lagunare, ovvero sono attualmente connessi, mediante rete telematica ad alte prestazioni, tre poli tecnologici ed operativi ove il personale del Servizio Informativo svolge le sue attività:
   - il centro del Servizio Informativo a Venezia,
   - il centro sperimentale del Magistrato alle Acque di Voltabarozzo (PD),
   - gli uffici tecnici dell'Ufficio per la Salvaguardia del MAV a Venezia;
2. è stata completamente informatizzata la geografia del territorio;
3. l'architettura hardware e software, resa modulare e flessibile e costantemente adeguata all'accelerata dinamica del progresso informatico, rimane all'avanguardia e aperta a ulteriori sviluppi;
4. i tempi di aggiornamento dei dati sono tali da consentire di avere una base operativa sufficientemente affidabile per la gestione dei fenomeni territoriali dell'ecosistema lagunare.

Oltre allo sviluppo di tali attività di "base", il Servizio Informativo ha realizzato alcune attività specifiche. Tra quelle più significative si rilevano le seguenti: aggiornamento della batimetria della laguna; installazione, presso il proprio centro di calcolo, di modelli matematici che simulano i processi di propagazione della marea; realizzazione di un modello per migliorare la previsione delle acque alte; potenziamento informatico del Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo; esecuzione di studi sugli apporti inquinanti in laguna.

La crescita continua di enti e persone che chiedono ed utilizzano conoscenze del Servizio Informativo sono una conferma della validità delle scelte di impostazione del servizio e della sua adeguatezza scientifica e tecnologica.

Interventi di cui all'Articolo 3 - Lettera d) Legge n. 798/84

Interventi di ausilio alla navigazione marittima notturna e con nebbia lungo il canale Malamocco – Marghera

Descrizione degli interventi

Per rendere sicura la navigazione in laguna nelle ore notturne e in caso di scarsa visibilità dovuta alla nebbia, il Consorzio Venezia Nuova ha messo in opera, lungo il canale tra la bocca di porto di Malamocco e la zona industriale di porto Marghera, per complessivi 15 Km, un sistema di illuminazione e una serie di strumentazioni ausiliarie. Gli interventi sono stati dettati dalla necessità di garantire alla navigazione requisiti e standard di sicurezza adeguati. Il sistema predisposto consente di ridurre i rischi di incidenti e di migliorare la capacità operativa delle aree portuali di Venezia. In futuro, inoltre, la realizzazione degli ausili alla navigazione potrà soddisfare nuove possibili esigenze: bilanciare i sia pur limitatissimi periodi di inagibilità delle bocche di porto dovuti alla prevista chiusura dei varchi in occasione di alte maree eccezionali e la perdita di produttività portuale qualora venisse eliminato il traffico marittimo petrolifero dalla laguna.

Su entrambi i lati del canale tra Malamocco e Marghera sono stati disposti 340 segnali luminosi, installati a 80 metri l'uno dall'altro, 111 riflettori radar, collocati sulla sommità dei pali di supporto dei segnali luminosi, e 4 "fog detectors" per rilevare le condizioni di visibilità.

I punti luce, situati a circa 8 metri sopra il livello del mare, sono costituiti da lampade a vapori di sodio a bassa pressione montate su uno stelo di acciaio inossidabile.

L'alimentazione elettrica avviene tramite allacciamento alla rete ENEL. Una stazione generatrice di emergenza è stata realizzata a S. Leonardo. Per la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica sono state predisposte 16 centraline.

Approvazioni, attività completate, in corso, di prossimo avvio alla data del 31 dicembre 1999

L'intero intervento di ausilio alla navigazione notturna e con nebbia è stato completato nel 1996.

Nel corso del 1997 è stata completata l'attività di videomonitoraggio che, mediante l'impiego di telecamere equipaggiate con intensificatori di luminosità, ha consentito la ripresa del traffico marittimo lungo il canale Malamocco-Marghera sia di giorno che di notte, e la memorizzazione delle immagini del traffico in una apposita banca dati.

Si è svolta, infine, per circa sei mesi, la gestione dell'impianto per il suo avviamento.

Il "sentiero luminoso" è stato definitivamente consegnato all'Autorità Portuale nel corso del 1997 che lo gestisce con piena soddisfazione propria e degli utenti.

STATO DI ATTUAZIONE DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI AL CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Importi lordi in Lire miliardi

	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI SOTTOSCRITTI AL 31.12.1999	%	IMPORTI IMPEGNATI AL 31.12.1999	%	IMPORTI REALIZZATI, IN CORSO E DI PROSSIMA REALIZZAZIONE AL 31.12.1999	%	IMPORTI SPESI AL 31.12.1999	%
	(A)	(B)	(B)/(A)	(C)	(C)/(A)	(D)	(D)/(A)	(E)	(E)/(A)
LEGGE 798/84	778,396	777,936	100%	777,936	100%	777,936	100%	775,349	100%
LEGGE 139/92	1035,000	1035,000	100%	1035,000	100%	979,056	95%	870,359	84%
LEGGE 539/95	233,000	233,000	100%	233,000	100%	188,256	81%	119,108	51%
LEGGE 515/96	847,000	847,000	100%	847,000	100%	567,807	67%	230,684	27%
LEGGE 345/97	432,000	432,000	100%	432,000	100%	49,742	12%	23,317	5%
TOTALE PARZIALE	3325,396	3324,936	100%	3324,936	100%	2562,797	77%	2018,817	61%
LEGGE 448/98	495,000	287,000	58%	0,000	0%	1,616	0%	0,303	0%
TOTALE	3820,396	3611,936	95%	3324,936	87%	2564,413	67%	2019,120	53%

LEGENDA

IMPORTI FINANZIATI: gli importi finanziati complessivamente dalla legislazione speciale per Venezia in favore del Consorzio Venezia Nuova.

IMPORTI SOTTOSCRITTI AL 31.12.1999: gli importi relativi a convenzioni sottoscritte a tale data tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova.

IMPORTI IMPEGNATI AL 31.12.1999: gli importi impegnati con apposito Decreto del Presidente del Magistrato alle Acque registrato da parte della Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti.

IMPORTI REALIZZATI, IN CORSO E DI PROSSIMA REALIZZAZIONE AL 31.12.1999: l'avanzamento totale ovvero gli importi realizzati, in corso di realizzazione e di prossima realizzazione (progetto esecutivo approvato) a tale data.

IMPORTI SPESI AL 31.12.1999: gli importi prodotti a tale data.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE
TRA IL MINISTERO LAVORI PUBBLICI E IL CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Aggiornamento al 31 dicembre 1999

Importi lordi in lire miliardi

CONVENZIONE rep. n°		DATA SOTTOSCRIZIONE	LEGGE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO DELLA CONVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/99 (***)	
					IMPORTI SPESI	%
(A)		(B)	(C)	(D)	(E)	(E/D)
1^	6479 (*)	12-lug-85	798/84 - 910/86	270,365	270,365	100%
2^	6745 (*)	23-dic-87	910/86 - 67/88	191,350	191,350	100%
3^	7025 (*)	15-dic-89	67/88	124,200	123,672	100%
4^	7138 (*)	21-feb-91	67/88 - 360/91	80,000	79,386	99%
5^	7191 (*)	04-ott-91	67/88	5,000	4,814	96%
6^	7295 (*)	05-giu-92	67/88	59,521	58,480	98%
7^	7322 (*)	03-dic-92	139/92	720,000	647,141	90%
8^	7395 (*)	23-nov-93	139/92	315,000	223,217	71%
9^	7601 (*)	20-mar-96	539/95	78,000	43,598	56%
10^	7637 (*)	29-ott-96	539/95	155,000	75,509	49%
11^	7649 (*)	18-dic-96	515/96	602,000	210,583	35%
12^	7695 (*)	28-lug-97	515/96	245,000	20,102	8%
13^	7725 (*)	23-dic-97	345/97	207,000	9,539	5%
14^	7760 (*)	14-lug-98	345/97	225,000	13,778	6%
15^	7818 (*)	01-dic-99	448/98	287,000	0,302	0%
	1568 (**)	21-nov-87	798/84	7,500	7,500	100%
	1685 (**)	20-apr-89	910/86	40,000	39,782	99%
	TOTALE			3611,936	2019,118	56%

(*) Convenzioni sottoscritte tra il Ministero Lavori Pubblici - Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova.
(**) Convenzioni sottoscritte tra il Ministero Lavori Pubblici - Genio Civile Opere Marittime e Consorzio Venezia Nuova.
(***) Sono riportati gli importi spesi ovvero prodotti al 31.12.1999.

Allegato n. 2

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLO STATO IN CONCESSIONE AL CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Aggiornamento al 31 dicembre 1999 - Importi lordi in Lire miliardi

OBIETTIVI	LEGGE N. 798/84 E SUCC. RIF.			LEGGE N. 139/92			LEGGE N. 539/95			LEGGE 515/96			LEGGE 345/97			LEGGE 448/98			RIEPILOGO TOTALE		
	IMPORTI FINANZIATI (A)	IMPORTI SPESI AL 31.12.1999 (B)	% (B/A)	IMPORTI FINANZIATI (C)	IMPORTI SPESI AL 31.12.1999 (D)	% (D/C)	IMPORTI FINANZIATI (E)	IMPORTI SPESI AL 31.12.1999 (F)	% (F/E)	IMPORTI FINANZIATI (G)	IMPORTI SPESI AL 31.12.1999 (H)	% (H/G)	IMPORTI FINANZIATI (I)	IMPORTI SPESI AL 31.12.1999 (L)	% (L/I)	IMPORTI FINANZIATI (I)	IMPORTI SPESI AL 31.12.1999 (L)	% (L/I)	IMPORTI FINANZIATI (M)	IMPORTI SPESI AL 31.12.1999 (N)	% (N/M)
OPERE DI REGOLAZIONE DELLE MAREE	166,664	165,018	99%	40,439	39,438	98%	19,566	17,552	90%	6,833	2,668	39%	12,815	5,729	45%	16,941	0,034	0%	263,258	230,439	88%
ADEGUAMENTO E RINFORZO DEI MOLI FORANEI ALLE TRE BOCCHE LAGUNARI	30,407	30,395	100%	165,665	164,608	99%	—	—	—	13,400	8,123	61%	—	—	—	20,000	0,000	0%	229,472	203,126	89%
DIFESA DALLE ACQUE ALTE DEGLI ABITATI INSULARI, INSULAE E MARGINAMENTI	216,586	216,504	100%	251,139	175,495	70%	61,882	21,251	34%	323,589	55,896	17%	155,916	5,231	3%	120,500	0,000	0%	1129,612	474,379	42%
RIPRISTINO DELLA MORFOLOGIA LAGUNARE E ARRESTO DEL PROCESSO DI DEGRADO DELLA LAGUNA	232,165	231,626	100%	307,826	222,818	72%	60,336	30,729	51%	320,892	63,209	20%	245,270	11,767	5%	302,000	0,153	0%	1468,489	560,300	38%
DIFESA DEI LITORALI	85,393	84,643	99%	231,089	230,303	100%	87,216	47,455	54%	158,284	94,872	60%	12,000	0,399	3%	15,559	0,116	1%	589,541	457,788	78%
SOSTITUZIONE DEL TRAFFICO PETROLIFERO IN LAGUNA	6,180	6,180	100%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,180	6,180	100%
APERTURA DELLE VALLI DA PESCA ALL'ESPANSIONE DELLE MAREE	1,638	1,632	100%	5,815	5,589	96%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,000	0,000	0%	15,453	7,221	47%
SERVIZIO INFORMATIVO	24,998	24,986	100%	17,996	17,078	95%	4,000	2,120	53%	24,001	5,914	25%	6,000	0,191	3%	12,000	0,000	0%	88,995	50,289	57%
INTERVENTI DI AUSILIO ALLA NAVIGAZIONE	14,365	14,365	100%	15,032	15,032	100%	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	29,397	29,397	100%
TOTALI	778,396	775,349	100%	1035,000	870,359	84%	233,000	119,107	51%	847,000	230,684	27%	432,000	23,317	5%	495,000	0,303	0%	3820,396	2019,119	53%

Documento C *Regione del Veneto*

Interventi per la salvaguardia di Venezia - Prospetto generale e stato degli interventi - Aggiornato al 20 dicembre 1999

PAGINA BIANCA



GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

SEGRETERIA ALL'AMBIENTE

SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

PROSPETTO GENERALE E STATO DEGLI INTERVENTI SUDDIVISI PER SOGGETTI ATTUATORI

AGGIORNATO AL 20/12/99

PAGINA BIANCA



GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

SEGRETERIA ALL'AMBIENTE

SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

TABELLE RIEPILOGATIVE

AGGIORNATO AL 20/12/99

Legenda

Importi finanziati: Somme messe a disposizione dallo Stato

Importi impegnati: Importi relativi ad interventi per i quali sono stati individuati i soggetti attuatori

Importi contabilizzati: Importi dei progetti già approvati dai competenti organi regionali, i cui interventi sono pertanto stati avviati o sono in fase di avvio

Importi erogati: Importi già erogati ai soggetti esecutori delle opere

TABELLA RIEPILOGATIVA
(per leggi)

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
	SETTORE Disinquinamento			
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	L. 58.000.000.000	L. 58.000.000.000 100,0%	L. 47.500.000.000 81,9%	L. 38.151.888.094 65,8%
Legge 910/86 Es. 1989	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000 100,0%	L. 0 0,0%	L. 0 0,0%
Legge 910/86 Es. 1987-1988	L. 88.000.000.000	L. 88.000.000.000 100,0%	L. 88.000.000.000 100,0%	L. 68.293.070.328 77,6%
Legge 910/86 Es. 1989	L. 59.000.000.000	L. 59.000.000.000 100,0%	L. 53.387.000.000 90,5%	L. 39.730.805.454 67,3%
Legge 67/88 Es. 1988	L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000 100,0%	L. 15.500.000.000 100,0%	L. 2.567.066.087 16,6%
Legge 67/88 Es. 1990	L. 104.500.000.000	L. 104.500.000.000 100,0%	L. 103.054.574.975 98,6%	L. 51.402.136.779 49,2%
Legge 67/88 Es. 1991	L. 30.600.000.000	L. 30.600.000.000 100,0%	L. 30.600.000.000 100,0%	L. 16.358.892.079 53,5%
Legge 67/88 Es. 1992 - I^ fase	L. 29.700.000.000	L. 29.700.000.000 100,0%	L. 17.200.000.000 57,9%	L. 16.159.223.310 54,4%
Legge 139/92 II fase	L. 60.000.000.000	L. 60.000.000.000 100,0%	L. 24.000.000.000 40,0%	L. 7.769.391.139 12,9%

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
Legge 360/91	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0
		100,0%	0,0%	0,0%
Legge 360/91	L. 13.500.000.000	L. 13.500.000.000	L. 10.170.400.000	L. 9.242.120.495
		100,0%	75,3%	68,5%
Legge 139/92 Es. 1993	L. 350.000.000.000	L. 350.000.000.000	L. 333.120.000.000	L. 233.276.759.262
		100,0%	95,2%	66,7%
Legge 139/92 II fase	L. 320.000.000.000	L. 320.000.000.000	L. 107.978.051.114	L. 21.910.449.679
		100,0%	33,7%	6,8%
Legge 539/95 Es. 1996	L. 30.000.000.000	L. 30.000.000.000	L. 27.000.000.000	L. 11.921.742.828
		100,0%	90,0%	39,7%
Legge 539/95 Es. 1997	L. 53.500.000.000	L. 53.500.000.000	L. 48.275.000.000	L. 11.441.103.189
		100,0%	90,2%	21,4%
Legge 515/96 Es. 1997	L. 200.000.000.000	L. 200.000.000.000	L. 65.743.743.980	L. 8.026.630.913
		100,0%	32,9%	4,0%
Legge 515/96 Es. 1999	L. 117.000.000.000	L. 117.000.000.000	L. 0	L. 0
		100,0%	0,0%	0,0%
Legge 345/97 Es. 1999	L. 194.200.000.000	L. 194.200.000.000	L. 0	L. 0
		100,0%	0,0%	0,0%
TOTALE SETTORE	**L. 1.729.000.000.000**	**L. 1.729.000.000.000**	**L. 971.528.770.069**	**L. 536.251.279.636**

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
	SETTORE Acquedotti			
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000 100,0%	L. 10.000.000.000 100,0%	L. 1.504.260.408 15,0%
Legge 910/86 Es. 1987-1988	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000 100,0%	L. 2.000.000.000 100,0%	L. 589.750.386 29,5%
Legge 910/86 Es. 1989	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000 100,0%	L. 8.000.000.000 100,0%	L. 0 0,0%
Legge 67/88 Es. 1988	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000 100,0%	L. 20.000.000.000 100,0%	L. 1.240.254.000 6,2%
Legge 345/97 Es. 1999	L. 68.800.000.000	L. 68.800.000.000 100,0%	L. 0 0,0%	L. 0 0,0%
TOTALE SETTORE	**L. 108.800.000.000**	**L. 108.800.000.000**	**L. 40.000.000.000**	**L. 3.334.264.794**

SETTORE Ospedali

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000
		100,0%	100,0%	100,0%
Legge 910/86 Es. 1987-1988	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000
		100,0%	100,0%	100,0%
Legge 910/86 Es. 1989	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 147.713.484
		100,0%	100,0%	3,0%
Legge 539/95 Es. 1997	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 711.228.057
		100,0%	100,0%	10,9%
TOTALE SETTORE	L. 33.500.000.000	L. 33.500.000.000	L. 33.500.000.000	L. 22.858.941.541

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
TOTALE	L. 1.871.300.000.000			
TOTALE	L. 1.871.300.000.000	L. 1.871.300.000.000	L. 1.045.028.770.069	L. 562.444.485.971
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,00%	55,85%	30,06%

PAGINA BIANCA



GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

SEGRETERIA ALL'AMBIENTE

SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

TABELLE RIEPILOGATIVE

AGGIORNATO AL 20/12/99

Legenda

Importi finanziati: Somme messe a disposizione dallo Stato

Importi impegnati: Importi relativi ad interventi per i quali sono stati individuati i soggetti attuatori

Importi contabilizzati: Importi dei progetti già approvati dai competenti organi regionali, i cui interventi sono pertanto stati avviati o sono in fase di avvio

Importi erogati: Importi già erogati ai soggetti esecutori delle opere

TABELLA RIEPILOGATIVA
(per soggetti attuatori)

Soggetto attuatore	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
	Comuni			
Comune di Arquà Petrarca	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 2.483.717.977
Comune di Battaglia Terme	L. 1.930.000.000	L. 1.930.000.000	L. 830.000.000	L. 0
Comune di Castelfranco Veneto	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 171.269.017
Comune di Cavarzere	L. 8.500.000.000	L. 8.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 2.378.819.650
Comune di Chioggia	L. 83.100.000.000	L. 83.100.000.000	L. 64.190.868.980	L. 35.613.715.588
Comune di Codevigo	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.054.365.402
Comune di Este	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 269.155.250
Comune di Galzignano	L. 1.870.000.000	L. 1.870.000.000	L. 1.870.000.000	L. 1.246.980.915
Comune di Jesolo	L. 12.115.000.000	L. 12.115.000.000	L. 12.097.343.123	L. 10.615.211.399
Comune di Marcon	L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000	L. 459.544.965
Comune di Meolo	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.832.123.735
Comune di Mogliano Veneto	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 12.300.000.000	L. 6.595.184.118
Comune di Monastier	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 719.387.832
Comune di Monselice	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 3.691.408.125
Comune di Morgano	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0
Comune di Musile di Piave	L. 5.400.000.000	L. 5.400.000.000	L. 5.000.000.000	L. 1.877.102.821
Comune di Noale	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0

Soggetto attuatore	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
Comune di Padova	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0
Comune di Piove di Sacco	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 6.484.664.058
Comune di Preganziol	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0
Comune di Quarto d'Altino	L. 10.500.000.000	L. 10.500.000.000	L. 10.500.000.000	L. 9.285.954.666
Consorzio Sile-Piave	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 223.656.158
Comune di Venezia	L. 533.900.000.000	L. 533.900.000.000	L. 291.087.000.000	L. 148.536.979.612
Comune di Zero Branco	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 121.555.680
Subtotale	**L. 730.015.000.000**	**L. 730.015.000.000**	**L. 447.275.212.103**	**L. 235.660.796.968**
	Consorzi di bonifica			
Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	L. 62.000.000.000	L. 62.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 15.539.287.292
Consorzio di bonifica Basso Piave	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0
Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	L. 21.000.000.000	L. 21.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.569.204.990
Consorzio di bonifica Dese - Sile	L. 96.200.000.000	L. 96.200.000.000	L. 39.700.000.000	L. 14.140.595.506
Consorzio di bonifica Destra Piave	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0
Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brent	L. 31.200.000.000	L. 31.200.000.000	L. 19.700.000.000	L. 1.089.537.606
Subtotale	**L. 213.900.000.000**	**L. 213.900.000.000**	**L. 102.400.000.000**	**L. 33.338.625.394**
	Consorzi di fognatura e depurazione			
Consorzio Acquedotto Euganeo Berico	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0
Consorzio Sile-Piave	L. 14.500.000.000	L. 14.500.000.000	L. 0	L. 0
Consorzio Alta Servizi	L. 35.800.000.000	L. 35.800.000.000	L. 24.500.000.000	L. 10.810.483.525

Soggetto attuatore	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
Azienda Piovese Gestione Acque	L. 43.300.000.000	L. 43.300.000.000	L. 25.300.000.000	L. 17.638.830.816
Azienda Servizi idrici della Castellana	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0
A.S.P.I.V.	L. 43.800.000.000	L. 43.800.000.000	L. 0	L. 0
Centro Veneto Servizi	L. 24.400.000.000	L. 24.400.000.000	L. 11.500.000.000	L. 641.748.210
Azienda Consorzio del Mirese	L. 128.400.000.000	L. 128.400.000.000	L. 92.172.875.000	L. 69.172.491.284
Consorzio del Tergola	L. 158.100.000.000	L. 158.100.000.000	L. 100.075.000.000	L. 51.437.123.401
Subtotale	**L. 452.300.000.000**	**L. 452.300.000.000**	**L. 253.547.875.000**	**L. 149.700.677.236**
	Regione			
Regione - Arpav	L. 30.422.000.000	L. 30.422.000.000	L. 26.422.000.000	L. 14.175.839.691
Regione - Fognature e Depurazione	L. 146.663.000.000	L. 146.663.000.000	L. 80.235.231.852	L. 65.407.769.706
Regione - Foreste	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 1.670.400.000	L. 847.996.979
Subtotale	**L. 180.085.000.000**	**L. 180.085.000.000**	**L. 108.327.631.852**	**L. 80.431.606.376**
	Altri			
Ente di bacino R.S.U. VE 2	L. 43.200.000.000	L. 43.200.000.000	L. 43.200.000.000	L. 38.192.611.373
In attesa di indiv. sogg. attuatori	L. 181.500.000.000	L. 181.500.000.000	L. 35.478.051.114	L. 222.797.157
U.S.S.L. n. 12 - Venezia	L. 37.500.000.000	L. 37.500.000.000	L. 37.500.000.000	L. 24.897.371.467
Delta Po S.p.A.	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 0
U.L.S.S. n. 17 Este-Monselice	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0
Enti vari	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0
Magistrato alle Acque	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0

Soggetto attuatore	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
Subtotale	L. 295.000.000.000	L. 295.000.000.000	L. 133.478.051.114	L. 63.312.779.997
TOTALE	L. 1.871.300.000.000	L. 1.871.300.000.000	L. 1.045.028.770.069	L. 562.444.485.971

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE
COMUNI

ARQUA' PETRARCA
BATTAGLIA TERME
CASTELFRANCO VENETO
CAVARZERE
CHIOGGIA
CODEVIGO
ESTE
GALZIGNANO
JESOLO
MARCON
MEOLO
MOGLIANO VENETO
MONASTIER
MONSELICE
MORGANO
MUSILE DI PIAVE
NOALE
PADOVA
PIOVE DI SACCO
PREGANZIOL
QUARTO D'ALTINO
SAN BIAGIO DI CALLALTA
VENEZIA
ZERO BRANCO

Legenda

Importi finanziati: Somme messe a disposizione dallo Stato

Importi impegnati: Importi relativi ad interventi per i quali sono stati individuati i soggetti attuatori

Importi contabilizzati: Importi dei progetti già approvati dai competenti organi regionali, i cui interventi sono pertanto stati avviati o sono in fase di avvio

Importi erogati: Importi già erogati ai soggetti esecutori delle opere

Soggetto attuatore: Comune di Arquà Petrarca

Settore: Disinquinamento

Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
56 Fognatura nel comune di Arquà Petrarca	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 992.784.806	Lavori ultimati.(Progetto 6. Risanamento del bacino tra Adige e Bacchiglione)
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 1.000.000.000**	**L. 1.000.000.000**	**L. 1.000.000.000**	**L. 992.784.806**	

Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Ampliamento della rete fognaria in Comune di Arquà Petrarca	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 1.490.933.171	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 1.490.933.171**	

TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 4.000.000.000**	**L. 4.000.000.000**	**L. 4.000.000.000**	**L. 2.483.717.977**
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**100,0%**	**62,1%**

Soggetto attuatore: Comune di Battaglia Terme				Settore: Disinquinamento	
Legge 539/95 Es. 1997	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**
3. Adeguamento depuratore di Battaglia Terme	L. 830.000.000	L. 830.000.000	L. 830.000.000	L. 0	La DGR 463/98 ha individuato quale soggetto attuatore il Consorzio Acquedotto Euganeo Berico. Eug. B
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 830.000.000**	**L. 830.000.000**	**L. 830.000.000**	**L. 0**	
Legge 515/96 Es. 1997	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**
8 Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Battaglia Terme	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di approvazione
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 1.100.000.000**	**L. 1.100.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 1.930.000.000**	**L. 1.930.000.000**	**L. 830.000.000**	**L. 0**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**43,0%**	**0,0%**	

Soggetto attuatore: Comune di Castelfranco Veneto

Settore: Disinquinamento

Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
11 Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione in Comune di Castelfranco Veneto, località Salvatronda	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 171.269.017	Progetto approvato.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.800.000.000**	**L. 2.800.000.000**	**L. 2.800.000.000**	**L. 171.269.017**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 2.800.000.000**	**L. 2.800.000.000**	**L. 2.800.000.000**	**L. 171.269.017**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**100,0%**	**6,1%**	

Soggetto attuatore: Comune di Cavarzere					Settore: Disinquinamento
Legge 67/88 Es. 1992 - I^ fase	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**
3 Fognatura comunale di Cavarzere	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 990.000.000	Lavori ultimati.
4 Ampliamento dell'impianto di depurazione - III lotto	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 1.260.000.000	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.250.000.000**	
Legge 515/96 Es. 1997	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**
16 Ampliamento della rete fognaria in Comune di Cavarzere	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 128.819.650	L'ampliamento della rete fognaria in centro (2Mld) è in fase di appalto, mentre la rete fognaria di Martinelle e Boscochiaro (1 Mld) è in corso di redazione del progetto.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 128.819.650**	
Legge 515/96 Es. 1999	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**
17 Interventi di fognatura	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 8.500.000.000**	**L. 8.500.000.000**	**L. 5.500.000.000**	**L. 2.378.819.650**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**64,7%**	**28,0%**	

Soggetto attuatore: Comune di Chioggia | **Settore: Disinquinamento**

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
14 Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 569.361.501	Lavori ultimati
15 Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI lotto	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 912.083.961	Lavori ultimati
22 Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XVI lotto	L. 3.650.000.000	L. 3.650.000.000	L. 3.650.000.000	L. 500.000.000	L'impresa ha rescisso il contratto. Perizia approvata in C.T.R.A. voto n. 1994 del 14-7-94.
24 Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (VE) - Opere elettromeccaniche	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.459.541.098	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 7.600.000.000**	**L. 7.600.000.000**	**L. 7.600.000.000**	**L. 3.440.986.560**	

Legge 910/86 Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
9 Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 8.195.996.107	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 10.000.000.000**	**L. 10.000.000.000**	**L. 10.000.000.000**	**L. 8.195.996.107**	

Legge 67/88 Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
11 Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 110.000.000	Il comune di Chioggia ha proposto di modificare il progetto collegando la fognatura all'impianto di Val da Rio
21 Completamento della rete fognaria di Chioggia e Sottomarina	L. 14.400.000.000	L. 14.400.000.000	L. 14.400.000.000	L. 7.224.640.499	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 15.500.000.000**	**L. 15.500.000.000**	**L. 15.500.000.000**	**L. 7.334.640.499**	

Legge 67/88 Es. 1991	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5 Fognatura di Chioggia (VE)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 995.488.817	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 1.000.000.000**	**L. 1.000.000.000**	**L. 1.000.000.000**	**L. 995.488.817**	

Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
52 Ampliamento fognature bianca e nera nel centro storico di Chioggia	L. 8.950.000.000	L. 8.950.000.000	L. 8.950.000.000	L. 2.236.210.258	Lavori in corso. L'attuale progetto di L. 5.900.000.000 è al netto di L. 1.350.000.000 già corrisposti al Consorzio Ravennate col quale è stato rescisso il contratto (DGCA n. 368 del 24/9/1997)
53 Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acqua salata nella rete di fognatura	L. 1.050.000.000	L. 1.050.000.000	L. 1.050.000.000	L. 978.659.409	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 10.000.000.000**	**L. 10.000.000.000**	**L. 10.000.000.000**	**L. 3.214.869.667**	

Legge 539/95 Es. 1996	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6 Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Comune di Chioggia	L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 5.613.728.148	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 9.500.000.000**	**L. 9.500.000.000**	**L. 9.500.000.000**	**L. 5.613.728.148**	

Legge 539/95 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6 Progetto definitivo dell'impianto elettrico del depuratore di Val da Rio - 1° e 2° stralcio	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 524.336.002	Lavori in corso
7 Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento ed ammodernamento della linea "Picchi" del depuratore di Val da Rio	L. 230.000.000	L. 230.000.000	L. 230.000.000	L. 215.974.279	Lavori ultimati
8 Lavori di miglioramento ed ammodernamento dell'impianto di depurazione di Val da Rio - lotto funzionale A	L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	L. 1.766.517.554	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.800.000.000**	**L. 2.800.000.000**	**L. 2.800.000.000**	**L. 2.506.827.835**	

Legge 515/96 Es. 1997		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
17	Ampliamento della rete fognaria e interventi sugli impianti di depurazione comunale in Comune di Chioggia	L. 13.359.131.020	L. 13.359.131.020			Bisogna suddividere in sottointerventi.
18	Progetto di riqualificazione edilizia della linea "picchi" del depuratore di Val da Rio	L. 406.045.980	L. 406.045.980	L. 406.045.980	L. 328.002.059	Lavori ultimati.
29	Progetto esecutivo per un sistema di disadratazione dei fanghi - 2° lotto	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 376.376.000	Con DDDA 54 del 25/6/99 è stato assegnato il contributo definitivo di L 376.376.000 con un'economia di 23.624.000
30	Progetto di manutenzione straordinaria presso l'impianto di depurazione di Val da Rio	L. 284.823.000	L. 284.823.000	L. 284.823.000	L. 272.535.102	
31	Affinamento qualitativo dell'effluente del depuratore di Val da Rio	L. 3.950.000.000	L. 3.950.000.000	L. 0	L. 0	
32	Collettore di allacciamento della fognatura comunale per il conferimento dei reflui da Cà Bianca al depuratore di Val da Rio	L. 1.600.000.000	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 0	
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 20.000.000.000**	**L. 20.000.000.000**	**L. 1.090.868.980**	**L. 976.913.161**	
TOTALE (soggetto attuatore)		**L. 76.400.000.000**	**L. 76.400.000.000**	**L. 57.490.868.980**	**L. 32.279.450.794**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			**100,0%**	**75,2%**	**42,3%**	

Soggetto attuatore: Comune di Codevigo				Settore: Disinquinamento	
Legge 67/88 Es. 1990	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**
5 Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (PD)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.054.365.402	Lavori ultimati. Ulteriori L. 54.365.402 con DGR n. 1358 del 21.4.98
Subtotale (legge - esercizio)	***L. 3.000.000.000***	***L. 3.000.000.000***	***L. 3.000.000.000***	***L. 3.054.365.402***	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.054.365.402**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**100,0%**	**101,8%**	

Soggetto attuatore: Comune di Este					Settore: Disinquinamento
Legge 515/96 Es. 1997	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**
6 Ampliamento della rete fognaria nella zona del canale Bisatto - XI stralcio "Meggiaro"	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 269.155.250	Progetto approvato
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 269.155.250**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 269.155.250**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**100,0%**	**10,8%**	

Soggetto attuatore: Comune di Galzignano				Settore: Disinquinamento	
Legge 539/95 Es. 1997	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**
2 Collegamento della fognatura comunale all'impianto di depurazione di Battaglia Terme	L. 670.000.000	L. 670.000.000	L. 670.000.000	L. 413.921.104	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 670.000.000**	**L. 670.000.000**	**L. 670.000.000**	**L. 413.921.104**	
Legge 515/96 Es. 1997	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**
7 Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Galzignano	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 833.059.811	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 1.200.000.000**	**L. 1.200.000.000**	**L. 1.200.000.000**	**L. 833.059.811**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 1.870.000.000**	**L. 1.870.000.000**	**L. 1.870.000.000**	**L. 1.246.980.915**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**100,0%**	**66,7%**	

Soggetto attuatore: Comune di Jesolo | **Settore: Disinquinamento**

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3 Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (VE)	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.428.520.054	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.428.520.054**	

Legge 910/86 Es. 1987-1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
26 Rilievi ed ispezioni televisive della rete fognaria del Comune di Jesolo (VE). 2° Stralcio	L. 195.636.000	L. 195.636.000	L. 195.636.000	L. 97.818.000	Lavori in corso
27 Progetto esecutivo delle opere fognarie di collegamento della zona P.I.P. all'impianto di depurazione (VE)	L. 185.183.123	L. 185.183.123	L. 185.183.123	L. 183.853.720	Lavori ultimati. Il finanziamento in origine era di 310.000.000 L, sono avanzati L. 124.816.877 che sono stati utilizzati per il progetto relativo al percolati (DDDA 35/99)
28 Interventi alle reti -parte 1^/ parte 2^.	L. 469.364.000	L. 469.364.000	L. 469.364.000	L. 469.364.000	Lavori ultimati L'importo del progetto è di 714.000.000. I restanti 244.636.000 sono finanziati con la 67/88.
34 Somme per ulteriori interventi	L. 640.000.000	L. 640.000.000	L. 640.000.000	L. 640.000.000	Lavori finiti
35 Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale	L. 124.816.877	L. 124.816.877	L. 124.816.877	L. 12.638.229	Progetto approvato. L'importo finanziato dal DDDA 35/99 è di 150.000.000, i restanti 25.283.123 sono finanziati con i residui provenienti dalla 744/88 e dalla 4599/91.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 1.615.000.000**	**L. 1.615.000.000**	**L. 1.615.000.000**	**L. 1.403.673.949**	

Legge 67/88 Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale	L. 25.183.123	L. 25.183.123	L. 25.183.123		Progetto approvato. L'importo complessivo è di 150.000.000 L.
14 Ampliamento della rete fognaria di via Bafile in Comune di Jesolo (VE)	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.072.357.964	Lavori ultimati. Il decreto 49/99 di contabilità finale è di 5.039.436.496 L. Pertanto il comune restituirà i soldi dati in più pari a 13.232.893 L. (la differenza di L. 12.655.498 sono soldi d'interessi su un pagamento ritardato).
17 Interventi alle reti -parte 1^ / parte 2^.	L. 244.636.000	L. 244.636.000	L. 244.636.000	L. 244.636.000	Lavori ultimati.L'importo totale è di 714.000.000 L . Il resto di L 469.364.000 è finanziato con la legge 910/86
18 Progetto degli interventi presso l'impianto di depurazione.	L. 2.212.524.000	L. 2.212.524.000	L. 2.212.524.000	L. 1.466.023.432	Lavori in corso.
19 Somme per ulteriori interventi.	L. 17.656.877	L. 17.656.877	L. 0	L. 0	Soldi provenienti dagli avanzi della DGR 744/88 e della DGR 4599/91
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 8.000.000.000**	**L. 8.000.000.000**	**L. 7.982.343.123**	**L. 6.783.017.396**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 12.115.000.000**	**L. 12.115.000.000**	**L. 12.097.343.123**	**L. 10.615.211.399**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**99,9%**	**87,6%**	

Soggetto attuatore: Comune di Marcon | **Settore: Disinquinamento**

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
4 Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VIII lotto	L. 82.862.477	L. 82.862.477	L. 82.862.477	L. 82.233.170	Il Comune di Marcon con nota n. 17134 del 5/10/98 ha chiesto lo storno della somma iniziale di 600.000.000. per il recupero della fognatura nera di Gaggio. Tale progetto è stato finanziato con DDDA 48 del 25/6/99 per 517.137.523 £.
27 Recupero della rete di fognatura nera in loc. Gaggio	L. 517.137.523	L. 517.137.523	L. 517.137.523	L. 0	Fondi provenienti dal progetto fognatura VIII lotto di 600 mln.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 600.000.000**	**L. 600.000.000**	**L. 600.000.000**	**L. 82.233.170**	

Legge 539/95 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
10 Riabilitazione fognaria del Comune di Marcon	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 377.311.795	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 377.311.795**	

TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 3.600.000.000**	**L. 3.600.000.000**	**L. 3.600.000.000**	**L. 459.544.965**
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**100,0%**	**12,8%**

Soggetto attuatore: Comune di Meolo				Settore: Disinquinamento	
Legge 67/88 Es. 1991	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**
4 Adeguamento impianto di depurazione e rete fognaria in comune di Meolo.	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 1.000.000.000**	**L. 1.000.000.000**	**L. 1.000.000.000**	**L. 900.000.000**	
Legge 515/96 Es. 1997	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**
21 Ampliamento della rete fognaria in Comune di Meolo	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 932.123.735	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 1.000.000.000**	**L. 1.000.000.000**	**L. 1.000.000.000**	**L. 932.123.735**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 2.000.000.000**	**L. 2.000.000.000**	**L. 2.000.000.000**	**L. 1.832.123.735**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**100,0%**	**91,6%**	

Soggetto attuatore: Comune di Mogliano Veneto | **Settore: Disinquinamento**

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
Fognatura di Mogliano Veneto	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	Fondi proven. da riallocazione "Giudecca" - Imp. Totale 4 Mld
2 Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 733.359.359	Lavori ultimati
19 Fognatura frazioni di Bonisiolo e Zerman in comune di Mogliano Veneto (TV)	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 452.212.485	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.300.000.000**	**L. 2.300.000.000**	**L. 1.300.000.000**	**L. 1.185.571.844**	

Legge 910/86 Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
Fognatura di Mogliano Veneto	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Fondi proven. da riallocazione "Giudecca" - Imp. Totale 4 Mld
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
54 Opere di completamento della fognatura comunale e monitoraggio/telerilevamento impianti di sollevamento	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.330.008.413	Lavori in corso. Con decreto 6961 del 13 agosto 1999 del genio civile di TV è stata approvata una perizia suppletiva e di variante con concordamento nuovi prezzi.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 6.000.000.000**	**L. 6.000.000.000**	**L. 6.000.000.000**	**L. 5.330.008.413**	

Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
12 Ampliamento della rete fognaria in Comune di Mogliano Veneto	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 79.603.861	Progetto approvato
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 5.000.000.000**	**L. 5.000.000.000**	**L. 5.000.000.000**	**L. 79.603.861**	

Legge 515/96 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
14 Interventi di fognatura	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	Inetrvento finanziato per 4 mld con fondi riallocati
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 1.000.000.000**	**L. 1.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

TOTALE (soggetto attuatore)	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 12.300.000.000	L. 6.595.184.118
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	71,1%	38,1%

Soggetto attuatore: Comune di Monastier | **Settore: Disinquinamento**

Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
13 Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione comunale in Comune di Monastier	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 719.387.832	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 719.387.832**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 719.387.832**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**100,0%**	**24,0%**	

Soggetto attuatore: Comune di Monselice					Settore: Disinquinamento
Legge 139/92 Es. 1993	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**
55 Fognatura di Monselice	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 3.691.408.125	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 5.000.000.000**	**L. 5.000.000.000**	**L. 5.000.000.000**	**L. 3.691.408.125**	
Legge 515/96 Es. 1997	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**
9 Ampliamento della rete fognaria in Comune di Monselice	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	Progetto approvato
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 5.000.000.000**	**L. 5.000.000.000**	**L. 5.000.000.000**	**L. 0**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 10.000.000.000**	**L. 10.000.000.000**	**L. 10.000.000.000**	**L. 3.691.408.125**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**100,0%**	**36,9%**	

Soggetto attuatore: Comune di Morgano					Settore:	Disinquinamento
Legge 515/96 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
15 Interventi di fognatura	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0		
Subtotale (legge - esercizio)	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0		
TOTALE (soggetto attuatore)	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0		
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	0,0%	0,0%		

Soggetto attuatore: Comune di Musile di Piave

Settore: Disinquinamento

Legge 910/86 Es. 1987-1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
9 Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 372.031.985	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 1.000.000.000**	**L. 1.000.000.000**	**L. 1.000.000.000**	**L. 372.031.985**	

Legge 67/88 Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
4 Ampliamento della rete fognaria di Musile di Piave (VE)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 1.505.070.836	Lavori in corso.
13 Ampliamento impianto di depurazione del Comune di Musile di Piave (VE)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 4.000.000.000**	**L. 4.000.000.000**	**L. 4.000.000.000**	**L. 1.505.070.836**	

Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
22 Completamento funzionale dell'impianto di depurazione comunale di Musile di Piave	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 400.000.000**	**L. 400.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 5.400.000.000**	**L. 5.400.000.000**	**L. 5.000.000.000**	**L. 1.877.102.821**
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**92,6%**	**34,8%**

Soggetto attuatore: Comune di Noale

Settore: Disinquinamento

Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
23 Realizzazione di un parco ecologico - bacino di lagunaggio in Comune di Noale	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**0,0%**	**0,0%**	

Soggetto attuatore: Comune di Padova					Settore:	Disinquinamento
Legge 515/96 Es. 1997	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**	
10 Ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nordio in Comune di Padova	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0		
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 4.000.000.000**	**L. 4.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**		
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 4.000.000.000**	**L. 4.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**		
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**0,0%**	**0,0%**		

Soggetto attuatore: Comune di Piove di Sacco

Settore: Disinquinamento

Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
48 Sistemazioni idraulico-ambientali di Piove di Sacco ("Valle di circonvallazione")	L. 3.117.332.477	L. 3.117.332.477	L. 3.117.332.477	L. 2.985.267.333	Lavori in corso.
49 Ampliamento fognature di Piove di Sacco	L. 3.882.667.523	L. 3.882.667.523	L. 3.882.667.523	L. 3.499.396.725	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 7.000.000.000**	**L. 7.000.000.000**	**L. 7.000.000.000**	**L. 6.484.664.058**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 7.000.000.000**	**L. 7.000.000.000**	**L. 7.000.000.000**	**L. 6.484.664.058**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**100,0%**	**92,6%**	

Soggetto attuatore: Comune di Preganziol					Settore:	Disinquinamento
Legge 515/96 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
16 Interventi di fognatura	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0		
Subtotale (legge - esercizio)	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0		
TOTALE (soggetto attuatore)	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0		
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	0,0%	0,0%		

Soggetto attuatore: Comune di Quarto d'Altino | **Settore: Disinquinamento**

Legge 910/86 Es. 1987-1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
21 Costruzione della rete fognaria di Quarto d'Altino (VE)	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.350.000.000	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 1.500.000.000**	**L. 1.500.000.000**	**L. 1.500.000.000**	**L. 1.350.000.000**	

Legge 67/88 Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
8 Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino (VE)	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 4.194.551.388	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 5.000.000.000**	**L. 5.000.000.000**	**L. 5.000.000.000**	**L. 4.194.551.388**	

Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
43 Interventi alle fognature di Quarto d'Altino (II stralcio)	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.741.403.278	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 4.000.000.000**	**L. 4.000.000.000**	**L. 4.000.000.000**	**L. 3.741.403.278**	

TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 10.500.000.000**	**L. 10.500.000.000**	**L. 10.500.000.000**	**L. 9.285.954.666**
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**100,0%**	**88,4%**

Soggetto attuatore: Consorzio Sile-Piave

Settore: Disinquinamento

Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
14 Ampliamento della rete fognaria e realizzazione I stralcio dell'impianto di depurazione comunale della frazione Olmi in Comune di San Biagio di Callalta	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 223.656.158	Con DGR n. 1519 del 13.05.1998 il soggetto attuatore è diventato Azienda Speciale Consorziale Sile - Piave di Roncade.(prima era il comune).Progetto approvato.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 223.656.158**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 223.656.158**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**100,0%**	**7,5%**	

Soggetto attuatore: Comune di Venezia — **Settore: Disinquinamento**

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Ampliamento e completamento impianto di depurazione di Campalto (VE) - Telecontrollo	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	Con DGR n. 3183 del 22-7-96, i fondi sono stati destinati alla vasca di pioggia della Gazzera (imp. complessivo £ 4.400.000.000 vedi n. 22 L. 139/92 esercizio 1993) (Aspiv)
6 Costruzione della fognatura di Treporti (VE)	L. 2.700.000.000	L. 2.700.000.000	L. 2.700.000.000	L. 2.672.031.910	Lavori ultimati
7 Costruzione rete fognaria del Lido (VE) - V lotto	L. 3.090.000.000	L. 3.090.000.000	L. 3.090.000.000	L. 3.074.777.797	Lavori ultimati
9 Completamento scolmatore bacino S. Giuliano (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.992.669.601	Lavori ultimati
10 Costruzione della fognatura del Terraglio (VE)	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.158.394.619	Lavori ultimati
11 Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (VE) - II lotto	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 2.887.959.819	Lavori ultimati. La somma residua di L. 1.150 ml è stata destinata ai lavori della fognatura di Carpenedo L. 910/86 es. 1989 n. 4 (decreto n. 55 del 12.10.94)
12 Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - III lotto	L. 1.150.000.000	L. 1.150.000.000	L. 1.150.000.000	L. 1.124.100.837	Lavori ultimati
13 Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - I lotto	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 4.023.025.949	Lavori ultimati
16 Completamento delle fognature di Via Torino - Mestre VE	L. 1.650.000.000	L. 1.650.000.000	L. 1.650.000.000	L. 1.586.526.731	Lavori ultimati
17 Costruzione della fognatura ed impianto di depurazione di Pellestrina e S. Pietro in Volta (VE)	L. 1.310.000.000	L. 1.310.000.000	L. 1.310.000.000	L. 0	Progetto approvato. (Fondi riallocati)
18 Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mestre - Marghera	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	Lavori ultimati
26 Interventi di risanamento igienico ed edilizio di Pellestrina e S. Pietro in Volta	L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 0	L. 0	E' stato sottoscrittol'accordo di programma tra Regione e Comune
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 32.800.000.000**	**L. 32.800.000.000**	**L. 23.300.000.000**	**L. 19.519.487.263**	

Legge 910/86 Es. 1987-1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
14 Lavori di costruzione del collettore di via Paleocapa e via Canal - Marghera (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.759.688.982	Lavori in corso. Con DDDA n. 6 DEL 27/01/1997 il finanziamento è stato modificato da L. 2.000.000.000 a L. 1.970.000.000. Lavori ultimati in data 22.06.99. E' in corso il collaudo (21/10/99).	(Aspiv)
17 Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VII lotto	L. 3.100.000.000	L. 3.100.000.000	L. 3.100.000.000	L. 242.513.283	Progetto approvato.	
19 Costruzione della rete secondaria di fognatura di Pellestrina	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	E' stato approvato il collegamento all'impianto del Lido.	
20 Costruzione della rete di fognatura di S. Marta (VE)	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 89.005.091	Lavori in corso	
22 Interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e nere a completamento della fognatura consortile Mestre - Marghera (VE)	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 5.761.005.698	Lavori ultimati	
23 Costruzione dell'impianto di depurazione e scarico a mare di Pellestrina (VE)	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 0	E' stato approvato il progetto di collegamento all'impianto del Lido	
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 22.800.000.000**	**L. 22.800.000.000**	**L. 22.800.000.000**	**L. 7.852.213.054**		

Legge 910/86 Es. 1989		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
2	Costruzione vasca di modulazione di Favaro Veneto (VE)	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 3.093.411.867	Lavori in corso. (L.3.150.000.000 = 90% importo).	(Aspiv)
3	Costruzione della vasca di pioggia del nodo idraulico di Ca' Emiliani - Loc. Rana (VE)	L. 7.750.000.000	L. 7.750.000.000	L. 7.750.000.000	L. 735.000.000	Progetto approvato. Appalto in corso (rifatta perizia geologica e calcoli statici nuovi)	
4	Costruzione fognatura di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)	L. 3.750.000.000	L. 3.750.000.000	L. 3.750.000.000	L. 4.264.978.225	Lavori in corso. L'importo del progetto è di L. 4.900 ml cui si fa fronte per L. 3.750 ml con i fondi della L. 910/86 e per L. 1.150 ml presi dal decreto n. 1001 del 26.10.97 (fognatura di Carpenedo - II lotto).	(Aspiv)
7	Impianto di depuratore del Cavallino - adeguamento della fase biologica alla rimozione dell'azoto	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.079.483.722	Lavori ultimati.	(Aspiv)
8	Fognatura e depurazione del Lido e del Cavallino	L. 3.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 3.187.000.000	L. 164.329.500	Progetto approvato.	(Aspiv)
10	Fognatura S. Erasmo	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	E' stato sottoscr. l'accordo di programma tra Regione e Comune.	
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 25.000.000.000**	**L. 25.000.000.000**	**L. 19.387.000.000**	**L. 9.337.203.314**		

Legge 67/88 Es. 1988		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
1	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (VE)	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 407.953.305	Progetto in istruttoria. Con DGR n. 4523 del 1/12/1998 sono stati stanziati ulteriori L. 2 Mld dai fondi ex Legge n. 67/88. Incarico per progetto definitivo. Vedi anche DGR 259/94	
2	Completamento dell'impianto di trattamento di Campalto - Opere accessorie	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.159.112.782	Lavori quasi ultimati. (Vedi anche DGR 259/94). I lavori sono sospesi dal 8/9/99.	(Aspiv)
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 15.500.000.000**	**L. 15.500.000.000**	**L. 15.500.000.000**	**L. 2.567.066.087**		

Legge 67/88 Es. 1990		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
2	Ampliamento della fognatura del Cavallino (VE) - II stralcio	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.578.965.650	Lavori ultimati. Opere civili terminate il 10/4/98. Opere elettromeccaniche ultimati. E' in corso il collaudo	(Aspiv)
3	Ampliamento delle fognature di Pellestrina (VE)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	Progetto approvato.	
9	Ampliamento delle fognature del Lido di Venezia - VIII lotto	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 3.000.000.000	Lavori ultimati (maggio 1999).E' in corso il collaudo delle opere.	
12	Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo - Bissuola (VE)	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 1.398.768.536	I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Campalto. Progetto approvato.	
15	Costruzione della vasca di accumulo acque meteoriche di piazzale Giovannacci - Marghera (VE)	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 6.576.183.496	Lavori in corso.(vedi anche DGR 259/94). Sono in corso lavori per la realizzazione della tenuta idraulica dei diaframmi proposti da consulenti specialistici. (30/9/99)	(Aspiv)
16	Razionalizzazione della rete fognaria di Marghera (VE) - via Asseggiano a Chirignago	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 4.824.945.022	Lavori ultimati (14/12/98). Vedi anche DGR 259/94	(Aspiv)
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 42.500.000.000**	**L. 42.500.000.000**	**L. 42.500.000.000**	**L. 21.378.862.704**		

Legge 67/88 Es. 1991		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
1	Estensione della rete fognaria di tipo separato nella zona di Trivignano - Zelarino - II lotto	L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 5.832.586.053	Lavori in corso	(Aspiv)
3	Impianto di depurazione di Pellestrina (VE)	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	Fondi riallocati per fognatura di Pellestrina. Progetto approvato	
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 8.100.000.000**	**L. 8.100.000.000**	**L. 8.100.000.000**	**L. 5.832.586.053**		

Legge 67/88 Es. 1992 - I^ fase		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
5	Progetto di rifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.163.855.532	Lavori ultimati. I fondi sono stati riallocati con PCR n. 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 - progetto Lusore.	(Aspiv)
6	Potenziamento dell'impianto di sollevamento Rana e costruzione di un modulo di sedimentazione	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 0	E' stato dato nulla osta alla modifica progettuale.	
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 10.000.000.000**	**L. 10.000.000.000**	**L. 5.500.000.000**	**L. 5.163.855.532**		

Legge 360/91	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3 Bonifica della discarica di rifiuti Ca' Emiliani (Marghera)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	Il Comune di Venezia doveva presentare il progetto nel 1991
4 Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bonifica discarica di S. Giuliano (VE) - I lotto "B1"	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	Lavori ultimati per questa quota parte.L'intervento rientra nella realizzazione del Parco di S. Giuliano.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 4.000.000.000**	**L. 4.000.000.000**	**L. 2.000.000.000**	**L. 2.000.000.000**	

Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
11 Ristrutturazione dei collettori principali di fognatura di via Torino a Mestre	L. 9.200.000.000	L. 9.200.000.000	L. 9.200.000.000	L. 8.293.709.649	Lavori ultimati (06.08.99)	(Aspiv)
12 Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano	L. 5.800.000.000	L. 5.800.000.000	L. 5.800.000.000	L. 2.151.743.302	Sospensione dei lavori in data 18.11.98 in attesa di decisioni in merito alla tenuta idraulica dei diaframmi.	(Aspiv)
13 Completamento della rete di fognatura separata della zona del Terraglio - bacino di Carpenedo - Mestre	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 4.428.368.937	Lavori in corso. I lavori sono stati sospesi dal 18.08.1999.	(Aspiv)
14 Estensione della rete di fognatura separata nella zona di Marghera tra SS. Romea e autostrada VE-PD	L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000	L. 3.214.854.134	Lavori ultimati (14.09.99)	(Aspiv)
15 Ristrutturazione rete di fognatura attigua al rio Cimetto - bacino Gazzera - Mestre	L. 3.900.000.000	L. 3.900.000.000	L. 3.900.000.000	L. 3.351.542.553	Lavori in corso. I lavori sono sospesi dal 07.05.1999	(Aspiv)
16 Ristrutturazione della fognatura nella zona di Cipressina - Zelarino	L. 5.300.000.000	L. 5.300.000.000	L. 5.300.000.000	L. 3.784.053.693	Lavori in corso. I lavori sono sospesi dal 15.03.99	(Aspiv)
17 Ricostruzione della fognatura di via S. Donà - Bacino di Carpenedo	L. 7.200.000.000	L. 7.200.000.000	L. 7.200.000.000	L. 4.695.115.357	Lavori ultimati	(Aspiv)
18 Ricostruzione della fognatura della zona di via Silvio Trentin - Mestre	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 1.102.296.400	Lavori in corso.	(Aspiv)
19 Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Veneto	L. 4.200.000.000	L. 4.200.000.000	L. 4.200.000.000	L. 3.706.958.789	Lavori ultimati (23.10.98)	(Aspiv)
20 Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Campalto e Tessera	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 0	Lavori in fase di appalto.	
21 Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto	L. 14.000.000.000	L. 14.000.000.000	L. 14.000.000.000	L. 490.038.464	In fase di appalto. Importo complessivo £ 20.000 ml vedi L. 139/92 II fase (8)	
22 Risanamento fognario nella zona di Carpenedo (via Tevere)	L. 9.600.000.000	L. 9.600.000.000	L. 9.600.000.000	L. 1.465.200.127	Lavori in corso.	(Aspiv)
23 Completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcontenta	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 207.201.738	Lavori fermi - problemi con espropri.Non è ancora avvenuta la consegna dei lavori (30/9/99).	(Aspiv)
24 Ricostruzione della rete fognaria nella zona del centro urbano di Mestre attigua al canale Osellino	L. 3.700.000.000	L. 3.700.000.000	L. 3.700.000.000	L. 2.290.297.871	Lavori in corso.	(Aspiv)
25 Vasca di pioggia della Gazzera	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 0	Importo complessivo £ 4.400 ml di cui 1 mld proviene dalla 798/84 es. 1984-1985-1986 (1). Progetto approvato.	(Aspiv)

40	Progetto integrato escavo rii - centro storico di Venezia	L. 35.000.000.000	L. 35.000.000.000	L. 35.000.000.000	L. 29.149.793.066	Lavori in corso.	
44	Interventi alle fognature di Pellestrina	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	Progetto approvato.	
45	Interventi alle fognature del Lido - IX lotto-.	L. 9.000.000.000	L. 9.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso. Presentato progetto per meno di 5 Mld; restano dei fondi.	
46	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Est - Ca' di Valle	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 2.979.653.087	Lavori ultimati. (30.7.99)	(Aspiv)
47	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Ovest - Ca' Savio	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.574.878.438	Lavori ultimati in data 8.8.99. Bloccato pagamenti in attesa di chiarimenti (9/9/99).	(Aspiv)
	Subtotale (legge - esercizio)	**. 145.000.000.000**	**. 145.000.000.000**	**L. 136.000.000.000**	**L. 74.885.705.605**		

Legge 139/92 II fase		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
	Progetto Campalto-completamento impianto depurazione	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	Fondi provenienti da riallocazione "fitodepurazione estuarina sul canale Vela"
	Progetto Campalto - affinamento con fitodepurazione	L. 7.500.000.000	L. 7.500.000.000	L. 0	L. 0	Fondi provenienti da riallocazione "diversione acque piena Tergola-Sostegno torre di Burri"
4	Progetto Fusina: completamento della rete fognaria e relativi allacciamenti nell'area Mestre-Gazzera e Mestre-Malcontenta	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
7	Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
9	Progetto Campalto: ampliamento dell'impianto di depurazione di Campalto (V linea)	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso. Importo complessivo £ 20.000ml finanziato con 14.000 ml sulla L. 139/92 I fase (18). 800 ml sono stati utilizzati per finanziare perizia suppletiva "vasca di modulazione di Favaro".
10	Progetto Campalto: adeguamento della rete principale di via Torino e interconnessione con la rete di Mestre	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso.
12	Progetto Campalto: costruzione tronco di interconnessione tra il collettore Acque Basse ed i bacini di via Torino e S. Giuliano	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso.
13	Progetto Campalto: regolazione dei flussi di piena e di trattamento acque di pioggia a S. Giuliano	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso
15	Progetto Campalto: spese di gestione riferite all'intero progetto	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati con riparto '99 su progetto Campalto affinamento.
21	Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali delle reti fognarie del Comune di Venezia	L. 6.700.000.000	L. 6.700.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
26	Escavo rii nel centro storico di Venezia	L. 32.000.000.000	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	Elaborato il piano programma degli interventi
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 79.700.000.000**	**L. 79.700.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

Legge 539/95 Es. 1996	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
9 Escavo dei rii del centro storico di Venezia	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Elaborato il piano programma degli interventi
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

Legge 539/95 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
9 Escavo rii nel centro storico di Venezia	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Importo complessivo: L. 26.000.000.000 finanziato con DGR n. 553 del 25.02.97 e DGR 2613 del 22.07.97 (vedi C/26/1)
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
25 Ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria in Comune di Venezia	L. 53.000.000.000	L. 53.000.000.000	L. 0	L. 0	Sono previsti 9 interventi in varie località.
28 Progetto scavo rii	L. 23.000.000.000	L. 23.000.000.000	L. 0	L. 0	Importo complessivo: L. 26.000.000.000 finanziato con DGR n. 553 del 25.02.97 e DGR 2613 del 22.07.97 (vedi C/26/1). Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 76.000.000.000**	**L. 76.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

Legge 345/97 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Progetto Campalto - completamento impianto di depurazione	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 0	L. 0	L'intervento è finanziato per 13 mld di cui 500 mln provengono da fondi riallocati
21 Progetto integrato Rii	L. 38.000.000.000	L. 38.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 50.500.000.000**	**L. 50.500.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 517.900.000.000**	**L. 517.900.000.000**	**L. 275.087.000.000**	**L. 148.536.979.612**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**53,1%**	**28,7%**	

Soggetto attuatore: Comune di Zero Branco				Settore: Disinquinamento	
Legge 139/92 II fase	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**
Fognatura di Zero Branco	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	Fondi proven. da riallocazione "Normativa e Regolamenti"
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 500.000.000**	**L. 500.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
Legge 515/96 Es. 1997	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**
15 Ampliamento della rete fognaria e completamento del costruendo impianto di depurazione comunale	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 121.555.680	Lavori appaltati
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 121.555.680**	
Legge 515/96 Es. 1999	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**
19 Interventi di fognatura e depurazione	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	Gli interventi sono finanziati per 500 mln con fondi riallocati per un totale di 1 mld.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 500.000.000**	**L. 500.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 4.000.000.000**	**L. 4.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 121.555.680**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**75,0%**	**3,0%**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

CONSORZI DI BONIFICA

CONSORZIO ADIGE - BACCHIGLIONE
CONSORZIO BASSO PIAVE
CONSORZIO BRENTA - BACCHIGLIONE
CONSORZIO DESE - SILE
CONSORZIO DESTRA PIAVE
CONSORZIO SINISTRA - MEDIO BRENTA

PAGINA BIANCA

Soggetto attuatore: Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione

Settore: Disinquinamento

Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
57 Intervento di diversione idraulica della laguna - incremento invasi - monitoraggio e telecontrollo	L. 25.000.000.000	L. 25.000.000.000	L. 25.000.000.000	L. 15.090.269.476	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 25.000.000.000**	**L. 25.000.000.000**	**L. 25.000.000.000**	**L. 15.090.269.476**	

Legge 139/92 II fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
32 Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sui rii Barbegara, Rebosola e S. Silvestro	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 449.017.816	Lavori in fase di appalto. Con DDDA 62 del 5/8/99 sono stati prorogati al 21/6/2000 e 21/6/2003 i termini d'inizio e fine lavori.
37 Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica.	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	Progetto approvato.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 15.000.000.000**	**L. 15.000.000.000**	**L. 15.000.000.000**	**L. 449.017.816**	

Legge 345/97 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
12 Fitodepurazione per integraz. rete fognaria e di bonifica	L. 15.000.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	L. 0	
13 Interv. per incremento tempi di ritenzione acque sfioro urbane e da superf. agricole a Este e Baone	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 22.000.000.000**	**L. 22.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

TOTALE (soggetto attuatore)	***L. 62.000.000.000***	***L. 62.000.000.000***	***L. 40.000.000.000***	***L. 15.539.287.292***
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**64,5%**	**25,1%**

Soggetto attuatore: Consorzio di bonifica Basso Piave				Settore: Disinquinamento	
Legge 515/96 Es. 1997	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**
19 Miglioramento della efficienza dello scarico delle reti fognarie	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**0,0%**	**0,0%**	

Soggetto attuatore: Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione

Settore: Disinquinamento

Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
50 Sistemazioni idraulico-ambientali area Brenta-Bacchiglione (foce lagunare di Lova)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.569.204.990	Lavori ultimati. A seguito di perizia di variante in assestamento, i lavori di telecomando e tele controllo saranno realizzati nell'ambito degli "interventi strutturali in rete di bonifica - diversione acque di piena del Fiumicello"
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 2.569.204.990**	

Legge 139/92 II fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
35 Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Fiumicello (idrovora Cambroso)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Lavori in corso.Vedi decreto 34/99 per approvazione perizia di variante.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

Legge 345/97 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
8 Ricalibratura e sostegni sui Rii di piove	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	L. 0	
9 Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di S. e Codevigo	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 0	L. 0	
10 Ricalibratura reti bonif. e gestione invasi e recapito finale in area "Brondolo" - Chioggia	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 15.000.000.000**	**L. 15.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 21.000.000.000**	**L. 21.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 2.569.204.990**
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**14,3%**	**12,2%**

Soggetto attuatore: Consorzio di bonifica Dese - Sile

Settore: Disinquinamento

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
8 Costruzione impianto idrovoro Canale Scolmatore F. Marzenego	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 2.659.880.988	Lavori ultimati. Il costo totale dell'opera è di 4,700 ml. Vedasi anche intervento relativo alle opere accessorie per L. 1.500 ml (punto 23).
23 Opere accessorie relative all'impianto idrovoro del Canale Scolmatore e ristrutturazione rete di bonifica Favaro Veneto (VE)	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.610.833.252	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 4.700.000.000**	**L. 4.700.000.000**	**L. 4.700.000.000**	**L. 4.270.714.240**	

Legge 67/88 Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
20 Risanamento e rinaturalizzazione del II tronco del canale Acque Basse	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 1.643.758.731	I fondi sono stati riallocati con la II fase degli interventi della L. 139/92 - progetto Campalto.E' stata richiesta una proroga il 16.02.99 di 12 mesi per la presentazione del progetto esecutivo. E' stato redatto il Piano Guida datato aprile 1999.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 12.500.000.000**	**L. 12.500.000.000**	**L. 12.500.000.000**	**L. 1.643.758.731**	

Legge 67/88 Es. 1992 - I^ fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
7 Impianto idrovoro a servizio del Canale Scolmatore del fiume Marzenego - II stralcio	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	Lavori ultimati. Decreto contabilità finale 27/1999.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 6.000.000.000**	**L. 6.000.000.000**	**L. 6.000.000.000**	**L. 6.000.000.000**	

Legge 67/88 Es. 1992 - II^ fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5 Sistemazione del fiume Marzenego "Ramo Beccherie" nel centro di Mestre	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 1.019.391.139	Lavori in corso. (ex-VE
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 1.019.391.139**	

Legge 360/91	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
Ricalibrazione e sostegno nei sottobacini del Marzenego	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	Fondi provenienti da riallocazione "progetto Marzenego"
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

Legge 139/92 II fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
11 Progetto Campalto: costruzione del I tronco del collettore Acque Basse	L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso. Presentata il 12.02.99 una proroga di 12 mesi per la presentazione del progetto esecutivo.E' stato redatto il Piano guida datato aprile 1999. il 6/9/99 è scaduto il termine per le domande di incarico progettazione
14 Progetto Campalto: risezionamento del canale di interconnessione tra gli impianti di Campalto e dello Scolmatore Marzenego	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso. Presentata il 16.02.99 richiesta di proroga per 12 mesi per la presentazione del progetto esecutivo.
30 Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Dese	L. 16.000.000.000	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
30 Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Zero	L. 14.000.000.000	L. 14.000.000.000	L. 14.000.000.000	L. 1.206.731.396	Lavori appaltati
31 Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Marzenego.	L. 15.000.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione definitiva in corso.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 65.500.000.000**	**L. 65.500.000.000**	**L. 14.000.000.000**	**L. 1.206.731.396**	

Legge 345/97 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
11 Ricalibratura e sostegni nei sottobacini del Marzenego	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	L'intervento è finanziato per 5 mld, di cui 2,5 mld provengono da fondi riallocati.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 96.200.000.000**	**L. 96.200.000.000**	**L. 39.700.000.000**	**L. 14.140.595.506**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**41,3%**	**14,7%**	

Soggetto attuatore: Consorzio di bonifica Destra Piave				Settore: Disinquinamento	
Legge 345/97 Es. 1999	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**
15 Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque del sottobac. "Vela"	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 1.000.000.000**	**L. 1.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 1.000.000.000**	**L. 1.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**0,0%**	**0,0%**	

Soggetto attuatore: Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta | **Settore: Disinquinamento**

Legge 139/92 II fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3 Sistemazione rete Chirignago e interconnessione all' impianto idrovoro di Malcontenta (finanziato effettivo: L. 5.500.000.000)	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	Qs. prog., assieme a quello da 2,5 Mld (Potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta) , nasce da 2 progetti di 4 Mld l'uno: intercon. fra fosso Sette e imp. idrov. Malcontenta + ricalibratura e *rinaturaliz.* rete bonifica. 1,5 mld Cap.50511.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 4.000.000.000**	**L. 4.000.000.000**	**L. 4.000.000.000**	**L. 0**	

Legge 139/92 II fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Progetto integrato Fusina - Ricalibratura degli scoli Fondi a Est e Fondi a Sud e sottopasso del Naviglio	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 246.228.736	Progetto approvato
2 Progetto integrato Fusina: Ricalibratura canali di bonifica (Bastie, Foscara e Giare)	L. 5.050.000.000	L. 5.050.000.000	L. 5.050.000.000	L. 547.553.196	Progetto approvato. Con DGR n. 33 del 12/01/1999 integrato il finanziamento per 2,3 Mld richiesto in seguito a verifiche progettuali. Il progetto trae origine da un progetto di L. 10 Mld di cui alla DGR n. 3324/96.
2 Progetto integrato Fusina: Potenziamento impianto idrovoro di Dogaletto in comune di Mira	L. 4.950.000.000	L. 4.950.000.000	L. 4.950.000.000	L. 188.764.833	Progetto approvato. Il progetto trae origine da un progetto di L. 10 Mld di cui alla DGR n. 3324/96
5 Potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta (finanziato effettivo: L. 2.500.000.000)	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 2.500.000.000	L. 106.990.841	Progetto approvato.Questo, assieme a quello da 5,5 Mld (sistem. rete Chirignago e interconn. imp. idrov. Malcontenta), nasce da 2 progetti di 4 Mld l'uno: intercon. fra fosso Sette e imp. idrov. Malcontenta + ricalibrat. e rinaturalizz. rete bonifica.
6 Progetto Fusina: invasi di laminazione e sedimentazione in aree depresse per circa 30 ha con sistemazione a parco e con restituzione all'idrovora di Malcontenta	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto mai presentato. Proposta di riallocazione dei fondi con nuovo P.D. come "Progetto dimostrativo in comune di Dolo".
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 20.200.000.000**	**L. 20.200.000.000**	**L. 15.700.000.000**	**L. 1.089.537.606**	

Legge 345/97 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
14 Progetto dimostrativo integrazione rete fognaria e di bonifica	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 0	L. 0	L'intervento è finanziato per 10 mld di cui 3 provenienti da fondi riallocati.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 7.000.000.000**	**L. 7.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 31.200.000.000**	**L. 31.200.000.000**	**L. 19.700.000.000**	**L. 1.089.537.606**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**63,1%**	**3,5%**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

REGIONE

REGIONE - A.R.P.A.V.
REGIONE - FOGNATURE E DEPURAZIONE
REGIONE - FORESTE

PAGINA BIANCA

Soggetto attuatore: Regione - Arpav | **Settore: Disinquinamento**

Legge 67/88 Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
7 Aggiornamento del Piano Direttore - quota ARPAV	L. 422.000.000	L. 422.000.000	L. 422.000.000	L. 422.000.000	Lavori in corso. L'importo deriva dall'intervento di L. 5 Mld di cui alla DGR n. 4599 del 05/08/1991.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 422.000.000**	**L. 422.000.000**	**L. 422.000.000**	**L. 422.000.000**	

Legge 67/88 Es. 1991	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6 Sistema informativo regionale - Nodo laguna	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 31.475.500	Fondi utilizzati per il SINA regionale. Appalto in corso. Questi fondi vengono utilizzati con DGR 2558/99 nel progetto di monitoraggio del bacino scolante (18,57 Mld)
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 500.000.000**	**L. 500.000.000**	**L. 500.000.000**	**L. 31.475.500**	

Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
42 Interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	Programma SINA regionale. Questi fondi sono stati utilizzati con DGR 2558/99 nel progetto di monitoraggio del bacino scolante
58 Estensione rete agrometeorologica	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 997.663.930	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 997.663.930**	

Legge 139/92 II fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
23 Settore agricolo: potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 3.401.600.335	Lavori in corso
24 Settore agricolo: potenziamento del Centro Agrochimico della Regione Veneto	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 1.894.715.796	Lavori in corso. La DGR n. 694 del 10.03.98 (modificata con DGR n. 1327/1998) assegna 2 Mld, mentre la DGR n. 1398 del 16.04.97 assegna il rimanente 1 Mld.
29 Monitoraggio e controllo rete: sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 6.697.500.000	Fondi riallocati 98. Con DGR 2558/99 questi fondi vengono utilizzati per il progetto di monitoraggio del bacino scolante (18,57 Mld).
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 20.500.000.000**	**L. 20.500.000.000**	**L. 20.500.000.000**	**L. 11.993.816.131**	

Legge 515/96 Es. 1997		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
27	Potenziamento della rete di telerilevamento agrometeorologica	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 730.884.130	Decreti dirigenziali d'impegno del servizio agrometeorologia: 3/98, 8/98, 33/98, 24/97 per L =1.664.488.840 e DDDA 107 del 28/10/99 per L.335.511.160.
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.000.000.000**	**L. 2.000.000.000**	**L. 2.000.000.000**	**L. 730.884.130**	

Legge 345/97 Es. 1999		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
7	Centro ambientale di Castelfranco	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
16	Sistema di monitoraggio	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	L'intervento è finanziato per 13,8 Mld di cui 11,8 provenienti da fondi riallocati.
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 4.000.000.000**	**L. 4.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 30.422.000.000**	**L. 30.422.000.000**	**L. 26.422.000.000**	**L. 14.175.839.691**
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**86,9%**	**46,6%**


Settore: Disinquinamento


Soggetto attuatore: Regione - Fognature e Depurazione

Legge 910/86 Es. 1987-1988		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Impianto di sollevamento e modulazione del bacino di Zelarino.	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.159.292.212	Lavori ultimati. Per saldare la liquidazione si prendono L. 219.085.640 dalla gara n. 24 DDDA n. 5
2	Lavori di costruzione dello scolmatore di via del Bosso a Chirignago - Mestre (VE)	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.638.739.954	Lavori ultimati. L'ulteriore importo è preso dal decreto n. 20 della gara n. 6 (L.733.653.016)
3	Lavori di ristrutturazione delle reti fognarie del Cavallino (VE)	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.742.730.798	Lavori ultimati.
4	Lavori di completamento dei sistemi principali di collettamento della rete fognaria di Chioggia (VE)	L. 9.100.000.000	L. 9.100.000.000	L. 9.100.000.000	L. 8.439.722.007	Lavori finiti.
5	Lavori di costruzione rete di fognatura zona di via Martiri di Marzabotto - bacino Gazzera - Mestre (VE)	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.611.979.843	Lavori ultimati. Approvata contabilità finale per L.2.334.468.828. Parte dei soldi rimasti sono stati usati per gara 1 (Via del Bosso Chirignago) e gara 24 (Asseggiano L. 3.2 mld).
6	Lavori di estensione delle reti fognarie secondarie di Chioggia e Sottomarina (VE)	L. 5.900.000.000	L. 5.900.000.000	L. 5.900.000.000	L. 5.885.561.275	Lavori ultimati.
7	Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.927.176.193	Lavori finiti.
8	Lavori di costruzione dei collettori fognari di collegamento all'impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.922.588.847	Lavori in corso
10	Lavori di costruzione nuovo impianto di sollevamento nel bacino di via Torino e collegamento bacino di S. Giuliano	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.506.154.340	Lavori ultimati. Con DGR n. 4 l'importo di L. 1.500.000.000 è stato portato a L. 1.660.000.000 tramite prelevamento di L. 160.000.000 da gara 5.
11	Lavori di costruzione della rete di fognatura della zona di via Asseggiano - bacino Gazzera (VE)	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.586.084.840	Lavori ultimati. La somma originaria di £ 1.700.000.000 è stata modificata con deliberazione 4650 del 4-10-94
12	Lavori di completamento della fognatura nella zona Nord-Est del Comune di Campagna Lupia (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.035.534.791	Lavori ultimati. con decreto n. 554 del 18.12.1997 la somma originaria di L. 2.000.000.000 è stata portata a 2.040.703.593 per ulteriori oneri.
13	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Chirignago - Mestre (VE)	L. 2.900.000.000	L. 2.900.000.000	L. 2.900.000.000	L. 2.488.599.868	Lavori ultimati. - L. 160.000.000 da dare a gara 23.
15	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Carpenedo - Mestre (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.889.695.167	Lavori ultimati.

16	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VI lotto	L. 2.200.000.000	L. 2.200.000.000	L. 2.200.000.000	L. 573.063.497	Lavori in corso
18	Fognatura bacino San Giuliano	L. 900.000.000	L. 900.000.000	L. 900.000.000	L. 833.456.673	Lavori quasi ultimati. Con DDDA 45/96 è stata approvata una perizia di completamento e finitura delle opere eseguite a Chirignago, Via Torino, Zelarino, Via Garibaldi ed Asseggiano.
24	Redazione del Piano Direttore	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	Approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 255 del 19-12-91
25	Lavori di adeguamento delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione - reti di Jesolo Lido (VE)	L. 5.225.000.000	L. 5.225.000.000	L. 5.225.000.000	L. 5.125.053.054	Lavori ultimati. Approvata contabiltà finale per L. 5.140.612.664
29	Lavori di estensione della rete interna ed il collegamento alla rete consortile - Comune di Mira (I parte)	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.343.657.488	Lavori ultimati.
30	Lavori di teleregolazione e telecontrollo della fognatura di Jesolo - Philips	L. 1.082.814.095	L. 1.082.814.095	L. 1.082.814.095	L. 528.874.588	Lavori in corso. Il decreto 53/97 stanzia L. 3.800.000.000 divisi per: Impianto depurazione, ispezioni televisive, opere teleregolazione e controllo, piano pilota WRC.
31	Lavori di adeguamento reti e impianto di depurazione di Jesolo (VE) - opere civili ed elettromeccaniche	L. 1.006.869.147	L. 1.006.869.147	L. 1.006.869.147	L. 1.006.869.147	Lavori finiti
32	Ispezioni televisive	L. 293.376.629	L. 293.376.629	L. 293.376.629	L. 293.376.629	Lavori ultimati
33	Piano pilota W.R.C.	L. 776.940.129	L. 776.940.129	L. 776.940.129	L. 776.940.129	Lavori finiti
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 61.085.000.000**	**L. 61.085.000.000**	**L. 61.085.000.000**	**L. 57.315.151.340**	

Legge 910/86 Es. 1989		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5	Lavori di estensione rete interna e collegamento alla rete consortile - Comune di Mira - II parte	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.814.452.883	Lavori ultimati. Decreto contabilità finale 73/97 per L. 5.815.750.819
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 6.000.000.000**	**L. 6.000.000.000**	**L. 6.000.000.000**	**L. 5.814.452.883**	

Legge 67/88 Es. 1990		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
7	Aggiornamento del Piano Direttore - seconda fase - Monitoraggio dei corsi d'acqua sfocianti in laguna	L. 4.578.000.000	L. 4.578.000.000	L. 3.150.231.852	L. 2.278.165.483	Lavori in corso. Importo originale di L. 5 Mld diminuito di L. 422.000.000 per Arpav. Nuovo importo: L. 4.578.000.000. I soldi sono stati impegnati con vari decreti e delibere.
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 4.578.000.000**	**L. 4.578.000.000**	**L. 3.150.231.852**	**L. 2.278.165.483**	

Legge 67/88 Es. 1992 - II^ fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2 Quota regionale agenzia per Venezia	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 0	Revocato il finanziamento con decreto 108 del 28/10/99, *i fondi possono essere* riallocati .
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 10.000.000.000**	**L. 10.000.000.000**	**L. 10.000.000.000**	**L. 0**	

Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
26 Bonifica siti inquinati in Comune di Venezia - Zona industriale di Marghera	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '99 - cambiata la scheda con PCR 45 del 15.07.99
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 5.000.000.000**	**L. 5.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

Legge 345/97 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3 Progetto integrato Fusina (reflui civili industriali)	L. 35.000.000.000	L. 35.000.000.000	L. 0	L. 0	Il costo degli interventi è di 79 mld di cui 44 provengono da fondi riallocati.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 35.000.000.000**	**L. 35.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 121.663.000.000**	**L. 121.663.000.000**	**L. 80.235.231.852**	**L. 65.407.769.706**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**65,9%**	**53,8%**	

Soggetto attuatore: Regione - Foreste | **Settore: Disinquinamento**

Legge 360/91	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5 Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - I stralcio	L. 877.000.000	L. 877.000.000	L. 877.000.000	L. 451.296.979	Lavori ultimati per 451 ml.
6 Progetto per la realizzazione del Bosco di Mestre - II stralcio	L. 793.400.000	L. 793.400.000	L. 793.400.000	L. 396.700.000	I^ fase (area di proprietà del Comune di Venezia - L. 427.800.000): lavori ultimati. II^ fase (area di proprietà della Provincia di Venezia - L. 365.600.000): lavori in corso.
7 Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - II stralcio	L. 1.329.600.000	L. 1.329.600.000	L. 0	L. 0	Il Comune di Venezia deve individuare le aree per il bosco
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 1.670.400.000**	**L. 847.996.979**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 1.670.400.000**	**L. 847.996.979**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**55,7%**	**28,3%**	

PAGINA BIANCA

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

CONSORZI DI FOGNATURA ED AZIENDE

A.S.P.I.V.
AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE
AZIENDA SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA
CENTRO VENETO SERVIZI
CONSORZIO ALTA SERVIZI
CONSORZIO ACQUEDOTTO EUGANEO-BERICO
CONSORZIO DEL MIRESE
CONSORZIO DESTRA PIAVE
CONSORZIO SILE-PIAVE
CONSORZIO DEL TERGOLA

PAGINA BIANCA

Soggetto attuatore: Consorzio Acquedotto Euganeo Berico				Settore:	Disinquinamento
Legge 515/96 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
13 Interventi di fognatura nei comuni di Galzignano, Montegrotto, Interv. di depurazione in comune di Battaglia T	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (soggetto attuatore)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	0,0%	0,0%	

Soggetto attuatore: Consorzio Sile-Piave

Settore: Disinquinamento

Legge 515/96 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
8 Interventi di fognatura nei comuni di Meolo, Marcon, S. Biagio di Callalta, Roncade	L. 10.500.000.000	L. 10.500.000.000	L. 0	L. 0	
9 Interventi di fognatura in comune di Quarto d'Altino	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 14.500.000.000**	**L. 14.500.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 14.500.000.000**	**L. 14.500.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**0,0%**	**0,0%**	

Soggetto attuatore: Consorzio Alta Servizi | **Settore: Disinquinamento**

Legge 67/88 Es. 1992 - II^ fase		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6	Ampliamento impianto di depurazione di Onara	L. 2.400.000.000	L. 2.400.000.000	L. 2.400.000.000	L. 2.160.000.000	Lavori eseguiti al 90%.
7	Collettore fognario di adduzione Ovest Fontaniva - Cittadella - Tombolo	L. 5.100.000.000	L. 5.100.000.000	L. 5.100.000.000	L. 4.590.000.000	Lavori ultimati.
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 7.500.000.000**	**L. 7.500.000.000**	**L. 7.500.000.000**	**L. 6.750.000.000**	

Legge 139/92 II fase		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
16	Collettore Campretto - Lovari nel comune di S. Martino di Lupari	L. 4.050.000.000	L. 4.050.000.000	L. 4.050.000.000	L. 1.190.216.600	Lavori in corso. Richiesta al genio una proroga del termine dei lavori.
17	Adeguamento strutture fognarie: fognatura aerea sud di S. Martino di Lupari e collegamento al depuratore di Onara	L. 4.250.000.000	L. 4.250.000.000	L. 4.250.000.000	L. 1.605.022.529	Lavori in corso.
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 8.300.000.000**	**L. 8.300.000.000**	**L. 8.300.000.000**	**L. 2.795.239.129**	

Legge 539/95 Es. 1997		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
4	Fognatura di Cittadella e Fontaniva	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 1.063.601.619	Lavori in corso.
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 3.200.000.000**	**L. 3.200.000.000**	**L. 3.200.000.000**	**L. 1.063.601.619**	

Legge 515/96 Es. 1997		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3	Adeguamento impianto elettrico e cogenerazione depuratore di Cittadella	L. 1.430.000.000	L. 1.430.000.000	L. 1.430.000.000	L. 60.024.350	Progetto approvato. E' stato pubblicato il bando di gara.
4	Ottimizzazione impianto consorziale di Cittadella	L. 3.340.000.000	L. 3.340.000.000	L. 3.340.000.000	L. 114.013.546	Progetto approvato. In data 29/6/99 è stato approvato il bando di gara ed è in fase di pubblicazione.
5	Scolmatore roggia Munara	L. 730.000.000	L. 730.000.000	L. 730.000.000	L. 27.604.881	Progetto approvato. E' in fase di pubblicazione il bando di gara. (30/6/99).
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 5.500.000.000**	**L. 5.500.000.000**	**L. 5.500.000.000**	**L. 201.642.777**	

Legge 515/96 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
10 Interventi di fognatura nel comuni di Cittadella, Galliera V., Tombolo, S. Giorgio in Bosco, S. Martino di Lupari	L. 11.300.000.000	L. 11.300.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 11.300.000.000**	**L. 11.300.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 35.800.000.000**	**L. 35.800.000.000**	**L. 24.500.000.000**	**L. 10.810.483.525**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**68,4%**	**30,2%**	

Soggetto attuatore: Azienda Piovese Gestione Acque

Settore: Disinquinamento

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5 Costruzione del collettore consortile da Piove di Sacco all'impianto di depurazione di Codevigo	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.313.217.112	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.313.217.112**	

Legge 67/88 Es. 1992 - I^ fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2 Realizzazione di collettori fognari e depurazione nell'area sud del Piovese	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 2.745.367.778	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 3.200.000.000**	**L. 3.200.000.000**	**L. 3.200.000.000**	**L. 2.745.367.778**	

Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
51 Completamento impianto di depurazione di Codevigo	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 4.673.500.271	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 6.000.000.000**	**L. 6.000.000.000**	**L. 6.000.000.000**	**L. 4.673.500.271**	

Legge 139/92 II fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
18 Adeguamento strutture fognarie: miglioramento reti secondarie nei comuni di Legnaro e S. Angelo di Piove	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	Lavori ultimati
19 Adeguamento strutture fognarie: progetto esecutivo per il disinquinamento area sud del Piovese (Pontelongo, Correzzola e Cona)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.760.644.856	Lavori in corso.
20 Adeguamento strutture fognarie: estensione rete fognaria in località San Pieri in Comune di Piove di Sacco	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.615.462.745	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 5.000.000.000**	**L. 5.000.000.000**	**L. 5.000.000.000**	**L. 4.376.107.601**	

Legge 539/95 Es. 1996		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
8	Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari del Consorzio del Piovese - I stralcio (Legnaro, S. Angelo di Piove e Polverara)	L. 2.450.000.000	L. 2.450.000.000	L. 2.450.000.000	L. 1.240.844.402	Lavori in corso.
10	Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari del Consorzio del Piovese - II stralcio (S. Angelo di Piove, Brugine, Piove di Sacco, Arzergrande e Pontelongo)	L. 2.750.000.000	L. 2.750.000.000	L. 2.750.000.000	L. 1.514.097.276	Lavori in corso.
11	Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari del Consorzio del Piovese - III stralcio (Brugine, Piove di Sacco e Correzzola)	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 775.696.376	Lavori in corso
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 8.600.000.000**	**L. 8.600.000.000**	**L. 8.600.000.000**	**L. 3.530.638.054**	

Legge 515/96 Es. 1997		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5	Ampliamento delle reti di fognatura e del sistema depurativo nel territorio del consorzio del Piovese	L. 15.000.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	L. 0	Lavori in fase di appalto
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 15.000.000.000**	**L. 15.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

Legge 515/96 Es. 1999		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
11	Interventi di fognatura nei comuni di Piove di sacco, Legnaro, Brugine, Polverara, Correzzola, S. Angelo, Pontelongo, Arzergrande	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 43.300.000.000**	**L. 43.300.000.000**	**L. 25.300.000.000**	**L. 17.638.830.816**
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**58,4%**	**40,7%**

Soggetto attuatore: Azienda Servizi Idrici della Castellana

Settore: Disinquinamento

Legge 515/96 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
18 Interventi di fognatura in comune di Riese Pio X	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.000.000.000**	**L. 2.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 2.000.000.000**	**L. 2.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**0,0%**	**0,0%**	

Soggetto attuatore: Centro Veneto Servizi | **Settore: Disinquinamento**

Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2 Ampliamento dello schema fognario della zona del Conselvano	L. 11.500.000.000	L. 11.500.000.000	L. 11.500.000.000	L. 641.748.210	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 11.500.000.000**	**L. 11.500.000.000**	**L. 11.500.000.000**	**L. 641.748.210**	

Legge 515/96 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3 Interventi di fogn. e dep. nei comuni di :Pernumia, Solesino, Borgoforte, Anguillara V., Arre, Agna, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Pozzonovo, Terrassa P, Tribano	L. 7.400.000.000	L. 7.400.000.000	L. 0	L. 0	
4 Ampliamento impianto di depurazione di Monselice	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
5 Interventi di fognatura e depurazione nel comune di Este	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 0	
6 Interventi di fognatura in comune di S. Elena	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 12.900.000.000**	**L. 12.900.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 24.400.000.000**	**L. 24.400.000.000**	**L. 11.500.000.000**	**L. 641.748.210**
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**47,1%**	**2,6%**

Soggetto attuatore: Azienda Consorzio del Mirese | **Settore: Disinquinamento**

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
20 Costruzione della rete di fognatura consortile del Mirese - XIV lotto sub B (VE)	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 344.611.615	Lavori ultimati.
21 Completamento funzionale di opere fognarie precedentemente realizzate nel Consorzio del Mirese	L. 4.600.000.000	L. 4.600.000.000	L. 4.600.000.000	L. 4.566.546.236	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 5.000.000.000**	**L. 5.000.000.000**	**L. 5.000.000.000**	**L. 4.911.157.851**	

Legge 910/86 Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Costruzione della rete fognaria di Campagna Lupia - capoluogo (VE)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.700.000.000	Lavori in corso. Il progetto complessivo di £ 4.290 ml finanziati con la L. n. 910/86 es. 1989 1 mld e 290 ml sui fondi MESPA-CEE
6 Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase	L. 14.500.000.000	L. 14.500.000.000	L. 14.500.000.000	L. 13.183.153.150	Lavori ultimati.
12 Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase: Rilievi ed ispezioni televisive collettori fognari	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 18.000.000.000**	**L. 18.000.000.000**	**L. 18.000.000.000**	**L. 16.383.153.150**	

Legge 67/88 Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6 Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (VE)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 762.635.986	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 1.000.000.000**	**L. 1.000.000.000**	**L. 1.000.000.000**	**L. 762.635.986**	

Legge 67/88 Es. 1992 - I^ fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Realizzazione di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 8.000.000.000**	**L. 8.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

Legge 139/92 Es. 1993		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6	Completamento fognatura nera in Comune di Noale	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 1.752.167.054	Lavori ultimati
7	Completamento fognatura nera in Comune di Salzano	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	Lavori finiti
8	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Martellago	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.154.249.986	Lavori in corso
9	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Scorzè	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.498.026.740	Lavori ultimati
10	Vasca di pioggia di Noale	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 624.125.569	Lavori in corso.
26	Interventi alle fognature del Consorzio del Mirese	L. 7.880.000.000	L. 7.880.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso.
27	Pulizia, ispezione televisiva e rilievo di condotte fognarie nei comuni di Dolo e Spinea	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 462.538.056	Lavori in corso.
28	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Mirano	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 5.672.337.717	Lavori in corso.
29	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di S. Maria di Sala	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.212.617.184	Lavori ultimati
30	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Vigonovo	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.099.353.200	Lavori ultimati
31	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Stra	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.540.594.639	Lavori in corso
32	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Fiesso d'Artico	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.665.064.046	Lavori ultimati
33	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Dolo	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 3.052.654.254	Lavori in corso
34	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Pianiga	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.797.006.027	Lavori ultimati
35	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Campolongo Maggiore	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.050.315.095	Lavori ultimati
36	Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - I stralcio	L. 4.950.000.000	L. 4.950.000.000	L. 4.950.000.000	L. 4.273.993.029	Lavori in corso.
37	Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - II stralcio	L. 6.550.000.000	L. 6.550.000.000	L. 6.550.000.000	L. 6.205.854.800	Lavori ultimati
38	Lavori di costruzione fognature nel Comune di Camponogara	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	Lavori finiti.

39	Interventi alle fognature nel Comune di Fossò	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	Lavori finiti.
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 60.000.000.000**	**L. 60.000.000.000**	**L. 52.120.000.000**	**L. 46.560.897.396**	

Legge 539/95 Es. 1996		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
7	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Consorzio del Mirese	L. 4.900.000.000	L. 4.900.000.000	L. 4.900.000.000	L. 264.927.160	Progetto approvato
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 4.900.000.000**	**L. 4.900.000.000**	**L. 4.900.000.000**	**L. 264.927.160**	

Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
20 Ampliamento ed ottimizzazione delle reti fognarie del Consorzio del Mirese	L. 8.847.125.000	L. 8.847.125.000	L. 0	L. 0	Queste L. 8.847.125.000 sono quello che resta dei 20 miliardi di partenza. Il resto è stato contabilizzato con decreti dal 73-83 del 22/9/99.
33 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28°lotto in comune di Fossò	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 23.073.029	Progetto approvato.
34 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Camponogara	L. 900.000.000	L. 900.000.000	L. 900.000.000	L. 28.620.555	Progetto approvato.
35 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Noale	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 31.608.658	Progetto approvato.
36 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Scorzè-Settore A	L. 1.084.373.000	L. 1.084.373.000	L. 1.084.373.000	L. 27.667.481	Progetto approvato.
37 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Scorzè-Settore B	L. 968.502.000	L. 968.502.000	L. 968.502.000	L. 19.535.049	Progetto approvato.
38 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Planiga	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 29.592.113	Progetto approvato
39 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mirano. Settore A	L. 1.015.800.000	L. 1.015.800.000	L. 1.015.800.000	L. 24.532.591	Progetto approvato.
40 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mirano. Settore B	L. 984.200.000	L. 984.200.000	L. 984.200.000	L. 23.761.242	Progetto approvato.
41 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Spinea	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 35.025.802	Progetto approvato.
42 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mira. Settore A	L. 550.000.000	L. 550.000.000	L. 550.000.000	L. 12.351.264	Progetto approvato
43 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mira. Settore B	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000	L. 33.951.957	Progetto approvato.

Subtotale (legge - esercizio)	**L. 20.000.000.000**	**L. 20.000.000.000**	**L. 11.152.875.000**	**L. 289.719.741**	

Legge 515/96 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
12 Interventi di fognatura in tutti i comuni consorziati	L. 11.500.000.000	L. 11.500.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 11.500.000.000**	**L. 11.500.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 128.400.000.000**	**L. 128.400.000.000**	**L. 92.172.875.000**	**L. 69.172.491.284**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**71,8%**	**53,9%**	

Soggetto attuatore: Consorzio del Tergola | **Settore: Disinquinamento**

Legge 67/88 Es. 1991	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
7 Impianto di Vigonza (PD).	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	Lavori in corso. Importo complessivo £ 14.600 ml vedi L. 139/92 - esercizio 1993 (n.6)
8 Interventi nel settore della zootecnia dell'alta padovana	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	Progetto approvato. Fondi destinati all'impianto di biotrattamento di Camposampiero (Approvato CTRA 26/11/98)
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 7.000.000.000**	**L. 7.000.000.000**	**L. 7.000.000.000**	**L. 0**	

Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Appalti A e B	L. 31.300.000.000	L. 31.300.000.000	L. 31.300.000.000	L. 28.047.872.775	Lavori in corso.
2 Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza	L. 12.600.000.000	L. 12.600.000.000	L. 12.600.000.000	L. 13.356.251.668	Lavori quasi ultimati. Importo complessivo 14,6 Mld, di cui 2mld impegnati nel cap 50511.
3 Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero	L. 8.400.000.000	L. 8.400.000.000	L. 8.400.000.000	L. 1.920.919.000	Progetto impianto di biotrattamento approvato dalla CTRA. Importo complessivo di L. 44.128.504.000 approvato con delibera 561/99.
4 Progetto del collettore di collegamento della rete di Loreggia al depuratore di Camposampiero - XV lotto	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.357.665.676	Lavori ultimati
5 Collegamento della rete di Borgoricco a Villanova di Camposampiero	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 2.361.670.130	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 57.000.000.000**	**L. 57.000.000.000**	**L. 57.000.000.000**	**L. 47.044.379.249**	

Legge 539/95 Es. 1996		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali dei comuni del Consorzio del Tergola	L. 213.000.000	L. 213.000.000	L. 213.000.000	L. 316.568.066	Fondi trasferiti al progetto "rete fognaria Camposampiero - Trebaseleghe" di costo complessivo L. 243 ml (vedasi L. 539/95 es. 97 n° 17)
2	Ampliamento rete fognaria comunale di Borgoricco	L. 250.000.000	L. 250.000.000	L. 250.000.000	L. 116.772.490	Lavori in corso
3	Ampliamento rete fognaria comunale di Massanzago	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	Lavori in corso
4	Ampliamento rete fognaria in comune di Vigonza.	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 658.504.542	Lavori in corso
5	Completamento del collegamento fognario tra Cavino di S. Giorgio delle Pertiche e Campodarsego	L. 737.000.000	L. 737.000.000	L. 737.000.000	L. 636.104.298	Lavori in corso
12	Progetto fognatura acque nere in comune di Villanova di Camposampiero - I stralcio	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 334.551.424	In corso di esecuzione
13	Progetto allargamento fognatura in comune di Campodarsego	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 270.947.000	Lavori in corso
14	Progetto rete fognaria comune di Noventa Padovana	L. 560.000.000	L. 560.000.000	L. 560.000.000	L. 179.001.646	Lavori in corso.
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 4.000.000.000**	**L. 4.000.000.000**	**L. 4.000.000.000**	**L. 2.512.449.466**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge 539/95 Es. 1997		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5	Collettore fognario Abbazia Pisani-Villa del Conte-S. Giustina in Colle	L. 4.300.000.000	L. 4.300.000.000	L. 4.300.000.000	L. 1.713.423.228	Lavori in corso
11	Ampliamento impianto di depurazione di Cadoneghe	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	Progetto approvato.
12	Impianto di biotrattamento di Camposampiero	L. 23.000.000.000	L. 23.000.000.000	L. 23.000.000.000	L. 0	Progetto approvato. Importo complessivo 44,4 Mld
13	Progetto fognatura nera in comune di S. Giustina in Colle	L. 545.000.000	L. 545.000.000	L. 545.000.000	L. 166.871.458	
14	Progetto fognatura nera in comune di Cadoneghe	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	
15	Progetto fognatura nera in comune di S. Giorgio delle Pertiche	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	
16	Progetto rete fognaria in comune di Loreggia	L. 580.000.000	L. 580.000.000	L. 580.000.000	L. 0	
17	Progetto rete fognaria Camposampiero - Trebaseleghe	L. 2.225.000.000	L. 2.225.000.000	L. 0	L. 0	Costo complessivo L. 2.438 ml . I 213 ml mancanti provengono da L 533/95 es. 96 n° 1.
18	Progetto rete fognaria in comune di Saonara.	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	Progetto approvato
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 34.300.000.000**	**L. 34.300.000.000**	**L. 32.075.000.000**	**L. 1.880.294.686**	

Legge 515/96 Es. 1999		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Interventi di fognatura nei comuni consorziati e negli impianti di depurazione di Vigonza e Cadoneghe	L. 19.200.000.000	L. 19.200.000.000	L. 0	L. 0	
2	Interventi di fognatura nei comuni di Resana, Loreggia, Villa del Conte, S. Giustina in Colle, Nov. Padovana	L. 7.500.000.000	L. 7.500.000.000	L. 0	L. 0	
26	Completamento centro di biotrattamento di Camposampiero	L. 12.100.000.000	L. 12.100.000.000	L. 0	L. 0	
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 38.800.000.000**	**L. 38.800.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

Legge 345/97 Es. 1999		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6	Impianto di biotrattamento di Conselve	L. 17.000.000.000	L. 17.000.000.000	L. 0	L. 0	
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 17.000.000.000**	**L. 17.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 158.100.000.000**	**L. 158.100.000.000**	**L. 100.075.000.000**	**L. 51.437.123.401**
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**63,3%**	**32,5%**

PAGINA BIANCA

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

ALTRI

ENTE DI BACINO R.S.U. VE 2
ENTI VARI
IN ATTESA DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI
MAGISTRATO ALLE ACQUE
ULSS 17 ESTE-MONSELICE
U.S.S.L. n. 16 - VENEZIA
SOC. DELTA PO S.p.A.

PAGINA BIANCA

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: Ente di bacino R.S.U. VE 2

Settore: Disinquinamento

Legge 67/88 Es. 1991	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2 Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 8.599.341.709	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 13.000.000.000**	**L. 13.000.000.000**	**L. 13.000.000.000**	**L. 8.599.341.709**	

Legge 360/91	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.394.123.516	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 6.500.000.000**	**L. 6.500.000.000**	**L. 6.500.000.000**	**L. 6.394.123.516**	

Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
41 Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia-Marghera, loc. Malcontenta	L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 17.999.999.998	Lavori finiti.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 18.000.000.000**	**L. 18.000.000.000**	**L. 18.000.000.000**	**L. 17.999.999.998**	

Legge 539/95 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Completamento Impianto R.S.U. di Venezia (Fusina)	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.199.146.150	Lavori ultimati. L'importo complessivo è di £ 78.531 ml finanziato con 35.331 ml con i fondi FIO, £ 6.500 ml sulla L. 360/91 (1) , £ 13.000 ml sulla L. 67/88 es. 1991 (3) £ 18.000 sulla L. 139/92 (44) e 5.700 ml sulla L. 539/95 es. 1997 (1)
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 5.700.000.000**	**L. 5.700.000.000**	**L. 5.700.000.000**	**L. 5.199.146.150**	

TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 43.200.000.000**	**L. 43.200.000.000**	**L. 43.200.000.000**	**L. 38.192.611.373**
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**100,0%**	**88,4%**

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: In attesa di Indiv. sogg. attuatori

Settore: Disinquinamento

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
25 Costruzione fognatura centro storico di Venezia - stralcio funzionale della Giudecca (VE)					ondi riallocati con il riparto fondi 1998 per fognature di Mogliano Veneto.
Subtotale (legge - esercizio)					

Legge 910/86 Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
11 Costruzione della rete fognaria della Giudecca (VE)	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati con riparto 1998 per Comune di Mogliano Veneto
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 0**	**L. 0**	**L. 0**	**L. 0**	

Legge 67/88 Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Progetto depuratore Fusina (linea di filtrazione per il riutilizzo delle acque trattate - I stralcio)	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 222.797.157	I fondi originariamente dati alla filtrazione di Fusina, sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95. Successivamente riallocati con il riparto '99 per 4 Mld su Prog. Fusina e per 2 Mld. sulla IV linea Fusina.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 6.000.000.000**	**L. 6.000.000.000**	**L. 6.000.000.000**	**L. 222.797.157**	

Legge 67/88 Es. 1992 - II^ fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Progetto integrato depurazione Fusina	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 0	L. 0	I fondi originariamente destinati all'impianto del Mirese sono stati riallocati con PCR n.1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Fusina. Riallocato con riparto 1998.
4 progetto integrato depurazione Fusina	L. 16.000.000.000	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase. Riallocato con riparto 1998.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 36.000.000.000**	**L. 36.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge 360/91	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2 Progetto pilota del bacino del Marzenego	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	Riallocato con riparto 1999 in ricalibrazione e sostegno nei sottobacini del Marzenego
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 0**	**L. 0**	**L. 0**	**L. 0**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge 139/92 II fase		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
	Gestione reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	Fondi provenienti da riallocazione "fitodepurazione estuarina sul canale Vela"
3	Progetto integrato Fusina: opera ancora da individuare	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
8	Progetto Fusina: spese di gestione riferite all'intero progetto	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
22	Prevenzione: normativa e regolamentazioni, istituzione di incentivazioni	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati con riparto '99 per fognature Zero Branco
25	Interventi strutturali: gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole - I lotto	L. 30.000.000.000	L. 30.000.000.000	L. 22.678.051.114	L. 0	Adottata DGR per avviare le attività. Il decreto 113/99 del dirigente della direzione regionale tutela del territorio rurale stanzia 15.509.973.472 L e individua i soggetti beneficiari. Il DDTR rettifica il 113 e concede altri 7.168.177.642.
27	Protezione zootecnia: gestione reflui zootecnici	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 0	L. 0	Adottata DGR per avviare le attività. Il decreto 77/99 del dirigente delle politiche agricole stanzia 2.898.436.308 mld e individua i beneficiari del contributo.
28	Protezione zootecnia: interventi strutturali in zootecnia	L. 40.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 0	L. 0	Adottata DGR per avviare le attività. Domanda in corso di esame.Il decreto 77/99 del dirigente della direzione regionale politiche agricole strutturali e di mercato stanzia 9.678.144.924 mld per questo intervento e individua i vari beneficiari.
33	Interventi strutturali in rete di bonifica.	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 6.800.000.000	L. 0	Fondi riallocati..Con DGR 2558/99 vengono utilizzati nel progetto di monitoraggio e controllo del bacino scolante (18,57Mld) di cui 1,625 Mld vanno all'ARPAV e 5,175 Mld ai consorzi di bonifica .
34	Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Tergola (sostegno di Torre di Burri)	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '99
36	Fitodepurazione estuarina sul Canale Vela	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '99
38	Regolazione intromissioni da Sile, Brenta e Nodo Castelfranco	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '99 su progetto Campalto affinamento
39	Gestione acque di magra del Brenta - Bacchiglione - LEB	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati 99 su progetto Campalto affinamento

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Subtotale (legge - esercizio)	**. 102.300.000.000**	**. 102.300.000.000**	**L. 29.478.051.114**	**L. 0**	

Legge 345/97 Es. 1999		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
4	Incentivi modif. colturali, piani spargim., gest. idraulica defl. superf. agricole	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 0	L. 0	
18	Bonifica siti inquinati P.Marghera	L. 14.800.000.000	L. 14.800.000.000	L. 0	L. 0	L'intervento è finanziato per 19,8 Mld di cui 5 Mld provenienti da fondi riallocati.
19	Bonifica siti inquinati nel bacino scolante	L. 2.200.000.000	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 0	
20	Indagine epidemiologica Marghera	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 0	
	Subtotale (legge - esercizio)	**L. 37.200.000.000**	**L. 37.200.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
TOTALE (soggetto attuatore)		**L. 181.500.000.000**	**L. 181.500.000.000**	**L. 35.478.051.114**	**L. 222.797.157**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			**100,0%**	**19,5%**	**0,1%**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: U.S.S.L. n. 12 - Venezia

Settore: Disinquinamento

Legge 67/88 Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
10 Riabilitazione funzionale delle fognature del centro storico di Venezia (ospedale SS. Giovanni e Paolo)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.822.271.197	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.000.000.000**	**L. 2.000.000.000**	**L. 2.000.000.000**	**L. 1.822.271.197**	

Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
24 Ristrutturazione della rete fognaria di complessi ospedalieri: ospedale civile (SS. Giovanni e Paolo) e G.B. Giustinian. Primo stralcio funzionale	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 216.158.729	Lavori in corso..
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.000.000.000**	**L. 2.000.000.000**	**L. 2.000.000.000**	**L. 216.158.729**	

TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 4.000.000.000**	**L. 4.000.000.000**	**L. 4.000.000.000**	**L. 2.038.429.926**
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**100,0%**	**51,0%**

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: U.L.S.S. n. 17 Este-Monselice

Settore: Disinquinamento

Legge 515/96 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
7 Fognature in area ospedaliera di monselice	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 2.500.000.000**	**L. 2.500.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**0,0%**	**0,0%**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore:	**Enti vari**				**Settore:**	**Disinquinamento**
Legge 515/96	**Es. 1999**	**Finanziato**	**Impegnato**	**Contabilizzato**	**Erogato**	**Note**
23 Fondo di rotazione per la progettazione		L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)		**L. 10.000.000.000**	**L. 10.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
TOTALE (soggetto attuatore)		**L. 10.000.000.000**	**L. 10.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			**100,0%**	**0,0%**	**0,0%**	

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: Magistrato alle Acque

Settore: Disinquinamento

Legge 345/97 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
24 Interventi per ripristino dei pennelli alle foci di Adige e Brenta	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 3.000.000.000**	**L. 3.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**0,0%**	**0,0%**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: Comune di Chioggia | **Settore: Acquedotti**

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Potenziamento servizio idrico frazioni Ca' Bianca e Valli	L. 290.000.000	L. 290.000.000	L. 290.000.000	L. 285.726.106	Lavori finiti
2 Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio	L. 1.710.000.000	L. 1.710.000.000	L. 1.710.000.000	L. 1.218.534.302	Lavori ultimati. L'importo complessivo è di £ 3.710.000.000
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.000.000.000**	**L. 2.000.000.000**	**L. 2.000.000.000**	**L. 1.504.260.408**	

Legge 910/86 Es. 1987-1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Adeguamento impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 589.750.386	Lavori ultimati. L'importo complessivo è di £ 3.710.000.000
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.000.000.000**	**L. 2.000.000.000**	**L. 2.000.000.000**	**L. 589.750.386**	

Legge 67/88 Es. 1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2 Realizzazione vasche di accumulo per acqua grezza alla centrale di Cavanella d'Adige	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 750.000.000	Importo complessivo £ 4.500.000.000. Lavori sospesi in attesa di definizione causa danni
3 Rifacimento impianti di sollevamento a Cavanella d'Adige (acqua grezza e potabile)	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 400.000.000	Importo complessivo £ 850.000.000. Lavori ultimati.
4 Razionalizzazione reti di distribuzione interna e recupero perdite dell'acquedotto di Chioggia	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 90.254.000	Importo complessivo I stralcio £ 185.000.000
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 2.700.000.000**	**L. 2.700.000.000**	**L. 2.700.000.000**	**L. 1.240.254.000**	

TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 6.700.000.000**	**L. 6.700.000.000**	**L. 6.700.000.000**	**L. 3.334.264.794**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**100,0%**	**49,8%**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: Comune di Venezia | **Settore: Acquedotti**

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3 Acquedotto di Venezia	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	Il Comune sta elaborando un nuovo progetto.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 8.000.000.000**	**L. 8.000.000.000**	**L. 8.000.000.000**	**L. 0**	

Legge 910/86 Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Acquedotto di Venezia	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	Il Comune sta elaborando un nuovo progetto.
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 8.000.000.000**	**L. 8.000.000.000**	**L. 8.000.000.000**	**L. 0**	

TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 16.000.000.000**	**L. 16.000.000.000**	**L. 16.000.000.000**	**L. 0**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**100,0%**	**0,0%**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: Regione - Fognature e Depurazione

Settore: Acquedotti

Legge 345/97 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
22 Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione area Cavallino	L. 25.000.000.000	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 25.000.000.000**	**L. 25.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 25.000.000.000**	**L. 25.000.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**0,0%**	**0,0%**	

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: A.S.P.I.V.

Settore: Acquedotti

Legge 345/97 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
23 Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia	L. 43.800.000.000	L. 43.800.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 43.800.000.000**	**L. 43.800.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 43.800.000.000**	**L. 43.800.000.000**	**L. 0**	**L. 0**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**0,0%**	**0,0%**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: Delta Po S.p.A.

Settore: Acquedotti

Legge 67/88 Es. 1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Sistema degli acquedotti del Basso Veneto - Opere in Comune di Chioggia	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 0	Le opere ricadono all' interno della concessione in essere tra Regione e la Delta Po per la progettazione del sistema degli acquedotti del Basso Veneto
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 17.300.000.000**	**L. 17.300.000.000**	**L. 17.300.000.000**	**L. 0**	
TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 17.300.000.000**	**L. 17.300.000.000**	**L. 17.300.000.000**	**L. 0**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**100,0%**	**0,0%**	

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: U.S.S.L. n. 12 - Venezia | **Settore: Ospedali**

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L'importo complessivo è di 30.100 ml finanziati per 12 mld con la L. n. 798/84 es. 1984-85-86, L. 10 mld con la L. n. 910/86 es. 1987-1988, L. 5 mld con la L. n. 910/86 esercizio 1989, 3.100
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 12.000.000.000**	**L. 12.000.000.000**	**L. 12.000.000.000**	**L. 12.000.000.000**	

Legge 910/86 Es. 1987-1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L'importo complessivo è di 30.100 ml finanziati per 12 mld con la L. n. 798/84 es. 1984-85-86, L. 10 mld con la L. n. 910/86 es. 1987-1988, L. 5 mld con la L. n. 910/86 esercizio 1989, 3.100
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 10.000.000.000**	**L. 10.000.000.000**	**L. 10.000.000.000**	**L. 10.000.000.000**	

Legge 910/86 Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 147.713.484	L'importo complessivo è di 30.100 ml finanziati per 12 mld con la L. n. 798/84 es. 1984-85-86, L. 10 mld con la L. n. 910/86 es. 1987-1988, L. 5 mld con la L. n. 910/86 esercizio 1989, 3.100
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 5.000.000.000**	**L. 5.000.000.000**	**L. 5.000.000.000**	**L. 147.713.484**	

Legge 539/95 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 711.228.057	
Subtotale (legge - esercizio)	**L. 6.500.000.000**	**L. 6.500.000.000**	**L. 6.500.000.000**	**L. 711.228.057**	

TOTALE (soggetto attuatore)	**L. 33.500.000.000**	**L. 33.500.000.000**	**L. 33.500.000.000**	**L. 22.858.941.541**	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		**100,0%**	**100,0%**	**68,2%**	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
TOTALE	L. 1.871.300.000.000	L. 1.871.300.000.000	L. 1.045.028.770.069	L. 562.444.485.971

TABELLA RIEPILOGATIVA
(per leggi)

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
SETTORE Disinquinamento				
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	L. 58.000.000.000	L. 58.000.000.000 100,0%	L. 47.500.000.000 81,9%	L. 38.151.888.094 65,8%
Legge 910/86 Es. 1989	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000 100,0%	L. 0 0,0%	L. 0 0,0%
Legge 910/86 Es. 1987-1988	L. 88.000.000.000	L. 88.000.000.000 100,0%	L. 88.000.000.000 100,0%	L. 68.293.070.328 77,6%
Legge 910/86 Es. 1989	L. 59.000.000.000	L. 59.000.000.000 100,0%	L. 53.387.000.000 90,5%	L. 39.730.805.454 67,3%
Legge 67/88 Es. 1988	L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000 100,0%	L. 15.500.000.000 100,0%	L. 2.567.066.087 16,6%
Legge 67/88 Es. 1990	L. 104.500.000.000	L. 104.500.000.000 100,0%	L. 103.054.574.975 98,6%	L. 51.402.136.779 49,2%
Legge 67/88 Es. 1991	L. 30.600.000.000	L. 30.600.000.000 100,0%	L. 30.600.000.000 100,0%	L. 16.358.892.079 53,5%
Legge 67/88 Es. 1992 - I^ fase	L. 29.700.000.000	L. 29.700.000.000 100,0%	L. 17.200.000.000 57,9%	L. 16.159.223.310 54,4%
Legge 139/92 II fase	L. 60.000.000.000	L. 60.000.000.000 100,0%	L. 24.000.000.000 40,0%	L. 7.769.391.139 12,9%

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
Legge 360/91	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0
		100,0%	0,0%	0,0%
Legge 360/91	L. 13.500.000.000	L. 13.500.000.000	L. 10.170.400.000	L. 9.242.120.495
		100,0%	75,3%	68,5%
Legge 139/92 Es. 1993	L. 350.000.000.000	L. 350.000.000.000	L. 333.120.000.000	L. 233.276.759.262
		100,0%	95,2%	66,7%
Legge 139/92 II fase	L. 320.000.000.000	L. 320.000.000.000	L. 107.978.051.114	L. 21.910.449.679
		100,0%	33,7%	6,8%
Legge 539/95 Es. 1996	L. 30.000.000.000	L. 30.000.000.000	L. 27.000.000.000	L. 11.921.742.828
		100,0%	90,0%	39,7%
Legge 539/95 Es. 1997	L. 53.500.000.000	L. 53.500.000.000	L. 48.275.000.000	L. 11.441.103.189
		100,0%	90,2%	21,4%
Legge 515/96 Es. 1997	L. 200.000.000.000	L. 200.000.000.000	L. 65.743.743.980	L. 8.026.630.913
		100,0%	32,9%	4,0%
Legge 515/96 Es. 1999	L. 117.000.000.000	L. 117.000.000.000	L. 0	L. 0
		100,0%	0,0%	0,0%
Legge 345/97 Es. 1999	L. 194.200.000.000	L. 194.200.000.000	L. 0	L. 0
		100,0%	0,0%	0,0%
TOTALE SETTORE	**L. 1.729.000.000.000**	**L. 1.729.000.000.000**	**L. 971.528.770.069**	**L. 536.251.279.636**

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
	SETTORE Acquedotti			
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 1.504.260.408
		100,0%	100,0%	15,0%
Legge 910/86 Es. 1987-1988	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 589.750.386
		100,0%	100,0%	29,5%
Legge 910/86 Es. 1989	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0
		100,0%	100,0%	0,0%
Legge 67/88 Es. 1988	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 1.240.254.000
		100,0%	100,0%	6,2%
Legge 345/97 Es. 1999	L. 68.800.000.000	L. 68.800.000.000	L. 0	L. 0
		100,0%	0,0%	0,0%
TOTALE SETTORE	**L. 108.800.000.000**	**L. 108.800.000.000**	**L. 40.000.000.000**	**L. 3.334.264.794**

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
	SETTORE Ospedali			
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000
		100,0%	100,0%	100,0%
Legge 910/86 Es. 1987-1988	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000
		100,0%	100,0%	100,0%
Legge 910/86 Es. 1989	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 147.713.484
		100,0%	100,0%	3,0%
Legge 539/95 Es. 1997	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 711.228.057
		100,0%	100,0%	10,9%
TOTALE SETTORE	**L. 33.500.000.000**	**L. 33.500.000.000**	**L. 33.500.000.000**	**L. 22.858.941.541**

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
TOTALE	L. 1.871.300.000.000			
TOTALE	L. 1.871.300.000.000	L. 1.871.300.000.000	L. 1.045.028.770.069	L. 562.444.485.971
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,00%	55,85%	30,06%


PAGINA BIANCA

Documento D ***Comune di Venezia***

Interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna programma e stato di avanzamento – Aggiornato al 31 dicembre 1999

PAGINA BIANCA

COMUNE DI VENEZIA

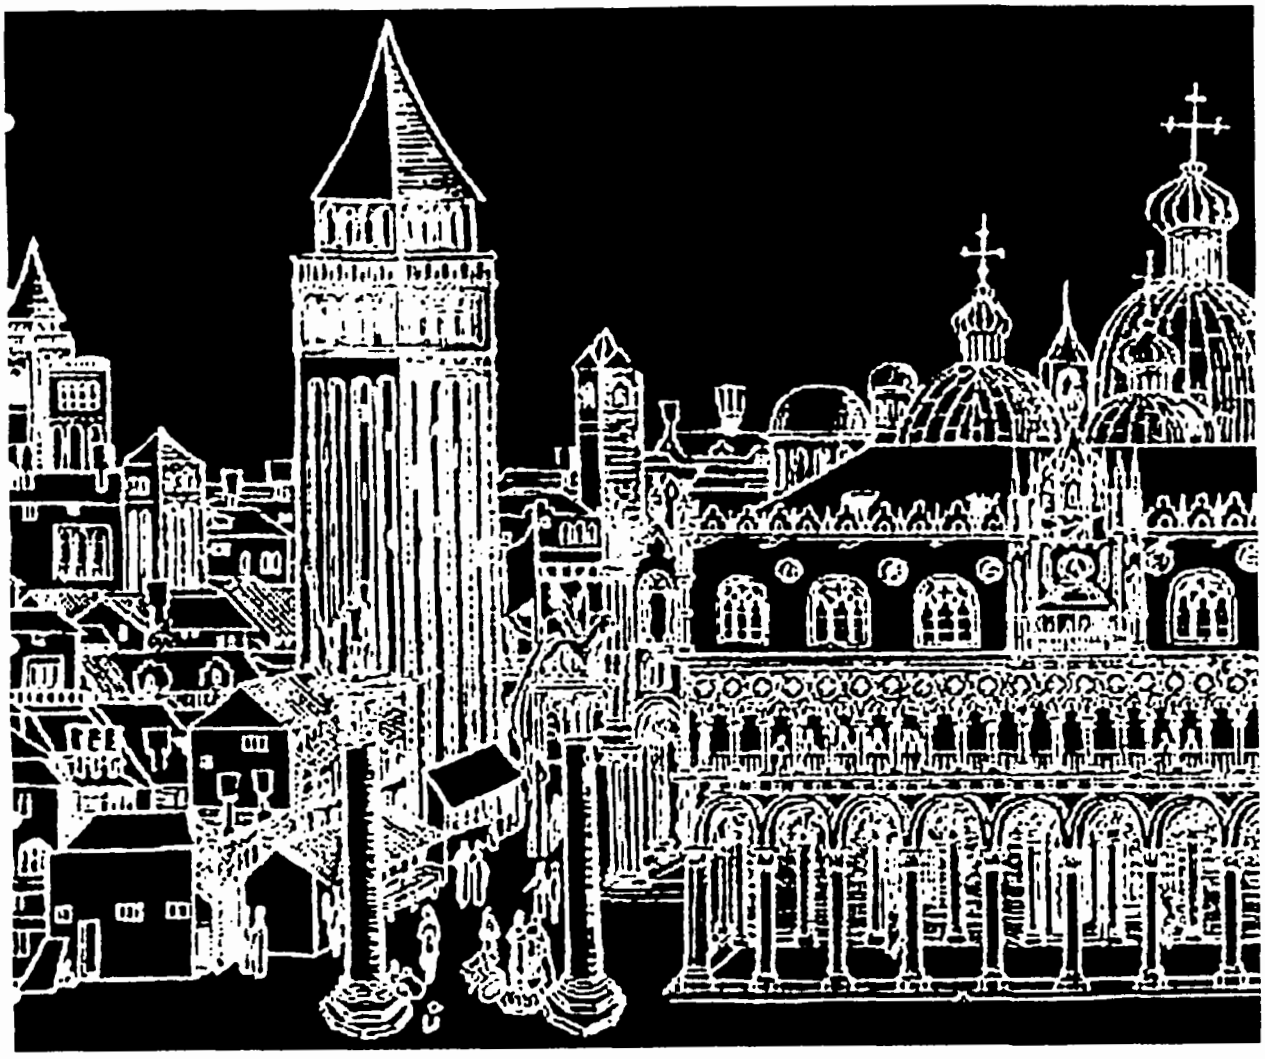

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA PROGRAMMA E STATO DI AVANZAMENTO

Leggi 5 Febbraio 1992 n° 139 - 20 Dicembre 1995 n° 539
4 Agosto 1996 n° 515 - 2 Ottobre 1997 n° 345
3 Agosto 1998 n° 295 - 28 Dicembre 1998 n° 448

Pubblicazione aggiornata al
31 dicembre 1999
a cura del settore Coordinamento alla Legge Speciale

PAGINA BIANCA

Interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna
Programma e stato di avanzamento

Pubblicazione periodica aggiornata al 31 dicembre 1999
a cura del Settore Coordinamento Legge Speciale

Schede

Progetto Integrato rii

Residenza

Musei Civici

Teatri, cinema, sale espositive

Scuole

Sport

Immobili di interesse pubblico
adibiti ad usi vari

Opere di urbanizzazione

Contributi al patrimonio immobiliare privato

Insediamenti produttivi

Il presente fascicolo indica gli interventi inclusi nei programmi della Legge Speciale per Venezia di competenza del Comune di Venezia .
Le schede raccolte contengono le fonti finanziarie destinate a ciascun intervento e lo stato di avanzamento delle opere. La numerazione corrisponde a quella delle tavole di localizzazione degli interventi.
Le fonti di finanziamento sono divise in due raggruppamenti: quello riferito alle leggi antecedenti al 1999 (Leggi: *5 febbraio 1992 n. 139; 20 dicembre 1995 n. 539; 4 ottobre 1996 n. 515; 2 ottobre 1997 n. 345*), e quello relativo alla Legge *3 agosto 1998 n. 295* con mutui a decorrere dal 1999 e 2000, e alla Legge *28 dicembre 1998 n. 448* (Finanziaria 1999) con mutuo a decorrere dal 1999.

Gli importi e le percentuali del quadro finanziario (impegnato - obligato- speso) non tengono conto delle annualità 2000 e 2001 della Legge n. 448/98, in quanto i mutui saranno stipulati nel 2000.

Quadro finanziario

Programmato:	intervento inserito in un programma approvato con deliberazione consiliare.
Impegnato:	importi definiti con deliberazione degli organi competenti, giunta o consiglio comunale. L'impegno può essere assunto solo dopo la stipula del mutuo contratto sulla base dei limiti di impegno della annualità relativa.
Obbligato:	contratti di appalto, di compravendita, approvazione graduatorie definitive dei bandi, convenzioni con terzi.
Speso:	importi erogati, uscite di cassa.

Stato avanzamento

in progettazione: comprende la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva ed i tempi derivanti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici per l'aggiudicazione dei lavori. Per le voci riferite alle sole acquisizioni si riferisce alla trattativa in corso e alla stima del bene.

in corso: decorrono dalla data di aggiudicazione alla ditta vincitrice dell'appalto. Per le voci rifente alle sole acquisizioni è stata approvata le delibera di accettazione della stima.

conclusi: considerati dai verbali di ultimazione dei lavori. Per le voci riferite alle sole acquisizioni è stata firmata la stipula dal notaio.

Leggi di Finanziamento - Limiti di impegno - Risorse disponibili

Leggi di finanziamento	Mutuo a decorrere dall'anno	Limiti di impegno quindicennali a carico dello stato	Data stipula Mutuo	Ammontare disponibile alla stipula del mutuo	Di cui accantonato come riserva (1)
Legge 5 febbraio 1992 n. 139	1993	33,000	22-12-92	293,035	/
	1994	13,710	21-07-94	133,893	/
	1995	9,581	9-06-1995	87,394	/
	1996	8,710	22-12-95	82,056	/
Legge 20 dicembre 1995 n. 539	1996	6,118	24-07-96	60,000	12,000
-	1997	11,557	24-07-96	120,000	24,000
Legge 4 ottobre 1996 n. 515	1997	35,848	30-08-96	410,000	45,000
	1998	18,255	30-07-97	166,000	18,607
Legge 2 ottobre 1997 n. 345	1998	18,665	23-12-97	240,000	80,000
	1999	12,750	12-11-98	160,000	20,000
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999	1,275	2-11-1999	18,000	5,250
	2000	0,850	2-11-1999	12,000	3,500
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	20,600	25-10-99	270,000	50,000
	2000	5,800	(2)	69,600(3)	8,600
	2001	7,500	(2)	90,000(3)	10,000

Importi espressi in miliardi

(1) La riserva è una somma prudenziale che viene accantonata e che potrà essere disponibile solo dopo i primi 5 anni dalla stipula di ogni singolo contratto di mutuo. L'ammontare è presunto e dipende dal tasso ufficiale di sconto vigente alla data della verifica e dai relativi piani di erogazione
Per la sua indeterminatezza e la sua non immediata disponibilità non è stata conteggiata nel programma degli interventi.

(2) Mutuo da stipulare nell'anno 2000.


(3) Ammontare presunto alla stipula del mutuo.


Sintesi Quadro Finanziario

Leggi:

- 5 febbraio 1992 n. 139;
- 4 ottobre 1996 n. 515;
- 3 agosto 1998 n. 295;
- 20 dicembre 1995 n. 539;
- 2 ottobre 1997 n. 345;
- 28 dicembre 1998 n. 448.

	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
TOTALE	1.929 219	1.877.159	97	1 511 488	78	772.820	40

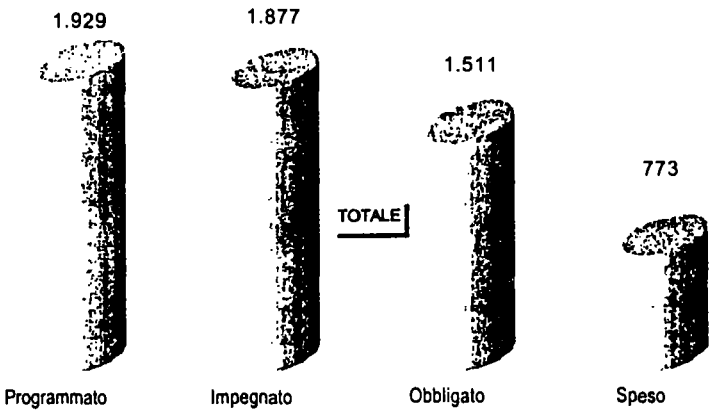

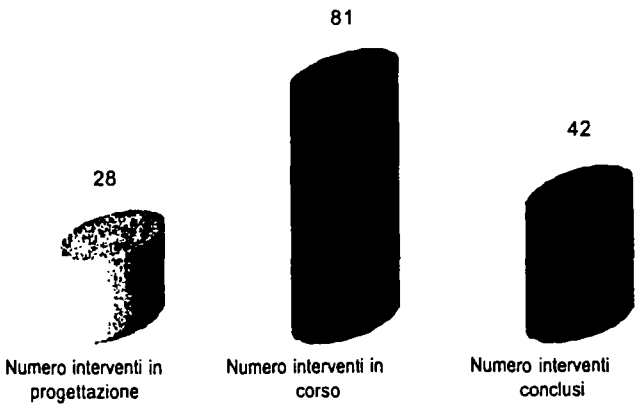


Sintesi Quadro Finanziario


	Annualità	Programmato A	Impegnato B	% B/A	Obbligato C	% C/A	Speso D	% D/A
Finanziamenti antecedenti al 1999 (*)		1.687.969	1.658.241	98,24	1.511.488	89,54	772.820	45,78
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	220.000	203.218	92,37				
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999	12.750	12.750	100,00				
	2000	8.500	2.950	34,71				
TOTALE		1.929.219	1.877.159	97,30	1.511.488	78,35	772.820	40,06

importi in milioni

(*) Leggi

- 5 febbraio 1992 n. 139;
- 4 ottobre 1996 n. 515,
- 20 dicembre 1995 n. 539;
- 2 ottobre 1997 n. 345.

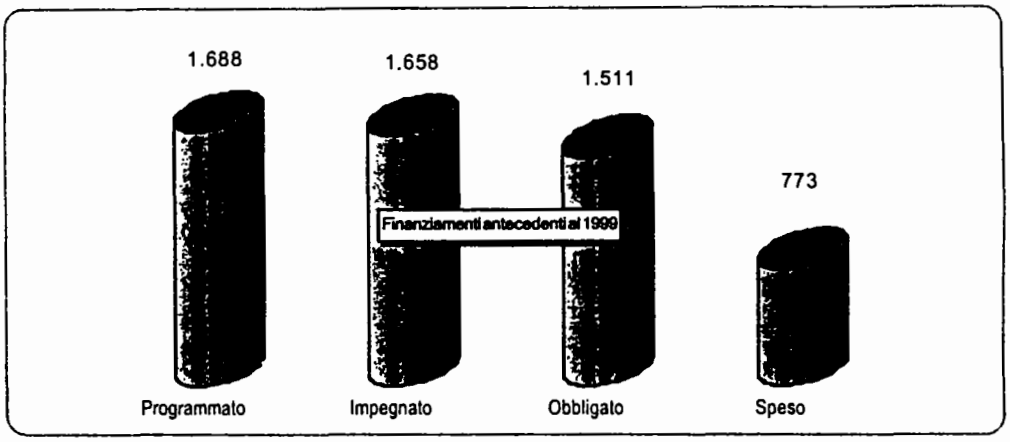


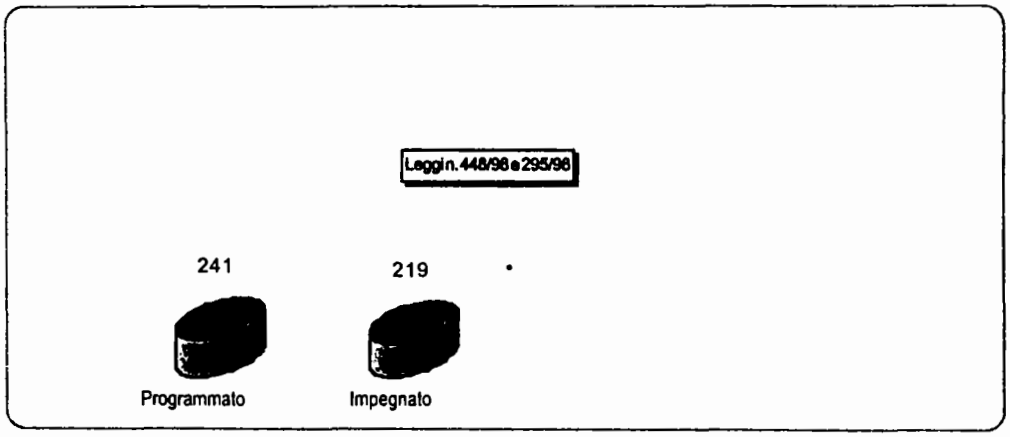


Progetto Integrato Rii

Il progetto integrato rii oggetto di apposito accordo di programma, tra Stato, Regione, e Comune di Venezia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 139 prende in considerazione gli interventi di scavo dei rii e smaltimento dei fanghi, le opere di sistemazione e risanamento della rete fognaria esistente e dei sottoservizi a rete, gli interventi di consolidamento statico degli edifici pubblici e privati (soggetti a specifici contributi) prospicienti i rii e le opere per la difesa delle acque alte mediante l'innalzamento dei percorsi pedonali.
Gli interventi fanno parte di un piano organico generale che investe tutto il centro storico e le Isole per un importo di circa 1.500 miliardi e si sviluppa nell'arco di 23 anni con inizio dal 1994.
I principali obiettivi che si intende perseguire con il piano sono:
- ricambio idraulico;
- disinquinamento delle acque (risanamento igienico-sanitario)
- consolidamento statico delle strutture;
- protezione della città dalle acque medio-alte.

Il Comune di Venezia ha recentemente assegnato tale compito ad una società per azioni denominata Insula in cui le partecipazioni sono così suddivise: Comune di Venezia 52%; Italgas 12%; Aspiv 12%;Telecom 12%; Ismes S.p.A. (Enel) 12%.

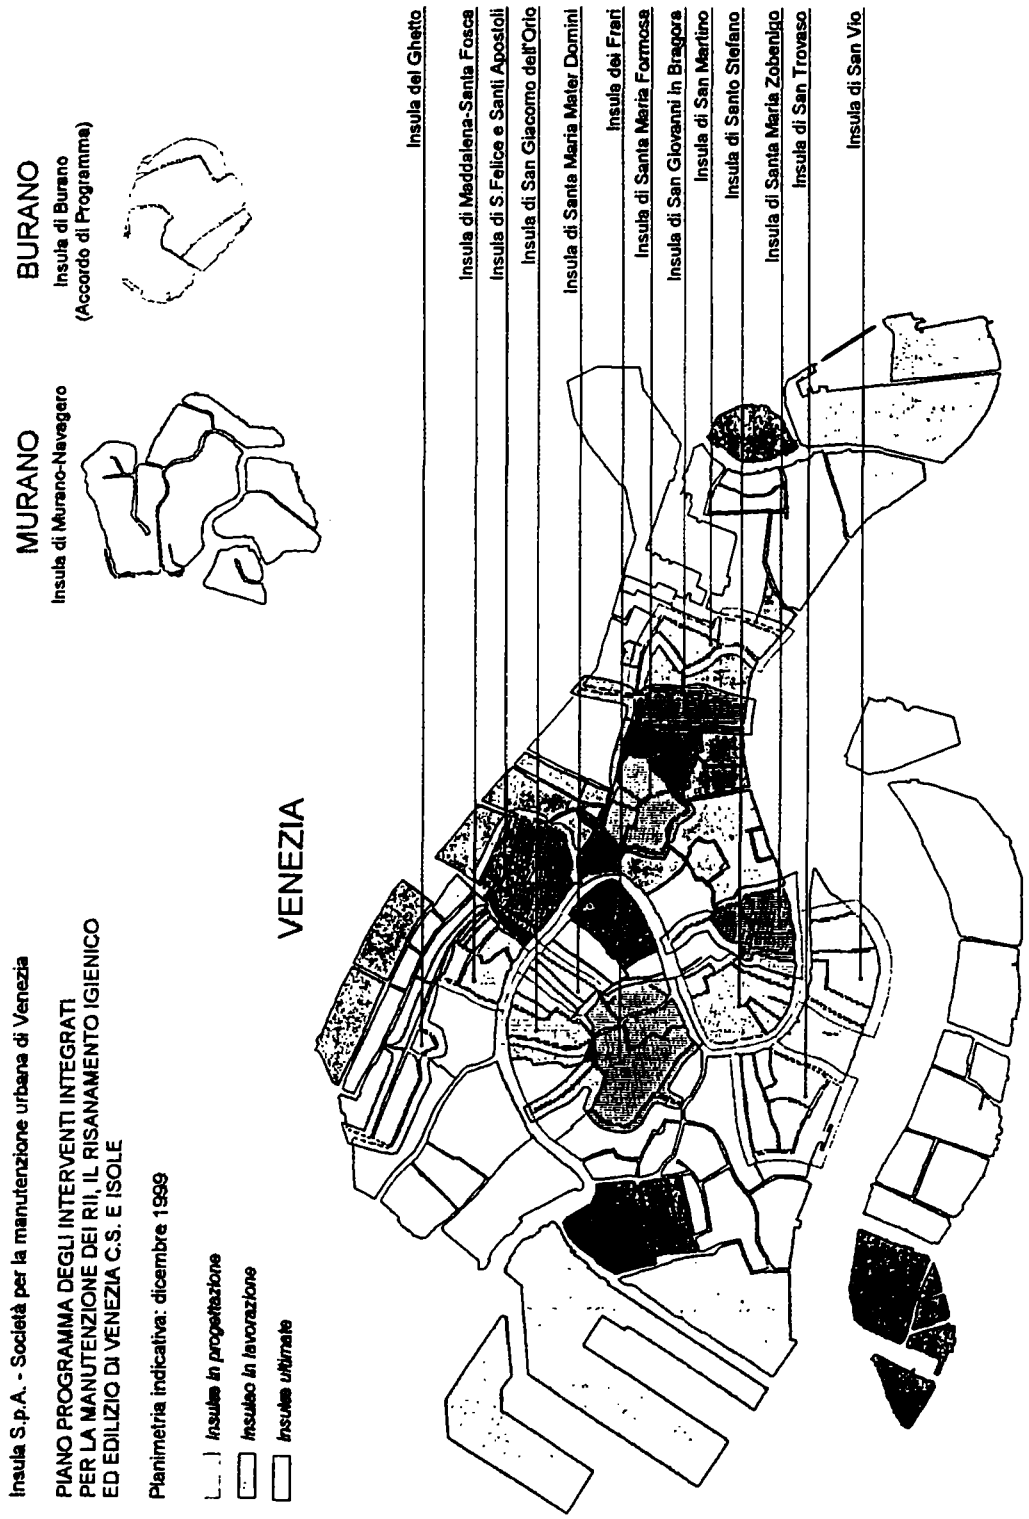
Insula S.p.A. - Società per la manutenzione urbana di Venezia
PIANO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI INTEGRATI
PER LA MANUTENZIONE DEI RII, IL RISANAMENTO IGIENICO
ED EDILIZIO DI VENEZIA C.S. E ISOLE
Planimetria indicativa: dicembre 1999
Insule in progettazione
Insule in lavorazione
Insule ultimate
MURANO
Insula di Murano-Navagero
BURANO
Insula di Burano
(Accordo di Programma)
VENEZIA
Insula del Ghetto
Insula di Maddalena-Santa Fosca
Insula di S.Felice e Santi Apostoli
Insula di San Giacomo dell'Orio
Insula di Santa Maria Mater Domini
Insula dei Frari
Insula di Santa Maria Formosa
Insula di San Giovanni in Bragora
Insula di San Martino
Insula di Santo Stefano
Insula di Santa Maria Zobenigo
Insula di San Trovaso
Insula di San Vio

INSULA DEL GHETTO

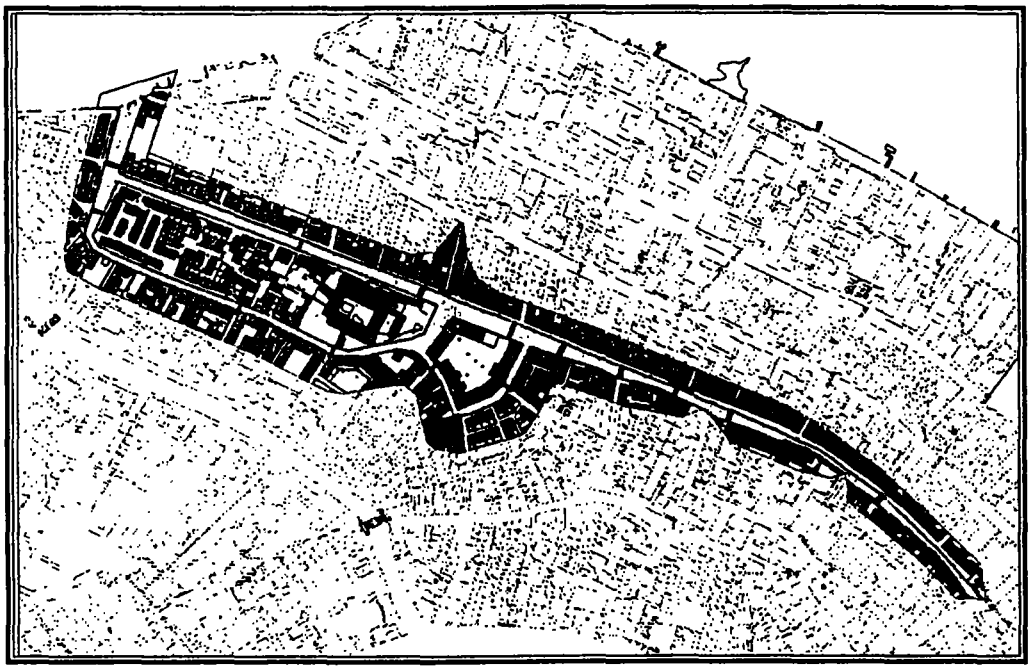

Rii dell'insula

- Rio del Ghetto novo
- Rio de Ca' Moro
- Rio del Batelo
- Rio di San Girolamo
- Rio de la Misericordia
- Rio de le Torete

Dati di progetto

- Lunghezza rii interessati da scavo: **1.975 ml**
- Quantità totale di fango da scavare: **18.336 mc**
- Fondamenta pubblica interessata da interventi: **2.321 ml**
- Fondamenta privata interessata da interventi: **1.612 ml**
- Pavimentazione da sistemare: **5.190 mq**
- Ponti interessati da restauro: **9**

Superficie emersa: **3.68 ha**

Consolidamento dati post-intervento

Interventi di scavo



Denominazione	Lunghezza (m.)	Scavo in presenza d'acqua (mc.)	Scavo all'asciutto entro casseri (mc.)	Quantità di fango (mc)
1-Rio del Ghetto Novo	196	0	1.593	1.593
2-Rio de Cà Moro	81	683	0	683
3-Rio del Batelo	525	1.030	3.744	4.774
4-Rio di S.Girolamo	389	248	3.459	3.707
5-Rio de la Misericordia	697	0	5.654	5.654
6-Rio de le Torete	87	99	434	533
TOTALE	**1.975**	**2.060**	**14.884**	**16.944**

Interventi sui ponti



Denominazione	Tipo di intervento
1-Ponte Novo	Rifacimento
2-Ponte del Ghetto Nuovissimo	Rifacimento
3-Ponte di S.Girolamo	Consolidamento e restauro
4-Ponte de le Torete	Manutenzione straordinaria
5-Ponte degli Ormesini	Manutenzione straordinaria
6-Ponte dell'Aseo	Manutenzione straordinaria
7-Ponte dei Lustraferi	Manutenzione straordinaria
8-Ponte di S.Marziale	Manutenzione straordinaria

Interventi sulle sponde



Denominazione	Sponde pubbliche risanate (ml.)	Sponde private risanate (ml.)	Totale sponde risanate (ml.)
Rio del Ghetto Novo	80	312	392
Rio de Cà Moro	177	0	177
Rio del Batelo	462	597	1059
Rio di S.Girolamo	755	20	775
Rio de la Misericordia	777	594	1371
Rio de le Torete	70	105	175
TOTALE	**2.321**	**1.628**	**3.949**

Interventi sulle fondamente




Denominazione	Superficie rialzata (mq.)
1-F.ta del Batelo – Calle Madonna – Calle Vedei	553
2-Fondamenta delle Chioverete	95
3-Fondamenta de la Misericordia	2.088
4-Fondamenta degli Ormesini	1.022
5-Fondamenta de le Capuzine e Coletti	1.255
TOTALE	**5.013**

*I lavori di sistemazione delle pavimentazioni comprendono anche i recuperi di quota tendenti a +1,20m s.l.m.m.

La superficie pubblica della città allagata a +1,20m è di 340 000mq. pari al 31% del totale

Il n° medio di eventi mareali annui a +1,20m è di 4

INSULA DI SANTA MARIA FORMOSA

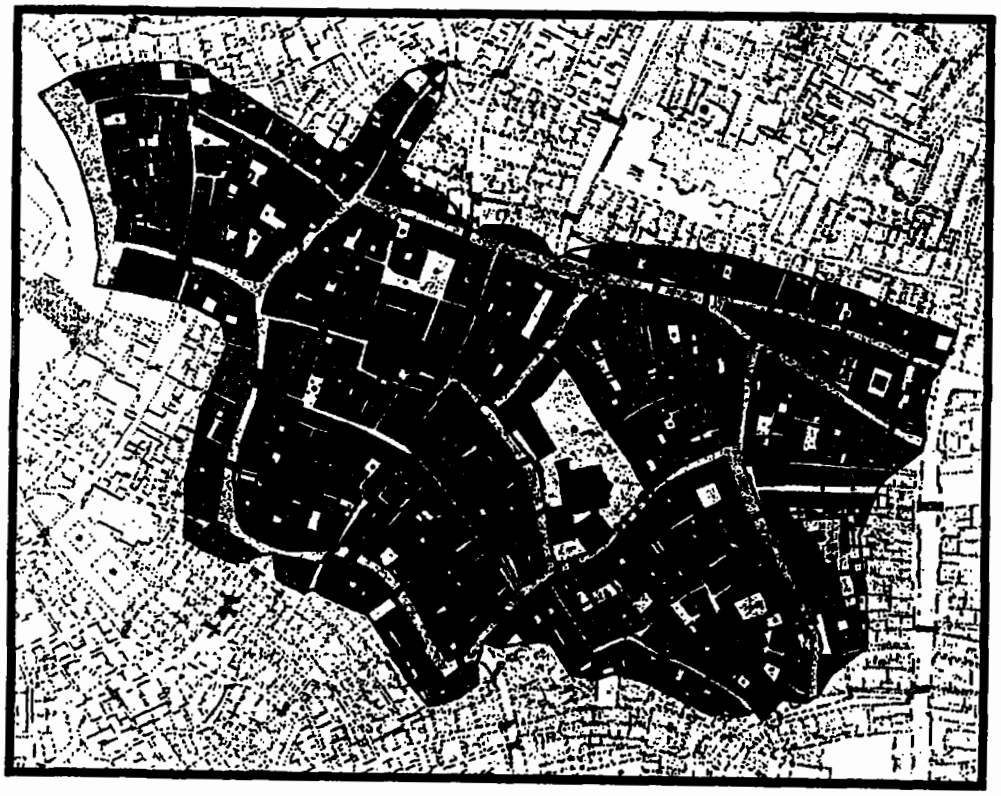


Rii dell'insula

- Rio di San Giovanni Grisostomo
- Rio dei Miracoli
- Rio de San Lio
- Rio de Santa Marina
- Rio del Piombo
- Rio del Pestrin
- Rio de San Giovanni Laterano alto
- Rio de la Tetta
- Rio de San Severo
- Rio de Santa Maria Formosa
- Rio del Mondo Novo
- Rio de San Zulian
- Rio de la Fava
- Rio del Fontego dei Tedeschi

Dati di progetto

- Lunghezza rii interessati da scavo: **2.873ml**
- Quantità totale di fango da scavare: **14.803mc**
- Fondamenta pubblica interessata da interventi: **1.376ml**
- Fondamenta privata interessata da interventi: **4.452ml**
- Ponti interessati da restauro: **30**

INSULA DEI FRARI

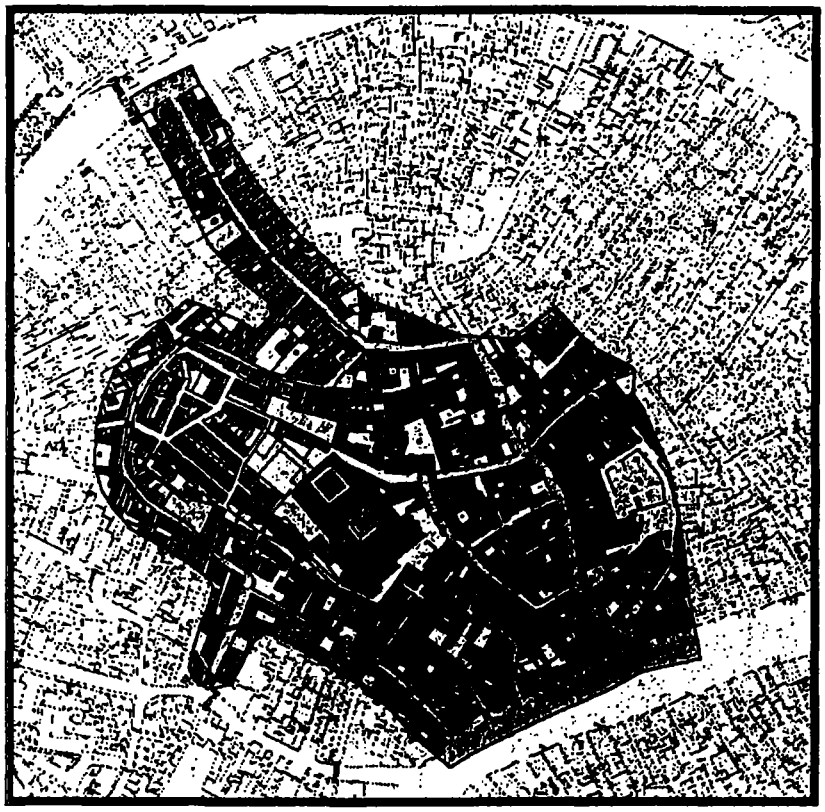


Rii dell'insula

- Rio Marin
- Rio di San Giacomo dell'Orio
- Rio di San Giovanni Evangelista
- Rio delle Muneghette
- Rio de San Pantalon
- Rio de la Frescada
- Rio de Sant'Agostin
- Rio Amalteo
- Rio de San Stin
- Rio dei Frari
- Rio de San Tomà
- Rio de le Do Torre
- Rielo Sant'Antonio
- Rio de San Polo
- Rielo de le Erbe

Dati di progetto

- Lunghezza rii interessati da scavo: **2.743ml**
- Quantità totale di fango da scavare: **12.822mc**
- Fondamenta pubblica interessata da interventi: **1.588ml**
- Fondamenta privata interessata da interventi: **3.455ml**
- Ponti interessati da restauro: **16**

INSULA DI SAN GIOVANNI IN BRAGORA

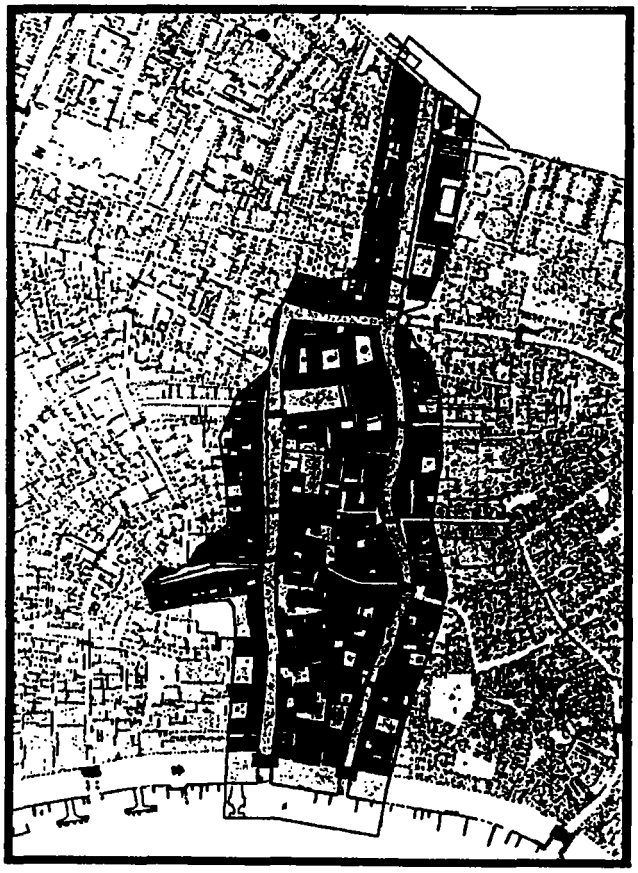


Rii dell'insula

- Rio de la Pietà
- Rio de San Antonin
- Rio dei Greci
- Rio de San Provolo o de l'Osmarin
- Rio de San Lorenzo
- Rio de San Giovanni Laterano basso
- Rio de Santa Giustina

Dati di progetto

- Lunghezza rii interessati da scavo: **1.445 ml**
- Quantità totale di fango da scavare: **4.325 mc**
- Fondamenta pubblica interessata da interventi: **1.044 ml**
- Fondamenta privata interessata da interventi: **1.808 ml**
- Ponti interessati da restauro: **14**
- Pavimentazione da sistemare: **842 mq**

INSULA DI BURANO (Accordo di Programma)

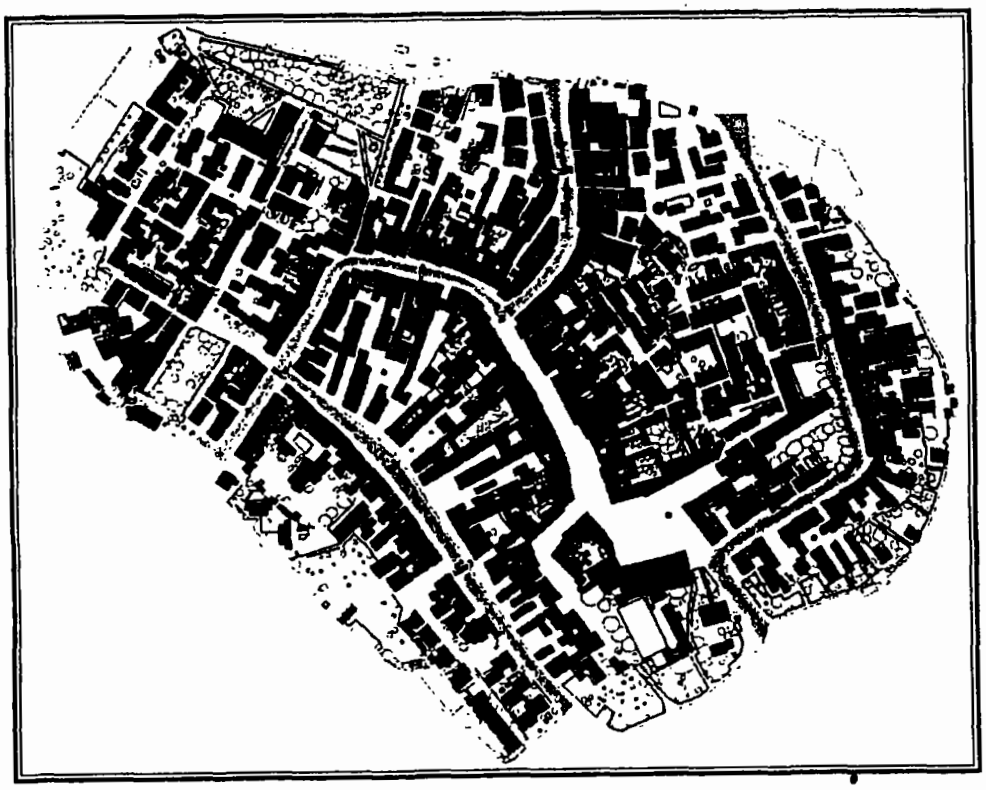

Le ipotesi di progetto

Interventi diffusi

- Rinnovo del sistema fognario:

(la tipologia è a reti separate con recapito delle acque nere all'impianto di depurazione di S.Erasmo mediante condotta sublagunare in pressione, scavi dei rii in asciutto),

- Difesa dalle acque medio-alte:

(rialzi della pavimentazione, interventi sui marginamenti lagunari e sui muri di sponda dei canali interni, realizzazione di cinque paratoie all'imbocco dei canali),

- Riassetto dei sottoservizi;

Interventi puntuali

- Riqualificazione delle aree a verde:

(via di Mazzorbo, corte Comare, corte Novello),

- Rifacimento di quattro ponti in legno:

(ponte Pontinello, ponte delle Capuccine, ponte Galuppi, ponte dei Tre Ponti),


- Manutenzione di tre ponti in muratura,
- Costruzione di due darsene.

Dati di progetto su interventi integrati eseguiti e in corso di esecuzione

INSULA	*Lunghezza scavo rii (ml)*	*Asporto fanghi (mc)*	*Sponde pubbliche (ml)*	*Sponde private (ml)*	*Pavimentazione (mq)*	*Ponti (n.)*
Santa Maria Zobenigo	1.618	7.089	869	2.386	-	13
Santa Maria Formosa	2.873	14.803	1.376	4.452	-	30
Ghetto	1.975	18.336	2.321	1.612	5.190	9
Fran	2.743	12.822	1.588	3.455	-	16
Santo Stefano	1.191	3.658	338	1.954	1.566	9
San Trovaso I	780	1.122	548	1.008	1.889	8
San Trovaso II	1.263	4.702	1.346	1.167	5.629	12
San Giovanni in Bragora	1.445	4.325	1.044	1.808	842	14
San Giacomo dell'Orio	978	6.092	436	1.475	939	12
San Martino	1.509	3.757	1.112	1.915	1.148	14
San Felice - S S Apostoli	1.899	5.880	846	2.913	3.007	17
Santa Maria Mater Domini	952	6.493	374	1.501	580	10
Maddalena - Santa Fosca	1.064	6.367	676	1.461	2.623	11
San Vio	1.109	5.201	1.316	936	4.867	10
Murano - Navagero	-	10.550	980	-	5.137	-
Totale	21.399	111.197	15.170	28.043	33.417	185

	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Insula Santa Maria Zobenigo	5.775	5.775	4.601	3.310
Insula Santa Maria Formosa	9.107	9.107	9.107	3.780
Insula Ghetto	11.015	11.015	11.015	10.798
Insula Frari	10.796	10.796	10.796	9.669
Insula Giudecca - Sacca Fisola	5.021	5.021	3.731	3.731
Insula percorso Tolentini	5.000	5.000	1.707	1.707
Insula S. Giovanni In Bragora	16.210	16.210	16.210	960
Insula S. Maria Mater Domini	8.448	8.448	300	
Isola Murano Navagero	10.365	10.365	10.365	10.365
Isola Ghetto Chiovere (2a fase)	15.051	15.051	15.051	
Lido Riva via Candia	3.000	3.000	3.000	500
Dorsoduro F.ta gradinata chiesa della Salute	4.692	4.692	150	
S.Croce Riva di Biasio	3.578	3.578	200	
Rialto Pescheria (adeguamento fognario)	3.837	3.837	3.837	423
Guidecca F.ta Rio Ponte Lungo	2.738	2.738	2.738	422
Guidecca F.ta Rio S.Croce	2.210	2.210	2.210	220
Murano F.ta Tiepolo	1.700	1.700	1.700	800
Murano F.ta Venier	5.215	5.215	5.215	3.210
Murano F.ta S.Mattia/ponte Zaniol	2.904	2.904	2.904	980
Interventi puntuali e diffusi fondamente, ponti, scarico umido, rialzi pavimentazione pubblica risanamento igienico sanitario acque reflue, contributi ai privati, arredi etc.	192.420	186.791	177.366	85.753
TOTALE	319.082(*)	313.453	282.203	136.628

(*) L'importo è comprensivo della quota Regionale pari a 135 miliardi.

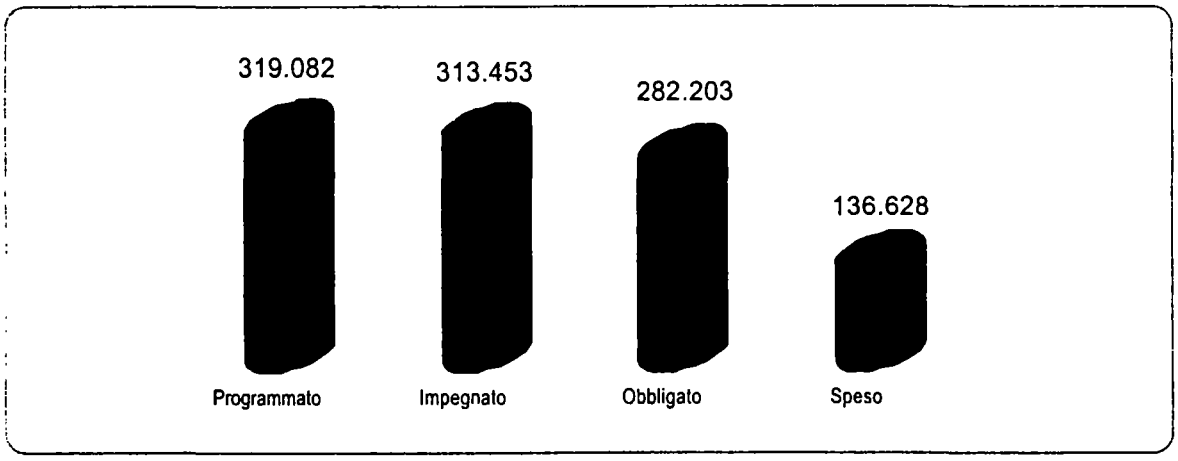

importi in milioni


Interventi finalizzati alla esecuzione di importanti opere pubbliche, all'acquisizione ed al restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari.


Tra essi va rilevato il peso che assumono le risorse impegnate per:

- la residenza che, unitamente ai contributi al patrimonio immobiliare privato di cui alla successiva lettera c) della Legge 798/'84 ed altri provvedimenti integrativi di carattere normativo e finanziario, si propongono di contrastare e invertire il fenomeno dell'esodo;
- la cultura che garantiscono la riorganizzazione culturale ed economica del sistema museale della città;
- la ricostruzione del Teatro la Fenice.

Residenza

Gli interventi finanziati dalla Legge Speciale, riguardanti la questione abitativa, hanno come obiettivo non solo quello di incrementare il patrimonio edilizio residenziale, ma sono finalizzati anche alla riqualificazione di aree residenziali degradate, al recupero del patrimonio comunale non adeguatamente utilizzato, oltre alla reintroduzione sul mercato residenziale di ampie aree dismesse un tempo destinate a funzioni produttive oggi obsolete.
Dal 1993 ad oggi la Legge Speciale ha finanziato in questo settore una serie di interventi tra recuperi, nuove realizzazioni e acquisizioni, per un totale di circa 1.000 tra alloggi e residenze speciali per anziani e per studenti.

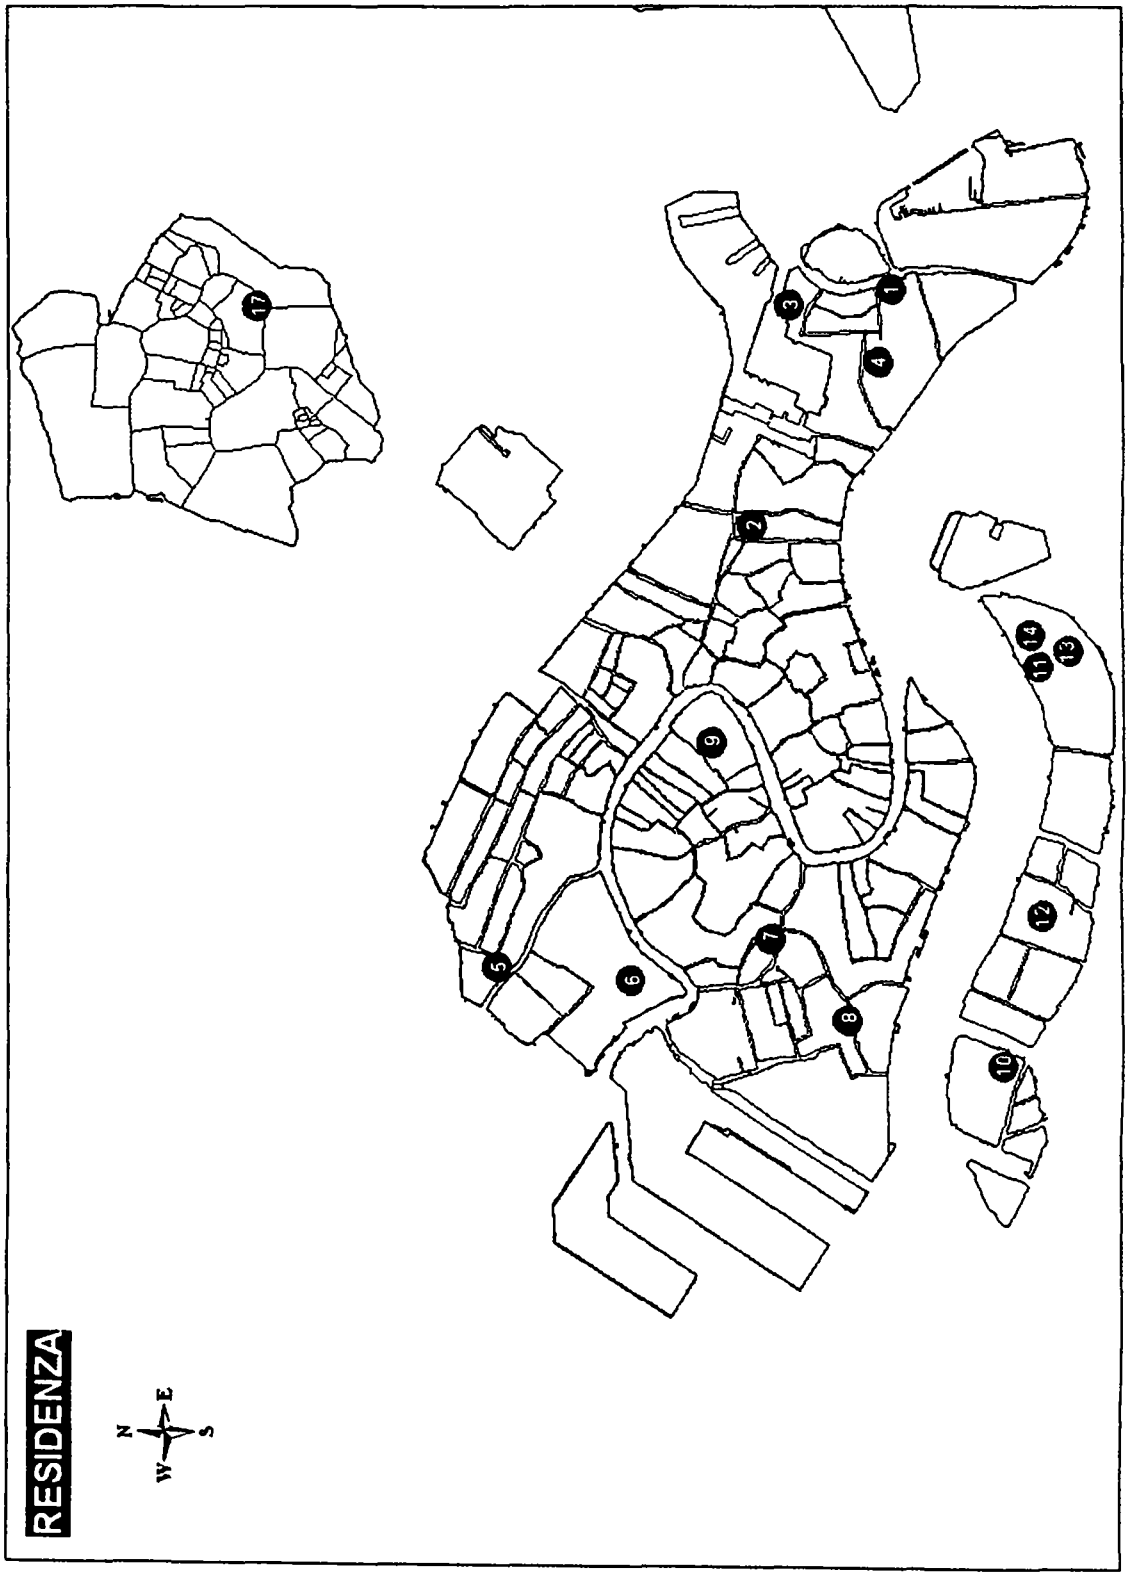
RESIDENZA
N
E
S
W

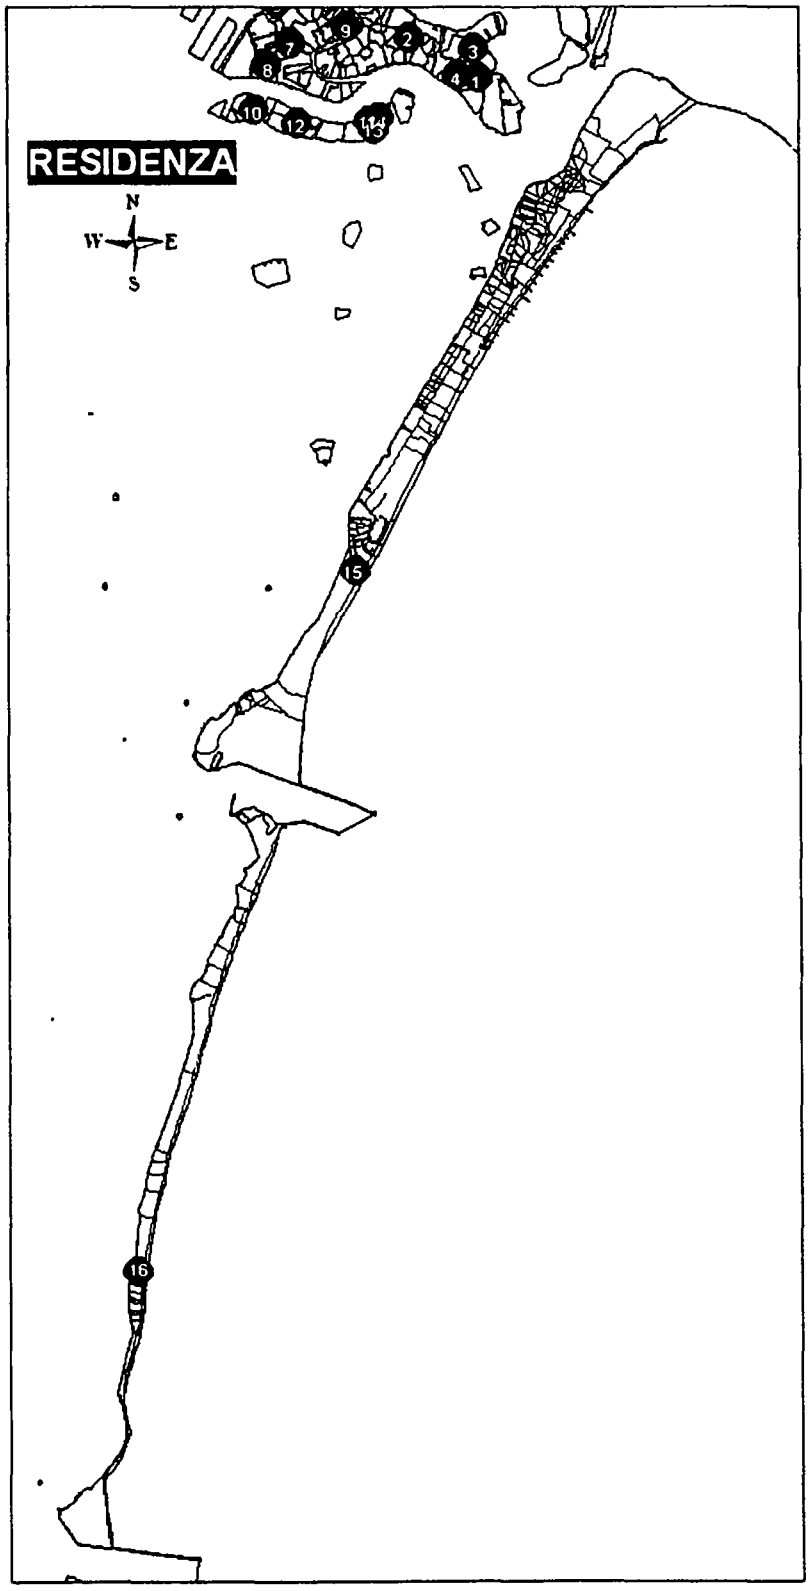
RESIDENZA
N
W
E
S
1
2
3
4
7
8
9
10
12
13
14
15
16



Complesso convento Sant'Anna - Castello 1

Intervento in corso → Previsione fine lavori 2° semestre 2001

Il complesso fondato nel 1242. La struttura composta dalla chiesa, dal chiostro e dal corpo conventuale, venne destinata nel 1860 a ospedale militare funzione che ha conservato fino ai giorni nostri
L'intervento prevede il recupero di spazi da decenni inutilizzati. Nel complesso conventuale verranno ricavate 106 alloggi, di cui alcuni speciali per anziani e per portatori di handicap, oltre a spazi per funzioni collettive

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		22 880	22 880	22 880	6 608
Legge 28 dicembre 1998 n 448	1999	11 500	11 500		
Legge 3 agosto 1998 n 295	1999				
	2000				
Totale		34 380	34 380	22 880	6 608



Ospedale San Lorenzo - Castello 2

Intervento in corso → Previsione fine lavori giugno 2003

Il complesso di San Lorenzo articolato attorno a due chiostri e ad una corte, fu fondato nel IX secolo Nel 1806 a seguito della soppressione del convento Benedettino fu adibito a Civica Casa di Industria per il ricovero degli indigenti. Attualmente il complesso (che ha una sup Totale di ca 11 000 mq) e adibito a casa di riposo per anziani Il progetto prevede il potenziamento e la riqualificazione della destinazione assistenziale geriatrica fino a 220 posti letto, integrandola con servizi sanitari, riabilitativi e per il ristoro rivolti non solo alla popolazione anziana

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		20 070	20 070	20 070	16 632
Legge 28 dicembre 1998 n 448	1999	22.000	22 000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		42 070	42 070	20 070	16 632



Caserma San Daniele - Castello 3

Intervento concluso

La caserma fa parte di un complesso vincolato all'interno dell'Arsenale che in parte risale al IX secolo La ristrutturazione prevede la realizzazione di 56 alloggi, sale riunioni e servizi accessori, per il personale dipendente dal Ministero della Difesa dell'Arsenale di Venezia

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		10 058	10 058	10 058	9 556



Complesso Santa Maria Ausiliatrice - Castello 4

Intervento concluso

Le origini del vasto complesso risalgono al 1171 quando una confraternita eresse un ospedale ed una chiesa. Da istituzione sanitaria di cantà privata e poi più recentemente, istituzione scolastica e professionale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, il complesso è stato acquistato dal Comune nel 1995
L'intervento di ristrutturazione prevede la realizzazione di 81 posti letto per studenti, una ventina di alloggi e spazi coperti e scoperti di uso comune La chiesa verra destinata allo svolgimento di attività didattiche

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		*7 810*	*7 810*	*7 810*	*7 218*



Complesso Santa Maria delle Penitenti - Cannaregio 5

Intervento in progettazione

Previsione fine lavori 1° semestre 2003

Costruito nella prima metà del Settecento su progetto di G Massari, da sette anni si trova in condizioni di abbandono, dopo aver svolto per quasi due secoli la funzione di ricovero per donne traviate e pentite, e negli ultimi anni quella di ospizio per donne Sulla base di una convenzione tra Comune ed I R E il complesso verrà ristrutturato per ospitare una casa albergo per anziani (65) autosufficienti, una casa dello studente, alloggi protetti, servizi e strutture per attività di tipo sociale, assistenziale e sanitario, attività commerciali e amministrative per la gestione dei servizi sociali

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1 500	1 500	1 500	1 188
Legge 28 dicembre 1998 n 448	1999	9 500	9 500		
Legge 3 agosto 1998 n 295	1999				
	2000				
Totale		11 000	11 000	1 500	1 188



Area Saffa - Cannaregio 6

Intervento in corso →

Previsione fine lavori dicembre 1999

L intervento si inserisce in un'area industriale da tempo dismessa e in grave stato di degrado Il progetto prevede la realizzazione dell'ultimo dei sei edifici di edilizia residenziale di 42 alloggi

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		12 395	12 395	12 395	7 609
Legge 28 dicembre 1998 n 448	1999	37	37		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		12 432	12 432	12 395	7 609



Immobile Rio Novo - Dorsoduro 7

Intervento concluso

Tale complesso edilizio è costituito da corpi di fabbrica che, seppur fatiscenti, sono ancor oggi chiaramente individuabili nella loro consistenza fisico-volumetrica e morfologica. Si tratta di edifici costruiti in periodo novecentesco, in aree precedentemente libere, con funzioni di deposito e lavorazione di materiali edili, dislocati attorno ad un'area verde. Vengono ricavati sette alloggi, servizi comunali e negozi

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		3 170	3 170	3.170	2 798



Casa 7 camini - Dorsoduro 8

Intervento concluso

L'edificio, vincolato, rappresenta un esempio di edilizia residenziale minore di formazione preottocentesca che nel corso del tempo ha subito poche modificazioni e attualmente è composto da 14 abitazioni
Il progetto prevede il sollevamento dell'immobile di 35/40 centimetri per garantire l'isolamento delle strutture murarie e altezze dei vani di almeno 2 20 mt. Così facendo il piano terra potrà acquistare nuovamente la destinazione residenziale (n. 21 alloggi)

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2 000	2 000	2 000	1 940



Complesso Calle Carampane - San Polo 9

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2000

Intervento di restauro e risanamento di edificio ad uso residenziale (16 alloggi)

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5 800	5 800	5 800	625




Area Fregnan - Giudecca 10

Intervento concluso

Il progetto riguarda il secondo lotto di completamento dell'intervento di edilizia residenziale pubblica comunale nell'angolo sud est di Sacca Fisola che prevedeva due edifici a corte, di cui uno già realizzato Costituito da 38 alloggi di varie taglie e tipologie e caratterizzato da un alto portico che si affaccia sull'acqua con ponte trasversale che collega l'isola con Sacca San Biagio

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		8 150	8 150	8 150	6 996



Magazzini Granari - Giudecca 11

Intervento concluso

Il complesso di edifici fu realizzato nel periodo successivo alla fine della Repubblica quando l'isola fu convertita all'uso industriale e ha ospitato fino ad oggi magazzini e laboratori Mediante interventi misti di riassetto funzionale e restauro conservativo si prevede la realizzazione di 67 residenze e 10 laboratori artigianali

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		9 704	9 704	9 704	9 400



SS. Cosma e Damiano - Giudecca 12

Intervento in corso → Previsione fine lavori 1° trimestre 2000

Ex Convento benedettino (XV) composto da un corpo con ampi ambienti collettivi affacciati sul chiostro e tre corpi destinati alle celle, venne parzialmente demolito e ricostruito agli inizi del secolo per essere adibito a magazzino. Definitivamente abbandonato negli anni Settanta, attualmente si trova in grave stato di degrado
Gli interventi di risanamento e riqualificazione funzionale porteranno il complesso ad ospitare alloggi e laboratori, una scuola artigiana di specializzazione, un centro di documentazione, sale polifunzionali, aule, uffici

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		7 502	7 502	7 502	6 492
Legge 28 dicembre 1998 n 448	*1999*	*238*	*238*		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		7 740	7 740	7 502	6 492



Pastificio Zaggia - Giudecca 13

Intervento concluso

Ristrutturazione di un'area edificata negli anni Trenta mediante intervento di riconversione della volumetria di un pastificio, dismesso con la cessazione della produzione negli anni sessanta, e delle annesse attività commerciali L'intervento di demolizione e ricostruzione, necessario per il generalizzato stato di degrado dell'immobile, ha permesso di ottenere 32 alloggi, mentre il piccolo nucleo di negozi al pino terra è stato restaurato

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5 265	5 265	5 265	5 235
Legge 28 dicembre 1998 n 448	1999	226	226		
Legge 3 agosto 1998 n 295	1999				
	2000				
Totale		5 491	5 491	5 265	5 235



Ex fabbrica del ghiaccio - Giudecca 14

Intervento concluso

L'intervento si colloca nell'area su cui insistono i resti di una vecchia fabbrica del Novecento Il nuovo sistema di abitazioni da cui vengono ricavati 23 alloggi, è costruito all'interno dei vecchi muri perimetrali della ex fabbrica che, benché degradati, vengono risanati e recuperati così da mantenere visibile l'intreccio tra l'edificio dell'epoca e il nuovo impianto

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2 038	2 038	2 038	2 038
Legge 28 dicembre 1998 n 448	1999	360	360		
Legge 3 agosto 1998 n 295	1999				
	2000				
Totale		2 398	2 398	2 038	2 038



Interventi di recupero urbano - Giudecca

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2000

Programma di Recupero Urbano - Centro Storico di Venezia, Isola della Giudecca è uno degli strumenti che l'Amministrazione ha attivato, utilizzando le risorse offerte dalla Regione Veneto, dal CER e dalla Ue, volti alla riqualificazione di aree residenziali e al recupero delle aree produttive dismesse Il quartiere ERP Sacca Fisola e il quartiere ERP Giudecca '95 sono complessi residenziali nati entrambi nella seconda metà degli anni cinquanta.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		11 500	11 500	11 500	
Legge 28 dicembre 1998 n 448	1999	5 000	5 000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		16 500	16 500	11 500	



Immobili Via Doge Beato - Lido 15

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2000

Edificazione di un nuovo complesso composto da due corpi di fabbrica dotati di vani seminterrati per magazzini e garage per un totale di 16 alloggi (6 600 mc) L'intervento verra realizzato su un'area inedificata di proprietà comunale

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5 620	5 620	3 587	2 688



Villa Taice - Pellestrina 16

Intervento concluso

Il villino costruito agli inizi di questo secolo nel passato ha svolto prevalentemente funzioni di foresteria Acquistato dal Comune agli inizi del Novanta, conclusa la ristrutturazione e destinato a uso residenziale per un totale di 8 alloggi

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		457	457	457	457



Conterie - Murano 17

Intervento in corso → Previsione fine lavori 1° semestre 2001

Il Programma di Recupero Urbano denominato *"Conterie" comprende l'omonimo* complesso produttivo di perle, nato nel 1898 e definitivamente chiuso nel 1993, e il limitrofo complesso ERP situato in Campo S Bernardo. L'obiettivo della Amministrazione, diventata proprietaria del complesso nel 1995, è quello di reintegrare nel tessuto urbano l'area dismessa Il programma prevede un consistente insediamento di residenza studentesca affiancata da servizi a questa connessi, un complesso residenziale e attività artigianali oltre al recupero degli edifici residenziali comunali

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5 452	4 970	4 612	1 111
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1.000	920		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		6 452	5 890	4 612	1 111

Acquisizioni di alloggi singoli o raggruppati, diffusi nella città

Intervento concluso

Per far fronte alla emergenza abitativa dal 1994 ad oggi sono state investite risorse per acquistare 122 alloggi o immobili da destinare a questo uso

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		23 407	23 407	23 407	23 407

Manutenzione straordinaria e diffusa

Intervento in corso → Previsione fine lavori fine 2000


Interventi sul patrimonio immobiliare comunale nel centro storico e nelle isole destinato a residenza che comprende 749 alloggi per un totale di 52 000 mq

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		44 995	44 395	31 277	27 066

TotaleResidenza

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		209 773	208 691	193 182	139 064
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	49 861	49 781		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		259 634	258 472	193 182	139 064


Numero interventi in progettazione	Numero interventi in corso	Numero interventi conclusi
1	9	10

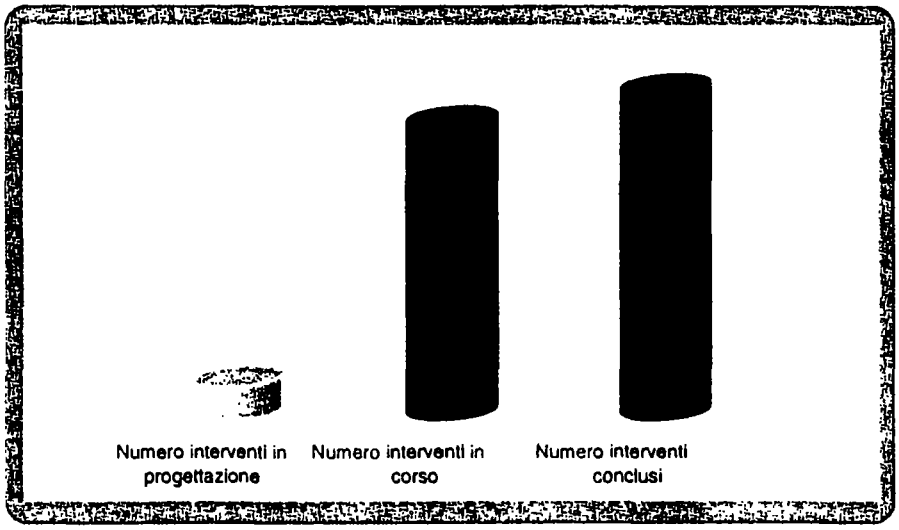

PAGINA BIANCA

Musei Civici

Gli interventi programmati alle sedi museali civiche hanno per obiettivo generale la riprogettazione del sistema museale cittadino in tutte le sue sedi e articolazioni con restauro degli immobili, la loro messa a norma e la creazione di condizioni ambientali idonee alla funzione assolta dai vari musei.
Detti interventi garantiranno il conseguimento di importanti obiettivi funzionali ed economici alla struttura museale con ampliamento dei servizi offerti al pubblico, l'estensione delle aree museali aperte ai visitatori o la riapertura di sedi chiuse da tempo e il conseguente incremento delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti, dalla riscossione di royalties per attività varie di servizio e comunicazioni.

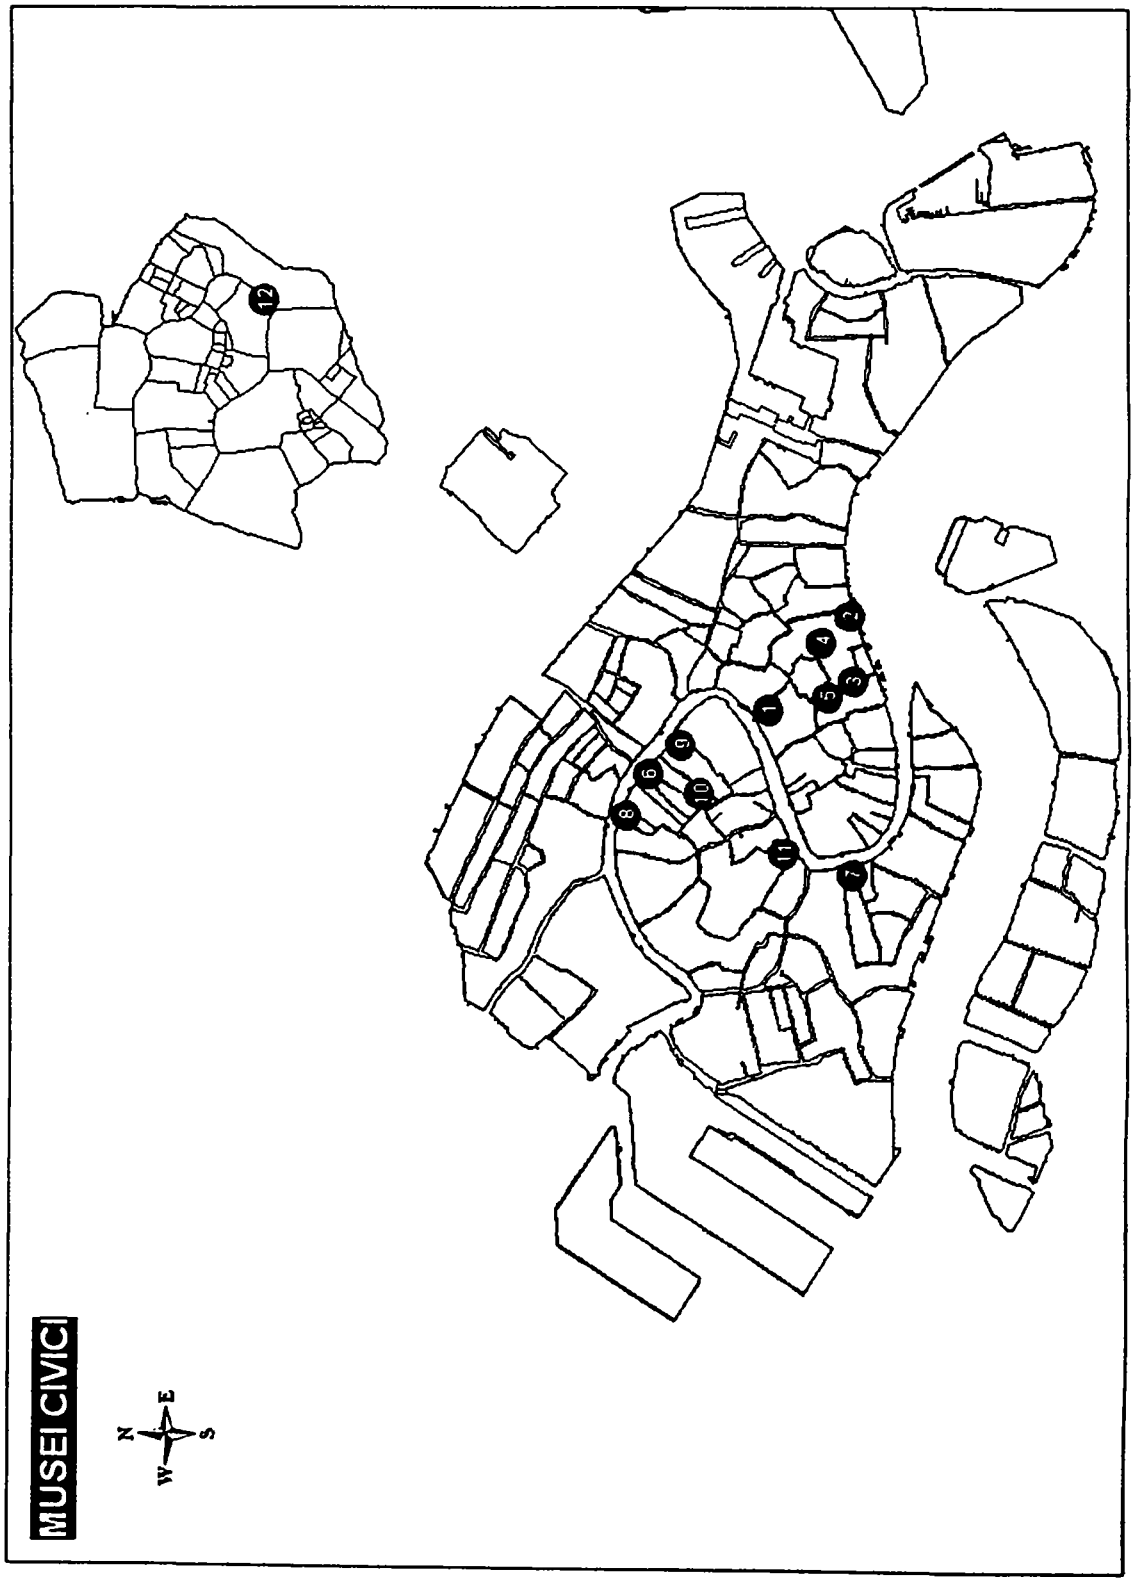
MUSEI CIVICI
N
E
S
W




Palazzo Pesaro degli Orfei - San Marco 1

Intervento in progettazione

Previsione fine lavori 1° semestre 2003

Fabbrica Gotica subì delle modifiche tra la fine dell'ottocento e il novecento. Il palazzo fu trasformato da M. Fortuny nel proprio atelier di fotografia e scenografia. Di queste funzioni ha conservato ambienti e strutture.
Il progetto prevede il restauro conservativo e la razionalizzazione dei volumi ad uso museale ed espositivo

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		546	511	511	25
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	153	153		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		699	664	511	25




Area Marciana - Palazzo Ducale e Prigioni - San Marco 2

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 1999

Destinato fino alla caduta della Repubblica (1797) a residenza del Doge è il simbolo più alto e ricco della civiltà veneziana e ha conservato tutto il fascino e la suggestione di uno dei più splendidi edifici mai costruiti. Grazie ad un incessante lavoro di manutenzione e restauro, offre oggi al visitatore il Museo dell'Opera, il nuovo percorso delle Prigioni, il Ponte dei Sospiri. L'intervento prevede opere di restauro di pareti e soffitti decorati, il restauro della facciata, interventi strutturali, e l'adeguamento e messa a norma degli impianti

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		11 887	11 887	11 887	10 839
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	19	19		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		11 906	11 906	11 887	10 839



Area Marciana - Museo Correr e Procuratie - San Marco 3

Intervento in corso → Previsione fine lavori ottobre 2000

Ha sede nelle Procuratie Nuove di Piazza San Marco, *edificio cinquecentesco di impostazione* scamozzina, mentre parte si estende nella così detta Ala Napoleonica cioè il lato minore della Piazza
Il Museo oltre a raccoglie una gran varietà di collezioni (sculture, dipinti, gessi, legni etc.) ospita il Museo del Risorgimento, il Gabinetto di stampe e disegni, la Biblioteca d'Arte e Storia Veneziana con annesso Archivio.
L'intervento di restauro e messa a norma degli impianti prevede anche un significativo ampliamento della superficie museale ed espositiva.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		4 880	4 880	4 880	2.576
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1.982	38		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		6 862	4.918	4 880	2 576




Area Marciana - Torre dell'Orologio - San Marco 4

Intervento in corso → Previsione fine lavori 1° semestre 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.570	1.500	1.500	568

Concepita in forma di torre campanaria alzata su un essenziale arco di trionfo, risale agli ultimi anni del Quattrocento. La Torre fu dotata sin dalla costruzione di un grande orologio astronomico composto di sistemi ottici e sonori atti a scandire lo scorrere del tempo. L'intervento prevede sia il restauro degli elementi esterni (Mori, quadranti, Magi e tamburi delle ore), sia della meccanica e delle funzioni dell'orologio. Terminata la ristrutturazione la torre e l'orologio diventeranno un piccolo museo visitabile al pubblico. L'importo si riferisce al prezzo di acquisto.



Area Marciana - Palazzo "Manin-Pilsen" - San Marco 5

Intervento concluso

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		15.111	15.111	15.111	15.111

L'edificio acquistato dal Comune nel 1997, è costituito di due entità edilizie di diversa concezione e anzianità che offrono una sup. lorda commerciale di circa 4.000 mq. Tipicamente ottocentesca e legata alla creazione del Bacino Orseolo la palazzina verso ovest; realizzato tra la fine ottocento e i primi del novecento il padiglione in cemento ad ampie finestrature nato come ristorante e birreria, il settore verso est. La destinazione del complesso è intimamente legata al progetto di ristrutturazione dell'offerta museale dell'area marciana, dovendo ospitare importanti sezioni del museo Correr.




Palazzo Marcello - Cannaregio 6

Intervento in corso → Previsione fine lavori fine 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	3.000	3.000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		3.000	3.000		

Costruito con affaccio sul Canal Grande a cavallo fra Seicento e Settecento, a lato dell'ala seicentesca del palazzo Ca' Vendramin Calergi (Casinò), sarà oggetto di restauro conservativo a seguito di un Accordo di Programma tra Stato e Comune, prima di diventare la sede museale.



Cà Rezzonico - Dorsoduro 7

Intervento in corso → Previsione fine lavori 2° semestre 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		19 275	19.275	18 074	9 159
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	3 000	737		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		22 275	20 012	18 074	9 159

Progettato a metà del Seicento e rimasto incompiuto per la morte dell'architetto, il palazzo fu portato a termine e ristrutturato a metà del Settecento. Nell'occasione fu decorato ex novo da alcuni fra i maggiori artisti del secolo tra cui Tiepolo. Acquistato nel 1932 dal Comune venne subito allestito come museo ambientale del Settecento Veneziano. I lavori comprendono il restauro delle facciate, delle pareti e dei soffitti affrescati e la messa a norma degli impianti.




Fontego dei Turchi - Santa Croce 8

Intervento in corso → Previsione fine lavori 2° semestre 1999

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		10.433	10 433	10.272	5.934
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	3.500	3.500		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		13.933	13 933	10 272	5 934

Il palazzo risale al XII-XIII secolo. Il nome deriva dalla destinazione che gli fu attribuita, nel primo seicento, a emporio e centro *commerciale dei mercanti* turchi a Venezia e tale rimase fino a metà ottocento. L'attuale aspetto è dovuto ai radicali restauri del secolo scorso quando fu comprato dal Comune per ospitare le collezioni civiche. Attualmente nel fontego sono rimaste le collezioni naturalistiche ed etnografiche. Si prevede con il restauro un significativo ampliamento e razionalizzazione delle aree espositive temporanee



Cà Pesaro - Santa Croce 9

Intervento in corso → Previsione fine lavori febbraio 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		12.101	12.101	10 730	5 536
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	2.000			
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		14.101	12.101	10.730	5 536

È il più importante palazzo barocco di Venezia Iniziato nel 1628, rimasto incompiuto fu terminato nel secolo successivo. Dal 1897 è sede della Galleria Internazionale d'Arte Moderna ricca di dipinti e sculture originariamente provenienti dagli acquisti che il comune e vari enti e personalità effettuavano in occasione delle Biennali di Venezia. L'intervento prevede la realizzazione di una ricca dotazione di servizi aggiuntivi, laboratori di sperimentazione, piccole gallerie e gabinetti di grafica, librerie, etc.



Palazzo Mocenigo - Santa Croce 10

Intervento in corso → Previsione fine lavori luglio 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1 144	1.144	434	432

Il palazzo di origine gotica fu rimaneggiato ampiamente e profondamente nstrutturato nel primo seicento, quando ha raggiunto l'attuale configurazione. Il decoro e l'arredo hanno invece la tipica impronta settecentesca Nel piano generale dei Musei Civici il Mocenigo è diventato dal 1985 sede del Museo del Tessuto e del Costume. Restaurato con un primo accurato intervento conservativo è dotato di depositi tecnologicamente aggiornati e avrà, alla fine dei lavori, locali attrezzati per il laboratori di conservazione e per apprezzare attività didattiche e di sperimentazione



Casa Goldoni - San Polo 11

Intervento in corso → Previsione fine lavori ottobre 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		4.196	4 105	4.105	428

Palazzo Centanni noto come Casa Goldoni è un palazzo gotico di medie dimensioni dove ebbe i natali il commediografo veneziano. Donato al comune nel 1931 perché avesse una destinazione museale il palazzo oggi ospita un piccolo museo di cimeli teatrali veneziani e un importante archivio e biblioteca di testi e studi teatrali




Palazzo Giustiniani - Murano 12

Intervento concluso

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		4 195	4 195	4.154	2.531
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1 500			
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		5.695	4 195	4.154	2 531

L'edificio in cui venne trasferito nel 1862 il Museo che raccoglie documenti sulla storia dell'isola, vetri di antica fabbricazione a Murano e l'annessa scuola di disegno per vetrai, è l'antico palazzo dei Vescovi di Torcello nato come abitazione patrizia nelle tipiche forme del gotico fiorito. I lavori prevedono, oltre alla creazione delle nuove zone di accoglienza, una consistente espansione del Museo nei contigui spazi delle ex Conterie, e un rinnovamento della sezione tecnologica didattica.

Manutenzione Musei




Interventi manutentivi su tutte le strutture museali del centro storico e isole.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		6 944	6.944	6 141	4 771
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	3.018	2 517		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		9 962	9 461	6 141	4 771

Totale Musei Civici


	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		92.282	92.086	87 799	57 910
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	18.172	9.964		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		110 454	102 050	87 799	57 910

Numero interventi in progettazione	Numero interventi in corso	Numero interventi conclusi
2	10	1

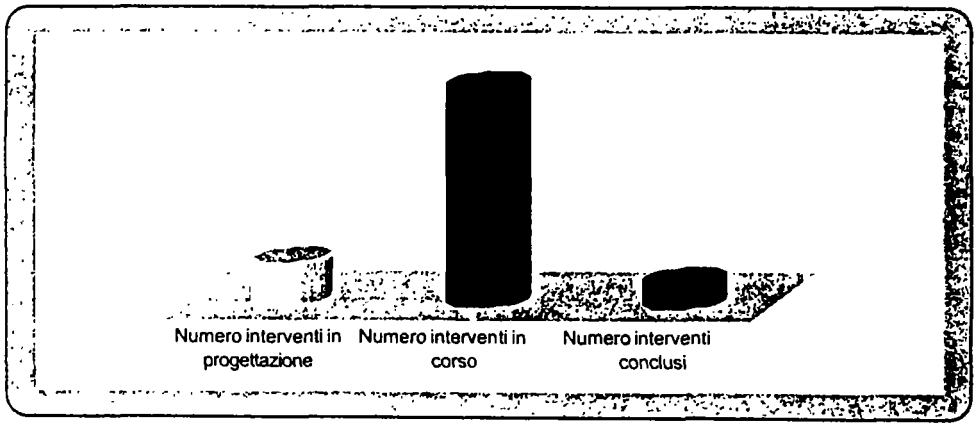


Teatri - Sale Espositive

Teatri - Sale Espositive

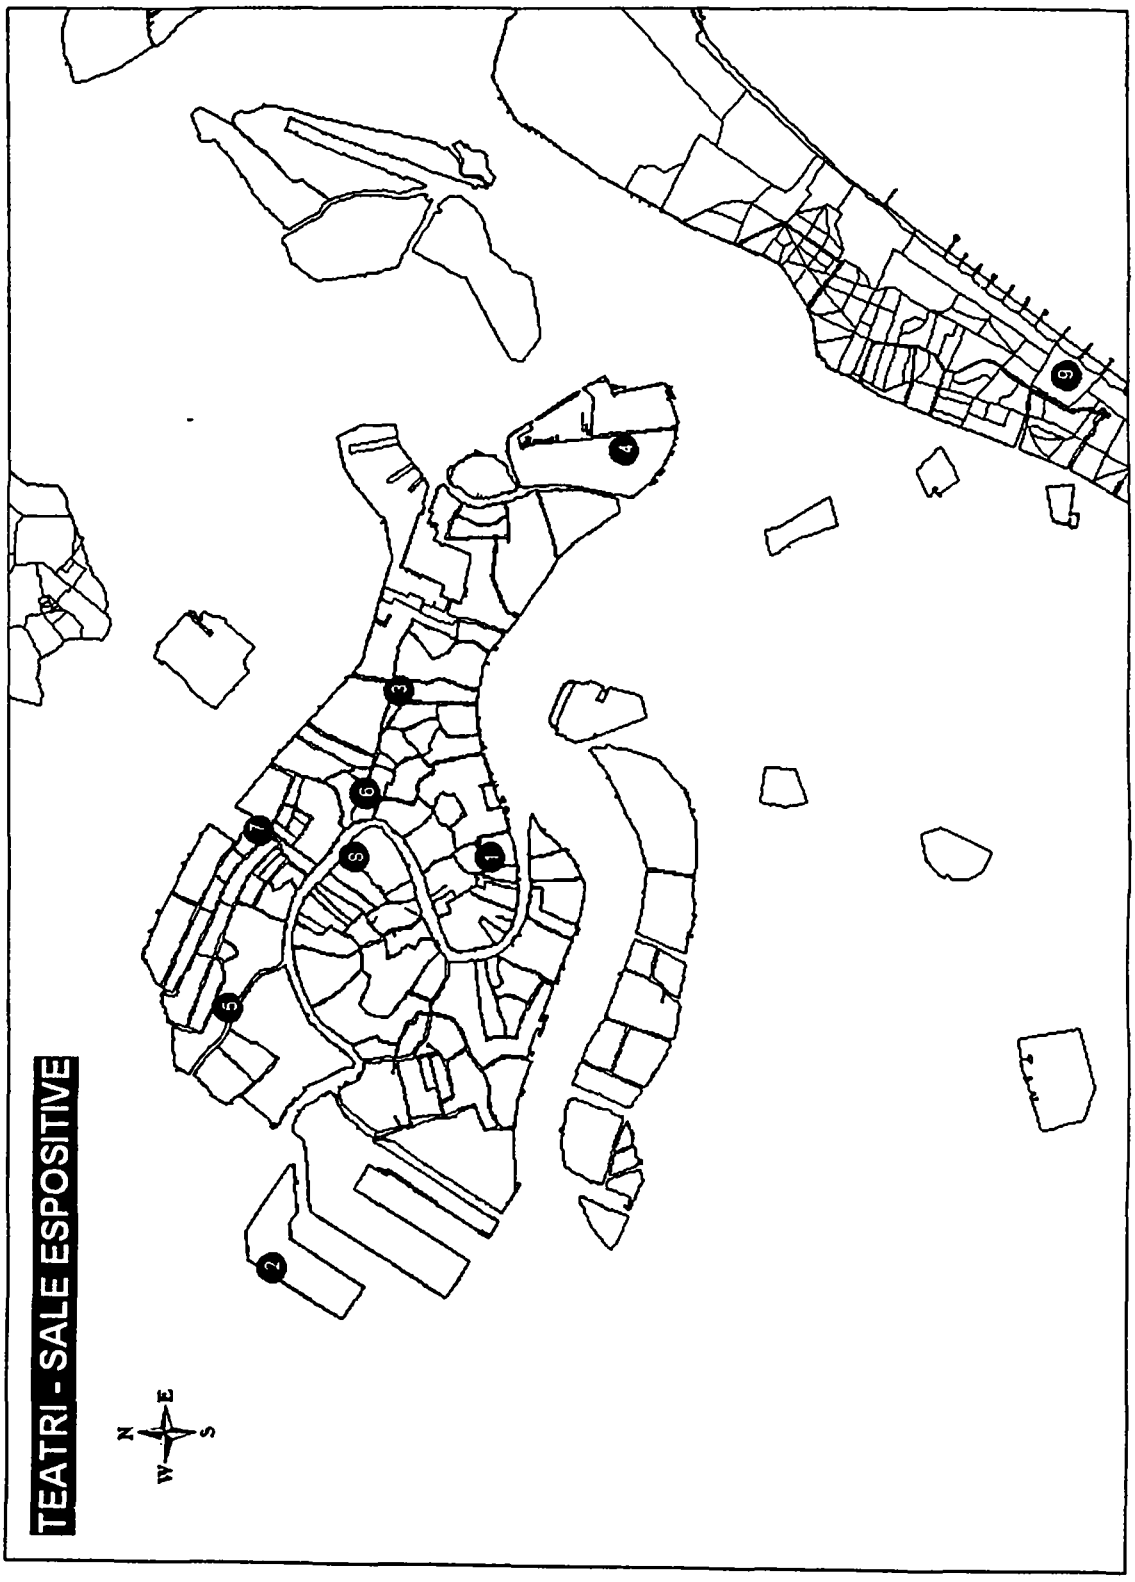

Teatri - Sale Espositive



Teatro la Fenice - San Marco 1

Intervento in corso → Previsione fine lavori ottobre 2002

3.298 milioni (legge 139/92) sono riferiti lavori eseguiti prima dell'incendio del 29 gennaio 1996. L'Amministrazione Comu ha impegnato per consentire in tempi ra l'espletamento dell'appalto concorso per ricostruzione del teatro 102.300 milioni (515/96), il cui costo totale è stimato in lir miliardi

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		105 598	105.598	105 598	2 227
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999				
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		105.598	105 598	105 598	2 227

Gestione Teatro la Fenice - San Marco

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2000

Intervento di gestione possibile in virtù d Legge 295/98

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999				
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999	4.500	4.500		
	2000	4 500			
Totale		9 000	4 500		




PalaFenice - Tronchetto 2

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1 000	1 000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		1 000	1 000		

Teatri - Sale Espositive



Chiesa San Lorenzo - Castello 3

Intervento in progettazione

Previsione fine lavori aprile 2000

Fondata nel VI secolo, diventa agli inizi del secolo la sede dei ricoverati della casa dell'industria istituita nell'omonimo ex monastero. Il Comune la acquista nel 1865 e la adibisce a deposito e magazzino. Il restauro conservativo dell'immobile l destinerà a spazio per iniziative culturali.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5 560	5 560	221	221




Padiglione Italia - Castello 4

Intervento in corso → Previsione fine lavori aprile 2000

È il più antico dei padiglioni che ospitano la Biennale Internazionale dell'Arte. Parte della struttura risale al 1840, prima dell'istituzione della manifestazione, e venne trasformata una prima volta in occasione della Esposizione internazionale (1895). Negli anni seguenti venne continuamente ampliato e trasformato per opera di noti architetti, quali Guido Binlli, Duilio Torres, ed infine da Carlo Scarpa che a più riprese intervenne sul complesso e lo modificò cosi come lo vediamo oggi

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		6 649	6 649	6.034	3 984




Teatrino Groggia - Cannaregio 5

Intervento in corso → Previsione fine lavori 1° trimestre 2000

Il teatrino, il vicino parco e la sede stessa dell'adiacente Consiglio di Quartiere, erano alla fine degli anni Ottanta in forte stato di degrado. Oggi il contesto è profondamente mutato. Il parco è diventato il fulcro dell'attività di quartiere, utilizzato dagli utenti della biblioteca e della vicina piscina. Il recupero del teatro prevede interventi strutturali (tetto, taglio delle murature), il restauro delle decorazioni del soffitto e delle capriate e la messa a norma degli impianti. Per un uso più flessibile degli spazi la capienza stata portata, dai 120 posti originale, sotto la sogli dei 100.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.480	1.480	789	558

Teatri - Sale Espositive




Teatro Malibran - Cannaregio 6

Intervento *in corso* → Previsione fine lavori *luglio 2000*

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		27 548	27 548	27 548	11 955

Realizzato nel 1678 e giudicato il migliore di Venezia, subì nel XVIII secolo una singolare trasformazione che ne rovinò la composizione architettonica interna. Ulteriori interventi si susseguirono nei secoli, ma nessuno riportò il teatro agli antichi splendori. Quando il comune lo acquistò era stato declassato alla sola funzione di sala cinematografica. Il Progetto prevede di restituire il teatro alla antica funzione, senza alterarne l'assetto attuale, e di adeguare la struttura esistente alle normative di prevenzione e sicurezza. Avrà una capienza di 1000 spettatori.




Scuola Grande Misericordia - Cannaregio 7

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		9 548	9 548	9 078	978

Sede della scuola di una Confraternita di Cantà, opera di J.Sansovino, fu ultimata nel 1583. Alla parte esterna, lasciata incompiuta, si contrappone la grandiosa sala al piano terra, divisa in tre navate e il vasto salone superiore. Sciolta la confraternita, alla fine del secolo XVIII, numerose furono le funzioni che vi si avvicendarono: magazzino militare, archivio, deposito ed infine palazzetto per la pallacanestro. Il restauro e il risanamento conservativo destinerà il complesso a Centro Multimediale per la Musica Sinfonica da Camera.




Cà Corner della Regina - Santa Croce 8

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2001

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		10 791	10 791	10 791	494

Il Palazzo con affaccio sul Canal Grande, opera monumentale di D.Rossi fu edificato alla fine del XVIII secolo. Nell'ottocento, dopo un uso ecclesiale lo acquistò il comune che lo adibì a Monte di Pietà. Dal 1975 vi ha sede l'Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia. I lavori di restauro prevedono il miglioramento dell'accessibilità e utilizzo degli spazi per i disabili, il consolidamento generale delle strutture portanti, la revisione delle coperture, e la messa a norma degli impianti.

Teatri - Sale Espositive



Palazzo del Cinema - Lido 9

Intervento concluso

Sede della Mostra del Cinema il palazzo realizzato negli anni trenta. Ampliato nel con l'aggiunta di una nuova hall, oggi l'intervento prevede la manutenzione la norma degli impianti.


	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1 782	1 782	1 782	1 662

Totale Teatri - Sale Espositive

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		168 956	168 956	161 841	22 079
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1.000	1 000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999	4 500	4 500		
	2000	4 500			
Totale		178 956	174 456	161 841	22 079

QUADRO RIASSUNTIVO STATO AVANZAMENTO INTERVENTI - Teatri - Sale Espositive


Numero interventi in progettazione	Numero interventi in corso	Numero interventi conclusi
1	8	1

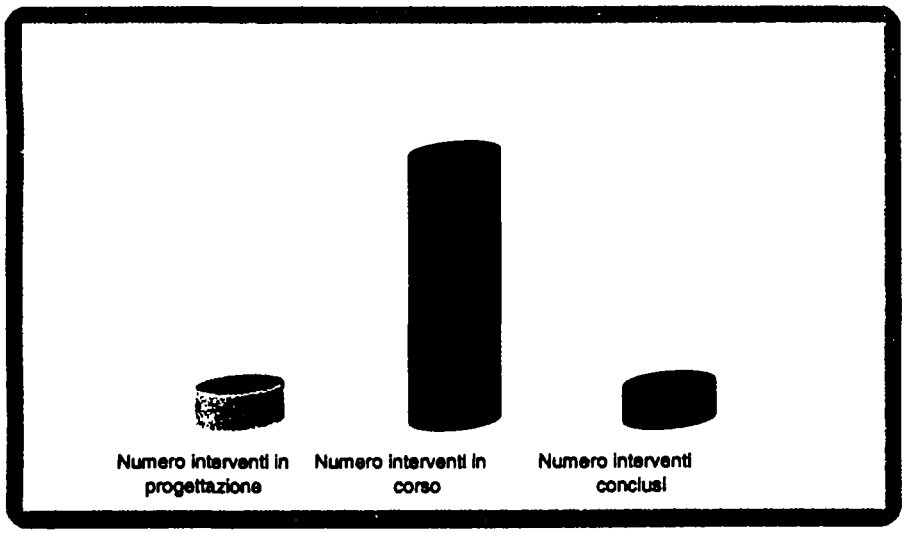


PAGINA BIANCA

Gli interventi riguardano i principali lavori di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, messa norma e manutenzione straordinaria effettuati su tutto il patrimonio di edilizia scolasrica di competenza comunale (nel centro storico e nelle isole) che consta di:

- Asili nido	5
- Materne	17
- Elementari	23
- Medie Inferiori	11
- Medie Superiori	12
Totale	70

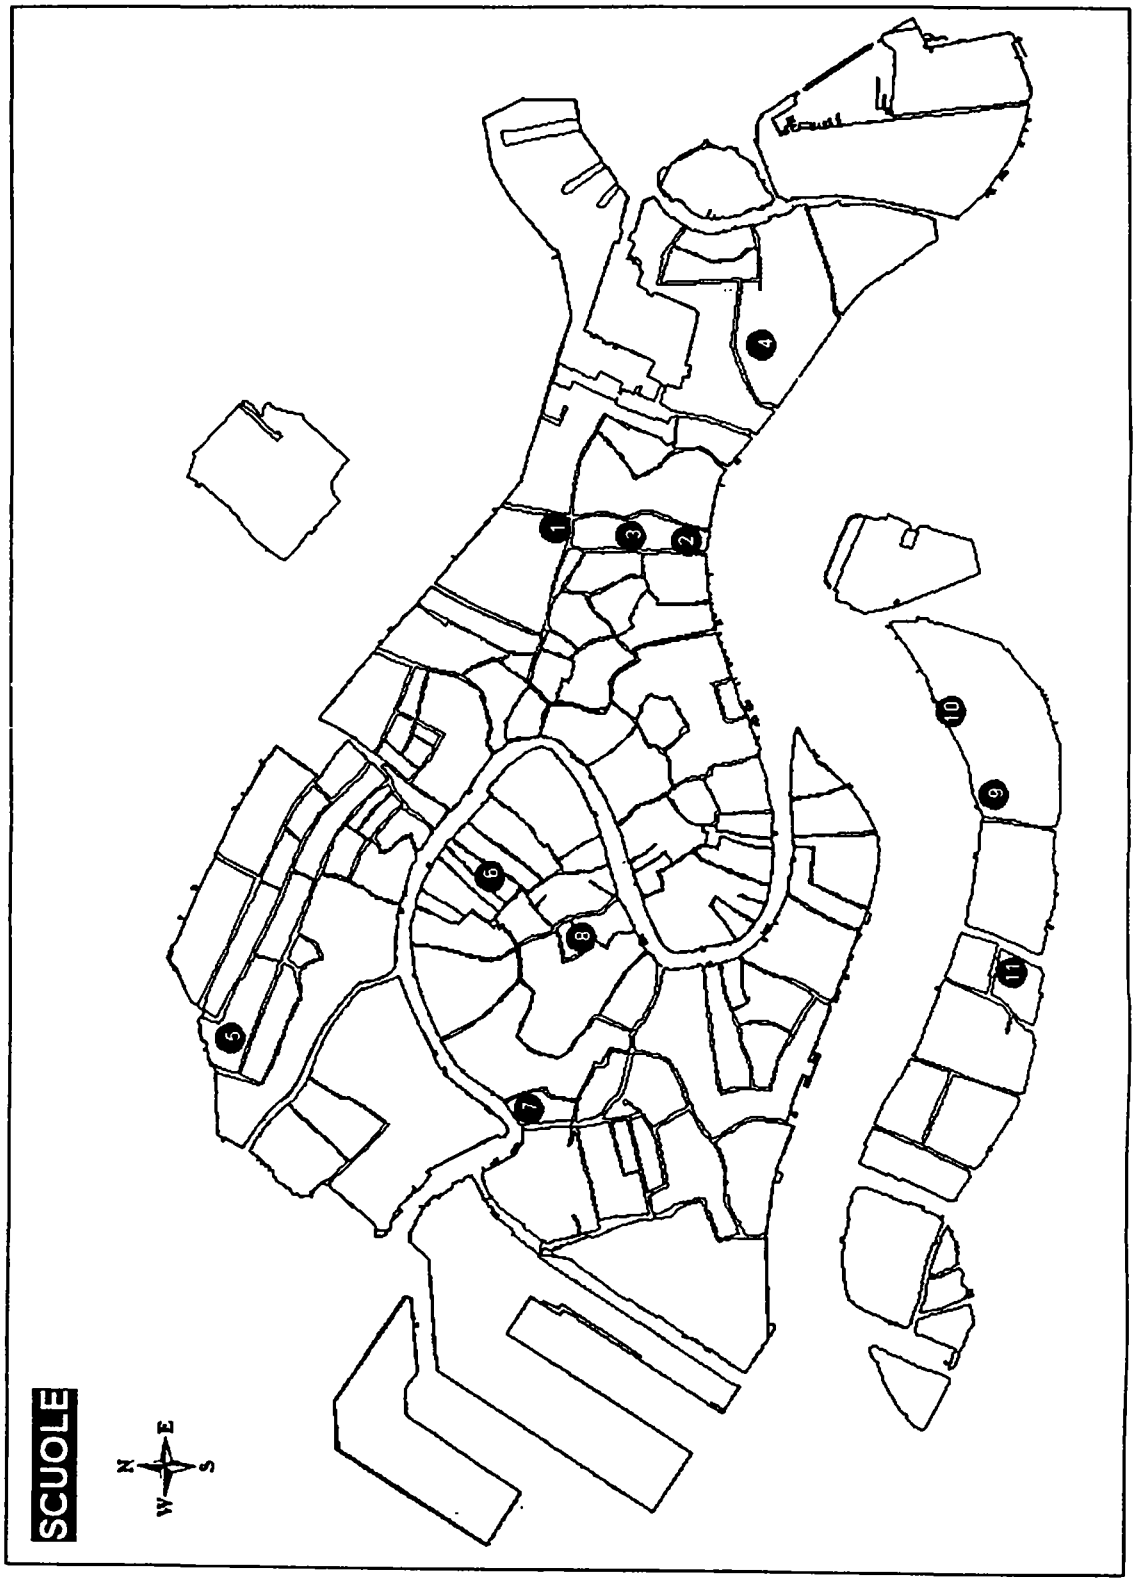
SCUOLE
N
E
S
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

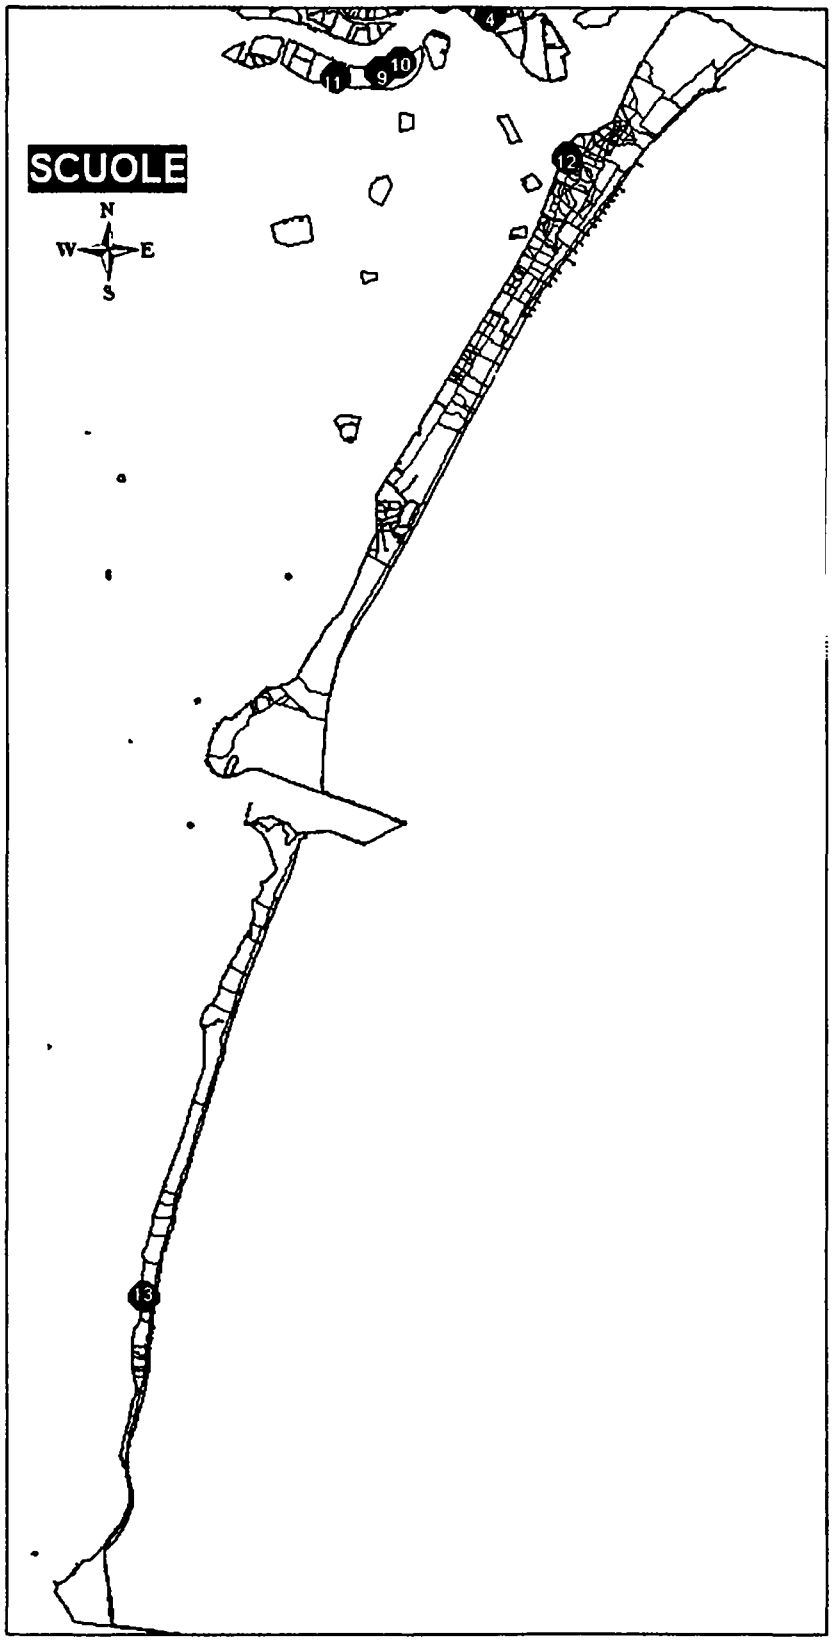
SCUOLE
N
W
E
S
4
10
9
11
12
13



Convento S.Giovanni Laterano - Ist. Turistico A.Barbarigo - Castello 1

Intervento concluso

Istituito nel 1504 fu più volte rimaneggiato e nel 1731 ampliato da A.Tirali, cui si deve anche l'elegante chiostro centrale con vera da pozzo ottagonale e balaustri. Soppresso il convento nel 1806 fu prima utilizzato come caserma, poi archivio, ed infine come sede di vari istituti scolastici sia di livello inferiore che superiore. Il complesso dopo gli importanti lavori di consolidamento statico, restauro e ripristino, sarà dotato di moderne strutture per la didattica e per i corsi di ristorazione e ospiterà l'Istituto Alberghiero (350 studenti)

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		11 727	11 727	11 727	9 297




Palazzo Barbarigo - Castello 2

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2000

Intervento manutentivo e messa a norma degli impianti su edificio di valore storico monumentale (legge 1089/39)

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2 251	1 581	1 011	287



Scuola Elementare A.Diaz - Castello 3

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2000

Adeguamenti tecnico funzionali e messa a norma degli impianti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1 723	1 723	1 723	714



Gozzi -Tommaseo - Castello 4

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2001

Adeguamenti tecnico funzionali e messa a norma degli impianti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999				
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999	2.819	2.819		
	2000				
Totale		2 819	2 819		



Istituto d'arte San Girolamo - Cannaregio 5

Intervento in progettazione

Previsione fine lavori dicembre 2001

Adeguamenti tecnico funzionali e messa a norma degli impianti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2 262	2 262	2.111	509



Palazzo Priuli - Scuola Media F.Morosini - S.Croce 6

Intervento in progettazione

Previsione fine lavori giugno 2001

Palazzo della fine del XVI secolo, pare sul disegno di J.Sansovino.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999				
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999	1.273	1.273		
	2000				
Totale		1 273	1 273		



Papadopoli - Asilo Nido - S.Croce 7

Intervento in progettazione

Previsione fine lavori 1° trimestre 2001

Edificio dei primi del secolo
L'intervento prevede la messa a norma degli impianti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	2.200	2.200		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		2.200	2.200		



Scuola Elementare Michiel - Dorsoduro 8

Intervento in progettazione

Previsione fine lavori dicembre 2000

Adeguamenti tecnico funzionali e messa a norma degli impianti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.563	1.563	1.563	190



Asilo Nido Gabbiano - Giudecca 9

Intervento in progettazione

Previsione fine lavori giugno 2001

Adeguamenti tecnico funzionali e messa a norma degli impianti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999				
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999	634	634		
	2000				
Totale		634	634		




Scuola Materna S.Francesco - Giudecca 10

Intervento in progettazione

Previsione fine lavori giugno 2001

Adeguamenti tecnico funzionali e messa a norma degli impianti

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999				
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999	1.174	1.174		
	2000				
Totale		1.174	1.174		



Scuola Elementare Duca D'Aosta - Giudecca 11

Intervento in progettazione

Previsione fine lavori dicembre 2001

Adeguamenti tecnico funzionali e messa a norma degli impianti

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999				
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999	2.350	2.350		
	2000	2.550	2.550		
Totale		4.900	4.900		



Scuola Pisani/Orseolo - Lido 12

Intervento in corso →

Previsione fine lavori giugno 2000

Ristrutturazione generale dell'edificio per la messa in sicurezza sia per quanto riguarda la parte statica che le vie di esodo con il ricavo di una nuova scala di sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Tali lavori comprendono tra l'altro l'installazione dell'ascensore e relative rampe di accesso

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5.052	5.052	5.052	42

Scuola Media Loredan - Pellestrina 13

Intervento concluso

Realizzazione di un nuovo complesso scolastico come sede della scuola media dell'isola, in sostituzione del vecchio che sorgeva nella stessa area. La struttura, che comprende 15 aule normali, 6 speciali, aule insegnati, uffici, un ambulatorio, un auditorium, una biblioteca, una mensa, grazie alla organizzazione degli spazi, potra diventare un centro di aggregazione sociale aperto all'esterno

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		3 016	3 016	3 016	2 703

Manutenzione straordinaria e diffusa e messa a norma

Intervento in corso → Previsione fine lavori fine 2000


Manutenzione e messa a norma degli impianti su tutto il patrimonio di edilizia scolastica comunale Diquesti 1.250 sono destinati al restauro del nuovo Asilo Nido ex scuola Tiepolo a Castello

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		26 534	26 534	24 934	14 926
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	850	850		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000	1 450	400		
Totale		28 834	27 784	24 934	14 926

TotaleScuola


	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		54 128	53 458	51 137	28 668
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	3 050	3.050		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999	8 250	8 250		
	2000	4.000	2.950		
Totale		69 428	67 708	51 137	28 668


Numero interventi in progettazione	Numero interventi in corso	Numero interventi conclusi
7	5	2

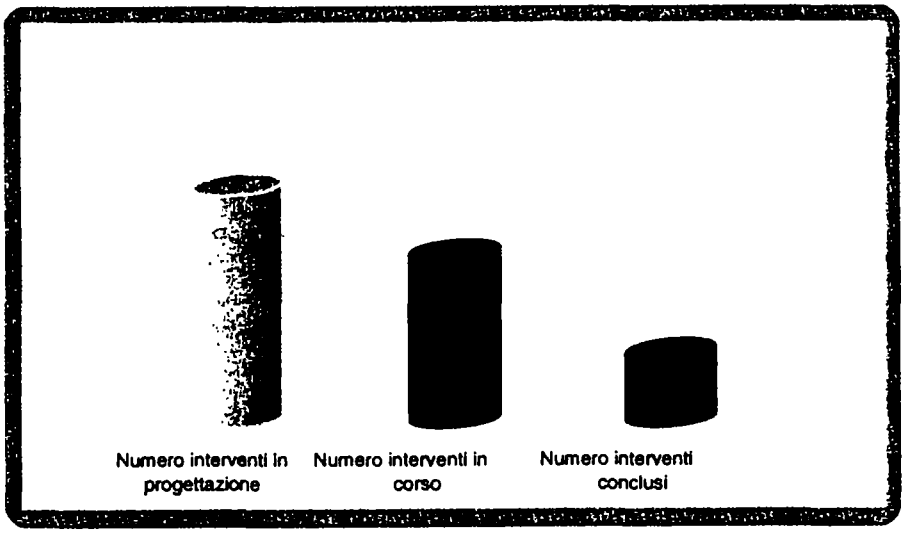


PAGINA BIANCA

SPORT

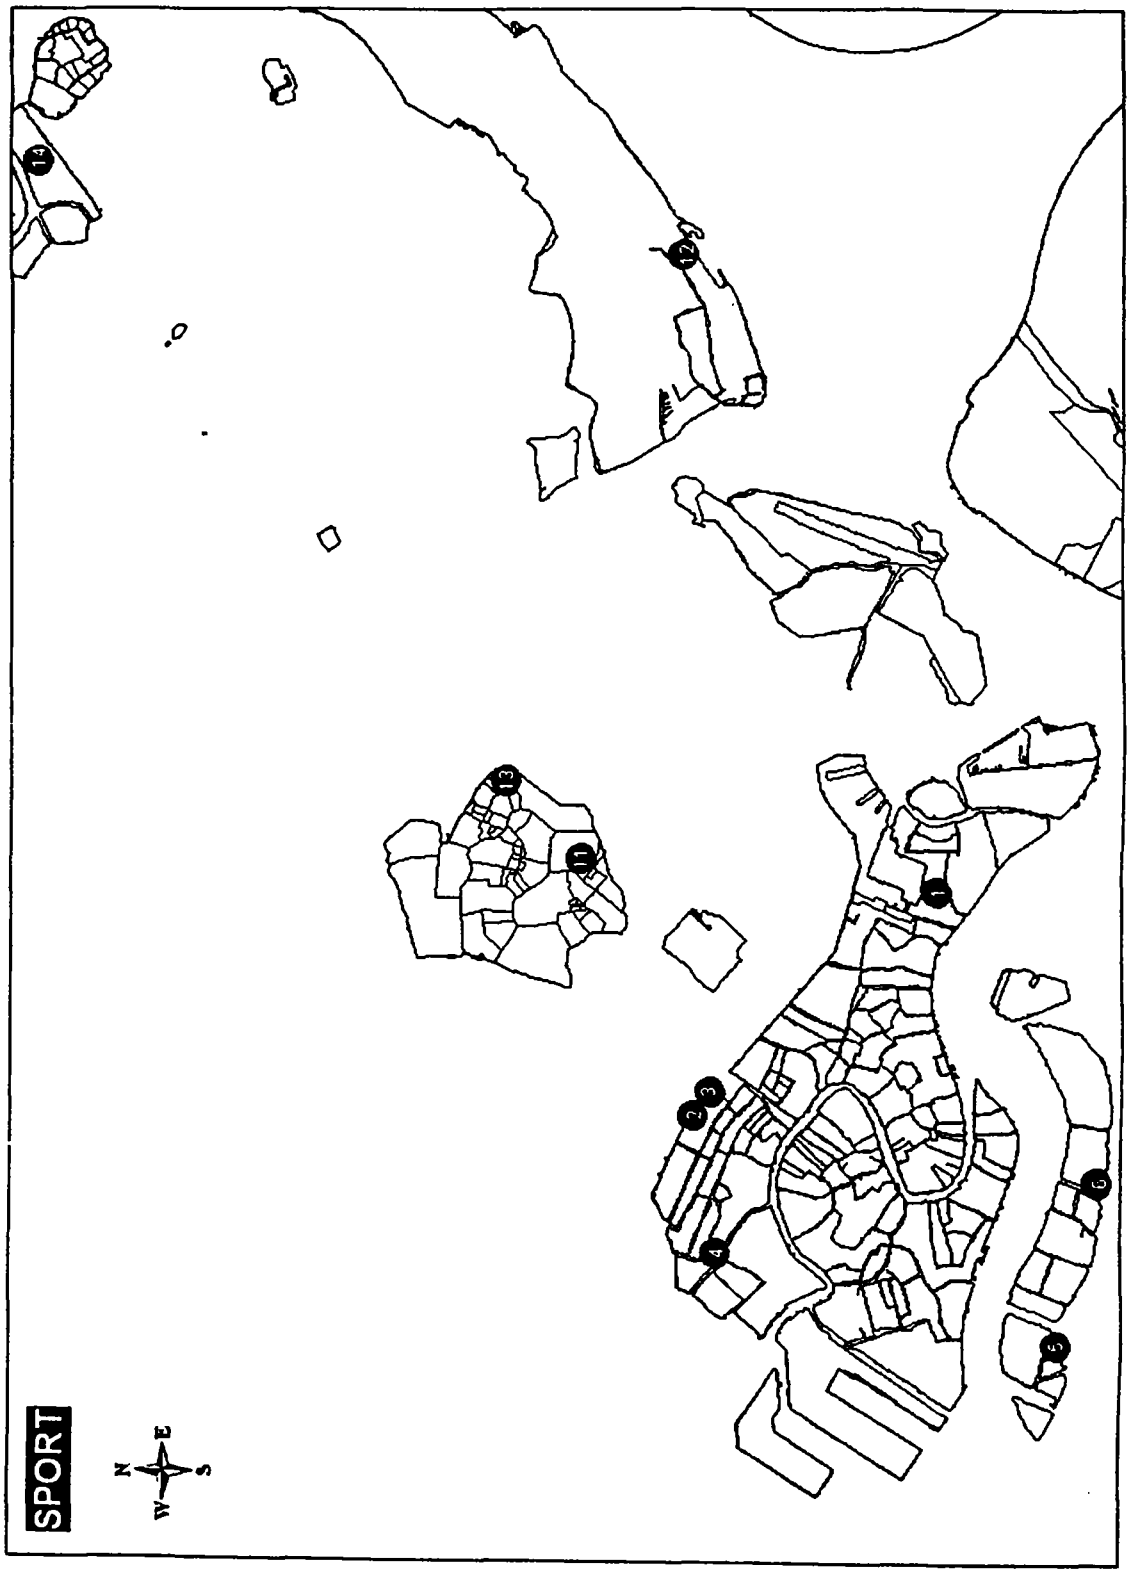
SPORT
N
E
S
W

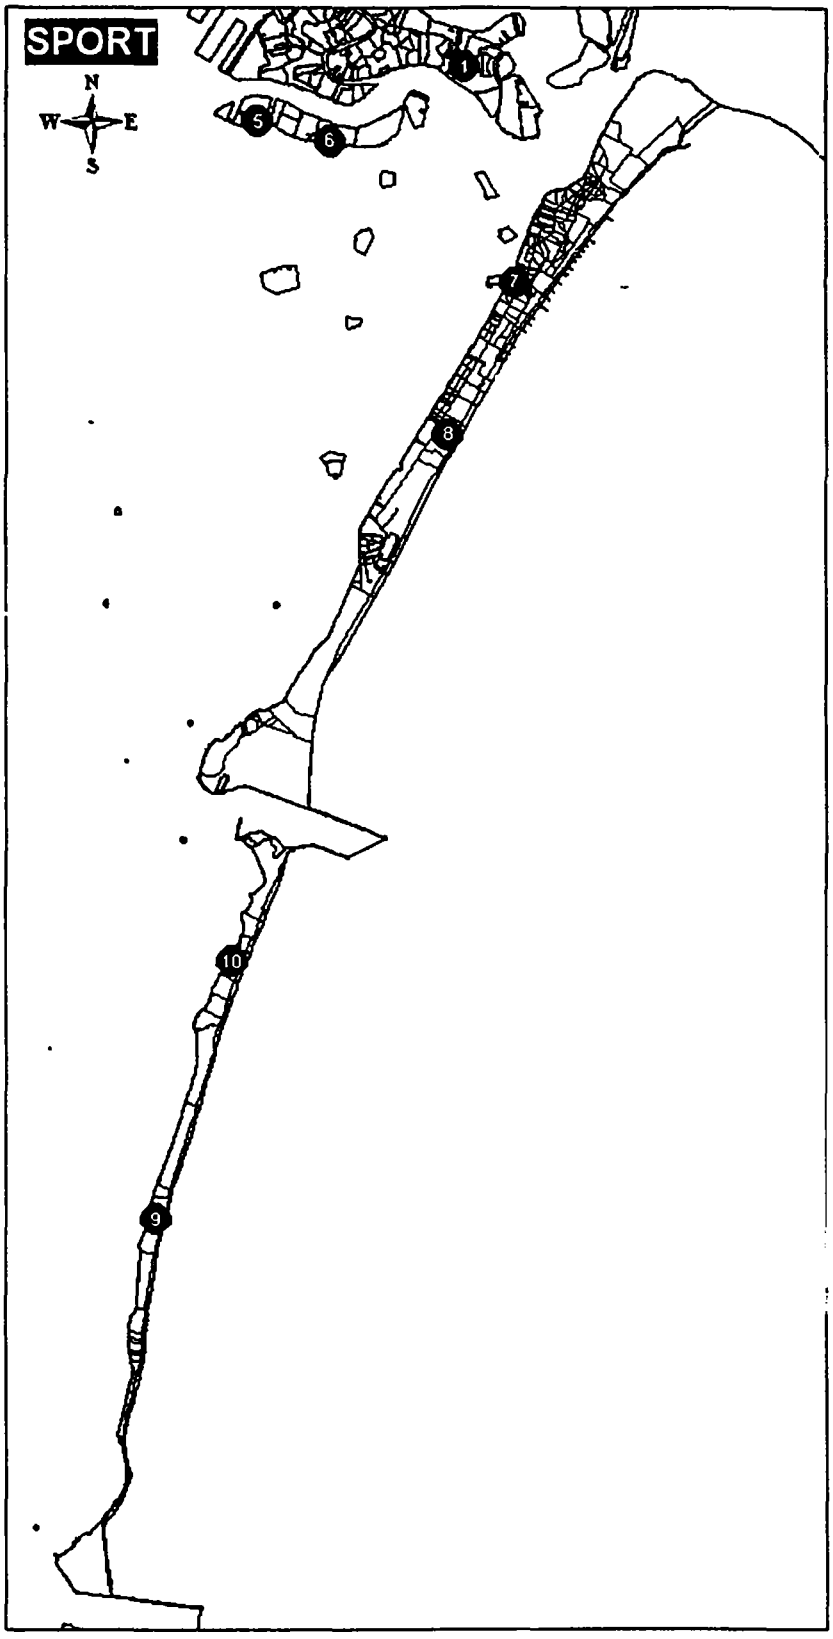
SPORT
N
W
E
S
1
5
6
7
8
10
9



Palasport G.B.Gianquinto - Castello 1

Intervento concluso

Il progetto prevede la messa a norma degli impianti del palazzetto di E.Capuzzo e G.Cocco (sorto su un'area già occupata da ottocentesche attrezzature di servizio all'arsenale).

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		850	850	800	605




Centro Sportivo Sant'Alvise - Cannaregio 2

Intervento concluso

L'intervento prevede il recupero dei sei capannoni dell'ex CIGA, realizzati nella seconda metà dell'Ottocento, su una vasta area (4 241 mq) che si affaccia sulla laguna nord. Il recupero del complesso, nel rispetto delle strutture storiche, permetterà la realizzazione di. un nucleo per le attività natatorie costituito da due piscine di (da 25 m. e da 6X10 m. per i bambini); un campo per la pallacanestro con 268 posti a sedere; tre palestre attrezzate (minibasket, scherma, parete per arrampicata, bocciodromo, ginnastica); infine un campo per la pallacanestro scoperto

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		12 896	12.896	12.767	11 288
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1.100	1.100		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		13 996	13 996	12 767	11 288



Remiere - Sant'Alvise - Cannaregio 3

Intervento in corso → Previsione fine lavori 1° semestre 2000

Realizzazione di un capannone per il ricovero delle imbarcazioni delle Associazioni Remiere.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		3 400	3 400	3 400	1.289




Centro sportivo Opera Pia Coletti - Cannaregio 4

Intervento in corso → Previsione fine lavori 2° semestre 2000

La ristrutturazione del vecchio impianto sportivo, concesso in gestione al Consiglio di Quartiere, doterà il quartiere di un campo da calcetto e un grande spazio chiuso che diventerà sala polivalente.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.500	1 500	1 500	449
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	32	32		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		1 532	1 532	1 500	449



Complesso Sportivo Sacca San Biagio - Giudecca 5

Intervento in corso → Previsione fine lavori giugno 2000

La sacca S.Biagio (interamente proprietà del Comune) è un complesso di tre isole di recente formazione poste nell'estremità ovest dell'isola della Giudecca. Nell'isola centrale è in funzione dal 1985 la piscina comunale coperta. Il progetto prevede l'inserimento di nuovi impianti sportivi nell'isola centrale: un centro per il tennis, un bocciodromo coperto, una vasta area verde. Nell'isola di levante in stato di totale degrado è previsto l'insediamento di attrezzature sportive legate agli sport d'acqua e al tempo libero (pontili, strutture per il ricovero delle barche, etc.).

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		7 919	7 919	7 873	2 939



Remiere ex CNOMV - Giudecca 6

Intervento concluso

Restauro e risanamento di manufatti da destinare a ricovero e rimessaggio barche. I capannoni fanno parte del complesso degli ex Cantieri Navali e Officine Meccaniche Veneziane di proprietà comunale. Il progetto prevede la demolizione degli edifici impropri addossati alla struttura originale, la ottimizzazione della capacità ricettiva dei contenitori mediante sistemi di meccanizzazione della movimentazione dei natanti, riorganizzazione degli spazi liberi per attività integrative, servizi a queste attività connessi.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2.990	2 990	2 990	1.953




Pattinodromo Quattro Fontane - Lido 7

Intervento concluso

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2 693	2 693	2 693	1 551

Costruito nel '62 è composto da due piste per il pattinaggio, dall'edificio adibito a servizi e spogliatoi e da una tribuna per il pubblico. Il progetto al fine di superare le attuali carenze strutturali e funzionali, prevede: la demolizione delle piste e la realizzazione al loro posto un anello di 175 metri con all'interno un campo polivalente per il pattinaggio artistico e per l'hockey (sede sociale dell'Hockey Club di Venezia); la sistemazione degli spogliatoi e servizi; il completamento della tribune (650 posti); la costruzione della rete fognana e degli altri impianti (termico, elettrico,



Nuova Piscina - Lido 8

Intervento in corso → Previsione fine lavori 1° trimestre 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		9.894	9 894	9 894	8 773

Realizzazione di un nuovo impianto natatorio con una vasca da 25 m. (sei corsie). L'impianto sarà dotato di due tribune laterali che potranno ospitare trecento spettatori. È prevista inoltre una palestra di 14x10 m. dotata di servizi e spogliatoi autonomi La struttura è completata dai locali per la sauna, i servizi per il ristoro, il pronto soccorso e gli impianti tecnologici. La costruzione è predisposta per un futuro ampliamento con altri impianti sportivi Il bacino di utenza è stato calcolato in 50.000 persone.




Centro Sportivo - Pellestrina 9

Intervento concluso

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.172	1.172	1 160	1.050

Il progetto prevede il restauro delle strutture esistenti, rifacimento del manto del campo da calcio, sistemazione del campo di allenamento e delle aree a verde, adeguamento degli impianti, e il completamento dell'impianto con una pista polivalente, un campo per la pallacanestro e la pallavolo, due campi da bocce, e con locali per il pronto soccorso.

Centro polisportivo - San Pietro In Volta 10



Intervento in progettazione

Previsione fine lavori giugno 2001

L'intervento mira alla risistemazione dell'impianto esistente. Il progetto prevede: il rifacimento del campo da calcio con due nuove tribune di cui una coperta inserita nel nuovo palazzetto (800 posti ca.); la realizzazione di due campi da tennis con fondo sintetico (gli unici sull'isola) ed illuminazione notturna e un campo da calcetto anch'esso sintetico; la costruzione di un palazzetto per il basket, pallamano, calcetto, pallavolo (600 ca. posti a sedere). Quest'ultima struttura comprenderà gli spazi ed i servizi di supporto alle attività sportive praticate sia all'aperto che al coperto

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5.000	5.000	190	105
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1.500	1.500		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		6.500	6.500	190	105

Centro Sportivo San Mattia - Murano 11



Intervento concluso

L'impianto, attivo e notevolmente frequentato, è fortemente degradato e non a norma con le recenti disposizioni nel campo della sicurezza e dell'igiene. La risistemazione prevede una serie di interventi volti alla riorganizzazione spaziale, alla sistemazione dei due campi da calcio e della pista di atletica, al recupero degli spogliatoi e dei servizi sottotribuna, all'adeguamento degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento della accessibilità attraverso la realizzazione di un ponte e una nuova strada.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2.826	2.826	2.820	2.703

Remiere - Sant'Erasmo 12




Intervento in progettazione

Previsione fine lavori dicembre 2000

Realizzazione di un nuova fabbricato da destinare a ricovero imbarcazioni per lo sviluppo di attività remiere.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.793	330	300	80



Palestra L. Perziano - Murano 13

Intervento concluso

L'intervento prevede l'adeguamento normativo di prevenzione incendi e sicurezza per l'esercizio degli impianti sportivi.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.420	1 420	1 379	1 334



Nuova Palestra - Mazzorbo 14

Intervento concluso

Il progetto prevede la ristrutturazione del campo da calcio esistente palestra (300 posti) e la realizzazione a suo lato di una nuova palestra (300 posti) per il basket, e pallavolo omologata per le partite ufficiali, un campo da tennis e i servizi a queste attrezzature connessi (quattro spogliatoi, una sala riunioni, bar e serviz).

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		6 057	6 057	6.057	5 472

Manutenzione straordinaria e diffusa


Intervento in corso → Previsione fine lavori fine 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		9.297	8.917	7 710	5 794
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	968	968		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		10 265	9.885	7 710	5 794


Totale Sport


	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		69 707	67.864	61 533	45 385
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	3.600	3.600		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		73 307	71.464	61.533	45 385


Numero interventi in progettazione	Numero interventi in corso	Numero interventi conclusi
2	5	8

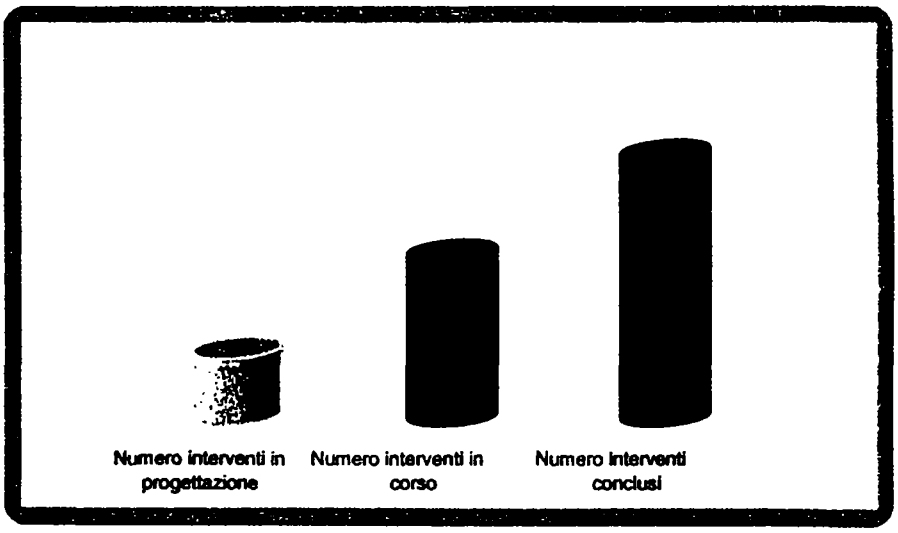

Immobili di interesse pubblico adibiti ad usi vari

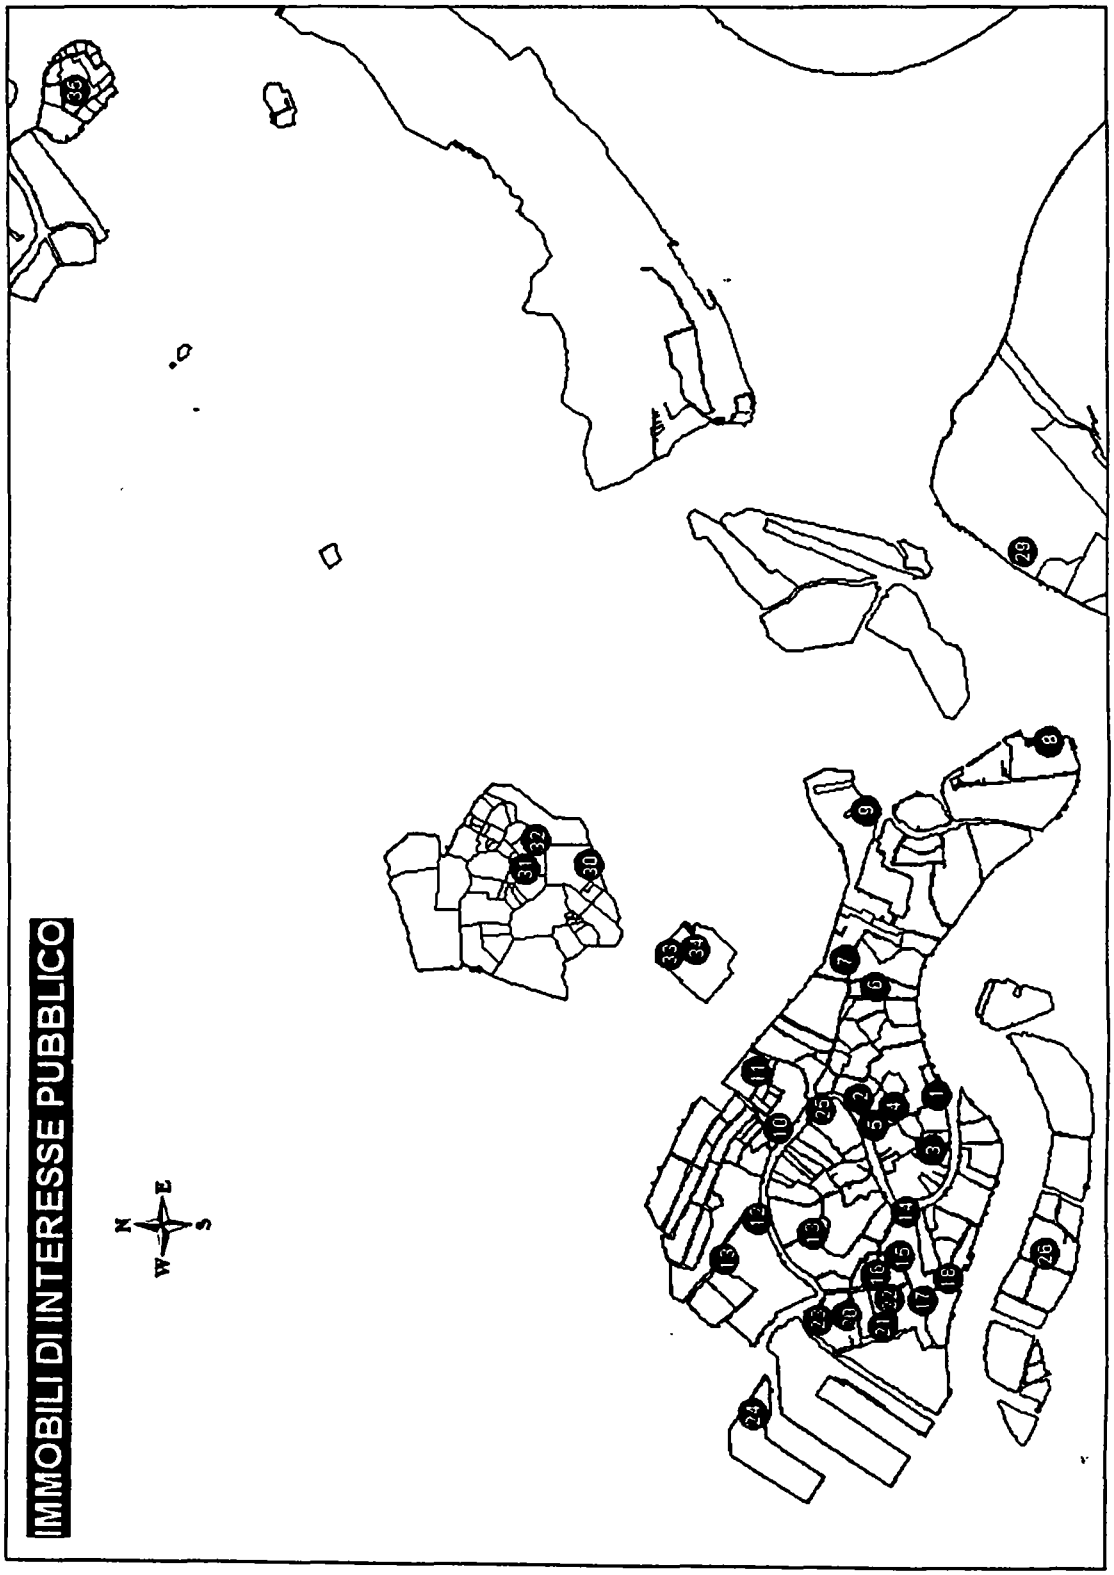
IMMOBILI DI INTERESSE PUBBLICO
N
E
S
W

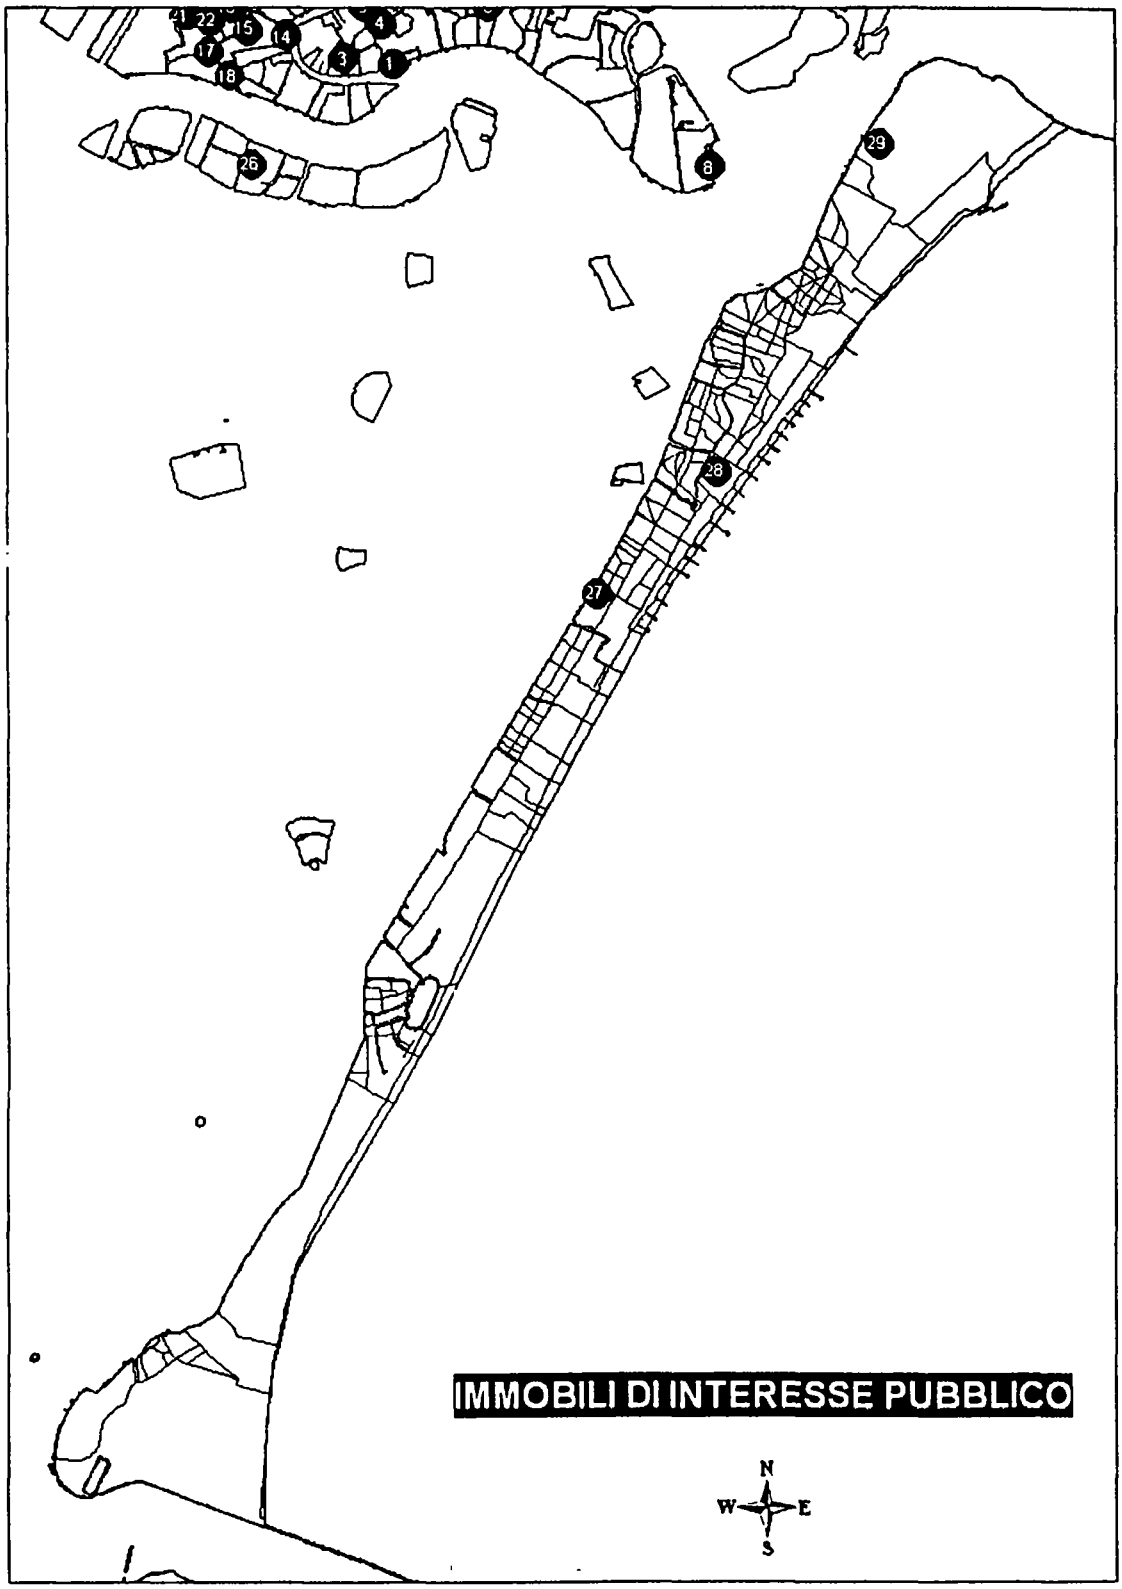
21
22
15
14
4
17
3
1
18
26
8
29
28
27
IMMOBILI DI INTERESSE PUBBLICO
N
W
E
S



Cà Giustinian - San Marco 1

Intervento in corso → Previsione fine lavori 1° semestre 2001

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		12 332	5.012	4 498	4 259

L'edificio è composto da due palazzi distinti, Giustinian e Badoer-Tiepolo. Il primo di origine tardo gotica, con affaccio sul Canal Grande nel 1500 fu annesso al retrostante palazzo come corpo unico grazie all'adeguamento interno delle murature e dei solai. Dopo numerose modifiche (E.Mozzi, 1937) e cambi di destinazione (albergo, Casinò di Venezia), nel secondo dopoguerra l'immobile diverne sede di uffici comunali. Il progetto prevede il restauro edilizio, statico, impiantistico e il ripristino della Sala delle Colonne che potrà riacquistare la funzione di spazio per convegni e manifestazioni.



Cà Loredan e Cà Farsetti - San Marco 2

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2001

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		17.536	17.520	7 792	4.936

Fondati nel secolo XII, i due palazzi, composti da due corpi ben distinti, si affacciano sul Canal Grande a pochi passi da Rialto. Abitazioni di importanti famiglie prima, adibiti ad albergo poi, nell'Ottocento divennero sede degli uffici del Municipio di Venezia, nel 1867 il primo, nel 1826 il secondo. Oggi i due palazzi, sede centrale degli uffici Comunali, sono interessati da una serie di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e di adeguamento delle norme vigenti.



Palazzo Zaguri - San Marco 3

Intervento in progettazione → Previsione fine lavori dicembre 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		121	121	115	47
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	6.500	6.500		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		6 621	6.621	115	47

Costruzione gotica della fine del XIV secolo, rimaneggiata nel '500, con due prospetti a due piani di elegantissime bifore. Attualmente qui vi ha sede il Centro Documentazione della Pubblica Istruzione. Gli interventi previsti, riguardano il restauro conservativo e la messa a norma degli impianti.



Immobile Campo Manin - San Marco 4

Intervento in progettazione

Previsione fine lavori settembre 2001

Acquisto e ristrutturazione di un immobile da destinare ad uso uffici.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		26.860	26 860	26.860	15.220



Casa Corner - San Marco 5

Intervento concluso

Acquisto immobili destinati ad uso uffici.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		6.034	6 034	6.034	6.034




Palazzo Zorzi - Castello 6

Intervento in corso →

Previsione fine lavori 2° semestre 2000

Il palazzo realizzato su preesistenti case agli inizi del 1500 (opera attribuita a M.Condussi) fu uno dei primi ad essere rivestito in pietra d'istria. Il palazzo in grave stato di degrado verrà restaurato e a seguito di una convenzione tra il Comune e l'UNESCO, verrà destinato a sede degli uffici del ROSTE (Regional Office Science Techonology Europe).

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2 600	2.600	2.600	2.000



Palazzo Gradenigo - Castello 7

Intervento concluso

Costruito nel secolo XVII, conserva all'interno stucchi e decorazioni sette-ottocentesche. L'intervento mira al recupero integrale di tutti gli elementi di interesse storico e artistico eliminando le intrusioni di epoche più recenti e alla predisposizione del palazzo per la nuova funzione: sede del Centro di calcolo e elaborazione dati e sede della Venis Spa (Venezia Informatica e Sistemi, partner tecnologico del Comune). A tal fine è stato interamente cablato e dotato di impiantistica altamente sofisticata che ha permesso di preservare la planimetria originale.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5.318	5.318	5.318	4 978



Convento Sant'Elena - Castello 8

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2001

Fondato nel 1175 il complesso ha da tempo perso l'ambiente originario in cui era inserito Del convento rimangono due corpi del chiostro (seconda metà del XV secolo) e la vera da pozzo settecentesca. Il recupero mira ad affiancare le funzioni parrocchiali e conventuali con attività a queste compatibili quali la ricerca e lo studio L'intervento, a carico del comune, riguarda un'ala del chiostro, destinata a sede della Fondazione "Venezia per la ricerca della pace". La ristrutturazione adibirà i nuovo spazi a sale conferenze, a esposizione, a sala riunioni e studio. Disporrà inoltre di tre camere per forestena

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		12.783	12.783	12.626	3 045
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	581	581		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		13 364	13.364	12 626	3 045




Cantiere ACTV - Castello 9

Intervento in progettazione

Previsione fine lavori dicembre 2002

Intervento di ristrutturazione di un capannone.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5 400	5 400	5 400	86




Cà Vendramin Calergi - Cannaregio 10

Intervento in corso → Previsione fine lavori 1° semestre 2000

Palazzo rinascimentale di M.Colussi con importante facciata sul Canal Grande rivestita di marmo con intarsi policromi. Sul lato si sviluppa il giardino con ala seicentesca. Attualmente è sede invernale del Casinò Municipale. L'intervento prevede la ristrutturazione e la messa a norma degli impianti elettrici e di trattamento dell'aria.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		10.174	9.980	9 047	3 354
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	600	600		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		10.774	10 580	9 047	3 354



Ex Convento dei Crociferi - Cannaregio 11

Intervento concluso

Il vasto complesso fondato dai Crociferi nel XII secolo e ricostruito nel XVI con l'attigua chiesa, passò ai Gesuiti nel 1657. Con la soppressione dell'ordine il complesso fu adibito ad usi profani prima scuola e del 1807 caserma). Oggi il convento è di proprietà comunale Il restauro conservativo, eseguito solo in parte, mira al recupero dei volumi interni che furono alterati dall'uso militare.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		6 159	6 159	6 159	5 213



Palazzo Manfrin Venier - Cannaregio 12

Intervento in corso → Previsione fine lavori gennaio 2000

Costruito da A.Tirali nel 1735 si affaccia sul Canale di Cannaregio con un prospetto in pietra bianca privo di sovrastrutture decorative. Posteriormente si sviluppa un ampio giardino un tempo famoso per le essenze e piante rare. È sottoposto a restauro conservativo e messa a norma degli impianti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		3 566	3.566	3.566	611




Palazzo Bonfadini - Cannaregio 13

Intervento concluso

Palazzo settecentesco con affaccio sul canale di cannaregio. Il comune ha acquistato il complesso nel 1993 per destinarlo a sede degli uffici amministrativi dell'Azienda Multiservizi Aambientali Veneziana (AMAV) La cifra è nfenta all'acquisto.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2 384	2.384	2 384	2 374



Cà Foscari Sede Università - Dorsoduro 14

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2000

Imponente edifico realizzato a partire dal 1452 come residenza personale rappresentativa del Doge. La facciata, sul Canal Grande, e la composizione del palazzo è una delle più significative creazioni architettonico-urbanistiche del più maturo gotico veneziano. Oggi il palazzo, sede della Università di Ca' Foscari, viene investito da un complesso restauro conservativo e manutentivo per risolvere i gravi problemi statici delle facciate prospicienti i canali

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5.000	5.000	5 000	1 218
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	4.000	4.000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		9 000	9 000	5 000	1.218



Immobile Santa Margherita - Dorsoduro 15

Intervento in corso → Previsione fine lavori 1° semestre 2000

Edificio isolato, che si erge al centro del Campo S.Margherita, ex Scuola dei Varoteri (pellicciai) un tempo prospiciente al Rio Ca' Canal interrato nel 1863. Fu edificata nel 1725 riproducendo fedelmente la più antica sede di cannaregio. L'interno modificato per ospitare un piccolo cinematografo, negli anni Settanta divenne la sede della Democrazia Cristiana. Acquistato dal Comune nel 1997 per adibirlo a uffici. La cifra è nfenta all'acquisto.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1 744	1.044	1 044	1.044



Spazio polivante Rio Novo - Dorsoduro 16

Intervento concluso

Tale complesso edilizio è costituito da corpi di fabbrica che, seppur fatiscenti, sono ancor oggi chiaramente individuabili nella loro consistenza fisico-volumetrica e morfologica. Si tratta di edifici costruiti in periodo novecentesco, in aree precedentemente libere, con funzioni di deposito e lavorazione di materiali edili, dislocati attorno ad un'area verde. Vengono ricavati servizi comunali ad uso quartierale.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.250	1.250	1.140	1.083



Palazzo Minotto - Dorsoduro 17

Intervento concluso

Restauro, eseguito solo in parte, di un edificio cinquecentesco in grave stato di degrado.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2.590	2.590	2.590	2.025



Convento delle Terese - Dorsoduro 18

Intervento in corso → Previsione fine lavori giugno 2000

Il complesso conventuale di S.Teresa della fine del XVII secolo, si sviluppa intorno al un grande chiostro ad arcate che include la semplice facciata della chiesa. Dopo essere stato adibito ad orfanotrofio, nel 1925 fu in buona parte destinato dal comune a ricovero degli sfrattati e dei senzatetto. Alcuni degli alloggi sono stati liberati solo in anni recentissimi. Oggi il complesso versa in pesanti condizioni di degrado e di dissesto con gravi *alterazioni del distributivo* a seguito all'incongruo utilizzo. L'intervento prevede il recupero delle strutture originali e il restauro e risanamento conservativo del convento che varrà destinato a sede universitaria (IUAV).

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		23.643	23.643	23.643	10.996



Palazzo Cappello - S.Croce 19

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2001

Costruzione del tardo '500 o dei primi del '600 il cui androne di apre sul vasto giardino. Terminato il restauro conservativo, in vista di un apposito Accordo tra Stato e Comune, verrà destinato a sede degli uffici amministrativi della Direzione della sovrintendenza.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	6.000	8.000		
Legge 3 agosto 1998 n 295	1999				
	2000				
Totale		6 000	6 000		



Cittadella della Giustizia - Santa Croce 20

Intervento in progettazione — Previsione fine lavori dicembre 2002

Esteso complesso sorto intorno al 1786, su un'area ancora libera, tra i più antichi insediamenti industriali di Venezia, nonostante le modifiche subite, conserva ancora l'esenziale struttura originaria estremamente funzionale sviluppata attorno ad un cortile interno. L'intervento prevede il progetto e l'adattamento della struttura per la sede dei nuovi uffici giudiziari. L'importo si riferisce ai soli costi di progettzione

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		3 827	3.827	3 827	25



Sede ASPIV - Santa Croce 21

Intervento concluso

Costruzione degli anni Trenta insenta nell'area che ospita gli impianti dell'Acquedotto. L'immobile in parte non ublizzato in parte destinato a magazzino, verrà interessato da tavori che modificheranno la struttura distnbutiva interna, da lavori di restauro della struttura murana esterna e di nfacimento delle coperture. E' sede degli uffici amministrativi dell'ASPIV.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		4 500	4 000	4 000	4 000




Rio Terrà dei Pensieri - Decentramento - Santa Croce 22

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2000

Ristrutturazione di un edificio destinato a sede del Decentramento dell'Assessorato Casa del Comune

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.000	1 000		
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	2.000	2.000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		3 000	3 000		



Autorimessa comunale - Santa Croce 23

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2000

Costruzione risalente alla metà degli anni '30, su progetto dell'ing. Miozzi, ha una capienza di circa 2.500 posti auto. È sottoposta a restauro manutentivo e messa a norma degli impianti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		6.458	6.458	6.458	5.616
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1.000	1.000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		7.458	7.458	6.458	5.616



Tronchetto - Interscambio - Santa Croce 24

Intervento in progettazione → *Previsione fine lavori dicembre 2001*

Centro interscambio merci gomma/acqua localizzato sull'isola del Tronchetto, per lo stoccaggio e la distribuzione di merci di ogni genere nel centro di Venezia. È previsto un sistema per non interrompere la catena del freddo degli alimenti; organizzato con porte sezionali per lo scarico delle merci direttamente dagli autotreni, e pontili per il carico nelle imbarcazioni.

	Annualità	*Programmato*	*Impegnato*	*Obbligato*	*Speso*
Finanziamenti antecedenti al 1999		2.500			



Immobile Pescheria - San Polo 25

Intervento in corso → Previsione fine lavori novembre 1999

Costruzione dei primi del secolo (1907) realizzata in stile neogotico con porticato con grande arcate ogivali e loggiato superiore con affaccio sul Canal Grande. È il centro del mercato del pesce dal 1300. L'intervento, si inserisce in quello più complesso che riguarda la più generale sistemazione del mercato e degli uffici giudiziari, riguarda il restauro e la messa a norma degli impianti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.500	1 500	1 500	259



Complesso ex Herion - Giudecca 26

Intervento concluso

Il complesso è composto da un blocco a schiera (3 alloggi), dalla villa in stile veneziano, con annesso fabbricato di servizio, parco e cavana, da un fabbricato recente adibito a servizi e dalla chiesa (vincolata) di S.Cosmo e Damiano. La chiesa edificata nel XV secolo, soppressa al culto nel 1810, venne completamente trasformata per diventare la sede dell'opificio industriale tessile Herion nel 1886. Nel 1997 il Comune ha acquistato l'intero complesso per destinare l'ex chiesa a struttura ricettiva a carattere alberghiero. L'importo si riferisce al prezzo di acquisto.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		6 135	6.135	6 102	6 102



Centro Civico - Lido 27

Intervento in corso → Previsione fine lavori 1° semestre 2000

Ristrutturazione del complesso ex tiro a volo da adibire a sede del centro civico.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		4 425	4 425	4 345	1 512



Casinò - Lido 28

Intervento concluso

Palazzo costruito su progetto di E.Mozzi negli anni Trenta, con ambiguo linguaggio littorio, per ospitare la sede estiva del Casinò Municipale, funzione che conserva ancora.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		986	986	798	798



Convento San Nicolò - Master - Lido 29

Intervento in progettazione

Previsione fine lavori agosto 2000

Fondato dai Benedettini nel 1053 e più volte restaurato nei secoli XIV e XVI. Soppresso nel 1770 e adibito a caserma, solo nel 1926 tornò all'originaria destinazione. Gli interventi di manutenzione straordinaria renderanno il complesso idoneo ad ospitare il "Master Europeo per i diritti umani"

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		755	755	720	720
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	521	521		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		1.276	1.276	720	720



Scuola Vetrai *A.Zanetti* e stazione sper. Vetro - Murano 30

Intervento in corso →

Previsione fine lavori 1° semestre 2000

L'intervento investe uno dei due fabbricati industriali (1930), nell'area ex Montecatini. Nel 1934 il Comune acquista uno dei fabbricati che viene utilizzato prima come capannone e magazzino poi come sede di residenze abusive che si protraggono fino agli anni Settanta. Il progetto di recupero prevede il mantenimento della struttura originale, lunga 107 metri ed in parte sviluppata su due livelli, e l'inserimento all'interno di una nuova struttura adatta ad accogliere le nuove funzioni. Parte dei volumi verranno utilizzati dal Centro di Formazione vetrai, parte dalla Stazione Sperimentale del Vetro.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		7 869	7 869	3 776	3 595



Palazzo da Mula - Murano 31

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1 344	1 344	639	609

Edificio Quattrocentesco, con ricca facciata aperta da finestratura gotica, si apre sul cortile perimetrato da un portico a bifore. L'intervento è stato rivolto sia alla conservazione degli elementi decorativi sia alla rifunzionalizzazione orientata dalla tipologia del complesso, dalle potenzialità delle sue strutture e dalla necessità di mantenere inalterata l'organizzazione spaziale. Il piano terra, il cortile e il portico hanno suggerito un uso ad uffici e servizi con affluenza di pubblico, ad emeroteca e a spazio per manifestazione all'aperto. Il primo e il secondo piano vengono destinati rispettivamente alle esposizioni e a servizio degli uffici di quartiere. Gli importi si riferiscono alla sola parte finale del restauro.



Conterie - Murano 32

Intervento in corso → Previsione fine lavori giugno 2001

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5 451	4 969	4 611	1 111
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1 000	900		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		6 451	5 869	4 611	1 111

Il complesso, degli inizi del Novecento, è nato per la produzione di conterie (perle e perline). L'attività cessa nel 1993 dopo un lento declino avviato negli anni Settanta. L'obiettivo progetto di recupero è l'integrazione nel tessuto urbano della vasta area dismessa. L'intervento prevede il restauro conservativo e la riqualificazione funzionale. Gli spazi recuperati verranno destinati a residenza studentesca (280 posti letto), a Edilizia Sovvenzionata(50 alloggi), ad attività mussali e ad attrezzature pubbliche e collettive.



Chiesa San Michele 33

Intervento in progettazione → Previsione fine lavori dicembre 2002

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	2.000			
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		2 000			

La chiesa, una delle prime costruzioni religiose a Venezia nello spirito del Rinascimento, fu eretta da M.Colussi alla fine del XV secolo. L'intervento prevede il restauro conservativo.



Ampliamento Cimitero San Michele 34

Intervento in progettazione

Previsione fine lavori dicembre 2001

La conformazione e destinazione d'uso attuale dell'isola derivano prevalentemente dagli interventi attuati agli inizi del secolo XIX quando venne congiunta all'isola di S Cristoforo della Pace, già sede del cimitero di Venezia. La nuova estensione risponde alla richiesta di adeguamento alle esigenze cittadine e alla necessità di recuperare fanghi prelevati dall'escavo dei ri. Nella sacca già marginata (17.640 mq) verranno creati 3 000 posti per le salme e 5.000 tra ossari e cinerari, e realizzate una cappella e forno crematorio. Su una nuova isola artificiale (55.000 mq), unita con due ponti a S Michele, saranno creati 20 600 posti ca tra loculi e campi inumatori

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1 008	1 008	1 008	618
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	23 000	23 000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		24 008	24 008	1 008	618



Tempo libero - Burano 35

Intervento in progettazione

Previsione fine lavori dicembre 2000

Intervento di ristrutturazione.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1 259	1 251	1 251	1 251
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1 000			
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		2 259	1 251	1.251	1 251

Cimiteri

Intervento in corso →

Previsione fine lavori giugno 2001

Manutenzione delle strutture cimiteriali del centro storico e delle isole.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		21 070	21 070	19 460	11 002
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	9 000	9 000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		30 070	30 070	19 460	11 002

Manutenzioni straordinarie e diffuse

Intervento in corso → Previsione fine lavori fine 2000

Le manutenzioni includono l'acquisto ed i restauri dell'ex Opificio Cipriani alla Giudecca da destinare a deposito archivio giudiziario, per un totale di 5 258.


	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		30 737	30.737	25.172	21 551
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	13.084	13.084		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		43 821	43 821	25.172	21 551

Totale Immobili di interesse pubblico adibiti ad usi vari

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		246 318	234.598	209 483	127.292
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	70.286	67.186		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		316 604	301 784	209.483	127 292

QUADRO RIASSUNTIVO STATO AVANZAMENTO INTERVENTI

Numero interventi in progettazione	Numero interventi in corso	Numero interventi conclusi
9	19	9

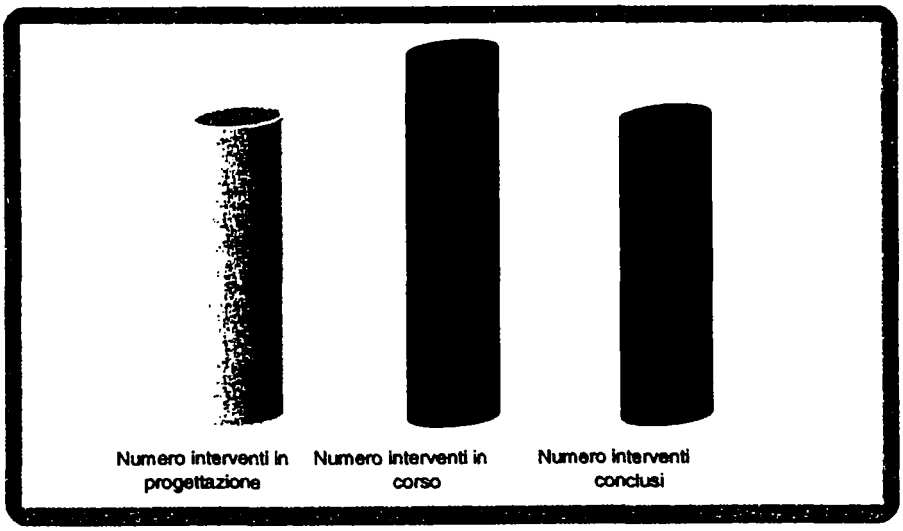


Varie

Intervento in corso → Previsione fine lavori fine 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		17.492	17 492	16 240	13 414
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	2.885	419		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		20 377	17 911	16 240	13 414

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		858.656	843.145	781.215	433.812
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	148.854	135.000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999	12.750	12.750		
	2000	8.500	2.950		
Totale		1.028.760	993.845	781.215	433 812

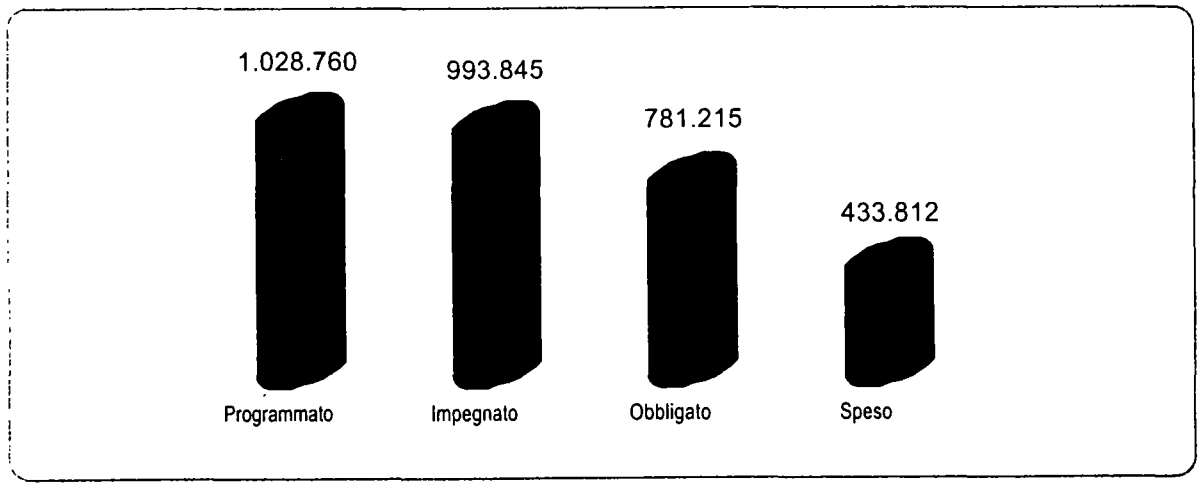



PAGINA BIANCA

Opere di Urbanizzazione

lett. b) art. 6 L. 798/84

... per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione dei ponti, canali e fondamenta.....

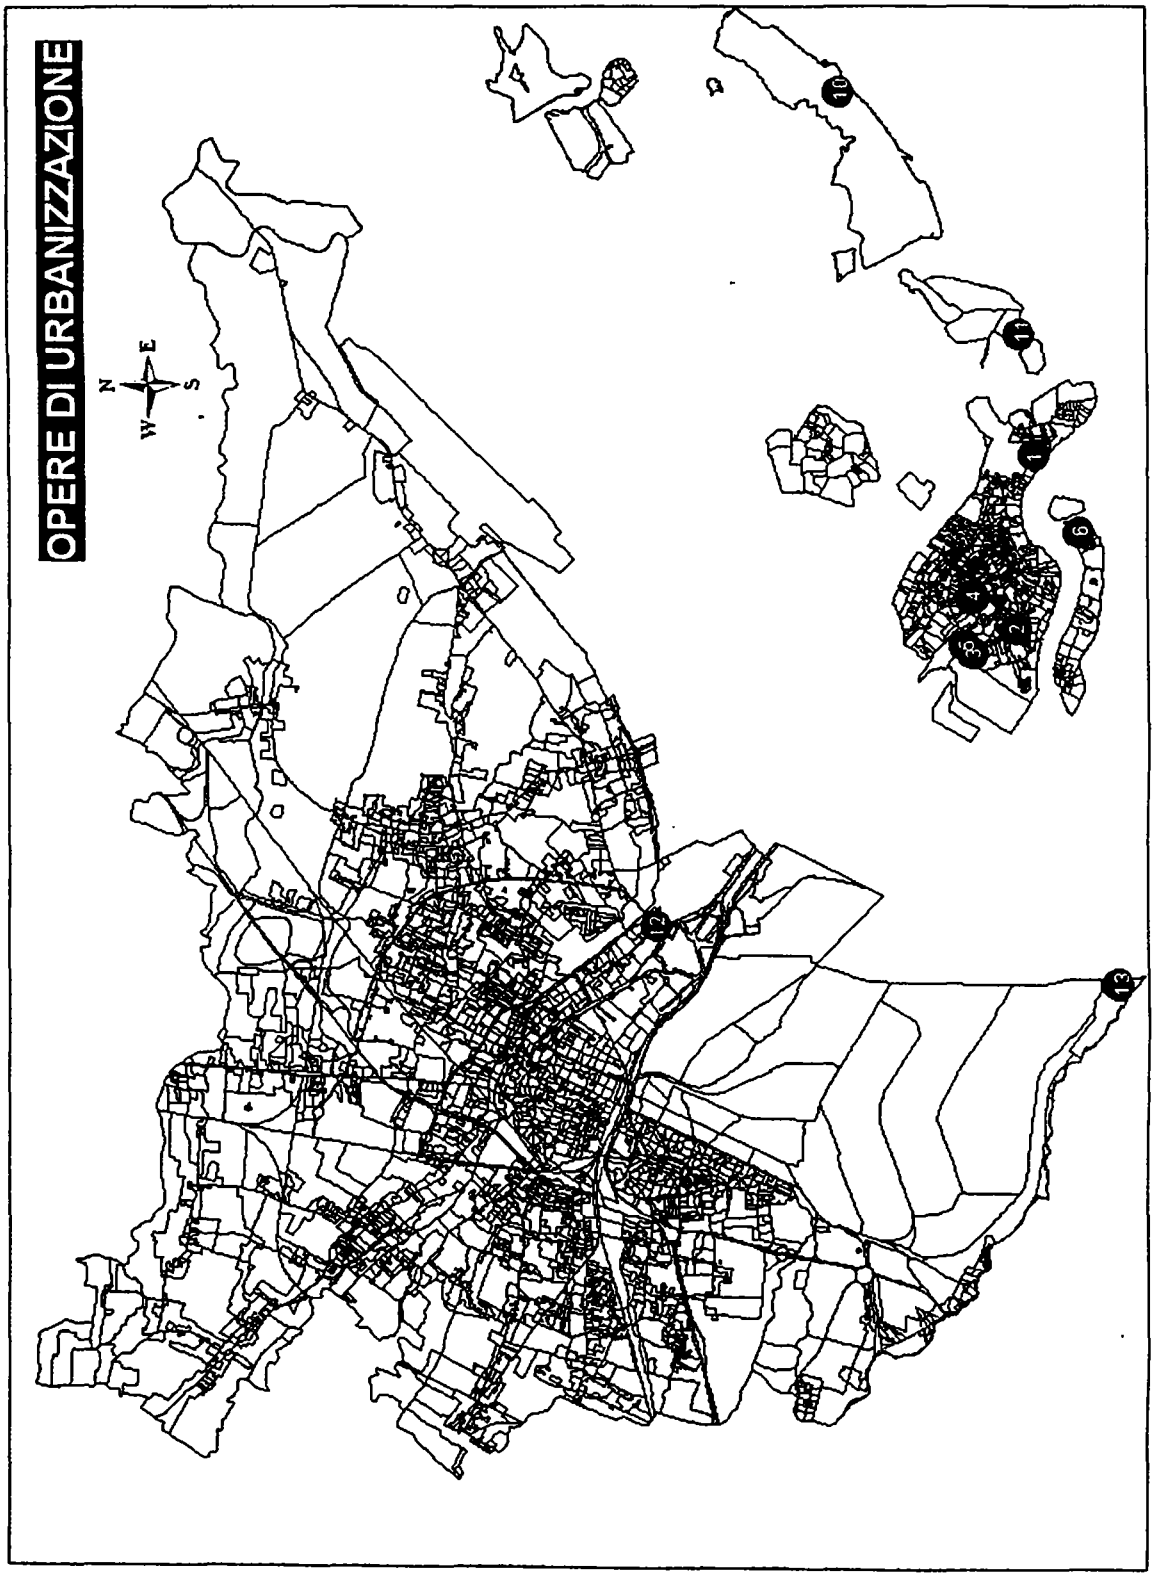
OPERE DI URBANIZZAZIONE
N
E
S
W

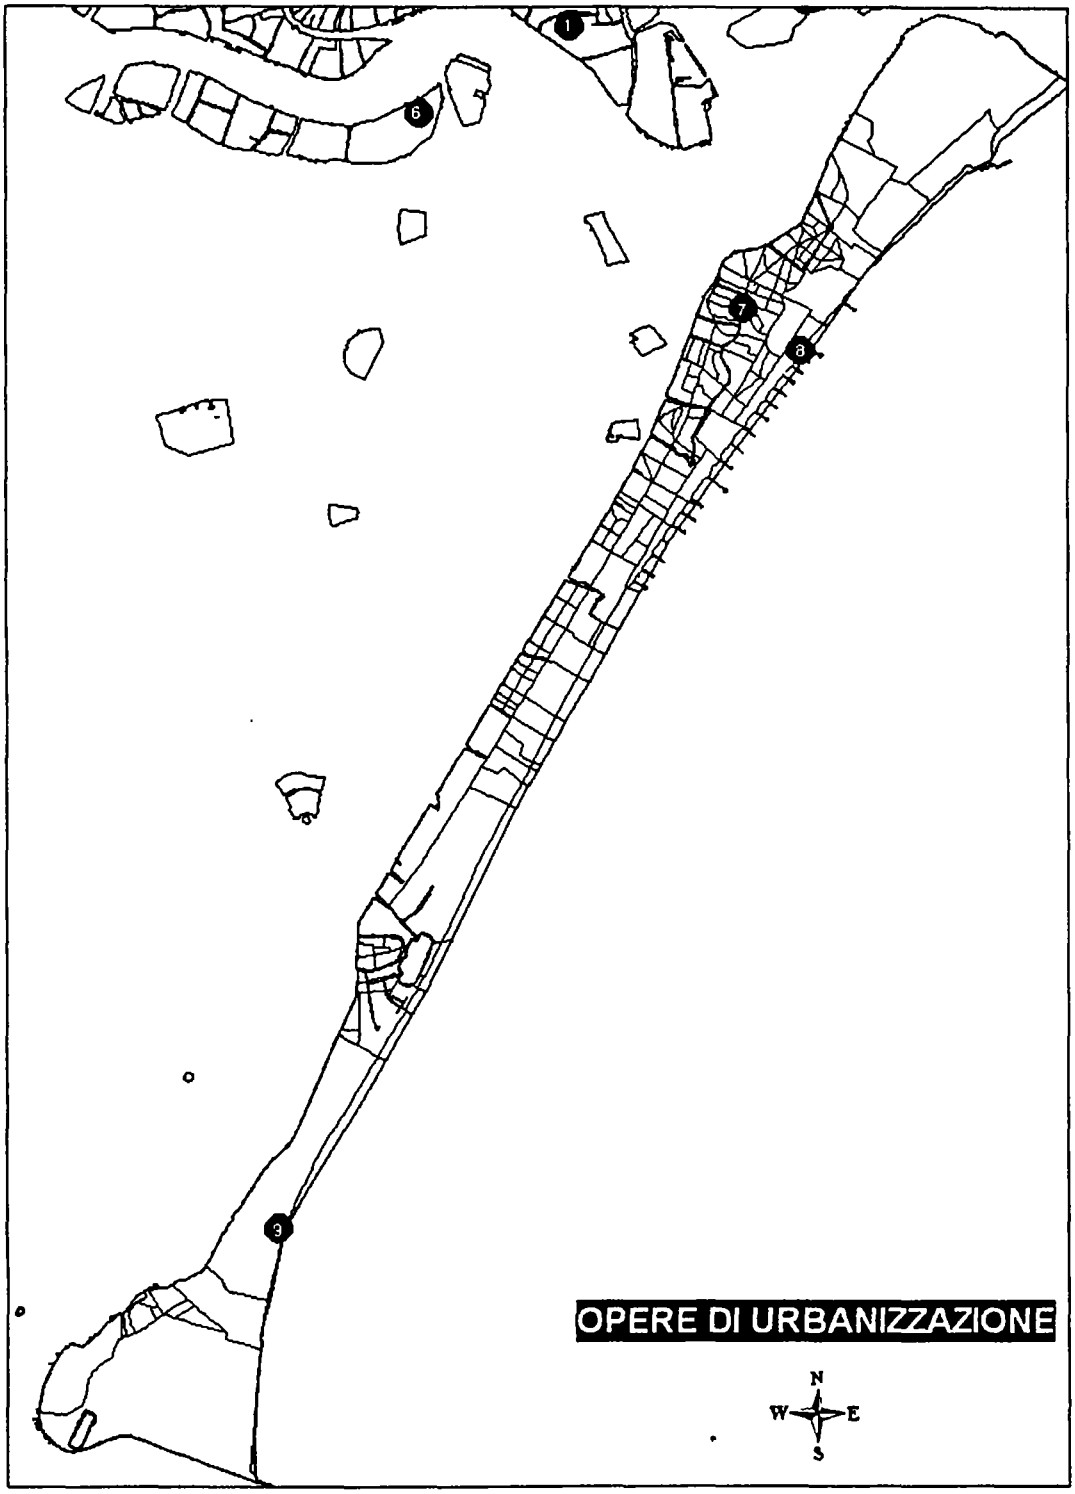
1
6
7
8
3
OPERE DI URBANIZZAZIONE
N
W
E
S



Via Garibaldi - Castello 1

Intervento concluso

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		4.746	4.746	4 691	4 595

Realizzata mediante la copertura parziale del no di castello, nel 1807, da G.Selva al fine di creare un collegamento pedonale con i Giardini, è estranea per dimensioni all'ambiente veneziano (larga 15 metri in media, lunga 360). Il progetto vuole recuperare il valore e il senso della proposta ottocentesca di rifunzionalizzione del tracciato come spina dorsale di un sistema si infrastrutture per l'area di Castello. Il totale rifacimento della pavimentazione si avvale dell'uso di materiali ripresi dalla tradizione costruttiva veneziana: pietra d'istria, masegni e salizzoni di trachite grigia.



Campo Santa Margherita - Dorsoduro 2

Intervento concluso

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1 341	1 341	1.341	1 278

Ancora oggi popolare luogo di mercato e centro di vita, il campo, tra i maggiori della città, è cinto da una cortina di interessanti edifici anche trecenteschi. Al centro si eleva isolato l'edificio ex scuola dei Varoteri un tempo prospiciente il rio, interrato nel 1863, che delimitava il lato sud del campo. L'ultimo intervento consistente fu eseguito negli anni '70 quando furono inserite alberature. L'intervento proposto si colloca nell'ambito del mantenimento dell'assetto formale del campo e prevede interventi di recupero e restauro dei manufatti e il rifacimento della pavimentazione.



Piazzale Roma - Santa croce 3

Intervento in corso → Previsione fine lavori inizio 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2.923	2 255	1 400	678

Terminal di tutti i servizi automobilistici pubblici ce collegano Venezia con le città di terraferma fu aperto a seguito della costruzione del ponte translagunare nel 1931. Il progetto di riordino ha lo scopo di razionalizzare il piazzale per rendere più funzionale la circolazione e garantire una maggior sicurezza ai pedoni. La superficie di 18 000 mq verrà suddivisa per separare la sosta e la circolazione del traffico privato da quello pubblico a cui sarà dedicato la maggior parte del piazzale



Campo S.Giacomo dell'Orio - S.Croce 4

Intervento concluso

Parzialmente alberato è articolato in tre spazi differenti disegnati dalla particolare posizione della chiesa (XIII sec.) che con la parte absidale diviene l'elemento predominante dello spazio". Si affacciano sul Campo importanti edifici sei-settecenteschi e tre vere da pozzo. Per la mancanza di manutenzione il campo si trova in condizioni di degrado Il progetto prevede la manutenzione straordinaria della pavimentazione, per migliorarne la fruizione, nonché la salvaguardia delle alberature presenti, riqualificandone la funzione di polo aggregativo che nel passato, il campo, ha sempre avuto.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.100	1 100	1 000	892




IV ponte sul Canal Grande - Santa Croce - Cannaregio 5

Intervento in progettazione

Previsione fine lavori dicembre 2000

Il ponte dovrebbe collegare le due rive, tra P.le Roma, e la fondamenta di S Lucia a ridosso della stazione ferroviaria. L'obiettivo è quello di rendere accessibile ai passeggeri giunti in ferrovia tutte le infrastrutture di trasporto di P le Roma, trasformato in questo nuovo assetto in nodo di interscambio veloce Inoltre si insensce come elemento di riqualificazione e rivitalizzazione dell'intera area ovest della città, in un piano che coinvolge la ferrovia, P le Roma, il Tronchetto e la Marittima Il ponte verrà realizzato su progetto dell'arch Calatrava.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	7 440	7.440		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		7 440	7 440		



Urbanizzazioni Campo Marte (convenzione ATER) - Giudecca 6

Intervento in progettazione

Previsione fine lavori dicembre 2002

Opere di urbanizzazione per la realizzazione di un intervento localizzato nella parte est dell'isola della Giudecca. È prevista la demolizione di un quartiere di edilizia economica popolare costruito nel 1921 e la ricostruzione di nuovi edifici residenziali pubblici, con il ricavo di 56 nuovi alloggi

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	2.000	2.000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		2.000	2 000		




Via Lepanto - Lido 7

Intervento concluso

È una delle vie centrali del Lido che collega il Gran Viale con la zona del Casinò, snodandosi lungo un canale interno. Il tratto interessato dal progetto è quello più vicino al Gran Viale. Si propone la riqualificazione dell'ambiente urbano attraverso la pedonalizzazione e una serie di interventi di rinnovo dell'arredo urbano tali da creare uno spazio di aggregazione.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2.763	2.763	2 700	2.237



Piazzale Bucintoro "ex Blue Moon" - Lido 8

Intervento in corso → Previsione fine lavori giugno 2000

È il punto di incrocio tra il lungomare e il perpendicolare Gran Viale che, dopo aver attraversato il Lido, unisce la laguna al mare. Nel luogo del progetto era stato costruito il primo stabilimento balneare pubblico. Diventato fatiscente venne dimesso. Il progetto prevede di rendere evidente il punto di arrivo al mare collocandovi un padiglione su due livelli che costituisce una piazza semicircolare, il luogo di incontro del lungomare. Il sistema è completato da un corpo edificato con terrazze gradonate che verranno destinate ad attività commerciali e ricettive

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		8 651	8 651	8 586	2 409



Viabilità Lido

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2000

Il sistema viario (pedonale, ciclabile, carrabile) è sottoposto ad un progetto di riordino della circolazione e a lavori di manutenzione dei sedimi e arredi urbani secondo quanto stabilito dal Piano Urbano del Traffico

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		28.111	26.111	14.318	5.495
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	300	300		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		28 411	26.411	14.318	5.495



Centro Soggiorno Morosini - Lido 9

Intervento in corso → Previsione fine lavori giugno 2000

Realizzazione dell'impianto fognario.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.400	1.400	1.400	

Interventi vari di urbanizzazione - Pellestrina

Intervento concluso

Interventi di manutenzione e rifacimento della rete viaria.

	Annualità	*Programmato*	*Impegnato*	*Obbligato*	*Speso*
Finanziamenti antecedenti al 1999		2.593	2.593	2.420	1.351




Piano Particolareggiato PEEP - Sant'Erasmo 10

Intervento in corso → Previsione fine lavori giugno 2000

L'intervento di nuova edificazione è sito in un'area di espansione edilizia regolata da Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica attuativo del PRG vigente. L'area interessata dal progetto è nei pressi del minuscolo accentramento nei pressi della chiesa. L'edificio in oggetto è composto da 10 alloggi di varie dimensioni e tipologie (4 alloggi a schiera ed un blocco da 6 alloggi).

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		3.146	3.146	224	224



Isola Certosa 11

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 1999

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		7 810	7.810	7 224	2 384
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	653	653		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		8 463	8 463	7 224	2.384

Posta di fronte a Sant'Elena, già sede nel XII secolo di un convento dedicato a S.Andrea, prende il nome dai Certosini che vi si insediarono nel 1424. Dopo la soppressione napoleonica dell'ordine il complesso fu distrutto. In seguito divenne polveriera e fu occupato da militari fino al 1968. Oggi è la più estesa tra le isole abbandonate della laguna caratterizzata da una fittissima vegetazione. Il progetto destina l'isola a parco. I lavori consistono in opere di bonifica ambientale, ristrutturazione dei capannoni nei quali insediare attività legate alla manutenzione di imbarcazioni, alla ristrutturazione di un edificio come Centro Servizi per gli utenti, dotato di foresteria.



Realizzazione Parco San Giuliano - Terraferma 12

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2004

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		31 295	31.295	31 281	3 709

Il progetto coinvolge un'area di circa 700 ettari di terra e acqua comprendente la penisola di S.Giuliano, Forte Marghera, l'area dei Pili e la gronda lagunare fino a Passo Campalto, il canale Osellino fino al centro di Mestre. L'obiettivo è la riqualificazione ambientale e la bonifica dell'area al fine di renderla accessibile e fruibile e fare del parco una cerniera verde tra la realtà urbana di Mestre e quella di Venezia. Il Parco viene diviso in comparti territoriali, area ricreativa, area di recupero e protezione ambientale, ecc. con vari poli di attività, tutte le parti sono connesse con il Centro Storico e le zone circostanti da una rete viaria e ciclopedonale.



Terminal di Fusina -Terraferma 13

Intervento in progettazione → Previsione fine lavori

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		3 272	1.772	1 435	883

È, con Tessera e Punta Sabbioni, uno dei nodi del sistema di interscambio terra – acqua. La realizzazione dei tre terminal risponde alla scelta strategica di riorganizzare il sistema di accesso alla città storica rafforzando e valorizzando il rapporto con la terraferma, ma differenziando i flussi e privilegiando i percorsi acquei. Il terminal di Fusina prevede la concentrazione di circa _ del flusso turistico intercettando gli arrivi da sud e da ovest che attraverso il Canale della Giudecca arriveranno rapidamente al cuore della città insulare. L'intervento prevede 1.500 parcheggi a raso, 350 coperti, 150 per autocorriere, darsena per vaporetti e approdo per mezzi privati

Realizzazione strutture traffico acqueo

Intervento in corso → Previsione fine lavori febbraio 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		3.878	3 858	2.467	2 467
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1 500	301		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		5 378	4 159	2 467	2.467

Centro Previsioni e Segnalazioni Maree



Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		296	296	47	47
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1.500	1.500		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		1 796	1 796	47	47

Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, istituito nel 1980, ha raggiunto, in questi ultimi anni, un elevato livello di specializzazione nell'archiviazione ed elaborazione dei parametri meteomarini del Mare Adriatico. Questo ha consentito di realizzare e rendere operativi alcuni modelli statistici di alta affidabilità con i quali si sono potuti realizzare nuovi sistemi per l'informazione e la segnalazione dei fenomeni di inondazione della città di Venezia (sistema di risponditori automatici su 60 linee, sistema di segnalazione a mezzo sirene, sistema di avvisi ai residenti ed operatori economici veneziani, ecc.)

ASPIV - Manutenzione rete idrica

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	2.000	2.000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		2.000	2 000		

Rete antincendio Venezia centro storico

Intervento in progettazione

Quota parte di un finanziamento di un progetto che si articola in più anni.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5.000	5 000		

Manutenzione straordinaria e diffusa su opere di urbanizzazione varie

Intervento in corso → Previsione fine lavori fine 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		32 843	29 768	23 632	15 324
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	4.368	4.368		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		37 211	34 136	23 632	15 324

Manutenzione verde pubblico

Intervento in corso → Previsione fine lavori fine 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		6 195	6.195	4.530	3.998
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	2.982	2.982		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		9 177	9 177	4 530	3.998

Adeguamento, manutenzione impianti di illuminazione pubblica

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 1999

Appalto decennale

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		10 681	10 681	9.539	9.200
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	5.000	5.000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		15.681	15 681	9.539	9 200

Infrastrutture e opere di urbanizzazione centri urbani insulari

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2001

Accordi di programma tra Stato e Regione sui territori di :
Malamocco 5 mld;
Pellestrina 5 mld;
Sant'Erasmo 4 mld;
Burano 6,3 mld.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		20 300	20.300	20.300	13


Varie

Intervento in corso → Previsione fine lavori 1° trimestre 2000


	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		3.785	3.769	3 574	3 070
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1.156	527		
Legge 3 agosto 1998 n 295	1999				
	2000				
Totale		4.941	4 296	3 574	3 070

Totale Opere di Urbanizzazione

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		182.129	174 850	142.109	60 254
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	28.899	27.071		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		211 028	201 921	142 109	60 254

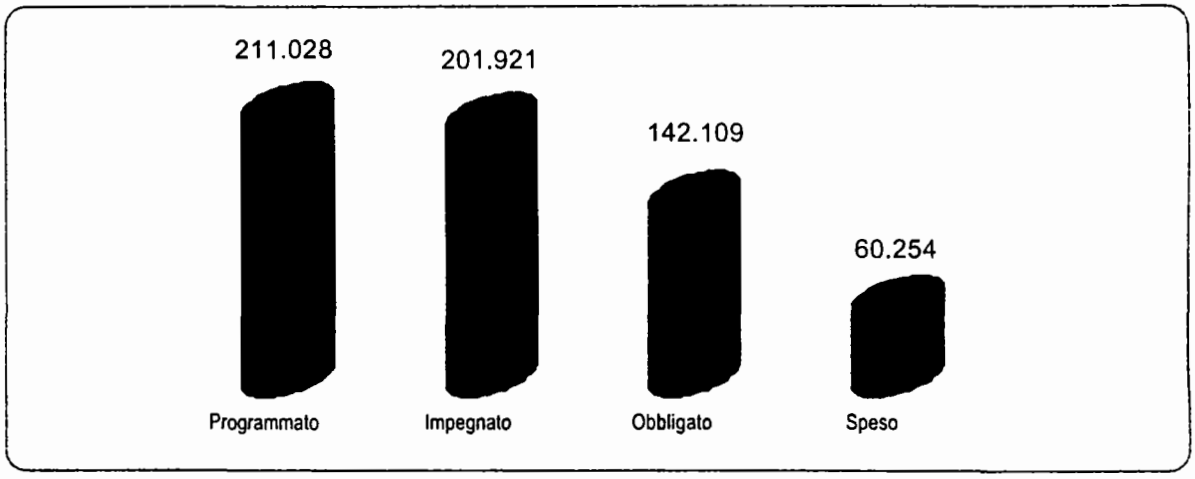

Numero interventi in progettazione	Numero interventi in corso	Numero interventi conclusi
4	15	5

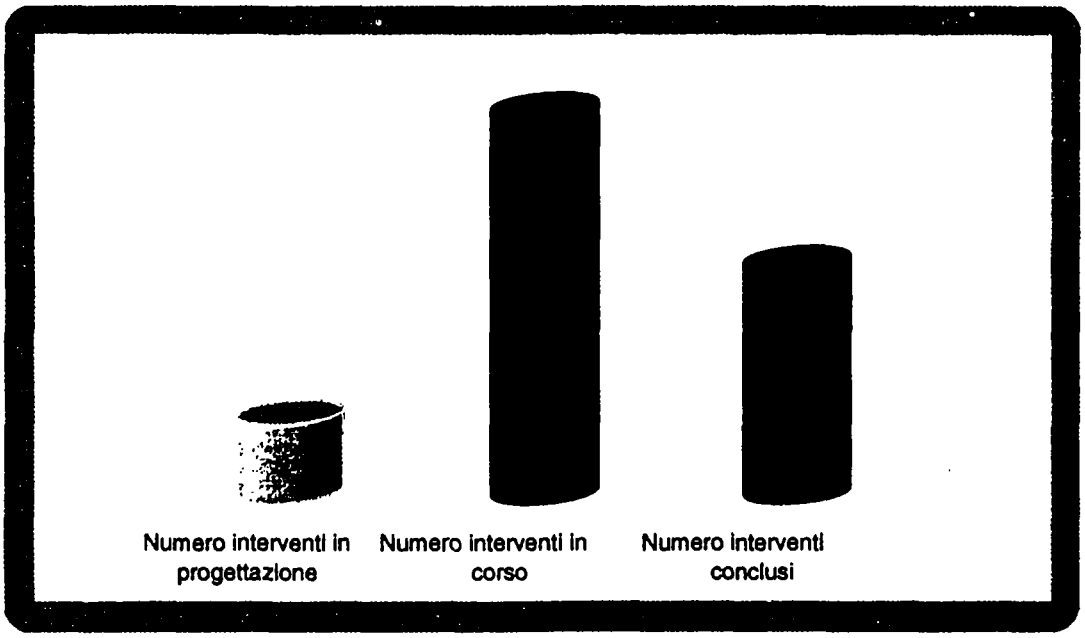

PAGINA BIANCA

Contributi al patrimonio immobiliare privato

L'obiettivo di questo settore di intervento è quello da un lato di rallentare il degrado del patrimonio immobiliare attraverso il recupero edilizio, dall'altro incentivare la residenza nel Centro Storico favorendo l'immissione sul mercato immobiliare di abitazioni non utilizzate e agevolando la locazione ad affitti convenzionati. Altro comparto di intervento è quello legato alle attività artigianali e della piccola e media impresa per il recupero degli immobili a queste funzioni destinati.

A partire dal 1984 il Comune di Venezia, attraverso le risorse della Legge Speciale, ha avviato un programma di incentivi, con l'assegnazione di contributi, per l'esecuzione di opere di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato.
I Bandi di concorso per l'attribuzione dei contributi a tutt'oggi sono otto (l'ultimo dei quali, aperto tre anni fa, viene definito Permanente poiché alla fine di ogni anno viene stilata una nuova graduatoria) ed hanno interessato sia le unità edilizie che le unità immobiliari a destinazione residenziale. Il Comune ha stanziato dal 1993 ad oggi circa 164,03 miliardi, di cui 3 miliardi per il recupero di due isole abbandonate.

Accanto ai contributi per il recupero ed il restauro del patrimonio privato, nel 1992 il Comune ha avviato un programma per agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa ai residenti a Venezia o a quanti volessero stabilirvisi. Tale iniziativa è nata dalla consapevolezza che un numero consistente di famiglie non dispone autonomamente di tutte le risorse necessarie per l'acquisto dell'alloggio a prezzi di mercato e contemporaneamente viene escluso dalle graduatorie per l'assegnazione di alloggi pubblici per ragioni di reddito.
Dal 1992 al 1998 il Comune ha promosso 5 bandi per l'acquisto stanziando a tal fine dal 1993 ad oggi complessivamente circa 48,03 miliardi.

Una ultima azione messa in atto dalla Amministrazione è stata quella rivolta al recupero degli alloggi localizzati al piano terra soggetti alle acque alte. Si è voluto incentivare i proprietari dei piani terra istituendo una corsia preferenziale per l'assegnazione di contributi per la messa in sicurezza dalle acque alte degli alloggi che siano situati al di sotto del 160 cm Imm. Le opere finanziate dovranno difendere le unità immobiliari da maree almeno sino ad una quota di 160 cm.

Sono infine stati assegnati attraverso appositi bandi contributi per il restauro del patrimonio immobiliare privato adibito ad attività produttive localizzate nel Centro Storico ed Isole con un impegno finanziario di oltre 8 miliardi.

Contributi per il restauro del patrimonio immobiliare privato

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		143 830	143.830	143.830	43 012
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	17 200	17.200		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		161.030	161 030	143 830	43 012

Nel febbraio 2000 il Comune chiuderà l'ultimo de bandi (in orine di tempo) destinati alla assegnazione di contributi per i restauro del patrimonio immobiliare privato a destinazione residenziale. Si tratta dell'11° bando aperto in questo settore, dal 1994 ad oggi, ed il quarto ch viene istituito annualmente dal 1996. La cadenz annuale dei bandi costringe il Comune ad un impegno cospicuo di risorse necessarie per contrastare l'obsolescenza fisico funzionale del patrimonio edilizio e favorire l'incremento del parc alloggi. I finanziamenti stanziati hanno permesso di soddisfare 1 816 domande in Conto Capitale (investono le parti comuni degli edifici) e 788 richieste in Conto Interessi (investono le singole unità immobiliari).

Contributi per l'acquisto della prima casa di abitazione

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		43 030	43.030	43 030	31 975
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	5 000	5.000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		48 030	48 030	43 030	31 975

Dal 1992 sono stati promossi 5 bandi che mettevano a disposizione delle famiglie contributi per l'acquisto della prima casa. I bandi (ad eccezione dei primi due) riservano il finanziamen solo a che vuole abitare a Venezia o nelle isole. Parte del finanziamento viene destinato a coppi di nuova formazione o convivenze e a coppie ch si sono impegnate a contrarre matrimonio L'obiettivo è quello di dare un supporto alle famiglie che vogliono risiedere nel centro storico do dinamiche di mercato contribuiscono a mantene alti i prezzi. Complessivamente sono state finanziate 731 domande

Contributi per il restauro di immobili privati destinati alla residenza soggetti alla acque alte

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		7.300	7 300	7.300	
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	3.200	3.200		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		10.500	10.500	7 300	

Nel febbraio del corrente anno si è chiuso il prim bando di assegnazione di contributi per il recupero e miglioramento delle condizioni igienic delle unità immobiliari soggette alle acque alte. L singole unità immobiliari ammesse al contributo sono quelle aventi quote di calpestio compreso i 110 cm e i 160 cm sul lmm Sono state finanzia 109 richieste.

Contributi per il restauro del patrimonio immobiliare privato destinato alle attività produttive

Nel 1996 e nel 1999 il Comune ha promosso tre bandi per l'assegnazione di contributi per il restauro del patrimonio immobiliare privato. In questi bandi però gli immobili ammessi al contributo non sono quelli a destinazione residenziale, ma quelli che ospitano funzioni produttive: per le attività artigianali il bando del 1996 e quello del 1999, per la piccola/media impresa il bando del 1999. In totale sono state soddisfatte 98 richieste in Conto Capitale e 49 in Conto Interessi.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		6.440	6 440	6 440	1.219
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1.800	1.800		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		8.240	8.240	6 440	1 219

Contributi per il recupero del patrimonio immobiliare privato su isole della laguna

Recupero del patrimonio immobiliare privato su due isole minori della laguna: Sacca Sessola e S.Giacomo in Paludo.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2.000	2 000	2.000	
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1.000			
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		3 000	2.000	2 000	

Contributi per il restauro del Complesso del Ghetto

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1.000	1.000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		1 000	1 000		

Restauro Complesso Ponte degli Schiavoni - Ordine di Malta


	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999					
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	2.000	2 000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		2 000	2 000		

Varie

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		352	293	135	135

Totale Contributi al patrimonio immobiliare privato


	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		202.952	202 893	202 735	76 341
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	31.200	30 200		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		234 152	233 093	202 735	76 341

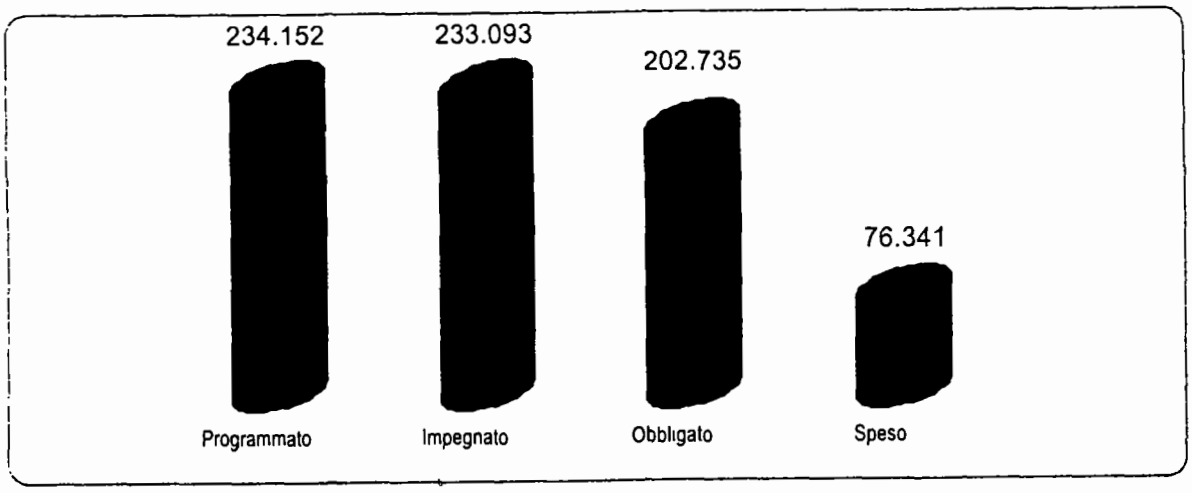


PAGINA BIANCA

Insediamenti Produttivi

lett. b) art. 6 L. 798/84
... per l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi
e per la urbanizzazione primaria secondaria delle stesse.

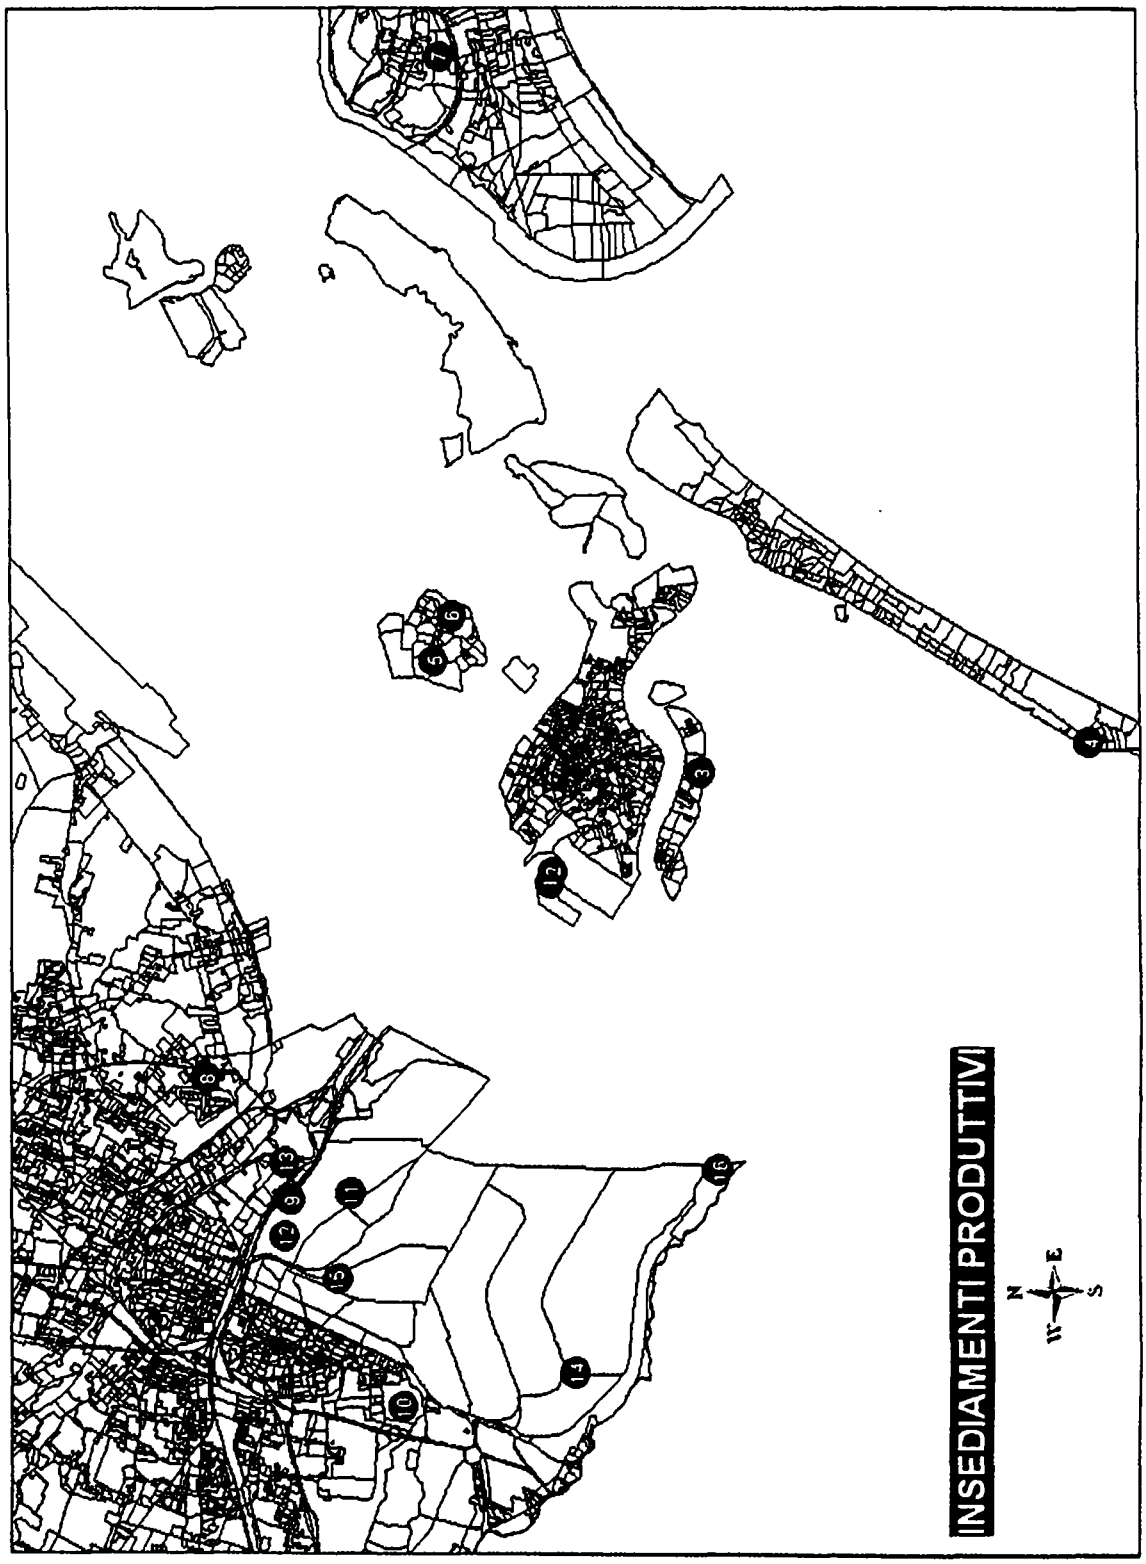
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
N
E
S
W



Mercato Ortofrutticolo al Tronchetto - Santa Croce 1

Intervento concluso

Il progetto prevede la nallocazione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso, proveniente da Rialto, in un lotto libero della nuova isola del Tronchetto. Il lotto, situato nella parte iniziale dell'isola, ha una superficie di 9 413 mq di quali 2 049 verranno coperti dai nuovi volumi (11.274 mc) È prevista la realizzazione di sei corpi di fabbnca (11,70x29,30x5,50 m) disposti su due file parallele separate da in corridoio di 10 ml coperto da una struttura metallica

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		4 900	4 151	4 000	2 261



Mercato Ittico - Santa Croce 2

Intervento in corso → Previsione fine lavori 1° trimestre 2000

Immobile della seconda metà del '900, adibito alla conservazione e al commercio all'ingrosso dei prodotti ittici. L'intervento prevede una sene di opere di manutenzione straordinaria e la messa a norma degli impianti.

	Annualita	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		3 002	3.002	2 941	1 632



Area ex CNOMV - Giudecca 3

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 1999

Il complesso degli ex cantieri navali e officine meccaniche, risalenti ai primi del Novecento, insiste su un'area di circa 3 attan (con edifici per 14.000 mq) in posizione centrale nspetto alla lunghezza dell'isola dalla Giudecca. Il Comune, proprietario dal 1980, decise il recupero dell'area e degli edifici esistenti dandoli in concessione al Consorzio Cantieristica Minore Veneziana per la realizzazione di una nuova darsena, 14 unità produttive per attività artigiane operanti nell'ambito della cantieristica minore, servizi per il ristoro, agenzie nautiche ed impianti tecnologici a servizio di tali attività. Le cifre si nferiscono alle opere di urbanizzazione

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		11 801	11 801	11.801	9.335
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	2.000	2.000		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		13 801	13 801	11 801	9 335

PIP - Terre Perse - Lido 4

Intervento in progettazione

Previsione fine lavori fine 2002

Attuazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi che prevede la realizzazione di fabbricati da destinare ad attività artigianali.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		1.100	1.100		
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	3.400	3.400		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		4 500	4.500		

Sacca Serenella - Murano 5



Intervento in corso →

Previsione fine lavori giugno 2000

Realizzazione di una piattaforma ecologica, ponti e banchinamenti.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		4 212	4 212	4 212	2.111

Conterie - Murano 6



Intervento in corso →

Previsione fine lavori 1° semestre 2001

Il Programma di Recupero Urbano denominato "Conterie" comprende l'omonimo complesso produttivo di perle, nato nel 1898 e definitivamente chiuso nel 1993, e il limitrofo complesso ERP situato in Campo S.Bernardo. L'obiettivo della Amministrazione, diventata proprietaria del complesso nel 1995, è quello di reintegrare nel tessuto urbano l'area dismessa. Il programma prevede un consistente insediamento di residenza studentesca affiancata da sevizi a questa connessi, un complesso residenziale e attività artigianali oltre al recupero degli edifici residenziali comunali.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		5 452	4.970	4 612	1 111
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	1.000	900		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		6 452	5.870	4 612	1 111

Ca' Savio - Area PIP - Cavallino 7

Intervento concluso

Attuazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi che prevede la realizzazione di fabbricati da destinare ad attività artigianali. Le opere di urbanizzazione prevedono 13 000 mq di strade, 5.000 mq di marciapiedi, 15.200 mq di verde, 3 km di rete fognaria e 150 punti luce. Intervento approvato prima della costituzione del nuovo Comune.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		7 378	7.378	7.378	6 416

Deposito ACTV - Bissuola 8

Intervento in corso → Previsione fine lavori giugno 2000.

XXX

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		6 800	6.800	6 800	6.469




Via Torino, SS. 11 - Piave 9

Intervento in progettazione

Previsione fine lavori novembre 2001

Realizzazione collegamento viario con cavalcaferrovia per unire via Torino con la vicina zona industriale.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		11 061	11 061	1.005	592




Area PIP Cà Emiliani - Marghera 10

Intervento concluso

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2 472	2.472	2 361	2 361

Ristrutturazione urbanistica di un'area già urbanizzata per l'85%, fortemente degradata, demolizione di edifici residenziali di proprieta comunale (riallocati in altra area) e realizzazione di nuovi edifici da destinare ad aziende artigiane e industriali di piccola - media dimensione Dotazione di servizi infrastrutturali e logistici (sup area 350.000mq, sup. cop 14.000).




Area CIPI Sartori - Marghera 11

Intervento concluso

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		13 000	13 000	13 000	12 736

Utilizzo a fini produttivi di aree e capannoni dimessi nella prima zona industriale. L'area di proprietà comunale è da tempo considerata funzionale all'espansione del porto grazie alla vicinanza ai nodi della rete di comunicazioni che la rendono appetibile alle aziende per le aziende che costruiscono e/o montano macchine di grosse dimensioni. La superficie utilizzata è di circa 10 ettari, di cui 5 sono assegnati in forma continua ad aziende locali e 5 sono tenuti disponibili a rotazione per aziende che intendono utilizzare l'area per brevi periodi




Parco Scientifico Tecnologico - Marghera 12

Intervento concluso

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		3 750	3 750	3 750	3 552

Localizzato lungo la direttrice Mestre-Venezia, nel nucleo più antico della zona industriale. Il progetto si insensce nel processo di riqualificazione del Porto Marghera che punta allo sviluppo delle attività di ricerca e a quelle con caratteri innovativi già presenti nell'area e nelle capacità del polo di attrarre nuove iniziative. L'intervento prevede la bonifica, l'urbanizzazione, il restauro di un complesso di archeologia industriale e nuove edificazioni. Negli edifici gia agibili (17 500 mq) vi hanno trovato sede 35 aziende. Altri 9 000 mq saranno disponibili con la conclusione dei lavori.



Opere di urbanizzazione asse P.S.T. 13

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2001

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		20 000	20 000	20 000	25



43 ettari - Marghera 14

Intervento in corso → Previsione fine lavori aprile 2001

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		4.416	4 416	4 416	2 630

Riconversione ambientale e urbanizzazione primaria di un'area degradata, inutilizzata, insenta nell'area industriale (acquistata dal Comune nel 1980) di circa 43 ettari per l'insediamento di nuove attività produttive. L'intervento prevede la progettazione e la realizzazione di un'opera di banchinamento lungo il canale delle industriale sud, l'urbanizzazione primaria e la costruzione di un'edificio direzionale con dotazioni tecnologiche telematiche. L'importo si riferisce ai lavori di bonifica relativi al primo stralcio



Porto Marghera ex Sirma - Marghera 15

Intervento in corso → Previsione fine lavori dicembre 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2 084	2 084	2 084	626

Riconversione ambientale e urbanizzazione primaria di un'area industriale di circa 11 ettari di proprietà comunale, per l'insediamento di nuove attività produttive del settore manifatturiero. L'area è dotata di un grosso potenziale di intermodalità essendo servita da linee carrabili, ferroviarie, marittime, fluviali aeroportuali. Degli 11 ettari 3,5 sono edificabili, 5,5 sono destinati a verde pubblico, 0,7 sono aree a parcheggio scoperto e 1,5 sono destinati alla viabilità pedonale e carrabile.

Stazione travaso compattazione AMAV - Fusina 16

Intervento concluso

Realizzazione di un impianto di riduzione volumetrica e stoccaggio provvisorio di raccolta differenziata in un'area di 4 ettari.

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		4 000	4 000	4 000	4 000



Opere urbanizzazioni portuali - Marghera

Intervento in corso → Previsione fine lavori fine 2000

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		10 240	10 240	5 000	4 823

Acquisizioni e urbanizzazioni varie

Intervento in corso → Previsione fine lavori fine 2000


	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		7.477	7.458	3 861	3 655
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	4.347	4.347		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		11.824	11.805	3 861	3 655

Varie


	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		2 005	2 005	2 005	1 450
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	300	300		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		2 305	2 305	2.005	1 450

Totale Insediamenti Produttivi

	Annualità	Programmato	Impegnato	Obbligato	Speso
Finanziamenti antecedenti al 1999		125 150	123 900	103 226	65 785
Legge 28 dicembre 1998 n. 448	1999	11 047	10.947		
Legge 3 agosto 1998 n. 295	1999				
	2000				
Totale		136 197	134 847	103 226	65.785

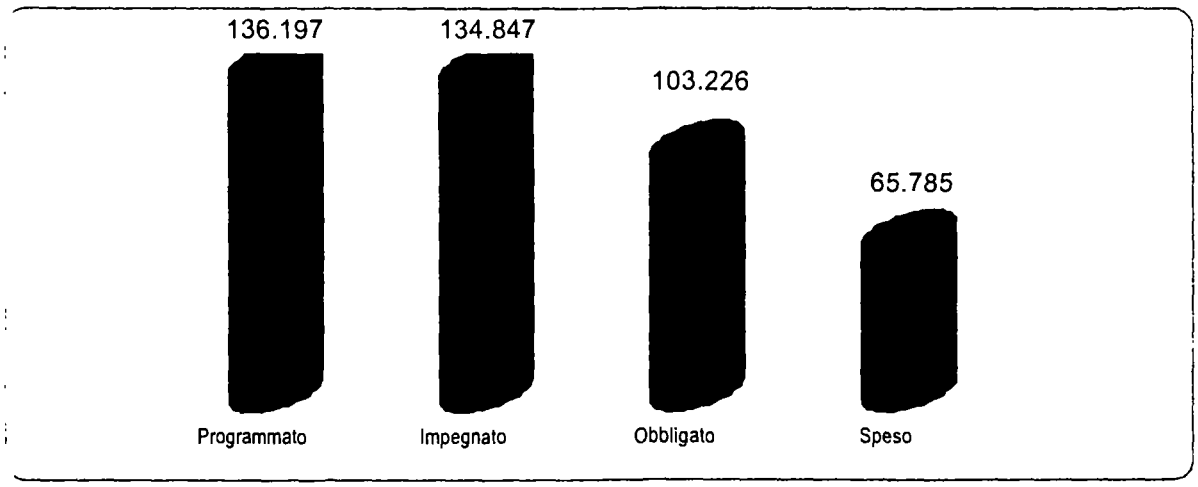

Numero interventi in progettazione	Numero interventi in corso	Numero interventi conclusi
2	10	6

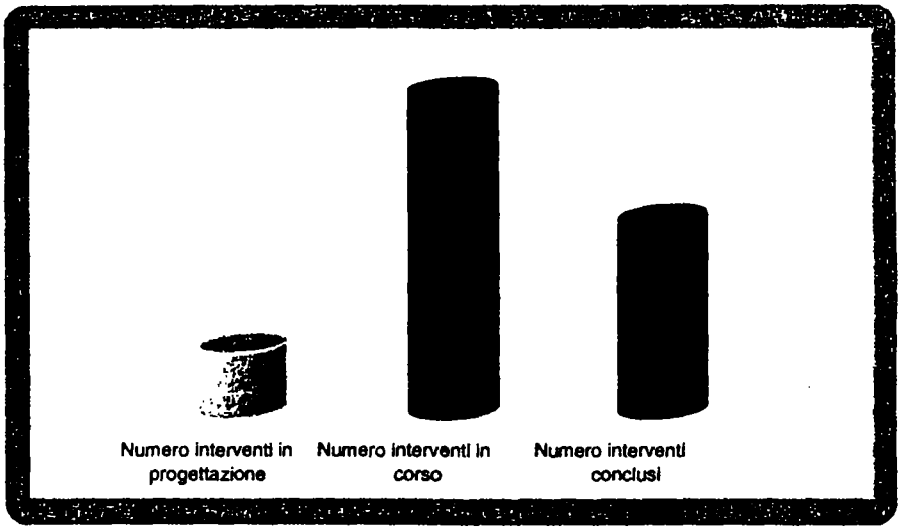

Documento E ***Comune di Chioggia***

Interventi per la salvaguardia di Venezia – Prospetto riepilogativo stanziamenti Legge n. 798/84 e successive - Aggiornamento al 31 dicembre 1999

PAGINA BIANCA

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA - PROSPETTO RIEPILOGATIVO STANZIAMENTI LEGGE 798/84 E SUCCESSIVE

LEGGE	RIFERIM.ESERCIZI	STANZIAMENTO	EROGATO	DA EROGARE	IMPEGNATO	DISPONIBILITA'	MANDATI EMESSI
798/84	1984-1985-1986	20.250.000.000	20.250.000.000	0	20.240.530.902	9.469.098	
910/86	1987-1988-1989	25.500.000.000	25.500.000.000	0	25.468.415.483	31.584.517	
67/88	1988-90-91-92-94	11.976.900.000	11.976.900.000	0	11.826.313.318	150.586.682	
TOTALI LEX 798-910-67		**57.726.900.000**	**57.726.900.000**	**0**	**57.535.259.703**	**191.640.297**	**47.199.934.409**
LEX 360/91	1991	**4.350.000.000**	**4.350.000.000**	**0**	**4.349.596.092**	**403.908**	**3.766.478.486**
139/92 - 1^	1992	32.497.892.295	32.497.892.295	0	32.497.892.295	0	25.153.695.636
139/92 - 2^	1993	12.656.329.974	12.656.329.974	0	12.656.329.974	0	11.367.351.930
139/92 - 3^	1995	11.945.619.875	11.945.619.875	0	11.945.619.875	0	5.361.413.880
139/92 - 4^	1996	12.000.000.000	4.487.072.504	7.512.927.496	12.000.000.000	0	3.604.749.098
TOTALI LEX 139/92		**69.099.842.144**	**61.586.914.648**	**7.512.927.496**	**69.099.842.144**	**0**	**45.487.210.544**
539/95 - 1^	1996	10.000.000.000	4.665.000.000	5.335.000.000	10.000.000.000	0	1.488.217.383
539/95 - 2^	1997	18.000.000.000	526.890.483	17.473.109.517	18.000.000.000	0	526.890.483
TOTALI LEX 539/95		**28.000.000.000**	**5.191.890.483**	**22.808.109.517**	**28.000.000.000**	**0**	**2.015.107.866**
515/96 - 1^	1997	58.000.000.000	2.722.111.093	55.277.888.907	58.000.000.000	0	2.722.111.093
515/96 - 2^	1998	32.000.000.000	4.192.247.833	27.807.752.167	32.000.000.000	0	127.150.020
TOTALI LEX 515/96		**90.000.000.000**	**6.914.358.926**	**83.085.641.074**	**90.000.000.000**	**0**	**2.849.261.113**
345/97 - 1^	1998	19.000.000.000	1.100.459.600	17.899.540.400	19.000.000.000	0	1.100.459.600
345/97 - 2^	1999	27.000.000.000	1.169.162.800	25.830.837.200	27.000.000.000	0	1.132.232.000
TOTALI LEX 345/97		**46.000.000.000**	**2.269.622.400**	**43.730.377.600**	**46.000.000.000**	**0**	**2.232.691.600**
295/98 - 1^	1999	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0
TOTALI LEX 295/98		**2.500.000.000**	**0**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**0**	**0**
TOTALE GENERALE		*297.676.742.144*	*138.039.686.457*	*159.637.055.687*	*297.484.697.939*	*192.044.205*	*103.550.684.018*

COMUNE DI CHIOGGIA - QUADRO RIEPILOGATIVO RISORSE / IMPIEGHI - LEGGE 139/92 E SUCCESSIVE

FINANZIAMENTO	LEGGE	CAPITOLO	PROGRAMMA E CONTRATTI	ISTITUTO MUTUAMTE	IMPORTO	EROGAZIONI
1^ TRANCHE ES. 1992	139/05-02-92	326850	CC.108/26-07-95 - Rep.1299/23-12-92 NOTAIO CARLO GIUBBINI FERRONI RICOGNIZIONE FINALE CC.191/06-12-95 MODIFICATA CON CC.179-180/19-12-97	SANPAOLO-IMI Spa (ex IMI SpA)	32.497.892.295	32.497.892.295
2^ TRANCHE ES. 1993	139/05-02-92 538/93	326850	CC.27/15-03-94 - Rep.3319/26-07-94 NOTAIO CARLO GIUBBINI FERRONI INTEGRATA E MODIF. CC.18/01-02-96 RICOGNIZIONE FINALE CC.179/19-12-97 MODIFICATA CON CC.86/08-07-99	SANPAOLO-IMI Spa (ex IMI SpA)	12.656.329.974	12.656.329.974
3^ TRANCHE ES. 1995	139/05-02-92 206/95	326850	CC.166/25-11-94 - Rep.3833/09-06-95 NOTAIO CARLO GIUBBINI FERRONI INTEGRATA E MODIF. CC.19/01-02-96 RICOGNIZIONE FINALE CC.180/19-12-97	SANPAOLO-IMI Spa (ex IMI SpA)	11.945.619.875	11.945.619.875
4^ TRANCHE ES. 1996	139/05-02-92 206/95	326850	CC.168/06-11-95 - Rep.4255/22-12-95 NOTAIO CARLO GIUBBINI FERRONI MODIFICATA CON CC.86/08-07-99	SANPAOLO-IMI Spa (ex IMI SpA)	12.000.000.000	4.487.072.504
5^ TRANCHE ES. 1996	539/20-12-95 1^ quota	326860	CC.192/06-12-95 - Rep.33600/28-12-95 NOTAIO MARIO LUPI MODIFICATA CON CC.86/08-07-99	CREDIOP SpA	10.000.000.000	4.665.000.000
6^ TRANCHE ES. 1997	539/20-12-95 2^ quota	da 400000 a 450000	CC.187/20-11-96 - Rep.4874/29-11-96 NOTAIO CARLO GIUBBINI FERRONI MODIFICATA CON CC.86/08-07-99	SANPAOLO-IMI Spa (Capogruppo) (ex IMI SpA)	18.000.000.000	526.890.483
7^ TRANCHE ES. 1997	515/04-10-96 1^ quota	da 460000 a 499000	CC.188/20-11-96 - Rep.4873/29-11-96 NOTAIO CARLO GIUBBINI FERRONI MODIFICATA CON CC.86/08-07-99	SANPAOLO-IMI Spa (Capogruppo) (ex IMI SpA)	58.000.000.000	2.722.111.093
8^ TRANCHE ES. 1998	515/04-10-96 2^ quota	da 400030 a 400140	CC.162/15-10-97 - Rep.78561/26-11-97 NOTAIO ALESSANDRO CAPUTO MODIFICATA CON CC.86/08-07-99	CA.RI.VE. SpA	32.000.000.000	4.192.247.833
9^ TRANCHE ES. 1998	345/02-10-97 1^ quota	da 400020 a 400250	CC.181/19-12-97 - Rep.35547/29-12-97 NOTAIO MARIO LUPI	CREDIOP SpA	19.000.000.000	1.100.459.600
10^ TRANCHE ES. 1999	345/02-10-97 2^ quota	da 500001 a 500010	CC.165/10-12-98 - Rep.493911/29-12-98 NOTAIO TESEO SIROLLI MENDARO	CREDIOP SpA	27.000.000.000	1.169.162.800
11^ TRANCHE ES. 1999	295/03-08-98 1^ quota	500011	CC.172/21-12-98 - Rep.493910/29-12-98 NOTAIO TESEO SIROLLI MENDARO	CREDIOP SpA	2.500.000.000	
RIPARTIZIONE FINANZA E CONTABILITA' - Uff. Ragioneria				TOTALI	235.599.842.144	75.962.786.457

Documento F *Università Ca' Foscari di Venezia*

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia - Aggiornamento al 30 ottobre 1999

PAGINA BIANCA

UNIVERSITÀ
CA' FOSCARI
DI VENEZIA

DIVISIONE SERVIZI TECNICI
Il Direttore

Ca' Foscari, 23 dicembre 1999

Prot. n. 585

Al Ministero dei Lavori Pubblici
Magistrato alle Acque di Venezia
Comitato di Indirizzo
Coordinamento e Controllo

VENEZIA

Oggetto: Legislazione speciale per Venezia – Richiesta dati

Si risponde alla lettera del 22 dicembre 1999 prot.n. 291/GAB per inviare copia del quadro sullo stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale aggiornato al mese di Ottobre 1999.

Cordiali saluti.

Il Direttore della Divisione Servizi Tecnici
Dott. Ing. Antonino Lo Cascio
Coordinatore Generale

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1999

LEGGE 331/85 - Fondi Ministeriali

Edilizia Generale e Dipartimentale

1) LAVORI NOPPI/C.P.I. (e revisione prezzi)

Edilizia Sportiva

1) CALLE DEI GUARDIANI - Il finanziamento è destinato alla realizzazione parziale ed al risanamento di alcuni capannoni da adibire a palestra polivalente. E' in corso il montaggio della copertura.
I lavori stanno ultimando.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1999

LEGGE 67/88 - Fondi Ministeriali

1) SAN SEBASTIANO - Fino ad ora sono stati realizzati vari interventi suddivisi in più stralci per il restauro della sede Universitaria, l'adeguamento del muro di confine, porzioni del I°, II°, III° e V° stralcio, acquisto di ascensori, sistemazione degli spazi esterni e della cabina Enel. I lavori sono stati tutti eseguiti.

2) S. MARGHERITA - Fino ad ora con questi fondi sono stati in parte eseguiti i lavori di adeguamento funzionale della sede Universitaria. I predetti lavori sono stati completati.

3) CA' GARZONI E MORO - Gli interventi edilizi finanziati in parte con questa legge sono stati ultimati. Si sta predisponendo l'appalto per i lavori strutturali di Ca'Moro.

4) CA' FOSCARI - L'importo è servito per finanziare la progettazione (circa 200.000.000.) e con i rimanenti sono state effettuate le indagini geognostiche e conoscitive del palazzo.

5) S. MARTA - Fino ad ora sono stati eseguiti alcuni interventi di cui il principale è l'adeguamento funzionale del fabbricato "C" per il quale è stata impegnata la somma di Lire 5.020.000.000. (finanziamento parziale) il cui intervento è stato eseguito. Si è chiusa la contabilità dei lavori.

6) CALLE DEI GUARDIANI - Fino ad ora sono stati eseguiti vari interventi tra i quali parte della sistemazione della sede del custode per L. 57.000.000 circa e la sistemazione degli scoperti per un importo di L. 65.000.000 circa.
Il resto della somma è stato impegnato per realizzare i lavori già descritti alla legge 331/85.

7) PALAZZO NANI MOCENIGO - Ad eccezione alcuni interventi condominiali e di riparazione del tetto per L. 144.000.000., il rimanente è stato impegnato per il restauro architettonico e funzionale del palazzo che recentemente ha avuto il benestare della Salvaguardia, ed attualmente è in corso la predisposizione dei progetti esecutivi per provvedere alle operazioni di appalto.

8) CA' CAPPELLO - Sono stati eseguiti due stralci esecutivi di intervento

9) WOLF FERRARI - L'intervento è stato completato nel 1991.

10) CELESTIA - L'intervento è stato completato nel 1993.

11) S. GIOBBE ED ALTRI EDIFICI - Il finanziamento fa parte del progetto di restauro e adeguamento funzionale relativo alla fase "A", I° stralcio del complesso universitario. Le opere che competono sono state eseguite completamente.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1999

LEGGE 407/89 - Fondi Ministeriali

Edilizia Generale e Dipartimentale

1) VIA TORINO Capannoni - Adeguamento funzionale del capannone da adibire a laboratorio chimico per la facoltà di Scienze MM.FF.NN.. E' stata effettuata la gara d'appalto vinta dall'Impresa Edile Costruzioni Srl. I lavori stanno ultimando.

2) S. GIOBBE fase "A" - Il finanziamento fa parte del progetto di restauro e adeguamento funzionale relativo alla fase "A", I° stralcio del complesso universitario. Le opere che competono sono state eseguite completamente.

Edilizia Sportiva

1) CALLE DEI GUARDIANI - Il finanziamento è destinato alla realizzazione ed al risanamento di alcuni capannoni da adibire a palestra polivalente. I lavori sono stati già descritti alla legge 331/85 e alla legge 67/88.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1997

LEGGE 725/94 - Fondi Ministeriali

Edilizia Generale e Dipartimentale

1) S. GIOBBE fase "A" - Le opere sono descritte alla legge 407/89.

2) S. SEBASTIANO - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

Edilizia Sportiva

1) CALLE DEI GUARDIANI - Il finanziamento è destinato alla realizzazione ed al risanamento di alcuni capannoni da adibire a palestra polivalente. I lavori sono stati già descritti alla legge 331/85, alla legge 67/88 e 407/89.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1999

LEGGE 550/95 - Fondi Ministeriali

Edilizia Generale e Dipartimentale

1) S. MARTA Teatro G. Poli - Restauro e adeguamento funzionale. La gara d'appalto è stata aggiudicata all'impresa Garbuio Oscar &C. Snc. Sono in corso le opere di fondazione. Durante dette opere si sono presentate alcune difformità nelle fondazioni preesistenti le quali hanno avuto bisogno di modifiche progettuali. Tali modifiche consistono in opere di rinforzo soprattutto a sostegno dei muri perimetrali.

2) VIA TORINO Capannoni - Adeguamento funzionale del capannone da adibire a laboratorio chimico per la facoltà di Scienze MM.FF.NN.. La descrizione dei lavori è già stata fatta alla legge 407/89.

3) S. GIOBBE fase "A" - Le opere sono descritte alla legge 407/89 e alla legge 725/94.

Edilizia Sportiva

1) CALLE DEI GUARDIANI - Il finanziamento è destinato alla realizzazione ed al risanamento di alcuni capannoni da adibire a palestra polivalente. I lavori sono stati già descritti alle leggi nn. 331/85, 67/88, 407/89 e 725/94.

LEGGE 663/96

Edilizia Generale e Dipartimentale

1) ATTUAZIONE D.Lgs. 626/94 - Attuazione delle condizioni per la messa a norma degli edifici secondo le disposizioni dettate dalla legge sulla prevenzione e protezione dai rischi.

2) San Giobbe Fase "A" - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

3) VIA TORINO Capannone - Adeguamento funzionale del capannone da adibire a laboratorio chimico per la facoltà di Scienze MM.FF.NN.. Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

Edilizia Sportiva

1) CALLE DEI GUARDIANI - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1999

LEGGE 450/97

Edilizia Generale e Dipartimentale

1) ATTUAZIONE D.Lgs. 626/94 - Attuazione delle condizioni per la messa a norma degli edifici secondo le disposizioni dettate dalla legge sulla prevenzione e protezione dai rischi.

2) SAN BASILIO – E' stato affidato l'incarico di progettazione preliminare e definitiva.

3) San Giobbe Fase "A" - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

4) VIA TORINO Capannone - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

Edilizia Sportiva

1) CALLE DEI GUARDIANI - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1999

LEGGE 139/92

Mutuo IMI

1) INFORMATIZZAZIONE ATENEO E BIBLIOTECHE - Fino ad ora sono stati eseguiti due grossi interventi che riguardano: il primo la conversione su nastro magnetico dei cataloghi delle biblioteche per un importo di L. 2.200.000.000. ed il secondo la realizzazione della rete informatica di Ateneo e l'acquisto delle relative apparecchiature per l'importo di L. 3.000.000.000. Si prevede di destinare la somma rimanente al il finanziamento delle opere di restauro e adeguamento funzionale della fase "A" di S. Giobbe.

2) S. GIOBBE fase "A" - Quota parte del finanziamento relativo del progetto di restauro e adeguamento funzionale relativo alla fase "A" I° stralcio. Lavori completamente eseguiti.

3) ZATTERE Acquisto Sci - E' stato effettuato un acquisto "chiavi in mano" di un edificio sito alle Zattere dove è stato insediato il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari Europei e Postcoloniali. I lavori sono stati eseguiti ed ultimati nel novembre '95. (Superficie mq 1436)

4) OPERE VARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Sono stati eseguiti vari interventi di natura manutentoria e di completamento di alcune opere di restauro e ristrutturazione già avviati e finanziati con altre leggi, con particolare riferimento ai seguenti interventi:
- parte dell'imbrigliamento della sede centrale di Ca' Foscari
- realizzazione di alcuni serramenti nella sede di S. Marta
- porzione del restauro ed adeguamento funzionale della sede di Ca' Cappello
- porzione del restauro e adeguamento funzionale del Fabbricato "C" di S. Marta.

5) CA' DALLA ZORZA Acquisto 3° piano - Acquisto di alcuni locali posizionati al terzo piano da destinare all'uso istituzionale dell'Università.

Mutuo BNL

1) S. GIOBBE fase "A" - Quota parte del progetto di restauro e adeguamento funzionale relativo alla Fase "A" I° stralcio di S. Giobbe.. Importo completamente utilizzato.

2) CA' BEMBO acquisto - E' stato acquistato un immobile che era concesso in Comodato dalla Cassa di Risparmio di Venezia. L'operazione è stata conclusa nel 1996. (Superficie mq 2107)

3) ZATTERE Acquisto Star Gas 1 - Sono stati acquistati i locali. (Superficie mq 404)

4) ZATTERE Acquisto Star Gas 2 - Sono stati acquistati i locali (Superficie mq 386)

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1999

LEGGE 539/95

Mutuo Crediop

1) SAN GIOBBE fase "A" - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

2) SAN GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Il progettista ha completato il progetto esecutivo e si è in attesa del parere del Provveditorato Regionale alle OO.PP.

3) VIA TORINO Capannoni - Adeguamento funzionale del capannone da adibire a laboratorio chimico per la facoltà di Scienze MM.FF.NN.. Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

4) S. MARTA Teatro G. Poli - Restauro e adeguamento funzionale. Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

5) CA' GARZONI E MORO - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

6) S. MARTA fabbricato "C" - Fino ad ora sono stati eseguiti alcuni interventi di cui il principale è l'adeguamento funzionale del fabbricato "C" per il quale è stata impegnata la somma di Lire 5.020.000.000. (finanziamento parziale) il cui intervento è stato eseguito. Si sta chiudendo la contabilità dei lavori.

Mutuo Interbanca

1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Il progettista ha completato il progetto esecutivo e si è in attesa del parere del Provveditorato Regionale alle OO.PP.

2) S. GIOBBE Poste – Il progetto è in fase di predisposizione da parte della Divisione Servizi Tecnici di questa Università.

3) OPERE VARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Sono stati eseguiti vari interventi di natura manutentoria e di completamento di alcune opere di restauro e ristrutturazione già avviati e finanziati con altre leggi, con particolare riferimento ai seguenti interventi:
- Ripassatura del tetto presso la sede di Ca' Bernardo
- Restauro degli affreschi dell'Auditorium di S. Margherita
- Esecuzione di ulteriori interventi di imbrigliamento a Ca' Foscari
- Restauro delle parti lapidee esterne della sede di Ca' Cappello
- Interventi di restauro presso la sede di S. Sebastiano

4) VIA TORINO – Facoltà di SS.MM.FF – La progettazione è stata affidata alla Ati formata dall'arch. G.P. Mar, dall'Ing. G. Finotti e dai Professionisti Raggruppati arch. C. Lamanna e arch. F. Pittaluga. Il progetto è in corso di stesura.

5) VIA TORINO Capannoni - Adeguamento funzionale del capannone da adibire a laboratorio chimico per la facoltà di Scienze MM.FF.NN.. Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

6) S. MARTA Teatro G. Poli - Restauro e adeguamento funzionale. Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1999

LEGGE 515/96

Mutuo Mediocredito

1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Il progettista ha completato il progetto esecutivo e si è in attesa del parere del Provveditorato Regionale alle OO.PP.

2) ZATTERE Ex falegnameria – La Commissione di Salvaguardia ha dato parere favorevole al progetto in data 23 aprile 1998 e il Comando dei VV.FF. in data 22 settembre 1998.

3) ATTUAZIONE D.LGS 626/94 - Attuazione delle condizioni per la messa a norma degli edifici secondo le disposizioni dettate dalla legge sulla prevenzione e protezione dai rischi.

Mutuo Crediop

1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Il progettista ha completato il progetto esecutivo e si è in attesa del parere del Provveditorato Regionale alle OO.PP.

2) ZATTERE Ex falegnameria - La Commissione di Salvaguardia ha dato parere favorevole al progetto in data 23 aprile 1998 e il Comando dei VV.FF. in data 22 settembre 1998. Si stanno avviando le procedure per la gara d'appalto.

LEGGE 345/97 mutuo Crediop

1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

2) CA'FOSCARI – L'importo è stanziato per il restauro.

3) Acquisto edifici

4) Manutenzione straordinaria – Sono stati finanziate opere di falegnameria e opere lapidee della sede di Ca'Garzoni e Moro nell'ambito del restauro della sede stessa.

LEGGE 345/97 mutuo Meliorbanca

1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

2) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

3) CA'FOSCARI – L'importo è stanziato per il restauro.

4) ATTUAZIONE D.LGS 626/94 - Attuazione delle condizioni per la messa a norma degli edifici secondo le disposizioni dettate dalla legge sulla prevenzione e protezione dai rischi.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1999

LEGGE 295/98 mutuo San Paolo IMI

1) SAN BASILIO – E' stato affidato l'incarico di progettazione preliminare e definitiva.

5) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

6) ZATTERE – Vedi precedenti leggi.

7) ATTUAZIONE D.LGS 626/94 - Attuazione delle condizioni per la messa a norma degli edifici secondo le disposizioni dettate dalla legge sulla prevenzione e protezione dai rischi.

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 139/92	**34.835.929.049**			
	mutuo I.M.I.	**25.347.333.394**			
1	Informatizzazione Ateneo e delle Biblioteche		5.219.250.912	5.219.250.912	5.219.250.912
2	S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		6.163.082.929	6.163.082.929	6.163.082.929
3	S.Giobbe fase "C" - e "B" 1° stralcio		712.476.315	712.476.315	712.476.315
4	Zattere - acquisto SCI		10.260.000.000	10.260.000.000	9.677.800.000
5	Opere varie manutenz. straordinaria		2.345.043.328	2.345.043.328	2.344.506.422
6	Ca' Zorza - acquisto 3° piano		647.479.910	647.479.910	647.479.910
	mutuo B.N.L.	**9.488.595.655**			
1	S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		1.780.547.066	1.780.547.066	1.780.547.066
2	Ca' Bembo - acquisto		2.905.860.880	2.905.860.880	2.905.860.880
3	Zattere - acquisto Star Gas 1		2.500.880.759	2.500.880.759	2.500.880.759
4	Zattere - acquisto Star Gas 2		2.301.306.950	2.301.306.950	2.301.306.950
	TOTALE		**34.835.929.049**	**34.835.929.049**	**34.253.192.143**

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 539/95	17.090.000.000			
	mutuo CREDIOP	8.728.000.000			
1	S.Globbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		5.636.912.432	5.636.912.432	5.636.912.432
2	S.Globbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		201.614.280	201.614.280	96.322.999
3	Opere di manutenzione straordinaria		719.407.959	719.407.959	719.407.959
4	S.Marta fabb. "C" 1°stralcio Compl.		367.057.539	367.057.539	367.057.539
5	Ca' Garzoni e Moro - Ristrutt. e adeg. norme sicurezza e prev. incendi		1.496.779.508	1.496.779.508	1.496.779.508
6	S.Marta fabbr. "C" - 2° str. restauro e adeguamento funzionale		306.228.282	306.228.282	306.228.282
			8.728.000.000	8.728.000.000	8.622.708.719
	mutuo INTERBANCA	8.362.000.000			
1	S.Globbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		4.056.074.595	0	0
2	S. Globbe Poste - restauro e adeguamento funzionale		1.000.000.000	0	0
3	Opere varie manutenz. straor.		716.834.390	716.834.390	0
4	Via Torino - Facoltà di SS.MM.FF		1.874.493.236	1.874.493.236	0
5	Via Torino - Capannoni		691.817.094	691.817.094	0
6	S.Marta - Aula Teatro		22.780.685	22.780.685	0
	TOTALE		8.362.000.000	3.305.925.405	0

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 515/96	**34.000.176.000**			
	mutuo MEDIOCREDITO	**21.210.176.000**			
1	S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		13.710.176.000		0
2	Zattere Capannone		5.000.000.000	5.000.000.000	196.134.653
3	Attuazione D.Lgs 626/94		2.500.000.000	281.658.295	141.738.000
	mutuo CREDIOP	**12.790.000.000**			
1	S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		11.790.000.000	0	0
2	Zattere Capannone		1.000.000.000	1.000.000.000	0
	TOTALE		**34.000.176.000**	**6.281.658.295**	**337.872.653**

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 345/97	**41.900.000.000**			
	mutuo CREDIOP	**31.900.000.000**			
1	S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		10.527.000.000		0
2	Ca'Foscari - restaurc		10.392.546.435		
3	Calle del Guardiani - Paletra		134.453.565	134.453.565	
4	Acquisto edifici		8.613.000.000		
5	Manutenzione staordinaria		2.233.000.000	582.784.100	548.023.493
	TOTALE		**31.900.000.000**	**717.237.665**	**548.023.493**
	mutuo Mellorbanca	**10.000.000.000**			
1	S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		1.861.968.810	1.861.968.810	0
2	San Giobbe - Fase "B" 2° stralcio		1.138.031.190		
3	Ca'Foscari - restaurc		6.000.000.000		
4	Attuazione D.Lgs 626/94		1.000.000.000		
	TOTALE		**10.000.000.000**	**1.861.968.810**	**0**

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 295/98	18.188.615.201			
	mutuo San Paolo IMI	18.188.615.201			
1	San Basilio - Adeguamento funzionale		6.366.015.320		0
2	S.Giobbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		9.185.055.273		
3	Zattere Capannone		1.910.000.000	1.910.000.000	
4	Attuazione D.Lgs 626/94		727.544.608		
	TOTALE		18.188.615.201	1.910.000.000	0

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 67/88 - Fondi Ministeriali	25.000.000.000			
1	S. Sebastiano - Restauro e adeguamento funzionale		2.500.000.000	2.343.000.000	2.195.000.000
2	S. Margherita - Restauro e adeguamento funzionale		3.000.000.000	2.975.800.000	2.568.000.000
3	Ca' Garzoni e Moro - Ristrutt. e adeg. norme sicurezza e prev. incendi		3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
4	Ca' Foscari - Ristrutturazione e adeguamento funzionale		574.000.000	574.000.000	491.000.000
5	S. Marta - Ristrutturazione e adeguam. funzionale dei laborat. chimici		5.400.000.000	5.394.448.889	5.208.000.000
6	Calle dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		4.900.000.000	4.891.173.981	3.956.035.000
7	Palazzo Nani Mocenigo - Restauro e adeguamento funzionale		1.524.000.000	1.523.920.000	144.000.000
8	Ca' Cappello - Restauro e adeguamento funzionale		500.000.000	500.000.000	485.000.000
9	Wolf Ferrari - Restauro e adeguamento funzionale		500.000.000	500.000.000	500.000.000
10	Celestia - Ristrutturazione e adeguamento funzionale		1.102.000.000	1.101.282.140	1.066.000.000
11	Restauro e adeguamento funzionale di S.Giobbe e altri edifici		2.000.000.000	2.000.000.000	1.565.000.000
	TOTALE		25.000.000.000	24.803.625.010	21.178.035.000

	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 331/85 Fondi Ministeriali	12.160.000.000			
	Edilizia Generale e Dipartimentale	11.330.000.000			
1	lavori noppi/c.p.i. (+rev. prezzi)		11.330.000.000	10.764.437.664	10.188.688.886
	Edilizia Sportiva	830.000.000			
1	Calle dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		830.000.000	830.000.000	830.000.000
	TOTALE		12.160.000.000	11.594.437.664	11.018.688.886

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 407/89 Fondi Ministeriali	10.900.000.000			
	Edilizia Generale e Dipartimentale	10.000.000.000			
1	Via Torino - Manutenzione e adeguamento funzionale del capannone		5.000.000.000	4.976.978.690	4.494.000.000
2	S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	Edilizia Sportiva	900.000.000			
1	Calle dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		900.000.000	900.000.000	900.000.000
	TOTALE		10.900.000.000	10.876.978.690	10.394.000.000
	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 725/94 Fondi Ministeriali	2.419.000.000			
	Edilizia Generale e Dipartimentale	2.338.000.000			
1	S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		2.000.000.000	2.000.000.000	0
2	S. Sebastiano - restauro		388.000.000	0	0
	Edilizia Sportiva	31.000.000			
1	Calle dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		31.000.000	0	0
	TOTALE		2.419.000.000	2.000.000.000	0

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
.	LEGGE 550/95 Fondi Ministeriali	3.299.000.000			
	Edilizia Generale e Dipartimentale	3.131.000.000			
1	S.Marta teatro G.Poli - restauro e adeguamento funzionale		1.467.645.889	1.467.645.889	604.873.705
2	Via Torino - Manutenzione e adeguamento funzionale del capannone		518.309.448	518.309.448	126.472.000
3	Via Torino - Facoltà SS.MM.FF		481.690.552	481.690.552	42252097
4	S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		663.354.111	663.354.111	583.354.111
	Edilizia Sportiva	168.000.000			
1	Calle del Guardiani - Realizzazione di una palestra		168.000.000	168.000.000	
	TOTALE		3.299.000.000	3.299.000.000	1.356.951.913
	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 663/96 Fondi Ministeriali	2.357.000.000			
	Edilizia Generale e Dipartimentale	2.243.000.000			
1	Attuazione D.Lgs. 626/94		1.000.000.000	447.226.248	68.482.098
2	S.Giobbe Fase "A"		1.000.000.000	1.000.000.000	122.916.709
3	Via Torino - Manutenzione e adeguamento funzionale del capannone		243.000.000	243.000.000	
	Edilizia Sportiva	114.000.000			
1	Calle del Guardiani - Realizzazione di una palestra		114.000.000	114.000.000	0
	TOTALE		2.357.000.000	1.804.226.248	191.398.807

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 450/97 Fondi Ministeriali	3.466.000.000			
	Edilizia Generale e Dipartimentale	3.229.000.000			
1	Attuazione D.Lgs. 626/94		500.000.000		
. 2	San Basilio - Adeguamento funzionale		1.593.310.330		
3	S.Giobbe Fase "A"		500.000.000	500.000.000	
4	Via Torino - Capannone		635.689.670	635.689.670	
	Edilizia Sportiva	237.000.000			
1	Calle dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		237.000.000	237.000.000	0
	TOTALE		3.466.000.000	1.372.689.670	0

Documento G *Autorità Portuale di Venezia*

Stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità Portuale finanziati dalla Legislazione Speciale per Venezia - Aggiornamento al 31 dicembre 1999

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Venezia

Direzione Amministrazione e Pianificazione

Al MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE
Segreteria del Comitato di coordinamento
e controllo
(art.4 – legge 29.11.1984, n.798)
S.Polo, 19
30125 VENEZIA

ANTICIPATO VIA FAX

AMM/PIAN. 165/6092

Venezia, 07.06.00

Oggetto: Stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità Portuale finanziati dalla legislazione speciale per Venezia – Leggi 515/1996 e 295/1998.

In risposta alla lettera Prot.107/GAB del 18 maggio 2000 si trasmette, unito alla presente, un dettagliato quadro, aggiornato al 31/12/1999, sullo stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la Legge 515/96.

Per quanto riguarda la Legge 295/98, in data 29 dicembre 1999 è stato stipulato, così come previsto dal D.M. 9 marzo 1999, il contratto di mutuo per l'utilizzo del contributo quindicennale (pari a 1.000 mio Lit/anno) a decorrere dal 1999: tale contratto prevede un finanziamento massimo di 12.000 mio Lit.

Si anticipa, inoltre, che, allo stato attuale, è in corso di pubblicazione il bando di gara per la contrazione del mutuo relativo al contributo a decorrere dal 2000 (1.000 mio Lit/anno).

Si specifica che i valori riportati nelle tabelle allegate sono espressi in milioni di lire.

Il Segretario Generale
Dott. Andrea Razzini

SITUAZIONE UTILIZZO FINANZIAMENTO LEGGE 515/96

FINANZIAMENTO A DECORRERE DAL 1997

LA DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI E DEL QUIETANZATO AL 31.12.99 SONO RIPORTATI IN DETTAGLIO NELLA TABELLA 1

TOTALE DISPONIBILITA' [illegible] mio Lit

TOTALE IMPEGNATO [illegible] mio Lit ⇒ TOTALE QUIETANZATO AL 31/12/99 11.795 mio Lit

[illegible] mio Lit

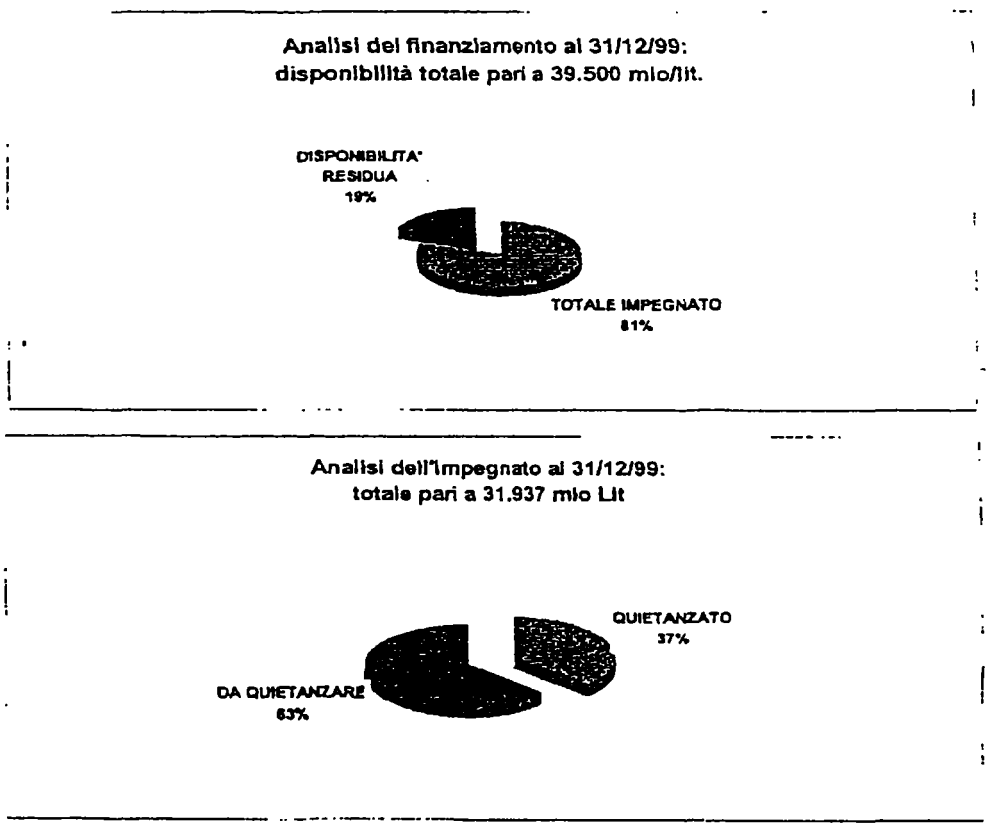


TABELLA 1 ELENCO IMPEGNI E PAGAMENTI I TRANCHE AL 31/12/99

Descrizione	Impegnato mio Lit	Tranche	Tipo Progetto	Quietanzato mio Lit
Indagini geognostiche	29	1997	Banchinamento Molo Sali	29
Escavo canali convenzione con AMAV	3.000	1997	Escavo I fase	3.000
Escavo bacino di evoluzione 4	779	1997	Escavo I fase	779
Fornitura sistema software	113	1997	Escavo I fase	113
Escavo cunetta bacino 4	470	1997	Escavo I fase	470
Convenzione amav smaltimento fanghi	3.111	1997	Escavo I fase	3.111
Riparazione accosto RO-Ro banchina Isonzo	431	1997	Escavo I fase	431
Carotaggi bacini Venezia	131	1997	Escavo I fase	131
Progettazione molo sali	260	1997	Banchinamento Molo Sali	260
Escavo canale Novisso	129	1997	Escavo I fase	129
Escavo da 52W a 196W	1.400	1997	Escavo I fase	1.400
Sistemazione sponda nord canale ind.le sud	1.450	1997	Escavo I fase	1.408
Escavo fondali testata marmi	339	1997	Escavo I fase	339
Escavo 17W - 42W	136	1997	Escavo I fase	136
Indagini geognostiche	6	1997	Banchinamento Molo Sali	6
Ampliamento incarico progett.ne M.Sali	50	1997	Banchinamento Molo Sali	50
Collaudo bacino ev.ne 4 e canale ind.le	3	1997	Escavo I fase	3
Escavo accosti operativi n.7 e 8 di b.na Testat	400	1997	Escavo I fase	-
Completamento Banchinamento M.Sali	16.000	1997	Banchinamento Molo Sali	-
Escavo Bacino 1	1.400	1997	Escavo I fase	-
Escavo Bacino 4	2.300	1997	Escavo I fase	-
Totali	**L. 31.937**			**L. 11.795**

TABELLA 2 ELENCO IMPEGNI E PAGAMENTI II TRANCHE AL 31/12/99

Descrizione	Impegnato mio Lit	Tranche	Tipo Progetto	Quietanzato mio Lit
Sistemazione area Molo Sali	L. 88	1998	Sistemazione area Molo Sali	88
Recinzione doganale a Marghera	L. 235	1998	Sistemazione area Molo Sali	235
Sistemazione sponda nord canale Ind.le	L. 5.080	1998	Escavo II fase	4.756
Formazione recinzione punto franco	L. 115	1998	Sistemazione area Molo Sali	103
Carotaggi ed analisi	L. 170	1998	Escavo II fase	170
Manut.ne area ex monopoli	L. 1.500	1998	Sistemazione area Molo Sali	4
Carotaggi ed analisi (maggiori oneri)	L. 63	1998	Escavo II fase	63
Totali	**L. 7.251**			**L. 5.419**

SITUAZIONE UTILIZZO FINANZIAMENTO LEGGE 515/96


FINANZIAMENTO A DECORRERE DAL 1998


LA DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI E DEL QUIETANZATO AL 31.12.99 SONO RIPORTATI IN DETTAGLIO NELLA TABELLA 2

TOTALE DISPONIBILITA' [illegible] mio Lit

TOTALE IMPEGNATO [illegible] mio Lit ⟹ TOTALE QUIETANZATO AL 31/12/99 5.419 mio Lit

[illegible] mio Lit

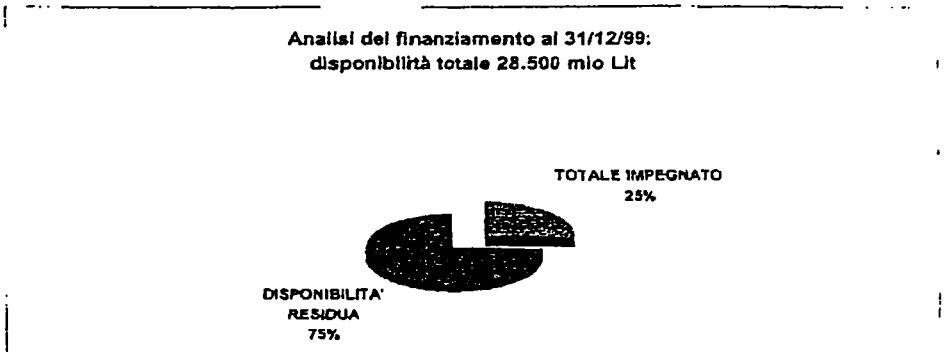

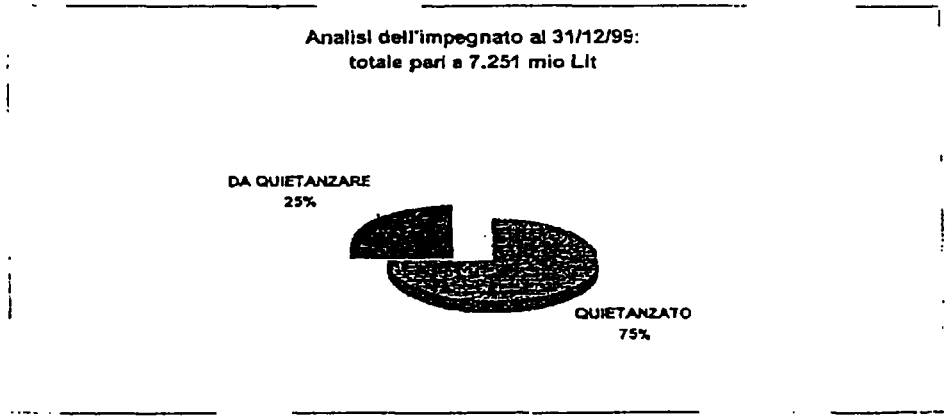

PAGINA BIANCA

Documento H *SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo*

Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale - Aggiornamento al 31 dicembre 1999

PAGINA BIANCA



Il Presidente

Spett.le
Ministero dei Lavori Pubblici
Magistrato alle Acque
Comitato di indirizzo,
coordinamento e controllo
Riva del vin 19
30100 VENEZIA

Oggetto: ***Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale***

Con riferimento alla Vostra richiesta del 22/12/1999 (rif. 291/GAB) in allegato diamo un riepilogo delle opere eseguite od in via di esecuzione per le quali l'Aeroporto di Venezia ha usufruito dei finanziamenti ottenuti con la legislazione in oggetto.

Forniamo inoltre alcune immagini panoramiche che testimoniano l'avanzamento delle opere in corso.

Distinti saluti.

Giovanni Pellicani

Venezia Tessera, 18 GEN. 2000
Prot. nr. 00/0014/Pres/GP/pl

SCHEDA RIEPILOGATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DI OGNI SINGOLO INTERVENTO INFRASTRUTTURALE

Aeroporto	MARCO POLO DI VENEZIA			
Descrizione lavori	Nuova aerostazione, di complessivi 56.000 mq, comprensivi impianti tecnologici.			
Progetto	Presentazione	25-gen-94	decreto di approvazione	13-set-96
	Importo totale	109.103.570.151	Importo a base d'asta	101.965.953.412
Impresa esecutrice	ATI: Grandi Lavori Fincosit S.p.A./ ABB SAE-Sadelmi S.p.A.			
Procedura di gara	procedura aperta			
Contratto	agg. provvisoria	–	stipula contratto	25-lug-97
Importo contratto	per lavori	76.219.550.175	per lavori in economia	–
Consegna lavori	data	21-ago-97	durata contratto in giorni	1644
Propoghe concesse (in giorni)	proroghe: gg 549	sospensioni: –	nuova fine contrattuale: 19-feb-02	
Stato dei lavori	in corso	si	ultimati	
Stato avanzamento lavori (ultimo SAL emesso) (alla data compil. scheda)	Importo	% avanz	di cui a canco Concessionaria	
	7° S.A.L.	al 20dicembre 1999		
	L. 42 636.461 510	48,63%	11 368.756 472	con finanz. CIPE
	L. 42.636 461 510	al 31 dicembre 1999	10.231.880.825	con finanz. Min. Trasporti
			21.035.824.212	L. 139/92 e/o in autofinanziamento
Perizie	decreto n.	del	Importo	di cui a canco della Conces.
1a	005	21-gen-99	11.444.006.304	Vedi sopra
2a	012	29-dic-99	12.728.236.065	in autofinanziamento
... ...	.. ...	... . .	.. ...	
Conto finale	appalto opere			
	penali			
	totale			
Contenzioso				
Collaudo	data	decreto n°	del	

data compilazione scheda: 31-dic-99

SCHEDA RIEPILOGATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DI OGNI SINGOLO INTERVENTO INFRASTRUTTURALE

Aeroporto	MARCO POLO DI VENEZIA			
Descrizione lavori	*Piazzali Aeromobili a servizio della Nuova Aerostazione* passeggeri, per complessivi 70.000 mq circa.			
Progetto	Presentazione	###	decreto di approvazione	16-gen-97
	Importo totale	15.530.333.406	Importo a base d'asta	14.790.793.720
Impresa esecutrice	ATI: Pavimental; Grassetto; Viabit; Kopa.			
Procedura di gara	procedura aperta			
Contratto	agg provvisoria	–	stipula contratto	25-lug-97
Importo contratto	per lavori	14.014.232.239	per lavori in economia	–
Consegna lavori	data	21-ago-97	durata contratto in giorni	820
Propoghe	proroghe	sospensioni	nuova fine contrattuale	
concesse (in giorni)	gg 430	##	16-apr-00	
Stato dei lavori	in corso	si	ultimati	
Stato avanzamento	Importo	%a vanz	di cui a carico Conces	
lavori	10° S A L	al 30 settembre 1999		
(ultimo SAL emesso)	L 14 193 485 958	86,00%	3 972.995 540	con finanz CIPE
			3 575 695 986	con finanz Min. Trasporti
(alla data compil. scheda)	L. 14 900 000 000	al 31 dicembre 1999	7 351 308 473	L. 139/92 e/o in autofinanziamento
Perizie	decreto n	del	Importo	di cui a carico della Conces.
1a	126	30-dic-98	2.481.276.282	Vedi sopra
2a	. ..	. ..	. ..	... ...
... ...	. ..	... ...	... ...	... ...
Conto finale	appalto opere			
	penali			
	totale			
Contenzioso				
Collaudo	data	decreto n°	del	

data compilazione scheda 31-dic-99

SCHEDA RIEPILOGATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DI OGNI SINGOLO INTERVENTO INFRASTRUTTURALE

Aeroporto	MARCO POLO DI VENEZIA			
Descrizione lavori	Viabilità e Parcheggi, a servizio della Nuova Aerostazione, comprendente la viabilità a raso e il sistema parcheggi in fronte aerostazione			
Progetto	Presentazione: ###		decreto di approvazione.	16-gen-97
	Importo totale	11.874.352.874	Importo a base d'asta	11.308.907.499
Impresa esecutrice	ATI: Grassetto; Pavimental; Viabit; Kopa.			
Procedura di gara	procedura aperta			
Contratto	agg provvisoria	–	stipula contratto	30-set-97
Importo contratto	per lavori	8.350.500.000	per lavori in economia	–
Consegna lavori	data	07-ott-97	durata contratto in giorni	924
Propoghe	proroghe	sospensioni	nuova fine contrattuale	
concesse (in giorni)	116	89	17-apr-00	
Stato dei lavori	in corso	si	ultimati	
Stato avanzamento	Importo	% avanz.	di cui a carico Concessionaria	
lavori	4° S A L	al 20 dicembre 1999		
(ultimo SAL emesso)	L. 5 772 499 152	59,59%	1.539 202.241 con finanz. CIPE	
			1.385 282 017 con finanz. Min Trasporti	
(alla data compil. scheda)	L. 5.772 499 152	al 31 dicembre 1999	2 848.014 894 L. 139/92 e/o in autofinanziamento	
Perizie	decreto n	del	Importo	di cui a carico della Conces
1a	#	#	#	#
2a	.. ...	... . .	... ...	.. ...
... ...	.. ...	... . .	... ...	. ...
Conto finale	appalto opere			
	penali			
	totale			
Contenzioso				
Collaudo	data	decreto n°	del	
data compilazione scheda	31-dic-99			

SCHEDA RIEPILOGATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DI OGNI SINGOLO INTERVENTO INFRASTRUTTURALE

Aeroporto	MARCO POLO DI VENEZIA			
Descrizione lavori	Nuova viabilità a doppio livello, a servizio della Nuova Aerostazione Passeggeri			
Progetto	Presentazione:	29-lug-98	decreto di approvazione:	08-apr-99
	Importo totale	19.562.919.700	Importo a base d'asta	19.562.919.700
Impresa esecutrice	ATI: Grandi Lavori Fincosit S.p.A./ ABB SAE-Sadelmi S.p.A.			
Procedura di gara	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 13 lettera f del D.Lgs. 17/3/95 n° 158			
Contratto	agg. provvisoria	–	stipula contratto	01-giu-99
Importo contratto	per lavori	17.500.000.000	per lavori in economia	–
Consegna lavori	data	23-giu-99	durata contratto in giorni	380
Propoghe concesse (in giorni)	proroghe #	sospensioni #	nuova fine contrattuale 06-lug-00	
Stato dei lavori	in corso	si	ultimati	
Stato avanzamento lavori (ultimo SAL emesso) (alla data compil. scheda)	Importo	%	di cui a carico Concessionaria	
	1° S.A.L.	al 5 novembre 99		
	L. 1.500.000.000	8,11%	L. 2.633.346.682 con finanz. L. 139/92 e/o in autofinanziamento	
	L. 2.633.346.682	al 31 dicembre 99		
Perizie	decreto n.	del	Importo	di cui a carico della Conces.
1a	#	#	#	#
2a	... ...	... ...	... ...	... ...
... ...	... ...	... ...	... ...	... ...
Conto finale	appalto opere penali totale			
Contenzioso				
Collaudo	data	decreto n°	del	


data compilazione scheda: 31-ago-99

PAGINA BIANCA


DIREZIONE LAVORI
NUOVA AEROSTAZIONE
E OPERE ESTERNE

7 RILIEVO FOTOGRAFICO

PAGINA BIANCA

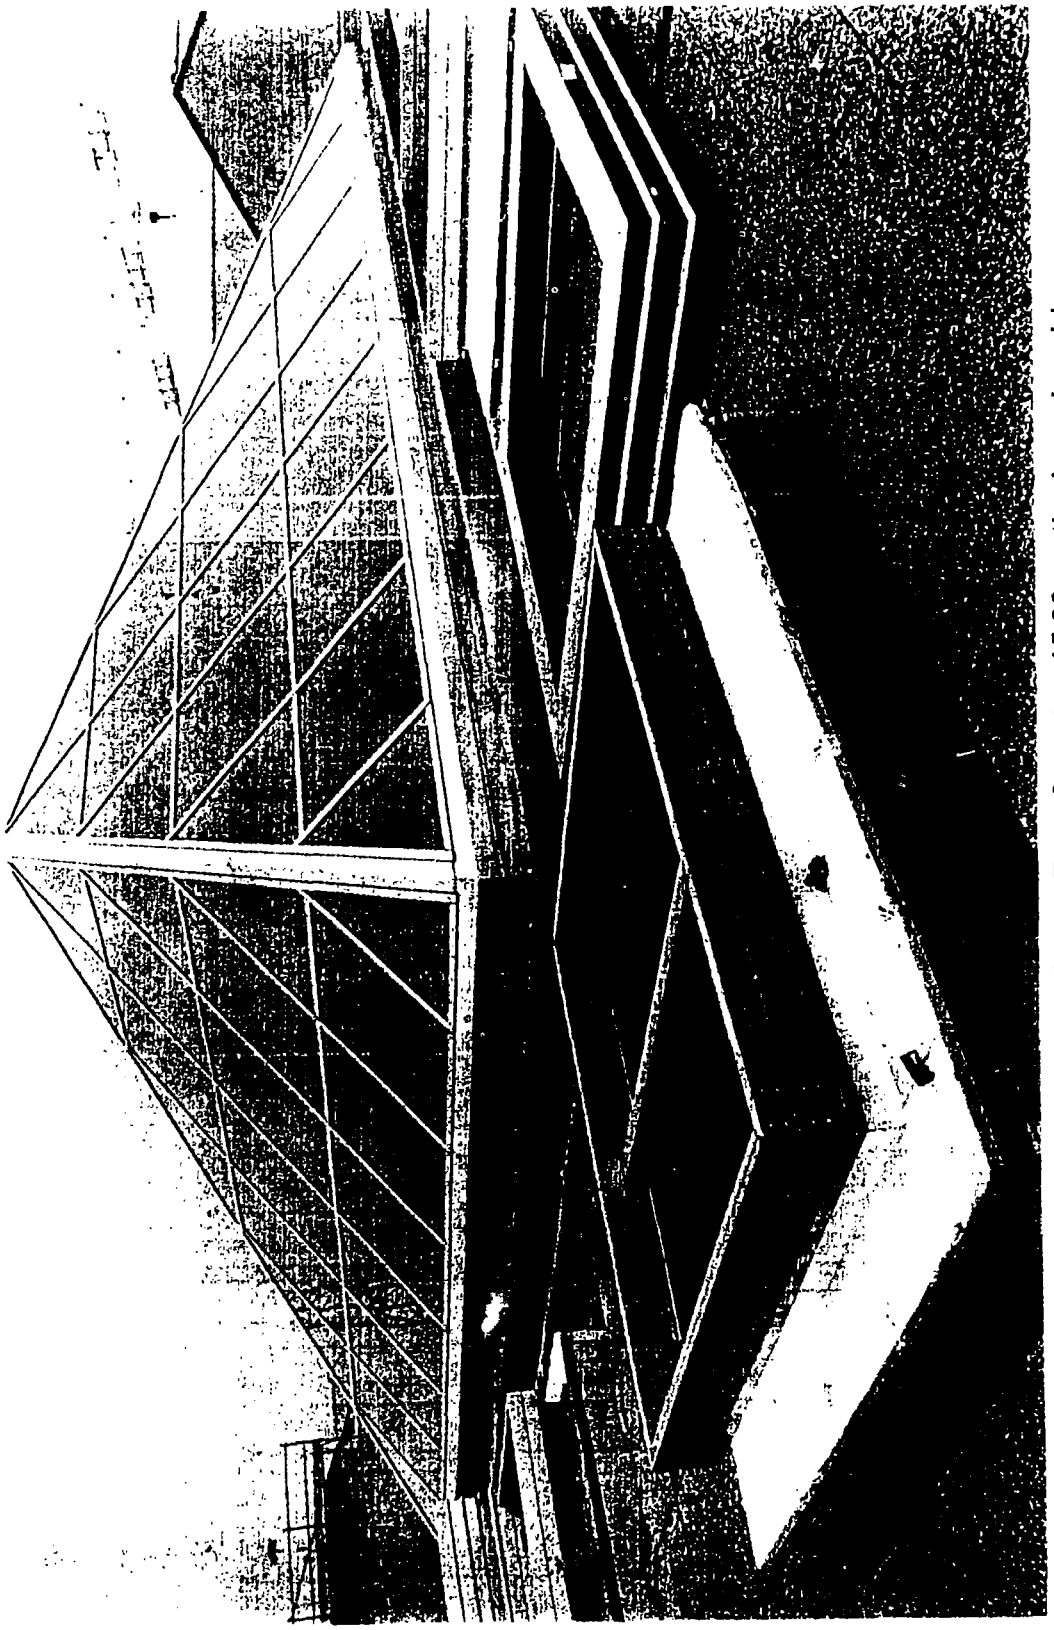


AVE Aeroporto Marco Polo S.p.a.-Nuova Aerostazione – **Zona 2 quota +15,98 particolare piramide**
Fl: Grandi Lavori Fincosit S.p.a. – ABB Sae S.p.a.

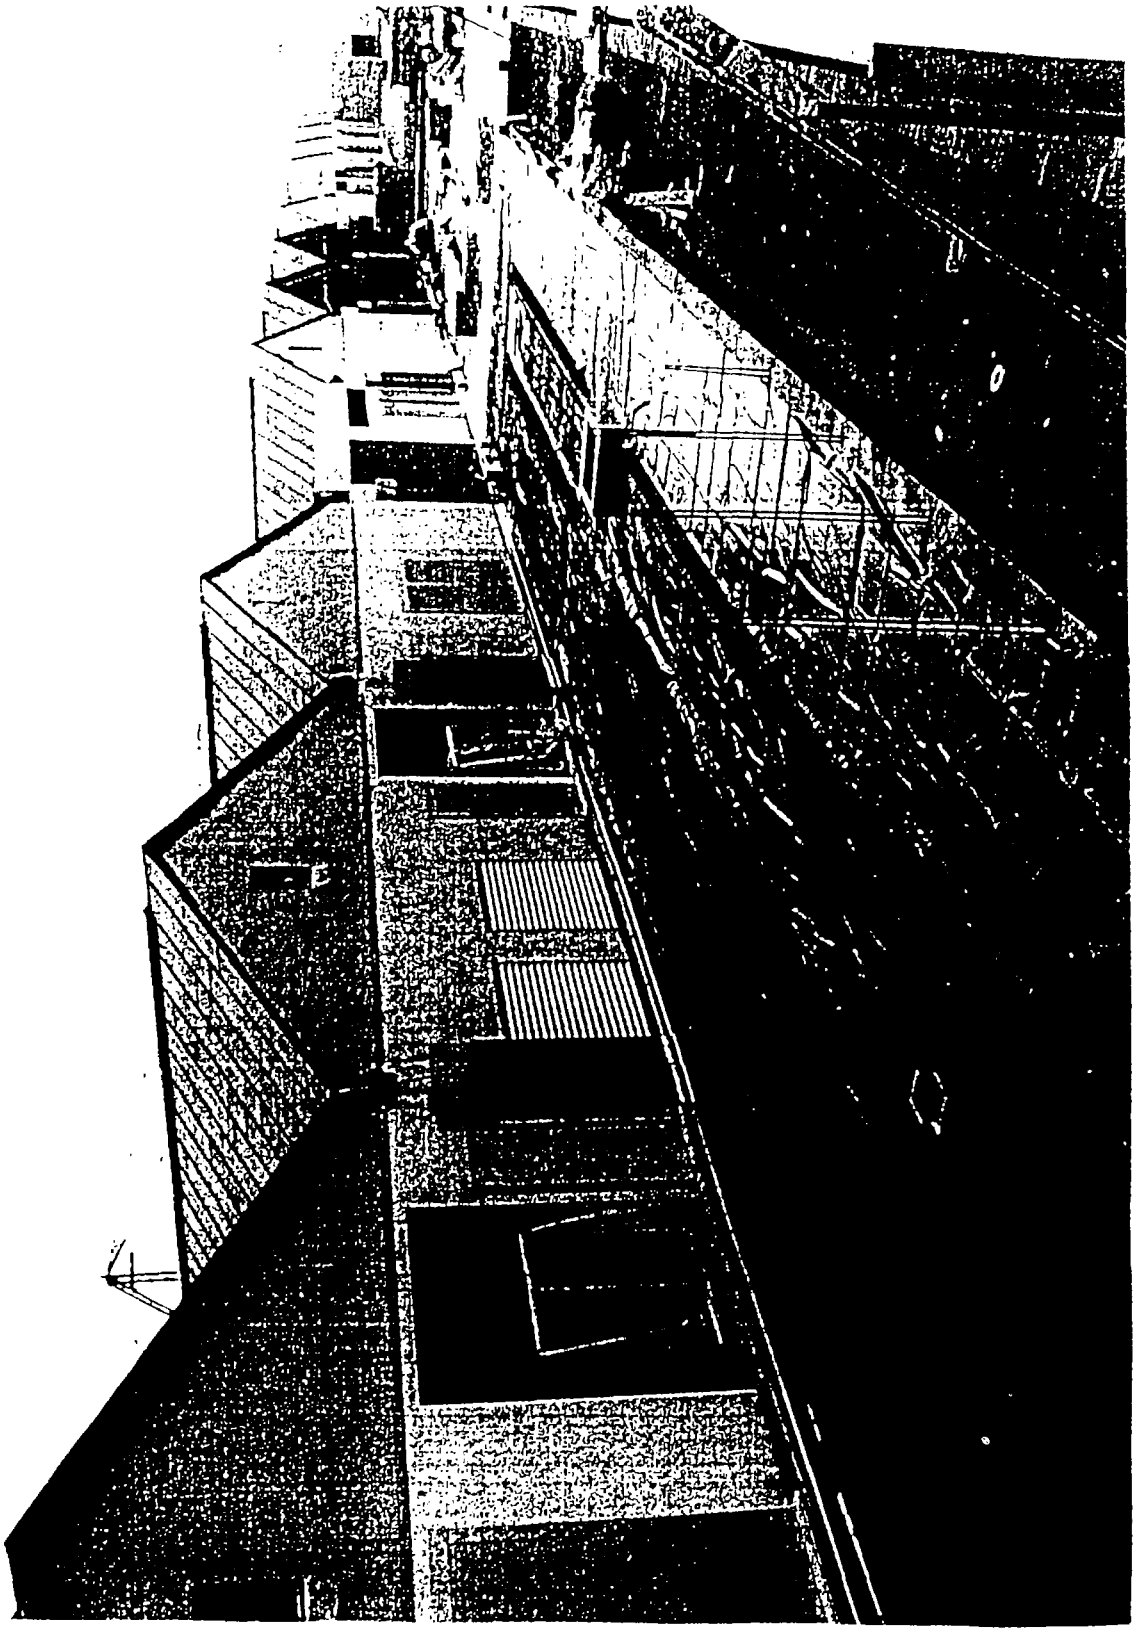


AVE Aeroporto Marco Polo S.p.a.-Nuova Aerostazione – **Zone 3 e 6 particolare colbentazione**

TI: Grandi Lavori Fincosit S.p.a. – ABB Sae S.p.a.

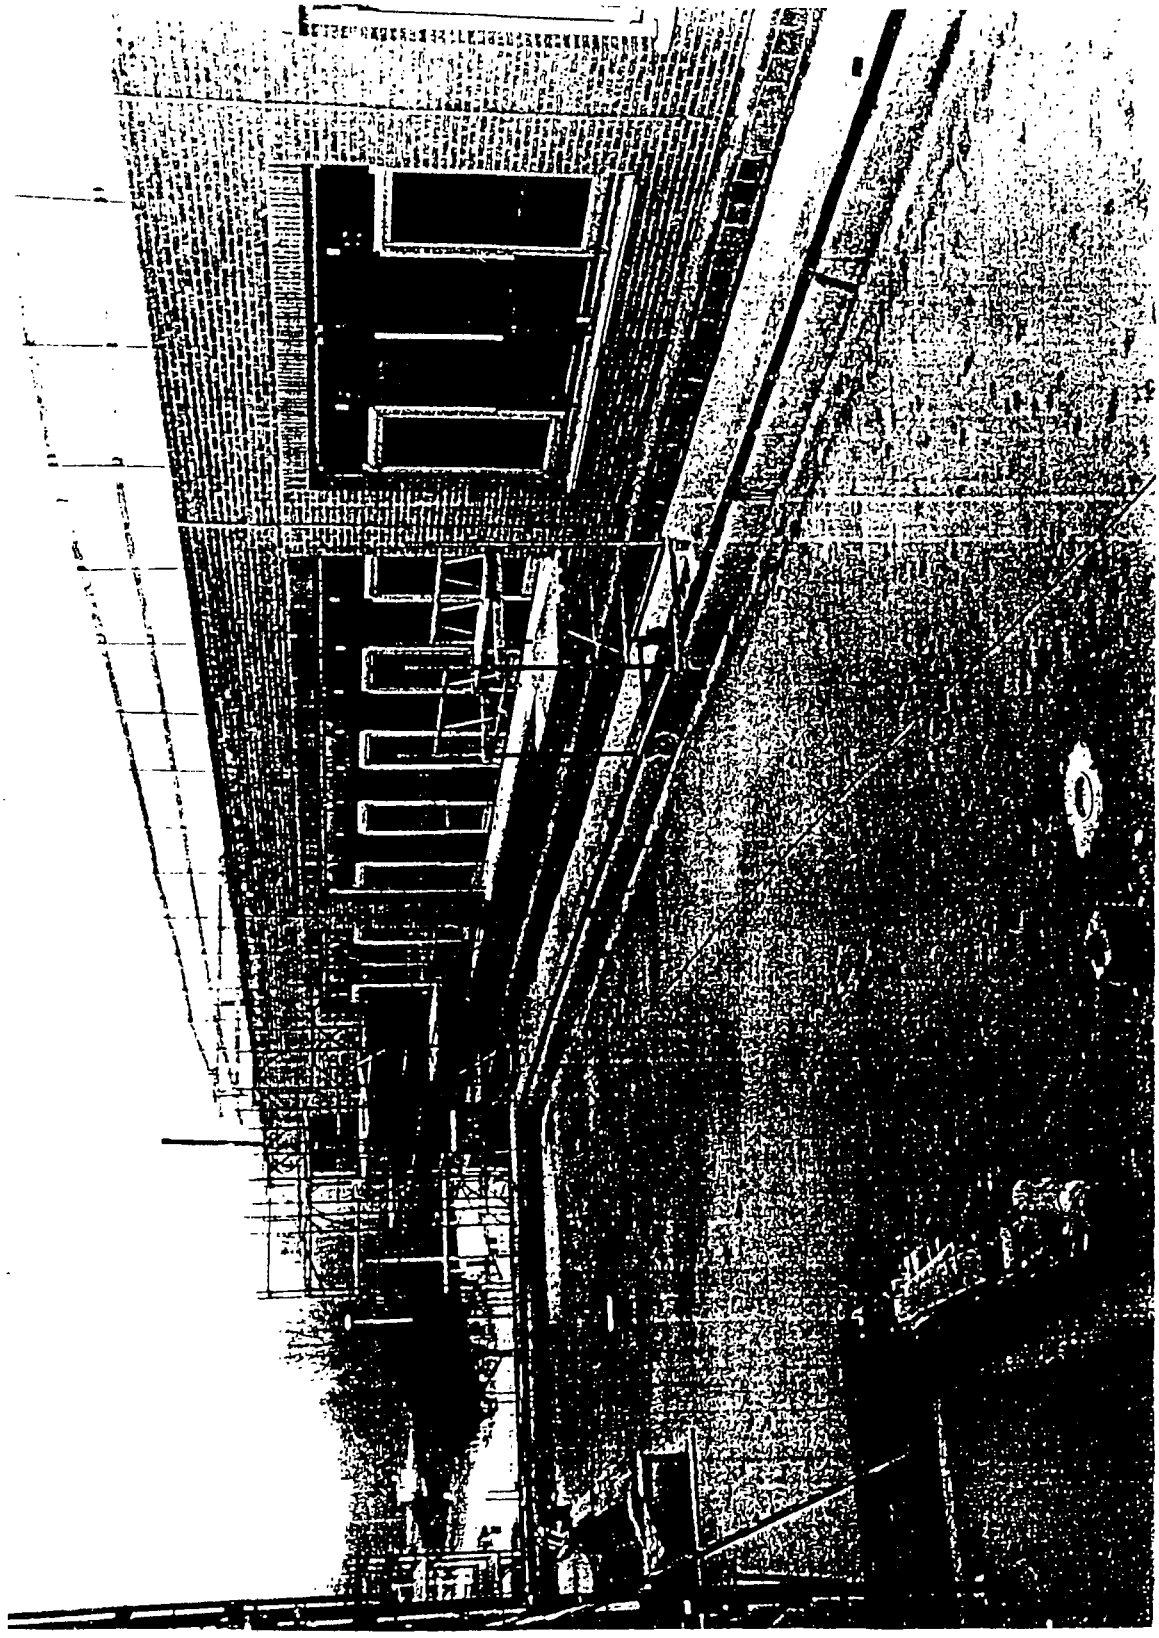


AVE Aeroporto Marco Polo S.p.a.-Nuova Aerostazione – **Zone 4-1 all. 17-16 giardini pensili**


Fl: Grandi Lavori Fincosit S.p.a. – ABB Sae S.p.a.

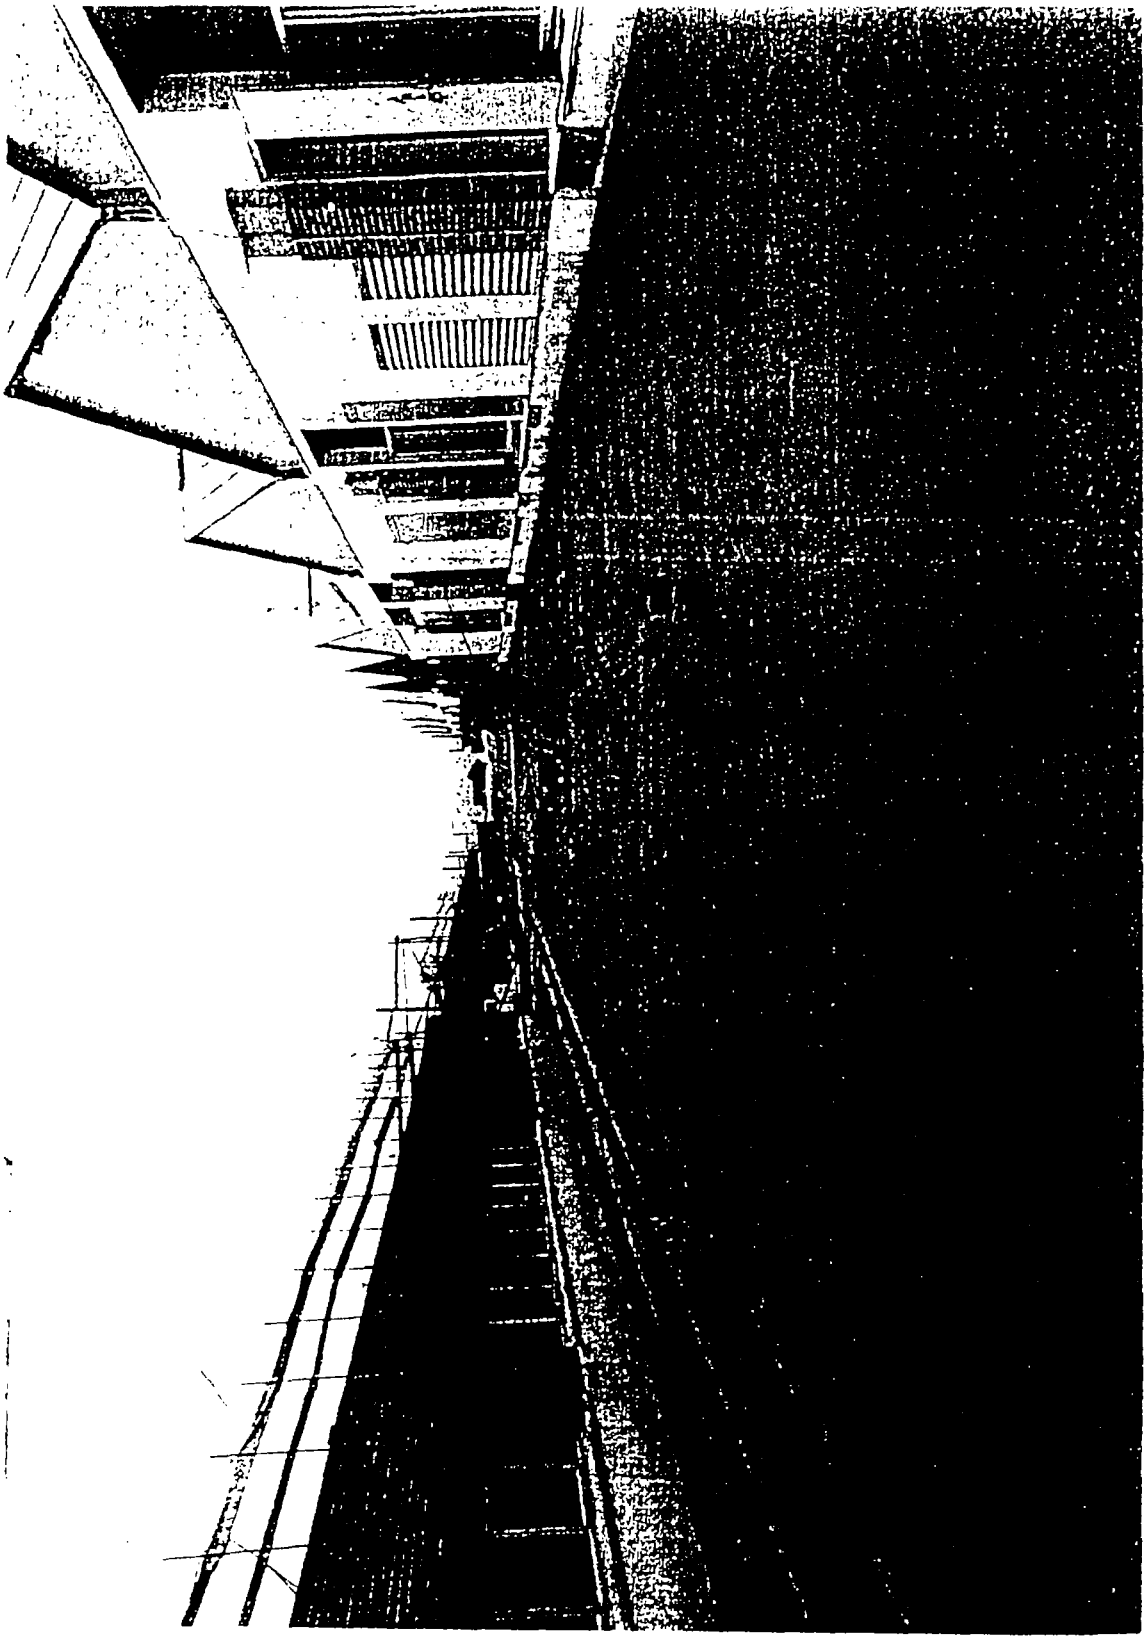

SAVE Aeroporto Marco Polo S.p.a.-Nuova Aerostazione – **Corridoio locali tecnici massetto alleggerito quota +13,28**
ATI: Grandi Lavori Fincosit S.p.a. – ABB Sae S.p.a.

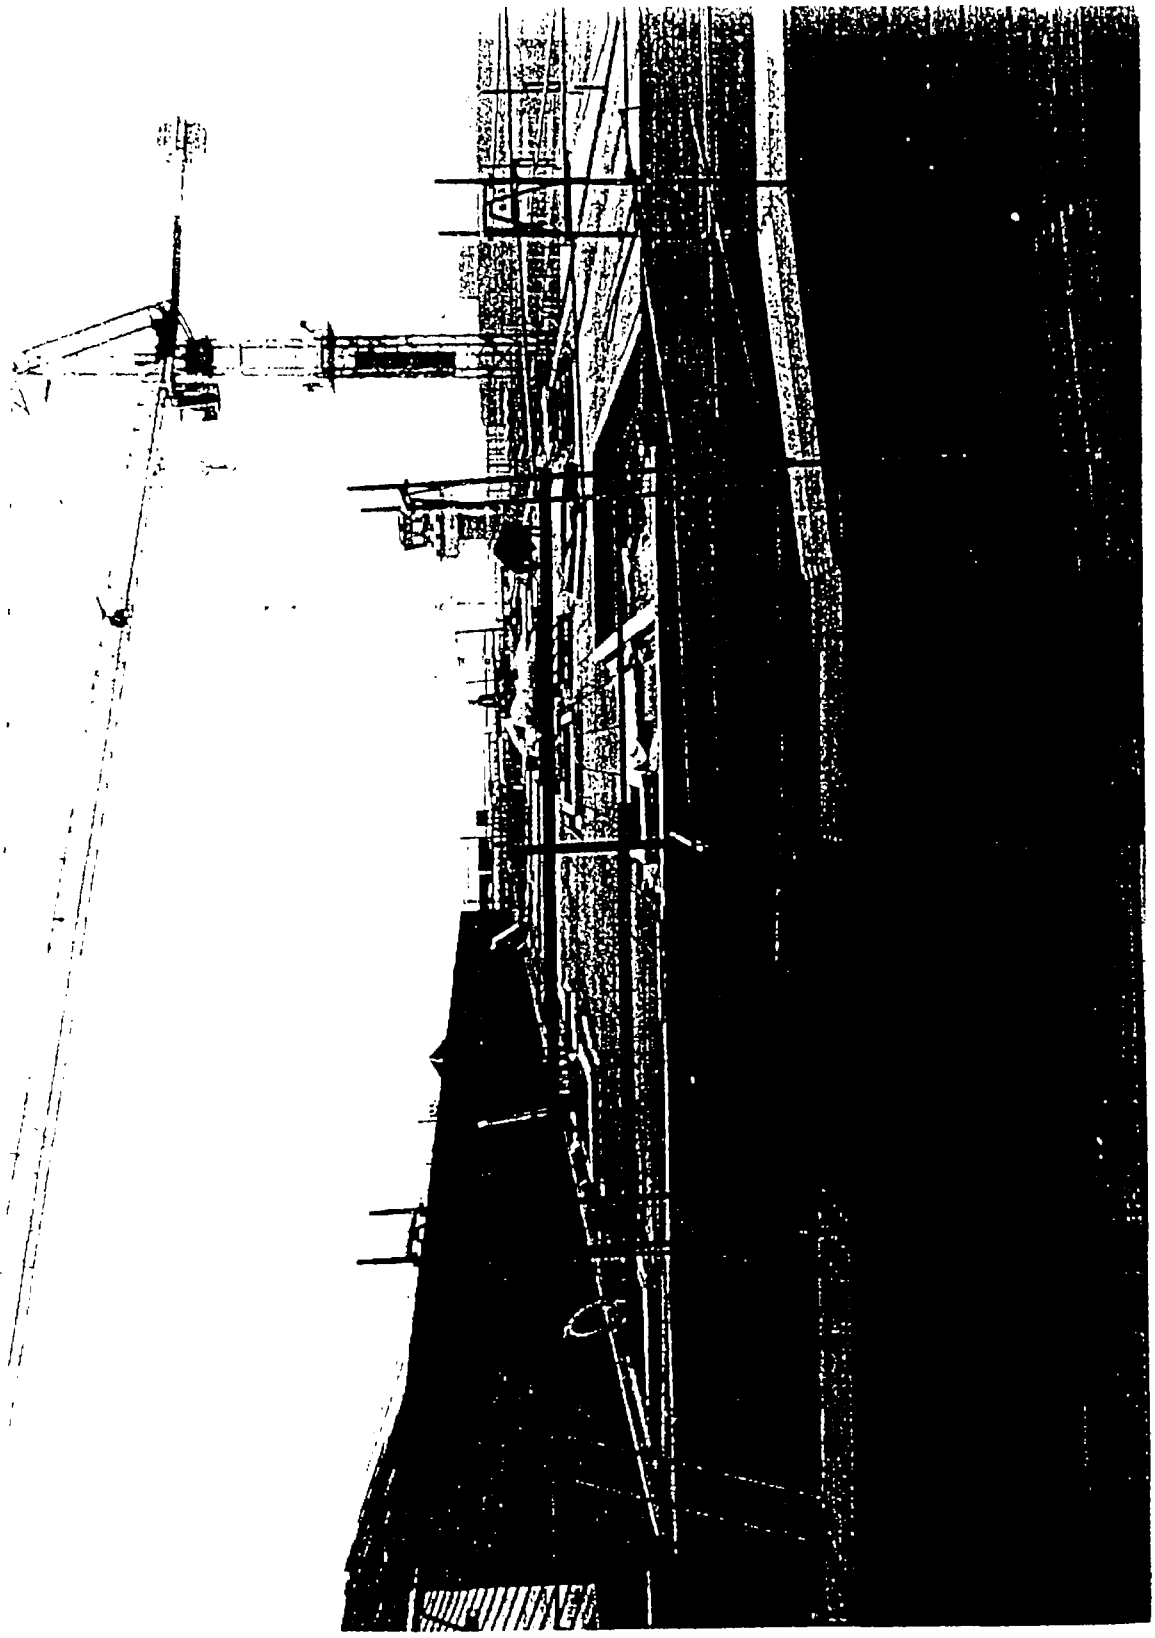


SAVE Aeroporto Marco Polo S.p.a.-Nuova Aerostazione – **Zona 1 quota +15,98 tetto piano impermeabilizzazione**
ATI: Grandi Lavori Fincosit S.p.a. - ABB Sae S.p.a.

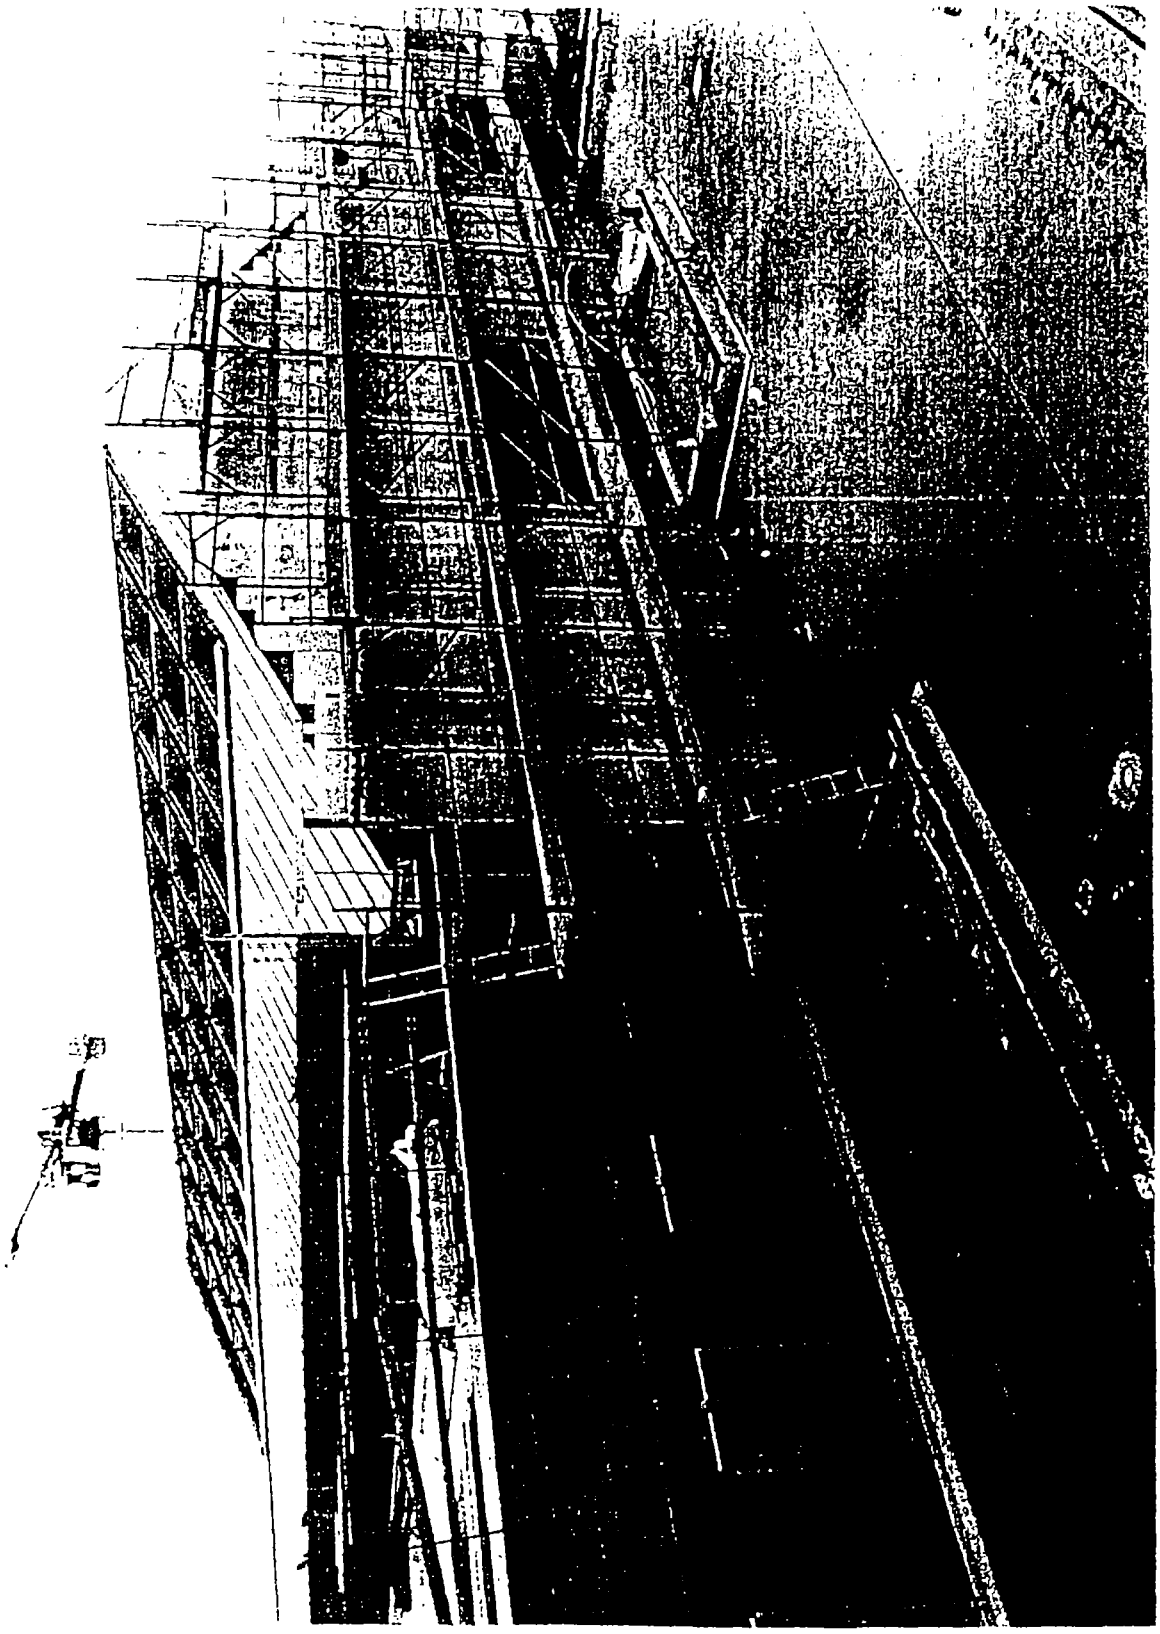


SAVE Aeroporto Marco Polo S.p.a.-Nuova Aerostazione – **Zona 1 quota +11,46 chiusura in gasbeton all. 16**


ATI: Grandi Lavori Fincosit S.p.a. – ABB Sae S.p.a.

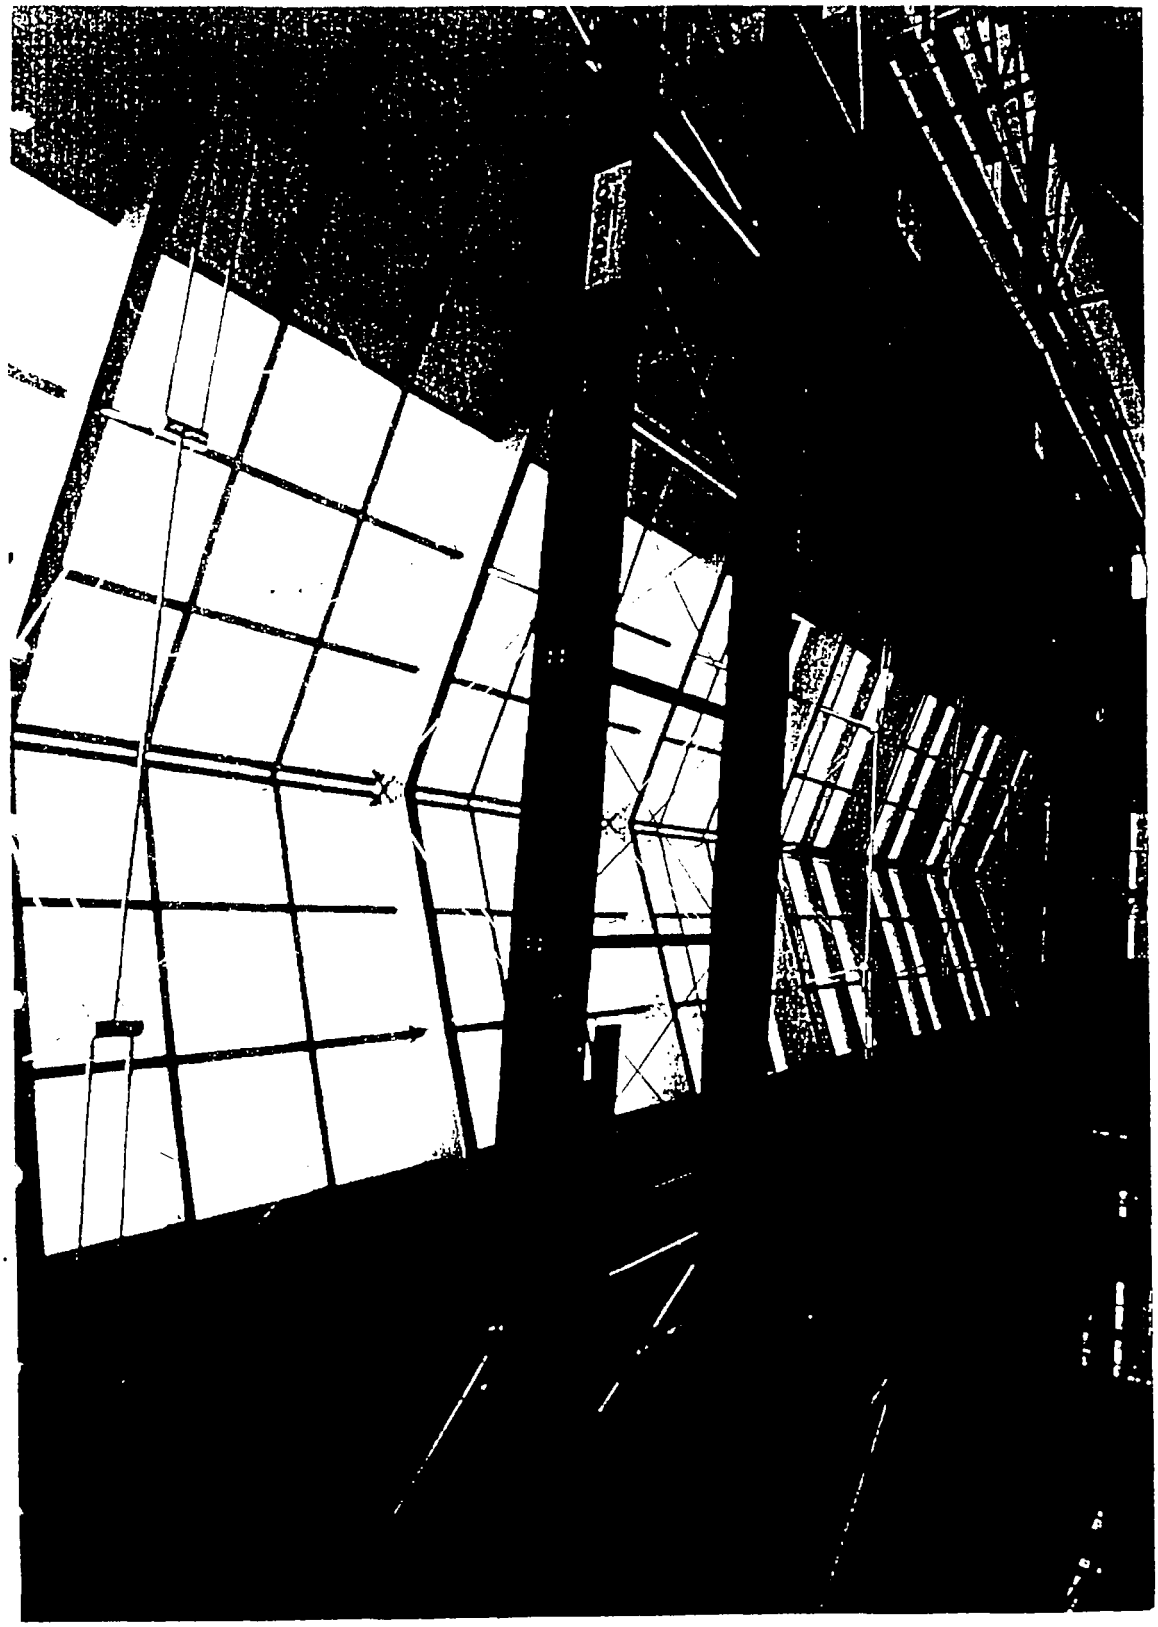

:AVE Aeroporto Marco Polo S.p.a.-Nuova Aerostazione – **Zona 1 copertura centrale**
(TI: Grandi Lavori Fincosit S.p.a. – ABB Sae S.p.a.

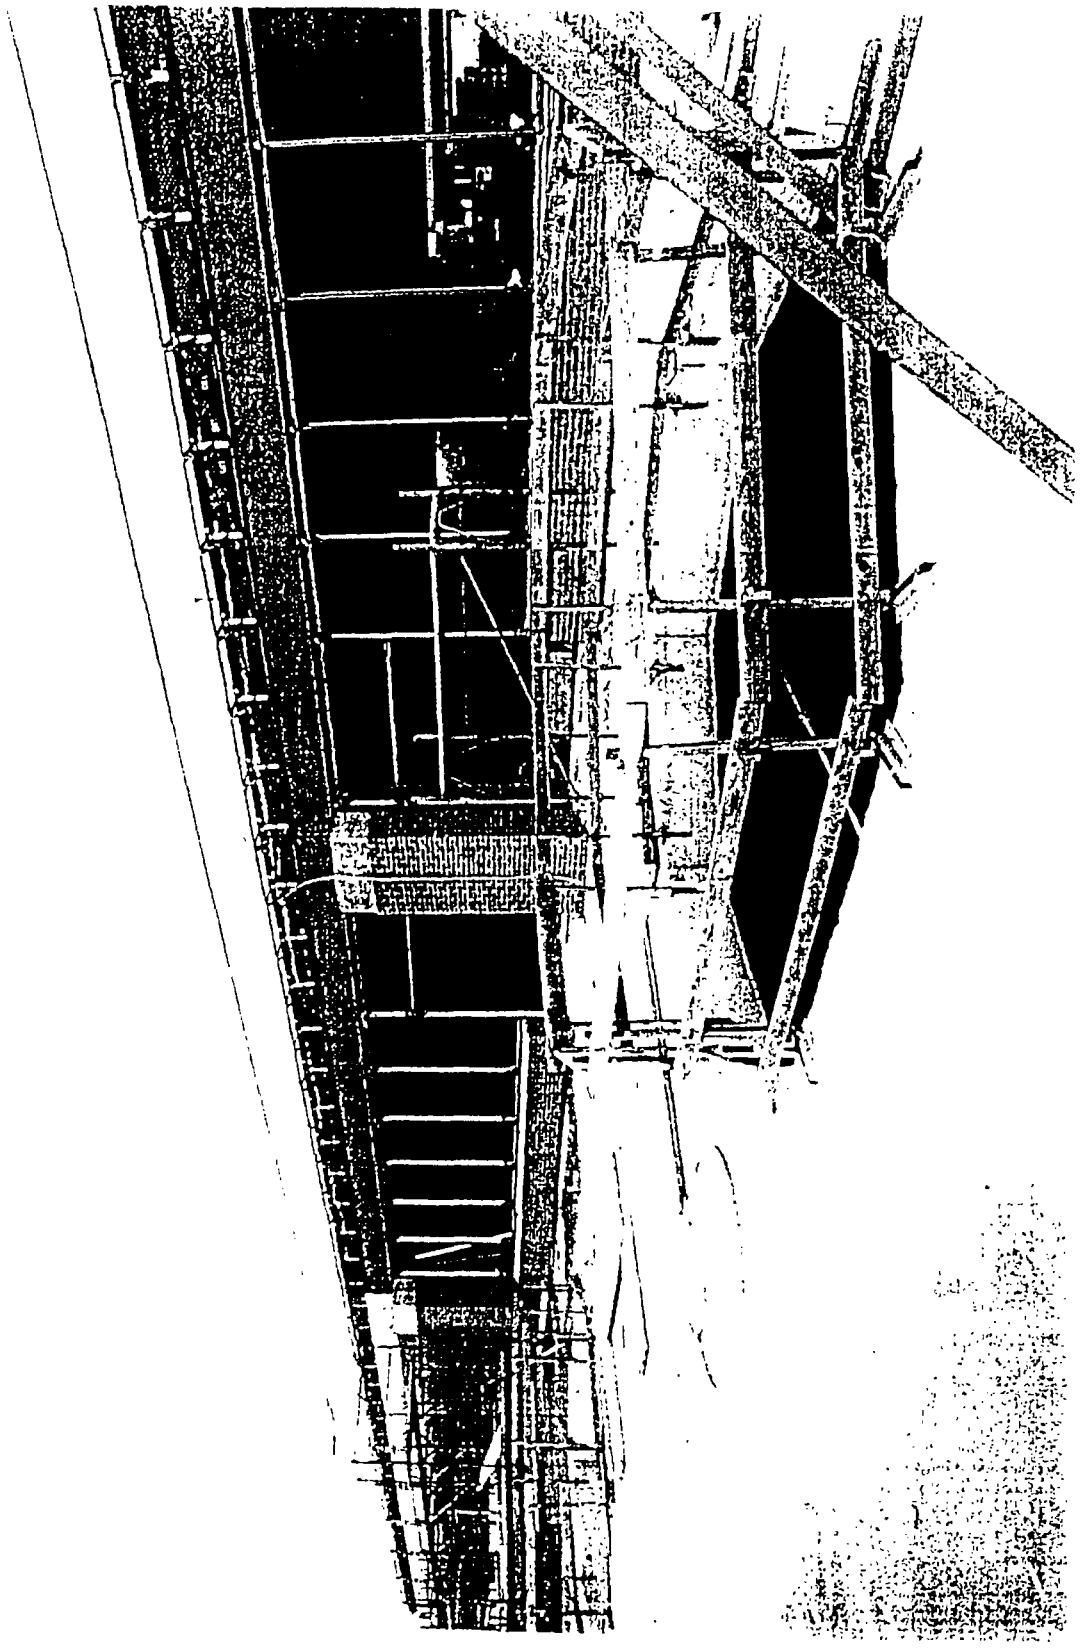

AVE Aeroporto Marco Polo S.p.a.-Nuova Aerostazione – **Zona 6 quota +13,28 particolare telai vetrate**
TI: Grandi Lavori Fincosit S.p.a. – ABB Sae S.p.a.

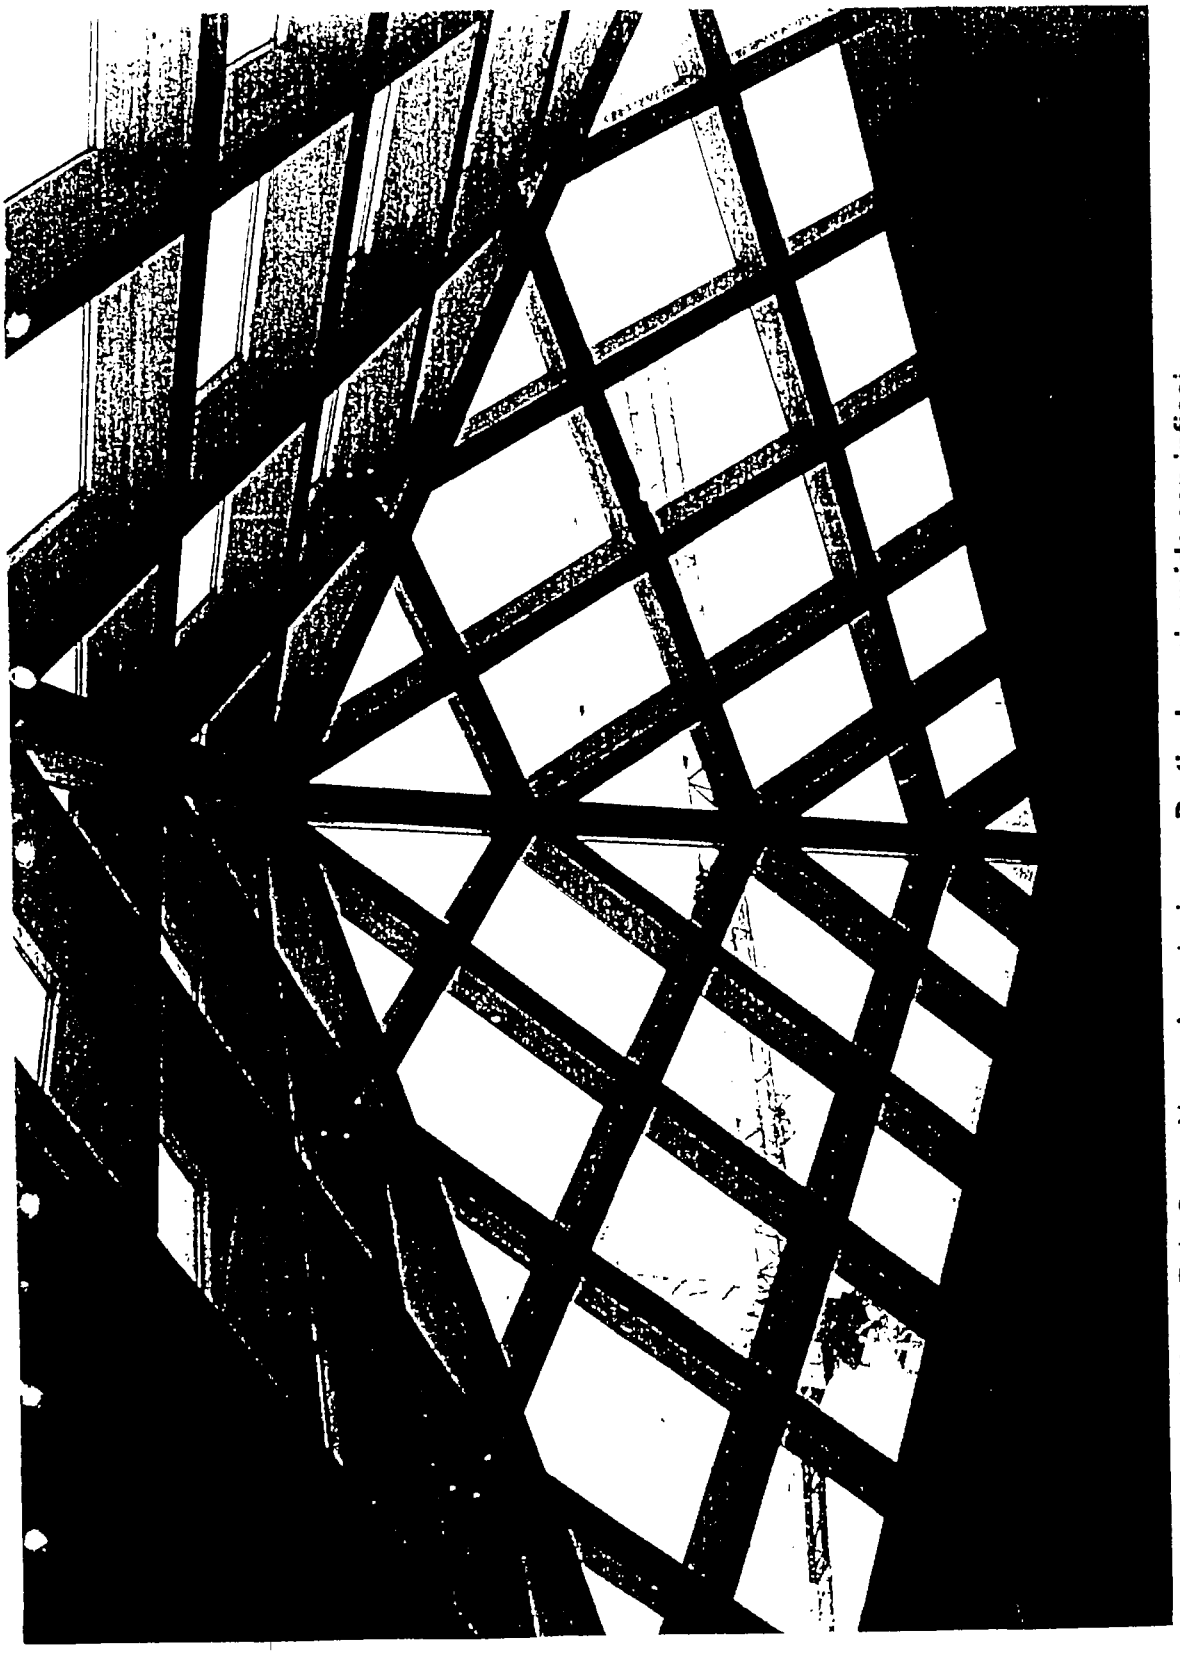



AVE Aeroporto Marco Polo S.p.a.-Nuova Aerostazione – **Particolare piramide con infissi**

TI: Grandi Lavori Fincosit S.p.a. – ABB Sae S.p.a.

PIAZZALI AEROMOBILI


Allacciamento pozzetto con condotta diametro 1.400

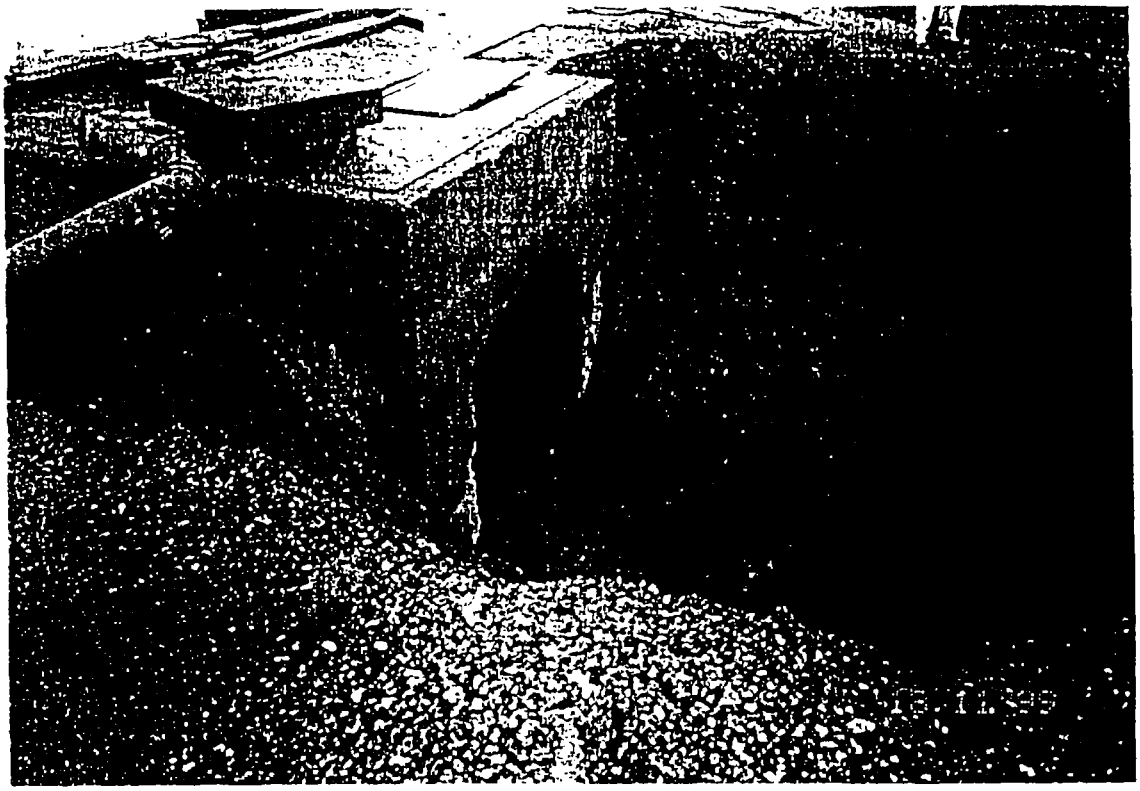


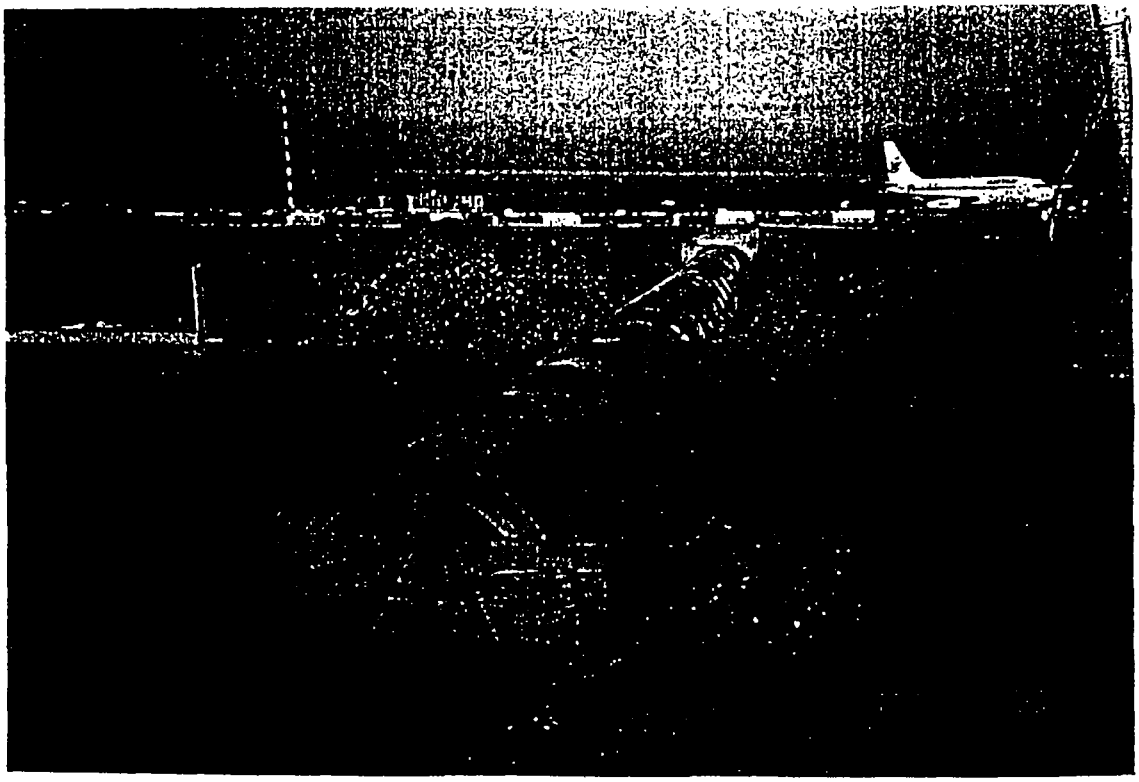

PIAZZALI AEROMOBILI

Ampliamento area fronte Vigili del Fuoco: tombamento fossato

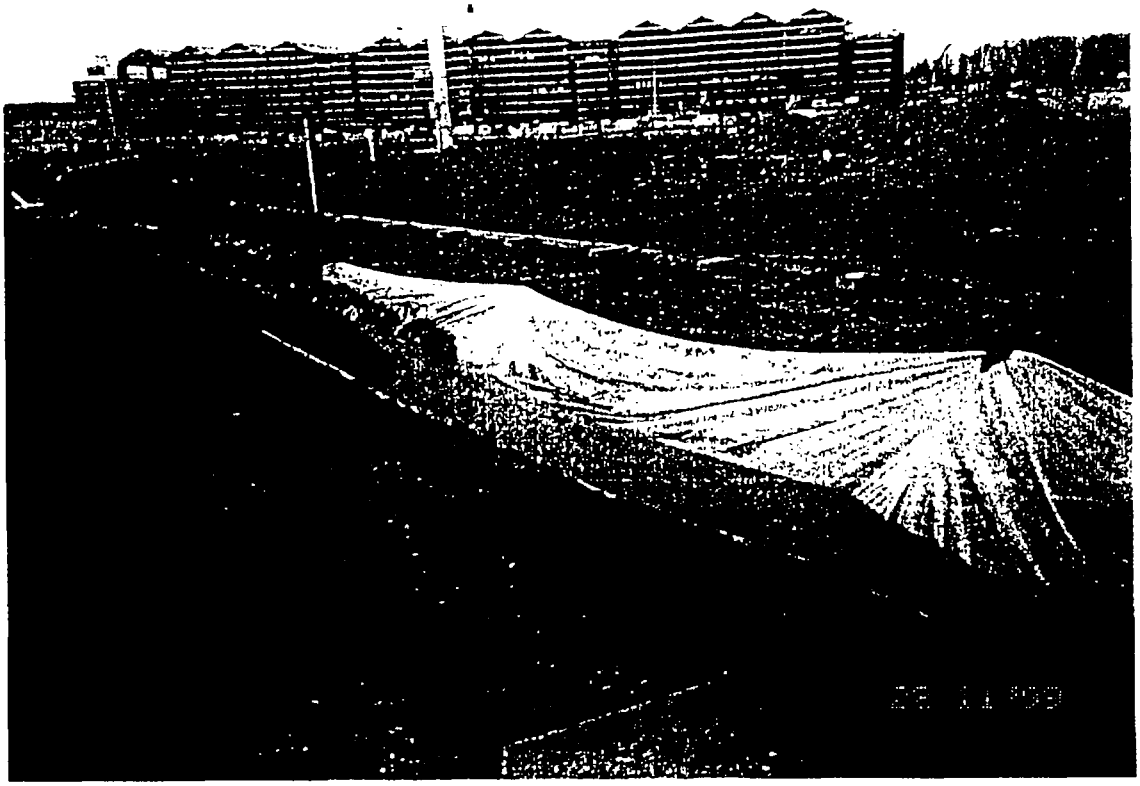

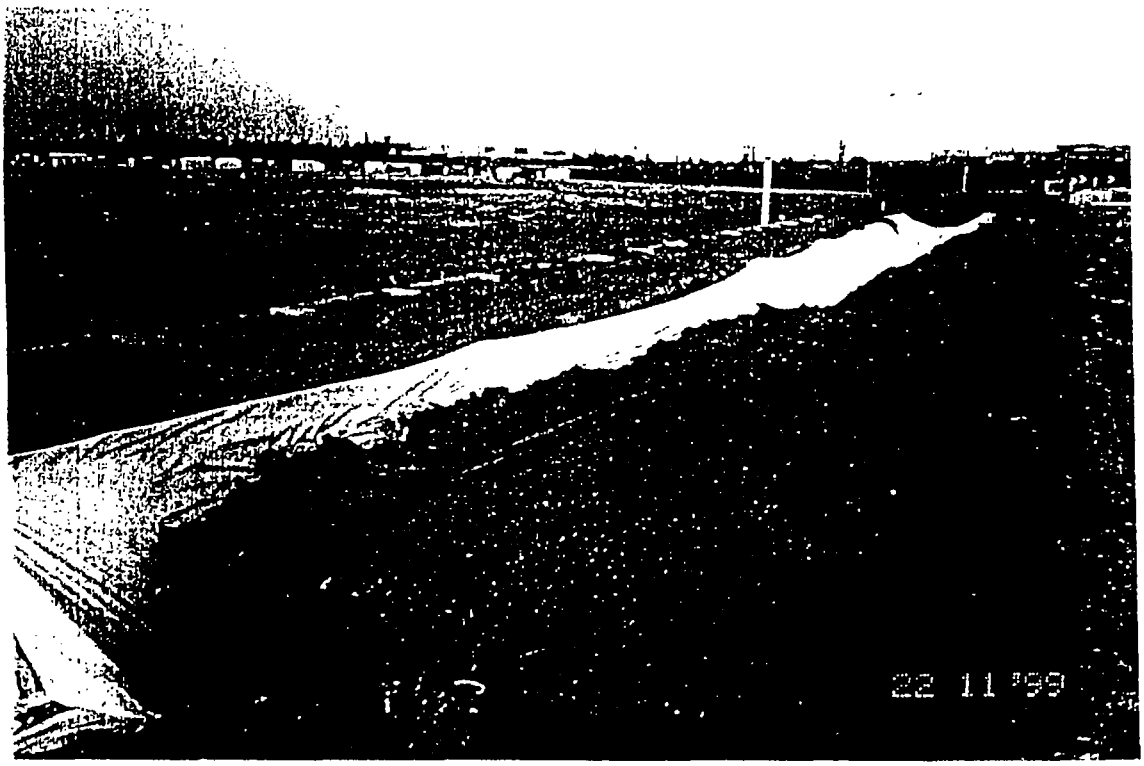


PIAZZALI AEROMOBILI

Tombamento fosso




VIABILITA' e PARCHEGGI

Innesto doppia viabilità attraversamento fognatura acque nere

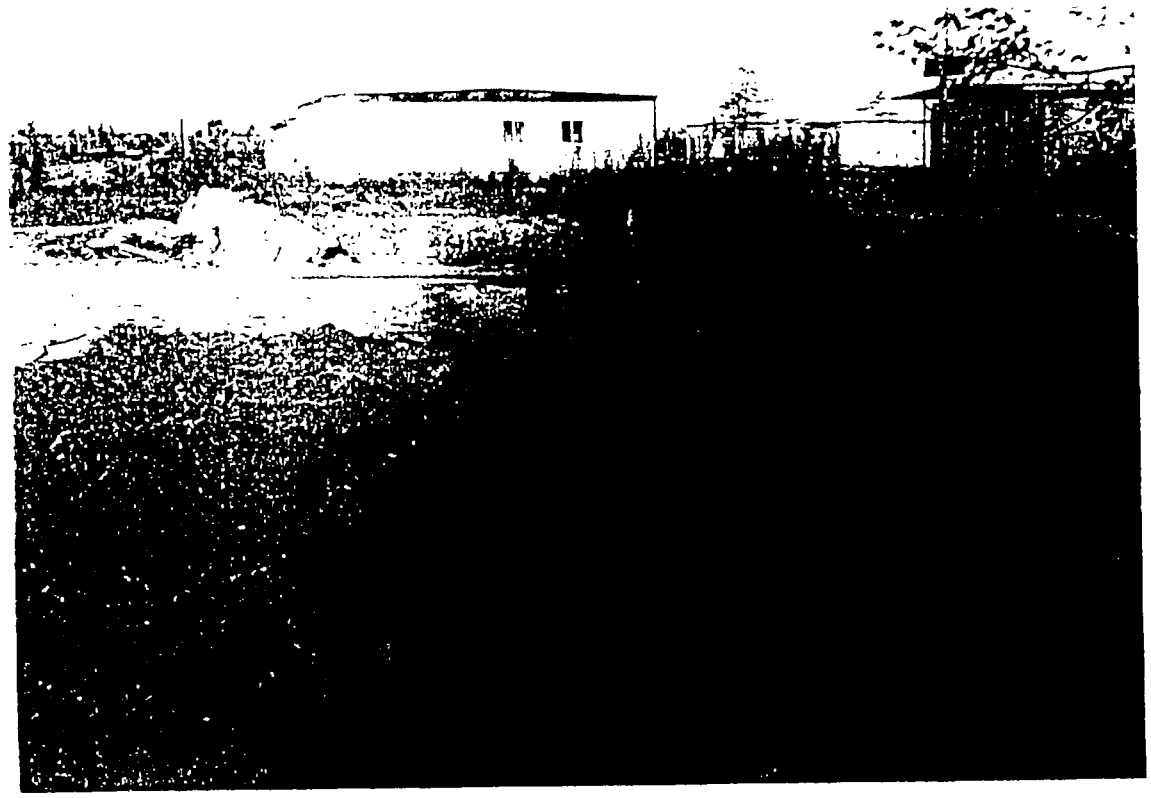

VIABILITA' e PARCHEGGI


Park raso cavidotti

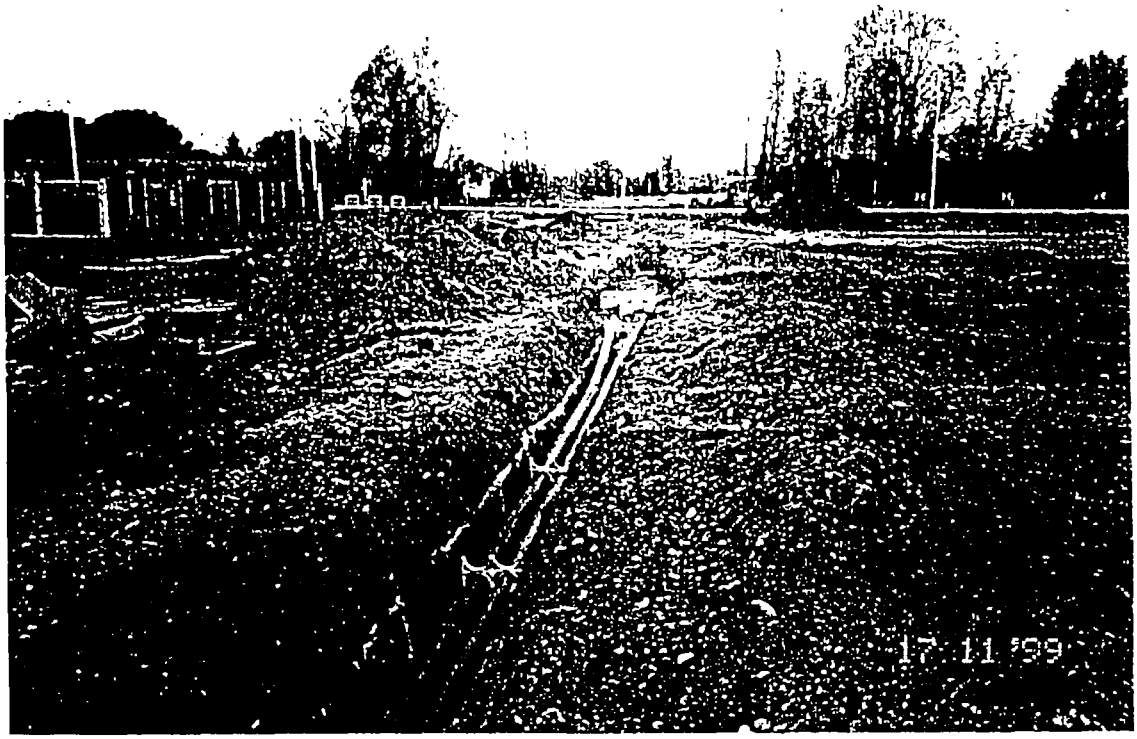





VIABILITA' e PARCHEGGI

Vasca di disoleazione

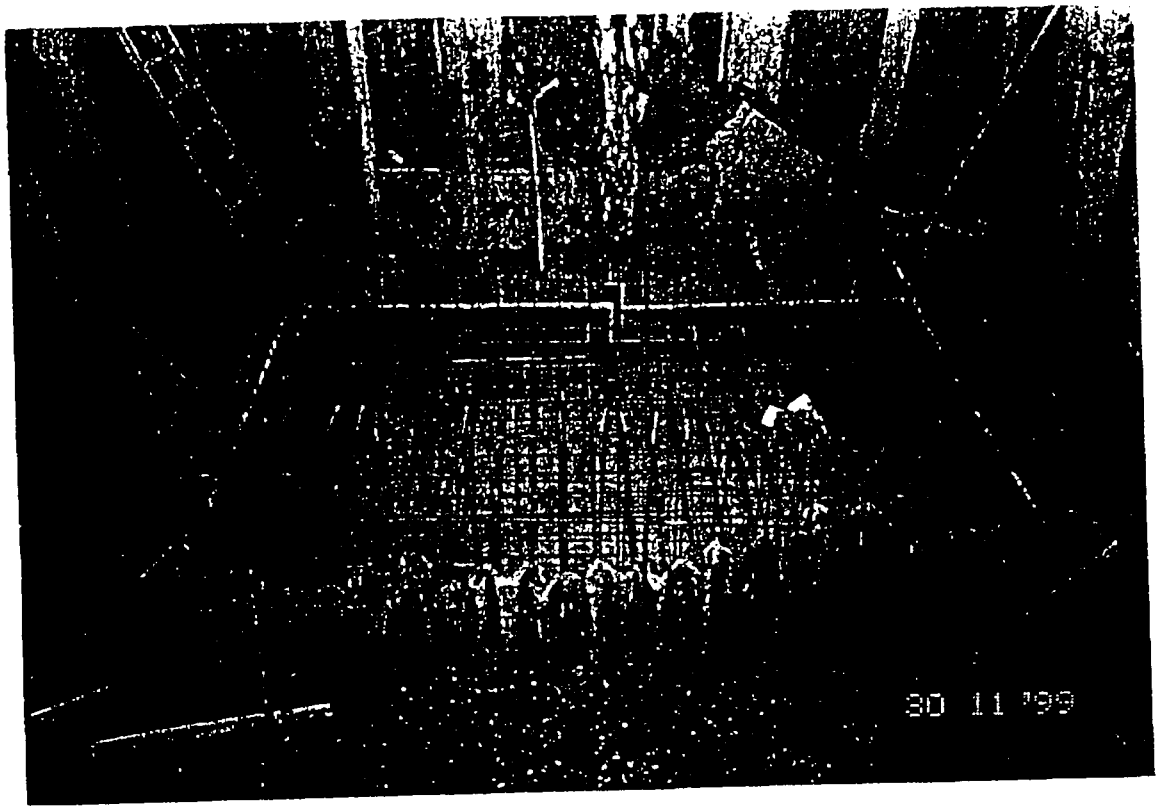


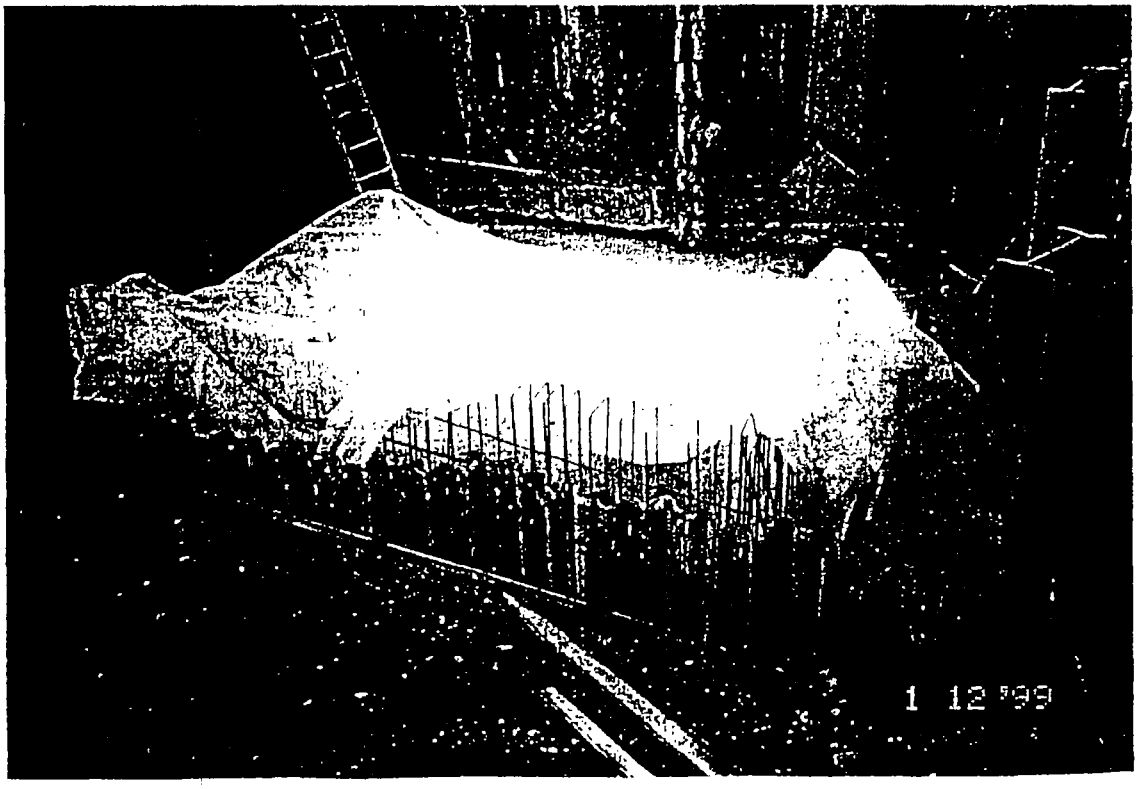

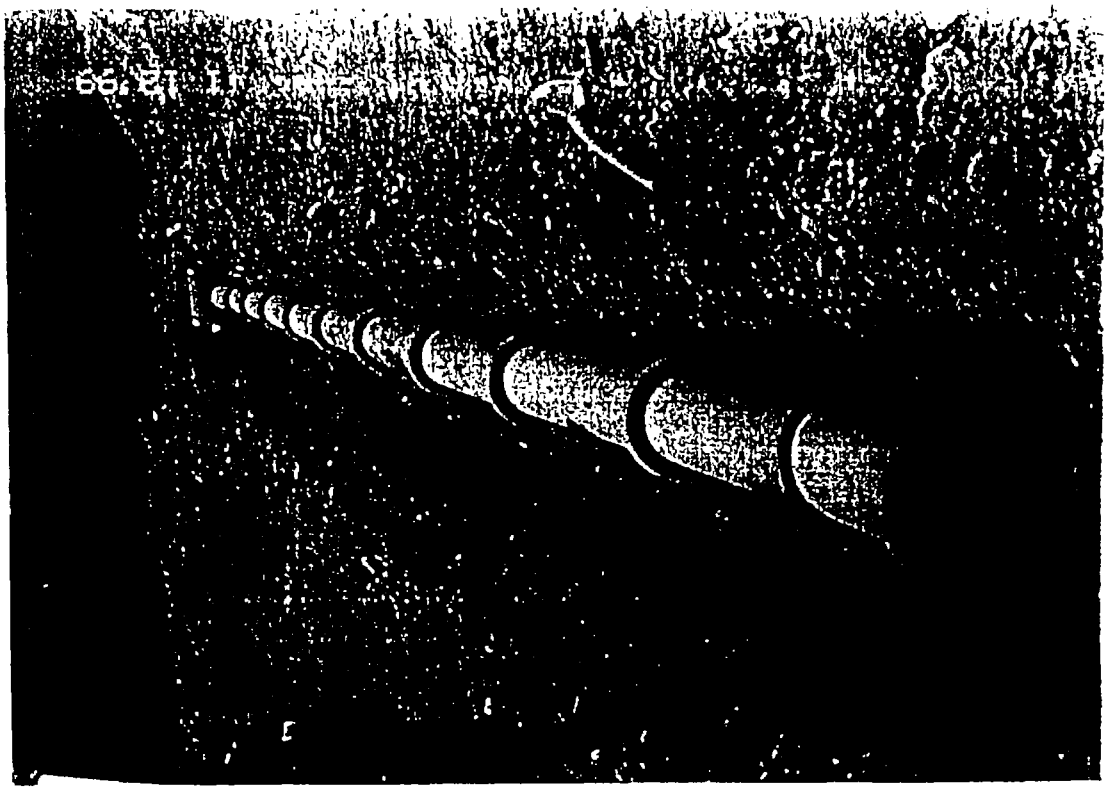

VIABILITA' e PARCHEGGI


Fognature Centrale Tecnologica

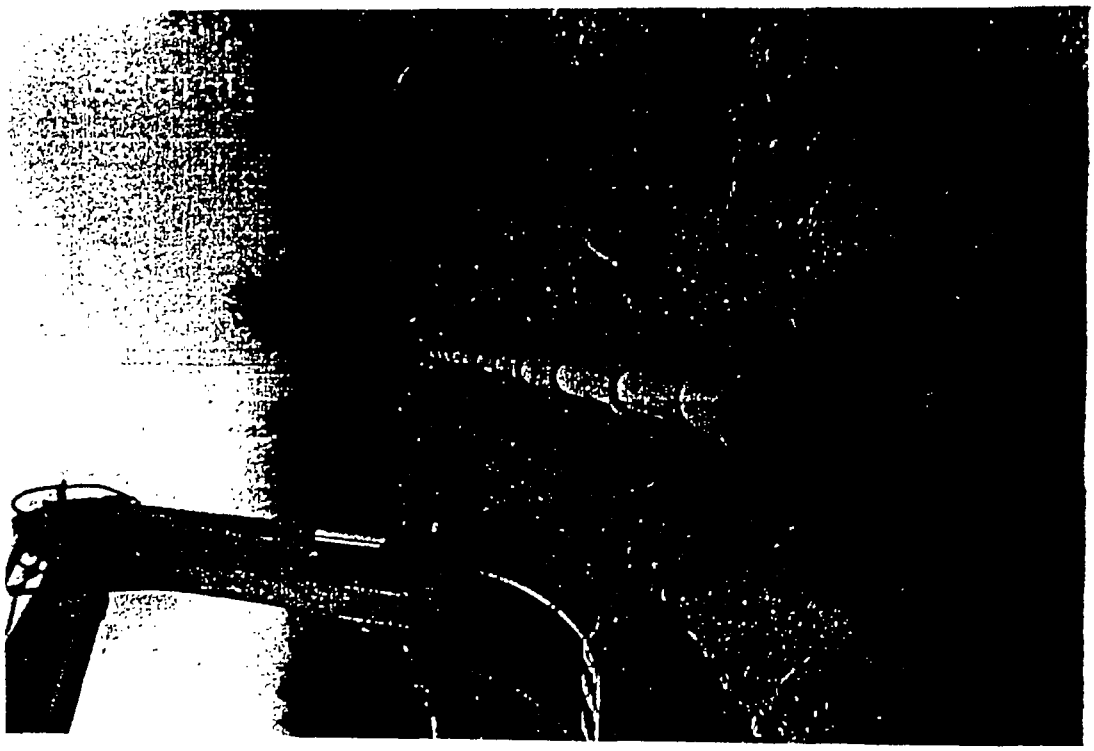

SAVE ENGINEERING S.p.A. VENEZIA

VIABILITÀ A DOPPIO LIVELLO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

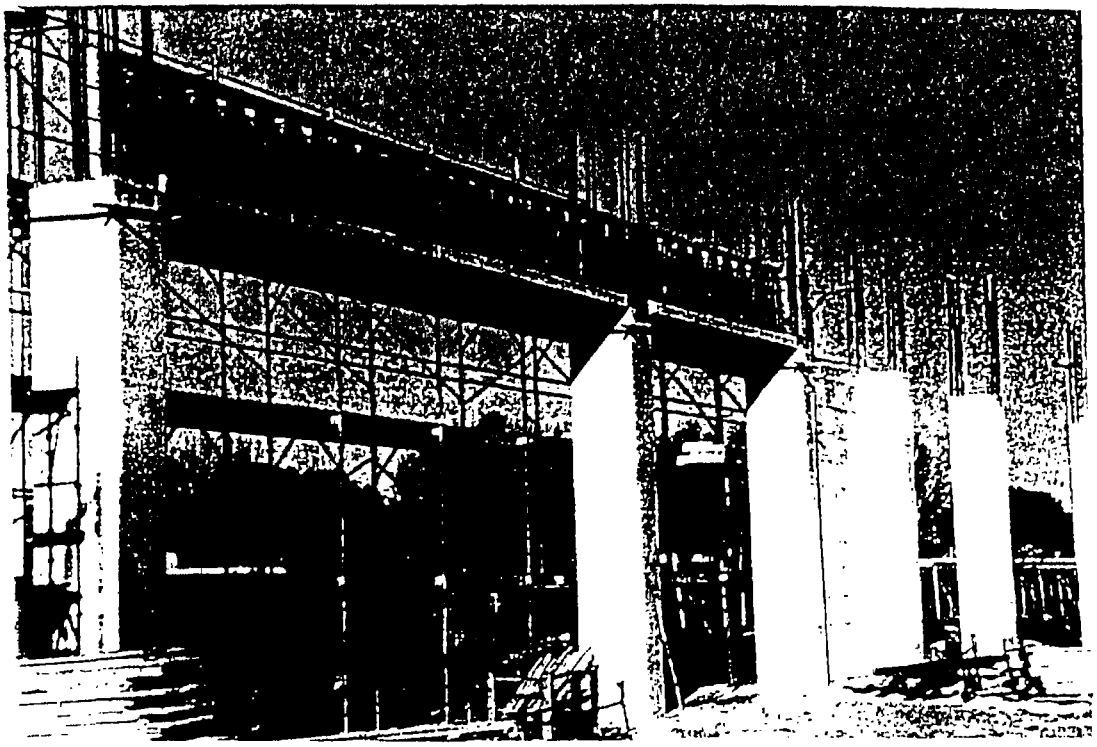



PAGINA BIANCA

Documento I ***Consorzio per la gestione del Centro di Coordinamento delle attività di ricerca inerenti al sistema lagunare di Venezia – CO.RI.LA***

Stato di attuazione attività svolte con fondi legislazione speciale - Aggiornamento al 31 dicembre 1999

PAGINA BIANCA

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INERENTI AL
SISTEMA LAGUNARE DI VENEZIA

Il Presidente

Venezia, 23 dicembre 1999
Prot. 112/99

Al Presidente del Magistrato
Alle Acque di Venezia
Ing. Patrizio Cuccioletta
Segretario del Comitato ex art. 4 L. 798/84
Palazzo X Savi
Rialto - Venezia

OGGETTO: stato di attuazione attività svolte con fondi legislazione speciale

In risposta alla nota del 22/12/1999, Prot. n. 291/GAB, informo che il Consorzio che presiedo, destinatario del finanziamento previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 3/8/98 n. 295, che autorizza "limiti di impegno" quindicennali di Lit. 500 milioni annui con decorrenza 1999, ha stipulato solo in data 27 ottobre 1999 il contratto per l'accensione del mutuo con l'Istituto Sanpaolo IMI di Torino e che, alla data odierna, non ha ancora goduto di alcuna erogazione.

Restando a disposizione per ogni eventuale, ulteriore informazione, invio cordiali saluti

Prof. Paolo Cescon

PAGINA BIANCA

Documento L ***Istituto Universitario di Architettura di Venezia - I.U.A.V.***

Utilizzazione fondi Legge n. 139/92 e seguenti

PAGINA BIANCA

Venezia, 30/12/99 Prot. n. 4765/DSIE

Al Presidente del
Magistrato alle Acque
S.Polo 19 – Venezia

Rif. prot. n. 291/GAB del 22/12/1999

OGGETTO: Utilizzazione fondi legge 5/2/92 n.139;

Con riferimento ai fondi della legge 5/2/92 (n.139) erogati a favore di questo Istituto si fa presente che i medesimi sono stati utilizzati alla data del 30/06/1999 per un complessivo importo di lire 39.900.000.000 per l'esecuzione dei sottoindicati interventi:

1) Interventi di restauro sede di S.Maria (Ex Cotonificio Veneziano) - Dorsoduro 2196 – Venezia;
2) Acquisizione Grandi Magazzini Frigoriferi in area S.Basilio – Dorsoduro 2196 - Venezia;
3) Acquisizione edificio di proprieta' ULSS 12 Campo della Lana - S.Croce 601 – Venezia;
4) Interventi di restauro sede di Palazzo Badoer – S.Polo 2554 – Venezia;
5) Acquisto Ostello della Giudecca
Lire 4.400.000.000;

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Rettorato

Dorsoduro, Santa Croce 191, 30123 Venezia
Telefono +39 041 2571100 - 2571126
Fax +39 041 2571200
E-mail rettore@iuav.it

I prossimi programmi di utilizzazione prevedono i seguenti ulteriori interventi:

6) Completamento Interventi di restauro sede di S.Marta(Ex Cotonificio Veneziano) – Dorsoduro 2196 – Venezia
L. 1.440.000.000;
7) Interventi di restauro edificio Campo della Lana – S.Croce 601 – Venezia
L.10.778.000.000;
8) Interventi di restauro Magazzini Frigoriferi in area S.Basilio – Dorsoduro 2196 – Venezia
L. 20.654.000.000;
Con i piu' cordiali saluti.

IL RETTORE
prof.Marino Folin

Rettorato

Tolentini, Santa Croce 191, 30135 Venezia
Telefono +39 041 5221109-2571726
Fax +39 041 2571760
E-mail rettore@iuav.it

I prossimi programmi di utilizzazione prevedono i seguenti ulteriori interventi:

6) Completamento interventi di restauro sede di S.Marta(Ex Cotonificio Veneziano) – Dorsoduro 2196 – Venezia
L. 1.440.000.000;
7) Interventi di restauro edificio Campo della Lana – S.Croce 601 – Venezia
L.10.778.000.000;
8) Interventi di restauro Magazzini Frigoriferi in area S.Basilio – Dorsoduro 2196 – Venezia
L. 20.654.000.000;
Con i piu' cordiali saluti.

IL RETTORE
prof.Marino Folin



ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Area Servizi Generali, Immobiliari e Patrimoniali

Tolentini, Santa Croce 191
I-30135 Venezia
Telefono +39.(0)41.5242694
Telefax +39.(0)41.2571808

Prot. 67/asG Venezia, 27/1/2000

Oggetto: utilizzazione fondi legge 5/2/92 n. 139 e seguenti;

Con riferimento alle comunicazioni telefoniche intercorse si trasmette il prospetto riepilogativo dello stato dei finanziamenti di cui all'oggetto;

(importi in milioni)

legge	soggetto	Limite di impegno	importi assegnati	importi sottoscritti disponibili	importi impegnati	importi spesi
139/92	I.U.A.V.	2.500	20.318	20.318	20.318	20.318
539/95	I.U.A.V.	1.149	12.093	12.093	10.912	10.912
515/96	I.U.A.V.	1.800	19.134	19.134	10.397	10.397
345/97	I.U.A.V.	2.000	23.339	23.339	0	0

Con i più cordiali saluti.

Il Rettore
Prof. Marino Folin

Documento M Diocesi di Chioggia

Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale - Aggiornamento al 31 dicembre 1999

PAGINA BIANCA

DIOCESI DI CHIOGGIA
D.M. 20 ott. 1986, n. 328 G.U. 1° nov. 1986, n. 26[illegible]
Rione Duomo 1006 - 30015 CHIOGGIA (Ve)
Tel (041) 400513 - 550[illegible] - Fax (041) 40132

Prot n 438/2000 *Chioggia.* 2/6/2000

Al Presidente del Cominato di Indirizzo Coordinamento e Controllo
art. 4 legge 29.11.1984 n.798
Ministero dei LL.PP - Magistrato alle Acque
Palazzo X Savi
VENEZIA

Risposta a Prot. N. 107/GAB del 18/5/2000.
Oggetto: Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale
(Rif. Vs/ prot. 107 del 18 /5/2000

Premesso

- che ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.B della legge 23 dic. 1998 n.448 sono stati autorizzati limiti d'impegno quindicinali relativi alla prosecuzione dei programmi d'intervento per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio economico di cui alle leggi 29/11/1984 n.798 e 5/2/1992 n.139;
- che tali fondi sono stati ripartiti dal comitato misto di cui all'art.4 della legge 798/84 assegnando alla Diocesi di Chioggia limiti d'impegno di Lit. 417.000.000.- con decorrenza dall'anno 1999;
- che a seguito della trattativa privata, indetta ai sensi dell'art.7 comma 2, lett.A del decreto legge 17 marzo 1995 n.157 con lettera d'invito datata 8 novembre 1999 ., è risultato aggiudicatario per il mutuo di cui alla legge n.448/98 l'Istituto S.Paolo-IMI spa di Roma;
- che è presumibile, dalla proiezione effettuata , che l'importo mutuato ammonti a Lit. 6.000.000.000.- circa, salva diversa variazione del tasso Euribor;
- che in data 13 dicembre 1999 la Diocesi di Chioggia, con decreto dell'Ordinario diocesano, mons. Angelo Daniel , ha adottato il programma il programma di utilizzo dei finanziamenti in allegato;

si comunica

che la prima fase del programma si è esaurita con la sottoscrizione del mutuo e la seconda sarà attivata il prossimo 8 giugno p.v. con la pubblicazione della gara d'appalto per i lavori di restauro del primo stralcio.

In fede.

DIOCESI DI CHIOGGIA
Rione Duomo 1006 Chioggia (Ve)

Diocesi di Chioggia
Il Vicario Generale
(Mozzato Mons. Dr. Pietro)

Mozzato M. Pietro V.g.

Allegato -D)

DIOCESI DI CHIOGGIA - CURIA VESCOVILE - Rione Duomo, 1006 - 30015 - CHIOGGIA (VE)

PROGRAMMA DELLA TEMPISTICA E QUANTIFICAZIONE DELLE EROGAZIONI-

Fondi ripartiti dal Comitato misto di cui all'art. 4 legge 798/84 alla Diocesi di Chioggia
Finanziamento di circa Lit. 6.000.000.000# a fronte del limite d'impegno quindicennale di Lire 417/milioni - decorrente dal 1999

INTERVENTO- Opere di Restauro	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Totale
Cattedrale	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000
Palazzo Vescovile	600.000.000	-	-	-	-	600.000.000
Chiesa S.Andrea	750.000.000	-	-	-	-	750.000.000
Chiesa S.Caterina	-	500.000.000	-	-	-	500.000.000
Chiesa S.Giacomo	-	750.000.000	-	-	-	750.000.000
Chiesa S.Martino Chioggia	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000
Chiesa S.Martino Sottomarina	-	100.000.000	-	-	-	100.000.000
Chiesa SS.Trinità	-	400.000.000	-	-	-	400.000.000
Seminario Vescovile	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	300.000.000	2.300.000.000
	1.950.000.000	1.750.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	300.000.000	6.000.000.000

Chioggia, 13 dicembre 1999

ANGELO DANIEL VESCOVO DI CHIOGGIA

Mons. Angelo Daniel
Vescovo di Chioggia

CURIA VESCOVILE - CHIOGGIA (VE)
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Chioggia, 13 dicembre 1999
IL CANCELLIERE VESCOVILE
sac. Paolo Vianello

Prot. n. 119/99

Il Cancelliere Vescovile
sac. Paolo Vianello

CURIA VESCOVILE - CHIOGGIA (VE) Il Cancelliere
