ALLEGATO

PAGINA BIANCA

Riepilogo Residui passivi Categoria XI " Lavori"

	Totale residuo "C" al 31-dic-1999	Totale impegnato Esercizio 2000	Totale Pagato Esercizio 2000	Totale residuo "C" al 31-dic-2000	n° Lavori con residuo al 31/12/2000	% Avanzamento Fisico
- Accordi di programma						
Anno 1996	927.967.832.445	249.481.951.966	115.512.381.054	1.061.937.403.357	38	24,2%
Anno 1997	943.555.801.642	157.235.225.112	349.865.419.243	750.925.607.511	32	65,0%
Anno 1998	416.600.550.911	232.388.489.854	19.244.106.011	629.744.934.754	18	6,5%
Anno 1999 Elenco A	887.255.562.296	392.830.721.521	200.571.218.866	1.079.515.064.951	61	35,3%
Anno 1999 Elenco B	252.576.682.770	607.781.871.498	127.367.679.218	732.990.875.050	29	12,7%
Anno 2000	4.964.162.808	1.628.558.717.603	191.857.200	1.633.331.023.211	59	0,0%
- Alluvione Novembre '94	96.081.494.245	132.120.325.486	7.733.184.959	220.468.634.772	14	9,8%
- Articolo 2 legge 662/96	1.079.386.136.899	408.304.128.096	495.806.484.800	991.883.780.195	68	72,0%
- "Roma Capitale"	30.847.528.176	6.871.717.599	23.021.321.954	14.697.923.821	3	100,0%
- "Magistrato del Po"	66.171.947.937	-8.115.780.498	1.281.795.944	56.774.371.495	2	0,0%
- CIPE	1.664.836.393.314	330.790.441.174	137.063.176.315	1.858.563.658.173	27	11,3%
Sommano liste	6.370.244.093.443	4.138.247.809.411	1.477.658.625.564	9.030.833.277.290	351	
					n.classifiche	
- Altri lavori dal 1996/2000	1.498.542.043.654	1.508.933.219.586	512.492.109.710	2.494.983.153.530	617	
- Lavori ante 96	3.758.100.401.896	313.194.459.305	692.073.688.439	3.379.221.172.762	11.421	
Sommano lavori	11.626.886.538.993	5.960.375.488.302	2.682.224.423.713	14.905.037.603.582	12.389	
- Manutenzione ordinaria	929.994.071.686	1.286.623.885.437	1.215.201.520.004	1.001.416.437.119	20.797	
Totale Categoria XI - "Lavori"	12.556.880.610.679	7.246.999.373.739	3.897.425.943.717	15.906.454.040.701	33.186	
Residui di Stanziamento di Lettera "F" per Categoria XI - "Lavori"				5.076.858.094.432		
Altre categorie - Residui di Lettera "C" (impegni)				214.183.513.828		
Altre categorie - Residui di Lettera "F" (stanziamenti)				276.640.000.000		
				21.474.135.648.961		

Distribuzione e stato Lavori delle liste

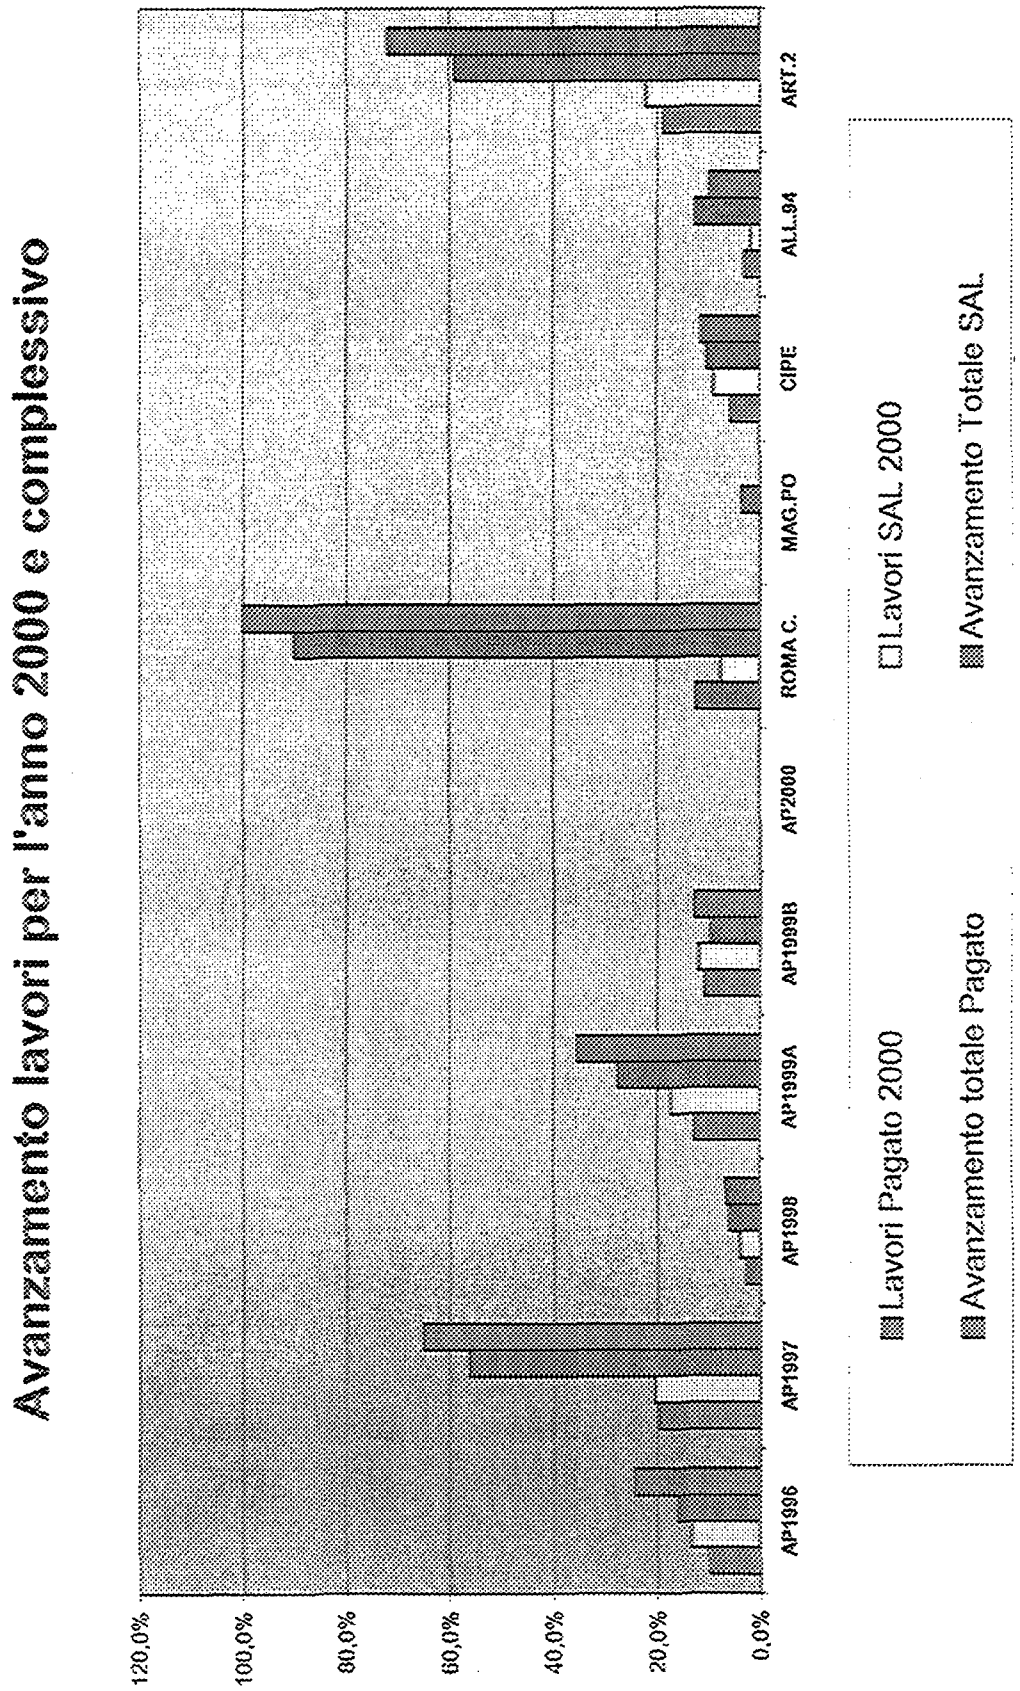


LavoriBilancio

- a) Ultimati .....n. 88
- b) In Corso.....n.140
- c) Aggiudicati.....n. 45
- d) In Appalto.....n. 93

TrattiRegionali

Strade


Avanzamento lavori per l'anno 2000 e complessivo
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
AP1996
AP1997
AP1998
AP1999A
AP1999B
AP2000
ROMA C.
MAG.PO
CIPE
ALL.94
ART.2
Lavori Pagato 2000
Avanzamento totale Pagato
Lavori SAL 2000
Avanzamento Totale SAL

Accordo di Programma 1996

Per AREA		Esercizio 2000							TOTALI			
		Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	Impegnato / Stato dei Lavori Principali	Anni Futuri	Pagato	%Pag. / %Fisico
TOTALI Area	Nord	353.407.031.224	Comp.	21.356.000.000	0	337.837.801.963	10,8%	13,7%	423.339.025.378	29.252.810.000	56.248.413.415	13,3%
			Res.	-1.042.065.847	35.883.163.414							21,4%
TOTALI Area	Centro	223.152.963.770	Comp.	132.101.281.393	1.589.862.600	297.651.995.365	12,6%	15,8%	442.233.350.574	29.476.904.207	115.104.451.002	26,0%
			Res.	-5.908.298.735	50.104.088.463							38,7%
TOTALI Area	Sud	351.407.837.451	Comp.	102.950.031.861	0	426.447.606.029	6,5%	10,4%	485.890.611.811	17.397.810.000	42.045.195.782	8,7%
			Res.	25.003.294	27.935.266.577							13,3%
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 1996	927.967.832.445	Comp.	256.407.313.254	1.589.862.600	1.061.937.403.357	9,8%	13,2%	1.351.462.987.763	76.127.524.207	213.398.060.199	15,8%
			Res.	-6.925.361.288	113.922.518.454							24,2%

Accordo di Programma 1996

n°	LAVORO titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato / Anni Futuri / Pagato / %Pag. / Stato dei Lavori Principali / %Fisico
1	RACCORDO AUTOSTRADALE TOLENTINO CIVITANOVA MARCHE (AN 709 00323) Lavori per la realizzazione del nuovo svincolo nei pressi della zona industriale "A" di Civitanova Marche.	981.205.122	Comp. Res.	0 0	0 41.302.420	939.902.702	0,0%	0,0%	3.994.861.612 / 0 / 3.054.958.910 / 76,5% Lavori Principali Ultimati / 100,0%
2	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (AN 709 00324) E78-GROSSETO-FANO - TRONCO: SELCI-MERCATELLO SUL METAURO -LOTTO 2^ - COMPLETAMENTO VIA SX GALLERIA "GUINZA"E RELATIVI COLLE.TI VIAB .ESISTENTE-OPERE SOTTERRANE	7.233.199.999	Comp. Res.	56.897.998.813 -1	0 331.615.200	63.799.583.611	0,0%	0,0%	94.376.103.018 / 29.476.904.207 / 1.099.615.200 / 1,2% Lavori iniziati il 02/05/2000 - Ritardo per aggiornamento pareri / 0,0%
3	SS.N.27 DEL GRAN SAN BERNARDO (AO 727 00180) Lavori di sistemazione tra Saint Oyen e l'innesto autostrada per il traforo del Gran San Bernardo dal km 18+860 al 19+820.	11.546.888.513	Comp. Res.	0 -1.042.065.847	0 10.458.350	10.494.364.316	0,0%	30,9%	10.504.822.666 / 0 / 10.458.350 / 0,1% Lavori iniziati il 30/10/1998 Proroghe & Sosp. 396 gg / 65,0%
4	SS.N.260 PICENTE (AQ 709 00349) Lavori di costruzione della Variante di Pizzoli fino al bivio di Cagnano Amiterno - Lotto 2?	19.764.623.477	Comp. Res.	0 -306.599.832	0 0	19.458.023.645	0,0%	8,9%	19.838.661.180 / 0 / 380.637.535 / 1,9% Lavori iniziati il 29/06/2000 - Ricorsi al TAR / 8,9%
5	SS.N.16 ADRIATICA (AQ 709 00356) Lavori urgenti occorrenti per l'allargamento del ponte a 19 campate sul fiume Vomano ubicato alla progr.va Km.ca 421+700	3.200.000.000	Comp. Res.	0 -718.622.640	0 1.653.519.600	827.857.760	72,3%	100,0%	2.481.377.360 / 0 / 1.653.519.600 / 66,6% Lavori Principali Ultimati / 100,0%
6	SS.N.17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO (AQ 709 00369) Lavori urgenti per garantire la sicurezza della circolazione sul nuovo tratto stradale "Variante di Sulmona" fra i Km. 93+800 e 99+600.	3.937.069.200	Comp. Res.	0 -2.367.563.700	0 1.241.854.150	327.651.350	28,8%	0,0%	4.377.822.300 / 0 / 4.050.170.950 / 92,5% Lavori Principali Ultimati / 100,0%
7	SS.N.580 DI GINOSA (BA 709 00547) S.S.580 "DI GINOSA" LAVORI DI NORMALIZZZIONE DELLA SEZIONE STRADALE AL TIPO IV? DELLE NORME C.N.R. IN SEDE E IN VARIANTE DAL KM 11+232 AL KM 24+142	20.559.288.296	Comp. Res.	0 0	0 565.539.820	19.993.748.476	0,0%	5,0%	20.619.751.446 / 0 / 626.002.970 / 3,0% Lavori iniziati il 27/07/2000 - Ricorsi al TAR / 5,0%

Accordo di Programma 1996

LAVORO n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato / Anni Futuri / Pagato / %Pag. / Stato dei Lavori Principali / %Fisico
8	SS.N.468 DI CORREGGIO (BO 709 00580) SS 468-LAVORI DI COSTRUZIONE TANGENZIALE NORD FINALE EMILIA VARIANTE DELLA SS 468 DAL KM 66+000 AL KM 72+000 - 1^ STRALCIO DELL'ESTESA KM 2+250 TRA IL KM 72+000 E LA S.C. ROVERE	17.527.308.779	Comp. Res.	0 0	0 2.157.903.600	15.369.405.179	16,5%	29,6%	17.584.637.472 / 0 / 2.215.232.293 / 12,6% Lavori iniziati il 17/12/1998 - Difficoltà amm.ve impresa / 29,6%
9	SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO (BO 709 00581) SS 12 - LAVORI COSTRUZIONE VARIANTE MIRANDOLA TRA I KM 209+505 E 220+175 - LOTTO 1^ DAL KM 209+505 AL KM 217+000.==REINTEGRO IVA 1%===	28.320.046.308	Comp. Res.	0 0	0 2.419.405.200	25.900.641.108	11,5%	14,0%	29.961.285.885 / 0 / 4.060.644.777 / 13,6% Lavori iniziati il 26/11/1998 - Difficoltà amm.ve impresa / 14,0%
10	S.G.C. ORTE - RAVENNA (E45) (BO 709 00585) SGC E/45-"ORTE-RAVENNA"-LAVORI PER ADEGUAMENTO LIVELLO DI SERVIZIO NEL TRONCO SARSINA - BORELLO TRA I KM 196+000 E 212+000 - LOTTO V	4.109.190.000	Comp. Res.	12.138.000.000 0		16.247.190.000	0,0%	0,0%	45.500.000.000 / 29.252.810.000 / 0 / 0,0% Progetto in rielaborazione / 0,0%
11	SS.N.310 DEL BIDENTE (BO 709 00586) LAVORI DI COSTRUZIONE VARIANTE ELIMINAZIONE VIZIOSITA' PLANIMETRICHE TRA I KM 61+680 E 63+400 IN LOCALITA TOMBINA.	3.147.411.680	Comp. Res.	0 0	0 671.387.725	2.476.023.955	15,8%	16,1%	4.857.490.880 / 0 / 2.381.466.925 / 49,0% Rescissione contratto in corso / 57,3%
12	SS.N.64 PORRETTANA (BO 709 00589) LAV.COSTR.VAR.TE ALLA STATALE-TRONCO 1^:DAL KM 0+000 ALL'INCROCIO CON VIA BAZZABESE E COLLEGAMENTO CON LA NUOVA VIA UGO BASSI ==REINTEGRO IVA 1%===	4.294.018.033	Comp. Res.	0 0	0 8.718.000	4.285.300.033	0,0%	20,3%	8.874.507.697 / 0 / 4.589.207.664 / 51,7% Lavori iniziati il 22/05/1998 Proroghe & Sosp. 614 gg / 83,6%
13	SS.N.310 DEL BIDENTE (BO 709 00590) LAVORI DI COSTRUZIONE VARIANTE TRA I KM 57+600 E 59+900 IN CORRISPONDENZA DEL RIO SUASIA.	6.401.275.306	Comp. Res.	0 0	0 2.119.402.000	4.281.873.306	39,0%	52,9%	6.426.794.206 / 0 / 2.144.920.900 / 33,4% Lavori iniziati il 29/10/1998 -Difficoltà amm.va impresa / 52,9%
14	SS.N.495 DI CODIGORO (BO 709 00595) SS 495 - LAVORI COSTRUZIONE VARIANTE ALLA STATALE TRA I KM20+550 E 22+750 IN CORRISPONDENZA DI MIGLIARINO=======REINTEGRO IVA 1%==	7.242.765.866	Comp. Res.	0 0	0 0	7.242.765.866	0,0%	0,3%	8.358.210.506 / 0 / 1.115.444.640 / 13,3% Rescissione contratto in corso / 14,0%

Accordo di Programma 1996

LAVORO n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato	TOTALI Anni Futuri	TOTALI Pagato	TOTALI %Pag. / Stato dei Lavori Principali / %Fisico
15	ASSE VIARIO CISPADANO (BO 709 00598) ASSE VIARIO CISPADANO-LOTTO 2^ DAL KM 7+500 AL KM 16+700 -1^ STRALCIO DAL KM 13+000 AL KM 16+700	28.462.768.904	Comp. Res.	0 0	0 4.587.562.340	23.875.206.564	16,3%	16,5%	30.715.401.204	0	6.840.194.640	22,3% Lavori iniziati il 03/07/1999 - Ricorsi al TAR 23,0%
16	SS.N.127 SETTENTRIONALE SARDA (CA 709 00464) Lavori di ammodernamento e sistemazione dell'itinerario Sassari-Tempio-Olbia. Tratto Tempio-Olbia. 1^ Lotto (Stazione Aggius-Luras).	27.447.333.811	Comp. Res.	0 0	0 0	27.447.333.811	0,0%	0,0%	27.530.701.736	0	83.367.925	0,3% Aggiudicato il 02/10/1998 - Sospeso dal TAR 0,0%
17	SS.N.127 SETTENTRIONALE SARDA (CA 709 00466) Lavori di ammodernamento e sistemazione dell'itinerario Sassari-Tempio-Olbia. Tratto Tempio-Olbia. 5^ LOTTO (Monte Pinu-Olbia)	41.292.744.745	Comp. Res.	0 0	0 0	41.292.744.745	0,0%	0,0%	41.346.500.694	0	53.755.949	0,1% Lavori iniziati il 11/03/1999 - Sospeso dal TAR 0,0%
18	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 801 00291) Lavori di costruzione della nuova SS.125 - Tronco: Tertenia - S.Priamo - 4^lotto 2^stralcio (Muravera-S.Priamo).	48.941.184.061	Comp. Res.	0 0	0 21.474.227	48.919.709.834	0,0%	0,0%	48.941.184.061	0	21.474.227	0,0% Lavori iniziati il 07/09/2000 - Ricorso al TAR 0,0%
19	SS.N.283 DELLE TERME LUIGIANE (CZ 709 00441) LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3 TRONCO DALL'INNESTO CON LA S.S.533(S.MARCO ARGENTANO) ALLO SVINCOLO DI SPEZZANO TERME DELL'AUTOSTRADA SA/RC LOTTO 1 DALL'INNESTO CON LA S.S.533(S.MARCO	41.513.696.000	Comp. Res.	0 0	0 6.751.638.555	34.762.057.445	21,3%	34,7%	41.513.696.000	0	6.751.638.555	16,3% 34,7%
20	SS.N.283 DELLE TERME LUIGIANE (CZ 709 01119) SS 283-LAVORI ADEGUAM.TO 4^ E 5^ TRONCO STRADA DELLE TERMEDALLO SVINC.SPEZZANO ALBANESE AUT.SA-RC A INNESTO CON SS 534 LOTTO 3^ KM 46+973 E 5 2+477 =BANDO SETTEMBRE 1996== 10	15.486.190.000	Comp. Res.	13.090.000.000 0		28.576.190.000	0,0%	0,0%	45.974.000.000	17.397.810.000	0	0,0% Gara sospesa 0,0%
21	SS.N.106 JONICA (CZ 709 01186) LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL TRATTO COMPRESO TRA KM 393+840 E 410+040 3 LOTTO TRA KM 403+227 E 405+950 2 STRALCIO CARREGGIATA DI MONTE	70.971.568.827	Comp. Res.	0 0	0 17.711.986.800	53.259.582.027	28,4%	39,9%	75.555.204.113	0	22.295.622.086	29,5% Lavori iniziati il 12/01/1999 - In corso Perizia di Variante Tecnica 47,1%

Accordo di Programma 1996

n°	LAVORO titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato / Anni Futuri / Pagato / %Pag. — Stato dei Lavori Principali / %Fisico
22	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00712) S.G.C. E/78 - Lavori di adeguamento a quattro corsie dell'estesa di km.14+710,12 tra le prog.ve 7+535,60 e 22+245,72 , oltre al ripristino s.s.73- lotto 2? Casetta - Armaiolo - Prov. SIENA	43.026.406.818	Comp. Res.	9.320.562.662 0	1.589.862.600 8.407.945.224	42.349.161.656	19,6%	20,7%	57.540.778.086 / 0 / 15.191.616.430 / 26,4% Lavori iniziati il 02/03/1998 - Ricorso al TAR / 70,0%
23	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00714) LAVORI ADEGUAMENTO A QUATTRO CORSIE DELL'ESTESA DI KM.23+484,43 TRA LE PROG. KM.CHE 22+245.72 E 45+730,15 LOTTO 3? ARMAIOLO-RIGOMAGNO-BETTOLLE (A1)	64.593.809.565	Comp. Res.	41.103.038.446 0	0 27.762.526.350	77.934.321.661	28,5%	33,2%	111.364.457.705 / 0 / 33.430.136.044 / 30,0% Lavori iniziati il 18/05/1998 - In corso Perizia di Variante Tecnica / 41,7%
24	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 801 00722) TRATTO AREZZO-MONTERCHI=LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO TRA LE LOCALITA' "PALAZZO DEL PERO" E "LE VILLE DI MONTERCHI" - 4^ LOTTO.	29.999.960.000	Comp. Res.	13.393.289.280 -3.715.296.000	0 2.101.704.000	37.576.249.280	6,0%	12,4%	39.677.953.280 / 0 / 2.101.704.000 / 5,3% Lavori iniziati il 15/02/2000 / 12,4%
25	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 801 00723) TRATTO AREZZO-MONTERCHI=LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO COMPRESO TRA LE LOCALITA'"PALAZZO DEL PERO" E "LE VILLE DI MONTERCHI"-5^ LOTTO-	12.642.190.456	Comp. Res.	11.386.392.192 1.200.000.000	0 45.286.800	25.183.295.848	0,0%	20,0%	25.228.582.648 / 0 / 45.286.800 / 0,2% Lavori iniziati il 29/11/1999 / 20,0%
26	SS.N.29 DEL COLLE DI CADIBONA (GE 751 00583) Lavori di sistemazione del tratto da Savona al Confine regionale - Lotto 3 - fra i km. 133+000 (San Giuseppe di Cairo) e 138+150 (Svincolo di Altare dell'Autostrada Torino-Savona).	78.787.527.453	Comp. Res.	0 0	0 0	78.787.527.453	0,0%	0,0%	78.894.000.000 / 0 / 106.472.547 / 0,1% Ricorso al TAR / 0,0%
27	SS.N.42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA (MI 709 00736) Lavori di adeguamento e ammodernamento da Darfo a Edolo - IV Lotto - Variante agli abitati di Niardo - Braone - Ceto e Nadro	62.408.470.040	Comp. Res.	0 0	0 10.798.268.053	51.610.201.987	22,5%	20,6%	65.392.117.040 / 0 / 13.781.915.053 / 21,1% Lavori iniziati il 31/03/1998 - In corso Perizia di Variante Tecnica / 35,3%
28	SS.N.671 DELLA VAL SERIANA (MI 709 01045) Lavori di costruzione del raccordo Seriate (S.S. 42), Nembro Albino - Gazzaniga (S.P. 34)- LOTTO UNICO	101.159.360.342	Comp. Res.	9.218.000.000 0	0 13.110.058.146	97.267.302.196	16,9%	20,3%	116.269.757.822 / 0 / 19.002.455.626 / 16,3% Lavori iniziati il 18/09/1998 - Ricorsi al TAR / 28,1%

Accordo di Programma 1996

LAVORO n°	LAVORO titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato	TOTALI Anni Futuri	TOTALI Pagato	TOTALI %Pag. / Stato dei Lavori Principali %Fisico
29	SS.N.123 DI LICATA (PA 707 00803) LAVORI URGENTI OCCORRENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE "FAVAROTTA" AL KM.21+900	557.132.742	Comp. Res.	0 25.003.294	0 159.371.495	422.764.541	0,0%	0,0%	3.358.335.146	0	2.935.570.605	87,4% 100,0%
30	SS.N.113 SETTENTRIONALE SICULA (PA 709 00809) LAVORI URGENTI DI RETTIFICA PLANO-ALTIMETRICA MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI UN VIADOTTO SUL TORRENTE "ARANCIO" TRA I KM.172+400 E KM.173+000	7.470.194.083	Comp. Res.	0 0	0 7.453.600	7.462.740.483	0,0%	10,0%	7.470.194.083	0	7.453.600	0,1% 10,0%
31	SS.N.3 VIA FLAMINIA (PG 709 00571) S.S.n?3 "Via Flaminia". Tronco: FOLIGNO - OSTERIA DEL GATTO Esecuzione dei lavori di sistemazione generale - LOTTO 4B - 1? STRALCIO: dal km. 176+000 (Campo d'Arco) al km. 177+500 (Parrano).	10.260.038.148	Comp. Res.	0 0	0 3.379.774.585	6.880.263.563	32,7%	32,8%	12.954.848.514	0	6.074.584.951	46,9% 60,0%
32	SS.N.578 SALTO CICOLANA (RM 709 00662) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE RIETI - TORANO 3? LOTTO - 1? STRALCIO	16.814.247.773	Comp. Res.	0 0	0 639.321.600	16.174.926.173	4,7%	16,5%	16.854.811.893	0	679.885.720	4,0% 16,5%
33	SS.N.2 VIA CASSIA (RM 801 00672) RACC.:C/VECCHIA-VT-ORTE-TR-RI - LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLO SVINCOLO AL KM 84+800 DELLA S.S.N. 2	755.533.444	Comp. Res.	0 -12.348	0 0	755.521.096	0,0%	0,0%	2.591.235.162	0	1.835.714.066	70,8% 100,0%
34	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00008) AUT.: ROMA - AEROPORTO DI FIUMICINO. - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA 3? CORSIA DAL KM 6+400 AL KM 10+800 - LOTTO N. 1?	9.944.679.768	Comp. Res.	0 -204.214	0 4.499.238.534	5.445.237.020	3,2%	0,0%	50.951.857.816	0	45.506.620.796	89,3% 100,0%
35	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCS750 01193) AUTOSTRADA:RA-RC-LAVORI RISANAMENTO TRAVATA METALLICA DELVIADOTTO "ITALIA" AL KM 157+150	7.437.432.223	Comp. Res.	0 0	0 2.645.640.000	4.791.792.223	19,0%	45,7%	13.977.312.223	0	9.185.520.000	65,7% 100,0%

Accordo di Programma 1996

LAVORO n°	titolo	Esercizio 2000							TOTALI				
		Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	%Fisico
36	S.S.V. LICODIA-EUBEA-LIBERTINIA (USPA709 00527) Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117bis tratto compreso tra la contrada "Margi" all'innesto sulla S.S. N^ 117 (Bivio Gigliotto) dalla sez. 299 e la sez. 320 dell'estesa di Km. 1+470,91 Lotto 5^ - Stralcio 3^.	21.494.559.037	Comp.	26.548.517.205	0	48.001.601.137	0,1%	0,1%	48.048.537.922	0	46.936.785	0,1%	
			Res.	0	41.475.105				Aggiornamento pareri			0,1%	
37	S.S.V. LICODIA-EUBEA-LIBERTINIA (USPA709 00573) Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117bis tratto compreso tra lo svincolo Molona (escluso) e la contrada "Fontana" e "Margi" tra la sez.116e la sez. 210 dell'estesa di Km.3+026,19. Lotto 5^ - Stralcio 1^.	21.426.062.693	Comp.	21.860.212.516	0	43.286.275.209	0,0%	0,0%	43.293.441.314	0	7.166.105	0,0%	
			Res.	0	0				Aggiornamento pareri			0,0%	
38	S.S.V. LICODIA-EUBEA-LIBERTINIA (USPA709 00576) Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117bis tratto compreso tra le contrade "Fontana" e "Margi" tra la sez. 210 e la sez. 299 dell'estesa di Km. 6+512,13. Lotto 5^ - Stralcio 2^.	26.810.450.933	Comp.	41.451.302.140	0	68.231.066.098	0,0%	0,0%	68.261.753.073	0	30.686.975	0,0%	
			Res.	0	30.686.975				Aggiornamento pareri			0,0%	
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 1996	927.967.832.445	Comp.	256.407.313.254	1.589.862.600	1.061.937.403.357	9,8%	13,2%	1.351.462.987.763	76.127.524.207	213.398.060.199	15,8%	
			Res.	-6.925.361.288	113.922.518.454							24,2%	

Accordo di Programma 1997

Per AREA		Esercizio 2000							TOTALI				
		Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	%Fisico
									Stato dei Lavori Principali				
TOTALI Area	Nord	242.836.304.297	Comp.	34.794.016.480	631.057.660	222.334.257.343	16,2%	21,6%	395.374.825.616	10.642.124.592	162.398.443.681	41,1%	
			Res.	264.391.507	54.929.397.261								48,3%
TOTALI Area	Centro	125.830.403.262	Comp.	0	0	63.246.699.430	15,4%	6,2%	358.830.025.594	0	295.583.326.164	82,4%	
			Res.	-24.091.312	62.559.612.520								100,0%
TOTALI Area	Sud	574.889.094.083	Comp.	43.420.536.733	227.255.200	465.344.650.738	22,3%	25,1%	982.513.225.577	0	517.168.574.839	52,6%	
			Res.	78.780.371.704	231.518.096.582								59,6%
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 1997	943.555.801.642	Comp.	78.214.553.213	858.312.880	750.925.607.511	19,5%	20,5%	1.736.718.076.787	10.642.124.592	975.150.344.684	56,1%	
			Res.	79.020.671.899	349.007.106.363								65,0%

Accordo di Programma 1997

n°	LAVORO titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato / Anni Futuri / Pagato / %Pag. / Stato dei Lavori Principali / %Fisico
1	SS.N.7 VIA APPIA (BA 806 00553) S.S.007 "APPIA" - TRONCO: TARANTO - BRINDISI PROGETTO DEI LAVORI PER L'ALLARGAMENTO DA DUE A QUATTRO CORSIE DEL TRONCO STRADALE GROTTAGLIE-BRINDISI IV? LOTTO DALLA SEZ.244 ALLA SEZ.292 -	28.366.598.310	Comp. Res.	0 0	0 5.820.796.180	22.545.802.130	16,1%	16,5%	37.280.518.295 / 0 / 14.734.716.165 / 39,5% Lavori iniziati il 22/07/1998 - Ricorsi al TAR / 42,0%
2	SS.N.7 VIA APPIA (BA 806 00554) S.S.007 "APPIA" - TRONCO: TARANTO - BRINDISI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLA SEZIONE III DELLE NORME C.N.R. TRATTO GROTTAGLIE-BRINDISI V? LOTTO DAL KM 712+122 AL KM 721+069	29.689.501.369	Comp. Res.	0 3.083.255.452	0 294.047.780	32.478.709.041	0,0%	12,0%	36.383.426.141 / 0 / 3.904.717.100 / 10,7% Lavori iniziati il 13/07/2000 - Ricorsi al TAR / 12,0%
3	SS.N.7 VIA APPIA (BA 806 00555) S.S.007 "APPIA" - TRONCO: TARANTO - BRINDISI PROGETTO DEI LAVORI PER L'ALLARGAMENTO DA DUE A QUATTRO CORSIE DEL TRONCO STRADALE GROTTAGLIE-BRINDISI III? LOTTO DALLA SEZ.173 ALLA SEZ.244 -	23.672.345.753	Comp. Res.	0 4.236.636.606	0 5.744.940.725	22.164.041.634	16,0%	17,6%	38.319.420.669 / 0 / 16.155.379.035 / 42,2% Lavori iniziati il 22/07/1998 - Ricorsi al TAR / 47,7%
4	SS.N.16 ADRIATICA (BA 806 00556) SS.SS.016-379 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SEZ III DELLE NORME C.N.R. IN AGRO DI FASANO TRA I KM 854+500 KM 859+900 DELLA SS.16 E TRA I KM 0+000 E 10+517 DELLA SS. 379	39.128.702.907	Comp. Res.	0 0	0 22.667.946.315	16.460.756.592	35,9%	32,8%	71.799.727.182 / 0 / 55.338.970.590 / 77,1% Lavori Principali Ultimati / 100,0%
5	SS.N.7 VIA APPIA (BA 806 00557) S.S.007 "APPIA" - TRONCO: TARANTO - BRINDISI PROGETTO DEI LAVORI PER L'ALLARGAMENTO DA DUE A QUATTRO CORSIE DEL TRONCO STRADALE GROTTAGLIE-BRINDISI II? LOTTO DALLA SEZ.104 ALLA SEZ.173 - IN AGRO	29.438.869.856	Comp. Res.	0 0	0 10.774.213.055	18.664.656.801	27,0%	36,9%	43.966.447.546 / 0 / 25.301.790.745 / 57,5% Lavori iniziati il 09/09/1998 / 70,9%
6	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00593) LAVORI DI REALIZZAZIONE LOTTO 2 DELLA SECANTE DI CESENA VARIANTE ALLA SS. 9 DAL KM 2+282 AL KM 5+256,52.	121.178.799.006	Comp. Res.	0 0	0 4.617.078.800	116.561.720.206	3,4%	10,0%	128.639.383.461 / 0 / 12.077.663.255 / 9,4% Lavori iniziati il 02/09/1999 - Sospensione BB.AA.CC. / 10,0%
7	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00594) COSTRUZIONE DEL 3? LOTTO DELLA SECANTE DI CESENA DAL KM 5+256 AL KM 9+619.	48.010.349.217	Comp. Res.	0 0	0 23.226.916.421	24.783.432.796	49,6%	57,8%	63.637.847.437 / 0 / 38.854.414.641 / 61,1% Lavori iniziati il 25/09/1998 / 87,9%

Accordo di Programma 1997

n°	LAVORO titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato / Stato dei Lavori Principali	TOTALI Anni Futuri	TOTALI Pagato	TOTALI %Pag. / %Fisico
8	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00602) SS SS 588 E 9-VARIANTE ESTERNA ABITATO DI FIDENZA-LOTTO IITRA LA SS 588 E SS 9 - LAVORI PIANO TRIENNALE 1997/99===TC GIORNI 660	11.941.569.780	Comp. Res.	12.000.000.000 0	0 520.134.720	23.421.435.060	0,0%	0,0%	34.583.694.372 Aggiudicato il 06/12/2000	10.642.124.592	520.134.720	1,5% 0,0%
9	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 806 00472) Lavori per l'eliminazione delle intersezioni a raso in corrispondenza dell'abitato di Uras tra i Km 65+200-69+500 - Lotto 5^	16.470.759.291	Comp. Res.	0 1.895.083.994	0 10.111.920.327	8.253.922.958	32,9%	37,6%	32.325.206.119 Lavori Principali Ultimati	0	24.071.283.161	74,5% 100,0%
10	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 806 00473) Lavori di costruzione degli svincoli altimetrici per Sardara e Villanovaforru ed adeguamento del tratto tra i Km 47+000-58+500 - Lotto 3^.	38.088.012.991	Comp. Res.	0 15.547.282.341	0 20.475.576.765	33.159.718.567	22,8%	24,5%	91.262.059.017 Lavori iniziati il 04/12/1997 - In corso P.V.T.	0	58.102.340.450	63,7% 80,0%
11	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 806 00475) Lavori di ammodernamento e di adeguamento del tronco compreso tra il Km 69+500 e il Km 146+800 - 1^ lotto - 1^ stralcio dal Km 69+500 al Km 75+000.	21.019.030.839	Comp. Res.	0 0	0 3.361.127.778	17.657.903.061	12,1%	14,6%	24.879.198.650 Lavori iniziati il 15/12/1998 - In corso P.V.T.	0	7.221.295.589	29,0% 32,5%
12	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 806 00477) Lavori di adeguamento della statale e per l'eliminazione delle intersezione a raso. Svincolo di Mogoro - 4^ lotto (Km 58+500-65+200)	38.650.608.496	Comp. Res.	1.465.353.446 1.620.000.000	0 13.041.117.651	28.694.844.291	26,9%	29,6%	45.518.053.148 Lavori iniziati il 10/03/1999 - In corso P.V.T.	0	16.823.208.857	37,0% 38,9%
13	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 806 00478) Lavori di ammodernamento e di adeguamento del tronco compreso tra il Km 69+500 e 146+800. 1^ Lotto - 2^ Stralcio tra i Km 75+000 e 79+500.	22.928.987.202	Comp. Res.	657.053.545 0	0 3.244.417.072	20.341.623.675	12,7%	13,0%	24.771.858.530 Lavori iniziati il 13/05/1999 - In corso P.V.T.	0	4.430.234.855	17,9% 18,0%
14	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00467) Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - tronco: Capo Boi-S.Priamo - 2^ lotto (Camisa-Castiadas)	21.504.615.231	Comp. Res.	1.968.478.947 0	0 8.104.557.600	15.368.536.578	26,1%	27,4%	35.961.124.551 Lavori iniziati il 18/12/1997 - In corso P.V.T.	0	20.592.587.973	57,3% 72,3%

Accordo di Programma 1997

n°	LAVORO titolo	Totale Residuo C al 31-dic-1999	C / R	Esercizio 2000 Impegnato	Esercizio 2000 Pagato	Totale Residuo C al 31-dic-2000	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Lavori Principali Avanzamento Fisico	TOTALI Impegnato / Anni Futuri / Pagato / %Pag. — Stato dei Lavori Principali / %Fisico
15	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00468) Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tronco: S.Priamo-Capo Boi - 1^lotto (S.Priamo-Camisa)	21.241.141.414	Comp. Res.	6.673.713.654 3.586.199.483	0 6.417.570.000	25.083.484.551	16,1%	17,0%	44.596.317.641 / 0 / 19.512.833.090 / 43,8% Lavori iniziati il 18/12/1997 - Ricorsi al TAR / 61,2%
16	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00469) Lavori di costruzione della nuova S.S.125. Tronco S.Priamo-Capo Boi - 3^Lotto - 2^Stralcio	37.522.985.332	Comp. Res.	1.064.167.281 0	0 7.065.068.400	31.522.084.213	18,1%	18,9%	43.764.768.273 / 0 / 12.242.684.060 / 28,0% Lavori iniziati il 19/12/1997 - In corso P.V.T. / 32,1%
17	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00470) Lavori di costruzione della nuova S.S.125 - Tronco Capo Boi-S.Priamo - 3^ lotto 1^stralcio	20.015.050.307	Comp. Res.	382.748.883 0	0 6.947.850.000	13.449.949.190	27,3%	29,1%	29.210.625.931 / 0 / 15.760.676.741 / 54,0% Lavori iniziati il 18/12/1997 - In corso P.V.T. / 61,5%
18	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00471) Lavori di costruzione della nuova S.S.125. Tronco: S.Priamo-Capo Boi - 3^Lotto - 3^Stralcio	28.764.159.319	Comp. Res.	0 0	0 12.005.484.000	16.758.675.319	27,0%	36,3%	48.511.761.121 / 0 / 31.753.085.802 / 65,5% Lavori iniziati il 18/12/1997 - In corso P.V.T. / 79,5%
19	SS.N.336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA (MI 709 01043) Lavori di costruzione del collegamento alla nuova aerostazione di Malpensa e raccordo alla S.S. 527 " Bustese" - IV LOTTO	24.429.154.594	Comp. Res.	12.494.016.480 298.700.000	524.016.480 13.610.307.320	23.087.547.274	14,0%	19,2%	112.305.943.903 / 0 / 89.218.396.629 / 79,4% Lavori Principali Ultimati / 100,0%
20	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00009) AUTOSTRADA DEL G.R.A. - LAVORI DI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 36+100 AL KM 40+022 LOTTO N. 16 - 17 - 17 BIS	33.550.863.359	Comp. Res.	0 -795.873	0 12.827.676.541	20.722.390.945	18,5%	16,8%	81.577.649.876 / 0 / 60.855.258.931 / 74,6% Lavori Principali Ultimati / 100,0%
21	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00011) AUTOSTRADA DEL G.R.A. - LAVORI DI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 64+515 AL KM 68+223 SVINCOLO AURELIA - LOTTO N. 23 b - 2? STRALCIO	13.711.092.343	Comp. Res.	0 -18.270.619	0 9.108.457.506	4.584.364.218	15,0%	15,4%	49.883.795.549 / 0 / 45.299.431.331 / 90,8% Lavori Principali Ultimati / 100,0%
