Pertanto, detti interventi in parte sono stati realizzati, in parte sono in corso di esecuzione, in parte devono essere avviati, mediante Atti Attuativi della "Convenzione Generale", sottoscritti tra l'Amministrazione Concedente e il Consorzio concessionario sulla base dei finanziamenti via via disponibili. Altri interventi debbono essere ancora finanziati e, pertanto, sulla base delle future disponibilità dovranno essere oggetto di nuovi, specifici, Atti Attuativi.

Il *Piano* ha subìto negli anni una evoluzione nei contenuti degli interventi previsti, anche per una sempre maggiore conoscenza del sistema lagunare e dei meccanismi alla base delle problematiche che lo investono, consentendo di mettere in atto le più avanzate soluzioni progettuali nel rispetto delle situazioni ambientali, urbanistiche e artistiche del luogo di realizzazione dell'intervento.

Il *Piano Generale degli Interventi*, pertanto, è un documento programmatorio in continua specificazione, che prevede lo sviluppo temporale parallelo di più attività tra loro diversificate ma fortemente interconnesse e che si realizza progressivamente facendo bagaglio delle esperienze acquisite nelle fasi attuative precedenti.

Nel corso del 2002 si è pervenuti alla ridefinizione del *Piano Generale degli Interventi* a seguito degli accordi intercorsi tra il Governo italiano e la Commissione Europea. Si ricorda, infatti, che, nel corso del 2002, la Commissione Europea ha proceduto all'archiviazione della procedura di infrazione a suo tempo avviata nei confronti dello Stato Italiano in ordine alla presunta incompatibilità, rispetto alla normativa comunitaria, dell'affidamento da parte del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Infrastrutture e Trasporti) al Consorzio Venezia Nuova della concessione unitaria per l'esecuzione delle attività ricomprese nel *Piano Generale degli Interventi* per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

A tale importante decisione, che riafferma il ruolo svolto dal Consorzio Venezia Nuova nell'ambito delle peculiari attività unitariamente finalizzate alla salvaguardia fisica e ambientale di Venezia e della sua laguna, nonché la validità della concessione ad esso affidata dallo Stato italiano, la Commissione Europea è pervenuta dopo l'esame dei documenti contrattuali stipulati tra il Magistrato alle

Acque e il Consorzio Venezia Nuova in data 21 giugno 2002, che recepiscono gli accordi intercorsi tra le Autorità Italiane e la Commissione Europea volti alla ridefinizione del perimetro degli interventi la cui esecuzione è affidata in concessione.

In base a tali accordi, sono state stralciate dal *Piano Generale degli Interventi* affidati in concessione le opere di difesa dei centri urbani dalle acque alte e le difese per "insulae", se non ricomprese in finanziamenti già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova, per essere appaltate mediante procedure concorsuali. Inoltre, il Consorzio Venezia Nuova dovrà eseguire le opere meccaniche ed elettromeccaniche, necessarie per la realizzazione dell'intervento di regolazione delle maree alle bocche di porto, mediante appalti di fornitura i cui esecutori dovranno essere individuati per mezzo di gare da indire ed esperire dal Consorzio stesso, secondo le direttive comunitarie.
La ridefinizione del *Piano Generale degli Interventi* che recepisce tali accordi è stata favorevolmente esaminata dal Comitato Tecnico di Magistratura nella seduta del 20 dicembre 2002.

Si ricorda in particolare che successivamente, il *Piano* è stato presentato, aggiornato al 31.12.2002, dal Presidente del Magistrato alle Acque, quale segretario del Comitato ex art. 4 Legge 798/84, nella seduta del 3 aprile 2003 al Comitato stesso, che ne ha preso atto e ha deliberato:
"1. di prendere atto del documento "Piano dei Finanziamenti relativi al Piano Generale degli Interventi" nella versione 31.12.2002, invitando a provvedere al suo adeguamento anche sulla base di quanto già deliberato da questo Comitato relativamente alla redazione del progetto esecutivo e alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree del "Sistema Mo.S.E.";
2. di prendere formale impegno affinché si provveda ad attivare tutte le iniziative utili a garantire senza soluzione di continuità i flussi finanziari, indicati nel documento "Piano dei finanziamenti relativi al Piano Generale degli Interventi", necessari per la realizzazione del "Sistema Mo.S.E." nonché per ulteriori attività, di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova, tendenti al recupero ambientale della laguna di Venezia ed alla sua salvaguardia".

2 *LO STATO DI ATTUAZIONE DEI FINANZIAMENTI*

Gli interventi dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova riguardano i seguenti obiettivi, richiamati anche dall'art. 3 lettere a), c), d) e l) della Legge n. 798/84 e dall'art. 2, 1° comma lettera a) della Legge n. 360/91 nonché dalla Legge n. 139/92:

- difesa dalle acque alte eccezionali;
- difesa locale dalle acque medio-alte;
- ristrutturazione dei moli foranei alle tre bocche lagunari;
- difesa dalle mareggiate;
- recupero della morfologia lagunare;
- arresto del degrado dell'ecosistema lagunare;
- allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna;
- ausilii luminosi alla navigazione;
- apertura delle valli da pesca;
- costituzione e potenziamento del Servizio Informativo.

Il totale degli importi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia, al 31 dicembre 2003, per la realizzazione dei suddetti interventi in concessione al Consorzio Venezia Nuova è pari a 3.379 milioni di euro, importo che tiene conto dei recenti finanziamenti provenienti dalla Legge 166/02 (Collegato Infrastrutture) di cui delibera CIPE del 29 novembre 2002 e dall'accordo transattivo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Montedison (ora Edison S.p.A.) in data 31 ottobre 2001.

Con riferimento all'**Allegato n. 1**, per **importi finanziati** si intendono gli importi complessivamente finanziati in favore delle attività del Consorzio Venezia Nuova dal 1984 al 31.12.2003.

A partire dalla Legge n. 139/92, i finanziamenti vengono attivati con contratti di finanziamento a valere sui "limiti di impegno", recati anno dopo anno dalle Leggi Finanziarie, destinati in quota parte al Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova per l'ammortamento delle rate (per capitali ed interessi) relative ai mutui contratti dal Consorzio Venezia Nuova, mediante specifica ripartizione proposta dal

Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 e operata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Per **importi sottoscritti** si intendono gli importi relativi ad Atti Attuativi sottoscritti tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova alla data del 31 dicembre 2003. Come specificato anche nell'**Allegato n. 1**, alla data del 31 dicembre 2003, gli importi sottoscritti risultano pari al 100% degli importi resi disponibili dalle Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96, n. 345/97, n. 448/98, n. 488/99, n. 388/00, n. 448/01 e n. 166/02.
Gli importi sottoscritti non tengono conto dell'Atto Attuativo (28^) che verrà sottoscritto, a valere sui finanziamenti provenienti dall'accordo Stato – Montedison (ora Edison S.p.A.) nei primi mesi del 2004.
L'elenco degli Atti Attuativi sottoscritti e il loro avanzamento è riportato nell'**Allegato n. 2**.

Per **importi impegnati** si intendono gli importi relativi ad Atti Attuativi il cui Decreto Presidenziale approvativo è già stato registrato da parte della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto. Al 31.12.2003 risulta, pertanto, impegnato l'86% degli importi sottoscritti (v. **Allegato n. 1**).

Per **importi spesi** al 31.12.2003 si intendono gli importi prodotti a tale data. **Al 31.12.2003 risulta speso il 56% degli importi sottoscritti** (v. **Allegato n. 1**) **reperiti a valere sulle Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96, n. 345/97, n. 448/98, n. 488/99, n. 388/00, n. 448/01 e n. 166/02.**

Per singole Leggi:

- il Consorzio Venezia Nuova, a valere sulla **Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti** (Leggi n. 910/86, n. 67/88, n. 360/91), ha ottenuto un finanziamento che ammonta complessivamente a 401 milioni di euro. A valere su tali somme, il Consorzio Venezia Nuova ha sottoscritto dal 1985 al 1992 otto Atti Attuativi, sei con il Magistrato alle Acque e due con il Genio Civile Opere Marittime, e numerosi atti aggiuntivi a tali Atti Attuativi per un importo complessivo di 401 milioni di euro circa. Gli importi spesi al 31.12.2003 sono 399 milioni di euro (pari a quasi il 100% degli importi sottoscritti).

- il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 139/92** con decorrenza dal 1993 e dal 1994, ha stipulato con gli istituti finanziatori[1] due contratti di mutuo e successivi atti aggiuntivi, che hanno complessivamente reso disponibili 557 milioni di euro. Con tali somme sono stati sottoscritti due Atti Attuativi (rep. n. 7322 e rep. n. 7395) e alcuni atti aggiuntivi agli Atti Attuativi stessi, per un importo complessivo di 557 milioni di euro (100% dell'importo disponibile). Gli importi spesi al 31.12.2003 relativamente alla Legge n. 139/92 sono pari a 510 milioni di euro (92% degli importi sottoscritti).

- il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 539/95** con decorrenza dal 1996 e dal 1997, ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo e successivi atti aggiuntivi, che hanno reso disponibili 124 milioni di euro[2]. Con tali somme sono stati finanziati due Atti Attuativi con il Magistrato alle Acque (rep. n. 7601 e rep. n. 7637) e tre atti aggiuntivi agli Atti Attuativi originari, per un importo complessivo di 120 milioni di euro. Gli importi spesi al 31.12.2003 relativamente alla Legge n. 539/95 sono pari a 112 milioni di euro (93% degli importi sottoscritti).

- il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 515/96** con decorrenza dal 1997 e dal 1998, ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo e successivi atti aggiuntivi che hanno reso disponibili 454 milioni di euro. Con tali somme sono stati sottoscritti due Atti Attuativi (rep. n. 7649 e rep. n. 7695) e cinque atti aggiuntivi con il Magistrato alle Acque per un importo complessivo pari a 454 milioni di euro.
  Gli importi spesi al 31.12.2003 relativamente alla Legge n. 515/96 sono pari a 358 milioni di euro (79% degli importi sottoscritti).

- il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 345/97** con decorrenza dal 1998 e dal 1999, ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo e successivi atti

[1] Gli Istituti finanziatori vengono individuati mediante procedura concorsuale ex decreto legislativo del 15.03.1995 n. 157 e successive integrazioni e modificazioni.

[2] Si fa notare che l'importo degli Atti Attuativi finanziati a valere sui fondi resi disponibili dai contratti di finanziamento è, talvolta, minore dell'importo mutuato in quanto si è considerato opportuno disporre, nei singoli contratti, di un margine per fronteggiare eventuali variazioni dei tassi di interesse, rispetto a quelli presupposti dal contratto, nel corso del "periodo di utilizzo" del finanziamento.

aggiuntivi che hanno reso disponibili 239 milioni di euro. Con tali somme sono stati sottoscritti due Atti Attuativi (rep. n. 7725 e rep. n. 7760) e cinque atti aggiuntivi con il Magistrato alle Acque per un importo complessivo pari a 239 milioni di euro.
Gli importi spesi al 31.12.2003 relativamente alla Legge n. 345/97 sono pari a 132 milioni di euro (55% degli importi sottoscritti).

- il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 448/98** con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001, ha stipulato con gli istituti finanziatori tre contratti di mutuo che hanno reso disponibili 256 milioni di euro. Con tali somme sono stati sottoscritti con il Magistrato alle Acque tre nuovi Atti Attuativi (rep. n. 7818, rep. n. 7844 e rep. n. 7868) di importo pari a 256 milioni di euro.
  Gli importi spesi al 31.12.2003 relativamente alla Legge n. 448/98 sono pari a 115 milioni di euro (45% degli importi sottoscritti).

- il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 488/99** con decorrenza dal 2001 e dal 2002 ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo e un atto aggiuntivo che hanno reso disponibili 201 milioni di euro. Con tali somme sono stati sottoscritti due Atti Attuativi (rep. n. 7894 e rep. n. 7923) e due atti aggiuntivi con il Magistrato alle Acque per un importo complessivo pari a 201 milioni di euro.
  Gli importi spesi al 31.12.2003 relativamente alla Legge n. 488/99 sono pari a 60 milioni di euro (30% degli importi sottoscritti).

- il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla **Legge n. 388/00** con decorrenza dal 2002 e dal 2003 ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo che hanno reso disponibili 154 milioni di euro. Con tali somme sono stati sottoscritti due Atti Attuativi (rep. n. 7952 e rep. n. 7962) con il Magistrato alle Acque per un importo complessivo pari a 154 milioni di euro.
  Gli importi spesi al 31.12.2003 relativamente alla Legge n. 388/00 sono pari a 34 milioni di euro (22% degli importi sottoscritti).

- la **Legge n. 448/01 del 28 dicembre 2001 (Legge Finanziaria per il 2002)** prevede, per il rifinanziamento della legislazione speciale per Venezia, gli

stanziamenti a copertura delle rate di ammortamento dei mutui già perfezionati dai vari Enti destinatari dei finanziamenti per la salvaguardia di Venezia in forza del disposto della Legge n. 139/92 e seguenti, nonché ulteriori limiti di impegno destinati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

La ripartizione tra i vari Enti e la destinazione specifica dei fondi per la realizzazione degli interventi per Venezia è stata operata mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recepita la proposta di ripartizione che il Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 ha deliberato nella seduta del 6 dicembre 2001.

In base a tale ripartizione, sono stati destinati al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali limiti di impegno, 3,254 milioni di euro con decorrenza dal 2002, 5,268 milioni di euro con decorrenza dal 2003 e 10,329 milioni di euro con decorrenza dal 2004.

Il Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno quindicennali con decorrenza dal 2002 e dal 2003 ha stipulato con gli istituti finanziatori due contratti di mutuo che hanno reso disponibili 225 milioni di euro. Con tali somme sono stati sottoscritti tre Atti Attuativi (rep. n. 7953, rep. n. 7980 e rep. 8007) con il Magistrato alle Acque per un importo complessivo pari a 225 milioni di euro.

Gli importi spesi al 31.12.2003 relativamente alla Legge n. 448/01 sono pari a 14 milioni di euro (6% degli importi sottoscritti) data la recente operatività degli Atti Attuativi.

- la **Legge del 1° agosto 2002, n. 166, Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti,** in attuazione a quanto disposto dalla "legge obiettivo", istituisce un apposito "fondo" e autorizza "limiti di impegno" quindicennali al fine di consentire il finanziamento della progettazione e della realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale individuate nel programma di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre 2001.

  Tale legge, pertanto, ha consentito l'assegnazione da parte del CIPE al "Sistema MOSE", compreso nel primo elenco delle opere strategiche di cui alla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001, di un importo pari a 450 milioni di euro a valere sul limite di impegno con decorrenza dal 2002 pari a 36,3332 milioni di euro, originariamente suddiviso in tre decorrenze dagli anni 2002, 2003 e 2004 (con delibera n. 109 adottata dal CIPE nella seduta del 29 novembre 2002,

rimodulata con successive delibere n. 63 del 25 luglio 2003 e n. 72 del 29 settembre 2003).

In data 24 novembre 2003 è stato stipulato tra il Consorzio Venezia Nuova e gli altri Istituti finanziatori il primo contratto di mutuo a valere sulla somma dei limiti di impegno originariamente decorrenti dal 2002 e dal 2003; il 16 dicembre 2003 è stato stipulato tra il Consorzio Venezia Nuova e gli Istituti finanziatori il secondo contratto di mutuo, a valere sulla quota parte rimanente del limite di impegno rispetto all'ammontare totale del limite di impegno assegnato dal CIPE al Consorzio Venezia Nuova, attivando così, rispettivamente, 136 e 314 milioni di euro. Con tali somme il 22 dicembre 2003 sono stati sottoscritti due nuovi Atti Attuativi (rep. n. 8014 e rep. n. 8015) di importo, rispettivamente, pari a 136 e 314 milioni di euro, che potranno essere resi operativi a tutti gli effetti nei primi mesi del 2004 mediante registrazione dei rispettivi Decreti Presidenziali da parte della Corte dei Conti. Con tali finanziamenti si darà corso alla realizzazione dei primi interventi relativi al "Sistema MOSE".

- **Legge 27 dicembre 2002, n. 289 legge finanziaria per il 2003.**

  La legge assicura l'assegnazione dei "limiti di impegno", con decorrenza dal 2003, destinati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna da parte delle precedenti leggi finanziarie, ma non stanzia ulteriori "limiti di impegno" a favore degli Enti competenti in materia di salvaguardia. D'altra parte, per assicurare continuità alle attività in corso, l'art. 80 – comma 28 recita *"Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, può essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalità ivi previste, nonché di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile."*

- **Legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria per il 2004.**

  La legge assicura l'assegnazione dei "limiti di impegno", con decorrenza dal 2004, destinati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna da parte delle precedenti leggi finanziarie, ma non stanzia ulteriori "limiti di impegno" a favore degli Enti competenti in materia di salvaguardia.

  La legge assicura, invece, il rifinanziamento dell'art. 13 della legge 166/02, destinando alle opere strategiche, tra le quali è ricompreso il "Sistema MOSE", "limiti di impegno" con decorrenza dal 2005 e dal 2006.

L'**Allegato n. 3** riporta sinteticamente, per ciascun obiettivo indicato dalle Leggi n. 798/84 e 139/92, il fabbisogno totale, gli importi finanziati, gli importi sottoscritti, gli importi impegnati, gli importi relativi ad attività già realizzate e in corso di realizzazione nonché gli importi spesi.
Nei grafici riportati nell'**Allegato n. 3.1** e **3.2** sono resi evidenti i dati riportati nelle tabelle precedenti. In particolare, si mette in evidenza la percentuale elevata che rappresenta gli interventi già realizzati e in corso di realizzazione alla data del 31 dicembre 2003, rispetto agli importi già stanziati a favore del concessionario e sottoscritti tra il Consorzio Venezia Nuova e il Magistrato alle Acque.

Il "*Fabbisogno Totale*", del *Piano Generale degli Interventi* viene valutato sulla base di documenti tecnici già prodotti, di stime provenienti da lavori analoghi, di indicazioni di massima, qualora si tratti di interventi non ancora sufficientemente delineati, da preventivi più dettagliati per interventi il cui progetto si trova già in fase di sviluppo.
Per quegli interventi il cui progetto esecutivo è già stato approvato dall'Amministrazione concedente, il Fabbisogno totale coincide con l'importo approvato.
Per tale motivo, l'importo indicato quale Fabbisogno totale, subisce delle evoluzioni nel tempo, tenendo conto di quanto definitosi progressivamente con l'approvazione dei singoli progetti esecutivi.

Il Fabbisogno totale, indicato nell'**Allegato n. 4** recepisce la stima effettuata al 31.12.2002, di cui il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ha preso atto nella seduta del 3 aprile 2003, e lo aggiorna al 31.12.2003 relativamente agli interventi ultimati – recependone lo stato finale – e agli interventi approvati dal Magistrato alle Acque – recependone gli importi indicati nei relativi progetti esecutivi –.

Il "*Fabbisogno residuo da finanziare*", indicato per ciascun obiettivo, è dato dalla differenza tra il Fabbisogno totale e gli importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova.
Con il fabbisogno residuo si dovrà trovare copertura finanziaria per quegli interventi:

- che costituiscono ulteriori stralci di interventi già realizzati o in corso di realizzazione;

- che costituiscono ulteriori fasi di sviluppo di attività che, per loro natura, si sviluppano nel corso di più anni (monitoraggi, manutenzioni di interventi già realizzati, gestione del Servizio Informativo);
- che non hanno trovato copertura finanziaria nell'ambito degli atti Convenzionali già sottoscritti in quanto non particolarmente urgenti o comunque rinviabili rispetto ad altri interventi;
- la cui progettazione è ancora in fase di sviluppo e, poiché richiede tempi lunghi di completamento e di successiva procedura approvativa, si è ritenuto opportuno rinviare il finanziamento delle relative opere (ciò vale soprattutto per gli interventi di sistemazione delle sponde e dei fondali dei canali portuali a Porto Marghera che non trovano copertura nell'ambito dei fondi provenienti dall'accordo Stato-Montedison (ora Edison S.p.A.) per i quali, per la complicatezza delle progettazioni e per la complessità del successivo iter approvativo, trovano per lo più finanziamento nell'ambito degli Atti Attuativi finanziati solo i relativi progetti, mentre gli interventi veri e propri non risultano coperti da finanziamenti e quindi sono compresi nel fabbisogno residuo da finanziare);
- che costituiscono nuovi studi e sperimentazioni da realizzare in funzione di alcune esigenze specifiche di approfondimento emerse nel corso di attività progettuali.

La maggior parte del fabbisogno residuo è rappresentata dagli importi valutati necessari per la realizzazione del sistema delle opere per la regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto lagunari.
L'altra parte rilevante del Fabbisogno residuo è rappresentata dagli interventi ambientali per molti dei quali, come sopra segnalato, nell'ambito dei finanziamenti disponibili, si è preferito finanziare le sole progettazioni, richiedendo tempi di sviluppo e iter approvativi molto lunghi.

L'**Allegato n. 5** infine, dà contezza di quanto già realizzato anche in termini di "quantità" ovvero dello sviluppo dei lavori effettuati, sia nel campo della salvaguardia fisica (difesa dalle acque medio-alte, difesa dalle mareggiate, rinforzo dei moli foranei) che nel campo della salvaguardia ambientale (interventi per il recupero morfologico e per l'arresto del degrado del bacino lagunare).

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato n. 1

STATO DI ATTUAZIONE DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI AL CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Aggiornamento al 31 dicembre 2003

Importi in milioni di Euro

	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI SOTTOSCRITTI AL 31.12.2003	%	IMPORTI IMPEGNATI AL 31.12.2003	%	IMPORTI SPESI AL 31.12.2003	%	
	(A)	(B)	(B)/(A)	(C)	(C)/(B)	(D)	(D)/(B)	
LEGGE 798/84	401,380	401,380	100%	401,380	100%	399,327	99%	
LEGGE 139/92	556,560	556,560	100%	556,560	100%	509,511	92%	
LEGGE 539/95	120,334	120,334	100%	120,334	100%	111,723	93%	
LEGGE 515/96	454,037	454,037	100%	454,037	100%	357,950	79%	
LEGGE 345/97	239,000	239,000	100%	239,000	100%	131,603	55%	
LEGGE 448/98	255,646	255,646	100%	255,646	100%	115,455	45%	
FONDI CIPE PER INTERVENTI AMBIENTALI	50,096	50,096	100%	50,096	100%	2,269	5%	
LEGGE 488/99	201,456	201,456	100%	201,456	100%	59,703	30%	
LEGGE 388/00	154,000	154,000	100%	154,000	100%	34,421	22%	
LEGGE 448/01	225,000	225,000	100%	225,000	100%	14,396	6%	
TOTALE PARZIALE	**2.657,509**	**2.657,509**	**100%**	**2.657,509**	**100%**	**1.736,358**	**65%**	
LEGGI 448/01 – 166/02 (Collegato Infrastrutture) DI CUI DELIBERA CIPE 29/11/02 PER "SISTEMA MOSE"	450,000	450,000	100%	0,000	0%	4,239	1%	(*)
FINANZIAMENTO DA ACCORDO STATO - MONTEDISON (ora Edison S.p.A.)	271,140	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%	(**)
TOTALE GENERALE	**3.378,649**	**3.107,509**	**92%**	**2.657,509**	**86%**	**1.740,597**	**56%**	

LEGENDA

IMPORTI FINANZIATI: gli importi complessivamente stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova alla data del 31.12.2003.
IMPORTI SOTTOSCRITTI AL 31.12.2003: gli importi relativi ad Atti Attuativi sottoscritti a tale data tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova.
IMPORTI IMPEGNATI AL 31.12.2003: gli importi impegnati a tale data con apposito Decreto del Presidente del Magistrato alle Acque registrato da parte della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.
IMPORTI SPESI AL 31.12.2003: gli importi prodotti a tale data.

NOTE

(*) Alcune attività sono state anticipate nelle more della formalizzazione degli Atti Attuativi finanziati con i fondi CIPE
(**) Finanziamento proveniente dall'accordo transattivo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Montedison (ora Edison S.p.A.), in data 31.10.2001.

Allegato n. 2

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ATTI ATTUATIVI SOTTOSCRITTI TRA IL MAGISTRATO ALLE ACQUE E IL CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Aggiornamento al 31 dicembre 2003

Importi in milioni di Euro

ATTO ATTUATIVO rep. n°	DATA SOTTOSCRIZIONE	LEGGE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO DELL' ATTO ATTUATIVO	STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2003 (***)		
				IMPORTI SPESI	%	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(E/D)	
6479 (*)	12-lug-85	798/84 - 910/86	139,379	139,379	100%	
6745 (*)	23-dic-87	910/86 - 67/88	98,824	98,159	99%	(****)
7025 (*)	15-dic-89	67/88	64,144	63,574	99%	(****)
7138 (*)	21-feb-91	67/88 - 360/91	41,317	40,995	99%	(****)
7191 (*)	04-ott-91	67/88	2,582	2,486	96%	(****)
7295 (*)	05-giu-92	67/88	30,740	30,340	99%	(****)
1568 (**)	21-nov-87	798/84	3,868	3,868	100%	
1685 (**)	20-apr-89	910/86	20,527	20,527	100%	
7322 (*)	03-dic-92	139/92	388,260	371,508	96%	
7395 (*)	23-nov-93	139/92	168,300	138,003	82%	
7601 (*)	20-mar-96	539/95	40,284	34,722	86%	
7637 (*)	29-ott-96	539/95	80,051	77,001	96%	
7649 (*)	18-dic-96	515/96	315,038	273,778	87%	
7695 (*)	28-lug-97	515/96	139,000	84,172	61%	
7725 (*)	23-dic-97	345/97	111,000	66,864	60%	
7760 (*)	14-lug-98	345/97	128,000	64,739	51%	
7818 (*)	01-dic-99	448/98	148,223	70,894	48%	
7844 (*)	24-feb-00	448/98	40,284	28,204	70%	
7867 (*)	03-nov-00	CIPE	50,096	2,269	5%	
7868 (*)	03-nov-00	448/98	67,139	16,356	24%	
7894 (*)	30-mar-01	488/99	108,456	22,790	21%	
7923 (*)	01-ago-01	488/99	93,000	36,913	40%	
7952 (*)	21-giu-02	388/00	60,000	21,266	35%	
7953 (*)	27-giu-02	448/01	39,000	5,269	14%	
7962 (*)	21-ott-02	388/00	94,000	13,155	14%	
7980(*)	18-dic-02	448/01	63,000	4,496	7%	
8007(*)	01-ott-03	448/01	123,000	4,631	4%	
8014(*)	22-dic-03	448/01-166/02 CIPE	136,000	1,786	1%	
8015(*)	22-dic-03	448/01-166/02 CIPE	314,000	2,453	1%	
TOTALE			**3.107,509**	**1.740,597**	**56%**	

(*) Atti Attuativi sottoscritti tra il Ministero Lavori Pubblici (ora Infrastrutture e Trasporti) - Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova. Non sono comprese le attività finanziate da altri Enti nell'ambito di specifici "Accordi di programma".

(**) Atti Attuativi sottoscritti tra il Ministero Lavori Pubblici (ora Infrastrutture e Trasporti) - Genio Civile Opere Marittime e Consorzio Venezia Nuova.

(***) Sono riportati gli importi spesi ovvero realizzati al 31.12.2003. Non compreso l'avanzamento delle attività finanziate da altri Enti.

(****) Lo scostamento tra l'importo dell'Atto Attuativo e l'importo speso è dato dalla somme a disposizione (Atti Attuativi ultimati in attesa di collaudo finale).

Allegato n. 3

ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE IN CONCESSIONE DAL CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Aggiornamento al 31 dicembre 2003

Importi in milioni di Euro

		fabbisogno totale	importi finanziati	importi sottoscritti	importi impegnati	importi realizzati e in corso di realizzazione	importi spesi
1	studi e sperimentazioni ambientali	109	82	84	84	78	58
2	difesa dalle acque alte eccezionali	3.632	749	749	300	291	208
3	difesa locale dalle acque medio alte	917	917	917	917	702	474
4	ristrutturazione dei moli foranei	107	107	107	107	107	107
5	difesa dalle mareggiate	389	318	318	318	315	281
6	recupero morfologico	719	398	398	398	371	265
7	arresto del degrado dell'ecosistema lagunare	1.082	673	402	402	320	256
8	allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna	45	13	13	13	8	8
9	ausilii luminosi alla navigazione	21	21	21	21	15	15
10	apertura valli da pesca	4	4	4	4	4	4
11	servizio informativo	113	82	82	82	81	65
12	ulteriori somme a disposizione	14	14	13	12	0	0
	TOTALE	**7.152**	**3.378**	**3.108**	**2.658**	**2.292**	**1.741**
	VALORI %			**92% degli importi finanziati**	**86% degli importi sottoscritti**	**74% degli importi sottoscritti**	**56% degli importi sottoscritti**

LEGENDA

FABBISOGNO TOTALE: il fabbisogno del Piano Generale degli Interventi affidati in concessione al Consorzio Venezia Nuova (stima al 31.12.2002 aggiornata al 31.12.2003 per gli interventi ultimati o già approvati).

IMPORTI FINANZIATI: gli importi complessivamente stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova alla data del 31.12.2003.

IMPORTI SOTTOSCRITTI AL 31.12.2003: gli importi relativi ad Atti Attuativi sottoscritti a tale data tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova.


IMPORTI IMPEGNATI AL 31.12.2003: gli importi degli Atti Attuativi impegnati a tale data con apposito Decreto del Presidente del Magistrato alle Acque registrato da parte della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

IMPORTI REALIZZATI, IN CORSO E DI PROSSIMA REALIZZAZIONE AL 31.12.2003: l'avanzamento totale delle attività e cioè gli importi delle attività realizzate, in corso di realizzazione e di prossimo avvio (progetto esecutivo approvato) a tale data.


IMPORTI SPESI AL 31.12.2003: gli importi prodotti a tale data.

Allegato n. 3.1

PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI: FABBISOGNO E STATO DI ATTUAZIONE DEI FINANZIAMENTI

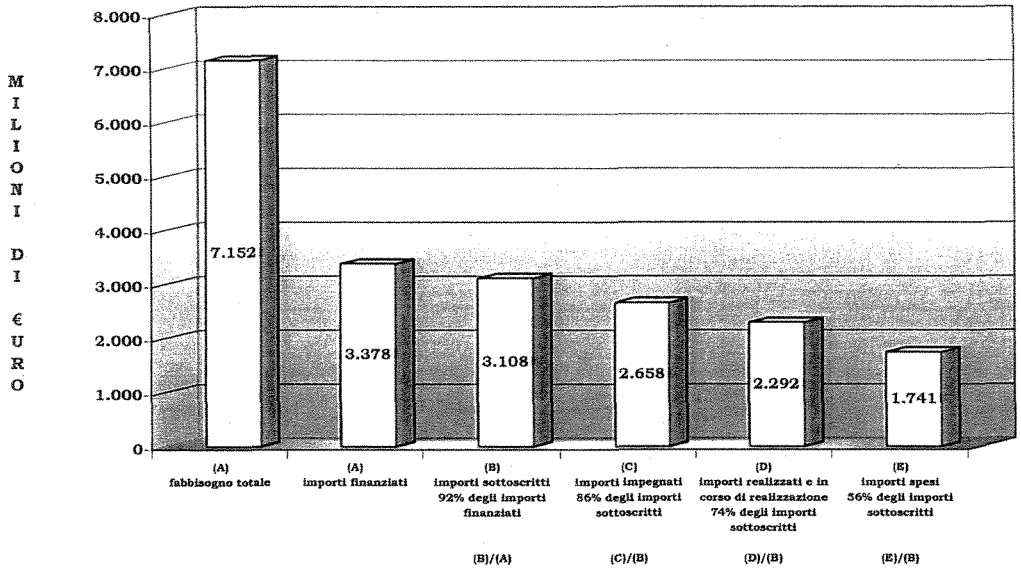

CONFRONTO FRA IMPORTI SOTTOSCRITTI (3.108 Mln €),IMPORTI REALIZZATI E IN CORSO DI REALIZZAZIONE (2.292 Mln €) E IMPORTI SPESI (1.741 Mln €)

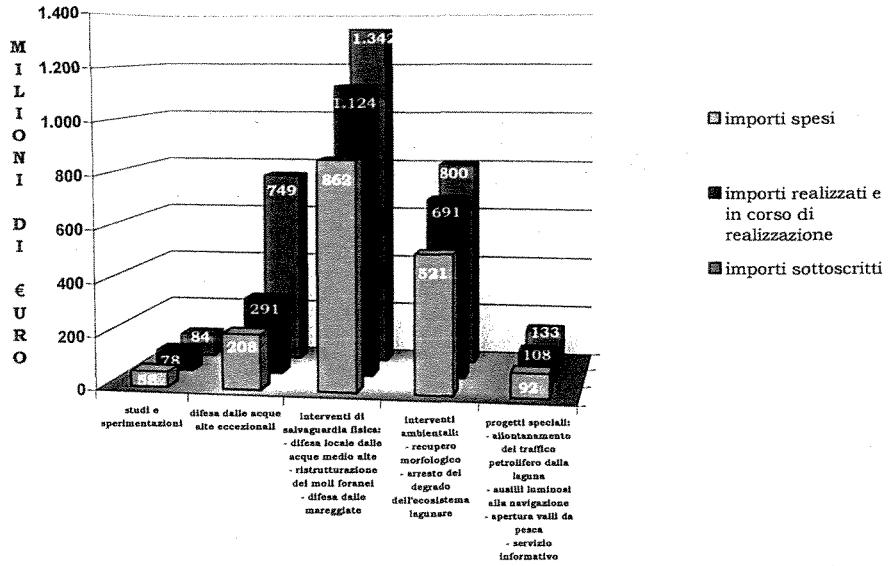

LEGENDA

FABBISOGNO TOTALE: il fabbisogno del Piano Generale degli Interventi affidati in concessione al Consorzio Venezia Nuova (stima al 31.12.2002 aggiornata al 31.12.2003 per gli interventi ultimati o già approvati).

IMPORTI FINANZIATI: gli importi complessivamente stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova alla data del 31.12.2003.

IMPORTI SOTTOSCRITTI AL 31.12.2003: gli importi relativi ad Atti Attuativi sottoscritti a tale data tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova.

IMPORTI IMPEGNATI AL 31.12.2003: gli importi degli Atti Attuativi impegnati a tale data con apposito Decreto del Presidente del Magistrato alle Acque registrato da parte della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

IMPORTI REALIZZATI, IN CORSO E DI PROSSIMA REALIZZAZIONE AL 31.12.2003: l'avanzamento totale delle attività e cioè gli importi delle attività realizzate, in corso di realizzazione e di prossimo avvio (progetto esecutivo approvato) a tale data.

IMPORTI SPESI AL 31.12.2003: gli importi prodotti a tale data.
