

DIFESA DALLE MAREGGIATE

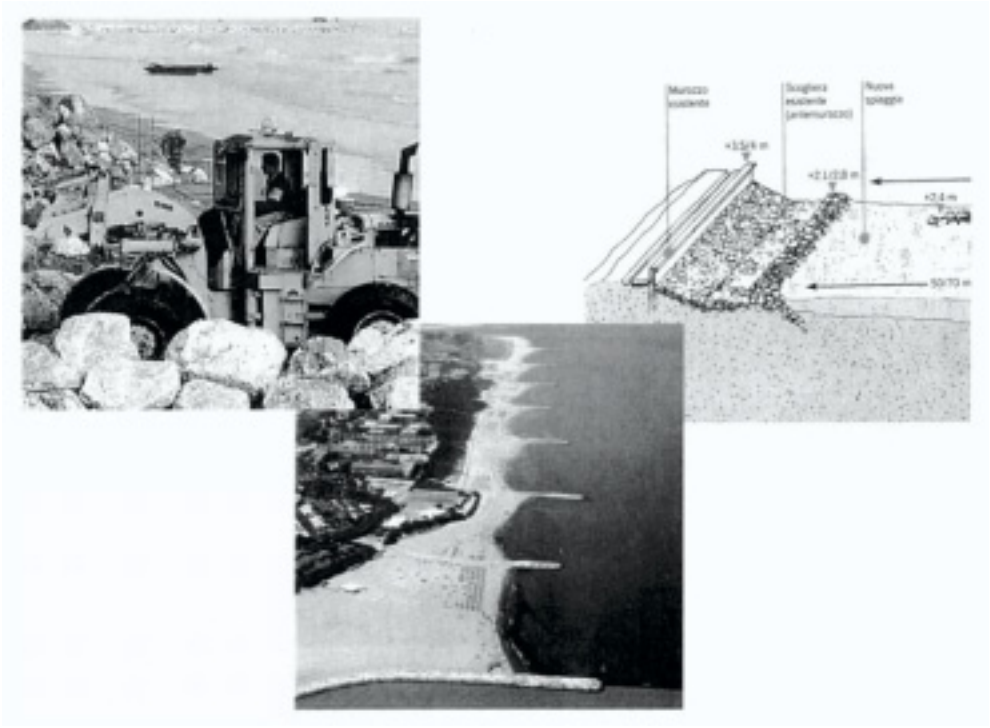

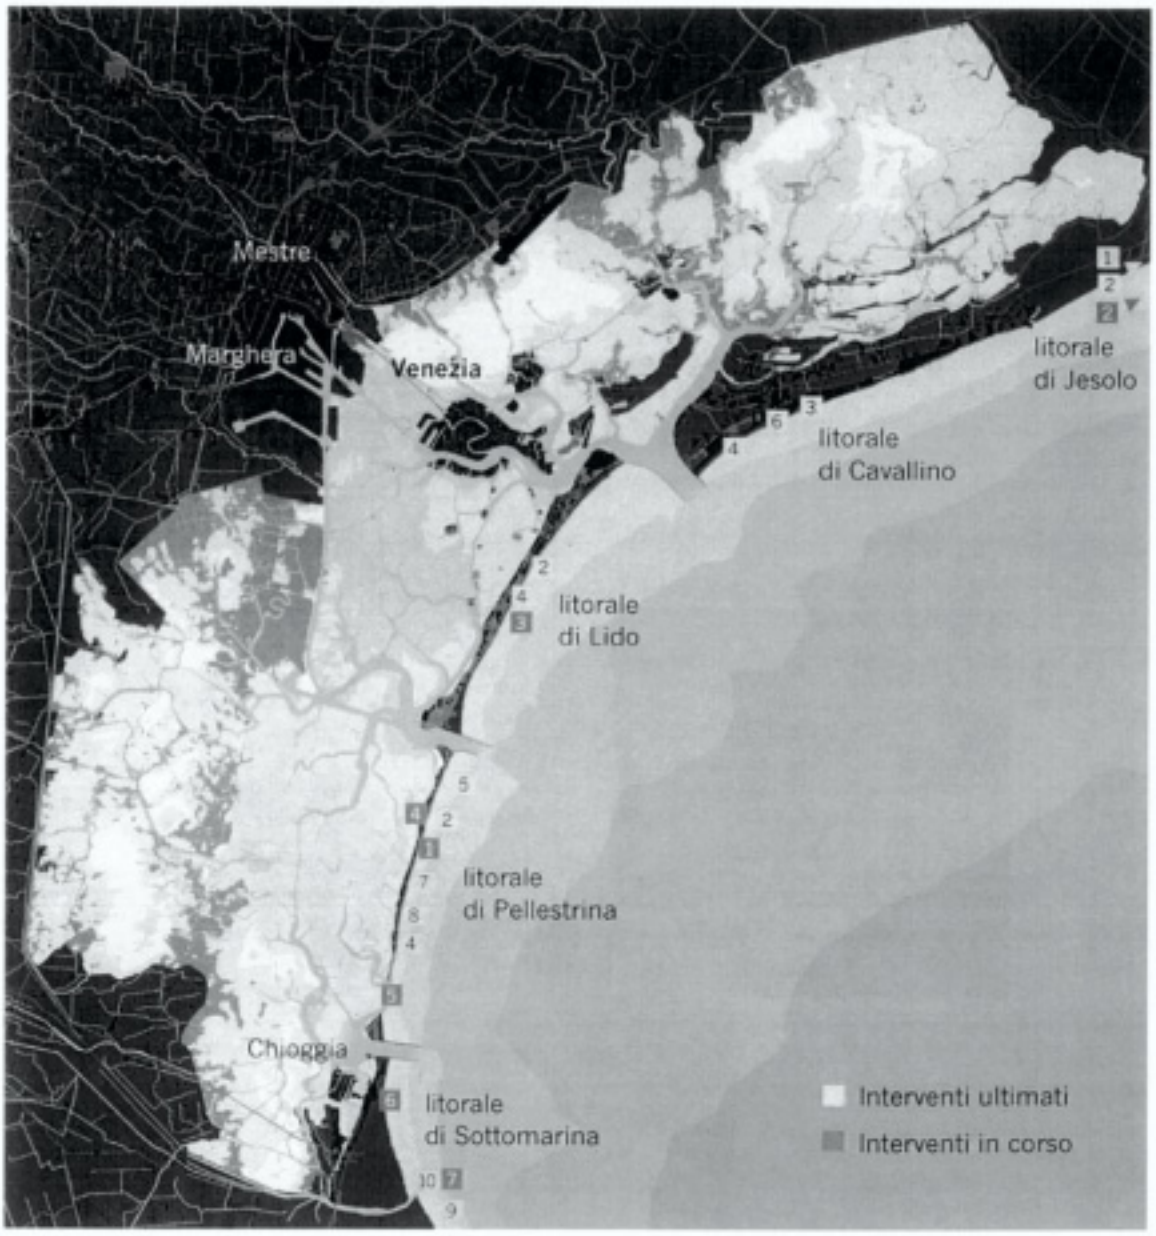

DIFESA DALLE MAREGGIATE
ATTIVITA' ULTIMATE E IN CORSO

Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Rinforzo del litorale di Jesolo 1° e 2° stralcio – in Accordo di programma con il Comune di Jesolo.
2. Sistemazione zona Cortellazzo e Foce Piave – 1° stralcio
3. Interventi sperimentali di difesa del litorale di Cavallino (località Cà Pasquali)
4. Indagini propedeutiche alla realizzazione degli interventi
5. Monitoraggio del litorale da Cavallino a Pellestrina – prime fasi
6. Rinforzo e rinaturalizzazione del litorale di Cavallino
7. Rinforzo della scogliera tra S. Pietro in Volta e Pellestrina e del murazzo di Caroman (litorale di Pellestrina)
8. Rinforzo e ripascimento del litorale di Pellestrina
9. Rinforzo del litorale di Isola Verde/Chioggia
10. Interventi stagionali alla foce del Brenta e alla foce dell'Adige – in Accordo di programma con la Regione del Veneto, Comune di Chioggia e Comune di Rosolina – 1^ fase

Attività in corso

1. Manutenzione dei litorali mediante ripristino del ripascimento in sabbia
2. Interventi di difesa del litorale di Cortellazzo – 2° stralcio 1^ fase – ripascimento litorale di Eraclea
3. Difesa litorale Lido 1° stralcio
4. Litorale di Pellestrina: accessi attrezzati alla spiaggia; ulteriori attività specialistiche e rilievi ambientali sommersi ed emersi
5. Restauro murazzo Cà Roman sul litorale di Pellestrina
6. Rinforzo del litorale di Sottomarina (Chioggia)
7. Interventi stagionali alla foce del Brenta e alla foce dell'Adige – in Accordo di programma con la Regione del Veneto, Comune di Chioggia e Comune di Rosolina – 2^ fase


Attività da avviare

1. Completamento rinforzo litorale di Lido
2. Completamento rinforzo litorale di Isola Verde

Attività da finanziare:

1. Prosecuzione della manutenzione dei litorali mediante ripristino del ripascimento
2. Completamento rinforzo litorale di Jesolo (zone Cortellazzo, Eraclea) e di Lido
3. Monitoraggi di controllo degli interventi realizzati

Litorale di Jesolo

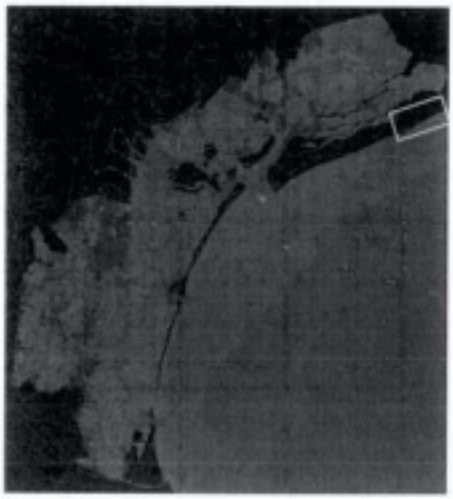


Obiettivi specifici: proteggere i territori e gli abitati litoranei; contrastare l'erosione della costa; smorzare l'energia delle onde; ripristinare ambienti naturali degradati

Interventi principali: ampliamento della spiaggia (10 km); adeguamento dei pontili lungo la riva (34 pontili ristrutturati, 16 di nuova costruzione) e realizzazione di 4 scogliere di roccia ("pennelli")

Intervento ultimato


A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: un tratto del litorale prima e dopo i lavori

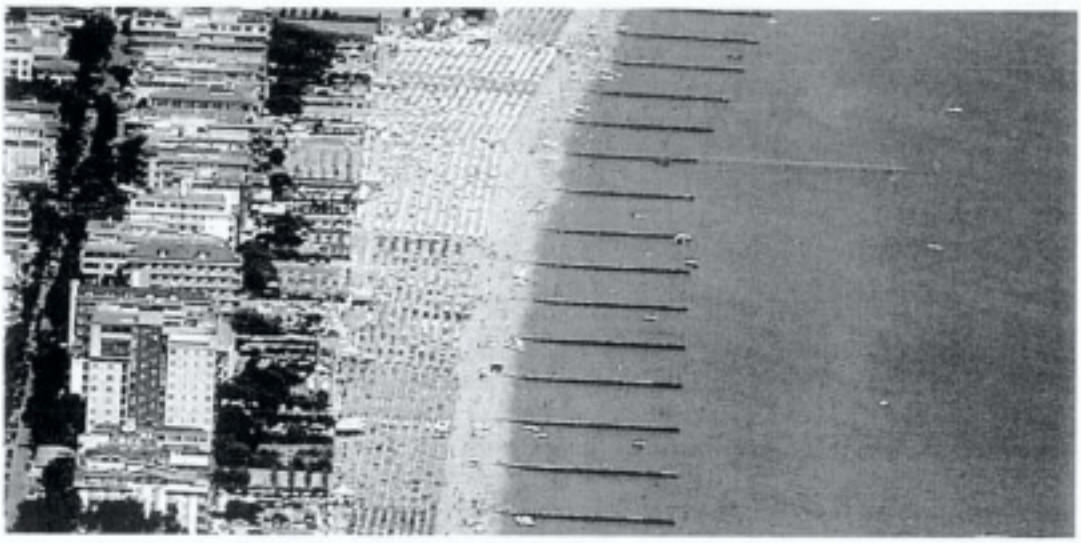



Litorale di Cavallino

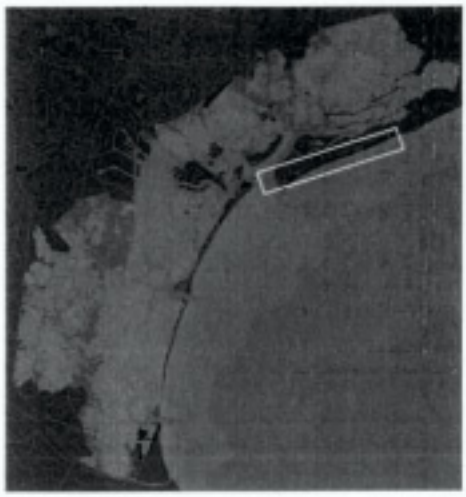

Obiettivi specifici: proteggere i territori e gli abitati litoranei; contrastare l'erosione della costa; smorzare l'energia delle onde; ripristinare ambienti naturali degradati

Interventi principali: ampliamento della spiaggia (11 km) protetta da 32 "pennelli"

Intervento ultimato


A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: la parte sud del litorale prima e dopo l'intervento





Litorale di Pellestrina

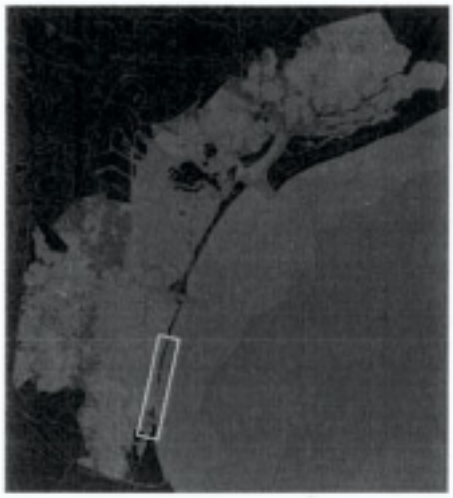

Obiettivi specifici: proteggere i territori e gli abitati litoranei; contrastare l'erosione della costa; smorzare l'energia delle onde; rinforzare le antiche difese a mare "murazzi"

Interventi principali: formazione di una nuova spiaggia (9 km) contenuta entro "celle" delimitate da 18 "pennelli" trasversali alla riva e da una scogliera sommersa longitudinale (9 km)

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: un tratto del litorale prima e dopo i lavori





Litorale di Isola Verde



Obiettivi specifici: proteggere i territori e gli abitati litoranei; contrastare l'erosione della costa; smorzare l'energia delle onde

Interventi principali: rinascimento della spiaggia (2,5 km) e costruzione di 8 "pennelli" di roccia a difesa del nuovo arenile

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento


In basso: un tratto del litorale prima e dopo i lavori






PAGINA BIANCA

RECUPERO MORFOLOGICO

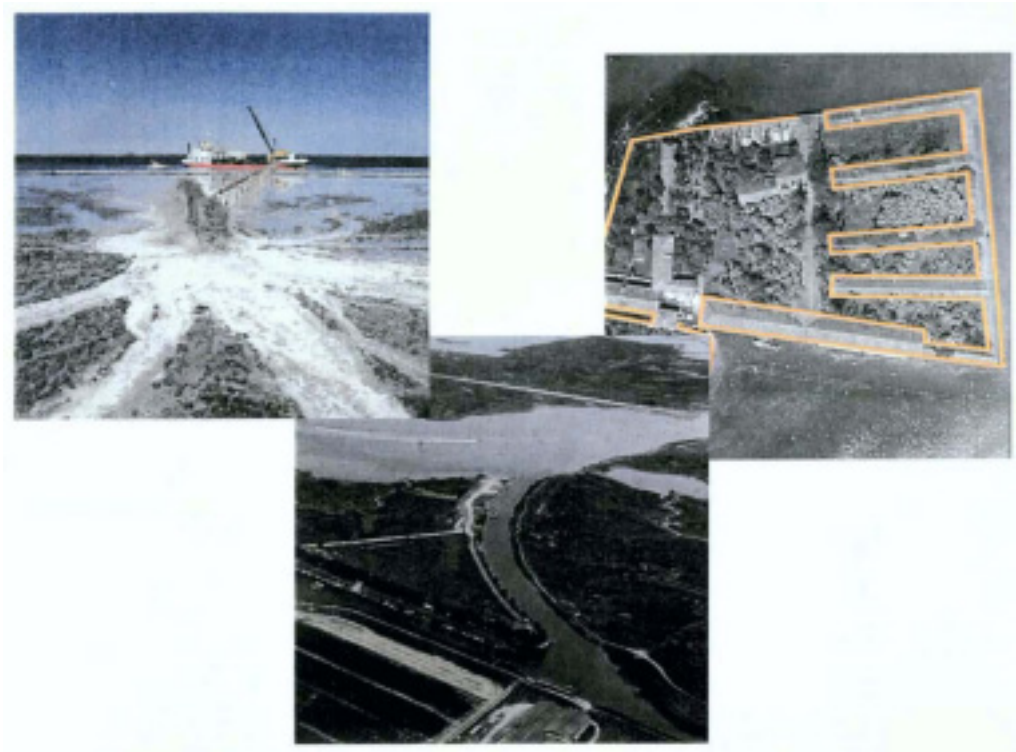

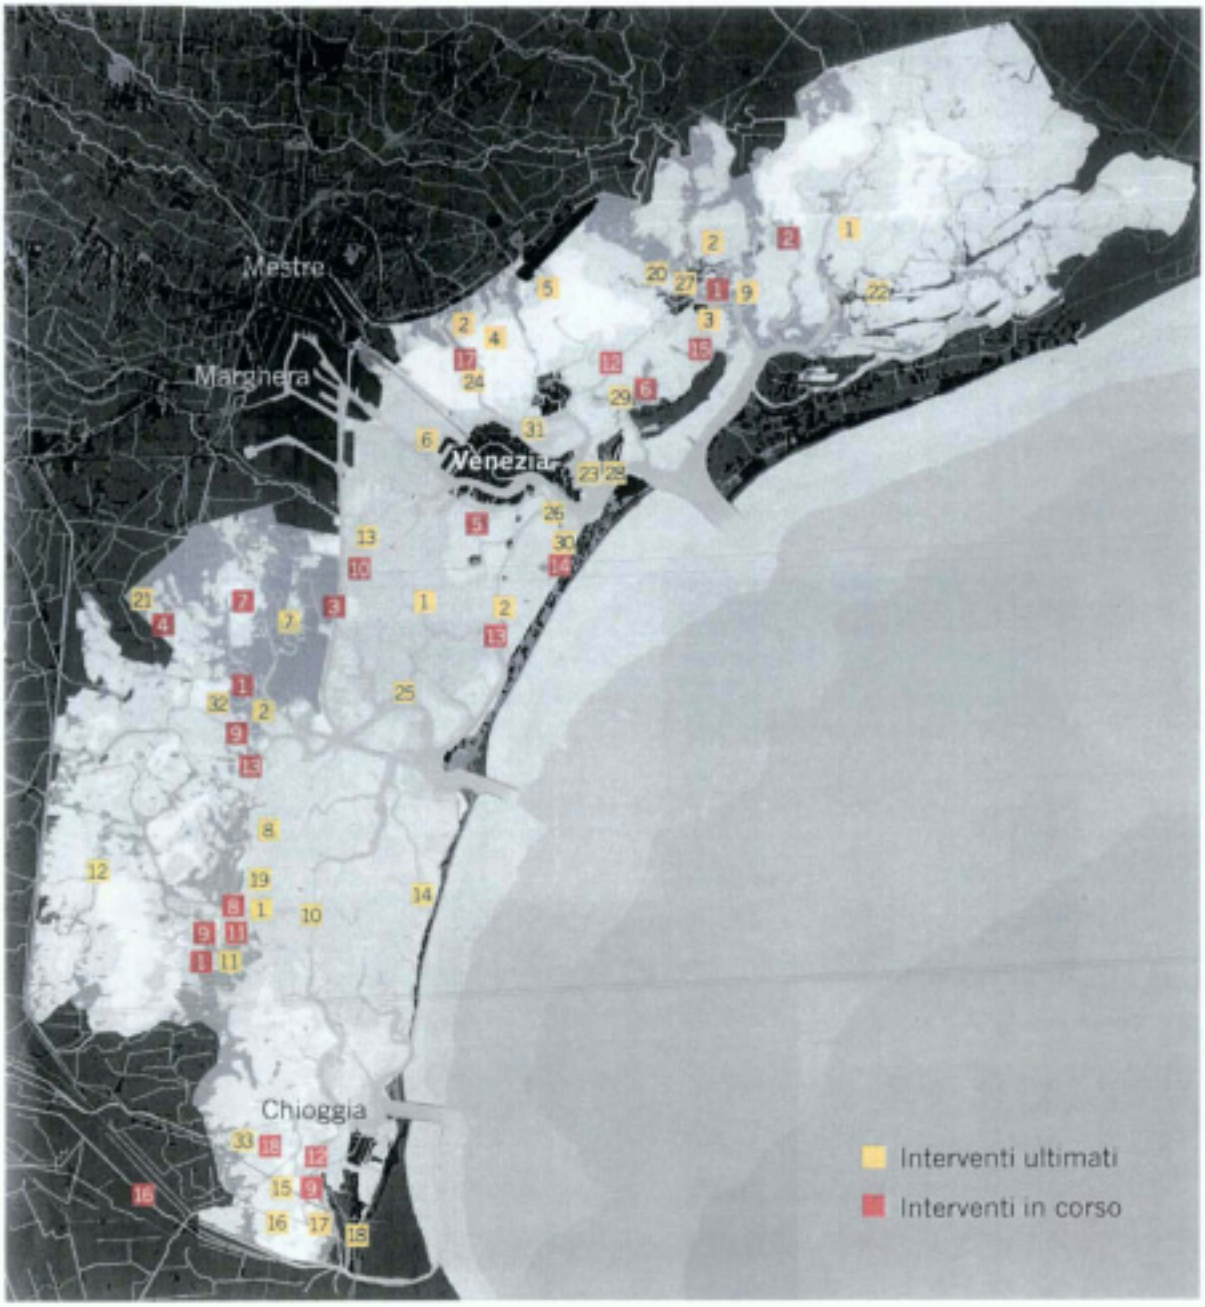

RECUPERO MORFOLOGICO
ATTIVITA' ULTIMATE E IN CORSO

Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Indagini propedeutiche alla realizzazione degli interventi
2. Interventi sperimentali
3. Recupero morfologico zona Burano, Mazzorbo, S. Francesco del Deserto (laguna nord)
4. Recupero morfologico zona Tessera, Campalto, Osellino (laguna nord)
5. Interventi integrativi sul canale di Tessera (laguna nord)
6. Isola del Tronchetto – escavo per la vivificazione area sud-ovest in Accordo di programma con il Comune di Venezia (laguna centrale)
7. Ripristino dei canali nelle casse di colmata B e D/E e ricostruzione di barene a sud della cassa di colmata D/E (laguna centrale)
8. Cordoni sabbiosi a difesa di barene in erosione 1° stralcio
9. Intervento di protezione barene 1° e 2° ciclo (laguna nord)
10. Dragaggio del canale Allacciante (laguna centrale)
11. Dragaggio di canali in valle Millecampi (laguna sud) e ricostruzione di barene
12. Dragaggio canale Scirocchetto e canale Buello (laguna centrale)
13. Dragaggio canali lagunari di Tessera, Fusina, e Contorta S. Angelo e ricostruzione di barene (laguna nord e centrale)
14. Dragaggio del canale S. Antonio dalla bocca di Malamocco a Caroman (laguna centrale)
15. Dragaggio dei varchi sotto il ponte translagunare tra Chioggia e la terraferma (laguna sud)
16. Dragaggio canali Sottomarina, Madonna, Alghero, Laghini 1- Alghero, Trezze, Otregan, Scarpion, S. Domenico e Borgo S. Giovanni (Chioggia)
17. Dragaggio canali nel bacino del Lusenzo e ricostruzione di barene lungo il canale Lombardo esterno sud e nord (Chioggia)
18. Sistemazione dei fondali del canale Fossetta (Chioggia)
19. Realizzazione di sovralzi di sabbia a protezione delle barene in erosione (laguna nord e sud)
20. Recupero ambientale e morfologico delle barene – rilievi e monitoraggi; recupero barene con tecniche di ingegneria naturalistica (progetto Life Natura)
21. Ricostruzione argini di conterminazione lungo i canali Bondantino (laguna centrale)
22. Ricostruzione argine a Lio Piccolo (laguna nord)
23. Completamento dell'isola della Certosa
24. Recupero morfologico dell'isola di Campalto (laguna nord)
25. Recupero morfologico dell'isola Fisolo (laguna centrale)
26. Recupero morfologico dell'isola di S. Servolo (laguna centrale)
27. Recupero morfologico dell'isola dei Laghi (laguna nord)
28. Recupero morfologico dell'isola della Certosa (laguna nord)
29. Recupero morfologico dell'isola del Lazzaretto Nuovo (laguna nord)
30. Recupero morfologico dell'isola di San Lazzaro degli Armeni (laguna centrale)

31. Recupero morfologico dell'isola di San Michele (laguna centrale)

32. Opere di confinamento della barena Novisso (laguna centrale)

33. Manutenzione canale Novissimo (laguna sud)

☐ **Attività in corso**

1. Monitoraggi sugli esiti dei lavori morfologici realizzati

2. Vivificazione e recupero morfologico lagunare della zona dell'isola di S. Cristina (laguna nord)

3. Intervento di recupero morfologico aree casse di colmata D/E Fossetta Barambani (laguna centrale)

4. Campagna di monitoraggio argine Bondantino (laguna centrale)

5. Interventi di ripristino morfologico e risagomatura del canale marittimo di S. Spirito e dei canali limitrofi Rezzo e Fasiol (laguna centrale)

6. Isola Lazzaretto Nuovo completamento impianto fitobiodepurazione e gestione (laguna centrale)

7. Ripristino fondali canali area lago Teneri 1^ stralcio (canali Volpego e Fiumesino) e 2^ stralcio (barena Casone Zappa A e B)

8. Cordoni sabbiosi a difesa di barene in erosione 2° stralcio (1^ fase)

9. Naturalizzazione e riqualificazione ambientale delle strutture morfologiche artificiali a velma e barena

10. Strutture morfologiche per la protezione dei bassofondali adiacenti il canale S.Leonardo - Marghera

11. Recupero ambientale Valle Millecampi

12. Intervento di ripristino morfologico e restauro statico murature perimetrali dell'isola di S. Giacomo in Paludo (laguna nord)

13. Recupero morfologico dell'isola di Poveglia (laguna centrale)

14. Recupero morfologico dell'isola di Lazzaretto Vecchio (laguna centrale)

15. Recupero morfologico dell'isola San Francesco del Deserto (laguna centrale)

16. Ricalibratura e rinforzo del canal Morto tratto tra l'idrovora Cà Bianca e l'innesto del Canale Barbegara

17. Manutenzione per lo scavo, riprofilatura e ripristino briccole di segnalamento sul canale di Campalto

18. Recupero morfologico dell'area lungo il canale Novissimo – barena Otregan

Attività da avviare

1. Prosecuzione degli interventi sperimentali per l'adeguamento del progetto morfologico

2. Interventi morfologici strettamente connessi alle opere alle bocche di porto

3. Prosecuzione degli interventi morfologici di ricalibratura dei canali lagunari, di sollevamento dei bassi fondali e di ricostruzione di velme e barene

4. Prosecuzione degli interventi per il recupero morfologico e ambientale, per la protezione delle barene e dei bassifondi, per il riavvio dei dinamismi naturali e per la naturalizzazione delle barene e delle strutture morfologiche artificiali


5. Interventi di ricalibratura degli argini lungo la conterminazione lagunare

6. Recupero morfologico e ambientale delle isole: Mazzorbetto e S. Caterina, San Giorgio in Alga

Attività da finanziare:

1. Interventi sperimentali per adeguamento progetto morfologico
2. Prosecuzione degli interventi morfologici di ricalibratura dei canali lagunari, di sollevamento dei bassi fondali e di ricostruzione di velme e barene
3. Prosecuzione degli interventi per il recupero morfologico e ambientale, per la protezione delle barene e dei bassifondi, per il riavvio dei dinamismi naturali e per la naturalizzazione delle barene e delle strutture morfologiche artificiali
4. Interventi per il recupero morfologico e ambientale nell'ambito del Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (Prusst)
5. Completamento interventi di ricalibratura degli argini lungo la conterminazione lagunare
6. Prosecuzione del recupero morfologico e ambientale delle isole: Madonna del Monte, Isola Campana, S. Angelo delle Polveri, Santo Spirito, Vignole, San Pieretto, San Michele

Isola di Poveglia

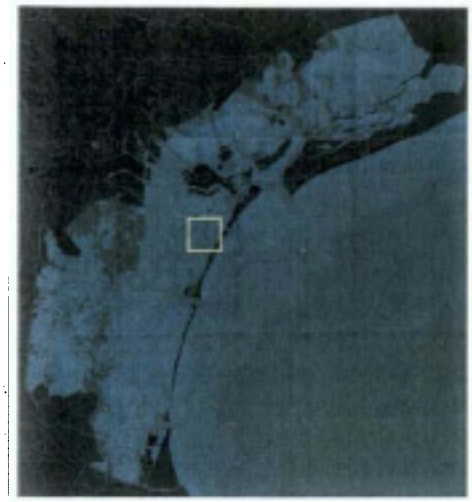

Obiettivi specifici: contrastare il degrado delle rive; sistemazione dei canali interni mediante dragaggio del fondo e rimodellamento delle sponde; restauro delle murature dell'Ottagono; restauro della "cavana" e realizzazione di ponteggi per garantire la sicurezza dei fabbricati prospicienti le rive durante l'esecuzione degli interventi sulle medesime

Interventi principali: ripristino delle sponde; restauro dei muri perimetrali dell'Ottagono a ridosso dell'isola; realizzazione di ponteggi a protezione dei fabbricati prospicienti le sponde; protezione delle rive del canale interno

Intervento in corso

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso:vista aerea dell'isola

