ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXLVII
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

(Aggiornate al 31 dicembre 2005)

(articolo 4, ultimo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798)

Presentata dal Ministro delle infrastrutture

(DI PIETRO)

Trasmessa alla Presidenza il 15 giugno 2007

TIPOGRAFIA DEL SENATO

PAGINA BIANCA

INDICE

1. *Quadro riepilogativo dei finanziamenti e dello stato di attuazione degli interventi finanziati dalla legislazione speciale per Venezia* ..... *Pag.* 5

1.1 Premessa ..... » 5

1.2 Lo stato di attuazione ..... » 6

1.3 Il ruolo dell'Ufficio di Piano ..... » 12

1.4 Conclusioni ..... » 13

2. *Stato di attuazione dei finanziamenti da parte dei diversi soggetti attuatori* ..... » 17

2.1 Interventi di competenza dello Stato (in amministrazione diretta e in concessione al Consorzio Venezia Nuova) ..... » 17

2.2 Stato di attuazione degli interventi di competenza della Regione del Veneto ..... » 19

2.3 Stato di attuazione degli interventi di competenza del Comune di Venezia, del Comune di Chioggia e del Comune di Cavallino – Treporti ..... » 20

2.4 Stato di attuazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni ..... » 22

Stato di attuazione degli interventi ..... » 61

PAGINA BIANCA

1 QUADRO RIEPILOGATIVO DEI FINANZIAMENTI E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA LEGISLAZIONE SPECIALE PER VENEZIA

1.1 Premessa

La presente relazione costituisce l'aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna che, in base all'art. 4 della Legge n. 798/84, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo è tenuto a trasmettere annualmente al Parlamento, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.

Il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ex art. 4 legge n. 798/84, infatti, in conformità ai disposti della legislazione speciale per Venezia, ha esercitato ed esercita le proprie funzioni seguendo e promuovendo le attività dei vari soggetti attivi nell'attuazione della Legge Speciale, costituendo il punto di riferimento e di coordinamento tra i vari Organismi che operano per la salvaguardia e che rappresentano realtà ed esigenze fortemente diversificate, nonostante perseguano l'unico obiettivo della salvaguardia di Venezia.

I lavori del Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ex art. 4 legge n. 798/84 consentono di sviluppare e di porre in essere alcune fondamentali tematiche riguardanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, permettendo l'assunzione di decisioni di carattere generale e di scelte operative specifiche, in forma di stretto coordinamento e di cooperazione tra i diversi Organismi attivi sul territorio lagunare.

La Relazione che annualmente il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 fornisce al Parlamento è, pertanto, una informativa importante sull'azione svolta dal Comitato stesso e sui risultati che si possono raggiungere quando più Enti agiscono in modo sinergico e coordinato per il raggiungimento di uno stesso obiettivo.

I dati economico – finanziari riportati nella presente Relazione tengono conto degli aggiornamenti trasmessi dai diversi Enti a seguito di specifica richiesta da

parte del Segretario del Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 (v. nota allegata prot. n. 238/GAB del 04 aprile 2006) e riproducono la **situazione al 31 dicembre 2005**.

1.2 Lo stato di attuazione

Dal quadro riepilogativo dei finanziamenti finora assegnati (*Allegato n. 1*), risulta che **lo Stato italiano, dal 1984, ha finanziato per Venezia 8.559 milioni di euro**.

Il finanziamento indicato comprende anche i volumi di investimento assegnati dal CIPE al "Sistema MOSE" con deliberazione n. 109 del 29.11.2002 e successive modificazioni e integrazioni e n. 40 del 29.09.2004 e successive modificazioni, quale opera inserita nel programma delle "infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale" finanziate nell'ambito della "Legge Obiettivo" n. 443/01, a conferma della volontà dello Stato italiano di procedere nella realizzazione degli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, anche ricorrendo a strumenti di finanziamento diversi dalla legislazione speciale per Venezia.

A questo riguardo giova ricordare che il decreto di attuazione della "Legge Obiettivo" (Decreto Legislativo n. 190 del 20 agosto 2002), prendendo atto del carattere sistemico dell'opera, all'art. 16, comma 4, prevede specificamente che «*le norme del [...] decreto non derogano le previsioni delle leggi [...] relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia*».

La procedura codificata dalla legislazione speciale rimane, quindi, vigente e il Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 continua ad essere l'organo di riferimento istituzionale per la programmazione e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna.

L'importo indicato non comprende, il volume di investimento assegnato dal CIPE al "Sistema MOSE" – con deliberazione n. 74 del 29.03.2006, in quanto tale finanziamento sarà effettivamente disponibile solo dall'esercizio finanziario 2007 e quindi non rientra nella situazione al 31.12.2005.

Tenendo conto anche della 3ª assegnazione da parte del CIPE (380 milioni di euro), le somme complessivamente assegnate dallo Stato ammontano a 8.939 milioni di euro circa.

Nell'*Allegato n. 2* è riportato sinteticamente lo *stato di attuazione dei finanziamenti* per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, con l'indicazione per ciascun Ente degli *importi assegnati* e degli *importi spesi* relativamente agli interventi di propria competenza.

Viene riportato nelle tabelle successive il *quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti* con l'indicazione delle somme assegnate, impegnate e spese per ciascuna Legge:

- *Allegato n. 3 – Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti;*
- *Allegato n. 4 – Legge n. 139/92;*
- *Allegato n. 5 – Legge n. 539/95;*
- *Allegato n. 6 – Legge n. 515/96;*
- *Allegato n. 7 – Legge n. 345/97;*
- *Allegato n. 8 – Legge n. 295/98;*
- *Allegato n. 9 – Legge n. 448/98;*
- *Allegato n. 10 – Legge n. 488/99;*
- *Allegato n. 11 – Legge n. 388/00;*
- *Allegato n. 12 – Legge n. 448/01;*
- *Allegato n. 13 – Legge n. 166/02;*
- *Allegato n. 14 – Legge n. 350/03 per il rifinanz. fondo opere strategiche;*
- *Allegato n. 15 – Legge n. 350/03.*

L'*Allegato n. 16* riepiloga sinteticamente, per gli Enti principali, gli importi assegnati e disponibili nel 2005, impegnati e spesi.

Al 31 dicembre 2005 risultano complessivamente impegnati 7.708 milioni di euro, pari al 90% degli importi assegnati, e spesi 5.382 milioni di euro, pari al 63% degli importi assegnati.

L'*Allegato n. 17* riporta il *confronto dello stato di attuazione delle somme spese* tra la situazione al 31.12.2004 della precedente "Relazione al Parlamento", datata settembre 2005, e la situazione aggiornata al 31.12.2005 presentata in questo documento. Risulta che nel corso del 2005 vi è stato un incremento di circa il 8% delle somme complessivamente spese, in linea con l'andamento rilevato negli anni precedenti.

Con riferimento ai singoli Allegati, relativamente agli importi finanziati, impegnati e spesi per singole Leggi si ha:

- la **Legge n. 798/1984** e le successive Leggi di rifinanziamento (Leggi n. 910/86, n. 67/88, n. 360/91, n. 415/92 e n. 724/94) hanno reso disponibili **1.134 milioni di euro in conto capitale, già tutti sostanzialmente impegnati e spesi;**

- a partire dalla **Legge n. 139/1992 e per tutte le Leggi di seguito indicate,** per proseguire l'opera di salvaguardia **vengono autorizzati "limiti di impegno" quindicennali** e indicati i soggetti autorizzati a contrarre mutui a valere su tali "limiti di impegno". **La Legge n. 139/92 ha reso così disponibili 1.357 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati** 1.265 milioni (**93%**) e **spesi** 1.170 milioni (**86%**);

- la **Legge n. 539/1995** ha reso disponibili **324 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati** 315 milioni (**97%**) e **spesi** 287 milioni (**89%**);

- la **Legge n. 515/1996** ha reso disponibili **1.153 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati** 1.095 milioni (**95%**) e **spesi** 931 milioni (**81%**);

- la **Legge n. 345/1997** ha reso disponibili **667 milioni di euro,** di cui risultano **impegnati** 612 milioni (**92%**) e **spesi** 453 milioni (**68%**);

- la **Legge n. 295/1998** ha reso disponibili **135 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati** 119 milioni (**88%**) e **spesi** 88 milioni (**65%**).

Si fa notare che, data l'entità, molto contenuta, dei fondi resi disponibili dalla Legge in oggetto per le annualità 1999 e 2000, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo, nel proporre l'attribuzione di tali finanziamenti ai diversi Enti, ha ritenuto opportuno favorire, in particolare, lo sviluppo di interventi da parte di Enti normalmente non destinatari di fondi – o di fondi di entità significativa – provenienti dalla Legge Speciale;

- la **Legge n. 448/1998** ha reso disponibili **778 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati** 686 milioni **(88%)** e **spesi** 473 milioni **(61%)**;

- la **Legge n. 488/1999** ha reso disponibili **636 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati** 504 milioni di euro **(79%)** e **spesi** 286 milioni di euro **(45%)**;

- la **Legge n. 388/2000** ha reso disponibili **482 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati** 367 milioni di euro **(76%)** e **spesi** 232 milioni di euro **(48%)**;

  la **Legge n. 448/2001** ha reso disponibili **672 milioni di euro** di cui risultano **impegnati** 484 milioni di euro **(72%)** e **spesi** 172 milioni di euro **(26%)**. In tali importi sono compresi anche 28 milioni di euro assegnati al Magistrato alle Acque in conto capitale.

- la **Legge n. 166 del 1° agosto 2002, Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti,** in attuazione di quanto disposto dalla Legge n. 443/01 (c.d. "legge obiettivo"), all'art. 13 istituisce un apposito "fondo" e autorizza "limiti di impegno" quindicennali al fine di consentire il finanziamento della progettazione e della realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale individuate nel programma di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre 2001.
  In base a tale Legge, il CIPE, con deliberazione n. 109 del 29.11.2002, successivamente rimodulata con deliberazione n. 63 del 25.07.2003, ha assegnato al "Sistema MOSE", compreso nel già citato programma delle opere strategiche di cui alla deliberazione del CIPE del 21.12.2001, un volume di

investimento attivabile a valere su "limiti di impegno" con decorrenza dal 2003, quale prima "tranche" di finanziamento del fabbisogno complessivo del "Sistema MOSE".

Successivamente, il CIPE ha recepito, nella deliberazione n. 72 del 29.09.03, le indicazioni del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 del 4.02.2003 – espresse sulla base delle disposizioni di cui all'art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo n. 190/2002 di attuazione della "Legge Obiettivo" e di cui all'art. 80, comma 28, della Legge n. 289/2002 – assegnando il "limite di impegno" di 41 milioni di euro circa, con decorrenza dal 2003, ripartito tra il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e le Amministrazioni Comunali di Venezia, di Chioggia e di Cavallino – Treporti, consentendo così l'attivazione di un volume di investimento complessivo pari a **500 milioni di euro circa**.

Al 31.12.2005, relativamente a tale Legge, risultano **impegnati** 493 milioni di euro (**99%**) e spesi 249 milioni di euro (**50%**);

- la **Legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria per il 2003)** non destina nuovi "limiti di impegno" per la prosecuzione delle attività di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ma all'art. 80 comma 28 espressamente dispone che *"una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'art. 13 della L. 1.8.2002 n. 166 può essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6 della L. 29.11.1984 n. 798 con le modalità ivi previste, nonché di quelli previsti dalle relative Ordinanze di Protezione Civile"*.

  Come indicato al punto precedente, il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84, nella seduta del 4 febbraio 2003, sulla base di quanto disposto all'art. 16 comma 4 dal Decreto Legislativo 20 agosto 2002 n. 190 recante la *"Attuazione della L. 21.11.2001 n. 443"*, ha quindi deliberato in merito alla ripartizione dei suddetti "limiti di impegno", destinandone una quota-parte ai Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti, e una quota-parte agli interventi di regolazione delle maree alle bocche di porto affidati al concessionario Consorzio Venezia Nuova;

- la **Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (Legge Finanziaria per il 2004)** non destina nuovi "limiti di impegno" di rifinanziamento della Legge Speciale per la prosecuzione delle attività di salvaguardia da parte dei diversi Enti, mentre **reca, in Tabella D, in conto capitale, 13 milioni di euro nel 2004, 3 milioni di euro nel 2005 e 3 milioni di euro nel 2006 per gli interventi di competenza dello Stato in amministrazione diretta** di cui all'art. 3, primo comma, lettera a) della Legge 798/84. Il finanziamento si è reso effettivamente disponibile solo alla fine del 2004, pertanto, al 31.12.2005 risultano solo **impegnati** 13 milioni di euro.

  La Legge, inoltre, assicura il rifinanziamento dell'art. 13 della Legge n. 166/2002, destinando alle opere strategiche, tra le quali è compreso il "Sistema MOSE", nuovi "limiti di impegno" con decorrenza dal 2005 e dal 2006.

  In base a tale Legge, pertanto, il CIPE, con deliberazione n. 40 del 29.09.2004, ha assegnato al "Sistema MOSE" un "contributo" pluriennale con decorrenza dal 2005, quale seconda "tranche" di finanziamento del fabbisogno complessivo del "Sistema MOSE". Successivamente, il CIPE ha recepito, nella deliberazione n. 75 del 20.12.04, le indicazioni del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 del 4.11.2004 – espresse sulla base delle disposizioni di cui all'art. 80, comma 28, della Legge n. 289/2002 prorogato dall'art. 23-quater del Decreto legge n. 355/2003, convertito con la Legge n. 47/2004 – e ha assegnato il "contributo" di 64,888 milioni di euro circa, con decorrenza dal 2005, ripartito tra il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e le Amministrazioni Comunali di Venezia, di Chioggia e di Cavallino – Treporti, consentendo così l'attivazione, nel corso del 2005, di un importo complessivo di **703 milioni di euro circa**. Di questi, al 31.12.2005 risultano **impegnati** 665 milioni di euro (95%) e **spesi** solo 50 milioni di euro (7%), in modo anticipato rispetto all'effettiva disponibilità dei fondi avvenuta nei primi mesi del 2006, per assicurare continuità alle attività già avviate.

- la **Legge n. 331 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria per il 2005)** non destina nuovi limiti di impegno per la prosecuzione delle attività di

salvaguardia da parte dei diversi Enti, ne' assicura il rifinanziamento dell'art. 13 della Legge n. 166/2002 per le opere strategiche.

- la **Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria per il 2006)** non destina nuovi limiti di impegno per la prosecuzione delle attività di salvaguardia da parte dei diversi soggetti; assicura, invece, il rifinanziamento dell'art. 13 della Legge n. 166/2002 per le opere strategiche.
  In base a tale legge, il CIPE, con deliberazione n. 74 del 29.03.2006, ha assegnato al "Sistema MOSE" un contributo pluriennale di 33,972 milioni di euro che consentirà l'attivazione di un volume di investimento di almeno 380 milioni di euro.
  Poiché il contributo assegnato ha decorrenza dal 2007 e, quindi, le somme potranno essere rese disponibili solo da tale anno, tale importo non è stato considerato nella situazione dei finanziamenti assegnati al 31.12.2005.

1.3 Il ruolo dell'Ufficio di Piano

L'**Ufficio di Piano**, costituito con D.P.C.M. del 13 febbraio 2004, quale organo tecnico collegiale di supporto al Comitato ex art. 4 Legge 798/84, coordinato dal Presidente del Magistrato alle Acque, ha svolto in questi anni un importante ruolo di concertazione tra i vari Soggetti competenti in materia di salvaguardia. L'Ufficio di Piano ha iniziato la propria attività nel mese di aprile del 2004 e fino a luglio 2006 si è riunito 30 volte; si è dotato di proprie Linee Guida e di un Programma di Attività e, a fini istruttori, ha formato una propria Segreteria avente il compito di predisporre indagini conoscitive, effettuare analisi ed elaborazioni dei dati, integrare e sintetizzare la documentazione ed eseguire approfondimenti tematici sui quali ha espresso propri specifici pareri.

In particolare, l'ufficio di Piano si è posto il compito di formulare un quadro organico e aggiornato sullo **stato di avanzamento delle attività da parte dei soggetti che operano nell'ambito della legislazione speciale per Venezia,** al

fine di pervenire a futuri indirizzi sull'impiego ottimale delle risorse finanziarie afferenti alla legislazione speciale e alla massima integrazione degli interventi di salvaguardia programmati dalle singole Amministrazioni competenti.

L'Ufficio ha inteso, quindi, procedere innanzitutto con l'audizione dei principali soggetti beneficiari dei finanziamenti assegnati dalla Legislazione Speciale per Venezia, ritenendo, invece, sufficiente, per i restanti soggetti non chiamati in audizione, il semplice esame della documentazione da essi fornita sullo stato di avanzamento tecnico e finanziario degli interventi di loro competenza.

Il Magistrato alle Acque, per gli interventi in amministrazione diretta e per quelli in concessione, la Regione del Veneto, i Comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti sono stati invitati a rispondere "de visu" sullo stato di avanzamento degli interventi e sullo stato della spesa e del fabbisogno ulteriore da finanziare per il prosieguo delle opere di rispettiva competenza. Alle audizioni hanno fatto seguito la richiesta di approfondimenti di carattere tecnico, ove ritenuti necessari.

La documentazione nel complesso fornita ha consentito all'Ufficio di Piano di concludere la propria disamina, in maggio 2005, con la redazione di quadri di sintesi e di dettaglio finanziario sugli interventi di salvaguardia.

E' prevista, quindi, l'emissione di un parere da parte dell'Ufficio di Piano sull'impiego ottimale delle risorse finanziarie afferenti la Legislazione Speciale.

1.4 Conclusioni

Anche se dalla situazione riportata nella presente Relazione al Parlamento risulta che, progressivamente, lo Stato italiano ha destinato delle somme molto significative alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, confermando, nel corso degli anni, l'impegno finanziario e la volontà politica di sostenere gli interventi fisici, ambientali, socio – economici e artistici avviati dalle Amministrazioni e dagli Enti e Istituzioni a ciò preposti, **è comunque necessario che il Governo italiano assicuri continuità alle attività di salvaguardia intraprese.**

Da una parte, infatti, diviene **necessario che venga assicurata continuità ai finanziamenti al "Sistema MOSE", nell'ambito dei fondi per le opere strategiche**, per consentire il suo sviluppo secondo il *"Cronoprogramma"* di realizzazione, allegato all'atto contrattuale rep. n. 8067, sottoscritto in data 11.05.2005 dall'Amministrazione Concedente con il Concessionario, che ha introdotto il "prezzo chiuso" per il completamento delle opere alle bocche di porto e che prevede l'ultimazione dei lavori entro il 2012.

Si ricorda che, sulla base del progetto definitivo del novembre 2002, il Comitato ex art. 4 legge 798/84 ha deliberato, nella seduta del 3 aprile 2003, di completare la progettazione esecutiva e di avviare la realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto lagunari, sviluppando, in parallelo, alcuni approfondimenti richiesti dalle Amministrazioni Comunali di Venezia e di Chioggia.

A valere sulle prime due "tranches" di fondi assegnati dal CIPE, resisi effettivamente spendibili, rispettivamente, dai primi mesi del 2004 e dai primi mesi del 2006, sono stati avviati i cantieri alle bocche di porto lagunari per la realizzazione del "Sistema MOSE", una volta acquisite le necessarie approvazioni sugli stralci di progetto esecutivo, cantieri che ora stanno lavorando a pieno ritmo; i suddetti fondi si esauriranno sostanzialmente a fine 2006 e a fine 2007.

La Legge Finanziaria per il 2005 non ha recato il rifinanziamento del fondo per le opere strategiche, mentre, a valere sul rifinanziamento di tale fondo destinato dalla Legge n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006), in data 29.03.2006 il CIPE ha assegnato (deliberazione n. 74) una terza "tranche" di finanziamento al "Sistema MOSE", con decorrenza dal 2007, di 380 milioni di euro. L'importo assegnato risulta inferiore rispetto al fabbisogno indicato dal *Piano dei Finanziamenti* allegato al citato contratto rep. n. 8067/2005 – di cui peraltro la deliberazione n. 74 ha preso atto – ed inoltre si renderà disponibile in ritardo rispetto alle tempistiche previste dal *Piano* stesso.

Pertanto, nonostante gli impegni assunti dal Comitato Interministeriale, **permangono** tuttavia **delle difficoltà di reperimento dei relativi finanziamenti**

necessari al completamento delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto lagunari.

Al riguardo è importante segnalare che il Consiglio dell'*Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture*, nell'adunanza del 7 marzo 2006, in esito alla visita effettuata ai lavori di salvaguardia in corso di realizzazione da parte del Magistrato alle Acque tramite il proprio Concessionario, ha comunicato al Magistrato alle Acque (nota del 5.04.2006) che avrebbe predisposto una segnalazione al Governo per *"rimarcare la necessità di assicurare gli ulteriori finanziamenti del Piano Generale degli Interventi in tempi certi a fronte dei segnalati rischi di degrado che le opere corrono se non utilizzate nella loro completezza"*.

Dall'altra parte, in una visione sistemica e globale dell'opera di salvaguardia, ribadita dal Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nel corso delle sedute del 3 aprile 2003, del 4 novembre 2004, del 28 settembre 2005 nonché nella recente seduta del 20 luglio 2006, è necessario che **vengano garantite, comunque e indipendentemente dal "Sistema MOSE", anche le risorse per la prosecuzione delle altre attività di salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica già intraprese dai diversi Soggetti, secondo le varie competenze, a valere sulla Legislazione Speciale per Venezia**; ciò mediante l'assegnazione, anno dopo anno, di "limiti di impegno" – ovvero di contributi pluriennali sulla base della vigente normativa - di entità adeguata che, secondo le procedure previste per gli interventi ricompresi nella legislazione speciale per Venezia, una volta ripartiti tra i vari soggetti dal Comitato ex art. 4 Legge 798/84, consentano l'attivazione delle risorse finanziarie richieste.

E' importante ricordare che, mentre con le precedenti Leggi Finanziarie era stato assicurato un flusso di finanziamenti continuativo, anche se inferiore al fabbisogno esposto dai vari Enti nei propri piani generali di intervento, **con le Leggi Finanziarie per il 2003** (Legge n. 289/2002), **per il 2004** (Legge n. 350/2003), **per il 2005** (Legge n. 311/2004) **e per il 2006** (Legge n. /2005) **questo flusso finanziario è stato addirittura interrotto.**

La possibilità di accedere a una quota parte delle risorse assegnate dal CIPE, per il "Sistema MOSE" a valere sui limiti di impegno destinati alle opere strategiche, infatti, è stata riservata, in questo ultimo triennio, solo ad alcuni Soggetti (Amministrazioni Comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti), con un "iter" particolarmente complesso per l'ottenimento effettivo dei fondi. Tale "iter" non è più comunque percorribile essendo decaduta la normativa al riguardo (art. 80, comma 28, della Legge n. 289/2002 prorogato dall'art. 23-quater della Legge 47/2004).

Si segnala, infine, la necessità che anche il **Magistrato alle Acque di Venezia possa godere con continuità di adeguati finanziamenti in conto capitale,** per provvedere alla realizzazione, in amministrazione diretta, degli interventi di cui alle proprie competenze e, in particolare, della realizzazione di opere urgenti di sistemazione e di difesa di rive, marginamenti e "insulae" dei centri storici lagunari nonché di messa in sicurezza di edifici demaniali di significativo valore storico-artistico.

Si ritiene, pertanto, doveroso segnalare la **necessità che nella Legge Finanziaria per il 2007 siano previste adeguate assegnazioni per gli interventi di salvaguardia di Venezia,** sia mediante lo stanziamento di "limiti di impegno" e di fondi in conto capitale per la legislazione speciale per Venezia, sia mediante il rifinanziamento delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, tra le quali è ricompreso il "Sistema MOSE", la cui realizzazione, ormai in corso a tutti gli effetti, non può essere inficiata da interruzioni nel flusso dei finanziamenti.

2 STATO DI ATTUAZIONE DEI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI DIVERSI SOGGETTI ATTUATORI

2.1 INTERVENTI DI COMPETENZA DELLO STATO

2.1.1 Interventi dello Stato in amministrazione diretta (v. Documento A)

Gli interventi dello Stato da eseguire in amministrazione diretta – Magistrato alle Acque di Venezia, previsti dall'art. 3 (lettere a), b), c), e), f), g), h), i), m)) della Legge n. 798/84, riguardano: riequilibrio idrogeologico della laguna; servizio vigilanza ed antinquinamento; marginamenti lagunari; restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico-artistico destinati all'uso pubblico; recupero del complesso edilizio dell'Arsenale; consolidamento di ponti, canali e fondamenta; sistemazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali; restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico; interventi di edilizia universitaria.

Per lo Stato in Amministrazione diretta – **Magistrato alle Acque di Venezia,** le somme complessivamente assegnate sono pari a 217 milioni di euro, relativamente alla Legge n. 798/84 e alle recenti Leggi n. 448/01, che ha assegnato dei fondi al Magistrato alle Acque per il servizio di polizia lagunare e per la manutenzione straordinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna, e n. 350/03 che ha assegnato dei fondi per il riequilibrio idrogeologico. Al 31 dicembre 2005, il Magistrato alle Acque ha impegnato 200 milioni di euro e speso 176 milioni di euro relativamente alle somme effettivamente disponibili.

2.1.2 Interventi dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova (v. Documento B)

Gli interventi dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova riguardano i seguenti obiettivi, richiamati anche dall'art. 3 lettere a), c), d), e l) della Legge n. 798/84, dall'art. 3 della Legge n. 139/92 nonché dalla Legge 443/2001 (c.d. Legge Obiettivo): riequilibrio idrogeologico della laguna e arresto ed inversione del processo di degrado del bacino lagunare; opere di regolazione delle maree alle bocche di porto lagunari; difesa dalle acque alte degli abitati insulari; rinforzo dei moli foranei alle tre bocche di porto; marginamenti lagunari; opere portuali marittime a difesa dei litorali; studi per la sostituzione del traffico petrolifero in laguna e per l'apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree.

Per il concessionario dello Stato **Consorzio Venezia Nuova**, le somme complessivamente assegnate e disponibili sono pari a 3.737 milioni di euro, che tengono conto dei fondi assegnati con la Legislazione Speciale per Venezia e da parte del CIPE nell'ambito della c.d. Legge obiettivo. Al 31 dicembre 2005, il Consorzio Venezia Nuova ha impegnato 3.737 milioni di euro e speso 2.461 milioni di euro.

2.2 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA REGIONE DEL VENETO (v. Documento C)

Gli interventi della Regione del Veneto di cui alla Legge n. 798/84, Legge n. 360/91 e n. 139/92 riguardano in particolare gli interventi in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dall'inquinamento del territorio dei comuni della gronda lagunare e del bacino scolante nella laguna di Venezia, anche mediante la realizzazione di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario nonché d'impianti di depurazione; opere di ristrutturazione dell'ospedale SS. Giovanni e Paolo; realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia secondo un progetto integrato, in accordo con il Comune di Venezia, finalizzato alla manutenzione dei rii cittadini.

Per la **Regione del Veneto,** le somme complessivamente assegnate sono pari a 1.762 milioni di euro compresi i fondi relativi alle Leggi n. 388/00 e n. 448/01, di recente attivazione da parte della Regione. Al 31 dicembre 2005, la Regione del Veneto ha impegnato 1.103 milioni di euro e speso 788 milioni di euro relativamente alle somme assegnate.

Si ricorda che le somme indicate comprendono la quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai "limiti di impegno" destinati alla Regione Veneto, quota che viene assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato rii in base all'art. 3 della Legge n. 139/92.

Si segnala che gli ultimi finanziamenti destinati alla Regione del Veneto dalla legislazione speciale per Venezia risalgono alla Finanziaria per il 2002 (Legge n. 448/2001).

2.3 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VENEZIA, DEL COMUNE DI CHIOGGIA E DEL COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

Gli interventi del Comune di Venezia e del Comune di Chioggia di cui all'art. 6 della Legge n. 798/84 riguardano: acquisizione, restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza e ad attività sociali, culturali, produttive, artigianali e commerciali; opere di urbanizzazione primaria; sistemazione di ponti, canali e fondamenta di competenza comunale; contributi ai privati per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare; acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi; per il Comune di Venezia: interventi volti alla manutenzione dei rii cittadini e degli edifici su di essi prospicienti secondo un progetto integrato, in accordo con la Regione Veneto.

2.3.1 Stato di attuazione degli interventi di competenza del Comune di Venezia (v. Documento D)

Per il **Comune di Venezia**, le somme complessivamente assegnate e disponibili sono pari a 1.911 milioni di euro. Al 31 dicembre 2005, il Comune di Venezia ha impegnato 1.822 milioni di euro e speso 1.378 milioni di euro relativamente alle somme disponibili che tengono conto anche delle recenti Leggi n. 388/00, n. 488/01 e della prima e seconda assegnazione di fondi al Comune di Venezia dal CIPE, come quota-parte delle somme assegnate al "Sistema MOSE" .

Come già indicato nel paragrafo relativo alla Regione del Veneto, l'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione del Veneto venga destinata al Comune di Venezia per la **realizzazione del progetto integrato di manutenzione dei rii** e degli edifici su di essi prospicienti.

Pertanto, agli importi totali assegnati al Comune di Venezia dalle diverse Leggi speciali vanno sommati tali importi.

Il documento del Comune di Venezia (Documento D) non tiene conto degli importi assegnati e spesi relativamente alla Legge n. 798/1984.
Con gli importi assegnati al Comune di Venezia con la legge 448/98 e con la prima assegnazione CIPE, come quota-parte dei fondi per il "Sistema MOSE", il Comune di Venezia ha finanziato l'Aeroporto Marco Polo (SAVE) e il Commissario Delegato al traffico acqueo.

2.3.2 Stato di attuazione degli interventi di competenza del Comune di Chioggia

Per il **Comune di Chioggia**, le somme complessivamente assegnate e disponibili sono pari a 276 milioni di euro, che diventano 287 milioni di euro se si tiene conto dei fondi di cui alla seconda assegnazione del CIPE al Comune di Chioggia, come quota-parte delle somme assegnate per il "Sistema MOSE", disponibili dalla fine del 2005. Al 31 dicembre 2004, il Comune di Chioggia ha impegnato 270 milioni di euro e speso 145 milioni di euro relativamente alle somme disponibili che tengono conto anche delle recenti Leggi n. 388/00, n. 488/01 e della prima assegnazione di fondi al Comune di Chioggia dal CIPE – tramite il Comune di Venezia -, come quota-parte delle somme assegnate al "Sistema MOSE".

I dati si riferiscono al 31.12.2004 in quanto non sono stati forniti, da parte del Comune di Chioggia, dati aggiornati al 31.12.2005.

2.3.3 Stato di attuazione degli interventi di competenza del Comune di Cavallino - Treporti

Per il **Comune di Cavallino – Treporti**, Amministrazione Comunale di recente istituzione di cui il Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 ha preso atto nel corso

della seduta del 6 dicembre 2001, le somme complessivamente assegnate e disponibili sono pari a 17 milioni di euro, che diventano 20 milioni di euro se si tiene conto dei fondi di cui alla seconda assegnazione del CIPE al Comune stesso – tramite il Comune di Venezia, come quota-parte delle somme assegnate per il "Sistema MOSE", che saranno disponibili alla fine del 2005. Al 31 dicembre 2004, il Comune di Cavallino-Treporti ha impegnato 17 milioni di euro e speso 285.000 euro relativamente alle somme disponibili provenienti dalle recenti Leggi n. 388/00, n. 488/01 e dalla prima assegnazione di fondi al Comune di Cavallino-Treporti dal CIPE – tramite il Comune di Venezia -, come quota-parte delle somme assegnate al "Sistema MOSE" .

I dati si riferiscono al 31.12.2004 in quanto non sono stati forniti, da parte del Comune di Cavallino-Treporti, dati aggiornati al 31.12.2005.

2.4 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Per gli interventi di competenza di **altri Enti** [1], le somme complessivamente assegnate sono pari a 625 milioni di euro. Al 31 dicembre 2005, tali Enti hanno complessivamente impegnato 559 milioni di euro e hanno speso 434 milioni di euro delle somme disponibili.
Di seguito si evidenziano i finanziamenti e gli importi spesi di competenza di ogni singola Amministrazione:

[1]Provincia di Venezia; Università degli Studi Ca' Foscari; Istituto Universitario Architettura Venezia; Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica; Procuratoria di S. Marco; Autorità Portuale di Venezia già Provveditorato al Porto; Fondazione Querini Stampalia; SAVE Aeroporto Marco Polo; CO.RI.LA.; Diocesi Patriarcato di Venezia; Diocesi di Chioggia; Fondazione Giorgio Cini; Biennale di Venezia; Azienda Speciale Porto Chioggia; Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

2.4.1 Provincia di Venezia

Gli interventi della Provincia di Venezia riguardano il restauro e il risanamento conservativo del patrimonio di competenza della Provincia nei centri storici di Venezia e Chioggia.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Provincia di Venezia, è pari a 103 milioni di euro (Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96, n. 345/97, n. 295/98, n. 388/00 e n. 448/01); gli importi spesi ammontano a 47 milioni di euro.

2.4.2 Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica (già Ministero Università Ricerca Scientifica e Tecnologica)

Gli interventi di competenza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica riguardano lo svolgimento del programma di ricerca e di studio sul "Sistema lagunare veneziano" che coinvolge CNR, Università di Padova, Università di Venezia, Istituto di architettura di Venezia, UNESCO.

Il totale dei finanziamenti assegnati al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca Scientifica è di 10 milioni di euro (Legge n. 798/84); gli importi spesi sono pari a 9 milioni di euro.

2.4.3 Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Gli interventi di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali riguardano il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico-artistico destinati all'uso pubblico.

Il totale dei finanziamenti assegnati al Ministero per i Beni e le Attività Culturali è di 9 milioni di euro (Legge n. 798/84); gli importi spesi sono pari a 8 milioni di euro.

2.4.4 Ministero del Tesoro

Il totale dei finanziamenti assegnati al Ministero del Tesoro è di 1 milione di euro (Legge n. 798/84), già speso prima del 1998.

2.4.5 Università degli Studi Ca' Foscari (v. Documento E)

Gli interventi di competenza dell'Università degli Studi Ca' Foscari riguardano l'acquisizione e il restauro di sedi universitarie, l'informatizzazione dell'Ateneo e la creazione di biblioteche informatiche.
Il totale dei finanziamenti assegnati all'Università degli Studi Ca' Foscari al 31.12.2005 è di 121 milioni di euro (Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96, n. 345/97, n. 295/98, n. 388/00 e n. 488/01); gli importi spesi ammontano a 83 milioni di euro.

2.4.6 Istituto Universitario Architettura Venezia (I.U.A.V.) (v. Documento F)

Gli interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura riguardano l'acquisizione e il restauro di sedi per lo svolgimento delle attività dell'Istituto.
Il totale dei finanziamenti assegnati all'Istituto Universitario Architettura Venezia al 31.12.2005 è di 54 milioni di euro (Leggi n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96, n. 345/97, n. 295/98 e 448/01); gli importi spesi ammontano a 51 milioni di euro.

2.4.7 Consorzio per la gestione del Centro di Coordinamento delle attività di ricerca inerenti la salvaguardia della laguna veneziana – CO.RI.LA. (Consorzio tra Università di Venezia Ca' Foscari, IUAV, Università di Padova e CNR) **(v. Documento G)**

Gli interventi di competenza del CO.RI.LA. riguardano il coordinamento delle ricerche e degli studi scientifici inerenti la laguna di Venezia e la sua salvaguardia.

Il totale dei finanziamenti assegnati al CO.RI.LA. al 31.12.2005 è pari a 12 milioni di euro (Leggi n. 295/98, n. 388/00 e n. 448/01). Gli importi spesi sono pari a 9 milioni di euro.

2.4.8 Aeroporto Marco Polo (SAVE) (v. Documento H)

Gli interventi di competenza dell'Aeroporto Marco Polo riguardano l'ampliamento dell'aerostazione, la sistemazione della viabilità, la realizzazione di piste e impianti per voli notturni, di nuovi piazzali per aeromobili e di garage multipiano.

Il totale dei finanziamenti assegnati all'Aeroporto Marco Polo al 31.12.2005 è di 91 milioni di euro (Leggi n. 798/84, n. 139/92, n. 539/95, n. 515/96, n. 345/97, n. 295/98, n. 388/00 e n. 448/01), Gli importi spesi sono pari a 84 milioni di euro.

Relativamente alla Legge n. 448/98, i limiti di impegno e, quindi, i finanziamenti per la SAVE sono stati concessi attraverso il Comune di Venezia e quindi inseriti nei conteggi del Comune di Venezia.

2.4.9 Autorità Portuale di Venezia già Provveditorato al Porto

Gli interventi di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia (già Provveditorato al Porto) riguardano il dragaggio di accosti e di canali portuali, consolidamento di banchine, sistemazione di aree portuali, realizzazione di piazzali e banchine.

Il totale dei finanziamenti assegnati all'Autorità Portuale al 31.12.2004 è di 68 milioni di euro (Leggi n. 798/84, n. 515/96 n. 295/98, n. 388/00 e n. 448/01); gli importi spesi sono pari a 54 milioni di euro.

I dati si riferiscono al 31.12.2004 in quanto non sono stati forniti, da parte dell'Autorità Portuale di Venezia, dati aggiornati al 31.12.2005.

2.4.10 Azienda Speciale per il Porto Chioggia (v. Documento I)

Gli interventi di competenza Azienda Speciale per il Porto Chioggia riguardano il dragaggio di accosti e di canali portuali, consolidamento di banchine, sistemazione di aree portuali, realizzazione di piazzali e banchine.

Il totale dei finanziamenti assegnati all'Azienda Speciale per il Porto Chioggia (A.S.P.O) al 31.12.2005 è pari a 11 milioni di euro (Legge n. 448/98 concessi attraverso il Comune di Chioggia, Leggi n. 388/00 e n. 448/01). Gli importi spesi sono pari a 1,72 milioni di euro.

2.4.11 La Biennale di Venezia (v. Documento L)

Gli interventi di competenza della Biennale di Venezia riguardano l'allestimento e la gestione di attività culturali di livello internazionale.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Biennale di Venezia al 31.12.2005 è pari a 26 milioni di euro (Legge n. 295/98 e n. 488/99). Gli importi spesi sono pari a 22 milioni di euro.
Con le Leggi n. 388/00 e n. 448/01 sono stati concessi dei "limiti di impegno" e, quindi, dei finanziamenti attraverso il Comune di Venezia.

2.4.12 Fondazione Scientifica Querini Stampalia (v. Documento M)

Gli interventi di competenza della Fondazione Querini Stampalia riguardano attività per l'ampliamento e la funzionalità della sede destinata a biblioteca e a galleria.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Fondazione Querini Stampalia al 31.12.2005 è di 8 milioni di euro (Leggi n. 798/84 e n. 295/98); gli importi spesi sono pari a 7 milioni di euro.

Con la Legge n. 448/01 sono stati concessi dei "limiti di impegno" e, quindi, dei finanziamenti attraverso il Comune di Venezia.

2.4.13 Fondazione Giorgio Cini

Gli interventi di competenza della Fondazione Giorgio Cini riguardano il restauro del compendio immobiliare ubicato nell'isola di San Giorgio Maggiore, sede della Fondazione stessa.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Fondazione Giorgio Cini al 31.12.2004 è di 32 milioni di euro (fondi concessi attraverso il Consorzio Venezia Nuova per la Legge n. 488/99; fondi assegnati direttamente per le Leggi n. 388/00 e n. 448/01); gli importi spesi ammontano a 3 milioni di euro.

I dati si riferiscono al 31.12.2004 in quanto non sono stati forniti, da parte della Fondazione Giorgio Cini, dati aggiornati al 31.12.2005.

2.4.14 Procuratoria di S. Marco (v. Documento N)

Gli interventi di competenza della Procuratoria di S. Marco riguardano interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione della Basilica di San Marco.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Procuratoria di S. Marco al 31.12.2005 è di 17 milioni di euro (Leggi n. 798/84, n. 488/99 e n. 388/00); gli importi spesi sono pari a 17 milioni di euro.

2.4.15 Curia Patriarcale di Venezia (v. Documento O)

Gli interventi di competenza della Diocesi riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle chiese e delle sedi patriarcali nel centro storico veneziano.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Diocesi al 31.12.2005 è pari a 52 milioni di euro (Legge n. 295/98, n. 488/99 e n. 388/00). Gli importi spesi sono pari a 29 milioni di euro.

2.4.16 Diocesi di Chioggia (v. Documento P)

Gli interventi di competenza della Diocesi riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle chiese del centro storico di Chioggia.

Il totale dei finanziamenti assegnati alla Diocesi al 31.12.2005 è pari a 10 milioni di euro (Leggi n. 448/98, n. 488/99, n. 388/00 e n. 448/01). Gli importi spesi sono pari a 7 milioni di euro.

Relativamente alla Legge n. 448/98 i finanziamenti sono stati concessi attraverso il Comune di Chioggia.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

MAGISTRATO ALLE ACQUE

COMITATO DI INDIRIZZO COORDINAMENTO E CONTROLLO
(ART. 4 - LEGGE 29.11.1984, N. 798)

IL SEGRETARIO
(T. +39041794341 / 351 Fax +39041794384
Mail: presidenza@magisacque.it)

Prot. n. 238 / GAB

Venezia, 04 APR. 2006

Al Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca Scientifica
Gabinetto On.le Ministro
Piazzale Kennedy, 20
00100 ROMA

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Gabinetto On.le Ministro
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

Alla Giunta Regionale del Veneto
Segreteria del Sig. Presidente
Cà Balbi - Dorsoduro, 3901
30123 VENEZIA

Al Sig. Presidente Provincia di Venezia
S. Marco - Palazzo Corner, 2662
30124 VENEZIA

Al Sig. Sindaco del Comune di Venezia
S. Marco, 4136 - Cà Farsetti
30124 VENEZIA

Al Sig. Sindaco del Comune di Chioggia
Corso del Popolo, 1193
30015 CHIOGGIA

Al Sig. Sindaco del Comune di Cavallino Treporti
Via Concordia, 38/d
30010 CA' SAVIO (VE)

Al Sig. Rettore Università degli Studi di Venezia
Dorsoduro-Ca' Foscari, 3246
30125 VENEZIA

Al Sig. Rettore I.U.A.V.
Tolentini - S. Croce, 191
30123 VENEZIA

Al Sig. Presidente CO.RI.LA
S. Marco, 2847 - Palazzo Franchetti
30124 VENEZIA

Al Sig. Presidente S.A.V.E.
Aeroporto Marco Polo
30030 TESSERA-VENEZIA

Al Sig. Presidente Autorità Portuale
Dorsoduro, Zattere, 1401
30100 VENEZIA

Al Sig. Presidente Azienda Speciale
Porto di Chioggia
Via Maestri del Lavoro, 50
30015 CHIOGGIA

Al Sig. Presidente Società di Cultura .
La Biennale di Venezia
S. Marco, Cà Giustinian, 1364/a
30124 VENEZIA

Al Sig. Presidente Fondazione Giorgio Cini
Isola di S. Giorgio Maggiore
30100 VENEZIA

Al Sig. Presidente Fondazione Querini
Stampalia
Castello, 4778
30100 VENEZIA

Al Responsabile Amministrativo della
Procuratoria di S. Marco di Venezia
S. Marco, 328
30124 VENEZIA

Al Responsabile Amministrativo della
Diocesi Patriarcato di Venezia
S. Marco, 320/a
30124 VENEZIA

Al Responsabile Amministrativo della
Diocesi di Chioggia
via del Vescovado
30015 CHIOGGIA

Al Consorzio Venezia Nuova
S. Marco, 2803
30124 VENEZIA

OGGETTO: *Richiesta dati.*

In esecuzione al disposto del quarto comma dell'art. 4 della legge 798/84 è necessario predisporre l'annuale "Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia".

Ai fini della redazione di tale elaborato si chiede di voler trasmettere, entro il ***30 Giugno 2006****, un dettagliato quadro, con somme espresse in Euro ed aggiornato al 31 dicembre 2005, sullo stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale.*

Al fine di rendere omogenee tali informazioni e per facilitare l'aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2005, Vi anticipiamo, in allegato, i precedenti "Quadri analitici dello stato di attuazione dei finanziamenti", già inseriti nella Relazione sopraccitata aggiornata al 31 dicembre 2004.

Distinti saluti

Presidente del Magistrato alle Acque
Segretario del Comitato
dott. ing. Maria Giovanna Piva

ALLEGATI

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI

Allegato n. 1

CON LE LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI, 139/92, 539/95, 515/96, 345/97, 295/98, 448/98, 488/99, 388/00, 448/01, 166/02 E 350/03

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2005

IMPORTI LORDI IN MIGLIAIA DI EURO

	LEGGE N. 798/84 E RIFINANZ.	LEGGE N. 139/92	LEGGE N. 539/95	LEGGE N. 515/96	LEGGE N. 345/97	LEGGE N. 295/98	LEGGE N. 448/98	LEGGE N. 488/99	LEGGE N. 388/00	LEGGE N. 448/01	LEGGE N. 350/03	LEGGE N. 166/02 E RIFINANZ. FONDO OPERE STRATEGICHE	TOTALE PER ENTE E TOTALE GENERALE	
	IMPORTI ASSEGNATI IN CONTO CAPITALE	FINANZIAMENTI ASSEGNATI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO CON DECORRENZA DAL 1993 E DAL 1994	FINANZIAMENTI ASSEGNATI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO CON DECORRENZA DAL 1996 E DAL 1997	IMPORTI FINANZIATI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO CON DECORRENZA DAL 1997 E DAL 1998	IMPORTI FINANZIATI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO CON DECORRENZA DAL 1998 E DAL 1999	IMPORTI FINANZIATI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO CON DECORRENZA DAL 1999 E DAL 2000	IMPORTI FINANZIATI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO CON DECORRENZA DAL 1999, DAL 2000 E DAL 2001	IMPORTI FINANZIATI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO CON DECORRENZA DAL 2001 E DAL 2002	IMPORTI ATTIVABILI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO CON DECORRENZA DAL 2002 E DAL 2003	IMPORTI ATTIVABILI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO CON DECORRENZA DAL 2002 DAL 2003 E DAL 2004	IMPORTI ASSEGNATI IN CONTO CAPITALE	IMPORTI ATTIVABILI A VALERE SUI LIMITI DI IMPEGNO/CONTRIBUTI DELIBERATI DAL CIPE	(O) = A+B+C+D+E+F+G+H+I+L+M+N	% RISPETTO AL TOTALE
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)		
STATO:														
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	170.408									27.505	19.000		216.913	3%
Risanamento idrogeologico	382										19.000		19.382	
Antinquinamento	7.775									27.505			7.775	
Marginamenti lagunari	1.984												29.489	
Edifici demaniali	77.975												77.975	
Arsenali	12.352												12.352	
Ponti, canali, fondamenta	49.643												49.643	
Corsi d'acqua	9.413												9.413	
Patrimonio mobiliare pubblico	4.662												4.662	
Università Architettura	6.242												6.242	
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	401.405	556.560	125.500	478.000	239.000		261.423	208.000	154.000	225.000		1.088.100	3.736.988	44%
Opere alle bocche di porto	85.548	25.249	9.418	2.858	10.133		19.666	50.571	89.131	12.367			305.041	
Rinforzo moli	15.705	85.051	0	6.964	0		0	130	0	0			107.850	
Difesa abitati, insulae e marginamenti	112.221	137.337	23.584	210.858	92.230		117.155	54.369	2.651	117.693			868.298	
Morfologia e arresto degrado	119.560	167.525	41.909	184.239	104.348		92.016	87.486	49.757	67.250			894.190	
Servizio informativo	12.893	11.454	3.447	15.722	3.099		12.061	10.823	8.137	9.451			86.887	
Ausili alla navigazione	7.414	7.746	0	0	0		303	0	0	0			15.463	
Difesa litorali	43.825	119.181	47.142	76.090	27.140		17.673	997	4.124	18.238			354.410	
Petroli e valli da pesca	4.040	3.005	0	1.270	2.050		2.548	3.823	0	0			16.736	
REGIONE VENETO (1) (3)	274.393	386.376	50.435	181.903	142.026		236.505	205.033	97.701	189.123			1.762.495	21%
Disinquinamento	239.791	386.376	47.078	181.903	119.351		201.935	194.704	89.867	173.958			1.634.963	
Acquedotti	20.658				22.675		33.570	10.329	6.812	13.187			107.231	
Ospedale SS. Giovanni e Paolo	13.944		3.357						1.022	1.978			20.301	
COMUNE DI VENEZIA (2) (4)	203.941	308.003	97.320	315.617	195.994	13.698	235.310	147.706	133.920	167.644		91.846	1.910.999	22%
Risanamento immobili		187.020	70.706	199.122	91.597	13.698	90.255	69.767	71.613	47.526				
Urbanizzazione primaria		23.794	12.630	44.348	24.422		43.274	22.234	19.204	43.222				
Contributi a privati		30.794	9.256	41.781	35.895		23.570	23.004	4.667	26.796				
Insediamenti produttivi		31.960	3.739	12.575	16.306		29.337	9.815	12.827	4.066				
Progetto integrato rii		54.435	949	17.791	27.772		48.874	22.886	25.609	46.034				
COMUNE DI CHIOGGIA (3) (5)	32.060	35.687	14.761	46.706	24.830	2.506	40.904	23.396	16.831	29.940		18.859	286.481	3%
Risanamento immobili														
Urbanizzazione primaria														
Contributi ai privati									13.219	28.140				
Infrastrutture														
Contributi acquisto 1^ casa														
Enti vari finanziati attraverso il Comune di Chioggia									3.612	1.800				
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI									6.230	8.838		4.869	19.937	0,2%

ALTRI ENTI:	51.616	69.925	35.962	130.558	54.714	116.304	4.657	51.668	74.201	23.857			625.481	7%
PROVINCIA DI VENEZIA	1.756	14.928	8.263	42.886	13.428	15.494			4.648	1.356			102.739	
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CA' FOSCARI	12.911	17.991	9.237	22.134	26.546	24.177			3.916	3.602			120.517	
ISTITUTO UNIVERSITARIO ARCHITETTURA VENEZIA		10.493	6.246	9.878	12.039	12.562				3.024			54.242	
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	10.329												10.329	
PROCURATORIA DI SAN MARCO	4.670							11.524	1.239				17.434	
AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA	10.846			36.736		13.685			4.300	3.040			68.607	
FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA (4)	516					7.230							7.746	
AEROPORTO MARCO POLO (4)	1.033	26.512	12.216	18.944	12.701	12.739	0		5.578	1.548			91.271	
CONSORZIO UNIVERSITARIO (CO.RI.LA.)						6.595			4.338	1.548			12.481	
DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA (3)						12.394		10.699	28.488				51.581	
DIOCESI DI CHIOGGIA (3)							3.098	723	4.500	1.200			9.521	
FONDAZIONE CINI (5)								16.347	9.134	6.889			32.370	
BIENNALE DI VENEZIA (4)						13.428		12.395					25.823	
AZIENDA SPECIALE PORTO CHIOGGIA (6)							1.559		8.057	1.650			11.266	
MINISTERO TESORO	1.033												1.033	
MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI	8.522												8.522	
TOTALE PER LEGGE E TOTALE GENERALE	**1.133.823**	**1.356.551**	**323.979**	**1.152.784**	**686.564**	**134.508**	**777.799**	**835.823**	**482.883**	**671.907**	**19.000**	**1.203.674**	**8.559.294**	**100%**

NOTE

(1) L'art. 3 della Legge 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia, mediante "Accordi di programma" con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il "progetto integrato rii".

(2) Gli importi indicati non tengono conto delle somme provenienti dalla Regione Veneto per il "progetto integrato rii".

(3) A seguito della delibera del Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 del 4 febbraio 2003, relativamente alla legge 388/00, la Regione Veneto ha rinunciato ad una quota pari al 7,5% dei limiti di impegno con decorrenza dal 2003 ad essa assegnati, a favore della Diocesi Patriarcato di Venezia, per le necessità derivanti dal restauro e mantenimento di immobili religiosi (Palazzo Patriarcale di Venezia) di competenza della Diocesi. Relativamente alla legge 449/01 il Comune di Chioggia ha rinunciato ad una quota complessiva di limiti di impegno di euro 250.000 con decorrenza 2004 che vengono assegnati per 150.000 euro all'AULSS 14 e per 100.000 euro alla Diocesi di Chioggia.

(4) Attraverso il Comune di Venezia sono stati finanziati:
- l'Aeroporto Marco Polo relativamente alla Legge 448/98;
- la Biennale di Venezia e l'Azienda Consorzio Trasporti Veneziano relativamente alla legge 388/00 (importi finanziati non specificati dal Comune di Venezia);
- la Biennale di Venezia, l'Azienda Consorzio Trasporti Veneziano, la Fondazione Querini Stampalia e la Fondazione Ugo e Olga Levi relativamente alla legge 448/01 (importi finanziati non specificati dal Comune di Venezia).

(5) Per la Fondazione Giorgio Cini relativamente alla Legge 486/99, i limiti di impegno con decorrenza dal 2001, e quindi i finanziamenti, sono stati concessi attraverso il Consorzio Venezia Nuova. Inoltre il Comitato ex. art. 4 Legge n. 798/84, nella seduta del 6.12.2001 ha deliberato di destinare direttamente alla Fondazione Cini una quota parte del limite di impegno destinato al Consorzio Venezia Nuova, con decorrenza dal 2002, su indicazione del Presidente del Magistrato alle Acque in data 5 luglio 2002.

(6) Attraverso il Comune di Chioggia sono stati finanziati :
- la Diocesi di Chioggia e l'Azienda Speciale Porto Chioggia relativamente alla Legge 448/98,
- la AULSS 14, l'Istituto Cavanis, l'Istituto Salesiano S. Giusto, la Diocesi di Chioggia e il Circolo Nautico relativamente alla Legge 488/99 (dati dettagliati solo da Diocesi di Chioggia);
- la AULSS 14, l'Istituto Cavanis, Azienda Servizi Pubblici, l'Istituto per Anziani di Chioggia e la Diocesi di Chioggia relativamente alla Legge 388/00 (dati dettagliati solo da Diocesi di Chioggia).

NOTE BENE

Si ricorda che in attuazione della Legge Obiettivo (L. n. 443/01), in data 29.03.2006, il CIPE ha deliberato (n. 74) la terza assegnazione di fondi (380 Meuro) per il "Sistema MOSE". Il totale generale dei finanziamenti assegnati non tiene conto di tali fondi, in quanto potranno essere effettivamente disponibili solo nel corso del 2007. Tenendo conto anche di tale assegnazione, lo Stato Italiano dal 1984 a oggi ha assegnato alla Salvaguardia di Venezia 8.939 Meuro.

Venezia, 15 settembre 2006

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI E DEGLI IMPORTI SPESI

RELATIVAMENTE ALLE LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI, 139/92, 539/95, 515/96, 345/97, 295/98, 448/98, 488/99, 388/00, 448/01, 166/02 E 350/03

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2005

IMPORTI LORDI IN MIGLIAIA DI EURO

	LEGGE N. 798/84 E RIFINANZ.		LEGGE N. 139/92		LEGGE N. 539/95		LEGGE N. 515/96		LEGGE N. 345/97		LEGGE N. 295/98	
	FINANZIAMENTI ASSEGNATI IN CONTO CAPITALE (A1)	IMPORTI SPESI (A2)	FINANZIAMENTI ASSEGNATI (B1)	IMPORTI SPESI (B2)	FINANZIAMENTI ASSEGNATI (C1)	IMPORTI SPESI (C2)	FINANZIAMENTI ASSEGNATI (D1)	IMPORTI SPESI (D2)	FINANZIAMENTI ASSEGNATI (E1)	IMPORTI SPESI (E2)	FINANZIAMENTI ASSEGNATI (F1)	IMPORTI SPESI (F2)
STATO:												
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	**170.408**	**169.865**										
Riequilibrio idrogeologico	362	362										
Antinquinamento	7.775	7.232										
Marginamenti lagunari	1.984	1.984										
Edifici demaniali	77.975	77.975										
Arsenale	12.352	12.352										
Ponti, canali, fondamenta	49.643	49.643										
Corsi d'acqua	9.413	9.413										
Patrimonio mobiliare pubblico	4.662	4.662										
Università Architettura	6.242	6.242										
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	**401.405**	**399.287**	**556.560**	**540.219**	**125.500**	**117.500**	**478.000**	**414.568**	**239.000**	**195.076**		
Opere alle bocche di porto	85.648	85.230	25.249	24.014	9.418	9.418	2.858	2.858	10.133	9.973		
Rinforzo moli	15.705	15.699	85.061	85.061	0	0	6.964	6.964	0	0		
Difesa abitati, insulae e marginamenti	112.221	111.610	137.337	129.188	23.584	21.061	210.858	180.220	92.230	71.685		
Morfologia e arresto degrado	119.660	118.719	167.525	160.569	41.909	37.881	164.239	147.352	104.348	62.138		
Servizio informativo	12.893	12.893	11.454	11.454	3.447	2.083	15.722	15.215	3.099	3.052		
Aiuti alla navigazione	7.414	7.414	7.746	7.746	0	0	0	0	0	0		
[illegible]	43.825	43.686	119.181	119.181	47.142	47.058	76.090	61.867	27.140	26.038		
[illegible]ia pesca	4.040	4.036	3.005	3.005	0	0	1.270	91	2.050	1.991		
REGIONE VENETO	**274.393**	**182.047**	**386.376**	**240.301**	**50.435**	**45.535**	**181.903**	**117.077**	**142.026**	**63.468**		
Disinquinamento	239.791	162.818	386.376	240.301	47.078	42.218	181.903	117.077	119.351	43.633		
Acquedotti	20.658	5.285							22.675	19.835		
Ospedale SS. Giovanni e Paolo	13.944	13.944			3.357	3.317						
COMUNE DI VENEZIA	**203.941**	**163.200**	**308.003**	**290.769**	**97.320**	**82.733**	**316.617**	**262.124**	**195.994**	**132.320**	**13.698**	**13.484**
Risanamento immobili			167.020	163.099	70.706	58.720	199.122	171.905	91.597	74.257	13.698	13.484
Urbanizzazione primaria			23.794	19.788	12.630	11.486	44.348	40.176	24.422	21.031		
Contributi a privati			30.794	26.568	9.296	8.826	41.781	23.511	35.895	13.464		
Inse[illegible]enti produttivi			31.960	28.102	3.739	3.615	12.575	10.744	16.308	8.856		
[illegible]ntegrato rii			54.435	53.232	949	86	17.791	15.788	27.772	14.712		
COMUNE DI CHIOGGIA	**32.060**	**26.322**	**35.687**	**34.293**	**14.761**	**9.006**	**48.706**	**26.493**	**24.830**	**18.087**	**2.508**	**282**
Risanamento immobili												
Urbanizzazione primaria												
Contributi ai privati												
Infrastrutture												
Contributi acquisto 1ª casa												
Enti vari finanziati attraverso il Comune di Chioggia												
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI												
ALTRI ENTI:	**51.616**	**49.668**	**69.925**	**64.628**	**35.982**	**32.895**	**130.558**	**110.301**	**64.714**	**44.243**	**116.304**	**74.241**
PROVINCIA DI VENEZIA	1.756	1.756	14.928	9.632	8.263	5.929	42.866	26.393	13.428	3.252	15.494	121
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CA FOSCARI	12.911	12.430	17.991	17.991	9.237	8.304	22.134	20.871	26.546	16.251	24.177	6.581
ISTITUTO UNIVERSITARIO ARCHITETTURA VENEZIA			10.493	10.493	6.246	6.246	9.878	9.878	12.039	12.039	12.562	9.179
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	10.329	9.312										
PROCURATORIA DI SAN MARCO	4.670	4.670										
AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA	10.846	10.846					36.736	34.215			13.685	6.953
FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA	516	516									7.230	6.251
AEROPORTO MARCO POLO	1.033	1.033	26.512	26.512	12.216	12.216	18.944	18.944	12.701	12.701	12.739	12.739
CONSORZIO UNIVERSITARIO (CO.RI.LA.)											6.595	6.595
DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA											12.394	12.394
DIOCESI DI CHIOGGIA												
FONDAZIONE CINI												
BIENNALE DI VENEZIA											13.428	13.428
AZIENDA SPECIALE PORTO CHIOGGIA												
MINISTERO TESORO	1.033	1.033										
MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI	8.522	8.072										
TOTALE PER LEGGE E TOTALE GENERALE	**1.133.823**	**990.388**	**1.356.551**	**1.170.230**	**323.979**	**287.469**	**1.152.784**	**930.563**	**666.564**	**453.194**	**134.508**	**88.017**

Allegato n. 2

LEGGE 448/98		LEGGE N. 488/99		LEGGE N. 388/00		LEGGE N. 448/01		LEGGE N. 350/03		LEGGE N. 166/02 E RIFINANZ. FONDO OPERE STRATEGICHE		TOTALE PER ENTE E TOTALE GENERALE	
FINANZIAMENTI ASSEGNATI (G1)	IMPORTI SPESI (G2)	FINANZIAMENTI ASSEGNATI (H1)	IMPORTI SPESI (H2)	FINANZIAMENTI ASSEGNATI (I1)	IMPORTI SPESI (I2)	FINANZIAMENTI ASSEGNATI (L1)	IMPORTI SPESI (L2)	FINANZIAMENTI ASSEGNATI IN CONTO CAPITALE (M1)	IMPORTI SPESI (N2)	FINANZIAMENTI ASSEGNATI (M1)	IMPORTI SPESI (M2)	FINANZIAMENTI ASSEGNATI (O1) = A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1+H1+I1+L1+M1+N1	IMPORTI SPESI (O2) = A2+B2+C2+D2+E2+F2+G2+H2+I2+L2+M2+N2
						27.505	6.196	19.000	33			216.913	176.094
								19.000	33			19.362	395
						27.505	6.196					7.775	7.232
												29.489	8.180
												77.975	77.975
												12.352	12.352
												49.643	49.643
												9.413	9.413
												4.662	4.662
												6.242	6.242
281.423	193.506	208.000	127.491	154.000	123.581	225.000	70.119			1.088.100	280.010	3.736.988	2.461.357
19.666	19.199	50.571	44.762	89.131	84.876	12.367	8.759						
0	0	130	92	0	0	0	0						
117.155	78.872	54.369	22.727	2.851	1.584	117.693	24.143						
92.016	66.792	87.488	48.873	49.757	25.168	87.250	24.285						
12.061	10.258	10.623	10.039	8.137	7.873	9.451	8.537						
303	64	0	0	0	0	0	0						
17.673	15.782	997	997	4.124	4.080	18.238	4.396						
2.548	2.541	3.823	0	0	0	0	0						
236.505	90.426	205.033	28.186	97.701	8.974	189.123	13.499					1.762.495	787.513
201.935	78.108	194.704	25.087	89.867	4.930	173.958	9.543					1.634.963	723.715
33.570	12.318	10.329	3.099	6.812	2.044	13.187	3.956					107.231	46.537
				1.022	0	1.978	0					20.301	17.261
235.310	166.962	147.706	89.603	133.920	84.094	167.644	73.924			91.846	18.972	1.910.999	1.378.205
90.255	74.352	69.767	36.726	71.613	42.201	47.526	24.181						
43.274	34.358	22.234	12.141	19.204	10.237	43.222	18.999						
23.570	12.550	23.004	15.170	4.667	3.542	26.796	12.226						
29.337	4.541	9.815	2.676	12.827	5.999	4.066	851						
48.874	41.161	22.886	22.886	25.609	22.115	46.034	17.667						
40.904	17.744	23.396	6.279	16.831	2.893	29.940	3.340			18.869	104	286.481	144.853
				13.219	2.893	28.140	3.340						
				3.612	0	1.800	0						
				6.230	56	8.838	18			4.869	211	19.937	285
4.657	4.277	51.688	34.442	74.201	14.480	23.857	4.744					625.481	433.720
				4.648	0	1.356	0					102.739	47.083
				3.918	0	3.602	425					120.517	82.853
						3.024	3.024					54.242	50.859
												10.329	9.312
		11.524	11.524	1.239	1.239							17.434	17.433
				4.300	1.765	3.040	599					68.607	54.378
												7.746	6.767
0	0			5.578	0	1.548	0					91.271	84.145
				4.338	1.870	1.548	696					12.481	9.161
		10.699	10.699	28.488	5.844							51.581	28.937
3.098	2.718	723	674	4.500	3.600	1.200	0					9.521	6.992
		16.347	3.193	9.134	0	6.889	0					32.370	3.193
		12.395	8.352									25.823	21.780
1.559	1.559			8.057	162	1.650	0					11.266	1.721
												1.033	1.033
												8.522	8.072
777.799	472.915	635.823	286.001	482.883	232.078	671.907	171.840	19.000	33	1.203.674	299.297	8.559.294	5.382.026
												% speso/assegnato	63%

Allegato n. 3

LEGGE N. 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:				
Stato in amministrazione diretta - dati al 31.12.2005	176.067	170.408	169.865	169.865
L. 798/84, art. 3 lett. a) Riequilibrio Idrogeologico	362	362	362	362
L. 798/84, art. 3 lett. b) Serv. Antinquinamento	11.199	7.775	7.232	7.232
L. 798/84, art. 3 lett. c) Marginamenti lagunari	3.445	1.984	1.984	1.984
L. 798/84, art. 3 lett. e) Restauro edifici demaniali	77.975	77.975	77.975	77.975
L. 798/84, art. 3 lett. f) Recupero Arsenale	12.352	12.352	12.352	12.352
L. 798/84, art. 3 lett. g) Ponti, canali, fondamenta	49.643	49.643	49.643	49.643
L. 798/84, art. 3 lett. h) Sistemaz. corsi d'acqua	10.188	9.413	9.413	9.413
L. 798/84, art. 3 lett. i) Patrimonio mobiliare pubblico	4.662	4.662	4.662	4.662
L. 798/84, art. 3 lett. m) Università Architettura	6.242	6.242	6.242	6.242
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2005	401.405	401.405	401.405	399.287
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche	85.648	85.648	85.648	85.230
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli	15.705	15.705	15.705	15.699
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.	112.221	112.221	112.221	111.610
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado	119.660	119.660	119.660	118.719
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo	12.893	12.893	12.893	12.893
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione	7.414	7.414	7.414	7.414
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali	43.825	43.825	43.825	43.686
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca	4.040	4.040	4.040	4.036
ALTRI ENTI :	57.065	51.616	51.616	49.668
Provincia di Venezia - dati al 31.12.2000	2.041	1.756	1.756	1.756
Autorità Portuale già Provveditorato al Porto	10.846	10.846	10.846	10.846
Ministero BB.CC.AA. - dati al 31.12.98	8.522	8.522	8.522	8.072
Ministero Industria	5.165			
Ministero Ricerca Scientifica - dati al 21.02.97	10.329	10.329	10.329	9.312
Ministero del Tesoro	1.033	1.033	1.033	1.033
Procuratoria di S. Marco	4.670	4.670	4.670	4.670
Università degli Studi - dati al 31.12.2005	12.911	12.911	12.911	12.430
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.2005	1.033	1.033	1.033	1.033
Fond. Querini Stampalia	516	516	516	516
Ministero Ambiente				
IUAV				
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2005	274.393	274.393	231.992	182.047
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento	239.791	239.791	197.390	162.818
L. 798/84, art. 5 lett. a) - Acquedotti	20.658	20.658	20.658	5.285
L. 798/84, art. 5 lett. b) Osp. SS. Giovanni e Paolo	13.944	13.944	13.944	13.944
COMUNE DI VENEZIA - dati al 30.06.97	203.941	203.941	203.941	163.200
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili				
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria				
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati				
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi				
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture				
L. 360/91, art. 2 lett. d) Contributi acquisto 1^ casa				
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2000	32.060	32.060	31.961	26.322
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili				
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria				
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati				
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture				
L. 360/91, art. 2 lett. d) Contributi acquisto 1^ casa				
TOTALE	1.144.932	**1.133.823**	**1.090.779**	**990.388**

NOTE

1) Per i rifinanziamenti della Legge 798/84, sono stati considerati gli importi risultanti dalle successive rimodulazioni e al netto delle riduzioni di cui al D.M. Tesoro n. 114758 del 21.02.1994.

2) IMPORTI IMPEGNATI:

- per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

Allegato n. 4

LEGGE N. 139/92

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 139/92	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:					
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2005	47.772	556.560	(1) 556.560	556.560	540.219
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		25.249	25.249	25.249	24.014
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli		85.061	85.061	85.061	85.061
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.	35.016	137.337	137.337	137.337	129.188
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		167.525	167.525	167.525	160.569
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		11.454	11.454	11.454	11.454
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione	12.447	7.746	7.746	7.746	7.746
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		119.181	119.181	119.181	119.181
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca	310	3.005	3.005	3.005	3.005
ALTRI ENTI :	6.714	69.925	69.925	67.772	64.628
Provincia di Venezia - dati al 18.02.98	1.291	14.928	(1) 14.928	12.776	9.632
Università degli Studi - dati al 31.12.2005	2.066	17.991	(1) 17.991	17.991	17.991
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.2005	2.066	26.512	(1) 26.512	26.512	26.512
IUAV - dati al 31.12.2004	1.291	10.493	(1) 10.493	10.493	10.493
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2005 (*)	36.927	386.376	386.376	298.087	240.301
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento	36.927	386.376	(1) 386.376	298.087	240.301
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2005	34.020	308.003	(2) 308.003	306.646	290.789
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		167.020		165.710	163.099
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		23.794		23.776	19.788
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		30.794		30.794	26.568
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		31.960		31.931	28.102
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)		54.435		54.435	53.232
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2004	4.132	35.687	(2) 35.687	35.687	34.293
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili	3.062				
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture					
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria	401				
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati	669				
TOTALE	129.565	**1.356.551**	1.356.551	**1.264.752**	**1.170.230**

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI : gli importi attivati a valere sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge.
- I limiti di impegno con decorrenza dal 1994 autorizzati per la Regione Veneto, il Comune di Venezia e il Comune di Chioggia dalla Legge 139/92 e successivo D.M. n. 140503 del 21.05.1992 sono stati rimodulati dal Decreto Legge n. 659 del 30 novembre 1994 spostandone in parte la decorrenza al 1995 e/o al 1996.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :
(1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1993 e dal 1994.
(2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1993, dal 1994, dal 1995 e dal 1996.

- IMPORTI IMPEGNATI:
- per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):
(*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi assegnati, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.

(**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

Allegato n. 5

LEGGE N. 539/95

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 539/95	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:						
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2005	9.908	125.500	(1)	125.500	125.500	117.500
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		9.418		9.418	9.418	9.418
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli						
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.		23.584		23.584	23.584	21.061
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		41.909		41.909	41.909	37.881
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		3.447		3.447	3.447	2.083
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione						
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		47.142		47.142	47.142	47.058
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca						
ALTRI ENTI :	3.460	35.962		35.962	34.826	32.695
Provincia di Venezia dati al 31.12.2000	952	8.263	(1)	8.263	7.127	5.929
Università degli Studi - dati al 31.12.2005	962	9.237	(1)	9.237	9.237	8.304
Aeroporto Marco Polo dati al 31.12.2005	953	12.216	(1)	12.216	12.216	12.216
IUAV - dati al 31.12.2004	593	6.246	(1)	6.246	6.246	6.246
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2005 (*)	4.663	50.435	(1)	50.435	46.481	45.535
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b)						
Disinquinamento		47.078		47.078	43.124	42.218
L. 798/84, art. 5 lett. b) Ospedali		3.357		3.357	3.357	3.317
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2005	9.129	97.320	(1)	97.320	93.675	82.733
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		70.706			67.461	58.720
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		12.630			12.230	11.486
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		9.296			9.296	8.826
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		3.739			3.739	3.615
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)		949			949	86
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2004	1.503	14.761	(1)	14.761	14.761	9.006
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili						
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture						
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria						
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati						
TOTALE	28.664	323.979		323.979	315.243	287.469

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI TOTALI : stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1996 e dal 1997.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :
  (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1996 e dal 1997.

- IMPORTI IMPEGNATI:
  - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):
  (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi assegnati, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.
  (**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

Allegato n. 6

LEGGE N. 515/96

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 515/96	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:						
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2005	35.997	478.000	(1)	478.000	478.000	414.568
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		2.858		2.858	2.858	2.858
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli		6.964		6.964	6.964	6.964
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.		210.858		210.858	210.858	180.220
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		164.239		164.239	164.239	147.352
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		15.722		15.722	15.722	15.215
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione						
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		76.090		76.090	76.090	61.867
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca		1.270		1.270	1.270	91
ALTRI ENTI :	11.207	130.558		130.558	122.378	110.301
Provincia di Venezia - dati al 31.12.2000	3.822	42.866	(1)	42.866	34.686	26.393
Università degli Studi - dati al 31.12.2005	1.833	22.134	(1)	22.134	22.134	20.871
Autorità Portuale - dati al 31.12.2004	3.099	36.736	(1)	36.736	36.736	34.215
Aeroporto Marco Polo dati al 31.12.2005	1.524	18.944	(1)	18.944	18.944	18.944
IUAV - dati al 31.12.2005	930	9.878	(1)	9.878	9.878	9.878
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2005 (*)	15.907	181.903		181.903	139.671	117.077
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento		181.903	(1)	181.903	139.671	117.077
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2005	27.942	315.617	(1)	315.617	308.064	262.124
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		199.122			193.940	171.905
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		44.348			42.916	40.176
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		41.781			41.281	23.511
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		12.575			12.136	10.744
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)		17.791			17.791	15.788
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2004	4.492	46.706	(1)	46.706	46.706	26.493
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati						
TOTALE	95.545	**1.152.784**		1.152.784	**1.094.819**	**930.563**

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1997 e dal 1998.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :
(1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1997 e dal 1998.

- IMPORTI IMPEGNATI:
  - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):
  (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi assegnati, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.
  (**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

Allegato n. 7

LEGGE N. 345/97

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 345/97	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:						
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2005	18.076	239.000	(1)	239.000	239.000	195.076
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche		10.133		10.133	10.133	9.973
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli						
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.		92.230		92.230	92.230	71.885
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado		104.348		104.348	104.348	82.138
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo		3.099		3.099	3.099	3.052
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione						
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali		27.140		27.140	27.140	26.038
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca		2.050		2.050	2.050	1.991
ALTRI ENTI:	5.165	64.714		64.714	61.057	44.243
Provincia di Venezia - dati al 31.12.2000	1.033	13.428	(1)	13.428	9.771	3.252
Università degli Studi - dati al 31.12.2005	2.066	26.546	(1)	26.546	26.546	16.251
Aeroporto Marco Polo dati al 31.12.2005	1.033	12.701		12.701	12.701	12.701
IUAV - dati al 31.12.2005	1.033	12.039	(1)	12.039	12.039	12.039
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2005 (*)	10.329	142.026	(1)	142.026	92.263	63.468
L. 798/84, art. 5 lett. a) Acquedotti		22.675		22.675	22.675	19.835
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento		119.351		119.351	69.588	43.633
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2005	16.224	195.994	(1)	195.994	194.257	132.320
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		91.597			90.806	74.257
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		24.422			23.476	21.031
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		35.895			35.895	13.464
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		16.308			16.308	8.856
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)		27.772			27.772	14.712
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2004	1.852	24.830	(1)	24.830	24.830	18.087
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili						
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture						
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria						
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati						
TOTALE	51.646	666.564		666.564	611.407	453.194

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1998 e dal 1999.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo:
  (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1998 e dal 1999.

- IMPORTI IMPEGNATI:
  - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):
  (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi assegnati, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.
  (**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

Allegato n. 8

LEGGE N. 295/98

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 295/98		IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI			IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 1999	anno 2000	anno 1999	anno 2000	totale				
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova)	=	=	=	=	=		=	=	=
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche									
798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli									
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.									
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado									
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo									
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione									
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali									
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca									
ALTRI ENTI :	4.391	4.648	57.071	61.231	118.304		118.304	102.625	74.241
Provincia di Venezia - dati al 31.12.2000	516	516	7.747	7.747	15.494	(1)	15.494	2.040	121
Università degli Studi - dati al 31.12.2005	776	1.033	10.044	14.133	24.177	(1)	24.177	24.177	6.581
Autorità Portuale di Venezia - dati al 31.12.2004	516	516	6.843	6.843	13.685	(1)	13.685	11.638	6.953
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.2005	516	516	6.369	6.369	12.739	(1)	12.739	12.739	12.739
CO.RI.LA. - dati al 31.12.2005	258	258	3.262	3.333	6.595	(1)	6.595	6.595	6.595
Diocesi Patriarcato di Venezia al 31.12.2005	516	516	6.197	6.197	12.394	(1)	12.394	12.394	12.394
Biennale di Venezia - dati al 31.12.2002	516	516	6.714	6.714	13.428	(1)	13.428	13.428	13.428
Querini Stampalia - dati al 31.12.2005	258	258	3.615	3.615	7.230	(1)	7.230	7.230	6.251
IUAV - dati al 31.12.2005	516	516	6.281	6.281	12.562	(1)	12.562	12.384	9.179
REGIONE VENETO	=	=	=	=	=		=	=	=
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento									
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2005	658	439	8.255	5.443	13.698	(1)	13.698	13.585	13.484
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili			8.255	5.443	13.698			13.585	13.484
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria									
798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati									
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi									
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii									
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2004	116	77	1.476	1.030	2.506	(1)	2.506	2.506	292
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili									
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture									
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria									
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati									
TOTALE	5.166	5.165	66.802	67.704	**134.508**		134.508	**118.716**	**88.017**

NOTE

IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1999 e dal 2000.

IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo.

(1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999 e dal 2000.

IMPORTI IMPEGNATI:

- per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

Allegato n. 9

LEGGE N. 448/98

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 448/98			IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI				IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 1999	anno 2000	anno 2001	anno 1999	anno 2000	anno 2001	totale				
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2005	11.362	3.099	5.165	148.223	40.284	67.139	261.423	(2)	261.423	261.423	193.506
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche							19.666		19.666	19.666	19.199
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli											
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.							117.155		117.155	117.155	78.872
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado							92.016		92.016	92.016	66.792
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo							12.061		12.061	12.061	10.258
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione							303		303	303	64
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali							17.673		17.673	17.673	15.782
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca							2.548		2.548	2.548	2.541
ALTRI ENTI :	344	0	0	4.657	0	0	4.657		4.657	4.277	4.277
Provincia di Venezia											
Azienda speciale porto Chioggia dati al 31.12.2005 (°)	129			1.559			1.559	(1)	1.559	1.559	1.559
Aeroporto Marco Polo dati al 31.12.2005 (°°)											
Diocesi di Chioggia - dati al 31.12.2005 (°)	215			3.098			3.098	(1)	3.098	2.718	2.718
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2005 (*)	11.362	3.099	5.165	136.345	37.185	61.975	235.505	(2)	235.505	150.937	90.426
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento							201.935		201.935	128.322	78.108
L. 798/84, art. 5 lett. a) Acquedotti							33.570		33.570	22.615	12.318
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2005 (°°)	10.639	2.995	3.873	143.540	45.288	46.481	235.310	(2)	235.310	228.864	166.962
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili							90.255			87.055	74.352
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria							43.274			42.531	34.358
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati							23.570			23.330	12.550
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi							29.337			27.557	4.541
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)							48.874			48.391	41.161
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2004 (°)	1.670	620	775	22.591	8.242	10.071	40.904	(2)	40.904	40.904	17.744
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili											
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture											
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria											
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati											
TOTALE	35.377	9.812	14.977	455.356	130.999	185.666	777.799		777.799	686.405	472.915

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo :
  (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999.
  (2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.
  Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".

- IMPORTI IMPEGNATI:
  - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):
  (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.
  (**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

- Finanziamenti per Enti diversi:
  (°) I limiti di impegno all'Azienda Speciale Porto Chioggia e alla Diocesi di Chioggia, del valore indicato, sono stati concessi attraverso il Comune di Chioggia. Gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti al Comune di Chioggia non comprendono, pertanto, tali somme.
  (°°) I limiti di impegno all'Aeroporto Marco Polo di Venezia, sono stati concessi attraverso il Comune di Venezia. Gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti al Comune di Venezia comprendono, tali somme.

Allegato n. 10

LEGGE N. 488/99

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 488/99		IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI			IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2001	anno 2002	anno 2001	anno 2002	totale				
STATO:									
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2005 (°)	9.141	7.928	108.456	93.000	208.000	(2)	208.000	208.000	127.491
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche					50.571		50.571	50.571	44.762
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli					130		130	130	92
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.					54.369		54.369	54.369	22.727
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado					87.486		87.486	87.486	48.873
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo					10.623		10.623	10.623	10.039
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione									
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali					997		997	997	997
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca					3.823		3.823	3.823	0
ALTRI ENTI:	1.346	2.143	23.941	27.747	51.688		51.688	43.039	34.442
Provincia di Venezia									
Diocesi Patriarcato di Venezia - dati al 31.12.2005	413	516	4.750	5.949	10.699	(2)	10.699	10.699	10.699
Biennale di Venezia dati al 31.12.2005	465	516	5.681	6.714	12.395	(2)	12.395	12.395	8.352
Procuratoria di S. Marco - dati al 31.12.2005	413	516	5.040	6.484	11.524	(2)	11.524	11.524	11.524
Fondazione Giorgio Cini (°) dati al 31.12.2004		594	7.747	8.600	16.347	(2)	16.347	7.747	3.193
Diocesi di Chioggia (°°) dati al 31.12.2005	55		723		723	(1)	723	674	674
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2005 (*)	8.005	7.747	104.065	100.969	205.033	(2)	205.033	92.782	28.186
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento					194.704		194.704	82.453	25.087
L. 798/84, art. 5 lett. a) Acquedotti					10.329		10.329	10.329	3.099
COMUNE DI VENEZIA - dati al 31.12.2005	6.352	6.972	68.689	79.017	147.706	(2)	147.706	136.626	89.603
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili					69.767			63.298	36.728
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					22.234			18.045	12.141
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					23.004			22.755	15.170
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi					9.815			9.642	2.678
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)					22.886			22.886	22.886
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2004 (°°)	978	1.033	9.968	13.428	23.396	(2)	23.396	23.396	6.279
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili									
L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture									
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria									
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati									
TOTALE	25.823	25.823	315.119	314.161	635.823		635.823	503.843	286.001

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 2001 e dal 2002.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo:
  (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2001.
  (2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2001 e dal 2002.
  Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".

- IMPORTI IMPEGNATI:
  - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):
  (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.
  (**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

- Finanziamenti per Enti diversi:
  (°) Attraverso il Consorzio Venezia Nuova, sulla base di quanto deliberato dal Comitato ex. art. 4 Legge n. 798/84, a valere sul finanziamento attivato con limite di impegno decorrente dal 2001, è stata finanziata la Fondazione Giorgio Cini per il restauro del compendio immobiliare ubicato nell'isola di San Giorgio Maggiore nella laguna di Venezia. Inoltre, poiché il Comitato ex. art. 4 Legge n. 798/84, nella seduta del 6.12.2001, ha deliberato di destinare direttamente alla Fondazione Cini una quota parte del limite di impegno destinato già al Consorzio Venezia Nuova, su indicazione del Presidente del Magistrato alle Acque in data 5 luglio 2002 è stata destinata alla Fondazione Giorgio Cini anche la quota di limite di impegno pari a euro 593.925,43. Di conseguenza la quota di limite di impegno con decorrenza 2002 destinata al Consorzio Venezia Nuova è variata da euro 8.521.538,83 a euro 7.927.613,40.
  (°°) Attraverso il Comune di Chioggia, sono stati finanziati l'AULSS 14, l'Istituto Cavanis, l'Istituto Salesiano S. Giusto, la Diocesi di Chioggia e il circolo Nautico per interventi volti alla rivitalizzazione socio - economica e culturale della città di Chioggia. Solo la Diocesi di Chioggia ha fornito i dati sullo stato di attuazione, non compresi pertanto, tra quelli del Comune di Chioggia.

Allegato n. 11

LEGGE N. 388/00

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 388/00		IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI			IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2002	anno 2003	anno 2002	anno 2003	totale				
STATO:									
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2005	5.061	7.913	60.000	94.000	154.000	(2)	154.000	154.000	123.581
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche					89.131		89.131	89.131	84.876
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli									
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.					2.851		2.851	2.851	1.584
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado					49.757		49.757	49.757	25.168
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo					8.137		8.137	8.137	7.873
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausili alla navigazione									
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali					4.124		4.124	4.124	4.080
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca									
ALTRI ENTI :	1.790	4.337	21.870	52.331	74.201		69.530	59.412	14.480
Provincia di Venezia	181	207	2.169	2.479	4.648				
Diocesi Patriarcato di Venezia dati al 31.12.2005 (°°°)		2.374		28.488	28.488	(3)	28.488	28.488	5.844
Procuratoria di S. Marco - dati al 31.12.2005		103		1.239	1.239	(3)	1.239	1.239	1.239
Università degli studi Ca' Foscari - dati al 31.12.2005		310		3.918	3.918	(3)	3.918	3.918	0
Autorità Portuale - dati al 31.12.2004		362		4.300	4.300	(3)	4.300	4.216	1.765
Aeroporto Marco Polo - dati al 31.12.2005	258	207	3.099	2.479	5.578	(2)	5.578	5.578	0
Azienda Speciale Porto Chioggia dati al 31.12.2005	465	207	5.578	2.479	8.057	(2)	8.035	8.035	162
Fondazione Giorgio Cini - dati al 31.12.2004	516	207	6.524	2.610	9.134	(2)	9.134		
Consorzio Universitario (CO.RI.LA.) - dati al 31.12.2005		362		4.338	4.338	(3)	4.338	4.338	1.870
Diocesi di Chioggia (°°) - dati al 31.12.2005	370		4.500		4.500	(1)	4.500	3.600	3.600
REGIONE VENETO - dati al 31.12.2005 (*) (°°°)	3.693	5.189	40.619	57.082	97.701	(2)	97.701	17.459	6.974
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento					89.867			15.415	4.930
L. 798/84, art. 5 lett. a) - Acquedotti					6.812			2.044	2.044
L. 798/84, art. 5 lett. b) Ospedali					1.022				
COMUNE DI VENEZIA - dati aggiornati al 31.12.2005 (°)	3.925	6.972	43.920	90.000	133.920	(2)	133.920	117.020	84.094
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili					71.613			57.971	42.201
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria					19.204			16.247	10.237
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					4.667			4.667	3.542
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi					12.827			12.526	5.999
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)					25.609			25.609	22.115
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2004 (°°)	301	1.102	3.612	13.219	16.831	(2)	13.219	13.219	2.893
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		1.102		13.219	13.219		13.219	13.219	2.893
Enti vari finanziati attraverso il Comune di Chioggia (°°)	301		3.612		3.612				
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI - dati al 31.12.2004	207	310	2.494	3.736	6.230	(2)	6.230	6.230	56
TOTALE	14.977	25.823	172.515	310.368	482.883		474.600	367.340	232.078

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 2002 e dal 2003.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo:
  - (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002.
  - (2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002 e dal 2003.
  - (3) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2003.

  Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".

- IMPORTI IMPEGNATI:
  - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):
  - (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.
  - (**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

- Finanziamenti per Enti diversi:
  - (°) Attraverso il Comune di Venezia, sono stati finanziati La Biennale di Venezia e l'Azienda Consorzio Trasporti Veneziano
  - (°°) Attraverso il Comune di Chioggia, sono stati finanziati l'AULSS 14, l'Istituto Cavanis, Azienda Servizi Pubblici, l'Istituto per Anziani di Chioggia e la Diocesi di Chioggia, per interventi volti alla rivitalizzazione socio - economica e culturale della città di Chioggia. Solo la Diocesi ha fornito i dati sullo stato di attuazione, non compresi, pertanto, in quelli del Comune di Chioggia.
  - (°°°) A seguito della delibera del Comitato ex art.4 Legge n. 798/84 del 4 febbraio 2003 la Regione Veneto rinuncia ad una quota pari al 7,5% dei limiti di impegno con decorrenza 2003 ad essa assegnati, a favore della Diocesi Patriarcato di Venezia per le necessità derivanti dal restauro e mantenimento di immobili religiosi (Palazzo Patriarcale di Venezia) di competenza della Diocesi.

Allegato n. 12

LEGGE N. 448/01

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 448/01			IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI				IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO		IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2002	anno 2003	anno 2004	totale				
STATO:											
Stato in amministrazione diretta - dati al 31.12.2004				8.459	8.459	10.587	27.505	(3)		16.919	6.196
L. 798/84, art. 3 lett. a) Riequilibrio Idrogeologico L. 798/84, art. 3 lett. b) Serv. Antinquinamento L. 798/84, art. 3 lett. c) Marginamenti lagunari L. 798/84, art. 3 lett. e) Restauro edifici demeniali L. 798/84, art. 3 lett. f) Recupero Arsenale L. 798/84, art. 3 lett. g) Ponti, canali, fondamenta L. 798/84, art. 3 lett. h) Sistemaz. corsi d'acqua L. 798/84, art. 3 lett. i) Patrimonio mobiliare pubblico L. 798/84, art. 3 lett. m) Università Architettura				8.459	8459	10587	27.505			16.919	6.196
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2005	3.254	5.268	10.329	39.000	63.000	123.000	225.000	(1)	225.000	225.000	70.119
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche							12.367		12.367	12.367	8.759
L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli											
L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin.							117.693		117.693	117.693	24.143
L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado							67.250		67.250	67.250	24.285
L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo							9.451		9.451	9.451	8.537
L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione											
L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali							18.238		18.238	18.238	4.396
L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca											
ALTRI ENTI :	655	278	982	8.149	3.418	12.290	23.857		19.753	11.509	4.744
Provincia di Venezia	113			1.356			1.356				
Università degli studi Ca' Foscari - dati al 31.12.2005	155		129	2.014		1.588	3.602	(2)	3.602	3.602	425
IUAV dati al 31.12.2005		149	103		1.788	1.236	3.024	(2)	3.024	3.024	3.024
Autorità Portuale di Venezia - dati al 31.12.2004	129		129	1.520		1.520	3.040	(2)	3.040	1.685	599
Aeroporto Marco Polo dati al 31.12.2005			129			1.548	1.548				
Azienda Speciale Porto Chioggia dati al 31.12.2005			134			1.650	1.650	(2)	1.650	1.650	
Fondazione Giorgio Cini dati al 31.12.2004	258	129	129	3.259	1.630	2.000	6.889	(1)	6.889		
Consorzio Universitario (CO.RI.LA.) dati al 31.12.2005			129			1.548	1.548	(2)	1.548	1.548	696
Diocesi di Chioggia dati al 31.12.2005 (°°)			100			1.200	1.200				
REGIONE VENETO dati al 31.12.2005 (*)	3.254	4.932	9.007	35.794	54.252	99.077	189.123	(1)	189.123	33.795	13.499
L. 798/84, art. 5 lett. a) e L. 360/91, art. 2 lett. b) Disinquinamento							173.958			29.839	9.543
L. 798/84, art. 5 lett. a) - Acquedotti							13.187			3.956	3.956
L. 798/84, art. 5 lett. b) Ospedali							1.978				
COMUNE DI VENEZIA dati al 31.12.2005 (°)	2.505	4.170	8.780	27.372	45.448	94.824	167.644	(1)	167.644	159.445	73.924
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili							47.526			43.333	24.181
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria							43.222			39.934	18.999
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati							26.796			26.796	12.226
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi							4.066			3.483	851
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii (**)							46.034			45.899	17.667
COMUNE DI CHIOGGIA - dati al 31.12.2004 (°°)	387	658	1.450	4.644	7.896	17.400	29.940	(1)	28.140	28.140	3.340
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati	387	658	1.300	4.644	7.896	15.600	28.140		28.140	28.140	3.340
Enti vari finanziati attraverso il Comune di Chioggia (°°)			150			1.800	1.800				
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI dati al 31.12.2004	110	186	439	1.350	2.220	5.268	8.838	(1)	8.838	8.838	18
TOTALE	10.165	15.492	30.987	124.768	184.693	362.446	671.907		638.498	483.646	171.840

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali autorizzati dalla legge con decorrenza dal 2002, dal 2003 e dal 2004.
- Finanziamenti per lo Stato in amministrazione diretta:
  l'importo indicato è stato finanziato in conto capitale per "spese in gestione al Magistrato alle Acque di Venezia per il servizio di polizia lagunare e la manutenzione straordinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna" sul cap. 8620 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e assegnato in conto competenza per € 10.587.366,00 nel 2002 e € 10.587.366,00 nel 2003.

- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo
  (1) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002,dal 2003 e dal 2004.
  (2) Importo dei contratti di mutuo stipulati a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002 e/o dal 2003 e/o dal 2004.
  (3) Fondi in conto capitale.
  Per il Comune di Venezia non si è tenuto conto delle "riserve".

- IMPORTI IMPEGNATI:
  - per Stato in Amministrazione diretta, Regione Veneto, Comuni di Venezia e di Chioggia e per gli altri Enti Pubblici, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti.
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Finanziamenti per progetto integrato rii (Legge n. 139/92, art. 5):
  (*) L'art. 3 della Legge n. 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga destinata alla realizzazione del progetto integrato per i rii di Venezia mediante accordi di programma con il Comune di Venezia. Pertanto, gli importi disponibili, impegnati e spesi riferiti alla Regione Veneto comprendono le somme destinate al Comune di Venezia per il progetto integrato rii.
  (**) Agli importi assegnati indicati vanno sommati gli importi provenienti dalla Regione Veneto per il progetto integrato rii.

- Finanziamenti per Enti diversi:
  (°) Attraverso il Comune di Venezia, sono stati finanziati La Biennale di Venezia, Azienda Consorzio Trasporti Veneziano, Fondazione Querini Stampalia e Fondazione Ugo ed Olga Levi, per interventi volti alla rivitalizzazione socio - economica e culturale della città di Venezia.
  (°°) A seguito della delibera del Comitato ex art.4 Legge n. 798/84 del 4 febbraio 2003 il Comune di Chioggia rinuncia ad una quota complessiva di limiti di impegno con decorrenza 2004, pari a 250.000 euro che viene assegnata per 150.000 euro all'AULSS 14 di Chioggia per la prosecuzione delle opere a favore dell' Ospedale Civile di Chioggia e per 100.000 euro alla Diocesi di Chioggia per la prosecuzione delle opere di risanamento delle chiese dei Centri Storici di Chioggia e Sottomarina.

Allegato n. 13

LEGGE N. 166/02 (Collegato Infrastrutture)

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 166/02	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2003	anno 2003			
STATO:					
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2005	36.333	450.000	450.000	450.000	230.451
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin. L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca					
COMUNE DI VENEZIA dati al 31.12.2005 (°)	3.652	40.320	40.320	32.959	18.698
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili		12.481		8.168	2.309
L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria		7.885		7.885	2.957
L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati		5.576		5.456	2.747
L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi		4.060		1.132	517
L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii		150		150	
Commissario delegato al traffico acqueo		10.168		10.168	10.168
COMUNE DI CHIOGGIA dati al 31.12.2004 (°)	685	8.224	8.224	8.224	104
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI - dati al 31.12.2004 (°)	228	1.856	1.856	1.856	211
TOTALE	40.898	500.400	500.400	493.039	249.464

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali assegnati dal CIPE con decorrenza dal 2003
- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo
- IMPORTI IMPEGNATI:
  - per le Amministrazioni comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti;
  - per Stato in Concessione, sono gli importi destinari mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- Si ricorda che il primo elenco delle opere strategiche di cui alla delibera del CIPE del 21.12.2001, in attuazione della Legge Obiettivo (L. n. 443/01), ricomprende il "Sistema MOSE", per il quale è intervenuta una assegnazione di limiti di impegno con decorrenza dal 2002, dal 2003 e dal 2004 per l'attivazione di una prima tranche di finanziamenti da parte del CIPE con deliberazione n. 109 del 29.11.2002, a valere sul "fondo" per le opere strategiche di cui all'art. 13 della Legge n. 166/02. Per i suddetti limiti di impegno è intervenuta la ripartizione da parte del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nella seduta del 4 febbraio 2003, che ne ha destinato una quota parte alle Amministrazioni Comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti in base alle previsioni di cui all'art. 80, comma 28, della Legge n. 289/2002. Con deliberazioni del CIPE n. 63 del 25 luglio 2003 e n. 72 del 29 settembre 2003, a modifica e integrazione della precedente delibera n. 109 del 29.11.2002, è stato assegnato un unico limite di impegno di importo pari a 40,898 M€ decorrente dal 2002 differito al 2003, ripartito secondo le indicazioni del Comitato.

- (°) Con il limite di impegno assegnato dal CIPE (4,566 M€), il Comune di Venezia, quale soggetto aggiudicatore ai sensi del decreto interministeriale n. 5279 del 20.03.2003, ha attivato finanziamenti in nome e per conto anche del Comune di Chioggia e di Cavallino - Treporti provvedendo a trasferire le somme di loro spettanza (10,080 M€).
  Per quanto attiene la quota degli importi assegnati al Comune di Venezia per il finanziamento delle attività del Commissario delegato al traffico acqueo nella laguna di Venezia, importo pari a 10,168 M€, la devoluzione è avvenuta con apposito provvedimento. L'importo indicato (€ 40.320) è al lordo di tale quota.

Allegato n. 14

LEGGE N. 350/03 per il rifinanziamento fondo opere strategiche

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	LIMITI DI IMPEGNO EX LEGE 350/03	IMPORTI ASSEGNATI	IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
	anno 2005	anno 2005			
STATO:					
Stato in concessione (Consorzio Venezia Nuova) - dati al 31.12.2005	58.399	638.100	638.100	638.100	49.559
L. 798/84, art. 3 lett. a) Opere alle bocche L. 798/84, art. 3 lett. a), d) Rinforzo moli L. 798/84, art. 3 lett. a), c) Difesa abitati, insulae, margin. L. 798/84, art. 3 lett. a) Morfologia e arresto degrado L. 798/84, art. 3 lett. a) Servizio Informativo L. 798/84, art. 3 lett. d) Ausilii alla navigazione L. 798/84, art. 3 lett. d) Difesa litorali L. 798/84, art. 3 lett. l) Petroli e valli da pesca					
COMUNE DI VENEZIA dati al 31.12.2005 (°)	5.240	51.526	51.526	26.567	274
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento immobili L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati L. 798/84, art. 6 lett. d) Insediamenti produttivi L. 139/92, art. 5 Progetto integrato rii					
COMUNE DI CHIOGGIA dati al 31.12.2004 (°°)	973	10.635			
L. 798/84, art. 6 lett. a) Risanamento Immobili L. 360/91, art. 2 lett. c) Infrastrutture L. 798/84, art. 6 lett. b) Urbanizzazione primaria L. 798/84, art. 6 lett. c) Contributi a privati					
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI - dati al 31.12.2004 (°)	276	3.013			
TOTALE	64.888	703.274	689.626	664.667	49.833

NOTE

- IMPORTI ASSEGNATI: stima degli importi attivabili con i limiti di impegno quindicennali assegnati dal CIPE con decorrenza dal 2005
- IMPORTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI DI MUTUO: gli importi perfezionati con i relativi contratti di mutuo
- IMPORTI IMPEGNATI:
- per le Amministrazioni comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti, sono gli importi destinati con delibera degli organi competenti;
- per Stato in Concessione, sono gli importi destinati mediante convenzioni tra l'Amministrazione Concedente e il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e già registrati da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

- La Legge n. 350/03 rifinanzia il "fondo" per le opere strategiche (art. 13 Legge n. 166/02) di cui al primo programma deliberato dal CIPE (21.12.2001) in attuazione della Legge Obiettivo (Legge n. 443/01). Si ricorda che tale primo programma ricomprende il "Sistema MOSE" per il quale è intervenuta l'assegnazione di un contributo quindicennale con decorrenza dal 2005 per l'attivazione di una seconda tranche di finanziamento da parte del CIPE con deliberazione n. 40 del 29.09.2004, a valere sul suddetto "fondo". Per i summenzionati contributi è intervenuta la ripartizione da parte del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nella seduta del 4 novembre 2004, che ne ha destinato una quota parte alle Amministrazioni Comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti in base alle disposizioni di cui all'art. 80, comma 28, della Legge n. 289/02 prorogata dall'art. 23 quater della Legge n. 47/04, e una quota parte al Consorzio Venezia Nuova. Con deliberazione n. 75 del 20 dicembre 2004, il CIPE ha recepito tale ripartizione.

  La legge n. 350/03 finanzia anche, in conto capitale, 19 milioni di euro per il Magistrato alle Acque di Venezia. Essendo stato reso effettivamente disponibile solo alla fine del 2004, l'importo non viene considerato in quanto l'impegno e la spesa saranno possibili solo a partire dal 2005.

- (°) Al Comune di Cavallino - Treporti, in base alla delibera CIPE n. 75 del 20.12.2004, che recepisce la ripartizione proposta dal Comitato ex art. 4 Legge 798/84, viene attribuito il 5% dell'importo assegnato al Comune di Venezia.
- (°°) A seguito della delibera del Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 del 4.11.2004 dalla quota spettante al Comune di Chioggia verranno scorporati 3,7 milioni di euro per finanziare attività dell'AULSS 14, della Diocesi di Chioggia, della Provincia di Venezia, della Congregazione Serve di Maria Addolorata e dell'Istituto Cavanis di Chioggia.

Allegato n. 15

LEGGE N. 350/03

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti

(importi in migliaia di euro)

Soggetti	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI ASSEGNATI E DISPONIBILI	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
STATO:				
Stato in amministrazione diretta - dati al 31.12.2005	19.000	19.000	13.000	33
L. 798/84, art. 3 lett. a) Riequilibrio Idrogeologico	19.000	19.000	13.000	33
L. 798/84, art. 3 lett. b) Serv. Antinquinamento				
L. 798/84, aft. 3 lett. c) Marginamenti lagunari				
L. 798/84, art. 3 lett. e) Restauro edifici demaniali				
L. 798/84, art. 3 lett. f) Recupero Arsenale				
L. 798/84, art. 3 lett. g) Ponti, canali, fondamenta				
L. 798/84, art. 3 lett. h) Sistemaz. corsi d'acqua				
L. 798/84, art. 3 lett. i) Patrimonio mobiliare pubblico				
L. 798/84, art. 3 lett. m) Università Architettura				
TOTALE	**19.000**	**19.000**	**13.000**	**33**

Aggiornamento al 31 dicembre 2005

TABELLA DI SINTESI DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI, IMPEGNATI E SPESI

CON LE LEGGI 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI, 139/92, 539/95, 515/96, 345/97, 295/98, 448/98, 488/99, 388/00, 448/01, 166/02 E 350/03

Importi lordi in migliaia di euro

	IMPORTI ASSEGNATI (A)	Importi assegnati rispetto al totale generale (%)	IMPORTI IMPEGNATI (B)	Importi impegnati rispetto importi disponibili (%) (B/A)	IMPORTI SPESI (C)	Importi spesi rispetto importi disponibili (%) (C/A)
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	216.913		199.784		176.094	
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	3.736.988		3.736.988		2.461.356	
REGIONE VENETO (*)	1.762.495		1.103.467		787.513	
COMUNE DI VENEZIA (*)	1.910.999		1.821.649		1.378.205	
COMUNE DI CHIOGGIA	286.481		270.334		144.853	
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI	19.937		16.924		285	
ALTRI ENTI	625.481		558.511		433.720	
TOTALE GENERALE	8.559.294	100%	7.707.657	90%	5.382.026	63%

(*) L'art. 3 della Legge 139/92 prevede che una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per la Regione Veneto venga assegnata al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto integrato per i rii. I valori indicati per il Comune di Venezia sono al netto di tale quota.

Venezia, 15 settembre 2006

CONFRONTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE

Importi lordi in migliaia di euro

	IMPORTI TOTALI ASSEGNATI	SOMME SPESE				
		Stato attuazione al 31.12.2004		Stato attuazione al 31.12.2005		Variazione in percentuale
	(A)	Importi spesi (B)	% (B/A)	Importi spesi (C)	% (C/A)	(D)
STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	216.913	174.006		176.094		
STATO IN CONCESSIONE (CONSORZIO VENEZIA NUOVA)	3.736.988	2.038.925		2.461.356		
REGIONE VENETO	1.762.495	674.953		787.513		
COMUNE DI VENEZIA	1.910.999	1.222.111		1.378.205		
COMUNE DI CHIOGGIA (*)	286.481	144.853		144.853		
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI (*)	19.937	285		285		
ALTRI ENTI	625.481	430.948		433.720		
TOTALE	**8.559.294**	**4.686.080**	**55%**	**5.382.026**	**63%**	**+8%**

(*) Non forniti i dati al 31.12.2005

Venezia, 15 settembre 2006

ELENCO DOCUMENTI

Documento A *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque*
Le attività del Magistrato alle Acque in amministrazione diretta – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

Documento B *Consorzio Venezia Nuova*
Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

Documento C *Regione del Veneto*
Stato di attuazione degli interventi finanziati con fondi della legge speciale per Venezia – Aggiornato al 31 dicembre 2005

Documento D *Comune di Venezia*
Stato di attuazione delle attività finanziate con fondi di legislazione speciale per Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

Documento E *Università Ca' Foscari di Venezia*
Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

Documento F *Istituto Universitario di Architettura di Venezia - I.U.A.V.*
Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

Documento G *Consorzio per la gestione del Centro di Coordinamento delle attività di ricerca inerenti il sistema lagunare di Venezia – CO.RI.LA*
Stato di attuazione delle attività finanziate dalla legge speciale per Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

Documento H *SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo*
Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

Documento I *Azienda Speciale per il Porto di Chioggia*
Stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti sulla legge per la salvaguardia di Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

Documento L *La Biennale di Venezia*
Stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti sulla legge per la salvaguardia di Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

Documento M *Fondazione Scientifica Querini Stampalia*
Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

Documento N *Procuratoria di San Marco – Venezia*
Stato di attuazione degli interventi – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

Documento O *Curia Patriarcale di Venezia*
Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

Documento P *Diocesi di Chioggia*
Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

Documento A ***Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque***

Le attività del Magistrato alle Acque in amministrazione diretta – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLO STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Aggiornamento al 31 dicembre 2005

Importi lordi in migliaia di euro

COMPETENZA	OBIETTIVI		LEGGE N. 798/84 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI (910/86 - 67/88 - 360/91 - 415/92 - 724/94)					
			IMPORTI FINANZIATI (A)	IMPORTI ASSEGNATI (B)	IMPORTI IMPEGNATI (C)	% (C/B)	IMPORTI EROGATI (D)	% (D/B)
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. a)	Riequilibrio idrogeologico	362	362	362	100%	362	100%
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. b)	Servizio vigilanza e Anti-inquinamento (*)	11.199	7.775	7.232	93%	7.232	93%
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. c)	Marginamenti lagunari	3.445	1.984	1.984	100%	1.984	100%
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. e)	Restauro di edifici demaniali	77.975	77.975	77.975	100%	77.975	100%
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. f)	Recupero dell'Arsenale	12.352	12.352	12.352	100%	12.352	100%
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. g)	Sistemazione di ponti, canali e fondamenta	49.643	49.643	49.643	100%	49.643	100%
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. h)	Sistemazione dei corsi d'acqua	10.188	9.413	9.413	100%	9.413	100%
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. i)	Restauro del patrimonio mobiliare pubblico	4.662	4.662	4.662	100%	4.662	100%
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. m)	Edilizia per Università Architettura	6.242	6.242	6.242	100%	6.242	100%
		TOTALI	**176.067**	**170.408**	**169.865**	**100%**	**169.865**	**100%**

(*) La differenza tra l'assegnato e l'impegnato è dovuto all'accantonamento di euro 170.430,78 e al trasferimento di parte dei fondi ad altro capitolo per il pagamento dei contrattisti.

Tabella n. 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLO STATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Aggiornamento al 31 dicembre 2005

Importi lordi in migliaia di euro

COMPETENZA	OBIETTIVI		LEGGE N. 448/01						LEGGE N. 350/03					
			IMPORTI FINANZIATI (A)	IMPORTI ASSEGNATI (B)	IMPORTI IMPEGNATI (C)	% (C/B)	IMPORTI EROGATI (D)	% (D/B)	IMPORTI FINANZIATI (A)	IMPORTI ASSEGNATI (B)	IMPORTI IMPEGNATI (C)	% (C/B)	IMPORTI EROGATI (D)	% (D/B)
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. a)	Riequilibrio idrogeologico												
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. b)	Servizio vigilanza e Anti-inquinamento												
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. c)	Marginamenti lagunari	27.505	27.505	16.919	62%	6.196	23%	19.000	19.000	13.000	68%	33	0%
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. e)	Restauro di edifici demaniali												
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. f)	Recupero dell'Arsenale												
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. g)	Sistemazione di ponti, canali e fondamenta												
Isp. Gen. lagune Venezia, Marano e Grado	L. 798/84, art. 3 lett. h)	Sistemazione dei corsi d'acqua												
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. i)	Restauro del patrimonio mobiliare pubblico												
Provv. Reg. alle OO.PP.	L. 798/84, art. 3 lett. m)	Edilizia per Università Architettura												
		TOTALI	**27.505**	**27.505**	**16.919**	**62%**	**6.196**	**23%**	**19.000**	**19.000**	**13.000**	**68%**	**33**	**0%**

L'importo finanziato con la Legge 448/01 per il Magistrato alle Acque a seguito di specifica richiesta avanzata in sede di Comitato ex art. 4 L. 798/84 nella seduta del 6.12.2001 per "spese in gestione al Magistrato alle Acque per il servizio di polizia lagunare e la manutenzione straordinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna" - cap. 7671 ex 8620 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, può essere utilizzato nel periodo 2002-2005.

L'importo finanziato con la Legge 350/03 è relativo al capitolo 7197 i cui fondi vengono assegnati al Magistrato alle Acque tramite il Ministero dell'Ambiente - Difesa del suolo e possono essere utilizzati nel periodo 2004-2006.

Tabella n. 2

PAGINA BIANCA

Documento B ***Consorzio Venezia Nuova***

Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

MAGISTRATO ALLE ACQUE
SEGRETERIA
20
P ot N 286 GAB

Cab
Segn. ex 798/84

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA
21. APR. 2006
GABINETTO

Venezia, 20 APR. 2006
Prot. n.12823 spc/ndo/gol

Spettabile
Magistrato alle Acque
Palazzo X Savi
San Polo, 19
30124 Venezia

Alla c.a.: dott. ing. Maria Giovanna Piva

Oggetto*: *"Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova. Aggiornamento al 31 dicembre 2005".

In risposta alla Vs. nota prot. n. 238/GAB del 04 aprile 2006, con la presente Vi inviamo il documento in oggetto per la redazione dell'annuale "Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia".

Si fa presente che il fabbisogno indicato tiene conto di quanto definito con l'atto aggiuntivo rep. 8067 del 11 maggio 2005 alla convenzione generale rep. 7191/91, che introduce il criterio del "prezzo chiuso" per il completamento del "Sistema MOSE".

Cordiali saluti.

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

All.: c.s.

Stato di attuazione degli interventi di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova

Aggiornamento al 31 dicembre 2005

PAGINA BIANCA

Indice

Il Consorzio Venezia Nuova e il Piano Generale degli Interventi

I Finanziamenti

Tabella n. 1 *Stato di attuazione dei finanziamenti assegnati al Consorzio Venezia Nuova*

Tabella n. 2 *Stato di Attuazione degli Atti Attuativi sottoscritti tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova*

Tabella n. 3 *Attuazione del Piano Generale degli Interventi da eseguire in concessione dal Consorzio Venezia Nuova*

Grafici *Diagrammi generali*

Tabella n. 4 *Le quantità realizzate e in corso di realizzazione*

Lo stato di attuazione delle attività

3.1 Studi e sperimentazioni

3.2 Difesa dalle acque alte eccezionali

3.3 Difesa locale acque medio-alte

3.4 Ristrutturazione dei moli foranei

3.5 Difesa dalle mareggiate

3.6 Recupero morfologico

3.7 Arresto del degrado dell'ecosistema lagunare

3.8 Allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna

3.9 Ausilii luminosi alla navigazione

3.10 Apertura delle valli da pesca

3.11 Costituzione e potenziamento del Servizio Informativo

Appendice

Elenchi – Mappe - Foto

1 *Il Consorzio Venezia Nuova e il Piano Generale degli Interventi*

Il Consorzio Venezia Nuova è il soggetto attuatore, per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia, delle attività di salvaguardia di competenza dello Stato in attuazione della legge 798/84 (art. 3, lettere a), c), d) e l).
Per svolgere il proprio compito di concessionario di studi, sperimentazioni, progetti e opere, il Consorzio Venezia Nuova si è dotato di una struttura in grado di pianificare, organizzare e gestire le diverse attività nel loro complesso e in tutte le fasi di attuazione.
Il Consorzio è costituito da imprese nazionali, da cooperative e da imprese locali. La sua operatività è iniziata nella seconda metà degli anni '80, quando sono stati avviati i primi interventi previsti dalla legislazione speciale per Venezia.

Al fine di perseguire gli obiettivi di competenza dello Stato, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia e Consorzio Venezia Nuova agiscono in base a una Convenzione Generale[1] e in base a una serie di obiettivi indicati dalla legge, organizzati in un *Piano Generale degli Interventi*.

Il *Piano*, redatto sin dal 1985 come allegato alla Convenzione rep. n. 6479, è stato successivamente adeguato e formulato sugli indirizzi forniti dal Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 nel 1987 ed approvato, nella seduta dell'11 marzo 1987, dal Comitato stesso; nella successiva versione adeguata e aggiornata del 1991, è stato approvato dal Magistrato alle Acque di Venezia, su parere del Comitato Tecnico di Magistratura, e dallo stesso Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nel 1991.
Il *Piano* è stato espressamente richiamato dall'art. 3 della Legge

1 La "Convenzione Generale" rep. n. 7191, sottoscritta nell'ottobre del 1991, disciplina il rapporto fra l'Amministrazione concedente e il Consorzio concessionario in ordine all'insieme degli interventi affidati in concessione per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, come prefigurato dal Comitato ex art. 4 legge n. 798/84.

139/1992, quale strumento di pianificazione dell'azione del Ministero dei Lavori Pubblici (ora delle Infrastrutture e dei Trasporti). Esso contiene le conclusioni di anni di confronti, di studi e di progettazioni generali con i quali sono state esaminate alternative diverse ed è stata valutata la fattibilità del sistema delle opere e di ciascuna di esse con riguardo alla loro compatibilità ambientale ed alla loro reciproca influenza.
Tale documento è articolato secondo linee di azione distinte, ma in reciproca relazione: la difesa dalle acque alte eccezionali e medio-alte; la difesa dalle mareggiate; il recupero della morfologia lagunare; il riequilibrio ambientale.

Al Piano fanno riferimento otto specifici progetti generali:

Progetto di massima delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto lagunari: approvato nel novembre 1992 e valutato positivamente dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'ottobre 1994 e nel febbraio 1999;
Progetto per la difesa locale delle "insulae" dalle acque medio-alte: approvato nel luglio 1992;
Progetto per il rinforzo dei litorali: approvato nel settembre 1990;
Progetto per la ristrutturazione dei moli foranei: approvato nel luglio 1991;
Progetto per il recupero morfologico: approvato nel luglio 1993;
Progetto per l'arresto e l'inversione del degrado: approvato nel luglio 1994;
Progetto di fattibilità per la riapertura delle valli da pesca: approvato nel luglio 1993;
Progetto operativo per l'allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna di Venezia: una prima soluzione approvata nel settembre 1994 ed una seconda nel luglio 1997.

L'attuazione dei progetti generali è avvenuta negli anni, e avviene tuttora, attraverso la definizione dei singoli interventi con appositi progetti esecutivi che vengono a loro volta approvati dall'Amministrazione Concedente e dai diversi enti competenti. Detti interventi in parte sono stati realizzati, in parte sono in corso di esecuzione, in parte devono essere avviati, mediante Atti Attuativi della Convenzione Generale, sottoscritti tra l'Amministrazione Concedente e il Consorzio concessionario sulla base dei finanziamenti via via disponibili. Altri interventi debbono essere ancora finanziati e, pertanto, sulla base delle future disponibilità dovranno essere oggetto di nuovi, specifici, Atti

Attuativi.

Il *Piano Generale degli Interventi* ha subìto negli anni una evoluzione nei contenuti degli interventi previsti, anche per una sempre maggiore conoscenza del sistema lagunare e dei meccanismi alla base delle problematiche che lo investono, consentendo di mettere in atto le più avanzate soluzioni progettuali nel rispetto delle situazioni ambientali, urbanistiche e artistiche del luogo di realizzazione dell'intervento.

Il *Piano*, pertanto, è un documento programmatorio in continua specificazione, che prevede lo sviluppo temporale parallelo di più attività tra loro diversificate ma fortemente interconnesse e che si realizza progressivamente cumulando le esperienze acquisite nelle fasi attuative precedenti.

Nel corso del 2002, si è pervenuti alla ridefinizione del *Piano Generale degli Interventi* a seguito degli accordi intercorsi tra il Governo italiano e la Commissione Europea.
Si ricorda, infatti, che, proprio nel corso del 2002, la Commissione Europea ha proceduto all'archiviazione della procedura di infrazione a suo tempo avviata nei confronti dello Stato Italiano in ordine alla presunta incompatibilità, rispetto alla normativa comunitaria, dell'affidamento da parte del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Infrastrutture e Trasporti) al Consorzio Venezia Nuova della concessione unitaria per l'esecuzione delle attività ricomprese nel *Piano Generale degli Interventi* per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

All'archiviazione della procedura di infrazione, che riafferma il ruolo svolto dal Consorzio Venezia Nuova nell'ambito delle peculiari attività unitariamente finalizzate alla salvaguardia fisica e ambientale di Venezia e della sua laguna, nonché la validità della concessione ad esso affidata dallo Stato italiano, la Commissione Europea è pervenuta dopo l'esame dello specifico documento contrattuale stipulato tra il Magistrato alle Acque e il Consorzio Venezia Nuova in data 21 giugno 2002, ammesso al visto e alla conseguente registrazione da parte della Sezione per il Veneto della Corte dei Conti in data 25 ottobre 2002, che recepisce gli accordi intercorsi tra le Autorità Italiane e la Commissione Europea volti alla ridefinizione del perimetro degli interventi la cui esecuzione è affidata in concessione.

In base a tali accordi, sono state stralciate dal *Piano Generale degli Interventi* affidati in concessione le opere di difesa dei centri urbani dalle acque alte e le difese per "insulae", se non ricomprese in finanziamenti già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova, per essere appaltate dal Magistrato alle Acque di Venezia mediante procedure concorsuali. Inoltre, il Consorzio Venezia Nuova dovrà eseguire le opere elettromeccaniche, necessarie per la realizzazione dell'intervento di regolazione delle maree alle bocche di porto, mediante appalti di fornitura i cui esecutori dovranno essere individuati per mezzo di gare da indire ed esperire dal Consorzio stesso, secondo le direttive comunitarie.

La ridefinizione del *Piano Generale degli Interventi* che recepisce tali accordi è stata favorevolmente esaminata dal Comitato Tecnico di Magistratura nella seduta del 20 dicembre 2002.

Si ricorda che, successivamente, il *Piano* è stato presentato, aggiornato al 31 dicembre 2002, dal Presidente del Magistrato alle Acque, quale Segretario del Comitato ex art. 4 Legge 798/84, nella seduta del 3 aprile 2003 al Comitato stesso, che ne ha preso atto e ha deliberato:

"1. di prendere atto del documento "Piano dei Finanziamenti relativi al Piano Generale degli Interventi" nella versione 31.12.2002, invitando a provvedere al suo adeguamento anche sulla base di quanto già deliberato da questo Comitato relativamente alla redazione del progetto esecutivo e alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree del "Sistema Mo.S.E.";

2. di prendere formale impegno affinché si provveda ad attivare tutte le iniziative utili a garantire senza soluzione di continuità i flussi finanziari, indicati nel documento "Piano dei finanziamenti relativi al Piano Generale degli Interventi", necessari per la realizzazione del "Sistema Mo.S.E." nonché per ulteriori attività, di competenza dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova, tendenti al recupero ambientale della laguna di Venezia ed alla sua salvaguardia".

Si segnala che, nel corso del 2005, la Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 è stata oggetto di un importante atto modificativo per l'introduzione del *criterio "a prezzo chiuso" per gli interventi necessari al completamento delle opere alle bocche di porto per la*

regolazione dei flussi di marea ("Sistema MOSE").

In data 11 maggio 2005, infatti, è stato sottoscritto tra Magistrato alle Acque di Venezia e Consorzio Venezia Nuova l'atto aggiuntivo rep. n. 8067 alla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 che introduce il criterio del "prezzo chiuso" per completare il "Sistema MOSE", al fine di poter contare su finanziamenti ulteriori complessivi definiti e disponibili, a fronte della determinazione "certa" del fabbisogno residuo e del relativo programma di esecuzione dell'opera.
L'atto e i relativi allegati (*Piano di esecuzione degli interventi*, *Cronoprogramma* e *Piano dei finanziamenti*), esaminato preliminarmente con parere favorevole dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nella seduta del 29 aprile 2005 e approvato, quindi, con Decreto Presidenziale n. 3638 del 23 maggio 2005, è stato registrato dalla Sezione per il Veneto della Corte dei Conti in data 8.07.2005.

Si tratta di un importante risultato che permette, in modo efficace, la programmazione e la realizzazione degli interventi di completamento del "Sistema MOSE" nell'ambito di un quadro temporale ed economico definito, idoneo a consentire la conseguente programmazione dei fabbisogni finanziari ancora necessari per il completamento dell'opera.

2 *I Finanziamenti*

Gli interventi dello Stato in concessione al Consorzio Venezia Nuova riguardano i seguenti obiettivi, richiamati dall'art. 3 lettere a), c), d) e l) della Legge n. 798/84 e dall'art. 2, 1° comma lettera a) della Legge n. 360/91 nonché dalla Legge n. 139/92:

- difesa dalle acque alte eccezionali;
- difesa locale dalle acque medio-alte;
- ristrutturazione dei moli foranei alle tre bocche lagunari;
- difesa dalle mareggiate;
- recupero della morfologia lagunare;
- arresto del degrado dell'ecosistema lagunare;
- allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna;
- ausilii luminosi alla navigazione;
- apertura delle valli da pesca;
- costituzione e potenziamento del Servizio Informativo.

Lo stato di attuazione dei finanziamenti stanziati per la realizzazione dei suddetti interventi in concessione al Consorzio Venezia Nuova viene di seguito riportato in alcune tabelle che evidenziano per ciascuna legge e per ciascun obiettivo l'avanzamento aggiornato al 31 dicembre 2005.

In riferimento alla *Tabella n.* 1, per **importi finanziati** si intendono gli importi complessivamente stanziati in favore delle attività del Consorzio Venezia Nuova dal 1984 al 31.12.2005. Essi ammontano a 4.125 milioni di euro, importo che tiene conto della prima e della seconda assegnazione di fondi da parte del CIPE per la realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto ("Sistema MOSE"), in quanto ricompreso nel primo programma delle opere strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121/2001 in attuazione della Legge Obiettivo.

Nell'ambito della Legislazione Speciale per Venezia, a partire dalla Legge n. 139/92, i finanziamenti vengono attivati con contratti di finanziamento a valere sui "limiti di impegno", recati anno dopo anno dalle Leggi Finanziarie, destinati in quota - parte allo Stato per gli interventi in concessione, per l'ammortamento delle rate (per capitali ed interessi) relative ai mutui contratti dal Consorzio Venezia Nuova, mediante specifica ripartizione proposta dal Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 e operata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Nell'ambito della Legge Obiettivo, per il "Sistema MOSE", i finanziamenti vengono attivati con contratti di finanziamento a valere sui "limiti di impegno" ovvero sui "contributi" pluriennali recati dalle Leggi finanziarie per il rifinanziamento del fondo per le opere strategiche di cui all'art. 13 della Legge n. 166/2002, destinati mediante deliberazione del CIPE in quota - parte alle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto, quale opera strategica di cui alla delibera CIPE n. 121/2001.

Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi a Porto Marghera di competenza dello Stato derivano sia dalle somme attivate nell'ambito della Legislazione speciale per Venezia, sia dalle somme messe a disposizione dal Ministero dell'Ambiente, a valere sulla legge n. 641/1996, sia da accordi transattivi e di cooperazione tra lo Stato e alcuni Soggetti privati che operano a Porto Marghera, finalizzati ad accelerare la realizzazione delle opere di messa in sicurezza progettate dallo Stato/Magistrato alle Acque di Venezia.

Per **importi sottoscritti** si intendono gli importi relativi ad Atti Attuativi della Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 sottoscritti tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova alla data del 31 dicembre 2005. Tali importi sono pari a 4.125 milioni di euro.

Per **importi impegnati** si intendono gli importi relativi ad Atti Attuativi il cui relativo Decreto Presidenziale approvativo sia già stato registrato da parte della Sezione per il Veneto della Corte dei Conti. Al 31 dicembre 2005, sono stati indicati come impegnati tutti gli importi sottoscritti, preso atto che il Decreto Presidenziale approvativo dell'Atto Attuativo rep. n. 8100/2005, finanziato con i fondi di cui alla seconda assegnazione del CIPE per il "Sistema MOSE", è stato registrato alla Sezione per il Veneto della Corte dei Conti in data 27 gennaio 2006.

Per **importi spesi** al 31.12.2005 si intendono gli importi prodotti a tale data. **Al 31.12.2005 risulta speso il 61% degli importi sottoscritti.**

Nella *Tabella n. 2* è riportato l'elenco degli Atti Attuativi sottoscritti tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova e il loro avanzamento.

Nella *Tabella n. 3* viene riportato sinteticamente, per ciascun obiettivo indicato dalle Leggi n. 798/84 e n. 139/92 il fabbisogno totale, gli importi finanziati, gli importi sottoscritti, gli importi impegnati, gli importi relativi ad attività già realizzate e in corso di realizzazione (comprese le attività di prossimo avvio che hanno il progetto esecutivo approvato) nonché gli importi spesi.
Di seguito alcuni *grafici* che mettono in evidenza i dati riportati nelle tabelle precedenti.

Il **fabbisogno totale** viene valutato sulla base di documenti tecnici già prodotti, di stime provenienti da lavori analoghi, di indicazioni di massima, qualora si tratti di interventi non ancora sufficientemente delineati, da preventivi più dettagliati per interventi il cui progetto si trova già in fase di sviluppo. Per quegli interventi il cui progetto esecutivo è già stato approvato dall'Amministrazione concedente, il fabbisogno totale coincide con l'importo approvato.
Per tale motivo, l'importo indicato quale fabbisogno totale subisce delle evoluzioni nel tempo, tenendo conto di quanto definitosi progressivamente con l'approvazione dei singoli progetti esecutivi.

Si segnala che il fabbisogno totale aggiornato al 31.12.2005 tiene conto di quanto definito con l'atto aggiuntivo rep. n. 8067/2005 alla "Convenzione Generale", che ha introdotto il criterio del "prezzo chiuso" per gli interventi da realizzare per il completamento del "Sistema MOSE".
In particolare, con tale atto aggiuntivo il Magistrato alle Acque e il Consorzio Venezia Nuova hanno definito specifiche modalità esecutive per gli interventi ancora necessari per il completamento delle opere di regolazione delle maree: se ne prevede la realizzazione con l'applicazione di un "prezzo chiuso" comprensivo dei lavori, delle prestazioni di ingegneria, degli obblighi e oneri di competenza del concessionario, con conseguente contabilizzazione dei lavori "a corpo", fermo restando che le opere diverse da quelle finalizzate alla regolazione delle maree, ma a queste strettamente connesse, nonché gli studi, le sperimentazioni e le attività del

Servizio Informativo saranno contabilizzati "a misura", in quanto non ricompresi nel "prezzo chiuso".

Il **fabbisogno residuo da finanziare**, per ciascun obiettivo, indicato nelle tabelle riportate alla fine di ogni paragrafo, è dato dalla differenza tra il fabbisogno totale e gli importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova.
Con il fabbisogno residuo si dovrà trovare copertura finanziaria per quegli interventi:

- che costituiscono ulteriori stralci di interventi già realizzati o in corso di realizzazione;
- che costituiscono ulteriori fasi di sviluppo di attività che, per loro natura, si sviluppano nel corso di più anni (monitoraggi, manutenzioni di interventi già realizzati, gestione del Servizio Informativo);
- che non hanno trovato copertura finanziaria nell'ambito degli atti Convenzionali già sottoscritti, in quanto non particolarmente urgenti o comunque rinviabili rispetto ad altri interventi;
- la cui progettazione è ancora in fase di sviluppo e, poiché richiede tempi lunghi di completamento e di successiva procedura approvativa, si è ritenuto opportuno rinviare il finanziamento delle relative opere (ciò vale soprattutto per gli interventi di sistemazione delle sponde e dei fondali dei canali portuali a Porto Marghera per i quali, per la complicatezza delle progettazioni e per la complessità del successivo iter approvativo, trovano per lo più finanziamento nell'ambito degli Atti Attuativi finanziati solo i relativi progetti, mentre alcuni degli interventi veri e propri non risultano coperti da finanziamento e quindi sono compresi nel fabbisogno residuo da finanziare);
- che costituiscono nuovi studi e sperimentazioni da realizzare in funzione di alcune esigenze specifiche di approfondimento emerse nel corso di attività progettuali.

La maggior parte del fabbisogno residuo è rappresentata dagli importi valutati necessari per il completamento della realizzazione del sistema delle opere per la regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto lagunari.
L'altra parte rilevante del fabbisogno residuo è rappresentata dagli interventi ambientali per molti dei quali, come sopra segnalato, nell'ambito dei finanziamenti disponibili, si è preferito finanziare le

sole progettazioni, richiedendo tempi di sviluppo e iter approvativi molto lunghi.

La *Tabella n. 4* infine, dà contezza di quanto già realizzato anche in termini di "quantità" ovvero dello sviluppo dei lavori effettuati, sia nel campo della salvaguardia fisica (difesa dalle acque medio-alte, difesa dalle mareggiate, rinforzo dei moli foranei) che nel campo della salvaguardia ambientale (interventi per il recupero morfologico e per l'arresto del degrado del bacino lagunare).

Nuova. Aggiornamento al 31 dicembre 2005 -

importi in milioni di Euro

	DECORRENZA LIMITI DI IMPEGNO	IMPORTI FINANZIATI (A)	IMPORTI SOTTOSCRITTI (B)	% (B)/(A)	IMPORTI IMPEGNATI (C)	% (C)/(B)	IMPORTI SPESI (D)	% (D)/(B)
LEGGE 798/84	(*)	401,405	401,405	100%	401,405	100%	399,287	99%
LEGGE 139/92	1993 - 1994	556,560	556,560	100%	556,560	100%	540,219	97%
LEGGE 539/95	1996 - 1997	125,500	125,500	100%	125,500	100%	117,500	94%
LEGGE 515/96	1997 - 1998	478,000	478,000	100%	478,000	100%	414,568	87%
LEGGE 345/97	1998 - 1999	239,000	239,000	100%	239,000	100%	195,076	82%
LEGGE 448/98	1999 - 2000 -2001	261,423	261,423	100%	261,423	100%	193,506	74%
FONDI CIPE PER INTERVENTI AMBIENTALI	(*)	50,096	50,096	100%	50,096	100%	8,858	18%
LEGGE 488/99	2001 - 2002	208,000	208,000	100%	208,000	100%	127,491	61%
LEGGE 388/00	2002 - 2003	154,000	154,000	100%	154,000	100%	123,581	80%
LEGGE 448/01	2002 - 2003 - 2004	225,000	225,000	100%	225,000	100%	70,119	31%
LEGGI 448/01 – 166/02 DELIBERA CIPE 29/11/02 PER "SISTEMA MOSE"	2003	450,000	450,000	100%	450,000	100%	230,450	51%
FINANZIAMENTO DA ACCORDO STATO - MONTEDISON (ora Edison S.p.A.) per Porto Marghera	(*)	271,140	271,140	100%	271,140	100%	26,328	10%
FINANZIAMENTO DA ACCORDO STATO - ENTI PRIVATI per Porto Marghera	(*)	66,375	66,375	100%	66,375	100%	8,577	13%
LEGGI 166/02 - 350/03 DELIBERA CIPE 29/09/04 PER "SISTEMA MOSE"	2005	638,100	638,100	100%	638,100	100%	49,559	0%
TOTALE GENERALE		**4.124,599**	**4.124,599**	**100%**	**4.124,599**	**100%**	**2.505,119**	**61%**

LEGENDA

Negli importi indicati non sono compresi i fondi provenienti da Accordi di Programma con altri Enti.

IMPORTI FINANZIATI: gli importi complessivamente stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova alla data del 31.12.2005.

IMPORTI SOTTOSCRITTI AL 31.12.2005: gli importi relativi ad Atti Attuativi sottoscritti a tale data tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova.

IMPORTI IMPEGNATI AL 31.12.2005: gli importi impegnati a tale data con apposito Decreto del Presidente del Magistrato alle Acque registrato da parte della Sezione per il Veneto della Corte dei Conti.

IMPORTI SPESI AL 31.12.2005: gli importi prodotti a tale data.

NOTE

(*) Fondi in conto capitale.

Tabella n. 2 - Stato di attuazione degli Atti Attuativi sottoscritti tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova. Aggiornamento al 31 dicembre 2005 -

Importi in milioni di Euro

ATTO ATTUATIVO rep. n° (A)	DATA SOTTOSCRIZIONE (B)	LEGGE DI FINANZIAMENTO (C)	IMPORTO DELL' ATTO ATTUATIVO (D)	STATO DI AVANZAMENTO AL 31/12/2005 (***) IMPORTI SPESI (E)	% (E/D)	
6479 (*)	12-lug-85	798/84 - 910/86	139,380	139,380	100%	
6745 (*)	23-dic-87	910/86 - 67/88	98,824	98,108	99%	(****)
7025 (*)	15-dic-89	67/88	64,144	63,551	99%	(****)
7138 (*)	21-feb-91	67/88 - 360/91	41,317	40,995	99%	(****)
7191 (*)	04-ott-91	67/88	2,582	2,487	96%	(****)
7295 (*)	05-giu-92	67/88	30,740	30,347	99%	(****)
1568 (**)	21-nov-87	798/84	3,892	3,892	100%	
1685 (**)	20-apr-89	910/86	20,527	20,527	100%	
7322 (*)	03-dic-92	139/92	388,260	386,252	99%	
7395 (*)	23-nov-93	139/92	168,300	153,967	91%	
7601 (*)	20-mar-96	539/95	44,000	40,055	91%	
7637 (*)	29-ott-96	539/95	81,500	77,445	95%	
7649 (*)	18-dic-96	515/96	333,000	295,477	89%	
7695 (*)	28-lug-97	515/96	145,000	119,091	82%	
7725 (*)	23-dic-97	345/97	111,000	100,584	91%	
7760 (*)	14-lug-98	345/97	128,000	94,492	74%	
7818 (*)	01-dic-99	448/98	154,000	116,306	76%	
7844 (*)	24-feb-00	448/98	40,284	36,546	91%	
7867 (*)	03-nov-00	CIPE	50,096	8,858	18%	
7868 (*)	03-nov-00	448/98	67,139	40,654	61%	
7894 (*)	30-mar-01	488/99	115,000	60,158	52%	
7923 (*)	01-ago-01	488/99	93,000	67,333	72%	
7952 (*)	21-giu-02	388/00	60,000	56,803	95%	
7953 (*)	27-giu-02	448/01	39,000	8,543	22%	
7962 (*)	21-ott-02	388/00	94,000	66,778	71%	
7980 (*)	18-dic-02	448/01	63,000	23,832	38%	
8007 (*)	01-ott-03	448/01	123,000	37,744	31%	
8014 (*)	22-dic-03	448/01-166/02 CIPE	136,000	78,056	57%	
8015 (*)	22-dic-03	448/01-166/02 CIPE	314,000	152,394	49%	
8022 (*)	31-mar-04	FONDI EDISON	271,140	26,328	10%	
8062 (*)	23-mar-05	FONDI ENTI PRIVATI	66,375	8,577	13%	
8100 (*)	19-dic-05	166/02-350/03 CIPE	638,100	49,559	8%	
TOTALE			**4.124,599**	**2.505,119**	**61%**	

(*) Atti Attuativi sottoscritti tra il Ministero Lavori Pubblici (ora Infrastrutture e Trasporti) - Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova. Non sono comprese le attività finanziate da altri Enti nell'ambito di specifici "Accordi di programma".

(**) Atti Attuativi sottoscritti tra il Ministero Lavori Pubblici (ora Infrastrutture e Trasporti) - Genio Civile Opere Marittime e Consorzio Venezia Nuova.

(***) Sono riportati gli importi spesi ovvero realizzati al 31.12.2005. Non compreso l'avanzamento delle attività finanziate da altri Enti.

(****) Lo scostamento tra l'importo dell'Atto Attuativo e l'importo speso è dato dalle somme a disposizione (Atti Attuativi ultimati in attesa di collaudo finale).

Tabella n. 3 - Attuazione del Piano Generale degli Interventi da eseguire in concessione dal Consorzio Venezia Nuova. Aggiornamento al 31 dicembre 2005 -

importi in milioni di Euro

			fabbisogno totale	importi finanziati	importi sottoscritti	importi impegnati	importi realizzati e in corso di realizzazione	importi spesi
1	difesa dalle acque alte eccezionali: attività preliminari		195	195	195	195	195	195
2	difesa dalle acque alte eccezionali: realizzazione opere alle bocche e attività strettamente connesse	(*)	4.272	1.200	1.200	1.200	911	387
3	difesa locale dalle acque medio alte		911	911	911	911	862	684
4	ristrutturazione dei moli foranei		108	108	108	108	108	108
5	difesa dalle mareggiate		416	354	354	354	351	323
6	recupero morfologico	(**)	714	469	469	469	413	342
7	arresto del degrado dell'ecosistema lagunare		1.236	766	766	766	660	356
8	allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna		45	13	13	13	8	8
9	ausilii luminosi alla navigazione		21	15	15	15	15	15
10	apertura valli da pesca		4	4	4	4	4	4
11	servizio informativo	(**)	146	89	89	89	88	83
	TOTALE		**8.067**	**4.124**	**4.124**	**4.124**	**3.615**	**2.505**
	VALORI %				**100%** degli importi finanziati	**100%** degli importi sottoscritti	**88%** degli importi sottoscritti	**61%** degli importi sottoscritti

(*) Il fabbisogno indicato tiene conto di quanto definito con l'atto aggiuntivo rep. 8067 del 11 maggio 2005 alla convenzione generale rep. 7191/91, che introduce il criterio del "prezzo chiuso" per il completamento del "Sistema MOSE".

(**) Gli importi indicati sono al netto delle attività strettamente connesse alla realizzazione delle opere alle bocche di porto, già inserite al punto 2 nell'ambito del citato "prezzo chiuso".

Grafici

Composizione del fabbisogno totale (8.067 Mln €)

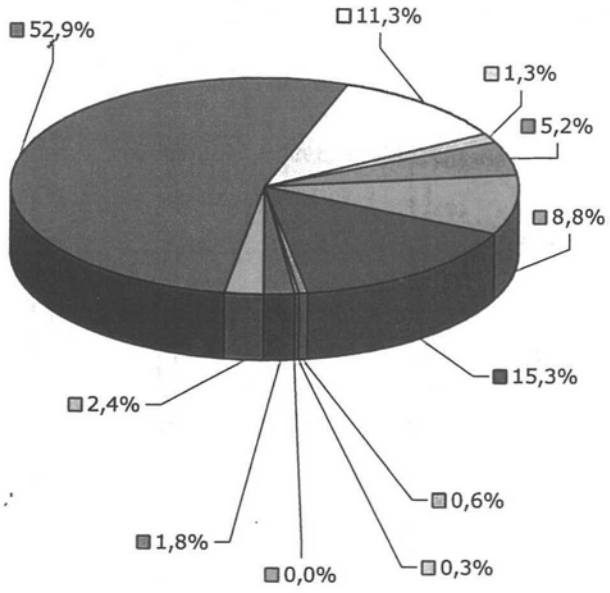

- difesa dalle acque alte eccezionali: attività preliminari: 195 Mln €
- difesa dalle acque alte eccezionali: realizzazione opere alle bocche e attività strettamente connesse: 4.272 Mln €
- difesa locale dalle acque medio alte: 911 Mln €
- ristrutturazione dei moli foranei: 108 Mln €
- difesa dalle mareggiate: 416 Mln €
- recupero morfologico: 714 Mln €
- arresto del degrado dell'ecosistema lagunare: 1.236 Mln €
- allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna: 45 Mln €
- ausilii luminosi alla navigazione: 21 Mln €
- apertura valli da pesca: 4 Mln €
- servizio informativo: 146 Mln €

Distribuzione degli importi sottoscritti (4.125 Mln €)

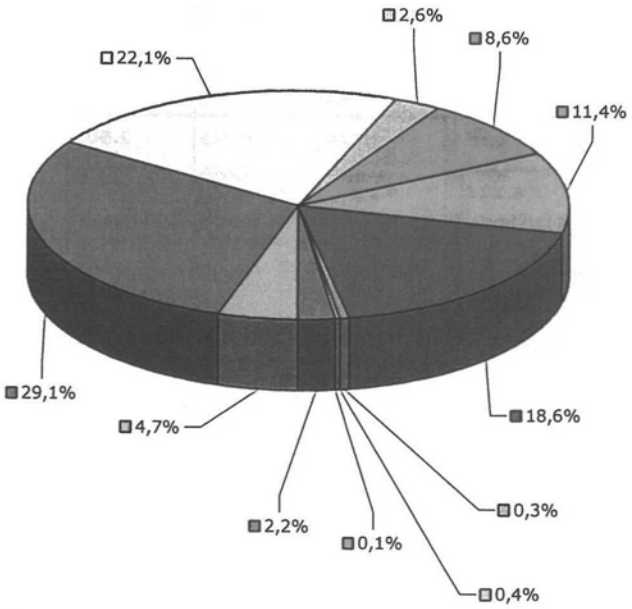

- difesa dalle acque alte eccezionali: attività preliminari: 195 Mln €
- difesa dalle acque alte eccezionali: realizzazione opere alle bocche e attività strettamente connesse: 1.200 Mln €
- difesa locale dalle acque medio alte: 911 Mln €
- ristrutturazione dei moli foranei: 108 Mln €
- difesa dalle mareggiate: 354 Mln €
- recupero morfologico: 469 Mln €
- arresto del degrado dell'ecosistema lagunare: 766 Mln €
- allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna: 13 Mln €
- ausilii luminosi alla navigazione: 15 Mln €
- apertura valli da pesca: 4 Mln €
- servizio informativo: 89 Mln €

Confronto fra importi sottoscritti (4.125 Mln €), importi realizzati e in corso di realizzazione (3.615 Mln €) e importi spesi (2.505 Mln €)

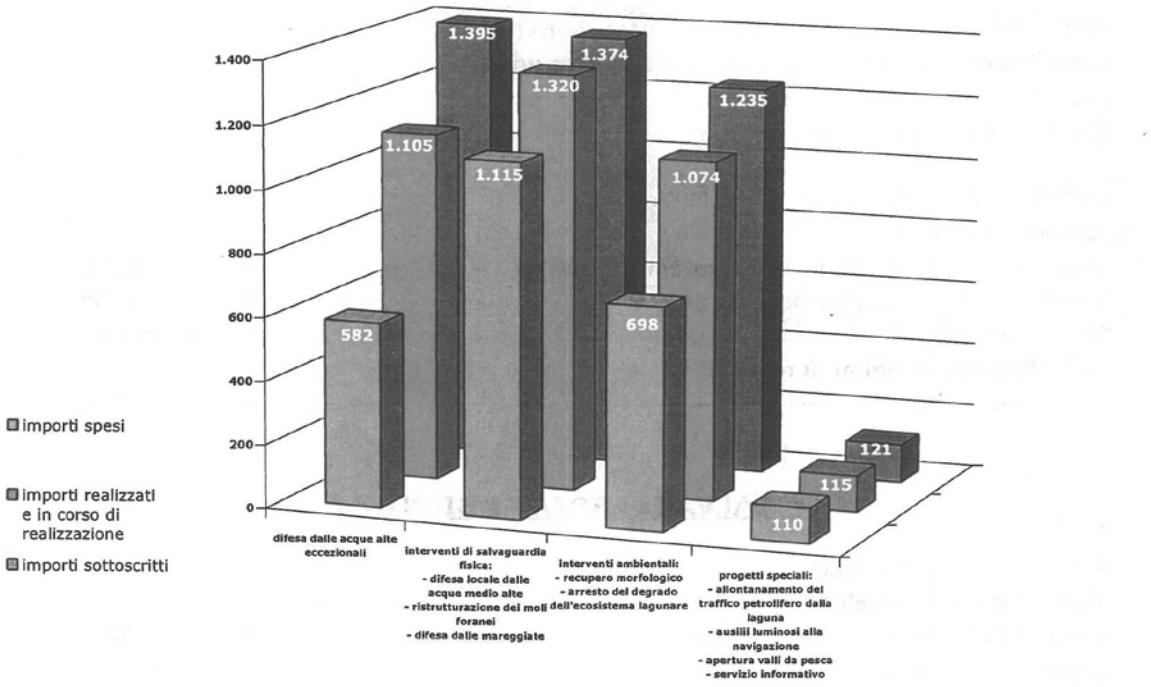

Tabella n. 4 - Le quantità realizzate e in corso di realizzazione. Aggiornamento al 31 dicembre 2005 –

SALVAGUARDIA FISICA

DIFESA DALLE ACQUE ALTE, INSULAE E MARGINAMENTI

Consolidamento, ristrutturazione e rialzo rive urbane e sponde lagunari

Sviluppo lavori	88 km
Superficie totale aree difese	1195 ettari

DIFESA DALLE MAREGGIATE

Rinforzo dei litorali

Sviluppo lavori di ricostruzione o ampliamento spiagge	45 km
Sviluppo dune ricostruite e naturalizzate	8 km
Sabbia impiegata	9,8 milioni di m^3

Ristrutturazione dei moli foranei

Sviluppo lavori	11 km

SALVAGUARDIA AMBIENTALE

RECUPERO MORFOLOGICO

Ricalibratura di canali

Sviluppo lavori	154 km
Sedimenti dragati	9 milioni di m^3

Ricostruzione di velme e barene

Sviluppo lavori	980 ettari
Sedimenti impiegati	10,8 milioni di m^3

Protezione di barene, velme e bassifondali

Sviluppo palificate o burghe a protezione del bordo delle barene	21 km
Sviluppo fascinate di sedimentazione	8 km
Aree di trapianto vegetazione alofila e fanerogame	n. 34

Recupero isole

Isole oggetto di intervento	n. 12

ARRESTO DEL DEGRADO

Messa in sicurezza delle ex discariche

Discariche oggetto di intervento	n. 5
Superficie totale aree messe in sicurezza	182 ettari

Messa in sicurezza di sponde dei canali industriali

Sviluppo lavori	32,5 km

Asportazione di sedimenti inquinati dai canali industriali

Sviluppo lavori	322.000 m^3

Copertura di fondali inquinati

Sviluppo lavori	12 ettari

Ripristino di aree umide di fitobiodepurazione

Aree di intervento	n. 2

Raccolta di macroalghe

Biomassa raccolta	221.000 m^3

3 *Lo stato di attuazione delle attività*

3.1 Studi e sperimentazioni

(Interventi di cui all'art. 3 lettera a) legge n. 798/84)

Obiettivo

Acquisire le conoscenze sul sistema fisico e sul sistema ambientale della laguna e sulle loro problematiche, al fine di poter disporre in un quadro unitario, di tutti gli elementi necessari alla fase di progettazione degli interventi.

Descrizione degli interventi

La grande rilevanza attribuita dal Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova all'attività di studio trova la sua origine nella complessità insita nella definizione di un insieme di interventi con forti contenuti innovativi e inquadrati in una concezione sistemica dell'ambiente lagunare.

Dall'inizio della sua attività ad oggi, il Consorzio Venezia Nuova ha portato a compimento un rilevante programma di studi, compiutamente definito con il Piano generale degli studi del 1988, successivamente aggiornato in base alle conoscenze via via acquisite, riguardante circa 250 attività, già sostanzialmente realizzate.

La caratteristica principale della realizzazione di questo piano di studi è l'interdisciplinarietà dell'approccio adottato, che consente per la prima volta di inquadrare in una visione unitaria le complesse interrelazioni tra l'ambiente fisico, l'ambiente naturale e l'economia del territorio lagunare.

Il Consorzio Venezia Nuova, per realizzare questo compito, si è dotato di un nucleo di coordinamento altamente qualificato composto da esperti, interni alla struttura e consulenti, che definisce e programma le diverse fasi di sviluppo del piano di attività e garantisce il controllo della qualità dei risultati raggiunti.

Gli studi e le sperimentazioni realizzati nell'ambito del progetto di salvaguardia di Venezia hanno prevalentemente un carattere applicato e una finalità operativa strettamente connessa alla progettazione.
Questi studi si differenziano notevolmente dall'attività condotta dagli enti, come il CNR o le Università, che hanno svolto e svolgono ricerche relative al territorio lagunare. Generalmente, infatti, l'obiettivo di tale attività di ricerca non è la formazione di una conoscenza di tipo interdisciplinare con finalità operative, come è nel caso del Consorzio Venezia Nuova, bensì lo sviluppo di linee settoriali di ricerca su specifici aspetti di interesse dei singoli ricercatori o delle strutture cui essi fanno riferimento.
In questo senso, i risultati delle ricerche di enti e istituzioni sono il fondamento su cui si basano gli studi promossi dal Consorzio per gli obiettivi della salvaguardia, i quali, invece, hanno principalmente lo scopo di fornire i necessari input all'attività di progettazione.

Lo sforzo compiuto con l'attuazione del Piano degli studi[2] non solo ha contribuito allo sviluppo della conoscenza dell'ecosistema veneziano, ma ha soprattutto consentito di mettere a punto un insieme di progetti ad alto contenuto innovativo al fine di affrontare compiutamente e in modo unitario tutte le grandi questioni della salvaguardia di Venezia.
Il Piano degli studi è stato concepito in maniera flessibile, per essere periodicamente aggiornato a seconda delle esigenze che si manifestano nello sviluppo dell'attività di sperimentazione e di progettazione.

2 La realizzazione del programma degli studi e delle sperimentazioni del Consorzio Venezia Nuova richiede il contributo di alcune Università, di centri di ricerca pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, dei maggiori laboratori in Italia e all'estero, di società di ingegneria, di studi professionali, oltre che dei principali esperti del settore.

Dal punto di vista del loro contenuto, gli studi possono essere classificati in:

<u>Studi propedeutici agli interventi di salvaguardia fisica</u>

Si tratta di *studi propedeutici alla progettazione* del sistema di interventi volti alla difesa fisica della laguna.

Riguardano, pertanto, le *opere di regolazione delle maree alle bocche di porto*, la *ristrutturazione dei moli* alle bocche di porto, il *rinforzo dei litorali*, le *difese locali dei centri abitati e delle "insulae"*.

Per questa tipologia di interventi, gli studi propedeutici sono già conclusi, trattandosi di interventi già tutti passati alla fase di progettazione esecutiva e realizzazione.
In questo modo, la realizzazione degli interventi, in relazione alla natura delle opere, è stata preceduta da approfondimenti storici con riferimento ai metodi costruttivi e ai materiali utilizzati ed è stata supportata da analisi, ricerche, sperimentazioni con modelli matematici e fisici con le quali sono stati valutati i complessi processi di interazione tra gli elementi fisici e la struttura delle opere, per l'ottimizzazione delle loro caratteristiche e per il loro dimensionamento.
Il complesso degli studi svolti per la progettazione preliminare, di massima e definitiva si può suddividere nelle tipologie di seguito elencate:

a) *campagne di indagini geognostiche, di rilievi batimetrici, correntometrici e ondametrici* svolte in laguna, alle bocche di porto, lungo i litorali e in prossimità dei moli foranei;

b) studi finalizzati alla conoscenza dell'idrodinamica e della propagazione del moto ondoso in laguna mediante *modelli matematici* della laguna di Venezia e delle tre bocche di Lido, Malamocco e Chioggia. In tale contesto è stato avviato lo sviluppo di un sistema di previsione dell'acqua alta e delle condizioni meteomarine, indispensabile alla gestione delle opere mobili. I modelli matematici nelle diverse tipologie oggi disponibili, con l'ulteriore fondamento che potrà ottenersi con nuove osservazioni e misure, potranno anche essere utilizzati per la futura gestione del sistema lagunare nei vari aspetti e implicazioni che presenta;

c) *modelli fisici* presso il Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (Padova), che proprio a seguito dell'attività svolta per la salvaguardia di Venezia, oggi dispone di una attrezzatura che sicuramente lo qualifica come il più importante centro di ricerca italiano in questo campo.

Nel corso dello sviluppo dell'attività, sia per la modellistica matematica che per quella fisica, sono stati utilizzati, oltre al Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (Padova), anche altri centri sperimentali specializzati in Italia e all'estero quali: Estramed (Pomezia - Roma), Danish Hydraulics Laboratory (Danimarca), Delft Hydraulics Institute (Olanda) e Hydraulics Research di Wallingford (Inghilterra), Danish Maritime Institute

L'insieme di queste attività ha consentito di acquisire un bagaglio di conoscenze non immaginabile fino a pochi anni fa per gli approfondimenti raggiunti, ma soprattutto per la coerenza con cui sono stati affrontati. Ciò ha consentito anche di mettere a punto e di calibrare sofisticati modelli matematici con i quali prevedere gli effetti prodotti con gli interventi.

Studi propedeutici agli interventi di salvaguardia ambientale

L'importanza che hanno assunto, nel quadro dell'azione di salvaguardia, gli interventi di riequilibrio ambientale trova una precisa corrispondenza nel piano degli studi sviluppato dal Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova, nell'ambito del quale un elevato numero di studi riguarda direttamente l'analisi dei processi inquinanti e delle condizioni dell'ecosistema.
E' stato, pertanto, possibile definire un programma generale di interventi di risanamento ambientale che non ha precedenti in Italia e che, per la sua qualità e dimensione, si colloca tra le esperienze più avanzate a livello internazionale.
Gli studi di carattere strettamente ambientale possono essere distinti in *studi di identificazione delle problematiche generali* e in *studi su aspetti specifici* dell'ecosistema, sia per quanto riguarda la morfologia lagunare, sia per quanto riguarda il processo di degrado ambientale. I primi costituiscono degli studi di inquadramento delle conoscenze e di ridefinizione in termini sistemici dell'approccio all'intervento di risanamento. Questi studi costituiscono il punto di arrivo di una serie molto ampia di analisi e di campagne di rilievi delle condizioni dell'ecosistema lagunare che riguardano la tendenza evolutiva della morfologia della laguna e le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche delle acque e dei sedimenti; i secondi riguardano, invece, aree della laguna o elementi settoriali dell'ambiente sui quali è necessario, a fini progettuali, condurre degli approfondimenti. Rientrano in questo ambito, ad esempio, lo studio degli effetti della navigazione interna sulla morfologia lagunare o le prove condotte presso il centro Sperimentale di

Voltabarozzo per verificare le strutture da collocare lungo le rive e i bordi delle barene, idonee ad assorbire il moto ondoso prodotto dai natanti e dal vento.
Maggiori dettagli sullo stato di attuazione sono riportati nelle singole schede per obiettivo.

3.2 Difesa dalle acque alte eccezionali
(interventi di cui all'art. 3 lettera a) legge n. 798/84)

Obiettivo

Attuare la difesa della laguna e dei centri abitati dalle alte maree eccezionali - ovvero quando il livello della marea in laguna supera la quota delle difese dei centri abitati -, fino a raggiungere i massimi livelli prevedibili in futuro, mediante la realizzazione di opere che separano, momentaneamente, la laguna dal mare.

Descrizione degli interventi

Il fenomeno delle acque alte a Venezia ha registrato, negli ultimi 50 anni, una rilevante evoluzione negativa, sia sotto il profilo della frequenza, sia dal punto di vista della sua durata e intensità.
La causa è da tempo nota: si tratta, principalmente, dell'effetto congiunto tra l'abbassamento del livello del suolo –23 cm (in parte dovuto a processi naturali ma soprattutto, fino agli anni '70, all'estrazione di acque per uso industriale dalle falde sotterranee), e l'innalzamento del livello medio del mare registrato in questo secolo.
A questi fenomeni se ne sono aggiunti altri che hanno contribuito a peggiorare le condizioni generali della morfologia lagunare: le alterazioni ambientali provocate dalle opere realizzate a fini industriali, come lo scavo del c. d. "canale dei petroli" e i vasti imbonimenti delle aree umide; il diffondersi di attività distruttive dell'ambiente, come la circolazione dei natanti a motore e la pesca secondo modalità non consentite.

La conseguenza di tutto ciò è stato l'aumento del rischio cui sono esposti Venezia e gli altri insediamenti storici del bacino lagunare di fronte a eventi mareali eccezionali e alla continua azione disgregatrice delle alte maree, che si verificano con crescente frequenza.

E' inoltre prevedibile che la situazione possa diventare ancora più critica in futuro per il sovrapporsi degli effetti del riscaldamento dell'atmosfera.

La complessità delle cause che nel tempo hanno messo a rischio i centri abitati lagunari ha indirizzato lo studio e la scelta della soluzione in grado di ricreare adeguate condizioni di sicurezza.
Si è previsto di attuare la difesa attraverso un piano organico di interventi che comprende le difese locali dagli allagamenti (vedi scheda specifica), gli interventi morfologici che, pur se in modo molto limitato, attenuano i livelli del mare in laguna (vedi scheda specifica) e le opere per isolare momentaneamente la laguna dal mare quando il livello di marea in laguna supera comunque la quota delle difese locali, fino a raggiungere i massimi livelli prevedibili in futuro.

Gli interventi previsti per la protezione di Venezia e della sua laguna dagli effetti delle alte maree eccezionali si incentrano sul sistema di opere mobili alle bocche di porto ("*Sistema MOSE*"), in grado di separare la laguna dal mare per il tempo necessario a evitare gli allagamenti degli abitati lagunari.

Il sistema delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto rappresenta nel campo dell'ingegneria un progetto originale e complesso. Il progetto di massima, presentato nel 1992, fu elaborato nel rispetto dei criteri indicati dal voto n. 209, espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 1982, secondo il quale le opere non devono alterare lo scambio idrico tra mare e laguna, per evitare effetti ambientali negativi, non devono costituire un ostacolo alla navigazione e, quindi, una penalizzazione delle importanti attività economiche ad essa collegate, non devono, infine, costituire un'alterazione del paesaggio.
Il progetto, formulato sulla base degli indirizzi e dei pareri originariamente espressi dal Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84, tiene conto degli elementi, delle prescrizioni e delle indicazioni emerse in sede di approvazione del progetto di massima del 1992 e successivamente; di anni di confronti, approfondimenti e studi; dei recenti pareri e dei nuovi criteri espressi dalle Istituzioni competenti sul progetto definitivo.

Le opere progettate consistono, per ciascuna bocca di porto, nell'installazione di *dispositivi mobili* che si sollevano dalla posizione di riposo negli alloggiamenti sul fondale del canale di bocca che si attivano quando il livello di marea supera i 110 cm rispetto al livello misurato al mareografo di Punta della Salute, e nella realizzazione di opere fisse, cosiddette *opere complementari*,

(in ottemperanza a quanto richiesto dalla deliberazione del consiglio dei Ministri del 15 marzo 2001) atte ad aumentare gli attriti nei canali di bocca al fine di smorzare la vivacità delle correnti di marea, attenuando i livelli di quelle più frequenti.

I dispositivi mobili, collocati nei canali di bocca, rappresentano il cuore del sistema e sono costituiti da paratoie a ventola a spinta di galleggiamento, a scomparsa, ciascuna delle quali è costituita da un cassone in acciaio a sezione rettangolare, vuoto all'interno. Le paratoie, quando si trovano in posizione di riposo, sono trattenute sul fondo dal proprio peso e da quello dell'acqua che contengono e sono incernierate lungo un lato sulla struttura di fondazione. In caso di attivazione, le paratoie vengono svuotate dell'acqua mediante immissione di aria compressa e si sollevano per effetto della spinta di galleggiamento, formando una barriera contro la marea.
Il numero totale delle paratoie è 78 per le quattro schiere (Lido-Treporti 21, Lido S. Nicolò 20, Malamocco 19 e Chioggia 18). Lo spessore varia tra i 3,6 m (schiera di Lido-Treporti) e i 5 m (schiera di Chioggia), la lunghezza varia tra i 18,5 m (schiera di Lido-Treporti) e i 29,6 m (schiera di Malamocco) e la larghezza è di 20 m per tutte le schiere. Il tempo medio di chiusura è di 4 o 5 ore, compresi i tempi di manovra per l'apertura e la chiusura delle paratoie. Il dislivello massimo sostenuto tra mare e laguna è di 2 m.

Le "opere complementari" consistono nella realizzazione di una scogliera all'esterno di ciascuna bocca di porto, realizzata con pietrame e accropodi[3], della lunghezza di 1000 m per la bocca di Lido, 1280 m per la bocca di Malamocco, 520 m per la bocca di Chioggia, e nel rialzo del fondale alla bocca di Malamocco, da –16 m a –14 m, per diminuire il volume di acqua scambiato tra mare e laguna.

Per la bocca di Malamocco, inoltre, è prevista la realizzazione di una conca di navigazione per le grandi navi, in modo da garantire l'operatività del porto anche con le paratoie in funzione. La conca avrà una lunghezza utile di 370 m e una larghezza di 48 m.

3 Elementi artificiali in calcestruzzo che verranno utilizzati per ricoprire le parti della scogliera più esposte al moto ondoso. Si tratta di elementi largamente utilizzati nella costruzioni marine, che per la loro particolare forma "a quattro teste" si incastrano tra loro e assicurano una forte resistenza alla forza disgregatrice delle onde.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2005

Attività finanziate

Fino al 31.12.2003, i finanziamenti resi via via disponibili per le opere alle bocche di porto sono stati impegnati e spesi per: la *progettazione preliminare di massima*; per la successiva *progettazione di massima*; per la realizzazione del prototipo in scala reale di una paratoia (*Modulo Sperimentale Elettromeccanico – MOSE*) e per l'effettuazione di prove sul campo, dal 1988 al 1992; per lo svolgimento dello *studio di impatto ambientale* (S.I.A.) delle opere stesse; per le *attività di approfondimento del progetto di massima* richieste dal Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nella seduta dell'8 marzo 1999 e dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 15 marzo 2001; per la *progettazione definitiva* delle opere alle bocche di porto secondo quanto deliberato dal Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 nella seduta del 6 dicembre 2001; per una complessa e articolata serie di *studi e di sperimentazioni* propedeutici alle suddette progettazioni e attività; infine, per *avviare la progettazione esecutiva*, secondo quanto deliberato dal Comitato stesso nella seduta del 3 aprile 2003.

Si ritiene opportuno ripercorrere, in *Appendice*, i principali momenti approvativi del progetto delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto.

Per quanto riguarda la *progettazione esecutiva* del "Sistema MOSE", si ricorda che, nel 2003, il Magistrato alle Acque di Venezia, a seguito della deliberazione del Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 del 3 aprile 2003, ha dato incarico al Consorzio Venezia Nuova di avviare la progettazione esecutiva per fasi del "Sistema MOSE".
Già nel corso del 2003, quindi, la progettazione esecutiva è stata avviata e, per molte fasi, è stata portata ad uno sviluppo avanzato, in particolare per le fasi i cui conseguenti lavori erano previsti da programma con avvio nel 2004 e nel 2005.

Al 31 dicembre 2005, la progettazione esecutiva delle opere finanziate nell'ambito della 1^ assegnazione CIPE è completata.
Inoltre, è in corso, e già sostanzialmente completata o in avanzata fase di sviluppo, la progettazione esecutiva relativa a quelle opere che trovano finanziamento nell'ambito della 2^ assegnazione CIPE: l'esame da parte del Comitato Tecnico del Magistrato alle

Acque di Venezia di tali fasi progettuali è già iniziato e prosegue con la presentazione di ulteriori fasi e stralci esecutivi, per l'immediato avvio dei lavori relativi.

Nel corso del 2004, si sono potute avviare le *prime opere alle bocche di porto*, una volta completato l'iter approvativo dei singoli stralci del progetto esecutivo.

Nel corso del 2005, sono proseguiti a pieno ritmo i lavori, contemporaneamente nelle bocche di porto, per la costruzione delle opere di regolazione delle maree.

La *costruzione del sistema di difesa dalle acque alte* prevede tre fasi di lavoro: la prima fase, già in avanzato stato di realizzazione, consiste nella costruzione delle opere complementari e nell'esecuzione di una serie di interventi propedeutici (campi prove per il consolidamento dei fondali, indagini subacquee per rilevare eventuali presenze archeologiche, bonifiche da ordigni bellici, ecc.). La seconda fase dei lavori, in corso, comporta la costruzione delle opere di spalla, oltre alle opere connesse: i porti rifugio e le conche di navigazione per i pescherecci, le imbarcazioni da diporto e i mezzi di soccorso alle bocche di porto di Lido e Chioggia e la conca di navigazione per le grandi navi alla bocca di porto di Malamocco. La terza e ultima fase dei lavori comporta la realizzazione delle schiere di paratoie vere e proprie, ovvero la costruzione dei cassoni di alloggiamento delle paratoie e delle paratoie stesse, nonché la loro installazione.

Nella **bocca di Lido** si stanno realizzando i seguenti elementi strutturali:

1. Isola artificiale: "spalla" ovest e "spalla" nord: si ricorda che, data l'ampiezza della bocca di porto e la presenza di due canali con profondità diverse, al Lido sono previste due schiere di paratoie: una sul canale di Treporti e una sul canale di San Nicolò, separate da un'isola artificiale che, oltre a costituire la "spalla" ovest della barriera di Treporti e la "spalla" nord della barriera di S. Nicolò, ospiterà anche gli edifici di controllo e gli impianti per il funzionamento delle opere.
Relativamente all'isola artificiale, nel 2005, sono state in corso di realizzazione le seguenti fasi/stralci dell'opera:

- *"Lido – Isola tra S. Nicolò e Treporti – prima fase A (OP/306)"*: lavori in corso, avviati a giugno del 2004. I lavori riguardano

sostanzialmente la predisposizione delle opere di scogliera che delimitano il nucleo centrale dell'isola.

- *"Lido – Isola tra S. Nicolò e Treporti - prima fase B (OP/353)":* lavori in corso, avviati a novembre 2005, si concluderanno nel 2006. I lavori consistono nella realizzazione del canale di navigazione a tergo dell'isola, lato laguna, al fine di consentire il collegamento tra S. Nicolò e Treporti, e nel contemporaneo riempimento dell'isola.
- *"Lido – Isola tra S. Nicolò e Treporti – seconda fase: Spalla lato Ovest della barriera di Treporti - 1° stralcio (OP/365-1)"*: lavori avviati a dicembre 2005. I lavori consistono nella realizzazione delle opere di sostegno, lungo l'isola artificiale lato canale di Treporti, con funzioni di contenimento del terrapieno dell'isola, nel tratto che sarà interessato dal cassone di spalla, lato ovest, della barriera di Treporti.

2. Porto rifugio a Lido - Treporti: il porto rifugio di Treporti consentirà il ricovero e il transito, attraverso la conca di navigazione, delle imbarcazioni da diporto e dei mezzi di soccorso durante l'esercizio delle opere. Tale struttura comprende due bacini, uno lato mare, di più ampie dimensioni, e uno lato laguna, situati nella zona di Punta Sabbioni, collegati da una conca di navigazione, per consentire il transito delle imbarcazioni minori dalla bocca di porto di Lido verso Treporti, durante la chiusura dei varchi di Treporti e di S. Nicolò con le barriere mobili. Durante la fase di costruzione del porto rifugio, la parte lato mare verrà utilizzata provvisoriamente (tura) per la prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento della schiera di paratoie da installarsi nel canale di Treporti.

Relativamente al porto rifugio, nel 2005, sono state in corso di realizzazione le seguenti fasi/stralci dell'opera:

- *"Lido Treporti – Tura e porto rifugio, prima fase (OP/299)",* i lavori in corso, avviati nel mese di aprile del 2004, prevedono: il rinforzo della sponda tra il molo nord ed il porto rifugio; la formazione di due terrapieni protetti da due dighe in massi naturali; le strutture provvisorie per l'utilizzo dell'area del futuro porto rifugio quale tura per la prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento delle paratoie di Treporti; la prima fase del bacino rifugio nord; la formazione di due riempimenti nell'area della futura conca di navigazione.
- *"Lido Treporti – Porto rifugio, seconda fase – 1° stralcio (OP/360 – 1)",* lavori avviati a dicembre 2005; vengono realizzati i dragaggi all'interno del bacino nord (lato laguna) del

porto rifugio e la protezione della sponda lato terra mediante la realizzazione di una scogliera.

3. "Spalla" sud della barriera a Lido – S. Nicolò: la "spalla" sud della barriera che verrà realizzata a Lido – S. Nicolò interessa un tratto del molo sud della bocca di Lido. I principali edifici e dispositivi troveranno alloggio nella "spalla" nord situata sull'isola artificiale, tuttavia anche qui sono necessari importanti lavori di rinforzo e consolidamento e di creazione di "cassoni andatori" e di terrapieni in corrispondenza e a ridosso della zona ove la schiera di paratoie si congiungerà con il litorale. La soluzione messa a punto nel progetto per la spalla sud tiene conto della configurazione definita dallo IUAV nell'ambito dello "Studio di inserimento architettonico delle opere mobili alle bocche lagunari" e prevede la realizzazione di una piccola darsena per l'attracco delle imbarcazioni.

Relativamente alla "spalla" sud, nel 2005, sono state in corso di esecuzione le seguenti fasi/stralci dell'opera:

- *"Lido S. Nicolò – Spalla sud: rinforzo molo sud esistente(OP/301)"*, lavori avviati nel mese di aprile del 2004. E' in corso la realizzazione di una nuova opera in scogliera, parallela a quella esistente, e il riempimento dello spazio intermedio con materiale proveniente da dragaggi. Le opere interessano la parte iniziale del molo per circa 1300 metri.

4. Protezione del fondale in prossimità della barriera di Lido – S. Nicolò: gli interventi consistono nella realizzazione di una protezione in materiale lapideo da predisporre, sia lato mare che lato laguna, sul fondale del canale di San Nicolò in prossimità dell'area dove verrà installata la schiera di paratoie, al fine di evitare fenomeni di erosione in occasione delle manovre delle paratoie.

Nel 2005, sono stati in corso le seguenti fasi/stralci dell'opera:

- *"Lido S. Nicolò – Barriera: protezione del fondale – 1^ fase(OP/312)"*, lavori avviati nel mese di maggio 2005. Si tratta delle protezioni dei fondali nelle aree non immediatamente adiacenti alla zona ove verranno ubicati i cassoni di alloggiamento. Vengono anche realizzati dragaggi per raccordare il livello di progetto con quello attuale.

5. Realizzazione di aree di produzione funzionali alla costruzione delle opere a Lido – S. Nicolò: si tratta di realizzare le strutture da utilizzarsi quale base logistica operativa

delle attività di cantiere, nonché per lo stoccaggio dei materiali e l'accosto dei natanti da lavoro.
Nel 2005, è stata in corso:

- *"Lido - S. Nicolò: aree di produzione: realizzazione banchina accosto natanti (OP/354-1)":* lavori avviati a settembre 2005. Vengono realizzati una banchina per lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali e le opere di cantiere connesse.

Nella **bocca di Malamocco** si stanno realizzando i seguenti elementi strutturali:

1. Diga foranea: la diga foranea di fronte alla bocca di Malamocco svolge una duplice funzione: contribuire ad aumentare l'effetto dissipativo della marea entrante, come richiesto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15.03.2001 e dalla deliberazione del Comitato ex art. 4 legge 798/1984 nella seduta del 6.12.2001; proteggere la conca di navigazione e il relativo canale di accesso dal moto ondoso. I lavori, in corso dal 2003, si completeranno nel 2006.

2. Conca di navigazione per grandi navi: la conca di navigazione alla bocca di porto di Malamocco è prevista, come richiesto dall'Autorità Portuale di Venezia, per consentire il passaggio delle grandi navi durante l'operatività del sistema di difesa dalle acque alte. La conca è predisposta per accogliere, sia le grandi navi, che i rimorchiatori di appoggio e consente il transito a imbarcazioni con lunghezza fino a 280 metri, larghezza massima di 39 metri e pescaggio fino a 12 metri.
L'opera si presenta costituita dai seguenti componenti principali:

- camera della conca;
- porte e relativo sistema di movimentazione;
- strutture di alloggiamento e soglie di scorrimento delle porte;
- strutture guida alle imboccature;
- sistemi di alimentazione, manovra e controllo delle porte e relativi locali tecnici e cabina di controllo;
- arredi marini, impianti ausiliari e di servizio;
- opere di sostegno del territorio lungo il canale di accesso lato laguna.

Nel 2005 sono state in corso di realizzazione le seguenti fasi/stralci dell'opera:

- *"Malamocco – Conca di navigazione: opere civili della camera della conca (OP/300)"*, lavori avviati nel mese di aprile del 2004. La realizzazione della conca è iniziata con la costruzione

della "camera", che ne rappresenta l'elemento strutturale principale attraverso il quale transitano, appunto, le navi. La camera ha dimensioni interne di 380 metri x 50 metri ed è delimitata da pareti longitudinali laterali chiuse alle estremità da porte in acciaio.

- *"Malamocco – Opere di protezione della sponda del territorio lato Forte S. Pietro, prima fase (OP/316)"*, lavori avviati a settembre del 2004. Gli interventi riguardano la realizzazione di opere di sostegno del terreno lungo il canale di accesso alla conca, lato laguna, e, in particolare, di una protezione in scogliera al piede del murazzo storico e del muro del Forte di S. Pietro, sull'isola di Pellestrina.
- *"Malamocco – Opere di protezione della sponda del territorio lato Forte S. Pietro, seconda fase (OP/326)"*. I lavori, strettamente connessi con quelli della prima fase, sono stati avviati, parzialmente, ad agosto 2005. La consegna parziale è relativa alle attività di esecuzione dei micropali in corrispondenza dello sperone del Forte San Pietro e il restauro statico-architettonico del muro storico. Per l'avvio completo dei lavori si dovrà attendere la risoluzione di alcune interferenze con sottoservizi situati nella bocca di Malamocco. E' in corso il dragaggio del canale di accesso alla conca.
- *"Malamocco – Conca di navigazione: opere civili per l'alloggiamento delle porte e delle strutture guida (OP/355-1)"*, lavori avviati nel mese di ottobre 2005. I lavori consistono nella realizzazione delle strutture delle soglie e di alloggiamento delle porte della conca, quando aperte, lato mare e lato laguna.

3. Realizzazione di aree di produzione funzionali alla costruzione delle opere a Malamocco: si tratta di realizzare le strutture da utilizzarsi quale base logistica-operativa delle attività di cantiere, nonché per lo stoccaggio dei materiali e l'accosto dei natanti da lavoro.

Nel 2005, sono stati in corso di esecuzione i lavori relativi a:

- *"Malamocco – Aree di produzione, primo stralcio: piarda di selezione dei materiali (OP/356-1)"*; i lavori di costruzione di un piazzale provvisionale attrezzato, alla radice del molo nord, per la selezione e la movimentazione del materiale, avviati in novembre 2005, si concluderanno nel 2006.
- *"Malamocco – Aree di produzione, secondo stralcio: Terminal di Malamocco (OP/356-2)"*, lavori avviati a dicembre del 2005. Viene realizzata una banchina di attracco, di scarico e di

stoccaggio temporaneo, in corrispondenza del molo sud della bocca, lato mare.

Nella **bocca di Chioggia** si stanno realizzando i seguenti elementi strutturali:

1. Diga foranea: la diga foranea di fronte alla bocca di Chioggia contribuisce ad aumentare l'effetto dissipativo della marea entrante, conformemente a quanto richiesto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15.03.2001 e dalla deliberazione del Comitato ex art. 4 legge 798/1984 nella seduta del 6.12.2001. I lavori, in corso dal 2003, si completeranno nel 2006.

2. Porto rifugio: Il porto rifugio, situato sulla sponda nord della bocca di porto, è stato previsto per consentire il ricovero e il transito, attraverso due conche di navigazione affiancate, dei pescherecci, delle imbarcazioni da diporto e dei mezzi di soccorso durante la temporanea chiusura della bocca di porto in situazione di acqua alta. Il porto rifugio è diviso dalle conche di navigazione in due bacini, uno lato mare e uno lato laguna. Il bacino rifugio lato mare è, a sua volta, suddiviso in un avamporto ed in una zona più ridossata, il vero e proprio porto rifugio, destinato all'ormeggio delle imbarcazioni in attesa di transito attraverso le conche di navigazione. Il bacino lato mare verrà provvisoriamente utilizzato come "tura" per la prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento della barriera di Chioggia.
Nel 2005, sono state in corso di realizzazione le seguenti fasi/stralci dell'opera:

- *"Chioggia – Porto Rifugio: scogliera sud del porto rifugio – 1^ fase (OP/298)"*. Sono in corso i lavori, avviati ad aprile del 2004, per la realizzazione della scogliera che delimiterà, lungo il canale di bocca, il bacino lato mare, per lo sviluppo di circa 260 metri.
- *"Chioggia – Porto Rifugio: bacino lato laguna (OP/334)"*, lavori avviati a ottobre 2005; vengono realizzate le opere che delimitano il bacino lato laguna del porto rifugio, sia verso il canale di bocca che verso il territorio di Caroman, nonché i riempimenti dei terrapieni necessari a raccordare l'opera con le altre strutture. Viene realizzato anche il dragaggio del bacino interno.
- *"Chioggia – Porto rifugio: bacino lato mare/tura (OP/357-1)"*, lavori avviati a dicembre 2005. Il progetto riguarda, sia la realizzazione del bacino lato mare del porto rifugio, sia la sua

configurazione e predisposizione come "tura" per la prefabbricazione dei manufatti in calcestruzzo di alloggiamento della barriera di Chioggia.

3. Conche di navigazione per pescherecci: nel porto rifugio da realizzare nella bocca di Chioggia sono previste due conche di navigazione affiancate, per piccole imbarcazioni e pescherecci, aventi lunghezza utile di 134 m, larghezza di 16 m e profondità di 5,00 m s.l.m.m.. La lunghezza è stata definita in modo tale da permettere il transito di un numero di pescherecci pari al valore di punta dei rientri nella situazione attuale, per garantire, cioè, il passaggio di circa 100 pescherecci all'ora, come richiesto dal Comune di Chioggia. La larghezza di 16 m permette di affiancare, all'interno della conca, un'imbarcazione da 26 x 6,5 m a due da 15 x 4 m.
Nel 2005, sono state in corso di realizzazione le seguenti fasi/stralci dell'opera:

- *"Chioggia – Conche: opere civili (OP/303)".* Gli interventi, avviati nel mese di maggio del 2004, riguardano la costruzione delle "camere", ovvero degli elementi strutturali principali delle conche, quelli attraverso i quali transitano le imbarcazioni. Le camere hanno dimensioni interne nette di 130 x 16 metri e sono delimitate da pareti longitudinali laterali chiuse alle estremità da porte.

4. "Spalla" nord della barriera di Chioggia : la "spalla" nord della barriera della bocca di Chioggia dovrà raccordarsi con le strutture di nuova costruzione, lungo il canale di bocca lato Caroman, relative al porto rifugio, nel tratto in cui verranno realizzate le due conche di navigazione parallele.
Nel 2005, è stato in corso il seguente stralcio dell'opera:

- *"Chioggia – Spalla lato Nord", (OP/352-1),* i lavori, avviati a ottobre 2005, consistono nella realizzazione di banchine e strutture di raccordo fra la zona che ospiterà il cassone di "spalla" della barriera e i terrapieni in fase di costruzione per le conche di navigazione.

5. Protezione del fondale in prossimità della barriera di Chioggia: gli interventi consistono nella realizzazione di una protezione in materiale lapideo da predisporre, sia lato mare che lato laguna, sul fondale del canale di bocca in prossimità della zona dove verrà installata la schiera di paratoie, al fine di evitare fenomeni di erosione in occasione delle manovre delle paratoie.

Nel 2005, è stato avviato il seguente stralcio dell'opera:

- *"Chioggia – Protezione del fondale", (OP/358-1)*, lavori avviati a dicembre 2005. Vengono realizzate le protezioni dei fondali nelle aree non immediatamente adiacenti alla zona ove verranno ubicati i cassoni di alloggiamento. Vengono anche realizzati dei dragaggi per raccordare il livello di progetto con quello attuale.

E' necessario segnalare, inoltre, che nel corso del 2005, sono stati completati gli studi condotti dal Consorzio Venezia Nuova, per conto del Magistrato alle Acque, relativi alle richieste di approfondimento espresse dalle Amministrazioni Comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti in sede di Comitato ex art. 4 legge 798/84 nella seduta del 3 aprile 2003.
I risultati delle elaborazioni sono stati presentati dal Presidente del Magistrato alle Acque al Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nel corso della seduta del 28 settembre 2005. Tali risultanze sono ora oggetto di verifica da parte dell'*Ufficio di Piano* ex D.P.C.M. 13 febbraio 2004, come richiesto dal Comitato stesso.

Si segnala, infine, lo studio "*Sperimentazione in scala reale di un restringimento temporaneo del canale della bocca di Malamocco: studio degli effetti prodotti e Studio di Impatto Ambientale*". Lo studio permetterà di acquisire gli elementi necessari per poi realizzare un restringimento sperimentale del canale alla bocca di Malamocco, di cui alla deliberazione del 3 aprile 2003 del Comitato ex art. 4 Legge 798/84, la cui opportunità di esecuzione è stata ribadita dal Comitato stesso nella seduta del 4 novembre 2004, sulla base del progetto presentato dal Consorzio Venezia Nuova. Lo studio è stato avviato ad aprile del 2005 ed è attualmente in corso.

Attività da finanziare

Al 31 dicembre 2005 rimane da finanziare il completamento dei lavori alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea, secondo il piano di realizzazione e di finanziamento definiti nell'ambito dell'atto aggiuntivo rep. n. 8067/2005 alla Convenzione Generale che introduce il "prezzo chiuso", nonché alcune fasi di ulteriore approfondimento di aspetti costruttivi e operativi specifici della progettazione e la prima fase di avvio sperimentale del "Sistema MOSE".

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

	Fabbisogno Totale	Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova	Fabbisogno residuo da finanziare
Attività preliminari già concluse prima dell'avvio dell'esecutivo (a misura)	194,986	194,986	-
Attività sperimentali e indagini propedeutiche alla costruzione delle opere alle bocche di porto (a corpo da prezzo chiuso)	37,850	10,510	27,340
Progettazione esecutiva (parte) e realizzazione opere alle bocche di porto (a corpo da prezzo chiuso)	3.331,169	526,503	2.804,666
Progettazione esecutiva (parte) e realizzazione opere complementari (a misura)	111,729	111,729	-
Prime fasi di realizzazione delle opere alle bocche di porto (I^ Delibera CIPE - misura)	420,000	420,000	-
Interventi morfologici e altre attività strettamente connesse alle opere alle bocche di porto (a misura da prezzo chiuso)	177,247	52,607	124,640
Interventi morfologici e altre attività strettamente connesse alle opere alle bocche di porto (I^ Delibera CIPE - a misura)	30,000	30,000	-
Altre attività connesse (Ulteriori Indagini, Espropri, Interferenze, Security e Perizie del Servizio Informativo) (a misura da prezzo chiuso)	163,631	48,480	115,151
TOTALE	**4.466,612**	**1.394,815**	**3.071,797**

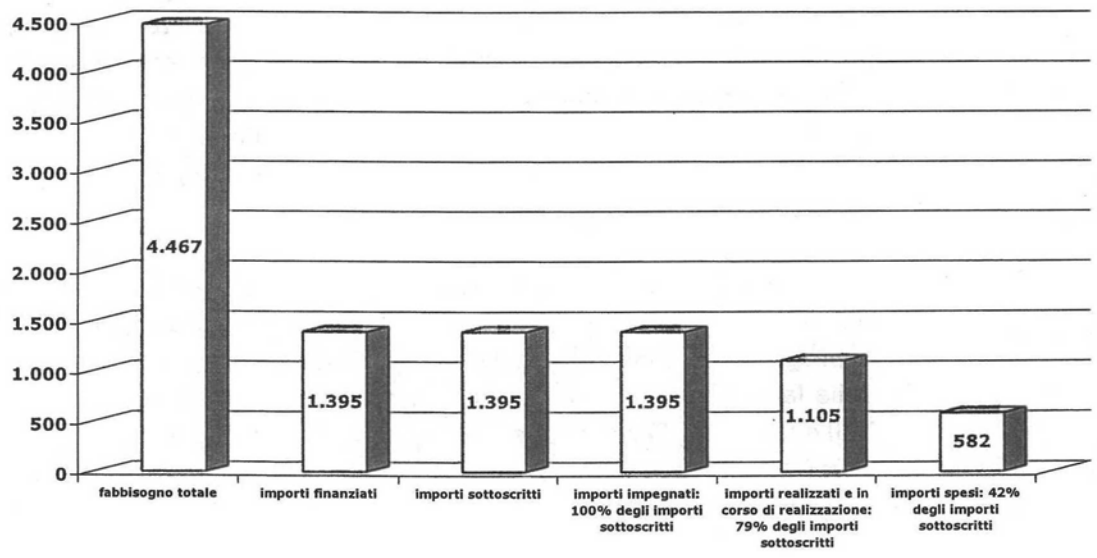

3.3 Difesa dalle acque medio-alte

(interventi di cui all'art. 3 lettera a), c) legge n. 798/84)

Obiettivo

Gli interventi di difesa locale degli abitati lagunari e dei centri storici di Venezia e di Chioggia sono finalizzati alla difesa dalle acque medio-alte fino a maree che raggiungono il livello di +110/120 cm rispetto al mareografo di Punta della Salute, e alla difesa dalle acque eccezionali in sinergia con la gestione dei futuri interventi alle bocche di porto per la regolazione delle maree.

Descrizione degli interventi

La difesa locale dei centri urbani è un ampio e articolato piano di messa in sicurezza degli abitati correlato alla futura gestione delle opere mobili.

Negli ultimi decenni, le maree superiori a +80 centimetri sul livello medio del mare misurato a Punta della Salute si sono verificate, in media, 45 volte all'anno rispetto alle 7-8 volte dell'inizio del secolo. Piazza San Marco viene, in parte, già allagata quando la marea supera +60 centimetri sul livello medio del mare misurato a Punta della Salute, assunto come riferimento. Il ripetersi degli allagamenti causa numerosissimi disagi per la popolazione, una pericolosa e lenta aggressione alle strutture architettoniche ed edilizie e impedimenti alle attività economiche.

Le opere mobili alle bocche di porto sono in grado di difendere Venezia dalle alte maree per qualsiasi livello di marea. Una limitazione della frequenza di chiusura delle bocche può, tuttavia, consentire di ridurre la penalizzazione della navigazione e dello scambio idrico mare-laguna. Per questo motivo è stato progettato un insieme di interventi di difesa locale dei centri abitati lagunari. Essi consentono la difesa da alte maree fino a quote compatibili con la struttura degli abitati attraverso il rinforzo e il rialzo delle sponde, talvolta della quota delle pavimentazioni, e mediante la realizzazione di barriere antinfiltrazione.

La tematica delle difese locali delle terre emerse è stata considerata già anche in sede di definizione dello studio di fattibilità e progetto di massima delle opere di salvaguardia di Venezia e della laguna ultimato nel 1981, il cosiddetto "Progettone".
Nell'esame del "Progettone", effettuato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e conclusosi con il voto di approvazione del 27 maggio 1982 (voto n. 209), le difese locali delle terre emerse

vennero già da allora considerate complementari alle opere di controllo delle maree da realizzare alle bocche di porto.
Analoghi orientamenti riguardanti la complementarietà di interventi locali ed interventi alle bocche di porto sono sempre stati ribaditi in modo esplicito da tutti gli atti legislativi e dai documenti che hanno accompagnato le fasi di progettazione degli interventi di salvaguardia, dopo l'approvazione della Legge 798/84.

Il *Piano Generale degli Interventi* del 1991 a questo riguardo prevede l'esecuzione di interventi sulle "insulae" del centro storico di Venezia, la cui fattibilità tecnico-economica è stata successivamente verificata mediante uno specifico studio, e la realizzazione degli interventi di difesa locale nelle zone di Treporti, Pellestrina, Malamocco, S. Pietro in Volta, Sottomarina, Burano, S. Erasmo, nonché la realizzazione di marginamenti lagunari in zone residenziali e in zone agricole.

Gli studi, le indagini e gli interventi eseguiti in questi anni hanno avuto lo scopo di individuare, mettere a punto e realizzare le soluzioni appropriate per la difesa delle preziosissime tipologie urbane storiche lagunari, sulla base di un'attenta analisi della plurisecolare tradizione di trasformazione e di riadeguamento delle quote e dei marginamenti delle isole di cui i centri urbani lagunari sono composti.
In particolare, il Consorzio Venezia Nuova ha condotto, in modo propedeutico alla progettazione e alla realizzazione delle opere, numerose indagini fisiche; indagini storiche; indagini socio-economiche; indagini sulla mobilità delle persone e delle merci; definizione delle tipologie di intervento; verifica dell'applicabilità delle tipologie di intervento; verifica dell'impatto architettonico; definizione della quota ottimale di rialzo.

In sintesi, sono state individuate due situazioni tipiche cui corrispondono due diverse modalità di intervento e due differenti possibilità di difesa locale.
La prima riguarda gli *abitati situati lungo il cordone litoraneo* ove l'edificato, più rado e meno fragile, ha consentito maggiori rialzi e, dunque, una quota di difesa relativamente alta (compresa tra 130 e 180 cm).
La seconda situazione interessa i *centri storici* interni alla laguna e dunque le zone più basse delle città di *Venezia* e di *Chioggia*, dove gli interventi risultano molto più delicati e complessi e anche la soglia di difesa raggiungibile è molto più bassa rispetto a quella

degli abitati del litorale. I progetti approvati e gli interventi finora realizzati sono stati impostati in modo da non alterare in modo inaccettabile gli elementi architettonici delle città e i rapporti compositivi tra di essi, realizzando le difese a una quota generalizzata e omogenea, quindi funzionale alla gestione delle opere mobili, fino a +110 cm a Venezia e fino a +120 cm a Chioggia.

La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2001 ha espresso l'indirizzo di realizzare le difese, nel centro storico di Venezia e delle isole minori, fino alle quote massime compatibili con il contesto storico, architettonico, monumentale e paesaggistico, comunque tendendo alla quota +120 cm, alla luce delle risultanze delle indagini e delle verifiche di fattibilità del rialzo fino a tale quota, condotte nel corso del 1999 a seguito di specifica richiesta da parte del Comitato ex art. 4 Legge 798/1984 nella seduta dell'8 marzo 1999.
Lo stesso indirizzo è stato recepito anche dal Comitato stesso nel parere espresso nel corso della seduta del 6 dicembre 2001, nonché nella seduta del 3 aprile 2003, recependo una specifica richiesta del Comune di Venezia.
Mettere in sicurezza il centro storico di Venezia con interventi localizzati di sollevamento della pavimentazione fino a +120 cm significherebbe intervenire su circa il 35-40% del territorio.

A seguito degli accordi intervenuti tra le Autorità Italiane e la Commissione Europea (atto aggiuntivo rep. n. 7950 del 21 giugno 2002 alla Convenzione Generale rep. 7191/91), rimangono tra le attività la cui esecuzione è affidata in concessione al Consorzio Venezia Nuova le difese locali nei centri urbani lagunari e delle "insulae" dei centri storici di Venezia e di Chioggia, se già finanziate nell'ambito di finanziamenti già destinati al concessionario.

Nel *Piano Generale degli Interventi*, aggiornato al 31 dicembre 2002, pertanto, non sono previsti ulteriori finanziamenti per procedere con la realizzazione delle difese locali che non trovano allocazione nell'ambito degli Atti Attuativi della "Convenzione Generale" già finanziati; né gli interventi di difesa delle "insulae" del centro storico di Venezia e di Chioggia fino a una quota tendente a +120 cm e a +140 rispettivamente.
Tali interventi, stralciati dal *Piano* affidato al concessionario, troveranno esecuzione mediante gare da indire da parte del Magistrato alle Acque di Venezia secondo la normativa europea.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2005

Il Magistrato alle Acque e il Consorzio Venezia Nuova, fin dal 1988, hanno sviluppato specifici progetti generali di intervento di difesa, sia dei centri storici di Venezia e di Chioggia, sia dei centri abitati lagunari.

Da allora a oggi molto è stato fatto intervenendo, in pratica, in ogni località lagunare, mettendola in condizioni di sicurezza, ciascuna a una quota di salvaguardia compatibile con il particolare contesto urbanistico e architettonico che la caratterizza.

In tempi più recenti, in base a quanto previsto dalla Legge n. 139/92, questi interventi hanno avuto particolare sviluppo tramite gli "Accordi di programma": strumenti operativi che assicurano l'esecuzione coordinata e unitaria di interventi che coinvolgono Enti e Istituzioni diversi.

Tale strumento si è rivelato indispensabile qualora, in presenza di interventi particolarmente complessi, si debba *"garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie".*

Le attività relative alla *difesa dei centri abitati lungo il litorale e gli abitati insulari*, sviluppate sin dal 1986, hanno consentito di realizzare la difesa dei principali abitati lagunari, fino ad una quota di salvaguardia compatibile con il particolare contesto urbanistico ed architettonico che li caratterizza, spesso ricorrendo ai già citati "Accordi di programma".

Sono ormai posti in sicurezza gli abitati di *Treporti, Malamocco, Alberoni, Pellestrina, San Pietro in Volta* e *Sottomarina*; si sta ancora lavorando a *Murano, Torcello* e *Sant'Erasmo*.

Caso per caso è stato necessario individuare tipologie costruttive e modalità di intervento adeguate e coerenti rispetto a un territorio molto vasto e diversificato con assetto, caratteristiche fisico-morfologiche e funzioni diverse (aree urbane, zone agricole, valli da pesca, ecc.) e con una varietà di condizioni particolari (livello del suolo, natura dei terreni, stato delle strutture preesistenti, esposizione al moto ondoso, ecc.). Le soluzioni esecutive adottate sono state messe a punto in modo da mantenere, per aree omogenee, ma anche nel complesso, un disegno architettonico unitario.

Allo scopo di assicurare la completa difesa idraulica delle singole aree, gli interventi hanno spesso comportato anche la realizzazione di una serie di opere complementari come, per esempio, la sistemazione delle chiaviche di regolazione idraulica così da migliorarne gli aspetti funzionali e impiantistici.

Per quanto riguarda i centri storici, gli interventi a Venezia e Chioggia, in particolare, risultano molto più delicati e complessi, rispetto a quelli sugli abitati del litorale, così come la soglia di difesa raggiungibile molto più bassa. I progetti approvati e gli interventi finora realizzati mostrano come, senza alterare in modo inaccettabile gli elementi architettonici delle città e i rapporti compositivi tra di essi, nei centri storici ci si può difendere a una quota generalizzata e omogenea fino a circa +110 cm a Venezia e fino a +120 cm a Chioggia.
Queste quote (funzionali anche alla gestione delle opere mobili) sono quelle assunte nel progetto "insulae" e adottate e realizzate, per esempio, nell'"insula" dei *Tolentini* e nel Progetto esecutivo per la difesa dell'"*insula" di S. Marco*, che è stato approvato, tra gli altri, anche dalla Amministrazione Comunale di Venezia, dalla Soprintendenza ai Beni e alle Attività Culturali di Venezia e dalla Commissione per la Salvaguardia. Ciò conferma, di fatto, come le zone più preziose e più antiche non possano essere rialzate o comunque protette oltre a tale livello.
Contestualmente ai lavori di difesa locale dalle acque alte, si è proceduto e si procede alla realizzazione di opere di riqualificazione urbana, definite in appositi "Accordi di programma" con le Amministrazioni comunali: oltre al rialzo di rive e pavimentazioni, gli interventi hanno quindi comportato anche una serie di opere complementari quali l'adeguamento di piani terra alle nuove quote del piano di calpestio, il riordino dei sottoservizi, l'adeguamento del sistema fognario, mediante co-finanziamento con gli Enti interessati.

Lo sviluppo di questo tipo di interventi è molto avanzato: non soltanto per il numero di lavori eseguiti o che sono in corso di esecuzione, quanto per la realizzazione di interventi risolutivi, riguardanti quasi tutti i centri abitati della laguna, destinati ad evitare allagamenti fino ai livelli di salvaguardia, o di sicurezza, compatibili con la loro struttura edilizia e urbana, nonché all'eliminazione totale degli allagamenti di qualsiasi entità in concorso con la protezione offerta, in futuro, dalle opere mobili alle bocche di porto lagunari.

Numerose sono state le attività di progettazione e di realizzazione svolte, nel 2005 per la difesa locale dalle acque medio-alte, sia nei centri abitati lagunari, sia nel centro storico veneziano, sia nella città di Chioggia.

Per quanto riguarda i *centri abitati lagunari*, a *Treporti*, sono proseguiti i lavori relativi alla terza fase del quinto stralcio, che implicano ulteriori interventi di protezione di sponde e di difesa dell'abitato; a gennaio 2005, inoltre, sono stati avviati i lavori, relativi al primo stralcio del progetto per la sistemazione del marginamento del *canale Pordelio*. Questo primo stralcio prevede la realizzazione di un ponte stradale apribile di collegamento tra la località *Cà Savio e l'isola Sud*.

Al *Lido*, si segnala la prosecuzione degli interventi per la riqualificazione ambientale e urbana degli abitati di *Malamocco* e *Alberoni*, primo stralcio (centro urbano di Malamocco). L'opera riguarda interventi di marginamento e riqualificazione ambientale (consolidamento e valorizzazione ambientale di sponde e rive, vivificazione e bonifica dei canali, predisposizione del sistema fognario), interventi di riqualificazione urbana (riqualificazione delle piazze e sistemazione delle pavimentazioni, predisposizione di percorsi e passerelle pedonali, adeguamento dell'illuminazione pubblica e dei sottoservizi, realizzazione di un parcheggio). Questo intervento si sviluppa secondo uno specifico "Accordo di programma" intervenuto tra il Magistrato alle Acque e l'Amministrazione comunale di Venezia.
Nell'abitato di Lido, infine, si è concluso l'intervento di ristrutturazione delle rive in corrispondenza di *via Coletti*, anche nella parte sud a completamento di quanto già realizzato.

A *Pellestrina*, si segnala la prosecuzione dei lavori lungo il tratto tra Portosecco e il cantiere De Poli. I lavori riguardano la ricostruzione del marginamento esistente, in precarie condizioni dovute all'erosione delle strutture di sponda e ai forti moti di filtrazione innescati da fenomeni di sifonamento al di sotto delle strutture stesse.

A *Murano,* si segnala l'avvio, ad aprile 2005, dei lavori relativi alla sistemazione del canale *San Mattia*. L'intervento prevede il rinforzo e l'adeguamento delle rive, la ricalibratura dei fondali e la sostituzione dell'attuale ponte in legno, di accesso a San Mattia, con un nuovo ponte in pietra.

A *Sant'Erasmo*, sono proseguiti e in parte terminati gli importanti lavori di difesa e di riqualificazione ambientale dell'isola, mediante l'esecuzione di due stralci funzionali: il primo, avviato alla fine del 2000, si è concluso a fine novembre 2005, mentre il secondo,

avviato nel mese di febbraio del 2002, terminerà nel corso del 2006. Si fa rilevare, inoltre, l'avvio, nel secondo semestre del 2005, del terzo stralcio che prevede, principalmente, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale dei marginamenti in corrispondenza del centro urbano (località tra la darsena della remiera e la località Cà Ragazzi per circa 1 km) e la sistemazione delle chiaviche di regolazione idraulica presenti nell'area di intervento

Anche nel *centro storico di Venezia* sono proseguiti numerosi e importanti interventi per la difesa locale di rive e marginamenti.
Alle *Zattere*, gli interventi, nel loro complesso, interessano l'intero percorso della fondamenta, da Punta della Salute fino alla Stazione Marittima, per 1,3 chilometri, mentre alla *Giudecca* si sviluppano dall'estremità est della fondamenta, all'interno della caserma della Guardia di Finanza, fino al rio di San Biagio, per 1,7 chilometri. I lavori procedono per stralci successivi, individuati tenendo conto delle situazioni di particolare urgenza ma anche delle esigenze delle attività commerciali.
In particolare, sono terminati, nel secondo semestre del 2005, i lavori relativi al quinto stralcio, che consente di completare la ristrutturazione delle rive delle Zattere in due tratti distinti, in prossimità della zona di San Basilio e in quella della chiesa dei Gesuati. Nel mese di gennaio 2006, termineranno, inoltre, gli interventi relativi al sesto stralcio, completando, così, la sistemazione delle rive alla Giudecca.
Sono proseguiti, infine, gli interventi per la ristrutturazione, il consolidamento o il restauro di rive e muri di sponda alla *Giudecca, lato sud* e a *sacca Fisola, lato nord*, con la realizzazione di rive urbane percorribili e ripristino di muri di cinta di spazi pubblici e privati, la ricalibratura dei fondali a ridosso delle rive, la predisposizione degli impianti per l'installazione dell'illuminazione pubblica.
Sono stati avviati nel secondo semestre del 2005, i lavori di sistemazione dei marginamenti lungo il *fronte est dell'isola di S. Elena*. Il progetto prevede il restauro, il consolidamento e la ristrutturazione delle rive fra il Collegio Navale Morosini e l'imbocco del canale Quintavalle, compreso il molo frangiflutti che delimita la darsena grande antistante il canale dei Marani, la ricalibratura dei fondali della darsena grande e in corrispondenza della darsena del collegio Morosini e infine, alcuni lavori complementari. Il progetto di primo stralcio prevede la sistemazione di tutte le rive previste dal progetto generale, ad eccezione di quelle, interne ed esterne,

in corrispondenza della zona della darsena grande di pertinenza dell'ACTV e di quelle del lato ovest della stessa darsena, realizzazione di una parte dei lavori di dragaggio e dei lavori complementari.

Nel corso del 2005, si segnala, inoltre, la prosecuzione del primo stralcio degli importanti lavori di difesa dell'*"insula" di San Marco* dalle acque alte più frequenti. I lavori relativi al primo stralcio, avviati nel mese di marzo del 2003, comprendono il rialzo, il restauro e il consolidamento della riva, anche a protezione dal moto ondoso, l'intercettazione degli scarichi per la predisposizione della nuova rete per lo smaltimento delle acque piovane e il restauro della pavimentazione. Sempre nel contesto degli interventi di difesa delle rive del bacino di San Marco, sono proseguiti i *lavori nel tratto di riva compreso tra il ponte della Paglia e il ponte del Vin*. I lavori consistono nel restauro, consolidamento e rialzo del marginamento, nell'adeguamento, restauro e rialzo della pavimentazione retrostante e nella sistemazione della rete per lo smaltimento delle acque e nel riordino dei sottoservizi.

Sono proseguite, inoltre, sia in fase di progettazione, che in fase di esecuzione, le importanti attività intraprese da Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova, riguardanti la ricostruzione dei marginamenti dell'area dell'*Arsenale di Venezia* e la messa in sicurezza e il restauro dei fabbricati prospicienti lo specchio acqueo, le cui murature perimetrali costituiscono il bordo del marginamento. In particolare, nel corso del 2005, sono proseguiti i lavori relativi alla ricostruzione del muro di sponda dell'area edificata a nord dell'Arsenale, cosiddetta "*riva delle Casermette*", i lavori di messa in sicurezza dei tre capannoni denominati di *S. Cristoforo*, gli interventi di messa in sicurezza delle sommità dei muri perimetrali delle *Galeazze* e i lavori, avviati nei primi mesi del 2005, di messa in sicurezza definitiva del *Capannone n. 111* e del *Capannone n. 110*. Sono, inoltre, stati avviati, nel mese di maggio del 2005, i lavori di somma urgenza di ripristino statico di due capannoni denominati "della *Novissima*". E' stato, altresì, esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque, nella seduta del 21 luglio 2005, l'intervento di messa in sicurezza di alcuni capannoni delle *Tese della Novissima*, i cui lavori verranno avviati nel corso del primo semestre del 2006.

Nel centro storico, infine, è proseguito il primo stralcio dei lavori di ripristino delle rive delle *Fondamente Nuove*. Il progetto generale comprende il restauro, il consolidamento e il rialzo delle rive comprese tra la "sacca" della Misericordia e il rio di Santa Giustina,

l'adeguamento altimetrico delle soglie di unità immobiliari al piano terra rispetto alla nuova quota della pavimentazione esterna, il risanamento igienico ambientale del sistema fognario e il riordino dei sottoservizi. In questo primo stralcio verranno eseguiti interventi nel tratto compreso tra la "sacca" della Misericordia e il rio dei Gesuiti.

Anche nella *zona di Chioggia*, nel corso del 2005, sono proseguite numerose attività finalizzate alla difesa dalle acque medio – alte e alla riqualificazione del centro storico. I lavori vengono realizzati mediante un "Accordo di programma" siglato il 17 settembre 1998, tra il Magistrato alle Acque di Venezia e l'Amministrazione comunale di Chioggia. Si tratta di un programma di opere finalizzato a un complessivo riassetto del territorio urbano che renda più semplice per i cittadini abitare, vivere e lavorare nella propria città.
Nel corso del 2005, in particolare, sono proseguiti i lavori di difesa locale dalle acque alte avviati nel 1998 con l'intervento pilota di rialzo della *fondamenta S. Domenico,* mediante due stralci funzionali. E' proseguito, inoltre, lo sviluppo dei progetti per la protezione della parte centrale della città (*Corso del Popolo e Canal Vena – in parte già conclusa*) e la progettazione delle principali opere di riqualificazione urbana. Gli interventi potranno essere avviati non appena si saranno espressi i diversi Enti competenti.
Sono proseguiti i lavori, avviati nel 2001, per il restauro del *Ponte di Vigo*, primo di nove ponti sul Canal Vena che saranno tutti interessati dai lavori di restauro.
A marzo 2005, sono stati avviati lavori di restauro funzionale ed architettonico dei ponti pedonali sul C*anal Vena*: con il primo stralcio progettuale, sviluppato sulla scorta del progetto definitivo generale, si procede con il restauro statico e architettonico del *Ponte della Pescheria* e del *Ponte Scarpa*. Si tratta di quelli che, allo stato attuale, versano nelle peggiori condizioni statiche. E' oggetto della progettazione anche un piccolo tratto di riva urbana (circa 30 metri), posto nelle immediate vicinanze del Ponte Scarpa, in parte crollata.
Si segnala, infine, la prosecuzione dell'intervento per la riapertura del *canale Perottolo* e la riqualificazione urbana delle aree limitrofe – Quartiere Tombola. Anche questi lavori sono realizzati in "Accordo di programma" con l'Amministrazione comunale di Chioggia.

A *Sottomarina* sono stati sostanzialmente ultimati, nel corso degli

esercizi precedenti, gli interventi di difesa locale dagli allagamenti che hanno comportato, mediante quattro stralci funzionali, il rialzo delle rive fino a quota + 130 centimetri per 900 metri di riva, congiuntamente agli interventi realizzati dal Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova, d'intesa con il Comune di Chioggia, volti a valorizzare l'intero tratto del marginamento lungo la laguna e le piazzette che vi si affacciano. Nel corso del 2005, sono proseguiti i lavori relativi al *quinto stralcio* che riguardano il consolidamento e il rialzo della *riva del forte San Felice* e l'estremità nord del centro urbano.

I finanziamenti disponibili per le difese locali degli abitati sono appena sufficienti per portare a completamento le opere ancora in corso. Una volta esauriti tali fondi la continuità operativa dovrà essere garantita dal Magistrato alle Acque di Venezia che, in base a quanto stabilito negli accordi tra Autorità italiane e Commissione Europea, dovrà proseguire nella realizzazione della opere di difesa non ancora, allora, oggetto di finanziamento, mediante procedure concorsuali per l'affidamento dei lavori.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

	Fabbisogno Totale	**Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova**	**Fabbisogno residuo da finanziare**
Studi propedeutici alla progettazione	3,946	3,946	-
Indagini propedeutiche	22,042	22,042	-
Difesa insediamenti urbani situati lungo i litorali	239,432	239,432	-
Rive e marginamenti nella gronda lagunare	16,600	16,600	-
Protezione degli abitati insulari	176,021	176,021	-
Interventi di difesa delle rive, marginamenti e insulae nel centro storico di Venezia fino alla quota +110 cm	219,914	219,914	-
Difesa insediamenti urbani, marginamenti e rive nell'area di Chioggia; difesa dell'insula di Chioggia fino a quota +120 cm	159,637	159,637	-
Altri interventi	61,046	61,046	-
Somme a disposizione / Rev. Prezzi / Espropri	12,624	12,624	-
TOTALE	**911,262**	**911,262**	**-**

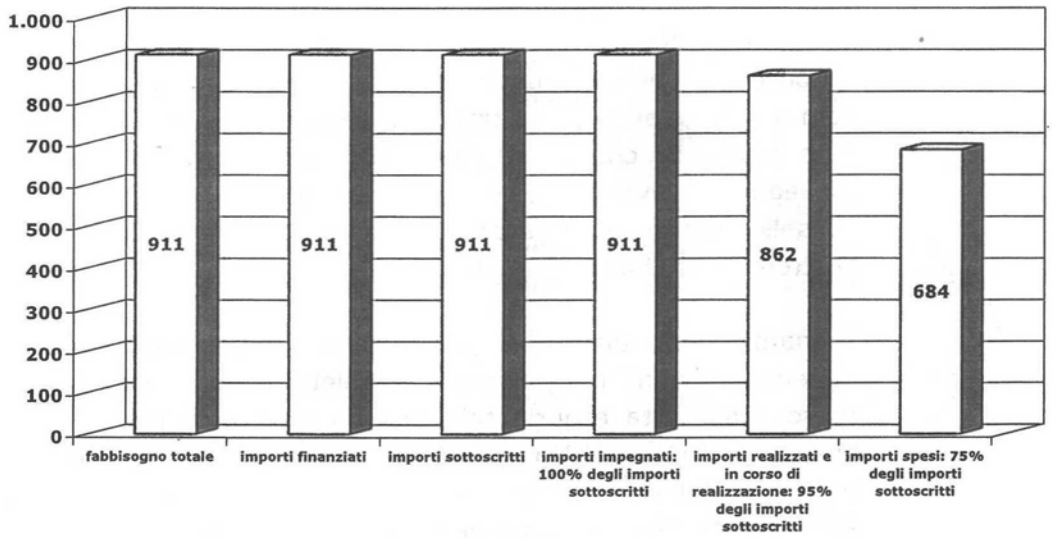

3.4 Ristrutturazione dei moli foranei
(interventi di cui all'art. 3 lettera a) legge n. 798/84)

Obiettivo

L'obiettivo dell'intervento è il rinforzo della struttura dei moli per assicurare la continuità della difesa della laguna dal mare in coerenza con gli interventi necessari per rinforzare il cordone litoraneo e per difendere i centri abitati lagunari dalle alte maree anche nei casi eccezionali.

Descrizione degli interventi

La laguna è collegata al mare attraverso le tre bocche di porto e ciascuna di esse è "armata" con due moli guardiani la cui lunghezza varia tra 2 e 4 km.

I moli sono stati costruiti tra il 1840 e il 1934 in modo da creare un aumento della profondità dei fondali dei canali di bocca (a causa dell'aumento della velocità della corrente) per adeguarli alla stazza sempre maggiore delle navi moderne.

Le strutture dei moli e le loro funzioni sono diverse procedendo da mare verso terra.

Lato mare i moli hanno la tipica struttura di opera marittima che si deve opporre all'azione del moto ondoso; lato laguna i moli coincidono con le opere di contenimento del territorio.

I moli foranei alle bocche di porto, che costituiscono un fattore di sicurezza per la navigazione, necessitavano di importanti lavori di ristrutturazione.
I moli sono stati realizzati ricorrendo a pietrame di grande dimensione che ha subìto, per l'azione delle correnti e del moto ondoso, continui sprofondamenti nel tempo. Questi fenomeni avevano finito per compromettere la stabilità dell'intera struttura. I lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in passato avevano fronteggiato i dissesti più immediati senza però eliminare il problema.
La ricostruzione dei moli è stata supportata da analisi, ricerche, sperimentazioni con modelli matematici e fisici con le quali sono state valutate le caratteristiche del moto ondoso lungo ciascuno dei moli, l'intensità delle correnti di marea al piede delle scogliere, la natura geotecnica dei terreni di fondazione, la profondità dei fondali lungo i moli e la loro tendenza evolutiva, la stabilità della struttura e delle mantellate in roccia.
La realizzazione delle opere non ha comportato modifiche dimensionali e ha fatto ricorso, per le parti a vista, a materiali omogenei a quelli esistenti.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2005

Attività finanziate
Il progetto di massima degli interventi per il rinforzo dei moli, che era stato preceduto da specifiche attività di studio e sperimentazione, è stato assentito dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nel luglio del 1991.

Durante il 1994 sono iniziati quasi tutti gli interventi previsti.
Nel 1996 sono stati completati i lavori sul *molo nord di Malamocco* mentre sono proseguiti quelli relativi agli altri moli.
Nel 1997 sono stati completati anche i lavori relativi ai *moli nord e sud di Chioggia e sud di Lido*, mentre nel 1998 sono terminati i lavori relativi al *molo sud di Malamocco*.
Nel 1998 sono anche state completate le opere per la messa in sicurezza e l'adeguamento dei *fari sulle testate dei moli* nord di Lido e di Malamocco, lavori segnalati dal Genio Civile per le Opere Marittime su indicazione del Comando zona fari di Venezia.
I lavori relativi al *molo nord di Lido* sono stati completati nel 1999.
Nel corso del 1999 sono stati avviati i lavori relativi alle *radici dei moli sud di Chioggia,* completati nel corso del 2002, e *nord di*

Malamocco, sostanzialmente finiti nel corso del 2003; qui i lavori si collocano in interventi più ampi che interessano l'intera zona e comprendono anche la difesa dalle acque medio-alte dell'abitato di Alberoni sud retrostante e si raccordano con le opere di rinforzo del molo già realizzate.

I lavori realizzati sono stati condotti secondo tre tipologie di intervento sostanzialmente comuni a tutti i sei moli foranei: rinforzo e risagomatura delle mantellate (gli strati di blocchi di roccia o calcestruzzo posti a difesa del molo dall'azione del moto ondoso); rifacimento dei tratti danneggiati dei massi di coronamento; protezione dei fondali mediante una platea di blocchi di roccia collocata sopra un filtro costituito da geotessili sintetici.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

	Fabbisogno Totale	Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi	0,620	0,620	-
Indagini e altri interventi minori	3,011	3,011	-
Moli bocca di Lido	21,515	21,515	-
Moli bocca di Malamocco	48,623	48,623	-
Moli bocca di Chioggia	34,086	34,086	-
Somme a disposizione	0,006	0,006	-
TOTALE	**107,861**	**107,861**	**-**

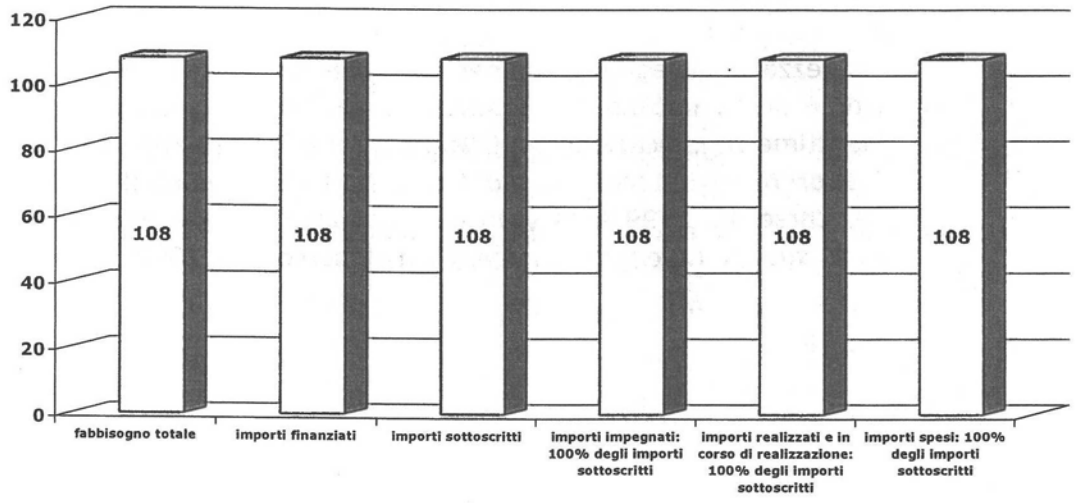

3.5 Difesa dalle mareggiate
(Interventi di cui all'art. 3 lettera d) legge n. 798/84)

Obiettivo

L'obiettivo dell'intervento è il rinforzo del cordone litoraneo che divide la laguna dal mare per proteggere i centri abitati dei litorali dall'azione diretta del moto ondoso e assicurare la continuità della difesa della laguna nel suo complesso da tutte le acque alte, anche dagli eventi estremi.

Descrizione degli interventi

Il cordone litoraneo che separa l'Adriatico dalla laguna, lungo circa 45 chilometri, rappresenta la prima e naturale difesa di Venezia e dei centri urbani lagunari dal mare. Il rinforzo dei litorali ha assunto un carattere di assoluta necessità e d'urgenza. Infatti, il cordone litoraneo si è fatto sempre più sottile e fragile a causa della quasi assenza di apporti fluviali, dei processi erosivi, delle azioni disgregatrici del moto ondoso e del vento e del degrado delle strutture storiche in pietra (i "murazzi") che sono state erette nel corso del XVIII secolo a protezione dalle mareggiate. L'insieme dei fenomeni ha determinato il generale arretramento della linea di costa e la scomparsa del cordone di dune che costituiva un'ulteriore difesa dei territori e degli abitati retrostanti. Il fenomeno è stato particolarmente evidente, fin dai secoli scorsi, nel caso dei litorali di Pellestrina e di Lido per interessare, più recentemente, anche i litorali di Jesolo, Cavallino, Sottomarina e Isola Verde. Il sistema di opere, in gran parte realizzato, persegue molteplici obiettivi: la protezione della laguna e dei suoi abitati; il ripristino delle difese naturali mediante la creazione di nuove spiagge e l'ampliamento di quelle divenute inadeguate; la formazione, dove possibile, di un nuovo fronte di dune, il restauro dei "murazzi" e la ristrutturazione delle opere di difesa degradate.

Il Magistrato alle Acque di Venezia, tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova, ha, da tempo, messo in atto una serie di interventi per il rinforzo dei litorali veneziani, anche mediante la realizzazione di ripascimenti, finalizzati a difendere dalle mareggiate la laguna di Venezia, rafforzando opportunamente i punti più deboli lungo il cordone litoraneo.

La difesa di un litorale mediante la costruzione di una nuova spiaggia è senza dubbio la soluzione che, tra quelle possibili, è più compatibile con l'ambiente costiero in quanto ne riprende, anche se in modo artificiale, i caratteri naturali. Benché sia già stata adottata in altri casi, la soluzione mantiene, per la particolarità della zona, un elevato carattere di novità. Gli effetti conseguiti vanno

attentamente monitorati poiché dipendono strettamente dalle caratteristiche fisiche e dalle condizioni meteomarine della zona.
L'ideazione e la progettazione è stata supportata da numerosi approfondimenti di carattere scientifico, ma è stata possibile solo associando ad esse approfondimenti altrettanto completi e rigorosi riguardo alla ricerca delle cave per l'approvvigionamento delle sabbie, ai metodi costruttivi per il prelievo, il trasporto e il deposito delle sabbie in grado di limitare l'impatto sull'ambiente circostante alle zone di lavoro e riguardo ai controlli da effettuare sia in corso d'opera, che nei mesi e negli anni successivi all'intervento.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2005

Attività finanziate
A oggi si è intervenuti o si sta intervenendo su sei litorali per un tratto complessivo di costa di circa 45 chilometri, utilizzando per l'ampliamento o la ricostruzione delle spiagge circa 8,5 milioni di m^3 di sabbia.

Litorale di Cortellazzo – Eraclea
I fenomeni erosivi nel corso degli ultimi anni, si sono resi particolarmente accentuati sul tratto di litorale compreso tra le foci dei fiumi Piave e Livenza in relazione, soprattutto, all'esposizione particolare del paraggio alle mareggiate di scirocco nonché alla significativa carenza di apporto sedimentario "naturale" dal fiume Piave.
Nel corso degli ultimi anni, il Magistrato alle Acque è, pertanto, intervenuto lungo il litorale di Cortellazzo realizzando piccole opere di emergenza per contrastare il grave fenomeno erosivo in atto.
Anche la Regione Veneto, in attuazione del Decreto Legislativo n. 112 del 1998, relativo ai trasferimenti delle competenze in materia di difesa e gestione delle coste dallo Stato alle Regioni, ha da tempo avviato interventi per la protezione delle spiagge venete.
In data 7 novembre 2001, è stato siglato un Accordo di Programma tra la Regione Veneto e il Magistrato alle Acque finalizzato a gestire in modo coordinato l'assetto della foce del fiume Piave e gli interventi di difesa dei litorali di competenza delle due Amministrazioni tenendo conto delle suddette interferenze.
In base a quanto sopra, il Magistrato alle Acque ha ravvisato la necessità di anticipare i tempi di realizzazione del ripascimento del litorale di Eraclea mediante il proprio Concessionario e con co-finanziamento della Regione del Veneto, in quanto funzionale alla

protezione del litorale di Cortellazzo, e, pertanto, ricompreso nel Piano Generale degli Interventi in quanto consente la difesa fisica del litorale veneziano.
Il progetto generale per il rinforzo del litorale di *Cortellazzo* prevede: la sistemazione e il riallineamento delle testate dei 4 "pennelli" esistenti e la realizzazione di 2 nuovi "pennelli" lungo il litorale, in funzione di lavori di ripascimento che verranno realizzati successivamente; il ripascimento del litorale di Eraclea; il rinforzo del molo sud della foce del Piave. Sono previsti quattro stralci di intervento. Nel corso del 2003 sono stati avviati il primo e il secondo stralcio, prima fase. Nell'intervento di primo stralcio, terminato nel maggio del 2003, si è proceduto all'adeguamento di "pennelli" esistenti e alla realizzazione di nuovi "pennelli" in funzione dei lavori di ripascimento successivamente previsti. Il secondo stralcio, prima fase, attualmente in corso, riguarda il ripascimento del litorale di Eraclea, realizzato con sabbie provenienti da cave marine già autorizzate dal Ministero dell'Ambiente e già parzialmente utilizzate per il ripascimento del litorale di Jesolo.

Litorale di Jesolo
Nell'autunno del 1998 sono state avviate le opere per la difesa del litorale di Jesolo che è soggetto a un significativo fenomeno di erosione; le opere, in fase di massimo sviluppo nel corso del 2001, sono sostanzialmente terminate nel corso del 2002. Nel corso del 2003 e del 2004 sono state realizzate alcune attività complementari per l'accessibilità e la fruizione della spiaggia.
Il litorale di Jesolo si estende per 12 chilometri tra le foci dei fiumi Piave, a nord, e Sile, a sud. A partire dagli anni '40 si è determinato un rapido sviluppo turistico che ha raggiunto la massima intensità dopo il 1970. La conseguente urbanizzazione e infrastrutturazione del territorio ha profondamente modificato l'aspetto originario dell'ambiente litoraneo e ha contribuito alla progressiva erosione della spiaggia.
La situazione di erosione ha determinato la necessità, espressa anche dagli abitanti del litorale, oltre che dagli operatori economici locali, di un programma generale e unitario di opere, definite in accordo con il Comune di Jesolo. A questa necessità risponde il progetto esecutivo elaborato dal Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova.
Il *ripascimento della spiaggia* lungo 10 chilometri di riva, con la movimentazione di un milione di metri cubi di sabbia, è avvenuto secondo criteri progettuali analoghi a quelli già adottati a Cavallino

e Pellestrina.
A riva, per contenere il ripascimento, è stata prolungata la metà dei pontili su pali già esistenti (34 su 68), in relazione all'allargamento della spiaggia, e ne sono stati realizzati 16 nuovi.
I lavori hanno permesso di ottenere una larghezza omogenea di almeno 50 metri, con un avanzamento della riva, nelle zone più critiche, di circa 30 metri.
Complementare al ripascimento è stata la realizzazione, per complessivi 3,9 chilometri, della struttura di difesa tra la spiaggia e le aree abitate retrostanti, costituita da un'ampia *gradonata*.
Il progetto ha previsto anche la *ricostruzione delle dune*: i lavori hanno uno sviluppo di quasi 2,5 chilometri, a partire dalla foce del Piave.
Per quanto riguarda, infine, i lavori alla *foce del Sile*, sono stati realizzati lavori di rinforzo della scogliera attorno al faro sulla sponda destra; di rinforzo della scogliera che delimita la sponda sinistra; lavori di dragaggio.

Litorale di Cavallino
Nel corso del 1990 è stato eseguito *l'intervento sperimentale* di difesa del litorale di Cavallino, *in località Ca' Pasquali*: si è messo in opera un tratto di barriera sommersa longitudinale, parallela alla costa e ne è stata misurata l'efficacia nell'evitare la dispersione della sabbia.

Nel 1999 sono state completate le attività iniziate nel gennaio 1994. Il progetto ha consentito la *realizzazione dell'ampliamento e del rafforzamento di 11 chilometri di spiagge già esistenti*. La spiaggia ricostruita è difesa da 31 "pennelli", 5 di nuova realizzazione e 26 ottenuti dalla ristrutturazione di parte dei 65 "pennelli" preesistenti. Di questi, la metà circa è stata demolita. I lavori di ripascimento del litorale sono stati eseguiti in progressione da sud verso nord e il versamento della sabbia è stato effettuato dopo la realizzazione di tutti i "pennelli". Sono stati versati complessivamente circa 2 milioni di metri cubi di sabbia prelevata in mare al largo della bocca di Malamocco.
I lavori per la formazione della spiaggia sono stati integrati da una serie di interventi complementari; in particolare, lungo sei tratti del litorale, per complessivi 4,8 chilometri, la protezione del territorio alle spalle della spiaggia è stata completata, mediante la *ricostruzione del fronte delle dune*, che da sempre costituisce la naturale difesa dal mare ma che ora è assai degradato e, in molti punti, è ormai scomparso.

Nel corso del 2000 sono state completate alcune attività, specifiche, finalizzate a garantire la manutenzione delle specie vegetative messe a dimora sulle dune di Ca' Savio, Ca' Ballarin e valle Dolce, al fine di dare corso a eventuali sostituzioni e/o trattamenti delle piante sofferenti.

Litorale di Lido

Durante il 2000 sono state completate le attività relative alla progettazione esecutiva delle opere di difesa del litorale di Lido; nel corso del 2001, l'Amministrazione Comunale di Venezia ha richiesto al Magistrato alle Acque di procedere a una revisione del progetto esecutivo, recependo le istanze del Consiglio di Quartiere di Lido e di alcuni gruppi e associazioni di cittadini. Si è proceduto, pertanto, alla revisione del progetto esecutivo, che è stato favorevolmente esaminato dal Comitato Tecnico di Magistratura del Magistrato alle Acque nella seduta del 1° ottobre 2003. Nel febbraio del 2004, è stato avviato un primo stralcio dei lavori.

La zona di intervento si estende per circa 5 km a nord della spiaggia di Alberoni, di fronte al murazzo storico.

La soluzione individuata, prevede la realizzazione di una barriera sommersa a distanza media dalla costa di circa 300 m, in grado di abbattere l'energia del moto ondoso, provocando il frangimento dell'onda, e quindi di ridurre il moto ondoso contro i murazzi in modo da rendere non pericolosa la tracimazione, anche in caso di eventi eccezionali. La barriera si estende per una lunghezza di circa 4700 m, ed è realizzata in massi naturali

Per aumentare ulteriormente la dissipazione dell'energia associata alle onde si è previsto il versamento sommerso di sabbia nella zona retrostante la barriera (lato murazzo), conseguendo anche l'obiettivo di ricostituire i fondali storici soggetti a continua erosione. Si prevede il versamento di circa 680.000 m^3 di sabbia, con la formazione di cumuli trasversali rispetto alla barriera sommersa, con sommità intorno alla –2 m.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di quattro nuovi pennelli, di lunghezza emersa variabile tra 160 e 220 m, collegati alla barriera sommersa da setti sommersi, e la realizzazione di ulteriori due setti sommersi in corrispondenza di pennelli esistenti.

A completamento dell'intervento di difesa, come richiesto dal Comune di Venezia, si prevede infine un intervento di tutela ambientale delle dune nella zona di Alberoni, attualmente in condizioni precarie e soggette ad un pesante carico antropico.

Litorale di Pellestrina

Nel 1991 sono iniziati i lavori per il *rinforzo della scogliera* nel punto più fragile del litorale di Pellestrina, l'ansa *di Caroman*, dove solo pochi metri separano il mare dalla laguna, completati nel 1995.

Nel corso del 1992 sono stati avviati i lavori per il *rinforzo* di 5 chilometri *di "murazzo"* a Pellestrina, completati nel 1997.

Il *rafforzamento del litorale* di Pellestrina, per conformazione fisiografica e per importanza dei fenomeni erosivi in atto, ha comportato l'esecuzione di un sistema di opere mai attuato prima in Italia. I lavori realizzati consistono nella formazione di nuove ampie spiagge protette, nel rinforzo della scogliera, nel rifacimento o restauro della lastricatura del murazzo per quasi 5 chilometri.
I lavori di *ripascimento* a Pellestrina sono stati eseguiti secondo una concezione di intervento e criteri esecutivi analoghi a quelli messi a punto per il litorale di Cavallino. La formazione della spiaggia è avvenuta con l'impiego di quasi 5 milioni di metri cubi di nuova sabbia prelevata da una draga in mare, a una distanza di circa 20 chilometri dalla costa.
Al fine di assicurare la stabilità della spiaggia, si sono costruiti 18 *"pennelli" in pietrame* collegati, mediante setti di prolungamento sommersi, a una *berma continua*, anch'essa *sommersa,* messa in opera a circa 300 metri dalla costa. In questo modo si sono formate delle aree (celle) di ripascimento.
Dal 1994 al 1999 sono stati realizzati otto stralci dell'opera mediante i quali sono stati costruiti 18 pennelli, circa 6 chilometri di berma sommersa e il ripascimento di 19 celle, realizzando così la nuova spiaggia che si estende per poco più di 9 chilometri.
Sono in corso di realizzazione delle opere complementari che consentiranno agli abitanti l'accesso alla spiaggia mediante il superamento attrezzato del "murazzo" preesistente.

Litorale di Sottomarina

Nel 1997 è stata completata la progettazione esecutiva della difesa del litorale di Sottomarina ed è stata approvata dall'Amministrazione concedente; le relative opere sono state avviate nel mese di maggio del 1998 e sono state completate nel corso del 2000 mentre sono state ultimate nel 2002 le opere di riqualificazione urbana previste dall'Accordo di Programma intervenuto tra il Magistrato alle Acque e l'Amministrazione Comunale di Chioggia. Nel corso del 2005 si sono realizzati alcuni

nuovi lavori richiesti dall'Amministrazione Comunale, oggetto di una apposita perizia di variante esaminata favorevolmente dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nel mese di giugno del 2003.
Il litorale di Sottomarina si sviluppa per più di 5 chilometri tra la bocca di porto di Chioggia e la foce del fiume Brenta.
Gli obiettivi degli interventi progettati sono la difesa fisica dell'ambiente costiero, la protezione delle abitazioni e dei territori a ridosso della spiaggia e, indirettamente, la tutela delle attività che vi si svolgono. Contemporaneamente, così come è avvenuto per i litorali di Cavallino e di Pellestrina, si risponde anche all'esigenza di valorizzazione della costa dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.
Nella parte nord del litorale il progetto ha riguardato, essenzialmente, la realizzazione di un *"muro paraonde"* con sommità a circa +3 metri – a una quota, cioè, di assoluta sicurezza – sul livello del medio mare. Il muretto, che si sviluppa dalla fine dell'attuale Lungomare Adriatico fino a Via S. Felice, è affiancato da un ampio marciapiede che prolunga quello esistente sul lungomare, configurando una passeggiata continua che raggiunge il centro abitato.
Nella parte sud del litorale è già stato realizzato il *ripascimento* dell'arenile (500 metri), mediante il quale è stata riportata la spiaggia a una quota adeguata. Il ripascimento ha richiesto il versamento di circa 120.000 metri cubi di sabbia ed è contenuto da un'opera foranea in scogliera sulla sponda sinistra della foce del Brenta.

Litorale di Isola Verde

Nel corso del 1998, sono stati avviati gli interventi di difesa del litorale di Isola Verde a Chioggia che si sono conclusi nel 2002.
Isola Verde si trova nel Comune di Chioggia, tra la foce del fiume Brenta, a nord; la foce dell'Adige, a sud; il canale Vecchio Adigetto, a ovest; l'Adriatico a est. Il litorale si estende per 2,7 chilometri ed ha alle spalle un territorio fortemente urbanizzato.
Da tempo il litorale è investito da processi erosivi che provocano l'arretramento della linea di riva.
Il Consorzio Venezia Nuova ha, quindi, realizzato il *ripascimento protetto* della parte meridionale del litorale (2 chilometri) mediante il versamento di circa 450.000 metri cubi di sabbia e la realizzazione di 7 "pennelli" di roccia.
Sono stati eseguiti lavori complementari di difesa a terra con la costruzione di un *muro "paraonde"*, che ha uno sviluppo di circa

700 metri, con il rinforzo della sponda destra della foce del Brenta e di quella sinistra della foce dell'Adige.
Nel corso del 2004 è stato avviato il progetto per la realizzazione di interventi integrativi per la difesa del litorale, quali ad esempio camminamenti, piste ciclabili e/o collegamenti, per permettere una migliore fruizione delle aree in questione nel rispetto delle realtà locali.
Nel primo semestre del 2005 è stato avviato l'intervento di *rafforzamento delle testate dei pennelli del settore sud del litorale* che implica la sistemazione e l'adeguamento di due "pennelli" in pietrame e massi naturali e l'esecuzione di un monitoraggio dello stato del mare e dei fondali davanti alla foce del fiume Sile, mediante l'impiego di tecniche fotogrammetriche.
Uno specifico "Accordo di programma" tra la Regione del Veneto, il Magistrato alle Acque, il Comune di Chioggia e il Comune di Rosolina, ha permesso, infine, l'esecuzione coordinata e unitaria degli interventi alle *foci del Brenta e dell'Adige*, necessari per allontanare dal litorale di Sottomarina e di Isola Verde le acque dolci inquinate e tutelare la balneabilità delle spiagge. Questi interventi consistono nella realizzazione di lunghi palancolati metallici che, "prolungando" le sponde delle foci, sono in grado di veicolare verso il largo, per alcune centinaia di metri, le acque dolci superficiali.

Nel corso del 2005, si è concluso il primo stralcio dell'intervento di manutenzione dei litorali, mediante il ripristino del ripascimento in sabbia degli interventi realizzati sul litorale da Jesolo a Isola Verde.

E' proseguito lo studio "*Monitoraggio dei litorali da Eraclea a Isola Verde*" che è articolato su rilievi dei parametri meteomarini (moto ondoso, correnti, vento e livelli di marea), rilievi batimetrici, rilievi fotografici, analisi dei dati e valutazione delle tendenze evolutive dei litorali e degli interventi di ripascimento.

Sono terminati, infine, i rilievi e le attività specialistiche per il miglioramento ambientale della parte sommersa e della parte emersa della nuova spiaggia sul litorale di Pellestrina.

Gli interventi già realizzati e in corso di realizzazione sono monitorati con continuità: i controlli effettuati mostrano che gli obiettivi di progetto sono stati raggiunti, con una generale approvazione e soddisfazione dell'autorità marittima e delle Amministrazioni locali interessate; la stabilità delle nuove opere,

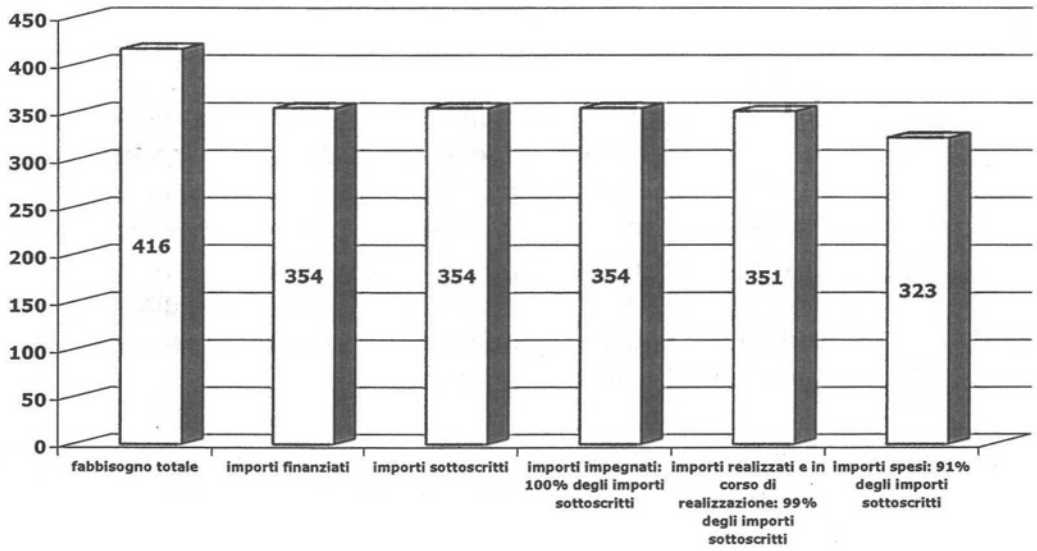

3.6 Recupero morfologico
(interventi di cui all'art. 3 lettera a) legge n. 798/84)

Obiettivo

Obiettivo generale del recupero morfologico è la conservazione delle caratteristiche del sistema fisico ed ambientale della laguna contrastando l'erosione e la perdita di quota del territorio, ripristinando o tutelando le strutture morfologiche preesistenti, indirizzando i flussi mareali nelle diverse aree della laguna per migliorare di volta in volta le condizioni di vivificazione degli specchi acquei, confinando gli apporti di nutrienti e di sedimenti.
Gli interventi individuati hanno anche sempre l'obiettivo del ripristino dei dinamismi naturali tipici delle aree umide lagunari. Il principale riguarda il processo di accrescimento naturale delle zone umide e dei fondali per effetto congiunto di interventi atti a catturare i sedimenti e a favorire lo sviluppo della vegetazione, opponendosi così alla naturale perdita di quota del territorio lagunare per subsidenza e compattazione.

Descrizione degli interventi

La Legge n. 798/84 e, particolarmente, la Legge n. 139/92 dispongono che gli interventi ambientali siano integrati e contestuali alle opere per la difesa dalle acque alte.
Condizione per la sopravvivenza della laguna di Venezia è, infatti, il suo riequilibrio ambientale.

già completate, dopo un periodo sufficientemente lungo di "stress" da parte del mare e degli agenti atmosferici, conferma pienamente la validità delle scelte progettuali e dei metodi costruttivi.

Attività da finanziare

Con gli ulteriori finanziamenti che verranno resi disponibili, si completerà l'intervento generale di difesa dei litorali veneziani; in particolare, gli interventi lungo il litorale di Lido, di Cortellazzo, e di Eraclea per completare alcune attività precedentemente avviate.
Dovrà essere garantito il finanziamento per le attività di monitoraggio e di gestione degli interventi già realizzati, con particolare riguardo ai ripascimenti che dovranno essere oggetto di manutenzione negli anni futuri.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

	Fabbisogno Totale	Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi	19,682	19,682	-
Indagini, monitoraggi e gestione dei litorali	45,439	19,239	26,200
Litorale di Jesolo - Cortellazzo - Eraclea	56,900	39,400	17,500
Litorale di Cavallino	54,583	54,583	-
Litorale di Lido	45,652	27,652	18,000
Litorale di Pellestrina	162,531	162,171	0,360
Litorale di Sottomarina	7,296	7,296	-
Litorale di Isola Verde	21,017	21,017	-
Somme a disposizione	3,371	3,371	-
TOTALE	**416,471**	**354,411**	**62,060**

Due fenomeni hanno contribuito al rapido degrado dell'ecosistema lagunare:

- l'erosione, che sottrae sabbia e sedimenti con una dinamica che provoca l'appiattimento dei fondali e la scomparsa delle strutture fisiche proprie dell'ambiente lagunare (canali, bassifondi, velme e barene);
- l'inquinamento che, divenuto imponente negli ultimi quarant'anni, ha causato il progressivo decadimento della qualità delle acque.

Le opere per contrastare i fenomeni suddetti sono state definite in due diversi progetti: quello del recupero morfologico e quello dell'arresto del degrado (v. paragrafo 3.7).

La ricchezza e la complessità morfologica dell'ecosistema lagunare vanno via via scomparendo per effetto di una serie di fattori che si alimentano tra loro. Erosione, acque alte e moto ondoso stanno gradualmente trasformando la laguna: essa sta perdendo le sue caratteristiche fisiche di zona umida per assumere, invece, quelle semplificate e indifferenziate dell'ambiente marino.
Contrastare l'erosione, trattenendo in laguna parte dei sedimenti che, per cause naturali o artificiali, si disperderebbero a mare o nella laguna stessa è il primo obiettivo degli interventi per il recupero morfologico che sono finalizzati a ripristinare le funzioni ambientali, idrodinamiche e naturalistiche dei singoli elementi dell'ambiente lagunare, concorrendo a una complessiva rinaturalizzazione dell'ambiente.

Mediante studi, sperimentazioni e monitoraggi prima, durante e a fine lavori, le opere stanno acquisendo progressivamente una specializzazione naturalistico-ambientale sempre più accentuata.

Il programma degli interventi va dalla ricalibratura dei fondali dei canali lagunari soggetti all'interramento, al riuso dei sedimenti dragati per la realizzazione di zone umide e piane a marea (velme e barene); dalla protezione dei bordi e della vegetazione delle barene esistenti con le più avanzate tecniche dell'ingegneria naturalistica, al sovralzo dei fondali per contrastare il moto ondoso e al consolidamento dei fondali attraverso il trapianto di fanerogame. Di questo programma fanno parte anche i lavori per il ripristino delle sponde delle isole minori degradatesi a causa della crescita del livello del mare e del moto ondoso.

Le aree di intervento vengono individuate anche sulla base di una serie di studi specifici che hanno consentito una suddivisione della laguna in aree omogenee definite a seconda delle locali condizioni idrodinamiche, morfologiche, del valore ambientale ed a seconda degli usi.

Tutti gli interventi sulla morfologia mantengono nel loro insieme un carattere di costante attività locale con contenuti di innovazione e di sperimentalità.

Un continuo monitoraggio degli effetti consente di ottimizzarne via via l'efficacia. Le attività di monitoraggio, infatti, costituiscono l'indispensabile supporto ad alcuni tra i principali lavori realizzati e in corso e forniscono un quadro completo e dettagliato della situazione preesistente nelle aree in cui si opera, dei criteri e dei sistemi esecutivi adottati, degli effetti degli interventi a breve e lungo termine e della loro congruenza con le ipotesi progettuali.
Solamente attraverso il monitoraggio protratto per lunghi periodi (dell'ordine dei 5-10 anni) è possibile acquisire le conoscenze che consentono di raggiungere gli obiettivi di ricostruzione dell'ambiente lagunare attraverso progressivi affinamenti dei progetti, dei materiali impiegati e dei mezzi d'opera.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2005

Attività finanziate
Specifici *interventi sperimentali* sono stati realizzati anche nell'ambito degli interventi di riequilibrio ambientale. In tali sperimentazioni, uniche nel loro genere eseguite in questo campo, sono state applicate strategie operative del tutto originali e tecnologie, per molti aspetti, innovative.

Anche sulla base dei risultati ottenuti con gli interventi sperimentali, il Consorzio Venezia Nuova ha, successivamente, predisposto un *progetto generale di massima per il ripristino della morfologia lagunare*, approvato dall'Amministrazione Concedente nel 1992, che prevede la realizzazione di una serie di interventi, già realizzati o in corso di realizzazione come più oltre descritto.

Si ritiene importante segnalare che, nel corso del 2005, è stato completato l'elaborato *Studi di base, linee-guida e proposte di intervento del Piano morfologico* redatto preliminarmente

all'aggiornamento del *Piano Generale degli Interventi per il recupero morfologico*, richiesto dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 15 marzo 2001, e dal Comitato ex art. 4 Legge 798/84 recependo, in particolare, con deliberazione del 3 aprile 2003, la richiesta dell'Amministrazione Comunale di Venezia.

Le linee-guida per l'aggiornamento del Piano sono state illustrate alla Commissione degli Esperti del Magistrato alle Acque e, successivamente, sottoposte all'esame del Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nelle sedute del 20 ottobre 2004 e del 24 novembre 2004. In quest'ultima seduta, il Comitato, con voto n. 165, ha espresso parere favorevole sul documento presentato, con raccomandazioni e osservazioni. In parallelo, l'*Ufficio di Piano* ex D.P.C.M. 13 febbraio 2004 ha iniziato l'esame della documentazione prodotta, richiedendo delle relazioni integrative e l'illustrazione, da parte del Concessionario, degli elaborati, nel corso delle sedute tenutesi, da novembre 2004, per tutto il primo semestre del 2005. *L'Ufficio di Piano*, a completamento degli approfondimenti condotti, ha espresso un proprio parere in data 1° luglio 2005, con il quale, sulla base di specifiche osservazioni sull'impostazione metodologica delle linee-guida, fornisce alcuni indirizzi per l'elaborazione del redigendo aggiornamento del Piano morfologico, che dovrà essere supportato da opportune attività sperimentali.

Al 31 dicembre 2005, i principali interventi realizzati e in via di realizzazione sono i seguenti, raggruppati secondo i principali obiettivi:

a) *Ricalibratura dei canali, sollevamento dei bassi fondali e ricostruzione di velme e barene, anche attraverso il riuso dei sedimenti dragati e reintroducendo sedimenti in laguna; ricostruzione morfologica degli argini di conterminazione lagunare.*

   A seguito dell'approvazione da parte del Magistrato alle Acque dei relativi progetti esecutivi, gli interventi di ricalibratura dei canali lagunari e di ricostruzione delle strutture morfologiche lagunari hanno riguardato circa 90 aree di intervento.

   Il quantitativo di sedimenti riutilizzato è stato, mediamente, di circa 500.000 metri cubi all'anno, realizzando così circa 980 ettari di velme, barene e sovralzi di fondale.

   Nelle opere di recupero morfologico di questo tipo si utilizzano i sedimenti presenti in laguna, i quali hanno caratteristiche

chimiche e fisiche fortemente variabili da zona a zona ed il loro riuso dipende anche dalle condizioni meteomarine variabili nel tempo.

Attualmente, in questo ambito, sono in corso di realizzazione attività che riguardano la ricostruzione del tessuto morfologico di numerose zone lagunari in situazioni particolarmente critiche, in particolare: la zona di velme e barene e canali intorno all'isola di *Santa Cristina* (intervento ultimato nel secondo semestre del 2005); l'area lagunare in prossimità del canale di *Tessera*; i *canali Santo Spirito, Rezzo e Fasiol* ove vengono risagomate le sezioni (intervento ultimato nel secondo semestre del 2005); interventi per la sistemazione delle *Casse di Colmata D/E* e del *canale Fossetta dei Barambani* (intervento in corso); l'intervento di *ripristino morfologico dell'area del lago dei Teneri,* primo e secondo stralcio. Il primo stralcio prevede la ricalibratura del canale "Taglio vecchio" e il ripristino di tre barene lungo il canale "Taglio vecchio" e il canale "Tezze fonde" con sedimenti idonei, provenienti da lavori di dragaggio.
Il secondo stralcio comporta il ripristino di due barene in corrispondenza di valle Zappa.
Si segnala, infine, l'avvio, nel secondo semestre del 2005, dell'intervento di protezione dei fondali adiacenti il canale *S. Leonardo – Marghera* primo stralcio - prima fase pilota. La zona lungo il canale Malamocco - Marghera è una delle porzioni della laguna che ha subito, in quest'ultimo trentennio, il maggior depauperamento delle strutture morfologiche dovuto, soprattutto, allo scavo del "canale c.d. dei Petroli", tra la bocca di Malamocco e il porto S. Leonardo, che ha comportato un profondo mutamento del regime delle correnti di marea, provocando un progressivo appiattimento della laguna centrale per erosione dei bassofondali e sedimentazione dei canali naturali adiacenti, alcuni dei quali sono oggi, ormai, completamente scomparsi. Questo primo stralcio comprende la realizzazione di cinque strutture morfologiche a barena lungo i bassofondali adiacenti il canale.
Sempre in questo ambito di attività si evidenzia, inoltre, l'avvio, nel 2005, dell'intervento di recupero morfologico dell'area lungo il *canale Novissimo – Barena Otregan*. Il progetto riguarda la realizzazione di alcuni degli interventi relativi al recupero morfologico della parte meridionale della laguna di Venezia, mediante la messa in opera delle conterminazioni della barena Otregan sita nell'area di Valle

della Dolce, in adiacenza al canale Novissimo. Tale barena sarà realizzata mediante refluimento di sedimenti idonei, provenienti da altri interventi in corso di realizzazione in aree limitrofe e dagli interventi alle bocche di porto, destinandola, in particolare, al recapito dei materiali provenienti da alcuni dragaggi nella bocca di Chioggia.

b) *Protezione delle barene; riavvio dei dinamismi naturali nei bassifondi e nelle barene; naturalizzazione delle barene già realizzate.*
La naturalizzazione dell'ambiente lagunare di fondale e di barena è un obiettivo importante per il recupero morfologico in quanto consente di potenziare le capacità di automantenimento e di riorganizzazione del sistema lagunare attraverso processi naturali di accrescimento, per sedimentazione e sviluppo, della vegetazione che garantiscono la conservazione dell'identità del territorio. Inoltre, le barene artificiali, al termine della loro realizzazione mediante il refluimento dei sedimenti, non costituiscono l'opera finita. Esse sono solo il presupposto indispensabile per l'avvio di processi naturali (l'assestamento della quota, le variazioni delle caratteristiche pedologiche, lo sviluppo della vegetazione) che trasformano il semplice deposito dei nuovi sedimenti, attuato per contrastare la perdita di quota, in un ambiente che progressivamente acquista i caratteri e le funzione tipiche delle zone umide lagunari (elevata biodiversità, alta produzione biologica, capacità di automantenimento). Si ha:

- *protezione barene*: ad oggi gli interventi in corso di esecuzione o già realizzati hanno riguardato 50 aree.
  Negli interventi di protezione delle barene naturali vengono impiegati materiali diversi a seconda del grado di esposizione ai processi erosivi e nel rispetto dei vincoli di natura archeologica e paesaggistica.
  In generale sono state impiegate: palificate; piccole scogliere in pietrame contenute entro reti (le burghe); sovralzi sabbiosi; piantumazione di specie vegetali alofile secondo tipologie operative e modalità costruttive che ben si inseriscono nel paesaggio lagunare senza rinunciare ad una loro sufficiente durata; in alcuni casi si è iniziato a sperimentare materiali biodegradabili;
- *interventi di riavvio dei dinamismi naturali*: sono in corso di realizzazione, ovvero sono stati realizzati, interventi in 17

aree con fascinate di sedimentazione (aree confinate in cui è facilitata la cattura dei sedimenti sospesi); in 34 aree con trapianto di vegetazione.

- *naturalizzazione delle barene artificiali*: si è intervenuti su 12 barene.
  Allo scopo di accelerare i processi di naturalizzazione delle barene artificiali, si procede alla rimozione delle palificate di contenimento delle barene artificiali, una volta completato il consolidamento del materiale refluito. Ciò, per facilitare lo scambio con le acque circostanti, e, quindi, lo sviluppo naturale della vegetazione. E' anche previsto lo scavo di "ghebi" e "chiari" all'interno delle barene artificiali per aumentare la diversificazione degli habitat.

c) *Arresto dell'erosione e del degrado ambientale delle isole minori*
E' stata completata, ovvero è in corso di esecuzione, la protezione di 12 isole (Campalto, Fisolo, San Servolo, Isola dei Laghi, Certosa, Lazzaretto Nuovo San Lazzaro degli Armeni, San Michele – completate; San Giacomo in Paludo, Poveglia, Lazzaretto Vecchio, San Francesco del Deserto – in corso).
Sono in fase di progettazione gli interventi riguardanti le isole di Mazzorbetto, Santa Caterina, Santo Spirito, Vignole, San Michele, San Giorgio in Alga, San Pieretto, Madonna del Monte, Isola Campana, S. Angelo delle Polveri.

Gli interventi riguardano il rinforzo di margini di isole in cui non era possibile ridurre l'azione erosiva del moto ondoso generato dal vento con interventi di protezione e sollevamento dei fondali lagunari ed in cui non era nemmeno eliminabile il moto ondoso da natanti.

Infine, anche nel corso del 2005 sono proseguite numerose attività di *studio, sperimentazione e monitoraggio* nel settore ambientale.
In particolare, a seguito degli approfondimenti richiesti dalle Amministrazioni Comunali di Venezia e di Chioggia in sede di Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nella seduta del 3 aprile 2003, si fa rilevare il completamento dei seguenti studi:

- *Studio degli interventi per rinaturalizzare la bocca di Lido*;

- *Analisi della possibilità di reperimento di sedimenti dal fiume*

Brenta;

- *Interventi per immettere in laguna acqua dolce e sedimenti trasportati dai fiumi. Analisi della disponibilità di sedimenti nel fiume Piave*;

- *Verifica della possibilità di approvvigionamento dei sedimenti per gli interventi morfologici in laguna da invasi idroelettrici.*

Proseguono, infine, le attività di monitoraggio che costituiscono l'indispensabile supporto ad alcuni tra i principali lavori, realizzati e in corso di realizzazione. Tali attività forniscono un quadro completo e dettagliato della situazione preesistente nelle aree in cui si opera, dei criteri e dei sistemi esecutivi adottati, degli effetti degli interventi a breve e lungo termine e della loro congruenza con le ipotesi progettuali.

Attività da finanziare

Si segnala la necessità di disporre di ulteriori finanziamenti per poter proseguire, senza soluzione di continuità, gli interventi di ripristino morfologico nelle zone lagunari più critiche, secondo le linee-guida recentemente delineate nell'ambito dell'aggiornamento del Piano morfologico.

In particolare è necessario disporre di finanziamenti per sviluppare le attività di rinaturalizzazione e riattivazione dei dinamismi naturali estese al bacino lagunare; la realizzazione di interventi sperimentali specifici per testare sul campo le problematiche emerse in sede di revisione del Piano morfologico; il completamento di ricostruzione morfologica e ambientale nelle zone della laguna nord, lungo il canale S. Leonardo-Marghera nella zona di Lago dei Teneri, nonché nelle zone di gronda lagunare, per citarne solo alcuni.

E necessario, infine, disporre di finanziamenti per avviare studi sulla biodiversità dell'ambiente lagunare ed in particolare sull'ambiente di barena e di fondale, in modo da ottimizzare gli interventi di rinaturalizzazione.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

	Fabbisogno Totale	Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi e interventi sperimentali	60,717	40,567	20,150
Progetto generale, indagini	14,723	14,723	-
Ricalibratura canali, sollevamento bassi fondali e ricostruzione velme e barene, sistemazione argini di conterminazione	320,278	241,478	78,800
Protezione barene, riavvio di dinamismi naturali, naturalizzazione barene	169,295	65,201	104,094
Interventi per l'arresto dell'erosione e del degrado ambientale delle isole minori	143,214	101,643	41,571
Somme a disposizione	5,334	5,334	-
TOTALE	**713,561**	**468,946**	**244,615**

Il fabbisogno totale e il finanziato non comprendono gli importi relativi a interventi morfologici strettamente connessi con la realizzazione delle opere alle bocche di porto, ricompresi, pertanto, nel prezzo chiuso (vedi scheda "Difesa dalle acque alte eccezior

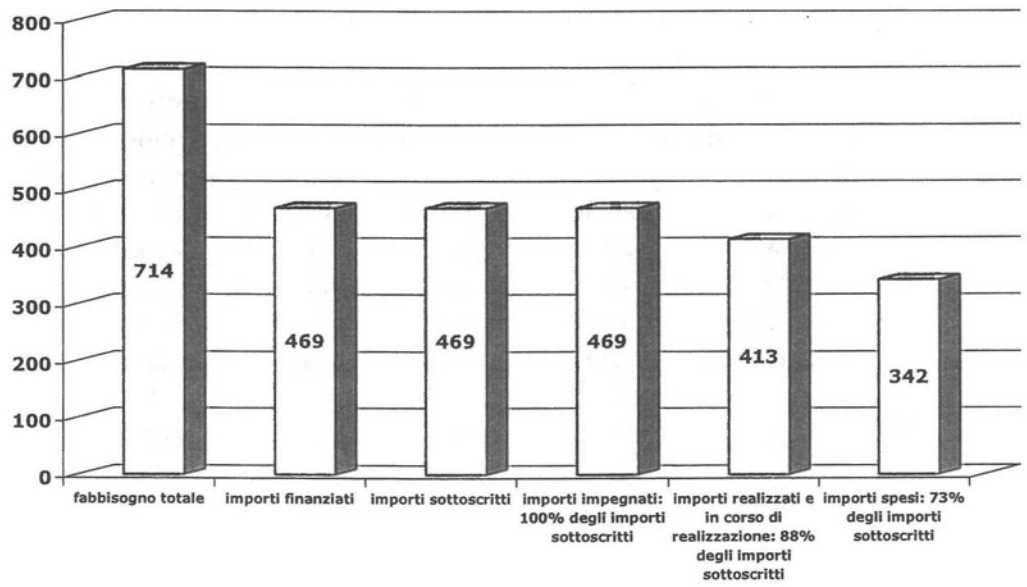

3.7 Arresto del degrado dell'ecosistema lagunare
(interventi di cui all'art. 3 lettera a) legge n. 798/84)

Obiettivo

Gli obiettivi degli interventi per l'arresto e l'inversione del degrado sono così raggruppabili:
- difesa della qualità delle acque, eliminando o limitando gli apporti di inquinanti provenienti dai depositi di rifiuti abbandonati e dai suoli inquinati emersi;
- difesa della qualità delle acque, eliminando o limitando gli apporti di inquinanti provenienti dalle sponde e dai fondali dei canali industriali;
- difesa della qualità delle acque, limitando la disponibilità delle sostanze inquinanti presenti nei sedimenti lagunari;
- difesa della qualità, delle acque controllando gli apporti inquinanti provenienti dal bacino scolante in laguna.

In accordo con la Direttiva 2000/60/EC del Parlamento e del Consiglio Europeo, pubblicata il 22 Dicembre 2000 sulla GUCE, che ha istituito un quadro di riferimento comunitario per le politiche dell'acqua, la qualità delle acque non si definisce più solo in base alle caratteristiche chimiche e fisiche delle stesse ma sulla base dell'insieme degli aspetti che ne definiscono i caratteri e sostengono i processi ecologici. Gli obiettivi degli interventi devono quindi tener adeguatamente conto anche degli aspetti biologici e delle interazioni tra gli ecosistemi costituenti il Sistema lagunare.

Descrizione degli interventi

La situazione di degrado ambientale degli ecosistemi della laguna dovuta all'inquinamento ancora significativo (ancorché il picco degli apporti sia ormai stato superato da circa vent'anni) è indicata in modo macroscopico da: riduzione del numero delle specie animali e vegetali; distorsioni dei processi trofici; alterazioni nei processi metabolici, nelle capacità riproduttive e nella durata tipica della vita di molte specie animali; morie occasionali di pesci per scarsità di ossigeno nell'acqua; torbidità dell'acqua e conseguente ridislocazione della vegetazione acquatica (comprese le fanerogame, che con il loro apparato radicale, contrastano l'erosione dei fondali).
Gli studi condotti in questi anni, principalmente dal Magistrato alle Acque, hanno permesso di mettere gradualmente a fuoco anche gli aspetti meno appariscenti ma sempre significativi del degrado ambientale, e di affinare quindi gli interventi di contrasto ed eliminazione degli apporti inquinati e di correzione degli effetti indotti sul Sistema lagunare.

La scomparsa di una fascia di transizione tra terraferma e laguna, ai margini del bacino lagunare, ha aggravato la situazione in quanto tale fascia catturava una grande quantità di nutrienti ed altre sostanze realizzando una "depurazione" naturale degli apporti e sosteneva "habitat" caratteristici e complementari di quelli lagunari per molta parte della fauna superiore.
Il disinquinamento delle acque che pervengono nel bacino lagunare dall'entroterra è, prevalentemente, di competenza della Regione del Veneto. Gli interventi di competenza del Magistrato alle Acque si attuano all'interno della conterminazione lagunare ed hanno come obiettivo la difesa e/o il miglioramento della qualità delle acque e dei sedimenti e, quindi, della biosfera lagunari.

Il Progetto Generale sviluppato dal Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova per l'arresto dei processi di degrado prevede diversi tipi di intervento che:

- eliminano, o limitano, gli apporti al sistema lagunare di inquinanti provenienti:
  - dai siti inquinati emersi interni alla conterminazione lagunare e dalle fonti puntuali e diffuse dislocate nel bacino scolante in laguna a questa recapitati tramite i corsi d'acqua superficiali e sotterranei;
  - dai sedimenti lagunari.

- migliorano la capacità delle diverse componenti di sopportare l'azione degli inquinanti, di reagire e di eliminare e disperdere gli inquinanti stessi.

Le azioni devono svilupparsi secondo una strategia volta, parallelamente, a:

- contrastare ed eliminare le situazioni critiche che possono causare collassi e crisi irreversibili del sistema, almeno localmente;
- ridurre, fino ad eliminarli, gli apporti inquinanti indesiderati e, successivamente, eliminare gli accumuli di inquinanti interni al sistema, intervenendo infine anche per re-indirizzare la produttività biologica del sistema e ripristinare l'habitat e i processi ecologici che erano stati alterati dall'inquinamento, in stretto coordinamento con gli interventi di recupero e ripristino morfologico.

Mentre procede la riduzione degli apporti dai corsi d'acqua del bacino scolante e dagli scarichi diretti in laguna, l'azione del Magistrato alle Acque si è concentrata sulla difesa delle acque lagunari dal degrado causato dagli inquinanti provenienti da:

- rilasci, risospensioni e dispersioni di sedimenti, in ambito portuale, molto inquinati e tali da essere una fonte significativa interna alla laguna stessa;
- rilasci, erosioni e dispersioni di materiali contaminanti dalle discariche incontrollate (ante DPR 915/1984), utilizzate in passato per smaltire rifiuti di diversa origine, tra cui scorie delle produzioni industriali, che ora si trovano abbandonate all'interno della conterminazione lagunare;
- rilasci e dispersioni di inquinanti da sedimenti esterni all'area critica di Porto Marghera: nuove tecniche di risanamento dei fondali vengono sperimentate in zone lagunari esterne alle aree più critiche per bloccare il rilascio di inquinanti via via accumulatisi nei sedimenti;
- rilasci, erosioni e dispersioni di materiali contaminanti dalle sponde dei canali di Porto Marghera afferenti suoli artificiali realizzati utilizzando anche residui delle lavorazioni industriali.

Con riguardo a quest'ultima fonte di inquinamento per le acque lagunari, è opportuno ricordare che le aree industriali di Porto Marghera sono state realizzate, negli anni dal 1920 al 1960, imbonendo zone lagunari di barene con riporti di materiali eterogenei quali: terre da dragaggi portuali, residui di lavorazioni industriali e rifiuti solidi urbani.
Oggi, in alcuni casi, lungo le sponde dei canali industriali, tali materiali sono a contatto con le acque lagunari, per cui si verifica il rilascio di sostanze inquinanti per effetto del moto ondoso, della marea e del dilavamento da parte delle piogge. Sui fondali dei canali, inoltre, si sono accumulate, negli anni, sostanze inquinanti provenienti dai reflui delle lavorazioni portuali e industriali: un problema che solo da alcuni anni è apparso in tutta la sua gravità e viene oggi affrontato in modo sistematico e organico.

In data 21 ottobre 1998, anche alla luce del Decreto del Ministro dell'Ambiente del giugno 1998 sugli scarichi in laguna di Venezia, è stato siglato l'Accordo di Programma sulla chimica a Porto Marghera (approvato con D.P.C.M. del 12 febbraio 1999, successivamente integrato il 15 dicembre 2000 con un atto approvato con D.P.C.M. del 15 novembre 2001) in cui sono inserite

anche le azioni di competenza del Magistrato alle Acque.
Gli interventi del Magistrato alle Acque vengono attuati secondo un piano concordato con l'Autorità Portuale di Venezia mediante specifici atti d'intesa e riguardano, principalmente, la realizzazione di opere di conterminazione delle sponde delle "macroisole" di Porto Marghera individuate dal *"Master Plan delle bonifiche di Porto Marghera"*, dichiarato sito di interesse nazionale ex art. 1, legge 426/1998 (D.M. Ambiente 23.02.2000) e di dragaggio dei sedimenti inquinati depositati sul fondale e sulle rive dei canali industriali.
In questo ambito, il Magistrato alle Acque ha incaricato il proprio concessionario di predisporre un inquadramento tecnico generale degli interventi di propria competenza nonché di svolgere la progettazione esecutiva e di realizzare gli interventi considerati prioritari.

Nuove tecniche di risanamento dei fondali vengono, infine, sperimentate in zone lagunari esterne alle aree più critiche per bloccare il rilascio di inquinanti via via accumulatisi nei sedimenti.
Per migliorare la capacità delle diverse componenti del sistema di sopportare l'azione degli inquinanti, per prevenire il rischio di crisi ambientali dovute alla proliferazione di macroalghe alimentate dall'abbondanza di nutrienti disponibili nelle acque lagunari, vengono eseguite periodiche campagne di raccolta.
Le conoscenze sullo stato di inquinamento dei sedimenti e sulle problematiche di protezione dell'ambiente e della salute umana crescono rapidamente in parallelo con l'attuazione degli interventi e con l'emergere di nuove normative e direttive di tutela.
Gli interventi da attuare in laguna hanno, quindi, un forte contenuto sperimentale conseguente alla necessità di tener conto delle problematiche che via via emergono.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2005

Attività finanziate
I primi *interventi sperimentali* di riequilibrio ambientale sono stati realizzati nella *zona tra i canali S. Spirito e delle "Scoasse"*, una zona di fronte all'isola di Lido caratterizzata da abnorme crescita di macroalghe, nel *Lago dei Teneri*, un tratto di laguna retrostante le casse di colmata, e in *Palude della Rosa*, vicino all'isola di Torcello.
Si è potuta verificare la risposta locale dell'ecosistema ai

trattamenti compiuti per il miglioramento della qualità dei sedimenti del fondale.

Il Consorzio Venezia Nuova ha redatto un *progetto di massima degli interventi per l'arresto del degrado* che è stato approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nel 1994.
Per poter realizzare le attività previste dal progetto di massima degli interventi per l'arresto del degrado, è necessario acquisire dati e informazioni mediante indagini e monitoraggi propedeutici alla progettazione esecutiva degli interventi e monitoraggi ex ante e ex post rispetto alla realizzazione degli interventi.

In particolare, obiettivi delle *indagini* sono:

- definire e mantenere aggiornato lo stato degli ecosistemi lagunari e delle loro linee di evoluzione tendenziale, individuando priorità, opportunità e sinergie di intervento;
- ottenere una mappatura delle caratteristiche chimiche, fisiche, idrogeologiche e geotecniche dei depositi di rifiuti e dei sedimi su cui questi giacciono;
- ottenere una mappatura delle caratteristiche chimiche, fisiche, mineralogiche e geotecniche dei sedimenti, sia dei bassifondali che dei canali;
- ottenere una mappatura dei popolamenti bentonici e delle loro dinamiche;
- avere una mappatura dei popolamenti vegetali ed animali degli ecosistemi lagunari che potrebbero essere bersaglio e poi veicolo di propagazione dell'inquinamento;
- ottenere una mappatura delle caratteristiche chimiche, fisiche, idrogeologiche e geotecniche dei materiali costituenti le sponde dei canali;
- stabilire le profondità a cui eventualmente scavare e bonificare i fondali, i relativi volumi di sedimenti da prelevare e le modalità di gestione;
- definire la possibile destinazione dei sedimenti e le modalità di trattamento;
- verificare le condizioni che hanno portato e che potrebbero portare alterazioni dei sedimenti sul fondo dei canali;
- acquisire elementi sulla pericolosità per la salute umana e per gli ecosistemi lagunari dei diversi depositi di inquinanti, anche in relazione alla graduale evoluzione dello stato complessivo dell'ecosistema;
- valutare la compatibilità degli interventi previsti con quanto indicato dagli strumenti di pianificazione territoriale.

Per quanto riguarda i *monitoraggi*, questi hanno tre finalità principali strettamente correlate:

- tenere aggiornate le basi conoscitive generate dalle indagini a supporto della programmazione e della progettazione degli interventi;
- controllare l'efficacia diretta ed indiretta degli interventi realizzati, al fine di migliorare l'efficienza dell'azione del Magistrato alle Acque e di correggere eventuali insufficienze;
- sostenere il Magistrato alle Acque nella sua azione di gestore generale del sistema lagunare attribuitagli dalla legge, in collaborazione con la Regione, le Province e i Comuni interessati.

La progressiva realizzazione del progetto generale degli interventi per l'arresto ed inversione dei processi di degrado prevede una serie di *interventi* secondo le seguenti principali tipologie:

a) *Difesa della qualità delle acque mediante interventi che limitano l'entità delle sostanze inquinanti provenienti dalle sponde e dai fondali dei canali industriali di Porto Marghera e dai depositi abbandonati di rifiuti.*
La progressiva realizzazione degli interventi per l'arresto e l'inversione dei processi di degrado prevede una serie di attività finalizzate a contrastare la dispersione in laguna dei materiali contaminanti e, quindi, a proteggere le acque lagunari dal rilascio di inquinanti provenienti - per erosione, per dilavamento e per filtrazione - dalle sponde delle "macroisole" di Porto Marghera individuate dal citato "Master Plan delle bonifiche di Porto Marghera" e dalle discariche che venivano utilizzate, in passato, per smaltire rifiuti di diversa origine.
In questo ambito, si ritiene significativo segnalare che, su precisa indicazione impartita dall'Amministrazione Concedente, d'intesa con l'Autorità Portuale di Venezia, nell'ambito delle competenze definite dall' "Accordo di Programma per la Chimica a Porto Marghera", approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.02.1999, il Consorzio Venezia Nuova sta sviluppando un articolato programma, avviato sin dal 1996, di marginamento delle sponde delle aree inquinate che si affacciano sui canali di Porto Marghera e sulla laguna. La progettazione degli interventi di conterminazione e di messa in sicurezza delle

"macroisole" è stata avviata da tempo ed è, ormai, già completata o, comunque, in avanzata fase di sviluppo; numerosi lavori sono già stati realizzati o sono in corso di realizzazione.

Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi a Porto Marghera di competenza dello Stato derivano sia dalle somme attivate nell'ambito della Legislazione speciale per Venezia, sia dalle somme messe a disposizione dal Ministero dell'Ambiente, a valere sulla legge n. 641/1996 - deliberazione CIPE del 18.12.1996 -, sia dagli accordi transattivi tra lo Stato e alcuni Soggetti che operano a Porto Marghera, finalizzati ad accelerare la realizzazione delle opere di messa in sicurezza progettate dallo Stato/Magistrato alle Acque di Venezia.

Il principale accordo è stato stipulato tra lo Stato e la Montedison - ora Edison S.p.A. - il 31.10.2001 e ha finanziato l'Atto Attuativo rep. n. 8022/2004 tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova.
Nel 2005 si sono aggiunti ulteriori accordi tra Stato (Ministero dell'Ambiente e del Territorio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque) ed ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing (15.02.2005), ENEL S.p.A. (21.07.2005), IES S.p.A. (21.07.2005), API S.p.A. (21.07.2005) ed ESSO Italiana s.r.l.(01.08.2005), che hanno permesso di finanziare l'Atto Attuativo rep. n. 8062/2005.
Ulteriori accordi sono in fase di definizione tra lo Stato e gli enti privati operanti a Porto Marghera.

Gli interventi, realizzati e in corso di realizzazione, consistono, essenzialmente, nell'infissione, lungo l'asse del filo della sponda individuato dal "Piano Regolatore Portuale", di una schiera di palancole metalliche tra loro strutturalmente collegate e sigillate con apposite guarnizioni poliuretaniche, spinte fino alla quota necessaria ad assicurare l'intercettazione delle acque della prima falda in pressione. Qualora la quota del fondale del canale antistante la schiera di palancole sia maggiore di -4 metri sul l.m.m., il palancolato metallico richiede un rinforzo strutturale costituito da tirantature e ancoraggi. In ogni caso, in vista della eventuale trasformazione del marginamento in una banchina portuale, la schiera di palancole viene opportunamente dimensionata e verificata nel calcolo ipotizzando la successiva asportazione

del materiale antistante, lato canale, fino alla profondità prevista dal "Piano Regolatore Portuale".
La quota superiore del marginamento è compresa tra 2,1 e 2,5 metri sul l.m.m.; la profondità di infissione delle palancole varia da 14 a 28 metri dal l.m.m..
Per mettere in sicurezza e isolare idraulicamente i suoli inquinati retrostanti la schiera di palancole, l'intervento prevede anche la realizzazione di opere per la raccolta delle acque di falda e meteoriche (drenaggi) e il loro allontanamento mediante il recapito, a gravità o con pompaggio, ai cunicoli di adduzione all'impianto di depurazione multifunzionale di Fusina, in fase di realizzazione da parte della Regione del Veneto, anche mediante un Accordo di Programma siglato nel corso del 2005 con il Magistrato alle Acque (Progetto Integrato Fusina). L'allontanamento delle acque di falda dal terreno retrostante la schiera di palancole riduce i sovraccarichi, e le loro variazioni, che gravano sulle strutture del marginamento e, inoltre, consente di eliminare sostanze inquinate dai suoli delle "macroisole".

Gli interventi in corso di esecuzione e avviati nel 2005 hanno riguardato:

- lungo la "macroisola" del Nuovo Petrolchimico: la *sponda nord del canale industriale sud,* ove l'erosione della riva e i rilasci di inquinanti, soprattutto fanghi di bauxite, i cosiddetti "fanghi rossi", erano particolarmente evidenti; la sponda lagunare ovest del *canale S. Leonardo – Marghera*; la *sponda sud del canale industriale Ovest; la sponda sud del canale Lusore Brentelle; la sponda sud della darsena della Rana;*

- lungo la "macroisola" del Vecchio Petrolchimico: la sponda nord del *canale Lusore Brentelle*;

- lungo la "macroisola" delle Raffinerie: le sponde e i fondali del *canale industriale Brentella*; la sponda nord del *canale Vittorio Emanuele III*; la sponda lagunare detta *III Argine*; la sponda lagunare dell'area cosiddetta dei *Pili*; la sponda sud del canale *S. Giuliano*. In questa "macroisola", in particolare, si segnala l'avvio degli importanti lavori di bonifica, con misure di sicurezza, delle aree dei Pili e del III Argine. Il primo prevede, oltre alla realizzazione del palancolato metallico strutturale, anche di un diaframma

plastico, in cemento bentonite, con funzione di barriera impermeabile per il contenimento degli inquinanti; la bonifica dei fondali antistanti le sponde mediante il dragaggio dei sedimenti direttamente contaminati; il refluimento e la collocazione temporanea dei sedimenti dragati, all'interno di contenitori in geotessuto di poliestere (collocati in bacini di accumulo appositamente predisposti nella zona), allo scopo di ottenere una riduzione - per essiccamento - del volume dei materiali dragati, in vista di un loro successivo smaltimento finale; la predisposizione del sistema di drenaggio. Il secondo prevede interventi per la messa in sicurezza permanente, con soluzioni analoghe a quelle per la contigua area de "I Pili", dell'area demaniale di circa 11 ettari confinante con i depositi di Petroven, in cui poter eventualmente collocare una o più vasche da utilizzare per la messa in riserva dei sedimenti più inquinati provenienti dai canali di Porto Marghera, destinati al trattamento finalizzato al riutilizzo e/o allo smaltimento;

- lungo la "macroisola" 1^ Zona industriale: la sponda ovest del *canale Brentella*; la sponda nord del *canale industriale nord*;

- lungo la "macroisola" dei Serbatoi petroliferi: tutte le sponde della "macroisola": ovest, nord e sud;

- lungo la "macroisola" di Malcontenta: *darsena terminale del canale industriale sud: sponda nord* in corrispondenza dell'area in concessione a Sirma S.p.A. e *sponda ovest*;

- lungo la "macroisola" di Fusina: la *sponda sud* del *canale industriale sud,* in corrispondenza dell'area in concessione ad Abibes S.p.A. e in corrispondenza della zona denominata "area 43 ettari". In questa zona l'area, sostanzialmente formata da rifiuti industriali, la cui sponda non ha nessuna protezione, rappresenta una delle principali fonti di inquinamento del canale. Le opere progettate hanno la finalità di tutelare la laguna contro i rilasci inquinanti provenienti dalle aree a tergo delle sponde e di arrestare i fenomeni erosivi in atto lungo le sponde non protette con il conseguente progressivo arretramento della linea di riva; la sistemazione della

sponda ovest del canale San Leonardo - Marghera compresa tra il canale industriale Ovest e Fusina;

- lungo la "macroisola" Portuale: la *sponda est del canale industriale Ovest.*

Anche *l'attività di asportazione dei sedimenti inquinanti dal fondale del canale industriale Nord a Porto Marghera* ha interessato tutto il 2005.
L'intervento, avviato nel 1996, con una prima fase completata nel 2000, risponde alla finalità di realizzare uno scavo dello specchio acqueo in prossimità della banchina in concessione alla Fincantieri S.p.A., allontanando dal sito il materiale inquinante ivi depositato che, nel tempo, continuava a rilasciare sostanze provenienti dalle lavorazioni industriali.
Nel corso del 2001 sono state completate anche le lavorazioni relative alla seconda fase e sono state avviate le lavorazioni relative al secondo stralcio, la cui prima fase è in corso di esecuzione.

b) *Difesa della qualità delle acque mediante interventi che limitano la disponibilità delle sostanze inquinanti presenti nei sedimenti lagunari.*
Gli interventi del Piano Generale già realizzati, in corso e in fase di progettazione per raggiungere questo obiettivo sono:

- confinamento mediante ricopertura dei sedimenti dei bassifondali inquinati ma di dimensioni tali da non poter essere asportati e sostituiti, ricostruendo così habitat adatti alla flora e alla fauna lagunari (interventi effettuati con interessanti risultati nel corso degli anni novanta ma ormai non più realizzabili con le nuove norme di tutela ambientale);
- realizzazione di installazioni di messa in riserva temporanea dei sedimenti inquinati in attesa del loro trattamento;
- realizzazione di impianti di condizionamento dei sedimenti inquinati a supporto dei successivi processi di trattamento e di smaltimento;
- raccolta selettiva delle macroalghe nitrofile e riutilizzo delle stesse.

In particolare a partire dal 1989, il Consorzio Venezia Nuova ha svolto periodiche *campagne di raccolta delle macroalghe,*

predisponendo anche un sistema di monitoraggi che indirizzano gli interventi nelle aree maggiormente a rischio (Burano, Tessera, Campalto, Lido, Giudecca e Chioggia). Fino ad oggi sono stati raccolti 221.000 metri cubi di alghe, con un massimo di 50.000 metri cubi nel 1989.
Parte del materiale raccolto è stato utilizzato, per la prima volta, nella produzione di carta. Ne è stato studiato, tra l'altro, anche il possibile uso come ammendante in agricoltura.

c) *Difesa della qualità delle acque lagunari mediante interventi di controllo degli apporti inquinanti dal bacino scolante.*
Gli apporti di inquinanti dal bacino scolante in laguna, compreso il territorio delle isole lagunari e delle isole del litorale si sono significativamente ridotti negli ultimi due decenni per effetto degli interventi di collettamento e depurazione degli scarichi civili e del miglioramento della gestione dei reflui degli impianti produttivi.
I livelli di inquinanti, nutrienti e bioalteranti (inorganici ed organici di sintesi) immessi in laguna dai corsi d'acqua sono tuttavia ancora significativi, per cui appare necessario sviluppare interventi volti ad integrare, agendo sull'interfaccia tra laguna e bacino scolante, l'importante programma che la Regione del Veneto sta attuando secondo un proprio "Piano Direttore", periodicamente aggiornato.
Gli interventi affidati al Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova riguardano:

- realizzazione di strutture morfologiche in prossimità delle foci atte a favorire i processi di sedimentazione degli apporti solidi e dei residui dei processi di flocculazione dei soluti quando le acque da dolci diventano salmastre, in modo da confinare e ridurre le aree di influenza degli apporti inquinanti e, al contempo, realizzare zone a vegetazione palustre salmastra, un tipo di habitat lagunare in progressiva perdita di area;
- regolazione ed eventuale diversione temporanea dei flussi idraulici immessi in laguna in condizioni di piena, quando è massimo il carico di inquinanti veicolato dalle acque immesse;
- trasferimento di parte delle acque dolci che arrivano in laguna in bacini di sedimentazione e fitodepurazione, prima della loro definitiva immissione in laguna.

Sono state ultimate o sono in corso di realizzazione alcune *aree umide in zone di transizione*, localizzate alla Foce del fiume Dese in Palude di Cona, a lato del canale Nuovo e alla foce Cavaizza e delle *aree sperimentali di fitodepurazione* a lato del fiume Brenta, nel ramo abbandonato del canale Novissimo, a servizio delle acque provenienti dal canale Montalbano; un impianto sperimentale è stato in parte realizzato nell'ambito dell'isola demaniale del Lazzaretto Nuovo, per evitare l'immissione di scarichi civili non trattati in laguna.
Inoltre sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione, manufatti di regolazione delle immissioni in laguna delle acque dolci nella zona di Botte Trezze.

Con gli interventi di creazione di aree umide in zone di gronda si intende raggiungere il duplice obiettivo di ripristinare l'ambiente di transizione tra acque dolci e salate di particolare pregio ambientale per la complessità biologica e l'interessa paesaggistico e di ridurre il carico inquinante immesso nel sistema lagunari dagli apporti dal bacino scolante.

Con gli interventi di regolazione dei manufatti idraulici, sarà invece possibile controllare nel tempo le quantità di acqua dolce da immettere in laguna, aumentando così l'estensione delle aree a canneto.
Tali interventi consistono talvolta nella realizzazione di veri e propri impianti; più spesso invece si tratta di interventi di adattamento mirato dell'ambiente esistente al fine di indirizzarne la funzionalità per il trattamento delle acque dolci provenienti dal bacino scolante.

Attività da finanziare

Le attività di monitoraggio degli ambienti lagunari dovranno essere garantite almeno per tutto l'arco di attuazione degli interventi programmati, a supporto della cui progettazione verranno eseguite le necessarie indagini.
Gli interventi, organizzati negli stessi macro-obiettivi, sono:

a) *Difesa della qualità delle acque mediante interventi che limitano l'entità delle sostanze inquinanti provenienti dalle sponde e dai fondali dei canali industriali di Porto Marghera e dai depositi abbandonati di rifiuti.*

Dovrà essere completato il programma di isolamento dalla laguna dei suoli di Porto Marghera, realizzando anche le connesse opere di captazione e convogliamento delle acque retrostanti agli impianti di depurazione.
Verranno anche effettuati interventi sulle falde potenzialmente advettrici di inquinanti al sistema lagunare, sia mediante interventi di puro confinamento, captazione e trattamento, sia mediante realizzazione di barriere semi-permeabili capaci di catturare o di modificare gli inquinanti senza alterarne significativamente i flussi.
Una volta realizzato il marginamento di messa in sicurezza, nelle aree demaniali interessate da depositi incontrollati di rifiuti si potrà procedere alla bonifica selettiva, all'isolamento delle aree con particolari caratteristiche di inquinamento e, infine, al completamento della sistemazione ambientale delle aree.
Gli interventi di messa in sicurezza, mediante confinamento in situ dei sedimenti inquinati, dovranno progressivamente essere sostituiti da interventi di bonifica generale e di bonifica con misure di sicurezza, procedendo alla definitiva sistemazione ambientale delle aree.

b) *Difesa della qualità delle acque mediante interventi che limitano la disponibilità delle sostanze inquinanti presenti nei sedimenti lagunari.*
Una volta drasticamente ridotti gli apporti inquinanti al sistema lagunare, si potrà procedere alla sostanziale riduzione degli apporti inquinanti provenienti dai sedimenti lagunari.
Complessivamente gli interventi anzidetti riguarderanno meno del 10% dei 49.000 ettari di laguna aperti all'escursione della marea.

c) *Difesa della qualità delle acque lagunari mediante interventi di controllo degli apporti inquinanti dal bacino scolante.*
Gli interventi di *diversione* saltuaria e controllata delle immissioni di acque dolci dal bacino scolante dovranno interessare diverse foci fino a permettere di regolare almeno il 50% dei flussi annualmente recapitati in laguna.
Le aree di fitobiodepurazione dovranno essere integrate con gli interventi di rinaturalizzazione delle fasce di gronda e di ricostituzione di zone di graduale transizione tra terra ed acqua, estendendosi complessivamente (considerando anche

quelle realizzate negli interventi di competenza regionale) per una superficie pari almeno al 5% di quella lagunare.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

	Fabbisogno Totale	Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi	28,510	22,544	5,966
Progetti generali, indagini e monitoraggi generali, interventi sperimentali	58,768	53,269	5,499
Interventi che limitano gli apporti di inquinanti provenienti da depositi di rifiuti abbandonati e da suoli inquinati emersi	113,120	100,620	12,500
Interventi che limitano gli apporti inquinanti provenienti dalle sponde e dai fondali dei canali industriali	827,474	480,106	347,368
Interventi che limitano la disponibilità di sostanze inquinanti provenienti dai sedimenti lagunari	100,781	50,952	49,829
Interventi di controllo degli apporti inquinanti provenienti dal bacino scolante	102,853	54,320	48,533
Somme a disposizione	4,331	4,331	-
TOTALE	**1.235,837**	**766,142**	**469,695**

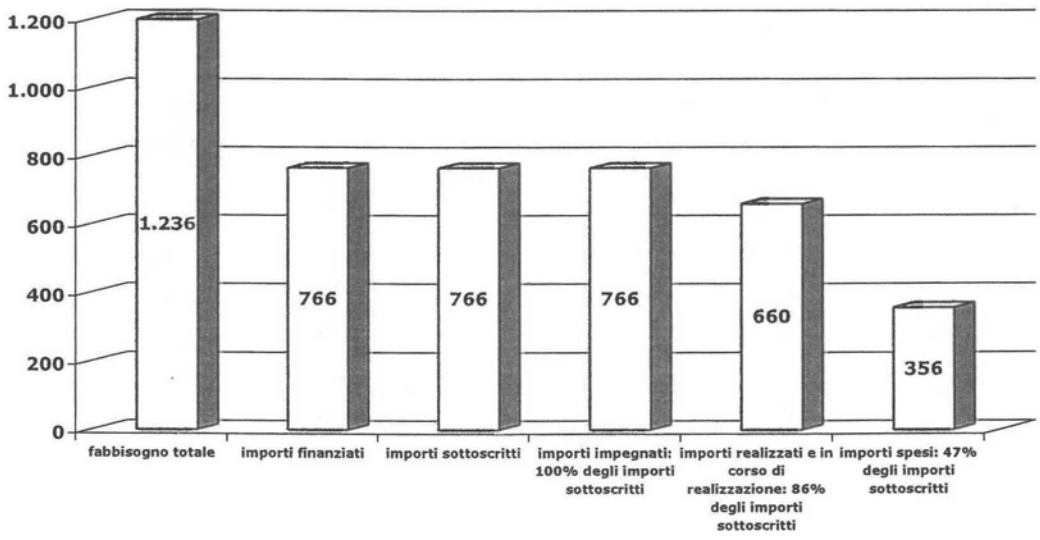

3.8 Allontanamento del traffico petrolifero dalla laguna
(interventi di cui all'art. 3 lettera l) legge n. 798/84)

Obiettivo

Studiare la fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto in laguna di petroli e derivati, al fine di eliminare i rischi derivanti da sversamenti accidentali di prodotti pericolosi per l'ecosistema lagunare.

Descrizione degli interventi

Nella laguna di Venezia transitano mediamente, ogni anno, circa dodici milioni di tonnellate di prodotti petroliferi e chimici liquidi. Oltre 1200 navi, di diverso tonnellaggio, sono interessate da questo traffico.

Il traffico petrolifero costituisce un rischio potenziale gravissimo per l'ambiente lagunare: per la sua struttura morfologica, la laguna non è in grado di tollerare alcun consistente sversamento di sostanze inquinanti che immediatamente si diffonderebbero nel fitto tessuto delle barene e nei bassi fondali ove è impossibile l'azione dei mezzi di soccorso. I centri abitati lagunari e Venezia subirebbero danni irreversibili.

Si ricorda che per l'eliminazione di rischi derivanti da sversamenti accidentali di prodotti petroliferi all'interno del bacino lagunare, il legislatore, a partire dalla legge n. 171/73 in poi, ha chiaramente indicato la necessità di approfondire la fattibilità di estromettere dalla laguna i traffici di prodotti pericolosi per l'ecosistema lagunare, affidandone la competenza allo Stato; in particolare, la legge n. 798/84 all'Art. 3 lettera l) indica come interventi di competenza dello Stato la realizzazione di "*studi e progettazioni ... per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati...*", mentre la legge n. 139/92 prevedendo l'esecuzione degli interventi di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici (ora delle Infrastrutture e dei Trasporti), secondo il Piano Generale degli Interventi approvato dal Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nella seduta del 19 giugno 1991, indica, tra gli interventi da realizzarsi secondo il Piano stesso, quelli "*relativi alla sostituzione del traffico petrolifero in laguna*" (cfr. Art. 3 comma 2).

Stato di attuazione al 31 dicembre 2005

Attività finanziate

In questo ambito di attività, il Magistrato alle Acque, attraverso il proprio concessionario, ha nel corso degli anni realizzato numerosi *studi propedeutici* e un *progetto operativo* volti ad esaminare e approfondire le diverse soluzioni possibili di intervento per l'estromissione del traffico petrolifero dalla laguna.

Tra le attività più recenti, si ricorda che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 25 ottobre 2001, ha invitato il Magistrato alle Acque di Venezia a considerare l'ipotesi di realizzare un "punto di scarico" esterno alla laguna e collegato con "pipeline" al Porto di Marghera, per estromettere il traffico petrolifero dalla laguna.

A seguito di tale richiesta, è stata presentata al Comitato ex art. 4 legge n. 798/84, nell'adunanza del 6.12.2001, una scheda progettuale di fattibilità di un *terminale "off-shore" al largo dei lidi veneziani*, collegato a terra con un oleodotto ancorato al fondo del mare fino al cordone litoraneo e posto all'interno di una apposita galleria, in laguna, fino al Porto San Leonardo per l'estromissione del greggio, in modo da eliminare il rischio connesso al mantenimento del traffico dei petroli in laguna garantendo, comunque, lo svolgimento delle attività produttive presenti.

Il Comitato ex art 4 legge n. 798/84 ha approvato la soluzione proposta; conseguentemente il Magistrato alle Acque ha invitato il Concessionario a sviluppare il progetto preliminare. Nello sviluppo della progettazione e' emersa la necessità di estromettere dalla laguna tutti i prodotti a rischio e, quindi, non solo il greggio ma anche prodotti chimici derivati dal petrolio. E' stata, pertanto, sviluppata la progettazione di una struttura "off-shore" in collegamento, sempre attraverso pipeline, con la zona industriale di Porto Marghera.

Il progetto preliminare è stato favorevolmente esaminato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nell'adunanza del dicembre 2002. Il Comitato ha, altresì, invitato il Magistrato alle Acque a sviluppare un'analisi di benefici – costi della soluzione proposta, le cui conclusioni sono state sottoposte all'attenzione del Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 nella seduta del 4 febbraio 2003. In quella sede il Magistrato alle Acque è stato incaricato di avviare la progettazione definitiva della soluzione presentata, provvedendo alla preventiva acquisizione dei pareri di legge in merito alla compatibilità ambientale dell'opera.

In ottemperanza a tale prescrizione, il Magistrato alle Acque ha conferito specifico incarico al Concessionario di svolgere il relativo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e, una volta concluso lo stesso, ha avviato la procedura di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), che è attualmente in corso. Lo stato di avanzamento delle attività è stato esposto dal Presidente del Magistrato alle Acque al Comitato ex art. 4 legge 798/1984, da ultimo, nella seduta del 28.09.2005.
Contemporaneamente, è in fase di sviluppo il progetto di un intervento pilota per il *contenimento di sversamenti accidentali*, mediante "panne" lungo il canale Malamocco – Marghera.

Attività da finanziare

Il Piano Generale degli Interventi prevede il finanziamento da reperire per l'esecuzione dell'intervento pilota e, successivamente, dell'intervento complessivo per la protezione da sversamenti accidentali mediante la realizzazione di panne di contenimento lungo il canale Malamocco – Marghera. Prevede anche il finanziamento di alcune attività preliminari e la progettazione esecutiva dell'approdo off-shore in Alto Adriatico.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

	Fabbisogno Totale	Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi	16,871	3,871	13,000
Progetti	14,160	7,728	6,432
Interventi sperimentali	14,270	1,270	13,000
Somme a disposizione	0,017	0,017	-
TOTALE	**45,318**	**12,886**	**32,432**

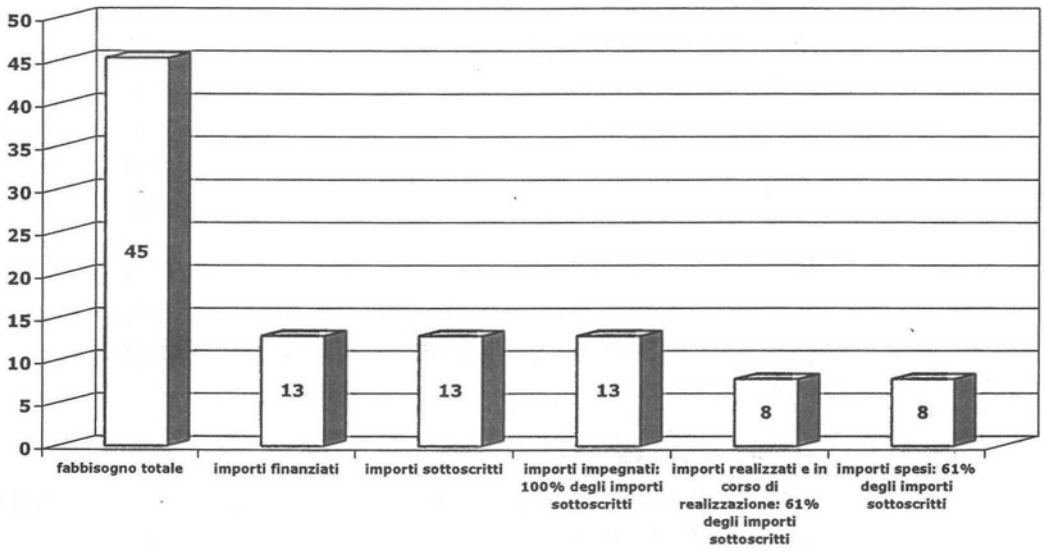

3.9 Ausilii luminosi alla navigazione
(interventi di cui all'art. 3 lettera d) legge n. 798/84)

Obiettivo

Realizzare un sistema di illuminazione del canale Malamocco - S. Leonardo - Marghera, per consentire la navigazione anche nelle ore notturne e nelle giornate nebbiose in condizioni di sicurezza, quale intervento di mitigazione per recuperare gli eventuali "ritardi" imputabili alla chiusura delle bocche di porto durante i fenomeni di acqua alta.

Descrizione degli interventi

Per rendere più sicura la navigazione in laguna, nelle ore notturne e in caso di scarsa visibilità dovuta alla nebbia, sono stati messi in opera un sistema di illuminazione e una serie di strumentazioni ausiliarie lungo il canale tra la bocca di porto di Malamocco e la zona industriale di Porto Marghera. Il sistema predisposto consente di ridurre i rischi di incidenti e di migliorare la capacità operativa delle aree portuali di Venezia.

In futuro, inoltre, esso potrà soddisfare nuove esigenze: bilanciare i periodi di forzata inagibilità delle bocche lagunari dovuti alla chiusura dei varchi in occasione di alte maree eccezionali e migliorare, comunque, la competitività portuale.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2005

Attività finanziate

Mediante l'esecuzione di *studi specifici* sono stati valutati gli interventi in grado di migliorare l'agibilità e la sicurezza complessiva del porto: in questo ambito sono stati forniti gli elementi per la progettazione e la realizzazione dell'intervento detto "*sentiero luminoso*".

Su entrambi i lati del canale tra Malamocco e Marghera, per complessivi 15 km, sono stati disposti 340 segnali luminosi, installati a 80 metri l'uno dall'altro, 111 riflettori radar, collocati sulla sommità dei pali di supporto dei segnali luminosi, e 4 "fog detectors" per rilevare le condizioni di visibilità.

I punti luce, situati a circa 8 metri sopra il livello del mare, sono costituiti da lampade a vapori di sodio a bassa pressione montate su uno stelo di acciaio inossidabile.

L'intero *intervento* è stato completato nel 1996.

Nel corso del 1997 è stata completata l'attività di *videomonitoraggio* che, mediante l'impiego di telecamere equipaggiate con intensificatori di luminosità, ha consentito la memorizzazione delle immagini del traffico in una apposita banca dati.

Il "sentiero luminoso" è stato definitivamente consegnato all'Autorità Portuale nel corso del 1997.

E' previsto un intervento di adeguamento dell'impianto al fine di ottimizzare la protezione delle linee elettriche subacquee.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

	Fabbisogno Totale	Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi	7,414	7,414	-
Interventi sperimentali e monitoraggi	13,246	8,049	5,197
TOTALE	**20,660**	**15,463**	**5,197**

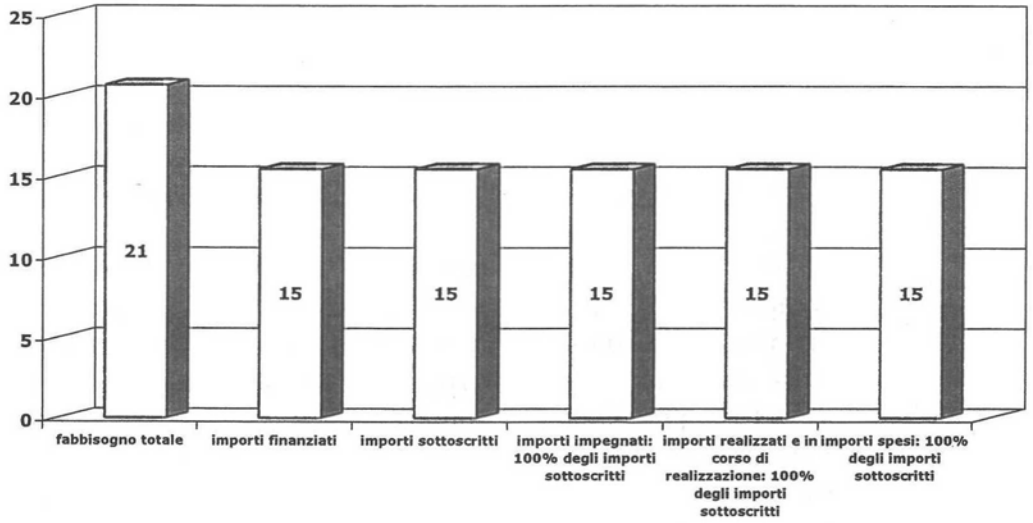

3.10 Apertura delle valli da pesca
(interventi di cui all'art. 3 lettera l) legge n. 798/84)

Obiettivo

Migliorare la qualità delle acque e dei sedimenti nelle zone immediatamente prossime alle valli da pesca nell'ambito del più ampio obiettivo di recupero morfologico e ambientale delle diverse aree della laguna di Venezia

Descrizione degli interventi

Le valli da pesca sono ambienti naturali, da secoli utilizzati per l'allevamento di specie ittiche pregiate e per la maricoltura. Le valli sono separate dalla "laguna viva" mediante argini dotati di aperture che consentono il ricambio dell'acqua al loro interno in modo regolato dagli allevatori sulla base delle esigenze della produzione. Attualmente le aree vallive sono 23 per una superficie complessiva di quasi 9000 ettari: un sesto dell'intero bacino lagunare.

Negli anni passati le valli da pesca sono state oggetto di studio per valutare l'efficacia della loro riapertura, durante le alte maree eccezionali, ai fini della diminuzione del livello dell'acqua in laguna. La questione è stata affrontata fin dal 1981 nel corso dello studio di fattibilità delle opere di difesa dalle acque alte e successivamente, con ulteriori approfondimenti, nell'ambito del progetto preliminare di massima delle opere mobili alle bocche di porto (progetto REA).

In entrambi i casi è risultato che gli effetti della riapertura sono del tutto ininfluenti.
Anche le simulazioni realizzate nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) del progetto di massima delle opere mobili hanno portato alle medesime conclusioni.
Negli ultimi anni, quindi, la riapertura delle valli da pesca è stata studiata in relazione all'obiettivo del miglioramento ambientale dell'ecosistema in quanto può produrre effetti positivi sulle condizioni idrodinamiche locali con benefici per ampie zone lagunari.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2005

Attività finanziate
Gli *studi* sulla pesca e sulla vallicoltura hanno consentito di evidenziare il rapporto tra interventi di risanamento ambientale e produttività di questo importante settore dell'ecosistema lagunare. Un'attenzione particolare è stata dedicata alla vallicoltura, soprattutto per verificare gli effetti sull'economia valliva del progetto della riapertura delle valli da pesca alla libera espansione delle maree.
Il Consorzio Venezia Nuova ha esaminato diverse soluzioni alternative per consentire l'espansione mareale e mantenere i livelli produttivi qualitativamente e quantitativamente.

A seguito di specifica indicazione del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 (riunione del 20 marzo 1990), il Magistrato alle Acque di Venezia, tramite il Consorzio Venezia Nuova, ha dedicato a questo aspetto del problema un *progetto operativo generale*, approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nel luglio del 1993, che ha definito criteri, modalità, durata e frequenza dell'apertura delle valli allo scopo di verificare se ciò comporta un effettivo miglioramento della qualità ambientale nelle aree contigue.
Vista la complessità realizzativa e gestionale delle soluzioni di apertura proposte, il progetto operativo suggeriva la necessità di procedere a un intervento sperimentale.

Nel corso del 1995, pertanto, il Consorzio ha redatto anche il progetto esecutivo *dell'intervento sperimentale di apertura di una valle da pesca,* che è stato realizzato e completato nell'estate del 1999.

L'intervento pilota è stato effettuato in valle Figheri, una valle della laguna sud, scelta come campione, seguendo precise modalità di gestione. La valle è stata divisa in due parti tramite un argine di terra ("teragio") lungo oltre 2 chilometri, e le due parti sono state gestite in modo differenziato: una è stata tenuta chiusa e gestita in base agli orientamenti produttivi consolidati; l'altra, più piccola della prima, è stata aperta al flusso di marea.

Le attività hanno anche compreso la realizzazione di un ampio programma di *monitoraggi* eseguiti prima, durante e dopo i lavori. I risultati della sperimentazione hanno dimostrato la possibilità di mantenere la produzione ittica anche nella porzione valliva lasciata aperta al flusso mareale, mentre i miglioramenti nell'ambiente circostante sono risultati poco apprezzabili.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln €).

	Fabbisogno Totale	Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova	Fabbisogno residuo da finanziare
Studi	0,412	0,412	-
Progetti	0,431	0,431	-
Interventi sperimentali	3,005	3,005	-
Somme a disposizione	0,002	0,002	-
TOTALE	**3,850**	**3,850**	**-**

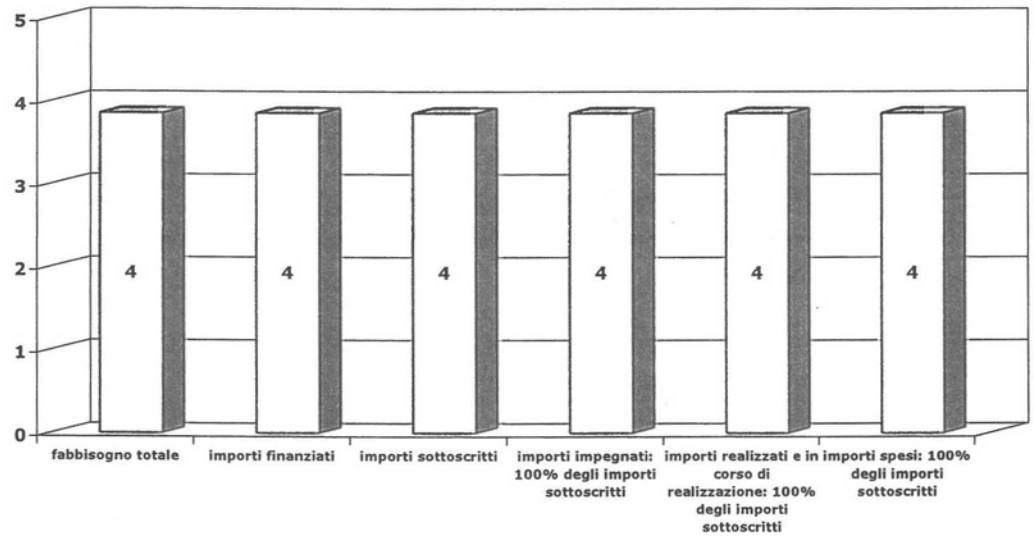

3.11 Costituzione e potenziamento del servizio informativo
(interventi di cui all'art. 3 lettera a) legge n. 798/84)

Obiettivo

Il Servizio Informativo ha il compito di acquisire, ordinare e aggiornare tutte le informazioni sull'ambiente lagunare, cooperando con gli altri Enti che operano sul territorio, in modo da facilitare la definizione delle politiche di intervento in un quadro conoscitivo generale.

Descrizione degli interventi

La conoscenza del territorio, ai fini della sua gestione, può essere completa ed efficace se i diversi strumenti disponibili per la sua conoscenza sono correlati in un sistema informativo completo ed articolato; in sintesi occorre che le risorse disponibili (umane, tecniche, scientifiche ed economiche) concorrano in modo integrato alla creazione delle diverse percezioni del territorio, delle sue dinamiche e dei fenomeni che su di esso avvengono.

Il Servizio Informativo, per assolvere ai compiti di conoscenza dello stato di fatto e di salute dell'ambiente lagunare, di studio del territorio, di progettazione e di esecuzione degli interventi, di gestione dei monitoraggi e dei controlli degli effetti degli interventi stessi, ha utilizzato diversi strumenti tecnologicamente avanzati che, nel corso degli anni, sono diventati strumenti di lavoro e di controllo dei diversi uffici tecnici ed amministrativi preposti, sia all'interno del Consorzio Venezia Nuova che all'interno del Magistrato alle Acque.

E' stato creato, quindi, un centro tecnico operativo a supporto dell'intera collettività tecnica che è coinvolta nei diversi progetti di salvaguardia fisica ed ambientale della laguna di Venezia e del suo bacino scolante.

Il Servizio Informativo ha compiuto, in 20 anni di attività, un'evoluzione, oltre che tecnica, anche funzionale in rapporto all'evolversi e allo specializzarsi delle richieste di supporto tecnico ed operativo provenienti dal Magistrato alle Acque e dagli altri uffici del Consorzio Venezia Nuova. Questa evoluzione funzionale viene di seguito descritta in modo da essere di supporto alla comprensione delle attività dell'ufficio che ha in gestione una delle banche dati territoriali ed ambientali più complesse ed, al tempo stesso, più interessanti del mondo.

La funzione del Servizio Informativo resta quella di realizzare un quadro conoscitivo generale del territorio e dell'ecosistema a supporto del risanamento e della gestione della laguna di Venezia e può essere così riassunta:

- gestire tutte le informazioni territoriali sull'ecosistema (incluse quelle per il controllo conoscitivo delle tendenze evolutive);
- cooperare con gli altri enti che interagiscono sul territorio;
- costruire il necessario supporto conoscitivo per il futuro Centro Operativo della laguna (struttura che avrà il compito di gestire gli interventi di salvaguardia compiuti dallo Stato attraverso il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova e monitorare l'evoluzione dello stato dell'ambiente lagunare).

In questo contesto diventa essenziale l'unità, se non della conoscenza, quantomeno del complesso di informazioni che la generano; a tal fine occorre rendere consultabile il patrimonio informativo esistente, occorre cioè ordinare le informazioni territoriali con precisi criteri.
I criteri di ordinamento adottati dal Servizio Informativo perseguono:

- l'ordine fisico dei documenti (Biblioteche dei materiali);
- l'ordine geografico dei dati (Banca Dati Geografica);
- l'ordine funzionale dei dati, finalizzato alla soluzione di specifici problemi (sistemi di supporto alle decisioni).

Il mantenimento della coerenza e dell'integrità di tali "ordini" viene garantito attraverso una serie di attività che si succedono secondo un piano di aggiornamento e di verifica continua che viene perseguito attraverso i seguenti strumenti:

- studi per la verifica dell'efficacia di metodologie e strumenti tecnici e scientifici;
- sistemi di consultazione per l'accessibilità ad utenti differenziati ai diversi stati della conoscenza del territorio;
- centro servizi per la disponibilità di risorse umane, tecniche ed informatiche finalizzate al supporto dell'intero scenario delle attività.

I diversi gradi della conoscenza ed i diversi strumenti operativi creati hanno, quindi, permesso di differenziare le attività del Servizio Informativo secondo le seguenti finalità:

a) *Biblioteche* ovvero raccolta, catalogazione informatica e aggiornamento di informazioni tecniche, scientifiche, storiche e socioeconomiche relative alla documentazione sulla Laguna di Venezia, sul suo bacino scolante, sugli studi e sui progetti

effettuati, sugli interventi realizzati; queste "informazioni di base" sono state raccolte e mantenute nel loro formato originario (testi storici, mappe, fotografie, diapositive, filmati, materiale digitale, relazioni tecniche e scientifiche, studi, progetti, leggi, ecc.);

b) *Banca dati* ovvero la trasformazione dei dati cartografici e tecnici in dati informatizzati su computer e rappresentabili mediante i moderni strumenti di analisi e riproduzione del territorio (GIS o Sistemi Informativi Territoriali e strumenti di riproduzione). La base della banca dati territoriale del Servizio Informativo è dotata di circa 30 livelli tematici informatici differenziati (uso del suolo, canali lagunari, reti idrografiche, sezioni di censimento, fanerogame, alghe, sondaggi, reti tecnologiche, ecc.) che vengono aggiornati mediante rilievi da compiersi in proprio o mediante acquisizione dei dati da Enti che ne sono preposti per competenza;

c) *Sistemi di supporto alle decisioni* ovvero utilizzo di sistemi informatici predisposti ad hoc per la gestione dei dati cartografici, modellistici e tecnici finalizzati alla comprensione di fenomeni ambientali, morfologici, socioeconomici in evoluzione e, quindi, alla loro facile comprensione da parte di chi deve prendere decisioni sulla progettazione e realizzazione degli interventi;

d) *Studi* ovvero approfondimenti sugli aspetti tecnici delle attività connesse con il Servizio Informativo; tali studi sono stati svolti in modo integrato con le attività di studio previste ed in corso da parte del Consorzio Venezia Nuova, ovvero gli uffici del Servizio Ingegneria e del Servizio Ambiente;

e) *Sistemi di consultazione* ovvero realizzazione di sistemi informatici personalizzati per la fruizione dei dati archiviati dal Servizio Informativo ed utilizzabili da più utenti della rete Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova;

f) *Centro servizi* ovvero la dotazione e l'utilizzo di strumenti, di persone e di materiali finalizzati al supporto delle attività tecniche ed amministrative del Magistrato alle Acque e del Servizio Informativo; sono parte di questa sezione le attività svolte dal personale del Servizio Informativo presso la sede di Venezia del Magistrato alle Acque e di Voltabarozzo (PD), la

creazione e la gestione di due laboratori chimici attrezzati per l'analisi della qualità dell'acqua, dell'aria e dei sedimenti prelevati in laguna di Venezia, la creazione e la gestione di 10 stazioni fisse di monitoraggio ambientale collocate in laguna e dotate di strumentazioni per la misura in tempo reale di parametri chimico-fisici dell'acqua e dell'aria (sonde multiparametriche, autocampionatori, deposimetri, anemometri, ecc.). E' infine da sottolineare la disponibilità all'utilizzo di attrezzature tecniche di rilievo e di misura della morfologia terrestre e lagunare.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2005

Attività finanziate

Il lavoro del Servizio Informativo si è articolato fin dalla sua origine in *sezioni di lavoro* ovvero in unità di lavoro singolarmente riconoscibili ed associabili alle finalità di cui si è già riferito (biblioteche, banche dati, sistemi di supporto alle decisioni, sistemi di consultazione, centro servizi).

Le *sezioni di lavoro* hanno, quindi, il significato di singoli progetti per la realizzazione e il conseguimento di obiettivi diversificati. Sino a questo momento sono state sviluppate quasi 80 sezioni di lavoro ciascuna articolata, se necessario, in più fasi.

I risultati fin qui raggiunti dal Servizio Informativo possono essere così sintetizzati:

- E' stata costituita una raccolta ordinata di documenti (libri, mappe, nastri, audiovisivi) attinenti l'ecosistema, raggiungendo l'obiettivo istituzionale che si prefiggeva di raccogliere e conservare in una unica sede il vastissimo patrimonio di conoscenze tecniche, scientifiche, storiche, legislative, ecc., riguardanti il problema di Venezia e della sua laguna;

- E' stata informatizzata insieme ai principali parametri descrittivi del territorio la complessa e stratificata geografia dell'ecosistema che rimane a disposizione (come G.I.S. di base – ovvero sistema informatizzato di gestione ed analisi delle rappresentazioni delle componenti territoriali) per le future applicazioni;

- I sistemi informatici sono basati su una struttura hardware e software che si mantiene all'avanguardia e rimane bilanciata

nei suoi componenti anche dopo alcuni anni di lavoro nonostante l'accelerata dinamica evolutiva del mercato dell'informatica. La struttura informatica del Servizio Informativo è stata, inoltre, integrata alla struttura informatica costituita presso il CED del Magistrato alle Acque di Venezia; da esso è, infine, possibile connettersi al Centro Sperimentale di Voltabarozzo (PD), al Laboratorio di analisi chimiche di Venezia ed al Genio Civile Opere Marittime di Venezia;

- La tipologia dei dati gestiti semplifica e minimizza i tempi di aggiornamento degli stessi, permette di analizzare e rappresentare la loro evoluzione temporale, quantitativa e qualitativa e, infine, può ridurre i costi ed i tempi di operazioni di verifica e controllo degli scenari territoriali necessari per la progettazione degli interventi;

- L'architettura delle strutture informatiche preposte alla gestione dei dati (banche dati) è modulare e flessibile agli ulteriori sviluppi (Sistemi di supporto) ed è adattabile agli obiettivi ampi e complessi che per legge sono assegnati all'intero progetto Venezia.

L'impostazione adottata e i risultati finora ottenuti consentono ulteriori sviluppi verso la gestione vera e propria dell'ecosistema lagunare.

Nel corso degli ultimi anni, lo sviluppo tecnologico del mondo dell'informatica, delle tecnologie di rilievo, di misura e delle telecomunicazioni e, in particolare, l'attendibilità sempre maggiore dei dati territoriali digitali che ha consigliato il loro utilizzo per la progettazione e lo sviluppo degli interventi, hanno indotto il Servizio Informativo a programmare la propria attività in settori produttivi che, sempre attraverso la definizione di sezioni di lavoro, possa permettere di far fronte alle maggiori richieste di "sicurezza" e "certificazione di qualità" delle proprie metodologie e dei processi di lavoro.

Sono in fase di implementazione le procedure per l'ottenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per i settori tecnici del Servizio Informativo. A tale fine il Servizio Informativo, sulla base delle finalità precedentemente descritte, ha intrapreso un percorso di riorganizzazione delle proprie attività in *settori operativi* che, sottoposti a certificazione secondo gli standard del

sistema qualità, permettono di perseguire l'obiettivo dello sviluppo e della gestione delle attività del Servizio Informativo.

I *settori operativi* che si svilupperanno nei prossimi anni a supporto dei processi di controllo e gestione dell'ecosistema lagunare e di progettazione degli interventi e degli effetti degli stessi sull'ambiente, sono i seguenti:

a) *Gestione tecnica dei laboratori di analisi chimiche di Venezia e di Voltabarozzo (PD).*
Questo settore riguarda le attività alla gestione tecnica dei laboratori di analisi chimiche siti a Venezia e a Voltabarozzo (Padova). Per il laboratorio di Venezia, le attività riguardano gli adeguamenti tecnici e strutturali, il potenziamento delle attrezzature e la gestione del personale tecnico.
Il laboratorio di Venezia ha già conseguito la certificazione di qualità SINAL, mentre il laboratorio di Voltabarozzo, operativo dall'aprile 2004, ha in corso la procedura per l'ottenimento della stessa certificazione.

b) *Acquisizione e gestione di attrezzature tecniche, informatiche e di rete a Venezia e a Voltabarozzo (PD).*
Nél corso degli anni il Servizio Informativo ha mantenuto aggiornata la propria dotazione informatica e di rete nella sua sede originaria di Campo S. Stefano a Venezia. Le attività informatiche e i sistemi tecnici a supporto di esse sono stati diffusi in altre sedi ed uffici. I dati e i sistemi di consultazione, elaborazione e decisione sono ora implementati presso le seguenti sedi del Magistrato alle Acque: Ispettorato Generale, Centro Elaborazione Dati, Sezione Antinquinamento, Ufficio Concessioni, Centro Sperimentale di Voltabarozzo, Genio Civile Opere Marittime a Venezia.

c) *Attività di rilievi della morfologia terrestre e lagunare.*
La conoscenza puntuale ed estesa della morfologia della laguna di Venezia è condizione essenziale sia per la progettazione degli interventi, sia per il successivo monitoraggio degli effetti degli interventi stessi sull'ambiente e per la verifica delle modificazioni antropiche e naturali.

d) *Programmazione e gestione di monitoraggi ambientali in tempo reale e correlazione con indagini stagionali.*
Il Servizio Informativo, in accordo con la sezione

antinquinamento del Magistrato alle Acque, ha predisposto una serie di strumenti di rilievo della qualità dell'acqua e dell'aria; la gestione di tali strumentazioni comporta la dotazione di mezzi tecnici adeguati, di personale tecnico specializzato e di un programma di manutenzione e di gestione dell'intero sistema. La presenza di 10 stazioni di monitoraggio dell'acqua e dell'aria, di 7 stazioni di misura dei parametri atmosferici, di strumentazioni e di sistemi informatizzati per il controllo remoto degli scarichi in laguna, comporta un adeguato gruppo di tecnici specializzati per la gestione la manutenzione degli strumenti e l'analisi e l'interpretazione dei risultati delle misure.

e) *Gestione dell'informazione tecnica e della diffusione dei dati.*
La gestione del patrimonio informativo implementato dal Servizio Informativo si sviluppa attraverso la predisposizione di strutture tecniche ed informatiche adeguate. Il Servizio Informativo ha costituito un sito internet strutturato per accessi di consultazione, sia generale che tecnica, un centro, aperto al pubblico, dotato di attrezzature, materiali e sistemi di consultazione denominato "Punto laguna", una serie di attività atte alla predisposizione e alla distribuzione dei materiali tecnici cartacei ed informatici.

f) *Predisposizione e gestione di banche dati territoriali e sistemi di consultazione e di elaborazione.*
In tale settore si svolgono attività di costituzione, controllo, validazione e gestione delle banche dati territoriali e dei rispettivi sistemi di analisi, consultazione e supporto alla decisioni. E' il cuore della produzione della base informativa territoriale relativa al Servizio Informativo.

g) *Campagne di rilevamento satellitare ed aereo.*
L'utilizzo dell'esplorazione del territorio attraverso i rilievi satellitari ed aerei ha permesso di evidenziare e controllare un notevole numero di fenomeni di tipo ambientale e morfologico.
Sono normalmente eseguiti i voli annuali fotogrammetrici a colori a media risoluzione ed i voli biennali fotogrammetrici in toni di grigio ad alta risoluzione sull'intera laguna.

Attività da finanziare

a) *Gestione tecnica dei laboratori di analisi chimiche di Venezia e*

di Voltabarozzo (PD).
Per i laboratori di Venezia e di Voltabarozzo è prevista la gestione di tutte le procedure di trattamento, preparativa ed analisi dei campioni provenienti dalle campagne di monitoraggio, dalle stazioni fisse in laguna e dalle attività istituzionali del Magistrato alle Acque. Le tipologie di analisi sono diversificate nei laboratori in funzione della loro specializzazione: in particolare a Venezia vengono trattati i campioni per le analisi di routine e dei parametri inorganici, a Voltabarozzo vengono trattati i campioni per le analisi dei parametri organici e, in particolare, dei microinquinanti organici.

b) *Acquisizione e gestione di attrezzature tecniche, informatiche e di rete a Venezia e a Voltabarozzo (PD).*
Nei prossimi anni si provvederà al mantenimento in efficienza delle attrezzature ed all'acquisto di nuovi e più completi sistemi informatici, all'aggiornamento dei software di base ed applicativi, alla fornitura di servizi tecnici ed informatici e di supporto per la gestione e l'utilizzo delle applicazioni informatiche implementate nei vari uffici. Si svilupperanno in modo coerente ed efficace le tecnologie che consentiranno l'utilizzo delle banche dati e delle cartografie su supporti informatici portatili (palmari dotati di DGPS e schermo grafico) utilizzabili per controlli e verifiche in situ del territorio.

c) *Attività di rilievi della morfologia terrestre e lagunare.*
Nei prossimi anni si procederà all'attuazione di un programma di rilievi basati su utilizzo di strumenti topografici e fotogrammetrici per le zone emerse, e di ecoscandagli per le zone lagunari sotto il livello dell'acqua. Tali rilievi saranno necessari sia per evidenziare il fenomeno dell'erosione e della sedimentazione della morfologia lagunare, sia per rilevare, in zone precedentemente definite, la presenza di aree a rischio archeologico o di particolare pregio geomorfologico e paesaggistico.

d) *Programmazione e gestione di monitoraggi ambientali in tempo reale e correlazione con indagini stagionali.*
E' necessario garantire la gestione e la manutenzione della rete di monitoraggio ambientale e l'analisi e l'implementazione delle misure effettuate.
Dovrà, inoltre, essere gestita ed ampliata l'attuale struttura

tecnica a supporto delle campagne di campionamento e di manutenzione delle 10 stazioni fisse di monitoraggio ambientale di acqua ed aria. Si dovrà anche procedere all'analisi ed all'interpretazione dei dati ambientali acquisiti in Laguna di Venezia.

e) *Gestione dell'informazione tecnica e della diffusione dei dati.*
Questa attività dovrà essere garantita anche nei prossimi anni attraverso un adeguato aggiornamento dei materiali per le diverse tipologie di strumenti di diffusione che verranno utilizzati. In particolare sono da considerare essenziali le strutture: "Punto Laguna" (sede attrezzata al piano terra dell'edificio ove è situato il Servizio Informativo) per il supporto di conoscenza fornito sull'attuazione degli studi, dei progetti e degli interventi di salvaguardia; i siti internet salve.it e magisacque.it per il contributo alla conoscenza ed alla fruizione dei progetti e degli interventi eseguiti ed in corso di esecuzione da parte del Magistrato alle Acque; i portali informatici realizzati e sviluppati per la necessari condivisione tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova di tutti gli atti tecnici ed amministrativi relativi alle opere, agli studi ed ai progetti oggetto delle convenzioni.

f) *Predisposizione e gestione di banche dati territoriali e sistemi di consultazione e di elaborazione.*
In questo ambito verranno sviluppate nuove banche dati ed aggiornate quelle ormai datate secondo un progetto di acquisizione controllata di nuove informazioni tecniche, morfologiche e ambientali.

g) *Campagne di rilevamento satellitare ed aereo.*
Nel corso degli anni si procederà alla programmazione di tali rilievi anche utilizzando nuovi sensori e nuove tecnologie che il mercato dell'innovazione tecnologica metterà a disposizione. Vengono previsti, per l'enorme quantità e qualità dell'informazione che ciò rende disponibile, rilievi annuali con satelliti multispettrali ad alta risoluzione (Ikonos o QuickBird).

h) *Gestione dell'interscambio dei dati tra i diversi sistemi ed uffici preposti alla loro gestione ed utilizzo.*
La totalità dei dati e della conoscenza del territorio, organizzata in sistemi di analisi e di consultazione presso il Servizio Informativo, dovrà essere organizzata in modo da poter essere

distribuita ad uffici tecnici, società di progettazione e di monitoraggi, organi di controllo ed altri enti preposti alla gestione ed al controllo del territorio stesso. Dovrà essere anche garantito il percorso al contrario, ovvero l'inserimento nei sistemi del Servizio Informativo di tutti i dati provenienti dalle altre entità.

La contemporaneità nella realizzazione e nella gestione dei succitati programmi di attività del Servizio Informativo serviranno a garantire al Magistrato alle Acque la disponibilità di una struttura tecnica, informatica e documentale sicuramente necessaria per il supporto di un così ampio e complesso sistema di interventi e di gestione dell'ecosistema lagunare.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Mln di €).

	Fabbisogno Totale	Importi già stanziati a favore del Consorzio Venezia Nuova	Fabbisogno residuo da finanziare
Realizzazione e gestione del Servizio Informativo	145,444	88,219	57,225
Somme a disposizione	0,474	0,474	-
TOTALE	**145,918**	**88,693**	**57,225**

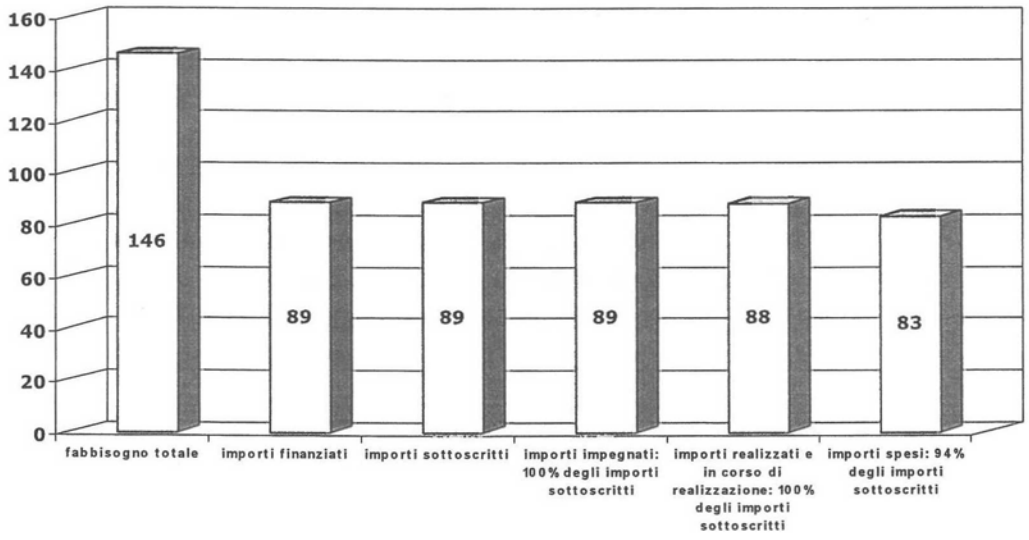

PAGINA BIANCA

Appendice

PAGINA BIANCA

CRONOLOGIA SINTETICA DELL'ITER APPROVATIVO DEL PROGETTO DELLE OPERE DI REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA ALLE BOCCHE DI PORTO LAGUNARI

1989, il *progetto preliminare di massima*[1] (Riequilibrio e Ambiente - REA) viene completato nel mese di luglio e approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nello stesso anno e dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 1990.

1992, il *progetto di massima*, ultimato nel mese di settembre, viene approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque nel mese di novembre e inviato, nel gennaio del 1993, ai Comuni di Venezia e di Chioggia e alla Regione del Veneto.

1994, il progetto di massima viene approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 18 ottobre 1994.

1995, il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84, nelle sedute del 4 luglio e del 12 dicembre, aderendo a una specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale di Venezia, stabilisce di sottoporre il progetto di massima delle opere mobili alle bocche di porto lagunari a una *specifica procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)*, nonostante il progetto non dovesse essere interessato dalla suddetta procedura ai sensi della specifica regolamentazione nazionale e sovranazionale. In particolare, il Comitato decide che si debba sviluppare una speciale procedura di valutazione in cui, tra l'altro, al giudizio della Commissione di V.I.A. costituita secondo la normativa vigente, si affianchi quello di un *"Collegio di esperti di livello internazionale"*, appositamente istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Collegio di Esperti internazionali, nel 1998, consegna il proprio rapporto positivo al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Lavori Pubblici, al Ministro dell'Ambiente e al Comitato ex art. 4 legge 798/1984.

1995 - 2000, si susseguono numerosi[2] eventi legati allo sviluppo della peculiare procedura che il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 aveva delineato per la valutazione della compatibilità ambientale del progetto delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto.

14 luglio 2000, il TAR del Veneto annulla, per questioni di metodo e di merito, il Decreto di compatibilità ambientale negativo del progetto emesso dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

15 marzo 2001, il Consiglio dei Ministri delibera in merito all'avvio della fase progettuale esecutiva, subordinandola allo svolgimento di alcune *attività di approfondimento*. La deliberazione recepisce tutte le diverse istanze di approfondimento emerse durante la procedura di V.I.A. e prescrive un ulteriore stadio progettuale che preveda la progettazione, contestualmente a quella delle opere di regolazione delle maree, di interventi atti ad aumentare gli attriti lungo i canali delle bocche di porto per attenuare i livelli delle maree più frequenti (*opere cosiddette complementari*), nonché l'aggiornamento del Piano per il recupero morfologico della laguna per contrastare gli eventuali effetti derivanti da tali interventi complementari.

1 Il progetto fa proprie le prescrizioni espresse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 109 del 1982 sul c.d. "Progettone", studio di fattibilità redatto da un gruppo di esperti sulla base dei progetti che parteciparono all'appalto-concorso internazionale del 1975, acquisiti poi dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici dato che l'appalto-concorso si concluse senza aggiudicazione.

2 Nel 1998: la Commissione Tecnica Regionale del Veneto approva il Progetto di massima; la Commissione VIA del Ministero dell'Ambiente esprime un parere di valutazione ambientale negativa; l'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali esprime parere favorevole, con prescrizioni; il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, emana un decreto con il quale esprime "allo stato giudizio di compatibilità ambientale negativo sul progetto".
Nel 1999: il Consiglio Comunale di Chioggia esprime il proprio parere favorevole; il Consiglio Comunale di Venezia esprime il proprio parere sul progetto e richiede "il proseguimento dell'attività progettuale"; il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in Assemblea Generale, presenta il proprio parere sul SIA delle opere mobili riconfermando il parere favorevole sulla soluzione progettata.

2001, a seguito dei risultati degli studi condotti, vengono definiti gli interventi necessari per aumentare gli effetti dissipativi lungo i canali di bocca: *tre dighe foranee, con annessa protezione dei fondali, una di fronte a ciascuna delle tre bocche di porto.*

6 dicembre 2001, il Comitato ex art. 4 legge 798/84 prende atto dei risultati delle attività e degli approfondimenti condotti e, quindi, delibera che si dia corso al completamento della progettazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto, nonché alla progettazione ed esecuzione delle opere cosiddette complementari e alla progettazione ed esecuzione delle opere tendenti al ripristino morfologico della laguna.

21 dicembre 2001, il CIPE delibera in merito al *primo programma delle infrastrutture strategiche*, di cui alla legge n. 443/01 ("Legge obiettivo"), indicando, tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, il *Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: "Sistema MOSE".*

4 novembre 2002, la Commissione di V.I.A. della Regione del Veneto esprime parere positivo per i progetti delle opere complementari, ad eccezione della scogliera di fronte alla bocca di Lido per la quale rimanda a successivi approfondimenti.

8 novembre 2002, il *progetto definitivo* delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto, redatto a seguito della deliberazione del Comitato del 6 dicembre 2001, viene favorevolmente esaminato, con prescrizioni, dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia, con voto n. 116.

29 novembre 2002[3], il CIPE prende atto, sia sotto l'aspetto tecnico, sia sotto l'aspetto finanziario, del progetto definitivo del "Sistema MOSE", esaminato sulla base di una specifica relazione istruttoria elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e assegna al "Sistema MOSE" un *primo finanziamento di 450 milioni di euro.*

3 Deliberazione n. 109 del 29.11.2002, successivamente rimodulata con deliberazioni n.63 del 25.07.2003 e n. 72 del 29.09.03.

4 febbraio 2003, il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 delibera, tra l'altro, in ordine alla ripartizione dei fondi assegnati dal CIPE al "Sistema MOSE"[4].

4 In base a quanto previsto dall'art. 80, legge 289/2002, una quota parte dei fondi assegnati dal CIPE al "Sistema MOSE" viene assegnata per le attività di competenza delle Amministrazioni comunali secondo una ripartizione proposta dal Comitato ex art. 4 legge 798/1984, successivamente recepita dal CIPE.

3 aprile 2003, il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 delibera, tra l'altro, in ordine all'*avvio della progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere per la regolazione delle maree alle bocche di porto*, nonché allo sviluppo di approfondimenti relativi a specifiche richieste delle Amministrazioni Comunali di Venezia e di Chioggia, sancendo, di fatto, il passaggio dalle fasi propedeutiche alla fase di realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto.

5 Organo collegiale istituito dalla Legge n. 171/1973, Titolo II, comma 5

20 gennaio 2004, la Commissione per la Salvaguardia di Venezia[5] esprime all'unanimità parere favorevole sul progetto definitivo, impartendo alcune prescrizioni da adottare nella fase di sviluppo della progettazione esecutiva.

Gennaio – dicembre 2004: a seguito del parere positivo della Commissione di Salvaguardia, il Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque, sulla base del Piano – Programma approvato nel giugno del 2003[6], esamina ed esprime parere favorevole sugli stralci del progetto esecutivo delle opere di regolazione delle maree finanziati con la 1^ assegnazione di fondi da parte del CIPE.

6 In data 6.06.2003, il Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque ha esaminato con parere favorevole il programma delle progettazioni e della realizzazione delle opere alle bocche di porto, redatto a seguito delle deliberazioni assunte dal Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 nella seduta del 3.04.2003, che prevede lo sviluppo per fasi della progettazione esecutiva e della conseguente realizzazione dei lavori, in relazione ai finanziamenti via via disponibili.

13 febbraio 2004, viene istituito l'Ufficio di Piano con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione alle delibere del Comitato ex art. 4 legge 798/1984 del 6 dicembre 2001 e del 3 aprile 2003. L'Ufficio provvede alla massima integrazione tra i piani formulati dalle singole amministrazioni competenti in tema di salvaguardia, al fine di garantire continuità agli interventi programmati e ottimizzare l'impiego delle risorse.

Aprile 2004, intervenuta la registrazione da parte della Corte dei Conti degli Atti contrattuali tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova che impegnano il finanziamento di cui alla 1^ deliberazione da parte del CIPE[7], inizia la formalizzazione della consegna dei lavori dal Magistrato alle Acque al Consorzio Venezia Nuova, relativamente agli stralci già esaminati dal Comitato Tecnico di Magistratura. Si avviano, pertanto, a tutti gli effetti, contemporaneamente nelle tre bocche di porto, i lavori per la realizzazione delle opere di regolazione delle maree.

7 Atti Attuativi rep. n. 8014/2003 e n. 8015/2003 alla Convenzione Generale, D.P. n. 9500 e n. 9499 del 29.01.2004, registrati alla Sezione del Veneto della Corte dei Conti in data 30.03.2004

20 e 21 maggio 2004, il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Veneto esamina e rigetta, con sentenza depositata in data 24 luglio 2004, i numerosi ricorsi avverso provvedimenti amministrativi propedeutici o comunque connessi all'approvazione e all'avvio del "Sistema MOSE", presentati da alcune associazioni ambientaliste, nonché delle Amministrazioni Comunale e Provinciale di Venezia.

29 settembre 2004, il CIPE assegna un ulteriore volume di investimento, a valere su un "contributo" quindicennale[8] con decorrenza dal 2005, garantendo così continuità alle opere di regolazione dei flussi di marea avviate alle bocche di porto. In base a tale deliberazione, successivamente rimodulata[9], vengono *assegnati al Consorzio Venezia Nuova 638,1 milioni di euro.*

8 E' necessario segnalare che gli elementi di novità introdotti dal "contributo pluriennale", in sostituzione del "limite di impegno", hanno comportato la necessità di chiarimenti circa la sua "bancabilità", ottenuti solo nel mese di marzo del 2005.

9 Deliberazione n. 40 del 29.09.2004, successivamente rimodulata con deliberazione n.75 del 20.12.2004, che prende atto della ripartizione dei fondi proposta dal Comitato ex art. 4 legge 798/1984 in favore delle Amministrazioni comunali.

4 novembre 2004, il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 prende atto dello stato di avanzamento delle attività alle bocche di porto e degli approfondimenti che il Magistrato alle Acque sta conducendo circa gli argomenti richiesti dalle Amministrazioni comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti. Delibera, tra l'altro, in ordine alla ripartizione dei fondi assegnati dal CIPE.

17 dicembre 2004, il Consiglio di Stato – Sezione VI emette il dispositivo della propria sentenza respingendo i ricorsi presentati in appello da alcune associazioni ambientaliste, nonché dalle Amministrazioni Comunale e Provinciale di Venezia avverso alcuni provvedimenti amministrativi propedeutici all'avvio del "Sistema MOSE".

11 maggio 2005, interviene la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo rep. n. 8067 alla "Convenzione Generale" rep. n. 7191/1991 che introduce il *"prezzo chiuso"* per il completamento delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto, con conseguente revisione dello schema contrattuale tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova, al fine di poter contare su finanziamenti ulteriori,

complessivi "certi", a fronte della determinazione "certa" del fabbisogno residuo e del relativo programma di esecuzione dell'opera.
L'atto specifica il valore economico delle opere da realizzare nel *Piano di esecuzione degli interventi,* suddivisi in fasi, i tempi di esecuzione nel *Cronoprogramma* e i fabbisogni finanziari nel relativo *Piano dei Finanziamenti.* Il Cronoprograma prevede la conclusione delle attività finalizzate alla realizzazione delle opere alle bocche di porto entro il 31.12.2012, purché la disponibilità dei finanziamenti ulteriori necessari avvenga nell'entità e con la scansione temporale indicate nel *Piano dei finanziamenti.*

luglio 2005, una volta completato l'iter approvativo[10] dell'atto aggiuntivo rep. n. 8067/2005, inizia la presentazione all'esame del Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque dei progetti esecutivi delle opere finanziate a valere sui fondi di cui alla 2^ assegnazione da parte del CIPE (638,1 milioni di euro), nell'ambito del "prezzo chiuso".

settembre 2005, nelle more della effettiva disponibilità dei fondi di cui alla 2^ assegnazione da parte del CIPE[11], inizia la formalizzazione della consegna dei lavori, sotto le riserve di legge, dal Magistrato alle Acque al Consorzio Venezia Nuova, relativamente agli stralci già esaminati dal Comitato Tecnico di Magistratura, per assicurare continuità ai lavori in corso alle bocche di porto.

10 In data 8.07.2005, avviene la registrazione, da parte della Sezione di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti, del Decreto Presidenziale del 23.05.2005 approvativo dell'atto aggiuntivo che introduce il "prezzo chiuso".

11 Solo in data 14.12.2005, una volta ottenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti i chiarimenti sulla natura del "contributo" pluriennale, si stipula il contratto-quadro di mutuo tra Consorzio Venezia Nuova e il Raggruppamento finanziatore che mette a disposizione del Consorzio un volume di investimento di importo pari a 638,1 milioni di euro.
In data 19.12.2005, avviene la sottoscrizione del nuovo Atto Attuativo rep. n. 8100 alla "Convenzione Generale", approvato con D.P. n. del, registrato alle Sezione del Veneto della Corte dei Conti in data 8.01.2006

Elenchi

Mappe

Foto

PAGINA BIANCA

DIFESA DALLE ACQUE ALTE ECCEZZIONALI

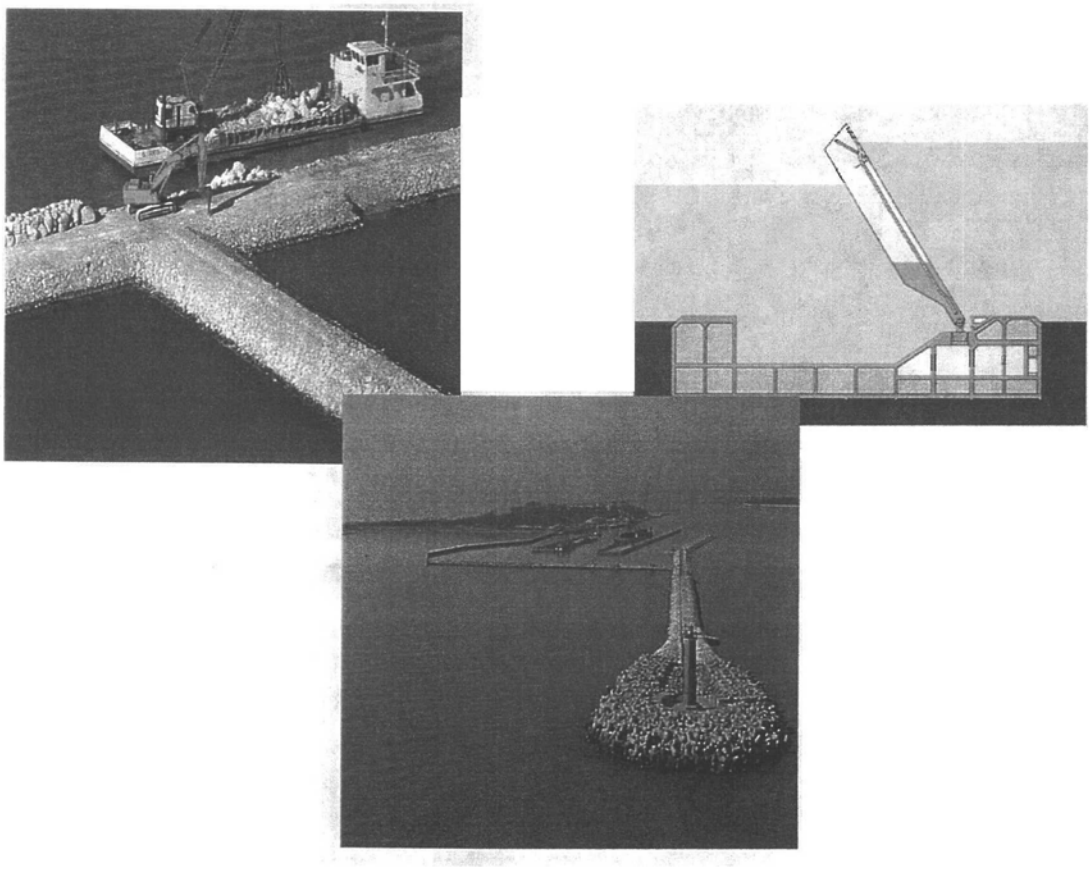

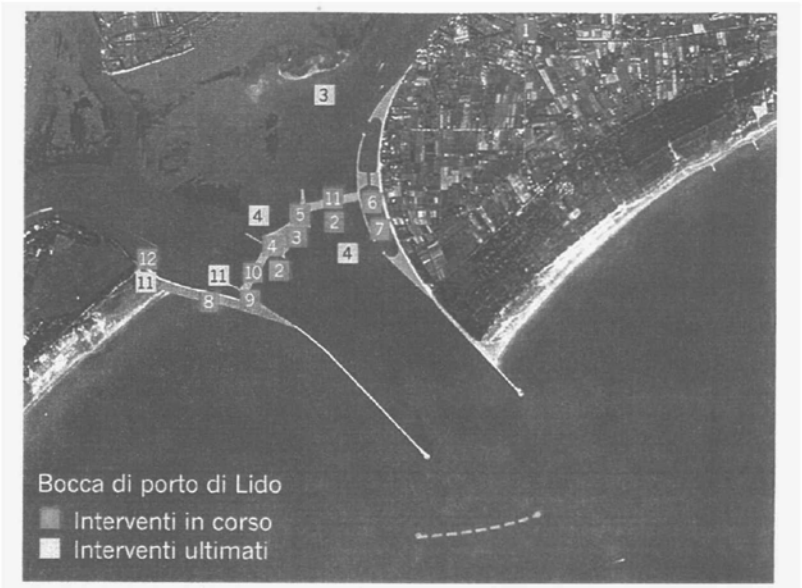
Bocca di porto di Lido
Interventi in corso
Interventi ultimati

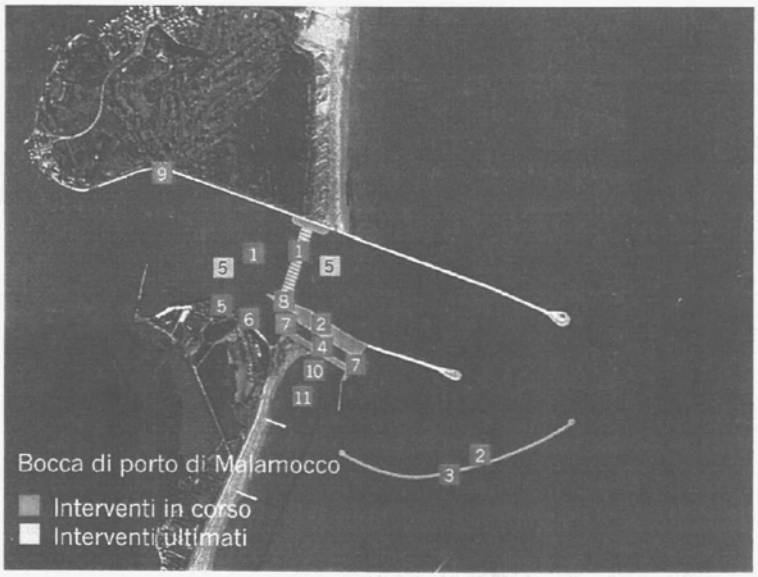
Bocca di porto di Malamocco
Interventi in corso
Interventi ultimati

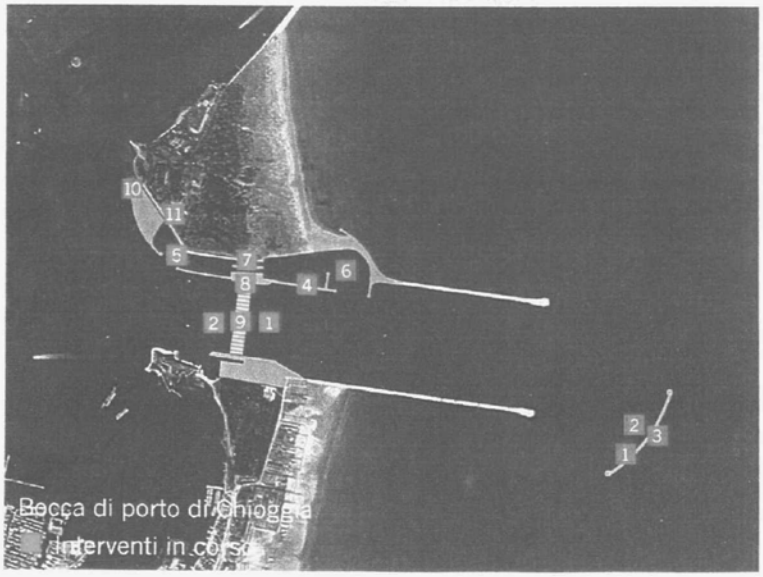
Bocca di porto di Chioggia
Interventi in corso

Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Progettazione preliminare e di massima
2. Procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle opere mobili
3. Interventi sperimentali (Modulo Sperimentale Elettromeccanico: costruzione, sperimentazione, sorveglianza e dismissione)
4. Indagini alla bocca di Lido
5. Indagini alla bocca di Malamocco, 1^ fase e integrazioni
6. Campagne di sondaggi per le opere complementari
7. Procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle opere complementari e della conca di navigazione a Malamocco
8. Studi e Sperimentazioni propedeutici alla progettazione preliminare, di massima e definitiva
9. Progetto definitivo delle opere mobili e delle opere complementari
10. Progettazione esecutiva delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto (parte)
11. Lido: Campo prova pali di fondazione

Attività in corso

Progetto esecutivo delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto (completamento)

Bocca di Lido: realizzazione delle seguenti fasi/stralci delle opere di regolazione delle maree:

1. Costruzione e gestione rilevato sperimentale per modello geotecnico del sottosuolo
2. Indagini archeologiche e bonifica bellica
3. Lido – S. Nicolò – Isola tra S. Nicolò e Treporti 1^ fase A
4. Lido – Treporti - Isola tra S. Nicolò e Treporti 1^ fase B
5. Lido – Treporti – Isola tra S. Nicolò e Preporti - spalla ovest 2^ fase 1° stralcio
6. Lido – Treporti: Tura e porto rifugio 1^ fase
7. Lido – Treporti: Tura e porto rifugio 2^ fase 1° stralcio
8. Lido – S. Nicolò – Spalla sud: rinforzo molo sud esistente
9. Lido – S. Nicolò – Spalla sud 1° stralcio
10. Lido – S. Nicolò – Barriera: protezione del fondale 1° stralcio
11. Lido – Treporti - Barriera : protezione del fondale 1° stralcio
12. Lido – S. Nicolò – Aree di produzione 1° stralcio banchina di accosto natanti

Bocca di Malamocco: realizzazione delle seguenti fasi/stralci delle opere di regolazione delle maree:

1. Indagini alla bocca di Malamocco 2^ fase
2. Indagini archeologiche e bonifica bellica
3. Realizzazione della diga foranea di fronte alla bocca di Malamocco
4. Malamocco - Conca di navigazione per grandi navi: Opere civili - camera
5. Malamocco - Conca di navigazione per grandi navi: Protezione della sponda del territorio lato Forte S. Pietro 1^

6. Malamocco - Conca di navigazione per grandi navi: Protezione della sponda del territorio lato Forte S. Pietro 2^ fase
7. Malamocco - Conca di navigazione per grandi navi: Opere civili per alloggiamento porte 1° stralcio
8. Malamocco – Spalla lato sud 1° stralcio
9. Malamocco – Aree di produzione: 1° stralcio piarda di selezione materiale
10. Malamocco – Aree di produzione: 2° stralcio Terminal Malamocco
11. Malamocco – Infrastrutture per prefabbricazione cassoni di Malamocco e San Nicolò 1° stralcio – rilevato

Bocca di Chioggia : realizzazione delle seguenti fasi/stralci delle opere di regolazione delle maree:

1. Indagini alla bocca di Chioggia
2. Indagini archeologiche e bonifica bellica
3. Realizzazione della diga foranea di fronte alla bocca di Chioggia
4. Chioggia - Porto rifugio: 1^ fase scogliera sud
5. Chioggia - Porto rifugio: bacino lato laguna
6. Chioggia - Porto rifugio: bacino lato mare / tura 1^ fase 1° stralcio
7. Chioggia - Conca per pescherecci: opere civili
8. Chioggia - Spalla nord 1° stralcio
9. Chioggia - Barriera: protezione del fondale 1° stralcio Realizzazione della parte centrale della protezione dei fondali
10. Chioggia - Aree di produzione 1° stralcio
11. Chioggia - Cavidotti per attraversamento linee elettriche

Attività da avviare

1. Ulteriori approfondimenti, indagini e campi prova propedeutici al progetto costruttivo/operativo delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto
2. Ulteriori fasi/stralci funzionali delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto a Lido, Malamocco, Chioggia

Attività da finanziare:

1. Completamento della realizzazione degli interventi di regolazione delle maree alle bocche di porto
2. Avvio della fase sperimentale di gestione funzionale delle opere alle bocche di porto

Bocca di Lido

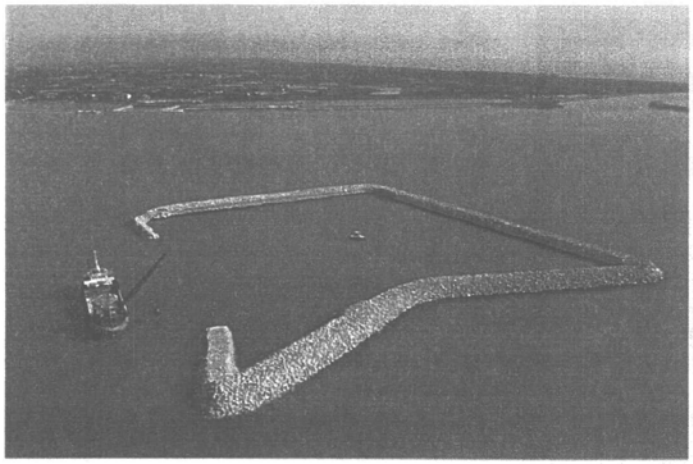

Bocca di Lido – Isola tra S. Nicolò e Treporti 1^ fase

Obiettivi specifici: realizzazione di un'isola artificiale avente la funzione di collegamento tra la spalla della barriera mobile situata a Ovest del canale di Treporti e la spalla della barriera mobile situata a Nord del canale di S. Nicolò.

Intervento in corso

Bocca di Lido – Isola tra S. Nicolò e Treport 1^ fase. Vista aerea dell'isola.

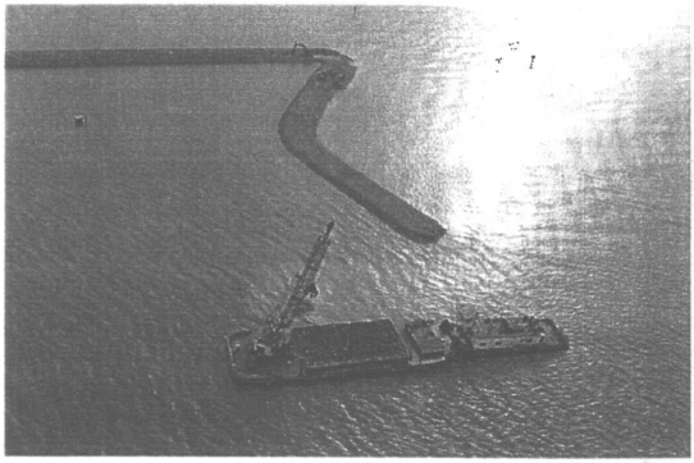

Bocca di Lido – Isola tra S. Nicolò e Treport 1^ fase. Fasi di lavoro.

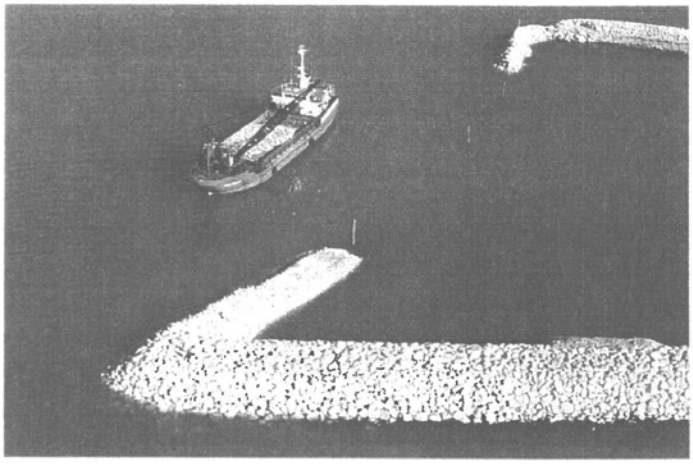

Bocca di Lido – Isola tra S. Nicolò e Treport 1^ fase. Fasi di lavoro.



Bocca di Lido – Porto rifugio a Treporti e tura

Obiettivi specifici: realizzazione di un porto rifugio per evitare l'interruzione del transito marittimo durante la chiusura dei varchi in occasione di eventi di acqua alta.

Intervento in corso

Bocca di Lido – Porto Rifugio a Treporti e Tura: Vista aerea del terrapieno lato mare.

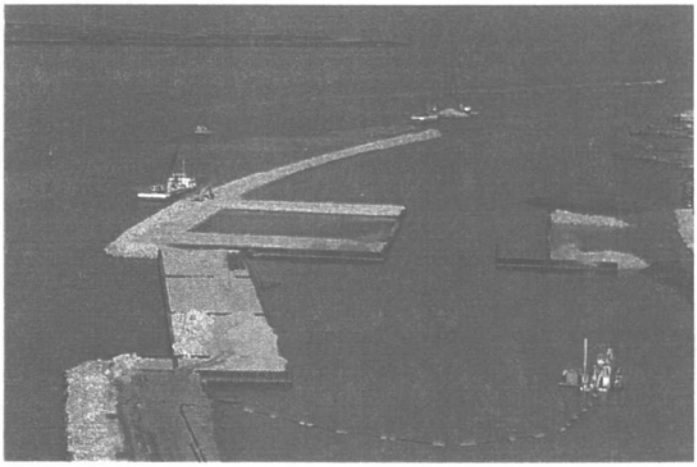

Bocca di Lido – Porto Rifugio a Treporti e Tura. Realizzazione terrapieni in corrispondenza della conca.

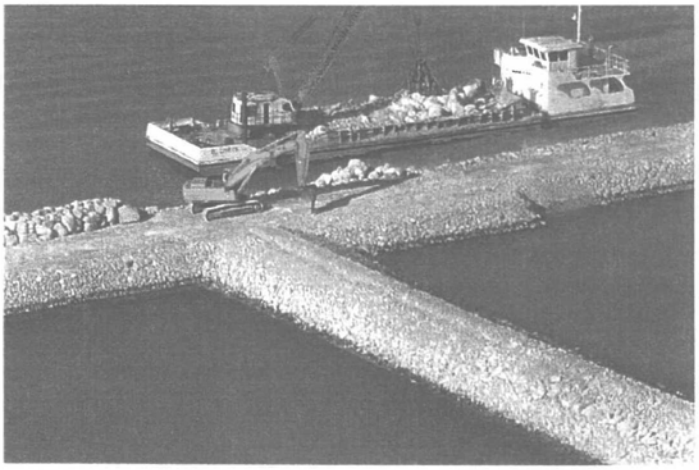

Bocca di Lido – Porto Rifugio a Treporti e Tura: Fasi di lavoro.

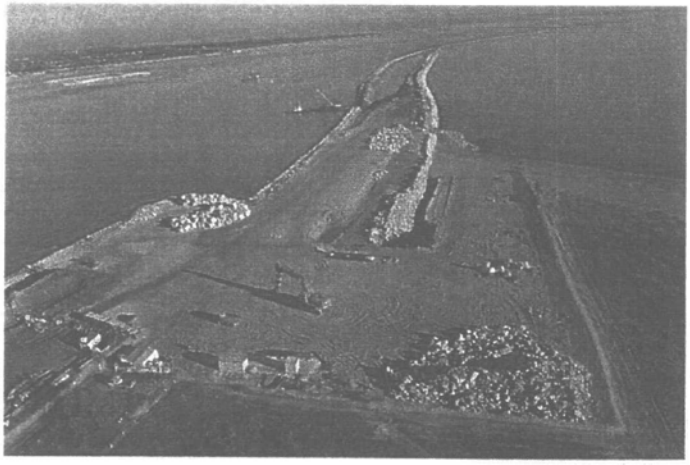

Bocca di Lido – Rinforzo radice del molo sud

Obiettivi specifici: Rinforzo del molo sud per garantire la funzione di ritenuta idraulica in condizioni di chiusura della barriera. Il rinforzo si estende per 1300 m lato mare e per 250 m lato canale.

Intervento in corso

Bocca di Lido - Rinforzo radice del molo sud. Nuova scogliera lato mare e riempimento a rinforzo del molo.

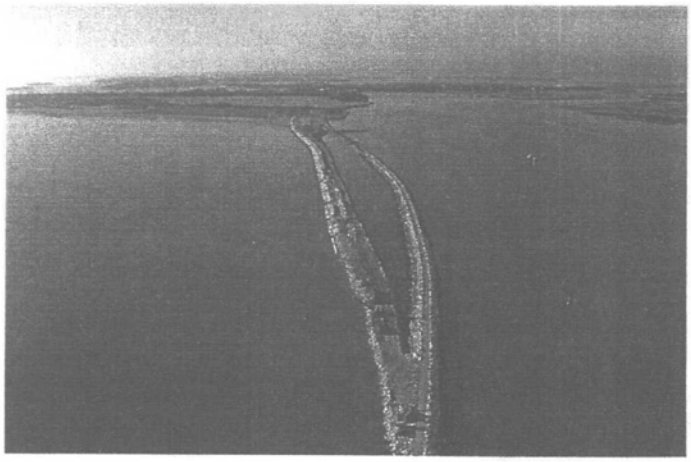

Bocca di Lido- Rinforzo radice del molo sud. Vista aerea della nuova scogliera lato mare.

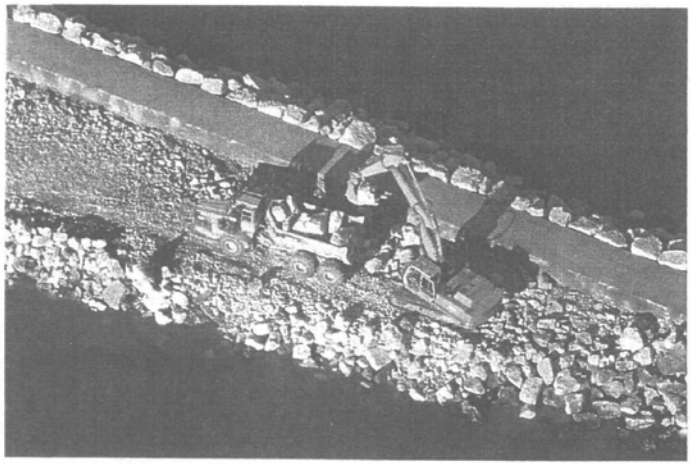

Bocca di Lido- Rinforzo radice del molo sud. Mezzi in opera.

Bocca di Malamocco

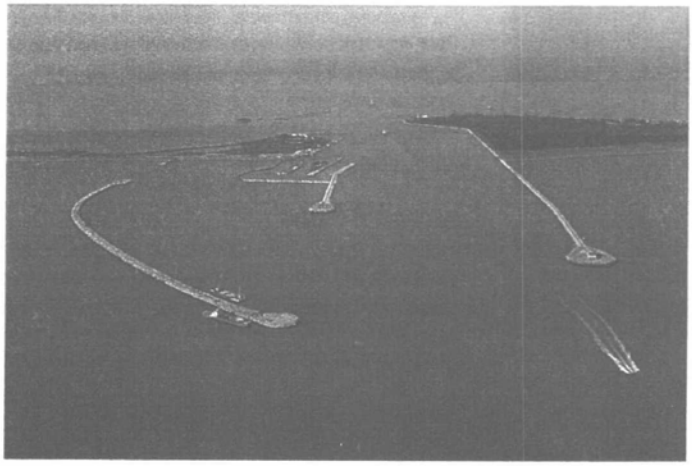

Bocca di Malamocco – Diga foranea

Obiettivi specifici: realizzazione di una diga foranea che svolge la duplice funzione di protezione della costruenda conca di navigazione ed il relativo canale di accesso e, allo stesso tempo, contribuisce a creare l'effetto dissipativo delle correnti nei canali di bocca.

Intervento in corso

Bocca di Malamocco- Diga foranea. Vista aerea della diga.



Bocca di Malamocco- Diga foranea. Mezzi in opera.

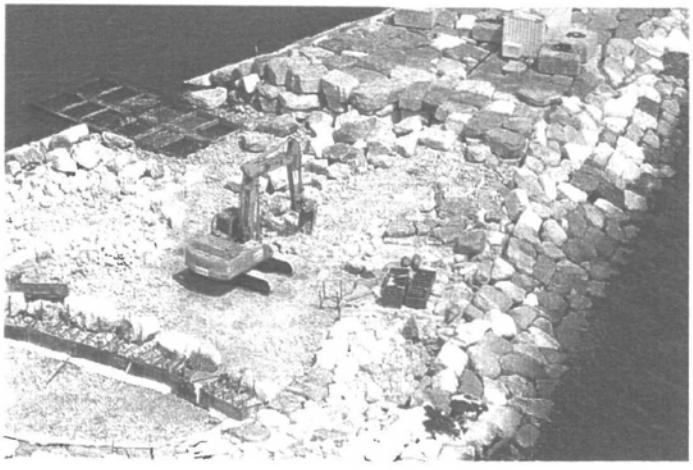

Bocca di Malamocco- Diga foranea. Mezzi in opera.

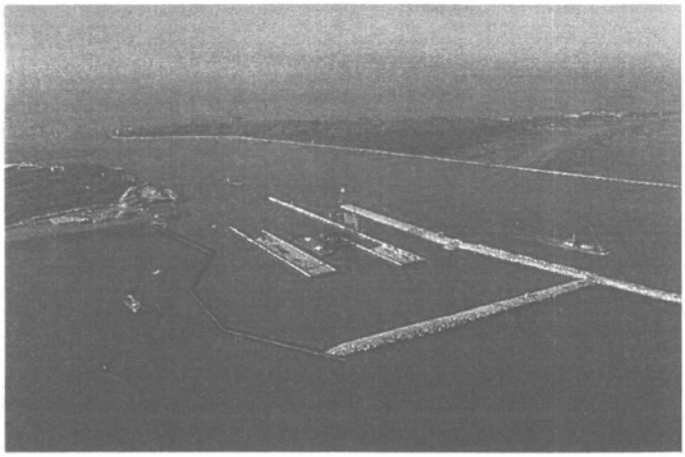

Bocca di Malamocco – Conca di navigazione – camera della conca

Obiettivi specifici: realizzazione della camera della conca di navigazione la cui funzione e quella di consentire l'accesso alla laguna anche durante la chiusura dei varchi in occasione di eventi di acqua alta.

Intervento in corso

Bocca di Malamocco – Conca di navigazione – camera di conca. Realizzazione pareti longitudinali della conca prolungamento del molo.

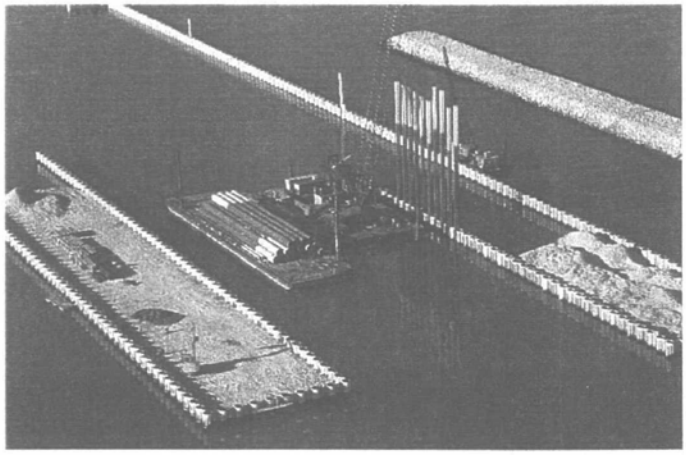

Bocca di Malamocco – Conca di navigazione – camera di conca. Realizzazione riempimenti.

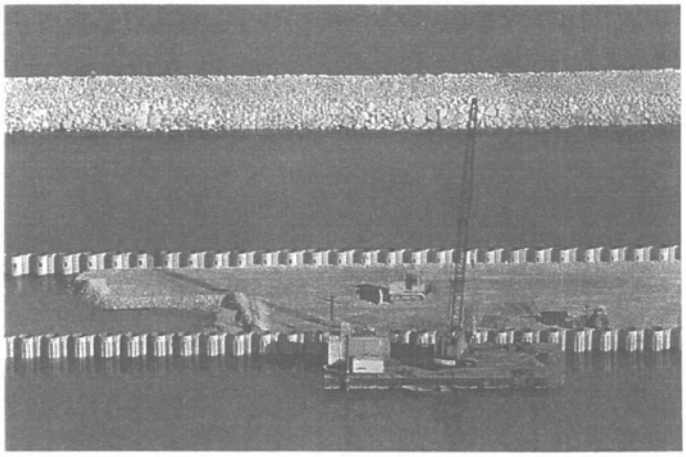

Bocca di Malamocco – Conca di navigazione – camera di conca. Realizzazione riempimenti.

Bocca di Chioggia

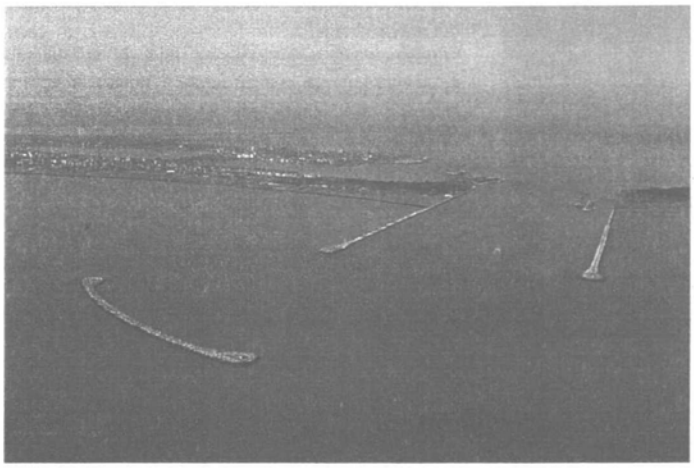

Bocca di Chioggia – Diga Foranea

Obiettivi specifici: realizzazione di una diga per creare effetti dissipativi delle correnti nei canali di bocca. Lo sviluppo della diga è di 522 m.

Intervento in corso

Bocca di Chioggia – Diga foranea. Vista della diga.

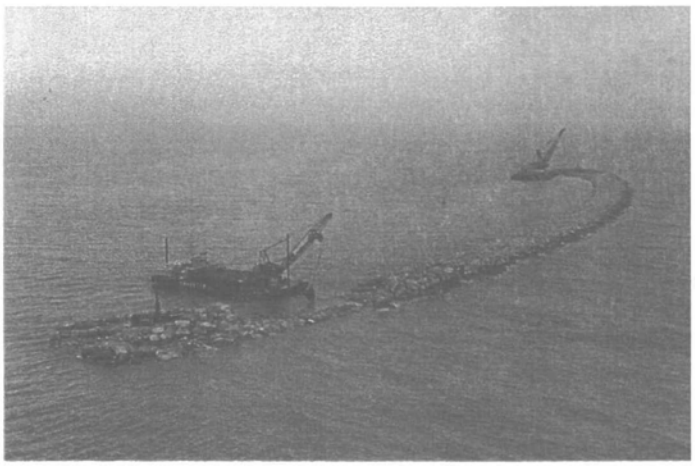

Bocca di Chioggia – Diga foranea. Vista della diga.

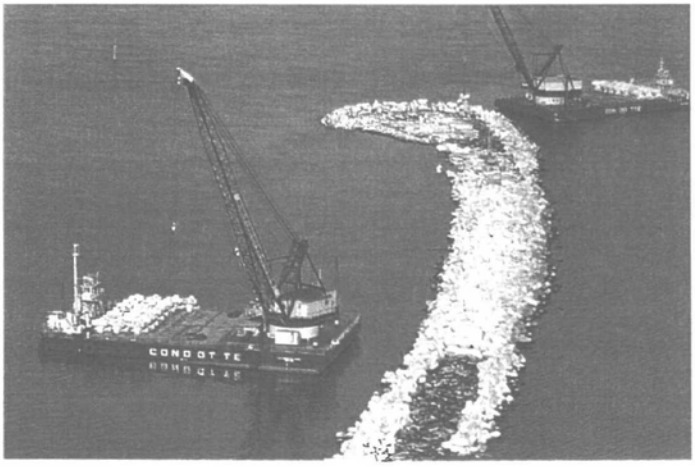

Bocca di Chioggia – Diga foranea. Testata nord, posa degli accropodi.

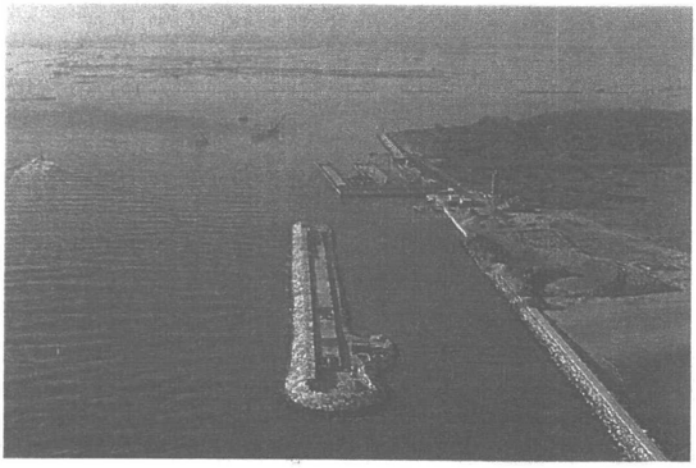

Bocca di Chioggia – Porto rifugio – Scogliera sud
Conche per piccole imbarcazioni

Obiettivi specifici: realizzazione del Porto rifugio e di du conche di navigazione per consentire il passaggio piccole imbarcazioni e di pescherecci durante le chiusu della barriera mobile.

Interventi in corso

Bocca di Chioggia – Porto rifugio – Scogliera sud. Vis aerea della scogliera.

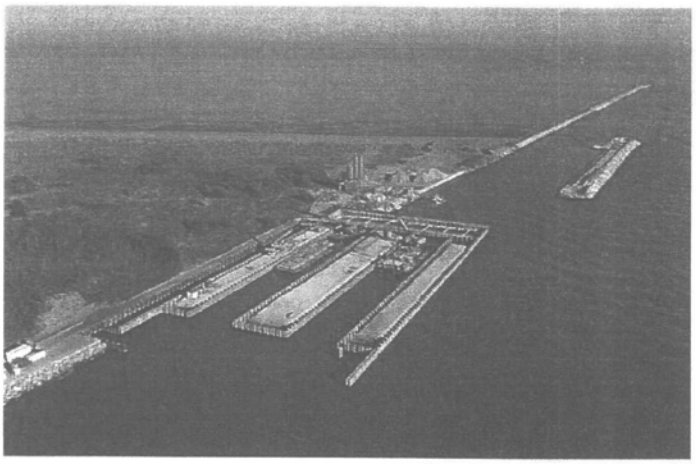

Bocca di Chioggia –Conche di navigazione. Fasi realizzazione delle conche.

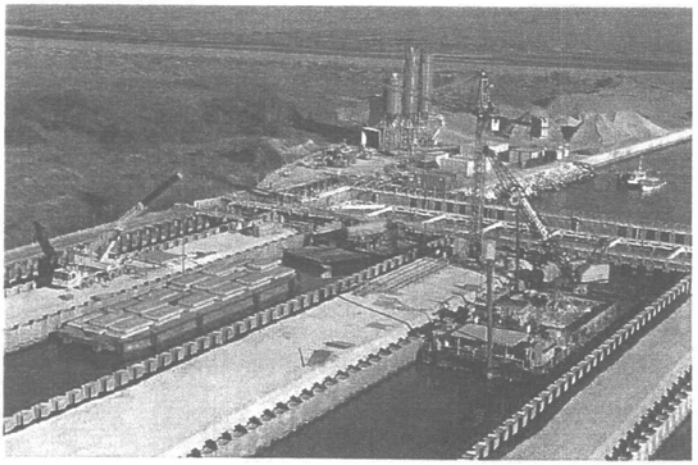

Bocca di Chioggia – Conche di navigazione. Mezzi i opera.

PAGINA BIANCA

DIFESA LOCALE DALLE ACQUE MEDIO - ALTE



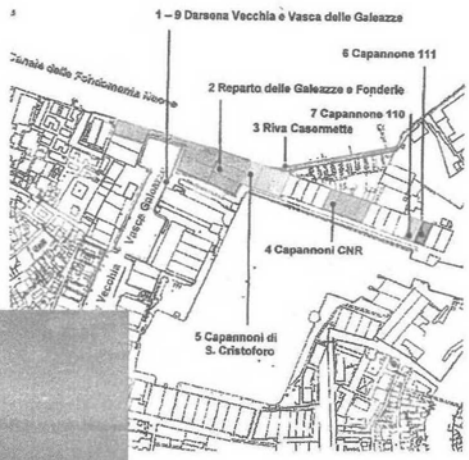



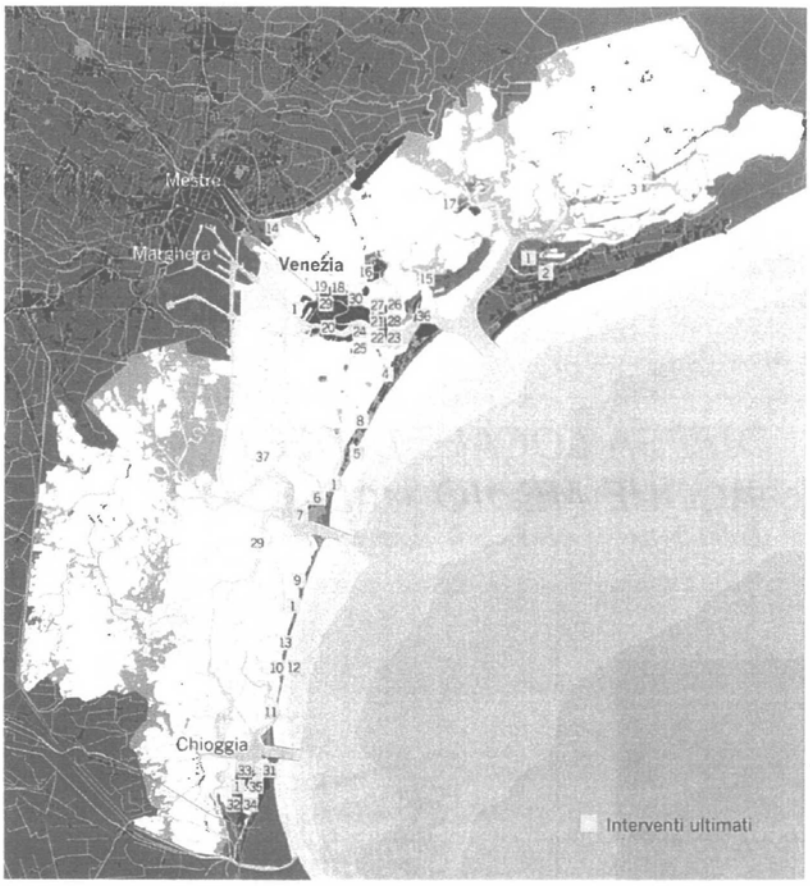
Mestre
Marghera
Venezia
Chioggia
Interventi ultimati

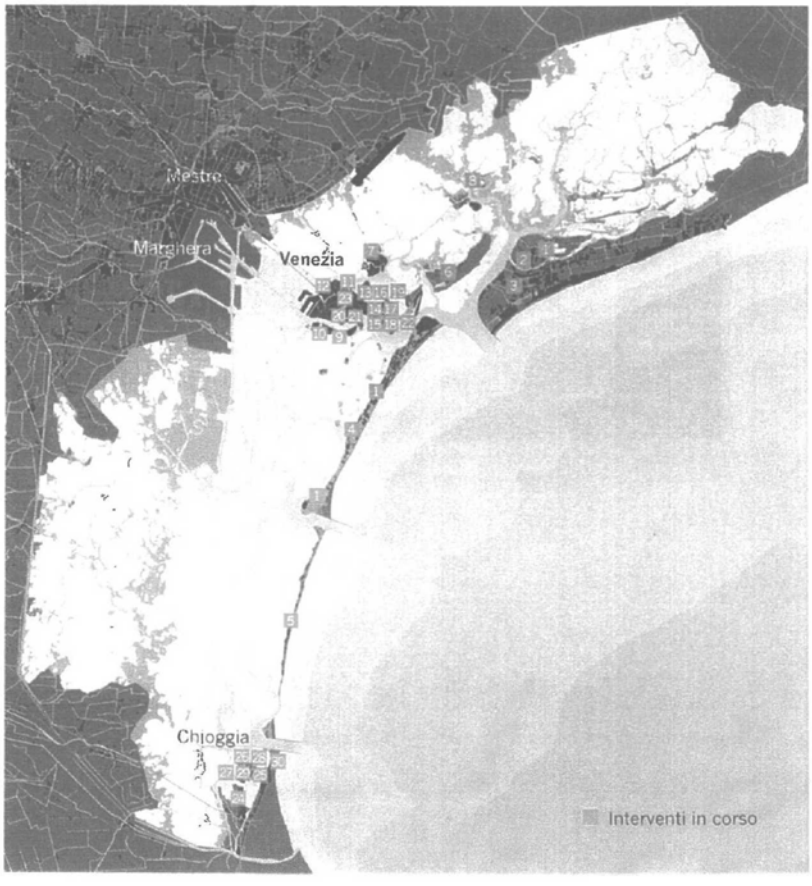
Mestre
Marghera
Venezia
Chioggia
Interventi in corso

Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Indagini propedeutiche a progetti di recupero e difesa degli insediamenti 1^, 2^, 3^, 4^ , 5^ e 6^ fase
2. Ricostruzione di marginamenti e difesa dell'insediamento urbano di Treporti - primi quattro stralci e 1^ e 2^ fase del 5° stralcio (marginamento via Vivaldi e sistemazione delle chiaviche) (Cavallino)
3. Ricostruzione rive del canale dei Bari (Cavallino)
4. Ricostruzione riva in corrispondenza di via Navarrino (Lido)
5. Difesa dell'abitato di Malamocco (Lido)
6. Ristrutturazione riva in località Alberoni (Lido)
7. Difesa dell'abitato di Alberoni, lato sud-est (Lido) in Accordo di programma con il Comune di Venezia
8. Marginamento a Lido – via Coletti, e lato sud (Lido)
9. Difesa dell'insediamento urbano di S. Pietro in Volta 1° e 2° stralcio (Pellestrina)
10. Difesa dell'abitato di Pellestrina – quattro stralci funzionali (Pellestrina)
11. Sistemazione area banchinamento Cà Roman (Pellestrina)
12. Gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento e dei presidi posti a difesa dell'abitato di Pellestrina (Pellestrina)
13. Completamento in direzione nord delle opere di difesa dell'abitato di Pellestrina, lato laguna (Pellestrina)
14. Ristrutturazione rive a S. Giuliano 1° (gronda lagunare)
15. Difesa insediamento urbano a S. Erasmo 1° stralcio (laguna nord)
16. Difesa dell'abitato di Murano 1° stralcio (laguna nord)
17. Ristrutturazione rive a Mazzorbo (laguna nord)
18. Ristrutturazione riva a S. Alvise (Venezia)
19. Ristrutturazione riva cantiere ex Opere marittime a Cannaregio (Venezia)
20. Ricostruzione delle rive alle Zattere e alla Giudecca 1°, 2°, 3°, 4° e 5° stralcio (Venezia)
21. Ricostruzione delle rive dei Giardini Napoleonici – in Accordo di programma con il Comune di Venezia (Venezia)
22. Ristrutturazione riva a S. Elena – Giardini (Venezia)
23. Ristrutturazione riva a S. Elena – Morosini (Venezia)
24. Messa in sicurezza del molo e delle lanterne dell'isola di S. Giorgio – interventi urgenti (Venezia)
25. Intervento di messa in sicurezza del molo di San Giorgio Maggiore 2^ fase (Venezia)
26. Indagini storico architettoniche sull'Arsenale Militare (Venezia) e indagini propedeutiche alla progettazione degli interventi (Venezia)
27. Consolidamento banchine dell'Arsenale – interventi urgenti (Venezia)
28. Intervento di messa in sicurezza del "Reparto delle Galeazze" e "Fonderie" presso l'Arsenale (Venezia)
29. Difesa del percorso dei Tolentini (Venezia) – in Accordo di programma con il Comune di Venezia
30. Interventi per il ripristino delle rive delle Fondamente Nuove – messa in sicurezza del Ponte Donà (Venezia)
31. Sistemazione rive e difesa dell'insediamento urbano di Sottomarina (Chioggia) in Accordo di programma con il Comune di Chioggia, primi quattro stralci

32. Difesa dei quartieri Tombola e Borgo S. Giovanni (Chioggia) in Accordo di programma con il Comune di Chioggia, 1° stralcio

33. Difesa dell'"insula" di Chioggia dalle acque alte in Accordo di programma con il Comune di Chioggia: ponte lungo

34. Sistemazione zona Lusenzo interno (Chioggia)

35. Difesa dell'isola dell'Unione e Buon Castello (Chioggia) in Accordo di programma con il Comune di Chioggia

36. Protezione del Forte di S. Andrea (bocca di porto di Lido)

37. Intervento di adeguamento e messa in sicurezza delle stazioni mareografiche nella laguna di Venezia

Attività in corso

1. Indagini propedeutiche a progetti di recupero a difesa degli insediamenti 7^ fase

2. Interventi a difesa dell'abitato di Treporti (Cavallino) ed aree annesse dalle acque alte 5° stralcio: ulteriori interventi di protezione di sponda (3^ fase)

3. Marginamento canale Pordelio – Treporti 1^ stralcio Ponte girevole (Cavallino)

4. Interventi di difesa degli abitati di Malamocco e Alberoni (Lido) nell'ambito dell'Accordo di programma con il Comune di Venezia

5. Interventi di difesa insediamenti urbani lungo l'isola di Pellestrina, lato laguna – tratto tra Portosecco e il cantiere de Poli (Pellestrina)

6. Difesa dell'abitato di S. Erasmo 2° e 3° stralcio (laguna nord)

7. Difesa Insula Murano – Canale S. Mattia (laguna nord)

8. Difesa dell'abitato di Torcello (laguna nord)

9. Ricostruzione delle rive alle Zattere e alla Giudecca 6° stralcio (Venezia)

10. Rive sud Giudecca e Sacca Fisola nord (Venezia)

11. Ripristino Fondamente Nuove 1^ stralcio (Venezia)

12. Ripristino del marginamento antistante l'ex macello a S. Giobbe (Venezia)

13. Ricostruzione della difesa spondale dell'area edificata a nord dell'Arsenale di Venezia – Rive Casermette (Venezia)

14. Arsenale di Venezia - Messa in sicurezza e restauro Capannoni S. Cristoforo (Venezia)

15. Arsenale di Venezia - Messa in sicurezza Capannoni Novissima (capannone 110 e 111) (Venezia)

16. Arsenale di venezia – Messa in sicurezza delle Tese della Novissima (capannoni da 96 a 100, da 107 a 109, 112 e 113) (Venezia)

17. Arsenale di Venezia - Risanamento e consolidamento delle rive della Darsena Vecchia e Vasca delle Galeazze (Venezia)

18. Intervento di recupero e adeguamento funzionale dei marginamenti dell'area a nord dell'Arsenale di Venezia (Venezia)

19. Intervento di recupero del marginamento dell'area nord dell'Arsenale di Venezia lungo il canale delle Fondamente Nuove tra la Celestia e le Casermette (Venezia)

20. Difesa Insula di San Marco 1° stralcio (Venezia)

21. Difesa bacino San Marco tra il Ponte delle Paglia e il Ponte del Vin (Venezia)

22. Marginamento lungo il fronte est dell'isola di S. Elena (Venezia)

23. Difesa dell'insula di Rialto (Venezia) – progettazione

24. Difesa dei quartieri S. Giovanni e Tombola (Chioggia) 2° stralcio in Accordo di programma con il Comune di Chioggia

25. Difesa dei quartieri San Domenico (Chioggia) 1° e 2° stralcio in Accordo di programma con il Comune di Chioggia

26. Difesa dell'"insula" di Chioggia dalle acque alte interventi sulle rive del canale Lombardo e del bacino Vigo in Accordo di programma con il Comune di Chioggia

27. Difesa dell'"insula" di Chioggia dalle acque alte, interventi sulle rive del canale Perottolo in Accordo di programma con il Comune di Chioggia

28. Difesa dell'"insula" di Chioggia dalle acque alte, sistemazione del ponte Vigo in Accordo di programma con il Comune di Chioggia

29. Difesa dell'"insula" di Chioggia dalle acque alte, sistemazione dei ponti sul canal Vena 1° stralcio in Accordo di programma con il Comune di Chioggia

30. Interventi di difesa dell'insediamento urbano di Sottomarina dalle acque alte 5° stralcio, riva San Felice (Chioggia)

Attività da avviare

1. Prosecuzione sistemazione marginamento canale Pordelio – Treporti 2^ stralcio

2. Completamento dell'intervento nella zona Malamocco – Alberoni a Lido

3. Prosecuzione degli interventi nella zona di Lido

4. Prosecuzione della sistemazione di rive e marginamenti del centro storico di Venezia

5. Sistemazione sponde, ed edifici prospicienti, all'Arsenale di Venezia

6. Prosecuzione della difesa del centro storico di Chioggia

Venezia – San Marco

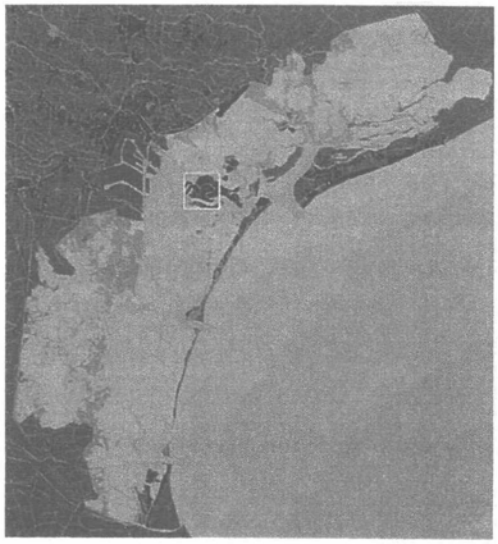

Obiettivi specifici: ridurre la frequenza degli allagamenti; contrastare il dissesto delle rive; proteggere dal moto ondoso.

Interventi principali: Contrastare l'allagamento: per sormonto rialzando il molo sul bacino e la pavimentazione retrostante; per risalita dai tombini e per filtrazione isolando l'antica rete dei cunicoli sotterranei dall'acqua che risale dai rii che circondano l'insula. Predisposizione di un nuovo sistema di raccolta e collettamento delle acque piovane.

Interventi in corso

A lato: localizzazione dell'intervento.

In basso: localizzazione delle aree oggetto dell'intervento.

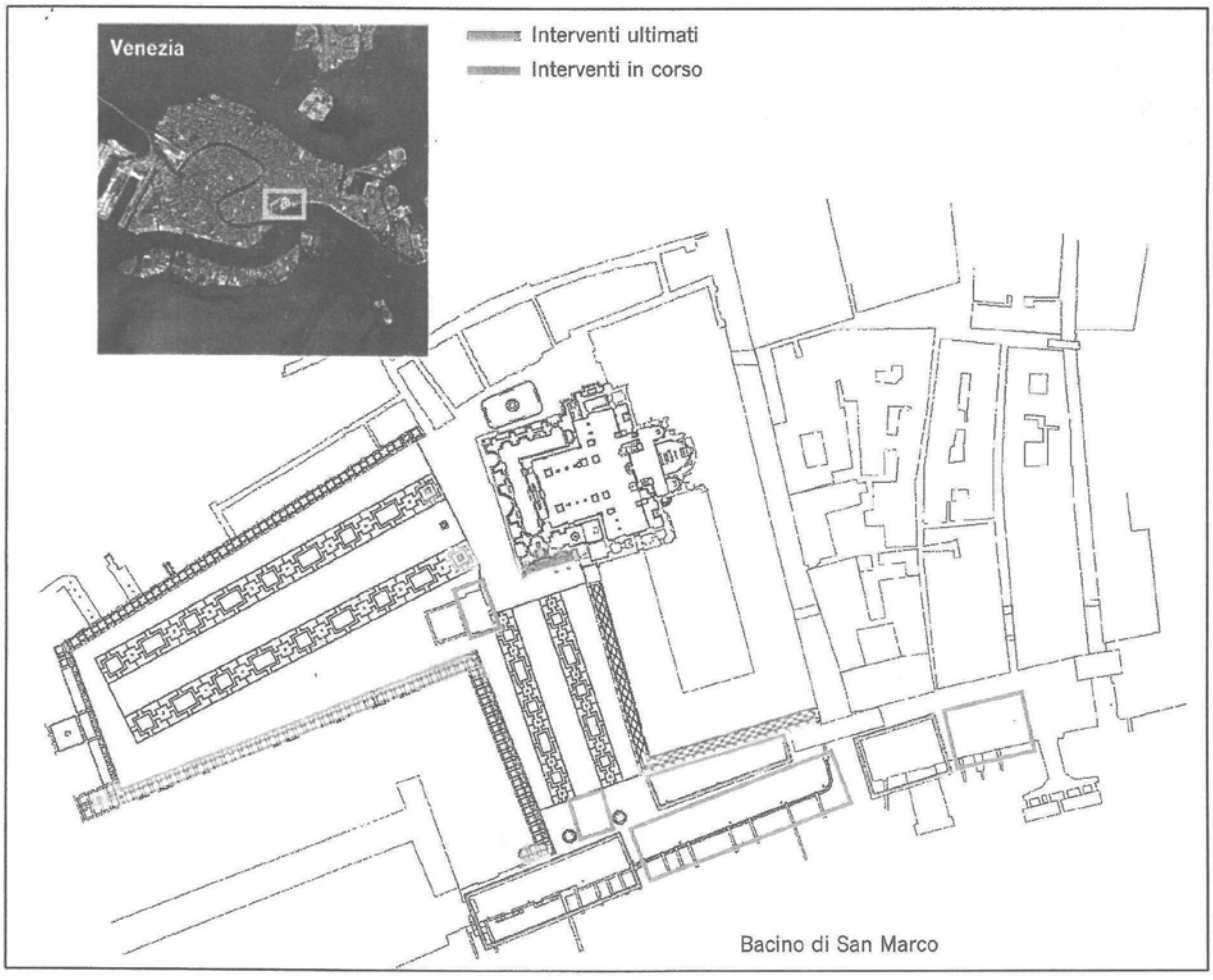

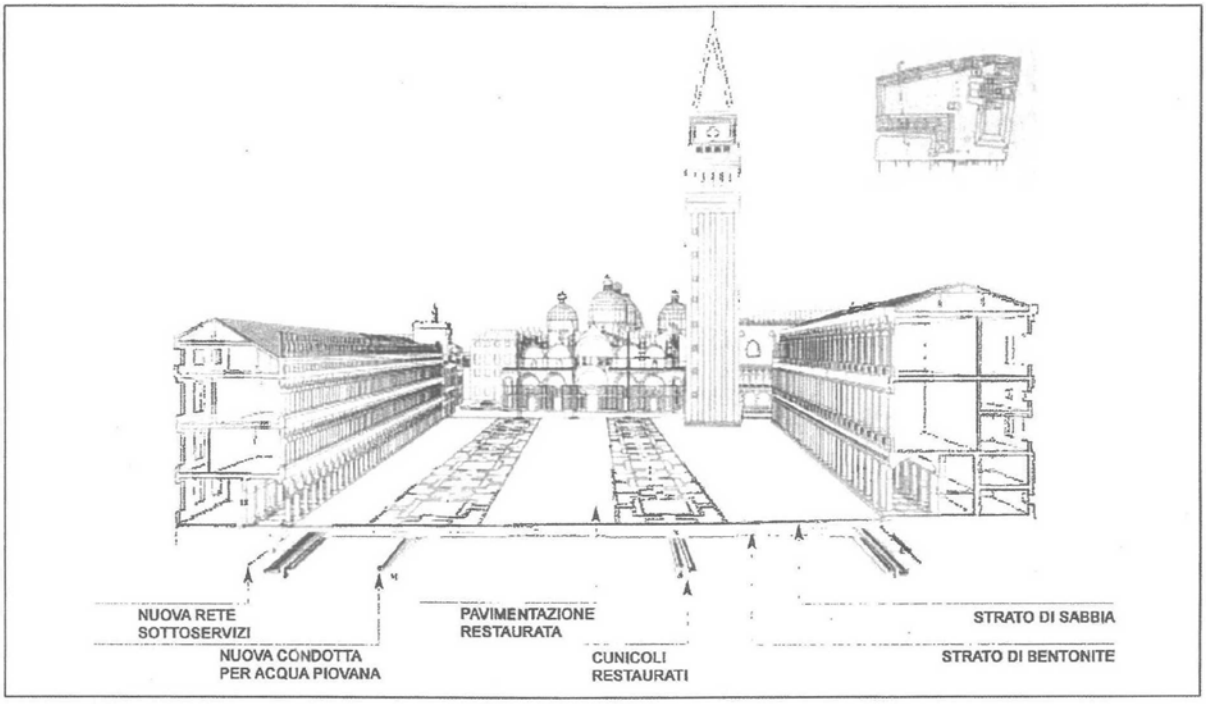

Piazza San Marco: *sopra* modalità di intervento, *sotto* modalità di intervento per sistemazione pavimentazione e cunicoli.

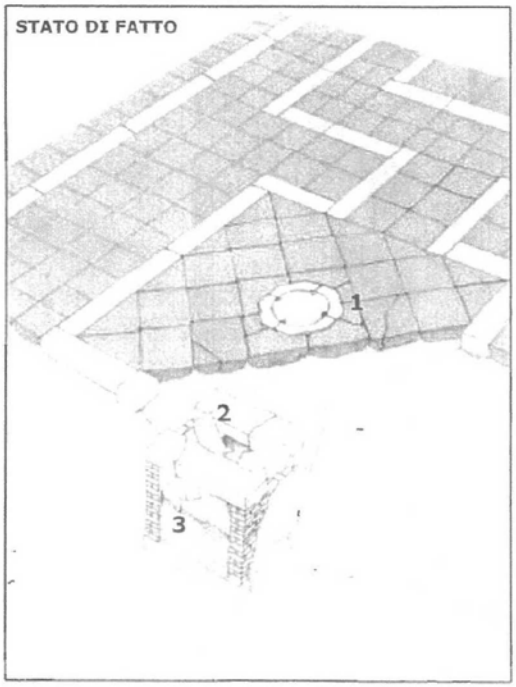

1 pavimentazione dissestata
2 degrado copertura
3 fango, detriti e degrado muratura

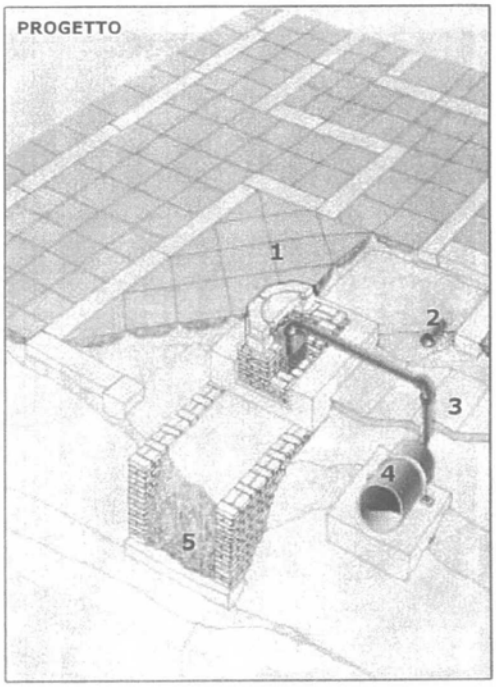

1 pavimentazione restaurata
2 rete di drenaggio
3 membrana bentonitica
4 nuova rete di smaltimento acque piovane
5 cunicolo restaurato e riempito

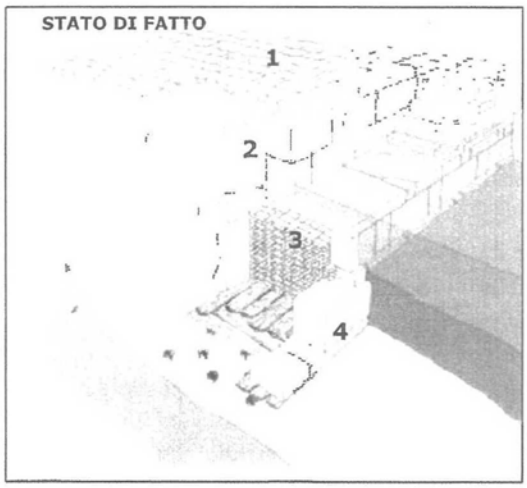

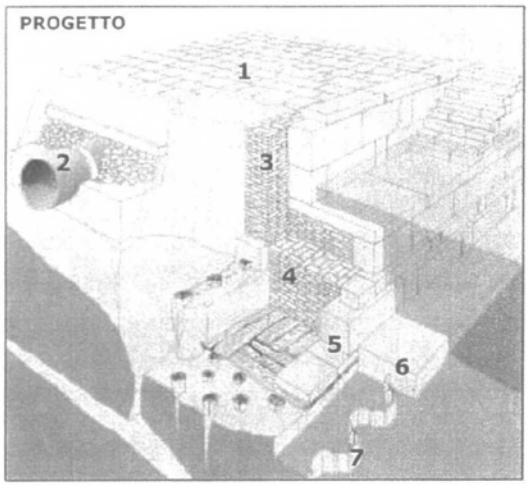

1 pavimentazione dissestata
2 elementi in calcestruzzo
3 elementi in laterizio dissestati
4 elementi lapidei dissestati

1 pavimentazione restaurata
2 nuova condotta di smaltimento acque piovane
3 nuova muratura
4 elementi in laterizio restaurati
5 elementi lapidei restaurati
6 nuovo cordolo di protezione
7 palancola antierosione

Piazza San Marco: *sopra* modalità di intervento per sistemazione del molo sul bacino.

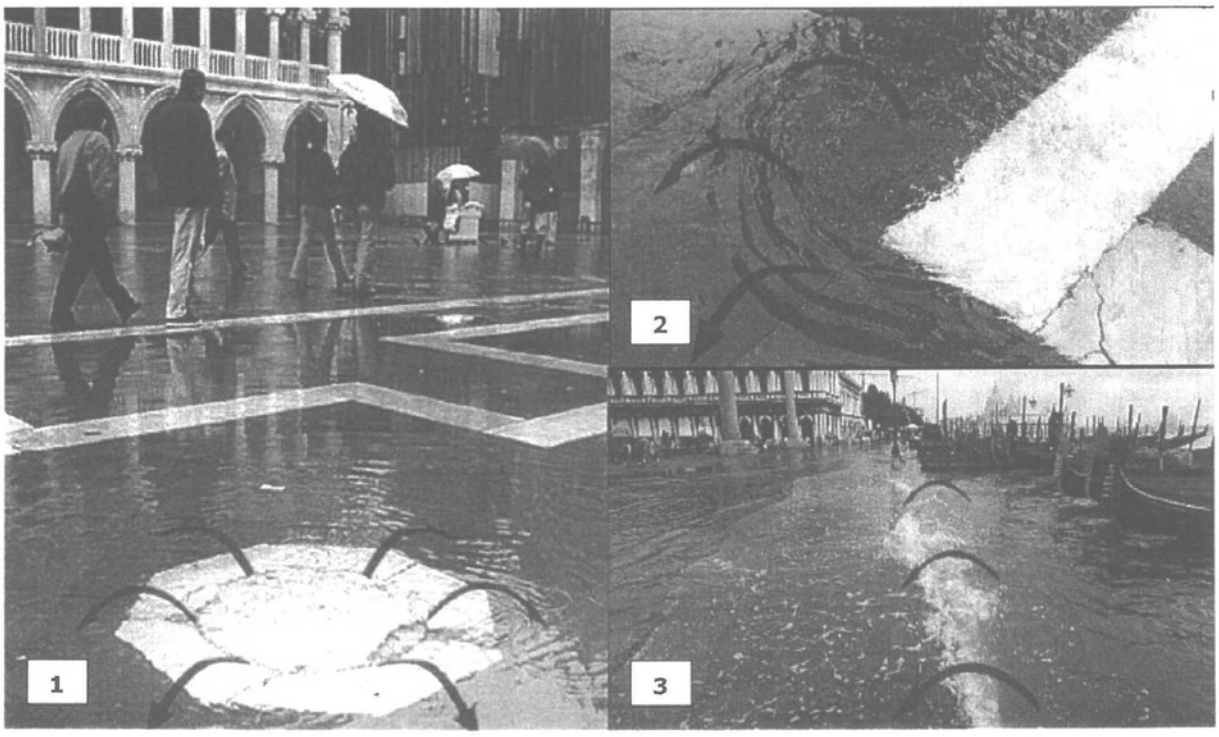

Piazza San Marco: modalità di allagamento, 1 per rigurgito dei tombini; 2 per filtrazione dal sottosuolo; 3 per sormonto della riva.



Difesa Insula di San Marco. Vista del molo durante i lavori.



Difesa Insula di San Marco Vista del molo a lavori ultimati.



Difesa Insula San Marco 1° stralcio. Ritrovamento di antiche pavimentazioni durante i lavori.



Difesa Insula di San Marco 1° stralcio. Particolare della pavimentazione ritrovata.



Difesa Insula S. Marco 1° stralcio. L'area di cantiere e l'allestimento della recinzione con pannelli descrittivi degli obiettivi dei lavori e delle modalità esecutive.



Difesa Insula S. Marco 1° stralcio. Vista del molo durante i lavori.



Difesa rive bacino S. Marco tra Ponte della Paglie e Ponte del Vin. Un tratto della riva durante i lavori.

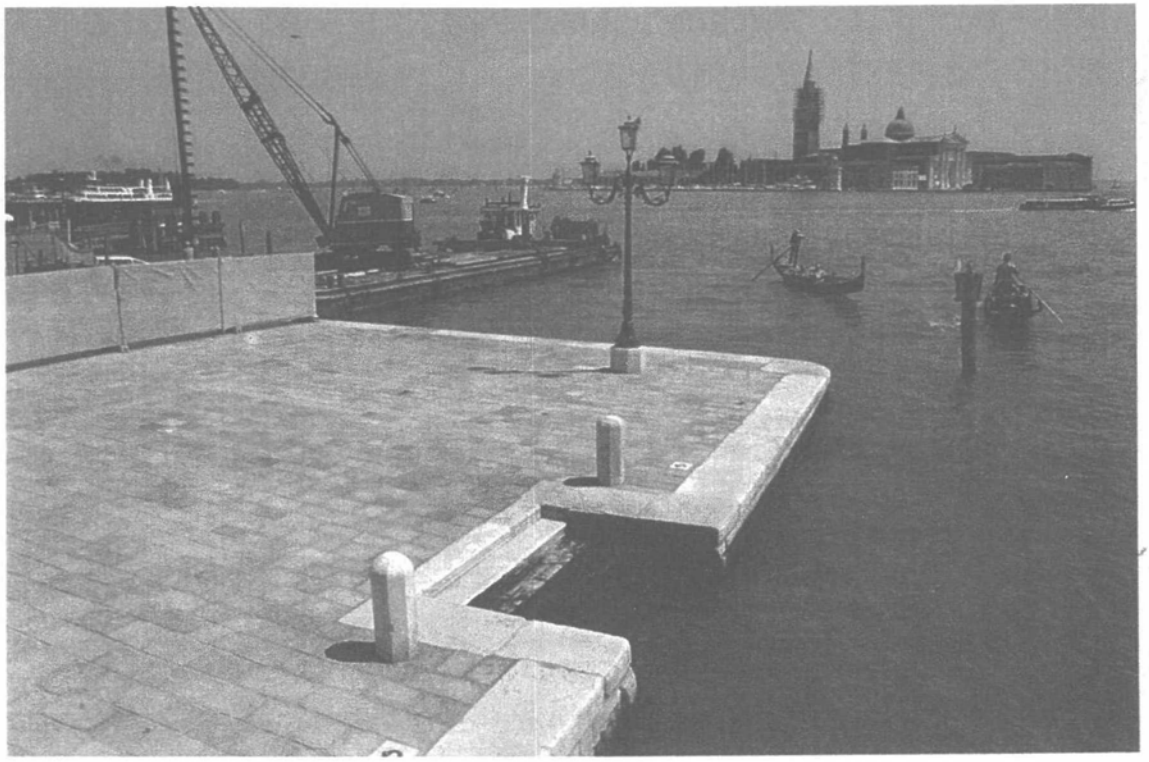

Difesa rive bacino S. Marco tra Ponte della Paglie e Ponte del Vin. Un tratto della riva a lavori ultimati.

Chioggia – Ponte Vigo

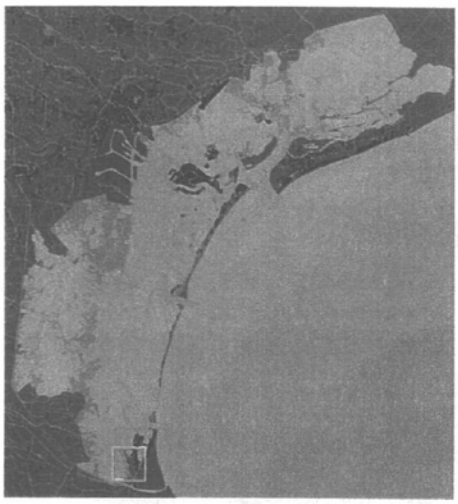

Obiettivi specifici: restauro conservativo e consolidamento del Ponte nell'ambito dell'Accordo di Programma con il Comune di Chioggia.

Interventi principali: rimozione delle sovrastrutture che costituiscono i passaggi pedonali realizzati negli anni '50, ripristino della forma originaria della struttura, consolidamento e ricostruzione del manufatto in mattoni, realizzazione di una nuova struttura a sostegno della sezione stradale e ciclo pedonale, sistemazione della pavimentazione e degli impianti di illuminazione, realizzazione dei nuovi sottoservizi.

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'area.

In basso: vista del Ponte durante i lavori.





Il ponte prima degli interventi.



Il ponte prima degli interventi.



Il ponte dopo i lavori di ristrutturazione e adeguamento.



Il ponte dopo i lavori di ristrutturazione e adeguamento.

PAGINA BIANCA

RISTRUTTURAZIONE DEI MOLI FORANEI

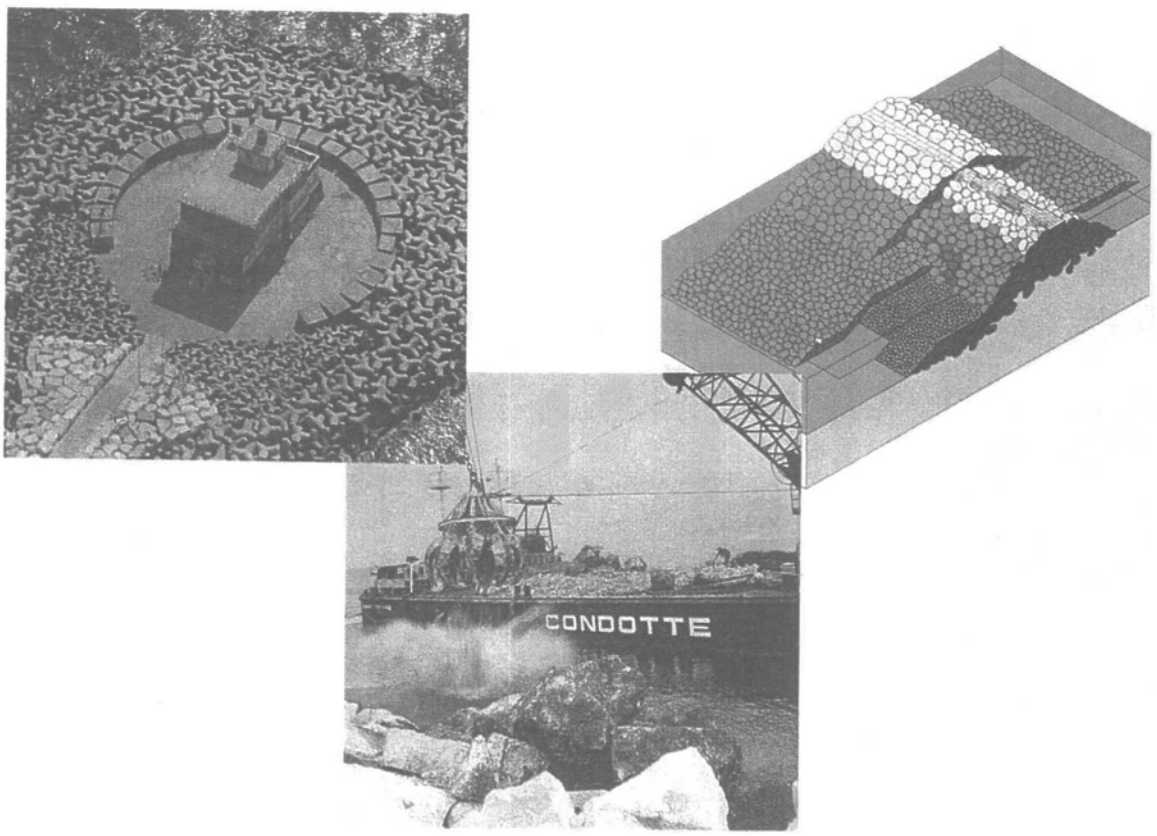

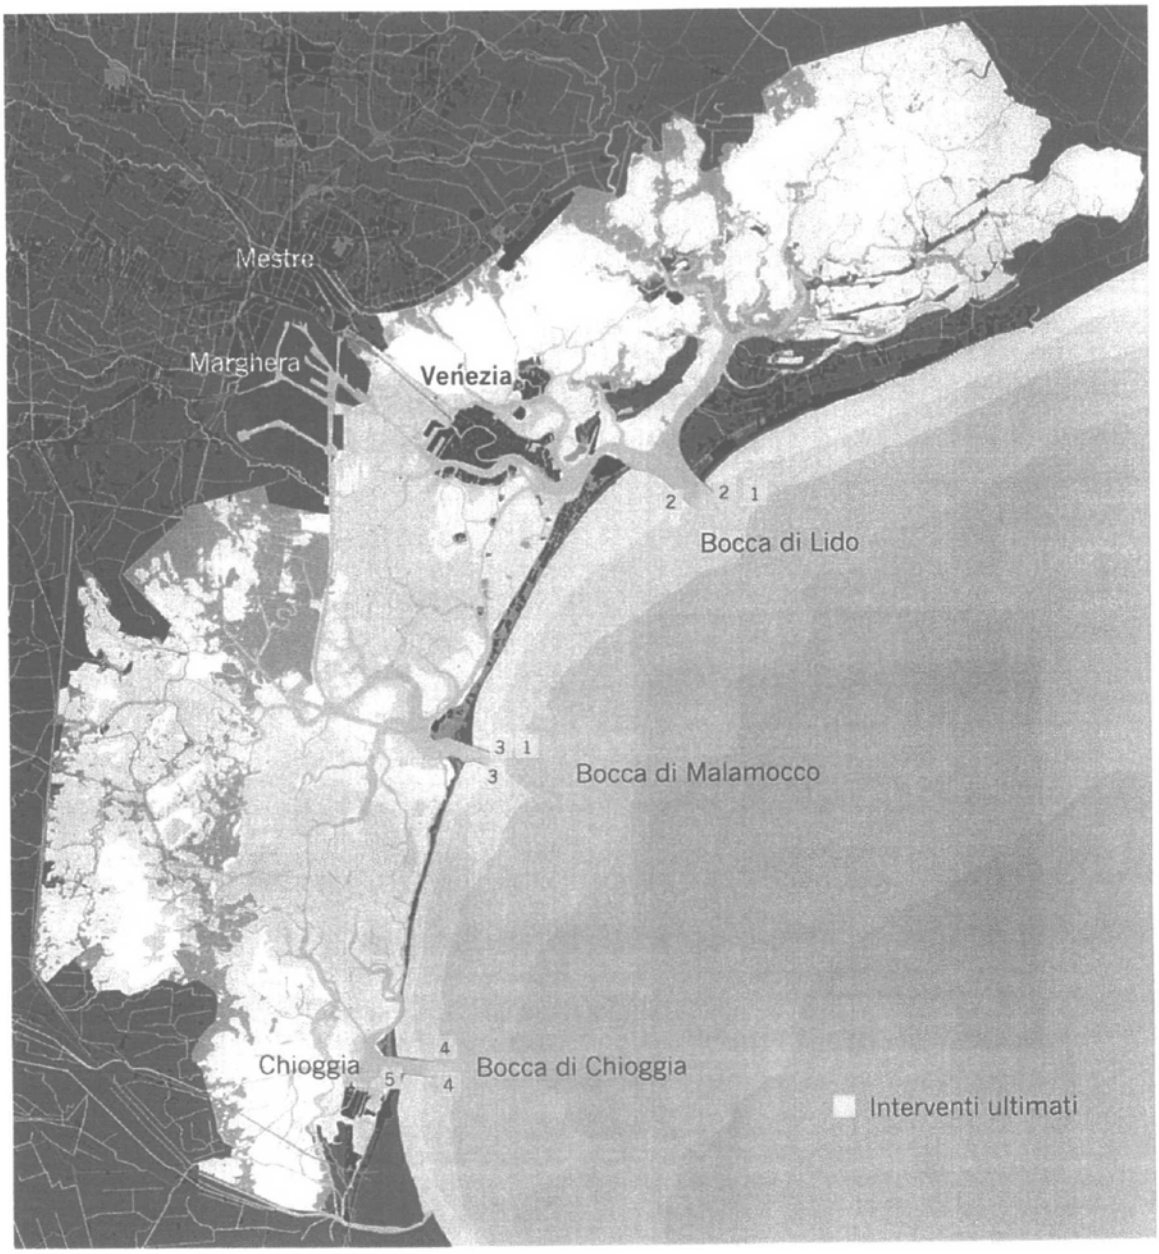

RISTRUTTURAZIONE DEI MOLI FORANEI
ATTIVITA' ULTIMATE
(nessuna attività è attualmente in corso)

Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Messa in sicurezza e adeguamento dei fari sui moli foranei a nord di Malamocco e di Lido
2. Ristrutturazione dei moli nord e sud di Lido
3. Ristrutturazione del molo nord e sud di Malamocco
4. Ristrutturazione del molo nord e sud di Chioggia
5. Sistemazione della radice del molo sud di Chioggia

Malamocco – ristrutturazione del molo nord

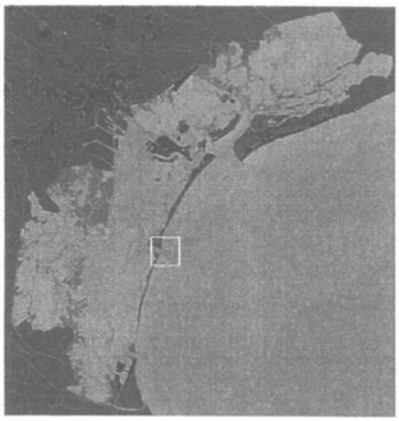

Obiettivi specifici: contrastare il dissesto e il degrado della struttura; aumentare la resistenza rispetto alle mareggiate.

Interventi principali: rinforzo delle scogliere e protezione del fondale alla base del molo per impedire l'erosione (2 km).

Intervento ultimato

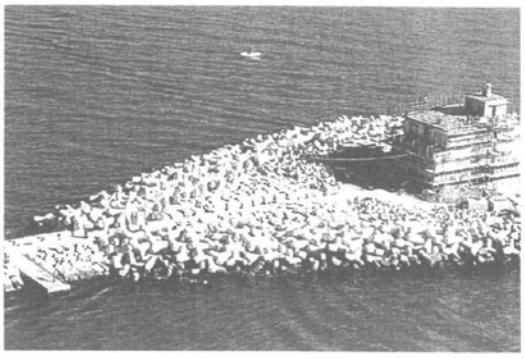



Molo di Malamocco. *A sinistra*: Un tratto del molo nord al termine degli interventi di rinforzo della scogliera. *A destra*: Lavori per l'adeguamento del faro, al termine degli interventi di ristrutturazione del molo.

PAGINA BIANCA

DIFESA DALLE MAREGGIATE

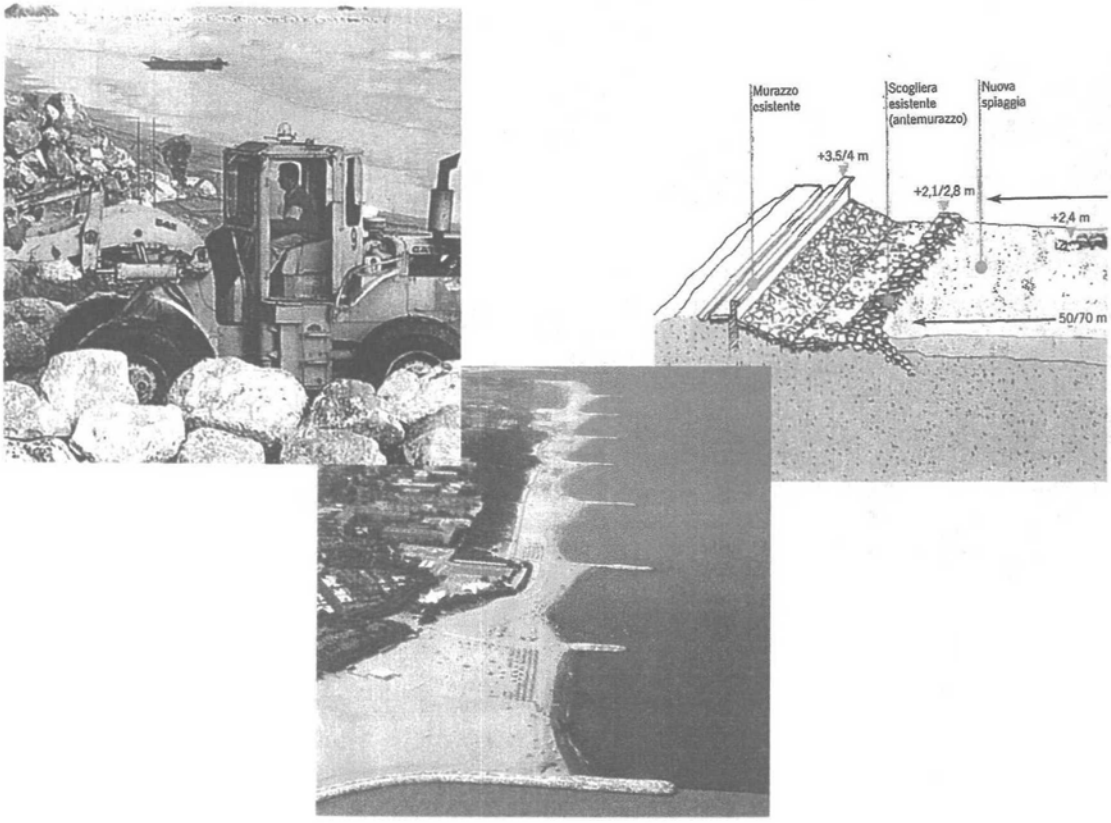

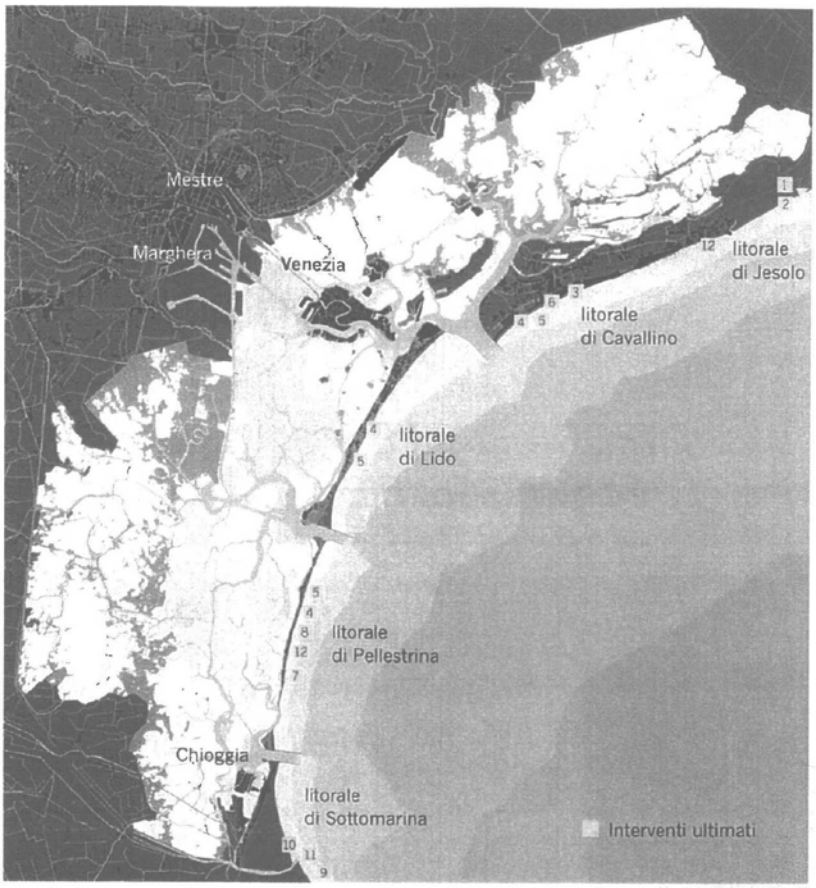
Mestre
Marghera
Venezia
litorale
di Jesolo
litorale
di Cavallino
litorale
di Lido
litorale
di Pellestrina
Chioggia
litorale
di Sottomarina
Interventi ultimati

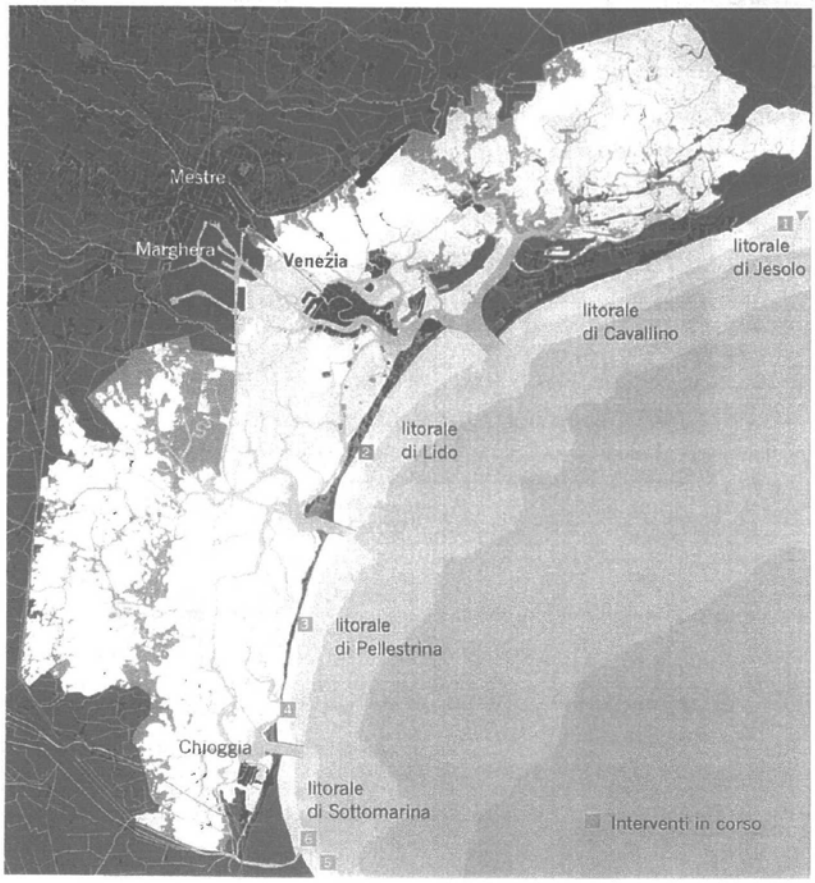
Mestre
Marghera
Venezia
litorale
di Jesolo
litorale
di Cavallino
litorale
di Lido
litorale
di Pellestrina
Chioggia
litorale
di Sottomarina
Interventi in corso

Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Rinforzo del litorale di Jesolo 1° e 2° stralcio – in Accordo di programma con il Comune di Jesolo
2. Sistemazione zona Cortellazzo e Foce Piave – 1° stralcio
3. Interventi sperimentali di difesa del litorale di Cavallino (località Cà Pasquali)
4. Indagini propedeutiche alla realizzazione degli interventi
5. Monitoraggio del litorale da Cavallino a Pellestrina – prime fasi
6. Rinforzo e rinaturalizzazione del litorale di Cavallino
7. Rinforzo della scogliera tra S. Pietro in Volta e Pellestrina e del murazzo di Caroman (litorale di Pellestrina)
8. Rinforzo e ripascimento del litorale di Pellestrina
9. Rinforzo del litorale di Isola Verde/Chioggia
10. Rinforzo del litorale di Sottomarina (Chioggia)
11. Interventi stagionali alla foce del Brenta e alla foce dell'Adige – in Accordo di programma con la Regione del Veneto, Comune di Chioggia e Comune di Rosolina – 1^ fase
12. Manutenzione dei litorali mediante ripristino del ripascimento in sabbia

Attività in corso

1. Interventi di difesa del litorale di Cortellazzo – 2° stralcio 1^ fase – ripascimento litorale di Eraclea
2. Difesa litorale Lido 1° e 2° stralcio
3. Litorale di Pellestrina: accessi attrezzati alla spiaggia; ulteriori attività specialistiche e rilievi ambientali sommersi ed emersi
4. Restauro murazzo Cà Roman sul litorale di Pellestrina
5. Completamento rinforzo litorale di Isola Verde
6. Interventi stagionali alla foce del Brenta e alla foce dell'Adige – in Accordo di programma con la Regione del Veneto, Comune di Chioggia e Comune di Rosolina – 2^ fase

Attività da avviare

1. Manutenzione dei litorali mediante ripristino del rinascimento in sabbia

Attività da finanziare:

1. Prosecuzione della manutenzione dei litorali mediante ripristino del ripascimento
2. Completamento rinforzo litorale di Jesolo (zone Cortellazzo, Eraclea) e di Lido
3. Monitoraggi di controllo degli interventi realizzati

Litorale di Jesolo



Obiettivi specifici: proteggere i territori e gli abitati litoranei; contrastare l'erosione della costa; smorzare l'energia delle onde; ripristinare ambienti naturali degradati.

Interventi principali: ampliamento della spiaggia (10 km); adeguamento dei pontili lungo la riva (34 pontili ristrutturati, 16 di nuova costruzione) e realizzazione di 4 scogliere di roccia ("pennelli").

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento.

In basso: un tratto del litorale prima e dopo i lavori.

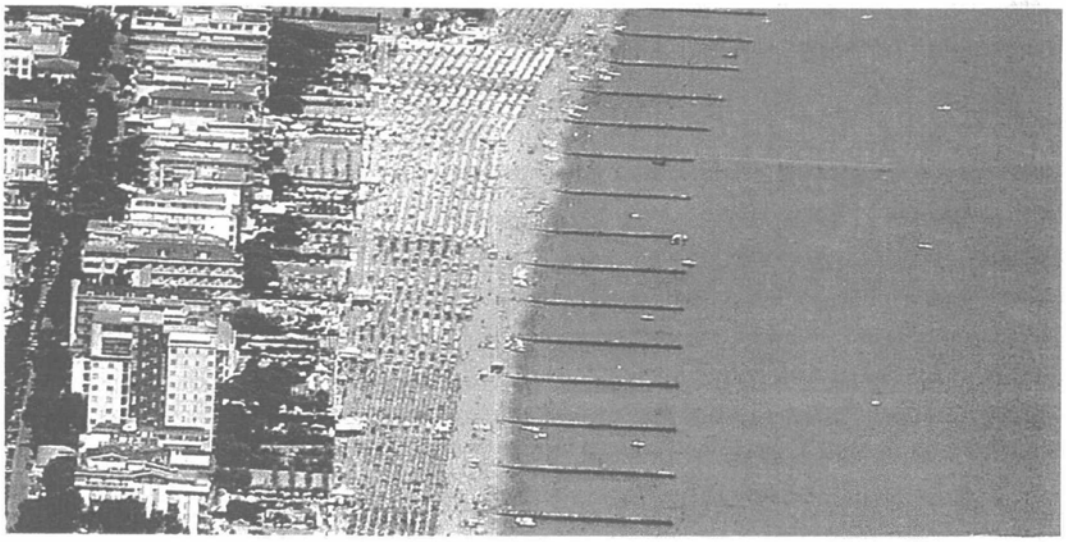

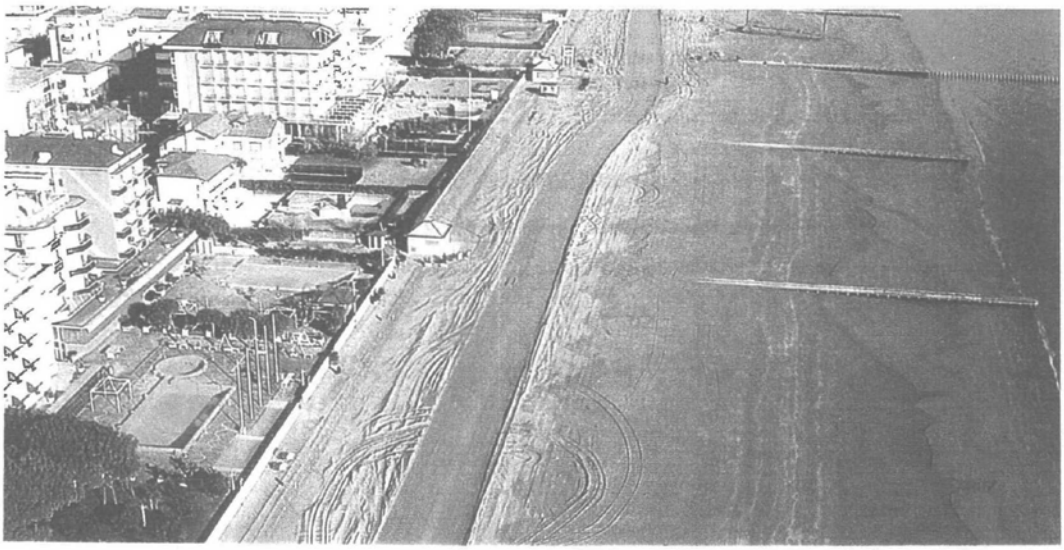

Litorale di Cavallino

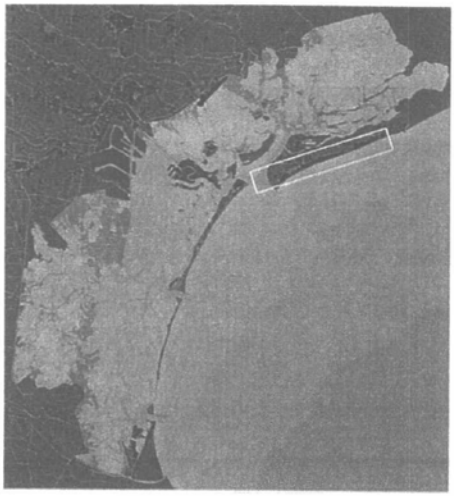

Obiettivi specifici: proteggere i territori e gli abitati litoranei; contrastare l'erosione della costa; smorzare l'energia delle onde; ripristinare ambienti naturali degradati.

Interventi principali: ampliamento della spiaggia (11 km) protetta da 32 "pennelli".

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento.

In basso: la parte sud del litorale prima e dopo l'intervento.

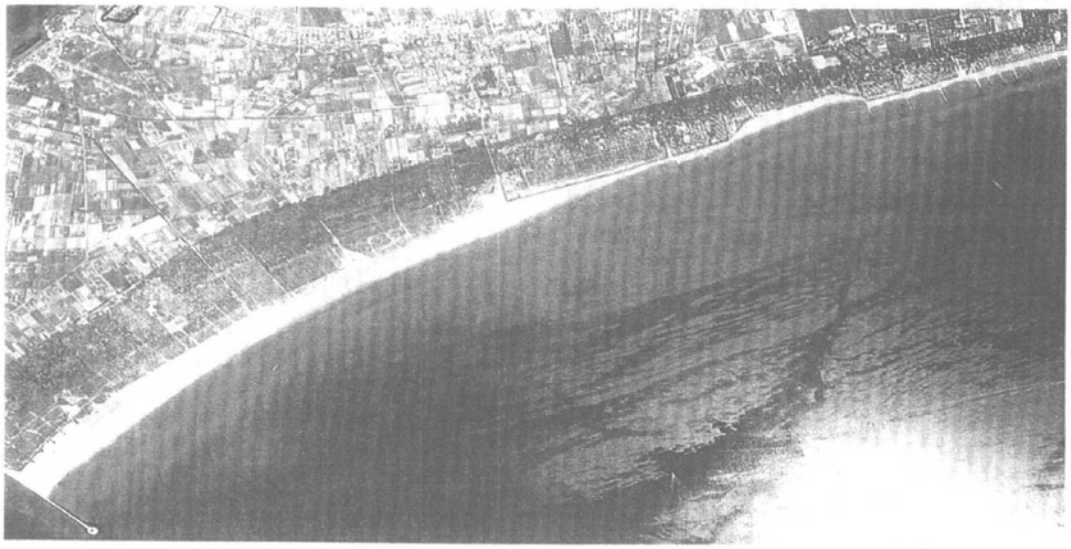



Litorale di Pellestrina

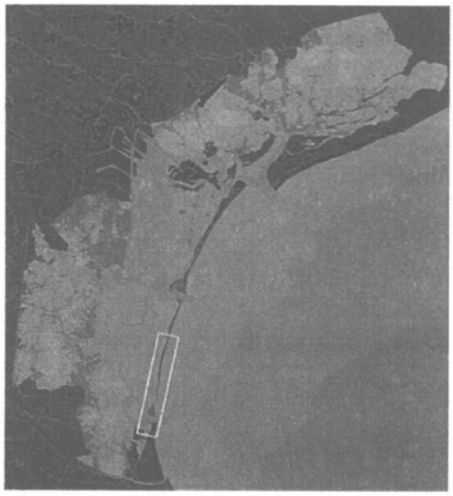

Obiettivi specifici: proteggere i territori e gli abitati litoranei; contrastare l'erosione della costa; smorzare l'energia delle onde; rinforzare le antiche difese a mare "murazzi".

Interventi principali: formazione di una nuova spiaggia (9 km) contenuta entro "celle" delimitate da 18 "pennelli" trasversali alla riva e da una scogliera sommersa longitudinale (9 km).

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento.

In basso: un tratto del litorale prima e dopo i lavori.





Litorale di Isola Verde

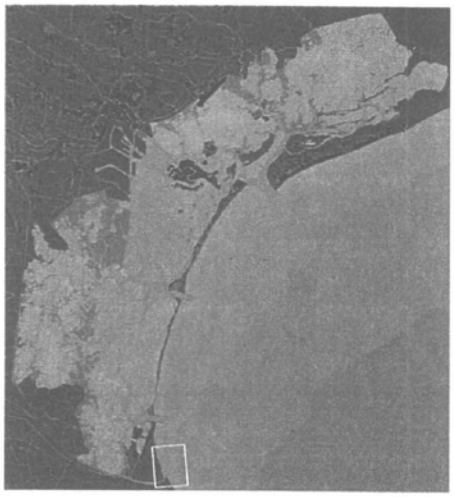

Obiettivi specifici: proteggere i territori e gli abitati litoranei; contrastare l'erosione della costa; smorzare l'energia delle onde.

Interventi principali: rinascimento della spiaggia (2,5 km) e costruzione di 8 "pennelli" di roccia a difesa del nuovo arenile.

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento.

In basso: un tratto del litorale prima e dopo i lavori.

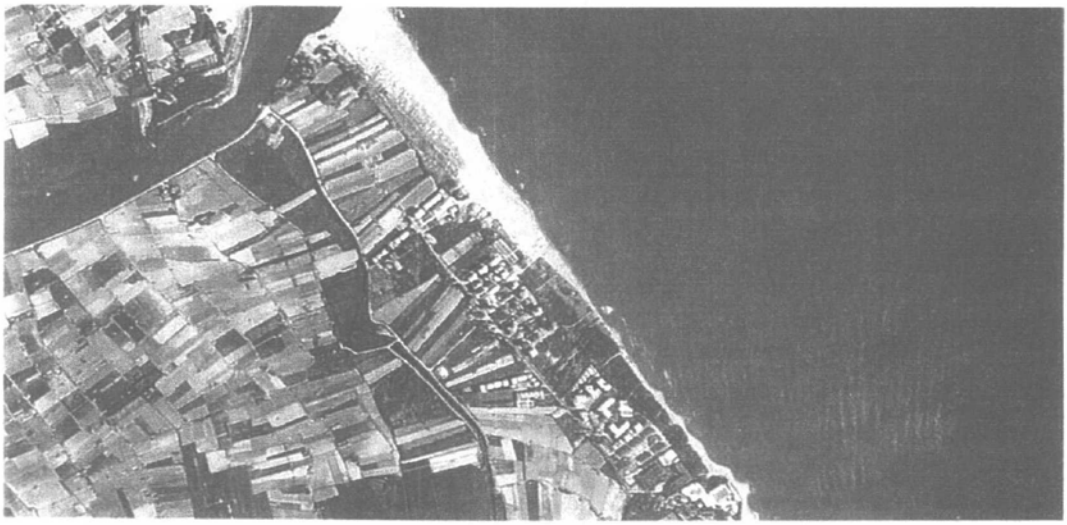

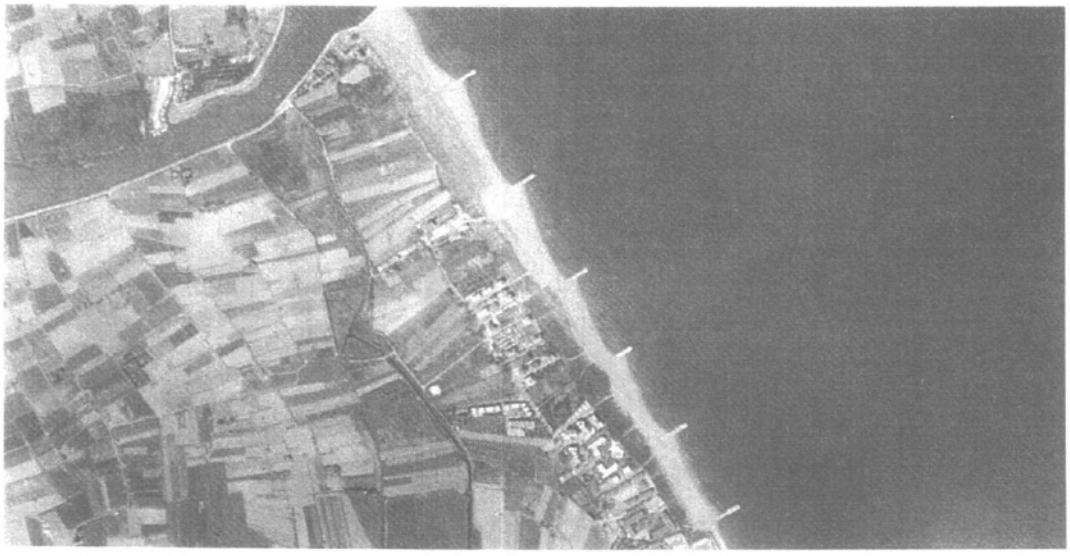

PAGINA BIANCA

RECUPERO MORFOLOGICO

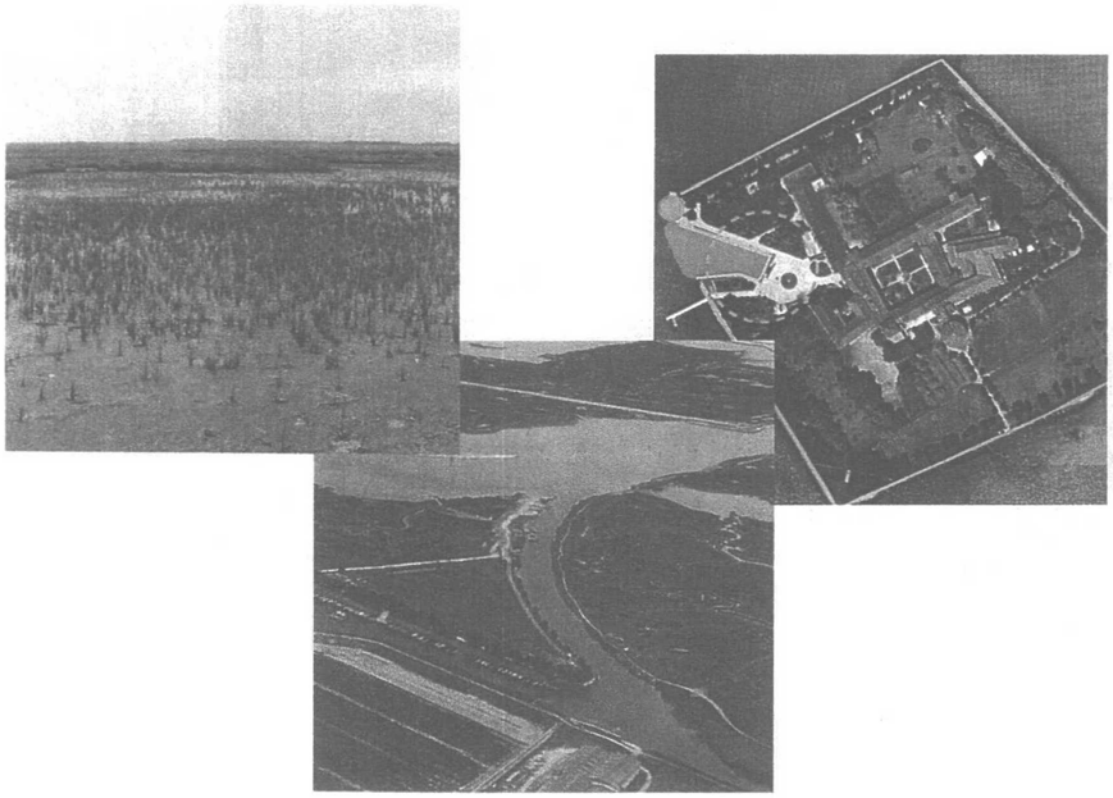

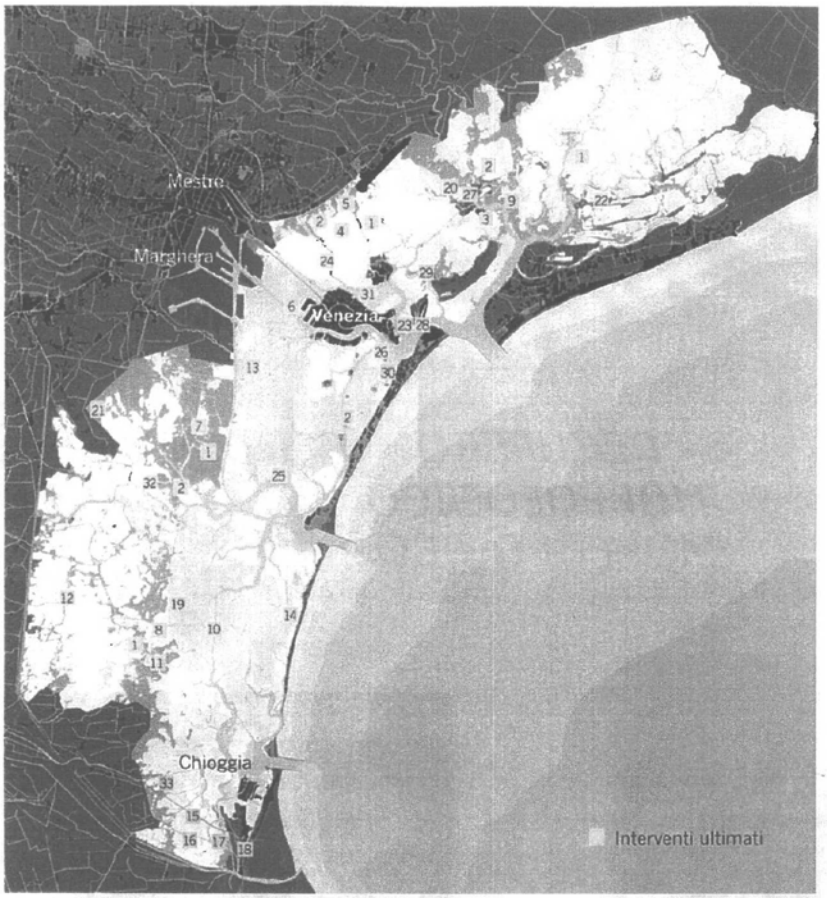
Mestre
Marghera
Venezia
Chioggia
Interventi ultimati

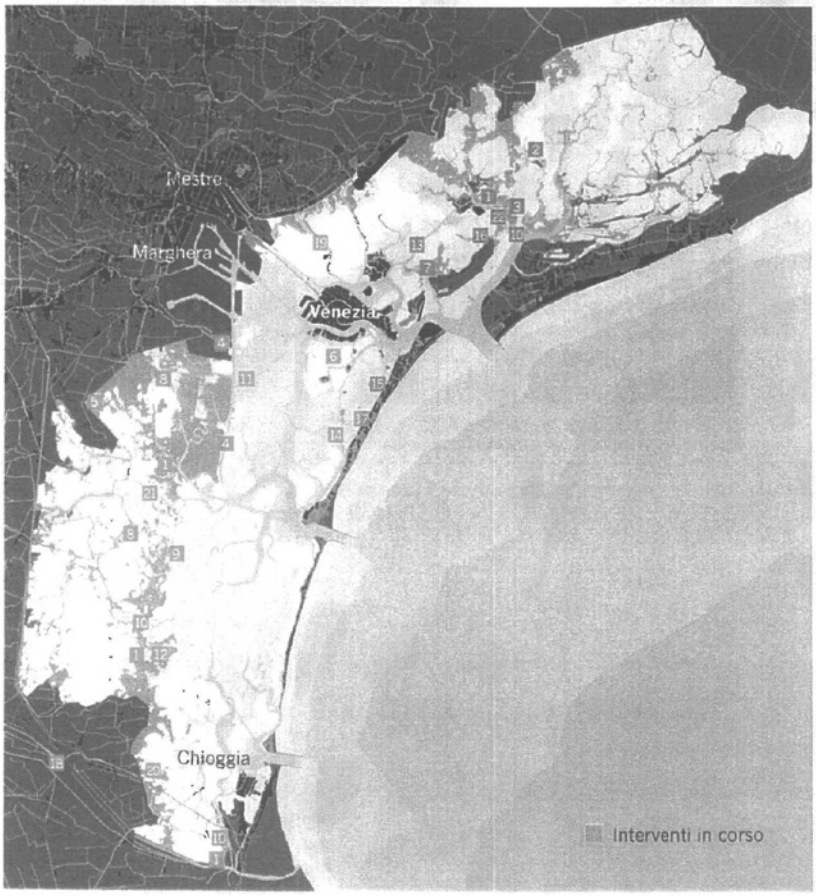
Mestre
Marghera
Venezia
Chioggia
Interventi in corso

Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Indagini propedeutiche alla realizzazione degli interventi
2. Interventi sperimentali
3. Recupero morfologico zona Burano, Mazzorbo, S. Francesco del Deserto (laguna nord)
4. Recupero morfologico zona Tessera, Campalto, Osellino (laguna nord)
5. Interventi integrativi sul canale di Tessera (laguna nord)
6. Isola del Tronchetto – escavo per la vivificazione area sud-ovest in Accordo di programma con il Comune di Venezia (laguna centrale)
7. Ripristino dei canali nelle casse di colmata B e D/E e ricostruzione di barene a sud della cassa di colmata D/E (laguna centrale)
8. Cordoni sabbiosi a difesa di barene in erosione 1° stralcio
9. Intervento di protezione barene 1° e 2° ciclo (laguna nord)
10. Dragaggio del canale Allacciante (laguna centrale)
11. Dragaggio di canali in valle Millecampi (laguna sud) e ricostruzione di barene
12. Dragaggio canale Scirocchetto e canale Buello (laguna centrale)
13. Dragaggio canali lagunari di Tessera, Fusina, e Contorta S. Angelo e ricostruzione di barene (laguna nord e centrale)
14. Dragaggio del canale S. Antonio dalla bocca di Malamocco a Caroman (laguna centrale)
15. Dragaggio dei varchi sotto il ponte translagunare tra Chioggia e la terraferma (laguna sud)
16. Dragaggio canali Sottomarina, Madonna, Alghero, Laghini 1- Alghero, Trezze, Otregan, Scarpion, S. Domenico e Borgo S. Giovanni (Chioggia)
17. Dragaggio canali nel bacino del Lusenzo e ricostruzione di barene lungo il canale Lombardo esterno sud e nord (Chioggia)
18. Sistemazione dei fondali del canale Fossetta (Chioggia)
19. Realizzazione di sovralzi di sabbia a protezione delle barene in erosione (laguna nord e sud)
20. Recupero ambientale e morfologico delle barene – rilievi e monitoraggi; recupero barene con tecniche di ingegneria naturalistica (progetto Life Natura)
21. Ricostruzione argini di conterminazione lungo i canali Bondantino (laguna centrale)
22. Ricostruzione argine a Lio Piccolo (laguna nord)
23. Completamento dell'isola della Certosa
24. Recupero morfologico dell'isola di Campalto (laguna nord)
25. Recupero morfologico dell'isola Fisolo (laguna centrale)
26. Recupero morfologico dell'isola di S. Servolo (laguna centrale)
27. Recupero morfologico dell'isola dei Laghi (laguna nord)
28. Recupero morfologico dell'isola della Certosa (laguna nord)
29. Recupero morfologico dell'isola del Lazzaretto Nuovo (laguna nord)
30. Recupero morfologico dell'isola di San Lazzaro degli Armeni (laguna centrale)

31. Recupero morfologico dell'isola di San Michele (laguna centrale)

32. Opere di confinamento della barena Novisso (laguna centrale)

33. Manutenzione canale Novissimo (laguna sud)

Attività in corso

1. Monitoraggi sugli esiti dei lavori morfologici realizzati

2. Vivificazione e recupero morfologico lagunare della zona dell'isola di S. Cristina (laguna nord)

3. Manutenzione straordinaria e completamento barene di Burano

4. Intervento di recupero morfologico aree casse di colmata D/E Fossetta Barambani (laguna centrale)

5. Campagna di monitoraggio argine Bondantino (laguna centrale)

6. Interventi di ripristino morfologico e risagomatura del canale marittimo di S. Spirito e dei canali limitrofi Rezzo e Fasiol (laguna centrale)

7. Isola Lazzaretto Nuovo completamento impianto fitobiodepurazione e gestione (laguna centrale)

8. Ripristino fondali canali area lago Teneri 1^ stralcio (canali Volpego e Fiumesino) e 2^ stralcio (barena Casone Zappa A e B)

9. Cordoni sabbiosi a difesa di barene in erosione 2° stralcio (1^ fase)

10. Naturalizzazione e riqualificazione ambientale delle strutture morfologiche artificiali a velma e barena

11. Strutture morfologiche per la protezione dei bassofondali adiacenti il canale S.Leonardo - Marghera

12. Recupero ambientale Valle Millecampi

13. Intervento di ripristino morfologico e restauro statico murature perimetrali dell'isola di S. Giacomo in Paludo (laguna nord)

14. Recupero morfologico dell'isola di Poveglia (laguna centrale)

15. Recupero morfologico dell'isola di Lazzaretto Vecchio (laguna centrale)

16. Recupero morfologico dell'isola San Francesco del Deserto (laguna centrale)

17. Ripristino morfologico canale litoraneo Lido 1^ stralcio (laguna centrale)

18. Ricalibratura e rinforzo del canal Morto tratto tra l'idrovora Cà Bianca e l'innesto del Canale Barbegara

19. Manutenzione per lo scavo, riprofilatura e ripristino briccole di segnalamento sul canale di Campalto

20. Recupero morfologico dell'area lungo il canale Novissimo – barena Otregan

21. Ripristino morfologico dell'area lungo il canale Cornio

22. Intervento pilota sperimentale per uso di sedimenti idonei a sviluppo biocenosi vegetali

Attività da avviare

1. Prosecuzione degli interventi sperimentali per l'adeguamento del progetto morfologico

2. Interventi morfologici strettamente connessi alle opere alle bocche di porto

3. Prosecuzione degli interventi morfologici di ricalibratura dei canali lagunari, di sollevamento dei bassi fondali e di ricostruzione di velme e barene

4. Prosecuzione degli interventi per il recupero morfologico e ambientale, per la protezione delle barene e dei bassifondi, per il riavvio dei dinamismi naturali e per la naturalizzazione delle barene e delle strutture morfologiche artificiali
5. Recupero morfologico e ambientale delle isole: Mazzorbetto e S. Caterina, San Giorgio in Alga

Attività da finanziare:

1. Prosecuzione degli interventi morfologici di ricalibratura dei canali lagunari, di sollevamento dei bassi fondali e di ricostruzione di velme e barene
2. Prosecuzione degli interventi per il recupero morfologico e ambientale, per la protezione delle barene e dei bassifondi, per il riavvio dei dinamismi naturali e per la naturalizzazione delle barene e delle strutture morfologiche artificiali
3. Interventi per il recupero morfologico e ambientale nell'ambito del Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (Prusst)
4. Completamento interventi di ricalibratura degli argini lungo la conterminazione lagunare
5. Prosecuzione del recupero morfologico e ambientale delle isole: Madonna del Monte, Isola Campana, S. Angelo delle Polveri, San Michele, San Pieretto, Vignole, Santo Spirito

Metodi di intervento per rinforzo/ricostruzione delle barene



Protezione barene mediante buzzoni.



Protezione barene mediante ripasimento.

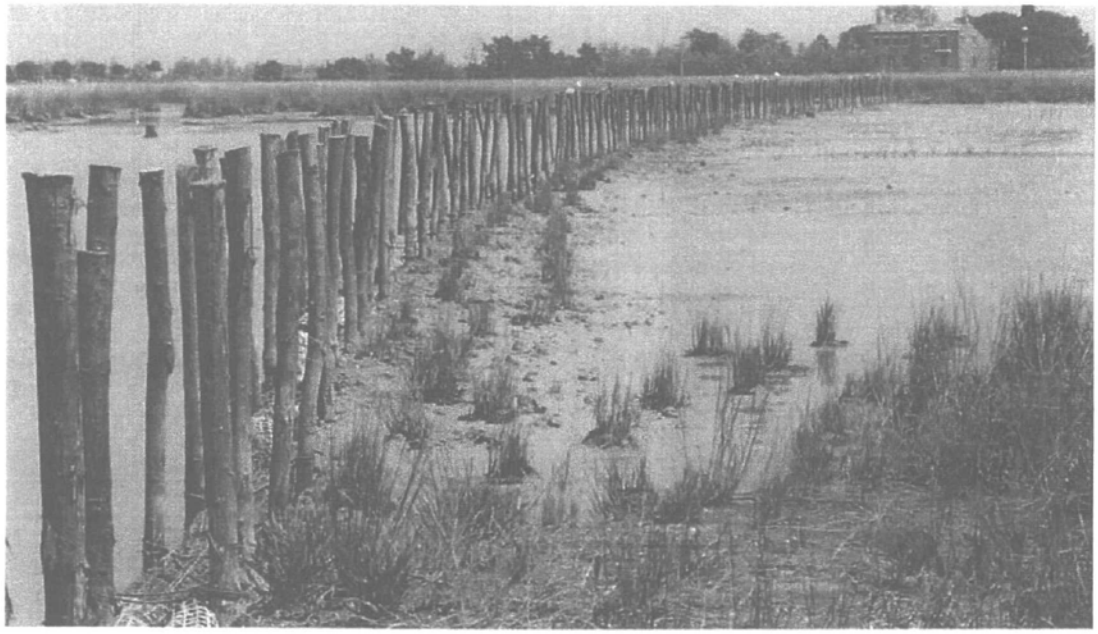

Protezione barene mediante fascinate.

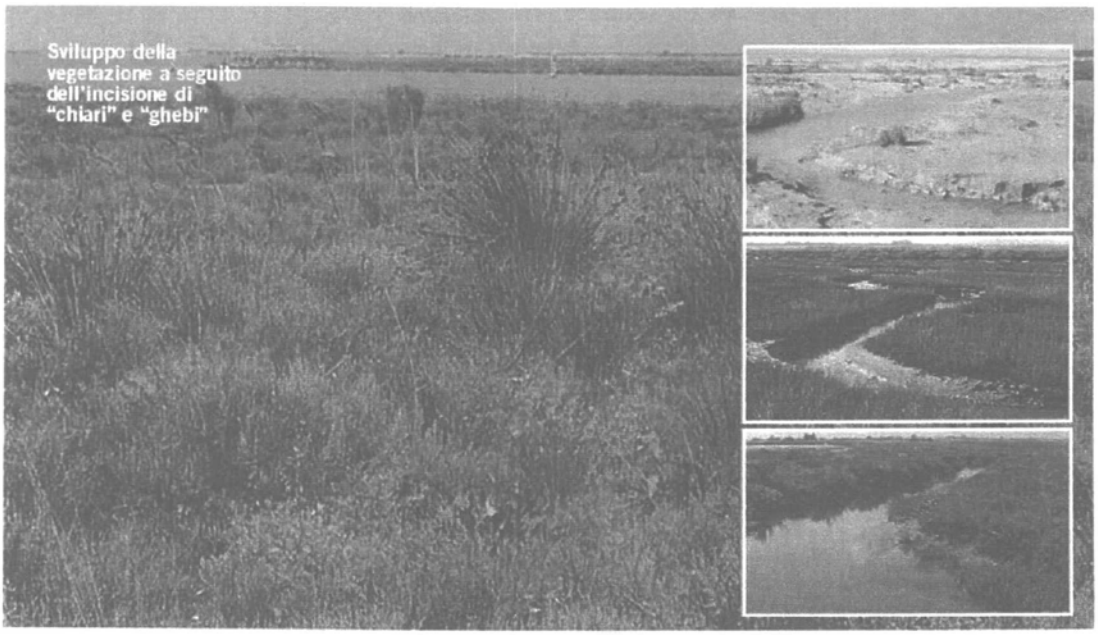

Evoluzione nel tempo di una barena ricostruita.

Laguna centrale – ripristino morfologico e ambientale nell'area Lago Teneri e Valle Zappa



Obiettivi specifici: contrastare l'erosione di barene e bassi fondali; migliorare la circolazione idrica locale; migliorare le caratteristiche ambientali ed ecologiche locali; ripristinare habitat tipici della laguna.

Interventi principali: ricostruzione di nuove barene; ampliamento di barene esistenti; protezione del bordo in erosione mediante palificate di legno; ripascimento di barene in deficit di quota; ricalibratura canali.

Intervento in corso

A lato: localizzazione dell'intervento.

In basso: Vista aerea di una barena, oggetto di intervento in corrispondenza di Valle Zappa.





Lago Teneri. Vista aerea della zona di intervento durante i lavori di ripristino della barena.

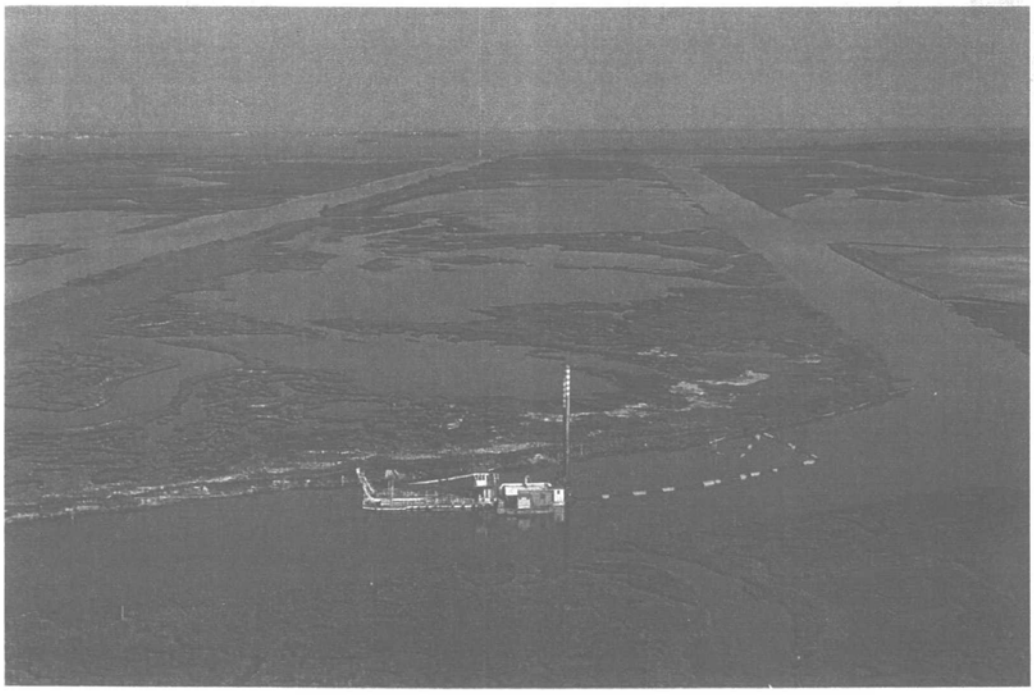

Lago Teneri. Vista aerea della zona di intervento durante i lavori di ripristino della barena.

Isola degli Armeni

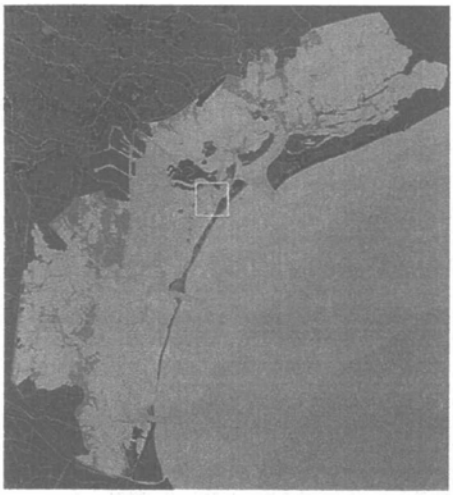

Obiettivi specifici: contrastare il degrado del muro perimetrale e bloccare i dissesti strutturali verificatesi nel tempo; migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'isola.

Interventi principali: ripristino del muro perimetrale; ripristino e adeguamento delle rive della darsena; ristrutturazione della "cavana" per il ricovero delle imbarcazioni.

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento.

In basso:localizzazione e tipologie di intervento.

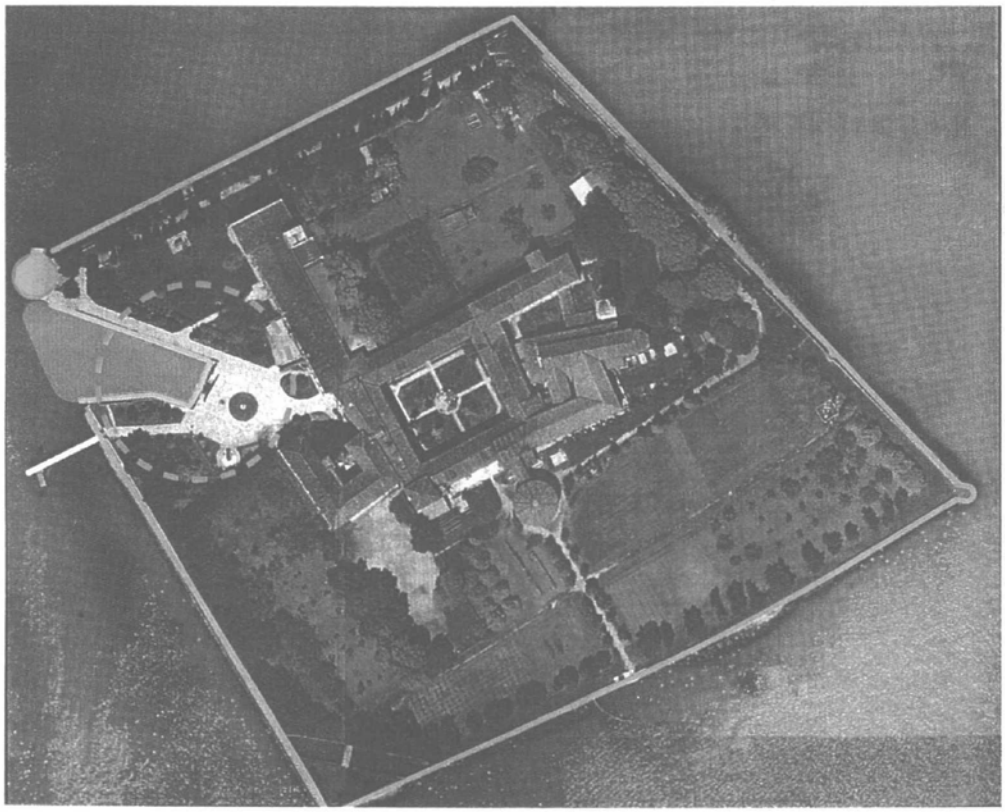



Ripristino muro perimetrale



Ripristino e adeguamento rive della darsena



Ristrutturazione della cavana



Ricalibratura dei fondali della darsena



Sistemazione pavimentazione nell'area di accesso



Ricostruzione dell'approdo per mezzi pubblici

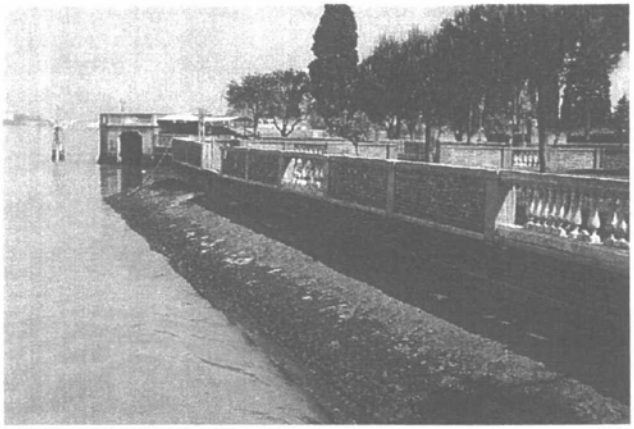

Isola degli Armeni. Un tratto della sponda sud-ovest prima dei lavori.



Isola degli Armeni. Un tratto della sponda sud-ovest durante i lavori.

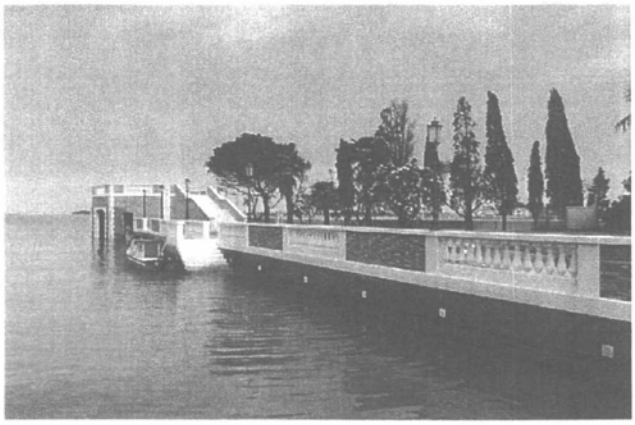

Isola degli Armeni. Un tratto della sponda sud-ovest a lavori ultimati.



Isola degli Armeni. Le nuove rive attrezzate della darsena.

PAGINA BIANCA

ARRESTO DEL DEGRADO DELL'ECOSISTEMA LAGUNARE

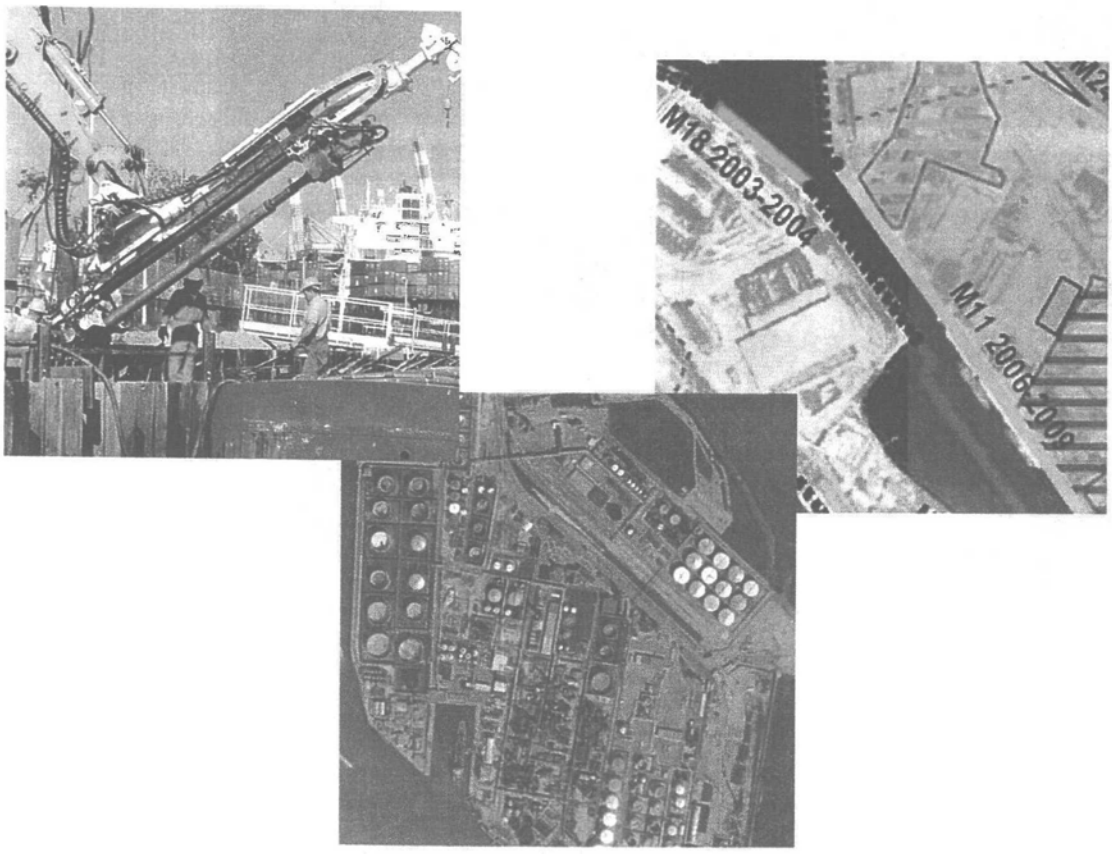

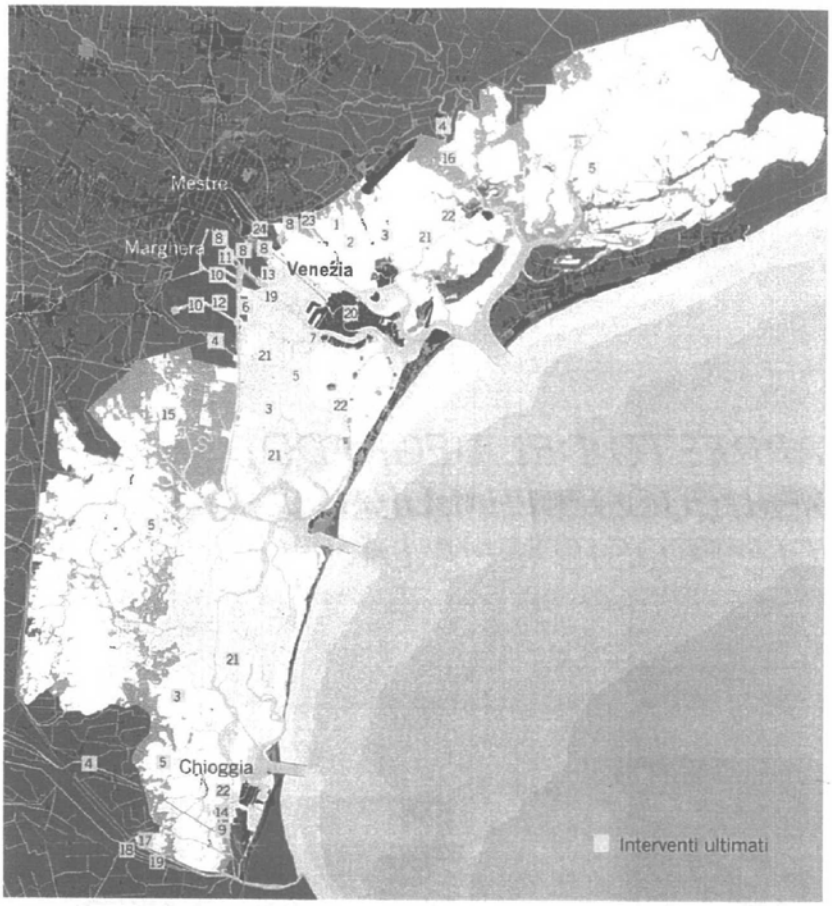
Mestre
Marghera
Venezia
Chioggia
Interventi ultimati

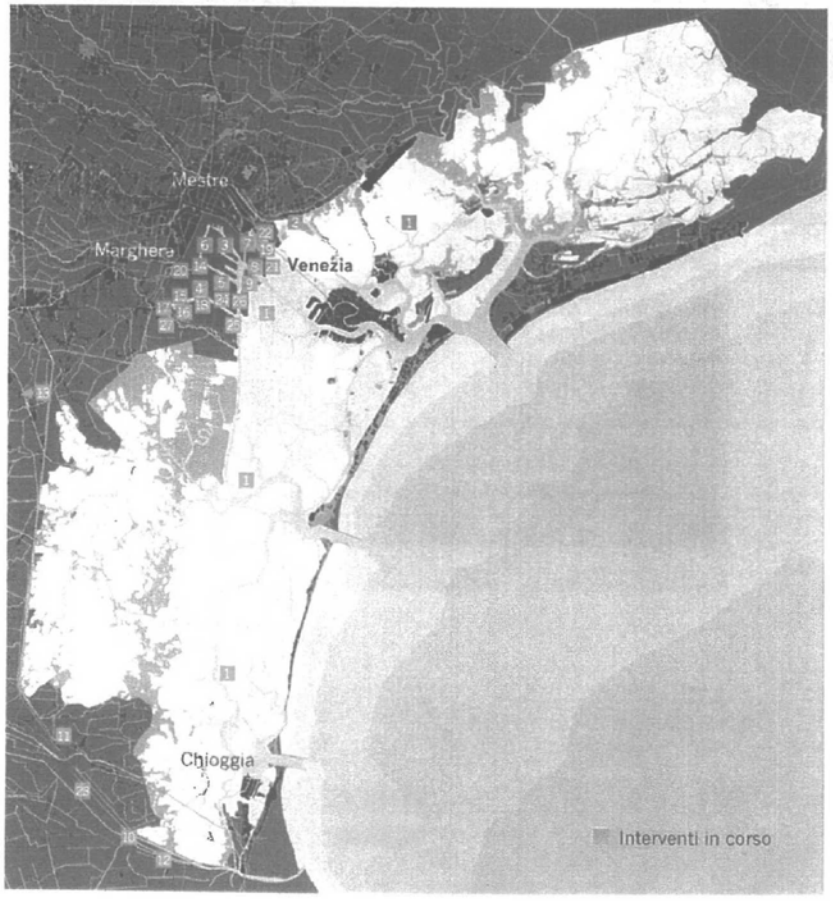
Mestre
Marghera
Venezia
Chioggia
Interventi in corso

Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Verifica sperimentale di tecniche di arresto e di inversione del degrado della Laguna 1° e 2° fase ("Mosambiente")
2. Interventi sui fondali e rimozione algale nella zona di Tessera – Campalto
3. Attività di approfondimento del quadro conoscitivo di riferimento per gli interventi ambientali (progetto 2023)
4. Determinazione degli apporti inquinanti dal bacino scolante (progetto Drain)
5. Indagine della qualità dei sedimenti e mappatura dell'inquinamento dei fondali Lagunari
6. Messa in sicurezza e risanamento ambientale della macroisola delle Trezze (Laguna centrale)
7. Messa in sicurezza e risanamento ambientale della macroisola dell'ex inceneritore (Venezia)
8. Indagini per la caratterizzazione dei siti inquinati (Passo Campalto, PIII, Canale Industriale Nord, Brentella)
9. Messa in sicurezza della discarica di Val da Rio 1° stralcio (Chioggia)
10. Indagini integrative a supporto della progettazione degli interventi sulle sponde dei canali di Porto Marghera 1^ fase e 2^ fase
11. Asportazione selettiva di sedimenti inquinati dal Canale Industriale Nord di Porto Marghera - 1° stralcio (1^ e 2^ fase) (Laguna centrale)
12. Sistemazione della sponda nord del Canale Industriale Sud di Porto Marghera – in Accordo di Programma con Autorità Portuale 1° e 2° stralcio
13. Messa in sicurezza dell'area demaniale denominata Terzo Argine a Porto Marghera
14. Interventi di risanamento della discarica di borgo S. Giovanni in zona Val da Rio a Chioggia – completamento (Laguna sud)
15. Risanamento del fondale nel Lago dei Teneri (Laguna centrale)
16. Vivificazione della Palude di Cona (Laguna nord)
17. Indagini propedeutiche agli interventi di controllo degli apporti inquinanti provenienti dal bacino scolante: Botte delle Trezze (Laguna sud)
18. Realizzazione di opere di regolazione delle acque scolanti in Laguna attraverso la Botte delle Trezze (Laguna sud)
19. Intervento sperimentale di fitobiodepurazione nel tratto abbandonato del Canale Novissimo, realizzazione e monitoraggio (Laguna sud)
20. Monitoraggio della qualità dell'acqua dei canali del centro storico di Venezia – Sistema Waters 1^ fase e integrazione
21. Monitoraggio ambientale della Laguna di Venezia 1^ e 2^ fase
22. Interventi per l'arresto del degrado connessi alla proliferazione delle macroalghe in Laguna di Venezia – Campagne 1989/1999, 2000/2002, 2003/2004
23. Messa in sicurezza della macroisola di Passo Campalto 1^ fase (Laguna nord)
24. Ristrutturazione rive a S. Giuliano – piano di caratterizzazione dell'area

Attività in corso

1. Monitoraggio ambientale della Laguna di Venezia 3^ fase

2. Monitoraggio Post Operam Passo Campalto (laguna centrale)
3. Asportazione selettiva di sedimenti inquinati dal Canale Industriale Nord a Porto Marghera 2° stralcio
4. Sistemazione della sponda nord del Canale Industriale Sud di Porto Marghera 3° stralcio
5. Sistemazione della sponda sud del Canale Industriale Ovest a Porto Marghera
6. Sistemazione della sponda est Canale Industriale Ovest a Porto Marghera
7. Sistemazione ambientale del Canale Brentella 1° e 2° stralcio
8. Sistemazione della sponda del Canale Vittorio Emanuele III 2^ fase
9. Sistemazione della sponda ovest dell'Isola dei Serbatoi Petroliferi 1° e 2° stralcio
10. Messa in sicurezza della Botte delle Trezze sottopassante il fiume Bacchiglione 1^ fase in Laguna sud
11. Messa in sicurezza della Botte a Sifone sottopassante il fiume Brenta in località Conche di Codevigo
12. Monitoraggio fitobiodepurazione del canale Novissimo (laguna sud)
13. Sistemazione nodi idraulici e ricalibratura canale Piovego di Villabozza 1° stralcio
14. Sistemazione del Canale Lusore Brentelle
15. Sistemazione della sponda del Canale Industriale sud 4° stralcio 1° e 2° lotto (area nuova Sirma e area 43 ettari)
16. Sistemazione della sponda del Canale Industriale sud 4° stralcio sponda sud e darsena terminale 2° lotto fase C (sponda 43Ha)
17. Sistemazione della sponda del Canale Industriale sud 4° stralcio sponda sud e darsena terminale fase A(sponda ovest della darsena)
18. Sistemazione della sponda del Canale Industriale sud 4° stralcio sponda sud e darsena terminale 6° lotto fase A (sponda ex Abibes)
19. Intervento di messa in sicurezza dell'area demaniale i Pili a Porto Marghera 1° stralcio di emergenza
20. Sistemazione darsena della Rana e completamento sponda sud del canale industriale Ovest 1^ stralcio
21. Messa in sicurezza dell'area denominata Terzo Argine completamento 1^ stralcio
22. Messa in sicurezza di emergenza del canale S. Giuliano 2^ stralcio 1° lotto
23. Messa in sicurezza discarica Cà Rossa 1^ stralcio
24. Installazione di un campo prova per la verifica di tiranti strutturali
25. Interventi di sistemazione della sponda ovest del Canale S. Leonardo – Marghera nel tratto tra il Canale Industriale Sud e Fusina
26. Interventi di sistemazione della sponda ovest del Canale S. Leonardo – Marghera nel tratto tra il Canale Industriale Ovest e Sud
27. Caratterizzazione di una parte dell'area 43 ettari a Porto Marghera

Attività da avviare

1. Completamento delle caratterizzazioni dell'area 43 ettari, dell'area Lusore Brentelle, dei fondali del Brentella, dell'area dei Pili, dell'area "Terzo Argine", della Rana
2. Sistemazione sponde canali industriali: Darsena della Rana e completamento Canale Industriale Ovest sponda Sud, Canale Industriale Ovest sponda Est , Canale S. Leonardo – Marghera sponda Ovest, messa in sicurezza dell'area demaniale c.d. "Terzo Argine"

Attività da finanziare:

1. Prosecuzione di monitoraggi ambientali e gestione sperimentale degli interventi già realizzati
2. Completamento interventi di messa in sicurezza delle discariche abbandonate situate all'interno della conterminazione Lagunare
3. Completamento asportazione selettiva di sedimenti inquinati dal Canale Industriale Nord a Porto Marghera
4. Asportazione selettiva dei sedimenti della Darsena della Rana e del canale Industriale Brentella a Porto Marghera
5. Prosecuzione interventi di sistemazione sponde delle macroisole a Porto Marghera
6. Realizzazione di un sistema di gestione delle terre inquinate risultanti da scavi, dragaggi e bonifiche eseguiti a Marghera e in Laguna
7. Prosecuzione degli interventi per l'arresto del degrado connesso alla proliferazione delle macroalghe in Laguna di Venezia
8. Bonifica anche mediante sopralzo di alcune aree di basso fondale inquinate poste tra Venezia e Porto Marghera
9. Sperimentazione di interventi di indirizzo dei processi autodepurativi dei bassifondali
10. Estensione degli interventi di indirizzo dei processi autodepurativi dei bassifondali
11. Prosecuzione messa in sicurezza della Botte delle Trezze sottopassante il fiume Bacchiglione e la Botte a sifone sottopassante il fiume Brenta
12. Prosecuzione ed estensione interventi di sistemazione nodi idraulici

Interventi di sistemazione delle sponde dei canali portuali dell'area di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera

	Intervento del Magistrato alle Acque di Venezia	Lunghezza in metri	Stato di avanzamento al 31.12.2005
1	Conterminazione Isola delle Tresse lato canali (tratto H2)	1.730	LAVORI ULTIMATI
2	Conterminazione Isola delle Tresse lato laguna (tratti I1 + I2 + I3)	2.080	LAVORI ULTIMATI
3	Messa in sicurezza del sito "Passo Campalto"	2.640	LAVORI ULTIMATI
4	Canale Industriale Sud sponda nord 1° stralcio e 2° stralcio (parte di tratto E1)	1.737	LAVORI ULTIMATI
5	Penisola di S. Giuliano 1° stralcio sponda est	1.650	LAVORI ULTIMATI
6	Canale Industriale Sud - sistemazione sponda nord (3° stralcio) (parte di tratto E1)	1.308	LAVORI IN CORSO
7	Canale Industriale Ovest - sistemazione sponda sud 1^ lotto (tratto D4/1)	1.570	LAVORI IN CORSO
8	Canale Industriale Brentella - 1^ fase sistemazione sponde (compreso 1° stralcio Canale Vittorio Emanuele III) (tratto G1/1 + G2/2 + G2/3 + G1/2 + G2/1 + F1/1 + A2/1)	3.450	LAVORI IN CORSO
9	Isola dei Serbatoi Petroliferi - sistemazione sponda ovest (tratto H/1)	890	LAVORI IN CORSO
10	Isola dei Serbatoi Petroliferi - sistemazione sponda nord e sud 1° e 2° stralcio (tratti F4 e K1)	2.110	LAVORI IN CORSO
11	Canale Lusore-Brentelle - sistemazione sponde nord e sud (tratti Z1/1 e Z1/2)	1.910	LAVORI IN CORSO
12	Canale Industriale Sud, 4° stralcio - sistemazione sponda sud e darsena terminale - 1° lotto (Nuova Sirma) (parte tratto E2/1)	290	LAVORI IN CORSO
13	Canale Industriale Sud, 4° stralcio - sistemazione sponda sud e darsena terminale - 2° lotto fase A e C (43 ettari e sponda sud darsena) (tratto E2/3a)	660	LAVORI IN CORSO
14	Canale Vittorio Emanuele III - sponda nord completamento - darsene Agip e Petrolven 1° stralcio (tratto F1/2 + F2 + F3)	1.480	LAVORI IN CORSO
15	Sponda lagunare III argine 1° stralcio di emergenza 1^ fase 1° lotto + completamento (tratto parte L1)	1.100	LAVORI IN CORSO
16	Sponda lagunare area Pili ° stralcio di emergenza (tratto parte L2)	1.200	LAVORI IN CORSO
17	Canale S. Giuliano sponda sud 2° stralcio 1^ fase di emergenza (tratto parte P2)	1.940	LAVORI IN CORSO
18	Darsena Rana sponde e completamento canale ind. Ovest sponda Sud (D5/2a Sponda Sud) 1° str	700	LAVORI IN CORSO
19	Canale S. Leonardo Marghera - sistemazione sponda ovest tra i Canale Industriale Sud e Fusina 1° stralcio (parte tratto H4/1)	410	LAVORI IN CORSO
20	Canale Industriale Ovest - sistemazione sponda est - 1° stralcio (tratto D2/1)	820	LAVORI IN CORSO
21	Canale Industriale Sud, 4° stralcio - sistemazione sponda sud e darsena terminale - 5° lotto fase A e B (sponda ovest della darsena) (tratto E2/2)	420	LAVORI IN CORSO
22	Canale Industriale Sud, 4° stralcio - sistemazione sponda sud e darsena terminale - 6° lotto (Abibes + Decal +Italcementi +Vesta + Alcoa) (tratto E2/4)	1.410	LAVORI IN CORSO
23	Canale S. Leonardo Marghera - sistemazione sponda ovest tra i Canali Industriali Ovest e Sud 1° stralcio (2A) (tratto H3/1, H3/2, H3/3 e H3/4)	1.480	LAVORI IN CORSO
24	Canale S. Leonardo Marghera - sistemazione sponda ovest tra i Canali Industriali Ovest e Sud 2° stralcio (2A) (tratto H3/2 e H3/4)		PROGETTO IN CORSO
25	Canale S. Leonardo Marghera - sistemazione sponda ovest tra i Canale Industriale Sud e Fusina 2° e 3° stralcio (parte tratto H4/1)		PROGETTO IN CORSO
26	Canale Vittorio Emanuele III - sponda nord completamento - darsene Agip e Petrolven 2° stralcio (tratto F1/2 + F2 + F3)		PROGETTO IN CORSO
27	Canale Industriale Sud, 4° stralcio - sistemazione sponda sud e darsena terminale -2° lotto Nuova Sirma (sponda nord darsena) (parte tratto E2/1)		PROGETTO IN CORSO
28	Canale Industriale Sud, 4° stralcio - sistemazione sponda sud e darsena terminale - 2° lotto fasi B e D (43 ettari e sponda sud darsena) (tratto E2/3a)		PROGETTO IN CORSO
29	Canale Industriale Sud, 4° stralcio - sistemazione sponda sud e darsena terminale - 3° lotto fasi A e B (sponda sud della darsena) (tratto E2/3b)	320	PROGETTO IN CORSO
30	Canale Industriale Sud, 4° stralcio - sistemazione sponda sud e darsena terminale - 4° lotto B fasi A e B (sponda sud tratto Fassa) (tratto E2/6)	300	PROGETTO IN CORSO
31	Canale Industriale Sud, 4° stralcio - sistemazione sponda sud e darsena terminale - 4° lotto C fasi A e B (sponda sud tratto Syndial, Polimeri Europa) (tratto E2/7)	230	PROGETTO IN CORSO
32	Canale Industriale Sud, 4° stralcio - sistemazione sponda sud e darsena terminale - 7° lotto (Enel) (tratto E2/5)	390	PROGETTO IN CORSO
33	Canale Industriale Ovest - sistemazione sponda sud - 2° lotto (tratto D4/2)	400	PROGETTO IN CORSO
34	Canale Industriale Ovest - sistemazione sponda est - 2° e 3° stralcio (tratto D2/2 e D2/3)	1.500	PROGETTO IN CORSO
35	Darsena della Rana, sponda nord e sponda sud 1° e 2° lotto (tratti D5/1, D5/2b)	700	PROGETTO IN CORSO
36	Canale S. Giuliano sponda sud 2° stralcio 2^ fase di emergenza (tratto parte P2)		PROGETTO IN CORSO
37	Canale Industriale Ovest - sponda ovest tratto sud 1°, 2° e 3° lotto (tratto D3/1)	690	PROGETTO IN CORSO
38	Canale Industriale Nord - sponda nord completamento (tratto A2/2 + A2/3 + A2/A + A2/5)	1.500	PROGETTO IN CORSO
39	Canal Salso sponda sud (tratto R1)	750	PROGETTO IN CORSO

Sponde lungo i canali industriali di Porto Marghera oggetto di intervento

I colori servono a distinguere i tratti di marginamento oggetto di intervento

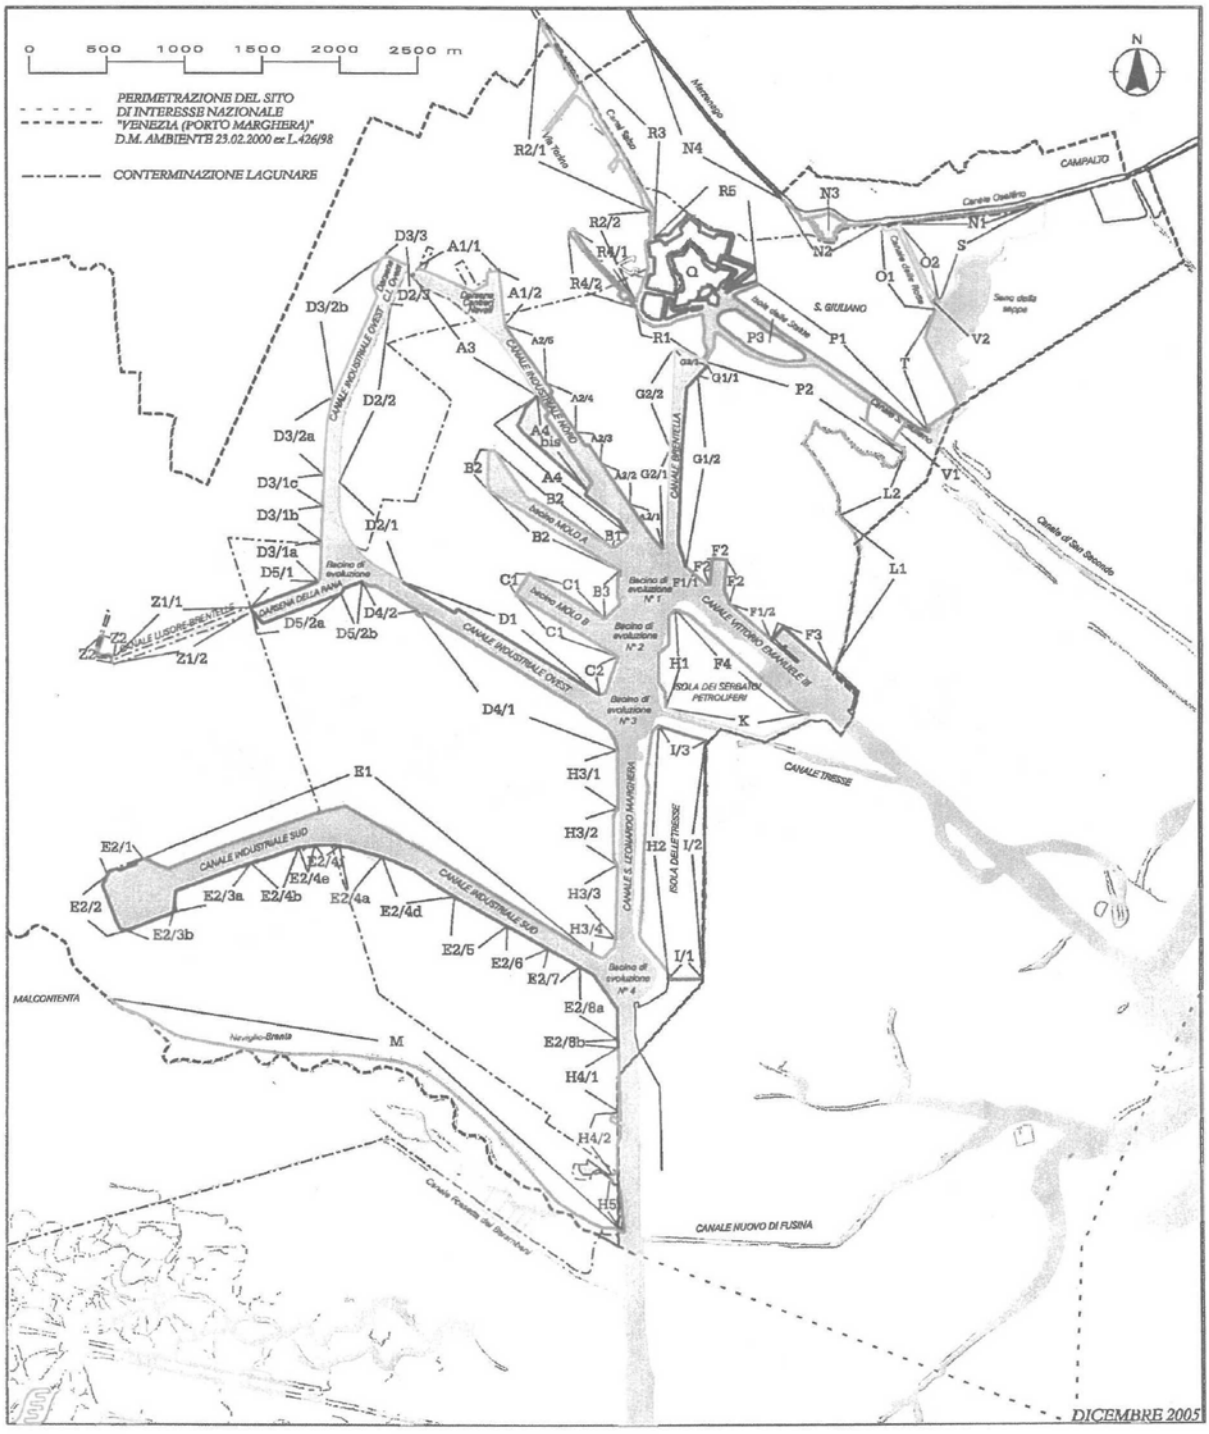

Isola dei Serbatoi Petroliferi



Obiettivi specifici: Contrastare l'erosione delle sponde e bloccare la diffusione in laguna degli inquinanti contenuti nel suolo, isolandoli dall'ambiente esterno.

Interventi principali: Ristrutturazione delle rive, realizzate con palancolato di acciaio completato da una guaina impermeabile (per sponda ovest 890 mt, per sponda nord e sud 2.110 mt); realizzazione di un diaframma di contenimento dei rifiuti depositati, per realizzare l'isola artificiale, indicato come prioritario dall'Autorità Portuale di Venezia anche per verificare la possibilità di confinare una parte dell'isola in modo adeguato a consentire il conferimento di terre di dragaggio di tipo "C"; protezione idraulica, affinché sia impedita la filtrazione verso i canali e quindi sia arrestato il processo di rilascio di inquinanti attraverso la realizzazione di un sistema di drenaggio con il compito di mantenere costante il livello della falda.

Interventi in corso

A lato: localizzazione dell'intervento.

In basso: vista satellitare dell'Isola. Al 31 dicembre 2005 si sta intervenendo su tutte le sponde dell'isola.



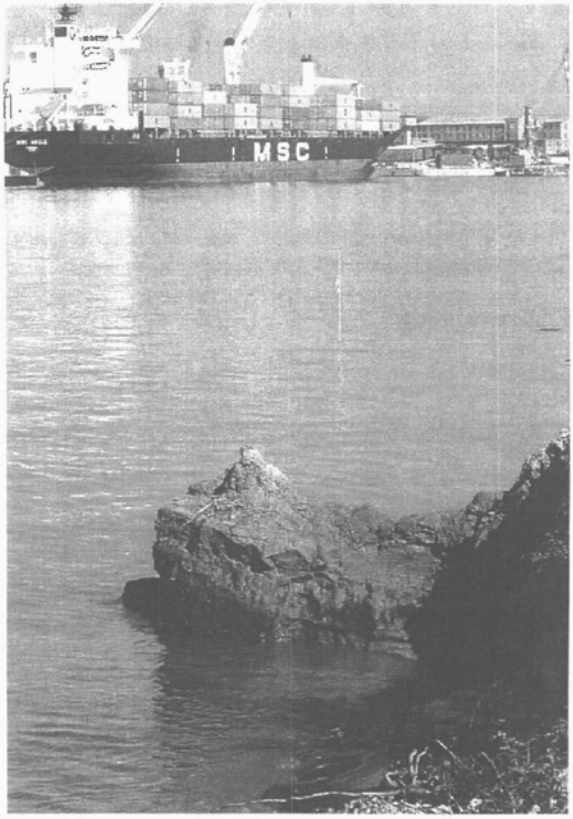

Isola dei Serbatoi Petroliferi. In questa foto è visibile la diffusione di inquinanti dal terreno.

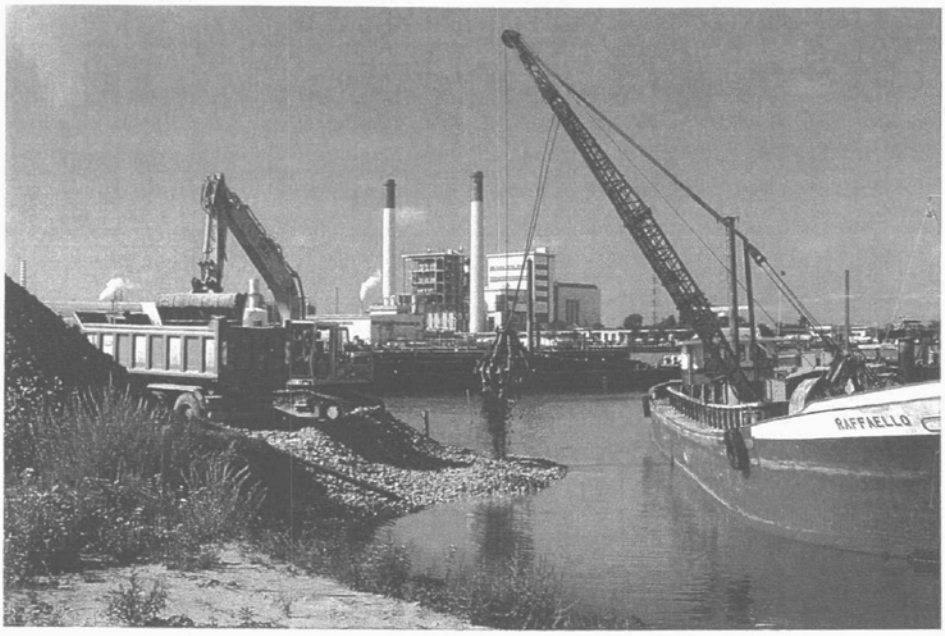

Isola dei Serbatoi Petroliferi. Un tratto di sponda durante i lavori.

Canale Industriale Sud – Porto Marghera

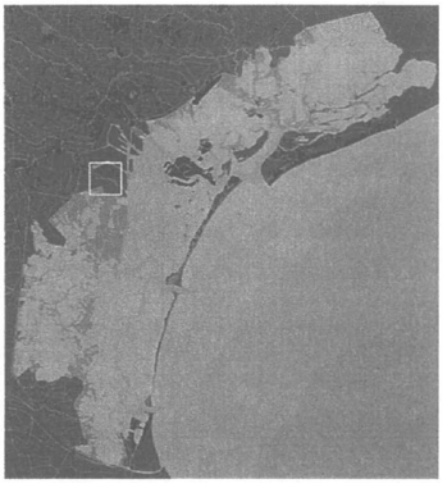

Obiettivi specifici: Contrastare l'erosione delle sponde e bloccare la diffusione in laguna degli inquinanti contenuti nel suolo, isolandoli dall'ambiente esterno.

Interventi principali: Ristrutturazione delle rive, realizzate con palancolato di acciaio completato da una guaina impermeabile

Interventi in corso

A lato: localizzazione dell'intervento.

In basso: vista satellitare del canale. In arancione i tratti di sponda che, al 31 dicembre 2005, sono oggetto di intervento.



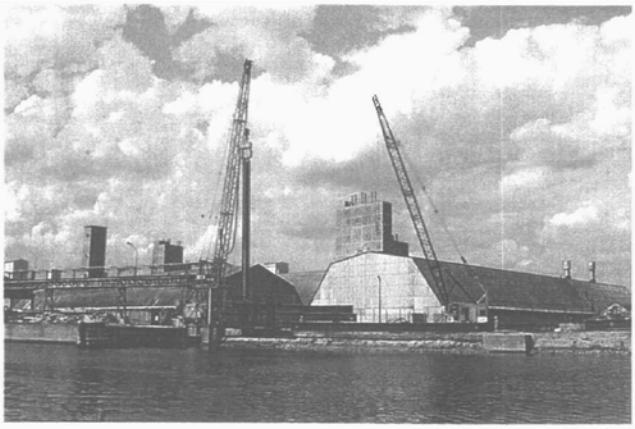

Canale industriale Sud. Un tratto della sponda sud durante i lavori di messa in sicurezza.



Canale industriale Sud. Una fase dei lavori per la messa in sicurezza della sponda sud, riva in corrispondenza dell'area 43 ettari.



Canale industriale Sud. Infissione del palancolato di acciaio a ridosso della riva nord preesistente.

PAGINA BIANCA

ALLONTANAMENTO DEL TRAFFICO PETROLIFERO DALLA LAGUNA

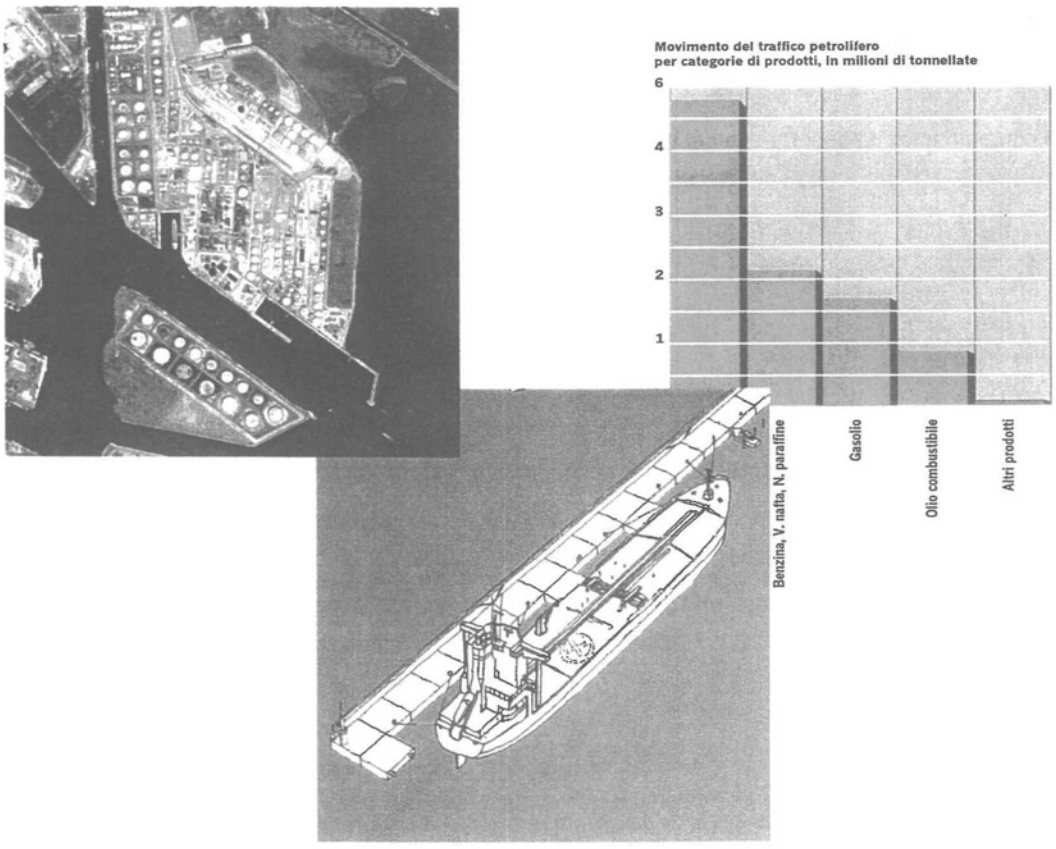

Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Studi propedeutici al progetto operativo
2. Progetto operativo per la sostituzione del traffico petrolifero in laguna
3. Progetto preliminare fattibilità di un approdo off shore in alto Adriatico

Attività in corso

1. Esame dei provvedimenti per il contenimento di spandimenti accidentali in laguna
2. Analisi costi – benefici e V.I.A. della realizzazione di un approdo off shore in Alto Adriatico
3. Progetto definitivo di un primo intervento pilota per il contenimento di spandimenti accidentali

Attività da avviare

1. Intervento sperimentale per il contenimento di spandimenti accidentali lungo il canale Malamocco – Marghera

Attività da finanziare:

1. Panne di contenimento lungo il Canale dei Petroli (presidi per protezione della laguna da sversamenti accidentali da natanti)
2. Attività preliminari alla progettazione esecutiva e alla realizzazione di un approdo off shore in Alto Adriatico

Realizzazione di un approdo off – shore in Alto Adriatico

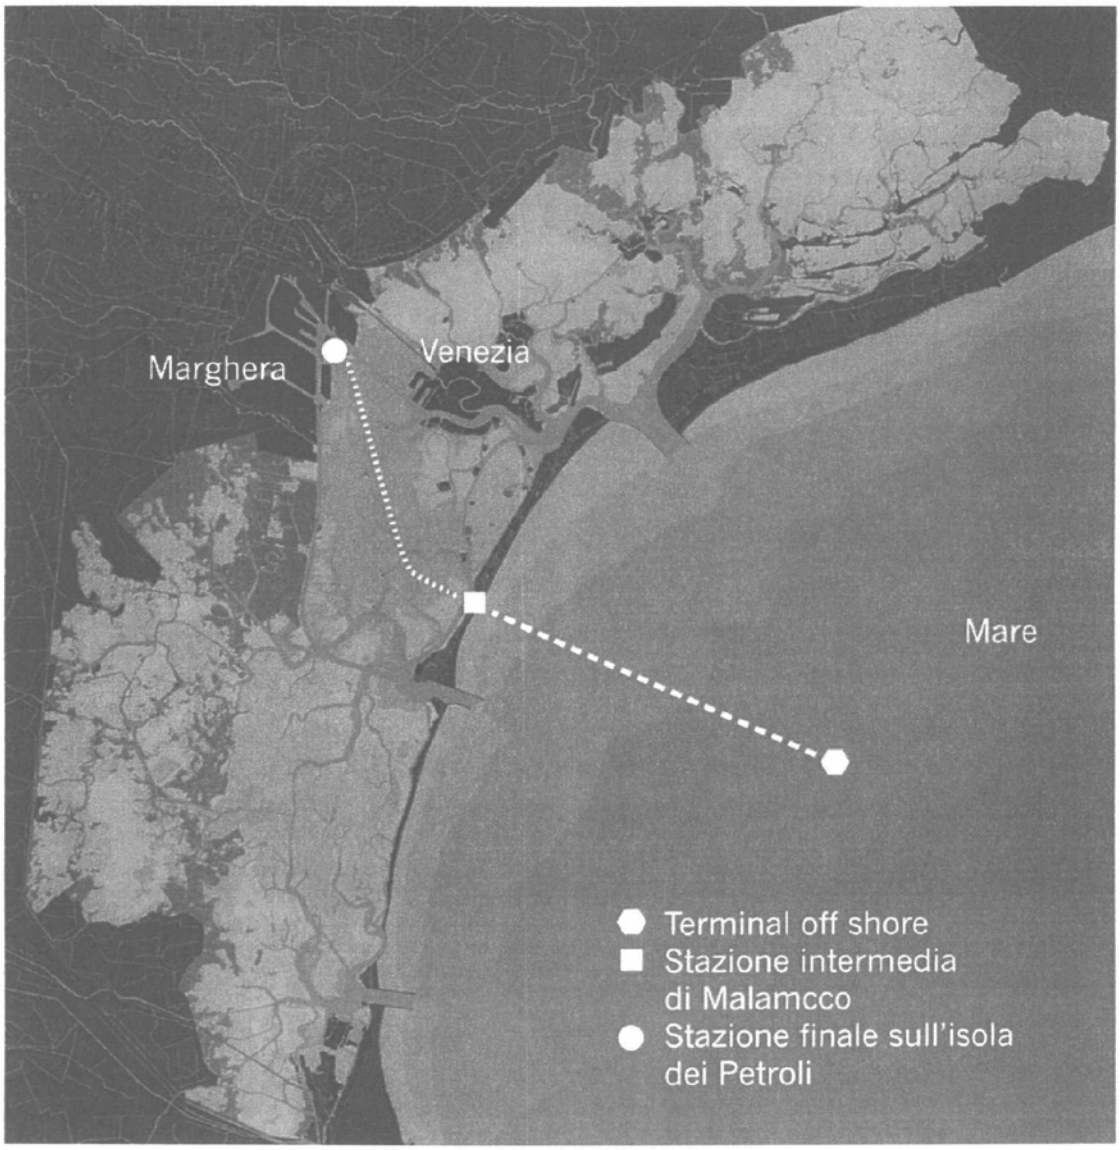

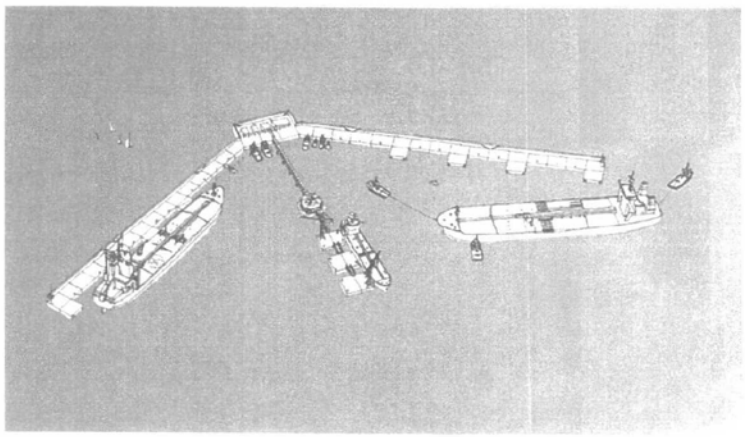

In alto: localizzazione dell'intervento.

A lato: vista dell'approdo off – shore.

PAGINA BIANCA

AUSILI LUMINOSI ALLA NAVIGAZIONE

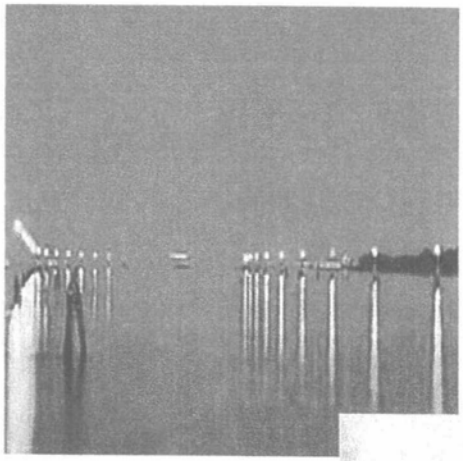





Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Analisi della convenienza della realizzazione del traffico portuale di notte e con nebbia
2. Realizzazione sistema di illuminazione e radar lungo il Canale Malamocco - Marghera

Attività da finanziare:

1. Intervento di adeguamento dell'impianto

Ausilii alla navigazione lungo il canale Malamocco / Marghera

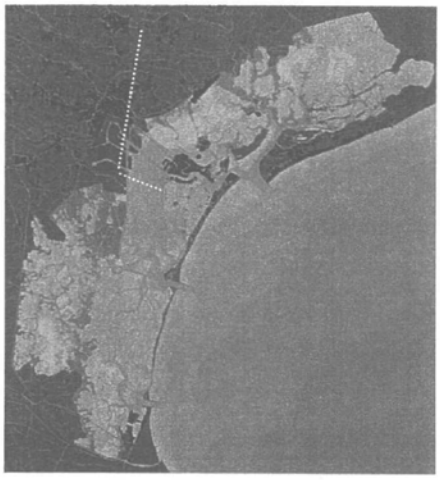

Obiettivi specifici: ridurre i rischi derivanti dal trasporto in laguna di prodotti petroliferi e chimici; facilitare la navigazione di notte e con la nebbia

Interventi principali: installazione di segnali luminosi, riflettori radar e "fog detectors" lungo il canale tra la bocca di Malamocco e la zona industriale (15 km)

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento

In basso: un tratto del canale Malamocco/Marghera con il nuovo sistema di illuminazione



PAGINA BIANCA

APERTURA DELLE VALLI DA PESCA

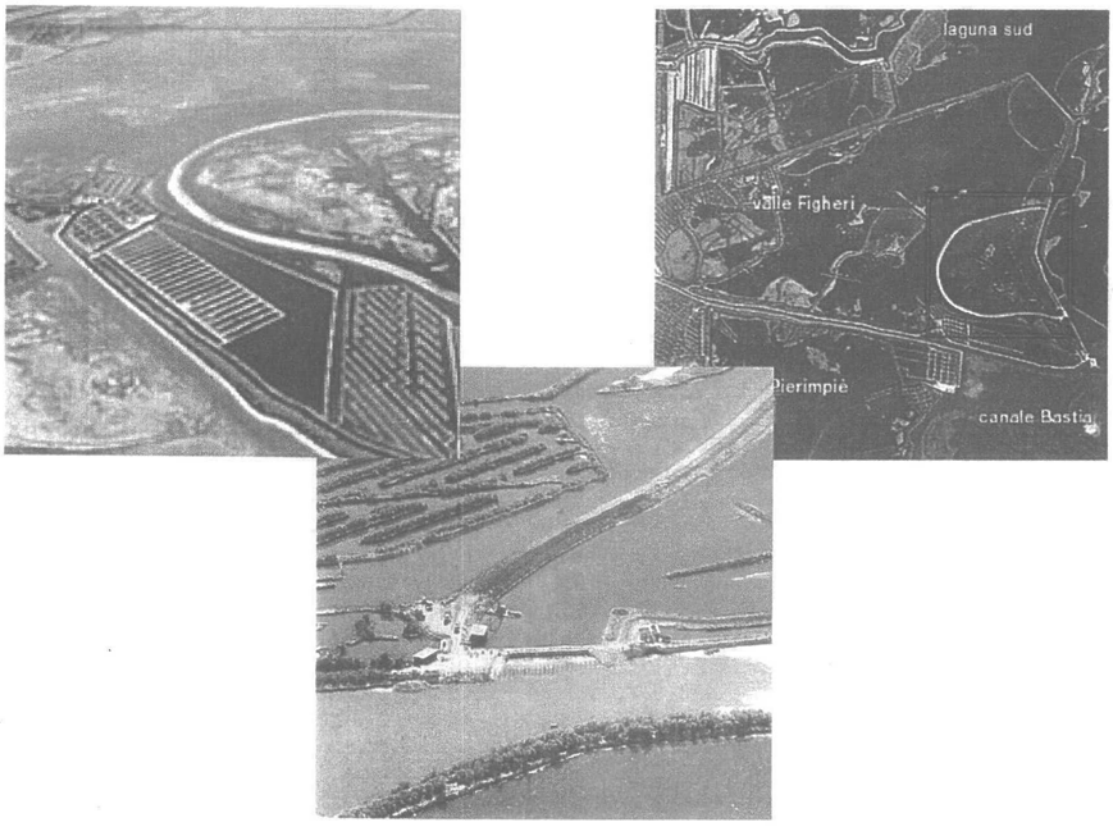

Attività finanziate:

Attività ultimate

1. Analisi della convenienza della realizzazione del traffico portuale di notte e con nebbia
2. Realizzazione sistema di illuminazione e radar lungo il Canale Malamocco - Marghera

Attività da finanziare:

1. Intervento di adeguamento dell'impianto

Valle Figheri – intervento sperimentale

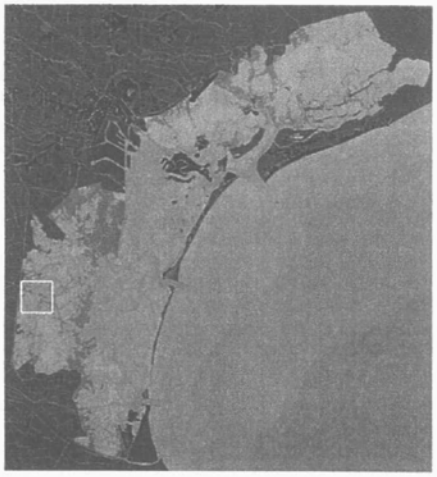

Obiettivi specifici: migliorare la qualità delle acque in aree periferiche della laguna in cui circolazione e ricambi idrici avvengono con difficoltà; monitorare gli effetti di questo tipo di opere attraverso un intervento pilota in una valle scelta come campione.

Interventi principali: realizzazione di un argine di terre (2 km) per dividere la valle in due parti, di cui una "riaperta"; realizzazione di un manufatto per regolare il flusso della marea tra valle aperta e laguna e di due manufatti tra valle aperta e valle chiusa.

Intervento ultimato

A lato: localizzazione dell'intervento.

In basso: il manufatto di regolazione tra valle aperta e laguna.

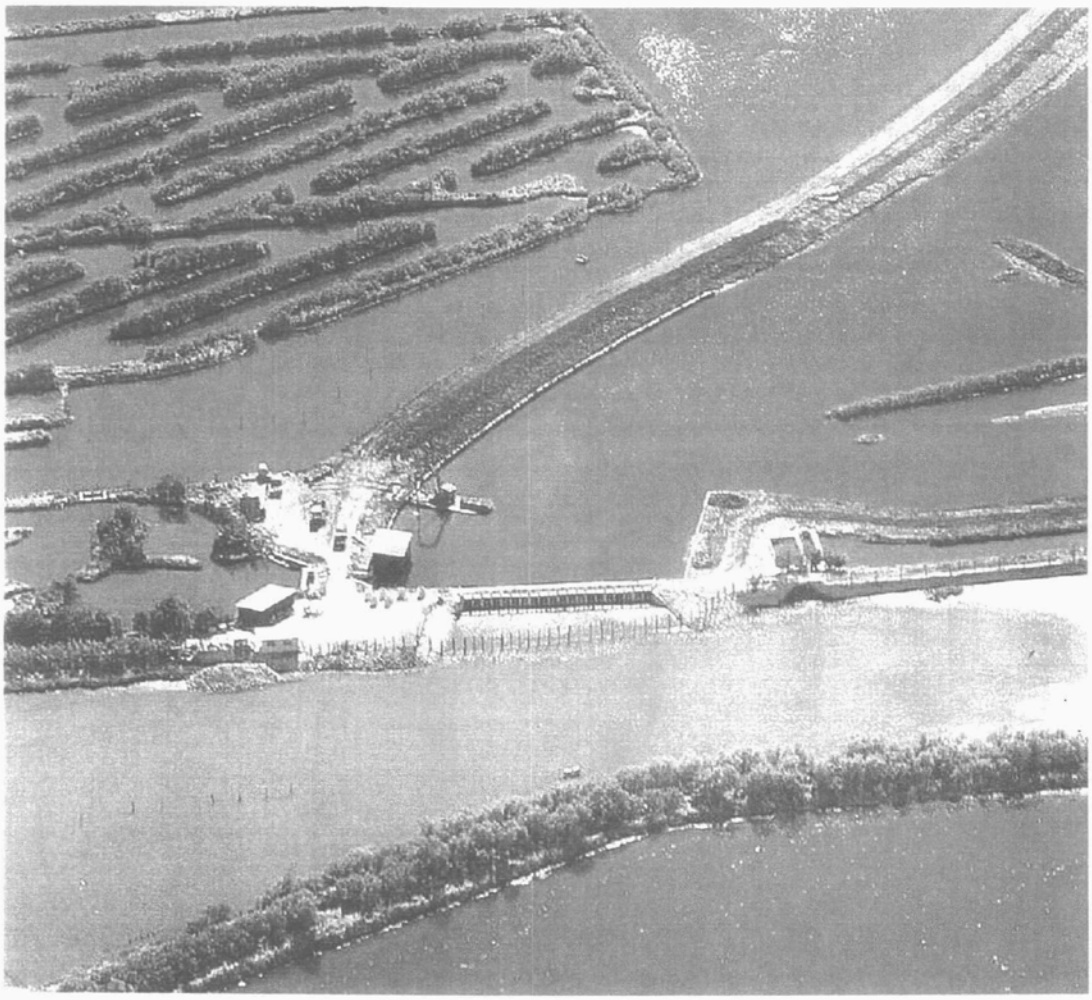

PAGINA BIANCA

SERVIZIO INFORMATIVO

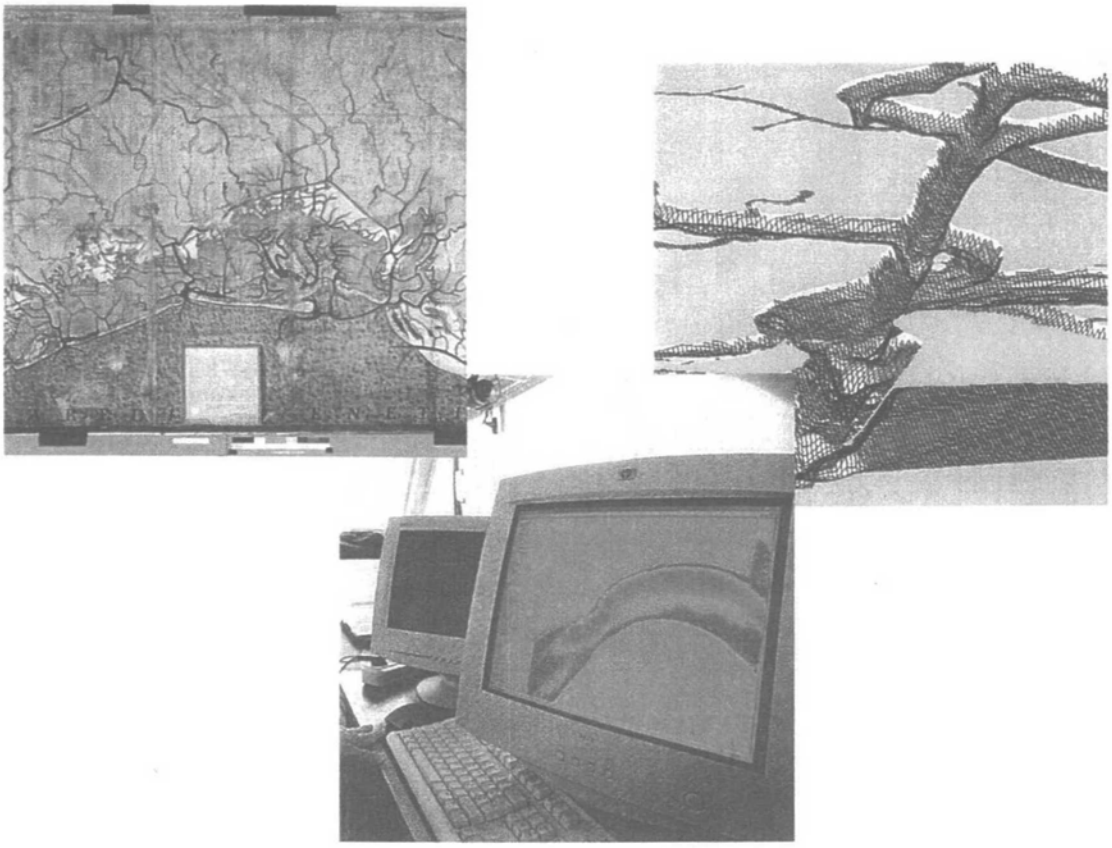

Attività finanziate:

Attività ultimate

n. 84 perizie

Attività in corso

n. 35 perizie

Attività da avviare

n. 20 perizie

Attività da finanziare:

Almeno n. 80 stralci delle varie sezioni di lavoro per garantire continuità alle attività dal 2006 fino al 2015

Attività del Servizio Informativo

Banche dati territoriali e sistemi di consultazione

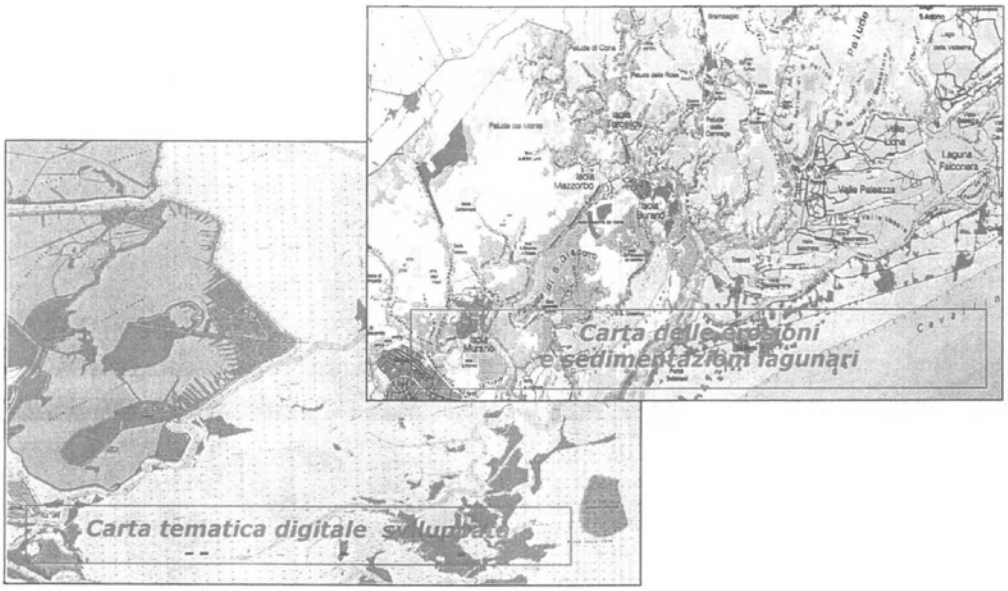

Acquisizione e gestione attrezzature informatiche e di rete

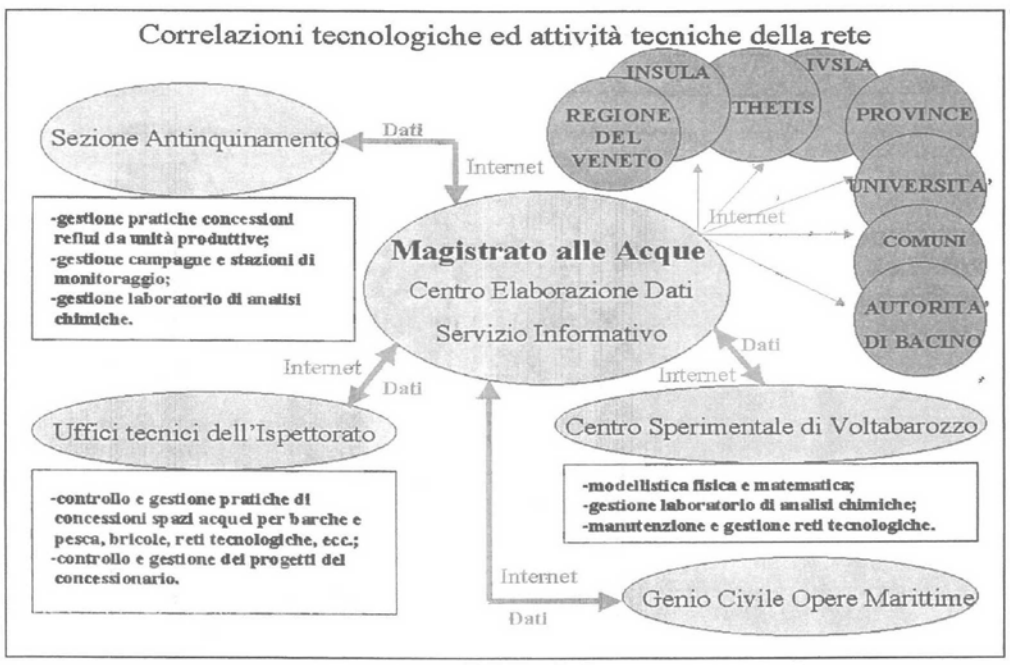

Rilievi della morfologia terrestre e lagunare







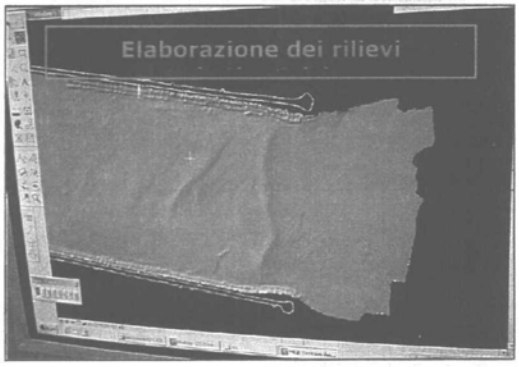

Monitoraggi ambientali in tempo reale ed indagini stagionali

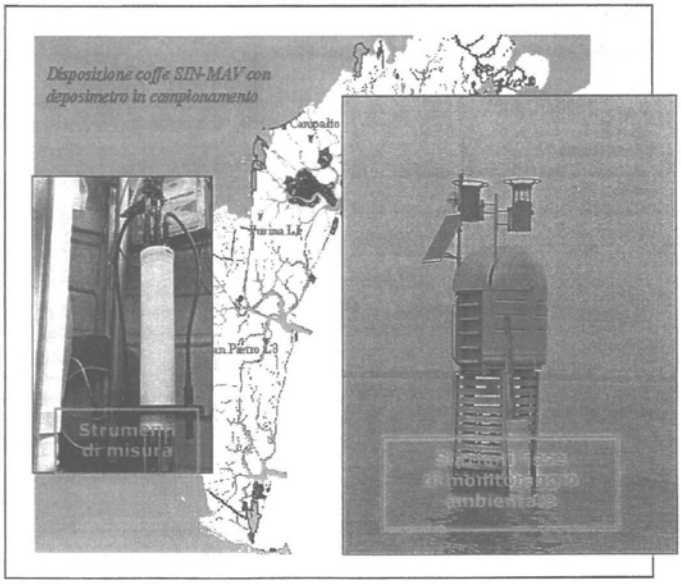

Laboratorio di analisi chimiche di Venezia e Voltabarozzo

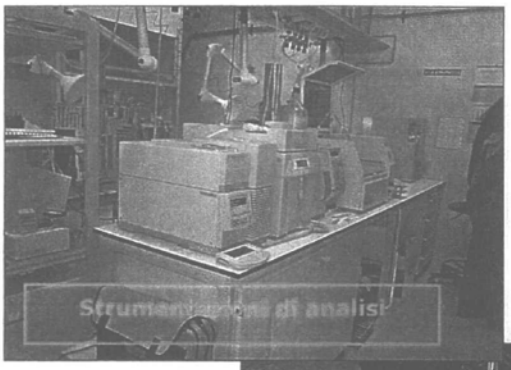

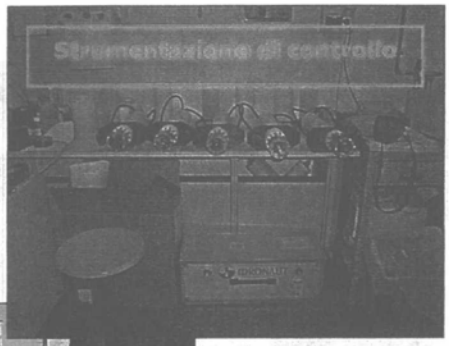



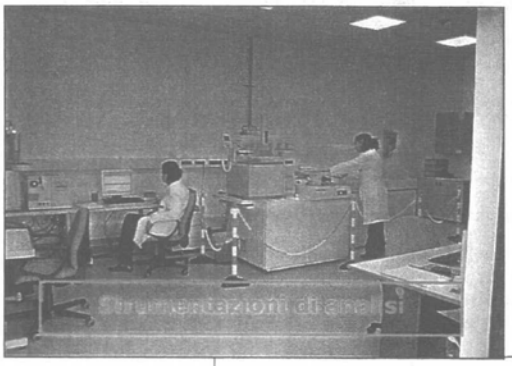





Gestione dell'informazione tecnica e della diffusione dei dati

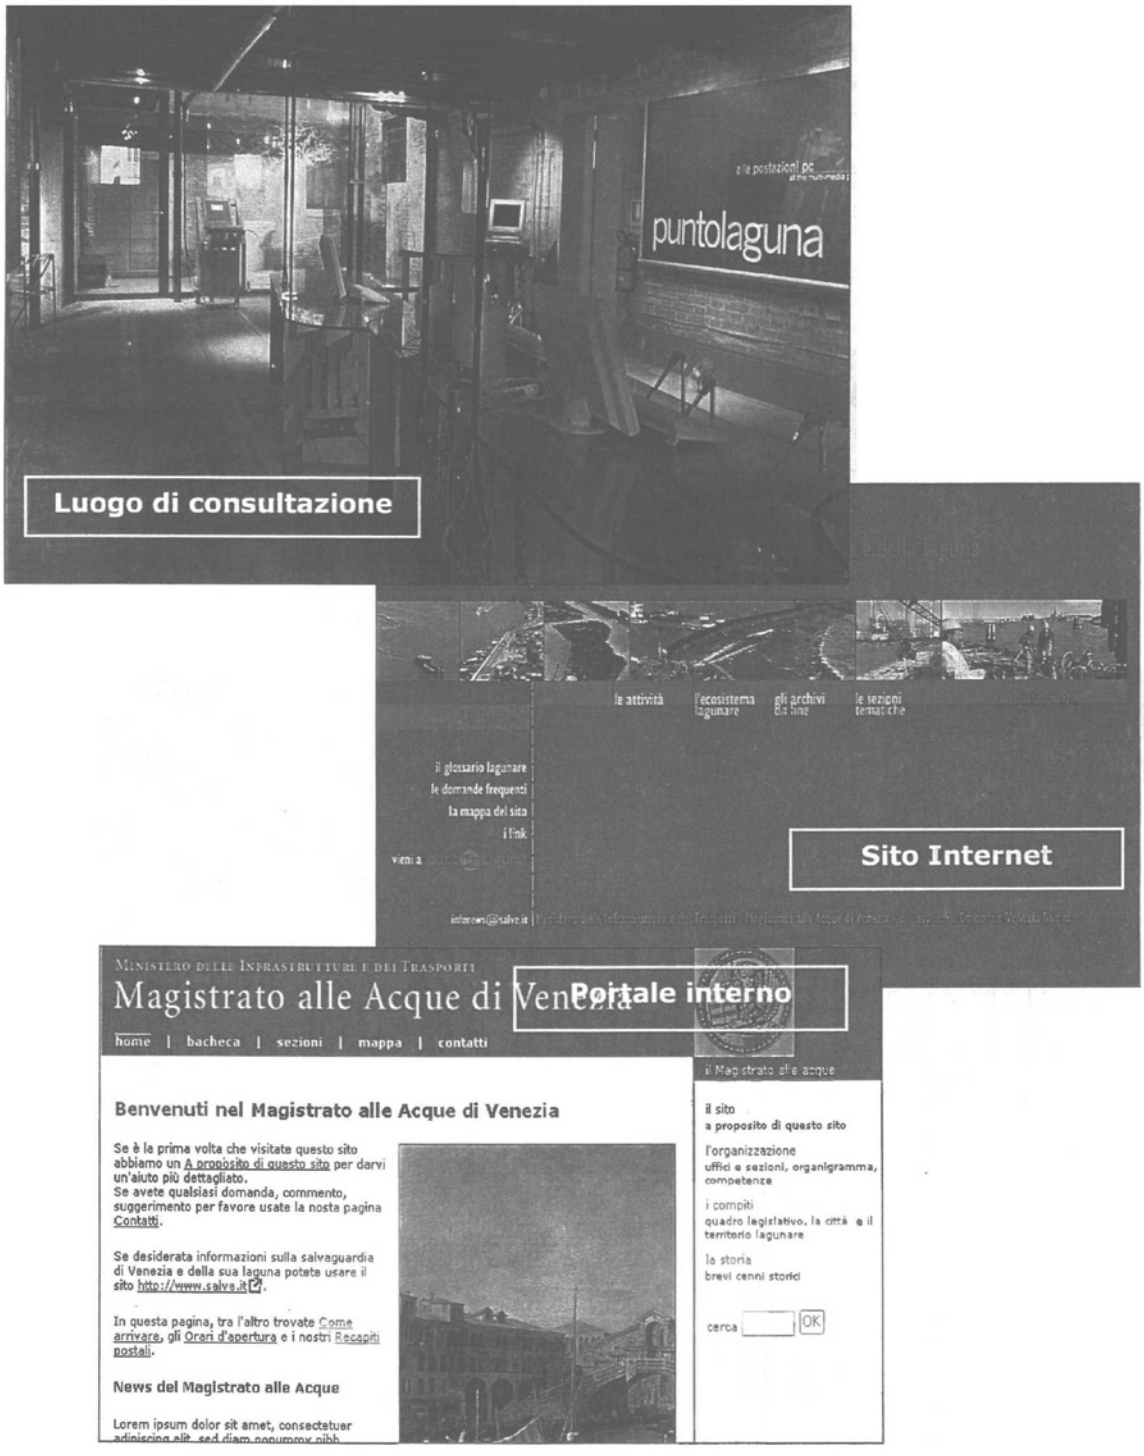

Telerilevamento satellitare ed aereo



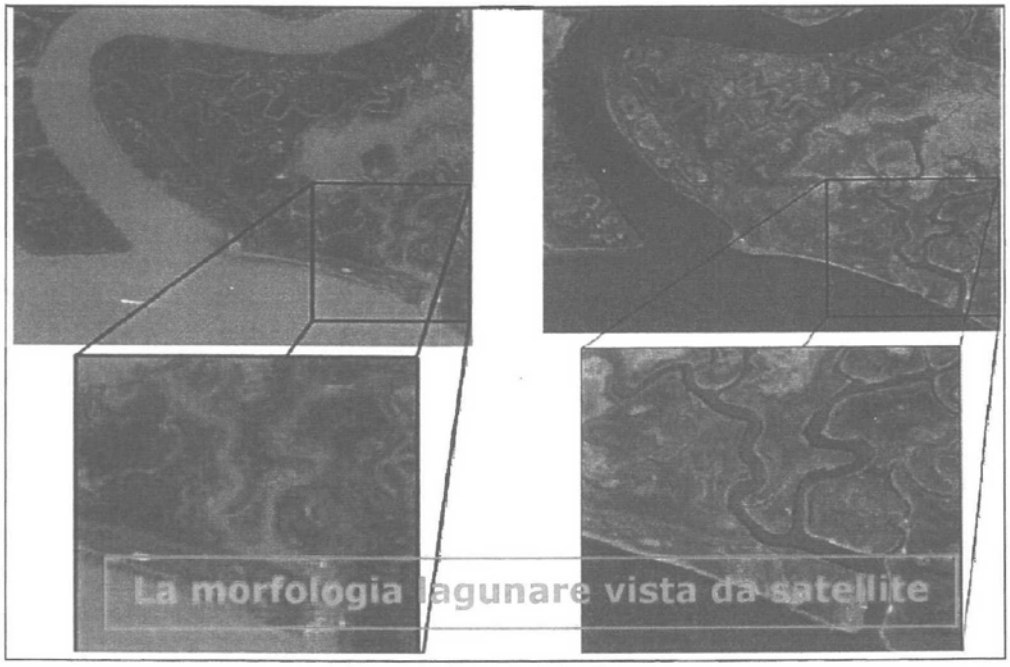

PAGINA BIANCA

Documento C ***Regione del Veneto***

Stato di attuazione degli interventi finanziati con fondi della legge speciale per Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

GABINETTO

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA
16. GIU. 2006
GABINETTO

15 GIU 2006 | Protocollo N° 365682/57.00 | Allegati N°

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia al 31.12 2005.

MAGISTRATO ALLE ACQUE
- SEGRETERIA -
Arr. 20. GIU. 2006
Prot. N. 446 /GAB.

Al Presidente
Magistrato alle Acque
Segretario del Comitato
ex art.4, L.798/1984
Palazzo X Savi- Rialto
35100 VENEZIA

Con riferimento a quanto richiesto con nota n. 238/GAB in data 4 aprile 2006, concernente l'oggetto, si inviano la relazione illustrativa ed i quadri analitici dello stato dei finanziamenti, suddivisi per Leggi e per Soggetti Attuatori, aggiornati al 31 dicembre 2005.

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Il Segretario Regionale
All'Ambiente e Territorio
ing. Roberto Casarin

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

SEGRETERIA REGIONALE ALL'AMBIENTE E TERRITORIO

DIREZIONE REGIONALE PROGETTO VENEZIA

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

ANNO 2005

RELAZIONE AL PARLAMENTO

LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Quadro normativo e di programmazione

I fondi messi a disposizione dalla legge speciale per Venezia dal 1984 ad oggi hanno consentito di avviare concretamente una radicale azione di disinquinamento e risanamento della laguna.

Tenuto conto delle competenze attribuite alla Regione Veneto dalla legislazione, la quasi totalità dei fondi stanziati è stata destinata dalla Regione ad opere mirate al disinquinamento delle acque.

Nei primi tempi, fino al 1991, i finanziamenti furono destinati alla realizzazione di fognature e impianti di depurazione delle acque negli otto comuni della gronda lagunare, secondo quanto stabilito dalle leggi 171/73 e 798/84. Successivamente, dal 1991 in poi, con l'entrata in vigore della legge 360/91, i finanziamenti furono estesi anche ad opere finalizzate al risanamento ambientale in senso lato, cioè volte a limitare l'effetto dell'inquinamento diffuso proveniente dall'agricoltura e dalla zootecnia, alla razionalizzazione del sistema idraulico della bonifica, al risanamento dei suoli contaminati, impianti di compostaggio e al trattamento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel bacino scolante, ecc.

Una parte dei fondi stanziati della legge speciale sono stati infine destinati ad opere acquedottistiche e ospedaliere, secondo quanto previsto dalla legge 798/84.

Con l'applicazione della legge speciale per Venezia la Regione con apposite leggi regionali ha introdotto norme tese a regolamentare le relative attività.

La legge regionale 49/74 ha normato le attività fino al 1990, quando, con l'entrata in vigore della legge 17/90, è stato radicalmente modificato l'assetto normativo. La legge 17/90 è stata successivamente modificata con la legge 8/92 e con la legge 35/93.

La legge regionale 17/90 stabilisce che il disinquinamento della laguna di Venezia deve essere definito da uno strumento programmatorio di carattere generale chiamato "Piano Direttore".

Il Piano Direttore 2000

La Regione si è dotata di un Piano Direttore per il disinquinamento della Laguna sin dal 1979. Detto piano è servito per coordinare i primi interventi di disinquinamento.

Nel 1991, in ottemperanza alla citata legge 17/90, è stato predisposto e approvato dal Consiglio Regionale il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

Detto Piano affronta le problematiche dell'inquinamento lagunare nella loro complessità, e tiene conto delle varie fonti che lo possono originare. Fornisce quindi gli

indirizzi da seguire per individuare le azioni più efficaci e le opere più idonee a conseguire i risultati voluti.

Successivamente, nel 1994, la Giunta Regionale, nell'intento di individuare azioni specifiche per limitare il carico di sostanze nutrienti immesso in laguna, e controllare quindi il fenomeno dell'eutrofizzazione, ha predisposto ed adottato un documento denominato "Piano pluriennale degli interventi in attuazione del Piano per il disinquinamento della laguna di Venezia" al fine di meglio individuare gli interventi da finanziare con i fondi messi a disposizione dalla legge n. 139/92.

In data 1 marzo 2000, infine, il Consiglio Regionale ha approvato un aggiornamento al Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, in ottemperanza all'incarico affidato alla Regione dal Ministro dell'Ambiente Ronchi con l'ordinanza n. 4498 dell'1.10.1996. Tale aggiornamento è denominato "Piano Direttore 2000".

Il *"Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia"* prevede:

a) per gli interventi finalizzati all'abbattimento dell'inquinamento civile e urbano diffuso, di operare principalmente attraverso il miglioramento e il completamento delle strutture di raccolta e depurazione degli scarichi fognari civili e delle acque di pioggia;
b) per gli interventi finalizzati alla razionalizzazione dei prelievi dai corsi d'acqua del bacino scolante o da pozzi della relativa zona di ricarica diretta, di garantire una maggiore portata e favorire, in sinergia con gli interventi di naturalizzazione, di estendere i processi di autodepurazione naturale dei corsi d'acqua stessi. Questi obiettivi rientrano nella prospettiva del mantenimento del minimo deflusso vitale in tutta la rete idrografica del bacino scolante.
c) per gli interventi finalizzati al settore agricolo e zootecnico, di ridurre l'apporto di macronutrienti (azoto e fosforo) nella Laguna di Venezia, attraverso il miglioramento della qualità delle acque superficiali che scolano nel sistema idrografico che sfocia in Laguna, che è alimentato sia dalle acque di ruscellamento e percolazione dai terreni coltivati, sia dalla ricarica dell'acquifero indifferenziato che si trova nella parte nord-occidentale del bacino, intervenendo anche con azioni di prevenzione e di riuso in agricoltura dei letami e dei liquami zootecnici;
d) per gli interventi finalizzati al settore territorio, di operare principalmente attraverso l'aumento della capacità di autodepurazione dei corsi d'acqua del Bacino Scolante per ridurre l'inquinamento residuo versato nella Laguna;
e) per la verifica ed il monitoraggio delle azioni del Piano, di destinare cospicue quote delle risorse finanziarie per approfondimenti e sperimentazioni per una corretta valutazione sia dei carichi inquinanti residui che del raggiungimento degli obiettivi generali di risanamento e di riequilibrio del sistema lagunare.

La strategia degli interventi

La strategia di disinquinamento adottata dalla Regione del Veneto nel Piano Direttore 2000 prevede di intervenire sull'inquinamento generato nel Bacino Scolante in tre momenti diversi.

1° PREVENZIONE

Il primo passo è quello d'intervenire su tutte le possibili fonti inquinanti con azioni di prevenzione, che mirano ad abbattere all'origine l'inquinamento.

2° RIDUZIONE

Sull'inquinamento che sfugge alle azioni di prevenzione si interviene, dove possibile, attraverso azioni di riduzione. Si tratta principalmente della depurazione delle acque di scarico civili e industriali prima di immetterle nei corsi d'acqua del Bacino Scolante.

3° AUTODEPURAZIONE e/o DIVERSIONE

L'inquinamento residuo, che raggiunge i corsi d'acqua, può subire un ulteriore abbattimento grazie alla loro naturale capacità di autodepurazione, che può agire per l'intero percorso sino allo sbocco nella Laguna.

Il Piano Direttore 2000 prevede di intervenire sui corsi d'acqua per aumentare la loro capacità di autodepurazione.

Un'ultima possibilità di intervento è data dalla diversione, cioè dall'allontanamento parziale e temporaneo dalla Laguna delle acque dolci inquinate.

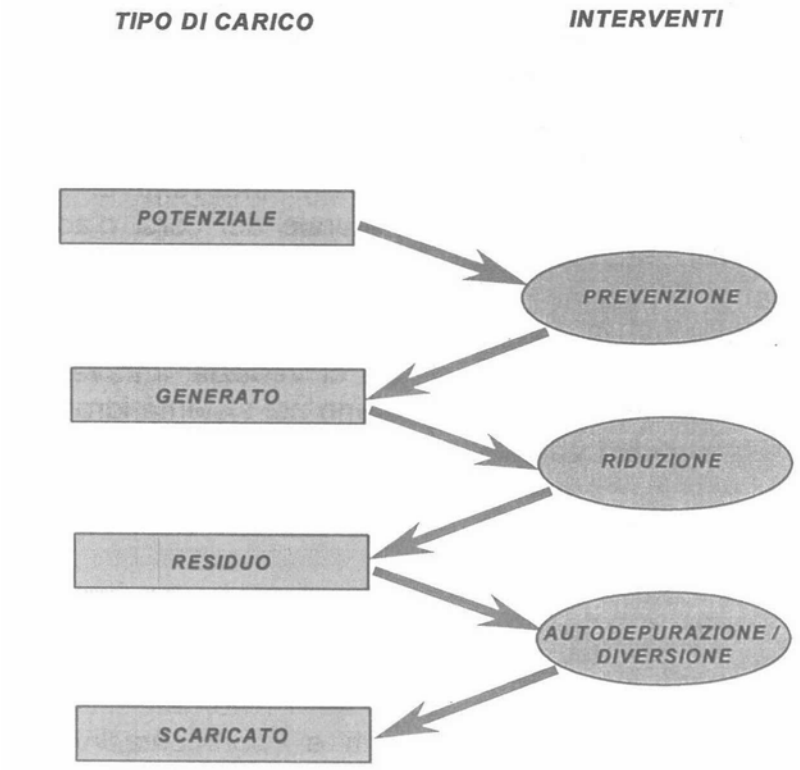

I settori di intervento sono:

Settore Fognatura e Depurazione

Gli interventi nella rete fognaria mirano alla riduzione degli scarichi diretti in Laguna, attraverso il completamento dei sistemi fognari, con la separazione della fognatura delle acque nere dalle acque di prima pioggia, la eliminazione delle acque parassite e la costruzione di vasche di prima pioggia sull'intero territorio del bacino scolante.
Gli interventi puntano, da una parte, allo sviluppo della rete di raccolta minore (sviluppo dei "pettini"), laddove già esistono le principali linee di collettamento, e dall'altra alla realizzazione di nuove linee principali dove esistano zone convenientemente servibili e non ancora raggiunte da pubblica fognatura. L'obiettivo è quello di estendere gli allacciamenti di fognatura all'84% degli abitanti residenti all'interno del bacino scolante (percentuale fissata sulla base di un'analisi costi-benefici a seguito di una capillare ricognizione del reale stato di consistenza delle reti di fognatura, dello stato degli allacciamenti e del tipo di urbanizzazione esistente).

Gli interventi agli impianti di depurazione si possono essenzialmente suddividere in tre categorie:

- interventi di affinamento dei processi di depurazione e di adeguamento della qualità degli scarichi ai limiti legislativi;
- interventi di incremento della potenzialità dell'impianto in termini di abitanti equivalenti;
- collettamento di impianti minori ad impianti più grandi, per una migliore economia di gestione, e per la diversione dello scarico in corpi ricettori sfocianti fuori dalla Laguna.

Settore Acquedotti

Questa tipologia di interventi è finalizzata alla razionalizzazione dei prelievi dai corsi d'acqua del bacino scolante o da pozzi della relativa zona di ricarica diretta, al fine di garantire sia una maggiore portata dei corsi d'acqua e l'incremento, così, dei processi di autodepurazione naturale, sia la riduzione dei consumi idropotabili finalizzata ad un miglioramento dell'efficienza degli impianti di depurazione. Le principali azioni sono:

- realizzazione di nuove linee di distribuzione;
- interconnessione di sistemi di produzione ad uso idropotabile del Veneto centrale e del basso Veneto al fine di ridurre gli attingimenti di punta e riequilibrare, nel lungo periodo, i prelievi nel loro complesso. In questo modo verranno rifornite con acqua di buona qualità le aree oggi sfavorite del basso Veneto;
- rendere il sistema acquedottistico veneto di tipo reticolare, ad anello chiuso;
- gestione, su base pluriennale, delle risorse idriche, anche mediante monitoraggio e riuso di acque depurate all'interno dei cicli industriali e a scopo irriguo.

All'interno della programmazione regionale rientra il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, previsto dall'art. 14 della L.R. 5/1998, che individua gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche del Veneto, nonché le fonti da salvaguardare per risorse idriche ad uso potabile. La Legge Speciale per Venezia interviene finanziando

specificamente lo Schema del Veneto Centrale che alimenterà con acque di buona qualità i territori della Provincia di Rovigo, della Bassa Padovana e delle aree limitrofe della Provincia di Venezia.

Settore Territorio

Questo settore rappresenta, in termini di finanziamenti ripartiti, il secondo grande settore di intervento a favore del disinquinamento della Laguna, dopo quello di fognatura e depurazione. Gli interventi finanziati hanno come obiettivo primario l'aumento della capacità autodepurativa dei corsi d'acqua del Bacino Scolante, in modo da contribuire alla riduzione dell'inquinamento veicolato dalla rete idrografica scolante in Laguna. Vale, infatti, il principio secondo il quale quanto più a lungo l'acqua inquinata risiede in un sistema naturale biologicamente attivo, tanto più i processi naturali di assimilazione dei nutrienti e di abbattimento dei microinquinanti possono agire e favorire la depurazione di quell'acqua.

Settore Agricoltura e Zootecnia

Le azioni nel settore agricolo e zootecnico rispondono all'esigenza di ridurre l'apporto di macronutrienti (azoto e fosforo) nella Laguna di Venezia, attraverso il miglioramento della qualità delle acque superficiali che scolano nel sistema idrografico che sfocia in Laguna.

Tipici del settore sono i carichi diffusi, cioè quelli presenti nelle acque di pioggia, o di irrigazione, drenate dal territorio, che scolano dalle superfici coltivate verso i corsi d'acqua portando con sé parte delle sostanze nutrienti fornite alle colture con i fertilizzanti chimici, con le deiezioni animali (liquami), con la letamazione e sostanze microinquinanti contenute nei fitofarmaci

I carichi di sostanze nutrienti provenienti dal settore agricolo e zootecnico dipendono soprattutto da alcune componenti, come la tipologia delle colture, i metodi di irrigazione, il tipo di fertilizzazione, le pratiche agricole adottate, il rapporto tra carico di bestiame e dimensione dei fondi, e le modalità di spargimento dei liquami zootecnici sui terreni. Le attività di questo settore si articolano in cinque sottosettori:

- Incentivi all'agricoltura compatibile nell'area del Bacino Scolante
- Realizzazione di fasce tampone e messa a riposo colturale con finalità ambientali nel Bacino Scolante
- Gestione delle pratiche irrigue: razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica nel Bacino Scolante
- Gestione dei reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia a tutela dell'ambiente nel Bacino Scolante
- Gestione delle pratiche agricole: incentivazione all'innovazione ambientale eco compatibile in agricoltura nel Bacino Scolante

Settore Bonifica siti inquinati.

Le azioni finanziano interventi all'interno del territorio del Bacino Scolante volti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni

delle sostanze inquinanti nel suolo a causa della presenza di siti inquinati, ex-discariche, depositi abusivi. La destinazione dei fondi si specifica in due distinti settori territoriali: il primo è specifico per l'area industriale inquinata di Porto Marghera, il secondo sono le aree inquinate nel territorio del Bacino Scolante.

Settore Monitoraggio e Sperimentazione.

Il sistema di monitoraggio costituisce lo strumento di verifica del raggiungimento degli obiettivi generali di risanamento e di riequilibrio del sistema Bacino Scolante - Laguna – Mare. E' quindi essenziale che la rete di monitoraggio fornisca dati, sia qualitativi sia quantitativi, sulle acque superficiali in modo tale da permettere una corretta valutazione dei carichi di inquinanti. La Regione Veneto è sempre attenta alle evoluzioni tecnologiche nel settore del disinquinamento e nelle sue azioni continua a finanziare studi, approfondimenti e sperimentazioni nell'ambito della riduzione dell'apporto di nutrienti e sedimenti in Laguna.

Queste attività si esplicano essenzialmente tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), e sono particolarmente concentrate nelle attività di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali nei seguenti settori:

- monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici del bacino scolante;
- monitoraggio qualità dell'aria e gestione del rischio industriale;
- monitoraggio e previsione meteorologica;
- realizzazione della carta dei suoli;
- studi e servizi nel settore agro-zootecnico ed agro-meteorologico;
- sviluppo del sistema informativo ambientale.

Ospedali

I finanziamenti assegnati a questo settore riguardano interventi di risanamento igienico sanitario presso l'ospedale S. Giovanni e Paolo di Venezia, secondo quanto stabilito dalla legislazione speciale per Venezia.

INTERVENTI SPECIALI

1) Progetto Integrato Fusina e Progetto Integrato Campalto.

Il territorio della terraferma veneziana non è individuabile come un'unica unità idrografica con caratteristiche univoche ma come un insieme di singoli bacini con regime idraulico, allo stato attuale, indipendente l'uno dall'altro. Motivo principale di tale disomogeneità è la giacitura dei terreni, tale da imporre un regime di scolo meccanico continuo a buona parte del territorio in oggetto.

In generale la terraferma è suddivisibile in due distinti ambiti, quello di Fusina e quello di Campalto, a seconda dei recapiti (impianti di depurazione) cui sono convogliati i reflui di ciascun bacino.

1.A) Progetto Integrato Fusina

In tale contesto territoriale si inserisce il Progetto Integrato Fusina (PIF), realizzato dalla Regione Veneto in regime di Project Financing. L'importo dell'intervento ammonta a circa 200 milioni di euro, IVA esclusa. Di questi 92,8 milioni di euro sono messi a disposizione dalla Regione Veneto; la quota rimanente è a carico di capitali privati.

Il Progetto nasce dall'idea di coordinare gli interventi per la depurazione spinta dei reflui e di rigenerazione delle acque usate mediante la trasformazione dell'attuale impianto di depurazione in centro di trattamento polifunzionale per gli scarichi civili, le acque di pioggia di Mestre, Marghera e del Mirese, il post-trattamento degli scarichi industriali di Porto Marghera, la depurazione delle acque di falda e per la produzione di acque per il riuso industriale.

Il progetto si pone come raccordo tra le pianificazioni regionali costituite dal Piano Direttore 2000, dal Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera, dal Modello strutturale degli acquedotti – Schema del Veneto Centrale e dalle attività del Magistrato alle Acque di Venezia (MAV) consistenti nel ripristino morfologico della laguna e nell'estromissione del traffico petrolifero.

In particolare, il PIF prevede il riutilizzo nell'area industriale di Porto Marghera di quota parte dei reflui depurati. Ciò libererà risorse idriche di buona qualità del fiume Sile per un utilizzo più pregiato, a scopo potabile che saranno destinate in particolar modo alle aree più sfavorite del territorio regionale, quali sono quelle meridionali.

La creazione di un'area umida in Cassa di Colmata A permetterà, inoltre, l'utilizzo di tale volume per la collocazione dei fanghi lagunari scavati dal Magistrato alle Acque di Venezia nell'ambito degli interventi previsti dal Master Plan.

Contestualmente il materiale di buona qualità presente in Cassa A potrà essere utilizzato per gli interventi di ripristino morfologico attuati dal Magistrato alle Acque di Venezia, mentre per lo scarico finale a mare potranno essere utilizzate le condotte previste nel progetto per l'estromissione del traffico petrolifero dalla Laguna di Venezia, predisposto sempre dal MAV, qualora l'intervento venga realizzato.

Per quanto attiene l'iter amministrativo si allega di seguito una tabella esplicativa:

1 marzo 2000	Con il Provvedimento del Consiglio Regionale 01.03.2000, n. 24 viene approvato il "PIANO PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ED IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DEL BACINO IDROGRAFICO IMMEDIATAMENTE SVERSANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA – PIANO DIRETTORE 2000 –, che contiene le strategie e le linee-guida operative individuate dalla Regione per il disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo bacino idrografico scolante. Uno degli interventi principali individuati dal Piano Direttore 2000 è il "PROGETTO INTEGRATO FUSINA – P.I.F. –", secondo il quale l'impianto integrato di depurazione di Fusina costituisce il *"filtro*

	artificiale" nei riguardi della Laguna dello scarico puntuale più rilevante del bacino scolante nella Laguna di Venezia. Il PIF è conforme alle direttive del P.A.L.A.V. – approvato con il P.C.R. n. 70/1995 e con la D.C.R. n. 70/1999.
4 agosto 2000	Con la D.G.R. n. 2636/2000 viene aggiudicata la gara d'appalto per la redazione del progetto preliminare, già indetta con la D.G.R. 03.11.1999, n. 3881.
28 dicembre 2000	Presentazione del Progetto preliminare da parte dell'aggiudicatario alla Direzione Tutela Ambiente
16 febbraio 2001	Con D.G.R. n. 365/2001 viene adottato il progetto preliminare e viene avviata la proceduta di VIA.
2 aprile 2001	Domanda di VIA inoltrata dalla Direzione Tutela Ambiente
1° luglio 2002	Conclusa l'istruttoria tecnica la Commissione V.I.A. esprime parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni - Parere 01.07.2002, n. 30 –.
26 novembre 2002	Espressione dei Pareri positivi con prescrizioni delle Commissioni consiliari regionali "Settima" e "Per Venezia".
14 febbraio 2003	Con D.G.R. n. 386/2003 la Giunta regionale esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale – Parere VIA 01.07.2002, n. 30 – e viene conseguentemente adottato il progetto preliminare. Viene dato avvio alla progettazione definitiva, revocando le disposizioni relative alla progettazione esecutiva delle opere urgenti individuate nella precedente D.G.R. n. 365/2001.
31 dicembre 2003	La costituenda A.T.I. composta da Veneto Acque S.p.a (Capogruppo mandataria), Vesta s.p.a. e Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani presenta una proposta di *project financing* denominata "PROGETTO INTEGRATO FUSINA – progetto preliminare".
6 febbraio 2004	Con D.G.R. 06.02.2004, n. 282, viene approvato l'Avviso di selezione per l'avvio delle procedure di ricerca del soggetto promotore, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato con D.G.R. n. 386/2003. Con la medesima Deliberazione viene nominato il Responsabile Unico del Procedimento – RUP –.
22 aprile 2004	La Conferenza dei Servizi per gli Interventi a Porto Marghera, con la Deliberazione 22.04.2000, n. 1, approva il MASTERPLAN PER LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI DI PORTO MARGHERA che definisce il *Progetto Integrato Fusina quale impianto strategico di area al quale affidare il trattamento delle acque di drenaggio provenienti dai retromarginamenti, nonché delle acque di processo industriale e delle acque pluviali.*
3 giugno 2004	Termine per la presentazione di eventuali ulteriori proposte. Non perviene alcuna proposta concorrente.
18 giugno 2004	Con la D.G.R. 18.06.2004, n. 1906, viene nominata un'apposita Commissione per l'esame della documentazione presentata e per formulare le proposte per le successive determinazioni dell'Amministrazione regionale.

26 novembre 2004	La D.G.R. 26.11.2004, n. 3801, approva il Piano di caratterizzazione della Cassa di Colmata A – ex D.M. n. 471/1999 –.
29 dicembre 2004	La D.G.R. 29.12.2004, n. 4532 stabilisce l'acquisizione al patrimonio regionale della Cassa di Colmata A e delle aree all'interno dell'impianto di FUSINA destinate alla realizzazione del PIF.
29 dicembre 2004	Con la D.G.R. 29.12.2004, n. 4531, viene approvato l'Accordo di programma tra Regione e Magistrato alle Acque – "*Accordo di programma regolante le modalità di attuazione di alcuni interventi di salvaguardia ambientale della laguna da attuarsi a Porto Marghera e in aree lagunari vicine*" –.
7 febbraio 2005	Con Decreto n. 18 della Direzione Tutela Ambiente viene affidato l'incarico di caratterizzazione della Casa di Colmata A. Contestualmente si affidano gli incarichi per i rilievi topografici ed i frazionamenti della Cassa di Colmata A e dell'area VESTA di Fusina.
14 febbraio 2005	Il Promotore integra in via definitiva la proposta del 31.12.2003, prot. n. 21658, con nota 14.02.2005, n. 045/05.
17 marzo 2005	Con nota 17.03.2005, prot. n. 199334/40.08, il N.U.V.V. - ex art. 45, L.R. n. 27/2003 – trasmette al R.U.P. il Parere espresso nelle sedute dell11 e 15.03.2005, con esito positivo sulla convenienza del *project financing PIF* per la Pubblica Amministrazione e di sostenibilità economico-finanziaria.
18 marzo 2005	Con la D.G.R. 18.03.2005, n. 1134, sulla scorta dell'art. 37-ter della Legge Quadro sui LL.PP., n. 109/1994 e ss.mm.ii., vengono individuate le condizioni di pubblico interesse in relazione alla Proposta, e viene dato mandato al RUP di dar corso a tutte le attività necessarie per l'espletamento della gara di concessione dei lavori pubblici.
29 marzo 2005	Con il Decreto del Dirigente Servizio VIA, viene fatto proprio il Parere VIA espresso nella seduta 14.03.2005, che esclude dalla procedura VIA i lavori nella Cassa di Colmata A, e prende atto della Valutazione d'incidenza Ambientale di tali lavori in Cassa Colmata A.
21 aprile 2005	Il R.U.P. trasmette all'Unione Europea il Bando di gara "*Affidamento tramite contratto di concessione di cui agli artt. 19 e 37-quater della L. n. 109/1994 e ss.mm.ii. della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina*". Segue la pubblicazione sulla GUCE, GURI, BURV e su quattro quotidiani il 05.05.2005.
23 giugno 2005	Il RUP provvede a dare regolare Avviso di Avvio del procedimento in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, con pubblicazione agli Albi Pretori dei Comuni di Venezia e Mira e su due quotidiani locali.
11 maggio 2005	Con il Decreto del Dirigente della Direzione regionale Tutela dell'Ambiente 11.05.2005, n. 79, viene nominata la Commissione per le operazioni di preselezione della gara di cui al Bando 21.04.2005.
30 maggio 2005	Termine stabilito dal Bando 21.04.2005 per la presentazione delle domande di partecipazione alla licitazione privata.
31 maggio 2005	La Commissione per le operazioni di preselezione della gara, rilevato

	che la gara è andata deserta, redige l'apposito Verbale.
1° giugno 2005	Il RUP, in esito alla Licitazione Privata, attiva una procedura negoziale con il Promotore.
28 giugno 2005	La Giunta Regionale approva lo schema di "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina – ex art. 37-bis Legge n. 109/94" ed affida all'ATI Veneto Acque S.p.a. (Capogruppo mandataria), VESTA S.p.a. e Impresa Costruzioni Ing. E. mantovani S.p.a., la progettazione definitica ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione del Progetto Integrato Fusina.
6 luglio 2005	Firma del Contratto tra Regione e l'ATI. In pari data, la A.T.I. si trasforma in Società Consortile per Azioni, denominata S.I.F.A. (Sistema Integrato Fusina Ambiente);
04 ottobre 2005	In esito alla richiesta della S.I.F.A. di modifica della compagine sociale originaria, con la D.G.R. 04.10.2005, n. 2868 la Giunta Regionale accoglie la richiesta sulla scorta dell'art. 7 del Contratto Regione-S.I.F.A. scpa;
30 novembre 2005	Consegna alla Regione – Servizio Legge Speciale per Venezia – del Progetto Definitivo da parte della di S.I.FA. per l'approvazione da parte della Commissione VIA – art. 19-bis L.R. 10/1999.
12 dicembre 2005	VESTA Spa invia in Regione il Progetto Integrato Fusina-Progetto definitivo trattamenti primari.
Primi mesi 2006	*Si prevede che la C.T.R.A. esprima Parere favorevole al Progetto Integrato Fusina-Progetto definitivo, presentato dalla SIFA scpa, e sul Progetto Integrato Fusina-Progettodefinitivo Trattamenti primari, presentato da VESTA Spa.*

1.B) Progetto Integrato Campalto

L'ambito di Campalto è collocato nella parte nord orientale della terraferma; in esso si possono individuare due tipologie fognarie di bacini:

- bacini di tipo misto ovvero caratterizzati da rete fognaria unitaria generalmente facenti parte l'area mestrina, fortemente urbanizzata;
- bacini di tipo separato, caratterizzati dalla presenza di una fitta rete di canali di bonifica cui è affidato il compito di raccogliere e smaltire gli afflussi meteorici.

Della prima categoria fanno parte i bacini centrali di Via Torino, Mestre Centro, San Giuliano, Carpendo, Bissuola e Favaro; la seconda accomuna invece i bacini marginali degli abitanti di Campalto, Villaggio Laguna e Tessera.

Nell'ambito di Campalto confluiscono inoltre le acque reflue derivanti dall'immissione da Mogliano Veneto.

In questo contesto territoriale si inserisce il Progetto Integrato Campalto che si pone il duplice obiettivo di ridurre il carico di inquinanti originati dal bacino di Campalto e sversati

in Laguna di Venezia e di porre in condizioni di efficienza idraulica la rete di recapito dei deflussi meteorici incidenti nel bacino stesso.

I soggetti attuatori sono la società VESTA S.p.A. ed il Consorzio di Bonifica Dese-Sile, ciascuno per le rispettive parti di competenza.

Il Progetto Integrato Campalto (PIC) rientra nell'ambito di un'opera composta di tre parti:

1) collettore acque basse da Via Torino a Campalto (PIC1), per il quale di recente è stata approvata la procedura di VIA;
2) impianto di depurazione di Campalto che sarà potenziato da 130.000 a 160.000 abitanti equivalenti. Detto progetto è stato approvato ed è in corso di realizzazione (PIC2);
3) opere di finissaggio dei reflui tramite fitodepurazione al fine di raggiungere concentrazioni degli inquinanti in linea con i valori stabiliti dal D.M. 30 luglio 1999 (PIC3), per le quali il Comune di Venezia sta redigendo il progetto.

2) Modello Strutturale degli Acquedotti – Schema del Veneto Centrale

Nell'ambito degli interventi di programmazione merita particolare interesse anche il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, previsto dall'art. 14 della L.R. 5/1998, al fine di coordinare le azioni delle otto Autorità d'ambito istituite, e approvato dalla Giunta Regionale del Veneto nel 2000, che consiste nell'individuazione degli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche del Veneto, nonché delle fonti da salvaguardare per risorse idriche per uso potabile:

I principali obiettivi sono:

- fornitura di acqua di buona qualità alle aree oggi sfavorite del basso Veneto;
- ottimizzazione della gestione del servizio idrico integrato;
- salvaguardia delle risorse idropotabili;
- riduzione dei costi dell'acqua potabile conseguenti all'abbattimento degli sperperi di acqua e di risorse finanziarie di esercizio.

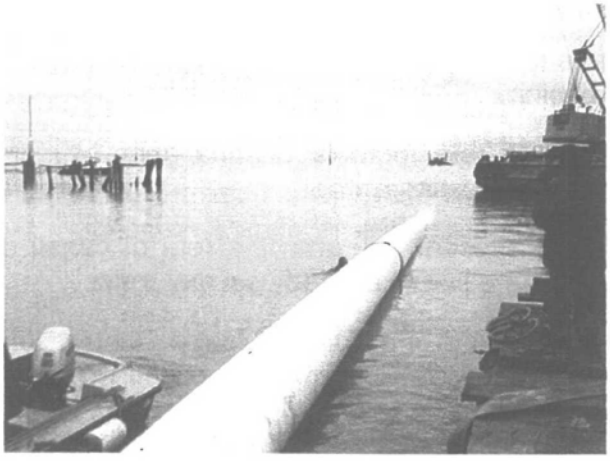

Le principali azioni sono:

- realizzazione di nuove linee di distribuzione;
- interconnessione di sistemi di produzione ad uso idropotabile del Veneto centrale e del basso Veneto;
- resa del sistema acquedottistico veneto di tipo reticolare, ad anello chiuso;
- gestione su base pluriennale delle risorse idriche, anche mediante monitoraggio.

Lo Schema del Veneto Centrale, in corso di esecuzione da parte del concessionario Veneto Acque S.p.A., è strettamente connesso al Progetto Integrato Fusina. Tra gli obiettivi del Progetto Integrato Fusina, infatti, c'è anche il riuso delle acque depurate per scopi non potabili all'interno dell'area di Porto Marghera. In questo modo si

potranno liberare risorse idriche di buona qualità del fiume Sile per un utilizzo più pregiato, a scopo potabile, che saranno destinate in particolar modo alle aree più sfavorite del territorio regionale, quali sono quelle del Basso Veneto.
Sarà, quindi, possibile garantire servizi acquedottistici migliori (caratterizzati da maggiori portate, elasticità e ridondanza della rete) nell'area compresa fra la bassa padovana ed il Polesine e una adeguata gestione del ciclo integrato delle acque con considerevoli vantaggi per la tutela ed il risparmio delle risorse ambientali.

La realizzazione dello Schema del Veneto Centrale è finanziata con i fondi della Legge Speciale per Venezia, che finora ha complessivamente destinato € 91.968.268,89.

3) Centro di biotrattamento di Camposampiero.

Il Centro di biotrattamento di Camposampiero, un'opera di competenza della società SE.T.A. S.p.A., rappresenta un importante progetto nel settore Fognatura e Depurazione.

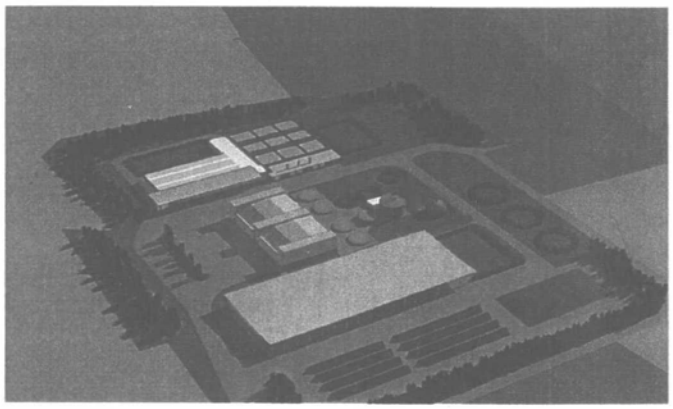

L'impianto prevede il trattamento integrato di quattro tipi di rifiuti: reflui urbani, liquami zootecnici, frazione organica della raccolta differenziata di rifiuti urbani e scarti vegetali. Dal loro trattamento vengono prodotti energia termica, acqua irrigua e per usi civili non potabili (irrigazione, servizi igienici,....), liquido fertilizzante e compost di qualità.

Il concetto ispiratore di questo impianto è l'integrazione della depurazione tradizionale con l'attività di recupero di materiali utili dai rifiuti organici, con il conseguente ottenimento di molteplici benefici tra i quali il migliore equilibrio economico della gestione dell'impianto (grazie ai ritorni derivanti dalla collocazione sul mercato dei materiali prodotti e dalla produzione di energia), la possibilità di sostituzione di parte dei concimi chimici azotati con l'ammendante agricolo prodotto dall'impianto, con conseguente minore inquinamento, e la possibilità di riutilizzo dell'acqua depurata in agricoltura ed in acquedotto duale a servizio di un'area artigianale contigua per usi industriali e per gli usi civili non potabili, meno esigenti dal punto di vista qualitativo.

Tale opera consiste in una serie di impianti strettamente interconnessi (depurazione biologica, codigestione anaerobica, cogenerazione, compostaggio aerobico) attraverso i quali è possibile la realizzazione di un unico centro che consente di valorizzare congiuntamente materiali di matrice diversa quali:

- le frazioni umide e verde dei rifiuti solidi rese disponibili dalla raccolta differenziata nei comuni del consorzio bacino Padova 1;
- i fanghi derivanti dalla depurazione biologica.

Il progetto del centro di Biotrattamento di Camposampiero è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 561 del 02.03.1999 ed è stato inaugurato il 24 marzo 2005.
Le opere successive di completamento prevedono il raddoppio del codigestore anaerobico e della capacità di trattamento dei liquami civili e dei liquami zootecnici.

4) Oasi di Cà di Mezzo.

Un altro progetto di rilevante importanza riguarda l'area di fitodepurazione di Cà di Mezzo di competenza del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione.
Tale area, situata nel Comune di Codevigo (PD) tra il fiume Bacchiglione e il Canal Morto, occupa una superficie di circa 30 ettari. L'area è un ecosistema palustre ed è stato completamente ricostruito su terreni a precedente uso agricolo e ritenuti scarsamente produttivi a seguito di una ridotta capacità di drenaggio.



Il progetto di ricostruzione di quest'area è stato impostato con una logica multi obiettivo; se da un lato la finalità principale è stata quella di migliorare la qualità dell'acqua, riducendo il carico dei nutrienti (azoto e fosforo) scaricati in laguna di Venezia, dall'altro si è posta l'attenzione anche al conseguimento di altri obiettivi quali la laminazione di picchi di piena con conseguente aumento della sicurezza idraulica del territorio, la ricarica di falda, la disponibilità di acqua da utilizzare nel periodo irriguo e l'aumento del valore naturalistico dell'area e della sua valenza sociale (usi paesaggistici, ricreativi, didattici).

STATO DELLA SPESA

I fondi messi a disposizione dalla Legge Speciale per Venezia sommano complessivamente a 1.762,5 Milioni di EURO di cui :

- impegnati con progetti approvati, per circa 1.103,47 Milioni di EURO pari a circa il 62,61% delle somme finanziate;
- erogati (spesi) per circa a 787,51 Milioni di EURO corrispondenti a circa il 44,68% delle somme finanziate.

La suddivisione dei finanziamenti per i settori di intervento è riportata nella tabella che segue:

SETTORI	Fondi Finanziati	Fondi Impegnati	Fondi Erogati
Fognatura e depurazione	1.127,16 MLN €	738,34 MLN €	572,22 MLN €
Territorio	262,55 MLN €	106,64 MLN €	62,30 MLN €
Agricoltura e zootecnia	150,23 MLN €	97,10 MLN €	47,45 MLN €
Bonifica siti inquinati	52,92 MLN €	25,62 MLN €	12,82 MLN €
Acquedotti	107,23 MLN €	82,27 MLN €	46,53 MLN €
Monitoraggio e Sperimentazione	42,09 MLN €	36,17 MLN €	28,90 MLN €
Ospedali	20,30 MLN €	17,30 MLN €	17,26 MLN €
TOTALE	**1.762,5 MLN €**	**1.103,47 MLN €**	**787,51 MLN €**

Il totale degli interventi a cui è stato concesso il finanziamento alla data del 31.12.2005 è pari a 929. Nella tabella che segue tale numero di interventi viene suddiviso a secondo del settore di appartenenza.

SETTORI	Numero Interventi
Fognatura e depurazione	669
Territorio Acquedotti	21
Territorio	136
Agricoltura e zootecnia	23 (1)
Bonifica siti inquinati	44
Monitoraggio e Sperimentazione	31
Ospedali	5
TOTALE	**929**

A tale proposito si sottolinea che il Consiglio Regionale ha già individuato interventi urgenti da finanziare per complessivi 1784,32 milioni di euro con un'eccedenza di 21,8 milioni di euro rispetto alla somma a tutt'oggi finanziata.

(1) Sotto questa voce sono compresi i finanziamenti attribuiti ai 5 settori che costituiscono il comparto Agricoltura e Zootecnia:

1. Incentivi all'agricoltura compatibile nell'area del Bacino Scolante
2. Realizzazione di fasce tampone e messa a riposo colturale con finalità ambientali nel Bacino Scolante
3. Gestione delle pratiche irrigue: razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica nel Bacino Scolante
4. Gestione dei reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia a tutela dell'ambiente nel Bacino Scolante
5. Gestione delle pratiche agricole: incentivazione all'innovazione ambientale ecocompatibile in agricoltura nel Bacino Scolante

Con successivi provvedimenti vengono finanziati i singoli interventi alle Aziende Agricole e ai Consorzi di Bonifica.

Si riporta, nel seguito e suddivisa per legge, la situazione degli interventi finanziati con i fondi della Legge Speciale per Venezia, aggiornata al 31 dicembre 2005.

Legge 798/84 - esercizi 1984-85-86 (€ 41.316.551,93, pari a 58 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 41.316.551,93	€ 36.049.897,79	*87,3%*	€ 31.401.784,07	*76,0%*

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 33 interventi relativi principalmente ad opere del settore Fognatura e Depurazione. I finanziamenti ammontano a € 41.316.551,93 e alla data del 31.12.2005 risultano impegnati per l'87,3% ed erogati per il 76,0%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	27	20
Acquedotti	3	1
Territorio	2	2
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali	1	
TOTALE	33	23

La maggior parte delle opere risultano ultimate e collaudate. Si rilevano alcuni interventi la cui situazione rimane invariata rispetto all'anno scorso.

In particolare, sono tuttora in corso i lavori per la realizzazione del progetto relativo *all'estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera comunale* presentato dal Comune di Mogliano Veneto che ammontano a € 2.582.284,50 e sono finanziati da questa legge limitatamente ad € 516.456,90. E' importante sottolineare che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1075 del 2004 è stato approvato il cambio del soggetto attuatore, divenuto l'azienda Servizi Pubblici Integrati Mogliano, S.P.I.M. S.p.A.

Anche i lavori per il *"Progetto definitivo della nuova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud"* sono tuttora in corso. I ritardi sono dovuti alla revisione del progetto originario le cui modifiche sono state approvate con il decreto della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 147 del 29 marzo 2001.

Per quanto riguarda la fognatura di Pellestrina il Comune di Venezia ha presentato un progetto che definisce lo schema fognario dell'isola: tale progetto è stato approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 26 del 19 marzo 1999 e le opere sono in fase di collaudo. Questo progetto beneficia anche di fondi provenienti dalle leggi di finanziamento 67/88 Es. 1991 e 910/86 Es. 1987 – 1988.

Infine, si ribadisce che i fondi del progetto relativi alla costruzione della *"vasca di prima pioggia e laminazione in località Gazzera Mestre (VE)"* sono stati revocati per la quota non ancora erogata (pari a € 444.697,73) e accantonati a favore della Diocesi Patriarcato di Venezia per finanziare interventi di risanamento igienico sanitario relativi ai *"lavori di restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute "* con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3521 del 12 novembre 2004.

Legge 910/86 - esercizio 87-88 (€ 51.645.689,91, pari a 100 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 51.645.689,92	€ 47.449.802,10	*91,9%*	€ 45.367.428,62	*87,8%*

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 42 interventi relativi principalmente ad opere del settore Fognatura e Depurazione.

I finanziamenti ammontano a € 51.645.689,92 e alla data del 31.12.2005 risultano impegnati per il 91,9% ed erogati per l' 88,5%.

	Int..	Collaudi
Fognatura e Depurazione	39	28
Acquedotti	1	
Territorio		
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	1	
Ospedali	1	
TOTALE	42	28

I lavori finanziati con i fondi della legge 910/86 esercizi 1987-88, sono stati per la maggior parte progettati ed eseguiti direttamente dalla Regione Veneto , con il supporto tecnico del Consorzio Venezia Disinquinamento. I lavori sono tutti conclusi e già collaudati.

Le economie di spesa degli interventi finanziati con questa legge i cui lavori, ultimati e collaudati, hanno determinato una spesa inferiore rispetto a quanto impegnato, saranno utilizzate per finanziare altre opere. Tra queste rientrano i *"lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave"*, per un importo complessivo pari a € 45.900,53. La quota finanziata con le economie di questa legge è pari a € 26.788,59. La quota rimanente, pari a € 19.111,94, è finanziata con le economie della Legge 67/88 – Esercizio 1990. Rispetto al 2004 la situazione rimane invariata, dato che il progetto è stato approvato e l'impegno di spesa è stato assunto con Decreto Regionale del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 214 del 17 novembre 2004, ma i lavori non sono ancora iniziati.

Rispetto alla situazione del 31.12.2004 sono stati collaudati ulteriori due interventi. In particolare i lavori per il *"Progetto definitivo della rete di fognatura in via Rusti, nel comune di Jesolo"* di cui è stata approvata la contabilità finale con il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 99 del 8 giugno 2005.

Legge 910/86 esercizio 1989 (€ 38.734.267,43, pari a 75 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 38.734.267,43	€ 37.757.647,44	*97,5%*	€ 25.877.521,86	*66,8%*

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 16 interventi relativi principalmente ad opere del settore Fognatura e Depurazione. I finanziamenti ammontano a € 38.734.267,43 e alla data del 31.12.2005 risultano impegnati per il 97,5% (percentuale invariata rispetto al 31.12.2004) ed erogati per il 66,8%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	12	3
Acquedotti	1	
Territorio	2	
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali	1	1
TOTALE	**16**	**4**

Si tratta di 12 progetti rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 1 del settore Acquedotti, 2 del settore Territorio ed 1 relativo ad interventi presso l'Ospedale di SS. Giovanni e Paolo di Venezia. Gli interventi collaudati sono tre, mentre quelli per i quali i lavori sono conclusi e il collaudo è in corso sono otto.

In relazione all'intervento relativo al *Dipartimento d'urgenza dell'Ospedale di SS. Giovanni e Paolo di Venezia – 2° stralcio*, la quota di cofinanziamento a carico della Regione del Veneto ammonta a € 2.582.284,50. I lavori risultano collaudati.

Per quanto riguarda i *"Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera"* nel comune di Mogliano Veneto, la presente legge finanzia le opere per € 1.549.370,70. Lo stesso progetto riceve finanziamenti anche dalla legge 798/84 ES. 1984 – 1985 –1986 e dalla legge 515/96 Es. 1998 - IV fase, per un importo complessivo pari a € 2.582.284,50. I lavori sono tuttora in corso.

Per quanto riguarda l'intervento relativo alla *"nuova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud"* la situazione riamne invariata rispetto al 2004: la società VE.S.T.A. S.p.A., incaricata della realizzazione dell'opera ha realizzato un nuovo progetto che è stato approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 147 del 29 marzo 2001.

Infine, gli interventi relativi al settore Territorio sono due. In particolare per quanto concerne gli *"interventi di difesa dell'isola di S. Erasmo dalle acque alte"*, il Magistrato alle Acque di Venezia (MAV) ha presentato il progetto definitivo, per il quale è stato assunto l'impegno di spesa, con Decreto Regionale del Dirigente della Tutela Ambiente n. 99 del 30 ottobre 2000.

Legge 67/88 esercizio 1988 (€ 18.334.219,92, pari a 35,5 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 18.334.219,92	€ 11.851.990,41	*64,6 %*	€ 5.003.771,93	*27,3 %*

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 7 interventi e ammontano a € 18.334.219,92 e alla data del 31.12.2005 risultano impegnati per il 64,6 % ed erogati per il 27,3 %.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	3	1
Acquedotti	4	1
Territorio		
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	**7**	**2**

Del totale degli interventi 4 sono concentrati nel settore degli Acquedotti e 3 nel Settore della Fognatura e Depurazione.

Per quanto riguarda gli interventi nel settore Acquedotti, l'unico i cui lavori sono tuttora in corso riguarda le opere connesse alla *"Realizzazione della condotta Cavarzere – Chioggia"* nell'ambito del Sistema degli acquedotti del Basso Veneto

I tre interventi del settore Fognatura e Depurazione sono inerenti ad opere effettuate presso gli impianti di depurazione di Fusina e Campalto.

In merito all'impianto di depurazione di Fusina, si rimanda all'approfondimento nella sezione introduttiva dedicata alle opere speciali. E' però opportuno precisare che i finanziamenti di questa legge sono assegnati al Comune di Venezia per opere presso l'attuale depuratore di Fusina, che si differenzia dal Progetto Integrato Fusina in capo alla Regione Veneto.

Per quanto riguarda l'intervento relativo ad *"opere accessorie all'impianto di Campalto"* di competenza del Comune di Venezia, i lavori sono ultimati e collaudati.

Legge 67/88 esercizio 1990 (€ 53.969.745,95, pari a 104,5 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 53.969.745,96	€ 51.858.089,74	*96,1%*	€ 35.469.284,40	*65,7%*

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 29 interventi, di cui 26 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 1 appartenente al settore Territorio e 2 al Monitoraggio e Sperimentazione. I finanziamenti ammontano a € 53.969.745,96 e alla data del 31.12.2005 risultano impegnati per il 96,1 % ed erogati per il 65,7%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	26	12
Acquedotti		
Territorio	1	
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	2	
Ospedali		
TOTALE	**29**	**12**

Di questi interventi, 12 risultano collaudati e 12 ultimati o in avanzata fase di esecuzione. Si descrive ora la situazione degli altri 3 interventi che invece non sono ancora avviati.

1) *"Interventi di risanamento igienico sanitario relativi al restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute":* l'intervento è stato finanziato parzialmente con i fondi della legge 798/84, come evidenziato in precedenza, e parte con i fondi di questa legge (L. 67/88 Es. 1990) originariamente

destinati al Comune di Chioggia/ASP e riassegnati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3521 del 12 novembre 2004.

2) "*Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave*", per un importo complessivo pari a € 45.900,53. I finanziamenti per quest'opera derivano dall'impegno delle economie di spesa degli interventi finanziati i cui lavori, ultimati e collaudati, hanno determinato una spesa inferiore rispetto a quanto impegnato. Tali economie fanno riferimento sia a questa legge (67/88 Es. 1990) sia alla legge 910/86 - esercizio 87-88. Si ribadisce che alla data del 31.12.2005 il progetto è stato approvato e l'impegno di spesa è stato assunto con Decreto Regionale del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 214 del 17 novembre 2004 per un importo pari a € 19.111,94 relativo a questa legge di finanziamento

3) *"Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo - Bissuola (VE)":* per quest'opera la Giunta Regionale ha recepito e fatto proprio, con Deliberazione n. 719 del 19/03/2004, il giudizio di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione Valutazione di Impatto Ambientale. Questo intervento fa parte del Progetto Integrato Campalto.

Il Progetto Integrato Campalto (PIC) risulta sostanzialmente composto di tre parti:

1) collettore acque basse da Via Torino a Campalto (PIC1), per il quale di recente è stata approvata la procedura di VIA;
2) impianto di depurazione di Campalto che sarà potenziato da 130.000 a 160.000 abitanti equivalenti. Detto progetto è stato approvato ed è in corso di realizzazione (PIC2);
3) opere di finissaggio dei reflui tramite fitodepurazione al fine di raggiungere concentrazioni degli inquinanti in linea con i valori stabiliti dal D.M. 30 luglio 1999 (PIC3).

4) Nell'ambito del Progetto Integrato Campalto rientrano inoltre le opere relative al *"Risanamento e rinaturalizzazione del II° tronco del canale Acque Basse"* e con DGR 3772/2005 viene individuata la società Vesta S.p.A. come soggetto attuatore. L'opera si inserisce nell'ambito di una una radicale riprogettazione di tutta la fase terminale delle fognature afferenti all'impianto di Campalto e finalizzata al controllo dell'inquinamento diffuso urbano che il Comune di Venezia in accordo con il Consorzio di Bonifica Dese Sile di Mestre (VE) sta effettuando. I lavori sono attualmente in corso.

Legge 67/88 esercizio 1991 (€ 15.803.581,11, pari a 30,6 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 15.803.581,11	€ 15.803.581,11	*100%*	€ 15.373.362,35	*97,3%*

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 8 interventi, di cui 7 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione e 1 appartenente al settore Monitoraggio e Sperimentazione. I finanziamenti ammontano a € 15.803.581,16 e alla data del 31.12.2005 risultano totalmente impegnati ed erogati per il 97,3%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	7	2
Acquedotti		
Territorio		
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	1	
Ospedali		
TOTALE	**8**	**2**

Gli interventi rientranti nel settore Fognatura e Depurazione risultano ultimati e/o collaudati. In particolare *"l'impianto di trattamento R.S.U. di Venezia"* risulta terminato. Questo progetto è stato cofinanziato con i fondi della Legge Speciale per Venezia e con i fondi F.I.O.
Rimane un intervento in questo settore i cui lavori sono tuttora in corso: si tratta dell'*impianto di biotrattamento di Camposampiero.* Questo progetto riceve ulteriori finanziamenti anche da altre leggi (legge 139/92 - I^ fase per € 4.338.237,95, legge 539/95 - 3^ fase per € 11.878.508,68 e legge 515/96 - 4^ fase per € 5.375.864,61, per un totale complessivo di € 24.174.895,74), e per la conclusione dei lavori è stato fissato, con Decreto Regionale del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 173 del 2003, il nuovo termine di fine lavori al 19/11/2008. Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla parte introduttiva relativa alle opere speciali.

L'unico intervento rientrante nel settore Monitoraggio e Sperimentazione è il *sistema informativo regionale – progetto SINA*, che è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2558 del 27 luglio 1999. L'intervento è finanziato con fondi a valere su questa legge e sulla legge 139/92 Es. 1993. I lavori, condotti dall'A.R.P.A.V. sono ultimati.

Legge 67/88 esercizio 1992 1^ tranche (€ 15.338.769,90 pari a 29,7 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 15.338.769,90	€ 11.819.744,67	*77,1%*	€ 8.969.201,53	*58,5%*

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 13 interventi, di cui 12 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione e 1 appartenente al settore Territorio. I finanziamenti ammontano a € 15.338.769,90 e alla data del 31.12.2005 risultano impegnati per il 77,1% ed erogati per il 58,5%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	12	4
Acquedotti		
Territorio	1	1
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	**13**	**5**

Degli interventi di fognatura e Depurazione 5 risultano con lavori in corso e riguardano la *"realizzazione di vasche di raccolta di prima pioggia e il completamento delle fognature nei comuni di Strà, Campagna Lupia, Fiesso D'Artico, Mirano e Spinea"*, tutte per conto dell'Azienda Consorzio del Mirese A.C.M. S.p.A.

I lavori per il "*rifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana*" del comune di Venezia sono invece ultimati.

L'unico intervento appartenente al settore Territorio riguarda il *"II° stralcio dell' impianto idrovoro a servizio del Canale Scolmatore del fiume Marzenego"*. I lavori, eseguiti da parte

del Consorzio di Bonifica Dese Sile, risultano collaudati e il Decreto Regionale del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 27 del 31 marzo 1999 ne approva la contabilità finale.

Legge 67/88 esercizio 1992 2^ tranche (€ 30.987.413,94 pari a 60 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 30.987.413,94	€ 14.782.680,23	*47,7%*	€ 10.781.020,12	*34,8%*

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 10 interventi, di cui 7 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione e 3 appartenenti al settore Territorio. I finanziamenti ammontano a € 30.987.413,94 e alla data del 31.12.2005 risultano impegnati per il 47,7% ed erogati per il 34,8%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	7	2
Acquedotti		
Territorio	3	1
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	10	3

Dei 7 interventi rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 2 sono collaudati mentre 3 risultano con lavori in corso. In particolare, 2 di questi sono gestiti dall'Azienda Centro Veneto Servizi. Il primo riguarda *"interventi di fognatura nei comuni di Candiana, Conselve, Monselice, Pozzonovo, Solesino, Tribano"* e per il quale il Decreto Regionale del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 183 del 2005 stabilisce come termine fine lavori il 18/10/2007. La stessa valutazione vale per gli *"Interventi di fognatura per impianti di depurazione minori"* per i quali, cioè, il Decreto Regionale del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 182 del 2005 stabilisce come termine fine lavori il 12/12/2007. Si rileva, inoltre, che gli *"interventi di fognatura per impianti di depurazione minori"* hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Ambiente n. 3178 del 04 dicembre 2003, in merito alla proroga per l'adeguamento degli scarichi ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 luglio 1999.

I 2 interventi del settore Fognatura e Depurazione che risultano ancora in progettazione fanno parte del Progetto Integrato Fusina, per le cui caratteristiche si rimanda a quanto descritto in premessa.

Degli interventi appartenenti al settore Territorio, i lavori per il "*potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta*" realizzati dal consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta risultano ultimati e il collaudo in corso, mentre i lavori di *"sistemazione del Fiume Marzenego - Ramo Beccherie"* realizzati dal Consorzio di Bonifica Dese Sile sono stati collaudati e con Decreto Regionale del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 132 del 25 novembre 2002 ne è stata approvata la contabilità finale.

Legge 360/91 (€ 8.263.310,39, pari a 16 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 8.263.310,39	€ 4.620.080,26	*55,9%*	€ 3.803.309,92	*46,0%*

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 7 interventi, di cui 1 rientrante nel settore Fognatura e Depurazione, 1 appartenente al settore Territorio, 3 relativi all'Agricoltura e Zootecnia e 2 relativi alla Bonifica dei Siti Inquinati. I finanziamenti ammontano a € 8.263.310,39 e alla data del 31.12.2005 risultano impegnati per il 55,9% ed erogati per il 46,0%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	1	
Acquedotti		
Territorio	1	
Agricoltura e Zootecnia	3	1
Bonifica siti inquinati	2	
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	7	1

L'unico intervento del settore Fognatura e Depurazione, i cui lavori risultano ultimati, è *"l'impianto di trattamento R.S.U. di Venezia"*. Questo progetto, come già sottolineato in precedenza, è stato cofinanziato con i fondi della Legge Speciale per Venezia e con i fondi F.I.O.

L'intervento rientrante nel settore Territorio, *"ricalibrazione e sostegno nei sottobacini del Marzenego"*, di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile, è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e il Decreto regionale del Dirigente della Direzione Ambiente n. 133 del 13 luglio 2004 ha fatto proprio il parere della competente commissione.

Per quanto attiene il progetto relativo al recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano in Venezia e la creazione del cosiddetto *"Bosco di Mestre"*, i lavori risultano ultimati relativamente al 1° stralcio. il Comune di Venezia ha predisposto il progetto per quanto attiene il 2° stralcio.

I due interventi rientranti nel settore Bonifica Siti Inquinati, riguardanti il *"Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bonifica discarica di S. Giuliano (VE) - I lotto "B1"* e la *"bonifica in viale S. Marco"* entrambi in comune di Venezia, sono tuttora in fase di progettazione.

Legge 139/92 - esercizio 1993 – I^ fase (€ 180.759.914,68, pari a 350 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 180.759.914,68	€ 178.483.372,67	*98,7%*	€ 151.320.127,07	*83,7%*

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 67 interventi, di cui 62 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 3 appartenenti al settore Territorio e 2 relativi al Monitoraggio e Sperimentazione. I finanziamenti ammontano a € 180.759.914,68 e alla data del 31.12.2005 risultano impegnati per il 98,7% ed erogati per l' 83,7%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	62	37
Acquedotti		
Territorio	3	3
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	2	
Ospedali		
TOTALE	**67**	**40**

Dei 62 interventi del settore Fognatura e Depurazione, 37 risultano essere collaudati e 12 sono ormai conclusi.

Tra gli interventi tuttora in fase di progettazione, rientrano gli *"interventi di risanamento igienico sanitario relativi al restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute"* della Diocesi Patriarcato di Venezia. In particolare per questo intervento, è importante ribadire quanto espresso in precedenza: infatti, tale opera è finanziata parzialmente con la riallocazione di fondi delle leggi 798/84, 67/88 – Esercizio 1990 e di questa legge, che revoca fondi originariamente destinati al Comune di Venezia. Tali revoche e riassegnazioni dei fondi sono state effettuate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3521 del 12 novembre 2004.

Tra i lavori tuttora in corso rientrano quelli relativi al *"Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto"*: originariamente il soggetto attuatore di tale progetto era il Comune di Venezia, ma la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 3772 del 2005, ha individuato nella società Vesta il nuovo interlocutore per il proseguimento dei lavori.

Inoltre, il *"progetto definitivo relativo agli interventi diffusi di ristrutturazione della fognatura nera e bianca del Lido di Venezia. Bacino 16 e 20 - IX° lotto"* redatto dal Comune di Venezia, è stato approvato con Decreto Regionale del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 115 del 23/06/2004.

Una nota particolare va riservata ai lavori per la realizzazione del Centro di Biotrattamenti di Camposampiero ad opera dell'azienda Servizi Territorio Ambiente, SE.T.A. S.p.A. Questo intervento beneficia di finanziamenti dalle Leggi n. 67/88 (per € 2.582.284,50), 139/92 - I^ fase (per € 4.338.237,95), 539/95 - 3^ fase (per € 11.878.508,68) e 515/96 - 4^ fase (per € 5.375.864,61) per un totale complessivo di € 24.174.895,74.

I lavori di realizzazione di tale opera hanno subito un rallentamento dovuto ad un ricorso presentato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale in relazione alla graduatoria finale di aggiudicazione dell'opera, presentato dalla seconda ditta classificata. La sentenza favorevole per la stazione appaltante, porta la data del 23 maggio 2002 ed è stata depositata il 15 gennaio 2003. A tutt'oggi i lavori sono in fase di esecuzione e la nuova conclusione dei lavori è stata fissata, con Decreto Regionale del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 173 del 2003, per il 19/11/2008.

I 3 interventi rientranti nel settore Territorio sono stati tutti collaudati e riguardano le *"sistemazioni idraulico-ambientali area Brenta-Bacchiglione (foce lagunare di Lova)"* del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta e *"l'intervento di diversione idraulica dalla laguna - incremento invasi - monitoraggio e telecontrollo"* e l' *"area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica"* del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione.

Infine vi sono due interventi relativi al settore Monitoraggio e Sperimentazione. Il primo riguarda l' *"estensione della rete agrometeorologica"* di A.R.P.A.V. per il quale i lavori risultano ultimati. Il secondo è inerente ad *"interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua"*, sempre dell' A.R.P.A.V., e rientra nel progetto SINA. L'intervento è finanziato con fondi a valere su questa legge e sulla legge 67/88 Es. 1991 e i lavori sono stati ultimati.

Legge 139/92 - II^ fase (€ 165.266.207,71, pari a 320 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 165.266.207,64	€ 106.373.035,53	*64,4%*	€ 84.955.447,62	*51,4%*

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 49 interventi, di cui 18 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 22 appartenenti al settore Territorio, 4 relativi al settore Agricoltura e Zootecnia e 5 relativi al Monitoraggio e Sperimentazione. I finanziamenti ammontano a € 165.266.207,64 e alla data del 31.12.2005 risultano impegnati per il 64,4% ed erogati per il 51,4%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	18	7
Acquedotti		
Territorio	22	6
Agricoltura e Zootecnia	4	
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	5	
Ospedali		
TOTALE	49	13

Dei 18 interventi del settore Fognatura e Depurazione, per 8 la progettazione è tuttora in corso: di questi 7 riguardano opere di competenza del Comune di Venezia, di cui 4 relative ad opere rientranti nell'ambito del Progetto Integrato Campalto.
L'unico finanziamento intestato alla Regione Veneto riguarda il Progetto Integrato Fusina, ammonta a € 12.181.000,00 e per il quale si rimanda a quanto descritto nella parte introduttiva alla presente relazione.

Una nota particolare merita il finanziamento riservato al *Progetto Integrato RII* di Venezia, pari a € 16.526.620,77. Tale quota è stata completamente esaurita.

Tra gli interventi rientranti nel settore Territorio la cui progettazione è in corso sono da annoverare 2 di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile che riguardano la *"costruzione del I tronco del collettore Acque Basse"* e il *"Risanamento e rinaturalizzazione del secondo tronco del canale Acque Basse"*: per questi due interventi la Commissione Regionale VIA ha esaminato il progetto in data 1/12/2003 e il giudizio di compatibilità ambientale è stato recepito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 719 del 19/03/2004. Inoltre la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3772 del 2005 ha stabilito di individuare come soggetto attuatore dell'intervento la Società Ve.S.T.A. S.p.A.

Inoltre tra gli interventi i cui lavori sono in corso si ricordano gli *"interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Fiumicello (idrovora Cambroso)"* che si stanno per concludere, e i lavori per gli *"interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo"* che risultano in avanzata fase di esecuzione: entrambi i progetti fanno capo al Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta.

Sempre tra gli interventi ricadenti nel settore Territorio e i cui lavori sono in avanzata fase di attuazione, si ricordano, tra gli altri, gli *"interventi di ristrutturazione della rete di bonifica dell'area centrale del medio corso dei fiumi Dese e Zero nei comuni di Scorzè, Zero Branco, Trebaseleghe, Piombino Dese e Mogliano Veneto e tributaria corsi d'acqua consortili Pioveva di Cappella, Scolo Dosolino, Rio S.Ambrogio e Piovega di Levada"* e i lavori per la realizzazione del *"sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia. Interventi strutturali in reti di bonifica. Estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino scolanteImpianto per n. 24 stazioni."*

Per quanto riguarda le opere di *"riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia"* ad opera del Comune di Noale, con Decreto Regionale del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 28 del 15 maggio 2000, è stato deliberato il non assoggettamento a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con prescrizioni di questo intervento. In particolare per la sua realizzazione si rileva l'importante collaborazione maturata tra l'amministrazione comunale e il Consorzio di Bonifica Dese Sile, sia in fase di progettazione che di conduzione dei lavori.

Nel settore Agricoltura e Zootecnia, con DGR n. 2876 del 28 luglio 1998, la Giunta Regionale ha avviato tutte le attività connesse con l'erogazione di contributi a soggetti privati operanti nell'agricoltura e nella zootecnia per la realizzazione di interventi volti a ridurre il rilascio di sostanze eutrofizzanti nei corsi d'acqua sfocianti nella laguna di Venezia; l'istruttoria per l'erogazione dei finanziamenti si è conclusa già da tempo, per alcuni interventi i lavori sono in corso di esecuzione, per altri sono già terminati e collaudati.

Verificato che nel settore zootecnico molti progetti non risultano realizzati, il Consiglio Regionale, con DCR n. 103/2002 ha provveduto a riallocare € 15.493.706,97, pari a 30 miliardi di lire, originariamente destinati per la gestione delle pratiche agricole nel Bacino Scolante, produzione di energia rinnovabile da culture a minor rilascio di nutrienti. Detti fondi sono stati definitivamente assegnati, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2834 del 10 settembre 2004, a Veneto Agricoltura, per € 3.300.000,00, e con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 4 maggio 2004 per € 12.181.000,00 a numerosi altri interventi.

Gli interventi del settore Monitoraggio e Sperimentazione sono tutti in corso di realizzazione, mentre per quanto riguarda *"il potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto"* i lavori risultano ultimati.

Maggiori e più favorevoli mutui dalla Legge 139/92– II^ fase (€ 40.349.825,52, pari a circa 78,13 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 40.349.825,52	€ 13.231.334,22	*32,8%*	€ 4.026.419,70	*10,0%*

Il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 103 del 18 dicembre 2002 ha provveduto a ripartire la somma complessiva di € 40.385.977,50 in ragione delle più favorevoli condizioni rinegoziate dagli uffici regionali per l'assunzione del mutuo per il finanziamento degli interventi di cui alle leggi n. 139/1992 – II^ fase e n. 515/1996 – IV^ fase

In questa sezione si analizza lo stato della spesa della quota riferita ai maggiori e più favorevoli mutui dalla legge 139/92 – II^ fase (per la destinazione della quota di finanziamento riferita ai maggiori e più favorevoli mutui dalla legge 515/96 – IV^ fase si rimanda alla sezione dedicata).

I fondi così ottenuti sono stati destinati al finanziamento di 34 interventi, in prevalenza nel settore fognatura e depurazione. Alla data del 31.12.2005 i finanziamenti risultano impegnati per il 32,8% ed erogati per il 10%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	28	
Acquedotti		
Territorio	4	1
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati	2	
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	**34**	**1**

Nel settore Fognatura e Depurazione sono previsti 28 interventi, in gran parte di adeguamento degli impianti di depurazione ai limiti previsti dal Decreto Ministeriale 30 luglio 1999 e per la realizzazione di condotte fognarie.

La maggior parte degli interventi è in fase di realizzazione ed inoltre nel corso del 2006 si prevede di emettere il decreto di finanziamento per il progetto di adeguamento al decreto ministeriale del 30 luglio 1999 dell'impianto di depurazione di Monselice per l'importo complessivo di € 5.400.000,00.

Nel settore Territorio, l'unica opera collaudata sono gli *"interventi di completamento ed adeguamento per la riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia"* di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile.

Per quanto riguarda il settore della Bonifica Siti Inquinati, i fondi sono stati assegnati per il finanziamento di due interventi, entrambi ancora in fase di progettazione: il primo è di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia e riguarda un "*impianto pilota per il lavaggio di sedimenti nel Porto di Venezia*". Il secondo, invece, è stato assegnato alla Azienda Speciale del Porto di Chioggia per la "*bonifica aree interessate alla realizzazione delle banchine "A", "E", "B" - terminal di Val da Rio*".

Legge 539/95 - esercizio 1996 – II^ fase (€ 15.493.706,97, pari a 30 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 15.493.706,97	€ 15.493.706,97	*100%*	€ 14.872.926,88	*96,0%*

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 16 interventi, tutti rientranti nel settore Fognatura e Depurazione. I finanziamenti ammontano a € 15.493.706,97 ed alla data del 31.12.2005 risultano totalmente impegnati ed erogati per il 96,0%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	**16**	**13**
Acquedotti		
Territorio		
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali		
TOTALE	**16**	**13**

Di questi 16 interventi, 13 risultano collaudati mentre altri 2 presentano i lavori ultimati: tra questi ultimi, rientrano le opere relative allo *scavo dei Rii del Centro storico di Venezia*.
Questo particolare intervento consiste nell'esecuzione di opere e di servizi di manutenzione urbana del Centro Storico e di parte delle isole di Venezia con particolare riferimento al suolo, al sottosuolo e al sistema dei rii e dei ponti.

Il progetto prevede la manutenzione complessiva di tutte le infrastrutture di urbanizzazione comprensiva del recupero funzionale dei muri di sponda, il restauro e/o ricostruzione dei ponti, la manutenzione della pavimentazione, la difesa dalle maree medio-alte attraverso rialzi della pavimentazione.
Per quanto riguarda la quota a carico della Regione Veneto relativa al risanamento igienico-sanitario, il progetto prevede lo scavo dei rii ed il radicale rispristino ed adeguamento del sistema di collettamento e smaltimento fognario.

Nel corso del 2005 il progetto relativo al *"2°stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di S. Angelo di Piove, Brugine, Piove di Sacco, Arzergrande e Pontelongo"* eseguito dall'Azienda Piovese Gestione Acque A.P.G.A. s.r.l. è stato ultimato e collaudato: il decreto del Dirigente della Direzione Tutela dell'Ambiente n. 98 del 08.06.2005 ne approva la contabilità finale.

Si ricorda, infine, un intervento il cui progetto è stato approvato, per la realizzazione di *"un nuovo tratto di condotta fognaria in via S. Giovanni Bosco - Piove di Sacco"* che utilizza fondi derivanti dall'utilizzo delle economie di spesa maturate da altri progetti già conclusi.

Legge 539/95 - esercizio 1997 – III^ fase (€ 30.987.413,95, pari a 60 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 30.987.413,95	€ 30.987.413,95	*100%*	€ 30.663.651,29	*98,9%*

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 20 interventi, di cui 19 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione e 1 appartenente al settore Ospedali. I finanziamenti ammontano a € 30.987.413,95 ed alla data del 31.12.2005 risultano totalmente impegnati ed erogati per il 98,9%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	19	12
Acquedotti		
Territorio		
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione		
Ospedali	1	
TOTALE	**20**	**12**

Per gli interventi del settore Fognatura e Depurazione la maggior parte dei lavori risultano ultimati.
Tra questi, si ricorda quello relativo allo *"scavo dei Rii nel centro storico di Venezia"* ed quello relativo al *"completamento dell'impianto R.S.U. di Venezia"* ad opera dell'Ente di Bacino R.S.U. di Venezia 2.
Infine per quanto riguarda l'intervento relativo al *"dipartimento d'urgenza dell'Ospedale di SS. Giovanni e Paolo di Venezia – 2° stralcio"*, i lavori risultano ultimati.

In relazione al progetto relativo all'ampliamento di biotrattamento del Comune di Camposampiero, ad opera dell'Azienda Servizi Territorio Ambiente, SE.T.A. S.p.A., si rimanda a quanto già riportato su questo progetto nella sezione dedicata alla Legge 139/1992 – esercizio 1993 – I^ fase.

Nel corso del 2005 alcuni interventi sono stati collaudati; tra questi il Decreto del Dirigente della Direzione Tutela dell'Ambiente n.176 del 11.10.2005 approva la contabilità finale del progetto di *"Ampliamento impianto di depurazione di Cadoneghe"* eseguito dalla SE.T.A. S.p.A. ed il Decreto del Dirigente della Direzione Tutela dell'Ambiente n.167 del 03.10.2005 approva la contabilità finale del progetto di *"Riabilitazione fognaria del Comune di Marcon"* eseguito dal Comune di Marcon.

Legge 515/96 - esercizio 1997 - III^ fase (€ 103.291.379,82, pari a 200 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 103.291.379,82	€ 86.805.268,00	*84,0%*	€ 71.692.204,09	*69,4%*

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 69 interventi, di cui 62 rientranti nel settore Fognatura e Depurazione, 2 relativi al settore Territorio, 4 alla Bonifica dei Siti inquinati e 1 appartenente al settore Monitoraggio e Sperimentazione. I finanziamenti ammontano a € 103.291.379,82 ed alla data del 31.12.2005 risultano impegnati per l'84,0% ed erogati per il 69,4%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	62	36
Acquedotti		
Territorio	2	1
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati	4	
Monitoraggio e sperimentazione	1	
Ospedali		
TOTALE	**69**	**37**

Degli interventi relativi al settore Fognatura e Depurazione, 46 risultano ultimati e/o collaudati. Tra quelli ultimati rientra anche lo *"scavo dei Rii nel centro storico di Venezia"*.

Tra le opere con lavori in corso si ricorda il progetto di *"ampliamento della rete fognaria nel Comune di Battaglia Terme"* dell'Azienda Servizi Territorio Ambiente, SE.T.A. S.p.A.
Per tutti gli interventi del 28° Lotto fognature ricadenti nei comuni dell'A.C.M. S.p.A. i lavori risultano, invece, tutti ultimati e/o collaudati.

Tra gli interventi ancora in fase di progettazione rientrano i lavori di *"restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute"* ad opera della Diocesi Patriarcato di Venezia che, come più volte ricordato in precedenza, è finanziata parzialmente con la riallocazione di fondi delle leggi 798/84, 67/88 – Esercizio 1990, 139/92 – Esercizio 1993 e di questa legge, che revoca fondi originariamente destinati al Comune di Venezia. Tali revoche e riassegnazioni dei fondi sono state effettuate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3521 del 12 novembre 2004.

Nel corso del 2005 sono stati ultimati e collaudati i lavori relativi ad una serie di progetti; tra questi:
- Il progetto di *Ampliamento della rete fognaria in Comune di Monselice*, eseguito dal Comune di Monselice: il Decreto del Dirigente della Direzione Tutela dell'ambiente n. 19 del 08.02.2005 ne ha approvato la contabilità finale.
- Il progetto di *Potenziamento del sistema depurativo e ampliamento delle reti di fognatura nel territorio del consorzio del Piovese - 1° stralcio Impianti* eseguito dall'Azienda Piovese Gestione Acque S.p.A.: il Decreto del Dirigente della Direzione Tutela dell'ambiente n. 131 del 04.08.2005 ne ha approvato la contabilità finale.
- Il progetto di *Ampliamento della rete fognaria in Comune di Mogliano Veneto* eseguito dal Comune di Mogliano Veneto: il Decreto del Dirigente della Direzione Tutela dell'ambiente n. 117 del 11.07.2005 ne ha approvato la contabilità finale.

Per quanto riguarda gli interventi del settore Territorio il progetto di *"riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia"* del Comune di Noale (si veda quanto già riportato per la Legge 139/1992 –II^ fase) risulta ancora in fase di attuazione mentre i lavori *"miglioramento della efficienza dello scarico delle reti fognarie 1° stralcio - Risanamento e riordino idraulici delle Isole Treportine in comune di Cavallino Treporti"* del Consorzio di Bonifica Basso Piave risultano collaudati: il Decreto del Dirigente della Direzione Tutela dell'Ambiente n. 191 del 25/10/2005 ne approva la contabilità finale.

Infine, per quanto riguarda i lavori di *"potenziamento della rete di telerilevamento agrometeorologica"* di A.R.P.A.V., i lavori sono in fase di ultimazione.

Maggiori e più favorevoli mutui dalle Leggi 539/95 e 515/96 – III^ fase (€ 21.342.612,00, pari a 41,32 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 21.342.612,00	€ 0,00	*0%*	€ 0,00	*0%*

L'ammontare di tali fondi deriva, per € 3.954.247,00 dai maggiori e più favorevoli mutui della legge 539/95 e per € 17.388.364,00 dai maggiori e più favorevoli mutui della legge 515/96. Questo finanziamento è stato assegnato ad un unico intervento. Si tratta del Progetto Integrato Fusina. L'utilizzo di questi fondi viene previsto dall'ultimo riparto di spesa, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 4 maggio 2004.

Legge 515/96 – esercizio 1998 – IV^ fase (€ 61.187.231,14, pari a 118,475 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 61.187.231,12	€ 52.830.366,11	*86,3%*	€ 45.377.807,08	*74,2%*

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 71 interventi, dei quali 68 relativi il settore Fognatura e Depurazione, 1 relativo al settore Territorio e 2 appartenenti al settore Monitoraggio e Sperimentazione. I finanziamenti ammontano complessivamente ad € 61.187.231,12 ed alla data del 31.12.2005 risultano impegnati per l'86,3% ed erogati per il 74,2%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	68	26
Acquedotti		
Territorio	1	
Agricoltura e Zootecnia		
Bonifica siti inquinati		
Monitoraggio e sperimentazione	2	
Ospedali		
TOTALE	71	26

I 68 interventi del settore Fognatura e Depurazione riguardano opere di fognatura ed ampliamento impianti di depurazione.

Di questi progetti, 47 risultano già collaudati o in fase di collaudo mentre di altri 15 lavori sono in avanzata fase di realizzazione.

La gestione delle opere in fase di esecuzione è affidata principalmente a 3 aziende di servizi idrici Integrati: Azienda Servizi Territorio Ambiente SE.T.A. S.p.A., l'Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. e i Servizi Pubblici Integrati Mogliano, S.P.I.M. S.p.A.

In relazione al progetto relativo all'ampliamento del Centro di biotrattamento del Comune di Camposampiero, ad opera Azienda Servizi Territorio Ambiente SE.T.A. S.p.A., si rimanda a quanto già riportato per la Legge 139/1992 – esercizio 1993 – I^ fase.

Per quanto riguarda il settore Territorio, si tratta di un intervento realizzato dal Magistrato alle Acque di Venezia per "*il ripristino dei pennelli alle foci di Adige e Brenta*". I lavori risultano al 31.12.2005 in avanzata fase di realizzazione.

Maggiori e più favorevoli mutui dalla Legge 515/96 – IV^ fase (€ 36.151,98, pari a 70 milioni di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 36.151,98	€ 36.151,98	100%	€ 6.501,93	17,9%

I fondi sono stati destinati ad una sola opera di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile inerente *"il completamento e l'adeguamento degli interventi per la riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia"*. I lavori sono stati collaudati e gli atti sono stati approvati con il Decreto Regionale del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 105 del 8 giugno 2004. Tale intervento fa parte del riparto di spesa approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 103 del 18 dicembre 2002.

Legge 345/97 - esercizio 1998 – V^ fase (€ 142.025.647,25, pari a circa 275 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 142.025.647,26	€ 92.263.044,28	*65,0%*	€ 63.467.945,72	*44,7%*

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 33 interventi, distribuiti su quasi tutti i settori di intervento, ad esclusione del settore degli Ospedali. Gli interventi riguardano opere di fognatura ed ampliamento impianti di depurazione, di riqualificazione di corsi d'acqua e di bonifica di siti inquinati ed opere acquedottistiche ed interventi nel settore agricolo e zootecnico. Infine 1 progetto è relativo allo *"scavo Rii nel centro storico di Venezia"*.

L'importo dei finanziamenti ammonta ad € 142.025.647,01. Alla data del 31.12.2005 i finanziamenti risultano impegnati per il 65,0% ed erogati per il 44,7%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	10	1
Acquedotti	4	
Territorio	11	1
Agricoltura e Zootecnia	1	
Bonifica siti inquinati	5	1
Monitoraggio e sperimentazione	2	
Ospedali		
TOTALE	**33**	**3**

I progetti di tali interventi risultano quasi tutti approvati ed i lavori sono in corso di realizzazione. Alcuni di questi sono stati sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Per quanto attiene al settore fognatura e depurazione nel corso del 2005 l'intervento relativo alla *"fognatura nei comuni di Piove di sacco, Legnaro, Brugine, Polverara, Correzzola, S. Angelo, Pontelongo, Arzergrande"* ad opera dell'Azienda Centro Veneto Servizi è stato collaudato: il Decreto Regionale del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 186 del 23 ottobre 2005 approva la contabilità finale dell'opera.

Per quanto attiene le opere acquedottistiche, il finanziamento a favore dell' *"Acquedotto sostitutivo dei pozzi del Cavallino"*, affidato al Consorzio di Bonifica Basso Piave, è stato

definitivamente revocato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3521 del 12 novembre 2004, per carenze progettuali. La quota revocata ammonta a € 12.857.632,91 ed è stata così ripartita: la quota più consistente, pari a € 10.857.632,91, è stata assegnata alla Diocesi Patriarcato di Venezia per i *"lavori di adeguamento igienico sanitario relativi al progetto di restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute"*, mentre la parte rimanente pari a € 2.000.000,00 è stata assegnata alla Comunità Ebraica di Venezia sempre per i *"lavori di adeguamento igienico sanitario relativi al progetto di restauro dell'edificio adibito all'assistenza agli anziani della Comunità Ebraica di Venezia"*.

I finanziamenti rientranti nel settore Acquedotti riguardano *"l'interconnessione dei sistemi acquedottistici Venezia Chioggia"* nell'ambito di attuazione dello schema del Veneto centrale del Modello Strutturale degli Acquedotti.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3968 del 9 novembre 1999 è stato approvato l'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto ed il Magistrato alle Acque del Veneto per la realizzazione degli interventi Torre di Burri e Botte di Conche. Ai sensi del suddetto accordo detti lavori vengono cofinanziati per € 6.197.482,79, pari a 12 miliardi ciascuno, dalla Regione Veneto e dal Magistrato alle Acque di Venezia che provvede inoltre al coordinamento dell'intervento in parola.

Per quanto riguarda il settore Agricoltura e Zootecnia, l'unico intervento finanziato riguarda gli *"incentivi, modifiche colturali e piani di spargimento e gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole"*, per il quale i lavori sono in corso.

Tra gli interventi di Bonifica di Siti Inquinati nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, rientra la *"bonifica delle "Corti femminili" a Mestre"* per opera del Comune di Venezia che è stata collaudata e la *"bonifica area inquinata localizzata in via Teramo, località Olmo di Borbiago in comune di Mira (VE)"*. Per questo ultimo intervento è stata erogata una quota per la progettazione, che è tuttora in corso.

Gli interventi del settore Monitoraggio e Sperimentazione di competenza dell'A.R.P.A.V. e che riguardano il *"potenziamento del servizio di analisi ed informazione in campo agro-zootecnico del centro Agroambientale di Castelfranco Veneto"* e il *"sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia - estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino Scolante"*, sono in avanzata fase di realizzazione.

Legge 448/98 – esercizio 1999-2000-2001 – VI^ fase (€ 235.504.345,99, pari a 456 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 235.504.345,99	€ 150.936.849,95	*64,1%*	€ 90.426.166,30	*38,3%*

Il Consiglio Regionale ha approvato il riparto dei fondi attribuiti dalla Legge 448/1999, individuando un cospicuo numero di interventi ed i relativi soggetti attuatori, con Deliberazione n. 23 del 1 marzo 2000. I finanziamenti ammontano a € 235.504.345,99 e alla data del 31.12.2005 risultano impegnati per il 64,1% ed erogati per il 38,3%.

Si tratta di 113 interventi di cui 77 relativi al settore Fognatura e Depurazione (tra i quali 1 relativo allo *scavo Rii nel centro storico di Venezia*), e 11 inerenti al settore Territorio. Gli altri si distribuiscono equamente tra tutti i rimanenti settori, ad esclusione degli Ospedali.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	77	9
Acquedotti	6	
Territorio	11	1
Agricoltura e Zootecnia	5	
Bonifica siti inquinati	8	1
Monitoraggio e sperimentazione	6	
Ospedali		
TOTALE	**113**	**11**

Per quanto attiene al settore fognatura e depurazione la maggior parte degli interventi, circa 32, è in corso di realizzazione, 21 interventi sono stati ultimati mentre 9 sono stati collaudati: di questi nel corso del 2005 sono stati predisposti i decreti di determinazione del contributo definitivo di 7 interventi.

Per quanto attiene il settore Territorio nel corso del 2005 il progetto "*Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque del sottobacino Vela: risezionamento corsi d' acqua, manufatti di controllo, nuovi collegamenti e recupero capacità d' invaso nei comuni di S. Biagio di C., Monastier, Roncade*" il cui soggetto attuatore è il Consorzio di Bonifica Destra Piave, è stato collaudato e il Decreto del Dirigente della Direzione Tutela dell'Ambiente n. 157 del 20 settembre 2005 ne approva la contabilità finale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2122 del 2004 e' stato approvato un Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, Comune di Mira ed il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta per la realizzazione del Parco Lagunare di Mira che consentirà:
a) l'aumento della capacità fitodepurativa del sistema idraulico di scolo, in particolare dello scolo Giare, con interventi di rinaturalizzazione dell'alveo, la creazione di golene sommerse, adeguata piantumazione delle rive e la creazione di alcuni specchi d'acqua avendo come riferimento l'assetto morfologico storico dell'ambito;
b) la creazione nell'estremo sud dell'area, a ridosso della Laguna di Venezia, di un ambito di interesse paesaggistico – naturalistico ed ecologico caratterizzato dalla presenza di un'area umida d'acqua dolce, fruibile anche per attività didattiche e ricreative, compatibilmente con le funzioni agricole presenti;
c) migliorare complessivamente la qualità paesaggista e ambientale del sito;

In relazione al progetto relativo al centro di biotrattamento di Camposampiero, ad opera dell'Azienda Servizi Territorio Ambiente S.E.T.A. S.p.A., si rimanda a quanto già riportato nella sezione dedicata alla Legge 139/1992 – esercizio 1993 – I^ fase.

Legge 488/99 – esercizio 2002-2003 – VII^ fase (€ 205.033.388,94, pari a 397 miliardi di lire)

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 205.033.388,96	€ 92.782.369,02	*45,2%*	€ 28.185.554,08	*13,7%*

Il Consiglio Regionale, con DCR n. 70 del 27 dicembre 2001, ha approvato il riparto dei fondi, attribuiti dalla Legge n. 448/199 e riallocazione dei fondi assegnati con la Legge n. 345/1997, gli interventi ed i relativi soggetti attuatori, per un totale di € 212.780.242,45.

I fondi di questa legge sono stati destinati al finanziamento di 111 interventi suddivisi tra i vari settori: in particolare nel settore Fognatura e Depurazione sono compresi 75 interventi, nel Territorio 20, Bonifica Siti Inquinati 11. I finanziamenti ammontano complessivamente ad € 205.033.388,96 e alla data del 31.12.2005 risultano impegnati per il 45,2% ed erogati per il 13,7%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	75	3
Acquedotti	1	
Territorio	20	
Agricoltura e Zootecnia	3	
Bonifica siti inquinati	11	
Monitoraggio e sperimentazione	1	
Ospedali		
TOTALE	111	3

Per quanto riguarda l'intervento relativo al "Progetto Integrato Fusina" valgono le considerazioni gia riportate in precedenza.

I finanziamenti relativi alla Legge 488/1999 sono stati assegnati negli esercizi finanziari 2002-2003 pertanto la maggior parte degli interventi è ancora in fase di progettazione.
Ad oggi per quanto attiene al settore Fognatura e Depurazione il numero degli interventi in fase di realizzazione è costituito da 31 opere.

Gli interventi i cui lavori sono già stati ultimati, e dunque sono in fase di collaudo, sono 7, mentre nel corso del 2005 sono stati predisposti i Decreti di approvazione della contabilità finali di tre interventi. Tra questi si sottolinea il progetto di "*Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell' isola di S. Giorgio Maggiore*" di competenza dell'Abbazia di S. Giorgio Maggiore: il decreto del Dirigente della Direzione Tutela dell'Ambiente n. 158 del 20.09.2005 ne approva la contabilità finale.

L'unico intervento del settore Acquedotti fa parte del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V. – Schema del Veneto Centrale) e riguarda il primo stralcio della "*sistemazione del nodo idrico di Padova e la chiusura dell'anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia*". I lavori di quest'opera sono in corso.

Infine, per quanto riguarda il settore Monitoraggio e Sperimentazione, è stato finanziato un intervento, gestito da A.R.P.A.V., che è inerente al *"sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio industriale e delle emergenze per l' area di Porto Marghera - SIMAGE II° Lotto"*. I lavori sono in fase di realizzazione.

Leggi n. 388/2000 e 448/2001 – esercizio 2002-2003-2004 – VIII^ fase € 286.824.446,15

Finanziato	Impegnato		Erogato	
€ 286.824.446,15	€ 51.253.795,14	*17,9%*	€ 20.473.426,59	*7,1%*

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 4 maggio 2004 è stata definita la distribuzione dei fondi del nuovo riparto di spesa. I finanziamenti derivanti dai contratti di mutuo stipulati per le leggi 388/2000 e 448/2001 ammontano complessivamente a € 286.824.446,15 (di cui € 97.701.446,15 dalla Legge 388/2000 e € 189.123.000,00 dalla Legge 448/2001). A tale proposito si sottolinea che il riparto approvato ha individuato interventi urgenti da finanziare con fondi nuovi per un importo complessivo di € 308.657.387,00 con un'eccedenza di € 21 rispetto al finanziato-

Questo ultimo riparto gestisce inoltre anche fondi provenienti dalla riallocazione di finanziamenti originariamente destinati dalla legge 139/92 – II fase, per una quota pari a € 12.181.000,00. Si aggiungono, inoltre, i fondi derivanti dai migliori e più favorevoli mutui dalle leggi n. 539/95 e n. 515/96 – III fase, per un ammontare di € 21.342.612,00, di cui si è già detto nelle sezioni corrispondenti.

Alla data del 31.12.2005 i finanziamenti risultano impegnati per il 17,9% ed erogati per il 7,1%.

	Int.	Collaudi
Fognatura e Depurazione	100	
Acquedotti	1	
Territorio	51	
Agricoltura e Zootecnia	7	
Bonifica siti inquinati	12	
Monitoraggio e sperimentazione	8	
Ospedali	1	
TOTALE	**180**	

Gli interventi avviati con questo ultimo riparto sono 180, gran parte rientranti nei settori Fognatura e Depurazione e Territorio.

Un'elevata percentuale dei progetti si trova ancora in fase di progettazione, vista la recente assegnazione dei finanziamenti.

In particolare si sottolinea che i finanziamenti assegnati ai Consorzi di Bonifica, sono stati destinati soprattutto per la copertura delle maggiori spese, relative a progetti già finanziati, che gli stessi consorzi devono sostenere a seguito dell'aumento delle indennità di esproprio.

Per quanto riguarda il settore Fognatura e Depurazione, si rileva che il Progetto Integrato Fusina, beneficia, in questo riparto, di un finanziamento complessivo pari a € 65.276.000,00.

Per il settore Bonifica Siti Inquinati nel Bacino Scolante sono stati assegnati € 11.000.000,00.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 4529/04 sono stati individuati i soggetti attuatori che potranno disporre di fondi per la realizzazione di opere di bonifica di aree precedentemente occupate da discariche, inceneritori, attività industriali. Tra questi vi sono nuovi soggetti attuatori tra cui la Provincia di Padova per la realizzazione dell' "*Intervento di bonifica in via sostitutiva dell'ex area Promofin in comune di Piombino Dese*".

Si prevede inoltre di stanziare € 3.000.000,00 per la bonifica del Basso Corso del Fiume Marzenego – Osellino, alla presentazione da parte del Consorzio di Bonifica Dese Sile del relativo progetto.

Alla società Veneto Acque S.p.A sono stati assegnati € 20.000.000,00 nell'ambito *"del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto – Schema Veneto Centrale, segmento del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia"*. Tale progetto si trova in fase di realizzazione.

Il Dirigente del Servizio
Legge Speciale per Venezia
Dott.ssa Gisella Penna

PAGINA BIANCA

RAPPORTO
SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

SUDDIVISO PER LEGGI DI FINANZIAMENTO

Aggiornamento al 31 dicembre 2005

TABELLA RIEPILOGATIVA

(per leggi)

Legge		Finanziato	Impegnato	Erogato
Legge 798/84	Es. 1984-1985-1986	€ 41.316.551,93	€ 36.049.897,79	€ 31.401.784,08
			87,3%	76,0%
Legge 910/86	Es. 1987-1988	€ 51.645.689,91	€ 47.449.802,10	€ 45.367.428,62
			91,9%	87,8%
Legge 910/86	Es. 1989	€ 38.734.267,43	€ 37.757.647,44	€ 25.877.521,86
			97,5%	66,8%
Legge 67/88	Es. 1988	€ 18.334.219,92	€ 11.851.990,41	€ 5.003.771,93
			64,6%	27,3%
Legge 67/88	Es. 1990	€ 53.969.745,96	€ 51.858.089,74	€ 35.469.284,40
			96,1%	65,7%
Legge 67/88	Es. 1991	€ 15.803.581,11	€ 15.803.581,11	€ 15.373.362,35
			100,0%	97,3%
Legge 67/88	Es. 1992 - I^ tranche	€ 15.338.769,90	€ 11.819.744,67	€ 8.969.201,53
			77,1%	58,5%
Legge 67/88	Es. 1992 - II^ tranche	€ 30.987.413,94	€ 14.782.680,23	€ 10.781.020,12
			47,7%	34,8%
Legge 360/91		€ 8.263.310,39	€ 4.620.080,26	€ 3.803.309,92
			55,9%	46,0%

Legge	Finanziato	Impegnato	Erogato
Legge 139/92 Es. 1993	€ 180.759.914,68	€ 178.483.372,67	€ 151.320.127,07
		98,7%	83,7%
Legge 139/92 II fase	€ 165.266.207,64	€ 106.373.035,53	€ 84.955.447,62
		64,4%	51,4%
Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	€ 40.349.825,52	€ 13.231.334,22	€ 4.026.419,70
		32,8%	10,0%
Legge 539/95 Es. 1996	€ 15.493.706,97	€ 15.493.706,97	€ 14.872.926,88
		100,0%	96,0%
Legge 539/95 Es. 1997	€ 30.987.413,95	€ 30.987.413,95	€ 30.663.651,29
		100,0%	99,0%
Legge 539/95 Magg. Mutui III^fase	€ 21.342.612,00	€ 0,00	€ 0,00
		0,0%	0,0%
Legge 515/96 Es. 1997	€ 103.291.379,33	€ 86.805.268,00	€ 71.692.204,09
		84,0%	69,4%
Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase	€ 61.187.231,13	€ 52.830.366,11	€ 45.377.807,07
		86,3%	74,2%
Legge 515/96 Magg. Mutui IV^fase	€ 36.151,98	€ 36.151,98	€ 6.501,93
		100,0%	18,0%
Legge 345/97 Es. 1998 - V fase	€ 142.025.647,25	€ 92.263.044,28	€ 63.467.945,71
		65,0%	44,7%

Legge	Finanziato	Impegnato	Erogato
Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001	€ 235.504.345,99	€ 150.936.849,95	€ 90.426.166,30
		64,1%	38,4%
Legge 488/99 Es. 2002, 2003	€ 205.033.388,95	€ 92.782.369,32	€ 28.185.554,08
		45,3%	13,7%
Legge 388/00, Es. 2002,2003,2004	€ 286.824.446,15	€ 51.253.795,14	€ 20.473.426,59
		17,9%	7,1%
TOTALE	**€ 1.762.495.822,04**	**€ 1.103.470.221,87**	**€ 787.514.863,12**
PERCENTUALE SU TOTALE		**62,61%**	**44,68%**

SUDDIVISIONE PER LEGGE DI FINANZIAMENTO E PER SETTORI DI INTERVENTO AL 31.12.2005

	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	29.954.500,15	24.687.846,01	23.705.088,55
2	Acquedotti	5.164.568,99	5.164.568,99	1.499.212,75
3	Ospedali	6.197.482,79	6.197.482,79	6.197.482,79
	TOTALE	**41.316.551,93**	**36.049.897,79**	**31.401.784,08**

	Legge 910/86 Es. 1987-1988	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	45.448.207,13	41.252.319,31	39.898.278,97
2	Acquedotti	1.032.913,80	1.032.913,80	304.580,66
3	Ospedali	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99
	TOTALE	**51.645.689,92**	**47.449.802,10**	**45.367.428,62**

	Legge 910/86 Es. 1989	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	32.020.327,74	31.043.707,75	23.295.237,36
2	Acquedotti	4.131.655,19	4.131.655,19	0,00
3	Ospedali	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50
	TOTALE	**38.734.267,43**	**37.757.647,44**	**25.877.521,86**

	Legge 67/88 Es. 1988	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	8.005.081,94	1.522.852,43	1.522.852,43
2	Acquedotti	10.329.137,98	10.329.137,98	3.480.919,50
3	Ospedali			
	TOTALE	**18.334.219,92**	**11.851.990,41**	**5.003.771,93**

	Legge 67/88 Es. 1990	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	53.969.745,96	51.858.089,74	35.469.284,40
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**53.969.745,96**	**51.858.089,74**	**35.469.284,40**

	Legge 67/88 Es. 1991	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	15.803.581,16	15.803.581,11	15.373.362,35
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**15.803.581,16**	**15.803.581,11**	**15.373.362,35**

	Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	15.338.769,90	11.819.744,67	8.969.201,53
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**15.338.769,90**	**11.819.744,67**	**8.969.201,53**

	Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	30.987.413,94	14.782.680,23	10.781.020,12
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**30.987.413,94**	**14.782.680,23**	**10.781.020,12**

	Legge 360/91	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	8.263.310,39	4.620.080,26	3.803.309,92
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**8.263.310,39**	**4.620.080,26**	**3.803.309,92**

	Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	180.759.914,68	178.483.372,67	151.320.127,07
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**180.759.914,68**	**178.483.372,67**	**151.320.127,07**

	Legge 139/92 II fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	165.266.208,31	106.373.035,53	84.955.447,61
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**165.266.208,31**	**106.373.035,53**	**84.955.447,61**

	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	40.349.825,52	13.231.334,22	4.026.419,70
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**40.349.825,52**	**13.231.334,22**	**4.026.419,70**

	Legge 539/95 Es. 1996	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	15.493.706,97	15.493.706,97	14.872.926,90
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**15.493.706,97**	**15.493.706,97**	**14.872.926,90**

	Legge 539/95 Es. 1997	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	27.630.444,10	27.630.444,10	27.346.241,26
2	Acquedotti			
3	Ospedali	3.356.969,84	3.356.969,84	3.317.410,04
	TOTALE	**30.987.413,95**	**30.987.413,95**	**30.663.651,30**

	Legge 539-95 Magg. Mutui III fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	21.342.612,00	0,00	0,00
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**21.342.612,00**	**0,00**	**0,00**

	Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	103.291.379,33	86.805.268,01	71.692.204,11
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**103.291.379,33**	**86.805.268,01**	**71.692.204,11**

	Legge 515/96 Es. 1998	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	61.187.231,15	52.830.366,11	45.377.807,08
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**61.187.231,15**	**52.830.366,11**	**45.377.807,08**

	Legge 515/96 Magg. Mutui IV^fase	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	36.151,98	36.151,98	6.501,93
2	Acquedotti			
3	Ospedali			
	TOTALE	**36.151,98**	**36.151,98**	**6.501,93**

	Legge 345/97 Es. 1998	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	119.351.045,51	69.588.442,54	43.633.343,97
2	Acquedotti	22.674.601,75	22.674.601,75	19.834.601,75
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**142.025.647,26**	**92.263.044,29**	**63.467.945,72**

	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	201.934.646,86	128.322.235,25	78.108.077,60
2	Acquedotti	33.569.698,44	22.614.614,70	12.318.088,70
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**235.504.345,30**	**150.936.849,95**	**90.426.166,30**

	Legge 488/99 Es. 2002, 2003	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	194.704.250,94	82.453.231,35	25.086.812,68
2	Acquedotti	10.329.137,98	10.329.137,98	3.098.741,40
3	Ospedali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**205.033.388,92**	**92.782.369,33**	**28.185.554,08**

	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002/03/04	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	263.824.446,15	45.253.795,14	14.473.426,59
2	Acquedotti	20.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3	Ospedali	3.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	**286.824.446,15**	**51.253.795,14**	**20.473.426,59**

SINTESI

	TOTALE LEGGI FINANZIAMENTO	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Disinquinamento	1.634.962.801,81	1.003.892.285,38	723.716.972,11
2	Acquedotti	107.231.714,14	82.276.630,40	46.536.144,76
3	Ospedali	20.301.306,12	17.301.306,12	17.261.746,32
	TOTALE	**1.762.495.822,07**	**1.103.470.221,89**	**787.514.863,18**

Legge 798/1984 ES. 1984-1985-1986

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	COMUNE DI CHIOGGIA - DISINQUINAMENTO											
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDEA N. 27 20/7/1993	335.696,98	335.696,98	331.607,90	Lavori collaudati			20/05/1994	Registrata, con DDLP n. 133 del 23/4/1997, un'economia pari a € 4.089,08 convogliata all'intervento 4
2	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI lotto			DDLP N. 324 03/06/1988	671.393,97	671.393,97	571.793,63	Lavori collaudati			20/05/1994	Registrata, con DDLP n. 73 del 17/03/1997, un'economia pari a € 99.600,34 convogliata all'intervento 4
3	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XVI lotto		DGR N. 5541 DEL 10/11/1996	DDDA N.120 6/9/1990	1.885.067,68	1.885.067,68	1.838.810,70	Lavori collaudati	07/10/1997	26/10/1999	26/10/2000	Registrata, con DDLP n° 423 del 11/12/2003, un'economia pari a € 46.256,97.
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (VE) - Opere elettromeccaniche (XV lotto - I° stralcio)		DGR N. 710 DEL 22/7/1986	DDDA N. 13162 DEL 12/12/1986	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	02/10/1986	24/08/1992	29/04/1995	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n° 391 del 03/10/1997. Supero di spesa parzialmente coperto con le economie degli interventi 1 e 2. Residuo a carico dell'ente
	COMUNE DI CHIOGGIA - ACQUEDOTTI											
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Potenziamento servizio idrico frazioni Ca' Bianca e Valli		DGR N. 3002 DEL 26/05/1987		149.772,50	149.772,50	149.772,50	Lavori collaudati			05/10/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n° 81 del 13/04/1999. Importo finale intervento 164.640,48. Supero di spesa a carico dell'ente
2	Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio		DGR N. 4667 DEL 20/09/95		883.141,30	883.141,30	629.320,45	Lavori collaudati				Collaudo effettuato: in attesa dell'invio da parte dell'ente della relazione acclarante
	COMUNE DI JESOLO											
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (VE)	1/1.4			1.291.142,25	1.291.142,25	1.282.148,91	Lavori collaudati			16/01/1997	Registrata, con DDLP n. 312 del 02/12/1998, un'economia pari a € 8.993,34 da reiscrivere sul capitolo 50511 del bilancio regionale esercizio 1986
	COMUNE DI MARCON											
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											

Legge 798/1984 ES. 1984-1985-1986

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VIII lotto		DGR N. 950 DEL 31/10/1987	DDLP N. 951 31/10/1987	42.794,90	42.794,90	42.794,90	Lavori collaudati	22/03/1988	30/10/1990		Determinazione del contributo definitivo con Decreto dei LL.PP n. 7 del 28/03/2000
2	Recupero della rete di fognatura nera in loc. Gaggio	1/4.7.2	DGR N. 48 DEL 25/06/1999	DDDA N. 48 25/6/1999	267.079,24	267.079,24	266.770,30	Lavori collaudati	25/06/2001	17/06/2002	14/01/2003	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo da parte del Comune di Marcon. Ente esecutore dei lavori Consorzio Sile Piave
	COMUNE DI MOGLIANO VENETO Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)			DGR 994 DEL 09/10/1986	413.165,52	413.165,52	378.748,60	Lavori collaudati			14/11/1995	Registrata, con DDLP n. 407 del 14/11/1995, un'economia pari a € 34.417,02 impegnata sul capitolo 50511 del bilancio regionale esercizio 1986
2	Fognatura frazioni di Bonisiolo e Zerman in comune di Mogliano Veneto (TV)			DGR 875 DEL 12/09/1986	258.228,45	258.228,45	231.666,14	Lavori collaudati	13/07/1987	18/031988		Registrata, con DDLP n. 684 del 06/11/1991, un'economia pari a € 26.562,30
	COMUNE DI VENEZIA Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Realizzazione del 1° stralcio funzionale della rete fognaria dell'isola della Giudecca.	1/3.6		DDEA N. 54 17/10/1991	85.417,05	85.417,05	85.417,05					L'intervento consiste nella redazione dello studio e del progetto
2	Ampliamento e completamento impianto di depurazione di Campalto (Ve) - Telecontrollo				0,00	0,00	0,00	Fondi riallocati nell'int. 2A				
2A	Vasca di prima pioggia e laminazione in località Gazzera Mestre VE	1/5.1	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 51 25/6/1999	71.759,17	71.759,17	71.759,17	Lavori ultimati				Finanziamento originale pari a € 516.456,90, di cui € 444.697,73 revocati e devoluti alla Diocesi Patriarcato di Venezia
3	Costruzione della fognatura di TREPORTI		DGR N. 1175 DEL 26/03/1985	DDLP N. 1190 23/12/1987	1.394.433,63	1.394.433,63	1.379.989,31	Lavori collaudati	14/11/1988	26/02/1991	16/09/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 55 del 09/02/1996, per € 1.379.989,31. Con DDLP n. 83 del 14/04/1999 si finanzia l'aumento della revisione dei prezzi per € 37.357,55
4	Costruzione rete fognaria del Lido (VE) - V lotto			DDLP N. 1006 26/10/1987	1.595.851,82	1.595.851,82	1.587.990,21	Lavori collaudati	23/11/1987	24/02/1989	06/12/1993	Registrata, con DDLP n. 167 del 11/07/1994, un'economia pari a € 7.861,61.

Legge 798/1984 ES. 1984-1985-1986

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
5	Completamento scolmatore bacino S. Giuliano (VE)			DDLP N. 1003 26/10/1987	1.032.913,80	1.032.913,80	1.029.127,96	Lavori collaudati	23/11/1987	16/11/1988	13/12/1991	Registrata, con DDLP n. 208 del 23/08/1994, un'economia pari a € 3.785,84
6	Costruzione della fognatura del Terraglio (VE)		DGR N. 2992 DEL 26/05/1987	DDLP N. 1002 26/10/1987	619.748,28	619.748,28	605.927,75	Lavori collaudati	30/11/1987	24/09/1988	26/01/1996	Registrata, con DDLP n. 285 del 23/07/1997, un'economia pari a € 13.820,53
7	Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (VE) - II lotto		DGR N. 5591 DEL 29/09/1987	DDLP N. 1001 26/10/1987	2.117.473,29	2.117.473,29	1.491.506,77	Lavori collaudati	18/01/1988	31/05/1989	08/04/1991	Registrata, con DDLP n. 118 del 11/05/1994, un'economia pari a € 625.966,51, destinata in parte all'intervento 22A
8	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - III lotto		DGR N. 5590 DEL 29/09/1987	DDLP N. 1000 26/10/1987	593.925,43	593.925,43	593.925,43	Lavori collaudati	13/01/1988	06/01/1989	04/05/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 32 del 23/02/1999. Con DDLP n. 75 del 31/03/1999 si concede un ulteriore finanziamento per € 6.201,73
9	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - I lotto		DGR N. 999 DEL 26/10/1987	DGR N. 999 26/10/1987	2.117.473,29	2.117.473,29	2.077.719,51	Lavori collaudati	12/01/1988	25/05/1989	16/03/1992	Registrata, con DDLP n. 322 del 10/11/1994, un'economia pari a € 39.753,78
10	Completamento delle fognature di Via Torino - Mestre VE		DGR N. 2994 DEL 26/05/1987	DDLP N. 1005 26/10/1987	852.153,88	852.153,88	823.357,07	Lavori collaudati	11/01/1988	15/12/1988	08/05/1997	Registrata, con DDLP n. 301 del 06/08/1997, un'economia pari a € 28.796,81
11	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld	1/4.2 bis	DAST N. 124 DEL 11/10/1990	DDDA N. 26 19/3/1999	676.558,54	675.525,62	675.525,62	Finanziamento convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
12	Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mestre - Marghera (vasca di arrivo del collettore)			DDLP N. 949 21/10/1987	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori collaudati	12/10/1987	08/04/1988	22/10/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 95 del 11/05/1998. Con DDLP 255 del 15/10/1998 finanziato aumento revisione prezzi per € 10.940,58
13	Interventi di risanamento igienico ed edilizio di Pellestrina e S. Pietro in Volta	1/3.6.A		DDEA N. 54 17/10/1991	4.820.923,49	0,00	0,00	Progetto in fase di redazione				Interventi gestiti dalla società INSULA

CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986

1	Costruzione impianto idrovoro Canale Scolmatore F. Marzenego		DGR N. 1151 DEL 19/11/1986	DDLP N. 909 10/12/1990	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	Lavori collaudati		08/04/1994	11/11/1995	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 356 del 17/09/1997. La maggiore spesa rispetto al finanziato, pari a € 140.088,36 è a carico dell'ente

Legge 798/1984 ES. 1984-1985-1986

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
2	Opere accessorie relative all'impianto idrovoro del Canale Scolmatore e ristrutturazione rete di bonifica Favaro Veneto (VE)		DGR N. 1151 DEL 19/11/1986	DR N. 762 08/08/1990	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori collaudati		30/11/1990	15/10/1992	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 356 del 17/09/1997. La maggiore spesa rispetto al finanziato, pari a € 140.088,36 è a carico dell'ente
	ULSS.12 VENEZIA											
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio				6.197.482,79	6.197.482,79	6.197.482,79					
	AZIENDA CONSORZIO DEL MIRESE											
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Costruzione della rete di fognatura consortile del Mirese - XIV lotto sub B (VE)			DPGR N.1523 16/12/1986	206.582,76	206.582,76	184.286,86	Contabilità finale				Registrata, con DDLP n. 422 del 11/12/2003, un'economia pari a € 20.183,39
2	Completamento funzionale di opere fognarie precedentemente realizzate nel Consorzio del Mirese		DPGR N. 621 DEL 20/07/1987	DR N. 1004 DEL 26/10/1987	2.375.701,74	2.375.701,74	2.375.701,74	Contabilità finale				Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 424 del 11/12/2003
	A.P.G.A.											
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Costruzione del collettore consortile da Piove di Sacco all'impianto di depurazione di Codevigo			DDLP N. 471 26/07/1988	1.291.142,25	1.291.142,25	1.285.338,08	Lavori collaudati	28/03/1989	24/05/1991	26/09/1996	Registrata, con DDLP n. 491 del 27/11/1996, un'economia di € 5.804,16
	S.P.I.M.											
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	1/3.6.B	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 29 21/03/2001	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori in corso				
	VE.S.T.A.											
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1 (94 V.)	(Acquedotto di Venezia ORIGINARIAMENTE) Progetto definitivo della nuova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud	1/4.9		DGCA N. 147 29/3/2001	4.131.655,19	4.131.655,19	720.119,80	Progetto approvato				
	DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA											
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											

Legge 798/1984 ES. 1984-1985-1986

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/5.1B	DGR 4976 02/11/1993		444.697,73			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia" cod 1/5.1
	TOTALE				41.316.551,93	36.049.897,79	31.401.784,08					
						87,3%	76,0%					

Legge 910-86 Es. 87-88

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	COMUNE DI CHIOGGIA - ACQUEDOTTI											
	Legge 910/86 Es. 1987-1988											
3	Adeguamento impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio		DGR N. 4667 DEL 20/09/95		1.032.913,80	1.032.913,80	304.580,66	Lavori collaudati				Collaudo effettuato: in attesa dell'invio da parte dell'ente della relazione acclarante
	COMUNE DI JESOLO											
	Legge 910/86 Es. 1987-1988											
2	Rilievi ed ispezioni televisive della rete fognaria del Comune di Jesolo (VE). 2° Stralcio	1/1.4.1	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DGR N. 158 27/9/1996	46.551,70	46.551,70	46.551,70	Lavori collaudati				Registrata, con DDDA n. 29 del 15/05/2000, un'economia di € 54.485,00 reimpiegata nell'intervento 12
3	Progetto esecutivo delle opere fognarie di collegamento della zona P.I.P. all'impianto di depurazione (VE)	1/1.4.2	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 162 2/10/1996	95.639,10	95.639,10	95.639,10	Lavori collaudati	07/01/1997	16/04/1997	24/07/1997	Registrata, con DDDAn. 98 del 21/10/1999, un'economia di € 64.462,54 reimpiegata nell'intervento 11
4	Interventi alle reti -parte 1^/ parte 2^.	1/1.4.3 a	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 71 23/6/1997	242.406,28	242.406,28	242.406,28	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 26/10/1999
5	Opere di completamento fognario	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	59.686,88	59.686,88	11.312,06	Lavori in corso				Dati non forniti dall'ente
	COMUNE DI JESOLO - ASI											
	Legge 910/86 Es. 1987-1988											
11	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale di Jesolo (€ 64.462,00)	1/1.4.4 a	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 27 12/3/2001	64.462,54	64.462,54	63.847,29					Finanziamento costituito dall'economia di € 64.462,54 dell'intervento 3 del comune di Jesolo
12	Progetto definitivo rete fognatura in via Rusti - Comune di Jesolo (€ 54.485,00)	1/1.4.1 bis	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 25 25/3/2002	54.485,86	54.485,86	54.485,86					Finanziamento costituito dall'economia di € 54.485,86 dell'intervento 2 del comune di Jesolo
	COMUNE DI MUSILE											
	Legge 910/86 Es. 1987-1988											
1	Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/1.21	DCR N. 744 DEL 1/7/1988	DPGR N. 2817 28/12/1990	516.456,90	516.456,90	516.456,90					Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
2	Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie	1/3.1bis ECO	DCR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA 214 17/11/2004	26.788,59	26.788,59	0,00	Progetto approvato				

Legge 910-86 Es. 87-88

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	COMUNE DI QUARTO D'ALTINO											
	Legge 910/86 Es. 1987-1988											
1	Costruzione della rete fognaria di Quarto d'Altino (VE)	1/3.2	DGR N. 259 25/1/1994	DDDA N. 26 11/4/1991	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori collaudati	20/04/1995	20/01/1997	20/11/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 102 del 20/11/2000
	COMUNE DI VENEZIA											
	Legge 910/86 Es. 1987-1988											
14 V.	Lavori di costruzione del collettore di via Paleocapa e via Canal - Marghera (VE)	1/1.5	DGR N. 259 DEL 25/01/1994	DDDA N. 9 12/9/1990	1.032.913,80	1.032.913,80	919.192,17	Lavori collaudati				La Regione ha utilizzato parte del finanziamento per € 15.493,70, destinando il rimanente pari a € 1.017.420,09 al Comune di Venezia. In attesa di ricevere la richiesta di saldo da parte del Comune di Venezia
15	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VII lotto	1/1.9		DDDA N. 14 11/10/1990	133.601,63	133.601,63	133.601,63	Progetto approvato				Modifica del progetto approvato utilizzando il finanziamento regionale oltre a fondi propri del Comune: in attesa della documentazione da parte del Comune
16	Costruzione della rete secondaria di fognatura di Pellestrina		DGR N. 4976 DEL 2/11/1993		2.582.284,50			Progettazione in corso				Impegno pari a € 2.582.284,50 disimpegnato con decreto Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
17	Costruzione della rete di fognatura di S. Marta (VE)	1/3.7	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 7 23/2/1993	2.065.827,60	2.065.827,60	2.028.110,08	Lavori collaudati				Dati attesi da parte del Comune di Venezia per decreto di contabilità finale
18	Interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e nere a completamento della fognatura consortile Mestre - Marghera (VE)				3.615.198,29	3.615.198,29	2.975.311,14	Lavori ultimati				Dati attesi da parte del Comune di Venezia
19	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld	1/4.2 bis	DAST N. 124 DEL 11/10/1990	DDDA N. 26 19/3/1999	877.976,73	877.976,73	877.976,73					
	REGIONE - DISINQUINAMENTO											
	Legge 910/86 Es. 1987-1988											
1	Somme in amministrazione per spese tecniche e notarili	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	424.340,91	424.340,91	424.340,91					

Legge 910-86 Es. 87-88

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
2	Impianto di sollevamento e modulazione del bacino di Zelarino.	1/1.3		DDDA N. 7 12/9/1990	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati				Variazione finanziamento con DDDA n. 81/96. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 55/2001
3	Lavori di costruzione dello scolmatore di via del Bosso a Chirignago - Mestre (VE)	1/1.2		DDDA N. 6 12/9/1990	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	Lavori collaudati				Variazione finanziamento con DDDA n. 76/96. D.C.F. 23 del 22/06/1998
4	Lavori di ristrutturazione delle reti fognarie del Cavallino (VE)	1/1.11		DDDA N. 19 12/11/1990	1.931.597,89	1.931.597,89	1.931.597,89	Lavori collaudati				Finanziamento originale pari a € 2.065.827,60. DCF 147 del 24/03/1998. Economia, pari a € 134.229,71, convogliata nell'int. 24
5	Lavori di completamento dei sistemi principali di collettamento della rete fognaria di Chioggia (VE)	1/1.8	N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 12 12/9/1990	4.699.757,78	4.699.757,78	4.358.752,66	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 82 del 16/02/1998 e trasferita economia al Comune di Chioggia con DDDA 15/1999
6	Lavori di costruzione rete di fognatura zona di via Martiri di Marzabotto - bacino Gazzera - Mestre (VE)	1/1.14		DDDA N. 28 18/12/1990	1.344.229,74	1.344.229,74	1.344.229,74	Lavori collaudati				Finanziamento originale pari a € 1.446.079,32. DCF 47/1996. Economia, pari a € 101.849,58, convogliata nell'int. 24
7	Lavori di estensione delle reti fognarie secondarie di Chioggia e Sottomarina (VE)	1/1.15		DDDA N. 29 18/12/1990	3.042.086,08	3.042.086,08	3.042.086,07	Lavori collaudati				Finanziamento originale pari a € 3.047.095,70. DCF 96 del 06/08/2001. Economia, pari a € 5.009,62, convogliata nell'int. 24
8	Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo	1/1.23	DGR N. 5263 DEL 2/10/1990	DDDA N. 13 15/2/1991	995.302,79	995.302,79	995.302,79	Lavori collaudati				Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. DCF DGCA 161/1998. Economia, pari a € 37.611,00, convogliata nell'int. 24
9	Lavori di costruzione dei collettori fognari di collegamento all'impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/1.13	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 25 12/12/1990	980.577,05	980.577,05	980.577,05	Lavori collaudati				Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80 . DCF DDDA 106 del 26/10/1999. Economia, pari a € 52.336,76, convogliata nell'int. 24
10	Lavori di costruzione nuovo impianto di sollevamento nel bacino di via Torino e collegamento bacino di S. Giuliano	1/1.17		DDDA N. 31 18/12/1990	770.689,83	770.689,83	770.689,83	Lavori collaudati				Finanziamento originale pari a € 774.685,35. DCF DDDA n. 48 del 14/06/1996. Economia pari a € 3.995,52 convogliata nell'int. 24

Legge 910-86 Es. 87-88

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
11	Lavori di costruzione della rete di fognatura della zona di via Asseggiano - bacino Gazzera (VE)	1/1.1	DCR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 5 12/9/1990	835.121,92	835.121,92	835.121,92	Lavori collaudati				Finanziamento originale pari a € 877.976,73 . DCF DDDA 42/1996. Economia, pari a € 42.854,81, convogliata nell'int. 24

Legge 910-86 Es. 87-88

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
12	Lavori di completamento della fognatura nella zona Nord-Est del Comune di Campagna Lupia (VE)	1/1.16		DDDA N. 30 18/12/1990	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati				Variazione finanziamento con DDDA n 554 del 18/12/1997. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 83 del 16/02/1998
13	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Chirignago - Mestre (VE)	1/1.10		DDDA N. 15 11/10/1990	1.298.757,42	1.298.757,42	1.298.757,42	Lavori collaudati				Finanziamento originale pari a € 1.497.725,01. DCF 48 del 20/03/1996. Economia, pari a € 198.967,59, convogliata nell'int. 24
14	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Carpenedo - Mestre (VE)	1/1.12		DDDA N. 20 12/11/1990	972.642,76	972.642,76	972.642,76	Lavori collaudati				Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. DCF 106 del 19/06/1996. Economia, pari a € 60.271,04, convogliata nell'int. 24
15	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VI lotto	1/1.7		DDDA N. 11 12/9/1990	1.136.205,18	1.136.205,18	1.068.506,88	Lavori ultimati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 53 del 20/05/2002
16	Fognatura bacino San Giuliano	1/1.6		DDDA N. 10 12/9/1990	433.816,22	433.816,22	433.816,22	Lavori collaudati				Finanziamento originale pari a € 464.811,21. DCF 18 del 03/03/1997. Economia, pari a € 30.994,99, convogliata nell'int. 24
17	Redazione del Piano Direttore				516.456,90	516.456,90	516.456,90	Intervento concluso				
18	Lavori di adeguamento delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione - reti di Jesolo Lido (VE)	1/1.4	DGR N. 5263 DEL 2/10/1990	DDETA N. 8 12/9/1990	2.698.487,30	2.698.487,30	2.652.463,24	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 151/1998
19	Lavori di estensione della rete interna ed il collegamento alla rete consortile - Comune di Mira (I parte)	1/1.19	DGR N. 5263 DEL 2/10/1990	DDDA N. 34 19/12/1990	3.352.130,39	3.279.236,61	3.279.236,61	Lavori collaudati				Finanziamento originale pari a € 3.356.969,84. DCF n. 76/1997. Economia pari a € 77.733,23 convogliata nell'int. 24
20	Lavori di teleregolazione e telecontrollo della fognatura di Jesolo - Philips	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	627.508,56	627.508,56	624.095,07	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n.84 del 12/08/2002
21	Lavori di adeguamento reti e impianto di depurazione di Jesolo (VE) - opere civili ed elettromeccaniche	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	446.078,81	446.078,81	446.078,81	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DGCA n.125/1998
22	Ispezioni televisive	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	77.590,68	77.590,68	77.590,68	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DGCA n.125/1998
23	Piano pilota W.R.C.	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	327.330,38	327.330,38	327.330,38	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DGCA n.125/1998

Legge 910-86 Es. 87-88

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
24	RIUTILIZZO ECONOMIE L. 910/86 Es. 1987/88	1/1. ECO	DGR 2517 DEL 13/09/2002		2.085.508,84	544.799,30	516.004,90	Lavori in corso				
25	Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo. RIUTILIZZO ECONOMIA	1/1.23 ECO		DGR 1356 21/04/1998	28.077,39	28.077,39	28.077,39	Lavori ultimati				
	ULSS.12 VENEZIA											
	Legge 910/86 Es. 1987-1988											
2	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio				5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99					
	TOTALE				51.645.689,92	47.449.802,10	45.367.428,62					
						91,88%	87,84%					

Legge 910-86 Es. 1989

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	A.C.M.											
	Legge 910/86 Es. 1989											
3	Costruzione della rete fognaria di Campagna Lupia - capoluogo (VE)	1/3.1bis	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	N. 1249 DEL 4/6/1993	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Decreto di contabilità finale n. 92/2004, per € 1.394.433,63. Disimpegnati, con DGR 2517/2002 € 154.937,07.
4	Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase	1/3.1A	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DPGR N.1365 25/6/1993	7.488.625,04	7.488.625,04	6.808.530,40	Primo appalto collaudato. Secondo appalto in attesa di collaudo	14/12/1994	27/10/2000 -	22/07/2003	Decreto di contabilità finale in sospeso: manca relazione acclarante
5	Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase: Rilievi ed ispezioni televisive collettori fognari	1/3.1	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	N. 41 DEL 8/11/1993	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Lavori collaudati	02/01/1995	20/06/1997	25/03/1998	Decreto di contabilità finale sospeso in attesa dell'integrazione della documentazione
	COMUNE DI CHIOGGIA											
	Legge 910/86 Es. 1989											
5	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia	1/1.20	DCR N. 745 DEL 1/7/1988	DDDA N. 120 DEL 6/9/1990	5.164.568,99	5.164.568,99	4.359.929,32	Lavori collaudati				Intervento suddiviso in opere elettromeccaniche (€ 2.840.512,94) e opere civili (€ 2.324.056,05). Esiste solo la relazione acclarante del collaudatore amministrativo. Manca il collaudo tecnico.
	S.PI.M.											
	Legge 910/86 Es. 1989											
2	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	1/3.6.D	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 29 21/03/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	1.037.655,67	Lavori in corso				0,00
	COMUNE DI VENEZIA											
	Legge 910/86 Es. 1989											
20 V.	Costruzione vasca di modulazione di Favaro Veneto (VE)	1/3.8	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 37 26/5/1994	1.807.599,15	1.807.599,15	1.597.613,90	Collaudo in corso	02/12/2002			Inizio dei lavori ritardato dal fallimento dell'impresa. Le opere sono finanziate, oltre che dal presente finanziamento, anche da € 568.102,59 (int. 84) e da € 413.165,52 (int. 64)

Legge 910-86 Es. 1989

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
21 V.	Costruzione della vasca di pioggia del nodo idraulico di Ca' Emiliani - Loc. Rana (VE)	1/3.3	DGR N. 745 DEL 1/7/1988	DDEA N. 59 11/12/1991	3.795.958,21	3.795.958,21	586.178,58	Lavori da appaltare				L'appalto sarà unificato all'int. n. 38. Dell'importo finanziato, una quota parte pari a € 206.582,76 è destinata al Conosorzio Sinistra Medio Brenta.
22 V.	Costruzione fognatura di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)	1/3.9	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 55 12/10/1994	1.936.713,37	1.936.713,37	2.202.677,43	Finanziamento convogliato nell'intervento 22A				Le erogazioni si riferiscono al finanziamento complessivo dell'int. 22A
22A V.	Costruzione fognatura di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)		Riuniti i finanziamenti 7 (€ 593.925,43) + 22 (€ 1.936.713,37) = € 2.530.638,80					Lavori collaudati	06/05/1997	08/07/1999	26/11/2001	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
23 V.	Impianto di depuratore del Cavallino - adeguamento della fase biologica alla rimozione dell'azoto	1/3.6.E		DDEA N. 63 11/6/1997	619.748,28	619.748,28	557.506,82	Lavori collaudati	14/07/1997	22/10/1997	04/05/1998	Registrata, con DDDA n. 17 del 02/03/1999, un' economia di € 62.241,46 destinata all'int. 24
24 V.	Fognatura e depurazione del Lido e del Cavallino	1/3.6.E 1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 32 26/4/1999	1.962.536,22	1.645.948,14	1.282.315,78	Lavori ultimati	01/05/2000			Quota parte del finanziamento, pari a € 378.046,45, convogliati nell'int. 28. Utilizzate le economie dell'int. 23 pari a € 62.241,46
25	Fognatura S.Erasmo							Fondi riallocati				Intervento affidato al MAV

VE.S.T.A.

Legge 910/86 Es. 1989

2 (95 V.)	(Acquedotto di Venezia ORIGINARIAMENTE) Progetto definitivo della nova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud	1/4.10		DGCA N. 147 29/3/2001	4.131.655,19	4.131.655,19	0,00	Progetto approvato				

CONSORZIO SINISTRA MEDIO BRENTA

Legge 910/86 Es.1989

Legge 910-86 Es. 1989

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Interventi urgenti alla stazione di sollevamento di Malcontenta	1/3.3a	DGR N. 2549 DEL 30/4/1992	DDEA N. 59 11/12/1991	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Lavori ultimati.				Intervento inizialmente affidato al CVD poi revocato (DDEA N. 2549 del 30/04/1992) e affidato a questo consorzio. Le date non sono reperibili.
	MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA											
	Legge 910/86 Es. 1989											
1	Interventi di difesa dell'isola di S.Erasmo dalle acque alte.	1/3.6.C 1	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 99 30/10/2000	1.922.252,58	1.922.252,58	0,00	Progetto approvato				Accordo di programma tra Regione e Comune. Fondi ex "Fognature Giudecca" pari a € 2.582.284,49 riallocati con DCR 32/97, al finanziamento 1 (€ 1.922.252,58) e al finanziamento 2 (€ 660.031,92)
2	Fognatura S. Erasmo	1/3.6.C	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		660.031,92			Fondi disimpegnati sul capitolo 50511 con DGR 2517 DEL 13/09/2002				
	REGIONE - DISINQUINAMENTO											
	Legge 910/86 Es. 1989											
26	Lavori di estensione rete interna e collegamento alla rete consortile - Comune di Mira - II parte	1/1.18		DDDA N. 32 18/12/1990	3.098.741,39	3.098.741,39	3.003.584,63	Lavori collaudati				Registrata, con DDDA n. 73 del 30/06/1997, un'economia di € 95.156,76
	ULSS.12 VENEZIA											
	Legge 910/86 Es. 1989											
3	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio				2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Finanziamento convogliati nell'interventi 4A				
	TOTALE				38.734.267,43	37.757.647,44	25.877.521,86					
						97,48%	66,81%					

Legge 67-88 Es. 88

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	COMUNE DI CHIOGGIA											
	Legge 67/88 Es. 1988											
4	Realizzazione vasche di accumulo per acqua grezza alla centrale di Cavanella d'Adige		DGR N. 4171 DEL 24/9/1996	DDDA N. 577 24/12/1997	774.685,35	774.685,35	387.342,67	Lavori collaudati				Collaudo effettuato: in attesa dell'invio da parte dell'ente della relazione acclarante
5	Rifacimento impianti di sollevamento a Cavanella d'Adige (acqua grezza e potabile)		DGR N. 2357 DEL 04/06/1996	DDDA N. 576 24/12/1997	413.165,52	413.165,52	206.582,76	Lavori collaudati				Collaudo effettuato: in attesa dell'invio da parte dell'ente della relazione acclarante
6	Razionalizzazione reti di distribuzione interna e recupero perdite dell'acquedotto di Chioggia		DGR N. 4442 DEL 27/7/1990	DDDA N. 61 12/3/1997	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Lavori collaudati				Decreto di contabilità finale in preparazione.
	COMUNE DI VENEZIA											
	Legge 67/88 Es. 1988											
26 V.	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (VE) - trattamento delle acque.				Finanziamento suddiviso negli interventi 26A e 26B							
26A V.	Opere presso depuratore Fusina (ex fondi "ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (VE) - trattamento delle acque.")	1/2.1	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990		6.482.229,51	0,00	0,00	Fondi riallocati				In attesa di chiarimenti sulla destinazione dei fondi da parte del Comune di Venezia
26B V.	Ampliamento impianto di depurazione di Fusina - IV linea . Trattamento delle acque.	1/2.1a	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990		231.710,18	231.710,18	231.710,18	Progettazione conclusa				Finanziamento limitato alle sole spese di progettazione
27 V.	Completamento dell'impianto di trattamento di Campalto - Opere accessorie	1/2.2	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990	DPGR N. 207 26/1/1994	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 203 del 22/10/2004
	VENETO ACQUE S.p.A.											
	Legge 67/88 Es. 1988											
1	Sistema degli acquedotti del Basso Veneto - Realizzazione della condotta Cavarzere - Chioggia	1/4.10	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	8.934.704,35	8.934.704,35	2.680.411,31	Lavori in corso				Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002
	TOTALE				18.334.219,92	11.851.990,41	5.003.771,93					
						64,64%	27,29%					

Legge 67-88 Es. 90

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	ACM											
	Legge 67/88 Es. 1990											
6	Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (VE)	1/2.15	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR N. 1249 4/6/1993	516.456,90	516.456,90	446.735,22	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Registrata, con DDDA n. 92/2004, un'economia pari a € 69.721,68
6A	Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (VE) (€ 2.065.827,60)	Finanziato con i fondi del finanziamento 3 (€ 1.549.370,70) + 6 (€ 516.456,90) = € 2.065.827,60						Lavori collaudati	28/12/1994	16/03/1998	29/09/2003	Registrata, con DDDA n. 92/2004, un'economia pari a € 69.721,68
	COMUNE DI CHIOGGIA											
	Legge 67/88 Es. 1990											
6	Collegamento a impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)	1/2.14b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 109 20/6/1996	56.810,26	56.810,26	56.810,26	Lavori ultimati				Finanziamento originale pari a € 568.102,59, di cui € 511.292,33 revocati e devoluti alla Diocesi Patriarcato di Venezia
7	Appalto 42/A e 42/B. Ampliamento rete fognaria del centro strorico di Chioggia e Sottomarina	1/2.14a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 27 20/7/1993	7.436.979,35	7.436.979,35	7.191.067,31	Lavori collaudati	21/05/1997	15/06/2000	14/10/2002	Registrata, con DDDA n. 2 del 13/01/2003, un'economia di € 254.911,79 reiscritta nel capitolo 50511 del bilancio regionale
	COMUNE DI CODEVIGO											
	Legge 67/88 Es. 1990											
1	Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (PD)	1/2.13	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 2261 29/10/1992	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	Date non comunicate dall'ente			Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 381 del 02/10/1997
	COMUNE DI JESOLO											
	Legge 67/88 Es. 1990											
6	Ampliamento della rete fognaria di via Bafile in Comune di Jesolo (VE)	1/2.10a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 14 16/4/1993	2.614.145,78	2.614.145,78	2.614.145,78	Lavori collaudati				L'erogazione comprende l'importo di € 226.367,16 (economia) reimpiegata nell'intervento 14, con DDDA n. 34 del 21/06/2000
7	Interventi alle reti -parte 1^ / parte 2^.	1/1.4.3 b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 71 23/6/1997	126.343,95	126.343,95	126.343,95	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 26/10/1999
8	Progetto degli interventi presso l'impianto di depurazione comunale.	1/2.10b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 13 12/5/1997	1.142.673,28	1.142.673,28	1.062.639,11	Lavori collaudati	17/09/1997	13/11/1999	07/03/2002	Registrata, con DDDA n. 6 del 05/02/2003, un'economia di € 80.034,17

Legge 67-88 Es. 90

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
9	Somme per ulteriori interventi per copertura supero di spesa progetto "ampliamento rete fognaria Via Bafile" (1/2.10a)		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		9.119,02	6.536,02	6.536,02					Dati non forniti dall'ente
10	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 35 DEL 5/5/1999	6.527,10	6.527,10	6.527,10	Finanziamento riallocato nell'intervento 13A				
	COMUNE DI JESOLO/ASI											
	Legge 67/88 Es. 1990											
13	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale di Jesolo	1/1.4.4 b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 27 12/3/2001	6.478,90	6.478,90	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 13A				
13A	Trattamento dei percolati da discarica (€ 77.468,53)		Riuniti i finanziamenti 10 (€ 6.527,10) + 13 (€ 6.478,90) + 11 (€ 64.462,54) = € 77.468,53					Lavori ultimati. Collaudo in corso	03/09/2001	30/04/2002	-	
14	Progetto definitivo rete fognatura in via Rusti - Comune di Jesolo	1/2.10a bis	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 25 25/3/2002	226.367,16	226.367,16	226.367,16	Finanziamento convogliato nell'intervento 14A				
14A	Costruzione della rete fognaria in via Rusti - Comune di Jesolo (€ 280.853,02)		Riuniti i finanziamenti 12 (€ 54.485,86) + 14 (€ 226.367,16) = € 280.853,02					Lavori ultimati. Collaudo in corso				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 99 del 08/06/2005
	COMUNE DI MUSILE											
	Legge 67/88 Es. 1990											
3	Rete fognaria comune di Musile di Piave	1/2.11a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 111 15/10/1992	1.530.258,76	1.530.258,76	1.530.258,76	Lavori collaudati				Importo originale del finanziamento € 1.549.370,70. Registrata, con DDDA n. 22 del 26/03/2003, un'economia di € 19.111,94 (reinvestita nell' int. 4)
4	Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie	1/2.11a ECO	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA 214 17/11/2004	19.111,94	19.111,94	0,00	Progetto approvato				
5	Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/2.11b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 32 26/3/1997	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
	COMUNE DI QUARTO D'ALTINO											
	Legge 67/88 Es. 1990											
2	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino (VE)	1/2.12	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 1047 28/4/1993	2.582.284,50	2.582.284,50	2.259.776,30	Lavori collaudati	25/10/1996	20/07/1998	20/09/1998	Registrata, con DDDA n. 93 del 19/05/2004, un'economia di € 322.508,20
	COMUNE DI VENEZIA											

Legge 67-88 Es. 90

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 67/88 Es. 1990											
28 V.	Ampliamento della fognatura del Cavallino (VE) - II stralcio	1/2.7	DGR N. 259 DEL 25/1/1994		3.098.741,39	3.098.741,39	2.881.295,30	Lavori collaudati	23/05/1996	10/04/1998	28/01/2002	L'importo dei lavori sale con perizia suppletiva di € 542.279,74, finanziato con parte dell'int. 24, pari a € 378.046,45 e con parte dell'int. 68 pari a € 163.727,74. In attesa di ricevere la richiesta di saldo
29	Ampliamento delle fognature di Pellestrina (VE)	1/2.8	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		1.549.370,70	0,00	0,00	Progettazione in corso				Impegno pari a € 1.549.370,70 disimpegnato con decreti Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
30	Ampliamento delle fognature del Lido di Venezia - VIII lotto	1/2.6	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	N. 23 DEL 15/4/1994	3.098.741,39	3.098.741,39	2.883.521,33	Lavori collaudati				In attesa dell'invio della documentazione da parte del Comune di Venezia per decreto di contabilità finale (importo € 2.883.521,17)
31 V.	Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo - Bissuola (VE)	1/2.4b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 2436 3/10/1994	6.455.711,24	6.455.711,24	722.403,66	Lavori in corso				L'erogazione è comprensiva delle spese di progettazione e dell'anticipo del 10%
32 V.	Costruzione della vasca di accumulo acque meteoriche di piazzale Giovannacci - Marghera (VE)	1/2.3a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDEA N. 24 DEL 7/4/1995	4.131.655,19	4.131.655,19	3.718.489,67	Collaudo in corso				Collaudate le opere civili. In appalto le opere elettromeccaniche
33 V.	Razionalizzazione della rete fognaria di Marghera (VE) - via Asseggiano a Chirignago	1/2.3b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 1182 9/6/1994	3.615.198,29	3.615.198,29	3.167.908,06	Lavori collaudati				Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
34 V.	Ampliamento IV linea depuratore Fusina.							Fondi riallocati				
34B V.	Opere presso depuratore Fusina (ex fondi "ampliamento IV linea depuratore Fusina").	1/2.5.B	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		936.407,25	936.407,25	0,00	Progetto approvato				Finanziamento proveniente da fondi riallocati
	CONSORZIO DESE SILE											
	Legge 67/88 Es. 1990											
3	Risanamento e rinaturalizzazione del II tronco del canale Acque Basse	1/2.4a	DGR N. 3324 DEL 29/07/1996	DPGR 2436 03/10/1994	6.455.711,24	6.455.711,24	275.991,49	Lavori in corso				
	REGIONE DISINQUINAMENTO											
	Legge 67/88 Es. 1990											

Legge 67-88 Es. 90

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
27	Aggiornamento Piano Direttore II^ fase, monitoraggio acque sfocianti in laguna e fognature di Venezia	1/2.16 Penna	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		1.614.488,62	1.612.365,41	1.506.446,74	Lavori in corso				
28	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)	1/2.5.A	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		2.065.827,60	2.019.540,61	631.110,85	Lavori in corso				
29	Aggiornamento del Piano Direttore	1/2.16	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		967.795,88	967.795,88	959.662,38	Lavori ultimati				
30	Impianto integrato di Fusina - P.I.F. (linea di filtrazione per il riutilizzo industriale delle acque trattate - I° stralcio)	1/2.5	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		96.506,54	96.506,54	96.506,54	Intervento concluso				Quota spesa per la sola progettazione
	ULSS 12 VENEZIA/SETTORE DISINQUINAMENTO											
	Legge 67/88 Es. 1990											
6	Ristrutturazione della rete fognaria dell'ospedale civile SS. Giovanni e Paolo - Primo stralcio funzionale	1/2.9	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 68 16/10/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	04/12/1995	30/06/1998	25/09/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 21 del 26/03/2003
	DIOCESI PTRIARCATO DI VENEZIA											
	Legge 67/88 Es. 1990											
2	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/2.14b .1	DGR 4599 05/08/1991		511.292,33	0,00	0,00	Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Chioggi/ASP "Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)" cod 1/2.14b
	TOTALE				53.969.745,96	51.858.089,74	35.469.284,40					
						96,09%	65,72%					

Legge 67-88 Es. 91

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	ARPAV											
	Legge 67/88 Es. 1991											
1	Sistema informativo regionale - Nodo laguna	4a	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DGR N. 2558 27/07/1999	258.228,50	258.228,45	274.484,19	Lavori in corso				Fondi derivanti da un finanziamento iniziale di € 7.950.853,96 suddiviso negli interventi 1 (€ 258.228,45), 2 (€ 1.032.913,80), 7A (€ 4.787.555,45), 8 (€ 839.242,46) e 11 (€ 1.032.913,80)
	AZIENDA CONSORZIO DEL TERGOLA											
	Legge 67/88 Es. 1991											
1	Impianto di Vigonza (PD)		DGR N. 4975 2/11/1993	DPGR 2267 6/11/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				
2	Interventi nel settore della zootecnia dell'alta padovana		DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DGR N. 561 DEL 2/3/1999	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Lavori in corso	01/03/2000			Le opere eseguite vanno a far parte dell'intervento 1A SE.T.A. "Centro di biotrattamento di Camposampiero", il cui nuovo termine dei lavori è stabilito al 19/11/2008 con DDDA n. 173/2003.
	COMUNE DI CHIOGGIA											
	Legge 67/88 Es. 1991											
8	Fognatura di Chioggia (VE)	3c	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 115 28/6/1996	516.456,90	516.456,90	514.127,07	Lavori collaudati	16/10/1996	29/04/1997	03/03/1998	Registrata, con DDDA n. 35 del 21/06/2000, un'economia di € 2.329,83 reiscritta nel capitolo 50511 del bilancio regionale
	COMUNE DI MEOLO											
	Legge 67/88 Es. 1991											
1	Adeguamento impianto di depurazione e rete fognaria in comune di Meolo	3b	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 7 20/1/1995	516.456,90	516.456,90	464.811,21	Finanziamento diviso negli interventi 1A, 1B e 1C				
1A	Adeguamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura di via Cà Tron, via Verdi e via Toscanini (progetto complessivo € 428.963,36)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 1					Lavori collaudati	12/06/1998	10/06/1999	25/09/2000	Documentazione relativa al collaudo, sollecitata più volte, non ancora inviata da parte dell'ente
1B	Ampliamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura (progetto complessivo € 74.913,49)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 1					Lavori collaudati	09/11/1995	15/10/1998	coll. provvis. 15-10-1998	Documentazione relativa al collaudo, sollecitata più volte, non ancora inviata da parte dell'ente

Legge 67-88 Es. 91

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1C	Ampliamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura (progetto complessivo € 74.554,87)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 1					Lavori collaudati	09/11/1995	15/10/1998	coll. provvis. 15-10-1998	Documentazione relativa al collaudo, sollecitata più volte, non ancora inviata da parte dell'ente
	COMUNE DI VENEZIA											
	Legge 67/88 Es. 1991											
35 V.	Estensione della rete fognaria di tipo separato nella zona di Trivignano - Zelarino - II lotto	1b	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 12 12/2/1996	3.925.072,43	3.925.072,43	3.532.573,45	Lavori in via di ultimazione	12/12/1997			Mancano lavori di completamento. Integrazione di € 516.456,89 proveniente dall'int. 85. Ritardi dovuti al fallimento dell'impresa
36	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld	1/4.2 bis	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 26 19/3/1999	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Finanziamento convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
36A	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld	1/4.2 bis	Riuniti i finanziamenti 11(€ 676.558,54) + 19 (€ 877.976,73) + 36 (€ 258.228,45) + 58 (€ 1.545.239,04) = € 3.358.002,76					Lavori ultimati				
	ENTE BACINO RSU VE 2											
	Legge 67/88 Es. 1991											
1	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia	4a	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DGR N. 863 09/03/1993	6.713.939,69	6.713.939,69	6.713.939,69					
	TOTALE				15.803.581,16	15.803.581,11	15.373.362,35					
						100,00%	97,28%					

Legge 67-88 Es. 92 1^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	ACM											
	Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche											
7	Realizzazione di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature (€ 4.131.655,19)	1/4.3	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994		1.194.969,19	0,00	0,00	Finanziamento suddiviso da 7A a 7E				Finanziamento originale pari a € 4.131.655,19
7A	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature del comune di Strà	1/4.3c	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 144 23/07/2004	462.554,00	462.554,00	55.562,74	Lavori in corso				
7B	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature del comune di Campagna Lupia	1/4.3a	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 142 23/07/2004	499.945,00	499.945,00	44.299,97	Lavori in corso				
7C	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature del comune di Fiesso d'Artico	1/4.3b	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 143 23/07/2004	460.000,00	460.000,00	99.642,92	Lavori in corso				
7D	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature nel comune di Mirano (VE)	1/4.3d	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 92 31/05/2005	654.835,00	654.835,00	27.844,19	Lavori in corso				
7E	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature nel comune di Spinea (VE)	1/4.3e	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 93 31/05/2005	859.352,00	859.352,00	33.592,90	Lavori in corso				
	APGA											
	Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche											
2	Realizzazione di collettori fognari e depurazione nell'area Sud del Piovese	1/4.4	DGR N. 2773 21/6/1994	DPGR N. 1293 8/6/1995	1.549.568,48	1.549.568,48	1.549.568,48	Contabilità finale				Finanziamento originale pari a € 1.652.662,08 Registrata un'economia di € 103.093,6 destinata, con DDDA n. 26 del 25/03/2002, all'intervento 2 bis
2bis	Potenziamento dei sistemi depurativi e ampliamento reti fognarie - 1° stralcio - Impianti (€ 103.093,60)	1/4.4bis	DGR N. 2773 21/6/1994	DDDA N. 126 6/11/2002	103.093,60	103.093,60	103.093,60	Contabilità finale				Utilizzata l'economia di € 103.093,6 dell'intervento 2
	COMUNE DI CAVARZERE											
	Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche											
1	Fognatura comunale di Cavarzere	1/4.5	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 62 DEL 8/9/1995	568.102,59	568.102,59	566.906,86	Lavori collaudati	Date non comunicate dall'ente			Registrata, con DDDA n. 19 del 26/02/2001, un'economia di € 1.195,73 reiscritta sui fondi impegnati con DGR n. 186/CR/1993

Legge 67-88 Es. 92 1^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
2	Ampliamento dell'impianto di depurazione - III lotto	1/4.5bis	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DPGR 2293 9/11/1995	723.039,66	723.039,66	723.039,66	Lavori collaudati	Date non comunicate dall'ente			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 93 del 23/09/2002
	COMUNE DI VENEZIA											
	Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche											
37 V.	Progetto di rifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana	1/4.2	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	N. 157 DEL 16/9/1996	2.840.512,95	2.840.512,95	2.666.908,82	Lavori collaudati	27/05/1997	08/05/1999	14/10/2002	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
38 V.	Impianto di sollevamento in località "Rana" e condotta di scarico.	1/4.2 bis	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994		2.324.056,05			Progettazione in corso				Impegno pari a € 2.324.056,05 disimpegnato con decreti Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
	CONSORZIO DESE SILE											
	Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche											
4	Impianto idrovoro a servizio del Canale Scolmatore del fiume Marzenego - II stralcio	1/4.1	DGR N. 2773 DEL 21/06/1994	DDDA N. 72 02/11/1995	3.098.741,39	3.098.741,39	3.098.741,39	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 27 del 31/03/1999
	TOTALE				15.338.769,90	11.819.744,67	8.969.201,53					
						77,06%	58,47%					

Legge 67-88 Es. 92 2^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche											
1	Ampliamento impianto di depurazione di Onara	1/4.6	DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	DPGR 2207 31/10/1995	1.239.496,56	1.239.496,56	1.239.496,56	Lavori collaudati	04/12/1996	16/10/2001	12/04/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 155 del 30/10/2003
2	Collettore fognario di adduzione Ovest Fontaniva - Cittadella - Tombolo	1/4.6	DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	DDDA N. 70 18/10/1995	2.633.930,19	2.633.930,19	2.633.907,51	Lavori collaudati	02/09/1999	23/07/1999	15/10/2001	Registrata, con DDDA n. 47 del 9/05/2002, una economia di € 22,68
	AZIENDA CONSORZIALE VENETO SERVIZI Legge 67/88 Es. 1992 - II tranche											
1	Interventi di fognatura per impianti di depurazione minori.	1/5.2	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 146 12/12/2002	1.549.370,70	1.549.370,70	1.360.924,27	Lavori in corso				
2	Interventi di fognatura nei comuni di Candiana, Conselve, Monselice, Pozzonovo, Solesino, Tribano	4d	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 101 18/10/2002	3.615.198,29	3.615.198,29	2.117.624,21	Lavori in corso				
	CONSORZIO DESE SILE Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche											
5	Sistemazione Fiume Marzenego - Ramo Beccherie		DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	DGCA N. 367 24/09/1997	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	23/07/1999	23/01/2001	22/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 132 del 25/11/2002
	CONSORZIO SINISTRA MEDIO BRENTA Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche											
2	Lavori di sistemazione idraulica e di ricalibratura della rete di bonifica di Chirignago e di interconnessione con l'impianto idrovoro di Malcontenta.	4b	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		774.685,35			Finanziamento convogliato nell'intervento 8A				Impegno pari a € 774.685,35 disimpegnato con decreto Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
3	Potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta (finanziato effettivo: L. 2,5 MLD)	4 c	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 39 19/5/1999	1.291.142,25	1.291.142,25	1.145.525,32	Collaudo in corso	12/06/2000	03/06/2002		
	VENETO ACQUE Legge 67/88 Es. 1992 II tranche											
5	Progetto Integrato Fusina P.I.F. (Impianto taratura processi: completamento ed aggiornamento del progetto e realizzazione dell'impianto)	1/6.1.1	DGR N. 45 DEL 15/07/1999	DGR 3905 12/12/2003	3.100.000,00	3.100.000,00	930.000,00	Lavori in corso				
	REGIONE DISINQUINAMENTO Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche											

Legge 67-88 Es. 92 2^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
31	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)	1/6.1	DGR N. 45 DEL 15/07/1999	DGR N. 2121 DEL 2004	7.229.137,98	62.400,00	62.400,00					Impegno di spesa a favore dello IUAV
32	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)		DGR N. 45 DEL 15/07/1999		8.263.310,39							
33	Quota regionale agenzia per Venezia											Finanziamento di € 5.164.568,99 revocato con DDDA n. 108 del 28/10/1999
	TOTALE				30.987.413,94	14.782.680,23	10.781.020,12					
						47,71%	34,79%					

Legge 360-91

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	COMUNE DI VENEZIA Legge 360/91											
39	Bonifica della discarica di rifiuti Ca' Emiliani (Marghera)		DGR N. 5211 DEL 18/11/1993					Fondi riallocati nell'intervento 39A				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
39A	Bonifica in viale S. Marco in comune di Venezia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		1.032.913,80	0,00	0,00	Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. In attesa dell'invio della documentazione da parte del Comune di Venezia
40	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bonifica discarica di S. Giuliano (VE) - I lotto "B1"	1/2.5	DGR N. 6243 DEL 30/10/1991		1.032.913,80	0,00	0,00	Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. Impegno pari a € 1.032.913,80 disimpegnato con decreti Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
	CONSORZO DESE SILE Legge 360/91											
6	Ricalibrazione e sostegno nei sottobacini del Marzenego		DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		1.291.142,25			Finanziamento convogliato nell'intervento 16 per € 1.291.142,25				
	ENTE DI BACINO RSU VE 2 Legge 360/91											
2	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia		DGR N. 6243 DEL 30/10/1991	DPRG N. 911 06/05/1992	3.356.969,84	3.356.969,84	3.356.969,84					
	REGIONE FORESTE/AGRICOLTURA/ZOOTECNIA Legge 360/91											
1	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - I stralcio	1/3.4	DGR N. 6243 DEL 30/10/1991	DDEA N. 33 DEL 28/9/1993	452.932,70	452.932,70	216.807,60	Lavori ultimati				Progetto affidato al Centro Veneto Disinquinamento (CVD) e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)
2	Progetto per la realizzazione del Bosco di Mestre - II stralcio	1/4.8	DGR N. 5211 DEL 18/11/1993	DGCA N. 542 DEL 10/12/1997	409.756,90	229.532,47	229.532,47	Lavori in corso				Progetto esecutiva e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)

Legge 360-91

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
3	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - II stralcio		DGR N. 5211 DEL 18/11/1993		686.681,09	580.645,25	0,00					Progetto esecutiva e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)
	TOTALE				8.263.310,39	4.620.080,26	3.803.309,92					
						55,91%	46,03%					

Legge 139-92 Es 93

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	ARPAV Legge 139/92 Es. 1993											
2	Interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua	4/B/1	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DGR N. 2558 27/07/1999	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori in corso				
3	Estensione rete agrometeorologica	6/C/1	DGR N. 4977 DEL 22/07/1993	DGR N. 156 27/1/1995	516.456,90	516.456,90	515.250,42	Lavori ultimati			15/05/1998	
	ACM Legge 139/92 Es. 1993											
8	Completamento fognatura nera in Comune di Noale	1/B/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 36 25/5/1995	929.622,42	929.622,42	929.622,42	Lavori collaudati	28/06/1996	24/09/1998	01/08/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 119 del 25/10/2002
9	Completamento fognatura nera in Comune di Salzano	1/B/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	06/11/1995	17/04/1997	18/10/1997	Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 99 del 02/03/1998
10	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Martellago	1/B/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 67 16/10/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	11/04/1996	26/02/1999	21/12/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 8 del 15/02/2002
11	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Scorzè	1/B/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 69 19/10/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	11/04/1996	26/11/1998	26/03/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 79 del 15/07/2002
12	Vasca di pioggia di Noale	1/B/5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 170 29/10/1996	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Lavori collaudati	01/09/1998	25/03/1999	21/02/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 7 del 15/02/2002
13	Interventi alle fognature del Consorzio del Mirese (€ 1.229.167,42)	2/A/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993		0,00	0,00	0,00	Intervento suddiviso negli interventi 31 (€ 242.734,74), 32 (€ 142.025,65) e 33 (€ 844.407,03)				
14	Pulizia, ispezione televisiva e rilievo di condotte fognarie nei comuni di Dolo e Spinea	2/A/7	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 7 27/1/1997	320.203,28	320.203,28	320.203,28	Lavori collaudati	27/01/1998	26/07/1999	29/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 9 del 07/01/2004
15	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Mirano	2/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 28 19/4/1995	3.356.969,84	3.356.969,84	3.356.969,84	Lavori collaudati	11/04/1996	22/12/2000	24/06/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 151 del 30/10/2003
16	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di S. Maria di Sala	2/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 28 19/4/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	29/03/1996	31/07/1999	29/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 45 del 07/07/2000
17	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Vigonovo	2/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 28 19/4/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	18/09/1998	01/08/1999	29/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 9 del 14/02/2001
18	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Stra	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	16/07/1997	19/11/1998	29/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 87 del 30/10/2000
19	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Fiesso d'Artico	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	27/11/1995	31/12/1997	07/10/1999	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 88 del 30/10/2000

Legge 139-92 Es 93

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
20	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Dolo	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 18 3/3/1995	2.324.056,05	2.324.056,05	2.314.921,22	Lavori collaudati	27/11/1995	06/02/2003	15/09/2003	Registrata, con DDDA n. 10 del 07/01/2004, un'economia pari a € 9.134,83
21	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Pianiga	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 18 DEL 3/3/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	25/11/1995	27/09/1997	25/11/1999	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 07/07/2000
22	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Campolongo Maggiore	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	27/11/1995	09/07/1997	08/08/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 43 del 07/07/2000.
23	Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - I stralcio	2/A/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 4 19/1/1995	2.556.461,65	2.556.461,65	2.556.461,65	Lavori collaudati	25/09/1996	25/09/1999	25/02/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 80 del 15/07/2002
24	Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - II stralcio	2/A/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 5 19/1/1995	3.382.792,69	3.382.792,69	3.382.792,69	Lavori collaudati	31/05/1995	09/01/1999	07/05/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 07/01/2004
25	Lavori di costruzione fognature nel Comune di Camponogara	2/A/5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 56 24/10/1994	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	25/02/1995	16/10/1996	02/03/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 18 del 27/05/1998
26	Interventi alle fognature nel Comune di Fossò	2/A/6	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 51 7/10/1994	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori ultimati				Collaudo in corso
27	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira A	2/A/1.1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 146 31/12/1999	854.736,17	854.736,17	854.736,17	Contabilità finale				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 101 del 10/06/2005
28	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira B	2/A/1.2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 147 31/12/1999	671.393,97	671.393,97	671.393,97	Contabilità finale				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 37 del 08/03/2005
29	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira C	2/A/1.3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 148 31/12/1999	539.697,46	539.697,46	539.697,46	Lavori collaudati	20/12/2000	31/07/2002		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 138 del 16/07/2004
30	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mirano	2/A/1.4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 149 31/12/1999	774.685,35	774.685,35	774.295,86	Lavori collaudati	20/12/2000	29/10/2002		Registrata, con DDDA n. 46 del 3/3/2004, un'economia pari a € 389,49
31	Progetto esecutivo per l'eliminazione di perdite, rotture, infiltrazioni, sedimentazioni, incrostazioni, ecc. da effettuarsi sulla base di risultanze acquifere. 27° Lotto fognature.	2/A/1.5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 16 28/2/2002	242.734,74	242.734,74	242.734,74	Lavori collaudati	12/07/2002	10/02/2003	22/10/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 45 del 02/03/2004
32	Progetto esecutivo per l' eliminazione di perdite, rotture, infiltrazioni, sedimentazioni, ecc. da effettuarsi sulla base di risultanze acquifere. 27° lotto fognature.	2/A/1.6	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 17 28/2/2002	142.025,65	142.025,65	142.025,65	Contabilità finale				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 154 del 20/09/2005

Legge 139-92 Es 93

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
33	Progetto esecutivo per la costruzione di reti fognarie nere e per il completamento degli allacciamenti alle utenze. 27° lotto fognature	2/A/1.7	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 18 28/2/2002	844.407,03	844.407,03	759.966,34	Collaudo in corso				
	APGA Legge 139/92 Es. 1993											
3	Completamento impianto di depurazione di Codevigo	5/E/1	DGR N. 4977 2/11/1993	DPGR N. 2955 28/11/1994	3.064.204,68	3.064.204,68	3.064.204,68	Lavori collaudati	10/09/1996	16/12/1998	26/11/2001	Finanziamento originale pari a € 3.098.741,39. Registrata, con DDDA n. 39 del 23/04/2002, un'economia di € 34.536,72 destinata all'intervento 3 bis
3bis	Utilizzo delle economie di spesa maturate nel finanziamento del progetto relativo alle opere di ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Codevigo	5/E/1 ECO	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 169 13/09/2004	34.536,72	34.536,72	34.536,72	Contabilità finale				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 227 del 05/12/2005
	AZIENDA CONSORZIO DEL TERGOLA Legge 139/92 Es. 1993											
3	Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Appalti A e B	1/A/1	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 51 21/6/1995	16.165.100,94	16.165.100,94	16.165.100,94	Lavori collaudati	29/01/1996 16/01/1996 23/05/1997	29/07/1999 28/12/1998 04/08/2000	15/10/2000 07/07/2001 28/12/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 95 del 23/09/2002
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza	1/A/2	DGR N. 4977 2/11/1993	DPGR 2267 6/11/1995	6.507.356,93	6.507.356,93	6.507.356,93	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				
4A	Esecuzione dei lavori di ampliamento impianto di depurazione di Vigonza (€ 7.540.270,73)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.032.913,80) + 4 (€ 6.507.356,93) = € 7.540.270,73					Lavori collaudati	24/09/1996	07/07/1999 28/07/1999	10/02/2000 15/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 15/01/2001 per € 7.540.270,73
5	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero	1/A/3	DGR 4977 2/11/1993	DPGR 2391 24/11/1995	4.338.237,95	4.338.237,95	4.338.237,95	Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SE.T.A.				
6	Progetto del collettore di collegamento della rete di Loreggia al depuratore di Camposampiero - XV lotto	1/A/4	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 54 12/10/1994	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori collaudati	20/11/1995	30/11/1996	09/03/1999	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 45 del 09/05/2002
7	Collettore di collegamento della rete di Borgoricco alla rete consortile a Villanova di Camposampiero e costruzione fognatura Via Roma e S. Lorenzo a Borgoricco	1/A/5	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 53 12/10/1994	1.652.662,08	1.652.662,08	1.651.834,57	Lavori collaudati	02/09/1996 01/06/2000	26/07/1999 27/06/2001	30/10/2001 06/12/2001	Registrata, con DDDA n. 14 del 15/01/2004, un'economia di € 827,51
	COMUNE DI ARQUA' PETRARCA Legge 139/92 Es. 1993											

Legge 139-92 Es 93

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Fognatura nel comune di Arquà Petrarca	6/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DPGR N. 6 DEL 3/1/1995	516.456,90	516.456,90	513.763,48	Lavori collaudati	05/02/1999 01/06/1999	29/07/2002	08/09/2003	Decreto di contabilità finale in sospeso, in attesa dell'invio da parte dell'ente della documentazione completa relativa al collaudo
	COMUNE DI CHIOGGIA Legge 139/92 Es. 1993											
9	Ampliamento fognature bianca e nera nel centro storico di Chioggia	5/F/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 66 2/10/1995	4.622.289,25	4.622.289,25	1.154.906,22	Parte dei lavori collaudati	29/04/1996	16/04/1999	03/10/2000	Rescisso il contratto con la ditta appaltatrice
10	Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acqua salata nella rete di fognatura	5/F/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 45 13/6/1995	542.279,74	542.279,74	505.435,40	Lavori collaudati	06/05/1996	06/12/1997	15/05/2000	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo dell'opera.
	COMUNE DI MOGLIANO VENETO Legge 139/92 Es. 1993											
3	Opere di completamento della fognatura comunale e monitoraggio/telerilevamento impianti di sollevamento	5/G/1	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 68 24/11/1994	3.098.741,39	3.098.741,39	2.755.972,37	Lavori ultimati				Dati e documentazione non ancora inviata da parte dell'ente
	COMUNE DI MONSELICE Legge 139/92 Es. 1993											
1	Fognatura di Monselice	6/A/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DPGR N. 103 24/1/1995	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Lavori collaudati	20/11/1995	03/12/1998	31/10/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 41 del 28/04/2002
	COMUNE DI PIOVE DI SACCO Legge 139/92 Es. 1993											
1	Sistemazioni idraulico-ambientali di Piove di Sacco ("Vallo di circonvallazione")	5/C/1	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 80 24/11/1995	1.609.967,86	1.609.967,86	1.609.967,86	Lavori collaudati	14/04/1997	05/11/1998	06/06/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 19 del 26/3/2003
2	Ampliamento fognature di Piove di Sacco	5/C/2	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 23 03/04/1995	2.005.230,43	2.005.230,43	2.005.230,43	Lavori collaudati	06/09/1995	28/08/1998	07/04/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 20 del 26/3/2003
	COMUNE DI QUARTO D'ALTINO Legge 139/92 Es. 1993											
3	Interventi alle fognature di Quarto d'Altino (II stralcio)	5/A/1	DGR N. 4977 2/11/1993	DDETA N. 6 20/1/1995	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	Lavori collaudati	18/12/1996	05/08/1999	21/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 103 del 20/11/2000
	COMUNE DI VENEZIA Legge 139/92 Es. 1993											

Legge 139-92 Es 93

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
41	Fognature di Pellestrina (VE)	5/B/1.1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993		520.588,55	0,00	0,00	Progettazione in corso				Interventi gestiti dalla società INSULA
42 V.	Ristrutturazione dei collettori principali di fognatura di via Torino a Mestre	1/C/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 17 12/2/1996	4.751.403,47	4.751.403,47	4.283.343,57	Lavori collaudati	14/01/1997	06/08/1999	22/01/2001	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
43 V.	Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano	1/C/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 20 12/2/1996	2.995.450,01	2.995.450,01	1.333.826,50	Lavori in corso	31/01/1997			Sospensione lavori per mancata tenuta dei diaframmi. Impresa fallita. Nuovo progetto che comporta un incremento di spesa di € 1.549.371,00 finanziato con parte dei fondi dell'int. 84.
44 V.	Completamento della rete di fognatura separata della zona del Terraglio - bacino di Carpenedo - Mestre	1/C/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 16 12/2/1996	2.943.804,32	2.943.804,32	2.649.423,89	Lavori collaudati	15/05/1997	03/11/1999	07/01/2002	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
45 V.	Estensione della rete di fognatura separata nella zona di Marghera tra SS. Romea e autostrada VE-PD	1/C/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 13 12/2/1996	1.859.244,84	1.859.244,84	1.660.333,60	Lavori collaudati	10/03/1997	14/09/1999	04/11/2002	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
46 V.	Ristrutturazione della rete fognatura attigua al rio Cimetto - bacino Gazzera Mestre	1/C/5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 14 12/2/1996	2.014.181,91	2.014.181,91	1.730.927,27	Lavori collaudati	07/01/1998	19/11/1999	05/02/2001	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
47 V.	Ristrutturazione della fognatura nella zona di Cipressina - Zelarino	1/C/6	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 22 12/2/1996	2.737.221,57	2.737.221,57	2.649.067,15	Lavori collaudati	23/03/1998	24/03/2000	09/02/2001	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
48 V.	Ricostruzione della fognatura di via S. Donà - Bacino di Carpenedo	1/C/7	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 19 12/2/1996	3.718.489,67	3.718.489,67	3.419.977,74	Lavori collaudati	16/11/1998	29/09/1999	18/10/2000	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
49 V.	Ricostruzione della fognatura della zona di via Silvio Trentin - Mestre	1/C/8	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 18 12/2/1996	3.356.969,84	3.356.969,84	1.526.061,65	Lavori in corso	10/07/1997			Risolto il contratto in danno all'impresa con lavori al 45%. Completamento appaltato ad altra ditta in data 05/05/2003
50 V.	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Veneto	1/C/9	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 15 12/2/1996	2.169.118,98	2.169.118,98	2.140.491,59	Lavori collaudati	05/05/1997	23/10/1998	06/12/1999	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
51 V.	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Campalto e Tessera	1/C/10	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 168 10/4/1998	1.755.953,46	1.755.953,46	13.578,74	Lavori in corso				In attesa dell'approvazione della variante urbanistica
52 V.	Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto	1/C/11	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 528 1/12/1997	7.230.396,59	7.230.396,59	349.459,20	Lavori in corso	16/01/2001			

Legge 139-92 Es 93

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
53 V.	Risanamento fognario nella zona di Carpenedo (via Tevere)	1/C/12	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 11 12/2/1996	4.957.986,23	4.957.986,23	2.912.123,56	Lavori in corso	06/04/1998			Rescisso il contratto in danno all'impresa. Completamento lavori appaltato ad altra ditta
54 V.	Completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcontenta	1/C/13	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 133 DEL 8/8/1996	1.807.599,15	1.807.599,15	133.030,26	Lavori in corso				Consegna sospesa in attesa di risoluzione espropri
55 V.	Ricostruzione della rete fognaria nella zona del centro urbano di Mestre attigua al canale Osellino	1/C/14	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 21 12/2/1996	1.910.890,53	1.910.890,53	1.446.753,40	Lavori in corso	26/06/1997			Rescisso il contratto in danno all'impresa. Completamento lavori appaltato ad altra ditta il 12/12/2003
56 V.	Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia	1/C/15	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 51 25/6/1999	0,00	0,00	0,00	Finanziamento revocato				Finanziamento originale pari a € 1.755.953,46 completamente revocato e devoluto alla Diocesi Patriarcato di Venezia
57	PROGETTO INTEGRATO RII	3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993		18.075.991,47	18.075.991,47	18.075.991,47	Lavori in corso				
58	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld.	5/B/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 26 19/3/1999	1.545.239,04	1.545.239,04	1.209.542,06	Finanziamento interamente convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
59 V.	Interventi alle fognature del Lido - IX lotto-.	5/B/2		DDDA N. 115 23/06/2004	4.648.112,09	4.648.112,09	0,00	Progetto approvato				importo complessivo del progetto pari a € 6.894.700,00. Finanziato con parte dei fondi (€ 2.246.587,51) dell'int. 86
60 V.	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Est - Ca' di Valle	5/B/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 23 12/2/1996	2.065.827,60	2.065.827,60	2.011.949,29	Lavori collaudati	15/01/1997	30/07/1999	04/10/2000	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
61 V.	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Ovest - Ca' Savio	5/B/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 24 12/2/1996	2.065.827,60	2.065.827,60	1.846.270,63	Lavori collaudati	09/09/1999		06/06/2000	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
	CONSORZIO ADIGE BACCHIGLIONE Legge 139/92 Es. 1993											
1	Intervento di diversione idraulica dalla laguna - incremento invasi - monitoraggio e telecontrollo	6/B/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 130 DEL 8/8/1996	12.844.589,35	12.844.589,35	12.844.589,35	Lavori collaudati	22/09/1997	20/03/2001	04/08/2001	Registrata, con DDDA n. 112 del 14/9/2001, un'economia di € 66.833,12 destinata a finanziare l'intervento 1 bis
1 bis	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica (€ 66.833,12)	6/B/2		DDDA N. 35 19/4/2002	66.833,12	66.833,12	66.833,12	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				DDDA n. 35 del 19/04/2002 utilizza l'economia di € 66.833,12 dell'intervento 1. Decreto di contabilità finale DDDA n. 6 del 07/01/2004

Legge 139-92 Es 93

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	CONSORZIO BRENTA BACCHIGLIONE Legge 139/92 Es. 1993											
1	Sistemazioni idraulico-ambientali area Brenta-Bacchiglione (foce lagunare di Lova)	5/D/1	DGR N. 4987 DEL 3/10/1995	DDDA N. 71 27/10/1995	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	22/07/1996	29/11/1997	20/03/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 82 del 12/7/2001
	ENTE DI BACINO RSU VE2 Legge 139/92 Es. 1993											
3	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia-Marghera, loc. Malcontenta	4/A/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGR N. 4977 02/11/1993	9.296.224,18	9.296.224,18	9.296.224,18					
	DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA Legge 139/92 Es. 1993											
3	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/C/15. 1	DGR 4977 02/11/1993		1.755.953,46			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia" cod 1/C/15
	TOTALE				180.759.914,68	178.483.372,67 98,74%	151.320.127,07 83,71%					

Legge 139-92 2^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	ARPAV Legge 139/92 II fase											
4	Interventi strutturali in rete di bonifica.		DGR N. 2558 DEL 27/7/1999		103.291,60							Intervento soppresso per errore di attribuzione di ente
5	Settore agricolo: potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto	2/B/1	DGR N. 2238 DEL 21/5/1996	DGR 2584/96 DGR 2696/97	1.807.599,15	1.783.792,29	1.769.184,73	Lavori in corso				Finanziamento suddiviso in 2 interventi: servizio agrometeo (€ 774.685,34) e radar meteo progetto 2RADMETEO (€ 1.032.913,80)
6	Settore agricolo: potenziamento del Centro Agrochimico della Regione Veneto	2/C/1penna	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DGR N. 2203 DEL 21/5/1996	2.582.284,50	2.582.284,50	1.647.866,29	Lavori in corso				Finanziamento suddiviso: parte attività agro-zootecnica (€ 1.807.599,15) lavori ultimati e parte ampliamento sede (€ 774.685,35)
7A	Progetto quadro di monitoraggio (€ 4.785.555,45)							Finanziamento convogliato nell'intervento 7				
7B	S.I.R.A.V. (Sistema Informativo Regione Ambiente Veneto) (€ 1.409.927,33)							Finanziamento convogliato nell'intervento 7				
7	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna (€ 6.197.482,79)	5/A/1	DGR 2516/98 DGR 2558/99	DGR 2516/98 DGR 2558/99	6.197.482,90	6.197.482,79	6.187.559,90	Lavori in corso				
8	Interventi strutturali in rete di bonifica.	5/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DGR N. 2558 27/07/1999	839.242,80	839.242,46	147.448,45	Lavori in corso				
	APGA Legge 139/92 II fase											
4	Adeguamento strutture fognarie: miglioramento reti secondarie nei comuni di Legnaro e S. Angelo di Piove	1/D/4	DGR N. 2203 21/5/1996	DDDA N. 11 DEL 12/2/1997	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori collaudati	04/09/1997	09/10/1998	09/07/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 5 del 07/01/2004
5	Adeguamento strutture fognarie: progetto esecutivo per il disinquinamento area sud del Piovese (Pontelongo, Correzzola e Cona)	1/D/5	DGR N. 2203 21/5/1996	DDDA N. 11 DEL 12/2/1997	987.807,50	987.807,50	987.807,50	Lavori collaudati	16/09/1997	07/02/2000	25/01/2002	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. Registrata, con DDDA n. 38 del 14/04/2003, un'economia di € 45.106,24 destinata all'intervento 4 bis
5bis	Utilizzo delle economie di spesa maturate nel finanziamento del progetto definitivo relativo ai lavori di disinquinamento dell'area sud - interventi nei comuni di Pontelongo, Correzzola e Cona	1/D/5.1	DGR N. 2203 21/5/1996	DDDA N. 136 14/07/2004	45.106,24	45.106,24	45.106,24	Contabilità finale				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 178 del 11/10/2005

Legge 139-92 2^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
6	Adeguamento strutture fognarie: estensione rete fognaria in località San Pieri in Comune di Piove di Sacco	1/D/3	DGR N. 2203 21/5/1996	DDDA N. 11 DEL 12/2/1997	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	23/09/1998	05/11/1999	26/09/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 74 del 02/07/2001
	AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI Legge 139/92 II fase											
3	Collettore Campretto - Lovari nel comune di S. Martino di Lupari	1/D/1	DGR N. 4987 DEL 3/10/1995	DGCA N. 380 2/10/1997	2.091.650,44	2.091.650,44	2.091.650,44	Lavori collaudati (eseguiti con 2 appalti)	30/03/1998 10/10/2001	17/07/2002 12/02/2003	09/06/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 63 del 30/03/2004
4	Adeguamento strutture fognarie: fognatura nell'area sud di S. Martino di Lupari, Lovari e collegamento al depuratore di Onara	1/D/2	DGR N. 4987 DEL 3/10/1997	DGCA N. 387 2/10/1997	2.194.941,82	2.194.941,82	2.194.941,83	Lavori collaudati (eseguiti con 2 appalti)	08/07/1998 17/02/2003	04/08/2000 -	27/05/2002 -	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 177 del 11/10/2005
	COMUNE DI NOALE Legge 139/92 II fase											
2	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (Finanziato inizialmente al Consorzio DESE-SILE)	5/B/3.3	DGR N. 6400 12/12/1995	DDDA N. 18 26/12/2001	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Finanziamento convogliato nell'intervento 2B per l'importo di € 774.685,35				
2B	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (€ 2.065.827,60)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.291.142,25) + 2 (€ 774.685,35) = € 2.065.827,60					Lavori in corso	01/07/2002 03/09/2003			Lavori in corso mediante due appalti
	COMUNE DI VENEZIA Legge 139/92 II fase											
62 V.	Progetto Fusina: completamento della rete fognaria e relativi allacciamenti nell'area Mestre-Gazzera e Mestre-Malcontenta	1/B/1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		2.065.827,60	0,00	0,00	Progettazione in corso				Intervento facente parte del Progetto Integrato
63 V.	Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3	1/B/4	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		2.065.827,60	0,00	0,00	Progetto definitivo				Integrazione del finanziamento, per € 1.549.370,69, con parte dei fondi dell'int.86
64 V.	Progetto Campalto: ampliamento dell'impianto di depurazione di Campalto (V linea)	1/C/1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 110 14/12/2000	3.098.741,39	2.685.575,88	82.181,72	Lavori in corso	16/01/2002			La differenza tra importo finanziato ed impegnato, pari a € 413.165,51, convogliato nell'int. 20

Legge 139-92 2^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
65	Progetto Campalto: adeguamento della rete principale di via Torino e interconnessione con la rete di Mestre	1/C/2	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		2.582.284,50	0,00	0,00	Progettazione in corso				Progetto Integrato Campalto
66	Progetto Campalto: costruzione tronco di interconnessione tra il collettore Acque Basse ed i bacini di via Torino e S. Giuliano	1/C/4	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		3.098.741,39	0,00	0,00	Progettazione in corso				Progetto Integrato Campalto
67	Progetto Campalto: regolazione dei flussi di piena e di trattamento acque di pioggia a S. Giuliano	1/C/5	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		4.131.655,19	0,00	0,00	Progettazione in corso				Progetto Integrato Campalto
68 V.	Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali delle reti fognarie del Comune di Venezia	1/E/1	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996		3.460.261,22	0,00	0,00	Progettazione in corso				Integra per € 115.686,34 l'int. 61, per € 163.716,84 l'int. 28 e per € 2.633.930,18 due interventi dell'appalto integrato.
69	PROGETTO INTEGRATO RII	3/A/1	DGR N. 2203 DEL 21/5/1996		16.526.620,77	16.526.620,77	16.526.620,77	Lavori in corso				
70 V.	Progetto Campalto - affinamento con fitodepurazione	5/B/6	DCR N. 45 DEL 15/7/1999		3.873.426,74	0,00	0,00	Progettazione in corso	16/01/2002			Finanziamento proveniente da fondi riallocati
71 V.	Interventi di miglioramento dell' impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione U.V.	1/C/7	DCR N. 45 DEL 15/7/1999	DDDA N. 57 27/5/2002	258.228,45	258.228,45	0,00	Lavori in corso	16/01/2002			Finanziamento complessivo pari a € 6.713.939,68 distribuito tra gli int. 71, 77A e 77B. Impegno inerente alle spese di progettazione
	COMUNE DI ZERO BRANCO											
	Legge 139/92 II fase											
1	Interventi di fognatura e depurazione in territorio comunale.	2/A/1	DGR 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 21 DEL 7/3/2002	258.228,45	258.228,45	258.204,50	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per l'importo di € 258.228,45				
	CONSORZIO ADIGE BACCHIGLIONE											
	Legge 139/92 II fase											
2	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DDDA N. 21 26/2/2001	619.748,28	619.748,28	493.459,25	Lavori collaudati	26/02/2002			Registrata, con DDDA n. 163 del 31/08/2004, un'economia di € 126.289,03
3	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sui rii Barbegara, Rebosola e S. Silvestro	5/B/4	DGR N. 2203 DEL 21/5/1996	DDDA N. 22 22/6/1998	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	Lavori collaudati	21/06/2000	21/06/2003	03/11/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 205 del 22/10/2204
4	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica.	5/C/1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 61 DEL 4/8/1999	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per € 2.582.284,50				
4A	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica (€ 2.649.117,67)		Riuniti i finanziamenti 1 bis (€ 66.833,12) + 4 (€ 2.582.284,50) = € 2.649.117,62					Lavori collaudati	04/08/2000	04/08/2003	04/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 6 del 07/01/2004
	CONSORZIO BRENTA BACCHIGLIONE											

Legge 139-92 2^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 139/92 II fase											
2	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DDDA N. 73 DEL 2/7/2001	619.748,28	619.748,28	413.760,65	Lavori in corso	03/09/2001			La somma impegnata è stata ridotta rispetto a quella finanziata in base alla riduzione dell'importo del progetto iniziale (da € 619.748,28 a € 516.456,90)
3	Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Fiumicello (idrovora Cambroso)	5/B/7	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DGCA N. 72 DEL 2/2/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.272.486,29	Lavori in corso	12/10/1998	29/11/1997		Appovata perizia di variante
	CONSORZIO DESE SILE											
	Legge 139/92 II fase											
7	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (il finanziamento di € 774,685,35 - DGR N. 6400 DEL 12/12/1995 - è stato assegnato al Comune di Noale)	5/B/3.3			0,00	0,00	0,00	Con D.D.A. n° 18 del 26/02/01 e successivo D.D.A. n°38 del 09/04/01 il finanziameno è stato trasferito al comune di Noale				
8	Progetto Campalto: costruzione del I tronco del collettore Acque Basse	1/C/3	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		8.005.081,94	0,00	0,00	Progettazione in corso				La DGR 719 del 19/03/2004 concede al progetto il giudizio di compatibilità ambientale
9	Progetto Campalto: risezionamento del canale di interconnessione tra gli impianti di Campalto e dello Scolmatore Marzenego	1/C/6	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		2.582.284,50	0,00	0,00	Progettazione in corso				La DGR 719 del 19/03/2004 concede al progetto il giudizio di compatibilità ambientale
10	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia. Interventi strutturali in reti di bonifica. Estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino scolanteImpianto per n. 24 stazioni.	5/B/5	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 59 16/05/2001	813.419,62	813.419,62	536.177,29	Lavori in corso	14/05/2002			
11	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero	5/B/1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 33 19/08/1998	7.230.396,59	7.230.396,59	7.230.396,59	Lavori collaudati	18/11/1999	08/08/2003		Importo originale € 7.670.396,59. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 08/06/2004. L'economia registrata convogliata negli int. 25 e 26
12	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Dese (finanziamento iniziale: 8.263.310,39 euro)	5/B/2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		0,00	0,00	0,00	Finanziamento di € 8.263.310,39 suddiviso negli interventi 12A (€ 4.131.655,19) e 12B (€ 4.131.655,19)				

Legge 139-92 2^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
12A	Ristrutturazione rete di bonifica dell'area centrale e del medio corso dei fiumi Dese e Zero e tributaria dei corsi d'acqua consortili: Piovega di C., Desolino, Rio S.Martino, Piovega di S., Rio S.Amnrogio, Piovega di L. e Piovega dei Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason (€ 4.131.655,19)	5/B/2.1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 83 11/05/2004	4.131.655,19	4.131.655,19	2.162.525,79	Progetto approvato				
12B	Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggiana, Marocchesa e Tarù in Comune di Venezia, Mogliano V.to e Scorze' (€ 4.131.655,19)	5/B/2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		4.131.655,19	0,00	0,00	Progettazione in corso				
13	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Marzenego.	5/B/3	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		2.014.181,91	0,00	0,00	Progettazione in corso				
14	Sistemazione del fiume Marzenego - Ramo Beccherie in Venezia - Mestre. 1^ e 2^ perizia suppletiva e di variante.	5/B/3.1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 40 30/06/2000	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Lavori collaudati	23/07/1999	23/01/2001	22/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 132 del 25/11/2002
15	Interventi di riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua della terraferma veneziana	5/B/3.2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 53 04/08/2000	4.648.112,09	4.648.112,09	4.625.055,93	Lavori in corso	02/01/2002			

CONSORZIO SINISTRA MEDIO BRENTA

Legge 139/92 II fase

4	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura degli scoli Fondi a Est e fondi a Sud e sottopasso del Naviglio)	1/A/1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 40 19/5/1999	1.652.662,08	1.652.662,08	127.166,53	Lavori in corso				
5	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastie, Foscara e Giare)	1/A/2 .2	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 100 22/10/1999	2.608.107,34	2.608.107,34	282.787,63	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				
6	PARCO LAGUNARE DI MIRA - EX Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastie, Foscara e Giare)	1/A/2 .3	DGR N. 33 DEL 12/1/1999	DDDA N. 100 22/10/1999	1.187.850,87	1.187.850,87	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				
6A	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastie, Foscara, Giare) (€ 3.795.958,22)		Riuniti i finanziamenti 5 (€ 2.608.107,34) + 6 (€ 1.187.850,87) = € 3.795.958,22					Progettazione in corso				
7	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Potenziamento impianto idrovoro di Dogaletto in comune di Mira)	1/A/2 .1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 38 19/5/1999	2.556.461,65	2.556.461,65	2.556.461,65	Lavori in corso	12/06/2000	29/06/2002		
8	Sistemazione idraulica e ricalibratura della rete di bonifica del bacino di Chirignago e interconnessione all' impianto idrovoro di Malcontenta	1/B/2	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 101 22/10/1999	2.065.827,60	2.065.827,60	195.153,33	Finanziamento convogliato nell'intervento 8A				

Legge 139-92 2^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
8A	Sistemazione idraulica e ricalibratura della rete di bonifica del bacino di Chirignago e interconnessione all' impianto idrovoro di Malcontenta (€ 2.840.512,95)		Riuniti i finanziamenti 2 (€ 774.685,35) + 8 (€ 2.065.827,60) = € 2.840.512,95					Progettazione in corso				
9	Progetto Integrato Fusina P.I.F. (invasi di laminazione e sedimentazione in aree depresse per circa 30 ha con sistemazione a parco e con restituzione all'idrovora di Malcontenta)	1/B/3	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		1.549.370,70	0,00	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 11A				Fondi riallocati con DGR N. 5087/99
10	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999		619.748,28	619.748,28	0,00	Progetto approvato				In attesa di coordinamento con l'intervento di ARPAV codice 5/A/1
	REGIONE DISINQUINAMENTO Legge 139/92 II fase											
34	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)		DCR N. 24 DEL 04/05/2004 (PCR 1115/95 di assegnazione dei fondi)		12.181.000,00	0,00	0,00					Finanziamento proveniente da fondi riallocati di cui alla legge 139/92 II fase (schede 4/A/1 e 4/A/2 destinati alla Direzione Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura)
	REGIONE FORESTE/AGRICOLTURA/ZOOTECNIA Legge 139/92 II fase											
4	Interventi strutturali: gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole - I lotto (3.2a) (€ 15.493.706,97)	2/D/1	DGR N. 2876 DEL 28/7/1998	Vari	15.493.706,97	14.367.008,64	10.540.198,73		Importo complessivo del finanziamento pari a € 15.493.706,97, di cui € 13.014.701,34 destinati aiConsorzi di bonifica. La somma di tutte le erogazioni destinate ai consorzi di bonifica è pari a € 7.787.425,94			
5	Protezione zootecnia: gestione reflui zootecnici(3.3a)	4/A/1	DGR N. 2876 DEL 28/7/1998	Vari	4.205.698,28	2.052.576,04	1.671.034,65	Verifiche di collaudo				Importo complessivo del finanziamento pari a € 6.713.939,69, di cui € 2.510.813,37 destinati al Progetto Integrato Fusina (vedi scheda Regione: Disinquinamento int. 34)
6	Protezione zootecnia: interventi strutturali in zootecnia(3.3b).	4/A/2	DGR N. 2876 DEL 28/7/1998	Vari	10.985.517,37	8.109.746,08	7.915.044,11	Verifiche di collaudo				Importo complessivo del finanziamento pari a € 20.658.275,96, di cui € 9.670.186,63 destinati al Progetto Integrato Fusina (vedi scheda Regione: Disinquinamento int. 34)

Legge 139-92 2^ tranche

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
7	Gestione reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia	4/A/3	DCR N. 45 DEL 15/7/1999	Vari	5.164.568,99	4.708.850,97	2.614.383,16	Lavori in corso				
	TOTALE				165.266.208,31	106.373.035,53	84.955.447,61					
						64,36%	51,41%					

Legge 139-92 Mag. Mutui

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	ACM Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
97	Costruzione nuove opere di fognatura nel comune di Camponogara - 31° lotto bis	6/E/1.A	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 183 05/10/2004	1.250.000,00	1.250.000,00	28.015,40	Lavori in corso				
98	Costruzione nuove opere di fognatura nel comune di Spinea - 31° lotto bis	6/E/1.B	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 184 05/10/2004	1.250.000,00	1.250.000,00	28.015,40	Lavori in corso				
	APGA Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
29	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Pontelongo e Pegolotte	6/D/1	DGR N. 1140 18/4/2003		1.540.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
	AZIENDA SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
5	Costruzione dei collettori di fognatura nera (Riese Pio X - Castello di Godego - Altivole - Maser - Asolo) per un importo di € 2.500.000		DGR N. 1140 18/4/2003	Interventi unificati per l'importo totale di € 3.500.000 e poi suddivisi nei tre interventi 6A, 6B e 6C								
6	Costruzione dei collettori di fognatura nera in comune di Castello di Godego per un importo di € 1.000.000		DGR N. 1140 18/4/2003									
6A	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera in Comune di Castello di Godego e Loria - 4° stralcio (1° lotto)	6/F/2 e 6/F/1.1	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 65 30/03/2004	1.033.000,00	1.033.000,00	453.049,18	Lavori in corso				
6B	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera nei Comune di Riese Pio X° e Altivole - 4° stralcio (2° lotto)	6/F/1.2	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 69 13/04/2004	1.367.000,00	1.367.000,00	800.901,22	Lavori in corso				
6C	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera nei comune di Altivole, Asolo e Maser - 4° stralcio (3° lotto)	6/F/1	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 84 11/05/2004	1.100.000,00	1.100.000,00	412.168,62	Lavori in corso				
	AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
14	Realizzazione condotta di collegamento dall'impianto di depurazione di Roncade all'impianto di depurazione di Quarto d'Altino	6/C/1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		200.000,00	200.000,00	0,00					

Legge 139-92 Mag. Mutui

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
15	Adeguamento al D.M. 30/07/99 dell'impianto di depurazione di Monastier di Treviso	6/C/2	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		504.000,00	0,00	0,00					
16	Progetto definitivo relativo al collegamento fognario tra Monastier e Roncade - tratto tra la frazione di Vallio e Roncade.	6/C/2.1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA 235 15/12/2005	796.000,00	796.000,00	0,00					
17	Adeguamento al D.M. 30/07/99 dell'impianto di depurazione di Meolo capoluogo	6/C/3	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 178 24/09/2004	1.300.000,00	1.300.000,00	658.780,00	Lavori in corso				
	SETA Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
1	Completamento dell' impianto di depurazione di Camposampiero		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		1.000.000,00			Finanziamento convogliato nell'intervento 1A				
1A	Realizzazione del centro di biotrattamenti di Camposampiero (importo progetto del 1998 pari a € 22.790.470,34, aggiornato al settembre 2003 in € 26.724.765,46)		Finanziato parzialmente con i fondi dei finanziamenti 1 SE.T.A. (€ 1.000.000,00) + 2 Tergola (€ 2.582.284,50) + 5 Tergola (€ 4.338.237,95) + 18 Tergola (€.11.878.509,68) + 38 Tergola (€ 6.249.128,48) + 54 Tergola (€ 516.456,90) = € 26.564.616,50					Lavori in corso	14/01/2003			La differenza tra l'importo di progetto e l'importo finanziato è a carico dell'ente
2	Completamento dell' impianto di depurazione di Vigonza		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		515.000,00			Finanziamento convogliato nell'intervento 2A				
2A	Completamento dell' impianto di depurazione di Vigonza e diversione scarico in fiume Brenta (€ 2.890.701,74)		Riuniti i finanziamenti 2 SE.T.A. (€ 515.000,00) + 35G Tergola (€ 826.331,04) + 74 Tergola (€ 1.549.370,70) = € 2.890.701,74					Progettazione in corso				
3	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999: collegamento dell' impianto di depurazione minore di via Fabris di Camposampiero con l' impianto principale.		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		460.000,00			Progettazione in corso				
4	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Onara di Tombolo		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.115.000,00			Progettazione in corso				
5	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999: collegamento (con dismissione) dell' impianto di depurazione di Battaglia Terme con l' impianto di depurazione di Montegrotto T. con relative opere di adeguamento dimensionale di quest' ultimo.		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.750.000,00			Progettazione in corso				
6	Interventi di fognatura nei comuni di S. Martino di Lupari frazioni Caprette e Borghetti, Villa del Conte e S. Giustina in Colle fraz. Fratte		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.000.000,00			Progettazione in corso				
	AZIENDA CONSORZIALE CENTRO VENETO SERVIZI Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											

Legge 139-92 Mag. Mutui

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
11	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Conselve - II stralcio	6/B/1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		667.086,20	667.086,20	43.295,72	Finanziamento convogliato nell'intervento 11A per l'importo di € 667.086,20				
11A	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Conselve - II stralcio (€ 1.700.000,00)		Riuniti i finanziamenti 8A (€ 1.032.913,80) + 11 (€ 667.086,20) = € 1.700.000,00					In fase di progettazione				
12	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Agna: diversione dello scarico nel fiume Fiume Gorzone	6/B/2	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		450.000,00	450.000,00	0,00	Progetto approvato				
13	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Candiana: dismissione e collegamento con l' impianto di depurazione di Conselve	6/B/3	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		400.000,00	400.000,00	0,00	Progetto approvato				
14	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Pozzonovo: diversione dello scarico fuori laguna	6/B/4	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		300.000,00	300.000,00	0,00	Progetto approvato				
15	Interventi di fognatura in comune di Cartura	6/B/5	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 250 23/12/2004	640.000,00	640.000,00	0,00	Progetto approvato				
	PORTO DI CHIOGGIA Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
1	Bonifica aree interessate alla realizzazione delle banchine "A", "E", "B" - terminal di Val da Rio in comune di Chioggia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.500.000,00			Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante
	COMUNE DI MONSELICE Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
7	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Via del Borgo	6/H/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		5.400.000,00			Progettazione in corso				
	COMUNE DI MORGANO Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
5	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Morgano	6/G/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 222 22/11/2004	400.000,00	400.000,00	30.483,21	Lavori in corso				
	COMUNE DI VENEZIA Legge 139/92 - Magg.Mutui II FASE											
88	PROGETTO INTEGRATO RII		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		4.038.597,75	0,00	0,00	Progettazione in corso				
	COMUNE DI ZERO BRANCO Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											

Legge 139-92 Mag. Mutui

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
5	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 ed ampliamento dell' impianto di depurazione comunale	6/I/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 52 16/03/2004	210.000,00	210.000,00	34.062,93	Lavori in corso				
	CONSORZIO BRENTELLA DI PEDEROBBA											
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
2	Sistemazione dello scarico di Salvarosa a monte della confluenza nel fiume Zero		DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		780.000,00			Progettazione in corso				
	CONSORZIO DESE SILE											
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
25	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia - Completamento ed adeguamento	5/B/1.2	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDTA N. 84 02/07/2003	403.848,02	403.848,02	403.848,02	Lavori collaudati	03/07/2003	08/08/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 08/06/2004
	AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA											
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
1	Impianto pilota per il lavaggio di sedimenti nel Porto di Venezia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		516.450,00			Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante
	MAV											
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
4	Interventi per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi Adige e Brenta	5/D/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDSPC 431 09/10/2003	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Lavori in corso				Accordo di Programma tra Regione Veneto, MAV, comuni di Chioggia e Rosolina
5	Interventi sui manufatti idraulici di Torre di Burri e Castelfranco	5/D/2	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.767.443,55							
	SEMINARIO PATRIARCALE DI VENEZIA											
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
4	Adeguamento a delle linee fognarie e degli impianti di depurazione a servizio del complesso edilizio del seminario patriarcale in Venezia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 80 20/02/2004	464.400,00	464.400,00	133.800,00	Lavori in corso				
	ULSS 17 ESTE - MONSELICE											
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
2	Interventi di completamento e ristrutturazione della fognatura nera dell' area ospedaliera di Monselice		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		232.000,00			Progettazione esecutiva in corso				

Legge 139-92 Mag. Mutui

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	TOTALE				40.349.825,52	13.231.334,22	4.026.419,70					
						32,79%	9,98%					

Legge 539-95 Es 96

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	ACM											
	Legge 539/95 Es. 1996											
34	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Consorzio del Mirese	1/E/3	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DDDA N. 44 DEL 1/6/1999	2.530.638,81	2.530.638,81	2.530.638,80	Lavori collaudati	05/09/2000	07/04/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 162 31/08/2004.
	APGA											
	Legge 539/95 Es. 1996											
7	Progetto 1° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Legnaro, S. Angelo di Piove di Sacco e Polverara	1/E/5	DGR N. 4533 15/10/1996	DGCA N. 84 DEL 16/2/1998	1.265.319,40	1.265.319,40	1.248.823,93	Contabilità finale	31/05/1999	28/04/2000	15/05/2002	Registrata, con DDDA n. 226 del 03/12/2004, un'economia di € 16.495,49
8	Progetto 2°stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di S. Angelo di Piove, Brugine, Piove di Sacco, Arzergrande e Pontelongo.	1/E/5	DGR N. 4533 15/10/1996	DGCA N. 85 DEL 16/2/1998	1.420.256,47	1.420.256,47	1.420.256,47	Contabilità finale	36.025,00	36.763,00	37.588,00	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 98 del 08/06/2005
9	Progetto 3° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Brugine, Piove di Sacco e Correzzola.	1/E/5	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 24 DEL 22/6/1998	1.586.627,28	1.586.627,28	1.586.627,28	Lavori collaudati	31/05/1999	13/10/2000	16/02/2002	Finanziamento originale pari a € 1.755.953,46. Registrata, con DDDA n. 37 del 14/04/2003, un'economia di € 169.326,17 destinata all'intervento 9 bis
9bis	Utilizzo delle economie di spesa per un nuovo tratto di condotta fognaria in via S. Giovanni Bosco - Piove di Sacco	1/E/5.3 ECO	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 168 13/09/2004	169.326,17	169.326,17	152.393,12	Lavori ultimati				
	AZIENDA CONSORZIO DEL TERGOLA											
	Legge 539/95 Es. 1996											
8	Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e Margarise e della pista ciclabile in comune di S.Giorgio delle Pertiche	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 82 9/12/1998	110.005,32	110.005,32	110.005,32	Finanziamento convogliato nell'intervento 21A				
9	Ampliamento rete fognaria comunale di Borgoricco	1/E/4	DGR N. 4533 8/11/1996	DGCA N. 17 12/1/1998	129.114,22	129.114,22	129.114,22	Lavori collaudati	19/08/1999	03/07/2000	18/10/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 13 del 21/02/2001
10	Progetto esecutivo di ampliamento rete fognaria comunale di Massanzago	1/E/4	DGR N. 4533 8/11/1996	DGCA N. 16 12/1/1998	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Lavori collaudati	19/08/1999	03/07/2000	27/11/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 69 del 08/06/2001
11	Ampliamento rete fognaria in comune di Vigonza.	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1996	DGCA N. 54 DEL 2/2/1998	356.355,26	356.355,26	356.355,26	Lavori collaudati	27/07/1998	05/07/1999	05/05/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 5 del 15/01/2001
12	Completamento del collegamento fognario tra Cavino di S. Giorgio delle Pertiche e Campodarsego	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1996	DGCA N. 53 DEL 2/2/1998	380.628,73	380.628,73	380.628,73	Lavori collaudati	12/10/1998	04/10/2000	21/06/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 46 del 09/05/2002

Legge 539-95 Es 96

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
13	Progetto fognatura acque nere in comune di Villanova di Camposampiero - I stralcio	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1996	DGCA N. 124 13/3/1998	201.418,19	201.418,19	201.418,19	Lavori collaudati	06/07/1998	10/05/1999	15/09/2000	Registrata una economia di € 56.810,26, reimpegnata nell'intervento 13 bis come da DDDA N. 113 del 18/10/2002
13 bis	Realizzazione rete fognatura nera nelle vie Cavin Caselle, Cornara, Cavin del Do' e piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero	1/E/4.1	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 28 26/3/2003	56.810,26	56.810,26	56.810,26	Finanziamento convogliato nell'intervento 68A con DDDA N. 28 del 26/03/2003				Utilizzata l'economia di € 56.810,26 del finanziamento 13
14	Progetto esecutivo integrato dell'allargamento e della fognatura di Via Bassa 1^ in comune di Campodarsego	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 160 DEL 1/4/1998	335.696,98	335.696,98	335.696,98	Lavori collaudati	05/03/1999	27/07/2000	08/03/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 153 del 30/10/2003
15	Progetto rete fognaria comune di Noventa Padovana	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 17 27/5/1998	289.215,86	289.215,86	289.215,86	Lavori collaudati	03/02/1999	20/09/2000	19/12/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 70 del 08/06/2001
	COMUNE DI CHIOGGIA Legge 539/95 Es. 1996											
11	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Comune di Chioggia	1/E/2	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DGCA N. 517 18/11/1997	4.906.340,54	4.906.340,54	4.318.989,01	Lavori collaudati	30/04/1998	10/11/2000	12/10/2002	Registrata, con DDDA n. 225 del 03/12/2004, un'economia di € 587.351,53
	COMUNE DI VENEZIA Legge 539/95 Es. 1996											
72	PROGETTO INTEGRATO RII	3/A/1	DGR N. 2203 DEL 21/5/1996		1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori in corso				
	TOTALE				15.493.706,97	15.493.706,97	14.872.926,90					
						100,00%	95,99%					

Legge 539-95 Es 97

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	AZIENDA CONSORZIO DEL TERGOLA Legge 539/95 Es. 1997											
16	Collettore fognario Abbazia Pisani-Villa del Conte-S. Giustina in Colle	C/32/1	DGR N. 553 25/2/1997	DGCA N. 28 19/1/1998	1.962.536,22	1.962.536,22	1.962.536,22	Lavori collaudati	15/12/1998	28/02/2001	28/01/2002	Registrata una economia di € 258.228,45. reimpegnata nell'intervento 16 bis come da DDDA N. 112 del 18/10/2002
16 bis	Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani. (€ 258.228,45)	C/32/1. 1	DGR N. 553 25/2/1997	DDDA N. 27 26/3/2003	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Finanziamento convogliato nell'intervento 76H				Utilizzata, con DDDA n. 27 del 26/03/2003, l'economia di € 258.228,45 dell'intervento 16
17	Ampliamento impianto di depurazione di Cadoneghe	A/5.2	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 33 DEL 5/5/1999	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 44A				
18	Impianto di biotrattamento di Camposampiero	A/5/1	DGR N. 561 DEL 2/3/1999		11.878.508,68	11.878.508,68	11.878.508,68	Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SETA				
19	Progetto fognatura nera in comune di S. Giustina in Colle	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 1 DEL 3/2/1999	281.469,01	281.469,01	281.469,01	Lavori collaudati	22/04/1999	02/10/2000	08/01/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 143 del 12/11/2001
20	Progetto fognatura nera in comune di Cadoneghe	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 16 DEL 2/3/1999	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Lavori collaudati	22/06/1999	21/12/2000	30/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 94 del 23/09/2002
21	Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e Margarise e della pista ciclabile in comune di S. Giorgio delle Pertiche	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 82 9/12/1998	122.400,29	122.400,29	122.400,28	Finanziamento convogliato nell'intervento 21A				
21A	Realizzazione fognatura nera lungo le vie Roma e Margarise e pista ciclabile lungo via Roma in Comune di S. Giorgio delle Pertiche (€ 232.405,60)		Riuniti i finanziamenti 8 (€ 110.005,32) + 21 (€ 122.400,29) = € 232.405,60					Lavori in fase di collaudo	18/11/1999	17/10/2002		L'importo del finanziamento regionale è pari a € 232.405,60. Il residuo, rispetto all'importo di progetto di € 521.621,47 resta a carico dell'ente. Determinazione del contributo defnitivo con DDDA n. 57/2004
22	Progetto rete fognaria di Via Ronchi in comune di Loreggia	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 83 9/12/1998	299.545,00	299.545,00	299.545,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 66A				
23	Progetto per l'estensione della rete fognaria nei Comuni di Trebaseleghe e Camposampiero e adeguamento impianto di sollevamento.	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 50 25/6/1999	1.259.121,92	1.259.121,92	1.259.121,92	Lavori collaudati	06/03/2000 25/05/2000	19/10/2001 19/01/2001	30/04/2002 30/07/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 154 del 30/10/2003
24	Progetto rete fognaria in comune di Saonara.	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 52 25/6/1999	309.874,14	309.874,14	309.874,13	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 100 del 10/06/2005

Legge 539-95 Es 97

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI Legge 539/95 Es. 1997											
5	Fognatura di Cittadella e Fontaniva	C/31/1	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 527 1/12/1997	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	Lavori collaudati	26/08/1998 21/02/2000	21/01/2003 26/04/2002	26/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 62 del 30/03/2004
	AZIENDA CONSORZIO ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO Legge 539/95 Es. 1997											
1	Adeguamento depuratore di Battaglia Terme	C/30/2	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 126 13/3/1998	428.659,23	428.659,23	428.659,23	Per questo progetto sono stati utilizzati anche fondi CIPE (n.74/97) per un importo totale di € 1.032.913,80. Lavori collaudati	01/02/1999	08/02/2001	20/05/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 32 del 2/4/2003
	COMUNE DI CHIOGGIA Legge 539/95 Es. 1997											
12	Progetto definitivo dell'impianto elettrico del depuratore di Val da Rio - 1° e 2° stralcio	C/33/2	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 526 1/12/1997	320.203,28	320.203,28	270.796,95	Lavori collaudati	16/02/1998	27/04/1999	21/01/2000	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo dell'opera.
13	Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento ed ammodernamento della linea "Picchi" del depuratore di Val da Rio	C/33/3	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 546 16/12/1997	118.785,09	118.785,09	111.541,41	Lavori collaudati	18/03/1998	24/07/1998	29/03/1999	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo dell'opera.
14	Lavori di miglioramento ed ammodernamento dell'impianto di depurazione di Val da Rio - lotto funzionale A	C/33/1	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 366 24/9/1997	1.007.090,95	1.007.090,95	912.330,18	Lavori collaudati	13/11/1997	05/02/1999	28/03/2002	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo dell'opera.
	COMUNE DI GALZIGNANO Legge 539/95 Es. 1997											
1	Collegamento della fognatura comunale all'impianto di depurazione di Battaglia Terme	C/30/1	DGR N. 553 DEL 25/02/1997	DDDA N. 62 11/06/1997	346.026,12	346.026,12	274.003,05	Lavori collaudati	14/05/1998	29/06/2002	19/09/2003	Registrata, con DDDA n. 119 del 23/06/2004, un'economia di € 72.023,06
	COMUNE DI MARCON Legge 539/95 Es. 1997											
3	Riabilitazione fognaria del Comune di Marcon	C/29/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 186 24/4/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.488.601,72	Lavori collaudati				Registrata, con DDDA n. 167 del 3/10/2005, un'economia di € 60.768,99
	COMUNE DI VENEZIA Legge 539/95 Es. 1997											
73	PROGETTO INTEGRATO RII	C/26/1	DGR N. 553 DEL 25/2/1997		1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori in corso				
	ENTE DI BACINO RSU VE2											

Legge 539-95 Es 97

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 539/95 Es. 1997											
4	Completamento impianto R.S.U. di Venezia (Fusina)	C/28/1	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGR N. 553 25/02/1997	2.943.804,32	2.943.804,32	2.943.804,32					
	ULSS 12 VENEZIA/OSPEDALI											
	Legge 539/95 Es. 1997											
4	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio	C/27/1	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DDLLPP 157 13/7/1998	3.356.969,84	3.356.969,84	3.317.410,04	Finanziamento convogliati nell'interventi 4A				
4A	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio		Riuniti i finanziamenti 1, 2, 3 e 4					Lavori collaudati	-	-	30/09/2003	Decreto di contabilità finale in preparazione
	TOTALE				30.987.413,95	30.987.413,95	30.663.651,30					
						100,00%	98,96%					

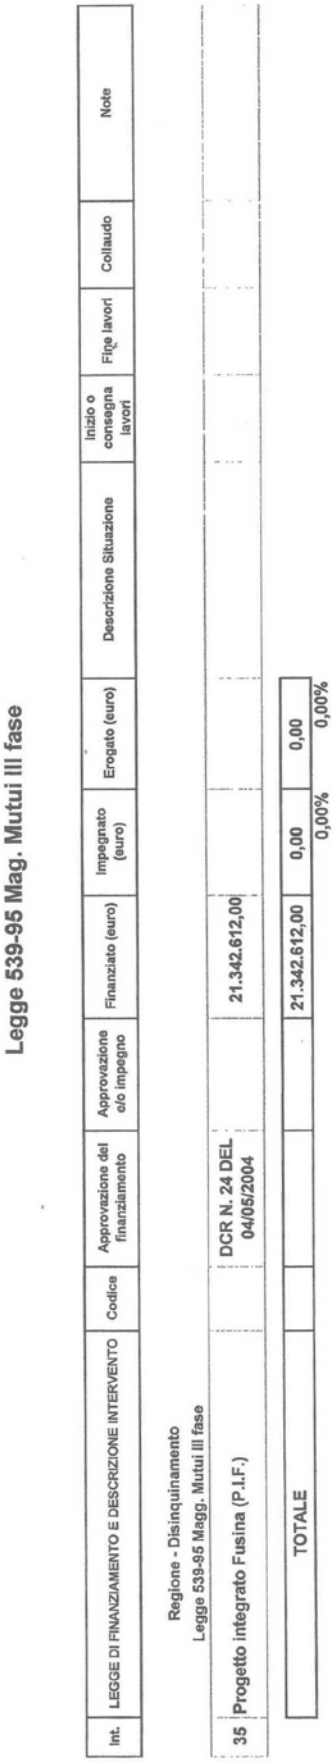

Legge 539-95 Mag. Mutui III fase

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Regione - Disinquinamento Legge 539-95 Magg. Mutui III fase											
35	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)		DCR N. 24 DEL 04/05/2004		21.342.612,00							
	TOTALE				21.342.612,00	0,00	0,00					
						0,00%	0,00%					

Legge 515-96 Es 97 3^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	ARPAV											
	Legge 515/96 Es. 1997											
9	Potenziamento della rete di telerilevamento agrometeorologica	C/25/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGR 2696 29/07/1997	1.032.913,80	1.032.913,80	946.275,27	Lavori in corso				L'importo finanzia parte del progetto 2RADMETEO
	ACM											
	Legge 515/96 Es. 1997											
35	Opere di fognatura nera - 28° lotto in comune di Fiesso D'Artico	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 73 13/9/2000	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Lavori collaudati	13/03/2001	21/03/2002	25/03/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 98 del 18/08/2003
36	Progetto per la realizzazione di opere di fognatra nera - 28° lotto nel comune di Salzano	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 109 14/12/2000	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Lavori collaudati	15/10/2001	30/05/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 239 del 20/12/2004
37	Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto nel comune di Campagna Lupia.	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 107 14/12/2000	284.051,29	284.051,29	284.051,29	Lavori in corso	16/07/2002			Con DDDA n. 195 del 13/10/2004 stabilito nuovo termine fine lavori: 14/11/2005
38	Impianto di fognatura del Comune di Martellago - settore A - 28° lotto	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 28 21/3/2001	413.165,52	413.165,52	371.848,96	Collaudo in corso				
39	Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto in comune di Dolo	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 74 13/9/2000	568.102,59	568.102,59	511.292,33	Lavori in corso				
40	Interventi di opere fognarie nei comuni di Martellago settore "B" e Salzano settore "B". Progettazione esecutiva del 28° lotto.	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 117 3/10/2001	619.748,28	619.748,28	619.748,28	Contabilità finale				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 188 del 21/10/2005
41	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28°lotto in comune di Fossò	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 73 22/9/1999	413.165,52	413.165,52	393.860,72	Lavori collaudati	04/02/2000	04/04/2001		Registrata, con DDDA n. 113 del 16/06/2004, un'economia pari a € 19.304,81
42	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Camponogara	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 74 22/9/1999	464.811,21	464.811,21	464.692,98	Lavori collaudati	13/03/2000	27/04/2001	10/05/2002	Registrata, con DDDA n 141 del 12/12/2002, un'economia di € 118,23
43	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto - in comune di Noale (Ve)	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 75 22/9/1999	568.102,59	568.102,59	568.102,59	Lavori collaudati	14/03/2000	22/03/2002	02/12/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 57 del 27/05/2003
44	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Scorzè-Settore A	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 144 31/12/1999	534.209,07	534.209,07	534.209,06	Lavori collaudati	22/05/2000	30/10/2002	12/07/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 7 del 07/01/2004
45	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Scorzè-Settore B	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 145 31/12/1999	395.413,35	395.413,35	395.413,35	Lavori collaudati	11/02/2000	03/05/2001	22/11/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 58 del 27/05/2003

Legge 515-96 Es 97 3^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
46	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Pianiga	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 78 22/9/1999	516.456,90	516.456,90	497.090,05	Lavori collaudati	14/09/2000	21/05/2002	11/12/2003	Registrata, con DDDA n. 100 del 01/06/2004, un'economia di € 19.366,85
47	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mirano. Settore A	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 79 22/9/1999	524.616,92	524.616,92	519.457,90	Lavori collaudati	07/03/2000	30/07/2001	10/09/2002	Registrata, con DDDA n. 7 del 7/02/2003, un'economia di € 5.159,02
48	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mirano. Settore B	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 80 22/9/1999	508.296,88	508.296,88	481.632,89	Lavori collaudati	22/05/2000	04/07/2001	04/11/2003	Registrata, con DDDA n. 94 del 19/05/2004, un'economia di € 26.663,99
49	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Spinea	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 81 22/9/1999	671.393,97	671.393,97	669.023,23	Lavori collaudati	05/09/2000	07/10/2002	01/09/2003	Registrata, con DDDA n. 8 del 07/01/2004, un'economia di € 2.370,74
50	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mira. Settore A	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 82 22/9/1999	284.051,29	284.051,29	274.136,39	Lavori collaudati	05/09/2000	23/11/2001		Registrata, con DDDA n. 161 del 31/08/2004, un'economia di € 9.914,90
51	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mira. Settore B	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 83 22/9/1999	748.862,50	748.862,50	748.862,49	Lavori collaudati	22/05/2000	22/02/2002		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 231 del 06/12/2004
52	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di S. Maria di Sala	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 131 23/12/1999	774.685,35	774.685,35	750.560,99	Lavori collaudati	20/10/2000	27/05/2002	20/10/2003	Registrata, con DDDA n. 91 del 19/05/2004, un'economia di € 24.124,37
53	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Strà	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 132 23/12/1999	413.165,52	413.165,52	404.960,93	Lavori collaudati	14/09/2000	06/06/2002		Registrata, con DDDA n. 139 del 16/07/2004, un'economia di € 8.204,60
54	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Vigonovo	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 133 23/12/1999	490.634,05	490.634,05	490.634,05	Lavori collaudati	20/12/2000	16/12/2002		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 241 del 20/12/2004
55	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Campolongo Maggiore	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 135 23/12/1999	516.456,90	516.456,90	508.825,66	Lavori collaudati	22/01/2001	20/06/2002		Registrata, con DDDA n. 112 del 16/06/2004, un'economia di € 7.631,24

APGA

Legge 515/96 Es. 1997

10	Potenziamento del sistema depurativo e ampliamento delle reti di fognatura nel territorio del consorzio del Piovese - 1° stralcio Impianti	A/4/1.1	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 39 DEL 10/4/2001	2.788.867,26	2.788.867,26	2.788.867,25	Contabilità finale				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 131 del 04/08/2005
11	Ampliamento delle reti di fognatura e del sistema depurativo nel territorio del consorzio del Piovese	A/4/1	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 68 DEL 7/9/2000	4.957.986,23	4.957.986,23	4.957.986,24	Contabilità finale				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 228 del 05/12/2005

AZIENDA CONSORZIO SILE PIAVE

Legge 515-96 Es 97 3^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o Impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1997											
1	Ampliamento della rete fognaria e realizzazione I stralcio dell'impianto di depurazione comunale della frazione Olmi in Comune di San Biagio di Callalta	B/13/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DDDA N. 43 01/06/1999	115.508,77	115.508,77	115.508,77	Intervento sospeso e fondi dirottati per € 1.549.370,70 all'intervento 7A.				Intervento revocato con DDDA n. 71 del 11/06/2001
1B	Progetto di ampliamento della rete fognaria e realizzazione primo stralcio dell'impianto di depurazione comunale in comune di S. Biagio di Callalta (TV)	B/13/1.1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	0,00	1.433.861,93	0,00	0,00	Progettazione in corso				
	AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI											
	Legge 515/96 Es. 1997											
6	Progetto n. 7 . Adeguamento impianto elettrico e cogenerazione depuratore di Cittadella.	A/3/1.a	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 60 4/11/1998	408.000,95	408.000,95	369.156,83	Lavori collaudati	11/02/2003	07/10/2003	28/10/2003	Registrata, con DDDA n. 164 del 31/08/2004, un'economia di € 38.844,13
7	Progetto n. 8 . Ottimizzazione impianto consorziale di Cittadella	A/3/1.b	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 60 4/11/1998	1.996.105,92	1.996.105,92	1.996.105,92	Lavori collaudati	03/05/2000	01/12/2001	25/10/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 164 del 31/08/2004
8	Progetto n. 6. Scolmatore roggia Munara	A/3/1.c	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 60 4/11/1998	436.406,08	436.406,08	436.406,08	Lavori collaudati	30/11/2000	30/11/2001	20/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 164 del 31/08/2004
	AZIENDA CONSORZIO ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO											
	Legge 515/96 Es. 1997											
2	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Battaglia Terme	A/7/2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 58 22/8/2000	568.102,59	568.102,59	468.442,37	Lavori in corso	31/07/2002			
	AZIENDA CONSORZIO VENETO SERVIZI											
	Legge 515/96 Es. 1997											
3	Ampliamento schema fognario della zona del Conselvano.	A/2/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DPGR N. 63 12/11/1998	5.939.254,34	5.939.254,34	5.939.254,34	Lavori collaudati	19/04/1998	7/11/2001	07/12/2001 15/02/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 30 del 05/04/2002
	COMUNE DI ARQUA' PETRARCA											
	Legge 515/96 Es. 1997											
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Arquà Petrarca	A/1/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 540 9/12/1997	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Lavori collaudati				Decreto di contabilità finale in itinere.
	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO											
	Legge 515/96 Es. 1997											
1	Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione in Comune di Castelfranco Veneto, località Salvatronda	A/10/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1998	DDDA N. 25 19/03/1999	1.446.079,32	1.446.079,32	1.260.029,51	Lavori conclusi. Collaudo in corso	23/05/2000	29/11/2001		

Legge 515-96 Es 97 3^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	COMUNE DI CAVALLINO Legge 515/96 Es. 1997											
1	Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)	C/23/1.2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 38 23/4/2002	4.648.112,09	4.648.112,09	3.626.098,64	Lavori in corso				
	COMUNE DI CAVARZERE Legge 515/96 Es. 1997											
3	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Cavarzere	B/15/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 64 12/11/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Lavori collaudati	Date non comunicate dall'ente			Registrata, con DDDA n. 204 del 22/10/2004, un'economia di € 4.303,48. Richiesta la restituzione alla R.V. di € 12.354.14
	COMUNE DI CHIOGGIA Legge 515/96 Es. 1997											
15	Realizzazione di interventi di completamento funzionale dell'impianto di depurazione di Val da Rio	B/16/7	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 55 29/6/1999	250.998,05	250.998,05	0,00	Lavori in corso	10/09/1999			
16	Progetto esecutivo di ampliamento della rete fognaria nelle calli del centro storico di Sottomarina a nord di Via Roma, per l'adeguamento dello stesso alla nuova normativa di riferimento Merloni Ter. Finanziamento dei primi due lotti dell'opera	B/16/4	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 95 30/10/2000	4.991.555,93	4.991.555,93	3.601.978,90	Lavori in corso	04/10/2002			Progetto riadottato
17	Ampliamento della rete fognaria e interventi sugli impianti di depurazione comunale in Comune di Chioggia	B/16/8	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 135 29/11/2002	0,00	0,00	0,00	Finanziamento originale di € 1.669.062,18 suddiviso negli interventi 17A (€) e 17B (€)				0,00
17A	Progetto esecutivo relativo ad interventi a difesa dell'abitato di Chioggia - Fondamenta San Domenico.	B/16/4.2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 138 30/08/2005	516.062,18	516.062,18	116.834,35	Lavori in corso				
17B	Completamento del depiuratore di Val da Rio. 1° lotto funzionale. Impianto di modulazione e sollevamento "Niccolò De Conti".	B/16/4.3	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 207 10/11/2005	1.153.000,00	1.025.000,00	0,00	Progetto approvato				
18	Progetto di riqualificazione edilizia della linea "picchi" del depuratore di Val da Rio	B/16/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 545 16/12/1997	209.705,25	209.705,25	189.927,74	Lavori collaudati	09/03/1998	07/05/1998	08/07/1998	Registrata, con DDDA n. 39 del 14/04/2003, un'economia di € 19.777,51 da reiscrivere nel bilancio regionale 2003

Legge 515-96 Es 97 3^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
19	Progetto esecutivo per un sistema di disidratazione dei fanghi depuratore Val da Rio-2° lotto	B/16/2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 146 24/3/1998	194.381,98	194.381,98	194.381,98	Lavori collaudati	03/03/1999	10/06/1999	15/09/1999	Registrata, con DDDA n. 54 del 25/06/1999, un'economia di € 12.200 convogliata nel finanziamento 16
20	Progetto di manutenzione straordinaria presso l'impianto di depurazione di Val da Rio	B/16/3	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 430 22/10/1997	147.098,80	147.098,80	140.752,63	Lavori collaudati	29/11/1997	12/05/1998	19/12/1998	Documentazione relativa al collaudo dell'opera non ancora inviata da parte dell'ente.
21	Affinamento qualitativo dell'effluente del depuratore di Val da Rio	B/16/5	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 12 DEL 2/3/1999	2.040.004,75	2.040.004,75	1.684.034,30	Collaudo in corso	19/07/1999	31/10/2000		
22	Collettore di allacciamento della fognatura comunale per il conferimento dei reflui da Cà Bianca al depuratore di Val da Rio	B/16/6	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 22 15/3/1999	826.331,04	826.331,04	500.688,08	Lavori in corso	15/07/1999			L'importo complessivo dell'opera è pari a 3,1 MLD di lire, finanziato per 1,5 mld dal CIPE e per 1,6 MLD dalla Legge Spec. Ve
	COMUNE DI ESTE Legge 515/96 Es. 1997											
1	Ampliamento della rete fognaria nella zona del canale Bisatto - XI stralcio "Meggiaro"	A/6/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 30 DEL 5/8/1998	1.291.142,25	1.291.142,25	1.162.028,02	Collaudo in corso Lavori ultimati	02/02/2000 09/06/2003	15/05/2001 -		
	COMUNE DI GALZIGNANO Legge 515/96 Es. 1997											
2	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Galzignano	A/7/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 185 24/4/1998	619.748,28	619.748,28	619.711,96	Lavori collaudati	11/01/1999	09/03/2001	31/02/2002	Registrata, con DDDA n. 61 del 31/05/2002, un'economia pari a € 36,32
	COMUNE DI MEOLO Legge 515/96 Es. 1997											
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Meolo (progetto complessivo € 538.335,67)	B/19/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 11 DEL 5/5/1998	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori collaudati	12/06/1998	10/06/1999	25/09/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 166 del 13/11/2003
	COMUNE DI MOGLIANO VENETO Legge 515/96 Es. 1997											
4	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Mogliano Veneto	A/11/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DDDA N. 84 09/12/1998	2.582.284,50	2.582.284,50	2.504.915,29	Lavori ultimati				Dati e documentazione non ancora inviata da parte dell'ente
	COMUNE DI MONASTIER Legge 515/96 Es. 1997											

Legge 515-96 Es 97 3^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione comunale in Comune di Monastier	B/12/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 29 DEL 5/8/1998	1.401.642,79	1.401.642,79	1.401.642,79	Lavori collaudati	01/07/1999	26/10/2001	22/07/2002	Importo originale del progetto pari a € 1.549.370,70. Registrata, con DDDA n. 36 del 14/04/2003, un'economia di € 147.727,91, reinvestita per finanziare l'int. 2
2	Ampliamento della rete fognaria in via Pralongo nel comune di Monastier - opere di completamento	B/12/1.1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 182 05/10/2004	147.727,91	147.727,91	0,00	Progetto approvato				Utilizzo economie di spesa maturate dal decreto contabilità finale n. 36 del 14/04/2003
	COMUNE DI MONSELICE Legge 515/96 Es. 1997											
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Monselice	A/8/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 116 13/12/1999	2.582.284,50	2.582.284,50	2.575.114,19	Lavori collaudati				Registrata, con DDDA n. 19 del 08/02/2005, un'economia di € 7.170,31
	COMUNE DI MUSILE Legge 515/96 Es. 1997											
6	Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	B/20/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 93 30/7/2001	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
6A	Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE) (€ 1.239.496,56)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 516.456,90) + 3 (€ 516.456,90) + 4 (€ 206.582,76) = € 1.239.496,56					Lavori collaudati	18/02/2000	20/06/2001	28/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
	COMUNE DI NOALE Legge 515/96 Es. 1997											
1	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio.	B/21/1	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 18 26/2/2001	1.291.142,25	1.291.142,25	767.891,05	Finanziamento convogliato nell'intervento 2B per l'importo di € 1.291.142,25				
	COMUNE DI PADOVA Legge 515/96 Es. 1997											
1	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nordio in Comune di Padova	A/9/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DGCA N. 213 03/05/1999	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	Lavori collaudati				Importo compless. dell'opera € 6.971.742,72 (fondi della Legge Speciale per Venezia per € 2.065.827,60) DGCA 355/05 determinazione contributo definitivo

Legge 515-96 Es 97 3^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	COMUNE DI VENEZIA Legge 515/96 Es. 1997											
74 V.	Ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria in Comune di Venezia	C/23/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997		7.521.618,25	0,00	0,00	Progettazione in corso				Importo complessivo del finanziamento € 27.372.215,65 suddiviso negli interventi 74A (€ 428.659,23), 74B (4.343.402,52), 74C (€ 2.065.827,60) e uno di competenza del Comune del Cavallino (€ 4.648.112,09). Parte del finanziamento revocato,
74A V.	Impianto di sollevamento località "Rana" e condotta di scarico.	C/23/1.1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 179 24/12/2001	428.659,23	428.659,23	0,00	Progetto approvato				
74B V.	Ristrutturazione della rete fognaria della zona del centro di Marghera (VE)	C/23/1.3	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 78 27/6/2002	4.343.402,52	4.343.402,52	0,00	Progetto approvato				
75	PROGETTO INTEGRATO RII	C/26/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997		11.878.508,68	11.878.508,68	11.878.508,68	Lavori in corso				
74C V.	Ristrutturazione della rete fognaria secondaria della zona Nord e Centro di Marghera (VE)	C/23/1.4	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999		2.065.827,60	0,00	0,00					Il DDDA n. 90 del 12/08/2002 che impegnava € 2.065.827,6 è annullato con il DDDA 77/03 in quanto l'intervento deve essere finanziato con i fondi CIPE
74D V.	Completamento della rete di fognatura di tipo misto del Bacino della Gazzera.	C/23/1.5	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 114 20/08/2003	3.098.741,39	3.098.741,39	0,00	Progetto approvato				
	COMUNE DI ZERO BRANCO Legge 515/96 Es. 1997											
2	Ampliamento della rete fognaria e completamento del costruendo impianto di depurazione comunale	B/14/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 67 13/11/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Collaudo in corso				Con DDDA n. 52/2004 stabilito integrazione finanziamento di € 210.000,00. Con DGR 1234/04 stabilito nuovo termine fina e lavori: 31/12/2005
	CONSORZIO BASSO PIAVE Legge 515/96 Es. 1997											
1	Miglioramento della efficienza dello scarico delle reti fognarie 1° stralcio - Risanamento e riordino idraulico delle isole Trepontine	B/17/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 52 DEL 4/8/2000	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.091,54	Lavori collaudati				Determinazione contributo definitivo con DDDA 191 del 25/10/2005: registrata economia di € 50.71

Legge 515-96 Es 97 3^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	REGIONE BONIFICA SITI INQUINATI Legge 515/96 Es. 1997											
1	Bonifica siti inquinati in Comune di Venezia - Zona industriale di Marghera	C/24/1	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA 95/03 DGR 2382/03 DGR 1948/03	498.721,69	498.272,22	185.366,68	Lavori in corso				Fondi a disposizioni della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003
2	Accordo integrativo per la chimica di Porto Marghera - MASTER PLAN.(Bonifica siti inquinati in comune di Venezia - Z. I. di Porto Marghera)	C/24/1.1	DCR N. 45 DEL 15/7/1999	DDDA N. 37 23/4/2002	551.575,97	551.575,97	551.575,97	Lavori ultimati	Date diverse			Esecuzione dei lavori affidata a 5 soggetti attuatori.
	Interventi legati all'attuazione dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004. Bonifica area Porto Marghera.	C/24/1.A	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 109 04/07/2005	784.386,84	784.386,84	784.386,84					
	Bonifica siti inquinati in comune di Venezia - Zona Industriale di Porto Marghera	C/24/1.B	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		747.599,50	677.100,00	410.843,90					
	ULSS 12 VENEZIA / DISINQUINAMENTO Legge 515/96 Es. 1997											
7	Ristrutturazione della rete fognaria dell'ospedale civile SS. Giovanni e Paolo - Secondo stralcio funzionale	B/22/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 152 27/3/1998	929.622,42	929.622,42	915.230,09	Lavori collaudati	25/10/1999	16/11/2000	30/04/2003	Registrata, con DDDA n. 153 del 30/10/2003, un'economia di € 14.392,33 reiscritta nel bilancio regionale
8	Ristrutturazione della rete fognaria di complessi ospedalieri: ospedale civile e G.B. Giustinian in Comune di Venezia	B/22/2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 425 27/10/1997	103.291,38	103.291,38	75.910,27	Lavori collaudati	13/06/1995	30/10/1998	27/03/2003	In attesa del decreto di contabilità finale di competenza dei lavori pubblici
	DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA Legge 515/96 Es. 1997											
5	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	C/23/1.6	DGR 2613 22/07/1997		5.265.854,58			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Ampliamento e ristrutturazione rete fognaria" cod C/23/1
	TOTALE				103.291.379,33	86.805.268,01 84,04%	71.692.204,11 69,41%					

Legge 515-96 Es 98 4^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	ACM Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
56	Lavori di costruzione del 29° lotto - Fognatura in comune di Strà	A/11.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 33 DEL 2/4/2001	206.582,76	206.582,76	185.924,48	Collaudo in corso				0,00
57	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Santa Maria di Sala.	A/11.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 44 23/4/2001	413.165,52	413.165,52	371.848,97	Collaudo in corso	04/03/2002			
58	Lavori per la costruzione del 29° lotto di fognature. Intervento nel comune di Fossò	A/11.5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 45 23/4/2001	103.291,38	103.291,38	103.291,38	Contabilità finale				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 38 del 08/03/2005
59	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature . Intervento nel comune di Noale.	A/11.8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 58 14/5/2001	516.456,90	516.456,90	464.811,23	Collaudo in corso	18/02/2003			
60	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Scorzè	A/11.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 41 23/5/2001	568.102,59	568.102,59	568.102,59	Lavori collaudati	13/02/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 227 del 03/12/2004
61	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Campolongo Maggiore.	A/11.17 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 120 3/10/2001	309.874,14	309.874,14	278.886,73	Collaudo in corso	07/10/2003			
62	Lavori di costruzione del 29° lotto - Fognatura in comune di Vigonovo	A/11.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 32 DEL 2/4/2001	258.228,45	258.228,45	232.405,61	Collaudo in corso	06/03/2002	26/06/2003		
63	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Dolo.	A/11.12 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 106 DEL 7/9/2001	258.228,45	258.228,45	210.410,42	Lavori in corso	03/07/2002			
64	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Fiesso d' Artico.	A/11.7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 57 14/5/2001	154.937,07	154.937,07	139.443,36	Collaudo in corso	10/09/2002			
65	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Martellago	A/11.11 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 91 30/7/2001	361.519,83	361.519,83	325.367,85	Collaudo in corso	09/10/2002			
66	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Mira.	A/11.13 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 107 DEL 7/9/2001	723.039,66	723.039,66	650.735,69	Collaudo in corso	28/08/2002			
67	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Mirano.	A/11.16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 119 3/10/2001	619.748,28	619.748,28	619.023,53	Lavori in corso	28/10/2002			
68	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Salzano.	A/11.15 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 118 3/10/2001	413.165,52	413.165,52	413.165,52	Contabilità finale				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 83 del 13/05/2005
69	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Spinea.	A/11.14 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 108 DEL 7/9/2001	154.937,07	154.937,07	154.937,07	Contabilità finale	11/07/2002	22/07/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 240 del 20/12/2004

Legge 515-96 Es 98 4^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
70	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Campagna Lupia	A/11.9 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 89 30/7/2001	154.937,07	154.937,07	125.462,11	Lavori in corso	11/09/2002			
71	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Pianiga.	A/11.6 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 56 14/5/2001	258.228,45	258.228,45	257.682,29	Contabilità finale				Registrata, con DDDA n. 84 del 13/05/2005, un'economia pari a € 546,16
72	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Camponogara	A/11.10 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 90 30/7/2001	464.811,21	464.811,21	418.330,09	Collaudo in corso	12/07/2002			
	AZIENDA SERVIZI IDRICI CASTELLANA Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
1	Interventi di fognatura in comune di Riese Pio X (TV). 1° stralcio	B/17.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 48 DEL 1/8/2000	1.032.913,80	1.032.913,80	966.608,02	Lavori collaudati	22/02/2001	14/11/2002	24/04/2003	Registrata, con DDDA n. 148 del 20/10/2003, un'economia di € 66.305,78 da reiscrivere nel bilancio regionale 2003
	AZIENDA CONSORZIO SILE PIAVE Legge 515/96 Es. 1998 – IV fase											
2	Interventi di fognatura in comune di Quarto d'Altino	A/9 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 63 01/09/2000	2.065.827,60	2.065.827,60	2.052.399,45	Lavori collaudati	09/10/2001	30/06/2003		Registrata, con DDDA n. 229 del 03/12/2004, un'economia di € 13.428,15
3	Interventi di fognatura nei comuni di Meolo, Marcon, S. Biagio di Callalta, Roncade per l'importo totale di € 5.422.797,44	A/8 IV fase	Finanziamento suddiviso negli interventi 4 (DDDA n. 78/2000), 5A e 5B (DDDA n. 94/2000), 6 (DDDA n. 61/2000) e 7 (DDDA n. 51/2000). Rimodulazione delle somme finanziate a seguito della DGR 3907/04 e DDDA233/05									
4	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Marcon	A/8.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 78 15/09/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 35 del 02/03/2005
5A	Costruzione della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Ampliamento della rete - II stralcio	A/8.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 94 30/10/2000	68.736,33	68.736,33	68.736,33	Fondi dirottati all'intervento 7A per l'importo di € 1.446.079,32.				DGR 3907/04 variante parziale al PRRA: rimodulazione finanziamenti. DDDA 233/05 disimpegno somme
5B	Interventi di fognatura nei comuni di Meolo, Marcon, S. Biagio di Callalta, Roncade.	A/8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999		1.377.342,98	0,00	0,00	Fondi provenienti dalla rimodulazione delle somme dell'intervento 3, come da DGR 3907/04				
6	Ampliamento della rete fognaria dei comuni di Meolo e Roncade	A/8.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 61 01/09/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.542.032,77	Lavori collaudati				Registrata, con DDDA n. 34 del 02/03/2005, un'economia di € 7.337,93

Legge 515-96 Es 98 4^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
7	Costruzione della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta. Impianto di depurazione della Frazione Olmi - 2° stralcio	A/8.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 51 04/08/2000	877.976,75	0,00	0,00	Fondi dirottati nell'intervento 7A per l'importo di € 877.976,73.				DDDA 233/05 disimpegno somme
7A	Realizzazione di rete fognaria e relativi allacciamenti in conformità al nuovo Progetto Generale Definitivo (€ 3.873.426,75)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.549.370,70) + 5 (€ 1.446.079,32) + 7 (€ 877.976,73) = € 3.873.426,75					Redatto il progetto definitivo				
	AZIENDA CONSORZIO TERGOLA Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
25	Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani	A/1.14 - IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 161 3/12/2001	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Finanziamento convogliato nell'intervento 76H				
26	Progetto esecutivo per il completamento della rete fognaria nelle vie Carpane e Col di Lana in Comune di Vigonza (Pd)	A/1.5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 92 30/10/2000	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 9 del 21/01/2005
27	Realizzazione del bypass fognario in Comune di S. Giustina in Colle	A/2.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 77 15/9/2000	387.342,67	387.342,67	387.342,67	Lavori collaudati	04/07/2001 09/12/2002	27/06/2002 31/12/2002	18/11/2002 25/07/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 170 del 17/11/2003
28	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Giovanni XXIII, Cao del Mondo e Puccini in comune di Camposampiero	A/1.8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 116 19/12/2000	89.347,04	89.347,04	89.347,04	Finanziamento convogliato nell'intervento 50A				
29	Rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana	A/1.9 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 50 DEL 4/8/2000	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 56A				
30	Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcanton e Muson in comune di Borgoricco	A/1.11 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 85 30/7/2001	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Finanziamento convogliato nell'intervento 63A				
31	Progetto esecutivo per la realizzazione del collettore fognario di collegamento della frazione di Fiumicello di Campodarsego alla rete consortile principale	A/1.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 76 15/9/2000	619.748,28	619.748,28	557.773,46	Appalto A lavori in collaudati Appalto B lavori in corso	30/07/2001 26/05/2003	27/09/2002 -	26/02/2003 -	
32	Rete fognaria nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana	A/2.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 50 DEL 4/8/2000	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 56A				
33	Progetto esecutivo per il completamento della rete fognaria nera nelle vie Julia, Trieste, Muggia e Parenzo in Comune di Vigonza (Pd)	A/1.6 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 93 30/10/2000	144.607,93	144.607,93	130.147,14	Lavori in corso	03/04/2002			
34	Progetto esecutivo per l'ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Russia	A/1.7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 97 30/10/2000	165.266,21	165.266,21	165.266,21	Finanziamento convogliato nell'intervento 67A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004
35	Interventi di fognatura nei comuni consorziati e negli impianti di depurazione di Vigonza e Cadoneghe	A/1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		1.675.698,87	0,00	0,00	Finanziamento suddiviso dall'ente in 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 35F e 35G				

Legge 515-96 Es 98 4^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
35A	Collegamento stradale e fognario Z.I. laterale Via Visentin con Via Straelle San Pietro in Comune di Camposampiero (€ 88.364,63)	A/1.18 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 35 04/02/2004	88.425,43	88.425,43	79.582,89	Collaudo in corso				
35B	Riqualifica della rete di fognatura nera nelle Vie: prolungamento e lottizzazione Fratina e Bassa I^a^ in comune id Campodarsego - Rostirola in comune di Camposampiero (€ 516.456,90)	A/1.17 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 123 10/09/2003	516.456,90	516.456,90	145.970,10	Progetto approvato				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35
35C	Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Straelle, Bonora, S. Pietro, Straelle di Rustega e del Graticolato Romano nei Comuni di Camposampiero, Borgoricco e Massanzago - 1° stralcio (€ 51.645,69)	A/1.16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 91 06/08/2003	51.645,69	51.645,69	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 72A				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35
35D	Riqualifica della rete di fognatura nera nelle Vie: Rigotti e Matteotti in comune di Cadoneghe - S. Francesco, Goldoni e S. Chiara in Comune di Vigonza - Don Orione in Comune di Trebaseleghe (€ 1.032.913,80)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35					In fase di progettazione	-			
35E	Costruzione di una fognatura nera lungo Via Capriccio in Comune di Vigonza (€ 191.089,05)	A/1.15 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 72 13/06/2003	191.089,05	191.089,05	191.089,05	Finanziamento convogliato nell'intervento 58A				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35
35F	Interventi nei Comuni ex Tergola (€ 331.514,83)	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35						Finanziamento convogliato nell'intervento 76G				
35G	Completamento impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in fiume Brenta (€ 826.331,04)	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35						Finanziamento convogliato nell'intervento 2A gestito dalla subentrante SETA				
35H	Estensione fognatura nera lungo la strada regionale 245 "Castellana" in comune di Trebaseleghe	A/1.19 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 21 09/02/2005	165.000,00	165.000,00	136.503,23	Lavori in corso				
35I	Realizzazione rete di fognatura nera nelle vie Trevisan, Manara ed Umberto I° in comune di Vigonza	A/1.20 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 25 14/02/2005	350.000,00	350.000,00	0,00	Progetto approvato				
36	Estensione delle reti di fognatura nera nelle vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in comune di S. Giustina in Colle	A/2.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 115 19/12/2000	247.899,31	247.899,31	247.899,31	Finanziamento convogliato nell'intervento 60A				
37	Progetto esecutivo per il collegamento della zona industriale di S. Giorgio delle Pertiche alla rete di fognatura nera comunale e riabilitazione rete principale nei Comuni di Borgoricco e Massanzago.	A/1.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 56 22/8/2000	404.385,75	404.385,75	404.385,75	Lavori collaudati	02/07/2001	05/09/2002	19/03/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 96 del 18/08/2003
38	Completamento centro di biotrattamento di Camposanpiero	B/20 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		6.249.128,48	5.285.000,00	2.732.505,34	Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SE.T.A.				

Legge 515-96 Es 98 4^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
39	Collettore di collegamento fognario Resana - Torreselle	A/2.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 31 21/3/2001	2.030.418,74	2.030.418,74	1.896.852,79	Finanziamento convogliato nell'intervento 65A				
39A	Intervento per la riqualificazione del sistema fognario del comune di Resana - Realizzazione della rete fognaria separata in località Castelminio	A/2.4 IV fase ECO	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 179 12/10/2005	35.408,86	35.408,86	0,00	Progetto approvato				
40	Ampliamento della rete fognaria nelle vie Stroppari e Piovega Nord in comune di Villanova di Camposampiero.	A/1.10 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 84 30/7/2001	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Finanziamento convogliato nell'intervento 70A				
41	Progetto esecutivo per il collegamento della rete fognaria di Via dell'Industria in Comune di Borgoricco alla fognatura comunale.	A/1.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 57 22/8/2000	65.073,57	65.073,57	65.073,57	Lavori collaudati	04/12/2001	01/07/2002	02/09/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 97 del 18/08/2003
42	Nuovo by-pass della rete di fognatura in comune di Loreggia	A/2.5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 88 30/7/2001	139.443,36	139.443,36	139.443,36	Finanziamento convogliato nell'intervento 47A				
43	Nuovo by-pass della rete fognatura in comune di Loreggia	A/1.12 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 88 30/7/2001	224.658,75	224.658,75	224.658,75	Finanziamento convogliato nell'intervento 47A				
44	Progetto di ampliamento del depuratore di Cadoneghe (PD)	A/1.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 54 DEL 4/8/2000	774.685,35	774.685,35	772.526,83	Finanziamento convogliato nell'intervento 44A				Registrata, con DDDA n. 176 del 11/10/2005, un'economia di € 2.158,52
44A	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe (€1.807.599,15)		Riuniti i finanziamenti 17 (€ 1.032.913,80) + 44 (€ 774.685,35) = € 1.807.599,15					Opere in fase di collaudo	03/07/2000	24/04/2003		
45	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe - 2^ fase	A/1.13 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 124 4/10/2001	2.117.473,29	2.117.473,29	1.551.741,49	Finanziamento convogliato nell'intervento 73A				
	AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
9	Progetto "Laguna 9" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area di Cittadella e Fontaniva	A/10.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 70 13/9/2000	2.014.181,91	2.014.181,91	2.014.181,91	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 246 del 30/12/2005
10	Progetto "Laguna 10" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area est di Cittadella, Galliera e Tombolo	A/10.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 72 13/9/2000	1.910.890,53	1.910.890,53	1.910.890,52	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 245 del 30/12/2005
11	Progetto "Laguna 11" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area dei comuni di Tombolo e San Martino di Lupari.	A/10.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 71 13/9/2000	1.910.890,53	1.910.890,53	1.579.788,84	Lavori in corso				0,00
	AZIENDA CONSORZIO ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											

Legge 515-96 Es 98 4^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
3	Ampliamento della fognatura in località Regazzoni nei comuni di Montegrotto T. e Galzignano T.	B/12 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 62 DEL 4/6/2002	1.032.913,80	1.032.913,80	929.622,42	Lavori in corso	18/07/2002			
	AZIENDA CONSORZIO VENETO SERVIZI											
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
4	Ampliamento impianto di depurazione di Monselice	A/4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 171 12/12/2001	1.032.913,80	1.032.913,80	358.553,92	Lavori in corso				
5	Interventi di fognatura in comune di S. Elena	A/6 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/2000	DDDA N. 114 19/12/2000	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Contabilità finale	12/07/2001	19/09/2002	14/04/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 147 del 20/10/2003
6	Interventi su impianti di depurazione di fognature e di diversione nei comuni di: Pernumia, Solesino, Borgoforte di Anguillara Veneta, Arre, Agna, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Pozzonovo, Terrassa P. ,Tribano.	A/3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/2001	DDDA N. 87 30/07/2001	3.821.781,05	3.821.781,05	3.411.455,81	Lavori in corso	02/07/2002 02/07/2002 15/05/2002 02/07/2002			
7	Lavori di rifacimento della fognatura e pavimentazione nelle vie Matteotti e Principe Umberto, con sistemazione di Piazza Maggiore - 13° stralcio fognature in comune di Este	A/5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/2002	DDDA N. 136 30/10/2001	1.446.079,32	1.446.079,32	1.142.853,27	Lavori in corso				
	S.P.I.M.											
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
3	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	B/13 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 29 21/03/2001	516.456,90	516.456,90	0,00	Progetto approvato				
	COMUNE DI CAVARZERE											
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
4	Interventi fognari a Villaggio Busonera, S. Giuseppe e Zona Industriale	B/16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 81 9/10/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.532.180,55	Lavori collaudati	Date non comunicate dall'ente			Registrata, con DDDA n. 228 del 03/12/2004, un'economia di € 17.190,15
	COMUNE DI MORGANO											
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
1	Ampliamento della fognatura comunale di via Ongarie, via Zeriolo, via Statue, via Aldo Moro in Comune di Morgano (Tv)	B/14 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 62 DEL 1/9/2000	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 146 del 13/09/2005
	COMUNE DI PREGANZIOL											
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											

Legge 515-96 Es 98 4^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Costruzione della fognatura a servizio della frazione di Sambughè	B/15.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 46 27/7/2000	774.685,35	774.685,35	761.531,09	Lavori collaudati				Registrata, con DDDA n. 53 del 29/03/2005, un'economia pari a € 13.154,26
	COMUNE DI ZERO BRANCO											
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
3	Interventi di fognatura e di depurazione nel comune di Zero Branco.	B/18 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 64 DEL 1/9/2000	123.949,66	123.949,66	123.949,66	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per l'importo di € 123.949,66				
4	Interventi di fognatura e depurazione	B/18 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 21 DEL 7/3/2002	134.278,79	134.278,79	134.278,79	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per l'importo di € 134.278,79				
4A	Interventi di fognatura e depurazione (€ 516.456,90)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 258.228,45) + 3 (€ 123.949,66) + 4 (€ 134.278,79) = € 516.456,90					Lavori collaudati				Registrata, con DDDA n. 10 del 21/01/2005, un'economia pari a € 23,94
	MAV											
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
3	Interventi per ripristino dei pennelli alle foci di Adige e Brenta	B/21 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDS N. 28 11/3/1999	1.549.370,70	1.520.474,93	1.254.439,76	Lavori in corso				
	REGIONE DISINQUINAMENTO											
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
36	Realizzazione Carta Geologica della Laguna	B/22.1 IV fase	DCR N. 23 DEL 1/3/2000	DGR N. 3788 1/12/2000	309.874,14	309.870,17	303.930,59	Lavori ultimati				
37	Informazione, stampa, divulgazione, Piano Direttore, carta geologica della laguna	B/22 IV fase	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		451.899,79	428.730,01	428.129,97	Lavori in corso				
	ULSS 17 ESTE MONSELICE											
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
1	Ristrutturazione delle fognature in area ospedaliera di Monselice - 1^ fase funzionale.	A/7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 96 30/10/2000	1.291.142,25	1.291.142,25	1.162.028,03	Lavori in corso	08/04/2002			
	ENTI VARI											
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
1	Fondo di rotazione per la progettazione	B/19 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		5.164.568,99	1.754.920,54	1.754.920,54	Progetto approvato				
	TOTALE				61.187.231,15	52.830.366,11	45.377.807,08					
						86,34%	74,16%					

Legge 515-96 Magg Mutui

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	CONSORZIO DESE SILE Legge 515/96 Magg. Mutui IV^fase											
26	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia - Completamento ed adeguamento	B/23	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDTA N. 84 02/07/2003	36.151,98	36.151,98	6.501,93	Lavori collaudati	03/07/2003	08/08/2003		Registrata, con DDDA n. 105 del 08/06/2004, un'economia di € 29.650,05
	TOTALE				36.151,98	36.151,98	6.501,93					
						100,00%	17,98%					

Legge 345-97 Es 98 5^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	ARPAV											
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
10	Potenziamento del servizio di analisi ed informazione in campo agro-zootecnico del centro Agroambientale di Castelfranco Veneto.	A/6.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 97 8/10/2002	1.032.913,80	1.032.913,80	619.748,00	Lavori in corso				
11	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna di venezia - estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino Scolante	B/15.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DGR N. 667 14/3/2003	1.032.913,80	1.032.913,80	516.456,90	Lavori in corso				
	ACM											
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
	Progetto dimostrativo per l'integrazione di reti di fognatura bianca e reti di bonifica DOLO-MIRA (Finanziamento iniziale € 5.164.568,99 al Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta - int. 11A - e poi diviso per competenze)	B/13.1 - V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA 230 05/12/2005	415.000,00	415.000,00	0,00					
	APGA											
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
12	Interventi di fognatura nei comuni di Piove di sacco, Legnaro, Brugine, Polverara, Correzzola, S. Angelo, Pontelongo, Arzergrande	A/1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 106 14/12/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Contabilità finale				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 186 del 21/10/2005
	AZIENDA SPECIALE VENETO SERVIZI											
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
8	Impianto di biotrattamento di Conselve (€ 8.779.767,28)		Intervento sospeso e fondi riallocati con D.G.R. 794/2002 agli interventi 8A (€ 1.032.913,80), 8B (€ 4.648.112,09) e 8C (€ 3.098.741,39)									
8A	Adeguamento al D. M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Conselve - II stralcio	A/5 V fase	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 11A per l'importo di € 1.032.913,80				
8B	Impianto di depurazione di Conselve potenzialità 46.880 A.E. - 1° stralcio	A/5.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 30/08/1999	DDDA N. 69 26/06/2002	4.648.112,09	4.648.112,09	3.777.346,59	Lavori in corso				
8C	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati	A/5.2 V fase	DGR N. 2924 DEL 30/08/1999	DDDA N. 25 26/03/2003	3.098.741,39	3.098.741,39	743.813,40	Finanziamento convogliato nell'intervento 9A per l'importo di € 3.098.741,39				
	A.S.P. DI CHIOGGIA											
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
7	Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia	B/21.2 Vfase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DGCA N. 180 31/05/2004	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Lavori ultimati				Intervento originario di € 19.780.812,18 affidato alla Delta Po S.p.A. ora Veneto
	COMUNE DI MIRA											
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											

Legge 345-97 Es 98 5^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Bonifica area inquinata localizzata in via Teramo, loc. Olmo di Borbiago in comune di Mira (VE)	B/17 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N.148 13/12/2002	1.136.205,18	113.620,50	113.620,50	Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
	COMUNE DI VENEZIA Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
76 V.	Bonifica "Corti femminili" - Mestre	B/16 V fase	DGR N. 2962 DEL 14/9/2000		1.518.216,98	1.518.216,98	1.417.549,70	Lavori collaudati				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. Registrata, con DDDA n. 152 del 22/11/2001, un'economia di € 100.667,29
77A V.	Interventi di miglioramento dell' impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiarifloculazione, filtrazione e disinfezione U. V.	A/2.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 57 27/5/2002	5.216.214,68	5.216.214,68	0,00	Progetto approvato				Importo complessivo del progetto pari a € 6.713.939,68 distribuito tra gli int. 71, 77A e 77B.
77B V.	Progetto Campalto - completamento impianto di depurazione	A/2 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		1.239.496,56	0,00	0,00	Progettazione in corso				Importo complessivo del progetto pari a € 6.713.939,68 distribuito tra gli int. 71, 77A e 77B.
78	PROGETTO INTEGRATO RII	B/19 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 123 4/10/2001	19.625.362,17	19.625.362,17	19.625.362,17	Lavori in corso				
	CONSORZIO ADIGE BACCHIGLIONE Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
5	Intervento di incremento dei tempi di ritenzione delle acque di sfioro urbane e di dilavamento di superfici agricole nei comuni di Este e Baone	B/12 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 18 12/3/2003	3.615.198,29	3.615.198,29	149.344,87	Progetto approvato				In corso perizia per espropri. Erogazione limitata alle sole spese di progettazione
6	Fitodepurazione per integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l' autodepurazione nei bacini centrali.	A/11 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 138/01 DDDA N. 110/02	7.746.853,49	361.519,83	361.519,83	Progetto approvato				In corso perizia per espropri. Decreti di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione
	CONSORZIO BASSO PIAVE Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											

Legge 345-97 Es 98 5^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
2	Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione area Cavallino	B/20 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 223 DEL 2004	53.789,57	53.789,57	53.789,57	Finanziamento revocato				Finanziamento originale pari a € 12.911.422,48, di cui € 10.857.632,91 devoluti alla Diocesi Patriarcato di Venezia e € 2.000.000,00 alla Comunità Ebraica di Venezia.
	CONSORZIO BACCHIGLIONE BRENTA Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
4	Ricalibratura e sostegni sui rii di Piove	A/7 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 71 13/6/2003	4.131.655,20	4.131.655,20	206.582,75	Progetto definitivo				Decreto di impegno ed erogazioni limitati alle sole spese di progettazione
5	Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nell'area "Brondolo" in comune di Chioggia	A/9 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 108 14/12/2000	774.685,35	774.685,35	271.210,86	Progetto approvato				
6	Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo	A/8 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999					Finanziamento originale di € 2.840.512,95 suddiviso negli interventi 6A (€ 1.549.370,70) e 6B (€ 1.291.141,25)				
6A	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (1° stralcio) - Bacino Sesta Presa - sottobacino dei Rii di Piove (€ 1.549.370,70)	A/8 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		1.549.370,95	1.549.370,95	0,00	Progetto definitivo				Con DGR 1550 e1551 del 26/05/2004 ottenuto giudizio di compatibilità ambientale
6B	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (1° stralcio) - Bacino Bernio (€ 1.291.141,25)	A/8.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 190 07/10/2004	1.291.142,00	1.291.142,00	142.025,65	Lavori in corso				
	CONSORZIO DESE SILE Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
16	Ricalibratura e sostegni nei sottobacini del Marzenego	A/10.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999		1.291.142,25			Finanziamento suddiviso negli interventi 16A (€ 309.874,14) e 16B (€ 981.268,11)				
16A	Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago, Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta (€ 309.874,14)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 16 (€ 309.874,14)					Progettazione in corso				Approvazione VIA con DGR N. 1549 DEL 14/06/02
16B	Interventi di riqualificaz. nell'area denominata "Oasi di Noale". 2° Stralcio (€ 981.268,11)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 16 (€ 981.268,11)					Progettazione in corso				
	CONSORZIO DESTRA PIAVE Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											

Legge 345-97 Es 98 5^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque del sottobac. Vela: risezionamento corsi d' acqua, manufatti di controllo, nuovi collegamenti e recupero capacità d' invaso nei comuni di S. Biagio di Callalta, Monastier, Roncade.	B/14 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 29 27/3/2003	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Contabilità finale				Lavori collaudati.DDDA 157 del 20/9/2005 determinazione contributo definitivo.
	CONSORZIO SINISTRA MEDIO BRENTA Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
11	Progetto dimostrativo integrazione rete fognaria e di bonifica	B/13.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		3.200.198,29	Finanziamento convogliato nell'intervento 11A						
11A	Progetto dimostrativo integrazione rete fognaria e di bonifica (L'importo complessivo del progetto è pari a € 8.234.568,99, di cui € 5.164.568,99 costituiscono il primo stralcio)		Riuniti i finanziamenti 9 (€ 1.549.370,70) + 11(€ 3.615.198,29) = € 5.164.568,99					Progettazione in corso				L'importo di € 5.164.568,99 è costituito da uno stralcio di € 2.469.568,99 affidato al Consorzio e da uno stralcio di € 2.695.000,00 all' A.C.M.
	VENETO ACQUE Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
2	Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia	B/21 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DGCA N. 344 10/10/2000	17.880.812,18	17.880.812,18	17.880.812,18	Lavori in corso				Intervento originario di € 19.780.812,18 affidato alla Delta Po S.p.A. ora Veneto Acque. La quota pari a € 1.900.000,00 assegnati all'ASP di Chioggia (int. 7)
	REGIONE BONIFICA SITI INQUINATI Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
3	Bonifica siti inquinati P.Marghera	B/16.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		5.125.345,12	5.125.345,12	5.125.345,12					Fondi a disposizioni della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003. Il finanziamento complessivo pari a € 7.643.562,11, comprende anche una quota pari a € 1.518.216,98 destinata al Comune di Venezia per la bonifica delle Corti Femminili
					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
4	Indagine epidemiologica Marghera	B/18.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		103.291,38			Progettazione in corso				

Legge 345-97 Es 98 5^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	REGIONE DISINQUINAMENTO											
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
39	Progetto integrato Fusina (reflui civili industriali) - P.I.F.	A/3	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		18.075.991,47							
	REGIONE FORESTE AGRICOLTURA ZOOTECNIA											
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
8	Incentivi, modifiche colturali e piani di spargimento e gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole	A/4 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	Vari	10.329.137,98	9.939.688,99	6.298.041,04	Lavori in corso	Importo complessivo del finanziamento pari a € 10.329.137,98, di cui € 6.818.335,60 destinati ai Consorzi di bonifica. La somma di tutte le erogazioni relative ai consorzi di bonifica è pari a € 3.451.802,81			
	VESTA											
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
3	Realizzazione della condotta Ponte della Libertà - Tronchetto (Venezia)	B/21.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DGR N. 3057 DEL 2003	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	Progetto approvato				
	MAV											
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
	Intervento sui manufatti idraulici di torre di Burri, Castelfranco, botte di Conche	B/22 V fase	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		6.197.482,79	0,00	0,00					
	COMUNITA' EBRAICA DI VENEZIA											
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
1	Lavori di restauro dell'edificio adibito all'assistenza agli anziani della Comunità Ebraica di Venezia	B/20.2 V fase	DGR 2924 03/08/1999		2.000.000,00	2.000.000,00	1.199.548,98	Lavori in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino"
	DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA											
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											

Legge 345-97 Es 98 5^

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
6	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	B/20.1 V fase	DGR 2924 03/08/1999		10.857.632,91			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod B/20 V fase
	TOTALE				142.025.647,26	92.263.044,29	63.467.945,72					
						64,96%	44,69%					

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	ARPAV Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
12	Monitoraggio delle acque lagunari e dei corsi d'acqua del bacino scolante	E/91	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		54.370,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				Importo complessivo del finanziamento pari a € 1.549.370,70, suddiviso negli interventi 12 e 13
13	Monitoraggio interventi di disinquinamento nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia e realizzazione del Laboratorio per l'analisi delle diossine presso il Dipartimento dell'ARPAV di Venezia - Centro di riferimento del Bacino Scolante	E/91.1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 53 26/5/2003	1.495.000,00	1.495.000,00	712.000,00	Lavori in corso				Importo complessivo del finanziamento pari a € 1.549.370,70, suddiviso negli interventi 12 e 13
14	Piano di monitoraggio della qualità dell' aria a Porto Marghera e nel bacino scolante nella laguna di Venezia. Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la previsione del rischio industriale e delle emergenze a P.M.	E/92	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 4013 31/12/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	774.685,35	Lavori in corso				Progetto SIMAGE I° LOTTO
	ACM Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
73	Interventi di fognatura in comune di S.Maria di Sala	B/49	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 167 7/12/2002	413.165,52	413.165,52	371.849,01	Collaudo in corso	13/02/2003			
74	Interventi di fognatura in comune di Vigonovo	B/52	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 103 DEL 7/9/2001	258.228,45	258.228,45	209.300,21	Lavori in corso	25/10/2002			
75	Interventi di fognatura in comune di Stra	B/51	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 168 7/12/2001	309.874,14	309.874,14	243.526,10	Lavori in corso	05/03/2003			
76	Interventi di fognatura in comune di Spinea	B/50	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 158 30/11/2001	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Contabilità finale				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 36 del 8/03/2005
77	Interventi di fognatura in comune di Scorzè	B/48	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 157 30/11/2001	516.456,90	516.456,90	464.811,21	Collaudo in corso	13/02/2003			
78	Interventi di fognatura in comune di Salzano	B/47	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 155 30/11/2001	413.165,52	413.165,52	413.165,52	Contabilità finale				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 82 del 13/05/2005
79	Progettazione esecutiva del 3° lotto. Interventi di fognatura in comune di Campolongo Maggiore	B/37	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 121 3/10/2001	361.519,83	361.519,83	265.755,52	Lavori in corso	13/02/2003			
80	Interventi di fognatura in comune di Noale	B/45	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 159 30/11/2001	671.393,97	671.393,97	550.638,63	Lavori in corso	18/02/2003			
81	Interventi di fognatura in comune di Martellago	B/42	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 156 30/11/2001	361.519,83	361.519,83	325.367,85	Collaudo in corso	13/02/2003			

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
82	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Mirano	B/44	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 129 4/10/2001	733.368,80	733.368,80	498.327,66	Lavori in corso	12/02/2003			
83	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Pianiga	B/46	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 127 4/10/2001	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Contabilità finale				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 55 del 20/09/2005
84	Interventi di fognatura in comune di Campagna Lupia	B/36	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 142 9/11/2001	258.228,45	258.228,45	226.500,60	Lavori in corso	18/02/2003			
85	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Mira	B/43	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 128 4/10/2001	1.032.913,80	1.032.913,80	726.867,81	Lavori in corso	29/01/2003			
86	Interventi di fognatura in comune di Camponogara	B/38	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 104 DEL 7/9/2001	1.032.913,80	1.032.913,80	929.622,42	Collaudo in corso	18/02/2003			
87	Interventi di fognatura in comune di Dolo	B/39	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 160 30/11/2001	361.519,83	361.519,83	325.367,85	Collaudo in corso	12/02/2003			
88	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Fiesso D'Artico	B/40	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 122 3/10/2001	258.228,45	258.228,45	226.106,31	Lavori in corso	13/02/2003			
89	Interventi di fognatura in comune di Fossò	B/41	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 105 DEL 7/9/2001	247.899,31	247.899,31	247.899,31	Contabilità finale				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 187 del 21/10/2005
	APGA Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
13	Interventi di fognatura in comune di Arzergrande	B/32	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 145 12/12/2002	309.874,14	309.874,14	0,00	Progetto approvato				
14	Interventi di fognatura in comune di Brugine	B/30	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Lavori in corso				
15	Interventi di fognatura in comune di Correzzola	B/29	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 145 12/12/2002	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Lavori in corso				
16	Interventi di fognatura in comune di Legnaro	B/33	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	593.925,43	593.925,43	593.925,43	Lavori ultimati				
17	Interventi di fognatura in comune di Piove di Sacco	B/31	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 145 12/12/2002	1.549.370,70	1.549.003,44	617.084,70	Lavori in corso				
18	Interventi di fognatura in comune di Pontelongo	B/28	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 145 12/12/2002	671.393,97	671.393,97	671.393,97	Lavori in corso				
19	Interventi di fognatura in comune di S. Angelo di Piove	B/34	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	542.279,74	542.279,74	302.865,78	Lavori in corso				
20	Interventi di fognatura in comune di Polverara	B/27	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori in corso				
21	Adeguamento Impianti di depurazione minori	B/35	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 102 01/06/2004	1.549.370,70	1.549.370,70	360.692,31	Lavori in corso				

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	AZIENDA SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
2	Interventi di fognatura nei comuni di Riese Pio X, Loria	B/54	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 30 21/3/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	30/10/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 165 del 31/08/2004
	AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 – VI fase											
8	Estensione ed adeguamento della rete fognaria e realizzazione allacciamenti nel comune di Quarto d' Altino - 3° stralcio	B/22	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 88 12/08/2002	1.755.953,46	1.755.953,46	1.580.358,11	Collaudo in corso	01/04/2003			
9	Interventi di fognatura in comune di Marcon	B/23	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA n. 70 del 13/06/2003	1.136.205,18	1.136.205,18	415.247,80	Lavori in corso				Erogazione limitata alla copertura delle spese di progettazione
10	Estensione ed adeguamento della rete fognaria e realizzazione allacciamenti nel comune di Monastier	B/24	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 86 12/08/2003	774.685,35	774.685,35	736.199,14	Contabilità finale				DDDA 210/05 determinazione contributo definitivo : registrata economia € 38.486,21!
11	Interventi di fognatura in comune di S. Biagio di Callalta	B/25	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 100 14/10/2002	774.685,35	774.685,35	697.215,81	Collaudo in corso	25/02/2003			
	AZIENDA CONSORZIO TERGOLA Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
46	Interventi di fognatura nera in comune di Massanzago	B/12	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 105 18/10/2002	309.874,14	309.874,14	278.886,72	Lavori in corso				
47	Interventi di fognatura in comune di Loreggia	B/3.2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 88 30/7/2001	358.937,54	358.937,54	172.073,22	Finanziamento convogliato nell'intervento 47A				
47A	Costruzione di un nuovo by-pass della rete fognaria di Loreggia (€ 723.039,65)		Riuniti i fondi dei finanziamenti 42 (€ 139.443,36) + 43 (€ 224.658,75) + 47 (€ 358.937,54) = € 723.039,65					Lavori in corso	15/05/2002			
48	Riqualificazione della rete di fognatura mista del comune di Campodarsego e dell' area denominata "Fornace"	B/7	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 52 DEL 9/5/2001	516.456,90	516.456,90	464.811,21	Lavori in corso	02/05/2002			
49	Interventi di fognatura in comune di Campodarsego loc. Fiumicello (PD)	B/8	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 14 22/2/2002	1.136.205,18	1.136.205,18	703.138,31	Lavori in corso				
50	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Giovanni XXIII, Cao del Mondo e Puccini in comune di Camposanpiero	B/11	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 116 19/12/2000	413.165,52	413.165,52	297.561,97	Finanziamento convogliato nell'intervento 50A				

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
50A	Esecuzione della rete di fognatura nera in via Giovanni XXIII e via Cao del Miondo e Puccini a Camposampiero (€ 502.512,56)		Riuniti i finanziamenti 28 (€ 89.347,04) + 50 (€ 413.165,52) = € 502.512,56					Lavori in corso	02/05/2002			
51	Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcanton e Muson in comune di Borgoricco	B/9	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 85 30/7/2001	258.228,45	258.228,45	103.291,38	Finanziamento convogliato nell'intervento 63A				
52	Interventi di fognatura in comune di Cadoneghe	B/10	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 56 27/5/2003	258.228,45	258.228,45	130.385,08	Progetto approvato				
53	Interventi di fognatura in comune di Resana	B/15	DGR N. 1834 23/6/2000		154.937,07	154.937,07	0,00	Progettazione in corso				
54	Impianto di depurazione di Camposanpiero	B/20	DGR N. 1834 23/6/2000		516.456,90	0,00	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SETA				
55	Estensione rete di fognatura nera lungo le vie Granzetta e Morosini in comune di Saonara - 2° tronco	B/17	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 149 19/11/2001	258.228,45	258.228,45	232.405,61	Lavori in corso	20/02/2002			
56	Rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana	B/13. 1	DGR N. 1834 DEL 3/6/2000	DDDA N. 98 30/10/2000	330.532,42	330.532,42	330.532,42	Finanziamento convogliato nell'intervento 56A				
56A	Realizzazione rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in Comune di Noventa Padovana (€ 1.879.903,12)		Riuniti i finanziamenti 29 (€ 516.456,90) + 32 (€ 1.032.913,80) + 56 (€ 330.532,42) = € 1.879.903,12					Opere in fase di collaudo	04/08/2000 30/10/2002	19/06/2003		
57	Impianto di depurazione di Cadoneghe	B/21	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 124 4/10/2001	413.165,52	413.165,52	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 73A				
58	Interventi di fognatura in comune di Vigonza	B/6	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 72 13/06/2003	144.607,93	144.607,93	111.038,23	Finanziamento convogliato nell'intervento 58A con DDDA N. 72 del 13/06/2003				
58A	Costruzione di una fognatura lungo via Capriccio in Comune di Vigonaza (€ 335.969,98)		Riuniti i finanziamenti 35E (€ 191.089,05) + 58 (€ 144.607,93) = € 335.969,98									
59	Interventi di fognatura nera e pista ciclabile in via Montello, I° e II° tronco, in comune di Trebaseleghe - 1° stralcio.	B/2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 51 DEL 9/5/2001	516.456,90	516.456,90	464.811,21	Lavori in corso	08/04/2002			
60	Estensione delle reti di fognatura nera nelle vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in comune di S. Giustina in Colle	B/4	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 115 19/12/2000	516.456,90	516.456,90	379.271,71	Finanziamento convogliato nell'intervento 60A				
60A	Estensione della rete fognaria nera nelle vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in Comune di Santa Giustina in Colle (€ 764.356,21)		Riuniti i finanziamenti 36 (€ 247.899,31) + 60 (€ 516.456,90) = € 764.356,21									
61	Rete fognaria nella via Palù e sistemazione rete nelle vie Stiffonie villaggio Europa in comune di Piombino Dese.	B/14	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 35 DEL 3/4/2001	309.874,14	309.874,14	278.886,72	Lavori in fase di collaudo	03/04/2002	28/05/2003		

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
62	Condotta fognaria in via Marconi e laterali in comune di Noventa Padovana	B/13	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 86 30/7/2001	547.444,31	547.444,31	416.603,21	Lavori in corso	09/01/2003			
63	Condotta di by-pass impianto di depurazone Camposanpiero (vedi Dgr 1834/00)Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcanton e Muson in comune di Borgoricco	B/19	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 85 30/7/2001	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 63A				
63A	Realizzazione rete di fognatura nelle vie di Sabbadina, Lovara, Malcanton in Comune di Borgioricco (€ 1.549.370,70)		Riuniti i finanziamenti 30 (€ 774.685,35) + 51 (€ 258.228,45) + 63 (€ 516.456,90) = € 1.549.370,70					Lavori in corso	23/05/2002			
64	Completamento del collettore fognario Abbazia Pisani - Villa del Conte e della pista ciclabile lungo le vie Cardinale Priuli, Militare e Rettilineo.	B/5.1	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 121 29/12/2000	619.748,28	619.748,28	557.773,45	Lavori in corso	04/12/2001 30/06/2003			
65	Collettore di collegamento fognario Resana - Torreselle.	B/15.1 VI^ fase	DGR N. 1834 DEL 3/6/2000	DDDA N. 31 21/3/2001	359.157,14	359.157,14	359.157,14	Finanziamento convogliato nell'intervento 65A				
65A	Collagamento fognario Resana - Torreselle (€ 2.685.575,88)		Riuniti i finanziamenti 39 (€ 2.065.827,60) + 65 (€ 619.748,28) = € 2.685.575,88					Opere in fase di collaudo	23/05/2002	20/05/2003		
65B	Intervento per la riqualificazione del sistema fognario del comune di Resana - Realizzazione della rete fognaria separata in località Casteiminio	B/15.1 ECO	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 179 12/10/2005	260.591,14	260.591,14	0,00	Progetto approvato				
66	Progetto definitivo per la realizzazione della rete fognaria di via Ronchi in comune di Loreggia (PD)	B/3.1	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 23 26/2/2001	157.519,35	157.519,35	157.519,35	Finanziamento convogliato nell'intervento 66A				
66A	Realizzazione fognature acque nere e pista ciclabile lungo la SP 71 nel Comune di Loreggia (€ 475.064,35)		Riuniti i finanziamenti 22 (€ 299.545,00) + 66 (€ 157.519,35) = € 475.064,35					Lavori collaudati	13/10/1999	06/04/2002	18/11/2002	L'importo del finanziamento regionale è pari a € 475.064,35. Il residuo, rispetto all'importo di progetto di € 846.989,30 resta a carico dell'ente. Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte dell'ente
67	Ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Russia	B/16	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 97 30/10/2000	464.811,21	464.811,21	464.811,21	Finanziamento convogliato nell'intervento 67A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004
67A	Ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Russia (appalto A) e completamento degli stessi (appalto B) (€ 630.077,42)		Riuniti i finanziamenti 34 (€ 165.266,21) + 67 (€ 464.811,21) = € 630.077,42					Lavori collaudati	30/07/2001 21/01/2003	26/09/2003 02/07/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
68	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Cavin Caselle Cornara, Cavin del Do e Piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero	B/18.2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 135 30/10/2001	335.696,98	335.696,98	262.453,37	Finanziamento convogliato nell'intervento 68A con DDDA N. 28 del 26/03/2003				
68A	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Cavin Caselle Cornara, Cavin del Do e Piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero - 1 stralcio (€ 392.500,00)		Riuniti i finanziamenti 13 bis (€ 56.810,26) + 68 (€ 335.696,98) = € 392.500,00					Lavori in corso	14/01/2003			
69	Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani	B/5	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 161 3/12/2001	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Finanziamento convogliato nell'intervento 76H				
70	Ampliamento della rete fognaria nelle vie Stroppari e Piovega Nord in comune di Villanova di Camposampiero.	B/18.1	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 84 30/7/2001	77.468,53	77.468,53	49.063,40	Finanziamento convogliato nell'intervento 70A				
70A	Ampliamento rete di fognatura nelle vie Stroppari e Piovega nord in Comune di Villanova di Camposampiero (€ 284.051,29)		Riuniti i finanziamenti 40 (€ 206.582,76) + 70 (€ 77.468,53) = € 284.051,29					Opere in fase di collaudo	08/05/2002	20/05/2003		
71	Progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori di allargamento della sede stradale e fognatura di acque nere di via Prati in comune di Vigonza - 1° stralcio	B/6.1	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 130 25/11/2002	320.203,28	320.203,28	288.182,95	Lavori in corso				
	AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
12	Interventi di fognatura nei comuni di Cittadella, Galliera V.ta, Tombolo, S.Giorgio in Bosco, S. Martino di Lupari	B/26	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 170 12/12/2001	7.746.853,49	7.746.853,49	4.915.867,22	Lavori in corso				
	AZIENDA CONSORZIO ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
4	Interventi di fognatura ed adeguamento impianto di depurazione in Comune di Battglia Terme	B/53	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 149 13/09/2005	813.420,94	0,00	0,00	Finanziamento diviso negli interventi 4A (€ 529.367,32) e 4B (€ 813.420,62).				
4A	Ampliamento rete fognaria in Comune di Battaglia Terme (€ 529.367,32)		DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 149 13/09/2005	529.367,00	529.367,00	0,00	Progettazione in corso				
4B	Ampliamento rete fognaria in Comune di Montegrotto Terme (€ 813.420,62)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 4					Progettazione in corso				
	A.S.P. DI CHIOGGIA											

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
23	Messa in sicurezza della discarica "Cà Rossa" in Comune di Chioggia	D/85	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		2.582.284,50	0,00	0,00	Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante
24	Adeguamento tecnologico ambientale e completamento del depuratore di Val da Rio	B1/55	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 134 29/11/2002	9.812.681,08	9.812.681,08	5.243.023,47	Progetto approvato				
	COMUNE DI CAMPODARSEGO											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
1	Bonifica ambientale presso la discarica di Campodarsego (PD)	D/84	DGR N. 1834 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	2.582.284,50	2.582.284,50	159.380,45	Lavori in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante
	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
2	Interventi di fognatura e depurazione	B1/62	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		258.228,45			Finanziamento convogliato nell'intervento 3A				
	COMUNE DI CAVALLINO											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
2	Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)	B1/63	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 38 23/4/2002	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Progetto approvato				
	COMUNE DI CAVARZERE											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
5	Realizzazione di interventi fognari nelle località Rottanova, Cà Venier e Villaggio Busonera.	B1/61	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 126 4/10/2001	2.065.827,60	2.065.827,60	1.859.244,84	Lavori ultimati	Date non comunicate dall'ente			
	COMUNE DI ESTE											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
2	Lavori di rifacimento delle fognature e pavimentazione nelle vie Sabina, Largo Tiepolo - XIV° stralcio fognature.	B1/64. B	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 67 DEL 4/6/2001	516.456,90	516.456,90	51.072,26	Lavori in corso				
3	Ampliamento ed adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione di Este - III° lotto, 1° stralcio	B1/64. A	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 53 DEL 9/5/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	294.638,65	Lavori in corso				

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	COMUNE DI FOSSO'											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
1	Bonifica sito inquinato via Favalli, in comune di Fossò (VE)	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	634.684,42	634.684,42	285.096,00	Progetto approvato				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante
	COMUNE DI MIRA											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
2	Parco lagunare di Mira	D/82	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		2.582.284,50			Progettazione in corso				Intervento congiunto con il Consorzio Sinistra Medio Brenta e la Regione Veneto
	COMUNE DI MONSELICE											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
3	Impianto di depurazione	B1/65	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 90 06/08/2003	774.685,35	774.685,35	0,00	Progetto approvato				
	COMUNE DI MORGANO											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
2	Lavori di ampliamento delle fognature comunali nelle vie S. Martino, Chiesa, Trentin, Papa Luciani in comune di Morgano (TV).	B1/66	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 13 22/2/2002	516.456,90	516.456,90	417.034,59	Lavori in corso				
3	Bonifica ex discarica R.S.U. in loc. via Bosco	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	516.456,90	516.456,90	56.657,69	Lavori in corso				Vedi scheda riepilogativa degli intereventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
	COMUNE DI VENEZIA											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
79	PROGETTO INTEGRATO RII	A/1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 22 DEL 7/3/2002	24.789.931,16	24.789.931,16	24.789.931,16	Lavori in corso				
80	Opere di potenziamento e risistemazione idraulica degli impianti di sollevamento S5 e S6 (FUSINA)	B1/56.1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 120 29/12/2000	1.068.549,32	1.068.549,32	45.650,86	Lavori in corso	27/03/2003			
81	Interventi di fognatura al Lido di Venezia	B1/58	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		826.331,04	0,00	0,00	Progettazione in corso				
82	Fognature afferenti all'impianto di Campalto	B1/57	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		6.078.919,94	0,00	0,00	Progettazione in corso				Finanziamento suddiviso dall'ente in 6 interventi

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
83	Fognature afferenti all'impianto di Fusina	B1/56	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		6.265.138,64	0,00	0,00	Progettazione in corso				Finanziamento suddiviso dall'ente in 7 interventi (4 integrazioni di interventi precedenti e 2 nuovi interventi)
84	Bonifica area "ex - conterie" a Murano per stoccaggio rifiuti speciali e tossico - nocivi.	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	3.098.741,39	3.098.741,39	0,00	Progetto approvato				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. In attesa dell'invio della documentazione da parte del Comune di Venezia
85	Interventi di riqualificazione della fognatura di viale Garibaldi e Piazza Carpenedo.	B1/57.1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 106 18/10/2002	1.254.768,03	1.254.768,03	0,00	Progetto approvato				
	CONSORZIO ADIGE BACCHIGLIONE Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
7	Incremento invaso e capacità di autodepurazione Valli di Galzignano e di Arquà Petrarca. (ricalibratura canali, creazione aree umide e sostegni, ripristino vegetazione di sponde)	D/79	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		5.164.568,99	0,00	0,00	Progettazione in corso				Procedura di screening in corso
8	Progetto per la miglior gestione delle acque irrigue	D/80	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		7.746.853,49	0,00	0,00	Progettazione in corso				Procedura di screening in corso
	CONSORZIO BRENTA BACCHIGLIONE Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
7	Ricalibratura, realizzazione aree golenali e ripristino vegetazione nei corsi d'acqua in zona Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio)	D/72	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 78 13/6/2003	3.098.741,39	154.937,07	154.937,07	Finanziamento suddiviso negli interventi 7A (€ 2.324.056,05) e 7B (€ 774.685,35)				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
7A	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio) - Bacino Sesta Presa - sottobacini a sud del Fiumicello (€ 2.324.056,05)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 7 (€ 2.324.056,05)					Progetto preliminare				
7B	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio) - Bacino Trezze (€ 774.685,35)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 7 (€ 774.685,35)					Progetto preliminare				

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
8	Miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Presa in Sinistra Brenta e Settima Presa Inferiore (Ricalibrazione e rinaturalizzazioni canali, nuove opere di derivazione, nuove reti di condotte)	D/75	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 63 13/6/2003	2.582.284,50	129.114,23	129.114,23	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
9	Ricalibratura e rinaturalizzazione della rete di bonifica costituita dallo scolo Noventana e sue diramazioni; costruzione nuovo impianto idrovoro "Noventa" per la diversione acque di piena della Laguna	D/73	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 64 13/6/2003	2.324.056,05	116.202,80	116.202,80	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
10	Progetto definitivo per la realizzazione di interventi strutturali in rete minore di bonifica. Gestione degli invasi e diversione delle acque di piena nell' idrovia Padova - Venezia.	D/74	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 128 18/11/2002	774.685,35	774.685,00	300.425,31	Progetto approvato				
	CONSORZIO BRENTELLA DI PEDEROBBA											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
1	Bonifica ex - cava di Riese denominata "Cava Bergamin"	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DGR N. 2621 DEL 10/10/2001	823.748,75	823.748,75	613.796,31	Progetto approvato	15/04/2003			Vedi scheda riepilogativa degli intereventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
	CONSORZIO DESE SILE											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
17	Riqualificazione ambientale della fossa Storta e interventi presso cave Praello a Marcon	D/78	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		2.582.284,50			Progettazione in corso				
18	Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del F.Marzenego e interv. sugli affluenti	D/77	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		7.746.853,49			Finanziamento diviso negli interventi 18A (€ 5.164.568,99) e 18B (€ 2.582.284,50)				
18A	Interventi nella zona a monte del bacino del canale Scolmatore del f. Marzenego e suoi affluenti (€ 5.164.568,99)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 18 (€ 5.164.568,99)					Progettazione definitiva in corso				Approvazione del S.I.A. e del progetto preliminare con DGR 67/2003
18B	Interventi nella zona di valle del bacino del canale Scolmatore del f. Marzenego e suoi affluenti (€ 2.582.284,50)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 18 (€ 2.582.284,50)					Progettazione definitiva in corso				Approvazione del S.I.A. e del progetto preliminare con DGR 67/2003
	CONSORZIO DESTRA PIAVE											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
2	Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque del sottobac. Vela: risezionamento corsi d' acqua, manufatti di controllo, nuovi collegamenti e recupero capacità d' invaso nei comuni di S. Biagio di Callalta, Monastier, Roncade.	D/81	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 29 27/3/2003	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Contabilità finale				Lavori collaudati.DDDA 157 del 20/9/2005 determinazione contributo definitivo.
	CONSORZIO SINISTRA MEDIO BRENTA Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
12	Realizzazione di un sistema di contenimento e fitobiodepurazione delle acque della zona a Nord del naviglio brenta	D/76	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		4.131.655,19	4.131.655,19	0,00	Progettazione esecutiva in corso				
	VENETO ACQUE Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
3	Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Realizzazione delle condotte Padova - Mestre e collegamento con il Piovese	D/86	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002				Finanziamento originale pari a € 19.108.905,27. Impegnati alla Delta Po € 18.876.499,66 suddivisi, poi, negli intt. 3A (€ 14.018.456,41) e 3B (€ 4.858.043,25). Il residuo, pari a € 232.405,61 impegnatoper psese di progettazione				Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002
3A	Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Realizzazione delle condotte Padova - Mestre e collegamento con il Piovese	D/86	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	14.250.862,02	14.250.862,02	11.325.899,80	Lavori in corso				
3B	Schema acquedottistico del Veneto centrale - Condotta Padova-Mestre - Progetto definitivo 2° stralcio Condotta Centrale Gazzera-Casello autostradale di Mestre e condotta centrale Villa Augusta - svincolo autostrada A4 Padova-Mestre-Bologna	D/86.2	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	4.625.637,64	4.625.637,64	0,00	Progetto approvato				
	REGIONE BONIFICA SITI INQUINATI Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
5	Bonifica dell' area industriale ex Italsintex in comune di Camposampiero (PD)	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 4136 22/12/2000	39.291,84	39.291,84	39.284,92	Lavori in corso				Liquidazione sospesa
6	Bonifica dei siti inquinati - Porto Marghera	D/83	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.463.310,39	1.463.310,39	1.463.310,39					Fondi a disposizioni della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003
	PROGETTO INTEGRATO FUSINA	D/83B	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		6.800.000,00	0,00	0,00					

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	REGIONE ACQUEDOTTI											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
1	Condotta Cà solaro - Gazzera	D/90	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGCA N. 178 19/4/2001	4.002.540,97	6.197,48	6.197,48	Progettazione in corso				
2	Condotta Cà solaro - Cavallino	D/89	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGCA N. 178 19/4/2001	6.972.168,14	13.427,88	13.427,88	Progettazione in corso				
	REGIONE DISINQUINAMENTO											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
40	Contributi per riduzione inquinamento atmosferico (comune VE)	E/94	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		2.582.284,50	102.000,00	0,00					Intervento congiunto Regione Veneto/Comune di Venezia
41	Studi e sperimentazioni per interventi coordinati di riduzione dell'inquinamento e dell'asporto di sedimenti dalla laguna	E/95	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 43 DEL 2002	1.291.142,25	70.427,88	25.427,88	Progetti in fase di approvazione				
42	Informazione, stampa, divulgazione, Piano Direttore, carta geologica della laguna	E/93	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.032.913,80	762.558,60	497.921,20	Lavori in corso				
	REGIONE FORESTE AGRICOLTURA ZOOTECNIA											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
9	Incentivi alla politiche agricole ecocompatibili, modifiche colturali e piani di spargimento	C/67	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDRPASA 156 DEL 23.10.2003	10.329.137,98	10.085.905,08	5.787.569,21	Lavori in corso				
10	Gestione pratiche agricole: incentivazione all'innovazione ambientale	C/71	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.549.370,70	1.549.370,69	4.333,32	In istruttoria				
11	Gestione reflui zootecnici e interventi strutturali	C/70	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		5.164.568,99	5.164.409,07	2.132.229,15	In istruttoria				
12	Ricostruzione fasce tampone e set-aside	C/68	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	Vari	3.615.198,29	3.614.872,81	1.788.110,44	Lavori in corso				
13	Gestione pratiche irrigue	C/69	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		10.329.137,98	6.043.614,59	1.112.422,93	Lavori in corso				
	MAV											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
	Interventi di fognatura; accordo di programma Malamocco-Alberoni	B1/60	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		5.681.025,89			Progettazione in corso				
	Interventi di fognatura; accordo di programma S. Erasmo	B1/59	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.807.599,15			Progettazione in corso				

Legge 448-98 Es 99-00-01

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	VESTA											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
4	Adeguamento impianto di potabilizzazione Cà Solaro	D/88	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGCA N. 178 19/4/2001	3.486.084,07	3.486.084,07	788.104,00	Lavori in corso				
	ENTI VARI											
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
2	Spese per progettazione inerenti :" Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto ".	D/86.1	DGR 1834 DEL 23/06/2000		232.405,61	232.405,61	184.459,54					
	TOTALE				235.504.345,30	150.936.849,95	90.426.166,30					
						64,09%	38,40%					

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	ABBAZIA SAN GIORGIO MAGGIORE Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
1	Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell' isola di S. Giorgio Maggiore	1/Z/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 146 15/10/2003	206.582,76	206.582,76	206.532,97	Lavori in corso				
	ARPAV Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
15	Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio industriale e delle emergenze per l' area di Porto Marghera - SIMAGE II° Lotto	6/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 186 17/12/2003	1.549.370,70	1.549.370,70	774.685,35	Lavori in corso				
	ACM Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
90	Interventi di fognatura nel comune di Spinea (€ 1.549.370,70)	1/F/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 46/03, 49/03 e 50/03	1.549.370,70	0,00	0,00	Finanziamento suddiviso in 90A (€ 162.000,00), 90B (€ 830.000,00) e 90C (€ 517.370,70)				Importo complessivo dell'intervento € 1.549.370,70
90A	Interventi di fognatura nel comune di Spinea - parte A (€ 162.000,00)	1/F/1.2	Finanziato con parte dei fondi finanziamento 90			162.000,00	93.727,25	Lavori in corso				
90B	Interventi di fognatura nel comune di Spinea - parte B (€ 830.000,00)	1/F/1.3	Finanziato con parte dei fondi finanziamento 90			830.000,00	739.735,61	Lavori in corso	07/10/2003			
90C	Interventi di fognatura nel comune di Spinea - parte C (€ 557.370,70)	1/F/1.1	Finanziato con parte dei fondi finanziamento 90			557.370,70	482.980,59	Lavori in corso	16/09/2003			L'importo complessivo del progetto è pari a € 636.387,00; il comune copre la quota di € 79.017,00
91	Interventi di fognatura nel comune di Camponogara		DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA 115/03	1.032.913,80	0,00	0,00	Finanziamento suddiviso in 91A (€ 878.328,20), 91B (€ 154.585,00)				Importo complessivo dell'intervento € 1.359.387,00. Il Comune copre la quota residua di 326.762,00
91A	Interventi di fognatura nel comune di Camponogara - parte A (€ 878.328,20)	1/F/2.1	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 91			878.328,20	597.229,13	Progetto approvato				
91B	Interventi di fognatura nel comune di Camponogara - parte B (€ 154.585,00)	1/F/2	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 91			154.585,60	82.715,60	Progettazione in corso				
92	Interventi di fognatura nel comune di Fossò		DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA 88/03	1.032.913,80	0,00	0,00	Finanziamento suddiviso in 92A (€ 640.000,00) e 92B (€ 392.913,00)				
92A	Interventi di fognatura nel comune di Fossò - parte A (€ 640.000,00)	1/F/3.1	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 92			640.000,00	509.149,48	Lavori in corso				
92B	Interventi di fognatura nel comune di Fossò - parte B (€ 392.913,00)	1/F/3	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 92			392.913,80	33.041,33	Lavori in corso				
93	Interventi di fognatura nel comune di Noale	1/F/4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori in corso				
94	Interventi per il completamento e la realizzazione di opere fognarie nei 17 comuni consorziati (€ 4.648.112,10)	1/F/5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		0,00	0,00	0,00					

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
94A	Interventi per il completamento e la realizzazione di opere fognarie nei 17 comuni consorziati	1/F/5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		0,00	0,00	0,00					Scheda madre
94B	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Spinea - parte C	1/F/5.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 46 23/05/2003	79.017,91	79.017,91	0,00	Lavori in corso	16/09/2003			
94C	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Mirano	1/F/5.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 47 23/05/2003	493.629,50	493.629,50	392.432,44	Lavori in corso				
94D	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Salzano	1/F/5.3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 48 23/05/2003	305.380,96	305.380,96	274.842,86	Collaudo in corso				
94E	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Campagna Lupia	1/F/5.4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 52 26/05/2003	123.639,78	123.639,78	97.925,70	Lavori in corso				
94F	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di S. Maria di Sala e Pianiga	1/F/5.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 87 29/07/2003	510.827,52	510.827,52	459.744,77	Collaudo in corso				
94G	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nei comuni di Dolo, Camponogara e Strà.	1/F/5.6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 55 27/05/2003	564.114,40	564.114,40	564.114,40	Collaudo in corso	27/09/2003			
94H	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nei comuni di Scorzè e Martellago.	1/F/5.7	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 87 29/07/2003	709.301,91	709.301,91	597.464,17	Lavori in corso				
94I	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nel comune di Noale	1/F/5.8	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 89 29/07/2003	430.879,99	430.879,99	336.146,30	Collaudo in corso				
94L	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nel comune di Mira.	1/F/5.9	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 117 20/08/2003	772.051,42	772.051,42	617.044,92	Lavori in corso				
94M	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto nel comune di Fossò - parte B.	1/F/5.10	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 174 19/11/2003	74.834,60	74.834,60	0,00	Lavori in corso				
94N	Realizzazione fognatura in comune di Stra. 31° lotto - parte B	1/F/5.11	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 22 9/02/2005	75.001,01	75.001,01	0,00	Progetto approvato				
94O	Costruzione fognatura nei comuni di Campolongo Maggiore, Fiesso D'Artico e Vigonovo - 31° lotto	1/F/5.12	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 49 23/03/2005	509.433,08	509.433,08	0,00	Progetto approvato				
95	Messa in sicurezza ex discarica per RSU	4/A/1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA 114/04	2.400.000,00	240.000,00	142.484,31	Progettazione in corso				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante. Impegno di spesa relativo alle sole spese di progettazione
96	Intervento di prevenzione dell'inqinamento dell'ex discarica per RSU e RSAU in loc. Cà Perale del Comune di Mirano.	4/A/1.7	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	0,00	2.402.250,26	0,00	0,00	Progetto in corso				

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
22	Adeguamento alle nuove normative e potenziamento impianti di depurazione di Codevigo, Pegolotte di Cona e Pontelongo	1/E/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		2.582.284,50	0,00	0,00	Progettazione in corso				
23	Realizzazione linee fognarie di collegamento per la dismissione di impianti di depurazione minori di Corezzola, Cona, diversione scarico di Pontelongo.	1/E/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		4.648.112,09	0,00	0,00	Progettazione in corso				
24	Riqualificazione ed implementazione dati della rete fognaria del comprensorio consortile	1/E/3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		516.456,90	0,00	0,00	Progettazione in corso				
25	Interventi di fognatura nel comune di Polverara	1/E/4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		258.228,45	0,00	0,00	Progettazione in corso				
26	Interventi di fognatura nel comune di Legnaro	1/E/5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		258.228,45	0,00	0,00	Progettazione in corso				
27	Interventi di fognatura a Sant' Angelo di Piove.	1/E/6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		413.165,52	0,00	0,00	Progettazione in corso				
28	Estensione ed adeguamento della rete fognaria nei comuni consorziati	1/E/7	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.652.662,08	0,00	0,00	Progettazione in corso				
	AZIENDA SERVIZI IDRICI CASTELLANA											
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
3	Interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Castello di Godego, Riese Pio X, Altivole, Maser, Asolo	1/M/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 85 12/8/2002	1.748.741,39	1.748.741,39	1.736.676,40	Contabilità finale				Registrata, con DDDA n. 192 del 25/10/2005, un'economia pari a € 12.064,99
4	Costruzione della fognatura nera nei comuni di Castello di Godego e Loria (TV) - 3° stralcio (1° Lotto)	1/M/1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 87 12/8/2002	1.350.000,00	1.350.000,00	1.340.726,57	Contabilità finale				Registrata, con DDDA n. 114 del 11/07/2005, un'economia pari a € 9.273,43
	AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE											
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
12	Ampliamento impianti Quarto d'Altino e realizzazione impianto trattamento bottini	1/C/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.549.370,70	1.549.370,70	104.645,68	Progettazione in corso				
13	Realizzazione condotta da impianto depurazione di Roncade ad impianto di Quarto d'Altino (Costo del progetto € 2.400.000,00)	1/C/2	(ex 794 del 9/4/02) DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 1 DEL 07/01/2004	2.892.158,61	2.400.000,00	94.172,00	Progetto approvato				Il residuo, rispetto al costo del progetto pari a € 492.158,63, è riallocato nell'intervento 15A con DDDA n. 1/2004
	AZIENDA CONSORZIO DEL TERGOLA											
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
72	Realizzazione della condotta fognaria di by-pass fra S.Giustina in Colle e Camposampiero	1/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		774.685,35			Finanziamento convogliato nell'intervento 72A				

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
72A	Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Straelle, Bonora, S. Pietro, Straelle di Rustega e del Graticolato Romano nei Comuni di Camposampiero, Borgoricco e Massanzago-1° stralcio (€ 826.331,04)		Riuniti i finanziamenti 35C (€ 51.645,69) + 72 (€ 774.685,35) = € 826.331,04					Progettazione in corso				
73	Completamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe	1/A/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 124 30/10/2002	1.859.244,84	1.859.244,84	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 73A				
73A	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe - 2^ fase (€ 4.389.883,65)		Riuniti i finanziamenti 45 (€ 2.117.473,29) + 57 (€ 413.165,52) + 73 (€ 1.859.244,84) = € 4.389.883,65					Progettazione esecutiva terminata				
74	Completamento dell'impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in fiume Brenta	1/A/3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.549.370,70	0,00	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 2A gestito dalla subentrante SETA				
75	Realizzazione di condotte fognarie a Piombino Dese.	1/A/4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		640.913,80	0,00	0,00	Progettazione in corso	14/01/2003			
76	Interventi di fognatura nei comuni consorziati	1/A/5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.705.853,66	0,00	0,00	Finanziamento diviso negli interventi 76A, 76B, 76C, 76D, 76E, 76F, 76G e 76H				
76A	Rete fognaria nelle vie Ronchi, Obbia Alta e Bassa in Comune di Trebaseleghe (€ 260.000,00)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 76					In fase di progettazione	-			
76B	Realizzazione reti di fognatura nera nelle vie Isonzo, Treviso, Arrigoni, Capriccio, Cavinello e Garibaldi (€ 600.000,00)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 76					In fase di progettazione	-			
76C	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle Vie Cavin Caselle, Cornara, Cavin del Do', Piazza Mercato e Via Cantele in Comune di Villanova di Camposampiero - 2° Stralcio (€ 750.000,00)		DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 23 09/02/2005	679.664,52	679.664,52	0,00	In fase di progettazione	-			
76D	Realizzazione condotte di fognatura nera in Via Frattina, in Via Tiepolo, Via Castellaro e via Desman in Comune di Borgoricco	1/A/5.3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 64 30/03/2004	460.000,00	460.000,00	149.263,52	Progetto approvato	-			
76E	realizzazione della rete fognaria nelle Vie Straelle, Bonora, S. Pietro, Straelle di Rustega e del Graticolato Romano nei Comuni di Camposampiero, Borgoricco e Massanzago - 2° stralcio (€ 800.000,00)	1/A/5.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 91 06/08/2003	774.685,35	774.685,35	0,00	Progetto approvato	-			
76F	Rete di fognatura nera in depressione nelle Vie Noventana e laterali a Noventa Padovana - 1° Stralcio (€ 600.000,00)	1/A/5.6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 193 13/10/2004	645.000,00	645.000,00	291.588,55	Progetto approvato	-			
76G	Estensione della rete fognaria nelle vie Guizza Alta e Carpane in comune di Loreggia (PD)	1/A/5.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 194 13/10/2004	350.000,00	350.000,00	0,00	Progetto approvato				
76H	Interventi nei Comuni ex Consorzio Tergola (€ 2.299.203,53)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 76 e unito all'intervento 35F (€ 331.514,83)					In fase di progettazione				

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
76I	Sistemazione e messa in sicurezza di un tratto della S.P. 10 "Desman" (via Roma) e relativi servizi tecnologici in comune di S. Giorgio delle Pertiche (PD).	1/A/5.7	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 138 17/08/2005	650.000,00	650.000,00	0,00	Progetto approvato				
76L	Intervento per la riqualificazione del sistema fognario del comune di Resana - Realizzazione della rete fognaria separata in località Castelminio	1/A/5.8	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 179 12/10/2005	94.000,00	94.000,00	0,00	Progetto approvato				
76M	Realizzazione della rete fognaria nera nelle vie Roma (S.P. 34) e Franceschina in comune di Cadoneghe	1/A/5.9	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 203 31/10/2005	500.000,00	500.000,00	0,00	Progetto approvato				
76N	Ampliamento rete di fognatura nera nel Comune di Villa del Conte e nella frazione di Abbazia Pisani (€ 286.633,57)	1/A/5.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 179 05/12/2003	286.633,57	286.633,57	175.337,11	Progetto approvato				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 76 e unito agli interventi 16 bis (€ 258.228,45), 25 (€ 258.228,45) e 69 (€ 309.874,14)
77	Progetto definitivo per lavori di rifacimento e separazione condotte fognarie lungo via Manzoni, via Zanella, vicolo Aggio e viale della Vitttoria in Comune di Piombino Dese	1/A/4.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 123 30/10/2002	392.000,00	392.000,00	295.525,49	Lavori in corso	14/01/2003			
	AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
13	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Cittadella con incremento da 60,000 a 75,000 A.E.	1/D/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		10.329.137,98			Progettazione in corso				
	AZIENDA ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
5	Interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Battaglia Terme, Galzignano Terme e Montegrotto Terme.	1/G/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		980.509,25			Finanziamento diviso negli interventi 5A (€ 1.291.142,25) e 5B (€ 774.685,35).				
5A	Interventi nei Comuni ex Consorzio Interprovinciale Acquedotto Euganeo Berico (€ 1.291.142,25)	1/G/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 20 09/02/2005	774.685,35	774.685,35	39.949,14	Progettazione in corso				
5B	Completamento della rete fognaria nera e ristrutturazione tratti di condotta in Comune di Galzignano Terme. (€ 774.685,35)	1/G/1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 149 13/09/2005	310.633,00	310.633,00	0,00	Progettazione in corso				
	AZIENDA CENTRO VENETO SERVIZI Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
9	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati	1/B/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 25 26/03/2003	516.456,90	516.456,90	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 9A per l'importo di € 516.456,90				
9A	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati (€ 3.615.198,29)		Riuniti i finanziamenti 8C (€ 3.098.741,39) + 9 (€ 516.456,90) = € 3.615.198,29					Progettazione definitiva				

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
10	Progetto definitivo relativo alle opere di rifacimento delle fognature nelle vie Massimo D Azeglio, Pescheria Vecchia, Madonnetta, Marconi, P.zza Trieste, Cavour, Calle della Musica etc. - XV° Stralcio fognature	1/T/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 116 20/08/2003	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Lavori in corso	09/06/2003			
11	Interventi di fognatura nel territorio comunale di Arquà Petrarca.	1/V/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 14 21/02/2003	516.456,90	516.456,90	194.071,30	Lavori in corso				
	A.S.P. DI CHIOGGIA											
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
25	Completamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione di Val da Rio. (€ 6.197.482,79)		DGR N. 794 DEL 9/4/2002					Finanziamento suddiviso nelgi interventi 25A (€ 5.510.163,87) e 25B (€ 687.318,92)				
25A	Completamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione di Val da Rio. (€ 5.510.163,87)	1/Q/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		5.510.163,87	0,00	0,00	Progettazione in corso				
25B	Adeguamento tecnologico - ambientale e definitivo completamento del depuratore di Val da Rio - 1° lotto funzionale	1/Q/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 89 DEL 2004	687.318,92	687.318,92	0,00	Progetto approvato				
26	Risanamento e completamento dei sistemi fognari nei centri storici di Chioggia e Sottomarina	1/Q/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 142 12/12/2002	2.065.827,60	2.015.755,73	144.607,93	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO											
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
3	Interventi di ampliamento dell' impianto di depurazione di Salvatronda	1/R/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 257 28/12/2004	1.187.850,87	1.187.850,87	66.761,24	Finanziamento convogliato nell'intervento 3A				
3A	Interventi di ampliamento dell' impianto di depurazione di Salvatronda (€ 1.446.079,32)		Riuniti i finanziamenti 2 (€ 258.228,45) + 3 (€ 1.187.850,87) = € 1.446.079,32					In fase di progettazione				
4	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale (€ 2.375.701,74)	1/R/2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002					Finanziamento diviso negli interventi 4A (€ 1.358.322,68), 4B (€ 345.985,06) e 4C (€ 671.394,00)				
4A	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale. Località Salvatronda e BorgoPadova (€ 1.358.322,68)	1/R/2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.319.948,42	1.319.948,42	0,00	In fase di progettazione				
4B	Integrazione fasi di processo depuratori Borgo Padova e Salvatronda. Filtrazione e disinfezione dello scarico	1/R/2.2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 257 28/12/2004	345.985,06	345.985,06	0,00	Progetto approvato				
4C	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale. Località S. Andrea O. M. (€ 671.394,00)	1/R/2.1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 116 23/06/2004	671.394,00	671.394,00	38.724,97	Lavori in corso				
4d	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale	1/R/2.4	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		38.374,26	0,00	0,00	In fase di progettazione				

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
5	Integrazione tecnologica dell' impianto di depurazione di Borgo Padova	1/R/3	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 258 29/12/2004				Progetto approvato				
5A	Integrazione tecnologica dell' impianto di depurazione di Borgo Padova	1/R/3.1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 258 29/12/2004	1.216.657,36	1.216.657,36	42.318,04	Lavori in corso				
5B	Potenziamento del Depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno	1/R/3.2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 170 11/10/2005	126.130,58	126.130,58	0,00	Progetto approvato				
	COMUNE DI CAVALLINO Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
3	Costruzione della rete di fognatura nera della zona di Via dell'artigliere in comune di Cavallino - Treporti (VE)	1/S/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 2 07/01/2004	1.032.913,80	1.032.913,80	915.159,31	Lavori in corso				
4	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		517.000,00	0,00	0,00	Progetto in fase di redazione				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante
	COMUNE DI CAVARZERE Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
6	Estensione della rete fognaria e depurazione nel territorio comunale	1/L/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 97 26/05/2004	1.032.913,80	1.032.380,62	699.353,35	Lavori in corso				
	COMUNE DI FOSSO' Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
2	Bonifica area ex discarica per RSU, in via Favalli	4/A/1.9	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DGR 2833 10/09/2004	280.000,00	280.000,00	0,00	Progetto approvato				Vedi scheda riepilogativa degli interventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante
	COMUNE DI MONSELICE Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
4	Interventi di completamento ed adeguamento della rete fognaria della frazione Marendole e di via Mandic.	1/U/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 26 26/3/2003	284.051,29	284.051,29	0,00	Progetto approvato				
5	Bonifica area ex inceneritore	4/A/1.3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.807.599,00	1.807.599,00	157.193,09	Progettazione in corso				
6	Bonifica area ex inceneritore per RSU in località Schiavonesca	4/A/1.7	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR 2833 10/09/2004	718.367,98	718.367,98	0,00	Progetto approvato				
	COMUNE DI MORGANO Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
4	Interventi di fognatura e depurazione nel territorio comunale	1/H/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 53 16/03/2004	826.331,04	826.331,04	436.019,81	Lavori in corso				
	COMUNE DI NOALE Legge 488/99 Es. 2002, 2003											

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
3	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1.4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 167 DEL 2003	1.342.788,00	134.278,80	70.965,84	Lavori in corso				Vedi scheda riepilogativa degli intereventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
	COMUNE DI PREGANZIOL											
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
2	Estensione della rete fognaria nelle frazioni di Sambughè e Boschetta	1/I/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 30 27/3/2003	1.032.913,80	1.032.913,80	825.900,00	Lavori in corso	26/11/2003			
	COMUNE DI SALZANO											
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
1	Bonifica ex discarica per RSU e Rifiuti speciali	4/A/1.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 185 07/10/2004	2.400.000,00	2.400.000,00	160.056,69	Lavori in corso				Vedi scheda riepilogativa degli intereventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante
	COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA											
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
1	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali	4/A/1.6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 54 26/05/2003	750.000,00	75.000,00	75.000,00	Progetto approvato				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazone (importo pari a € 75.000,00). Vedi scheda riepilogativa degli intereventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
2	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali (in particolare da Cr6)	4/A/1.8	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR N. 2833 10/09/2004	500.000,00	500.000,00	0,00	Progetto approvato				Vedi scheda riepilogativa degli intereventi relativi alla bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante.
	COMUNE DI VENEZIA											
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
86 V.	Interventi di fognatura nel territorio comunale (importo complessivo € 17.043.077,67)	1/N/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		14.796.489,67	0,00	0,00	Progettazione in corso				Finanziamento originale di € 17.043.077,67 suddiviso dall'ente in 7 interventi (4 integrazioni e 3 nuovi interventi)

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
86A V.	Progetto definitivo relativo agli interventi diffusi di ristrutturazione e fognatura nera e bianca del Lido di Venezia. Bacino 16 e 20 - IX° lotto.	1/N/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 115 23/06/2004	2.246.588,00	2.246.588,00	0,00	Progetto approvato				
87	PROGETTO INTEGRATO RII	7/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 22 07/03/2002	20.658.275,96	20.658.275,96	5.838.427,16	Progetto approvato				
	CONSORZIO ADIGE BACCHIGLIONE Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
9	Incremento volume invaso canale dei Cuori e diaframmatura argini	2/M/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 109 18/10/2002	3.098.741,39	232.405,60	232.405,60	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
10	Opere di diaframmatura e completamento bacino Ca' di Mezzo	2/N/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 130 24/09/2003	258.228,45	258.228,45	129.301,13	Progetto definitivo				Erogazione limitata alle sole spese di progettazione (€ 19.367,13) come da DDDA n. 108/02
11	Ricalibratura canale San Giacomo - Monselesana	2/O/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 111 18/10/2002	1.291.142,25	1.291.142,25	96.835,67	Progetto definitivo				Decreto di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione
12	Ricalibratura e sostegni canali Barbegara, Rebosola, S. Silvestro	2/P/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 107 18/10/2002	3.098.741,39	3.098.741,39	232.405,60	Progetto definitivo				Decreto di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione
	CONSORZIO BASSO PIAVE Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
3	Completamento intervento per aquedotto sostitutivo pozzi in comune di Cavallino	5/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		0,00	0,00	0,00	Finanziamento revocato				Finanziamento originale pari a € 5.164.586,99 interamente revocato e devoluto alla Diocesi Patriarcato di Venezia
	CONSORZIO BRENTA BACCHIGLIONE Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
11	Completamento ricalibratura e gestione invasi nell' area Brondolo di Chioggia	2/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 66 13/6/2003	1.239.496,56	61.974,83	61.974,83	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
12	Estensione sistema telecomando e telecontrollo alle opere di derivazione e manufatti irrigui	2/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 65 13/6/2003	1.032.913,80	1.032.913,80	51.645,69	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
13	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti di sollevamento Bernio e Trezze di Chioggia	2/C/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 67 13/6/2003	3.098.741,39	154.937,07	154.937,07	Finanziamento suddiviso neigi interventi 13A (€ 1.291.142,25) e 13B (€ 1.807.599,15)				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
13A	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti Bernio e Trezze di Chioggia - bacino Bernio (€ 1.291.142,25).		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 13 (€ 1.291.142,25)					Progetto preliminare				

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
13B	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti Bernio e Trezze di Chioggia - bacino Trezze (€ 1.807.599,15).		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 13 (€ 1.807.599,15)					Progetto preliminare				Procedura di screening
14	Ricalibrazione e sostegni su corsi d' acqua nell' area della Riviera del Brenta	2/D/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 68 13/6/2003	2.375.701,74	118.785,09	118.785,09	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
	CONSORZIO DESE SILE											
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
19	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Zermason	2/E/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.291.142,25			Progettazione in corso				
20	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Rusteghin	2/F/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.291.142,25			Progettazione in corso				
21	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Zeretto	2/G/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.032.913,80			Progettazione in corso				
22	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Vernise	2/H/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		2.582.284,50			Progettazione in corso				
23	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del fiume Marzenego e del suo scolmatore. II° stralcio - scolo Draganziolo	2/I/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		774.685,35			Progettazione in corso				
24	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del fiume Marzenego e del suo scolmatore. II° stralcio - scolo Dosa e prolungamento	2/L/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		774.685,35			Progettazione in corso				
	CONSORZIO DESTRA PIAVE											
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
3	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel Bacino Vela: diversione delle acque, recupero della capacità di invaso, manufatti di controllo e fitodepurazione.	2/U/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.549.370,70	0,00	0,00	Progettazione in corso				
4	Risanamento dell' alto corso del fiume Meolo in area ad alta intensità di allevamenti ittici e colture agricole	2/V/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 114 18/10/2002	1.032.913,80	51.645,69	51.645,69	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
	CONSORZIO SINISTRA MEDIO BRENTA											
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
13	Riassetto idraulico e rinaturalizzazione dell' asta principale del bacino Pionca a monte del sifone sotto il taglio di Mirano, nei comuni di Mira, Dolo, Pianiga e Mirano	2/Q/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 89 12/10/2002	2.065.827,60	103.291,38	103.291,38	Progettazione in corso				Decreto di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
14	Completamento della sistemazione idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte della botte a sifone del taglio di Mirano	2/R/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 96 12/10/2002	2.065.827,60	103.291,38	0,00	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
15	Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, S. Marco e Vandura).	2/S/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 104 12/10/2002	1.032.913,80	51.645,69	0,00	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
16	Riassetto della rete scolante del sottobacino dell' Arzere	2/T/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 102 12/10/2002	1.032.913,80	51.645,69	0,00	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
	VENETO ACQUE Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
4	Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Sistemazione nodo idrico di Padova e chiusura anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia (I° stralcio)	5/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	10.329.137,98	10.329.137,98	3.098.741,40	Lavori in corso				Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002
	REGIONE BONIFICA SITI INQUINATI Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
8	MASTERPLAN bonifica Porto Marghera	4/A/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		516.456,90	22.250,00	0,00					In attesa del decreto di impegno
	REGIONE DISINQUINAMENTO Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
43	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)	1/O/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		15.493.706,97							
	REGIONE FORESTE AGRICOLTURA ZOOTECNIA Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
14	AGRICOLTURA COMPATIBILE. (Al fine di ridurre gli apporti di fitonutrienti e favorire una più corretta gestione del suolo.)	3/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		10.329.137,98	3.965.044,50	1.532.614,46	Lavori in corso				
15	Realizzazione di fasce tampone e messa a riposo colturale con finalità ambientali nell' area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia	3/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		2.298.233,20	2.298.198,00	910.073,20	In istruttoria				
16	Gestione delle pratiche irrigue: razionalizzazione dell' uso della risorsa idrica nel Bacino Scolante Laguna di Venezia	3/C/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		5.164.568,99	0,00	0,00	In istruttoria				
	ULSS 12 VENEZIA - DISINQUINAMENTO Legge 488/99 Es. 2002, 2003											

Legge 488-99 Es 02-03

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
9	Completamento della rete fognaria acque bianche dell' Ospedale SS. Giovanni e Paolo e prolungamento della condotta di scarico nella laguna Nord.	1/P/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 126 29/06/2004	774.685,35	774.685,35	0,00	Progetto preliminare approvato				
	DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
7	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	5/B/1.1	DGR 794 09/04/2002		5.164.568,99			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod 5/B/1
	TOTALE				205.033.388,92	92.782.369,33	28.185.554,08					
						45,25%	13,75%					

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	ABBAZIA SAN GIORGIO MAGGIORE											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
2	Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell' isola di S. Giorgio Maggiore	B/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		80.000,00	80.000,00	0,00	Progettazione in corso				
	ARPAV											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
16	Progetto Grandi Rischi Industriali - Verifiche zona Industriale di Porto Marghera	A/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00	500.000,00	250.000,00	Lavori in corso				
17	Completamento Progetto SIMAGE - III° LOTTO	A/1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	Lavori in corso				
18	Realizzazione nuova sede del laboratorio ARPAV di Venezia a supporto dei monitoraggi e dei controlli ambientali nel sistema lagunare	B/17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Lavori ultimati				
	ACM											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
100	Intervento in comune di Fossò	E/1.3	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		384.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
101	Realizzazione delle opere di fognatura nel comune di Campolongo Maggiore, parte A - 32° lotto	E/1.10 A	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		426.000,00	426.000,00	0,00	Progetto approvato				
102	Realizzazione delle opere di fognatura nel comune di Campolongo Maggiore, parte B - 32° lotto	E/1.10 B	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		150.000,00	150.000,00	0,00	Progetto approvato				
103	Intervento in comune di Pianiga	E/1.12	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		416.000,00	416.000,00	0,00	Progetto approvato				
104	Intervento in comune di Mira	E/1.8	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		1.656.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
105	Intervento in comune di Salzano	E/1.1	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		664.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
106	Intervento in comune di Spinea	E/1.5	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		416.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
107	Realizzazione delle opere di fognatura nei comuni di Stra e Fiesso d' Artico - 32° lotto.	E/1.7	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		488.000,00	488.000,00	0,00	Progettazione in corso				
108	Realizzazione delle opere di fognatura nei comuni di Stra e Fiesso d' Artico - 32° lotto 1	E/1.15. 1	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		72.000,00	72.000,00	0,00					
109	Intervento in comune di Vigonovo	E/1.11	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		408.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
110	Intervento in comune di Dolo	E/1.2	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		576.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
111	Intervento in comune di S. Maria di Sala	E/1.4	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		664.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
112	Intervento in comune di Camponogara	E/1.9	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		1.656.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
113	Intervento in comune di Campagna Lupia	E/1.6	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		416.000,00	416.000,00	0,00	Progettazione in corso				
114	Realizzazione delle opere di fognatura nel comune di Mirano, parte A - 32° lotto.	E/1.13 A	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		715.000,00	715.000,00	0,00	Progetto approvato				
115	Realizzazione delle opere di fognatura nel comune di Mirano, parte B - 32° lotto.	E/1.13 B	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		485.000,00	485.000,00	0,00	Progetto approvato				
116	Intervento in comune di Martellago	E/1.14	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		576.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
117	Interventi nei vari comuni	E/1.15	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		428.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
118	Intervento di prevenzione dell'inquinamento dell'ex discarica per RSU e RSAU in loc. Cà Perale del comune di Mirano	B/15	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		97.749,74	0,00	0,00					
	APGA Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
30	Ampliamento, potenziamento ed affinamento dei processi degli impianti di depurazione di Cona, Codevigo e Pontelongo	E/6	DCR N. 24 04/05/2004		2.400.000,00			Progettazione in corso				
31	Completamento, estensione e riqualificazione di opere già avviate: a) reti fognarie di centri abitati b) impianti di sollevamento	E/7	DCR N. 24 04/05/2004		3.200.000,00			Progettazione in corso				
	AZIENDA SERVIZI IDRICI CASTELLANA Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
7	Costruzione rete di fognatura nera in comune di Riese Pio X° (TV): via Monfenera, e Brigata Martiri del Grappa	E/5.2	DCR N. 24 04/05/2004		152.000,00			Progettazione in corso				
8	Costruzione rete di fognatura nera nei comuni di Asolo e Maser: completamento collettore Asolo / impianto di depurazione di Maser.	E/5.1	DCR N. 24 04/05/2004		450.000,00			Progettazione in corso				
9	Costruzione rete di fognatura nera in Comune di Castello di Godego (TV): via Vegre, via Cacciatore e via Motte	E/5.3	DCR N. 24 04/05/2004		650.000,00			Progettazione in corso				

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
17	Intervento in Comune di Quarto D'Altino - riconversione fognature esistenti da miste a nere ed ampliamento rete esistente. Via De Gasperi e Via IV Novembre	E/16.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		779.520,00			Progetto approvato				
18	Intervento in Comune di Roncade - realizzazione di interventi per costruzione condotte fognarie in Via Carboncine e Via Dary	E/16.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		666.080,00			Progetto approvato				
19	Intervento in Comune di Marcon - riconversione fognature esistenti da miste a nere ed ampliamento rete esistente. Vie zermanesa, Monte Pelmo, Tofane, Cristallo, Ortolan, Don Bosco e Ancilotto	E/16.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		853.200,00			Progetto approvato				
	SE.T.A. Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
7	Impianto di depurazione di Vigonza: completamento ed adeguamento trattamenti terziari	E/17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		800.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
8	Impianto di depurazione di Onara: dismissione impianto depurazione di Onara e collegamento all'impianto di depurazione di Cittadella	E/18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		308.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
9	Completamento rete fognaria Galzignano e Battaglia, dismissione impianto di depurazione di Battaglia, collegamento all'impianto di depurazione di Montegrotto e suo potenziamento fino a 30.000 A.E.	E/19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
10	Impianto di depurazione di Camposanpiero: seconda fase digestione anaerobica, completamento compostaggio aerobico, viabilità	E/20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
11	Impianto di depurazione di Cittadella: opere di completamento (acquedotto duale e trattamento sabbie)	E/21	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
12	Intervento in Comune di Trebaseleghe - Via Ronchi , Obbia Alta e Bassa	E/22.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		208.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
13	Intervento in Comune di Trebaseleghe - Via Villanova	E/22.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		240.000,00	240.000,00	147.461,31	Lavori in corso				
14	Intervento in Comune di Cittadella - Via delle Sorgenti	E/22.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		42.000,00	42.000,00	37.800,00	Lavori in corso				

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
15	Intervento in Comune di Villa del Conte - Via degli Alpini, Don Carrara, Marconi, Maso Moro, Tergola	E/22.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		755.600,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
16	Intervento in Comune di Massanzago - Via Roma, Stradona, Padovane, Cà Zorzi e Rigolo	E/22.5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		240.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
17	Intervento in comune di S. Giorgio delle Pertiche: collegamento Imp. Selezione frazione secca, della SS 307 e di via Anconetta, nonché fognatura nera nelle vie Montegrappa e Ceccarello	E/22.6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.060.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
18	Intervento in Comune di Piombino Dese - Via Piave, Massari, Stiffoni	E/22.7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		160.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
19	Intervento in Comune di Piombino Dese - riqualifica funzionale rete fognaria del capoluogo	E/22.8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
20	Intervento in Comune di S. Martino di Lupari riqualifica funzionale rete fognaria del capoluogo	E/22.9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.800.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
21	Intervento in Comune di S. Martino di Lupari/S. Giustina in Colle - collegamento fraz. Campretto - Borghetto - Fratte a S. Giustina in Colle - 2° Stralcio	E/22.10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		800.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
22	Intervento in Comune di Campodarsego - riqualifica funzionale rete fognaria del capoluogo	E/22.11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
23	Intervento in Comune di Resana - interventi di riqualificazione del sistema fognario	E/22.12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.120.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
24	Interventi di fognatura nei comuni del comprensorio	E/22.13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
25	Intervento in comune di Noventa Padovana: fognatura nera nelle vie Marezzane, Marco Polo e laterali e completamento delle opere di fognatura in depressione lungo via Noventana e laterali	E/22.14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		450.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
	AZIENDA CENTRO VENETO SERVIZI Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
16	Lavori di fognatura in via S. Pietro - S.P. 14, Pernumia	E/9.8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		235.200,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
17	Lavori di fognatura in via Cà Erizzo, Bovolenta	E/9.12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		115.360,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
18	Lavori di fognatura in via Rovere prolungamento, Anguillara	E/9.17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		67.680,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
19	Lavori di fognatura in via Bologna, Ponte S. Nicolò	E/9.10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		46.400,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
20	Lavori di fognatura in via Bologna laterale, Ponte S. Nicolò	E/9.11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		46.400,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
21	Sdoppiamento rete, adeguamento rete del centro e del nucleo del centro storico, suddivisione acque nere e bianche, nella zona di Monselice capoluogo	E/9.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.561.626,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
22	Completamento rete fognatura nella vecchia zona industriale e via Umbria, Monselice	E/9.31	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
23	Lavori di fognatura in via Marconi laterale, Terrassa Padovana	E/9.7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		47.680,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
24	Lavori di fognatura in via Corso e Ponte de Riva laterali, Due Carrare	E/9.26	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		66.400,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
25	Lavori di fognatura in via Chiaviche, Arquà	E/9.27	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		66.400,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
26	Comune di Ponte S. Nicolò. Completamento della rete fognaria nera nella porzione di territorio comunale ricadente nel bacino scolante nella Laguna di Venezia	E/9.15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		360.000,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
27	Lavori di fognatura in via Boario Polito, Arquà	E/9.19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		33.840,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
28	Lavori di fognatura in via Argine, Pozzonovo	E/9.16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		90.880,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
29	Lavori di fognatura in via Arre prolungamento, S.P., Conselve	E/9.21	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		90.240,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
30	Lavori di fognatura in via Cà Borin laterale, Baone	E/9.20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		225.600,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
31	Lavori di fognatura in via S. Trinità, Pernumia	E/9.14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		228.160,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
32	Lavori di fognatura in via Monte Grappa laterale, Conselve	E/9.18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		112.800,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
33	Lavori di fognatura in via Stanga prolungamento, Arre	E/9.23	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		201.120,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
34	Lavori di fognatura in via Paraiso, Pozzonovo	E/9.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		60.000,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
35	Lavori di fognatura in via Roma prolungamento lato destro, Ponte S. Nicolò	E/9.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		144.800,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
36	Lavori di fognatura in via Maseralino, Cartura	E/9.25	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		189.200,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
37	Ulteriore stralcio funzionale di completamento della rete fognaria nel centro storico di Este e nel quartiere di Meggiaro	E/9.22	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.800.000,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
38	Lavori di fognatura nella S.P. 21 prolungamento, Baone	E/9.28	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		66.400,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
39	Lavori di fognatura in via Fossalta prolungamento, Conselve	E/9.30	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		197.920,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
40	Lavori di fognatura in via Santo, Anguillara	E/9.24	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		223.040,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
41	Collegamento al depuratore comunale dello scarico depurato del mattatoio "Agricola Berica" e di altre 20 utenze civili, Monselice	E/9.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		392.800,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
42	Lavori di fognatura in via Ponte de Riva S.P., Cartura	E/9.6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		310.400,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
43	Lavori di fognatura in via Rana Camori laterale, Este	E/9.5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		105.600,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
44	Lavori di fognatura in via Rezzole laterale, Pozzonovo	E/9.13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		92.160,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
45	Lavori di fognatura in via Rialto laterale, Candiana	E/9.9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		46.400,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
46	Lavori di fognatura in via Rana Camori laterale, Este	E/9.29	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		464.800,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
	A.S.P. DI CHIOGGIA											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
27	Interventi urgenti per l'ottimizzazione dell'afflusso delle acque bianche e nere di Sottomarina al depuratore di Val da Rio tramite adeguamento dell'impianto di sollevamento e modulazione "Niccolò De Conti"	E/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.200.000,00			Progettazione in corso				
28	Completamento dei sistemi fognari nel centro storico di Sottomarina - I^ fase	E/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.400.000,00			Progettazione in corso				
29	Adeguamento dei sistemi fognari del centro storico di Chioggia in concomitanza dei lavori di difesa della città dalle acque alte	E/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.400.000,00			Progettazione in corso				
	AZIENDA BRENTA SERVIZI											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
1	Comune di Rossano: fognatura in zone laterali Via Salute e Via 11 Febbraio	E/8.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.087.320,00							

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
2	Comune di Rosà: fognature in laterali via Granella, zona S. Pietro e Cusinati	E/8.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.598.400,00							
	AZIENDA SPIM											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
4	Adeguamento del depuratore di Preganziol: potenziamento dei sistemi di decantazione, clorazione e filtazione finale	E/23	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		560.000,00	560.000,00	0,00	Progettazione in corso				
5	Completamento rete fognaria nel territorio comunale: Via Statua, Via Zeriolo, Via Levada, Via Marcello, Via Molin Cappello Nord	E/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 194 25/10/2005	260.800,00	260.800,00	0,00	Progetto approvato				
	AZIENDA SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
1	Realizzazione rete fognaria primaria Comuni di Castelfranco Veneto, Vedelago, Altivole, - 1° Lotto	E/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		7.360.000,00			Progettazione esecutiva				
	COMUNE DI CAMPODARSEGO											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
	Intervento di bonifica e riqualificazione ambientale della discarica per RSU in loc. S. Andrea	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.500.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
	COMUNE DI CAVALLINO											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
5	Completamento della fognatura separata (nera e bianca) zona di Cà Ballarin e Cà Valle	E/10.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.440.000,00			Progettazione in corso				
6	Interventi vari di miglioramento dell'impianto di depurazione del Cavallino (trattamento fanghi e igiene ambientale)	E/11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.200.000,00			Progettazione in corso				
7	Individuazione e riduzione di acque parassite nella fognatura	E/10.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00			Progettazione in corso				
	COMUNE DI CODEVIGO											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
2	Interventi di ripristino dei caratteri lagunari in alcune aree della gronda attraverso rinaturalizzazione di aree prossime alla conterminazione lagunare, finalizzate al ripristino delle funzioni ecologiche proprie delle zone umide	B/6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progetto preliminare				Stipulato un accordo di programma tra il comune di Codevigo e il MAV per la realizzazione dell'intervento
	COMUNE DI MIRA											

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
	Intervento di messa in sicurezza di emergenza della discarica della Soc. Veneta Mineraria in loc. Bastiette	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
	Intervento di messa in sicurezza dell'area Baldan.	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		250.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
	COMUNE DI SPINEA											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
	Interventi di bonifica e messa in sicurezza di emergenza ex discarica per rifiuti inerti in via Luneo - comune di Spinea (V E)	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
	COMUNE DI CORNUDA											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
1	Adeguamento ai limiti di legge del depuratore comunale di Cornuda, località La Valle	E/12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		943.675,00	943.675,00	0,00	Progettazione in corso				
	COMUNE DI VENEZIA											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
89	Opere di disinquinamento ambito Campalto: diminuzione acque parassite	E/14.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.040.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
90	Opere di disinquinamento ambito Lido di Venezia: diminuzione acque parassite	E/14.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
91	Opere di disinquinamento ambito Fusina: diminuzione acque parassite	E/14.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.200.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
92	Opere di disinquinamento ambito Lido di Venezia: fognatura nera e riqualificazione fognatura bianca	E/14.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.320.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
93	Osservatorio naturalistico della Laguna	B/19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		400.000,00	400.000,00	0,00	Progettazione in corso				
94	Programma di iniziative sul tema dell'educazione ambientale e della promozione dell'agricoltura biologica nel territorio del bacino scolante in Laguna di Venezia	B/20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		600.000,00	600.000,00	0,00	Progettazione in corso				
95	PROGETTO INTEGRATO RII	A/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
96	Redazione dei piani della caratterizzazione per i siti inquinati compresi nel territorio comunale	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	0,00	250.000,00	0,00	0,00					
	CONSORZIO ADIGE BACCHIGLIONE											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
13	Fitodepurazione per integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l' autodepurazione nei bacini centrali - (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 6)	D1/1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		183.819,20	0,00	0,00	Progetto approvato				
14	Intervento di incremento dei tempi di ritenzione delle acque di sfioro urbane e di dilavamento di superfici agricole nei comuni di Este e Baone (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 5)	D1/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		139.228,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
15	Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica. Incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 7)	D1/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		481.339,20	0,00	0,00	Progettazione in corso				
16	Progetto per la miglior gestione delle acque irrigue (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 8)	D1/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.211.142,20	0,00	0,00	Progettazione in corso				
17	Ricalibratura canale San Giacomo - Monselesana (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 11)	D1/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		176.097,20	176.097,20	0,00	Progettazione in corso				
18	Ricalibratura e sostegni canali Barbegara, Rebosola, S. Silvestro (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 12)	D1/6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		308.373,20	308.373,20	0,00	Progettazione in corso				
19	Interventi in rete minore di bonifica. Aumento tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale	D1/7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
20	Aumento tempi di ritenzione per autodepurazione nei bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore e Rebosola: stralcio	D1/8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
21	Impinguamento canali Beoli - Rebosola	D2/42	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.150.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
	CONSORZIO BASSO PIAVE Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
4	Progetto di opere aziendali e comuni a più fondi nel settore dell'irrigazione - Distribuzione di acqua alle aziende delle unità irrigue elementari	D2/44	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.978.171,00			Progetto preliminare				
	CONSORZIO BRENTA BACCHIGLIONE Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
15	Interventi strutturali in rete di bonifica: diversione delle acque di piena del Fiumicello (idrovora di Cambroso) (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 3)	D1/9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		180.000,00	0,00	0,00	Lavori in corso				
16	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riclaibratura e sostegni sui Rii di Piove (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 4)	D1/10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
17	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo - Bacino Sesta Presa e Bacino Bernio (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 6)	D1/11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
18	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nell'area di "Brondolo" in comune di Chioggia (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 5)	D1/12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		150.000,00	0,00	0,00	Progetto esecutivo				
19	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (II stralcio) - Bacino Sesta Presa e Bacino Trezze (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 7)	D1/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		300.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
20	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nel bacino "Noventana" (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 9)	D1/14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
21	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Presa in Sinistra Brenta e Settima Presa Inferiore (I stralcio) (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 8)	D1/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		350.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
22	Completamento, ricalibratura e gestione invasi nell'area Brondolo di Chioggia (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 11)	D1/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		50.000,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
23	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti di sollevamento Bernio e Trezze di Chioggia (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 13)	D1/17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		570.000,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
24	Completamento ricalibratura e sostegni sullo scolo Altipiano	D1/18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
25	Interventi di trasformazione irrigua del Bacino Bernio in sx del canale Novissimo nei Comuni di Chioggia e Codevigo	D2/43	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		5.963.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
	CONSORZIO BRENTELLA DI PEDEROBBA Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
3	Sistemazione dello scarico di Salvatronda a monte della confluenza nello Zero in Comune di Castelfranco	D1/33	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.400.000,00			Progettazione in corso				
4	Riconversione del sistema irriguo in Comune di Vedelago, zona di Fanzolo e Barcon - Riconversione da scorrimento ad aspersione (pluvirrigazione) su un'area di 1.200 Ha	D2/45	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		6.840.000,00			Progettazione in corso				
	CONSORZIO DESE SILE Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
27	Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego - Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna - Integrazione tra la rete principale di bonifica ed il sistema di smaltimento delle acque meteoriche	B/7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		7.000.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
28	Estensione, completamento e gestione della Zona Tampone arborea realizzata presso l'Azienda Diana di Veneto Agricoltura, con raccolta ed elaborazione di dati per il monitoraggio dell'efficacia delle fasce tampone arboree nel controllo dell'inquinamento	D1/29	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
29	Interventi strutturali in rete minore di bonifica - Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego - 2° Stralcio, Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne	D1/30	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
30	Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggiana, Marocchesa e Tarù in Comune di Venezia, Mogliano V.to e Scorze' (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 12B)	D1/19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.950.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato				

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
31	Ristrutturazione rete di bonifica dell'area centrale e del medio corso dei fiumi Dese e Zero e tributaria dei corsi d'acqua consortili: Piovega di C., Desolino, Rio S.Martino, Piovega di S., Rio S.Amnrogio, Piovega di L. e Piovega dei Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 12A)	D1/20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00	500.000,00	0,00	Progetto approvato				
32	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Marzenego. (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 13)	D1/21	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
33	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del bacino del canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 18)	D1/22	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
34	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sui sottobacino del Dese e Zero. II stralcio - scolo Zermason (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 19)	D1/23	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
35	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sui sottobacino del Dese e Zero. II stralcio - scolo Rusteghin (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 20)	D1/24	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		150.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
36	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sui sottobacino del Dese e Zero. II stralcio - scolo Zeretto (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 21)	D1/25	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		80.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
37	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sui sottobacino del Dese e Zero. II stralcio - scolo Vernise (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 22)	D1/26	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		850.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
38	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sui sottobacino del Dese e Zero. II stralcio - scolo Draganziolo (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 23)	D1/27	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		50.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
39	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sui sottobacino del Dese e Zero. II stralcio - scolo Dosa e prolungamento (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 24)	D1/28	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	0,00	120.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
40	Interventi nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia per la bonifica di aree precedentemente occupate da discariche, inceneritori, attività industriali, ecc.	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
	CONSORZIO DESTRA PIAVE Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
5	Risanamento dell'alto corso del fiume Meolo in area di alta densità di allevamenti ittici e colture agricole	D1/31	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione preliminare				
6	Diversione delle acque, recupero della capacità di invaso, manufatti di controllo e fitodepurazione	D1/32	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progettazione preliminare				
	CONSORZIO SINISTRA MEDIO BRENTA Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
17	Ammodernamento e potenziamento impianto idrovoro di Dogaletto a Mira (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 7)	D1/34	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 215 17/11/2004	310.000,00	310.000,00	23.353,84	Lavori ultimati.				
18	Ricalibratura scoli Fondi a Est e Fondi a Sud a Malcontenta (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 4)	D1/35	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		206.582,00	0,00	0,00	Lavori in corso				
19	Sistemazione idraulica e ricalibratura rete di bonifica bacino Chirignago Malcontenta (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 8A)	D1/36	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		774.684,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
20	Riclibrazione e rinaturalizzazione della rete idraulica del bacino Gambarare - Mira (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 8A)	D1/37	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		852.152,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
21	Progetto dimostrativo per integrazione di rete di fognatura bianca e rete di bonifica (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 11A)	D1/38	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		488.478,42	0,00	0,00	Progettazione in corso				
22	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Realizzazione di un sistema di contenimento e fitobiodepurazione delle acque della zona a nord del Naviglio Brenta (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 12)	D1/39	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		300.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
23	Riassetto idraulico e rinaturalizzazione dell' asta principale del bacino Pionca a monte del sifone sotto il taglio di Mirano, nei comuni di Mira, Dolo, Pianiga e Mirano (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 13)	D1/40	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.032.913,88	0,00	0,00	Progettazione in corso				

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
24	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riassetto della rete scolante del sottobacino Rio dell'Arzere (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 16)	D1/41	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.549.370,70	0,00	0,00	Progettazione in corso				
25	Riconversione irrigua di preesistenti impianti a scorrimento nella zona di Cittadella, S.Martino di Lupari e Castelfranco	D2/46	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		174.240,00	0,00	0,00	Progetto approvato				
26	Indagine preliminare sulla qualità dei terreni da scavo	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	0,00	200.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
27	Completamento piano caratterizzazione della qualità di escavo dei collettori consorziati fondi sud e fondi sud-est (bacini scolo meccanico di Malcontenta)	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	0,00	150.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
	VENETO ACQUE Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
6	Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Schema Veneto centrale Linea-Padova-Piove di Sacco-Cavarzere	B/14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		20.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Progetto definitivo				
	MAV Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
6	Accordo di programma Regione Veneto/M.A.V. - Interventi per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi Adige e Brenta	A/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDSPC 287 16/09/2004	3.400.000,00	3.400.000,00	795.580,56	Lavori in corso				
7	Accordo di programma Regione Veneto/M.A.V. - Botte di CONCHE	A/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.242.000,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
	REGIONE DISINQUINAMENTO Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
45	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)		DCR N. 24 DEL 04/05/2004		9.919.447,15	0,00	0,00					
46	Accordo di programma relativo a progetti di ricerca, sperimentazione e utilizzo dell'Idrogeno tra Regione Veneto e Ministero dell'Ambiente	B/11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Progetto preliminare				
47	Attività di studi, ricerche, indagini e divulgazione, cocernenti il Piano Direttore 2000	B/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		700.000,00	0,00	0,00					
	REGIONE FORESTE AGRICOLTURA ZOOTECNIA Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
17	Agricoltura compatibile nell'area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia (C5.1.3a)	C/1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		6.611.724,00	0,00	0,00	In corso di realizzazione				

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
18	Gestione dei reflui zootecnici ed interventi strutturali in zootecnia (C5.1.4)	C/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		22.264.354,00	14.564.465,14	2.990.037,68	In corso di realizzazione				
19	Realizzazione fasce tampone e messa a riposo colturale con finalità ambientali nell'area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia (C5.1.3b)	C/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		11.046.290,00	7.478.134,60	1.713.443,20	In corso di realizzazione				
20	Gestione delle pratiche irrigue: razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica nel Bacino Scilante nella laguna di Venezia (C5.1.3c)	C/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		10.406.396,00	0,00	0,00	In corso di realizzazione				
21	Gestione delle pratiche agricole: incentivazione all'innovazione ambientale ecocompatibile in agricoltura nel Bacino Scilante nella laguna di Venezia (C5.1.5)	C/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.500.000,00	0,00	0,00	In corso di realizzazione				
	REGIONE BONIFICA SITI INQUINATI Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
	Interventi nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia per la bonifica di aree precedentemente occupate da discariche, inceneritori, attività industriali ecc.	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	0	952.250,26	22.250,00	15.750,00	Progettazione in corso				
	VENETO AGRICOLTURA Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
1	Messa a punto di modelli produttivi innovativi nelle colture estensive per una gestione ecocompatibile nell'ambito del Bacino scolante in Laguna di Venezia	B/8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		900.000,00	900.000,00	0,00	Progettazione in corso				
2	Utilizzo del compost di qualità in agricoltura e sperimentazione tecnica ed economica finalizzata alla riduzione dei concimi azotati tradizionali	B/9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Progettazione in corso				
	ULSS 12 VENEZIA - OSPEDALI Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
5	Urgenti lavori di messa a norma di alcuni padiglioni dell'Ospedale S.S. Giovanni e Paolo di Venezia	B/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00			Progetto preliminare				
	ASL 15 ALTA PADOVANA Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
1	Progetto per l'integrazione delle informazioni sanitarie ed ambientali per la gestione del territorio scolante nel bacino della Laguna di Venezia	B/18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.039.000,00			Studio di fattibilità				
	ENTE DI BACINO RSU VE2											

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
	Bonifica ex discarica per RSU in loc. S. Liberale di Marcon	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.500.000,00	0,00	0,00					
	SA.V.E.											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
1	Realizzazione di un sistema di trattamento di prima pioggia al fine di contenere gli inquinanti attualmente scaricati nella Laguna di Venezia - Porzione scolante in bonifica - 1° stralcio	B/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.090.000,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
2	Realizzazione di un sistema di trattamento di prima pioggia al fine di contenere gli inquinanti attualmente scaricati nella Laguna di Venezia - Porzione scolante in bonifica - 2° stralcio	B/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.520.000,00	0,00	0,00	Progetto preliminare				
	PROVINCIA DI PADOVA											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
	Intervento di bonifica in via sostitutiva dell'ex area Promofin in comune di Piombino Dese	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		400.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
	PROVINCIA DI VENEZIA											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
1	Realizzazione di una rete ecologica in Provincia di Venezia mediante individuazione di aree ad esempio meccanismi di fitodepurazione, sostenendo i principi di un'agricoltura sostenibile a basso impatto ambientale	B/10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progetto prelimare				
	ASSOCIAZIONE TEATRO GOLDONI											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
1	Risanamento igienico sanitario degli impianti del Teatro Goldoni	B/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		455.000,00			Progetto preliminare				
	DIOCESI PATRIARCALE DI VENEZIA											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											
	Risanamento igienico sanitario delle Chiese di Venezia	B/12.2	DCR N. 24 04/05/2004		1.300.743,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
	PARROCCHIA DI OGNISSANTI											
	Legge 388/00 e 488/01 Es. 2002, 2003, 2004											

Leggi 388/2000 e 448/2001

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Risanamento igienico sanitario delle Chiese di Venezia. Parrocchia Ognissanti - Templo della Madonna dell'Apparizione.	B/12.1 V fase	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 147 13/09/2005	800.000,00	800.000,00	0,00	Progetto approvato				
	TOTALE				286.824.446,16	51.253.795,14	20.473.426,59					
						17,87%	7,14%					

PAGINA BIANCA

RAPPORTO

SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

SUDDIVISO PER SOGGETTI ATTUATORI

Aggiornamento al 31 dicembre 2005

RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI, DEGLI IMPEGNI E DELLE EROGAZIONI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA, AL 31 Dicembre 2005

nr.	ENTE	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
1	Azienda Consorzio del Mirese (A.C.M.)	101.250.686,60	87.967.717,42	73.915.757,58
2	Azienda Piovese Gestione Acque (A.P.G.A.)	46.442.369,96	28.972.864,72	26.263.746,80
3	Azienda Servizi Idrici della Castellana	10.433.025,89	9.181.025,89	7.259.500,71
4	Azienda Servizi Pubblici Sile Piave s.p.a	23.019.854,41	16.035.714,14	9.614.666,56
5	Azienda Servizi Territoriali Ambientali (SE.T.A.)	28.123.600,00	282.000,00	185.261,31
5a	*Azienda Consorzio del Tergola*	94.614.903,92	86.787.796,17	74.296.849,98
5b	*Azienda Consorzio Alta Servizi*	36.565.148,46	26.236.010,47	23.035.055,74
5c	*Azienda Consorzio Acquedotto Euganeo Berico*	5.438.291,15	3.644.360,96	1.866.673,16
6	Azienda Speciale Consorziale Centro Veneto Servizi	42.274.561,31	31.585.255,31	19.450.712,66
7	Azienda Brenta Servizi	2.685.720,00	0,00	0,00
8	Azienda S.P.I.M.	3.403.084,50	3.403.084,50	1.554.112,57
9	A.S.P. di Chioggia	70.964.551,95	56.694.031,72	38.771.470,33
10	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano	7.360.000,00	0,00	0,00
11	VESTA - Venezia Servizi Territoriali Ambientali	14.589.394,45	14.589.394,46	1.508.223,80
12	Comune di Arquà Petrarca	2.065.827,60	2.065.827,60	1.908.197,11
13	Comune di Campodarsego	5.082.284,50	2.582.284,50	159.380,45
14	Comune di Castelfranco Veneto	6.610.648,31	6.314.045,61	1.407.833,76
15	Comune di Cavallino	11.470.939,69	6.713.939,69	4.541.257,95
16	Comune di Cavarzere	7.488.625,04	7.488.091,86	6.775.158,89
17	Comune di Codevigo	3.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70
18	Comune di Cornuda	943.675,00	943.675,00	0,00
19	Comune di Este	3.356.969,84	3.356.969,84	1.507.738,93
20	Comune di Fossò	914.684,42	914.684,42	285.096,00
21	Comune di Galzignano	965.774,40	965.774,40	893.715,01
22	Comune di Jesolo / A.S.I.	5.986.029,80	5.983.446,81	5.838.950,32
23	Comune di Marcon	1.859.244,84	1.859.244,84	1.798.166,92
24	Comune di Meolo	1.032.913,80	1.032.913,80	981.268,11
25	Comune di Mira	4.168.489,67	113.620,50	113.620,50
26	Comune di Mogliano Veneto	6.352.419,86	6.352.419,86	5.871.302,30
27	Comune di Monastier	1.549.370,70	1.549.370,70	1.401.642,79
28	Comune di Monselice	14.149.272,61	8.749.272,61	5.314.591,78
29	Comune di Morgano	3.550.387,08	3.550.387,09	2.231.337,55
30	Comune di Musile di Piave	2.815.655,85	2.815.655,85	2.769.755,32
31	Comune di Noale	3.408.615,60	2.200.106,40	1.613.542,24
32	Comune di Padova	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60
33	Comune di Piove di Sacco	3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.198,29
34	Comune di Preganziol	1.807.599,15	1.807.599,15	1.587.431,09
35	Comune di Quarto d'Altino	5.422.797,44	5.422.797,44	5.100.289,25
36	Comune di Salzano	2.400.000,00	2.400.000,00	160.056,69
37	Comune di Spinea	500.000,00	0,00	0,00

nr.	ENTE	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)
38	Comune di Tezze sul Brenta	1.250.000,00	575.000,00	75.000,00
39	Comune di Venezia /VE.S.T.A.	376.089.083,32	254.492.572,73	178.148.493,36
40	Comune di Zero Branco	2.275.827,60	2.275.827,60	2.099.866,58
41	Consorzio di bonifica Adige – Bacchiglione	60.948.350,98	30.619.730,45	22.353.547,91
42	Consorzio di bonifica Basso Piave	4.323.102,82	1.344.931,82	1.344.881,11
43	Consorzio di bonifica Brenta – Bacchiglione	39.454.963,95	14.008.893,06	4.943.458,98
44	Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba	9.843.748,75	823.748,75	613.796,31
45	Consorzio di bonifica Dese – Sile	84.837.879,43	31.346.399,93	22.367.602,25
46	Consorzio di bonifica Destra Piave	6.148.112,09	2.117.473,29	2.117.473,29
47	Consorzio di bonifica Sinistra – medio Brenta	34.080.196,14	16.939.912,15	4.640.322,43
48	Regione – Bonifiche siti inquinati	18.582.229,88	10.183.782,38	9.575.863,82
49	Regione – Acquedotti / Delta Po	10.974.709,11	19.625,36	19.625,36
50	Regione – Disinquinamento / C.V.D.	144.975.921,84	46.176.574,56	43.673.823,48
51	Regione – Foreste/Agricoltura/Zootecnia	148.336.118,41	95.204.995,62	47.455.875,35
52	Veneto Acque S.p.A.	79.121.154,18	65.121.154,18	41.915.864,69
53	Veneto Agricoltura	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
54	ARPAV	25.584.352,93	25.402.883,97	19.668.558,65
55	Autorità portuale di Venezia	516.450,00	0,00	0,00
56	Azienda Speciale Porto di Chioggia	2.500.000,00	0,00	0,00
57	Ente di bacino R.S.U. VE 2	24.810.938,04	22.310.938,04	22.310.938,04
58	Magistrato alle Acque di Venezia	26.227.206,57	7.842.727,51	3.050.020,32
59	Provincia di Padova	400.000,00	0,00	0,00
60	Provincia di Venezia	2.000.000,00	0,00	0,00
61	S.A.V.E. - Servizi Aeroportuali di Venezia	6.610.000,00	0,00	0,00
62	U.S.S.L. n.12 – Venezia/Disinquinamento	2.840.512,94	2.840.512,95	2.024.054,16
62a	U.S.S.L. n.12 – Venezia/Ospedali	20.301.306,12	17.301.306,12	17.261.746,32
63	A.S.L. n. 15 Alta Padovana	1.039.000,00	0,00	0,00
64	U.S.S.L. n.17 - Este-Monselice	1.523.142,25	1.291.142,25	1.162.028,03
65	Abbazia di San Giorgio Maggiore	286.582,76	286.582,76	206.532,97
66	Comunità Ebraica di Venezia	2.000.000,00	2.000.000,00	1.199.548,98
67	Diocesi Patriarcato di Venezia	25.765.143,00	464.400,00	133.800,00
68	Parrocchia Ognissanti	800.000,00	800.000,00	0,00
69	Associazione Teatro Stabile del Veneto "Goldoni"	455.000,00	0,00	0,00
70	Enti Vari (Fondo rotazione progetti)	5.396.974,60	1.987.326,15	1.939.380,08
	TOTALI	**1.762.495.822,07**	**1.103.470.221,89**	**787.514.863,18**

GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO

Gli schemi che sono riportati nel proseguo di questo report rappresentano la successione ordinata, Ente per Ente, di tutti i finanziamenti erogati dal Servizio Legge Speciale nella sua storia.

Lo scopo di questo lavoro è, oltre che quello di quantificare i singoli finanziamenti, di riepilogare lo stato dei lavori andando ad individuare le principali fasi di esecuzione:

- data di approvazione del finanziamento
- data di approvazione del progetto
- data di inizio lavori
- data di fine lavori
- data di collaudo

In molti casi un singolo finanziamento può essere stato diviso dall'Ente e dar vita a più progetti. In questo caso una singola riga di finanziamento si interrompe e si sviluppa in un numero di righe pari al numero di progetti sviluppati. Come si vede nell'esempio la riga madre (n. 12) mantiene i riferimenti dell'approvazione del finanziamento ma rimanda alle righe successive le informazioni inerenti i tempi di esecuzione del progetto e degli impegni ove siano separati.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
12	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Dese (finanziamento iniziale: 8.263.310,39 euro)	5/B/2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		8.263.310,39			Finanziamento suddiviso negli interventi 12A (€ 4.131.655,19) e 12B (€ 4.131.655,19)				
12A	Ristrutturazione rete di bonifica dell'area centrale e del medio corso dei fiumi Dese e Zero e tributaria dei corsi d'acqua consortili: Piovega di C., Desolino, Rio S.Martino, Piovega di S., Rio S.Amnrogio, Piovega di L. e Piovega dei Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason (€ 4.131.655,19)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 12 (€ 4.131.655,19)					Progettazione definitiva in corso				
12B	Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggiana, Marocchesa e Tarù in Comune di Venezia, Mogliano V.to e Scorze' (€ 4.131.655,19)		Realizzato con parte dei fondi del finanziamento 12 (€ 4.131.655,19)					Progettazione in corso				Progetto all'esame della Commissione V.I.A.

Ci sono anche casi in cui due o più finanziamenti danno vita ad un unico progetto. In questo caso le righe degli interventi originari (che sono stati evidenziati in grigio) contengono le informazioni sul finanziamento, mentre le notizie inerenti all'impegno e allo stato dei lavori sono riportate nella riga relativa all'intervento unificato.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
1	Impianto di Vigonza (PD)		DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DPGR N. 2267 DEL 6/11/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza	1/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DPGR N. 2267 DEL 6/11/1995	6.507.356,93	6.507.356,93	6.507.356,93	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				
4A	Esecuzione dei lavori di ampliamento impianto di depurazione di Vigonza (€ 7.540.270,73)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.032.913,80) + 4 (€ 6.507.356,93) = € 7.540.270,73					Lavori collaudati	24/09/1998	07/07/1999 28/07/1999	10/02/2000 15/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 15/01/2001 per € 7.540.270,73

Inoltre, le note nelle tabelle guidano il lettore nella consultazione dei progetti realizzati con i fondi della Legge Speciale.

SEZIONE I: COMUNI

Nota: nelle tabelle che seguono vengono riportati i finanziamenti attribuiti direttamente ai Comuni

COMUNE DI ARQUA' PETRARCA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 139/92 Es. 1993											
1	Fognatura nel comune di Arquà Petrarca	6/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DPGR N. 6 DEL 3/1/1995	516.456,90	516.456,90	513.763,48	Lavori collaudati	05/02/1999 01/06/1999	29/07/2002	08/09/2003	Decreto di contabilità finale in sospeso, in attesa dell'invio da parte dell'ente della documentazione completa relativa al collaudo
	Legge 515/96 Es. 1997											
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Arquà Petrarca	A/1/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 540 9/12/1997	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Lavori collaudati	16/06/1998 03/12/1998	25/01/2001	29/09/2003	Decreto di contabilità finale in itinere.
	TOTALI				2.065.827,60	2.065.827,60	1.908.197,11					

COMUNE DI CAMPODARSEGO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
1	Bonifica ambientale presso la discarica di Campodarsego (PD)	D/84	DGR N. 1834 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	2.582.284,50	2.582.284,50	159.380,45	Lavori in corso				
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
2	Intervento di bonifica e riqualificazione ambientale della discarica per RSU in loc. S. Andrea	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.500.000,00	0,00	0,00	Progettazione in corso				
	TOTALI				5.082.284,50	2.582.284,50	159.380,45					

COMUNE DI CASTELFRANCO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1997											
1	Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione in Comune di Castelfranco Veneto, località Salvatronda	A/10/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1998	DDDA N. 25 19/03/1999	1.446.079,32	1.446.079,32	1.260.029,51	Lavori conclusi. Collaudo in corso	23/05/2000	29/11/2001		
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
2	Interventi di fognatura e depurazione	B1/62	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		258.228,45			Finanziamento convogliato nell'intervento 3A				
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
3	Interventi di ampliamento dell' impianto di depurazione di Salvatronda	1/R/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 257 28/12/2004	1.187.850,87	1.187.850,87	66.761,24	Finanziamento convogliato nell'intervento 3A				
3A	Interventi di ampliamento dell' impianto di depurazione di Salvatronda (€ 1.446.079,32)		Riuniti i finanziamenti 2 (€ 258.228,45) + 3 (€ 1.187.850,87) = € 1.446.079,32					In fase di progettazione				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
4	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale (€ 2.375.701,74)	1/R/2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		Finanziamento diviso negli interventi 4A (€ 1.319.948,42), 4B (€ 345.985,06), 4C (€ 671.394,00) e 4D(€ 38.374,26)							
4A	Potenziamento del Depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno	1/R/2.3	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 170 11/10/2005	1.319.948,42	1.319.948,42	0,00	In fase di progettazione				
4B	Integrazione fasi di processo depuratori Borgo Padova e Salvatronda. Filtrazione e disinfezione dello scarico	1/R/2.2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 257 28/12/2004	345.985,06	345.985,06	0,00	Progetto approvato				
4C	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale. Località S. Andrea O. M. (€ 671.394,00)	1/R/2.1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 116 23/06/2004	671.394,00	671.394,00	38.724,97	Lavori in corso				
4D	Interventi di razionalizzazione processi depurativi ed estensione rete fognaria comunale	1/R/2.4	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		38.374,26	0,00	0,00	In fase di progettazione				
5	Integrazione tecnologica dell' impianto di depurazione di Borgo Padova	1/R/3	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		Finanziamento diviso negli interventi 5A (€ 1.216.657,36) e 5B (€ 126.130,58)							
5A	Integrazione tecnologica dell' impianto di depurazione di Borgo Padova	1/R/3.1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 258 29/12/2004	1.216.657,36	1.216.657,36	42.318,04	Lavori in corso				
5B	Potenziamento del Depuratore di Salvatronda per l'allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno	1/R/3.2	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 170 11/10/2005	126.130,58	126.130,58	0,00	Progetto approvato				
	TOTALI				6.610.648,31	6.314.045,61	1.407.833,76					

COMUNE DI CAVALLINO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1997											
1	Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)	C/23/1.2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 38 23/4/2002	4.648.112,09	4.648.112,09	3.626.098,64	Lavori in corso				DDDA 58 del 06/04/2005 nuovi termini per fine lavori : 23/04/2007.
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
2	Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria del Cavallino (VE)	B1/63	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 38 23/4/2002	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Lavori in corso				DDDA 58 del 06/04/2005 nuovi termini per fine lavori : 23/04/2007.
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
3	Costruzione della rete di fognatura nera della zona di Via dell'artigliere in comune di Cavallino - Treporti (VE)	1/S/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 2 07/01/2004	1.032.913,80	1.032.913,80	915.159,31	Lavori in corso				
4	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		517.000,00			Progetto in fase di redazione				
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
5	Completamento della fognatura separata (nera e bianca) zona di Cà Ballarin e Cà Valle	E/10.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.440.000,00			Progettazione in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
6	Interventi vari di miglioramento dell'impianto di depurazione del Cavallino (trattamento fanghi e igiene ambientale)	E/11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.200.000,00			Progettazione in corso				
7	Individuazione e riduzione di acque parassite nella fognatura	E/10.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				11.470.939,69	6.713.939,69	4.541.257,95					

COMUNE DI CAVARZERE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche											
1	Fognatura comunale di Cavarzere	1/4.5	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 62 DEL 8/9/1995	568.102,59	568.102,59	566.906,86	Lavori collaudati	Date non comunicate dall'ente			Registrata, con DDDA n. 19 del 26/02/2001, un'economia di € 1.195,73 reiscritta sui fondi impegnati con DGR n. 186/CR/1993
2	Ampliamento dell'impianto di depurazione - III lotto	1/4.5bis	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DPGR 2293 9/11/1995	723.039,66	723.039,66	723.039,66	Lavori collaudati	Date non comunicate dall'ente			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 93 del 23/09/2002
	Legge 515/96 Es. 1997											
3	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Cavarzere	B/15/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 64 12/11/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Lavori collaudati	Date non comunicate dall'ente			Registrata, con DDDA n. 204 del 22/10/2004, un'economia di € 4.303,48. Richiesta la restituzione alla R.V. di € 12.354,14
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
4	Interventi fognari a Villaggio Busonera, S. Giuseppe e Zona Industriale	B/16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 81 9/10/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.532.180,55	Lavori collaudati	Date non comunicate dall'ente			Registrata, con DDDA n. 228 del 03/12/2004, un'economia di € 17.190,15
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
5	Realizzazione di interventi fognari nelle località Rottanova, Cà Venier e Villaggio Busonera.	B1/61	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 126 4/10/2001	2.065.827,60	2.065.827,60	1.859.244,84	Lavori ultimati				DDDA 200 del 20/10/04 nuovi termini fine lavori : 04/10/2005
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
6	Estensione della rete fognaria e depurazione nel territorio comunale	1/L/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 97 26/05/2004	1.032.913,80	1.032.380,62	699.353,35	Lavori in corso				
	TOTALI				7.488.625,04	7.488.091,86	6.775.158,89					

COMUNE DI CODEVIGO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 67/88 Es. 1990											
1	Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (PD)	1/2.13	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 2261 29/10/1992	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	Date non comunicate dall'ente			Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 381 del 02/10/1997
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
2	Interventi di ripristino dei caratteri lagunari in alcune aree della gronda attraverso rinaturalizzazione di aree prossime alla conterminazione lagunare, finalizzate al ripristino delle funzioni ecologiche proprie delle zone umide	B/6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progetto preliminare				Stipulato un accordo di programma tra il comune di Codevigo e il MAV per la realizzazione dell'intervento
	TOTALI				3.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70					

COMUNE DI CORNUDA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
1	Adeguamento ai limiti di legge del depuratore comunale di Cornuda, località La Valle	E/12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 42 09/03/2005	943.675,00	943.675,00		Progetto approvato				
	TOTALI				943.675,00	943.675,00	0,00					

COMUNE DI ESTE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1997											
1	Ampliamento della rete fognaria nella zona del canale Bisatto - XI stralcio "Meggiaro"	A/6/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 30 DEL 5/8/1998	1.291.142,25	1.291.142,25	1.162.028,02	Collaudo in corso Lavori ultimati	02/02/2000 09/06/2003	15/05/2001 -		
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
2	Lavori di rifacimento delle fognature e pavimentazione nelle vie Sabina, Largo Tiepolo - XIV° stralcio fognature.	B1/64.B	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 67 DEL 4/6/2001	516.456,90	516.456,90	51.072,26	Lavori in corso				DDDA 59 del 6/04/05 nuovi termini fine lavori : 04/06/2006.
3	Ampliamento ed adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione di Este - III° lotto, 1° stralcio	B1/64.A	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 53 DEL 9/5/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	294.638,65	Lavori in corso				
	TOTALI				3.356.969,84	3.356.969,84	1.507.738,93					

COMUNE DI FOSSO'

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
1	Bonifica sito inquinato via Favalli, in comune di Fossò (VE)	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	634.684,42	634.684,42	285.096,00	Lavori in corso				
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
2	Bonifica area ex discarica per RSU, in via Favalli	4/A/1.6C	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DGR 2833 10/09/2004	280.000,00	280.000,00	0,00	Progetto approvato				
	TOTALI				914.684,42	914.684,42	285.096,00					

COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 539/95 Es. 1997											
1	Collegamento della fognatura comunale all'impianto di depurazione di Battaglia Terme	C/30/1	DGR N. 553 DEL 25/02/1997	DDDA N. 62 11/06/1997	346.026,12	346.026,12	274.003,05	Lavori collaudati	14/05/1998	29/06/2002	19/09/2003	Registrata, con DDDA n. 119 del 23/06/2004, un'economia di € 72.023,06
	Legge 515/96 Es. 1997											
2	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Galzignano	A/7/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 185 24/4/1998	619.748,28	619.748,28	619.711,96	Lavori collaudati	11/01/1999	09/03/2001	31/02/2002	Registrata, con DDDA n. 61 del 31/05/2002, un'economia pari a € 36,32
	TOTALI				965.774,40	965.774,40	893.715,01					

COMUNE DI JESOLO / A.S.I.

FINANZIAMENTI DIRETTI AL COMUNE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (VE)	1/1.4			1.291.142,25	1.291.142,25	1.282.148,91	Lavori collaudati			16/01/1997	Registrata, con DDLP n. 312 del 02/12/1998, un'economia pari a € 8.993,34 da resicrivere sul capitolo 50511 del bilancio regionale esercizio 1986
	Legge 910/86 Es. 1987-1988											
2	Rilievi ed ispezioni televisive della rete fognaria del Comune di Jesolo (VE). 2° Stralcio	1/1.4.1	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DGR N. 158 27/9/1996	46.551,70	46.551,70	46.551,70	Lavori collaudati	03/07/1996	03/11/1996	29/01/1997	Registrata, con DDDA n. 29 del 15/05/2000, un'economia di € 54.485,00 reimpiegata nell'intervento 12
3	Progetto esecutivo delle opere fognarie di collegamento della zona P.I.P. all'impianto di depurazione (VE)	1/1.4.2	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 162 2/10/1996	95.639,10	95.639,10	95.639,10	Lavori collaudati	07/01/1997	16/04/1997	24/07/1997	Registrata, con DDDAn. 98 del 21/10/1999, un'economia di € 64.462,54 reimpiegata nell'intervento 11
4	Interventi alle reti -parte 1^/ parte 2^.	1/1.4.3a	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 71 23/6/1997	242.406,28	242.406,28	242.406,28	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 26/10/1999
5	Opere di completamento fognario	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	59.686,88	59.686,88	11.312,06	Lavori in corso				Dati non forniti dall'ente
	Legge 67/88 Es. 1990											
6	Ampliamento della rete fognaria di via Bafile in Comune di Jesolo (VE)	1/2.10a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 14 16/4/1993	2.614.145,78	2.614.145,78	2.614.145,78	Lavori collaudati	04/09/1995	01/05/1997	24/06/1998	L'erogazione comprende l'importo di € 226.367,16 (economia) reimpiegata nell'intervento 14, con DDDA n. 34 del 21/06/2000
7	Interventi alle reti -parte 1^ / parte 2^.	1/1.4.3b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 71 23/6/1997	126.343,95	126.343,95	126.343,95	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 26/10/1999
8	Progetto degli interventi presso l'impianto di depurazione comunale.	1/2.10b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 13 12/5/1997	1.142.673,28	1.142.673,28	1.062.639,11	Lavori collaudati	17/09/1997	13/11/1999	07/03/2002	Registrata, con DDDA n. 6 del 05/02/2003, un'economia di € 80.034,17
9	Somme per ulteriori interventi per copertura supero di spesa progetto "ampliamento rete fognaria Via Bafile" (1/2.10a)		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		9.119,02	6.536,02	6.536,02					Dati non forniti dall'ente
10	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 35 DEL 5/5/1999	6.527,10	6.527,10	6.527,10	Finanziamento riallocato nell'intervento 13A				
	TOTALI				5.634.235,34	5.631.652,35	5.494.250,01					

FINANZIAMENTI DIRETTI ALL'A.S.I.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 910/86 Es. 1987-1988											
11	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale di Jesolo (€ 64.462,00)	1/1.4.4a	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 27 12/3/2001	64.462,54	64.462,54	63.847,29	Finanziamento convogliato nell'intervento 13A				Finanziamento costituito dall'economia di € 64.462,54 dell'intervento 3 del comune di Jesolo
12	Progetto definitivo rete fognatura in via Rusti - Comune di Jesolo (€ 54.485,00)	1/1.4.1 bis	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 25 25/3/2002	54.485,86	54.485,86	54.485,86	Finanziamento convogliato nell'intervento 14A				Finanziamento costituito dall'economia di € 54.485,86 dell'intervento 2 del comune di Jesolo
	Legge 67/88 Es. 1990											
13	Progetto esecutivo per il trattamento dei percolati di discarica presso l'impianto di depurazione comunale di Jesolo	1/1.4.4b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 27 12/3/2001	6.478,90	6.478,90	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 13A				
13A	Trattamento dei percolati da discarica (€ 77.468,53)		Riuniti i finanziamenti 10 (€ 6.527,10) + 13 (€ 6.478,90) + 11 (€ 64.462,54) = € 77.468,53					Lavori ultimati. Collaudo in corso	03/09/2001	30/04/2002	-	
14	Progetto definitivo rete fognatura in via Rusti - Comune di Jesolo	1/2.10a bis	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 25 25/3/2002	226.367,16	226.367,16	226.367,16	Finanziamento convogliato nell'intervento 14A				
14A	Costruzione della rete fognaria in via Rusti - Comune di Jesolo (€ 280.853,02)		Riuniti i finanziamenti 12 (€ 54.485,86) + 14 (€ 226.367,16) = € 280.853,02					Lavori ultimati. Collaudo in corso	22/04/2002	08/10/2003	-	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 99 del 08/06/2005
	TOTALI				351.794,46	351.794,46	344.700,31					
	Totale Comune di Jesolo/A.S.I.				5.986.029,80	5.983.446,81	5.838.950,32					

COMUNE DI MARCON

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VIII lotto		DGR N. 950 DEL 31/10/1987	DDLP N. 951 31/10/1987	42.794,90	42.794,90	42.794,90	Lavori collaudati	22/03/1988	30/10/1990		Determinazione del contributo definitivo con Decreto dei LL.PP n. 7 del 28/03/2000
2	Recupero della rete di fognatura nera in loc. Gaggio	1/4.7.2	DGR N. 48 DEL 25/06/1999	DDDA N. 48 25/6/1999	267.079,24	267.079,24	266.770,30	Lavori collaudati	25/06/2001	17/06/2002	14/01/2003	Registrata, con DDDA n. 103 del 23/06/2005, un'economia di € 308,94
	Legge 539/95 Es. 1997											
3	Riabilitazione fognaria del Comune di Marcon	C/29/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 186 24/4/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.488.601,72	Lavori collaudati	25/06/2001			Registrata, con DDDA n. 167 del 3/10/2005, un'economia di € 60.768,99
	TOTALI				1.859.244,84	1.859.244,84	1.798.166,92					

COMUNE DI MEOLO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 67/88 Es. 1991											
1	Adeguamento impianto di depurazione e rete fognaria in comune di Meolo.	3b	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 7 20/1/1995	516.456,90	516.456,90	464.811,21	Finanziamento diviso negli interventi 1A, 1B e 1C				
1A	Adeguamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura di via Cà Tron, via Verdi e via Toscanini (progetto complessivo € 428.963,36)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 1					Lavori collaudati	12/06/1998	10/06/1999	25/09/2000	Documentazione relativa al collaudo, sollecitata più volte, non ancora inviata da parte dell'ente
1B	Ampliamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura (progetto complessivo € 74.913,49)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 1					Lavori collaudati	09/11/1995	15/10/1998	coll. provvis. 15-10-1998	Documentazione relativa al collaudo, sollecitata più volte, non ancora inviata da parte dell'ente
1C	Ampliamento per adeguamento impianto di depurazione e della rete di fognatura (progetto complessivo € 74.554,87)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 1					Lavori collaudati	09/11/1995	15/10/1998	coll. provvis. 15-10-1998	Documentazione relativa al collaudo, sollecitata più volte, non ancora inviata da parte dell'ente
	Legge 515/96 Es. 1997											
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Meolo (progetto complessivo € 538.335,67)	B/19/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 11 DEL 5/5/1998	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori collaudati	12/06/1998	10/06/1999	25/09/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 166 del 13/11/2003
	TOTALI				1.032.913,80	1.032.913,80	981.268,11					

COMUNE DI MIRA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
1	Bonifica area inquinata localizzata in via Teramo, loc. Olmo di Borbiago in comune di Mira (VE)	B/17 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N.148 13/12/2002	1.136.205,18	113.620,50	113.620,50	Progettazione in corso				
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
2	Parco lagunare di Mira	D/82	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		2.582.284,50			Progettazione in corso				Intervento congiunto con il Consorzio Sinistra Medio Brenta e la Regione Veneto
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
3	Intervento di messa in sicurezza di emergenza della discarica della Soc. Veneta Mineraria in loc. Bastiette	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				
4	Intervento di messa in sicurezza dell'area Baldan.	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		250.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				4.168.489,67	113.620,50	113.620,50					

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)			DGR 994 DEL 09/10/1986	413.165,52	413.165,52	378.748,50	Lavori collaudati			14/11/1995	Registrata, con DDLP n. 407 del 14/11/1995, un'economia pari a € 34.417,02 impegnata sul capitolo 50511 del bilancio regionale esercizio 1986
2	Fognatura frazioni di Bonisiolo e Zerman in comune di Mogliano Veneto (TV)			DGR 875 DEL 12/09/1986	258.228,45	258.228,45	231.666,14	Lavori collaudati	13/07/1987	18/031988		Registrata, con DDLP n. 684 del 06/11/1991, un'economia pari a € 26.562,30
	Legge 139/92 Es. 1993											
3	Opere di completamento della fognatura comunale e monitoraggio/telerilevamento impianti di sollevamento	5/G/1	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 68 24/11/1994	3.098.741,39	3.098.741,39	2.755.972,37	Lavori ultimati				Dati e documentazione non ancora inviata da parte dell'ente
	Legge 515/96 Es. 1997											
4	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Mogliano Veneto	A/11/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DDDA N. 84 09/12/1998	2.582.284,50	2.582.284,50	2.504.915,29	Lavori ultimati				Registrata, con DDDA n. 113 del 11/07/2005, un'economia pari a € 77.369,21
	TOTALI				6.352.419,86	6.352.419,86	5.871.302,30					

COMUNE DI MONASTIER

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1997											
1	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione comunale in Comune di Monastier	B/12/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 29 DEL 5/8/1998	1.401.642,79	1.401.642,79	1.401.642,79	Lavori collaudati	01/07/1999	26/10/2001	22/07/2002	Importo originale del progetto pari a € 1.549.370,70. Registrata, con DDDA n. 36 del 14/04/2003, un'economia di € 147.727,91, reinvestita per finanziare l'int. 2
2	Ampliamento della rete fognaria in via Pralongo nel comune di Monastier - opere di completamento	B/12/1.1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 182 05/10/2004	147.727,91	147.727,91	0,00	Progetto approvato				Utilizzo economie di spesa maturate dal decreto contabilità finale n. 36 del 14/04/2003
	TOTALI				1.549.370,70	1.549.370,70	1.401.642,79					

COMUNE DI MONSELICE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 139/92 Es. 1993											
1	Fognatura di Monselice	6/A/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DPGR N. 103 24/1/1995	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Lavori collaudati	20/11/1995	03/12/1998	31/10/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 41 del 28/04/2002

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1997											
2	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Monselice	A/8/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 116 13/12/1999	2.582.284,50	2.582.284,50	2.575.114,19	Lavori collaudati	18/01/2000	26/09/2002		Registrata, con DDDA n. 19 del 08/02/2005, un'economia di € 7.170,31
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
3	Impianto di depurazione	B1/65	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 90 06/06/2003	774.685,35	774.685,35	0,00	Progetto approvato				
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
4	Interventi di completamento ed adeguamento della rete fognaria della frazione Marendole e di via Mandic.	1/U/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 26 26/3/2003	284.051,29	284.051,29	0,00	Progetto approvato				
5	Bonifica area ex inceneritore	4/A/1.4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 197 14/10/2004	1.807.599,00	1.807.599,00	157.193,09	Lavori in corso				
6	Bonifica area ex inceneritore per RSU in località Schiavonesca	4/A/1.6A	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR 2833 10/09/2004	718.367,98	718.367,98	0,00	Progetto approvato				
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
7	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Via del Borgo	6/H/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		5.400.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				14.149.272,61	8.749.272,61	5.314.591,78					

COMUNE DI MORGANO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
1	Ampliamento della fognatura comunale di via Ongarie, via Zeriolo, via Statue, via Aldo Moro in Comune di Morgano (Tv)	B/14 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 62 DEL 1/9/2000	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	14/01/2003	22/07/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 146 del 13/09/2005
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
2	Lavori di ampliamento delle fognature comunali nelle vie S. Martino, Chiesa, Trentin, Papa Luciani in comune di Morgano (TV).	B1/66	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 13 22/2/2002	516.456,90	516.456,90	417.034,59	Lavori in corso				
3	Bonifica ex discarica R.S.U. in loc. via Bosco	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	516.456,90	516.456,90	56.657,69	Lavori in corso				
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
4	Interventi di fognatura e depurazione nel territorio comunale	1/H/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 53 16/03/2004	826.331,04	826.331,04	436.019,81	Lavori in corso				
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
5	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Morgano	6/G/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 222 22/11/2004	400.000,00	400.000,00	30.483,21	Lavori in corso				
	TOTALI				3.550.387,08	3.550.387,09	2.231.337,55					

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 910/86 Es. 1987-1988											
1	Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/1.21	DCR N. 744 DEL 1/7/1988	DPGR N. 2817 28/12/1990	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
2	Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie	1/3.1bis ECO	DCR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA 214 17/11/2004	26.788,59	26.788,59	0,00	Progetto approvato				
	Legge 67/88 Es. 1990											
3	Rete fognaria comune di Musile di Piave	1/2.11a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 111 15/10/1992	1.530.258,76	1.530.258,76	1.530.258,76	Lavori collaudati	11/02/1999	20/06/2002	18/11/2002	Importo originale del finanziamento € 1.549.370,70. Registrata, con DDDA n. 22 del 26/03/2003, un'economia di € 19.111,94 (reinvestita nell' int. 4)
4	Lavori di realizzazione della fognatura comunale di via Rovigo in comune di Musile di Piave - Riutilizzo economie	1/2.11a ECO	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA 214 17/11/2004	19.111,94	19.111,94	0,00	Progetto approvato				
5	Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/2.11b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 32 26/3/1997	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
	Legge 515/96 Es. 1997											
6	Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	B/20/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 93 30/7/2001	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
6A	Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE) (€ 1.239.496,56)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 516.456,90) + 3 (€ 516.456,90) + 4 (€ 206.582,76) = € 1.239.496,56					Lavori collaudati	18/02/2000	20/06/2001	28/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 9/05/2002
	TOTALI				2.815.655,85	2.815.655,85	2.769.755,32					

COMUNE DI NOALE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1997											
1	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio.	B/21/1	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 18 26/2/2001	1.291.142,25	1.291.142,25	767.891,05	Finanziamento convogliato nell'intervento 2B per l'importo di € 1.291.142,25				
	Legge 139/92 II fase											
2	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (Finanziato inizialmente al Consorzio DESE-SILE)	5/B/3.3	DGR N. 6400 12/12/1995	DDDA N. 18 26/12/2001	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Finanziamento convogliato nell'intervento 2B per l'importo di € 774.685,35				DDDA 42/03 nuovi termini fine lavori: 26/02/2006.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
2B	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (€ 2.065.827,60)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.291.142,25) + 2 (€ 774.685,35) = € 2.065.827,60					Lavori in corso	01/07/2002 03/09/2003			Lavori in corso mediante due appalti
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
3	Bonifica ex discarica per RSU	4/A/1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 167 DEL 2003	1.342.788,00	134.278,80	70.965,84	Lavori in corso				
	TOTALI				3.408.615,60	2.200.106,40	1.613.542,24					

COMUNE DI PADOVA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1997											
1	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nordio in Comune di Padova	A/9/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DGCA N. 213 03/05/1999	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	Lavori collaudati	20/05/2002			Importo compless. dell'opera € 6.971.742,72 (fondi della Legge Speciale per Venezia per € 2.065.827,60) DGCA 355/05 determinazione contributo definitivo
	TOTALI				2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60					

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 139/92 Es. 1993											
1	Sistemazioni idraulico-ambientali di Piove di Sacco ("Valio di circonvallazione")	5/C/1	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 80 24/11/1995	1.609.967,86	1.609.967,86	1.609.967,86	Lavori collaudati	14/04/1997	05/11/1998	06/06/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 19 del 26/3/2003
2	Ampliamento fognature di Piove di Sacco	5/C/2	DGR N. 4977 DEL 02/11/1993	DDDA N. 23 03/04/1995	2.005.230,43	2.005.230,43	2.005.230,43	Lavori collaudati	06/09/1995	28/08/1998	07/04/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 20 del 26/3/2003
	TOTALI				3.615.198,29	3.615.198,29	3.615.198,29					

COMUNE DI PREGANZIOL

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
1	Costruzione della fognatura a servizio della frazione di Sambughè	B/15.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 46 27/7/2000	774.685,35	774.685,35	761.531,09	Lavori collaudati	19/07/2001	26/10/2002	04/02/2003	Registrata, con DDDA n. 53 del 29/03/2005, un'economia pari a € 13.154,26
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
2	Estensione della rete fognaria nelle frazioni di Sambughè e Boschetta	1/I/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 30 27/3/2003	1.032.913,80	1.032.913,80	825.900,00	Lavori in corso	26/11/2003			
	TOTALI				1.807.599,15	1.807.599,15	1.587.431,09					

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 910/86 Es. 1987-1988											
1	Costruzione della rete fognaria di Quarto d'Altino (VE)	1/3.2	DGR N. 259 25/1/1994	DDDA N. 26 11/4/1991	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori collaudati	20/04/1995	20/01/1997	20/11/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 102 del 20/11/2000
	Legge 67/88 Es. 1990											
2	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino (VE)	1/2.12	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 1047 28/4/1993	2.582.284,50	2.582.284,50	2.259.776,30	Lavori collaudati	25/10/1996	20/07/1998	20/09/1998	Registrata, con DDDA n. 93 del 19/05/2004, un'economia di € 322.508,20
	Legge 139/92 Es. 1993											
3	Interventi alle fognature di Quarto d'Altino (II stralcio)	5/A/1	DGR N. 4977 2/11/1993	DDETA N. 6 20/1/1995	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	Lavori collaudati	18/12/1996	05/08/1999	21/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 103 del 20/11/2000
	TOTALI				5.422.797,44	5.422.797,44	5.100.289,25					

COMUNE DI SALZANO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
1	Bonifica ex discarica per RSU e Rifiuti speciali	4/A/1.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 185 07/10/2004	2.400.000,00	2.400.000,00	160.056,69	Lavori in corso				
	TOTALI				2.400.000,00	2.400.000,00	160.056,69					

COMUNE DI SPINEA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
1	Interventi di bonifica e messa in sicurezza di emergenza ex discarica per rifiuti inerti in via Luneo - comune di Spinea (V E)	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				500.000,00	0,00	0,00					

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
1	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali	4/A/1.6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 54 26/05/2003	750.000,00	75.000,00	75.000,00	Progetto approvato				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazone (importo pari a € 75.000,00).
2	Bonifica tratto di canale contaminato da scarichi industriali (in particolare da Cr6)	4/A/1.8	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR N. 2833 10/09/2004	500.000,00	500.000,00	0,00	Progetto approvato				
	TOTALI				1.250.000,00	575.000,00	75.000,00					

COMUNE DI VENEZIA / VE.S.T.A.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Realizzazione del 1° stralcio funzionale della rete fognaria dell'isola della Giudecca.	1/3.6		DDEA N. 54 17/10/1991	85.417,05	85.417,05	85.417,05					L'intervento consiste nella redazione dello studio e del progetto
2	Ampliamento e completamento impianto di depurazione di Campalto (Ve) - Telecontrollo							Fondi riallocati nell'int. 2A				
2A	Vasca di prima pioggia e laminazione in località Gazzera Mestre VE	1/5.1	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 51 25/6/1999	71.759,17	71.759,17	71.759,17	Lavori ultimati				Finanziamento originale pari a € 516.456,90, di cui € 444.697,73 revocati e devoluti alla Diocesi Patriarcato di Venezia

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o Impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
3	Costruzione della fognatura di TREPORTI		DGR N. 1175 DEL 26/03/1985	DDLP N. 1190 23/12/1987	1.394.433,63	1.394.433,63	1.379.989,31	Lavori collaudati	14/11/1988	26/02/1991	16/09/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 55 del 09/02/1996, per € 1.379.989,31. Con DDLP n. 83 del 14/04/1999 si finanzia l'aumento della revisione dei prezzi per € 37.357,55
4	Costruzione rete fognaria del Lido (VE) - V lotto			DDLP N. 1006 26/10/1987	1.595.851,82	1.595.851,82	1.587.990,21	Lavori collaudati	23/11/1987	24/02/1989	06/12/1993	Registrata, con DDLP n. 167 del 11/07/1994, un'economia pari a € 7.861,61.
5	Completamento scolmatore bacino S. Giuliano (VE)			DDLP N. 1003 26/10/1987	1.032.913,80	1.032.913,80	1.029.127,96	Lavori collaudati	23/11/1987	16/11/1988	13/12/1991	Registrata, con DDLP n. 208 del 23/08/1994, un'economia pari a € 3.785,84
6	Costruzione della fognatura del Terraglio (VE)		DGR N. 2992 DEL 26/05/1987	DDLP N. 1002 26/10/1987	619.748,28	619.748,28	605.927,75	Lavori collaudati	30/11/1987	24/09/1988	26/01/1996	Registrata, con DDLP n. 285 del 23/07/1997, un'economia pari a € 13.820,53
7	Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (VE) - II lotto		DGR N. 5591 DEL 29/09/1987	DDLP N. 1001 26/10/1987	2.117.473,29	2.117.473,29	1.491.506,77	Lavori collaudati	18/01/1988	31/05/1989	08/04/1991	Registrata, con DDLP n. 118 del 11/05/1994, un'economia pari a € 625.966,51, destinata in parte all'intervento 22A
8	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - III lotto		DGR N. 5590 DEL 29/09/1987	DDLP N. 1000 26/10/1987	593.925,43	593.925,43	593.925,43	Lavori collaudati	13/01/1988	06/01/1989	04/05/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 32 del 23/02/1999. Con DDLP n. 75 del 31/03/1999 si concede un ulteriore finanziamento per € 6.201,73
9	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - I lotto		DGR N. 999 DEL 26/10/1987	DGR N. 999 26/10/1987	2.117.473,29	2.117.473,29	2.077.719,51	Lavori collaudati	12/01/1988	25/05/1989	16/03/1992	Registrata, con DDLP n. 322 del 10/11/1994, un'economia pari a € 39.753,78
10	Completamento delle fognature di Via Torino - Mestre VE		DGR N. 2994 DEL 26/05/1987	DDLP N. 1005 26/10/1987	852.153,88	852.153,88	823.357,07	Lavori collaudati	11/01/1988	15/12/1988	08/05/1997	Registrata, con DDLP n. 301 del 06/08/1997, un'economia pari a € 28.796,81
11	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld	1/4.2 bis	DAST N. 124 DEL 11/10/1990	DDDA N. 26 19/3/1999	676.558,54	675.525,62	675.525,62	Finanziamento convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
12	Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mestre - Marghera (vasca di arrivo del collettore)			DDLP N. 949 21/10/1987	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori collaudati	12/10/1987	08/04/1988	22/10/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 95 del 11/05/1998. Con DDLP 255 del 15/10/1998 finanziato aumento revisione prezzi per € 10.940,58
13	Interventi di risanamento igienico ed edilizio di Pellestrina e S. Pietro in Volta	1/3.6.A		DDEA N. 54 17/10/1991	4.820.923,49	0,00	0,00	Progetto in fase di redazione				Interventi gestiti dalla società INSULA
	Legge 910/86 Es. 1987-1988											
14 V.	Lavori di costruzione del collettore di via Paleocapa e via Canal - Marghera (VE)	1/1.5	DGR N. 259 DEL 25/01/1994	DDDA N. 9 12/9/1990	1.032.913,80	1.032.913,80	919.192,17	Lavori collaudati	20/10/1197	22/06/1999	12/04/2000	La Regione ha utilizzato parte del finanziamento per € 15.493,70, destinando il rimanente pari a € 1.017.420,09 al Comune di Venezia. In attesa di ricevere la richiesta di saldo da parte del Comune di Venezia

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
15	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VII lotto	1/1.9		DDDA N. 14 11/10/1990	133.601,63	133.601,63	133.601,63	Progetto approvato				Modifica del progetto approvato utilizzando il finanziamento regionale oltre a fondi propri del Comune: in attesa della documentazione da parte del Comune
16	Costruzione della rete secondaria di fognatura di Pellestrina		DGR N. 4976 DEL 2/11/1993		2.582.284,50			Progettazione in corso				Impegno pari a € 2.582.284,50 disimpegnato con decreto Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
17	Costruzione della rete di fognatura di S. Marta (VE)	1/3.7	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 7 23/2/1993	2.065.827,60	2.065.827,60	2.028.110,08	Lavori collaudati	29/09/1997	09/03/2001	22/02/2002	Dati attesi da parte del Comune di Venezia per decreto di contabilità finale
18	Interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e nere a completamento della fognatura consortile Mestre - Marghera (VE)				3.615.198,29	3.615.198,29	2.975.311,14	Lavori ultimati				Dati attesi da parte del Comune di Venezia
19	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld Legge 910/86 Es. 1989	1/4.2 bis	DAST N. 124 DEL 11/10/1990	DDDA N. 26 19/3/1999	877.976,73	877.976,73	877.976,73	Finanziamento convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
20 V.	Costruzione vasca di modulazione di Favaro Veneto (VE)	1/3.8	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 37 26/5/1994	1.807.599,15	1.807.599,15	1.597.613,90	Collaudo in corso	02/12/2002			Inizio dei lavori ritardato dal fallimento dell'impresa. Le opere sono finanziate, oltre che dal presente finanziamento, anche da € 568.102,59 (int. 84) e da € 413.165,52 (int. 64)
21 V.	Costruzione della vasca di pioggia del nodo idraulico di Ca' Emiliani - Loc. Rana (VE)	1/3.3	DGR N. 745 DEL 1/7/1988	DDEA N. 59 11/12/1991	3.795.958,21	3.795.958,21	586.178,58	Lavori da appaltare				L'appalto sarà unificato all'int. n. 38. Dell'importo finanziato, una quota parte pari a € 206.582,76 è destinata al Consorzio Sinistra Medio Brenta.
22 V.	Costruzione fognatura di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)	1/3.9	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DDDA N. 55 12/10/1994	1.936.713,37	1.936.713,37	2.202.677,43	Finanziamento convogliato nell'intervento 22A				Le erogazioni si riferiscono al finanziamento complessivo dell'int. 22A
22A V.	Costruzione fognatura di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)		Riuniti i finanziamenti 7 (€ 593.925,43) + 22 (€ 1.936.713,37) = € 2.530.638,80					Lavori collaudati	06/05/1997	08/07/1999	26/11/2001	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
23 V.	Impianto di depuratore del Cavallino - adeguamento della fase biologica alla rimozione dell'azoto	1/3.6.E		DDEA N. 63 11/6/1997	619.748,28	619.748,28	557.506,82	Lavori collaudati	14/07/1997	22/10/1997	04/05/1998	Registrata, con DDDA n. 17 del 02/03/1999, un' economia di € 62.241,46 destinata all'int. 24
24 V.	Fognatura e depurazione del Lido e del Cavallino	1/3.6.E1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 32 26/4/1999	1.962.536,22	1.645.948,14	1.282.315,78	Lavori ultimati	01/05/2000			Quota parte del finanziamento, pari a € 378.046,45, convogliati nell'int. 28. Utilizzate le economie dell'int. 23 pari a € 62.241,46

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
25	Fognatura S.Erasmo							Fondi riallocati				Intervento affidato al MAV
	Legge 67/88 Es. 1988											
26 V.	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (VE) - trattamento delle acque.	Finanziamento suddiviso negli interventi 26A e 26B										
26A V.	Opere presso depuratore Fusina (ex fondi "ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (VE) - trattamento delle acque.")	1/2.1	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990		6.482.229,51	0,00	0,00	Fondi riallocati				In attesa di chiarimenti sulla destinazione dei fondi da parte del Comune di Venezia
26B V.	Ampliamento impianto di depurazione di Fusina - IV linea . Trattamento delle acque.	1/2.1a	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990		231.710,18	231.710,18	231.710,18	Progettazione conclusa				Finanziamento limitato alle sole spese di progettazione
27 V.	Completamento dell'impianto di trattamento di Campalto - Opere accessorie	1/2.2	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990	DPGR N. 207 26/1/1994	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	14/01/1997	20/06/2000	03/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 203 del 22/10/2004
	Legge 67/88 Es. 1990											
28 V.	Ampliamento della fognatura del Cavallino (VE) - II stralcio	1/2.7	DGR N. 259 DEL 25/1/1994		3.098.741,39	3.098.741,39	2.881.295,30	Lavori collaudati	23/05/1996	10/04/1998	28/01/2002	L'importo dei lavori sale con perizia suppletiva di € 542.279,74, finanziato con parte dell'int. 24, pari a € 378.046,45 e con parte dell'int. 68 pari a € 163.727,74. In attesa di ricevere la richiesta di saldo
29	Ampliamento delle fognature di Pellestrina (VE)	1/2.8	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		1.549.370,70			Progettazione in corso				Impegno pari a € 1.549.370,70 disimpegnato con decreti Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
30	Ampliamento delle fognature del Lido di Venezia - VIII lotto	1/2.6	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	N. 23 DEL 15/4/1994	3.098.741,39	3.098.741,39	2.883.521,33	Lavori collaudati	11/11/1996	26/05/1999	31/03/2003	In attesa dell'invio della documentazione da parte del Comune di Venezia per decreto di contabilità finale (importo € 2.883.521,17)
31 V.	Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo - Bissuola (VE)	1/2.4b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 2436 3/10/1994	6.455.711,24	6.455.711,24	722.403,66	Lavori in corso				L'erogazione è comprensiva delle spese di progettazione e dell'anticipo del 10%
32 V.	Costruzione della vasca di accumulo acque meteoriche di piazzale Giovannacci - Marghera (VE)	1/2.3a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDEA N. 24 DEL 7/4/1995	4.131.655,19	4.131.655,19	3.718.489,67	Collaudo in corso				Collaudate le opere civili. In appalto le opere elettromeccaniche
33 V.	Razionalizzazione della rete fognaria di Marghera (VE) - via Asseggiano a Chirignago	1/2.3b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR 1182 9/6/1994	3.615.198,29	3.615.198,29	3.167.908,06	Lavori collaudati	24/02/1997	14/12/1998	18/10/1999	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
34 V.	Ampliamento IV linea depuratore Fusina.							Fondi riallocati				
34B V.	Opere presso depuratore Fusina (ex fondi "ampliamento IV linea depuratore Fusina").	1/2.5.B	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		936.407,25	936.407,25	0,00	Progetto approvato				Finanziamento proveniente da fondi riallocati

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 67/88 Es. 1991											
35 V.	Estensione della rete fognaria di tipo separato nella zona di Trivignano - Zelarino - II lotto	1b	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 12 12/2/1996	3.925.072,43	3.925.072,43	3.532.573,45	Lavori in via di ultimazione	12/12/1997			Mancano lavori di completamento. Integrazione di € 516.456,89 proveniente dall'int. 85. Ritardi dovuti al fallimento dell'impresa
36	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld	1/4.2 bis	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 26 19/3/1999	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Finanziamento convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
36A	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld	1/4.2 bis	Riuniti i finanziamenti 11(€ 676.558,54) + 19 (€ 877.976,73) + 36 (€ 258.228,45) + 58 (€ 1.545.239,04) = € 3.358.002,76					Lavori ultimati				
	Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche											
37 V.	Progetto di rifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana	1/4.2	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	N. 157 DEL 16/9/1996	2.840.512,95	2.840.512,95	2.666.908,82	Lavori collaudati	27/05/1997	08/05/1999	14/10/2002	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
38 V.	Impianto di sollevamento in località "Rana" e condotta di scarico.	1/4.2 bis	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994		2.324.056,05			Progettazione in corso				Impegno pari a € 2.324.056,05 disimpegnato con decreti Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
	Legge 360/91											
39	Bonifica della discarica di rifiuti Ca' Emiliani (Marghera)		DGR N. 5211 DEL 18/11/1993					Fondi riallocati nell'intervento 39A				
39A	Bonifica in viale S. Marco in comune di Venezia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		1.032.913,80	0,00	0,00	Progettazione in corso				In attesa dell'invio della documentazione da parte del Comune di Venezia
40	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bonifica discarica di S. Giuliano (VE) - I lotto "B1"	1/2.5	DGR N. 6243 DEL 30/10/1991		1.032.913,80			Progettazione in corso				Impegno pari a € 1.032.913,80 disimpegnato con decreti Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
	Legge 139/92 Es. 1993											
41	Fognature di Pellestrina (VE)	5/B/1.1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993		520.588,55	0,00	0,00	Progettazione in corso				Interventi gestiti dalla società INSULA
42 V.	Ristrutturazione dei collettori principali di fognatura di via Torino a Mestre	1/C/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 17 12/2/1996	4.751.403,47	4.751.403,47	4.283.343,57	Lavori collaudati	14/01/1997	06/08/1999	22/01/2001	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
43 V.	Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano	1/C/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 20 12/2/1996	2.995.450,01	2.995.450,01	1.333.826,50	Lavori in corso	31/01/1997			Sospensione lavori per mancata tenuta dei diaframmi. Impresa fallita. Nuovo progetto che comporta un incremento di spesa di € 1.549.371,00 finanziato con parte dei fondi dell'int. 84.
44 V.	Completamento della rete di fognatura separata della zona del Terraglio - bacino di Carpenedo - Mestre	1/C/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 16 12/2/1996	2.943.804,32	2.943.804,32	2.649.423,89	Lavori collaudati	15/05/1997	03/11/1999	07/01/2002	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
45 V.	Estensione della rete di fognatura separata nella zona di Marghera tra SS. Romea e autostrada VE-PD	1/C/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 13 12/2/1996	1.859.244,84	1.859.244,84	1.660.333,60	Lavori collaudati	10/03/1997	14/09/1999	04/11/2002	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
46 V.	Ristrutturazione della rete fognatura attigua al rio Cimetto - bacino Gazzera - Mestre	1/C/5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 14 12/2/1996	2.014.181,91	2.014.181,91	1.730.927,27	Lavori collaudati	07/01/1998	19/11/1999	05/02/2001	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
47 V.	Ristrutturazione della fognatura nella zona di Cipressina - Zelarino	1/C/6	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 22 12/2/1996	2.737.221,57	2.737.221,57	2.649.067,15	Lavori collaudati	23/03/1998	24/03/2000	09/02/2001	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
48 V.	Ricostruzione della fognatura di via S. Donà - Bacino di Carpenedo	1/C/7	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 19 12/2/1996	3.718.489,67	3.718.489,67	3.419.977,74	Lavori collaudati	16/11/1998	29/09/1999	18/10/2000	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
49 V.	Ricostruzione della fognatura della zona di via Silvio Trentin - Mestre	1/C/8	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 18 12/2/1996	3.356.969,84	3.356.969,84	1.526.061,65	Lavori in corso	10/07/1997			Risolto il contratto in danno all'impresa con lavori al 45%. Completamento appaltato ad altra ditta in data 05/05/2003
50 V.	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Veneto	1/C/9	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 15 12/2/1996	2.169.118,98	2.169.118,98	2.140.491,59	Lavori collaudati	05/05/1997	23/10/1998	06/12/1999	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
51 V.	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Campalto e Tessera	1/C/10	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 168 10/4/1998	1.755.953,46	1.755.953,46	13.578,74	Lavori in corso				In attesa dell'approvazione della variante urbanistica
52 V.	Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto	1/C/11	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 528 1/12/1997	7.230.396,59	7.230.396,59	349.459,20	Lavori in corso	16/01/2001			
53 V.	Risanamento fognario nella zona di Carpenedo (via Tevere)	1/C/12	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 11 12/2/1996	4.957.986,23	4.957.986,23	2.912.123,56	Lavori in corso	06/04/1998			Rescisso il contratto in danno all'impresa. Completamento lavori appaltato ad altra ditta
54 V.	Completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcontenta	1/C/13	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 133 DEL 8/8/1996	1.807.599,15	1.807.599,15	133.030,26	Lavori in corso				Consegna sospesa in attesa di risoluzione espropri
55 V.	Ricostruzione della rete fognaria nella zona del centro urbano di Mestre attigua al canale Osellino	1/C/14	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 21 12/2/1996	1.910.890,53	1.910.890,53	1.446.753,40	Lavori in corso	26/06/1997			Rescisso il contratto in danno all'impresa. Completamento lavori appaltato ad altra ditta il 12/12/2003

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
56 V.	Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia	1/C/15	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 51 25/6/1999	0,00	0,00	0,00	Finanziamento revocato				Finanziamento originale pari a € 1.755.953,46 completamente revocato e devoluto alla Diocesi Patriarcato di Venezia
57	PROGETTO INTEGRATO RII	3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993		18.075.991,47	18.075.991,47	18.075.991,47	Lavori in corso				
58	Progetto delle opere di collegamento delle fognature di Pellestrina alla fognatura degli Alberoni. Importo £ 6,5 Mld.	5/B/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 26 19/3/1999	1.545.239,04	1.545.239,04	1.209.542,06	Finanziamento interamente convogliato nell'intervento 36A				Interventi gestiti dalla società INSULA
59 V.	Interventi alle fognature del Lido - IX lotto-.	5/B/2		DDDA N. 115 23/06/2004	4.648.112,09	4.648.112,09	0,00	Progetto approvato				Importo complessivo del progetto pari a € 6.894.700,00. Finanziato con parte dei fondi (€ 2.246.587,51) dell'int. 86
60 V.	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Est - Ca' di Valle	5/B/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 23 12/2/1996	2.065.827,60	2.065.827,60	2.011.949,29	Lavori collaudati	15/01/1997	30/07/1999	04/10/2000	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
61 V.	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Ovest - Ca' Savio	5/B/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 24 12/2/1996	2.065.827,60	2.065.827,60	1.846.270,63	Lavori collaudati	09/09/1999		06/06/2000	Documentazione relativa al collaudo non ancora inviata da parte del Comune di Venezia
	Legge 139/92 II fase											
62 V.	Progetto Fusina: completamento della rete fognaria e relativi allacciamenti nell'area Mestre-Gazzera e Mestre-Malcontenta	1/B/1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		2.065.827,60	0,00	0,00	Progettazione in corso				Intervento facente parte del Progetto Integrato
63 V.	Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3	1/B/4	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		2.065.827,60	0,00	0,00	Progetto definitivo				Integrazione del finanziamento, per € 1.549.370,69, con parte dei fondi dell'int.86
64 V.	Progetto Campalto: ampliamento dell'impianto di depurazione di Campalto (V linea)	1/C/1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 110 14/12/2000	3.098.741,39	2.685.575,88	82.181,72	Lavori in corso	16/01/2002			La differenza tra importo finanziato ed impegnato, pari a € 413.165,51, convogliato nell'int. 20
65	Progetto Campalto: adeguamento della rete principale di via Torino e interconnessione con la rete di Mestre	1/C/2	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		2.582.284,50	0,00	0,00	Progettazione in corso				Progetto Integrato Campalto
66	Progetto Campalto: costruzione tronco di interconnessione tra il collettore Acque Basse ed i bacini di via Torino e S. Giuliano	1/C/4	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		3.098.741,39	0,00	0,00	Progettazione in corso				Progetto Integrato Campalto
67	Progetto Campalto: regolazione dei flussi di piena e di trattamento acque di pioggia a S. Giuliano	1/C/5	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		4.131.655,19	0,00	0,00	Progettazione in corso				Progetto Integrato Campalto
68 V.	Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali delle reti fognarie del Comune di Venezia	1/E/1	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996		3.460.261,22	0,00	0,00	Progettazione in corso				Integra per € 115.686,34 l'int. 61, per € 163.716,84 l'int. 28 e per € 2.633.930,18 due interventi dell'appalto integrato.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
69	PROGETTO INTEGRATO RII	3/A/1	DGR N. 2203 DEL 21/5/1996		16.526.620,77	16.526.620,77	16.526.620,77	Lavori ultimati				
70 V.	Progetto Campalto - affinamento con fitodepurazione	5/B/6	DCR N. 45 DEL 15/7/1999		3.873.426,74	0,00	0,00	Progettazione in corso	16/01/2002			Finanziamento proveniente da fondi riallocati
71 V.	Interventi di miglioramento dell' impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione U.V.	1/C/7	DCR N. 45 DEL 15/7/1999	DDDA N. 57 27/5/2002	258.228,45	258.228,45	0,00	Lavori in corso	16/01/2002			Finanziamento complessivo pari a € 6.713.939,68 distribuito tra gli int. 71, 77A e 77B. Impegno inerente alle spese di progettazione
	Legge 539/95 Es. 1996											
72	PROGETTO INTEGRATO RII	3/A/1	DGR N. 2203 DEL 21/5/1996		1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori in corso				
	Legge 539/95 Es. 1997											
73	PROGETTO INTEGRATO RII	C/26/1	DGR N. 553 DEL 25/2/1997		1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori in corso				
	Legge 515/96 Es. 1997											
74 V.	Ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria in Comune di Venezia	C/23/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997		7.521.618,25	0,00	0,00	Progettazione in corso				Importo complessivo del finanziamento € 27.372.215,65 suddiviso negli interventi 74A (€ 428.659,23), 74B (4.343.402,52), 74C (€ 2.065.827,60) e uno di competenza del Comune del Cavallino (€ 4.648.112,09). Parte del finanziamento revocato, pari a € 5.265.854,58 e devoluto alla Diocesi Patriarcato di Venezia (int. C/23/1.6).
74A V.	Impianto di sollevamento località "Rana" e condotta di scarico.	C/23/1.1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 179 24/12/2001	428.659,23	428.659,23	0,00	Progetto approvato				
74B V.	Ristrutturazione della rete fognaria della zona del centro di Marghera (VE)	C/23/1.3	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 78 27/6/2002	4.343.402,52	4.343.402,52	0,00	Progetto approvato				
75	PROGETTO INTEGRATO RII	C/26/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997		11.878.508,68	11.878.508,68	11.878.508,68	Lavori in corso				
74C V.	Ristrutturazione della rete fognaria secondaria della zona Nord e Centro di Marghera (VE)	C/23/1.4	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999		2.065.827,60							Il DDDA n. 90 del 12/08/2002 che impegnava € 2.065.827,6 è annullato con il DDDA 77/03 in quanto l'intervento deve essere finanziato con i fondi CIPE
74D V.	Completamento della rete di fognatura di tipo misto del Bacino della Gazzera.	C/23/1.5	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 114 20/08/2003	3.098.741,39	3.098.741,39	0,00	Progetto approvato				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
76 V.	Bonifica "Corti femminili" - Mestre	B/16 V fase	DGR N. 2962 DEL 14/9/2000		1.518.216,98	1.518.216,98	1.417.549,70	Lavori collaudati				Registrata, con DDDA n. 152 del 22/11/2001, un'economia di € 100.667,29
77A V.	Interventi di miglioramento dell' impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiarifiocculazione, filtrazione e disinfezione U. V.	A/2.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 57 27/5/2002	5.216.214,68	5.216.214,68	0,00	Progetto approvato				Importo complessivo del progetto pari a € 6.713.939,68 distribuito tra gli int. 71, 77A e 77B.
77B V.	Progetto Campalto - completamento impianto di depurazione	A/2 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		1.239.496,56	0,00	0,00	Progettazione in corso				Importo complessivo del progetto pari a € 6.713.939,68 distribuito tra gli int. 71, 77A e 77B.
78	PROGETTO INTEGRATO RII	B/19 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 123 4/10/2001	19.625.362,17	19.625.362,17	19.625.362,17	Lavori in corso				
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
79	PROGETTO INTEGRATO RII	A/1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 22 DEL 7/3/2002	24.789.931,16	24.789.931,16	24.789.931,16	Lavori in corso				
80 V.	Opere di potenziamento e risistemazione idraulica degli impianti di sollevamento S5 e S6 (FUSINA)	B1/56.1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 120 29/12/2000	1.068.549,32	1.068.549,32	45.650,86	Lavori in corso	27/03/2003			
81 V.	Interventi di fognatura al Lido di Venezia	B1/58	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		826.331,04	0,00	0,00	Progettazione in corso				
82 V.	Fognature afferenti all'impianto di Campalto	B1/57	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		6.078.919,94	0,00	0,00	Progettazione in corso				Finanziamento suddiviso dall'ente in 6 interventi
83 V.	Fognature afferenti all'impianto di Fusina	B1/56	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		6.265.138,64	0,00	0,00	Progettazione in corso				Finanziamento suddiviso dall'ente in 7 interventi (4 integrazioni di interventi precedenti e 2 nuovi interventi)
84	Bonifica area "ex - conterie" a Murano per stoccaggio rifiuti speciali e tossico - nocivi.	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2621 10/10/2001	3.098.741,39	3.098.741,39	0,00	Progetto approvato				In attesa dell'invio della documentazione da parte del Comune di Venezia
85 V.	Interventi di riqualificazione della fognatura di viale Garibaldi e Piazza Carpenedo.	B1/57.1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 106 18/10/2002	1.254.768,03	1.254.768,03	0,00	Progetto approvato				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
86 V.	Interventi di fognatura nel territorio comunale (importo complessivo € 17.043.077,67)	1/N/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		14.796.489,67	0,00	0,00	Progettazione in corso				Finanziamento originale di € 17.043.077,67 suddiviso dall'ente in 7 interventi (4 integrazioni e 3 nuovi interventi)
86A V.	Progetto definitivo relativo agli interventi diffusi di ristrutturazione e fognatura nera e bianca del Lido di Venezia. Bacino 16 e 20 - IX° lotto.	1/N/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 115 23/06/2004	2.246.588,00	2.246.588,00	0,00	Progetto approvato				
87	PROGETTO INTEGRATO RII	7/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 22 07/03/2002	20.658.275,96	20.658.275,96	5.838.427,16	Progetto approvato				
	Legge 139/92 - Magg.Mutui II FASE											
88	PROGETTO INTEGRATO RII		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		4.038.597,75	0,00	0,00	Progettazione in corso				
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
89	Opere di disinquinamento ambito Campalto: diminuzione acque parassite	E/14.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.040.000,00			Progettazione in corso				
90	Opere di disinquinamento ambito Lido di Venezia: diminuzione acque parassite	E/14.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00			Progettazione in corso				
91	Opere di disinquinamento ambito Fusina: diminuzione acque parassite	E/14.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.200.000,00			Progettazione in corso				
92	Opere di disinquinamento ambito Lido di Venezia: fognatura nera e riqualificazione fognatura bianca	E/14.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.320.000,00			Progettazione in corso				
93	Osservatorio naturalistico della Laguna	B/19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 243 28/12/2005	400.000,00	400.000,00		Progettazione in corso				
94	Programma di iniziative sul tema dell'educazione ambientale e della promozione dell'agricoltura biologica nel territorio del bacino scolante in Laguna di Venezia	B/20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 243 28/12/2005	600.000,00	600.000,00		Progettazione in corso				
95	PROGETTO INTEGRATO RII	A/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		28.000.000,00			Progettazione in corso				
96	Redazione dei piani della caratterizzazione per i siti inquinati compresi nel territorio comunale	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		250.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				376.089.083,32	254.492.572,73	178.148.493,36					

COMUNE DI ZERO BRANCO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 139/92 II fase											
1	Interventi di fognatura e depurazione in territorio comunale.	2/A/1	DGR 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 21 DEL 7/3/2002	258.228,45	258.228,45	258.204,50	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per l'importo di € 258.228,45				
	Legge 515/96 Es. 1997											
2	Ampliamento della rete fognaria e completamento del costruendo impianto di depurazione comunale	B/14/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 67 13/11/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Collaudo in corso	25/10/2000			Con DDDA n. 52/2004 stabilito integrazione finanziamento di € 210.000,00. Con DGR 1234/04 stabilito nuovo termine fina e lavori: 31/12/2005
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
3	Interventi di fognatura e di depurazione nel comune di Zero Branco.	B/18 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 64 DEL 1/9/2000	123.949,66	123.949,66	123.949,66	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per l'importo di € 123.949,66				
4	Interventi di fognatura e depurazione	B/18 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 21 DEL 7/3/2002	134.278,79	134.278,79	134.278,79	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per l'importo di € 134.278,79				
4A	Interventi di fognatura e depurazione (€ 516.456,90)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 258.228,45) + 3 (€ 123.949,66) + 4 (€ 134.278,79) = € 516.456,90					Lavori collaudati				Registrata, con DDDA n. 10 del 21/01/2005, un'economia pari a € 23,94
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
5	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 ed ampliamento dell' impianto di depurazione comunale	6/I/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 52 16/03/2004	210.000,00	210.000,00	34.062,93	Lavori in corso				
	TOTALI				2.275.827,60	2.275.827,60	2.099.866,58					

PAGINA BIANCA

SEZIONE II: AZIENDE SPECIALI CONSORTILI

Nota: nelle tabelle che seguono vengono riportati i finanziamenti attribuiti direttamente alle Aziende Speciali Consortili.

AZIENDA CONSORZIO DEL MIRESE (A.C.M.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Costruzione della rete di fognatura consortile del Mirese - XIV lotto sub B (VE)			DPGR N.1523 16/12/1986	206.582,76	206.582,76	184.286,86	Contabilità finale	23/03/1987	21/04/1987	16/01/1989	Registrata, con DDLP n. 422 del 11/12/2003, un'economia pari a € 20.183,39
2	Completamento funzionale di opere fognarie precedentemente realizzate nel Consorzio del Mirese		DPGR N. 621 DEL 20/07/1987	DR N. 1004 DEL 26/10/1987	2.375.701,74	2.375.701,74	2.375.701,74	Contabilità finale	14/09/1987	16/07/1989	15/06/1989	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 424 del 11/12/2003
	Legge 910/86 Es. 1989											
3	Costruzione della rete fognaria di Campagna Lupia - capoluogo (VE)	1/3.1bis	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	N. 1249 DEL 4/6/1993	1.549.370,70	1.549.370,70	1.394.433,63	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Decreto di contabilità finale n. 92/2004, per € 1.394.433,63. Disimpegnati, con DGR 2517/2002 € 154.937,07.
4	Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase	1/3.1A	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	DPGR N.1365 25/6/1993	7.488.625,04	7.488.625,04	6.808.530,40	Primo appalto collaudato. Secondo appalto in attesa di collaudo	14/12/1994	27/10/2000 -	22/07/2003	Decreto di contabilità finale in sospeso: manca relazione acclarante
5	Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase: Rilievi ed ispezioni televisive collettori fognari	1/3.1	DGR N. 4976 DEL 2/11/1993	N. 41 DEL 8/11/1993	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Lavori collaudati	02/01/1995	20/06/1997	25/03/1998	Decreto di contabilità finale sospeso in attesa dell'integrazione della documentazione
	Legge 67/88 Es. 1990											
6	Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (VE)	1/2.15	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DPGR N. 1249 4/6/1993	516.456,90	516.456,90	446.735,22	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				Registrata, con DDDA n. 92/2004, un'economia pari a € 69.721,68
6A	Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (VE) (€ 2.065.827,60)	Finanziato con i fondi del finanziamento 3 (€ 1.549.370,70) + 6 (€ 516.456,90) = € 2.065.827,60						Lavori collaudati	28/12/1994	16/03/1998	29/09/2003	Registrata, con DDDA n. 92/2004, un'economia pari a € 69.721,68
	Legge 67/88 Es. 1992 - IA tranche											
7	Realizzazione di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature (€ 4.131.655,19)	1/4.3	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994		1.194.969,19	0,00	0,00	Finanziamento suddiviso in 7A (€ 462.554,00), 7B (€ 499.945,00), 7C (460.000,00), 7D (€ 654.835,00) e 7E (€ 859.352,00)				Finanziamento originale pari a € 4.131.655,19
7A	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature del comune di Strà	1/4.3c	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 144 23/07/2004	462.554,00	462.554,00	55.562,74	Lavori in corso				
7B	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature del comune di Campagna Lupia	1/4.3a	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 142 23/07/2004	499.945,00	499.945,00	44.299,97	Lavori in corso				
7C	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature del comune di Fiesso d'Artico	1/4.3b	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 143 23/07/2004	460.000,00	460.000,00	99.642,92	Lavori in corso				
7D	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature nel comune di Mirano (VE)	1/4.3d	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 92 31/05/2005	654.835,00	654.835,00	27.844,19	Lavori in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
7E	Realizzazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature nel comune di Spinea (VE)	1/4.3e	DGR N. 2773 DEL 21/6/1994	DDDA N. 93 31/05/2005	859.352,00	859.352,00	33.592,90	Lavori in corso				
	Legge 139/92 Es. 1993											
8	Completamento fognatura nera in Comune di Noale	1/B/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 36 25/5/1995	929.622,42	929.622,42	929.622,42	Contabilità finale	28/06/1996	24/09/1998	01/08/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 119 del 25/10/2002
9	Completamento fognatura nera in Comune di Salzano	1/B/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Contabilità finale	06/11/1995	17/04/1997	18/10/1997	Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 99 del 02/03/1998
10	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Martellago	1/B/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 67 16/10/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Contabilità finale	11/04/1996	26/02/1999	21/12/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 8 del 15/02/2002
11	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Scorzè	1/B/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 69 19/10/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Contabilità finale	11/04/1996	26/11/1998	26/03/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 79 del 15/07/2002
12	Vasca di pioggia di Noale	1/B/5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 170 29/10/1996	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Contabilità finale	01/09/1998	25/03/1999	21/02/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 7 del 15/02/2002
13	Interventi alle fognature del Consorzio del Mirese (€ 1.229.167,42)	2/A/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993					Intervento suddiviso negli interventi 31 (€ 242.734,74), 32 (€ 142.025,65) e 33 (€ 844.407,03)				
14	Pulizia, ispezione televisiva e rilievo di condotte fognarie nei comuni di Dolo e Spinea	2/A/7	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 7 27/1/1997	320.203,28	320.203,28	320.203,28	Contabilità finale	27/01/1998	26/07/1999	29/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 9 del 07/01/2004
15	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Mirano	2/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 28 19/4/1995	3.356.969,84	3.356.969,84	3.356.969,84	Contabilità finale	11/04/1996	22/12/2000	24/06/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 151 del 30/10/2003
16	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di S. Maria di Sala	2/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 28 19/4/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Contabilità finale	29/03/1996	31/07/1999	29/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 45 del 07/07/2000
17	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Vigonovo	2/A/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 28 19/4/1995	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Contabilità finale	18/09/1998	01/08/1999	29/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 9 del 14/02/2001
18	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Stra	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Contabilità finale	16/07/1997	19/11/1998	29/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 87 del 30/10/2000
19	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Fiesso d'Artico	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Contabilità finale	27/11/1995	31/12/1997	07/10/1999	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 88 del 30/10/2000
20	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Dolo	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 18 3/3/1995	2.324.056,05	2.324.056,05	2.314.921,22	Contabilità finale	27/11/1995	06/02/2003	15/09/2003	Registrata, con DDDA n. 10 del 07/01/2004, un'economia pari a € 9.134,83
21	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Pianiga	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 18 DEL 3/3/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Contabilità finale	25/11/1995	27/09/1997	25/11/1999	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 44 del 07/07/2000
22	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Campolongo Maggiore	2/A/3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGCA N. 18 3/3/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Contabilità finale	27/11/1995	09/07/1997	08/08/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 43 del 07/07/2000.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione a/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
23	Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - I stralcio	2/A/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 4 19/1/1995	2.556.461,65	2.556.461,65	2.556.461,65	Contabilità finale	25/09/1996	25/09/1999	25/02/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 80 del 15/07/2002
24	Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - II stralcio	2/A/4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 5 19/1/1995	3.382.792,69	3.382.792,69	3.382.792,69	Contabilità finale	31/05/1995	09/01/1999	07/05/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 07/01/2004
25	Lavori di costruzione fognature nel Comune di Camponogara	2/A/5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 56 24/10/1994	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Contabilità finale	25/02/1995	16/10/1996	02/03/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 18 del 27/05/1998
26	Interventi alle fognature nel Comune di Fossò	2/A/6	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 51 7/10/1994	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori ultimati	23/02/1995	07/05/1997	04/05/1998	Collaudo in corso
27	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira A	2/A/1.1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 146 31/12/1999	854.736,17	854.736,17	854.736,17	Contabilità finale	20/12/2000			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 101 del 10/06/2005
28	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira B	2/A/1.2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 147 31/12/1999	671.393,97	671.393,97	671.393,97	Contabilità finale	20/12/2000	10/11/2001		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 37 del 08/03/2005
29	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mira C	2/A/1.3	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 148 31/12/1999	539.697,46	539.697,46	539.697,46	Contabilità finale	20/12/2000	31/07/2002		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 138 del 16/07/2004
30	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 27° lotto in comune di Mirano	2/A/1.4	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 149 31/12/1999	774.685,35	774.685,35	774.295,86	Contabilità finale	20/12/2000	29/10/2002		Registrata, con DDDA n. 46 del 3/3/2004, un'economia pari a € 389,49
31	Progetto esecutivo per l'eliminazione di perdite, rotture, infiltrazioni, sedimentazioni, incrostazioni, ecc. da effettuarsi sulla base di risultanze acquifere. 27° Lotto fognature.	2/A/1.5	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 16 28/2/2002	242.734,74	242.734,74	242.734,74	Contabilità finale	12/07/2002	10/02/2003	22/10/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 45 del 02/03/2004
32	Progetto esecutivo per l' eliminazione di perdite, rotture, infiltrazioni, sedimentazioni, ecc. da effettuarsi sulla base di risultanze acquifere. 27° lotto fognature.	2/A/1.6	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 17 28/2/2002	142.025,65	142.025,65	142.025,65	Contabilità finale	25/11/2002	09/04/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 154 del 20/09/2005
33	Progetto esecutivo per la costruzione di reti fognarie nere e per il completamento degli allacciamenti alle utenze. 27° lotto fognature	2/A/1.7	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 18 28/2/2002	844.407,03	844.407,03	759.966,34	Collaudo in corso	03/07/2002			
	Legge 539/95 Es. 1996											
34	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Consorzio del Mirese	1/E/3	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DDDA N. 44 DEL 1/6/1999	2.530.638,81	2.530.638,81	2.530.638,80	Contabilità finale	05/09/2000	07/04/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 162 31/08/2004.
	Legge 515/96 Es. 1997											
35	Opere di fognatura nera - 28° lotto in comune di Fiesso D'Artico	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 73 13/9/2000	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Contabilità finale	13/03/2001	21/03/2002	25/03/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 98 del 18/08/2003
36	Progetto per la realizzazione di opere di fognatra nera - 28° lotto nel comune di Salzano	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 109 14/12/2000	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Contabilità finale	15/10/2001	30/05/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 239 del 20/12/2004
37	Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto nel comune di Campagna Lupia.	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 107 14/12/2000	284.051,29	284.051,29	284.051,29	Contabilità finale	16/07/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 156 del 20/09/2005

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
38	Impianto di fognatura del Comune di Martellago - settore A - 28° lotto	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 28 21/3/2001	413.165,52	413.165,52	371.848,96	Collaudo in corso	16/05/2002			
39	Progetto per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto in comune di Dolo.	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 74 13/9/2000	568.102,59	568.102,59	511.292,33	Lavori in corso	13/04/2001			
40	Interventi di opere fognarie nei comuni di Martellago settore "B" e Salzano settore "B". Progettazione esecutiva del 28° lotto.	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 117 3/10/2001	619.748,28	619.748,28	619.748,28	Contabilità finale	05/03/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 188 del 21/10/2005
41	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28°lotto in comune di Fossò	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 73 22/9/1999	413.165,52	413.165,52	393.860,72	Contabilità finale	04/02/2000	04/04/2001		Registrata, con DDDA n. 113 del 16/06/2004, un'economia pari a € 19.304,81
42	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Camponogara	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 74 22/9/1999	464.811,21	464.811,21	464.692,98	Contabilità finale	13/03/2000	27/04/2001	10/05/2002	Registrata, con DDDA n 141 del 12/12/2002, un'economia di € 118,23
43	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera - 28° lotto - in comune di Noale (Ve)	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 75 22/9/1999	568.102,59	568.102,59	568.102,59	Contabilità finale	14/03/2000	22/03/2002	02/12/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 57 del 27/05/2003
44	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Scorzè-Settore A	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 144 31/12/1999	534.209,07	534.209,07	534.209,06	Contabilità finale	22/05/2000	30/10/2002	12/07/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 7 del 07/01/2004
45	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Scorzè-Settore B	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 145 31/12/1999	395.413,35	395.413,35	395.413,35	Contabilità finale	11/02/2000	03/05/2001	22/11/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 58 del 27/05/2003
46	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Pianiga	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 78 22/9/1999	516.456,90	516.456,90	497.090,05	Contabilità finale	14/09/2000	21/05/2002	11/12/2003	Registrata, con DDDA n. 100 del 01/06/2004, un'economia di € 19.366,85
47	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mirano. Settore A	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 79 22/9/1999	524.616,92	524.616,92	519.457,90	Contabilità finale	07/03/2000	30/07/2001	10/09/2002	Registrata, con DDDA n. 7 del 7/02/2003, un'economia di € 5.159,02
48	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mirano. Settore B	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 80 22/9/1999	508.296,88	508.296,88	481.632,89	Contabilità finale	22/05/2000	04/07/2001	04/11/2003	Registrata, con DDDA n. 94 del 19/05/2004, un'economia di € 26.663,99
49	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Spinea	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 81 22/9/1999	671.393,97	671.393,97	669.023,23	Contabilità finale	05/09/2000	07/10/2002	01/09/2003	Registrata, con DDDA n. 8 del 07/01/2004, un'economia di € 2.370,74
50	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mira. Settore A	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 82 22/9/1999	284.051,29	284.051,29	274.136,39	Contabilità finale	05/09/2000	23/11/2001		Registrata, con DDDA n. 161 del 31/08/2004, un'economia di € 9.914,90
51	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mira. Settore B	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 83 22/9/1999	748.862,50	748.862,50	748.862,49	Contabilità finale	22/05/2000	22/02/2002		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 231 del 06/12/2004
52	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di S. Maria di Sala	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 131 23/12/1999	774.685,35	774.685,35	750.560,99	Contabilità finale	20/10/2000	27/05/2002	20/10/2003	Registrata, con DDDA n. 91 del 19/05/2004, un'economia di € 24.124,37
53	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Strà	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 132 23/12/1999	413.165,52	413.165,52	404.960,93	Contabilità finale	14/09/2000	06/06/2002		Registrata, con DDDA n. 139 del 16/07/2004, un'economia di € 8.204,60
54	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Vigonovo	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 133 23/12/1999	490.634,05	490.634,05	490.634,05	Contabilità finale	20/12/2000	16/12/2002		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 241 del 20/12/2004

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
55	Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Campolongo Maggiore	B/18/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1999	DDDA N. 135 23/12/1999	516.456,90	516.456,90	508.825,66	Contabilità finale	22/01/2001	20/06/2002		Registrata, con DDDA n. 112 del 16/06/2004, un'economia di € 7.631,24
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
56	Lavori di costruzione del 29° lotto - Fognatura in comune di Strà	A/11.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 33 DEL 2/4/2001	206.582,76	206.582,76	185.924,48	Collaudo in corso	06/03/2002	28/05/2003		
57	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Santa Maria di Sala.	A/11.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 44 23/4/2001	413.165,52	413.165,52	371.848,97	Collaudo in corso	04/03/2002			
58	Lavori per la costruzione del 29° lotto di fognature. Intervento nel comune di Fossò	A/11.5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 45 23/4/2001	103.291,38	103.291,38	103.291,38	Contabilità finale	15/10/2001	13/12/2002		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 38 del 08/03/2005
59	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature . Intervento nel comune di Noale.	A/11.8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 58 14/5/2001	516.456,90	516.456,90	464.811,23	Collaudo in corso	18/02/2003			
60	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Scorzè	A/11.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 41 23/5/2001	568.102,59	568.102,59	568.102,59	Contabilità finale	13/02/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 227 del 03/12/2004
61	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Campolongo Maggiore.	A/11.17 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 120 3/10/2001	309.874,14	309.874,14	278.886,73	Collaudo in corso	07/10/2003			
62	Lavori di costruzione del 29° lotto - Fognatura in comune di Vigonovo	A/11.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 32 DEL 2/4/2001	258.228,45	258.228,45	232.405,61	Collaudo in corso	06/03/2002	26/06/2003		
63	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Dolo.	A/11.12 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 106 DEL 7/9/2001	258.228,45	258.228,45	210.410,42	Lavori in corso	03/07/2002			
64	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Fiesso d' Artico.	A/11.7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 57 14/5/2001	154.937,07	154.937,07	139.443,36	Collaudo in corso	10/09/2002			
65	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Martellago	A/11.11 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 91 30/7/2001	361.519,83	361.519,83	325.367,85	Collaudo in corso	09/10/2002			
66	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Mira.	A/11.13 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 107 DEL 7/9/2001	723.039,66	723.039,66	650.735,69	Collaudo in corso	28/08/2002			
67	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Mirano.	A/11.16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 119 3/10/2001	619.748,28	619.748,28	619.023,53	Lavori in corso	28/10/2002			Determinazione contributo definitivo con DDDA 185del 21/10/2005: registrata economia € 724,75
68	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Salzano.	A/11.15 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 118 3/10/2001	413.165,52	413.165,52	413.165,52	Contabilità finale	05/09/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 83 del 13/05/2005
69	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Spinea.	A/11.14 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 108 DEL 7/9/2001	154.937,07	154.937,07	154.937,07	Contabilità finale	11/07/2002	22/07/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 240 del 20/12/2004
70	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Campagna Lupia	A/11.9 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 89 30/7/2001	154.937,07	154.937,07	125.462,11	Lavori in corso	11/09/2002			
71	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Pianiga.	A/11.6 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 56 14/5/2001	258.228,45	258.228,45	257.682,29	Contabilità finale	10/09/2002	26/07/2003		Registrata, con DDDA n. 84 del 13/05/2005, un'economia pari a € 546,16

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
72	Lavori per la costruzione del 29° lotto fognature. Intervento nel comune di Camponogara	A/11.10 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 90 30/7/2001	464.811,21	464.811,21	418.330,09	Collaudo in corso	12/07/2002			
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
73	Interventi di fognatura in comune di S.Maria di Sala	B/49	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 167 7/12/2002	413.165,52	413.165,52	371.849,01	Collaudo in corso	13/02/2003			
74	Interventi di fognatura in comune di Vigonovo	B/52	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 103 DEL 7/9/2001	258.228,45	258.228,45	209.300,21	Lavori in corso	25/10/2002			
75	Interventi di fognatura in comune di Stra	B/51	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 168 7/12/2001	309.874,14	309.874,14	243.526,10	Lavori in corso	05/03/2003			
76	Interventi di fognatura in comune di Spinea	B/50	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 158 30/11/2001	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Contabilità finale	03/10/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 36 del 8/03/2005
77	Interventi di fognatura in comune di Scorzè	B/48	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 157 30/11/2001	516.456,90	516.456,90	464.811,21	Collaudo in corso	13/02/2003			
78	Interventi di fognatura in comune di Salzano	B/47	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 155 30/11/2001	413.165,52	413.165,52	413.165,52	Contabilità finale	13/02/2003			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 82 del 13/05/2005
79	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Campolongo Maggiore	B/37	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 121 3/10/2001	361.519,83	361.519,83	265.755,52	Lavori in corso	13/02/2003			
80	Interventi di fognatura in comune di Noale	B/45	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 159 30/11/2001	671.393,97	671.393,97	550.638,63	Lavori in corso	18/02/2003			
81	Interventi di fognatura in comune di Martellago	B/42	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 156 30/11/2001	361.519,83	361.519,83	325.367,85	Collaudo in corso	13/02/2003			
82	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Mirano.	B/44	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 129 4/10/2001	733.368,80	733.368,80	498.327,66	Lavori in corso	12/02/2003			
83	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Pianiga	B/46	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 127 4/10/2001	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Contabilità finale	13/02/2003			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 55 del 20/09/2005
84	Interventi di fognatura in comune di Campagna Lupia	B/36	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 142 9/11/2001	258.228,45	258.228,45	226.500,60	Lavori in corso	18/02/2003			
85	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Mira	B/43	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 128 4/10/2001	1.032.913,80	1.032.913,80	726.867,81	Lavori in corso	29/01/2003			
86	Interventi di fognatura in comune di Camponogara	B/38	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 104 DEL 7/9/2001	1.032.913,80	1.032.913,80	929.622,42	Collaudo in corso	18/02/2003			
87	Interventi di fognatura in comune di Dolo	B/39	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 160 30/11/2001	361.519,83	361.519,83	325.367,85	Collaudo in corso	12/02/2003			
88	Progettazione esecutiva del 30° lotto. Interventi di fognatura in comune di Fiesso D'Artico	B/40	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 122 3/10/2001	258.228,45	258.228,45	226.106,31	Lavori in corso	13/02/2003			

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
89	Interventi di fognatura in comune di Fossò	B/41	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 105 DEL 7/9/2001	247.899,31	247.899,31	247.899,31	Contabilità finale	01/10/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 187 del 21/10/2005
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
90	Interventi di fognatura nel comune di Spinea (€ 1.549.370,70)	1/F/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 46/03, 49/03 e 50/03	1.549.370,70			Finanziamento suddiviso in 90A (€ 162.000,00), 90B (€ 830.000,00) e 90C (€ 517.370,70)				Importo complessivo dell'intervento € 1.549.370,70
90A	Interventi di fognatura nel comune di Spinea - parte A (€ 162.000,00)	1/F/1.2	Finanziato con parte dei fondi finanziamento 90			162.000,00	93.727,25	Lavori in corso				
90B	Interventi di fognatura nel comune di Spinea - parte B (€ 830.000,00)	1/F/1.3	Finanziato con parte dei fondi finanziamento 90			830.000,00	739.735,61	Lavori in corso	07/10/2003			
90C	Interventi di fognatura nel comune di Spinea - parte C (€ 557.370,70)	1/F/1.1	Finanziato con parte dei fondi finanziamento 90			557.370,70	482.980,59	Lavori in corso	16/09/2003			L'importo complessivo del progetto è pari a € 636.387,00; il comune copre la quota di € 79.017,00
91	Interventi di fognatura nel comune di Camponogara	1/F/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA 115/03	1.032.913,80			Finanziamento suddiviso in 91A (€ 878.328,20), 91B (€ 154.585,00)				Importo complessivo dell'intervento € 1.359.387,00. Il Comune copre la quota residua di 326.762,00
91A	Interventi di fognatura nel comune di Camponogara - parte A (€ 878.328,20)	1/F/2.1	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 91			878.328,20	597.229,13	Lavori in corso				
91B	Interventi di fognatura nel comune di Camponogara - parte B (€ 154.585,00)	1/F/2.2	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 91			154.585,60	82.715,60	Collaudo in corso				
92	Interventi di fognatura nel comune di Fossò		DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA 88/03	1.032.913,80			Finanziamento suddiviso in 92A (€ 640.000,00) e 92B (€ 392.913,00)				
92A	Interventi di fognatura nel comune di Fossò - parte A (€ 640.000,00)	1/F/3.1	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 92			640.000,00	509.149,48	Lavori in corso				
92B	Interventi di fognatura nel comune di Fossò - parte B (€ 392.913,00)	1/F/3.2	Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 92			392.913,80	33.041,33	Lavori in corso				
93	Interventi di fognatura nel comune di Noale	1/F/4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		516.456,90	516.456,90	516.456,90	Collaudo in corso				
94	Interventi per il completamento e la realizzazione di opere fognarie nei 17 comuni consorziati (€ 4.648.112,10)	1/F/5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002									
94A	Interventi per il completamento e la realizzazione di opere fognarie nei 17 comuni consorziati	1/F/5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002									Scheda madre
94B	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Spinea - parte C.	1/F/5.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 46 23/05/2003	79.017,91	79.017,91	0,00	Lavori in corso	16/09/2003			
94C	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Mirano	1/F/5.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 47 23/05/2003	493.629,50	493.629,50	392.432,44	Lavori in corso				
94D	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Salzano	1/F/5.3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 48 23/05/2003	305.380,96	305.380,96	274.842,86	Collaudo in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
94E	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di Campagna Lupia	1/F/5.4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 52 26/05/2003	123.639,78	123.639,78	97.925,70	Lavori in corso				
94F	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto delle fognature nel comune di S. Maria di Sala e Pianiga	1/F/5.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 87 29/07/2003	510.827,52	510.827,52	459.744,77	Collaudo in corso				
94G	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nei comuni di Dolo, Camponogara e Strà.	1/F/5.6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 55 27/05/2003	564.114,40	564.114,40	564.114,40	Collaudo in corso	27/09/2003			
94H	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nei comuni di Scorzè e Martellago.	1/F/5.7	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 87 29/07/2003	709.301,91	709.301,91	597.464,17	Lavori in corso				
94I	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nel comune di Noale	1/F/5.8	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 89 29/07/2003	430.879,99	430.879,99	336.146,30	Collaudo in corso				
94L	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto della fognatura nel comune di Mira.	1/F/5.9	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 117 20/08/2003	772.051,42	772.051,42	617.044,92	Lavori in corso				
94M	Progetto esecutivo dei lavori del 31° lotto nel comune di Fossò - parte B.	1/F/5.10	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 174 19/11/2003	74.834,60	74.834,60	0,00	Lavori in corso				
94N	Realizzazione fognatura in comune di Stra. 31° lotto - parte B	1/F/5.11	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 22 9/02/2005	75.001,01	75.001,01	0,00	Progetto approvato				
94O	Costruzione fognatura nei comuni di Campolongo Maggiore, Fiesso D'Artico e Vigonovo - 31° lotto	1/F/5.12	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 49 23/03/2005	509.433,08	509.433,08	0,00	Progetto approvato				
95	Messa in sicurezza ex discarica per RSU	4/A/1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA 114/04	2.400.000,00	240.000,00	142.484,31	Progettazione in corso				Impegno di spesa relativo alle sole spese di progettazione
96	Intervento di prevenzione dell'inquinamento dell'ex discarica per RSU e RSAU in loc. Cà Perale del Comune di Mirano.	4/A/1.7	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		2.402.250,26			Progettazione in corso				
	Legge 345/97 Es. 1996 - V fase											
97	Progetto dimostrativo per l'integrazione di reti di fognatura bianca e reti di bonifica DOLO-MIRA (Finanziamento iniziale € 5.164.568,99 al Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta - int. 11A - e poi diviso per competenze)	B/13.1 - V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA 230 05/12/2005	415.000,00	415.000,00		Progetto in corso				Quota di competenza A.C.M. pari a € 2.695.000,00. Presentato alla Regione Veneto in data 06/08/2003 progetto preliminare con S.I.A. Il finanziamento è riportato nell'intervento 11A del consorzio Sinistra Medio Brenta
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
98	Costruzione nuove opere di fognatura nel comune di Camponogara - 31° lotto bis	6/E/1.A	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 183 05/10/2004	1.250.000,00	1.250.000,00	28.015,40	Lavori in corso				
99	Costruzione nuove opere di fognatura nel comune di Spinea - 31° lotto bis	6/E/1.B	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 184 05/10/2004	1.250.000,00	1.250.000,00	28.015,40	Lavori in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
100	Intervento in comune di Fossò	E/1.3	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		384.000,00			Progettazione in corso				
101	Realizzazione delle opere di fognatura nel comune di Campolongo Maggiore, parte A - 32° lotto	E/1.10 A	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004	DDDA 198 25/10/2005	426.000,00	426.000,00		Progetto approvato				
102	Realizzazione delle opere di fognatura nel comune di Campolongo Maggiore, parte B - 32° lotto	E/1.10 B	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004	DDDA 197 25/10/2005	150.000,00	150.000,00		Progetto approvato				
103	Intervento in comune di Pianiga	E/1.12	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004	DDDA 134 17/08/2005	416.000,00	416.000,00		Progetto approvato				
104	Intervento in comune di Mira	E/1.8	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		1.656.000,00			Progettazione in corso				
105	Intervento in comune di Salzano	E/1.1	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		664.000,00			Progettazione in corso				
106	Intervento in comune di Spinea	E/1.5	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		416.000,00			Progettazione in corso				
107	Realizzazione delle opere di fognatura nei comuni di Stra e Fiesso d' Artico - 32° lotto.	E/1.7	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004	DDDA 145 13/09/2005	488.000,00	488.000,00		Progettazione in corso				
108	Realizzazione delle opere di fognatura nei comuni di Stra e Fiesso d' Artico - 32° lotto	E/1.15.1	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004	DDDA 145 13/09/2005	72.000,00	72.000,00						
109	Intervento in comune di Vigonovo	E/1.11	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		408.000,00			Progettazione in corso				
110	Intervento in comune di Dolo	E/1.2	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		576.000,00			Progettazione in corso				
111	Intervento in comune di S. Maria di Sala	E/1.4	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		664.000,00			Progettazione in corso				
112	Intervento in comune di Camponogara	E/1.9	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		1.656.000,00			Progettazione in corso				
113	Intervento in comune di Campagna Lupia	E/1.6	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004	DDDA 134 17/08/2005	416.000,00	416.000,00		Progettazione in corso				
114	Realizzazione delle opere di fognatura nel comune di Mirano, parte A - 32° lotto.	E/1.13 A	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004	DDDA 136 17/08/2005	715.000,00	715.000,00		Progetto approvato				
115	Realizzazione delle opere di fognatura nel comune di Mirano, parte B - 32° lotto.	E/1.13 B	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004	DDDA 135 17/08/2005	485.000,00	485.000,00		Progetto approvato				
116	Intervento in comune di Martellago	E/1.14	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		576.000,00			Progettazione in corso				
117	Interventi nei vari comuni	E/1.15	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		428.000,00			Progettazione in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
118	Intervento di prevenzione dell'inquinamento dell'ex discarica per RSU e RSAU in loc. Cà Perale del comune di Mirano	B/15	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		97.749,74							
	TOTALI				101.250.686,60	87.967.717,42	73.915.757,58					

AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE (A.P.G.A.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Costruzione del collettore consortile da Piove di Sacco all'impianto di depurazione di Codevigo			DDLP N. 471 26/07/1988	1.291.142,25	1.291.142,25	1.285.338,08	Lavori collaudati	28/03/1989	24/05/1991	26/09/1996	Registrata, con DDLP n. 491 del 27/11/1996, un'economia di € 5.804,16
	Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche											
2	Realizzazione di collettori fognari e depurazione nell'area Sud del Piovese	1/4.4	DGR N. 2773 21/6/1994	DPGR N. 1293 8/6/1995	1.549.568,48	1.549.568,48	1.549.568,48	Contabilità finale	10/07/1996	10/10/1999	09/04/2001	Finanziamento originale pari a € 1.652.662,08 Registrata un'economia di € 103.093,6 destinata, con DDDA n. 26 del 25/03/2002, all'intervento 2 bis
2bis	Potenziamento dei sistemi depurativi e ampliamento reti fognarie - 1° stralcio - impianti (€ 103.093,60)	1/4.4bis	DGR N. 2773 21/6/1994	DDDA N. 126 6/11/2002	103.093,60	103.093,60	103.093,60	Contabilità finale	10/07/1996	10/10/1999	-	Utilizzata l'economia di € 103.093,6 dell'intervento 2
	Legge 139/92 Es. 1993											
3	Completamento impianto di depurazione di Codevigo	5/E/1	DGR N. 4977 2/11/1993	DPGR N. 2955 28/11/1994	3.064.204,68	3.064.204,68	3.064.204,68	Contabilità finale	10/09/1996	16/12/1998	26/11/2001	Finanziamento originale pari a € 3.098.741,39. Registrata, con DDDA n. 39 del 23/04/2002, un'economia di € 34.536,72 destinata all'intervento 3 bis
3bis	Utilizzo delle economie di spesa maturate nel finanziamento del progetto relativo alle opere di ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Codevigo	5/E/1 ECO	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 169 13/09/2004	34.536,72	34.536,72	34.536,72	Contabilità finale				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 227 del 05/12/2005
	Legge 139/92 II fase											
4	Adeguamento strutture fognarie: miglioramento reti secondarie nei comuni di Legnaro e S. Angelo di Piove	1/D/4	DGR N. 2203 21/5/1996	DDDA N. 11 DEL 12/2/1997	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Contabilità finale	04/09/1997	09/10/1998	09/07/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 5 del 07/01/2004
5	Adeguamento strutture fognarie: progetto esecutivo per il disinquinamento area sud del Piovese (Pontelongo, Correzzola e Cona)	1/D/5	DGR N. 2203 21/5/1996	DDDA N. 11 DEL 12/2/1997	987.807,50	987.807,50	987.807,50	Contabilità finale	16/09/1997	07/02/2000	25/01/2002	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. Registrata, con DDDA n. 38 del 14/04/2003, un'economia di € 45.106,24 destinata all'intervento 4 bis

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
5bis	Utilizzo delle economie di spesa maturate nel finanziamento del progetto definitivo relativo ai lavori di disinquinamento dell'area sud - interventi nei comuni di Pontelongo, Correzzola e Cona	1/D/5.1	DGR N. 2203 21/5/1996	DDDA N. 136 14/07/2004	45.106,24	45.106,24	45.106,24	Contabilità finale				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 178 del 11/10/2005
6	Adeguamento strutture fognarie: estensione rete fognaria in località San Pieri in Comune di Piove di Sacco	1/D/3	DGR N. 2203 21/5/1996	DDDA N. 11 DEL 12/2/1997	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Contabilità finale	23/09/1998	05/11/1999	26/09/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 74 del 02/07/2001
	Legge 539/95 Es. 1996											
7	Progetto 1° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Legnaro, S. Angelo di Piove di Sacco e Polverara	1/E/5	DGR N. 4533 15/10/1996	DGCA N. 84 DEL 16/2/1998	1.265.319,40	1.265.319,40	1.248.823,93	Contabilità finale	31/05/1999	28/04/2000	15/05/2002	Registrata, con DDDA n. 226 del 03/12/2004, un'economia di € 16.495,49
8	Progetto 2°stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di S. Angelo di Piove, Brugine, Piove di Sacco, Arzergrande e Pontelongo.	1/E/5	DGR N. 4533 15/10/1996	DGCA N. 85 DEL 16/2/1998	1.420.256,47	1.420.256,47	1.420.256,47	Contabilità finale	18/08/1998	25/08/2000	28/11/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 98 del 08/06/2005
9	Progetto 3° stralcio esecutivo di estensione della rete di fognatura di tipo separato ad alcune aree dei comuni di Brugine, Piove di Sacco e Correzzola.	1/E/5	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 24 DEL 22/6/1998	1.586.627,28	1.586.627,28	1.586.627,28	Contabilità finale	31/05/1999	13/10/2000	16/02/2002	Finanziamento originale pari a € 1.755.953,46. Registrata, con DDDA n. 37 del 14/04/2003, un'economia di € 169.326,17 destinata all'intervento 9 bis
9bis	Utilizzo delle economie di spesa per un nuovo tratto di condotta fognaria in via S. Giovanni Bosco - Piove di Sacco	1/E/5.3 ECO	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 168 13/09/2004	169.326,17	169.326,17	152.393,12	Lavori ultimati				
	Legge 515/96 Es. 1997											
10	Potenziamento del sistema depurativo e ampliamento delle reti di fognatura nel territorio del consorzio del Piovese - 1° stralcio Impianti	A/4/1.2	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 39 DEL 10/4/2001	2.788.867,26	2.788.867,26	2.788.867,25	Contabilità finale	18/04/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 131 del 04/08/2005
11	Ampliamento delle reti di fognatura e del sistema depurativo nel territorio del consorzio del Piovese	A/4/1.1	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 68 DEL 7/9/2000	4.957.986,23	4.957.986,23	4.957.986,24	Contabilità finale	03/09/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 228 del 05/12/2005
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
12	Interventi di fognatura nei comuni di Piove di sacco, Legnaro, Brugine, Polverara, Correzzola, S. Angelo, Pontelongo, Arzergrande	A/1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 106 14/12/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Contabilità finale				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 186 del 21/10/2005
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
13	Interventi di fognatura in comune di Arzergrande	B/32	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 145 12/12/2002	309.874,14	309.874,14	0,00	Progetto approvato				
14	Interventi di fognatura in comune di Brugine	B/30	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Lavori in corso				
15	Interventi di fognatura in comune di Correzzola	B/29	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 145 12/12/2002	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Lavori in corso				
16	Interventi di fognatura in comune di Legnaro	B/33	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	593.925,43	593.925,43	593.925,43	Lavori ultimati				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
17	Interventi di fognatura in comune di Piove di Sacco	B/31	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 145 12/12/2002	1.549.370,70	1.549.003,44	617.084,70	Lavori in corso				
18	Interventi di fognatura in comune di Pontelongo	B/28	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 145 12/12/2002	671.393,97	671.393,97	671.393,97	Lavori in corso				
19	Interventi di fognatura in comune di S. Angelo di Piove	B/34	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	542.279,74	542.279,74	302.865,78	Lavori in corso				
20	Interventi di fognatura in comune di Polverara	B/27	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 144 12/12/2002	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori in corso				
21	Adeguamento impianti di depurazione minori	B/35	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 102 01/06/2004	1.549.370,70	1.549.370,70	360.692,31	Lavori in corso				
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
22	Adeguamento alle nuove normative e potenziamento impianti di depurazione di Codevigo, Pegolotte di Cona e Pontelongo	1/E/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		2.582.284,50			Progettazione in corso				
23	Realizzazione linee fognarie di collegamento per la dismissione di impianti di depurazione minori di Correzzola, Cona, diversione scarico di Pontelongo.	1/E/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		4.648.112,09			Progettazione in corso				
24	Riqualificazione ed implementazione dati della rete fognaria del comprensorio consortile	1/E/3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		516.456,90			Progettazione in corso				
25	Interventi di fognatura nel comune di Polverara	1/E/4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		258.228,45			Progettazione in corso				
26	Interventi di fognatura nel comune di Legnaro	1/E/5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		258.228,45			Progettazione in corso				
27	Interventi di fognatura a Sant' Angelo di Piove.	1/E/6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		413.165,52			Progettazione in corso				
28	Estensione ed adeguamento della rete fognaria nei comuni consorziati	1/E/7	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.652.662,08			Progettazione in corso				
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
29	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Pontelongo e Pegolotte	6/D/1	DGR N. 1140 18/4/2003		1.540.000,00			Progettazione in corso				
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
30	Ampliamento, potenziamento ed affinamento dei processi degli impianti di depurazione di Cona, Codevigo e Pontelongo	E/6	DCR N. 24 04/05/2004		2.400.000,00			Progettazione in corso				
31	Completamento, estensione e riqualificazione di opere già avviate: a) reti fognarie di centri abitati b) impianti di sollevamento	E/7	DCR N. 24 04/05/2004		3.200.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				46.442.369,96	28.972.864,72	26.263.746,80					

AZIENDA BRENTA SERVIZI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
1	Comune di Rossano: fognatura in zone laterali Via Salute e Via 11 Febbraio	E/8.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.087.320,00			Progettazione in corso				
2	Comune di Rosà: fognature in laterali via Granella, zona S. Pietro e Cusinati	E/8.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.598.400,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				2.685.720,00	0,00	0,00					

AZIENDA SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1996 - IV fase											
1	Interventi di fognatura in comune di Riese Pio X (TV). 1° stralcio	B/17.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 48 DEL 1/8/2000	1.032.913,80	1.032.913,80	966.608,02	Contabilità finale	22/02/2001	14/11/2002	24/04/2003	Registrata, con DDDA n. 148 del 20/10/2003, un'economia di € 66.305,78 da reiscrivere nel bilancio regionale 2003
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
2	Interventi di fognatura nei comuni di Riese Pio X, Loria	B/54	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 30 21/3/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Contabilità finale	30/10/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 165 del 31/08/2004
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
3	Interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Castello di Godego, Riese Pio X, Altivole, Maser, Asolo	1/M/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 85 12/8/2002	1.748.741,39	1.748.741,39	1.736.676,40	Contabilità finale	03/03/2003			Registrata, con DDDA n. 192 del 25/10/2005, un'economia pari a € 12.064,99
4	Costruzione della fognatura nera nei comuni di Castello di Godego e Loria (TV) - 3° stralcio (1° Lotto)	1/M/1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 87 12/8/2002	1.350.000,00	1.350.000,00	1.340.726,57	Contabilità finale	11/02/2003			Registrata, con DDDA n. 114 del 11/07/2005, un'economia pari a € 9.273,43
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
5	Costruzione dei collettori di fognatura nera (Riese Pio X - Castello di Godego - Altivole - Maser - Asolo) per un importo di € 2.500.000		DGR N. 1140 18/4/2003	Interventi unificati per l'importo totale di € 3.500.000 e poi suddivisi nei tre interventi 6A, 6B e 6C								
6	Costruzione dei collettori di fognatura nera in comune di Castello di Godego per un importo di € 1.000.000		DGR N. 1140 18/4/2003									
6A	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera in Comune di Castello di Godego e Loria - 4° stralcio (1° lotto)	6/F/2 e 6/F/1.1	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 65 30/03/2004	1.033.000,00	1.033.000,00	453.049,18	Progetto approvato				
6B	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera nei Comune di Riese Pio X° e Altivole - 4° stralcio (2° lotto)	6/F/1.2	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 69 13/04/2004	1.367.000,00	1.367.000,00	800.901,22	Lavori in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
6C	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia costruzione della fognatura nera nei comune di Altivole, Asolo e Maser - 4° stralcio (3° lotto)	6/F/1	DGR N. 1140 18/4/2003	DDDA N. 84 11/05/2004	1.100.000,00	1.100.000,00	412.168,62	Lavori in corso				
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
7	Costruzione rete di fognatura nera in comune di Riese Pio X° (TV): via Monfenera, e Brigata Martiri del Grappa	E/5.2	DCR N. 24 04/05/2004		152.000,00			Progettazione in corso				
8	Costruzione rete di fognatura nera nei comuni di Asolo e Maser: completamento collettore Asolo / impianto di depurazione di Maser.	E/5.1	DCR N. 24 04/05/2004		450.000,00			Progettazione in corso				
9	Costruzione rete di fognatura nera in Comune di Castello di Godego (TV): via Vegre, via Cacciatore e via Motte	E/5.3	DCR N. 24 04/05/2004		650.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				10.433.025,89	9.181.025,89	7.259.500,71					

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI A.S.P. DI CHIOGGIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	COMUNE DI CHIOGGIA - DISINQUINAMENTO											
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto		DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDEA N. 27 20/7/1993	335.696,98	335.696,98	331.607,90	Lavori collaudati			20/05/1994	Registrata, con DDLP n. 133 del 23/4/1997, un'economia pari a € 4.089,08 convogliata all'intervento 4
2	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI lotto			DDLP N. 324 03/06/1988	671.393,97	671.393,97	571.793,63	Lavori collaudati			20/05/1994	Registrata, con DDLP n. 73 del 17/03/1997, un'economia pari a € 99.600,34 convogliata all'intervento 4
3	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XVI lotto		DGR N. 5541 DEL 10/11/1996	DDDA N.120 6/9/1990	1.885.067,68	1.885.067,68	1.838.810,70	Lavori collaudati	07/10/1997	26/10/1999	26/10/2000	Registrata, con DDLP n° 423 del 11/12/2003, un'economia pari a € 46.256,97.
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (VE) - Opere elettromeccaniche (XV lotto - I° stralcio)		DGR N. 710 DEL 22/7/1986	DDDA N. 13162 DEL 12/12/1986	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	02/10/1986	24/08/1992	29/04/1995	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n°391 del 03/10/1997. Supero di spesa parzialmente coperto con le economie degli interventi 1 e 2. Residuo a carico dell'ente
	Legge 910/86 Es. 1989											
5	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia	1/1.20	DCR N. 745 DEL 1/7/1988	DDDA N. 120 DEL 6/9/1990	5.164.568,99	5.164.568,99	4.359.929,32	Lavori collaudati	26/11/1996	31/07/1998	08/03/1998	Intervento suddiviso in opere elettromeccaniche (€ 2.840.512,94) e opere civili (€ 2.324.056,05). Esiste solo la relazione acclarante del collaudatore amministrativo. Manca il collaudo tecnico.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 67/88 Es. 1990											
6	Collegamento a impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)	1/2.14b	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 109 20/6/1996	56.810,26	56.810,26	56.810,26	Lavori ultimati				Finanziamento originale pari a € 568.102,59, di cui € 511.292,33 revocati e devoluti alla Diocesi Patriarcato di Venezia
7	Appalto 42/A e 42/B. Ampliamento rete fognaria del centro strorico di Chioggia e Sottomarina	1/2.14a	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 27 20/7/1993	7.436.979,35	7.436.979,35	7.191.067,31	Lavori collaudati	21/05/1997	15/06/2000	14/10/2002	Registrata, con DDDA n. 2 del 13/01/2003, un'economia di € 254.911,79 reiscritta nel capitolo 50511 del bilancio regionale
	Legge 67/88 Es. 1991											
8	Fognatura di Chioggia (VE)	3c	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DDDA N. 115 28/6/1996	516.456,90	516.456,90	514.127,07	Lavori collaudati	16/10/1996	29/04/1997	03/03/1998	Registrata, con DDDA n. 35 del 21/06/2000, un'economia di € 2.329,83 reiscritta nel capitolo 50511 del bilancio regionale
	Legge 139/92 Es. 1993											
9	Ampliamento fognature bianca e nera nel centro storico di Chioggia	5/F/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 66 2/10/1995	4.622.289,25	4.622.289,25	1.154.906,22	Parte dei lavori collaudati	29/04/1996	16/04/1999	03/10/2000	Rescisso il contratto con la ditta appaltatrice
10	Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acqua salata nella rete di fognatura	5/F/2	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 45 13/6/1995	542.279,74	542.279,74	505.435,40	Lavori collaudati	06/05/1996	06/12/1997	15/05/2000	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo dell'opera.
	Legge 539/95 Es. 1996											
11	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Comune di Chioggia	1/E/2	DGR N. 4533 DEL 15/10/1996	DGCA N. 517 18/11/1997	4.906.340,54	4.906.340,54	4.318.989,01	Lavori collaudati	30/04/1998	10/11/2000	12/10/2002	Registrata, con DDDA n. 225 del 03/12/2004, un'economia di € 587.351,53
	Legge 539/95 Es. 1997											
12	Progetto definitivo dell'impianto elettrico del depuratore di Val da Rio - 1° e 2° stralcio	C/33/2	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 526 1/12/1997	320.203,28	320.203,28	270.796,95	Lavori collaudati	16/02/1998	27/04/1999	21/01/2000	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo dell'opera.
13	Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento ed ammodernamento della linea "Picchi" del depuratore di Val da Rio	C/33/3	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 546 16/12/1997	118.785,09	118.785,09	111.541,41	Lavori collaudati	18/03/1998	24/07/1998	29/03/1999	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo dell'opera.
14	Lavori di miglioramento ed ammodernamento dell'impianto di depurazione di Val da Rio - lotto funzionale A	C/33/1	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 366 24/9/1997	1.007.090,95	1.007.090,95	912.330,18	Lavori collaudati	13/11/1997	05/02/1999	28/03/2002	In attesa dell'invio della documentazione relativa al collaudo dell'opera.
	Legge 515/96 Es. 1997											
15	Realizzazione di interventi di completamento funzionale dell'impianto di depurazione di Val da Rio	B/16/7	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 55 29/6/1999	250.998,05	250.998,05	0,00	Lavori in corso	10/09/1999			
16	Progetto esecutivo di ampliamento della rete fognaria nelle calli del centro storico di Sottomarina a nord di Via Roma, per l'adeguamento dello stesso alla nuova normativa di riferimento Merloni Ter. Finanziamento dei primi due lotti dell'opera	B/16/4.1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 95 30/10/2000	4.991.555,93	4.991.555,93	3.601.978,90	Lavori in corso	04/10/2002			Progetto riadottato
17	Ampliamento della rete fognaria e interventi sugli impianti di depurazione comunale in Comune di Chioggia		DGR N. 2613 DEL 22/7/1997					Finanziamento originale di € 1.669.062,18 suddiviso negli interventi 17A (€) e 17B (€)				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
17A	Progetto esecutivo relativo ad interventi a difesa dell'abitato di Chioggia - Fondamenta San Domenico.	B/16/4.2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 138 30/08/2005	516.062,18	516.062,18	116.834,35	Lavori in corso				
17B	Completamento del depiuratore di Val da Rio. 1° lotto funzionale. Impianto di modulazione e sollevamento "Niccolò De Conti".	B/16/4.3	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 207 10/11/2005	1.153.000,00	1.025.000,00	0,00	Progetto approvato				
18	Progetto di riqualificazione edilizia della linea "picchi" del depuratore di Val da Rio	B/16/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 545 16/12/1997	209.705,25	209.705,25	189.927,74	Lavori collaudati	09/03/1998	07/05/1998	08/07/1998	Registrata, con DDDA n. 39 del 14/04/2003, un'economia di € 19.777,51 da reiscrivere nel bilancio regionale 2003
19	Progetto esecutivo per un sistema di disidratazione dei fanghi depuratore Val da Rio-2° lotto	B/16/2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 146 24/3/1998	194.381,98	194.381,98	194.381,98	Lavori collaudati	03/03/1999	10/06/1999	15/09/1999	Registrata, con DDDA n. 54 del 25/06/1999, un'economia di € 12.200 convogliata nel finanziamento 16
20	Progetto di manutenzione straordinaria presso l'impianto di depurazione di Val da Rio	B/16/3	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 430 22/10/1997	147.098,80	147.098,80	140.752,63	Lavori collaudati	29/11/1997	12/05/1998	19/12/1998	Documentazione relativa al collaudo dell'opera non ancora inviata da parte dell'ente.
21	Affinamento qualitativo dell'effluente del depuratore di Val da Rio	B/16/5	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 12 DEL 2/3/1999	2.040.004,75	2.040.004,75	1.684.034,30	Collaudo in corso	19/07/1999	31/10/2000		
22	Collettore di allacciamento della fognatura comunale per il conferimento dei reflui da Cà Bianca al depuratore di Val da Rio	B/16/6	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 22 15/3/1999	826.331,04	826.331,04	500.688,08	Lavori in corso	15/07/1999			L'importo complessivo dell'opera è pari a 3,1 MLD di lire, finanziato per 1,5 mld dal CIPE e per 1,6 MLD dalla Legge Spec. Ve
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
23	Messa in sicurezza della discarica "Cà Rossa" in Comune di Chioggia	D/85	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		2.582.284,50			Progettazione in corso				
24	Adeguamento tecnologico ambientale e completamento del depuratore di Val da Rio	B1/55	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 134 29/11/2002	9.812.681,08	9.812.681,08	5.243.023,47	Progetto approvato				
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
25	Completamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione di Val da Rio. (€ 6.197.482,79)		DGR N. 794 DEL 9/4/2002					Finanziamento suddiviso neigi interventi 25A (€ 5.510.163,87) e 25B (€ 687.318,92)				
25A	Completamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione di Val da Rio. (€ 5.510.163,87)	1/Q/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		5.510.163,87			Progettazione in corso				
25B	Adeguamento tecnologico - ambientale e definitivo completamento del depuratore di Val da Rio - 1° lotto funzionale	1/Q/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 89 DEL 2004	687.318,92	687.318,92	0,00	Progetto approvato				
26	Risanamento e completamento dei sistemi fognari nei centri storici di Chioggia e Sottomarina	1/Q/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 139 30/08/2005	2.065.827,60	2.015.755,73	144.607,93	Lavori in corso				
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
27	Interventi urgenti per l'ottimizzazione dell'afflusso delle acque bianche e nere di Sottomarina al depuratore di Val da Rio tramite adeguamento dell'impianto di sollevamento e modulazione "Niccolò De Conti"	E/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.200.000,00			Progettazione in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
28	Completamento dei sistemi fognari nel centro storico di Sottomarina - I^ fase	E/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.400.000,00			Progettazione in corso				
29	Adeguamento dei sistemi fognari del centro storico di Chioggia in concomitanza dei lavori di difesa della città dalle acque alte	E/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.400.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				65.604.290,73	51.333.770,49	34.987.288,54					
	COMUNE DI CHIOGGIA - ACQUEDOTTI											
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Potenziamento servizio idrico frazioni Ca' Bianca e Valli		DGR N. 3002 DEL 26/05/1987		149.772,50	149.772,50	149.772,50	Lavori collaudati			05/10/1994	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n°81 del 13/04/1999. Importo finale intervento 164.640,48. Supero di spesa a carico dell'ente
2	Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio		DGR N. 4667 DEL 20/09/95		883.141,30	883.141,30	629.320,45	Lavori collaudati				Collaudo effettuato: in attesa dell'invio da parte dell'ente della relazione acclarante
	Legge 910/86 Es. 1987-1988											
3	Adeguamento impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio		DGR N. 4667 DEL 20/09/95		1.032.913,80	1.032.913,80	304.580,66	Lavori collaudati				Collaudo effettuato: in attesa dell'invio da parte dell'ente della relazione acclarante
	Legge 67/88 Es. 1988											
4	Realizzazione vasche di accumulo per acqua grezza alla centrale di Cavanella d'Adige		DGR N. 4171 DEL 24/9/1996	DDDA N. 577 24/12/1997	774.685,35	774.685,35	387.342,67	Lavori collaudati	29/01/1997	18/05/2001	20/12/2002	Collaudo effettuato: in attesa dell'invio da parte dell'ente della relazione acclarante
5	Rifacimento impianti di sollevamento a Cavanella d'Adige (acqua grezza e potabile)		DGR N. 2357 DEL 04/06/1996	DDDA N. 576 24/12/1997	413.165,52	413.165,52	206.582,76	Lavori collaudati	02/11/1995	06/07/1999		Collaudo effettuato: in attesa dell'invio da parte dell'ente della relazione acclarante
6	Razionalizzazione reti di distribuzione interna e recupero perdite dell'acquedotto di Chioggia		DGR N. 4442 DEL 27/7/1990	DDDA N. 61 12/3/1997	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Lavori collaudati	05/03/1996	24/02/2000	03/02/2003	Decreto di contabilità finale in preparazione.
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
7	Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia	B/21.2 Vfase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DGCA N. 180 31/05/2004	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Lavori ultimati				Intervento originario di € 19.780.812,18 affidato alla Delta Po S.p.A. ora Veneto Acque (int. 2)
	TOTALI				5.360.261,22	5.360.261,22	3.784.181,80					
	Totale Comune di Chioggia / A.S.P.				70.964.551,95	56.694.031,72	38.771.470,33					

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1997											
1A	Ampliamento della rete fognaria e realizzazione I stralcio dell'impianto di depurazione comunale della frazione Olmi in Comune di San Biagio di Callalta	B/13/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DDDA N. 43 01/06/1999	115.508,77	115.508,77	115.508,77	Intervento sospeso e fondi dirottati per € 1.549.370,70 all'intervento 7A.				Intervento revocato con DDDA n. 71 del 11/06/2001. DDEA 234/05 disimpegno € 1.433.861,93
1B	Progetto di ampliamento della rete fognaria e realizzazione primo stralcio dell'impianto di depurazione comunale in comune di S. Biagio di Callalta (TV)	B/13/1.1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997		1.433.861,93			Progettazione in corso				
	Legge 515/96 Es. 1998 – IV fase											
2	Interventi di fognatura in comune di Quarto d'Altino	A/9 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 63 01/09/2000	2.065.827,60	2.065.827,60	2.052.399,45	Lavori collaudati	09/10/2001	30/06/2003		Registrata, con DDDA n. 229 del 03/12/2004, un'economia di € 13.428,15
3	Interventi di fognatura nei comuni di Meolo, Marcon, S. Biagio di Callalta, Roncade per l'importo totale di € 5.422.797,44	A/8 IV fase	Finanziamento suddiviso negli interventi 4 (DDDA n. 78/2000), 5A e 5B (DDDA n. 94/2000), 6 (DDDA n. 61/2000) e 7 (DDDA n. 51/2000). Rimodulazione delle somme finanziate a seguito della DGR 3907/04 e DDDA233/05									
4	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Marcon	A/8.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 78 15/09/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati	18/10/2001	25/01/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 35 del 02/03/2005
5A	Costruzione della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta - Ampliamento della rete - II stralcio	A/8.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 94 30/10/2000	68.736,33	68.736,33	68.736,33	Fondi dirottati all'intervento 7A per l'importo di € 1.446.079,32.				DGR 3907/04 variante parziale al PRRA: rimodulazione finanziamenti. DDDA 233/05 disimpegno somme
5B	Interventi di fognatura nei comuni di Meolo, Marcon, S. Biagio di Callalta, Roncade.	A/8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999		1.377.342,98	0,00	0,00	Fondi provenienti dalla rimodulazione delle somme dell'intervento 3, come da DGR 3907/04				
6	Ampliamento della rete fognaria dei comuni di Meolo e Roncade	A/8.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 61 01/09/2000	1.549.370,70	1.549.370,70	1.542.032,77	Lavori collaudati	26/10/2001			Registrata, con DDDA n. 34 del 02/03/2005, un'economia di € 7.337,93
7	Costruzione della fognatura del Comune di S. Biagio di Callalta. Impianto di depurazione della Frazione Olmi - 2° stralcio	A/8.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 51 04/08/2000	877.976,75	0,00	0,00	Fondi dirottati nell'intervento 7A per l'importo di € 877.976,73.				DDDA 233/05 disimpegno somme
7A	Realizzazione di rete fognaria e relativi allacciamenti in conformità al nuovo Progetto Generale Definitivo (€ 3.873.426,75)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.549.370,70) + 5 (€ 1.446.079,32) + 7 (€ 877.976,73) = € 3.873.426,75					Redatto il progetto definitivo				
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 – VI fase											
8	Estensione ed adeguamento della rete fognaria e realizzazione allacciamenti nel comune di Quarto d' Altino - 3° stralcio	B/22	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 88 12/08/2002	1.755.953,46	1.755.953,46	1.580.358,11	Collaudo in corso	01/04/2003			

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
9	Interventi di fognatura in comune di Marcon	B/23	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA n. 70 del 13/06/2003	1.136.205,18	1.136.205,18	415.247,80	Lavori in corso				Erogazione limitata alla copertura delle spese di progettazione
10	Estensione ed adeguamento della rete fognaria e realizzazione allacciamenti nel comune di Monastier	B/24	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 86 12/08/2003	774.685,35	774.685,35	736.199,14	Contabilità finale	27/01/2003			DDDA 210/05 determinazione contributo definitivo : registrata economia € 38.486,21!
11	Interventi di fognatura in comune di S. Biagio di Callalta	B/25	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 100 14/10/2002	774.685,35	774.685,35	697.215,81	Collaudo in corso	25/02/2003			
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
12	Ampliamento impianti Quarto d'Altino e realizzazione impianto trattamento bottini	1/C/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 86 23/05/2005	1.549.370,70	1.549.370,70	104.645,68	Lavori in corso				
13	Realizzazione condotta da impianto depurazione di Roncade ad impianto di Quarto d'Altino (Costo del progetto € 2.400.000,00)	1/C/2	(ex 794 del 9/4/02) DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 1 DEL 07/01/2004	2.892.158,61	2.400.000,00	94.172,00	Lavori in corso				Il residuo, rispetto al costo del progetto pari a € 492.158,63, è riallocato nell'intervento 15A con DDDA n. 1/2004
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
14	Realizzazione condotta di collegamento dall'impianto di depurazione di Roncade all'impianto di depurazione di Quarto d'Altino	6/C/1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA 235 15/12/2005	200.000,00	200.000,00	0,00					
15	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Monastier di Treviso	6/C/2	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		504.000,00							
16	Progetto definitivo relativo al collegamento fognario tra Monastier e Roncade - tratto tra la frazione di Vallio e Roncade.	6/C/2.1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA 235 15/12/2005	796.000,00	796.000,00	0,00					
17	Adeguamento al D.M. 30/07/99 dell'impianto di depurazione di Meolo capoluogo	6/C/3	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 178 24/09/2004	1.300.000,00	1.300.000,00	658.780,00	Lavori in corso				
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
17	Intervento in Comune di Quarto D'Altino - riconversione fognature esistenti da miste a nere ed ampliamento rete esistente. Via De Gasperi e Via IV Novembre	E/16.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		779.520,00			Progetto approvato				
18	Intervento in Comune di Roncade - realizzazione di interventi per costruzione condotte fognarie in Via Carboncine e Via Dary	E/16.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		666.080,00			Progetto approvato				
19	Intervento in Comune di Marcon - riconversione fognature esistenti da miste a nere ed ampliamento rete esistente. Vie zermanesa, Monte Pelmo, Tofane, Cristallo, Ortolan, Don Bosco e Ancilotto	E/16.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		853.200,00			Progetto approvato				
	TOTALI				23.019.854,41	16.035.714,14	9.614.666,56					

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI AMBIENTALI (SE.T.A.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 139/92 Megg. Mutui II^fase											
1	Completamento dell' impianto di depurazione di Camposampiero	6/A/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		1.000.000,00			Finanziamento convogliato nell'intervento 1A				
1A	Realizzazione del centro di biotrattamenti di Camposampiero (importo progetto del 1998 pari a € 22.790.470,34, aggiornato al settembre 2003 in € 26.724.765,46)		Finanziato parzialmente con i fondi dei finanziamenti 1 SE.T.A. (€ 1.000.000,00) + 2 Tergola (€ 2.582.284,50) + 5 Tergola (€ 4.338.237,95) + 18 Tergola (€.11.878.509,68) + 38 Tergola (€ 6.249.128,48) + 54 Tergola (€ 516.456,90) = € 26.564.616,50					Lavori in corso	14/01/2003			La differenza tra l'importo di progetto e l'importo finanziato è a carico dell'ente
2	Completamento dell' impianto di depurazione di Vigonza	6/A/2	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		515.000,00			Finanziamento convogliato nell'intervento 2A				
2A	Completamento dell' impianto di depurazione di Vigonza e diversione scarico in fiume Brenta (€ 2.890.701,74)		Riuniti i finanziamenti 2 SE.T.A. (€ 515.000,00) + 35G Tergola (€ 826.331,04) + 74 Tergola (€ 1.549.370,70) = € 2.890.701,74					Progettazione in corso				
3	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999: collegamento dell' impianto di depurazione minore di via Fabris di Camposampiero con l' impianto principale.	6/A/3	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		460.000,00			Progettazione in corso				
4	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Onara di Tombolo.	6/A/4	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.115.000,00			Progettazione in corso				
5	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999: collegamento (con dismissione) dell' impianto di depurazione di Battaglia Terme con l' impianto di depurazione di Montegrotto T. con relative opere di adeguamento dimensionale di quest' ultimo.	6/A/5	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.750.000,00			Progettazione in corso				
6	Interventi di fognatura nei comuni di S. Martino di Lupari frazioni Caprette e Borghetti, Villa del Conte e S. Giustina in Colle fraz. Fratte	6/A/6	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.000.000,00			Progettazione in corso				
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
7	Impianto di depurazione di Vigonza: completamento ed adeguamento trattamenti terziari	E/17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		800.000,00			Progettazione in corso				
8	Impianto di depurazione di Onara: dismissione impianto depurazione di Onara e collegamento all'impianto di depurazione di Cittadella	E/18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		308.000,00			Progettazione in corso				
9	Completamento rete fognaria Galzignano e Battaglia, dismissione impianto di depurazione di Battaglia, collegamento all'impianto di depurazione di Montegrotto e suo potenziamento fino a 30.000 A.E.	E/19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00			Progettazione in corso				
10	Impianto di depurazione di Camposanpiero: seconda fase digestione anaerobica, completamento compostaggio aerobico, viabilità	E/20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progettazione in corso				
11	Impianto di depurazione di Cittadella: opere di completamento (acquedotto duale e trattamento sabbie)	E/21	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progettazione in corso				
12	Intervento in Comune di Trebaseleghe - Via Ronchi , Obbia Alta e Bassa	E/22.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		208.000,00			Progettazione in corso				

13	Intervento in Comune di Trebaseleghe - Via Villanova	E/22.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 77 11/05/2005	240.000,00	240.000,00	147.461,31	Lavori in corso				
14	Intervento in Comune di Cittadella - Via delle Sorgenti	E/22.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 24 14/02/2005	42.000,00	42.000,00	37.800,00	Lavori in corso				
15	Intervento in Comune di Villa del Conte - Via degli Alpini, Don Carrara, Marconi, Maso Moro, Tergola	E/22.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		755.600,00			Progettazione in corso				
16	Intervento in Comune di Massanzago - Via Roma, Stradona, Padovane, Cà Zorzi e Bigolo	E/22.5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		240.000,00			Progettazione in corso				
17	Intervento in comune di S. Giorgio delle Pertiche: collegamento Imp. Selezione frazione secca, della SS 307 e di via Anconetta, nonché fognatura nera nelle vie Montegrappa e Ceccarello	E/22.6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.060.000,00			Progettazione in corso				
18	Intervento in Comune di Piombino Dese - Via Piave, Massari, Stiffoni	E/22.7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		160.000,00			Progettazione in corso				
19	Intervento in Comune di Piombino Dese - riqualifica funzionale rete fognaria del capoluogo	E/22.8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00			Progettazione in corso				
20	Intervento in Comune di S. Martino di Lupari - riqualifica funzionale rete fognaria del capoluogo	E/22.9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.800.000,00			Progettazione in corso				
21	Intervento in Comune di S. Martino di Lupari/S. Giustina in Colle - collegamento fraz. Campretto - Borghetto - Fratte a S. Giustina in Colle - 2° Stralcio	E/22.10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		800.000,00			Progettazione in corso				
22	Intervento in Comune di Campodarsego - riqualifica funzionale rete fognaria del capoluogo	E/22.11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.600.000,00			Progettazione in corso				
23	Intervento in Comune di Resana - interventi di riqualificazione del sistema fognario	E/22.12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.120.000,00			Progettazione in corso				
24	Interventi di fognatura nei comuni del comprensorio	E/22.13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione in corso				
25	Intervento in comune di Noventa Padovana: fognatura nera nelle vie Marezzane, Marco Polo e laterali e completamento delle opere di fognatura in depressione lungo via Noventana e laterali	E/22.14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		450.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				28.123.600,00	282.000,00	185.261,31					

AZIENDA CONSORZIO ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 539/95 Es. 1997											
1	Adeguamento depuratore di Battaglia Terme	C/30/2	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 126 13/3/1998	428.659,23	428.659,23	428.659,23	Per questo progetto sono stati utilizzati anche fondi CIPE (n.74/97) per un importo totale di € 1.032.913,80. Lavori collaudati	01/02/1999	08/02/2001	20/05/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 32 del 2/4/2003
	Legge 515/96 Es. 1997											
2	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Battaglia Terme	A/7/2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 58 22/8/2000	568.102,59	568.102,59	468.442,37	Lavori in corso	31/07/2002			

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
3	Ampliamento della fognatura in località Regazzoni nei comuni di Montegrotto T. e Galzignano T.	B/12 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 62 DEL 4/6/2002	1.032.913,80	1.032.913,80	929.622,42	Lavori in corso	18/07/2002			
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
4	Interventi di fognatura ed adeguamento impianto di depurazione in Comune di Battglia Terme	B/53	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 149 13/09/2005	813.420,94			Finanziamento originale pari a € 1.342.787,94 diviso negli interventi 4A (€ 529.367,32) e 4B (€ 813.420,62).				
4A	Ampliamento rete fognaria in Comune di Battaglia Terme (€ 529.367,32)		DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 149 13/09/2005	529.367,00	529.367,00	0,00	Progettazione in corso				
4B	Ampliamento rete fognaria in Comune di Montegrotto Terme (€ 813.420,62)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 4					Progettazione in corso				
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
5	Interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Battaglia Terme, Galzignano Terme e Montegrotto Terme.	1/G/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		980.509,25							
5A	Completamento fognatura nera e ristrutturazione tratti di condotta in comune di Galzignano Terme (PD)	1/G/1.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 20 09/02/2005	774.685,35	774.685,35	39.949,14					
5B	Ampliamento ed adeguamento della rete di fognatura nera in comune di Battaglia Terme.	1/G/1.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 149 13/09/2005	310.633,00	310.633,00	0,00					
	TOTALI				5.438.291,15	3.644.360,96	1.866.673,16					

AZIENDA CONSORZIO ALTA SERVIZI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche											
1	Ampliamento impianto di depurazione di Onara	1/4.6	DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	DPGR 2207 31/10/1995	1.239.496,56	1.239.496,56	1.239.496,56	Lavori collaudati	04/12/1996	16/10/2001	12/04/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 155 del 30/10/2003
2	Collettore fognario di adduzione Ovest Fontaniva - Cittadella - Tombolo	1/4.6	DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	DDDA N. 70 18/10/1995	2.633.930,19	2.633.930,19	2.633.907,51	Lavori collaudati	02/09/1999	23/07/1999	15/10/2001	Registrata, con DDDA n. 47 del 9/05/2002, una economia di € 22,68
	Legge 139/92 II fase											
3	Collettore Campretto - Lovari nel comune di S. Martino di Lupari	1/D/1	DGR N. 4987 DEL 3/10/1995	DGCA N. 380 2/10/1997	2.091.650,44	2.091.650,44	2.091.650,44	Lavori collaudati (eseguiti con 2 appalti)	30/03/1998 10/10/2001	17/07/2002 12/02/2003	09/06/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 63 del 30/03/2004
4	Adeguamento strutture fognarie: fognatura nell'area sud di S. Martino di Lupari, Lovari e collegamento al depuratore di Onara	1/D/2	DGR N. 4987 DEL 3/10/1997	DGCA N. 387 2/10/1997	2.194.941,82	2.194.941,82	2.194.941,83	Lavori collaudati (eseguiti con 2 appalti)	08/07/1998 17/02/2003	04/08/2000 -	27/05/2002 -	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 177 del 11/10/2005

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 539/95 Es. 1997											
5	Fognatura di Cittadella e Fontaniva	C/31/1	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGCA N. 527 1/12/1997	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	Lavori collaudati	26/08/1998 21/02/2000	21/01/2003 26/04/2002	26/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 62 del 30/03/2004
	Legge 515/96 Es. 1997											
6	Progetto n. 7 . Adeguamento impianto elettrico e cogenerazione depuratore di Cittadella.	A/3/1.a	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 60 4/11/1998	408.000,95	408.000,95	369.156,83	Lavori collaudati	11/02/2003	07/10/2003	28/10/2003	Registrata, con DDDA n. 164 del 31/08/2004, un'economia di € 38.844,13
7	Progetto n. 8 . Ottimizzazione impianto consorziale di Cittadella	A/3/1.b	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 60 4/11/1998	1.996.105,92	1.996.105,92	1.996.105,92	Lavori collaudati	03/05/2000	01/12/2001	25/10/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 164 del 31/08/2004
8	Progetto n. 6. Scolmatore roggia Munara	A/3/1.c	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 60 4/11/1998	436.406,08	436.406,08	436.406,08	Lavori collaudati	30/11/2000	30/11/2001	20/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 164 del 31/08/2004
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
9	Progetto "Laguna 9" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area di Cittadella e Fontaniva	A/10.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 70 13/9/2000	2.014.181,91	2.014.181,91	2.014.181,91	Lavori collaudati	29/01/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 246 del 30/12/2005
10	Progetto "Laguna 10" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area est di Cittadella, Galliera e Tombolo	A/10.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 72 13/9/2000	1.910.890,53	1.910.890,53	1.910.890,52	Lavori collaudati	27/03/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 245 del 30/12/2005
11	Progetto "Laguna 11" - Progetto della rete di fognatura nera nell'area dei comuni di Tombolo e San Martino di Lupari.	A/10.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 71 13/9/2000	1.910.890,53	1.910.890,53	1.579.788,84	Lavori in corso	27/03/2001			
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
12	Interventi di fognatura nei comuni di Cittadella, Galliera V.ta, Tombolo, S.Giorgio in Bosco, S. Martino di Lupari	B/26	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 170 12/12/2001	7.746.853,49	7.746.853,49	4.915.867,22	Lavori in corso				
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
13	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Cittadella con incremento da 60,000 a 75,000 A.E.	1/D/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		10.329.137,98			Progettazione in corso				
	TOTALI				36.565.148,46	26.236.010,47	23.035.055,74					

AZIENDA CONSORZIO DEL TERGOLA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 67/88 Es. 1991											
1	Impianto di Vigonza (PD)		DGR N. 4975 2/11/1993	DPGR 2267 6/11/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
2	Interventi nel settore della zootecnia dell'alta padovana		DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DGR N. 561 DEL 2/3/1999	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Lavori in corso	01/03/2000			Le opere eseguite vanno a far parte dell'intervento 1A SE.T.A. "Centro di biotrattamento di Camposampiero", il cui nuovo termine dei lavori è stabilito al 19/11/2008 con DDDA n. 173/2003.
	Legge 139/92 Es. 1993											
3	Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Appalti A e B	1/A/1	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 51 21/6/1995	16.165.100,94	16.165.100,94	16.165.100,94	Lavori collaudati	29/01/1996 16/01/1996 23/05/1997	29/07/1999 28/12/1998 04/08/2000	15/10/2000 07/07/2001 28/12/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 95 del 23/09/2002
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza	1/A/2	DGR N. 4977 2/11/1993	DPGR 2267 6/11/1995	6.507.356,93	6.507.356,93	6.507.356,93	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				
4A	Esecuzione dei lavori di ampliamento impianto di depurazione di Vigonza (€ 7.540.270,73)		Riuniti i finanziamenti 1 (€ 1.032.913,80) + 4 (€ 6.507.356,93) = € 7.540.270,73					Lavori collaudati	24/09/1996	07/07/1999 28/07/1999	10/02/2000 15/02/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 4 del 15/01/2001 per € 7.540.270,73
5	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero	1/A/3	DGR 4977 2/11/1993	DPGR 2391 24/11/1995	4.338.237,95	4.338.237,95	4.338.237,95	Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SE.T.A.				
6	Progetto del collettore di collegamento della rete di Loreggia al depuratore di Camposampiero - XV lotto	1/A/4	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 54 12/10/1994	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori collaudati	20/11/1995	30/11/1996	09/03/1999	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 45 del 09/05/2002
7	Collettore di collegamento della rete di Borgoricco alla rete consortile a Villanova di Camposampiero e costruzione fognatura Via Roma e S. Lorenzo a Borgoricco	1/A/5	DGR N. 4977 2/11/1993	DDDA N. 53 12/10/1994	1.652.662,08	1.652.662,08	1.651.834,57	Lavori collaudati	02/09/1996 01/06/2000	26/07/1999 27/06/2001	30/10/2001 06/12/2001	Registrata, con DDDA n. 14 del 15/01/2004, un'economia di € 827,51
	Legge 539/95 Es. 1996											
8	Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e Margarise e della pista ciclabile in comune di S.Giorgio delle Pertiche	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 82 9/12/1998	110.005,32	110.005,32	110.005,32	Finanziamento convogliato nell'intervento 21A				
9	Ampliamento rete fognaria comunale di Borgoricco	1/E/4	DGR N. 4533 8/11/1996	DGCA N. 17 12/1/1998	129.114,22	129.114,22	129.114,22	Lavori collaudati	19/08/1999	03/07/2000	18/10/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 13 del 21/02/2001
10	Progetto esecutivo di ampliamento rete fognaria comunale di Massanzago	1/E/4	DGR N. 4533 8/11/1996	DGCA N. 16 12/1/1998	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Lavori collaudati	19/08/1999	03/07/2000	27/11/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 69 del 08/06/2001
11	Ampliamento rete fognaria in comune di Vigonza.	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1996	DGCA N. 54 DEL 2/2/1998	356.355,26	356.355,26	356.355,26	Lavori collaudati	27/07/1998	05/07/1999	05/05/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 5 del 15/01/2001
12	Completamento del collegamento fognario tra Cavino di S. Giorgio delle Pertiche e Campodarsego	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1996	DGCA N. 53 DEL 2/2/1998	380.628,73	380.628,73	380.628,73	Lavori collaudati	12/10/1998	04/10/2000	21/06/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 46 del 09/05/2002
13	Progetto fognatura acque nere in comune di Villanova di Camposampiero - I stralcio	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1996	DGCA N. 124 13/3/1998	201.418,19	201.418,19	201.418,19	Lavori collaudati	06/07/1998	10/05/1999	15/09/2000	Registrata una economia di € 56.810,26, reimpegnata nell'intervento 13 bis come da DDDA N. 113 del 18/10/2002

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
13 bis	Realizzazione rete fognatura nera nelle vie Cavin Caselle, Cornara, Cavin del Do' e piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero	1/E/4.1	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 28 26/3/2003	56.810,26	56.810,26	56.810,26	Finanziamento convogliato nell'intervento 68A con DDDA N. 28 del 26/03/2003				Utilizzata l'economia di € 56.810,26 del finanziamento 13
14	Progetto esecutivo integrato dell'allargamento e della fognatura di Via Bassa 1^ in comune di Campodarsego	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 160 DEL 1/4/1998	335.696,98	335.696,98	335.696,98	Lavori collaudati	05/03/1999	27/07/2000	08/03/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 153 del 30/10/2003
15	Progetto rete fognaria comune di Noventa Padovana	1/E/4	DGR N. 4533 15/10/1996	DDDA N. 17 27/5/1998	289.215,86	289.215,86	289.215,86	Lavori collaudati	03/02/1999	20/09/2000	19/12/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 70 del 08/06/2001
	Legge 539/95 Es. 1997											
16	Collettore fognario Abbazia Pisani-Villa del Conte-S. Giustina in Colle	C/32/1	DGR N. 553 25/2/1997	DGCA N. 28 19/1/1998	1.962.536,22	1.962.536,22	1.962.536,22	Lavori collaudati	15/12/1998	28/02/2001	28/01/2002	Registrata una economia di € 258.228,45. reimpegnata nell'intervento 16 bis come da DDDA N. 112 del 18/10/2002
16 bis	Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani. (€ 258.228,45)	C/32/1.1	DGR N. 553 25/2/1997	DDDA N. 27 26/3/2003	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Finanziamento convogliato nell'intervento 76H				Utilizzata, con DDDA n. 27 del 26/03/2003, l'economia di € 258.228,45 dell'intervento 16
17	Ampliamento impianto di depurazione di Cadoneghe	A/5.2	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 33 DEL 5/5/1999	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 44A				
18	Impianto di biotrattamento di Camposampiero	A/5/1	DGR N. 561 DEL 2/3/1999		11.878.508,68	11.878.508,68	11.878.508,68	Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SETA				
19	Progetto fognatura nera in comune di S. Giustina in Colle	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 1 DEL 3/2/1999	281.469,01	281.469,01	281.469,01	Lavori collaudati	22/04/1999	02/10/2000	08/01/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 143 del 12/11/2001
20	Progetto fognatura nera in comune di Cadoneghe	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 16 DEL 2/3/1999	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Lavori collaudati	22/06/1999	21/12/2000	30/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 94 del 23/09/2002
21	Progetto fognatura nera lungo le vie Roma e Margarise e della pista ciclabile in comune di S. Giorgio delle Pertiche	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 82 9/12/1998	122.400,29	122.400,29	122.400,28	Finanziamento convogliato nell'intervento 21A				
21A	Realizzazione fognatura nera lungo le vie Roma e Margarise e pista ciclabile lungo via Roma in Comune di S. Giorgio delle Pertiche (€ 232.405,60)		Riuniti i finanziamenti 8 (€ 110.005,32) + 21 (€ 122.400,29) = € 232.405,60					Lavori in fase di collaudo	18/11/1999	17/10/2002		L'importo del finanziamento regionale è pari a € 232.405,60. Il residuo, rispetto all'importo di progetto di € 521.621,47 resta a carico dell'ente. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 57/2004
22	Progetto rete fognaria di Via Ronchi in comune di Loreggia	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 83 9/12/1998	299.545,00	299.545,00	299.545,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 66A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 12 del 31/01/2005
23	Progetto per l'estensione della rete fognaria nei Comuni di Trebaseleghe e Camposampiero e adeguamento impianto di sollevamento.	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 50 25/6/1999	1.259.121,92	1.259.121,92	1.259.121,92	Lavori collaudati	06/03/2000 25/05/2000	19/10/2001 19/01/2001	30/04/2002 30/07/2001	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 154 del 30/10/2003

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
24	Progetto rete fognaria in comune di Saonara.	A/5.3	DGR N. 2613 22/7/1997	DDDA N. 52 25/6/1999	309.874,14	309.874,14	309.874,13	Lavori collaudati	07/06/2000			Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 100 del 10/06/2005
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
25	Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani	A/1.14 - IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 161 3/12/2001	258.228,45	258.228,45	258.228,45	Finanziamento convogliato nell'intervento 76H				
26	Progetto esecutivo per il completamento della rete fognaria nelle vie Carpane e Col di Lana in Comune di Vigonza (Pd)	A/1.5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 92 30/10/2000	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori collaudati	30/07/2001			Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 9 del 21/01/2005
27	Realizzazione del bypass fognario in Comune di S. Giustina in Colle	A/2.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 77 15/9/2000	387.342,67	387.342,67	387.342,67	Lavori collaudati	04/07/2001 09/12/2002	27/06/2002 31/12/2002	18/11/2002 25/07/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 170 del 17/11/2003
28	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Giovanni XXIII, Cao del Mondo e Puccini in comune di Camposampiero	A/1.8 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 116 19/12/2000	89.347,04	89.347,04	89.347,04	Finanziamento convogliato nell'intervento 50A				
29	Rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana.	A/1.9 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 50 DEL 4/8/2000	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 56A				
30	Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcanton e Muson in comune di Borgoricco	A/1.11 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 85 30/7/2001	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Finanziamento convogliato nell'intervento 63A				
31	Progetto esecutivo per la realizzazione del collettore fognario di collegamento della frazione di Fiumicello di Campodarsego alla rete consortile principale	A/1.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 76 15/9/2000	619.748,28	619.748,28	557.773,46	Appalto A lavori in collaudati Appalto B lavori in corso	30/07/2001 26/05/2003	27/09/2002 -	26/02/2003 -	
32	Rete fognaria nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana	A/2.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 50 DEL 4/8/2000	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Finanziamento convogliato nell'intervento 56A				
33	Progetto esecutivo per il completamento della rete fognaria nera nelle vie Julia, Trieste, Muggia e Parenzo in Comune di Vigonza (Pd)	A/1.6 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 93 30/10/2000	144.607,93	144.607,93	130.147,14	Lavori in corso	03/04/2002			
34	Progetto esecutivo per l'ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Russia	A/1.7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 97 30/10/2000	165.266,21	165.266,21	165.266,21	Finanziamento convogliato nell'intervento 67A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004
35	Interventi di fognatura nei comuni consorziati e negli impianti di depurazione di Vigonza e Cadoneghe	A/1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		1.675.698,87			Finanziamento suddiviso dall'ente in 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 35F e 35G				
35A	Collegamento stradale e fognario Z.I. laterale Via Visentin con Via Straelle San Pietro in Comune di Camposampiero (€ 88.364,63)	A/1.18 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 35 04/02/2004	88.425,43	88.425,43	79.582,89	Collaudo in corso				
35B	Riqualifica della rete di fognatura nera nelle Vie: prolungamento e lottizzazione Fratina e Bassa I^a in comune id Campodarsego - Rostirola in comune di Camposampiero (€ 516.456,90)	A/1.17 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 123 10/09/2003	516.456,90	516.456,90	145.970,10	Progetto approvato				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35
35C	Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Straelle, Bonora, S. Pietro, Straelle di Rustega e del Graticolato Romano nei Comuni di Camposampiero, Borgoricco e Massanzago - 1° stralcio (€ 51.645,69)	A/1.16 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 91 06/08/2003	51.645,69	51.645,69	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 72A				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
35D	Riqualifica della rete di fognatura nera nelle Vie: Rigotti e Matteotti in comune di Cadoneghe - S. Francesco, Goldoni e S. Chiara in Comune di Vigonza - Don Orione in Comune di Trebaseleghe (€ 1.032.913,80)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35					In fase di progettazione	-			
35E	Costruzione di una fognatura nera lungo Via Capriccio in Comune di Vigonza (€ 191.089,05)	A/1.15 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 72 13/06/2003	191.089,05	191.089,05	191.089,05	Finanziamento convogliato nell'intervento 58A				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35
35F	Interventi nei Comuni ex Tergola (€ 331.514,83)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35					Finanziamento convogliato nell'intervento 76G				
35G	Completamento impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in fiume Brenta (€ 826.331,04)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 35					Finanziamento convogliato nell'intervento 2A gestito dalla subentrante SETA				
35H	Estensione fognatura nera lungo la strada regionale 245 "Castellana" in comune di Trebaseleghe	A/1.19 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 21 09/02/2005	165.000,00	165.000,00	136.503,23	Lavori in corso				
35I	Realizzazione rete di fognatura nera nelle vie Trevisan, Manara ed Umberto I° in comune di Vigonza	A/1.20 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 25 14/02/2005	350.000,00	350.000,00	0,00	Progetto approvato				
36	Estensione delle reti di fognatura nera nelle vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in comune di S. Giustina in Colle	A/2.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 115 19/12/2000	247.899,31	247.899,31	247.899,31	Finanziamento convogliato nell'intervento 60A				
37	Progetto esecutivo per il collegamento della zona industriale di S. Giorgio delle Pertiche alla rete di fognatura nera comunale e riabilitazione rete principale nei Comuni di Borgoricco e Massanzago.	A/1.2 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 56 22/8/2000	404.385,75	404.385,75	404.385,75	Lavori collaudati	02/07/2001	05/09/2002	19/03/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 96 del 18/08/2003
38	Completamento centro di biotrattamento di Camposanpiero	B/20 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		6.249.128,48	5.285.000,00	2.732.505,34	Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SE.T.A.				
39	Collettore di collegamento fognario Resana - Torreselle	A/2.4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 31 21/3/2001	2.030.418,74	2.030.418,74	1.896.852,79	Finanziamento convogliato nell'intervento 65A				Registrata, con DDDA n. 179 del 12/10/2005, un'economia di € 35.408,86 convogliata nell'intervento 39A
39A	Intervento per la riqualificazione del sistema fognario del comune di Resana - Realizzazione della rete fognaria separata in località Castelminio	A/2.4 IV fase ECO	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 179 12/10/2005	35.408,86	35.408,86	0,00	Progetto approvato				
40	Ampliamento della rete fognaria nelle vie Stroppari e Piovega Nord in comune di Villanova di Camposampiero.	A/1.10 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 84 30/7/2001	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Finanziamento convogliato nell'intervento 70A				
41	Progetto esecutivo per il collegamento della rete fognaria di Via dell'Industria in Comune di Borgoricco alla fognatura comunale.	A/1.3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 57 22/8/2000	65.073,57	65.073,57	65.073,57	Lavori collaudati	04/12/2001	01/07/2002	02/09/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA N. 97 del 18/08/2003
42	Nuovo by-pass della rete di fognatura in comune di Loreggia	A/2.5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 88 30/7/2001	139.443,36	139.443,36	139.443,36	Finanziamento convogliato nell'intervento 47A				
43	Nuovo by-pass della rete fognatura in comune di Loreggia	A/1.12 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 88 30/7/2001	224.658,75	224.658,75	224.658,75	Finanziamento convogliato nell'intervento 47A				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
44	Progetto di ampliamento del depuratore di Cadoneghe (PD)	A/1.1 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 54 DEL 4/8/2000	774.685,35	774.685,35	772.526,83	Finanziamento convogliato nell'intervento 44A				Registrata, con DDDA n. 176 del 11/10/2005, un'economia di € 2.158,52
44A	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe (€1.807.599,15)		Riuniti i finanziamenti 17 (€ 1.032.913,80) + 44 (€ 774.685,35) = € 1.807.599,15					Opere in fase di collaudo	03/07/2000	24/04/2003		
45	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe - 2^ fase	A/1.13 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 124 4/10/2001	2.117.473,29	2.117.473,29	1.551.741,49	Finanziamento convogliato nell'intervento 73A				
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
46	Interventi di fognatura nera in comune di Massanzago	B/12	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 105 18/10/2002	309.874,14	309.874,14	278.886,72	Lavori in corso				
47	Interventi di fognatura in comune di Loreggia	B/3.2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 88 30/7/2001	358.937,54	358.937,54	172.073,22	Finanziamento convogliato nell'intervento 47A				
47A	Costruzione di un nuovo by-pass della rete fognaria di Loreggia (€ 723.039,65)		Riuniti i fondi dei finanziamenti 42 (€ 139.443,36) + 43 (€ 224.658,75) + 47 (€ 358.937,54) = € 723.039,65					Lavori in corso	15/05/2002			
48	Riqualificazione della rete di fognatura mista del comune di Campodarsego e dell' area denominata "Fornace"	B/7	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 52 DEL 9/5/2001	516.456,90	516.456,90	464.811,21	Lavori in corso	02/05/2002			
49	Interventi di fognatura in comune di Campodarsego loc. Fiumicello (PD)	B/8	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 14 22/2/2002	1.136.205,18	1.136.205,18	703.138,31	Lavori in corso				
50	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Giovanni XXIII, Cao del Mondo e Puccini in comune di Camposanpiero	B/11	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 116 19/12/2000	413.165,52	413.165,52	297.561,97	Finanziamento convogliato nell'intervento 50A				
50A	Esecuzione della rete di fognatura nera in via Giovanni XXIII e via Cao del Miondo e Puccini a Camposampiero (€ 502.512,56)		Riuniti i finanziamenti 28 (€ 89.347,04) + 50 (€ 413.165,52) = € 502.512,56					Lavori in corso	02/05/2002			
51	Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcanton e Muson in comune di Borgoricco	B/9	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 85 30/7/2001	258.228,45	258.228,45	103.291,38	Finanziamento convogliato nell'intervento 63A				
52	Interventi di fognatura in comune di Cadoneghe	B/10	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 56 27/5/2003	258.228,45	258.228,45	130.385,08	Lavori in corso				
53	Interventi di fognatura in comune di Resana	B/15.2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 150 13/09/2005	154.937,07	154.937,07	0,00	Progetto approvato				
54	Impianto di depurazione di Camposanpiero	B/20	DGR N. 1834 23/6/2000		516.456,90			Finanziamento convogliato nell'intervento 1A gestito dalla subentrante SETA				
55	Estensione rete di fognatura nera lungo le vie Granzetta e Morosini in comune di Saonara - 2° tronco	B/17	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 149 19/11/2001	258.228,45	258.228,45	232.405,61	Lavori in corso	20/02/2002			
56	Rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in comune di Noventa Padovana	B/13. 1	DGR N. 1834 DEL 3/6/2000	DDDA N. 98 30/10/2000	330.532,42	330.532,42	330.532,42	Finanziamento convogliato nell'intervento 56A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 112 del 11/07/2005
56A	Realizzazione rete di fognatura nera a servizio della località Noventana in Comune di Noventa Padovana (€ 1.879.903,12)		Riuniti i finanziamenti 29 (€ 516.456,90) + 32 (€ 1.032.913,80) + 56 (€ 330.532,42) = € 1.879.903,12					Opere in fase di collaudo	04/08/2000 30/10/2002	19/06/2003		
57	Impianto di depurazione di Cadoneghe	B/21	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 124 4/10/2001	413.165,52	413.165,52	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 73A				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
58	Interventi di fognatura in comune di Vigonza	B/6.2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 72 13/06/2003	144.607,93	144.607,93	111.038,23	Finanziamento convogliato nell'intervento 58A con DDDA N. 72 del 13/06/2003				
58A	Costruzione di una fognatura lungo via Capriccio in Comune di Vigonaza (€ 335.969,98)		Riuniti i finanziamenti 35E (€ 191.089,05) + 58 (€ 144.607,93) = € 335.969,98					Lavori in corso				
59	Interventi di fognatura nera e pista ciclabile in via Montello, I° e II° tronco, in comune di Trebaseleghe - 1° stralcio.	B/2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 51 DEL 9/5/2001	516.456,90	516.456,90	464.811,21	Lavori in corso	08/04/2002			
60	Estensione delle reti di fognatura nera nelle vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in comune di S. Giustina in Colle	B/4	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 115 19/12/2000	516.456,90	516.456,90	379.271,71	Finanziamento convogliato nell'intervento 60A				
60A	Estensione della rete fognaria nera nelle vie Ghiacciaia, Pio X e Montegrappa in Comune di Santa Giustina in Colle (€ 764.356,21)		Riuniti i finanziamenti 36 (€ 247.899,31) + 60 (€ 516.456,90) = € 764.356,21									
61	Rete fognaria nella via Palù e sistemazione rete nelle vie Stiffonie villaggio Europa in comune di Piombino Dese.	B/14	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 35 DEL 3/4/2001	309.874,14	309.874,14	278.886,72	Lavori in fase di collaudo	03/04/2002	28/05/2003		
62	Condotta fognaria in via Marconi e laterali in comune di Noventa Padovana	B/13.2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 86 30/7/2001	547.444,31	547.444,31	416.603,21	Lavori in corso	09/01/2003			
63	Condotta di by-pass impianto di depurazone Camposanpiero (vedi Dgr 1834/00)Rete di fognatura nera nelle vie Sabbadina, Lovara, Malcanton e Muson in comune di Borgoricco	B/19	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 85 30/7/2001	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Finanziamento convogliato nell'intervento 63A				
63A	Realizzazione rete di fognatura nelle vie di Sabbadina, Lovara, Malcanton in Comune di Borgioricco (€ 1.549.370,70)		Riuniti i finanziamenti 30 (€ 774.685,35) + 51 (€ 258.228,45) + 63 (€ 516.456,90) = € 1.549.370,70					Lavori in corso	23/05/2002			
64	Completamento del collettore fognario Abbazia Pisani - Villa del Conte e della pista ciclabile lungo le vie Cardinale Priuli, Militare e Rettilineo.	B/5.1	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 121 29/12/2000	619.748,28	619.748,28	557.773,45	Lavori in corso	04/12/2001 30/06/2003			
65	Collettore di collegamento fognario Resana - Torreselle.	B/15.1 VI^ fase	DGR N. 1834 DEL 3/6/2000	DDDA N. 31 21/3/2001	359.157,14	359.157,14	359.157,14	Finanziamento convogliato nell'intervento 65A				Finanziamento originale par a € 619.748,28. Con DDDA n. 179/2005 disimpegnata somma di € 260.591,14 e convogliata nell'in. 65B
65 A	Collagamento fognario Resana - Torreselle (€ 2.389.575,88)		Riuniti i finanziamenti 39 (€ 2.030.418,74) + 65 (€ 359.157,14) = € 2.389.575,88					Opere in fase di collaudo	23/05/2002	20/05/2003		
65 B	Intervento per la riqualificazione del sistema fognario del comune di Resana - Realizzazione della rete fognaria separata in località Castelminio	B/15.1 ECO	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 179 12/10/2005	260.591,14	260.591,14	0,00	Progetto approvato				
66	Progetto definitivo per la realizzazione della rete fognaria di via Ronchi in comune di Loreggia (PD)	B/3.1	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 23 26/2/2001	157.519,35	157.519,35	157.519,35	Finanziamento convogliato nell'intervento 66A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 12 del 31/01/2005
66A	Realizzazione fognature acque nere e pista ciclabile lungo la SP 71 nel Comune di Loreggia (€ 475.064,35)		Riuniti i finanziamenti 22 (€ 299.545,00) + 66 (€ 157.519,35) = € 475.064,35					Lavori collaudati	13/10/1999	06/04/2002	18/11/2002	L'importo del finanziamento regionale è pari a € 475.064,35. Il residuo, rispetto all'importo di progetto di € 846.989,30 resta a carico dell'ente.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
67	Ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Russia	B/16	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 97 30/10/2000	464.811,21	464.811,21	464.811,21	Finanziamento convogliato nell'intervento 67A				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004
67A	Ampliamento della rete fognaria comunale di S. Giorgio delle Pertiche nelle vie Fornace e Russia (appalto A) e completamento degli stessi (appalto B) (€ 630.077,42)		Riuniti i finanziamenti 34 (€ 165.266,21) + 67 (€ 464.811,21) = € 630.077,42					Lavori collaudati	30/07/2001 21/01/2003	26/09/2003 02/07/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 238 del 17/12/2004
68	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Cavin Caselle Cornara, Cavin del Do e Piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero	B/18.2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 135 30/10/2001	335.696,98	335.696,98	262.453,37	Finanziamento convogliato nell'intervento 68A con DDDA N. 28 del 26/03/2003				
68A	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie Cavin Caselle Cornara, Cavin del Do e Piazza Mercato in comune di Villanova di Camposampiero - 1 stralcio (€ 392.500,00)		Riuniti i finanziamenti 13 bis (€ 56.810,26) + 68 (€ 335.696,98) = € 392.500,00					Lavori in corso	14/01/2003			
69	Ampliamento della rete di fognatura nera del comune di Villa del Conte e della frazione Abbazia Pisani	B/5.2	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 161 3/12/2001	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Finanziamento convogliato nell'intervento 76H				
70	Ampliamento della rete fognaria nelle vie Stroppari e Piovega Nord in comune di Villanova di Camposampiero.	B/18.1	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 84 30/7/2001	77.468,53	77.468,53	49.063,40	Finanziamento convogliato nell'intervento 70A				
70A	Ampliamento rete di fognatura nelle vie Stroppari e Piovega nord in Comune di Villanova di Camposampiero (€ 284.051,29)		Riuniti i finanziamenti 40 (€ 206.582,76) + 70 (€ 77.468,53) = € 284.051,29					Opere in fase di collaudo	08/05/2002	20/05/2003		
71	Progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori di allargamento della sede stradale e fognatura di acque nere di via Prati in comune di Vigonza - 1° stralcio	B/6.1	DGR N. 1834 23/6/2000	DDDA N. 130 25/11/2002	320.203,28	320.203,28	288.182,95	Lavori in corso				
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
72	Realizzazione della condotta fognaria di by-pass fra S.Giustina in Colle e Camposampiero	1/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		774.685,35			Finanziamento convogliato nell'intervento 72A				
72A	Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Straelle, Bonora, S. Pietro, Straelle di Rustega e del Graticolato Romano nei Comuni di Camposampiero, Borgoricco e Massanzago-1° stralcio (€ 826.331,04)		Riuniti i finanziamenti 35C (€ 51.645,69) + 72 (€ 774.685,35) = € 826.331,04					Progettazione in corso				
73	Completamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe	1/A/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 124 30/10/2002	1.859.244,84	1.859.244,84	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 73A				
73A	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Cadoneghe - 2^ fase (€ 4.389.883,65)		Riuniti i finanziamenti 45 (€ 2.117.473,29) + 57 (€ 413.165,52) + 73 (€ 1.859.244,84) = € 4.389.883,65					Progettazione esecutiva terminata				
74	Completamento dell'impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in fiume Brenta	1/A/3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.549.370,70			Finanziamento convogliato nell'intervento 2A gestito dalla subentrante SETA				
75	Realizzazione di condotte fognarie a Piombino Dese.	1/A/4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		640.913,80			Progettazione in corso	14/01/2003			
76	Interventi di fognatura nei comuni consorziati	1/A/5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.705.853,66			Finanziamento diviso negli interventi 76A, 76B, 76C, 76D, 76E, 76F, 76G e 76H				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
76A	Rete fognaria nelle vie Ronchi, Obbia Alta e Bassa in Comune di Trebaseleghe (€ 260.000,00)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 76					In fase di progettazione	-			
76B	Realizzazione reti di fognatura nera nelle vie Isonzo, Treviso, Arrigoni, Capriccio, Cavinello e Garibaldi (€ 600.000,00)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 76					In fase di progettazione	-			
76C	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle Vie Cavin Caselle, Cornara, Cavin del Do', Piazza Mercato e Via Cantele in Comune di Villanova di Camposampiero - 2° Stralcio (€ 750.000,00)	1/A/5.6	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 23 09/02/2005	679.664,52	679.664,52	0,00	Progetto approvato	-			
76D	Realizzazione condotte di fognatura nera in Via Frattina, in Via Tiepolo, Via Castellaro e via Desman in Comune di Borgoricco	1/A/5.3	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 64 30/03/2004	460.000,00	460.000,00	149.263,52	Progetto approvato	-			
76E	realizzazione della rete fognaria nelle Vie Straelle, Bonora, S. Pietro, Straelle di Rustega e del Graticolato Romano nei Comuni di Camposampiero, Borgoricco e Massanzago - 2° stralcio (€ 800.000,00)	1/A/5.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 91 06/08/2003	774.685,35	774.685,35	0,00	Progetto approvato	-			
76F	Rete di fognatura nera in depressione nelle Vie Noventana e laterali a Noventa Padovana - 1° Stralcio (€ 600.000,00)	1/A/5.4	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 193 13/10/2004	645.000,00	645.000,00	291.588,55	Progetto approvato	-			
76G	Estensione della rete fognaria nelle vie Guizza Alta e Carpane in comune di Loreggia (PD)	1/A/5.5	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 194 13/10/2004	350.000,00	350.000,00	0,00	Progetto approvato				
76H	Interventi nei Comuni ex Consorzio Tergola (€ 2.299.203,53)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 76 e unito all'intervento 35F (€ 331.514,83)					In fase di progettazione				
76I	Sistemazione e messa in sicurezza di un tratto della S.P. 10 "Desman" (via Roma) e relativi servizi tecnologici in comune di S. Giorgio delle Pertiche (PD).	1/A/5.7	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 138 17/08/2005	650.000,00	650.000,00	0,00	Progetto approvato				
76L	Intervento per la riqualificazione del sistema fognario del comune di Resana - Realizzazione della rete fognaria separata in località Castelminio	1/A/5.8	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 179 12/10/2005	94.000,00	94.000,00	0,00	Progetto approvato				
76M	Realizzazione della rete fognaria nera nelle vie Roma (S.P. 34) e Franceschina in comune di Cadoneghe	1/A/5.9	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 203 31/10/2005	500.000,00	500.000,00	0,00	Progetto approvato				
76I	Ampliamento rete di fognatura nera nel Comune di Villa del Conte e nella frazione di Abbazia Pisani (€ 286.633,57)	1/A/5.2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 179 05/12/2003	286.633,57	286.633,57	175.337,11	Progetto approvato				Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 76 e unito agli interventi 16 bis (€ 258.228,45), 25 (€ 258.228,45) e 69 (€ 309.874,14)
77	Progetto definitivo per lavori di rifacimento e separazione condotte fognarie lungo via Manzoni, via Zanella, vicolo Aggio e viale della Vittoria in Comune di Piombino Dese	1/A/4.1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 123 30/10/2002	392.000,00	392.000,00	295.525,49	Lavori in corso	14/01/2003			
	TOTALI				94.614.903,92	86.787.796,17	74.296.849,98					

AZIENDA SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
1	Realizzazione rete fognaria primaria Comuni di Castelfranco Veneto, Vedelago, Altivole, - 1° Lotto	E/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		7.360.000,00			Progettazione esecutiva				
	TOTALI				7.360.000,00	0,00	0,00					

SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI MOGLIANO S.p.A. (SPIM S.p.A.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	1/3.6.B	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 29 21/03/2001	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Lavori in corso				
	Legge 910/86 Es. 1989											
2	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	1/3.6.D	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 29 21/03/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	1.037.655,67	Lavori in corso				
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
3	Lavori di estensione della rete fognaria ed implementazione degli allacciamenti in fognatura nera.	B/13 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 29 21/03/2001	516.456,90	516.456,90	0,00	Progetto approvato				
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
4	Adeguamento del depuratore di Preganziol: potenziamento dei sistemi di decantazione, clorazione e filtazione finale	E/23	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N.214 22/1012005	560.000,00	560.000,00		Progetto approvato				
5	Completamento rete fognaria nel territorio comunale: Via Statua, Via Zeriolo, Via Levada, Via Marcello, Via Molin Cappello Nord	E/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 194 25/10/2005	260.800,00	260.800,00	0,00	Progetto approvato				
	TOTALI				3.403.084,50	3.403.084,50	1.554.112,57					

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE CENTRO VENETO SERVIZI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 67/88 Es. 1992 - II tranche											
1	Interventi di fognatura per impianti di depurazione minori.	1/5.2	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 146 12/12/2002	1.549.370,70	1.549.370,70	1.360.924,27	Lavori in corso				
2	Interventi di fognatura nei comuni di Candiana, Conselve, Monselice, Pozzonovo, Solesino, Tribano	4d	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 101 18/10/2002	3.615.198,29	3.615.198,29	2.117.624,21	Lavori in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1997											
3	Ampliamento schema fognario della zona del Conselvano.	A/2/1	DGR N. 2613 DEL 22/07/1997	DPGR N. 63 12/11/1998	5.939.254,34	5.939.254,34	5.939.254,34	Contabilità finale	19/04/1998	7/11/2001	07/12/2001 15/02/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 30 del 05/04/2002
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
4	Ampliamento impianto di depurazione di Monselice	A/4 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DDDA N. 171 12/12/2001	1.032.913,80	1.032.913,80	358.553,92	Lavori in corso				
5	Interventi di fognatura in comune di S. Elena	A/6 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/2000	DDDA N. 114 19/12/2000	361.519,83	361.519,83	361.519,83	Contabilità finale	12/07/2001	19/09/2002	14/04/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 147 del 20/10/2003
6	Interventi su impianti di depurazione di fognature e di diversione nei comuni di: Pernumia, Solesino, Borgoforte di Anguillara Veneta, Arre, Agna, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Pozzonovo, Terrassa P. ,Tribano.	A/3 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/2001	DDDA N. 87 30/07/2001	3.821.781,05	3.821.781,05	3.411.455,81	Lavori in corso	02/07/2002 02/07/2002 15/05/2002 02/07/2002			
7	Lavori di rifacimento della fognatura e pavimentazione nelle vie Matteotti e Principe Umberto, con sistemazione di Piazza Maggiore - 13° stralcio fognature in comune di Este	A/5 IV fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/2002	DDDA N. 136 30/10/2001	1.446.079,32	1.446.079,32	1.142.853,27	Lavori in corso				
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
8	Impianto di biotrattamento di Conselve (€ 8.779.767,28)		Intervento sospeso e fondi riallocati con D.G.R. 794/2002 agli interventi 8A (€ 1.032.913,80), 8B (€ 4.648.112,09) e 8C (€ 3.098.741,39)									
8A	Adeguamento al D. M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Conselve - II stralcio	B/23 V fase	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 6 08/01/2005	1.032.913,80	1.032.913,80	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 11A per l'importo di € 1.032.913,80				
8B	Impianto di depurazione di Conselve potenzialità 46.880 A.E. - 1° stralcio	A/5.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 30/08/1999	DDDA N. 69 26/06/2002	4.648.112,09	4.648.112,09	3.777.346,59	Lavori in corso				Proveniente da fondi riallocati
8C	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati	A/5.2 V fase	DGR N. 2924 DEL 30/08/1999	DDDA N. 25 26/03/2003	3.098.741,39	3.098.741,39	743.813,40	Finanziamento convogliato nell'intervento 9A per l'importo di € 3.098.741,39				
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
9	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati	1/B/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 25 26/03/2003	516.456,90	516.456,90	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 9A per l'importo di € 516.456,90				
9A	Interventi su reti fognarie per allacciare l'80% dei residenti, nei comuni consorziati (€ 3.615.198,29)		Riuniti i finanziamenti 8C (€ 3.098.741,39) + 9 (€ 516.456,90) = € 3.615.198,29					Progettazione definitiva				
10	Progetto definitivo relativo alle opere di rifacimento delle fognature nelle vie Massimo D Azeglio, Pescheria Vecchia, Madonnetta, Marconi, P.zza Trieste, Cavour, Calle della Musica etc. - XV° Stralcio fognature	1/T/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 116 20/08/2003	€ 1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Progetto approvato				Cambio soggetto attuatore: ex comune di Este
11	Interventi di fognatura nel territorio comunale di Arquà Petrarca.	1/V/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002	DDDA N. 14 21/02/2003	516.456,90	516.456,90	194.071,30	Lavori in corso	09/06/2003			
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
12	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Conselve - II stralcio	6/B/1	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 6 18/01/2005	667.086,20	667.086,20	43.295,72	Finanziamento convogliato nell'intervento 12A per l'importo di € 667.086,20				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
12A	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Conselve - II stralcio (€ 1.700.000,00)		Riuniti i finanziamenti 8A (€ 1.032.913,80) + 11 (€ 667.086,20) = € 1.700.000,00					In fase di progettazione				
13	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Agna: diversione dello scarico nel fiume Fiume Gorzone	6/B/2	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 96 06/06/2005	450.000,00	450.000,00		Progetto approvato				
14	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Candiana: dismissione e collegamento con l' impianto di depurazione di Conselve	6/B/3	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 95 01/06/2005	400.000,00	400.000,00	0,00	Progetto approvato				
15	Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999 dell' impianto di depurazione di Pozzonovo: diversione dello scarico fuori laguna	6/B/4	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 102 15/06/2005	300.000,00	300.000,00	0,00	Progetto approvato				
16	Interventi di fognatura in comune di Cartura	6/B/5	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDDA N. 250 23/12/2004	640.000,00	640.000,00	0,00	Progetto approvato				
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
17	Lavori di fognatura in via S. Pietro - S.P. 14, Pernumia	E/9.8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		235.200,00			Progetto preliminare				
18	Lavori di fognatura in via Cà Erizzo, Bovolenta	E/9.12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		115.360,00			Progetto preliminare				
19	Lavori di fognatura in via Rovere prolungamento, Anguillara	E/9.17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		67.680,00			Progetto preliminare				
20	Lavori di fognatura in via Bologna, Ponte S. Nicolò	E/9.10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		46.400,00			Progetto preliminare				
21	Lavori di fognatura in via Bologna laterale, Ponte S. Nicolò	E/9.11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		46.400,00			Progetto preliminare				
22	Sdoppiamento rete, adeguamento rete del centro e del nucleo del centro storico, suddivisione acque nere e bianche, nella zona di Monselice capoluogo	E/9.4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.561.626,00			Progetto preliminare				
23	Completamento rete fognatura nella vecchia zona industriale e via Umbria, Monselice	E/9.31	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progetto preliminare				
24	Lavori di fognatura in via Marconi laterale, Terrassa Padovana	E/9.7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		47.680,00			Progetto preliminare				
25	Lavori di fognatura in via Corso e Ponte de Riva laterali, Due Carrare	E/9.26	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		66.400,00			Progetto preliminare				
26	Lavori di fognatura in via Chiaviche, Arquà	E/9.27	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		66.400,00			Progetto preliminare				
27	Comune di Ponte S. Nicolò. Completamento della rete fognaria nera nella porzione di territorio comunale ricadente nel bacino scolante nella Laguna di Venezia	E/9.15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		360.000,00			Progetto preliminare				
28	Lavori di fognatura in via Boario Polito, Arquà	E/9.19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		33.840,00			Progetto preliminare				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
29	Lavori di fognatura in via Argine, Pozzonovo	E/9.16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		90.880,00			Progetto preliminare				
30	Lavori di fognatura in via Arre prolungamento, S.P., Conselve	E/9.21	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		90.240,00			Progetto preliminare				
31	Lavori di fognatura in via Cà Borin laterale, Baone	E/9.20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		225.600,00			Progetto preliminare				
32	Lavori di fognatura in via S. Trinità, Pernumia	E/9.14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		228.160,00			Progetto preliminare				
33	Lavori di fognatura in via Monte Grappa laterale, Conselve	E/9.18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		112.800,00			Progetto preliminare				
34	Lavori di fognatura in via Stanga prolungamento, Arre	E/9.23	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		201.120,00			Progetto preliminare				
35	Lavori di fognatura in via Paraiso, Pozzonovo	E/9.2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		60.000,00			Progetto preliminare				
36	Lavori di fognatura in via Roma prolungamento lato destro, Ponte S. Nicolò	E/9.3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		144.800,00			Progetto preliminare				
37	Lavori di fognatura in via Maseralino, Cartura	E/9.25	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		189.200,00			Progetto preliminare				
38	Ulteriore stralcio funzionale di completamento della rete fognaria nel centro storico di Este e nel quartiere di Meggiaro	E/9.22	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.800.000,00			Progetto preliminare				
39	Lavori di fognatura nella S.P. 21 prolungamento, Baone	E/9.28	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		66.400,00			Progetto preliminare				
40	Lavori di fognatura in via Fossalta prolungamento, Conselve	E/9.30	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		197.920,00			Progetto preliminare				
41	Lavori di fognatura in via Santo, Anguillara	E/9.24	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		223.040,00			Progetto preliminare				
42	Collegamento al depuratore comunale dello scarico depurato del mattatoio "Agricola Berica" e di altre 20 utenze civili, Monselice	E/9.1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		392.800,00			Progetto preliminare				
43	Lavori di fognatura in via Ponte de Riva S.P., Cartura	E/9.6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		310.400,00			Progetto preliminare				
44	Lavori di fognatura in via Rana Camori laterale, Este	E/9.5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		105.600,00			Progetto preliminare				
45	Lavori di fognatura in via Rezzole laterale, Pozzonovo	E/9.13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		92.160,00			Progetto preliminare				
46	Lavori di fognatura in via Rialto laterale, Candiana	E/9.9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		46.400,00			Progetto preliminare				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
47	Lavori di fognatura in via Rana Camori laterale, Este	E/9.29	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		464.800,00			Progetto preliminare				
	TOTALI				42.274.561,31	31.585.255,31	19.450.712,66					

VE.S.T.A.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1 (94 V.)	(Acquedotto di Venezia ORIGINARIAMENTE) Progetto definitivo della nuova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud	1/4.9		DGCA N. 147 29/3/2001	4.131.655,19	4.131.655,19	720.119,80	Progetto approvato				
	Legge 910/86 Es. 1989											
2 (95 V.)	(Acquedotto di Venezia ORIGINARIAMENTE) Progetto definitivo della nova centrale di sollevamento sull'isola del Tronchetto dell'acquedotto di Venezia centro storico ed estuario sud	1/4.10		DGCA N. 147 29/3/2001	4.131.655,19	4.131.655,19	0,00	Progetto approvato				
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
3	Realizzazione della condotta Ponte della Libertà - Tronchetto (Venezia)	B/21.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999	DGR N. 3057 DEL 2003	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	Progetto approvato				
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
4	Adeguamento impianto di potabilizzazione Cà Solaro	D/88	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGCA N. 178 19/4/2001	3.486.084,07	3.486.084,07	788.104,00	Lavori in corso				
	TOTALI				14.589.394,45	14.589.394,46	1.508.223,80					

PAGINA BIANCA

SEZIONE III: CONSORZI DI BONIFICA

Nota: nelle tabelle che seguono vengono riportati i finanziamenti attribuiti direttamente ai Consorzi di Bonifica

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE BACCHIGLIONE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 139/92 Es. 1993											
1	Intervento di diversione idraulica dalla laguna - incremento invasi - monitoraggio e telecontrollo	6/B/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DDDA N. 130 DEL 8/8/1996	12.844.589,35	12.844.589,35	12.844.589,35	Contabilità finale	22/09/1997	20/03/2001	04/08/2001	Registrata, con DDDA n. 112 del 14/9/2001, un'economia di € 66.833,12 destinata a finanziare l'intervento 1 bis
1 bis	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica (€ 66.833,12)	6/B/2		DDDA N. 35 19/4/2002	66.833,12	66.833,12	66.833,12	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A				DDDA n. 35 del 19/04/2002 utilizza l'economia di € 66.833,12 dell'intervento 1. Decreto di contabilità finale DDDA n. 6 del 07/01/2004
	Legge 139/92 II fase											
2	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DDDA N. 21 26/2/2001	619.748,28	619.748,28	493.459,25	Contabilità finale	26/02/2002			Registrata, con DDDA n. 163 del 31/08/2004, un'economia di € 126.289,03
3	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sui rii Barbegara, Rebosola e S. Silvestro	5/B/4	DGR N. 2203 DEL 21/5/1996	DDDA N. 22 22/6/1998	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	Contabilità finale	21/06/2000	21/06/2003	03/11/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 205 del 22/10/2204
4	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica.	5/C/1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 61 DEL 4/8/1999	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Finanziamento convogliato nell'intervento 4A per € 2.582.284,50				
4A	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica (€ 2.649.117,67)		Riuniti i finanziamenti 1 bis (€ 66.833,12) + 4 (€ 2.582.284,50) = € 2.649.117,62					Lavori collaudati	04/08/2000	04/08/2003	04/09/2003	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 6 del 07/01/2004
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
5	Intervento di incremento dei tempi di ritenzione delle acque di sfioro urbane e di dilavamento di superfici agricole nei comuni di Este e Baone	B/12 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 18 12/3/2003	3.615.198,29	3.615.198,29	149.344,87	Progetto approvato				In corso perizia per espropri. Erogazione limitata alle sole spese di progettazione
6	Fitodepurazione per integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l' autodepurazione nei bacini centrali.	A/11 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 138/01 DDDA N. 110/02	7.746.853,49	361.519,83	361.519,83	Progetto approvato				In corso perizia per espropri. Decreti di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
7	Incremento invaso e capacità di autodepurazione Valli di Gaizignano e di Arquà Petrarca. (ricalibratura canali, creazione aree umide e sostegni, ripristino vegetazione di sponde)	D/79	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		5.164.568,99			Progettazione in corso				Procedura di screening in corso
8	Progetto per la miglior gestione delle acque irrigue	D/80	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		7.746.853,49			Progettazione in corso				Procedura di screening in corso
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
9	Incremento volume invaso canale dei Cuori e diaframmatura argini	2/M/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 109 18/10/2002	3.098.741,39	232.405,60	232.405,60	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
10	Opere di diaframmatura e completamento bacino Ca' di Mezzo	2/N/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 130 24/09/2003	258.228,45	258.228,45	129.301,13	Progetto definitivo				Erogazione limitata alle sole spese di progettazione (€ 19.367,13) come da DDDA n. 108/02
11	Ricalibratura canale San Giacomo - Monselesana	2/O/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 164 21/09/2005	1.291.142,25	1.291.142,25	96.835,67	Progetto definitivo				Decreto di impegno dell'opera.
12	Ricalibratura e sostegni canali Barbegara, Rebosola, S. Silvestro	2/P/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 163 21/09/2005	3.098.741,39	3.098.741,39	232.405,60	Progetto approvato				Decreto di impegno dell'opera. Riunito il finanziamento con opera 18, complessivamente € 3.407.114,59
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
13	Fitodepurazione per integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l' autodepurazione nei bacini centrali - (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 6)	D1/1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		183.819,20			Progetto approvato				
14	Intervento di incremento dei tempi di ritenzione delle acque di sfioro urbane e di dilavamento di superfici agricole nei comuni di Este e Baone (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 5)	D1/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		139.228,00			Progetto approvato				
15	Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica. Incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 7)	D1/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		481.339,20			Progettazione in corso				
16	Progetto per la miglior gestione delle acque irrigue (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 8)	D1/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.211.142,20			Progettazione in corso				
17	Ricalibratura canale San Giacomo - Monselesana (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 11)	D1/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 164 del 21/09/2005	176.097,20	176.097,20		Progetto approvato				
18	Ricalibratura e sostegni canali Barbegara, Rebosola, S. Silvestro (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 12)	D1/6	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 163 del 21/09/2005	308.373,20	308.373,20		Progetto approvato				Decreto di impegno dell'opera. Riunito il finanziamento con opera 12, complessivamente € 3.407.114,59
19	Interventi in rete minore di bonifica. Aumento tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale	D1/7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00			Progettazione in corso				
20	Aumento tempi di ritenzione per autodepurazione nei bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore e Rebosola: stralcio	D1/8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progetto preliminare				
21	Impinguamento canali Beoli - Rebosola	D2/42	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.150.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				60.948.350,98	30.619.730,45	22.353.547,91					

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE BRENTA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 139/92 Es. 1993											
1	Sistemazioni idraulico-ambientali area Brenta-Bacchiglione (foce lagunare di Lova)	5/D/1	DGR N. 4987 DEL 3/10/1995	DDDA N. 71 27/10/1995	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Contabilità finale	22/07/1996	29/11/1997	20/03/2000	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 82 del 12/7/2001
	Legge 139/92 II fase											
2	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DDDA N. 73 DEL 2/7/2001	619.748,28	619.748,28	413.760,65	Lavori in corso	03/09/2001			La somma impegnata è stata ridotta rispetto a quella finanziata in base alla riduzione dell'importo del progetto iniziale (da € 619.748,28 a € 516.456,90)
3	Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Fiumicello (idrovora Cambroso)	5/B/7	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DGCA N. 72 DEL 2/2/1998	1.549.370,70	1.549.370,70	1.272.486,29	Lavori in corso	12/10/1998	29/11/1997		Appovata perizia di variante
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
4	Ricalibratura e sostegni sui rii di Piove	A/7 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 151 13/9/2005	4.131.655,20	4.131.655,20	206.582,75	Lavori in corso				Decreto di impegno dell'opera
5	Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nell'area "Brondolo" in comune di Chioggia	A/9 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 108 14/12/2000	774.685,35	774.685,35	271.210,86	Lavori in corso				
6	Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo	A/8 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999					Finanziamento originale di € 2.840.512,95 suddiviso negli interventi 6A (€ 1.549.370,70) e 6B (€ 1.291.141,25)				
6A	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (1° stralcio) - Bacino Sesta Presa - sottobacino dei Rii di Piove (€ 1.549.370,70)	A/8.2 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 148 13/09/2005	1.549.370,95	1.549.370,95		Progetto definitivo				Con DGR 1550 e1551 del 26/05/2004 ottenuto giudizio di compatibilità ambientale
6B	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (1° stralcio) - Bacino Bernio (€ 1.291.141,25)	A/8.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 190 07/10/2004	1.291.142,00	1.291.142,00	142.025,65	Lavori in corso				
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
7	Ricalibratura, realizzazione aree golenali e ripristino vegetazione nei corsi d'acqua in zona Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio)	D/72	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 78 13/6/2003	3.098.741,39	154.937,07	154.937,07	Finanziamento suddiviso negli interventi 7A (€ 2.324.056,05) e 7B (€ 774.685,35)				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
7A	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio) - Bacino Sesta Presa - sottobacini a sud del Fiumicello (€ 2.324.056,05)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 7 (€ 2.324.056,05)					Progetto preliminare				
7B	Interventi strutturali in rete minore. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio) - Bacino Trezze (€ 774.685,35)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 7 (€ 774.685,35)					Progetto preliminare				
8	Miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Presa in Sinistra Brenta e Settima Presa Inferiore (Ricalibrazione e rinaturalizzazioni canali, nuove opere di derivazione, nuove reti di condotte)	D/75	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 63 13/6/2003	2.582.284,50	129.114,23	129.114,23	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
9	Ricalibratura e rinaturalizzazione della rete di bonifica costituita dallo scolo Noventana e sue diramazioni; costruzione nuovo impianto idrovoro "Noventa" per la diversione acque di piena della Laguna	D/73	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 64 13/6/2003	2.324.056,05	116.202,80	116.202,80	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
10	Progetto definitivo per la realizzazione di interventi strutturali in rete minore di bonifica. Gestione degli invasi e diversione delle acque di piena nell' idrovia Padova - Venezia.	D/74	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 128 18/11/2002	774.685,35	774.685,00	300.425,31	Lavori in corso				
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
11	Completamento ricalibratura e gestione invasi nell' area Brondolo di Chioggia	2/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 66 13/6/2003	1.239.496,56	61.974,83	61.974,83	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
12	Estensione sistema telecomando e telecontrollo alle opere di derivazione e manufatti irrigui	2/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 64 21/4/2005	1.032.913,80	1.032.913,80	51.645,69	Lavori in corso				Decreto di impegno dell'opera
13	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti di sollevamento Bernio e Trezze di Chioggia	2/C/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 67 13/6/2003	3.098.741,39	154.937,07	154.937,07	Finanziamento suddiviso neigi interventi 13A (€ 1.291.142,25) e 13B (€ 1.807.599,15)				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
13A	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti Bernio e Trezze di Chioggia - bacino Bernio (€ 1.291.142,25).		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 13 (€ 1.291.142,25)					Progetto preliminare				
13B	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti Bernio e Trezze di Chioggia - bacino Trezze (€ 1.807.599,15).		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 13 (€ 1.807.599,15)					Progetto preliminare				Procedura di screening
14	Ricalibrazione e sostegni su corsi d' acqua nell' area della Riviera del Brenta	2/D/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 68 13/6/2003	2.375.701,74	118.785,09	118.785,09	Progetto preliminare				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
15	Interventi strutturali in rete di bonifica: diversione delle acque di piena del Fiumicello (idrovora di Cambroso) (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 3)	D1/9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		180.000,00			Lavori in corso				
16	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riclaibratura e sostegni sui Rii di Piove (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 4)	D1/10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione in corso				
17	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo - Bacino Sesta Presa e Bacino Bernio (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 6)	D1/11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				
18	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nell'area di "Brondolo" in comune di Chioggia (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 5)	D1/12	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		150.000,00			Progetto esecutivo				
19	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (II stralcio) - Bacino Sesta Presa e Bacino Trezze (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 7)	D1/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		300.000,00			Progettazione in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
20	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nel bacino "Noventana" (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 9)	D1/14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				
21	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Presa in Sinistra Brenta e Settima Presa Inferiore (I stralcio) (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 8)	D1/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		350.000,00			Progettazione in corso				
22	Completamento, ricalibratura e gestione invasi nell'area Brondolo di Chioggia (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 11)	D1/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		50.000,00			Progetto preliminare				
23	Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti di sollevamento Bernio e Trezze di Chioggia (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 13)	D1/17	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		570.000,00			Progetto preliminare				
24	Completamento ricalibratura e sostegni sullo scolo Altipiano	D1/18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00			Progettazione in corso				
25	Interventi di trasformazione irrigua del Bacino Bernio in sx del canale Novissimo nei Comuni di Chioggia e Codevigo	D2/43	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		5.963.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				39.454.963,95	14.008.893,06	4.943.458,98					

CONSORZIO DI BONIFICA BASSO PIAVE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1997											
1	Miglioramento della efficienza dello scarico delle reti fognarie 1° stralcio - Risanamento e riordino idraulico delle isole Trepontine	B/17/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DDDA N. 52 DEL 4/8/2000	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.091,54	Lavori collaudati	24/04/2002			Determinazione contributo definitivo con DDDA 191 del 25/10/2005: registrata economia di € 50,71
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
2	Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione area Cavallino	B/20 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 223 DEL 2004	53.789,57	53.789,57	53.789,57	Finanziamento revocato				Finanziamento originale pari a € 12.911.422,48, di cui € 10.857.632,91 devoluti alla Diocesi Patriarcato di Venezia e € 2.000.000,00 alla Comunità Ebraica di Venezia.

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
3	Completamento intervento per aquedotto sostitutivo pozzi in comune di Cavallino	5/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		0,00	0,00	0,00	Finanziamento revocato				Finanziamento originale pari a € 5.164.586,99 interamente revocato e devoluto alla Diocesi Patriarcato di Venezia
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
4	Progetto di opere aziendali e comuni a più fondi nel settore dell'irrigazione - Distribuzione di acqua alle aziende delle unità irrigue elementari	D2/44	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	/	2.978.171,00			Progetto preliminare				
	TOTALI				4.323.102,82	1.344.931,82	1.344.881,11					

CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Costruzione impianto idrovoro Canale Scolmatore F. Marzenego		DGR N. 1151 DEL 19/11/1986	DDLP N. 909 10/12/1990	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	Lavori collaudati	1990	08/04/1994	11/11/1995	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 356 del 17/09/1997. La maggiore spesa rispetto al finanziato, pari a € 140.088,36 è a carico dell'ente
2	Opere accessorie relative all'impianto idrovoro del Canale Scolmatore e ristrutturazione rete di bonifica Favaro Veneto (VE)		DGR N. 1151 DEL 19/11/1986	DR N. 762 08/08/1990	774.685,35	774.685,35	774.685,35	Lavori collaudati	1989	30/11/1990	15/10/1992	Determinazione del contributo definitivo con DDLP n. 356 del 17/09/1997. La maggiore spesa rispetto al finanziato, pari a € 140.088,36 è a carico dell'ente
	Legge 67/88 Es. 1990											
3	Risanamento e rinaturalizzazione del II tronco del canale Acque Basse	1/2.4a	DGR N. 3324 DEL 29/07/1996	DPGR 2436 03/10/1994	6.455.711,24	6.455.711,24	275.991,49	Lavori in corso				
	Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche											
4	Impianto idrovoro a servizio del Canale Scolmatore del fiume Marzenego - II stralcio	1/4.1	DGR N. 2773 DEL 21/06/1994	DDDA N. 72 02/11/1995	3.098.741,39	3.098.741,39	3.098.741,39	Lavori collaudati	23/11/1996	30/05/1997	06/12/1998	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 27 del 31/03/1999
	Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche											
5	Sistemazione Fiume Marzenego - Ramo Beccherie		DGR N. 6752 DEL 28/12/1994	DGCA N. 367 24/09/1997	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	Lavori collaudati	23/07/1999	23/01/2001	22/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 132 del 25/11/2002
	Legge 360/91											
6	Ricalibrazione e sostegno nei sottobacini del Marzenego		DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		1.291.142,25			Finanziamento convogliato nell'intervento 16 per € 1.291.142,25				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 139/92 II fase											
7	Riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata "Oasi" in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di Venezia. Progetto definitivo di 1° stralcio (il finanziamento di € 774,685,35 - DG	5/B/3.3						Con D.D.A. n° 18 del 26/02/01 e successivo D.D.A. n°38 del 09/04/01 il finanziameno è stato trasferito al comune di Noale				
8	Progetto Campalto: costruzione del I tronco del collettore Acque Basse	1/C/3	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		8.005.081,94			Progettazione in corso				La DGR 719 del 19/03/2004 concede al progetto il giudizio di compatibilità ambientale
9	Progetto Campalto: risezionamento del canale di interconnessione tra gli impianti di Campalto e dello Scolmatore Marzenego	1/C/6	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		2.582.284,50			Progettazione in corso				La DGR 719 del 19/03/2004 concede al progetto il giudizio di compatibilità ambientale
10	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia. Interventi strutturali in reti di bonifica. Estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino scolanteimpianto per n. 24 stazioni.	5/B/5	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 59 15/05/2001	813.419,62	813.419,62	536.177,29	Lavori in corso	14/05/2002			
11	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero	5/B/1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 33 19/08/1998	7.230.396,59	7.230.396,59	7.230.396,59	Contabilità finale	18/11/1999	08/08/2003		Importo originale € 7.670.396,59. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 08/06/2004. L'economia registrata convogliata negli int. 25 e 26
12	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Dese (finanziamento iniziale: 8.263.310,39 euro)	5/B/2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995					Finanziamento di € 8.263.310,39 suddiviso negli interventi 12A (€ 4.131.655,19) e 12B (€ 4.131.655,19)				
12A	Ristrutturazione rete di bonifica dell'area centrale e del medio corso dei fiumi Dese e Zero e tributaria dei corsi d'acqua consortili: Piovega di C., Desolino, Rio S.Martino, Piovega di S., Rio S.Amnrogio, Piovega di L. e Piovega dei Tre Comuni, Fossa St	5/B/2.1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 83 11/05/2004	4.131.655,19	4.131.655,19	2.162.525,79	Lavori in corso				
12B	Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggiana, Marocchesa e Tarù in Comune di Venezia, Mogliano V.to e Scorze' (€ 4.131.655,19)	5/B/2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		4.131.655,19			Progettazione in corso				
13	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Marzenego.	5/B/3	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995		2.014.181,91			Progettazione in corso				
14	Sistemazione del fiume Marzenego - Ramo Beccherie in Venezia - Mestre. 1^ e 2^ perizia suppletiva e di variante.	5/B/3.1	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 40 30/06/2000	309.874,14	309.874,14	309.874,14	Contabilità finale	23/07/1999	23/01/2001	22/01/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 132 del 25/11/2002

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione a/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
15	Interventi di riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua della terraferma veneziana	5/B/3.2	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DDDA N. 53 04/08/2000	4.648.112,09	4.648.112,09	4.625.055,93	Lavori collaudati	02/01/2002			Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 193 del 25/12/2005: registrata economia di € 23.065,16
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
16	Ricalibratura e sostegni nei sottobacini del Marzenego	A/10.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 03/08/1999		1.291.142,25			Finanziamento suddiviso negli interventi 16A (€ 309.874,14) e 16B (€ 981.268,11)				
16A	Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago, Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta (€ 309.874,14)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 16 (€ 309.874,14)					Progettazione in corso				Approvazione VIA con DGR N. 1549 DEL 14/06/02
16B	Interventi di riqualificaz. nell'area denominata "Oasi di Noale". 2° Stralcio (€ 981.268,11)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 16 (€ 981.268,11)					Progettazione in corso				
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
17	Riqualificazione ambientale della fossa Storta e interventi presso cave Praello a Marcon	D/78	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		2.582.284,50			Progettazione in corso				
18	Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del F.Marzenego e interv. sugli affluenti	D/77	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		7.746.853,49			Finanziamento diviso negli interventi 18A (€ 5.164.568,99) e 18B (€ 2.582.284,50)				
18A	Interventi nella zona a monte del bacino del canale Scolmatore del f. Marzenego e suoi affluenti (€ 5.164.568,99)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 18 (€ 5.164.568,99)					Progettazione definitiva in corso				Approvazione del S.I.A. e del progetto preliminare con DGR 67/2003
18B	Interventi nella zona di valle del bacino del canale Scolmatore del f. Marzenego e suoi affluenti (€ 2.582.284,50)		Finanziato con parte dei fondi del finanziamento 18 (€ 2.582.284,50)					Progettazione definitiva in corso				Approvazione del S.I.A. e del progetto preliminare con DGR 67/2003
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
19	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Zermason	2/E/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.291.142,25			Progettazione in corso				
20	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Rusteghin	2/F/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.291.142,25			Progettazione in corso				
21	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Zeretto	2/G/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		1.032.913,80			Progettazione in corso				
22	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II° stralcio - scolo Vernise	2/H/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		2.582.284,50			Progettazione in corso				
23	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del fiume Marzenego e del suo scolmatore. II° stralcio - scolo Draganziolo	2/I/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		774.685,35			Progettazione in corso				
24	Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del fiume Marzenego e del suo scolmatore. II° stralcio - scolo Dosa e prolungamento	2/L/1	DGR N. 794 DEL 09/04/2002		774.685,35			Progettazione in corso				
	Legge 139/92 Magg. Mutui II fase											
25	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia - Completamento ed adeguamento	5/B/1.2	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDTA N. 84 02/07/2003	403.848,02	403.848,02	403.848,02	Contabilità finale	03/07/2003	08/08/2003		Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 105 del 08/06/2004

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Magg. Mutui IV^fase											
26	Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella Laguna di Venezia - Completamento ed adeguamento	B/23	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003	DDTA N. 84 02/07/2003	36.151,98	36.151,98	6.501,93	Contabilità finale	03/07/2003	08/08/2003		Registrata, con DDDA n. 105 del 08/06/2004, un'economia di € 29.650,05
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
27	Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego - Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna - Integrazione tra la rete principale di bonifica ed il sistema di smaltimento delle acque meteoriche	B/7	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		7.000.000,00			Progettazione in corso				
28	Estensione, completamento e gestione della Zona Tampone arborea realizzata presso l'Azienda Diana di Veneto Agricoltura, con raccolta ed elaborazione di dati per il monitoraggio dell'efficacia delle fasce tampone arboree nel controllo dell'inquinamento	D1/29	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progettazione in corso				
29	Interventi strutturali in rete minore di bonifica - Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego - 2° Stralcio, Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne	D1/30	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progettazione in corso				
30	Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggiana, Marocchesa e Tarù in Comune di Venezia, Mogliano V.to e Scorze' (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 12B)	D1/19	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.950.000,00			Progettazione in corso				
31	Ristrutturazione rete di bonifica dell'area centrale e del medio corso dei fiumi Dese e Zero e tributaria dei corsi d'acqua consortili: Piovega di C., Desolino, Rio S.Martino, Piovega di S., Rio S.Amnrogio, Piovega di L. e Piovega dei Tre Comuni, Fossa St	D1/20	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDTA N. 238 20/12/2005	500.000,00	500.000,00		Progetto approvato				
32	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Marzenego. (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 13)	D1/21	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione in corso				
33	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del bacino del canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 18)	D1/22	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				
34	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. II stralcio - scolo Zermason (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 19)	D1/23	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				
35	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Dese e Zero. II stralcio - scolo Rusteghin (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 20)	D1/24	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		150.000,00			Progettazione in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
36	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sui sottobacino del Dese e Zero. II stralcio - scolo Zeretto (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 21)	D1/25	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		80.000,00			Progettazione in corso				
37	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sui sottobacino del Dese e Zero. II stralcio - scolo Vernise (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 22)	D1/26	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		850.000,00			Progettazione in corso				
38	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sui sottobacino del Dese e Zero. II stralcio - scolo Draganziolo (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 23)	D1/27	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		50.000,00			Progettazione in corso				
39	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni sui sottobacino del Dese e Zero. II stralcio - scolo Dosa e prolungamento (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 24)	D1/28	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		120.000,00			Progettazione in corso				
40	Interventi nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia per la bonifica di aree precedentemente occupate da discariche, inceneritori, attività industriali, ecc.	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				84.837.879,43	31.346.399,93	22.367.602,25					

CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA PIAVE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
1	Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque del sottobac. Vela: risezionamento corsi d' acqua, manufatti di controllo, nuovi collegamenti e recupero capacità d' invaso nei comuni di S. Biagio di Callalta, Monastier, Roncade.	B/14 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 29 27/3/2003	516.456,90	516.456,90	516.456,90	Contabilità finale	14/05/2003			Lavori collaudati.DDDA 157 del 20/9/2005 determinazione contributo definitivo. Con DDDA 29/03 stabilito nuovo termine fine lavori
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
2	Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque del sottobac. Vela: risezionamento corsi d' acqua, manufatti di controllo, nuovi collegamenti e recupero capacità d' invaso nei comuni di S. Biagio di Callalta, Monastier, Roncade.	D/81	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 29 27/3/2003	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Contabilità finale	14/05/2003			Lavori collaudati.DDDA 157 del 20/9/2005 determinazione contributo definitivo. Con DDDA 29/03 stabilito nuovo termine fine lavori

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
3	Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel Bacino Vela: diversione delle acque, recupero della capacità di invaso, manufatti di controllo e fitodepurazione.	2/U/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		1.549.370,70			Progettazione in corso				
4	Risanamento dell' alto corso del fiume Meolo in area ad alta intensità di allevamenti ittici e colture agricole	2/V/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 114 18/10/2002	1.032.913,80	51.645,69	51.645,69	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
5	Risanamento dell'alto corso del fiume Meolo in area di alta densità di allevamenti ittici e colture agricole	D1/31	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		500.000,00			Progettazione preliminare				
6	Diversione delle acque, recupero della capacità di invaso, manufatti di controllo e fitodepurazione	D1/32	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.000.000,00			Progettazione preliminare				
	TOTALI				6.148.112,09	2.117.473,29	2.117.473,29					

CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTELLA DI PEDEROBBA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
1	Bonifica ex - cava di Riese denominata "Cava Bergamin"	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DGR N. 2621 DEL 10/10/2001	823.748,75	823.748,75	613.796,31	Lavori in corso	15/04/2003			
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
2	Sistemazione dello scarico di Salvarosa a monte della confluenza nel fiume Zero	5/D/3	DGR N. 1140 DEL 18/04/2003		780.000,00			Progettazione in corso				
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
3	Sistemazione dello scarico di Salvatronda a monte della confluenza nello Zero in Comune di Castelfranco	D1/33	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.400.000,00			Progettazione in corso				
4	Riconversione del sistema irriguo in Comune di Vedelago, zona di Fanzolo e Barcon - Riconversione da scorrimento ad aspersione (pluvirrigazione) su un'area di 1.200 Ha	D2/45	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		6.840.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				9.843.748,75	823.748,75	613.796,31					

CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 910/86 Es.1989											
1	Interventi urgenti alla stazione di sollevamento di Malcontenta	1/3.3a	DGR N. 2549 DEL 30/4/1992	DDEA N. 59 11/12/1991	206.582,76	206.582,76	206.582,76	Lavori ultimati.				Intervento inizialmente affidato al CVD poi revocato (DDEA N. 2549 del 30/04/1992) e affidato a questo consorzio. Le date non sono reperibili.
	Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche											
2	Lavori di sistemazione idraulica e di ricalibratura della rete di bonifica di Chirignago e di interconnessione con l'impianto idrovoro di Malcontenta.	4b	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		774.685,35			Finanziamento convogliato nell'intervento 8A				Impegno pari a € 774.685,35 disimpegnato con decreto Direzione Bilancio nn. 6, 7 e 9 del 07/04/2004
3	Potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta (finanziato effettivo: L. 2,5 MLD)	4 c	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 39 19/5/1999	1.291.142,25	1.291.142,25	1.145.525,32	Collaudo in corso	12/06/2000	03/06/2002		
	Legge 139/92 II fase											
4	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura degli scoli Fondi a Est e fondi a Sud e sottopasso del Naviglio)	1/A/1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 40 19/5/1999	1.652.662,08	1.652.662,08	127.166,53	Lavori in corso				
5	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastie, Foscara e Giare)	1/A/2 .2	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 100 22/10/1999	2.608.107,34	2.608.107,34	282.787,63	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				
6	PARCO LAGUNARE DI MIRA - EX Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastie, Foscara e Giare)	1/A/2 .3	DGR N. 33 DEL 12/1/1999	DDDA N. 100 22/10/1999	1.187.850,87	1.187.850,87	0,00	Finanziamento convogliato nell'intervento 6A				
6A	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Ricalibratura canali di bonifica Bastie, Foscara, Giare) (€ 3.795.958,22)		Riuniti i finanziamenti 5 (€ 2.608.107,34) + 6 (€ 1.187.850,87) = € 3.795.958,22					Progettazione in corso				
7	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Potenziamento impianto idrovoro di Dogaletto in comune di Mira)	1/A/2 .1	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 38 19/5/1999	2.556.461,65	2.556.461,65	2.556.461,65	Lavori ultimati.	12/06/2000	29/06/2002		Lavori ultimati - collaudo in corso
8	Sistemazione idraulica e ricalibratura della rete di bonifica del bacino di Chirignago e interconnessione all' impianto idrovoro di Malcontenta	1/B/2	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996	DDDA N. 101 22/10/1999	2.065.827,60	2.065.827,60	195.153,33	Finanziamento convogliato nell'intervento 8A				
8A	Sistemazione idraulica e ricalibratura della rete di bonifica del bacino di Chirignago e interconnessione all' impianto idrovoro di Malcontenta (€ 2.840.512,95)		Riuniti i finanziamenti 2 (€ 774.685,35) + 8 (€ 2.065.827,60) = € 2.840.512,95					Progettazione in corso				
9	Progetto integrato Fusina P.I.F. (Invasi di laminazione e sedimentazione in aree depresse per circa 30 ha con sistemazione a parco e con restituzione all'idrovora di Malcontenta)	1/B/3	DGR N. 3324 DEL 29/7/1996		1.549.370,70			Finanziamento convogliato nell'intervento 11A				Fondi disimpegnati con DGR N. 5087/99
10	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999		619.748,28	619.748,28	0,00	Progetto approvato				In attesa di coordinamento con l'intervento di ARPAV codice 5/A/1

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
11	Progetto dimostrativo integrazione rete fognaria e di bonifica	B/13.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		3.200.198,29			Finanziamento convogliato nell'intervento 11A				Con decreto 230/05 impegnati € 415.000 a favore A.C.M per opere complementari
11A	Progetto dimostrativo integrazione rete fognaria e di bonifica (L'importo complessivo del progetto è pari a € 8.234.568,99, di cui € 5.164.568,99 costituiscono il primo stralcio)		Riuniti i finanziamenti 9 (€ 1.549.370,70) + 11(€ 3.615.198,29) = € 5.164.568,99					Progettazione in corso				L'importo di € 5.164.568,99 è costituito da uno stralcio di € 2.469.568,99 affidato al Consorzio e da uno stralcio di € 2.695.000,00 all' A.C.M.
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
12	Realizzazione di un sistema di contenimento e fitobiodepurazione delle acque della zona a Nord del naviglio brenta	D/76	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 11 25/01/2005	4.131.655,19	4.131.655,19		Progetto approvato				Decreto di impegno dell'opera
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
13	Riassetto idraulico e rinaturalizzazione dell' asta principale del bacino Pionca a monte del sifone sotto il taglio di Mirano, nei comuni di Mira, Dolo, Pianiga e Mirano	2/Q/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 89 12/10/2002	2.065.827,60	103.291,38	103.291,38	Progettazione in corso				Decreto di impegno ed erogazione limitati alle sole spese di progettazione
14	Completamento della sistemazione idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte della botte a sifone del taglio di Mirano	2/R/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 96 12/10/2002	2.065.827,60	103.291,38	0,00	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
15	Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, S. Marco e Vandura).	2/S/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 104 12/10/2002	1.032.913,80	51.645,69	0,00	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
16	Riassetto della rete scolante del sottobacino dell' Arzere	2/T/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 102 12/10/2002	1.032.913,80	51.645,69	0,00	Progettazione in corso				Decreto di impegno limitato alle sole spese di progettazione
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
17	Ammodernamento e potenziamento impianto idrovoro di Dogaletto a Mira (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 7)	D1/34	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA N. 215 17/11/2004	310.000,00	310.000,00	23.353,84	Lavori ultimati.				Lavori ultimati - collaudo in corso
18	Ricalibratura scoli Fondi a Est e Fondi a Sud a Malcontenta (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 4)	D1/35	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		206.582,00			Lavori in corso				
19	Sistemazione idraulica e ricalibratura rete di bonifica bacino Chirignago Malcontenta (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 8A)	D1/36	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		774.684,00			Progettazione in corso				
20	Riclibrazione e rinaturalizzazione della rete idraulica del bacino Gambarare - Mira (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 8A)	D1/37	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		852.152,00			Progettazione in corso				
21	Progetto dimostrativo per integrazione di rete di fognatura bianca e rete di bonifica (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 11A)	D1/38	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		488.478,42			Progettazione in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
22	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Realizzazione di un sistema di contenimento e fitobiodepurazione delle acque della zona a nord del Naviglio Brenta (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 12)	D1/39	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		300.000,00			Progettazione in corso				
23	Riassetto idraulico e rinaturalizzazione dell' asta principale del bacino Pionca a monte del sifone sotto il taglio di Mirano, nei comuni di Mira, Dolo, Planiga e Mirano (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 13)	D1/40	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.032.913,88			Progettazione in corso				
24	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riassetto della rete scolante del sottobacino Rio dell'Arzere (COPERTURA MAGGIORI SPESE PER ESPROPRI dell'int. 16)	D1/41	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.549.370,70			Progettazione in corso				
25	Riconversione irrigua di preesistenti impianti a scorrimento nella zona di Cittadella, S.Martino di Lupari e Castelfranco	D2/46	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		174.240,00			Progetto approvato				
26	Indagine preliminare sulla qualità dei terreni da scavo	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		200.000,00			Progettazione in corso				Somma assegnata con DGR 4529/04.
27	Completamento piano caratterizzazione della qualità di escavo dei collettori consorziati fondi sud e fondi sud-est (bacini scolo meccanico di Malcontenta)	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		150.000,00			Progettazione in corso				Somma assegnata con DGR 4529/04.
	TOTALI				34.080.196,14	16.939.912,15	4.640.322,43					

PAGINA BIANCA

SEZIONE IV: REGIONE VENETO

Nota:
REGIONE VENETO – BONIFICA SITI INQUINATI: i fondi vengono ripartiti con Deliberazione della Giunta Regionale tra i diversi soggetti attuatori (vedi anche scheda riepilogativa pag. 115)
REGIONE VENETO / CONSORZIO VENEZIA DISINQUINAMENTO: gli interventi con i numeri evidenziati in grigio sono stati realizzati direttamente dalla Regione Veneto, tramite il C.V.D.)
REGIONE VENETO – FORESTE/AGRICOLTURA/ZOOTECNIA: i fondi vengono ripartiti con Deliberazione di Giunta Regionale tra i diversi soggetti attuatori (Consorzi di Bonifica ed aziende Agricole)

REGIONE: ACQUEDOTTI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
1	Condotta Cà solaro - Gazzera	D/90	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGCA N. 178 19/4/2001	4.002.540,97	6.197,48	6.197,48	Progettazione in corso				
2	Condotta Cà solaro - Cavallino	D/89	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGCA N. 178 19/4/2001	6.972.168,14	13.427,88	13.427,88	Progettazione in corso				
	TOTALI				10.974.709,11	19.625,36	19.625,36					

REGIONE: DISINQUINAMENTO / CONSORZIO VENEZIA DISINQUINAMENTO (C.V.D.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 910/86 Es. 1987-1988											
1	Somme in amministrazione per spese tecniche e notarili	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	424.340,91	424.340,91	424.340,91					
2	Impianto di sollevamento e modulazione del bacino di Zelarino.	1/1.3		DDDA N. 7 12/9/1990	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	Lavori collaudati				Variazione finanziamento con DDDA n. 81/96. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 55/2001
3	Lavori di costruzione dello scolmatore di via del Bosso a Chirignago - Mestre (VE)	1/1.2		DDDA N. 6 12/9/1990	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	Lavori collaudati			31/07/1997 30/03/1998	Variazione finanziamento con DDDA n. 76/96. D.C.F. 23 del 22/06/1998
4	Lavori di ristrutturazione delle reti fognarie del Cavallino (VE)	1/1.11		DDDA N. 19 12/11/1990	1.931.597,89	1.931.597,89	1.931.597,89	Lavori collaudati			22/07/1995	Finanziamento originale pari a € 2.065.827,60. DCF 147 del 24/03/1998. Economia, pari a € 134.229,71, convogliata nell'int. 24
5	Lavori di completamento dei sistemi principali di collettamento della rete fognaria di Chioggia (VE)	1/1.8	N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 12 12/9/1990	4.699.757,78	4.699.757,78	4.358.752,66	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 82 del 16/02/1998 e trasferita economia al Comune di Chioggia con DDDA 15/1999
6	Lavori di costruzione rete di fognatura zona di via Martiri di Marzabotto - bacino Gazzera - Mestre (VE)	1/1.14		DDDA N. 28 18/12/1990	1.344.229,74	1.344.229,74	1.344.229,74	Lavori collaudati			07/07/1994	Finanziamento originale pari a € 1.446.079,32. DCF 47/1996. Economia, pari a € 101.849,58, convogliata nell'int. 24
7	Lavori di estensione delle reti fognarie secondarie di Chioggia e Sottomarina (VE)	1/1.15		DDDA N. 29 18/12/1990	3.042.086,08	3.042.086,08	3.042.086,07	Lavori collaudati				Finanziamento originale pari a € 3.047.095,70. DCF 96 del 06/08/2001. Economia, pari a € 5.009,62, convogliata nell'int. 24

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
8	Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo	1/1.23	DGR N. 5263 DEL 2/10/1990	DDDA N. 13 15/2/1991	995.302,79	995.302,79	995.302,79	Lavori collaudati			13/03/1997	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. DCF DGCA 161/1998. Economia, pari a € 37.611,00, convogliata nell'int. 24
9	Lavori di costruzione dei collettori fognari di collegamento all'impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	1/1.13	DGR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 25 12/12/1990	980.577,05	980.577,05	980.577,05	Lavori collaudati			22/10/1998	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80 . DCF DDDA 106 del 26/10/1999. Economia, pari a € 52.336,76, convogliata nell'int. 24
10	Lavori di costruzione nuovo impianto di sollevamento nel bacino di via Torino e collegamento bacino di S. Giuliano	1/1.17		DDDA N. 31 18/12/1990	770.689,83	770.689,83	770.689,83	Lavori collaudati			14/08/1995	Finanziamento originale pari a € 774.685,35. DCF DDDA n. 48 del 14/05/1996. Economia pari a € 3.995,52 convogliata nell'int. 24
11	Lavori di costruzione della rete di fognatura della zona di via Asseggiano - bacino Gazzera (VE)	1/1.1	DCR N. 744 DEL 1/7/1988	DDDA N. 5 12/9/1990	835.121,92	835.121,92	835.121,92	Lavori collaudati			07/07/1995	Finanziamento originale pari a € 877.976,73 . DCF DDDA 42/1996. Economia, pari a € 42.854,81, convogliata nell'int. 24
12	Lavori di completamento della fognatura nella zona Nord-Est del Comune di Campagna Lupia (VE)	1/1.16		DDDA N. 30 18/12/1990	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati			31/05/1997	Variazione finanziamento con DDDA n 554 del 18/12/1997. Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 83 del 16/02/1998
13	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Chirignago - Mestre (VE)	1/1.10		DDDA N. 15 11/10/1990	1.298.757,42	1.298.757,42	1.298.757,42	Lavori collaudati			21/06/1994	Finanziamento originale pari a € 1.497.725,01. DCF 48 del 20/03/1996. Economia, pari a € 198.967,59, convogliata nell'int. 24
14	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Carpenedo - Mestre (VE)	1/1.12		DDDA N. 20 12/11/1990	972.642,76	972.642,76	972.642,76	Lavori collaudati			08/11/1994	Finanziamento originale pari a € 1.032.913,80. DCF 106 del 19/06/1996. Economia, pari a € 60.271,04, convogliata nell'int. 24
15	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VI lotto	1/1.7		DDDA N. 11 12/9/1990	1.136.205,18	1.136.205,18	1.068.506,88	Lavori ultimati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 53 del 20/05/2002
16	Fognatura bacino San Giuliano	1/1.6		DDDA N. 10 12/9/1990	433.816,22	433.816,22	433.816,22	Lavori collaudati			16/05/1994	Finanziamento originale pari a € 464.811,21. DCF 18 del 03/03/1997. Economia, pari a € 30.994,99, convogliata nell'int. 24
17	Redazione del Piano Direttore				516.456,90	516.456,90	516.456,90	Intervento concluso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
18	Lavori di adeguamento delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione - reti di Jesolo Lido (VE)	1/1.4	DGR N. 5263 DEL 2/10/1990	DDETA N. 8 12/9/1990	2.698.487,30	2.698.487,30	2.652.463,24	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DGCA n. 151/1998
19	Lavori di estensione della rete interna ed il collegamento alla rete consortile - Comune di Mira (I parte)	1/1.19	DGR N. 5263 DEL 2/10/1990	DDDA N. 34 19/12/1990	3.352.130,39	3.279.236,61	3.279.236,61	Lavori collaudati			30/05/1996	Finanziamento originale pari a € 3.356.969,84. DCF n. 76/1997. Economia pari a € 77.733,23 convogliata nell'int. 24
20	Lavori di teleregolazione e telecontrollo della fognatura di Jesolo - Philips	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	627.508,56	627.508,56	624.095,07	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DDDA n.84 del 12/08/2002
21	Lavori di adeguamento reti e impianto di depurazione di Jesolo (VE) - opere civili ed elettromeccaniche	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	446.078,81	446.078,81	446.078,81	Lavori collaudati			28/06/1996	Determinazione del contributo definitivo con DGCA n.125/1998
22	Ispezioni televisive	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	77.590,68	77.590,68	77.590,68	Lavori collaudati			22/03/1995	Determinazione del contributo definitivo con DGCA n.125/1998
23	Piano pilota W.R.C.	1/1.22		DPGR 2853 31/12/1990	327.330,38	327.330,38	327.330,38	Lavori collaudati				Determinazione del contributo definitivo con DGCA n.125/1998
24	RIUTILIZZO ECONOMIE L. 910/86 Es. 1987/88	1/1. ECO	DGR 2517 DEL 13/09/2002		2.085.508,84	544.799,30	516.004,90	Lavori in corso				
25	Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo. RIUTILIZZO ECONOMIA	1/1.23 ECO		DGR 1356 21/04/1998	28.077,39	28.077,39	28.077,39	Lavori ultimati				
	Legge 910/86 Es. 1989											
26	Lavori di estensione rete interna e collegamento alla rete consortile - Comune di Mira - II parte	1/1.18		DDDA N. 32 18/12/1990	3.098.741,39	3.098.741,39	3.003.584,63	Lavori collaudati			12/07/1996	Registrata, con DDDA n. 73 del 30/06/1997, un'economia di € 95.156,76
	Legge 67/88 Es. 1990											
27	Aggiornamento Piano Direttore II^ fase, monitoraggio acque sfocianti in laguna e fognature di Venezia	1/2.16 Penna	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		1.614.488,62	1.612.365,41	1.506.446,74	Lavori in corso				
28	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)	1/2.5.A	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		2.065.827,60	2.019.540,61	631.110,85	Lavori in corso				
29	Aggiornamento del Piano Direttore	1/2.16	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		967.795,88	967.795,88	959.662,38	Lavori ultimati				
30	Impianto integrato di Fusina - P.I.F. (linea di filtrazione per il riutilizzo industriale delle acque trattate - I° stralcio)	1/2.5	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991		96.506,54	96.506,54	96.506,54	Intervento concluso				Quota spesa per la sola progettazione
	Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche											
31	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)	1/6.1	DGR N. 45 DEL 15/07/1999	DGR N. 2121 DEL 2004	7.229.137,98	62.400,00	62.400,00					Impegno di spesa a favore dello IUAV
32	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)	1/6.3	DGR N. 45 DEL 15/07/1999		8.263.310,39							

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
33	Quota regionale agenzia per Venezia											Finanziamento di € 5.164.568,99 revocato con DDDA n. 108 del 28/10/1999
	Legge 139/92 - II fase											
34	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)	6/N/1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004 (PCR 1115/95 di assegnazione dei fondi)		12.181.000,00			Finanziamento convogliato nell'intervento 45A				Finanziamento proveniente da fondi riallocati di cui alla legge 139/92 II fase (schede 4/A/1 e 4/A/2 destinati alla Direzione Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura)
	Legge 539/95 Magg. Mutui III^fase											
35	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)	B/1 MM 3^ fase	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		21.342.612,00			Finanziamento convogliato nell'intervento 45A				
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
36	Realizzazione Carta Geologica della Laguna	B/22.1 IV fase	DCR N. 23 DEL 1/3/2000	DGR N. 3788 1/12/2000	309.874,14	309.870,17	303.930,59	Lavori ultimati				
37	Informazione, stampa, divulgazione, Piano Direttore, carta geologica della laguna	B/22 IV fase	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		451.899,79	428.730,01	428.129,97	Lavori in corso				
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
38	Progetto integrato Fusina (reflui civili industriali) - P.I.F.	A/3	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		18.075.991,47							
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
39	Contributi per riduzione inquinamento atmosferico (comune VE)	E/94	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		2.582.284,50	102.000,00		Lavori in corso				Intervento congiunto Regione Veneto/Comune di Venezia
40	Studi e sperimentazioni per interventi coordinati di riduzione dell'inquinamento e dell'asporto di sedimenti dalla laguna	E/95	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 43 DEL 2002	1.291.142,25	70.427,88	25.427,88	Lavori in corso				
41	Informazione, stampa, divulgazione, Piano Direttore, carta geologica della laguna	E/93	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.032.913,80	762.558,60	497.921,20	Lavori in corso				
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
42	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)	1/O/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		15.493.706,97							
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
43	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)		DCR N. 24 DEL 04/05/2004		9.919.447,15			Finanziamento convogliato nell'intervento 45A				
44A	Progetto integrato Fusina (P.I.F.)	B/1	Riuniti i finanziamenti 45 (€ 31.752.388,00), 34 (€ 12.181.000,00) e 35 (€ 21.342.612,00) = € 65.276.000,00					Progetto approvato				
45	Accordo di programma relativo a progetti di ricerca, sperimentazione e utilizzo dell'idrogeno tra Regione Veneto e Ministero dell'Ambiente	B/11	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Progetto preliminare				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
46	Attività di studi, ricerche, indagini e divulgazione, cocernenti il Piano Direttore 2000	B/16	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		700.000,00							
	TOTALI				144.975.921,84	46.176.574,56	43.673.823,48					

REGIONE: BONIFICA SITI INQUINATI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1997											
1	Bonifica siti inquinati in Comune di Venezia - Zona industriale di Marghera	C/24/1	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA 95/03 DGR 2382/03 DGR 1948/03	498.721,69	498.272,22	185.366,68	Lavori in corso				Fondi a disposizioni della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003
2	Accordo integrativo per la chimica di Porto Marghera - MASTER PLAN.(Bonifica siti inquinati in comune di Venezia - Z. I. di Porto Marghera)	C/24/1.1	DCR N. 45 DEL 15/7/1999	DDDA N. 37 23/4/2002	551.575,97	551.575,97	551.575,97	Lavori ultimati	Date diverse			Esecuzione dei lavori affidata a 5 soggetti attuatori.
	Interventi legati all'attuazione dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004. Bonifica area Porto Marghera.	C/24/1.A	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 109 04/07/2005	784.386,84	784.386,84	784.386,84					
	Bonifica siti inquinati in comune di Venezia - Zona industriale di Porto Marghera	C/24/1.B	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		747.599,50	677.100,00	410.843,90					
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
3	Bonifica siti inquinati P.Marghera	B/16.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 109 04/07/2005	5.125.345,12	5.125.345,12	5.125.345,12					Fondi a disposizioni della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003. Il finanziamento complessivo pari a € 7.643.562,11, comprende anche una quota pari a € 1.518.216,98 destinata al Comune di Venezia per la bonifica delle Corti Femminili
	Interventi legati all'attuazione dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004. Oneri connessi al funzionamento della gestione Commissariale.	B/16.2 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 67 26/04/2005	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
4	Indagine epidemiologica Marghera	B/18 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		103.291,38			Progettazione in corso				
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
5	Bonifica dell' area industriale ex Italsintex in comune di Camposampiero (PD)	D/84	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 4136 22/12/2000	39.291,84	39.291,84	39.284,92	Lavori in corso				Liquidazione sospesa

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
6	Interventi legati all'attuazione dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004. Bonifica area Porto Marghera.	D/83A	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 109 04/07/2005	1.463.310,39	1.463.310,39	1.463.310,39	Lavori ultimati				Fondi a disposizioni della Regione Veneto da utilizzare assieme ai fondi di cui al D.M. 468/2003
7	PROGETTO INTEGRATO FUSINA	D/83B	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		6.800.000,00							
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
8	MASTERPLAN bonifica Porto Marghera	4/A/2	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		516.456,90	22.250,00	0,00					In attesa del decreto di impegno
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
3	Interventi nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia per la bonifica di aree precedentemente occupate da discariche, inceneritori, attività industriali ecc.	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		952.250,26	22.250,00	15.750,00	Progettazione in corso				
	TOTALI				18.582.229,88	10.183.782,38	9.575.863,82					

REGIONE: FORESTE / AGRICOLTURA / ZOOTECNIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 360/91											
1	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - I stralcio	1/3.4	DGR N. 6243 DEL 30/10/1991	DDEA N. 33 DEL 28/9/1993	452.932,70	452.932,70	216.807,60	Lavori ultimati				Progetto affidato al Centro Veneto Disinquinamento (CVD) e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)
2	Progetto per la realizzazione del Bosco di Mestre - II stralcio	1/4.8	DGR N. 5211 DEL 18/11/1993	DGCA N. 542 DEL 10/12/1997	409.756,90	229.532,47	229.532,47	Lavori in corso				Progetto esecutiva e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)
3	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - II stralcio		DGR N. 5211 DEL 18/11/1993	DDDA N. 73 DEL 03/05/2005	686.681,09	580.645,25	0,00	Progetto approvato				Progetto esecutiva e direzione lavori affidata all'Azienda Regionale Foreste (A.R.F.)
	Legge 139/92 II fase											
4	Interventi strutturali: gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole - I lotto (3.2a) (€ 15.493.706,97)	2/D/1	DGR N. 2876 DEL 28/7/1998	DDRTTR 113 DEL 14.6.1999; DDRTTR 137 DEL 23.8.1999; DDRPAS 63 DEL 21.12.2000; DDRPAS 69 DEL 28.12.2000; DDRPAS 71 DEL 28.12.2000	15.493.706,97	14.367.008,64	10.540.198,73					

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
5	Protezione zootecnia: gestione reflui zootecnici(3.3a)	4/A/1	DGR N. 2876 DEL 28/7/1998	DDRPASM N. 77 DEL 14/6/1999; DSRSP 128 DEL 27.10.1999; DSRSP 102 DEL 23.08.2000; DSRSP 103 DEL 23.08.2000; DDRPAS 69 DEL28.12.2000; DDRPAS 71 DEL 28.12.2000; DDRPAS 1 DEL 07.02.2002; DDRPAS 141 DEL 05.09.2002; DDRPASA 13 DEL 04.06.2003	4.205.698,28	2.052.576,04	1.671.034,65	Verifiche di collaudo				Importo complessivo del finanziamento pari a € 6.713.939,69, di cui € 2.510.813,37 destinati al Progetto Integrato Fusina (vedi scheda Regione: Disinquinamento int. 44)
6	Protezione zootecnia: interventi strutturali in zootecnia(3.3b).	4/A/2	DGR N. 2876 DEL 28/7/1998	DDRPASM N. 77 DEL 14.06.1999; DSRSP 128 DEL 27.10.1999; DSRSP 102 DEL 23.08.2000; DSRSP 103 DEL 23.08.2000;DDRPAS71 DEL 28.12.2000; DDRPAS 1 DEL 07.02.2002; DDRPAS 141 DEL 05.09.2002; DGR 4093 DEL 30.12.2002; DDRPAS 32 DEL 22.03.2003; DDRPAS 26 DEL 21.02.2003; DDRPASA 13 DEL 04.06.2003	10.985.517,37	8.109.746,08	7.915.044,11	Verifiche di collaudo				Importo complessivo del finanziamento pari a € 20.658.275,96, di cui € 9.670.186,63 destinati al Progetto Integrato Fusina (vedi scheda Regione: Disinquinamento int. 44)
7	Gestione reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia	4/A/3	DCR N. 45 DEL 15/7/1999	DDRPAS 1 DEL 07.02.2002; DDRPAS 141 DEL 05.09.2002; DDRPASA 13 DEL 04.06.2003	5.164.568,99	4.708.850,97	2.614.383,16	Lavori in corso				
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
8	Incentivi, modifiche colturali e piani di spargimento e gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole	A/4 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDRPAS 72 DEL 28.12.2000; DDRPAS 1 DEL 07.02.2002; DDRPAS 37 DEL 28.3.2002; DDRPAS 141 DEL 05.09.2002	10.329.137,98	9.939.688,99	6.298.041,04	Lavori in corso	Importo complessivo del finanziamento pari a € 10.329.137,98, di cui € 6.818.335,60 destinati ai Consorzi di bonifica. La somma di tutte le erogazioni relative ai consorzi di bonifica è pari a € 3.451.802,81			
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
9	Incentivi alla politiche agricole ecocompatibili, modifiche colturali e piani di spargimento	C/67	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDRPASA 156 DEL 23.10.2003	10.329.137,98	10.085.905,08	5.787.569,21	Lavori in corso				
10	Gestione pratiche agricole: incentivazione all'innovazione ambientale	C/71	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.549.370,70	1.549.370,69	4.333,32	Lavori in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
11	Gestione reflui zootecnici e interventi strutturali	C/70	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		5.164.568,99	5.164.409,07	2.132.229,15	Lavori in corso				
12	Ricostruzione fasce tampone e set-aside	C/68	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDRPAS 72 DEL 13.05.2003; DDRPASA 29 DEL 18.06.2003; DDRPASA 34 DEL 25.06.2003	3.615.198,29	3.614.872,81	1.788.110,44	Lavori in corso				
13	Gestione pratiche irrigue	C/69	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		10.329.137,98	6.043.614,59	1.112.422,93	Lavori in corso				
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
14	AGRICOLTURA COMPATIBILE. (Al fine di ridurre gli apporti di fitonutrienti e favorire una più corretta gestione del suolo.)	3/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		10.329.137,98	3.965.044,50	1.532.614,46	Lavori in corso				
15	Realizzazione di fasce tampone e messa a riposo colturale con finalità ambientali nell' area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia	3/B/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		2.298.233,20	2.298.198,00	910.073,20	Lavori in corso				
16	Gestione delle pratiche irrigue: razionalizzazione dell' uso della risorsa idrica nel Bacino Scolante Laguna di Venezia	3/C/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002		5.164.568,99			In istruttoria				
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
17	Agricoltura compatibile nell'area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia (C5.1.3a)	C/1	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		6.611.724,00			In corso di realizzazione				
18	Gestione dei reflui zootecnici ed interventi strutturali in zootecnia (C5.1.4)	C/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		22.264.354,00	14.564.465,14	2.990.037,68	In corso di realizzazione				
19	Realizzazione fasce tampone e messa a riposo colturale con finalità ambientali nell'area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia (C5.1.3b)	C/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		11.046.290,00	7.478.134,60	1.713.443,20	In corso di realizzazione				
20	Gestione delle pratiche irrigue: razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica nel Bacino Scilante nella laguna di Venezia (C5.1.3c)	C/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		10.406.396,00			In corso di realizzazione				
21	Gestione delle pratiche agricole: incentivazione all'innovazione ambientale ecocompatibile in agricoltura nel Bacino Scilante nella laguna di Venezia (C5.1.5)	C/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.500.000,00			In corso di realizzazione				
	TOTALI				148.336.118,41	95.204.995,62	47.455.875,35					

PAGINA BIANCA

SEZIONE V: AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PUBBLICHE

ARPAV

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 67/88 Es. 1991											
1	Sistema informativo regionale - Nodo laguna	4a	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DGR N. 2558 27/07/1999	258.228,50	258.228,45	274.484,19	Lavori in corso				Fondi derivanti da un finanziamento iniziale di € 7.950.853,96 suddiviso negli interventi 1 (€ 258.228,45), 2 (€ 1.032.913,80), 7A (€ 4.787.555,45), 8 (€ 839.242,46) e 11 (€ 1.032.913,80)
	Legge 139/92 Es. 1993											
2	Interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua	4/B/1	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DGR N. 2558 27/07/1999	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori in corso				
3	Estensione rete agrometeorologica	6/C/1	DGR N. 4977 DEL 22/07/1993	DGR N. 156 27/1/1995	516.456,90	516.456,90	515.250,42	Lavori ultimati			15/05/1998	
	Legge 139/92 II fase											
4	Interventi strutturali in rete di bonifica.		DGR N. 2558 DEL 27/7/1999		103.291,60							Intervento soppresso per errore di attribuzione di ente
5	Settore agricolo: potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto	2/B/1	DGR N. 2238 DEL 21/5/1996	DGR 2584/96 DGR 2696/97	1.807.599,15	1.783.792,29	1.769.184,73	Lavori in corso				Finanziamento suddiviso in 2 interventi: servizio agrometeo (€ 774.685,34) e radar meteo progetto 2RADMETEO (€ 1.032.913,80)
6	Settore agricolo: potenziamento del Centro Agrochimico della Regione Veneto	2/C/1penna	DGR N. 6400 DEL 12/12/1995	DGR N. 2203 DEL 21/5/1996	2.582.284,50	2.582.284,50	1.647.866,29	Lavori in corso				Finanziamento suddiviso: parte attività agro-zootecnica (€ 1.807.599,15) lavori ultimati e parte ampliamento sede (€ 774.685,35)
7A	Progetto quadro di monitoraggio (€ 4.785.555,45)							Finanziamento convogliato nell'intervento 7				
7B	S.I.R.A.V. (Sistema Informativo Regione Ambiente Veneto) (€ 1.409.927,33)							Finanziamento convogliato nell'intervento 7				
7	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna (€ 6.197.482,79)	5/A/1	DGR 2516/98 DGR 2558/99	DGR 2516/98 DGR 2558/99	6.197.482,90	6.197.482,79	6.187.559,90	Lavori in corso				
8	Interventi strutturali in rete di bonifica.	5/B/5	DGR N. 2558 DEL 27/7/1999	DGR N. 2558 27/07/1999	839.242,80	839.242,46	147.448,45	Lavori in corso				
	Legge 515/96 Es. 1997											
9	Potenziamento della rete di telerilevamento agrometeorologica	C/25/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGR 2696 29/07/1997	1.032.913,80	1.032.913,80	946.275,27	Lavori in corso				L'importo finanzia parte del progetto 2RADMETEO
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
10	Potenziamento del servizio di analisi ed informazione in campo agro-zootecnico del centro Agroambientale di Castelfranco Veneto.	A/6.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 97 8/10/2002	1.032.913,80	1.032.913,80	619.748,00	Lavori in corso				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
11	Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante in Laguna di venezia - estensione del sistema di telecontrollo nel Bacino Scolante	B/15.1 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DGR N. 667 14/3/2003	1.032.913,80	1.032.913,80	516.456,90	Lavori in corso				
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
12	Monitoraggio delle acque lagunari e dei corsi d'acqua del bacino scolante	E/91	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		54.370,00			Progettazione in corso				Importo complessivo del finanziamento pari a € 1.549.370,70, suddiviso negli interventi 12 e 13
13	Monitoraggio interventi di disinquinamento nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia e realizzazione del Laboratorio per l'analisi delle diossine presso il Dipartimento dell'ARPAV di Venezia - Centro di riferimento del Bacino Scolante	E/91.1	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DDDA N. 53 26/5/2003	1.495.000,00	1.495.000,00	712.000,00	Lavori in corso				Importo complessivo del finanziamento pari a € 1.549.370,70, suddiviso negli interventi 12 e 13
14	Piano di monitoraggio della qualità dell' aria a Porto Marghera e nel bacino scolante nella laguna di Venezia. Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la previsione del rischio industriale e delle emergenze a P.M.	E/92	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 4013 31/12/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	774.685,35	Lavori in corso				Progetto SIMAGE I° LOTTO
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
15	Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio industriale e delle emergenze per l' area di Porto Marghera - SIMAGE II° Lotto	6/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 186 17/12/2003	1.549.370,70	1.549.370,70	774.685,35	Lavori in corso				
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
16	Progetto Grandi Rischi Industriali - Verifiche zona Industriale di Porto Marghera	A/2	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004		500.000,00	500.000,00	250.000,00	Lavori in corso				
17	Completamento Progetto SIMAGE - III° LOTTO	A/1	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004	DGR 4375 30/12/2003	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	Lavori in corso				
18	Realizzazione nuova sede del laboratorio ARPAV di Venezia a supporto dei monitoraggi e dei controlli ambientali nel sistema lagunare	B/17	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004	DDDA 44 11/03/2005	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Lavori ultimati				
	TOTALI				25.584.352,93	25.402.883,97	19.668.558,65					

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
1	Impianto pilota per il lavaggio di sedimenti nel Porto di Venezia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		516.450,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				516.450,00	0,00	0,00					

AZIENDA SPECIALE PORTO DI CHIOGGIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
1	Bonifica aree interessate alla realizzazione delle banchine "A", "E", "B" - terminal di Val da Rio in comune di Chioggia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.500.000,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				2.500.000,00	0,00	0,00					

ENTE DI BACINO R.S.U. VENEZIA 2

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 67/88 Es. 1991											
1	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia	4a	DGR N. 4975 DEL 2/11/1993	DGR N. 863 09/03/1993	6.713.939,69	6.713.939,69	6.713.939,69					
	Legge 360/91											
2	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia		DGR N. 6243 DEL 30/10/1991	DPRG N. 911 06/05/1992	3.356.969,84	3.356.969,84	3.356.969,84					
	Legge 139/92 Es. 1993							Lavori collaudati	18/10/1988	09/12/1998	07/06/1999	I finanziamenti sono stati riuniti in un unico progetto il cui importo finale è stato determinato con DDDA n. 118 del 18/11/1999 in € 39.835.911,31. Oltre ai finanziamenti della Legge Speciale per Venezia, l'intervento ha beneficiato dei fondi F.I.O. e della legge regionale 48/1994
3	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia-Marghera, loc. Malcontenta	4/A/1	DGR N. 4977 DEL 2/11/1993	DGR N. 4977 02/11/1993	9.296.224,18	9.296.224,18	9.296.224,18					
	Legge 539/95 Es. 1997											
4	Completamento impianto R.S.U. di Venezia (Fusina)	C/28/1	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DGR N. 553 25/02/1997	2.943.804,32	2.943.804,32	2.943.804,32					
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
5	Bonifica ex discarica per RSU in loc. S. Liberale di Marcon	B/15	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.500.000,00							
	TOTALI				24.810.938,04	22.310.938,04	22.310.938,04					

MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 910/86 Es. 1989											
1	Interventi di difesa dell'isola di S.Erasmo dalle acque alte.	1/3.6.C1	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000	DDDA N. 99 30/10/2000	1.922.252,58	1.922.252,58	0,00	Progetto approvato				Accordo di programma tra Regione e Comune. Fondi ex "Fognature Giudecca" pari a € 2.582.284,49 riallocati con DCR 32/97, al finanziamento 1 (€ 1.922.252,58) e al finanziamento 2 (€ 660.031,92)
2	Fognatura S. Erasmo	1/3.6.C	DGR N. 1834 DEL 23/06/2000		660.031,92			Fondi disimpegnati sul capitolo 50511 con DGR 2517 DEL 13/09/2002				
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
3	Interventi per ripristino dei pennelli alle foci di Adige e Brenta	B/21 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDS N. 28 11/3/1999	1.549.370,70	1.520.474,93	1.254.439,76	Lavori in corso				
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
4	Interventi per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi Adige e Brenta	5/D/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDSPC 431 09/10/2003	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Lavori in corso				Accordo di Programma tra Regione Veneto, MAV, comuni di Chioggia e Rosolina
5	Interventi sui manufatti idraulici di Torre di Burri e Castelfranco	5/D/2	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		2.767.443,55							
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
6	Intervento sui manufatti idraulici di torre di Burri, Castelfranco, botte di Conche	B/22 V fase	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		6.197.482,79							Intervento coordinato con il M.A.V. che finanzia una quota pari ad altri € 6.197.483,01
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
7	Interventi di fognatura; accordo di programma Malamocco-Alberoni	B1/60	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		5.681.025,89	0,00	0,00	Progettazione in corso				
8	Interventi di fognatura; accordo di programma S. Erasmo	B1/59	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000		1.807.599,15	0,00	0,00	Progettazione in corso				Intervento affidato al MAV
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
9	Accordo di programma Regione Veneto/M.A.V. - Interventi per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi Adige e Brenta	A/3	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDSPC 287 16/09/2004	3.400.000,00	3.400.000,00	795.580,56	Lavori in corso				
10	Accordo di programma Regione Veneto/M.A.V. - Botte di CONCHE	A/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.242.000,00			Progetto preliminare				
	TOTALI				**26.227.206,57**	**7.842.727,51**	**3.050.020,32**					

PROVINCIA DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
1	Realizzazione di una rete ecologica in Provincia di Venezia mediante individuazione di aree ad esempio meccanismi di fitodepurazione, sostenendo i principi di un'agricoltura sostenibile a basso impatto ambientale	B/10	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		2.000.000,00			Progetto preliminare				
	TOTALI				2.000.000,00	0,00	0,00					

S.A.VE. – SERVIZI AEROPORTUALI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
1	Realizzazione di un sistema di trattamento di prima pioggia al fine di contenere gli inquinanti attualmente scaricati nella Laguna di Venezia - Porzione scolante in bonifica - 1° stralcio	B/4	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.090.000,00			Progetto preliminare				
2	Realizzazione di un sistema di trattamento di prima pioggia al fine di contenere gli inquinanti attualmente scaricati nella Laguna di Venezia - Porzione scolante in bonifica - 2° stralcio	B/5	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.520.000,00			Progetto preliminare				
	TOTALI				6.610.000,00	0,00	0,00					

U.L.S.S. n° 12 - VENEZIA

SETTORE "OSPEDALI"

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio				6.197.482,79	6.197.482,79	6.197.482,79	Finanziamento convogliati nell'interventi 4A				
	Legge 910/86 Es. 1987-1988											
2	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio				5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	Finanziamento convogliati nell'interventi 4A				
	Legge 910/86 Es. 1989											
3	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio				2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	Finanziamento convogliati nell'interventi 4A				
	Legge 539/95 Es. 1997											
4	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio	C/27/1	DGR N. 553 DEL 25/2/1997	DDLLPP 157 13/7/1998	3.356.969,84	3.356.969,84	3.317.410,04	Finanziamento convogliati nell'interventi 4A				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
4A	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - II stralcio		Riuniti i finanziamenti 1, 2, 3 e 4					Lavori collaudati	-	-	30/09/2003	Decreto di contabilità finale in preparazione
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
5	Urgenti lavori di messa a norma di alcuni padiglioni dell'Ospedale S.S. Giovanni e Paolo di Venezia	B/2	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		3.000.000,00			Progetto preliminare				
	TOTALI				20.301.306,12	17.301.306,12	17.261.746,32					

SETTORE "DISINQUINAMENTO"

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 67/88 Es. 1990											
6	Ristrutturazione della rete fognaria dell'ospedale civile SS. Giovanni e Paolo - Primo stralcio funzionale	1/2.9	DGR N. 4599 DEL 5/8/1991	DDDA N. 68 16/10/1995	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	Lavori collaudati	04/12/1995	30/06/1998	25/09/2002	Determinazione del contributo definitivo con DDDA n. 21 del 26/03/2003
	Legge 515/96 Es. 1997											
7	Ristrutturazione della rete fognaria dell'ospedale civile SS. Giovanni e Paolo - Secondo stralcio funzionale	B/22/1	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 152 27/3/1998	929.622,42	929.622,42	915.230,09	Lavori collaudati	25/10/1999	15/11/2000	30/04/2003	Registrata, con DDDA n. 153 del 30/10/2003, un'economia di € 14.392,33 reiscritta nel bilancio regionale
8	Ristrutturazione della rete fognaria di complessi ospedalieri: ospedale civile e G.B. Giustinian in Comune di Venezia	B/22/2	DGR N. 2613 DEL 22/7/1997	DGCA N. 425 27/10/1997	103.291,38	103.291,38	75.910,27	Lavori collaudati	13/06/1995	30/10/1998	27/03/2003	In attesa del decreto di contabilità finale di competenza dei lavori pubblici
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
9	Completamento della rete fognaria acque bianche dell' Ospedale SS. Giovanni e Paolo e prolungamento della condotta di scarico nella laguna Nord.	1/P/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 126 29/06/2004	774.685,35	774.685,35	0,00	Progetto preliminare approvato				
	TOTALI				2.840.512,94	2.840.512,95	2.024.054,16					

A.S.L. n° 15 – ALTA PADOVANA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
1	Progetto per l'integrazione delle informazioni sanitarie ed ambientali per la gestione del territorio scolante nel bacino della Laguna di Venezia	B/18	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		1.039.000,00			Studio di fattibilità				
	TOTALI				1.039.000,00	0,00	0,00					

U.L.S.S. n° 17 – ESTE - MONSELICE

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
1	Ristrutturazione delle fognature in area ospedaliera di Monselice - 1^ fase funzionale.	A/7 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DDDA N. 96 30/10/2000	1.291.142,25	1.291.142,25	1.162.028,03	Lavori in corso	08/04/2002			
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
2	Interventi di completamento e ristrutturazione della fognatura nera dell' area ospedaliera di Monselice	6/L/1	DGR N. 1140 DEL 18/4/2003		232.000,00			Progettazione esecutiva in corso				
	TOTALI				1.523.142,25	1.291.142,25	1.162.028,03					

VENETO ACQUE S.p.A (ex DELTA PO S.p.A.)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 67/88 Es. 1988											
1	Sistema degli acquedotti del Basso Veneto - Realizzazione della condotta Cavarzere - Chioggia	1/4.10	DGR N. 4442 DEL 27/7/1990	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	8.934.704,35	8.934.704,35	2.680.411,31	Lavori in corso				Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
2	Interconnessione sistemi acquedottistici Venezia - Chioggia	B/21 V fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999	DGCA N. 344 10/10/2000	17.880.812,18	17.880.812,18	17.880.812,18	Lavori in corso				Intervento originario di € 19.780.812,18 affidato alla Delta Po S.p.A. ora Veneto Acque. La quota pari a € 1.900.000,00 assegnati all'ASP di Chioggia (int. 7)
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
3	Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Realizzazione delle condotte Padova - Mestre e collegamento con il Piovese	D/86	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002				Finanziamento originale pari a € 19.108.905,27. Impegnati alla Delta Po € 18.876.499,66 suddivisi, poi, negli intt. 3A (€ 14.018.456,41) e 3B (€ 4.858.043,25). Il residuo, pari a € 232.405,61 impegnatoper psese di progettazione				Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002
3A	Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Realizzazione delle condotte Padova - Mestre e collegamento con il Piovese	D/86	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	14.250.862,02	14.250.862,02	11.325.899,80	Lavori in corso				
3B	Schema acquedottistico del Veneto centrale - Condotta Padova-Mestre - Progetto definitivo 2° stralcio Condotta Centrale Gazzera-Caselle autostradale di Mestre e condotta centrale Villa Augusta - svincolo autostrada A4 Padova-Mestre-Bologna	D/86.2	DGR N. 1834 DEL 23/6/2000	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	4.625.637,64	4.625.637,64	0,00	Progetto approvato				

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
4	Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Sistemazione nodo idrico di Padova e chiusura anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia (I° stralcio)	5/A/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DGR N. 2367 DEL 9/8/2002	10.329.137,98	10.329.137,98	3.098.741,40	Lavori in corso				Erogazioni stabilite dalla DGR 2367/2002
	Legge 67/88 Es. 1992 II tranche											
5	Progetto Integrato Fusina P.I.F. (Impianto taratura processi: completamento ed aggiornamento del progetto e realizzazione dell'impianto)	1/6.1.1	DGR N. 45 DEL 15/07/1999	DGR 3905 12/12/2003	3.100.000,00	3.100.000,00	930.000,00	Lavori in corso				
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
6	Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Schema Veneto centrale Linea-Padova-Piove di Sacco-Cavarzere	B/14	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		20.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Progetto definitivo				
	TOTALI				79.121.154,18	65.121.154,18	41.915.864,69					

VENETO AGRICOLTURA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
1	Messa a punto di modelli produttivi innovativi nelle colture estensive per una gestione ecocompatibile nell'ambito del Bacino scolante in Laguna di Venezia	B/8	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 208 10/11/2005	900.000,00	900.000,00	0,00	Progetto approvato				
2	Utilizzo dei compost di qualità in agricoltura e sperimentazione tecnica ed economica finalizzata alla riduzione dei concimi azotati tradizionali	B/9	DCR N. 24 DEL 04/05/2004	DDDA 162 21/09/2005	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Progetto approvato				
	TOTALI				1.900.000,00	1.900.000,00	0,00					

PAGINA BIANCA

SEZIONE VI: ENTI VARI

ABBAZIA DI SAN GIORGIO MAGGIORE (Venezia)

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
1	Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell' isola di S. Giorgio Maggiore	1/Z/1	DGR N. 794 DEL 9/4/2002	DDDA N. 146 15/10/2003	206.582,76	206.582,76	206.532,97	Lavori in corso				Registrata, con DDDA n. 158 del 20/09/2005, un'economia pari a € 49,79
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
2	Ristrutturazione e completamento della rete di fognatura nell' isola di S. Giorgio Maggiore	B/3	DGR N. 3094 DEL 01/10/2004	DDDA N. 180 13/10/2005	80.000,00	80.000,00	0,00	Progettazione in corso				
	TOTALI				286.582,76	286.582,76	206.532,97					

COMUNITA' EBRAICA DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
1	Lavori di restauro dell'edificio adibito all'assistenza agli anziani della Comunità Ebraica di Venezia	B/20.2 V fase	DGR 2924 03/08/1999	DDDA N. 68 26/04/2005	2.000.000,00	2.000.000,00	1.199.548,98	Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod B/20 V fase
	TOTALI				2.000.000,00	2.000.000,00	1.199.548,98					

DIOCESI PATRIARCALE DI VENEZIA

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986											
1	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/5.1B	DGR 4976 02/11/1993		444.697,73			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia" cod 1/5.1
	Legge 67/88 Es. 1990											
2	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/2.14b.1	DGR 4599 05/08/1991		511.292,33			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Chioggi/ASP "Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)" cod 1/2.14b

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 139/92 Es. 1993											
3	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	1/C/15.1	DGR 4977 02/11/1993		1.755.953,46			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Vasca di prima pioggia e laminazione in loc. "Gazzera" Mestre - Venezia" cod 1/C/15
	Legge 139/92 Magg. Mutui II^fase											
4	Adeguamento a delle linee fognarie e degli impianti di depurazione a servizio del complesso edilizio del seminario patriarcale in Venezia		DGR N. 1140 DEL 18/4/2003	DDDA N. 80 / 20/02/2004	464.400,00	464.400,00	133.800,00	Lavori in corso				
	Legge 515/96 Es. 1997											
5	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	C/23/1.6	DGR 2613 22/07/1997		5.265.854,58			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Comune di Venezia "Ampliamento e ristrutturazione rete fognaria" cod C/23/1
	Legge 345/97 Es. 1998 - V fase											
6	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	B/20.1 V fase	DGR 2924 03/08/1999		10.857.632,91			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod B/20 V fase
	Legge 488/99 Es. 2002, 2003											
7	Restauro della Sede Patriarcale, del Seminario Patriarcale e della Basilica della Salute	5/B/1.1	DGR 794 09/04/2002		5.164.568,99			Progettazione in corso				Finanziamento proveniente dalla riallocazione degli ex fondi Consorzio di bonifica Basso Piave "Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino" cod 5/B/1
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
8	Risanamento igienico sanitario delle Chiese di Venezia	B/12.2	DCR N. 24 04/05/2004		1.300.743,00			Progettazione in corso				
	TOTALI				25.765.143,00	464.400,00	133.800,00					

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO "GOLDONI"

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 388/00 e 448/01 Es. 2002, 2003, 2004											
1	Risanamento igienico sanitario degli impianti del Teatro Goldoni	B/13	DCR N. 24 DEL 04/05/2004		455.000,00			Progetto preliminare				
	TOTALI				455.000,00	0,00	0,00					

ENTI VARI

Int.	LEGGE DI FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice	Approvazione del finanziamento	Approvazione e/o impegno	Finanziato (euro)	Impegnato (euro)	Erogato (euro)	Descrizione Situazione	Inizio o consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
	Legge 515/96 Es. 1998 - IV fase											
1	Fondo di rotazione per la progettazione	B/19 IV fase	DGR N. 2924 DEL 3/8/1999		5.164.568,99	1.754.920,54	1.754.920,54	Progetto approvato				
	Legge 448/98 Es. 1999, 2000, 2001 - VI fase											
2	Spese per progettazione inerenti :" Schema acquedottistico del Veneto Centrale previsto dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto ".	D/86.1	DGR 1834 DEL 23/06/2000		232.405,61	232.405,61	184.459,54	Progettazione in corso				
	TOTALI				5.396.974,60	1.987.326,15	1.939.380,08					

Documento D ***Comune di Venezia***

Stato di attuazione delle attività finanziate con fondi di legislazione speciale per Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

COMUNE DI VENEZIA
MAGISTRATO ALLE ACQUE
SEGRETERIA
06. GIU. 2006
Prot. N. 413 /GAB.

Vice Sindaco
on. Michele Vianello

Venezia, 31 maggio 2006
Prot. 227850

MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA
05. GIU. 2006
GABINETTO

Alla Signora Presidente del Magistrato alle Acque
Dott. Ing. Maria Giovanna Piva
Segretario del Comitato di Indirizzo/Coordinamento/Controllo
Palazzo dei X Savi
Venezia

Oggetto: **Stato di attuazione delle attività finanziate con fondi di legislazione speciale per Venezia**

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 4, comma IV°, della legge 798/'84 si trasmette, compiegato, lo stato di avanzamento degli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nelle competenze di questa Amministrazione, aggiornato al 31 dicembre 2005.

Con l'adozione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione n. 131/'05, che ha approvato il programma degli interventi di legge speciale. si sono utilizzate risorse pari ad euro **65.509.076,35** così in dettaglio:

euro **9.546.725,40**= economie risultanti da ribassi d'asta o interventi conclusi finanziati con:

- legge 139/'92, mutui IMI con decorrenza 1993 e 1996;
- legge 539/'95, mutui CREDIOP con decorrenza 1996 e 1997;
- legge 515/'96, mutuo CREDIOP con decorrenza 1997;
- legge 345/'97, mutuo CREDIOP con decorrenza 1998 e COMIT con decorrenza 1999;
- legge 448/'98, mutui CREDIOP con decorrenza 1999 e 2000;
- legge 488/'99, mutuo OPI con decorrenza 2001;

euro **4.363.686,42**= disponibilità risultanti a seguito della ricognizione dei mutui legge 448/'98 CREDIOP e Monte Paschi con decorrenza dal 2000;
euro **72.089,53**= disponibilità risultanti a seguito della ricognizione del mutuo legge n. 295/'98 Ca.Ri.Ve. con decorrenza dal 2000;
euro **51.526.575,00** deliberazione C.I.P.E. 20 dicembre 2004, mutuo contratto con la Depfa Bank in data 16 dicembre 2005.

Corre l'obbligo di sottolineare che la civica Amministrazione, pur a fronte dei mancati rifinanziamenti statali abbia, ancora una volta, cercato di supplirvi attraverso una programmazione dinamica e trasparente del proprio operato.

In tal senso merita apprezzamento l'aumento percentuale dell'impegnato, dell'obbligato e dello speso, pur a fronte del fatto, non certo positivo, che le risorse derivanti dalla deliberazione C.I.P.E. si sono rese disponibili il 16 dicembre 2005.

On. Michele Vianello

COMUNE DI VENEZIA

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AREA LEGGE SPECIALE E MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI

LEGGI DI FINANZIAMENTO	MUTUO A DECORRERE DALL'ANNO	LIMITI DI IMPEGNO QUINDICENNALI A CARICO DELLO STATO	DATA STIPULA MUTUO	AMMONTARE DISPONIBILE ALLA STIPULA DEL MUTUO	DI CUI ACCANTONAMENTO COME RISERVA (*)
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 139	1993	17.043	22.12.1992	151.340	---
	1994	7.081	21.07.1994	69.150	---
	1995	4.948	09.06.1995	45.135	---
	1996	4.498	22.12.1995	42.378	---
LEGGE 20 DICEMBRE 1995 N. 539	1996	3.160	24.07.1996	32.702	---
	1997	5.969	24.07.1996	64.619	---
LEGGE 4 OTTOBRE 1996 N. 515	1997	18.514	30.08.1996	204.290	---
	1998	9.428	30.07.1997	111.328	---
LEGGE 2 OTTOBRE 1997 N. 345	1998	9.640	23.12.1997	114.611	---
	1999	6.585	12.11.1998	81.384	---
LEGGE 3 AGOSTO 1998 N. 295	1999	658	02.11.1999	8.254	---
	2000	439	02.11.1999	5.443	---
LEGGE 28 DICEMBRE 1998 N. 448	1999	10.639	25.10.1999	143.540	---
	2000	2.995	20.12.1999	45.288	---
	2001	3.873	07.07.2000	46.481	5.165
LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488	2001	6.352	11.10.2000	68.689	6.197
	2002	6.972	08.05.2001	79.017	8.263
LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388	2002	3.925	23.04.2002	43.920	4.880
	2003	6.972	17.06.2002	90.000	10.000
LEGGE 28 DICEMBRE 2001 N. 448	2002	2.505	17.07.2002	27.372	2.628
	2003	4.170	17.07.2002	45.448	4.552
	2004	8.780	17.07.2003	94.824	10.536
DELIBERA C.I.P.E. DEL 29/09/2003 n. 72 PER IL TRIENNIO 2002-2004 ART. 80, COMMA 28, L. 166/2002 (art. 6, lett. A) - B) - C), L. 798/84)	2004	(1) 4.566	29.12.2003	(2) 50.400	5.600
DELIBERA C.I.P.E. DEL 20/12/2004 N. 75: "Progetto per la Salvaguardia della Laguna di Venezia (sistema MO.S.E.): ripartizione tra i soggetti attuatori della seconda tranche di finanziamento" - DELIBERA N. 40/2004, art. 13 - L. 166/2002, art. 6, lett. A) - B) - C) - D) - L. 798/84	2005	(3) 5.516	16.12.2005	(4) 54.540	5.725

(*) la riserva è una somma prudenziale che viene accantonata e che potrà essere disponibile solo dopo i primi 5 anni dalla stipula di ogni singolo contratto di mutuo. L'ammontare è presunto e dipende dal tasso ufficiale di sconto vigente alla data della verifica e dai relativi piar erogazione. Per la sua indeterminatezza e la sua non immediata disponibilità, non è stata conteggiata nel programma degli interventi.

(1) limite di impegno per il Comune di Venezia € 3.652= per il Comune di Cavallino - Treporti € 228= per il Comune di Chioggia € 685=

(2) Comune di Venezia € 30.152=, Commissario delegato al traffico acqueo € 10.168=, Comune Cavallino - Treporti e Comune di Chioggia € 10.080=

(3) limite di impegno per il Comune di Venezia € 5.240=, per il Comune di Cavallino - Treporti € 276=

(4) Comune di Venezia € 51.527=, Comune Cavallino - Treporti € 3.013=

I DATI SONO ESPOSTI IN MILIONI DI EURO

Programmazione e Controllo Area Legge Speciale e Monitoraggio degli Investimenti

RIEPILOGO

31/12/2005	TOTALE LEGGE 5 febbraio 1992 n. 139				TOTALE LEGGE 30 dicembre 1995 n. 539				TOTALE LEGGE 4 ottobre 1996 n. 513				TOTALE LEGGE 2 ottobre 1995 n. 345				TOTALE LEGGE 2 ottobre 1998 n. 295				TOTALE LEGGE 28 dicembre 1998 n. 448			
Interventi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	167.020	165.710	165.455	163.099	70.706	67.461	67.013	58.720	199.122	193.940	193.183	171.905	91.597	90.806	90.376	74.257	13.698	13.585	13.585	13.484	90.255	87.055	85.999	74.352
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	23.794	23.776	23.776	19.788	12.630	12.230	11.301	11.486	44.348	42.916	41.728	40.176	24.422	23.476	23.364	21.031	-	-	-	-	43.274	42.531	42.046	34.358
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	30.794	30.794	30.794	26.568	9.296	9.296	9.296	8.826	41.781	41.281	41.281	23.511	35.895	35.895	35.895	13.464	-	-	-	-	23.570	23.330	23.330	12.550
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	31.960	31.931	31.931	28.102	3.739	3.739	3.618	3.618	12.575	12.136	12.130	10.744	16.308	16.308	16.308	8.856	-	-	-	-	29.337	27.557	26.378	4.541
rll - art. 5 Legge 139/92	54.435	54.435	54.435	53.232	949	949	949	86	17.791	17.791	17.791	15.788	27.772	27.772	27.772	14.712	-	-	-	-	48.874	48.391	48.391	41.161
TOTALE	308.003	306.646	306.391	290.789	97.320	93.673	92.174	82.733	315.617	308.064	306.113	262.124	195.994	194.257	193.715	132.320	13.698	13.585	13.585	13.484	235.310	228.864	226.144	166.962
		100%	99%	94%		96%	95%	85%		98%	97%	83%		99%	99%	68%		99%	99%	98%		97%	96%	71%

LEGGENDA

Programmato: intervento inserito in un programma approvato con Deliberazione Consiliare

Impegnato: importi definiti con deliberazione degli organi competenti Giunta o Consiglio Comunale. L'impegnato può essere assunto solo dopo la stipula del mutuo contratto sulla base dei limiti di impegno della annualità relative

Obbligato: contratti di appalto, di compravendita, approvazione graduatorie definitive dei bandi, convenzioni con terzi

Spesa: importi erogati, uscite di cassa

Le somme degli interventi riferiti al progetto integrato rll non comprende la quota regionale corrispondente al 10% delle competenze regionali e assegnata al comune di Venezia ai sensi del 3° comma art. 2 Legge 5 febbraio 1992 n. 139

Programmazione e Controllo Area Legge Speciale e Monitoraggio degli Investimenti

RIEPILOGO

31/12/2005	TOTALE LEGGE				TOTALE LEGGE				TOTALE LEGGE				TOTALE LEGGE				TOTALE LEGGE				TOTALE GENERALE			
	23 dicembre 1999 n. 488				23 dicembre 2000 n. 388				23 dicembre 2001 n. 388				Art. 30, Comma 23 L. 166/02 - Delibera C.I.P.E. annualità 2004				Art. 30, Comma 23 L. 166/02 Delibera C.I.P.E. annualità 2005							
Interventi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	69.767	63.298	56.001	36.728	71.613	57.971	52.081	42.201	47.526	43.333	41.453	24.181	12.481	8.168	6.775	2.309	18.462	5.724	1.309	-	852.247	797.051	773.230	661.236
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	22.234	18.045	15.203	12.141	19.204	16.247	14.258	10.237	43.222	39.934	30.184	18.999	7.885	7.885	4.201	2.957	9.739	5.264	4.011	-	250.752	232.304	210.072	171.173
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	23.004	22.755	22.755	15.170	4.667	4.667	4.667	3.542	26.796	26.796	26.796	12.226	5.576	5.456	-	2.747	4.908	209	209	200	206.287	200.479	195.023	118.804
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	9.815	9.642	9.046	2.678	12.827	12.526	10.140	5.999	4.066	3.483	3.483	851	4.060	1.132	628	517	3.049	2	2	2	127.736	118.456	113.661	65.905
ril - art. 5 Legge 139/92	22.886	22.886	22.886	22.886	25.609	25.609	25.609	22.115	46.034	45.899	45.899	17.667	150	150	150	-	15.368	15.368	15.368	72	259.868	259.250	259.250	187.719
TOTALE	147.706	136.626	125.891	89.603	133.920	117.020	106.755	84.094	167.644	159.445	147.815	73.924	30.152	22.791	11.754	8.530	51.526	26.567	20.899	274	1.696.890	1.607.540	1.551.236	1.204.837
		92%	85%	81%		87%	90%	53%		95%	88%	44%		76%	39%	28%		52%	41%	1%		95%	91%	71%

Legge 5 febbraio 1992 n. 139

31/12/2005	1998 MM Limite d'impegno a decorrere dal 1998 - Mutuo fino a Euro 151.339.965,97				1994 MM Limite d'impegno a decorrere dal 1994: 7.081 mil € - Mutuo fino a Euro 49.180.141,2				1995 MM Limite d'impegno a decorrere dal 1995, 4.948 mil € - Mutuo fino a Euro 46.195.085,29				1996 MM Limite d'impegno a decorrere dal 1996: 4.[illegible] mil € - Mutuo fino a Euro 42.578.518,2				TOTALE LEGGE			
Interventi	programmato	impegnato	obbligato	speso	programmato	impegnato	obbligato	speso	programmato	impegnato	obbligato	speso	programmato	impegnato	obbligato	speso	programmato	impegnato	obbligato	speso
Lettera a) - art. 6 Legge 358/84	80.948	80.662	80.662	79.119	26.627	26.389	26.389	26.338	31.050	31.009	31.009	30.675	28.395	27.650	27.395	26.972	167.020	165.710	165.455	163.099
Lettera b) - art. 6 Legge 358/84	9.229	9.215	9.215	8.937	603	599	599	599	5.522	5.522	5.522	5.349	8.440	8.440	8.440	4.903	23.794	23.776	23.776	19.788
Lettera c) - art. 6 Legge 358/84	14.569	14.569	14.569	14.485	15.225	15.225	15.225	11.791	785	785	785	292	215	215	215		30.794	30.794	30.794	26.568
Lettera d) - art. 6 Legge 358/84	15.994	15.994	15.994	15.947	2.909	2.909	2.909	2.909	7.729	7.700	7.700	6.161	5.328	5.328	5.328	3.085	31.960	31.931	31.931	28.102
ex - art. 5 Legge 139/92	30.600	30.600	30.600	30.373	23.786	23.786	23.786	22.810	49	49	49	49					54.435	54.435	54.435	53.232
TOTALE	151.340	151.040	151.040	148.861	69.150	68.908	68.908	64.442	45.135	45.065	45.065	42.526	42.378	41.633	41.378	34.960	308.003	306.646	306.391	290.789
		100%	100%	98%		100%	100%	93%		100%	100%	94%		98%	98%	82%		100%	99%	94%

Programmazione e Controllo Area Legge Speciale e Monitoraggio degli Investimenti

31/12/2005	Legge 30 dicembre 1993 n. 559								TOTALE [illegible]			
	1996 CREDIOP Limite d'impegno a decorrere dal 1996: 5.160 mil € - Mutuo fino a Euro 32.701.921,06				1997 CREDIOP Limite d'impegno a decorrere dal 1997: 5.969 mil € - Mutuo fino a Euro 64.619.045,09							
Interventi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Lettera a) - art. 6 Legge 398/84	25.002	24.267	24.127	20.300	45.704	43.194	42.886	38.420	70.706	67.461	67.013	58.720
Lettera b) - art. 6 Legge 398/84	3.369	3.369	3.369	2.984	9.261	8.861	7.932	8.502	12.630	12.230	11.301	11.486
Lettera c) - art. 6 Legge 398/84	2.582	2.582	2.582	2.112	6.714	6.714	6.714	6.714	9.296	9.296	9.296	8.826
Lettera d) - art. 6 Legge 398/84	1.033	1.033	1.033	1.033	2.706	2.706	2.582	2.582	3.739	3.739	3.615	3.615
Al - art. 5 Legge 139/92	716	716	716		233	233	233	86	949	949	949	86
TOTALE	32.702	31.967	31.827	26.429	64.618	61.708	60.347	56.304	97.320	93.675	92.174	82.733
		98%	97%	81%		95%	93%	87%		96%	95%	85%

Programmazione e Controllo Area Legge Speciale e Monitoraggio degli Investimenti

30/12/2005	Legge 4 ottobre 1996 n. 518								TOTALE LEGGE			
	1997 CREDIOP Limite d'impegno a decorrere dal 1997: 18.514 mil € - Mutuo fino a Euro 204.290.230,10				1998 Banco Napoli Limite d'impegno a decorrere dal 1998: 9.428 mil € - Mutuo fino a Euro 111.327.236,89							
Interventi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Lettera a) - art. 6 Legge 398/84	127.775	126.969	126.969	121.985	71.347	66.971	66.214	49.920	199122	193.940	193.183	171.905
Lettera b) - art. 6 Legge 398/84	36.062	36.062	36.062	34.581	8.286	6.854	5.666	5.595	44348	42.916	41.728	40.176
Lettera c) - art. 6 Legge 398/84	30.791	30.791	30.791	18.182	10.990	10.490	10.490	5.329	41781	41.281	41.281	23.511
Lettera d) - art. 6 Legge 398/84	6.567	6.567	6.567	5.453	6.008	5.569	5.563	5.291	12575	12.136	12.130	10.744
ril - art. 5 Legge 139/92	3.095	3.095	3.095	2.484	14.696	14.696	14.696	13.304	17791	17.791	17.791	15.788
TOTALE	204.290	203.484	203.484	182.685	111.327	104.580	102.629	79.439	315617	308.064	306.113	262.124
		100%	100%	89%		94%	92%	71%		98%	97%	83%

31/12/2005	Legge 2 ottobre 1997 n. 345								TOTALE LEGGE			
	1998 CREDIOP Limite d'impegno a decorrere dal 1998: 9.640 mil € - Mutuo fino a Euro 114.611.993,71				1999 CONTI Limite d'impegno a decorrere dal 1999: 6.585 mil € - Mutuo fino a Euro 81.383.746,76							
Interventi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Lettera a) - art. 6 Legge 398/84	57.021	56.588	56.158	42.967	34.576	34.218	34.218	31.290	91.597	90.806	90.376	74.257
Lettera b) - art. 6 Legge 398/84	17.736	17.163	17.059	14.784	6.686	6.313	6.305	6.247	24.422	23.476	23.364	21.031
Lettera c) - art. 6 Legge 398/84	24.931	24.931	24.931	7.522	10.964	10.964	10.964	5.942	35.895	35.895	35.895	13.464
Lettera d) - art. 6 Legge 398/84	10.111	10.111	10.111	8.533	6.197	6.197	6.197	323	16.308	16.308	16.308	8.856
ril - art. 5 Legge 139/92	4.812	4.812	4.812	4.743	22.960	22.960	22.960	9.969	27.772	27.772	27.772	14.712
TOTALE	114.611	113.605	113.071	78.549	81.383	80.652	80.644	53.771	195.994	194.257	193.715	132.320
		99%	99%	69%		99%	99%	66%		99%	99%	68%

Programmazione e Controllo Area Legge Speciale e Monitoraggio degli Investimenti

31/12/2005	Legge 3 ottobre 1998 n. 395											
	1999 Cassa di Risparmio Veneto Limite d'impegno a decorrere dal 1999: 0,658 mil € - Mutuo fino a Euro 8.264.548,38				2000 Cassa di Risparmio di Venezia Limite d'impegno a decorrere dal 2000: 0,489 mil € - Mutuo fino a Euro 5.443.241,28				[illegible]			
Interventi	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Lettera a) - art. 6 Legge 798/84	8.255	8.142	8.142	8.053	5.443	5.443	5.443	5.431	13.698	13.585	13.585	13.484
Lettera b) - art. 6 Legge 798/84	-								-	-	-	-
Lettera c) - art. 6 Legge 798/84	-								-	-	-	-
Lettera d) - art. 6 Legge 798/84	-								-	-	-	-
ril - art. 5 Legge 139/92	-								-	-	-	-
TOTALE	8.255	8.142	8.142	8.053	5.443	5.443	5.443	5.431	13.698	13.585	13.585	13.484
		99%	99%	99%		100%	100%	100%		99%	99%	99%

Programmazione e Controllo Area Legge Speciale e Monitoraggio degli Investimenti

31/12/2005	Legge 28 dicembre 1998 n. 448												TOTALE LEGGE			
	1999 Credop + Bei Limite d'impegno a decorrere dal 1999: 10.639 mil € - Mutuo fino a Euro 148.540.641,26 (185.793.787,77+Save 7.750.000,00)				2000 Credop + Monte Paschi Siena Limite d'impegno a decorrere dal 2000: 2.995 mil € - Mutuo fino a Euro 45.288.441,03 (38.449.841,76 + Save)				2001 Monte Paschi Siena Limite d'impegno a decorrere dal 2001: 3.573 mil € - Mutuo fino a Euro 46.481.120,92 (Save Euro 5.164.568,99)							
Interventi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	77.016	73.955	73.449	64.685	6.178	6.039	5.733	3.710	7.061	7.061	6.817	5.957	90.255	87.055	85.999	74.352
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	27.929	27.202	26.782	19.216	4.248	4.232	4.232	4.132	11.097	11.097	11.032	11.010	43.274	42.531	42.046	34.358
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	20.856	20.706	20.706	12.124	2.714	2.624	2.624	426					23.570	23.330	23.330	12.550
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	14.153	14.047	12.868	4.220	10.101	8.427	8.427	321	5.083	5.083	5.083		29.337	27.557	26.378	4.541
rii - art. 5 Legge 139/92	3.586	3.586	3.586	3.060	22.047	22.047	22.047	20.202	23.241	22.758	22.758	17.899	48.874	48.391	48.391	41.161
TOTALE	143.540	139.496	137.391	103.305	45.288	43.369	43.063	28.791	46.482	45.999	45.690	34.866	235.310	228.864	226.144	166.962
		97%	96%	72%		96%	95%	64%		99%	98%	75%		97%	96%	71%

Programmazione e Controllo Area Legge Speciale e Monitoraggio degli Investimenti

31/12/2005	Legge 30 DICEMBRE 1999 N. 488								TOTALE [illegible]			
	2001 OPI Limite d'impegno a decorrere dal 2001: 3.875 mil. € - Mutuo fino a Euro 68.488.747,58 (Lire Euro 5.661.025,69)				2002 Banco di Napoli OPI Limite d'impegno a decorrere dal 2002: 6.972 mil. € - Mutuo fino a Euro 79.017.908,57							
Interventi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Lettera a) - art. 6 Legge 798/84	43.471	41.083	34.615	23.880	26.296	22.215	21.386	12.848	69.767	63.298	56.001	36.728
Lettera b) - art. 6 Legge 798/84	9.930	6.794	4.417	3.002	12.304	11.251	10.786	9.139	22.234	18.045	15.203	12.141
Lettera c) - art. 6 Legge 798/84	7.747	7.623	7.623	7.208	15.257	15.132	15.132	7.962	23.004	22.755	22.755	15.170
Lettera d) - art. 6 Legge 798/84	7.541	7.409	6.813	1.143	2.274	2.233	2.233	1.535	9.815	9.642	9.046	2.678
rii - art. 5 Legge 139/92					22.886	22.886	22.886	22.886	22.886	22.886	22.886	22.886
TOTALE	68.689	62.909	53.468	35.233	79.017	73.717	72.423	54.370	147.706	136.626	125.891	89.603
		92%	78%	51%		93%	92%	69%		92%	85%	61%

Programmazione e Controllo Area Legge Speciale e Monitoraggio degli Investimenti

31/12/2005	Legge 23 dicembre 2000 n. 338								TOTALE LEGGE			
	2002 OPI Limite d'impegno a decorrere dal 2002: 3.925 mil. € - Mutuo fino a Euro 43.920.000,00				2003 Denta Credlop Limite d'impegno a decorrere dal 2002: 6.972 mil. € - Mutuo fino a Euro 90.000.000,00							
Interventi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	13.862	13.788	13.788	12.397	57.751	44.183	38.293	29.804	71.613	57.971	52.081	42.201
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	3.116	3.116	3.082	2.830	16.088	13.131	11.176	7.407	19.204	16.247	14.258	10.237
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	4.648	4.648	4.648	3.523	19	19	19	19	4.667	4.667	4.667	3.542
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	790	790	790	766	12.037	11.736	9.350	5.233	12.827	12.526	10.140	5.999
rii - art. 5 Legge 139/92	21.504	21.504	21.504	21.175	4.105	4.105	4.105	940	25.609	25.609	25.609	22.115
TOTALE	43.920	43.846	43.812	40.691	90.000	73.174	62.943	43.403	133.920	117.020	106.755	84.094
		100%	100%	93%		81%	70%	48%		87%	80%	63%

Programmazione e Controllo Area Legge Speciale e Monitoraggio degli Investimenti

31/12/2005	Legge 28 dicembre 2001 n. 448												TOTALE LEGGE			
	2002 OPI Limite d'impegno a decorrere dal 2002: 2.505 mil € - Mutuo fino a Euro 27.372.000,00				2003 OPI Limite d'impegno a decorrere dal 2003: 4.176 mil € - Mutuo fino a Euro 45.448.000,00				2004 Banca OPI Limite d'impegno a decorrere dal 2004: 8,780 mil € - Mutuo fino a Euro 94.824.000,00							
Interventi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Lettera a) - art. 6 Legge 392/84	12.288	9.991	8.749	6.294	5.510	4.087	3.633	2.921	29.728	29.255	29.071	14.966	47.526	43.333	41.453	24.181
Lettera b) - art. 6 Legge 392/84	12.329	9.481	6.856	4.241	9.730	9.630	8.597	7.628	21.163	20.823	14.731	7.130	43.222	39.934	30.184	18.999
Lettera c) - art. 6 Legge 392/84					20.678	20.678	20.678	9.076	6.118	6.118	6.118	3.150	26.796	26.796	26.796	12.226
Lettera d) - art. 6 Legge 392/84	852	390	390	328	2.701	2.581	2.581	219	513	512	512	304	4.066	3.483	3.483	851
ii - art. 5 Legge 139/92	1.903	1.903	1.903	793	6.829	6.829	6.829	2.062	37.302	37.167	37.167	14.812	46.034	45.899	45.899	17.667
TOTALE	27.372	21.765	17.898	11.656	45.448	43.805	42.318	21.906	94.824	93.875	87.599	40.362	167.644	159.445	147.815	73.924
		80%	65%	43%		96%	93%	48%		99%	92%	43%		95%	88%	44%

Programmazione e Controllo Area Legge Speciale e Monitoraggio degli Investimenti

31/12/2005	Art. 30, Comma 38 L. 166/02 - Delibera C.I.P.E. n. 73 2004 - DEXIA - CREDIOP - OPI - DEPFA BANK T.L.C. Limite d'impegno a decorrere dal 2004: 4.566 mil. € - Mutuo fino a Euro 30.152.000,00				Art. 30, Comma 38 L. 166/02 - Delibera C.I.P.E. n. 73 2005 - DEPFA BANK T.L.C. Limite d'impegno a decorrere dal 2004: 4.566 mil. € - Mutuo fino a Euro 51.526.575,00			
Interventi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
lettera a) - art. 6 Legge 798/84	12.481	8.168	6.775	2.309	18.462	5.724	1.309	
lettera b) - art. 6 Legge 798/84	7.885	7.885	4.201	2.957	9.739	5.264	4.011	
lettera c) - art. 6 Legge 798/84	5.576	5.456		2.747	4.908	209	209	200
lettera d) - art. 6 Legge 798/84	4.060	1.132	628	617	3.049	2	2	2
ri - art. 5 Legge 139/92	150	150	150		15.368	15.368	15.368	72
TOTALE	30.152	22.791	11.754	8.530	51.526	26.567	20.899	274
		76%	39%	28%		52%	41%	1%

PAGINA BIANCA

Documento E ***Università Ca' Foscari di Venezia***

Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

GABINETTO

ex 798/84

UNIVERSITÀ
CA' FOSCARI
VENEZIA

Prot. n. 16755 - IX/2
Rag/MN/af

GABINETTO

Venezia, 14.06.2006

DIVISIONE
RAGIONERIA

MAGISTRATO ALLE ACQUE
- SEGRETERIA -
Arr. 22.06.200
Prot. N. 4574 /GAB.

Dott. Ing. Maria Giovanna Piva
Presidente del Magistrato alle Acque
Segretario del Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo (art. 4 – Legge 29.11.1984, n. 798)
San Polo, 19
30125 VENEZIA

Oggetto: Dati per "Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia".

Come richiesto, si invia il quadro delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale.

Con i migliori saluti

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Ghetti

Il Responsabile del Procedimento Tecnico:
Dott. Francesco Sorrentino – Direttore Divisione Servizi Tecnici

Il Responsabile del Procedimento Contabile:
Dott.ssa Martina Nardo – Direttore Divisione Ragioneria

UNIVERSITÀ CA'FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Fondi	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
798/84	L. 67/88	12.911.422,49				
			S. Sebastiano	1.291.142,25	1.291.142,25	1.266.105,44
			S. Margherita	1.581.112,61	1.581.112,61	1.581.112,61
			Ca'Garzoni e Moro	1.549.370,70	1.549.370,70	1.548.043,94
			Ca'Foscari	296.446,26	296.446,26	50.167,53
			S.Marta	2.788.867,26	2.788.867,26	2.788.867,26
			Calle dei Guardiani	2.530.638,81	2.530.638,81	2.515.528,18
			Palazzo Nani Mocenigo	662.376,16	662.376,16	477.433,44
			Ca'Cappello	258.228,45	258.228,45	249.766,67
			Wolf Ferrari	258.228,45	258.228,45	258.228,45
			Celestia	569.135,50	569.135,50	569.135,50
			S. Giobbe Restauro e adeg. Funzionale	1.125.876,04	1.125.876,04	1.125.876,04
	Totale L. 798/84	**12.911.422,49**		**12.911.422,49**	**12.911.422,49**	**12.430.265,06**

UNIVERSITÀ CA'FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
139/92	Imi	13.090.805,21				
			Informatizzazione Ateneo e Biblioteche	2.606.342,05	2.606.342,05	2.606.342,05
			S. Giobbe Restauro e adeg. Funzionale	3.550.930,01	3.550.930,01	3.550.930,01
			Zattere - Acquisto SCI	5.388.023,87	5.388.023,87	5.388.023,87
			Opere varie - Manutenzione straordinaria	1.211.113,81	1.211.113,81	1.211.113,81
			Ca' dalla Zorza - Acq. 3° piano	334.395,47	334.395,47	334.395,47
			Totale Mutuo Imi	**13.090.805,21**	**13.090.805,21**	**13.090.805,21**
	Bnl	4.900.450,69				
			S. Giobbe fase A - Restauro e adeg. Funzionale	919.575,82	919.575,82	919.575,82
			Ca' Bembo - Acquisto	1.500.751,90	1.500.751,90	1.500.751,90
			Zattere - Acquisto Stargas 1	1.291.597,12	1.291.597,12	1.291.597,12
			Zattere - Acquisto Stargas 2	1.188.525,85	1.188.525,85	1.188.525,85
			Totale Mutuo Bnl	**4.900.450,69**	**4.900.450,69**	**4.900.450,69**
	Totale L. 139/92	**17.991.255,90**		**17.991.255,90**	**17.991.255,90**	**17.991.255,90**

UNIVERSITÀ CA'FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
539/95	Crediop 1	4.717.454,71				
			S. Giobbe - Edifici vari	3.096.994,00	3.096.994,00	3.096.994,00
			Ca' Garzoni - Restauro	773.022,10	773.022,10	773.022,10
			S. Marta Fabb. C	347.723,11	347.723,11	347.723,11
			Opere varie - Manutenzione straordinaria	371.543,20	371.543,20	371.543,20
			S. Giobbe - Fase A 5° stralcio	128.172,30	128.172,30	15.362,07
			Totale Mutuo Crediop 1	**4.717.454,71**	**4.717.454,71**	**4.604.644,48**
	Interbanca	4.519.856,17				
			S. Giobbe fase C e B	1.779.206,43	1.779.206,43	1.544.557,87
			S. Giobbe Edificio Ex Poste	960.609,27	960.609,27	959.736,61
			Via Torino - Capannoni	808.931,78	808.931,78	808.931,78
			S.Marta - Teatro Poli	11.765,24	11.765,24	11.765,24
			Via Torino - Facoltà di Scienze	516.456,90	516.456,90	237.844,20
			Opere varie - Manutenzione straordinaria	370.214,07	370.214,07	136.306,07
			S. Giobbe - Fase A 5° stralcio	72.671,91	72.671,91	-
			Totale Mutuo Interbanca	**4.519.855,60**	**4.519.855,60**	**3.699.141,77**
	Totale L. 539/95	**9.237.310,88**		**9.237.310,31**	**9.237.310,31**	**8.303.786,25**

UNIVERSITÀ CA'FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
515/96	**Mediocredito**	**14.570.918,33**				
			S. Giobbe fase C e B	3.398.918,83	3.398.918,83	3.154.579,58
			Zattere - Capannone	3.822.445,61	3.822.445,61	3.822.209,53
			Attuazione D.lgs. 626/94	1.291.142,25	1.291.142,25	1.241.146,03
			Acquisto Edificio Ex Poste	5.965.077,19	5.965.077,19	5.965.077,18
			Ca' Foscari - restauro	93.334,45	93.334,45	91.536,00
			Totale Mutuo Mediocredito	**14.570.918,33**	**14.570.918,33**	**14.274.548,32**
	Crediop 2	**7.562.973,82**				
			S. Giobbe fase C e B	6.089.026,84	6.089.026,84	6.089.026,84
			Zattere - Capannone	516.456,90	516.456,90	507.475,01
			Adeg. Ex falegnameria Bozzola	957.490,08	957.490,08	-
			Totale Mutuo Crediop 2	**7.562.973,82**	**7.562.973,82**	**6.596.501,85**
	Totale L. 515/96	**22.133.892,15**		**22.133.892,15**	**22.133.892,15**	**20.871.050,17**

UNIVERSITÀ CA'FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
345/97	**Crediop 3**	**19.505.426,22**				
			S. Giobbe fase C e B	9.229.777,94	9.229.777,94	8.800.837,38
			Ca' Foscari - restauro	4.229.808,87	4.229.808,87	3.765.763,69
			Acquisto Falegnameria Ex Bozzola	258.228,45	258.228,45	258.228,45
			Opere varie - Manutenzione straordinaria	1.245.840,47	1.245.840,47	1.227.364,40
			S. Marta - Copertura Fabbricato B	66.770,00	66.770,00	66.770,00
			S. Margherita Auditorium - Rilascio CPI	40.250,90	40.250,90	22.559,37
			Via Torino - Adeguamento locali	78.207,00	78.207,00	77.285,99
			Palazzo Cosulich - Chiusura porticato	40.495,00	40.495,00	39.828,00
			Ca'Cappello - Manutenzione locali 1° e 2° piano	57.705,00	57.705,00	56.471,66
			Via Torino - Fac. Scienze	2.568.363,93	2.568.363,93	-
			Fondo per accordi bonari	1.293.000,00	1.293.000,00	-
			S. Giobbe - Fase A 5° stralcio	396.978,66	396.978,66	-
			Totale Mutuo Crediop 3	**19.505.426,22**	**19.505.426,22**	**14.315.108,94**
	Meliorbanca	**7.040.144,43**				
			S. Giobbe fase C e B	953.803,20	953.803,20	881.000,76
			S. Giobbe - Fase A 5° stralcio	121.387,25	121.387,25	-
			Ca' Foscari - restauro	7.134,57	7.134,57	7.134,57
			Ca' Foscari - trasloco	94.630,35	94.630,35	-
			Via Torino - Fac. Scienze	3.703.631,23	3.703.631,23	-
			Opere varie - Manutenzione straordinaria	428.236,75	428.236,75	161.705,00
			Fondo per accordi bonari	1.000.000,00	1.000.000,00	886.000,00
			S. Sebastiano	649.521,08	649.521,08	-
			S. Sebastiano - Trasloco	50.000,00	50.000,00	-
			Zattere - Trasloco	31.800,00	31.800,00	-
			Totale Mutuo Meliorbanca	**7.040.144,43**	**7.040.144,43**	**1.935.840,33**
	Totale L. 345/97	**26.545.570,65**		**26.545.570,65**	**26.545.570,65**	**16.250.949,27**

UNIVERSITÀ CA'FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
295/98	San Paolo Imi 1	10.044.089,42				
			S. Basilio - Adeg. Funzionale	46.512,00	46.512,00	-
			Ca'Foscari - restauro	8.260.551,82	8.260.551,82	6.078.418,80
			Zattere - Capannone	469.975,78	469.975,78	289.041,01
			Via Torino - Fac. Scienze	1.267.049,82	1.267.049,82	-
			Totale Mutuo Crediop 3	**10.044.089,42**	**10.044.089,42**	**6.367.459,81**
	San Paolo Imi 2*	14.132.860,06				
			S. Giobbe fase A 5°stralcio	982.008,17	982.008,17	35.103,28
			Attuazione D.lgs. 626/94	516.456,90	516.456,90	178.571,66
			Via Torino - Fac. Scienze	12.634.394,99	12.634.394,99	-
			Totale Mutuo San Paolo Imi 2	**14.132.860,06**	**14.132.860,06**	**213.674,94**
	Totale L. 295/98	**24.176.949,48**		**24.176.949,48**	**24.176.949,48**	**6.581.134,75**

* L'Istituto di Credito ha rideterminato il mutuo in Euro 14.132.860,06

UNIVERSITÀ CA'FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
388/00	Opi 2*	3.918.170,48				
			Via Torino - Facoltà di Scienze	3.718.489,68	3.718.489,68	-
			S. Giobbe fase A 5°stralcio	199.680,80	199.680,80	-
			Totale Mutuo Opi 2	**3.918.170,48**	**3.918.170,48**	-
	Totale L. 388/00	**3.918.170,48**		**3.918.170,48**	**3.918.170,48**	-

* L'Istituto di Credito ha rideterminato il mutuo in Euro 3.918.170,48

UNIVERSITÀ CA'FOSCARI di VENEZIA

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge	Denominazione Mutuo	Importo Assegnato	Opere finanziate	Importo Progetto	Impegnato	Pagato
448/01	Opi 1*	2.013.601,79				
			Via Torino - Facoltà di Scienze	1.860.000,00	1.860.000,00	424.738,92
			S. Giobbe fase A 5°stralcio	153.601,79	153.601,79	-
			Totale Mutuo Opi 1	**2.013.601,79**	**2.013.601,79**	**424.738,92**
	Unicredit**	1.587.898,68				
			Via Torino - Facoltà di Scienze	1.587.898,68	1.587.898,68	-
			Totale Mutuo Unicredit	**1.587.898,68**	**1.587.898,68**	-
	Totale L. 448/01	**3.601.500,47**		**3.601.500,47**	**3.601.500,47**	**424.738,92**

* L'Istituto di Credito ha rideterminato il mutuo in Euro 2.013.601,79

** L'Istituto di Credito ha rideterminato il mutuo in Euro 1.587.898,68

Documento F ***Istituto Universitario di Architettura di Venezia - I.U.A.V.***

Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

GABINETTO

ASG I U A V

Università Iuav di Venezia

Tolentini / Santa Croce 191
30135 Venezia
t. +39 041 524 6758 f. +39 041 257 1808
asg-amm@iuav.it www.iuav.it

AREA DEI SERVIZI
GENERALI, IMMOBILIARI
E PATRIMONIALI

ex 798/84

MAGISTRATO ALLE ACQUE
- SEGRETERIA -
Arr. 20 GIU 2006
Prot. N. 4417 /GAB.

MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA
6 GIU 2006
GABINETTO

Area Servizi Generali, Patrimoniali e Immobiliari *Franco Bacciolo*
t. +39 041 257 1829 - bacciolo@iuav.it

Venezia, 9 giugno 2006
Prot. n. 10920
Tit. VIII/1
anno 2006/fasc. n.

Al Magistrato alle Acque
Ufficio di Piano – Il Coordinatore
S.Polo, 19
30125 VENEZIA

Oggetto: **Risposta a richiesta dati finanziari**

Facendo seguito a Vs nota prot. N. 238/GAB del 4/4/2006 si invia, in allegato, un prospetto a tutto il 31/12/2005 con somme espresse in euro relativamente ai finanziamenti ottenuti di da questo Ateneo con legislazione speciale, limitatamente ai finanziamenti ancora disponibili e rispettivi aggiornamenti a tutto il 2005.

Con i migliori saluti.

Il dirigente asG
Franco Bacciolo

FINANZIAMENTI LEGGE N. 515/96

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti - dati al 31/12/2005

soggetti	limiti di impegno ex Lege 515/96	imp.assegnati e disponib.	imp.sottoscr.con contr.di mutuo	imp.impegnati	imp.spesi
IUAV	930	9.878	9.878	9.878	9.878

FINANZIAMENTI LEGGE N. 345/97

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti - dati al 31/12/2005

soggetti	limiti di impegno ex Lege 345/97	imp.assegnati e disponib.	imp.sottoscr.con contr.di mutuo	imp.impegnati	imp.spesi
IUAV	1.033	12.039	12.039	12.039	12.039

FINANZIAMENTI LEGGE N. 295/98

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti - dati al 31/12/2005

soggetti	limiti di impegno ex Lege 295/98	imp.assegnati e disponib.	imp.sottoscr.con contr.di mutuo	imp.impegnati	imp.spesi
IUAV	12.562	12.562	12.562	12.384	9.179

FINANZIAMENTI LEGGE N. 448/01

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti - dati al 31/12/2005

soggetti	limiti di impegno ex Lege 448/01	imp.assegnati e disponib.	imp.sottoscr.con contr.di mutuo	imp.impegnati	imp.spesi
IUAV	3.024	3.024	3.024	3.024	3.024

Venezia, 9/6/06

PAGINA BIANCA

Documento G ***Consorzio per la gestione del Centro di Coordinamento delle attività di ricerca inerenti il sistema lagunare di Venezia – CO.RI.LA***

Stato di attuazione delle attività finanziate dalla legge speciale per Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

CORILA

Consorzio per la Gestione del Centro di Coordinamento delle Attività di Ricerca Inerenti il Sistema Lagunare di Venezia

Palazzo Franchetti
S. Marco 2847
30124 Venezia
Tel. +39.041.2402511
Fax +39.041.2402512
venezia@corila.it
www.corila.it
C.F. 94041400279
P.IVA 03838290277

MAGISTRATO ALLE ACQUE
SEGRETERIA
Prot.N. 459 /GAB.

Prot. 393/06
Venezia, 15/06/06

Al Presidente
del Magistrato alle Acque di Venezia
Ing. Maria Giovanna Piva
Palazzo X Savi
30121 Venezia

Gentile Presidente,

in risposta alla cortese Sua del 4/04/06 si comunicano i dati aggiornati al 31/12/05 relativamente ai finanziamenti assegnati.

Legge n. 295/98

Limiti di impegno		Importi assegnati e disponibili		Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
1999	2000	1999	2000			
258	258	3262	3333	6595	6595	6595

Legge n. 388/00

Limiti di impegno	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
2003	2003			
362	4.338	4.338	4.338	1.870

Legge n. 488/01

Limiti di impegno	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
2004	2004			
129	1.548	1.548	1.548	696

Cordiali saluti

Il Direttore

Ing. Pierpaolo Campostrini

Documento H ***SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo***

Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

SEGRETERIA COMITATO

SAVE
AEROPORTO MARCO POLO Sp.A

MAGISTRATO ALLE ACQUE
- SEGRETERIA -
Arr. 04. LUG. 200
Prot. N. 507 /GAB.

MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA
04. LUG. 2006
GABINETTO

Spett.le
Ministero dei Lavori Pubblici
Magistrato alla Acque
Comitato di indirizzo,
coordinamento e controllo
Riva del Vin, 19
30100 VENEZIA

Oggetto: Aeroporto Marco Polo Tessera Venezia - Attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale

In riferimento alla Vostra richiesta del 4 aprile 2006 prot. n. 238/GAB, con la presente si trasmettono prospetti riepilogativi delle opere, eseguite presso l'Aeroporto di Venezia, per le quali Save S.p.A. ha usufruito dei finanziamenti ottenuti con la legislazione speciale.

Distinti saluti.

Enrico Marchi

All.: c.s.d.

Venezia Tessera, 29 giugno 2006
Prot. 06/ 048 /Pres/EM/LS/mc

FINANZIAMENTO LEGGE n. 798/84 e rifinanziamenti (L. 910/86 - L. 67/88 - L. 360/91 - 415/92 - 724/94) al 31.12.2005					
CATEGORIA	**VOCI**		**IMPORTI ASSEGNATI (000 €)**	**IMPORTI IMPEGNATI (000 €)**	**IMPORTI SPESI (000 €)**
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali		1.033	1.033	1.033
Altri interventi	.... (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 798/84 e successivi rifinanziamenti			**1.033**	**1.033**	**1.033**

NOTE: Vedi nota di allegato n. 3 lettera Magistrato: importi impegnati mediante Convenzione con altri enti

FINANZIAMENTO LEGGE n. 139/92 al 31.12.2005					
CATEGORIA	**VOCI**		**IMPORTI ASSEGNATI (000 €)**	**IMPORTI IMPEGNATI (000 €)**	**IMPORTI SPESI (000 €)**
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a	culto (chiese, etc.)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali		26.512	26.512	26.512
Altri interventi	..... (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 139/92			**26.512**	**26.512**	**26.512**

NOTE:

FINANZIAMENTO LEGGE n. 539/95 al 31.12.2005					
CATEGORIA	**VOCI**		**IMPORTI ASSEGNATI (000 €)**	**IMPORTI IMPEGNATI (000 €)**	**IMPORTI SPESI (000 €)**
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali		12.216	12.216	12.216
Altri interventi	.. .. (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 539/95			**12.216**	**12.216**	**12.216**

NOTE:

FINANZIAMENTO LEGGE n. 515/96 al 31.12.2005					
CATEGORIA	**VOCI**		**IMPORTI ASSEGNATI (000 €)**	**IMPORTI IMPEGNATI (000 €)**	**IMPORTI SPESI (000 €)**
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali		18 944	18 944	18 944
Altri interventi	. . . (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 515/96			**18.944**	**18.944**	**18.944**

NOTE:

FINANZIAMENTO LEGGE n. 345/97 al 31.12.2005					
CATEGORIA	**VOCI**		**IMPORTI ASSEGNATI (000 €)**	**IMPORTI IMPEGNATI (000 €)**	**IMPORTI SPESI (000 €)**
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali		12.701	12.701	12.701
Altri interventi	... (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 345/97			**12.701**	**12.701**	**12.701**

NOTE:

FINANZIAMENTO LEGGE n. 295/98 al 31.12.2005					
CATEGORIA	**VOCI**		**IMPORTI ASSEGNATI (000 €)**	**IMPORTI IMPEGNATI (000 €)**	**IMPORTI SPESI (000 €)**
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Parrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali		12.739	12.739	12.739
Altri interventi	..... (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 295/98			**12.739**	**12.739**	**12.739**

NOTE:

FINANZIAMENTO LEGGE n. 448/98 al 31.12.2005					
CATEGORIA	**VOCI**		**IMPORTI ASSEGNATI (000 €)**	**IMPORTI IMPEGNATI (000 €)**	**IMPORTI SPESI (000 €)**
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali		19.109	19.109	19.109
Altri interventi	(specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 448/98			**19.109**	**19.109**	**19.109**

NOTE: Vedi nota di allegato n. 9 lettera Magistrato: importi impegnati tramite altri enti

FINANZIAMENTO LEGGE n. 488/99 al 31.12.2005					
CATEGORIA	**VOCI**		**IMPORTI ASSEGNATI (000 €)**	**IMPORTI IMPEGNATI (000 €)**	**IMPORTI SPESI (000 €)**
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a	culto (chiese, etc.)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali				
Altri interventi	... (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 488/99			**0**	**0**	**0**

NOTE:

FINANZIAMENTO LEGGE n. 388/00 al 31.12.2005					
CATEGORIA	**VOCI**		**IMPORTI ASSEGNATI (000 €)**	**IMPORTI IMPEGNATI (000 €)**	**IMPORTI SPESI (000 €)**
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali		5.578	5.578	0
Altri interventi	(specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 388/00			**5.578**	**5.578**	**0**

NOTE: inporti riferiti a due mutui in fase di stipula

FINANZIAMENTO LEGGE n. 448/01 al 31.12.2005					
CATEGORIA	**VOCI**		**IMPORTI ASSEGNATI (000 €)**	**IMPORTI IMPEGNATI (000 €)**	**IMPORTI SPESI (000 €)**
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali		1 548	0	0
Altri interventi	... (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 448/01			**1.548**	**0**	**0**

NOTE: importi riferiti a mutuo che dovrà essere messo in appalto per la futura stipula

FINANZIAMENTO N. ... (specificare il riferimento dell'atto di erogazione del finanziamento) al 31.12.2005					
CATEGORIA	**VOCI**		**IMPORTI ASSEGNATI (000 €)**	**IMPORTI IMPEGNATI (000 €)**	**IMPORTI SPESI (000 €)**
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)			
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali				
	Infrastrutture aeroportuali				
Altri interventi	(specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE			0	0	0

NOTE:

RIEPILOGO FINANZIAMENTI AL 31.12.2005

CATEGORIA	VOCI		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)	FABBISOGNO DA FINANZIARE (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente	0	0	0	
		beni culturali	0	0	0	
		economia	0	0	0	
		gestione dati	0	0	0	
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.		0	0	0	
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a	culto (chiese, etc.)	0	0	0	
		cultura musei/beni architettonici	0	0	0	
		istruzione	0	0	0	
		altri usi (specificare)	0	0	0	
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi		0	0	0	
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture portuali		0	0	0	
	Infrastrutture aeroportuali		110 379	108 831	103 254	
Altri interventi	... (specificare la tipologia di intervento realizzato)		0	0	0	
TOTALE			**110.379**	**108.831**	**103.254**	**0**

NOTE: in fase di definizione i fabbisogni da finanziare. Concordata nota con riferimento presso Magistrato alle Acque, dott Bellodi

FINANZIAMENTI PER ANNO dal 1984 al 2005

CATEGORIA	VOCE	1984 - 1999			2000			2001			2002			2003			2004			2005			TOTALE		
		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI RIMODULATI (1.000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)	IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI RIMODULATI (1.000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)	IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI RIMODULATI (1.000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)	IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI RIMODULATI (1.000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)	IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI RIMODULATI (1.000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)	IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI RIMODULATI (1.000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)	IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI RIMODULATI (1.000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indirizzi e verifiche tecnici	Risorse finalizzate all'aggiornamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di ultimo stralcio	ambiente																						
		beni culturali																						
		economia																						
		gestione dati																						
Partecipazione (pubblica)	Restauro, conservazione di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc																							
Investimenti	Restauro, risanamento, consolidamento statico, ristrutturazione di immobili destinati a	ville (chiese, etc.)																						
		cultura/musei/archivi																						
		mobilità/ferrovie																						
		istruzione																						
		altro uso																						
Riqualificazione (anche linguistica)	Ripristino reali e risanamento luoghi																							
Urbanizzazione e infrastrutture	Infrastrutture puntuali																							
	Infrastrutture comprensoriali	101.254	101.254	10.250			14.966			18.154			27.650	4.128	4.128	1.874			170				110.379	106.481	105.254
Altri interventi	(specificare in capoverso il tipo di intervento realizzato)																							
	TOTALE	101.254	101.254	10.250	0	0	14.966	0	0	18.154	0	0	27.650	4.128	4.128	1.874	0	0	170	0	0	0	110.379	106.481	105.254

NOTE: finanziamenti legge 798/84 e 448/98 assegnati da altri enti o considerati nel periodo 1984/1999
2001 - residui in incentivi 234 + assegnazioni in comm 335

PAGINA BIANCA

Documento I ***Azienda Speciale per il Porto di Chioggia***

Stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti sulla legge per la salvaguardia di Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

GABINETTO

AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA

DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI VENEZIA

MAGISTRATO ALLE ACQUE – SEGRETERIA –
Arr. 11 LUG. 200
Prot. N. 583 /GAB.

Prot. n. 330/353
Anticipata via fax

Chioggia, 28 giugno 2006

MAGISTRATO ALLE ACQUE VENEZIA
07. LUG. 2006
GABINETTO

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA
Comitato di Indirizzo, Coordinamento Controllo
San Polo, 19
30100 – VENEZIA (VE)

Oggetto: Legge Speciale per Venezia – Attuazione degli interventi

In riferimento alla Vostra nota prot. 238/GAB del 4 aprile 2006, questa Azienda trasmette i dati richiesti relativi all'utilizzo dei fondi assegnati con la legislazione speciale, allegando una scheda di riparto delle risorse e del loro utilizzo aggiornata a tutto il 31 dicembre 2005.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Com.te Oscar Nalesso

Allegati: Scheda finanziamenti

Allegato

FONDI LEGGE SPECIALE PER VENEZIA al 31/12/2005

(Importi in migliaia di euro)

SOGGETTI	Limiti di impegno ex Legge 448/98			Importi assegnati e disponibili				Contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi Spesi
	anno 1999	anno 2000	anno 2001	anno 1999	anno 2000	anno 2001	TOTALE			
Azienda Speciale Porto di Chioggia	129	=	=	1.548			1.548	1.559	1.559	1.559

Contratto di Mutuo con la banca San Paolo IMI
Base d'asta: euro 1.935.000,00.-
Netto incassato in relazioni ai tassi d'interesse annui: euro 1.559.000,00.-

SOGGETTI	Limiti di impegno ex Legge 338/00		Importi assegnati e disponibili			Contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi Spesi
	anno 2002	anno 2003	anno 2002	anno 2003	TOTALE			
Azienda Speciale Porto di Chioggia	465	207	5.578	2.479	8.057	8.035	8.035	162

Contratto di Mutuo con la banca Unicredito
Base d'asta: euro 10.080.000,00.-
Netto stimato soggetto a variazioni in relazioni ai tassi d'interesse annui: euro 8.035.450,24.-

SOGGETTI	Limiti di impegno ex Legge 448/01			Importi assegnati e disponibili				Contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi Spesi
	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2002	anno 2003	anno 2004	TOTALE			
Azienda Speciale Porto di Chioggia	=	=	134	=	=	1.608	1.608	1.650	1.650	=

Contratto di Mutuo con la Banca OPI SPA
Base d'asta: euro 2.010.000,00.-
Netto stimato soggetto a variazioni in relazioni ai tassi d'interesse annui: euro 1.650.000,00.-

PAGINA BIANCA

Documento L *La Biennale di Venezia*

Stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti sulla legge per la salvaguardia di Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

SEGRETERIA CONSIGLIO

la Biennale di Venezia
Ca' Giustinian, San Marco
30124 Venezia
tel. + 39 041 5218711
fax +39 041 5218810
p.IVA e C.F. 00330320276
www.labiennale.org

MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA
04. LUG. 2006
GABINETTO

la Biennale di Venezia

Spett.le
MAGISTRATO ALLE ACQUE
Comitato di indirizzo coordinamento e controllo
(art.4-legge 29.11.1984 n.798)

S. Polo, 19
30125 VENEZIA

MAGISTRATO ALLE ACQUE
Prot. N. 510 GAB.

prot. n.1158/PS

Venezia, 27.06.2006

Oggetto: Trasmissione dati Legge n. 488/99

In ottemperanza a quanto da voi richiesto con lettera del 4 aprile (prot. n. 238/GAB) alleghiamo di seguito un quadro dettagliato, aggiornato al 31.12.2005, sullo stato di attuazione delle attività svolte.

Cordiali saluti

PROGETTI SPECIALI
Il responsabile
arch. Pina Maugeri

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITA' SVOLTE AL 31.12.2005 (LEGGE 488/99)

1	*ARSENALE DI VENEZIA - INTERVENTI SUGLI EDIFICI IN CONCESSIONE*	
	Interventi di riqualificazione delle aree espositive nell'Area Sud dell'Arsenale di Venezia (edificio 306, edificio 229, edificio 227/a)	1.050.188,53
2	*ASAC - ALLESTIMENTO SEDE PRESSO EDIFICIO PLEIADI (Vega)*	
	Interventi per la riqualificazione di alcuni locali dell'edificio Pleiadi al Vega (Marghera) destinati a deposito e laboratori ASAC	126.771,32
3	*CONCORSO INTERNAZIONALE NUOVO PALAZZO DEL CINEMA*	
	Concorso Internazionale di Progettazione del Nuovo Palazzo del Cinema e riqualificazione dell'area pertinente	254.167,58
	Spese generali di produzione e spese mutuo	*43.521,54*
	TOTALE SPESO ANNO 2005	**1.474.648,97**

PAGINA BIANCA

Documento M *Fondazione Scientifica Querini Stampalia*

Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

GABINET

MAGISTRATO ALLE ACQUE
- SEGRETERIA -
Arr. 03 LUG. 2006
Prot. N. 500 /GAB.

FONDAZIONE SCIENTIFICA
QUERINI STAMPALIA
BIBLIOTECA E GALLERIA - VENEZIA

ONLUS

Venezia 28 giugno 2006
Prot.n. 862/47D
BR/br

Gent.ma Signora
Ing. Maria Giovanna Piva
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Magistrato alle Acque Comitato di indirizzo
coordinamento e controllo
S. Polo,19
30125 Venezia

Oggetto: legge n. 798/ 84 e 295/98. Invio dati richiesti

In riscontro alla Vs richiesta, lettera prot. n° 238/GAB del 04/04/2006, si comunicano i dati relativi alle opere eseguite nell'ambito delle leggi 798/84 e 295/98.

1 – Legge n° 798/84 – finanziamento di € 920.768,58 ottenuto mediante Convenzione stipulata con il Comune di Venezia in data 19 luglio 2004, registrata a Mestre il 27 luglio 2004 n° di repertorio 100167; si evidenzia che la cifra deliberata dal Consiglio Comunale in data 28 marzo 2002 PD 2002/1158 ammontava a € 1.033.000,00.

2 – Legge n. 295/98 – finanziamento ottenuto tramiti il Crediop (istituto finanziatore) stipulando i seguenti contratti:

a) contratto stipulato in data
30.12.1999 n° di repertorio 12461
(notaio Alberto Gasparotti)
per la somma valutabile,
compreso gli interessi di € 3.615.198,29

b) contratto stipulato in data
29.12.2000 n° di repertorio 13705
(notaio Alberto Gasparotti)
per la somma valutabile,
compreso gli interessi di € 3.615.198,29

Totale somma ottenibile comprensiva degli interessi € 7.230.396,58

Si allegano i quadri aggiornati dei piani di settore distinti in, Allegato A, Legge 798/84, Allegato B, Legge n° 295/98.

Si allega dischetto contenente la relazione.

Distinti saluti



Il direttore
Chiara Simonato Rabitti

FONDAZIONE SCIENTIFICA

QUERINI STAMPALIA

BIBLIOTECA E GALLERIA - VENEZIA

ONLUS

ALLEGATO A

Legge 798/84

Prospetto 1° - Elenco delle opere in progetto

A) Completamento della corte coperta

B) Ristrutturazione locale "M"

C) Ristrutturazione ingresso civico 5252

D) Completamento della corte scoperta e ristrutturazione del passaggio verso corte Nova

E) Sistemazione facciata esterna e piante su Rio di Santa Maria Formosa

F) Realizzazione opere strutturali e a protezione dell'umidità dell'auditorium

G) Realizzazione opere strutturali e contro l'umidità dei locali 0.35 - 0.36 - 0.37

H) Realizzazione opere strutturali e di protezione contro l'umidità dello "Stabile Nuovo"

1) Importo presunto delle opere a base di gara	€ 1.968.828,99
2) Somma a disposizione per progettazione e Direzione Lavori	€ 98.441,45
3) A disposizione per IVA	€ 196.882,90
Importo generale di progetto	€ 2.264.153,34

Su detto importo è stato ottenuto un contributo in conto capitale di € 920.768,58.

Prospetto 2° - Elenco delle opere eseguite a tutto il 31.12.2005

A) Completamento della Corte Coperta

B) Ristrutturazione locale "M"

1) Importo dei lavori	€ 348.800,00
2) Spese progettazione e Direzione Lavori	€ 17.500,00
3) Spese per IVA	€ 34.880,00
Spesa generale delle opere eseguite	€ 401.180,00

Opere ancora da collaudare da parte dei tecnici del Comune di Venezia e per le quali si presume di ottenere un contributo in conto capitale di € 200.000,00.

Prospetto 3° - Opere in corso

1) Realizzazione opere strutturali e di protezione contro l'umidità per auditorium	€ 480.000,00
2) Somma a disposizione per progettazione e Direzione Lavori	€ 24.000,00
3) Somma a disposizione per IVA	€ 48.000,00
Sommano	€ 552.000,00

I lavori sono iniziati il 15 maggio 2006 e l'ultimazione degli stessi è prevista per il mese di marzo 2007.

Opere per le quali si presume di ottenere un contributo in conto capitale di circa il 49,90% pari a € 275.000,00.

Prospetto 4° - Opere in fase di progettazione

1) Ristrutturazione ingresso civico 5252
2) Completamento della corte scoperta e ristrutturazione del passaggio versò Corte Nova
3) Sistemazione facciata esterna e del ponte su Rio Santa Maria Formosa

Le opere descritte saranno eseguite, presumibilmente, negli anni 2007 – 2008 e la spesa presunta ammonta ad € 712.500,00 così distinta:

-	per esecuzione lavori a mezzo trattativa privata tra ditte di fiducia della Fondazione	€ 570.000,00
-	somme a disposizione per progettazione e direzione lavori compreso oneri fiscali	€ 85.500,00
-	somme a disposizione per iva	€ 57.000,00
Totale		€ 712.500,00

Per queste opere si presume di ottenere un contributo in conto capitale del 49,90%, pari a € 356.000,00.

il direttore
Chiara Simonato Rabitti

FONDAZIONE SCIENTIFICA

QUERINI STAMPALIA

BIBLIOTECA E GALLERIA - VENEZIA

ONLUS

Allegato B/1

Legge n. 295/98

Prospetto 1° - Piano d'intervento previsto

Categoria delle opere	**Descrizione dell'intervento**	**Importo presunto**	**IVA importo**	**Importo totale**
Opere edili	- area pianoterra per servizi al pubblico - realizzazione scala C e locali adiacenti - area sottotetto - opere di rinforzo solaio stanza piano 1° per biblioteca multimediale - assistenza muraria per impianto contro le scariche atmosferiche - ristrutturazione ingresso Civico n. 5252 - restauro corte scoperta - restauro corte coperta compreso impianto di condizionamento			

	- ristrutturazione locale su riva - sistemazione facciata su Rio			
		€ 1.595.851,82	€ 159.585,18	€ 1.755.437,00
Impianti tecnologici	- impianto antintrusione locali piano terra - impianto segnalazione acustica locali piano terra - arredi elettrici servizi e sala regia - impianti locali piano 1°. Sottotetto e scala C - installazione impianto contro le scariche atmosferiche - impianto pressurizzato per antincendio (gruppo elettropompe) - spostamento impianti antintrusione, segnalazione fumi con fornitura nuove centrali - installazione centralino telefonico dect, compreso acquisto impianto condizionamento piani terra, 1° e 2° - installazione gruppo elettrogeno per antincendio e sistemazione impianti elettrici giardino - completamento sala Control Room compreso arredo, insonorizzazione e unità di raccordo per energia di emergenza - opere di insonorizzazione			

	cabina elettrica e impianto di condizionamento in altana - completamento opere climatizzazione locali			
		€ 671.393,97	€ 67.139,40	€ 738.533,37
Deposito libri				
	- ristrutturazione adiacenze Nord- Est per deposito libri compreso arredo con COMPAT			
		€ 1.291.142,25	€ 129.114,22	€1.420.256,47
Auditorium				
	- ristrutturazione locali, acquisto arredi e attrezzature, tecnologie			
		€ 1.549.370,70	€ 154.937,07	€ 1.704.307,77
Restauri conservativi	- area Scarpa - stucchi e affreschi piani 1° e 2° - interventi straordinari per la conservazione di strutture e impianti del complesso sede			
		€ 1.910.890,52	€ 191.089,05	€ 2.101.979,57
Acquisto arredi				
	- guardaroba piano terra - emeroteca piano primo - completamento locali piano terra			
		€ 92.962,24	€ 9.296,22	€ 102.258,46
Acquisto attrezzature				
	- attrezzature informatiche e multimediali			
		€ 258.228,45	€ 25.822,84	€ 284.051,29
Spese per la preorganizzazione del cantiere	- magazzini per deposito provvisionale dei libri della Chiesa S.			

	Giovanni Novo e attrezzature - Locali da destinare a ampliamento e supporto logistico dei servizi bibliotecari e museali			
		€ 743.697,94	€ 68.172,30	€ 811.870,24
Acquisizioni immobiliari				
	- immobili adiacenti e/o locali piani terra, primo e secondo, adiacenze a Nord virtualmente collegabili con il palazzo sede			
		€ 2.065.827,60	---	€ 2.065.827,60
Competenze professionali				
	- progettazione, direzione e contabilità lavori, collaudi tecno – amministrativi e statici, pratica prevenzione incendi (onorari più CNAPAIA)			
		€ 490.634,05	€ 98.126,81	€ 588.760,86
Sommano		€ 10.699.999,54	€ 903.283,09	€ 11.573.282,63

Venezia 28 giugno 2006

il direttore
Chiara Simonato Rabitti

FONDAZIONE SCIENTIFICA

QUERINI STAMPALIA

BIBLIOTECA E GALLERIA - VENEZIA

ONLUS

Allegato B/2

Legge n. 295/98

Prospetto 2° - Piano di settore attuato a tutto il 31.12.2005

Fino al 31.12.2005 è stato attuato solo parte del programma e la spesa occorsa ammonta, compreso gli oneri fiscali a € 6.250.659,68.
Il tutto è meglio specificato nel quadro seguente. L'Iva è applicata secondo la legge vigente e quindi variabile a seconda del tipo dei lavori.

Categoria delle opere	Descrizione dell'intervento	Importo presunto	IVA importo	Importo totale
Opere edili	- area pianoterra per servizi al pubblico - realizzazione scala C e locali adiacenti - area sottotetto - opere di rinforzo solaio stanza piano 1° per biblioteca multimediale - restauro corte coperta - nuova via di fuga piano 1° - opere varie di manutenzione			

	strordinaria indispensabili per la utilizzazione del palazzo			
Mutuo 1999		€ 1.013.846,41	€ 104.675,87	€ 1.118.522,28
Mutuo 2000		€ 586.243,25	€ 66.984,02	€ 653.227,27
Totale		€ 1.600.089,66	€ 171.659,89	€ 1.771.749,55
Impianti tecnologici	- impianto antintrusione locali piano terra - impianto segnalazione acustica locali piano terra - impianti locali piano 1°. Sottotetto e scala C - impianto pressurizzato per antincendio - installazione centralino telefonico dect, compreso acquisto apparecchi telefonici - installazione antitaccheggio biblioteca e bookshop - completamento impianti condizionamento piani terra 1° e 2° - climatizzazione locali uffici - impianti elettrici e di segnalazione corte coperta, locale "M", nuova via di fuga al piano 1° - completamento impianti informatici - interventi di straordinaria manutenzione per il funzionamento degli impianti			
Mutuo 1999		€ 244.244,69	€ 35.499,53	€ 279.744,22
Mutuo 2000		€ 251.089,05	€ 48.719,28	€ 299.808,33
Totale		€ 495.33,747	€ 84.218,81	€ 579.552,55
Deposito libri				

	- ristrutturazione adiacenze Nord- Est per deposito libri compreso arredo con COMPAT e impianti			
Mutuo 1999		€ 581.127,44	€ 69.736,98	€ 127.849,42
Mutuo 2000		€ 1.076.401,92	€ 120.099,62	€ 1.196.501,54
Totale		€ 1.657.529,36	€ 189.836,60	€ 1.847.365,96
Auditorium				
	- sono in corso di completamento i progetti esecutivi e gli elaborati per la gara d'appalto - i lavori sono iniziati il 15.05.2006			
		---	---	----
Restauri conservativi	- restauro del ponte Scarpa - riordino del giardino Scarpa - interventi straordinari per la conservazione delle strutture degli arredi e degli impianti delle aeree museali e della biblioteca di Palazzo Querini			
Mutuo 1999		€ 123.102,92	€ 14.999,30	€ 138.102,22
Mutuo 2000		€ 40.488,71	€ 8.097,74	€ 48.586,45
Totale		€ 163.591,63	€ 23.097,04	€ 186.688,67
Acquisto arredi				
	- guardaroba piano terra - emeroteca piano primo - completamento arredi locali piano terra per servizio al pubblico del piano terra - arredi per gli uffici			
Mutuo 1999		€ 107.272,28	€ 21.454,50	€ 128.726,78
Mutuo 2000		€ 107.715,04	€ 21.533,03	€ 129.248,07
Totale		€ 214.987,32	€ 42.987,53	€ 257.974,85
Acquisto attrezzature				
	- attrezzature informatiche e			

	multimediali - attrezzature video e audio per le attività culturali - attrezzature per gli uffici			
Mutuo 1999		€ 157.366,50	€ 29.870,86	€ 187.237,36
Mutuo 2000		€ 120.889,07	€ 24.177,82	€ 145.066,89
Totale		€ 278.255,57	€ 54.048,68	€ 332.304,25
Spese per la preorganizzazione del cantiere	- magazzini per deposito provvisionale dei libri della Chiesa S. Giovanni Novo e attrezzature - allestimento spazi a Santa Croce di proprietà della Querini Stampalia per deposito provvisorio libri - Locali da destinare a ampliamento e supporto logistico dei servizi bibliotecari e museali - uffici provvisori per la presidenza e la direzione			
Mutuo 1999		€ 265.731,07	€ 34.525,95	€ 300.257,02
Mutuo 2000		€ 223.639,30	€ 13.323,64	€ 236.962,94
totale		€ 489.370,37	€ 47.849,59	€ 537.219,96
Acquisizioni immobiliari				
	- immobili adiacenti e/o locali piani terra, primo e secondo, adiacenze a Nord virtualmente collegabili con il palazzo sede			
		---	---	---
Competenze professionali				
	- progettazione, direzione e contabilità lavori, collaudi tecno – amministrativi e statici, pratica			

	prevenzione incendi Direzione artistica			
Mutuo 1999		€ 278.362,77	€ 55.173,04	€ 333.535,80
Mutuo 2000		€ 337.029,77	€ 67.238,31	€ 404.268,08
Totale		€ 615.392,54	€ 122.411,35	€ 737.803,89
Totale generale				€ 6.250.659,68

Come si evince dai prospetti precedenti i piani di intervento elaborati in occasione dell'ottenimento dei finanziamenti nell'ambito della Legge Speciale di Venezia con i mutui concessi negli anni 1999 e 2000 sono stati attuati per il 86% circa.

Venezia 28 giugno 2006

Il direttore
Chiara Simonato Rabitti

FONDAZIONE SCIENTIFICA

QUERINI STAMPALIA

BIBLIOTECA E GALLERIA - VENEZIA

ONLUS

Allegato B/3

Legge n. 295/98

Prospetto 3° - Piano di intervento nuovo programma

Per completare i programmi della Fondazione a suo tempo elaborati e per attuare le nuove deliberazioni presumibilmente sono ancora necessarie le seguenti somme.
L'Iva è applicata secondo la legge vigente e quindi variabile a seconda del tipo dei lavori.

Categoria delle opere	Descrizione dell'intervento	Importo presunto	IVA importo	Importo totale
Opere edili	- ristrutturazione ingresso Civico n. 5252 - sistemazione facciata su Rio - restauro della corte coperta - opere di straordinaria manutenzione necessarie per il mantenimento di Palazzo Querini Stampalia - approntamento del 3° piano uffici amministrativi			

		€ 280.000,00	€ 28.000,00	€ 308.000,00
Impianti tecnologici	- arredi elettrici servizi e sala regia - adeguamento impianti antitintrusione, segnalazione fumi con nuove forniture della centrali - installazione gruppo elettrogeno per antincendio - sostituzione gruppi di condizionamento in altana - insonorizzazione cabina elettrica - adeguamento impianto elettrico della biblioteca			
		€ 420.600,00	€ 42.000,00	€ 462.000,00
Auditorium				
	-. nel mese di settembre 2005 è programmato l'inizio delle opere edili strutturali e di ristrutturazione - negli anni 2005-2007 dovranno essere eseguiti gli impianti tecnologici e l'arredamento			
		€ 1.600.000,00	€ 260.000,00	€ 1.860.000,00
Restauri conservativi	- restauro area Scarpa - restauro stucchi e affreschi piani 1° e 2° (fino ad oggi sono state restaurate solo due stanze del museo) ed è in corso il restauro di altre 4 sale - completamento degli interventi straordinari per la conservazione di strutture e impianti del complesso sede			
		€ 1.300.000,00	€ 130.000,00	€ 1.430.000,00

Acquisto arredi				
	- per l'arredamento dell'ingresso 5252 - per arredare i nuovi uffici			
		€ 105.000,00	€ 21.000,00	€ 176.000,00
Acquisto attrezzature				
	- completamento delle attrezzature informatiche e multimediali			
		€ 55.000,00	€ 11.000,00	€ 66.000,00
Spese per la preorganizzazione del cantiere dell'auditorium	- allestimento nuovi uffici provvisori - disallestimento magazzini e uffici provvisori - locazione per ulteriori 3 anni della chiesa di S. Giovanni Novo (deposito libri)			
		€ 150.000,00	€ 10.500,00	€ 160.500,00
Acquisizioni immobiliari				
	- immobili adiacenti e/o locali piani terra, primo e secondo, adiacenti al palazzo sede			
		€ 3.065.827,60	---	€ 3.065.827,60
Nuove ristrutturazioni				
	- ristrutturazione area Segarizzi (ex deposito libri) per ampliare i servizi al pubblico, l'area bibliotecaria e l'area da adibire a mostre			
		€ 1.800.000,00	€ 180.000,00	€ 1.980.000,00
Competenze professionali				
	- progettazione, direzione lavori, consulenze artistiche, collaudi e			

	altre spese per la realizzazione del programma			
		€ 715.00,00	€ 140.000,00	€ 855.000,00
Sommano		**€ 9.491.427,60**	**€ 822.500,00**	**€ 10.313.927,60**

Come si evince la spesa occorrente per i nuovi programmi che la Fondazione Querini Stampalia ha in animo di realizzare è notevolmente superiore ai fondi rimasti a disposizione con il mutuo del 2000 (il mutuo del 1999 è già esaurito).
La realizzazione del nuovo piano, come pure il completamente del piano precedente sarà possibile con l'eventuale contributo di ulteriori finanziamenti pubblici e solo in minima parte con i fondi che a la Fondazione reperirà dal proprio bilancio.

Venezia 29 giugno 2005

il direttore
Chiara Nicoletto Rabitti

PAGINA BIANCA

Documento N ***Procuratoria di San Marco - Venezia***

Stato di attuazione degli interventi – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

SEGRETERIA GENERALE

PROCURATORIA DI SAN MARCO
San Marco, 328 30124 - Venezia
Tel. 041.5225205 – fax 041.5208289

UFFICIO TECNICO

MAGISTRATO ALLE ACQUE
SEGRETERIA
Arr. 7 LUG. 201
Prot. N. 601 /GAB.

Spett.le
MAGISTRATO ALLE ACQUE
COMITATO DI INDIRIZZO COORDINAMENTO E CONTROLLO
San Polo n. 19
30125 – VENEZIA

Oggetto: Art. 4 della Legge 798/84. Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la Salvaguardia di Venezia. Risposta lettera prot. 238/GAB del 4 aprile 2006.

Si fa seguito alla lettera in oggetto e si invia la relazione annuale richiesta sullo stato di attuazione degli interventi svolti al 31.12.2005 dalla Procuratoria di San Marco.

Cordiali saluti.

Venezia, 30 giugno 2006

Il Procuratore delegato ai
Servizi di Segreteria
Mons. Antonio Meneguolo

PROCURATORIA DI SAN MARCO VENEZIA

PROCURATORIA DI SAN MARCO - VENEZIA

STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE A FRONTE DEI FINANZIAMENTI OTTENUTI CON LA LEGISLAZIONE SPECIALE

Legge 798/84 e successivi rifinanziamenti
Legge 488/99 e Legge 388/00

PROCURATORIA DI SAN MARCO - VENEZIA

STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE A FRONTE DEI FINANZIAMENTI OTTENUTI CON LA LEGISLAZIONE SPECIALE

Legge 798/84 e successivi rifinanziamenti
Legge 488/99 e Legge 388/00

RELAZIONE

La Procuratoria di San Marco ha ottenuto dallo Stato finanziamenti per gli interventi di manutenzione, conservazione e restauro della basilica di San Marco con la legislazione speciale di cui alla Legge 798/84 e successivi rifinanziamenti e Legge 488/99 e 388/00.
Dal 1818 il governo austriaco finanzia i restauri della basilica di San Marco sulla base di una perizia generale. Dal 1861 l'impegno di tale governo è trasformato in un contributo annuale. Con l'annessione di Venezia al Regno d'Italia, dalla fine del 1866 il contributo viene assunto dal nuovo governo. Salva l'interruzione negli anni della seconda guerra mondiale, il contributo continua fino a tutto il 1987 e cessa con la Finanziaria n. 67/1988 che consente di attingere ai finanziamenti di cui alla Legge speciale per Venezia 798/84. I finanziamenti si estendono per alcuni anni e consentono di realizzare le seguenti indagini ed opere.
Indagini per la valutazione della tensione strutturale complessiva individuabile nelle varie membrature della struttura muraria della fabbrica marciana, con particolare riguardo alla tensione nei pilastri, nelle volte e nelle cupole. Il risultato fu condensato nel modello matematico della struttura della fabbrica. Modello che, con opportuni aggiornamenti e modifiche, è ora utilizzabile per definire le tensioni in ogni zona della struttura muraria della basilica.
Le indagini compresero il completamento del rilievo fotogrammetrico della basilica, edificio caratterizzato da strapiombi e dislivelli in tutte le sue membrature e da deformazioni della geometria di archi e cupole. La fotogrammetria risultò il più adeguato strumento al rilevamento di questa particolare architettura.

Assieme al rilievo iniziò la catalogazione dell'archivio storico della basilica e della notevole serie di disegni esistenti presso l'ufficio tecnico.
Questa attività di studio e indagine consentì di procedere nei restauri con sicurezza ed efficacia.

I principali interventi finanziati con la Legge 798/84 ed eseguiti fino al 31/12/2002 sono:
- consolidamento del pilastro a destra dell'altare della Madonna Nicopeia, con rimozione del rivestimento marmoreo, iniezioni di consolidamento del "sacco" laterizio, stilatura di tutti i corsi di malta tra i mattoni e successiva riapplicazione delle lastre marmoree di rivestimento;
- restauro della cupola di San Giovanni, quella sul braccio nord del transetto. Negli anni 1988-1991 fu completato il restauro della struttura lignea della calotta semisferica, fu rifatto il fasciame di legno di larice di chiusura e restaurato e riposto in opera il manto di lastre di piombo dopo averle restaurate e sostituiti gli aggrappaggi. Fu completato il sistema di salita con una scaletta interna fino alla botola da cui si esce all'esterno sotto il cupolino;
- restauro di un'edicola di facciata, lato meridionale con rimozione della cuspide lignea rivestita di piombo; restauro delle colonne, dei capitelli e degli archetti gotici con sostituzione dei tiranti di ferro, che rischiavano la rottura del marmo con altri di rame. Rifacimento della struttura lignea della cuspide e riposa in opera del manto di lastre di piombo dopo averle restaurate;
- restauro della copertura con interventi urgenti sopra le cupolette del Battistero con sostituzione della struttura principale degradata, rinnovo del tavolato e riposa in opera del manto di lastre di piombo dopo averle restaurate;
- rimozione della grande vetrata di vetro a piombo del quarto arcone del portale centrale, detta "a rulli", per consentire il restauro dell'arcone;
- restauro dell'arcone dei profeti, quarto arcone del portale centrale della facciata della Basilica. Eseguite indagini preliminari fisico-chimiche, rilievo fotogrammetrico di dettaglio delle due facce dell'arcone, rimozione delle formelle per consentire il loro consolidamento e quello dell'arcone;
- restauro della Cripta. Si completano l'impermeabilizzazione delle murature della navata centrale, della retro-cripta e della navata destra, si restaura l'ex tomba di San Marco, viene

studiato un adeguato impianto di ventilazione e quello di illuminazione con la consulenza dell'Enel. Si esegue il trattamento desalinizzante e il consolidamento delle murature delle volte;

- restauro dei pavimenti. Vengono restaurati quadri centrali e sei quadri sotto la volta sud della cupola dell'Ascensione, con rimozione, restauro in laboratorio e integrazione delle tessere distrutte;

- restauro dei mosaici. Iniziano i rilievi grafici e fotografici per i mosaici del Battistero. Il consolidamento comprende volta, archi di sostegno e pennacchi della cupola orientale, nonché la lunetta della Crocifissione e dell'Annuncio della nascita di Giovanni Battista. Si iniziano i lavori della cupola centrale.

In occasione dei rilievi fotografici dei mosaici a cura dell'Enel si utilizzano le speciali impalcature per la riposa in opera di parte del pennacchio di Sant'Ambrogio, da oltre cinquant'anni in attesa nello Studio di mosaico;

- impianto di riscaldamento. Si rinnova completamente il complesso termoventilante;

- ascensore. Viene installato un ascensore adeguato ai portatori di handicap con portata massima di 10 persone, che serve il museo, il coperto e i due livelli degli uffici;

- impianto elettrico. Si procede alla costruzione di nuove linee e del quadro nel settore destro della Basilica assieme alla manutenzione ordinaria dell'intero impianto elettrico;

- impianto antincendio. Adeguamento dell'impianto antincendio secondo la normativa. Si procede all'elaborazione, assieme ai Vigili del Fuoco, di un progetto che viene approvato dalla Soprintendenza;

- indagini e ricerche. Vengono eseguite indagini sui livelli della Basilica, la verticalità delle cupole e del campanile e integrato il rilievo fotogrammetrico con parti del piano terreno e degli spazi esterni alla Basilica, nonché dei sotterranei;.

Viene predisposto con il prof. Creazza e i prof. Vitaliani, Mola, Strada e Biscontin, il programma per le indagini strutturali e quelle sul pavimento, che vengono poi eseguite dall'ISMES per conto del Magistrato alle Acque.

I principali interventi finanziati con la Legge 488/99 ed eseguiti fino al 31/12/2002 sono:

- restauro del pavimento di mosaico di fronte al Tesoro con rimozione di quadri opportunamente suddivisi, restauro in laboratorio con integrazione delle tessere distrutte e restauro del sottofondo in opera. Lavoro pressoché ultimato, inizia la posa nel prossimo 2003;
- restauro dei mosaici nel nartece, Nascita di Isacco e sopraporta di San Clemente, nonché lunetta sopra il portale di San Teodoro. I mosaici vengono restaurati parte in loco con consolidamenti, parte in laboratorio. Si inizia il rilievo del degrado dei mosaici della Cappella di Sant'Isidoro;
- restauro della copertura del lato sud, sopra il Battistero con rinnovo del tavolato e restauro delle lastre di piombo;
- Museo Marciano sopra il nartece. Si realizza il collegamento tra il Museo e i matronei. Si completano gli impianti antintrusione e di TVCC, si realizzano i pannelli espositori;
- restauro del rivestimento di marmo della parete ovest del transetto sud e della parete nord del transetto nord, nell'area dell'altare della Nicopeia con lievo d'opera delle lastre previo rilievo di dettaglio, desalinizzazione delle stesse e restauro delle situazioni di degrado dell'apparato murario;
- manutenzioni varie degli impianti e del pavimento;
- cupola del Coro. Si completano gli studi preliminari e l'approvvigionamento dei materiali, si inizia la realizzazione della grande impalcatura;
- restauro delle "cassine" di mosaico originale da esporre nel Museo Marciano, opera eseguita in laboratorio;
- restauro del rivestimento marmoreo della porta di San Clemente, colonne acquitane e capitelli bizantini;
- restauro del mosaico del pilastro dell'Inventio.
- inizia ed è in corso il restauro dell'apparato lapideo della parete nord della Basilica di San Marco.

I principali interventi finanziati con la Legge 488/99 e Legge 388/00 ed eseguiti fino al 31/12/2003 sono:

MOSAICI

- Restauro dei mosaici nel nartece, Nascita di Isacco e sopraporta di San Clemente: i mosaici restaurati e consolidati in laboratorio sono stati riposti in opera;
- Cappella di Sant'Isidoro: Ultimato il rilievo del degrado dei mosaici;
- Restauro del mosaico del pilastro dell'Inventio.
- Restauro mosaico sopra il portale di San Teodoro: ultimato il restauro in laboratorio si procederà nel 2004 alla posa in opera;

PAVIMENTO

- Restauro del primo dei tre lotti del pavimento di mosaico di fronte al Tesoro: è stato restaurato in laboratorio con integrazione delle tessere distrutte e restauro del sottofondo in opera, poi completamente riposto in opera il primo quadro;
- Restauro degli altri due tre lotti del pavimento di mosaico di fronte al Tesoro: completati i rilievi esecutivi in scala al vero del restante pavimento; si è previsto l'inizio dei lavori di restauro del II° lotto durante il 2004 con lievo d'opera dei quadri da restaurare;
- Manutenzione del pavimento;

CUPOLA DEL CORO

- Cupola del Coro: si completano gli studi preliminari e l'approvvigionamento dei materiali, si completa la realizzazione della grande impalcatura;

TETTO

- Copertura: restauro della falda sud della copertura sopra la volta del Paradiso, con rinnovo del tavolato e restauro delle lastre di piombo;

PARAMENTI MARMOREI

- Restauro del rivestimento di marmo della parete nord del transetto nord: presso l'area dell'altare della Nicopeia, con lievo d'opera delle lastre previo rilievo di dettaglio (2003), desalinizzazione delle stesse e restauro delle situazioni di degrado dell'apparato murario (2003 ancora in corso nel 2004);
- Restauro del rivestimento di marmo della parete Cappella Zen e porta San Clemente: con lievo d'opera delle lastre previo rilievo di dettaglio, desalinizzazione delle stesse e riposa in opera;

MURATURE

- Sant'Apollonia: Chiostro, restauro muratura verso il cortile interno;

IMPIANTI E VARIE

- Manutenzioni varie degli impianti
- Opere varie di falegname, manutenzione porte, serramenti e arredi;

MUSEO

- Museo Marciano: Completato l'intervento di restauro, il collegamento tra Museo e i matronei con servoscala, gli impianti antincendio e TVCC, i pannelli espositori, la posa di tutte le opere d'arte per l'apertura del museo dell'8 ottobre 2003;
- Si completa il restauro delle "cassine" di mosaico originale da esporre nel Museo Marciano: opera eseguita in laboratorio;

INTERVENTI DI DITTE ESTERNE CON NOSTRA ASSISTENZA E FORNITURE

BASILICA DI SAN MARCO

- E' in corso il restauro dell'apparato lapideo della parete nord della Basilica di San Marco (Ottorino Nonfarmale S.r.l.);
- Manutenzione straordinaria della Cripta (IAR);
- Restauro del rivestimento marmoreo della porta di San Clemente, colonne acquitane e capitelli bizantini (SERES);
- Restauro di oggetti lignei del Museo (Leutenmayer);
- Restauro di dipinti "cartone" dell'inferno (Walter Piovan: in corso anche nel 2004);
- Manutenzione tessili del Museo (Annamaria Morassutti);
- Restauri di disegni e carte dipinte Opera Ongania (Pignatelli - Tecnauro);
- Allestimento espositivo carte e dipinti su carta (Herrera - Filigrana);
- Restauro tessili e pizzi (Esedra);
- Restauro oggetti del tesoro (Corinna Mattiello);

COMPLESSO DI SANT'APOLLONIA

- Sant'Apollonia: interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento e ristrutturazione del complesso Ex Jesurum di Sant'Apollonia (Impresa Antonio Toniolo). Progetto e D.L. a cura della Procuratoria con collaborazioni esterne. Per realizzazione di alloggi e uffici ad uso della Curia Patriarcale, con Sala Riunioni, depositi e laboratori ad uso della Procuratoria, ampliamento dell'area del Museo Diocesano.

I principali interventi finanziati con la Legge 488/99 e Legge 388/00 ed eseguiti fino al 31/12/2004 sono:

MOSAICI

- Cappella di Sant'Isidoro: è iniziato il lavoro di restauro dei mosaici dopo il completo rilievo dello stato di degrado; si interviene in modi diversi in funzione delle diverse problematiche riscontrate e della localizzazione, consolidando il supporto con iniezioni di apposito legante, ricollocando in opera tessere mancanti o ancorate malamente al supporto. Si procede poi con le operazioni per rendere uniforme nel colore gli interstizi tra le tessere e quindi pulire la superficie decorata;
- Restauro mosaico sopra il portale di San Teodoro: dopo la preparazione ed il restauro in laboratorio è stata ultimata la posa in opera;
- Restauro mosaici facciata Nord esterna: in occasione degli interventi in corso nella facciata nord sono stati restaurati i decori a mosaico previo stacco, risanamento in laboratorio e successiva posa in opera;

PAVIMENTO

- Restauro del secondo dei tre lotti del pavimento di mosaico di fronte al Tesoro: completati i rilievi esecutivi in scala al vero del restante pavimento sono iniziate le fasi preliminari al lievo d'opera con le verifiche e la composizione delle stampe necessaria alla suddivisione che verrà poi attuata;
- Manutenzione del pavimento;

CUPOLA DEL CORO

- Cupola del Coro: si completa la realizzazione della grande impalcatura;

PARAMENTI MARMOREI

- Restauro del rivestimento di marmo della parete nord del transetto nord: presso l'area dell'altare della Nicopeia, con lievo d'opera delle lastre previo rilievo di dettaglio, desalinizzazione delle stesse e restauro delle situazioni di degrado dell'apparato murario;
- Restauro del rivestimento di marmo della parete Cappella Zen e porta San Clemente: con lievo d'opera delle lastre previo rilievo di dettaglio, desalinizzazione delle stesse e riposa in opera;
- Sistemazione deposito marmi Sant'Apollonia: sono stati movimentati i marmi del deposito per consentire le opere di restauro del fabbricato adiacente e con lo scopo di dare una prossima disposizione più razionale di elementi lapidei utilizzati per fini di restauro;

MURATURE

- Cripta: ricostruzione dei paramenti murari delle nicchie dove sono state eseguite opere di impermeabilizzazione da parte della ditta IAR;
- Sant'Apollonia: Chiostro, restauro muratura verso il cortile interno;

IMPIANTI E VARIE

- Impianto televisivo Basilica: è stato realizzato l'impianto televisivo interno alla chiesa con 7 video e completo di telecamere;
- Manutenzioni varie degli impianti
- Opere varie di falegname, manutenzione porte, serramenti e arredi;
- Soffitte: eseguita in parte la messa in sicurezza antincendio delle soffitte mediante l'eliminazione del materiale infiammabile e la formazione dei nuovi piani in metallo;

MUSEO

- Museo Marciano: Completata la messa in sicurezza e a norma del museo con l'installazione delle lampade di segnalazione evacuazione, delle telecamere di controllo e dei rivelatori antintrusione;

ATENEO DI SAN BASSO

- Eseguita la messa a norma di tutti gli impianti, elettrico, antincendio, antintrusione e dell'impianto per l'utilizzo come sala multimediale nonché esecuzione dei lavori funzionali all'accoglienza e alla custodia dei bagagli dei visitatori della Basilica;

INTERVENTI DI DITTE ESTERNE CON NOSTRA ASSISTENZA E FORNITURE

BASILICA DI SAN MARCO

- E' in corso il restauro dell'apparato lapideo della parete nord della Basilica di San Marco (Ottorino Nonfarmale S.r.l.);
- Manutenzione straordinaria della Cripta (IAR);
- Restauro del rivestimento marmoreo della porta di San Clemente, colonne acquitane e capitelli bizantini (SERES);
- Restauro di oggetti lignei del Museo (Leutenmayer);
- Restauro di dipinti "cartone" dell'inferno (Walter Piovan: in corso anche nel 2004);
- Restauro oggetti del tesoro (Corinna Mattiello);

COMPLESSO DI SANT'APOLLONIA

- Sant'Apollonia: interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento e ristrutturazione del complesso Ex Jesurum di Sant'Apollonia (Impresa Antonio Toniolo). Progetto e D.L. a cura della Procuratoria con collaborazioni esterne. Per realizzazione di alloggi e uffici ad uso della Curia Patriarcale, con Sala Riunioni, depositi e laboratori ad uso della Procuratoria, ampliamento dell'area del Museo Diocesano.

I principali interventi finanziati con la Legge 488/99 e Legge 388/00 ed eseguiti fino al 31/12/2005 sono:

MOSAICI

- Cappella di Sant'Isidoro: prosegue il lavoro di restauro dei mosaici dopo il completo rilievo dello stato di degrado; si interviene in modi diversi in funzione delle diverse problematiche riscontrate e della localizzazione, consolidando il supporto con iniezioni di apposito legante, ricollocando in opera tessere mancanti o ancorate malamente al supporto. Si procede poi con le operazioni per rendere uniforme nel colore gli interstizi tra le tessere e quindi pulire la superficie decorata;
- Restauro mosaico sopra il portale di San Teodoro: dopo la preparazione ed il restauro in laboratorio è stata ultimata la posa in opera;
- Restauro mosaici facciata Nord esterna: in occasione degli interventi in corso nella facciata nord sono stati restaurati i decori a mosaico previo stacco, risanamento in laboratorio e successiva posa in opera;
- Restauro mosaico Cappella Zen: si è dato corso ad un intervento di manutenzione ad una porzione del mosaico parietale della Cappella Zen, fortemente aggrediti da fenomeni di risalita capillare con conseguente formazione di Sali; si è provveduto al distacco delle porzioni ammalorate, ed al successivo risanamento in laboratorio in attesa della posa in opera;

PAVIMENTO

- Restauro del secondo dei tre lotti del pavimento di mosaico di fronte al Tesoro: completati i rilievi esecutivi in scala al vero del restante pavimento sono iniziate le fasi preliminari al lievo d'opera con le verifiche e la composizione delle stampe necessaria alla suddivisione che verrà poi attuata;
- Manutenzione del pavimento;

CUPOLA DEL CORO

- Cupola del Coro: si completa la realizzazione della grande impalcatura;

PARAMENTI MARMOREI

- Restauro del rivestimento di marmo della parete nord del transetto nord: presso l'area dell'altare della Nicopeia, con lievo d'opera delle lastre previo rilievo di dettaglio, desalinizzazione delle stesse e restauro delle situazioni di degrado dell'apparato murario;
- Restauro del rivestimento di marmo della parete Cappella Zen e porta San Clemente, Porta centrale e Porta di San Piero, Cantiere Nonfarmale: con lievo d'opera delle lastre previo rilievo di dettaglio, desalinizzazione delle stesse e riposa in opera;
- Sistemazione deposito marmi Sant'Apollonia: sono stati movimentati i marmi del deposito per consentire le opere di restauro del fabbricato adiacente e con lo scopo di dare una prossima disposizione più razionale di elementi lapidei utilizzati per fini di restauro;

MURATURE

- Cripta: ricostruzione dei paramenti murari delle nicchie dove sono state eseguite opere di impermeabilizzazione da parte della ditta IAR;
- Sant'Apollonia: Chiostro, restauro muratura verso il cortile interno;
- Pilastro transetto Nord: eseguito il consolidamento con iniezioni;

IMPIANTI E VARIE

- Impianto televisivo Basilica: è stato realizzato l'impianto televisivo interno alla chiesa con 7 video e completo di telecamere;
- Manutenzioni varie degli impianti
- Opere varie di falegname, manutenzione porte, serramenti e arredi;
- Soffitte: eseguita in parte la messa in sicurezza antincendio delle soffitte mediante l'eliminazione del materiale infiammabile e la formazione dei nuovi piani in metallo;
- Ponteggi: realizzati ponteggi a servizio delle opere delle ditte esterne;
- Copertura: si esegue la manutenzione del tavolato e delle travi nelle zone con infiltrazioni d'acqua provvedendo anche alla manutenzione e riparazione delle lastre in piombo;

MUSEO

- Museo Marciano: Completata la messa in sicurezza e a norma del museo con l'installazione delle lampade di segnalazione evacuazione, delle telecamere di controllo e dei rivelatori antintrusione;

ATENEO DI SAN BASSO

- Eseguita la messa a norma di tutti gli impianti, elettrico, antincendio, antintrusione e dell'impianto per l'utilizzo come sala multimediale nonché esecuzione dei lavori funzionali all'accoglienza e alla custodia dei bagagli dei visitatori della Basilica;

INTERVENTI DI DITTE ESTERNE CON NOSTRA ASSISTENZA E FORNITURE

BASILICA DI SAN MARCO

- E' in corso il restauro dell'apparato lapideo della parete nord della Basilica di San Marco (Ottorino Nonfarmale S.r.l.);
- Manutenzione straordinaria della Cripta (IAR);
- Restauro del rivestimento marmoreo della porta di San Clemente, colonne acquitane e capitelli bizantini (SERES);
- Restauro di oggetti lignei del Museo (Leutenmayer);
- Restauro di dipinti "cartone" dell'inferno (Walter Piovan: in corso anche nel 2004);
- Restauro oggetti del tesoro (Corinna Mattiello);
- Eseguito impianto a scariche elettriche per allontanamento volatili in Atrio e nella Facciata Nord (Monetti);

COMPLESSO DI SANT'APOLLONIA

- Sant'Apollonia: interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento e ristrutturazione del complesso Ex Jesurum di Sant'Apollonia (Impresa Antonio Toniolo). Progetto e D.L. a cura della Procuratoria con collaborazioni esterne. Per realizzazione di alloggi e uffici ad uso della Curia Patriarcale, con Sala Riunioni, depositi e laboratori ad uso della Procuratoria, ampliamento dell'area del Museo Diocesano.

In relazione all'esecuzione di tali opere si riportano di seguito gli importi ottenuti, al 31.12.2005, per mezzo dei tre mutui stipulati con gli istituti di credito indicati ed i riepiloghi corrispondenti, ricordando che i finanziamenti stipulati con DEXIA CREDIOP in data 3 luglio 2001 e in data 26 giugno 2002 fanno riferimento alla Legge 488/99 mentre il finanziamento stipulato con Banca OPI in data 23 luglio 2003 fa riferimento alla Legge 388/00 e che quindi, ad oggi, i contributi erogati per le due Leggi sono rispettivamente:

Legge 488/99	5.040.311,69 + 6.483.902,12 =	**11.524.213,81 Euro**
Legge 388/00		**1.239.496,56 Euro**

Venezia, 30 giugno 2006

Il Primo Procuratore
Prof. Giorgio Orsoni

Arch. Ettore Vio
Proto di San Marco

PROCURATORIA DI SAN MARCO – VENEZIA

OPERE DI SALVAGUARDIA, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL COMPENDIO MARCIANO

CONTRATTO DI MUTUO PER IL FINANZIAMENTO
stipulato in data 3 luglio 2001 con Dexia Crediop S.p.A. Roma

Riepilogo Pagamenti al 30 giugno 2006

	Contabilità lavori	*Somma Erogata (al lordo delle tasse)*
1° SAL ANNO 2001	*Euro 973.110,51*	*Euro 973.110,51* ***(di cui Tasse Euro 2.432,78)***
2° SAL ANNO 2001	*Euro 362.422,08*	*Euro 362.422,08* ***(di cui Tasse Euro 906,06)***
1° SAL ANNO 2002	*Euro 761.878,06*	*Euro 761.878,06* ***(di cui Tasse Euro1 .904,69)***
2° SAL ANNO 2002	*Euro 444.687,97*	*Euro 444.687,97* ***(di cui Tasse Euro 1.111,72)***
1° SAL ANNO 2003	*Euro 614.358,92*	*Euro 614.358,92* ***(di cui Tasse Euro 1535,90)***
2° SAL ANNO 2003	*Euro 1.199.126,31*	*Euro 1.813.485,23* ***(di cui Tasse Euro 4533,71)***
1° SAL ANNO 2004	*Euro 195.932,66*	*Euro 70.368,92* ***(di cui Tasse Euro 175,92)***
2° SAL ANNO 2004	*Euro* ----------	----------
1° SAL ANNO 2005	*Euro 617.581,57*	----------
2° SAL ANNO 2005	*Euro* ----------	----------
TOTALE MATURATO	***Euro 5.169.098,08***	
	TOTALE EROGATO	***Euro 5.040.311,69***

Finanziamento Esaurito

Il Proto di San Marco
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Arch. Ettore Vio

Venezia, 30 giugno 2006

Visto
Il Primo Procuratore di San Marco
Prof. Avv.to Giorgio Orsoni

PROCURATORIA DI SAN MARCO – VENEZIA

OPERE DI SALVAGUARDIA, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL COMPENDIO MARCIANO

CONTRATTO DI MUTUO PER IL FINANZIAMENTO
stipulato in data 26 giugno 2002 con Dexia Crediop S.p.A. Roma

Riepilogo Pagamenti al 30 giugno 2006

	Contabilità lavori	*Somma Erogata (al lordo delle tasse)*
2° SAL ANNO 2002	*Euro 602.138,74*	*Euro 602.138,74* ***(di cui Tasse Euro 1.505,35)***
1° SAL ANNO 2003	*Euro 656.339,37*	*Euro 656.339,37* ***(di cui Tasse Euro 1.640,85)***
2° SAL ANNO 2003	*Euro 979.329,49*	*Euro 1.635.668,86* ***(di cui Tasse Euro 4.089,17)***
1° SAL ANNO 2004	*Euro 1.254.889,03*	*Euro 1.254.889,03* ***(di cui Tasse Euro 3.137,22)***
2° SAL ANNO 2004	*Euro 951.875,88*	*Euro 951.875,88* ***(di cui Tasse Euro 2.379,69)***
1° SAL ANNO 2005	*Euro 812.321,01*	----------
1° SAL ANNO 2005	*Euro 2.345.262,07*	*Euro 1.382.990,24* ***(di cui Tasse Euro 3.457,48)***
TOTALE MATURATO	***Euro 7.602.155,59***	
	TOTALE EROGATO	***Euro 6.483.902,12***

Finanziamento Esaurito

Il Proto di San Marco
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Arch. Ettore Vio

Venezia, 30 giugno 2006

Visto
Il Primo Procuratore di San Marco
Prof. Avv. to Giorgio Orsoni

PROCURATORIA DI SAN MARCO – VENEZIA

OPERE DI SALVAGUARDIA, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL COMPENDIO MARCIANO

CONTRATTO DI MUTUO PER IL FINANZIAMENTO
stipulato in data 23 luglio 2003 con BANCA OPI

Riepilogo Pagamenti al 30 giugno 2006

	Contabilità lavori	*Somma Erogata (al lordo delle tasse)*
2° SAL ANNO 2003	*Euro 35.053,75*	*Euro 35.053,75* ***(di cui Tasse Euro87,63)***
1° SAL ANNO 2004	*Euro 554.246,46*	*Euro 554.246,46* ***(di cui Tasse Euro1385,62)***
2° SAL ANNO 2004	*Euro 673.850,70*	*Euro 650.196,35* ***(di cui Tasse Euro1.625,49)***
TOTALE MATURATO	***Euro 1.263.150,91***	
	TOTALE EROGATO	***Euro 1.239.496,56***

Finanziamento Esaurito

Il Proto di San Marco
(Progettista e Direttore dei Lavori)
Arch. Ettore Vio

Venezia, 30 giugno 2006

Visto
Il Primo Procuratore di San Marco
Prof. Avv.to Giorgio Orsoni

Documento O ***Curia Patriarcale di Venezia***

Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

CURIA PATRIARCALE DI VENEZIA

UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO - S. Marco 320/A - 30124 Venezia

MAGISTRATO ALLE ACQUE
SEGRETERIA
Prot. N. 474 /GAB.

Venezia, 19.06.2006

ex 798/84

85

Prot.

Prot. OPI L.S.-Magistr.Acque

Dott. Ing. Maria Giovanna Piva
Presidente
Magistrato alle Acque
Segretario del Comitato di Indirizzo
Coordinamento e Controllo
S. Polo, 19
30125 VENEZIA

Oggetto: Diocesi: Patriarcato di Venezia.
Richiesta dati.
Rilevazione dati L. 798/84, al 31.12.2005.

In risposta alla Vs. del 04.04.2005, Prot. N. 338/GAB, questa Amministrazione allega le schede relative ai finanziamenti assegnati con la legislazione speciale, suddivisi per numero di legge.

Con distinti saluti.

L'AMMINISTRAZIONE DIOCESANA
Il Segretario U.A.D.
Rag. Arrigo Memo

P.S. Con riferimento alla scheda contabile relativa alla L. 388/00 – resoconto dei dati al 31.12.2004, inviata da questa Amministrazione in data 12.09.2005 e riportati nel quadro analitico, si fa presente che da un riscontro contabile risulta che l'esatto "importo speso" (al 31.12.2004) **è di € 3.403** e non € 7.846.

ALLEGATI: scheda finanziamento L. n. 295/98
" L. n. 488/99
" L. n. 388/00

FINANZIAMENTO LEGGE n. 488/99 al 31.12.2005					
CATEGORIA	VOCI		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)	10.699	10.699	10.699
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Altri interventi	….. (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 488/99			**10.699**	**10.699**	**10.699**

FINANZIAMENTO LEGGE n. 295/98 al 31.12.2005					
CATEGORIA	VOCI		IMPORTI ASSEGNATI (000 €)	IMPORTI IMPEGNATI (000 €)	IMPORTI SPESI (000 €)
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)	12.394	12.394	12.394
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Altri interventi	..... (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 295/98			12.394	12.394	12.394

FINANZIAMENTO LEGGE n. 388/00 al 31.12.2005					
CATEGORIA	**VOCI**		**IMPORTI ASSEGNATI (000 €)**	**IMPORTI IMPEGNATI (000 €)**	**IMPORTI SPESI (000 €)**
Studi, sperimentazioni, monitoraggi, indagini e raccolta dati	Ricerche finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e alla realizzazione degli interventi di salvaguardia	ambiente			
		beni culturali			
		economia			
		gestione dati			
Patrimonio mobiliare	Restauro conservativo di quadri, arazzi, sculture, mobili, etc.				
Immobili	Restauro, manutenzione, consolidamento statico, sistemazione di immobili destinati a:	culto (chiese, etc.)	28.488	28.488	5.844
		cultura/musei/beni architettonici			
		istruzione			
		altri usi (specificare)			
Manutenzione bacino lagunare	Escavo canali e smaltimento fanghi				
Altri interventi	….. (specificare la tipologia di intervento realizzato)				
TOTALE LEGGE n. 388/00			**28.488**	**28.488**	**5.844**

PAGINA BIANCA

Documento P ***Diocesi di Chioggia***

Stato di attuazione interventi finanziati dalla legislazione speciale – Aggiornamento al 31 dicembre 2005

SEGRETERIA COMITATO

DIOCESI DI CHIOGGIA
Curia Vescovile
D.M. 20 ott. 1986, n. 328 - G.U. 17 nov. 1986, n. 267

MAGISTRATO ALLE ACQUE
- SEGRETERIA -
Arr. 1 6 LUG 2006
Prot. N. 536 /GAB.

MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA
10. LUG. 2006
GABINETTO

Ufficio TECNICO

Prot. n. 105/2006

Chioggia, 30 giugno 2006

Al Segretario del Comitato di Indirizzo
Coordinamento e Controllo
(Art. 4 legge 29.11.1984 n. 798)
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Magistrato alle Acque
Palazzo X Savi
VENEZIA

Risposta al Prot. n. 238/GAB del 04/04/2006

OGGETTO: Stato di attuazione interventi finanziari della legislazione speciale al 31-12-2005.

In riscontro alla Vs richiesta a margine ed in esecuzione al disposto del quarto comma dell'art. 4 della legge 798/84 abbiamo predisposto lo schema sullo stato degli utilizzi dei finanziamenti concessi a questa Diocesi relativi alla legge sulla Salvaguardia di Venezia, che alleghiamo.

Distinti saluti.

DIOCESI DI CHIOGGIA
Rione Duomo 1006
Chioggia (Ve)

Il Vicario Generale
Mons. Pietro Mozzato

Mozzato M. Pietro

DIOCESI DI CHIOGGIA

Finanziamenti legge speciale per Venezia

Quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti al 31 dicembre 2005

(importi in migliaia di euro)

1

Anno 1999	Limiti d'impegno - ex lege 448/98	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
Importi	**215**	**3.098**	**3.098**	**2.718**	**2.718**

N.B.: Finanziamento totalmente speso

2

Anno 2000	Limiti d'impegno - ex lege 488/99	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
Importi	**55**	**723**	**723**	**674**	**674**

N.B.: Finanziamento totalmente speso

3

Anno 2002	Limiti d'impegno - ex lege 448/2001	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
Importi	**370**	**4.500**	**4.500**	**3.600**	**3.600**

4

Anno 2004	Limiti d'impegno - ex lege 448/2001	Importi assegnati e disponibili	Importi sottoscritti con contratti di mutuo	Importi impegnati	Importi spesi
Importi	**100**	-	-	-	-

N.B.: Non ancora utilizzato

Chioggia 30/06/2006

DIOCESI DI CHIOGGIA
Riene Duomo 1006 Chioggia (Ve)

Il Vicario Generale
(Mons. Mozzato dr. Pietro)

Mozzato d. Pietro
