ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXVII**
n. **2**

RELAZIONI

DEI COMMISSARI STRAORDINARI DELEGATI PER L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA FINALIZZATI ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

(Anno 2012)

(Articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26)

Presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(ORLANDO)

Trasmessa alla Presidenza il 14 giugno 2013

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Relazione annuale anno 2012

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 8 MARZO 2011.

08/03/2013
Commissario Straordinario Delegato all'attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo
Ing - Emilio Santori

PAGINA BIANCA

1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

(Compilare i campi sottostanti)

Regione	Abruzzo
Commissario straordinario delegato	Ing- Emilio Santori
Decreto nomina	***8 marzo 2011***
Data sottoscrizione Accordo	***16 settembre 2010***
Data sottoscrizione Accordo Integrativo	-
Importo complessivo assentito in Accordo	***€ 40.750.000,00***
Importo programmato per il periodo (anno 2012)	***€ 20.732.770,76***
Importo speso per il periodo (anno 2012)	***€ 293.072,024***
Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno 2012)	***€ 20.000.000,00***

1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

Descrivere il contesto in cui si inseriscono le attività commissariali a livello regionale.

L'ambito territoriale della Regione Abruzzo conforma un territorio altamente soggetto a fenomeni di dissesto, sia per la cospicua presenza della catena appenninica, che determina anche la consistente attività di scorrimento delle acque tra rilievi, sia per la struttura geomorfologica complessiva degli strati e dei substrati della crosta terrestre pertinente, sia infine per le notevoli attività sismiche registrate nel tempo. Condizioni e risultanze ovviamente interconnesse.

Secondo un approccio più tecnico, l'Abruzzo si potrebbe sinteticamente definire una regione fisicamente caratterizzata da una famiglia di rilievi appenninici che si addossano gli uni sugli altri. In alcuni casi – come per le gole di Celano e l'alto bacino dell'Aventino – questi rilievi si accavallano in derivazione del raddoppio tettonico, allungandosi come fronti di onde orogenetiche, con partenza da NO e arrivo a SE, dunque procedenti dal Tirreno all'Adriatico. In tempi remoti, tra cresta e cresta si sono formate alcune vaste aree depressionarie, in genere di età tardo-pliocenica, attualmente livellate sia da coltri di materiali alluvionali, sia da sedimenti di alcune generazioni lacustri, argille di dissoluzione calcarea. I rilievi calcarei delimitano i margini delle pianure, cui sono raccordati quasi sempre con scarpate di faglia inverse sui forti declivi dei fianchi occidentali, con scarpate di faglia dirette sui meno ripidi fianchi orientali, con una serie di terrazzamenti sedimentari fluviali e lacustri, per lo più sollevati dalla neo-tettonica quaternaria, o da detriti di falda e da conoidi torrentizi.

Questa particolare strutturazione, ampiamente sedimentaria e alluvionale, del territorio regionale, ha conformato un ambiente altamente soggetto a smottamenti, straripamenti e alterazioni varie del tessuto geomorfologico.

Tuttavia, il territorio è ampiamente abitato, sia negli ambiti vallivi che in gran parte di quelli montuosi.

Il modello insediativo è comunque tendenzialmente perimetrale delle conche intermontane abruzzesi. Qui, mentre i sedimenti pleistocenici hanno assunto particolare rilievo agronomico, quelli olocenici costituiscono, con i conoidi perimetrali, i luoghi privilegiati dall'insediamento. In esso si riconosce una linea mediana- sempre dominante nella storia della conca peligna - secondo l'allineamento Sulmona-Pratola Peligna-Corfinio, e una linea perimetrale le cui modalità coincidono con siti di conoide o di terrazzo sui fianchi delle principali vallate che immettono nella conca: Popoli controlla il corso del Pescara; Vittorito e Raiano quello dell'Aterno; Campo di Fano, Torre di Nolfi e Bugnara si dispongono sui fianchi del Sagittario; Introdacqua, Vallelarga e Pettorano dominano l'accesso alla valle del Gizio. Allo schema sfuggono Roccacasale e Prezza: il primo, come centro difensivo tra Popoli e Sulmona; il secondo in posizione di controllo sulla via tradizionale di collegamento tra la conca peligna e quella subequana.

Gli interventi in esecuzione e in programmazione, affidati a questo commissariamento, sono disposti nell'intera regione e, proprio per la varietà delle condizioni geo-fisiche, assumono caratteristiche tra essi differenti. Da queste, scaturiscono approcci necessariamente prudenti per ognuna delle opere.
Al fine di affrontare con grande attenzione ogni azione a me Commissario demandata, ho disposto il controllo esaminativo dei luoghi – tramite sopralluoghi esplorativi affidati al personale competente del mio Ufficio di supporto – fin dalle fasi di organizzazione del lavoro. Questo, anche per la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali pervenuti alla mia struttura, con la situazione effettiva dei siti.

Gli interventi a me ascritti sono riportati di seguito (per ognuno è indicato il titolo, l'ambito amministrativo, l'ambito di attribuzione per la tipologia di difesa, l'importo e una breve descrizione del dissesto in relazione all'intervento in previsione):

Intervento denominato "Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali" nel Comune di Carsoli (AQ). Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 5.000.000,00

Il Torrente Vallemura, nel transito all'interno del Comune di Carsoli, presenta un'insufficienza del letto di portata, generando disagevoli e frequenti allagamenti, specie nelle stagioni piovose e di scioglimento delle nevi.

Si intende realizzare una vasca di espansione della capacità di mc 500.000, oltre che rinforzi delle arginature e vari interventi di difesa degli spondali. In aggiunta, appaiono necessarie opere di presa e restituzione controllata delle acque, al fine di regimentare le portate transitanti.

Intervento denominato "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno" nel Comune de L'Aquila. Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo di 3,8 Ml di Euro

Il fiume Aterno, in prossimità della confluenza col torrente Raio e praticamente all'altezza del nucleo industriale della città de L'Aquila, possiede una ingente portata, ostacolata anche dalla ostruzione di alcune sezioni di deflusso. In particolari periodi dell'anno e in condizioni meteo avverse, si determina lo straripamento delle acque, anche investendo pericolosamente le prossime aree dove sono siti gli impianti industriali.

Il progetto prevede la realizzazione di opere idrauliche e di ingegneria naturalistica, per la riapertura delle sezioni di deflusso, oltre che opere complementari necessarie a regimentare l'intero sistema.

Intervento denominato "per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo" nel Comune di PESCARA. Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 3.600.000,00

In un'ampia area praticamente interna alla città di Pescara, l'omonimo fiume provoca spesso allagamenti diffusi, a danno delle limitrofe aree insediate e delle ingenti infrastrutture di collegamento tra gli argini. Questa condizione di dissesto si è sviluppata in tempi rapidi, per il probabile effetto della variazione di portata del corso d'acqua.

Il progetto prevede la sistemazione del corso d'acqua tramite adeguamento delle sezioni di deflusso e della capacità di trasporto dell'alveo. Inoltre prevede la messa in opera di nuove arginature e altri interventi di supporto con tecniche di ingegneria naturalistica.

Intervento denominato "Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano" nei Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi (TE). Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 3.600.000,00

Il fiume Vomano, nel percorso di attraversamento dei comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi, presenta frequenti esondazioni per via dei sovralluvionamenti in alveo.

Si prevede il ripristino delle difese spondali tramite gabbionate e/o ricarichi arginali. Si tratta di opere diffuse di ingegneria naturalistica.

Intervento denominato "Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo" nei Comuni di Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona (CH). Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 5.000.000,00

In prossimità della confluenza del torrente Dendalo col fiume Foro, la capacità dei letti non è sufficiente a contenere le portate di transito. Ciò determina diffusi allagamenti, con pericolo di smottamenti e decompressioni del piano di campagna.

Si prevede la realizzazione di due vasche di espansione (una di grandi dimensioni e una di minore ampiezza), poste rispettivamente a monte e a valle de dissesto. L'obiettivo è contenere circa 1.000.000 di metri cubi. Sono da aggiungersi opere varie di difesa spondali e miglioramento di tratti delle arginature.

Intervento denominato "Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento" nel Comune di Martinsicuro (TE). Ambito: Difesa della Costa, Importo € 3.000.000,00.

Il dissesto sulla costa di Martinsicuro è tale da provocare ampie situazioni di disagio, derivate dalla mutevole altezza delle acque marine nei diversi periodi dell'anno e nelle diverse ore della giornata. Possibili, le inondazioni della linea di costa.

Si prevede un intervento tramite la realizzazione di barriere emerse e sommerse, oltre che di ripascimento.

Intervento denominato "Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento" nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE). Ambito: Difesa della Costa, Importo € 3.000.000,00.

Come per il punto precedente, anche il dissesto sulla costa di Roseto degli Abruzzi è tale da provocare ampie situazioni di disagio, derivate dalla mutevole altezza delle acque marine nei diversi periodi dell'anno e nelle diverse ore della giornata. Possibili, le inondazioni della linea di costa.

Si prevede un intervento tramite la realizzazione di barriere emerse e sommerse, oltre che di ripascimento.

Intervento denominato "Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento" nel Comune di Francavilla al Mare (CH). Ambito: Difesa della Costa, Importo € 2.000.000,00.

Analogamente, il dissesto sulla costa di Francavilla al Mare è tale da provocare ampie situazioni di disagio, derivate dalla mutevole altezza delle acque marine nei diversi periodi dell'anno e nelle diverse ore della giornata. Possibili, le inondazioni della linea di costa.

Anche qui, si prevede un intervento tramite la realizzazione di barriere emerse e sommerse, oltre che di ripascimento.

Intervento denominato "Consolidamento e risanamento idrogeologico" nel Comune di Corfinio (AQ). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

L'intero nucleo storico di Corfinio, ancorato ad un'emergenza prevalentemente rocciosa, rischia di subire gravissimi danni per via dello scivolamento/smottamento che si evidenzia nella zona più a valle, ove si dipana la strada principale di accesso. Smottamento presumibilmente dovuto alla differente composizione del sottosuolo, tanto che l'attrito tra le due diverse materie geomorfologiche si rivela insufficiente a garantire la stabilità. Il rischio per la pubblica incolumità è evidente.

Il consolidamento previsto riguarda la realizzazione di opere di contenimento delle spinte, tramite paratie in pali, da porre al di sotto della strada di accesso.

Intervento denominato "Consolidamento dei versanti rocciosi - consolidamento zona in via Valone" nel Comune di Aielli (AQ). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Materiali detritici e argillosi, prodotti nel tempo dalle mutevoli condizioni geofisiche del territorio, hanno causato un evidente dissesto all'interno del Comune di Aielli, con rischio di smottamenti a danno del complesso più abitato.

Si prevede di realizzare opere di contenimento con paratie armate, previa rimozione dei materiali sedimentari sciolti. Inoltre, si prevede la chiodatura della parete rocciosa e il relativo rivestimento con rete metallica.

Intervento denominato "Sistemazione versanti del Centro Storico" nel Comune di Roccacasale (AQ). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

L'intero nucleo abitato del Comune di Roccacasale è situato su un solo versante montuoso, con pendenza sostenuta. Fatto salvo il dissesto relativo a delocalizzati smottamenti di modesta entità, quello che appare problematico è il disagio strutturale del corso di regimentazione delle acque meteoriche che attraversa l'intero comune, da monte a valle. Disagio che potrebbe, in tempi rapidi, tradursi in grave forma di alterazione dell'equilibrio complessivo del sito.

Pertanto, oltre alla necessità di porre in sicurezza quattro ambiti diversamente dissestati (con rete metallica di contenimento, chiodature di parete rocciosa, modesta palificata con micropali, brevi tratti a tirante), quello che costituirà il focus dell'opera è la sistemazione complessiva del canale in c.a. e delle relative diramazioni di regimentazione.

Intervento denominato "Messa in sicurezza e consolidamento abitato via Per Vittorio" nel Comune di Raiano (AQ). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

L'abitato di Via per Vittorio, interna al Comune di Raiano, presenta un cedimento per slittamento dell'intera area collinare posta a valle. Slittamento che ha determinato nel tempo fenomeni di eccessiva compressione dell'area più irta posta a monte della stessa strada, con conseguente dissesto anche delle pregresse strutture di contenimento.

Sono previsti interventi di salvaguardia delle strutture preesistenti tramite recupero strutturale e rinforzo armato, nonché gabbionate in corrispondenza delle aree della scarpata a pendenza maggiore.

Intervento denominato "Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del Fiume Orta – Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato" nel Comune di Caramanico Terme (PE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Il centro abitato del Comune di Caramanico Terme s'erge al di sopra di un rilievo prevalentemente roccioso, comunque posto all'interno di una grande vallata caratterizzata da natura parzialmente solfatica del substrato. Le composizioni geofisiche della parte a rilievo e di quella valliva, presentano dunque differenze consistenti che hanno determinato, nel tempo, fenomeni di dissesto con pericolo per la pubblica incolumità.

L'intervento previsto riguarda la sagomatura dei versanti tramite gabbionate e terre armate, oltre che il rifacimento delle precedenti briglie danneggiate e opere di regimentazione delle acque superficiali.

Intervento denominato "Consolidamento movimento franoso" nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore presenta un dissesto a valle del nucleo principale, in area non particolarmente ripida. La composizione del terreno è del tipo sciolto (in prevalenza) e, per questo, facilmente soggetto a scivolamento. Pur se in prossimità dell'area di dissesto sono presenti pochi edifici, la localizzazione del danno è tale da suscitare attenzione per la più compatta area abitata posta a monte.

Sono previste opere diffuse di drenaggio del terreno e di consolidamento con diverse tecniche, anche di ingegneria naturalistica.

Intervento denominato "Completamento risanamento idrogeologico Roccacaramanico – consolidamento/risanamento frazione San Giacomo" nel Comune di Sant'Eufemia a Maiella (PE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Le frazioni Roccacaramanico e San Giacomo del Comune di Sant'Eufemia a Maiella, sono investite da dissesto evidente, dovuto allo scorrimento delle pareti rocciose più esterne ai grossi rilievi di localizzazione, rispetto al substrato. Ciò ha determinato problematiche di distaccamento rotatorio, oltre che di decompressione destabilizzante. La situazione di dissesto è evidente anche dalle ampie lesioni che riportano gli edifici più prossimi.

Si prevedono la stabilizzazione del versante con opere di ingegneria naturalistica, interventi di ricostruzione orografica, catenarie e consolidamenti vari.

Intervento denominato "Capoluogo Borgo Pagliara Vecchia: rete drenante, stabilizzazione… - frazione Ceriseto: consolidamento" nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Il Capoluogo Borgo Pagliara Vecchia è investito da dissesto idrogeologico per cedimento di pareti verticali.

Sono previsti interventi di apposizione di rete drenante sia profonda che superficiale (anche tramite realizzazione di trincee), palificate con pali di grande diametro completi di tiranti e un sistema complessivo di stabilizzazione tramite rete in acciaio.

Intervento denominato "Consolidamento versante ovest del Centro Storico" nel Comune di Castelli (TE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Il Comune di Castelli è sito al di sopra di un enorme pendio, molto ripido. Interventi eseguiti nel passato, hanno garantito la stabilità del centro abitato tramite ingenti costruzioni di sostegno a parete della scarpata, complete di arcate, anche per il drenaggio delle falde acquifere. Tuttavia, più recenti fenomeni geofisici hanno spostato le azioni di dissesto oltre la citata opera di sostegno, interessando l'area più estrema del paese e non protetta.

L'azione di stabilizzazione va eseguita con la continuazione dell'opera di sostegno, anche compattando i due interventi tramite opportune catenarie. Si ravvisa, in ogni caso, l'esiguità della somma imputata a questo intervento rispetto alle necessità emerse in sede di sopralluogo. Pertanto, l'azione possibile sarà limitata e, pur potendo contribuire al miglioramento della staticità complessiva, non potrà essere considerata esaustiva.

Intervento denominato "Messa in sicurezza movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico abitato di Villa Carosi" nel Comune di Civitella del Tronto (TE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 750.000,00.

Il dissesto evidente nel comune di Civitella del Tronto, localizzato in un'area a borgo nella quale insistono alcune abitazioni, riguarda lo slittamento dell'intera scarpata a valle di Villa Carosi. La decompressione del suolo che si è venuta a creare al livello di campagna, ha determinato ingenti danni agli edifici, con situazione di elevata pericolosità per la pubblica incolumità.

Si prevede la realizzazione di palificate molto profonde e paratie, a completamento di interventi parziali già eseguiti nel recente passato. Tali interventi, settorializzati e non collegati tra loro, hanno infatti prodotto lo smottamento degli strati superficiali nelle direzioni libere, con conseguente rotazione delle aree insediate.

Intervento denominato "Consolidamento corona di frana" nel Comune di Treglio (CH). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

In zona prossima al nucleo abitato del Comune di Treglio, si è prodotto un costone di frana, generando gradi di pericolosità elevata. Qui, la disponibilità di un pregresso studio geologico ha evidenziato la sedimentazione di diversi materiali, con conseguente riduzione di attrito stabilizzante.

Si prevede la difesa del ciglio di frana con berlinese di pali speciali di piccolo diametro, oltre che chiodature passive, reti armate e riforestazione.

Intervento denominato "Consolidamento costone orientale zona Piazza Marconi/Loggia Ambligh" nel Comune di Vasto (CH). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

La Loggia Ambligh, corrisponde al grande terrazzamento che apre verso il mare il centro abitato del Comune di Vasto. Si tratta di un'opera importante, che recentemente ha subito fenomeni decompressori con conseguente danno ad edifici e alla pavimentazione. Analogamente, il costone orientale di Piazza Marconi ha mostrato cedimenti piuttosto preoccupanti, data la elevata posizione orografica.

L'intervento in previsione consta del placcaggio della falesia sub verticale tramite geo-rete, oltre che la realizzazione di gradonate rinforzate in terra e sistemi di regimentazione e drenaggio delle acque. Il tutto, aggiunto della piantumazione di essenze arboree stabilizzanti.

Si tratta dunque di venti interventi, cinque dei quali imputati alla Difesa dei Fiumi, tre alla Difesa della Costa e dodici alla Difesa del Suolo.

In ragione della disponibilità economica acquisita fino all'anno 2012, è stato possibile avviare solo alcuni dei sopraelencati interventi. In particolare, a seguito di sopralluoghi tecnici, nonché di verifica della disponibilità di atti progettuali (anche non definitivi), ho scelto di dare priorità a quelle opere che risultavano essere maggiormente critiche dal punto di vista del dissesto (anche su indicazione della Regione competente) e che vantavano, contestualmente, la presenza di progettazioni. Questo, oltre a garantire il territorio, ha permesso una maggiore celerità nella fase di avvio. Per le specifiche, si rimanda al paragrafo 1.7.

1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

Descrivere la struttura commissariale sia dal punto di vista logistico sia come risorse umane.

La creazione della struttura commissariale è stata resa possibile solo a seguito del DPCM aggiuntivo del 20 luglio 2011, che all'art. 1, c. 5 destina la quota dell'1,5% delle risorse assegnate all'acquisizione di risorse necessarie al più efficace espletamento dell'incarico:

Ad oggi l'Ufficio conta la presenza di due amministrativi (l'uno senior e l'altro Junior, già interni alla PP.AA.) per la gestione degli aspetti propri del mestiere con inclusione di quelli contabili, due architetti (uno senior e l'altro junior) per l'attuazione dei Cronoprogrammi (ivi inclusi la gestione delle questioni di controllo tecnico su campo e di esame

degli atti progettuali nonché di gestione dei rapporti con le figure dei RUP), di due legali di alto profilo, con competenze fondamentali per le attività commissariali e tra loro complementari, una risorsa per la gestione dell'Ufficio già interna alla PP.AA. Nel dettaglio, le figure sono le seguenti (al fianco di ognuna è riportata la durata dell'incarico e l'oggetto del rapporto):

- *Ragioniere ENNIO ANTONETTI 1/1/2012 – 8/8/2014 "Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti amministrativi, contabili e di gestione dell'Ufficio Commissariale" –*
- *Architetto ELODIA ROSSI 9/2/2012 – 8/8/2014 "Attuazione del Cronoprogramma degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico nella Regione Abruzzo"*
- *Architetto SARA FRANCESCON 9/2/2012 – 9/2/2011 - 8/8/2014 "Attuazione del Cronoprogramma degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico nella Regione Abruzzo"*
- *Dottor GIUSEPPE COSENTINO 1/2/2012 - 8/8/2014 "Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti della gestione delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio Commissariale" – già dipendente MATTM*
- *Avvocato MASSIMO PALLINI 19/3/2012 – 8/8/2014 "Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti legali e amministrativi dell'Ufficio Commissariale"*
- *Avvocato LEONARDO SALVEMINI 19/3/2012 – 8/8/2014 "Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti legati al codice degli appalti pubblici dell'Ufficio Commissariale"*
- *Ragioniere GIUSEPPE BUSCEMA - area B – Pos. Economica FII - in posizione di distacco di ruolo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.*
- *Sig. MARIO IMBROGNO in posizione di distacco di ruolo dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.*

Questa azione di reclutamento è stata dunque fondamentale, sempre nel rispetto del budget disposto dalla citata nota, per giungere alla strutturazione di un Ufficio in tutto capace di gestire alcuni dei lavori in proprio (nei limiti, ovviamente, possibili scaturenti da ovvie sovrapposizioni e/o sovraccarichi). L'obiettivo primario rimane quello di soddisfare le esigenze dei numerosi campi di attività che io Commissario sono chiamato a gestire secondo le disposizioni della pianificazione strategica in campo pubblico: l'organizzazione del programma, l'amministrazione e la gestione, le risorse umane, il budget, la valutazione. Ed infatti sono questi i campi che, nelle forme consone al lavoro che sto eseguendo, sono contenuti all'interno dei Cronoprogrammi di ogni intervento.
Al fine, poi, di rendere la struttura in grado di operare, ho disposto l'acquisizione delle strumentazioni informatiche necessarie alla soddisfazione delle esigenze lavorative. Tali strumentazioni, attratte con metodi propri della PP.AA. (comparazione tra preventivi, fonti di provenienza consolidate in sede pubblica, eccetera), sono state poste in operatività presso il MATTM, nelle stanze destinate a me Commissario (Rif. Nota Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale del MATTM 15078/AG1 del 13 ottobre 2011), rese praticabili soltanto a partire dal mese di febbraio 2012.

Tali risorse sono state acquisite direttamente, per quel che attiene il personale già occupato all'interno della PP.AA. Mentre, è stato svolto regolare concorso (con preventiva pubblicazione all'interno del sito Ministeriale e di testate giornalistiche, ai sensi di legge), per l'acquisizione delle risorse esterne alla PP.AA., ma ritenute necessarie al completamento delle necessità della struttura, comunque solo dopo aver verificato la non disponibilità di analoghe competenze all'interno del pubblico.

Dal punto di vista logistico, la struttura fa capo agli Uffici concessi dal MATTM. Si tratta di due stanze al Piano ottavo, all'interno delle quali esplicitano la loro funzione pressoché continuativa alcuni dei referenti interni alla PP.AA., mentre sono utilizzate all'occorrenza (riunioni, giornate di lavoro periodiche e saltuarie, eccetera) dagli esterni acquisiti con contratto Co.Co.Pro.

1.4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Dichiarare quanto è stato versato sulla c.s. dal Ministero dell' Ambiente, dalla Regione, o da altre fonti sia con importo corrente che cumulato, lo speso, i relativi residui.

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente			
Importo corrente (per l'anno 2012)	**Importo cumulato** (anno 2012 + precedente periodo)	**Speso**	**Residuo**
€ 0,00	€ 20.732.770,76	€ 293. 072,04	€ 20.365.023,12

Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti (precisare)			
Importo corrente (per l'anno 2012)	**Importo cumulato** (anno 2012 + precedente periodo)	**Speso**	**Residuo**
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

1.5. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

Indicare per ciascuna delle attività indicate nella seguente tabella il relativo stato di rendicontazione della spesa, considerando esclusivamente quanto effettivamente pagato.

Descrizione attività	**Importo speso corrente** (per l'anno 2012)	**Importo speso cumulato** (anno 2012 + precedente periodo)
struttura commissariale	€ 242.949,04 (Commissario +Struttura)	€ 317.624,64 (Commissario +Struttura)
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	€ 50.123,00	€ 50.123,00

1.6. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

Allegare il prospetto contabile riepilogativo entrate/uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.
Contabilità speciale 5631 aperto presso la Tesoreria Prov.le dello Stato di Roma.

Entrate: 20.732.770,72 (Anno 2011)
Spese: 74.675,60 (Anno 2011)

Entrate:0,00 (Anno 2012)

Spese: 293.072,04 (Anno 2012)

1.7. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

1.7.1 Descrizione delle attività

Descrivere le attività prodotte sia a livello centrale dal commissario, sia a livello locale degli enti realizzatori e rilevare gli eventuali ritardi/criticità rispetto al cronoprogramma delle attività per il periodo di riferimento.

Per alcuni degli interventi (in particolare, quelli per i quali era stata avviata una procedura di interlocuzione prima che fosse resa possibile la creazione della struttura commissariale - rif. Paragrafo 1.3) e, per la gran parte, in ragione della disponibilità economica allora in essere, è stata scelta la strada dell'Avvalimento a valere su Amministrazioni territoriali competenti. Si tratta degli interventi riportati di seguito, completi delle principali informazioni sull'andamento dei lavori, rappresentate in ordine cronologico.

*Intervento denominato "**Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali" nel Comune di Carsoli (AQ)**.*

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo € 5.000.000,00

Principali attività svolte nell'anno 2012:

Convenzione di Avvalimento: firma avvenuta in data 27/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Comune di Carsoli (AQ).

a) *Nell'intenzione di equilibrare la spesa disponibile in ragione di alcuni fabbisogni emergenti sui territori interessati al dissesto, io Commissario ho disposto che parte dei fondi pertinenti questa opera (per la quota di 2 ML di Euro) fossero posti momentaneamente a disposizione di altro intervento (Difesa del Suolo). Pertanto si è proceduto verso l'organizzazione e l'esecuzione di un Primo Stralcio dei lavori di cui alla presente opera, per complessivi 3 ML di Euro;*

b) *sono state eseguite alcune riunioni (presso il MATTM, Ufficio del Commissario) per monitorare l'avanzamento dei lavori. L'azione di monitoraggio e controllo, infatti, come emerge dal Cronoprogramma specifico, rimane a carico di me Commissario. In particolare si fa riferimento all'incontro, da cui è scaturito Verbale sottoscritto dalle parti, avuto presso l'Ufficio del Commissario in data 8 marzo 2012; qui sono stati trattati alcuni temi di particolare rilevanza per le azioni a seguire. Tra questi: lo stato delle progettazioni, la Conferenza di Servizi, le eventuali espropriazioni e la possibilità di ricorrere a provvedimento d'urgenza;*

c) *il Comune è in possesso di uno Studio di Fattibilità abbastanza approfondito, di cui rappresenta in sede d'incontro dell'8 marzo 2012. Essendo questo pregresso rispetto alla nomina di me Commissario, si è fatto presente che i relativi oneri progettuali non possono rientrare nella spesa da me gestita;*

d) *sono state eseguite alcune altre riunioni (presso il MATTM, Ufficio del Commissario) per monitorare l'avanzamento dei lavori. L'azione di monitoraggio e controllo, infatti, come emerge dal Cronoprogramma specifico, rimane a carico di me Commissario.*

e) *07.05.2012 con Nota Prot. 168/CS il Commissario Straordinario preso atto dell'impossibilità per l'Ente di procedere con risorse interne all'esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva, previa richiesta dell'Ente e verifica dello stesso della disponibilità di supporto degli Uffici Regionali, ne autorizza l'affidamento esterno attraverso le procedure ad evidenza pubblica previste dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e relativo Regolamento d'attuazione.*

f) *13.07.2012 Il Comune di Carsoli, con nota prot. 6637 del 13.07.2012 acquisita con ns prot. 216/CS del 13.07.2012 (a mezzo posta certificata), trasmette gli elaborati di gara (disciplinare e bando) approvati in data 05.07.2012 con determinazione del Responsabile del Servizio. La gara avrà ad oggetto l'appalto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti l'esecuzione delle seguenti prestazioni:*

- ✓ *Progettazione Preliminare;*
- ✓ *Progettazione Definitiva;*
- ✓ *Progettazione Esecutiva;*
- ✓ *coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;*
- ✓ *attività tecnico–amministrative connesse alle progettazioni (esecuzione di indagini e rilievi);*
- ✓ *redazione del piano particellare di esproprio;*
- ✓ *esecuzione della direzione ed assistenza dei lavori.*

g) *07.08.2012 io Commissario Straordinario, con nota prot. 240/CS, in riferimento alla nota prot. 6584 dell'11.07.2012, acquisita con ns prot. 227/CS del 23.07.2012, preso atto della tempistica definita dal RUP Quinto D'Andrea, rilevo:*
- ✓ *una eccessiva dilatazione temporale così come descritta;*
- ✓ *una inesatta interpretazione del cronoprogramma allegato alla Convenzione di Avvalimento siglata il 27.01.2012;*
- ✓ *la mancata trasmissione del Cronoprogramma dettagliato entro i dieci giorni dalla sottoscrizione della Convenzione.*

Tanto esposto convoco, al fine di riordinare il lavoro e ridefinire congiuntamente le fasi operative, una riunione per il giorno 06.09.2012, alle ore 15:00 presso il MATTM, via Cristoforo Colombo, 44 a Roma;

h) *08.09.2012 il Comune di Carsoli, con nota prot. 7487, acquisita con ns prot. 242/CS del 21.08.2012, in riferimento alla nota prot. 240/CS del 07.08.2012, rappresenta quanto segue:*
- ✓ *conferma la partecipazione alla riunione prevista per il giorno 06.09.2012 presso il MATTM alle ore 15:00;*
- ✓ *comunica che l'eccessiva dilatazione temporale occorsa nelle fasi iniziali del procedimento sarà recuperata nelle fasi successive;*
- ✓ *specifica che, nonostante l'inadempienza nella trasmissione del cronoprogramma - lavori (obbligatorio nei successivi 10 gg dalla stipula della convenzione) tutte le fasi e le tempistiche sono state attentamente valutate e stimate nella redazione del Documento Preliminare alla Progettazione;*

i) *06.09.2012 ha avuto luogo presso il MATTM, Ufficio del Commissario una riunione tra me Commissario, rappresentanti del mio Ufficio Commissariale e il RUP, ing. Quinto D'Andrea. In tale sede:*

- ✓ *è stato evidenziato un notevole ritardo rispetto alla tempistica stimata nel cronoprogramma;*
- ✓ *sono state fornite le indicazioni per un ridimensionamento dello stralcio progettuale, necessario sia da un punto di vista planimetrico che economico;*
- ✓ *sono state date indicazioni di massima per ottimizzare le fasi successive ed avviare il più rapidamente possibile la cantierizzazione;*

j) *13.09.2012 a seguito della riunione svoltasi il giorno 06.09.2012 presso il MATTM, tra me Commissario, il personale dell'Ufficio Commissariale e il RUP, ing. Quinto D'Andrea, in cui si è preso atto delle rilevanti difficoltà dell'Ente nel proseguire nell'attuazione di quanto sottoscritto nella Convenzione di Avvalimento siglata in data 27.01.2012, con nota prot. 273/CS si richiede al Comune di Carsoli:*

- ✓ *un rapporto sui fattori che hanno determinato il ritardo nell'attuazione dell'intervento;*
- ✓ *il prosieguo delle fasi di affidamento lavori in tempi rapidi pena la risoluzione dalla Convenzione succitata;*

k) *27.09.2012 io Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla richiesta pervenuta da parte di uno degli "enti attuatori" di approvazione relativa al bando di gara ad evidenza pubblica, secondo quanto indicato dall'art. 8 della Convenzione di avvalimento, espongo quanto segue:*

- ✓ *l'art. 8 sopraccitato è una norma procedurale, pertanto l'intesa richiamata è da intendersi quale comunicazione interna tra il Commissario ed il RdP ma che non assume valore di efficacia e/o validità dell'atto assunto dal RdP;*
- ✓ *non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RdP della Stazione Appaltante;*
- ✓ *tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";*

l) *03.10.2012 il Comune di Carsoli, con nota prot. 9121 acquisita con prot. 308/CS del 12.10.2012, (rif. nota prot. 273/CS del 13.09.2012) rileva che nel corso della verifica dello "Studio di Fattibilità per la messa in sicurezza idraulica del Centro abitato di Carsoli (AQ) – Nodo Idraulico" redatto da Beta Studio e acquisito agli atti dal Commissario in data 30.08.2011 (comprendente una Cassa di espansione sul Torrente Vallemura, sistemazioni idrauliche e ambientali e una cassa di espansione integrativa) sono emerse alcune criticità la cui risoluzione ha determinato una notevole dilatazione temporale in quanto l'Ente ha ritenuto necessario rivisitare:*

- ✓ *lo Studio suddetto sulla base delle condizioni in loco, in modo da ridurre il notevole impatto dell'intervento sulle attività antropiche presenti nell'area ove è stata localizzata la vasca di espansione in oggetto;*
- ✓ *il quadro economico dello stesso essendo emerse discordanze importanti in relazione alle previsioni di spesa e le risorse assegnate al Commissario.*

La soluzione individuata dal Comune è illustrata nella documentazione, trasmessa comprendente:

- ✓ *Documento Preliminare all'avvio della progettazione "Comune di Carsoli (AQ) – Bacino Nazionale del Fiume Tevere: Realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali" importo di progetto: 5.000.000 di euro;*

- ✓ *Quadro Economico Preliminare - definizione delle categorie di progettazione – ammontare spese tecniche;*
- ✓ *Disciplinare di Gara;*
- ✓ *Avviso di procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), CSE, DL, misura e contabilità lavori, esecuzione rilievi e indagini), importo superiore a 100.000,00 euro;*

L'Ente, preso atto dei limiti finanziari previsti per la realizzazione del progetto pari a 5.000.000 di euro (comprensivi delle spese per lavori e per somme a disposizione dell'amministrazione) informa che:

- ✓ *la soluzione ottimale da sviluppare a livello definitivo ed esecutivo dovrà essere compatibile con il finanziamento disponibile, pur se esso risulta notevolmente ridotto rispetto a quanto preventivato con lo Studio di Fattibilità;*
- ✓ *a livello di progettazione preliminare potranno invece essere contemplate anche soluzioni che prevedano importi superiori al finanziamento disponibile purché la loro realizzazione possa essere suddivisa in stralci funzionali il primo dei quali rientri nell'importo finanziato.*

Il Disciplinare di gara ha ad oggetto l'appalto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- ✓ *Progettazione preliminare e definitiva sull'importo totale dei lavori di € 8.076.000;*
- ✓ *Progettazione di uno stralcio esecutivo funzionale, lavori pari ad € 2.500.000;*
- ✓ *CSE;*
- ✓ *Attività tecnico – amministrative connesse alle progettazioni (esecuzione di indagini e rilievi);*
- ✓ *Redazione del piano particellare di esproprio;*
- ✓ *Esecuzione della direzione e assistenza dei lavori, misura e contabilità;*

m) *16.10.2012 lo Commissario Straordinario, con nota prot. 310/CS (in rif. nota prot. 290/CS del 27.09.2012, nonché in risposta alla nota prot. 9121 del 03.10.2012), ribadisco:*
- ✓ *la Convenzione di Avvalimento costituisce l'unico strumento di riferimento che regola il rapporto con ogni singolo Ente Avvalso;*
- ✓ *ogni documento che pertiene l'azione del RUP – secondo quanto prescritto nel citato Avvalimento - è di esclusiva competenza di questi;*
- ✓ *il rispetto dell'impegno di spesa come sottoscritto in sede di Convenzione;*
- ✓ *il sollecito a procedere tempestivamente verso la cantierizzazione dell'intervento;*

n) *08.11.2012 - Verbale di Sopralluogo (n. 2) - il RUP conferma quanto dichiarato nel precedente verbale del 24.10.2012, nulla aggiungendo per via delle attese legali a seguito di bando;*

o) *Al 15.11.2012:*
- ✓ *il giorno 22.10.2012 è stato pubblicato sul sito comunale l'avviso Affidamento dell'incarico di progettazione e servizi connessi dei lavori denominati " Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dell'abitato di Carsoli".*
- ✓ *L'importo complessivo del corrispettivo a base di gara, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali è di € 500.000,00, il criterio di aggiudicazione avverrà mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Il corrispettivo è comprensivo dell'onorario per le prestazioni relative alle progettazioni (preliminare, definitiva ed esecutiva), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori;*
- ✓ *il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del 07.12.2012;*

- ✓ *i tempi entro cui dovranno essere espletati i servizi richiesti sono così suddivisi:*
  - *progettazione preliminare, esecuzione dei rilievi topografici preliminari ed esecuzione delle indagini geognostiche preliminari: entro 2 mesi dalla data di stipula del contratto;*
  - *progettazione definitiva, esecuzione dei rilievi topografici ed esecuzione delle indagini geognostiche: entro 2 mesi dalla data di approvazione del progetto preliminare;*
  - *progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: entro 2 mesi dalla data di approvazione del progetto definitivo;*

p) *28.11.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 3) - il RUP riferisce che:*
- ✓ *In merito al bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione, sicurezza e direzione lavori sono in corso le operazioni di presa visione da parte dei soggetti interessati all'affidamento;*
- ✓ *Al momento l'Ufficio sta provvedendo a richiedere indicazioni di dettaglio riguardo alla procedura da adottare per le liquidazioni e i pagamenti ai sensi della Convenzione di Avvalimento e, inoltre, nei confronti della Regione Abruzzo richiesta di nomina di un referente tecnico che possa affiancare l'Ufficio in relazione alla funzioni di competenza regionale stabilite dalla medesima Convenzione;*
- ✓ *In relazione all'esigenza di accelerare il più possibile le tempistiche delle varie azioni procedimentali connesse all'esecuzione dell'intervento quali le espropriazioni e le Conferenze di Servizi, questo Ufficio intende avvalersi dei poteri straordinari del Commissario.*

q) *29.11.2012 - il Comune, con nota prot. 11112, richiede alla Regione Abruzzo (e, p.c. al Commissario Straordinario) se ritiene opportuno provvedere al conferimento di uno specifico incarico per affiancamento all'Ufficio di RUP;*

r) *06.12.2012 - il Commissario Straordinario, con nota prot.355/CS, rilevati importanti scollamenti temporali tra i tempi d'attuazione degli interventi avviati e quanto dichiarato nei singoli cronoprogrammi redatti in sede di Convenzione, invita l'Ente Avvalso ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali dei cronoprogrammi, andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi.*

s) *12.12.2012 - Verbale di Sopralluogo (n. 4) - il RUP riferisce che:*
- ✓ *Alla scadenza del 07.12.2012 del bando relativo alla progettazione e altri servizi tecnici risultano pervenute n. 22 richieste di partecipazione;*
- ✓ *Considerata la mole di lavoro necessaria per la valutazione delle suddette offerte, ritiene necessario individuare una Commissione esaminatrice che possa garantire non solo la necessaria competenza tecnico- amministrativa ma anche una notevole disponibilità per fare in modo che i lavori vengano conclusi correttamente nel minor tempo possibile; la suddetta Commissione sarà nominata entro la settimana corrente e avrà l'obiettivo di concludere i propri lavori entro il 20.01.2013;*
- ✓ *Il maggior tempo richiesto è determinato dalla quantità delle offerte pervenute, certamente superiore a quello che si poteva prevedere per la tipologia di gara indetta, che richiede requisiti di qualificazione particolarmente restrittivi;*
- ✓ *Appena nominata la Commissione esaminatrice verrà inviata specifica nota al Commissario straordinario sullo stato di attuazione della procedura nonché l'aggiornamento del cronoprogramma, come richiesto con nota in data 06.12.2012 con prot. n. 355/CS, acquisita con prot. n. 11451 del 10.12.2012.*

t) 13.12.2012 - il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 espone che, qualora fossero interessati all'utilizzo di:

- *procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante Conferenza dei Servizi (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio commissariale;*
- *Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere allo scrivente Ufficio l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU;*

Si coglie inoltre l'occasione per ribadire la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara;

u) 29.11.2012 - il Comune di Carsoli, con nota prot. 11112, acquisita con prot. 361/CS del 12.12.2012 richiede:

- ✓ *indicazioni formali circa le modalità da seguire per quanto attiene le fasi di liquidazione e pagamento delle spese riferibili all'intervento in argomento;*
- ✓ *schemi e modelli di ausilio in formato digitale;*

v) 14.12.2012 - il Commissario Straordinario, con nota prot. 368/CS, in risposta alla nota prot. 11112 del 29.11.2012 del Comune di Carsoli, comunica a questi e, per conoscenza a tutti gli Enti Avvalsi, che per le liquidazioni dovranno far pervenire, nei limiti del Quadro Economico approvato, i Certificati di Pagamento ogni qual volta necessario;

w) 18.12.2012 - il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS, (in riferimento alla nota prot. 363/CS del 13.12.2012), ribadisce che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per l'amministrazione. Ogni spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente medesimo.

x) 09.01.2013 - Verbale di Sopralluogo (n. 5) - il RUP riferisce che:

- ✓ *la Commissione esaminatrice non è stata nominata, come dichiarato nel precedente verbale del 12.12.2012, in quanto non sono pervenute le autorizzazioni definitive della Provincia dell'Aquila riguardo alla partecipazione dell'architetto Gilberto Di Giorgio, quale membro di Commissione;*
- ✓ *ad oggi è stato comunicato che il suddetto funzionario non potrà essere autorizzato per motivi di mancanza di personale, pertanto si provvederà immediatamente a sostituire tale designazione e a procedere con la nomina della Commissione;*
- ✓ *si ritiene comunque che la Commissione potrà concludere i propri lavori entro il corrente mese di gennaio;*
- ✓ *si conferma l'impegno a trasmettere al Commissario straordinario la nota di aggiornamento delle attività e del cronoprogramma relativo, come richiesto con nota del 06.12.2012 prot. n. 355/CS non appena sarà nominata la Commissione.*

*Intervento denominato "**Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno**" nel Comune de L'Aquila.*

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo di 3,8 Ml di Euro

Principali attività svolte nell'anno 2012:

Opera gestita direttamente dall'Ufficio del Commissario.
Di tale opera esiste ed è completo l'intero iter progettuale, di cui è già stata coperta la spesa precedentemente alla mia nomina e con risorse di altro Ente. Tali progettazioni sono state da me Commissario acquisite agli atti, esaminate e, soprattutto in riferimento agli elaborati del Progetto Esecutivo, è stata chiesta (e concessa) disponibilità non onerosa alla Beta Studio (firmataria della progettazione), per la verifica dell'attualità dei contenuti (risalenti all'anno 2006) e per l'eventuale aggiornamento.

a) *07.05.2012 con Determina Commissariale n. 1, l'ing. Giuseppe Russo è nominato RUP - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 (notificata con Prot. 176/CS del 09.05.2012);*

b) *06.06.2012 il R.U.P., con nota 195/CS, chiede alla Società Beta Studio la revisione/aggiornamento del progetto esecutivo presentato precedentemente al Commissario Delegato - arch. Adriano Goio, per le attività di competenza trasmesse al Commissario Straordinario - ing. Emilio Santori. Al fine di intraprendere gli atti di propria competenza ai sensi del D. lgs n. 163/2006 e del relativo Regolamento attuativo, DPR n. 207/2010, chiede la disponibilità della Società per un incontro presso l'Ufficio commissariale. Si ricorda che esiste ed è completo l'intero iter progettuale, di cui è già stata coperta la spesa in precedenza alla mia nomina commissariale e con risorse di altro Ente. Tali progettazioni sono state acquisite agli atti, esaminate e, soprattutto con riferimento agli elaborati del Progetto Esecutivo, era già stata chiesta (e concessa) disponibilità non onerosa alla Beta Studio (firmataria della progettazione), per la verifica dell'attualità dei contenuti (risalenti all'anno 2006) e per l'eventuale aggiornamento.*

c) *11.06.2012 incontro, presso l'Ufficio commissariale, tra il Commissario Straordinario, risorse umane dell'Ufficio, un rappresentante di Beta Studio e il RUP. In tale circostanza sono stati:*

- ✓ *presi accordi sulla consegna degli atti progettuali riesaminati;*
- ✓ *discussi tempi e modalità per procedere nella tempestiva cantierizzazione dell'intervento.*

d) *09.08.2012 emanazione del Decreto Commissariale n. 4 di approvazione del progetto esecutivo;*

e) *22.08.2012 la Regione Abruzzo, Direzione LL. PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del suolo e della Costa, Protezione Civile, con nota prot. 189993/RA, acquisita con ns prot. 260/CS del 31.08.2012 (in riferimento alla nota prot. 238/CD del 07.08.2012) raccomanda:*

- ✓ *ogni solerzia nella rapida esecuzione delle opere, nel rispetto costante della normativa;*

- ✓ *che sulle attività in essere i soggetti avvalsi conservino sempre il necessario coordinamento e l'interlocuzione tecnica con gli Uffici Regionali competenti, non modificando le previsioni di finanziamento.*

f) *24.08.2012 Pubblicazione "Bando di gara per l'esecuzione dei lavori per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del torrente Raio e del fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno" e dei seguenti allegati sul sito del MATTM (art. 66 del D. Lgs 163/06 obblighi di pubblicità della "stazione appaltante"):*
- ✓ *Capitolato speciale completo di allegati;*
- ✓ *Relazione generale;*
- ✓ *Relazioni specialistiche: 2.1.1 Relazione topografica - 2.1.2 Planimetria - 2.1.3.1Sezioni Parte I - 2.1.3.2 Sezioni Parte II 2.1.4 Opere - 2.1.5.1 Profilo Raio - 2.1.5.2 Profilo Aterno - 2.2 Geologia Idrogeologica - 2.3 Geotecnica sismica - 2.4 Carattere ambientale - 2.5 Idrologia idraulica - 2.6 Interferenze;*
- ✓ *Elaborati grafici: 3.1 Corografia - 3.2 Planimetria Ortofoto - 3.3 Planimetria strumento urbanistico - 3.4 Planimetria generale - 3.5 Planimetrie dettaglio - 3.6 Sezioni sterri-riporti - 3.7 Profili longitudinali - 3.8 Particolari - 3.9 Riqualificazione Ambientale - 3.10 Ponte RA1030 - 3.11 Illuminazione;*
- ✓ *Calcoli strutture e impianti;*
- ✓ *Piano Manutenzione;*
- ✓ *Sicurezza;*
- ✓ *Espropri;*
- ✓ *Documentazione economica;*

Contestuale pubblicazione per estratto sui quotidiani "Il Messaggero", "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera" e "Il Centro" (art. 66 del D. Lgs 163/06 obblighi di pubblicità della "stazione appaltante");

g) *31.08.2012 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Contratti Pubblici – sez. Avvisi e Bandi di Gara del "Bando di gara per l'esecuzione dei lavori per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del torrente Raio e del fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno", da eseguirsi mediante:*
- ✓ *contratto: esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lett. a), art. 3, comma 37, art.55, comma 5, art.83 del decreto legislativo n. 163 del 2006);*
- ✓ *tipologia gara: procedura aperta;*
- ✓ *criterio dell'offerta: economicamente più vantaggiosa;*
- ✓ *luogo di gara: la gara verrà esperita in seduta pubblica il giorno 18 ottobre 2012 alle ore 11,00 Presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stanza 604;*
- ✓ *offerte da far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 (ore dodici) del giorno 12 ottobre 2012;*

h) *10.09.2012 il Parco Regionale Sirente Velino, con nota prot. 2259 del 30.08.2012, acquisita con prot. 269/CS, dichiara:*
- ✓ *di aver appreso, solo recentemente e a mezzo stampa, della gara d'appalto dei lavori previsti sul Fiume Aterno;*
- ✓ *che il tratto del Fiume Aterno, dell'abitato di Siffe, per 25 km è interamente ricompreso nel Parco;*
- ✓ *di non aver rilasciato il preventivo parere di compatibilità ambientale in merito all'intervento;*

i) 10.09.2012 Riunione presso l'Ufficio Commissariale per la verifica degli elaborati progettuali in merito alle richieste pervenute dal Parco Regionale. Dalla comparazione tra l'area di intervento e quella del Parco è emerso che lo stralcio progettuale di competenza Commissariale non insiste sul territorio protetto;

j) 14.09.2012 io Commissario Straordinario, necessitando dell'istituzione di un Ufficio di direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ho mosso le seguenti azioni:

- ✓ *ho richiesta la disponibilità di personale tecnico in organico pubblico (presso la Regione Abruzzo) disponibile a svolgere tali funzioni di istituto e accertatane la carenza ai sensi dell'art. 90, c. 6 del D. Lgs. 163/2006;*
- ✓ *considerato che la Beta Studio Srl ha redatto il progetto esecutivo, con nota prot. 280/CS, richiedo alla Società sopraccitata la disponibilità a svolgere tale incarico*

h) *27.09.2012 la Beta Studio srl, a mezzo mail, acquisita con ns prot. 294/CS del 28.09.2012, conferma la disponibilità della Società a supportare la struttura Commissariale nella fase di presa visione degli elaborati progettuali da parte delle Ditte e di sopralluogo nelle zone dell'intervento. Contestualmente propone date utili;*

i) *27.09.2012 la Beta Studio Srl, a mezzo mail, acquisita con ns prot. 295/CS del 28.09.2012, in risposta alla nota prot. 280/CS del 14.09.2012, accetta la proposta di affidamento dell'incarico di direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Contestualmente propone:*

- ✓ *la valutazione economica delle attività da svolgere che ammonta complessivamente ad € 116.483,36 (IVA e CI esclusi);*
- ✓ *il nominativo del professionista responsabile dell'attività, nella persona del Direttore Tecnico;*

j) *01.10.2012 io Commissario Straordinario, con nota prot. 296/CS dell'01.10.2012, in riferimento all'offerta economica per l'incarico di direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione trasmessa da Beta Studio srl, pur riconoscendola rispettosa delle ragioni tecnico – professionali, richiedo:*

- ✓ *la rimodulazione degli importi in accordo con le recenti disposizioni governative in materia di parcelle (Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, G.U. 22.08.2012);*
- ✓ *uno sconto pari al 25% rispetto alle tariffe del citato Decreto in quanto la Società è già stata incaricata della redazione dei progetti;*
- ✓ *che venga effettuato il medesimo ribasso già operato, a suo tempo, per l'aggiudicazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere;*

k) ***03.10.2012*** *la Beta Studio srl, con nota prot. 650/12, acquisita con prot. 302/CS del 03.10.2012 (anticipata via fax), in risposta alla nota prot. 296/CS dell'01.10.2012, trasmette l'offerta economica rivisitata secondo quanto previsto dal Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140. La nuova valutazione economica ammonta ad € 117.023,11 (IVA esclusa) avendo la Società applicato le riduzioni del:*

- ✓ *25% perché già esecutrice delle progettazioni (preliminare, definitiva, esecutiva);*
- ✓ *12% in quanto tale ribasso era stato offerto in sede di aggiudicazione della gara per l'esecuzione della progettazione delle opere;*

l) *04.10.2012 si effettua il sopralluogo sul sito di accoglimento dell'intervento, a cui prendono parte: un rappresentante della Beta Studio Srl (in qualità di progettista), un rappresentante dell'Ufficio Commissariale (su delega del RUP) e le Ditte richiedenti;*

m) *09.10.2012 è stato rimodulato il "compenso professionale per direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere" presentato dalla Beta Studio Srl, con nota prot. 650/12, acquisita con prot. 302/CS del 03.10.2012. Il compenso viene aggiornato in accordo con le recenti disposizioni governative in materia di parcelle (Decreto Ministro Giustizia 20.07.2012 n° 140), ma soprattutto, in modo che l'importo finale sia inferiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia;*

Viene richiesto e acquisito un parere legale in merito alle modalità di affidamento della direzione lavori, nel rispetto di quanto stabilito dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE come recepite nel Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e relativo regolamento d'attuazione d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". Ne deriva:

- ✓ *nella gara espletata dal Commissario incaricato al Bacino Aterno/Pescara (cui era affidato l'intervento) per l'affidamento del servizio di architettura ed ingegneria, successivamente aggiudicata dalla Beta Studio, era oggetto dell'appalto, insieme alle progettazioni (preliminare, definitiva, esecutiva), la direzione lavori (la Commissione europea ritiene incompatibile con il diritto comunitario una norma che preveda in via preferenziale l'affidamento al progettista anche dell'incarico di DL. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, pari a 100.000,00 €, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione, art. 91, c. 6 del D. Lgs 163/2006);*
- ✓ *io Commissario Straordinario, avendo acquisito le progettazioni trasmesse dal precedente Commissario competente riguardo l'opera da eseguirsi, adotto la sopraccitata condizione;*
- ✓ *il RUP, una volta attestate e certificate le condizioni che consentono il ricorso all'affidamento esterno dell'incarico di DL: carenza in organico di personale tecnico, difficoltà di rispettare i tempi della programmazione (art. 90, c. 6 D. Lgs. 163/2006), può procedere all'affidamento esterno di questo, nell'ordine, ai seguenti soggetti (art. 130 D. Lgs. 163/2006):*
  - *altre amministrazioni pubbliche;*
  - *progettista incaricato;*
  - *altri soggetti con le medesime procedure previste per l'affidamento degli incarichi di progettazione;*
- ✓ *non essendo disponibili altre amministrazioni pubbliche a svolgere l'incarico, in forza dell'art. 130, c. 2, lett. a), la Beta Studio può essere incaricata direttamente della Direzione Lavori;*

Tanto esposto, ne sono derivate le seguenti necessità:

- *la rimodulazione della parcella professionale della Beta Studio, in modo che l'importo finale sia inferiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia;*
- *l'aggiornamento del quadro economico, considerando i ribassi effettuati sulla parcella professionale;*

a seguire, si è notificata la possibilità dell'affidamento diretto dell'incarico di "direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere", nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Contestualmente vengono fornite indicazioni per l'aggiornamento del relativo compenso professionale;

n) *16.10.2012 il RUP, con nota prot. 312/CS, comunica all'Impresa G. & M. Lavori che la prima seduta pubblica per l'espletamento della gara d'appalto avente ad oggetto "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno", prevista per il giorno 18 ottobre p.v., è rinviata al giorno 07.11.2012 presso la Sala Stampa del MATTM.*

o) *24.12.2012 aggiudicazione provvisoria in favore della CODIMAR srl di Capistrello (AQ) - pubblicazione sito MATTM.*

*Intervento denominato "**per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo"** nel Comune di PESCARA.*

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo € 3.600.000,00

Principali attività svolte nell'anno 2012:

Convenzione di Avvalimento siglata in data 18/11/2011, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e Comune di Pescara.

Nel corso del primo trimestre del 2012, si sono avuti i seguenti risultati

a) sono state eseguite alcune riunioni (presso il MATTM, Ufficio del Commissario, nonché presso la sede del Comune di Pescara) per monitorare l'avanzamento dei lavori. L'azione di monitoraggio e controllo, infatti, come emerge dal Cronoprogramma specifico, rimane a carico di me Commissario. In particolare si fa riferimento all'incontro del 17.02.2012, cui ha fatto seguito un Verbale, teso a trattare l'aggiornamento in merito agli impegni di spesa pregressi della stazione appaltante e l'eventuale assegnazione di progettazioni all'esterno nell'ambito della Convenzione (cui ha dato seguito quanto esplicitato al Punto 3);

b) è stato nominato il RUP interno al Comune;

c) a seguito di istanza giunta da parte del RUP, indicante l'assenza temporanea di personale interno utile all'elaborazione del progetto definitivo (anche dopo istanza di supporto, inviata dal RUP alla Regione Abruzzo), ai fini dell'accelerazione dei lavori e del rispetto delle previsioni temporali programmatiche, nonché di valutazioni costi/benefici effettuate, io Commissario ho dovuto dare il nulla osta all'affidamento all'esterno della Progettazione Definitiva;

d) acquisizione degli atti di Progettazione Definitiva;

e) si è avviata la preparazione della Conferenza di Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo. La data programmata per detta Conferenza di Servizi è stata dal RUP fissata per il giorno 11 Aprile 2012 presso la Sede distaccata della Regione Abruzzo a Roma. Il Comune provvede all'inoltro degli atti progettuali agli Enti interessati.

A seguire, si sono verificati i seguenti avvenimenti:

f) sono state eseguite alcune altre riunioni (presso il MATTM, Ufficio del Commissario, nonché presso la sede del Comune di Pescara) per monitorare l'avanzamento dei lavori. L'azione di monitoraggio e controllo, infatti, come emerge dal Cronoprogramma specifico, rimane a carico di me Commissario.

g) 15.06.2012 il Comune ha ottenuto i pareri necessari alla chiusura della Conferenza di Servizi. Tali pareri, tutti positivi, hanno riguardato:

- *Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;*
- *Soprintendenza per i Beni Archeologici;*
- *Autorità di Bacino;*
- *Genio Civile di Pescara;*

h) 25.06.2012 esecuzione della Conferenza di Servizi di chiusura lavori presso l'Ufficio Commissariale. E' approvato il Progetto Definitivo previa rimodulazione del quadro economico (voci: imprevisti - lavori in economia);

i) 04.07.2012 si apprende (telefonicamente) dall'assistente al RUP, che ad oggi non è pervenuto il parere VIA della Direzione Regionale, necessario per la chiusura della Conferenza dei Servizi e l'approvazione del progetto definitivo, svoltasi il giorno 25.06.2012 presso il MATTM (si attiveranno per ottenerlo comunque nei tempi brevi);

j) 11.07.2012 con nota Prot. 157657/RA acquisita con ns prot. 214/CS il giorno 11.07.2012, il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara, nella consapevolezza che la situazione riguardante l'area antropizzata nella vallata del Fiume Pescara impone iniziative e provvedimenti immediati e straordinari per le possibili implicazioni sulla pubblica incolumità, ribadisce la massima urgenza d'azione;

k) 07.08.2012 io Commissario Straordinario, con nota prot. 239/CS (in risposta alle note prot. 104809 e prot. 104423 del 27.07.2012), autorizzo il RUP, arch. Trisi:

- ✓ *ad impegnare la somma di € 97.942,33 oltre oneri ed IVA per l'affidamento a tecnici esterni, mediante procedura negoziata, degli incarichi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione al fine di istituire l'Ufficio direzione lavori, prima delle procedure di gara;*
- ✓ *alla liquidazione della somma di € 25.553,02 (24.336,00 €+ 1.217,021 €) che trova copertura finanziaria all'interno del Quadro economico di progetto a favore dell'ing. Andreella e della Eliografia Gaspari;*

l) *27.09.2012 io Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla Convenzione e alla richiesta pervenuta da parte di uno degli "enti attuatori" di approvazione relativa al bando di gara ad evidenza pubblica, secondo quanto indicato dall'art. 8 della Convenzione di avvalimento, espongo quanto segue:*

- ✓ *l'art. 8 sopraccitato è una norma procedurale, pertanto l'intesa richiamata è da intendersi quale comunicazione interna tra il Commissario ed il RdP ma che non assume valore di efficacia e/o validità dell'atto assunto dal RdP;*
- ✓ *non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RdP della Stazione Appaltante;*

- ✓ *tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";*

l) *15.10.2012 si apprende, telefonicamente, dal supporto al RUP, ing. Rossi che:*
- ✓ *l'Ufficio di direzione lavori è stato aggiudicato in via provvisoria e che a breve ci sarà l'approvazione definitiva;*
- ✓ *il progetto definitivo sarà trasmesso martedì/giovedì alla Giunta per l'approvazione definitiva;*
- ✓ *entro la fine di ottobre p.v. sarà indetta la gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base della progettazione definitiva della Stazione Appaltante (ex appalto integrato, art. 53, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006). Inoltre, il RUP si impegna a trasmettere urgentemente (fax):*

m) *la delibera di approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta Comunale (entro 31.10.2012); il verbale della II Conferenza dei Servizi di approvazione del progetto definitivo.*

n) *07.11.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 2): il RUP riferisce che:*
- ✓ *il Progetto Definitivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 691 del 25.10.2012;*
- ✓ *la determina a contrarre è stata fatta in data 02.11.2012, n.366, ed è stata resa esecutiva in data 06.11.2012;*
- ✓ *si conferma che il Settore Gare pubblicherà il bando di gara entro il 15.12.2012;*
- ✓ *per quanto concerne la gara relativa all'affidamento dell'Ufficio DL, come previsto, in data 25.10.2012 è stata fatta l'aggiudicazione provvisoria; è in corso la verifica dei requisiti al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva il 15 novembre p.v.;*
- ✓ *si impegna a trasmettere una nota di aggiornamento delle azioni poste in essere con tutta la documentazione correlata;*

o) *15.11.2012 aggiornamento:*
- ✓ *il 15 dicembre sarà pubblicato il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base della progettazione definitiva della Stazione Appaltante, ex appalto integrato, art. 53, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006);*
- ✓ *il RUP, come indicato il 07.11.2012, trasmetterà a breve una nota sullo stato dell'arte dei lavori;*
- ✓ *l'aggiudicazione dell'Ufficio direzione lavori diventa definitiva;*

p) *27.11.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 3): il RUP riferisce che:*
- ✓ *Il bando di gara sarà pubblicato entro la prossima settimana;*
- ✓ *Per quanto concerne la gara relativa all'affidamento dell'Ufficio DL è stata fatta l'aggiudicazione definitiva in data 16.11.2012;*
- ✓ *Per quanto concerne la durata dei lavori il cronoprogramma del progetto definitivo (elaborato n. 7.5) prevede 224 giorni naturali e consecutivi;*
- ✓ *Con la premessa che si tratta di una procedura negoziata e che il termine della pubblicazione è previsto per il 15-20 gennaio 2013, per lo svolgimento della gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa si stima un tempo di 3 settimane, in assenza di offerta anomala i primi di marzo potrebbero iniziare i lavori. In caso di offerta anomala si registrerà uno slittamento dei tempi di circa 40 giorni (metà aprile 2013);*

- ✓ *Il 10 dicembre p.v. sarà trasmesso l'aggiornamento e la relativa documentazione delle azioni poste in essere.*

q) *06.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot.354/CS, in riferimento alla nota prot. 145369 del 30.10.2012, acquisita con prot. 318/CS del 30.10.2012, richiede all'Ente un'esplicazione dettagliata delle motivazioni che lo inducono a dotarsi di nuovo personale. In riferimento alla richiesta di autorizzazione fatta dall'Ente ad impegnare la somma di € 29.600,00 per dotare il RUP di un supporto tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, per lo svolgimento dei compiti e attività di propria competenza, secondo quanto previsto dell'art. 10, c. 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*

r) *06.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot.355/CS, rilevati importanti scollamenti temporali tra i tempi d'attuazione degli interventi avviati e quanto dichiarato nei singoli cronoprogrammi redatti in sede di Convenzione, invita l'Ente ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali dei cronoprogrammi, andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi;*

s) *07.12.2012 pubblicazione sul sito informatico del Comune (www.comune.pescara.it) del bando di gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi agli interventi messa in sicurezza de argini golenali fiume Pescara in prossimità del costruendo ponte nuovo:*

- *data inizio: 07.12.2012;*
- *data fine: 16.01.2012;*
- *tipo di procedura: aperta;*
- *criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;*
- *quantitativo totale dell'appalto: €1.800.278,68 di cui:*
  - *€ 1.724.734,99 per lavori a corpo;*
  - *€ 34.494,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta*
  - *€ 41.039,81 per spese di progettazione esecutiva soggette a ribasso d'asta;*
- *termini di esecuzione:*
  - *progettazione esecutiva: 60gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio;*
  - *lavori: 224 gg naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.*

t) *11.12.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 4): il RUP riferisce che:*

- ✓ *Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. n. 143 del 07.12.2012; le offerte dovranno pervenire entro il 16.01.2013 alle ore 13.00 e la prima seduta della gara si terrà in forma pubblica alle ore 10.00 del 21.01.2013;*
- ✓ *Si impegna a trasmettere entro il 10.01.2013 l'aggiornamento del cronoprogramma, come da richiesta pervenuta in data 10.12.2012 al prot. n. 6124, congiuntamente alla relazione di aggiornamento delle azioni poste in essere.*

u) *13.12.2012 la Città di Pescara, con nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012 (rif. alla ns. prot. 354/CS del 06.12.2012) chiarisce le prestazioni amministrative/informatiche di attività di supporto al RUP che, ai sensi dell'art. 10, c. 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 intendono affidare a personale esterno:*

- ✓ *le comunicazioni all'AVCP;*

- ✓ *gli adempimenti previsti dalla normativa in merito alla pubblicità pre, post e durante l'espletamento della gara di aggiudicazione;*
- ✓ *la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 e ss. mm. e ii. Del D. Lgs. 163/2006;*
- ✓ *la verifica della sussistenza di tutti i requisiti per le fasi per le fasi successive all'aggiudicazione definitiva del soggetto aggiudicatario e dei subappaltatori in occasione di ogni SAL;*
- ✓ *controllo di tutti gli atti contabili redatti dall'Ufficio DL e delle relative liquidazioni;*

L'Ente richiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 29.600,00 per procedere a tale affidamento, ovviamente finanziabile con le somme in amministrazione del progetto e senza ulteriori spese dal quadro economico di progetto;

v) *13.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 espone che, qualora fossero interessati all'utilizzo di:*

1. *procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante Conferenza dei Servizi (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio commissariale;*
2. *Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere allo scrivente Ufficio l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU;*

Si coglie inoltre l'occasione per ribadire la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara;

w) *18.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS, in riferimento alla nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012, ribadisce che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per l'amministrazione. Ogni spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente medesimo;*

*Intervento denominato "**Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano" nei Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi (TE)**.*

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo € 3.600.000,00

Principali attività svolte nell'anno 2012:

Convenzione di Avvalimento siglata in data 16/12/2011, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e Provincia di Teramo.

Il primo trimestre del 2012 ha registrato le seguenti attività:

a) *sono state eseguite alcune riunioni (presso il MATTM, Ufficio del Commissario) per monitorare l'avanzamento dei lavori. L'azione di monitoraggio e controllo, infatti, come*

emerge dal Cronoprogramma specifico, rimane a carico di me Commissario. In particolare si fa riferimento all'incontro avuto presso l'Ufficio del Commissario in data 8 marzo 2012, da cui è scaturito Verbale sottoscritto dalle parti, nel corso del quale sono stati trattati i seguenti argomenti: stato di attuazione degli impegni assunti con Convenzione, stato d'avanzamento della progettazione, Conferenza di Servizi, occupazioni d'urgenza ed espropriazioni;

b) *l'ente sta provvedendo, con proprie risorse, all'elaborazione degli atti progettuali preliminari, dei quali esiste da tempo un primo sommario approccio ancora incompleto. Questi – come da sopraccitato Verbale – saranno trasmessi al Commissario per le verifiche del caso.*

c) *L'Ente, inoltre, sta provvedendo ad un preliminare confronto con i Comuni interessati, al fine di raccogliere consensi anche in previsione della futura Conferenza di Servizi.*

A seguire, si sono succeduti i seguenti eventi:

d) *sono state eseguite alcune altre riunioni (presso il MATTM, Ufficio del Commissario, nonché presso la sede del Comune di Pescara) per monitorare l'avanzamento dei lavori. L'azione di monitoraggio e controllo, infatti, come emerge dal Cronoprogramma specifico, rimane a carico di me Commissario.*

e) *05.07.2012 l'Ufficio Commissariale apprende telefonicamente che la convocazione per il giorno 29.06.2012 della Giunta Provinciale per l'approvazione del progetto preliminare è stata revocata. Attesa prossima convocazione.*

f) *16.07.2012 la Provincia di Teramo, con Nota Prot. 183596 acquisita con Ns Prot. 221/CS del 19.07.2012, trasmette il Progetto Preliminare approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 381 e copia della Determina Dirigenziale n. 464 del 16.05.2012 di nomina del RUP.*

g) *13.09.2012 io Commissario Straordinario, con nota prot. 276/CS, richiedo al RUP:*

- ✓ *un quadro sullo stato delle azioni intraprese e di quelle prossime, in riferimento alla tempistica concordata con la Convenzione di Avvalimento;*
- ✓ *il prosieguo delle fasi di affidamento delle progettazioni, della direzioni lavori e della sicurezza in tempi rapidi;*

h) *27.09.2012 io Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla Convenzione siglata con l'Ente e alla richiesta pervenuta da parte di uno degli "enti attuatori" di approvazione relativa al bando di gara ad evidenza pubblica, secondo quanto indicato dall'art. 8 della Convenzione di avvalimento espongo quanto segue:*

- ✓ *l'art. 8 sopraccitato è una norma procedurale, pertanto l'intesa richiamata è da intendersi quale comunicazione interna tra il Commissario ed il RdP ma che non assume valore di efficacia e/o validità dell'atto assunto dal RdP;*
- ✓ *non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RdP della Stazione Appaltante;*
- ✓ *tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";*

i) *15.10.2012 si apprende, telefonicamente, dal RUP e dall'Assessore ai LL.PP., che le Spese Tecniche (da Quadro Economico) risultano inferiori a € 200.000,00, pertanto l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria avverrà mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno 5 imprese accreditate negli appositi elenchi dell'Ente Avvalso.*

Inoltre, il RUP si impegna a trasmettere il prima possibile (fax) un quadro sullo stato delle azioni intraprese e di quelle prossime, in riferimento alla tempistica concordata con la Convenzione di Avvalimento (come da me richiesto con nota prot. 276/CS del 13.09.2012)

j) 13.11.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 2): il RUP, riferisce che:

- ✓ *è stato elaborato il bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;*
- ✓ *sono in corso ulteriori accertamenti relativamente ai criteri per la scelta dello studio che sarà incaricato, le modalità di pubblicazione (Gazzetta Ufficiale, Albo Pretorio e Sito Internet) escludendo i quotidiani) e tempi di pubblicazione;*
- ✓ *nel contempo, avendo riscontrato la disponibilità di risorse interne (dottore geologo) per la redazione della relazione geologica, si sta procedendo all'affidamento dell'incarico, con determina dirigenziale, al fine anche di accelerare la successiva progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi;*
- ✓ *si è provveduto a rispondere alla nota del Commissario prot. 276/CS del 23.10.2012;*
- ✓ *il bando provvederà 40gg per il definitivo e 30gg per l'esecutivo (dopo aver ottenuto tutti i pareri e nulla osta richiesti), soggetti a ribasso;*

k) 15.11.2012 aggiornamento:

- ✓ *è in fase di predisposizione il bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione mediante procedura negoziata;*

l) 13.11.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 3): il RUP, riferisce che:

- ✓ *Si procederà mediante procedura ristretta ai sensi degli artt. 3 comma 38, 54-55 e 83 del D. Lgs. 163/2006 per affidamento di incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza, di importo superiore a 100.000 Euro, con pubblicazione del bando di gara, con tempi di pubblicazione secondo legge;*
- ✓ *Il bando per l'affidamento dell'incarico suddetto è in corso di perfezionamento, entro 7-10 giorni sarà pubblicato;*
- ✓ *È stato affidato l'incarico con determina dirigenziale del settore B12 (n. 1022 del 13.11.2012) al dott. Rosa Maurizio per la redazione della relazione geologica e piano di indagini;*
- ✓ *Il piano di indagini è stato redatto e prevede una somma complessiva di circa 13.000 Euro + IVA) a base d'asta) per la campagna geognostica; si provvederà alla trasmissione dello stesso Commissario al fine di procedere all'affidamento a ditta specializzata, previa lettera di invito a n. 5 ditte che dovranno rispondere entro 7 giorni; il capitolato prevede 30 giorni per l'esecuzione delle indagini;*
- ✓ *Ai fini del contenimento della spesa, come già dichiarato nel precedente verbale del 13.11.2012, è stato affidato ad un tecnico interno all'Amministrazione l'incarico della relazione geologica; all'interno del piano di indagine sono stati tenuti in considerazione i dati provenienti da indagini pregresse effettuate sulla formazione geologica all'interno del Fiume Vomano;*
- ✓ *Verrà posta all'attenzione del Commissario una nota di richiesta di delucidazioni e indicazioni in merito al punto 6 dell'Ordinanza di Avvalimento ovvero sulla procedura da adottare per impegni di spesa; parimenti con la medesima nota verranno chieste*

informazioni e chiarimenti sulla procedura espropriativa da adottare in merito all'elenco ditte allegato al Progetto Preliminare

m) *06.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot.355/CS, rilevati importanti scollamenti temporali tra i tempi d'attuazione degli interventi avviati e quanto dichiarato nei singoli cronoprogrammi redatti in sede di Convenzione, invita ciascun Ente Avvalso ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali dei cronoprogrammi, andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi.*

n) *11.12.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 4): il RUP, riferisce che:*
- ✓ *Il bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza (importo pari a 198.000 Euro), sarà pubblicato entro il mese corrente; il bando prevede 50 giorni per la progettazione definitiva e 40 giorni per la progettazione esecutiva;*
- ✓ *Il ritardo nella pubblicazione del suddetto bando è dovuto agli ulteriori approfondimenti dei criteri da adottare per il bando stesso nonché alle problematiche indotte dal riordino delle Province unitamente ad alcuni dubbi da chiarire in merito alla procedure amministrative da adottare circa la copertura economica;*
- ✓ *Con nota prot. n. 309253 del 30.11.2012 è stato trasmesso il Progetto Indagini Geologiche per la verifica di congruità; al fine di avviare i lavori a gennaio 2013 saranno inviate le lettere d'invito a n. 5 ditte specializzate nella settimana 17-21.12.2012;*
- ✓ *A seguito di chiarimento relativamente all'adozione di atti necessari al pagamento per l'esecuzione dei lavori e spese tecniche, l'Ente procederà all'adozione di opportuni provvedimenti amministrativi per la liquidazione delle spese.*

o) *30.11.2012 la Provincia di Teramo, con nota prot. 309253, acquisita con prot. 362/CS del 12.12.2012, trasmette copia del Progetto Indagini Geologiche propedeutiche alla Relazione Geologica, per la verifica di congruità. La campagna geognostica, prevista dal Capitolato Prestazionale allegato, si prefigge come obiettivo la modellazione geologica e geotecnica, nonché la valutazione del rischio sismico, in considerazione alle risorse economiche da computo metrico estimativo. Questa dovrà essere espletata nel tempo massimo di 30 gg continuativi a partire dalla data della consegna delle indagini geologiche e geotecniche;*

p) *11.12.2012 la Provincia di Teramo, con nota prot. 319021, acquisita con prot. 378/CS del 20.12.2012, trasmette la Determina Dirigenziale n° 1143 dell'11.12.2012 di approvazione del quadro economico dei costi necessari per lo svolgimento della campagna di indagini geognostiche a supporto della relazione geologica e relativa alla Progettazione Definitiva/Esecutiva.*

q) *13.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 espone che, qualora fossero interessati all'utilizzo di:*
- ✓ *procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante Conferenza dei Servizi (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio commissariale;*
- ✓ *Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere allo scrivente Ufficio l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU;*

Si coglie inoltre l'occasione per ribadire la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara;

r) *18.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS, in riferimento alla nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012, ribadisce che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo, senza ulteriori spese per l'amministrazione. Ogni spesa di natura differente sarà imputata all'Ente medesimo;*

*Intervento denominato "**Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo**" nei Comuni di Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona (CH). Ambito:*

Difesa dei Fiumi

Importo € 5.000.000,00

Principali attività svolte nell'anno 2012:

Convenzione di avvalimento siglata in data 19/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Consorzio di Bonifica Centro, Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro.

Il primo trimestre del 2012 è stato caratterizzato dalle seguenti attività:

a) *Nell'intenzione di equilibrare la spesa disponibile in ragione di alcuni fabbisogni emergenti sui territori interessati al dissesto, io Commissario ho disposto che parte dei fondi pertinenti questa opera (per la quota di 2 ML di Euro) fossero posti momentaneamente a disposizione di altro intervento (Difesa del Suolo). Pertanto si sta procedendo verso l'organizzazione e l'esecuzione di un Primo Stralcio dei lavori di cui alla presente opera, per complessivi 3 ML di Euro;*

b) *in merito alla preparazione della procedura di gara, da concordare tra le parti, si è disposto che i lavori, pur essendo suddivisi in due lotti (che andranno a specificarsi anche in sede di quadro economico), dovranno comunque essere affidati con unico incanto;*

c) *sono state eseguite alcune riunioni (presso il MATTM, Ufficio del Commissario) per monitorare l'avanzamento dei lavori. L'azione di monitoraggio e controllo, infatti, come emerge dal Cronoprogramma specifico, rimane a carico di me Commissario. In particolare si fa riferimento all'incontro, da cui è scaturito Verbale sottoscritto dalle parti, avuto presso l'Ufficio del Commissario in data 7 marzo 2012; qui sono stati trattati alcuni temi di particolare rilevanza per le azioni a seguire. Tra questi: lo stato delle progettazioni, la Conferenza di Servizi, le eventuali espropriazioni e la possibilità di ricorrere a provvedimento d'urgenza;*

d) *l'Ente sta provvedendo all'elaborazione, con risorse interne, degli atti progettuali preliminari. Allo stesso tempo l'Ente, in sede di sopraccitato incontro, ha fatto rilevare l'impossibilità di procedere con la progettazione definitiva per indisponibilità futura di idonee risorse già*

programmate in altre attività. Dunque fa rilevare la certa diluizione temporale, nel caso si imponesse l'esecuzione progettuale a proprio carico;

e) *Data l'articolazione del lavoro e la suddivisione – pur soltanto interna – in corpi, sempre nel sopraccitato incontro, si è convenuto utile inserire nel quadro economico complessivo una somma disponibile per spese generali, ovviamente da concordare preventivamente.*

A seguire, gli avvenimenti di seguito elencati:

f) *07.05.2012 con Nota Prot. 169/CS l'Ufficio del Commissario, viste l'estrema impellenza nell'attuazione dell'intervento, la ristrettissima tempistica imposta con l'atto di convenzione siglato, nonché la necessità di definizione di una progettazione definitiva ed esecutiva, accoglie l'istanza dell'Ente a provvedere all'aggiudicazione all'esterno dell'appalto di tali servizi;*

g) *12.06.2012 con Nota Prot. 5384, acquisita con Ns Prot. 202/CS del 12.06.2012, il Consorzio di Bonifica Centro trasmette il progetto preliminare. La nota di accompagnamento rappresenta che questo progetto, in esecuzione delle disposizioni commissariali del 22.03.2012, sarà posto a base di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione ed assistenza dei lavori. Allega congiuntamente lo schema di avviso e di disciplinare di gara per l'espletamento di detti servizi, per la loro approvazione. Infine il Consorzio rende noto che, una volta ottenute le suddette approvazioni e l'autorizzazione a procedere, si attiverà da subito per l'acquisizione delle autorizzazioni mediante la convocazione di apposita Conferenza dei Servizi ai sensi della L.241/90 e s.m.i.*

h) *13.09.2012 io Commissario Straordinario, con nota prot. 275/CS, richiedo al RUP, ing. Tommaso Valerio:*
   - ✓ *un quadro sullo stato delle azioni intraprese e di quelle prossime, in riferimento alla tempistica concordata con la Convenzione di Avvalimento;*
   - ✓ *il prosieguo delle fasi di affidamento delle progettazioni, della direzioni lavori e della sicurezza in tempi rapidi;*

i) *27.09.2012 io Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla richiesta pervenuta da parte di uno degli "enti attuatori" di approvazione relativa al bando di gara ad evidenza pubblica, secondo quanto indicato dall'art. 8 della Convenzione di avvalimento, espongo quanto segue:*
   - ✓ *l'art. 8 sopraccitato è una norma procedurale, pertanto l'intesa richiamata è da intendersi quale comunicazione interna tra il Commissario ed il RdP ma che non assume valore di efficacia e/o validità dell'atto assunto dal RdP;*
   - ✓ *non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RdP della Stazione Appaltante;*
   - ✓ *tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";*

j) *05.10.2012 il Consorzio di Bonifica Centro, con nota prot. 9477, acquisita con prot. 304/CS del 05.10.2012, comunica la nomina del Direttore del Consorzio, ing. Tommaso Valerio a responsabile del procedimento, in sostituzione della Dott.ssa Angela Berarducci che comunque svolgerà funzioni di supporto al RUP;*

k) 15.10.2012 si apprende, telefonicamente, dal RUP, ing. Tommaso Valerio, che è stato predisposto il bando, per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (art. 91, c. 1 del D. Lgs. 163/2006) inerenti:

- ✓ *progettazione definitiva;*
- ✓ *progettazione esecutiva;*
- ✓ *direzione lavori;*
- ✓ *CSE;*

Inoltre, il RUP si impegna a trasmettere il prima possibile un quadro sullo stato delle azioni intraprese e di quelle prossime, in riferimento alla tempistica concordata con la Convenzione di Avvalimento (come da noi richiesto con nota prot. 274/CS del 13.09.2012);

l) 16.10.2012 il Consorzio di Bonifica Centro, con nota prot. 9914 del (acquisita con ns. prot. 313/CS del 23.10.2012) in riferimento alla richiesta verbale del 15.10.2012, circa lo stato di attuazione dell'intervento, espone quanto segue.

- ✓ *19.01.2012 stipula della Convenzione;*
- ✓ *12.06.2012 trasmissione progetto preliminare unitamente al bando di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione ed assistenza dei lavori;*
- ✓ *23.07.2012 parere positivo dell'Ufficio Commissariale sul progetto preliminare;*
- ✓ *13.09.2012 con nota 275/CS il Commissario invita il Consorzio alla predisposizione dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi tecnici;*
- ✓ *24.09.2012 con nota prot. 9094 il CBC fa presente che il bando è già stato trasmesso ed è in attesa della relativa approvazione;*
- ✓ *27.09.2012 con nota prot. 290 il Commissario chiarisce alcuni aspetti procedurali pertinenti la Convenzione di Avvalimento;*
- ✓ *05.10.2012 con nota prot. 9478 il CBC avanzato richiesta di alcune informazioni tecniche da inserire nel bando ed è attualmente in attesa di riceverle;*

La pubblicazione del bando pertinente i servizi tecnici è prevista entro la fine del mese di ottobre

j) 07.11.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 2) - il RUP riferisce che:

- ✓ *Sulla base dei preventivi richiesti alle società di servizi, si è affidato alla Società INTESTO per la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sul sito dell'Osservatorio Regionale, dell'Avviso di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori, sicurezza ed attività complementari. La pubblicazione dell'avviso medesimo è prevista per il giorno 9 novembre p.v.;*
- ✓ *Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del 29 novembre p.v.;*
- ✓ *L'importo a base di gara è pari a 198.840,45 Euro;*
- ✓ *I tempi previsti per l'esecuzione dei servizi di progettazione sono: 60 giorni per la definitiva e 60 giorni per l'esecutiva, soggetti comunque a ribasso;*
- ✓ *Entro questo mese, sulla base dei termini previsti dalla normativa vigente, sarà convocata la Conferenza di Servizi per l'approvazione del Progetto Preliminare;*
- ✓ *Ad avvenuta conferma della pubblicazione da parte della società INTESTO sarà data opportuna comunicazione al Commissario, al quel saranno inviati anche gli atti di gara;*

k) 09.11.2012 pubblicazione del bando: Realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il torrente Dendalo. - Termine ultimo per la presentazione delle istanze: 29/11/2012 alle 12:00;

La gara ha ad oggetto l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori, per un importo complessivo di € 198.840,45 al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali.

Tempistica d'esecuzione:

- *progettazione definitiva, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio: entro 60 gg dalla stipula del contratto;*
- *progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: entro 60 gg dalla data di approvazione del progetto definitivo;*

l) 27.11.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 3) - il RUP riferisce che:

- ✓ *L'avviso di disciplinare di gara per il servizio di progettazione, direzione lavori, sicurezza ed attività complementari è stato pubblicato sulla G.U. n. 131 del 9.11.2012 e contemporaneamente sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul sito dell'Osservatorio Regionale Lavori Pubblici della Regione Abruzzo, sul Sito Internet del Consorzio di Bonifica, all'Albo Pretorio del Consorzio di Bonifica ed è stata data comunicazione al Commissario con nota dell'8.11.2012;*
- ✓ *Si sta provvedendo a rispondere a quesiti e a fornire informazioni relativamente alle procedure di gara espressi dai professionisti e dalle Società concorrenti, che al momento attuale si stimano pari a n. 20;*
- ✓ *Si provvederà a convocare la Conferenza di servizi a chiusura della scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta (30 novembre);*
- ✓ *Si riserva di contattare il Commissario per la definizione della Commissione Aggiudicatrice e per l'aggiornamento del cronoprogramma di tutte le attività da svolgersi sino ad arrivare alla gara per l'assegnazione dei lavori;*
- ✓ *Per la realizzazione delle opere in questione, intende avvalersi del poteri straordinari del Commissario (espropri e Conferenze di servizi)*

m) 06.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 355/CS, rilevati importanti scollamenti temporali tra i tempi d'attuazione degli interventi avviati e quanto dichiarato nei singoli cronoprogrammi redatti in sede di Convenzione, invita l'Ente Avvalso ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali dei cronoprogrammi, andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi.

n) 11.12.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 4) - la Dott.ssa Berarducci su delega del RUP riferisce che:

- ✓ *Il 29.11.2012 alle ore 12.00, termine per la presentazione dei plichi contenenti documentazione amministrativa e offerte, sono pervenute n. 15 offerte;*
- ✓ *Entro la settimana 17-21.12.2012 sarà convocata la Conferenza di Servizi;*
- ✓ *Per quanto concerne la nomina della Commissione di Gara per la valutazione delle offerte, essendo il criterio di aggiudicazione quello previsto dall'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii., con nostra nota prot. 11730 del 06.12.2012 è stata rappresentata*

al Commissario Straordinario la necessità di procedere all'individuazione dei membri della suddetta Commissione, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di avvalimento e si è in attesa di un riscontro in merito;

- ✓ *Sarà predisposto e trasmesso al Commissario Straordinario un cronoprogramma dettagliato e aggiornato, così come richiesto nella nota prot. n. 355/CS del 06.12.2012, acquisita al prot. n. 11887 del 11.12.2012, nel tempo più breve possibile.*

Allegata al presente verbale la delibera del 28.09.2012 n.294 e la delega del RUP Ing. Tommaso Valerio.

o) *13.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 espone che, qualora fossero interessati all'utilizzo di:*

- ✓ *procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante Conferenza dei Servizi (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio commissariale;*
- ✓ *Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere allo scrivente Ufficio l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU;*

Si coglie inoltre l'occasione per ribadire la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara;

p) *18.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS, in riferimento alla nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012, ribadisce che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per l'amministrazione. Qualsiasi spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente medesimo;*

*Intervento denominato "**Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento" nel Comune di Martinsicuro (TE)**.*

Ambito: Difesa della Costa

Importo € 3.000.000,00.

Principali attività svolte nell'anno 2012:

In data 27 marzo 2012 è stata siglata una Convenzione di Avvalimento con la Regione Abruzzo, per l'affidamento di questo intervento, nonostante i fondi per la realizzazione non siano ancora disponibili. L'obiettivo è quello di avviare le azioni pertinenti i lavori, non appena la disponibilità finanziaria sarà colmata, dall'erogazione dei fondi FAS 2007-2013 previsti dalla delibera CIPE n. 79 del 30 settembre 2011.

*Intervento denominato "**Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento" nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)**.*

Ambito: Difesa della Costa

Importo € 3.000.000,00.

Principali attività svolte nell'anno 2012:

Per il quale ancora non sono state avviate azioni disponibili, in quanto la delibera CIPE n. 79 del 30 settembre 2011 che prevede l'erogazione dei fondi FAS 2007-2013, non ha permesso, ad oggi, di poter intraprendere alcun intervento per le difficoltà incontrate da parte del MISE a poter erogare la somma prevista per incongruenze normative che non permetterebbero di accreditare sulla contabilità del Commissario i fondi.

*Intervento denominato "**Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento" nel Comune di Francavilla al Mare (CH)**.*

Ambito: Difesa della Costa

Importo € 2.000.000,00.

Principali attività svolte nell'anno 2012:

Per il quale ancora non sono state avviate azioni disponibili, in quanto la delibera CIPE n. 79 del 30 settembre 2011 che prevede l'erogazione dei fondi FAS 2007-2013, non ha permesso, ad oggi, di poter intraprendere alcun intervento per le difficoltà incontrate da parte del MISE a poter erogare la somma prevista per incongruenze normative che non permetterebbero di accreditare sulla contabilità del Commissario i fondi.

*Intervento denominato "**Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del Fiume Orta – Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato**" nel Comune di Caramanico Terme (PE).*

Ambito: Difesa del Suolo

Importo € 1.000.000,00.

Principali attività svolte nell'anno 2012:

Convenzione di Avvalimento siglata in data 20/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Comune di Caramanico Terme (PE)

Nel corso del primo trimestre di attività dell'anno 2012, si sono registrati i seguenti eventi principali:

a) *sono state eseguite alcune riunioni (presso il MATTM, Ufficio del Commissario) per monitorare l'avanzamento dei lavori. L'azione di monitoraggio e controllo, infatti, come emerge dal Cronoprogramma specifico, rimane a carico di me Commissario. In particolare si fa riferimento all'incontro, da cui è scaturito Verbale sottoscritto dalle parti, avuto presso l'Ufficio del Commissario in data 7 marzo 2012; qui sono stati trattati alcuni temi di particolare rilevanza per le azioni a seguire. Tra questi: lo stato delle progettazioni, la Conferenza di Servizi, le eventuali espropriazioni e la possibilità di ricorrere a provvedimento d'urgenza (il Comune ha rappresentato l'assenza di aree da assoggettare ad espropriazioni);*

b) *acquisizione degli atti di Progettazione Definitiva, eseguiti dall'Ente con proprio personale (Loro Prot. N°1885 del 17 marzo 2012; Ns. Prot. N°120/CS del 28 marzo 2012). Tali atti mostrano carenze riguardo il Quadro Economico, elaborato – come da loro Nota – quale parte di un più ampio programma d'interventi, dunque con costi progettuali non riferibili allo*

specifico Stralcio di competenza commissariale. Ragione che spinge ad una verifica e alla conseguente rettifica del Conto complessivo;

c) *attività di preparazione della Conferenza di Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo.*

A seguire, nei successivi trimestri:

d) *sono state eseguite alcune altre riunioni (presso il MATTM, Ufficio del Commissario, nonché presso la sede del Comune di Pescara) per monitorare l'avanzamento dei lavori. L'azione di monitoraggio e controllo, infatti, come emerge dal Cronoprogramma specifico, rimane a carico di me Commissario.*

e) *07.05.2012 il Commissario Straordinario, con nota Prot. 170/CS, a seguito di quanto appreso nella riunione del 07.03.20121 esorta l'ente, già in possesso di una progettazione definitiva, a procedere con estrema urgenza verso:*

- ✓ *la convocazione della Conferenza di Servizi;*
- ✓ *la procedura ad evidenza pubblica imposta dalla vigente normativa sui LL.PP. per l'appalto di servizi;*

f) *15.05.2012 il Comune, con Nota Prot. 4311, acquisita con Ns Prot. 203/CS il 15.05.2012, convoca una riunione tecnica per il giorno 19.05.2012, per definire compiutamente alcuni elementi di progetto. Invitati:*

- ✓ *Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;*
- ✓ *Genio Civile Regionale di Pescara;*
- ✓ *Parco Nazionale della Majella;*

g) *26.05.2012 il Comune, con Nota Prot. 3801, acquisita con Ns Prot. 189/CS del 29.05.2012, ha indetto e convocato la I riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 14.06.2012 presso il Palazzo TAR a L'Aquila con contestuale trasmissione del progetto definitivo. Sono invitati in considerazione degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, le seguenti Amministrazioni pubbliche ed Enti:*

- ✓ *Commissario Straordinario per gli Interventi di Mitigazione del Dissesto Idrogeologico nella Regione Abruzzo;*
- ✓ *Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo;*
- ✓ *Regione Abruzzo - Servizio Difesa del Suolo;*
- ✓ *Regione Abruzzo - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;*
- ✓ *Regione Abruzzo - Servizio Difesa del Suolo del Genio Civile regionale di Pescara;*
- ✓ *Parco Nazionale della Majella;*

h) *14.06.2012 a Roma, presso il palazzo del TAR in Via Salaria Antica Est n.27, si è svolta la Conferenza dei Servizi. In sede di riunione sono state avanzate richieste di integrazione/modifica del progetto definitivo, da alcuni degli Enti invitati per l'acquisizione dei pareri.*

Per la Regione (Servizio Difesa del Suolo e per il Servizio per la Sicurezza idraulica) sono intervenuti l'ing. Dionisi e l'Ing. Cofini che hanno consegnato osservazioni e richieste di integrazioni al progetto presentato.

Per il Genio Civile di Pescara interviene l'ing. Iervese il quale fa presente che il corso d'acqua ha un regime idraulico turbolento riconducibile alle pendenze di versante e

d'alveo e che questo motivo dà luogo ad instabilità sia per la sicurezza idraulica che per la parte geologica. Richiede pertanto, oltre all'integrazione dello studio di compatibilità idraulica, di perfezionare con appositi elaborati gli aspetti sopra evidenziati perché, allo stato attuale, queste discrasie non consentono di esprimere un parere favorevole.

Per l'Ente Parco Nazionale della Majella interviene il dott. Andrisano, il quale rammenta che gli interventi si trovano all'interno di un sito ZPS e SIC e rappresenta pertanto la necessità che il progetto sia integrato da uno studio di una valutazione di incidenza. Fa rilevare, inoltre, che all'interno del progetto, si prevede anche la realizzazione di una strada e pertanto chiede se si tratta di una pista di servizio per la realizzazione dei lavori previsti in progetto, nel qual caso, una volta terminati i lavori si richiede di riportare il ripristino delle condizioni ante operam. Chiede, inoltre, se le briglie vecchie saranno riattivate o ripristinate e di poter acquisire lo studio di massima complessivo dell'intera area.

Per l'Ente - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Pescara (Comando Prov.le di Pescara del Corpo Forestale dello Stato), prende la parola Ing. Macino il quale, contestualmente a questo intervento chiede di conoscere quali siano gli interventi previsti a sistemare e consolidare dal punto di vista idraulico e forestale tutto il pendio che dal fiume va verso il centro abitato oggetto di consolidamento; supportati da relativa verifica di stabilità. Nel rappresentare che molte delle briglie esistenti sono danneggiate per effetto del fenomeno della "segatura", chiede di conoscere quali siano gli interventi messi in progetto per evitare che detto intervento possa verificarsi nuovamente. Tutta la sistemazione dell'alveo nel tratto d'interesse è sostenuta a valle da una briglia già esistente, chiede che preliminarmente sia eseguita un'attenta verifica per valutare lo stato della medesima; nel calcolo idraulico delle briglie deve essere eseguita la relativa verifica al sifonamento. La gabbionata posta a difesa spondale deve essere adeguatamente protetta dal trasporto solido. Inoltre è opportuno prevedere un piano di manutenzione delle opere in progetto. Conferma, infine, la necessità della valutazione d'incidenza e chiede di verificare "in situ" la fattibilità della strada di accesso al cantiere.

Il Presidente, alla luce degli interventi verbalizzati, al fine di poter ottenere il nulla osta necessario per la Valutazione d'Incidenza Ambientale, ritiene opportuno sospendere i lavori e rinviarli ad una successiva seduta già fissata per il giorno 04.07.2012.

i) 15.06.2012 il Comune di Caramanico, con Nota Prot. 4311 acquisita con Ns Prot. 203/CS del 15.06.2012, indice un incontro tecnico, per il 19.06.2012 alle ore 10,00 presso la sede del Comune, per definire compiutamente alcuni interventi di progetto. Sono convocati:

- ✓ *Regione,*
- ✓ *Corpo Forestale,*
- ✓ *Genio Civile,*
- ✓ *Parco Nazionale della Maiella,*

j) 19.06.2012 il RUP comunica (telefonicamente) che l'Ente Parco della Majella, a seguito del sopralluogo effettuato, ha richiesto una modifica al progetto definitivo consistente nella traslazione dell'asse viario in cui saranno effettuati i lavori per la gestione delle aree protette, comportando lo slittamento della data di chiusura della Conferenza dei Servizi fissata per il 04.07.2012;

k) 25.06.2012 presso il MATTM, alle ore 15:30, ha avuto luogo un incontro tra personale di supporto a me Commissario e personale di fiducia del Comune, per la determinazione di alcuni aspetti del progetto definitivo. In tale circostanza:

- ✓ *sono state fornite indicazioni per la gestione e rimodulazione del quadro economico secondo quanto indicato in sede di Conferenza dei Servizi;*
- ✓ *è stata fissata la data di convocazione della Conferenza dei Servizi di chiusura lavori per il giorno 11.07.2012;*
- ✓ *si è concordata la necessità di ricercare, con modalità e strumenti di trasparenza, pubbliche amministrazioni disponibili ad effettuare l'intervento (responsabile del procedimento, redazione del progetto, piano della sicurezza, direzione dei lavori, collaudo, collaboratori) per una somma compresa nel due per cento dell'importo dell'opera, ai sensi del comma 5, art. 92, del D. Lgs 163/2006;*

l) *05.07.2012 il Responsabile del Procedimento, con Nota Prot. 4769 acquisita con Ns Prot. 217/CS del 17.07.12, indice e convoca la Conferenza dei Servizi di chiusura lavori per il giorno 16.07.2012, alle ore 11:00, presso il Palazzo TAR a L'Aquila. Viene trasmesso contestualmente il progetto definitivo unitamente alle integrazioni prodotte.*

Sono formalmente invitati a partecipare:

- ✓ *Commissario Straordinario;*
- ✓ *Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo;*
- ✓ *Regione Abruzzo – Servizio Difesa del Suolo;*
- ✓ *Regione Abruzzo – Ispettorato Dipartimentale delle Foreste;*
- ✓ *Regione Abruzzo – Servizio Difesa del Suolo del Genio Civile Regionale di Pescara;*
- ✓ *Parco Nazionale di Majella;*
- ✓ *Regione Abruzzo – Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale;*

m) *16.07.2012 presso la sede Comunale de L'Aquila, alle ore 11:00, ha avuto luogo la Conferenza dei Servizi di chiusura lavori per l'approvazione del Progetto Preliminare. Qualche nota di riserva emersa, sarà concordemente affrontata in sede di Progetto Esecutivo;*

n) *19.07.2012 il Sindaco, con Nota Prot. 4823, acquisita con Ns Prot. 220 del 19.07.2012 (e, p.c. al Commissario Straordinario), chiede alla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici Artistici e Storici della Regione Abruzzo il nulla – osta al Progetto, ai sensi della L.R. n. 2/2003, comma 2, art. 1, funzioni relative all'art. 146 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06.07.2002, n. 137, modificato con D. Lgs. N. 62/2008, modificato dall'art. 4-quinquies della Legge n. 129 del 2008;*

m) *13.09.2012 io Commissario Straordinario, con nota prot. 274/CS, richiedo al RUP, geom. Filippo De Ingeniis:*

- ✓ *un quadro sullo stato delle azioni intraprese e di quelle prossime, in riferimento alla tempistica concordata con la Convenzione di Avvalimento;*
- ✓ *il prosieguo delle fasi di affidamento delle progettazioni, della direzioni lavori e della sicurezza in tempi rapidi;*

n) *27.09.2012 io Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla richiesta pervenuta da parte di uno degli "enti attuatori" di approvazione relativa al bando di gara ad evidenza pubblica, secondo quanto indicato dall'art. 8 della Convenzione di avvalimento espongo quanto segue:*

- ✓ *l'art. 8 sopraccitato è una norma procedurale, pertanto l'intesa richiamata è da intendersi quale comunicazione interna tra il Commissario ed il RdP ma che non assume valore di efficacia e/o validità dell'atto assunto dal RdP;*
- ✓ *non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RdP della Stazione Appaltante;*
- ✓ *tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";*

o) *15.10.2012 si apprende, telefonicamente, dal RUP, geom. De Ingeniis che:*

- ✓ *il progetto definitivo è stato trasmesso alla Giunta per l'approvazione definitiva;*
- ✓ *la progettazione esecutiva è stata affidata direttamente ad un tecnico esterno al Comune (ai sensi del combinato disposto degli art. 91, c. 2 e 125 c. 11 del D. Lgs 163/2006, i servizi tecnici di importo inferiore a 40.000,00€ possono essere affidati direttamente dalla Stazione Appaltante previa indicazione dei medesimi nel Regolamento Interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia);*
- ✓ *la consegna del progetto esecutivo è prevista per il 26 ottobre p.v.;*
- ✓ *la direzione lavori sarà affidata direttamente ad un professionista esterno (già individuato);*
- ✓ *la Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori verrà selezionata entro dicembre mediante procedura negoziata con invito rivolto a 10 ditte, senza pubblicazione di bando (art. 122, c. 7 D. Lgs 163/2006, importo lavoro superiore a 500.000,00 €);*

Inoltre, il RUP si impegnava a trasmettere il prima possibile:

- ✓ *la delibera di approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta Comunale;*
- ✓ *un quadro sullo stato delle azioni intraprese e di quelle prossime, in riferimento alla tempistica concordata con la Convenzione di Avvalimento (come da noi richiesto con nota prot. 274/CS del 13.09.2012).*

p) *13.11.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 2): il RUP riferisce che:*

- ✓ *è stato acquisito in data 25.10.2012 con prot. n. 7371 il Progetto Esecutivo;*
- ✓ *in pari data è stata fatta la delibera di Giunta Comunale di approvazione del Progetto Esecutivo medesimo (delibera n. 103);*
- ✓ *in data 26.10.2012 è stata inviata copia del Progetto Esecutivo agli Enti che hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi del 16.07.2012;*
- ✓ *il 15 p.v. verrà fatta la determina a contrarre con individuazione delle ditte da invitare alla gara (ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 163/2006 ci sono le condizioni per procedere mediante procedura negoziata con invito ad almeno 10 soggetti);*
- ✓ *entro la settimana 19.11.2012/23.11.2012 saranno trasmesse le lettere di invito alle ditte individuate;*
- ✓ *si conferma che entro la fine dell'anno corrente saranno affidati, anche in via provvisoria, i lavori;*
- ✓ *il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di 150gg;*

q) *15.11.2012 aggiornamento:*

- ✓ *il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 7371 del 25.10.2012.*
- ✓ *oggi 15.11.2012 il Comune, con determina a contrarre, ai sensi dell'art. 11, c. 2 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rende nota:*

- ✓ *la propria volontà di stipulare un contratto per l'esecuzione lavori mediante procedura negoziata. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, ai sensi dell'art. 122, c. 7 del D. Lgs. 163/2006;*
- ✓ *i nominativi delle 10 ditte invitate a presentare un'offerta;*

27.11.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 3): il RUP riferisce che:

- ✓ *In data 15.11.2012 è stata fatta la determina a contrarre, stabilendo la procedura di gara;*
- ✓ *In data odierna è stata fatta la determina per l'individuazione delle imprese;*
- ✓ *Le lettere di invito alle suddette imprese sono state protocollate in data odierna per essere trasmesse in data 28.11.2012;*
- ✓ *Il giorno 20.12.2012 alle ore 15.00 avrà luogo la gara, con relativa apertura delle buste per l'affidamento provvisorio dei lavori;*

r) *06.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot.355/CS, rilevati importanti scollamenti temporali tra i tempi d'attuazione dell'intervento e quanto dichiarato nel Cronoprogramma redatto in sede di Convenzione, invita l'Ente Avvalso ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali del Cronoprogramma, andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi.*

s) *11.12.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 4): il RUP riferisce che:*

- ✓ *È stata affidata la Direzione Lavori e individuato il collaudatore con Determina n. 169-170 del 27.11.2012;*
- ✓ *Si provvederà a predisporre l'aggiornamento del cronoprogramma così come richiesto dal Commissario con nota prot. n. 355/CS del 06/12/2012, acquisita al prot. n. 8502 del 10.12.2012 e a trasmetterlo al Commissario Straordinario in data 18.12.2012.*

13.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 espone che, qualora fossero interessati all'utilizzo di:

1. *procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante Conferenza dei Servizi (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio commissariale;*
2. *Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere allo scrivente Ufficio l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU;*

Si coglie inoltre l'occasione per ribadire la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara;

t) *18.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS (in riferimento alla nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012), ribadisce che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per l'amministrazione. Qualsiasi spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente medesimo;*

u) *24.12.2012 il Comune di Caramanico, con nota prot. 8908, acquisita con prot. 380/CS del 27.12.2012 (in riferimento alla nota prot. 355/CS del 06.12.2012), comunica che in data 20.12.2012 è stata espletata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. Pertanto il Cronoprogramma viene rettificato come segue:*
   - *20.12.2012 – gara per l'affidamento dei lavori;*
   - *gennaio/aprile – contratto e consegna lavori;*
   - *ottobre/novembre – chiusura lavori e collaudo.*

   La durata complessiva dei lavori rimane immutata in 22 mesi, con ultimazione prevista per novembre 2013.

v) *11.12.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 5): il RUP riferisce che:*
   - ✓ *In data 20.12.2012, come dichiarato nel precedente verbale del 27.11.2012, è stata espletata la gara con l'aggiudicazione provvisoria all'Impresa Di Persio Costruzioni S.r.l. di Montesilvano (PE);*
   - ✓ *È stato inviato con nota prot. n. 8908 del 24.12.2012 l'aggiornamento del cronoprogramma, come richiesto dal Commissario con nota prot. n. 355/CS del 06.12.2012, che conferma la tempistica complessiva di 22 mesi come stabilito dalla Convenzione di avvalimento;*
   - ✓ *Il suddetto cronoprogramma prevede la fase di esecuzione dei lavori tra il mese di maggio e di ottobre corrente anno, periodo ottimale per la realizzazione degli stessi;*
   - ✓ *È in corso l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per la verifica della certificazioni utili alla stipula del contratto, prevista entro il mese di aprile corrente anno.*

   22.01.2013 Verbale di Sopralluogo (n. 6): il RUP riferisce che:

   - ✓ *Si conferma quanto dichiarato nel precedente verbale dell'08.01.2013 e in particolare si precisa che per procedere all'aggiudicazione definitiva si è ancora in attesa della visura camerale dell'impresa.*

A seguito della creazione della struttura commissariale e del più volte sollecitato, frazionato e parziale trasferimento delle risorse economiche Ministeriali temporaneamente giacenti in tesoreria della Regione Abruzzo ed oggetto di accese rivendicazioni, nonché in attesa del trasferimento delle ulteriori altre risorse alla contabilità speciale aperta a mio nome, ho ritenuto di programmare l'avviamento di una cospicua parte degli interventi rimasti attraverso la mia diretta opera, col supporto del mio Ufficio.

1.7.2 **Livello di attuazione globale degli interventi**

*Attraverso la compilazione della tabella sottostante evidenziare lo stato di avanzamento **globale** degli interventi in Accordo. Lo stato di attuazione relativo ad ogni singolo intervento dovrà, invece, essere prodotto attraverso l'aggiornamento delle schede intervento RENDIS e lì, dove previsto, nella Banca Dati Unitaria del QSN.*

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	n. interventi al dicembre 2012	n. interventi al dicembre 2011
Attesa di avvio	n. 14 (slittamento dovuto ad assenza di fondi – riferimento Allegato "Slittamenti e ritardi")	n. 19

Esecuzione studi ed indagini	*n. 14*	*n. 14*
In corso di progettazione	*n. 9*	*n. 12*
Progettazione ultimata	*n. 3*	*n. 2*
Lavori aggiudicati	*n. 2*	*n. 0*
In esecuzione	*n. 0*	*n. 0*
Lavori ultimati (collaudati e non)	*n. 0*	*n. 0*
Totale interventi finanziati	*Su 20 interventi complessivi, la copertura finanziaria disponibile al 31 dicembre 2012 era sufficiente a coprire un totale di 6 interventi, di cui 2 soltanto parzialmente. Per i dettagli, si vedano i paragrafi 1.4, 1.6 e 1.7.*	

1.8. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2013

Compilare la tabella seguente

La previsione che segue risulta strutturata supponendo che all'avvio dell'anno 2013 pervengano tutte le risorse ancora da acquisire. Evidentemente, qualora i tempi di trasferimento alla contabilità speciale del Commissario si dilatino ulteriormente, la previsione subirà uno slittamento temporale pari allo slittamento nell'arrivo dei fondi.

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	***n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2013***
Attesa di avvio	*n. 0 (compatibilmente con l'acquisizione dell'intera risorsa finanziaria imputata alle opere da AdP)*
Esecuzione studi ed indagini	*n. 20*
In corso di progettazione	*n. 0*
Progettazione ultimata	*n. 20*
Lavori aggiudicati	*n. 20*
In esecuzione	*n. 14*
Lavori ultimati (collaudati e non)	*n. 6*
Totale interventi finanziati	*Come detto in premessa, si è supposto che pervengano celermente i fondi per tutti i 20 interventi. Diversamente, la previsione non è eseguibile.*

1.9. CRITICITA'

Descrivere le eventuali criticità riscontrate nello svolgimento delle attività per il periodo di riferimento e le modalità adottate per favorire il superamento delle stesse per il successivo periodo.

1.10. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Annotazioni e precisazioni finali che si ritengono essenziali ad una esaustiva lettura della presente relazione

Allo scopo di fornire ogni possibile dettaglio in merito alle attività commissariali per l'anno 2012 - sempre in stretta relazione ai fondi resi disponibili – di seguito si riporta una tabella in forma di diario giornaliero, all'interno della quale sono contenuti i principali eventi susseguitisi, con relativa descrizione sintetica.

Data	Azione del Commissario	Contenuti
3.1.2012	*Incontro operativo con personale di supporto al Commissario*	*Incontro finalizzato all'organizzazione del proseguo dei lavori, nonché alla definizione dei contenuti di missive necessarie a contrastare le recenti azioni della Direzione Regionale ai LL.PP: dell'Abruzzo*
10.1.2012	*Confronto de visu con referenti regionali*	*Motivazioni:* - *gestione dell'operatività e controllo/supervisione commissariale;* - *questioni relative agli immotivati ostacoli formali e sostanziali avanzati dalla Direzione Regionale ai LL.PP.*
10.1.2012	*Confronto legale de visu*	
12.1.2012	*Incontro presso il MATTM*	*Analisi dello stato degli Uffici destinati al Commissario e ipotesi organizzative degli stessi al fine dell'operatività.* *Incontro con Direzione Generale per disquisizione sulla disponibilità di risorse commissariali (per l'attuazione degli interventi) presenti e future.*
19.1.2012	*Stipula di Convenzione, con Ordinanza di Avvalimento, con il Consorzio di Bonifica Centro*	*La Convenzione riguarda la progettazione e la realizzazione dell'intervento "Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo" (importo € 5.000.000,00).* *Sottoscrittori:* - *Commissario Straordinario,* - *Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo* - *Consorzio di Bonifica Centro, Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro*
19.1.2012	*Incontro a Francavilla al Mare*	*Confronto tra Commissario e Sindaco di Francavilla, in particolare su temi competenti la salvaguardia della costa, miratamente all'attuazione dell'intervento sul territorio comunale*

20.1.2012	*Stipula di Convenzione, con Ordinanza di Avvalimento, con il Comune di Caramanico Terme*	*La Convenzione riguarda la progettazione e la realizzazione dell'intervento "Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del fiume Orta - Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme, (1° stralcio funzionale)" (importo € 1.000.000,00).* *Sottoscrittori:* - *Commissario Straordinario,* - *Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo* - *Comune di Caramanico Terme (PE)*
27.1.2012	*Stipula di Convenzione, con Ordinanza di Avvalimento, con il Comune di Carsoli*	*La Convenzione riguarda la progettazione e la realizzazione dell'intervento "Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali" (importo € 5.000.000,00).* *Sottoscrittori:* - *Commissario Straordinario,* - *Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo,* - *Comune di Carsoli (AQ)*
2.2.2012	*Risposta del CdC su richiesta di me Commissario*	*A seguito di richiesta di me Commissario mirata a generare una Convenzione con il Commissario Goio per l'esecuzione dell'intervento n° 3 della Difesa dei Fiumi (pertinente l'Aterno/Pescara, area geografica di sovrapposizione delle competenze), il CdC risponde negativamente richiamando l'art. 4 del Decreto di Nomina*
4.2.2012	*Avvio delle procedure per la selezione di arch./ing. per l'attuazione del Cronoprogramma – esame dei curricula pervenuti*	*A seguito di pubblicazione su "Il Sole 24 ore" dell'Avviso pubblico di selezione di due unità Co-Co-Pro (una senior e l'altra Junior), riservato a tecnici laureati in architettura ed ingegneria (Avviso pubblicato a seguito di richiesta di preventivi su più quotidiani), sono stati esaminati i curricula pervenuti*
6.2.2012	*Svolgimento dei colloqui per l'assunzione delle due unità di cui al punto precedente*	*(rif. punto precedente)* *I colloqui hanno avuto luogo preso la sede del MATTM, all'interno di locali formalmente messi a disposizione per il caso. La Commissione esaminatrice è stata nominata tra esperti delle varie discipline utili, interni al MATTM*
6/7. 2. 2012	*Confronto tra i membri della Commissione esaminatrice*	*La Commissione, di cui al punto precedente, ha eseguito confronti per la stesura della graduatoria delle figure professionali esaminate. La graduatoria è stata pubblicata sul web, all'interno del Sito del MATTM*
9.2.2012	*Firma dei contratti Co-Co-Pro per le due unità richieste (Rif. Punti precedenti)*	-
9.2.2012	*Incontro presso il MATTM con le nuove figure professionali, addizionate delle due unità*	*Incontro tra il Commissario e il gruppo di lavoro allo stato disponibile, per affidare specifici compiti ad ognuno e per programmare e coordinare le attività*

	amministrative già reclutate con formula diretta, poiché interne alla PP.AA:	*Tra gli argomenti in trattazione:* - *le modalità di avvio dell'intervento riguardante il Fiume Aterno (n°3 Difesa dei Fiumi)* - *problematiche nascenti con Enti Avvalsi* - *esame delle progettazioni e individuazione delle carenze* - *sollecito per la richiesta dei fascicoli amministrativi di supporto alle progettazioni pervenute* - *predisposizione di un Piano economico riguardante gli impegni assunti* - *convocazione del RUP per i lavori di cui alla Convenzione con il Comune di Pescara*
9.2.2012	*Pervenuta sollecitazione dal Sindaco de L'Aquila*	*Il dottor Massimo Cialente, sindaco della città de L'Aquila, mi sollecita a procedere tempestivamente per l'esecuzione dell'Opera n° 3 della Difesa dei Fiumi (peraltro da me già presa in considerazione), trattando essa in particolare la creazione di una vasca di espansione sul Torrente Raio/Fiume Aterno in prossimità della zona industriale di Pile. Situazione di dissesto resa più gravosa per via delle avverse condizioni meteo.*
9.2.2012	*Confronto con legale*	*Il confronto ha riguardato argomenti particolarmente pregnanti, tra cui il tema di come gestire l'affidamento delle progettazioni, a rispetto della norma contenuta all'interno del DPCM di nomina, qualora mancasse disponibilità di personale all'interno degli Enti Avvalsi. La questione, infatti, è emersa a seguito della segnalazione di qualche Ente che lamentava appunto la non disponibilità di personale tecnico. Altra argomentazione di rilievo è stata quella di individuare le modalità di pagamento delle progettazioni già eseguite (date in affidamento all'esterno) prima della mia nomina e disponibili presso gli Enti. Infatti, la questione è pertinente il tema delle economie complessive in campo pubblico (evitare di pagare due volte lo stesso lavoro), nonché il tema dei tempi di attuazione (evitare che questi si dilatino, in ragione di richieste di nuova progettazione).*
13.2.2012	*Giunge missiva dalla Direzione Generale delle Risorse idriche del MATTM*	*Trattasi del Procedimento di rideterminazione dei compensi dei Commissari*
14.02.2012	*Invio formale alla Segreteria Generale della Regione Abruzzo delle Convenzioni/Schemi di Convenzione con gli Enti:* - *Comune di Carsoli* - *Comune di Caramanico Terme*	
15.2.2012	*Ricevimento lettera (anticipata con PEC) da parte della Direzione Regionale d'Abruzzo ai LL.PP*	*La missiva trattava di un sopralluogo presso il lungomare di Roseto degli Abruzzi, Via Makarska, mirato a verificare lo stato del dissesto*
17.02.2012	*Incontro presso il MATTM, Uffici*	*Nell'incontro sono stati chiariti i vincoli pertinenti le azioni*

	del Commissario, con i referenti del Comune di Pescara (Ente Avvalso)	*commissariali, soprattutto riguardo gli affidamenti all'esterno delle progettazioni. Tuttavia, il Comune di Pescara rappresenta la difficoltà a procedere con il completamento della progettazione con le risorse interne, essendo queste applicate da tempo su altri lavori ed avendo, da Convenzione stipulata con l'Ufficio commissariale, tempi ristretti per la medesima attività. Sono state discusse possibili soluzioni a beneficio sia dei tempi che dell'economia pubblica*
17.02.2012	*Arrivo di parte della fornitura informatica per l'Ufficio commissariale*	
20.02.2012	*Giunge, per conoscenza, missiva della Città di Pescara*	*La missiva contiene informazioni sul pericolo di esondazione del Fiume Pescara, a seguito del maltempo*
20.02.2012	*Giunge, attraverso PEC, missiva della Consorzio di Bonifica Centro*	*La missiva contiene una richiesta di indicazioni/approfondimenti sui punti discussi in data 31.01.2012. In particolare, il Direttore del Consorzio, ing. Tommaso Valerio, a seguito dell'incontro avuto presso il MATTM, in attuazione della Convenzione sottoscritta il 19 gennaio u. s., informa di essere in attesa delle indicazioni sui punti discussi in suddetto incontro, al fine di attuare gli interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro, nel rispetto dei tempi stabiliti in Convenzione*
20.02.2012	*Giunge missiva della Provincia di Teramo*	*La missiva contiene richieste di chiarimenti in merito alla progettazione (affidamenti, disponibilità, eccetera) per l'intervento sul Fiume Vomano. In particolare si tratta di una richiesta di chiarimenti in merito alle attività progettuali da perseguire al fine di delineare definitivamente le aree che devono essere considerate nell'intervento complessivo ed evitare di effettuare lavorazioni che possono rivelarsi inutili, pur richiedendo impegni di spesa*
21.02.2012	*Trasmissione, via e-mail, di lettera al Comune di Caramanico Terme*	*La missiva contiene la trasmissione della Convenzione di Avvalimento, per i lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico da eseguirsi presso Comune di Caramanico Terme, firmata dalla R. A. a nome della Segreteria Generale*
21.02.2012	*Arrivo di comunicazione della Direzione Generale del MATTM*	*La comunicazione riguarda la liquidazione dei Compensi ai Commissari e introduce una norma pertinente gli incentivi*
23.02.2012	*Arrivo di comunicazione della Direzione Generale del MATTM*	*La comunicazione riguarda argomenti di gestione commissariale Comunicazione degli indirizzi di posta elettronica dell'Ispettorato Generale.*
23.02.2012	*Incontro a L'Aquila presso la sede della Regione Abruzzo*	*L'incontro è avvenuto tra me Commissario, l'Assessorato ai LL.PP. e la Direzione Generale ai LL.PP: della Regione Abruzzo. I temi trattati hanno riguardato aspetti vari del rapporto tra Commissario e Direzione Generale Regionale (laddove si è evinta, ancora una volta, una forma di*

		ostacolo all'attività commissariale da parte della Direzione Generale medesima), nonché questioni prettamente operative come: - *l'avvio dei lavori riguardanti la salvaguardia della costa (il Commissario propone, evocando precedenti richieste della Direzione Generale, che tali interventi siano affidati alla Regione con specifica Convenzione di Avvalimento)*
23.02.2012	*Incontro col sindaco de L'Aquila*	*L'incontro, avuto presso la sede del Comune de L'Aquila, si è svolto tra me Commissario, il Sindaco, l'Assessore ai LL.PP. del Comune, la risorsa tecnica senior dell'Ufficio Commissariale. Il Sindaco ha posto l'accento sull'aggravarsi della situazione di dissesto che compete il suo territorio nella zona di Pile, dove gli straripamenti del Fiume Aterno hanno generato gravi difficoltà alle industrie, con conseguente possibile problematica pertinente i posti di lavoro (essendo quest'area la maggiore delle risorse occupazionali della città). Il Commissario ha chiarito che il tema, pertinente l'intervento n°3 della Difesa dei Fiumi, è in continua esamina da parte dell'Ufficio Commissariale e che, in tempi adeguatamente rapidi, le azioni della cantierizzazione saranno poste in essere.*
23.02.2012	*Incontro preso la Provincia di Teramo con la Segreteria Generale della Regione Abruzzo*	*L'incontro è avvenuto tra me Commissario, il Segretario Generale della Regione Abruzzo, il Sindaco di Martinsicuro, la risorsa tecnica senior dell'Ufficio Commissariale. In tale sede, ho comunicata la volontà di affidare gli interventi per la Difesa delle Coste alla Regione (con apposita Convenzione). Sono inoltre stati discusse possibili ipotesi di suddivisione dei citati interventi in tre lotti separati (quanti sono gli interventi stessi segnalati all'interno dell'AdP), al fine della migliore gestione dei Fondi FAS che potrebbero ancora rivelarsi insufficienti*
24.02.2012	*Arrivo di missiva da parte del Comune di Pescara*	*La missiva contiene richiesta di informazioni inerenti la riunione del 20.02.2012*
24.02.2012	*Arrivo di missiva da parte del Comune di Pescara*	*La missiva contiene informazioni riguardo il pericolo di esondazione del Fiume Pescara a seguito del maltempo e la richiesta di un incontro per il giorno 29.02.2012.* *In particolare, si richiede:* ▪ *l'autorizzazione della presa d'incarico del progetto definitivo redatto precedentemente da una società di progettazione esterna all'Ente, alle condizioni economiche previste dall'art. 91 del D.Lgs 163/2006.* ▪ *eventuale indizione Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 della L. 241/90*
24.02.2012	*Confronto, presso gli Uffici commissariali all'interno del MATTM, tra me Commissario e il gruppo di supporto*	*L'incontro è stato mirato alla pianificazione del lavoro a seguire, in particolare in ambito amministrativo*

27.02.2012	*Incontro, presso gli Uffici commissariali all'interno del MATTM, tra me Commissario e altre risorse tecniche emerse idonee dal colloquio del 6.2.2012*	*L'incontro è stato mirato ad approfondire le competenze di altre due risorse, eventualmente necessarie in tempi di maggiore incisività del lavoro (ad avvio di altri interventi)*
27.02.2012	*Ricezione di A/R da parte del Commissario del Bacino dell'Aterno*	*La missiva, a firma del Commissario per il Bacino dell'Aterno, ribadisce l'impossibilità di stipulare Convenzione per la gestione dell'intervento sul Fiume Aterno*
28.02.2012	*Ricezione di lettera della Direzione Generale del MATTM*	*La missiva contiene la rideterminazione dei compensi dei Commissari*
29.02.2012	*Ricezione di lettera da parte dell'Assessorato ai LL.PP. della Regione Abruzzo*	*La missiva, a firma dell'Assessore ai LL.PP. della Regione Abruzzo, contiene attestazioni di disappunto verso la propria Direzione Generale in ordine ai contrasti da essa generati a svantaggio dell'impegno commissariale*
27.02.2012	*Pubblicazione di Avviso sul Corriere della Sera e sul sito web del MATTM*	*L'Avviso pubblico riguardava il reclutamento di due risorse legali di alto profilo ad implementazione dell'Ufficio Commissariale*
1.3.2012	*Richiesta formale all'ISPRA – MATTM*	*per il distacco di una risorsa a favore dell'Ufficio Commissariale*
2.3.2012	*Invio comunicazione al Comune di escara e p.c. alla Direzione Generale ai LL.PP. della Regione Abruzzo*	*La comunicazione contiene l'autorizzazione alla presa in carico degli elaborati progettuali disponibili presso il Comune (come detto, a seguito di analisi costi/benefici e risorse/tempo già effettuate)*
6.3.2012	*Trasmissione missiva al Comune di Caramanico Terme (Ente Avvalso)*	*La missiva contiene la convocazione di un incontro presso il MATTM – Ufficio del Commissario, per il giorno 7 marzo 2012*
6.3.2012	*Trasmissione missiva al Comune di Carsoli (Ente Avvalso)*	*La missiva contiene la convocazione di un incontro presso il MATTM – Ufficio del Commissario, per il giorno 7 marzo 2012*
6.3.2012	*Trasmissione missiva alla Provincia di Teramo (Ente Avvalso)*	*La missiva contiene la convocazione di un incontro presso il MATTM – Ufficio del Commissario, per il giorno 7 marzo 2012*
6.3.2012	*Trasmissione missiva al Consorzio di Bonifica Centro (Ente Avvalso)*	*La missiva contiene la convocazione di un incontro presso il MATTM – Ufficio del Commissario, per il giorno 7 marzo 2012*
6.3.2012	*Ricevimento missiva dal Consorzio di Bonifica Centro (Ente Avvalso)*	*La missiva contiene la disponibilità dell'Ente per l'incontro presso il MATTM – Ufficio del Commissario, per il giorno 7 marzo 2012*
6.3.2012	*Ricevimento missiva dal Comune di Caramanico Terme (Ente Avvalso)*	*La missiva contiene la disponibilità dell'Ente per l'incontro presso il MATTM – Ufficio del Commissario, per il giorno 7 marzo 2012*

6.3.2012	*Ricevimento missiva dalla Provincia di Teramo (Ente Avvalso)*	*La missiva contiene la disponibilità dell'Ente per l'incontro presso il MATTM – Ufficio del Commissario, per il giorno 7 marzo 2012*
7/8.3.2012	*Incontro presso l'Ufficio del Commissario – MATTM con gli Enti di cui ai punti precedenti*	*Nell'incontro sono stati affrontati temi pertinenti, in particolare, le progettazioni (manifestandosi queste un nodo particolarmente difficoltoso da risolvere in seno alle PP.AA: avvalse); ma anche questioni riguardanti il complesso delle azioni che ogni Ente deve affrontare nell'esecuzione dei lavori (tra cui la Direzione del Lavori e la Sicurezza sui Cantieri). E' stata rappresentata la necessità di interloquire con me Commissario per ogni impegno di spesa, durante tutto il corso dell'attuazione delle Convenzioni. Gli incontri sono stati registrati con verbali sottoscritti (con sospensione del Consorzio di Bonifica Centro per maggiori necessità di chiarimento), che si conservano agli atti*
9.3.2012	*Preliminare impostazione della Conferenza di Servizi per l'opera competente la Città di Pescara*	
14.3.2012	*Incontro con Studio di Progettazione*	*L'incontro tra me Commissario e lo Studio che ha elaborato (da tempo e su incarico pubblico) la progettazione dell'intervento n° 3 della Difesa dei Fiumi (Aterno/Pescara) è stato mirato a richiedere disponibilità (nella stessa sede accordata) affinché lo stato degli esecutivi fosse aggiornato ed eventualmente revisionato prima della formale adozione*
15.3.2012	*Incontro presso il Comune di Pescara*	*All'incontro ha partecipato, su mia delega, il tecnico senior dell'Ufficio Commissariale, per confrontarsi con le necessità dell'Ente riguardo l'organizzazione della Conferenza di Servizi pertinente il lavoro sul Fiume Pescara*
15.3.2012	*Convegno/conferenza a Miglianico*	*La Regione Abruzzo, Assessorato e Direzione Generale ai LL.PP., ha organizzato un convegno presso la sede del Golf Club di Miglianico per illustrare pubblicamente la progettazione dell'intervento riguardante il territorio di Miglianico/Francavilla al Mare denominato "Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo". All'incontro ha partecipato, su mia delega, il tecnico senior dell'Ufficio Commissariale, riferendo pubblicamente in merito alla disponibilità e all'attenzione del Commissario per il lavoro in trattazione.*
22.3.2012	*Incontro presso l'Ufficio del Commissario – MATTM con il Consorzio di Bonifica Centro*	*A seguire l'incontro del 7.3.2012, nel corso del quale erano rimaste inevase alcune importanti questioni sorte tra l'Ufficio Commissariale e il Consorzio di Bonifica Centro, nell'incontro di cui qui trattasi si è proceduto verso ogni chiarimento, con conseguente sottoscrizione del Verbale definitivo*
22.3.2012	*Inoltro – su richiesta - delle Convenzioni stipulate alla*	-

	Segreteria Generale della Regione Abruzzo	
22.3.2012	*Ricezione missiva IGEI - MATTM*	*La missiva contiene specifiche sulla redazione delle Relazioni Trimestrali e, in particolare, Annuali dei Commissari Straordinari Delegati al Dissesto Idrogeologico (modalità di compilazione e di trasmissione)*
28.3.2012	*Incontro legale*	*Sono stati discussi temi pertinenti le modalità di organizzazione del lavoro, nel rispetto delle attese della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che questioni molto operative, come le migliori modalità di organizzazione delle Conferenze di Servizi (a rispetto della norma) e le formali interlocuzioni con la Regione Abruzzo*
28.3.2012	*Ricezione progettazione definitiva da parte del Comune di Caramanico Terme*	*Ricezione di sei copie, con lettera di trasmissione, della progettazione definitiva pertinente l'intervento di Difesa del Suolo da eseguirsi nel Comune di Caramanico Terme*
28.3.2012	*Ricezione richiesta Comune di Carsoli*	*Il Comune di Carsoli richiede formalmente la possibilità di ricorrere all'affidamento all'esterno della progettazione di competenza, mancando delle risorse interne necessarie (a seguito di formale richiesta di sostegno inoltrata alla Regione Abruzzo)*
28.3.2012	*Ricezione richiesta Provincia di Teramo*	*La Provincia di Teramo richiede formalmente la possibilità di ricorrere all'affidamento all'esterno della progettazione di competenza, mancando delle risorse interne necessarie (a seguito di formale richiesta di sostegno inoltrata alla Regione Abruzzo)*
28.3.2012	*Indizione Conferenza di servizi*	*Viene formalmente indetta la Conferenza di Servizi per l'opera "per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo, nella città di Pescara", come disposto – previo accordo tra le parti – dal RUP nominato dal Comune di Pescara e ad esso interno. La data per la Conferenza di Servizi è stabilita per il giorno 11.4.2012, alle ore 11,00, presso la sede distaccata della Regione Abruzzo a Roma.*
29.3.2012	*Incontro a L'Aquila e ad Avezzano*	*L'incontro tra me Commissario e l'Assessore ai LL.PP. della Regione Abruzzo è stato particolarmente mirato a risolvere alcuni problemi organizzativi. Tra questi, la necessità di avere disponibilità di una sede internamente alla Regione a beneficio delle operazioni di controllo continuo dell'andamento dei lavori da parte dell'Ufficio Commissariale.* *L'occasione ha portato alla luce anche altre questioni importanti a me Commissario sottoposte, tra cui ulteriori impellenze che il territorio aquilano deve affrontare in tema di dissesto, all'interno dell'area del Cratere*
2.5.2012	*Giunge missiva del Direttore Generale Pernice, DG X, TRI del MATTM, Prot. 12096 del*	*In riferimento alle osservazioni avanzate dal Commissario Straordinario Delegato Orrù, con parere dell'Ufficio legislativo Prot. GAB/1848 UL del 31/01/2012 si disponeva*

	26.04.2012, acquisita con Ns. Prot. 166/CS del 02.05.2012	*che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, anche per i Commissari Straordinari nominati ai sensi dell'art. 17 del D.L. n.195/2009, si sarebbe applicata la rideterminazione dei compensi, secondo quanto previsto dalla legge n. 111/2011 e che, nelle more dell'emanazione del relativo D.P.C.M., a partire dal 1° gennaio stesso, i Commissari avrebbero potuto liquidare il loro compenso mensile nella misura di 1/12 della sola parte fissa annuale, stabilita per legge per un valore massimo di € 50.000,00, salvo successivo conguaglio.* *Peraltro la proposta del D.P.C.M. di cui sopra, è stata oggetto di una riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I valori di misurazione delle performance, quindi la determinazione dei relativi indicatori e target, saranno disposti con riferimento al target o risultato atteso per l'azione di ogni Commissario, come già stabilito nel decreto di nomina*
7.5.2012	*Nota del Commissario al Comune di Carsoli*	*con nota prot. 168/CS io Commissario Straordinario, preso atto dell'impossibilità per il Comune di Carsoli di procedere con risorse interne all'esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva, accolta altresì la richiesta del medesimo Ente, ne autorizzo l'affidamento esterno attraverso le procedure ad evidenza pubblica previste dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e relativo Regolamento d'attuazione. L'azione si è rivelata di particolare necessità, nell'ottica di ottemperare ai bisogni prefissi nel Cronoprogramma relativo*
7.5.2012	*Nota del Commissario al Consorzio di Bonifica Centro*	*con nota prot. 169/CS l'Ufficio del Commissario, viste l'estrema impellenza nell'attuazione dell'intervento competente l'Ente Avvalso, la ristrettissima tempistica imposta con l'atto di convenzione siglato, la richiesta pervenuta dal medesimo Ente, nonché la necessità di definizione di una progettazione definitiva ed esecutiva, esorta il Consorzio di Bonifica Centro a provvedere all'aggiudicazione esterna dei relativi servizi*
7.5.2012	*Incontro presso l'Ufficio Commissariale con i rappresentanti del Comune di Caramanico Terme*	*i rappresentanti del Comune di Caramanico Terme, nel corso della riunione, rappresentano lo stato d'avanzamento delle azioni, puntualizzando il fatto di essere già in possesso di progettazione definitiva ma di non avere disponibilità interna di personale sufficiente a coprire l'insieme dei ruoli richiesti per l'appalto dei lavori*
7.5.2012	*Nota del Commissario al Comune di Caramanico Terme*	*il Commissario Straordinario, con nota prot. 170/CS, a seguito di quanto appreso dai rappresentanti del Comune di Caramanico nel corso della riunione di cui al punto precedente, esorta l'Ente ad indire:* • *la convocazione della Conferenza di Servizi;* • *la procedura ad evidenza pubblica imposta dalla vigente normativa sui LL.PP. per l'appalto di servizi di supporto*

8.5.2012	*Perviene missiva dal Comune di Roccacasale*	*con nota Prot. 630 del 18.04.2012, acquisita con ns Prot. 171/CS dell'08.05.2012 il Comune di Roccacasale (AQ) rende noto:* • *l'impossibilità di impiego di risorse interne del Comune (perché numericamente insufficienti; l'Ente dispone di una sola risorsa umana a gestione dell'intera Area Tecnica) in relazione al notevole impegno richiesto per l'espletamento della progettazione e direzione dei lavori;* • *il nominativo del R.U.P. interno, ing. Camillo Gambale, Responsabile Area Tecnica*
8.5.2012	*Perviene missiva dal Comune di Castellafiume (AQ)*	*il Comune di Castellafiume (AQ), con nota Prot. 1032 del 24.04.2012, acquisita con Ns Prot. 173/CS dell'08.05.2012, chiede il finanziamento di € 6.900.000,00 per l'intervento di lavori indifferibili e urgenti di cui alla frana in località frazione Pagliara dei Marsi, dal cimitero della frazione all'abitato della stessa. La località è censita dall'Autorità di Bacino a rischio R4*
11.5.2012	*Nota del Commissario al Ministero dello Sviluppo Economico*	*il Commissario Straordinario, con nota Prot. 179/CS, al fine di non incorrere nell'adozione di impegni di spesa privi della relativa copertura finanziaria, chiede al Ministero dello Sviluppo Economico di indicare quali tempistiche e modalità debbano essere osservate affinché l'Amministrazione Regionale ponga nella disponibilità della Contabilità Speciale del Commissario Straordinario le risorse economiche relative ai Fondi FAS e vincolate al finanziamento degli interventi previsti dagli Accordi di Programma intervenuti tra Regioni e Commissari*
17.5.2012	*Perviene missiva dal Comune di Casalincontrada (CH)*	*il Comune di Casalincontrada (CH), con nota Prot. 2768 del 09.04.2012, acquisita con Ns Prot. 182/CS del 17.05.2012, chiede il finanziamento di € 950.000,00 per l'intervento di lavori indifferibili e urgenti di cui alla frana in località centro abitato (Via IV Novembre). La località è censita dall'Autorità di Bacino zona il rischio R4*
17.5.2012	*Perviene missiva dal Comune di Casalincontrada (CH)*	*il Comune di Casalincontrada (CH), con nota Prot. 2769 del 09.04.2012, acquisita con Ns Prot. 183/CS del 17.05.2012, chiede il finanziamento di € 950.000,00 per l'intervento di lavori indifferibili e urgenti di cui alla frana in località centro storico, Via Dante Alighieri. La località è censita dall'Autorità di Bacino zona il rischio R4*
23.5.2012	*Nota del Commissario alla Provincia di Teramo*	*con nota Prot. 184/CS, in seguito al sopralluogo effettuato il 15.05.2012 dall'arch. Rossi (Ufficio Commissariale) per verificare lo stato dei luoghi oggetto d'intervento denominato "Difese Spondali del Fiume Vomano nei Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi" nella Provincia di Teramo, il Commissario Straordinario:* • *conferma la rispondenza degli elaborati progettuali preliminari ai bisogni del territorio;*

		• *conferma la congruità degli elaborati progettuali preliminari con quanto ascritto nell'Accordo di Programma;* • *sollecita l'avvio delle fasi successive dei lavori affidati tramite Convenzione*
25.5.2012	*Perviene missiva dal Comune di Morino*	*il Comune di Morino (AQ), con nota prot. 2334 del 16.05.2012, acquisita con ns prot. 186/CS del 23.05.2012, chiede il finanziamento di € 750.000,00 per intervento di lavori indifferibili e urgenti di cui alla frana in località Fusara – Biancone. La località è censita dall'Autorità di Bacino zona a rischio R4*
25.5.2012	*Perviene missiva della Regione Abruzzo, Assessorato ai LL.PP.*	*l'Assessore ai LL.PP. della R.A, con nota Prot. 2582/2012, acquisita con Ns Prot. 187/CS del 25.05.2012 (mezzo fax), in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma, laddove ulteriori necessità dell'Ufficio Commissariale lo richiedesse, suggerisce l'eventuale impiego di consulenti (amministrativi, tecnici, legali) della Regione Abruzzo in quanto questi, vista la conoscenza specifica delle problematiche locali, potrebbero dare un contributo aggiuntivo allo svolgimento dell'attività Commissariale, soprattutto a seguito dell'apertura dei cantieri*
25.5.2012	*Trasmissione documentazione al MATTM da parte del Commissario*	*il Commissario Straordinario, con nota Prot. 188/CS del 25.05.2012, trasmette al MATTM uno schema sintetico dei movimenti finanziari effettuati, dalla data di apertura della Contabilità Speciale intestata a suo nome alla data odierna, al fine di dare evidenza delle informazioni generali relative alla stessa, nonché di permettere al Ministero di poter procedere ad effettuare le azioni di propria competenza relative alla legge di assestamento 2012*
29.5.2012	*Indizione Conferenza di Servizi da parte del RUP nominato dal Comune di Caramanico Terme*	*il Comune di Caramanico, con nota Prot. 3801 del 26.05.2012, acquisita con Ns Prot. 189/CS del 29.05.2012, ha indetto e convocato la I riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 14.06.2012 presso il Palazzo TAR a L'Aquila, con contestuale trasmissione del progetto definitivo.* *Maggiori approfondimenti nel paragrafo: Dettagli relativi all'esecutività delle opere*
29.5.2012	*Nota del Commissario alla Regione Abruzzo, Assessorato ai LL.PP.*	*il Commissario Straordinario, con nota Prot. 190/CS del 29.05.2012, trasmette all'Assessore ai LL.PP. della R.A., Servizio idrico integrato, gestione integrata dei bacini idrografici, Difesa del suolo, le richieste d'interventi franosi trasmesse da:* • *Comune di Casalincontrada - due interventi nelle località di: Via IV Novembre e Via Dante Alighieri;* • *Comune di San Vincenzo Valle Roveto - località Roccavivi da Piazza San Rocco fino alla Pavo;* • *Comune di Castellafiume - località frazione Pagliara dei Marsi;* • *Comune di Morino - località Fusara - Biancone;*

		per le valutazioni del caso
29.5.2012	*Trasmissione nota al Comune di Caramanico Terme*	*per convocazione CdS per il 14.06.12 Comune di Caramanico Terme, Prot. 189*
29.5.2012	*Consulto con legale dell'Ufficio Commissariale*	*In particolare, sui temi dell'art. 14-ter, comma 3, L. 241/90*
29.5.2012	*Interlocuzione Ufficio Commissariale con RUP di Caramanico Terme*	*In particolare, per la risoluzione di problematiche legate alla corretta compilazione del Quadro Economico*
29-5.2012	*Trasmissione al MATTM delle note integrative alla Relazione Annuale*	*integrazione alla Relazione Annuale 2012 dei Cronoprogrammi dei Ritardi.*
30.5.2012	*Nota E. MATTM, DG, TRI - CSD ing. Egidio Orrù*	*Su: applicazione ai CS del disposto dell'art. 15, c. 2 - 3 L. 111/2011. Liquidazione Compensi*
30.5.2012	*Consulto con legale dell'Ufficio Commissariale*	*in merito alla consultazione sull'art. 14 - ter, c. 3 L 241/90.*
30.5.2012	*Richiesta telefonica da parte del MATTM*	*Il MATTM richiede copia della Relazione Annuale*
31.5.2012	*Nota E MATTM, DG, TRI – CSD, giunte per conoscenza a tutti i Commissari del Dissesto*	*Tratta: Accordo di Programma Regione Puglia - Richiesta del CS di autorizzazione alla spesa per espropri relativo all'intervento nel Comune di Corato. L'amministrazione autorizza il Commissario scrivente, pur nel rispetto della spesa complessiva stabilita per l'intervento citato, e sottolinea (con evidenza per tutti i Commissari) che qualsiasi spesa imprevista può essere autonomamente affrontata con la ricomposizione del Quadro Economico, laddove la dimensione dell'investimento complessivo non subisce variazioni. Per sovradimensionamenti della spesa, invece, è necessario interpellare preventivamente l'Ente Centrale a cui spetta la decisione con atto formale*
4.6.2012	*Disposizioni aggiuntive per l'Ufficio Commissariale*	*Necessità di organizzazione di un Database aggiornato e aggiornabile dei contatti dei responsabili Uffici Tecnici, Sindaci, Presidenti e altro personale degli Enti relativi agli interventi in avviamento e da avviare*
5.6.2012	*Nota del MATTM al Commissario*	*Relativa all'autorizzazione dell'utilizzo dell'ing. Giuseppe Russo, interno all'Amministrazione, a svolgere l'incarico di RUP per l'intervento di Difesa dei Fiumi Aterno-Pescara (gestito direttamente dal Commissario)*
5.6.2012	*Riunione interna Ufficio Commissariale*	*L'incontro operativo è stato mirato a definire tempi e modi di alcuni passi necessari da conseguire rapidamente. In particolare per le Opere n° 2, 4 e 5 della Difesa dei Fiumi e per l'Opera n° 5 della Difesa del Suolo*
5.6.2012	*Nota prot. 193 MATTM, Ispettorato Generale - DG, TRI*	*Richiesta formale delle Relazioni Annuali a tutti i Commissari per il Dissesto*
5.6.2012	*Giunta e-mail da parte del*	*Trasmissione degli atti di Progettazione Esecutiva per*

	Comune di Corfinio	*l'opera relativa al territorio del Comune di Corfinio*
6.6.2012	*Incontro tra Ufficio Commissariale e RUP ing. G. Russo*	*Per organizzazione del lavoro e consegna delle documentazioni necessarie affinché il RUP possa avviare le procedure necessarie alla cantierizzazione dell'intervento*
7.6.2012	*Disposizioni interne all'Ufficio Commissariale*	*Affidamento compiti per:* • *implementazione Cronoprogrammi relativi agli slittamenti e ritardi;* • *gestione del Protocollo Informatico*
8.6.2012	*Perviene missiva del Comune di Caramanico Terme (PE) del 26.05.2011 Prot. n. 3801, acquisita con Ns Prot. 196/CS (già anticipata via fax Prot. 189/CS)*	*Indizione e convocazione CdS per il giorno 14 giugno 2012 e contestuale trasmissione progetto definitivo aggiornato*
8.6.2012	*Perviene missiva della Giunta Regionale Dir. LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Servizio Opere Marittime e Acque Marine, R.A./127496, acquisita con Ns Prot. 198/CS*	*Oggetto: "Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della R.A." Convenzione Quadro tra il CS Delegato e la R.A., Direzione LL.PP., Ciclo Idrico e Integrato e Difesa del Suolo e della Costa per il Comune di Martinsicuro del 27/04/2012 – richiesta notizie.* *Il Servizio OM e AM in data 19 agosto 2011 ha trasmesso i progetti preliminari della difesa della costa per complessivi 8.000.000 di euro e sostiene di non aver ricevuto nessuna nota informativa riguardo le procedure da intraprendere. Richiede pertanto una riunione per definire le suddette procedure*
8.6.2012	*Riunione Ufficio Commissariale*	*in merito alla Nota Prot. 198/CS, con approfondimento legale* *1. si è definito il contenuto per la risposta al Servizio Opere Marittime e Acque Marine;* *2. sono stati definiti i contenuti di una comunicazione agli EELL per chiarire che la sede a cui inoltrare le missive deve essere l'ufficio del CS e non la residenza;* *3. è stato analizzato il Quadro Economico trasmesso con il progetto esecutivo dal Comune di Corfinio e contestualmente è stato convocato l'Ufficio Tecnico per il lunedì p.v. alle ore 15:00 (per chiarimenti).*
11.6.2012	*Incontro operativo Commissario – personale di supporto - RUP ing. Giuseppe Russo*	*Sullo stato d'avanzamento delle azioni e sulla previsione tempistica dei passi a seguire* *Esame congiunto degli elaborati progettuali disponibili*
11.6.2012	*Incontro operativo tra personale di supporto al Commissario*	*Approfondimenti riguardanti lo stato delle progettazioni e il QE del Comune di Corfinio. Si è stabilito che Q E e Cronoprogramma, come disposti dall'Ente, sono da riformulare*
12.6.2012	*Missiva pervenuta da parte del Consorzio di Bonifica Centro*	*Consegna Progettazione Preliminare dell'intervento "Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione*

		sul Fiume Foro, in prossimità della confluenza con il Fiume Dendalo" da parte del Consorzio di Bonifica Centro
13.6.2012	*Incontro operativo tra personale di supporto al Commissario*	*Sono stati discussi temi organizzativi e modalità di sollecito degli EE.LL.* *E' stata predisposta la documentazione per partecipare alla CdS del 14.16.2012 (Comune Caramanico)*
14.6.2012	*Conferenza di Servizi per l'opera "Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme – (primo stralcio funzionale) - Movimenti gravitativi del versante dx idrografica del fiume Orta"*	*La CdS ha avuto luogo a L'Aquila, presso la sede della Regione Abruzzo.* *Ne sono derivate alcune osservazioni al progetto. Maggiori approfondimenti nel paragrafo: Dettagli relativi all'esecutività delle opere* *Il Presidente, alla luce degli interventi verbalizzati, al fine di poter ottenere il nulla osta necessario per la Valutazione d'Incidenza Ambientale, ritiene opportuno sospendere i lavori e rinviarli ad una successiva seduta fissata per il giorno 4 luglio 2012.*
15.6.2012	*Colloquio telefonico col Comune di Pescara (RUP)*	*Il RUP comunica che sono stati ottenuti tutti i pareri (positivi) necessari per la chiusura della CdS, si tratta di: Soprintendenza per beni Ambientali, Soprintendenza per beni Archeologici, Autorità di Bacino, Genio Civile. L'ultimo parere necessario atteso è quello della Regione Abruzzo che sarà reso in data 22 giugno.* *Il RUP chiede di concordare un data successiva al 22 giugno per la chiusura della CdS.*
18.6.2012	*Riunione personale di supporto al Commissario*	*Predisposizione relazione di dettaglio dello stato d'avanzamento dei lavori per il Comitato di Indirizzo e Controllo convocato per il giorno 20 giugno 2012.*
18.6.2012	*Comunicazione telefonica dal Sindaco di Roccacasale*	*Il Sindaco notifica l'avvenuta rettifica del progetto preliminare e chiede in merito un incontro.* *Stabilito che il sopralluogo a Roccacasale avverrà nella prima settimana di luglio, salvo contrattempi.*
19.6.2012	*Incontro personale di supporto al Commissario*	*Difesa Fiumi, OPERA n. 2, Provincia di Pescara: Viene fissata la data per la CdS di chiusura lavori per il giorno 25 p.v. presso il MATTM alle ore 14:00. Notificata al RUP di Pescara*
20.6.2012	*Interlocuzione telefonica col Sindaco di Roccacasale*	*Fissato appuntamento c/o MATTM lunedì 25 p.v. ore 12:00 per la seconda verifica del progetto preliminare.*
20.6.2012	*Telefonata al RUP del Comune di Caramanico Terme*	*Fissato appuntamento c/o MATTM lunedì 25 p.v. ore 15:30 per la verifica del quadro economico. Il Comune rappresenta, inoltre, una richiesta pervenuta (a seguito di sopralluogo) dal Parco della Majella che comporta lo spostamento di un asse temporaneo previsto dal progetto definitivo.*
20.6.2012	*Comitato di Indirizzo e Controllo*	*Ordine del Giorno: 1) stato di avanzamento dei lavori da parte degli Enti Attuatori; 2) stato dei trasferimenti finanziari*

		effettuati nella disponibilità del Commissario Straordinario Delegato; 3) procedure previste dal MISE in ordine all'utilizzo e rendicontazione dei fondi PAR-FAS 2007-2013 costituenti la quota di cofinanziamento regionale dell'Accordo di Programma siglato; 4) costi funzionali connessi all'espletamento dell'incarico commissariale di cui alle previsioni del DPCM del 27/07/2011 .
21.6.2012	*Telefonata al RUP del Comune di Caramanico Terme*	*In seguito al sopralluogo effettuato con il Parco della Majella questo ha richiesto una modifica al progetto definitivo che consiste nella traslazione dell'asse viario in cui saranno effettuati i lavori per la gestione delle aree protette.* *La data di chiusura della CdS fissata per il 4 luglio p.v. subisce slittamento.*
25.6.2012	*Riunione tra Ufficio Commissariale e Sindaco di Roccacasale*	*Dalla riunione, finalizzata alla verifica di alcuni aspetti del progetto preliminare, modificato come precedentemente indicato, sono emersi ulteriori aspetti da ridefinire.* *Chiarimenti in merito alle logiche del quadro economico.*
25.6.2012	*Conferenza di Servizi di chiusura indetta dal RUP del Comune di Pescara – presso la sede della Regione Abruzzo a L'Aquila.*	*Viene approvato il progetto definitivo con prescrizioni relative alla rimodulazione del quadro economico (imprevisti - lavori in economia).* *Il RUP predisporrà il verbale conclusivo e lo trasmetterà all'avv. Salvemini (dell'Ufficio Commissariale) per la verifica dei contenuti.*
25.6.2012	*Riunione tra personale del Commissario e personale del Comune di Caramanico Terme*	*Indicazioni per la gestione e rimodulazione del quadro economico in base alle richieste avanzate in sede di C.d.S. Fissata la data di convocazione della C.d.S. per il giorno 11 luglio.*
26.6.2012	*Telefonata con RUP della Provincia di Teramo*	*E' convocata per venerdì 29 p.v. la Giunta Comunale per l'approvazione del progetto preliminare.*
3.7.2012	*Riunione tra Commissario e personale dell'Ufficio*	*Argomenti:* *1.Co.lindirizzo e Co. - l'avv. Di Maggio sta predisponendo il verbale della seduta del 26.6.12; l'avv. Pernice sta predisponendo la proposta di atto integrativo. In attesa della documentazione.* *2.Interrogazione MISE in merito alle modalità di utilizzo dei FONDI FAS - non pervenuta risposta, il CS propone la predisposizione di un sollecito.* *3.Convenzione tra Commissario e INVITALIA per la progettazione degli interventi da avviare in futuro - già sottoscritta dal CS è stata trasmessa all'avv. Mazzotta che si occuperà di trasmetterla all'avv. Squitieri.* *4.Predisposizione Convenzioni di Avvalimento in merito ai lavori che devono essere avviati.* *5.Stato dell'arte dei lavori avviati e rispetto della tempistica prevista - Comune di Caramanico Terme, prevista Conferenza dei Servizi di chiusura lavori per il 13.07.2012; Comune di Pescara: approvato il progetto definitivo in Conferenza dei Servizi il giorno 25.06.2012; Comuni di*

		Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona trasmesso progetto preliminare in data 12.06.2012 dal Consorzio di Bonifica Centro; Comune di Carsoli - non ancora pervenuto il progetto preliminare. Si propone di assegnare un termine ultimo per la consegna.
4.7.2012	*Telefonata con l' assistente al RUP di Pescara per chiarimenti*	*Non è pervenuto il parere VIA della Direzione Regionale, necessario per la chiusura della Conferenza dei Servizi (verbale) e l'approvazione del progetto definitivo, svoltasi il giorno 25.06.2012 presso il MATTM.* *Si attiveranno per ottenerlo comunque nei tempi brevi.*
5.7.2012	*Telefonata con il RUP della Provincia di Teramo*	*La convocazione per venerdì 29 u.s. della Giunta Comunale per l'approvazione del progetto preliminare è stata revocata.* *Attesa prossima convocazione.*
5.7.2012	*Perviene Fax dalla Prefettura dell'Aquila*	*L'Aquila Sito di San Giuliano - crollo della volta della cavità presente a nord-ovest del Convento dei Frati Minori. Convocazione riunione per il 09.07.2012*
6.7.2012	*Telefonata intercorsa tra personale del Commissario e Vice Prefetto de L'Aquila*	*Chiarimenti in merito alla nota del 28.06.2012, prot. 208/CS, avente ad oggetto: sito di San Giuliano (AQ) - dissesto idrogeologico.*
9.7.2012	*Riunione presso la Prefettura dell'Aquila*	*Presenti: arch. Rossi per il CS, Dott. Guetta Viceprefetto per il Prefetto di L'Aquila; Geom. Tarquini – Settore Ricostruzione Pubblica del Comune dell'Aquila; Dott. Moroni - Assessore ai LL. PP. Comune dell'Aquila; Dott. D'Eramo - Autorità dei Bacini Abruzzo ; Ing. Leone – Ufficio Coordinamento Ricostruzione, Area programmazione OO.PP. e valutazione progetti; Sig. Gigante – Funzionario Amministrativo della Prefettura con compiti di Segretario. OdG: il crollo della volta della cavità presente a nord-ovest del Convento dei Frati Minori – presso il Sito di San Giuliano (AQ)* *Maggiori approfondimenti nel paragrafo: L'attività svolta*
10.7.2012	*Telefonata con il Sindaco di Roccacasale*	*Il Sindaco di Roccacasale rende noto che sono state apportate le modifiche al progetto preliminare come indicato. Chiede la verifica dei risultati*
11.7.2012	*nota del Genio Civile di Pescara acquisita con prot. 214/CS - CS*	*Si sollecita l'intervento di messa in sicurezza del Fiume Pescara.*
11.7.2012	*Comunicazione del Comune di Caramanico Terme*	*La Conferenza dei Servizi prevista per il giorno 13.07.2012 è spostata al 16.07.2012.* *Non è giunta nota/avviso formale presso l'Ufficio commissariale*
13.7.2012	*Fax Prefettura dell'Aquila - CS*	*L'Aquila Sito di San Giuliano - crollo della volta della cavità presente a nord-ovest del Convento dei Frati Minori. Trasmissione verbale riunione del 09.07.2012*

13.7.2012	Posta Certificata Comune di Carsoli - CS	In data 05.07.2012 con determina del Responsabile del Servizio sono tati approvati gli elaborati di gara (disciplinare e bando di gara), che vengono trasmessi in copia.
16.7.2012	Conferenza di Servizi per Caramanico Terme - chiusura lavori presso L'Aquila	E' approvato il progetto definitivo. Si dispone qualche modifica di lieve entità da apportare direttamente nel progetto esecutivo.
16.7.2012	Incontro a Roccacasale	La verifica delle modifiche al progetto preliminare ha avuto un esito positivo
16.7.2012	posta certificata (PE)	L' assistente al RUP di Pescara trasmette il verbale di chiusura lavori della CdS svoltasi il 25.06.12
17.7.2012	Riunione col personale di supporto	Si è discusso in merito alla predisposizione di: 1. nota agli EE.LL. avvalsi per conoscere lo stato dell'arte degli interventi; 2. nota alle Province e al Provveditorato alle OO. PP. per l'eventuale individuazione di pubbliche amministrazioni disponibili ad effettuare attività di supporto agli interventi (responsabile del procedimento, redazione del progetto, piano della sicurezza, direzione dei lavori, collaudo, collaboratori) per una somma compresa nel due per cento dell'importo lavori, ai sensi del comma 5, art. 92, del D. Lgs 163/2006 ; 3. Relazione Timestrale (luglio 2012).
18.7.2012	e - mail Comune di Pescara	trasmissione dispositivo di nomina a RUP dell'arch. Trisi (PE), acquisita con Ns Prot. 219 del 18.07.2012)
19.7.2012	Provincia di Teramo - nota Prot. 183596 del 16.07.2012 acquisita con Ns Prot. 221/CS del 19.07.2012	trasmissione progetto preliminare approvato in linea tecnica con Delibera della Giunta Provinciale n. 381 e copia della Determina Dirigenziale n. 464 del 16.05.2012 di nomina del RUP.
19.7.2012	nota Comune di Caramanico - Soprintendenza per i Beni Ambientali, (e, p.c. al Commissario Straordinario, acquisita con ns prot. 220/CS)	il Sindaco chiede alla Soprintendenza per i Beni Ambientali della Regione Abruzzo il nulla – osta ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.
20.7.2012	Nota del Commissario al Comune di Corfinio	Si notifica l'avvenuta ricezione del progetto esecutivo e la momentanea indisponibilità all'avvio delle fasi operative a causa dalla temporanea assenza di fondi
20.7.2012	Nota del Commissario al Al Genio Civile Regionale di Pescara	In merito all'intervento di Messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo, le azioni propedeutiche sono in via di definizione e si è ormai prossimi all'avvio dei lavori dal momento che in data 25 giugno 2012, si è chiusa positivamente la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo.
20.7.2012	Nota del Commissario al Consorzio di Bonifica Centro	si comunica l'avvenuta ricezione della progettazione preliminare (acquisita con prot. 202 del 05.06.2012), e comunicare che in merito, non si evincono scostamenti

		dagli obiettivi tecnici disposti dall'Accordo di Programma;
20.7.2012	*Nota del Commissario alla Provincia di Teramo*	*si comunica l'avvenuta ricezione della progettazione preliminare (acquisita con prot. 221/CS del 19.07.2012), e comunicare che in merito non si evincono scostamenti dagli obiettivi disposti dall'Accordo di Programma.*
20.7.2012	*Perviene missiva dal Comune di Carsoli*	*Stato di avanzamento del procedimento*
20.7.2012	*Perviene missiva dal Comune di Caramanico Terme*	*Trasmissione copia conforme del 1° verbale della Converenza del 14.06.2012 e del 2° verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16.07.2012.*
20.7.2012	*Perviene missiva (per conoscenza) dal Commissario Delegato Emergenza Fiume Aterno - Pescara*	*Interventi urgenti di messa in sicurezza idraulica del fiume Pescara (rif. nota prot. 157657/RA acquisita con ns prot. 214).*
20.7.2012	*Perviene missiva dalla Regione Abruzzo – Servizi OM e AM*	*Convenzione Quadro tra CS e RA, per il Comune di Martinsicuro - Sollecito.*
23.7.2012	*Comunicazioni del RUP per l'intervento sull'Aterno-Pescara*	*Perviene il progetto esecutivo denominato: "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno" dopo aver apportato le modifiche richieste;*
24.7.2012	*Firma di Verbale di CdS*	*Il Segretario verbalizzante della Conferenza dei Servizi svoltasi il 25.06.2012 presso l'Ufficio Commissariale per l'approvazione del progetto definitivo per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo" nel Comune di Pescara, ha firmato il verbale di chiusura lavori, a seguito dell'accertamento e verifica di questo compiuta dall'avv. Salvemini.*
24.7.2012	*Confronto telefonico con responsabile del Consorzio di Bonifica Centro*	*Il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Centro, in riferimento alla Ns nota Prot. 223 con cui è stata valutata positivamente la fase progettuale preliminare, nell'intenzione di procedere alle necessarie fasi disposte dall'Avvalimento, con attenzione al rispetto del Cronoprogramma condiviso, richiede di concordare un appuntamento in tempi rapidi.*
24.7.2012	*Iincontro col RUP per il lavoro sull'Aterno-Pescara*	*Definizione degli ultimi dettagli dell'avviso pubblico per l'eventuale individuazione di pubbliche amministrazioni disponibili ad effettuare gli interventi (direzione dei lavori, collaudo, collaboratori) per una somma compresa nel due per cento dell'importo lavori, ai sensi del comma 5, art. 92, del D. Lgs 163/2006*
27.7.2012	*Perviene missiva da parte del Comune di Caramanico*	*Tramissione copia conforme del 1° verbale della Conferenza del 14.06.2012 e del 2° verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16.07.2012.*

27.7.2012	*Perviene nota Commissario Delagato Aterno - Pescara, prot. 229 - Genio Civile PE, Presidente Prov. PE, CS.*	*Il Commissario Delegato Emergenza Fiume Aterno - Pescara, in riferimento alla nota Prot. 157657/RA acquisita con Ns Prot. 214, conferma e ribadisce al Genio Civile Regionale di Pescara, la necessità di avviare urgentemente il quadro di azioni che consentirebbero, se realizzate in modo organico, di mitigare notevolmente il grave rischio idraulico a cui è soggetto il territorio vallivo del Fiume Pescara.*
27.7.2012	*Perviene nota Regione Abruzzo, Servizio OM e AM - CS*	*La Regione Abruzzo – Servizio O.M. e A. M., con nota Prot. 175584/RA del 27.07.2012, acquisita con Ns Prot. 230/CS del 27.07.2012 (in riferimento alla nota Prot. 127496/R.A., acquisita con Ns Prot. 198/CS), chiede nuovamente un incontro al fine di avviare urgentemente le procedure di approvazione del progetto preliminare per l'intervento previsto nel Comune di Martinsicuro.*
1.8.2012	*Giunge missiva dalla Città di Pescara prot. 233/CS*	*Richiesta autorizzazione per impegni di spesa*
1.8.2012	*Riunione interna Ufficio Commissariale*	*Sono stati predisposti/aggiornati i seguenti atti: Relazione per Ministro richiesta per la convocazione del giorno 09.08.2012; Relazione Trimestrale 31.07.2012; nota per Città di Pescara*
2.8.2012	*Trasmissione Atto – Prot. 234/CS - a:* - *Ministro MATTM*	*Relazione generale per preparazione degli argomenti di discussione relativi all'incontro del 9 agosto 2012 (come richiesta dal sig, Ministro con nota prot. 000154 del 26.07.2012, acquisita con ns prot. 232/CS del 31.07.2012).*
7.8.2012	*Riunione interna Ufficio Commissariale*	*Vengono predisposti i seguenti atti:* *1 - nota prot. 239/CS, alla Città di Pescara, in riferimento alle note prot. 104809 e prot. 104423 del 27.07.2012.* *2 - nota prot. 240/CS, al Comune di Carsoli, in riferimento alla nota prot. 6584 dell'11.07.2012 .*
7.8.2012	*Trasmissione nota prot. 238/CS, a Direzione Regionale, Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa*	*Attuazione Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Abruzzo. Comunicazioni e chiarimenti in merito all'avvio delle opere*
9.8.2012	*Riunione presso il MATTM, presieduta dal Sig. Ministro, convocata con nota prot. 000154 del 26.07.2012, acquisita con ns prot. 232 del 31.07.2012, a cui hanno preso parte tutti i Commissari Straordinari per l'Emergenza Idrogeologica.*	*Resoconti in merito allo stato di attuazione degli Accordi di Programma per gli interventi nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico.* *Il Ministro indica, nella persona del Direttore Generale ing. Mauro Luciani, la persona referente per tutti i Commissari.* *Inoltre, chiede a tutti i Commissari:* o *una relazione, entro il 23 agosto, perché questi diano suggerimenti – sulla base delle loro esperienze – riguardo possibili atti migliorativi (anche normativi) finalizzati alla gestione dei lavori;* o *suggerimenti per una strategia complessiva nazionale sul dissesto idrogeologico, mirata ad uniformare le modalità di azione dei Commissari.*

16.8.2012	Giunge nota dalla Direzione LL. PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile	Con tale atto, la Direzione Regionale sollecita la predisposizione degli atti strettamente necessari a non interrompere il procedimento avviato inerente la Convenzione stipulata per l'intervento da realizzarsi nel Comune di Martinsicuro
21.8.2012	Giunge nota da parte del Comune di Carsoli	Conferma della partecipazione all'incontro fissato per il 6.9.2012
22.8.2012	Trasmissione atto, prot. 244/CS, a: • Ministro MATTM; • Direttore Generale ing Mauro Luciani; • A tutti i Commissari Straordinari al Dissesto Idrogeologico	Consegna, al Ministro, p.c. al Direttore Generale ing. Mauro Luciani, p.c. a tutti i Commissari Straordinari al Dissesto Idrogeologico, della Relazione richiesta dal Ministro alla data del 9.8.2012
24.8.2012	Viene bandita la gara ad evidenza pubblica per l'intervento per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno dall'Aquila a Molina Aterno	Viene dato ordine di pubblicazione del Bando di Gara su: Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee; Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana "Il sole 24 Ore"; "Il Corriere della Sera"; "Il Messaggero", ed. locale "Abruzzo" "Il Centro"; sito Web MATTM, sezione Bandi
28.8.2012	Incontro tra il Commissario e il Direttore Generale ing. Mauro Luciani	L'incontro è avvenuto sulla base delle informazioni raccolte nella riunione del 2 agosto. Alla presenza del suo staff, il direttore Luciani chiede a me Commissario – tra l'altro - i criteri di organizzazione dell'Ufficio commissariale anche riguardo gli aspetti propriamente economici. Io Commissario ribadisco quanto già espresso puntualmente nella Relazione trasmessa, come richiesto, entro il 23.8.2012. Il Direttore Luciani afferma di non aver ricevuto la citata Relazione, da me trasmessa in data 22.8.2012, prot. 244/CS. Io Commissario ne predispongo immediatamente il nuovo invio.
31.8.2012	Perviene missiva da R.A., Direzione LL. PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del suolo e della Costa, Protezione Civile	Si richiedono chiarimenti sull'attuazione degli interventi
4.9.2012	Richiesta di visione atti da parte di 2 ditte interessate alla partecipazione al bando sull'Aterno/Pescara	Incontro con il RUP e acquisizione delucidazioni in merito
6.9.2012	Riunione col RUP incaricato	Sono stati trattati diversi aspetti: progettuali, il ritardo

	(Carsoli), presso l'Ufficio commissariale	*rispetto alla tempistica stimata nel cronoprogramma, indicazioni per velocizzare la cantierizzazione*
6.9..2012	*Predisposizione nota per la R.A, in uscita con prot. 268/CS (in risposta alla nota prot. n. 189993/RA 2012)*	*in riferimento alla nota prot. RA/189993 2012 - sono esposti: 1. stato d'attuazione degli interventi già avviati; 2. una possibile procedura per risolvere il problema della gestione dei Fondi FAS.*
10.8.2012	*Perviene nota prot. 269/CS Parco Naturale Regionale Sirente Velino*	*L'Ente sostiene che il tratto del Fiume Aterno, dell'abitato di Siffe, per 25 km è interamente ricompreso nel Parco che è quindi tenuto per Legge a rilasciare il proprio parere in merito al progetto*
10.8.2012	*Riunione Ufficio Commissariale con RUP Aterno/Pescara*	*In merito alla questione sollevata dall'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino (rif. nota prot. 269/CS)*
10.8.2012	*Riunione Ufficio Commissariale con rappresentanti di INVITALIA*	*In merito agli accordi siglati in convenzione e alle mansioni cui destinare il personale concesso da INVITALIA*
12.8.2012	*Predisposizione note prot. 273-4-5-6/CS*	*per sollecitare le procedure di affidamento lavori ai Comuni di Carsoli, Caramanico, Francavilla al Mare e la Provincia di Teramo*
13.09.2012	*Missiva inviata al Comune di Carsoli*	*Si sollecita l'elaborazione di un rapporto sullo stato d'attuazione dell'intervento, nonché il prosieguo delle fasi di affidamento lavori in tempi rapidi pena la risoluzione dalla Convenzione siglata in data 27 gennaio 2012*
13.09.2012	*Missiva inviata al Comune di Caramanico*	*Si sollecita l'elaborazione di un rapporto sullo stato d'attuazione dell'intervento, nonché il prosieguo delle fasi di affidamento lavori in tempi rapidi*
13.09.2012	*Missiva inviata al Consorzio di Bonifica Centro*	*Si sollecita l'elaborazione di un rapporto sullo stato d'attuazione dell'intervento, nonché il prosieguo delle fasi di affidamento lavori in tempi rapidi*
13.09.2012	*Missiva inviata alla Provincia di Teramo*	*Si sollecita l'elaborazione di un rapporto sullo stato d'attuazione dell'intervento, nonché il prosieguo delle fasi di affidamento lavori in tempi rapidi*
14.8.2012	*Predisposizione nota prot. 280/CS destinata alla società Beta Studio*	*Richiesta di disponibilità a svolgere l'incarico di Direzione Lavori per l'intervento sul Fiume Aterno (a seguito delle pertinenti verifiche normative)*
17.9.2012	*Giunge comunicazione telefonica da parte del. Sindaco di Roccacasale*	*Il sindaco richiede indicazioni per procedere con l'intervento. Viene spiegato che le procedure saranno possibili solo a seguito di ricevimento dei fondi utili*
19.9.2012	*Stipula di Convenzione con INVITALIA*	*La Convenzione prevede l'uso di una risorsa a vantaggio dell'Ufficio commissariale, deputata ad azioni di supporto all'attuazione del Cronoprogramma*
19.9.2012	*Sopralluogo nei territori oggetto delle azioni di Avvalimento*	*Il sopralluogo è stato eseguito al fine di istruire la risorsa umana pervenuta da INVITALIA: rapporti con gli Enti*

		Avvalsi per il continuo monitoraggio delle azioni
20.9.2012	*Missiva inviata alla Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa*	*Chiarimenti riguardo l'attuazione degli Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Abruzzo – Convenzione interventi sulla costa*
25.8.2012	*Incontri interni all'Ufficio del Commissario*	*Per:* - *Disposizioni personale;* - *Definizione possibili date per sopralluogo sull'area interessata all'intervento sull'Aterno/Pescara*
27.9.2012	*Consulto con legale dell'Ufficio Commissariale*	
27.9.2012	*Missive inviate a: Comune Caramanico, Comune Carsoli, Consorzio di Bonifica Centro, Città di Pescara, Provincia di Teramo*	*Attuazione interventi Accordo di Programma del 16 settembre 2010. Elementi chiarificatori in ordine alle convenzioni di avvalimento*
27.9.2012	*Riunione interna all'Ufficio Commissariale*	*In particolare, per la valutazione delle modalità di affidamento DL e Coord. Sic. Dell'intervento Aterno/Pescara e per il riesame dell'offerta economica presentata da Beta Studio Srl*
28.9.2012	*Giunge comunicazione dal MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche*	*Rapporta circa l'emissione del titolo di spesa per provvedere al trasferimento della somma complessiva di € 10.017.229,24 a valere sulla contabilità speciale aperta a mio nome.*
28.9.2012	*Perviene missiva da parte di Beta Studio Srl*	*Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del torrente Raio e del fiume Aterno dall'Aquila a Molina Aterno. 1° lotto – Zona Industriale di Pile (AQ). Direzione Lavori, Contabilità, Assistenza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. Trasmissione offerta economica.*
1.10.2012	*Trasmissione di missiva alla Beta Studio Srl*	*Riscontro trasmissione dell'offerta economica per Direzione Lavori, Contabilità, Assistenza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione*
1.10.2012	*Riunioni interne all'Ufficio Commissariale*	*Per concordare:* - *le date di possibili sopralluoghi sull'Aterno/Pescara;* - *la nota di riscontro all'offerta della Beta Studio Srl;* - *le modalità di aggiornamento della conoscenza riguardo lo stato dell'arte dei lavori avviati e in avviamento*
3.10.2012	*Giunge Nota prot. 302/CS, da parte di Beta Studio*	*La Beta Studio srl, trasmette l'offerta economica rivisitata secondo quanto previsto dal Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (€ 117.023,11 IVA esclusa) con l'applicazione delle riduzioni richieste dal Commissario*

3.10.2012	*Giunge Nota prot. 299/CS da parte del Comune di Corfinio*	*il Comune di Corfinio comunica di aver appreso, dalla Regione Abruzzo, l'accredito di circa € 10.000.000 a completamento dell'intero pacchetto finanziario di € 40.750.000. Richiesta di chiarimenti*
3.10.2012	*Invio Nota prot. 300/CS al Comune di Corfinio*	*Il Commissario Straordinario evidenzia che: l'effettivo trasferimento dei restanti fondi non è ancora avvenuto; l'intervento in oggetto è già stato considerato di preminente urgenza e sarà cura dell'Ufficio Commissariale avviare le procedure propedeutiche alla cantierizzazione appena possibile*
4.10.2012	*Perviene nota da parte del RUP nominato per l'intervento Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno*	*Delega a presenziare al sopralluogo del 04.10.2012 di cui all'art. 4 del bando di gara*
4.10.2012	*Sopralluogo sul Fiume Aterno*	*Il sopralluogo si è reso necessario a seguito dell'esplicita richiesta di Imprese interessate a partecipare al Bando per l'affidamento dei lavori sull'Aterno/Pescara, gestiti direttamente dall'Ufficio Commissariale*
5.10.2012	*Nota prot. 304/CS del Consorzio di Bonifica Centro*	*Il Consorzio comunica la nomina del Direttore, ing. Tommaso Valerio a responsabile del procedimento, in sostituzione della Dott.ssa Angela Berarducci che comunque svolgerà funzioni di supporto al RUP*
9.10.2012	*Riunione interna dell'Ufficio Commissariale*	*Rimodulazione "compenso professionale per direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere" presentato da Beta Studio in data nota prot. 650/12, acquisita con prot. 302/CS del 03.10.2012 (anticipata via fax) in vista dell'incontro pomeridiano con il responsabile della medesima società*
9.10.2012	*Riunione interna dell'Ufficio Commissariale, in presenza di esperto legale*	*L'incontro è stato mirato all'acquisizione del parere legale in merito alle modalità di affidamento della direzione lavori, nel rispetto di quanto stabilito dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE come recepite nel Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e relativo regolamento d'attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"*
11.10.2012	*Riunione interna Ufficio Commissariale*	*L'incontro è stato mirato ad esporre alla nuove risorsa professionale acquisita, proveniente da INVITALIA, lo stato dell'arte riguardo ogni interventi in essere*
11.10.2012	*Perviene nota del Comune di Carsoli prot. 308/CS*	*Il Comune di Carsoli, trasmette: 1. Documento Preliminare all'avvio della progettazione "Comune di Carsoli (AQ) – Bacino Nazionale del Fiume Tevere: Realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali" importo di progetto: 5.000.000 di euro; 2. Quadro Economico Preliminare - definizione delle categorie di*

		progettazione – ammontare spese tecniche; 3. Disciplinare di Gara; 4. Avviso di procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione e servizi connessi, importo superiore a 100.000,00 euro
12.10.2012	*Perviene nota dal Comune di Carsoli*	*Trasmissione di: 1. Documento Preliminare all'avvio della progettazione "Comune di Carsoli (AQ) – Bacino Nazionale del Fiume Tevere: Realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali" importo di progetto: 5.000.000 di euro; 2. Quadro Economico Preliminare - definizione delle categorie di progettazione – ammontare spese tecniche; 3. Disciplinare di Gara*
12. 10.2012	*Perviene nota da parte di Beta Studio Srl*	*La società trasmette l'offerta definitiva per i servizi di Direzione Lavori e Sicurezza, relativamente all'intervento sull'Aterno/Pescara*
15.10.2012	*Raccolta di informazioni sullo stato dei lavori delegati agli EE.LL. avvalsi*	*Sono state eseguite telefonate ai seguenti soggetti: RUP nominato dal Comune di Carsoli , RUP nominato dal Consorzio Bonifica Centro, supporto al RUP nominato dal Comune di Pescara, RUP nominato dalla Provincia di Teramo.* *L'obiettivo è stato quello di acquisire informazioni sullo stato di avanzamento delle azioni pertinenti ogni intervento.* *Ne è seguita la compilazione di un Report sulle citate argomentazioni*
16.10.2012	*Incontro interno all'Ufficio Commissariale*	*Analisi delle progettazioni pertinenti gli interventi prossimi alla cantierizzazione per illustrazione dei contenuti alla nuova risorsa professionale destinata al monitoraggio in loco. Organizzazione delle attività della nuova risorsa con fissazione delle date di sopralluogo.*
16.10.2012	*Incontro interno all'Ufficio Commissariale*	*Predisposizione nota prot. 310/CS per il Comune Carsoli*
16.10.2012	*Elaborazione documento*	*Predisposizione nota prot. 312/CS per Ditta G. & M. Lavori*
16.10.2012	*trasmissione missiva al Comune di Carsoli*	*Chiarimenti in merito alla missiva del 12.10.2012*
16.10.2012	*Trasmissione missiva all'Impresa G.& M. Lavori*	*Comunicazione di rinvio procedura aperta ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. A) del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno"*
23.10.2012	*Nota prot. 313/CS, CBC, RUP, ing. Tommaso Valerio*	*Convenzione del 19.01.2012 "Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo" - Relazione sull'attuazione del progetto in risposta alle richieste precedentemente avanzate*
23.10.2012	*Sopralluogo presso le sedi degli*	*Il sopralluogo ha sancito l'avvio delle attività della nuova*

	EE,LL. avvalsi – confronto coi RUP	*risorsa professionale.* *Ogni incontro presso gli Enti Avvalsi, è stato mirato all'azione di monitoraggio ed è stato formalizzato attraverso un verbale concordemente sottoscritto tra le parti*
24.10.2012	*Incontro interno all'Ufficio Commissariale*	*Organizzazione lavoro a seguire*
25.10.2012	*Incontro interno all'Ufficio Commissariale*	*Verifica delle azioni effettuate e approfondimento sui compiti di ogni risorsa umana*
30.10.2012	*Perviene nota dal Comune di Pescara, acquisita con prot. 328/CS*	*Con deliberazione di Giunta Comunale n. 691 del 25.10.2012 è stato approvato il progetto definitivo. Inoltre, in merito alla possibilità prevista dall'art. 10, c. 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per il RUP di dotarsi di un supporto tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, per lo svolgimento dei compiti di propria competenza, il Comune richiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 29.600,00 per procedere a tale affidamento, ovviamente finanziabile con le somme in amministrazione del progetto e senza ulteriori spese per l'amministrazione*
02.11.2012	*Emessa nota prot. 330/CS*	*Trasmissione Relazione Trimestrale 30.10.2012 al Sig. Ministro*
05.11.2012	*Riunione interna del personale della struttura commissariale*	*Riunione per la sistematizzazione delle procedure di aggiornamento dei GANTT ritardi e la tenuta del diario giornaliero lavori per l'ottenimento una gestione unitaria delle informazioni relative ai lavori avviati ed in fase di avviamento*
07.11.2012	*Riunione della Commissione Giudicatrice della Gara d'Appalto dei lavori Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno -* *Prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice* *Note prot. 334/CS e 335/CS*	*Si è riunita nella Sala Stampa, al piano terra del MATTM, alle ore 10:00, la Commissione giudicatrice per procedere all'apertura dei 22 plichi pervenuti, all'esame della documentazione contenuta nella "Busta Documenti" e "Busta Offerta Tecnica" e contestualmente, ai sensi del p. 13 del Bando di gara, alla verifica:* *a) della correttezza formale della documentazione trasmessa ed in caso negativo all' esclusione dalla gara* *b) di eventuali forme di divieto a partecipare previste dal d.lgs.n.163/2006;* *Dall'analisi della documentazione è emersa:* *- n. 1 una istanza formalmente irregolare di cui si provvederà all'esclusione (le esclusioni saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica);* *- n. 1 una istanza incompleta (predisposta richiesta integrazioni);* *Nella medesima circostanza il Presidente di Commissione dispone:* *- con nota prot. 334/CS del 07.12.2012, una richiesta di chiarimenti, all'Impresa Edile Stradale di Pacifici Emidio, sulle modalità di esecuzione lavori previste per le categoria OG8 e OG13. Tali chiarimenti dovranno pervenire entro 5*

		gg solari consecutivi, pertanto entro il 12 c.m., pena l'esclusione dalla gara; *- con nota prot. 335/CS del 07.12.2012, all'ATI Coget S.r.l. e all'ATI Settembre Costruzioni Generali S.r.l. una richiesta di documentazione ex art. 48, c. 1 del d.lgs. 163/2006 con la quale si invitano a presentare entro 10 (dieci) giorni e cioè entro e non oltre il 19 p.v. alle ore 10:00 tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti secondo quanto disposto dal disciplinare di gara*
07/8.11.2012	*Sopralluoghi:* *Comune di Carsoli - Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali; Comuni di Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona - Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo; Città di Pescara - messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo"*	*La risorsa umana dedicata esegue il secondo sopralluogo presso i Comuni di Carsoli, Francavilla al Mare e la Città di Pescara, redigendo appositi verbali, controfirmati dai RUP*
13.11.2012	*Sopralluoghi* *Provincia di Teramo - Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano nei Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi; Comune di Caramanico - Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del fiume Orta - Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme, (1° stralcio funzionale)*	*La risorsa umana dedicata esegue il secondo sopralluogo presso il Comuni di Caramanico e la Provincia di Teramo redigendo appositi verbali, controfirmati dai RUP;*
13.11.2012	*Riunione programmatica tra personale interno*	*Per: sistematizzazione delle procedure di aggiornamento dei GANTT ritardi e di tenuta del diario giornaliero lavori per l'ottenimento di una gestione unitaria delle informazioni relative ai lavori avviati ed in fase di avviamento*
21.11.2012	*Riunione programmatica tra personale interno*	*In tale circostanza:* *- è stato aggiornato il diario giornaliero lavori;* *- sono state fissate le date per i prossimi sopralluoghi nelle giornate del 27 e 28 novembre*
22.11.2012	*Perviene Nota dal Comune di Caramanico Terme*	*Il Comune di Caramanico, con nota prot. 7385 del 26.10.2012, in seguito alla Conferenza dei Servizi tenutasi a luglio, trasmette il progetto esecutivo redatto dall'ing.*

		Claudio Alberico. Sulla scorta degli studi e progetti precedenti vengono valutate le opere più idonee per la sistematizzazione sia dell'ambito fluviale sia del versante in destra idrografica del fiume Orta, in modo da ridurre e mitigare la tendenza erosiva con incassamento dell'alveo, sia dei fianchi vallivi in corrispondenza dei quali si sviluppano le aree urbanizzate e le arterie stradali di collegamento. L'importo complessivo lavori ed oneri sicurezza ammonta a 622.427,70 euro, da quadro economico
28.11.2012	*Riunione interna*	*Contenuti: analisi dei verbali di sopralluogo.* *Dall'analisi e valutazione dei verbali sono emerse alcune richieste comuni agli Enti Avvalsi, quali:* *- indicazioni di dettaglio riguardo alla procedura da adottare per le liquidazioni e i pagamenti; possibilità e modalità di eventuale utilizzo dei poteri straordinari conferiti al Commissario Straordinario con il DPCM del 20.06.2011, art. 1, commi 2 e 3, riguardo all'utilizzo di procedure semplificate e tempistiche ridotte per conferenze dei servizi, occupazioni d'urgenza, espropriazioni;* *- partecipazione di un rappresentante commissariale alle sedute delle Commissioni giudicatrici;* *unitamente ad altre a carattere puntuale:* *- la Città di Pescara - Intervento per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo" – notifica di aver trasmesso una richiesta di autorizzazione in merito alla possibilità prevista dell'art. 10, c. 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per il RUP di dotarsi di un supporto tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, per lo svolgimento dei compiti di propria competenza;* *- il Comune di Carsoli - Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali - notifica di aver trasmesso una richiesta alla Regione Abruzzo (e, p.c. al Commissario) di nomina di un referente tecnico che possa affiancare il RUP e collaborare con l'Ufficio Tecnico in relazione alla funzioni di competenza regionale stabilite dalla Convenzione*
04.12.2012	*Perviene nota dal Comune di Martinsicuro, acquisita con prot. 351/CS*	*Erosione della Costa a Martinsicuro - Richiesta attivazione finanziamento. Il Comune richiama all'attenzione commissariale la situazione gravosa in cui versa il litorale della Città in conseguenza delle mareggiate delle ultime settimane che in alcuni casi potrebbero mettere a rischio l'incolumità dei cittadini che risiedono nelle adiacenze del lungomare. Tanto esposto, alla luce dello stanziamento dei fondi inserito nell'Accordo di Programma del 16 settembre 2010 tra MATTM e Regione Abruzzo per il Comune di Martinsicuro, si sollecita il rapido intervento Commissariale*
05.12.2012	*Riunioni interne al personale*	*Per:* *- definizione modalità e tempi d'esecuzione dei prossimi sopralluoghi (12/13.12.2012) presso enti avvalsi e modalità di predisposizione dei relativi*

		verbali. - *predisposizione note di sollecito e chiarimenti vari agli enti avvalsi*
6.12.2012	*Missiva prot. 356/CS inviata al Comune di Martinsicuro*	*Erosione della Costa a Martinsicuro - Richiesta attivazione finanziamento. Il Commissario Straordinario, con nota prot.356/CS del 06.12.2012, in riferimento alla nota prot. 32167 del 04.12.2012, acquisita con prot. 351/CS del 04.12.2012, trasmessa dal Comune di Martinsicuro - "Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento" riguardante il territorio di Martinsicuro (TE) - espone quanto segue:* *- le somme stanziate per l'intervento sopraccitato ad oggi non sono ancora disponibili (somme imputate sui Fondi FAS);* *- il 27.03.2012 è stata sottoscritta una Convenzione tra il Commissario Straordinario e la Regione Abruzzo con cui è stato accettato da questa il ruolo di Ente Attuatore responsabile dell'esecuzione e dell'attuazione tecnico/amministrativa dell'intervento in oggetto, proprio al fine di velocizzarne le procedure d'attuazione.* *Inoltre, il Commissario Straordinario rammenta che, in data:* *- 10.09.2012 ha espresso il proprio parere in merito agli elaborati progettuali preliminari relativi all'intervento di cui trattasi alla Regione Abruzzo;* *- 20.09.2012 in attesa dei necessari chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo dei Fondi FAS destinati alle azioni commissariali ha invitato la Regione Abruzzo a procedere con propri mezzi all'attuazione degli interventi sulla Costa*
6.12.2012	*Missiva prot. 354/CS inviata alla Città di Pescara*	*Il Commissario Straordinario richiede all'Ente un'esplicazione dettagliata delle motivazioni che lo inducono a dotarsi di nuovo personale. In particolare l'Ente Avvalso, aveva richiesto l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 29.600,00 per dotare il RUP di un supporto tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, per lo svolgimento dei compiti e attività di propria competenza, secondo quanto previsto dell'art. 10, c. 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*
6.12.2012	*Missiva prot. 355/CS, inviata a tutti gli Enti Avvalsi*	*Il Commissario Straordinario, rilevati importanti scollamenti temporali tra i tempi d'attuazione degli interventi avviati e quanto dichiarato nei singoli cronoprogrammi redatti in sede di Convenzione, invita ciascun Ente Avvalso ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali dei cronoprogrammi, andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi*
10.12.2012	*Perviene nota del Comune di Corfinio, acquisita con prot. 359/CS*	*Il Comune, con nota prot. 6666 del 10.12.2012, comunica che:* *- il Progetto Esecutivo è completo di tutte le autorizzazioni;* *- sono in fase di predisposizione gli atti di gara per l'affidamento dei lavori.*

		Richiede, pertanto, che siano comunicati tempestivamente eventuali motivi ostativi all'avvio delle procedure propedeutiche alla cantierizzazione
11.12.2012	*Quarto sopralluogo della risorsa umana dedicata presso gli Enti Avvalsi*	*I sopralluoghi hanno riguardato:* *- Comune di Carsoli - Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali;* *- Città di Pescara - Intervento per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo";* *- Provincia di Teramo - Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano nei Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi;* *- Comuni di Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona (Consorzio di Bonifica Centro) - Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo;* *- Comune di Caramanico - Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del fiume Orta - Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme, (1° stralcio funzionale);*
12.12.2012	*Riunioni interne al personale*	*Per:* *- verifica dei verbali di sopralluogo;* *- predisposizione di un archivio dei verbali;* *- definizione dello stato delle varie attività*
12.12.2012	*Perviene nota della Provincia di Teramo, acquisita con prot. 362/CS*	*La Provincia di Teramo, con nota prot. 309253 del 30.11.2012, trasmette copia del Progetto Indagini Geologiche propedeutiche alla Relazione Geologica, per la verifica di congruità. La campagna geognostica, prevista dal Capitolato Prestazionale allegato, si prefigge come obiettivo la modellazione geologica e geotecnica, nonché la valutazione del rischio sismico, in considerazione alle risorse economiche da computo metrico estimativo. Questa dovrà essere espletata nel tempo massimo di 30 gg continuativi a partire dalla data della consegna delle indagini geologiche e geotecniche*
12.12.2012	*Perviene nota del Comune di Carsoli, acquisita con prot. 361/CS*	*Il Comune di Carsoli, con nota prot. 11112 del 29.11.2012, richiede:* *- indicazioni formali circa le modalità da seguire per quanto attiene le fasi di liquidazione e pagamento delle spese riferibili all'intervento in argomento;* *- schemi e modelli di ausilio in formato digitale*
13.12.2012	*Perviene nota della Città di*	*La Città di Pescara, con nota prot. 168604 del 13.12.2012*

	Pescara, acquisita con prot. 363/CS	*(riferimento alla ns. prot. 354/CS del 06.12.2012), elenca puntualmente quali sono le prestazioni amministrative/informatiche di attività di supporto al RUP che ai sensi dell'art. 10, c. 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 intende affidare a personale esterno:* *- la predisposizione e cura delle comunicazioni all'AVCP;* *- gli adempimenti previsti dalla normativa in merito alla pubblicità pre, post e durante l'espletamento della gara di aggiudicazione;* *- la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 e ss. mm. e ii. del D. Lgs. 163/2006;* *- la verifica della sussistenza di tutti i requisiti per le fasi successive all'aggiudicazione definitiva del soggetto aggiudicatario e dei subappaltatori in occasione di ogni SAL;* *- il controllo di tutti gli atti contabili redatti dall'Ufficio DL e delle relative liquidazioni;* *L'Ente richiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 29.600,00 per procedere a tale affidamento, ovviamente finanziabile con le somme in amministrazione del progetto e senza ulteriori spese rispetto al quadro economico di progetto*
13.12.2012	*Missiva prot. 365/CS del Commissario Straordinario*	*Il Commissario Straordinario, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni degli Enti Avvalsi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011, espone che qualora fossero interessati all'utilizzo delle:* *1. procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante Conferenza dei Servizi (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio commissariale;* *2. Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere allo scrivente Ufficio l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU;* *Si coglie inoltre l'occasione per ribadire la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara*
14.12.2012,	*Missiva prot. 368/CS del Commissario Straordinario*	*Il Commissario Straordinario, in risposta alla nota prot. 11112 del 29.11.2012 del Comune di Carsoli, comunica a questi e, per conoscenza a tutti gli Enti Avvalsi che per le liquidazioni dovranno far pervenire, nei limiti del Quadro Economico approvato, i Certificati di Pagamento ogni qual volta necessario*
18.12.2012	*Missiva prot. 372/CS del Commissario Straordinario*	*Il Commissario Straordinario, in riferimento alla nota prot. 6666 del 10.12.2012 trasmessa dal Comune di Corfinio, ribadisce che pur valutando in modo positivo la volontà manifestata dall'Ente nel procedere verso la cantierizzazione, non può autorizzarne l'avvio in quanto:* *- non sono ancora state trasferite le risorse, necessarie ad attivare l'intervento, alla Contabilità Speciale aperta a*

		nome del Commissario medesimo; *- non avendo stipulato la Convenzione d'Avvalimento, presupposto necessario all'avvio dei lavori, qualsiasi azione intrapresa dall'Ente sarà esclusivamente a suo carico*
18.12.2012	*Missiva prot. 373/CS del Commissario Straordinario*	*Il Commissario Straordinario, in riferimento alla nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012 trasmessa dal Comune di Pescara e per conoscenza a tutti gli Enti Avvalsi, ribadisce che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per l'amministrazione. Qualsiasi spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente*
20.12.2012	*Perviene nota prot. 378/CS della Provincia di Teramo*	*La Provincia di Teramo trasmette la Determina Dirigenziale n° 1143 dell'11.12.2012 di approvazione del quadro economico dei costi necessari per lo svolgimento della campagna di indagini geognostiche a supporto della relazione geologica e relativa alla Progettazione Definitiva/Esecutiva*
24.12.2012	*Perviene nota prot. 8908 del 24.12.2012, acquisita con prot. 380/CS del 27.12.2012, in riferimento alla nota prot. 355/CS del 06.12.2012.*	*L'Ente comunica che in data 20.12.2012 è stata espletata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. Pertanto il cronoprogramma viene rettificato come segue:* *- 20.12.2012 – gara per l'affidamento dei lavori;* *- gennaio/aprile – contratto e consegna lavori;* *- ottobre/novembre – chiusura lavori e collaudo.* *La durata complessiva dei lavori rimane immutata in 22 mesi, con ultimazione prevista per novembre 2013*

PAGINA BIANCA

A cura del Commissario Straordinario Delegato per il dissesto idrogeologico della Regione Abruzzo

CRONOPROGRAMMA

TASK 1 - INVARIATA

MODIFICHE PREVISIONALI **TASK 1 bis – 1 Gennaio 2012**

AGGIORNAMENTI **TASK 2 – 31 Dicembre 2012**

IL DIAGRAMMA DI GANTT *(note per la lettura)*

In generale

- **Il diagramma di Gantt** mette in relazione ogni progetto con il tempo disponibile per la sua attuazione.
- Il **mese 1** corrisponde all'attivazione del procedimento Commissariale (nomina Commissario 8 marzo 2011).
- E' un diagramma attivo, con due **Task** per ogni opera:
  - l'una di **previsione** (campita in sede di programmazione di virtuale obiettivo cioè di definizione del Cronoprogramma ufficiale di riferimento)
  - l'altra di **esecuzione** (questa viene campita in corso d'opera).

LEGGENDA


	interventi di cui è pervenuta documentazione progettuale (parziale o complessiva)
	tempi finora spesi per la ricezione del materiale (nella Task 2)
	tempi di definizione progettuale (da disposizione commissariale). Nel caso di progettazioni definitive, la presenza dell'azzurro segnala la rilevazione di mancanze di documentazione da colmare.
	tempi per gli espropri (e l'approvazione progettuale, qualora si necessitasse di ulteriore tempo da sovrapporre al precedente)
	tempi per gli appalti (procedure di gara, pubblicazioni, aggiudicazioni e firma contratti)
	tempi per l'esecuzione degli interventi, incluse l'inizio lavori (1 mese) e la consegna degli stessi(certificato di ultimazione)
	tempi per la valutazione commissariale a seguito degli interventi e a seguito del collaudo. momento che dispone di un tempo utile anche ad eventuali azioni correttive oggi non valutabili
	ulteriore tempo a disposizione del Commissario, impiegabile o meno, per eventualità e approfondimenti – qualora necessari – sul lavoro svolto.
	tempi per il collaudo
	Slittamento del Cronoprogramma
	Ritardi nell'esecuzione delle opere

- ***La rappresentazione grafica è una semplificazione espositiva che non rispecchia la reale consecutività delle differenti fasi operative ma ne delimita i confini utili alla stima dei tempi complessivi di attuazione.***
- ***Nel redigere i Gantt si è tenuto debito conto del grado di definizione del materiale progettuale finora pervenuto alla gestione commissariale e delle esigenze espresse da alcuni degli interlocutori diretti (EE.LL.).***
- ***I lavori con caratteristiche di particolare urgenza (come da indicazioni emerse in fase organizzativa) sono segnalati con nota in testa ai diagrammi specifici.***
- ***la Task 1 (bis) riguarda il rapporto tra la previsione generale del Cronoprogramma e la più recente previsione di quelle opere in avvalimento o in via di avvalimento. Le variazioni sostanzialmente scaturiscono dal confronto con le esigenze degli Enti attuatori.***

Gantt per ogni opera

I Gantt specifici sono suddivisi in **WPs (pacchetti di lavoro)**, a loro volta ripartiti in Task, ognuna delle quali è affidata ad uno o più soggetti attivi.
In sede avanzata, ad ogni Gantt sarà associata la tabella relativa alle WPs, necessaria a dettagliare gli elementi fondamentali da estrarre dal Gantt, per una lettura più immediata.
Ancora, vi sarà associata la tabella delle **Deliverables (momenti fissati per il raggiungimento di specifici obiettivi)**. I riferimenti saranno sempre estraibili nel Gantt relativo (valida per ognuno dei cronoprogrammi specifici).
Per ultima, sarà associata la tabella delle **Milestones (o momenti di grande importanza),** da intendersi orientate prevalentemente alle azioni di valutazione del programma e del percorso. Risulta fondamentale per esaminare, approvare e validare le azioni (valida per ognuno dei cronoprogrammi specifici).

Cronoprogramma – Diagramma di Gantt

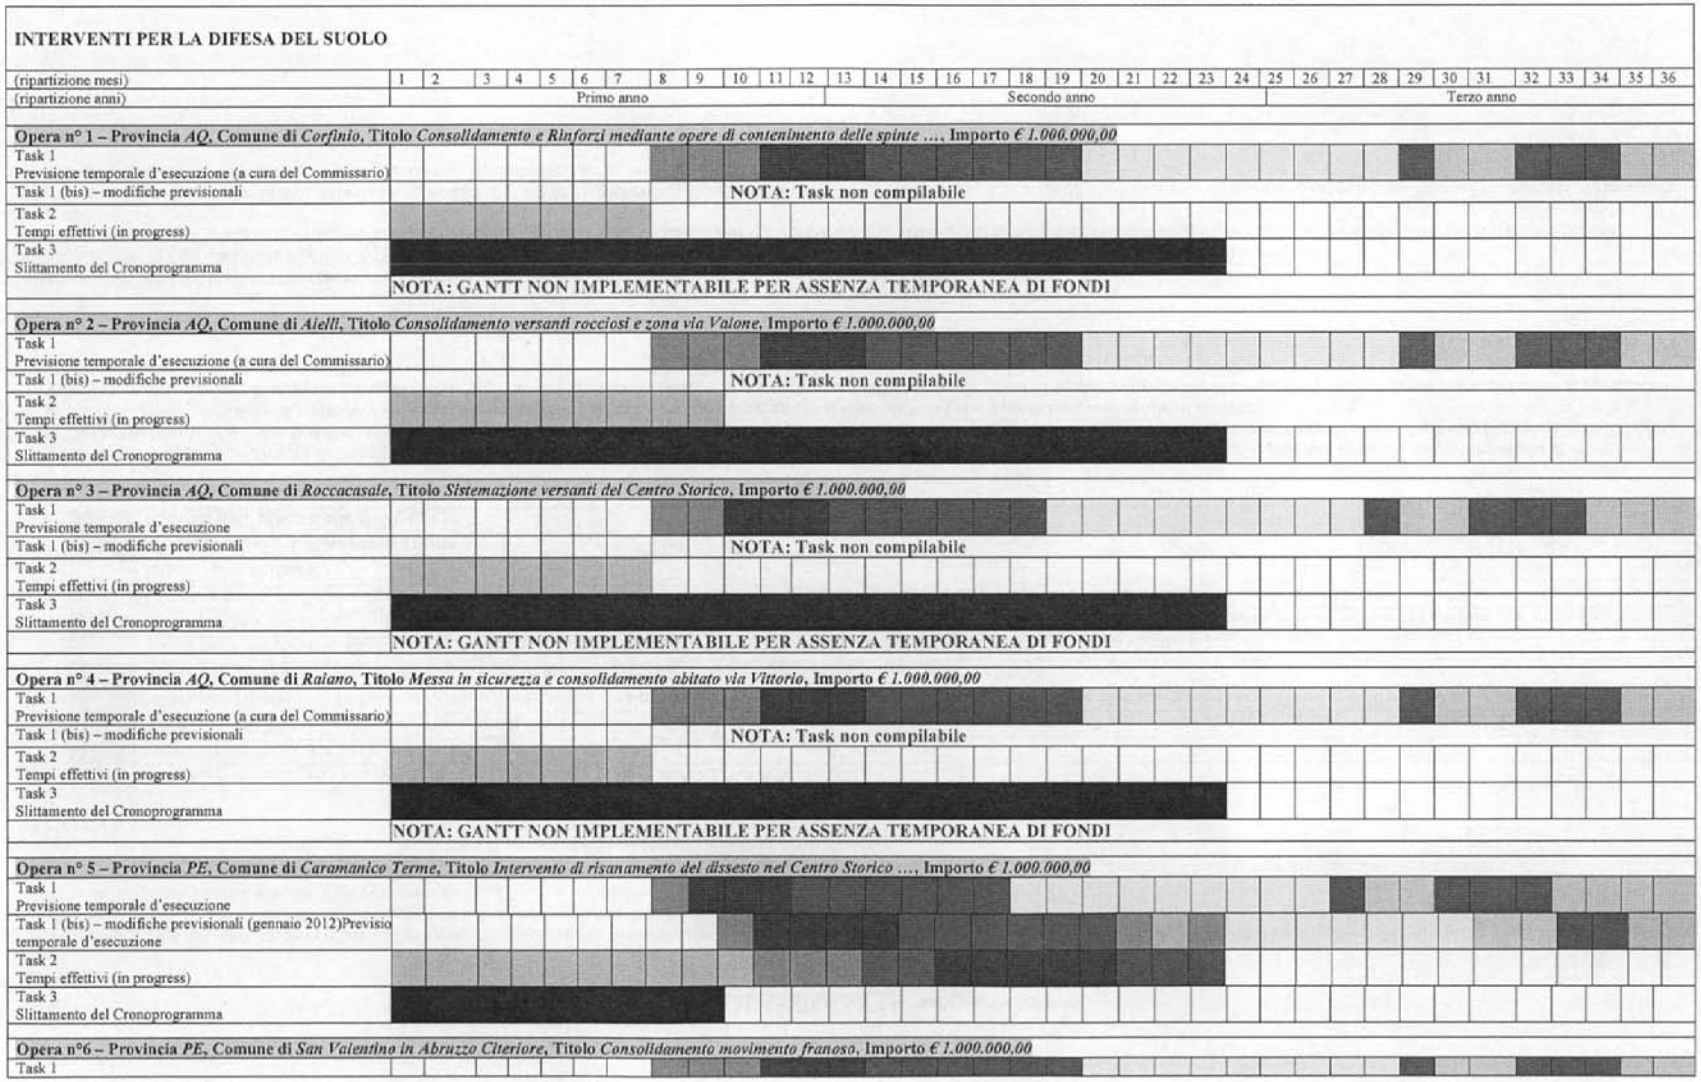

Cronoprogramma – Diagramma di Gantt

Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali	NOTA: Task non compilabile
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI
Opera n° 7 – Provincia *PE*, Comune di *Sant'Eufemia a Maiella*, Titolo *consolidamento e risanamento idrogeologico*, Importo *€ 1.000.000,00*	
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali	NOTA: Task non compilabile
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI
Opera n° 8 – Provincia *TE*, Comune di *Isola del Gran Sasso*, Titolo *Mitigazione rischio idrogeologico*, Importo *€ 1.000.000,00*	
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali	NOTA: Task non compilabile
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI
Opera n° 9 – Provincia *TE*, Comune di *Castelli*, Titolo *Consolidamento versante ovest del Centro Storico*, Importo *€ 1.000.000,00*	
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali	NOTA: Task non compilabile
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI
Opera n°10 – Provincia *TE*, Comune di *Civitella del Tronto*, Titolo *Messa in sicurezza movimento franoso …*, Importo *€750.000,00*	
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali	NOTA: Task non compilabile
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI
Opera n° 11 – Provincia *CH*, Comune di *Treglio*, Titolo *Consolidamento corona di frana*, Importo *€ 1.000.000,00*	
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali	NOTA: Task non compilabile
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI


Cronoprogramma – Diagramma di Gantt

Opera n° 12 – Provincia *CH*, Comune di *Vasto*, Titolo *Consolidamento costone orientale zona Piazza Marconi*, Importo *€ 1.000.000,00*	
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali	NOTA: Task non compilabile
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI

INTERVENTI PER LA DIFESA DEI FIUMI

(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno											
Opera n° 1 – Provincia *AQ*, Comune di *Carsoli*, Titolo *Realizzazione vasca di espansione sul torrente Valle Mura*, Importo *€ 5.000.000,00*																																				
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione																																				
Task 1 (bis) – modifiche previsionali (gennaio 2012) Previsione temporale d'esecuzione																																				
Task 2 Tempi effettivi (in progress)																																				
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma																																				
Opera n° 2 – Provincia *AQ*, Comune di *L'Aquila*, Titolo *Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale …*, Importo *€ 3.800.000,00*																																				
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione																																				
Task 1 (bis) – modifiche previsionali (gennaio 2012) Previsione temporale d'esecuzione																																				
Task 2 Tempi effettivi (in progress)																																				
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma																																				
Opera n° 3 – Provincia *PE*, Comune di *Pescara*, Titolo *Opere idrauliche finalizzate al risanamento idrogeologico … - Aterno/Pescara*, Importo *€ 3.600.000,00*																																				
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione																																				
Task 1 (bis) – modifiche previsionali (gennaio 2012) Previsione temporale d'esecuzione																																				
Task 2 Tempi effettivi (in progress)																																				
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma																																				
Opera n° 4 – Provincia *TE*, Comuni di *Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi*, Titolo *Ripristino difese spondali del Fiume Vomano …*, Importo *€ 3.600.000,00*																																				
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione																																				
Task 1 (bis) – modifiche previsionali (gennaio 2012) Previsione temporale d'esecuzione																																				
Task 2 Tempi effettivi (in progress)																																				
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma																																				
Opera n° 5 – Provincia *CH*, Comuni di *Francavilla al mare, Miglianico e Ortona*, Titolo *Realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro …*, Importo *€ 5.000.000,00*																																				

Cronoprogramma – Diagramma di Gantt



INTERVENTI PER LA DIFESA DELLA COSTA

(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno											

Opera n° 1 – Provincia *TE*, Comune di *Martinsicuro*, Titolo *Difesa della costa (barriere e rinascimento)*, Importo *€ 3.000.000,00*

Task 1 Previsione temporale d'esecuzione	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali	NOTA: Task non compilabile
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI

Opera n° 2 – Provincia *TE*, Comune di *Roseto degli Abruzzi*, Titolo *Difesa della costa (barriere e rinascimento)*, Importo *€ 3.000.000,00*

Task 1 Previsione temporale d'esecuzione	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali	NOTA: Task non compilabile
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI

Opera n° 3 – Provincia *CH*, Comune di *Francavilla al mare*, Titolo *Difesa della costa (barriere e rinascimento)*, Importo *€ 2.000.000,00*

Task 1 Previsione temporale d'esecuzione	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali	NOTA: Task non compilabile
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI

RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 5 - *"Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del Fiume Orta - Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme (1° stralcio funzionale)"*
Ambito: Difesa del suolo - Provincia di Pescara – Comune: Caramanico – importo 1.000.000,00 € (acquisita progettazione esecutiva).

(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno											
Task 1 previsione temporale d'esecuzione																																				
Aggiornamento Cronoprogramma al 24.12.2012 (come trasmesso dall'Ente prot. 380/CS)																																				
Riferimenti importanti							A	B	C		D	E				F1	F2			G H	I L	L M														
Assenza fondi																																				
Condizioni meteo										2	2	2																								
Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di A d P					1	1			3	3																										
Impedimenti da parte di Enti avvalsi ed Enti Terzi												4	4	4	4	5	5	5	5	6	6															
Varianti in corso d'opera																																				
Sopravvenute disposizioni normative																																				
Cause impreviste e imprevedibili																																				

RITARDI	
Ritardo	**Note**
1	Ritardo per: • mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto. Infatti dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso confronto epistolare, come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Regione a sollecitare gli EE.LL. interessati all'Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile. (All. da 1.1 a 1.6)
2	Ritardo per avverse condizioni metereologiche. (All. 2)
3	Ritardo dovuto ad una serie di atteggiamenti ostativi e missive pretestuose inviate dalla Regione Abruzzo contenenti varie richieste, tra cui quella del trasferimento delle risorse necessarie per gli interventi della *difesa del suolo*, alla propria Direzione LL.PP., in virtù della L.R. 81/1998 *Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.* (All da 3.1 - 3.2)
4	Ritardo dovuto: • al necessario adeguamento/aggiornamento della progettazione definitiva; • alla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di risorse professionali in grado di svolgere la progettazione esecutiva e direzione lavori; (All. 4.1 - 4.2)
5	Ritardo dovuto allo slittamento della chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi, a causa delle richieste di integrazione/modifica del progetto definitivo, avanzate da alcuni degli Enti invitati per l'acquisizione dei diversi pareri tra cui: la Regione, il Genio Civile di Pescara, l'Ente Parco Nazionale della Majella, l'Ente - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE – PESCARA (Comando Provinciale di Pescara del Corpo Forestale dello Stato). La chiusura dei lavori, prevista per il giorno 04.07.2012 è avvenuta il 16.07.2012. (All. 5.1 – 5.5)
6	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. Il cronoprogramma, su richiesta Commissariale, è stato rettificato dall'Ente e il ritardo precedentemente accumulato è stato gestito lasciano comunque immutata la durata complessiva dei lavori in 22 mesi, con ultimazione prevista per novembre 2013. (all. 7)

RIFERIMENTI			
	Data	**Documento**	**Contenuto**
A	13/22.09.2011	Progettazione preliminare/definitiva.	Trasmissione atti progettuali dalla Direzione Regionale e dal Comune di Caramanico Terme.
B	06.10.2011	Comunicazione della Direzione Regionale LL.PP. d'Abruzzo	Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili.
C	4/6.11.2011	Determinazione della Regione Abruzzo DC21/60 del 18 agosto 2011 – accertamento e accreditamento II tranche di fondi da parte della R. Abruzzo.	Presa nota del trasferimento di fondi, per la somma di € 14.512.939,53 (quale scarto tra € 20.732.770,76 in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli precedentemente già accreditati, pari a € 6.219.831,23 come da Determinazione della Regione Abruzzo).

D	20.01.2012	Convenzione	Firma Convenzione tra Commissario Straordinario, Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del suolo e il Comune di Caramanico Terme (PE). Con la firma della Convenzione, contenete l'Ordinanza di avvalimento, il Commissario ha dato formalmente avvio all'esecutività dell'intervento. La Convenzione viene sottoscritta in assenza (non giustificata) del convocato Direttore Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo.
E	17.03.2012	Nota prot. 1885, acquisita con prot. 120/CS del 28.03.2012.	Trasmissione progetto definitivo, ai fini della convocazione della Conferenza dei Servizi. Il progetto, dell'importo di 1.000.000,00 € è uno stralcio di un progetto generale *Risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme*, dell'importo complessivo di 6.900.00,00 €, redatto da un gruppo comunale di tecnici fra cui l'ing. Alberico Claudio (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 09.06.2011). Lo stesso presentava carenze in merito al Quadro Economico, elaborato quale parte di un più ampio programma d'interventi, dunque con costi progettuali non riferibili allo specifico stralcio di competenza Commissariale. Tale ragione ha reso necessaria una verifica con conseguente rettifica del quadro economico in vista della prossima convocazione della Conferenza dei Servizi prevista per il giorno 14.06.2012.
F1	14.06.2012	I Conferenza dei Servizi (All. 5.1 – 5.2)	Convocazione Conferenza dei Servizi e contestuale trasmissione del progetto definitivo.
F2	16.07.2012	II Conferenza dei Servizi (All. 5.3 – 5.4 – 5.5)	Il giorno 16.07.2012 presso la sede Comunale de L'Aquila, alle ore 11:00, ha avuto luogo la Conferenza dei Servizi di chiusura lavori per l'intervento. Partecipano su delega Commissariale, l'arch. Rossi e il rag. Antonetti. E' approvato il progetto definitivo con qualche modifica di lieve entità da apportare direttamente sul progetto esecutivo.
G	15.10.2012	Comunicazione Telefonica - RUP, geom. De Ingeniis	si apprende che: • il progetto definitivo è stato trasmesso alla Giunta per l'approvazione definitiva; • la progettazione esecutiva è stata affidata direttamente ad un tecnico esterno al Comune (ai sensi del combinato disposto degli art. 91, c. 2 e 125 c. 11 del D. Lgs 163/2006, i servizi tecnici di importo inferiore a 40.000,00 € possono essere affidati direttamente dalla Stazione Appaltante previa indicazione dei medesimi nel Regolamento Interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia); • la consegna del progetto esecutivo è prevista per il 26 ottobre p.v.; • la direzione lavori sarà affidata direttamente ad un professionista esterno (già individuato); • la Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori verrà selezionata entro dicembre mediante procedura negoziata con invito rivolto a 10 ditte, senza pubblicazione di bando (art. 122, c. 7 D. Lgs 163/2006, importo lavoro superiore a 500.000,00 €);
H	29.10.2012	Progetto Esecutivo (All. 6.1 – 6.2)	Trasmissione del progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7371 del 25.10.2012.
I	27.11.2012	Determina 169 – 170 (all. 7)	Istituzione Ufficio Direzione Lavori e nomina Collaudatore.
L	28.11.2012 20.12.2012	Trasmissione inviti alle 10 Ditte per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata – Aggiudicazione provvisoria; (All. 8)	• Procedura negoziata con invito rivolto a 10 ditte (art. 57, c. 6 del D. Lgs. 163/06), senza pubblicazione di bando (art. 122, c. 7 del D. Lgs 163/2006, importo lavoro superiore a 500.000,00 € e inferiore ad 1.000.000,00 €); • trasmissione inviti il 28.11.2012; • aggiudicazione provvisoria all'Impresa Di Persio Costruzioni Srl il giorno 20.12.2012;
M	24.12.2012	Aggiornamento Cronoprogramma (All. 8)	L'Ente comunica che in data 20.12.2012 è stata esperita la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. A partire da tale data viene rettificato il Cronoprogramma lavori.

ALLEGATI AI RITARDI

All. n°	Data	Documento	Contenuto
1.1	19.07.2011	Nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.: • il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma;
1.2	04.08.2011	Nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti Regione Abruzzo.	Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: • della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; • del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma);
1.3	04.08.2011	Nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP	• Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); • modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori).
1.4	05.08.2011	Nota prot. 165880/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del 04.08.2011.	La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1.5	10.08.2011	Nota prot. 008/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario sollecita: • il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma; • trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi;
1.6	30.08.2011	Nota prot. 177524/RA	La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: • accelerazione dei tempi; • l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi;
2	12.2011 -01.2012 - 02.2012	Bollettini meteo	Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/.
3.1	28.12.2011	Nota prot. 269648/RA – attuazione interventi	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita ulteriormente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti secondo *L. R. 81/1998*.
3.2	09.01.2012	Nota prot. 005/CS	Il Commissario Straordinario espone quanto segue: • non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti; • non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi; • la normativa regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione; • viene ribadito che gli interventi avocati dal Direttore Regionale (compreso Carsoli) sono di competenza commissariale;
4.1	07.03.2012	Verbale	Vengono approfonditi alcuni temi di particolare rilevanza per le azioni a seguire: • stato delle progettazioni (l'Amministrazione è in possesso di un progetto definitivo); • Conferenza di Servizi; • eventuali espropriazioni e la possibilità di ricorrere a provvedimento d'urgenza (il Comune rappresenta l'assenza di aree da assoggettare ad espropriazioni).
4.2	07.05.2012	Nota prot. 170/CS - Sollecito	In seguito alla riunione del 07.03.2012 il Commissario sollecita l'Ente Avvalso a: • convocare la Conferenza dei Servizi; • indire la procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto di servizi in questione.
5.1	26.05.2012	nota prot.3801, acquisita con prot. 189/CS - indizione e convocazione Conferenza dei Servizi per il giorno 14.06.2012	Indizione e convocazione, ex art. 14 della L. 241/90 e ss.mm. e ii. e trasmissione contestuale del progetto definitivo con le modifiche apportate.
5.2	14.06.2012	Verbale Conferenza dei Servizi	In sede di riunione sono state avanzate richieste di integrazione/modifica del progetto definitivo, da alcuni degli Enti invitati per l'acquisizione dei pareri.

			• Per la Regione (Servizio Difesa del Suolo e per il Servizio per la Sicurezza idraulica) sono intervenuti l'ing. Dionisi e l'ing. Cofini che hanno consegnato memoria scritta con le osservazioni e richieste di integrazioni al progetto presentato. • Per il Genio Civile di Pescara interviene l'ing. Iervese il quale, fa presente che il corso d'acqua ha un regime idraulico torbolento riconducibile alle pendenze di versante e d'alveo e che questo motivo da luogo ad instabilità sia per la sicurezza idraulica che per la parte geologica. Richiede pertanto, oltre all'integrazione dello studio di compatibilità idraulica, di integrare con appositi elaborati gli aspetti sopra evidenziati perché allo stato attuale queste discrasie non consentono di esprimere un parere favorevole. • Per l'Ente Parco Nazionale della Majella interviene il dott. Andrisano, il quale rammenta che gli interventi si trovano all'interno di un sito ZPS e SIC, rappresenta pertanto la necessità che il progetto sia integrato da uno studio di una valutazione di incidenza. Fa rilevare, inoltre, che all'interno del progetto, si prevede anche la realizzazione di una strada e pertanto chiede se si tratta di una pista di servizio per la realizzazione dei lavori previsti in progetto, nel qual caso, una volta terminati i lavori si richiede di riportare il ripristino delle condizioni ante operam. Chiede, inoltre, se le briglie vecchie saranno riattivate o ripristinate e di poter acquisire lo studio di massima complessivo dell'intera area. • Per l'Ente - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE – PESCARA (Comando Prov.le di Pescara del Corpo Forestale dello Stato), prende la parola Ing. Macino il quale, contestualmente a questo intervento richiede di conoscere quali siano gli interventi previsti a sistemare e consolidare dal punto di vista idraulico e forestale tutto il pendio che dal fiume va verso il centro abitato oggetto di consolidamento, supportati da relativa verifica di stabilità. Nel rappresentare che molte delle briglie esistenti sono danneggiate per effetto del fenomeno della "segatura", chiede di conoscere quali siano gli interventi messi in progetto per evitare che detto intervento possa verificarsi nuovamente. Tutta la sistemazione dell'alveo nel tratto d'interesse è sostenuta a valle da una briglia già esistente, chiede che preliminarmente sia eseguita un'attenta verifica per valutare lo stato della medesima; nel calcolo idraulico delle briglie deve essere eseguita la relativa verifica al sifonamento. La gabbionata posta a difesa spondale deve essere adeguatamente proletta dal trasporto solido. Inoltre è opportuno prevedere un piano di manutenzione delle opere in progetto. Conferma, infine, la necessità della valutazione d'incidenza e chiede di verificare "in situ" la fattibilità della strada di accesso al cantiere. Il Presidente, alla luce degli interventi verbalizzati, al fine di poter ottenere il nulla osta necessario per la valutazione d'incidenza ambientale ritiene opportuno sospendere i lavori e rinviarli ad una successiva seduta (già ipotizzata per il giorno 4 luglio p.v.).
5.3	15.06.2012	Nota prot. 4311 acquisita con prot. 203/CS del 15.06.2012 – convocazione riunione tecnica.	Il Comune di Caramanico indice un incontro tecnico, per il 19.06.2012 alle ore 10.00 presso la sede del Comune, per definire computalmente le tipologie di alcuni interventi di progetto. Sono convocati: • Regione, • Corpo Forestale, • Genio Civile, • Parco Nazionale della Maiella, • RUP.
5.4	05.07.2012	Nota prot. 4769 acquisita con prot. 217/CS del 17.07.2012	Il Responsabile del Procedimento, Geom. De Ingeniis, indice e convoca la Conferenza dei Servizi di chiusura lavori per il giorno 16.07.2012, alle ore 11.00, presso il Palazzo TAR a L'Aquila. Viene trasmesso contestualmente il progetto definitivo unitamente alle integrazioni prodotte. Sono formalmente invitati a partecipare: • Commissario Straordinario; • Soprintenderza per i beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo; • Regione Abruzzo – Servizio Difesa del Suolo; • Regione Abruzzo – Ispettorato Dipartimentale delle Foreste; • Regione Abruzzo – Servizio Difesa del Suolo del Genio Civile Regionale di Pescara; • Parco Nazionale di Majella; • Regione Abruzzo – Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale;
5.5	18.07.2012	Nota prot. 5049, acquisita con prot. 228 del 27.07.2012	Trasmissione copia conforme del 1° verbale della Conferenza del 14.06.2012 e del 2° verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16.07.2012.
6.1	26.10.2012	Nota prot. 7396, acquisita con prot. 322/CS	Il Comune di Caramanico, in riferimento alla richiesta avanzata dal Commissario con nota prot. 274/CS del 13.09.2012, comunica che: • 20.01.2012 - firma della Convenzione tra Commissario, Regione Abruzzo e Comune di Caramanico Terme; • 14.06.2012 – I Conferenza dei Servizi; • 16.07.2012 – II Conferenza dei Servizi; • 25.10.2012 – approvazione progetto esecutivo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103; • a breve sarà attivata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori.
6.2	29.10.2012	nota prot. 7385	Trasmissione progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale (delibera n. 103).
7	11.12.2012	Verbale di sopralluogo n. 4	Il RUP riferisce che è stata affidata la Direzione Lavori e individuato il collaudatore con Determina n. 169 -170 del 27.11.2012.
8	24.12.2012	nota prot. 8908, acquisita con prot. 380/CS del 27.12.2012	L'Ente comunica che in data 20.12.2012 è stata espletata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. Il cronoprogramma viene rettificato come segue: • 20.12.2012 – gara per l'affidamento dei lavori; • gennaio/aprile – contratto e consegna lavori; • ottobre/novembre – chiusura lavori e collaudo. La durata complessiva dei lavori rimane immutata in 22 mesi, con ultimazione prevista per novembre 2013.

RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 1 "Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Vallemura e difese spondali"
Ambito: Difesa dei Fiumi - Provincia di L'Aquila – Comune: Carsoli – importo complessivo 5.000.000 € - primo stralcio 3.000.000 € (acquisito Studio di Fattibilità e DPP).

(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno											
Task 1 previsione temporale d'esecuzione																																				
In attesa che l'Ente trasmetta la nuova previsione temporale d'esecuzione																																				
Riferimenti importanti						A		B	C		D						E1 E2		F-G	H	H	H H1														
Assenza fondi																																				
Condizioni meteo										2																										
Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di A d P					1	1			3	3																										
Impedimenti da parte di Enti avvalsi													4	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6													
Varianti in corso d'opera																																				
Sopravvenute disposizioni normative																																				
Cause impreviste e imprevedibili																																				

RITARDI	
Ritardo	**Note**
1	Ritardo per: • mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto. Infatti, dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alle Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso confronto epistolare, come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Regione a sollecitare gli EE.LL. interessati dall'Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile. (All. da 1.1 a 1.6)
2	Ritardo per avverse condizioni metereologiche. (All. 2)
3	Ritardo dovuto ad una serie di atteggiamenti ostativi e missive pretestuose inviate dalla Regione Abruzzo con svariate richieste tra le quali il trasferimento delle risorse necessarie per lo svolgimento degli interventi nei Comuni di L'Aquila, Carsoli, Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona, alla propria Direzione Regionale LL.PP., ai sensi della *L. R. 81/1998*. (All. da 3.1 a 3.4)
4	Ritardo dovuto: • alla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di risorse professionali disponibili all'esecuzione delle successive fasi di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) nonché, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e assistenza alla direzione lavori; • adeguamento/aggiornamento Studio di Fattibilità; (All. 4.1 – 4.2 – 4.3)
5	Ritardo dovuto, come rilevato dall'Ente ad alcune criticità emerse nel corso della verifica dello *"Studio di Fattibilità per la messa in sicurezza idraulica del Centro abitato di Carsoli (AQ) – Nodo Idraulico"* redatto da Beta Studio e acquisito agli atti dal Commissario in data 30.08.2011 (comprendente una Cassa di espansione sul Torrente Vallemura, sistemazioni idrauliche e ambientali e una cassa di espansione integrativa) la cui risoluzione, ha determinato una notevole dilatazione temporale in quanto il RUP ha ritenuto necessario rivisitare: • lo Studio suddetto sulla base delle condizioni in loco in modo da ridurre il notevole impatto dell'intervento sulle attività antropiche presenti nell'area ove è stata localizzata la vasca di espansione in oggetto; • il quadro economico dello stesso essendo emerse discordanze importanti in relazione alle previsioni di spesa in quanto, le risorse assegnate al Commissario Straordinario per questo intervento risultano pari a € 5.000.000,00. La soluzione determinata dal Comune è illustrata nel Documento Preliminare all'avvio della progettazione *"Comune di Carsoli (AQ) – Bacino Nazionale del Fiume Tevere: Realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali"* importo di progetto: 5.000.000 di euro; (All.5)
6	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. In seguito alla pubblicazione del Bando per l'acquisizione delle prestazioni tecniche e attività connesse (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, coordinamento sicurezza) sono pervenute 22 istanze. La Commissione di Gara è stata nominata. Tale collegio, secondo quanto comunicato dal RUP, concluderà i propri lavori entro il mese di gennaio. Inoltre, nonostante le note prot. 273/CS del 13.09.2012 e 355/CS del 06.12.2012 con cui il Commissario Straordinario ha richiesto la rettifica/aggiornamento del cronoprogramma lavori e la puntuale motivazione dei suddetti ritardi l'Ente non ha ancora provveduto.

RIFERIMENTI			
	Data	**Documento**	**Contenuto**
A	16.08.2011 - 30.08.2011	• Nota prot. n. 171139/RA - lo Studio di Fattibilità; • nota prot. 177204/RA, acquisita con prot. 006/CS del 30.08.2011 - integrazione dello Studio di Fattibilità;	La Direzione Regionale LL.PP, Ufficio Tecnico per i Bacini Idrografici trasmette: • lo Studio di fattibilità; • una integrazione dello Studio di Fattibilità;

B	06.10.2011	Comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili.
C	4/6.11.2011	Determinazione della Regione Abruzzo DC21/60 del 18 agosto 2011 – accertamento e accreditamento II trance di fondi da parte della Regione Abruzzo.	Trasferimento di fondi, per la somma di € 14.512.939,53 (quale scarto tra € 20.732.770,76 in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli precedentemente già accreditati, pari a € 6.219.831,23 come da Determinazione della Regione Abruzzo).
D	27.01.2012	Convenzione - prot. 028/CS	Firma Convenzione tra Commissario Straordinario, Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del suolo e della Costa e Comune di Carsoli (AQ). Con la firma della Convenzione, contenete l'Ordinanza di avvalimento, il Commissario ha dato formalmente avvio all'esecutività dell'intervento. La Convenzione è siglata con verbale di assenza del firmatario regionale e l'impegno del Commissario a raccogliere le firme necessarie presso la Regione Abruzzo.
E1	13.07.2012	Elaborati di gara (disciplinare e bando) - nota prot. 6637 acquisita con prot. 216/CS del 13.07.2012 (All. 4.4)	Il Comune trasmette gli elaborati di gara approvati in data 05.07.2012 con determinazione del Responsabile del Servizio. La gara avrà ad oggetto l'appalto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti l'esecuzione delle seguenti prestazioni: • progettazione preliminare; • progettazione definitiva; • progettazione esecutiva; • coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; • attività tecnico–amministrative connesse alle progettazioni (esecuzione di indagini e rilievi); • redazione del piano particellare di esproprio; • esecuzione della direzione ed assistenza dei lavori;
E2	11.07.2012	Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione - nota prot. 6584, acquisita con prot. 227/CS del 23.07.2012. (All. 4.5)	Il Comune di Carsoli, rappresenta quanto segue: • 05.07.2012 con determina n. 226, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, sono stati approvati il Documento Preliminare alla Progettazione, lo Schema di Bando per l'acquisizione dei servizi tecnici di Progettazione, DL, accessori, lo Schema di Disciplinare di gara relativo al Bando; • settembre 2012 – marzo 2013 previsto affidamento incarico di progettazione; • giugno 2013 – previsto inizio dei lavori; • maggio/giugno 2014 previsti completamento dei lavori e collaudo; il tempo assegnato precedentemente per la fine dei lavori, di mesi 28 decorrenti dal 15 febbraio 2012, è quindi confermato al 15 giugno 2014;
F	06.09.2012	Incontro con RUP, ing. Quinto D'Andrea, presso MATTM.	In tale sede: ✓ è stato evidenziato un notevole ritardo rispetto alla tempistica stimata nel cronoprogramma; ✓ sono state fornite le indicazioni per un ridimensionamento dello stralcio progettuale, necessario sia da un punto di vista planimetrico che economico; ✓ sono state date indicazioni di massima per ottimizzare le fasi successive ed avviare il più rapidamente possibile la cantierizzazione;
G	03.10.2012	Documento Preliminare all'avvio della progettazione (All. 5)	Trasmissione: ✓ Documento Preliminare all'avvio della progettazione "Comune di Carsoli (AQ) – Bacino Nazionale del Fiume Tevere: Realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali" importo di progetto: 5.000.000 di euro; ✓ Quadro Economico Preliminare - definizione delle categorie di progettazione – ammontare spese tecniche; ✓ Disciplinare di Gara; ✓ Avviso di procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione e servizi connessi, importo superiore a 100.000,00 euro;
H	22.10.2012	Pubblicazione Bando: ✓ data di attivazione: lun 22.10.2012; ✓ data di scadenza: ven 07.12.2012; (All. 6)	Pubblicazione del bando: *Affidamento dell'incarico di progettazione e servizi connessi dei lavori denominati "Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dell'abitato di Carsoli".* data di attivazione: lun 22.10.2012; data di Scadenza: ven 07.12.2012; importo a base di gara, al netto dell'IVA, pari a € 5.00.000,00.
H1	07.12.2012	Scadenza del termine di presentazione istanze (All.7 – verbale sopralluogo n. 4)	Pervenute 22 istanze. L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In attesa di nomina della Commissione giudicatrice. I tempi entro cui dovranno essere espletati i servizi richiesti sono così suddivisi: - progettazione preliminare, esecuzione dei rilievi topografici preliminari ed esecuzione delle indagini geognostiche preliminari: entro 2 mesi dalla data di stipula del contratto; - progettazione definitiva, esecuzione dei rilievi topografici ed esecuzione delle indagini geognostiche: entro 2 mesi dalla data di approvazione del progetto preliminare; - progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: entro 2 mesi dalla data di approvazione del progetto definitivo;

ALLEGATI AI RITARDI			
All. n°	**Data**	**Documento**	**Contenuto**
1.1	19.07.2011	Nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.: • il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro), • tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma;
1.2	04.08.2011	Nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti R.A.	Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: • della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; • del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma);
1.3	04.08.2011	nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	• Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); • modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori).
1.4	05.08.2011	Nota prot. n. 165880/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del 04.08.2011.	La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1.5	10.08.2011	Nota prot. n. 008/CS	Il Commissario Straordinario sollecita: • il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma; • trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi;
1.6	30.08.2011	Nota prot. n. 177524/RA	La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede:

			• accelerazione dei tempi; • l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi;
2	12.2011 - 01.2012 - 02.2012	Bollettini meteo	Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/;
3.1	06.12.2011	Nota prot. 252582/RA, acquisita con prot. 033/CS del 12.12.2011– proposta di intervento.	La Regione Abruzzo sollecita il trasferimento delle risorse alla propria Direzione LL.PP. per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di: • L'Aquila (AQ); • Carsoli (AQ); • Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona;
3.2	15.12.2011	Nota prot. 261403/RA acquisita con prot. 037/CS del 15.12.2011 – attuazione interventi.	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita l'urgente trasferimento delle risorse alla propria Direzione Regionale.
3.3	28.12.2011	nota prot. 265648/RA – attuazione interventi	
3.4	09.01.2012	nota prot. 005/CS (rif nota prot. 265648/RA del 28.12.2011)	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita ulteriormente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti secondo L. R. 81/1998. Il Commissario Straordinario espone quanto segue: • non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti; • non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi; • la normativa regionale, nello stato di commissariamento, non inovare applicazione; • viene ribadito che gli interventi avocati dal Direttore Regionale (compreso Carsoli) sono di competenza commissariale;
4.1	08.03.2012	Verbale	Vengono trattate le seguenti tematiche: 1. stato di attuazione dei lavori; 2. progettazioni; 3. conferenza dei servizi; 4. eventuali occupazioni d'urgenza ed esproprì. Si apprende inoltre che l'Ente attualmente è in possesso di uno Studio di Fattibilità abbastanza approfondito. Per quanto riguarda i livelli successivi di progettazione (preliminare e definitiva) il Comune dovrà procede alla verifica della disponibilità interna delle risorse necessarie.
4.2	19.03.2012	Nota prot. 2746 acquisita con prot. 121/CS del 28.03.2012 – ricorso all'individuazione esterna per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva, esecutiva e della direzione dei lavori.	L'Ente comunica alla Direzione Regionale LL.PP. (e, p.c. al Commissario Straordinario) che, a seguito di verifiche interne, pur disponendo di personale tecnico adeguato, non è nelle condizioni di poter rispettare i tempi di progettazione stabiliti in sede di Convenzione. Chiede all'Ente di verificare a sua volta l'eventuale disponibilità di risorse materiali e professionali interne per svolgere le attività tecniche necessarie all'intervento;
4.3	07.05.2012	Nota prot. 168/CS - Sollecito	Il Commissario Straordinario preso atto dell'impossibilità per l'Ente di procedere con risorse interne all'esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva ne autorizza e sollecita l'affidamento esterno attraverso le procedure ad evidenza pubblica previste dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e relativo Regolamento d'attuazione.
4.4	13.07.2012	Elaborati di gara (disciplinare e bando) - Nota prot. 6637 acquisita con prot. 216/CS del 13.07.2012	Il Comune trasmette gli elaborati di gara approvati in data 05.07.2012 con determinazione del Responsabile del Servizio. La gara avrà ad oggetto l'appalto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti l'esecuzione delle seguenti prestazioni: • progettazione preliminare; • progettazione definitiva; • progettazione esecutiva; • coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; • attività tecnico–amministrative connesse alle progettazioni (esecuzione di indagini e rilievi); • redazione del piano particellare di esproprio; • esecuzione della direzione ed assistenza dei lavori;
4.5	11.07.2012	Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione - nota prot. 6584, acquisita con prot. 227/CS del 23.07.2012.	Il Comune rappresenta quanto segue: • 05.07.2012 con determina n. 226, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, sono stati approvati il Documento Preliminare alla Progettazione, lo Schema di Bando per l'acquisizione dei servizi tecnici di Progettazione, DL, accessori, lo Schema di Disciplinare di gara relativo al Bando; • settembre 2012 – marzo 2013 previsto affidamento incarico di progettazione; • giugno 2013 – previsto inizio dei lavori; • maggio/giugno 2014 previsti completamento dei lavori e collaudo; il tempo assegnato precedentemente per la fine dei lavori, di mesi 28 decorrenti dal 15 febbraio 2012, è quindi confermato al 15 giugno 2014.
5	03.10.2012	Nota prot. 9121, acquisita con prot. 308/CS del 12.10.2012 (	Il Comune rileva che, nel corso della verifica dello *"Studio di Fattibilità per la messa in sicurezza idraulica del Centro abitato di Carsoli (AQ) – Nodo Idraulico"* redatto da Beta Studio e acquisito agli atti dal Commissario in data 30.08.2011 (comprendente una Cassa di espansione sul Torrente Vallemura, le sistemazioni idrauliche e ambientali e una cassa di espansione integrativa), sono emerse alcune criticità la cui risoluzione, ha determinato una notevole dilatazione temporale in quanto l'Ente ha ritenuto necessario rivisitare: ✓ lo Studio suddetto sulla base delle condizioni in loco in modo da ridurre il notevole impatto dell'intervento sulle attività antropiche presenti nell'area ove è stata localizzata la vasca di espansione in oggetto; ✓ il quadro economico dello stesso essendo emerse discordanze importanti in relazione alle previsioni di spesa in quanto, le risorse assegnate al Commissario Straordinario per questo intervento risultano pari a € 5.000.000,00. La soluzione individuata dal Comune è illustrata nella documentazione, trasmessa comprendente: ✓ Documento Preliminare all'avvio della progettazione *"Comune di Carsoli (AQ) – Bacino Nazionale del Fiume Tevere. Realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mure e difesa spondali"* importo di progetto: 5.000.000 di euro; ✓ Quadro Economico Preliminare - definizione delle categorie di progettazione – ammontare spese tecniche; ✓ Disciplinare di Gara; ✓ Avviso di procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), CSE, DL, misura e contabilità lavori, esecuzione rilievi e indagini), importo superiore a 100.000,00 euro. L'Ente, preso atto dei limiti finanziari previsti per la realizzazione del progetto pari a 5.000.000 di euro, comprensivi delle spese per lavori e per somme a disposizione dell'amministrazione, aventi copertura finanziaria mediante risorse assegnate al Commissario informa che: ✓ la soluzione ottimale da sviluppare a livello definitivo ed esecutivo dovrà essere compatibile con il finanziamento disponibile, pur se esso risulta notevolmente ridotto rispetto a quanto evidenziato nello Studio di Fattibilità realizzato dalla Regione Abruzzo; ✓ a livello di progettazione preliminare potranno invece essere contemplate anche soluzioni che prevedano importi superiori al finanziamento disponibile purché la loro realizzazione possa essere suddivisa in stralci funzionali il primo dei quali rientri nell'importo finanziato.
6	22.10.2012	Pubblicazione Bando	✓ data di attivazione: lun 22.10.2012; ✓ data di scadenza: ven 07.12.2012; *Avviso di procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione e servizi connessi importo superiore a 100.000,00 euro.* Gara per l'affidamento dei servizi di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi plano - altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori denominati "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dell'abitato di Carsoli (AQ)"; importo a base di gara, al netto dell'IVA, pari a € 5.00.000,00

7	12.12.2012	**Verbale** di Sopralluogo n. 4	Il RUP riferisce che: ✓ **Alla scadenza** del 07.12.2012 del bando relativo alla progettazione e altri servizi tecnici risultano pervenute n. 22 richieste di partecipazione; ✓ **Considerata** la mole di lavoro necessaria per la valutazione delle suddette offerte, ritiene necessario individuare una Commissione esaminatrice che possa garantire non solo la necessaria competenza tecnico- amministrativa ma anche una notevole disponibilità per fare in modo che i lavori vengano conclusi correttamente nel minor tempo possibile; la suddetta Commissione sarà nominata entro la settimana corrente e avrà l'obiettivo di concludere i propri lavori entro il 20.01.2012; ✓ Il maggior tempo richiesto è determinato dalla quantità delle offerte pervenute, certamente superiore a quello che si poteva prevedere per la tipologia di gara indetta, che richiede requisiti di qualificazione particolarmente restrittivi; ✓ Appena nominata la Commissione esaminatrice verrà inviata specifica nota al Commissario straordinario sullo stato di attuazione della procedura nonché l'aggiornamento del cronoprogramma, come richiesto con nota in data 06.12.2012 con prot. n. 355/CS, acquisita con prot. n. 11451 del 10.12.2012.

RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 5 "interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo" (suddiviso in 2 lotti)
Ambito: Difesa dei Fiumi - Provincia di Chieti – Comuni: Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona – importo complessivo 5.000.000 € - primo stralcio 3.000.000 € (acquisita progettazione preliminare).

(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno											
Task 1 previsione temporale d'esecuzione																																				
In attesa che l'Ente trasmetta la nuova previsione temporale d'esecuzione																																				
Riferimenti importanti							A	B	C		D					E			F		G														
Assenza fondi																																				
Condizioni meteo										2																										
Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di A d I					1	1			3	3																										
Impedimenti da parte di Enti avvalsi													4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6													
Varianti in corso d'opera																																				
Sopravvenute disposizioni normative																																				
Cause impreviste e imprevedibili																																				

RITARDI	
Ritardo	**Note**
1	Ritardo per: • mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto. Infatti dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso confronto epistolare, come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Regione a sollecitare gli EE.LL. interessati all'Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile. (All. da 1.1 a 1.6)
2	Ritardo per avverse condizioni metereologiche. (All. 2)
3	Ritardo dovuto ad una serie di atteggiamenti ostativi e missive pretestuose inviate dal Presidente della R. A. con svariate richieste tra le quali il trasferimento delle risorse necessarie per lo svolgimento degli interventi nei Comuni di L'Aquila, Carsoli, Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona, alla propria Direzione Regionale LL.PP., ai sensi della *L. R. 81/1998*. (All. da 3.1 a 3.4)
4	Il ritardo è dovuto: • al necessario adeguamento/aggiornamento della progettazione preliminare; • alla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di risorse materiali e professionali in grado di svolgere la progettazione definitiva con risorse interne; (All. 4.1 – 4.2 -4.3 – 4.4)
5	Ritardo dovuto ad una errata interpretazione delle norme procedurali illustrate nella Convenzione, in particolare all'art. 8 *(Verifiche e controlli)*. Il Consorzio, in forza di tale articolo, ha atteso l'approvazione del bando di gara ad evidenza pubblica per i servizi tecnici fino al chiarimento Commissariale (nota prot. 209/CS - vedi allegati) in cui si espone quanto segue: • l'art. 8 sopraccitato è una norma procedurale, pertanto l'intesa richiamata è da intendersi quale comunicazione interna tra il Commissario ed il RUP ma che non assume valore di efficacia e/o validità dell'atto assunto dal RUP; • non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RUP della Stazione Appaltante; • tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; (all. 5 - 6)
6	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. In seguito alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione (definitiva, esecutiva), e prestazioni accessorie sono pervenute 15 istanze. La commissione giudicatrice non è stata ancora nominata Inoltre, nonostante con nota 355/CS del 06.12.2012 il Commissario Straordinario ha richiesto la rettifica/aggiornamento del Cronoprogramma lavori e la puntuale motivazione dei suddetti ritardi l'Ente non ha ancora provveduto.

RIFERIMENTI			
	Data	**Documento**	**Contenuto**
A	30.09.2011	Atti progettuali dalla Direzione Regionale.	Studio di fattibilità.
B	06.10.2011	Comunicazione della Direzione Regionale d'Abruzzo	Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili.

C	4/6.11.2011	Determinazione della Regione Abruzzo DC21/60 del 18 agosto 2011 – accertamento e accreditamento II trance di fondi da parte della Regione Abruzzo	Trasferimento di fondi, per la somma di € 14.512.939,53 (quale scarto tra € 20.732.770,76 in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli precedentemente già accreditati, pari a € 6.219.831,23 come da Determinazione della Regione Abruzzo).
D	19.01.2012	Convenzione	Firma Convenzione tra Commissario Straordinario, Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del suolo e della Costa e il Consorzio di Bonifica Centro, Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro. Con la firma della Convenzione, contenete l'Ordinanza di avvalimento, il Commissario ha dato formalmente avvio all'esecutività dell'intervento. La Convenzione viene sottoscritta in assenza (non giustificata) del convocato Direttore Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo.
E	12.06.2012	Nota prot. 5384, acquisita con prot. 202/CS del 12.06.2012 - Progetto Preliminare (All. 4.3 – 4.4)	Il Consorzio di Bonifica Centro trasmette il progetto preliminare.
F	05.10.2012	Nota prot. 9477, acquisita con prot. 304/CS del 05.10.2012 (All. 6)	il Consorzio di Bonifica Centro, comunica la nomina del Direttore del Consorzio, ing. Tommaso Valerio, a responsabile unico del procedimento, in sostituzione della Dott.ssa Angela Berarducci che comunque svolgerà funzioni di supporto al RUP.
G	09.11.2012	Pubblicazione bando (All. 7)	Oggetto: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori, per un importo complessivo di € 198.840,45 al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali; Termine ultimo per presentazione istanze: 29/11/2012 alle 12:00; I termini di esecuzione previsti sono: • progettazione definitiva, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio: entro 60 gg dalla stipula del contratto; • progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: entro 60 gg dalla data di approvazione del progetto definitivo; importo base: € 198.840,36

ALLEGATI AI RITARDI

All. n°	Data	Documento	Contenuto
1.1	19.07.2011	Nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.: • il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma;
1.2	04.08.2011	Nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti Regione Abruzzo.	Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: • della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; • del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma);
1.3	04.08.2011	Nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP	• Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); • modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori).
1.4	05.08.2011	Nota prot. 165880/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del 04.08.2011.	La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1.5	10.08.2011	Nota prot. 008/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario sollecita: • il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma; • trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi;
1.6	30.08.2011	Nota prot. 177524/RA	La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: • accelerazione dei tempi; • l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi;
2	12.2011 -01.2012 - 02.2012	Bollettini meteo	Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/;
3.1	06.12.2011	Nota prot. 252592/RA, acquista con prot. 033/CS del 12.12.2011 – proposta di intervento.	La Regione Abruzzo sollecita il trasferimento delle risorse alla propria Direzione LL.PP., per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di: • L'Aquila (AQ); • Carsoli (AQ); • Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona;
3.2	15.12.2011	Nota prot. 261403/RA acquisita con prot. 037/CS del 15.12.2011 – attuazione interventi.	La Regione Abruzzo sollecita l'urgente trasferimento delle risorse alla propria Direzione LL.PP.
3.3	28.12.2011	Nota prot. 269648/RA – attuazione interventi	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita ulteriormente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti secondo *L. R. 81/1998*.
3.4	09.01.2012	Nota prot. 005/CS	Il Commissario Straordinario espone quanto segue: • non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti; • non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi; • la normativa regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione; • viene ribadito che gli interventi avocati dal Direttore Regionale (compreso Carsoli) sono di competenza commissariale;
4.1	07.03.2012 - 22.03.2012	Verbali	Vengono trattati i seguenti argomenti: 1. stato di attuazione dei lavori; 2. progettazioni; 3. conferenza dei servizi; 4. occupazioni d'urgenza ed espropri; L'Ente, che sta procedendo all'elaborazione con risorse interne degli atti progettuali preliminari, rileva l'impossibilità di procedere anche con la progettazione definitiva per indisponibilità di risorse interne sufficienti.
4.2	07.05.2012	Nota prot. 169/CS - Sollecito	Preso atto dell'estrema urgenza dell'attuazione dell'intervento e dell'impossibilità per l'Ente Avvalso di procedere con la progettazione definitiva per l'indisponibilità di idonee risorse interne il Commissario esorta l'Ente a procedere anche all'affidamento esterno delle attività sopra indicate.
4.3	12.06.2012	Nota prot. 5384, acquisita con prot. 202/CS del 12.06.2012 – trasmissione progetto preliminare	Il Consorzio di Bonifica Centro trasmette il progetto preliminare. Questo, in esecuzione delle disposizioni commissariali del 22.03.2012, sarà posto a base di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione ed assistenza dei lavori. Si allega congiuntamente lo schema di avviso e di disciplinare di gara per l'espletamento di detti servizi, per la loro approvazione. Infine il Consorzio rende noto che, una volta ottenute le suddette approvazioni e l'autorizzazione a procedere, si attiverà da subito per l'acquisizione delle autorizzazioni mediante la convocazione di apposita conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. ii.
4.4	20.07.2012	Nota prot. 223/CS	Si notifica all'Ente l'avvenuta ricezione della progettazione preliminare e si comunica che in merito non si evincono scostamenti dagli obiettivi tecnici disposti con l'Accordo di Programma;

5	27.09.2012	Nota prot. 290/CS	Il Commissario Straordinario, in riferimento alla Convenzione siglata con l'Ente e alla richiesta di approvazione relativa al bando di gara ad evidenza pubblica, secondo quanto indicato dall'art. 8 della Convenzione di avvalimento espone quanto segue: • l'art. 8 sopracitato è una norma procedurale, pertanto l'intesa richiamata è da intendersi quale comunicazione interna tra il Commissario ed il RUP ma che non assume valore di efficacia e/o validità dell'atto assunto dal RUP; • non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RUP della Stazione Appaltante; • tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del *Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*;
6	05.10.2012	Nota prot. 9477, acquisita con prot. 304/CS del 05.10.2012 (All. 6)	Il Consorzio di Bonifica Centro, comunica la nomina del Direttore del Consorzio, ing. Tommaso Valerio, a responsabile del procedimento, in sostituzione della Dott.ssa Angela Beraducci che comunque svolgerà funzioni di supporto al RUP;
7	08.11.2012	Pubblicazione Bando. *Realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il torrente Dendalo.*	oggetto: affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori; importo: € 198.840,45 al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali; termini di esecuzione previsti: • progettazione definitiva, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio: entro 60 gg dalla stipula del contratto; • progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: entro 60 gg dalla data di approvazione del progetto definitivo; scadenza 29.11.2012 ore 12:00.

RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 2 (OPERA URGENTE) "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno da L'Aquila a Molina Aterno" Ambito: Difesa dei Fiumi - Provincia di L'Aquila – Comune: L'Aquila – importo complessivo 3.800.000€ - (acquisita progettazione esecutiva).

(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno											
Task 1 previsione temporale d'esecuzione																																				
Aggiornamento previsione temporale d'esecuzione																																				
Riferimenti importanti							A	B	C						D		E	F	G	H		I													
Assenza fondi																																				
Condizioni meteo										2	2	2																								
Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di AdP ed Enti Terzi					1	1			3	3			4	4																						
Varianti in corso d'opera																																				
Sopravvenute disposizioni normative																																				
Cause impreviste e imprevedibili																																				

RITARDI

Ritardo	Note
1	Ritardo per: • mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto. Infatti dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso confronto epistolare, come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Regione a sollecitare gli EE.LL. interessati all'Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile. (All. da 1.1 a 1.6)
2	Ritardo per avverse condizioni metereologiche. (All. 2)
3	Ritardo dovuto ad una serie di atteggiamenti ostativi e missive pretestuose inviate dalla Regione Abruzzo, con svariate richieste tra le quali il trasferimento delle risorse necessarie per lo svolgimento degli interventi nei Comuni di L'Aquila, Carsoli, Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona, alla propria Direzione Regionale, ai sensi della *L. R. 81/1998*. (All da 3.1 a 3.4)
4	Ritardo dovuto alla sovrapposizione di ruoli tra il Commissario Straordinario e il Commissario Delegato per fronteggiare la crisi di natura socio – economica – ambientale determinatasi nell'asta fluviale nel Bacino del Fiume Aterno arch. Goio. • Il Comitato di Indirizzo e Controllo in forza dell'art. 4 del Decreto di Nomina, nega la possibilità di stipulare una Convenzione con il Commissario Goio per l'esecuzione dell'intervento; • il Commissario del Bacino dell'Aterno - Pescara conferma l'impossibilità ad accettare l'incarico per la realizzazione dell'intervento poiché, in relazione alla specificità dei rispettivi poteri commissariali, non è possibile il trasferimento della gestione di questo da Commissario Straordinario a Commissario Delegato; (All. 4)

RIFERIMENTI

	Data	Documento	Contenuto
A	23.09.2011	Ricezione atti progettuali dalla Direzione Regionale LL.PP.	Progettazione esecutiva.
B	06.10.2011	Comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili.
C	4/6.11.2011	Determinazione della Regione Abruzzo DC21/60 del 18 agosto 2011 – accertamento e accreditamento II tranche di fondi da parte della R. Abruzzo	Trasferimento di fondi, per la somma di € 14.512.939,53 (quale scarto tra € 20.732.770,76 in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli precedentemente già accreditati, pari a € 6.219.831,23 come da Determinazione della Regione Abruzzo).
D	07.05.2012	Determina Commissariale n. 1 (notificata con prot. 176/CS del 09.05.2012); (All. n. 5)	L'ing. Giuseppe Russo è nominato responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006;
E	23.07.2012	Integrazione/aggiornamento Progetto Esecutivo.	Beta Studio srl consegna il progetto esecutivo dopo averlo integrato/aggiornato;
F	24.08.2012	Pubblicazione Bando (All. 6.1 – 6.2)	Gara ad evidenza pubblica secondo le seguenti modalità: ✓ contratto: esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lett. a), art. 3, comma 37, art.55, comma 5, art.83 del decreto legislativo n. 163 del 2006); ✓ tipologia gara: procedura aperta; ✓ criterio dell'offerta: economicamente più vantaggiosa;

			✓ luogo di gara: la gara verrà esperita in seduta pubblica il giorno 18 ottobre 2012 alle ore 11,00 Presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stanza 604; ✓ offerte: dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 (ore dodici) del giorno 12.10.2012;
G	14.09.2012	nota prot. 280/CS - Beta Studio srl (All. 7.1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 9)	Istituzione Ufficio di Direzione Lavori: il Commissario Straordinario, per l'esecuzione di lavori è obbligato ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pertanto: ✓ accertata la carenza in organico di personale tecnico disponibile a svolgere tale funzioni di istituto, ai sensi dell'art. 90, c. 6; ✓ considerato che la Beta Studio srl ha redatto il progetto esecutivo; è stato richiesto, a tale Società la disponibilità a svolgere l'incarico. La Beta Studio, in data 25.10.2012 accetta l'incarico di *"direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere"* e al fine di consentirne la formalizzazione, conferma che: ✓ il professionista responsabile dell'attività sarà l'ing. Massimo Coccato, Direttore Tecnico di Beta Studio; ✓ l'attività verrà espletata con il supporto di un Direttore Operativo e di un Ispettore di Cantiere, come previsto con l'offerta del 12.10.2012 prot. 670/12.
H	04.10.2012	Sopralluogo	Partecipano: l'ing. Coccato DL, il rag. Antonetti (su delega del RUP) e le Ditte richiedenti;
I	24.12.2012	Pubblicazione sito MATTM	Aggiudicazione provvisoria in favore della Società CODIMAR di Capistrello (AQ);

ALLEGATI AI RITARDI

All. n°	Data	Documento	Contenuto
1.1	19.07.2011	nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.: • il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma;
1.2	04.08.2011	nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti la Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: • della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; • del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a proprio nome (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma);
1.3	04.08.2011	nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	• Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); • modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori).
1.4	05.08.2011	nota prot. 165880/RA – risposta della Regione Abruzzo alla diffida Commissariale del 04.08.2011.	Invito al Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1.5	10.08.2011	nota prot. n. 008/CS	Il Commissario Straordinario sollecita: • il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma; • trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi;
1.6	30.08.2011	nota prot. 177524/RA	La Regione Abruzzo diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: • accelerazione dei tempi; • l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi;
2	12.2011 - 01.2012 - 02.2012	Bollettini meteo	Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/;
3.1	06.12.2011	nota prot. 252592/RA, acquista con prot. 033/CS del 12.12.2011 – proposta di intervento.	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita il trasferimento delle risorse alla propria Direzione, per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di: • L'Aquila (AQ); • Carsoli (AQ); • Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona;
3.2	15.12.2011	nota prot. 261403/RA acquisita con prot. 037/CS del 15.12.2011 – attuazione interventi.	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita l'urgente trasferimento delle risorse alla propria Direzione Regionale.
3.3	28.12.2011	nota prot. 269648/RA – attuazione interventi	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita ulteriormente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti secondo L. R. 81/1998.
3.4	09.01.2012	nota prot. 005/CS	Il Commissario Straordinario espone quanto segue: • non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti; • non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi; • la normativa regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione; • viene ribadito che gli interventi avocati dal Direttore Regionale sono di competenza commissariale;
4	27.02.2012	nota prot. 113, acquisita con prot. 067/CS	Il Commissario del Bacino dell'Aterno-Pescara conferma l'impossibilità ad accettare l'incarico per la realizzazione dell'intervento poiché, in relazione alla specificità dei rispettivi poteri commissariali non è possibile il trasferimento della gestione di questo da Commissario Straordinario a Commissario Delegato
5	07.05.2012	Determina Commissariale n. 1, (notificata con prot. 176/CS del 09.05.2012);	L'ing. Giuseppe Russo è nominato Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'intervento denominato *"Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno"*.
6.1	24.08.2012 - 31.08.2012	Pubblicazione Bando su quotidiani e in GURI	• Contestuale pubblicazione per estratto sui quotidiani "Il Messaggero", "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera" e "Il Centro" (art. 66 del D. Lgs 163/06 obblighi di pubblicità della "stazione appaltante"); • Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Contratti Pubblici – sez. Avvisi e Bandi di Gara;
6.2	31.08.2012	Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Contratti Pubblici – sez. Avvisi e Bandi di Gara del *"Bando di gara per l'esecuzione dei lavori per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del torrente Raio e del fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno"* (archivio)	Estratto: • contratto: esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lett. a), art. 3, comma 37, art.55, comma 5, art.83 del decreto legislativo n. 163 del 2006); • tipologia gara: procedura aperta; • criterio dell'offerta: economicamente più vantaggiosa; • luogo di gara: la gara verrà esperita in seduta pubblica il giorno 18 ottobre 2012 alle ore 11,00 Presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stanza 604; • offerte: dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 (ore dodici) del giorno 12 ottobre 2012;
7.1	14.09.2012	nota prot. 280/CS	Istituzione Ufficio di Direzione Lavori:

			il Commissario Straordinario, per l'esecuzione dei lavori è obbligato ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pertanto: ✓ accertata la carenza in organico di personale tecnico disponibile a svolgere tale funzioni di istituto, ai sensi dell'art. 90, c. 6; ✓ considerato che la Beta Studio srl ha redatto il progetto esecutivo; si richiede alla Società sopraccitata la disponibilità a svolgere tale incarico;
7.2	27.09.2012	mail, acquisita con prot. 294/CS del 28.09.2012	La Beta Studio srl, conferma la disponibilità a supportare la struttura Commissariale nella fase di presa visione degli elaborati progettuali da parte delle Ditte e di sopralluogo nelle zone dell'intervento. Contestualmente propone possibili date per gli appuntamenti: ✓ presa visione progetto c/o Uffici di Roma; ✓ sopralluogo c/o aree di intervento;
7.3	27.09.2012	mail, acquisita con prot. 295/CS del 28.09.2012	la Beta Studio srl, in risposta alla nota prot. 280/CS del 14.09.2012, accetta la proposta di affidamento dell'incarico di direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Contestualmente propone: ✓ la valutazione economica delle attività da svolgere che ammonta complessivamente ad € 116.483,36 (IVA e CI esclusi); ✓ il nominativo del professionista responsabile dell'attività, l'ing. Massimo Coccato, Direttore Tecnico di Beta Studio srl;
7.4	01.10.2012	nota prot. 296/CS dell'01.10.2012	il CS, in riferimento all'offerta economica per l'incarico di direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione trasmessa da Beta Studio srl, pur riconoscendola rispettosa delle ragioni tecnico – professionali, richiede: ✓ in accordo con le recenti disposizioni governative in materia di parcelle *(Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, G.U. 22.08.2012)*, una rimodulazione degli importi; ✓ uno sconto pari al 25% rispetto alle tariffe del citato Decreto in quanto la Società è già stata incaricata della redazione dei progetti; ✓ che venga effettuato il medesimo ribasso già operato, a suo tempo, per l'aggiudicazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere;
7.5	03.10.2012	nota prot. 650/12, acquisita con prot. 302/CS del 03.10.2012	la Beta Studio srl, in risposta alla nota prot. 296/CS dell'01.10.2012, trasmette l'offerta economica rivistata secondo quanto previsto dal *Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140.* La nuova valutazione economica ammonta ad € 117.023,11 (IVA esclusa) avendo la Società applicato le riduzioni del: ✓ 25% perché già esecutrice delle progettazioni (preliminare, definitiva, esecutiva); ✓ 12% in quanto tale ribasso era stato offerto in sede di aggiudicazione della gara per l'esecuzione della progettazione delle opere;
7.6	09.10.2012	Parere in merito all'affidamento esterno della Direzione Lavori	hanno avuto luogo le seguenti riunioni: • ore 10.00, tra l'arch. Rossi e l'arch. Francescon per la rimodulazione del *"compenso professionale per direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere"* presentato dall'ing. Coccato di Beta Studio con nota prot. 650/12, acquisita con prot. 302/CS del 03.10.2012; Il compenso viene aggiornato in accordo con le recenti disposizioni governative in materia di parcelle (Decreto Ministro Giustizia 20.07.2012 n° 140, G.U. 22.08.2012), ma soprattutto, in modo che l'importo finale non superi la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia; • ore 13.00 tra il Commissario Straordinario l'arch. Rossi, il rag. Antonetti, il dott. Sergio Zeuli e l'arch. Francescon. Viene richiesto un parere legale al dott. Zeuli in merito alle modalità di affidamento della direzione lavori, nel rispetto di quanto stabilito *dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* come recepite nel *Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* e relativo *regolamento d'attuazione d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207* recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".* Il Dott. Zeuli espone quanto segue: 1. nella gara espletata precedentemente dal Commissario Goio per l'affidamento del servizio di architettura ed ingegneria, successivamente aggiudicata dalla Beta Studio, era oggetto dell'appalto, insieme alle progettazioni (preliminare, definitiva, esecutiva), la direzione lavori (secondo la Commissione europea è incompatibile con il diritto comunitario una norma che preveda in via preferenziale l'affidamento al progettista anche dell'incarico di DL. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia ('100.000 €), l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione, art. 91, c. 6 del D. Lgs 163/2006); 2. il CS, ing. Santori, avendo acquisito le progettazioni trasmesse dal Commissario Goio, deve considerare la sopraccitata condizione; 3. il RUP, una volta attestate e certificate le condizioni che consentono il ricorso all'affidamento esterno dell'incarico di DL; carenza in organico di personale tecnico, difficoltà di rispettare i tempi della programmazione (art. 90, c. 6 D. Lgs. 163/2006), può procedere all'affidamento esterno di questo, nell'ordine, ai seguenti soggetti (art. 130 D. Lgs. 163/2006): ✓ alte amministrazioni pubbliche, ✓ progettista incaricato, ✓ altri soggetti con le medesime procedure previste per l'affidamento degli incarichi di progettazione; 4. non essendo disponibili altre amministrazioni pubbliche disponibili, in forza dell'art. 130, c. 2, lett. a), l'ing. Coccato può essere incaricato direttamente della DL; tanto esposto, consegue che sono necessarie ✓ la rimodulazione della parcella professionale dell'ing. Coccato, in modo che l'importo finale sia inferiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia; ✓ l'aggiornamento del quadro economico considerando i ribassi effettuati sulla parcella professionale; • ore 14.30 tra il Commissario Straordinario, l'arch. Rossi, l'arch. Francescon, l'ing. Coccato. Si notifica la possibilità dell'affidamento diretto dell'incarico di *"direzione lavori, contebilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere"*, nel rispetto di quanto stabilito dal *Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.* Contestualmente vengono fornite indicazioni per l'aggiornamento del relativo compenso professionale;
8	16.10.2012	nota prot. 312/CS	l'Ufficio del Commissario Straordinario comunica all'impresa G. & M. Lavori che la prima seduta pubblica per l'espletamento della gara d'appalto avente ad oggetto "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno", prevista per il giorno 18 ottobre p.v., è rinviata al giorno 07.11.2012 presso la Sala Stampa del MATTM, sita al piano terra;
9	25.10.2012	nota prot. 705/12 acquisita con prot. 317/CS;	Beta Studio srl al fine di consentire la formalizzazione dell'incarico di "direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere", conferma che: ✓ il professionista responsabile dell'attività sarà l'ing. Massimo Coccato, Direttore Tecnico di Beta Studio; ✓ l'attività verrà espletata con il supporto di un Direttore Operativo e di un Ispettore di Cantiere, come previsto con l'offerta del 12.10.2012 prot. 670/12.

RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 3 (opera urgente) - Interventi *"per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo"*
Ambito: Difesa dei Fiumi - Provincia di Pescara – Comune: Pescara - importo complessivo 3.600.000 € (acquisita progettazione definitiva).

(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno											
Task 1 previsione temporale d'esecuzione																																				
Aggiornamento previsione temporale d'esecuzione al 10.01.2013 (come trasmesso dall'Ente - Prot. 007/CS)																																				
Riferimenti importanti							A-B		C				D	E1			E2	F		G	H	I	I	L												
Assenza fondi																																				
Condizioni meteo										2		2																								
Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di A d P					1	1																														
Impedimenti da parte di Enti avvalsi ed Enti Terzi							3	3	3				4	4	4	4	4	4	4	5	5	5														
Varianti in corso d'opera																																				
Sopravvenute disposizioni normative																																				
Cause impreviste e imprevedibili																																				

RITARDI	
Ritardo	**Note**
1	Ritardo per: • mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto. Infatti dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso confronto epistolare, come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Direzione Regionale LL-PP. a sollecitare gli EE.LL. interessati all'Accordo di Programma a far pervenire ogni atto progettuale utile. (All. da 1.1 a 1.5)
2	Ritardo per avverse condizioni metereologiche. (All. 2)
3	Ritardo dovuto alla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di personale tecnico in grado di svolgere la progettazione definitiva ed esecutiva come reso noto in una riunione programmatica avanzata dall'Ente. (All. 3)
4	Ritardo dovuto allo slittamento dei tempi di valutazione della progettazione definitiva in sede di Conferenza dei Servizi a causa: • dell'assenza di alcuni dei rappresentanti degli enti convocati; • alle richieste/integrazioni avanzate al progettista. (All. 4.1 a 5)
5	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. Il bando di gara (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il 29.11.2012. Entro il giorno 16.01.2013, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 6 istanze. In data 21.01.2013 ha avuto luogo la prima seduta in forma pubblica della Commissione di gara per la verifica della documentazione amministrativa. Il 10.01.2013 è stato acquisito, con nota prot. 007/CS, il Cronoprogramma lavori aggiornato/rettificato in funzione delle attività finora svolte dall'Ente. (All. 6 a 8)

RIFERIMENTI			
	Data	**Documento**	**Contenuto**
A	01.09.2011	Bonifico I trance fondi	Accreditamento I trance fondi, pari a € 6.219.831,23, da parte della Regione Abruzzo.
B	05.09.2011	Progettazione preliminare	Ricezione atti progettuali preliminari dal Comune di Pescara, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 02.09.2011.
C	18.11.2011	Convenzione	Firma Convenzione tra Commissario Straordinario, Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del suolo e della Costa e Comune di Pescara. Con la firma della Convenzione, contenete l'Ordinanza di avvalimento, il Commissario ha dato formalmente avvio all'esecutività dell'intervento dichiarato di particolare urgenza.
D	27.03.2012	Trasmissione Progetto Definitivo e contestuale indizione Conferenza dei Servizi (All. 4.1)	E' indetta per il giorno 11.04.2012, alle ore 11:00, presso la sede distaccata della Regione Abruzzo a Roma la I seduta della Conferenza di Servizi e contestuale trasmissione della progettazione definitiva.

E1	11.04.2012	I Conferenza dei Servizi (All. 4.1 - 4.2)	Sono state rilevate le assenze della Regione Abruzzo e del Genio Civile di Pescara. Si evidenzia inoltre la non trasmissione del progetto definitivo: • al Genio Civile; • all'Autorità di Bacino.
E2	16.07.2012	II Conferenza dei Servizi – approvato Progetto Definitivo (All. 4.3 – 4.4 – 4.5 - 4.6)	Esecuzione della Conferenza di Servizi di chiusura lavori alle ore 14:00, presso l'Ufficio di Presidenza della Regione Abruzzo, in Via Piave, 8. Il Presidente, a seguito dell'ottenimento dei pareri favorevoli da parte di tutti gli Enti coinvolti, dichiara conclusa con esito positivo la Conferenza dei servizi e dispone l'approvazione del Progetto Definitivo.
F	07.08.2012	Nota prot. 239/CS (All. 5.1 – 5.2 – 5.3)	Aggiudicazione provvisoria dell'Ufficio Direzione Lavori: • affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 91, c. 2 e 57, c. 6 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.; • selezione attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del suddetto Codice.
G	31.10.2012	Nota prot. 328/CS (All. 6)	Approvato il progetto definitivo con deliberazione di Giunta Comunale n. 691 del 25.10.2012;
H	16.11.2012	Verbale Sopralluogo n. 2 e determina dirigenziale (All. 7.1 e 7.2)	L'aggiudicazione dell'Ufficio Direzione Lavori diventa definitiva.
I	07.12.2012	Pubblicazione Bando (All. 8)	Pubblicazione del bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori • data inizio: 07.12.2012; • data fine: 16.01.2012; tipo di procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; quantitativo totale dell'appalto: €1.800.278,68 di cui: • € 1.724.743,99 per lavori a corpo; • € 34.494,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta • € 41.039,81 per spese di progettazione esecutiva soggette a ribasso d'asta; termini di esecuzione: • progettazione esecutiva: 60 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio; • lavori: 224 gg naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.
L	10.01.2013	Nota prot. 6166 del 10.01.2013 acquisita con prot. 007/CS; (All. 9)	• Cronoprogramma lavori aggiornato/rettificato; • Relazione di aggiornamento dello stato di fatto delle fasi tecnico/amministrative;

ALLEGATI AI RITARDI

All. n°	Data	Documento	Contenuto
1.1	19.07.2011	Nota prot. n. 005/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP: • il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma;
1.2	04.08.2011	nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: • della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; • del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma);
1.3	04.08.2011	nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	• Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); • modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori).
1.4	05.08.2011	nota prot. n. 165880/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del 04.08.2011.	La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1.5	10.08.2011	Nota prot. n. 008/CS	Il Commissario Straordinario sollecita: • il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma; • trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi;
1.6	30.08.2011	Nota prot. n. 177524/RA	La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: • accelerazione dei tempi; • l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi;
2	12.2011 - 01.2012 - 02.2012	Bollettini meteo	Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/;
3	17.02.2012	Verbale	Riunione presso il MATTM, il RUP espone le azioni precedentemente intraprese: • ai sensi dell'art. 2 della Convenzione sottoscritta in data 18.11.2011 tra il Commissario Straordinario Delegato ing. Emilio Santori, la Regione Abruzzo ed il Comune di Pescara, l'Ufficio LL. PP. Del Comune si è occupato del coordinamento delle attività di progettazione dell'opera in argomento; • il Dirigente del Settore Grandi Infrastrutture ed Edilizia Scolastica ha avviato la ricognizione rivolta al personale tecnico in servizio presso l'Ente per verificare la disponibilità ad assumere l'incarico di Progettista per la redazione del progetto definitivo dell'opera da porre a base di gara; • la ricognizione ha avuto esito negativo, in quanto il personale tecnico dipendente, all'epoca, già impegnato in altri procedimenti tecnici ed amministrativi, non era disponibile ad assumere il suddetto incarico; • il Dirigente, nel rispetto del Codice dei Contratti, ha provveduto ad incaricare una società di progettazione per la redazione del progetto definitivo. La società individuata è la Beta Studio, in quanto già in possesso di uno studio idraulico relativo al Fiume Pescara, indispensabile per la corretta progettazione degli argini. Questa scelta ha consentito all'Amministrazione Comunale di ridurre le spese tecniche per la progettazione e di ottenere in tempi rapidi un prodotto rispondente alle necessità prestabilite; Alla luce di quanto esposto si rileva l'errata interpretazione dell'atto convenzionale poiché, l'Ente avvalso, prima di procedere ad impegni di spesa di qualunque natura, deve essere autorizzato preventivamente dal Commissario Straordinario. (Contestuale trasmissione del progetto definitivo redatto da Beta Studio).
4.1	28.03.2012	nota prot. 43546, acquisita con prot. 123/CS del 28.03.2012 – Progetto definitivo	L'ente trasmette il progetto definitivo e contestualmente comunica l'indizione della Conferenza dei Servizi per il giorno 11.04.2012;
4.2	13.04.2012	nota prot. 50811, acquisita con prot. 137/CS del 13.04.2012 - trasmissione verbale della I Conferenza dei Servizi e convocazione II Conferenza dei Servizi per il giorno 18.04.2012.	*Estratto del Verbale della I Conferenza dei Servizi tenutasi l' 11.04.2012:* Esecuzione della I Conferenza di Servizi presso la sede distaccata della Regione Abruzzo a Roma. • Sono state rilevate le assenze ingiustificate della Regione Abruzzo e dell'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume

			• Sangro. • Il Genio Civile di Pescara ha comunicato di non avere la disponibilità a partecipare utilmente alla seduta e che esprimerà le determinazioni di competenza, ai sensi del R.D. 523/1904, non appena l'Autorità di Bacino avrà comunicato il proprio parere sul relativo studio di compatibilità idraulica del progetto. Tali motivi hanno determinato lo slittamento della chiusura dell'azione di concertazione a data successiva; *Per tali motivi la Conferenza è rinviata alla data del 18.04.2012.*	
4.3	16.04.2012	Nota R.A verbale riunione del 16.04.2012.	*Estratto del Verbale della Riunione presso la sede del Genio Civile di Pescara*: Alla presenza del progettista, si sono riuniti: • arch. Trisi - Responsabile del Procedimento; • ing. Rossi - Tecnico del Comune di Pescara; • ing. Primavera - Dirigente del Servizio del Genio Civile; • ing. Iervese - Funzionario del Genio Civile; • ing. D'Eramo - Segretario Generale dell'Autorità di Bacino; • ing. Innocente - Tecnico dell'Autorità di Bacino. A seguito di una dettagliata analisi del progetto definitivo è stabilito che l'autorizzazione ai sensi del R.D. del 523/1904 dal Genio Civile verrà rilasciata in forma preventiva, da perfezionare in definitiva, solo dopo l'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino e della presentazione della documentazione integrativa necessaria richiesta al progettista.	
4.4	17.04.2012	Nota prot. 52339, acquisita con prot. 142/CS del 17.04.2012	la Città di Pescara; rinvia la seconda riunione della Conferenza dei Servizi (prevista per il giorno 18.04.2012) a data da destinarsi per permettere al progettista di apportare le modifiche/integrazioni richieste.	
4.5	17.04.2012	Nota prot. 86956/RA, acquisita con prot. 152/CS del 24.04.2012	Il Genio Civile di Pescara, specifica che la documentazione tecnica integrativa (richiesta nella riunione del 16.04.2012) deve essere già contemplata nel progetto definitivo secondo quanto prescritto dagli artt. 15 e 24 del D. Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/10. Questo permetterà sia la diretta espressione dell'autorizzazione definitiva, ex R.D. 523/1904 da parte del Genio Civile (senza la necessità di un lemporaneo parere idraulico preliminare, come originariamente riportato nel verbale del 16.04.2012), sia di evitare adeguamenti tecnici significativi sul progetto esecutivo successivamente alla fase di appalto del progetto definitivo con esclusione di possibili contenziosi con l'impresa appaltatrice.	
4.6	16.07.2012	Verbale	Approvato progetto definitivo.	
5.1	27.07.2012	Nota prot. 104423 acquisita con prot. 231/CS del 31.07.2012	L'Ente Avvalso chiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 97.942,33 oltre oneri ed IVA per l'affidamento a tecnici esterni, mediante procedura negoziata, degli incarichi di: • direzione lavori; • coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; per l'istituzione, prima della gara, dell'Ufficio della direzione lavori, ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 207/2010. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.	
5.2	27.07.2012	Nota prot. 104809, acquisita con prot. 233/CS dell'01.08.2012	L'Ente chiede l'autorizzazione per procedere alla liquidazione della somma di € 25.553,02, a favore dell'ing. Andreella e della Ellografia Gaspari, impegnata precedentemente con le seguenti modalità: • con Determinazione Dirigenziale n° 393BR del 03/08/2011 è stato affidato all'ing. Gaspare Andreella l'incarico di supporto al RUP per svolgere in particolare il seguente compito: "Predisposizione e collaborazione tecnica durante l'elaborazione della progettazione preliminare - definitiva – esecutiva con particolare riferimento agli studi in materia di protezione idraulica del territorio e valutazione di pericolosità o rischio idraulico del territori posti in adiacenza al corso del fiume Pescara"; • con Determinazione Dirigenziale n° 54/BR del 03/08/2011 è stato affidato il servizio di riproduzione copie alla ditta "Ellografia Gaspari";	
5.3	07.08.2012	Nota prot. 239/CS	Il Commissario Straordinario, autorizza il RUP, arch. Trisi: • ad impegnare la somma di € 97.942,33 oltre oneri ed IVA per l'affidamento a tecnici esterni, mediante procedura negoziata, degli incarichi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione al fine di istituire l'Ufficio direzione lavori, prima delle procedure di gara; • alla liquidazione della somma di € 25.553,02 (24.336,00 €+ 1.217,021 €) che trova copertura finanziaria all'interno del Quadro economico di progetto a favore dell'ing. Andreella e della Ellografia Gaspari;	
6	30.10.2012	nota prot. 328/CS	Il Comune di Pescara comunica che con deliberazione di Giunta Comunale n. 691 del 25.10.2012 è stato approvato il progetto definitivo, inoltre, in merito alla possibilità prevista dell'art. 10, c. 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per il RUP di doiarsi di un supporto tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, per lo svolgimento dei compiti di propria competenza, richiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 29.600,00 per procedere a tale affidamento, ovviamente finanziabile con le somme in amministrazione del progetto e senza ulteriori spese per l'amministrazione;	
7.1 - 7.2	07.11.2012	Verbale Sopralluogo n. 2 e determina dirigenziale (All. 7.1 – 7.2)	In merito alla gara relativa all'affidamento degli incarichi di direzione lavori e prestazioni connesse: • in data 25.10.2012 è stata fatta l'aggiudicazione provvisoria; • è in corso la verifica dei requisiti al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva il 15 novembre p.v.;	
8	07.12.2012	Bando di Gara (sito e GU n. 143 del 07.12.2012)	Pubblicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori • data inizio: 07.12.2012; • data fine: 16.01.2012;	
9	10.01.2013	Nota prot. 6166 acquisita con prot. 007/CS del 10.01.2013 - Relazione di aggiornamento dello stato di fatto delle fasi tecnico/amministrative con Cronoprogramma lavori aggiornato/retificato	*Estratto della Relazione*: 1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 02.09.2011 è approvato il progetto preliminare redatto dai tecnici comunali (*Allegato n. 1*); 2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 914 del 17.11.2011 è approvato lo Schema di Convenzione avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione della *Messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo"* con cui il Comune accetta il ruolo di Ente Attuatore (*Allegato n. 2*); 3. con atto dirigenziale n. 690/BR del 29.12.2011, ai sensi dell'art. 125, c. 11, ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, è stata affidata la progettazione definitiva, da porre a base di gara, alla Società BETA STUDIO srl per un importo complessivo di € 40.268,80 (*Allegato n. 3*); Ai fini dell'acquisizione di tutti i pareri necessari per l'approvazione del progetto definitivo sono state indette la I e la II Conferenza dei Servizi nei giorni: 11.04.2012 2 16.07.2012; 4. con determinazione dirigenziale n. 272/BR del 16.08.2012 è indetta una gara d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 91, c. 2 e 57, c. 6 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'art. 83 del predetto Codice dei Contratti (*Allegato n. 4*); 5. con determinazione dirigenziale n. 392/BR del 16.11.2012 sono stati aggiudicati definitivamente i servizi tecnici alla società GEINA srl per aver offerto un ribasso del 25% sul prezzo posto a base d'asta, quindi per il prezzo netto di € 73.456,75 oltre gli oneri 4% e all'IVA al 21% (*Allegato n. 5*); 6. con deliberazione di Giunta Comunale n. 691 del 25.10.2012 è approvato il progetto definitivo (*Allegato n. 6*); 7. con determinazione dirigenziale n. 31/AA del 03.12.2012 sono approvati il bando e il disciplinare per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., con le modalità di cui all'art. 53, c. 2, lett. B) dello stesso Decreto, da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 (*Allegato n. 7*).	

RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 4 "Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano nei Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi"
Ambito: Difesa dei Fiumi - Provincia di Teramo – Comuni: Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi
importo complessivo 3.600.000,00 € (acquisita progettazione preliminare)

(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno											
Task 1 previsione temporale d'esecuzione																																				
Aggiornamento previsione temporale d'esecuzione al 23.01.2013 – come trasmessa dall'Ente (NOTA in calce)																																				
Riferimenti importanti							A B	B C	D	E							F						G H-I													
Assenza fondi																																				
Condizioni meteo											2	2																								
Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di A d P					1	1																														
Impedimenti da parte di Enti Avvalsi ed Enti Terzi								3	3				3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4														
Varianti in corso d'opera																																				
Sopravvenute disposizioni normative																																				
Cause impreviste e imprevedibili																																				

NOTA: la previsione risulta sovradimensionata rispetto ai tempi commissariali e alle effettive possibilità d'esecuzione. Questo Gantt riporta le previsioni solo all'interno dei tre anni. Le azioni previste fuori questo tempo non sono riportate. L'Ente è chiamato a revisionare la previsione in tempi rapidi.

RITARDI

Ritardo	Note
1	Ritardo per: • mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto. Infatti dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso confronto epistolare, come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Regione a sollecitare gli EE.LL. interessati all'Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile. (All. da 1.1 a 1.7)
2	Ritardo per avverse condizioni metereologiche. (All. 2)
3	Ritardo dovuto: • al necessario approfondimento della progettazione preliminare dell'intervento allegato alla Convenzione di avvalimento, al tempo incompleto essendo emersa una incongruenza tra quanto proposto attraverso la bozza del progetto preliminare e quanto effettivamente di competenza del Commissario, in merito al terzo tratto di intervento. Come illustrato dai tecnici della Provincia sono necessarie delle opere accessorie ed esterne al canale principale, ovvero ubicate nel reticolo idrografico minore in dx idrografica in località Sceme di Pineto, aree comunque interne al bacino idrografico del Fiume Vomano. In mancanza di questo tratto d'intervento, anche a seguito della sistemazione dell'alveo principale ed al potenziamento arginale, le acque limitrofe della Zona Industriale, saranno sicuramente interessate nuovamente e facilmente da episodi di allagamento rendendo, di fatto, poco funzionale l'intervento nella sua interezza; • alla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di personale tecnico in grado di svolgere la progettazione definitiva ed esecutiva; (All.3.1 a 3.4)
4	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. Il Bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione (definitiva, esecutiva), direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza è stato pubblicato sul BURA ed il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per il giorno 25.02.2013. Il 23.01.2013 il RUP ha trasmesso il Cronoprogramma lavori aggiornato, agli atti con prot. 023/CS. Lo stesso risulta sovrastimato come tempistica avendo il RUP considerato di giungere ad uno livello di definizione progettuale esecutivo in 360 gg (13 mesi). Conseguenzialmente l'inizio lavori è previsto oltre il trentaseiesimo mese. (All. 4.1 – 4.2 – 5)

RIFERIMENTI

	Data	Documento	Contenuto
A	01.09.2011	Bonifico I trance fondi	Accreditamento I trance fondi (pari a € 6.219.831,23) da parte della Regione Abruzzo.
B	13.09.2011 – 20.09.2012 – 25.10.2011	1. nota prot. 186375/RA acquisita il 14.09.2011; 2. nota prot. 19143/RA acquisita il 23.09.2011; 3. nota prot. 21789/RA, acquisita il 26.10.2011.	1. Il Servizio Genio Civile Regionale trasmette la progettazione preliminare; 2. il Servizio Genio Civile Regionale trasmette un aggiornamento alla progettazione - Scheda Progettuale n. 7; 3. la Direzione Regionale LL.PP., Servizio per la Sicurezza Idraulica trasmette la progettazione definitiva/esecutiva predisposta dalla Provincia di Teramo.

C	06.10.2011	Comunicazione della Direzione Regionale d'Abruzzo	Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili.
D	4/6.11.2011	Determinazione della Regione Abruzzo DC21/60 del 18 agosto 2011 – accertamento e accreditamento II trance di fondi da parte della Regione Abruzzo.	Trasferimento di fondi, per la somma di € 14.512.939,53 (quale scarto tra € 20.732.770,76 in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli precedentemente già accreditati, pari a € 6.219.831,23 come da Determinazione della Regione Abruzzo).
E	16.12.2011	Convenzione	Firma Convenzione tra Commissario Straordinario, Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del suolo e della Costa e Provincia di Teramo. Con la firma della Convenzione, contenete l'Ordinanza di avvalimento, il Commissario ha dato formalmente avvio all'esecutività dell'intervento.
F	16.07.2012	Progetto Preliminare (All. 3.5)	La Provincia di Teramo, trasmette il progetto preliminare approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 381 del 09.07.2012 e copia della Determina Dirigenziale n. 464 del 16.05.2012 di nomina del RUP.
G	17.01.2013	Progetto Indagini Geologiche (All. 4.1 – 4.2)	Mediante inviti rivolti a 6 Ditte l'Ente ha provvedendo all'aggiudicazione di una campagna geognostica, che ha come obiettivo la modellazione geologica e geotecnica nonché la valutazione del rischio sismico, da espletare nel termine di 30 gg. Tali indagini serviranno da supporto alle successive fasi progettuali. Il 17.01.2013 è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta SEGEO con un ribasso del 43,57 %
H	23.01.2013	Pubblicazione bando	Il Bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione (definitiva, esecutiva), direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza è stato pubblicato sul BURA ed il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per il giorno 25.02.2012. Oggetto: appalto di servizi; Procedura: ristretta;
I	23.01.2013	Nota prot. 23537 acquisita con prot. 023/CS del 23.01.2013 (All. 5)	Aggiornamento Cronoprogramma Lavori

ALLEGATI AI RITARDI

All. n°	Data	Documento	Contenuto
1.1	19.07.2011	Nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.: • il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma;
1.2	04.08.2011	Nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti Regione Abruzzo.	Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: • della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; • del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma);
1.3	04.08.2011	Nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	• Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); • modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori).
1.4	05.08.2011	Nota prot. 165880/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del 04.08.2011.	La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1.5	10.08.2011	Nota prot. 008/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario sollecita: • il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma; • trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi;
1.6	30.08.2011	Nota prot. n. 177524/RA	La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: • accelerazione dei tempi; • l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi;
2	12.2011 - 01.2012 - 02.2012	Bollettini meteo	Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/;
3.1	08.03.2012	Verbale	Sono stati approfonditi i seguenti argomenti: 1. stato di attuazione dei lavori; 2. progettazioni; 3. conferenza dei servizi; 4. occupazioni d'urgenza ed espropri. Si apprende inoltre che l'Ente sta provvedendo, con proprie risorse, all'elaborazione degli atti progettuali preliminari, dei quali esiste da tempo una prima sommaria proposta ancora incompleto. Sarà trasmessa al Commissario per le verifiche del caso;
3.2	20.03.2012	Nota prot. 68235, acquisita con prot. 122/CS del 28.03.2012 - comunicazione	L'Amministrazione comunica che, a seguito di verifiche interne circa gli impegni precedentemente assunti e gli incarichi d'istituto, l'Ente pur disponendo di personale tecnico adeguato, non è nelle condizioni di poter rispettare i tempi di progettazione stabiliti in sede di Convenzione. Chiede pertanto di affidare all'esterno le progettazioni definitiva ed esecutiva.
3.3	02.04.2012	Nota prot. 80013, acquisita con prot. 145/CS del 18.04.2012 - Chiarimenti in merito alla progettazione preliminare.	A seguito della riunione svoltasi in data 08.03. 2012 l'Ente chiarisce le motivazioni che hanno portato ad alcune soluzioni nel progetto preliminare, in particolare nel tratto denominato n. 3. Questo prevede la realizzazione di opere esterne al canale principale, ovvero ubicate nel reticolo idrografico minore in destra idrografica in località Scerne di Pineto, aree comunque interne al bacino idrografico del fiume Vomano. In mancanza di questo tratto d'intervento, anche a seguito della sistemazione dell'alveo principale ed al potenziamento arginale, le acque limitrofe della Zona Industriale, saranno sicuramente interessate nuovamente e facilmente da episodi di allagamento rendendo, di fatto, poco funzionale l'intervento nella sua interezza. Il Dirigente del Servizio, ritenendo necessario realizzare tali lavorazioni poiché strettamente connesse agli obiettivi di salvaguardia idraulica dell'intera area che l'intervento si pone, ed in particolare la messa in sicurezza dell'adiacente Zona Industriale, chiede di comprendere tali opere all'interno del progetto di mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano.
3.4	23.05.2012	Nota prot. 184/CS	A seguito di sopralluogo effettuato in data 15.05.2012 il l'Ufficio Commissariale conferma: • la rispondenza degli elaborati progettuali preliminari ai bisogni del territorio; • la congruità degli elaborati progettuali preliminari con quanto ascritto nell'Accordo di Programma. Si sollecita inoltre l'avvio delle fasi successive dei lavori affidati tramite Convenzione.
3.5	16.07.2012	Nota prot. 183596 acquisita con prot. 224/CS del 20.07.2012.	La Provincia trasmette il progetto preliminare approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 381 e copia della Determina Dirigenziale n. 464 del 16.05.2012 di nomina del RUP, ing. Danilo Crescia.
4.1	10.01.2012	Nota prot. 11709, acquisita con prot. 005/CS.	la Provincia di Teramo comunica che: • è stata inoltrata richiesta di offerta economica ai fini dell'aggiudicazione dei lavori della campagna geognostica, per un importo di € 12.876,68, al netto di IVA, propedeutica alla progettazione; • le offerte verranno presentate entro e non oltre il 16.01.2012; • dell'aggiudicazione definitiva sarà data tempestiva comunicazione.
4.2	17.01.2013	Nota prot. 18387, acquisita con prot. 015/CS.	L'Ente trasmette il verbale di aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi alla campagna geognostica alla Ditta SEGEO che ha presentato un ribasso del 43,57 % sull'importo

			a base d'asta.
5	23.01.2013	Nota prot. 23537, acquisita con prot. 023/CS del 23.01.2013	Cronoprogramma aggiornato: 1. Scadenza presentazione domanda di partecipazione servizio di progettazione definitiva, sicurezza e DL.: 25.02.2013; 2. Nomina commissione di gara, scelta candidati tra le offerte pervenute e invio lettera d'invito: 20gg; 3. Tempo intercorrente per arrivo offerte partecipanti: 30gg; 4. Selezione offerte pervenute e aggiudicazione: 60gg; 5. Acquisizione documentazione propedeutica al contratto e stipula contratto: 60gg; 6. Definizione progettuale definitiva da parte dell'aggiudicatario: 50gg; 7. Attività di verifica del progetto definitivo: 30gg; 8. Convocazione Conferenza dei Servizi per acquisizione pareri, autorizzazioni, nulla osta, definizione espropri: 45gg; 9. Definizione progettuale esecutiva da parte dell'aggiudicatario: 40gg; 10. Attività di verifica del progetto esecutivo: 30gg; 11. Procedura di gara d'appalto comprensiva di preparazione, pubblicazione, bando ed affidamento: 60gg; 12. Acquisizione documentazione propedeutica al contratto e stipula contratto: 60gg; 13. Realizzazione opere: 180gg; 14. Collaudo: 90gg;

PAGINA BIANCA

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Relazione annuale anno 2012

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 21.01.2011

01/01/2013
Commissario Straordinario Delegato
Ing. Francesco Saverio ACITO

1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Regione	BASILICATA
Commissario straordinario delegato	ING. FRANCESCO SAVERIO ACITO
Decreto nomina	***21 GENNAIO 2011***
Data sottoscrizione Accordo	***14 DICEMBRE 2010***
Data sottoscrizione Accordo Integrativo	***14 GIUGNO 2011***
Importo complessivo assentito in Accordo	**€ 35.204.000,**
Importo ACCREDITATO per il periodo (anno 2012)	***MATTM*** ***1° di € 501.378,98*** ***in data 29.06.2011;*** ***-2° di €3.356.186,08*** ***in data 15.12.2011*** ***PER UN TOTALE DI*** ***€ 3.857.565,06;*** ***REGIONE BASILICATA*** ***1° di € 371.574,00*** ***in data 17.02.2012*** ***2° di € 638.676,00*** ***in data 11.09.2012*** ***PER UN TOTALE DI*** ***€ 1.010.250,00***
Importo speso per il periodo (anno 2012)	***€. 1.924.161,23***
Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno 2012)	***Fondi MATTM: € 6.925.384,03*** ***Fondi PO FESR: € 3.523.527,94***

1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

PREMESSA

La Basilicata offre un panorama quanto mai vario e completo di movimenti franosi visto che presenta una densità di dissesti pari a 27 frane per ogni 100km^2. In particolare, per quanto riguarda i centri storici sono circa **121** su 131 "i comuni lucani a **rischio idrogeologico"**, individuati dal Ministero dell'Ambiente, di cui 56 a rischio frana e 65 a rischio sia di frane che di alluvioni.

Il numero di frane fino ad ora censite è pari a 7499 (4724 Potenza - 2460 Matera) per un'area totale di 259,80km^2 (187,06 Potenza – 72,74 Matera).

Le tipologie di frana sono tutte presenti, prevalgono i movimenti roto-traslazionali (47,49%) che frequentemente evolvono sotto forma di colata (40,38%). Diverse sono le aree soggette a crolli e ribaltamenti (6.85%) mentre movimenti superficiali diffusi (5,17%) e frane complesse (0,11%) interessano aree molto localizzate.

Di drammatica attualità è poi il fenomeno, tuttora rovinosamente in atto, di arretramento della costa Jonica. Ogni mareggiata asporta metri di duna, in particolare nel tratto di Metaponto, ma ormai esteso a tutto il versante lucano. Con semplice effetto provvisorio, si sono dimostrati gli interventi, sino ad ora eseguiti, di ripascimento stagionale, facilmente asportati unitamente alle retrostanti dune.

INTERVENTI

Da quanto sopra evidenziato, si rileva che sono numerosi i centri abitati della regione caratterizzati da fenomeni franosi che, evolutisi nel tempo, hanno inficiato le condizioni di sicurezza e posto a rischio la pubblica e privata incolumità. In molti casi, sono state emesse ordinanze di sgombero sia per la transitabilità di alcune strade, di importanza primaria per l'accesso ad alcune contrade, sia per interi nuclei familiari con onerosissimi costi per le conseguenti iniziative di ripristini e temporanei sistemazione delle famiglie e nuclei colpiti in strutture ricettive.

In tale contesto si inserisce l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata (sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Basilicata).

Gli interventi in fase di progettazione e/o realizzazione, riguardano lavori su frane caratterizzate da uno stato di attività definito attivo-riattivo-sospeso che rappresenta il 71,58% dei dissesti censiti sul territorio regionale.

Le opere previste in progetto, in considerazione della modesta entità di finanziamento destinato ad ogni intervento, non possono che puntare solo parzialmente alla **mitigazione** del rischio idrogeologico attraverso tecniche di intervento che, con adeguato rispetto dell'ambiente e del paesaggio,

contribuiscono alla riduzione del rischio per persone e/o beni coinvolti, a causa della pericolosità di frane e, in definitiva, dal rischio idrogeologico in numerosi centri abitati della regione.

Infatti gli interventi di consolidamento programmati tengono conto della classificazione P.A.I. delle aree interessate da fenomeno (aree a rischio R3 o R4), del numero di ordinanze di sgombero emesse nell'aree in frana, del numero di abitanti interessato sul territorio dall'evento franoso e dell'estensione areale del dissesto.

Questi i criteri a base della individuazione degli interventi. verificati anche in seguito a specifici sopralluoghi effettuati per ciascun progetto previsto, nel corso dei quali si è posta particolare attenzione alle caratteristiche del fenomeno in termini di maggiore o minore attività, concentrandosi sui fenomeni maggiormente attivi e per i quali è maggiore il rischio di perdita di vite umane.

Tutti gli interventi sono comunque caratterizzati da budget insufficienti rispetto alla entità dei fenomeni da affrontare. Si è proceduto, in tutte le situazioni per le quali se ne è accertato la necessità e la funzionalità, ad utilizzare dare maggiore consistenza ed efficacia all'intervento, tutte le risorse programmate e quindi anche i ribassi offerti in sede di gara. Inoltre, in fase di progettazione, tutti gli interventi sono stati oggetto di approfondimento attraverso la realizzazione di prospezioni geofisiche e indagini geognostiche.

CONCLUSIONI

Lo stato dei lavori di progettazione e/o realizzazione inerente l'attuazione dell'Accordo di Programma evidenzia come le opere di consolidamento e protezione dei versanti consentono di ridurre i fenomeni franosi e ripristinare le condizioni di instabilità di versanti, con l'obiettivo prevalente di salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Tale obiettivo è perseguito attraverso interventi di messa in sicurezza caratterizzati sia da tecniche di ingegneria naturalistica sia tecniche di ingegneria civile o dall'integrazione delle stesse, minimizzando fortemente l'impatto ambientale delle opere di consolidamento.

1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

La disponibilità da subito dimostrata dalla Regione Basilicata di collaborare con il Commissario, ha reso possibile la messa a disposizione di spazi, Personale, mezzi strumentali e materiale di consumo che si sono dimostrati indispensabili non solo per avviare tempestivamente le attività, ma anche per garantire continuità, ed efficacia.

Dal punto di vista logistico quindi il Commissario beneficia di un Ufficio presso la sede decentrata di Matera della Regione Basilicata con collegamento telefonico, informatico e con la possibilità di utilizzo delle attrezzature di cui è fornito il complesso oltre che del servizio postale e di vigilanza della Regione.

Dal punto di vista organizzativo del personale, la "struttura" dell'Ufficio del Commissario è la seguente:

Dott. ing. Clara GIORDANO, dalla Regione Basilicata, a disposizione per 3 giorni alla settimana;

Dr. geol. Claudio BERARDI, dall'Autorità di Bacino della Basilicata, a disposizione per 1 giorno alla settimana,

Sig. Gaspare BUONSANTI, dal Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, a disposizione per 2 giorni alla settimana;

Geom. Domenico LAVECCHIA, dal Comune di Missanello, per un massimo di 30 ore (straordinario) al mese.

Collaborano con il Commissario straordinario delegato, secondo esigenza e a richiesta:

- l'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità della Regione Basilicata con il riconoscimento delle eventuali prestazioni in ore straordinarie del personale autorizzato;
- il dipartimento Presidenza della Giunta con personale impegnato alla bisogna, con il riconoscimento delle eventuali prestazioni in ore straordinarie del personale autorizzato;
- gli Uffici dei Dipartimenti Infrastrutture ed Ambiente con personale impegnato in progetti e collaborazione nelle istruttorie, con il riconoscimento delle eventuali prestazioni in ore straordinarie del personale autorizzato;
- gli Uffici del Provveditorato interregionale alle OO.PP di Puglia e Basilicata con personale impegnato in progetti, con il riconoscimento delle eventuali prestazioni in ore straordinarie del personale autorizzato.

1.4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente			
Importo corrente	***Importo cumulato***	***Speso***	***Residuo***
(per l'anno 2012)	*(anno 2012 + precedente periodo)*		
€. 2.827.805,77	***€. 6.685.370,83***	***€. 1.377.129,11***	***€. 5.308.241,72***

Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti *(Regione Basilicata PO-FESR 2007-2013)*			
Importo corrente	***Importo cumulato***	***Speso***	***Residuo***
(per l'anno 2012)	*(anno 2012 + precedente periodo)*		
€. 1.010.250,00	***€. 1.010.250,00***	***€. 913.228,60***	***€. 97.021,40***

1.5. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

Descrizione attività	***Importo speso corrente*** *(per l'anno 2012)*	***Importo speso cumulato*** *(anno 2012 + precedente periodo)*
Struttura commissariale	***€. 67.225,70***	***€. 67.225,70***
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	***€. 1.852.674,64***	***€.2.218.871,12***

1.6. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

Tabella 7 - Riepilogo Contabilità commissariale al 31/12/2012

IBAN: IT74I0100003245412000005594

Num. Ordinativo	data	Decreto Commissariale	Creditore/versante	ENTRATE			USCITE			SALDI		
				MATTM	Regione	Totale progressivo	MATTM	Regione	Totale progressivo	MATTM	Regione	DISPONIBILITA' DI CASSA
				codice A	codice B		codice A	codice B		progr. codice A	progr. codice B	
	29/06/2011		Direzione generale MATTM	€ 501.378,98		€ 501.378,98			€ 0,00	€ 501.378,98	€ 0,00	€ 501.378,98
1	20/10/2011	4	Marotta Srl				€ 155.269,33		€ 155.269,33	€ 346.109,65	€ 0,00	€ 346.109,65
2	21/10/2011	5	Petrocelli Costruzioni s.r.l.				€ 9.627,47		€ 164.896,80	€ 336.482,18	€ 0,00	€ 336.482,18
3	01/12/2011	6	Regione Basilicata				€ 225,00		€ 165.121,80	€ 336.257,18	€ 0,00	€ 336.257,18
4	02/12/2011	7	Regione Basilicata				€ 5.936,77		€ 171.058,57	€ 330.320,41	€ 0,00	€ 330.320,41
5	13/12/2011	8	Marotta Srl				€ 195.137,91		€ 366.196,48	€ 135.182,50	€ 0,00	€ 135.182,50
	15/12/2011		Direzione generale MATTM	€ 3.356.188,08		€ 3.857.565,06			€ 366.196,48	€ 3.491.368,58	€ 0,00	€ 3.491.368,58
1	03/02/2012	2	Negroni Key Engineering				€ 14.108,60		€ 380.305,08	€ 3.477.259,98	€ 0,00	€ 3.477.259,98
2	03/02/2012	3	Laser Graphic di Abiel Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera				€ 2.405,64		€ 382.710,72	€ 3.474.854,34	€ 0,00	€ 3.474.854,34
3	03/02/2012	3	Li Cartolplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 - 75100 Matera				€ 815,29		€ 383.526,01	€ 3.474.039,05	€ 0,00	€ 3.474.039,05
4	03/02/2012	4	Laser Graphic di Abiel Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera				€ 2.281,77		€ 385.807,78	€ 3.471.957,28	€ 0,00	€ 3.471.957,28
5	03/02/2012	4	Centro Copie società coop				€ 2.280,32		€ 387.888,10	€ 3.469.676,96	€ 0,00	€ 3.469.676,96
6	03/02/2012	4	Kartos di Giacumino - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza				€ 253,51		€ 388.141,61	€ 3.469.423,45	€ 0,00	€ 3.469.423,45
7	03/02/2012	5	Studio Tecnico Geom. Giuseppe Buonsanti - Via V.zo Cirsoprino, 9 - 75100 Matera				€ 2.600,00		€ 390.741,61	€ 3.466.823,45	€ 0,00	€ 3.466.823,45
8	03/02/2012	6	Ing. Acito Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera				€ 3.898,76		€ 394.640,37	€ 3.462.924,69	€ 0,00	€ 3.462.924,69
	17/02/2012		Regione Basilicata	€ 371.374,00		€ 4.229.139,06			€ 394.640,37	€ 3.471.374,00	€ 0,00	€ 3.834.498,69
9	21/02/2012	9	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato				€ 266,14		€ 394.906,51	€ 3.471.374,00	€ 0,00	€ 3.834.230,55
10	21/02/2012	10	Timbro Print di Patruno Anna				€ 216,00		€ 395.124,51	€ 3.471.374,00	€ 0,00	€ 3.834.014,55
11	23/02/2012	11	Ing. Acito Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera				€ 52.174,00		€ 447.298,51	€ 3.471.374,00	€ 0,00	€ 3.781.840,55
12	23/02/2012	11	Studio Sinanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera				€ 37.917,07		€ 485.215,58	€ 3.471.374,00	€ 0,00	€ 3.743.923,48
13	06/03/2012	17	Geoglcal & Geophisical Investigation				€ 5.000,00		€ 490.215,58	€ 3.367.349,48	€ 0,00	€ 3.738.923,48
14	08/03/2012	18	Eni Ceri Greco s.a.s.					€ 8.000,00	€ 498.215,58	€ 3.367.349,48	€ 0,00	€ 3.730.923,48
15	08/03/2012	20	Marotta Srl - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)				€ 1.642,77		€ 499.858,35	€ 3.365.706,71	€ 0,00	€ 3.729.280,71
16	02/04/2012	24	Regione Basilicata				€ 2.116,13		€ 501.974,47	€ 3.363.590,59	€ 0,00	€ 3.727.164,59
17	02/04/2012	26	Regione Basilicata				€ 14.260,85		€ 516.235,32	€ 3.349.329,74	€ 0,00	€ 3.712.903,74
18	02/04/2012	27	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera				€ 1.809,39		€ 518.130,71	€ 3.347.434,35	€ 0,00	€ 3.711.008,35
19	04/04/2012	28	Regione Basilicata				€ 853,23		€ 518.983,94	€ 3.346.581,12	€ 0,00	€ 3.710.155,12
20	17/04/2012	29	Regione Basilicata				€ 524,88		€ 519.508,82	€ 3.346.056,24	€ 0,00	€ 3.709.630,24
21	17/04/2012	31	Li Cartoplastica				€ 379,34		€ 519.888,16	€ 3.345.676,90	€ 0,00	€ 3.709.250,90
22	23/04/2012	48	Kicade Immi s.r.l.				€ 5.000,00		€ 524.888,16	€ 3.340.676,90	€ 0,00	€ 3.704.250,90
23	23/04/2012	49	Ing. Acito Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera				€ 1.964,52		€ 526.852,68	€ 3.338.712,38	€ 0,00	€ 3.702.286,38
24	27/04/2012	50	Laboratorio terre s.a.s. di Rocco Porsia & C. - Via I Maggio, 33 - 75100 Matera				€ 2.722,50		€ 529.575,18	€ 3.335.989,88	€ 0,00	€ 3.699.563,88
25	27/04/2012	51	Valda Progetti				€ 2.359,93		€ 532.935,11	€ 3.332.629,95	€ 0,00	€ 3.696.203,95
26	27/04/2012	52	Laser Graphic di Abiel Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera				€ 1.126,13		€ 534.061,24	€ 3.331.503,82	€ 0,00	€ 3.695.077,82
27	27/04/2012	53	Lazzari Maurizio				€ 12.058,80		€ 546.120,04	€ 3.319.445,02	€ 0,00	€ 3.683.019,02
28	27/04/2012	54	Studio Sasanelli - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera				€ 2.941,20		€ 549.061,24	€ 3.316.503,82	€ 0,00	€ 3.680.077,82
29	16/05/2012	59	Marotta Srl - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)				€ 5.705,86		€ 554.767,10	€ 3.310.797,96	€ 0,00	€ 3.674.371,96
30	16/05/2012	60	Il Sole 24ore S.p.A. - Milano Filiale sud				€ 2.420,00		€ 557.187,10	€ 3.308.377,96	€ 0,00	€ 3.671.951,96
31	16/05/2012	61	Agriss S.r.l. - Agenzia di informazione multimediale - 85025 Melfi (PZ)				€ 1.451,00		€ 558.638,10	€ 3.306.926,96	€ 0,00	€ 3.670.499,96
32	23/05/2012	62	Regione Basilicata				€ 2.696,49		€ 561.334,59	€ 3.304.229,47	€ 0,00	€ 3.667.803,47

Num. Ordinativo	data	Decreto (Ominissibile)	Creditore/versante	ENTRATE			USCITE			SALDI		
				MATTM	Regione	Totale progressivo	MATTM	Regione	Totale progressivo	MATTM	Regione	DISPONIBILITA' DI CASSA
				codice A	codice B		codice A	codice B		progr. codice A	progr. codice B	
33	23/05/2012	32	Regione Basilicata				€ 111,12		€ 561.446,71	€ 3.304.118,35	€ 363.574,00	€ 3.667.692,35
34	23/05/2012	32	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera				€ 433,36		€ 561.880,07	€ 3.303.684,99	€ 363.574,00	€ 3.667.258,99
35	23/05/2012	32	Dott.ssa Teresa Trabaci - III Vico Ferri, 41 - Bernalda (MT)				€ 340,77		€ 562.220,84	€ 3.303.344,22	€ 363.574,00	€ 3.666.918,22
36	23/05/2012	32	Studio Sasanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera				€ 85,19		€ 562.306,03	€ 3.303.259,03	€ 363.574,00	€ 3.666.833,03
37	23/05/2012	34	CBS Ingegneria di Alessandro Bochicchio C.S.n.c.				€ 3.250,00		€ 565.556,03	€ 3.300.009,03	€ 363.574,00	€ 3.663.583,03
38	23/05/2012	33	Geom. Contristano Alessandro - Via Sardegna, 5 - 85100 Potenza					€ 2.112,00	€ 567.668,03	€ 3.300.009,03	€ 361.462,00	€ 3.661.471,03
39	23/05/2012	33	Studio Sasanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera					€ 398,00	€ 568.066,03	€ 3.300.009,03	€ 361.064,00	€ 3.661.073,03
40	23/05/2012	34	Geom. Contristano Alessandro - Via Sardegna, 5 - 85100 Potenza					€ 1.403,00	€ 571.559,03	€ 3.300.009,03	€ 357.571,00	€ 3.657.580,03
41	23/05/2012	36	Studio Sasanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera					€ 660,00	€ 572.219,03	€ 3.300.009,03	€ 356.911,00	€ 3.656.920,03
42	23/05/2012	38	Geom. Donato Telesca - C.da Torretta, 64 - 85100 Potenza				€ 1.450,00		€ 573.669,03	€ 3.298.559,03	€ 356.911,00	€ 3.655.470,03
43	23/05/2012	38	Geom. Donato Telesca - C.da Torretta, 64 - 85100 Potenza					€ 2.111,00	€ 575.780,03	€ 3.298.559,03	€ 354.800,00	€ 3.653.359,03
44	04/06/2012	50	Laser Graphic di Allani Serafino - Via Dante Alighieri, 274/b - 75100 Matera				€ 153,55		€ 575.933,58	€ 3.298.405,48	€ 354.800,00	€ 3.653.205,48
45	04/06/2012	51	CBS Ingegneria di Alessandro Bochicchio C.S.n.c.				€ 3.375,00		€ 579.308,58	€ 3.298.405,48	€ 351.425,00	€ 3.649.830,48
46	18/06/2012	48	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera				€ 164,29		€ 579.472,87	€ 3.298.241,19	€ 351.425,00	€ 3.649.666,19
47	18/06/2012	62	Pascale Cave e Costruzioni S.r.l. - C.da Passarella, snc - 85050 Sabriano di Lucania (PZ)				€ 4.722,91		€ 584.195,78	€ 3.293.518,28	€ 351.425,00	€ 3.644.943,28
48	18/06/2012	54	Geom. Francesco Antonio Vigna - Castelmezzano (PZ)					€ 3.920,00	€ 588.115,78	€ 3.293.518,28	€ 347.505,00	€ 3.641.023,28
49	18/06/2012	56	Studio Geologico di Dilucchio Gennaro - Via Galliano, 31 - 85028 Rionero (PZ)					€ 3.457,01	€ 591.572,79	€ 3.293.518,28	€ 344.047,99	€ 3.637.566,27
50	18/06/2012	66	Studio Sasanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera					€ 668,54	€ 592.241,33	€ 3.293.518,28	€ 343.379,45	€ 3.636.897,73
51	18/06/2012	67	La Stamperia S.n.c. di Gaetano e Rosalba Liantonio				€ 2.364,34		€ 594.605,67	€ 3.291.153,94	€ 343.379,45	€ 3.634.533,39
52	18/06/2012	68	Ing. Gianluca Rongi - Via Dante, 9 - 75100 Matera					€ 4.233,60	€ 598.839,27	€ 3.291.153,94	€ 339.145,85	€ 3.630.299,79
53	18/06/2012	69	Studio Sasanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera					€ 800,00	€ 599.639,27	€ 3.291.153,94	€ 338.345,85	€ 3.629.499,79
54	21/06/2012	74	Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)				€ 2.987,04		€ 602.626,31	€ 3.288.166,90	€ 338.345,85	€ 3.626.512,75
55	21/06/2012	74	Studio Sasanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera				€ 512,95		€ 603.139,26	€ 3.287.653,95	€ 338.345,85	€ 3.625.999,80
	05/07/2012		Storno ordinativo n. 54 del 21/06/12				-€ 2.987,04		€ 600.152,22	€ 3.290.640,99	€ 338.345,85	€ 3.628.986,84
56	06/07/2012	77	Laboratorio Terre s.a.s. di Rocco Persia & C. - Via I Maggio, 31 - 75100 Matera					€ 6.092,35	€ 606.244,57	€ 3.290.640,99	€ 332.253,50	€ 3.622.894,49
57	06/07/2012	81	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma				€ 915,00		€ 607.159,57	€ 3.289.725,99	€ 332.253,50	€ 3.621.979,49
58	06/07/2012	74	Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)				€ 2.987,04		€ 610.146,61	€ 3.286.738,95	€ 332.253,50	€ 3.618.992,45
	19/07/2012		Storno ordinativo n. 58 del 06/07/12				-€ 2.987,04		€ 607.159,57	€ 3.289.725,99	€ 332.253,50	€ 3.621.979,49
59	10/07/2012	85	Ing. Azito Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera				€ 14.487,00		€ 621.646,57	€ 3.275.238,99	€ 332.253,50	€ 3.607.492,49
60	10/07/2012	83	Studio Sasanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera				€ 10.490,36		€ 632.136,93	€ 3.264.748,63	€ 332.253,50	€ 3.597.002,13
61	12/07/2012	86	Kartais di Giacumino - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza					€ 1.518,44	€ 633.655,37	€ 3.264.748,63	€ 330.735,06	€ 3.595.483,69
62	12/07/2012	87	Laser Graphic di Allani Serafino - Via Dante, 2 - 75100 Matera					€ 183,68	€ 633.839,05	€ 3.264.748,63	€ 330.551,38	€ 3.595.300,01
63	12/07/2012	89	Comune di Tursi (MT)				€ 2.988,92		€ 636.827,97	€ 3.261.759,71	€ 330.551,38	€ 3.592.311,09
64	12/07/2012	90	M.A. Costruzioni Generali S.r.l. - Via Cinfranca, 21 - 75018 Stigliano (MT)				€ 83.810,19		€ 720.638,16	€ 3.177.949,52	€ 330.551,38	€ 3.508.500,90
65	19/07/2012	91	Timbro Print di Pastrano Anna				€ 40,20		€ 720.678,36	€ 3.177.909,32	€ 330.551,38	€ 3.508.460,70
66	19/07/2012	91	Kartais di Giacumino - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza				€ 84,99		€ 720.763,35	€ 3.177.824,33	€ 330.551,38	€ 3.508.375,71
67	19/07/2012	93	Comune di Missanello (PZ)				€ 700,00		€ 721.463,35	€ 3.177.124,33	€ 330.551,38	€ 3.507.675,71
68	26/07/2012	97	Ing. Azito Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera				€ 2.113,90		€ 723.577,25	€ 3.175.010,43	€ 330.551,38	€ 3.505.561,81
69	26/07/2012	98	Fiumarino Tonia Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera				€ 23.375,01		€ 746.952,26	€ 3.151.635,42	€ 330.551,38	€ 3.482.186,80
70	26/07/2012	100	Fiumarino Tonia Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera				€ 55.268,75		€ 802.221,01	€ 3.096.366,67	€ 330.551,38	€ 3.426.918,05
71	10/08/2012	74	Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)				€ 2.987,04		€ 805.208,05	€ 3.093.379,63	€ 330.551,38	€ 3.423.931,01
	11/09/2012		Regione Basilicata			€ 638.676,00			€ 805.208,05	€ 3.093.379,63	€ 969.227,38	€ 4.062.607,01
73	18/09/2012	115	Geobest S.a.s. di Carbone Andrea - Via Lucca 55 A/B - Melfi (PZ)			€ 4.867.835,06		€ 8.957,67	€ 814.165,72	€ 3.093.379,63	€ 960.269,71	€ 4.053.649,34

Num. Ordinativo	data	Decreto Commissariale	Creditore/versante	ENTRATE			USCITE			SALDI		
				MATTM	Regione	Totale progressivo	MATTM	Regione	Totale progressivo	MATTM	Regione	DISPONIBILITA' DI CASSA
				codice A	codice B		codice A	codice B		progr. codice A	progr. codice B	
74	18/09/2012	116	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza				€ 701,74		€ 814.869,46	€ 3.092.675,89	€ 960.269,71	€ 4.052.945,60
75	18/09/2012	117	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza				€ 330,21		€ 815.199,67	€ 3.092.345,68	€ 960.269,71	€ 4.052.615,39
	19/09/2012		Direzione generale MATTM	€ 960.361,88		€ 5.828.176,94			€ 815.199,67	€ 4.052.707,56	€ 960.269,71	€ 5.012.977,27
	19/09/2012		Direzione generale MATTM	€ 663.138,54		€ 6.491.315,48			€ 815.199,67	€ 4.715.846,10	€ 960.269,71	€ 5.676.115,81
	04/10/2012		Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera				-€ 597,65		€ 814.602,02	€ 4.716.443,75	€ 960.269,71	€ 5.676.713,46
72	18/09/2012	102	Regione Basilicata				€ 30,00		€ 814.632,02	€ 4.716.413,75	€ 960.269,71	€ 5.676.683,46
76	21/09/2012	120	Angelone Domenico - Via Longarone, 36 - 75023 Policoro (MT)					€ 10.513,09	€ 825.145,11	€ 4.716.413,75	€ 949.756,62	€ 5.666.170,37
77	21/09/2012	120	Studio Sasanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 43 - 75100 Matera					€ 2.081,80	€ 827.226,91	€ 4.716.413,75	€ 947.674,82	€ 5.664.088,57
78	28/09/2012	129	Laser Graphic di Aluni Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera				€ 99,22		€ 827.326,13	€ 4.716.314,53	€ 947.674,82	€ 5.663.989,35
79	28/09/2012	133	De Nicola Teodosio - Via Lamamora, 11 - 85100 Potenza				€ 3.179,00		€ 830.505,13	€ 4.713.135,53	€ 947.674,82	€ 5.660.810,35
81	28/09/2012	134	Ripulone Gaetano - C.so Umberto I, 60 - 75018 Stigliano (MT)					€ 1.111,32	€ 831.616,45	€ 4.713.135,53	€ 946.563,50	€ 5.659.699,03
82	28/09/2012	134	Studio Sasanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 43 - 75100 Matera					€ 210,00	€ 831.826,45	€ 4.713.135,53	€ 946.353,50	€ 5.659.489,03
83	09/10/2012	135	Gaia Engrnie S.r.l. - Area Industriale 85059 Viggiano (PZ)				€ 3.500,00		€ 835.326,45	€ 4.709.635,53	€ 946.353,50	€ 5.655.989,03
84	09/10/2012	140	Pasquale Cave e Costruzioni S.r.l. - C.da Pasaniello, snc - 85050 Satriano di Lucania (PZ)					€ 4.341,77	€ 839.668,22	€ 4.709.635,53	€ 942.011,73	€ 5.651.647,26
85	09/10/2012	141	Geotest S.a.s. di Carbone Andrea - Via Lucca 55 A/B - Melfi (PZ)					€ 3.404,49	€ 843.073,11	€ 4.709.635,53	€ 938.606,84	€ 5.648.242,37
86	09/10/2012	142	CBS Ingegneria di Alessandro Bochicchio C.S.n.c.				€ 4.780,00		€ 847.853,11	€ 4.704.855,53	€ 938.606,84	€ 5.643.462,37
87	17/10/2012	146	Studio Sasanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 43 - 75100 Matera				€ 11.203,36		€ 859.056,47	€ 4.693.652,17	€ 938.606,84	€ 5.632.258,01
88	17/10/2012	146	INAIL - Via Lucania, 144 - 75100 Matera				€ 3.427,85		€ 862.484,32	€ 4.690.224,32	€ 938.606,84	€ 5.628.831,16
89	17/10/2012	146	Casa Edile Provinciale - Viale Nazioni Unite, 43 - 75100 Matera				€ 985,43		€ 863.469,79	€ 4.689.238,91	€ 938.606,84	€ 5.627.845,75
90	18/10/2012	144	Comune di Missanello (PZ)				€ 925,02		€ 864.394,75	€ 4.688.313,89	€ 938.606,84	€ 5.626.920,73
91	18/10/2012	149	Comune di Missanello (PZ)				€ 950,44		€ 865.345,19	€ 4.687.363,45	€ 938.606,84	€ 5.625.970,29
92	18/10/2012	149	Comune di Sant'Arcangelo (PZ)				€ 760,35		€ 866.105,54	€ 4.686.603,10	€ 938.606,84	€ 5.625.209,94
93	18/10/2012	133	De Nicola Giuseppe - Via Lamarmora, 11 - 85100 Potenza				€ 3.179,00		€ 869.284,54	€ 4.683.424,10	€ 938.606,84	€ 5.622.030,94
94	05/11/2012	134	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza				€ 929,53		€ 870.214,05	€ 4.682.494,59	€ 938.606,84	€ 5.621.101,43
95	05/11/2012	156	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera				€ 3.725,64		€ 873.939,69	€ 4.678.768,95	€ 938.606,84	€ 5.617.375,79
96	05/11/2012	164	Dalmar Opere Generali S.r.l. - Via Gilitti, 19 - Marconia Pisticci				€ 92.175,77		€ 966.115,46	€ 4.586.593,18	€ 938.606,84	€ 5.525.200,02
97	05/11/2012	163	Impresa Sinigalli S.r.l. - Via Pantoni di Freda, 6 - 85100 Potenza					€ 124.850,22	€ 1.090.965,68	€ 4.586.593,18	€ 813.756,62	€ 5.400.349,80
98	05/11/2012	162	Fantini Ing. Roberto - Vico II Roma, 11 - 75010 Aliano (MT)				€ 5.715,36		€ 1.096.681,04	€ 4.580.877,82	€ 813.756,62	€ 5.394.634,44
99	05/11/2012	162	Studio Sasanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 43 - 75100 Matera				€ 1.080,00		€ 1.097.761,04	€ 4.579.797,82	€ 813.756,62	€ 5.393.554,44
	06/11/2012		Storno ordinativo n. del				-€ 20.562,69		€ 1.077.198,35	€ 4.600.360,51	€ 813.756,62	€ 5.414.117,13
100	12/11/2012	166	Engineering Geology S.r.l. - Via del Gallitello, 90/A - 85100 Potenza				€ 14.341,34		€ 1.091.541,69	€ 4.588.017,17	€ 813.756,62	€ 5.399.773,79
101	15/11/2012	171	La Torre Luciano - C.da Spinette, 4 - 85050 Tito (PZ)				€ 224.818,00		€ 1.316.359,69	€ 4.363.199,17	€ 813.756,62	€ 5.174.955,79
102	15/11/2012	172	Sinigalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza				€ 41.390,47		€ 1.357.750,16	€ 4.319.808,70	€ 813.756,62	€ 5.133.565,32
103	15/11/2012	173	Pepe S.r.l. - Viale Italia - San Brancato di Sant'Arcangelo - 85037 Sant'Arcangelo (PZ)				€ 38.464,39		€ 1.396.214,55	€ 4.281.344,31	€ 813.756,62	€ 5.095.100,93
104	21/11/2012	175	Geomonter S.n.c. - Viale I Maggio - 85020 Filiano (PZ)				€ 9.953,79		€ 1.406.168,34	€ 4.271.390,52	€ 813.756,62	€ 5.085.147,14
105	21/11/2012	178	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma				€ 315,00		€ 1.406.483,34	€ 4.271.075,52	€ 813.756,62	€ 5.084.832,14
106	21/11/2012	179	Manotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)					€ 177.630,42	€ 1.584.113,76	€ 4.271.075,52	€ 636.126,20	€ 4.907.201,72
107	28/11/2012	181	Comune di Tito (PZ)				€ 3.335,37		€ 1.587.449,13	€ 4.267.740,15	€ 636.126,20	€ 4.903.866,35
108	28/11/2012	181	Gerardo Colangelo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)				€ 266,59		€ 1.587.715,72	€ 4.267.473,56	€ 636.126,20	€ 4.903.599,76
109	28/11/2012	181	Lusinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata				€ 355,44		€ 1.588.071,16	€ 4.267.118,12	€ 636.126,20	€ 4.903.244,32
110	28/11/2012	181	Studio Sasanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 43 - 75100 Matera				€ 230,06		€ 1.588.301,22	€ 4.266.888,06	€ 636.126,20	€ 4.903.014,26
111	28/11/2012	183	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma				€ 225,00		€ 1.588.526,22	€ 4.266.663,06	€ 636.126,20	€ 4.902.789,26
112	28/11/2012	184	Greco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata				€ 2.180,71		€ 1.590.706,93	€ 4.264.482,35	€ 636.126,20	€ 4.900.608,55

Num. Ordinativo	data	Decreto Commissariale	Creditore/versante	ENTRATE			USCITE			SALDI		
				MATTM	Regione	Totale progressivo	MATTM	Regione	Totale progressivo	MATTM	Regione	DISPONIBILITA' DI CASSA
				codice A	codice B		codice A	codice B		progr. codice A	progr. codice B	
113	23/11/2012	184	Larocca Maria Rosaria - Dipendente Regione Basilicata				€ 1.594,38		€ 1.992.301,13	€ 4.262.898,17	€ 636.126,20	€ 4.899.014,37
114	23/11/2012	184	D'Andrea Giovanni Salvatore - Dipendente Regione Basilicata				€ 2.087,86		€ 1.994.388,97	€ 4.260.810,31	€ 636.126,20	€ 4.896.926,51
115	23/11/2012	184	Iannello Giuseppina - Dipendente Regione Basilicata				€ 893,52		€ 1.995.282,49	€ 4.259.906,79	€ 636.126,20	€ 4.896.032,99
116	23/11/2012	184	D'Andrea Carmine - Dipendente Regione Basilicata				€ 3.083,14		€ 1.998.365,63	€ 4.256.823,65	€ 636.126,20	€ 4.892.949,85
117	24/11/2012	184	Grippa Vito - Dipendente Regione Basilicata				€ 3.039,98		€ 1.601.405,61	€ 4.253.783,67	€ 636.126,20	€ 4.889.909,87
118	24/11/2012	184	Cancelliere Bruna - Dipendente Regione Basilicata				€ 874,80		€ 1.602.280,41	€ 4.252.908,87	€ 636.126,20	€ 4.889.035,07
119	23/11/2012	184	Giordano Clara - Dipendente Regione Basilicata				€ 3.059,56		€ 1.605.339,97	€ 4.249.849,31	€ 636.126,20	€ 4.885.975,51
120	23/11/2012	184	Cavallo Vincenzo - Dipendente Regione Basilicata				€ 1.540,82		€ 1.606.880,79	€ 4.248.308,49	€ 636.126,20	€ 4.884.434,69
121	23/11/2012	184	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata				€ 387,95		€ 1.607.268,74	€ 4.247.920,54	€ 636.126,20	€ 4.884.046,74
122	23/11/2012	184	Nicoletti Vincenzo - Dipendente Regione Basilicata				€ 687,33		€ 1.607.955,87	€ 4.247.233,41	€ 636.126,20	€ 4.883.359,61
123	23/11/2012	184	Tolve Salvatore - Dipendente Regione Basilicata				€ 2.986,28		€ 1.610.942,15	€ 4.244.247,13	€ 636.126,20	€ 4.880.373,33
124	23/11/2012	184	Clita Antonio - Dipendente Regione Basilicata				€ 1.227,63		€ 1.612.169,78	€ 4.243.019,50	€ 636.126,20	€ 4.879.145,70
125	23/11/2012	184	Laviero Laurino - Dipendente Regione Basilicata				€ 278,92		€ 1.612.448,70	€ 4.242.740,58	€ 636.126,20	€ 4.878.866,78
126	23/11/2012	184	Maio Salvatore - Dipendente Regione Basilicata				€ 252,64		€ 1.612.701,34	€ 4.242.487,94	€ 636.126,20	€ 4.878.614,14
127	23/11/2012	184	Studio Sasanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera				€ 10.953,04		€ 1.623.652,38	€ 4.231.536,90	€ 636.126,20	€ 4.867.663,10
128	05/12/2012	185	G.A.T. Geologia Ambiente Territorio del geol. Donato Lacava - Via Sicilia, 43 - 85100 PZ					€ 1.751,94	€ 1.627.404,32	€ 4.231.536,90	€ 632.374,26	€ 4.863.911,16
129	05/12/2012	186	Kartoi di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza				€ 146,76		€ 1.627.551,08	€ 4.231.390,14	€ 632.374,26	€ 4.863.764,40
130	05/12/2012	187	Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)					€ 2.943,74	€ 1.630.494,82	€ 4.231.390,14	€ 629.430,52	€ 4.860.820,66
131	05/12/2012	187	Studio Sasanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera					€ 536,28	€ 1.631.051,08	€ 4.231.390,14	€ 628.874,26	€ 4.860.264,40
132	05/12/2012	188	Kartoi di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza (2/5 Cod. A e 3/5 Cod. B)				€ 493,61	€ 740,42	€ 1.632.285,11	€ 4.230.896,53	€ 628.133,84	€ 4.859.030,37
133	05/12/2012	189	Pinto Costruzioni S.r.l. - Corso Umberto N. 56 - 75018 Stigliano (MT)					€ 142.296,00	€ 1.774.581,11	€ 4.230.896,53	€ 485.837,84	€ 4.716.734,37
134	05/12/2012	190	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera				€ 76,60		€ 1.774.657,71	€ 4.230.819,93	€ 485.837,84	€ 4.716.657,77
135	05/12/2012	191	La Cartolitotipica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 - 75100 Matera				€ 523,00		€ 1.775.180,71	€ 4.230.296,93	€ 485.837,84	€ 4.716.134,77
136	05/12/2012	192	Soc. Coop Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Vigiano (PZ)				€ 8.232,61		€ 1.783.413,32	€ 4.222.064,32	€ 485.837,84	€ 4.707.902,16
137	05/12/2012	194	Sinigalli Mario & C. S.a.s. - Via Ardio, 53 - 85100 Potenza					€ 73.371,81	€ 1.856.785,13	€ 4.222.064,32	€ 412.466,03	€ 4.634.530,33
138	05/12/2012	195	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata				€ 45,73		€ 1.856.830,86	€ 4.222.018,59	€ 412.466,03	€ 4.634.484,62
139	05/12/2012	195	Greco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata				€ 193,31		€ 1.857.023,97	€ 4.221.825,48	€ 412.466,03	€ 4.634.291,51
140	05/12/2012	195	Nicoletti Vincenzo - Dipendente Regione Basilicata				€ 119,93		€ 1.857.143,90	€ 4.221.705,55	€ 412.466,03	€ 4.634.171,58
141	05/12/2012	195	Larocca Maria Rosaria - Dipendente Regione Basilicata				€ 24,39		€ 1.857.168,29	€ 4.221.681,16	€ 412.466,03	€ 4.634.147,19
142	05/12/2012	195	Studio Sasanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera				€ 141,72		€ 1.857.310,01	€ 4.221.539,44	€ 412.466,03	€ 4.634.005,47
143	05/12/2012	195	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera				€ 164,29		€ 1.857.474,30	€ 4.221.375,15	€ 412.466,03	€ 4.633.841,18
144	05/12/2012	196	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata				€ 243,35		€ 1.857.717,65	€ 4.221.131,80	€ 412.466,03	€ 4.633.597,83
145	05/12/2012	196	Greco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata				€ 829,69		€ 1.858.547,34	€ 4.220.302,11	€ 412.466,03	€ 4.632.768,14
146	05/12/2012	196	Nicoletti Vincenzo - Dipendente Regione Basilicata				€ 316,35		€ 1.858.863,69	€ 4.219.985,76	€ 412.466,03	€ 4.632.451,79
147	05/12/2012	196	Antonucci Francesca - Dipendente Regione Basilicata				€ 342,77		€ 1.859.206,46	€ 4.219.643,00	€ 412.466,03	€ 4.632.111,02
148	05/12/2012	196	Cocca Carmine - Dipendente Regione Basilicata				€ 266,69		€ 1.859.471,15	€ 4.219.378,30	€ 412.466,03	€ 4.631.844,33
149	05/12/2012	196	Larocca Maria Rosaria - Dipendente Regione Basilicata				€ 108,67		€ 1.859.577,82	€ 4.219.271,63	€ 412.466,03	€ 4.631.737,66
150	05/12/2012	196	Studio Sasanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera				€ 592,97		€ 1.860.170,79	€ 4.218.678,66	€ 412.466,03	€ 4.631.144,69
151	05/12/2012	196	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza				€ 111,12		€ 1.860.281,91	€ 4.218.567,54	€ 412.466,03	€ 4.631.033,57
152	05/12/2012	196	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera				€ 433,36		€ 1.860.715,27	€ 4.218.134,18	€ 412.466,03	€ 4.630.600,21
153	05/12/2012	197	De Carlo Luigi - Via Scota Le Mura, 31 - 85046 Rotoli (PZ)					€ 37.723,95	€ 1.898.439,22	€ 4.218.134,18	€ 374.742,08	€ 4.592.876,26
154	06/12/2012	193	Soc. Coop Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Vigiano (PZ)					€ 5.718,79	€ 1.904.158,01	€ 4.218.134,18	€ 369.023,29	€ 4.587.157,47
	10/12/2012		Direzione generale MATTM	€ 663.138,54		€ 663.138,54			€ 1.904.158,01	€ 4.881.272,72	€ 369.023,29	€ 5.250.296,01

Num. Ordinativo	data	Decreto Commissariale	Creditore/versante	ENTRATE			USCITE			SALDI		
				MATTM	Regione	Totale progressivo	MATTM	Regione	Totale progressivo	MATTM	Regione	DISPONIBILITA' DI CASSA
				codice A	codice B		codice A	codice B		progr. codice A	progr. codice B	
	10/12/2012		Direzione generale MATTM	€ 141.346,81		€ 1.704.305,35			€ 1.304.158,01	€ 5.422.439,53	€ 393.023,29	€ 5.791.462,82
155	11/12/2012	199	Agrello Geol. Domenico - Via dell'Arancio, 16 - 85044 Lauria (PZ)					€ 1.535,79	€ 1.909.693,80	€ 5.422.439,53	€ 367.457,50	€ 5.789.927,03
156	11/12/2012	199	Studio Sasanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera					€ 297,00	€ 1.905.990,80	€ 5.422.439,53	€ 367.190,50	€ 5.789.630,03
157	11/12/2012	201	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza				€ 190,62		€ 1.906.181,42	€ 5.422.248,91	€ 367.190,50	€ 5.789.439,41
158	11/12/2012	205	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza				€ 4.351,20		€ 1.910.532,62	€ 5.417.897,71	€ 367.190,50	€ 5.785.088,31
159	12/12/2012	202	Valbasento Lavori S.r.l. - C.da Parata, 1 - 75010 Calciano (MT)					€ 54.751,29	€ 1.965.283,91	€ 5.417.897,71	€ 312.439,21	€ 5.730.336,92
160	12/12/2012	206	Pastore Giovanni - Via Sant'Anna, 32 - 85050 Tito (PZ)					€ 1.348,00	€ 1.966.531,91	€ 5.417.897,71	€ 311.191,21	€ 5.729.088,92
161	12/12/2012	207	D'Andrea Giovanni Salvatore - Dipendente Regione Basilicata				€ 1.004,62		€ 1.967.536,53	€ 5.416.893,09	€ 311.191,21	€ 5.728.084,30
162	12/12/2012	207	Iannello Giuseppina - Dipendente Regione Basilicata				€ 202,37		€ 1.967.738,90	€ 5.416.690,72	€ 311.191,21	€ 5.727.881,93
163	12/12/2012	207	Antonico Francesca - Dipendente Regione Basilicata				€ 281,80		€ 1.968.020,70	€ 5.416.408,92	€ 311.191,21	€ 5.727.600,13
164	12/12/2012	207	Rivello Rocco - Dipendente Regione Basilicata				€ 665,06		€ 1.968.685,76	€ 5.415.743,86	€ 311.191,21	€ 5.726.935,07
165	12/12/2012	207	Cocca Carmine - Dipendente Regione Basilicata				€ 248,64		€ 1.968.934,40	€ 5.415.495,22	€ 311.191,21	€ 5.726.686,43
166	12/12/2012	207	Studio Sasanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera				€ 1.118,35		€ 1.970.052,75	€ 5.414.376,87	€ 311.191,21	€ 5.725.568,08
167	13/12/2012	208	Soc. Coop Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Viggiano (PZ)				€ 9.467,77		€ 1.979.520,52	€ 5.404.909,10	€ 311.191,21	€ 5.716.100,31
168	14/12/2012	209	Costruzioni Generali Infrastrutture Generali Srl C.da Piagge sx. SS8 Km. 70 85010 Gallicchio (PZ)					€ 21.545,91	€ 2.002.066,45	€ 5.404.909,10	€ 288.645,30	€ 5.693.554,38
169	14/12/2012	211	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza					€ 1.352,53	€ 2.003.418,98	€ 5.404.909,10	€ 287.292,75	€ 5.692.201,85
170	14/12/2012	212	La Nuova Edilstrade di Bochicchio Angelo - C.da Valle dell'oro - 85051 Bella (PZ)					€ 190.271,35	€ 2.193.690,33	€ 5.404.909,10	€ 97.021,40	€ 5.501.930,50
171	14/12/2012	213	Dalmar Opere Generali S.r.l. - Via Gallitti, 19 - Marconia Pisticci				€ 92.150,33		€ 2.285.840,66	€ 5.312.758,77	€ 97.021,40	€ 5.409.780,17
172	14/12/2012	214	Spilotro Giuseppe - Viale della resistenza, 48 G2 - 70125 Bari				€ 6.604,47		€ 2.292.445,08	€ 5.306.154,35	€ 97.021,40	€ 5.403.175,75
173	14/12/2012	214	Studio Sasanello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera				€ 1.248,00		€ 2.293.693,08	€ 5.304.906,35	€ 97.021,40	€ 5.401.927,75
	21/12/2012		Storno ordinativo n. del (Comune di Tito)				-€ 3.335,37		€ 2.290.357,71	€ 5.308.241,72	€ 97.021,40	€ 5.405.263,12
				€ 6.685.370,83	€ 1.010.290,00	€ 6.491.315,48	€ 1.377.129,11	€ 913.228,60	€ 2.290.357,71	€ 5.308.241,72	€ 97.021,40	€ 5.405.263,12

1.7. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

1.7.1 Descrizione delle attività

L'art. 2 del DPCM 21.01.2011 di nomina, ha definito puntualmente i compiti del Commissario:

- attuare gli interventi,
- provvedere alla opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso,
- emanare gli atti e i provvedimenti
- curare tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazioni degli interventi.

Al Commissario sono state attestate, quindi, competenze esclusivamente in materia di attuazione con esclusione delle attività di programmazione.

L'art. 4 del decreto di nomina ha individuato, poi, le possibili collaborazioni ed anche i limiti dei protagonismi:... "Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente ... delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tali attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163 del 2006" ...

In considerazione di quanto prescritto dal richiamato art. 4 si è provveduto, inizialmente, ad avviare le fasi propedeutiche a quella attuativa, individuando rapidamente i RUP (Responsabile Unici dei Procedimenti), dei singoli interventi inseriti nell'allegato 1- elenco A dell'AdP, esclusivamente tra i dirigenti degli uffici tecnici comunali, o tra i tecnici regionali.

Si è poi verificata anche la possibilità di dare diretta attuazione alle fasi successive, quelle di progettazione e di direzione dei lavori, impegnando, inizialmente, esclusivamente le strutture pubbliche disponibili, ma riscontrando gravi difficoltà per la cronica carenza, "in organico", in molte strutture comunali, di personale tecnico, in particolare ingegneri, strutturisti e geologi, indispensabili per le varie progettazioni.

Doverosamente, sono stati avviati, a tal fine, incontri e confronti con i responsabili politici ed amministrativi della Regione Basilicata e dei Comuni interessati dagli interventi.

E' stata riscontrata una incoraggiante immediata disponibilità per le più ampie forme di collaborazione: da quelle logistiche, alla fornitura di strumenti e mezzi ed alla messa a disposizione di qualificato personale tecnico ed amministrativo, in particolare da parte della Regione Basilicata.

Sono stati anche interessati, per possibili attività di collaborazione, il Provveditorato alle OO.PP. e la Soprintendenza regionale al paesaggio, oltre che la Presidenza del Dipartimento di Ingegneria della Università di Basilicata.

E' stata richiesta la collaborazione del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto che ha messo a disposizione del Commissario un proprio tecnico per due giorni alla settimana e della società di ricerca Agrobios SpA, Società a totale capitale regionale, che ha messo a disposizione propri ricercatori per eventuali collaborazioni su singoli progetti. E' stata anche coinvolta l'Autorità di Bacino della Basilicata che ha messo a disposizione un Geologo per un giorno alla settimana e altri professionisti per eventuali collaborazioni a progetto.

Con il Provveditorato alle OO.PP. di Puglia e Basilicata è stato sottoscritto, in data 20 giugno 2012, un protocollo per la gestione di 7 interventi dell'atto integrativo all'accordo.

Con la Università di Basilicata, non è stato possibile, allo stato, stipulare alcun accordo, ma sono in corso incontri per definire possibili collaborazioni.

A seguito degli incontri con Amministratori e tecnici dei vari comuni interessati e con dirigenti e funzionari della Regione Basilicata, si è provveduto, come già detto, ad individuare i RUP ed i soggetti realizzatori degli interventi. A seguito di successivi aggiustamenti e modifiche risultano i seguenti:

ELENCO INTERVENTI - SOGGETTI REALIZZATORI - RUP

Codice	Comune	Località	Titolo Intervento	Ente realizzatore	RUP
MT001B/10	Accettura	Fosso delle Conche - Zona le Piagge	Lavori di sistemazione e consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone
PZ002A/10	Acerenza	Area urbana e limitrofe	Consolidamento e difesa ambientale - 1° Stralcio - zona a Valle Glinni	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ003B/10	Albano di Lucania	Strade Provinciali Sp. 13 e Sp 16	Interventi di consolidamento lungo la SP. 13 e SP. 16	Ufficio tecnico Comune di Albano	Arch. Vito Stoppelli
MT004B/10	Aliano	Loc. Sant'Angelo	Monitoraggio dell'area a rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico del Comune di Aliano	Geom. Domenico Claps
PZ005B/10	Avigliano	Centro abitato	Sistemazione idrogeologica zona a valle della Chiesa del Carmelo-Pisciarelli	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ006A/10	Avigliano	Centro abitato	Sistemazione idrogeologica zona a valle Villa Comunale-Viale della Vittoria	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ007A/10	Avigliano	Loc. Spinamara	Consolidamento loc. Spinamara	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ008A/10	Baragiano	Zona del versante comunale	Intervento di messa in sicurezza di alcuni versanti	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ009A/10	Bella	Versante Est -Plesso Scolastico Via Gandhi	Lavori di consolidamento del Versante Est -Plesso Scolastico Via Gandhi	Ufficio Tecnico del Comune di Bella	Geom. Donato Gamma
MT010A/10	Bernalda	Bacino del Fiume Basento - Località Mezzana in Agro di Bernalda	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Antonio Losinno

MT011B/10	Bernalda	Fosso Zingari	Lavori di sistemazione e consolidamento muro di sostegno	Area Programma Bradanica medio Basento	Dott. For. Giovanni Fiorentini
MT012A/10	Bernalda - Pisticci	Bacino del Fiume Basento	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Antonio Losinno
PZ013B/10	Brienza	Centro abitato - Zona Spineto	Consolidamento area a monte abitato zona Spineto	Ufficio Tecnico del Comune di Brienza	Arch. Giuseppe Michele Palladino
MT014B/10	Calciano	Località Laghi Parata - Località Cicchione	Lavori di ripristino delle c ondizioni di stabilità del versante	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone
PZ015B/10	Calvello	Fosso Varcaturo	Sistemazione idrogeologica Fosso Varcaturo	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ016B/10	Calvera	Centro abitato	Lavori di consolidamento del centro abitato	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ017B/10	Campomaggiore	Centro abitato	Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ018B/10	Carbone	Centro abitato	Lavori di consolidamento centro abitato	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ019B/10	Castelmezzano	Loacalità Paschiere, Mirutto e Castello	Opere di contenimento e mitigazione del rischio idirogeologico	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ020A/10	Castelmezzano	Zona a valle strada comunale Cimitero e SP3	Opere di contenimento e mitigazione del rischio idirogeologico	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ021B/10	Chiaromonte	Centro abitato	Lavori di consolidamento in località Dietro le Mura-Scorciaturo	Ufficio Tecnico del Comune di Chiaromonte	Ing. Giovanni Pangaro
MT022B/10	Cirigliano	Valle Piano	Intervento di messa in sicurezza area interessata da caduta massi	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone

PZ023A/10	Gallicchio	Centro storico - Via Roma	Consolidamento e sistemazione idraulico forestale	Ufficio tecnico Comune di Gallicchio	Dr. Rocco Balzano
MT024B/10	Garaguso	Contrada Pantoni	Intervento di riduzione del rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico Comune di Garaguso	Ing. Angela Lisanti
PZ025A/10	Genzano di Lucania	Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655 Bradanica	Sistemazione idraulica del Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655 Bradanica	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ026B/10	Genzano di Lucania	Gaudemanno	Sistemazione fosso Gaudemanno	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT027B/10	Gorgoglione	Piazza Zanardelli	Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone
MT028B/10	Grassano	Via Tilea - Strettolone	Lavori di consolidamento del versante - area impianti sportivi	Ufficio tecnico Comune di Grassano	Arch.Pasquale Deniso
MT029A/10	Grottole	Centro abitato e aree limitrofe	Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del Comune di Grottole	Ufficio tecnico Comune di Grottole	Ing. Rocco Vitella
MT030A/10	Irsina		Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio	Ufficio Tecnico Comune di Irsina	Ing. Giuseppe Dicandia
PZ031C/10	Latronico	Latronico foglio 211 III° N.O.	Consolidamento zona N.O. Latronico centro - Fabbricato pericolante via Montegrappa	Uffico Tecnico Comune di Latronico	Ing. Prosperino Suanno
PZ032B/10	Lauria	Lauria Inferiore	Lavori di messa in sicurezza in Vico IV Cerruto-Piede Costone Armo	Ufficio Tecnico Comune di Lauria	Ing. Biagio Papaleo
PZ033A/10	Lauria	Seta -Gremile	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Tecnico Comune di Lauria	Ing. Biagio Papaleo
PZ034B/10	Lavello	Centro abitato	Lavori di completamento consolidamento Rione Casale	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello

PZ035A/10	Maschito	Centro abitato e frazioni	Consolidamento e difesa ambientale	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT036A/10	Matera	Rione Sassi	Rione Sassi. Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle Virtù".	Ufficio Tecnico Comune di Matera	Arch. Giuseppe Gandi
PZ037A/10	Melfi	Versante a monte SS.401 Dir Km. 13+100-Km. 13+400	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Tecnico del Comune di Melfi	Ing. Gerardo Calvello
MT038B/10	Miglionico	Via Trinità	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone
PZ039A/10	Missanello	Fosso Creta	Lavori di sistemazione idraulica e risagomatura alveo	Ufficio Tecnico del Comune di Missanello	Geom. Domenico La Vecchia
PZ040A/10	Moliterno	Sp ex SS 103 Km. 8+400-8+500	Consolidamento frana e ripristino sede stradale		
MT041A/10	Montalbano Jonico	Coordinate: 40°17' 36 N 16°23' 38 E	Messa in sicurezza dal rischio idraulico delle aree del centro storico del comune di Montalbano Jonico Area adiacente al centro urbano compresa tra piazza Cirillo e via Caracciolo	Ufficio Tecnico del Comune di Montalbano	Ing.Michelina Larocca
PZ042B/10	Montemurro	Fosso Libritti	Completamento lavori difesa del suolo Fosso Libritti	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ043A/10	Muro Lucano	Rione San Nicola	Lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano	Ufficio Tecnico del Comune di Muro Lucano	Arch. Francesco Cristiano
PZ044B/10	Nemoli	Vallone	Sistemazione idraulica	Ufficio Tecnico del Comune di Nemoli	Ing. Nicola Anania
MT045A/10	Nova Siri	Centro Storico	eliminazione condizioni di rischio idrogeologico nel centro storico	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone
MT046A/10	Oliveto Lucano	"Rupe - Vallone di Mezzo"	Mitigazione rischio idrogeologico (proposta ministeriale)	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone

PZ047B/10	Oppido Lucano	Centro abitato	Lavori di consolidamento in loc. Annunziata-Santa Lucia - Terzillo	Uffico Tecnico del Comune di Oppido	Ing. Donato Michele Ramunno
PZ048A/10	Oppido Lucano	Centro abitato e zone limitrofe	Mitigazione rischio idrogeologico	Uffico Tecnico del Comune di Oppido	Ing. Donato Michele Ramunno
PZ049A/10	Palazzo San Gervasio	Torrente Ginestrello	Lavori di ripristino dell'officiosità	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ050A/10	Picerno	Centro abitato	Lavori di consolidamento del centro abitato nelle località Via Convento e Montagna (Torrente Braide)	Uffico Tecnico del Comune di Picerno	Ing. Leonardo Zaccagnino
PZ051A/10	Picerno	Centro abitato	Riduzione rischio idrogeologico	Uffico Tecnico del Comune di Picerno	Ing. Leonardo Zaccagnino
PZ052A/10	Pignola	Piatamone	Lavori di consolidamento a valle della S.P.5	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT053A/10	Pomarico	Fosso Bordazzo e zone limitrofe	Intervento di messa in sicurezza, consolidamento e sistemazione idrogeologica del Fosso Bordazzo	Ufficio Tecnico del Comune di Pomarico	Arch. Giacomo Pignatelli
PZ054B/10	Potenza	S.Luca Branca	Lavori di sistemazione idrogeologica versante a valle della strada comunale	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ055A/10	Potenza	Costa della Gaveta	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Tecnico del Comune di Potenza	Ing. Giuseppe Lisi
PZ056B/10	Rapolla	Centro abitato	Lavori di sistemazione idrogeologica fosso in dx idraulica torrente Melfia	Ufficio Tecnico del Comune di Rapolla	Geom. Eduardo Di Franco
PZ057B/10	Rionero in Vulture	Centro abitato	Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Ciaolino	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ058A/10	Ripacandida	Centro abitato	Lavori di consolidamento loc. San Pietro	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello

PZ059A/10	Rivello	Cammartino	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT060A/10	Rotondella	Coordinate: 40°10' 19 N 16°31 '22 E	Consolidamento e messa in sicurezza del tratto di strada di via Aspomonte sottostante corso Garibaldi del centro abitato.	Ufficio Tecnico del Comune di Rotondella	Ing. Nicola Castronuovo
PZ061B/10	San Costantino Albanese	Centro abitato	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ062A/10	San Fele	Rione Pergola/Nocicchio	Intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ063A/10	San Martino d'Agri	Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe	Completamento consolidamento loc. San Giovanni	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT064A/10	San Mauro Forte	Zona Campo Sportivo - Vco A. Diaz	Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico zona "campo Sportivo vico Diaz	Ufficio Tecnico del Comune di San Mauro Forte	Geom. Egidio Cerabona
MT065A/10	San Mauro Forte	Località Garamme	Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico "località Garamme" - 1° Stralcio.	Ufficio Tecnico del Comune di San Mauro Forte	Geom. Egidio Cerabona
PZ066A/10	Sant'Angelo Le Fratte	Costone in località Pescara	Intervento urgente per lavori di sistemazione, messa in sicurezza e risanamento del costone in località Pescara	Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Le Fratte	Ing. Leonardo Calbi
PZ067A/10	Sant'Angelo Le Fratte	Coste-Cupa-Piazza dei Martiri	Consolidamento blocchi rocciosi in zona cupa	Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Le Fratte	Ing. Leonardo Calbi
PZ068A/10	Sant'Arcangelo	Rione Mauro	Completamento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in Rione Mauro	Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Arcangelo	Geom. Domenico Claps
PZ069A/10	Sarconi	Versante nord-est abitato - a valle della Chiesa Madre	Mitigazione rischio idrogeologico	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ070B/10	Sasso di Castalda	Calvario-Serrone	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello

PZ071B/10	Satriano di Lucania	Rione S. Martino	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT072B/10	Stigliano	Rione Casale e Sant'Antonio	Lavori urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico del Comune di Stigliano	Ing. Salvatore D'Ambrosio
PZ073A/10	Terranova di Pollino	Loc.Carolanza	Regimazione acque superficiali	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ074A/10	Tito	Via Gramsci-Via Roma	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Tecnico del Comune di Tito	Ing. Leonardo Calbi
PZ075A/10	Tolve	Selce	Lavori di rischio idrogeologico in Loc. Selce	Ufficio Tecnico del Comune di Tolve	Arch. Giuseppe Lo Tito
PZ076C/10	Trecchina	Zillona-SS.585	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ077A/10	Trecchina	SS.585 km 9+600	Lavori di messa in sicurezza costone roccioso a monte SS.585 all'altezza del km 9+600	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT078A/10	Tricarico	Fiume Basento-Serre del Ponte-Isola Amm. Va di Tricarico	Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT079A/10	Tricarico	Strada Comunale Alvanello-San Marco	Lavori di consolidamento strada Comunale Alvanello S. Marco	Ufficio Programma Regione Basilicata	Arch. Enzo Petruzzi
PZ080A/10	Trivigno	Centro abitato	Riduzione rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico del Comune di Trivigno	Ing. Vito Ramunno
MT081A/10	Tursi	Rione Rabatana	Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi – Rione Rabatana	Ufficio Tecnico del Comune di Tursi	Dott. Giuseppe Veneziano
MT082A/10	Valsinni	Coordinate: 40°10'07 N 16°26'35 E	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico nel centro abitato: intervento di consolidamento e messa in sicurezza della parete sovrastante e sottostante Piazza Melidoro	Ufficio Tecnico Comune di Valsinni	Ing. Francesco Tagliente

PZ083A/10	Venosa	Vallone Reale Vallone Ruscello	Risanamento e sistemazione idraulica a salvaguardia del centro storico	Ufficio Tecnico del Comune di Venosa	Arch. Elisabetta Pescuma
PZ084A/10	Viggianello	Località Gallizzi	Consolidamento versante a monte e a valle strada comunale	Ufficio Tecnico del Comune di Viggianello	Ing. Nicola Bencardino
MT085A/10	Bernalda	Spiaggia lido di Metaponto	Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Antonio Losinno
PZ0086A/11	Castelluccio Inferiore	C.da Amoroso	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT0087A/11	Grassano	Fosso Mulini - Golfo (loc. Golfi)	Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini-Golfo	Provveditorato OO.PP.	Ing. Mario Martorano
MT0088A/11	Miglionico	Sotto le Vigne - Via Marconia	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di regimentazione idraulica del versante.	Provveditorato OO.PP.	Ing. Giuseppe Brandi
MT0089A/11	Nova Siri	Torrente Toccacielo	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello
PZ0090A/11	Pignola	C.da Campo di Giorgio	Lavori di consolidamento in C.da Campo di Giorgio	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT0091A/11	Bacino del Fiume Agri	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Pulizia, eliminazione di vegetazione in alveo, eliminazione di materiale alluvionale e ripristino arginature	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello
PZ0092A/11	Chiaromonte	Valle dei Pastori	Lavori di sistemazione idraulica	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT0093A/11	Colobraro	Centro Abitato	Intervento urgente di consolidamento e messa in sicurezza dell'area Centro Abitato	Provveditorato OO.PP.	Ing. Giuseppe Brandi
PZ0094A/11	Maratea	SS.18 intero tratto regionale	Lavori di messa in sicurezza costone roccioso a monte e a valle della S.S. 18	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello

PZ0095A/11	Melfi	C.da Isca della Ricotta	Lavori di sistemazione idraulica Fiumara Ofanto	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT0096A/11	Montalbano Jonico	Via Sant'Antuono	Eliminazione condizioni di rischio	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT0097A/11	Pisticci	Versante di Fosso La Salsa e Fosso Concezione	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di consolidamento e regimentazione idraulica del versante di Fosso La Salsa e Fosso Concezione	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello
PZ0098A/11	Rapone	Mazzapone	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT0099A/11	Salandra	Centro abitato - Zona Calvario	Consolidamento del centro abitato di Salandra - Zona Calvario	Ufficio Tecnico Comune di Salandra	Ing. Domenico Terranova
MT0100A/11	San Giorgio Lucano	Centro abitato - zona Timpa	Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano; zona Timpa.	Provveditorato OO.PP.	Ing. Mario Martorano
PZ0101A/11	Tito	Zona a valle di Via Settentrionale	Consolidamento dell'abitato di Tito del Capoluogo	Comune di Tito	Ing. Leonardo Calbi
PZ0102A/11	Vaglio	Cannitelli	Lavori di Ripristino officosità	Provveditorato OO.PP.	Ing. Gennaro De Meo
PZ0103A/11	Vaglio	Via Ciro Menotti, Vico Diaz - Valle di Via Isonzo - Villa Comunale nel rione Paschiere	Consolidamento abitato e risanamento dissesto idrogeologico dell'abitato	Provveditorato OO.PP.	Ing. Vito Sivolella
MT0104A/11	Provincia di Matera	Bacino del Fiume Bradano	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello
MT0105A/11	Ferrandina, Salandra, Calciano	SS. 407 basentana	Sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello
MT0106A/11	Rotondella e Tursi - Bacino del Fiume Sinni	F.so Mortella; Confluenze Torrente Pescogrosso; F. Sinni-attraversamento ss106.	Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello

In verde gli interventi a cura dei Comuni; in azzurro quelli a cura degli Uffici regionali; in rosso l'intervento già finanziato con altre risorse e per il quale è stata avanzata proposta di devoluzione al progetto COD MT078A/10; in giallo gli interventi a cura del Provveditorato interregionale alle OO.PP.

Impegnando adeguatamente la disponibilità e la collaborazione degli Uffici regionali del Dipartimento Infrastrutture e l'apporto di Uffici di altri Dipartimenti della Regione Basilicata e della stessa Autorità di Bacino di Basilicata, si è garantito una iniziale attività e reso possibile la completa individuazione dei soggetti incaricati per la realizzazione e l'avvio delle prime progettazioni per gli interventi più urgenti.

Il coinvolgimento iniziale di sole strutture pubbliche è stato possibile perché non richiedeva necessariamente la disponibilità di risorse per avviare le progettazioni, ma, la perdurante mancanza di accreditamenti adeguati alla contabilità speciale del Commissario, ha condizionato non poco tempi e decisioni in particolare nell'anno 2011.

Il DPCM 20.07.2011, ha consentito, comunque, una qualche operatività dei Commissari, investiti di funzioni complesse, ma privi di struttura autonoma, autorizzando la prestazione e remunerazione del lavoro straordinario sino ad un massimo di 30 ore mensili e comunque nel limite massimo complessivo dell'1,5% della spesa per gli interventi, tenendo anche conto di altri oneri.

L'importo per straordinario è stato inizialmente liquidato direttamente agli Enti di appartenenza del Personale impegnato per la successiva attribuzione agli aventi titolo.

Successivamente alla nota n.185784/71AJ in data 23 ottobre 2012 l'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e sviluppo delle risorse umane ha sollecitato l'Ufficio Ragioneria e Fiscalità Regionale a restituire le somme al fine di consentire al Commissario la liquidazione delle competenze al personale per le attività svolte. Pertanto il Commissario ha dovuto attivare la procedura di liquidazione diretta.

L'avvenuto svolgimento di prestazione "straordinaria" è stato certificato o sulla base di dichiarazioni dei Responsabili degli Uffici di appartenenza, con la individuazione delle attività svolte e delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestato a supporto delle attività del Commissario, o sulla base di prospetti vistati dallo stesso Commissario, per il lavoro prestato presso "l'Ufficio del Commissario".

Le disponibilità iniziali delle strutture regionali e comunali, si sono dovute però lentamente a ridurre per il verificarsi di nuovi eventi alluvionali nella Regione, in particolare nel periodo dal 18 febbraio al 1 marzo del 2011 e quindi per l'esigenza di dover rispondere alle nuove emergenze e corrispondere adeguatamente alle nuove programmazioni e progettazioni conseguenti.

Non è stata quindi più garantita la stessa collaborazione delle diverse strutture regionali, impegnate anche ad assicurare la attuazione dell'OPCM n.3984 del 25 novembre 2011 nei tempi fissati dalla stessa OPCM.

Detta OPCM n. 3984, all'art. 5, ha inteso estendere, anche agli interventi dell'Accordo di Programma 14.12.2010 della Basilicata, le disposizioni del suo articolo 2 e per la durata dello stato di emergenza

Con il venir meno del consistente aiuto regionale si è reso indispensabile quindi ricorrere anche a professionalità esterne in particolare, quando i RUP hanno certificato il sussistere delle circostanze

previste dal comma 6 dell'art. 90 del Codice dei contratti: carenza di specifiche professionalità interne o rischio di perdere i finanziamenti europei.

Il ricorso alle collaborazioni "esterne", è stato però possibile solo successivamente all'accreditamento di più adeguata disponibilità di risorse sulla contabilità speciale n.5594 del Commissario, accesa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza, la cui apertura era stata autorizzata a seguito del decreto dirigenziale del 6 maggio 2011 e si rende ancor più indispensabile ora se come prevede il punto 6 della Delibera CIPE n.8/2012, occorrerà tassativamente procedere alla adozione entro il 30 giugno 2013 di impegni giuridicamente validi per tutti gli interventi ancora da progettare.

Per garantire principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza si sono utilizzate e si continueranno ad utilizzare, ove necessario, long list definite con gli Ordini Professionali della Regione, come già operato, dalle quali selezionare, da parte dei RUP, i professionisti da incaricare nel rigoroso rispetto del criterio di rotazione.

Il compenso massimo da riconoscere per le varie fasi di progettazione, direzione dei lavori, misurazione e contabilità, supporto geologico ed ogni altra spesa, da porre a base d'asta nella procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico, è stato e sarà in linea di massima, pari 5% del finanziamento lordo di ogni intervento,.

Con il procedere delle attività e l'accumularsi delle incombenze connesse con la attuazione degli interventi, continua ad evidenziarsi, ancora di più, tutta la insufficienza organica della struttura del Commissario operante in una condizione di "dipendenza" dalle disponibilità di soggetti pubblici terzi. Il ricorso a incarichi di consulenza esterne previsti dal DPCM 20 luglio 2011– art.1 comma 5 avrebbe garantito migliori e più tempestivi risultati.

Ancora ora, l'Ufficio del Commissario opera con le seguenti preziose e qualificate collaborazioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa con le strutture di appartenenza:

-una unità tecnica, a tempo parziale (2 giorni alla settimana), posta a disposizione dal Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto di Matera, impegnata per rilievi, disegni, gestione informatica dei dati;

-un geologo, per un giorno alla settimana posto a disposizione dall'Autorità di Bacino della Basilicata, impegnato per seguire sotto l'aspetto geologico-tecnico, gli interventi più "delicati", in particolare quello che interessa la stabilità di alcuni versanti dei Sassi di Matera;

-una unità tecnica, a tempo parziale (3 giorni alla settimana), posta a disposizione dal Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione Tecnologica della Regione Basilicata, che regge il gran peso di tutta la attività tecnica ed amministrativa;

-con le Direzioni Generali della Presidenza della Giunta Regionale e del Dipartimento regionale alle Infrastrutture sono attive collaborazioni a progetto e per la gestione del sito del Commissario;

-continua e costante è, poi, la collaborazione, dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata per la gestione dei rapporti con la tesoreria provinciale della Banca d'Italia, presso la quale è acceso il conto, in contabilità speciale, del Commissario e per le attività di rendicontazione;

-una unità tecnica, per un giorno alla settimana, posta a disposizione dal Comune di Missanello, impegnata per attività di verifica progetti e dati;

-con il personale degli uffici del Dipartimento regionale Ambiente e Territorio sono attive collaborazioni a progetto anche in orari eccedenti quello ordinario.

Ad oggi non è stata quindi attivata alcuna collaborazione "esterna" agli Enti pubblici o Società a capitale pubblico.

Pur nella limitata, numericamente, disponibilità di personale di supporto ed i ritardi nel trasferimento alla Contabilità speciale del Commissario delle somme programmate, l'attività del Commissario non ha subito soste ed allo stato è possibile certificare i dati di cui alle tabelle che seguono.

1.7.2 **Livello di attuazione globale degli interventi**

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	*n. interventi al dicembre 2012*	*n. interventi al dicembre 2011*
Attesa di avvio	*24*	*86*
Esecuzione studi ed indagini	*42*	*13*
In corso di progettazione	*6*	*6*
Progettazione ultimata	*8*	*0*
Lavori aggiudicati	*10*	*0*
In esecuzione	*11*	*1*
Lavori ultimati (collaudati e non)	*5*	*0*
Totale interventi finanziati	*106*	

1.8. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2013

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	*n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2013*
Attesa di avvio	*0*
Esecuzione studi ed indagini	*0*
In corso di progettazione	*0*
Progettazione ultimata	*0*
Lavori aggiudicati	*0*
In esecuzione	*78*
Lavori ultimati (collaudati e non)	*28*
Totale interventi finanziati	*106*

1.9. CRITICITA'

Superata la criticità legata all'avvio ed alla individuazione dei RUP, nell'ambito delle strutture pubbliche operanti sul territorio lucano, si è subito posta quella della disponibilità delle risorse nella contabilità speciale del Commissario. La mancanza di certezze sia sugli importi che sui tempi degli accrediti ha fortemente condizionato la assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Pur tuttavia tutte le risorse accreditate hanno nell'anno trovato corrispondente impegno con la approvazione dei progetti che più tempestivamente sono stati elaborati, anche in relazione alla urgenza dei rispettivi interventi, come si rileva dalle tabelle allegate. Più critica si è resa la situazione successivamente alla adozione della Delibera CIPE n. 8/2012 che già nei tempi per la pubblicazione sulla GURI e soprattutto, nelle procedure prevista per il trasferimento delle risorse alla contabilità del Commissario. Il passaggio delle risorse dal MISE alla Regione, e successivamente da questa alla contabilità speciale, nel rispetto del patto di stabilità, sottrae ad ogni possibile programma la individuazione dei tempi per rendere disponibile le risorse alla adozione di provvedimenti giuridicamente vincolanti. Valga a dimostrare la effettiva difficoltà di programmare che ad oggi non è stato accreditato alcun euro dei fondi previsti dalla citata delibera che non siano quelli del MATTM.

1.10. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

La vera criticità si è rivelata nella incertezza degli accreditamenti in relazione alla possibilità di assumere qualsiasi forma di "impegno" in assenza di risorse certe coincidenti con quelle "accreditate" presso la contabilità speciale del Commissario. Anche le assicurazioni fornite ai Commissari, che l'avvenuta pubblicazione della Delibera CIPE sulla Gazzetta Ufficiale costituisce impegno certo sulla base del quale i Commissari possono assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti, non garantiscono in alcun modo la possibilità del pagamento tempestivo del maturato agli aventi titolo, nel rispetto cioè dei limiti imposti dalla recepita normativa europea (30 gg), con conseguente indebitamento certo per lo Stato.

Scoraggia infatti sia il "maturato storico" dei tempi di accreditamento da parte degli Enti obbligati dalla sottoscrizione dell'Accordo e dell'Atto integrativo, sia e soprattutto la circostanza che, come previsto dal punto 6 della Delibera CIPE n. 8 /2012 gli accreditamenti alle contabilità speciale dei Commissari, transitano, per non si comprende quale ragione, dal MISE alle Regioni e da queste alle contabilità dei Commissari, nel rispetto del patto di stabilità. Nonchè chi non è perfettamente consapevole che le Regioni sono "strozzate" nella spesa dal "patto di stabilità" e l'aggiungersi di una nuova spesa non può non essere influenzata dalla consolidata difficoltà delle stesse Regioni a rispettare il programma di altro soggetto che quindi è bloccato nella disponibilità delle risorse dalla ragnatela dei vincoli: sarà poi questo il vero obiettivo , bloccare la spesa e responsabilizzare di tanto non chi programma in assenza di liquidità, ma chi nominato per accelerare la spesa non spende ... non solo quello che in ritardo gli viene centellinato , ma anche quanto non è nelle sue disponibilità!

Per la Basilicata, valga, a conferma di quanto riportato, che ad oggi non è stato accreditato sulla contabilità speciale del Commissario per gli interventi programmati con la Delibera CIPE n. 8/2012, dalla Regione Basilicata, neanche un euro... forse,per il patto di stabilità!

Non appaia superfluo, in questa strana e difficile situazione richiamare quanto previsto dal DL 78/2009, comma 2 art. 9: "nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi..."

Difficoltà sono quindi immaginabili sulla possibilità di

- accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti;

- adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

In relazione alla circostanza che entro il 30 giugno 2013 i Commissari sono tenuti all'assunzione, per tutti gli interventi programmati, di obbligazioni giuridicamente vincolanti, in assenza di atti formali della Regione per la messa a disposizione con copertura certa della spesa tra il 2013 ed il primo semestre del 2014, non è possibile assumere alcun impegno.

Tabella 1 - Riepilogo progetti approvati al 31/12/2012

Numero	Codice Lavoro	Decreto di approvazione	Codice Finanziamento	Comune	Importo intervento	
1	PZ003B/10	219/2012	B	Albano di Lucania	€ 180.000,00	B
2	MT004B/10	37/2012	B	Altano	€ 60.000,00	B
3	PZ005B/10	203/2012	B	Avigliano	€ 200.000,00	B
4	MT010A/10	1/2012	A	Bernalda	€ 100.000,00	A
5	MT012A/10	12/2012	A	Bernalda - Pisticci	€ 500.000,00	A
6	MT014B/10	76/2012	B	Calciano	€ 190.000,00	B
7	PZ015B/10	14/2012	B	Calvello	€ 190.000,00	B
8	PZ017B/10	35/2012	B	Campomaggiore	€ 80.000,00	B
9	MT022B/10	15/2012	B	Cirigliano	€ 190.000,00	B
10	MT024B/10	71/2012	B	Garaguso	€ 190.000,00	B
11	PZ026B/10	36/2012	B	Genzano di Lucania	€ 140.000,00	B
12	MT030A/10	216/2012	A	Irsina	€ 200.000,00	A
13	PZ031C/10	170/2012	C C	Latronico	€ 170.000,00 € 330.000,00	A B
14	PZ032B/10	45/2012	B	Lauria	€ 330.000,00	B
15	PZ033A/10	152/2012	A	Lauria	€ 450.000,00	A
16	MT036A/10	220/2012	A	Matera	€ 450.000,00	A
17	PZ039A/10	75/2012	A	Missanello	€ 270.000,00	A
18	PZ042B/10	53/2012	B	Montemurro	€ 180.000,00	B
19	PZ044B/10	73/2012	B	Nemoli	€ 130.000,00	B
20	MT053A/10	80/2012	A	Pomarico	€ 200.000,00	A
21	PZ054B/10	31/2012	B	Potenza	€ 190.000,00	B
22	PZ062A/10	157/2012	A	San Fele	€ 350.000,00	A
23	PZ063A/10	137/2012	A	San Martino d'Agri	€ 300.000,00	A
24	PZ071B/10	131/2012	B	Satriano di Lucania	€ 220.000,00	B
25	MT072B/10	16/2012	B	Stigliano	€ 255.000,00	B
26	PZ074A/10	61/2012	A	Tito	€ 400.000,00	A
27	PZ076C/10	136/2012	C C	Trecchina	€ 200.000,00 € 300.000,00	A B
28	PZ077A/10	21/2012	A	Trecchina	€ 80.000,00	A
29	MT078A/10	1/2011	A	Tricarico	€ 399.000,00	A
30	MT078A/10	151/2012	A	Tricarico	€ 401.000,00	A
31	MT081A/10	46/2012	A	Tursi	€ 700.000,00	A
32	MT065A/10	25/2012	A	Bernalda - Metaponto	€ 300.000,00	A
33	MT091A/11	143/2012	A	Bacino del fiume Agri	€ 500.000,00	A
				Totale	€ 9.325.000,00	

finanziamento codice A (MATTM)	16	€ 5.600.000,00
finanziamento codice B (FESR)	15	€ 2.725.000,00
fianziamento PIANO SUD	2	€ 1.000.000,00
TOTALE	33	€ 9.325.000,00

Tabella 2 - Progetti attivati escluso gli approvati al 31/12/2012

Numero	Codice Lavoro	Codice finanziamento	Comune	Importo Intervento		
				Codice A	Codice B	Piano SUD
1	MT001B/10	B	Accettura		€ 200.000,00	
2	PZ009A/10	A	Bella	€ 300.000,00		
3	MT011B/10	B	Bernalda		€ 190.000,00	
4	PZ013B/10	B	Brienza		€ 200.000,00	
5	PZ016B/10	B	Calvera		€ 330.000,00	
6	PZ018B/10	B	Carbone		€ 215.000,00	
7	PZ019B/10	B	Castelmezzano		€ 100.000,00	
8	PZ020A/10	A	Castelmezzano	€ 150.000,00		
9	PZ021B/10	B	Chiaromonte		€ 220.000,00	
10	PZ023A/10	A	Gallicchio	€ 300.000,00		
11	PZ025A/10	A	Genzano di Lucania	€ 300.000,00		
12	MT027B/10	B	Gorgoglione		€ 190.000,00	
13	MT028B/10	B	Grassano		€ 185.000,00	
14	PZ034B/10	B	Lavello		€ 330.000,00	
15	PZ035A/10	A	Maschito	€ 400.000,00		
16	PZ038B/10	B	Miglionico		€ 80.000,00	
17	MT041A/10	A	Montalbano Jonico	€ 350.000,00		
18	PZ043A/10	A	Muro Lucano	€ 300.000,00		
19	MT045A/10	A	Nova Siri	€ 500.000,00		
20	MT046A/10	A	Oliveto Lucano	€ 400.000,00		
21	PZ047B/10	B	Oppido Lucano		€ 200.000,00	
22	PZ048A/10	A	Oppido Lucano	€ 200.000,00		
23	PZ050A/10	A	Picerno	€ 250.000,00		
24	PZ051A/10	A	Picerno	€ 400.000,00		
25	PZ055A/10	A	Potenza	€ 450.000,00		
26	PZ056B/10	B	Rapolla		€ 200.000,00	
27	PZ057B/10	B	Rionero in Vulture		€ 340.000,00	
28	PZ058A/10	A	Ripacandida	€ 200.000,00		
29	PZ059A/10	A	Rivello	€ 350.000,00		
30	MT060A/10	A	Rotondella	€ 200.000,00		
31	PZ061B/10	B	San Costantino A.		€ 200.000,00	
32	MT064A/10	A	San Mauro Forte	€ 400.000,00		
33	MT065A/10	A	San Mauro Forte	€ 400.000,00		
34	PZ066A/10	A	Sant'Angelo Le Fratte	€ 600.000,00		
35	PZ067A/10	A	Sant'Angelo Le Fratte	€ 100.000,00		
36	PZ068A/10	A	Sant'Arcangelo	€ 200.000,00		
37	PZ069A/10	A	Sarconi	€ 200.000,00		
38	PZ070B/10	B	Sasso di Castalda		€ 200.000,00	
39	PZ075A/10	A	Tolve	€ 350.000,00		
40	MT079A/10	A	Tricarico	€ 380.000,00		
41	PZ080A/10	A	Trivigno	€ 400.000,00		
42	MT082A/10	A	Valsinni	€ 400.000,00		
43	PZ083A/10	A	Venosa	€ 350.000,00		
44	PZ084A/10	A	Viggianello	€ 250.000,00		
45	MT087A/11	A	Grassano	€ 400.000,00		
46	PZ098A/10	A	Rapone	€ 180.000,00		
47	MT099A/10	A	Salandra	€ 100.000,00		
48	MT100A/11	A	San Giorgio Lucano	€ 400.000,00		
49	PZ103A/11	A	Vaglio di Lucania	€ 500.000,00		
50	MT105A/11	A	SS 407	€ 200.000,00		
			Totale	**€ 10.860.000,00**	**€ 3.380.000,00**	**€ 0,00**
			Totale A + B + C		**€ 14.240.000,00**	
			Totale progetti finanziamento codice A (MATTM)	34		
			Totale progetti finanziamento codice B (FESR)		16	
			Totale progetti finanziamento PIANO SUD			0

Tabella 3 - Progetti aggiudicati al 31/12/2012

Numero	Codice Lavoro	Codice finanziamento	Comune	Decreto Approvazione Aggiudicazione definitiva	Importo Intervento			Importo a base d'asta			Importo di aggiudicazione			Ribasso d'asta			Note
					Codice A	Codice B	Codice C	Codice A	Codice B	Codice C	Codice A	Codice B	Codice C	Codice A	Codice B	Codice C	
1	MT0045/10	B	Aliano	76/2012		€ 60.000,00			€ 30.000,00			€ 34.674,00			12,000%		
2	MT0104/10	A	Bernalda	8/2012	€ 100.000,00			€ 69.612,68			€ 69.612,68			42,660%			assorbito in estendimento
3	MT0124/10	A	Bernalda - Pisticci	57/2012	€ 500.000,00			€ 345.387,01			€ 345.387,01			69,009%			assorbito in estendimento
4	MT0148/10	B	Calciano	113/2012		€ 190.000,00			€ 148.344,81			€ 103.788,88			30,526%		
5	PZ0158/10	B	Calvello	82/2012		€ 190.000,00			€ 147.179,59			€ 105.159,35			28,831%		
6	PZ0178/10	B	Campomaggiore	109/2012		€ 80.000,00			€ 52.305,12			€ 37.409,78			29,382%		
7	MT0228/10	B	Craco	95/2012		€ 190.000,00			€ 141.240,80			€ 97.973,89			31,123%		
8	MT0248/10	B	Garaguso	114/2012		€ 190.000,00			€ 125.211,50			€ 86.632,76			31,984%		
9	PZ0268/10	B	Genzano di Lucania	108/2012		€ 140.000,00			€ 100.953,37			€ 70.722,91			30,290%		
10	PZ0328/10	B	Lauria	101/2012		€ 330.000,00			€ 240.100,00			€ 166.601,21			31,477%		
11	PZ0390/10	A	Missanello	153/2012	€ 270.000,00			€ 190.087,84			€ 190.087,84			15,122%			assorbito in estendimento
12	PZ0428/10	B	Montemurro	107/2012		€ 180.000,00			€ 118.883,69			€ 82.904,88			31,025%		
13	PZ0448/10	B	Nemoli	111/2012		€ 130.000,00			€ 98.619,05			€ 69.792,72			30,795%		
14	MT0533/10	A	Pomarico	145/2012	€ 200.000,00			€ 144.127,38			€ 144.127,38			12,794%			assorbito in estendimento
15	PZ0548/10	B	Potenza	93/2012		€ 190.000,00			€ 136.380,01			€ 99.598,05			29,709%		
16	PZ0603A/10	A	San Martino d'Agri	200/2012	€ 300.000,00			€ 205.931,04			€ 143.814,89			31,333%			somma urgenza
17	PZ0608A/10	A	Sant'Arcangelo	119/2012	€ 40.456,99			€ 35.165,29			€ 33.436,53			5,000%			
18	MT0728/10	B	Stigliano	84/2012		€ 255.000,00			€ 164.000,00			€ 169.508,88			13,010%		
19	PZ0744/10	A	Tito	112/2012	€ 400.000,00			€ 304.321,52			€ 201.259,90			35,299%			
20	PZ0766/10	C	Trecchina	204/2012	€ 500.000,00		€ 500.000,00			€ 373.255,12			€ 256.352,49			31,935%	
21	PZ0774/10	A	Trecchina	94/2012	€ 60.000,00			€ 56.107,57			€ 40.762,43			29,641%			
22	MT0784/10	A	Tricarico	180/2012	€ 399.000,00			€ 288.112,32			€ 166.893,54			47,113%			
23	MT0914/11	A	Agri	215/2012	€ 500.000,00			€ 375.671,89			€ 375.671,89			32,759%			assorbito in estendimento
					€ 3.289.456,99	€ 2.125.000,00	€ 500.000,00	€ 2.011.564,54	€ 1.541.715,03	€ 373.255,12	€ 1.701.063,69	€ 1.121.245,27	€ 256.352,49				
						€ 5.914.456,99			€ 3.926.534,69			€ 3.078.660,85			Ribasso d'asta		€ 847.873,84
			Totale A + B + C														
			Totale progetti finanziamento tipo A (MATTM)		10												
			Totale progetti finanziamento tipo B (FESR)			12											
			Totale progetti finanziamento tipo C				1										

Tabella 4 - Riepilogo per intervento importo impegnato/speso al 31/12/2012

Numero	Codice Lavoro	TIPO FINANZIAMENTO	Comune	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO IMPEGNATO			IMPORTO SPESO					Differenza al
					Attività propedeutiche al	Progetto approvato	TOTALE al	Attività propedeutiche al	Importo totale SAL al	Oneri Autorità Vigilanza al	Attività interne al	TOTALE al	
					31/12/2012			31/12/2012					31/12/2012
1	MT001B/10	B	Accettura	€ 200.000,00	€ 16.720,21		€ 16.720,21	€ 1.321,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.321,32	€ 15.398,89
2	PZ002A/10	A	Acerenza	€ 200.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	PZ003B/10	B	Albano di Lucania	€ 180.000,00		€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00
4	MT004B/10	B	Aliano	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 12.594,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.594,89	€ 47.405,11
5	PZ005B/10	B	Avigliano	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 9.563,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.563,99	€ 190.436,01
6	PZ006A/10	A	Avigliano	€ 300.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	PZ007A/10	A	Avigliano	€ 500.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	PZ008A/10	A	Baragiano	€ 300.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	PZ009A/10	A	Bella	€ 300.000,00	€ 25.325,60		€ 25.325,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.325,60
10	MT010A/10	A	Bernalda	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 9.627,47	€ 83.810,19	€ 30,00	€ 853,46	€ 94.321,12	€ 5.678,88
11	MT011B/10	B	Bernalda	€ 190.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
12	MT012A/10	A	Bernalda - Pisticci	€ 500.000,00		€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 17.283,08	€ 184.326,10	€ 225,00	€ 3.833,94	€ 205.668,12	€ 294.331,88
13	PZ013B/10	B	Brienza	€ 200.000,00	€ 4.341,77		€ 4.341,77	€ 4.341,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.341,77	€ 0,00
14	MT014B/10	B	Calciano	€ 190.000,00		€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 183,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.780,38	€ 1.964,06	€ 188.035,94
15	PZ015B/10	B	Calvello	€ 190.000,00		€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 177.630,42	€ 30,00	€ 0,00	€ 177.660,42	€ 12.339,58
16	PZ016B/10	B	Calvera	€ 330.000,00	€ 14.415,00		€ 14.415,00	€ 13.110,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.110,67	€ 1.304,33
17	PZ017B/10	B	Campomaggiore	€ 80.000,00		€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 5.718,79	€ 0,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 5.748,79	€ 74.251,21
18	PZ018B/10	B	Carbone	€ 215.000,00	€ 8.200,00		€ 8.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.200,00
19	PZ019B/10	B	Castelmezzano	€ 100.000,00	€ 16.200,56		€ 16.200,56	€ 3.375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.375,00	€ 12.825,56
20	PZ020A/10	A	Castelmezzano	€ 150.000,00	€ 23.123,13		€ 23.123,13	€ 17.593,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.593,34	€ 5.529,79
21	PZ021B/10	B	Chiaromonte	€ 220.000,00	€ 28.223,67		€ 28.223,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.223,67
22	MT022B/10	B	Cirigliano	€ 190.000,00		€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 73.371,81	€ 0,00	€ 1.694,89	€ 75.066,70	€ 114.933,30
23	PZ023A/10	A	Gallicchio	€ 300.000,00	€ 20.460,00		€ 20.460,00	€ 9.467,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.467,77	€ 10.992,23
24	MT024B/10	B	Garaguso	€ 190.000,00		€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 5.033,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.033,60	€ 184.966,40
25	PZ025A/10	A	Genzano di Lucania	€ 300.000,00	€ 4.780,00		€ 4.780,00	€ 4.780,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.780,00	€ 0,00
26	PZ026B/10	B	Genzano di Lucania	€ 140.000,00		€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 22.545,93	€ 30,00	€ 0,00	€ 22.575,93	€ 117.424,07
27	MT027B/10	B	Gorgoglione	€ 190.000,00	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
28	MT028B/10	B	Grassano	€ 185.000,00	€ 9.250,00		€ 9.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.250,00
29	MT029A/10	A	Grottole	€ 250.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
30	MT030A/10	A	Irsina	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
31	PZ031C/10	C	Latronico	€ 500.000,00		€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
32	PZ032B/10	B	Lauria	€ 330.000,00		€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 190.271,35	€ 225,00	€ 0,00	€ 190.496,35	€ 139.503,65
33	PZ033A/10	A	Lauria	€ 450.000,00		€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00
34	PZ034B/10	B	Lavello	€ 330.000,00	€ 5.265,85		€ 5.265,85	€ 3.404,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.404,89	€ 1.860,96

Numero	Codice Lavoro	TIPO FINANZIAMENTO	Comune	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO IMPEGNATO			IMPORTO SPESO					Differenza al
					Attività propedeutiche al	Progetto approvato	TOTALE al	Attività propedeutiche al	Importo totale SAL al	Oneri Autorità Vigilanza al	Attività interne al	TOTALE al	
					31/12/2012			31/12/2012					31/12/2012
35	PZ035A/10	A	Maschito	€ 400.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36	MT036A/10	A	Matera	€ 450.000,00			€ 450.000,00	€ 15.616,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.616,62	€ 434.383,38
37	PZ037A/10	A	Melfi	€ 400.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
38	MT038B/10	B	Miglionico	€ 80.000,00	€ 1.890,00		€ 1.890,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.890,00
39	PZ039A/10	A	Missanello	€ 270.000,00		€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 6.795,36	€ 0,00	€ 225,00	€ 1.710,79	€ 8.731,15	€ 261.268,85
40	PZ040A/10	A	Molterno	€ 450.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41	MT041A/10	A	Montalbano Jonico	€ 350.000,00	€ 7.900,00		€ 7.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.900,00
42	PZ042B/10	B	Montemurro	€ 180.000,00		€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 8.203,35	€ 54.751,29	€ 30,00	€ 0,00	€ 62.984,64	€ 117.015,36
43	PZ043A/10	A	Muro Lucano	€ 300.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
44	PZ044B/10	B	Nemoli	€ 130.000,00		€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 1.832,79	€ 37.723,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.556,74	€ 90.443,26
45	MT045A/10	A	Nova Siri	€ 500.000,00	€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
46	MT046A/10	A	Oliveto Lucano	€ 400.000,00	€ 7.000,00		€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
47	PZ047B/10	B	Oppido Lucano	€ 200.000,00	€ 25.250,00		€ 25.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.250,00
48	PZ048A/10	A	Oppido Lucano	€ 200.000,00	€ 18.700,00		€ 18.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.700,00
49	PZ049A/10	A	Palazzo San Gervasio	€ 100.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
50	PZ050A/10	A	Picerno	€ 250.000,00	€ 40.929,17		€ 40.929,17	€ 23.375,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.375,01	€ 17.554,16
51	PZ051A/10	A	Picerno	€ 400.000,00	€ 83.147,99		€ 83.147,99	€ 55.268,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.268,75	€ 27.879,24
52	PZ052A/10	A	Pignola	€ 350.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
53	MT053A/10	A	Pomarico	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 2.722,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.722,50	€ 197.277,50
54	PZ054B/10	B	Potenza	€ 190.000,00		€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 5.000,00	€ 124.850,22	€ 30,00	€ 0,00	€ 129.880,22	€ 60.119,78
55	PZ055A/10	A	Potenza	€ 450.000,00	€ 31.054,41		€ 31.054,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.054,41
56	PZ056B/10	B	Rapolla	€ 200.000,00	€ 15.995,00		€ 15.995,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.995,00
57	PZ057B/10	B	Rionero in Vulture	€ 340.000,00	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00
58	PZ058A/10	A	Ripacandida	€ 200.000,00	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
59	PZ059A/10	A	Rivello	€ 350.000,00	€ 7.725,00		€ 7.725,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 4.225,00
60	MT060A/10	A	Rotondella	€ 200.000,00	€ 2.516,80		€ 2.516,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.516,80
61	PZ061B/10	B	San Costantino Albanese	€ 200.000,00	€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 0,00
62	PZ062A/10	A	San Fele	€ 350.000,00		€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 2.987,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.987,04	€ 347.012,96
63	PZ063A/10	A	San Martino d'Agri	€ 300.000,00		€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 7.379,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.379,51	€ 292.620,49
64	MT064A/10	A	San Mauro Forte	€ 400.000,00	€ 37.871,24		€ 37.871,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.871,24
65	MT065A/10	A	San Mauro Forte	€ 400.000,00	€ 12.835,00		€ 12.835,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.835,00
66	PZ066A/10	A	Sant'Angelo Le Fratte	€ 600.000,00	€ 39.027,38		€ 39.027,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.027,38
67	PZ067A/10	A	Sant'Angelo Le Fratte	€ 100.000,00	€ 4.819,30		€ 4.819,30	€ 4.722,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.722,91	€ 96,39
68	PZ068A/10	A	Sant'Arcangelo	€ 200.000,00	€ 40.456,99		€ 40.456,99	€ 0,00	€ 38.464,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.464,39	€ 1.992,60
69	PZ069A/10	A	Sarconi	€ 200.000,00	€ 6.522,44		€ 6.522,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.522,44
70	PZ070B/10	B	Sasso di Castalda	€ 200.000,00	€ 6.775,85		€ 6.775,85	€ 4.999,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.999,94	€ 1.775,91

Numero	Codice Lavoro	Tipo FINANZIAMENTO	Comune	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO IMPEGNATO			IMPORTO SPESO					Differenza al
					Attività propedeutiche al	Progetto approvato	TOTALE al	Attività propedeutiche al	Importo totale SAL al	Oneri Autorità Vigilanza al	Attività interne al	TOTALE al	
					31/12/2012			31/12/2012					31/12/2012
71	PZ0719/10	B	Sabriano di Lucania	€ 220.000,00		€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 220.000,00
72	MT0728/10	B	Stigliano	€ 255.000,00		€ 255.000,00	€ 255.000,00	€ 0,00	€ 142.296,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.296,00	€ 112.704,00
73	PZ0734/10	A	Terranova di Pollino	€ 100.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
74	PZ0744/10	A	Tito	€ 400.000,00		€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 9.953,79	€ 224.818,00	€ 0,00	€ 4.187,46	€ 238.959,25	€ 161.040,75
75	PZ0754/10	A	Tolve	€ 350.000,00	€ 10.480,23		€ 10.480,23	€ 8.232,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.232,61	€ 2.247,62
76	PZ0764/10	C	Trecchina	€ 500.000,00		€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.234,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.234,03	€ 498.765,97
77	PZ0774/10	A	Trecchina	€ 80.000,00		€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 41.390,47	€ 30,00	€ 0,00	€ 41.420,47	€ 38.579,53
78	MT0784/10	A	Tricarico	€ 399.000,00		€ 399.000,00	€ 399.000,00	€ 5.930,86	€ 392.907,01	€ 30,00	€ 6.790,00	€ 405.657,87	-€ 6.657,87
		A		€ 401.000,00		€ 401.000,00	€ 401.000,00	€ 7.852,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.852,42	€ 393.147,58
79	MT0794/10	A	Tricarico	€ 380.000,00	€ 8.808,00		€ 8.808,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.808,00
80	PZ0804/10	A	Trivigno	€ 400.000,00	€ 23.001,52		€ 23.001,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.001,52
81	MT0814/10	A	Tursi	€ 700.000,00		€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.988,92	€ 17.988,92	€ 682.011,08
82	MT0824/10	A	Valsinni	€ 400.000,00	€ 19.640,00		€ 19.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.640,00
83	PZ0834/10	A	Venosa	€ 350.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
84	PZ0844/10	A	Viggianello	€ 250.000,00	€ 12.679,83		€ 12.679,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.679,83
85	MT0854/10	A	Bernalda	€ 3.000.000,00		€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 15.138,18	€ 0,00	€ 600,00	€ 1.964,52	€ 17.702,70	€ 282.297,30
86	PZ0864/11	A	Castelluccio Inferiore	€ 2.000.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
87	MT0874/11	A	Grassano	€ 400.000,00	€ 15.100,00		€ 15.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.100,00
88	MT0884/11	A	Miglionico	€ 200.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
89	MT0894/11	A	Nova Siri	€ 200.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
90	PZ0904/11	A	Pignola	€ 150.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
91	MT0914/11	A	Bacino del Fiume Agri	€ 500.000,00		€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 523,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 523,00	€ 499.477,00
92	PZ0924/11	A	Chiaromonte	€ 150.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
93	MT0934/11	A	Colobraro	€ 500.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
94	PZ0944/11	A	Maratea	€ 700.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
95	PZ0954/11	A	Melfi	€ 500.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
96	MT0964/11	A	Montalbano Jonico	€ 200.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
97	MT0974/11	A	Pisticci	€ 150.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
98	PZ0984/11	A	Rapone	€ 180.000,00	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
99	MT0994/11	A	Salandra	€ 100.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
100	MT0100A/11	A	San Giorgio Lucano	€ 400.000,00	€ 15.100,00		€ 15.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.100,00
101	PZ0101A/11	A	Tito	€ 400.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
102	PZ0102A/11	A	Vaglio	€ 300.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
103	PZ0103A/11	A	Vaglio	€ 500.000,00	€ 18.880,00		€ 18.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.880,00
104	MT0104A/11	A	Provincia di Matera	€ 339.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
105	MT0105A/11	A	Ferrandina, Salandra, Calciano	€ 200.000,00	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00

Numero	Codice Lavoro	TIPO FINANZIAMENTO	Comune	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO IMPEGNATO			IMPORTO SPESO					Differenza al
					Attività propedeutiche al	Progetto approvato	TOTALE al	Attività propedeutiche al	Importo totale SAL al	Oneri Autorità Vigilanza al	Attività interne al	TOTALE al	
					31/12/2012			31/12/2012					31/12/2012
106	MT0106AV11	A	Rotondella e Tursi - Bacino del Fiume Sinni	€ 200.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Programma Triennale Spese Generali				impegnato			€ 400.000,00	€ 8.852,67			€ 173.441,46	€ 182.294,13	€ 217.705,87
Importo totale competenza MATTM				impegnato	€ 555.384,03		€ 6.555.384,03	€ 244.243,63	€ 965.716,16	€ 1.140,00	€ 22.326,09	€ 1.415.229,60	speso
Importo totale competenza Regione Basilicata				impegnato	€ 168.527,91		€ 2.893.527,91	€ 78.330,21	€ 836.035,86	€ 375,00	€ 3.475,27	€ 917.476,92	speso
Importo totale competenza Piano Sud				impegnato			€ 1.000.000,00					€ 1.234,03	speso
Totale				€ 35.204.000,00	€ 723.911,94	€ 8.875.000,00	€ 10.448.911,94	€ 331.426,71	€ 1.801.752,02	€ 1.515,00	€ 199.245,82	€ 2.333.939,55	€ 8.114.972,39

Tabella 5 - Riepilogo progetti presentati non approvati al 31/12/2012

Numero	Codice Lavoro	Codice Finanziamento	Comune	Importo intervento
1	PZ035A/10	A	Maschito	€ 400.000,00
2	MT041A/10	A	Montalbano Jonico	€ 350.000,00
3	PZ043A/10	A	Muro Lucano	€ 300.000,00
4	PZ050A/10	A	Picerno	€ 250.000,00
5	PZ068A/10	A	Sant'Arcangelo	€ 200.000,00
6	PZ083A/10	A	Venosa	€ 350.000,00
7	MT085A/10	A	Bernalda (Metaponto)	€ 2.700.000,00
8	MT099A/11	A	Salandra	€ 100.000,00
			Totale	**€ 4.650.000,00**

finanziamento codice A (MATTM)	**8**	**€ 4.650.000,00**
finanziamento codice B (FESR)	**0**	**€ 0,00**
TOTALE	**8**	**€ 4.650.000,00**

Approvato lavori di somma urgenza Decr. 119/2012	€ 40.456,99

Tabella 6 - Riepilogo somme accreditate al 31/12/2012

Numero	Data	MATTM	MATTM - Piano Sud	Regione Basilicata PO-FESR 07/13	Importo
		codice A		codice B	
1	29/06/2011	€ 501.378,98			€ 501.378,98
2	15/12/2011	€ 3.356.186,08			€ 3.356.186,08
3	17/02/2012			€ 371.574,00	€ 371.574,00
4	11/09/2012			€ 638.676,00	€ 638.676,00
5	19/09/2012		€ 960.361,88		€ 960.361,88
6	19/09/2012	€ 663.138,54			€ 663.138,54
7	10/12/2012		€ 663.138,54		€ 663.138,54
8	10/12/2012		€ 541.166,81		€ 541.166,81
		€ 4.520.703,60	**€ 2.164.667,23**	**€ 1.010.250,00**	**€ 7.695.620,83**

Totale Cod. A + Piano Sud	**€ 6.685.370,83**	
Totale Regione Basilicata		**€ 1.010.250,00**

Grafico 1 - Fonti di finanziamento

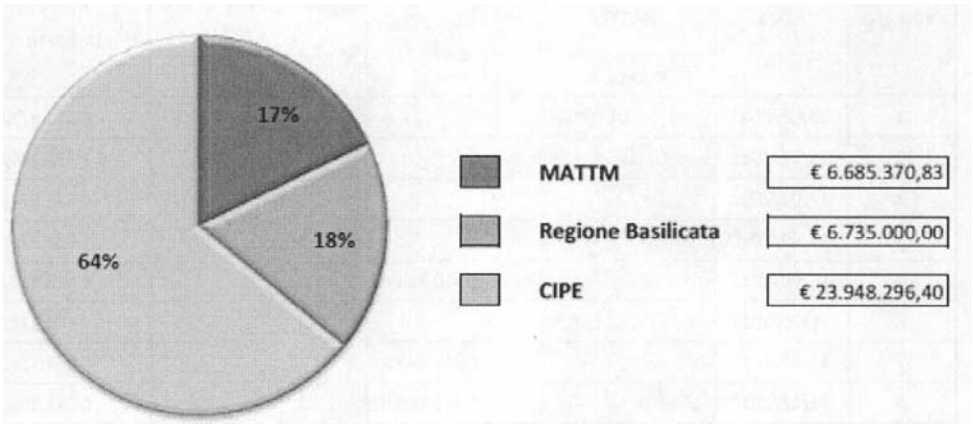


Grafico 2 - Rapporto percentuale tra somme accreditate e somme programmate

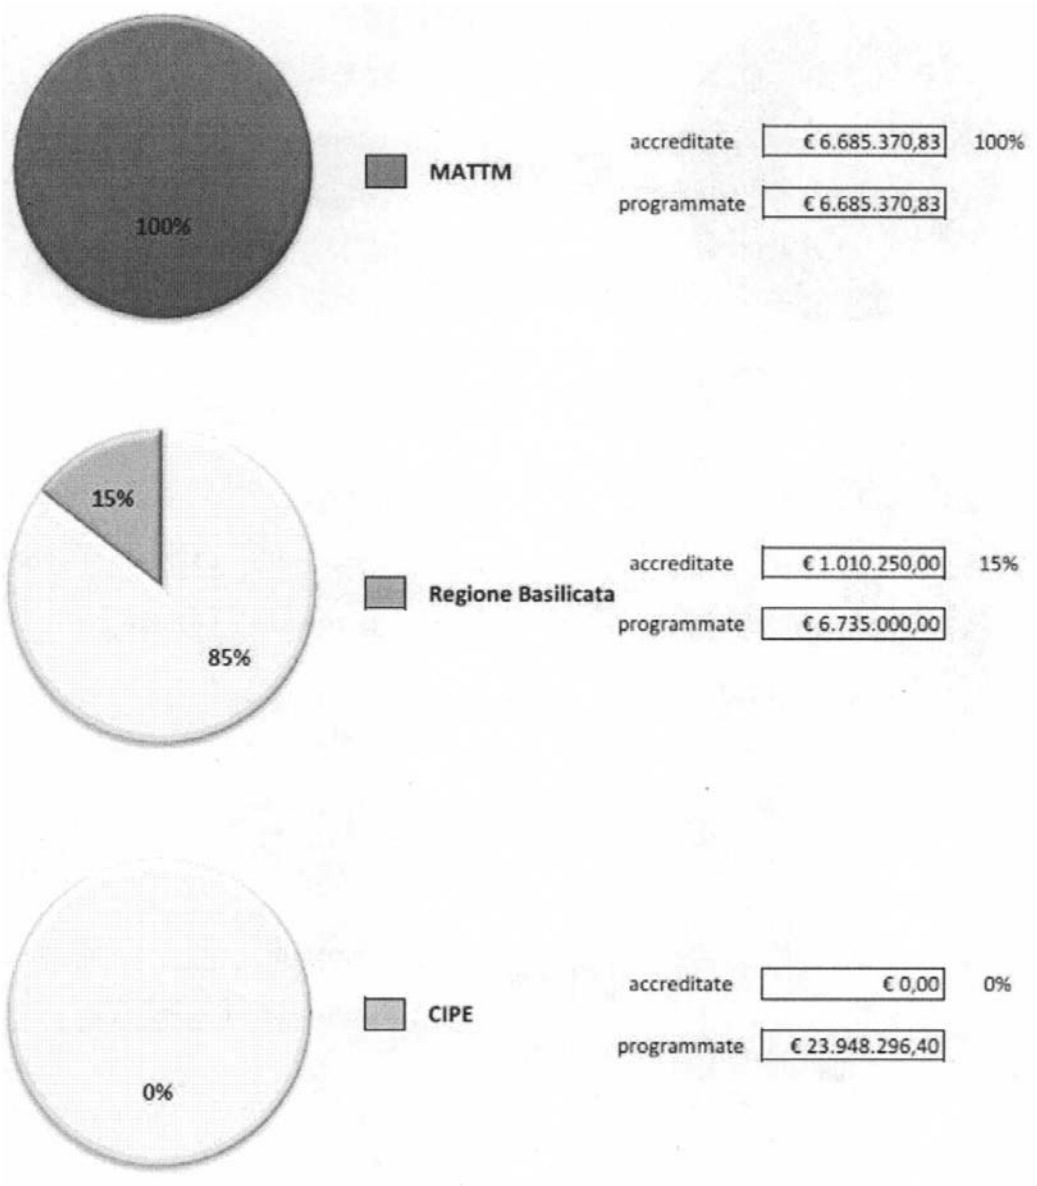


Grafico 3 - Rapporto percentuale tra somme impegnate e somme programmate


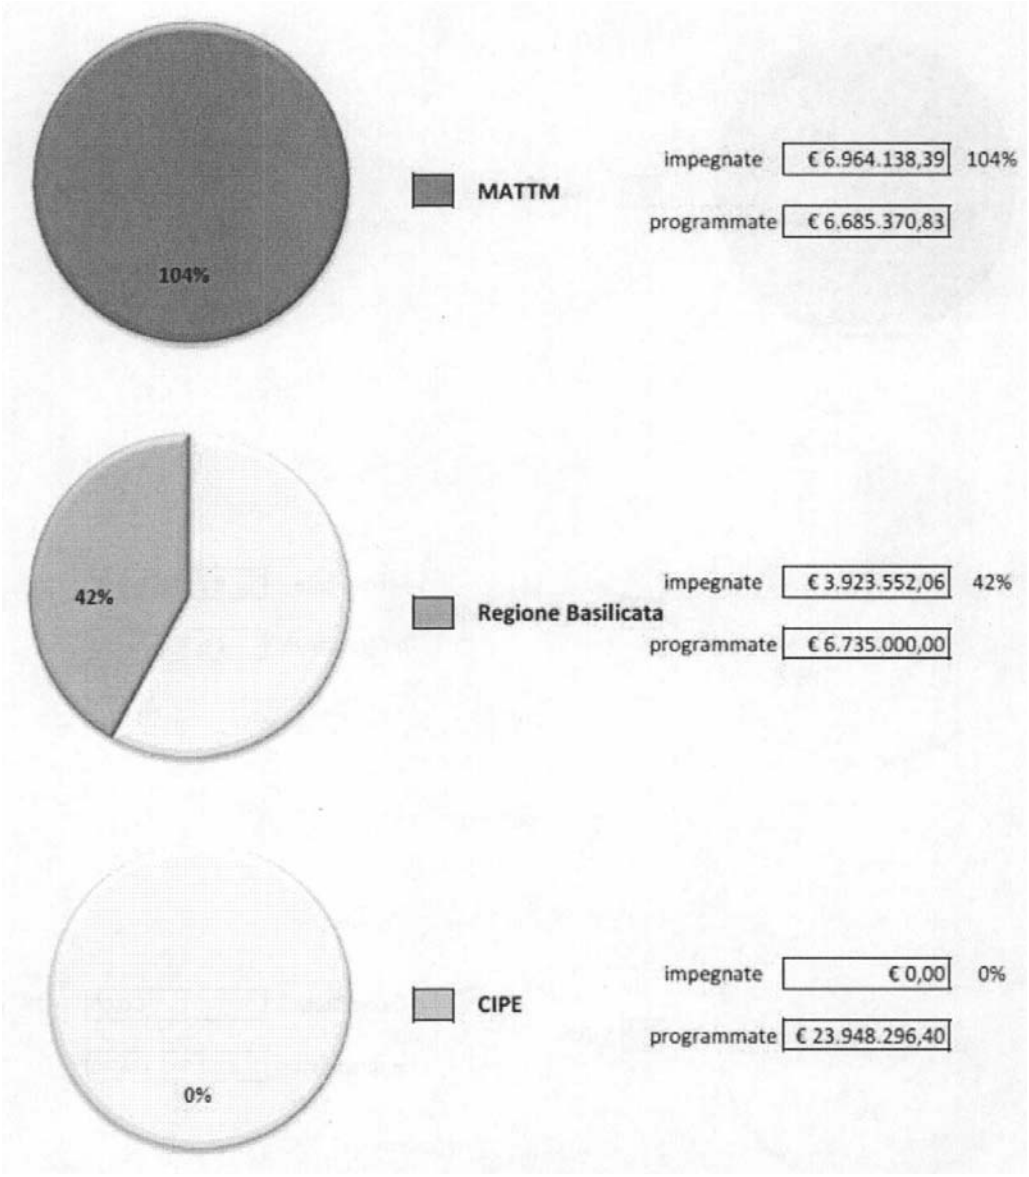


Grafico 4 - Rapporto percentuale tra somme spese e somme accreditate



PAGINA BIANCA

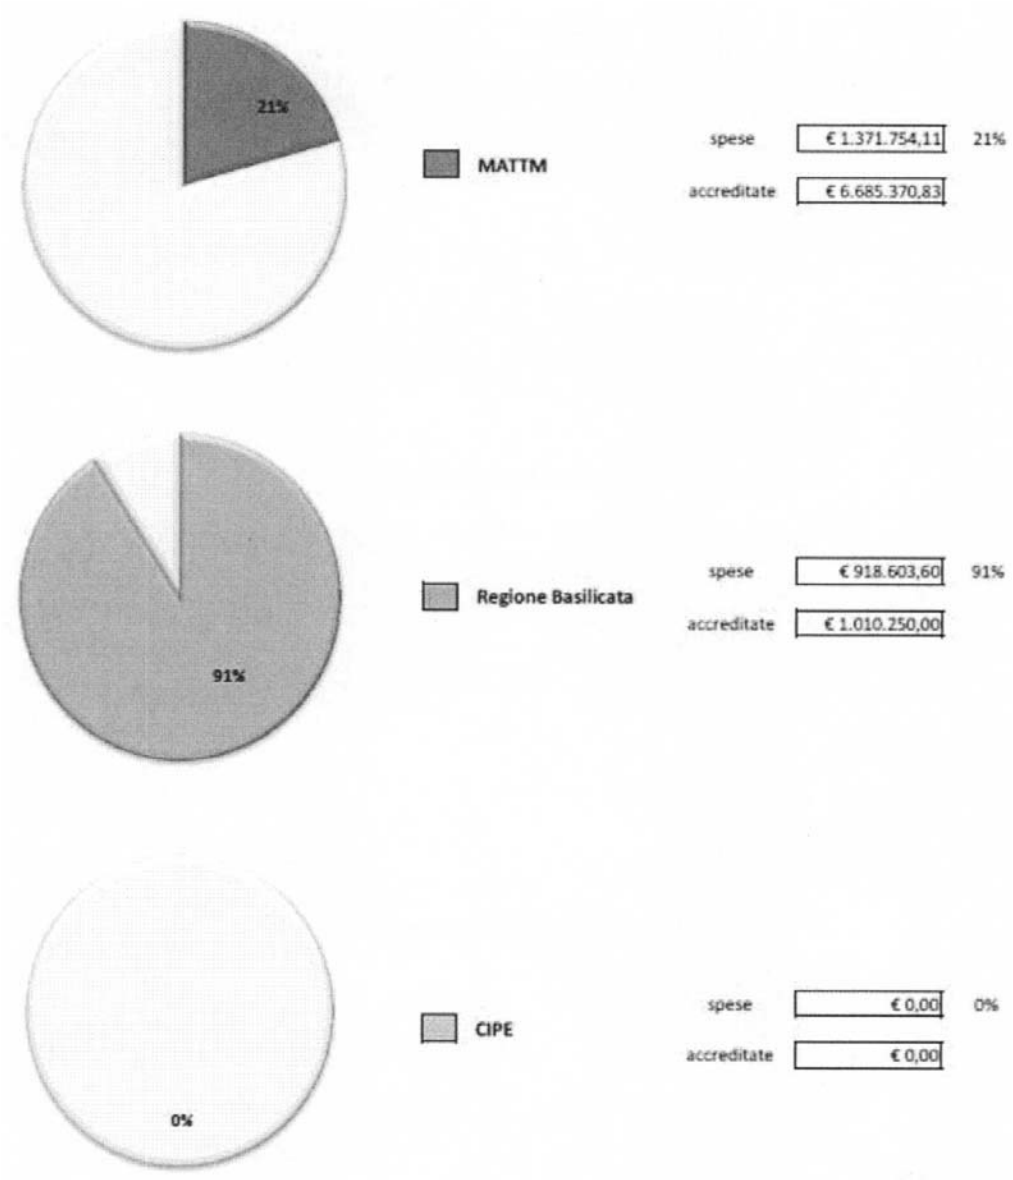

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione e previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - O.P.C.M. 21.05.2011

ANNESSO

RELAZIONE DI ATTIVITA'

Catanzaro, 04.10.2012

Allegati:

- Allegato 1: Lista degli interventi e sintesi stato delle singole attività;
- Allegato 2: Mappe "Categorie di rischio PAI associato all'intervento";

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione e previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 – D.P.C.M. 21.01.2011

Premessa

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Calabria hanno stipulato, in data il 25 novembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla "Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" da effettuare nel territorio della Regione Calabria nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.

In particolare gli interventi, da realizzare nell'ambito dell'AdP "Difesa del Suolo", rientrano nella proposta di programmazione regionale per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che tiene conto delle numerose richieste pervenute agli Uffici della Regione Calabria oltre che di quelle trasmesse, dagli Enti interessati, direttamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o alla Protezione civile nazionale e/o regionale.

L'accordo, tra l'altro, prevedeva, art. 5, che per l'attuazione degli interventi i sottoscrittori si sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.

Il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Presidente della Regione Calabria, ha provveduto a nominare, con DPCM in data 21 gennaio 2011 il sottoscritto, dott. Domenico Percolla, "Commissario straordinario delegato alla attuazione degli interventi di cui all'allegato A dell'AdP della Regione Calabria".

La presente relazione rappresenta una sintesi di quanto svolto dall'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma del 25.11.2010 – D.P.C.M. 21.01.2011" a partire dal mese di Gennaio 2011 e fino ad oggi.

1. Sintesi delle attività svolte

In particolare, suddividendo le attività per

A. <u>Gennaio 2011 – Luglio 2011</u>

In tale periodo, nel quale il Commissario Delegato in epigrafe non aveva alcuna disponibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 4 ha individuato le possibili collaborazioni, infatti

Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli enti da questo

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione e previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 – D.P.C.M. 21.01.2011

vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tali attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163 del 2006" ...

In considerazione di quanto prescritto dal richiamato art. 4 e per la assenza iniziale di risorse, si è provveduto ad operare esclusivamente usufruendo di alcune risorse tecnico-operative della Regione Calabria. In attesa del trasferimento delle risorse economiche specifiche, sono state svolte:

i. definizione di una scheda "istruttoria" finalizzata a raccogliere in maniera sintetica, ma esaustiva, tutti i dati di base degli interventi compresi nell'Accordo di Programma, del 25.11.2010;

ii. trasmissione della scheda a tutti i Comuni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da attuare, nonché alle provincie anch'esse interessati e beneficiari di alcuni interventi;

8. <u>Luglio 2011 – Dicembre 2011</u>

in tale periodo, a valle dell'erogazione di una prima parte di risorse economiche da parte del Ministero dell'Ambiente, avvenuta il 23.06.2011 per un importo pari ad € 2.339.261,85, è stata di fatto avviata la struttura operativa dell'Ufficio, avvalendosi, con Decreto Commissariale n. 2 del 19.07.2011, in forza di quanto previsto nel DPCM 21.01.2011, art. 4, comma 1, da personale proveniente dalla Regione Calabria - Dipartimento n.9 LL.PP. dell'Assessorato ai LL.PP, costituito da n. 7 risorse tecnico-amministrative esperte, e sono state svolte le seguenti attività

i. istruttoria preliminare delle schede ricevute;
ii. prima fase di istruttoria di dettaglio, anche tramite incontri diretti con i primi Comuni interessati dagli interventi;
iii. definizione di un cronoprogramma preliminare e della ripartizione annuale delle risorse;
iv. la seconda fase dell'istruttoria di dettaglio, anche attraverso ulteriori incontri con i Comuni;
v. la ricerca, acquisizione e costituzione dell'Ufficio della struttura commissariale;
vi a definizione della Lista degli Interventi Prioritari secondo delle "indicizzazioni" basate sui tempi di cantierabilità degli interventi, sullo stato della progettazione, sul

numero di persone potenzialmente sposte al rischio e sulla periodicità/frequenza degli eventi che innescano il suddetto rischio;

vii. stipula Convenzioni con le Provincie di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, per la progettazione di alcuni interventi e precisamente:

- Provincia di Cosenza: In virtù della convenzione stipulata in data 1 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto Codice Rendis CS025A/10; il progetto definitivo di tale intervento è stato esitato, positivamente, da parte dell' Autorità di bacino Regionale, e la Provincia ha già presentato il Progetto esecutivo al vaglio di questo ufficio;

- Provincia di Reggio Calabria: In virtù della convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Budello" da realizzare nel comune di Gioa Tauro Codice Rendis RC068A/10; il progetto preliminare di tale intervento è stato esitato, positivamente, da parte di questo ufficio, e la Provincia sta procedendo all'elaborazione delle successive fasi progettuali;

- Provincia di Catanzaro: in virtù della Convenzione stipulata in data 27 luglio 2011 è stata affidata la progettazione relativa a n. 2 interventi: "Interventi di sistemazione idraulica dei fossi Valeo I e II nel bacino del fosso Pia Lupia' da realizzare nel Comune di Falerna Codice Rendis CZ081A/10; "Interventi di sistemazione idraulica dei bacini dei Valloni Sciabica Chioccia e Marevitano" da realizzare nel comune di Nocera Terinese Codice Rendis CZ082A/10

- Provincia di Crotone: In virtù della convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Crotone" da realizzare nei comuni di Cirò Marina, Ciro, Carfizzi e Melissa" Codice Rendis KR071A/10; il progetto preliminare è stato esitato positivamente, da parte di questo ufficio, e la Provincia sta procedendo all'elaborazione delle successive fasi progettuali rispetto a tale intervento è stato emesso Decreto Commissariale di impegno somme per la realizzazione delle attività prove geognostiche e per l'affidamento delle prestazioni specialistiche.

- Provincia di Vibo Valentia: In virtu della convenzione stipulata in data 6 settembre 2011 e stata affidata la progettazione relativa a n.2 interventi:

"Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Vibo Valentia" da realizzare nei comuni di Pizzo Calabro, Ricadi e San Nicola da Crissa" Codice Rendis VV072A/10; "Interventi integrativi di mitigazione del rischio idrogeologico incombente nel centro abitato di Maierato" Codice Rendis VV005A/10. I progetti preliminari di ambedue gli interventi son stati esitati positivamente da parte di questo ufficio e la Provincia sta provvedendo all'elaborazione delle successive fasi progettuali.

viii. stipula Convenzione con il Dipartimento alle Infrastrutture della Regione Calabria ed il Provveditorato Interregionale per la Sicilia e la Calabria per la progettazione dell'intervento Codice RendisCS003A/10 "Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi di Balzata" nel Comune di Rogliano (CS)

C. Gennaio 2012 – oggi

A valle dell'accreditamento sulla contabilità speciale del Commissario, di € 11.413.730,83, avvenuto il 15.12.2011, e fino alla data di stesura della presente relazione, avendo reperito e costituito l'Ufficio commissariale, in termini di sede operativa e di strumentazione d'ufficio, hardware e software, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività:

i. numerosi incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.

ii. nomina di n. 2 RUP, sulla base di quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal DPCM integrativo del 20 luglio 2011 , attraverso specifici decreti commissariali, e loro accreditamento presso il sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per le formalità e procedure previste in materia di appalti pubblici;

iii. istituzione, tramite specifici bandi di gara, dell'elenco imprese - per le gare a procedura ristretta semplificata, da utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara – e dell'elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;

iv. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. CS014A/10 Comune di Firmo ", per € 600.000,00, gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 17.09.2012 ed consegna dei lavori in data 28.09.2012;

v. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. KR 021A/10 Comune di Santa Severina, per € 600.000,00, gara aggiudicata in via provvisoria, in corso le verifiche di rito;

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione e previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 21.01.2011

vi. predisposizione documentazione per espletamento gara di appalto per l'affidamento lavori intervento cod. CS 004A/10 Comune di Acri, per € 1.500.000,00;

vii. predisposizione documentazione per l'espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 019A/10 – Comune di Bisignano "Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant'Umile";

viii. predisposizione documentazione per l'espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CZ 079A/10 - S. Andrea Apostolo dello Ionio – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro";

ix. svolgimento di sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi relativamente agli interventi previsti nei Comuni di :

- Bisignano, Polia, Sant'Adrea Apostolo dello Jonio, Marina di Gioiosa Ionica e Catanzaro.

x. avvio implementazione progettazioni da parte dell'Ufficio del Commissario, relativamente agli interventi:

- CS 019A/10 – Bisignano "Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant'Umile";
- CS 020A/10 – Bisignano "Interventi di mitigazione del rischio nelle contrade Cretarossa e Fria";
- VV 043A/10 – Polia – "Interventi di mitigazione del rischio di frana e idraulico nella frazione Trecroci"
- CZ 079A/10 - S. Andrea Apostolo dello Ionio – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro"
- RC 024A/10 - Marina di Gioiosa Ionica – "Intervent di mitigazione del rischio di frana nella frazione Iunchi";
- CZ 002A/10 "Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro urbano e delle infrastrutture strategiche" nel Comune di Catanzaro;
- CZ 054A/10 "Interventi di consolidamento nel centro abitato di Catanzaro (Via Siciliani e Via Carlo V) e della Frazione Gagliano (Via Smaldone e Via Gradoni Giglio)" nel Comune di Catanzaro

xi. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto;

2. Quadro complessivo degli interventi previsti

La presente relazione viene redatta a valle della pubblicazione formale della Delibera Cipe n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella G.U., Serie Generale, n. 121 del 25.05.2012; rispetto a quanto previsto nell'Accordo di Programma del 25.11.2010, gli interventi sono stati tutti confermati, per un totale di 185, con un importo complessivo del finanziamento pari ad € 220.000.000,00, come previsto nell'Accordi di Programma originario.

In Allegato 1 si riporta un quadro generale degli interventi, ordinati secondo le priorità definite nel Dicembre 2011 e contenente:

- la lista completa dei 185 interventi previsti nell'Accordo di Programma del 25.11.2010, completa del Codice RENDIS per il monitoraggio degli stessi;
- il CUP generato per ciascun intervento;
- l'importo finanziato,
- i criteri usati nel Dicembre 2011 per la definizione delle priorità di intervento;
- lo stato delle attività per ogni intervento.

In estrema analisi, come si evince dalla tabella di seguito riportata, allo stato attuale:

- degli 88 interventi di cui all'allegato A quelli ricadenti in territorio comunale (gli altri ricadono in ambito provinciale) sono 64, di questi 46 Comuni hanno presentato elaborati progettuali già esitati positivamente dall'ufficio del commissario e si trovano dunque in un avanzata fase progettuale in ciò costantemente supportati e monitorati da parte di questo ufficio da un punto di vista sia tecnico che amministrativo attraverso il supporto costante agli uffici tecnici comunali.
- Rispetto ai restanti 18 Comuni la situazione è la seguente: la progettazione di 7 interventi viene svolta dal gruppo di lavoro costituito da Invitalia SpA nell'ambito della Convenzione stipulata con questo ufficio, 6 interventi sono dotati di progettazione di livello esecutivo (Acri, Firmo, Careri, Santa Severina e Villapiana). Rispetto ai restanti 6 interventi questi risultano costantemente monitorati, e sono stati sollecitati con nota del 12 luglio u.s. a trasmettere la documentazione progettuale inerente l'intervento di cui all'Accordo di Programma.
- Dei 97 interventi di cui all'Allegato B quelli ricadenti in territorio comunale (gli altri ricadono in ambito provinciale) sono 61, di questi 50 comuni hanno presentato il

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione e previsti nell'Accordo di Programma siglato il 28.11.2010 – D.P.C.M. 21.01.2011"

progetto preliminare, di cui 12 già esitati positivamente dall'ufficio del commissario e sono in corso da parte di questo ufficio le istruttorie tecniche per i restanti 38. Dei restanti 11, 2 interventi sono dotati di progettazione di livello definitivo ed 1 intervento è dotato di progettazione di livello esecutivo.

PRIORITA' 1 – MATTM (N. 63)	
N° INTERVENTI	STATO ATTUAZIONE
8	In attesa di documentazione dai Comuni
45	Progettazione in corso o da aggiornare
7	Progettazione in corso Ufficio del Commissario
2	Gara espletata per affidamenti lavori
1	In avvio gara per affidamenti lavori
63	**TOTALE**
PRIORITA' 2 – MATTM (N. 25)	
3	In attesa di documentazione dai Comuni
22	Progettazione in corso o da aggiornare
25	**TOTALE**
PRIORITA' 1 – REGIONE CALABRIA (N. 36)	
2	In attesa di documentazione dai Comuni
34	Progettazione in corso o da aggiornare
36	**TOTALE**
PRIORITA' 2 – REGIONE CALABRIA (N. 37)	
3	In attesa di documentazione dai Comuni
34	Progettazione in corso o da aggiornare
37	**TOTALE**
PRIORITA' 3 – REGIONE CALABRIA (N.24)	
7	In attesa di documentazione dai Comuni
17	Progettazione in corso o da aggiornare
24	**TOTALE**

Tabella di sintesi stato attività





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione e previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - DPCM 21.01.2011

3. Personale utilizzato

Con Decreto Commissariale n. 2 del 19.07.2011, in forza di quanto previsto nel DPCM 21.01.2011, art. 4, comma 1, è stata costituita la Struttura di supporto dell'Ufficio commissariale, composta:

- da personale in avvalimento, proveniente dalla Regione Calabria - Dipartimento n.9 LL.PP. dell'Assessorato ai LL.PP, costituito da n. 7 risorse tecnico-amministrative esperte, tutti sotto forma di collaborazione in forma non continuativa come disposto dal DPCM 20.07.2011, e per i quali viene corrisposto un compenso corrispondente alle sole ore di straordinario volte presso l'Ufficio del Commissario, nel limite mensile di 30 ore.

In aggiunta a tale personale operano, a seconda delle necessità, presso gli Uffici di questo Commissario, tecnici facenti parte dei Gruppi di Lavoro specifici costituiti da Invitalia e dal CGIAM, non in rapporto di dipendenza, pertanto, del Commissario, contrattualizzati dalle stesse Società/Amministrazioni, a seguito di selezione pubblica, sulla base delle esigenze manifestate dallo stesso Commissario Delegato.

Non sono state affidate consulenze, né incarichi professionali, da parte dell'Ufficio del Commissario delegato in oggetto.

4. Accreditamenti alla contabilita' speciale del Commissario

E' utile far rilevare che solo a giugno del 2011 il MATTM ha provveduto ad effettuare un primo accreditamento nella contabilità speciale del Commissario, un successivo a fine 2011 ed infine ulteriore accreditamento nel settembre 2012 .
Date ed importi sono i seguenti:
-1° di ~~€ 2.339.261,85 in data 23.06.2011~~;
-2° di € 11.413.730,83 in data 15.12.2011;
-3° di € 13.484.347,20 in data 25.09.2012.

Pertanto allo stato risultano in piccola parte trasferite le risorse, per il finanziamento di cui all'Accordo di Programma, previste dalla delibera CIPE n. 8/2012 "Frane e versanti", per cui si è tuttora in attesa del trasferimento, sulla contabilità speciale del Commissario, della restante cospicua parte necessaria al fine di dare concreta attuazione a tutti gli interventi previsti all'interno dell'AdP.

A tal riguardo nel gennaio 2012 è stata adottata la delibera Cipe n 3 pubblicata in G.U. il 25/05/2012, con la quale vengono esplicitate le modalità relative ai trasferimenti delle risorse dalla Regione Calabria alla contabilità speciale del Commissario Straordinario, quali ulteriori finanziamenti per il raggiungimento della somma complessiva dei 220.000.000,00 €. Sulle modalità





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 21.01.2011

di trasferimento delle risorse dalla Regione Calabria alla contabilità speciale del Commissario Straordinario si ricercano le modalità, di concreta attuazione del trasferimento, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico ed del CIPE.

5. Sito Ufficiale Del Commissario

Infine mi preme evidenziare l'apertura e la puntuale gestione del sito web ufficiale del Commissario, accessibile attraverso il link www.dissestocalabria.it

Tale strumento di comunicazione di tutte le attività del Commissario nonché delle procedure di gara attivate dal Commissario, è costantemente aggiornato.

Il Commissario Straordinario Delegato
(*Dott. Domenico Percolla*)





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione e previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 21.01.2011

Allegato 1:
Lista degli interventi e sintesi stato delle singole attività



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Calabria nel Accordo di Programma stipulato il 29.12.2010 - D.P.C.M. 22.12.10

codice INTERVENTO	Comune/Ente	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Lotto Funzionale	Livello Progettuale Precedente	CUP	Durata in mesi	Posizione Ranking PAI	NOTE	Ordinanza di Protezione Civile
INTERVENTI PRIORITARI FINANZIAMENTO MATTM													
INTERVENTI PRIORITARI													
CS 006A/10	Comune di Acri	CS	Acri	Serricciolo	Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato	€ 1.500.000,00	-	Progettazione Esecutiva	J50I12000100001	6 mesi	90	Risulta ubicato a ridosso del versante interessato dal movimento franoso	OPCM 3862/2010
VR 021A/10	Comune di Santa Severina	KR	Santa Severina	Centro storico Piazza Grande	Interventi di messa in sicurezza del versante interessato dal movimento franoso	€ 1.000.000,00	-	Progettazione Esecutiva	J41B12000130001	6 mesi	84		OPCM 3862/2010
CS 014A/10	Comune di Firmo	CS	Firmo	Via Salvatore e Via S. Via Salvatore e Via della Repubblica	Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del versante interessato dal movimento franoso	€ 2.400.000,00	-	Progettazione Esecutiva	J72B12000140001	6 mesi	82	Risulta ubicato a ridosso del versante interessato dal movimento franoso	OPCM 3862/2010
RC 064A/10	Comune di Caraffa	RC	Caraffa	Nuovo Nucleo	Interventi di mitigazione del rischio di frana nell'abitato di Nuovo Nucleo	€ 600.000,00	-	Progettazione Esecutiva	J96D12000160001	6 mesi		Risulta ubicato a ridosso del versante interessato dal movimento franoso	OPCM 3862/2010
CS 015A/10	Comune di Zumpano	CS	Zumpano	Località Mulinello	Interventi di mitigazione del rischio - località Mulinello	€ 1.500.000,00	-	Progettazione Definitiva	J77D12000130001	6 mesi	83	Area colpita da eventi 2006 2008 2009 e 2010 e non ancora completata	OPCM 3741/2009 OPCM 3862/2010
CS 017A/10	Comune di Zumpano	CS	Zumpano	Località Mantineria	Interventi di mitigazione del rischio in località Mantineria	€ 600.000,00	-	Progettazione Definitiva	J77D12000240001	6 mesi	84	Area colpita da eventi 2006 2008 2009 e 2010 e non ancora completata	OPCM 3741/2009 OPCM 3862/2010
CS 008A/10	Comune di Aprigliano	CS	Aprigliano	Frazione Vico	Interventi di mitigazione del rischio nella frazione Vico di Aprigliano	€ 1.000.000,00		Progettazione Definitiva	J22D12000110001	6 mesi	90	Interessato da fenomeno franoso	OPCM 3862/2010
RC 013A/10	Comune di Caraffa Marcellinara	RC	Oppido Marcellinara	Località Pantano	Adeguamento e consolidamento e completamento scuola Primaria	€ 1.500.000,00	-	Progettazione Definitiva	J96D12000130001	6 mesi	111		OPCM 3862/2010
CS 023A/10	Provincia di CS	CS	Rossano / Cropalati	Piano Franco	Completamento degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato di Piano Franco	€ 1.000.000,00	-	Progettazione Esecutiva	J46D12000090001	3 mesi	94		OPCM 3741/2009
CS 006A/10	Comune di Mottafollone	CS	Mottafollone	Via Mercatorio	Interventi di mitigazione del rischio nella Via Mercatorio	€ 500.000,00		Progettazione Definitiva	J22D12000120001	3,5 mesi	84		OPCM 3862/2010
[illegible]	Comune di San Nicola dell'Alto	KR	San Nicola dell'Alto	Centro storico	Interventi di consolidamento nel centro storico	€ 600.000,00	-	Progettazione Definitiva	J45D12000	3,5 mesi	91 - 94		OPCM 3741/2009 - OPCM 3862/2010
RC 072A/10	Comune di Melicucco	RC	Melicucco	Località Centro Abitato	Interventi di mitigazione del rischio nel centro abitato	€ 1.000.000,00	-	Progettazione Definitiva	J[illegible]D12000110001	6 mesi	94		OPCM 3862/2010
VV 005A/10	Provincia di VV	VV	Vibo Valentia	Centro storico	Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del centro storico	€ 1.500.000,00		Progettazione Esecutiva	J[illegible]D12000120001	6 mesi	91	Risulta ubicato in area a rischio idrogeologico	OPCM 3862/2010
CZ 067A/10	Comune di Tiriolo	CZ	Tiriolo	Centro storico Borgo Portosalvo	Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del centro storico Borgo Portosalvo	€ 1.000.000,00	-	Progettazione Definitiva	J[illegible]D12000140001	6 mesi	92	Area soggetta a movimenti franosi	OPCM 3862/2010
CZ 060A/10	Comune di Conflenti	CZ	Conflenti	Centro storico	Interventi di consolidamento del centro storico	€ 1.500.000,00		Progettazione Definitiva	J[illegible]D12000150001	6 mesi	94		OPCM 3862/2010
KR 037A/10	Provincia di KR	KR	KR	Via [illegible]	Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della Via [illegible]	€ 1.000.000,00		Progettazione Definitiva	J[illegible]D12000160001	6 mesi	91		



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

per l'attuazione degli interventi per il completamento del piano di risanamento

della Regione Calabria nel settore del Programma triennale 2007-2009 - D.P.C.M. 25 luglio 2007.

CS 000 LA/10	Comune di Rogliano	CS	Rogliano	Loc. Piazza	Intervento di completamento del movimento franoso in località Cuscino Piazza	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	1.5 mesi		OPCM 3781/2009 - OPCM 3863/2010
CS 059A/10	Comune di Tortora	CS	Tortora	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione Definitiva	[illegible]	[illegible]	mq	
CZ 001A/10	Provincia di CZ	CZ	Taverna	Area [illegible] via Guarna del Conte, Fondo Pia Lucia	Intervento di completamento del movimento franoso in località Pia Lucia	[illegible]		Progettazione Definitiva	[illegible]	[illegible]	mq	OPCM 3781/2009
CZ 002A/10	Provincia di CZ	CZ	Nocera Terinese	Bivio per Loreto, Località Cavallo, Località Cavallo, Località Cavallo, Località Cavallo	Intervento di completamento di Bivio per Loreto - Località Cavallo - Località Cavallo - Località Cavallo - Località Cavallo	[illegible]		Progettazione Definitiva	[illegible]	[illegible]	mq	OPCM 3781/2009 - OPCM 3863/2010
VV 013A/10	Provincia di VV	VV	Vibo	[illegible] Pizzoni	[illegible]	[illegible]		Progettazione Definitiva	[illegible]	[illegible]	mq	
RC 068A/10	Provincia di RC	RC	Gioia Tauro	Tornese Bivio Pa	[illegible]	[illegible]	-	Progettazione Definitiva	[illegible]	[illegible]	mq	OPCM 3781/2009
RC 018A/10	Comune di Montebello Ionico	RC	Montebello Ionico	Località Musella	[illegible]	[illegible]	1	Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	mq	OPCM 3863/2010
CZ 001A/10	Comune di Falerna	CZ	Falerna	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPCM 3781/2009 OPCM 3863/2010
CZ 002A/10	Comune di Caraffa	CZ	Caraffa	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPCM 3781/2009 OPCM 3863/2010
VV 006A/10	Comune di Vibo Valentia	VV	Vibo Valentia	Centro Urbano [illegible]	[illegible]	[illegible]	-	Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPCM 3863/2010
VV 007A/10	Comune di Vibo Valentia		Vibo Valentia	Frazione Piscopio	[illegible]	[illegible]	-	Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPCM 3863/2010
[illegible]	Comune di [illegible]	CS	Verbicaro	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPCM 3781/2009 - OPCM 3863/2010
[illegible]	Comune di Longobucco	CS	Longobucco	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPCM 3781/2009 - OPCM 3863/2010
CZ 012A/10	Comune di [illegible]	[illegible]	Taverna [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPCM 3863/2010
[illegible]	Comune di [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPCM 3863/2010
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPCM 3781/2009 - OPCM 3863/2010

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria - Accordo di Programma sig. n. 2[illegible] - D.P.C.M. 15.09.2015

VV 013/A/16	Provincia di VV		Vibo Valentia	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
VV 014/A/16	Provincia di VV		Vibo Valentia	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
VV 033/A/16	Provincia di VV		Vibo Valentia	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
VV 026/A/16	Provincia di VV		Vibo Valentia	Fossa Laurea	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CS 030/A/16	Comune di Bruginano	CS	Bruginano	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CS 036/A/16	Comune di Rocca Imperiale Bruzio	CS	Rocca Imperiale Bruzio	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CS 051/A/16	Comune di Pedrengiano	CS	Pedrengiano	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CS 076/A/16	Comune di Paola	CS	Paola	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
VV 075/A/16	Comune di Parghelia	VV	Parghelia	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
VV 074/A/16	Comune di Tropea	VV	Tropea	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
VV 077/A/16	Comune di Zambrone	VV	Zambrone	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
VV 078/A/16	Comune di Drapia	VV	Drapia	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Comune di Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
KR 027/A/16	Provincia di KR	KR	Crotone	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
KR 026/A/16	Provincia di KR	KR	Crotone	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
KR 035/A/16	Provincia di KR	KR	Crotone	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

CZ 0114/10	Comune di Lamezia Terme	CZ	Lamezia Terme	Località [illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPCM 3741/2009 - OPCM 3863/2010
CS 0408/10	Comune di Tortora	CS	Tortora	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPCM 3466/2005
CZ 0411/10	Provincia di CZ	CZ	San Mango d'Aquino - Nocera Terinese	Fiume [illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPCM 3741/2009
CZ 0432/10	Comune di Curinga	CZ	Curinga	centro storico	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPCM 3741/2009 - OPCM 3863/2010
VV 0433/10	Comune di Pizzo	VV	Pizzo	Frazione [illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPCM 3863/2010
CS 0442/10	Comune di Cerisano	CS	Cerisano	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPCM 3863/2010
CZ 0453/10	Provincia di CZ	CZ	Lamezia Centro - Sambiase - Sant'Eufemia	Fiume Simeri	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
CS 0456/10	Comune di Oriolo	CS	Oriolo	Zona Piazza San Luca	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPCM 3863/2010
KR 0471/10	Comune di Caccuria	KR	Caccuria	centro abitato di Caccuria e Via Diga	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPCM 3863/2010
CS 0466/10	Comune di Frigento C	CS	Frigento Castello	Località [illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPCM 3741/2009 OPCM 3863/2010
CS 0439/10	Comune di Falconara Alb	CS	Frazione Marinella	Frazione [illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
KR 0532/10	Comune di Rocca di Neto	KR	Rocca di Neto	centro abitato [illegible]	[illegible]	[illegible]		Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPCM 3741/2009
TOTALE PRIORITA' I						[illegible]						
INTERVENTI PRIORITA' II												
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

per l'attuazione degli interventi per fronteggiare le situazioni di rischio idrogeologico

e l'Ordinanza presidenziale delegata n. 3850 del 30.10.2010 - DPCM 12.01.10

RC 0818A/10	Comune di Villa San Giovanni	RC	Villa S.Gio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Comune di [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	OPCM 3863/2010
VV 0828A/10	Comune di [illegible]	VV	Drosi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	OPCM 3863/2010
CS 0857A/10	Comune di Rocca	CS	Rocca	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	OPCM 3863/2010
CZ 0834A/10	Comune di Catanzaro	CZ	Catanzaro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	
CS 0968A/10	Comune di Cerchiara	CS	Cerchiara	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	
RC 0812A/10	Comune di Caraffa	RC	Caraffa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	
CS 0833A/10	Comune di S.an Costantino di Fiore	CS	San Costantino di Fiore	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	OPCM 3863/2010
CS 0903A/10	Provincia di CS	CS	vari	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	
RC 0790A/10	Provincia di RC	RC	vari	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Provincia di CZ	[illegible]	vari	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
CZ 0808A/10	Provincia di CZ	CZ	Guardavalle	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
RC 0870A/10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	Progettazione preliminare	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

RC 0258/10	Comune di Reggio Calabria		Reggio Calabria	Fiumara Annunziata	Intervento di sistemazione idraulica della Fiumara Annunziata		2	Progettazione preliminare					
RC 0304/10	Comune di Reggio Calabria		Reggio Calabria	Fiumara Gallico	Intervento di sistemazione idraulica della Fiumara Gallico		2	Progettazione preliminare					
RC 0314/10	Comune di Reggio Calabria		Reggio Calabria	Fiumara Calopinace	Intervento di sistemazione idraulica della Fiumara Calopinace		2	Progettazione preliminare					
RC 0324/10	Comune di Reggio Calabria		Reggio Calabria	Fiumara Gallina	Intervento di sistemazione idraulica della Fiumara Gallina		2	Progettazione preliminare					
TOTALE PRIORITA' 2													
INTERVENTI PRIORITARI													
CS 0166/10	Comune di Mendicino	CS	Mendicino	Cammito Malvicino Cammito Mendicino	Intervento di regolazione del deflusso in alveo della Fiumara Malvicino e di Via Mendicino			Progettazione preliminare					DPCM 3862/2010
RC 0458/10	Comune di Africo	RC	Africo	Località Tre Aie	Completamento degli interventi di messa in sicurezza della località Tre Aie			Progettazione preliminare					DPCM 3862/2010
CS 0060/10	Comune di S. Caterina Albanese	CS	S. Caterina Albanese	Fiumara Viaggiano Località S. Monica e Cascina	Intervento di regolazione del deflusso nelle località S. Monica e Cascina mediante [illegible]			Progettazione preliminare					DPCM 3862/2010
CZ 0018/10	Comune di Miglierina	CZ	Miglierina	Centro abitato Piana Stanziale Fiumara Piano Grande Località Viaggio	Intervento di messa in sicurezza del Piano Grande e della località Viaggio mediante [illegible]			Progettazione preliminare					DPCM 3862/2010
VV 0024/10	Comune di Drapia	VV	Drapia	Abitato centro storico Drapia e zona [illegible]	Intervento di regolazione del deflusso [illegible]			Progettazione preliminare					DPCM 3717/2009 DPCM 3862/2010
CZ 0048/10	Provincia di CZ	CZ	Soverato alto	Fiumara Grande Soverato Superiore	Intervento di sistemazione idraulica nel centro abitato [illegible]			Progettazione preliminare					
CZ 0078/10	Comune di Roccelletta	CZ	Badolato	Centro Marina	[illegible]			Progettazione preliminare					DPCM 3862/2010
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni previsti nell'Accordo di Programma siglato il 29.12.2010 - O.P.C.M. n. ...

CS 1148/10	Comune di Cerchiara	CS	Cerchiara	Centro abitato e via Mediterranea	Intervento di mitigazione del rischio di frana a tutela dell'incolumità degli edifici ubicati nell'area centro abitato e via Mediterranea			Progettazione preliminare	039301_00010000	n.a. mesi		Parere di regolare esecuzione del	OPCM 3846/2010
KR 1178/10	Comune di Melissa	KR	Melissa	Centro abitato e località San Marco	Consolidamento degli interventi di consolidamento nel centro abitato e in loc. San Marco			Progettazione preliminare	KR01200030002	n.a. mesi		Trasmissione di atti e parere istruttorio	OPCM 3846/2010
CS 1168/10	Comune di Firmo	CS	Firmo	Centro abitato Sede Municipale e altre località	Interventi di messa in sicurezza del centro abitato del Comune di Firmo in alcuni edifici pubblici ed in altre località			Progettazione preliminare	CS01200030002	n.a. mesi	n.a.	Parere di regolare esecuzione	OPCM 3846/2010
CS 1176/10	Comune di Santa Maria del Cedro	CS	Santa Maria del Cedro	Centro abitato via delle Muse	Intervento di miglioramento del livello di Piano e di messa in sicurezza di Via delle Muse	[illegible]		Progettazione preliminare	CS01200030002	n.a. mesi	n.a.	Parere di regolare esecuzione	OPCM 3846/2010
KR 1210/10	Provincia di KR	KR	Crotone	Territorio Provinciale Crotonese	Riqualificazione e messa in sicurezza del versante in località Passovecchio	[illegible]		Progettazione preliminare	KR01200030002	n.a. mesi	n.a.	Approvazione di variante ex art. 132 D.Lgs 163/06	ordinanza del Ministro delegato n.3907 del 7/4/11
VV 1218/10	Provincia di VV	VV	Vibo Valentia	Vibo Marina - Bivona - Porto Salvo	Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Cutura - 1° Stralcio			Progettazione preliminare	VV01200030002	n.a. mesi	n.a.	Approvazione di Vibo marina per il 2009	OPCM 3533/2006 - OPCM 3334/2006
VV 1158/10	Provincia di VV	VV	Vibo Valentia	Vibo Marina - Bivona - Porto Salvo	Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Cutura			Progettazione preliminare	VV01200040003	n.a. mesi	n.a.	Approvazione di vibo marina 1 stralcio 2009	OPCM 3533/2006 - OPCM 3334/2006
VV 1198/10	Provincia di VV	VV	Vibo Valentia Bivalone	Fornace Trainiti	Intervento di sistemazione idraulica lungo il Fornace Trainiti	[illegible]		Progettazione preliminare	VV01200030002	n.a. mesi	n.a.	Approvazione di [illegible] marina 2 stralcio 2009	OPCM 3533/2006 - OPCM 3334/2006
RC 1048/10	Provincia di RC	RC	Scilla Bagnara	[illegible] Scilla e Bagnara	Sistemazione idrogeologica con opere di ingegneria ambientale nei bacini di Scilla e Bagnara Calabra	[illegible]		Progettazione preliminare	RC01200030002	n.a. mesi	n.a.	[illegible] 2007 [illegible] 2009 [illegible]	OPCM 3741/2009 OPCM 3846/2010
CS 1309/10	Comune di Pedace	CS	Pedace	Centro abitato e zone limitrofe	Intervento di miglioramento del rischio frana e messa in sicurezza degli edifici pubblici lungo via San Girolamo			Progettazione preliminare	CS01200030002	n.a. mesi	n.a.	[illegible]	OPCM 3846/2010
CS 1308/10	Comune di San Cosmo Albanese	CS	San Cosmo Albanese	Centro abitato	Intervento di miglioramento del rischio frana e messa in sicurezza nel centro abitato			Progettazione preliminare	CS01200030002	n.a. mesi	n.a.	[illegible]	OPCM 3846/2010
KR 1298/10	Comune di [illegible]	KR	Caccuri	Località [illegible]	[illegible]			Progettazione preliminare	[illegible]	n.a. mesi	n.a.	[illegible]	OPCM 3846/2010
CZ 1148/10	Comune di San [illegible]	CZ	San Mauro	[illegible]	[illegible]			Progettazione preliminare	[illegible]	n.a. mesi	n.a.	[illegible]	OPCM 3846/2010
CS 1316/10	Comune di Roggiano Gravina	CS	Roggiano Gravina	[illegible]	[illegible]			Progettazione preliminare	CS01200040002	n.a. mesi		[illegible]	OPCM 3846/2010
CS 1308/10	Comune di San Marzano di Focà	CS	San Marzano di Focà	Centro abitato e località [illegible]	[illegible]			Progettazione preliminare	[illegible]	n.a. mesi	n.a.		OPCM 3846/2010
CZ 1158/10	Comune di [illegible]	CZ	Marcedusa	Centro abitato [illegible]	[illegible]			Progettazione preliminare	[illegible]	n.a. mesi	n.a.		OPCM 3846/2010



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

CS 106B/10	Provincia di CS	CS	Cariati Corigliano	Cariati								OPCM 3741/2009
CZ 187B/10	Provincia di CZ	CZ	Catanzaro / Simeri Crichi	Catanzaro								OPCM 3741/2009
RC 089B/10	Comune di Palizzi	RC	Palizzi	Località Montecalvario								OPCM 3741/2009
RC 101B/10	Comune di Bovalino	RC	Bovalino	Località Fiumara a valle della S.S. 106 presso Via San Marcello e via Cristoforo Colombo								OPCM 1962/2010
RC 102B/10	Comune di Locri	RC	Locri	Località Fonte Angelica Contrada Fonte Angelica Località Santo Stefano								OPCM 1962/2010
RC 120B/10	Comune di San Luca	RC	San Luca	Località Mercadante								OPCM 1962/2010
KR 121B/10	Provincia di KR	KR	Cariati Crucoli	Fiume Nica								OPCM 3741/2009
CS 122B/10	Provincia di CS	CS	Paola Cetraro / Mendicino Amantea	Fiumara Abatemarco								OPCM 3741/2009
KR 115B/10	Comune di Verzino	KR	Verzino	Località Scesa Via Bagliano Via Santa Lucia								OPCM 1962/2010
RC 123B/10	Provincia di RC	RC	Casignana / Bovalino / San Luca	Fiumara Bonamico								OPCM 3741/2009
TOTALE INTERVENTI PRIORITARI												
INTERVENTI PRIORITARI												
RC 093B/10	Comune di [illegible]	RC	Gerace	[illegible]								OPCM 3741/2009 OPCM 1962/2010
CS 108B/10	Comune di Mongrassano	CS	Mongrassano	[illegible]								OPCM 3427/2005 OPCM 1962/2010
CS 107B/10	Comune di San Vincenzo La Costa	CS	San Vincenzo La Costa	[illegible]								OPCM 3741/2009 OPCM 1962/2010
KR 114B/10	Comune di Strongoli / Melissa	KR	Strongoli / Melissa	[illegible]								OPCM 3741/2009 OPCM 1962/2010
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								OPCM 3741/2009 OPCM 1962/2010
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								OPCM 3741/2009 OPCM 1962/2010

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria nel territorio della Provincia di Reggio Calabria - O.P.C.M. n. 3849/2010

CS 0818/10	Comune di Nova Siri		Nova Siri				2	Progettazione preliminare					OPCM 3837/2009 OPCM 3843/2010
CS 1248/10	Provincia di CS	CS	Trebisacce	Centro Polivalente		1	2	Progettazione preliminare			RI		
CS 1258/10	Provincia di CS	CS	Castroregio/Canna/Crosia	Comune Territorio		1	2	Progettazione preliminare			RI		
KR 1268/10	Provincia di KR	KR	Cutro	Centro Abitato		1	2	Progettazione preliminare			RI		
CS 1278/10	Provincia di CS	CS	Mongiana	Centro Sud Abitato		1	2	Progettazione preliminare			RI		
RC 1048/10	Comune di Martirano	RC	Martirano	Abitato Centro Rione		1	2	Progettazione preliminare			R3		
CZ 1358/10	Comune di Falerna	CZ	Falerna	Centro abitato e loc. Zambrone		1	2	Progettazione definitiva			R2 R3		OPCM 3842/2010
CS 1378/10	Comune di Lungi	CS	Lungi	Centro abitato e loc. Sambucina		1	2	Progettazione preliminare			R3		OPCM 3842/2010
CS 1398/10	Comune di Castrovillari	CS	Calloveto	Centro abitato		1	2	Progettazione preliminare			R3		OPCM 3842/2010
CS 1318/10	Comune di Paterno	CS	Paterno	Parte orientale del centro abitato		1	2	Progettazione preliminare			R2 R3		OPCM 3842/2010
CS 1438/10	Comune di Malito	CS	Malito	Località Pantano Viale Europa			2	Progettazione preliminare			R2		OPCM 3842/2010
RC 1298/10	Provincia di RC	RC	Cittanova località Marina di Cittanova	Tratto Sud			2	Progettazione preliminare			R4		
TOTALE INTERVENTI PRIORITA' II													
INTERVENTI PRIORITA' III													
CS 1348/10	Provincia di CS	CS	Belvedere Calabro	SP 44 in corrispondenza del centro abitato		1	3	Progettazione preliminare			R4		
RC 1408/10	Comune di Candidoni Riviera	RC	Candidoni/Riviera	Centro Urbano		1	3	Progettazione preliminare			R4		
CS 1418/10	Comune di Civita	CS	Civita	Via Carmine			3	Progettazione preliminare			R4		
CS 1448/10	Comune di Mormanno	CS	Mormanno	Centro abitato		1	3	Progettazione preliminare			R4		
RC 1448/10	Comune di Molochio	RC	Molochio	Centro abitato		1	3	Progettazione preliminare			R4		
CS 1478/10	Comune di Papasidero	CS	Papasidero	Centro abitato		1	3	Progettazione preliminare			R4		
CS 1488/10	Comune di San Donato di Ninea	CS	San Donato di Ninea	Centro abitato		1	3	Progettazione preliminare			R4		
CS 1518/10	Comune di Saracena	CS	Saracena/Aquila di Saracena	Centro abitato			3	Progettazione preliminare			R4		

Camera dei Deputati — 165 — *Senato della Repubblica*

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

RC 1548/10	Comune di Siderno	RC	Siderno	Centro	Riqualificazione urbana del centro storico		1	Progettazione preliminare		24	
CS 1549/10	Comune di Marina di Caloveto	CS	Marina Caloveto	Centro storico	Riqualificazione del centro storico		1	Progettazione preliminare		24	
CS 1550/10	Comune di San Benedetto Ullano	CS	San Benedetto Ullano	Centro storico Mirto Crosia	Riqualificazione del centro storico e valorizzazione urbana del Fiume Esaro		1	Progettazione preliminare		24	
CS 1551/10	Comune di Castrovillari	CS	Castrovillari	Centro storico Frazione Famola	Riqualificazione del centro storico e valorizzazione urbana del Fiume Esaro		1	Progettazione preliminare		24	
CS 1552/10	Comune di S. Pietro in Guarano	CS	S. Pietro in Guarano	Centro storico comunale Ex Via Roma	Riqualificazione del centro storico e valorizzazione urbana del Fiume Esaro		1	Progettazione preliminare		24	
CS 1553/10	Provincia di CS	CS	Villapiana	Centro abitato Villapiana Lido	Interventi di regimentazione delle acque nel tratto terminale della fiumara Satanasso		1	Progettazione preliminare		24	
RC 1554/10	Provincia di RC	RC	Gioiosa	Foce Fiumara a Marina	Completamento delle opere necessarie di messa in sicurezza del fiume Fiumara a Marina		1	Progettazione preliminare		24	
KR 1555/10	Provincia di KR	KR	Cirò Marina	Zona terminale T. Lipuda	Interventi di regimentazione idraulica nel tratto terminale per i		1	Progettazione preliminare		24	
CS 1556/10	Provincia di CS	CS	Amendolara	T. Canicello	Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente		1	Progettazione preliminare		24	
CS 1557/10	Provincia di CS	CS	Rossano	Torrente Gramazzolo	Interventi di sistemazione idraulica con pulizia e alveo del Torrente		1	Progettazione preliminare		24	
KR 1558/10	Provincia di KR	KR	Crotone	Torrente Passovecchio	Realizzazione di una vasca di laminazione sul Torrente		1	Progettazione preliminare		24	
CS 1559/10	Provincia di CS	CS	Rossano	Torrente Celadonia	Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Celadonia		1	Progettazione preliminare		24	
CZ 1560/10	Provincia di CZ	CZ	Lamezia Terme	Torrente Piccodio	Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente S. Ippolito		1	Progettazione preliminare		24	
CZ 1561/10	Provincia di CZ	CZ	Cropani e Borgia	Torrente Crocchio	Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Crocchio		1	Progettazione preliminare		24	
CZ 1562/10	Provincia di CZ	CZ	Curinga	Torrente Turrina e la Vasca	Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Turrina e la vasca		1	Progettazione preliminare		24	
CZ 1563/10	Provincia di CZ	CZ	Cittanova Isola Capo Rizzuto	Torrente Soverato	Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Soverato		1	Progettazione preliminare		24	
TOTALE PRIORITÀ III											
TOTALE FINANZIAMENTO REGIONE CALABRIA											
GRAN TOTALE						270 000 000,00					

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE LOMBARDIA

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione e previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 21.01.2011


Allegato 2

Mappe:"Categorie di rischio PAI associato all'intervento"

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO


AP del 25/11/2010

classificazione per rischio

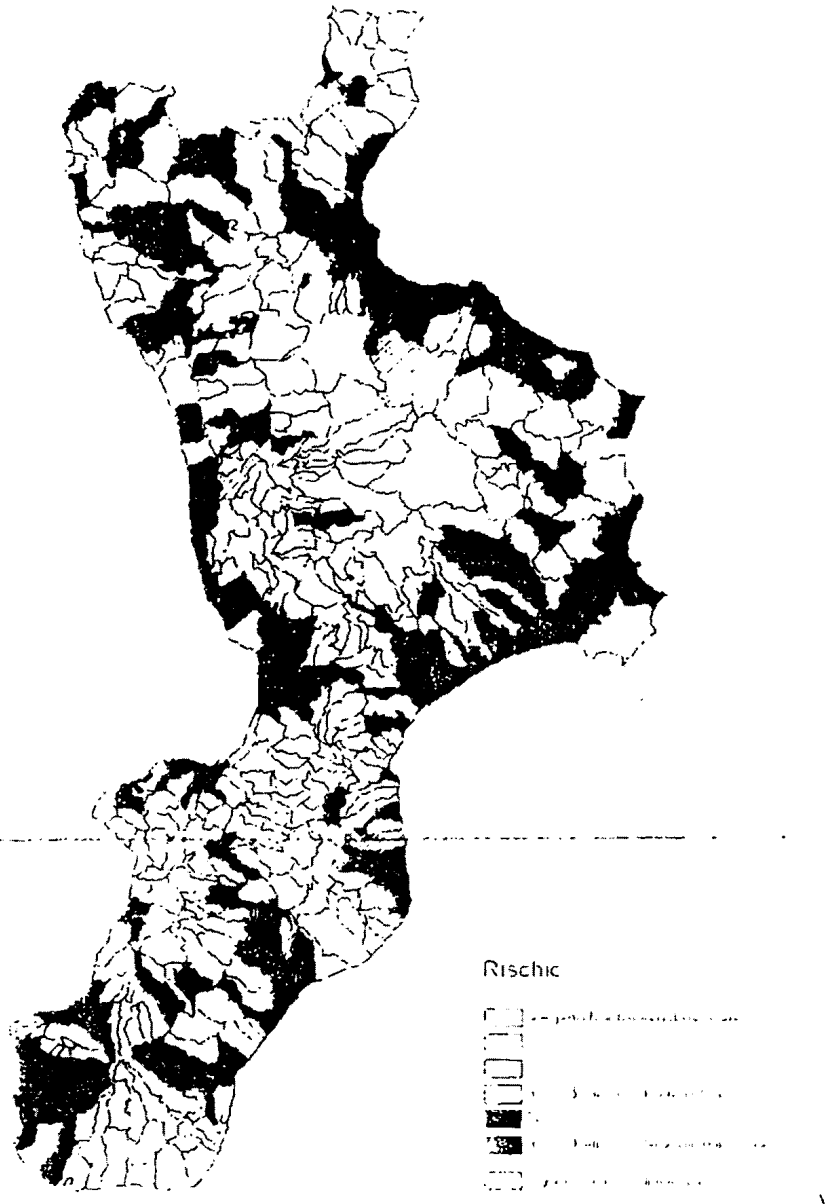

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

AP del 25/11/2010
classificazione per tipologia di rischio

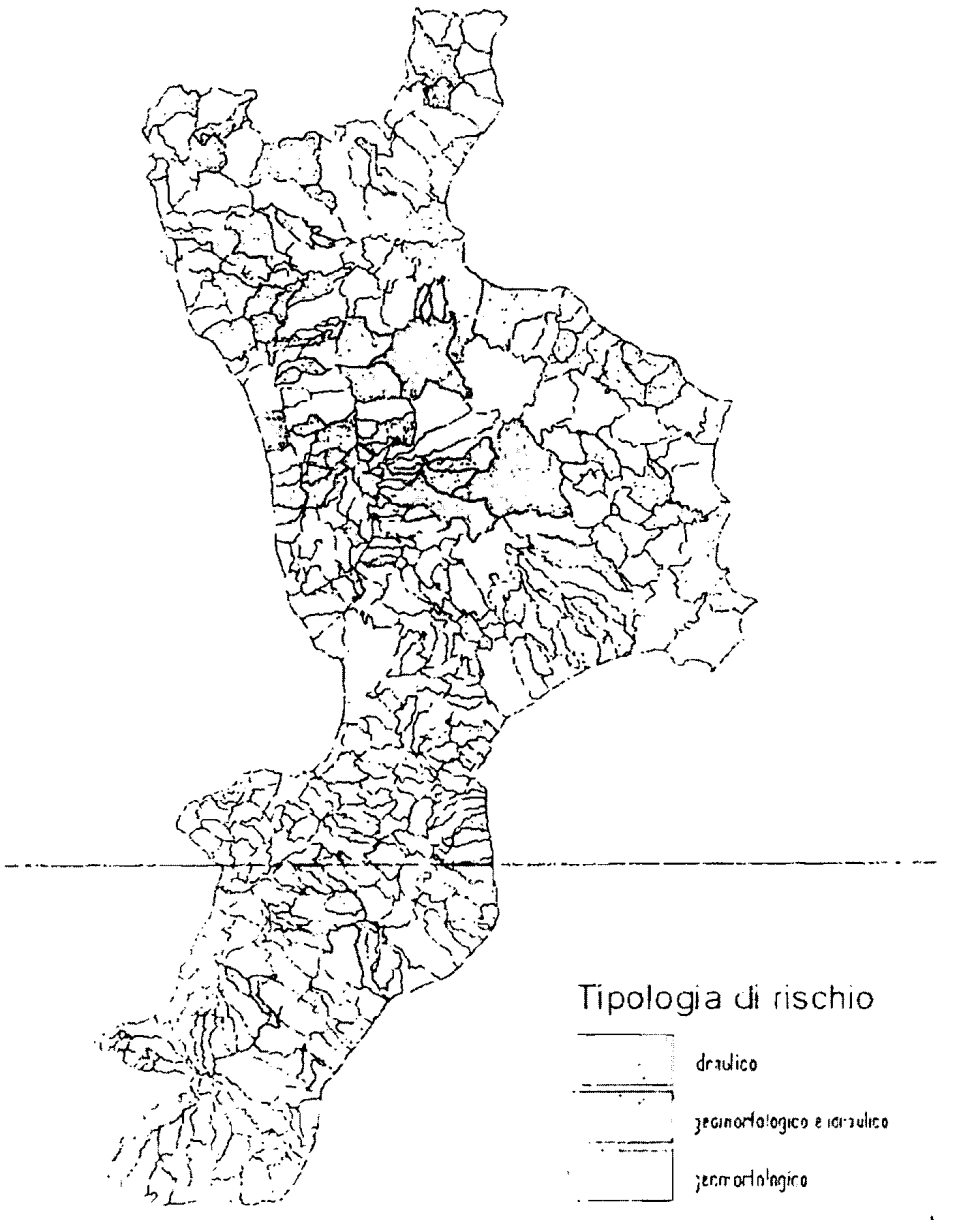

1:750000

PAGINA BIANCA

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Relazione annuale anno 2012

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 21 gennaio 2011

01/01/2013

Commissario Straordinario Delegato
Prof. ing. Giuseppe De Martino

1.1 ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

(Compilare i campi sottostanti)

Regione	CAMPANIA
Commissario straordinario delegato	Prof. ing. Giuseppe De Martino
Decreto nomina	D.P.C.M. 21 gennaio 2011
Data sottoscrizione Accordo	12/11/10
Data sottoscrizione Accordo Integrativo	Allegato 1 in data 26 aprile 2012
Importo complessivo assentito in Accordo	€ 220.000.000,00
Importo programmato per il periodo (anno 2012)	€ 35.636.870,01
Importo speso per il periodo (anno 2012)	€ 141.016,30
Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno 2012)	***€ 117.920,00***

1.2 CRICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

Descrivere il contesto in cui si inseriscono le attività commissariali a livello regionale.

Le attività commissariali interessano interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in aree classificate a rischio 'elevato' e 'molto elevato' da frane o alluvione.
La classificazionedelle aree è stata eseguita dalle Autorità di Bacino territorialmente competenti (Nazionale Liri-Garigliano e Volturno, Regionale della Campania Centrale, Regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, Regionale della Puglia e Interregonale del fiume Fortore) nell'ambito della redazione dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.
Gli interventi interessano tutte e cinque le provincie della Campania ed oltre cento comuni.

1.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

Descrivere la struttura commissariale sia dal punto di vista logistico sia come risorse umane.

Dal punto di vista logistico, la struttura commissariale è ubicata al secondo piano dell'edificio sito in Nalpoli alla via De Gasperi 28, sede degli Assessorati ai Lavori Pubblici, dell'Ambiente e del Capo Area del Settore Difesa Suolo della Regione Campania (dott. Italo Giulivo).
L'ufficio messo a disposizione del Commissario fin dal gennaio 2011, risulta costituito da due soli vani adiacenti:
- il primo, di circa 15 mq, ubicato proprio di fronte ai servizi igienici sia femminili che maschili, è adibito a studio del Commissario;

- il secondo, attiguo al precedente, di circa 12 mq, è impegnato dal marzo 2012 (nell'anno 2011 e fino a febbraio 2012, il Commissario venne aiutato a titolo grazioso da suoi ex allievi, attualmente docenti universitari) dai due collaboratori con contratto CO.CO.PRO. registrati alla Corte dei Conti Registro n. 06, Foglio 81 (CDC 14626/1012) e Foglio 82 (CDC 14627/1012).

Gli arredi, in entrambi i due vani, sono costituiti da scrivanie (una per lo studio del Commissario e due per lo studio dei collaboratori), armadi, computer di vecchio tipo, stampanti laser a solo colore nero e formato A4, due telefoni (uno in ogni stanza) e un fax.

I due collaboratori, di adeguate capacità professionali, selezionati, a seguito di avviso pubblico, da apposita Commissione costituita da tre docenti universitari, a titolo grazioso, svolgono anche le funzioni di usciere, segretari, telefonisti, redazione decreti e ordinanze, digitazione, oltre ad essere adibiti alle funzioni per le quali furono selezionati.

Lo scrivente Commissario è stato costretto a ricorrere ai due collaboratori esterni in quanto la Regione Campania, l'ARCADIS (Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo), le Autorità di Bacino ed altri enti pubblici non hanno mai ritenuto possibile affiancare al lavoro del Commissario propri dipendenti, atteso il 'sottodimensionamento del loro personale'.

Gli incontri con gli Enti (sempre numerosi e continui) si svolgono in un terzo studio (accanto a quello dei collaboratori), quando disponibile, perchè è spesso occupato dalle strutture regionali. Pertanto, più volte, il Commissario è costretto a ricevere presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell'Università di Napoli Federico II.

Spesso, per l'esame dei vari livelli progettuali ricevuti dagli enti proponenti, il Commissario è costretto a ricorrere al proprio studio professionale!

Il Commissario lavora in piena solitudine, e incontra molte difficoltà ad interagire con il Capo Area del Settore Difesa Suolo della Regione Campania, dott. Italo Giulivo (che è altresì componente del Comitato di indirizzo e Controllo).

* * *

Nonostante tutte le deficienze logistiche, il Commissario (che usa il proprio telefonino ed i mezzi pubblici a sue spese, ed acquista spesso anche la carta igienica) ritiene di avere finora svolto un ottimo lavoro, come di seguito illustrato nei successivi punti della presente nota.

Perché il Commissario accettò di fissare il proprio ufficio a via De Gasperi 28 pur se con le deficienze accennate?

Perché il suo compito prevedeva di interagire con la Regione Campania ed in particolare con il Capo Area del Settore Difesa Suolo.

Ritenne, inoltre, che i due vani assegnatigli erano solo provvisori e quindi in attesa di uffici più appropriati e dignitosi.

Purtroppo il provvisiorio è diventato definitivo e il Commissario non ritiene di fissare, ora, la sua sede di ufficio presso altro Ente pubblico, perché il trasferimento comporterebbe lavori onerosi, attesi i tanti e tanti fascicoli prodotti, le note degli enti, i progetti (originali e nelle edizioni aggiornate/integrate) e così via.

* * *

Perché il Commissario continua ad esercitare il proprio ruolo pur con le deficienze accennate?

Perché accettò la nomina solo per rendere un servizio al Paese e lo ha reso e lo rende ancora.

1.4 SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Dichiarare quanto è stato versato sulla c.s. dal Ministero dell' Ambiente, dalla Regione, o da altre fonti sia con importo corrente che cumulato, lo speso, i relativi residui.

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente			
Importo corrente (per l'anno 2012)	**Importo cumulato** (anno 2012 + precedente periodo)	**Speso**	**Residuo**
€ 20.407.094,96	€ 36.465.532,33	€ 289.081,58 *	€ 36.176.450,75

Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti (precisare)			
Importo corrente (per l'anno 2012)	**Importo cumulato** (anno 2012 + precedente periodo)	**Speso**	**Residuo**
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

1.5 ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

Indicare per ciascuna delle attività indicate nella seguente tabella il relativo stato di rendicontazione della spesa, considerando esclusivamente quanto effettivamente pagato.

Descrizione attività	**Importo speso corrente** (per l'anno 2012)	**Importo speso cumulato** (anno 2012 + precedente periodo)
struttura commissariale	€ 141.016,30	€ 289.081,58
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	€ 0,00 *	€ 0.00 *

* Si evidenzia che non è stata finora pagata alcuna progettazione, in quanto il Commissario ha collaborato con i vari enti ed ha consentito la redazione di livelli progettuali di dettaglio (preliminare, definitivo, esecutivo) per molti degli interventi che inizialemente erano dotati di progetti ancor meno che preliminare e, in numerosi casi, carenti sia dal punto di vista tecnico che normativo.

1.6 PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

Allegare il prospetto contabile riepilogativo entrate/uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.

Prospetto contabile riepilogativo entrate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 – Contabilità speciale 5586		
Data	***Entrata***	***Fonte Finanziaria***
19/09/12	€ 3.734.702,21	MATTM
28/09/12	€ 8.769.592,72	MATTM
10/12/12	€ 3.734.701,84	MATTM
10/12/12	€ 4.168.098,18	MATTM
Totale	***€ 20.407.094,95***	

Prospetto contabile riepilogativo uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 – Contabilità speciale 5586		
Data	***Uscite***	***Causale***
19/01/12	€ 31.460,00	Ordinativo n.1 e 2 del 12/01/2012 - Liquidazione compenso commissario periodo dal 01/11/11 al 31/12/11 - Decreto n. 1 del 3/01/2012
27/06/12	€ 500,00	Ordinativo n. 5 del 21/06/2012 – Fondo per le minute spese da affidare ad apposito funzionario per sostenere piccole – Decreto n. 44 del 21/06/2012
10/07/12	€ 9.000,00	Ordinativi nn. 3 e 4 del 27/06/2012 e 10/07/2012 – Pagamento del primo acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di lavoro a progetto approvato con decreto n. 8 del 2/03/2012, all'ing. Agostino Santillo – Liquidazione fattura n. 8/2012 relativa al periodo Marzo-Maggio 2012 - Decreto n. 43 del 21/06/2012
17/07/12	€ 31.460,00	Ordinativo n. 6 e 7 del 17/07/2012 – Pagamento compenso Commissario periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2012 – Decreto n. 46 del 11/07/2012
26/07/12	€ 7.500,00	Ordinativi nn. 8 e 9 del 26/07/2012 – Pagamento del primo acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di lavoro a progetto approvato con decreto n. 9 del 05/03/2012, al dott. Giovanni Palmiero – Liquidazione fattura n. 4/2012 relativa al periodo Marzo-Maggio 2012 - Decreto n. 48 del 24/07/2012
13/09/12	€ 7.663,40	Ordinativi nn. 10 e 11 del 11/09/2012 - Pagamento del secondo acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di lavoro a progetto approvato con decreto n. 9 del 05/03/2012, al dott. Giovanni Palmiero – Liquidazione fattura n. 6/2012 relativa al periodo Giugno-Agosto 2012 - Decreto n. 58 del 06/09/2012
13/09/12	€ 9.000,00	Ordinativi nn. 12 e 13 del 11/09/2012 – Pagamento del secondo acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di lavoro a progetto approvato con decreto n. 8 del 2/03/2012, all'ing. Agostino Santillo – Liquidazione fattura n. 11/2012 relativa al periodo Giugno-Agosto 2012 - Decreto n. 59 del 10/09/2012
11/10/12	€ 1.716,24	Ordinativo n. 14/2012 del 11/10/2012 - Rimborso spese sostenute dal commissario per sopralluoghi, missioni c/o ministero e spese spedizioni postali - Ordinanza n. 11 del 05/10/2011
10/12/12	€ 26.216,66	Ordinativo n. 15 e 16 del 10/12/2012 (Com/Stra IN 35/2013) – Pagamento compenso Commissario periodo dal 01/07/2012 al 30/11/2012 – Decreto n. 79 del 03/12/2012 (Com/Stra IN 35/2013)
10/12/12	€ 7.500,00	Ordinativi nn. 17 e 18 del 10/12/2012 (Com/Stra IN 35/2013) – Pagamento del terzo acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di lavoro a progetto approvato con decreto n. 9 del 05/03/2012, al dott. Giovanni Palmiero – Liquidazione fattura n. 9/2012 relativa al periodo Settembre-Novembre 2012 - Decreto n. 83 del 06/12/2012
20/12/12	€ 9.000,00	Ordinativi nn. 19 e 20 del 20/12/2012 (Com/Stra IN 35/2013) – Pagamento del terzo acconto ai sensi dell'art. 9 del contratto di lavoro a progetto approvato con decreto n. 8 del 2/03/2012, all'ing. Agostino Santillo – Liquidazione fattura n. 15/2012 relativa al periodo Settembre-Novembre 2012 - Decreto n. 85 del 11/12/2012
Totale	*€ 141.016,30*	

Nella seguente tabella si riportano le spese preventivamente autorizzate nell'anno 2012 occorrenti all'effettuazione di rilievi ed indagini propedeutici all'avanzamento delle fasi progettuali relative a particolari interventi ritenuti urgenti. Tali spese ammontano ad un totale di € 58.685,17. e saranno sostenute nell'anno 2013.

Spese autorizzate occorrenti all'effettuazione di rilievi ed indagini propedeutici all'avanzamento delle fasi progettuali

Cod. CIPE	Cod. ISTAT	Ente proponente	Comune interessato	Prov	Soggetto attuatore	Importo intervento	Indagini				Importo residuo
							Importo per indagini (Compreso IVA)	Importo per Consulenze esterne (Compreso IVA)	Richieste	Autorizzate	
39	87	Comunità Montana Vallo di Diano	San Rufo	SA	Commissario Straordinario Delegato	€ 2.723.280,00	€ 18.954,17		Com/Stra IN 332/2012	Com/Stra 347/2012	€ 2.704.325,83
57	86	Comune di San Giovanni a Piro	San Giovanni a Piro	SA	Commissario Straordinario Delegato	€ 500.000,00	€ 18.271,00		Com/Stra IN 328/2012	Com/Stra 348/2012	€ 481.729,00
15	66	Comune di Atrani	Atrani	SA	ARCADIS (Ordinanza n. 12 del 21/12/12)	€ 900.000,00	€ 9.680,00		Com/Stra IN 349/2012	Com/Stra 363/2012	€ 890.320,00
14	67	Comune di Atrani	Atrani	SA	ARCADIS (Ordinanza n. 13 del 21/12/12)	€ 2.487.667,00	€ 11.780,00		Com/Stra IN 349/2012	Com/Stra 363/2012	€ 2.475.887,00
					Importo totale autorizzato anno 2012		**€ 58.685,17**	**€ 0,00**	**€ 58.685,17**		
4	43	Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro	Cervinara	AV	Commissario Straordinario Delegato (Ente preposto alla progettazione AdB Liri Garigliano e Volturno)	€ 3.000.000,00	€ 72.600,00	€ 48.400,00	Com/Stra IN 46/2013	Com/Stra 78/2013	€ 2.879.000,00
49	93	Comune di Torre Orsaia	Torre Orsaia	SA	Commissario Straordinario Delegato	€ 9.500.000,00	€ 82.084,27		Com/Stra IN 53/2013	Com/Stra 86/2013	€ 9.417.915,73
7	94	Comune di Tramonti	Tramonti	SA	ARCADIS (Ordinanza n. 12 del 21/12/12)	€ 1.238.396,00		€ 20.927,13	Com/Stra IN 55/2013	Com/Stra 90/2013	€ 1.217.468,87
					Importo totale autorizzato anno 2013		**€ 154.684,27**	**€ 69.327,13**	**€ 224.011,40**		
					Totale Generale		**€ 213.369,44**	**€ 69.327,13**	**€ 282.696,57**		

1.7 STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

1.7.1 Descrizione delle attività

Descrivere le attività prodotte sia a livello centrale dal commissario, sia a livello locale degli enti realizzatori e rilevare gli eventuali ritardi/criticità rispetto al cronoprogramma delle attività per il periodo di riferimento.

Ai successivi punti da 1 a 74 è sintetizzata l'attività svolta dal Commissario nell'anno 2012.

1. In data 19 novembre 2012 il Commissario sollecitava la convocazione del Comitato di Indirizzo e Controllo, già richiesta con nota in data 21/09/2012, d'intesa con il dott. Giulivo, al Direttore Generale Maurizio Pernice e p.c. all'Ispettore Generale ing. Mauro Luciani.

Al 31 dicembre 2012, il Comitato non si è riunito.

2. Partecipazione al 'Gruppo tecnico di sorveglianza', richiesto dal Commissario, che ha avuto luogo a Roma il 4 dicembre 2012, presso il 'Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale' del Ministero dello Sviluppo Economico.

Durante la riunione, presieduta dal Direttore Generale, dott. Vincenzo Donato, presenti la dott.ssa Labonia, la dott.ssa Mattei Gentili, il dott. Giulivo e il Commissario, sono stati discussi alcuni aspetti relativi agli interventi previsti nella Delibera CIPE.

In data 21/12/2012 il Commissario Straordinario trasmetteva al dott. Donato il pro-memoria di quanto discusso.

Al 31 dicembre 2012 non si è avuta alcuna risposta. Pertanto, il Commissario si ritiene autorizzato ad anticipare le spese occorrenti all'effettuazione di rilievi ed indagini propedeutici all'avanzamento delle fasi progettuali relative a particolari interventi ritenuti urgenti.

3. Con nota in data 28/12/2012 è stato trasmesso al dott. Antonio Strambaci Scarcia e alla Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili, l'aggiornamento del quadro relativo allo stato finanziario e la tabella aggiornata relativa agli impegni assunti con copertura finanziaria disponibile nonché quella relativa agli interventi subordinati a disponibilità finanziaria.

4. Allo scopo di sensibilizzare i giovani studenti delle Facoltà di Ingegneria, i soci dell'Associazione Idrotecnica Italiana, nonché i tecnici che operano nel vasto campo delle costruzioni idrauliche e in particolare in quello degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (che tra quelli ambientali e territoriali è di certo il più frequente in termini spazio temporali ed è anche, ovviamente dopo i terremoti, quello che comporta conseguenze catastrofiche per quanto riguarda i danni, i costi e soprattutto le vittime), il sottoscritto Commissario ha inteso promuovere iniziative per incontri tecnici, invitando docenti a soffermarsi su varie tematiche afferenti al rischio idrogeologico. All'uopo, sono stati organizzati tre convegni: due nelle Facoltà di Ingegneria dell'Università di Napoli "Federico II" (13 maggio 2012 e il 14 giugno 2012) e uno presso l'Università del Sannio.

• • •

5. Come già comunicato nella precedente relazione annuale, si riporta, al fine di agevolare i riscontri successivi, lo stato progettuale per i 97 interventi (di cui n. 34 su FAS Statali, n. 23 su FAS Regionali, e n. 40 su bilancio gestionale regionale) desunto dall'Allegato 1 all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania:

- Stima dei costi – SC – n. 59,
- Studio di fattibilità – SF – n. 14,
- Progetto preliminare – PP – N. 14,
- Progetto definitivo – PD – N. 3,
- Progetto esecutivo – PE – n. 7

In numerosi casi la documentazione esistente trasmessa dagli enti presentava un livello progettuale differente da quello riportato nell'Allegato 1.

6. Non c'era sempre corrispondenza tra l'ente proponente riportato nell'Allegato 1 e quello effettivo.

7. Nell'Allegato 1 non sempre è riportato il livello di rischio (manca in n. 36 interventi) e la tipologia di fenomeno (manca in n. 5 interventi).

• • •

8. Dall'utilizzo del sistema di protocollo definito in uscita (Com/Stra num/anno) ed in ingresso (Com/Stra IN num/anno), risulta che nell'anno 2012 sono stati protocollati in uscita 371 documenti, ed acquisiti 344.

• • •

9. Partecipazione al Comitato di Indirizzo e di Controllo, il 26/04/2012 (espressamente richiesto da Commissario), presso il Ministero dell'Ambiente e di Tutela del Territorio e del Mare.

10. Con Deliberazione del 20 gennaio 2012 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012, la copertura finanziaria del fabbisogno occorrente per attuare i 57 interventi (previsti nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma con fonte finanziaria FAS), è assicurata con € 19.793.139,59 di risorse disponibili, e con le seguenti assegnazioni per il fabbisogno residuo:

- € 16.672.392,74 a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- € 75.534.467,67 fondi Riduzione PAIN;
- € 94.244.309,65 fondi PAR;

mentre i restanti 40 interventi di cui all'Allegato 1 al citato Accordo di Programma sono previsti con fondi Regionali (residui ex leggi: n. 183/89, n. 267/89, n. 179/02 e cap 1137 Bilancio Gestionale) per un importo pari a € 15.755.690,35.

Nonostante vari solleciti, al 31 dicembre 2012 la Regione Campania non ha ancora reso disponibile al Commissario alcuna risorsa.

11. Partecipazione al tavolo di concertazione sulle problematiche connesse alla difesa dal dissesto idrogeologico della strada amalfitana, tenutosi in data 5 giugno 2012 presso gli uffici del Settore Difesa Suolo della Regione Campania, alla presenza di Comuni interessati, ANAS, Vice Prefetto, Settore Difesa Suolo Regione Campania, Autorità di bacino Destra Sele.

12. Relatore, su invito della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, nel seminario tenutosi a Roma il 2 luglio 2012 dal titolo 'I piani straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico'.

13. Incontro a Roma il 9 agosto 2012, con il Ministro Clini presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

14. Incontri il 30 agosto e 20 settembre 2012 con il Direttore dell'Ispettorato Generale ing. Mauro Luciani, presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

15. Incontro con l'ing. Guerci ed altri funzionari dell'UVER, presso la sede della Regione Campania il 25/09/2012 e presso la sede del Comune di Furore (SA), in data 26/09/2012, per la verifica sull'attuazione dell'intervento di cui al n. 8 della Delibera CIPE n.8/2012 del 20/01/2012 (n. 76 dell'Allegato 1 all'AdP).

• • •

16. Incontri con i Commissari Straordinari delegati per altre Regioni, a Napoli e a Roma (più volte).

• • •

17. Contatti con l'Ufficio di Controllo Legittimità per contratti CO.CO.PRO..

• • •

18. Sono stati effettuati gli incontri con i seguenti Enti:

Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici (geol. Italo Giulivo, Dirigente) (più volte);

Regione Campania, Assessorato ai Lavori Pubblici (prof. ing. Edoardo Cosenza) (più volte);

Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno (dott.ssa Corbelli, ing. Velardo, geol. Capasso (più volte);

Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale (ing. Marrazzo) (più volte);

Autorità di Bacino Regionale Campania Sud e Interregionale del Fiume Sele (avv. Sorvino, geol. Grimaldi, Geol. Minotta, ing. Romano) (più volte);
Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (più volte);
Regione Campania settore Ciclo Integrato delle Acque (ing. Martone);
Regione Campania settore Difesa Suolo (geol. Esposito);
Provveditorato Opere Pubbliche Regione Campania (ing. Guglielmi, Provveditore);
Provincia di Benevento;
Società Sannio Ambiente e Territorio (SAMTE);
Genio Civile di Avellino (più volte);
Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro;
Comune di Andretta (AV) (più volte);
Comune di Ascea (SA);
Comune di Battipaglia (SA);
Comune di Buonalbergo (BN) (più volte);
Comune di Campagna (SA);
Comune di Celle di Bulgheria (SA);
Comune di Centola (SA);
Comune di Contursi Terme (SA);
Comune di Mercogliano (AV) (più volte);
Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV);
Comune di Ottaviano (NA);
Comune di Perdifumo (SA);
Comune di Pisciotta (SA);
Comune di Roccarainola (NA);
Comune di Sala Consilina (SA);
Comune di San Giovanni a Piro (SA);
Comune di Torre Orsaia (SA);
Comune di Tramonti (SA).

• • •

19. Contatti con il Provveditorato delle Opere Pubbliche delle Regioni Campania e Molise,

• • •

20. Sono stati eseguiti vari sopralluoghi su larga scala nonchè puntuali nei comuni interessati dagli interventi riportati nell'Allegato 1 (si riportano i numeri identificativi degli interventi riportati nella Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012):
Comune di Salerno (SA), intervento n. 56, in data 26.03.2011;
Comune di Battipaglia (SA), interventi nn. 54 e 55, in data 26.03.2011;
Comune di Ascea (SA), intervento n. 45, in data 23.08.2012;
Comune di Centola (SA), intervento n. 43, in data 23.08.2012;
Comune di Tramonti (SA), intervento n. 7, in data 25.09.2012;
Comune di Furore (SA), intervento n. 8, in data 26.09.2012;
Comune di Pisciotta (SA), intervento n. 40, in data 17.10.2012.

21. Nel contempo, sono stati esaminati preliminarmente, dal sottoscritto Commissario e da suoi collaboratori, gli studi/progetti e redatte le relative note di sintesi degli interventi proposti dai seguenti Enti (si riportano i numeri identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma):

- ARCADIS, progetto preliminare interventi nn. 64 e 96 (e successivo aggiornamento);
- Provincia di Benevento, progetto esecutivo int. 23 (verifica economica);
- Autorità di Bacino Destra Sele, progetto preliminare int. n. 95 (e successivo aggiornamento);
- Genio Civile di Benevento, progetto preliminare interventi nn. 10, 16, 18 e 22;
- Genio Civile di Ariano Irpino, studio di fattibilità intt. nn. 38, 42, 44,46 e 52; progetto preliminare intervento n. 44;

- Genio Civile di Avellino, progetto definitivo int. n. 61 (e successivo aggiornamento); progetto definitivo interventi nn. 48 e 53; progetto esecutivo int. n. 47 (aggiornamento);
- Genio Civile di Benevento, progetto preliminare interventi nn. 10, 16, 18 e 22 (aggiornamenti);
- Comune di Baselice (BN), progetto definitivo intervento n. 8 (e successivo aggiornamento);
- Comune di Buonalbergo, progetto definitivo int. n. 9 (aggiornato a seguito del parere del CTA del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania e del Molise);
- Comune di Campagna (SA), progetto preliminare int. n. 72 (aggiornamento);
- Comune di Casalbore, progetto preliminare int. n. 41;
- Comune di Contursi Terme, progetto preliminare int. n. 75;
- Comune di Mercogliano (AV), progetto preliminare int. n. 49;
- Comune di Monteforte Irpino (AV), progetto preliminare int. n. 50 (e successivo aggiornamento);
- Comune di Novi Velia (SA), progetto preliminare int. n. 80;
- Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV), progetto preliminare int. n. 51;
- Comune di Padula, progetto preliminare int. n. 81 (e successivo aggiornamento);
- Comune di Perdifumo (SA), progetto preliminare int. 82;
- Comune di Piedimonte Matese, progetto esecutivo int. n. 4 (aggiornamento);
- Comune di Salerno, progetto preliminare int. n. 85;
- Comune di San Giovanni a Piro (SA), progetto preliminare int. n. 86 (e successivo aggiornamento);
- Comune di Torre Orsaia (SA), progetto preliminare int. n. 93;
- Comune di Tramonti (SA), progetto definitivo int. n. 94.

22. Per i seguenti interventi (nel numero complessivo di 6, di cui 5 aventi quali ente proponente il Genio Civile di Napoli), gli enti, anche a seguito di ulteriore sollecito da parte dello scrivente, non hanno ancora provveduto alla trasmissione di alcuna documentazione o non hanno comunicato informazioni in merito (si riportano i codici identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'AdP):

- int. nn. 28, 32, 33, 35 e 36, Ente proponente 'Genio Civile di Napoli': l'Ente non ha ancora trasmesso alcuna documentazione;
- int. n. 74, Ente proponente 'Comune di Centola': l'Ente non ha trasmesso al 31 dicembre 2012 alcuna documentazione, nonostante numerosi solleciti.

Il Comune di Centola ha almeno richiesto, ed ottenuto, un incontro con il Commissario.

La negligenza del Genio Civile di Napoli è stata segnalata anche al Presidente della Giunta Regionale della Campania (dott. Stefano Caldoro), all'Assessore ai LL.PP. della Regione Campania (prof. Edoardo Cosenza) e al Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici (geol. Italo Giulivo).

23. Agli enti che hanno provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, successivamente esaminata, sono state comunicate le risultanze dell'esame preliminare effettuato dal sottoscritto e dai suoi collaboratori, principalmente conclusosi con la richiesta di aggiornamento/correzione/integrazione degli elaborati ai dettami delle seguenti norme e ordinanze:

- DPR 207/2010;
- D.Lgs. 81/2008;
- Ordinanza Commissariale n. 1 (con cui i prezzi unitari di riferimento per l'aggiornamento della stima dei lavori sono individuati sulla base dei prezzi unitari del Prezzario Regionale della Campania anno 2010, con l'applicazione del ribasso del 20%).

24. Sono state preliminarmente esaminate nuove richieste di inserimento al finanziamento, pervenute alla Regione Campania e trasmesse per conoscenza al Commissario.

25. È stata eseguita la verifica tecnica dei progetti relativi ai seguenti interventi:

- progetto esecutivo intervento n. 37 dell'Allegato 1 all'AdP (n. 51 della Delibera CIPE n. 8/2012 - Comune di Andretta);
- progetto esecutivo intervento n. 38 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Ariano Irpino - Comune di Ariano Irpino);

- progetto esecutivo intervento n. 44 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Ariano Irpino - Comune di Fontanarosa);
- progetto esecuto intervento n. 45 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Avellino – Comune di Forino);
- progetto esecutivo intervento n. 46 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Ariano Irpino - Comune di Grottaminarda);
- progetto esecuto intervento n. 47 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Avellino – Comune di Lacedonia);
- progetto esecutivo intervento n. 52 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Ariano Irpino - Comune di Montecalvo Irpino);
- progetto esecutivo intervento n. 57 dell'Allegato 1 all'AdP (Genio Civile di Ariano Irpino - Comune di Pratola Serra);
- progetto esecuto intervento n. 94 dell'Allegato 1 all'AdP (n. 7 della Delibera CIPE n. 8/2012 - Comune di Tramonti).

• • •

26. Con Decreto n. 5 del 26 gennaio 2012, pubblicato in data 26/01/2012 sul S.I.T.A.R. Regione Campania e sul B.U.R.C. n. 7 del 30 gennaio 2012, sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa delle candidature relative all'avviso "Monitoraggio ed elaborazioni informatiche di supporto al Commissario straordinario relative agli interventi dell'Accordo di Programma", da cui è risultato vincitore l'ing. Agostino Santillo.

27. In data 2 febbraio 2012 lo scrivente ha richiesto alla 'Corte dei Conti - Ufficio di Controllo sui Ministeri Istituzionali', di esprimere il parere sul controllo preventivo di legittimità per il bando da cui è risultato vincitore l'ing. Agostino Santillo, trasmettendo i seguenti atti:

- D.P.C.M. 21 gennaio 2011 di nomina del Commissario
- regolamento per il conferimento di incarichi in data 5 ottobre 2011
- decreto commissariale n. 1 del 10 ottobre 2011, di approvazione del regolamento
- atti trasmessi alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Napoli, in data 11 novembre 2011
- D.P.C.M. integrativo registrato alla Corte dei Conti in data 16 novembre 2011
- risposta della Corte dei Conti, in data 18 novembre 2011
- decreto commissariale n. 10 del 29 dicembre 2011, di nomina della commissione esaminatrice
- procedura della commissione, terminata in data 20 gennaio 2012
- decreto commissariale n. 5 del 26 gennaio 2012, di approvazione degli atti della commissione.

28. Con Decreto n. 7 del 14 febbraio 2012, pubblicato in data 14/02/2012 sul S.I.T.A.R. Regione Campania e sul B.U.R.C. n. 12 del 20 febbraio 2012, sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa delle candidature relative all'avviso "Monitoraggio tecnico e amministrativo di supporto al Commissario Straordinario delegato", da cui è risultato vincitore il dott. Giovanni Palmiero.

29. Con Decreto n. 8 del 2 marzo 2012, è stato approvato il contratto di lavoro a progetto firmato in data 01.03.2012 tra il Commissario e l'ing. Agostino Santillo.

30. Con Decreto n. 9 del 5 marzo 2012, è stato approvato il contratto di lavoro a progetto firmato in data 01.03.2012 tra il Commissario e il dott. Giovanni Palmiero.

31. In data 21/06/2012 l'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, ha comunicato che:

- il contratto di lavoro a progetto del dott. Giovanni Palmiero - CDC 14626/2012 è stato registrato al Registro n. 06 – Foglio n. 81 in data 05/06/2012;
- il contratto di lavoro a progetto dell'ing. Agostino Santillo - CDC 14627/2012 è stato registrato al Registro n. 06 – Foglio n. 82 in data 05/06/2012.

• • •

32. Con Decreto n. 6 del 2 febbraio 2012 sono specificate le modalità con cui '*individuare, nei casi ritenuti opportuni e/o necessari, gli enti attuatori e gli enti avvalsi per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 al citato Accordo di Programma da effettuare nel territorio della Regione Campania*'.

• • •

33. Nel mese di giugno 2012 è stato predisposto e trasmesso al dott. Pernice l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma, con cui '*il Commissario straordinario delegato è autorizzato a disporre, nell'ambito delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale ed a valere sulle economie dell'attuazione del programma, di un adeguato fondo base dell'importo di 500.000 euro, da utilizzare quale anticipazione delle somme necessarie per il sostenimento delle spese per l'effettuazione di rilievi ed indagini propedeutiche all'avanzamento delle fasi progettuali relative a particolari interventi ritenuti urgenti, nonché per la eventuale verifica dei progetti nei casi in cui non possa essere eseguita dall'ufficio tecnico dell'ente proponente (di cui al comma 2 art. 47 del D.P.R. 207/2010), nelle more delle previste assegnazioni CIPE per la realizzazione dei 57 interventi previsti nella Regione Campania*'. Poiché il Ministero dell'Ambiente e la Corte dei Conti non hanno effettuato alcun riscontro, il Commissario Straordinario Delegato si è sentito autorizzato ad istituire il predetto fondo di € 500.000,00 da utilizzare quale anticipazione delle somme occorrenti all'effettuazione di rilievi ed indagini propedeutici all'avanzamento delle fasi progettuali relative a particolari interventi ritenuti urgenti.

• • •

34. Sono stati individuati i soggetti attuatori per gli interventi di cui ai seguenti interventi:
- n. 16 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 96 dell'Allegato 1 all'AdP): ARCADIS con Ordinanza n. 1 del 6 febbraio 2012
- n. 1 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 5 dell'Allegato 1 all'AdP): ARCADIS con Ordinanza n. 2 del 7 febbraio 2012
- n. 2 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 6 dell'Allegato 1 all'AdP): ARCADIS con Ordinanza n. 3 dell'8 febbraio 2012
- n. 3 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 24 dell'Allegato 1 all'AdP): Regione Campania Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, con Ordinanza n. 4 del 9 febbraio 2012
- n. 6 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 71 dell'Allegato 1 all'AdP): ARCADIS con Ordinanza n. 5 del 21 marzo 2012
- n. 5 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 64 dell'Allegato 1 all'AdP): ARCADIS con Ordinanza n. 6 del 22 marzo 2012

• • •

35. A seguito della comunicazione dell'Autorità di Bacino Interregionale Fortore (ente proponente dell'intervento n. 8 di cui all'Allegato 1 all'Accordo di Programma) che rimetteva alla Regione Campania il suddetto intervento ed alla successiva comunicazione del Comune di Baselice che si attivava per le fasi progettuali, con Decreto Commissariale n. 32 del 4 giugno 2012 è stato nominato il Comune di Baselice ente preposto alla progettazione dell'int. n. 8;

36. A seguito della dichiarazione della Comunità Montana Calore Salernitano (ente proponente dell'intervento n. 88 di cui all'Allegato 1 all'Accordo di Programma) relativa alla mancanza di elaborati progettuali, ed alla successiva disponibilità dell'Autorità di Bacino Interregionale Sele, con Decreto Commissariale n. 33 del 5 giugno 2012 è stata nominata l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele ente preposto alla progettazione dell'int. n. 88.

37. A seguito della comunicazione della Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro della impossibilità di procedere alla progettazione dell'intervento n. 4 della Delibera CIPE (n. 43 dell'Allegato 1 all'AdP) con risorse del proprio ufficio tecnico e della disponiblità dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno che qualora la Comunità Montana '*non fosse in grado di adempiere al proprio incarico con risorse professionali interne e senza il supporto di professionisti esterni all'Amministrazione*', si rendeva disponibile alla progettazione definitiva dell'intervento, con Decreto Commissariale n. 53 del 2 agosto 2012 è stata nominata l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno soggetto deputato alla progettazione dell'int. n. 4 della Delibera CIPE;

38. A seguito della comunicazione del Comune di Carbonara di Nola (NA) di essere disponibile a progettare l'intervento n. 33 della Delibera CIPE (n. 25 dell'Allegato 1 all'AdP), senza il supporto di tecnici esterni, ed il relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale, con Decreto Commissariale n. 55 del 10 agosto 2012 è stato nominato il Comune di Carbonara di Nola (NA) soggetto deputato alla progettazione dell'int. n. 33 della Delibera CIPE;

39. A seguito della comunicazione del Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV) di essere disponibile a progettare l'intervento n. 34 della Delibera CIPE (n. 55 dell'Allegato 1 all'AdP), senza il supporto di tecnici esterni, ed il relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale, con Decreto Commissariale n. 56 del 10 agosto 2012 è stato nominato il Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV) soggetto deputato alla progettazione dell'int. n. 34 della Delibera CIPE;

40. A seguito della comunicazione del Comune di Roccarainola (NA) di essere disponibile a progettare l'intervento n. 25 della Delibera CIPE (n. 34 dell'Allegato 1 all'AdP), senza il supporto di tecnici esterni e con il supporto di funzionari dell'Autorità di Bacino, ed il relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale, con Decreto Commissariale n. 61 del 20 settembre 2012 è stato nominato il Comune di Roccarainola (NA) soggetto deputato alla progettazione dell'int. n. 25 della Delibera CIPE;

41. Poichè nel corso del tavolo di concertazione tenutosi in data 5 giugno 2012 ed avente ad oggetto *"S.S.163 Amalfitana. Problematiche dei crolli dai costoni rocciosi"*, il Sindaco del Comune di Furore ha evidenziato *"l'impossibilità di poter procedere all'aggiornamento della progettazione definitiva in parola, stante la carenza di personale dell'Amministrazione comunale"*, e l'Autorità di Bacino Campania Sud si è resa disponibile '*anche a supportare gli altri Enti per risolvere le problematiche di dissesto idrogeologico nel proprio territorio di competenza*', con Decreto Commissariale n. 62 del 21 settembre 2012 è stata nominata l'Autorità di Bacino Campania Sud soggetto deputato alla progettazione dell'int. n. 8 della Delibera CIPE (n. 76 dell'Allegato 1 all'AdP).

42. A seguito della comunicazione del Comune di Castellammare di Stabia (NA) di essere disponibile a progettare l'intervento n. 21 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 27 dell'Allegato 1 all'AdP), senza il supporto di tecnici esterni, ed al relativo nulla-osta comunicato dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale, con Decreto Commissariale n. 82 del 4 dicembre 2012 è stato nominato il Comune di Castellammare di Stabia (NA) ente preposto alla progettazione dell'int. n. 21 della Delibera CIPE.

• • •

43. Sono stati nominati i Responsabili del Procedimento dei seguenti interventi, con riferimento al n. Progr. Cod. ISTAT dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma:

- int. n. 95, RUP arch. Giuseppe Grimaldi - Decreto n. 3 del 17 gennaio 2012;
- int. n. 24, RUP ing. Manlio Martone - Decreto n. 4 del 19 gennaio 2012;
- int. n. 53, RUP dott. geol. Antonio Pasquale Iuliano - Decreto n. 12 del 26 aprile 2012;
- int. n. 56, RUP geom. Antonio Picone - Decreto n. 13 del 27 aprile 2012;
- int. n. 10, RUP arch. Domenico Itri - Decreto n. 16 del 7 maggio 2012;
- int. n. 16, RUP arch. Giuseppe Di Martino - Decreto n. 17 del 7 maggio 2012;
- int. n. 18, RUP arch. Giuseppe Di Martino - Decreto n. 18 del 7 maggio 2012;
- int. n. 22, RUP arch. Giuseppe Di Martino - Decreto n. 19 del 7 maggio 2012;
- int. n. 48, RUP ing. Rocco Orlando - Decreto n. 25 del 23 maggio 2012;
- int. n. 61, RUP ing. Antonio Ettore Pasquale - Decreto n. 26 del 23 maggio 2012;
- int. n. 96, RUP ing. Rosario Manzi - Decreto n. 31 del 29 maggio 2012;
- int. n. 8, RUP dott. Leonardo Bianco - Decreto n. 32 del 4 giugno 2012;
- int. n. 38, RUP ing. Nicola Dotolo - Decreto n. 36 dell'8 giugno 2012;
- int. n. 44, RUP ing. Nicola Dotolo - Decreto n. 37 dell'8 giugno 2012;
- int. n. 46, RUP ing. Nicola Dotolo - Decreto n. 38 dell'8 giugno 2012;
- int. n. 52, RUP ing. Nicola Dotolo - Decreto n. 39 dell'8 giugno 2012;
- rimozione del RUP dell'int. n. 9 - Decreto Commissariale n. 47 del 12 luglio 2012;
- int. n. 50, RUP geom. Carlo Cobucci - Decreto n. 50 del 26 luglio 2012;
- int. n. 43, RUP geol. Gennaro Capasso - Decreto n. 57 del 30 agosto 2012;
- int. n. 55, RUP arch. Luigi Scafuro - Decreto n. 60 dell'11 settembre 2012;
- int. n. 94, RUP ing. Mario Gaeta - Decreto n. 63 del 28 settembre 2012;
- int. n. 9, RUP ing. Mario Gaeta - Decreto n. 64 del 28 settembre 2012;
- int. n. 64, RUP ing. Mario Gaeta - Decreto n. 65 del 28 settembre 2012;
- int. n. 57, RUP geom. Pierluigi Miele - Decreto n. 66 dell'1 ottobre 2012;
- int. n. 72, RUP ing. Giambattista Cosentino - Decreto n. 69 del 12 ottobre 2012;

- int. n. 76, RUP geol. Crescenzo Minotta - Decreto n. 70 del 12 ottobre 2012;
- sostituzione del RUP int. 76, RUP ing. Elsabetta Romano - Decreto n. 72 del 13 novembre 2012;
- int. n. 41, RUP geom. Maria Lucia Ranaldo - Decreto n. 73 del 13 novembre 2012;
- int. n. 69, RUP arch. Fausto Dragonetti - Decreto n. 75 del 19 novembre 2012;
- int. n. 70, RUP arch. Fausto Dragonetti - Decreto n. 76 del 19 novembre 2012;
- int. n. 34, RUP arch. Fausto Dragonetti - Decreto n. 77 del 20 novembre 2012;
- int. n. 37, RUP geom. Luigi Scanzano - Decreto n. 78 del 27 novembre 2012;
- int. n. 82, RUP ing. Angelo Malandrino - Decreto n. 80 del 3 dicembre 2012;
- int. n. 25, RUP arch. Umberto Sibilla - Decreto n. 84 dell'11 dicembre 2012;
- int. n. 49, RUP ing. Vincenzo Morisco - Decreto n. 86 del 17 dicembre 2012.

• • •

44. Nel mese di gennaio 2012 è stato richiesto al Provveditore Interregionale OO.PP. Campania-Molise, il parere da parte del C.T.A. sul progetto definitivo redatto dal Comune di Buonalbergo (Intervento n. 9). Il C.T.A. ha esaminato il progetto definitivo nella seduta del 23 febbraio 2012, rilasciando parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni, come da comunicazione del sottoscritto in data 30.03.2012.

• • •

45. Sono stati approvati i progetti preliminari dei seguenti interventi(si riportano i codici identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'AdP):

- int. n. 53 (interessante il Comune di Montemiletto (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 24.000,00 - Decreto n. 14 del 30 aprile 2012;
- int. n. 56 (interessante il Comune di Paternopoli (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 70.000,00 - Decreto n. 15 del 2 maggio 2012;
- int. n. 10 (interessante il Comune di Colle Sannita (BN) ed avente il Genio Civile di Benevento quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 90.000,00 - Decreto n. 20 del 9 maggio 2012;
- int. n. 16 (interessante il Comune di Pannarano (BN) ed avente il Genio Civile di Benevento quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 125.000,00 - Decreto n. 21 del 10 maggio 2012;
- int. n. 18 (interessante il Comune di Pietraroja (BN) ed avente il Genio Civile di Benevento quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 150.000,00 - Decreto n. 22 dell'11 maggio 2012;
- int. n. 22 (interessante il Comune di San Nicola Manfredi (BN) ed avente il Genio Civile di Benevento quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 50.000,00 - Decreto n. 23 del 14 maggio 2012;
- int. n. 95 (interessante i Comuni di Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Positano (SA) ed avente l'Autorità di Bacino Campania Sud e Interregionale Fiume Sele quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 5.566.387,90 - Decreto n. 24 del 15 maggio 2012;
- int. n. 48 (interessante il Comune di Lioni (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 662.500,00 - Decreto n. 27 del 24 maggio 2012;
- int. n. 61 (interessante il Comune di Santo Stefano del Sole (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 723.000,00 - Decreto n. 28 del 24 maggio 2012;
- int. n. 38 (interessante il Comune di Ariano Irpino (AV) ed avente il Genio Civile di Ariano Irpino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 91.204,31 - Decreto n. 40 dell'11 giugno 2012;
- int. n. 46 (interessante il Comune di Grottaminarda (AV) ed avente il Genio Civile di Ariano Irpino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 74.356,99 - Decreto n. 41 dell'11 giugno 2012;

- int. n. 52 (interessante il Comune di Montecalvo Irpino (AV) ed avente il Genio Civile di Ariano Irpino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 182.537,02 - Decreto n. 42 dell'11 giugno 2012;
- int. n. 96 (interessante i Comuni di San Felice a Cancello, Quindici, Bracigliano, Sarno e Siano ed avente l'ARCADIS quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 1.476.000,00 - Decreto n. 45 del 26 giugno 2012;
- int. n. 44 (interessante il Comune di Fontanarosa (AV) ed avente il Genio Civile di Ariano Irpino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 148.690,78 - Decreto n. 49 del 26 luglio 2012;
- int. n. 93 (interessante il Comune di Torre Orsaia (SA) ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 7.467.086,34 - Decreto n. 52 del 2 agosto 2012;
- int. n. 86 (interessante il Comune di San Giovanni a Piro (SA) ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 500.000,00 - Decreto n. 67 del 2 ottobre 2012;
- int. n. 72 (interessante il Comune di Campagna (SA) ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 1.446.080,00 - Decreto n. 71 del 23 ottobre 2012;
- int. n. 82 (interessante il Comune di Perdifumo (SA) ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 1.119.596,45 - Decreto n. 81 del 4 dicembre 2012.

46. Sono stati approvati i progetti definitivi dei seguenti interventi(si riportano i codici identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'AdP):

- int. n. 45 (interessante il Comune di Forino (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 656.735,64 - Decreto n. 2 del 3 gennaio 2012;
- int. n. 47 (interessante il Comune di Lacedonia (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 167.500,00 - Decreto n. 10 del 13 marzo 2012;
- int. n. 9 (interessante il Comune di Buonalbergo (BN) ed avente lo stesso Comune quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 5.217.152,27 - Decreto n. 35 dell'8 giugno 2012.

47. Sono stati approvati i progetti esecutivi dei seguenti interventi(si riportano i codici identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'AdP):

- int. n. 45 (interessante il Comune di Forino (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 656.735,64 - Decreto n. 34 del 7 giugno 2012;
- int. n. 47 (interessante il Comune di Lacedonia (AV) ed avente il Genio Civile di Avellino quale ente proponente), per l'importo complessivo di € 167.500,00 - Decreto n. 54 del 6 agosto 2012.

48. Con Decreto Commissariale n. 11 del 3 aprile 2012 è stata approvata la perizia di variante, in linea tecnica ed economica, dell'intervento n. 3 della Delibera CIPE n. 8/2012 (n. 24 dell'Allegato 1 all'AdP), avente quale ente proponente il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile della Regione Campania.

• • •

49. Ai fini del monitoraggio RENDIS, sono state comunicate all'ISPRA, tramite le modalità telematiche del sistema ReNDiS-web, le seguenti informazioni (si riportano i codici identificativi degli interventi riportati nell'Allegato 1 all'AdP): decreto di nomina dei R.U.P. degli interventi 8, 9, 10, 16, 18, 22, 24, 25, 34, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 61, 64, 69, 70, 72, 76, 82, 86, 93, 94, 68 e 96; decreto di approvazione di progetti preliminari degli interventi 10, 16, 18, 22, 38, 44, 46, 48, 52, 53, 56, 61, 72, 82, 86, 93, 95 e 96; decreto di approvazione dei progetti definitivi degli interventi 9 e 47; decreto di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi 45 e 47; decreto di approvazione della perizia di variante dell'intervento 24; comunicazione dei CUP dei 57 interventi di cui alla Delibera n. 8/2012 del CIPE del 20 gennaio 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012), nonché i CUP degli interventi 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 38, 44, 46, 52, 45, 47, 48, 53, 56 e 61.

• • •

50. Con Decreto Commissariale n. 43 del 21 giugno 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 30.000,00, per l'anno 2012, per il pagamento del collaboratore ing. Agostino Santillo;

51. Con Decreto Commissariale n. 44 del 21 giugno 2012 è stato costituito un fondo per le minute spese (€ 500,00), per la cui gestione è stato incaricato il dott. Vincenzo Forte funzionario ARCADIS.

52. Con Decreto Commissariale n. 48 del 24 luglio 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 25.000,00, per l'anno 2012 (da marzo a dicembre), per il pagamento del collaboratore CO.CO.PRO. dott. Giovanni Palmiero, ed è stato disposto il pagamento del primo acconto per un importo complessivo di € 7.500 (trimestre marzo-maggio 2012);

53. Con Decreto Commissariale n. 58 del 6 settembre 2012, è stato disposto il pagamento del secondo acconto del collaboratore CO.CO.PRO. dott. Giovanni Palmiero, per un importo complessivo di € 7.500 (trimestre giugno-agosto 2012);

54. Con Decreto Commissariale n. 59 del 10 settembre 2012, è stato disposto il pagamento del secondo acconto del collaboratore CO.CO.PRO. ing. Agostino Santillo, per un importo complessivo di € 9.000 (trimestre giugno-agosto 2012).

55. Con Decreto Commissariale n. 74 del 13 novembre 2012, è stata disposta la sostituzione dell'incaricato alla gestione del fondo per le minute spese; la nuova figura è stata individuata nella persona della Dott.ssa Sabrina Armentano, componente della struttura di missione "APQ Commissario Straordinario D.P.C.M. 21.01.2011" con scadenza il 31/12/2012' nominata con Deteminazione del Commissario ARCADIS n. 0545 del 25/10/2012.

56. Con Decreto Commissariale n. 79 del 3 dicembre 2012, è stato disposto il pagamento della somma complessiva a favore del Commissario, per il periodo 1 luglio – 30 novembre 2012, per un importo lordo pari ad €. 26.216,66.

57. Con Decreto Commissariale n. 83 del 6 dicembre 2012, è stato disposto il pagamento del terzo acconto del collaboratore CO.CO.PRO. dott. Giovanni Palmiero, per un importo complessivo di € 7.500 (trimestre settembre-novembre 2012).

58. Con Decreto Commissariale n. 85 dell'11 dicembre 2012, è stato disposto il pagamento del terzo acconto del collaboratore CO.CO.PRO. ing. Agostino Santillo, per un importo complessivo di € 9.000 (trimestre settembre-novembre 2012).

• • •

59. Con Decreto Commissariale n. 29 del 25 maggio 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 5.015.241,74 per l'attuazione degli interventi nn. 1, 2 e 3 della Delibera CIPE n. 8/2012 (rispettivamente nn. 5, 6, 24 e 96 dell'Allegato 1 all'AdP);

60. Con Decreto Commissariale n. 30 del 28 maggio 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 12.040.000,00, appena disponibile (impegno subordinato alla disponibilità dei fondi), per l'attuazione degli interventi nn. 5 e 6 della Delibera CIPE n. 8/2012 (rispettivamente nn. 64 e 71 dell'Allegato 1 all'AdP);

61. Con Decreto Commissariale n. 51 del 26 luglio 2012, sono stati resi disponibili gli oneri occorrenti all'attuazione dell'intervento n. 5 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (n. 64 dell'Allegato 1 all'AdP), pari a € 2.200.000,00, ed è stato dato mandato all'ARCADIS di eseguire l'Ordinanza Commissariale n. 6 del 22/03/2012;

62. Con Ordinanza Commissariale n. 7 del 12 luglio 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 5.217.152,27 per l'attuazione dell'intervento n. 11 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (n. 9 dell'Allegato 1 all'AdP);

63. Con Ordinanza Commissariale n. 8 del 26 luglio 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 1.238.396,00 per l'attuazione dell'intervento n. 7 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (n. 94 dell'Allegato 1 all'AdP);

64. Con Ordinanza Commissariale n. 9 del 26 luglio 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 7.000.000,00, appena disponibile (impegno subordinato alla disponibilità dei fondi), per l'attuazione dell'intervento n. 40 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (n. 83 dell'Allegato 1 all'AdP);

65. Con Ordinanza Commissariale n. 10 dell'11 settembre 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 2.200.000,00 per l'attuazione dell'intervento n. 5 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (n. 64 dell'Allegato 1 all'AdP).

66. Con Decreto Commissariale n. 68 del 2 ottobre 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 33.375.572,70, con impegno subordinato alla disponibilità dei fondi, per l'attuazione degli interventi nn. 4,

8, 10, 13 e 25 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (rispettivamente nn. 43, 76, 95, 23 e 34 dell'Allegato 1 all'AdP).

67. Con Ordinanza Commissariale n. 11 del 5 ottobre 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 1.716,23 per il rimborso spese dei sopralluoghi e missioni effettuati.

68. Con Ordinanza Commissariale n. 12 del 21 novembre 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 900.000,00, con impegno subordinato alla disponibilità dei fondi, per l'attuazione dell'intervento n. 15 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (n. 66 dell'Allegato 1 all'AdP), ed individuata l'ARCADIS quale soggetto attuatore.

69. Con Ordinanza Commissariale n. 13 del 21 novembre 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 2.487.667,00, con impegno subordinato alla disponibilità dei fondi, per l'attuazione dell'intervento n. 14 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (n. 67 dell'Allegato 1 all'AdP), ed individuata l'ARCADIS quale soggetto attuatore.

70. Con Ordinanza Commissariale n. 14 del 6 dicembre 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 9.840.000,00, per l'attuazione dell'intervento n. 6 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (n. 71 dell'Allegato 1 all'AdP), ed individuata l'ARCADIS quale soggetto attuatore.

71. Con Decreto Commissariale n. 87 del 18 dicembre 2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 40.763.239,70, con impegno subordinato alla disponibilità dei fondi, per l'attuazione degli interventi nn. 8, 10, 13, 14, 15, 25 e 40 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012 (rispettivamente nn. 76, 95, 23, 67, 66, 34 e 81 dell'Allegato 1 all'AdP).

• • •

72. A seguito di numerosi colloqui telefonici avvenuti con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (dott. Grimaldi) e di numerose richieste da parte del Ministero relative agli interventi finanziati con fondi FAS (formulate dalla dott.ssa Mattei Gentili e dalla dott.ssa Marchetto), sono state trasmesse le seguenti informazioni per ogni intervento:

- livello di priorità: da 1 (maggiore priorità) a 3 (minore priorità),
- grado progressivo di cantierabilità: da 1 (a breve termine) a 3 (a lungo termine),
- livello di progettazione: da stima costi a progetto esecutivo,
- livello di rischio desunto dai PAI,
- numero di persone a rischio,
- affidamento dei lavori, entro mesi: 0, 6, 9, 12 e 15,
- durata realizzazione opere, in mesi,
- tempi collaudo, in mesi.

• • •

73. Su richiesta del dott. Antonio Perrone, Dirigente della Divisione dell'Ispettorato Generale istituito presso il Ministero dell'Ambiente, nel mese di gennaio 2012 sono state trasmesse le schede contenenti le relazioni intercorrenti tra i principali eventi calamitosi avvenuti negli anni 2010 2011, e gli interventi previsti dall'Accordo di Programma.

• • •

74. Su richiesta della dott.ssa Lelli (funzionaria della struttura di supporto CUP della Presidenza del Consiglio dei Ministri), sono stati trasmessi i CUP di tutti i 57 interventi che nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma erano previsti a valere sui fondi FAS Nazionali e Regionali.

• • •

L'attività del Commissario e dei due collaboratori ha consentito di guidare gli uffici tecnici del Genio Civile, dei Comuni e delle stesse Autorità di Bacino a pervenire a progetti preliminari, definitivi ed anche esecutivi senza che sia stato speso alcun euro per tali attività.

All'uopo, lo scrivente Commissario ritiene che siano state risparmiate allo Stato spese per oltre due milioni di euro per le spese di progettazione.

1.7.2 Livello di attuazione globale degli interventi

Attraverso la compilazione della tabella sottostante evidenziare lo stato di avanzamento ***globale*** *degli interventi in Accordo. Lo stato di attuazione relativo ad ogni singolo intervento dovrà, invece, essere prodotto attraverso l'aggiornamento delle schede intervento RENDIS e li, dove previsto, nella Banca Dati Unitaria del QSN.*

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	*n. interventi al dicembre 2012*	*n. interventi al dicembre 2011*
Attesa di avvio	*n. 41*	*n. 52*
Esecuzione studi ed indagini	*n. 4 (di cui 2 sono compresi tra quelli in attesa di avvio e 2 in corso di progettazione)*	*n. 0*
In corso di progettazione	*n. 46*	*n. 41*
Progettazione ultimata	*n. 6*	*n. 0*
Lavori aggiudicati	*n. 0*	*n. 0*
In esecuzione	*n. 3*	*n. 3*
Lavori ultimati (collaudati e non)	*n. 1*	*n. 1*
Totale interventi finanziati	*97*	

1.8 PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2013

Compilare la tabella seguente

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	*n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2013*
Attesa di avvio	*n. 32*
Esecuzione studi ed indagini	*n. 6 (compresi tra quelli in corso di progettazione)*
In corso di progettazione	*n. 35*
Progettazione ultimata	*n. 10*
Lavori aggiudicati	*n. 0*
In esecuzione	*n. 13*
Lavori ultimati (collaudati e non)	*n. 1*
Totale interventi finanziati	*97*

1.9 CRITICITA'

Descrivere le eventuali criticità riscontrate nello svolgimento delle attività per il periodo di riferimento e le modalità adottate per favorire il superamento delle stesse per il successivo periodo.

La principale criticità consiste nella mancata disponibilità dei fondi della Regione (Riduzione PAIN. PAR e 'residui ex leggi: n. 183/89, n. 267/89, n. 179/02 e cap 1137 Bilancio Gestionale), che non consente di poter avviare la progettazione di numerosi interventi, né di mandare in gara interventi per cui è già approvata la progettazione esecutiva.

Con nota prot. Com/Stra 212/2012 del 13/09/2012 (allegata alla presente relazione), indirizzata al Presidente della Giunte Regionale, all'Assessore LL.PP. e al Dirigente del Settore Difesa Suolo della Campania, lo scrivente Commissario ha sollecitato le predette Autorità affinchè comunicassero 'per le proprie competenze, quale sia la disponibilità finanziaria che potrà essere accreditata in tempi brevi sulla contabilità speciale intestata al sottoscritto, rimettendo ogni responsabilità per eventuali consegnenze dannose che dovessero verificarsi per la mancata realizzazione degli interventi'.

Ulteriore criticità è dovuta alla dichiarata incapacità di alcuni enti a redigere, con i propri uffici tecnici, le varie fasi progettuali o ad aggiornare le progettazioni a loro disposizione. Nel caso di Buonalbergo (int. cod. Istat 9 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma e n. 11 della Deliberazione n. 8/2012 del CIPE), ad esempio, dalla trasmissione del progetto definitivo inizialmente disponibile al Comune (aprile 2011) è trascorso quasi un anno affinché gli elaborati venissero aggiornati per ottemperare ai dettami normativi (D.Lgs. 81/2008 e D.P.R. 207/2010) e si potesse procedere dapprima alla validazione del progetto e successivamente alla sua approvazione da parte del Commissario Straordinario Delegato (giugno 2012).

Per far fronte alle predette insufficienze tecniche degli uffici degli enti preposti alla progettazione degli interventi, il Commissario ha utilizzato costantemente la propria struttura.

1.10 ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Annotazioni e precisazioni finali che si ritengono essenziali ad una esaustiva lettura della presente relazione

Lo scrivente Commissario Straordinario delegato si auspica che la presente relazione venga puntualmente commentata.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
REGIONE CAMPANIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21/01/2011

Prot. Com/Stra 212/2012

al sig. Presidente della Giunta Regionale
della Campania
Ill.mo dott. Stefano Caldoro
Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli
Fax: 081.7962320

13/9/2012

All'Assessore LL.PP. e Protezione Civile
Regione Campania
Prof. Ing. Edoardo Cosenza

Al Sig. Dirigente Settore Difesa del Suolo
Regione Campania
Dott. Italo Giulivo

Napoli, 13-09-2012

Oggetto: **Interventi di cui all'Allegato 1 dell'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania, da finanziare con fondi regionali.**

Ill.mi Presidente, Assessore e Dirigente,

lo scrivente Commissario Straordinario Delegato con D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 comunica che dei 40 interventi di cui all'oggetto (per complessivi € 15.755.690,35) previsti con fonte finanziaria '*fondi regionali (residui ex leggi: n. 183/89, n. 267/89, n. 179/02 e cap 1137 Bilancio Gestionale)*', oltre 20 presentano un livello di progettazione esecutivo o prossimo all'esecutivo, per un importo complessivo di circa 6 milioni di euro.

I predetti interventi sono da ritenersi urgenti, e non è da escludere che con l'inizio della stagione autunnale/invernale in occasione di eventi meteorologici di particolare entità, nelle aree oggetto degli interventi possano verificarsi problemi per l'incolumità di persone, territorio e patrimonio ambientale/paesaggistico.

Con nota prot. 128/2012 del 29/03/2012 il sottoscritto Commissario aveva richiesto al dott. Giulivo la possibilità di versare sulla contabilità speciale almeno parte dell'importo complessivo '*allo scopo di cantierizzare alcuni degli interventi ritenuti ad un maggiore livello di criticità*', e

80133 Napoli - Via De Gasperi, 28 - Tel. 081 796.3302 – 3311 - 3125 - Fax. 081.7963245 – 3123
http://mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it
e-mail: prof.demartino@alice.it

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
REGIONE CAMPANIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21/01/2011

comunicato che in assenza dei predetti fondi ed alla conseguente impossibilità di attuare i citati interventi '*il sottoscritto Commissario non può che rimettere ogni responsabilità per eventuali dannose conseguenze*'.

In data 19/07/2012 lo scrivente Commissario comunicava al dott. Gulivo '*che dei 40 interventi intesi da finanziare con i fondi regionali ben 16 possono ritenersi, a breve, a livello progettuale esecutivo, per un importo complessivo di circa € 5.600.000*'.

Alla data odierna entrambe le predette richieste/comunicazioni sono rimaste senza alcun riscontro, e alcun accredito da parte della Regione Campania è avvenuto sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato e aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli.

Con la presente lo scrivente Commissario sollecita le Autorità in indirizzo affinchè comunichino, per le proprie competenze, quale sia la disponibilità finanziaria che potrà essere accreditata in tempi brevi sulla contabilità speciale intestata al sottoscritto, che rimette ogni responsabilità per eventuali conseguenze dannose che dovessero verificarsi per la mancata realizzazione degli interventi.

In attesa di sollecito riscontro, cordiali saluti.

Il Commissario Straordinario delegato
Prof. ing. Giuseppe De Martino

80133 Napoli - Via De Gasperi, 28 - Tel. 081 796.3302 – 3311 - 3125 - Fax. 081.7963245 – 3123
http://mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it
e-mail: prof.demartino@alice.it

PAGINA BIANCA

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Relazione annuale anno 2012

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 10 dicembre 2010

Gennaio 2013

Commissario Straordinario Delegato

Prefetto Vincenzo Grimaldi

1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Tabella 1: situazione complessiva al 31/12/2012.

Regione	Emilia-Romagna
Commissario straordinario delegato	Prefetto Vincenzo Grimaldi
Decreto nomina	D.P.C.M. 10 dicembre 2010
Data sottoscrizione Accordo	3 novembre 2010
Data sottoscrizione Accordo Integrativo	5 maggio 2011
Importo complessivo assentito in Accordo	€ 145.872.029,15
Importo programmato per il periodo (anno 2012)[1]	€ 38.786.199,15
Importo speso per il periodo (anno 2012)	finanziamento 2012 € 12.359.863,67 cofinanziamento 2011 e 2012 € 16.458.686,71[2]
Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno 2012)	€ 24.500.381,23

[1] L'importo è riferito a quanto indicato nei cronoprogrammi delle attività trasmessi al Ministero. Per la quota di finanziamento statale la somma indicata per l'annualità 2012 è pari a € 17.591.000,00 (nota del Commissario straordinario n. PG.2011.101276 del 21/04/2011), mentre per la parte di cofinanziamento l'importo corrispondente ammonta a € 21.195.199,15 (nota del Commissario straordinario n. PG.2011.178556 del 22/07/2011).

[2] La disaggregazione del dato del cofinanziamento su base annuale è in corso, grazie alla collaborazione dei soggetti attuatori.

2. DIFESA DEL SUOLO E CONTESTO REGIONALE

La Regione Emilia-Romagna occupa un territorio vasto e paesaggisticamente variegato, caratterizzato da livelli di pericolosità idraulica, da frana e costiera cui, in alcuni contesti, corrispondono condizioni di rischio rilevanti.

Di seguito viene dato conto dello stato del dissesto nelle sue varie manifestazioni e dell'organizzazione regionale per quanto attiene la gestione operativa degli interventi di mitigazione del rischio. In tale quadro si è inserita l'attività commissariale per l'attuazione dell'Accordo.

2.1 Dissesto idrogeologico

L'Emilia-Romagna è una delle regioni più franose d'Italia, con oltre il 20% del territorio collinare e montano interessato da circa 70.000 frane, di cui 30.000 attive o riattivatisi negli ultimi 20 anni (dati 2009 – "Per la sicurezza del territorio 2007-2009", Regione Emilia-Romagna). Di queste, più di 400 sono state perimetrate e inserite nei Piani di Bacino in quanto a rischio molto elevato o elevato.

La grande maggioranza dei danni causati da movimenti franosi avviene per la riattivazione di corpi di frana già esistenti sui quali in passato, in numerosi casi, sono stati edificati centri abitati.

Per quanto riguarda le infrastrutture, la gestione del dissesto si pone come un tema di complessa e costosa risoluzione a causa della diffusione pervasiva delle frane sull'intero territorio collinare regionale. Si pensi che in alcuni comuni oltre il 40% del territorio è coperto da frane e spesso non esistono percorsi alternativi oltre a quelli esistenti.

La sicurezza dei versanti è oggi affrontata attraverso un approccio basato sul principio della prevenzione e della riduzione del danno, a partire da alcune azioni convergenti quali, in primo luogo, l'applicazione del sistema di vincoli e di prescrizioni presenti negli strumenti della pianificazione di bacino. Accanto a tali elementi è indispensabile approfondire la conoscenza del territorio e del meccanismo di innesco dei fenomeni franosi, al fine di prevederne l'evoluzione a breve termine: il bagaglio di conoscenze derivante dal monitoraggio dei versanti in dissesto è infatti il presupposto di eventuali azioni di emergenza e, nel medio-lungo periodo, di un'efficace pianificazione del territorio e di una corretta progettazione di interventi strutturali.

2.2 Rischio idraulico

Il complesso assetto della rete idrografica naturale e artificiale, la consistenza e la distribuzione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle attività produttive sono i fattori che concorrono a determinare le condizioni di rischio idraulico cui è esposto il territorio dell'Emilia-Romagna.

Nelle aree di pianura il reticolo naturale assume connotati di forte artificialità strutturale, a causa della progressiva arginatura degli alvei che ne ha irrigidito la naturale dinamica evolutiva. L'azione antropica sul sistema dei corpi idrici è inoltre evidente per la presenza di una fitta rete di canali di bonifica, con funzioni irrigue e di scolo delle acque, che si irradia capillarmente in questo ambito territoriale dalla solida vocazione produttiva.

A parte il fiume Po, caratterizzato dalla presenza di ampie aree golenali racchiuse dagli argini maestri in cui le piene possono trovare uno sfogo, i tratti fluviali interessati dalla presenza di rilevati arginali presentano, per lo più, alvei canalizzati con sezioni regolari che trasferiscono verso valle le onde di piena senza laminazione. In queste aree il rischio idraulico si può manifestare per tracimazione o rottura degli argini determinate dall'insufficiente capacità di smaltimento delle acque o da impreviste e locali criticità. In un contesto siffatto è evidente la strategicità di una manutenzione preventiva, in grado di mantenere in efficienza un sistema di opere di difesa così diffuso e ormai vetusto.

Nelle aree di montagna i corsi d'acqua presentano invece caratteristiche di naturalità, sebbene si collochino in alcuni casi in contesti fortemente antropizzati, con presenza di centri abitati, infrastrutture, attività produttive che si sono sviluppati sui terrazzi fluviali e, quindi, in aree potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione. In generale, la sicurezza idraulica e la stabilità dei versanti sono strettamente legate: l'equilibrio dei profili di fondo e delle sponde dei corsi d'acqua è infatti condizione necessaria ad evitare erosioni destabilizzanti al piede dei pendii e dei terrazzi fluviali.

È infine opportuno ricordare il reticolo idrografico minore, che negli anni passati è stato spesso soggetto a interventi di tombinamento, deviazione o artificializzazione a causa della crescente domanda di trasformazione urbanistica del territorio. Esso risulta sempre più di frequente inadeguato a sopportare le attuali condizioni di deflusso, divenute più gravose a causa dei cambiamenti di uso del suolo, spesso accompagnati da interventi che aumentano l'estensione di aree impermeabilizzate. La rete minore, inoltre, a causa dei tempi di corrivazione che la contraddistinguono, risente in modo più marcato rispetto ai corsi d'acqua di maggiori dimensioni degli eventi piovosi di forte intensità e localmente concentrati che si presentano sempre più frequentemente in tutto il corso dell'anno.

Il difetto di efficienza del sistema idrografico è dunque imputabile alla citata artificialità strutturale del reticolo idrografico, alle trasformazioni progressive di ampie porzioni di territorio e all'inadeguatezza della rete di scolo che ne è conseguita a causa dell'aumento dei carichi idraulici, oltre che alle variazioni indotte sulle sollecitazioni meteorologiche dai cambiamenti climatici. A questi elementi va inoltre aggiunta la riduzione della pendenza media dei corsi d'acqua nei tratti di pianura per effetto della subsidenza.

2.3 Difesa della costa e subsidenza

La fascia costiera, che si estende per circa 130 km dalla Foce del Po di Goro fino a Cattolica, è, per sua natura, un ambiente dinamico che subisce costanti modifiche per l'azione combinata di fattori climatici e meteo-marini. L'impatto di questi fattori è particolarmente significativo su una costa bassa e sabbiosa, come quella emiliano-romagnola, con territori retrostanti posti a quote inferiori al livello del mare (aree ferrarese e ravennate).

L'area costiera riveste grande importanza per l'economia regionale sia per l'attività turistica, che da sola contribuisce al 7% del PIL regionale, sia per il contributo di settori produttivi come la pesca e il trasporto marittimo. Essa, inoltre, comprende un inestimabile patrimonio ambientale e naturalistico tutelato all'interno del Parco del Delta del Po. Si comprende facilmente, quindi, come la dinamica evolutiva naturale di queste aree possa contrastare con le esigenze di sviluppo territoriale.

L'evoluzione della fascia costiera negli ultimi secoli ha risentito fortemente della naturale riduzione del trasporto solido che ha determinato l'arretramento delle cuspidi deltizie e la conseguente rettificazione della linea di riva. Tale tendenza si è aggravata, soprattutto nel dopoguerra, a causa dell' intenso sfruttamento dell'area costiera sia in superficie sia nel sottosuolo.

La costa si presenta quindi come un ambito sensibile sul quale occorre costantemente intervenire per contrastare e mitigare i processi di erosione delle spiagge e i fenomeni di inondazione degli abitati che si verificano in occasione di forti mareggiate e intense precipitazioni.

Le politiche di gestione del territorio e di difesa della costa, introdotte dalla Regione già a partire dagli anni Ottanta, hanno fatto registrare nell'ultimo decennio una sensibile riduzione dei più importanti fenomeni di dissesto.

Contestualmente la Regione ha promosso studi e ricerche al fine di creare un quadro sistemico dell'ambiente costiero capace di orientare le strategie di difesa della costa: l'opzione della "difesa morbida", rappresentata dal ripascimento artificiale, è apparsa la più idonea al fine di assecondare, in modo controllato, il dinamismo naturale della linea di costa. Gli interventi di ripascimento delle spiagge, realizzati dalla Regione, hanno ridotto notevolmente i tratti di costa interessati da arretramento per erosione, che sono

passati da circa 35 km del 2000 a circa 16 km del 2007. Oggi risultano stabilizzati 19 km di costa, rispetto ai quali vengono svolte verifiche periodiche per accertare le necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'approvvigionamento di sabbia per i ripascimenti è garantito dallo sfruttamento dei depositi sottomarini, costituiti dagli antichi cordoni litorali e individuati tra 30-e 50 m di profondità in Adriatico, delle sabbie litoranee provenienti da spiagge in forte avanzamento, accumuli presso moli e opere di difesa, dragaggi alle imboccature dei porti e alle bocche fluviali, e delle sabbie dell'entroterra (opere portuali, allargamento darsene, scavi edili in genere).

Ad oggi, dunque, il ripascimento e la manutenzione ordinaria delle spiagge fanno parte della nuova strategia regionale di gestione e di difesa della linea di costa, con l'abbandono del ricorso alle opere rigide tradizionali, per le quali si procede unicamente con una rimodulazione dell'esistente.

Le azioni mirate di ripascimento vengono inoltre integrate attraverso politiche di miglioramento del trasporto solido fluviale e di riduzione di perdita di sabbia dal sistema attraverso una corretta gestione dei sedimenti di spiaggia (pulizia e vagliatura in loco, installazione di barriere frangivento e di argini invernali di protezione), oltre che proseguendo nelle politiche di riduzione della subsidenza.

Oltre alle azioni strutturali rappresentate un elemento innovativo nella strategia di difesa dell'ambito costiero è rappresentato dallo sviluppo del monitoraggio e dalla diffusione delle conoscenze.

L'evoluzione dei fenomeni erosivi, infatti, deve essere monitorata costantemente in ragione del fatto che una seria programmazione di interventi non può essere attuata in una logica di emergenza. A tal fine la Regione ha istituito, da oltre 30 anni, reti di monitoraggio topo-batimetrico e della subsidenza a scala regionale. Negli ultimi anni sono state avviate nuove attività di rilievo con tecniche innovative, quale il telerilevamento, che consentono un'acquisizione rapida e capillare dei dati batimetrici, mareografici e di subsidenza.

La mole di dati così prodotta viene gestita attraverso un sistema di analisi e di gestione delle informazioni che risulta utile anche ai fini della diffusione e della condivisione delle conoscenze con tutte le strutture e gli enti periferici che operano per la difesa della costa[3].

Il riferimento per il governo del territorio negli ambiti costieri è costituito dalle linee guida per la "Gestione Integrata delle Zone Costiere - GIZC", nelle quali le azioni appena esposte sono portate a sistema in una visione complessiva e volta a raggiungere un assetto costiero ottimale e sostenibile ai fini della difesa e della sicurezza dei litorali e dei territori retrostanti.

2.4 Gestione operativa

Migliorare i livelli di sicurezza del territorio e delle popolazioni in relazione al rischio idraulico, idrogeologico, di erosione e ingressione marina è uno degli obiettivi principali che la Regione Emilia-Romagna si pone da tempo. Tale obiettivo si declina in un complesso di azioni finalizzate ad innalzare il livello di prevenzione e di protezione degli insediamenti e delle popolazioni in relazione alle criticità del territorio, a migliorare la capacità di valutazione delle azioni intraprese, a diffondere e rendere fruibili ai cittadini le conoscenze territoriali.

La programmazione regionale in materia di difesa del suolo si fonda, in particolare, sul riconoscimento del ruolo della pianificazione di bacino e sull'integrazione tra gli enti e i soggetti competenti per territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

La pianificazione di bacino, attraverso l'analisi di fenomeni e criticità in un'ottica di scala vasta, mette a sistema la complessità del reticolo idrografico regionale precedentemente descritto. A partire da tale

---

[3] interfaccia web-gis "Il Sistema Informativo del Mare e della Costa" (http://geo.regione.emilia-romagna.it/costa).

impostazione e dal bagaglio di conoscenze reperibile nei PAI, nei quali sono stati da tempo individuati gli interventi strategici a livello di bacino idrografico, vengono formati ed attuati i programmi regionali di intervento, che beneficiano degli aggiornamenti, delle segnalazioni di criticità e del contributo tecnico delle molteplici strutture operative presenti sul territorio regionale, il cui coordinamento consente di perseguire la coerenza e l'integrazione delle politiche regionali nei vari ambiti territoriali e nei diversi settori d'intervento.

Sotto il profilo tecnico, la Regione si avvale, infatti, di numerosi soggetti, relativamente alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di difesa del suolo e della costa, alle funzioni di polizia idraulica e gestione del servizio di piena, alla gestione del pronto intervento e gli interventi di somma urgenza, oltre che all'esecuzione delle verifiche tecniche in caso di dissesti, eventi alluvionali e meteorologici intensi e al monitoraggio dei fenomeni suddetti, anche nell'ambito del sistema di allertamento di protezione civile.

Tali funzioni vengono esercitate attraverso le seguenti strutture:

1) i **Servizi Tecnici di Bacino** (S.T.B.), strutture nate in seguito al passaggio dei Geni Civili dallo Stato alle Regioni, gestiscono il reticolo idrografico naturale minore, secondario e larga parte di quello principale, ad esclusione dei tratti di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po), di cui si dirà più avanti; i S.T.B. operano inoltre nei settori del dissesto idrogeologico e della difesa della costa;

2) l' **A.I.Po** è competente lungo i tratti di corsi d'acqua nei quali siano presenti opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria limitatamente al bacino del Po (affluenti principali del fiume Po nei tratti di pianura, cavi e canali artificiali classificati come precedentemente indicato); l'Agenzia, inoltre, riveste il ruolo di Centro di Competenza nell'ambito del sistema di allertamento della protezione civile, con riferimento alle analisi idrauliche e all'impiego della modellistica di piena;

3) i **Consorzi di Bonifica**, gestiscono il reticolo artificiale di competenza, con funzioni irrigue e di scolo, nonché parte del reticolo interconnesso, sulla base di specifici accordi con i soggetti 1) e 2). In alcuni casi realizzano inoltre interventi tesi ad assicurare il buon regime idraulico dei terreni ricadenti nei comprensori collinari e montani, attraverso la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti

Per quanto concerne, in particolare, le attività relative alla protezione civile il soggetto che opera in Emilia-Romagna è l'**Agenzia regionale di Protezione civile**, cui competono la predisposizione della pianificazione di emergenza regionale e il relativo supporto agli enti locali, le attività di previsione degli eventi calamitosi e prevenzione del rischio, nell'ambito del Sistema di protezione civile e in stretto raccordo con il Centro Funzionale regionale; in corso di evento competono alla struttura l'organizzazione e il coordinamento delle operazioni di soccorso delle popolazioni sinistrate e del Volontariato di Protezione civile. L'l'Agenzia opera costantemente in stretto rapporto con tutte le strutture competenti a livello regionale, cui fornisce ausilio e un affiancamento in caso di valutazioni tecniche di danni o dissesti e di necessità di supporto agli enti locali interessati da eventi calamitosi; provvede, inoltre, alla programmazione di interventi di somma urgenza e pronti interventi, alla formazione di piani di interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio, sulla base di Ordinanze di Protezione civile.

Nel contesto operativo ora descritto, il **Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli** fornisce un valido contributo conoscitivo grazie alle attività di studio e monitoraggio a supporto della Gestione Integrata della Zona Costiera e delle procedure di pianificazione ed intervento, in raccordo col Servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica, e di previsione e valutazione della pericolosità idrogeologica a supporto delle attività del Centro Funzionale dell'Emilia-Romagna, oltre che alla gestione del Sistema Informativo Geotematico, Sismico, dei Suoli, e del sistema fisico costiero.

Si è già fatto riferimento al ruolo dei PAI nel sistema di gestione della difesa del suolo a livello regionale. Vale comunque la pena ricordare che le **Autorità di bacino**, costituite ai sensi della L. 183/1989, in qualità di soggetti competenti in materia di pianificazione di bacino, per la Regione Emilia-Romagna sono cinque:

- di rilievo nazionale: Autorità di bacino del fiume Po e Autorità di bacino del fiume Tevere;
- di rilievo interregionale: Autorità di bacino del Reno, Autorità di bacino interregionale Marecchia e Conca;
- di rilievo regionale: Autorità di bacino dei Fiumi Romagnoli.

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 il territorio regionale è interessato dai tre distretti Padano, dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino centrale.

L'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna**, tra i vari compiti di monitoraggio e studio delle diverse componenti ambientali, fornisce un fondamentale supporto tecnico anche nel campo della difesa del suolo, in particolare attraverso il Servizio Idrometeoclima, che svolge osservazioni e previsioni operative e di ricerca e sviluppo in meteorologia, climatologia, idrologia, agrometeorologia, radarmeteorologia e meteorologia ambientale, anche in qualità di Centro Funzionale nell'ambito del Sistema di Allertamento nazionale.

Infine, il **Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica** opera il coordinamento a livello regionale tra le funzioni di pianificazione e di programmazione degli interventi per il tempo differito, oltre a collaborare e mantenere il raccordo con le strutture che si occupano della gestione degli interventi in emergenza. In particolare il Servizio collabora con le Autorità di bacino per la formazione e l'attuazione della pianificazione di bacino e verifica i contenuti dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale nei settori della difesa del suolo, della costa e bonifica (PTCP) e delle attività estrattive (PIAE). Provvede inoltre, di concerto con il S.T.B. competente territorialmente, a fornire supporto e coordinamento in materia di vincolo idrogeologico, all'attuazione del Piano di Gestione Integrata della Zona Costiera (GIZC) e per lo sviluppo dei sistemi di monitoraggio idropluviometrico, nonché alla redazione di studi, ricerche e monitoraggi nelle materie di competenza.

Sotto il profilo delle opere strutturali, il Servizio provvede alla programmazione esecutiva e al monitoraggio degli interventi di difesa del suolo, della costa e bonifica in connessione con le Autorità di bacino e i soggetti attuatori (S.T.B., A.I.Po, Consorzi, e, più raramente, Comuni), si occupa dell'istruttoria tecnica e della gestione amministrativo-contabile degli interventi e dei pronti interventi, nonché del coordinamento tecnico e amministrativo-procedurale dei S.T.B., dei Consorzi di Bonifica e dell'A.I.Po.

Relativamente alla gestione delle emergenze, il Servizio fornisce collaborazione e supporto all'Agenzia regionale di Protezione civile nell'ambito del Sistema di allertamento regionale e della formazione dei piani di interventi discendenti da Ordinanze.

3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMISSARIALI

A seguito della nomina a Commissario, il Prefetto Grimaldi ha avviato i primi contatti con l'Assessorato regionale alla Sicurezza territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e con la Direzione Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione (di seguito competente Direzione regionale), quest'ultima supportata dal punto di vista tecnico dal Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica e, dal punto di vista giuridico, dal Servizio Affari generali, giuridici e Programmazione finanziaria.

Per il tramite di tali strutture regionali, sono state avviate le iniziative necessarie a dare attuazione all'Accordo, anche attraverso contatti con i funzionari della Direzione generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM e dell'ISPRA, per quanto concerne la tematica del monitoraggio degli interventi.

Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2011 sono stati organizzati alcuni incontri, a cura della competente Direzione regionale, che hanno riguardato livelli attuativi distinti.

In primo luogo sono state discusse le possibili modalità di organizzazione del lavoro con il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, il Servizio Affari generali, giuridici e Programmazione finanziaria e l'Agenzia regionale di Protezione Civile; il confronto sulle proposte avanzate ha permesso di delineare un quadro delle prime attività necessarie e dei criteri operativi per l'attuazione dell'Accordo, oltre che di comporre un mosaico funzionale delle strutture di supporto da coinvolgere.

Successivamente, con il supporto del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, il Commissario ha consultato le strutture operative cui la Regione di norma ricorre per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio (Servizi Tecnici di Bacino, Agenzia Interregionale per il fiume Po, Consorzi di bonifica) ai fini di una ragionevole previsione dei tempi di attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento alla progettazione degli interventi previsti, ai tempi presunti per la cantierabilità e alla gestione degli interventi ricompresi nella quota di cofinanziamento, alcuni dei quali risultavano avviati in via ordinaria.

A conclusione di tale fase interlocutoria, ai fini di una celere attuazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, il Commissario straordinario ha deciso di avvalersi della Regione Emilia-Romagna, anche attraverso le strutture e gli enti a cui la medesima ricorre per la realizzazione degli interventi in materia di difesa del suolo, della costa e bonifica (nota n. PG/2011/39529 del 14 febbraio 2011 indirizzata al MATTM), fermi restando i poteri di indirizzo e, ove ritenuto necessario, di sostituzione e di deroga attribuiti al Commissario dal DPCM di nomina ai sensi della normativa ivi richiamata.

Come chiarito nella precedente relazione annuale, per gli interventi finanziati con risorse statali il Commissario, sentite le strutture regionali competenti circa la fattibilità di tale operazione, ha ritenuto di utilizzare gli strumenti forniti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011[4], che all'art. 6 comma 4, ha autorizzato il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, ad inserire gli interventi dell'Accordo in un apposito stralcio del Piano degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza e l'avvio della messa in sicurezza dei territori individuati dalla precedente ordinanza n. 3850/2010. Nell'ambito di tale percorso amministrativo, è stata operata una suddivisione degli interventi in tre piani attuativi distinti – Parte A, Parte B e Parte C - , sulla base del possesso, per ciascun intervento, dei requisiti di coerenza rispetto alla OPCM

[4] Con la finalità di garantire la rimozione delle situazioni di criticità ed accelerare le azioni volte alla messa in sicurezza ed alla mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale, la citata Ordinanza ha autorizzato i Commissari delegati ex OPCM 3850/2010 ad inserire gli interventi di cui agli Accordi di programma siglati dal MATTM con le Regioni in un apposito stralcio del Piano degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza e l'avvio della messa in sicurezza dei territori individuati da quest'ultima.

3850/2010. Per un maggior dettaglio dei contenuti dei piani attuativi si rimanda alla Relazione relativa alle attività 2011.

La correlazione con la pianificazione di protezione civile, oltre ad accelerare la realizzazione degli interventi ricollegabili alla OPCM 3850/2010, ha reso possibile il ricorso alle procedure di contabilità speciale, la quale, grazie all'esclusione delle relative somme dal Patto di stabilità, ha consentito alla Regione di operare senza limiti di spesa.

Nel contempo tale scelta comporta che solo una parte dei fondi statali da destinare agli interventi possa essere versato sulla Contabilità Speciale appositamente istituita e intestata al Commissario straordinario: il relativo Conto di Tesoreria, infatti, è stato aperto in virtù della OPCM 3925/2011 e, pertanto, le risorse che ad esso fanno capo possono essere impiegate unicamente per gli interventi ricompresi nel Piano attuativo Parte A, redatto ai sensi della citata ordinanza. Per gli interventi ricompresi nei piani attuativi Parte B e Parte C la corrispondente quota parte delle risorse statali dovrà essere trasferita su un Capitolo di contabilità ordinaria del Bilancio regionale.

Nel merito dell'attuazione degli interventi, le modalità operative e procedimentali sono state individuate con Decreto commissariale n. 1 del 16 maggio 2011, del quale di seguito si riportano le disposizioni organizzative più significative:

- le decisioni del Commissario hanno la forma di decreti;
- gli atti specifici per l'attuazione dei singoli interventi (determinazioni, pareri, ecc.) sono emanati in analogia a quanto previsto per i decreti del Presidente della Giunta regionale;
- agli atti viene applicato il regime di pubblicità vigente in Regione Emilia-Romagna attraverso lo strumento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione, in relazione alla natura e alle finalità del singolo provvedimento.

Come specificato nella precedente relazione annuale, è stata operata una distinzione iniziale tra gli interventi finanziati con risorse statali e con risorse del cofinanziamento regionale.

Per gli **interventi finanziati con risorse statali**, le indicazioni sono riportate nel citato Decreto, che prevede l'applicazione delle disposizioni vigenti presso la Regione in quanto alle relazioni organizzativo-funzionali e alle competenze, oltre che per la contabilità, fatto salvo il regime previsto per le risorse allocate su Contabilità Speciale intestata al Commissario straordinario presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Bologna.

Per gli **interventi oggetto di cofinanziamento**, il Commissario ha emanato uno specifico decreto (DCS/2011/4 del 20/09/2011, integrato con DCS/2012/1 del 16 aprile 2012) che stabilisce per tali fattispecie l'applicazione delle medesime disposizioni previste per l'attuazione della parte statale, ad eccezione di quanto attiene alla gestione contabile che, per gli interventi cofinanziati, fa riferimento alle procedure ordinarie. Il Commissario, infatti, come affermato in varie occasioni, ha ritenuto di mantenere le risorse del cofinanziamento sui capitoli di Bilancio originari per ragioni di semplificazione amministrativa e di efficacia di azione della struttura commissariale.

Tutti gli interventi, a prescindere dall'importo e dalla fonte di finanziamento, sono soggetti al parere preventivo del Comitato Consultivo Regionale[5] (di seguito CCR), di cui all'art. 12 e seguenti della L.R. n. 22/2000. Il parere viene generalmente reso sulla base del progetto preliminare, tuttavia i soggetti attuatori possono presentare al vaglio del CCR progetti definitivi/esecutivi qualora il Responsabile del Procedimento lo ritenga necessario ai fini di contenere i tempi complessivi del procedimento. In sede di

[5] Il Comitato Consultivo Regionale è costituito da membri tecnici e giuridici appartenenti a vari Servizi regionali e da cinque esperti esterni in materia di difesa del suolo e, in base alle citate norme regionali, valuta in linea tecnica gli interventi di importo superiore a 1.300.000 euro; l'espressione positiva del CCR è necessaria ai fini dei successivi atti di attuazione.

adunanza è facoltà del CCR richiedere un ulteriore parere per livelli successivi di progettazione in caso di interventi di particolare importanza e complessità.

Nel merito specifico delle procedure tecnico-amministrative individuate dal Commissario per l'attuazione dell'Accordo, si rimanda ai paragrafi 2.3 e 2.4 della precedente relazione annuale, trasmessa con nota n. PG.2012.0015072 del 19/01/2012.

In riferimento all'organizzazione vigente in Regione per la gestione ordinaria del settore della difesa del suolo, il Commissario ha stabilito di mantenere le competenze e le attribuzioni descritte al paragrafo 2.4.

In particolare, per la realizzazione degli interventi sono stati individuati i soggetti attuatori che, di norma, operano nell'ambito della difesa del suolo, con riferimento alle finalità dei singoli interventi e agli ambiti territoriali di competenza (Agenzia Interregionale per il fiume Po, Servizi Tecnici di Bacino, Consorzi di Bonifica). Essi provvedono alla realizzazione degli interventi nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici e delle disposizioni previste da altre normative di settore, oltre che delle disposizioni commissariali.

È stato inoltre costituito uno staff tecnico-operativo composto da collaboratori del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica e del Servizio Affari generali, giuridici e Programmazione finanziaria, i cui nominativi sono riportati nel Programma di Attività di pertinenza, con funzioni di coordinamento e supporto tecnico-amministrativo e giuridico, oltre che di gestione del monitoraggio dello stato degli interventi mediante la banca dati regionale SIMADA, che gestisce il monitoraggio di settore, e, con il supporto tecnico ed operativo dell'ISPRA, mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS).

La gestione contabile degli interventi finanziati con fondi afferenti alla Contabilità Speciale è condotta dall'Agenzia regionale di Protezione Civile, con il supporto di un'unità di personale appositamente acquisita e di cui si dirà nel seguito.

È stato inoltre necessario ricorrere a personale esterno per l'espletamento di funzioni specifiche:

1) un collaboratore a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di segreteria particolare (richiesta di assunzione con nota del Commissario n. 141991 del 09/06/2011); la procedura di assunzione, svolta ai sensi dell'art. 63 dello Statuto Regionale, si è conclusa con l'assunzione della collaboratrice Barbara Tantini (determina di assunzione n. 10772 del 08/09/2011); la durata del contratto decorre dal 12/09/2011 al 10/12/13 e prevede un impegno complessivo a carico delle risorse dell'Accordo pari a 88.368,55 euro, corrispondenti allo stipendio lordo contrattuale e agli oneri riflessi;

2) una unità di personale per la gestione delle attività e degli adempimenti connessi alla contabilità speciale dell'Accordo, a cui si è accennato sopra, operante presso l' Agenzia regionale di Protezione Civile (richiesta di assunzione con nota del Commissario n. PG.2012.0046980 del 22/02/2012); la procedura di assunzione, svolta con una selezione pubblica ha permesso di individuare la collaboratrice Chiara Morinelli (determina di assunzione n. 3926 del 26/03/2012); la durata del contratto decorre dal 02/04/2012 al 10/12/13 e prevede un impegno complessivo a carico delle risorse dell'Accordo pari a 65.458,20 euro, corrispondenti allo stipendio lordo contrattuale e agli oneri riflessi;

3) una unità professionale per la fornitura dei servizi di gestione fiscale, previdenziale e assicurativa relativa al compenso del Commissario e di gestione delle ritenute dei lavoratori autonomi (offerta del Rag. Gian Paolo Gianferrari in data 19/09/2011, agli atti del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica e assunta al protocollo con n, PG.2011.0231885 del 26/09/2011); la fornitura descritta è stata affidata con procedura di affidamento diretto con Decreto del Commissario straordinario n. DCS/2012/4 del 17/10/2012; l'impegno complessivo a carico delle risorse dell'Accordo è pari a

4.033,36 euro, oltre a una quota di rimborso per spese generali pari al 15% e i contributi previdenziali del 2% di cui all'art. 13 della Legge 5 agosto 1991, n. 249.

4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITÀ SPECIALE

Per le somme relative agli interventi ricompresi nella quota di finanziamento statale, tra maggio e dicembre 2011 sono stati versati sulla Contabilità Speciale n. 5578 intestata al Commissario straordinario fondi provenienti da capitoli di Bilancio del MATTM per un totale di € 33.047.688,47. Tali risorse sono state impiegate per avviare gli interventi previsti per l'annualità 2011 in base al cronoprogramma inviato al Ministero, ricompresi nel Piano attuativo – Parte A di cui si è parlato al Capitolo 3.

Negli ultimi mesi del 2012 sono state trasferite sulla Contabilità intestata al Commissario somme pari a € 7.552.311,53. Di queste, è stato chiarito che € 6.152.311,53 corrispondono al saldo dei fondi facenti capo a Capitoli di Bilancio del MATTM previsti dal quadro economico dell'Accordo, mentre € 1.400.000,00 corrispondono a un'anticipazione della prima quota dei fondi FAS assegnati alla Regione dalla Delibera del CIPE n. 6/2012 nell'ambito del cosiddetto "Piano Nord".

La situazione complessiva per le risorse di parte statale è riportata nella Tabella 2.

Tabella 2: risorse economiche di parte statale.

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente			
Importo corrente *(per l'anno 2012)*	***Importo cumulato*** *(anno 2012 + precedente periodo)*	***Speso***	***Residuo***
€ 7.552.311,53	*€ 40.600.000,00*	*€ 12.503.383,88*	*€ 28.096.616,12*

Nella **Errore. L'autoriferimento non è valido per un segnalibro.** è invece riassunto lo stato delle risorse in capo al cofinanziamento, che constano di fondi regionali e dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po. Si specifica nuovamente per chiarezza, come si è spiegato nel Capitolo 3, che tali risorse sono disponibili sui Capitoli del Bilancio della Regione poiché, per motivi di semplificazione amministrativa e rapidità di esecuzione, il Commissario ha ritenuto di non procedere al trasferimento sulla Contabilità Speciale.

Si precisa, inoltre, che i dati inseriti nella **Errore. L'autoriferimento non è valido per un segnalibro.** sono relativi all'ultimo monitoraggio effettuato per l'anno 2012 con il contributo dei soggetti attuatori degli interventi, riferito al 14 novembre scorso.

Tabella 3: risorse economiche relative al cofinanziamento regionale.

Risorse economiche provenienti dalla Regione e dall'A.I.Po			
Importo corrente *(per l'anno 2012)*	***Importo cumulato*** *(anno 2012 + precedente periodo)*	***Speso***	***Residuo***
€ 61.108.529,64	*€ 61.108.529,64*	*€ 16.458.686,71*	*€ 44.649.842,93*

5. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ E RELATIVO STATO DELLA SPESA

Può risultare utile effettuare un'analisi della spesa realizzata per la realizzazione degli interventi strutturali in rapporto ai costi sostenuti per il funzionamento della struttura commissariale.

Nella Tabella 4 sono riportati gli importi relativi a tali fattispecie di attività, con riferimento sia all'anno 2012, sia a tutta la durata dell'Accordo.

Nella casella relativa all' attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo per l'anno 2012 è riportata la spesa effettuata a valere sulle sole risorse statali in quanto la disaggregazione del dato del cofinanziamento su base annuale, a partire già dal 2010, è attualmente in corso grazie alla collaborazione dei soggetti attuatori competenti per l'adozione degli atti contabili. Quest'ultimo dato è stato dunque riportato unicamente nella casella relativa al valore di spesa cumulativo.

Tabella 4: spesa per l'attuazione dell'Accordo disaggregata per attività.

Descrizione attività	***Importo speso corrente*** *(per l'anno 2012)*	***Importo speso cumulato*** *(anno 2012 e precedente periodo)*
struttura commissariale	*€ 75.917,55*	*€ 219.437,76*
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	*€ 12.283.946,12*[6]	*€ 28.742.632,83*

Si specifica inoltre che le spese indicate per la struttura commissariale si riferiscono unicamente al compenso del Commissario straordinario in quanto:

1. gli stipendi delle due collaboratrici assunte a tempo determinato (capitolo 3, punti 1) e 2)) e relativi oneri riflessi sono anticipati dalla Regione Emilia-Romagna; è in corso di predisposizione il Decreto commissariale per il rimborso delle somme corrispondenti attraverso un trasferimento dalla Contabilità Speciale alla Regione;
2. al 31/12/2013 non sono stati effettuati pagamenti per i servizi prestati dal Ragioniere incaricato (capitolo 3, punto 3)).

[6] La disaggregazione del dato del cofinanziamento su base annuale è in corso, grazie alla collaborazione dei soggetti attuatori.

6. PROSPETTO CONTABILITÀ SPECIALE

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo entrate-uscite relativo al conto di tesoreria n. 5578.

Tabella 5: prospetto riepilogativo entrate-uscite Contabilità Speciale.

Contabilità Speciale n. 5578 intestato al "COMMISSARIO STRAORDINARIO OPCM 3925/2011"
Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna

Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e Regione Emilia-Romagna sottoscritto il 3 novembre 2010

Piano attuativo dell'Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della Giunta n. 114 del 10 giugno 2011 (reg. Corte dei Conti il 17/6/2011 reg.1 foglio 130)

		Entrate		**Uscite**	**Saldo**
Cap. dello Stato	Stanziamenti	Accrediti su C.S. 5578	Data accrediti		
Cap. 8640/2009	22.536.064,46	24.000.000,00	16 mag. 2011		
Cap. 8531/2009	16.663.935,54				
Cap. 8640 /2010		5.383.752,93	15 dic.2011		
Cap. 8531/2010		3.663.935,54	15 dic.2011		
Delibera CIPE 6/2012	18.200.000,00	1.400.000,00	27.09.2012		
Cap. 8640/2012		6.152.311,53	18-ott-12		
2011				**143.520,21**	32.904.168,26
2012				**12.359.863,67**	28.096.616,12
	57.400.000,00	**40.600.000,00**		**12.503.383,88**	**28.096.616,12**
residuo da riscuotere	**23.668.400,00**				

7. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ

7.1 Descrizione delle attività

Nel corso del 2012 sono proseguite le attività per l'attuazione dell'Accordo, che non hanno fatto rilevare particolari criticità di ordine tecnico, se non quelle legate ad imprevisti verificatisi in corso di progettazione o di esecuzione dei lavori ove si siano verificati eventi meteorologici intensi.

Alla prima fattispecie appartiene, a titolo di esempio, un intervento localizzato lungo l'argine maestro del Po di Goro, ove i sopralluoghi effettuati per lo sviluppo della progettazione preliminare hanno permesso di riscontrare caratteristiche geotecniche tali da richiedere approfondimenti accurati, con uno slittamento della cantierabilità dell'intervento, inizialmente previsto per il 2011, all'annualità 2013.

Le problematiche più rilevanti sono legate da un lato agli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia nel mese di maggio 2012 e che hanno provocato danni anche alle opere di difesa idraulica e di scolo delle acque, con il conseguente forte impegno per la ricostruzione richiesto ai soggetti attuatori interessati per territorio; in secondo luogo i ritmi dell'erogazione delle risorse statali non hanno consentito il totale rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma a suo tempo inviato al Ministero, in ragione dell'impossibilità di assumere obbligazioni giuridiche vincolanti in assenza di copertura finanziaria di cassa.

Oltre all'attuazione degli interventi, le attività più rilevanti che hanno impegnato il Commissario straordinario nel corso dell'anno e, a cascata, tutte le strutture operative e di staff coinvolte hanno riguardato l'assegnazione della quota di risorse CIPE afferenti al "Piano Nord", per la quale sono state svolte numerose riunioni di coordinamento in Regione, oltre che con le altre Amministrazioni regionali interessate e con gli uffici della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM.

È stato inoltre profuso grande impegno nel monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, al fine di avere a disposizione un quadro chiaro dell'effettivo avanzamento dei lavori e delle eventuali criticità riscontrate - locali o sistematiche, tecniche, amministrative o giuridiche che fossero - anche al fine di riferire al Ministero e al competente Ispettorato, sia in adempimento a quanto stabilito dall'Accordo e dal Decreto di nomina del Commissario, sia per soddisfare necessità di verifiche specifiche sollevate dagli uffici ministeriali.

È stata infine condotta, su impulso del Commissario, una ulteriore verifica in merito agli interventi ricompresi nell'Accordo, al fine di pervenire a una proposta di modifica aggiornata e corretta da sottoporre al Comitato di Indirizzo e Controllo nei primi mesi del 2013.

La necessità di stipulare un nuovo Atto integrativo era stata già sollevata nel 2012, ma le relative attività istruttorie hanno subito un rallentamento a causa dell'impegno richiesto a tutte le strutture regionali per far fronte all'emergenza terremoto.

Nei mesi di novembre e dicembre tali attività sono state riprese e hanno permesso di aggiornare l'elenco di interventi allegato al primo Atto integrativo attraverso l'allineamento della banca dati regionale (SIMADA) con ReNDiS, la correzione di meri errori materiali, la suddivisione in lotti funzionali e la verifica puntuale dell'ammontare delle risorse del cofinanziamento, che, come chiarito nella precedente relazione annuale, risulta variato rispetto alla situazione del maggio 2011.

7.2 Livello di attuazione globale degli interventi

Si riportano di seguito i dati riepilogativi dello stato di avanzamento complessivo dell'Accordo, relativi alle quote di finanziamento statale e cofinanziamento regionale.

Si precisa che, relativamente alla quota di finanziamento statale, al fine di restituire dati coerenti circa la consistenza degli interventi ricompresi nell'Accordo, sono stati considerati come in "attesa di avvio" tutti gli

interventi che non risultavano dotati di copertura finanziaria alla data del 31/12/2012, anche per i casi in cui per le medesime opere fossero stati già eseguiti rilievi, indagini e studi.

Per la medesima ragione, la fattispecie "esecuzione di studi e indagini" risulta non ricomprendere alcun intervento in quanto per gli interventi per i quali in passato era stata indicata questa fase, ormai completata, sono attualmente in corso di progettazione o di esecuzione, oppure in attesa di avvio.

Tabella 6: riepilogo dello stato di attuazione degli interventi.

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	***n. interventi al dicembre 2012***
Attesa di avvio	*n. 70*
Esecuzione studi ed indagini	*n. 0*
In corso di progettazione	*n. 14*
Progettazione ultimata	*n. 8*
Lavori aggiudicati	*n. 4*
In esecuzione	*n. 60*
Lavori ultimati (collaudati e non)	*n. 94*
Totale interventi finanziati	*n. 250*

8. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO PER L'ANNUALITÀ 2013

Nell'annualità 2013 si darà corso all'attuazione degli interventi previsti per le annualità 2011 e, in parte, 2012 che alla fine dell'anno di riferimento non risultavano coperti da risorse: si tratta della programmazione individuata per l'assegnazione dei fondi CIPE, per complessivi € 18.200.000,00 (Delibera n. 6/2012), oltre a ulteriori interventi per un totale di € 6.152.311,53 (risorse dal Bilancio del Ministero).

Ai 36 interventi finanziati con le risorse FSC è stata assegnata la priorità e pertanto per essi si prevede di arrivare al 31/12/2013 con tutti i lavori aggiudicati o in corso di esecuzione.

Le risorse ministeriali coprono il fabbisogno finanziario di ulteriori 10 interventi: per 2 di essi, cui corrisponde una complessità progettuale maggiore, si prevede di completare la progettazione al 31/12/2013; per i restanti 8 si conta di pervenire all'aggiudicazione dei lavori alla fine dell'anno.

9. CRITICITÀ

Ad oggi la criticità di maggior peso rispetto all'attuazione dell'Accordo è costituita dalla mancanza di certezze circa la disponibilità delle risorse non ancora trasferite.

In particolare, come si evince dalla Tabella 5, alla Regione Emilia-Romagna non risultano assegnati € 23.668.400,00, relativi ai fondi ex art. 2, comma 240 della Legge n. 191/2009 originariamente previsti dall'Atto integrativo sottoscritto nel maggio 2011, oltre a € 9.007.600,00 trasferiti alla fase programmatica.

Preme nuovamente sottolineare l'urgenza di provvedere quanto prima al trasferimento delle suddette somme: le ragioni risiedono non solo nella necessità di garantire la realizzazione in tempi brevi di interventi unanimemente riconosciuti come urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, ma anche nel fatto che tali interventi sono in parte localizzati in un territorio duramente colpito dai recenti eventi sismici.

Si pone infine un problema di ordine normativo: l'art. 12 del D.L. n. 98/2011, convertito con L. n. 111/2011, come integrato dall'art. 1, comma 138 della legge 24/12/2012, n. 228 (c.d. Legge di Stabilità 2013) introduce forti limitazioni alla capacità delle pubbliche amministrazioni di acquistare immobili a titolo oneroso. Più precisamente nella norma si danno disposizioni di divieto assoluto di acquisto per l'annualità 2013, acquisto condizionato all'indispensabilità e all'indilazionabilità dello stesso per l'annualità 2014.

L'attuazione di tale norma costituisce un potenziale ostacolo alla realizzazione di interventi di difesa del suolo ove questi coinvolgano terreni privati – circostanza peraltro assai frequente - in ragione della sua applicabilità anche all'acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità (art. 12): a fronte del divieto di dare compimento alle necessarie procedure di esproprio, l'Amministrazione sarà infatti obbligata a corrispondere indennizzi di occupazione delle aree sino a che non sia possibile concludere l'acquisizione definitiva, con un aggravio di ordine finanziario e procedurale non trascurabile nel quadro complessivo degli interventi previsti dall'Accordo.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Relazione annuale anno 2012

Relazione sulle attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 03/03/2011

01/01/2013

Commissario Straordinario Delegato per la Regione Friuli Venezia Giulia

Commissario dott. Vittorio Capocelli

1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Regione	**FRIULI VENEZIA GIULIA**
Commissario straordinario delegato	**DOTT. VITTORIO CAPOCELLI**
Decreto nomina	***D.P.C.M 03/03/2011***
Data sottoscrizione Accordo	***31/01/2011***
Data sottoscrizione Accordo Integrativo	***14/07/2011***
Importo complessivo assentito in Accordo	***32.274.100,00***
Importo programmato per il periodo (anno 2012)	***4.131.512,11***
Importo speso per il periodo (anno 2012)	***zero***

Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno 2012)	***zero***

1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

Le attività Commissariali si inseriscono nel contesto degli interventi di difesa del suolo della Regione F.V.G., da finanziarsi con fondi ministeriali e con fondi regionali, nell'ambito dell'Accordo di Programma Finalizzato alla Programmazione e al Finanziamento di Interventi Urgenti e Priorità per la mitigazione del Rischio Idrogeologico, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il 31 gennaio 2011, e dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma (anzidetto) stipulato il 14 luglio 2011, nel quale ultimo vengono riprogrammati gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da realizzarsi nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, così come definito nella sezione attuativa e nella sezione programmatica dell'Allegato 1 costituente parte integrante dell'Atto Integrativo stesso.

1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

La struttura Commissariale, dal punto di vista logistico, si articola su più postazioni, rispettivamente ubicate presso gli Uffici Regionali della Direzione Centrale Ambiente, in Trieste via Giulia, e presso gli Uffici Regionali delle Infrastrutture Civili e dell'Idraulica, in Pordenone in viale Oberdan, ove preminentemente opera il Commissario allocato in apposito Ufficio Direzionale dedicato.

Quanto alle risorse umane, con decreto del Direttore Centrale Funzione Pubblica della Regione F.V.G. del 19/9/2012 venivano messi a disposizione del Commissario, per gli avvalimenti, nei limiti e nelle forme previste dell'Accordo di Programma e da apposita Convenzione tra Commissario e Regione, sottoscritta in data 6 agosto 2012, n.9 unità di personale di varia qualifica, 7 operanti presso la sede di Trieste e 2 presso la sede di Pordenone.

Presso detta ultima, in forza di Convenzione tra Commissario e Prefetto di Pordenone, formalizzata in data 3 maggio 2012, venivano destinate n.2 unità appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno, di cui una con qualifica direttiva amministrativo-contabile e l'altra subalterna. Le prestazioni dei dipendenti prefettizi restano ancorate e regolamentate secondo Accordo di Programma e Convenzione di riferimento.

1.4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente			
Importo corrente *(per l'anno 2012)*	***Importo cumulato*** *(anno 2012 + precedente periodo)*	***Speso***	***Residuo***
3.106.839,03	*5.008.435,19*	*////////*	*5.008.435,19*

Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti *(precisare)*			
Importo corrente *(per l'anno 2012)*	***Importo cumulato*** *(anno 2012 + precedente periodo)*	***Speso***	***Residuo***
2.800.000,00	*////////*	*////////*	*2.800.000,00*

1.5. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

Descrizione attività	***Importo speso corrente*** *(per l'anno 2012)*	***Importo speso cumulato*** *(anno 2012 + precedente periodo)*
struttura commissariale	*101.259,64*	*//////*
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.		

1.6. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

Vedi allegato 1-prospetto entrate ed uscite di cassa, allegato 2 prospetto incluso con gli impegni per decreti di avvallimento agli enti realizzatori degli interventi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012

1.7. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

1.7.1 Descrizione delle attività

In forza di concerti organizzativi, il 6 agosto 2012 si perveniva a stipula di Convenzione, tra la Regione F.V.G. e Commissario, per l'avvalimento alla struttura Commissariale ed alla pedissequa messa a disposizione delle ordinate risorse regionali.

Il 9 agosto successivo, presso gli Uffici Ministeriali, cui i Commissari erano stati convenuti, si produceva dal Commissario documentata relazione sull'attività svolta ed in succedanea convocazione si teneva complementare consulto con il vertice Ministeriale con produzione, da parte Commissariale, di propositivi riferimenti per la elaborazione di linee guida per la gestione Commissariale.

Quanto alle attività dispiegate a livello locale, si evidenziano i reiterati approcci per acquisire la disponibilità alla realizzazione delle opere in A.d.P., avviati con preliminari ricognizioni tecniche e indagini su criticità e fattibilità. Ne conseguivano, dagli Enti locali officiati, formali declaratorie di adesione, siccome di seguito succintamente rassegnate:

a) Comune di Sacile, disponibile ad assumere realizzazione lavori in A.d.P., cod. PN 012 A/10, per importo di euro 1.250.000,00;

b) Comune di Prata di PN: disponibilità alla realizzazione di intervento in località, per importo di euro 1.000.000,00;

c) Regione F.V.G. – Servizio difesa del suolo: prodromico incontro declaratorio disponibilità Regionale ad assumere realizzazione intervento in Caneva (PN), località Fratte, per importo di euro 800.000,00;

d) Comune di Brugnera: disponibilità assumere realizzazione intervento in loc. S. Cassiano, dell'importo di euro 1.250.000,00 ;

e) Comune di Tarvisio (UD): disponibilità a realizzare intervento in Tarvisio (cod. UD 0248/10) per importo di euro 140.000,00;

f) Comune di Trasaghis (UD) disponibilità a realizzare intervento (cod. UD 023 B/10) in frazioni Avasinis e Braulins, dell'importo di euro 210.000.

In apposito incontro del 7/11/2012, presso il Genio Civile di PN, tra Commissario e Dirigenti Ufficio Genio Civile dell'intero F.V.G., si conveniva su opportunità di procedere ad eventuale riprogrammazione degli interventi, sulla base della quale rielaborare aggiornato prospetto degli interventi prioritari (in luogo di quello redatto e trasmesso il 7/2/2012), da sottoporre poi al Comitato di Controllo e di Indirizzo presso il Ministero dell'Ambiente. Si conveniva, a tal riguardo, che il Genio Civile facesse eventualmente tenere dati ed elementi di valutazione prima sconosciuti agli uffici Regionali e Commissariali.

Generica la disponibilità del Genio Civile alla realizzazione di interventi in A.d.P., eventualmente da definire in prosieguo.

In punto di criticità / ritardi, è d'uopo rimarcare la correlazione degli stessi ai rinvii degli assetti organizzativi, negli ambiti dell'Ente Regione, nelle more della definitoria conferma delle risorse statali, da una parte,e di quelle Regionali, per gli interventi finanziabili dall'Ente locale.

Sulle problematiche derivanti dalla incerta e ritardata somministrazione di risorse statali si innestavano fattivi interventi Commissariali postulanti le dotazioni necessarie all'attuazione dell'A.d.P..

Circa le criticità afferenti la definizione di problematiche correlate alla ritardata corresponsione di risorse regionali, anche qui l'attività ed il reiterato consulto tra Commissario, Regione e Ministero valevano a sortire positivi risultati. Restavano, tuttavia, problematiche pendenze in ordine alla definizione di quegli interventi già di propria iniziativa avviati dalla

Regione fuori del contesto Commissariale, di cui è perdurante attesa di benestare Ministeriale alla ipotizzata soluzione attraverso specifica convenzione Regione – Commissario.

1.7.2 Livello di attuazione globale degli interventi

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	*n. interventi al dicembre 2012*	*n. interventi al dicembre 2011*
Attesa di avvio	*n. 14*	*n. 23*
Esecuzione studi ed indagini	*n. 3*	*n. 0*
In corso di progettazione	*n. 3*	*n. 0*
Progettazione ultimata	*n. 12*	*n. 9*
Lavori aggiudicati	*n. 0*	*n. 0*
In esecuzione	*n. 0*	*n. 0*
Lavori ultimati (collaudati e non)	*n. 0*	*n. 0*
Totale interventi finanziati	*32*	

1.8. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2013

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	*n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2013*
Attesa di avvio	*n. 4*
Esecuzione studi ed indagini	*n. 2*
In corso di progettazione	*n. 3*
Progettazione ultimata	*n. 7*
Lavori aggiudicati	*n. 5*
In esecuzione	*n. 2*
Lavori ultimati (collaudati e non)	*n. 9*
Totale interventi finanziati	*32*

1.9. CRITICITA'

L'inadeguatezza di risorse per l'attuazione degli interventi finanziati con fondi statali costituiscono motivo di forte preoccupazione in ambito Commissariale e Regionale per le ricadute sull'intero processo attuativo e sugli articolati connessi. Da tanto si ponevano in atto concreti interventi da parte Commissariale per indurre, intanto, a compimento le propedeutiche organizzatorie in concerto con la Regione, nonché quelle iniziative utili presso gli altri Enti, associati in comunanza di interessi per l'espletamento delle incombenze commissariali, quali Genio Civile, Comuni di ubicazione dei presupposti interventi, Prefettura di Pordenone, Agenzia delle Entrate, INPS.

Il Convegno presso gli Uffici Ministeriali alla data del 30 gennaio 2012 e le contestuali iniziative Commissariali e Regionali di sostegno concorrevano a risolvere le criticità finanziarie attinenti gli interventi finanziati dallo Stato.

Peraltro incideva sull'attività del Commissario il ritardo nel trasferimento dei fondi della Regione alla contabilità speciale Commissariale, trasferimenti poi disposti dietro specifici indirizzi definiti dal Comitato di Controllo ed Indirizzo, convocato, a richiesta della Regione F.V.G, presso il Ministero dell'Ambiente, alla data del 14 maggio 2012, Ministero interpellato all'uopo e su altri temi, quali:

- programmazione delle attività in relazione alle incerte tempistiche delle risorse statali;
- criticità nei coordinamenti previsti e vincolati nell'Accordo di Programma con interventi complementari gestiti dalla Regione;
- individuazione degli Enti realizzatori;
- concomitanza con altra gestione Commissariale, in ambito di interventi relativi al Comprensorio minerario di Cave del Predil (UD);
- riserva del Magistrato alle acque di Venezia circa interventi di sua competenza pur inseriti nell'articolato dell'Accordo di Programma.

1.10. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Durante l'anno 2012, le difficoltà di attuazione degli interventi sono riconducibili principalmente ai ridotti trasferimenti delle risorse finanziarie alla contabilità speciale Commissariale. Ogni atto del commissario deve avere preventiva copertura di cassa, e la disponibilità ad inizio anno di risorse ministeriali per euro 4.131.512,11 ha permesso l'avvio delle procedure di avvalimento per soli 4 Enti. Il trasferimento delle risorse regionali, avvenuto nel mese di novembre 2012, permetterà l'avvio dei rispettivi interventi (8) solo con l'annualità entrante.

La mancata conferma entro l'anno 2012 da parte del Ministero in merito ai contenuti della convenzione stipulata dal Commissario e dalla Regione FVG in data 6 agosto 2012, ha rallentato l'avvio di 9 interventi già coperti con risorse regionali, cantierabili con fase progettuale conclusa.

Le previsioni per l'annualità 2013 si basano sull'ipotesi di previsto trasferimento alla contabilità speciale delle risorse regionali libere rimanenti (2 interventi) e di risorse ministeriali pari ad euro 11.400.000. Il trasferimento di tali risorse, se interamente o per acconti, condizionerà di conseguenza il raggiungimento dei risultati programmati.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Dott. Vittorio Capocelli

COMMISSARIO RISCHIO IDROGEOLOGICO FRIULI VENEZIA GIULIA ALL.1

PROSPETTO ECONOMICO FINANZIARIO AL 31.12.12 (COMPRESO ANNO 2011)

DATA	FONDI RICEVUTI		SPESE /USCITE	DATA ORDINATIVO	TIPOLOGIA SPESA
	STATALI	REGIONALI			
17/01/11	€ 458.214,80	€ 0,00	€ 781,06	22/02/12	SPESE MISSIONI
15/12/11	€ 1.443.381,36	€ 0,00	€ 386,70	05/03/12	SPESE MISSIONI
18/09/12	€ 876.923,08		€ 398,20	17/05/12	SPESE MISSIONI
18/10/12	€ 2.229.915,95		€ 50.378,49	15/06/12	INDENNITA' COMMISSARIO anno 2011
28/11/12		€ 350.000,00	€ 7.761,78	15/06/12	IRAP RITENUTE
			€ 39.265,45	15/06/12	IRPEF RITENUTE su indennità commissario
14/12/12		€ 2.450.000,00	€ 1.123,17	15/06/12	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF
			€ 547,89	15/06/12	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
			€ 304,70	03/09/12	SPESE MISSIONI
			€ 312,20	13/09/12	SPESE MISSIONI
TOTALE	**€ 5.008.435,19**	**€ 2.800.000,00**	**€ 101.259,64**		
	RIEPILOGO ENTRATE				
	STATALI	**€ 5.008.435,19**			
	REGIONALI	**€ 2.800.000,00**			
TOTALE	ENTRATE	**€ 7.808.435,19**			
	RIEPILOGO SPESE				
	SPESE INTERVENTI	€ 0,00			
	SPESE FUNZION.	**€ 101.259,64**			
TOTALE SPESE		**€ 101.259,64**			
	SALDO DI CASSA AL 31/12/2012	**€ 7.707.175,55**			

COMMISSARIO RISCHIO IDROGEOLOGICO FRIULI VENEZIA GIULIA ALL. 2

PROSPETTO ECONOMICO FINANZIARIO AL 31/12/2012 (COMPRESO ANNO 2011)

DATA	FONDI RICEVUTI		IMPEGNI	CREDITORE	SPESE /USCITE	DATA ORDINATIVO	TIPOLOGIA SPESA
	STATALI	REGIONALI					
17/01/11	€ 458.214,80	€ 0,00			€ 781,06	22/02/12	SPESE MISSIONI
15/12/11	€ 1.443.381,36	€ 0,00			€ 386,70	05/03/12	SPESE MISSIONI
18/09/12	€ 876.923,08				€ 398,20	17/05/12	SPESE MISSIONI
12/10/12			€ 1.250.000,00	COMUNE SACILE			
12/10/12			€ 1.000.000,00	COMUNE PRATA			
18/10/12	€ 2.229.915,95				€ 50.378,49	15/06/12	INDENNITA' COMMISSARIO anno 2011
28/11/12		€ 350.000,00			€ 7.761,78	15/06/12	IRAP RITENUTE
03/12/12			€ 800.000,00	REGIONE F.V.G	€ 39.265,45	15/06/12	IRPEF RITENUTE su indennità commissario
14/12/12		€ 2.450.000,00			€ 1.123,17	15/06/12	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF
					€ 547,89	15/06/12	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
					€ 304,70	03/09/12	SPESE MISSIONI
					€ 312,20	13/09/12	SPESE MISSIONI
TOTALE	€ 5.008.435,19	€ 2.800.000,00	€ 3.050.000,00	€ 0,00	€ 101.259,64		
	RIEPILOGO ENTRATE						
	STATALI	€ 5.008.435,19					
	REGIONALI	€ 2.800.000,00					
TOTALE	ENTRATE	€ 7.808.435,19					
	RIEPILOGO SPESE						
	SPESE INTERVENTI	€ 0,00					
	SPESE FUNZION.	€ 101.259,64					
TOTALE SPESE		€ 101.259,64					
	SALDO DI CASSA AL 31/12/2012	€ 7.707.175,55					

PAGINA BIANCA

LAZIO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Relazione annuale anno 2012

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. del 7/11/2011

18/03/2013
Commissario Straordinario Delegato
Dott. Vincenzo Santoro

1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Compilare la tabella sottostante

Regione	Lazio
Commissario straordinario delegato	Vincenzo Santoro
Decreto nomina	*D.P.C.M. del 7/11/2011*
Data sottoscrizione Accordo	*15/07/2010*
Data sottoscrizione Accordo Integrativo	*15/07/2010*
Importo complessivo assentito in Accordo	*90.000.000,00*
Importo programmato per il periodo (anno 2012)	*634.267,18*
Importo speso per il periodo (anno 2012)	*634.267,18*
Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno 2012)	

1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

Descrivere il contesto in cui si inseriscono le attività commissariali a livello regionale

In data 15 luglio 2010 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio un Accordo di Programma (AP) finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 240, della Legge 23 gennaio 2009, n. 191.

Con D.P.C.M. del 7.11.2011 è stato nominato il Dott. Vincenzo Santoro, Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 del suddetto Accordo di programma da effettuare nel territorio della Regione Lazio.

1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

Descrivere la struttura commissariale (risorse umane dedicate, ufficio dedicato, ecc.)

L'attività del Commissario straordinario delegato dal punto di vista logistico viene svolta all'interno della struttura della Regione Lazio.

Il Commissario, per l'espletamento delle attività di cui all'accordo di programma, si avvale del personale degli uffici della Regione Lazio, infatti con decreto n. 2 del 29/9/2011 ha costituito un gruppo di lavoro composto da personale interno della Regione.

Tale gruppo di lavoro è formato da figure professionali in grado di svolgere gli incarichi di supporto tecnico- amministrativo alle attività del Commissario Straordinario delegato nelle varie fasi relative alla progettazione, espletamento delle gare di appalto ed esecuzione dei lavori degli interventi individuati nell'Allegato 1 del suddetto Accordo di programma da effettuare nel territorio della Regione Lazio.

Ha proceduto inoltre, all'assunzione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di un soggetto esterno per lo svolgimento delle attività a supporto dell'Ufficio del Commissario.

1.4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente			
Importo corrente *(per l'anno 2012)*	***Importo cumulato*** *(anno 2012 + precedente periodo)*	***Speso***	***Residuo***
2.440.508,27	2.440.508,27	0	2.440.508,27

Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti (precisare)			
Importo corrente *(per l'anno 2012)*	***Importo cumulato*** *(anno 2012 + precedente periodo)*	***Speso***	***Residuo***
XXXX	XXXXX	XXX	XXX

1.5. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

Indicare per ciascuna delle attività indicate nella seguente tabella il relativo stato di rendicontazione della spesa, considerando esclusivamente quanto effettivamente pagato.

Descrizione attività	***Importo speso corrente*** *(per l'anno 2012)*	***Importo speso cumulato*** *(anno 2012 + precedente periodo)*
struttura commissariale		
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.		

In corso di progettazione	n. 22	n. XXXX
Progettazione ultimata	n. 15	n. XXXX
Lavori aggiudicati	n. 1	n. XXXX
In esecuzione	n. 3	n. XXXX
Lavori ultimati (collaudati e non)	n. 1	n. XXXX
Totale interventi finanziati	59	

1.8. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2013

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	*n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2013*
Attesa di avvio	n. 9
Esecuzione studi ed indagini	n. 5
In corso di progettazione	n. 4
Progettazione ultimata	n. 19
Lavori aggiudicati	n. 3
In esecuzione	n. 16
Lavori ultimati (collaudati e non)	n. 3
Totale interventi finanziati	59

1.9. CRITICITA'

Le maggiori criticità che hanno portato ad un rallentamento iniziale, si sono avute maggiormente nelle procedure di acquisizione dei pareri da parte degli organi competenti. Si evidenzia che pur essendo state espletate le conferenze di servizi, per alcuni lavori da effettuare soprattutto nel Comune di Roma, trattandosi di zone archeologiche è stato necessario acquisire pareri specifici da parte delle Soprintendenze archeologiche con conseguente rallentamento della tempistica prevista in fase di progettazione esecutiva.

1.10. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

In conclusione, come si evince dall'avanzamento dei lavori, tutti gli interventi previsti nell'Accordo di programma sono stati attivati. Per l'appalto degli interventi sono state esperite gare ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa del codice degli appalti D.L.vo n. 163 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

LIGURIA

IL COMMISSARIO DELEGATO
(ex D.P.C.M. dell'11.10.2010)

con sede c/o il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e Liguria
Genova – Viale Brigate Partigiane n. 2 – Tel. 010/5762.364 – Fax. 010/540017

Prot. n. 2/2013 *Genova, 15 Gennaio 2013*

All'attenzione del
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0005494 - 21/01/2013

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche
Direttore Generale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

All'attenzione dell'

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ispettorato Generale Emergenza Idrogeologica
Ing. Mauro Luciani
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA

All'attenzione del

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ispettorato Generale
Dott. Antonio Perrone
Via Cristoforo Colombo, 44

e p.c.

Al Presidente della Regione Liguria
Dott. Ing. Claudio Burlando
Piazza De Ferrari, 1
16100 GENOVA

OGGETTO: Lavori di intervento sul Torrente Bisagno – 2° lotto-2° stralcio-
Relazione attività gestione commissariale anno 2012.

Fornisco, con la presente relazione, le notizie di rilievo in ordine all'attività della gestione commissariale posta in essere durante il 2012.

Premetto che dalla data del mio insediamento al 7 marzo 2012, data di consegna da parte dell'apposita Commissione di gara degli atti della procedura concorsuale, erano stati sostanzialmente rispettati i tempi rispetto al cronoprogramma a suo tempo formulato per la realizzazione dei lavori di rifunzionalizzazione della copertura del Bisagno.

Ed infatti i progettisti incaricati di aggiornare in parte qua il progetto relativo all'intervento completo sul Bisagno, già nel settembre 2011 avevano presentato il c.d. "definitivo" che venne posto a base della gara conclusasi il 19 dicembre 2011.

oooooooooooooo

Nei giorni 8 e 9 marzo 2012 ho provveduto a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal Codice degli appalti, ivi compresa l'aggiudicazione provvisoria all'Impresa qualificatasi prima.

Tale ultimo relativo provvedimento è stato registrato dalla Corte dei Conti, senza alcun rilievo.

Debbo annotare che l'aggiudicazione provvisoria alla quale ero pervenuto in tempi ragionevolmente brevi, ha seguito purtroppo l'avvio di un contenzioso davanti alla giurisdizione amministrativa che si trascina da allora e che nei fatti ad oggi ha bloccato l'opera.

oooooooooooooo

In estrema sintesi si è verificato che la Commissione di gara ha escluso 10 Imprese (su 16 che avevano partecipato), per avere le stesse presentato varianti sostanziali al progetto definitivo, categoricamente escluse dal Bando.

La fase comparativa tra offerta tecnica ed offerta economica è stata quindi limitata alle rimanenti 6 imprese, che avevano presentato migliorie tecniche, ammesse dal disciplinare allegato al Bando.

Ritenendo di essere state illegittimamente escluse, 2 delle 10 Imprese hanno fatto ricorso al T.A.R. Lazio e poi si sono li appellate al Consiglio di Stato.

In entrambe le sedi è stata respinta la richiesta della misura cautelare della sospensiva dell'aggiudicazione provvisoria.

Altre 2 Imprese (sempre tra le escluse) si sono invece rivolte al T.A.R. Liguria che, nell'unificare i ricorsi, il 7 aprile ha respinto la richiesta di "sospensiva" rimandando al 12 luglio successivo la decisione di merito.

In quest'ultima data, anziché decidere, come preannunciato, il predetto T.A.R. ha incaricato il Dipartimento della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova di nominare un tecnico allo scopo di accertare attraverso una verifica "se sia ragionevole ritenere che le soluzioni tecniche rispettivamente proposte dai ricorrenti principali e dall'impresa aggiudicataria siano tali da alterare i caratteri essenziali del progetto definitivo".

L'udienza di merito è stata fissata prima al 15 novembre, poi al 29 successivo ed infine al 13 dicembre con la contestuale convocazione del sottoscritto.

In quella sede i 3 verificatori incaricati dal Dipartimento di Ingegneria, in contraddittorio con il consulente della gestione commissariale e quello dell'Impresa aggiudicataria hanno disquisito anche in maniera aspra sugli esiti della verifica, ritenuta superficiale ed infondata nelle conclusioni, in quanto sostanzialmente è data ragione alle 2 imprese ricorrenti.

Come riferito con e-mail del 14 dicembre u.s. il T.A.R. nel prendere atto delle reciproche posizioni ha conclusivamente rinviato al 23 gennaio la decisione sul contenzioso avviato dalle Imprese.

°°°°°°°°°°°°°°°

Per obbligo istituzionale mi astengo dal formulare qualsiasi giudizio sulle modalità procedurali seguite dal T.A.R. e sui tempi per pervenire ad una decisione.

Come ho avuto occasione di riferire nel corso dell'incarico, esistono nella Città di Genova e segnatamente presso il Comune e la stessa Regione che – come è noto – ha cofinanziato l'opera, notevoli aspettative per la realizzazione dell'opera, atteso che l'adeguamento idraulico - funzionale del Bisagno potrà contribuire ad evitare per il futuro il ripetersi di tragedie registrate in passato e per ultimo il 4 novembre 2011.

1.6. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

FONDI RICEVUTI ENTRATE		IMPORTI EROGATI USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1 es.	€ 1.754.713,46	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari		1) Redditi da lavoro dipendente	€ 52.435,03
2) Fondi Statali	€ 58.245.286,54	2) Consumi intermedi	
3) Fondi Regionali	€ 68.300,00	3) Interessi passivi	
4) Fonti di Enti Locali		4) Trasferimenti a Regioni	
5) Tariffe e Proventi per servizi		5) Trasferimenti a Enti Locali	
6) Accensione Prestiti		6) Investimenti diretti	€ 508.635,41
7) Versamenti errati stornati	€ 2.794.505,60	7) Trasferimenti in c/capitale	
8) Versamenti errati da stornare	€ 2.253.387,30	8) Rimborso prestiti	
		9) Versamenti erariali	€ 56.980,65
		10) Versamenti previdenziali	€ 18.216,09
		11) Versamenti errati stornati	€ 2.794.505,60
		Totale uscite	€ 3.428.772,78
		12) Titoli inestinti e	
Totale al 31/12	€ 65.116.192,90	accantonamenti di tesoreria	
		Disponibilità di cassa	€ 61.687.420,12
		Totale a pareggio	€ 65.116.192,90

1.7. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

1.7.1 Descrizione delle attività

Tutte le attività sono svolte a livello centrale dal Commissario e dalla sua struttura, mentre sono state trasferite a livello locale per una maggiore collaborazione con i Comuni, la redazione delle progettazioni dei vari interventi. Le criticità maggiori si sono avute soprattutto nell'acquisizione dei pareri da parte dei vari Enti competenti in materia (Soprintendenze, Genio civile).

1.7.2 Livello di attuazione globale degli interventi

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	*n. interventi al dicembre 2012*	*n. interventi al dicembre 2011*
Attesa di avvio	*n 14*	*n. XXXX*
Esecuzione studi ed indagini	*n 3*	*n XXXX*

Ovviamente dette aspettative, almeno ad oggi, risultano disattese se sono vere, come lo sono, le vicende che ho dinanzi illustrato.

Il Commissario delegato
(Romano)

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Relazione annuale anno 2012

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 10 dicembre 2010

18/02/2013

Commissario Straordinario Delegato
Carlo Maria Marino

1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Regione	**LOMBARDIA**
Commissario straordinario delegato	**CARLO MARIA MARINO**
Decreto nomina	***10 DICEMBRE 2010***
Data sottoscrizione Accordo	***4 NOVEMBRE 2010***
Data sottoscrizione Accordo Integrativo	***19 MAGGIO 2011***
Importo complessivo assentito in Accordo	**217.640.700,00**
Importo programmato per il periodo (anno 2012)	***69.421.700,00***
Importo speso per il periodo (anno 2012)	**23.406.428,57**
Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno 2012)	**43.204.838,80**

1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

Nel 2012 in Lombardia vi sono stati alcuni dissesti diffusi; tre sono stati gli eventi principali:

1. **Comune di Gargnano (BS)** – nel mese di marzo 2012 si sono staccate alcune frane di crollo dal monte Comer che hanno messo a rischio le abitazioni a nord del paese e la Strada statale Gardesana. Valutato il progetto di massima presentato dal Comune, sono stati stanziati nell'ambito della rimodulazione dell'Accordo di Programma 2 M€ per le opere di messa insicurezza dell'abitato e della strada statale.
2. **Comune di Sonico (BS)** – il 27 agosto 2012 una grossa colata detritica proveniente dalla Val Rabbia (circa 300.000 m^3) ha distrutto il ponte di collegamento con la frazione di Rino, interrotto la strada statale del Passo del Tonale e deviato il corso del fiume Oglio; per fronteggiare la situazione è stato accelerato un progetto già in corso, finanziato con i fondi della l.102/90, che prevede la ricostruzione del ponte di collegamento con la frazione di Rino, con una luce più ampia, e l'eliminazione dell'attuale strozzatura d'alveo che può provocare la fuoriuscita della colata nel centro abitato. Sono inoltre in corso le opere di rimozione del materiale accumulatosi sul fondovalle, con ripristino della funzionalità dell'alveo del fiume Oglio ed è attivo il monitoraggio della frana denominata Pal, lungo il torrente Rabbia, di cui si è mobilizzata una porzione del volume stimato di circa 2.5 M di m^3. Regione Lombardia ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare per questo intervento economie a valere su precedenti ordinanze ministeriali per un importo di circa 1 M€ per far fronte alle necessità iniziali.
3. **Comune di Somma Lombardo (VA)** – una frana si è innescata in località Belvedere a causa della rottura degli scarichi delle acque meteoriche del territorio comunale ed è in corso

un'inchiesta della Magistratura per l'accertamento delle responsabilità. Il Comune ha eseguito le opere di rispristino delle condotte e di prima sistemazione del versante. Regione Lombardia ha stanziato 1 M€ ed ha riconosciuto al Comune la quota parte delle spese sostenute per la salvaguardia delle infrastrutture regionali coinvolte (Diga di Panperduto, strada alzaia e alveo del fiume Ticino). La progettazione delle opere di ripristino della morfologia e dei valori paesaggistico-ambientali del versante è stata affidata da Regione Lombardia al Consorzio Est Ticino Villoresi, con un finanziamento di 575.000 €.

Altre segnalazioni importanti di situazioni di rischio idrogeologico sono pervenute al Ministero dell'Ambiente da parte di Enti locali della Lombardia; per tali questioni si segnala quanto segue:

- **Comune di San Cipriano Po (PV)** – l'intervento era stato già inserito nel Progetto Valle Po presentato dall'Autorità di Bacino del fiume Po che non è stato poi finanziato. Il Comune di San Cipriano Po ha messo a disposizione fondi per procedere alla progettazione dell'argine, mentre l'Agenzia Interregionale per il fiume Po si è detta disponibile a trovare i necessari finanziamenti per realizzare l'opera.
- **Comune di Monticelli Pavese (PV)** – l'intervento era stato già inserito nel Progetto Valle Po presentato dall'Autorità di Bacino del fiume Po che non è stato poi finanziato. Trattandosi di adeguamento arginale alle quote SIMPO di un argine maestro esistente l'opera potrà essere presa in considerazione nelle future programmazioni.
- **Comune di Como (CO)** – le opere di difesa e protezione dalle esondazioni del lungolago di Como, intervento in corso e finanziato con i fondi della l. 102/90, hanno avuto diversi problemi di tipo tecnico e di impatto paesaggistico; sono state già concordate e finanziate da Regione Lombardia 2 varianti in corso d'opera ed è in fase di definizione con il Comune di Como la terza variante definitiva e conclusiva del progetto per la quale Regione Lombardia ha messo a disposizione ulteriori 5 M€.
- **Comune di Cassano d'Adda (MI)** – l'ammodernamento dell'attuale traversa del Canale Retorto, sul fiume Adda, ed in particolare la ristrutturazione dell'opera di presa, è stata inserita negli interventi in fase programmatica nella rimodulazione dell'Accordo di programma proposta nella riunione del Comitato di indirizzo e controllo del 26 luglio 2011, per un importo previsto di 3 M€.

1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

A far tempo dal 5 aprile 2011 è stato reso disponibile, e da subito completamente funzionale, l'ufficio del Commissario presso la Regione Lombardia nella nuova sede di Piazza Città di Lombardia 1 in Milano. Detto ufficio si trova in contiguità con le strutture regionali in avvalimento garantendo così al meglio la sinergia necessaria per dare veloce seguito alle azioni previste dall'ADP.

In data 14/03/2011 il Commissario straordinario ha provveduto all'emissione di un decreto di avvalimento con il quale ha individuato in Regione Lombardia, nella Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, la struttura principale per le attività tecnico amministrative e di coordinamento connesse all'attuazione degli interventi urgenti e prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui all'Accordo di programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Le unità di personale che si occupano, in funzione delle necessità operative, degli interventi dell'Accordo di programma e delle attività amministrative connesse sono composte da 2 dirigenti, 3 quadri e 6 funzionari.

Il Commissario ha inoltre individuato le seguenti strutture regionali di cui avvalersi per gli aspetti di competenza in relazione all'attuazione dell'Accordo di Programma:

- Direzione Generale Protezione Civile, polizia locale e sicurezza e la Direzione Generale Sistemi verdi e paesaggio;
- Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria della Direzione Centrale Programmazione integrata, per gli aspetti relativi ai capitoli di bilancio;
- Unità Organizzativa Servizio Giuridico regionale e avvocatura, della Direzione Centrale Affari istituzionali e Legislativo, per le questioni legali e giuridiche;
- Unità Organizzativa Sistema dei Controlli e Coordinamento Organismi indipendenti, per le procedure relative ai controlli amministrativi;
- Struttura Valutazione di Impatto ambientale della Direzione generale Ambiente, Energia e Reti, per le verifiche di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Struttura Programmazione Comunitaria e attuazione del PAR 2007-2013 del FAS, della Direzione Centrale Programmazione Integrata, per la gestione dei fondi FAS regionali;
- Sedi Territoriali di Regione Lombardia, per i controlli a livello locale degli interventi e per i pareri e le autorizzazioni di competenza.

Nello stesso decreto è stata anticipata l'individuazione della tipologia degli Enti attuatori degli interventi, di cui all'Accordo di Programma, presa anche visione dei criteri di individuazione di cui alla d.g.r. 21 marzo 2007, n. 4369, tra Comuni, Comunità Montane, Province, Consorzi, Parchi ed Enti del Sistema Regionale.

1.4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente			
Importo corrente *(per l'anno 2012)*	***Importo cumulato*** *(anno 2012 + precedente periodo)*	***Speso***	***Residuo***
11.817.533,72	34.869.230,77	14.011.811,69	20.857.419,08*

*di cui 20.295.958,31 impegnati

Risorse economiche provenienti dalla Regione			
Importo corrente *(per l'anno 2012)*	***Importo cumulato*** *(anno 2012 + precedente periodo)*	***Speso***	***Residuo***
38.961.242,63	79.836.178,68	34.969.829,59	44.866.349,09*

*di cui 22.908.880,49 impegnati



1.5. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

Descrizione attività	***Importo speso corrente*** *(per l'anno 2012)*	***Importo speso cumulato*** *(anno 2012 + precedente periodo)*
struttura commissariale	*152.641,89*	*262.687,40*
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	*23.253.786,68*	*48.718.953,88*

1.6. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

ENTRATE	
Giacenza di cassa al 1/1/2012	38.351.420,39
1) Fondi Statali	11.817.533,72
2) Fondi regionali	38.961.242,63
Totale al 31 dicembre 2012	**89.130.196,74**

USCITE	
Tipologia di spesa:	
A) redditi da lavoro	44.584,45
B) consumi intermedi	3.634,80
C) interessi passivi	0,00
D) trasferimenti a Enti regionali	13.466.383,22
E) trasferimenti ad Enti Locali	9.847.403,46
F) investimenti diretti	0,00
G) trasferimenti in c/capitale	0,00
H) rimborso prestiti	0,00
I) versamenti erariali	30.183,26
L) versamenti previdenziali	14.239,38
M) altro	0,00
TOTALE USCITE	**23.406.428,57**
disponibilità di cassa	65.723.768,17*
Totale a pareggio	**89.130.196,74**

*di cui già impegnati € 40.204.483,80

1.7 STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

1.7.1 Descrizione delle attività

Sono state stipulate tutte le convenzioni con gli Enti Attuatori, per un totale di **158** interventi attivati; per altri **4** interventi già in corso si procederà all'aggiornamento delle convenzioni o di altri contratti esistenti. Risultano quindi attivati **162** interventi su 163. Rimane in sospeso l'intervento sul nodo idraulico di Brescia in quanto si sono resi necessari approfondimenti tecnici di fattibilità per individuare le modalità di intervento; la convenzione definitiva sarà siglata nei primi mesi del 2013.

E' stata definitivamente rescissa dalla Regione, con nota del 27 settembre 2012, prot. Z1.2012.24394, la convenzione sottoscritta da Regione Lombardia con il Comune di Bussero per la progettazione e la realizzazione della vasca di laminazione delle piene del torrente Molgora. Come sopra indicato è stato inoltre eliminato totalmente anche l'intervento previsto in località Oasi di Baggero, in Comune di Merone, per il quale non era stata sottoscritta alcuna convenzione.

Per quanto riguarda i 4 nuovi interventi definiti nell'ambito del Comitato di indirizzo e controllo dell'AdP, si è provveduto alla stipula delle relative convenzioni.

Sono state inoltre aggiornate la convenzione riguardante l'intervento di Oggiono, il cui importo è aumentato di 1 M€, ed è stata integrata la convenzione per le opere di messa in sicurezza del Lago d'Idro, per meglio chiarire le modalità di trasferimento dei fondi a Infrastrutture Lombarde S.p.A, con modifica dell'art. 5 della convenzione.

Sono state sottoscritte le seguenti convenzioni previste:

1. Opere per la laminazione delle piene e la riduzione del rischio esondazione Torrente Lesina e manutenzioni diffuse, con il Consorzio media Pianura Bergamasca (BG);
2. Vasca di laminazione e difese spondali lungo il fiume Garza, con il Comune di Nave (BS);
3. Completamento vasca di spagliamento torrente Fontanile di Tradate, con il Comune di Gorla Minore (VA);
4. Realizzazione area di laminazione controllata nei boschi di Uboldo-Origgio, con Infrastrutture Lombarde S.p.A.

Inoltre per l'intervento inerente la realizzazione delle vasche di laminazione sui torrenti delle Trobbie, attuato dal Consorzio Est Ticino Villoresi, sono state stipulate due nuove convenzioni, di cui la prima riguarda il primo lotto lavori e sostituisce la convenzione precedentemente stipulata al di fuori dell'AdP, e la seconda è relativa al secondo lotto lavori.

Infine è stata stipulata in data 7 settembre 2012 una convenzione con ARPA Lombardia per le attività di valutazione e controllo dell'indice di qualità morfologica (I.Q.M.) dei corsi d'acqua interessati dalle opere di difesa del suolo e la gestione del rendiconto ad ISPRA (nel sistema informativo RENDIS di cui all'art. 9 dell'AdP) sull'attuazione degli interventi inseriti nell'Accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente, a supporto del Commissario Straordinario; la convenzione, della durata 15 mesi, prevede un importo complessivo di 130.000,00 €.

E' stata indetta, in data 30 novembre, una Conferenza di Servizi preliminare sul progetto di utilizzo della miniera di Brenno quale area di laminazione del torrente Bevera, in Comune di Costa Masnaga, per valutare i pareri della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia del Ministero per i Beni e le attività culturali, pareri che contrastano con le necessità di messa in sicurezza idraulica del fiume Bevera/Lambro.

E' attivo il sito istituzionale del Commissario straordinario, periodicamente aggiornato, che contiene le indicazioni per la realizzazione e rendicontazione degli interventi da parte degli Enti Attuatori e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento del programma.

E' stato avviato l'inserimento dei dati dei progetti (al momento circa 70) nel sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDIS) di ISPRA, in ottemperanza all'art. 9 dell'Accordo di Programma.

Per attuare gli interventi previsti nell'Accordo di programma sono stati effettuati diversi incontri e riunioni sia in sede che presso altri Enti ed in particolare:

- 6 incontri presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- 36 riunioni in sede o presso altre sedi per la gestione ed attuazione degli interventi;

Per l'avanzamento tecnico finanziario degli interventi, nel 2012, il Commissario ha sottoscritto 100 decreti di pagamento, a cui è seguita l'emissione di 104 mandati di pagamento alla Banca d'Italia. Mediamente le procedure di verifica e l'erogazione del pagamento avviene entro 30 giorni dal momento in cui viene protocollata in entrata la richiesta da parte dell'Ente Attuatore.

Il Commissario per il proseguo delle attività legate all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma ha predisposto 2 decreti necessari a prendere atto delle modifiche sopravvenute all'Accordo di programma.

Gli interventi in capo agli Enti Attuatori avanzano mediamente con regolarità e con scarsi ritardi rispetto alle tempistiche previste nelle convenzioni sottoscritte. Ritardi si hanno spesso per gli interventi più complessi (es. vasche di laminazione) per i tempi lunghi che richiedono le diverse autorizzazioni.

Alcuni ritardi negli appalti si sono verificati per la necessità di negare l'assenso commissariale alle procedure di appalto per mancanza di completa copertura finanziaria degli interventi sulla contabilità speciale a seguito del ritardato trasferimento delle risorse ministeriali. Ritardi si sono spesso verificati nel trasferimento dei fondi agli Enti Attuatori a causa della necessità del rispetto del Patto di Stabilità locale.

Per i seguenti due interventi strutturali di notevole importanza, anche economica, sono in corso le progettazioni o le procedure autorizzative previste dalla legge che spesso ritardano le tempistiche previste, nonostante gli incontri ed i solleciti da parte commissariale.

- Intervento di messa in sicurezza del Lago d'Idro (importo 48 M€) – il progetto è stato depositato il 20 giugno 2011 deposito, da parte dell'Ente Attuatore (Infrastrutture Lombarde S.p.A.), per la procedura di VIA nazionale; successivamente sono state depositate le integrazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei Beni Culturali; si resta in attesa del decreto ministeriale di VIA. Nella stessa data, il 20 giugno 2011, è stata attivata la procedura presso il Ministero delle Infrastrutture per l'istruttoria necessaria per le Grandi Dighe; il Ministero ha concluso l'istruttoria e trasmesso informalmente la documentazione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che non si è ancora espresso.
- Intervento di realizzazione della vasca di laminazione di Nerviano (importo 10.5 M€) – il progetto della vasca di laminazione, dopo un lungo processo di condivisione con i Comuni ed i cittadini, ha raggiunto la fase definitiva ed è stato inviato per la procedura di VIA



regionale il 3 ottobre 2011, con successiva richiesta di integrazioni; la conclusione del procedimento è prevista per il 6 marzo 2013.

Inoltre gli interventi più impattanti sul territorio (esempio vasche di laminazione delle piene) hanno sempre forti opposizioni a livello locale sia da parte dei cittadini che, spesso, delle amministrazioni locali, con necessità di concordare le modalità di intervento, ciò che comporta allungamenti dei tempi di progettazione oltre le previsioni.

1.7.2 Livello di attuazione globale degli interventi

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	***n. interventi al dicembre 2012***	***n. interventi al dicembre 2011***
Attesa di avvio	*n. 1*	*n. 18*
Esecuzione studi ed indagini	*n. 0*	*n. 0*
In corso di progettazione	*n. 86*	*n. 126*
Progettazione ultimata	*n. 38*	*n. 10*
Lavori aggiudicati	*n.*	*n.*
In esecuzione	*n. 28*	*n. 3*
Lavori ultimati (collaudati e non)	*n. 10*	*n. 3*
Totale interventi finanziati	*163*	*160*

1.7. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2013

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	***n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2013***
Attesa di avvio	*n. 0*
Esecuzione studi ed indagini	*n. 0*
In corso di progettazione	*n. 30*
Progettazione ultimata	*n. 48*
Lavori aggiudicati	*n.*
In esecuzione	*n. 50*
Lavori ultimati (collaudati e non)	*n. 35*

Totale interventi finanziati	*163*

1.8. CRITICITA'

Le principali criticità sono legate al mancato disponibilità di fondi ministeriali in contabilità speciale, ciò cha ha comportato la necessità di negare l'assenso agli appalti di diversi interventi, con ritardi nella programmazione degli stessi. E' stato più volte sollecitato un trasferimento più rapido delle risorse finanziarie al Ministero dell'Ambiente.

A tal fine si ritiene indispensabile che nel 2013 vengano stanziati i fondi ministeriali mancanti a valere sui FSC, pari a 20.870.700,00 €, in quanto, in mancanza della delibera di stanziamento, non potranno essere attuati gli interventi finanziati con tali risorse.

Altre criticità si sono registrate per singoli interventi, soprattutto in funzione dei tempi molto lunghi per ottenere le autorizzazioni; il tal caso il Commissario Straordinario ha provveduto a sollecitare gli Enti preposti per un'accelerazione del rilascio dei pareri.

1.9. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Rimodulazione degli interventi dell'Accordo di programma

Nell'ambito del Comitato di indirizzo e controllo dell'Accordo di programma sono state effettuate nel 2012 (riunioni del 10 maggio e del 28 novembre) rimodulazioni del quadro programmatico secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 4, lettera f) dell'Accordo stesso.

In particolare sono state apportate le seguenti modifiche:

INTERVENTI ELIMINATI O MODIFICATI

Intervento	Importo	fondi
CO050A/10 - Oasi di Baggero, Merone	-280.000,00	Statali
MI081C/10 - Bussero	-247.700,00	Statali
MI081C/10 - Bussero	-2.970.000,00	Regionali
BS029B/10 - Idro	-1.000.000,00	Regionali

Intervento CO050A/10 - Oasi di Baggero, a Merone: questo intervento viene tolto dall'Accordo, per problemi connessi al suo inserimento in un progetto più ampio di sistemazione dell'area, senza separazione finanziaria dei costi; verrà quindi liquidato con fondi di Regione Lombardia, al di fuori dell'Accordo di programma.

Intervento MI081C/10 – Bussero: l'intervento è totalmente trasferito nella fase programmatica, salvo 330.000 € di fondi regionali che sono stati già erogati al Comune per la progettazione.

Intervento BS029B/10 – Idro: sulla base del quadro economico del progetto definitivo presentato è possibile ridurre di 1 M€ il finanziamento dell'intervento.

RIMODULAZIONI E NUOVI INTERVENTI

Intervento	Importo	fondi
Brienno (CO)	280.000,00	Statali
Manutenzione fiume Molgora (MB)	247.700,00	Statali
Manutenzione fiume Molgora (MB)	270.000,00	Regionali
Gargnano (BS)	2.000.000,00	Regionali
Piancogno (BS)	700.000,00	Regionali
Oggiono(LC)*	+1.000.000,00 *(tot) 2.550.000,00*	Regionali

**con fondi dall'intervento del Lago di Idro, che viene ridotto a 50.300.000,00 €.*

Intervento di Brienno (CO160A/10) – presente nella fase programmatica, è finanziato con 280.000 €, fondi precedentemente appostati sull'intervento CO050A/10 - Oasi di Baggero, a Merone.

Nuovo intervento di manutenzione del fiume Molgora (MB164A/10 e MB164B/10) – data la necessità di procedere urgentemente alla manutenzione del corso d'acqua a seguito di danni alluvionali recenti, viene inserito un nuovo intervento a valere in parte su fondi del Ministero, in parte di Regione.

Nuovo intervento di Gargnano (BS165B/10) – a causa di recenti crolli sul centro abitato (12 ottobre 2011), il terzo crollo negli ultimi 7 anni, in località Amburana, sotto il Monte Comero (in area ad elevato rischio idrogeologico 022-LO-BS), è necessario intervenire per il completamento del vallo esistente a protezione della strada e del centro abitato.

Nuovo intervento di Piancogno (BS166B/10) – è necessario provvedere al completamento dell'intervento di protezione caduta massi nelle località di Pianborno e Cogno (in area ad elevato rischio idrogeologico 035-LO-BS), a seguito di possibili crolli evidenziati in alcune aree della parete rocciosa.

Intervento di Oggiono (LC067B/10) – necessità di integrare il precedente finanziamento reso insufficiente dalla maggior incidenza delle indennità di esproprio, aggiornamento prezzi ed interferenze con la ferrovia e la rete SNAM; l'intervento viene aumentato di 1 M€ provenienti dallo stanziamento per il Lago d'Idro.

Inoltre per due interventi attuati dall'Agenzia interregionale del Fiume Po, è stata necessaria una ridistribuzione dei fondi in base alle risultanze della progettazione preliminare delle opere. Si tratta dei seguenti interventi:

- Nuovo argine in destra Serio, a Sergnano (CR059A/10) finanziamento previsto € 900.000; fondi necessari € **700.000**;
- Realizzazione argine in sinistra Adda a Rivolta d'Adda (CR058A/10) finanziamento previsto € 900.000; fondi necessari € **1.100.000**.

Pagamento competenze Commissariali

Il pagamento delle competenze del Commissario straordinario è definito dal d.p.c.m. del 8 aprile 2011, nel quale sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi e che tale compenso lordo, più gli oneri riflessi dovuti sui compensi, deve gravare sulle risorse finanziarie dell'Accordo di Programma; inoltre viene comunicato che i pagamenti devono essere autoliquidati dallo stesso utilizzando una parte dei fondi stanziati per gli interventi.

A partire dal 1 gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, è previsto all'art. 15, commi 2 e 3, che i compensi dei Commissari straordinari siano ridotti. Con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, del 9 febbraio 2012, è stato comunicato che il compenso dei Commissari ammonta ad un parte fissa massima di 50.000 € annui, cui andrà in seguito aggiunta una parte variabile, sempre di un massimo di 50.000 €, da determinare sulla base del raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi.

Nel rispetto di queste di queste regole, si è provveduto ad autoliquidare, dopo l'ultima rata 2011, le rate trimestrali 2012 sulla base della cifra lorda fissa annua di 50.000 €, in attesa di indicazioni del Ministero dell'Ambiente sulle modalità di determinazione della parte variabile del compenso commissariale.

Al 31 dicembre 2012, dopo oltre un anno dalla emanazione della legge, non è pervenuta alcuna comunicazione a riguardo, in assenza della quale il Commissario si regolerà secondo le prassi consolidate nella materia.

Rendiconto contabilità speciale

I fondi dell'AdP sono gestiti tramite contabilità speciale intestata al commissario straordinario, ai sensi degli articoli 8 e 10 del dpr 367/94, aperta il 4 aprile 2011 con n. 5580 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano.

Ai sensi degli artt. 11-15 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, si è provveduto in data 24 gennaio 2012, entro i termini previsti dal citato decreto legislativo, a trasmettere all'Organo di controllo il rendiconto amministrativo e contabile della contabilità speciale commissariale per il 2011 per i controlli previsti; in base all'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo, il rendiconto è stato trasmesso agli uffici preposti di Regione Lombardia.

Con nota del 18 settembre 2012, l'Organo di Controllo regionale ha trasmesso la relazione inerente l'attività di controllo alla Corte di Conti, alla sezione regionale della Corte dei Conti, alla Ragioneria generale dello Stato ed al Ministero dell'Ambiente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Prof. Carlo Maria Marino)

PAGINA BIANCA

Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

RELAZIONE ANNUALE DEL COMMISSARIO

ex COMMA 3, ART. 2 DEL DPCM DEL 9 MARZO 2011

Febbraio 2013

RELAZIONE ANNUALE – (1 gennaio - 31 dicembre 2012)
Comma 3, Art. 2 del DPCM 9 marzo 2012 di Nomina del Commissario
(Registrazione 14/06/2011)

I) SOMMARIO

Le attività previste nell'anno 2012 sono state realizzate in conformità con il cronoprogramma predisposto, che ha subito ritardi soltanto per la mancata disponibilità di risorse finanziarie.

Le criticità sono rappresentate principalmente

dalla mancata assegnazione delle risorse finanziarie, per cui sono state impegnate soltanto quelle disponibili, come si evince dalla presente relazione, attraverso la stipula di Convenzioni con gli Enti regionali, i cui interventi sono stati giudicati prioritari sulla base di una graduatoria che la Regione ha trasmesso al Ministero.

Ma si è fatto di più: Convenzioni ulteriori sono già state stipulate anche con gli altri Enti regionali beneficiari del finanziamento CIPE di circa 13 milioni, non ancora versato nella Contabilità speciale, convenzioni che saranno immediatamente operative solo nel momento in cui ci sarà la disponibilità finanziaria;

dalla urgente revisione tramite un Accordo integrativo, da promuovere attraverso il Comitato di indirizzo e controllo, la cui convocazione la Regione deve ancora richiedere al Ministero;

dalla poca chiarezza dei meccanismi che sono alla base del funzionamento delle varie Strutture commissariali operanti a livello nazionale.

Punti di forza sono rappresentati principalmente

dalla confortante collaborazione ed armonia tra il Commissario e la Regione Marche, che facilita la programmazione, il superamento di difficoltà e il pronto avvio degli interventi;

dalla determinazione che la stragrande maggioranza degli interventi è e sarà realizzata tramite la progettazione interna agli Enti regionali, come previsto dalle norme, per cui oltre il 90% delle risorse finanziarie verrà utilizzata per la realizzazione degli interventi e andrà a beneficio esclusivo del territorio, nella consapevolezza che nella mitigazione degli effetti del dissesto idrogeologico si interviene sulla sicurezza dell'incolumità e delle sicurezza dei cittadini, sulla tutela dell'ambiente e delle attività produttive e sullo sviluppo economico;

dalla certezza derivante dalla programmazione effettuata, che ogni ulteriore disponibilità finanziaria, fino alla copertura di quanto previsto dall'Accordo, circa 33 milioni solo di provenienza statale, troverà immediata utilizzazione e cantierizzazione di tutti gli interventi;

dalla possibilità di coinvolgere strutture regionali, prime fra tutte le Università delle Marche, nell'attuazione e nel monitoraggio degli interventi.

2) *INTRODUZIONE*

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011, registrato presso la Corte dei Conti in data 13 giugno 2011 al sottoscritto Prof. Antonio Senni è stato conferito l'incarico di Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo Di Programma (di seguito AdP) finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Marche, sottoscritto in data 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero) e della Regione Marche (di seguito Regione), ai sensi di quanto previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 291, che prevede una copertura finanziaria del fabbisogno per gli interventi di complessivi € 56.427.838,75 di cui € 35.900,00 di copertura finanziaria da parte del Ministero e € 20.527.838,75 da parte della Regione.

3) ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2012

- Raccolta di norme e di documentazione

Sono continuate le attività di conoscenza delle problematiche connesse all'incarico sia a livello delle amministrazioni centrali sia della Regione e degli altri Enti locali, Comunità montane comprese ed una attività di raccolta, consultazione e approfondimento delle norme, dei provvedimenti e documentazione connessi con i contenuti dell'AdP.

- Organizzazione della struttura commissariale

Al fine di dotare la struttura commissariale delle culture, delle professionalità e delle esperienze indispensabili alla corretta, proficua ed efficace realizzazione delle attività in programma si è svolta una selezione di esperti nei settori tecnico, amministrativo-contabile e giuridico. Nel rispetto delle indicazioni, delle prescrizioni e dei limiti fissati dal Ministero (MATTM) finora sono stati individuati e contrattualizzati

- Sig.ra Lucia Pafundi, funzionario MATTM, quale referente contabile ed amministrativo;

Ing. Rosario Previti, funzionario del MATTM, quale referente tecnico;

Avv. Francesco Rosi, quale referente giuridico, dopo espletamento di regolare procedura selettiva.

Raccolta di norme e di documentazione

E' proseguita l'attività di raccolta, consultazione e approfondimento delle norme, dei provvedimenti e documentazione connessi con i contenuti dell'AdP nonché le disposizioni regionali in materia.

Consultazione degli altri Commissari da tempo nominati

Si è ulteriormente intensificato il rapporto di collaborazione e di consultazione degli altri Commissari, già da tempo nominati e che avevano avviato, consolidato e precorso le attività rispetto l'attuazione degli AdP nelle varie Regioni, al fine di far tesoro delle esperienze, delle problematiche incontrate e delle soluzioni intraprese.

Perfezionamento dei contatti con la Regione, con gli Enti locali e con il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche dell'Emilia Romagna e Marche

Aggiornamento del cronoprogramma degli interventi

ASPETTI GIURIDICI

Gli aspetti giuridici vengono affrontati e definiti a mano a mano che si presentano durante il corso delle attività di realizzazione degli interventi contenuti nell'AdP.

ATTIVITA' SVOLTE NEL I E II TRIMESTRE DEL 2012

Come già rendicontato nella precedente relazione dell'anno 2011, il Commissario Straordinario, previa fattiva collaborazione avviata in incontri precedenti con gli Enti locali interessati dagli interventi da realizzare, ovvero con gli uffici competenti della Regione ma anche con i relativi uffici delle Provincie e dei vari Comuni territorialmente interessati nonché del Provveditorato OO.PP., ha redatto e quindi consegnato il Cronoprogramma Generale Annualità 2011-13 ed il Cronoprogramma di dettaglio Annualità 2011, all'interno del quale si evidenziava il concordato avvio di procedure di gara entro l'anno 2011 per complessivi n. 26 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 17.400.000,00.

Parimenti il Commissario ha consegnato una specifica relazione inerente i criteri previsti per la procedura di selezione degli Enti Attuatori degli interventi del programma, che si basa sulla analisi dei riscontri ottenuti nel corso degli incontri avuti con il sistema locale Regione/Provincie/Comuni, in particolar modo prendendo a riferimento i temi inerenti la celerità nella attuazione e la qualità degli interventi da realizzare, nonché le necessità di ottimizzazione della spesa.

Giova osservare che da tali incontri tecnici bilaterali intercorsi, si è potuto inoltre riscontrare che per gran parte degli interventi previsti è possibile procedere all'attuazione degli stessi avvalendosi quasi esclusivamente di risorse interne agli stessi Enti locali, con conseguenti non trascurabili risparmi di spesa.

Quindi, per una efficace attuazione dei singoli interventi, il Commissario ha comunicato la propria intenzione di predisporre, in condivisione con la Regione Marche, una Bozza di "Atto di Convenzionamento" tra Commissario, Regione ed Ente Attuatore, che contenga tutte le modalità specifiche per la gestione delle varie fasi inerenti l'attuazione di ciascun intervento, osservando al riguardo che a seguito della stipula delle convenzioni, si sarebbe reso necessario procedere con l'erogazione dei primi finanziamenti agli Enti Attuatori, sulla base delle disponibilità di cassa di cui alla contabilità speciale, che a quel momento erano però ancora limitate al versamento effettuato con provvedimento del 23 giugno 2011, per un importo di € 569.023,88, comunque poco significativo ai fini dell'attuazione di quanto previsto.

In seguito, al fine di provvedere a quanto sopra ed in vista dell'attivazione delle gare di appalto previste entro fine anno 2011, tenuto conto delle tempistiche definite all'interno del Cronoprogramma di cui sopra, il Commissario Straordinario con propria nota prot. 0037/2011/U del 17 ottobre 2011 ha chiesto al MATTM di poter introitare in contabilità speciale una prima erogazione dei fondi stanziati all'Art. 2, comma 240 L. 23 dicembre 2009 n. 191, a copertura della Annualità 2011, per un importo complessivamente stimato in € 17.400.000,00.

Con la stessa nota si è inoltre chiesto di avere conferma della disponibilità delle somme qui richieste, anche in virtù del fatto che con la stipula delle Convenzioni si sarebbe avviato tutto il processo attuativo dell'Accordo con le relative obbligazioni finanziarie.

Purtroppo tale nota non ha avuto significativi esiti per cui il Commissario nel corso del 2011 non ha ricevuto le somme richieste né parte significativa delle stesse. Parimenti nell'anno 2011 non risultano comunicazioni in merito alla conferma della disponibilità delle somme né in merito ai possibili tempi di erogazione.

Ragion per cui il Commissario non ha potuto procedere nel corso del 2011 con le attività previste, in quanto le stesse sono inevitabilmente vincolate alla disponibilità di copertura economica degli interventi da attuare. In assenza di tale copertura economica, il Commissario non è stato pertanto materialmente in condizione di poter procedere con quanto invece già da tempo programmato.

In merito alla disponibilità di risorse, solo verso la fine del 2011, previa verifica della disponibilità in Contabilità speciale, il Commissario ha potuto verificare l'avvenuto versamento con provvedimento del 15 dicembre 2011 per un importo di € 2.544.521,71, quindi per complessivi Euro 3.113.545,59.

Inoltre, a seguito della riunione del 30 gennaio 2012 indetta dal Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente, dr. Antonio Strambaci, relativa all'assegnazione risorse ex art.33, comma 3, L. 183/2011, si è appreso anche dell'avvenuto impegno a favore dell'AdP MATTM - Regione Marche di ulteriori Euro 2.017.081,03.

La disponibilità delle somme versate, nonché la prevedibile disponibilità delle somme impegnate, ha permesso quindi al Commissario di riavviare la fase di attuazione delle attività previste, anche se l'entità di tali somme comunque non permetteva di attuare quanto previsto ma imponeva inevitabilmente la necessità di operare tra gli interventi aventi prossima cantierabilità una forte selezione.

Pertanto, si è preso poi atto della comunicazione in data 20 febbraio 2012 dell'Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche al MATTM, conseguente alla citata riunione del 30 gennaio 2012, contenete la tabella degli interventi relativi alla Regione Marche compilata nei campi indicati dal Ministero per la definizione di criteri di riparto delle risorse in oggetto. In tale tabella i vari interventi vengono ordinati singolarmente secondo priorità definite a partire dal grado di cantierabilità e dall'importanza delle opere rispetto al rischio idrogeologico.

Sulla base di tale tabella e considerando le priorità espresse, si è convenuto con la regione Marche di avviare le fasi di attuazione del programma selezionando allo scopo i primi interventi in elenco fino alla concorrenza dell'importo complessivo delle somme disponibili e delle somme impegnate. Ciò di fatto ha condotto alla individuazione dei primi 12 interventi indicati quindi come maggiormente prioritari.

Ragion per cui in data 24 febbraio 2013 si è proceduto ad Ancona, presso la sede del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile - P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, ad un incontro con i rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati ai 12 interventi maggiormente prioritari.

Gli Enti territoriali beneficiari dei finanziamenti sono stati rappresentati da componenti dei propri organi istituzionali e/o da funzionari delle competenti strutture tecniche. I 12 interventi prioritari sono specificati nella seguente tabella:

Provincia	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo intervento	Livello priorità
AN	Genga	Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4	Disgaggi e barriere paramassi	400.000	1
AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4	Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS)	300.000	2
PU	Acqualagna-Fermignano	Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099	Opere di protezione fenomeni di crollo	100.000	3
PU	Piobbico	M. Montiego-capol FRANA R3-R4	Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego	200.000	4
FM	Lapedona	Centro storico - versante nord FRANA R4	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	700.000	5
PU	Borgo Pace	Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3	Riduzione rischio idrogeologico	300.000	6
MC	Fiumi Chienti e Potenza	Chienti: Civitanova, Corridonia, Tolentino (R4, R3); Potenza: Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Treia, Pollenza, San Severino, Fiuminata (R4, R3)	Opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti	600.000	7
AP	Fiume Tronto	Spinetoli ESOND E3	Riparazione argine	400.000	8
FM	Campofilone	Ponte Nina - Rio Canale ESOND R3	Messa in sicurezza idraulica foce	300.000	9
FM	Torre San Patrizio	Cupaggio FRANA R3	Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	300.000	10
FM	Montefortino	Capol -Via Circonvallazione ESOND R4	Opere di sostegno, difesa spondale	400.000	11
AP	Force	Versante Ovest di Montetorre FRANA R3	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	1.500.000	12

Durante gli incontri, gli Enti territoriali hanno fornito al Commissario, per l'intervento o gli interventi di loro competenza, informazioni relative ai seguenti aspetti:

- descrizione delle opere da eseguire;
- esistenza di eventuali lavori già fatti nel sito;
- stato attuale della progettazione;
- possibilità di realizzare l'intervento attraverso l'utilizzo dell'incentivo ex art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006;
- tempistica di attuazione;
- necessità di espropri e occupazione suoli;

- necessità di indagini specialistiche.

Sono stati inoltre esaminati, laddove prodotti, gli elaborati progettuali disponibili,.

Gli esiti di tali incontri, su cui ha positivamente influito quanto già rappresentato nel corso dei precedenti incontri del luglio 2011, possono essere considerati particolarmente soddisfacenti.

Infatti è stato possibile verificare che le varie ipotesi progettuali rappresentate si presentano in larga parte concettualmente condivisibili. Inoltre, specie in virtù di un importante supporto offerto dagli uffici tecnici sia della Regione che delle Provincie, si è potuto riscontrare che per gran parte degli interventi previsti è possibile procedere all'attuazione degli stessi avvalendosi in larga misura di risorse interne agli stessi Enti locali.

Inoltre, nel corso dei vari incontri è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, specificando con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

Contemporaneamente il Commissario, considerato che ai fini dell'attuazione del programma degli interventi e delle occorrenti intese con i soggetti pubblici interessati è necessario sottoscrivere con gli Enti Attuatori degli interventi una convenzione per regolare la tempistica di esecuzione dell'intervento, le modalità di trasferimento dei fondi ed i controlli e le verifiche sull'avanzamento dei lavori e sulla rendicontazione finanziaria, ha ritenuto utile definire una disciplina generale a cui fare riferimento nelle singole convenzioni di avvalimento, dando corso alla predisposizione dei seguenti documenti di riferimento:

- Linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma tra il MATTM e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
- Convenzione-Tipo di avvalimento per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi.

La predisposizione di tali documenti è stata curata dal Commissario in stretta collaborazione con l'ufficio del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, che ha potuto quindi visionare le bozze e proporre le proprie richieste di modifica.

Pertanto, anche in considerazione della comunicazione della Regione Marche, Assessorato alla Tutela e Risanamento Ambientale e alla Difesa del Suolo e della Costa prot. n. 839 del 15 maggio 2012, con cui si esprime formalmente la condivisione sugli schemi di convenzione proposti dal Commissario, lo stesso Commissario ha provveduto alla emanazione dei seguenti documenti, che di fatto definiscono e disciplinano le modalità di attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di programma:

Ordinanza n. 001/2012 del 18 maggio 2012 :

> Collaborazione tecnica ed operativa del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche.

Decreto n. 001/2012 del 18 maggio 2012 :

> Approvazione delle linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, e delle modalità di convenzionamento con gli enti avvalsi

Una volta definite le modalità di attuazione degli interventi, il Commissario ha dovuto però constatare che risultavano ancora soltanto impegnate dal MATTM le ulteriori somme per complessivi Euro 2.017.081,03. Considerato che sulla disponibilità delle stesse non si erano ancora avute indicazioni temporali da parte del MATTM, ha dovuto prendere atto che le stesse non potevano ancora considerarsi disponibili per l'attuazione degli interventi.

Ragion per cui il Commissario ha segnalato alla Regione Marche che occorreva operare una selezione sugli interventi inizialmente individuati, sulla base di valutazioni di priorità e di urgenza, al fine di individuare gli interventi finanziabili sulla base delle esigue risorse al momento utilmente disponibili in contabilità speciale del Commissario.

Al riguardo si è svolta ad Ancona presso il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, un incontro tra il Commissario ed i rappresentanti regionali, nel corso della quale il Commissario ed i rappresentanti della Regione Marche hanno condiviso l'opportunità di dar corso alla selezione degli interventi da finanziare, nei limiti delle risorse utilmente disponibili, utilizzando a tal fine le indicazioni di priorità comunicate dall'Assessore regionale al MATTM con la citata comunicazione del 20 febbraio 2012.

Pertanto, e visto l'Allegato 1 all'Accordo di programma, sono stati individuati i seguenti interventi, qui indicati anche secondo codici concordati dal Commissario straordinario delegato e Regione Marche, quali prioritari e da realizzarsi nel territorio della Regione Marche sulla base delle risorse attualmente utilmente disponibili in contabilità speciale, nonché i relativi importi presunti:

- AN002A/10 - Comune di Genga (AN). Località Gola di Frasassi. Disgaggi e barriere paramassi. 400.000,00 Euro;
- AP012A/10 - Comune di Acquasanta Terme (AP). Località Quintodecimo. Disgaggi e barriere. 300.000,00 Euro;
- PU039A/10 - Comune di Acqualagna-Fermignano (PU). Località Gola del Furlo. Opere di protezione fenomeni di crollo. 100.000,00 Euro;
- PU049A/10 - Comune di Piobbico (PU). Località M. Montiego-capol.. Consolidamento e riqualif. ambientale versante a monte capoluogo + studio crollo M. Montiego. 200.000,00 Euro;
- FM024A/10 - Comune di Lapedona (FM). Località Centro storico – versante nord. Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico. 700.000,00 Euro;
- PU040A/10 - Comune di Borgo Pace (PU). Località Capoluogo – T. Auro. Riduzione rischio idrogeologico. 300.000,00 Euro;
- MC031A/10 - Comuni di Civitanova, Corridonia, Tolentino, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati (MC). Località Fiumi Chienti e Potenza. Opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti. 600.000,00 Euro.

Per quanto sopra, si è ritenuto opportuno avviare quanto prima gli interventi sopra menzionati, per un importo complessivo presunto pari ad Euro 2.600.000,00. Per tali interventi le amministrazioni comunali o provinciali competenti per territorio sono state individuate dalla Regione Marche come soggetti competenti in via ordinaria.

In merito all'intervento indicato con codice MC031A/10, la Regione Marche, in accoglimento della richiesta formulata dall'ufficio del Genio Civile della Provincia di Macerata con nota prot. n. 16143 del 05/03/2012, ha chiesto al Commissario di scomporre l'intervento in questione articolandolo in tre distinti interventi e quindi di procedere con tre diversi appalti, considerando che l'articolazione proposta non attua un'artificiosa suddivisione dell'intervento in considerazione del fatto che i tre interventi interessano due corsi d'acqua e tre tratti ben distinti.

Al riguardo il Commissario ha condiviso, dal punto di vista funzionale, l'ipotesi di separare

l'intervento in tre distinti appalti, in considerazione che trattasi di fatto di lavorazioni interessanti tratti tra loro ben distinti.

Parimenti ha osservato che i tre interventi proposti riguardano territori comunali diversi da quelli rappresentati nell'intervento principale. Per tale motivo non può accogliere direttamente la richiesta, in quanto risulta tra i compiti del commissario anche quello di verificare che i progetti sottoposti al suo esame risultino conformi allo specifico intervento previsto dall'accordo di programma.

Ha suggerito pertanto ai rappresentanti regionali di sottoporre la modifica richiesta dal Genio Civile della Provincia di Macerata ad una prossima riunione del "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" previsto dall'art. 8 del sopracitato Accordo, essendo questo l'unico organo previsto dall'accordo avente facoltà di poter operare rimodulazioni e/o riprogrammazioni dell'elenco degli interventi.

Solo a seguito dell'avvenuto benestare da parte di questo organo, il Commissario potrà dare seguito all'attuazione dell'intervento nelle forme e modi richiesti dalla Provincia di Macerata.

Il Commissario ed i rappresentanti di Regione Marche hanno anche condiviso sulla opportunità di dar corso alla selezione degli ulteriori interventi da finanziare, nei limiti delle risorse al momento impegnate dal MATTM, utilizzando a tal fine le indicazioni di priorità comunicate da Regione Marche al MATT con la citata comunicazione del 20 febbraio 2012.

Pertanto, vengono selezionati gli ulteriori seguenti interventi, successivi in termini di priorità a quelli sopra elencati, da finanziare non appena disponibili le somme al momento impegnate dal MATTM o, nei limiti di quanto possibile, previo utilizzo delle eventuali economie progressivamente generate:

- AP019A/10 - Comune di Spinetoli (AP). Località Fiume Tronto. Riparazione argine. 400.000,00 Euro;
- FM021A/10 - Comune di Campofilone (FM). Località Ponte Nina – Rio Canale. Messa in sicurezza idraulica foce. 300.000,00 Euro;
- FM028A/10 - Comune di Torre San Patrizio (FM). Località Cupaggio. Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica. 300.000,00 Euro;
- FM027A/10 - Comune di Montefortino (FM). Località Capoluogo – Via Circonvallazione. Opere di sostegno, difesa spondale. 400.000,00 Euro;
- AP015A/10 - Comune di Force (AP). Località Versante Ovest di Montetorre. Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio. 1.500.000,00 Euro;

la Regione Marche ha osservato che tali ulteriori interventi sono qui rappresentati in ordine progressivo di priorità.

Successivamente, come convenuto anche durante gli incontri del 24 febbraio 2012, le Amministrazioni interessate hanno provveduto ad inviare delle comunicazioni formali, attraverso cui hanno dichiarato con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, hanno specificato le relative tempistiche nonché trasmesso gli atti progettuali al momento prodotti.

Ciò ha permesso al Commissario, prima di dare corso alle relative procedure di avvalimento inerenti gli interventi di cui sopra, di verificare la correttezza e completezza degli atti al momento prodotti e sottoposti al suo esame.

Da ciò è stato possibile emettere o stipulare i seguenti ulteriori atti:

Ordinanze di avvalimento:

- Ordinanza n. 002/2012 del 12/06/2012 :
  - Intervento AN002A/10 - Avvalimento Comune di Genga (AN);
- Ordinanza n. 003/2012 del 12/06/2012 :
  - Intervento AP012A/10 - Avvalimento Provincia di Ascoli Piceno (AP);
- Ordinanza n. 004/2012 del 12/06/2012 :
  - Intervento PU039A/10 - Avvalimento Provincia di Pesaro Urbino (PU);
- Ordinanza n. 005/2012 del 12/06/2012 :
  - Intervento PU049A/10 - Avvalimento Comune di Piobbico (PU) e Provincia di Pesaro Urbino (PU);
- Ordinanza n. 006/2012 del 12/06/2012 :
  - Intervento FM024A/10 - Avvalimento Provincia di Fermo (FM);
- Ordinanza n. 007/2012 del 12/06/2012 :
  - Intervento PU040A/10 - Avvalimento C.M. Alto e Medio Metauro e Comune di Borgo Pace (PU);

Convenzioni di avvalimento:

- Convenzione del 18/06/2012 :
  - Intervento AN002A/10 – Commissario, Regione Marche e Comune di Genga (AN);
- Convenzione del 19/06/2012:
  - Intervento AP012A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Ascoli Piceno (AP);
- Convenzione del 19/06/2012:
  - Intervento PU039A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Pesaro Urbino (PU);
- Convenzione del 19/06/2012:
  - Intervento PU049A/10 - Commissario, Regione Marche, Comune di Piobbico (PU) e Provincia di Pesaro Urbino (PU);
- Convenzione del 19/06/2012:
  - Intervento FM024A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Fermo (FM);
- Convenzione del 19/06/2012:
  - Intervento PU040A/10 - Commissario, Regione Marche, C.M. Alto e Medio Metauro e Comune di Borgo Pace (PU);

Decreti

- Decreto n. 002/2012 del 29/06/2012 :
  - Intervento AN002A/10 – Approvazione progetto definitivo;
- Decreto n. 003/2012 del 09/07/2012 :
  - Intervento PU049A/10 – Approvazione progetto definitivo;

Infine si riferisce che, in caso di approvazione da parte del Comitato di indirizzo e controllo della richiesta avanzata da Regione Marche di suddivisione dell'intervento :

- MC031A/10 - Comuni di Civitanova, Corridonia, Tolentino, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati (MC). Località Fiumi Chienti e Potenza. Opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti. 600.000,00 Euro.

il Commissario provvederà in tempi brevi alla emissione delle relative Ordinanze di avvalimento e quindi alla stipula delle relative convenzioni.

Ciò permetterà pertanto al Commissario di aver di fatto impegnato le somme attualmente utilmente disponibili in Contabilità speciale.

Inoltre per tutti gli interventi inerenti le 6 convenzioni stipulate, nonché per gli interventi di cui alle prossime convenzioni relative all'intervento MC031A/10, si procederà all'attuazione degli stessi avvalendosi esclusivamente di risorse interne agli stessi Enti locali, con conseguenti non trascurabili risparmi di spesa.

Parimenti, il Commissario al momento sta valutando i progetti definitivi già presentati dai restanti enti avvalsi. Pertanto, previa verifica della correttezza e completezza degli atti al momento prodotti e sottoposti al suo esame, potrà presumibilmente a breve procedere con i relativi atti di approvazione, di fatto dando l'avvio concreto alla attuazione di questi interventi.

Infine, si allega il nuovo Cronoprogramma degli interventi, che sostituisce quanto presentato nel corso del Comitato di indirizzo e controllo del 28 luglio 2011, redatto sulla base di quanto concordato con la Regione Marche nel corso dell'incontro del 28 maggio 2012, di quanto a suo tempo formalmente proposto dal sistema locali Regione/Provincie/Comuni e conseguenti agli incontri tecnici intercorsi nonché da quanto di recente comunicato dalla Regione Marche con nota n. 854 del 25/05/2012 in merito agli interventi proposti ai fini del finanziamento di cui alla Delibera CIPE 20 gennaio 2012.

Si rappresenta che tale Cronoprogramma è stato redatto facendo riferimento agli interventi come elencati nell'All.1 dell'Accordo di Programma del 25 novembre 2010, non essendo ancora intervenuta alcuna modifica ufficiale dello stesso.

Ovviamente, le modifiche o correzioni apportate a tale elenco nel corso dell'ultimo Comitato di Indirizzo e Controllo si intendono integralmente recepite dal suddetto cronoprogramma.

ATTIVITA' SVOLTE NEL III TRIMESTRE DEL 2012

- **Ulteriori Incontri con la Regione e gli Enti locali**

Sono continuati gli incontri per la definizione delle attività di consultazione, collaborazione e programmazione con i vertici politici, amministrativi e tecnici della Regione e degli Enti locali.

Si sono affrontati specifici temi tecnico-programmatici con alcuni Sindaci di Comuni interessati a interventi non ancora oggetto di convenzione al fine di individuare procedure e soluzioni che potessero facilitare e ridurre i tempi di attuazione non appena disponibili le risorse finanziarie. Giova osservare che da tali incontri tecnici bilaterali intercorsi, si è potuto inoltre riscontrare che per gran parte degli interventi previsti è possibile procedere all'attuazione degli stessi avvalendosi quasi esclusivamente di risorse interne agli stessi Enti locali, con conseguenti non trascurabili risparmi di spesa.

- **Ripresa del progetto di coinvolgimento culturale di alcune Università marchigiane per lo studio delle attività di mitigazione del dissesto idrogeologico.**
- **Ulteriori incontri di coordinamento e armonizzazione delle procedure con i Commissari delle altre regioni**
- **Urgenza di convocazione del Comitato di indirizzo e controllo al fine della revisione degli interventi da realizzare con fondi regionali già inseriti dall'Accordo di Programma**

Si è insistito presso la regione sulla necessità ed urgenza di organizzare prima della fine dell'anno una riunione del Comitato di indirizzo e controllo (CIC), di cui all'art. 8 dell'Accordo di programma, al fine del superamento delle difficoltà e dalle distonie derivanti dal fatto che gli interventi previsti dall'Accordo di programma (AdP) da realizzare con finanziamenti regionali erano già in gran parte avviati prima della nomina del Commissario e quindi non inseribili nelle attività commissariali. Tali interventi vanno stralciati con decisione approvativa del CIC e sostituiti con altri interventi individuati da parte della Regione, non compresi nell'AdP, da realizzarsi con nuovi finanziamenti che la Regione sta individuando.

- **Predisposizione degli atti da sottoporre al Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012**

Ai fini della predisposizione degli atti da sottoporre al "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" previsto dall'art. 8 dell'Accordo, si sono predisposti i seguenti atti:

- Relazione del Commissario al Comitato d'Indirizzo e Controllo dell'11 luglio 2012

  Redazione di una specifica relazione che illustra tutta l'attività svolta dal Commissario alla data del 11 luglio 2012, con indicazione dei vari incontri intercorsi con il sistema locale Regione/Provincie/Comuni, dei criteri previsti per la procedura di selezione degli Enti Attuatori degli interventi, della predisposizione di una disciplina generale per l'attuazione degli interventi ed in ultimo con la descrizione delle fasi di avvio della attuazione degli interventi al momento resi possibili viste le esigue disponibilità economiche.

- Cronoprogramma di attuazione degli interventi e del fabbisogno finanziario

  Redazione del nuovo Cronoprogramma degli interventi, che sostituisce quanto presentato nel corso del Comitato di indirizzo e controllo del 28 luglio 2011, redatto sulla base di quanto concordato con la Regione Marche nel corso dell'incontro del 28 maggio 2012, di quanto a suo tempo formalmente proposto dal sistema locale Regione/Provincie/Comuni e conseguente agli incontri tecnici intercorsi nonché da quanto di recente comunicato dalla Regione Marche con nota n. 854 del 25/05/2012 in merito agli interventi proposti ai fini del finanziamento di cui alla Delibera CIPE 20 gennaio 2012.

  Parimenti si fa presente che tale Cronoprogramma è stato redatto facendo riferimento agli interventi elencati nell'All.1 dell'Accordo di Programma del 25 novembre 2010, non essendo ancora intervenuta alcuna modifica ufficiale dello stesso.

  Si osserva che in merito all'intervento indicato con codice MC031A/10, la Regione Marche, in accoglimento della richiesta formulata dall'ufficio del Genio Civile della Provincia di Macerata, ha chiesto al Comitato di Indirizzo e Controllo per la Gestione dell'Accordo, di scomporre l'intervento in questione articolandolo in tre distinti interventi e quindi di procedere con tre diversi appalti, come di seguito indicato:

- MC031A-1/10 - Comuni di Macerata e Montecassiano (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza. 169.000,00 Euro;
- MC031A-2/10 - Comuni di Corridonia e Macerata (MC). Località Fiume Chienti. Lavori di manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del Torrente Fiastra e la loc. San Claudio in comune di Corridonia. 200.000,00 Euro;

- MC031A-3/10 - Comuni di Recanati, Montelupone e Macerata (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto. 231.000,00 Euro;

Considerato che l'articolazione proposta non attua un'artificiosa suddivisione dell'intervento in considerazione del fatto che i tre interventi interessano due corsi d'acqua e tre tratti ben distinti, il Comitato in questione ha espresso il proprio parere favorevole sulla richiesta della regione Marche.

- **Incontri tecnici con Enti Territoriali beneficiari dei finanziamenti**

Nel corso delle giornate del 28, 30 e 31 luglio 2012, presso la sede del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, si sono svolti degli incontri con alcuni dei rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati agli interventi individuati quali maggiormente prioritari nel verbale di coordinamento e concertazione del 28 maggio 2012. Tali incontri si sono svolti alla presenza del Commissario e di alcuni componenti della struttura commissariale (ing. Previti, dott.ssa Pafundi), che hanno curato la predisposizione di tutti gli atti di competenza Commissariale e fornito nel corso degli incontri consulenza tecnica, amministrativa e contabile al Commissario. Tali incontri si sono svolti secondo un calendario concordato con la struttura regionale con la partecipazione del Referente Operativo Regionale per la Gestione dell'AdP dott. Smargiasso e dei funzionari regionali. Gli Enti territoriali beneficiari dei finanziamenti sono stati rappresentati da componenti dei propri organi istituzionali e/o da funzionari delle competenti strutture tecniche. Nel corso degli incontri si sono svolte le seguenti attività:

- Incontro informale, di carattere generale, tra la struttura commissariale ed il referente regionale, ai fini del coordinamento e della preparazione delle varie attività da svolgere in relazione ai successivi incontri calendarizzati con i rappresentanti degli enti locali.

- Incontro con i possibili Enti attuatori dei seguenti interventi:

- AP019A/10 - Comune di Spinetoli (AP). Località Fiume Tronto. Riparazione argine. 400.000,00 Euro;

  (Provincia di Ascoli Piceno, arch. Rosati).

- FM021A/10 - Comune di Campofilone (FM). Località Ponte Nina – Rio Canale. Messa in sicurezza idraulica foce. 300.000,00 Euro;

  (Consorzio di Bonifica Aso Tenna Tronto, ing. Del Papa, Sindaco di Campofilone sig. D'Ercoli)

- FM028A/10 - Comune di Torre San Patrizio (FM). Località Cupaggio. Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica. 300.000,00 Euro;

  (Provincia di Fermo, ing. Babini – ing. Trovarelli)

Tali incontri sono stati calendarizzati considerato che a quella data era divenuta concreta la possibilità di un ulteriore accreditamento al Commissario di finanziamenti da parte del Ministero dell'Ambiente.

Nel corso dei vari incontri sono stati illustrati ai possibili Enti attuatori i contenuti delle bozze delle ordinanze e delle convenzioni di avvalimento che potrebbero essere emanate e stipulate non appena avvenuto l'accreditamento a copertura di ogni singolo intervento.

Sono state quindi illustrate anche le modalità da seguire nelle successive fasi di attuazione degli interventi (redazione e approvazione progetti definitivi ed esecutivi, espletamento delle gare d'appalto, esecuzione dei lavori, pagamenti, etc.). Inoltre, nel corso dei vari incontri è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, specificando con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

- Incontro con l'Ente attuatore dell'intervento:

- AP012A/10 - Comune di Acquasanta Terme (AP). Località Quintodecimo. Disgaggi e barriere. 300.000,00 Euro;

  (Provincia di Ascoli Piceno, arch. Rosati).

Nel corso di tale incontro si è proceduto alla definitiva verifica ed approvazione del progetto definitivo dell'intervento, avvenuto peraltro contestualmente all'incontro con l'emanazione del decreto n. 6/2012 del 30/07/2012.

- Incontro con l'Ente attuatore dell'intervento:

- PU040A/10- Comune di Borgo Pace (PU). Località Capoluogo – T. Auro. Riduzione rischio idrogeologico. 300.000,00 Euro;

  (Comunità Montana Alto e Medio Metauro, geom. Dini, alla presenza anche del sindaco del Comune di Borgo Pace dott.ssa Pierantoni)

Nel corso di tale incontro si è proceduto alla verifica e discussione di alcuni aspetti tecnici e scelte progettuali relative all'intervento. In particolare, si è addivenuti alla redazione di un apposito verbale tra il Referente Operativo Regionale, Comunità Montana e Comune di Borgo Pace per mezzo della quale le parti firmatarie convengono di apportare al progetto trasmesso dalla Comunità Montana Alto e Medio Metauro (PU), in sede di progettazione esecutiva, alcune modifiche espressamente definite, che comunque mantengono invariati gli obiettivi dell'intervento, che resta finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico causato dall'erosione spondale del torrente Auro all'altezza del centro abitato di Borgo Pace.

Con il verbale di riunione di cui sopra si è proposto al Commissario di voler considerare il suddetto verbale quale allegato al progetto definitivo trasmesso dalla Comunità Montana Alto e Medio Metauro (PU) nonché di voler procedere all'approvazione del progetto definitivo. Pertanto, fatte le opportune valutazioni, si è contestualmente proceduto alla definitiva predisposizione del testo del decreto di approvazione del progetto definitivo dell'intervento, ratificato quindi dal Commissario con l'emanazione del decreto n. 7/2012 del 31/07/2012.

- Incontro con l'Ente attuatore degli interventi:

- MC031A-1/10 - Comuni di Macerata e Montecassiano (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza. 169.000,00 Euro;

- MC031A-2/10 - Comuni di Macerata e Corridonia (MC). Località Fiume Chienti. Lavori di manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio in comune di Corridonia. 200.000,00 Euro;
- MC031A-3/10 - Comuni di Macerata, Recanati e Montelupone (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto. 231.000,00 Euro;

(Provincia di Macerata, ing. Tibaldi-ing. Ciani).

Nel corso dell'incontro si è pervenuti alla stipula delle convenzioni di avvalimento per l'attuazione di ognuno dei tre interventi.

Contestualmente si è proceduto alla verifica dei relativi progetti definitivi, nel frattempo presentati dall'ente attuatore. La verifica effettuata è stata quindi propedeutica alla successiva approvazione dei progetti definitivi avvenuta in seguito con l'emanazione dei decreti n. 8/2012, 9/2012, 10/2012 del 6/08/2012.

- **Ordinanze e Convenzioni di avvalimento prodotte dal 1/07/12 al 30/09/12**

Come convenuto nel corso degli incontri intercorsi, le Amministrazioni interessate hanno provveduto ad inviare delle comunicazioni formali, attraverso cui hanno dichiarato con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, hanno specificato le relative tempistiche nonché trasmesso gli atti progettuali al momento dagli stessi prodotti. Le comunicazioni ricevute hanno prevalentemente interessato le amministrazioni beneficiarie degli interventi selezionati come maggiormente prioritari, ovvero da finanziare sulla base della disponibilità economica al momento presente nella Contabilità speciale del Commissario.

Tra le ordinanze di avvalimento prodotte figurano anche quelle relative agli interventi individuati nel territorio dei comuni di Spinetoli (AP), Campofilone (FM) e Torre San Patrizio (FM), di cui agli incontri avvenuti in data 30 luglio 2012. La procedura di avvalimento di tali interventi è stata resa possibile dall'avvenuto accredito in Contabilità Speciale delle somme necessarie alla loro copertura economica, accredito avvenuto nel corso del mese di settembre 2012.

In particolare, riferendosi a tali interventi, sono state ricevute, tra le altre, le seguenti comunicazioni:

MC031A-1/10 - Comuni di Macerata e Montecassiano (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza. 169.000,00 Euro;

MC031A-2/10 - Comuni di Macerata e Corridonia (MC). Località Fiume Chienti. Lavori di manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio in comune di Corridonia. 200.000,00 Euro;

MC031A-3/10 - Comuni di Macerata, Recanati e Montelupone (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto. 231.000,00 Euro;

- nota della provincia di Macerata (MC) del 14 luglio 2011, prot. n. 58501, per mezzo della quale l'amministrazione provinciale:
  - si propone per procedere direttamente alla realizzazione dell'intervento in questione;
  - rappresenta che le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione (art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006) verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alla amministrazione provinciale, nel cui organico sono presenti idonee professionalità;
  - comunica la programmazione temporale delle fasi di attuazione progettuale, del bando di gara e della aggiudicazione dei lavori
- nota della provincia di Macerata (MC) del 28 maggio 2012, prot. n. 34904, per mezzo della quale l'amministrazione provinciale conferma quanto già rappresentato con la precedente nota n. 58501/2011, rispetto cui aggiorna la programmazione temporale delle fasi di attuazione progettuale, del bando di gara e della aggiudicazione dei lavori.
- nota prot. n. 51555 del 31 luglio 2012, per mezzo della quale l'amministrazione provinciale ha trasmesso copia dei progetti definitivi relativi agli interventi:
  - "Lavori di manutenzione idraulica del fiume Potenza tratto in comune di Montecassiano e Macerata, dal ponte di Sambucheto a valle del Centro fiere di Villa Potenza";
  - "Lavori di manutenzione idraulica del fiume Chienti, nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio in comune di Corridonia"
  - "Lavori di manutenzione idraulica del fiume Potenza in comune di Recanati, Montelupone e Macerata dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto"

AP019A/10 - Comune di Spinetoli (AP). Località Fiume Tronto. Riparazione argine. 400.000,00 Euro;

- nota della Provincia di Ascoli Piceno (AP) del 12 luglio 2011, comunicata con prot. n. 36684 del 19/07/2011, per mezzo della quale l'amministrazione provinciale:
  - si propone per procedere direttamente alla realizzazione dell'intervento in questione;
  - rappresenta che le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione (art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006) verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alla amministrazione provinciale, nel cui organico sono presenti idonee professionalità;
  - comunica la programmazione temporale delle fasi di attuazione progettuale, del bando di gara e della aggiudicazione dei lavori.
- nota della Provincia di Ascoli Piceno (AP) del 25 luglio 2012, prot. n. 34055, per mezzo della quale l'amministrazione provinciale conferma quanto già rappresentato con la precedente nota del 12 luglio 2011, rispetto cui aggiorna la programmazione temporale delle fasi di attuazione progettuale, del bando di gara e della aggiudicazione dei lavori

FM021A/10 - Comune di Campofilone (FM). Località Ponte Nina – Rio Canale. Messa in sicurezza idraulica foce. 300.000,00 Euro;

- nota del Consorzio di Bonifica Aso-Tenna-Tronto (FM) del 20 luglio 2011, prot. n. 3883, firmata anche dal Sindaco del Comune di Campofilone (FM) in data 22 luglio 2011, prot. n. 3752, per mezzo della quale l'amministrazione del Consorzio di bonifica:

- si propone per procedere direttamente alla realizzazione dell'intervento in questione;
- rappresenta che le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione (art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006) verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alla amministrazione del Consorzio di bonifica, nel cui organico sono presenti idonee professionalità;
- comunica la programmazione temporale delle fasi di attuazione progettuale, del bando di gara e della aggiudicazione dei lavori.

- nota del Consorzio di Bonifica Aso-Tenna-Tronto (FM) del 27 luglio 2012, prot. n. 3748, firmata anche dal Sindaco del Comune di Campofilone (FM) in data 27 luglio 2012, prot. n. 3520, per mezzo della quale l'amministrazione del Consorzio di bonifica conferma quanto già rappresentato con la precedente nota n. 3883/2011, rispetto cui aggiorna la programmazione temporale delle fasi di attuazione progettuale, del bando di gara e della aggiudicazione dei lavori.

FM028A/10 - Comune di Torre San Patrizio (FM). Località Cupaggio. Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica. 300.000,00 Euro;

- nota della provincia di Fermo, firmata anche dal Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Torre San Patrizio (FM), del 15 luglio 2011, prot. n. 4304, per mezzo della quale le amministrazioni in questione:
  - si propongono per procedere direttamente alla realizzazione dell'intervento in questione;
  - rappresentano che le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione (art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006) verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alle amministrazioni provinciale e comunale, nel cui organico sono presenti idonee professionalità;
  - comunicano la programmazione temporale delle fasi di attuazione progettuale, del bando di gara e della aggiudicazione dei lavori.
- nota del comune di Torre San Patrizio (FM), del 25 luglio 2012, prot. n. 3949, per mezzo della quale l'amministrazione comunale dichiara che le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione (art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006), comprese le procedure di esperimento ed aggiudicazione della gara d'appalto, sono delegate interamente alla Provincia di Fermo Servizio Genio Civile, nel cui organico sono presenti idonee professionalità.

Su tali documenti, oltre che su altri pervenuti, sono state effettuate le dovute istruttorie. In particolare sono stati verificati i progetti o gli stralci presentati, al fine di verificare che gli stessi corrispondano al relativo intervento previsto dall'Accordo di programma e che l'entità della spesa per ognuno di loro sia compatibile con l'importo assegnato. Fatte le opportune verifiche sugli atti pervenuti, e riscontrata la compatibilità degli stessi con le finalità dell'intervento di cui all'Accordo di programma, sono stati redatti gli atti inerenti le Ordinanze di avvalimento e conseguentemente le relative Convenzioni di avvalimento.

Quindi sono state redatte e di conseguenza emessi o stipulati dal Commissario i seguenti ulteriori atti:

- Ordinanze di avvalimento:
- Ordinanza n. 008/2012 del 23/07/2012 :
  - Intervento MC031A/10 - Avvalimento Provincia di Macerata;
- Ordinanza n. 009/2012 del 27/09/2012 :
  - Intervento AP019A/10 - Avvalimento Provincia di Ascoli Piceno;
- Ordinanza n. 010/2012 del 27/09/2012 :
  - Intervento FM021A/10 - Avvalimento C. B. Aso-Tenna-Tronto;
- Ordinanza n. 011/2012 del 27/09/2012 :
  - Intervento FM028A/10 - Avvalimento Provincia di Fermo;
- Convenzioni di avvalimento:
- Convenzione del 31/07/2012 :
  - Intervento MC031A-1/10 – Commissario, Regione Marche e Provincia di Macerata;
- Convenzione del 31/07/2012 :
  - Intervento MC031A-2/10 – Commissario, Regione Marche e Provincia di Macerata;
- Convenzione del 31/07/2012 :
  - Intervento MC031A-3/10 – Commissario, Regione Marche e Provincia di Macerata;

- **ATTI DI APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE PRODOTTI DAL 1/07/ AL 30/09/12**

A seguito della stipula delle convenzioni, gli enti avvalsi hanno avviato le procedure inerenti le richieste di approvazione di indagini specialistiche, delle progettazioni definitive, delle progettazioni esecutive e dei documenti di gara. In particolare, ai fini degli atti emessi dal 1 luglio al 30 settembre 2012, risultano pervenute al Commissario le seguenti richieste di approvazione o autorizzazione :

n. 1 richiesta di approvazione esecuzione di indagini specialistiche.

FM024A/10 - Comune di Lapedona (FM). Località Centro storico - versante nord. Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico. 700.000,00 Euro

- nota della Provincia di Fermo (FM) del 6 luglio 2012, prot. n. 25523, per mezzo della quale l'amministrazione provinciale chiede al Commissario Straordinario l'autorizzazione all'affidamento di attività e studi propedeutici per un importo massimo complessivo pari ad € 22.961,10;

- nota della Regione Marche - P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche prot. 485290 del 09/07/2012 a firma del Referente Operativo Regionale per la gestione dell'Accordo di Programma

n. 7 richieste di approvazione progetto definitivo.

PU049A/10 - Comune di Piobbico (PU). Località M. Montiego-capol.. Consolidamento e riqualif. ambientale versante a monte capoluogo + studio crollo M. Montiego. 200.000,00 Euro;

- nota del comune di Piobbico (PU) n. 180 del 16 gennaio 2012;
- nota della Regione Marche - P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche Prot. n. 480076 del 5 luglio 2012, a firma del Referente Operativo Regionale per la gestione dell'Accordo di Programma.

PU039A/10 - Comune di Acqualagna-Fermignano (PU). Località Gola del Furlo. Opere di protezione fenomeni di crollo. 100.000,00 Euro;

- nota della Provincia di Pesaro e Urbino (PU) del 6 luglio 2012;
- nota della Regione Marche - P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche prot. 530187 del 26/07/2012 a firma del Referente Operativo Regionale per la gestione dell'Accordo di Programma.

AP012A/10 - Comune di Acquasanta Terme (AP). Località Quintodecimo. Disgaggi e barriere. 300.000,00 Euro;

- nota n. 29847 del 4 luglio 2012 della Provincia di Ascoli Piceno (AP);
- nota della Regione Marche - P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche prot. 536316 del 30/07/2012 a firma del Referente Operativo Regionale per la gestione dell'Accordo di Programma.

PU040A/10 - Comune di Borgo Pace (PU). Località Capoluogo – T. Auro. Riduzione rischio idrogeologico. 300.000,00 Euro;

- nota n. 4512/7.5.6 del 29/06/2012 la Comunità Montana Alto e Medio Metauro (PU);
- nota n. 4850/7.5.6 del 12/07/2012 la Comunità Montana Alto e Medio Metauro (PU)
- verbale di riunione in data 31/07/2012 tra Comunità Montana Alto e Medio Metauro (PU), comune di Borgo Pace (PU) e Regione Marche – P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche.

MC031A-1/10 - Comuni di Macerata e Montecassiano (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza. 169.000,00 Euro;

- nota prot. n. 51555 del 31 luglio 2012 la Provincia di Macerata;
- nota della Regione Marche - P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche prot. n. 544834 del 01/08/2012 a firma del Referente Operativo Regionale per la gestione dell'Accordo di Programma

MC031A-2/10 - Comuni di Macerata e Corridonia (MC). Località Fiume Chienti. Lavori di manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio in comune di Corridonia. 200.000,00 Euro;

- nota prot. n. 51555 del 31 luglio 2012 la Provincia di Macerata;
- nota della Regione Marche – P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche prot. n. 544812 del 01/08/2012 a firma del Referente Operativo Regionale per la gestione dell'Accordo di Programma

MC031A-3/10 - Comuni di Macerata, Recanati e Montelupone (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto. 231.000,00 Euro;

- nota prot. n. 51555 del 31 luglio 2012 la Provincia di Macerata;
- nota della Regione Marche – P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche prot. n. 544983 del 01/08/2012 a firma del Referente Operativo Regionale per la gestione dell'Accordo di Programma

n. 1 richiesta di approvazione progetto esecutivo e documenti di gara:

AN002A/10 - Comune di Genga (AN). Località Gola di Frasassi. Disgaggi e barriere paramassi. 400.000,00 Euro;

- progetto esecutivo, trasmesso dal Comune di Genga (AN) con nota n. 3865 del 24 luglio 2012, come integrata dagli atti allegati alla successiva nota n. 4675 del 10 settembre 2012, unitamente allo schema del bando di gara e del contratto, dell'intervento "Mitigazione idrogeologica di un tratto di strada comunale vulnerabile a fenomeni di crollo di masse litoidi dalle sovrastanti pareti rocciose all'interno della Gola di Frasassi";
- nota della Regione Marche – P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche prot. n. 661205 del 27/09/2012 a firma del Referente Operativo Regionale per la gestione dell'Accordo di Programma

Anche su tali documenti, oltre che su altri pervenuti, sono stati effettuate le dovute istruttorie, per cui si è verificato che i vari progetti pervenuti corrispondono ai relativi interventi previsti dall'Accordo di programma, che l'entità della spesa è compatibile con i vari importi assegnati dall'Accordo di programma e si è ritenuto i vari progetti presentati idonei allo scopo. Ragion per cui sono stati redatti i relativi atti di approvazione.

Quindi sono stati redatti e quindi successivamente emessi dal Commissario i seguenti atti di approvazione o autorizzazione:

- Decreto n. 003/2012 del 09/07/2012 :
  - Intervento PU049A/10 – Approvazione progetto definitivo;
- Decreto n. 004/2012 del 16/07/2012 :
  - Intervento FM024A/10–Autorizzazione indagini specialistiche e nomina RUP;
- Decreto n. 005/2012 del 27/07/2012 :
  - Intervento PU039A/10 – Approvazione progetto definitivo e nomina RUP;

- Decreto n. 006/2012 del 30/07/2012 :
  - Intervento AP012A/10 - Approvazione progetto definitivo e nomina RUP;
- Decreto n. 007/2012 del 31/07/2012 :
  - Intervento PU040A/10 - Approvazione progetto definitivo e nomina RUP;
- Decreto n. 008/2012 del 06/08/2012 :
  - Intervento MC031A-1/10 - Approvazione progetto definitivo;
- Decreto n. 009/2012 del 06/08/2012 :
  - Intervento MC031A-2/10 - Approvazione progetto definitivo;
- Decreto n. 010/2012 del 06/08/2012 :
  - Intervento MC031A-3/10 - Approvazione progetto definitivo;
- Decreto n. 011/2012 del 28/09/2012 :
  - Intervento AN002A/10–Approvazione progetto esecutivo e procedure di gara;

Si stanno, infine, valutando alcuni ulteriori progetti definitivi ed esecutivi nel frattempo già presentati dai alcuni dei restanti enti avvalsi di cui alle convenzioni stipulate. Pertanto, previa verifica della correttezza e completezza degli atti al momento prodotti e sottoposti ad esame, si potrà presumibilmente a breve procedere con la redazione dei relativi atti di approvazione.

ATTIVITA' RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nel terzo trimestre a seguito della stipula delle convenzioni; gli enti avvalsi, hanno fatto pervenire all'Ufficio del Commissario le richieste di seguito specificate per le quali si è provveduto all'approvazione e/o all'autorizzazione:

Richieste approvazione indagini specialistiche:

INTERVENTO	COMUNE	LOCALITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO
FM024A/10	Lapedona (FM)	Centro storico – versante nord	consolidamento rischio idrogeologico	700.000

Richieste approvazione progetti definitivi:

INTERVENTO	COMUNE	LOCALITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO
PU049A/10	Piobbico (PU)	M. Montiego – capol.	consolidamento riqual. Ambientale	200.000,00
PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU	Gola del Furlo	opere di protezione per fenomeni di crollo	1000.000,00
AP012A/10	Acquasanta Terme (AP)	Quintodecimo	disgaggi e barriere	300.000,00
PU040A/10	Borgo pace (PU)	Capoluogo T. auro	riduzione rischio idrogeologico	300.000,00
MC031A-1/10	Macerata e Montecassiano (MC)	Fiume Potenza	manutenzione idraulica dal ponte Sambucheto a valle centro fiere di Villa Potenza	169.000,00
MC31A-2/10	Macerata e Corridona	Fiume Chienti	mantenimento tratto confluenza del torrente Fiastra e loc. S. Claudio in Corridia	200.000,00
MC031A-3/10	Macerata, Recanati e Montelupone (MC)	Fiume Potenza	mantenimento confluenza del Manocchia a Sambucheto	231.000,00

Richieste approvazione progetti esecutivi e documenti di gara:

INTERVENTO	COMUNE	LOCALITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO
AN002A/10	Genga (AN)	Gola di Frasassi	disgaggi e barriere paramassi	400.000

Inoltre sono pervenute presso gli uffici del Commissario le sotto indicate note per le quali sono state effettuate le dovute istruttorie:

- la nota della Provincia di Fermo prot. n. 25523 del 6/07/2012 ;
- la nota della Provincia di Ascoli Piceno prto. n. 29847 del 4/7/2012
- la nota della Provincia di Pesaro e Urbino del 6/07/2012
- le note della Comunità Montana Alto e Medio Metauro prot. n. 4512/756 del 29/06/2012 e prot. 4850/756 del 12/7/2012
- il verbale della riunione del 31/07/2012 tra Comunità montana Alto e medio Metauro, comune di Borgo Pace e Regione Marche
- la nota della Provincia di Macerata prot. n. 51555 del 31/07/2012
- le note della Regione Marche – P.F. Difesa del suolo a firma del Referente Operativo per la gestione dell'accordo prot. n. 480076 del 5/7/2012 – prot.n. 544834 del 01/08/2012 - prot. n. 485290 del 9/7/2012 – prot. n. 530187 del 26/07/2012 – prot. n. 536316 del 30/7/2012 – prot. n. 544812 del 01/08/2012 – prot.n. 544983 del 01/08/2012 – prot.n. 661205 del 27/9/2012
- le note del Comune di Genga prot.n. 3865 del 24/07/2012 e prot. n. 4675 del 10/09/2012

Sulla base delle opportune verifiche degli atti pervenuti, nel corso del terzo trimestre 2012, ritenuti idonei e corrispondenti alle finalità di cui all'Accordo di programma del 25/11/2010, sono stati predisposti a firma del Commissario Straordinario i seguenti atti:

Ordinanze di Avvalimento

N. ORDINANZA	DATA	INTERVENTO	AVVALIMENTO
008/2012	23/07/2012	MC031A/10	Provincia di Macerata
009/2012	27/09/2012	AP019A/10	Provincia di Ascoli Piceno
010/2012	27/09/2012	FM021A/10	C.B. Aso - Tenna -Tronto
011/2012	27/09/2012	FM028A/10	Provincia di Fermo

Convenzioni di Avvalimento

DATA	INTERVENTO	AVVALIMENTO
31/07/2012	MC031A-1/10	Commissario - Regione Marche - Provincia di Macerata
31/07/2012	MC031A-2/10	Commissario – Regione Marche - Provincia di Macerata
31/07/2012	MC031A-3/10	Commissario – Regione Marche - Provincia di Macerata

Decreti

N. DECRETO	DATA	INTERVENTO	OGGETTO
003/2012	09/07/2012	PU049/10	Approvazione progetto definitivo
004/2012	16/07/2012	FM024A/10	Approvazione progetto definitivo e nomina RUP
005/2012	27/07/2012	PU039A/10	Approvazione progetto definitivo e nomina RUP
006/2012	30/07/2012	AP012A/10	Approvazione progetto definitivo e nomina RUP
007/2012	31/07/2012	PU040A/10	Approvazione progetto definitivo e nomina RUP
008/2012	06/08/2012	MC031A-1/10	Approvazione progetto definitivo
009/2012	06/08/2012	MC031A-2/10	Approvazione progetto definitivo
010/2012	06/08/2012	MC031A-3/10	Approvazione progetto definitivo
011/2012	28/09/2012	AN002A/10	Approvazione progetto definitivo e procedure di gara

Si allega:

- Elenco complessivo degli atti prodotti (Allegato 1);
- Stato di avanzamento degli interventi attivati (Allegato 2);

ATTIVITA' SVOLTE NEL IV TRIMESTRE DEL 2012

- **Ulteriori Incontri con la Regione e gli Enti locali**

Sono continuati gli incontri per la definizione delle attività di consultazione, collaborazione e programmazione con i vertici politici, amministrativi e tecnici della Regione e degli Enti locali.

Sono stati trattati specifici temi tecnico-programmatici su interventi non ancora oggetto di convenzione al fine di individuare procedure e soluzioni che potessero facilitare e ridurre i tempi di attuazione non appena disponibili le risorse finanziare. Giova osservare che si è potuto riscontrare che per gran parte degli interventi previsti è possibile procedere all'attuazione degli stessi avvalendosi quasi esclusivamente di risorse interne agli stessi Enti locali, con conseguenti non trascurabili risparmi di spesa.

- **Ripresa del progetto di coinvolgimento culturale di alcune Università marchigiane per lo studio delle attività di mitigazione del dissesto idrogeologico.**
- **Ulteriori incontri di coordinamento e armonizzazione delle procedure con i Commissari delle altre regioni**
- **Urgenza di convocazione del Comitato di indirizzo e controllo al fine della revisione degli interventi da realizzare con fondi regionali già inseriti dall'Accordo di Programma**

Si è insistito presso la Regione sulla necessità ed urgenza di organizzare con estrema urgenza una riunione del Comitato di indirizzo e controllo (CIC), di cui all'art. 8 dell'Accordo di programma, al fine del superamento, tra l'altro, delle difficoltà e dalle distonie derivanti dal fatto che gli interventi previsti dall'Accordo di programma (AdP) da realizzare con finanziamenti regionali erano già in gran parte avviati prima della nomina del Commissario e quindi non inseribili nelle attività commissariali. Tali interventi vanno stralciati con decisione approvativa del CIC e sostituiti con altri interventi individuati da parte della Regione, non compresi nell'AdP, da realizzarsi con nuovi finanziamenti che la Regione sta individuando.

- **Incontri tecnici con Enti Territoriali beneficiari dei finanziamenti**

Presso la sede della Regione Marche - P.F. Difesa del Suolo in via Palestro 19, si sono svolti degli incontri con alcuni dei rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati agli interventi individuati quali maggiormente prioritari nel verbale di coordinamento e concertazione del 28 maggio 2012, ai fini della stipula delle relative Convenzioni di Avvalimento.

Quindi si è avuto un incontro con il Referente Operativo Regionale per la Gestione dell'Accordo di Programma dott. Smargiasso e del Rappresentante Regionale al fine di individuare procedure condivise che consentano una regolare attuazione degli interventi ricompresi nell'elenco di cui alla delibera CIPE n. 6/2012, nonché nella nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e nella conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012.

A seguire, si è avuto un incontro collegiale con i rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati agli interventi ricompresi nel citato elenco di cui alla delibera CIPE n. 6/2012, nonché nella nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e nella conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012. Tali incontri si sono svolti alla presenza del Commissario straordinario dott. Senni e di alcuni componenti della Struttura commissariale (ing. Previti, dott.ssa Pafundi) nonché del Referente Operativo Regionale per la Gestione dell'Accordo di Programma dott. Smargiasso e dei funzionari regionali.

Gli Enti territoriali beneficiari dei finanziamenti sono stati rappresentati da componenti dei propri organi istituzionali e/o da funzionari delle competenti strutture tecniche.

Nel corso degli incontri, sono state svolte le seguenti attività.

STIPULA CONVENZIONI DI AVVALIMENTO

- Incontro con i rappresentanti dei seguenti Enti locali territorialmente interessati agli interventi individuati quali maggiormente prioritari nel verbale di coordinamento e concertazione del 28 maggio 2012, ai fini della stipula delle relative Convenzioni di Avvalimento:

- AP019A/10 - Comune di Spinetoli (AP). Località Fiume Tronto. Riparazione argine. 400.000,00 Euro;

  (Ordinanza n. 009/2012 del 27/09/2012 di avvalimento della Provincia di Ascoli Piceno).

- FM021A/10 - Comune di Campofilone (FM). Località Ponte Nina - Rio Canale. Messa in sicurezza idraulica foce. 300.000,00 Euro;

  (Ordinanza n. 010/2012 del 27/09/2012 di avvalimento del C. B. Aso-Tenna-Tronto).

- FM028A/10 - Comune di Torre San Patrizio (FM). Località Cupaggio. Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica. 300.000,00 Euro;

  (Ordinanza n. 011/2012 del 27/09/2012 di avvalimento della Provincia di Fermo).

- FM027A/10 - Comune di Montefortino (FM). Località Capol. - Via Circonvallazione. Opere di sostegno, difesa spondale. 400.000,00 Euro;

(Ordinanza n. 012/2012 del 29/11/2012 di avvalimento della Provincia di Fermo).

Tali incontri conseguono ad un precedente incontro avuto con i citati Enti locali già in data 30 luglio 2012, nonché alla redazione delle relative Ordinanze di Avvalimento, emesse nel frattempo dal Commissario stante l'avvenuta formalizzazione delle relative proposte di disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante avanzate dagli stessi enti, che hanno altresì specificato con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, nonché indicato le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione. Nel corso dell'incontro si è quindi pervenuti alla stipula delle Convenzioni di Avvalimento per l'attuazione di ognuno dei quattro interventi.

RIUNIONE DI COORDINAMENTO E CONCERTAZIONE

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell'elenco presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi, ragion per cui il Commissario ha ritenuto opportuno segnalare alla Regione Marche che, stante le probabili e presumibili condizioni di celerità nella attuazione degli interventi richieste dal CIPE ai fini della erogazione dei fondi, occorreva procedere con l'individuare procedure condivise che consentano una regolare attuazione degli interventi ricompresi nell'elenco di cui sopra. Al riguardo si è pertanto svolto ad Ancona in data 4 dicembre 2012, un incontro tra il Commissario ed i rappresentanti regionali, nel corso della quale il Commissario ed i rappresentanti della Regione Marche hanno condiviso l'opportunità di individuare procedure che consentano una regolare attuazione degli interventi ricompresi nell'elenco di cui sopra e pertanto, nelle more della disponibilità delle relative risorse sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, al fine comunque di accelerare laddove possibile le procedure di attuazione degli interventi, hanno convenuto quanto segue:

- di dare corso alle varie attività propedeutiche attivabili anche in assenza di copertura finanziaria integrale dei vari interventi finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012;
- di procedere pertanto, per tali interventi, alla formalizzazione delle Ordinanze di avvalimento e delle relative Convenzioni per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi, indicando in via cautelare all'interno di tali provvedimenti che:

= le ordinanza e convenzioni di avvalimento si attivano in merito agli obblighi finanziari assunti dal Commissario Straordinario Delegato solo a seguito della avvenuta disponibilità in contabilità speciale vincolata n. 5621 della somma necessaria alla copertura economica integrale dell'intervento, di cui alle risorse finanziate dalla delibera CIPE n. 6/2012, e comunque solo a seguito di formale comunicazione che in tal senso il Commissario Straordinario Delegato invierà ad ogni singolo Ente avvalso;

prima di procedere all'avvio di qualsivoglia procedura che comporti un impegno di spesa, l'Ente Avvalso dovrà acquisire il formale assenso del Commissario Straordinario che deve programmare la spesa sulla contabilità speciale;

= il Commissario, avuta la disponibilità della relativa risorsa finanziaria sulla contabilità speciale

vincolata n. 5621, ne darà comunicazione all'ente avvalso. Conseguentemente, provvederà ad accantonare sulle somme disponibili sul conto della contabilità speciale n. 5621 "C.S. RISCHIO IDROGEOL. MARCHE" le relative somme.

- per tali interventi le amministrazioni comunali o provinciali competenti per territorio sono individuate dalla Regione Marche come soggetti competenti in via ordinaria.

E' stata redatta una bozza del verbale di coordinamento e concertazione, poi integrato e sottoscritto dai presenti in sede di riunione.

INCONTRI TECNICI CON ENTI TERRITORIALI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012

Sulla base della presa d'atto del 26 ottobre 2012 con cui il CIPE ha esaminato e recepito l'elenco presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012, si è convenuto con la regione Marche di avviare le fasi di attuazione del programma, nelle more della disponibilità delle relative risorse sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, al fine comunque di accelerare, laddove possibile, le procedure di attuazione degli interventi, ragion per cui, a seguito della riunione di coordinamento e concertazione di cui al punto precedente, si è tenuto un incontro con i rappresentanti degli enti territoriali beneficiari dei finanziamenti di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 secondo un calendario concordato con la struttura regionale.

Gli Enti territoriali beneficiari dei finanziamenti sono stati rappresentati da componenti dei propri organi istituzionali e/o da funzionari delle competenti strutture tecniche, e fanno riferimento agli interventi di seguito specificati:

Provincia	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo intervento
AP	Force	Montetorre versante W	Completamento lavori somma urgenza per riduzione rischio	1.500.000
AP	Arquata del Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000
AP	Fiume Tronto	AP-Marino del Tronto ESOND E4	Consolidamento briglia	1.100.000
FM	Fermo-P.S.Giorgio-Ponzano di Fermo-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin. arginature	800.000
FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	Completamento consolidamento parete rocciosa	300.000
FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000
FM	Monsampietro Morico	S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000

Provincia	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo intervento
PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000
MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	Consolidamento centro abitato	800.000
PU	S. Ippolito	Pian di Rose - F-05-0579 R4	Bonifica versante NW	300.000
PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	800.000
MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000
PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	Consolidamento frana	400.000
PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	Palificata, trincee drenanti	180.000
AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000
AP	San Benedetto del Tronto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000
MC	Castelsantangelo sul Nera	M Rotondo-M-.Prata ESOND R4	Valanghe	300.000
FM	Montefalcone Appennino	capoluogo - FRANA - CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000
PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000
MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	4.210.000

Nel corso dei vari incontri sono stati illustrati ai possibili Enti attuatori i contenuti della delibera CIPE n. 6/2012, nonché della nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e nella conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012.

Sono stati resi noti gli esiti della riunione di coordinamento e concertazione da poco conclusa tra il Commissario ed i rappresentanti di Regione Marche, che individua le procedure da attuare, nelle more della disponibilità delle relative risorse sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, al fine comunque di accelerare laddove possibile le procedure di attuazione degli interventi.

Sono state quindi illustrate le possibili bozze delle ordinanze e delle convenzioni di avvalimento che potrebbero comunque essere emanate e stipulate in attesa dell'avvenuto accreditamento delle risorse previste a copertura di ogni singolo intervento, nonché le modalità da seguire nelle successive fasi di attuazione degli interventi (redazione e approvazione progetti definitivi ed esecutivi, espletamento delle gare d'appalto, esecuzione dei lavori, pagamenti, etc.). Inoltre, nel corso dell'incontro è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, attualizzando quanto peraltro gli stessi avevano già formalizzato nel corso del mese di luglio 2011, specificando pertanto con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione

degli interventi in questione, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

Si è infine rappresentata la volontà, condivisa da Commissario e Regione Marche, affinché si proceda celermente alla fase di formalizzazione delle Ordinanze e Convenzioni di avvalimento, così come descritte e rappresentate, individuando nelle date del 20 e 21 dicembre il riferimento per il completamento di tale attività.

- **Adempimenti a seguito della riunione del 4 dicembre 2012**

A seguito della riunione con gli enti territoriali beneficiari dei finanziamenti di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 del 4 dicembre 2012, si è provveduto alla raccolta, analisi ed istruttoria della documentazione nel frattempo prodotta dagli enti interessati.

E' stata, quindi, verificata caso per caso la presenza della documentazione richiesta agli enti territoriali nel corso dell'incontro del 4 dicembre, con particolare riferimento alla documentazione progettuale prodotta, al fine di accertare la compatibilità tecnica ed economica con quanto previsto nell'accordo di programma. Conseguentemente sono state predisposte le bozze per le varie Ordinanze e Convenzioni di avvalimento, ai fini degli incontri programmati nelle date del 20 e 21 dicembre, da eventualmente integrare e quindi sottoscrivere nel corso dei prossimi incontri calendarizzati.

- **Adempimenti ai fini dell'aggiornamento dell'Ordinanza n. 001/2012**

Con la nota prot. n. 0819027 del 7 dicembre 2012 la Regione Marche, per mezzo del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, ha riproposto i rapporti di collaborazione con il Commissario, aggiornando i riferimenti di competenza regionale per le diverse tematiche attuative del programma di interventi.

Parimenti, a seguito dei contenuti della delibera CIPE n. 6/2012 e della conseguente presa d'atto dell'elenco degli interventi del 26 ottobre 2012, il Commissario a preso atto che ferma restando l'attività di monitoraggio a cura del Ministero dell'ambiente, come prevista nell'ambito degli accordi programma già stipulati, gli interventi elencati nella sopracitata presa d'atto saranno presumibilmente monitorati, in aderenza alle previsioni della delibera n. 166/2007 e successivi aggiornamenti, anche attraverso il sistema unico nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla Banca dati unitaria operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il CIPE vorrà indicare per dare attuazione ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012. Ragion per cui il Commissario ha ritenuto di continuare ad avvalersi della collaborazione offerta dalla amministrazione regionale delle Marche per le attività tecniche ed operative connesse all'attuazione degli interventi di cui al citato accordo di programma, ma anche di estendere la collaborazione alle attività connesse all'aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi, oltre che mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS - ISPRA), anche attraverso il sistema unico nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla Banca dati unitaria operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il CIPE vorrà indicare per dare attuazione ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012.

Su tali argomenti fatte le opportune verifiche sugli atti pervenuti, sono state redatti gli atti inerenti l'aggiornamento dell'Ordinanza Commissariale n. 001/2012 del 18 maggio 2012.

- **Incontri tecnici con Enti Territoriali beneficiari dei finanziamenti (Ancona, 20 e 21 dicembre 2012)**

Come convenuto nel corso della riunione del 4 dicembre, nel corso delle giornate del 20 e 21 dicembre 2012 ad Ancona, presso la sede della Regione Marche – P.F. Difesa del Suolo in via Palestro 19, si sono svolti degli incontri con i rappresentanti di tutti gli Enti locali territorialmente interessati agli interventi individuati dalla delibera CIPE n. 6/2012, nonché dalla nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e dalla conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012..Tali incontri si sono svolti alla presenza del Commissario straordinario dott. Senni e di alcuni componenti della Struttura commissariale (ing. Previti, dott.ssa Pafundi), nonché del Referente Operativo Regionale per la Gestione dell'Accordo di Programma dott. Smargiasso e dei funzionari regionali.

Sulla base di tali incontri, che si sono svolti secondo un calendario concordato con la struttura regionale, sono stati predisposti tutti gli atti tecnici di competenza Commissariale.

Gli Enti territoriali beneficiari dei finanziamenti sono stati rappresentati da componenti dei propri organi istituzionali e/o da funzionari delle competenti strutture tecniche, e fanno riferimento agli interventi di seguito specificati:

Provincia	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo intervento
AP	Force	Montetorre versante W	Completamento lavori somma urgenza per riduzione rischio	1.500.000
AP	Arquata del Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000
AP	Fiume Tronto	AP-Marino del Tronto ESOND E4	Consolidamento briglia	1.100.000
FM	Fermo-P.S.Giorgio-Ponzano di Fermo-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin. arginature	800.000
FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	Completamento consolidamento parete rocciosa	300.000
FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000
FM	Monsampietr o Morico	S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000
PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000
MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	Consolidamento centro abitato	800.000
PU	S. Ippolito	Pian di Rose - F-05-0579 R4	Bonifica versante NW	300.000
PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	800.000

Provincia	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo intervento
MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000
PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	Consolidamento frana	400.000
PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	Palificata, trincee drenanti	180.000
AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000
AP	San Benedetto del Tronto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000
MC	Castelsantangelo sul Nera	M Rotondo-M.-Prata ESOND R4	Valanghe	300.000
FM	Montefalcone Appennino	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000
PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000
MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	4.210.000

Nel corso degli incontri, per tutti gli enti intervenuti, sono state svolte le seguenti attività:

- Verifica della disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante;
- Verifica delle modalità con cui l'ente avvalso intende svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi in questione, ovvero se per mezzo di personale interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche ovvero esterno in rapporto di collaborazione libero professionale;
- Verifica delle relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione;
- Verifica dei progetti presentati, al fine di accertare compatibilità tecnica ed economica con quanto previsto nell'accordo di programma.
- Emissione da parte del Commissario delle relative ordinanze di avvalimento;
- Stipula tra Commissario, Regione Marche ed Ente avvalso delle relative Convenzioni di avvalimento.

Nel corso degli incontri sono state esaminate tutte le fasi di verifica di cui ai punti precedenti e si è completata la redazione di tutti gli atti conseguenti (Ordinanze e Convenzioni di avvalimento) ed è stato, pertanto, possibile per il Commissario emettere le Ordinanze e le relative Convenzioni di avvalimento per tutti gli enti Enti locali territorialmente interessati agli interventi individuati dalla delibera CIPE n. 6/2012, nonché dalla nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e dalla conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012.

- **Ordinanze e Convenzioni di avvalimento prodotte dal 1/10/12 al 31/12/12**

Come convenuto nel corso dei vari incontri intercorsi, le Amministrazioni interessate hanno provveduto ad inviare delle comunicazioni formali, attraverso cui hanno dichiarato con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, specificando altresì le relative tempistiche nonché trasmesso gli atti progettuali al momento dagli stessi prodotti.

Su tali documenti, oltre che su altri pervenuti, sono state effettuate le dovute istruttorie.

In particolare sono stati verificati i progetti o gli stralci presentati, al fine di verificare che gli stessi corrispondano al relativo intervento previsto dall'Accordo di programma e che l'entità della spesa per ognuno di loro sia compatibile con l'importo assegnato. Ciò ha consentito di rendicontare al Commissario, prima di dare corso alle relative procedure di avvalimento, in merito alla correttezza e completezza degli atti al momento prodotti e sottoposti al suo esame. Fatte le opportune verifiche sugli atti pervenuti e riscontrata la compatibilità degli stessi con le finalità dell'intervento di cui all'Accordo di programma, il Commissario ha dato mandato di redigere gli atti inerenti le Ordinanze di avvalimento e conseguentemente le relative Convenzioni di avvalimento.

Quindi, nel periodo posto a riferimento, sono state redatte e di conseguenza emessi o stipulati dal Commissario i seguenti atti:

- Ordinanze di avvalimento:
  - Ordinanza n. 012/2012 del 29/11/2012 :
    - Intervento FM027A/10 - Avvalimento Provincia di Fermo;
  - Ordinanza n. 013/2012 del 29/11/2012 :
    - Intervento AP015A/10 - Avvalimento Comune di Force;
  - Ordinanza n. 014/2012 del 10/12/2012 :
    - Aggiornamento Collaborazione Tecnico Operativa della Regione Marche;
  - Ordinanza n. 015/2012 del 20/12/2012 :
    - Intervento MC032A/10 - Avvalimento Comune di Cingoli;
  - Ordinanza n. 016/2012 del 20/12/2012 :
    - Intervento PU047A/10 - Avvalimento Provincia di Pesaro Urbino;
  - Ordinanza n. 017/2012 del 20/12/2012 :
    - Intervento PU048A/10 - Avvalimento Provincia di Pesaro Urbino;
  - Ordinanza n. 018/2012 del 20/12/2012 :
    - Intervento PU051A/10 - Avvalimento Comune di S. Ippolito + Prov. PU;
  - Ordinanza n. 019/2012 del 20/12/2012 :
    - Intervento MC033A/10 - Avvalimento Comune di Civitanova Marche;
  - Ordinanza n. 020/2012 del 21/12/2012 :
    - Intervento AP013A/10 - Avvalimento Provincia di Ascoli Piceno;

Ordinanza n. 021/2012 del 21/12/2012 :

- Intervento AP018A/10 - Avvalimento Provincia di Ascoli Piceno;

- Ordinanza n. 022/2012 del 21/12/2012 :
  - Intervento FM029A/10 - Avvalimento Provincia di Fermo;
- Ordinanza n. 023/2012 del 21/12/2012 :
  - Intervento FM020A/10 - Avvalimento Provincia di Fermo;
- Ordinanza n. 024/2012 del 21/12/2012 :
  - Intervento FM022A/10 - Avvalimento Provincia di Fermo;
- Ordinanza n. 025/2012 del 21/12/2012 :
  - Intervento FM025A/10 - Avvalimento Provincia di Fermo;
- Ordinanza n. 026/2012 del 21/12/2012 :
  - Intervento PU043A/10 - Avvalimento Comune di Macerata Feltria;
- Ordinanza n. 027/2012 del 21/12/2012 :
  - Intervento AN004A/10 - Avvalimento Comune di Sirolo;
- Ordinanza n. 028/2012 del 21/12/2012 :
  - Intervento FM026A/10 - Avvalimento Comune di Montefalcone Appennino;
- Ordinanza n. 029/2012 del 21/12/2012 :
  - Intervento AP017A/10 - Avvalimento Comune di S. Benedetto del Tronto;
- Ordinanza n. 030/2012 del 21/12/2012 :
  - Intervento MC037A/10 - Avvalimento Comune di Castelsantangelo sul Nera;
- Ordinanza n. 031/2012 del 21/12/2012 :
  - Intervento PU045A/10 - Avvalimento Comune di Montelabbate;
- Ordinanza n. 032/2012 del 21/12/2012 :
  - Intervento PU050A/10 - Avvalimento Comune di Sassocorvaro;
- Ordinanza n. 033/2012 del 21/12/2012 :
  - Intervento MC038A-1/10 - Avvalimento Comune di Porto Recanati + Regione Marche;

- Convenzioni di avvalimento:
  - Convenzione del 4/12/2012 :
    - Intervento AP019A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Ascoli Piceno;
  - Convenzione del 4/12/2012 :
    - Intervento FM021A/10 - Commissario, Regione Marche e C. B. Aso-Tenna-Tronto;
  - Convenzione del 4/12/2012 :
    - Intervento FM028A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Fermo;

- Convenzione del 4/12/2012 :
  - Intervento FM027A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Fermo;
- Convenzione del 20/12/2012 :
  - Intervento AP015A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Force;
- Convenzione del 20/12/2012 :
  - Intervento MC032A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Cingoli;
- Convenzione del 20/12/2012 :
  - Intervento PU047A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Pesaro Urbino;
- Convenzione del 20/12/2012 :
  - Intervento PU048A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Pesaro Urbino;
- Convenzione del 20/12/2012 :
  - Intervento PU051A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di S. Ippolito + Prov. PU;
- Convenzione del 20/12/2012 :
  - Intervento MC033A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Civitanova Marche;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - Intervento AP013A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Ascoli Piceno;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - Intervento AP018A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Ascoli Piceno;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - Intervento FM029A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Fermo;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - Intervento FM020A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Fermo;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - Intervento FM022A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Fermo;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - Intervento FM025A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Fermo;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - Intervento PU043A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Macerata Feltria;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - Intervento AN004A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Sirolo;

- Convenzione del 21/12/2012 :
    - Intervento FM026A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Montefalcone Appennino;
- Convenzione del 21/12/2012 :
    - Intervento AP017A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di S. Benedetto del Tronto;
- Convenzione del 21/12/2012 :
    - Intervento MC037A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Castelsantangelo sul Nera;
- Convenzione del 21/12/2012 :
    - Intervento PU045A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Montelabbate;
- Convenzione del 21/12/2012 :
    - Intervento PU050A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Sassocorvaro;
- Convenzione del 21/12/2012 :
    - Intervento MC038A-1/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Porto Recanati + Regione Marche;

- **Atti di approvazione ed autorizzazione prodotti dal 1/10/12 al 31/12/12**

A seguito della stipula delle convenzioni, gli enti avvalsi hanno avviato le procedure inerenti le richieste di approvazione di indagini specialistiche, delle progettazioni definitive, delle progettazioni esecutive, dei documenti di gara nonché la documentazione inerente le varie fasi della esecuzione dei lavori. Conseguentemente, ai fini della emissione dei relativi atti, provvedono a trasmettere al Commissario le relative richieste di approvazione o autorizzazione, corredate della necessaria documentazione. Su tale documentazione, effettuate le dovute istruttorie ed avendo verificato che i vari progetti pervenuti corrispondono ai relativi interventi previsti dall'Accordo di programma, che l'entità della spesa è compatibile con i vari importi assegnati dall'Accordo di programma, si è ritenuto i vari progetti presentati idonei allo scopo.

Sono stati verificati gli schemi proposti per i documenti di gara nonché gli esiti delle gare effettuate, i relativi contratti stipulati e la conseguente formulazione dei quadri economici rimodulati. Ragion per cui il Commissario ha dato mandato di redigere i relativi atti di autorizzazione o approvazione.

Sono stati quindi redatti e successivamente emessi dal Commissario i seguenti atti di approvazione o autorizzazione:

- Decreto n. 012/2012 del 14/11/2012 :
    - Intervento AP012A/10 - Approvazione perizia giustificativa, verbale di somma urgenza;
- Decreto n. 013/2012 del 14/11/2012 :
    - Intervento PU049A/10 – Approvazione progetto esecutivo e procedure di gara;
- Decreto n. 014/2012 del 16/11/2012 :
    - Intervento MC031A-1/10 – Approvazione progetto esecutivo e procedure di gara;

- Decreto n. 015/2012 del 16/11/2012 :
  - Intervento MC031A-2/10 - Approvazione progetto esecutivo e procedure di gara;
- Decreto n. 016/2012 del 16/11/2012 :
  - Intervento MC031A-3/10 – Approvazione progetto esecutivo e procedure di gara;
- Decreto n. 017/2012 del 30/11/2012 :
  - Intervento FM024A/10 – Approvazione progetto definitivo;
- Decreto n. 018/2012 del 7/12/2012 :
  - Intervento PU040A/10 – Approvazione progetto esecutivo e procedure di gara;
- Decreto n. 019/2012 del 18/12/2012 :
  - Intervento FM021A/10 – Autorizzazione affidamento integrazione geologico-geotecnica;

Infine, si sta valutando alcuni ulteriori progetti definitivi ed esecutivi nel frattempo già presentati da alcuni dei restanti enti avvalsi di cui alle convenzioni stipulate.

Pertanto, previa verifica della correttezza e completezza degli atti al momento prodotti e sottoposti ad esame, si potrà presumibilmente a breve procedere con la redazione dei relativi atti di approvazione.

Si allega:

- **Elenco degli atti prodotti nel periodo 1/10/2012 – 31/12/2012 (Allegato 3);**
- **Elenco complessivo degli atti prodotti (Allegato 4);**
- **Stato di avanzamento degli interventi attivati su risorse disponibili in Contabilità Speciale (Allegato 5);**
- **Stato di avanzamento degli interventi attivati a valere su risorse di cui alla Del. CIPE 6/2012 (Allegato 6);**

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI anno 2011 e 2012

- Attività di collaborazione e supporto alle funzioni proprie del Commissario straordinario

- Attività di segreteria tra le quali gestione del protocollo, gestione della posta entrate/uscite, Fax, archivio e varie attività tra cui raccordo e collabora con gli altri componenti della struttura commissariale;

- Raccolta e approfondimento di documentazione varia, provvedimenti, e norme di riferimento di supporto alle attività previste dal suddetto Accordo di Programma del 25/11/2010;

- Attività di supporto e collaborazione con la Dott.ssa Costanza Priore alla quale è stata affidato un incarico di prestazione professionale per l'elaborazione di buste paghe ed assistenza fiscale, ai fini delle attività amministrative-contabili previste per i pagamenti dei compensi del Commissario e della struttura commissariale;

- Predisposizione degli atti (in triplice copia) per il rendiconto di chiusura esercizio finanziario 2011 e relativa trasmissione alla Ragioneria territoriale dello Stato

- Procedure per la selezione per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto Co.Co.Pro. di n. 1 unità di personale (senior) con profilo professionale di Avvocato, quale componente della struttura commissariale :

  predisposizione dell'Avviso Pubblico

  predisposizione facsimile domanda partecipazione concorso

  procedure di pubblicazione del bando su 2 quotidiani nazionali

  procedure per la pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Mattm

  predisposizione decreto di nomina della commissione esaminatrice

  collaborazione con la commissione per la predisposizione della graduatoria di elezione e relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Mattm

  predisposizione del contratto all'Avv. Francesco Rosi, quale vincitore nella graduatoria di merito relativo al suddetto bando.

- Attività collaborativa con l'Avv. Francesco Rosi, quale componente della struttura commissariale, per tutte le attività amministrative che necessitano di una consulenza giuridica;

- Collaborazione con altri Commissari Straordinari e i relativi responsabili delle attività amministrative-contabili al fine di operare insieme un sinergico raccordo ed un costruttivo confronto sulle problematiche comuni.

- Predisposizione degli atti e degli ordinativi di pagamento per la liquidazione dei compensi della struttura commissariale (Ing. R. Previti - Avv. F. Rosi - Sig.ra L. Palmidi)

- Predisposizione degli atti e degli ordinativi di pagamento per la liquidazione del compenso del Commissario straordinario;

- Compilazione della modulistica e relativa autorizzazione presso la Tesoreria territoriale ai fini dei versamenti delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, effettuate sui pagamenti dei compensi del Commissario Straordinario e della struttura commissariale;

- Predisposizione, dopo attenta istruttoria degli atti, dei relativi ordinativi di pagamento per fatture e varie;

- Controllo calcolo e predisposizione degli atti per il rimborso delle spese di missioni sostenute dal Commissario Straordinario;

- Controllo calcolo e predisposizione degli atti per il rimborso delle spese di missioni sostenute dalla Struttura Commissariale (Ing:Previti –Sig.ra Pafundi);

- Predisposizione degli atti e dei prospetti relativi al rendiconto per la chiusura del corrente esercizio finanziario, da presentare alla Ragioneria Territoriale dello Stato, come previsto dalla normativa vigente;

- Verifica e controllo dei versamenti effettuati dal MATTM sul conto di contabilità speciale n. 5621 e relativo aggiornamento dei dati su appositi prospetti contabili elaborati dalla scrivente al fine di un puntuale e costante monitoraggio della spesa, di cui si riporta un prospetto di sintesi relativo ai movimenti contabili dell'anno 2012, come da allegata tabella riassuntiva della CONTABILITA' SPECIALE (Allegato 7)

ELENCO ATTI DELLA COMMISSARIO

Tipologia	Atto n	Data	n	Prot Data	Codice intervento	In Comune	Descrizione	All.	Allegati
Ordinanza	1 2012	18 05 12	40	18 05 12	---	---	Collaborazione Ten. Oper. Regione Marche	No	
Decreto	1 2012	18 05 12	41	18 05 12	---	---	Approv. Linee guida e Convenzione tipo	Si	Linee guida, Conv. tipo, Cartiglio
Ordinanza	2 2012	12 06 12	53	12 06 12	AN002A/10	Genga (AN)	Avvalimento Comune di Genga (AN)	No	
Ordinanza	3 2012	12 06 12	54	12 06 12	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno	No	
Ordinanza	4 2012	12 06 12	55	12 06 12	PU039A/10	Sant'Angelo in Vado (PU)	Avvalimento Provincia Pesaro Urbino	No	
Ordinanza	5 2012	12 06 12	56	12 06 12	PU049A/10	Piobbico (PU)	Avvalimento Comune Piobbico (PU) + Prov. PU	No	
Ordinanza	6 2012	12 06 12	57	12 06 12	FM024A/10	Lapedona (FM)	Avvalimento Provincia Fermo	No	
Ordinanza	7 2012	12 06 12	58	12 06 12	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Avvalimento C.M. Alto e Medio Metauro - Comune	No	
Ordinanza		18 06 12			AN002A/10	Genga (AN)	Commissario. Regione. Comune di Genga (AN)	No	
Ordinanza		19 06 12			AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Commissario. Regione. Provincia Ascoli Piceno	No	
Ordinanza		19 06 12			PU039A/10	Sant'Angelo in Vado (PU)	Commissario. Regione. Provincia Pesaro Urbino	No	
Ordinanza		19 06 12			PU049A/10	Piobbico (PU)	Commissario. Regione. Comune Piobbico (PU). Prov. PU	No	
Ordinanza		19 06 12			FM024A/10	Lapedona (FM)	Commissario. Regione. Provincia Fermo	No	
Ordinanza		19 06 12			PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Commissario. Regione. C.M. Alto e Medio Metauro + Co	No	
Decreto	2 2012	29 06 12	73	29 06 12	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP	No	
Decreto	3 2012	09 07 12	79	09 07 12	PU049A/10	Piobbico (PU)	Approv. Prog. Definitivo con prescr. e nomina RUP	No	
Decreto	4 2012	16 07 12	91	16 07 12	FM024A/10	Lapedona (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche e nomina RUP	No	
Ordinanza	8 2012	23 07 12	97	23 07 12	MC031A/10	Visso	Avvalimento Provincia Macerata	No	
Decreto	5 2012	27 07 12	98	27 07 12	PU039A/10	Sant'Angelo in Vado (PU)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP	No	
Decreto	6 2012	30 07 12	99	30 07 12	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP	No	
Decreto	7 2012	31 07 12	100	31 07 12	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP	No	
Decreto		31 07 12			MC031A-1/10	SC Montecassiano	Commissario. Regione. Prov. Macerata e nomina RUP	No	
Concessione		31 07 12			MC031A-2/10	SC Corridonia	Commissario. Regione. Prov. Macerata e nomina RUP	No	
Concessione		31 07 12			MC031A-3/10	SC Monteliupone Recana	Commissario. Regione. Prov. Macerata e nomina RUP	No	
Decreto	8 2012	06 08 12	113	06 08 12	MC031A-1/10	SC Montecassiano	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	9 2012	06 08 12	114	06 08 12	MC031A-2/10	SC Corridonia	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	10 2012	06 08 12	115	06 08 12	MC031A-3/10	SC Montelupone Recana	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Ordinanza	9 2012	27 09 12	133	27 09 12	AP019A/10	Spinetoli (AP)	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno	No	
Ordinanza	10 2012	27 09 12	134	27 09 12	FM021A/10	Campofilone (FM)	Avvalimento C.B. Aso-Tenna-Fronte	No	
Ordinanza	11 2012	27 09 12	135	27 09 12	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Avvalimento Provincia Fermo	No	
Decreto	11 2012	28 09 12	137	28 09 12	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	

Accordo di Programma MATTM – Regione Marche del 25/11/2010


Accordo delle Parti


Data	Importo
23 dic 2011	€ 369.[illegible]
19 12 2011	€ [illegible]
23 dic 2012	€ 1.046.153,84
Totale accordato	€ 4.139.999,84

Tabella degli interventi attivati

Intervento						Importo	Ente attuatore	Ordinanza di avviamento	Consegna di avviamento	Approv. Prog. Definitiva	Approv. Prog. Esecutivo e procedure di gara
Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento							
[illegible]	AN	Ancona	Costa di Trapezio e PASSATEMPO (Rif. 11 e 12)	Disgaggio e barriere paramassi		400.000	Comune di Ancona	12 06 2012	18 06 2012	29 06 2012	28 09 2012
[illegible]	AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo in prossimità PASSATEMPO Rif.	Disgaggi, barriere paramassi e rete		300.000	Provincia di Ascoli Piceno	12 06 2012	19 06 2012	30 07 2012	-
[illegible]	FM	Amandola	Centro storico - versante sopra PASSATEMPO Rif.	Consolidamento e protezione		700.000	Provincia di Fermo	12 06 2012	19 06 2012	30 07 2012	-
[illegible]	PU	Acqualagna Fermignano	Valle del Furlo - località Ponte Secco	Opere di protezione idraulica		100.000	Provincia di Pesaro e Urbino	12 06 2012	19 06 2012	27 07 2012	-
[illegible]	PU	Borgo Pace	Capoluogo - P. Anno PASSATEMPO RIPA PIATTA Rif.	Consolidamento e protezione		300.000	C.M. Alto e Medio Metauro, Comune di Borgo Pace (PU)	12 06 2012	19 06 2012	31 07 2012	-
[illegible]	PU	Fratterio	Via Montefeltro, quartiere PASSATEMPO Rif.	Consolidamento e riqualificazione ambientale versante a monte Capoluogo - stralcio 1		200.000	Comune di Peglio (PU), Provincia di Pesaro e Urbino	12 06 2012	19 06 2012	10 07 2012	-
[illegible]	MC	Macerata Monte San Giusto	Piazza Pancrazi	Manutenzione straordinaria del Ponte di Sambucheto e delle Mura Castellane di Villa Potenza		160.000	Provincia di Macerata	23 07 2012	31 07 2012	09 08 2012	-
[illegible]	MC	Macerata Tolentino	Fosso Cinelli	Manutenzione straordinaria nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Rustico e la via San Claudio		200.000	Provincia di Macerata	23 07 2012	31 07 2012	06 08 2012	-
[illegible]	MC	Matelica Esanatoglia Gagliole Castelraimondo	Piazza Boccatis	Manutenzione straordinaria dalla confluenza del Marena fino a Sanguinaio		230.000	Provincia di Macerata	23 07 2012	31 07 2012	06 08 2012	-
[illegible]	AP	Spinetoli	Piazza Fiorani	Ristrutturazione argini		300.000	Provincia di Ascoli Piceno	27 09 2012	-	-	-
[illegible]	FM	Campofilone	Ponte Nina - Rio Canale	Messa in sicurezza idraulica lungo		300.000	Consorzio di Bonifica Aso-Tenna-Tronto (FM)	27 09 2012	-	-	-
[illegible]	FM	Fermo San Tabarino	Capoluogo	Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica		300.000	Provincia di Fermo	27 09 2012	-	-	-

Interventi attivati: 12 — Importo impegnato: 3.600.000

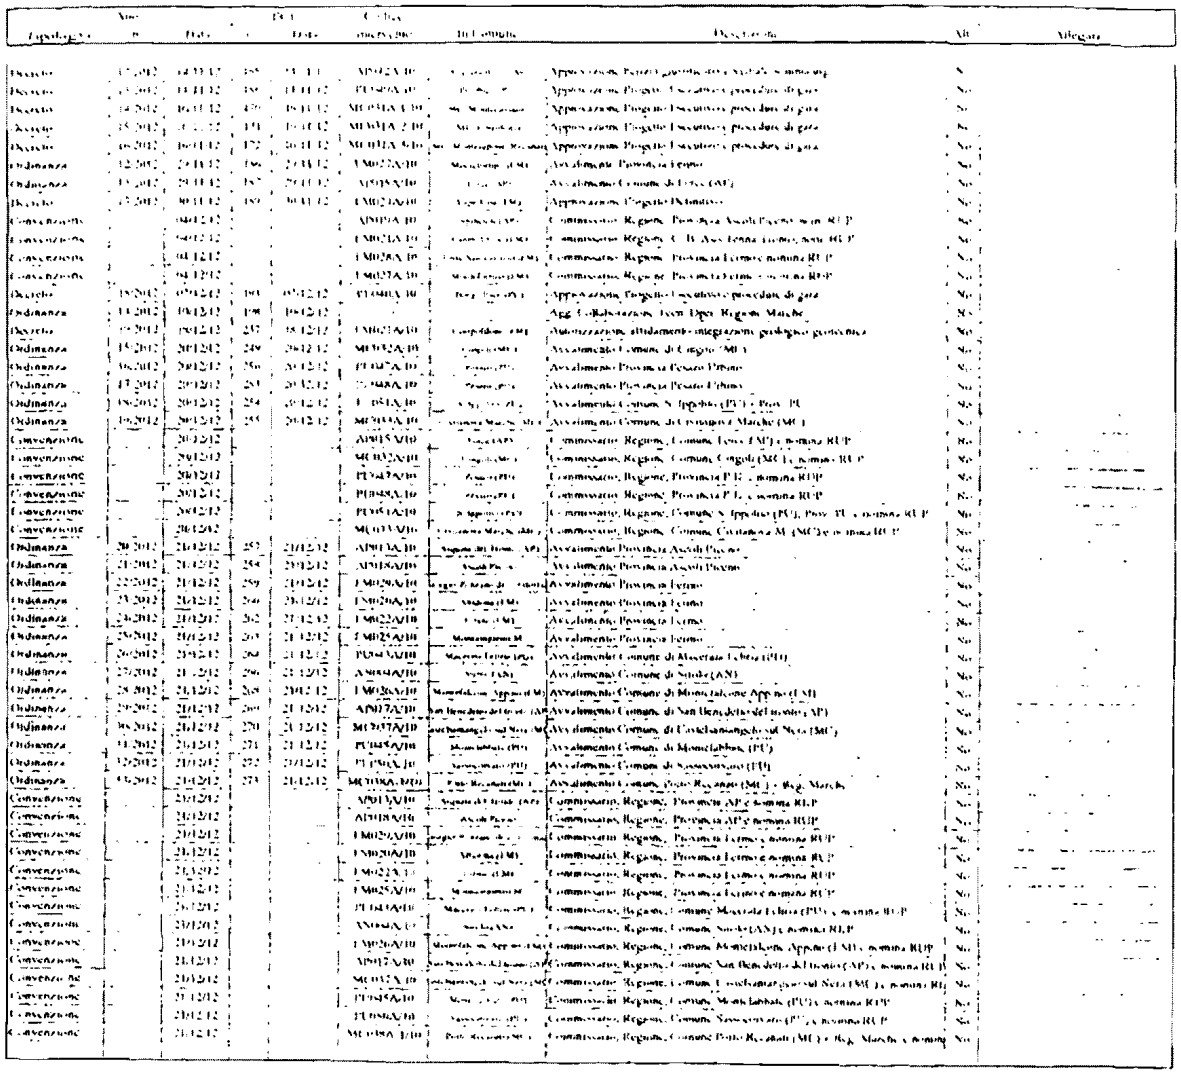

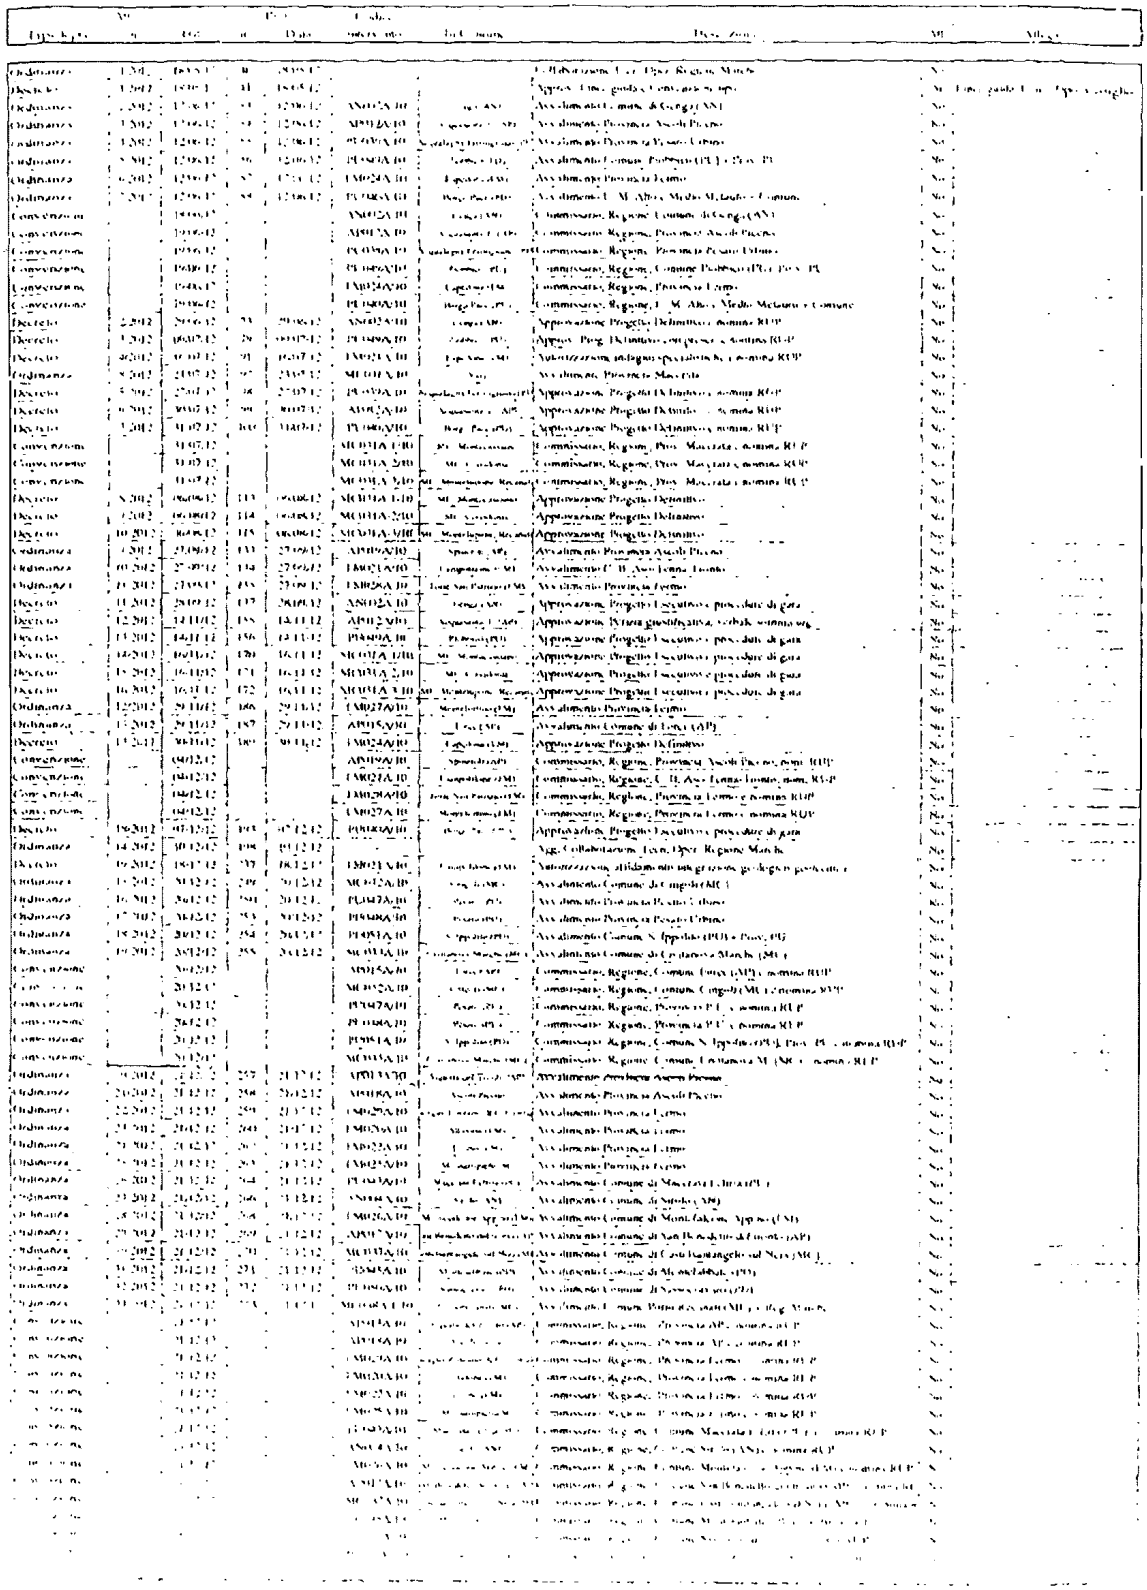

All 5

Accordo di Programma MATTM – Regione Marche del 25/11/2010 - Relazione sulle attività svolte alla data del 31 dicembre 2012

Accredito delle somme

Data	Importo
23/06/2011	€ 569.023,98
15/12/2011	€ 2.544.527,71
25/07/2012	€ 1.046.155,85
18/10/2012	€ 2.017.981,03
Totale accreditato	€ 6.176.780,47

Stato di avanzamento degli interventi attivati su risorse disponibili in Contabilità Speciale

Intervento							Ordinanza di aggiudicazione	Convenzione di aggiudicatario	Verif. Prog. Preliminare	Autorizzazioni (ed. Specialist.	Approv. Prog. Definitive	Approv. Prog. Esecutivo e proc. di gara	Approv. Contratto e q.e. rimodulato
Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso							
[illegible]	AN	Arcevia	Costa di Frassasi FRANA 4 RG4 FRA4	Disgaggi e barriere paramassi	100.000	Comune di Arcevia	12/06/2012	18/06/2012	In convenzione		29/06/2012	28/09/2012	
[illegible]	AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo - str. penetrazione FRANA 1 R4	Disgaggi Barriere (ottimaz. ANAS)	360.000	Provincia di Ascoli Piceno	12/06/2012	19/06/2012	In convenzione		31/07/2012		14/11/2012
[illegible]	AP	Force	Versante Ovest di Montefiore	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	1.300.000	Comune di Force (AP)	29/11/2012	29/12/2012	In convenzione				
[illegible]	AP	Spinetoli	Fosso Fiorito	Riparazione argini	400.000	Provincia di Ascoli Piceno	27/09/2012	04/12/2012	In convenzione				
[illegible]	FM	Campofilone	Fonte Nova - Rio Canale	Messa in sicurezza idraulica foce	500.000	Consorzio di Bonifica Aso-Tenna-Tronto (FM)	27/09/2012	04/12/2012	In convenzione	18/12/2012 Rel. geolog. 16/07/2012 Ind. geolog.			
[illegible]	FM	Lapedona	Centro storico - versante nord FRANA 4 R4	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	950.000	Provincia di Fermo	12/06/2012	19/06/2012	In convenzione		30/11/2012		
[illegible]	FM	Montefortino	Capol - Via [illegible] allacciamento	Opere di sostegno, difesa spondale	400.000	Provincia di Fermo	29/11/2012	04/12/2012	In convenzione				
[illegible]	FM	Torre San Patrizio	Cupaggio	Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	300.000	Provincia di Fermo	27/09/2012	04/12/2012	In convenzione				
[illegible]	MC	Macerata e Montecassiano	Fiume Potenza	Manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a valle del centro foce di Valle Potenza	169.000	Provincia di Macerata	23/07/2012	31/07/2012	In convenzione		06/08/2012	16/11/2012	
[illegible]	MC	Macerata e Montecassiano	Fiume Chienti	Manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio	200.000	Provincia di Macerata	23/07/2012	31/07/2012	In convenzione		06/08/2012	16/11/2012	
[illegible]	MC	Macerata Recanati e Montelupone	Fiume Potenza	Manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto	231.000	Provincia di Macerata	23/07/2012	31/07/2012	In convenzione		06/08/2012	16/11/2012	
[illegible]	PU	Acqualagna-Cantiano	Gola del Furlo - cgolo R3 F [illegible]	Opere di protezione fenomeni di crollo	180.000	Provincia di Pesaro e urbino	12/06/2012	19/06/2012	In convenzione		27/07/2012		
[illegible]	PU	Borgo Pace	Capologno - F. Auro FRANA RIPA 1 U.A. R3	riduzione rischio idrogeologico	300.000	C.M. Alto e Medio Metauro Comune Borgo Pace (PU)	12/06/2012	19/06/2012	In convenzione		31/07/2012	07/12/2012	
[illegible]	PU	Piandimeleto	M. Montegeo capol FRANA R3-R4	Consolidamento e riqualif. ambientale versante a monte capologo - nucleo crollo M. Montegeo	200.000	Comune di Piandimeleto (PU) Prov. Pesaro Urbino	12/06/2012	19/06/2012	In convenzione		09/07/2012	14/11/2012	

Interventi avviati: 14 Importo impegnato: 5.500.000

All. 6

Protocollo di Programmazione MATTM – Regione Marche del 25/11/2010 - Relazione sulle attività svolte alla data del 31 dicembre 2012

Stato di attuazione degli interventi alla data di avvio delle attività di rilevazione di cui alla Del. CIPE 6/2012

Codice	Prov.	Comune	Intervento: Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente attuatore	Ordinanza di avviamento	Contratto di avviamento	Verif. Prog. Preliminare	Autorizzazioni ind. speciali	Approv. Prog. Definitivo	Approv. Prog. Esecutivo prima di gara	Appalto Contratto e/o consegna
[illegible]	AN	Fabriano	Fabbr. delle Nazioni (NAZIONALE) RM	Interventi di difesa nella conca	4.230.000	Comune di Pesaro Regione Marche Servizio ITF	21/12/2012	21/12/2012	in convenzione				
[illegible]	AN	Castelbellino	Via Aldo Moro	Via Aldo Moro	300.000	Comune di Castelbellino	21/12/2012	21/12/2012	in convenzione				
[illegible]	PU	Pesaro	Località Ardizio FRANA	Messa in sicurezza versante via Ardizio	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio	20/12/2012	20/12/2012	in convenzione				
[illegible]	AN	Monterubbiano	Capoluogo FRANA	Cons. Versante SUD	800.000	Comune di Monterubbiano	21/12/2012	21/12/2012	in convenzione				
[illegible]	PU	S. Ippolito	Ponte di Rose - Fiastrone RM	Bonifica versante NW	300.000	Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. Pesaro Urbino	20/12/2012	20/12/2012	in convenzione				
[illegible]	AN	Fabriano Castelplanio Cerreto d'Esi	Loc. Case Sparse CAPO RM	Mantenimento stradale alpeggio	800.000	Provincia di Ancona	21/12/2012	21/12/2012	in convenzione				
[illegible]	AP	Arquata del Tronto	Loc. Tessaglia FRANA 1 RM	Disgaggi consolidamento frana Tessaglia	800.000	Provincia di Ascoli Piceno	21/12/2012	21/12/2012	in convenzione				
[illegible]	MC	Cingoli	Località Grotte FRANA RM	Consolidamento centro abitato	800.000	Comune di Cingoli	20/12/2012	20/12/2012	in convenzione				
[illegible]	AN	Offagna	Versante abitato Varano FRANA RM	Completamento opere di sistemazione versante in frana	300.000	Provincia di Ancona	21/12/2012	21/12/2012	in convenzione				
[illegible]	AP	Force (Borgo)	Località Piano (Borgo) RM	Consolidamento frana	1.000.000	Provincia di Ascoli Piceno	21/12/2012	21/12/2012	in convenzione				
[illegible]	PU	Pesaro	Località Pesaro FRANA RM	Messa in sicurezza centro abitato	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio	20/12/2012	20/12/2012	in convenzione				
[illegible]	AN	Senigallia	Località Vena NE	Frana - non provvedere	300.000	Comune di Senigallia	21/12/2012	21/12/2012	in convenzione				
[illegible]	AN	Castelfidardo Marche	Versante sud-ovest centro abitato - FRANA	Consolidamento	800.000	Comune di Castelfidardo Marche	20/12/2012	20/12/2012	in convenzione				
[illegible]	AP	San Benedetto del Tronto	Piane Alteti Località Piancarani FRANA	Consolidamento	600.000	Comune di San Benedetto del Tronto	21/12/2012	21/12/2012	in convenzione				
[illegible]	AN	Fabriano	Località Campo FRANA RM	Consol. campata V.le Vittorio Veneto	200.000	Provincia di Fermo	21/12/2012	21/12/2012	in convenzione				
[illegible]	PU	Sassocorvaro	Versante NW - Crocifisso FRANA RM	Consolidamento abitato	270.000	Comune di Sassocorvaro	21/12/2012	21/12/2012	in convenzione				
[illegible]	AN	Montemarciano Via [illegible]	Località Marina Centro sud FRANA RM	Consolidamento versante con opere di regimentazione acque	300.000	Provincia di Fermo	21/12/2012	21/12/2012	in convenzione				
[illegible]	PU	[illegible]	Palazzo di Fermo - Fra [illegible]	Palazzo di Fermo - Fra [illegible]	1.800.000	Comune di Macerata Feltria	21/12/2012	21/12/2012	in convenzione				
[illegible]	PU	Macerata Feltria	Località Area [illegible]	Consolidamento frana	1.000.000	Comune di Montelabbate	21/12/2012	21/12/2012	in convenzione				

Interventi avviati: 19

Importo complessivo: 13.210.000

Il 28/02/2013

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REGIONE MARCHE

Per la realizzaione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Marche previsti nell'Accordo di programma del 25/10/2010

Prof. ANTONIO SENNI - DPCM di nomina del 09/03/2011 - registrato dalla Corte dei Conti il 13/06/2011 Reg. n. 14 Fog. N. 55

CODICE FISCALE ATTIVITA' COMMISSARIALE n. **97655350581**

CONTABILITA' SPECIALE n. 5621 - **denominata "C S RISCHIO IDROGEOLOGICO"** (aperta con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/06/2011 n. 0072571

TRASFERIMENTO FONDI ESERCIZIO FINANZIARIO 2011	IMPORTO
DA MATTM/DTTRI - CAPITOLO 8531 PG. 6 - FONDI ESERCIZIO 2010 - CON PROVVEDIMENTO DEL 23/06/2011	€ 569.023,88
DA MATTM/DTTRI - CAPITOLO 8531 PG. 6 - FONDI ESERCIZIO 2010 - CON PROVVEDIMENTO DEL 15/12/2011	€ 2.544.521,71
TOTALE FONDI TRASFERITI SULLA CONTABILITA' SPECIALE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011	**€ 3.113.545,59**

TRASFERIMENTO FONDI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	IMPORTO
DA MATTM/DTTRI - CAPITOLO 8531 PG. 6 - nota DTTRI del 25/09/2012 (inviata per e-mail)	€ 1.046.153,85
DA MATTM/DTTRI - CAPITOLO 8531 PG. 6 - nota DTTRI del 25/09/2012 (inviata per e-mail)	€ 2.017.081,03
TOTALE FONDI TRASFERITI SULLA CONTABILITA' SPECIALE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	**€ 3.063.234,88**

TOTALE FONDI TRASFERITI SULLA CONTABILITA' SPECIALE	**€ 6.176.780,47**

MOVIMENTI CONTABILI ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

OP N.	DATA/OP	BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO
1	12/12/2011	Prof. A Senni	Pagamento compenso al Commissario Straordinario periodo dal 9/03/2011 al 09/09/2011	€ 38 805,00
TOTALE DISPONIBILITA' FONDI NELLA CONTABILITA' SPECIALE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011				**€ 3.074.740,59**

MOVIMENTI CONTABILI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

OP N.	DATA/OP	BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

28/02/2013

2	09/01/2012	IRPEF	Pagamento IRPEF su compenso Commissario Straordinario periodo dal 9/03/2011 al 09/09/2011	€	24.700,00
3	09/01/2012	Addizionale regionale (Lazio) Addizionale Comunale (Roma)	Pagamento F24 per addizionale regionale e addizionale comunale su compenso Commissario straordinario periodo dal 9/03/2011 al 09/09/2011	€	1.495,00
4	02/04/2012	Prof. Antonio Senni (Commissario)	Pagamento compenso Commissario Straordinario periodo dal 10/09/2011 al 31/12/2011	€	21.852,00
5	02/04/2012	Ing. Rosario Previti	Pagamento compenso Ing. Previti in qualità di componente della struttura commissariale periodo dal 20/07/2011 al 31/12/2011	€	9.177,00
6	02/04/2012	Sig.Ra Lucia Pafundi	Pagamento compenso Sig.ra Pafundi in qualità di componente della struttura commissariale periodo dal 20/07/2011 al 31/12/2011	€	9.177,00
7	09/05/2012	Gruppo 24 ore	Pagamento fattura n. 2357366 del 20/02/2012 per pubblicazione bando co.co.pro (Avvocato senior)	€	1.452,00
8	09/05/2012	Prof. Antonio Senni (Commissario)	Rimborso per anticipo pagamento fatture ditta Eurotimbri n. 407 del 24/06/2011 e n. 422 del 04/07/2011	€	77,66
9	09/05/2012	IRPEF	Pagamento IRPEF su compenso Commissario Straordinario periodo dal 10/09/2011 al 31/12/2011- e su compenso struttura dal 20/07/2011 al 31/12/2011 (Previti-Pafundi)	€	27.334,75
10	09/05/2012	IRAP	Pagamento IRAP su compenso Commissario Straordinario periodo dal 10/09/2011 al 31/12/2011- e su compenso struttura dal 20/07/2011 al 31/12/2011 (Previti-Pafundi	€	6.107,36
11	09/05/2012	Prof. Antonio Senni (Commissario)	annullato - restituito dalla banca di Italia con nota del 19/06/2012 prot. 0531548/12 -(euro 12.933,00)	€	-
12	09/05/2012	Sig.Ra Lucia Pafundi	Rimborso spese sostenute per missione Roma-Ancona dal 06/07/2011 al 08/07/2001	€	189,40
13	09/05/2012	Ing. Rosario Previti	Rimborso spese sostenute per missione Roma-Ancona dal 23/02/2012 al 24/02/2012	€	112,40
14	09/05/2012	Dott.ssa Costanza Priore	Pagamento fattura n. 22 del 10/04/2012 - come da prestazione contrattuale	€	499,56
15	09/05/2012	annullato	annullato - restituito dalla banca di Italia (euro 154,20)	€	-
16	15/05/2012	INPS/Pafundi	Pagamento INPS "modello F24" su compenso Commissario dal 10/09/2011 al 31/12/2011 - e su compenso struttura commissariale periodo dal 20/07/2011 al 31/12/2011	€	13.087,20
17	03/07/2012	Prof. Antonio Senni (Commissario)	Rimborso spese sostenute per le missioni : Ancona - Bologna dal 6/6 al 8/6/2011 - Ancona del 16/06/2011 - Ancona dal 6/7 al 8/7/2011 - Ancona dal 3/8 al 5/8/2011 - Ancona dal 6/9/2011 al 9/9/2011 - Ancona-Porto Recanati dal 19/10 al 21/10/2011 - Ancona dal 16/11 al 18/11/2011	€	2.972,56
18	03/07/2012	Prof. Antonio Senni (Commissario)	Rimborso spese sostenute per le missioni : Ancona del 24/02/2012 - Ancona dal 15/5 al 18/5/2012 - Ancona dal 17/6 al 16/06/2012	€	1.281,1[illegible]
19	03/07/2012	Sig.Ra Lucia Pafundi	Rimborso anticipo per modello F24 (versamento Ritenuta d'acconto su fattura n. 22 Dott.ssa Priore)	€	94,4[illegible]
20	03/07/2012	Ing. Rosario Previti	Rimborso spese sostenute per missione Roma-Ancona-Sirolo dal 6/7/2011 al 15/7/2011	€	951,9[illegible]
21	13/07/2012	RCS Mediagrup spa Pubblicità	Pagamento fattura n. 201200311499 del 31/01/2012/2012 per pubblicazione bando co.co.pro (Avvocato senior)	€	1.706,[illegible]
22	08/08/2012	Prof. Antonio Senni (Commissario)	Pagamento compenso Commissario Straordinario - 1° e 2° trimestre 2012 (dal 01/01/2012 al 30/06/2012)	€	15.490,[illegible]

28/02/2013

23	08/08/2012	Ing. Rosario Previti	Pagamento compenso Ing. Previti in qualità di componente della struttura commissariale - 1° e 2° trimestre 2012 (dal 01/01/2012 al 30/06/2012)	€	11.667,(
24		Sig.Ra Lucia Pafundi	Pagamento compenso Sig.ra Pafundi in qualità di componente della struttura commissariale - 1° e 2° trimestre 2012 (dal 01/01/2012 al 30/06/2012)	€	11.667,(
25	05/09/2012	Prof. Antonio Senni (Commissario)	Rimborso spese sostenute per missione Roma-Ancona del 31/07/2012	€	234,1
26	05/09/2012	Dott.ssa Costanza Priore	Pagamento fattura n. 50 del 8/08/2012 - come da prestazione contrattuale	€	730,3
27	05/09/2012	IRPEF	Pagamento IRPEF su compenso Commissario Straordinario periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2012- e su compenso struttura dal 01/01/2012 al 30/06/2012 (Previti-Pafundi)	€	17.960,8
28	05/09/2012	IRAP	Pagamento IRAP su compenso Commissario Straordinario periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2012- e su compenso struttura dal 01/01/2012 al 30/06/2012 (Previti-Pafundi	€	5.185,0(
29	05/09/2012	Ing. Rosario Previti	Rimborso spese sostenute per missione Roma-Ancona-Senigallia dal 27/7/2012 al 01/08/2012	€	863,44
30	05/09/2012	INPS (Commissario)	Pagamento INPS "modello F24" su compenso Commissario dal 01/01/2012 al 30/06/2012 - e su compenso struttura commissariale periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2012	€	7.186,82
31	27/09/2012	Avv. F. Rosi	Pagamento fattura n. 70 del 8/08/2012 - come da prestazione contrattualesu compenso struttura dal 01/01/2012 al 30/06/2012	€	9.525,60
32	27/09/2012	Ditta Eurtimbri	Pagamento fattura n. 536 del 07/09/2012 acquisto biglietti da visita per il Commissario	€	48,03
33	11/10/2012	Ritenuta d'Acconto	Pagamento ritenuta d'acconto su FT. n. 50/2012 Dott.ssa Priore e FT n. 70 Avv.Rosi	€	1.938,00
34	10/12/2012	Prof. Antonio Senni (Commissario)	Pagamento compenso Commissario Straordinario - 3° trimestre 2012 (dal 30/7/2012 al 30/09/2012)	€	7.751,00
35	10/12/2012	Ing. Rosario Previti	Pagamento compenso Ing. Previti in qualità di componente della struttura commissariale periodo dal 010/07/2012 al 30/09/2012	€	5.375,00
36	10/12/2012	Sig.Ra Lucia Pafundi	Pagamento compenso Sig.ra Pafundi in qualità di componente della struttura commissariale periodo dal 01/07/2012 al 30/09/2012	€	5.375,00
37	10/12/2012	Sig.Ra Lucia Pafundi	Rimborsu spese sostenute per missione Roma-Ancona-dal 02/12/2012 al 05/12/2012	€	149,00
38	10/12/2012	Prof. Antonio Senni (Commissario)	Rimborso spese sostenute per missione Roma-Ancona-dal 02/12/2012 al 05/12/2012	€	686,39
39	10/12/2012	Avv. F. Rosi	Pagamento fattura n. 86 del 23/10/2012 - come da prestazione contrattualesu compenso struttura dal 01/07/2012 al 30/09/2012	€	9.525,60
0	10/12/2012	Ing. Rosario Previti	Rimborso spese sostenute per missione Roma-Ancona-dal 02/12/2012 al 05/12/2012	€	117,40
		TOTALE PAGAMENTI SU ESERCIZIO FINANZIARIO 2012		**€**	**239.268,13**

DISPONIBILITA' FONDI NELLA CONTABILITA' SPECIALE 2012	**€ 5.898.707,34**
saldo conto alla data del 31/12/2012 - (Controllato con MOD. S6T Banca/IT)	

CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Relazione annuale anno 2012

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. del 07 novembre 2011

01/01/2013

Commissario Straordinario Delegato
Aldo Cosentino

1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

(Compilare i campi sottostanti)

Regione	Molise
Commissario straordinario delegato	Aldo Cosentino
Decreto nomina	***DPCM del 07 novembre 2011***
Data sottoscrizione Accordo	***02 maggio 2011***
Data sottoscrizione Accordo Integrativo	***09 gennaio 2012***
Importo complessivo assentito in Accordo	***27.000.000,00***
Importo programmato per il periodo (anno 2012)	
Importo speso per il periodo (anno 2012)	
Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno 2012)	

1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

Descrivere il contesto in cui si inseriscono le attività commissariali a livello regionale.

Provincia Campobasso, Provincia Isernia

1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

Descrivere la struttura commissariale sia dal punto di vista logistico sia come risorse umane.

1.4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Dichiarare quanto è stato versato sulla c.s. dal Ministero dell' Ambiente, dalla Regione, o da altre fonti sia con importo corrente che cumulato, lo speso, i relativi residui.

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente			
Importo corrente *(per l'anno 2012)*	***Importo cumulato*** *(anno 2012 + precedente periodo)*	***Speso***	***Residuo***
2.440.508,27	2.440.508,27	0	2.440.508,27

Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti *(precisare)*			
Importo corrente *(per l'anno 2012)*	***Importo cumulato*** *(anno 2012 + precedente periodo)*	***Speso***	***Residuo***
XXXX	XXXXX	XXX	XXX

1.5. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

Indicare per ciascuna delle attività indicate nella seguente tabella il relativo stato di rendicontazione della spesa, considerando esclusivamente quanto effettivamente pagato.

Descrizione attività	***Importo speso corrente*** *(per l'anno 2012)*	***Importo speso cumulato*** *(anno 2012 + precedente periodo)*
struttura commissariale		
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.		

1.6. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

Allegare il prospetto contabile riepilogativo entrate/uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012

1.7. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

1.7.1 Descrizione delle attività

Descrivere le attività prodotte sia a livello centrale dal commissario, sia a livello locale degli enti realizzatori e rilevare gli eventuali ritardi/criticità rispetto al cronoprogramma delle attività per il periodo di riferimento.

1.7.2 Livello di attuazione globale degli interventi

*Attraverso la compilazione della tabella sottostante evidenziare lo stato di avanzamento **globale** degli interventi in Accordo. Lo stato di attuazione relativo ad ogni singolo intervento dovrà, invece, essere prodotto attraverso l'aggiornamento delle schede intervento PENDIS e, dove previsto, nella Banca Dati Unitaria del CSN.*

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	*n. interventi al dicembre 2012*	*n. interventi al dicembre 2011*
Attesa di avvio	*n. XXXX*	*n. XXXX*
Esecuzione studi ed indagini	*n. XXXX*	*n. XXXX*
In corso di progettazione	*n. XXXX*	*n. XXXX*
Progettazione ultimata	*n. XXXX*	*n. XXXX*
Lavori aggiudicati	*n. XXXX*	*n. XXXX*
In esecuzione	*n. XXXX*	*n. XXXX*
Lavori ultimati (collaudati e non)	*n. XXXX*	*n. XXXX*
Totale interventi finanziati	*XXXXX*	

1.8. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2013

Compilare la tabella seguente

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	*n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2013*
Attesa di avvio	*n. XXXX*
Esecuzione studi ed indagini	*n. XXXX*
In corso di progettazione	*n. XXXX*
Progettazione ultimata	*n. XXXX*
Lavori aggiudicati	*n. XXXX*

In esecuzione	n. XXXX
Lavori ultimati (collaudati e non)	n. XXXX
Totale interventi finanziati	XXXXX

1.9. CRITICITA'

Descrivere le eventuali criticità riscontrate nello svolgimento delle attività per il periodo di riferimento e le modalità adottate per favorire il superamento delle stesse per il successivo periodo

1.10. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Alla data del 31 dicembre 2012 non è stato possibile finanziare nessuno degli 87 interventi dedotti nell'Accordo di Programma del 02 maggio 2011, e ciò poiché solo nel gennaio 2013 la Tesoreria dello Stato di Roma ha dato comunicazione dell'avvenuto accredito dell'importo di Euro 2.440.508,27, avvenuto alla fine dell'esercizio 2012 da parte del Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del Mare

Il Commissario Straordinario
Dr. Aldo Cosentino

PAGINA BIANCA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario

Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte (D.P.C.M. 19 Aprile 2011)

Torino 7 gennaio 2013

D.P.C.M. 19 aprile 2011 (art. 2 comma 3), Relazione Annuale al Parlamento sulle attività svolte dal Commissario Straordinario per la Regione Piemonte, anno 2012.

Il Commissario Straordinario Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte
C.so Bolzano 44 - 10121 Torino
Mail *commissario.bocca@regione.piemonte.it*

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 aprile 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 4 luglio 2011 il sottoscritto Prof. Pietro Giovanni Bocca è stato nominato Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma del 17 /11/ 2010 e s.m.i., tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte.
Con Decreto del Ministero del Tesoro in data 12/9/2011 è stata aperta la contabilità speciale con il numero n. 5647, presso la Banca d'Italia sezione di Torino di cui il sottoscritto è responsabile.

Attività svolta nell'anno 2012

Durante tutto l'anno 2012 è continuata in maniera proficua la collaborazione tra il Commissario con il suo Ufficio e la Regione Piemonte nella persona dell'Assessore all'Ambiente Dott. Roberto RAVELLO e del Direttore della Difesa del Suolo Dott. Vincenzo COCCOLO.
Dalla Regione Piemonte sono state messe a disposizione le Strutture e il personale necessario allo svolgimento delle attività comprese nell'Accordo di Programma (AdP) con notevoli benefici in termini di risparmio economico e di efficacia degli interventi.
Il Commissario Straordinario, con il supporto della Regione Piemonte, ha definito un percorso che, tenendo conto della realtà amministrativa piemontese, del contenuto dell'Accordo di Programma, prevede l'attuazione degli interventi tramite l'impiego di Enti pubblici, nel campo dell'assetto idrogeologico. Tale percorso segue due metodiche principali:

a) utilizzo degli Enti locali come stazioni appaltanti (ciò avviene mediante emissione di Decreti di avvalimento con specifiche indicazioni);
b) utilizzo di specifiche convenzioni per quegli interventi per i quali sono previsti cofinanziamenti degli enti locali.

Quanto sopra al fine di usufruire delle strutture pubbliche del sistema degli enti locali piemontesi, definendo criteri di scelta obiettivi, sia da un punto di vista dell'organizzazione complessiva, sia dal punto di vista dell'economicità.
Inoltre, al fine di utilizzare nella maniera più efficace le somme pervenute sulla Contabilità Speciale (CS) e velocizzare gli interventi, tenuto conto della esiguità delle somme pervenute in rapporto all'importo complessivo previsto dall'AdP, il Commissario ha deciso di avviare in un primo tempo la sola fase di progettazione del maggior numero possibile di interventi. Risulta infatti impossibile al Commissario la valutazione di interventi meritevoli dell'immediata e completa realizzazione, in mancanza della totale copertura finanziaria definita dall'AdP.
Con i Decreti Commissariali n. 2 – 3 e 4 del 2011, erano state individuate le Stazioni Appaltanti di n. 215 interventi di cui si sono avviate le progettazioni definitive. Con tale modalità di procedere, si sono messe in evidenza eventuali situazioni critiche dei singoli interventi e pertanto la loro gestione, in condizione di parziale finanziamento, trova una soluzione senza l'assillo della gestione del completo finanziamento.

Alla data del 31 dicembre 2012, sono pervenute le nomine di n. 207 RUP dalle Stazioni Appaltanti e inoltre sono stati emanati i decreti di approvazione dei seguenti 82 progetti definitivi :

- decreto n. 2 del 21.3. 2012 - Provincia di Cuneo – Dissesti nei comuni di Santa Vittoria d'Alba e Monticello lungo le SS.PP. nn. 142 – 341 – 152.
- decreto n. 3 del 28.3.2012 - Provincia di Cuneo – Dissesti nei comuni di La Morra , Novello e Barolo lungo le SS.PP. nn. 58 – 3.
- decreto n. 4 del 11.4.2012 - Comune di Vinchio - Dissesto idrogeologico S.C. Laiolo.
- decreto n. 5 del 11.4.2012 - Comune di Robassomero – Sistemazione scarpata morfologica a valle dell'abitato.

- decreto n. 6 del 11.4.2012 – Comune di Sciolze – Sistemazioni idrogeologiche località varie a seguito eventi calamitosi novembre – dicembre 2008 e aprile 2009.
- decreto n. 8 del 18.4.2012 – Comune di Carcoforo – Realizzazione barriere per la stabilizzazione del manto nevoso a difesa dell'abitato.
- decreto n. 9 del 3.5.2012 – Comuni di Ottiglio – Serralunga di Crea – Pontestura (i due progetti previsti) – Sarezzano e Stazzano.
- decreto n. 10 del 3.5.2012 – Comune di Monteu Roero (i due progetti previsti)–
- decreto n. 11 del 7.5.2012 – Provincia di Asti – (il progetto del comune di Cinaglio decreto commissariale n. 2 del 2011 e progetti dei Comuni di Bubbio e di Vesime decreto commissariale n. 3 del 2011).
- decreto n. 12 del 23.5.2012 – Comune di Aglie' – Sistemazione frana versante verso area parcheggio Castello a seguito evento calamitoso novembre – dicembre 2008.
- decreto n. 13 del 30.5.2012 – Provincia di Cuneo – progetti relativi ai Comuni di Castelmagno e di Vinadio.
- decreto n. 14 del 31.5.2012 – Comune di Bruzolo – Sistemazione frana strada Bruzolo – Leitera – S. Didero e strada della montagna a seguito evento calamitoso aprile 2009.
- decreto n. 16 del 5.6.2012 – Comune di Porte - Sistemazioni idrogeologiche località varie a seguito eventi calamitosi novembre-dicembre 2008 e aprile 2009.
- Decreto n. 18 del 8.6.2012 – Comuni di Murisengo – Lu – Borgiallo – Santo Stefano Roero (progetto Consolidamento versante località San Michele).
- Decreto n. 19 del 27.6.2012 – Comuni di Pamparato e Cortiglione
- Decreto n. 20 del 19.7.2012 – Comuni di Cervere – Quincinetto – Corio – Oulx – Bra – Groscavallo – Provincia di Biella (BI073A/10 – Comuni di Mongrando e Donato)
- Decreto n. 22 del 31.8.2012 – Comuni di S. Stefano Roero (cod. CN154A/101) – Farigliano Ferrere – Formazza
- Decreto n. 23 del 3.9.2012 - Comuni di Castelletto Cervo – Mango – Diano d'Alba Cereseto - San Sebastiano Po
- Decreto n. 24 del 7.9.2012 - Comune di Ceresole Reale
- Decreto n. 25 del 10.9.2012 - Comuni di Borgosesia – Brusasco – Chiomonte – Tigliole (cod. AT070A/10)
- Decreto n. 31del 11.10.2012 – Comuni di Benna – Niella Tanaro – Provincia di Cuneo (cod CN093A/10)
- Decreto n. 32 del 16.10.2012 – Comuni di Nomaglio – Gravellona Toce – Ceres – Mombello Monferrato – Roascio
- Decreto n. 33 del 02.11.2012 - Comuni di Tigliole – Cisterna d'Asti – Castiglione Falletto – Treiso – Cocconato – Canale
- Decreto n. 36 del 30.11.2012 – Comuni di Usseglio – Piea - Narzole – Dernice - Castelletto d'Erro – Cabella Ligure (cod AL004A/10) – Serravalle Scrivia
- Decreto n. 37 del 19.12.2012 – Comuni di Chiusa di Pesio – Castell'Alfero – Prunetto Clavesana – Bene Vagienna – Vesime – Cravagliana – San Raffaele Cimena – Rivarone - Cantalupo Ligure – Provincia di Cuneo (cod. CN094A/10 e cod. CN095A/10)

Inoltre sono stati emanati i decreti per la completa realizzazione dei seguenti 21 interventi :

- decreto n. 7 del 18.4.2012 - Provincia di Cuneo – Dissesti nei comuni di Santa Vittoria d'Alba e Monticello lungo le SS.PP. nn. 142 – 341 – 152.
- Decreto n. 27 del 24.9.2012 - Comune di Ceresole Reale
- Decreto n. 28 del 25.9.2012 - Comuni di Stazzano e Provincia di Cuneo (cod. CN096A/10)
- Decreto n. 30 del 4.10.2012 - Comune di Formazza
- Decreto n. 34 del 6.11.2012 - Comuni di Pontestura – Sarezzano – Vinchio – Cervere – Farigliano – Mango – Pamparato – Robassomero – Sciolze – Carcoforo.

- Decreto n. 35 del 16.11.2012 - Comuni di Ottiglio – Cereseto – Porte - Monteu Roero (cod CN134A/10) – Castelletto Cervo – Cortiglione.

Nella seguente tabella sono riassunte le somme accreditate sulla contabilità speciale che alla data del 31 dicembre 2012 ammonta a euro 12.943.418,95 a fronte dello stanziamento complessivo previsto dall'Adp di 65,67 M€. Le somme impegnate risultano di €. 12.943.418,95, pertanto la somma disponibile a nuovi impegni risulta pari a 0. Il totale dei progetti approvati,come si è detto, ammonta a 82 e soltanto per 21 si è potuta avviare la completa realizzazione.
In tal caso la criticità che si intende segnalare consiste nel ritardo con il quale sono avvenuti i trasferimenti verso la Contabilità Speciale del Commissario, per cui non è ancora possibile finanziare i 61 interventi già progettati e pronti per la realizzazione.

A.P. MATTM Regione Piemonte					
Importo accreditato sulla contabilità speciale n. 5647	data accredito	Emissione Decreti di impegno	Importo impegnato	N. progetti attivati	N. realizzazioni attivate
1.156.545,00	17/10/2011	n. 2 del 24/11/2011	170.000,00	4	
4.828.358,34	15/12/2011	n. 3 del 21/12/2011	5.191.613,00	210	
		n. 4 del 22/12/2011	32.300,00	1	
2.515.384,62	18/09/2012	dal 18 aprile 2012 (decreto n. 7) al 16 novembre 2012 (decreto n. 35) sono stati emessi n. 7 decreti di finanziamento della seconda fase	7.549.505,95		21
4.443.130,99	24/10/12				
12.943.418,95			12.943.418,95	215	21

Durante il 2012, il Commissario e col suo Ufficio ha costantemente tenuto aggiornate le Stazioni Appaltanti e i RUP, mediante contatti telefonici, incontri diretti, o per posta elettronica, per indirizzare, informare e chiarire le procedure definite nei Decreti.

In data 11.7.2012 il Commissario ha partecipato al Comitato di Indirizzo e Controllo dell' A.d.P.
Al Comitato è stata presentata una relazione relativa ad interventi per i quali si è proposta una qualche modifica o integrazione. Il Commissario, pertanto, ha successivamente emanato il seguente decreto di attuazione:
Decreto n. 21 del 29.8.2012 -Presa atto delle determinazioni assunte dal Comitato d'Indirizzo e Controllo dell'AP nella seduta dell'11 luglio 2012: modifiche e integrazioni al Decreto Commissariale n. 3 del 21.12.2011 – Riprogrammazione economica degli interventi cod. TO170A/10 E VB212A/10 senza variazione di spesa complessiva.

In data 9 agosto 2012, il Commissario, insieme agli altri Commissari Straordinari, ha partecipato a un incontro col Ministro Corrado CLINI e col Direttore Generale Mauro LUCIANI per definire un'azione di maggiore coordinamento tra tutti i Commissari.
In data 29 agosto 2012 il sottoscritto ha partecipato a un incontro presso l'Ispettorato Generale per fornire suggerimenti sulla ottimizzazione dell'azione dei Commissari.
Il sottoscritto, infine, durante tutto il periodo di riferimento ha continuato i suoi contatti con le Amministrazioni locali, le Stazioni Appaltanti e con gli Uffici periferici della Regione Piemonte per concordare le azioni da intraprendere.

In fede,

Prof. Ing. Pietro Giovanni BOCCA

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 – D.P.C.M. 10.12.2010"

Prot. n. _281_ /DCI del _13.02.2013__

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direz. Generale Tutela Territorio e Risorse idriche
Via C. Colombo 44
Anticipata via fax:06.57225194 00144 ROMA

Spett.le
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Protezione Civile
Anticipata via fax:06/68897696 c.a. *Dott. Franco GABRIELLI*

Spett.le
Assessorato LL.PP. Regione Puglia
Via delle Magnolie, 6
70026 Modugno (BA)
Anticipata via fax:080/5407780 c.a. *Assessore Fabiano Amati*

e p.c. Egr. Sig. Ministro dell'Ambiente
Corrado Clini
Via Cristoforo Colombo, 44
Anticipata via fax:06/57225525 00144 ROMA

Egr. Presidente della Regione Puglia
On. Nicola Vendola
Anticipata via fax:080/5406260 Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 BARI

OGGETTO: <u>Relazione sulle attività svolte nel periodo 10.12.2011 – 31.12.2012</u>

Facendo seguito alle precedenti note prot, n. 540 del 19.06.2012 e prot. n. 1380 del 5.12.2012, con le quali sono state trasmesse alle PP.AA. in indirizzo le relazioni di avanzamento delle attività del Commissario Straordinario per il Dissesto Idrogeologico nella Regione Puglia relative rispettivamente ai periodi:

- 10.12.2011 ÷ 9.06.2012 e 10.06.2012 ÷ 30.09.2012,

in allegato alla presente si trasmette la Relazione di dettaglio, relativa all'intero anno 2012, sulle attività svolte da questo Commissario Delegato, come previsto all'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 10.12.2010.

Distinti saluti

Il Commissario Straordinario Delegato
(Dott. Maurizio Croce)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO ex D.P.C.M. 10/12/2010 - DISSESTO IDROGEOLOGICO

ALLEGATO

RELAZIONE DI DETTAGLIO
RELATIVA AL 2° ANNO DI ATTIVITA'
(10.12.2011 – 31.12.2012)

Bari, Gennaio 2013

Premessa

Facendo seguito alla precedente Relazione Annuale relativa alle attività svolte dal Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia (ex DPCM 10.12.2010) nel periodo 10.12.2010 – 09.12.2011, trasmessa in data 12.12.2011 con nota prot. 291/DCI, con la presente si illustrano le attività svolte da questo Ufficio nel secondo anno di attività (dal 10.12.2011 al 31.01.2013).

La presente relazione viene redatta a valle della pubblicazione formale della Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella G.U., Serie Generale, n. 121 del 25.05.2012 e tiene conto della nuova lista degli interventi, che dai 91 previsti passano a 84, con un importo complessivo del finanziamento pari ad € 194.690.000, a fronte dei € 210.000.000 previsti originariamente nell'Accordo di Programma del 25.11.2010.

1. Costituzione dell'Ufficio del Commissario e dotazione di personale

1.1. Costituzione Ufficio del Commissario

Con Decreto Commissariale n. 6 del 12.12.2011, in forza di quanto previsto nel DPCM 10.12.2012, art. 4, comma 1, è stata costituita la Struttura di supporto dell'Ufficio commissariale, composta:

- da personale in avvalimento, proveniente dall'Ufficio del Commissario delegato per la bonifica di discariche pubbliche di Manfredonia, sulla base dell'atto convenzionale vigente sottoscritto il 18.05.2011, costituito da n. 3 risorse tecnico-amministrative esperte;
- da n. 16 risorse dei ruoli finanziari, contabilità, affari generali, servizi tecnici, amministrativi, della Regione Puglia;
- n. 2 risorse provenienti dal Dipartimento provinciale dell'Economia e Finanze di Bari,

tutti sotto forma di collaborazione in forma non continuativa come disposto dal DPCM 20.07.2011.

1.2. Avvalimento di personale tecnico proveniente dall'Autorità di bacino della Puglia

Il Commissario delegato:

- ✓ sulla base di quanto previsto dal DPCM 20 luglio 2011, con il quale vengono emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/09, convertiti in legge, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi";
- ✓ considerando l'esigenza di assicurare all'azione commissariale ogni possibile qualificata collaborazione, a garanzia dei risultati dell'azione medesima,

avendo verificato per le vie brevi la disponibilità ed avvalendosi dei poteri definiti all'art. 4 del DPCM del 10.12.2010, con propri Decreti n. 53 e n. 54 del 2 maggio 2012, ha disposto il comando

ed in diretto rapporto con lo stesso Commissario Straordinario delegato, della Dott.ssa Tiziana Caggiano e dell'Ing. Andrea Doria, entrambi dipendenti dell'Autorità di bacino della Puglia.
A far data dal 14 maggio 2012, i due tecnici sopra nominati hanno preso servizio presso l'Ufficio del Commissario Delegato in Bari, Via D. Cotugno 49/a.

1.3. Avvalimento di personale tecnico proveniente da Invitalia Attività Produttive S.p.A.

Il Commissario Delegato, per le medesime considerazioni ed in base agli stessi atti normativi richiamati al punto 1.2 precedente, con propri Decreti n. 71, n. 72 e n. 73 del 22 maggio 2012, ha disposto il comando ed in diretto rapporto con lo stesso Commissario Straordinario delegato, a far data dal 1° giugno 2012, del Dott. Claudio Mariotti, della Sig.ra Stefania De Simoni e dell'Ing. Micaela Faieta, tutti e tre dipendenti di Invitalia Attività Produttive S.p.A., e tutti e tre già operanti presso la sede di Via D. Cotugno 49/a in Bari, in comando presso il Commissario Delegato per la bonifica di discariche pubbliche di Manfredonia fino al 31.05.2012.

1.4. Nuova sede Ufficio del Commissario Delegato

A far data dal 16 febbraio 2012, dopo il completamento della fornitura e posa in opera di tutti i materiali di arredo, delle strumentazioni hardware e software, l'Ufficio del Commissario delegato è stato reso immediatamente operativo nella nuova sede di Via D. Cotugno 49/A in Bari:

- non essendo disponibile spazio sufficiente nella sede precedente, sita in Via F. Lattanzio 29, presso la quale era momentaneamente ospitato, presso il Commissario delegato per l'Emergenza ambientale in Puglia;
- non avendo potuto reperire altri locali idonei e già a disposizione presso altre PP.AA., come da richiesta svolta presso l'Agenzia del Demanio di Puglia e Basilicata, giusta nota prot. n. 229 del 15.11.2011 e dalla conseguente risposta di indisponibilità degli stessi da parte della stessa agenzia, giusta nota prot. n. 26524 del 22.11.2011,

L'Ufficio si compone:

- di uno spazio riservato al Commissario, all'interno del quale è stata allestita anche una sala riunioni per lo svolgimento delle Conferenze di Servizi e degli incontri tecnici;
- di tre stanze, con 5 postazioni di lavoro riservate al personale presente con continuità giornaliera (segreteria – protocollo – consegnatario, dirigente responsabile di struttura, tecnici progettisti/istruttori) ;
- di due openspace con n. 15 postazioni operative dedicato al personale tecnico ed amministrativo di supporto, al cui interno di una delle due è stata ricavata un'ulteriore sala riunioni per incontri con tecnici, progettisti , etc.

La logistica della Struttura commissariale è completata da:

- stanza "tecnica" (con plotter, stampanti multifunzioni e fotocopiatrici/scanner);
- stanza adibita ad archivio per l'organica conservazione e consultazione dei documenti progettuali ricevuti e prodotti

La struttura è inoltre per intero dotata di server, rete telefoni/dati ed impianto di allarme.

1.5. Nomina Consegnatario/Cassiere

Al fine del funzionamento ottimale della struttura commissariale, come già attuato da altri Commissari Delegati per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, con proprio Decreto n. 16 del 9.02.2012, il Commissario delegato ha provveduto a nominare il Consegnatario e l'Economo/cassiere, per l'espletamento delle mansioni e dei relativi obblighi previsti dalle norme vigenti in materia.

1.6. Convenzione con Invitalia Attività Produttive S.p.A. per attività di supporto tecnico e di progettazione interventi

Sulla base della Convenzione sottoscritta l'11 maggio 20112 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A., in forza di quanto previsto nel DPCM 10.12.2012, art. 4, comma 1, in data 14.12.2011, e delle successive note tecnico-operative con cui lo stesso Commissario ha trasmesso ad Invitalia Attività Produttive S.p.A. (IAP), in qualità di Soggetto Attuatore individuato da Invitalia S.p.A., la lista delle progettazioni di competenza da implementare, la Società:

- ha redatto le specifiche tecniche relative alle indagini integrative, ai fini della progettazione che deve implementare a propria firma o per la quale deve fornire supporto alla progettazione con attività specialistiche, riferite agli interventi di:

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento
BA046A/10	**Altamura**	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)
BA049A/10	**Bari**	Interventi ex Cava di Maso, Quart. S. Rita Carbonara 2 - Consolidamento parete rocciosa Nord
FG010A/10	**Biccari**	Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino
FG022A/10	**Chieuti**	Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani
FG036A/10	**Motta Montecorvino**	Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia
FG074A/10	**Motta Montecorvino**	Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere - **Progetto di completamento**
LE045A/10	**Seclì**	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Seclì

Di tali interventi ha parimenti avviato le attività progettuali, le quali sono in corso, mentre si sono alcune concluse (Biccari), in parte si stanno ultimando (Altamura, Chieuti e Seclì), in parte sono di prossimo affidamento (Bari e Motta Montecorvino) le campagne di indagini geognostiche.;

- ha svolto attività di supporto tecnico, relativamente alle fasi di istruttoria di alcuni progetti pervenuti agli uffici del Commissario, relativamente agli interventi:

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento
FG068A/10	**Anzano di Puglia**	Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo
FG003A/10	**Celle di San Vito**	Completamento sistemazione mov. franoso vers. collinare Via Roma

FG065A/10	**Chieuti**	Intervento di mitigazione del rischio idraulico sul canale della Castagna (Valle dell'Inferno)
FG019A/10	**Faeto**	Progetto per le opere di contenimento dei dissesti idrogeologici del centro abitato zona "Cimitero"
FG079A/10	**San Paolo di Civitate**	Lavori sistemazione alveo torrente Staina
FG066A/10	**San Paolo di Civitate**	Lavori di sistemazione alveo Torrente Radicosa x mitigazione rischio idraulico

Istruttorie sulla base delle quali il Commissario Delegato ha richiesto modifiche/integrazioni progettuali ai progettisti degli stessi, al fine dell'implementazione e realizzazione delle successive fasi della progettazione e dell'attuazione degli interventi stessi;

- nell'ambito delle attività progettuali affidate, così come per i diversi interventi in cui la progettazione viene svolta direttamente dai tecnici facenti parte dell'Ufficio del Commissario Delegato, la Società ha inoltre svolto i rilievi topografici di dettaglio e la stesura dei piani particellari di esproprio.

1.7. Convenzione con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo

In data 9 gennaio 2012 è stato sottoscritto con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del mediterraneo (CGIAM), sulla base del decreto commissariale n. 8 del 9 gennaio 2012 di approvazione e finanziamento di tale Accordo, ed avvalendosi di quanto disposto dal DPCM 10.12.2012, art. 4, comma 1, per lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di assistenza tecnico-specialistica nell'ambito dell'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nella Regione Puglia.

Il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM), istituito in data 6 febbraio 1979, soggetto di diritto pubblico ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è un Istituto di Ricerca Scientifica promosso dalla Regione Basilicata, che vi aderì con delibera del Consiglio Regionale del 25 novembre 1977, n. 305, operante nella ricerca finalizzata alla riduzione dei rischi naturali avvalendosi delle esperienze maturate e delle competenze riconosciute sia a livello nazionale e sia a livello internazionale sviluppando, inoltre, attività di alta formazione e diffusione della cultura scientifica sulle tematiche dell'Ambiente e della Protezione Civile come rinvenibile dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n.650 del 09.04.2010.

Considerato che tra i compiti istituzionali del CGIAM è compreso "*lo sviluppo socio economico della Regione Mediterranea, mediante lo studio geomorfologico integrato delle aree interessate, in modo da fornire gli strumenti conoscitivi più adatti per il miglior uso del territorio e la difesa dell'ambiente. Lo studio geomorfologico integrato è inteso nel senso multidisciplinare più ampio in grado di consentire, mediante una adeguata azione di monitoraggio, la predisposizione di metodologie scientifiche avanzate; di individuazione ed ingegnerizzazione di tecnologie finalizzate a programmi e progetti miranti alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, archeologico, monumentale e antropico dalle possibili situazioni di rischio, siano esse naturali o di origine antropica, nelle regioni dell'are Mediterranea.*", le attività per le quali il Commissario Straordinario Delegato si avvale del CGIAM sono principalmente:

1. Rilievo con tecniche da terra, aeree e da satellite di dati territoriali ed ambientali. In particolare, questa attività prevede in fase di rilievo l'utilizzo di GPS, laser scanner, camere fotogrammetriche, videocamere digitali, sensori iperspettrali, sensori IR ed in fase di post-

processing l'impiego dei più evoluti sistemi software di elaborazione oltre che codici di calcolo appositamente realizzati;

2. Post-processing di dati disponibili e/o rilevati, anche con modelli e procedure previsionali e di tipo anche statistico, al fine di pervenire alla definizione delle zone o delle situazioni di rischio per le quali provvedere, quindi, alla valutazione della vulnerabilità ambientale e territoriale legata ad eventi naturali ed antropici relativamente ad aree urbanizzate e non urbanizzate, con particolare riguardo al rischio: sismico, idrogeologico, idraulico (piene e siccità) e di incendio;
3. Sistema di monitoraggio del territorio per il controllo dei diversi fattori di rischio con la redazione di mappe dinamiche per la definizione della vulnerabilità delle risorse del territorio e dei possibili scenari previsionali;
4. Interventi di rilevamento delle condizioni di sicurezza del costruito e delle infrastrutture (strade, ferrovie e acquedotti, ecc.) con priorità per quelli di importanza strategica, con tecniche di rilievo innovative al fine di rilevarne il grado di vulnerabilità e pericolosità in relazione a possibili eventi calamitosi e prefigurarne l'eventuale intervento di adeguamento occorrente;
5. Progettazione e realizzazione di un Sistema Informativo per le emergenze che permetta una gestione informatizzata di tutte le attività connesse con le problematiche di intervento sul territorio sia in situazioni ordinarie sia in condizioni di allerta;
6. Supporto all'organizzazione ed istituzione di unità di crisi e sale operative, intese come sistema composto dal personale, locali, ed attrezzature, tecnologie, metodologie, finalizzate alla gestione delle emergenze;
7. *Man power* dedicato e/o a tempo da adibire a mansioni specialistiche di acquisizione, elaborazione, restituzione dati;
8. Mezzi (aereo e/o elicottero) per la ricognizione aerea, ove necessario equipaggiati con adeguata strumentazione per l'indagine e l'osservazione, da impiegare anche per interventi con carattere di urgenza;
9. Attività finalizzate al coinvolgimento in progetti e al reperimento di fondi in ambito nazionale ed internazionale,

visto che le richiamate attività sono funzionali al conseguimento del seguente obiettivo: "Supporto alla Struttura Commissariale in sede di progettazione degli interventi di competenza dello stesso" nonché "Caratterizzazione del territorio regionale al fine di ridurre i danni per l'uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico ed ambientale mediante attività di ricerca finalizzata alla definizione di modelli di analisi di rischio ambientale e dei possibili scenari di previsione del rischio stesso anche attraverso l'individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate ".

Sulla base di tale accordo, e facendo seguito ad incontri tecnici avuti presso la struttura commissariale, il Commissario Delegato ha successivamente trasmesso al CGIAM una lista di 20 "punti di intervento", compresi tra i 91 di cui all'Elenco A dell'Accordo di Programma del 25.11.2010, su cui il centro ha avviato i rilievi mediante piattaforme aerotrasportate e delle quali ha iniziato a restituire e rappresentare i dati all'ufficio del Commissario, secondo le priorità da questi stabilite, a partire dal 23.03.2012.

Ad oggi sono stati completati i rilievi delle aree oggetto dei seguenti interventi:

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento
BA046A/10	**Altamura**	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)
FG008A/10	**Carpino**	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato
FG031A/10	**Castelluccio Valmaggiore**	Completamento Sistem. Dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura
FG071A/10	**Castelluccio Valmaggiore**	Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla via Stretta della Monaca e via degli Emigranti)
FG022A/10	**Chieuti**	Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani
FG065A/10	**Chieuti**	Intervento di mitigazione del rischio idraulico sul canale della Castagna (Valle dell'Inferno)
BA033A/10	**Gravina in Puglia**	Lavori di sistemazioneTorrente Gravina (tratto compreso tra il ponte S. Stefano/S.S. Bari – Potenza e loc. Terrasanta)
TA072A/10	**Grottaglie**	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci
LE035A/10	**Miggiano**	Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica – Lavori di completamento.
FG077A/10	**Rignano Garganico**	Opere mitigazione rischio confluenza torrenti Triolo e Candelaro
FG066A/10	**San Paolo di Civitate**	Lavori di sistemazione alveo Torrente radicosa per mitigazione rischio idraulico
FG079A/10	**San Paolo di Civitate**	Lavori di sistemazione alveo Torrente Staina
LE083A/10	**Scorrano**	Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale
LE045A/10	**Seclì**	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Seclì
BA042A/10	**Terlizzi**	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti , Lama Bonasiere - Lotto di Completamento
LE080A/10	**Veglie**	Rimozione stato di rischio idrogeologico del territorio a nord dell'abitato. Stralcio funzionale
FG005A/10	**Volturara Appula**	Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in loc. Sant'Antonio. Progetto di Completamento
FG064A/10	**Volturara Appula**	Lavori di sistemazione dei dissesti idrog. interessanti la strada comunale Amborchia

Di ciascuna area di intervento, a valle dell'esecuzione del rilievo mediante piattaforma elitrasportata, il Centro ha fornito tutte le elaborazioni ed i rilevi georeferenziati con le quali è stato possibile:

- per i progetti redatti direttamente dalla struttura commissariale, eseguire tutti i calcoli idraulici per la simulazione della situazione ante e post-operam, secondo le regole dettate dall'Autorità di Bacino della Puglia, finalizzati alla definizione, configurazione ne dimensionamento delle opere idrauliche da attuarsi in tali interventi per la mitigazione del rischio;
- per i progetti redatti da/per conto dei Comuni, per la verifica idraulica nel corso delle istruttorie svolte.

Il personale facente parte del Gruppo di Lavoro costituito dal CGIAM per le attività di supporto tecnico-operativo agli uffici del Commissario Delegato, costituito tra l'altro, fino al 31.12.2012, da n. 1 ingegnere, 1 geologo e n. 1 geometra che collaborano con continuità quasi quotidiana con la struttura commissariale, oltre a personale amministrativo di supporto, ha operato anche mediante la stesura di relazioni di inquadramento geologico, di specifiche tecniche e computi, relativamente agli interventi che la struttura commissariale ha in fase di progettazione in proprio o per i quali svolge attività dirette di supporto progettuale ai Comuni (in casi cui sono gli Uffici Tecnici Comunali a svolgere attività di progettazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico), quali:

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento
BA069A/10	**Bitetto**	Lavori sistemaz. idraulica C.da Misetta (Alveo Lama del Conte, loc. Guadagno)
TA072A/10	**Grottaglie**	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci
FG037A/10	**Orta Nova**	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova
FG077A/10	**Rignano Garganico**	Opere mitig. rischio confluenza torrenti Triolo e Candelaro
BA042A/10	**Terlizzi**	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti , Lama Bonasiere - **Lotto di Completamento**

2. ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE

2.1. Sopralluoghi ed istruttorie

Nel periodo di riferimento, sono stati effettuati sopralluoghi diretti del personale tecnico facente parte della struttura commissariale, sulle aree oggetto degli interventi da attuare, secondo le priorità e le disponibilità definite con gli stessi Comuni.
Sono stati quindi espletati (in alcuni casi ripetuti, per approfondimenti necessari alla fase di progettazione ove questa viene svolta direttamente dalla struttura commissariale o da Invitalia A.P.), non in ordine temporale di esecuzione, sopralluoghi diretti per gli interventi:

Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo intervento
BA011A/10	Alberobello (BA)	Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico per gli attraversamenti stradali del Canale di Via Indipendenza. Progetto di Completamento
FG002A/10	Alberona (FG)	Completamento sistemazione dissesto loc. Municipio dell'abitato di Alberona
BA046A/10	Altamura (BA)	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)
FG050A/10	Ascoli Satriano (FG)	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle
BA049A/10	Bari	Interventi ex Cava di Maso, Quart. S. Rita Carbonara 2 - Consolidamento parete rocciosa Nord

FG010A/10	Biccari (FG)	Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino
BA069A/10	Bitetto (BA)	Lavori sistemazione idraulica C.da Misetta (Alveo Lama del Conte, loc. Guadagno)
FG006A/10	Candela (FG)	Lavori di risanamento dissesto idrogeologico zona "Fosso Cavallo"
FG008A/10	Carpino (FG)	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato
FG070A/10	Casalnuovo Monterotaro (FG)	Mitigazione rischio idrogeologico in località "Creta Rossa" - Completamento
FG031A/10	Castelluccio Valmaggiore (FG)	Completamento Sistem. Dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura
FG071A/10	Castelluccio Valmaggiore (FG)	Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla via Stretta della Monaca e via degli Emigranti)
FG003A/10	Celle di San Vito (FG)	Completamento di sistemazione mov. Franoso vers. Collinare Via Roma
FG056A/10	Celle di San Vito (FG)	Opere di contenimento impianto depur. comunale rete fogn. di adduzione verso est centro abitato SP 126
FG032A/10	Cerignola (FG)	Lavori di adeguamento Canale Lagrimaro (sottopasso FF.SS.)
FG022A/10	Chieuti (FG)	Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani
FG065A/10	Chieuti (FG)	Intervento di mitigazione del rischio idraulico sul canale della Castagna (Valle dell'Inferno)
BA014A/10	Corato (BA)	Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato
BA033A/10	Gravina in Puglia (BA)	Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra il ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e loc. Terrasanta)
TA072A/10	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci
FG034A/10	Isole Tremiti (FG)	Interventi di mitigazione rischio idraulico vers. Collinari e strade accesso Isola di San Domino
FG036A/10	Motta Montecorvino (FG)	Interventi di consolidamento centro urbano. Loc. Marseglia
FG074A/10	Motta Montecorvino (FG)	Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere – Progetto di completamento.
FG037A/10	Orta Nova (FG)	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova
FG023A/10	Pietramontecorvino (FG)	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del cento urbano – Progetto di completamento
FG077A/10	Rignano Garganico (FG)	Opere di mitigazione rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale
FG026A/10	San Marco la Catola (FG)	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano, loc. Mulino a fuoco – Via Marconi – Corso Umberto
BR053A/10	San Pietro Vernotico (BR)	Completamento progetto riduzione rischio idrogeologico R4 comune di San Pietro Vernotico. Progetto di completamento
LE045A/10	Secli	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli
BA042A/10	Terlizzi (BA)	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere – Lotto di Completamento
LE080A/10	Veglie (LE)	Rimozione stato di rischio idrogeologico del territorio a nord dell'abitato. Stralcio funzionale
FG043A/10	Vico del Gargano (FG)	Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio. Stralcio funzionale
FG081A/10	Vico del Gargano (FG)	Lavori di sistemazione e la regimentazione del Torrente Valle del Melaino

FG005A/10	Volturara Appula	Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in loc. Sant'Antonio. Progetto di Completamento
FG064A/10	Volturara Appula	Lavori di sistemazione dei dissesti idrog. interessanti la strada comunale Amborchia
FG082A/10	Volturino (FG)	Sistemazione e consolidamento versante in frana loc. Lame - Fontana Vecchia

Preliminarmente all'esecuzione dei sopralluoghi, i tecnici della Struttura hanno proceduto all'esame della documentazione progettuale al fine di:

- meglio contestualizzare le opere a farsi rispetto al reale stato dei luoghi;
- poter procedere, in occasione dei sopralluoghi medesimi, all'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione tecnica disponibile presso gli uffici comunali, utile a completare il quadro informativo in merito agli interventi a farsi e ad eventuali interventi già realizzati nelle aree oggetto di intervento ed in quelle contermini;
- ricevere chiarimenti in merito alla tipologia specifica di dissesti in atto ed alle valutazioni poste a base delle scelte progettuali;
- procedere, per le vie brevi, alla richiesta di integrazione e/o revisione degli elaborati progettuali mancanti o ritenuti carenti e/o necessitanti di approfondimento.

I sopralluoghi sono stati svolti congiuntamente a tecnici e/o responsabili dei Comuni interessati, e nel corso degli stessi sono stati verificati:

- gli elementi di base riportati nella documentazione di base oggetto della richiesta di finanziamento;
- lo stato di fatto attuale dell'area oggetto dell'intervento, in considerazione di possibili mutate condizioni, visto che per diversi interventi la documentazione progettuale si riferisce a diversi anni fa;
- eventuali emergenze e/o evidenze di dissesto idrogeologico in atto in continuità o nei pressi dell'area oggetto dell'intervento compreso nell'Accordo di Programma del 25.11.2010.

ed è stato on ogni caso realizzato un report fotografico del sopralluogo.

Nel corso dei sopralluoghi svolti nel primo semestre del 2012, relativamente agli interventi da eseguirsi nei Comuni di Volturara Appula e Corato, a valle degli incontri preliminari avuti con gli stessi Comuni, sono state verificate alcune situazioni in base alle quali, per motivazioni diverse, adeguatamente giustificate e rappresentate dai rispettivi Comuni con proprie relazioni e note, si riteneva necessario:

- modificare l'area di applicazione dell'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico previsto nell'Accordo di programma del 25.11.2010 oppure,
- verificare la effettiva fattibilità dell'intervento per condizioni al contorno vincolanti.

Nello specifico:

- Intervento FG005A/10 - Comune di Volturara Appula "Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato, in loc. S. Antonio", per € 2.940.000, in occasione del sopralluogo congiunto si era potuto constatare che l'intervento di mitigazione del rischio giù attuato, come 1° lotto, per l'area in oggetto, ha di fatto sortito effetti notevoli in termini di stabilizzazione del versante, che risulta allo stato attuale completamente risanato ormai da

oltre 3 anni (come testimoniato da monitoraggi in corso). Di contro, nello stesso territorio comunale si è nel frattempo verificato un grave fenomeno gravitativo che interessa la strada di collegamento "con Volturino, in Loc. "Migliare", con sprofondamento del corpo stradale, danneggiamento del tombino di attraversamento delle acque superficiali etc.

Poiché tale strada costituisce una arteria vitale di comunicazione con il centro abitato, considerata anche la presenza sia di abitazioni che di attività di aziende agricole, rimaste isolate a seguito del dissesto, il Comune ha chiesto di poter trasferire il finanziamento dell'intervento previsto in Accordo di Programma alla nuova area.

Per tale richiesta, la relazione tecnica del Comune e la relazione di sopralluogo redatta dai tecnici del Commissario delegato che hanno svolto il sopralluogo, sono andati a costituire gli allegati alla nota del Commissario prot. 310/DCI del 3.05.2012 trasmessa al Ministero dell'Ambiente, all'Assessorato OO.PP. della Regione Puglia ed al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per le decisioni da assumere in merito.

- Intervento BA014A/10 - Comune di Corato "Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato", per € 2.000.000. In cui, come ben argomentato e circostanziato nella relazione tecnico - economica redatta dal Comune di Corato:
  - ✓ si deve tenere conto che l'intervento oggetto del finanziamento rappresenta il 3° lotto, di completamento, di lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato di Corato, e della propria zona produttiva - che viene regolarmente invasa dalle acque a fronte di eventi meteorici di notevole intensità, anche non estremi - che verrebbero di fatto vanificati senza la realizzazione del 3° lotto in oggetto atto a connettere e by-passare la zona di impluvio a monte dell'abitato con le opere di valle già realizzate;
  - ✓ si evidenzia che gli oneri di esproprio, necessari per la realizzazione di tale 3° lotto, assommano nel Quadro Economico di progetto a circa il 15% del valore dei lavori da realizzare;
  - ✓ si precisa che per tali espropri occorre, a seguito delle mutate normative e procedure di legge, incrementare gli oneri previsti fino a 310.000 euro, che rappresentano il 23% circa del valore complessivo dei lavori.

  Anche in tale caso la relazione tecnica del Comune e la relazione di sopralluogo redatta dai tecnici del Commissario delegato che hanno svolto il sopralluogo, sono andati a costituire allegati alla nota del Commissario prot. 300/DCI del 2.05.2012 trasmessa al Ministero dell'Ambiente, all'Assessorato OO.PP. della Regione Puglia ed al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per le decisioni da assumere in merito.

Oltre a questi sopra riportati, sono stati svolti sopralluoghi in ulteriori quattro siti, per i quali i Comuni, con opportune e documentate motivazioni, hanno richiesto la traslazione del finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 8/2012 su altri interventi da attuare nel proprio territorio comunale, per sopravvenute diverse e più urgenti esigente di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia dell'incolumità pubblica.

Tali interventi sono:

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento
FG070A/10	Casalnuovo Monterotaro	Mitigazione del rischio idrogeologico in località "Creta rossa"
FG062A/10	Pietramontecorvino	Sistemazione idraulica-forestale in Loc. Pisciarelli-Fontanili
BR053A/10	San Pietro Vernotico	Completamento progetto di riduzione del rischio idrogeologico R4 nel Comune di San Pietro Vernotico –progetto di completamento
FG025A/10	Volturino	Sistemazione idraulica del Canale Valle Iuvara

Per tali quattro interventi, come già in precedenza fatto per quelli di Corato (BA014A/10) e Volturara Appula (FG005A710), sono state redatte le relative Relazioni di sopralluogo, di accompagnamento alla richiesta del Comune per la traslazione del finanziamento ed allegate alle note commissariali prott. n. 749 del 24.07.2012, n. 751 del 24.07.2012, n. 789 del 2.08.2012 e n. 929 del 18.09.2012, trasmesse al Comitato di Indirizzo e Coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di Programma per le conseguenti decisioni.

Relativamente all'intervento riguardante il Comune di Corato, in data 30 maggio 2012, con propria nota prot. n. 15972/TR/Di/X, il Ministero dell'Ambiente – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche ha comunicato che, a proprio parere, purché nell'ambito dell'importo massimo del finanziamento concesso nell'Accordo di Programma Quadro l'autorizzazione in oggetto rientra nelle competenze del Commissario Straordinario Delegato.

Per gli altri interventi, con nota prot. 0020333 del 19.12.2012, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha riscontrato le richieste di riprogrammazione degli interventi precedentemente elencati, richiedendo, relativamente agli interventi di Pietramontecorvino, Casalnuovo Monterotaro e San Pietro Vernotico, l'invio di una dettagliata relazione tecnico/amministrativa atta ad illustrare:

- le motivazioni a sostegno della richiesta di riprogrammazione, in particolare in relazione all'aggravamento della situazione di rischio che induce a considerare prioritario l'intervento proposto rispetto a quello inizialmente inserito in Accordo;
- inquadramento degli interventi nel PAI e livello di rischio delle aree coinvolte;
- il livello di progettazione disponibile per l'intervento che si propone;
- la popolazione esposta per l'intervento che si propone;
- sintetica descrizione della soluzione progettuale;
- cronoprogramma delle fasi di attuazione in relazione alla possibilità dell'impegno giuridicamente vincolante al 30 giugno 2013;
- parere della competente AdB;
- previsione di spesa per gli interventi proposti, qualora sia necessario il frazionamento della cifra inizialmente assegnata.

Richiedendo, contestualmente, per l'intervento del Comune di Volturino, di comunicare le eventuali modalità sostitutive dell'intervento.

Alla data del 31.12.2012, la Struttura commissariale ha in corso la redazione delle richieste relazioni ed acquisizione dei parei delle Autorità di bacino competenti.

2.2. Incontri e collaborazioni con Comuni

Immediatamente a valle della piena operatività dell'ufficio commissariale, sia come sede che come struttura tecnica, sono stati avviati incontri tecnico-operativi con i Comuni, finalizzati alla condivisione delle scelte progettuali e delle procedure operative da adottarsi.
Nel complesso, sono stati svolti incontri con 57 dei 59 Comuni facenti parte dell'Elenco A di cui all'Accordo di Programma del 25.11.2010 (alcuni comuni hanno più di un intervento), oltre che con l'Ex Ufficio del Genio Civile di Foggia (STP Foggia) e con la Provincia di Barletta-Andria-Trani (rispettivamente per gli interventi da attuare nel tratto terminale del Fiume Fortore e nel tratto terminale del Fiume Ofanto).
I Comuni con cui sono stati svolti incontri (per taluni anche più di uno), sia con gli uffici tecnici che, nella maggior parte dei casi, con i Sindaci e/o gli Assessori preposti, sono:

- Accadia, Alberobello, Alberona, Altamura, Apricena, Ascoli Satriano, Bari, Biccari, Bitetto, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Canosa, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Castelluccio Valmaggiore, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Cerignola, Chieuti, Cisternino, Corato, Deliceto, Faeto, Fasano, Foggia, Grottaglie, Grumo Appula, Martina Franca, Massafra, Miggiano, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Putignano, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Roseto Valfortore, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, San Pietro Vernotico, Scorrano, Sant'Agata di Puglia, Seclì, Terlizzi, Troia, Veglie, Vico del Gargano, Volturara Appula, Volturino.

Nell'ambito della propria attività ordinaria, la Struttura commissariale offre, ai Comuni che ne fanno richiesta, attività di supporto tecnico e procedurale, anche mediante periodici incontri tecnici, che vedono, nei casi in cui occorra, il diretto coinvolgimento anche degli Enti preposti al rilascio di pareri di competenza.

2.3. Attività di supporto alla progettazione affidata ai Comuni e monitoraggio dello stato di attuazione

A valle degli incontri effettuati con i Comuni, che hanno permesso di verificare la possibilità, in termini di disponibilità presso gli uffici comunali di tecnici abilitati alla progettazione, di procedere all'affidamento della progettazione definitiva e/o esecutiva (a seconda del livello di progettazione già disponibile) ai Comuni medesimi, si è proceduto ad affidare formalmente tali attività per complessivi n. 41 interventi (fino alla data del 16.10.2012)

Per ciascuno di tali interventi il Comune è stato quindi formalmente autorizzato a provvedere in proprio alla progettazione degli interventi in oggetto, o tramite il proprio Ufficio Tecnico – con il supporto eventuale di professionisti esterni per eventuali relazioni e/o calcoli specialistici – oppure avvalendosi direttamente di professionisti esterni in caso di importo degli affidamenti inferiore ad € 40.000.

Nelle medesime autorizzazioni, a valle di una verifica istruttoria delle valutazioni e delle richieste fatte dagli stessi Comuni, sono stati autorizzati i compensi massimi da riconoscere per:

- indagini geologico-geognostiche,
- relazioni geologico-geotecniche,
- relazioni idrauliche e/o di calcolo strutturale,
- rilievi topografici di dettaglio,
- piani di sicurezza e coordinamento,
- piani di manutenzione delle opere,
- e/o per l'eventuale progettazione (definitiva e/o esecutiva) interamente all'esterno in caso di importi limitati (< € 40.000).

e, sulla base di questi, sono stati pertanto definiti ed impegnati, per ciascun intervento, con un unico Decreto Commissariale n. 153 del 16.10.2012, gli oneri conseguenti, come rappresentato dalla tabella sottostante.

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento	CUP	spese autorizzate (valore in €)
BA011A/10	Alberobello	Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrog. per gli attraversamenti stradali del canale di Via Indipendenza. Progetto di Completamento	J65D12000100003	94.697,03
FG002A/10	Alberona	Completamento sistemazione dissesto loc. Municipio dell'abitato di Alberona	J35D12000060001	50.000,00
FG051A/10	Apricena	Realizzazione Canale scolmatore - 2° Lotto	J55D12000160003	50.000,00
FG050A/10	Ascoli Satriano	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle	J65D12000110003	83.453,29
FG055A/10	Biccari	Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, comparto Via Manzoni - Piazzale dei Caduti	J75D12000130003	89.578,21
FG018A/10	Bovino	Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale - 1° Lotto	J85D12000120001	72.870,13
FG006A/10	Candela	Lavori di risanamento dissesto idrogeologico zona "Fosso Cavallo"	J15D12000060003	85.670,00
FG029A/10	Carlantino	Consolidamento frana Rione Toppo x Lotto	J35D12000170003	158.790,30
FG008A/10	Carpino	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	J45D12000120001	90.635,45
FG031A/10	Castelluccio Valmaggiore	Completamento Sistem. Dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura	J85D12000180003	51.589,65
FG071A/10	Castelluccio Valmaggiore	Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla via Stretta della Monaca e via degli Emigranti)	J85D12000210003	50.496,48
FG007A/10	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via Regina Margherita. Progetto di completamento	J15D12000090003	62.783,21
FG084A/10	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via F.lli Bandiera	J15D12000160003	72.413,05
FG003A/10	Celle di San Vito	Completamento sistemazione mov. franoso vers. collinare Via Roma	J25D12000080001	22.805,00
FG056A/10	Celle di San Vito	Opere di contenimento impianto depur. Comunale rete fogn di adduzione vers. Est centro abitato SP 126	J25D12000150003	70.243,88
FG032A/10	Cerignola	Lavori di adeguamento Canale Lagrimaro (sottopasso FF.SS.)	J35D12000180003	55.612,18

FG065A/10	**Chieuti**	Intervento di mitigazione del rischio idraulico sul canale della Castagna (Valle dell'Inferno)	J45D12000230003	**70.669,26**
FG001A/10	**Deliceto**	Lavori di consolidamento dissesti idrog. Centro urbano zona Arena Cavata	J55D12000040001	**89.003,72**
FG057A/10	**Deliceto**	Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gavitelle	J55D12000130003	**120.236,76**
BR016A/10	**Fasano**	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 1° Lotto	J55D12000050001	**73.960,00**
BR017A/10	**Fasano**	Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano, Zona Laureto - 1° Lotto	J55D12000110003	**101.331,60**
BR058A/10	**Fasano**	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 2° Lotto	J55D12000140003	**80.110,00**
BR059A/10	**Fasano**	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 3° Lotto	J55D12000150003	
FG020A/10	**Foggia**	Demolizione e ricostruzione ponte Torrente Salsola - Loc. Masseria Cappuccini- Progetto di completamento	J75D12000120003	**35.754,84**
BA073A/10	**Grumo Appula**	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto	J95D12000150003	**50.000,00**
TA048A/10	**Martina Franca**	Lavori messa in sicurezza muro contenimento Ville De Gasperi	J95D12000130003	**42.734,73**
LE035A710	**Miggiano**	Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica - Lavori di completamento	J15D12000140003	**18.611,95**
FG036A/10	**Motta Montecorvino**	Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia	J85D12000200003	**35.090,00**
FG074A/10	**Motta Montecorvino**	Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere - Progetto di completamento	J85D12000220003	**36.300,00**
FG004A/10	**Panni**	Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato - Via Gramsci, Piazzola di Stoccaggio, S.p. 138 Limitoni	J25D12000070001	**76.125,00**
FG023A/10	**Pietramontecorvino**	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - Progetto di Completamento	J45D12000170003	**129.634,00**
BA076A/10	**Putignano**	Opere di mitigazione del rischio idrogeologio nell'area della Zona Industriale	J35D12000220003	**32.441,79**
FG077A/10	**Rignano Garganico**	Opere mitig. rischio confluenza torrenti Triolo e Candelaro	J65D12000150003	**82.367,63**
FG039A/10	**Rocchetta Sant'Antonio**	Lavori di consolidamento e recupero di aree comunali in ingegneria naturalistica in Via Lacedonia-Via Pioppi	J75D12000090001	**42.917,97**
FG078A/10	**Rocchetta Sant'Antonio**	Lavori di consodlidamento idrogeologico in Loc. "Sorgiallo"	J75D12000140003	**75.637,97**
FG044A/10	**Roseto Valfortore**	Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo	J95D12000100003	**30.442,31**
FG079A/10	**San Paolo di Civitate**	Lavori sistemazione alveo torrente Staina	J65D12000130003	**70.494,33**
FG066A/10	**San Paolo di Civitate**	Lavori di sistemazione alveo Torrente Radicosa x mitigazione rischio idraulico	J65D12000140003	**83.041,76**
FG024A/10	**Troia**	Consolidamento centro abitato zona Via Verdi-Via San Girolamo	J55D12000090003	**98.766,90**
FG063A/10	**Troia**	Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto	J55D12000180003	**108.540,00**
FG064A/10	**Volturara Appula**	Lavori di sistemazione dei dissesti idrog. interessanti la strada comunale Amborchia	J85D12000240003	**18.826,23**
			IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA	**2.764.676,58**

Successivamente a tale decreto, a seguito degli ulteriori incontri d attività operative svolte con i Comuni, sono stati autorizzati/sono in fase di autorizzazione ulteriori 12 interventi, relativi ai Comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Cagnano Varano, Cisternino, Peschici, SanMarco in Lamis, San Marco LA Catola, Sant'Agata di Puglia per i quali è in fase di firma un ulteriore secondo Decreto di finanziamento.

A seguito dell'affidamento della progettazione degli interventi direttamente ai Comuni, la Struttura commissariale, svolge costantemente attività di monitoraggio dello stato di attuazione della stessa, che si è concretizzata, nell'invio, in alcuni casi ripetuto, di note di sollecito della trasmissione della documentazione progettuale oltre che di richieste di integrazione e/o adeguamento degli elaborati progettuali acquisiti agli atti della Struttura.

2.4. Attività istruttoria per l'indizione e svolgimento di Conferenze di Servizi

Sempre nell'ambito delle attività ordinarie, dopo una preliminare fase istruttoria sui progetti originariamente trasmessi dai Comuni (stato di progettazione preliminare o definitivo), che ha portato a richieste di modifiche e/o integrazioni degli elaborati progettuali, l'Ufficio del Commissario ha proceduto alla valutazione, al fine di verificare la possibilità di indizione di specifiche Conferenze di Servizi, dei progetti definitivi/esecutivi dei seguenti interventi:

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento
FG050A/10	**Ascoli Satriano (FG)**	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle
BT012A/10	**Canosa (BA)**	Interventi di consolidamento centro abitato – cavità centro urbano – 1° stralcio di completamento
FG071A/10	**Castelluccio Valmaggiore (FG)**	Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla Via Stretta della Monaca e Via degli Emigranti)
FG003A/10	**Celle di San Vito (FG)**	Completamento sistemazione movimento. franoso versante collinare Via Roma
FG020A/10	**Foggia**	Demolizione e ricostruzione ponte Torrente Salsola – Loc. Masseria Cappuccini – Progetto di completamento
FG034A/10	**Isole Tremiti (FG)**	Interventi di mitigazione del rischio idraulico versanti collinari e strade di accesso Isola di San Domino
FG075A/10	**Orsara di Puglia (FG)**	Messa in sicurezza "Zona 167", consolidamento di n. 2 tratti di Via Gramsci – 2° stralcio
FG004A/10	**Panni (FG)**	Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato- Via Gramsci, Piazzola di Stoccaggio, S.P. 138 Limitoni
BA076A/10	**Putignano (FG)**	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della zona industriale
FG039A/10	**Rocchetta Sant'Antonio (FG)**	Lavori di consolidamento e recupero di aree comunali in ingegneria naturalistica in Via Lacedonia-Via Pioppi
FG078A/10	**Rocchetta Sant'Antonio (FG)**	Lavori di consolidamento idrogeologico loc. Sorgiallo
FG024/10	**Troia (FG)**	Consolidamento centro abitato zona Via Verdi-Via San Girolamo
FG063/10	**Troia (FG)**	Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto
LE080A/10	**Veglie (LE)**	Rimozione stato di rischio idrogeologico del territorio a nord dell'abitato. Stralcio funzionale

In aggiunta a quanto sopra sono stati svolti incontri periodici e tavoli tecnici con Enti (Regione Puglia, Autorità di Bacino) per la condivisione di osservazioni e richieste da trasmettere ai Comuni nell'ambito delle suddette istruttorie.

2.5. Attività di progettazione e/o di supporto alla progettazione svolte della Struttura commissariale

Parallelamente alle attività di sopralluogo prima descritte, di istruttoria dei progetti presentati, o in corso di predisposizione, da parte dei Comuni, di coordinamento delle attività di progettazione e di assistenza tecnica affidate e svolte da Invitalia Attività produttive S.p.A. e CGIAM, i tecnici della struttura interna dell'Ufficio del Commissario stanno procedendo direttamente alla progettazione di alcuni degli seguenti interventi compresi nell'Accordo di Programma:

Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo intervento	Tipologia progettazione
BA069A/10	Bitetto (BA)	Lavori di sistemazione idraulica C.da Misetta (Alveo Lama del Conte, loc. Guadagno)	Preliminare/Definitiva/Esecutiva
TA072A/10	Grottaglie (TA)	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci	Preliminare
FG037A/10	Orta Nova (FG)	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova	Preliminare/Definitiva/Esecutiva
BA042A/10	Terlizzi (BA)	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere – Lotto di Completamento	Preliminare/Definitiva/Esecutiva
FG081A/10	Vico del Gargano (FG)	Lavori di sistemazione e regimentazione del Torrente Valle del Melaino	Preliminare
FG043A/10	Vico del Gargano (FG)	Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio. **Stralcio funzionale**	Esecutiva

La Struttura commissariale, tramite il proprio gruppo di lavoro tecnico, sta inoltre offrendo supporto, su specifica richiesta dei Comuni interessati, per la redazione di relazioni specialistiche relativamente agli interventi:

Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo intervento	Tipologia di supporto alla progettazione
BA011A/10	**Alberobello**	Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico per gli attraversamenti stradali del canale di Via Indipendenza – progetto di completamento	Relazione geologica
FG008A/10	**Carpino**	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo)
FG036A/10	**Motta Montecorvino**	Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia	Relazione geologica + Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo)
FG074A/10	**Motta Montecorvino**	Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere - **Progetto di completamento**	Relazione geologica + Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo)

FG077A/10	**Rignano Garganico**	Opere di mitigazione del rischio alla confluenza dei torrenti Triolo e Candelaro	Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo)
FG043A/10	**Vico del Gargano**	Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio. Stralcio funzionale	Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo)

2.6. Nomine RUP

In parallelo agli incontri con i Comuni, di cui al punto precedente, come previsto dalla procedura definita con gli stessi in base a quanto previsto dal DPCM del 10.12.2010 e dal DPCM integrativo del 20 luglio 2011 (registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 3439), con il quale vengono emanate *"ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del d.l. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi"*, e tenuto conto delle procedure indicate dal D.lgs 163/06 e s.m.i. in materia di "contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il Commissario delegato ha provveduto ad integrare nella propria struttura, tramite specifici Decreti Commissariali di nomina, i Responsabili Unici del Procedimento (RUP) già nominati dai Comuni relativamente agli interventi da attuare.

Allo stato risultano già nominati i RUP dei 59 interventi di seguito specificati:

Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo intervento	Decreto nomina commissariale
BA011A/10	Alberobello	Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrog. per gli attraversamenti stradali del canale di Via Indipendenza. Progetto di Completamento	n. 137 del 19.09.2012
FG002A/10	Alberona	Completamento sistemazione dissesto loc. Municipio dell'abitato di Alberona	n. 186 del 04.12.2012
FG068A/10	Anzano di Puglia	Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo	n. 183 del 04.12.2012
FG021A/10	Anzano di Puglia	Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico loc. Gessara	n. 184 del 04.12.2012
BA046A/10	Altamura	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)	n. 47 del 11.04.2012
FG050A/10	Ascoli Satriano	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle	n. 195 del 04.12.2012
BA049A/10	Bari	Interventi ex Cava di Maso, Quart. S. Rita Carbonara 2 - Consolidamento parete rocciosa Nord	n. 193 del 04.12.2012
FG010A/10	Biccari	Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino	n. 35 del 13.03.2012
FG055A/10	Biccari	Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, comparto Via Manzoni - Piazzale dei Caduti	n. 200 del 04.12.2012
BA069A/10	Bitetto	Lavori sistemaz. idraulica C.da Misetta (Alveo Lama del Conte, loc. Guadagno)	n. 158 del 17.10.2012
FG018A/10	Bovino	Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale - 1° Lotto	n. 220 del 04.12.2012

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 – D.P.C.M. 10.12.2010"

FG006A/10	Candela	Lavori di risanamento dissesto idrogeologico zona "Fosso Cavallo"	n. 205 del 04.12.2012
BT012A/10	Canosa	Interventi di consolidamento abitato Cavità centro urbano - progetto 1° stralcio completamento	n. 109 del 04.09.2012
FG029A/10	Carlantino	Consolidamento frana Rione Toppo x Lotto	n. 213 del 04.12.2012
FG008A/10	Carpino	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	n. 165 del 17.10.2012
FG031A/10	Castelluccio Valmaggiore	Completamento Sistem. Dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura	n. 161 del 17.10.2012
FG071A/10	Castelluccio Valmaggiore	Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla via Stretta della Monaca e via degli Emigranti)	n. 162 del 17.10.2012
FG007A/10	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via Regina Margherita. Progetto di completamento	n. 157 del 16.10.2012
FG084A/10	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via F.lli Bandiera	n. 156 del 16.10.2012
FG003A/10	Celle di San Vito	Completamento sistemazione mov. franoso vers. collinare Via Roma	n. 160 del 17.10.2012
FG056A/10	Celle di San Vito	Opere di contenimento impianto depur. Comunale rete fogn di adduzione vers. Est centro abitato SP 126	n. 159 del 17.10.2012
FG032A/10	Cerignola	Lavori di adeguamento Canale Lagrimaro (sottopasso FF.SS.)	n. 221 del 04.12.2012
FG022A/10	Chieuti	Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani	n. 104 del 24.07.2012 (supp n. 188 del 04.12.2012)
FG065A/10	Chieuti	Intervento di mitigazione del rischio idraulico sul canale della Castagna (Valle dell'Inferno)	n. 122 del 04.09.2012
BR013A/10	Cisternino	Messa in sicurezza reticolo idrografico zona "Gravinella"	n. 196 del 04.12.2012
BA014A/10	Corato	Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato	n. 62 del 03.05.2012 (supp n. 216 del 04.12.2012)
FG001A/10	Deliceto	Lavori di consolidamento dissesti idrog. Centro urbano zona Arena Cavata	n. 222 del 04.12.2012
FG057A/10	Deliceto	Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gavitelle	n. 163 del 17.10.2012
FG019A/10	Faeto	Progetto per le opere di contenimento dei dissesti idrogeologici del centro abitato zona "Cimitero"	n. 208 del 04.12.2012
FG067A/10	Faeto	Lavori di consolidamento Area depuratore	n. 211 del 04.12.2012
BR015A/10	Fasano	Opere integrative e di completamento interventi di regimentazione e protezione idraulica Lotto 1/A - Loc. Montalbano, da Masseria Grande allo sbocco a mare	n. 20 del 20.02.2012
FG020A/10	Foggia	Demolizione e ricostruzione ponte Torrente Salsola – Loc. Masseria Cappuccini. Progetto di completamento	n. 207 del 04.12.2012
BA033A/10	Gravina in Puglia	Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e loc. Terrasanta)	n. 202 del 04.12.2012
TA072A/10	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci	n. 214 del 04.12.2012
BA073A/10	Grumo Appula	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto	n. 136 del 19.09.2012 (supp n. 217 del 04.12.2012)
FG034A/10	Isole Tremiti	Interventi di mitigazione rischio idraulico vers. Collinari e strade accesso Isola di San Domino	n. 166 del 17.10.2012





TA047A/10	Massafra	Interventi per la MISE di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico	n. 194 del 04.12.2012
LE035A/10	Miggiano	Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica - Lavori di completamento	n. 199 del 04.12.2012
FG036A/10	Motta Montecorvino	Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia	n. 121 del 04.09.2012
FG074A/10	Motta Montecorvino	Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere. Progetto di completamento	n. 120 del 04.09.2012
FG075A/10	Orsara di Puglia	Messa in sicurezza "zona 167", consolidamento di n. 2 tratti di Via Gramsci - 2° Stralcio	n. 203 del 04.12.2012
FG037A/10	Orta Nova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova	n. 197 del 04.12.2012
FG004A/10	Panni	Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato - Via Gramsci, Piazzola di Stoccaggio, S.p. 138 Limitoni	n. 185 del 04.12.2012
FG023A/10	Pietramontecorvino	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - Progetto di Completamento	n. 191 del 04.12.2012
BA076A/10	Putignano	Opere di mitigazione del rischio idrogeologio nell'area della Zona Industriale	n. 135 del 19.09.2012 (supp n. 204 del 04.12.2012)
FG044A/10	Roseto Valfortore	Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo	n. 192 del 04.12.2012
FG077A/10	Rignano Garganico	Opere mitig. rischio confluenza torrenti Triolo e Candelaro	n. 139 del 19.09.2012
FG040A/10	San Marco in Lamis	Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e "Schiavonesche"	n. 187 del 04.12.2012
FG026A/10	San Marco la Catola	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano, loc. Mulino a fuoco-Via Marconi-Corso Umberto	n. 215 del 04.12.2012
FG066A/10	San Paolo di Civitate	Lavori di sistemazione alveo Torrente Radicosa per mitigazione rischio idraulico	n. 210 del 04.12.2012
FG079A/10	San Paolo di Civitate	Lavori sistemazione alveo torrente Staina	n. 209 del 04.12.2012
FG052A/10	Sant'Agata di Puglia	Lavori di consolidamento versante Via Pagano-Gizzoli-Via della Libertà. Progetto di completamento	n. 189 del 04.12.2012
LE083A/10	Scorrano	Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale	n. 218 del 04.12.2012
LE045A/10	Secli	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli	n. 43 del 26.03.2012 (supp. n. 145 del 03.10.2012)
BA042A/10	Terlizzi	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti , Lama Bonasiere - Lotto di Completamento	n. 219 del 04.12.2012
FG024A/10	Troia	Consolidamento centro abitato zona Via Verdi-Via San Girolamo	n. 182 del 04.12.2012
FG063A/10	Troia	Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto	n. 190 del 04.12.2012
FG043A/10	Vico del Gargano	Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio. Stralcio funzionale	n. 55 del 02.05.2012 (supp. n. 144 del 03.10.2012)
FG064A/10	Volturara Appula	Lavori di sistemazione dei dissesti idrog. interessanti la strada comunale Amborchia	n. 124 del 04.09.2012 (supp. n. 212 del 04.12.2012)

2.7. Istituzione degli elenchi di Imprese e Professionisti

Con propri Decreti n. 22 e n. 23 del 20.02.2012, il Commissario Delegato ha emanato due bandi di gara, regolarmente pubblicati su GURI e Bollettino Ufficiale Regione Puglia, per l'istituzione, rispettivamente:

- dell'elenco imprese, per le gare a procedura ristretta semplificata, da utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara;
- dell'elenco professionisti, cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i.

Alla data del 11.05.2012 i due Elenchi in oggetto sono stati pubblicati nel sito web del Commissario Delegato, a valle delle procedure di verifica della documentazione richiesta e trasmessa dalle Imprese e dai Professionisti, dopo aver prorogato i termini per l'iscrizione (originariamente previsti per il 15 marzo 2012) fino al 16 aprile 2012.A tale data risultavano iscritti in tali elenchi:

- 279 imprese,
- 247 professionisti.

Con Decreto Commissariale n. 177 del 29.11.2012, è stato poi disposto, ai fini dell'adeguamento annuale previsto dalle norme vigenti, l'aggiornamento per l'anno 2013 dell'Albo delle imprese per la partecipazione alle gare senza pubblicazione di bando di gara. E' stato approvato lo schema di Bando integrale per la costituzione dell'Elenco. Bando integralmente pubblicato sul sito www.dissestopuglia.it e, per estratto, sulla GURI – 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 142 del 05.12.2012, nonché, sempre in data 05.12.2012, su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale (Corriere della Sera e La Repubblica9 e su n. 2 quotidiani a tiratura regionale (Nuovo Quotidiano di Puglia e Gazzetta del Mezzogiorno).

In data 19.12.2012 è stato pubblicato, sempre sul sito della Struttura commissariale, l'elenco delle 379 istanze di ammissione all'Albo pervenute ed è in corso la procedura di verifica delle richieste medesime e, conseguentemente, di approvazione per l'anno 2013 dell'Elenco delle Imprese.

Sono altresì in corso le procedure di aggiornamento dell'elenco dei professionisti cui affidare incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro.

2.8. Espletamento gare di appalto per affidamento lavori e lavori in corso

Nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa garantite dalla Convenzione sottoscritta in data 11.05.2011, la Struttura del Commissario Delegato ha affidato ad Invitalia Attività Produttive S.p.A. le procedure di espletamento di gare.

A valle dell'aggiudicazione, in via definitiva, della gara di appalto dell'intervento in oggetto, con Decreto Commissariale n. 66 del 18.05.2012, ed alla sottoscrizione del relativo contratto stipulato on bari in data 5 giugno 2012 (registrato presso l'Ag. Entrate Roma, Uff. Roma 2 al n.

12777, serie 3, in data 11.06.2012), sono state avviate il 02.08.2012 le attività di cantiere relative all'Intervento **Cod. BR015A/10 – Comune di** Fasano "opere integrative e di completamento interventi di regimazione e protezione idraulica Lotto 1/A – Loc. Montalbano, da Masseria Grande allo sbocco a mare" e, alla data attuale la realizzazione dell'intervento ha raggiunto una percentuale di avanzamento circa pari al 90%.

Inoltre, sempre a valle dell'aggiudicazione, in via definitiva, delle relative procedure di affidamento espletate, in ragione dell'urgenza posta a fondamento degli interventi di cui all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, mediante ricorso al comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. attraverso consultazione di almeno cinque operatori economici ricavabili dall'Elenco delle Imprese di cui al Decreto Commissariale n. 023 del 20.02.2012 e che abbiano dichiarato di essere dotati di idonee caratteristiche tecnico-organizzative e di essere presenti nell'elenco dei laboratori sul sito www.clp.it del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dotati di iscrizione nel settore "C" (Prove geotecniche in situ) dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture ai sensi del D.M. 14.01.2008, sono state avviate le seguenti attività di indagini geognostiche:

Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo dell'appalto	Stato di attuazione
BA011A/10	**Alberobello**	Realizzazione del Piano di indagini integrative relative all'intervento "Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico per gli attraversamenti stradali del Canale di Via indipendenza. Progetto di completamento."	In corso di completamento
BA046A/10	**Altamura**	Realizzazione del Piano di indagini integrative relative alla **Zona 1** – Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale complessiva della lunghezza, attualmente nota, di circa 13 Km"	In corso di completamento
BA046A/10	**Altamura**	Realizzazione del Piano di indagini integrative relative alla **Zona 2** – Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale complessiva della lunghezza, attualmente nota, di circa 13 Km"	In corso di completamento
FG01A/10	**Biccari**	Realizzazione del piano di indagini preliminari relative all'intervento "Mitigazione del rischio idrogeologico Torrente Organo, Torrente Calcare, Canale del Tufo, Vallone dell'Olmo, Torrente Calvino"	Concluso
FG022A/10	**Chieuti**	Realizzazione del piano di indagini e monitoraggio geognostico integrativo **Fase 1** relativi all'intervento "Consolidamento del centro abitato nel tratto Largo IV Novembre – Via Fani"	In corso di completamento
FG022A/10	**Chieuti**	Realizzazione del piano di indagini geofisiche **Fase 2** relative all'intervento "Consolidamento del centro abitato nel tratto Largo IV Novembre – Via Fani"	Concluso
LE045A/10	**Seclì**	Realizzazione del piano di indagini geofisiche integrative **Fase 1** relative all'intervento "Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Seclì"	Concluso
LE045A/10	**Seclì**	Realizzazione del piano di indagini geognostiche integrative **Fase 2** relative all'intervento "Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Seclì"	In corso di completamento

2.9. Conferenze di Servizi

Facendo riferimento alla nota prot. 0050098 del 15.09.2011 con cui l'Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali STP di Foggia ha trasmesso agli Enti interessati copia del "Progetto Generale Preliminare degli ulteriori interventi di ripristino dell'efficienza idraulica dell'asta del Fiume Fortore, sottesa alla diga di Occhito, nella provincia di Foggia" .cod. FG030A/10, al fine di ottenere le eventuali osservazioni/modifiche prima di poter procedere ai successivi livelli progettuali, ed in relazione alla nota trasmessa dal medesimo Ufficio di coordinamento STP di Foggia, con la quale lo stesso, in relazione ai pareri di riscontro al progetto trasmesso ricevuto da RFI, ANAS ed Autostrade e, soprattutto, ai pareri ancora mancanti, ha chiesto al Commissario Delegato in epigrafe di convocare una specifica Conferenza di Servizi, ai fini dell'acquisizione degli stessi,
Il Commissario delegato ha quindi ocnvocato, e poi svolto, in data 13.03.2012, una specifica Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto generale in oggetto - che riguardava l'intero tratto fluviale, per un importo complessivo pari ad € 18.400.000, a seguito della quale, ottenuti i pareri e le prescrizioni da parte degli Enti e PP.AA. coinvolte, lo stesso Ufficio STP sta provvedendo alla progettazione, preliminare e definitiva, del 1° lotto di intervento (dalla foce fino a circa gli attraversamenti con Autostrada A14 e Ferrovia RFI), per un importo pari ad € 5.000.00, oggetto del finanziamento di cui all'Accordo di Programma del 25.11.2010.

Nella seconda parte dell'anno 2012 sono state convocate e svolte, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del DPCM 20 luglio 2011, le Conferenze di Servizi per l'approvazione dei progetti definitivi dei seguenti interventi:

Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo intervento	Importo finanziamento (€)
FG031A/10	**Castelluccio Valmaggiore**	Completamento sistemazione dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura	720.000
BA014A/10	**Corato**	Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato	2.000.000
LE080A/10	**Veglie**	Rimozione stato di rischio idrogeologico del territorio a nord dell'abitato – Stralcio funzionale	2.800.000
FG043A/10	**Vico del Gargano**	Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio. **Stralcio funzionale**	850.000
FG064A/10	**Volturara Appula**	Lavori di sistemazione dissesti idrogeologici interessanti la strada comunale Amborchia	600.000

a seguito delle quali:

- per l'intervento FG031A/10 – Castelluccio Valmaggiore, il progetto definitivo è stato approvato, a condizione che il Comune trasmettesse alcune seppur minime integrazioni progettuali ed alcuni chiarimenti, per cui lo stesso Comune ha successivamente effettivamente provveduto e, pertanto, si è avviata la successiva fase di progettazione esecutiva dell'intervento. *Pervenuta nei primi di gennaio 2013*
- per l'intervento BA014A/10 – Corato, il progetto definitivo è stato approvato e sono stati acquisiti i pareri degli Enti competenti.

E' attualmente in corso di redazione il progetto esecutivo.

- per l'intervento LE080A/10 – Veglie, si è ritenuto che il progetto definitivo presentato dovesse essere integrato, soprattutto in relazione allo studio idraulico ed alla situazione pre-intervento, sulla base della quale vengono definite le scelte progettuali. Ritenendo necessario per tale fattispecie un tavolo tecnico congiunto tra Comune, Autorità di Bacino e Commissario Delegato, la procedura di approvazione è stata sospesa.
  Sono stati svolti ripetuti incontri tra i progettisti e l'Autorità di Bacino della Puglia per l'adeguamento degli elaborati progettuali; adeguamento a valle del quale verrà indetta nuova Conferenza di Servizi.
- per l'intervento FG043A/10 – Vico del Gargano, il progetto definitivo è stato approvato, a condizione che il Comune trasmettesse alcune integrazioni progettuali relative, in particolare alla relazione geologica specialistica ed allo Studio meteo-marino, per cui lo stesso Comune ha avviato l'implementazione, ai fini della chiusura della fase di approvazione finale del progetto.
  Al momento il Comune di Vico del Gargano ha proceduto alla trasmissione della relazione geologica e si è in attesa dello studio meteo-marino, mentre la progettazione esecutiva, svolta dalla struttura commisariale, è praticamernte pronta .
- per l'intervento FG064A/10 – Volturara Appula, è stato approvato il progetto esecutivo presentato al Comune e sono state avviate le procedure per l'appalto dell'intervento.
  E' in corso la procedura di gara per l'affidamento dei lavori.

Alla data del 31.12.2012 sono state inoltre indette nei giorni 14, 15 e 16 gennaio 2013 le Conferenza di Servizi relative ai progetti:

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento
FG002A/10	**Alberona**	Completamento sistemazione dissesti loc. municipio dell'abitato di Alberona
FG050A/10	**Ascoli Satriano (FG)**	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle
FG003A/10	**Celle di San Vito (FG)**	Completamento sistemazione movimento. franoso versante collinare Via Roma
FG056A/10	**Celle di San Vito (FG)**	Opere di contenimento inpianto di depurazione comunale rete fogn di adduzione vers. est centro abitato SP 126
FG071A/10	**Castelluccio Valmaggiore (FG)**	Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla Via Stretta della Monaca e Via degli Emigranti)
FG034A/10	**Isole Tremiti (FG)**	Interventi di mitigazione del rischio idraulico versanti collinari e strade di accesso Isola di San Domino
FG024/10	**Troia (FG)**	Consolidamento centro abitato zona Via Verdi-Via San Girolamo
FG063/10	**Troia (FG)**	Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto

Per suddetti progetti, pertanto, la Struttura commissariale ha svolto le attività istruttorie preparatorie.

2.10. Verifica e validazione dei progetti

Il D.Lgs. 163/2006 all'art. 93, comma 6, prevede un procedimento di verifica della progettazione finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

Il Titolo II – Capo II del DPR 207/2010, all'art. 47, comma 1, sancisce che la stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture operative e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Codice.

Alla luce di quanto sopra con Decreto commissariale n. 223 del 05.12.2012 è stato costituito il Gruppo Tecnico di verifica dei progetti ed è stato approvato Regolamento del sistema interno di verifica e validazione dei progetti.

Il suddetto GT ha in corso le procedure di verifica del progetto esecutivo relativo all'intervento BT012A/10 Canosa "Intervento di consolidamento abitato cavità centro urbano - progetto 1° stralcio completamento"

3. Accordi, protocolli e convenzioni in atto con altre PP.AA. ed Enti Pubbliuci

3.1. Accordo Interministeriale Puglia – Sicilia - Calabria

Con specifico decreto Commissariale n. 34 del 13 marzo 2012, il Commissario Delegato ha approvato, e quindi sottoscritto, un Accordo di collaborazione "intecommissariale" con i Commissari Straordinari Delegati per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Sicilia e della Regione Calabria, finalizzato all'interscambio di risorse tecnico-amministrative-finanziarie, mediante avvalimento, facenti parte delle rispettive Strutture commissariali costituite, con il fine di poter garantire in ogni momento la massima funzionalità operativa delle stesse, in relazione alle esigenze ed ai carichi di lavoro effettivi delle diverse Strutture.
L'avvalimento oltre che per le risorse umane, potrà riguardare anche strutture, servizi e materiali tecnici (servizi di telefonia, servizi informatici, etc.).
La durata della collaborazione è stata fissata fino al 31.12.2013, data di termine prevista delle attività commissariali, fatte salve eventuali proroghe delle stesse.

3.2. Convenzione con Provincia di Barletta-Andria-Trani per progettazione F. Ofanto

A seguito di incontri avuti con il Settore Urbanistica, Assetto territorio e Difesa del Suolo della provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), ed a valle della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 7 del 22/12/2012, con la quale veniva approvato lo schema di disciplinare con cui la Provincia di Barletta Andria Trani manifestava la volontà di fornire il supporto tecnico al Commissario Straordinario Delegato, relativamente alla realizzazione di alcuni degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma citato in premessa, di volta in volta individuati dal Commissario e

comunicati alla Provincia con apposita nota, in data 12/03/2012 veniva sottoscritto il predetto disciplinare tra il Commissario Straordinario Delegato e la Provincia di Barletta-Andria-Trani.
Con nota prot. n. 369 del 22/05/2012 l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato comunicava la volontà di procedere all'affidamento della progettazione dell'"Intervento BT027/A10 – "Interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del fiume Ofanto tra ponte romano e la foce – 1° stralcio, per un importo di € 5.000.000,00, al suddetto Settore Urbanistica, Assetto territorio e Difesa del Suolo della provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT).
Tale Ufficio iniziava immediatamente, nelle more della formalizzazione dell'incarico da stipulare con apposito decreto commissariale, la progettazione preliminare dell'intervento in oggetto, per la quale veniva già svolta, in data 8.06.2012, una riunione tecnica di coordinamento nel corso della quale il suddetto ufficio provinciale consegnava per le vie brevi ai tecnici del Commissario Delegato intervenuti, un primo documento "preliminare alla progettazione", contenente gli elementi di base necessari per la condivisione delle scelte progettuali e per il prosieguo delle attività.
Su tale attività ed intervento è in corso una verifica tecnico – procedurale in considerazione delle criticità connesse all'attuazione dell'intervento come "stralcio" o lotto funzionale [di valore pari a € 5.000.000] di un progetto generale, suddiviso in 4 lotti complessivi, di importo complessivo pari a € 20.000.000.

3.3. Convenzione CARS Altamura

In riferimento all'intervento BA046A/10 - Comune di Altamura " Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)":

- ✓ in considerazione della particolarità dello stesso - trattandosi di punti di applicazione in cavità sotterranee di difficile accesso - e,
- ✓ della necessità di acquisire ogni informazione utile ad una corretta e completa progettazione, dell'intervento da adottare, sia in termini ingegneristico - funzionali che in termini di modalità operative di intervento, sempre e comunque nel rispetto massimo della salvaguardia dell'incolumità degli operatori,

il Commissario Delegato ha ritenuto opportuno, in forza di quanto disposto dall'art. 4 del DPCM 10.12.2010, di avvalersi del centro Altamurano di Ricerche Speleologiche (CARS), associazione senza scopo di lucro attiva sin dal 1950 e che esegue da oltre 60 anni ricerche e rilievi di cavità, voragini e di qualsiasi fenomeno ipogeo, per:

- attività di rilevamento speleologico di dettaglio e di elaborazione e restituzione dei dati, utili alla migliore progettazione e realizzazione dell'intervento in oggetto,

ed ha all'uopo approvato e stipulato, con specifico decreto n. 77 del 6 giugno 2012, un Disciplinare d'Incarico con il CARS di Altamura, il quale si è impegnato entro 35 giorni dalla stipula dello stesso, a realizzare le attività di rilevamento ed elaborazione dati ed a consegnarle al Commissario al fine di poter proseguire celermente con la fase di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento stesso, attualmente in corso.

3.4. Convenzione con ANBI Puglia

In data 13.11.2012, è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Associazione Nazionale consorzi di Bonifica - Puglia , con il quale l'ANBI Puglia ha dato la disponibilità dei Consorzi associati a rendere prestazioni necessarie alla realizzazione di interventi di cui all'Accordo del 25.11.2010 mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni da stipulare, da parte dei singoli Consorzi con il Commissario o con i Comuni destinatari dei finanziamenti del più volte citato Accordo di Programma.
Ai sensi dell'art. 4 del richiamato Protocollo d'Intesa, in data 17.12.2012, il Commissario Straordinario Delegato ha successivamente affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento BA033A/10 – Comune di Gravina in Puglia "Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e località Terrasanta)" - importo € 1.720.000., al Consorzio Terre d'Apulia.

Il Commissario Straordinario Delegato
(*Dott. Maurizio Croce*)

Annessi:

Annesso 1 – Elenco e Tavola sinottica degli interventi Commissario Dissesto Puglia ex Delibera CIPE 8/2012

PAGINA BIANCA

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

ANNESSO 1

Elenco e Tavola sinottica interventi Commissario Dissesto Puglia ex Delibera CIPE 8/2012

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 – D.P.C.M. 10.12.2010"

	Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo intervento	Importo (€)
1	FG018A/10	Bovino *	Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale - 1° Lotto	790.000
2	BR015A/10	Fasano	Opere integrative e di completamento interventi di regimentazione e protezione idraulica Lotto 1/A - Loc. Montalbano, da Masseria Grande allo sbocco a mare	1.500.000
3	FG030A/10	ex Genio Civile Foggia	Interventi prioritari di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del fiume Fortore, tratto sotteso dalla diga di Occhito I lotto	5.000.000
4	BT027A/10	Aut. Bac. Puglia (Prov. BAT)	Progetto generale e interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell'Ofanto, dal Ponte Romano alla foce	5.000.000
5	FG004A/10	Panni *	Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato - Via Gramsci, Piazzola di Stoccaggio, S.p. 138 Limitoni	1.500.000
6	LE045A/10	Secli	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli	3.690.000
7	FG010A/10	Biccari	Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino	4.000.000
8	FG001A/10	Deliceto	Lavori di consolidamento dissesti idrog. Centro urbano zona Arena Cavata	2.500.000
9	FG008A/10	Carpino	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	4.000.000
10	BA049A/10	Bari	Interventi ex Cava di Maso, Quart. S. Rita Carbonara 2 - Consolidamento parete rocciosa Nord	4.430.000
11	BA046A/10	Altamura	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)	3.000.000
12	FG003A/10	Celle di San Vito	Completamento sistemazione mov. franoso vers. collinare Via Roma	950.000
13	FG002A/10	Alberona	Completamento sistemazione dissesto loc. Municipio dell'abitato di Alberona	1.200.000
14	BT012A/10	Canosa	Interventi di consolidamento abitato Cavità centro urbano - progetto 1° stralcio completamento	2.000.000
15	FG019A/10	Faeto	Progetto per le opere di contenimento dei dissesti idrogeologici del centro abitato zona "Cimitero"	800.000
16	BR016A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 1° Lotto	6.180.000
17	FG043A/10	Vico del Gargano	Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio. Stralcio funzionale	850.000
18	FG039A/10	Rocchetta Sant'Antonio	Lavori di consolidamento e recupero di aree comunali in ingegneria naturalistica in Via Lacedonia-Via Pioppi	870.000
19	FG006A/10	Candela	Lavori di risanamento dissesto idrogeologico zona "Fosso Cavallo"	3.300.000
20	FG009A/10	Accadia	Sistemazione dissesto zona a rischio frane interna al centro urbano, loc. Via Oberdan Impianti Sportivi	660.000
21	FG022A/10	Chieuti	Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani	2.290.000
22	FG023A/10	Pietramontecorvino	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - Progetto di Completamento	2.900.000





23	BA011A/10	Alberobello	Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrog. per gli attraversamenti stradali del canale di Via Indipendenza. Progetto di Completamento	1.720.000
24	FG007A/10	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via Regina Margherita. Progetto di completamento	2.270.000
25	FG005A/10	Volturara Appula	Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in loc. Sant'Antonio. Progetto di Completamento	2.940.000
26	FG024A/10	Troia	Consolidamento centro abitato zona Via Verdi-Via San Girolamo	2.500.000
27	FG028A/10	Cagnano Varano	Consolidamento e messa in sicurezza centro urbano loc. Costa - Fosso San Francesco - Valle S. Giovanni - Loc. Fondate	1.500.000
28	BA042A/10	Terlizzi	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti , Lama Bonasiere - Lotto di Completamento	1.550.000
29	FG026A/10	San Marco la Catola	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano, loc. Mulino a fuoco-Via Marconi-Corso Umberto	1.430.000
30	FG021A/10	Anzano di Puglia	Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico loc. Gessara	1.200.000
31	FG029A/10	Carlantino	Consolidamento frana Rione Toppo x Lotto	2.000.000
32	FG031A/10	Castelluccio Valmaggiore	Completamento Sistem. Dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura	720.000
33	FG032A/10	Cerignola	Lavori di adeguamento Canale Lagrimaro (sottopasso FF.SS.)	2.500.000
34	FG034A/10	Isole Tremiti	Interventi di mitigazione rischio idraulico vers. Collinari e strade accesso Isola di San Domino	2.000.000
35	LE035A/10	Miggiano	Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica - Lavori di completamento	400.000
356	FG044A/10	Roseto Valfortore	Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo	1.200.000
37	BR013A/10	Cisternino	Messa in sicurezza reticolo idrografico zona "Gravinella"	1.500.000
38	BA014A/10	Corato	Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato	2.000.000
39	BR017A/10	Fasano	Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano, Zona Laureto - 1° Lotto	5.450.000
40	BA033A/10	Gravina in Puglia	Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e loc. Terrasanta)	1.720.000
41	FG037A/10	Orta Nova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova	3.420.000
42	FG040A/10	San Marco in Lamis	Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e "Schiavonesche"	1.800.000
43	FG020A/10	Foggia	Demolizione e ricostruzione ponte Torrente Salsola - Loc. Masseria Cappuccini- Progetto di completamento	800.000
44	FG036A/10	Motta Montecorvino	Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia	1.430.000
45	FG025A/10	Volturino	Sistemazione idraulica del Canale Valle Iuvara	3.290.000
46	FG038A/10	Peschici	Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento idraulico Canale Calena	2.500.000
47	FG041A/10	Serracapriola	Completamento lavori di prevenzione del rischio idrog. del centro urbano, Loc. Vallone Don Ciccio. Progetto di completamento	750.000
48	TA047A/10	Massafra	Interventi per la MISE di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico	2.500.000





49	TA048A/10	Martina Franca	Lavori messa in sicurezza muro contenimento Ville De Gasperi	1.500.000
50	BR053A/10	San Pietro Vernotico	Completamento progetto riduzione rischio idrogeologico R4 comune di S.Pietro Vernotico. Progetto di Completamento	1.250.000
51	BA076A/10	Putignano	Opere di mitigazione del rischio idrogeologio nell'area della Zona Industriale	3.390.000
52	FG068A/10	Anzano di Puglia	Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo	1.000.000
53	FG050A/10	Ascoli Satriano	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle	1.800.000
54	FG055A/10	Biccari	Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, comparto Via Manzoni - Piazzale dei Caduti	3.250.000
55	FG056A/10	Celle di San Vito	Opere di contenimento impianto depur. Comunale rete fogn di adduzione vers. Est centro abitato SP 126	2.240.000
56	FG065A/10	Chieuti	Intervento di mitigazione del rischio idraulico sul canale della Castagna (Valle dell'Inferno)	950.000
57	FG057A/10	Deliceto	Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gavitelle	3.750.000
58	FG067A/10	Faeto	Lavori di consolidamento Area depuratore	1.200.000
59	BR058A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 2° Lotto	5.800.000
60	BR059A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 3° Lotto	4.680.000
61	FG075A/10	Orsara di Puglia	Messa in sicurezza "zona 167", consolidamento di n. 2 tratti di Via Gramsci - 2° Stralcio	700.000
62	FG060A/10	Peschici	Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex Canale S. Lucia - 3° Stralcio funzionale	2.500.000
63	FG078A/10	Rocchetta Sant'Antonio	Lavori di consodlidamento idrogeologico in Loc. "Sorgiallo"	1.300.000
	FG085A/10	*Roseto Valfortore*	*Consolidamento e messa in sicurezza centro abitato, tra Via Faeto e Via dei Pittori*	
64	FG079A/10	San Paolo di Civitate	Lavori sistemazione alveo torrente Staina	1.270.000
65	FG066A/10	San Paolo di Civitate	Lavori di sistemazione alveo Torrente Radicosa x mitigazione rischio idraulico	1.500.000
66	LE080A/10	Veglie	Rimozione stato di rischio idrogeologico del territorio a nord dell'abitato. Stralcio funzionale	2.800.000
67	FG054A/10	Accadia	Sistemazione disssesto idrog. Centro urbano Via Pertini	700.000
68	FG051A/10	Apricena	Realizzazione Canale scolmatore - 2° Lotto	5.250.000
69	BA069A/10	Bitetto	Lavori sistemaz. idraulica C.da Misetta (Alveo Lama del Conte, loc. Guadagno)	1.720.000
70	FG070A/10	Casalnuovo Monterotaro	Mitigazione del rischio idrog. In località "Creta rossa" - Completamento	2.500.000
71	FG071A/10	Castelluccio Valmaggiore	Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla via Stretta della Monaca e via degli Emigranti)	700.000
72	FG084A/10	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via F.lli Bandiera	2.600.000
73	BA073A/10	Grumo Appula	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto	3.520.000

74	FG074A/10	Motta Montecorvino	Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere - Progetto di completamento	3.080.000
75	FG062A/10	Pietramontecorvino	Sistemazione idraulica-forestale in Loc. Pisciarelli-Fontanili	2.800.000
76	FG077A/10	Rignano Garganico	Opere mitig. rischio confluenza torrenti Triolo e Candelaro	4.570.000
77	FG052A/10	Sant'Agata di Puglia	Lavori di consolidamento v ersante Via Pagano-Gizzoli-Via della Libertà. Progetto di completamento	1.650.000
78	LE083A/10	Scorrano	Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale	2.700.000
79	FG063A/10	Troia	Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto	3.000.000
80	FG081A/10	Vico del Gargano	Lavori di sistemazione e la regimentazione del Torrente Valle del Melaino	4.220.000
81	FG064A/10	Volturara Appula	Lavori di sistemazione dei dissesti idrog. interessanti la strada comunale Amborchia	600.000
82	FG082A/10	Volturino	Sistemazione e consolidamento versante in frana Loc. Lame-Fontana Vecchia	1.200.000
83	FG061A/10	Serracapriola	Completamento lavori prevenzione rischio idrog. centro urbano, Loc. Greppa Petronio. Progetto di completamento	540.000
84	TA072A/10	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci	3.960.000
			GRANTOTALE FINALE EX DELIBERA CIPE 8/2012	**194.690.000**

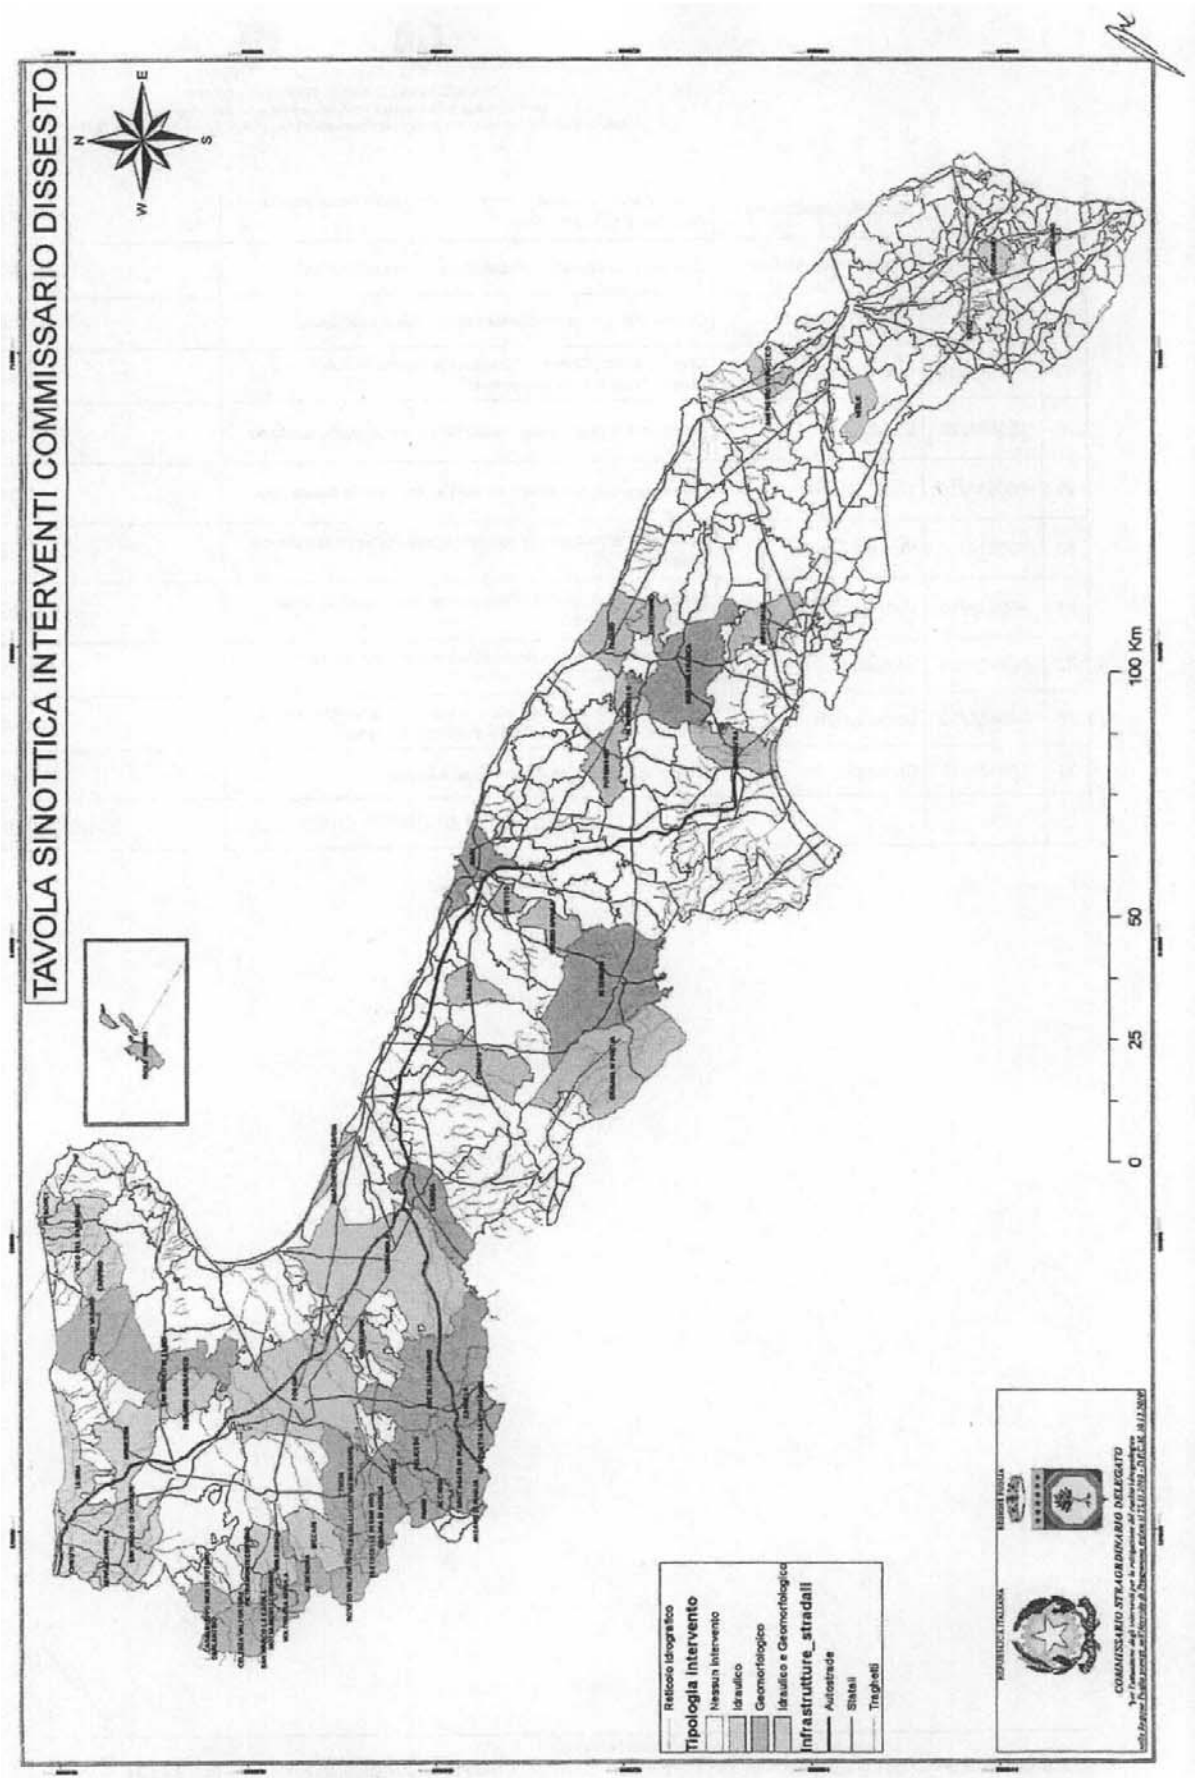
TAVOLA SINOTTICA INTERVENTI COMMISSARIO DISSESTO
N
E
S
W
0
25
50
100 Km
Reticolo Idrografico
Tipologia Intervento
Nessun Intervento
Idraulico
Geomorfologico
Idraulico e Geomorfologico
Infrastrutture_stradali
Autostrade
Statali
Tratteli
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Relazione annuale anno 2012

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 21.01.2011

01/01/2013
Commissario Straordinario Delegato
Efisio Orrù

1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Regione	SARDEGNA
Commissario straordinario delegato	EFISIO ORRU'
Decreto nomina	DPCM 21/01/2011
Data sottoscrizione Accordo	23/12/2010
Data sottoscrizione Accordo Integrativo	12/01/2012
Importo complessivo assentito in Accordo	70.065.510,00
Importo programmato per il periodo (anno 2012)	14.565.908,84
Importo speso per il periodo (anno 2012)	244.708,57
Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno 2012)	8.304.305,50

1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

Per descrivere il contesto idrogeologico in cui opera il Commissario, sembra opportuno riprendere quanto contenuto nella Relazione Generale del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Sardegna (pagg. 7 - 9)

« Una metodologia di approccio omogeneo ha consentito: un'analisi complessiva delle cause di pericolosità, un confronto dei risultati, rendendo possibile un utilizzo futuro del presente lavoro, proprio nell'ottica del possibile aggiornamento delle aree a rischio in seguito alla realizzazione di interventi di mitigazione. Per tale motivo gli elaborati grafici redatti alla scala della Cartografia Tecnica Regionale sono stati preparati in formati digitali compatibili al sistema informativo esistente presso la Regione Sardegna (IFRAS).

Tra i risultati prodotti, oltre a quelli espressamente richiesti dal DL 180/98 è stata definita in maniera distinta anche la perimetrazione delle aree pericolose nella convinzione che queste non solo fossero il passaggio nella definizione delle aree a Rischio, ma bensì servissero come indicazioni guida ad interventi futuri. In questo modo, mentre la carta rappresentativa del tema "rischio" fornisce il quadro dell'attuale livello di rischio esistente sul territorio, la carta del tema "aree pericolose per fenomeni di piena o di frana " consente di evidenziare il livello di pericolosità che insiste sul territorio anche se non attualmente occupato da insediamenti antropici. Ciò allo scopo di prevenire un uso improprio del territorio in aree non sicure come ad esempio nuove aree di espansione dei centri abitati, attività turistiche in aree attualmente non occupate, nuove infrastrutture che purtroppo costituiscono la maggioranza di casi a rischio nell'attuale censimento.

Dall'attività svolta si può osservare che il rischio di piena presente nell'intero territorio regionale risulta spesso indotto da una scarsa attenzione ai corsi d'acqua ed alle loro aree di pertinenza, soprattutto quando questi interagiscono con infrastrutture, come si evince dalla Figura 1 che evidenzia le cause principali di pericolosità per i fenomeni di allagamento.

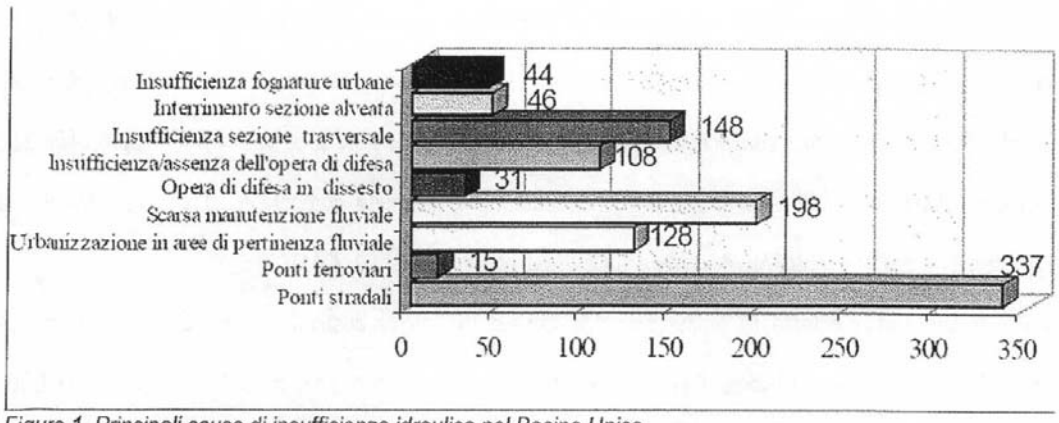


Figura 1. Principali cause di insufficienza idraulica nel Bacino Unico

Le corrispondenti superfici delle aree a Rischio Idraulico, sono riportate, suddivise per classe di rischio in Tabella I. Tabella I Estensione (ha) delle aree a Rischio Idraulico per Sub_Bacino e classi di rischio. La classe Ri4 rappresenta il rischio molto elevato.

Per quanto riguarda, invece, il Rischio di Frana, si può rilevare una situazione abbastanza diffusa di pericolosità derivante in parte dalle caratteristiche geologiche del territorio ed in parte dalle condizioni di uso del territorio stesso, soprattutto in relazione agli interventi antropici. In tal caso contrariamente a quanto si osserva per il Rischio Idraulico, l'uso del territorio non modifica la pericolosità del territorio, ma introducendo insediamenti legati all'attività antropica (elementi a rischio) in aree naturalmente pericolose le trasforma in aree a rischio. L'estensione delle superfici a Rischio di Frana sono riportate in Tabella II per classi di rischio e per ciascun Sub Bacino. Tabella II Estensione delle aree a rischio di frana (ha) suddivisi per Sub Bacino e per classi di rischio. La classe Rg4 è quella di rischio assai elevato

Classi	1-Sulcis	2-Tirso	3-C M T	4-Liscia	5-Po. Ce.	6- S. Or	7- F C C	Regione
Rg4	51	17	274	1	635	12	232	1'222
Rg3	101	203	1'240	22	632	390	2'727	5'315
Rg2	452	402	7'120	11	13'674	2'392	4'088	28'139
Rg1	30'380	10'593	16'890	154	0	12'513	19'290	89'820
TOTALE	**30'984**	**11'215**	**25'524**	**188**	**14'941**	**15'307**	**26'337**	**124'496**

Si osserva che all'elevata estensione delle aree a rischio di frana, sebbene per classi di rischio non elevate, contribuisce in maniera sostanziale il Sub_Bacino del Sulcis, in quanto in tale Sub_Bacino vi è la presenza di molte cave dismesse residue dell'intensa attività mineraria ».

1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

1.3.1 utilizzo del regime di avvalimento per l'acquisizione delle risorse strumentali e umane

«Per l'espletamento di tutte le attività tecnico – amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario può avvalersi degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli

enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. In particolare può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento (Art. 4, comma 1, DPCM di nomina del 21.01.2011)».

Facendo leva su tale potestà, il Commissario straordinario delegato ha costituito una propria struttura tecnico-amministrativa, mediante l'utilizzo di personale del ruolo regionale in regime di "distacco" ex art. 30, D.lvo 276/03.

Ciò ha comportato due chiari vantaggi:

1) utilizzo a costo zero del predetto personale, con evidenti riflessi sulle economie di gestione;
2) competenze e professionalità legate alla perfetta conoscenza del funzionamento della P.A. da parte di soggetti già inseriti nella stessa.

Inoltre, si è evitato in radice il ricorso a procedure di selezione con tutti i possibili effetti collaterali legati alla loro ammissibilità -anche alla luce della raccomandazione espressa dalla Corte dei Conti in sede di registrazione del DPCM 20.07.11- alla loro durata ed alla determinazione ed erogazione dei compensi.

Attraverso il medesimo strumento dell'avvalimento, si utilizzano i beni strumentali della Regione Sardegna, messi a disposizione a costo zero ossia: locali, telefoni, elettricità, computer, stampanti e fotocopiatore, auto di servizio etc.. I costi sopportati dalla regione Sardegna includono anche i costi variabili (es. consumo energia elettrica, canoni telefonici, benzina, bollo ed assicurazione dell'autoveicolo).

1.3.2. Organico a supporto del Commissario straordinario delegato

Nel corso del II trimestre, l'organico del personale a supporto del Commissario si è ridotto di due unità in quanto i due geometri utilizzati in distacco (area C e D), hanno chiesto ed ottenuto, con decreto n. 214/13 del 25.05.2012 di ritornare nella propria 'Amministrazione originaria, con decorrenza 1° giugno 2012.

Pertanto, al 30 giugno 2012, l'organico dell'Ufficio Commissariale è costituito da 8 unità, di cui 2 *part time*, così ripartite:

1 Funzionario amministrativo (Avvocato - Area D);

2 Funzionari amministrativi contabili, *part time* (ragionieri - Area D)

2 Funzionari tecnici (2 ingegneri – Area D);

1 Impiegato funzionario contabile (un ragioniere – Area C);

1 Impiegato funzionario amministrativo (Area C);

1 Impiegato amministrativo (Area A).

Nel corso del II trimestre, l'organico del personale a supporto del Commissario si è ridotto di due unità i0n quanto i due geometri utilizzati in distacco (area C e D), hanno chiesto ed ottenuto, con decreto n. 214/13 del 25 maggio 2012, di ritornare nella propria Amministrazione originaria, con decorrenza 1° giugno 2012.

Pertanto, al 30 giugno 2012, l'organico dell'Ufficio Commissariale è costituito da 8 unità, di cui 2 *part time*, così ripartite:

1 Funzionario amministrativo (Avvocato - Area D);

2 Funzionari amministrativi contabili, *part time* (Dottori in Economia e Commercio - Area D)

2 Funzionari tecnici (2 ingegneri – Area D);

1 Impiegato funzionario contabile (un ragioniere – Area C);

1 Impiegato funzionario amministrativo (Area C);

1 Impiegato amministrativo (Area A).

È stata presentata richiesta all'Assessorato regionale degli Affari Generali, personale e riforma della Regione, per poter acquisire, sempre in regime di distacco e quindi sostanzialmente senza oneri fissi, due geometri, mediante nota n 240 del 18 giugno 2012.

Va pure aggiunto che uno dei due Funzionari tecnici ha chiesto ed ottenuto -con Ordinanza n. 466/11 del 10.12.2012- la conversione a part time al 30% dell'orario del proprio rapporto di avvalimento, con decorrenza 17.12.2012.

Si è in attesa di un riscontro che dovrebbe giungere a breve.

1.3.3. Possibilità di conferire incarichi comportanti posizione organizzativa e non al personale in regime di utilizzo.

Al fine di premiare le professionalità del personale utilizzato da questo Ufficio e, nel contempo, migliorare le performance ed evitare il più dispendioso ricorso a professionalità esterne, venne proposto un interpello alla all'Ufficio Legislativo di Codesto Ministero con nostra nota n. 73 del 17 febbraio 2012 circa la potestà del Commissario di attribuire incarichi correlati all'organizzazione dell'ufficio ed alle funzioni così svolte.

Non avendo ottenuto alcuna risposta, lo stesso è stato riformulato e si è parimenti in attesa di risposta.

Il permanere di questa situazione ha contribuito alla decisione dei due geometri di tornare alla propria amministrazione distaccante, descritta nel punto precedente e incide negativamente sulle condizioni generali di operatività del restante personale ancora in organico.

1.4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente			
Importo corrente *(per l'anno 2012)*	***Importo cumulato*** *(anno 2012 + precedente periodo)*	***Speso***	***Residuo***
9.199.392,51	12.560.477,22	177.449,61	12.383.027,61

Risorse economiche provenienti dalla regione			
Importo corrente *(per l'anno 2012)*	***Importo cumulato*** *(anno 2012 + precedente periodo)*	***Speso***	***Residuo***
12.480.240,04	12.480.240,04	67.258,96	12.412.981,08

1.5. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

Descrizione attività	***Importo speso corrente*** *(per l'anno 2012)*	***Importo speso cumulato*** *(anno 2012 + precedente periodo)*
struttura commissariale	177.449,61	177.449,61
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	67.258,96	67.258,96

1.6. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE SARDEGNA

(D.P.C.M. 21.01.2011)

C.F. 92185470926

SCHEMA FINANZIARIO SINTETICO DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5601 "C S RISCHIO IDROGEOL SARDEGNA "
ISTITUITA PRESSO LA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CAGLIARI

IBAN IT44Q0100003245520200005601 - -

DATI AGGIORNATI AL 31/12/2012

AMMINISTRAZIONI EMITTENTI	entrate	uscite		SALDI	
	Somme accreditate	importi impegnati	importi pagati	Disponibilità di competenza	Disponibilità di cassa
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Terr. e del Mare	12 560 477,22	177 449,61	177 449,61	12 560 477,22	12 383 027,61
Regione	12 480 240,04	67 258,96	67 258,96	57 505 032,78	12 412 981,08
TOTALI	**25 040 717,26**	244 708,57	244 708,57	70 065 510,00	**24 796 008,69**

NB: Le percentuali di finanziamento a carico del MATTM e della Regione Sardegna sono contenute nell'A di P. 23.12.2010, nella sua successiva rimodulazione avvenuta con Accordo dell'8.01.2012 e nella Deliberazione attuativa CIPE n. 8 del 20.01.2012

1.7. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

1.7.1 Descrizione delle attività

1.7.1.1 Attività generale

Nel corso del 2012, il Commissario ha dovuto innanzitutto predisporre tutta l'attività propedeutica all'avvio delle fasi di realizzazione dei singoli interventi

Il primo atto di particolare rilevanza adottato dal Commissario è stato il decreto n. 39/1 del 17 gennaio 2012 "*Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e la Regione Sardegna del 23 dicembre 2010, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi*

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico attuazione".

Il provvedimento si è reso necessario perché, prima di iniziare la fase dell'attuazione degli interventi, si è preferito disciplinare in modo organico ed uniforme il rapporto con le Amministrazioni coinvolte e le procedure di esecuzione delle opere.

In particolare, è parso necessario fornire una definizione giuridica di "*avvalimento*", distinguendo nettamente tale istituto da quello di "*delega di funzioni*" per evitare qualsiasi possibile equivoco da parte delle Amministrazioni coinvolte e fondato sulla casistica precedente, basata su deleghe *ex lege* conferite agli Enti locali e dettate dal principio della devoluzione amministrativa. Il Regolamento è stato redatto prendendo a modello l'omologo strumento predisposto dal Commissario delegato della Regione Toscana con l'ausilio della Ragioneria dello Stato.

Ne è seguita la "*Guida alla procedura di realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma 23 dicembre 2010, attuati mediante il ricorso alla delega di funzioni*" approvata con Decreto n. 39/1 del 17.00.2012. La necessità di una Guida che esponesse in modo organico la procedura è nata dall'accertata difficoltà di alcune Amministrazioni coinvolte di comprendere le peculiarità del processo di realizzazione, rispetto ad omologhe fattispecie preesistenti. Invero, l'esigenza di imputare i costi direttamente alla contabilità speciale del Commissario, che è perciò diventato cessionario delle fatture inerenti, rendeva impossibile il ricorso tout court allo schema di delega di funzioni, come avviene nelle ordinarie ipotesi di delega ex lege a seguito di devoluzione amministrativa, avvenute all'indomani del D.lvo 112/98.

1.7.1.2 Attività specifica per intervento.

Contestualmente alla predisposizione dello schema operativo, questo Ufficio ha proceduto a convocare i singoli Comuni per esaminare ciascuna proposta d'intervento, da approvare con proprio decreto.

Queste sono state valutate singolarmente dall'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, quale ente avvalso, unitamente ai due funzionari tecnici di questo Ufficio (cfr § 1.3.2, 1.3.3).

La successiva approvazione -avvenuta per la maggior parte dei casi- è stata alla base dell'ordinanza di avvalimento dell'amministrazione proponente e della stipula della successiva convenzione, che è stata a sua

volta preceduta dall'approvazione del cronoprogramma.

In sintesi:

1. approvazione delle proposte d'intervento delle Amministrazioni interessate;
2. richiesta alle amministrazioni incaricande della proposta di nomina di RUP e dell'attestazione delle capacità dell'Ufficio Tecnico a svolgere l'incarico;
3. ottenuta la risposta, adottare l'ordinanza di avvalimento nei confronti dell'Amministrazione incaricata e dell'Assessorato regionale dei LL.PP. a cui vengono attribuiti funzioni di controllo;
4. approvare il cronoprogramma presuntivo dei lavori presentato dall'ente avvalso;
5. stipulare la convenzione con l'Amministrazione incaricata e l'Assessorato regionale dei LL.PP..

Queste ultime sono state quasi tutte stipulate nei mesi di gennaio – febbraio 2013.

1.7.2 Livello di attuazione globale degli interventi

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	***n. interventi al dicembre 2012***	***n. interventi al dicembre 2011***
Attesa di avvio	*n. 1*	*n. 13*
Esecuzione studi ed indagini	*n. 14*	*n. 2*
In corso di progettazione	*n. 1*	*n. 1*
Progettazione ultimata	*n. 0*	*n. 1*
Lavori aggiudicati	*n. 1*	*n. 0*
In esecuzione	*n. 0*	*n. 0*
Lavori ultimati (collaudati e non)	*n. 0*	*n. 0*
Totale interventi finanziati	*17*	

1.8. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2013

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	***n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2013***
Attesa di avvio	*n. 0*
Esecuzione studi ed indagini	*n. 0*
In corso di progettazione	*n. 3*
Progettazione ultimata	*n. 5*
Lavori aggiudicati	*n. 1*
In esecuzione	*n. 8*
Lavori ultimati (collaudati e non)	*n. 0*
Totale interventi finanziati	*17*

1.9. CRITICITA'

L'attività del Commissario Straordinario delegato ha risentito in modo significativo del mancato accredito delle risorse previste dall'Accordo di Programma.

Invero, sebbene nella già citata nostra nota n. 106 del 1 dicembre 2011 si stimassero in € 16.000.000,00 le risorse necessarie per l'esercizio 2012, nessuna delle due Amministrazioni contraenti ha mai versato alcunché nel corso del primo semestre del 2012, nonostante le svariate richieste formulate al riguardo, siano rimaste senza riscontri positivi.

Solamente nel secondo semestre del 2012, si è provveduto ad effettuare i versamenti indicati nelle tabelle di cui al precedente paragrafo 1.4.

È di fondamentale importanza ricordare che l'art. 4, comma 2, DPCM 21.01.2011 stabilisce che "*In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario straordinario* ***non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria*** *e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica*" .

Pertanto, vigerebbe il principio di cassa, come chiarito dalla risposta fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota Prot. n. 92730 del 28.09.2011 all'interpello formulato dal Commissario delegato della Regione Toscana.

Invero, tale nota affermava che *"un atto di impegno del dirigente regionale responsabile* ***non*** *costituisce provvista di fondi sulla contabilità speciale, che deve essere alimentata* ***con effettivi versamenti*** *delle somme previste dall'accordo di programma.* ***La copertura finanziaria degli interventi che dovranno essere realizzati può concretizzarsi, infatti, esclusivamente con l'effettivo afflusso dei finanziamenti*** *in Tesoreria Provinciale secondo la misura e la programmazione stabilita dall'articolo 4 del citato accordo".* Corollario di quanto sopra è stata l'impossibilità da parte di questo Ufficio di avviare la realizzazione degli interventi in assenza della necessaria copertura finanziaria, da intendersi come l'effettivo accredito delle risorse nella propria Contabilità Speciale.

Al fine di temperare la perentorietà della disposizione, è stato inoltrato un successivo interpello da parte del Commissario, con nota n. 184 dell'11 maggio 2012, allo scopo di chiedere un'ulteriore precisazione circa l'effettiva portata della disposizione.

In estrema sintesi, è stato chiesto di conoscere se la copertura vada intesa con riferimento all'intero intervento oppure alle singole fasi in cui lo stesso può essere scomposto.

Con parere n. 53694 del 18 giugno 2012, la Ragioneria Generale dello Stato ha risposto precisando esattamente che la copertura riguarda **l'esecuzione dell'intero intervento o di una sua fase.**

Tutto ciò ha comportato pure notevoli problemi di compatibilità con il criterio per l'assegnazione delle risorse per gli interventi di contrasto del rischio idrogeologico previsto dall'art. 7 della Deliberazione CIPE n. 80 del 20 gennaio 2012.

Si deve ricordare che la successiva rimodulazione dell'accordo intervenuta il 12 gennaio 2012, ha redistribuito la quota a carico del MATTM, originariamente ammontante a € 36.080.000,00, gravandola in parte sulla Regione Sardegna, nei seguenti termini: € 12.560.477,22 rimane in quota al MATTM; € 11.759.761,39 transita

a carico della Regione Sardegna, a valere sui fondi Programmi attuativi interregionali – PAIN € 11.759.761,39 sui fondi del Programma Attuativo Regionale (PAR) gestito direttamente dalla Regione Sardegna.

Orbene, la deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno"*, all'art. 7 – Trasferimento risorse, testualmente prevede: *"**7.2** Per quanto riguarda le risorse regionali rinvenienti dai PAR e dai PAIN, oggetto di assegnazione della presente delibera, esse saranno trasferite alle regioni interessate e da queste ultime, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, ai commissari straordinari delegati e alle altre amministrazioni competenti, per la gestione e l'attuazione degli interventi. **7.3** Il citato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede al trasferimento delle risorse del FSC secondo le seguenti modalità. Al fine di garantire, presso ciascuna amministrazione, un livello di liquidità finanziaria che consenta il soddisfacimento delle obbligazioni assunte, la prima quota sarà trasferita a titolo di anticipazione per un importo pari al 20% del valore del finanziamento, subordinatamente all'inserimento dei dati informativi nel sistema di monitoraggio di cui al punto successivo.*

La seconda e la terza quota, di importo pari al 25% del valore, saranno trasferite su certificazione della spesa sostenuta, allorquando questa avrà raggiunto il 75% del valore della prima quota ai fini dell'erogazione della seconda quota; il 100% della prima quota e il 75% della seconda quota, ai fini dell'erogazione della terza quota. L'ultima quota, di importo pari al 30%, è trasferita su certificazione della spesa sostenuta pari al 100% della prime due quote, e del 75% della terza quota".

Ne è derivato un problema di compatibilità tra il principio della disponibilità di cassa come condizione necessaria per l'avvio degli interventi, più volte ribadito dalla Ragioneria Generale dello Stato e le modalità di accredito dei fondi FSC come stabiliti dal citato art. 7, comma 2 e 3 come anche lamentato in occasione della riunione con il *"Comitato d'Indirizzo e controllo per la gestione dell'accordo"* tenutasi presso il MATTM il 13 giugno 2012, su richiesta di Quest'Ufficio.

Invero, da una prima lettura, era parso che ciascuna *tranche* di accredito delle risorse sarebbe potuto avvenire **solamente dopo** che il Commissario avesse certificato la spesa delle risorse in precedenza assegnate, nelle percentuali ivi indicate.

Si sarebbe arrivato quindi ad un evidente paradosso, posto che l'intervento non sarebbe potuto essere avviato per carenza delle relative risorse, le quali, a loro volta, non sarebbero potute essere accreditate -tranne il 20% di cui alla prima quota- perché non vi era stata alcuna spendita delle precedenti assegnazioni.

Da tale meccanismo, sarebbe derivata una paralisi dell'attività in relazione agli interventi che per il loro ammontare non possono essere interamente affrontati con le risorse nella disponibilità di cassa di questo Ufficio incrementato del 20% di anticipo per ogni singolo intervento ossia la maggior parte dei medesimi.

Invero, stante il loro importo ed i principi sopraesposti, il loro avvio avrebbe richiesto una preventiva assegnazione piuttosto che un saldo a rendicontazione.

Questo Ufficio, con nota n. 254 del 2 luglio 2012, aveva proposto una soluzione all'impasse, che avrebbe rispettato entrambe le discipline.

Essa consisteva nella previa individuazione dell'esatto significato della nozione di "fase dell'intervento" da cui discenderebbe l'applicazione in via complementare del sistema di misurazione del "*Earned Value Analysis*".

Suddividendo le "fasi dell'intervento" in modo convenzionale, in base alla loro percentuale di spesa, corrispondente a quelle indicate dal citato art. 7.3, verrebbe fatto salvo il principio della prevista disponibilità finanziaria, senza dover affermare la illegittimità della disposizione in questione.

Tale interpretazione costituirebbe quindi applicazione dell'art. 1367 del Codice Civile "*utile per inutile non vitiatur*"

Con nota n. 62636 del 7 agosto 2012, la Ragioneria Generale dello Stato ha risposto escludendo l'applicabilità del modello proposto. Nel ribadire il principio della previa disponibilità delle risorse, ha motivato argomentato che la nozione di fase va ricercata nella sottoscrizione del contratto (di servizi o di opera) in quanto assimilabile all' »impegno di spesa » delle contabilità ordinarie dello Stato.

Va però detto che di recente, con nota interpretativa n. 1859 del 11.02.2013, il MISE ha rilevato che il comma 866 della L. 296/06, primo periodo, come modificato dalla L. 244/2007 così recita: "*Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili*". Questa -sempre secondo la direttiva in oggetto- sarebbe "*la base giuridica nel cui ambito i Commissari sono tenuti ad operare*", essendo la citata Delibera CIPE n. 8 meramente attuativa del suddetto principio di competenza.

Per dirimere il chiaro contrasto interpretativo tra il principio di competenza appena espresso e quello di cassa rimarcato dalla Ragioneria, questo Commissario ha chiesto un intervento risolutore alla Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 132 del 21.02.2013.

Inoltre, ulteriori criticità emergeranno anche in sede di esecuzione della citata Deliberazione CIPE, posto che l'art. 7 prevede espressamente *che tali risorse verranno versate dalle Regioni sulla Contabilità speciale del Commissario nel rispetto dei vincoli imposti dai rispettivi patti di stabilità.*

Ciò costituisce un'ulteriore conferma della esigenza di addivenire ad una modifica delle modalità di accredito stabilite dalla Deliberazione CIPE n. 8/20, come più volte richiesto nei vari incontri con il Ministero.

1.10. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

A) Dal quadro appena esposto emerge come il tempestivo avvio delle fasi di realizzazione degli interventi affidati a questo Ufficio Commissariale dell'Accordo di Programma 23.12.2010 sia stato gravemente penalizzato, essenzialmente, da un fattore negativo : l'intempestiva erogazione delle risorse previste e -nel caso della Regione Sardegna - dal loro accredito solo in minima parte. Questa circostanza, unita all'ampiamente descritto principio contabile espresso a più riprese dalla Ragioneria Generale dello Stato ha impedito il passaggio dalla fase meramente propedeutica, non comportante esborsi, a quella attuativa degli interventi.

Per inciso, eventuali clausole che avessero previsto esoneri di responsabilità del committente legati a ritardi nei pagamenti in sede di esecuzione dovuti al mancato accredito delle risorse sarebbero state inficiate da nullità, come ha recentemente stabilito l'AVCP con parere n. 142 del 12.09.2012.

Ovviamente, tale circostanza rende di fatto impossibile il rispetto del termine del 30 giugno 2013 per l'assunzioni delle obbligazioni giuridicamente vincolanti previsto dall'art. 6 della Deliberazione CIPE n. 8/12. Questo problema è comune a buona parte dei Commissari straordinari ed infatti è stato più volte richiesto che Codesto Ministero si faccia portavoce della modifica del medesimo termine.

Inoltre, va pure segnalato che l'assenza di direttive e linee guida univoche da parte del Ministero, abbiano contribuito a determinare un rallentamento dell'attività.

Invero, nonostante siano state più volte e vanamente richieste, Codesto Ministero non ha adottato circolari esplicative e normative che determinassero in modo univoco l'operato di tutti i Commissari, presupposto fondamentale per una azione

rapida, stante le peculiarità del regime gestorio del Commissario, sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo contabile e ciò al fine di rendere omogenea l'attività di tutti i Commissari.

B) Infine, come già esposto al precedente paragrafo 1.3.3, un'ulteriore criticità è costituita dall'irrisolta questione circa il potere del Commissario straordinario di attribuire incarichi di posizione organizzativa e non al proprio personale utilizzato in regime di distacco.

Ciò costituisce un grave disincentivo alla permanenza del personale utilizzato ad alla richiesta di utilizzo in avvalimento da parte di potenziali aspiranti, stante la manifesta disparità di carriere che a cui medesimi sono sottoposti rispetto al trattamento loro riservato nelle rispettive Amministrazioni di appartenenza.


Una pronuncia in tal senso da parte di Codesto Ministero sulla già citata istanza di questo Commissario contenuta nella nota n. 73 del 17 febbraio 2012 (vedi *supra* § 1.3.3) potrebbe essere di stimolo ad un completamento dell'organico di quest'Ufficio ed al riconoscimento delle legittime aspettative di chi già presta la propria opera in regime di utilizzo.

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010



RELAZIONE DI DETTAGLIO ATTIVITA'
DAL 10.12.2010
AL 18.12.2012

Il Commissario Straordinario Delegato
(*Dott. Maurizio Croce*)

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010

RELAZIONE DI DETTAGLIO

DAL 10.12.2010 AL 18.12.2012

Palermo, 20.12.2012

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

PAGINA BIANCA

SOMMARIO

1 PREMESSA 3
2 ASPETTI GENERALI ACCORDO DI PROGRAMMA 3
2.1 ACCORDO DI PROGRAMMA ORIGINARIO 3
2.2 L'ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 4
3 CONVENZIONI 5
4 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SVOLTE 14
4.1 ISTRUTTORIA PRELIMINARE E RIPARTIZIONE ANNUALE DELLE RISORSE 14
4.2 ALBO PROFESSIONISTI 15
4.3 ALBO IMPRESE 16
4.4 E-PROCUREMENT 17
4.5 GARE 19
5 STATO DELL'ARTE 23
5.1 INTERVENTI LETTERA A (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo) 23
5.2 INTERVENTI LETTERA B (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo) 27
5.2.1 Interventi lettera B* (Ente beneficiario Commissario Straordinario OPCM 3886/10) 35
6 CONCLUSIONI 37

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

1 PREMESSA

La presente relazione illustra le attività svolte dal Commissario Straordinario Delegato, finalizzate all'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Sicilia, inseriti nell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 30 marzo 2010 (allegato 1) e del successivo atto integrativo siglato il 3 maggio 2011 (allegato 2). In particolare, le attività nel seguito descritte sono state espletate dal 10.12.2010, data di conferimento dell'incarico allo scrivente Commissario, ex D.P.C.M. del 10.12.2010 (allegato 3) successivamente integrato con D.P.C.M. del 20/07/2011 (allegato 4), al 18.12.2012.

2 ASPETTI GENERALI ACCORDO DI PROGRAMMA

2.1 ACCORDO DI PROGRAMMA ORIGINARIO

L'Accordo di Programma ed il successivo atto integrativo sono finalizzati alla programmazione, finanziamento e attuazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. La copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi nella regione Sicilia è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, per un importo pari **€ 152.692.572,11**, a copertura degli interventi identificati dalla **Lettera A**, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, per un importo di **€ 151.644.604,81**, a copertura degli interventi della **Lettera B**, per un importo complessivo pari a **€ 304.337.176,92**.

L'art. 8 dell'A.d.P. prevede, inoltre, la costituzione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo, organo collegiale chiamato, tra l'altro, a definire eventuali rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi derivanti da eventuali economie accertate sugli stessi - compresi i ribassi d'asta - nonché a definire le riprogrammazioni delle risorse, sia sulla base di eventi sopravvenuti che delle modifiche apportate agli strumenti di pianificazione di settore.

A tal proposito, in data 17 ottobre 2010, il suddetto Comitato, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella zona di Giampilieri (ME) e di S. Fratello (ME), ha deliberato di far transitare le risorse finanziarie, originariamente previste sui fondi regionali (elenco B), sulle risorse statali (elenco A) relativamente agli interventi ME087 Giampilieri "Opere di consolidamento località Giampilieri" di importo pari a **€ 24.000.000,00** e ME 107 San Fratello "Opere di consolidamento centro abitato per un importo **€ 18.000.000,00**.

Successivamente, a seguito dell'O.P.C.M. 3886 del 9 luglio 2010, i suddetti interventi identificati con la lettera A sono stati gestiti dal Commissario Delegato di cui all'O.P.C.M. 3815 del 10 ottobre

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

2009. Pertanto, i relativi fondi sono stati trasferiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella contabilità speciale di cui dispone il suddetto Commissario.

Con la medesima O.P.C.M. il Commissario è stato nominato Soggetto Attuatore per l'attuazione degli interventi previsti in AdP avvalendosi dei poteri previsti dall'O.P.C.M. 3815/09.

2.2 L'ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

A seguito della registrazione alla Corte dei Conti **dell'Accordo integrativo** del 3 maggio 2011 altre risorse, a valere sui Fondi FAS, sono state destinate alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, per complessivi **€ 21.251.185,84** di cui **€ 12.756.002,61** a valere sulle risorse ministeriali stanziate con Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed **€ 8.495.183,23** a valere sui fondi della Regione Sicilia del Programma Operativo FESR 2007/2013, linea di intervento 2.3.1.1.

Atto integrativo all'Accordo di programma		
Interventi lettera A	€	12.756.002,61
Interventi lettera B	€	8.495.183,23
Totale	€	21.251.185,84

Le risorse complessive stanziate per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Siciliana ammontano, pertanto, ad **€ 325.588.362,76**, ripartiti tra fondi Ministeriale e Regionale come riassunto nella tabella seguente.

Fondi Ministeriali (lettera A)		
AdP	€	152.692.572,11
AdP integrativo	€	12.756.002,61
Totale	€	165.448.574,72
Fondi Regionali (lettera B)		
AdP	€	151.644.604,81
AdP integrativo	€	8.495.183,23
Totale	€	160.139.788,04

Si rappresenta che nel transito di interventi tra le due diverse coperture finanziarie si è cercato di rispettare, per quanto possibile, gli stanziamenti del Ministero e della Regione, cosicché, a fronte di un finanziamento statale complessivo pari a **€ 165.448.574,72** (AdP + Atto integrativo) gli interventi identificati dalla lettera A risultano gravare per un onere complessivo pari a **€ 165.361.376,61**, mentre gli interventi ricadenti nella lettera B risultano gravare per un importo complessivo pari a **€ 160.139.788,04**.

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

In allegato (**Allegato 1**) viene riportato un quadro riepilogativo di tutti gli interventi inseriti nell'Accordo di Programma e nel successivo atto integrativo.

3 CONVENZIONI

L'art. 4 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2010 prevede che per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario Straordinario Delegato possa avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi e delle università, delle aziende pubbliche di servizi.

Come specificatamente previsto dal suddetto art. 4 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2010, potendo lo stesso Commissario avvalersi per la realizzazione degli interventi anche di società specializzate a totale capitale pubblico, in data 18 febbraio 2011 è stata sottoscritta una specifica convenzione tra il Commissario Delegato e Invitalia S.p.A.[1] [*Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A, di seguito denominata "INVITALIA" o Agenzia*], riguardante attività funzionali e/o di assistenza tecnico – amministrativa - e specialistica .

In particolare:

- nell'ambito delle attività di assistenza tecnico-amministrativa, l'Agenzia garantisce la progettazione ed il supporto nelle attività di predisposizione ed affidamento delle procedure di gara (anche ricorrendo a strumenti informatici dedicati) e di progettazione, e nelle fase esecutiva dei lavori e di collaudo. L'Agenzia si impegna, inoltre, a predisporre tutta la documentazione necessaria per l'adempimento, da parte del Commissario, degli oneri informativi al medesimo spettanti nei confronti del Parlamento, del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, della Regione Sicilia, del Comitato di gestione e di indirizzo per la gestione dell'Accordo, dell'ISPRA, del Repertorio Nazionale degli Interventi per la difesa del suolo (ReNDiS).

- nell'ambito delle attività di supporto tecnico-logistico, l'Agenzia assicura tra l'altro la presenza di un Ufficio a Palermo ed uno a Roma di supporto alle attività del Commissario Delegato, mettendo a disposizione almeno 10 risorse, tra competenze di carattere senior e

[1] *società a totale capitale pubblico, istituita con decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese, ha lo scopo di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione e i sistemi locali d'impresa, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari.L'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che, con apposite convenzioni, siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate*

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

competenze di carattere junior. Il suddetto personale opera all'interno di uno specifico gruppo di lavoro, le cui caratteristiche esatte, nonché le modalità operative, sia tecniche che amministrative, sono previste in uno specifico Piano esecutivo annesso alla Convenzione stessa.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, Invitalia si avvale, come previsto nel citato D.lgs 1/99, della propria controllata Invitalia Attività Produttive S.p.A. (per brevità nel seguito IAP, già Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.), che è in possesso di specifiche ed adeguate competenze ed esperienze, acquisite durante la pluriennale collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e con diversi Commissari Delegati, nel settore della progettazione e gestione di interventi ambientali[2].

Nel seguito viene riportata una tabella riassuntiva in cui vengono elencati gli interventi di cui IAP sta curando la progettazione:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO AdP
AG	174	Cattolica Eraclea	B*	Crolli costone roccioso Eraclea Minoa (Loc. Zagarella)	€ 1.170.000,00
CL	020	Serradifalco	A	Progetto per lo studio ed il monitoraggio dell'area a rischio "R4" interessata da cavità sotterranee e perimetrata con il dissesto 063-2SR-082 nel comune di Serradifalco (CL)	€ 1.700.000,00
CT	023	Calatabiano	A	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide - Pasteria	€ 250.000,00
CT	036	Ramacca	A	Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato	€ 1.200.000,00
EN	044	Gagliano Castelferrato	A	Lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante - C.da Urga	€ 800.000,00
ME	049	Alcara Li Fusi	A	*Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Cappuccini*	€ 1.200.000,00
ME	071	Frazzanò	A	*Monitoraggio delle aree in frana del centro abitato e delle aree ad elevato rischio idrogeologico (R4)*	€ 300.000,00
ME	079	Librizzi	A	*Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale*	€ 2.150.000,00
ME	081	Librizzi	A	*Opere di consolidamento versante e sistemazione – Zona Ronco Marurà*	€ 500.000,00
ME	091	Mirto	A	*Consolidamento centro abitato*	€ 2.500.000,00

[2] *Dal 1° dicembre 2011 Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. ha assunto la nuova denominazione "Invitalia Attività Produttive S.p.A., incorporando per fusione anche la ex Invitalia Reti S.pA.*

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO AdP
ME	099	Piraino	A	*Opere di consolidamento – Zona Roda - S.Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole*	€ 1.100.000,00
ME	100	Raccuja	A	Opere di consolidamento – Zona Centro abitato	€ 5.000.000,00
ME	109	San Pier Niceto	A	*Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante consolidamento dell'area a protezione del serbatoio del centro abitato*	€ 600.000,00
ME	115_3	Sant'Angelo di Brolo	A	*Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano*	€ 2.500.000,00
ME	119	Sinagra	A	*Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Faranò*	€ 3.000.000,00
ME	132	Ucria	A	*Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati,opere di drenaggio – Zona via Annunziata*	€ 2.500.000,00
ME	177_Int	Brolo	A	*Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da Iannello Alto*	€ 600.000,00
PA	142	Carini	A	Barriere paramassi - Zona Industriale	€ 1.000.000,00
PA	143	Castelbuono	A	Opere di drenaggio e consolidamento – C.da Liccia	€ 2.000.000,00
PA	180	Cefalù	A	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita-	€ 90.000,00
PA	181	Cefalù	A	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita- Proprietà Greco	€ 400.000,00
SR	162	Carlentini	A	Messa in sicurezza costone centro abitato – Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei caduti	€ 800.000,00
SR	163	Pachino	A	Intervento in Contrada Raneddi	€ 2.000.000,00
SR	186	Portopalo di Capo Passero	A	Regimazione acque e consolidamento scarpata	€ 600.000,00

Sono state, inoltre, stipulate le seguenti convenzioni con Enti pubblici:

1) **Convenzione con il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria** stipulata in data 28.10.10.
   Contenuti: supporto per le attività di RUP, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

Progetti assegnati:

cod	intervento	Comune	FONDI	*TITOLO*	Importo AdP
ME	113	Santa Marina Salina	A	*Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato - Fraz. Lingua e zona del Faro*	€ 2.000.000,00
ME	124	Terme Vigliatore	B	*Ripascimento scogliere – Zona Terme Marchesana*	€ 3.823.875,00
ME	130	Tusa	B	*Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni – Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)*	€ 1.500.000,00
TP	169	Mazara del Vallo	A	*Opere di protezione consolidamento e ripristino funzionalità infrastrutture – Zona Tonnarella*	€ 800.000,00
TP	189	Mazara del Vallo	A	*Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale – I stralcio*	€ 2.000.000,00

2) **Protocollo d'intesa** per l'accelerazione delle procedure di cui agli articoli 19 e ss. del D. Leg.vo 152/2006 e ss.mm.ii., in relazione ai progetti relativi agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Sicilia di cui all'allegato 1 dell'Accordo di Programma, stipulato con il **Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1 VIA/VAS – dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana** in data 28.10.10.

3) **Convenzione con il Servizio Provinciale di Palermo del Dipartimento Regionale della Protezione Civile** stipulata in data 10.11.10.
Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.
Progetti assegnati:

cod	intervento	Comune	FONDI	*TITOLO*	Importo AdP
PA	136	Belmonte Mezzagno	A	*Opere di consolidamento del canale di gronda, regimazione corsi d'acqua e revisione canale a protezione del centro urbano*	€ 3.000.000,00
PA	156	Termini Imerese	A	*Risagomatura argini e opere di pulitura – Zona foce Fiume Torto*	€ 800.000,00

4) **Convenzione con l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento** stipulata in data 10.11.10.
Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

Progetti assegnati:

cod	intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
AG	001	Agrigento	A	*Interventi di messa in sicurezza del centro abitato*	€ 2.000.000,00
AG	006	Favara	A	*Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis*	€ 1.500.000,00

5) **Convenzione con l'Ufficio del Genio Civile di Palermo** stipulata in data 11.11.10

Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

Progetti assegnati:

cod	intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
PA	140	Camporeale	B	*Opere di consolidamento del centro abitato*	€ 1.500.000,00
PA	150	Palermo	B	*Opere di regimazione idraulica - C.da Belmonte Chiavelli*	€ 4.300.000,00
PA	154	Polizzi Generosa	A	Opere di consolidamento – Zona via G.Borgese	€ 500.000,00

6) **Convenzione con il Servizio Provinciale di Siracusa del Dipartimento Regionale della Protezione Civile** stipulata in data 12.11.10.

Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

Progetti assegnati:

cod	intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
SR	161	Avola	A	*Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica - C.da Cavagrande del Cassibile*	€ 600.000,00

7) **Convenzione con l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa** stipulata in data 15.11.10

Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

8) **Convenzione con il Comune di Valledolmo** stipulata in data 17.11.10

Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, funzioni di stazione appaltante, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

Progetti assegnati:

cod	intervento	Comune	FONDI	*TITOLO*	Importo AdP
PA	157	Valledolmo	A	*Opere di consolidamento - C.da Renella*	€ 500.000,00

9) **Convenzione con il Comune di Ficarra** stipulata in data 18.11.10

Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, funzioni di stazione appaltante, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

Progetti assegnati:

cod	intervento	Comune	FONDI	*TITOLO*	Importo AdP
ME	065	Ficarra	B	*Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Grenne*	€ 1.028.981,00

10) **Convenzione Servizio Provinciale di Catania del Dipartimento Regionale della Protezione Civile** stipulata in data 18.11.10

Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

Progetti assegnati:

cod	intervento	Comune	FONDI	*TITOLO*	Importo AdP
CT	031	Misterbianco	A	*Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo*	€ 500.000,00
CT	033	Piedimonte Etneo	A	*Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Presa*	€ 500.000,00

11) **Convenzione Servizio Provinciale di Trapani del Dipartimento Regionale della Protezione Civile** stipulata in data 18.11.10

Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

Progetti assegnati:

cod	intervento	Comune	FONDI	*TITOLO*	Importo AdP
TP	168	Erice	A	*Consolidamento costone roccioso – Zona Crocifissello*	€ 500.000,00
TP	172	San Vito Lo Capo	A	*Collocazione rete paramassi – Zona Makari*	€ 450.000,00

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

12) **Convenzione Ufficio del Genio Civile di Trapani** stipulata in data 26.11.10

Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

Progetti assegnati:

cod	intervento	Comune	FONDI	*TITOLO*	Importo AdP
TP	173	Trapani	B	*Opere di regimazione idraulica – Zona Salinagrande*	€ 4.000.000,00

13) **Convenzione con il Dipartimento Di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Catania** stipulata in data 12.09.11 per "Rilievi batimetrici, prelievo e analisi granulometriche dei sedimenti marini di un tratto di mare prospiciente il Comune di Pachino (SR)" e la "realizzazione di un modello d'onda di larga scala del settore di mare della Sicilia sud orientale relativamente all'intervento SR 163 "Interventi in contrada Raneddi" – Comune di Pachino (SR).

14) **Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Messina** stipulata in data 14.09.11 "Analisi diacronica e delle tendenze evolutive del litorale del Comune di Pachino (SR) compreso tra la punta Castellazzo e Punta delle Formiche" relativamente all'intervento SR 163 "Interventi in contrada Raneddi" – Comune di Pachino (SR).

15) **Convenzione con la DHI -Italia** stipulata in data 16.11.11 per "Acquisizione e processamento dei dati del modello d'onda del Mar Mediterraneo di Met – Office per tre celle situate a largo della Costa Sud – Orientale della Sicilia" e la "realizzazione di un modello d'onda di larga scala del settore di mare della Sicilia sud orientale" relativamente all'intervento SR 163 "Interventi in contrada Raneddi" – Comune di Pachino (SR).

16) **Convenzione con Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo** stipulata in data 30.11.11

Contenuti:

a. *Rilievo con tecniche da terra, aeree e da satellite di dati territoriali ed ambientali. In particolare, questa attività prevede in fase di rilievo l'utilizzo di GPS, laser scanner, camere fotogrammetriche, videocamere digitali, sensori iperspettrali, sensori IR ed in fase di post-processing l'impiego dei più evoluti sistemi software di elaborazione oltre che codici di calcolo appositamente realizzati;*

b. *Post-processing di dati disponibili e/o rilevati, anche con modelli e procedure previsionali e di tipo anche statistico, al fine di pervenire alla definizione delle zone o delle situazioni di rischio per le quali provvedere, quindi, alla valutazione della vulnerabilità ambientale e*

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

territoriale legata ad eventi naturali ed antropici relativamente ad aree urbanizzate e non urbanizzate, con particolare riguardo al rischio: sismico, idrogeologico, idraulico (piene e siccità) e di incendio;

c. *Sistema di monitoraggio del territorio per il controllo dei diversi fattori di rischio con la redazione di mappe dinamiche per la definizione della vulnerabilità delle risorse del territorio e dei possibili scenari previsionali;*

d. *Interventi di rilevamento delle condizioni di sicurezza del costruito e delle infrastrutture (strade, ferrovie e acquedotti, ecc.) con priorità per quelli di importanza strategica, con tecniche di rilievo innovative al fine di rilevarne il grado di vulnerabilità e pericolosità in relazione a possibili eventi calamitosi e prefigurarne l'eventuale intervento di adeguamento occorrente;*

e. *Progettazione e realizzazione di un Sistema Informativo per le emergenze che permetta una gestione informatizzata di tutte le attività connesse con le problematiche di intervento sul territorio sia in situazioni ordinarie sia in condizioni di allerta;*

f. *Supporto all'organizzazione ed istituzione di unità di crisi e sale operative, intese come sistema composto dal personale, locali, ed attrezzature, tecnologie, metodologie, finalizzate alla gestione delle emergenze;*

g. *Man power dedicato e/o a tempo da adibire a mansioni specialistiche di acquisizione, elaborazione, restituzione dati;*

h. *Mezzi (aereo ed elicottero) per la ricognizione aerea, ove necessario equipaggiati con adeguata strumentazione per l'indagine e l'osservazione, da impiegare anche per interventi con carattere di urgenza;*

i. *Attività finalizzate al coinvolgimento in progetti e al reperimento di fondi in ambito nazionale ed internazionale."*

Progetti assegnati:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO AdP
AG	174	Cattolica Eraclea	B*	Crolli costone roccioso Eraclea Minoa (Loc. Zagarella)	€ 1.170.000,00
ME	079	Librizzi	A	*Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale*	€ 2.150.000,00
ME	081	Librizzi	A	*Opere di consolidamento versante e sistemazione – Zona Ronco Marurà*	€ 500.000,00
ME	091	Mirto	A	*Consolidamento centro abitato*	€ 2.500.000,00

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO AdP
ME	099	Piraino	A	*Opere di consolidamento – Zona Roda - S.Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole*	€ 1.100.000,00
ME	100	Raccuja	A	*Opere di consolidamento – Zona Centro abitato*	€ 5.000.000,00
ME	115_3	Sant'Angelo di Brolo	A	*Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano*	€ 2.500.000,00
ME	119	Sinagra	A	*Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Faranò*	€ 3.000.000,00
ME	120	Sinagra	A	*Opere di regimentazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini*	€ 1.000.000,00
ME	132	Ucria	A	*Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati,opere di drenaggio – Zona via Annunziata*	€ 2.500.000,00
ME	177_Int	Brolo	A	*Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da Iannello Alto*	€ 600.000,00
PA	142	Carini	A	Barriere paramassi - Zona Industriale	€ 1.000.000,00
PA	149	Misilmeri	A	Opere di regimazione idraulica - C.da piano Stoppa	€ 2.000.000,00
PA	179	Altofonte	A	Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto	€ 600.000,00
PA	181	Cefalù	A	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita- Proprietà Greco	€ 400.000,00
SR	162	Carlentini	A	Messa in sicurezza costone centro abitato – Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei caduti	€ 800.000,00
SR	186	Portopalo di Capo Passero	A	Regimazione acque e consolidamento scarpata	€ 600.000,00
SR	187	Rosolini	A	Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato	€ 1.800.000,00
TP	190	San Vito Lo Capo	B*	Consolidamento del tratto di costa	€ 1.350.000,00

17) **Protocollo di intesa con il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università degli Studi di Palermo** stipulato in data 15.03.12 per la collaborazione nell'analisi dei dati esistenti di geologia marina nell'offshore della Sicilia Sud orientale per l'individuazione delle strategie ottimali finalizzate al reperimento di giacimenti sommersi di sabbie da utilizzare nel ripascimento di spiagge in arretramento.

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

18) **Convenzione con l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero UOS di Capo Granitola del Consiglio Nazionale Delle Ricerche** stipulata in data 18 aprile 2012 per il "Progetto di ricerca finalizzato all'individuazione di sabbie relitte sulla piattaforma Siciliana nell'area prospicente il golfo di Gela".

19) **Convenzione con l'Azienda Regionale Foreste Demaniali** stipulata in data 06.09.12.
Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, funzioni di stazione appaltante, direzione lavori e collaudi, assistenza tecnico-amministrativa.

Infine, in virtù del predetto art. 4 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2010, nel corso del 2011 il Commissario Straordinario Delegato ha sottoscritto, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nello svolgimento delle proprie attività, ***l'Accordo con il Soggetto Attuatore dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque in Sicilia*** (gennaio 2011) e ***l'Accordo con il Soggetto Attuatore per l'Emergenza Isola di Lampedusa*** (giugno 2011) *"per l'interscambio di risorse tecnologiche e operative, finalizzato alla migliore esecuzione delle attività istituzionali di competenza"*.

4 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SVOLTE

4.1 ISTRUTTORIA PRELIMINARE E RIPARTIZIONE ANNUALE DELLE RISORSE

In primo luogo, a seguito di una serie di incontri effettuati con i singoli Comuni, con tutte le Amministrazioni e gli Enti convenzionati di cui al precedente paragrafo si è proceduto ad una istruttoria preliminare della documentazione tecnico – amministrativa relativa ai singoli interventi, ed in particolare in ordine alle seguenti priorità:

- stato e livello della progettazione disponibile;
- eventuali incarichi esterni affidati;
- importo aggiornato degli interventi (suddiviso ove possibile tra lavori, somme a disposizione ed IVA);
- vincoli e livello/stato delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere;
- presenza o meno del RUP dell'intervento, ed eventuale nomina;
- disponibilità o meno delle aree di intervento (occupazione dei suoli);
- eventuali lavori già affidati;
- eventuale previsione di affidamento interno alle Amministrazioni di attività di progettazione e gestione dell'intervento (ex comma 5, art. 92 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii.);
- eventuale previsione di quota del finanziamento da destinare alla struttura commissariale per la gestione degli interventi;
- predisposizione di note in risposta dovute all'analisi di dati trasmessi.

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

In particolare, nell'ambito dell'attività propedeutica al finanziamento degli interventi, la struttura Commissariale ha effettuato un'azione di coordinamento tra gli Enti incaricati della progettazione esecutiva e le Amministrazioni Comunali interessate, che in sintesi sono consistite:

- Coordinare e presenziare Conferenze dei Servizi (n. 25 nel corso del 2011 e n. 47 nel corso del 2012);
- Coordinare e presenziare tavoli tecnici (n. 18 nel corso del 2011 e n. 8 nel corso del 2012);
- Convocare gli Enti coinvolti nella progettazione di diversi interventi al fine di porre in essere iniziative utili al superamento di tutte le problematiche tecnico-amministrative;
- Promuovere azioni necessarie ad incentivare la progettazione esecutiva degli interventi inseriti nell'AdP.

4.2 ALBO PROFESSIONISTI

In data 20 aprile 2011, con Decreto Commissariale n° 55, è stato emanato il Bando per la istituzione presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato dell'albo dei professionisti a cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. .

L'elenco ha validità per il triennio 2011/2013. Così come stabilito dal Bando di cui sopra, è previsto un aggiornamento dello stesso ogni anno.

Con tale inserimento si possono affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..

I suddetti ELENCHI sono stati suddivisi in ragione delle classi e categorie di cui alla tabella dell'art.14 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e ss.mm.ii.

Le modalità di aggiornamento dell'elenco è regolamentato dallo stesso bando il quale prevede che:

- *"Entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, i Professionisti iscritti dovranno presentare, pena la cancellazione dall'Elenco dei Professionisti, una richiesta di conferma dell'iscrizione, corredata da una autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati";*
- *"Le nuove domande pervenute entro il 30 maggio di ogni anno verranno inserite in coda all'elenco in ordine di arrivo; le conferme dell'iscrizione, da effettuarsi entro la stessa data, saranno inserite in ordine numerico progressivo secondo l'ordine di presentazione;*

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

In data 17 maggio 2012 si è pertanto provveduto alla pubblicazione dell'avviso sul sito **www.ucomidrogeosicilia.it** relativo alla istanza e/o al rinnovo dell'iscrizione da effettuare mediante collegamento on line al sito dedicato al Commissario **https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor;**
Inoltre, al fine di dare maggiore pubblicità all'obbligo di conferma della propria istanza, il predetto avviso è stato, trasmesso in data **18 maggio 2012** ai tutti professionisti già inseriti nell'elenco pubblicato in data 20 luglio 2011 mediante *e-mail* certificata e/o fax pena la cancellazione dall'Elenco;
Le istanze pervenute ammontano a n. **316**, di cui 243 rinnovi di iscrizioni e 73 nuove iscrizioni;

Con Decreto n. 515 del 04 ottobre 2012 è stato approvato l'**Aggiornamento dell'Elenco Professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a € 100.000 (euro centomila/00), con le modalità di cui all'art.91, comma2, del d.lgs. n. 163/2006**, per l'anno 2012-2013.

4.3 ALBO IMPRESE

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, è stato istituito l'albo delle imprese per la partecipazione alle gare *a procedura ristretta semplificata*, da utilizzare anche *per cottimi fiduciari* e *procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara*.

L'Albo di Fiducia ha validità annuale, e prevede un aggiornamento trimestrale limitatamente agli affidamenti per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

Occorre evidenziare che, al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi previsti dall'AdP, il Commissario ha direttamente provveduto alla predisposizione ed all'affidamento delle procedure di gara relative agli interventi, individuando un numero congruo di soggetti, iscritti agli Albo di Fiducia, da invitare tra coloro che hanno dichiarato di possedere idonei requisiti.

In particolare, si rappresenta che il Commissario ha provveduto:

- **per l'anno 2011**: ad istituire l'Albo di Fiducia con il Decreto Commissariale n° 54 del 20 aprile 2011.

  Al fine di consentire la massima partecipazione e garantire nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, il Bando è stato pubblicato sul sito web www.ucomidrogeosicilia.it nonché per estratto sulla G.U.R.I. – Serie speciale n.51 del 02.05.2011, sulla G.U.R.S. del 20 maggio 2011 e su il Sole 24ore del 04.05.2011, su La Repubblica del 04.05.2011, su La Sicilia del 04.04.2011 e su Il Giornale di Sicilia del 04.05.2011.

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

Entro i termini previsti sono pervenute n. **492** istanze di ammissione all'Albo delle imprese 2011.

- **per l'anno 2012:** si è provveduto ad istituire, con Decreto Commissariale n. 323 del 15 novembre 2011, l'Albo di Fiducia Imprese.

  Avendo attivato nel corso del 2011 la piattaforma e-procurement, di cui al successivo punto, i soggetti interessati hanno presentato domanda per l'inserimento nel suddetto elenco, entro il 15 dicembre 2011 secondo le modalità previste nel Bando pubblicato sul sito www.ucomidrogeosicilia.it.

  Entro i termini previsti sono pervenute n. **481 istanze di ammissione all'Elenco** delle imprese 2012. Il cui elenco è stato pubblicato sul sito della Struttura Commissariale www.ucomidrogeosicilia.it in data 26 gennaio 2012.

  In data 30 ottobre 2012 è stato aggiornato l'Elenco Imprese 2012 limitatamente ai cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara, mediante l'integrazione con le domande ammissibili pervenute nel corso del ***terzo*** trimestre, entro il 26 ottobre 2012. Il numero delle istanze ammonta complessivamente a **610** imprese.

  Per le procedure ristrette semplificate, l'Elenco imprese istituito non può per legge essere integrato e l'elenco a cui si deve far riferimento rimane quello pubblicato il 26 gennaio 2012 con 481 iscritte.

- **per l'anno 2013:** si è provveduto ad istituire, con Decreto Commissariale n. 651 del 27 novembre 2012, l'Albo di Fiducia Imprese.

  I soggetti interessati hanno presentato domanda per l'inserimento nel suddetto elenco, entro le ore 24:00 del 15 dicembre 2012 secondo le modalità previste nel Bando pubblicato sul sito www.ucomidrogeosicilia.it.

  Entro i termini previsti sono pervenute più di **520 istanze di ammissione all'Elenco** delle imprese 2013. Allo stato sono in corso le verifiche al fine di poter procedere con la pubblicazione sul sito della Struttura Commissariale www.ucomidrogeosicilia.it.

4.4 E-PROCUREMENT

Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto, secondo quanto previsto dall'art. 85 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., si è provveduto, all'individuazione di una soluzione tecnologica in modalità Software as a Service (SaaS)/Application Service Provider (ASP), che consenta l'esecuzione di gare telematiche, la gestione di Elenchi di Operatori Economici, la fornitura di servizi di Help Desk Tecnico e Informativo, la formazione degli utenti. Con Decreto

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

Commissariale n. 129 del 12.07.11, è stata disposto l'affidamento della suddetta fornitura e la gestione del relativo servizio di e-procurement all'Impresa I-FABER S.p.A.

La finalità del suddetto servizio è quella di conseguire celermente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, gli obiettivi previsti dall'Accordo di Programma.

Il Bando di gara relativo all'"Affidamento di una soluzione tecnologica in modalità Software as a Service (SaaS)/Application Service Provider (ASP) che consenta l'esecuzione di gare telematiche, la gestione di Elenchi di Operatori Economici, la fornitura di servizi di Help Desk Tecnico e Informativo e la formazione degli utenti" è stato pubblicato integralmente sul sito web del Commissario www.ucomidrogeosicilia.it in data 28 aprile 2011, nonché sulla GUCE N. GU/S S85 03/05/2011 - 139625-2011-IT, sulla G.U.R.I. Serie 5 Speciale – Contratti pubblici n. 51 del 02-05-2011, sulla G.U.R.S. n. 19 del 13.05.2011, sui quotidiani a tiratura nazionale "La Repubblica" e "Il Sole 24ore" del 03.05.2011 e sui quotidiani a tiratura Regionale "La Sicilia" e il "Giornale di Sicilia" del 03.05.2011.

La piattaforma e-Procurement sviluppata da i-Faber per il Commissario Straordinario Delegato è composta da due moduli, perfettamente integrati tra di loro: la piattaforma per la gestione dell'Elenco Fornitori e la piattaforma per la gestione delle gare telematiche.

Il processo di gestione dell'Elenco Fornitori è un sistema di Vendor Management che, mediante un insieme di attività, organizza le informazioni sui Operatori Economici e le utilizza al fine di ottenere le migliori performance tecnico/economiche.

Mediante la piattaforma per la gestione delle gare telematiche possono essere gestite in modo interamente telematico tutte le tipologie di gare previste ai sensi del D.lgs 163/2006.

La Piattaforma elettronica è pienamente funzionante dal 1 gennaio 2012 e si precisa, a tal proposito, che tutte le gare del 2012, di cui al punto successivo, sono state espletate mediante procedure telematiche.

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

4.5 GARE

L'attività della Struttura Commissariale in qualità di Stazione Appaltante riguarda essenzialmente l'affidamento delle procedure di gara, mediante la predisposizione di bandi di gara e lettere di invito, predisposizione degli eventuali chiarimenti richiesti dalle imprese, ricezione delle eventuali richieste di prequalifica e di ricezione delle offerte, verifica delle domande di prequalifica, la valutazione delle offerte, predisposizione degli atti normativi necessari per l'affidamento dei lavori e del relativo contratto.

Altre attività complementari a quella sopra riportata sono:

- supporto ai Responsabili del Procedimento per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- ottemperanza agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicità dei Bandi di Gara pre/post informazione.

E' opportuno precisare che, a seguito del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 15 aprile 2011, Il Commissario ha provveduto a comunicare che per tutti i progetti non ancora approvati in linea tecnica alla data dell'8 giugno 2011, le fasi di progettazione, approvazione ed attuazione da porre in essere vengono disciplinate dalle disposizioni di cui al ***Decreto Legislativo 163/2006 "codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*** e il relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Da marzo 2011 ad oggi sono state attivate **81** procedure di affidamento lavori e/o servizi, di cui:

- **N. 43** procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 122 e 123 comma 7 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., di cui **6** tuttora in corso ed **4** in fase di avvio;
- **N. 6** procedure ristrette ai sensi dell'art. 55 comma 6 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. (di cui una in corso: la scadenza per la prequalifica è fissata per il 28 dicembre 2012)
- **N. 26** procedure espletate, ai sensi del comma 11 dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., attraverso consultazione di almeno cinque operatori economici ricavabili dall'elenco dei laboratori presenti sul sito www.clp.it per la realizzazione di **indagini preliminari** da espletare in situ e propedeutiche alla progettazione;
- **N. 6** procedure di **Affidamento del servizio di progettazione** definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, **Direzione lavori** a professionisti esterni mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del d.lgs. 163/2006;
-

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

Si riportano qui di seguito alcune tabelle riepilogative delle Gare effettuate nel corso dell'intero periodo di attività:

1. Gare per l'affidamento dei **Lavori per la realizzazione degli interventi inseriti in AdP**:

PROCEDURA NEGOZIATA E RISTRETTA SENZA BANDO EUROPEO			
N. GARE EFFETTUATE			43*
N. DI INVITI ALLE IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO			**832**
OFFERTE RICEVUTE DI CUI:		**66,5663%****	442**
A) VALIDE	403**	**91,1765%****	
B) NON AMMESSE	39**	**8,8235%****	
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA			€ 25.618.003,25
VALORE OFFERTO MINIMO RIBASSO			4,1312
VALORE OFFERTO MASSIMO RIBASSO			32,4811
MEDIA RIBASSI			24,14136

** (6 gare in corso; 4 gare in fase di avvio)*

*** i valori sono riferiti solo alle gare completate e non tengono conto delle gare in corso ne di quelle in fase di avvio*

GARE PROCEDURA CON BANDO EUROPEO			
N. GARE EFFETTUATE			6*
RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE			**656**
INVITI			636
OFFERTE RICEVUTE DI CUI:		**83,4906%**	531
B) VALIDE	500	**94,1620%**	
B) NON AMMESSE*	31	**5,8380%**	
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA			€ 12.616.566,11
MEDIA RIBASSI			**26,4235%**
VALORE OFFERTO MINIMO RIBASSO			7,5319
VALORE OFFERTO MASSIMO RIBASSO			40,3944

(1 gara in corso)

2. Gare per l'affidamento della realizzazione del Piano di Indagini preliminari propedeutiche alla progettazione degli interventi inseriti in AdP:

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

GARE INDAGINI				
N. GARE EFFETTUATE				26
IMPRESE INVITATE				250
OFFERTE RICEVUTE DI CUI:			**52,0000%**	
A)	**46,8927%**	124	**95,3846%**	130
B)	**16,1616%**	6	**4,6154%**	
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA				€ 665.057,33
MEDIA RIBASSI				27,7323%
VALORE OFFERTO MINIMO RIBASSO				1,211
VALORE OFFERTO MASSIMO RIBASSO				50,1111

3. Gare per l'affidamento dei servizi di Progettazione e Direzione Lavori degli interventi inseriti in AdP:

GARE PROFESSIONISTI				
N. GARE EFFETTUATE				6
PROFESSIONISTI INVITATI				70
OFFERTE RICEVUTE DI CUI:			**84,2857%**	
A)	VALIDE	58	**98,3051%**	59
B)	NON AMMESSE*	1	**1,6949%**	
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA				€ 468.125,72
MEDIA RIBASSI				**36,5755**
VALORE OFFERTO MINIMO RIBASSO				4,895
VALORE OFFERTO MASSIMO RIBASSO				64,888

Conclusioni:

Dall'analisi delle tabelle sopra riportate si evince che: relativamente alle 43 procedure di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi, senza Bando Europeo, delle imprese invitate, **il 70% hanno presentato offerta, con una media di ribassi pari al 25%**, in linea con la media dei ribassi nazionali, in considerazione anche della crisi economica che ha colpito l'intero Paese.

La percentuale di partecipazione risulta maggiore nel caso di procedure Ristrette con emanazione di Bando di Gara, ai sensi dell'art. 55 comma 6 del D.lgs 163/2006, dove ben 477 imprese hanno presentato domanda di partecipazione per le 4 gare indette, raggiungendo quasi il 85% di offerte presentate.

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

E' bene sottolineare inoltre che il ricorso a procedure telematiche, dal 1 gennaio 2012, ha permesso una notevole riduzione dei tempi intercorrenti tra l'emanazione del Bando e l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa miglior classificata.
Basti pensare che usufruendo delle procedure tradizionali nel 2011, per la valutazione delle 109 domande di prequalifica e delle 90 offerte, presentate dalle imprese ritenute idonee, nella procedura di Gara relativa all'affidamento alle "OPERE DI CONSOLIDAMENTO E REGIMAZIONE IDRAULICA CONTRADA BARBA NEL COMUNE DI S.ANGELO DI BROLO (ME)" - Intervento ME 115_1A e la predisposizione della atto di aggiudicazione sono stati necessari circa 70 giorni.
Con il ricorso alle piattaforma telematica per 4 le procedure indette con bando europeo, i giorni necessari per disporre l'aggiudicazione sono solo 45. E' evidente che il risparmio di tempo si traduce in un risparmio economico per l'amministrazione.

Relativamente all'affidamento della realizzazione del Piano di indagini preliminare la percentuale di partecipazione alle gare si attesta invece a circa il 52%.
È doveroso tuttavia sottolineare che tale valore è condizionato dalle gare espletate nel corso del 2011, periodo nel quale le imprese invitate non erano individuate tra quelle iscritte all'Elenco di Fiducia del Commissario, ma selezionate attraverso la consultazione di almeno cinque operatori economici ricavabili dall'elenco dei laboratori presenti sul sito www.clp.it del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dotati di iscrizione nel settore "C" (Prove geotecniche in situ) dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture ai sensi del D.M. 14.01.2008. La scelta randomica dei laboratori, se da un lato ha garantito il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, dall'altro ha comportato l'individuazione di imprese impossibilitate, per ragioni di convenienza economica, a svolgere le proprie attività nel territorio della Regione Siciliana, e costrette pertanto a rinunciare alla partecipazione.

E' opportuno infine evidenziare che nel corso del 2012 si è registrato l'aumento, rispetto ai valori del 2011, della percentuale di offerte valide presentate dalle Imprese iscritte all'Elenco imprese per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma.

OFFERTE RICEVUTE NEL CORSO DEL 2011 PER AFFIDAMENTO LAVORI			
A)	Offerte VALIDE	160	87%
B)	NON AMMESSE	24	13%

OFFERTE RICEVUTE NEL CORSO DEL 2012 PER AFFIDAMENTO LAVORI			
A)	Offerte VALIDE	243	94,19%
B)	NON AMMESSE	15	5,81

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

In particolare si rappresenta che a fronte di 184 offerte pervenute nel corso dello scorso anno ben 24, pari al circa 13%, non hanno superato la prima fase di valutazione della documentazione amministrativa richiesta in fase di gara, nello specifico:

- 16 presentavano una cauzione non autenticata da pubblico ufficiale a ciò deputato;
- 2 presentavano documentazione non conforme a quanto richiesto;
- 6 sono giunte oltre i termini fissati per la presentazione del plico;

Nel corso del 2012 la percentuale delle offerte valide si attesta al 95%.

Ciò può essere in parte attribuito al ricorso alle procedure telematiche per l'affidamento di servizi e lavori, che garantisce un servizio di assistenza alle imprese anche nell'ipotesi di partecipazione a gare.

In parte l'incremento di offerte ritenute conformi a quanto richiesto dalla stazione appaltante può essere attribuito al consolidato rapporto con le imprese iscritte all'Albo, oramai indirizzate al rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

In allegato (Allegato 2) viene riportato un quadro riepilogativo di tutte le Gare espletate dal Commissario, distinte in "Lavori", "Indagini" e "Progettazione e Direzione Lavori".

5 STATO DELL'ARTE

Si riporta qui di seguito un esame analitico e dettagliato dello stato dell'arte degli interventi rientranti nell'accordo di Programma e nel successivo atto integrativo dettagliato come segue:

1) Interventi lettera A;
2) Interventi lettera B.

Allo stato attuale ed a seguito delle revoche e della suddivisione in più stralci di alcuni Progetti, gli interventi sono 201 divisi in 94 ricadenti nella lettera A (fondi Ministeriali) e 107 nella lettera B (fondi regionali - PO FESR 2007-2013, Linea d'intervento 2.3.1).

5.1 INTERVENTI LETTERA A (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo)

Gli interventi che trovano copertura finanziaria con fondi ministeriali sono 94, ripartiti secondo i vari stati di avanzamento lavori, ed in particolare:

- n. 39 interventi per i quali sono in corso le attività di progettazione, , intendendo tutte le fasi propedeutiche la realizzazione degli interventi, pertanto sono inclusi quelli per i quali sono state già affidate le attività di indagini geognostiche o si è in attesa di acquisire le necessarie autorizzazioni e pareri;
- n. 45 interventi per i quali sono in corso le procedure di gara o gli interventi sono in fase di realizzazione;

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

- n. 10 interventi, tra cui quelli di Giampilieri e San Fratello, già ultimati.

Interventi A			
N. Interventi	*Stato*	*%*	*€*
39	*In fase di Progettazione*	35,16%	*€ 58.137.013,11*
45	*In fase di Attuazione Intervento*	35,40%	*€ 58.538.457,31*
10	*Interventi Ultimati*	29,12%	*€ 48.160.000,00*
4	*Economie derivanti da Revoche A*	*0,32%*	*€ 525.906,19*
94	***TOTALE INTERVENTI***	***100,00%***	***€ 165.361.376,61***

Analizzando le singole voci singolarmente si evince che:

Economie derivanti da revoche

Nell'ambito degli interventi A sono presenti economie residue, pari ad € 525.906,19, derivanti dalla revoca dell'intervento di Serradifalco (CL 020), decisa nel corso della seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 15 settembre 2011, pari originariamente ad € 1.600.000,00, decurtate della quota parte delle economie utilizzate per l'incremento del finanziamento dell'intervento di Caronia (ME 058), pari ad € 653.083,40 e della quota parte delle economie utilizzate per l'incremento del finanziamento dell'intervento di Ali Terme (ME 051) pari ad € 421.050,50, così come deciso in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo del 18 maggio 2012.

Interventi in fase di progettazione

Interventi in fase di Progettazione A			
N. Interventi	*Stato*	*%*	*€*
22	*PROGETTAZIONE IN CORSO*	22,87%	€ 37.820.000,00
4	*ATTESA ADEGUAMENTO PROGETTO*	3,39%	€ 5.600.000,00
7	*PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI*	3,18%	€ 5.251.010,50
6	*ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE*	5,72%	€ 9.466.002,61
39	***TOTALE in fase di Progettazione***	***35,16%***	***€ 58.137.013,11***

Gli interventi che risultano in fase di progettazione sono così suddivisi:

- n. 22 interventi per i quali è in corso la redazione del progetto esecutivo;
- n. 4 interventi per i quali il progetto esecutivo è già stato redatto ma, a seguito delle relative istruttorie e/o delle conferenze dei servizi, si è in attesa degli adeguamenti prescritti;
- n. 7 interventi per i quali interventi per i quali si è in attesa di pareri;

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

- n. 6 interventi per i quali è stata già svolta la conferenza dei servizi e sono stati acquisiti i pareri.

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di progettazione:



Interventi in fase di attuazione


Interventi in fase di Attuazione A			
N. Interventi	*Stato*	*%*	*€*
9	*PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA*	5,45%	€ 9.012.500,00
4	*CONTRATTO STIPULATO*	4,55%	€ 7.530.000,00
10	*AFFIDAMENTO LAVORI*	6,33%	€ 10.460.000,00
19	*AVVIATI LAVORI*	16,05%	€ 26.535.957,31
3	*SOSPENSIONE LAVORI*	3,02%	€ 5.000.000,00
45	*TOTALE in fase di attuazione intervento*	*35,40%*	*€ 58.538.457,31*

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

Gli interventi che risultano in fase di attuazione sono così suddivisi:

- n. 9 interventi per i quali sono in fase di predisposizione i relativi atti di gara;
- n. 4 interventi per i quali sono state già espletate le procedure di gara per la realizzazione, è già stato stipulato il relativo contratto e si è in attesa di consegnare i lavori;
- n. 10 interventi per i quali sono in corso le procedure di gara per la realizzazione degli interventi;
- n. 19 interventi per i quali i lavori sono in corso di realizzazione;
- n. 3 interventi per i quali i lavori sono stati sospesi al fine di valutare l'opportunità di una perizia di variante.

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di attuazione:

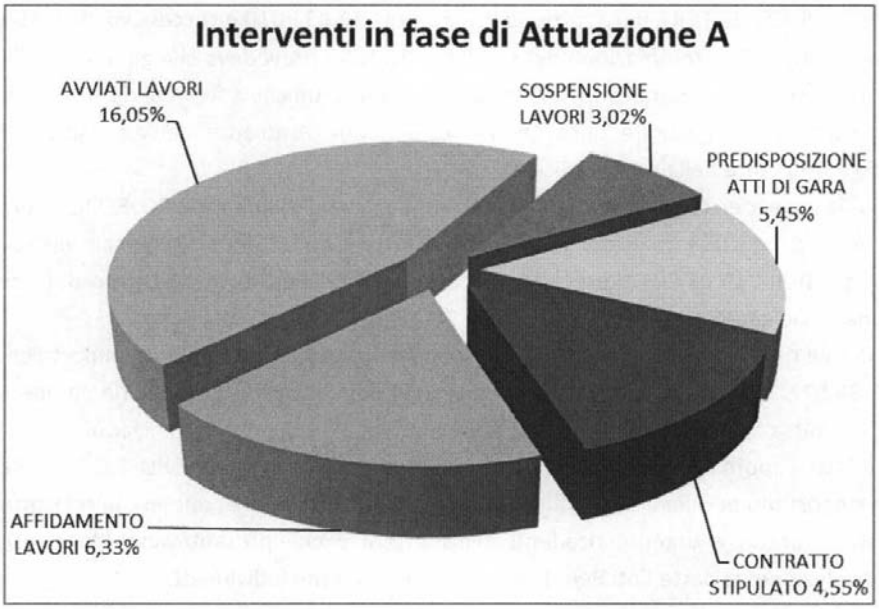

Interventi ultimati

Interventi Ultimati A			
N. Interventi	*Stato*	*%*	*€*
10	*LAVORI ULTIMATI (Giampilieri, SanFratello, Alcara Li Fusi, Valledolmo, Polizzi Generosa, Blufi_1, Blufi_2, Misterbianco, Randazzo, Piedimonte Etneo)*	29,12%	€ 48.160.000,00
10	***TOTALE interventi ultimati***	***29,12%***	***€ 48.160.000,00***

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

Gli interventi ultimati si riferiscono alle opere realizzate nei Comuni di San Fratello, Giampilieri ed Alcara Li Fusi ricadenti nella provincia di Messina, alle opere ricadenti nei comuni Valledolmo, Polizzi Generosa e Blufi ricadenti nella provincia di Palermo, Misterbianco, Randazzo e Piedimonte Etneo ricadenti nella provincia di Catania.
In allegato vengono riportati i seguenti documenti riepilogativi:

- Quadro riepilogativo degli interventi identificati con la lettera A (**Allegato 3**);
- Stato dell'arte degli interventi identificati con la lettera A in fase di attuazione e relative schede lavori (**Allegato 4**).

5.2 INTERVENTI LETTERA B (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo)

Il complemento di Programmazione del suddetto PO FESR prevedeva che gli unici Enti beneficiari di tali risorse fossero le Amministrazioni locali che erano le uniche a fungere da stazioni appaltanti, sotto il controllo di gestione della Direzione Generale Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della regione Sicilia.
La rimodulazione del complemento di Programmazione del suddetto PO FESR, approvata con Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011, adottata dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 20 del 19.01.2012, prevede anche quale Ente Beneficiario l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato.
In virtù di tale rimodulazione, la Regione ha già indicato 23 interventi, per un importo complessivo pari a € 39.522.214,39, corrispondenti circa al 25% degli interventi di propria competenza per i quali il Commissario Straordinario è stato individuato quale soggetto beneficiario.
Stante infatti l'approssimarsi delle date di scadenza del Programma PO FESR, la Regione ha ritenuto opportuno avvalersi degli uffici del Commissario al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, prioritari e urgenti, ricadenti nella lettera B che presentavano ritardi e criticità di difficile risoluzione da parte Enti Beneficiari precedentemente individuati.

Si riportano di seguito gli interventi ricadenti nella lettera B per i quali il Commissario Straordinario Delegato è stato individuato quale Soggetto Beneficiario, che vengono pertanto individuati con la Lettera B*.

- con nota prot. N. 13607 del 02.03.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
ME	124	Terme Vigliatore	Fondi Regionali	Ripascimento scogliere – Zona Terme Marchesana	€ 3.823.875,00

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato

REGIONE SICILIANA

- con nota prot. N. 13611 del 02.03.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
ME	130	Tusa	Fondi Regionali	Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni – Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)	€ 1.500.000,00

- con nota prot. N. 18003 del 21.03.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
ME	106	S. Alessio Siculo	Fondi Regionali	Barriera soffolta e radente a protezione del centro abitato	€ 5.000.000

- con nota prot. N. 31329 del 29.05.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
CL	106	Caltanissetta	Fondi Regionali	Consolidamento, bonifica e canalizzazione del versante sud della colline Sant'Anna, centro storico e quartiere Saccara, con opere di ingegneria naturalistica, rimodellamento e inerbimento dei versanti dell'abitato	€ 4.160.000

- con nota prot. N. 35347 del 15.06.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
AG	4	Cattolica Eraclea	Regione	Mitigazione Rischio Idrogeologico - Crolli Costone Roccioso Eraclea Minoa	€ 1.480.000,00
AG	14	Santo Stefano di Quisquina	Regione	Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale	€ 2.360.195,11
AG	174	Cattolica Eraclea	Regione	Crolli costone roccioso Eraclea Minoa (Loc. Zagarella)	€ 1.170.000,00
CL	17	Butera	Regione	Consolidamento centro abitato	€ 1.200.000,00
CL	18	Butera	Regione	Opere di consolidamento pendici del centro Storico	€ 800.000,00
CT	28	Licodia Eubea	Regione	Consolidamento Via Duca degli Abruzzi	€ 880.000,00

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
CT	38	Santa Venerina	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Badia-T. Fago	€ 1.000.000,00
CT	39	Sant'Agata Li Battiati	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Leucatia - Via Einaudi	€ 1.000.000,00
ME	65	Ficarra	Regione	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada grenne	€ 1.028.981,00
ME	68	Forza D'Agrò	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 414.163,28
ME	105	Rometta	Regione	Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare	€ 1.000.000,00
ME	127	Tortorici	Regione	Muri e paratie montevalle e opere idraluiche – Zona S.Paolo	€ 2.300.000,00
PA	148	Mezzojuso	Regione	Opere di consolidamento – Zona Collina Brigna	€ 2.144.000,00
PA	151	Partinico	Regione	Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò-terzo stralcio	€ 950.000,00
RG	158_1	Modica	Regione	Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e Monserrato	€ 2.000.000,00
SR	166	Rosolini	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00
TP	190	San Vito Lo Capo	Regione	Consolidamento del tratto di costa	€ 1.350.000,00

- con nota prot. N. 36531 del 21.06.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
PA	152	Petralia Sottana	Regione	Opere di consolidamento - Quartiere Casale e Scavarello	€ 1.200.000,00

- con nota prot. N. 40645 del 10.07.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
ME	131	Ucria	Regione	Consolidamento del Centro Urbano in località Vasile-Belvedere	€ 1.261.000,00


Si precisa che per gli interventi sopra elencati alla Struttura Commissariale compete:

- l'istruttoria e l'iter autorizzativo propedeutico all'emissione del Decreto di Finanziamento che rimane a carico della Regione;
- la funzione di Stazione Appaltante.

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

Si evidenzia di seguito lo stato di attuazione degli interventi B* al momento del passaggio al Commissario Straordinario.

INTERVENTI B*				
11	PROGETTAZIONE IN CORSO B *	34,68%	€	13.705.358,39
11	ISTRUTTORIA IN CORSO B*	62,72%	€	24.787.875,00
1	LAVORI ULTIMATI B*	2,60%	€	1.028.981,00
23		TOTALE	€	39.522.214,39

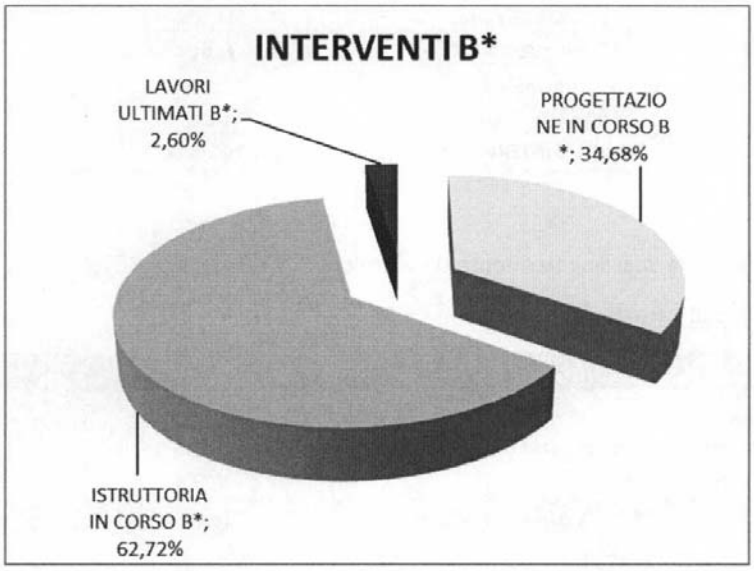

Si sottolinea che l'unico intervento che risulta ultimato (ME065 Ficarra: Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Grenne), se pur ufficialmente trasferito dalla Regione solo a giugno 2012, è stato gestito sempre dalla Struttura Commissariale in quanto inizialmente ricadente in Lettera A e transitato alla Lettera B in sede di Comitato del 24 febbraio 2011, a lavori già avviati.

Pertanto, la Struttura Commissariale ad oggi cura la realizzazione non solo degli interventi individuati nell'Accordo di Programma con la lettera A (n. 94), ma anche gli interventi trasferiti dalla Regione al Commissario quale soggetto beneficiario ed individuati dalla lettera B* (n. 23).

Si rappresenta che le informazioni ed i dati che seguiranno nei successivi paragrafi sono il frutto di comunicazioni pervenute a questo Ufficio da parte dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

In particolare, gli interventi che trovano copertura finanziaria con fondi messi a disposizione dalla regione Sicilia sono 107, ripartiti secondo i vari stati di avanzamento lavori, ed in particolare:

- n. 16 interventi che risultano in fase di istruttoria preliminare;
- n. 26 interventi che risultano in fase di progettazione;
- n. 63 interventi per i quali sono in corso le procedure di gara per l'affidamento dei lavori;
- n. 2 interventi per i quali i lavori sono stati conclusi

Interventi B + B*			
N. Interventi	Stato	%	€
16	Istruttoria in Corso	14,46%	€ 23.169.000,00
26	In fase di Progettazione	26,01%	€ 41.678.331,45
63	In fase di Attuazione Intervento	58,26%	€ 93.350.996,83
2	Interventi Ultimati	1,27%	€ 2.028.657,87
107	**TOTALE INTERVENTI**	**100,00%**	**€ 160.226.986,15**

Analizzando le singole voci singolarmente si evince che:

Interventi in fase di istruttoria in corso


Interventi in fase di Istruttoria B+B*			
N. Interventi	Stato	%	€
7	Progetto ancora non pervenuto	6,99%	€ 11.200.000,00
9	Istruttoria Progetto	7,47%	€ 11.969.000,00
16	**TOTALE Istruttoria in Corso**	**14,46%**	**€ 23.169.000,00**

Gli interventi che risultano in fase di istruttoria sono così suddivisi:

- n. 7 interventi per i quali non sono ancora stati acquisiti i progetti;
- n. 9 interventi per i quali si sta ancora svolgendo l'istruttoria preliminare a causa della carenza di documentazione tecnico – amministrativa reperita.

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di istruttoria:

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

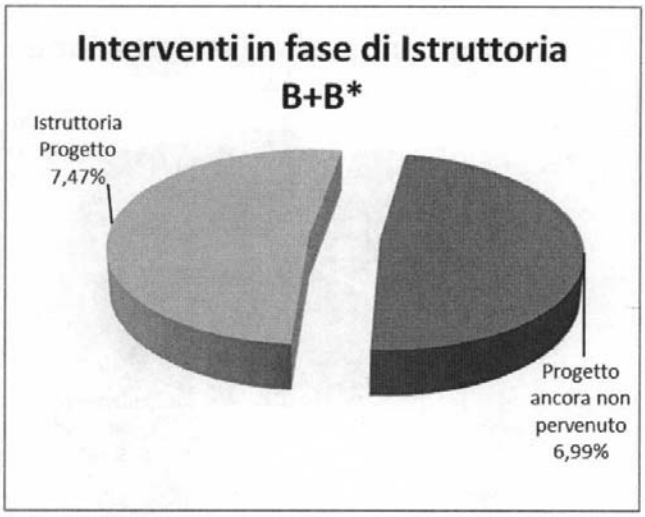

Interventi in fase di progettazione


*Interventi in fase di Progettazione B+B**			
N. Interventi	*Stato*	*%*	*€*
8	*Intervento finanziato*	9,18%	€ 14.708.973,06
10	*Progettazione in corso*	8,67%	€ 13.894.000,00
8	*PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI*	8,16%	€ 13.075.358,39
26	***TOTALE in fase di PROGETTAZIONE***	***26,01%***	***€ 41.678.331,45***

Gli interventi che risultano in fase di progettazione sono così suddivisi:

- n. 8 interventi per i quali è stato già emesso il Decreto di Finanziamento;
- n. 10 interventi per i quali è in corso la redazione del progetto esecutivo.
- n. 8 interventi per i quali si è in attesa dei pareri sul progetto presentato.

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di progettazione:

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

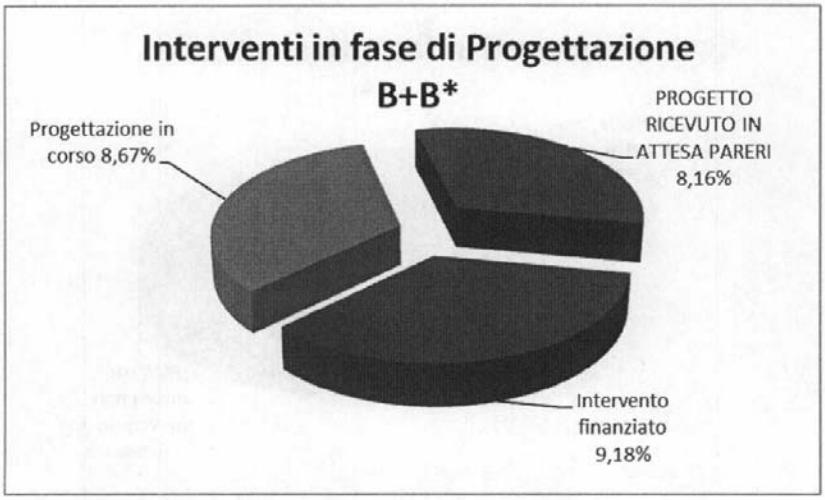

Interventi in fase di attuazione


*Interventi in fase di Attuazione B+B**			
N. Interventi	*Stato*	*%*	*€*
3	*Predisposizione atti di gara*	4,49%	€ 7.200.000,00
4	*Contratto stipulato*	3,72%	€ 5.953.161,34
27	*Affidamento Lavori*	27,34%	€ 43.809.308,23
29	*Avviati Lavori*	22,71%	€ 36.388.527,26
63	*TOTALE in fase di attuazione intervento*	*58,26%*	*€ 93.350.996,83*

Gli interventi che risultano in fase di attuazione sono così suddivisi:

- n. 3 interventi per i quali è in corso la predisposizione degli atti di gara;
- n. 4 interventi per i quali sono state già espletate le procedure di gara per la realizzazione degli interventi ed è già stato stipulato il relativo contratto;
- n. 27 interventi per i quali sono in corso le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere;
- n. 29 interventi per i quali i lavori sono in corso di realizzazione.

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di attuazione:

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

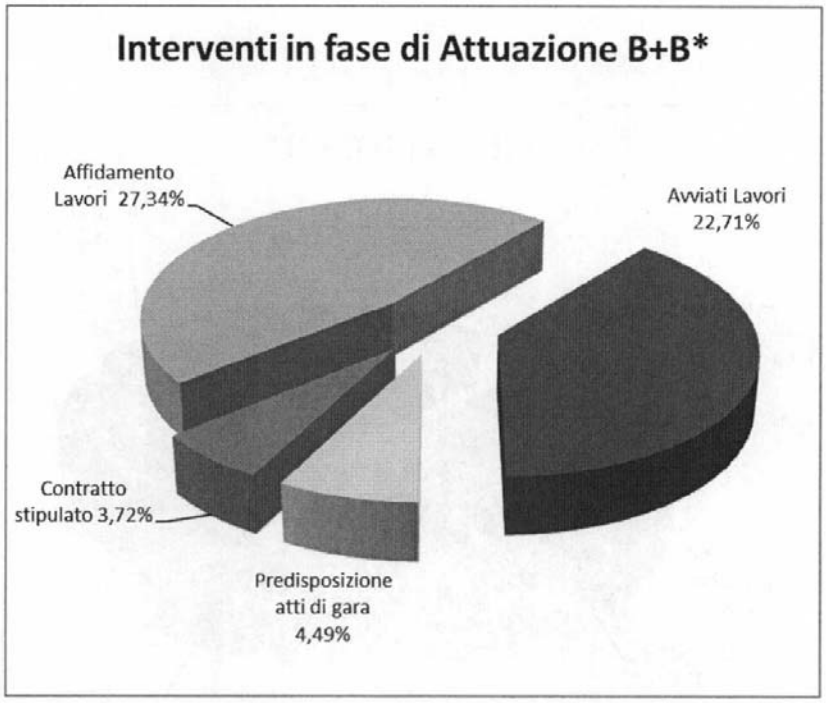


Si riporta di seguito si riporta la tabella degli interventi B suddivisa per lettera di appartenenza (B e B*):

*Interventi B + B**			
N. Interventi	*Stato*	*%*	*€*
16	*Istruttoria in Corso B*	14,46%	*€ 23.169.000,00*
0	*Istruttoria in Corso B**	0,00%	*€ 0,00*
8	*In fase di Progettazione B*	9,18%	*€ 14.708.973,06*
18	*In fase di Progettazione B**	16,83%	*€ 26.969.358,39*
59	*In fase di Attuazione Intervento B*	51,07%	*€ 81.827.121,83*
4	*In fase di Attuazione Intervento B**	7,19%	*€ 11.523.875,00*
1	*Interventi Ultimati B*	0,62%	*€ 999.676,87*
1	*Interventi Ultimati B**	0,64%	*€ 1.028.981,00*
84	***TOTALE Interventi B***		***€ 120.704.771,76***
23	***TOTALE Interventi B****		***€ 39.522.214,39***
107	***TOTALE B+B****	**100,00%**	**€ 160.226.986,15**

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

Di cui si riporta di seguito la rappresentazione grafica:

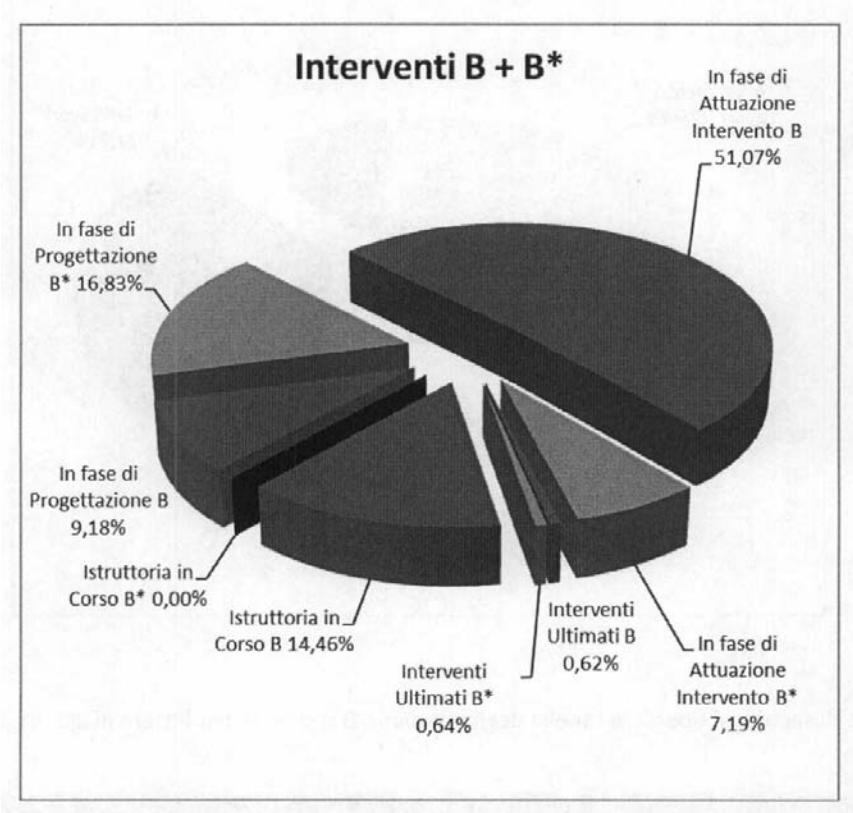

5.2.1 Interventi lettera B* (Ente beneficiario Commissario Straordinario OPCM 3886/10)

Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi ricadenti nella lettera B per i quali il Commissario Straordinario Delegato è stato individuato quale Soggetto Beneficiario, denominati con la Lettera B*.


Come riportato nel par. 4.2, gli interventi identificati con la lettera B* sono 23, ripartiti secondo i vari stati di avanzamento lavori, ed in particolare:

- n. 18 interventi che risultano in fase di progettazione;
- n. 2 interventi per i quali è in corso la predisposizione degli atti di gara per le procedure di affidamento dei lavori;
- n. 2 interventi per i quali i lavori sono in corso di realizzazione
- n. 1 intervento per il quale i lavori sono stati conclusi

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

*Interventi B**			
18	Interventi in fase di Progettazione	68,24%	€ 26.969.358,39
2	Interventi in fase di predisposizione atti di gara	15,69%	€ 6.200.000,00
2	Interventi per i quali i lavori sono avviati	13,47%	€ 5.323.875,00
1	Interventi per i quali i lavori sono ultimati	2,60%	€ 1.028.981,00
23	**totale**	**100,00%**	**€ 39.522.214,39**

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo dello stato di attuazione degli interventi B*:

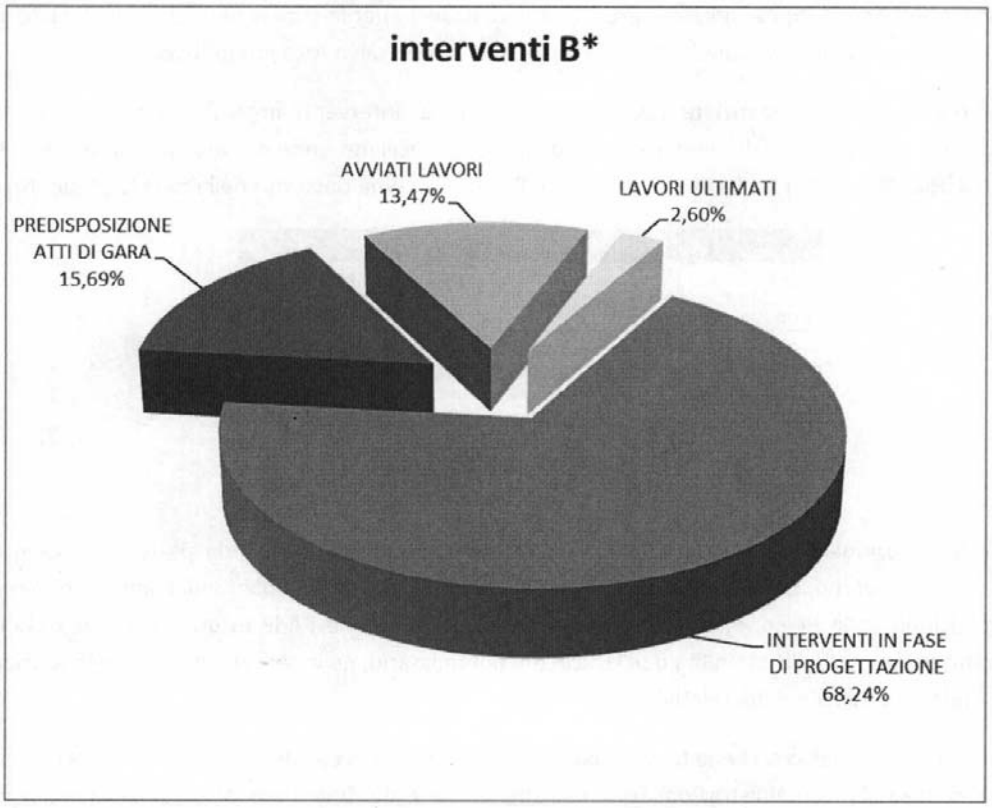

In allegato viene riportato il quadro riepilogativo degli interventi identificati con la lettera B (**Allegato 5**).

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

6 CONCLUSIONI

In questo paragrafo vengono riportate le considerazioni conclusive relative alle attività svolte dal Commissario Delegato per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Sicilia nel periodo dal 10.12.2010 al 18.12.2012.

Come già detto nei paragrafi precedenti l'Accordo di Programma stipulato in data 30.03.2010 ed il successivo Atto Integrativo hanno previsto la suddivisione degli interventi in due distinte lettere ("A" e "B") a seconda dell'origine dei finanziamenti. In entrambi i casi la regione Sicilia ha utilizzato come fonte di finanziamento i fondi provenienti dal *PO FESR 2007-2013*, linea d'intervento *2.3.1*. Il Ministero dell'Ambiente ha utilizzato propri fondi di bilancio per la stipula dell'AdP del 30.03.2010 mentre ha messo a disposizione i propri fondi FAS per il successivo Atto integrativo.

Le risorse complessive stanziate per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Siciliana ammontano pertanto ad **€ 325.588.362,76**, ripartiti tra fondi Ministeriale e Regionale come riassunto nella tabella seguente.


Fondi Ministeriali (lettera A)		
AdP	€	152.692.572,11
AdP integrativo	€	12.756.002,61
Totale	€	165.448.574,72
Fondi Regionali (lettera B)		
AdP	€	151.644.604,81
AdP integrativo	€	8.495.183,23
Totale	€	160.139.788,04


Prima dell'adozione della Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011 da parte della Giunta Regionale di Governo, sancita solo nel gennaio 2012, i vincoli derivanti dai fondi comunitari messi a disposizione dalla Regione Sicilia hanno, di fatto, diviso in due l'AdP in quanto gli stessi non potevano essere nella disponibilità dell'Ufficio del Commissario, né in termini di cassa né in termini di gestione ed attuazione dei relativi interventi.

Tale distinzione ha fatto sì che la fase attuativa degli interventi di cui alla lettera "B" è stata gestita direttamente dalle Amministrazioni comunali (beneficiarie del finanziamento) esclusivamente in regime ordinario e con tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente che disciplina i contratti pubblici sia sul territorio nazionale che europeo.

Nel seguito si riportano i grafici relativi allo stato di attuazione degli interventi suddivisi in lettera A e B, tra i quali sono inclusi i B* di competenza dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato.

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

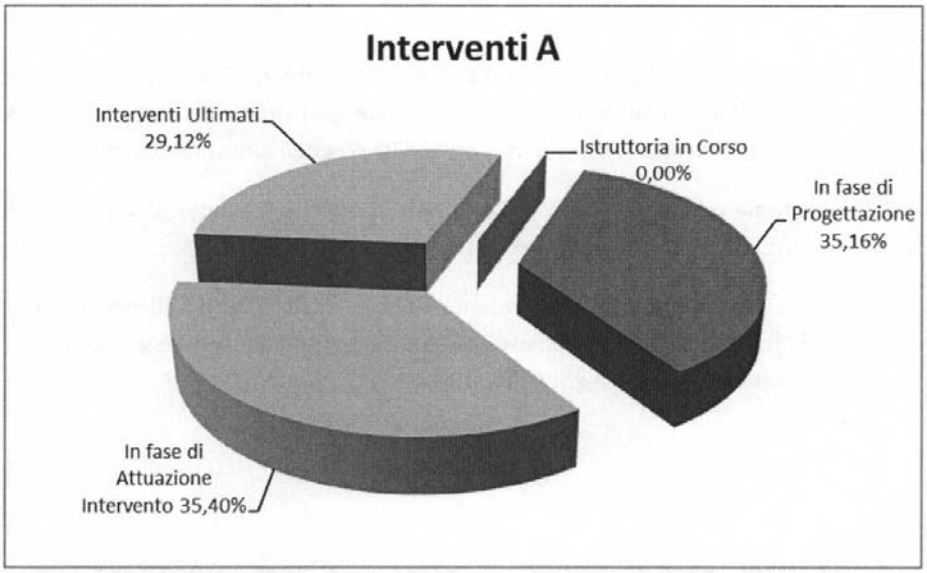

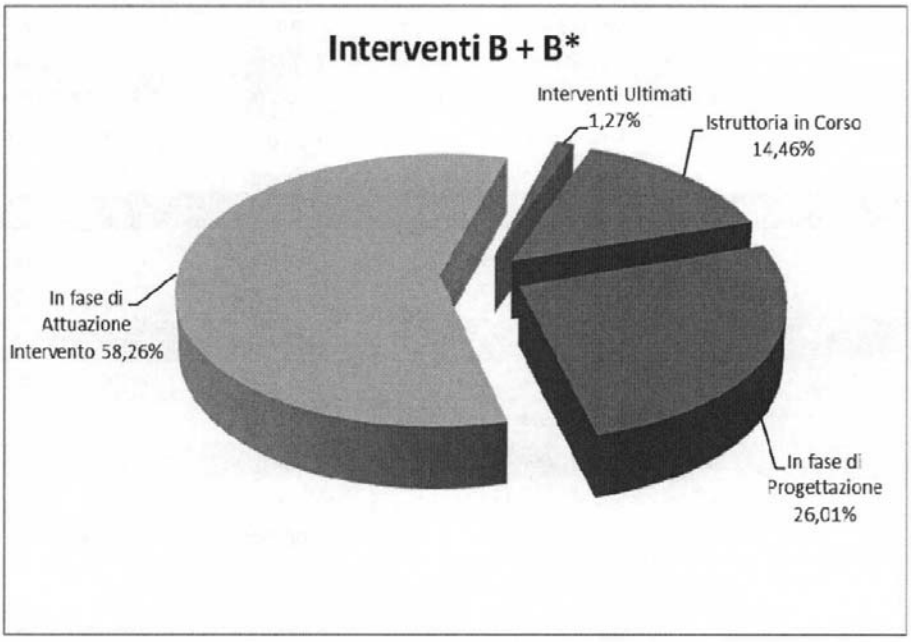

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it


Dall'esame dei grafici sopra riportati si evince che *la percentuale dello stato d'avanzamento di spesa della fase di ultimazione delle attività raggiunge una quota del circa il 29,12% per gli interventi in lettera "A", mentre si attesta intorno al 1,27% per gli interventi in lettera "B".*

Inoltre, la percentuale relativa alla fase di istruttoria in corso è nulla per gli interventi in lettera "A", mentre si attesta intorno al 14,46% per gli interventi in lettera "B".

Il risultato complessivo dello stato d'avanzamento della spesa dell'intero AdP e del successivo Atto integrativo è quindi il frutto della combinazione dei due grafici precedenti e viene riportato qui di seguito, sia in formato tabellare che grafico:

RIEPILOGO INTERVENTI A + B			
n. interventi	Stato	%	€
0	Istruttoria in Corso A	0,00%	€ 0,00
16	Istruttoria in Corso B	7,12%	€ 23.169.000,00
16	**totale interventi istruttoria in corso**	**7,28%**	**€ 23.169.000,00**
39	In fase di Progettazione A	17,86%	€ 58.137.013,11
26	In fase di Progettazione B	12,80%	€ 41.678.331,45
65	**Totale Interventi in fase di Progettazione**	**30,66%**	**€ 99.815.344,56**
45	In fase di Attuazione Intervento A	17,98%	€ 58.538.457,31
63	In fase di Attuazione Intervento B	28,67%	€ 93.350.996,83
108	**Totale Interventi in fase di attuazione**	**46,65%**	**€ 151.889.454,14**
10	Interventi Ultimati A	14,79%	€ 48.160.000,00
2	Interventi Ultimati B	0,62%	€ 2.028.657,87
12	**totale interventi ultimati**	**15,41%**	**€ 50.188.657,87**
	Economie derivanti da revoche interventi A	0,16%	€ 525.906,19
201	**TOTALE**	**100,00%**	**€ 325.588.362,76**

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

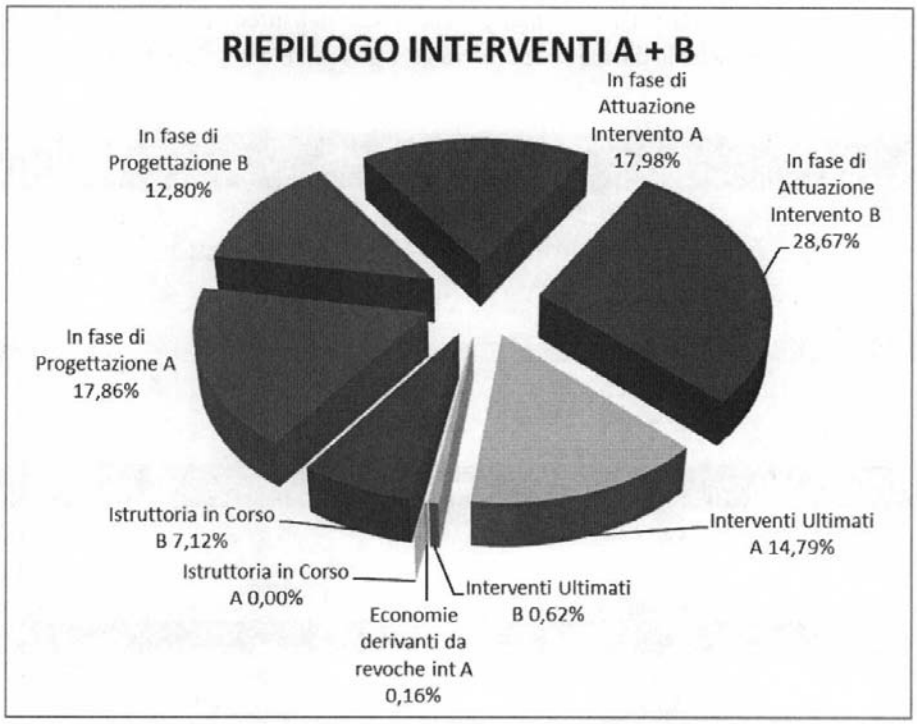


Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

Di seguito si riporta lo stato d'avanzamento della spesa dell'intero AdP e del successivo Atto integrativo operando anche la differenziazione tra gli interventi B e B*, sia in formato tabellare che grafico:

*Interventi A + B + B**			
N. Interventi	*Stato*	*%*	*€*
0	*Istruttoria in Corso A*	0,00%	*€ 0,00*
16	*Istruttoria in Corso B*	7,12%	*€ 23.169.000,00*
0	*Istruttoria in Corso B**	0,00%	*€ 0,00*
16	***Totale interventi istruttoria in corso***	***7,12%***	***€ 23.169.000,00***
39	*In fase di Progettazione A*	17,86%	*€ 58.137.013,11*
8	*In fase di Progettazione B*	4,52%	*€ 14.708.973,06*
18	*In fase di Progettazione B**	8,28%	*€ 26.969.358,39*
65	***Totale Interventi in fase di Progettazione***	***30,66%***	***€ 99.815.344,56***
45	*In fase di Attuazione Intervento A*	17,98%	*€ 58.538.457,31*
59	*In fase di Attuazione Intervento B*	25,13%	*€ 81.827.121,83*
4	*In fase di Attuazione InterventoB**	3,54%	*€ 11.523.875,00*
108	***Totale Interventi in fase di attuazione***	***46,65%***	***€ 151.889.454,14***
10	*Interventi Ultimati A*	14,79%	*€ 48.160.000,00*
1	*Interventi Ultimati B*	0,31%	*€ 999.676,87*
1	*Interventi Ultimati B**	0,32%	*€ 1.028.981,00*
12	***totale interventi ultimati***	***15,41%***	***€ 50.188.657,87***
0	*Economie derivanti da revoche int A*	*0,16%*	*€ 525.906,19*
201	***TOTALE***	**100,00%**	**€ 325.588.362,76**

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

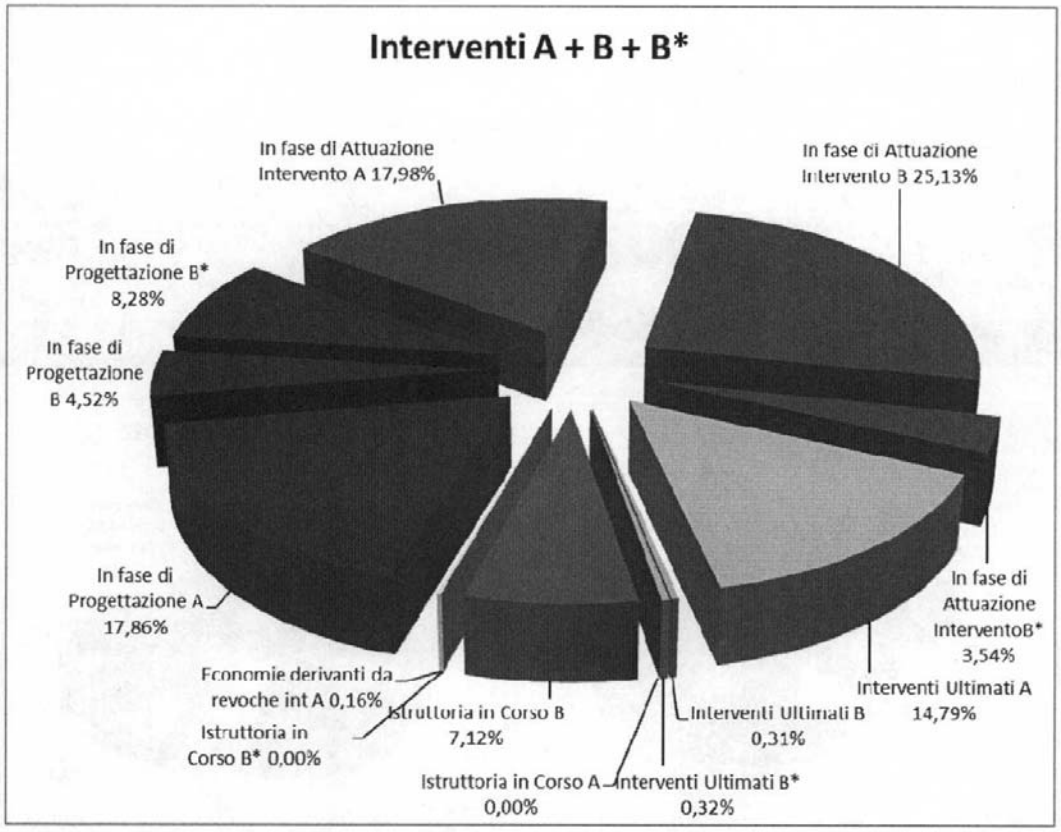

Viene infine qui di seguito riportato sia in formato tabellare e grafico tra lo stato dell'arte degli interventi, distinti in base alla copertura finanziaria, tra i dati riportati nella Relazione Annuale del Commissario Straordinario Delegato al 15.12.2011 con i dati risultati a tutt'oggi.

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

REPUBBLICA ITALIANA


Il Commissario Straordinario Delegato


REGIONE SICILIANA

Raffronto per gli Interventi A

N. Interventi	Stato al 15 dicembre 2011	%	€
26	TOTALE Istruttoria in Corso	20,75%	€ 34.339.855,61
44	TOTALE in fase di Progettazione	37,71%	€ 62.400.000,00
20	TOTALE in fase di attuazione intervento	14,03%	€ 23.221.521,00
4	TOTALE interventi Ultimati	27,50%	€ 45.500.000,00

N. Interventi	Stato al 20 dicembre 2012	%	€
0	TOTALE economie da revoche	0,32%	€ 525.906,19
39	TOTALE in fase di Progettazione	35,16%	€ 58.137.013,11
45	TOTALE in fase di attuazione intervento	35,40%	€ 58.538.457,31
10	TOTALE interventi Ultimati	29,12%	€ 48.160.000,00

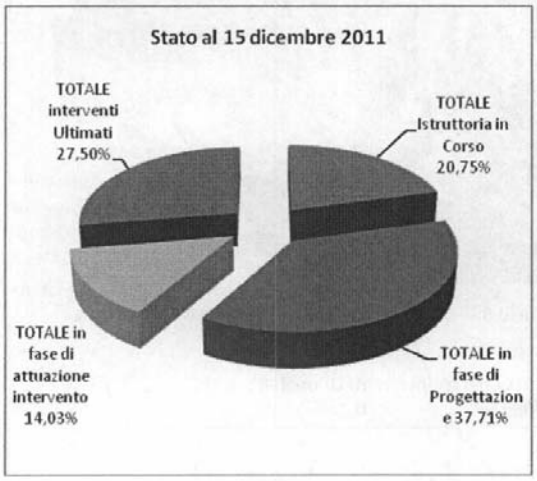

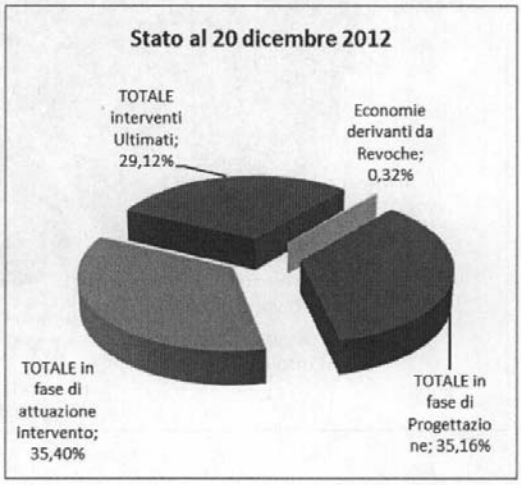

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

REPUBBLICA ITALIANA


Il Commissario Straordinario Delegato

REGIONE SICILIANA

Raffronto per gli Interventi B + B*

N. Interventi	*Stato al 15 dicembre 2011*	*%*	*€*
66	TOTALE interventi in fase di Istruttoria	67,36%	€ 107.864.785,20
4	TOTALE interventi in fase di progettazione	4,59%	€ 7.352.856,00
37	TOTALE interventi in fase di attuazione	28,05%	€ 44.909.344,95
0	Interventi Ultimati	0%	€ -

N. Interventi	*Stato al 20 dicembre 2012*	*%*	*€*
16	TOTALE Istruttoria in Corso	14,46%	€ 23.169.000,00
26	TOTALE in fase di Progettazione	26,01%	€ 41.678.331,45
63	TOTALE in fase di attuazione intervento	58,26%	€ 93.350.996,83
2	TOTALE interventi Ultimati	1,27%	€ 2.028.657,87

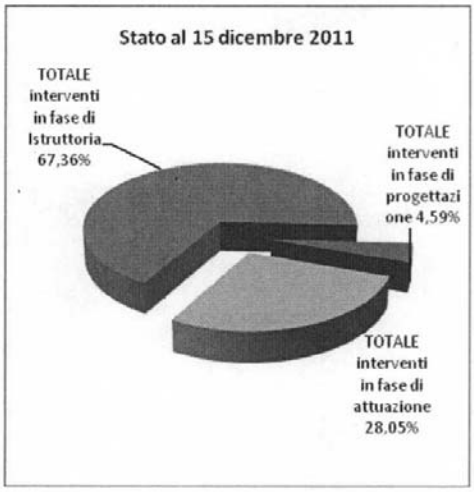



Il Commissario Straordinario Delegato

(*Dott. Maurizio Croce*)

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

Allegati:

Allegato 1 - Quadro riepilogativo degli interventi di cui alle lettere "A" e "B" dell'AdP

Allegato 2 - Quadro riepilogativo delle gare espletate per gli interventi di cui alla lettera "A" dell'AdP

Allegato 3 - Quadro riepilogativo degli interventi di cui alla lettera "A" dell'AdP

Allegato 4 - Stato dell'arte degli interventi identificati con la lettera A in fase di attuazione e relative schede lavori

Allegato 5 - Quadro riepilogativo degli interventi di cui alla lettera "B" dell'AdP.

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo
Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

Allegato 1

QUADRO RIEPILOGATIVO

degli interventi di cui all'elenco "A" e "B" dell'AdP

Il Commissario Straordinario Delegato
(*Dott. Maurizio Croce*)

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell' Accordo di Programma siglato il 20.03.2010"
Ex D.P.C.M. 19 dicembre 2019

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV	COD	COMUNE	ZONIZ. ATTUAZ.	COMITATO	TITOLO	IMPORTO AAP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	CUP	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO PROG/ESE	AFFIDAMENTO LAVORI: Impresa	AFFIDAMENTO LAVORI: Data inizio lavori	DECRETO FINANZIAMENTO: n. e data	DECRETO FINANZIAMENTO: Importo	RUP
AG	001	Agrigento	A	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Interventi di messa in sicurezza del centro abitato	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	La progettazione è affidata al Genio Civile di Agrigento il quale, a seguito di gara del 25 nov 2011, ha affidato i lavori relativi alle indagini preliminari_finanziate con Decreto Commissariale n. 394 del 21/11/2011 e ad oggi concluse. Con nota acquisita al prot. n. 1493 del 30/04/2012, il GC AG, a seguito di sopralluogo congiunto a ridosso del marciapiede in via Empedocle (Area di progetto), in corrispondenza dell'antica chiesa di S. Lucia, ha richiesto un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi e pianificare gli interventi da porre in essere. Con nota acquisita al prot. n. 4468 del 05/11/2012, il GC di Ag, comunica all'Ufficio del Commissario che a seguito del violento nubifragio verificatosi nella giornata del 04/10/2012 è stato necessario risedere la scelta progettuale, nonché ad adeguarla alla nuova situazione determinatasi. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4623 del 09/11/2012 il GC ha trasmesso copia del progetto. Con Decreto Commissariale n. 438 del 23/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dei Lavori di somma urgenza. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 680 del 10/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di somma urgenza per il consolidamento della parete murarie prospiciente la via delle Torri. Il Contratto è stato stipulato 11/12/2012 e la consegna dei lavori è avvenuta in data 13/12/2012.	AVVIATI LAVORI	SC Ag	SEGNERO Srl	CO.GE.MA.CA. S.r.l. (Lavori di somma urgenza)	13/12/2012	n.639 del 22/11/2012	683.300,00	Ing. Domenico Armenio (Ing. Capo GC AG)
AG	002	Caltabellotta	B		Interventi di consolidamento del centro abitato "Consolidamento a Monte e a Valle della Via Colonello Vita- 3°stralcio funzionale esecutivo"	€ 600.000,00	€ 600.000,00	Emesso nuovo Decreto di finanziamento nell'agosto del 2011, il Primo Decreto è stato annullato a seguito di un ribasso della Corte dei Conti relativo ai certificati emessi per l'approvazione tecnica. I lavori sono stati aggiudicati in data 02.04.2012 all'impresa Anzalone Luigi & Co. - San Cataldo che ha offerto un ribasso del 24,7985% e i lavori sono stati consegnati il 2/05/2012. E' ancora in corso di stipula il contratto.	Avviati Lavori			Anzalone Luigi & Co.	41.081,00	N. 624 DEL 18/06/2011	600.000,00	
AG	003	Cammarata	B	COMITATO 24 FEB 2011	Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	La Progettazione è affidata al Genio Civile di Agrigento. Il 30/1/2013 affidate indagini geognostiche. Nel corso del cantiere del 24 febbraio l'intervento tramite della lettera A alla Lettera B. I lavori sovvestati aggiudicati all'impresa Panepinto Costruzioni s.r.l con un ribasso del 26,938%	Affidamento Lavori		Genio Civile	Panepinto Costruzioni s.r.l.	-	139 DEL 9 MARZO 2012	1.050.000,00	
AG	004	Catolica Eraclea	B*	COMITATO 21 OTT 2010	Mitigazione Rischio Idrogeologico - Crolli Costone Roccioso Eraclea Minoa	€ 1.460.000,00	€ 1.460.000,00	Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2915 del 22/06/2012 l'APTA Serr. 3 comunica all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato che è stato individuato come Ente beneficiario del finanziamento relativo all'intervento. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2815 del 20/07/2012 l'AATO Serr. 3 trasmette due copie del progetto e la documentazione amministrativa trasmessa dal Comune (omissis) il progetto Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati invitati dal Commissario straordinario che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto	Progettazione in corso	Comune	#			-	-	-	
AG	005	Cianciana	B	COMITATO 15 SETT 2011	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del versante ovest del centro abitato	€ 942.838,00	€ 855.618,05	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 194 del 3/4/2011 per un importo di euro 855.618,05. La procedura di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 04/09/2012 con un ribasso del 23,2408% alla Torsten Costruzioni. Contratto sottoscritto il 30/03/2012. Lavori avviati in data 31/05/2012	Avviati Lavori			Torsten Costruzioni	31/05/12	N. 194 DEL 01/04/2011	855.618,05	
AG	006	Favara	A	-	Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	La progettazione è stata affidata al Genio Civile di AG che, con nota prot. 19174 del 5/10/2011, acquisita al prot. n. 2008 in pari data, ha trasmesso il Progetto Definitivo dell'intervento. In sede di Conferenza dei Servizi del 31/01/2012 sono stati acquisiti i pareri necessari per l'approvazione del progetto. Con nota prot. 131208 del 28/03/2012, acquisita al prot. n. 2132 del 03/04/2012 il GC di Ag ha trasmesso il progetto esecutivo. Con Decreto Commissariale n. 175 del 18 aprile 2012 è è provveduto a finanziare l'intervento. Con Decreto Commissariale n. 351 del 30/05/2012 è avvenuta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'impresa BOLLITA COSTRUZIONI Soc. Coop. Con nota acquisita agli atti al prot. n.3050 del 27/06/2012 il GC di Ag comunica che in data 06/06/2012 è stato redatto il verbale di immissione in possesso delle aree da espropriare e contestualmente è stato redatto il verbale sulle verifiche per l'immediata esecuzione dei lavori. In data 03/07/2012 è stato stipulato il contratto con l'impresa Bollita Costruzioni Soc. Coop.; In date 21/08/2012 è avvenuta la consegna dei lavori, che dovranno concludersi entro il 21/08/2013.	AVVIATI LAVORI	SC Ag	IMGA s.a.s	BOLLITA COSTRUZIONI Soc. Coop	21/08/2012	n.175 del 18/04/2012	1.500.000,00	Ing. Domenico Armenio (Ing. Capo GC Ag)
AG	007	Lucca Sicula	A	-	Opere di consolidamento centro urbano	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	La Progettazione è stata affidata al Comune di Lucca Sicula. Con Decreto Commissariale n. 34 del 26/11/2013 è stato nominato R.U.P. per la procedure espropriative l'Dirigente dell'UTC del Comune di Lucca Sicula. Ad oggi sono in corso le procedure di esproprio e la determinazione dell'indennità di Espropriazione per la definizione della quale l'Comune , con nota prot. n. 169 del 12/01/2012, acquisita al prot. n. 101 del 17/01/2013, ha richiesto alla Commissione per la Determinazione dell'Indennità di Espropriazione il parere ai sensi dell'art. 41 DPR 327/2011, già pervenuto al Comune di Lucca Sicula. L'U.T.C. sta redigendo il progetto esecutivo	PROGETTAZIONE IN CORSO	Comune Geom. Sebastio Sorrentino (resp UTC)	-	-	-	-	-	Dott. Giuseppe Lombardo
AG	008	Montallegro	B	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento della parete Est del Monte Lupo sovrastante il centro abitato	€ 2.467.326,00	€ 1.435.536,03	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 196 del 13/4/2011 per un importo di euro 1.435.536,03. A seguito di procedura di gara i lavori sono stati affidati alla BCI COSTRUZIONI S.R.L. C/da Cerì Misilmeri. Il Contratto è stato stipulato in data 08/06/2012 e i lavori avviati in data 18/06/2012	Avviati Lavori			BCI COSTRUZIONI S.R.L.	18/06/12	N. 196 DEL 13/04/2011	1.435.536,03	
AG	009	Ravanusa	B	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento zona Est Centro abitato	€ 1.000.000,00	€ 996.908,73	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 28 del 2/1/2011 per un importo di euro 996.908,73. Lavori aggiudicati con un Ribasso pari a al 22,197%. Sono in corso le attività necessarie per la stipula del contratto	Affidamento Lavori			Leanlar Srl	-	N. 28 DEL 02/02/2011	996.908,73	

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
per l'attuazione degli interventi nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 20.02.2009
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010
ELENCO INTERVENTI n. 8

PROG	CODICE	ITINERARIO	TIPO LOTTO	ITINERARIO	TITOLO	SAL/APQ AdP	SAL/PO Asse/Linea	SAL	ASSEGNAZIONE PROGET.	AFFIDAMENTO REGIONE	AFFIDAMENTO ENTE	RELATIVO FINANZIAMENTO		RUP
AG	010	Ribera	A	COMITATO 24 FEB 2011	Completamento consolidamento centro storico zona grande	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	ASSEGUITI PAGAMENTI PROGETTAZIONE	Ing. N.Vella, Arch. L. Puzzolo, Geom. G. Ferrara (atteso d.d.g. N. 1152 del 19/07/2012 di revoca delle rate non ancora pervenute alla progettazione esecutiva)					Ing. Giuseppe La Placa
AG	011	Ribera	A	-	Opere di consolidamento centro urbano	€ 939.021,90	€ 939.021,90	AVVIATI AVVIO?	1041 Ing	-	C.& A. Srl.	26/06/2012	n.33 - 8/1/2011	Arch. Genua Palumbo (a seguito revoca dell'Ing. Cimino)
AG	012	Sambuca di Sicilia	B	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento delle cavità sotterranee con sostegno metallici e in c.a. - Ristrutturazione - Quartiere "Saraceno"	€ 1.025.000,00	€ 1.025.000,00	Affidamento Lavori			ATI Jakmar s.r.l.	-	965 6-feb-12	991.047,87
AG	013	San Giovanni Gemini	B	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 2.500.000,00 € 2.474.826,76	€ 2.474.826,76	Affidamento Lavori			Mas Giovanni Jet	-	N. 55 DEL 10/02/2011	2.474.826,76
AG	014	Santa Stefano di Quisquina	B*	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale	€ 2.968.195,13 €	€ 2.968.195,13	PROGETTO BIOSYSTEM ATTUA MARA	Comune	€				
AG	015	Sciacca	A	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 24 MAR 2011	Opere di consolidamento pendici Colli di Voltea	€ 800.000,00 € 800.000,00	€ 800.000,00	ATTESA APERTURA PLICHI PROGETTO	IC.4g					
AG	174	Cattolica Eraclea	B*	COMITATO 24 MAR 2011	Drenaggio e consolidamento versante Ovest	€ 1.170.000,00 € 1.170.968,00	€ 1.170.968,00	Progettazione in corso	PROPOSTA	€				

Pagina 1 di 23

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 15 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV	COD	COMUNE	FONTE ATTUAZ.	COMITATO	OGGETTO	IMPORTO ADP	IMPORTO Rimodulato	STATO DI FATTO	SAL	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI: Impresa	AFFIDAMENTO LAVORI: data inizio lavori	DECRETO DI FINANZIAMENTO: n. e data	DECRETO DI FINANZIAMENTO: importo	RUP
AG	174_Int	Naro	B	AdP Integrativo	Lavori di consolidamento e salvaguardia e protezione del centro abitato	€ 1.067.000,00	€ 1.067.000,00	*l'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di gara*	Affidamento Lavori					N. 211 del 05/04/2012	996.000,00	
AG	175_Int	Palma di Montechiaro	b	AdP Integrativo	Lavori di rinaturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	*L'intervento è stato finanziato*	Affidamento Lavori					N. 180 del 06/08/2012	1.762.529,93	
CL	016	Acquaviva Platani	b	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento della parete rocciosa a monte della Via Marino Mistretta	€ 1.000.000,00	€ 986.525,06	*L'intervento è stato finanziato con D.D.S. n. 185 del 26/5/2011 per un importo di euro 986.525,06. Il contratto è stato stipulato in data 2/05/2012 ed i lavori sono iniziati il 26/07/2012*	Avviati Lavori					N. 185 DEL 26/05/2011	986.525,06	
CL	017	Butera	B*	-	Consolidamento centro abitato	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	*Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2564 del 27/09/2012, l'ARTA Serv.2 comunicò al Comune di Butera che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, mediante a trasmettere al C.S. tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.* *A seguito della nota di sollecito da parte del Commissario, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3065 del 08.08.2012, trasmette copia del progetto ed elenco della documentazione amministrativa.* *Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.* *Con nota prot. n. 1254 del 15/05/2012 e n.2934 del 30/05/2012, il Commissario sollecita il Comune alla trasmissione degli elaborati progettuali, integrati che richiese di cui alla riunione del 07/05/12.* *Il comune, con nota acquisita al prot. n. 28/12 del 26/07/2012, ri-inoltrò il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati richiesti.* *Il progetto generale è trasmesso dal Comune, sia all'ARTA (Serv. 1) che all'Ufficio del Commissario delegato con nota prot. n. 2917 del 02/08/2012.* *Il RUP, in data 14/09/2012, trasmette all'Ufficio del Commissario copia dell'avviso della pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 35 del 31.08.2012 dello verifica di assoggettabilità a V.I.A.* *A seguito della CdS del 07/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari relativi al progetto generale, ad eccezione del parere dell'ARTA Serv. 3, che si riserva di produrre entro "120 giorni le problematiche ambientali connesse ai pericolosità geologica per cause profonde, per il quale si rende necessaria uno studio investigativo e di monitoraggio.* *In data 14/11/2012 con nota prot.n. 4408, l'Arta (Serv. 3) esprime parere favorevole, con*	Progettazione in corso	Comune						Geom. Filippo Tudisi
CL	018	Butera	B*	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento puntuali del centro Storico	€ 800.000,00	€ 800.000,00	*A seguito della nota di sollecito da parte del Commissario, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3065 del 08.08.2012, trasmette copia del progetto, corredato dalla documentazione amministrativa.* *Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.* *In ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 marzo 2011, l'intervento è transato all'ARTA (4).* *Durante la riunione del 07/05/2012, si richiedeva indicazioni al Comune in merito ad alcuni adeguamenti del progetto.* *L'ARTA, con nota acquisita al prot. n.3538 del 15/05/2012, trasmette al Commissario, individuato come Ente Beneficiario, tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'intervento.* *Con nota prot. n. 1254 del 15/05/2012 e n.2934 del 30/05/2012, il Commissario sollecita il Comune alla trasmissione degli elaborati progettuali, integrati che richiese di cui alla riunione del 07/05/12.* *Il comune, con nota acquisita al prot. n. 28/12 del 26/07/2012, ri-inoltrò il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati richiesti.* *Il progetto generale è trasmesso dal Comune, sia all'ARTA (Serv. 1) che all'Ufficio del Commissario delegato con nota prot. n. 2917 del 02/08/2012.* *Il RUP, in data 14/09/2012, trasmette all'Ufficio del Commissario copia dell'avviso della pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 35 del 31.08.2012 dello verifica di assoggettabilità a V.I.A.* *A seguito della CdS del 07/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari relativi al progetto generale, ad eccezione del parere dell'ARTA Serv. 3, che si riserva di produrre entro "120 giorni le problematiche ambientali connesse ai pericolosità geologica per cause profonde, per il quale si rende necessaria uno studio investigativo e di monitoraggio.* *In data 14/11/2012 con nota prot.n. 4408, l'Arta (Serv. 3) esprime parere favorevole, con*	Progettazione in corso	Comune						Geom. Filippo Tudisi
CL	019	Caltanissetta	B*	COMITATO 14 MARZO 2011	Consolidamento, bonifica e canalizzazione del versante sud della collina Sant'Anna, centro storico e quartiere Saccara, con opere di ingegneria naturalistica, rimboschimento e trattamento dei versanti dell'abitato	€ 4.140.000,00	€ 4.140.000,00	*Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2564 del 27/09/2012, l'ARTA Serv.2 comunicò al Comune di Butera che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, mediante a trasmettere al C.S. tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.* *A seguito della nota di sollecito da parte del Commissario, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3065 del 08.08.2012, trasmette copia del progetto ed elenco della documentazione amministrativa.* *Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.* *Con nota prot. n. 1254 del 15/05/2012 e n.2934 del 30/05/2012, il Commissario sollecita il Comune alla trasmissione degli elaborati progettuali, integrati che richiese di cui alla riunione del 07/05/12.* *Il comune, con nota acquisita al prot. n. 28/12 del 26/07/2012, ri-inoltrò il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati richiesti.* *Il progetto generale è trasmesso dal Comune, sia all'ARTA (Serv. 1) che all'Ufficio del Commissario delegato con nota prot. n. 2917 del 02/08/2012.* *Il RUP, in data 14/09/2012, trasmette all'Ufficio del Commissario copia dell'avviso della pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 35 del 31.08.2012 dello verifica di assoggettabilità a V.I.A.* *A seguito della CdS del 07/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari relativi al progetto generale, ad eccezione del parere dell'ARTA Serv. 3, che si riserva di produrre entro "120 giorni le problematiche ambientali connesse ai pericolosità geologica per cause profonde, per il quale si rende necessaria uno studio investigativo e di monitoraggio.* *In data 14/11/2012 con nota prot.n. 4408, l'Arta (Serv. 3) esprime parere favorevole, con*	PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	Comune						Arch. Armando Junzo Dirigente dell'UTC
CL	020	Serradifalco	A	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Progetto per lo studio ed il monitoraggio dell'area a rischio "R4" interessata da cavità sotterranee e perimetrata con il dissesto 063-25R-082 nel comune di Serradifalco (CL)	€ 1.700.000,00	€ -	*Nel corso della riunione del 25/09/2011 il Comitato, su proposta del Commissario, dispone la revoca del finanziamento e contestualmente incarica il Commissario della predisposizione di un piano di monitoraggio, da sottoporre all'ARTA, per il relativo finanziamento a gravare sulla linea 2.3.1.1 PO FERS 2007-2013. Il Comitato si riserva la praticabilità di rivitalizzare il progetto a seguito dell'avvenuto monitoraggio.* *Il Commissario, con nota prot. 1828 del 21 sol 2011, incarica SVIITALIA della redazione e realizzazione del piano di monitoraggio dell'area R4 ricadente nel centro abitato del Comune di Serradifalco.* *Con nota prot n. 2160 del 27/06/2012 il Commissario affida a codesta società specializzata geologica necessaria all'attività di progettazione della studio e monitoraggio dell'intervento ed un finanziamento della Struttura.* *Con nota acquisita agli atti al prot.n.3182 del 18/07/2012, SVI trasmette gli elaborati progettuali per la "STUDIO ED IL MONITORAGGIO DELL'AREA A RISCHIO "R4" INTERESSATA DA CAVITA' SOTTERRANEE E PERIMETRATA CON IL CODICE DI DISSESTO PAI 063-25R-082 NEL COMUNE DI SERRADIFALCO", trasmessi dal Commissario all'ARTA Serv.3 con nota prot. n. 2807 del 26/07/2012*	INTERVENTO REVOCATO	INVITALIA						
CT	021	Acicatena	B	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento del centro abitato Loc. Vampolieri	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00	*Progetto ancora non pervenuto*	Progetto ancora non pervenuto							
CT	022	Bronte	A	-	Consolidamento frana	€ 1.092.500,00	€ 1.092.500,00	*Con nota prot. n. 559 del 30/01/2010 il Commissario autorizza il Comune di Bronte a redigere il progetto esecutivo.* *Il Comune trasmette il Progetto esecutivo con nota acquisita agli atti al n.2892 del 19/12/2011.* *A seguito di incontri e colloqui, il Commissario con nota protocollo n. 2182 del 24/08/2012 sollecita il comune a trasmettere il progetto esecutivo, debitamente munito dei pareri e documenti economici.* *Il RUP con nota counta al protocollo con n. 3577 del 27/08/2012, trasmette copia del progetto esecutivo con le integrazioni richieste, già inviato dallo stesso all'ARTA Serv. 3 per il relativo parere di competenza in quanto l'area oggetto dell'intervento è stata classificata R4 giusto Decreto n° 296/83 del 04.07.2008 (prot. n. 1376 del 27/06/2012).* *In sede della Conferenza dei Servizi del 18/07/2012, essendo stati acquisiti tutti i pareri e/o atti autorizzativi per la realizzazione dell'intervento il Comune comunica di aver già avviato le procedure espropriative.*	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	COMUNE					€ -	Geom. Santo Saitta (UTC)
CT	023	Calatabiano	A	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide - Fosterla	€ 250.000,00	€ 250.000,00	*A seguito del Comitato del 21/10/2010 l'intervento diventa di competenza dell'ARTA, alla quale si trasmette tutta la documentazione.* *Nel corso del Comitato del 24/01/2011 l'intervento transita nuovamente sotto la copertura finanziaria ministeriale.* *A seguito della rinuncia del Comune, la Progettazione viene affidata ad INVITALIA con nota prot. n.867 del 28/02/2012.* *Con nota protocollo n. 5295 del 11/12/2012 la Società Invitalia trasmette all'Ufficio del Commissario l'progetto esecutivo.*	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	INVITALIA					€ -	Dott. Gaetano Cani

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell' Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 19 dicembre 2019

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI 1 e 2

Provincia	Codice	Comune	Fonte attuale	Stralcio	Titolo	Importo ALIF	Importo Rimodulato	Stato Intervento	CUP	Affidamento Progett.	Affidamento Indagini	Affidamento Lavori: Impresa	Affidamento Lavori: Aut.to Amm.ne Lavori	Decreto di Finanziamento: N. e data	Decreto di Finanziamento: Importo	Rup
CT	024	Castel di Iudica	A	-	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	*AFFIDAMENTO LAVORI*	COMUNE	-	-	-	n. 640 del 13/11/2012	€ 3.000.000,00	Geom. Domenico Faranda
CT	025	Giarre	A	-	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti - Fraz. S. Maria la Strada	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	*PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI*	COMUNE	-	-	-	-	€ -	Geom. Sebastiano D'Anna Capo Servizio Progettazione della U3A Area
CT	026	Giarre	A	-	Realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - Zona Cadavolpe	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	*PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA*	COMUNE	-	-	-	-	€ -	Geom. Sebastiano D'Anna Capo Servizio Progettazione della U3A Area
CT	027	Grammichele	A	-	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B.Buozzi	€ 700.000,00	€ 700.000,00	*PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA*	COMUNE	-	-	-	D.C. n. 684 del 10/12/2012	€ 700.000,00	Geom. Michele Iudica UTC
CT	028	Licodia Eubea	B*	-	Consolidamento Via Duca degli Abruzzi	€ 880.000,00	€ 880.000,00	*La progettazione è in capo al Comune. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3280 del 22/05/2013 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario, in quanto Ente Beneficiario il progetto, la documentazione tecnica e amministrativa inerente all'intervento ed inoltre il Canone è nuovamente in Ufficio per Dichiarazione. Con nota protocollo n. 30/1 del 03/10/2013 il RUP trasmette il progetto esecutivo aggiornato.*	*PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI*	COMUNE	-	-	-	€ -	Arch. Salvatore Lentini
CT	029	Maniace	B	-	Consolidamento Sponda destra T.te Martello	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	*Progetto ancora non pervenuto. In attesa procedure ambientali.*	*Progetto ancora non pervenuto*							
CT	030	Maniace	B	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di regimazione idraulica e consolidamento delle scarpate - C/da Galatese-Petroalno	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	*Istruttoria in corso*	*Istruttoria Progetto*							
CT	031	Misterbianco	A	-	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo	€ 500.000,00	€ 500.000,00	*A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 248 del 03/10/2013 è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il Contratto è stato stipulato il 15/11/2013. I lavori sono stati consegnati il 7/11/2011 e sono stati ultimati in data25/05/2012. Durante lo svolgimento delle attività si è resa necessaria una Perizia di Varainte e Suppletiva e di conseguenza una rimodulazione del quadro economico dell'intervento. Il Commissario ha preso atto della perizia con Decreto Commissariale n. 371 del 18/07/2012. Con nota protocollo n. 3036 del 03/08/2012 l'Ing. Giovanna Barreto trasmette la relazione-certificato di collaudo statico.*	*LAVORI ULTIMATI*	DIRPC CT (Dott. Aldo Borina, Arch. Fabio Bonzi, Arch. Paolo Licandri)	SIGMA srl	Pizzini Pietro	07/11/2011	Decreto Commissariale n. 130 del 15/7/2011	€ 500.000,00	Dott. Aldo Borina(DIRPC)
CT	032	Motta Sant'Anastasia	B		Opere di consolidamento del centro abitato: Area Nord Est	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	*l'intervento è stato finanziato la procedura di gara sono state avviate nel mese di dicembre 2012*	*Affidamento Lavori*							

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.01.2010"
Ex D.P.C.M. 19 dicembre 2008

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV	COD	COMUNE	FONTE ATTUAZ	COMITATO	STUDIO	IMPORTO da AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DeI FATTI	SAL	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI		DECRETO DI FINANZIAMENTO		RUP
												Progetto	Esecuzione lavori	n. e data	importo	
CT	053	Piedimonte Etneo	A	-	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Frac. Presa	€ 500.000,00	€ 500.000,00	La progettazione è stata affidata al DRPC di CT che ha trasmesso il progetto in data 22/09/2011. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 309 del 03/11/2011 è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il Contratto è stato stipulato in data 18/01/2012. I lavori sono stati avviati in data 25/12/2012 e la data di ultimazione degli stessi come da contratto doveva avvenire entro il 22/07/2012, tuttavia, con nota acquisita al prot. n. 2921 del 31/03/2012, il DRPC di Catania trasmette la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal direttore dei lavori ed il parere favorevole del RUP. Con nota prot.n. 8014 del 31.08.2012 il Dirigente del Servizio del DRPC di Catania trasmette all'Ufficio del Commissario copia degli Ordini di Servizio del Direttore Lavori e del Verbale di Consegna della Perizia di Variante e Suppletiva Il Commissario notifica il Decreto Commissariale n. 409 del 02/08/2012 relativo l'approvazione della Perizia di variante e suppletiva n. 1 dell'intervento. Con nota prot. n. 57977 del 30/08/2012 acquisita agli atti al prot. n. 3205 di pari data, il Rup comunica che l'impresa esecutrice ha ultimato i lavori come accertato dal direttore dei lavori in data 09/08/2012.	LAVORI ULTIMATI	DRPC CT	GEOMERO srl	ARCHEA s.r.l.	25/01/2012	Decreto n. 265 del 07/10/2011	€ 500.000,00	Dott. Aldo Barone (DRPC)
CT	054	Raddusa	A	-	Opere di consolidamento del versante	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 10/07/2011. Il Commissario, con nota prot. 3277 del 26/10/2011, invita il RUP alla trasmissione della documentazione progettuale all'ARTA ai fine di avviare le procedure VIA/VAS; Il Servizio 1 dell'ARTA, con nota assunta al prot. n. 3006 del 23/12/2011, rappresenta la necessità di attivare la procedura relativa alla verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/06 e richiede la documentazione necessaria. A seguito della Conferenza dei Servizi del 26/06/2012, vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione per il parere dell'ARTA Serv.1 VIA/VAS che attende dei chiarimenti sulle scelte progettuali, e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania. Il Servizio 1 dell'ARTA, con nota assunta al prot. n. 2862 del 26/09/2012, comunica la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 152/06 ed esprime dubbi sulle scelte progettuali. Il Comune, ritenuto pertanto di dover modificare le scelte progettuali precedentemente adottate, chiede, con nota acquisita al prot. n. 3254 del 26/08/2012, autorizzazione ad affidare all'esterno gli incarichi di progettazione, studio geologico, indagini geognostiche e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, autorizzazione concessa dal Commissario con nota prot. n. 3390 del 10/09/2012.	ATTESA ADEGUAMENTO PROGETTO	COMUNE	-	-	-	-	-	€ -	Geom. Roberto Antonio La Mastra
CT	055	Raddusa	B	COMITATO 21 OTT 2010	Trincea drenante a monte del centro abitato e paratie di pali	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 158 del 9/3/2012 per un importo di euro 2.389.815,78.	Intervento finanziato					n. 158 del 9-mar-12	2.389.815,78	
CT	056	Ramacca	A	-	Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato	€ 1.300.000,00	€ 1.200.000,00	La progettazione è stata affidata ad Invitalia. A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 224 del 14/05/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di indagini Preliminari alla progettazione. A seguito della restituzione delle risultanze delle indagini, con nota acquisita al prot.n. 95 del 18/01/2012 la Soc. INVITALIA ha trasmesso il progetto esecutivo. Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 89 del 01/03/2012. Con Decreto n. 135 del 26/03/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. In data 02/04/2012 si è emesso Decreto per l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree interessate dall'intervento. Il contratto è stato firmato in data 30/05/2012 e i lavori hanno avuto inizio in data 08/06/2012. Con Decreto n. 458 del 12/09/2012 si è preso atto della Perizia di Variante n. 1 migliorativa ed in diminuzione. A seguito di comunicazione del RUP in merito ad una smottamento della parte superficiale del terreno con fuoriuscita di acqua di ignota provenienza, il Commissario, con nota prot. n. 4532 del 04/07/2012, richiede ad Invitalia di predisporre un piano di indagini integrative, successivamente acquisito al prot. n.2933 del 09/07/2012. Le indagini integrative sono state affidate dal RUP all'Dott. Domenico Boso come comunicato con nota acquisita agli atti al prot. n. 3053 del 06/08/2012. A seguito delle indagini e dalla nota tecnica integrativa del Geologo Dott. Boso, dalla quale si rileva "la necessità e l'urgenza di interventi invasi a stabilizzare il pendio ed evitare danni", il Comune ha chiesto di utilizzare le economie risultanti dal ribasso d'asta per la risoluzione della problematica. Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 4870 del 13/11/2012 ha trasmesso copia della perizia di variante e suppletiva n.2 di cui il Commissario ha preso atto con D. C. n. 810 del 19/11/2012.	AVVIATI LAVORI	INVITALIA	I.GE.M. INDAGINI GEOLOGICHE MERIDIONALI s.r.l.	CO.S.E.I. srl	08/06/2012	Decreto Commissariale n. 89 del 01/03/2012	€ 1.176.008,88	Geom.Salvatore Sottosanti (UTC)
CT	057	Randazzo	A	COMITATO 14 FEB 2011	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 960.000,00	€ 960.000,00	A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 339 del 24/11/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 26/12/2011. La consegna dei lavori è avvenuta il 20/12/2011 e la data di ultimazione degli stessi come da contratto doveva avvenire entro il 18/04/2012. A seguito dei verificarsi di fenomeni di scendicione del cemento Annunziata con possibili ripercussioni sul buon andamento dei lavori, emerge la necessità di una Perizia di Variante e suppletiva trasmessa dal DL con nota acquisita agli atti al prot. 1387 del 22/04/2012, per la sua approvazione si è tenuta apposita Conferenza dei Servizi in data 16.05.2012. La PVS viene approvata con Decreto Commissariale n.196 del 24/05/2012 ed a seguito della rimodulazione dei tempi previsti per la realizzazione dei lavori il nuova termine di ultimazione era fissato al 09/09/2012. I lavori si sono sospesi in data 03/09/2012.	LAVORI ULTIMATI	COMUNE	-	GOTECH SRL	consegna lavori 20 dicembre 2011	197 - 23/8/2011	960.000	Ing. Domenico Imbroglia
CT	058	Santa Venerina	B*	-	Opere di consolidamento del centro abitato Loc. Badia-T. Fags	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	La progettazione è stata redatta dal Comune. Con nota acquisita al protocollo al n. 3299 del 26/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Comune/ente in questo Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'intervento ne svolto il Comune è ritenendosi non l'Ufficio del Commissario.	PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	COMUNE						
CT	059	Sant'Agata Li Battiati	B*	-	Opere di consolidamento del centro abitato Loc. Leucatia - Via Etnea	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	La progettazione è stata redatta dal Comune. Con nota acquisita al protocollo al n. 7206 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Comune/ente in questo Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'intervento ne svolto il Comune è ritenendosi non l'Ufficio del Commissario.	PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	COMUNE						

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.08.2010"
Ex O.P.C.M. 16 dicembre 2010

ELENCO INTERVENTI n. 8

PROV	COD	COMUNE	PUNTO ATTUALE	ITEM	STATO	IMPORTO A&P	IMPORTO Beneficiario	STATO DI FATTO	DA	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO ESECUZIONE	AFFIDAMENTO LAVORI		ESECUZIONE		RUP
												Progetto	Data inizio lavori	n. e data	Importo	
CT	040	Trecastagni	B	COMITATO 15 SETT 2011	Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 460.000,00	€ 446.849,79	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 251 del 18/4/2011 per un importo di euro 446.849,79, ed avendo l'ufficio espletato la procedura di gara con verbale del 24/04/2012 e l'aggiudicazione definitiva con D.D.S. n. 1232/2012 con un ribasso del 24,041%. L'intervento è stato ammesso in data 30/05/2012 e i lavori sono stati avviati il 08/06/2012.	Avviati lavori			ATI Costruzioni Luigi Rosaulo Costruzioni	03/05/12	N. 25 DEL 18/04/2011	446.849,79	
CT	176_int	Santa Ilio	B	AdP Integrativo	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	Progetto non pervenuto	Progetto inizio non pervenuto							
EN	041	Barrafranca	B	COMITATO 15 SETT 2011	Mitigazione del rischio zona Bivio Cutrea	€ 1.900.000,00	€ 1.868.973,06	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 289 del 5/5/2011 per un importo di euro 1.868.973,06.	Iniziavvio/Avviato			Sesa Civis		N. 289 DEL 04/04/2011	1.868.973,06	
EN	042	Centuripe	A	COMITATO DEL 24 FEB 2011	Completamento consolidamento pendici sul lato di Mt. Calvario	€ 770.000,00	770.000,00	Gli progettisti e ditta affidata dell'Ufficio di Centuripe ed Ufficio del Commissario hanno sottoscritto il verbale di consegna lavori in data 19/10/2012 e i lavori hanno preso il via il 22/10/2012. A seguito delle CDS del 08/05/2012 e 25/07/2012 (Rif. Provvedimento Direttore di Lavoro e Validazione e Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva) è stata approvata la perizia di variante e suppletiva e l'intervento è stato ammesso con Decreto Commissariale n. 1007 del 13/12/2012 e stata finanziata l'intervento.	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	COMUNE	-	-	-	n. 663 del 13/02/2011	770.000,00	Geom. Salvatore Di Benedetto
EN	043	Gagliano Castelferrato	B	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento centro abitato	€ 1.560.000,00	€ 1.557.281,40	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 251 del 18/4/2011 per un importo di euro 1.557.281,40 ed avendo l'ufficio espletato la procedura di gara con verbale del 19/05/2012 e l'aggiudicazione definitiva con D.D.S. n. 1232/2012 con un ribasso del 24,041%. L'intervento è stato ammesso in data 30/08/2012 e i lavori sono stati avviati il 10/09/2012. Durante l'esecuzione dei lavori sopravvenivano delle prescrizioni a cui l'impresa si uniformava e quindi si richiedeva una perizia di variante e suppletiva.	Concreto esecutivi					N. 335 DEL 14/04/2011	1.557.281,40	
EN	044	Gagliano Castelferrato	A	-	Lavori di messa in sicurezza e drenaggio dell'area nord - Colle Vega	€ 800.000,00	800.000,00	Gli progettisti dell'intervento è stato affidato all'ANTEA S.p.A. A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 141 del 22/02/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva alla ditta risultata avere presentato la migliore offerta. A seguito alle varie consegne definitive(due delle indagini geognostiche che del successivi sopralluoghi effettuati, sono stati riscontrati delle problematiche che hanno reso necessario la redazione di una variante progettuale per un importo di questo previsto dall'Atto a prima visione. Alla luce delle criticità emerse, con nota del Commissario n. 1940 del 08/11/2013, sono stati richiesti i pareri degli Enti interessati, il cui rilascio ha reso necessario l'espletamento di una procedura di gara, con Decreto n. 283 del 02/14/2013. Il Progetto esecutivo è stato trasmesso da ANTEA con nota acquisita al prot. n. 179 del 08/01/2014 e successivamente validato dal RUP in data 10/01/2014 e dal Progettista incaricato in data 13/01/2014 e successivamente approvato con Decreto Commissariale n. 1 del 14/01/2014. A seguito della determinazione del Comitato paritetico nasce pertanto la procedura di gara. Il Comune trasmetta la nota prot. n. 42685 del 19/05/2012 dell'ATEA Spa, il cui viene richiesto il nulla osta per l'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta Costruzioni Generali Rio s.r.l. risultata del Commissario, con nota prot. n. 3067 del 07.08.13, al Comitato di indirizzo e Controllo del Ministero.	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	INVITALIA	Sia concesso con ottenimento lin.	-	-	-	-	Geom. Michele Cannarsa
EN	45_1	Leonforte	B	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza Monte Cerraglione - Zona sopraelevata Scuola Verga	€ 200.000,00	400.000,00	Progetto esecutivo non pervenuto Nel "Contratto di indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2012 l'intervento originario dell'OPCM è stato suddiviso in 2 stralci funzionali Verga / via Trieste) e è previsto di completare la via Trieste del Comune e di finanziare solo lo stralcio relativo alla scuola Verga	Progetto assente non pervenuto							
EN	45_2	Leonforte	B	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza Monte Cerraglione - Zona sopraelevata via via Trieste	€ 200.000,00	-	Progetto esecutivo non pervenuto Nel "Contratto di indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2012 l'intervento originario dell'OPCM è stato suddiviso in 2 stralci funzionali Verga / via Trieste) e è previsto di completare la via Trieste del Comune e di finanziare solo lo stralcio relativo alla scuola Verga	Progetto assente non pervenuto							
EN	046	Piazza Armerina	B	COMITATO 15 SETT 2011	Interventi nel quartiere Iolo	€ 1.130.000,00	1.130.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 27 del 2/2/2011 per un importo di euro 1.130.000,00 ed avendo l'ufficio espletato la procedura di gara con verbale del S.U.C. / Ufficio Tecnico Unico in data 9/3 settembre 2012	Avviati Lavori			Consorzio Colle S.c.a r.l. / Esec. Lavori Consorzio S.I.E. Piana Armerina	05/09/11	N. 27 DEL 02/02/2011	1.130.000,00	
EN	047	Regalbuto	A	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00	1.500.000,00	Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti esterni nominati dall'Amministrazione Comunale di Regalbuto (EN). A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 1132 del 30/12/2013 per la definizione della problematica relativa agli affidamenti degli incarichi in quota parte/esterni all'individuazione dei professionisti esterni nominati dal Comune. Con Decreto Commissariale del 01/08/2012 è stato acquisito il progetto dei professionisti precedentemente nominati dal Comune. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3081 del 07/05/2012, il progetto di progettazione che l'ufficio ha provveduto a trasmettere all'Ufficio del Commissario per la relativa approvazione. Il progetto è stato finanziato con D.D.G. n. 289 del 5/5/2011 per un importo di euro 1.868.973,06.	ACQUISTI AMBIENTI PROGETTAZIONE	COMUNE	-	-	-	-	1.868.973,06	Arch. Vito Palazzolo (Responsabile area tecnica)
EN	175	Barrafranca	A	COMITATO DEL 24 Marzo 2011	Mitigazione rischio idrogeologico (zona a monte dell'intervento già finanziato con Accordo di Programma del 30 marzo 2010)	€ 1.500.000,00	1.500.000,00	Con nota assunta al prot. n. 4207 del 19/12/2012 l'ufficio ha trasmesso il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 1.500.000,00 e validato dal RUP con rapporto conclusivo del 19/12/2012. Il Comune ha trasmesso la nota prot. n. 42685 del 19/05/2012 dell'ATEA Spa, il cui viene richiesto il nulla osta per l'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta Costruzioni Generali Rio s.r.l. risultata aggiudicataria provvisoria, rimodulato ai sensi della legge 18/2012, ed approvato dal Commissario con Decreto n. 352 del 05/12/2012. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 10 del 16/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva alla ditta risultata avere presentato la migliore offerta. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1877 del 04/06/2012, l'ufficio ha trasmesso il progetto esecutivo, rimodulato ai sensi della legge 18/2012, ed approvato dal Commissario con Decreto n. 352 del 05/12/2012. In merito alla nota prot. n. 42207 del 19/12/2012 l'ufficio ha trasmesso il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 1.500.000,00 e validato dal RUP con rapporto conclusivo del 19/12/2012. In data 13/12/2012 è stata trasmessa la nota prot. n. 42207 del 19/12/2012 con la quale l'ufficio ha trasmesso il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 1.500.000,00 e validato dal RUP con rapporto conclusivo del 19/12/2012.	SOSPENSIONE LAVORI	COMUNE	-	SOCIETA' Lavori Publici S.r.l.	21/05/2012	RIA - 5/12/2011	€ 1.500.000,00	Arch. Francesco Costa

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 19 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV	COD.	COMUNE	CONTO ATTUALE	COMITATO	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DI ATTUAZIONE	SAL	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO ESECUZIONE	AFFIDAMENTO LAVORI: PROMOTORE	AFFIDAMENTO LAVORI: RUP di Zona	DECRETO DI FINANZIAMENTO: N. e DATA	DECRETO DI FINANZIAMENTO: Importo	RUP
ME	048	Alcara Li Fusi	B	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento costone roccioso sovrastante Centro Abitato	€ 1.880.000,00	€ 1.880.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 485 del 19/7/2010 per un importo di euro 1.880.000,00. I lavori sono stati aggiudicati in data 31/01/2011 all'impresa Sidati Costruzioni Srl che ha offerto un ribasso del 51,7128%. I lavori sono stati consegnati in data 07/06/2012	Avviati Lavori			Sidati Costruzioni Srl-	07/03/12	N. 485 DEL 19/07/2010	1.880.000,00	
ME	049	Alcara Li Fusi	A	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	Consolidamento area, ripristino cigli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Coppolozzi	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	La progettazione è stata affidata ad invitalia in data 08.03.2011. A seguito di procedura di gara, con Decreto n.104 del 27.06.2013, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari ad oggi rancikus. Il progetto esecutivo è stato consegnato in data 10.10.2011 e finanziato con Decreto n. 392 del 20.12.2011. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 16 del 18/01/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. La consegna dei lavori è avvenuta in data 13.04.2012. Con nota acquisita al prot. n. 3888 del 16/02/2012 il Comune ha chiesto di poter riutilizzare le economie per estendere l'area di intervento. Con nota acquisita al prot. n. 4215 del 22/02/2012, il D.L. certifica l'ultimazione lavori, avvenuta in data 13/10/2012. Con nota prot. n. 5266 del 21/12/2012 il D.L. ha trasmesso al Collaudatore amministrativo e statico la relazione e struttura ultimate e ledubato con le prove di carico sui pali di fondazione.	LAVORI ULTIMATI	INVITALIA	S.G.M. Srl	Sa.Ma srl	13/04/2012	392 - 20/12/2011	€ 834.921,87	Ing. Basilio Sansalvatore (UTC)
ME	050	Alì	B		Opere di salvaguardia centro abitato	€ 900.000,00	€ 900.000,00	Intervento finanziato con D.D.G 163 del 11/03/2012	Intervento finanziato					N. 161 del 13-mar-12	843.098,81	
ME	051	Alì Terme	A	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	Interventi urgenti di consolidamento centro abitato	€ 900.000,00	€ 1.321.010,50	La progettazione è stata affidata all'ORPC di Messina che ha trasmesso il progetto in data 14/11/2011. In sede di Conferenza Servizi del 16/11/2011, il ORPC comunica che - a seguito delle prescrizioni dettate dal GC di Me sul progetto, delle indagini geognostiche e della nuova normativa sismica - il progetto generale ha un costo pari a circa 3.070.000 euro. Il Commissario invita il ORPC a valutare l'opportunità di redigere uno stralcio funzionale ricontrante nell'importo previsto in AdP di euro 900.000. Con nota prot. n. 3045 del 31/12/2011 il ORPC trasmette lo stralcio funzionale del progetto esecutivo, rappresentando l'impossibilità di rimodulare il progetto per un importo inferiore ai euro 1.321.010,50. Con nota prot. n. 333 del 25/01/12, il Commissario trasmette la documentazione relativa allo stralcio funzionale al Comitato di Indirizzo e Controllo, che, nell'ocso dell'incontro del 18/05/2012 dispone l'inserimento dei fondi per l'intervento pari a € 421.780,50, come richiesto dallo stralcio funzionale presentato dal ORPC. Con nota acquisita al prot.n. 3091 del 02/04/2012, il ORPC trasmette la documentazione scorrente il piano di indagini per "Adeguamento del bacino di convogliamento acque". Il MATTM invita RFI ed ARPA ad interfacciarsi con il Commissario per la problematica dei tombini, ed il Commissario, non avendo avuto riscontro, sollecita gli stessi direttamente con nota prot. n. 3499 del 26/06/2012 e nota prot.n. 4720 del 15/11/2012. Con nota acquisita al prot .n. 5042 del 20/11/2012, la Direzione Commerciale ed l'ufficio di rete di RFI comunica l'invenuta inoltre della richiesta all'ufficio RFI competente.	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	ORPC	-	-	-	-	-	€ -	Ing. Bruno Manfrè (ORPC ME)
ME	052	Basicò	A	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011	Drenaggi e opere di convogliamento - C/da Redazzo	€ 300.000,00	€ 1.300.000,00	La progettazione è stata affidata dal Comune a progettista esterno con Determina Sindacale n.22 del 28.04.2012. A seguito dell'acquisizione e della validazione del progetto esecutivo trasmesso, con Decreto n. 68 del 14.02.2012, a cl (nacisca "intervento, e con il successivo Decreto n. 128 del 16.03.2012 si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il contratto è stata firmata in data 04/06/2012. I lavori sono stati avviati in data 30/05/2012 e l'ultimazione dovrà avvenire entro il 28/05/2013.	AVVIATI LAVORI	Dott. Ing. Renato Cilona (Figura esterna)	-	Ltda Lo di lo Dredri	30/05/2012	68 - 14/02/2012	€ 1.291.828,12	Arch. Giuseppe Trifilò (UTC)
ME	053	Brolo	A	-	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - C.da Jannella	€ 3.630.000,00	€ 3.630.000,00	La progettazione esecutiva è stata affidata dal Comune all'UTC con Delibera di G.M. n. 174 del 06.12.2010. Con nota 9225 del 16.06.2011 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo. Con atto n. 110/U...PP. del 23.01.2012 l'UTC nomina un nuovo progettista, che ritiene di dover apportare modifiche al progetto, e chiede la nomina di un Ingegnere Geotecnico di supporto alla progettazione. L'Ufficio del Commissario nomina il RUP con Decreto Commissariale n.47 del 06.02.2012, e l'Ingegnere Geotecnico da affiancare al progettista, con nota prot.n. 343 del 06.02.2012. Il progetto rivisitato è stato trasmesso dal Comune il 16.04.2012. In sede di Conferenza Servizi del 24.04.2012 sono stati acquisiti i pareri degli enti coinvolti e si è provveduto a (finanziare l'intervento con Decreto n. 217 del 24/05/2012 . Con D. C. n. 261 del 07/05/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n.411 del 29/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore dell'impresa GEO PERFORAZIONI S.r.l. Il contratto è stato stipulato in data 26/09/2013 ed i lavori avviati in data 23/10/2012.	AVVIATI LAVORI	UTC	-	Geo Perforazioni srl	431 - 29/08/2012	237 - 24/05/2013	€ 3.630.000,00	Ing. La Placa Giuseppe
ME	054	Capizzi	B	COMITATO 15 SETT 2011	Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 1.200.000,00	€ 1.192.623,56	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 142 del 18/3/2010 per un importo di euro 1.192.623,56. I lavori sono stati aggiudicati in data 07/03/2012 all'impresa Tortsen Costruzioni che ha offerto un ribasso del 35,4253%. Il contratto è stato firmato in data 26/03/2013. I lavori sono iniziati in data 09/05/2013.	Avviati Lavori			Tortsen Costruzioni	09/05/12	N. 142 DEL 18/03/2011	1.192.623,56	
ME	055	Capo d'Orlando	B		Opere di consolidamento del centro abitato/a	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto							
ME	056	Capri Leone	A	-	Opere di risagomature e protezione versanti - Frazione Rocca	€ 550.000,00	€ 550.000,00	La progettazione è affidata dal Comune a professionisti esterni con Determina Sindacale n. 44 del 12.10.2010. Il progetto, dopo varie modifiche e integrazioni, viene trasmesso nella versione definitiva con nota assunta al prot. n. 136 del 16/01/2013 e, a seguito dell'acquisizione pareri, viene finanziato con Decreto Commissariale n. 96 del 08/01/2012. Con Decreto n. 99 del 15/01/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n. 287 del 20/06/2012 sono stati aggiudicati i lavori. Il contratto è stato sottoscritto in data 26/06/2013 ed i lavori consegnati il 19/07/2012 con data di conclusione prevista il 15/01/2013. Il RUP, con nota acquisita al prot. con n. 9438 del 12/08/2013, tra l'altro, ha comunicato che i lavori sono concretamente iniziati solo in data 11.08.12 ma che dovranno comunque terminare inderagabilmente entro il 15.01.2013. Con nota acquisita al prot. n. 5258 del 17/12/2012, l'RUP trasmette la Relazione di Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 resasi necessaria durante lo svolgimento dei lavori.	AVVIATI LAVORI	Ing. Salvatore Russo (Figura Esterna)	-	CONSORZIO SICILIANO ROMAGNOLO FRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - EUROVESA COSTRUZIONI	19/07/2013	Decreto n. 96 del 08/04/2013	€ 516.698,04	Ing. Domenico Imbrogia

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Siciliana previsti dal D.P.C.M. 15 settembre 2010
Ex O.P.C.M. 3906 del 13 novembre 2010

ELENCO INTERVENTI 1 e 2

Programma triennale 2012-2014

ENTE	COD	COMUNE	CONS. ASTAT.	CONSEGNA	TITOLO	GIUNTA G.R.	SOMMATORIA Amministrazioni	SAL	ATTUATORE	ATTESTATO VERIFICA	AFFIDAMENTO (AGGIUDICAZIONE)		ULTIMO SAL (FINANZIAMENTO)		Rup
											Importo	Data stipula contratto	n. e data	Importo	
ME	057	Capri Leone	A	-	Opere di consolidamento, con blocchi in pietra, rivestimento muri preesistenti - Esperienza Cimina	€ 600.000,00	600.000,00	AVVIATI LAVORI	Ing. Anselli Maurizio (Figura Esterna)	Testo in	RIBASSO CONTRATTUALE 15,4999%	17/12/2011	252 - 09/03/2012	€ 573.318,18	Geom. Gaetano Giuffrè (ATQ)
ME	058	Cesarea	A	COMITATO 18 MAG 2011	Consolidamento centro-abitato	€ 3.000.000,00	9.813.881,33	AVVIATI LAVORI	DAPC	-	PROV. CONTRIBUZIONE 0%	05/09/2013	31 - 1/7/2013	€ 3.000.000,00	Ing. Bruno Marchi (DAPC UP)
ME	059	Casalvecchio Siculo	A	COMITATO 24 FEB 2011	Consolidamento centro-abitato	€ 1.363.853,00	1.363.853,00	AVVIATI LAVORI	Ing. Carmelo Trimarchi (Figura Esterna)	-	PROV. 0.5	09/12/2013	-	€ -	Ing. Domenico Imbesi
ME	060	Castell di Lucio	B	COMITATO 15 SETT 2011	Completamento degli interventi di mitigazione per il rischio idrogeologico in località Le Curne per la S.P. 174 e per l'Centrale Idrolet - Via S. Pellegrino	€ 1.000.000,00	999.676,87	LAVORI ULTIMATI			PILA ME srl - Mutomec	05/07/11	N. 648 DEL 23/09/2010	999.676,87	
ME	061	Castell di Lucio	A	-	Consolidamento via Duomo e Via S. Lucia	€ 1.500.000,00	1.500.000,00	AVVIATI LAVORI	S.T.I. Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura (Figura esterna)	-	RIDOTTA CONTRIBUZIONE 0%	23/09/2013 scaduto il 23/09/2013 e rinnovato il 04/04/2012	31 - 1/7/2013 come modificato dal Dec. n. 91 del 14/06/2011	€ 1.500.000,00	Ing. Giuseppe La Placa

Pagina 6 di 23

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV	COD	COMUNE	Lettera ATTUAT	COMITATO	TITOLO	FINANZIATO ALLA	RIFINANZIATO domiciliato	STATO DI FATTO	SUE	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO ESECUZIONE	AFFIDAMENTO LAVORI: PROGRESS	AFFIDAMENTO LAVORI: ESECUTIVO LAVORI	ESECUTIVO DI FINANZIAMENTO: n. e data	ESECUTIVO DI FINANZIAMENTO: importo	RUP
ME	062	Castell'Umberto	A	-	Opere di contenimento a valle della sede stradale - Contrada Sferrando inferiore	€ 300.000,00	€ 300.000,00	In data 09.11.2010 la progettazione è stata offerta al DRPC di Messina, che ha trasmesso il progetto in data 24.05.2011. A seguito delle verifiche effettuate dalla Struttura Commissariale sono state richieste integrazioni al progetto trasmesso, inviate dal DRPC in data 24.11.2011 e 12.01.2012. Con nota prot.n. 395 del 09.02.2012 la Struttura Commissariale, analizzati gli allegati progettuali, ha sollecitato la consegna del progetto esecutivo, debitamente verificato e validato, tenendo conto delle osservazioni tecniche formulate. Con nota prot. n. 2148 del 15/06/2012 il Commissario ha sollecitato il DRPC di Me a trasmettere il progetto definitivo entro 7 giorni, debitamente verificato e validato, specificando che trascorso infruttuosamente tale termine, avrebbe attivato i poteri di sostituzione e di deroga di cui all'Art. 13 del D.L. 195/2009. A seguito di osservazione da parte del Commissario in merito alla difformità tra il Titolo del Progetto in corso di redazione e quello inserito nell'AAP, il Commissario 3865 trasmette la Cert Delibera di Giunta Municipale n. 37 del 28.06.2012 che conferma la titolarità del progetto di "somma urgenza per la realizzazione di opere di raccolta, convogliamento acque superficiali e regimentazione idraulica del torrente Battaglola nella Contrada Sferrando - Comune di Castell'Umberto" all'intervento ME062. Il progetto è stato trasmesso nel mese di novembre 2012 e finanziato con Decreto n. 702 del 17/12/2012. Con Decreto n. 713 del 18/12/2012 sono state avviate le procedure di gara	AFFIDAMENTO LAVORI	DRPC (Arch. Francesco Benedetti)	-	-	-	-	€ -	Ing. Bruno Manfrè (DRPC)
ME	063	Castroreale	A	COMITATO 24 FEB 2011	Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato- Completamento	€ 1.650.000,00	€ 1.650.000,00	La progettazione è affidata dal Comune a professionisti esterni Con Determina Sindacale n.31 del 18.02.2009. Con nota esposito agli atti al prot. n. 903 del 17/06/2011 il Comune ha comunicato essere in corso l'aggiornamento del progetto esecutivo alla vigente normativa. A seguito della nota di richiesta del Commissario Straordinario Delegato, il Comune, con nota acquisita agli atti al prot. n. 1950 del 11/05/2012, ha trasmesso il progetto esecutivo. Con Decreto n. 297 del 26.06.2012 il stato acquisito le progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori dai progettisti incaricati precedentemente dal Comune. A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/07/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione del GC di Me che ha richiesto la sospensione di elaborati integrativi. In data 16.07.2012 il Progettista ha trasmesso al GC le integrazioni richieste in sede di CdS ed il GC ha espresso il proprio parere con nota acquisita al prot. n. 2877 del 25/07/2012. Il RUP, con nota acquisita al prot.n.3164 del 21.08.2012 ha trasmesso copia del verbale di Verifica e Validazione del progetto. Con Decreto Commissariale n. 564 del 26/10/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dei lavori. Con Decreto Commissariale n. 862 del 10/12/2012 viene disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della C.M.T. srl.	AFFIDAMENTO LAVORI	Ing. Pietro Colonna (Figura Esterna)	-	C.M.T. srl	-	564 del 26/10/2012	€ 1.585.394,53	Arch. Gaetano Buschert (UTC)
ME	064	Casalvecchio Siculo	B	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento e sistemazione idraulica e salvaguardia del Centro Abitato in zona Castello-Colonna-Rocca a Sud dell'Abitato	€ 1.000.000,00	€ 985.547,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 2 del 12/1/2011 per un importo di euro 985.547,00. I lavori sono stati assegnati alla R.C.S. Costr. S.r.l. - Mistretta (ME). I lavori hanno avuto inizio il 7 settembre 2011	Avviati Lavori			R.C.S. Costr. S.r.l. - Mistretta (ME)	07/09/11	N. 2 DEL 11/01/2011	985.547,00	
ME	065	Ficarra	B*	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada grenne	€ 1.028.981,00	€ 1.028.981,00	La progettazione è stata affidata ai Comune che ha trasmesso il progetto in data 13.10.2010 Il progetto è stato finanziato con Decreto n.2 del 12.01.10 I lavori sono stati aggiudicati dal Comune, e bloccati in data 20.01.11 A seguito del Cianllario del 24 febbraio 2011 l'intervento è trasmesso alla Intera R. Ispettorat Regionale regionale) me conformità ad essere gestito dal Commissario, in quanto i lavori erano già avviati I lavori sono stati ripresi in data 09/11/2011 a seguito di lavori eccezionali sopraggiunti, come richiesto dal RUP prima del gg e quindi il 19/01/2012 Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1367 del 27/04/2012 l'ARTA ha fatto il regalo all'Ufficio del Commissario che il gruppo individuato come Ente Beneficiario dell'intervento	LAVORI ULTIMATI	Comune: professionista esterno	Sel Civile	ITALTECNICA COSTRUZIONI	20/01/2011 - sospesi il 30/08/2011 - ripresi il 18/10/2011	n. 1 del 23.11.2010	€ 1.028.981,00	Ing. Fabio Marino (UTC)
ME	066	Ficarra	A	-	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Minella - San Nito	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	La progettazione è stata affidata dal Comune di Ficarra a progettisti esterni con Determina Sindacale n. 9 del 23.08.2010. Il progetto è stato consegnato in data 21.03.2011 e, a seguito di approvazione e validazione, è stato finanziato con Decreto n. 44 del 07.04.2011. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 198 del 25.08.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il Contratto è stato firmato in data 05/09/2011 ed i lavori hanno avuto inizio in data 17/09/2011 Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 5222 del 24/08/2012, ritenuti necessario eseguire lavori complementari, ha chiesto autorizzazione ad effettuare le indagini geognostiche preliminari, trasmettendo al contempo elaborati tecnici dei lavori complementari previsti, ma il Commissario, attesa la quasi ultimazione dei lavori, non ha ritenuto accettabili le richieste avanzate.	AVVIATI LAVORI	ATP - Ing. Nunzio Colavecchio - Ing. Raffaele Cosentino - Geom. Giovanni Riciardo (Figura Esterna)	-	RENZO COSTRUZIONI	27/09/2011	Decreto n. 44 del 7/4/2011	€ 1.358.580,84	Ing. Fabio Marino (UTC)
ME	067	Fondachelli Fantina	B	-	Opere di salvaguardia centro abitato	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 298 del 30/05/2012 per un importo pari a € 927.137,42	Predisposizione atti di gara					298 del 30/05/2012	927.137,42	
ME	068	Forza D'Agrò	B*	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.250.000,00	€ 414.163,28	Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3868 del 21/09/2012 l'ARTA Sicilia ha comunicato all'Ufficio del Commissario che il citato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ai sensi dell'Ordinanza e Espletamento tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto. Con nota prot. n. 2553 del 06/07/2012 il Commissario affidato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato della documentazione prevista ex-lege. In data 30/07/2012 si è tenuto un vivace tecnico con Commissario, Progetto, ARTA e Comune. Con nota acquisita al prot. n. 5323 del 27/08/2012 il Comune, come concordato nell'incontro tecnico del 30.07.2012, trasmette all'Ufficio del Commissario n. 3 copie del progetto oltre la documentazione amministrativa della stessa. Con nota protocollo n. 3795 del 01/10/2012 il DRPC di ME inviato il Commissario comunica una richiesta sospensiva per i giorni 05/10/2012 al fine di esaminare la problematica dell'intervento.	PROGETTO ACQUISITO IN ATTESA PARERI		-	-	-	-	-	
ME	069	Frazzanò	B	COMITATO 21 OTT 2010	Lavori di consolidamento del centro abitato a valle della via S. Filippo di Fragalà - Zona Piazzale S.Lorenzo	€ 1.165.000,00	€ 1.165.000,00	L'intervento è stato finanziato e sono in corso la procedura di affidamento	Affidamento Lavori					n. 54 del 6-feb-12	1.165.000,00	
ME	070	Frazzanò	B	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento ad est del centro abitato	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	Aggiudicazione LIBERA Messina	Affidamento Lavori					n. 848 DEL 21/11/2011	2.500.000,00	
ME	071	Frazzanò	A	COMITATO 15 SETT 2011	Mantovaggio delle aree in frana del centro abitato e della area ad elevato rischio idrogeologico (R4)	€ 300.000,00	€ 300.000,00	In data 09.11.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 61 del 11.02.2012 è stato disposto l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione. In data 18.04.2012 sono stati acquisiti gli elaborati inerenti le indagini effettuate. Come comunicato dal Commissario al Comune con nota prot. n. 3296 del 08/09/2012, in base alle indagini svolte ed agli studi effettuati sull'area, è emersa una criticità molto più ampia e complessa rispetto all'inquadramento dei bisogni di intervento e, pertanto, l'attività di progettazione dell'intervento, correlata alla disponibilità economica di	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE	INVITALIA	GEO PLANTS	-	-	-	€ -	Ing. Fabio Marino (UTC)

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 20.03.2010"
Ex O.P.C.M. 30 dicembre 2009

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV	COD	COMUNE	CONTO ATTUALE	COMITATI	TITOLO	IMPORTO APP	IMPORTO Rimodulato	STATO DI FATTO	SAL	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO ANNUALE	AFFIDAMENTO LAVORI: Progressivo	AFFIDAMENTO LAVORI: data inizio lavori	DECRETO DI FINANZIAMENTO: n. e data	DECRETO DI FINANZIAMENTO: importo	RUP
ME	072	Galati Mamertino	A	-	Disgaggiamento massi, messe in sicurezza versante - C.da Gallini	€ 500.000,00	€ 500.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune che ha provveduto ad affidarla a professionisti esterni con Determina Sindacale n.72 del 09.10.2010. Il progetto è stato acquisito in data 02.11.2011 e, a seguito di approvazione e validazione, è stato finanziato con Decreto n. 13 del 17.01.2012. A seguito dell'espletamento della procedure di gara, con decreto n.369 del 14/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il Contratto è stato firmato in data 04/06/2013 ed i lavori sono stati avviati in data 23/08/2012. Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 7258 del 21.06.2012, ha trasmesso copia del Decreto di Occupazione Temporanea. Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 9209 del 10.09.2012, ha autorizzato il DL a redigere perizia di variante. A seguito dell'autorizzazione del RUP, in data 12/08/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Sospensione Lavori. Con nota prot. n. 9053 del 03/12/2012, il DL ha chiesto all'RUP autorizzazione al fine di poter procedere alla redazione della PVS-6.	SOSPENSIONE LAVORI	Arch. Felice Testagrossa (Figura Esterna)	-	0400	22/05/2013		€ -	Arch. Giuseppe Cavolo (UTC)
ME	073	Galati Mamertino	A	-	Consolidamento e messa in sicurezza versante - Località Pilieri	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterni con Determina Sindacale n.34 del 26/10/2010. Con nota prot. 2770 del 5/12/2011 il Commissario ha trasmesso la documentazione dell'intervento all'ARTA al fine di procedere al finanziamento su fondi europei PO FESR 2007-2013 destinati alla Regione Sicilia. Con nota acquisita al prot. n.1284 del 25/01/2012 l'ARTA comunica che l'intervento non possiede i requisiti necessari per l'ammissibilità al finanziamento e restituisce tutta la documentazione perché il Commissario si faccia carico della realizzazione dell'intervento. Con Decreto n. 153 del 03.04.2012 è è acquisito il progetto definitivo ed esecutivo e con Decreto n. 349 del 11/07/2012 si è acquisito lo studio geologico e le indagini geognostiche effettuati dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune. Con D.C. n. 406 del 01.08.2012 è stato finanziato l'intervento, con Decreto n. 448 del 2/09/2012 sono state avviate le procedure di affidamento lavori e con D.C. n. 514 del 04/10/2012 è stato disposto l'aggiudicazione definitiva della procedure negoziata per l'affidamento dei lavori. In data 19/10/2012 è avvenuta la consegna dei Lavori.	AVVIATI LAVORI	Comune Ing. Mario Saitta	-	ARCOBALENO 3000 srl	-	406 - 02/08/2013	€ 1.100.000,00	Arch. Giuseppe Cavolo
ME	074	Giardini Naxos	B	COMITATO 21 OTT 2010	Consolidamento versante - Località Orto Grande	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	L'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori					N. 9 del 18-gen-12	2.200.000,00	
ME	075	Gualtieri Sicaminò	B	COMITATO 15 SETT 2011	Interventi urgenti di consolidamento centro abitato	€ 1.651.041,00	€ 1.651.041,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 271 del 22/4/2011 per un importo di euro 1.651.041,00. La gara è stata indetta in data 14/11/2011. In corso di aggiudicazione	Affidamento Lavori			-		N. 273 DEL 23/04/2011	1.651.041,00	
ME	076	Itala	B	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Frazione Borgo	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	L'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori					N. 10 del 18-gen-12	1.494.168,80	
ME	077	Leni	B	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di difesa costiera a difesa del centro abitato	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	A seguito di espletamento di procedure di gara il contratto è stato stipulato il 15/06/2012. I lavori sarebbero consegnati in data 28/08/2012	Avviati Lavori					N. 792 DEL 26/10/2011	1.500.000,00	
ME	078	Letojanni	A	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di difesa costiera	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	Il progetto è stato affidato dal Comune a progettista esterno con Delibera di Giunta n. 194 del 11.10.2010. Con Decreto Commissariale n. 120 del 13.03.2012 si è acquisito il progetto definitivo ed esecutivo e con Decreto 327 del 10/07/2012 si è acquisito lo studio geologico dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune. Durante la conferenza dei servizi del 14.05.2012 il Commissario ha preso atto di quanto richiesto dalle amministrazioni presenti ed ha disposto che il progettista integrasse gli elaborati progettuali con quanto richiesto. Con nota prot. n.2147 del 13/06/2012 il Commissario ha trasmesso al progettista il parere con prescrizioni della Soprintendenza del Mare per la opportuna modifiche e integrazioni. Il Progettista, con nota acquisita al prot. n. 2680 del 12/07/2012 ha trasmesso le integrazioni progettuali richieste, inoltrate dal Commissario, con nota prot.n. 2896 del 26/07/2012 all'ARTA Serv 3 per il parere di competenza. Il RUP con nota acquisita al prot. n. 3393 del 10/09/2013 ha trasmesso gli atti di validazione del progetto. Con Decreto n. 686 del 11/12/20132 è stato finanziato l'intervento.	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	Ing. Sascaro Agostino e Geom. Sascaro Sabrina (Figura Esterna)	-	-	-	686 - 11/12/2012	€ 2.000.000,00	Arch. Pietro Bonaignore (UTC)
ME	079	Librizzi	A	-	Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Stadili e Via Fratelli	€ 2.150.000,00	€ 2.150.000,00	A seguito della rinuncia da parte del DRPC di Messina la progettazione è stata affidata ad INVITALIA , il 15/11/2011 . La realizzazione delle indagini preliminari alla progettazione è stata affidata dal DRPC ed i risultati sono stati trasmessi in data 23.03.2012 L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM), che, in data 16/02/2012, ha trasmesso i prodotti di restituzione dei voli aerei effettuati. A seguito dell'acquisizione della relazione geologica redatta dal Dott. Basile, vinta a seguito delle indagini geognostiche e geofisiche effettuate dal DRPC e secondo quanto discusso nel tavolo tecnico del 25/07/2012, il geologo della CGIAM, con nota acquisita al prot.n. 1157 del 04.04.2012, ha richiesto integrazioni alla relazione. Con nota acquisita agli atti al prot. n.2041 del 07/06/2013 il geologo ha trasmesso la relazione finale di sintesi della campagna di indagini geognostiche e geotecniche e del monitoraggio strumentale di Contrada Nasoli a Librizzi. Con nota aquisita agli atti al prot. n.3283 del 03/09/2012, la CGIAM ha trasmesso agli Uffici del Commissario le specifiche tecniche ed i relativi allegati riguardanti le indagini effettuate. Con D.C. n. 473 del 17/09/2012 sono state finanziate le indagini ed avviate le procedure per l'affidamento delle stesse. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 521 del 08/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della realizzazione del Piano di indagini Preliminari di cui l'Affidataria ha trasmesso i risultati con nota acquisita al prot. n. 4781 del 19/11/2012.	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	ISO GAV SH	-	-	-	€ -	Geom. Citino Carmelo (UTC)
ME	080	Librizzi	A	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di sistemazione idraulici centro	€ 150.000,00	€ -	INTERVENTO REVOCATO nel corso della riunione di Comitato del 24 febbraio 2011. Le risorse rese disponibili dalla mancata realizzazione delle opere, pari a € 150.000, sono state destinate all'intervento TP/TL Joleni	INTERVENTO REVOCATO		-	-	-	-	-	-

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 09 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV	COD	COMUNE	FONDI ATTUALI	ESIGENZE	FITEG	IMPORTO A+P	IMPORTO Rimodulato	STATO DI FATTO	SAL	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO DEFINITIVO	AFFIDAMENTO LAVORI		DECRETO DI FINANZIAMENTO		BUP
												Impresa	Ribassio Data	n. e data	Importo	
ME	081	Librizzi	A		Opere di consolidamento versante e sistemazione – Zona Rocca Marurà	€ 500.000,00	€ 500.000,00	*La progettazione è stata affidata ad invitalia in data 08.09.2011. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 142 del 23.07.2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione, ad oggi concluse. L'intervento è stato inserito nell'Accordo Quadro con il Centro di Geomorfologia integrata per l'Area del Mediterraneo al fine di ottenere un rilievo topografico e una restituzione aerofotogrammetrica adeguata. Con nota assunta al prot. n. 498 del 16/02/2012, 1363 del 03/05/2012 e 2781 del 18/07/2012 la CGIAM ha trasmesso i prodotti di restituzione dei rilievi effettuati. Con nota acquisita al prot. n. 3724 del 27/08/2012 INVITALIA ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito delle CdS tenutesi in data 23/10/2012, ed al parere espresso dall'ARTA (Serv. 3) con nota acquisita al prot. n. 4254 del 23/10/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri. L'intervento è stato finanziato con Decreto n. 707 del 17/12/2012 e con Decreto n. 209 del 18/12/2012 sono state avviate le procedure di gara.*	*AFFIDAMENTO LAVORI*	INVITALIA	RTI EXPLORING SAS		-		€ -	Geom. Santo di Perna (UTC)
ME	082	Limina	B		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.666.000,00	€ 1.666.000,00	*L'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento*	*Affidamento Lavori*					N. 301 del 30/05/2012	1.666.000,00	
ME	083	Longi	B	COMITATO 15 SETT 2011	Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 1.503.100,00	€ 1.474.985,06	*L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 155 del 18/5/2011 per un importo di euro 1.474.985,06. Lavori aggiudicati in data 15/11/2011 alla DEMETRA LAVORI SRL con un ribasso del 24,16354% e consegnati in data 06/02/2012. Il Contratto è stato stipulato in data 13/04/2012*	*Avviati Lavori*			Demetra Lavori Srl	06/01/12	N. 153 DEL 18/03/2011	1.474.985,06	
ME	084	Malfa	B		Messa in sicurezza e consolidamento del costone in località Terricella della Fraxione Capo	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	*Intervento finanziato*	*Affidamento Lavori*					N. 846 DEL 22/11/2011	998.000,00	
ME	085	Malvagna	B		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	*L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 388 del 3/5/2011 per un importo di euro 1.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla MICHELANGELO MAMMANA con un ribasso d'asta pari al 28,44 e consegnati in data 30/11/2011. Sono in corso le attività necessarie per la sottoscrizione del Contratto*	*Avviati Lavori*			MICHELANGELO MAMMANA - Castel di Lucio (ME)		N. 288 DEL 03/05/2011	1.000.000,00	
ME	086	Mandanici	B	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di salvaguardia centro abitato	€ 1.170.000,00	€ 1.149.943,49	*L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 74 del 22/2/2011 per un importo di euro 1.149.942,49. I lavori sono stati affidati alla ATIFIN PAR 2000 s.p.a. ROMA con un ribasso d'asta pari al 12,892. I lavori sono stati consegnati in data 20/10/11 e dovranno concludersi entro il 19/07/2013. Con D.C. n. 421 del 08.08.2012, funzionari dell'UTC sono stati incaricati del perfezionamento del procedimento espropriativo.*	*Avviati Lavori*			ATIFIN PAR 2000 s.p.a. ROMA	20/10/11	N. 74 DEL 22/02/2011	1.149.943,49	
ME	087	Messina	A	-	*Opere di consolidamento località Giampilieri*	€ 24.000.000,00	€ 24.000.000,00	*La gestione dell'intervento è stata trasferita al Commissario di cui all'OPCM 3815 del 10 ottobre 2009*	*LAVORI ULTIMATI*		*Trasferito nell' OPCM 3815 del 10 ottobre 2009 (Eventi alluvionali Giampilieri ME)*					
ME	088	Messina	A	COMITATO 15 SETT 2011	*Opere di salvaguardia centro abitato*	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	*La progettazione è affidata al Comune che incarica un progettista esterno con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 13.02.2011. Con nota acquisita al prot. n. 2951 del 30.12.2011 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della Conferenza dei servizi del 20.03.2013 è stata richiesta al Comune di rimodulare il progetto in ottemperanza alle indicazioni dell'ARTA Serv. 3. Il Progetto rimodulato è stato trasmesso con nota acquisita al prot. n. 1289 del 16.04.2012 e finanziato con Decreto n. 192 del 26.04.2012. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 383 del 20.07.2012, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il Contratto è stato sottoscritto il 24/07/2012, i lavori consegnati il 31.07.2012 e dovranno concludersi entro il 27/07/2013. Con D.C. n. 421 del 08.08.2012, funzionari dell'UTC sono stati incaricati del perfezionamento del procedimento espropriativo.*	*AVVIATI LAVORI*	Comune	SIGEO	Permissio Costruzioni srl	31/07/2012	193 - 26/04/2012	€ 3.000.000,00	Ing. Salvatore Bartolotta
ME	89_1	Messina	A	COMITATO 21 OTT 2080 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	*Opere di consolidamento località Gallati Sant'Anna*	€ 900.000,00	€ 900.000,00	*Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B Nel "Comitato di indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.300.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 446, trasmette la documentazione amministrativa. Con nota acquisita al prot. n. 3079 del 07.08.2012, il Progettista trasmette all'Ufficio del Commissario copia del Progetto esecutivo. A seguito delle CdS tenutesi in data 23.08.017 sono stati acquisiti tutti i pareri. Con Decreto Commissariale n. 593 del 08/11/2012 è stato finanziato l'intervento, e con Decreto n. 646 del 27/11/2012 è approvato lo schema lettera d'invito alla Procedura di gara.*	*AFFIDAMENTO LAVORI*	Comune	-	-	-	D.C. n. 593 del 08/11/2012	€ 900.000,00	Ing. Antonino Amato (UTC)
ME	89_2	Messina	A	COMITATO 21 OTT 2080 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	*Opere di consolidamento località Mill San Marco*	€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00	*Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B Nel " Comitato di indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.300.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 446, ha trasmesso la documentazione amministrativa. Con nota prot.n. 464 del 16/02/2012 il Commissario, in ricordo alla richiesta del Comune, ha nominato un tecnico interno a supporto della progettazione. Con nota prot.n. 3576 del 01.08.2012, il Geologo incaricato ha trasmesso copia della documentazione integrativa alla studio geologico. In data 12/12/2012 il RUP ha trasmesso copia del progetto definitivo del progettista in data 30/11/2012.*	*PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI*	Comune	-	-	-	-	€ -	Ing. Antonino Amato (UTC)
ME	89_3	Messina	A	COMITATO 21 OTT 2080 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	*Opere di consolidamento località Mill San Pietro*	€ 510.000,00	€ 510.000,00	*Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B Nel " Comitato di indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.300.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 446, ha trasmesso la documentazione amministrativa. Il Comune ha trasmesso, con nota acquisita ai prot. n. 3760 del 17.08.201, copia del progetto esecutivo aggiornato. A seguito delle conferenze dei servizi del 31/05/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento. In data 20/07/2012 con Decreto n.383 si è provveduto a finanziare il progetto. Il RUP, con nota acquisita al protocollo n. 2839 del 23/07/2012 ha trasmesso al Commissario il Verbale di Verifica e Validazione e l'Attestazione ex art. 106 comma 1. Con D. C. n. 517 del 05 ottobre 2012 è stato approvato lo schema lettera di invito e data avvio alla Procedura di gara. Con Decreto n. 843 del 26/11/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della RAR Scuola Soc. Cons.*	*AFFIDAMENTO LAVORI*	Comune	-	RAR SCUOLA Soc. Cons. - Via Nibesi snc	-	n.383 del 20/07/2012	€ 505.354,78	Geom. Marco Mancuso (UTC)

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 20.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV	COD.	COMUNE	CLASS. ATTUAZ.	CONTRATTO	LUOGO	IMPORTO A&P	IMPORTO Rimodulato	STATO DI FATTO	SAE	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO GEOLOGI	AFFIDAMENTO LAVORI: Impresa	AFFIDAMENTO LAVORI: Data inizio lavori	DECRETO DI FINANZIAMENTO: n. e data	DECRETO DI FINANZIAMENTO: importo	RUP
ME	89_4	Messina	A	COMITATO 31 OTT 2090 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento località Santa Margherita	€ 650.000,00	€ 650.000,00	Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento inerente da A a B Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento tramite nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 443, ha trasmesso la documentazione amministrativa. A seguito del tavolo tecnico del 12/10/2012, l'Commissario, con nota prot.n. 4366 del 26/10/2012, ha invitato il Comune a trasmettere con urgenza il progetto esecutivo ed il DRPC a trasmettere, entro 45 giorni, il progetto del riforramento del tratto di tronco prospiciente il complesso edilizio in località Santa Margherita . A seguito della CdS tenutasi giorno 29/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto. Il DRPC in data 10/12/2013, con nota assunta al prot.n. 5781, trasmette copia del progetto esecutivo di riforma messa. Il progetto prima stralcio è stato finanziato con Decreto n. 699 del 13/12/13	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	Comune	-	-	-	-	€ -	Ing. Salvatore Bartolotta
ME	89_5	Messina	A	COMITATO 31 OTT 2090 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento località Santo Stefano	€ 550.000,00	€ 550.000,00	Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento inerente da A a B Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento tramite nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 442, ha trasmesso la documentazione amministrativa. A seguito del tavolo tecnico del 12/10/2012, l'Commissario, con nota prot.n. 4366 del 26/10/2012, ha invitato il RUP a trasmettere il progetto entro 15 gg. In data 29/11/2012, con nota prot.n. 5808, il Commissario autorizza il Comune di Messina a procedere alla redazione delle attività connesse alla progettazione esecutiva dell'intervento.	PROGETTAZIONE IN CORSO	Comune	-	-	-	-	€ -	Geom. Domenico Currò (UTC)
ME	090	Militello Rosmarino	B		Consolidamento all'interno del centro abitato in c/da Ramisi	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Intervento finanziato	Intervento finanziato							
ME	091	Mirto	A	-	Consolidamento centro abitato	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	La progettazione è stata affidata sul invitalia in data 08.03.2011. Con Decreto n. 144 del 21.07.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione ed oggi conclusa. In riferimento all'Accordo Quadro del 29.11.2011 stipulato con la CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 1257 del 12 aprile 2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche inerenti ulteriori indagini da effettuare sul sito di cui il RUP ha preso atto in data 27.04.2012. Con Decreto Commissariale n. 205 del 08/05/2012 sono state approvate le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini integrative preliminari alla progettazione e data avvio alle procedure di gara per l'affidamento delle stesse. Con Decreto Commissariale n. 250 del 30/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di indagini preliminari integrative. Le attività sono state avviate il 18/06/2012 e sono state completate in data 16/07/2012, con la trasmissione della relazione sulle indagini integrative effettuate acquisita al prot.n. 2754 in pari data. Con nota acquisita al prot. n. 3421 del 11/09/2012, la CGIAM ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia della relazione geologica-tecnica.	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL GEOMERO (Indagini preliminari integrative)	-	-	-	€ -	Ing. Giuseppe Nastasi (UTC)
ME	092	Mistretta	A	-	Regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord-ovest dell'abitato di Mistretta – Torrente Santa Domenica	€ 800.000,00	€ 800.000,00	Con nota prot.n. 746 del 07.03.2012 la progettazione è stata affidata al Comune. In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM con nota prot. n. 1145 del 03/04/2012, ha restituito i dati del rilievo aereo effettuato. Con nota acquisita al prot.n. 3526 del 07.09.2012, il Comune ha comunicato che il progetto sarebbe stato redatto da personale interno dell'UTC che verrà affiancato, per la progettazione specialistica, da un supporto tecnico nella qualità di consopettista, incarico già autorizzato con nota del Commissario prot.n. 1174 del 04.04.2012 purchè eseguito ai sensi delle norme vigenti. Il Comune con nota prot.n. 3324 del 05.09.2012ha trasmesso il progetto esecutivo. Con nota prot. 3190 del 06/09/2012 il Commissario ha rinviato alla CGIAM l'incarico. A seguito della CdS tenutasi in data 25/09/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri/assensi degli Enti interessati per l'approvazione del progetto. Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3910 del 08/10/2012, ha trasmesso copia del Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo. L'intervento è stato finanziato con D.C. n. 586 del 07/11/2012 e con D.C. n. 626 del 20/12/2013 sono stati avviate le procedure di gara.	AFFIDAMENTO LAVORI	Geom. Lucio Pani (UTC)	060 SAS (AVP)	-	-	586 - 07/11/2012	€ 778.679,50	Geom. Rosario Mastorino (UTC)
ME	093	Monforte San Giorgio	B		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 380 del 6/6/2011 per un importo di euro 1.300.000,00.A seguito di espletamento di procedure di gara il contratto è stato stipulato in data 22/11/2011	Contratto stipulato					N. 380 DEL 06/06/2011	1.300.000,00	
ME	094	Motta Camastra	B	COMITATO 15 SETT 2011	Completamento consolidamento del Centro Abitato per le zone Nord di Rocca Mancusa	€ 1.000.000,00	€ 993.521,35	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 425 del 17/6/2011 per un importo di euro 993.521,35. A seguito di procedure di gara il contratto è stato stipulato in data 12/02/2012 e i lavori consegnati il 12/03/2013	Avviati i Lavori			VERTICAL PROJECT s.r.l. - Cesarò (ME)	12/03/12	N. 425 DEL 10/06/2011	993.521,35	
ME	095	Naso	A	COMITATO 24 FEB 2011	Consolidamento del versante, opere di drenaggio in località Guttina	€ 600.000,00	€ 1.650.000,00	La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterni con Determina Sindacale n. 37 del 01.06.2011. Con nota acquisita al prot.n. 1280 del 16.04.2012 il Comune ha comunicato di voler affidare incarichi professionali relativi alle competenze geotecniche, geologiche e per il consolidamento della sicurezza in fase di progettazione,e tali incarichi sono autorizzati dal Commissario con nota prot. n. 1919 del 20/04/2012, purchè conformi ai dettami delle norme vigenti. Con nota acquisita al prot. n. 3483 del 12/09/2012 il Comune ha informato che le indagini geognostiche e prove di laboratorio propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo erano in corso e che le stesse sarebbero state portate a termine rapidamente al fine di ed completare la progettazione esecutiva entro il mese di settembre. In data 11/10/2012 il Commissario, con nota prot.n. 4009, ha invitato l'Amministrazione a trasmettere entro 20 giorni il progetto esecutivo.	PROGETTAZIONE IN CORSO	UTC	-	-	-	-	€ -	Arch. Mario Sidoti Pinciaro (UTC)

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 19 dicembre 2019

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV	COD	COMUNE	FONTE ATTUAZ	COMITATO	TITOLO	IMPORTO Ass.	IMPORTO Rimodulato	STATO DEI LAVORI	SAL	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO PROGRAM	AFFIDAMENTO LAVORI		ESITO DI FINANZIAMENTO		RUP
												Impresa	Affidamento lavori	n. e data	Importo	
ME	096	Novara di Sicilia	B	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento del centro abitato	€ 400.000,00	€ 399.110,40	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 196 del 3/6/2011 per un importo di euro 399.110,40. I lavori sono stati affidati alla Chodalo Group con un ribasso d'asta pari a 13,947%.	Avviati lavori			CHODALO GROUP srl- San Filippo del Mela	25/11/11	N. 106 DEL 01/04/2011	399.110,40	
ME	097	Pagliara	B		Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Intervento finanziato	Intervento finanziato					N. 163 del 12-mar-12	911.521,64	
ME	098	Patti	B	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento frazione Sorrentino	€ 1.300.000,00	€ 1.085.544,63	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 154 del 16/3/2011 per un importo di euro 1.085.544,63. La gara è stata aggiudicata in data 04/11/201. Il contratto è stato stipulato il 12/05/2012 e i lavori consegnati il 14/07/2012	Avviati Lavori					N. 154 DEL 16/03/2011	1.085.544,63	
ME	099	Piraino	A		Opere di consolidamento – Zona Rodia - S.Costantino, Policaro, San Leonardo, Colomi, Portella, Torre della Clavare	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.08.2011. SAN LEONARDO. - Invitalia ha trasmesso il progetto in data 17.02.2012; - A seguito della Conferenza dei Servizi del 27.02.2012 sono stati acquisiti tutti i pareri; Con nota assunta al prot. n.1952 del 31/05/2012 Invitalia ha trasmesso al Commissario il progetto esecutivo con le integrazioni richieste dal parere del GC. Il Progetto consegnato prevedeva, come concordato, il ricalzo delle terre a cuca da sotto da parte di RFI. A seguito di rinuncia da parte di RFI al ricalzo, il Commissario, con nota prot. n. 2623 del 13/07/2012, ha chiesto ad INVITALIA di rimodulare e trasmettere, il Quadro Economico dell'intervento in funzione del minore ricalzo delle terre e roccia da scavo provenienti dalla ripresfittura degli argini del torrente Gonofalo. Con nota prot.n. 3252 del 27.08.2012 il RUP ha invitato il GdL a predisporre una variante al progetto, prevedendo la risistemazione del materiale proveniente dagli scavi nel tratto finale del Torrente Gonofalo e, in alternativa, nella medesima area d'intervento. Con Decreto Commissariale n. 459 del 25/09/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dei lavori "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo", e con D. C. n. 690 del 03/12/2012 è avvenuta l'approvazione schema lettera di invito alla procedura di gara dello stesso.	AFFIDAMENTO LAVORI	INVITALIA	SECONDO SAL (ED PLANTS (Integrated GEO SRU b) S.Costantino) "PROTEZIONE (Torre delle Clavole)			Decreto n.459 del 25/09/2012	€ 668.652,86	Geom. Carmelo Leone (UTC)
ME	100	Raccuja	A	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento - Zona Centro abitato	€ 5.000.000,00	€ -	Con nota prot.n. 429 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad IAP (a seguito di rinuncia del DRPC di Messina precedentemente incaricato). Il DRPC, con nota acquisita al prot.n. 954 del 21.03.2012, ha trasmesso copia del verbale delle indagini geognostiche e del monitoraggio strumentale geotecnico dell'incremento dei tassi effettuato, in virtù dell'ordinanza precedentemente confortegli. In adempimento all'Accordo Quadro del 29.12.2011 stipulato con la CONAI, la stessa ha trasmesso, con nota prot. n. 1343 del 05/04/2012, la restituzione dei dati da rilievo aerea effettuati, e con nota acquisita al prot. n. 1258 del 13 aprile 2012 la stessa ha trasmesso la specifiche tecniche per le indagini preliminari alla progettazione da realizzare. Nel Corso dell'Comitato del 26/09/2013 è stata decisa di sospendere ogni attività.	INTERVENTO REVOCATO	INVITALIA							Ing. Marco Calogero
ME	101	Reitano	B		Opere di consolidamento centro abitato	€ 980.000,00	€ 980.000,00	L'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori					N. 849 DEL 23/11/2011	966.134,00	
ME	102	Roccalumera	B		Consolidamento del centro abitato	€ 850.000,00	€ 850.000,00	I lavori sono stati consegnati il 31/10/2012 ed è in corso la stesura del contratto	Avviati Lavori					N. 89 DEL 01/03/2013	850.000,00	
ME	103	Roccavaldina	B		Consolidamento centro abitato	€ 1.885.000,00	€ 1.885.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 726 del 14/10/2010 per un importo di euro 1.885.000,00. Lavori sono stati affidati alla Ditatti Costruzioni con un ribasso d'asta pari a 47,731%. Il Contratto è stato stipulato in data 26/03/2013 e i lavori sono stati avviati il 14/06/2012	Avviati Lavori			SIDOTI COSTRUZIONI srl- Montagnareale (ME)	14/06/13	N. 726 DEL 14/10/2010	1.885.000,00	
ME	104	Roccella Valdemone	B		Opere di salvaguardia centro abitato	€ 875.000,00	€ 875.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 361 del 6/8/2013 per un importo di euro 875.000,00. Aggiudicazione avvenuta il 21/11/2013	Affidamento Lavori					N. 361 DEL 06/06/2011	875.000,00	
ME	105	Ronnetta	B*	COMITATO 21 OTT 2010	Opera di protezione e consolidamento del centro abitato di Ronnetta mare	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1371 del 27/04/2012 l'IATA Sicilia ha comunicato all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente beneficiario dell'intervento la Città Comune e trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa inerente al progetto. Con nota prot. n. 2582 del 06/07/2012 il Commissario ha richiesto il Comune e trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa. Con nota acquisita al prot.n.3185 del 23/08/2012 il Comune ha trasmesso copia del progetto definitivo generale delle opere e delle documentazione amministrativa, e con nota prot. n. 4378 del 16/10/2012 il comma certo ha inviato il Comune a trasmettere in sensi lievi copia del progetto esecutivo.	PROGETTAZIONE IN CORSO	Comune							
ME	106	S. Alessio Siculo	B*	Comitato del 21 ottobre 2010	Barriera soffolta e retente a protezione del centro abitato	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	A seguito delle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Coordinamento in data 21/09/2010 con nota prot. n.428 del 17/11/2010 l'intervento è stato trasmesso all'IATA. L'IATA-Serv. 3, con nota acquisita al prot. N. 998 del 22/08/2012, ha comunicato al Commissario essere l'ente beneficiario dell'intervento e la Ferita je 'ecorrente' con il Comune di S.Alessio Siculo. Con nota acquisita al prot. N. 1060 del 29/08/2012 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Con Decreto Commissariale n. 387 del 26/04/2013 è stato so-iniziato il progettazione definitiva-esecutiva dei progettisti incaricati dal Comune. In sede di conferenza dei servizi del 31/05/2013 sono state richieste integrazioni al fine di ottemperare alle prescrizioni formulate dagli Enti. A seguito dell'adeguamento del progetto, con nota prot. n. 7535 del 15/08/2013 il Commissario ha trasmesso all'IATA Serv.3 copia del progetto munito di tutti i nulla di ottemperazione e tutta la documentazione tecnico-amministrativa, ai fini dell'emissione del Decreto di finanziamento. Il Decreto è stato emesso dall'IATA e sarà trasmesso al Commissario a seguito di registrazione alla Corte dei Conti.	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	Comune: professionista esterno							Arch. Gaetano Faranna (Responsabile dell'UTC)
ME	107	San Fratello	A		Opere di consolidamento centro abitato	€ 18.000.000,00	€ 18.000.000,00	La gestione dell'intervento è stata trasferita al Commissario di cui all'OPCM 3815 del 31 ottobre 2009	LAVORI ULTIMATI		Transitato nell' OPCM 3865 del marzo 2010 (Eventi alluvionali S. Fratello ME)					

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV	COD	COMUNE	TIPOLOGIA ATTIVITA'	COMITATO	TITOLO	IMPORTO da AIP	IMPORTO rimodulato	STATO di ATTUAZIONE	SAL	AFFIDAMENTO PROGETT.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI: Importo	AFFIDAMENTO LAVORI: Ribasso (%)	DECRETO DI FINANZIAMENTO: n. e data	DECRETO DI FINANZIAMENTO: Importo	RUP
ME	108	San Pier Niceto	B		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.550.000,00	€ 1.550.000,00	Intervento finanziato	Intervento finanziato							
ME	109	San Pier Niceto	A		Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante consolidamento dell'area a protezione del serbatoio del centro abitato	€ 600.000,00	€ 600.000,00	Con nota acquisita al prot. n. 4355 del 30/10/2012 invitalia ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della CdS del 21/11/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari.	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE	INVITALIA	S.G.M. SOCIETA' GEOMINIERA MEDITERRANEA SRL (Mandante) (MP)				€ -	Geom. Francesco Milio (UTC)
ME	110	San Piero Patti	B	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento e regimazione idraulica del centro abitato	€ 1.850.000,00	€ 1.850.000,00	Il Comune con nota del 15 feb 2011 chiede di trasferire l'intervento, R4P4 DP1, dalla lettera A alla lettera B, click di inserito nel PO FESR 2007/2013; Il Comitato di Indirizzo e Controllo ha accolto l'istanza del Comune nel corso della seduta del 24 febbraio 2011. Il progetto è in corso di istruttoria	Istruttoria Progetto							
ME	111	Santa Lucia del Mela	B		Consolidamento centro abitato	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 572 del 31/8/2010 per un importo di euro 1.300.000,00. In data 20/4/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "UNICOS S.r.l. - Asi Castello" con un ribasso del 31,300%. I lavori hanno avuto inizio il 18 agosto 2011	Avviati Lavori			UNICOS srl Asi Castello	18/08/11	N. 572 DEL 31/08/2010	1.300.000,00	
ME	112	Santa Lucia del Mela	B		Consolidamento ed eliminazione rischio idrogeologico perimetro urbano in Contrada Grazie in prossimità del Viale del Pini	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 88 del 1/3/2011 per un importo di euro 1.200.000,00. I lavori sono stati affidati alla CIOFALO COSTR. S.R.L.-S.Filippo del Mela (ME) con un ribasso d'asta pari al 28,201%I lavori hanno avuto inizio il 2/5/11/ 2011	Avviati Lavori			CIOFALO COSTR. S.R.L.-S.Filippo del Mela (ME)	21/11/11	N. 88 DEL 01/03/2011	1.200.000,00	
ME	113	Santa Marina Salina	A		Opere di consolidamento versante e sistemazione e protezione del centro abitato - Rrsc. Lingua e zona del faro	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	In data 27.10.2010 la progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria. A seguito della riunione del 21/06/2011, è stata data priorità agli interventi di difesa costiera dal rio Narro a Punta Lingua. Con nota prot.n. 3234 del 20.06.2012, il Provv. Interr. OO.PP. ha comunicato essere in corso la rimodulazione delle scelte progettuali.	ATTESA ADEGUAMENTO PROGETTO	Provv. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria					€ -	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)
ME	114	Sant'Agata di Militello	B		Intervento di difesa idraulica del centro abitato	€ 1.710.000,00	€ 1.710.000,00	l'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori					N. 881 DEL 25/11/2011	1.098.113,43	
ME	115_1	Sant'Angelo di Brolo	A	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barbo	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 6.000.000, è stato scorporato, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi. In data 19.10.2011 la progettazione è stata affidata al DRPC di Messina. A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 295 del 30/10/2011, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 15/11/2011. I lavori sono stati avviati il 29/11/2011. Con nota prot.n. 261/KS del 08.08.2012 il RUP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia della Perizia di Varainte e Suppletiva, per l'autorizzazione di competenza. In data 08.08.2012 è stata sottoscritta Verbale di Sospensione Lavori. Il Commissario, data l'urgenza delle attività previste nell'ambito della PrIS ai lavori, ha convocato il 31.09.2012 un tavolo tecnico, in base agli esiti della quale, con nota prot. n. 3456 del 12/09/2012 sono state richieste integrazioni alla PrIS presentata, successivamente acquisite al prot.n. 4017 del 12/10/2012. In data 19/11/2012, con D.C. n. 624, è disposta l'occupazione anticipata d'urgenza degli immobili siti nel Comune.	SOSPENSIONE LAVORI	DRPC	S.G.M. Srl	A.T.I. MONDELLO COSTRUZIONI S.R.I (Capogruppo) - RN.CA. HM. S.R.L. (Mandante)	29/11/2011	151 - 2377/2011	€ 3.000.000,00	Ing. Bruno Manfrè (DRPC)
ME	115_2	Sant'Angelo di Brolo	A	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 MAG 2012	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli	€ 2.500.000,00	€ 2.930.000,00	L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 6.000.000, è stato scorporato, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi. La progettazione è stata affidata al DRPC di Messina. Con nota acquisita al prot.n. 955 del 21/03/2012 il DRPC ha trasmesso il progetto esecutivo i Giraldo. A seguito della riunione del 08/04/2013 si è ritenuto di destinare una quota parte del finanziamento relativo all'intervento ME115_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello stralcio dell'intervento ME115_2 A seguito delle Conferenze dei Servizi del 16/08/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri degli Enti e a seguito di validazione del RUP il progetto è stato finanziato con Decreto n. 301 del 28.06.2012. Con Decreto n. 182 del 15/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il Contratto è stato stipulato in data 25/10/2012 Con Decreto Commissariale n. 638 del 22/11/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilita' e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	CONTRATTO STIPULATO	DRPC	GIUDICE	GIUDICI' A. TRIVELLADORI	-	n. 301 del 28/08/2012	€ 2.930.000,00	Geom. Vittorio Riccardi (Comune)
ME	115_3	Sant'Angelo di Brolo	A	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 MAG 2012	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano	€ 2.500.000,00	€ 2.070.000,00	L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 6.000.000, è stato scorporato, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi. Con nota prot.n.425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia. In data 21/03.2012 l' DRPC ha trasmesso copia dei risultati delle indagini geognostiche e geotecniche affidatarie propedeutiche alla progettazione. In virtù dell'accordo quadro stipulato, le CGIAM, , con note acquisite ai prott. n. 753 del 07/03/2012, e 1781 del 16/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati. A seguito della riunione del 05/04/2012 si è ritenuto di destinare una quota parte del finanziamento relativo all'intervento ME115_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello stralcio dell'intervento ME115_2 Con nota prot. 3394 del 28/06/2012 il Commissario, a seguito di richiesta di CGIAM, ha chiesto al DRPC di voler fornire integrazioni allo studio geologico già effettuato, ad oggi non pervenute. A seguito di riscontro negativo alle integrazioni richieste, il Commissario, con note prot.3132 del 08/09/2012, ha invitato il Dott. Geol. Filippo Cappotto a fornire supporto al gruppo di progettazione per la stesura del progetto esecutivo. Il Dott. Geol. Filippo Cappotto, con nota prot.n. 4808 del 20/11/2012 ha trasmesso all'Ufficio del Commissario le integrazioni geologiche richiestegli.	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	MCR.RO	-	-	-	€ -	Geom. Tindaro Pino Scaffidi (Comune)
ME	118	Savoca	B	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento centro abitato	€ 1.200.000,00	€ 1.195.875,88	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 73 del 22/2/2011 per un importo di euro 1.195.875,88. I lavori sono stati affidati alla Cadore Asfalti s.p.a. Belluno con un ribasso d'asta pari al 23,1. Il contratto è stata stipulato in data 09/05/2011	Contratto stipulato			Cadore Asfalti s.p.a. Belluno		N. 71 DEL 21/03/2011	1.195.875,88	
ME	117_1	Scaletta Zanclea	B	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scaletta Superiore, della fraz. Divieto e della c/da Guidomandri Superiore Codice PAI 102-552-086 codice PAI 102 552 016	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00	istruttoria in corso	Istruttoria Progetto							
ME	117_2	Scaletta Zanclea	B	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scaletta Superiore, della fraz. Divieto e della c/da Guidomandri Superiore Codice PAI 102-552-020 codice PAI 102 552 029	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	istruttoria in corso	Istruttoria Progetto							
ME	117_3	Scaletta Zanclea	A	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scaletta Superiore, della fraz. Divieto e della c/da Guidomandri Superiore Codice PAI 102-527-004 codice PAI 102 552 004	€ 1.300.000,00	€ -	Nel corso della riunione del 15 settembre 2011 il Comitato decide di riscrivere il finanziamento dell'intervento ME118 erroneamente revocato nel corso della riunione del 24 febbraio. L'intervento che riceve copertura finanziaria con altri fondi è il 117_3, si procede pertanto alla revoca del relativo finanziamento	INTERVENTO REVOCATO	-						

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.01.2010"
Ex D.P.C.M. 16 dicembre 2010

ELENCO INTERVENTI 4 e 8

PROV	CUP	COMUNE	TIPO INTERV.	EVOLUZIO	STATO	IMPORTO A.d.P.	IMPORTO finanziato	STATO DI ATTUAZIONE	LAV.	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO ESECUZIONE	AFFIDAMENTO LAVORI: Impresa	AFFIDAMENTO LAVORI: Data lavori	COLLAUDO: TRASMESSO: n. e data	COLLAUDO: APPROVATO: importo	RUP
ME	118	Scaletta Zanclea	B	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Sistemazione idraulica a monte dell'autostrada - Zona Torrente Rocca Cudia - PAI ME-142-UO1	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	Non corso delle riunioni del 19 settembre 2011 il Comitato decide di rimodulare il finanziamento dell'intervento ME118 precedentemente revocato nel senso della riunione del 26 febbraio. L'intervento sarà messo rapidamente finanziato con economie di € 1.400.000,00	Progetto esecutivo non pervenuto							
ME	119	Sinagra	A	-	Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Feroni	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	La progettazione è stata affidata nel PATTILIA in data 08.03.2011. in atto dell'Ufficio del Commissario Nº 1780 del 18/07/2012, ha nominato il RUP nella persona dell'ing. Giuseppe Lo Presti, e con atto successivo

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell' Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 19 dicembre 2019

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV	COD	COMUNE	CONTO ATTUALE	COMITATO	INTERVENTO	IMPORTO A+B	IMPORTO Rimodulato	STATO DI FATTO	SAL	AFFIDAMENTO PROGETT.	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	AFFIDAMENTO LAVORI: IMPRESA	AFFIDAMENTO LAVORI: RIBASSO LAVORI	DECRETO DI FINANZIAMENTO: N. e data	DECRETO DI FINANZIAMENTO: importo	RUP
ME	127	Torto rici	B*	COMITATO 18 FEB 2011	Muri e paratie montevalle e scarp ishalauche – Zona S. Paolo	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3584 del 09/02/2012 TARTA Serv.3 ha comunicato all'Ufficio del Commissario di aver individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento ad ha invitato il Comune a trasmettere sulla documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto. Con nota prot. n. 2845 del 06/03/2013 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato della documentazione amministrativa. Con nota acquisita al prot.n. 2761 del 17.07.2013 il Comune ha trasmesso alla Struttura Commissariale tutta la documentazione inerente gli incarichi professionali conferiti. Con nota prot.n. 3297 del 23.08.2012 il RUP ha chiesto al Commissario la disponibilità di figure professionali a cui affidare la redazione dello studio geologico e quant'altro di risposta la vita progettazione definitiva ed esecutiva. Il Commissario, con nota prot. n. 3293 del 03/09/2012, ha confermato al RUP il nulla osta all'immediato avvio della procedura per il conferimento dei nuovi incarichi. In data 04/12/2012, con nota prot.n. 3108, il RUP ha trasmesso al Commissario richiesta di integrazioni al piano di indagini geognostiche ricevuta dalla ATI Dinamica srl - Studio Calonna srl.	PROGETTAZIONE IN CORSO	-	€ -	-	-	-	-	-	
ME	128	Torto rici	A	-	Muri e barriere paramassi – Zona Batana-Pagliara 3 Lecce	€ 500.000,00	€ 500.000,00	A seguito di procedura di gara la progettazione è stata affidataccon Decreto Commissariale n. 183 del 09.08.2011 a professionista esterno. Con Decreto n. 251 del 03.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alla progettazione è stata affidata alla ditta Geomeria, che ad oggi ha completato le attività. In data 10.02.2012 è stata trasmessa al progettista la studio geologico esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della progettazione. Con nota acquisita al prot. n.3048 del 07/06/2012 il progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della Conferenza di Servizi del 25/06/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2758 del 17/07/2012 ha trasmesso il verbale di verifica e validazione e l'attestazione del Direttore dei lavori in merito alla immediata cantierabilità degli stessi Con Decreto n. 374 del 08/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento,e con Decreto n. 849 del 27/11/2012 è stato approvato lo schema lettera d'invito alla Procedura di gara.	AFFIDAMENTO LAVORI	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)	GEOMERIA s.r.l.	-	-	-	574 - 06/11/2013	€ 476.038,45	Geom. Buttafarro Carmelo (UTC)
ME	129	Torto rici	B	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento, regimazione idraulica e drenaggi – Zona via Zappulla	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n.393 del 09/07/2012.	Affidamento Lavori					N. 393 del 9-lug-12	3.897.104,56	
ME	130	Tusa	B*	COMITATO 24 FEB 2011	Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni – Zona Castel di Tusa (alias Barcarà Jonia)	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	La progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria, in data 09.12.2010. In data 10.01.2013, con nota prot.n. 370, il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria ha trasmesso il progetto definitivo aggiornato. In sede di Conferenza del 19/02/2013 sono stati acquisiti i pareri con prescrizioni ed il Provv. Interr. OO.PP., con nota acquisita al prot.n. 1930 del 21.02.2013, ha trasmesso il progetto definitivo inoltrato dal Commissario all'ARTA, con nota prot.n. 1029 del 27.06.2012, ai fini dell'emissione del Decreto di Pronuncia Ambientale. In data 11/06/2012 l'Area Serv. 3 ha trasmesso il D.D.G. n. 396 del 06.07.2012 con cui è stato modificato e sostituito l'art. 4 del D.D.G. n. 390 del 24/05/2012 di finanziamento del progetto esecutivo. Con nota prot. n. 3420 del 13/06/2012, il Commissario ha trasmesso il D.D.G. di Provvedimento Interregionale OO.PP Sicilia e Calabria - Incaricato ed affidato, in tempi brevi,l'iter di affidamento dei lavori In data 23/10/2013, con nota acquisita al prot.n. 4178, il RUP ha comunicato l'aggiudicazione dei lavori. I lavori sono stati consegnati in data 16/11/2012 ed avranno una durata di circa 540 giorni.	Affidamento Lavori	Provv. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria	€ -	Costruzioni Mare Tecnitalia snc	-	-	-	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)
ME	131	Ucria	B*	-	Consolidamento del Centro Urbano in località Vasile - Belvedere	€ 1.241.000,00	€ 1.241.000,00	Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2847 del 25/06/2013 TARTA Serv.3 ha comunicato al Commissariato avente individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento ed ha invitato il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto. Con nota prot. n. 2986 del 25/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa. Con nota prot. n. 3089 del 01/08/2012 il Comune ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia del progetto e di tutti gli atti amministrativi richiesti.	PROGETTO IN FASE DI VALUTAZIONE PARERI	Ing. Cosentini Matteo	€ -	-	-	-	-	-	Geom. Gianfranco Vinciullo
ME	132	Ucria	A	-	Consolidamento mediante paratie e protezione dei fabbricati,opere di drenaggio – Zone via Annunziata	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	La progettazione è stata affidata a INVITALIA in data 08.06.2011. In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari. Con Decreto Commissariale n. 129 del 26.03.2012 è stata disposta l'approvazione definitiva per la realizzazione del Piano di indagini preliminari ed il contratto è stato firmato in data 04/04/2012 . In data 13/10/2012, con nota acquisita al prot.n. 4240, la CGIAM ha trasmesso la Relazione Geologica dell'intervento.	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	5.6 Mail	-	-	-	€ -	-	Ing. Sidoti Pino Benedetto

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.02.2010"
Ex O.P.C.M. 19 dicembre 2008

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A e B

AVEN'	COD	COMUNE	TORTO ATTUA'	COMITATO	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO dell'ATTIVITA'	SAL	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI: Impresa	AFFIDAMENTO LAVORI: data inizio lavori	DECRETO DI FINANZIAMENTO: n. e data	DECRETO DI FINANZIAMENTO: importo	RUP
ME	133	Valdina	B		Protezione, Consolidamento e sistemazione idrogeologica dell'abitato di Valdina Centro - versante Est	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 215 del 6/6/2011 per un importo di euro 3.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla ATIN ASC srl con un ribasso d'asta pari al 24,398%.	Contratto stipulato			ATIN ASC srl		N. 211 DEL 06/04/2011	3.000.000,00	
ME	134	Venetico	B		Consolidamento del centro abitato	€ 1.554.100,81	€ 1.554.100,81	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 492 del 7/7/2010 per un importo di euro 1.554.100,81. In fase di espletamento la procedura per l'indizione della gara.	Affidamento Lavori					N. 492 DEL 06/07/2011	1.554.100,81	
ME	176	Giardini Naxos	B	COMITATO 24 MAR 2011	Erosione costiera	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto							
ME	177_Int	Brolo	A	AdP Integrativo	Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da Ionnello Alto	€ 600.000,00	€ 600.000,00	L'intervento è stato inserito nell'AdP integrativo. In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CDIAM, con nota assunta al prot. n. 498 del 16/02/2012, ha trasmesso i preventivi di rendicontazione dei rilievi effettuati. Con nota prot. n. 1336 del 19/04/2012 il Commissario ha affidato la progettazione a INVITALIA	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	-	-	-	-	€ -	Arch. Mario Messina (UTC)	
ME	178	Capri Leone	A	AdP Integrativo	Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Il progetto è stato inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune. Il Comune con nota prot. n. 1271 del 13/04/2012 ha trasmesso la documentazione relativa al conferimento degli incarichi per lo studio geologico e per la progettazione ed il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3043 del 06/08/2012 il progettista incaricato ha trasmesso progetto esecutivo dell'intervento. A seguito delle CdS tenutasi giorno 30/10/2012 tutti i pareri si intendono acquisiti con esito positivo.	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE	ph3 Engineering s.r.l	-	-	-	-	€ -	Arch. Gianpiero Di Magni	
PA	135	Altofonte	B	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento centro abitato	€ 800.000,00	€ 789.270,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 143 del 10/3/2011 per un importo di euro 789.270,00. I lavori sono stati affidati alla Ditta Geom. Carmelo Cangemi con un ribasso d'asta pari al 23,827 %. Il Contratto è stato stipulato in data 29/02/2012 e la consegna lavori è avvenuta l'11/04/2012	Avvioti Lavori			Geom. Carmelo Cangemi	11/04/12	N. 143 DEL 16/03/2011	789.270,00	
PA	136	Belmonte Mezzagno	A	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 24 MAR 2011	Opere di consolidamento del canale di gronda, regimazione corsi d'acqua e revisione canale a protezione del centro urbano	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	La progettazione è stata affidata all'DRPC di Palermo con nota prot. n. 694 del 24/11/2010. In riscontro alla nota di sollecito alla trasmissione del progetto da parte del Commissario prot. 936 del 28/06/2011, il DRPC di PA, con nota acquisita al prot. n. 1984 del 5/10/2011, ha rappresentato la necessità di un maggior tempo per la redazione della progettazione per la complessa situazione riscontrata e le difficoltà tecniche connesse alla buona riuscita dell'intervento. A seguito della nota del Commissario prot. n. 3298 del 19/09/2012, con cui sollecitava il DRPC di Pa a trasmettere il progetto esecutivo, con nota acquisita agli atti al prot. n. 3571 del 30/09/2012, il DRPC di Pa ha comunicato di stan provvedendo alla redazione del piano particellare di esproprio, e successivamente alla convocazione delle CdS per acquisire i pareri propedeutici alla validazione del progetto,per poi trasmettere tutti gli atti all'Ufficio del Commissario per il seguito di competenza.	PROGETTAZIONE IN CORSO	DRPC Pa	-	-	-	-	€ -	Ing. Foti DRPC Pa	
PA	137_1	Bivio	A	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di sistemazione idraulica burrone San Domenico Malpasso e consolidamento del centro urbano	€ 1.310.000,00	€ 1.310.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 28/09/2011. A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 67 del 24/05/2011. A seguito dell'espletamento di gara con Decreto Commissariale n. 300 del 27/10/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della CEIT di GIUSEPPE MAMMOLITI. La consegna dei lavori è avvenuta il 06/12/2011. A seguito della richiesta avanzata dalla D.L. di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, autorizzata dal RUP con nota prot. n.3594 del 31/05/2012, la stessa DL ha trasmesso la perizia assunta al prot. n. 3983 del 24/07/2012 ed approvata dal RUP in data 29/08/2012 Con Decreto Commissariale n. 443 del 06/09/2012 si è provveduto a prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 e della rimodulazione del quadro economico di impegno della somma. I lavori sono ultimati in data 31/10/2012.	LAVORI ULTIMATI	Comune	-	CEIT di GIUSEPPE MAMMOLITI	06/12/2011	n. 67 del 24/05/201	€ 1.310.000,00	Ing. Giuseppe La Placa
PA	137_2	Bivio	A	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento del centro urbano e monte e a valle del quartiere Macelli	€ 690.000,00	€ 690.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 28/09/2011. A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 87 del 10/06/2011 A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 158 del 29/07/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori avviati in data 07/08/2011. Con nota acquisita al prot. n.493 del 16/01/2012 la D.L. ha evidenziato la necessità di effettuare nuovi lavori da inserire in una perizia di variante e suppletiva, la cui stesura è stata autorizzata dal RUP con nota prot. n.549 del 20/02/2012. La PVS è stata trasmessa dalla DL con nota acquisita al prot. n. 943 del 15/03/2012, approvata dal RUP in data 19/03/2012 e notificata dal Commissario con Decreto n. 148 del 02/04/2012. I lavori sono ultimati in data 26/03/2012.	LAVORI ULTIMATI	Comune	1	Arcobaleno 3000 Srl	07/09/2011	n. 87 del 10/6/2011	€ 690.000,00	Ing. Giuseppe La Placa
PA	138	Caltavuturo	B	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 24 MAR 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento centro abitato	€ 811.000,00	€ 798.690,51	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 352 del 18/4/2011 per un importo di euro 798.690,51. I lavori sono stati affidati alla Torsten Costruzioni con un ribasso d'asta pari al 23,253,3 Convento è stato stipulato in data 22/03/2012 e la consegna lavori è avvenuta l'02/02/2012	Avvioti Lavori			Torsten Costruzioni Srl	02/02/12	N. 252 DEL 18/04/2011	798.690,51	
PA	139	Campofelice di Roccella	B	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento - C/da Belvedere	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto							
PA	140	Camporeale	B	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	L'intervento tramite, in ottemperanza alla determinazioni del Comitato del 15 settembre 2011 della lettera A alla lettera B. Progetto ancora non pervenuto	Progetto ancora non pervenuto	GC	Geria Civile					

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV	COD	COMUNE	FUNZ. ATTUAT.	COMITATO	TITOLO	IMPORTO AAP	IMPORTO Rimodulato	STATO DI FATTO	SAL	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO ESECUZIONE	AFFIDAMENTO LAVORI		DECRETO DI FINANZIAMENTO		RUP
												Impresa	Data inizio lavori	n. e data	Importo	
PA	141	Capaci	A	COMITATO 24 FEB 2011	Consolidamento centro abitato	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	Facendo seguito alle determinazioni del Comitato del 24/02/2011 che hanno determinato il passaggio dell'intervento in A, l'ARTA, con nota acquisita al prot. n.528 del 18/04/2011 ha trasmesso tutta la documentazione tecnico-amministrativa dell'intervento. La progettazione è stata affidata dai progettisti esterni incaricati dal Comune. In data 07/02/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha fornito indicazioni per la definizioni della problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. Con Decreto Commissariale n.380 del 25/04/2012 il Commissario ha acquisito il progetto i stralcio esecutivo. A seguito della conferenza dei servizi del 30/05/2012 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento . Con nota acquisita al prot. n. 2902 del 27/07/2012 il RUP ha trasmesso gli atti di approvazione e validazione del progetto. Con Decreto Commissariale n. 450 del 02/08/2012 è stato finanziato l'intervento. Con Decreto Commissariale n. 532 del 09/10/2013, è stato disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed è in corso di stipula il Contratto	AFFIDAMENTO LAVORI	Dott Ing Carlo Barbuzza.		-	ZACCARA COSTRUZIONI Srl	-	n. 410 del 02/08/2012	€ 1.200.000,00	Arch. Giovan Battista Dragotta (Comune)
PA	142	Carini	A	-	Barriere paramassi - Zona Industriale	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Con nota prot. n. 520 del 18/04/2013 la progettazione è stata affidata ad INVITALIA, mentre con nota prot. n. 2758 del 05/12/2011, i rilievi propedeutici alla progettazione sono stati affidati al Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo "CGIAM". Con nota acquisita al prot. n. 3533 del 17/06/2013 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche ed i relativi allegati riguardanti il programma operativo per l'esecuzione del piano di indagini preliminari Con Decreto Commissariale n. 589 del 07/11/2013 sono state approvate le specifiche tecniche afferenti il Piano di Indagini Preliminari e con Decreto Commissariale n. 663 del 03/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle stesse	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	GEO R.A.S. S.r.l.	-	-	-	-	€ -	Ing. Antonino Cracchiolo
PA	143	Castelbuono	A	-	Opere di drenaggio e consolidamento – C.da Uccia	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	La progettazione è affidata al GC di Palermo; Con nota prot. n.978 del 28/06/2011 è stato sollecitato il GC alla trasmissione del progetto esecutivo. Con nota del 08/11/2013 il GC Pe ha chiesto al Dott Antonio Rubino di poter acquisire lo studio geologico-tecnico eseguito per conto della Procura della Repubblica e di poterlo utilizzare a supporto della progettazione esecutiva. A tutt'oggi è in corso una campagna di monitoraggio finanziata dal DRPC di PA di cui si resta in attesa dei risultati. Il Commissario, facendo seguito alla nota prot. n. 3861 del 09/10/2012, con la quale concedeva al GC di Pe 20 giorni per la trasmissione del progetto esecutivo PA 143 A - Castelbuono "Opere di drenaggio e consolidamento c.da Uccia" , con nota prot. n. 4383 del 29/10/2012 ha revocato tutti gli incarichi/liveRazioni alla realizzazione delle opere, compreso quello di RUP. Il Commissario con nota prot. n. 4570 del 29 ottobre 2012 ha affidato la progettazione a INVITALIA, che ha comunicato il GdL con nota acquisita al prot. n. 4438 del 23/10/2012. Il Commissario, con nota prot. n. 5292 del 10/12/2012 ha chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, di poter acquisire copia della consulenza tecnica al fine di ottenere dati e informazioni utili alla realizzazione dell'intervento.	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	-		-	-	-	€ -	Ing. Santi Sottile
PA	144	Castronovo di Sicilia	B		Opere di consolidamento del centro abitatoversante Est a difesa della Scuola Elementare di Via Mazzini,ecc.	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 186 del 28/3/2011 per un importo di euro 1.600.000,00. lavori sono stati affidati in SCF Costruzioni s.r.l. con un ribasso d'este pari al 21,062% Il Contratto è stato stipulato in data 17/05/2012 e le consegna lavori è avvenuta il 12/09/2012	Avviati Lavori			CF Costruzioni s.r.l.	21/06/12	N. 186 DEL 28/03/2011	1.600.000,00	
PA	145	Castronovo di Sicilia	B	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento centro urbano	€ 1.344.900,00	€ 1.344.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 359 del 21/06/2012 sono in corso la procedure di affidamento	Affidamento Lavori					n. 359 del 22-giu-12	1.291.335,45	
PA	146	Geraci Siculo	B		Progetto di consolidamento della zona nord orientale	€ 1.057.000,00	€ 1.057.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 909 del 2/12/2010 per un importo di euro 1.057.000,00. In data 30/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "Costruzioni San Giuseppe di Lanza Vincenza s.a.s" con un ribasso del 15,4850%. In data 14/6/2011 rapportuta gara e seguita ricorso della seconda classificata. nuova aggiudicazione alla impresa Di Maria Costruzioni srl con un ribasso del 32,4625% Lavori avviati il 13/04/2012e contratto firmato il 29/05/2012	Avviati Lavori			SI Maria Costruzioni srl	11/04/12	N. 909 DEL 02/12/2010	1.057.000,00	
PA	147	Marineo	B		Consolidamento centro abitato	€ 2.257.528,00	€ 2.257.528,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 290 del 3/5/2011 per un importo di euro 2.257.528,00 I lavori sono stati aggiudicati con un ribasso del 23,383. I lavori sono stati avviati il 29/12/2011	Avviati Lavori			ATI Costr. San Giuseppe di Lanza Vincenza e C.s.a.s.Catalano Francesco Mussomeli	29/12/11	N. 290 DEL 03/05/2011	2.257.528,00	
PA	148	Mezzojuso	B*	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento – Zona Collina Brigna	€ 2.144.000,00	€ 2.144.000,00	Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3295 del 22/06/2012 l'ARTA ha trasmesso all'Ufficio del Commissario la nuova Area Beneficiaria il progetto e la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'intervento inviatagli il Comune trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto in singola personale. Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati invitati alla formalizzazione comunale che i progettisti incaricati per effettuare la stabilità che si sono presentate nel corso dell'aggiornamento del progetto.	progettazione in corso	-		-	-	-	-	-	-
PA	149	Misilmeri	A	-	Opere di regimazione idraulica - C.da piano Stoppa	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	La Progettazione esecutiva è stata eseguita da progettisti esterni incaricati dal Comune di Misilmeri che con nota acquisita al prot. n. 1650 del 06/09/2011, ha trasmesso il progetto. Con nota prot. n.4707 del 02/02/2012 il comune ha trasmesso all'ARTA copia del progetto esecutivo per l'emissione del parere di competenza, parere poi acquisito al prot. 1011 del 26/03/2012 con esito negativo. Il Commissario, in riscontro alla nota acquisita al prot. n. 3286 del 22/06/2012 con cui il RUP ha trasmesso unitamente alla validazione e alla Deliberazione di G.M. n. 41 del 15/06/2012 di approvazione amministrativa, il progetto esecutivo e" fatto focalizzare, senza le giustificazioni e/o chiarimenti sulle procedure dell'affidamento dell'incarico professionale e senza le modifiche alle soluzioni progettuali delle opere richieste dall'ARTA Sez.3, ha ritenuto che avrebbe provveduto ad avviare nuova procedura per il conferimento dell'incarico di progettazione dell'intervento. Con nota prot. n.4251 del 25/10/2012 il Commissario ha trasmesso alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011 aggiungendo l'intervento - PA 149 Misilmeri. Con nota prot. n. 4827 del 26/11/2012, il Commissario ha invitato il Comune a trasmettere il progetto preliminare dell'intervento, per poter procedere ad avviare nuova procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione, richiesta reiterata con nota prot. n. 5229 del 10/12/2012.	PROGETTAZIONE IN CORSO	Ing. Paolino Rizzolo	€ -	-	-		-	€ -	Irene Gullo
PA	150	Palermo	B	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di regimazione idraulica - C.da Belmonte Chiavelli	€ 4.300.000,00	€ 4.300.000,00	In data 28/9/2016 affidata la progettazione al Genio Civile di Palermo. In corso di stipula contratto.	Affidamento Lavori	GC	Genio Civile	I.C.M. - Impresa Costruzioni Moderne - Agrigento		N. 880 DEL 25/11/2011	4.206.186,56	

Pagina 19 di 23

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 26.05.2010"
Ex O.P.C.M. n°3906/2010

ELENCO INTERVENTI n° 8

PROV	CODI	COMUNE	Quadro ATEGIAT	TITOLO		IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DI FATTO	SAL	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO LAVORI			ESECUTIVO		RUP
											Impresa	Importo	N. e data	Importo		
PA	180	Cefalù	A	AdP integrativo	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Tratarella	€ 90.000,00	90.000,00	A seguito della convenzione stipulata in data 29/11/2011 il Commissario ha trasmesso la CGM il medesimo in conferma recente per la realizzazione delle indagini geologiche #Commissario, con nota prot. n. 1761 del 01/12/2011 ha affidato la progettazione ed ha trasmesso la documentazione acquisita. Le attività di indagine hanno avuto inizio il 14/05/2012 e sono state completate in data 20/06/2012. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 06/08/2012 hanno trasmesso gli elaborati progettuali definitivi per la verifica ai sensi dell'art. 54 della L.R. 19/96 e s.m.i. in relazione alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale viene altresì sancita la necessità di avviare la procedura di verifica ex art. 54 della L.R. 19/96 e s.m.i. #Commissario, il Prot. con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012, ha trasmesso alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Pa per l'espressione del parere di competenza. Il progetto esecutivo è stato approvato con Decreto Commissariale n. 1350 del 02/08/2012 e sono stati espletati l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dell'opera di indagine preliminari. Le attività di indagine hanno avuto inizio il 14/05/2012 e sono state completate in data 20/06/2012. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 06/08/2012 hanno trasmesso gli elaborati progettuali definitivi per la verifica ai sensi dell'art. 54 della L.R. 19/96 e s.m.i. in relazione alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell' Accordo di Programma siglato il 30.01.2010"
Ex D.P.C.M. 15 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV	COD	COMUNE	FUNZ. ATTUAT.	COMITATI	LUOGO	IMPORTO AAP	IMPORTO Rimodulato	STATO DI ATTUAZ.	SAL	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO LAVORI	AFFIDAMENTO LAVORI		DECRETO DI FINANZIAMENTO		RUP
												Impresa	data inizio lavori	n. e data	Importo	
SR	161	Avola	A		Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica - C.da Cavagrande del Cassibile	€ 600.000,00	€ 600.000,00	La progettazione è stata affidata, con nota prot. n. 306 del 28/09/2010, all'DRPC SR che ha trasmesso il progetto esecutivo con nota acquisita al prot.n. 1223 del 25.07.2011. A seguito delle verifica degli elaborati e delle richieste di opportune modifiche da parte del Commissario con nota prot.n. 1976 del 04.10.2011, l'DRPC di SR ha trasmesso le integrazioni al progetto con nota acquisita al protocollo n.1063 del 28.02.2012. Con Decreto Commissariale n. 238 del 24/05/2012 si è finanziato il progetto esecutivo. Con Decreto Commissariale n. 861 del 03/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il Contratto è stato stipulato in data 11/12/2012	CONTRATTO STIPULATO	DRPC SR		-	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.c.a.r.l.	-	Decreto Commissariale n. 238 del 24/05/2012	€ 600.000,00	Dott. Geol. Gaetano Marino (DRPC SR)
SR	162	Carlentini	A		Messa in sicurezza costone centro abitato – Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei caduti	€ 800.000,00	€ 800.000,00	La progettazione è stata inizialmente affidata all'U.P.R.C. di Siracusa con nota n. 616 del 13/11/2010 non avendo svolto alcun riscontro e ritenuto il carattere di urgenza, il Commissario con nota prot. n.479 del 15/02/2012, ha revocato l'incarico. Con nota prot. n. 1342 del 20/04/2011 è stato incaricato la CGIAM per la predisposizione del piano di indagini preliminari, mentre la progettazione è stata affidata ad INVITALIA con nota prot. n. 1343 del 20/04/2012. Le specifiche tecniche per la realizzazione delle indagini preliminari sono state trasmesse dalla CGIAM con nota acquisita agli atti al prot. 2876 del 25/07/2012 e sono state approvate con Decreto Commissariale n. 438 del 03 Settembre 2012. Con Decreto Commissariale n. 484 del 12/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari e le indagini sono ad oggi concluse	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	GEOMETRI S.r.l.	-	-	-	-	€ -	Geom. Francesco Ingalisi
SR	163	Pachino	A	COMITATO 24 FEB 2011	Intervento in Contrada Ranedili	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	La progettazione è stata affidata a INVITALIA, nomine con Decreto n. 121 del 23/03/2012 sono state approvate convenzioni e contratti con le università di Catania, Messina, Palermo e con la DHI Italia. Con nota acquisita al prot. n. 2758 del 6/12/2011 il DICA ha trasmesso la relazione su "Rilievi batimetrici, prelievo e analisi granulometriche dei sedimenti marini", l'Università di Messina con nota acquisita all'prot. n. 368 del 01/02/2012 ha trasmesso la relazione su "Analisi diacroniche delle tendenze evolutive del litorale del Comune di Pachino (SR) compreso tra Punta Castellazzo e Punta delle Formiche", la DHI Italia acquisita al prot 363 del 01/02/2012 ha trasmesso la relazione su "Applicazione e processamento dei dati del modello d'onda Mar Mediterraneo di MetF Office per: tre celle situate a largo della costa Sud- Orientale della Sicilia". Con Decreto n. 194 del 26/04/2012 è stata approvata la convenzione con CNR per la "ricerca, l'individuazione e caratterizzazione di cave di sabbie relitte sulla piattaforme siciliana nell'area prospiciente il golfo di Gela". Con Decreto Commissariale n. 408 del 02 Agosto 2012 è stato approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione stipulata con il CNR in data 18/04/2012. Con nota protocollo n. 3825 del 08/10/2012 il CNR ha trasmesso il Rapporto Tecnico Finale delle attività relative alla Convenzione stipulata in data 30/03/2012. Il RUP, con nota acquisita al protocollo n. 4085 del 16/10/2012, ha trasmesso al Commissario gli elaborati relativi alle tre nuove zazzeri d'intervento. Con nota protocollo n. 5026 del 29/11/2012 il Commissario ha chiesto al DAP di Regusa la trasmissione dei risultati della caratterizzazione dei sedimenti portuali da esso effettuati nel porto di Pozzallo, necessari per la definizione delle scelte progettuali per l'attuazione dell'intervento.	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	-	-	-	-	-	€ -	Ing. Marco Calogero
SR	164	Portopalo di Capo Passero	B		Opere di salvaguardia e difesa del centro abitato	€ 719.000,00	€ 719.000,00	Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto							
SR	165	Portopalo di Capo Passero	A	-	Ripristino e stabilizzazione scarpate - ripristino e protezione litorale – Zona C.da Casuzze-Scalo mandria	€ 800.000,00	€ 800.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune di Portopalo di Capo Passero. Si è in attesa del progetto esecutivo in quanto necessita della verifica di assoggettabilità alla VIA presso il Servizio 1 VIA-VAS dell'ARTA, per cui il comune ha già avviato la procedura di verifica. Il Commissario ha sollecitato l'ARTA Serv 1 VIA/VAS con nota prot. n. 3486 del 12/09/2011	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	COMUNE	-	-	-	-	-	€ -	Geom. Mario Poidomani (Comune)
SR	166	Rosolini	3*	-	Opere di consolidamento nel centro abitato	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3296 del 23/08/2012 l'ARTA Serv.3 ha trasmesso il progetto e la documentazione prominente a nuova istruttoria al progetto al Commissario invitando il Comune di Ibrahim a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto. Con nota protocollo n. 3327 del 28/08/2012 il RUP ha comunicato che tutti la documentazione tecnica-amministrativa relativa al progetto è stata consegnata all'ufficio del Commissario in data 28/08/2012.	PROGETTAZIONE IN CORSO	COMUNE	-	-	-	-	-	-	Arch. Giovanni Calabrese (UTC)
SR	167	Rosolini	A	-	Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Mastrugno	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	La progettazione è stata affidata la Comune (ha con nota acquisita agli atti al prot. n. 537 del 13/05/2011 ha trasmesso il progetto esecutivo. Il Commissario con nota prot n. 1796 del 6/10/2011 ha chiesto alcuni chiarimenti al Comune e rappresentato la mancanza di alcuni pareri necessari all'approvazione e finanziamento progetto nonché della comunicazione del RUP relativa ai vincoli presenti sull'area oggetto dell'intervento. In sede di Conferenza dei Servizi del 16/05/2012, e nei giorni successivi, sono stati acquisiti i pareri e le autorizzazioni utili per l'approvazione dell'intervento, tra cui il parere del GC di SR che ha chiesto integrazioni per poter esprimersi. Le integrazioni sono state trasmesse dal Comune con note acquisite ai prot. n. 1947 del 31/05/2012 e n. 2176 del 14/06/2012. Con Decreto n. 427 del 22/08/2012 è stato finanziato del progetto esecutivo dell'intervento. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 534 del 15/10/2012è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.	CONTRATTO STIPULATO	COMUNE		-	Unifica Soc Coop.	-	Decreto Commissariale n. 417 del 12/08/2012	€ 1.315.000,00	Geom. Vindigni Giuseppe
SR	177	Carlentini	A	COMITATO 24 MAR 2011 COMITATO 15 SET 2011	Regimazione e riduzione rischio idraulico e difesa del centro abitato (3° stralcio)	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune che con nota acquisita al prot. n. 439 del 31/04/2011 ha trasmesso gli elaborati progettuali. Con nota acquisita al prot. n. 3161 del 12/08/2011, il Comune ha trasmesso variazioni tecniche ritenute necessarie, ma che non hanno modificato gli obiettivi di riduzione del rischio idraulico dell'area oggetto di intervento. A seguito dell'iscrizionamento dell'istanza di variante tecnica nel corso del comitato del 15/09/2011, il Commissario, con nota prot. 1821 del 11 set 2011, ha autorizzato il comune a procedere alle modifiche progettuali richieste. Con nota prot. n. 670 del 29/02/2012 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo rivisitato. In sede di Conferenza dei Servizi del 09/03/2012 sono stati espressi tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento, che è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 347 del 28/05/2012. Con D.C. n. 429 del 23/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori, il contratto è stato stipulato in data 26/09/2012. Con Decreto Commissariale n. 837 del 21/12/2012 è stato affidato l'incarico di direzione lavori, misure e contabilità' e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.	CONTRATTO STIPULATO	COMUNE		-	Vranca Costruzioni srl	-	Decreto n. 247 del 28/05/2012	€ 2.500.000,00	Geom. Francesco Ingalisi

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 19 dicembre 2019

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV	COD	COMUNE	TIPO ATTUAZ.	COMITATO	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ITER	SAL	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO ESECUZIONE	AFFIDAMENTO LAVORI		DECRETO DI FINANZIAMENTO		RUP
												Impresa	Ass.ni Imprese Varie	n. e data	Importo	
SR	184	Avola	A	AdP Integrativo	Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	L'intervento è inserito dell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune il quale, con nota prot. n. 2938 del 20/11/2013, è stato invitato a trasmettere il progetto esecutivo entro 60 giorni. Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 135 del 25/01/2012, ha rappresentato di essere in attesa dell'ultimo parere necessario per l'approvazione della progettazione definitiva generale di un intervento più ampio, e che provvederà alla trasmissione del progetto definitivo generale approvato con l'individuazione delle opere oggetto del primo stralcio, per un importo pari a 2.000.000,00. Al fine di pervenire all'acquisizione della progettazione esecutiva di uno stralcio funzionale di un importo complessivo di € 2.000.000,00, il Commissario, con nota prot. n. 5313 del 13/12/2012, ha convocato un tavolo tecnico FSE/01/2013.	PROGETTAZIONE IN CORSO	COMUNE	-	-	-	-	€ -	Arch. Gaetano Brex (Dirigente Area 4 del Comune di Avola)
SR	185	Buscemi	A	AdP Integrativo	Consolidamento costone sottostante il Santuario	€ 300.000,00	€ 300.000,00	La Progettazione è stata affidata al Comune. L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dell'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata dell'area di intervento. Tali rilievi sono stati trasmessi dalla CGIAM con nota acquisita al prot. n. 458 del 16/02/2012. Il Comune, con nota acquisita al prot. n.1393 del 13/04/2012 ha trasmesso il progetto esecutivo. In sede di Conferenza di Servizi del 26/04/2012 sono stati acquisiti gli assensi tra parte degli enti interessati all'approvazione del progetto, ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 1909 del 21/06/2012 ha trasmesso il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo. Con nota prot. n. 5309 del 06/09/2012, il Commissario comunica alla CGIAM la revoca dell'incarico conferito per SR 185. Con Decreto n. 319 del 09/5/2012 è stato finanziato il progetto. Con Decreto Commissariale n. 449 del 07/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto. I lavori sono stati avviati in data 23/10/2012 e la data di ultimazione è prevista per il 30/02/2013.	AVVIATI LAVORI	COMUNE	-	TECNO COSTRUZIONI Srl	41.335,00	n.193 del 09/07/2012	€ 300.000,00	Geom. Giuseppe Ferrara
SR	186	Portopalo di Capo Passero	A	AdP Integrativo	Regimazione acque e consolidamento scarpata	€ 600.000,00	€ 600.000,00	L'intervento è inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata ad INVITALIA con nota prot. n. 553 del 30/03/2011. L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dell'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM)al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata. La CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 753 del 07/09/2012, ha trasmesso la restituzione parziale degli elaborati Con nota acquisita al protocollo n. 2415 del 28/06/2012 la CGIAM, a seguito della presa d'atto del RUP, ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini. Il RUP, con nota protocollo n. 3021 del 03/08/2012, ha trasmesso la determinazione di modifica della presa d'atto delle specifiche tecniche delle indagini preliminari a supporto della progettazione esecutiva, approvata e finanziata con Decreto n. 452 del 21/09/2012. Con Decreto n. 521 del 4/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per il piano di indagini preliminari e in data 09/10/2012 è stato sottoscritto il contratto. I risultati delle indagini eseguite sono state acquisite al prot. n. 4961 del 26/10/2012.	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	GEOSERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI Srl	-	-	-	€ -	Geom. Mario Paldomani
SR	187	Rosolini	A	AdP Integrativo	Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune. Con nota prot. n. 130 del 18/01/2012 il Comune ha riferito che per la definire la progettazione esecutiva aveva necessità di svolgerai di consulenze specifiche (indagini idrauliche, idrogeologiche e geotecniche, condivimento della sicurezza) e ha chiesto autorizzazione. Il Commissario, con nota prot. n. 169 del 19/01/2012, ha comunicato al Comune di aver già incaricato la CGIAM per la realizzazione delle indagini geologiche, autorizzando il conferimento delle altre consulenze specifiche richieste. Con Decreto Commissariale n. 488 del 21/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini ed in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto. Con nota acquisita al prot. n. 4427 del 31/10/2012l'impresa ha trasmesso il verbale di consegna delle aree ed un parziale avvio dei lavori in quanto ancora in attesa della mappatura dei sottoservizi già richiesta al comune. Con nota acquisita al prot. n. 4508 del 08/11/2012 l'impresa ha comunicato di non essere ancora in possesso delle mappature dei sottoservizi, pertanto, ha chiesto la sospensione dei lavori. A Seguito della risoluzione delle problematiche incontrate, l'impresa ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 5155 del 05/12/2012, gli elaborati tecnici delle indagini effettuate.	PROGETTAZIONE IN CORSO	COMUNE	S.G.M. Società Geognostica Mediterranea Srl	-	-	-	€ -	Geom. Giuseppe Vindigni
SR	188	Siracusa	A	AdP Integrativo	Lavori di ripristino e consolidamento della falesia	€ 3.466.092,61	€ 3.466.092,61	L'intervento è stato inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune di Siracusa, che ha trasmesso il progetto con nota acquisita al prot. n. 1155 del 04/04/2013. In sede di CdS del 17.04.2012 si è invitato il Comune a trasmettere entro 45 giorni il progetto esecutivo invitato tenendo conto di tutte le prescrizioni impartite dagli enti: tale documentazione è stata trasmessa dal Comune con nota acquisita al prot. n.1855 del 29/05/2012. In sede di ulteriore CdS del 12/06/2012 l'ARTA Serv.1 VIA/VAS ha posto l'attenzione sull'interferenza della scogliera soffolta più alicuota con la proiezia di posidonia presente nel sito ed il Commissario ha invitato i progettisti a ridimensionare la suddetta barriera soffolta lato Punta Castelluccio in modo tale da limitare quanto più possibile l'interferenza della stessa con la posidonia, ed a presentare il progetto definitivo rielaborato entro il 18 giugno 2012. Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2222 del 19/06/2012, ha trasmesso le integrazioni richieste dall'ARTA, inviata poi al Serv.1 VIA/VAS dal Commissario con nota prot. n.2290 del 20/06/2012 per il rilascio entro 15 gg del parere di competenza. Con nota prot. n. 2877 del 30/07/2012 il Commissario ha sollecitato l'ARTA Serv. 1 VIA/VAS a trasmettere il parere di competenza ancora non prodotto. Con nota protocollo n. 3138 del 13/08/2012 la Ligma srl trasmette all'ARTA (Serv. 3) la documentazione integrativa allo studio di impatto ambientale L'ARTA (Serv. 3) con DDS n. 489 del 26/09/2012 ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo. Con nota protocollo n. 3960 del 09/10/2012 il Commissario, a seguito della visita ricognitiva del Nucleo Tecnico di Valutazione degli Investimenti Pubblici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico, e della riunione del 08/10/2012, ha chiesto al Comune di trasmettere, entro il 31.10.2012, la	ACQUISTI PAREN PROGETTAZIONE	COMUNE	-	-	-	-	€ -	Ing. Emanuele Fortunato (UTC)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

Allegato 2

QUADRO RIEPILOGATIVO GARE ESPLETATE

per gli interventi di cui alla lettera "A"

Lavori

Indagini

Professionisti

Il Commissario Straordinario Delegato
(*Dott. Maurizio Croce*)

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.09.2010"
Ex D.P.C.M. 19 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

Gare lavori

prog	Prov	Codice	Identificativo	Settore gara	Categoria prevalente	Oggetto	Importo ASP	Decreto Finanziamento	Importo finanziato Decreto Finanziamento	CUP	CIG	Importo d'appalto: Progetto	Importo soggetto a ribasso d'asta	Oneri NON soggetti a ribasso	Resp. Proced.	Estremi Aggiudicazione	Data Lettera invito	Data scadenza presentazione offerte	Aggiudicatario	Ribasso	Importo aggiudicato: importo ribassato	Importo aggiudicato: totale	Contratto: Decreto Aggiudic. Definitiva	Contratto: sottoscrizione	Contratto: Registrazione
1	ME	58	Caronia	Lavori	os21 IV	Consolidamento centro abitato	€ 3.000.000,00	Decreto n. 100 del 1 marzo 2011	€ 3.000.000,00	I38B10000520001	1285753CE0	€ 2.217.109,03	€ 2.107.109,03	€ 110.000,00	Ing. Bruno Manfrè (DRPC ME)	Decreto 031 del 08 mar 2011	04/03/2011	17/05/2011	PRESAL COSTRUZIONI SRL	6,7793%	€ 1.964.261,79	€ 2.074.261,79		12/04/2013	n. 30330 serie 1T
2	ME	61	Castel di Lucio	Lavori	OS21 III	Consolidamento via Durante e via S. Lucia	€ 1.500.000,00	Decreto n. 32 del 1/3/2011 Decreto n.201 del 14/6/2011	€ 1.500.000,00	G59D11000080002	2749986B49	€ 934.011,22	€ 911.444,40	€ 22.576,82	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto 111 del 30 giu 2011	07/07/2011	21/07/2011	TORSTEN COSTRUZIONI SRL	17,3568%	€ 753.248,64	€ 775.825,46	Decreto 163 del 1 ago 2011	10/08/2011	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffic Roma 2 Aurelio n. 17625 serie 3 del 9 set 2011
3	PA	134	Polizzi Generosa	Lavori	OS21 II	Opere di consolidamento – Zona via Borgese" nel comune di Polizzi Generosa (PA)	€ 500.000,00	Decreto n. 039 del 31/3/2011	€ 500.000,00	I30B10000540001	1845916212	€ 358.929,66	€ 348.131,58	€ 10.797,88	Ing. Vincenzo Di Rosa	Decreto 115 del 30 giu 2011	07/07/2011	21/07/2011	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	20,6700%	€ 276.954,56	€ 287.752,44	Decreto 168 del 3 ago 2011	10/08/2011	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffic Roma 2 Aurelio n. 17623 serie 3 del 9 set 2011
4	PA	137_2	Bluff 2	Lavori	os21 II	Finanziamento dei lavori di "Lavori di Consolidamento del centro urbano a monte e a valle del quartiere Macelli	€ 690.000,00	Decreto n. 087 del 10 giugno 2011	€ 690.000,00	I90B10000520001	2750361581	€ 459.215,58	€ 446.721,68	€ 12.493,70	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto 114 del 30 giu 2011	07/07/2011	20/07/2011	ARCOBALENO 3000 SRL	22,9692%	€ 344.113,28	€ 356.606,98	Decreto 158 del 29 luglio 2011	10/08/2011	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffic Roma 2 Aurelio n. 17624 serie 3 del 9 set 2011
5	ME	84	Ficarra	Lavori	OS21 III	Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Nicola	€ 1.450.000,00	Decreto n. 044 del 7/4/2011	€ 1.358.580,64	E32J09000090002	2796198B03	€ 824.216,35	€ 776.391,14	€ 47.825,21	Ing. Fabio Martino	Decreto 131 del 14 lug 2011	14/07/2011	29/07/2011	RENZO COSTRUZIONI	19,0611%	€ 597.191,52	€ 645.016,73	Decreto n. 196 del 25 ago 2011	04/09/2011	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffic Roma 2 Aurelio n. 18089 serie 3 del 19 settembre 2011
6	AG	11	Ribera	Lavori	OS21 III	Opere di consolidamento centro urbano	€ 999.021,00	Decreto n. 033 del 08/03/2012	€ 999.021,43	G93B10000720001	2847116A70	€ 715.401,18	€ 695.359,01	€ 20.042,17	Arch. Gessa Palumbo	Decreto 145 del 22 lug 2011	25/07/2011	04/08/2011	C. & P. SRL	19,5011%	€ 472.347,64	€ 492.789,81	Decreto n. 205 del 3 maggio 2012	26/06/2012	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffic Roma 2 Aurelio n. 14768 serie 3 del 6 luglio 2012
7	CT	31	Misterbianco	Lavori	OG3 II	Opere di consolidamento e regimazione idraulica – Fraz. Poggio Lupo	€ 500.000,00	Decreto n. 130 del 15/7/2011	€ 500.000,00	J11J11000100001	2940704583	€ 338.643,34	€ 328.661,33	€ 9.984,01	Arch. Aldo Bonina	Decreto 180 del 10 ago 2011	11/08/2011	01/09/2011	PIZZO PIZZO	28,0000%	€ 236.636,16	€ 246.620,17	Decreto n. 249 del 3 ottobre 2011	15/11/2011	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffic Roma 2 Aurelio n. 23604 del 28 novembre 2011
8	CT	57	Randazzo	Lavori	OG8 III	Mitigazione del rischio geomorfologico di un'area del Centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata"	€ 960.000,00	Decreto n. 197 del 23/8/2011	€ 960.000,00	J29H11000140001	32243113FC	€ 600.464,22	€ 555.474,34	€ 44.989,88	Ing. Domenico Interaglia con il supporto di Marco Caragera (decreto n. ...)	Decreto 306 del 30 ago 2011	07/09/2011	20/09/2011	COTESP SRL	25,6880%	€ 414.171,52	€ 469.101,00	decreto n.333 del 24 novembre 2011	29/11/2011	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffic Roma 2 Aurelio n. 25124 serie 3 del 18 dicembre 2011
9	ME	113_1	Sant'Angelo di Brolo	Lavori	OS21 IV	Opere di consolidamento e regimazione idraulica – Contrada Bonba	€ 3.900.000,00	Decreto n. 151 del 27/7/2011	€ 3.900.000,00	I85D11000450001	3130014086	€ 2.045.335,77	€ 1.990.671,34	€ 54.664,23	Ing. Bruno Manfrè (DRPC ME)	Decreto 223 del 14 set 2011	14/09/2011	30/09/2011	ATI: MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l. (Capogruppo) - AN.CA.MA. s.r.l. (Mandante)	24,8956%	€ 1.495.081,92	€ 1.549.746,15	Decreto n. 295 del 26 ottobre 2011	15/11/2011	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffic Roma 1 Aurelio n. 23486 del 25 novembre 2011
10	PA	137_1	Bluff 1 - BIS	Lavori	OS21 III	Sistemazione idraulica del burrone S. Domenica-Malbasso e consolidamento del centro urbano	€ 1.310.000,00	Decreto n. 067 del 24/5/2011	€ 1.310.000,00	I90B10000510001	3303449B40	€ 931.322,81	€ 894.953,60	€ 36.369,21	Ing. Giuseppe la Placa	Decreto 239 del 22 sett 2011	23/09/2011	05/10/2011	CEIT DI GIUSEPPE MAMMOUTI	22,4732%	€ 695.379,42	€ 719.748,63	Decreto n. 300 del 27 ottobre 2011	15/11/2011	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffic Roma 1 Aurelio n. 23499 del 25 novembre 2011
11	ME	57	Caprileone57	Lavori	OS21 II	Opere di consolidamento con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali Casri Leone Centro	€ 600.000,00	Decreto n. 252 del 3/10/2011	€ 573.816,18	J25D11000190001	3385B056A8	€ 356.852,89	€ 349.191,18	€ 7.659,71	Geom. Gaetano Giuffrè	Decreto n. 268 del 10 ottobre 2011	11/10/2011	25/10/2011	B.D.N.O. COSTRUZIONI s.r.l.	23,8878%	€ 271.607,06	€ 279.266,77	Decreto n. 302 del 3 novembre 2011	15/11/2011	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffic Roma 1 Aurelio n. 23601 del 28 novembre 2011
12	CT	33	Piedimonte Etneo	Lavori	OG3 II	Opere di consolidamento e regimazione idraulica fazione Presa nel comune di Piedimonte Etneo (CT)"	€ 500.000,00	Decreto n. 265 del 7/10/11	€ 500.000,00	J88G10000850001	3398456B98	€ 332.793,96	€ 324.690,33	€ 8.093,63	Arch. Aldo Bonina	Decreto n. 270 del 11 ottobre 2011	11/10/2011	26/10/2011	ARCHIS s.r.l.	24,2716%	€ 252.768,25	€ 261.862,88	Decreto n. 303 del 3 novembre 2011	18/01/2012	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffic Roma 1 Aurelio n. 1912 serie 3 del 26 gennaio 2012
13	EN	175	Barrafranca	Lavori	OG08 II OG03 II	Comune di Barrafranca. Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione d'un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardaro in Barrafranca – Prima Stralcio Funzionale	€ 1.500.000,00	Decreto n. 352 del 5 del 1 dicembre 2011	€ 1.500.000,00	J25C11B02140001	37022452C5	€ 1.080.000,03	€ 1.074.364,05	€ 5.415,98	Arch. Francesco Costa	Decreto n. 377 del 14 dicembre 2011	13/12/2011	28/12/2011	SOCIETA' LAVORI PUBBLICI SRL - S.L.P. SRL	24,8484%	€ 807.416,80	€ 813.032,78	decreto n. 10 del 16 gennaio 2012	26/01/2012	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffic Roma 1 Aurelio n. 2497 serie 3 del 01 febbraio 2012
14	ME	49	Alcara Li Fusi	Lavori	OS11R OG8I	Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Coppacchi – Comune di Alcara Li Fusi	€ 1.200.000,00	Decreto n. 392 del 30 dicembre 2011	€ 852.231,80	J25D11000280001	3741508E12	€ 607.229,86	€ 583.522,81	€ 23.706,54	Ing. Basilio Sanseverino	Decreto n. 395 del 31 dicembre 2011	21/12/2011	09/01/2012	SA.MA. s.r.l.	24,7923%	€ 438.854,09	€ 462.560,63	decreto n. 18 del 18 gennaio 2012	01/03/2012	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffic Roma 1 Aurelio n. 5314 serie 3 del 07 febbraio 2012

Dott. Maurizio Croce

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

Gare lavori

prog	Prov	Codice	Identificativo	Settore gara	Categoria prevalente	Oggetto	Importo A/P	Decreto Finanziamento	Importo finanziato Decreto Finanziamento	CUP	CIG	Importo d'appalto: Importo	Importo soggetto a ribasso d'asta	Importo NON soggetto a ribasso	Resp. Proced.	Direttore Lavori/Coll.	Data lettera invito	Data scadenza presentazione offerta	Aggiudicatario	Ribasso	Contratto: Importo e Data	Ribasso	Decreto Approvaz. Definitivo	Contratto: Rep.	Data stipula
15	ME	72	Galati Mamertino	Lavori	OG8 I	Disgaggiamento massi, messa in sicurezza versante Contrada Gallo	€ 500.000,00	DECRETO COMMISSARIALE n. 15 del 17 gennaio 2012	€ 500.000,00	J43B10000600001	5868549DEB	€ 318.547,17	€ 308.913,01	€ 7.634,16	Arch. Giuseppe Cavallo	decreto n. 42 del 26 gennaio 2012 - Revocato dal Decreto commissariale n. 49 del 27 gennaio 2012 decreto n. 52 del 8 febbraio 2012	08/02/2012	21/02/2012	D&D COSTRUZIONI s.r.l.	25,8200%	€ 229.769,50	€ 217.403,64	Decreto n. 103 del 14 marzo 2012	04/04/2012	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 8127 serie 3 del 10 aprile 2012
16	TP	172	San Vito Lo Capo	Lavori	OS21 I	Collocazione rete paramassi – Zona Makari	€ 450.000,00	DECRETO COMMISSARIALE n. 61 del 14 febbraio 2012	€ 450.000,00	J89H12000030001	3951452956	€ 333.183,30	€ 324.346,37	€ 8.837,02	Ing. Giovanni Indelicato	Decreto Commissariale n. 72 del 17 febbraio 2012	17/02/2012	01/03/2012	TORSTEN COSTRUZIONI SRL	25,2644%	€ 243.327,47	€ 211.264,49	Decreto n. 107 del 13 marzo 2012	10/05/2012	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 10780 serie 3 del 16 maggio 2012
17	ME	51	Basicò	Lavori	OS21 III	Drenaggi ed opere di consolidamento in C.da Badiazza	€ 1.300.000,00	Decreto Commissariale n. 65 del 14 febbraio 2012	€ 1.291.803,12	J78H12000080001	3998463094	€ 809.176,69	€ 771.790,59	€ 37.346,10	Arch. Giuseppe Trifilò	DECRETO COMMISSARIALE n. 88 del 29 febbraio 2012	05/03/2012	16/03/2012	I.CO.LI di LI DESTRI GIACOMO & C. S.a.s	25,8134%	€ 572.565,20	€ 509.951,30	Decreto n. 128 del 26 marzo 2012	04/04/2012	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 8131 serie 3 del 10 aprile 2012
18	CT	36	Ramacca	Lavori	OS21 III OG8 I	Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca	€ 1.300.000,00	Decreto Commissariale n. 89 del 1 marzo 2012	€ 1.176.908,88	J19H12000040001	4021009199	€ 884.888,97	€ 866.139,77	€ 18.549,20	Geom. Salvatore Sottosanti	Decreto Commissariale n. 94 del 7 marzo 2012	07/03/2012	19/03/2012	CO.E.S.I. Srl	25,8658%	€ 643.880,34	€ 562.638,34	Decreto n. 125 del 26 marzo 2012	10/05/2012	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 10674 serie 3 del 15 maggio 2012
19	ME	58	Capri Leone	Lavori	OG8 II	Opere di risagomatura e protezione versanti Fros. Rocco	€ 550.000,00	Decreto Commissariale n. 96 del 08 marzo 2012	€ 516.698,04	J35D12000020001	4043753284	€ 346.440,74	€ 324.382,74	€ 22.058,00	Ing. Domenico Imbraglia	Decreto Commissariale n. 99 del 13 marzo 2012	13/03/2012	26/03/2012	CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO FRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	25,6724%	€ 241.105,91	€ 203.181,91	Decreto	26/06/2012	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 14556 serie 3 del 4 LUGLIO 2012
20	PA	156	Termini Imerese	Lavori	OG8 II	Risagomatura argini e opere di sutturo – Zona fosso Fiume Torto	€ 800.000,00	Decreto Commissariale n. 108 del 15 marzo 2012	€ 800.000,00	J65D12000020001	4164400895	€ 418.891,77	€ 408.841,96	€ 12.551,81	Ing. Calogero Foti	Decreto Commissariale n. 174 del 18 aprile 2012	18/04/2012	03/05/2012	SILGEO S.r.l.	25,9214%	€ 300.641,04	€ 313.191,85	Decreto n. 213 del 11 maggio 2012	08/06/2012	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 13817 serie 3 del 25 giugno 2012
21	AG	6	FAVARA	Lavori	OS21 III	Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel Comune di Favara (AG)"	€ 1.500.000,00	Decreto n. 175 del 18 aprile 2012	€ 1.500.000,00	J25D12000050001	In attesa accredito RUP	€ 991.931,88	€ 963.677,77	€ 30.253,92	Ing. Domenico Armenio	Decreto n. 206 dell'8 maggio 2012	08/05/2012	21/05/2012	BOLLITA COSTRUZIONI Soc Coop	26,0561%	€ 711.101,05	€ 741.351,97	Decreto n. 251 del 30 maggio 2012	03/07/2012	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 15931 serie 3 del 16 luglio 2012
22	ME	88	Messina	Lavori	OS21 IV	"Opere di salvaguardia centro abitato in località Cumia e dello sbocco di collegamento con Bordonaro" - Comune di Messina	€ 3.000.000,00	Decreto n. 192 del 26 aprile	€ 3.000.000,00	J45D12000090001	42207058F0	€ 2.132.903,14	€ 2.068.916,14	€ 63.987,10	Ing. Salvatore Bartolotta Decreto n. 203 del 4 maggio 2012	Decreto n. 284 del 15 giugno 2012	15/06/2012	25/06/2012	ATI: PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo); CETI DI MAMMOLITI GIUSEPPE (Mandante)	26,6837%	€ 1.517.266,55	€ 1.581.251,65	Decreto 382 del 20 luglio 2012	04/07/2012	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 17118 serie 3 del 1 agosto 2012
23	ME	53	Brolo	Lavori	OS21 IV	Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Iannello" ME-053 4 – Brolo (ME).	€ 3.630.000,00	Decreto n. 237 del 24 maggio 2012	€ 3.630.000,00	J82J12000150001	4282898738	€ 2.547.718,00	€ 2.478.942,72	€ 68.775,28	Ing. Giuseppe Le Pera	Decreto n. 330 del 10 luglio 2012	10/07/2012	20/07/2012	GEO PERFORAZIONI S.R.L.	26,8977%	€ 1.812.184,14	€ 1.880.935,42	Decreto 431 del 29 agosto 2012	26-set-12	Agenzia Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio al n. 20435 in data 4 ottobre 2012
24	SR	177	Carlentini	Lavori	OG8 IV	"Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR)	€ 2.500.000,00	Decreto n. 247 del 28 maggio 2012	€ 2.500.000,00	I15D12000320001	4366169443	€ 1.745.120,16	€ 1.646.266,57	€ 98.853,59	geom. Francesco Ingalisi	Decreto n. 352 del 13 luglio 2012	13/07/2012	23/07/2012	URANIA COSTRUZIONI S.r.l.	26,9669%	€ 1.202.194,12	€ 1.301.167,81	decreto n. 429 del 23 agosto 2012	26-set-12	Agenzia Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio al n. 21647 in data 10 ottobre 2012
25	SR	181	Avola	Lavori	OS12 II	Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica c/da Cavagrande del Cassibile	€ 600.000,00	Decreto n. 236 del 24 maggio 2012	€ 600.000,00	J65D11000240001	43566250AF	€ 455.208,25	€ 433.232,85	€ 21.972,90	Dott. Gaetano Marino	Decreto n. 288 del 20 giugno 2012	20/06/2012	04/07/2012	CONSORZIO STABILE VITRUVIO Scarl	26,3666%	€ 319.003,73	€ 340.576,61	decreto n. 661 del 3 dicembre 2012	11-dic-12	In corso di registrazione
26	ME	113_3	Sant'Angelo di Brolo	Lavori	OG21 IV	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cortili	€ 2.500.000,00	Decreto n. 301 del 18 giugno 2012	2930000 Maggiore importo prelevato da ME 113_6	J85D12000540001	4418323378	€ 2.187.542,99	€ 2.138.366,45	€ 48.176,54	Ing. Vittorio Ricciardi	Decreto n. 430 del 28 agosto 2012	28/08/2012	10/09/2012	AVENI SRL con GIUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL	27,2407%	€ 1.568.548,67	€ 1.606.725,21	decreto n. 532 del 15 ottobre 2012	15-ott-12	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 29358 serie 1 del 7 novembre 2012
27	TP	168	ERICE	Lavori	OS21 II	Lavori di consolidamento del costone roccioso zone Crocifisello nel Comune di Erice	€ 500.000,00	decreto n. 225 del 16 maggio 2012	€ 500.000,00	I52J12000070001	4405430307	€ 368.134,52	€ 354.648,64	€ 13.675,88	Ing. Giovanni Indelicato	Decreto n. 331 del 10 luglio 2012	11/07/2012	25/07/2012	RENZO COSTRUZIONI S.R.L.	29,0332%	€ 251.682,79	€ 265.358,67	Decreto n. 428 del 23 agosto 2012	09-ott-12	Agenzia Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio al n. 29882 in data 19 ottobre 2012
28	SR	185	BUSCEMI	LAVORI	OS21 I	Consolidamento costone sottostante il Santuario	€ 200.000,00	Decreto n. 319 del 9 luglio 2012	€ 200.000,00	J85D12000550001	44269998E2	€ 139.760,81	€ 129.803,80	€ 9.957,00	Geom. Giuseppe Ferrante	Decreto n. 353 del 16 luglio 2012	17/07/2012	30/07/2012	TECNO COSTRUZIONI Srl	26,9088%	€ 94.948,12	€ 98.805,34	Decreto n. 448 del 7 settembre 2012	26-set-12	Agenzia Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio al n. 21693 in data 11 ottobre 2012

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2008

REGIONE SICILIANA

Gare lavori

prog	Prov	Codice	Identificativo	Settore CUAP	Categoria prevalente	Oggetto	Importo ADP	Decreto Determinazione	Importo finanziato Decreto Finanziamento	CUP	CIG	Importo d'appalto: Importo	Importo soggetto a ribasso d'asta	Importo NON soggetto a ribasso	Resp. Procedimento	Decreto Nomina Comm.	Data Lettera Invito	Data Scadenza presentazione offerte	Aggiudicatario	Ribasso	Importo aggiudicato: importo contrattuale	Importo aggiudicato: liquidato	Contratto: Decreto Aggiudic. Definitiva	Contratto: sottoscrizione	Contratto: Registrazione
29	ME	59	Casalvecchio siculo	LAVORI	OS21 III	Opere di consolidamento centro urbano	€ 1.363.853,00	DECRETO N.296 DEL 25 GIUGNO 2012	€ 1.363.853,00	J49H12000450001	4475225080	€ 838.051,94	€ 799.080,61	€ 38.971,33	ING. DOMENICO IMBROGLIA	Decreto n. 397 del 1 agosto 2012	01/08/2012	29/08/2012	ITINERA Srl 3	28,2317%	€ 572.991,14	€ 411.962,47	Decreto n. 484 del 13 settembre 2012	27-set-12	Agenzia Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 10892 in data 04 ottobre 2012
30	ME	73	Galati Mamertino	Lavori	OS21 III	Consolidamento e messa in sicurezza versante - Località Pileri	€ 1.100.000,00	Decreto n. 406 del 3 agosto 2012	€ 1.100.000,00	J49H12000480001	4528988F1D	€ 646.701,87	€ 629.083,71	€ 17.616,16	Arch. Giuseppe Cavolo	Decreto n. 448 del 6 settembre 2012	06/09/2012	18/09/2012	ARCOBALENO 3000 SRL	27,6986%	€ 454.637,78	€ 472.451,94	decreto n. 514 del 4 ottobre 2012	16-ott-12	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 15969 serie 3 del 22 ottobre 2012
31	PA	141	Capaci	Lavori	OS12 III	Consolidamento centro abitato	€ 1.200.000,00	DECRETO N. 410 DEL 2 AGOSTO 2012	€ 1.100.000,00	I15G12000480001	45520094A8	€ 694.124,58	€ 661.497,02	€ 32.627,36	Arch. Giovan Battista Dragotta giovannidragotta@virgilio.it cell. 3296606756	Decreto n. 477 del 18 settembre 1102	18/09/2012	02/10/2012	ZACCARIA COSTRUZIONI Srl	29,3638%	€ 467.256,36	€ 499.881,72	Decreto n. 464 del 13 settembre 2012	In attesa verbale 106, co3	
32	SR	167	ROSOLINI	Lavori	OG6 III OG13 I	Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zone vallone Rizzello-Mossuogno	€ 1.300.000,00	DECRETO N. 427 DEL 28 AGOSTO 2012	€ 1.315.000,00	J25D12000830003	4360432887	€ 852.565,74	€ 838.901,22	€ 13.682,13	Geom. Giuseppe Vindigni	Decreto n. 482 del 20 settembre 2012	20/09/2012	04/10/2012	UNIFICACOOP	27,8875%	€ 597.741,39	€ 621.423,91	decreto n. 534 del 15 ottobre 2012	25-ott-12	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 19366 serie 3 del 7 novembre 2012
33	ME	089_3	Messina_MilSanPietro	LAVORI	OS21 II	Opere di consolidamento località Mili San Pietro	€ 510.300,00	DECRETO N. 383 DEL 20 LUGLIO 2012	€505.154,78	J49H12000530003	A60023EDF1	€ 321.727,76	€ 305.953,05	€ 15.774,21	Geom. Marco Mancuso	decreto n. 517 del 5 ottobre 2012	05/10/2012	16/10/2012	PROJECT S.r.l.	26,5272%	€ 218.673,57	€ 234.447,78	decreto n. 643 del 26 novembre 2012	18-dic-12	in corso di registrazione
34	ME	83	Castroreale	Lavori	OS21 III	Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato- Completamento	€ 1.650.000,00	Decreto n. 564 del 26 ottobre 2012	€ 1.585.334,53	J85D12000780003	467B9C8D14	€ 999.317,16	€ 969.359,04	€ 29.979,52	Arch. Gaetano Buscheri 3334664786 tel 0909746087	Decreto n. 589 del 7 novembre 2012	07/11/2012	19/11/2012	C.N.T. SRL	28,1963%	€ 696.078,74	€ 726.058,26	decreto n. 662 del 1 dicembre 2012	In attesa verbale 106, co3	
35	ME	92	Mistretta	Lavori	OS21 I OG8 I	Regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area Nord_Ovest dell'Abitato di Mistretta	€ 800.300,00	Decreto n. 586 del 7 novembre 2012	€ 778.679,50	J85D12000780003	47106198D0	€ 490.472,68	€ 472.721,61	€ 17.750,37	geom. Rosario Massaro	DECRETO N. 626 DEL 20/11/2012	20/11/2012	03/12/2012	GEODESIA S.r.l.	29,7512%	€ 332.081,96	€ 349.832,33	Decreto n. 710 del 18/12/2012	In attesa verbale 106, co3	
36	AG	1	Agrigento	Lavori	OS21 II	Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete rocciosa prospiciente la Via delle Torri (PAI DEF-140-2001 nell'ambito dei lavori inerenti agli "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento	€ 2.000.000,00	decreto n. 639 del 22.11.2012	€ 681.300,00	J43B10000680001	4731658F2F	€ 488.976,74	€ 472.746,33	€ 16.230,41	Ing. Domenico Ammirato	decreto n. 642 del 23.11.2012	23/11/2012	05/12/2012	CO.GE.MA.LA. S.r.l.	29,8866%	€ 331.458,53	€ 345.688,54	decreto n. 680 del 10/12/2012	11-dic-12	in corso di registrazione
37	ME	089_1	Messina S. Anna	Lavori	OS21 III	Opere di consolidamento località Galati" – Galati S. Anna	€ 900.300,00	decreto n. 593 dell'8 novembre 2012	€ 900.000,00	J49D12000520003	4738438484	€ 670.000,00	€ 634.678,86	€ 35.321,14	Ing. Antonio Amanzi	DECRETO N. 648 DEL 27 NOVEMBRE 2012	27/11/2012	11/12/2012	C. & P. SRL	26,9554%	€ 450.905,06	€ 486.226,20	aggiudicazione provvisoria in attesa documentazione definitiva		
38	ME	128	Tortorici S. Leone	Lavori	OS21 II	Muri e barriere paramassi – Zona Batano-Pagliaro-S.Leone"	€ 500.000,00	decreto n. 574 del 6 novembre 2012	€ 476.638,45	I15D12000530003	4738111B0F	€ 341.884,71	€ 322.108,66	€ 19.586,07	Geom. Carmelo Battiato	decreto n. 645 del 27 novembre 2012	27/11/2012	10/12/2012	AVENI S.r.l.	28,8412%	€ 229.308,66	€ 248.794,73	aggiudicazione provvisoria in attesa documentazione definitiva		
39	ME	99	PIRAINO SAN LEONARDO	Lavori	OG08 II	Opere di "consolidamento in contrada San Leonardo" previste nell'ambito dell'intervento: "Opere di consolidamento Zona Roda – S. Costantino, Policarpo, San Leonardo, Calanni, Portiera, Torre delle Clavole" nel Comune di Piraino (ME)	€ 1.100.000,00	DECRETO N. 493 DEL 25 OTTOBRE 2012	€ 668.652,86	J89H11000400003	4733070A76	€ 510.725,40	€ 501.706,86	€ 9.018,54	Geom. Carmelo Leone	DECRETO N. 660 del 3 dicembre 2012	03/12/2012	17/12/2012	FERRAMARE S.R.L.	29,3563%	€ 354.434,29	€ 368.440,83	aggiudicazione provvisoria in attesa documentazione definitiva		
40	CT	24	Castel di Iudica	Lavori	OG8 IV OS21 I	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione di Cinquegrano	€ 3.000.000,00	Decreto Commissariale n. 640 del 22.11.2012	€ 3.000.000,00	I45D12000530001	4774249AE8	€ 1.947.941,85	€ 1.839.870,85	€ 108.071,00	Geom. Domenico Faranda	Decreto approvazione Bandon. 674 del 7 dicembre 2012	procedura ristretta	scadenza prequalifica 28/11/2012	gara avviata						
41	CT	27	GRANMICHELE	Lavori	OS21 II per il 71.00% Scorporabili OG3–OG6–OG10	Completamento di consolidamento del versante ed Opere di sostegno della scarpata sottostante lo via B. Buscè	€ 700.000,00	Decreto 684 del 10 dicembre 2012	€ 700.000,00	J65D12000450001	480BC2323	€ 426.322,90	€ 417.183,15	€ 13.139,75	Geom. Michele Iudica	Decreto n. 701 del 17/12/2012	17/12/2012	07/01/2013	gara avviata						
42	ME	62	Castel Umberto	Lavori	OG8 I	Opere di contenimento a valle della sede stradale – Contrada Sferanda Inferiore	€ 300.000,00	Decreto 702 del 17 dicembre 2012	€ 300.000,00	J83H12000690001	480E479F1E	€ 205.000,00	€ 194.750,00	€ 10.250,00	Ing. Bruno Manfrè	Decreto n. 711 del 18/12/2012	18/12/2012	09/01/2013	gara avviata						

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

Gare lavori

progr.	Prov.	Codice	Identificativo	Natura Lavori	categoria prevalente	Ricorso	importo ASP	Decreto Finanziamento	Importo finanziato Decreto Finanziamento	CUP	CIG	Importo d'asta: importo	Importo d'asta: importo soggetto a ribasso d'asta	Importo d'asta: oneri NON soggetti a ribasso	Resp. Arsenal	Numero Avviso Gara	Data bando gara	Data quadro prescrizione offerta	Aggiudicatario	Ribasso	Incentivo applicato: importo ribasso	Incentivo applicato: totale	Contratto: Decreto Approvaz. Definitiva	Contratto: sottoscrizione	Contratto: registrazione
43	ME	81	Librizzi	Lavori	OS21 I OG8 I		€ 500.000,00	Decreto 707 del 17 dicembre 2012	€ 500.000,00	J48H12000820001	4808581A1E	€ 344.891,03	€ 323.756,34	€ 17.186,79	Geom. Santo di Perna (UTC)	Decreto n. 709 del 18/12/2012	18/11/2012	08/01/2013	gara avviata						
44	ME	78	LETOJANNI	Lavori	OG7 III		€ 2.000.000,00	Decreto 686 dell'11 settembre 2012	€ 2.000.000,00	J35D12000490001	4799680538	€ 1.200.628,00	€ 1.178.840,00	€ 21.788,00	Arch. Pietro Bontempore	Decreto n. 712 del 19 dicembre 2012	19/11/2012	30/01/2013	gara avviata						
45	ME	89_4a	MESSINA S. MARGHERITA	Lavori	OG8		€ 650.000,00	decreto n. 689 del 13 dicembre 2012	€ 395.650,00	J45D12000550001	480978815C	€ 274.705,31	€ 265.356,64	€ 9.346,67	Ing. Salvatore Bartolotta	Decreto n. 713 del 19 dicembre 2012	19/11/2012	ore 12:00 del 04 gennaio 2013	gara avviata						
46	EN	42	CENTURIPE	Lavori			€ 770.000,00	decretro n. 692 del 13 dicembre 2012	€ 770.000,00			€ 460.000,70	€ 443.914,93	€ 16.088,77	Geom. Salvatore Di Benedetto				IN AVVIO						
47	CT	26	GIARRE	Lavori			€ 1.000.000,00	DECRETO N. 690 DEL 13 DICEMBRE 2012	€ 1.000.000,00			€ 745.095,27	€ 723.343,05	€ 21.752,22	Geom. Sebastiano D'Anna				IN AVVIO						
48	ME	126	Tortorici Sciortino	Lavori	OS21 I		€ 500.000,00	decreto n. 573 del 6 novembre 2012	€ 473.375,06			€ 300.000,00	€ 289.093,40	€ 10.906,60	Geom. Carmelo Catanni Rindina				IN AVVIO						

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

Gare indagini

prog.	Prov	Codice	Identificativo	Oggetto	CUP	CIG	Importo d'appalto: Importo	Importo d'appalto: importo soggetto a ribasso d'asta	Importo d'appalto: oneri NON soggetti a ribasso	Resp. Proced.	Decreto Aborto (ove fatto l'anche)	Data Lettera Invito	Data scadenza presentazione offerta	Aggiudicataria	Ribasso	Importo aggiudicato: importo ribasso	Importo aggiudicato: totale	Decreto Aggiudic. Definitiva	Contratto: sottoscrizione	Contratto: Registrazione
1	ME	99	Piraino loc. San Leonardo	*Realizzazione del Piano di indagini preliminari per la mitigazione del rischio idrogeologico in località San Leonardo del Comune di Piraino (ME) intervento ME099*	J61J11000100001	349679111	€ 19.341,20	€ 18.652,90	€ 688,30	Geom. Carmelo Leone	Decreto 066 del 19 mag 2011	19/05/2011	30/05/2011	GEOMERID SRL	29,0600%	€ 13.224,55	€ 13.913,85	Decreto 79 del 7 giu 2011	09-giu-11	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 12369 serie 3 del 16/06/2011
2	ME	49	Alcara Li Fusi	*Realizzazione del Piano di indagini preliminari Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Cappuccini – Comune di Alcara Li Fusi*	J22D11000117001	2700520897	€ 19.934,19	€ 19.569,69	€ 366,50	Ing. Basilio Sansevenino	Decreto 080 del 08 giu 2011	09/06/2011	20/06/2011	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL (Mandante)	31,1100%	€ 13.481,56	€ 13.848,06	Decreto 104 del 27 giu 2011	28-giu-11	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 14399 serie 3 del12/07/2011
3	EN	44	Gagliano Castelferrato	*Realizzazione Piano indagini preliminari "lavori di messa in sicurezza e drenaggio del'versante C.da Urga*	J82J1100016001	28512638a7	€ 22.300,26	€ 21.396,56	€ 903,70	Geom. Michele Corrente	Decreto 098 del 21 giu 2011	23/06/2011	05/07/2011	GIA EXPLORING SAS DI SARDO ANNA MARINA & C.	28,0500%	€ 12.719,89	€ 13.623,59	Decreto 141 del 22 lug 2011	26-lug-11	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 16994 serie 3 del 10 ago 2011
4	ME	81	Librizzi	*Realizzazione Piano indagini Preliminari intervento: "Opere di Consolidamento versante e sistemazione - zona Ronco Maiurdi"*	J42D1100190001	28891401DC	€ 19.603,65	€ 19.458,35	€ 145,30	Geom. Santo di Perna_Ing. Giuseppe La Placa	Decreto 106 del 28 giu 2011	28/06/2011	11/07/2011	GIA EXPLORING SAS DI SARDO ANNA MARINA & C.	28,3160%	€ 13.948,52	€ 14.093,82	Decreto 141 del 22 lug 2011	26-lug-11	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 16993 serie 3 del 10 ago 2011
5	ME	91	Mirto	*Realizzazione Piano indagini Preliminari intervento: "Opere di consolidamento del centro abitato"*	I72J11000180001	2941580C98	€ 19.947,73	€ 19.640,05	€ 307,68	Ing. Nastasi	Decreto 116 del 05 lug 2011	06/07/2011	18/07/2011	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL (Mandante)	14,6800%	€ 16.717,61	€ 17.025,29	Decreto 144 del 22 lug 2011	26-lug-11	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 16996 serie 3 del 10 ago 2011
6	CT	36	Ramacca	*"Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato"*	I71J11000100001	27B012855D	€ 19.995,10	€ 19.375,80	€ 619,30	Geom. Salvatore Sottosanti	Decreto 170 del 3 ago 2011	17/08/2011	08/09/2011	I.GE.M. INDAGINI GEOLOGICHE MERIDIONALI s.r.l.	21,7787%	€ 15.156,00	€ 15.771,30	Decreto n. 224 del 14 settembre 2011	22-set-11	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 3 Aurelio n. 19118 serie 3 del 3 ottobre 2011
7	ME	125	Tortorici 125_INDAG	*MURI E PARATIE MONTEVALLE E OPERE IDRAULICHE ZONA LEMBO- PELUZZA*	J14C11000120001	324068168E	€ 39.801,55	€ 39.131,94	€ 669,61	arch. Giampiero di Magro	Decreto 220 del 9 set 2011	12/09/2011	22/09/2011	GEOMERID s.r.l.	32,5000%	€ 26.414,06	€ 27.083,67	Decreto n. 250 del 3 ottobre 2011	04-ott-11	Serie 3 N. 20792 registrato il 24.10.2011
8	ME	128	Tortorici 128_INDAG	*"muri e barriere paramassi – zona Batana-Pagliaro-S.Leone".*	J14C11000110001	324073424C	€ 19.967,96	€ 18.256,00	€ 1.711,96	arch. Giampiero di Magro	Decreto 219 del 9 set 2011	12/09/2011	21/09/2011	GEOMERID s.r.l.	32,5000%	€ 12.322,80	€ 14.034,76	Decreto n. 251 del 3 ottobre 2011	04-ott-11	Serie 3 N. 20790 registrato il 24.10.2011
9	ME	99	Piraino loc. San Leonardo INTEGRATIVE	*Piano di indagini integrative preliminari per la mitigazione del rischio idrogeologico in località San Leonardo del Comune di Piraino (ME) intervento ME099*	J60H11000400001	3504608DFF	€ 2.541,10	€ 2.399,90	€ 141,20	Geom. Carmelo Leone	Decreto 306 del 4 novembre 2011	04/11/2011	14/11/2011	GEO PLANTS	1,2100%	€ 2.379,86	€ 2.512,06	Decreto n. 366 del 12 dicembre 201	14-dic-11	non necessità di registrazione
10	ME	126	Tortorici 126 indagini	*Piano di indagini preliminari intervento ME126 – Tortorici (ME) – Muri su pali e raccolta acque – Zona S.Antonio-Sciortino*	J19H11000210001	3512363DA0	€ 22.004,08	€ 21.291,15	€ 712,93	arch. Giampiero di Magro	Decreto 307 del 4 novembre 2011	04/11/2011	16/11/2011	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL (Mandante)	36,1100%	€ 13.602,92	€ 14.315,85	decreto n. 334 del 24 novembre 2011	30-nov-11	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 25123 serie 3 del 16 dicembre 2011
11	EN	44	Gagliano Castelferrato_integrative	*Realizzazione del Piano di indagini preliminari INTEGRATIVE intervento "Lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante - C.da Urga" da realizzare nel comune di Gagliano Castelferrato - intervento EN 044*	J85D11000810001	3545884CDB	€ 39.638,81	€ 35.145,51	€ 4.483,30	Geom. Michele Corrente	Decreto n. 314 del 11 novembre 2011	11/11/2011	22/11/2011	GEOMERID SRL	31,0000%	€ 24.250,40	€ 28.733,70	Decreto n. 361 del 2 dicembre 2011	05-dic-11	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 25302 serie 3 del 19 dicembre 2011
12	ME	109	San Pier Niceto	*Realizzazione del Piano di indagini preliminari intervento ME_109 San Pier Niceto "Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante consolidamento dell'area e protezione del serbatoio del Centro Abitato". CUP: J95D11000230001 CIG: 353865CC02*	J95D11000230001	353865CC02	€ 38.881,15	€ 35.576,65	€ 3.304,50	Geom. Francesco Maio con supporto dell'Arch. Giampiero di Magro	Decreto n. 313 del 11 novembre 2011	11/11/2011	22/11/2011	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL (Mandante)	31,1300%	€ 24.501,64	€ 27.806,14	Decreto n. 345 del 30 novembre 2011	30-nov-11	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 25301 serie 3 del 19 dicembre 2011
13	ME	92	Mistretta	*Realizzazione del Piano di indagini preliminari relativi all'intervento ME_092 Mistretta "Regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area Nord_Ovest dell'Abitato di Mistretta*	J85D11000850001	3578151F99	€ 17.620,25	€ 17.332,75	€ 287,50	Geom. Rosario Mazurco con supporto dell'Arch. Giampiero di Magro	Decreto n. 380 del 18 novembre 2011	18/11/2011	28/11/2011	GEO RAS	40,7200%	€ 10.274,85	€ 10.562,35	Decreto n. 367 del 12 dicembre 2011	15-dic-11	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 25308 serie 3 del 20 dicembre 2011
14	ME	71	Frazzanò	*PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO A MONTE DELLA VIA SAN FILIPPO DI FRAGALÀ IN CORRISPONDENZA DEL QUARTIERE SERRO*	J92J11000240001	383068389A	€ 22.500,95	€ 21.091,65	€ 1.409,30	Ing. Fabio Marino	decreto n. 41 del 26 gennaio 2012	26/01/2012	06/02/2012	GEO PLANTS s.r.l.	50,1111%	€ 10.522,39	€ 11.931,69	Decreto n. 61 del 13 febbraio 2012	16-feb-12	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 4066 serie 3 del 22 febbraio 2012
15	ME	132	UCRIA	*Consolidamento mediante paratie a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio tono via annunziata*	J45D12000030001	4006861648	€ 39.929,60	€ 38.757,30	€ 1.172,30	Geom. Domenico Rigoli	Decreto Commissariale n. 93 del 5 marzo 2012	05/03/2012	15/03/2012	S.G.M. Srl	35,1198%	€ 25.145,81	€ 26.318,11	Decreto n. 129 del 26 marzo 2012	04-apr-12	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 8122 serie 3 del10 aprile 2012
16	PA	181	CEFALU' 181	*realizzazione del Piano di indagini preliminari interventa PA181_ Cefalù– "Messa in sicurezza movimenti franosi".*	J82J12000130001	4110806868	€ 39.978,40	€ 39.358,10	€ 619,30	Ing. Giuseppe Morgani	Decreto Commissariale n. 132 del 30 marzo 20122	30/03/2012	16/04/2012	GEO PLANTS Srl	36,8111%	€ 24.870,58	€ 25.489,88	Decreto n. 196 del 2 maggio 2012	10-mag-12	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 10675 serie 3 del 15 maggio 2012

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

Gare indagini

prog.	Prov.	Codice	Identificativo	Oggetto	CUP	CIG	Importo d'appalto: Importo	Importo soggetto a ribasso d'asta	oneri NON soggetti a ribasso	Resp. Proced.	Decreto Approv. specifiche Tecniche	Data Lettera invito	Data ricezione presentazione offerta	Aggiudicataria	Ribasso	Importo aggiudicato: importo ribassato	totale	Contratto: Decreto Aggiudic. Definitivo	sottoscrizione	Registrazione
17	ME	91	Mirto	realizzazione del Piano di indagini integrative preliminari intervento Mirto (ME) -ME 091 A – "Opere di consolidamento del centro abitato".	J75D12000030001	42018368CD	€ 39.979,55	€ 39.360,25	€ 619,30	Ing. Nastasi	Decreto n. 205 dell'8 maggio 2012	08/05/2012	22/05/2012	Geomerid S.r.l.	38,2000%	€ 24.324,63	€ 24.943,93	Decreto n. 250 del 30 maggio 2012	08-giu-12	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 13287 serie 3 del 18 giugno 2012
18	ME	99	PIRAINO C.da San Costantino	Piano di indagini preliminari per "lavori di consolidamento strada comunale in C.da San Costantino" nell'ambito dell'intervento : "Opere di consolidamento – Zona Rada, S. Costantino, Pollcaro, S.Leonardo, Calomi, Torre delle Clavole" Codice ME - 99 Piraino	J65D12000040001	432876359E	€ 17.858,55	€ 17.587,85	€ 271,70	Geom. Carmelo Leone	Decreto n. 221 del 15 maggio 2012	15/05/2012	28/05/2012	GEO GAV Srl	39,2115%	€ 10.691,39	€ 10.963,09	Decreto n. 256 del 4 giugno 2012	08-giu-12	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 13814 serie 3 del 25 giugno 2012
19	PA	179	ALTOFONTE	realizzazione del Piano di Indagini preliminari Aree interessate da fenomeni di dissesto	J45D12000100001	4261741ED	€ 19.462,40	€ 18.843,10	€ 619,30	Ing. Pino La Placa	Decreto n. 233 del 21 maggio 2012	21/05/2012	01/06/2012	GEO R.A.S. Srl	35,1200%	€ 12.225,40	€ 12.844,70	Decreto n. 285 del 18 giugno 2012	03-lug-12	
20	SR	187	ROSOLINI187	Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato	J25D12000260001	Z400830C7C	€ 31.912,40	€ 30.106,10	€ 1.806,30	Geom. Giuseppe Vindigni	Decreto n. 434 del 31 agosto 2012	31/08/2012	11/09/2012	S.G.M. Società Geognostica Mediterranea s.r.l.	36,1167%	€ 19.232,77	€ 21.039,07	Decreto n. 485 del 21 settembre 2012	26-set-12	
21	ME	119	Sinagra	Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Foranò	J65D12000380001	Z480631169	€ 36.229,80	€ 34.981,50	€ 1.248,30	Ing. Cappotto	Decreto n. 437 del 3 settembre 2012	03/09/2012	13/09/2012	GEO PLANTS Srl	36,1111%	€ 22.349,30	€ 23.597,60	Decreto n. 486 del 24 settembre 2012	26-set-12	
22	SR	162	Carlentini162	Messa in sicurezza costone centro abitato – Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei cadutl	J15D12000450001	Z6205E88F0	€ 30.158,55	€ 29.384,25	€ 774,30	Geom. Francesco Ingallsi	Decreto n. 438 del 3 settembre 2012	03/09/2012	14/09/2012	GEOMERID SRL	35,1000%	€ 19.070,38	€ 19.844,68	Decreto n. 484 del 21 settembre 2012	27-set-12	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 20321 serie 3 del 3 ottobre 2012
23	SR	186	PORTOPALO DI CAPOPASSERO	Regimazione acque e consolidamento scarpate	J65D12000350001	4525658320	€ 14.899,30	€ 13.093,00	€ 1.806,30	Geom. Mario Poidomani	Decreto n. 451 del 10 settembre 2012	11/09/2012	25/09/2012	GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI SRL	39,4000%	€ 7.934,36	€ 9.740,66	decreto n. 511 del 4 ottobre 2012	09-ott-12	
24	ME	99	Piraino Torre delle Clavole	Piano di indagini preliminari afferente lavori di consolidamento strada statale 113 in località Torre delle Clavole" nell'ambito dell'intervento : "Opere di consolidamento – Zona Rada, S. Costantino, Pollcaro, S.Leonardo, Calomi, Torre delle Clavole" Codice ME - 99 Piraino"	J65D12000040001	4532238BA0	€ 14.861,05	€ 13.144,75	€ 1.716,30	Geom. Carmelo Leone	Decreto n. 450 del 10 settembre 2012	10/09/2012	24/09/2012	TRIVELSICILIA DI CASTELLI DOMENICO S.R.L.	41,3912%	€ 7.703,98	€ 9.420,28	decreto n. 529 dell'11 ottobre 2012	16-ott-12	
25	ME	79	Librizzi	Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale	J49H12000540001	Z8B0663783	€ 26.897,80	€ 26.278,50	€ 619,30	Geom. Carmelo CILONA	Decreto n. 473 del 17 settembre 2012	17/09/2012	28/09/2012 ore 9:30	GEO GAV Srl	35,6123%	€ 16.920,12	€ 17.539,42	decreto n. 521 dell'8 ottobre 2012	10-ott-12	
26	PA	142	CARINI	Barriere paramassi - Zona Industriale			€ 28.817,95	€ 28.198,65	€ 619,30	Ing. Antonino Cracchiolo	Decreto n. 473 del 17 settembre 2012	17/09/2012	28/09/2012	GEO RAS Srl	35,6000%	€ 18.174,66	€ 19.390,39	Decreto n. 633 del 3 dicembre 2012	In attesa stipula contratto	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma vigluto il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

Gare professionisti

Prov.	Codice	Identificativo	Famiglie LIAS	Oggetto	Importo AdP	CUP	CIG	Importo	Resp. Procedi.	Decreto Approv Specifiche Tecniche	Data lettera invito	Data scadenza presentazione offerta	Aggiudicatario	Ribasso	totale	Decreto Aggiudic. Definitiva	Contratto	
																	sottoscrizione	Registrazione
ME	128	**Tortorici 128**	Progettazione	*Servizio: PD PE DL e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di ""Muri e barriere paramassi – Zona Batana-Pagliaro-S.Leone"*	€ 500.000,00	J14C11000110001	29627277A8	€ 58.329,72	Arch. Di Magro	Decreto 122 del 07 lug 2011	11/07/2011	25/07/2011	**Daniele Bisignani**	**55,8500%**	**€ 25.752,57**	Decreto 181 del 9 ago 2011	23-ago-11	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 18090 serie 3 del 20 settembre 2011
ME	126	**Tortorici 126**	Progettazione	*Servizio: PD PE DL e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di "Muri su pali e raccolta acque – Zona S.Antonio-Sciortino"*	€ 500.000,00	J14C11000100001	2962626450	€ 58.872,65	Arch. Di Magro	Decreto 119 del 07 lug 2011	11/07/2011	26/07/2011	**Giuseppe Puglisi**	**51,0000%**	**€ 28.847,60**	02/09/2011	02-set-11	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 18547 del 26 settembre 2011
ME	125	**Tortorici 125**	Progettazione	*Servizio: PD PE DL e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di "MURI E PARATIE MONTEVALLE E OPERE IDRAULICHE ZONA LEMBO- PELLIZZA"*	€ 1.500.000,00	J14C11000120001	296279609B	€ 99.488,68	Arch. Di Magro	Decreto 121 del 07 lug 2011	11/07/2011	27/07/2011	**Mario Saitta**	**64,8880%**	**€ 34.932,47**	Decreto 182 del 9 ago 2011	23-ago-11	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 18091 serie 3 del 20 settembre 2011
ME	61	**Castel di Lucio DL**	Direzione Lavori	*Affidamento del servizio di Direzione dei lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Consolidamento via Durante e via S. Lucio"*	€ 1.500.000,00	G59D11000030002	308132342D	€ 89.030,85	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto 156 del 28 lug 2011	28/07/2011	04/08/2011	**STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGG. G. MINEO E P. SCAVAGLIERI**	**63,2000%**	**€ 32.763,35**	Decreto n. 199 del 25 ago 2011	08-set-11	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 18548 serie 3 del 20 settembre 2011
SR	177	**CARLENTINI 177-DL**	Direzione Lavori	*Direzione Lavori - Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR)*	€ 2.500.000,00	J15D12000320001	463381264A0	€ 63.460,01	Geom. Francesco Ingalisi	Decreto n. 544 del 18 ottobre 2012	18/10/2012	31/10/2012	**ING. ANTONIO LANZA**	**50,8523%**	**€ 31.189,14**	DECRETO N. 637 del 22/11/2012	11-dic-12	in corso di registrazione
ME	115_2	**Sant'Angelo di Brolo**	Direzione Lavori	*Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli*	€ 2.500.000,00	J85D12000540001	4641745924	€ 98.943,81	Ing. Vittorio Ricciardi	Decreto n. 548 del 22 ottobre 2012	22/10/2012	05/11/2012	**ING. SANDRO ORLANDO**	**43,5000%**	**€ 55.903,25**	DECRETO N. 638 del 22/11/2012	11-dic-12	in corso di registrazione

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

GARE LAVORI

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ME58	Consolidamento centro abitato		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 031 del 03 mar 2011	Data Lettera Invito	04/03/2011	CUP	J33B10000520001
Caronia					Data scadenza Gara	17/03/2011	CIG	1285753CED
	Resp. Proced.	Ing. Bruno Manfrè (DRPC ME)	Dirett. dei Lavori	Ing. C. Marletta, Arch. F. Benedetti (DRPC ME)	Collaudatore Statico	Ing. Luigi Boeri nota in uscita prot.n.1217 del 25 luglio 2011	Coordinatore della Sicurezza	
	importo	€ 2.217.109,03	importo soggetto a ribasso	€ 2.107.109,03	Decreto Commissione	to 037 del 18 marzo 2011	Aggiudicataria	PRESAL COSTRUZIONI SRL
			oneri sicurezza	€ 110.000,00	Verbale	18/03/2011		
	Ribasso	6,7793%	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 2.074.261,79	Aggiud.Provvisoria	prot. PA/331 del 21 mar 2011		
	IMPORTO AGGIUDICATO	€ 1.964.261,79			Aggiud. Definitiva			
	Decreto aggiud.Def		Verbale 106, comma 3		Contratto	12-apr-11	REGISTRAZIONE CONTRATTO	n. 30330 serie 37

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	INVITO	OFFERTA	Ribasso
	676	CANNIZZO COSTRUZIONI SRL n. fasc. 123	CANNIZZO GIANLUCA	PIAZZA DUOMO, 6	SAN PIERO PATTI	01755570833	prot. PA/223 del 3 mar 2011	prot. E/570 del 15 mar 2011	6,1800%
	389	CIVIESSE SRL fasc. n. 693	SALAMONE CARMELO	VIA SALVATORE LA ROSA, 392	ARAGONA	02581640840	prot. PA/224 del 3 mar 2011		
		CONSOTER SRL n. fasc. 135	FOTI ROCCO	VIA TOMMASO CANNIZZARO, 220	MESSINA	02892930831	prot. PA/225 del 3 mar 2011		
	29	CRUSCHINA COSTRUZIONI N. fasc. 285	CRUSCHINA ENZO	VIA ROSSO DI SAN SECONDO, 39	MUSSOMELI	01385120850	prot. PA/226 del 3 mar 2011	prot. E/526 del 14 mar 2011 + prot. E/576 del 16 mar 2011	5,6500%
		DAURO SRL fasc. n. 461	COMANDE' MARIA	VIA UGO BASSI, 116	MESSINA	02872300831	prot. PA/227 del 3 mar 2011		
		DE.MO.TER. SRL n. fasc. 173	BORELLA BENITO	VIA N. PANORAMICA DELLO STRETTO, 1416	MESSINA	00441090834	prot. PA/228 del 3 mar 2011	prot. E/574 del 15 mar 2011	6,5660%
		EURORESIDENCE SRL fasc. n. 448	SOFI GIOVANNI	VIA RISORGIMENTO, 123	MESSINA	02127630834	prot. PA/229 del 3 mar 2011	prot. E/578 del 16 mar 2011	17,3670%
	179	GANGEMI CARMELO n. fasc. 114	GANGEMI CARMELO	F.NE CASTEL DI TUSA VIA NAZIONALE,18	TUSA	00293900833	prot. PA/230 del 3 mar 2011	prot. E/585 del 16 mar 2011	6,5430%
		IDRO GEDIL SRL n. fasc. 133	FERLITO SALVATORE	VIA G. FILANGERI, 34	PALERMO	00276690823	prot. PA/231 del 3 mar 2011	prot. E/568 del 15 mar 2011	6,1220%
	47	MAMMANA MICHELANGELO n. fasc. 52	MAMMANA MICHELANGELO	VIA SANTA LUCIA	CASTEL DI LUCIO	01936500832	prot. PA/232 del 3 mar 2011	prot. E/571 del 15 mar 2011	6,1000%
	143	MESSINA COSTRUZIONI SRL n. fasc. 329	MESSINA SEBASTIANO	VIA PALERMO, 140/BIS	MUSSOMELI	01303330854	prot. PA/233 del 3 mar 2011	prot. E/569 del 15 mar 2011 + prot. E/577 del 16 mar 2011	5,6510%
	856	PELORITANA APPALTI SRL fasc. n. 749	LIVOTI MARIO	VIA OPERAI, 133	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	02835300837	prot. PA/234 del 3 mar 2011	prot. E/573 del 15 mar 2011	6,1280%
aggiudicataria	79	PRESAL COSTRUZIONI SRL fasc. n. 81	PRESTI DANISI CALOGERO	VIA MICHELANGELO, 15	SANT'AGATA DI MILITELLO	01848890834	prot. PA/235 del 3 mar 2011	prot. E/572 del 15 mar 2011	6,7793%
	571	PUGLISI COSTRUZIONI SRL fasc. n. 756	PUGLISI VINCENZO	C.DA PIANO OSPEDALE	GANGI	04371150824	prot. PA/236 del 3 mar 2011	prot. E/567 del 15 mar 2011	5,9517%
		SCS COSTRUZIONI SRL n. fasc. 230	CUTTONE GIUSEPPINA	VIA E. MAJORANA	TORREGROTTA	02589490834	prot. PA/237 del 3 mar 2011		

numero offerte pervenute 11

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

PA137_1	Sistemazione idraulica del burrone S. Domenica-Malpasso e consolidamento del centro urbano		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 239 del 22 sett 2011	Data Lettera Invito	23/09/2011	CUP	J93B10000510001
					Data scadenza Gara	05/10/2011	CIG	330244824D
B I u f i - 1 B I S	RUP	Ing. Giuseppe la Placa	Diret. dei Lavori	Ing. Michele Zafonti Decreto n. 208 del 1/09/2011	Collaudatore Statico	Arch. Laura Oleni (collaudatore tec-amm e statico)	Coordinatore della Sicurezza	
	importo	€ 921.322,81	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 896.953,60 € 24.369,21	Decreto Commissione Verbale	decreto n. 259 del 5 ottobre 2011 06/10/2011	Aggiudicataria	CEIT DI GIUSEPPE MAMMOLITI
	Ribasso IMPORTO AGGIUDICATO	22,47% € 695.379,42	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 719.748,63	Aggiud.Provvisoria Aggiud. Definitiva	prot. U_523 del 7 ottobre 2011 prot. 2302 del 27 ottobre 2001		
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 300 del 27 ottobre 2011			Contratto	15-nov-11	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 23499 del 25 novembre 2011

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	INVITO	OFFERTA	%Ribasso
	78	C.I.P.E.A.	MARIO GHERARDI	VIA DELLA COOPERAZIONE 9, 40100	BOLOGNA	00591631205	484/DCI/RM del 23 settembre 2011	prot. 1781 del 3 ottobre 2011	**21,5968**
	81	IMPRESA AGOSTARIO ROSARIO	ROSARIO AGOSTARO	VIA MILANO 23, 90048	SAN GIUSEPPE JATO	00695150821	485/DCI/RMdel 23 settembre 2012	prot. 1795 del 4 ottobre 2011	**23,4748**
	84	COSPE SRL	GIANDOMENICO PEDRETTI	VIA MADONNINA 7, LOCALITA' MADREGOLO, 43044	COLLECCHIO	00509610341	486/DCI/RMdel 23 settembre 2013		
	163	PRESTI SRL	ROSARIO PRESTI	VIA SALVATORE QUASIMODO 17, 98050	TERME VIGLIATORE	02097900837	487/DCI/RMdel 23 settembre 2014	prot. 1794 del 4 ottobre 2011	**21**
	168	AMATA COSTRUZIONI SRL	ANTONIO NOCIFORA AMATA	CONTRADA PIRATO 19, 98076	SANT'AGATA DI MILITELLO	02115870830	488/DCI/RMdel 23 settembre 2015	prot. 1791 del 4 ottobre 2011	**22**
	172	CFC CONSORZIO STABILE SRL	SALVATORE FERUTO* GIUSEPPE COSTANTINO	PIAZZALE DI PORTA PIA 121/A, 00198	SANTA SEVERINA	04083070872	489/DCI/RMdel 23 settembre 2016	prot. 1801 del 5 ottobre 2011	**19,737**
	178	ICM IMPRESA COSTRUZIONI MODERNE SRL	ANTONIETTA PATTI	CONTRADA MINAGA SS 189 snc, 92100	AGRIGENTO	01649200845	490/DCI/RMdel 23 settembre 2017	prot. 1748 del 30 settembre 2011	**21,648**
	182	CO.I.R. CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA	FRANCESCO CIPOLLA CROCE	VIA AGNELLI 12, 97019	VITTORIA	01231300888	491/DCI/RMdel 23 settembre 2018	prot. 1800 del 4 ottobre 2011	**18,5113**
	196	LUPO' COSTRUZIONI SRL	GIUSEPPE LUPO'	VIA MADDALENA 36, 98123	MESSINA	02552840833	492/DCI/RMdel 23 settembre 2019	prot. 1787 del 4 ottobre 2011	**20,036**
	197	CONSORZIO STABILE DINAMICO	GIOVANNI TODARELLO	VIA ETTORE PELLEGRINO 23/C 98123	MESSINA	03136880832	493/DCI/RMdel 23 settembre 2020	prot. 1790 del 4 ottobre 2011	**21,9**
	201	CO.MA.C. SRL	MASSIMO CASALEGGIO	VIA DI S. MARIA IN VIA LATA 6/10, 16128	GENOVA	01025340074	494/DCI/RMdel 23 settembre 2021	prot. 1786 del 4 ottobre 2011	**18,864**
esclusa	349	NA.SA. COSTRUZIONI SRL	SANTO NASELLO	LOCALITA' PIANO SPEDALE snc, 90024	GANGI	04321830822	495/DCI/RMdel 23 settembre 2022	prot. 1798 del 4 ottobre 2011	**Cauzione provvisoria non autenticata**
	353	CEIT DI GIUSEPPE MAMMOLITI	GIUSEPPE MAMMOLITI	VIA DOGALI (SCALO 222 P. 1, 98100	MESSINA	03700830	496/DCI/RMdel 23 settembre 2023	prot. 1797 del 4 ottobre 2011	**22,4732**
	357	SCIBETTA COSTRUZIONI SRL	FRANCESCO SCIBETTA	VIA PIETRO MIGNOSI 16, 93014	MUSSOMELI	01713620852	497/DCI/RMdel 23 settembre 2024	prot. 1759 del 30 settembre 2011	19,1349
	364	S.M. SRL	PIETRO GAZIANO	VIA RAGUSA 1, 92021	ARAGONA	02465090849	498/DCI/RMdel 23 settembre 2025	prot. 1744 del 30 settembre 2011	22,1001
	368	FUNARO COSTRUZIONI SRL	DOMENICO FUNARO	CONTRADA MAGAZINAZZI snc, 91029	SANTA NINFA	01506820818	499/DCI/RMdel 23 settembre 2026	prot. 1791 del 4 ottobre 2011	23,406
	373	COLNISA COSTRUZIONI SRL	NICOLA COLOMBRITA	VIA LORENZO GEMMELLARO 1, 95030	CATANIA	02043450879	500/DCI/RMdel 23 settembre 2027	prot. 1746 del 30 settembre 2011	25,25
	382	MESSINA GIUSEPPE	GIUSEPPE MESSINA	VIA ELIO VITTORINI 4, 93014	MUSSOMELI	00062840855	501/DCI/RMdel 23 settembre 2028	prot. 1782 del 3 ottobre 2011	21,2384
	390	SILGEO SRL	FILIPPO INFURNA	VIA ANTARES S/A 92100	AGRIGENTO	02452500842	502/DCI/RMdel 23 settembre 2029	prot. 1749 del 30 settembre 2011	19,9998
	396	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	FRANCESCO MONDELLO	VIA S. FRANCESCO DI PAOLA 398060	S. ANGELO DI BROLO	02761240833	503/DCI/RMdel 23 settembre 2030	prot. 1802 del 5 ottobre 2011	24,148
	397	AVENI SRL	ANTONINO AVENI	VIA MOLETI 14 98051	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	02675130831	504/DCI/RMdel 23 settembre 2031	prot. 1796 del 4 ottobre 2011	23,4685
	399	GEO DRILLING. SRL	CARMELINDA FANGANO	CONTRADA BURRIONE STRADA PROVINCIALE 16 96016	LENTINI	01413760891	505/DCI/RMdel 23 settembre 2032	prot. 1788 del 4 ottobre 2011	23,4514
	401	MAIORANA COSTRUZIONI SRL con Arcobaleno 3000	MAIORANA*ROCCO MARIA	VIA MAIO MARIANO 25 98057	MILAZZO	01931060832	506/DCI/RMdel 23 settembre 2033	prot. 1802 del 5 ottobre 2011	23,0303
	403	PETTINATO COSTRUZIONI SRL	SANTA TAVILLA	VIA UGO BASSI 31 98123	MESSINA	02569060839	507/DCI/RMdel 23 settembre 2034	prot. 1789 del 4 ottobre 2011	21,1219
	406	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	SALVATORE FICARRA	VIA GABBARA 11 93017	SAN CATALDO	1438980854	508/DCI/RMdel 23 settembre 2035	prot. 1758 del 30 settembre 2011	22,7341

numero offerte pervenute	24
soglia di anomalia	22,7293 %.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

PA137_2	Finanziamento dei lavori di "Lavori di Consolidamento del centro urbano a monte e a valle del quartiere Macelli		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 114 del 30 giu 2011	Data Lettera Invito	07/07/2011	CUP	J93B10000520001
B I u f i 2					Data scadenza Gara	20/07/2011	CIG	2750361581
	Resp. Proced.	Ing. Giuseppe La Placa	Diret. dei Lavori	Ing. Michele Zafonti DL	Collaudatore Statico	Prof. Ing. Angelo Milone (collaudatore Statico) Decreto n. 355 del	Coordinatore della Sicurezza	
	importo	€ 459.215,38	importo soggetto a ribasso	€ 446.721,68	Decreto Commissione Verbale	Decreto 138 del 20 luglio 2011 21/07/2011	Aggiudicataria	ARCOBALENO 3000 SRL
			oneri sicurezza	€ 12.493,70				
	Ribasso IMPORTO AGGIUDICATO	22,97% € 344.113,28	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 356.606,98	Aggiud. Provvisoria	prot. U/200 del 21 lug 2011		
					Aggiud. Definitiva	prot. 1319 del 29 lug 2011		
	Decreto aggiud.Def	Decreto 158 del 29 luglio 2011			Contratto	10-ago-11	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 17624 serie 3 del 9 set 2011

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	INVITO	OFFERTA	Ribasso
ammessa	87	ANGELO RUSSELLO SPA	EMANUELE CASCHETTO	VIA ETTORE ROMAGNOLI 128, 93012	GELA	01179080856	prot. U/80 del 7 lug 2011	prot. E/1284 del 19 lug 2011	12,7
aggiudicataria	90	ARCOBALENO 3000 SRL	SALVATORE SOTTILE	VIA II STRETTO MACEO snc, 98050	TERME VIGLIATORE	02546370830	prot. U/81 del 7 lug 2011	prot. E/1285 del 19 lug 2011	22,9692
esclusa	98	COSTRUBO SOCIETA' COOPERATIVA	EMANUELE BONFIGLIO	VIA NAZIONALE 166, VILL. GIAMPILIERI MARINA 98141	MESSINA	02748200835	prot. U/82 del 7 lug 2011	prot. E/1276 del 18 lug 2011	cauzione non autotenticata
fuori tempo	100	URANIA SRL	ALFREDO CANGEMI	VIALE GIOVANNI XXIII 2/F, 50033	FIRENZUOLA	02280690484	prot. U/83 del 7 lug 2011	prot. E/1311 del 20 lug 2011	Fuori tempo max
ammessa	103	LOTO SRL	CARMELO CALABRESE	VIA ING. S. CUTRONI 28, 98051	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	022948810839	prot. U/84 del 7 lug 2011	prot. E/1297 del 19 lug 2011	17,1545
ammessa	104	D.L.M. COSTRUZIONI SRL	LUCA FABIO CALABRESE	VIA SANT'ANDREA 215/E, 98051	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	03036160830	prot. U/85 del 7 lug 2011	prot. E/1298 del 19 lug 2011	18,3886
ammessa	106	I.CO.LI. DI LI DESTRI GIACOMO E C. SAS	GIACOMO LI DESTRI	VIA GIOVANNI MELI 85/A, 90022	CALTAVUTURO	04035280827	prot. U/86 del 7 lug 2011	prot. E/1292 del 19 lug 2011	13,6871
	108	SOCIETA' ITALIANA DI COSTRUZIONI STRADALI "SICS SRL"	CARMELO MISSERI	STRADA PROV. 25 PRIOLO-FLORIDIA AL KM 2 snc, 96010	PRIOLO GARGALLO	01143270898	prot. U/87 del 7 lug 2011		
	114	IMPRESA DEL BARONE SAS	BENEDETTO DEL BARONE	VIA PISA 29, 65100	PESCARA	01525500680	prot. U/88 del 7 lug 2011		
ammessa	119	LA FERRERA GIUSEPPE	GIUSEPPE LA FERRERA	VIA GIOVANNI VERGA 1, 94010	ENNA	00097900864	prot. U/89 del 7 lug 2011	prot. E/1302 del 19 lug 2011	8,8432

numero offerte pervenute 8

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

PA154	Opere di consolidamento – Zona via Borgese" nel comune di Polizzi Generosa (PA)	Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 115 del 30 giu 2011	Data Lettera Invito	07/07/2011	CUP	J33B10000540001
Polizzi Generosa				Data scadenza Gara	21/07/2011	CIG	1845916212
	Resp. Proced. Ing. Vincenzo Di Rosa	Diret. dei Lavori	Ing. Giuseppe Dragotta (Decreto n. 359 del 2 dicembre 2011)	Collaudatore Statico	Ing. Giuseppe Dragotta (Collaudatore statico) Decreto n. 359 del 2 dicembre 2011	Coordinatore della Sicurezza	
	importo € 359.929,46	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 276.954,56 € 10.797,88	Decreto Commissione Verbale	decreto 139 del 20 luglio 2011 22/07/2011	Aggiudicataria	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL
	Ribasso 20,67% IMPORTO AGGIUDICATO € 276.954,56	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 287.752,44	Aggiud Provvisoria Aggiud. Definitiva	prot. U/205 del 22 lug 2011 prot. 1372 del 3 ago 2011		
	Decreto aggiud Def Decreto 168 del 3 ago 2011			Contratto	10-ago-11	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 17623 serie 3 del 9 set 2011

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	INVITO	OFFERTA	Ribasso
	121	CO.GEN. SRL	ROBERTO ROGGIO	VIA CARLO FORLANINI 2/D, 96100	SIRACUSA	00984690891	prot. U/90 del 7 lug 2011		
ammessa	125	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. CARMELO CANNIZZO	CARMELO CANNIZZO	VIA NUOVA PANORAMICA 480 EDEN PARK, 98168	MESSINA	01522410834	prot. U/91 del 7 lug 2011	prot. E/1301 del 19 lug 2011	10,1111
fuori tempo max: inviata dalle poste al centro	126	SIDOTI COSTRUZIONI SRL	ANTONINO SIDOTI	CONTRADA LENZI snc, 98060	MONTAGNARE ALE	01674800832	prot. U/92 del 7 lug 2011	prot. 1357 del 25 lug 2011	fuori tempo max:
	134	SICULA COSTRUZIONI	SALVATORE FERLITO* GREGORIO D'AGATA	VIA PROVINCIALE 45, 95020	LINERA	02131800878	prot. U/93 del 7 lug 2011		
	135	SUD COSTRUZIONI	GREGORIO FABIO NICOLOSI* MARIA MARGA NICOLOSI	VIA LICCIARDI 7/A 95126	CATANIA	04794530875	prot. U/94 del 7 lug 2011	prot. E/1247 del 14 lug 2011	cauzione non autentica
	141	GLOBAL SERVICE ITALIA SRL	SIMONE BLARASIN	VIALE SANTA PANGIA 136/F, 96100	SIRACUSA	01381130895	prot. U/95 del 7 lug 2011		
ammessa	142	DIVA SRL	ROSARIA VULLO	VIA MAGELLANO 1, 93010	VALLELUNGA PRATAMENO	01654050853	prot. U/96 del 7 lug 2011	prot. E/1304 del 20 lug 2011	18,3731
	149	FERRETTI INTERNATIONAL SRL	ALBERTO FERRETTI	VIALE MARCONI 20, 24044	DALMINE	02247210160	prot. U/97 del 7 lug 2011		
	156	GIAMBRONE FRANCESCO	FRANCESCO GIAMBRONE	VIA TORINO 21, 92022	CAMMARATA	00594000846	prot. U/98 del 7 lug 2011	prot. E/1317 del 20 lug 2011	6,4531
aggiudicataria	160	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	MARCELLO D'AGATA	VIA ANZALONE 12, 95024	ACIREALE	04157170871	prot. U/99 del 7 lug 2011	prot. E/1290 del 19 lug 2011	20,6733
NON INVITATA		CANNIZZO COSTRUZIONI SRL	GIANLUCA CANNIZZO	PIAZZA DUOMO 6 98068	SAN PEIRO PATTI	01755570833		prot. E/1295 del 19 lug 2011	non invitata

numero offerte pervenute 7

Dott. Maurizio Croce

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME061	Consolidamento via Durante e via S. Lucia		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 111 del 30 giu 2011	Data Lettera Invito	07/07/2011	CUP	G59D11000030002
Castelluccio di					Data scadenza Gara	21/07/2011	CIG	2746936849
	Resp. Proced.	Ing. Giuseppe La Placa	Diret. dei Lavori	STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGG. G. MINEO E P. SCAVAGLIERI	Collaudatore Statico	MARCELLO D'ALIA (collaudatore tec-amm e statico) Decreto n. 298 del	Coordinatore della Sicurezza	
	importo	€ 934.021,22	importo soggetto a ribasso	€ 911.444,40	Decreto Commissione	Decreto 140 del 21 luglio 2011	Aggiudicataria	TORSTEN COSTRUZIONI SRL
			oneri sicurezza	€ 22.576,82	Verbale	22/07/2011		
	Ribasso	17,36%	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 775.825,46	Aggiud Provvisoria	prot. U/206 del 22 lug 2011		
	IMPORTO AGGIUDIC	€ 753.348,64			Aggiud. Definitiva	prot. 1348 del 1 ago 2011		
	Revoca aggiud Def	Decreto 163 del 1 ago 2011			Contratto	10-ago-11	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 17625 serie 3 del 9 set 2011

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	INVITO	OFFERTA	Ribasso
ammessa	10	CANTIERI RIUNITI SRL	GIOACCHINO ALI'	VIA REDENTORE 10, 95129	CATANIA	02518290875	prot. U/100 del 7 lug 2011	prot. E/1304 del 20 lug 2011	21,604
ammessa	11	MI CO SRL	LUIGINA LANZALACO	VIA LEONARDO DA VINCI 57, 93014	MUSSOMELI	01418060859	prot. U/101 del 7 lug 2011	prot. E/1286 del 19 lug 2011	19,3562
ammessa	12	CONSORES SRL	SALVATORE SCARBACI	VIA VAL DI MAZARA 52, 90144	PALERMO	04633930823	prot. U/102 del 7 lug 2011	prot. E/1287 del 19 lug 2011	10,819
ammessa	13	FRADEL COSTRUZIONI	GUGLIELMO DEL PRETE	VIA MATILDE SERRAO 11, 8100	QUARTO	06018431210	prot. U/103 del 7 lug 2011	prot. E/1293 del 19 lug 2011	7,3152
ESCLUSA PER RITARDO	21	ING. PRIOLO ROBERTO SRL	ROBERTO PRIOLO	CONTRADA S.NICASIO snc, 90023	CIMINNA	05367550828	prot. U/104 del 7 lug 2011	prot. E/1329 del 21 lug 2011	ESCLUSA PER RITARDO
esclusa	32	IMPREFER SRL	FABIO FERRARO*, ANTONINO FERRARO	VIA NAZIONALE S.S.120 CONTRADA CERRO snc, 95015	LINGUAGLOSSA	03816120871	prot. U/105 del 7 lug 2011	prot. E/1315 del 20 lug 2011	cauzione non autotentirata
ESCLUSA PER RITARDO	40	S.A.L.P. SPA	UGO FRATA	VIA JULIA 3, 33050	BAGNARIA ARSA	0166260307	prot. U/106 del 7 lug 2011	prot. E/1331 del 21 lug 2011	ESCLUSA PER RITARDO
ammessa	41	SOCIETA' COOPERATIVA EUROVEGA COSTRUZIONI	GIUSEPPE MANGANO	VIA MANCINI 33, 98071	CAPO D'ORLANDO	01515630836	prot. U/107 del 7 lug 2011	prot. E/1324 del 21 lug 2011	7,4568
ammessa	43	BONGIOVANNI COSTRUZIONI SAS DI BONGIOVANI CALOGERO	CALOGERO BONGIOVANNI	VIA LARGO R9 4, 92025	CASTELTERMINI	02409690845	prot. U/108 del 7 lug 2011	prot. E/1277 del 18 lug 2011	12,3456
ammessa	44	GRESY APPALTI SRL	MARIO CAPIZZI	VIA CALI' 18/20, 95035	MALETTO	04368150878	prot. U/109 del 7 lug 2011	prot. E/1308 del 20 lug 2011	20,505
ammessa	45	COSTRUZIONI SRL	RODOLFO GRECO	VIA ANDREA COSTA 11, 95129	CATANIA	04121290870	prot. U/110 del 7 lug 2011	prot. E/1257 del 17 lug 2011	6,9531
ammessa	49	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SPA	FRANCESCO BRUNO	VIA CAMPIDOGLIO 73, 98076	SANT'AGATA DI MILITELLO	02669810836	prot. U/111 del 7 lug 2011	prot. E/1322 del 21 lug 2011	16,0211
esclusa	53	CO.GE.ZAF. SRL	SEBASTIANO ZAFONTI	BIVIO SS. TRINITA' 12, 90026	PETRALIA SOPRANA	04393290822	prot. U/112 del 7 lug 2011	prot. E/1299 del 19 lug 2011	cauzione non autotenticata
ammessa	56	A.C. GROUP SRL	ANDREA MAROTTA	VIA UMBERTO 103, 92026	FAVARA	02559040841	prot. U/113 del 7 lug 2011	prot. E/1316 del 20 lug 2011	10,1527
ammessa	58	EMMECCI SRL	SANTO LIPIRA	VIA ANTONIO JERONE 25, 90024	GANGI	05648090826	prot. U/114del 7 lug 2011	prot. E/1294 del 19 lug 2011	28,3708
AGGIUDICATARIA	60	TORSTEN COSTRUZIONI SRL	GIANLUCA CAPIZZI	CORSO UMBERTO 226, 95034	BRONTE	4636340871	prot. U/115 del 7 lug 2011	prot. E/1309 del 20 lug 2011	17,3566
ammessa	65	PACOS SRL	CALOGERO PALILLA	VIA DANTE 148, 92028	NARO	02617190844	prot. U/116 del 7 lug 2011	prot. E/1312 del 20 lug 2011	15,326
ammessa	73	VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE	GABRIELE RUFFOLO	VIA MARIANNA DIONIGI 43, 00100	ROMA	08066951008	prot. U/117 del 7 lug 2011	prot. E/1320 del 21 lug 2011	24,4432
ammessa	75	CITTADINI SRL	CARLO CITTADINI	VIA CASSANO AL JONIO 2, 00178	ROMA	07947530585	prot. U/117 del 7 lug 2011	prot. E/1323 del 21 lug 2011	18,411
ammessa	76	GEOS SRL	CINZIA BLANDANO	PIAZZA MARCONI snc, 98060	MONTAGNAREALE	02919830832	prot. U/119 del 7 lug 2011	prot. E/1300 del 19 lug 2011	13,1
NON INVITATA	168	AMATA COSTRUZIONI SRL	ANTONIO NOCIFORA AMATA	CONTRADA PIRATO 19, 98076	SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)	02115870830	Impresa invitata per Blufi 1	prot. E/1313 del 19 lug 2011	NON INVITATA
							numero offerte pervenute	20	
							offerta da società non invitata	1	
							Soglia di anomalia	18,3686	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

AG011		Opere di consolidamento centro urbano	Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 145 del 22 lug 2011	Data Lettera Invito	25/07/2011	CUP	G91B1000072002	
					Data scadenza Gara	04/08/2011	CIG	2847116A70	
	Resp. Procedi	Arch. Gesua Palumbo	Diret. dei Lavori	Ing. Carmelo Arcieri DL	Collaudatore Statico	STUDIO DI MINO INGEGNERI ASSOCIATI (collaudatore tec-amm e statico)	Coordinatore della Sicurezza		
	Importo	€ 715.401,18	Importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 695.359,01 € 20.042,17	Decreto Commissione	Decreto 176 del 4 agosto 2011	Verbale	05/08/2011	
RIBERA	Aggiudicataria revocata	NA.SA COSTRUZIONI SRL	Ribasso IMPORTO AGGIUDICATO	20,53% € 552.591,37	Aggiud Provvisoria	prot. 245 del 5 ago 2011	INFO ANTIMAFIA	richiesata prot: 1419/UC del 5 agosto 2012 rispota prot:	revoca provvedimento di aggiudicazione provvisoria decreto n. 217 del 7 settembre 2011
	Aggiudicataria revocata	COSTRUZIONI GATTOPARDO SRL	Ribasso IMPORTO AGGIUDICATO	19,9999% € 556.287,90	Aggiud Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Prot.1 687/UC del 7 settembre 2012 Decreto n. 237 del 21 settembre 2012	INFO ANTIMAFIA	richiesta per Gattopardo prot: 482 del 21 settembre 2011 rispota prot: 1192 del 10 aprile 2012	Decreto di risoluzione del Contratto* n. 163 del 13 aprile 2012 *(stipulato il 23 settembre 2011 e Registrato Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 19136 serie 3 del 3 ottobre 2011)
	Aggiudicataria	C. & P. SRL	Ribasso IMPORTO AGGIUDICATO	19,5011% € 472.747,64	Aggiud Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	prot. 1355 del 19 aprile 2012 Decreto n. 200 del 3 maggio 2012			
	Decreto di aggiudicazione definitiva	Decreto n. 200 del 3 maggio 2012			Contratto	26-giu-12	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 14768 serie 3 del 6 luglio 2012	

note	prot. ltaliza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	INVITO	OFFERTA Ribasso	
ammessa	306	GHELLER SRL	DAVIDE GHELLER	VIA MONTEGRAPPA 7, 36020	SOLAGNA	02230600245	prot. U/217 del 25 lug 2011	prot. 1418 del 3 ago 2011	31,34
ammessa	300	EREDI DI ANELLO ANDREA SRL	MAURIZIO ANELLO	CONTRADA GUARDIOLA snc, 90012	CACCAMO	05630140829	prot. U/215 del 25 lug 2011	prot. 1414 del 2 ago 2011	29,23
ammessa	310	DI NICA COSTRUZIONI SRL	GIUSEPPE DI NICA	VILLAGGIO MOSE' - SS 115 KM 198.450 snc, 92100	AGRIGENTO	0238954084	prot. U/220 del 25 lug 2011	prot. 1425 del 3 ago 2011	24,1129
ammessa	299	ITAL COSTRUZIONI	EMILIO INCARBONE	VIA E. MORSELLI 38, 93012	GELA	01640260855	prot. U/214 del 25 lug 2011	prot. 1420 del 3 ago 2011	23,3485
provvedimento revocato	149	NA.SA COSTRUZIONI SRL	SANTO NASELLO	LOCALITA' PIANO SPEDALE snc, 90034	GANGI	04321830822	prot. U/226 del 25 lug 2011	prot. 1429 del 4 ago 2011	20,5315%
provvedimento revocato	231	COSTRUZIONI GATTOPARDO SRL	ANTONIO TAIBI	VIA JACOPONE DA TODI snc, 92010	FAVARA	1665681841	prot. U/209 del 25 lug 2011	prot. 1413 del 2 ago 2011	19,9999
aggiudicataria	317	C. & P. SRL	ANTONINO RIZZO	VIA SANT'ANDREA 329, 93051	BARCELLONA P.G.	02710410834	prot. U/222 del 25 lug 2011	prot. 1411 del 2 ago 2011	19,5011
ammessa	289	INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL	ROSARIO DE DOMENICO	VIA TOMMASO CANNIZZARO 209, 98122	MESSINA	01742180837	prot. U/211 del 25 lug 2011	prot. 1426 del 3 ago 2011	18,62
ammessa	315	PI.SA.RI. COSTRUZIONI SRL	ANTONINA MINGOIA	CONTRADA GERMANO snc, 93014	MUSSOMELI	01386490856	prot. U/221 del 25 lug 2011	prot. 1409 del 2 ago 2011	18,3631
ammessa	319	ITAL PROGET SRL	PASQUALE CUCINOTTA	VIALE UMBERTO 69, 98122	MESSINA	02071760835	prot. U/223 del 25 lug 2011	prot. 1421 del 3 ago 2011	17,143
ammessa	290	SPALLINA LUCIO	LUCIO SPALLINA	VIA LOMBARDIA30, 90024	GANGI	04316590829	prot. U/212 del 25 lug 2011	prot. 1427 del 4 ago 2011	16,973
ammessa	297	GRILLO INFRASTRUTTURE SRL Fax 090 9961352	PLACIDO GRILLO* SEBASTIANO GRILLO	VIA M. GANDHI 39, 98043	ROMETTA	02994060834	prot. U/213 del 25 lug 2011	prot. 1412 del 2 ago 2011	15,7751
ammessa	273	MATTIOLI SPA ALESSIA MARIGO VIA CRIMEA 94,	GIOACCHINO MARABELLO* STEFANO SCUTTARI	VIA CRIMEA 94, 35141	PADOVA	01269440283	prot. U/208 del 25 lug 2011	prot. 1428 del 4 ago 2011	15,6935
ammessa	288	FRESTA ROSARIO ANTONINO Fax: 095 88 80 157	ROSARIO ANTONIO FRESTA	VIA FELICETTO 11, 95010	SANTA VENERINA	01131500876	prot. U/210 del 25 lug 2011	prot. 1405 del 1 ago 2011	13,722
	272	CONSORZIO STABILE ITALIANO S.C.A.R.L PIAZZA DEI MARTIRI 30,	ENRICO NOBILIONE	PIAZZA DEI MARTIRI 30, 80121	NAPOLI	06283811211	prot. U/207 del 25 lug 2011		
	304	D & D COSTRUZIONI SRL Fax 090 6411590	ROSARIO DE DOMENICO	VIA FELICE BISAZZA 14, 98122	MESSINA	01781930837	prot. U/216 del 25 lug 2011		
	307	ITTEMO SRL Fax 059 783116	LUIGI BOFISE'	CORSO LIBERTA' 153, 41018	SAN CESARIO SUL PANARO	01851800365	prot. U/218 del 25 lug 2011		
	309	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI Fax: 178 4413143	MARIA RAMUGLIA	VIA DANTE ALIGHIERI 58, 98049	VILLAFRANCA TIRRENA	0272310838	prot. U/219 del 25 lug 2011		
	325	CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI SPA Fax: 0962 90 95 04	GENNARO COSENTINO	VIA PANTUSA 32, 88074	CROTONE	00103240792	prot. U/224 del 25 lug 2011		
	328	RCT SRL Fax: 02 95 35 03 16	DANIELE ATTALA* CESARE TREVISAN	VIALE PRIMO MAGGIO 6/BIS	PESCHIERA BORROMEO	00687660159	prot. U/225 del 25 lug 2011		
							numero offerte pervenute	14	
							soglia di anomalia	21,4988%	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ME066	Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 131 del 14 lug 2011	Data Lettera Invito	14/07/2011	CUP	E32J09000090002
					Data scadenza Gara	29/07/2011	CIG	2796158692
Fiara	Resp. Proced.	Ing. Fabio Marino	Diret. dei Lavori	Ing. Francesco Cappotto Decreto n. 231 del 21 settembre 2011	Collaudatore Statico	Ing. Nunzio Impellizzeri (Decreto n. 352 del 1	Coordinatore della Sicurezza	
	Importo	€ 824.216,35	Importo soggetto a ribasso	€ 776.391,14	Decreto Commissione	Decreto 157 del 29 luglio 2011	Aggiudicataria	RENZO COSTRUZIONI
			oneri sicurezza	€ 47.825,21	Verbale	01/08/2011		
	Ribasso	23,08%	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 645.016,73	Aggiud.Provvisoria	prot. 242 del 1 ago 2011		
	IMPORTO AGGIUDICATO	€ 597.191,52			Aggiud. Definitiva	Prot. 1559 del 25 agosto		
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 198 del 25 ago 2011			Contratto	01/09/2011	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufflo Roma 2 Aurelio n. 18089 serie 3 del 19 settembre 2011

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	INVITO	OFFERTA	Ribasso
ammessa	29	Fax: 0934952316	SALVATORE CRUSCHINA	VIA ROSSO DI SAN SECONDO 39, 93014	MUSSOMELI	01385120850	prot. U/169 del 14 lug 2011	prot. 1361 del 25 lug 2011	6,92
ammessa	47	Fax: 0921384278	MICHELANGELO MAMMANA	VIA S. LUCIA snc, 98070	CASTEL DI LUCIO	01936500832	prot. U/170 del 14 lug 2011	prot. 1383 del 27 lug 2011	17,8511
ammessa	208	Fax: 0916266836	ANDREA DI GIOVANNA	VIA SICILIA2, 90144	PALERMO	05728890822	prot. U/171 del 14 lug 2011	prot. 1388 del 27 lug 2011	24,4224
ammessa	210	S.C.A.R.L. IN SIGLS GOP S.C.A.R.L.	MARIAELISA RUSSO	VIA DELLA MINERVA 1, 00186	ROMA	10712911006	prot. U/172 del 14 lug 2011	prot. E/1378 del 26 lug 2011	14,71
	211	Fax: 0865503141	NICOLA AMODEI	VIA BIVIO 1, 86070	FORNELLI	00800240947	prot. U/173 del 14 lug 2011		
ammessa	212	Fax: 0823856458	PIETRO MARRA	VIA CAPPELLA REALE 7/A, 81030	CANCELLO ED ARNONE	03337560613	prot. U/174 del 14 lug 2011	prot. E/1335 del 21 lug 2011	23,479
ammessa	225	Fax: 0921307191	ROSA MARIA COSTANZA	VIA NAZIONALE 1/B, 98079	CASTEL DI TUSA	02608800831	prot. U/175 del 14 lug 2011	prot. E/1391 del 28 lug 2011	23,4782
	232	Fax: 081441718	ARCH. SALVATORE DE VITA	VIA BROGGIA 18, 80135	NAPOLI	07712821003	prot. U/176 del 14 lug 2011		
ammessa	237	SPECIALI	GABRIELE GALIPO'	CONTRADA SANTA LUCIA snc, 98071	CAPO D'ORLANDO	01800660837	prot. U/177 del 14 lug 2011	prot. 1386 del 27 lug 2011	24,3014
ammessa	238	Fax: 0934951339	VINCENZO CALLARI	VIA LIGURIA 2, 93014	MUSSOMELI	01384160857	prot. U/178 del 14 lug 2011	prot. 1385 del 27 lug 2011	16,635
ammessa	242	Fax: 0957611505	ORAZIO DI MARIA	PIAZZA G. LUPIS 9, 95020	SANTA VENERINA	04488920879	prot. U/179 del 14 lug 2011	prot. E/1389 del 28 lug 2011	24,1099
ammessa	244	Fax: 0918217135	FRANCESCO VERGA	CONTRADA SAN PIETRO snc, 90030	CASTRONOVO DI SICILIA	05792600826	prot. U/180 del 14 lug 2011	prot. E/1373 del 26 lug 2011	7,0226
ammessa	247	Fax: 0922606760	GIUSEPPA DE FRANCISCI	VIA ELICONE 7, 92100	AGRIGENTO	02618160846	prot. U/181 del 14 lug 2011	prot. E/1393 del 28 lug 2011	22,882
	248	Fax: 0341287367	LUCA DELLE DONNE	VIA FRATELLI CAIROLI 59, 23900	LECCO	01953630132	prot. U/182 del 14 lug 2011		
rinuncia	252	Fax: 0773414332	ROBERTO RECCHIONI	VIA FAZIOLI 10, 60123	ANCONA	01320360421	prot. U/183 del 14 lug 2011	prot. E/1358 del 25 lug 2011	rinuncia a presentare
ammessa	254	Fax: 010591336	RAFFAELLA RAPUZZI	SEDE AMMINISTRATIVA: VIA T. IVREA 9/14 16129	GENOVA	03425520107	prot. U/184 del 14 lug 2011	prot. E/1374 del 26 lug 2011	19,792
aggiudicataria	255	Fax: 0941243353	RENZO GIOVANNI BOLZON	VIA TRIESTE 50, 98066	PATTI	01786140663	prot. U/185 del 14 lug 2011	prot. E/1392 del 28 lug 2011	23,0811
ammessa	257	Fax: 0957252356	GIUSEPPE COPPOLA EUGENIO ANTONIO COPPOLA	VIA DANTE ALIGHIERI 20, 95030	SANT'AGATA LI BATTIATI	03009630876	prot. U/186 del 14 lug 2011	prot. E/1394 del 28 lug 2011	18,7977
fuori tempo massimo	258	Fax: 0543781730	ROBERTO ZAGO	VIA GRAMADORA 5, 42122	FORLI'	01334530407	prot. U/187 del 14 lug 2011	prot. 1401 del 29 lug 2011 ore 12:00	
ammessa	268	Fax: 0934993997	PINO MINGOIA	VIA MILANO 3, 93014	MUSSOMELI	01700950858	prot. U/188 del 14 lug 2011	prot. 1384 del 27 lug 2011	15,5745

numero offerte pervenute	17
Soglia di anomalia	23,406

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ME115_1	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barbà	Decreto Approv. Bando	Decreto 165 del 3 ago 2011	pubblicazione Bando	GUCE GU/S S150 DEL 06/08/2011 G.U.R.I. 5a Serie	Data scadenza Prequalifica	08/09/2011	
Sant'Angelo di Brolo	CUP: J85D11000450001	CIG	31100140BE	Resp. Proced.	Ing. Bruno Manfrè (DRPC ME)	Dirett. dei Lavori	DPRC ME Ing. A. Sorge	
	Decreto schede di offerta: Decreto 223 del 14 set 2011	lettera di invito	14/09/2011	scadenza presentazione quesiti	22/09/2011	scadenza presentazione Offerte	30/09/2011	
	importo: € 2.045.335,77	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 1.990.671,54 € 54.664,23	Ribasso	24,90%	importo aggiudicato	€ 1.495.081,92 € 54.664,23	€ 1.549.746,15
	Decreto Commissario: Decreto n. 248 del 30 settembre 2011 Verbale: 03-ott-11	Aggiudicataria	ATI: MORSELLO COSTRUZIONI s.r.l. (Capogruppo) - ANCA MA. s.r.l. (Mandante)	Aggiud. Provvisoria	prot. 565 del 13 ottobre			
				Aggiud. Definitiva	prot. 2267 del 26 ottobre 2011			
	Decreto nomina DL: Decreto n. 295 del 26 ottobre 2011			Contratto	15-nov-11	Data effett.va consegna Lav.	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 23496 del 25 novembre 2011	

prot. istanza	n. progressivo richiesta invito	Denominazione Impresa	richiesta di invito	invito	offerta	data offerta	Ribasso
singola	1	CA.TI.FRA. s.r.l. Via Stretto I° Bartolella, 126 98051 Barcellona P.G. (ME) Fax 090 9764304					24,7987
ATI	2	AVENI SRL IMPRESA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI (capogruppo) Ouglietta triuellazioni srl (mandante)					23,5953
singola	3	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL					23,682
singola	4	EdiTurci srl via della Liberazione 21 47025 Mercato Saraceno FC Tel 0547-90144 fax: 0547-971059 mail info@editurci.it					NO OFFERTA
ATI	5	DEMETRA LAVORI s.r.l. 854 Via Nazionale snc DIVA s.r.l.					20,4044
singola	6	NARDUPPI MICHELANGELO Via S. Lucia s.n. 98070 Castel di Lucio (ME)				DOCUMENTI MANCANTI	
singola	7	IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI PITASI s.r.l. Via S. Sperato Trav. I Laboccetta, 18 89100 REGGIO CALABRIA					NO OFFERTA
ATI	8	PINESI S.r.l. Via S. Quasimodo, 17 00040 Ciampino (RM) I.CO.LI. DI LI DESTRI GIACOMO & C. s.a.s					24,2126
singola	9	DE STEFANO SALVATORE & C. s.a.c. Viale del Bassento, 244/a 85100 POTENZA					22,9
singola	10	CFC CONSORZIO STABILE s.r.l. Via Provinciale, 45 95010 Santa Venerina (CT)					24,3586
singola	11	GHELLER s.r.l. Via Montegrappa, 7 36020 Solagna (VI)					NO OFFERTA
ATI	12	SGRO' ALBERTO ALVARO DANIELE Via Acciaroia Tirendi, 4 95031 Maletto (CT) In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: RE I.CO. s.r.l.					23,5337
singola	13	IMPRESA EDILE ITALIA S.r.l. Via Lodi Pal Inverno 92/1 12013 Racconigi (CN)					DOCUMENTI MANCANTI
singola	14	INGEGNERIA E COSTRUZIONI s.r.l. Via Tommaso Cannizzaro, 209 98123 MESSINA					22,62
singola	15	MA.CON. CONSOLIDAMENTI s.r.l. Via Emilia, 453 40064 Ozzano Emilia (BO)					NO OFFERTA
singola	16	VALORI s.c.a.r.l. CONSORZIO STABILE Via Marianna Dionigi, 43 00193 ROMA					25,4999
ATI	17	MAMORANA COSTRUZIONI Via Maio Mariano, 25 98057 Milazzo (ME) Fax 090 9222769 In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: ARCORALENO 3000 s.r.l.					23,7121
singola	18	PISCIOTTA COSTRUZIONI Via Domenico Trentacoste, 31 90143 PALERMO					24,7344
ATI	19	DITTA LUONGO PASQUALINO Via M.R. Imbriani, 77 83012 Cervinara (AV) In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: DITTA CHIOFALO COSTRUZIONI s.r.l.					24,386
ATI	20	GRAMEY s.r.l. Via Enrico Mattei, 17 98051 Barcellona P.G. (ME) In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: SUPREMA APPALTI s.r.l.					24,551
singola	21	EDILPALI S.r.l. Via Andrea Doria, 23 95125 CATANIA					NO OFFERTA
singola	22	DI NICA COSTRUZIONI SRL SS 115 km 188,450 tel 0922 33037 0922 438326 impresadinica@pec.it 92100 agrigento					24,2119
singola	23	EUROVEGA COSTRUZIONI Soc. Coop. di Produzione e Lavoro a r.l. Via Mancini, 33					19,6587
singola	24	INDUSTRIA E COSTRUZIONI S.p.A. Via SS Crocifisso, 39 95037 S. Giovanni La Punta (CT) Fax 095 7515102 info@industriaecostruzioni.com					31,33
singola	25	Via Sant'Andrea, 329 98071 Barcellona P.G. (ME) Fax 090 9794453 cp3003@vergilio.it cosri@pec.it					24,1111
singola	26	ITALIA S.r.l. Costruzioni e Ingegneria Via Renato Salvatori, 29 00173 ROMA Fax 06 89244383 italiasrl@arubapec.it assitt@italiasrl.it					23,321
singola	27	FESA S.r.l. Via Guglielmo Sanfelice, 24 80134 NAPOLI Fax 081 7576030 fesa@libero.it fesasrl@pec.it					NO OFFERTA
ATI	28	ECOL 3000 s.r.l. Via Oratorio della Pace, 3 98122 MESSINA Fax 090 662530 In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: COSTRUBO Soc. Coop.					26,5112
							NO OFFERTA

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ME115_1	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba		Decreto Approv. Bando	Decreto 165 del 3 ago 2011	pubblicazione Bando	GUCE GU/S S150 DEL 06/08/2011 G.U.R.I. 5a Serie	Data scadenza Prequalifica	08/09/2011
Sant'Angelo di Brolo	CUP	I85D11000450001	CIG	31100140BE	Resp. Proced.	Ing. Bruno Manfrè (DRPC ME)	Direttore dei Lavori	DPRC ME Ing. A. Sorge
	Verbale Udienza di offerta	Decreto 223 del 14 set 2011	Lettera di invito	14/09/2011	Scadenza presentazione offerte	22/09/2011	Scadenza presentazione Offerte	30/09/2011
	Importo	€ 2.045.335,77	Importo soggetto a ribasso / oneri sicurezza	€ 1.990.671,54 / € 54.664,23	Ribasso	24,90%	Importo aggiudicato	€ 1.495.081,92 / € 54.664,23 / € 1.549.746,15
	Giornale Commissione Verbale	Decreto n. 248 del 30 settembre 2011 / 03-ott-11	Aggiudicataria	ATI MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l. (Capogruppo) - AN.CA.MA. s.r.l. (Mandante)	Aggiud.Provvisoria / Aggiud. definitiva	prot. 565 del 13 ottobre / prot. 2267 del 26 ottobre 2011		
	Decreto approvazione	Decreto n. 295 del 26 ottobre 2011			Contratto	15-nov-11	Data effettiva consegna Lav.	Ag. Delle Entrate Div. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 23496 del 25 novembre 2011

prot. istanza	n. progressivo richiesta invito	Denominazione impresa	criterio di invito	invito	offerta	data offerta	Ribasso
singola	29	FIORELLO FIORETTI Via della Fiera, 14 05100 TERNI					NO OFFERTA
ATI	30	OFFICINE SAN GIORGIO s.r.l. Piazza M. Imbriani, 5 83016 Roccabascerana (AV) In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: FARRELLA PELLEGRINO s.r.l.					23,432 NO OFFERTA
singola	31	COSPIN s.r.l. Corso Sicilia, 40 95100 CATANIA					24,2709
singola	32	CONSORZIO GALILEO Via P. Mattarella, 14 97019 Vittoria (RG)					25,2628
singola	33	IMPRESA RICCIARDELLO COSTRUZIONI C.da Rocca S. Pietro Località Porte Nove					22,9262
singola	34	CCC CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Soc. Coop. Via Marco Emilio Lepido, 182/2					23,73
singola	35	C.A.E.C. Soc. Coop. Via Nunzio Digiacomo, 36 97013 Comiso (RG)					23,6273
ATI	36	FELICIANI FABRIZIO Via Capitonese, 19 05035 Narni (TR) Fax 0744 761394 In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: VENERI s.r.l.					24,2562 NO OFFERTA
ATI	37	SICE s.r.l. Centro Direzionale San Benedetto Z.I. 92100 AGRIGENTO Fax 0922 609169 Costituendo raggruppamento con: ZACCARIA TRIVELLAZIONI s.r.l.					31,666 NO OFFERTA
singola	38	COLNISA COSTRUZIONI S.r.l. Via Lorenzo Gemmellaro, 1 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT)					32,7
singola	39	VITRUVIO S.a.s.r.l. Località Licari, 37 98063 Gioiosa Marea (ME)					24,5548
singola	40	ARES S.r.l. Via Isole, 12 int. 8 00184 ROMA					24,3557
singola	41	CFC Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. Via Pansa, 55/f					24,3566
singola	42	PELORITANA APPALTI s.r.l. Via Operai, 133 98051 Barcellona P. G. (ME)					23,5971
ATI	43	Mandataria: IMPRESA I.S. A. MARIO E FIGLI DORIA CECHA FERDINANDO Via S. Agata, 90 94100 ENNA mandante: IMPRESA I.S. A. MARIO E FIGLI DI SILVIO E LORENZO SILLA s.n.c.				DOCUMENTI MANCANTI	
singola	44	PRESAL COSTRUZIONI s.r.l. Via Michelangelo, 15 98076 Sant'Agata Militello (ME) Fax 0941 702582					24,0697
singola	45	DI MARIA COSTRUZIONI s.r.l. Piazza G. Lupis, 9 (scala B) 95020 Santa Venerina (CT)					23,9483
singola	46	EL DA COSTRUZIONI s.r.l. Via Vittorio Emanuele, 248 98054 Furnari (ME)					36,5151
singola	47	Ing. ATTILIO GRASSI s.r.l. Via XX Settembre, 27 95027 San Gregorio di Catania (CT)					NO OFFERTA
ATI	48	Mandataria: LUPO' COSTRUZIONI s.r.l. Via Maddalena, 36 98123 MESSINA In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: VERTICAL PROJET s.r.l.					21,3334 NO OFFERTA
ATI	49	MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l. Via San Francesco di Paola, 3 98060 S. Angelo di Brolo (ME) In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: AN.CA.MA. s.r.l.					24,8958 NO OFFERTA
ATI	50	DB COSTRUZIONI s.r.l. Via Conte Verde, 9 86100 CAMPOBASSO In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: C.T.E. s.r.l.					NO OFFERTA NO OFFERTA
singola	51	CO.GE.TA. s.r.l. Via Dell'Olmo, 26 91100 TRAPANI					25,25
ATI	52	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA s.r.l. Via Valentino Mamola, s.n. 92026 Favara (AG) In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: SALAMONE RAIMONDO					23,5611 NO OFFERTA
singola	53	COSTRUZIONI s.r.l. Via Andrea Costa, 11 90129 CATANIA					26,9531
ATI	54	GIUSTI S.r.l. Piazza Mercato 98050 Montagnareale (ME) Costituendo raggruppamento con: Soc. PIZZO PIPPO DI PIAZZA FRANCESCO				DOCUMENTI MANCANTI	
ATI	55	IGURO' COSTRUZIONI s.r.l. C.da Granatari, 10 98040 Meri (ME) In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: SOVEL s.a.s.					23,5337 NO OFFERTA

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ME115_1	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba		Decreto Approv Bando	Decreto 145 del 3 ago 2011	pubblicazione Bando	GUCE GU/S S150 DEL 06/08/2011 G.U.R.I. 5a Serie	Data scadenza Prequalifica	08/09/2011	
Sant'Angelo di Brolo	CUP	J85D11000450001	CND	311001408E	Resp. Proced.	Ing. Bruno Manfrè (DRPC ME)	Direz. dei Lavori	DPRC ME Ing. A. Sorge	
	Decreto scheda di offerta	Decreto 223 del 14 set 2011	Bando di Gara	14/09/2011	Scadenza presentazione chiarimenti	22/09/2011	Scadenza presentazione Offerte	30/09/2011	
	Importo	€ 2.045.335,77	Importo soggetto a ribasso Oneri sicurezza	€ 1.990.671,54 € 54.664,23	Ribasso	24,90%	Importo aggiudicato	€ 1.495.081,92 € 54.664,23	€ 1.549.746,15
	Decreto Commissione Verbale	Decreto n. 248 del 30 settembre 2011 03-ott-11	Aggiudicataria	ATI: MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l. (Capogruppo) - AN.CA.MA. s.r.l. (Mandante)	Aggiud. Provvisoria Aggiud. Definitiva	prot. 565 del 13 ottobre prot. 2267 del 26 ottobre 2011			
	Decreto aggiudic.	Decreto n. 295 del 26 ottobre 2011			Contratto	15-nov-11	Data effett. ss consegna Lav.	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 23496 del 25 novembre 2011	

Prot. Istanza	N. progressivo richiesta invito	Denominazione impresa	richiesta di invito	Inoltro	offerta	data offerta	Ribasso
singola	56	SIDOTI COSTRUZIONI s.r.l. Contrada Lenzi 98060 Montagnareale (ME)					34,231
singola	57	D.L.M. COSTRUZIONI s.r.l. Via Sant'Andrea, 215/E 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Fax 090 9796859					23,6348
singola	58	BIDE S.r.l. Via G. D'Annunzio, 32 98061 Brolo (ME)					40,3944
singola	59	SOCIETA' LAVORI PUBBLICI s.r.l. Via Madre Teresa di Calcutta, 13 95035 Maletto (CT)					34,1226
singola	60	[illegible] Via Provinciale, 715 95010 Santa Venerina (CT)				DOCUMENTI MANCANTI	
ATI	61	BONINA s.r.l. Via Kennedy, 35 98061 Brolo (ME) In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: SOCIETA' COOPERATIVA EDILSICULA					23,3352 NO OFFERTA
singola	62	EURORESIDENCE s.r.l. Via Risorgimento, 123 98123 MESSINA					NO OFFERTA
ATI	63	SCIBETTA COSTRUZIONI s.r.l. Via Pietro Mignosi, 16 93014 Mussomeli (CL) In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: CALLARI COSTRUZIONI s.r.l.					24,1967 NO OFFERTA
singola	64	CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l. Via Rosso di San Secondo, 39 93014 Mussomeli (CL)					23,8561
singola	65	VENTURA S.p.A. Via Roma, 116/B 30030 Pianiga (Venezia) (VE)					NO OFFERTA
singola	66	CONSOLIDAMENTI SPECIALI s.r.l. Via Anzalone, 12 95024 Acireale (CT)					26,733
ATI	67	RENZO COSTRUZIONI s.r.l. Via Montegrappa, 7 36020 Solagna (VB) In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: F.LLI BARRESI COSTRUZIONI s.r.l.					33,8722 NO OFFERTA
singola	68	IMPRESA LA FERRERA GIUSEPPE Via Giovanni Verga, 1 94010 Gagliano Castelferrato (EN)					24,4553
singola	69	IMPRESA MOSPORA AMATA VINCENZO Contrada Salarona, 3 98076 S. Agata di Militello (ME)					NO OFFERTA
singola	70	MI.CO. s.r.l. Via Leonardo da Vinci, 57 93014 Mussomeli (CL)					19,8888
ATI	71	TRIGEO s.r.l. C.Da S. Lucia 98071 Capo d'Orlando (ME) Fax 0941 901892 In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: MESSINA COSTRUZIONI s.r.l.					24,2314 NO OFFERTA
ATI	72	[illegible] Via Nazionale, 150/D 98060 Piraino (ME) [illegible] Costituendo raggruppamento con: PROJECT s.r.l. PROFAS COSTRUZIONI s.r.l.					24,1129 NO OFFERTA NO OFFERTA
singola	73	Geom. ANTONIO GALLONE IMPRESA COSTRUZIONI Via Perugina, 298/B					7,5319
singola	74	SA.MA. s.r.l. Via Delle Industrie, 2 92021 Aragona (AG)					24,1222
singola	75	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.p.a. C.da Torre snc, Zona Ind. 98070 Raccuia (ME)					21,2216
singola	76	URANIA COSTRUZIONI s.r.l. Via Cesare Battisti IS. 73 98122 MESSINA					NO OFFERTA
singola	77	COSEDIL S.p.A. Via Principessa, 22 A/1 95010 Santa Venerina (CT)					NO OFFERTA
singola	78	AMATA COSTRUZIONI s.r.l. Contrada Pirato, 19 98076 S. Agata Militello (ME)					25
singola	79	C.G. COSTRUZIONE s.r.l. Via Nazionale, 1/B 98079 Castel di Tusa (ME)					25,2316
ATI	80	GEO DRILLING s.r.l. C/da Burrione S.P. 16, sn 96016 Lentini (SR) In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: ARCAN COSTRUZIONI s.r.					23,5262 NO OFFERTA
ATI	81	[illegible] Via [illegible], 93 91028 Partanna (TP) In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: GIUFFRE COSTRUZIONI s.r.l.				DOCUMENTI MANCANTI	
ATI	82	TRASPORTI MOVIMENTI TERRA s.r.l. Contrada Terrazze – Pantano D'Arci, s.n. Zona Industriale 95121 CATANIA Fax 095 292925 In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: EDIL ROCK s.r.l.					23,8778 NO OFFERTA
ATI	83	PETTINATO COSTRUZIONI s.r.l. Via Ugo Bassi, 31 98123 MESSINA In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: EUCONIA SCAVI s.r.l. E.C.I. s.r.l. Via T. Cannizzaro, 155 98122 MESSINA					26,5719 NO OFFERTA 18,7091



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME115_1	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba		Decreto Approv Bando	Decreto 165 del 3 ago 2011	pubblicazione Bando	GUCE GU/S S150 DEL 06/08/2011 G.U.R.I. 5a Serie	Data scadenza Prequalifica	08/09/2011
Sant'Angelo di Brolo	CUP	J85D11000450001	CIG	31100140BE	Reso. Proced.	Ing. Bruno Manfrè (DRPC ME)	Diret. dei Lavori	DPRC ME Ing. A. Sorge
	decreto scheda di lettera	Decreto 223 del 14 set 2011	lettera di invito	14/09/2011	scadenza presentazione chiarimenti	22/09/2011	scadenza presentazione Offerta	30/09/2011
	Importo	€ 2.045.335,77	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 1.990.671,54 € 54.664,23	Ribasso	24,90%	importo aggiudicato	€ 1.495.081,92 € 54.664,23 € 1.549.746,15
	Decreto Commissione Verbale	Decreto n. 248 del 30 settembre 2011 03-ott-11	Aggiudicataria	ATI MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l. (Capogruppo) - AN.CA.MA. s.r.l. (Mandante)	Aggiud.Provvisoria Aggiud. Definitiva	prot. 565 del 13 ottobre prot. 2267 del 26 ottobre 2011		
	Decreto aggiud Def	Decreto n. 295 del 26 ottobre 2011			Contratto	15-nov-11	Data effetti via telegrafo Uff	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 23496 del 25 novembre 2011

prot. istanza	n. progressivo richiesta invito	Denominazione Impresa	richiesta di invito	invito	offerta	data offerta	Ribasso
ATI	84	In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: OPERA APPALTI s.r.l.					NO OFFERTA
ATI	85	CESSECI s.r.l. Via S. Giovanni, 51 94014 Nicosia (EN) In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: ALAK s.r.l.					32,7777 NO OFFERTA
ATI	86	TEKNOGEO s.r.l. Via Dogali, 50 98122 MESSINA In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: IMPRESA FERRARIS s.a.s.					NO OFFERTA NO OFFERTA
ATI	87	FUNARO COSTRUZIONI s.r.l. Via Capitano Bruno, 3 91100 TRAPANI In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: SEICON s.r.l.					24,865 NO OFFERTA
ATI	88	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI s.r.l. Via Olanda, 54/B 92026 Favara (AG) In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: ARIS s.r.l.					31,4644 NO OFFERTA
ATI	89	GIUSEPPE CASILLO COSTRUZIONI s.r.l. Via Bonavolontà, 5 80024 Cardito (NA) Fax 081 8321014 In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: GI.GA. PROJECT s.r.l.					22,333 NO OFFERTA
singola	90	IMPRESA PREVEDELLO ISIDORO s.r.l. Via dell'Artigianato, 14 31047 Ponte di Piave (TV)					23,263
ATI	91	CUSIN S.r.l. Via Rosario, 33 36040 Brendola (VICENZA) In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: TROMBI COSTRUZIONI s.r.l.				CAUZIONE	
singola	92	BOSCHINI S.r.l. Piazza S. Pugno, 39 [illegible]				Fuori tempo	
singola	93	DEMOTER S.p.A. Via Nuova Panoramica dello Stretto, 1416 loc. C.Conqi, Linea Verde					NO OFFERTA
singola	94	CONSCOOP Consorzio Fra Cooperative di Produzione e lavoro Soc. Coop. Via L. Galvani, 17/b					NO OFFERTA
singola	95	CIPELAE s.r.l. Via A.da Mestre, 19 30174 VENEZIA MESTRE					27,336
singola	96	AEMME s.r.l. Via Ugo La Malfa, 74 92026 Favara (AG)					NO OFFERTA
singola	97	COSTRUZIONI POZZOBON S.p.A. Via Nazionale per Catania, 183/A 95024 Acireale (CT)					21,987
singola	98	IMPRESA S.A.CO.S.E.M. s.r.l. Via Cinzia P.co S.Paolo, n. 25/C 80126 NAPOLI					24,4671
singola	99	CONSORZIO STABILE AESARIS S.c. a r.l. Via Alessandria, 112 00198 ROMA					26,109
singola	100	FIN CONSORZIO Via Savoia, 78 00198 ROMA					18,543
ATI	101	GRESY APPALTI s.r.l. Via Cali, 18-20 95036 Maletto (CT) In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: TORSTEN COSTRUZIONI s.r.l.					24,5123 NO OFFERTA
singola	102	EDIL VINCENT s.r.l. Via Pietro Nenni, 14/A 95035 Maletto (CT)					21,5023
ATI	103	IMPRESA AGOSTINO ROSARIA Via Milano, 23 93018 San Giuseppe Jato (PA) In rappresentanza del Costituendo raggruppamento con: TDF INFRASTRUTTURE s.r.l.				Fuori tempo	
singola	104	COMEL s.r.l. Via Panepinto, 90 92022 Cammarata (AG)				24,3077	NO OFFERTA
singola	105	ITALCOSTRUZIONI s.r.l. Via Gen. Dalla Chiesa, 10 90141 Sclafani (PA)				DOCUMENTI MANCANTI	
singola	106	ITALRECUPERI s.r.l. Viale Principe Umberto, 81 [illegible]				DOCUMENTI MANCANTI	
singola	107	SANTACROCE s.r.l. Via Terze, 10 84018 Scafati (SA) Fax 081 8592789 [illegible]				24,3231	NO OFFERTA
singola	108	TECNO IMPIANTI 84 s.r.l. Via Crescenzio, 58 00193 ROMA				25,555	NO OFFERTA
singola	fuori tempo massimo	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P.A.				esclusi in prequalifica	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

CT037	Mitigazione del rischio geomorfologico di un'area del Centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata"	Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 206 del 30 ago 2011	Data Lettera Invito	07/09/2011	CUP	J29H11000140001
RANDAZZO				Data scadenza Gara	20/09/2011	CIG	322431119C
	Resp. Proced. Ing. Domenico Imbroglia con il supporto di Marco Calogero (decreto n. __)	Diret. dei Lavori	Ing. Antonino Romano Decreto n. 374 del 13/12/2011	Collaudatore Statico	FRANCESCO CLEMENTE (collaudatore tec-amm e statico)	Coordinatore della Sicurezza	
	Importo € 600.404,02	Importo soggetto a ribasso	€ 555.474,34	Decreto Commissione	Decreto n. 230 del 20 settembre 2011	Aggiudicataria	COTESP SRL
		oneri sicurezza	€ 44.929,68	Verbale	21/09/2011		
	Ribasso 23,6380%	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 469.101,00	Aggiud. Provvisoria	prot. 483 del 22 set 2011		
	IMPORTO AGGIUDICATO € 424.171,32			Aggiud. Definitiva	prot. 1972 del 4 ottobre 2011		
	Decreto aggiud. Def. decreto n.333 del 24 novembre 2011			Contratto	29/11/2011	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 25124 serie 3 del 16 dicembre 2011

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	INVITO	OFFERTA	Ribasso
	132	VIA GENERALE CASCINO 2, [illegible]	GIANFRANCO CACCAMO	VIA GENERALE CASCINO 2, 93012	GELA	01510940859	prot. 322 del 7 set 2011	prot. 1631 del 19 set 2011	11,569
	170	VIA ALESSANDRO VOLTA 139, [illegible]	SEBASTIANA CONIGLIO	VIA ALESSANDRO VOLTA 139, 95010	SANTA VENERINA	02468520875	prot. 323 del 7 set 2011	prot. 1637 del 20 settembre 2011	19,73
	181	VIA SAN GIOVANNI 20, [illegible]	MICHELE MESSINA	VIA SAN GIOVANNI 20, 94014	NICOSIA	01101530861	prot. 324 del 7 set 2011		
	240	VIA GIUSEPPE GAROFALO POETA 17, [illegible]	CAMILLO NAVARRA	VIA GIUSEPPE GAROFALO POETA 17, 91014	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	01475800817	prot. 325 del 7 set 2011	prot. 1616 del 16 set 2011	29,3012
	245	VIA GIOVANNI BOCCACCIO 29, [illegible]	MASSIMO DELL'ANDRINO	VIA GIOVANNI BOCCACCIO 29, 20123	SONDRIO	03581580960	prot. 326 del 7 set 2011		
	249	CONTRADA CUBA 1, FRAZIONE SANTA [illegible]	ANTONINO L'AVALLI	CONTRADA CUBA 1, FRAZIONE SANTA LUCIA SOPRA CONTESSE, 98126	MESSINA	03049590833	prot. 327 del 7 set 2011	prot. 1632 del 20 set 2011	20,7918
esclusa	262	VIA PRESENZANO 42, 00134	ROSANNA SIMONELLI	VIA PRESENZANO 42, 00134	ROMA	5429320582	prot. 328 del 7 set 2011	prot. 1629 del 19 set 2011	Cauzione provvisoria non
	291	VIA REGINA MARGHERITA 484, [illegible]	SANTO ROSARIO FERRARO	VIA REGINA MARGHERITA 484, 98028	S. TERESA DI RIVA	02825680834	prot. 329 del 7 set 2011	prot. 1607 del 14 set 2011	23,1975
	335	VIA FRATTE 7 - FRAZIONE PRATURLONE, [illegible]	LUCA SPAGNOL* EGLES TESOLIN	VIA FRATTE 7 - FRAZIONE PRATURLONE, 33080	FIUME VENETO	1531650933	prot. 330 del 7 set 2011	prot. 1634 del 20 settembre 2011	rinuncia a partecipare
	350	VIA LIBERTA' 191, [illegible]	DOMENICO FRANZONE	VIA LIBERTA' 191, 90143	PALERMO	4046870822	prot. 331 del 7 set 2011	prot. 1624 del 19 set 2011	21,222
	352	VIA PIETRO NENNI 14/A, [illegible]	GIUSEPPA CAPIZZI	VIA PIETRO NENNI 14/A, 95035	MALETTO	4767380878	prot. 332 del 7 set 2011	prot. 1625 del 19 set 2011	24,2
	365	VIA STRETTO I BARTOLELLA 68/1, [illegible]	TINDARO CALABRESE	VIA STRETTO I BARTOLELLA 68/1, 98051	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	01825880832	prot. 333 del 7 set 2011	prot. 1611 del 14 set 2011	21,6287
	366	G. CASTRIOTA SKANDERBERG 104, [illegible]	EMANUELE GRADILONE	G. CASTRIOTA SKANDERBERG 104, 87069	SAN DEMETRIO CORONE	2680150782	prot. 334 del 7 set 2011	prot. 1630 del 19 set 2011	23,906
	369	VIA ROMA 323, [illegible]	SALVATORE ZAMMUTO	VIA ROMA 323, 92021	ARAGONA	1820750840	prot. 335 del 7 set 2011	prot. 1612 del 14 set 2011	23,3273
	414	VIA PIEROBON 46, [illegible]	SERGIO VITTADELLO* ANDREA VITTADELLO	VIA PIEROBON 46, 35010	LIMENA	222300287	prot. 336 del 7 set 2011		
	415	PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI [illegible]	ERIO ZOLI* ENRICO CASTELLINI	VIA PIER TRAVERSARI 63, 48121	RAVENNA	00966060378	prot. 337 del 7 set 2011	prot. 1619 del 19 set 2011	24,478
aggiudicataria	419	VIA SAVANI 2, [illegible]	ANGELO CICCOTTO	VIA SAVANI 2, 43100	PARMA	3096600147	prot. 338 del 7 set 2011	prot. 1615 del 16 set 2011	23,638
	420	PARMENSI (Mandataria) [illegible]	ROSSANO RAVALDI*, CLAUDIO BERTOZZI, ALDO [illegible]	VIALE MENTANA 139/A, 43121	PARMA	02079260341	prot. 339 del 7 set 2011		
	433	VIALE DELLA COSTITUENTE C.D.G1 snc, [illegible]	MASSIMO MOCCIA	VIALE DELLA COSTITUENTE C.D.G1 snc, 80143	NAPOLI	05041951210	prot. 340 del 7 set 2011		
	456	LOCALITA' LICARI 37 98063 [illegible]	PAOLO SPEZIALE	LOCALITA' LICARI 37 98063	GIOIOSA MAREA	10149111006	prot. 341 del 7 set 2011	prot. 1636 del 20 settembre 2011	Cauzione provvisoria non

numero offerte pervenute 15

Soglia di anomalia 23,6538

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

M057	Opere di consolidamento con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali Capri Leone Centro		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 268 del 10 ottobre 2011	Data Lettera Invito	11/10/2011	CUP	J25D11000190001
Capri Leone 57					Data scadenza Gara	25/10/2011	CIG	33858056AB
	Resp. Proced.	Geom. Gaetano Giuffrè	Diret. dei Lavori	Studio Tecnico Ingg. Falzea_Decreto n. 329 del 17 novembre 2011	Collaudatore Statico	BETA Servizi di Ingegneria s.r.l. Direttore Tecnico ING.	Coordinatore della Sicurezza	
	importo	€ 356.850,89	importo soggetto a ribasso	€ 356.850,89	Decreto Commissione	del 26 ottobre 2011	Aggiudicataria	B.O.N.O. COSTRUZIONI s.r.l.
			oneri sicurezza	€ 349.191,18	Verbale	26/10/2011		
	Ribasso	23,89%	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 620.798,24	Aggiud.Provvisoria	prot. 568 del 26 agosto 2011		
	IMPORTO AGGIUDICATO	€ 271.607,06			Aggiud. Definitiva	prot. 574 del 3 novembre 2011		
	Decreto Aggiud.Def	Decreto n. 302 del 3 novembre 2011			Contratto	15/11/2011	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 23601 del 28 novembre 2011

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	INVITO	OFFERTA	Ribasso
	15	NEW & CO SRL	ANTONIO FURNARI	VIA TIRONE 11, 00146	ROMA	09473781004	prot. 525 del 11 ottobre 2011	prot. 1836del 24 ottobre 2011	19,726
	16	FIN.PAR.2000 SPA	CARLO DI CAVOLO	VIA ELVIA RECINA 6, 00183	ROMA	06195151003	prot. 526 del 11 ottobre 2011	prot. 1850 del 25 ottobre 2011	23,634
	22	SANTA MARIA SRL	UMBERTO PULEO	VIA ALDO MORO 55, 92020	SANTO STEFANO QUISQUINA	02371680840	prot. 527 del 11 ottobre 2011		
	31	SCANCARELLO GAETANO	GAETANO SCANCARELLO	VIA UGO BETTI 3, 90147	PALERMO	02468550823	prot. 528 del 11 ottobre 2011	prot. 1830del 21 ottobre 2011	23,243
	34	TEK INFRASTRUTTURE SRL	GIUSEPPE TRIPOLI	VIA DI PIAZZA 41, 90040	SAN CIPRIELLO	05436080823	prot. 529 del 11 ottobre 2011	prot. 1823del 21 ottobre 2011	25,6319
esclusa	50	H T. COSTRUZIONI SRL	ALFIO PATTAVINA	VIA LUIGI SPAGNA 50, 96100	SIRACUSA	01116600899	prot. 530 del 11 ottobre 2011	prot. 1846del 24 ottobre 2011	l'impresa non produce il
	57	PASSARELLO GIUSEPPE	GIUSEPPE PASSARELLO	BIVIO MADONNUZZA 74, 90026	PETRALIA SOPRANA	03541510826	prot. 531 del 11 ottobre 2011	prot. 1831del 21 ottobre 2011	22,6849
	162	ALDECA SRL	VINCENZO NAPOLI	LOCALITA' TRE AIRE snc, 87070	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	02775950781	prot. 532 del 11 ottobre 2011		
	164	C.G. COSTRUZIONI SRL	SANTO CUTRONE	CORSO KENNEDY 95, 97012	CHIARAMONTE GULFI	00914410881	prot. 533 del 11 ottobre 2011	prot. 1840del 24 ottobre 2011	23,9715
	179	GEOM. CARMELO GANGEMI	CARMELO GANGEMI	VIA NAZIONALE 18, 98079	CASTEL DI TUSA	00293900833	prot. 534 del 11 ottobre 2011	prot. 1825del 21 ottobre 2011	23,1983
	195	MUNECA SRL	ANGELA CARAMAZZA	VIA MAGELLANO 55, 92026	FAVARA	02478260843	prot. 535 del 11 ottobre 2011	prot. 1839del 24 ottobre 2011	19,6011
	222	PIAZZA COSTRUZIONI SRL	CALOGERO PIAZZA	VIA PALERMO 125, 93014	MUSSOMELI	01307010858	prot. 536 del 11 ottobre 2011	prot. 1829del 21 ottobre 2011	22,7331
	224	GRUPPO VENERE SRL	SALVATORE GRASSO	VIA NAZIONALE snc, 93010	VALLELUNGA PRATAMENO	01846410858	prot. 537 del 11 ottobre 2011	prot. 1834del 24 ottobre 2011	20,4041
	243	IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. FILIPPO COLOMBRITA & C. SRL	ROSARIO COLOMBRITA* NICOLA COLOMBRITA	VIA LORENZO GEMMELLARO 1, 95030	SANT'AGATA LI BATTIATI	00137980876	prot. 538 del 11 ottobre 2011	prot. 1837del 24 ottobre 2011	20,25
	253	L&R LABORATORI E RICERCHE (Mandataria)	STEFANO VINCI	VIA PADRE ANGELO SECCHI 7 95030 (indirizzo società mandataria)	GRAVINA DI CATANIA	04053900876	prot. 539 del 11 ottobre 2011		
esclusa	256	TRAINITO COSTRUZIONI SRL	GERMANO TRAINITO	STRADA STATALE 117 BIS KM 89+300 snc, 93012	GELA	02811870837	prot. 540 del 11 ottobre 2011	prot. 1833del 24 ottobre 2011	Cauzione non autenticata
	294	MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI SRL	FRANCESCO MUSUMECI	CONTRADA CIPERONE snc, 98037	LETOJANNI	02713580831	prot. 541 del 11 ottobre 2011	prot. 1835del 24 ottobre 2011	28,6923
aggiudicataria	301	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	GIUSEPPE BONO	CONTRADA BONAGRAZIA snc, 90040	MONTELEPRE	4446360820	prot. 542 del 11 ottobre 2011	prot. 1838del 24 ottobre 2011	23,8878
	341	GHEA SRL	SALVATORE CAUSAPRUNO	VIA ARCHIMEDE 19/A, 97100	RAGUSA	01243680889	prot. 543 del 11 ottobre 2011	prot. 1824 del 21 ottobre 2011	27,35
	349	NA.SA COSTRUZIONI SRL	SANTO NASELLO	LOCALITA' PIANO SPEDALE snc, 90024	GANGI	04321830822	prot. 544 del 11 ottobre 2011	prot. 1848 del 25 ottobre 2011	22,808
							numero offerte pervenute	17
							Soglia di anomalia	23,9278

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

CT031	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 180 del 10 ago 2011	Data Lettera Invito	11/08/2011	CUP	J12J11000100001
Misterbianco					Data scadenza Gara	01/09/2011	CIG	2940704983
	Resp. Proced.	Arch. Aldo Bonina	Diret. dei Lavori	DRPC CT Arch. Fabio Borzì Arch. Paolo Licandri	Collaudatore Statico	Ing. Giovanni Baratta (collaudatore statico) Decreto n. 149 del	Coordinatore della Sicurezza	
	importo	€ 338.645,34	importo soggetto a ribasso	€ 328.661,33	Decreto Commissione	Decreto 210 del 1 settembre 2011	Aggiudicataria	PIZZO PIZZO
			oneri sicurezza	€ 9.984,01	Verbale	02/09/2011		
	Ribasso	28,00%	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 246.620,17	Aggiud.Provvisoria	prot. 511 del 27 settembre 2011		
	IMPORTO AGGIUDICATO	€ 236.636,16			Aggiud. Definitiva	prot. 514 del 3 ottobre 2011		
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 249 del 3 ottobre 2011	Verbale 105, comma 3	02/10/2011	Contratto	15/11/2011	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 23604 del 28 novembre 2011

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	INVITO	OFFERTA	Ribasso
	14	EDIL SUD 75 Fax: 081 806 09 00	GAETANO GIGLIO	VIA MARIE CURIE snc, 80010	QUARTO	01593080631	prot. U/246 del 11 ago 2011		
	26	ENI.FIN.SPA Fax: 06 62 20 97 49	NUNZIATINA DI CAVOLO	VIA SAVOIA 78, 00198 (Scala A Int 3)	ROMA	07052711004	prot. U/247 del 11 ago 2011		
	30	LIBRIZZI COSTRUZIONI SRL Fax: 0921 64 19 53	CALOGERO LIBRIZZI	CONTRADA MULINI snc	PETRALIA SOTTANA	03731990820	prot. U/248 del 11 ago 2011		
	33	I.C.M. SRL Fax: 0932 41 00 00	ORNELLA MICELI	VIA EINSTEIN 5, 97018	SCICLI	01194810881	prot. U/249 del 11 ago 2011		
	37	RUSSO COSTRUZIONI SRL Fax: 091 95 34 96	FEDELE RUSSO	VIA SAN GIUSEPPE 68, 90014	PA.ERMO	05318820825	prot. U/250 del 11 ago 2011	prot. E/1456 del 29 agosto 2011	21,9031
	59	IN.CO.TER.SPA Fax: 095 71 80 857	GAETANO AMBROGIO	CORSO SICILIA 40, 95131	CATANIA	03832600872	prot. U/251 del 11 ago 2011		
	66	CO.GE.VI. Fax: 0932 83 34 57	VINCENZO IURATO*, ALFIO PATTAVINA	CONTRADA FARGIONE snc, 97015	MODICA	01243850888	prot. U/252 del 11 ago 2011		
verifica di anomalia	77	PIZZO PIPPO Fax: 0941 31 58 28	PIPPO PIZZO	VIA BELVEDERE 25, 98060	MONTAGNAREALE ME	01220660839	prot. U/253 del 11 ago 2011	prot. E/1473 del 31 agosto 2011	28
	79	PRESAL COSTRUZIONI SRL Fax: 0941 70 25 82	CALOGERO PRESTI DANISI	VIA MICHELANGELO 15, 98076	SANT'AGATA DI MILITELLO	01848890834	prot. U/254 del 11 ago 2011	prot. E/1474 del 31 agosto 2011	18,129
	83	BATTAGLIA GAUDENZIO SRL Fax: 0932 66 75 08	GAUDENZIO BATTAGLIA	CONTRADA PIANCATELLA snc, 97100	RAGUSA	01197200822	prot. U/255 del 11 ago 2011		
esclusa	109	DI BELLA COSTRUZIONI SRL Fax: 095 22 19 06	GIOVANNI DI BELLA*, DANIELE DI BELLA	VIA PIETRO NOVELLI 131, 95125	CATANIA	01302740871	prot. U/256 del 11 ago 2011	prot. E/1470 del 30 agosto 2011	cauzione non autenticata
	118	COMAR SRL Fax: 0922 60 73 50	ALFONSO LICATA	VIA CAVALIERI MAGAZZENI 60/A, 92100	AGRIGENTO	02531210843	prot. U/257 del 11 ago 2011	prot. E/1466 del 30 agosto 2011	23,4996
	120	FAMMA SRL Fax: 090 92 87 188	SALVATORE FORMICA	VIA MANZONI PAL. FORMICA snc, 98057	MILAZZO	02032000834	prot. U/258 del 11 ago 2011	prot. E/1468 del 30 agosto 2011	22,1122
	122	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL Fax: 059 981346	VALERIA PASSINI	VIA PONTICELLO 154, 41055	MONTESE	02378870360	prot. U/259 del 11 ago 2011		
	676	CANNIZZO COSTRUZIONI SRL Fax: 0941 661054	GIANLUCA CANNIZZO	PIAZZA DUOMO 6 98068	SAN PEIRO PATTI	01755570833	prot. U/260 del 11 ago 2011		

numero offerte pervenute 6

verifica di anomalia prot. 272 del 2 settembre 2011

presentazione documetazione per verifica anomalia 19-set-11

documentazione presentata il 14 set. All'esame del GdL SIAP

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

CT033	Opere di consolidamento e regimazione idraulica frazione Presa nel comune di Piedimonte Etneo (CT)"		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 270 del 12 ottobre 2011	Data Lettera Invito	13/10/2011	CUP	J88G10000930001
Piedimonte Etneo					Data scadenza Gara	26/10/2011	CIG	3398456E98
	Resp. Proced.	Arch. Aldo Bonina	Diret. dei Lavori	Ing. Gioacchino Marino (DRPC CT)	Collaudatore Statico	Ing. Maurizio Arteale (Collaudatore Statico) Decreto n. 150 del 02/04/2012	Coordinatore della Sicurezza	
	Importo	€ 333.783,96	Importo soggetto a ribasso	€ 333.783,96	Decreto Commissione	del 26 ottobre 2011	Aggiudicataria	ARCHAS s.r.l.
			oneri sicurezza	€ 9.093,63	Verbale	27/10/2011		
	Ribasso	24,27%	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 261.862,88	Aggiud.Provvisoria	prot. 571 del 27 ottobre 2011		
	IMPORTO AGGIUDICATO	€ 252.769,25			Aggiud. Definitiva	prot. 575del 3 novembre 2011		
	Decreto aggiudicaz	Decreto n. 303 del 3 novembre 2011			Contratto	18/01/2012	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 1912 serie 3 del 26 gennaio 2012

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	INVITO	OFFERTA	Ribasso
	145	SO.GE.MAR.	SALVATORE MARRONE	VIA ITALIA 18, 92026	FAVARA	02493870840	prot. 545 del 13 ottobre 2011	prot. 1847 del 25 ottobre 2011	19,6
	152	CRF INTERVENTI SUL TERRITORIO SRL	CLEMENTE FOTI	CONTRADA COLLA VIALE KENNEDY KM 2.150, 95034	BRONTE	03176440877	prot. 546 del 13 ottobre 2012	prot. 1855 del 25 ottobre 2011	l'impresa produce una
	155	IMPRESA LEANZA GEOM. GIOVANNI	GIOVANNI LEANZA	VIA DEI CICLAMINI 5, 95040	RAMACCA	00552820870	prot. 547 del 13 ottobre 2013		
	157	QUADRIFOGLIO GROUP SRL	NICOLO' DI SALVO	VIA MILANO 95, 90047	PARTINICO	05465780822	prot. 548 del 13 ottobre 2014	prot. 1852 del 25 ottobre 2011	l'impresa produce una
	158	ARCAN COSTRUZIONI SRL	ANDREA ARAGONA	VIA G. MATTEOTTI 65, 98051	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	02592490839	prot. 549 del 13 ottobre 2015	prot. 1843 del 24 ottobre 2011	25,5406
	159	NOCIFORA TIRANNO VINCENZO	VINCENZO NOCIFORA TIRANNO	CONTRADA MUTI 5, 98076	SANT'AGATA DI MILITELLO	00183850833	prot. 550 del 13 ottobre 2016	prot. 1850 del 25 ottobre 2011	21,3343
	171	MGF APPALTI SRL	GAETANO FICHERA* CARMEN GIUSEPPA PALILLA	VIA ROCCA D'API 42, 95019	ZAFFERANA ETNEA	04349120875	prot. 551 del 13 ottobre 2017	prot. ___ del 26 ottobre 2011	28,19
	173	SI.C.E.S.I SRL	SALVATORE PANTANO	VIA BARI 23, 96010	PRIOLO GARGALLO	00913650891	prot. 552 del 13 ottobre 2018		
	174	IMPREDIL SRL	BRUNO URCIULLO	VIA NAPOLI 44, 96010	PRIOLO GARGALLO	00264080896	prot. 553 del 13 ottobre 2019	prot. 1841 del 24 ottobre 2011	l'impresa produce una
	176	AZZURRA COSTRUZIONI SRL	SALVATORE PITRUZZELLA	CONTRADA SAN BIAGIO snc, 92100	AGRIGENTO	02539650842	prot. 554 del 13 ottobre 2020		
	185	ITA COSTRUZIONI	GIOVANNI DE LEO	VIA TURCHIA 4/R, 96100	SIRACUSA	01478060898	prot. 555 del 13 ottobre 2021	prot. 1844 del 24 ottobre 2011	23,8933
	187	ARCADIA COSTRUZIONI SRL	VIVIANA PIZZO	VIALE SANTA PANGIA 136/F, 96100	SIRACUSA	01713080560	prot. 556 del 13 ottobre 2022		
	194	FIDOTTA COSTRUZIONI SRL	CONCETTA FIDOTTA* GIUSEPPE FIDOTTA CLAUDIO	VIA PANTENELLI 3/G, 96100	SIRACUSA	00816200893	prot. 557 del 13 ottobre 2023	prot. 1863 del 27 ottobre 2011	fuori tempo
aggiudicataria	199	ARCHAS SRL	ANTONINO TERRANOVA	VIA DELLE PETUNIE 1, 95030	MASCALUCIA	04657630879	prot. 558 del 13 ottobre 2024	prot. 1842 del 24 ottobre 2011	24,2716
	202	IMPRESA EDILE F.LLI MICCIULLA SNC	VINCENZO MICCIULLA	CONTRADA CARRETTA 92, 98076	SANT'AGATA MILITELLO	01219260831	prot. 559 del 13 ottobre 2025	prot. 1853 del 25 ottobre 2011	22,793
	204	NOCIFORA AMATA VINCENZO	VINCENZO NOCIFORA AMATA	CONTRADA SALARONA 3, 98076	SANT'AGATA MILITELLO	00413940834	prot. 560 del 13 ottobre 2026	prot. 1854 del 25 ottobre 2011	22,08
	206	BELLIA MAURIZIO	MAURIZIO BELLIA	VIA PIER DELLA FRANCESCA 4, 92020	PAMA DI MONTECHIARO	01815650849	prot. 561 del 13 ottobre 2027		
	219	2 G COSTRUZIONI SRL	ANTONINO GUGLIANDOLO	VIA NICOLA SCOTTO 13, PALAZZO OSSIDIANA 98123	MESSINA	03025340831	prot. 562 del 13 ottobre 2028	prot. 1845 del 24 ottobre 2011	22,6451
	226	CAMMISA COSTRUZIONI SRL	SEBASTIANO LA ROSA	CONTRADA BIGGEMI EX. SS. 114 KM 145 snc, 96010	PRIOLO GARGALLO	00867900896	prot. 563 del 13 ottobre 2029		
	349	NA.SA COSTRUZIONI SRL	SANTO NASELLO	LOCALITA' PIANO SPEDALE snc, 90024	GANGI	04321830822	prot. 564 del 13 ottobre 2030	prot. 1849 del 25 ottobre 2011	22,1336

numero offerte pervenute 14

Soglia di anomalia 24,5685

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME049	Consolidamento area, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Ciaspuccini – Comune di Alcara Li Fusi	Decreto Approv Stucli Tecn	Decreto n. 395 del 23 dicembre 2011	Data Lettera Invito	21/12/2011	CUP	J25D11000280001
				Data scadenza Gara	09/01/2012	CIG	3741508612
Alcara Li Fusi	Resp. Proced. Ing. Basilio Sanseverino	Direz. dei Lavori	DL: Arch. Pulizzi Supporto DL: Ing. Zumbo e Dott. Sabatini Adriano Grassi Coordinatore Sicurezza	Collaudatore Statico	ING. Luciano Taranto (coll tec-amm e	Coordinatore della Sicurezza	Adriano Grassi (Decreto 101 del 13 marzo 2012)
	Importo € 607.229,36	Importo soggetto a ribasso	€ 583.521,82	Decreto Consegna Verbale	Decreto n. 1 del 9 gennaio 10/01/2011	Aggiudicataria	SA.MA. s.r.l.
	Ribasso 24,79%		€ 23.706,34				
	IMPORTO AGGIUDICATO € 438.854,09	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 462.560,63	Aggiud.Provvisoria	prot. 3/3012 del 10 gennaio 2012		
				Aggiud. Definitiva	prot. 7 del 18 gennaio 2012		
	Decreto aggiud.Def decreto n. 18 del 18 gennaio 2012			Contratto	01-mar-12	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 3 Aurelia n. 5314 serie 3 del 07 febbraio 2013

note	prot. Istanza	Denominazione impresa	Rappresentante Legale	indirizzo	CIttà	P. IVA	INVITO	OFFERTA	Ribasso
		MESSINA COSTRUZIONI	SEBASTIANO MESSINA	VIA PALERMO 140/BIS, 93014	MUSSOMELI	01303130854	prot. U/856 del 21 dicembre 2011	prot. E/14 del 05/01/2012	24,8131
		MATINA GEOM. GIOVANNI	GIOVANNI MATINA	VIA UGO LA MALFA 12, 92026	FAVARA	02064150845	prot. U/857 del 21 dicembre 2011	prot. E/4 del 05/01/2012	15,7809
		VIN. ARN. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	VINCENZO ARNONE	VIA HAMILTON 15 93100	CALTANISSETTA	01283390857	prot. U/858 del 21 dicembre 2011	prot. E/3 del 05/01/2012	23,2351
		VIMAN SRL	ANGELO MANCINO	VIA TOSCANA 6, 93014	MUSSOMELI	01526680853	prot. U/859 del 21 dicembre 2011	prot. E/5 del 05/01/2012	27,0135
		CIVIESSE SRL	CARMELO SALAMONE	VIA SALVATORE LA ROSA 390, 92021	AGRIGENTO	02581640840	prot. U/860 del 21 dicembre 2011	prot. E/10 del 05/01/2012	24,4311
		EDILIZIA SRL	GIORGIO ZACCARIA	VIA CORNELIA 18 97015	MODICA	07062361000	prot. U/861 del 21 dicembre 2011	prot. E/13 del 05/01/2012	non produce le dichiarazioni previste dall'o
aggiudicataria		SA.MA. SRL	GABRIELE CALLA	VIA DI LEI INDUSTRIA ZONA INDUSTRIALE 92021	ARAGONA	02613170840	prot. U/862 del 21 dicembre 2011	prot. E/15 del 05/01/2012	24,7926
		TRANSPORTI E MOVIMENTI TERRA SRL	GIUSEPPE TIDONA	ZONA INDUSTRIALE C.DA TORRAZZE PANTANO D'ARCI	CATANIA	02182130879	prot. U/863 del 21 dicembre 2011	prot. E/6 del 05/01/2012	24,8744
		EREDI GERACI SALVATORE SRL	MICHELANGELO GERACI	VIA AOSTA 1 93014	MUSSOMELI	01417670854	prot. U/864 del 21 dicembre 2011	prot. E/12 del 05/01/2012	24,9358
		BLU COSTRUZIONI SRL	MASSIMILIANO GAETA	VIA AURELIO SAFFI 31 96013	CARLENTINI	01347190891	prot. U/865 del 21 dicembre 2011	prot. E/8 del 05/01/2012	23,717
		BOLLITA COSTRUZIONI SOC. COOP.	VINCENZO DOMENICO STIGLIANO	VIA REGIO TRATTURO SONA P.I.P. FRAZIONE SCALO 75020	NOVA SIRI	00038780773	prot. U/866 del 21 dicembre 2011		
		DRAGON CONSORZIO STABILI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	RAFFAELE GARGIULO	VIA ZOE FONTANA 220 00171	ROMA	10488971001	prot. U/867 del 21 dicembre 2011		
		ARES SRL	RENATO CRIFO'	VIA ISIDE 12 INT 8 00184	ROMA	07847991001	prot. U/868 del 21 dicembre 2011	prot. E/1961 del 30/11/2011	23,8369
		GEOTEK ITALIA SRL	ADRIANO AGRO'	MONTE DE' CENCI 20 00186	ROMA	01349000840	prot. U/869 del 21 dicembre 2011		
		C.A.E.C. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO SOCIETA'COOPERATIVA	FORTUNATO BIAGIO	VIA NUNZIO DIGIACOMO 36 97013	COMISO	00573670881	prot. U/870 del 21 dicembre 2011	prot. E/7 del 05/01/2012	23,9832
		AMTECO SPA	GIANBATTISTA VERZELETTI	VIA TRINO 201 13100	VERCELLI	01707810021	prot. U/871 del 21 dicembre 2011	prot. E/19 del 05/01/2012	23,78
		SIAR SRL	ROSARIO ENZO MOLLICA	CONTRADA SCHINO 41, 98063	GIOIOSA MAREA	01807700831	prot. U/872 del 21 dicembre 2011	prot. E/1960 del 30/11/2011	24,6718
		CO.GER. SRL	VINCENZO GERACI	VIA TOSCANA 4 PT 1.4 93014	MUSSOMELI	01515010856	prot. U/873 del 21 dicembre 2011	prot. E/11 del 05/01/2012	25,2539
		LUCI COSTRUZIONI SPA	ROBERTO MINUSSI	VIA GUICCIARDINI 4 34134	TRIESTE	00719580326	prot. U/874 del 21 dicembre 2011		
		SA.CO.REST SRL	GIUSEPPE SAIEVA	VIA LIGABUE 2, 92026	FAVARA	02525120842	prot. U/875 del 21 dicembre 2011	prot. E/1_2012 del 04/01/2012	24,6579
		E.GE.CO SRL	EDMONDO DI SALVO	VIA CALTANISSETTA 2 93014	MUSSOMELI	01832151006	prot. U/876 del 21 dicembre 2011		
		PROGETTO CONTRACT SPA	GIUSEPPE LANZA DI SCALEA* DOMENICO DE SIMONE FIDASFAT DI TRAPANI	VIA GALILEO GALILEI 18/20 90044	CARINI	04366740827	prot. U/877 del 21 dicembre 2011	prot. E/17 del 05/01/2012	23,1814
		ASG COSTRUZIONI SRL	GIUSEPPE RUSSOTTO	VIA BERSAGLIERE URSO 18 93029	FAVARA	02232250841	prot. U/878 del 21 dicembre 2011		
		GEO GAV SRL Costituenda ATI: GEO GAV s.r.l (Mandataria), A.C. Group s.r.l (Associata)	GIUSEPPA MORREALESE	VIA DEI GELSOMINI 1 93026	FAVARA	02388030847	prot. U/879 del 21 dicembre 2011	prot. E/20 del 05/01/2012	28,6873
		ALONGI SRL	SALVATORE ALONGI	VIA PALESTRINA 44 92021	ARAGONA	02404080844	prot. U/880 del 21 dicembre 2011	prot. E/18 del 05/01/2012	24,8769

numero offerte pervenute 19

Soglia di anomalia 24,8115

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

EN175	Comune di Barrafranca. Mitigazione bivio catena – messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca – Primo Stralcio Funzionale		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 377 del 14 dicembre 2011	Data Lettera Invito	13/12/2011	CUP	J25C11002140001
Barrafranca					Data scadenza Gara	28/12/2011	CIG	37002452C5
	Resp. Proced.	Arch. Francesco Costa	Direz. dei Lavori	OL: arch. Salvatore La terra Decreto n. 45 del 1 febbaio 2012	Collaudatore Statico	FRANCESCO CLEMENTE (collaudatore tec-amm e statico) Decreto n. 218 del [illegible]	Coordinatore della Sicurezza	
	Importo	€ 1.080.000,03	Importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 1.074.384,05 € 5.615,98	Decreto Commissario Verbale	del 28 dicembre 2011 29/12/2011	Aggiudicataria	SOCIETA' LAVORI PUBBLICI SRL - S.L.P. SRL
	Ribasso	24,85%	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 813.032,78	Aggiud. Provvisoria	prot. 881 del 29 dicembre 2011		
	IMPORTO AGGIUDICATO	€ 807.416,80			Aggiud. Definitiva	prot. 6 del 16 gennaio 2012		
	Decreto aggiudic.	decreto n. 10 del 16 gennaio 2012			Contratto	26-gen-12	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 2497 serie 3 del 01 febbraio 2012

Inde	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante legale	Indirizzo	Città	P. IVA	IMPORTO	OFFERTA	Ribasso
	558	A.E.T. AMBIENTE EDILIZIA E TERRITORIO SRL	ANTONINO MARTINO	VIA ARGINE DESTRO ANNUNZIATA 41, 89122	REGGIO CALABRIA	01427110802	prot. 0/835 del 13 dicembre 2011	prot. 0/1949 del 23 dicembre 2011	cauzione
	622	BATTISTELLA SPA	MARCO BATTISTELLA	VIA PEDRINA 6 33087	PASIANO DI PORDENONE	00080070932	prot. 0/841 del 13 dicembre 2011	prot. 0/1941 del 23 dicembre 2011	cauzione
	638	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA	ERMAN BOLZONI* SERGIO BONINI	VIA PANSA 55/I 42100	REGGIO EMILIA	00447840356	prot. 0/842 del 13 dicembre 2011	prot. 0/1944 del 23 dicembre 2011	cauzione
	684	COGETA SRL	FERDINANDO SORTINO	VIA DELL'DMO 26 91100	TRAPANI	01473330817	prot. 0/850 del 13 dicembre 2011		
	830	COMEAP CONSORZIO MEDITERRANEO APPALTI SOC. CONSORTILE A.R.L.	GIOVANNI COSTANZO	[illegible] BLOCCO TERRAZZE PASSO MARTINO	CATANIA	04155930870	prot. 0/854 del 13 dicembre 2011		
	580	CONSORZIO FRA COOPERATRIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	MAURO PASOLINI* SERGIO LORENZI	VIA LUIGI GALVANI 17/B	FORLI'	00140990409	prot. 0/839 del 13 dicembre 2011	prot. 0/1940 del 23 dicembre 2011	24,1389
	673	CONSORZIO STABILE AEDARS SCARL	ALESSANDRO LAMBIASE	VIA ALESSANDRIA 112 00198	ROMA	07675601004	prot. 0/848 del 13 dicembre 2011	prot. 0/1938 del 23 dicembre 2011	24,9239
	564	CONSORZIO STABILE ARIES SCARL	ANDREA D'ANIELLO	VIA DEI MILLE 40, 80121	NAPOLI	03421340617	prot. 0/838 del 13 dicembre 2011	prot. 0/1955 del 23 dicembre 2011	23,9783
	651	COSTRUZIONI CAMARDO SRL	GIUSEPPE CAMARDO	C.DA GAUDO 86011	BARANELLO	01482930706	prot. 0/845 del 13 dicembre 2011		
	757	EDRA AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA	MAURO CARBONI* MARCO PAOLINI	VIA CIMABUE 1/3 60019	SENIGALLIA	00323030429	prot. 0/853 del 13 dicembre 2011		
	639	F.LLI SCUTTARI DI SCUTTARI BENITO E C. S.A.S	BENITO SCUTTARI	VIA MAESTRI DEL LAVORO 50 30015	CHIOGGIA	00348630278	prot. 0/843 del 13 dicembre 2011		
	547	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	ENZO GERACI	VIA LOMBARDO RADICE 18, 93014	MUSSOMELI	01534310857	prot. 0/832 del 13 dicembre 2011	prot. 0/1947 del 23 dicembre 2011	24,5033
	659	I.C.O.P. SRL	CARMELA MURDACA CAVALLO	C.DA BAGNI 89040	ANTONIMINA	01590820807	prot. 0/846 del 13 dicembre 2011	prot. 0/1943 del 23 dicembre 2011	24,347
	715	I.G.R. IMPRESE GENERALI RIUNITI SRL	FRANCESCO TRIPODI	VIA MEUSURGO 4 80133	NAPOLI	06550381212	prot. 0/851 del 13 dicembre 2011		
	581	IMPRESA ELISEO ING. RENATO SRL	MARIO ELISEO* DANIELA BONAZZI	VIA GAURICO LUCO 9/11, 00143	ROMA	00825190705	prot. 0/840 del 13 dicembre 2011	prot. 0/1951 del 23 dicembre 2011	24,48
	467	IMPRESA LUNGARINI SPA	PAOLO LUNGARINI	VIA DELLA COSTITUZIONE 10 61032	FANO	01416510418	prot. 0/828 del 13 dicembre 2011		
	560	IMPRESA MOLISANA OPERE SPECIALI - I.M.O.S. SRL	CORRADO OCCHIONERO	VIA MONSIGNOR BOLOGNA 18, 86100	CAMPOBASSO	00717630701	prot. 0/837 del 13 dicembre 2011		
	506	INTERCANTIERI SRL	SALVATORE ARDNICA	VIA HEMINGWAY 11 92023	CAMPOBELLO DI LICATA	02532890841	prot. 0/831 del 13 dicembre 2011	prot. 0/1953 del 23 dicembre 2011	24,7986
	682	IRCOP SPA	ANTONIO CIUCCI* MAURIZIO CIUCCI	VIA APPENNINI 52 00198	ROMA	00471180588	prot. 0/849 del 13 dicembre 2011		
	557	ITALCOMPANY SRL	GIUSEPPE SPINA* ALESSANDRO SPINA	VIA GEN. DALLA CHIESA 10, 90041	BALESTRATE	05653340827	prot. 0/834 del 13 dicembre 2011		
	469	ITER COOPERATIVA RAVENNATE DI INTERVENTI SUL TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA	GIANNI BATTOLA* MAIRA FAROLFI	VIA PROVINCIALE COTIGNOLA 17 48022	LUGO	00205320393	prot. 0/829 del 13 dicembre 2011		
	559	NOTARO MICHELE	MICHELE NOTARO	VIA DROSI 2/4 FRAZIONE RUSSOMANNO, 88060	SATRIANO	01835910793	prot. 0/836 del 13 dicembre 2011	prot. 0/1950 del 23 dicembre 2011	cauzione
	667	OPERAE SRL	LUIGI DE NOBILI	VIA ANTONIO DA MESTRE 19 30714	VENEZIA	05300701219	prot. 0/847 del 13 dicembre 2011		
	647	S.F.S. SOCIETA' FORESTALE SICILIANA SRL VIVAI E PIANTE (presenta offerta in ATI con Piscitta)	MARCO ANDREUCCETTI	VIA LIBERTà 56 90143	PALERMO	00120560826	prot. 0/844 del 13 dicembre 2011	prot. 0/1954 del 23 dicembre 2011	27,3333
	501	SAN MICHELE COSTRUZIONI SRL	FLAVIA SCRIMA	CORTILE BENNARDO 2 92026	FAVARA	02461280840	prot. 0/830 del 13 dicembre 2011	prot. 0/1942 del 23 dicembre 2011	24,9273
	832	SOCIETA' LAVORI PUBBLICI SRL - S.L.P. SRL	PAOLO CAPIZZI	VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 13 95030	MALETTO	03172280871	prot. 0/855 del 13 dicembre 2011	prot. 0/1948 del 23 dicembre 2011	24,8484
	459	TREVI SPA	CESARE TREVISANI* DAVIDE TREVISANI GIAN LUIGI TREVISANI	VIA DISMANO N. 5818 FRAZIONE PIEVESESTINA 47522	CESENA	00002890408	prot. 0/827 del 13 dicembre 2011		
	736	URANIA COSTRUZIONI SRL	GIUSEPPE TRAVIA	VIA CESARE BATTISTI 5 739, 8122	MESSINA	02122600832	prot. 0/852 del 13 dicembre 2011		
	549	VENTURA SPA	RAFFAELE VENTURA* RAFFAELE FRANCESCO VENTURA	VIA NAZIONALE CONTRADA RUSSO 19, 98054	FURNARI	02686690831	prot. 0/833 del 13 dicembre 2011	prot. 0/1956 del 23 dicembre 2011	25,1111
							Soglia di anomalia		

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

TP172	Collocazione rete paramassi – Zona Makari		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto Commissariale n. 72 del 17 febbraio 2012	Data Lettera Invito	17/02/2012	CUP	J89H12000030001
Stralcio Capo					Data scadenza Gara	02/03/2012	CIG	3951452956
	Resp. Proced.	Ing. Giovanni Indelicato	Diret. dei Lavori	Arch. Maria Giacoma Di Girolamo (DRPC TP)	Collaudatore Statico	Arch. Stefano Lucido CS e CA	Coordinatore della Sicurezza	
	importo	€ 333.183,39	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 324.246,37 € 8.937,02	Decreto Commissione Verbale	Decreto Commissariale n. 91 del 2 marzo 2012 02/03/2012	Aggiudicataria	TORSTEN COSTRUZIONI SRL
	Ribasso	25,2644%	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 251.264,49	Aggiud.Provvisoria	prot. n. 73 del 2 marzo 2011		
	IMPORTO AGGIUDICATO	€ 242.327,47			Aggiud. Definitiva	prot. 81 del 13 marzo 2012		
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 102 del 13 marzo 2012			Contratto	10-mag-12	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 10780 serie 3 del 16 maggio 2012

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	Codice Fiscale	OFFERTA	Ribasso
120	26	ANGELO RUSSELLO Spa	CaschettoEmanuele	Via Ettore Romagnoli	Gela	01179080856	01179080856	4,1312	
296	33	ARES Srl	crifòrenato	via Iside	Roma	IT07847991002	07847991002		
110	51	BONINA Srl	boninamarisa	VIA KENNEDY	Brolo	IT01810170835	01810170835	13,4635	
294	86	CIANCIO PARATORE RICCARDO	CIANCIO PARATORERICCARDO	CONTRADA SANTA VENERA 16	Tortorici	IT01444320830	CNCRCR59C25L308L	25,6965	
122	89	CIPEACOOP	GHERARDIMARIO	VIA DELLA COOPERAZIONE	Bologna	IT00591631205	03047870377		
295	95	CO.FER.Srl	ferraravincenzo	via caltanissetta	Mussomeli	00367670858	00367670858	25,1009	
225	101	CO.GER. Srl	geracivincenzo	Via Toscana	Mussomeli	01515010856	01515010856	25,3739	
299	103	CO.GRE. Srl	PiazzaMaurizio	Via Sicilia	Partanna	04074400872		25,2104	
157	112	COGEP Srl	MONTALBANOGIUSEPPE	S.S 115 KM 195	Agrigento	02492780842	02492780842	25,2433	
288	132	CONSORZIO STABILE VITRUVIO Scarl	spezialepaolo	Località Licari	Gioiosa Marea	IT10149111006	10149111006		
281	150	CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI Spa	CosentinoGennaro	Via Pantusa	Crotone	00103240792	00103240792		
235	210	FAZIO FILIPPO	FazioFilippo	Via A. De Gasperi	Patti	IT01392930838	FZAFPP67E05F158F	25,6315	
191	279	IMPRESA COSTANZO LEOPOLDO	CostanzoLeopoldo	via M. Carruba	Alcara Li Fusi	IT00441670833	CSTLLD50R07A177N		
289	311	ITER SOC. COOP.	FAROLFIMARIA	VIA PROVINCIALE COTIGNOLA	Lugo	IT00205320393	00205320393		
223	336	MAMMANA MICHELANGELO	MAMMANAMichelangelo	Via Santa Lucia	Castel di Lucio	01936500832	MMMMHL65L01H168D	24,7226	
118	450	SUPREMA APPALTI Srl	cuttonegliuseppina	via Ettore Maiorana	Torregrotta	03095530832	03095530832	25,3842	
188	459	TORSTEN COSTRUZIONI Srl	CAPIZZIGIANLUCA	CORSO UMBERTO	Bronte	4636340871	04636340871	25,2644	
158	467	URANIA COSTRUZIONI Srl	TraviaGiuseppe	Via Cesare Battisti is. 73	Messina	02122600832	02122600832		
							numero offerte pervenute	11	
							Soglia di anomalia	25,29524	

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME072	Disgaggiamento massi, messa in sicurezza versante Contrada Gallini	Decreto Approv Specif Tecn	decreto n. 42 del 26 gennaio 2012 - Revocato dal Decreto commissariale n. 43 del 27 gennaio 2012 decreto n. 52 del 8 febbraio 2012	Data Lettera Invito	08/02/2012	CUP	J43B10000600001
Galati Mamertino				Data scadenza Gara	21/02/2012	CIG	3868593FEB
	Resp. Proced. Arch. Giuseppa Cavoio	Diret. dei Lavori	Arch. Felice Testagrossa Det. Sind. n. 72 del 5-10-10	Collaudatore Statico	Ing. Luciano Taranto (collaudatore statico) NOTA PROT	Coordinatore della Sicurezza	
	Importo € 316.547,17	importo soggetto a ribasso	€ 308.913,01	Decreto Commissione	del 22 febbraio 2012	Aggiudicataria	D&D COSTRUZIONI s.rl.
		oneri sicurezza	€ 7.634,16	Verbale	22/02/2012		
	Ribasso 25,62%	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 237.403,66	Aggiud.Provvisoria	prot. 64 del 22 febbraio 2012		
	IMPORTO AGGIUDICATO € 229.769,50			Aggiud. Definitiva	prot. 82 del 14 marzo 2012		
	Decreto aggiud Def Decreto n. 103 del 14 marzo 2012			Contratto	04-apr-12	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 8127 serie 3 del 10 aprile 2012

ricte	Albo	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	Codice Fiscale	OFFERTA	Ribasso
100	20	AMATA COSTRUZIONI s.r.l.	NOCIFORA AMATA ANTONIO	CONTRADA PIRATO 19 98076	Sant'Agata di Militello	02115870830	05395141004	25,7317	
275	32	ARCOBALENO 3000 s.r.l.	SOTTILE SALVATORE	VIA II° STRETTO MACEO S.N. 98050	Terme Vigliatore	02546370830	02546370830	25,1082	
43	54	C. & P. s.r.l.	RIZZO ANTONINO	VIA SANT'ANDREA 329 98051	Barcellona Pozzo di Gotto	02710410834	02710410834	25,3165	
97	65	CA.TI.FRA. s.r.l.	Calabrese Tindaro	VIA STRETTO I BARTOLELLA 68/1 98051	Barcellona Pozzo di Gotto	01825880832	01825880832	26,9779	
105	110	CODRA MEDITERRANEA s.r.l.	DE SIMONE Sergio Maria	CONTRADA SCIFFRA snc 85010	Pignola	01098600768	01098600768		
404	138	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.p.A.	Bruno Francesco	via campidoglio 73 98076	Sant'Agata di Militello	02669810836	02669810836		
30	151	CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l.	CRUSCHINA SALVATORE	Via Rosso di San Secondo 39 93014	Mussomeli	01385120850	01385120850	25,2404	
56	137	COSTRUBO Soc. Coop.	bonfiglio emanuele	via nazionale giampilieri marina 166 98141	Messina	02748200835		27,0111	
74	152	D & D COSTRUZIONI s.r.l.	De Domenico Rosario	Via Felice Bisazza 29 98122	Messina	gecostruzioni@alice	01781930837	25,62	
27	153	D.L.M. COSTRUZIONI s.r.l.	Calabrese Luca Fabio	Via Sant'Andrea 215/E 98051	Barcellona Pozzo di Gotto	03036160830	03036160830	25,4531	
67	169	DIVA s.r.l.	VULLO ROSARIA	VIA MAGELLANO N.1 93010	Vallelunga Pratameno	01654050853	01654050853	24,9817	
44	229	GANGEMI CARMELO	gangemi carmelo	TUSA VIA NAZIONALE 18 98079	Tusa	00293900833	GNGCML52R27L478G	25,7254	
338	244	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l.	geraci enzo	Via Lombardo Radice 18 93014	Mussomeli	01534310857	01534310857		
264	289	IMPRESIM s.r.l.	SIMONAZZI STEFANIA	VIA RUGGIERO 30 86170	Isernia	IT06242761218	06242761218		
58	282	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. CANNIZZO CARMELO	cannizzo carmelo	via N. Panoramica dello stretto 480 98168	Messina	01522410834	cnncml65s18f158u	24,8768	
23	330	LUPO' COSTRUZIONI s.r.l.	LUPO' GIUSEPPE	VIA MADDALENA 36 98123	Messina	IT02552840833	02552840833	25,927	
20	347	MESSINA COSTRUZIONI s.r.l.	Messina Sebastiano	Via Palermo 140/Bis 93014	Mussomeli	01303330854	01303330854	25,2399	
335	349	MESSINA NOLEGGI s.r.l.	l'avalli antonino	c/da cuba S. lucia sopra contesse 1 98126	Messina	03049590833	03049590833	25,2832	
55	478	Z COSTRUZIONI s.r.l.	ZAMMUTO SALVATORE	VIA ROMA 323 92021	Aragona	01820750840	01820750840	25,3232	
145	479	ZACCARIA COSTRUZIONI s.r.l.	PASSINI VALERIA	VIA PONTICELLO 154 41055	Montese	02378870360	02378870360		
							Soglia di anomalia	25,69144	

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME052	Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza		Decreto Approv Specif Tecn	DECRETO COMMISSARIALE n. 88 del 29 febbraio 2012	Data Lettera Invito	05/03/2012	CUP	J79H12000000001
					Data scadenza Gara	16/03/2012	CIG	3999467094
Basicò	Resp. Proced.	Arch. Giuseppe Trifilò	Diret. dei Lavori	Ing. Renato Cilona (Decreto n. 118 del 21 marzo 2012) Dott. Antonino Savoca (DECRETO 454	Collaudatore Statico	MAURIZIO CORONEO (collaudatore tec-amm e statico) Decreto n. 343 del	Coordinatore della Sicurezza	
	importo	€ 809.176,69	importo soggetto a ribasso	€ 771.790,59	Decreto Commissione Verbale	Decreto n. 109 del 16 marzo 2012 16/03/2012 20/03/2012	Aggiudicataria	I.CO.LI di LI DESTRI GIACOMO & C. Sas
			oneri sicurezza	€ 37.386,10				
	Ribasso	25,81%	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 609.951,30	Aggiud.Provvisoria	prot. 86 del 20 marzo 2012		
	IMPORTO AGGIUDICATO	€ 572.565,20			Aggiud. Definitiva	prot. 92 del 26 marzo 2012		
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 128 del 26 marzo 2012			Contratto	04-apr-12	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 8118 serie 3 del 10 aprile 2012

note	prot. istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	codice fiscale	OFFERTA	Ribasso
esclusa		EDAM SOLUZIONI AMBIENTALI Srl	Bistoletti Oliviero	Via Guido Rossa	Gallarate	02467890121	02467890121	Cauzione provvisoria, non	
		AEMME Srl	Bruccoleri Massimiliano	Via Ugo La Malfa	Favara	02503080844	02503080844	25,7936	
		COSTRUZIONI Srl	Greco Rodolfo	VIA ANDREA COSTA	Catania	IT04121290870	04121290870	25,2566	
		CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI Soc Coop a Resp Lim	BELLUMAT PIETRO	Via Fenadora	Fonzaso	00586730251	00586730251		
		SIAP SERVICE SRL	COLLOVA' PASQUALE	VIA CRISTOFORO COLOMBO	Brolo	IT02980120832		25,1899	
		DI GIOVANNA Srl	DI GIOVANNA ANDREA	VIA SICILIA	Palermo	05728890822	05728890822	25,4555	
		DEMETRA LAVORI Srl	GRASSO SALVATORE	Via Nazionale Vallelunga Pratameno	Vallelunga Pratameno	01838830857	01838830857	25,8914	
		I.CO.LI di LI DESTRI GIACOMO & C. Sas	LI Destri Giacomo	Via G. Meli	Caltavuturo	4035280827	4035280827	25,8134	
		FRESTA ROSARIO ANTONIO	fresta rosario antonio	VIA FELICETTO	Santa Venerina	01131500876	FRSRRN56P15I314L	25,3381	
		SGRO' ALBERTO ALVARO DANIELE	Sgrò Alberto Alvaro Daniele	VIA ARCIPRETE TIRENDI 4	Maletto	02394090878	SGRLRT63A12E854W	25,5023	
		COSTRUZIONI GATTOPARDO Srl	talbi antonio	via Jacopone da Todi	Favara	01665880843		25,9464	
		PUGLISI COSTRUZIONI Srl	puglisi vincenzo	C/DA PIANO OSPEDALE	Gangi	04371150824	04371150824		
		SCIBETTA COSTRUZIONI S.R.L.	SCIBETTA FRANCESCO	VIA PIETRO MIGNOSI	Mussomeli	01713620852	01713620852	26,2568	
		LA FERRERA GIUSEPPE	LA FERRERA GIUSEPPE	Via Giovanni Verga	Gagliano Castelferrato	00097900864	LFRGPP49B04C351E	26,0402	
		MEDI APPALTI Srl	coppola Giuseppe	via Dante Alighieri	Sant'Agata Li Battiati	03009630876	01100300803	25,6547	
		MESSINA GIUSEPPE	Messina Giuseppe	Via Elio Vittorini	Mussomeli	00062840855	MSSGPP47C29F830O		
		FUNARO COSTRUZIONI Srl	FUNARO DOMENICO	C.da Magazzinazzi	Santa Ninfa	01506820818	01506820818	25,865	
		EREDI DI ANELLO ANDREA Srl	anello maurizio	c/da Guardiola	Caccamo	05630140829	05630140829		
		CONSORZIO STABILE DINAMICO	TODARELLO GIOVANNI	VIA PELLEGRINO ETTORE LOMBARDO	Messina	03136880832	03136880832	25,6718	
		C. G. COSTRUZIONI Srl	CUTRONE SANTO	CORSO KENNEDY	Chiaramonte Gulfi	00914410881	00914410881	25,71397	
							Soglia di anomalia	25,8373	

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

CT036	Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato nel Comune di Ramacca		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto Commissariale n. 94 del 7 marzo 2012	Data Lettera Invito	07/03/2012	CUP	J19H12000040001
RAMACCA					Data scadenza Gara	19/03/2012	CIG	4021009199
	Resp. Proced.	Geom. Salvatore Sottosanti	Diret. dei Lavori	Ing. Gianluca Coroneo Decreto n. 210 del 10/05/2012	Collaudatore Statico	LUIGI BOERI ING. & ASSOCIATI (collaudatore tec-amm e statico)	Coordinatore della Sicurezza	
	Importo	€ 884.888,97	importo soggetto a ribasso	€ 866.339,77	Decreto Commissione	Decreto n. 113 del 19 marzo 2012	Aggiudicataria	CO.E.S.I. Srl
			oneri sicurezza	€ 18.549,20	Verbale	19/03/2012		
	Ribasso	25,67%	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 662.538,54	Aggiud.Provvisoria	prot. 85 del 19 marzo 2012		
	IMPORTO AGGIUDICATO	€ 643.989,34			Aggiud. Definitiva	prot. 90 del 26 marzo 2012		
	Decreto aggiud.Def.	Decreto n. 125 del 26 marzo 2012			Contratto	10-mag-12	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurello n. 10674 serie 3 del 15 maggio 2012

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	codice fiscale	OFFERTA	Ribasso
		CALLARI COSTRUZIONI Srl	Callari Vincenzo	VIA LIGURIA	Mussomeli	01384160857	01384160857	25,9631	
		DI NICA COSTRUZIONI Srl	DI NICA GIUSEPPE	S.S. 115 KM. 198,450	Agrigento	02389540846	02389540846	25,5288	
		BCS COSTRUZIONI Srl	Bellardita Carmelo	C.da Cice'	Mistretta	02942960838	02942960838	25,4747	
		GRESY APPALTI Srl	CAPIZZI MARIO	Via Cali	Maletto	04368150878	04368150878	26,055	
		HERMES COSTRUZIONI Srl	Piscopo Rosalia	Via F. Crispi / Favara	Favara	IT02501830844	02501830844	25,3813	
		GEO DRILLING Srl	FANGANO CARMELINDA	C/DA BURRIONE SP.16	Lentini	01413760891	01413760891	25,6226	
		IRIDE Srl	mancuso gaetano	Via G. D'Annunzio	Brolo	01547760833	01547760833	25,1974	
		INJECTOSOND ITALIA Srl	Poggio Massimo	Via Ilva	Genova	IT03530780109	01366160420		
		MICOVER Srl	Verga Francesco	castronovo di sicilia	Castronovo di Sicilia	IT05792600826	VRGFNC86B13G273X		
		CIVIESSE Srl	SALAMONE CARMELO	via Salvatore La Rosa	Aragona	02581640840	02581640840	25,2225	
		SAITTA ANTONINO	Saitta Antonino	Via Salita San Nicola	Maletto	00571840875	STTNNN54R09E8545	25,4017	
		AVENI Srl	aveni Antonino	via moleti	Barcellona Pozzo di Gotto	IT02675130831	02675130831	25,7854	
		IMPRESA AGOSTARO ROSARIO	Agostaro Rosario	VIA MILANO	San Giuseppe Jato	00695150821	GSTRSR47M04H933S	25,3747	
		TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA Srl	tidona Giuseppe	contrada Torrazze Pantano D'arci Zona Industriale	Catania	IT02182530879	02182530879	25,7321	
		ING.PRIOLO ROBERTO Srl	PRIOLO ROBERTO	C/DA SAN NICASIO	Ciminna	05367550828	05367550828	25,505	
		CO.E.S.I. Srl	Blando Santo	via piemonte	Gangi	IT04601730825	04601730825	25,6655	
		BONGIOVANNI COSTRUZIONI Sas	Bongiovanni Calogero	Via Largo R9	Casteltermini	02409690845		25,7968	
		CO.MA.C. Srl	Casaleggio Massimo	Via Di Santa Maria in Via Lata	Genova	IT01025340074	01025340074		
		SARACEN S.P.A.	maniaci Giuseppe	VIA NAZIONALE	Piraino	IT02561850831	02561850831		
		PRESAL COSTRUZIONI Srl	presti danisi Calogero	via Michelangelo	Sant'Agata di Militello	01848890834	01848890834	25,7335	
							Soglia di anomalia	25,7227	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ME056	Opere di risagomatura e protezione versanti Fraz. Rocca	Decreto Approv Specif Tecn	Decreto Commissariale n. 99 del 13 marzo 2012	Data Lettera Invito	13/03/2012	CUP	J25D12000020001
				Data scadenza Gara	26/03/2012	CIG	404375328A
	Resp. Proced. Ing. Domenico Imbroglia	Diret. dei Lavori	Ing. RUSSO Salvatore Decreto n. 303 del 28/06/2012	Collaudatore Statico		Coordinatore della Sicurezza	
	Importo € 346.440,74	Importo soggetto a ribasso	€ 324.382,74	Decreto Commissione	Decreto n. 122 del 26 marzo 2012	Verbale	26/03/2012
		oneri sicurezza	€ 22.058,00				
	Aggiudicataria REVOCATA: EL.MI.AN. COSTRUZIONI Srl	Ribasso	25,68%	Aggiud Provvisoria	prot. 91 del 26 marzo 2012	INFO ANTIMAFIA	richiesta prot. 94 del 26 marzo 2012 — Decreto revoca Aggiudicazione Definitiva n. 204 del 7 maggio 2012
		IMPORTO AGGIUDICATO	€ 241.084,82	Aggiud. Definitiva	prot. 97 del 3 aprile 2012 - Decreto n. 154 del		risposta dell'11 aprile 2012
	Aggiudicataria 2 classificata: CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO FRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	Ribasso	25,6724%	Aggiud.Provvisoria	prot. 145 del 14 giugno 2012	INFO ANTIMAFIA	prot. U/DCI/RM/115 del 22 maggio 2012: per il Consorzio Emiliano Romagnolo prot. U/DCI/RM/116 del 22 maggio 2012: per Eurovega
		IMPORTO AGGIUDICATO	€ 241.105,91	Aggiud. Definitiva	prot.		
	Decreto aggiud Def: Decreto			Contratto	26-giu-12	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 14556 serie 3 del 4 LUGLIO 2012

note	albo	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	Sede Legale - Provincia	P. IVA	OFFERTA	Ribasso
	75	CANTIERI RIUNITI Srl	Agnese Rosaria Alì	Via Redentore	Catania	Catania	02518290875	agnese.ali@cantieririuniti.com	cauzione
	113	COGES Srl	LUISA MILORDO	VIA CESARE BATTISTI	Acri	Cosenza	02444220780	coges.gare@libero.it	
	122	CONSORZIO CIRO MENOTTI SCpA	eriozoli	VIA PIER TRAVERSARI	Ravenna	Ravenna	00966060378	ccm@ciromenotti.it	25,6497
	124	CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO FRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	Paolo Parmeggiani	Via Calzoni	Bologna	Bologna	416500379	mavilio@carcostruzioni.it	25,6724
	125	CONSORZIO STABILE AEDARS Scarl	Alessandro Lambiase	VIA ALESSANDRIA	Roma	Roma	07675601004	info@consorzioaedars.it	24,52
	136	COSPIN Srl	ANTONIO PINZONE VECCHIO COSTANTINO	CORSO SICILIA	Catania	Catania	IT04712420878	cospinsrl@gmail.com	25,7026
	146	COTESP Srl	ANGELO CICCOTTO	VIA SAVANI	Parma	Parma	02096600347	info@impresacotesp.com	25,6631
	156	DAPAM Srl	DARIO AMICI	VIA PONTE D'USCIO	Borno	Brescia	IT01760180982	dapam@dapam.it	
revocata	187	EL.MI.AN. COSTRUZIONI Srl	ANTONIETTA COSTANZA	VIA ROMITA	Favara	Agrigento	IT00768260846	elmianc@libero.it	25,6789
	219	FRANZONE Srl	MARCO FRANZONE	VIA LIBERTA'	Palermo	Palermo	04046870822	franzonesrl@alice.it	21,2121
	248	GHELLER Srl	davide gheller	VIA MONTEGRAPPA	Solagna	Vicenza	IT02230600245	info@gheller.it	25,5277
	268	I.G.R. Srl	FRANCESCO TRIPODI	VIA MELISURGO	Napoli	Napoli	IT06559381212	igr@igrsrl.it	
	284	IMPRESA COSTRUZIONI MODERNE I.C.M. Srl	Antonietta Patti	C.DA MINAGA SS. 189	Agrigento	Agrigento	01649200845	impresacostruzionimoderne@virgilio.it	25,2525
	299	INTERCANTIERI Srl	Salvatore Aronica	VIA HEMINGWAY	Campobello di Licata	Agrigento	02532890841	info@intercantierisrl.com	25,4392
	378	PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L.	SANTA TAVILLA	Via Ugo Bassi	Messina	Messina	IT02569060839	pettinatocostruzioni@virgilio.it	25,5736
	402	S.A.L.P. S.P.A. (SOCIETA' APPALTO LAVORI PUBBLICI)	ANDREA PINATTO	via Julia	Bagnaria Arsa	Udine	00166260307	simonato.p@salpspa.com	25,682
	423	SFS SOCIETA' FORESTALE SICILIANA Srl	Marco Andreuccetti	via liberta'	Palermo	Palermo	00130560826	sfsvival@alice.it	25,7182
	440	SOCIETA' LAVORI PUBBLICI SRL	PAOLO CAPIZZI	VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA	Maletto	Catania	03172280871	capizziant@tiscali.it	26,0222
	447	SPOSATO COSTRUZIONI S.R.L.	gianfranco sposato	VIA DUGLIA	Acri	Cosenza	IT02837410782	garesposato@libero.it	
	470	VENTURA Spa	RAFFAELE VENTURA	VIA NAZIONALE C.DA RUSSO	Furnari	Messina	02686690831	venturaspa@legalmail.it	26,1722
								Soglia di anomalia	25,681

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

PA156	Risagomatura argini e opere di pulitura – Zona foce Fiume Torto		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto Commissariale n. 174 del 18 aprile 2012	Data Lettera Invito	18/04/2012	CUP	J65D12000020001
TEMPI TERMINI					Data scadenza Gara	03/05/2012	CIG	4164400895
	Resp. Proced.	Ing. Calogero Foti	Direttore dei Lavori	Ing. Angelo Benedetto Alferi DRPC PA	Collaudatore Statico		Coordinatore della Sicurezza	
	Importo	€ 418.393,77	Importo soggetto a ribasso Oneri sicurezza	€ 405.841,96 € 12.551,81	Decreto Commissione Verbale	Decreto n. 196 Del 3 maggio 03/05/2012	Aggiudicataria	SUGEO S.r.l.
	Ribasso IMPORTO AGGIUDICATO	25,92% € 300.642,04	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 313.193,85	Aggiud.Provvisoria Aggiud. Definitiva	prot. n. 106 del 3 maggio 2012 prot. 111 del 11 maggio 2012		
	Decreto aggiud. Def.	Decreto n. 215 del 11 maggio 2012			Contratto	08-giu-12	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 13817 serie 3 del 25 giugno 2012

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	recapiti	P. IVA	OFFERTA	Ribasso
	5	A.C. GROUP Srl	Andrea Marotta	Via Umberto 103 92026	Favara (Agrigento)	acgroupsrl@pec.it	IT02558040841	25,7436	
	95	CO.FER.Srl	vincenzo ferrara	via caltanissetta n 21 93014	Mussomeli (Caltanissetta)	impresacofersrl@virgilio.it	00367670858	25,8771	
	103	CO.GRE. Srl	Maurizio Piazza	Via Sicilia 93 91028	Partanna (Trapani)	cogresrl@libero.it	0407440872	25,9071	
	116	COMER COSTRUZIONI MERIDIONALI Spa	SEBASTIANA CONIGLIO	VIA ALESSANDRO VOLTA 139 95010	Santa Venerina (Catania)	comerspa@pec.confindustriact.it	02468520875		
	119	CONSCOOP	mauro pasolini	VIA LUIGI GALVANI N. 17/b 47122	Forli' (Forli-Cesena)	gare@conscoop.it	00140990409	25,6717	
	122	CONSORZIO CIRO MENOTTI SCpA	elio zoli	VIA PIER TRAVERSARI 63 48121	Ravenna (Ravenna)	ccm@ciromenotti.it	00966060378	26,02	
	124	CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO FRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E	Paolo Parmeggiani	Via Calzoni 1/3 40128	Bologna (Bologna)	mavilio@cercostruzioni.it	00416500379		
	126	CONSORZIO STABILE CFC Srl	salvatore ferlito	PIAZZALE DI PORTA PIA 121/A 00198	Roma (Roma)	consorziostabilecfc@pec.confindustriact.it	04083070872		
	136	COSPIN Srl	ANTONIO PINZONE VECCHIO COSTANTINO	CORSO SICILIA 40 95131	Catania (Catania)	cospinsrl@gmail.com	IT04712420878	25,9562	
	166	DI VITA SCAVI Srl	GIOVANNI DI VITA	Strada Provinciale Vittoria-Acate km.1 88 97019	Vittoria (Ragusa)	divita.scavi@tiscali.it	IT01356890887	25,7814	
	169	DIVA Srl	ROSARIA VULLO	VIA MAGELLANO N.1 93010	Vallelunga Pratameno (Caltanissetta)	divasrl2003@libero.it	01654050853	25,8914	
	185	EFFE COSTRUZIONI Srl	santo rosario ferraro	VIA REGINA MARGHERITA 484/1° PIANO 484/1° PIANO 98028	Santa Teresa di Riva (Messina)	info@effecostruzioni.it	02823680834	26,2112	
	219	FRANZONE Srl	MARCO FRANZONE	VIA LIBERTA' 191 90143	Palermo (Palermo)	franzonesrl@alice.it	04046870822	25,6565	
	222	FRESTA ROSARIO ANTONIO	rosario antonio fresta	VIA FELICETTO 11 95010	Santa Venerina (Catania)	loredana19702@interfree.it	01131500876	Cauzione non autenticata	
	229	GANGEMI CARMELO	carmelo gangemi	TUSA VIA NAZIONALE 18 98079	Tusa (Messina)	carmelogangemi@tiscali.it	00293900833	25,77338	
	233	GEO PERFORAZIONI Srl	gerlando romano	c/da san benedetto snc 92026	Favara (Agrigento)	geoperforazioni@libero.it	02443840844		
	244	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI Srl	enzo geraci	Via Lombardo Radice 18 93014	Mussomeli (Caltanissetta)	geracigiuseppecostruzionisrl@hotmail.it	01534310857	25,8888	
	262	HERMES COSTRUZIONI Srl	Rosalia Piscopo	Via F. Crispi / Favara 99 92026	Favara (Agrigento)	hermescostruzionisrl@alice.it	IT02501830844		
	268	I.G.R. Srl	FRANCESCO TRIPODI	VIA MELISURGO 4 80133	Napoli (Napoli)	igr@igrsrl.it	IT06559381212		
	299	INTERCANTIERI Srl	Salvatore Aronica	VIA HEMINGWAY 11 92023	Campobello di Licata (Agrigento)	info@intercantierisrl.com	02532890841	25,8367	
	300	INTERCANTIERI VITTADELLO Spa	ANDREA VITTADELLO	VIA LUIGI PIEROBON 46 35010	Limena (Padova)	info@intercantieri.com	IT00222300287		
	349	MESSINA NOLEGGI Srl	antonino l'avalli	c/da cuba S. lucia sopra contesse 1 98126	Messina (Messina)	messinanoleggi@virgilio.it	03049590833	25,8393	
	402	S.A.L.P. S.P.A. (SOCIETA' APPALTO LAVORI PUBBLICI)	ANDREA PINATTO	via julia 3 33050	Bagnaria Arsa (Udine)	almonato.p@salpspa.com	00166260307	25,7592	
	435	SUGEO S.r.l.	Filippo Infurna	VIA ANTARES 3/A 92100	Agrigento (Agrigento)	sligeosrl@libero.it	IT02432500842	25,9214	
	454	TECNOAPPALT Srl	Giuseppe Capizzi	VIA UMBERTO 311 95129	Catania (Catania)	tecnoappaltsrl@live.it	IT04778150872	26,0317	
	469	VALORI Scarl CONSORZIO STABILE	Valentino Di Virgilio	via marianna dionigi 43 00193	Roma (Roma)	info@valoriscarl.it	08066951008	25,8078	
	470	VENTURA Spa	RAFFAELE VENTURA	VIA NAZIONALE C.DA RUSSO 19 98054	Furnari (Messina)	venturaspa@legalmail.it	02686690831	26,1722	
	475	VIPP LAVORI Spa	Stefano Rettondini	Via Lungo Bussè 3080 37050	Angiari (Verona)	vippspa@vippspa.com	IT01295430234		
	478	Z.COSTRUZIONI Srl	SALVATORE ZAMMUTO	VIA ROMA 323 92021	Aragona (Agrigento)	z.costruzioni@tin.it	01820750840	25,8801	
							numero offerte pervenute	21	
							Soglia di anomalia	25,9304	

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

AG006	Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel Comune di Favara (AG)"		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 206 dell'8 maggio 2012	Data Lettera Invito	09/05/2012	CUP	J25D12000050001
					Data scadenza Gara	23/05/2012	CIG	in attesa accredito RUP
F a v a r a	Resp. Proced.	Ing. Domenico Armenio	Diret. dei Lavori	Ing. Angelo Valerio Zambito Genio Civile AG	Collaudatore Statico		Coordinatore della Sicurezza	
	Importo	€ 991.931,69	Importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 961.677,77 € 30.253,92	Decreto Commissione Verbale	del 22 maggio 2012 22/05/2012	Aggiudicataria	BOLLITA COSTRUZIONI Soc Coop
	Ribasso IMPORTO AGGIUDICATO	26,06% € 711.102,05	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 741.355,97	Aggiud.Provvisoria Aggiud. Definitiva	prot. n. 118 del 22 maggio 2012 prot. n. 122 del 30 maggio 2012		
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 251 del 30 maggio 2012			Contratto	03-lug-12	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma Ufficio Roma 2 Aurelio n. 15551 serie 3 del 16 luglio 2012

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	PROVINCIA	recapiti	P. IVA	OFFERTA	Ribasso
	47	BLU COSTUZIONI Srl	Gaeta Massimiliano	Via Aurelio Saffi 31 96013 Carlentini	Siracusa	TEL:095992040 FAX:0957846507	IT01347190892	23,75	
Aggiudicataria	49	BOLLITA COSTRUZIONI Soc Coop	LIANO VINCENZO DOMEI	Via Regio Tratturo Zona P.I.P. snc 75020 Nova Siri	Matera	TEL:0835877664 FAX:0835505856	00358780773	26,0561	
	91	CLAUDIO SALINI Spa	Clemente Francesco	Via dei Crociferi 44 00187 Roma	Roma	TEL:06/97840548 FAX:06/97619794	08514961005		
	96	CO.GE.O. Srl	ORLANDO SERGIO	Frazione Madonnuzza S.S. 120 Km 66+100 snc 90026 Petralia Soprana	Palermo	TEL:0921680888 FAX:0921680888	IT04803120825		
esclusa	99	CO.GE.ZAF. Srl	zafonti sebastiano	via ss. trinità 12 90026 Petralia Soprana	Palermo	TEL:0921/686181 FAX:0921/686181	04393290822	cauzione senza art. 1957	cauzione
	114	COLNISA COSTRUZIONI Srl	Colombrita Nicola	Via Lorenzo Gemmellaro 1 95030 Sant'Agata Li Battiati	Catania	TEL:095/7256895 FAX:095/7250273	IT02043450879	25,674	
	218	FRANCO SANTO	Franco Santo	VIA REGINA MARGHERITA 4 90024 Gangi	Palermo	TEL:0921644099 FAX:092164499	IT04496500820	26,1023	
	255	GLOBALGEO Srl	millonzi salvatore	Via Maria degli Angeli 22 90020 Montemaggiore Belsito	Palermo	TEL:0918996120 FAX:0918996120 mail:	05489270826	25,5887	
	280	PRESA COSTRUZIONI ARCURI FRANCES	Arcuri Francesco	Via Principe Colonna 28 90030 Giuliana	Palermo	TEL:3356626878 FAX:09138046917	IT00487970824	25,9259	
esclusa	310	ITALRECUPERI Srl	DAMIANO CATANIA	viale Principe Umberto 81 98122 Messina	Messina	TEL:0902982065 FAX:0906513872	IT03106220837	cauzione senza art. 1957	cauzione
	335	MALFITANO Srl	EMBO LUSCARI ARMAND	VIA F.SCO CRISPI 56 98063 Gioiosa Marea	Messina	TEL:0941303016 FAX:0941303762	00924651003	26,1111	
	374	PELLEGRINI FABRIZIO	Pellegrini Fabrizio	VIA CAPITONESE 19 05035 Narni	Terni	TEL:0744751294 FAX:0744751294	00729450551	26,0207	
	381	PORTO COSTRUZIONI S.R.L.	PORTO VENERANDO	VIA EREMO 14/A 95017 Piedimonte Etneo	Catania	TEL:095648545 FAX:095648545	IT04370470876		
	396	REPIN S.R.L.	Finocchiaro Salvatore	via Elemosina s.n. 95022 Aci Catena	Catania	TEL:095/7110000 FAX:095/7221176	03004880872	26,135	
	418	SCA.CE.BIT. S.r.l.	DI MARCO GIUSEPPE	Strada Provinciale 190 95017 Piedimonte Etneo	Catania	TEL:095644345 FAX:095644589	IT00292050879		
	422	SEAF S.r.l.	DIPASQUALE MASSIMO	via Mongibello 82 97100 Ragusa	Ragusa	TEL:0932/668566 FAX:0932/1874328	IT00882360886	25,9977	
	426	SI.CO.GE. s.r.l.	CUCINOTTA DOMENICO	Via Mafalda di Savoia 15 95125 Catania	Catania	TEL:095/449231 FAX:095/449231	IT04655630871		
	428	SIAR S.R.L.	SCIAMMETTA GIANLUCA	contrada schino 41 98063 Gioiosa Marea	Messina	TEL:0941302890 FAX:0941303754	IT02807700832	25,9756	
	462	TREVI Spa	MENGONI GIUSEPPE	Via Dismano 5819 47522 Cesena	Forlì-Cesena	TEL:0547-319311 FAX:0547-318542	00002890408		
	463	TRIGEO Srl	Galipò Gabriele	C.da S. Lucia // 98071 Capo d'Orlando	Messina	TEL:0941/901892 FAX:0941/901892	01800660837	26,1126	
								Soglia di anomalia	26,05758

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME088	"Opere di salvaguardia centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" - Comune di Messina	Decreto Aperto Bando	Decreto n. 217 del 14 maggio 2012	pubblicazione bando	sito istituzionale 14 maggio 2012 GUCE: GU/S 104 del	Data scadenza Prequalifica	30/05/2012	
Messina	CUP J45D12000090001	CIG	42207058F0	Resp. Procedimento	Ing. Antonino Bartolotta Decreto n. 203 del 4	Diret. dei Lavori	Ing. Antonino Sutera Decreto n. 328 del 10/07/2012	
	Decreto scelta di lettera	Decreto n. 284 del 15 giugno 2012	lettera di invito	15/06/2012	scadenza presentazione documenti	22/09/2011	Verbale presentazione Offerte	25/06/2012
	Importo	€ 2.132.903,24	importo soggetto a ribasso / oneri sicurezza	€ 2.068.916,14 / € 63.967,10	Prozzo	26,66%	Importo aggiudicato	€ 1.517.266,55 / € 63.987,10 — € 1.581.253,65
	Decreto Commissario	Decreto n. 290 del 25 giugno 2012	Aggiudicataria	ATI: PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo); CEIT DI MAMMOLITI GIUSEPPE (Mandante)	Aggiud. Provvisoria	2012 - sospesa da nota prot. PA 3506 del 11		
	Verbale	00-gen-00			Aggiud. Definitiva	prot. 161 del 20 luglio 2012		
	Decreto approvazione	Decreto 382 del 20 luglio 2012			Contratto	04-lug-12	Data effettivo Consegna Lav	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 23496 del 25 novembre 2011

	n. progressivo sull'elenco Plichi	Denominazione impresa	verbale di prequalifica	note prequalifica	GARA	OFFERTA	note GARA	data offerta	Ribasso
	1	GEO DRILLING S.R.L.						ammessa	26,2867
	2	ITALRECUPERI S.R.L.						ammessa	26,905
	3	CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.						ammessa	27,1245
	4	CONSORES S.R.L.						ammessa	26,5479
	5	EREDI GERACI SALVATORE S.R.L.						ammessa	26,2684
	6	CO.GER. S.R.L.						ammessa	26,2859
	7	MESSINA COSTRUZIONI S.R.L.						ammessa	26,3431
	8	EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L.						ammessa	26,4123
	9	MI.CO. S.R.L.						ammessa	26,2535
	10	INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.	non ammessa	l'impresa viene esclusa ai sensi del punto m quater dell'art 38 Dlgs 163/2006 e s.m.i. in quanto risulta collegata all'impresa 06 D partecipante alla medesima procedura di gara.					
	11	SIDOTI COSTRUZIONI S.R.L.						ammessa	26,1731
	12	AVENI S.R.L. (Capogruppo); G. T. S.R.L. (Mandante)						ammessa	26,8154
	13	AEMME S.R.L.						ammessa	26,414
	14	D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.						ammessa	26,2551
	15	COLMSA COSTRUZIONI S.R.L.						ammessa	26,2626
	16	IMPRESA COSTRUZIONI MODERNE I.C.M. S.R.L.						ammessa	26,2278
	17	URANIA COSTRUZIONI S.R.L.						ammessa	26,7812
	18	VENTURA S.P.A.						ammessa	26,6995
	19	PRESTI S.R.L. (Capogruppo); I.CO.I. di U Destri Giacomo & C. s.a.s. (Mandante)	non ammessa	l'impresa viene esclusa in quanto la categoria OS21 prevalente dalla Mandataria, nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, non è sufficiente, ai sensi del DPR 207 art. 61 comma 2, già art 3 comma 2 del DPR 34/2000, a coprire la quota di partecipazione dichiarata rispetto all'importo a base di gara					
	20	GLOBAL SERVICE ITALIA S.R.L.						ammessa	no offerta
	21	IMPRESIM S.R.L. (Capogruppo); IMPRESA MARRA S.R.L. (Mandante)						ammessa	no offerta
	22	CO.GE.TA. S.R.L.						ammessa	26,2636
	23	ACQUA E VERDE NORD S.R.L.						ammessa	no offerta
	24	SA.MA. S.R.L.						ammessa	26,3561
	25	SILGEO S.R.L.						ammessa	26,4537
	26	DAPAM S.R.L.						ammessa	no offerta
	27	TRIGEO S.R.L.						ammessa	26,1026
	28	[illegible] (Capogruppo); SI.RI. TRIVELLAZIONI di Simonetti Rosario (Mandante)	non ammessa	la costituenda ATI viene esclusa in quanto la certificazione SOA dell'impresa SI.A.R. Trivellazioni di Simonetti Rosario risulta scaduta alla data di presentazione della richiesta di partecipazione, così come peraltro riscontrato dal sito dell' Autorità (Avcp)					
	29	GEOMERID S.R.L.						ammessa	no offerta
	30	CA.TI.FRA. S.R.L.						ammessa	26,7942
	31	MAIORANA COSTRUZIONI S.R.L.						ammessa	26,5832
	32	LA FERRERA GIUSEPPE						ammessa	26,3333
	33	PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo); CEIT DI MAMMOLITI GIUSEPPE (Mandante)	ammessa						26,6837
	34	C. & P. S.R.L.						ammessa	26,6151
	35	TPL CONSORZIO STABILE S.R.L.						ammessa	no offerta
	36	NUOVA COSTRUZIONE SICILIANA COOP. A R.L.						ammessa	26,4263
	37	AMATA COSTRUZIONI S.R.L.						ammessa	26,4626
	38	PACOS SRL (Capogruppo); PIAZZA COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante); VIMAR S.R.L. (Mandante)						ammessa	26,369
	39	GHELLER S.R.L.	non ammessa	l'impresa viene esclusa ai sensi del punto m quater dell'art 38 Dlgs 163/2006 e s.m.i. in quanto risulta e dichiara di essere collegata all'impresa Renzo costruzioni Srl partecipante alla medesima procedura di gara.					
	40	ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA S.R.L.						ammessa	24,9342
	41	FUNARO COSTRUZIONI S.R.L.						ammessa	26,3589
	42	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - S.R.L.						ammessa	24,1123
	43	EMMECO S.R.L.						ammessa	26,3282
	44	EDILMESAM S.R.L.						ammessa	26,3826
	45	ARCOBALENO 3000 S.R.L. (Capogruppo); BUILDING S.R.L. (Mandante)						ammessa	
	46	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.						ammessa	26,5522
	47	FIORELLO FIORETTI						ammessa	
	48	PELORITANA APPALTI S.R.L.						ammessa	
	49	GEOBRUGG ITALIA S.R.L.						ammessa	26,1012
	50	DI GIOVANNA S.R.L.						ammessa	26,2257

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.05.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ME088	"Opere di salvaguardia centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" - Comune di Messina	Decreto Approv Bando	Decreto n. 217 del 14 maggio 2012	pubblicazione bando	GURS 18/05/2012 e GUCE: GU/S 104 del 31/05/2012	Data scadenza Prequalifica	30/05/2012	
Messina	CUP J45D12000090001	CIG	42207058F0	Resp. Procedimento	Ing. Antonino Bartolotta Decreto n. 203 del 4 maggio 2012	Direz. dei Lavori	Ing. Antonino Sutera Decreto n. 328 del 10/07/2012	
	decreto impegno di fondi	Decreto n. 284 del 15 giugno 2012	lettera di invito	15/06/2012	scadenza presentazione preventivi	27/09/2011	scadenza presentazione Offerte	25/06/2012
	importo	€ 2.132.903,24	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 2.068.916,14 € 63.987,10	Ribasso	26,66%	importo aggiudicato	€ 1.517.266,55 € 63.987,10 € 1.581.253,65
	Decreto Commissario	Decreto n. 290 del 25 giugno 2012	Aggiudicatario	ATI: PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo); CEIT DI MAMMOLITI GIUSEPPE (Mandante)	Aggiud. Provvisoria	prot. 22/Gen/V seggio 2012 - sospesa da nota prot. PA 2606 del 11 luglio		
	Verbale	00-gen-00			Aggiud. Definitiva	prot. 161 del 20 luglio 2012		
	Comunicazioni	Decreto 382 del 20 luglio 2012			Contratto	04-lug-12	Data effettiva consegna Lav.	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 23496 del 25 novembre 2011

	n. progressivo di richiesta invito	Denominazione impresa	verbale di prequalifica	note prequalifica	GARA	OFFERTA	note GARA	data offerta	Ribasso
	51	ANGELO RUSSELLO S.p.A. (Capogruppo); ITALCOSTRUZIONI S.R.L. (Mandante)						ammessa	27,7882
	52	DIVA SRL (Capogruppo); GRUPPO VENERE S.R.L. (Mandante); GRANATELLA DI COCO ROSOLINO & C. s.a.s. (Mandante)						ammessa	26,4637
	53	UNIROCK S.r.l. (Capogruppo); TROMBI COSTRUZIONI (Mandante Cooptata)						ammessa	26,2431
	54	C.I.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.						ammessa	documentazione mancante
	55	PIETRO DURANTE S.R.L.						ammessa	26,0525
	56	CO.GE.MAR. S.R.L.						ammessa	11,2301
	57	RAMMACCA SALVATORE & C. S.R.L. (Capogruppo); TECNO COSTRUZIONI S.R.L.	non ammessa	la concorrente è in carenza requisito di cui all'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. in quanto la qualificazione nella categoria OG12 posseduta dalla Mandante Tecno Costruzioni SRL, nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, non è sufficiente a coprire la quota di partecipazione dichiarata rispetto all'importo a base di gara					
	58	CO.ANT S.R.L.						ammessa	26,4637
	59	CONSORZIO STABILE CPC S.R.L.						ammessa	no offerta
	60	IMPREFER S.R.L.						ammessa	no offerta
	61	COMER COSTRUZIONI MERIDIONALI S.p.A.						ammessa	26,3957
	62	CIANCIO PARATORE RICCARDO (Capogruppo); TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.R.L. (Mandante)						ammessa	26,3253
	63	FRESTA ROSARIO ANTONIO						ammessa	26,333
	64	CHIOFALO GROUP S.R.L.						ammessa	27,7337
	65	EREDI DI ANELLO ANDREA S.R.L (Capogruppo); INTILE GIUSEPPE (Mandante)						ammessa	no offerta
	66	EDILPAU S.R.L.						ammessa	26,2837
	67	BLU COSTRUZIONI S.R.L.						ammessa	26,061
	68	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo); DI PIAZZA S.R.L. (Mandante)						ammessa	26,2786
	69	FERRETTI INTERNATIONAL S.R.L.						ammessa	26,52
	70	ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.						ammessa	no offerta
	71	DEMETRA LAVORI S.R.L. (Capogruppo); GEODESIA S.R.L. (Mandante)						ammessa	26,4684
	72	ADRIAMBIENTE S.R.L.						ammessa	no offerta
	73	DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L.						ammessa	27,7777
	74	GEO PERFORAZIONI S.R.L.						ammessa	26,2223
	75	CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI Soc. Coop. a R. L.						ammessa	no offerta
	76	BCS Costruzioni srl (Capogruppo); EDIL SAFF S.R.L. (Mandante)						ammessa	26,3335
	77	F.LLI DESTRO S.R.L.						ammessa	26,5497
	78	CO.MIN. S.R.L.						ammessa	26,2917
	79	COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L.						ammessa	27,0849
	80	OFFICINE SAN GIORGIO S.R.L. (Capogruppo); Gi.GA. PROJECT S.R.L. (Mandante)						ammessa	26,1797
	81	COSTRUZIONI S.R.L.						ammessa	cessione
	82	Costituenda ATI GEO GAV S.R.L. (Capogruppo); 2 COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante)						ammessa	no offerta
	83	ALBANESE PERFORAZIONI S.R.L.						ammessa	26,4466
	84	EFFESER S.R.L. (Capogruppo); EUROSTRADE S.R.L. (Mandante)						ammessa	31,7641
	85	GUGGINO COSTRUZIONI s.a.s. di Guggino Remo Domenico e soci						ammessa	26,1376
	86	CONSORZIO STABILE TEKTON Soc. Cons. A R.L.						ammessa	26,3516
	87	VPP LAVORI S.p.A.						ammessa	26,386
	88	SUPREMA APPALTI S.R.L.						ammessa	26,3612
	89	COSEDIL S.p.A.						ammessa	26,2325
	90	INJECTOSOND ITALIA S.R.L.						ammessa	18,23
	91	C.G. COSTRUZIONE S.R.L.						ammessa	no offerta
	92	TEAS S.R.L. (Capogruppo); ISOR COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante)						ammessa	26,1674
	93	PROGETTO CONTRACT S.p.A. (Capogruppo); GLOBALGEO S.R.L. (Mandante)						ammessa	26,0722
	94	VALORI S.C.a R.L. Consorzio Stabile						ammessa	26,3199
	95	APPALTITALIA S.R.L.						ammessa	26,4145
	96	GANGEMI CARMELO						ammessa	26,5788
	97	PELLEGRINI FABRIZIO (Capogruppo); ITESA S.R.L. (Mandante)						ammessa	26,6571
	98	GRESY APPALTI S.R.L. (Capogruppo); BONGIOVANNI COSTRUZIONI s.a.s. (Mandante)						ammessa	27,2345
	99	REPIN S.R.L. (Capogruppo); GHEA S.R.L. (Mandante)						ammessa	26,3133
	100	MAZZEO S.R.L. (Capogruppo); COSTRUZIONI GENERALI PITASI S.R.L. (Mandante)						ammessa	26,3817

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME088	"Opere di salvaguardia centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" - Comune di Messina	Decreto Approv Bando	Decreto n. 217 del 14 maggio 2012	pubblicazione Bando	GUCE: GU/S S94 del	Data scadenza Prequalifica	30/05/2012	
Messina Cumia	CUP J45D12000090001	CIG	42207058F0	Resp. Procedimento	Ing. Antonino Sutera Decreto n. 203 del 4	Dirett. dei Lavori	Ing. Antonino Sutera Decreto n. 328 del 10/07/2012	
	Decreto Approvazione Bando di Gara	Decreto n. 284 del 15 giugno 2012	Lettera di invito	15/06/2012	Scadenza presentazione chiarimenti	22/09/2011	Scadenza presentazione Offerte	25/06/2012
	Importo	€ 2.132.903,24	Importo soggetto a ribasso / Oneri Sicurezza	€ 2.068.916,14 / € 63.987,10	Ribasso	26,66%	Importo Aggiudicato	€ 1.517.266,55 / € 63.987,10 / € 1.581.253,65
	Decreto Commissario / Verbale	Decreto n. 290 del 25 giugno 2012 / 00 gen 00	Aggiudicataria	ATI: PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo); CEIT DI MAMMOLITI GIUSEPPE (Mandante)	Aggiud. Provvisoria / Aggiud. Definitiva	prot. 224 del 4 luglio 2012 - sospesa da nota prot. PA 2606 del 11 / prot. 161 del 20 luglio 2012		
	Termini cogenti per	Decreto 382 del 20 luglio 2012			Contratto	06 lug 12	Data effettiva consegna Lavori	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffici Roma 2 Aurelio n. 23496 del 25 novembre 2011

	n. progr. in ordine di ricezione offerte	Denominazione Impresa	verbale di prequalifica	note prequalifica	GARA	OFFERTA	note GARA	esito offerta	% ribasso
	101	MONDELLO S.p.A.						ammessa	26,0625
	102	DI MARIA COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo); CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandante)						ammessa	26,3804
	103	COSPIN S.R.L.						ammessa	26,5643
	104	SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.R.L.						ammessa	26,254
	105	CONSORZIO STABILE AEDARS S.C.a R.L.						ammessa	26,3699
	106	Costituenda ATI ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo); COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.p.A. (Mandante)						ammessa	26,7564
	107	GEO R.A.S. S.R.L.						ammessa	26,2834
	108	SCEP S.R.L.						ammessa	no offerta
	109	ING. PRIOLO ROBERTO S.R.L. (Capogruppo); MICOVER S.R.L. (Mandante)						ammessa	no offerta
	110	EDIL VINCENT S.R.L.						ammessa	26,9898
	111	CO.GRE. S.R.L. (Capogruppo); ARCURI FRANCESCO (Mandante)						ammessa	26,9071
	112	IMPRESA COSTRUZIONI FRIDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. s.a.s. (Capogruppo); PROGECO Soc. Coop. (Mandante);GENCO GIUSEPPE (Mandante Cooptata)						ammessa	subappalto
	113	I.CO.M.E.T.T. S.R.L. (Capogruppo); IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. CANNIZZO CARMELO (Mandante); MESSINA NOLEGGI S.R.L. (Mandante)						ammessa	26,8301
	114	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI						ammessa	26,4527
	115	DICEARCO COSTRUZIONI S.R.L.						ammessa	26,3393
	116	AMTECO S.p.A.						ammessa	25,8795
	117	C.A.E.C. Soc. Coop.						ammessa	26,1225
	118	CONSCOOP						ammessa	27,2149
	119	PRESAL COSTRUZIONI S.R.L.						ammessa	28,7543
	120	CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO FRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO						ammessa	26,8989
	121	FONDAZIONI SPECIALI S.p.A.						ammessa	27,4725
	122	PISCIOTTA COSTRUZIONI S.R.L.						ammessa	26,2212
	123	EMMA LAVORI Soc. Coop. a R.L. (Capogruppo); MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (Mandante)						ammessa	sorteggio
	124	CANTIERI RIUNITI S.R.L. (Capogruppo); COSTRUZIONI GENERALI IACOPELLI S.R.L. (Mandante)						ammessa	26,4235
	125	FARINELLA INFRASTRUTTURE S.R.L. (Capogruppo); LIBRIZZI COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante); RASSARELLO DI PIERO	non ammessa	la costituenda ATI viene esclusa, in quanto la qualificazione nella categoria OG11 posseduta dalla Mandataria Librizzi Costruzioni Srl, non viene resa propria classifica incrementata di un quinto, non è sufficiente, ai sensi del DPR 207 art. 61 comma 2, già art 3 comma 2 del DPR 34/2000, a coprire la quota di partecipazione dichiarata riguardo all'importo a base di gara					
	126	TECNOAPPALT S.R.L.						ammessa	no offerta
	127	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.p.A.						ammessa	26,3789
	128	MA.GE.CO. S.R.L. (Capogruppo); QUINTALVI S.R.L. (Mandante)						ammessa	26,2672
	129	ZENIT CONSORZIO STABILE						ammessa	26,35
	130	S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.						ammessa	27,113
	131	COMEL S.R.L.						ammessa	26,4414
	132	CIG.M. S.R.L.(Capogruppo); TRIVELLAZIONI D'ANGELO DI D'ANGELO FERDINANDO (Mandante)	non ammessa	la costituenda A.T.I. viene esclusa in quanto i soggetti richiedenti presentano dichiarazione di partecipazione in A.T.I. in contrasto tra loro. Infatti l'impresa I.G.E.M. SRL dichiara di voler costituire A.T.I. con l'impresa SICI SRL, la quale non presenta alcun documento richiesto nel bando di gara; l'impresa Trivellazioni D'Angelo di D'Angelo Ferdinando dichiara, infine, di voler costituire A.T.I. orizzontalmente con l'impresa I.G.E.M. SRL					
	133	GIOVANNINI COSTRUTTORI s.a.s. DI GIOVANNINI FRANCESCO E C.	ammessa		ammessa				27,121
	134	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.C.a R.L.	ammessa		ammessa				26,3536
	135	CO.FER S.R.L.	ammessa		ammessa				26,2301
	136	CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.	ammessa		ammessa				27,241
	137	RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo); ARCAN COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante); PRIMA COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante)	non ammessa	la costituenda A.T.I. viene esclusa ai sensi del punto m-quater dell'art 38 Dlgs 163/2006 e s.m.i. in quanto l'impresa Renzo Costruzioni Srl risulta e dichiara di essere collegata all'impresa Gheller Srl partecipante alla medesima procedura di gara.					
	138	MALFITANO S.R.L.						ammessa	non sono state prodotte le dichiarazioni
	139	MEDI APPALTI S.R.L.						ammessa	26,3826
	140	FRANCO SANTO (Capogruppo); CO.E.S.I. S.R.L. (Mandante)						ammessa	
	141	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.a R.L.						ammessa	26,5113
	142	G.E.V. NEW EVOLUTION S.R.L.						ammessa	27,777
	143	TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.(Capogruppo); GEO PLANTS S.R.L. (Mandante); PULLARA CALOGERO (Mandante)						ammessa	
	144	ARES S.R.L.						ammessa	26,6086
	145	BONINA S.R.L.						ammessa	no modello DAP
	146	S.A.I.P. S.P.A. (SOCIETA' APPALTI LAVORI PUBBLICI)						ammessa	
	147	IMPRESA TOMAT S.p.A.						ammessa	
	148	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC Società Cooperativa						ammessa	26,3901
	149	IMPRESA LUIGI NOTARI S.p.A.						ammessa	26,14
	150	ESSETI S.R.L. SISTEMI E TECNOLOGIE (Capogruppo); FORTI S.R.L. (Mandante)	non ammessa	la costituenda ATI viene esclusa, in quanto la qualificazione nella categoria OG11 posseduta dalla Mandataria, non viene resa propria classifica incrementata di un quinto, non è sufficiente, ai sensi del DPR 207 art. 61 comma 2, già art 3 comma 2 del DPR 34/2000, a coprire la quota di partecipazione dichiarata rispetto all'importo a base di gara					

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ME088	"Opere di salvaguardia centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" - Comune di Messina		Decreto Approv Bando	Decreto n. 217 del 14 maggio 2012	pubblicazione Bando	GUCE: GU/S 594 del	Data scadenza Prequalifica	30/05/2012
Messina	CUP	J45D12000090001	CIG	4220705880	Resp. Procedimento	Ing. Salvatore Bartolotta Decreto n. 203 del 4	Diret. dei Lavori	Ing. Antonino Sutera Decreto n. 328 del 10/07/2012
	Decreto presa in carico Istruttoria	Decreto n. 284 del 15 giugno 2012	Lettera di invito	15/06/2012	scadenza presentazione strumenti	22/09/2011	scadenza presentazione Offerte	25/06/2012
	importo	€ 2.132.903,24	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 2.068.916,14 € 63.987,10	Ribasso	26,66%	importo aggiudicato	€ 1.517.266,55 € 63.987,10
	Decreto Commissario	Decreto n. 290 del 25 giugno 2012	Aggiudicataria	ATI: PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo); CEIT DI MAMMOLITI GIUSEPPE (Mandante)	Aggiud. Provvisoria			
	Verbale	00-gen-00			Aggiud. Definitiva	prot. 161 del 20 luglio 2012		
	Decreto approv.Del	Decreto 382 del 20 luglio 2012			Contratto	04-lug-12	Data effettivo consegna Lav.	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 23496 del 25 novembre 2011

	n. progressivo richiesta invito	Denominazione impresa	verbale di prequalifica	note prequalifica	GARA	OFFERTA	note GARA	data offerta	Ribasso
	151	CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. (Capogruppo); EFFE COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante); ISAF COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante)						ammessa	
	152	CIVESSE S.R.L.						ammessa	26,1821
	153	SARACEN S.P.A. (Capogruppo); PROJECT S.R.L.(Mandante); ASTONE COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante), PROFAS COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante Cooptata)						ammessa	26,4831
	154	NA.SA. COSTRUZIONI S.R.L. (Mandataria); LEENKER S.R.L. (Mandante)						ammessa	26,3422
	155	IMPRESA PREVEDELLO ISIDORO S.R.L.						ammessa	26,3015
	156	CONSORZIO ARTEK						ammessa	26,3454
	157	MA.CON. S.R.L.						ammessa	
	158	IRIDE S.R.L.						ammessa	26,7531
	159	ALAK S.R.L.(Capogruppo); D & D COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante)	non ammessa	la costituenda A.T.I. ALAK SRL - D & D COSTRUZIONI s.r.l. viene esclusa ai sensi del punto m-quater dell'art 38 Dlgs 163/2006 e s.m.i. in quanto l'impresa D & D COSTRUZIONI S.r.l. risulta e dichiara di essere collegata all'impresa INGEGNERIA E COSTRUZIONI partecipante alla medesima procedura di gara					
	160	ALPI S.R.L. (Costituenda ATI ALPI S.R.L.(Capogruppo); ALFANO S.R.L. (Mandante))						ammessa	l'impresa ALFANO S.R.L. allega uno schema di contratto
	161	CONSORZIO STABILE NOVUS S.R.L.						ammessa	26,3131
	162	TORSTEN COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo); OMNIA PROGETTI S.R.L. (Mandante)						ammessa	27,4664
	163	SEAF S.R.L. (Capogruppo); C.G. COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante); IMPRESA EDILE GIOVANNI RAVALLI (Mandante); SOSEDIL S.p.A. (Mandante)						ammessa	27,8756

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

SR161	Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica c/da Cavagrande del Cassibile		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 288 del 20 giugno 2012	Data Lettera Invito	20/06/2012	CUP	J65D12000240001	
AVOLA					Data scadenza Gara	04/07/2012	CIG	43566250AF	
	Resp. Proced.	Dott. Gaetano Marino	Diret. dei Lavori	Ing. Davide Di Grazia (DRPC SR) nota DRPC prot. N. 45374 del 31/08/2006 di incarico progettazione e	Collaudatore Statico		Coordinatore della Sicurezza		
	Importo	€ 455.205,25	Importo soggetto a ribasso	€ 433.232,35	Decreto Commissione	Decreto n. 308 del 4 luglio 2012	Verbale	__/07/201211/07/2012	
			oneri sicurezza	€ 21.972,90					
	Aggiudicataria revocata	SA.MA. S.R.L.	Ribasso	26,42%	Aggiud.Provvisoria	prot. 162/DCI/RM/2012 del 24 luglio 2012	INFO ANTIMAFIA	richiesta prot: 120/DCI/RM/2012 del 24 maggio 2012	revoca provvedimento di aggiudicazione provvisoria decreto n. 478 del 19 settembre 2012
			IMPORTO AGGIUDICATO	€ 340.734,87				rispota prot: 0032582 del 04 settembre 2012 (Prot.n. 2/Ris del 10 settembre 2012)	
	Aggiudicataria	CONSORZIO STABILE VITRUVIO Scarl	Ribasso	26,37%	Aggiud Provvisoria	NOTA PROT. 4753 DEL 17/11 Decreto 633 del 21			
			IMPORTO AGGIUDICATO	€ 340.976,61	Aggiudicazione Definitiva	prot. 264 del 3 dicembre 2012			
	Decreto aggiud Def	decreto n. 661 del 3 dicembre 2012			Contratto	11-dic-12	REGISTRAZIONE CONTRATTO	in corso di registrazione	

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo		tel	fax	OFFERTA	Ribasso
	34	ARIS Srl	PARISI STEFANO	viale aldo moro ,250 cap 92026 Favara- Agrigento	impresaaris@libero.it	0922/419099	0922/419099	IT02449490842	
	58	C.G. COSTRUZIONE Srl	costanza rosa maria	via nazionale ,1/b cap 98079 Tusa- Messina	costanzaro@virgilio.it	0921334571	0921307191	02608800831	
	120	CONSOLIDAMENTI SPECIALI Srl	D'Agata Marcello	via Anzalone,12 cap 95024 Acireale- Catania	e@consolidamentispeci	095/877738	095/7672135	04157170871	26,5335
	121	CONSORES Srl	Scarbaci Salvatore	Via val di Mazara, 52 cap 90144 Palermo- Palermo	consores@tin.it	091513918	091518206	IT04633930823	26,1707
	125	CONSORZIO STABILE AEDARS Scarl	Lambiase Alessandro	VIA ALESSANDRIA,112 cap 00198 Roma- Roma	info@consorzioaedars.it	0644252040	0645439033	07675601004	26,7763
	128	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S	russo mariaelisa	VIALE SHAKESPEARE,57 cap 00144 Roma- Roma	c.gop@email.it	0662288632	0623326826	10712911006	26,577
	132	CONSORZIO STABILE VITRUVIO Scarl	speziale paolo	Località Licari,37 cap 98063 Gioiosa Marea- Messina	nsorziovitruvio@gmail.c	0941302017	0941303753	IT10149111006	26,3666
	156	DAPAM Srl	AMICI DARIO	VIA PONTE D'USCIO,2/C cap 25042 Borno- Brescia	dapam@dapam.it	0364529172	0364527952	IT01760180982	cauzione
	178	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA Srl	MICCICHE' ROSARIA	VIA VALENTINO MAZZOLA ,S.N.C. cap 92026 Favara- Agrigento	edil_s@libero.it	0922415027	0922415027	IT01802370849	
	191	ENGECO Srl	Marco Mauri	via Medici,6 cap 20123 Milano- Milano	gare@engeco.it	0313355523	0316490680	12845550156	cauzione
	229	GANGEMI CARMELO	gangemi carmelo	TUSA VIA NAZIONALE ,18 cap 98079 Tusa- Messina	armelogangemi@tiscali.i	0921334471	0921307142	00293900833	26,1493
	339	MARTURANA COSTRUZIONI Srl	MARTURANA STEFANO	via Agrigento,41 cap 92026 Favara- Agrigento	arturanacostruzioni@pe	092235700	0922529049	01854270848	
	374	PELLEGRINI FABRIZIO	Pellegrini Fabrizio	VIA CAPITONESE ,19 cap 05035 Narni- Terni	fa.pellegrini@libero.it	0744751294	0744751294	00729450551	26,2978
	395	RENZO COSTRUZIONI S.R.L.	BOLZON RENZO GIOVANN	Via Trieste ,50 cap 98066 Patti- Messina	info@renzocostruzioni.it	0424558332	0424558700	01786140663	cauzione
	410	SA.MA. Srl	ciulla gabriele	Via delle Industrie, Zona Industriale,7 cap 92021 Aragona-	sa.masrl@virgilio.it	092231284	0922438501	02610770840	26,4224
	433	SICULA COSTRUZIONI SOC. COOP	FERLITO SALVATORE	VIA PROVINCIALE ,45 cap 95010 Santa Venerina- Catania	struzioni@pec.confindu	095954413	095954413	02131800878	
	434	SIDOTI COSTRUZIONI S.R.L.	SIDOTI ANTONINO	CONTRADA LENZI,SNC cap 98060 Montagnareale- Messina	sidoticostruzioni@tiscali.i	0941/315219	0941/315101	IT01674800832	26,1731
	455	TECNOTRAFF Srl	BONACCORSO ANGELO	via borzì ,8 cap 95121 Catania- Catania	angels970@hotmail.com	095476719	095476719	05610080821	
	479	ZACCARIA COSTRUZIONI Srl	PASSINI VALERIA	VIA PONTICELLO,154 cap 41055 Montese- Modena	info@zaccariacostruzioni.	059/970009	059/981346	02378870360	25,318
								Soglia di anomalia	26,474875

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

CARLENTINI

SR177	Lavori di consolidamento del costone roccioso zona Crocifisselle nel Comune di Erice	Decreto Approv Bando	non prevista	pubblicazione Bando	00/01/1900	Data scadenza Prequalifica	00/01/1900	
CUP	J15D12000320001	CIG	43661694A3	Resp. Proced.	geom. Francesco Ingelisi	Dirett. dei Lavori	–	
Decreto scheda di offerta	Decreto n. 352 del 13 luglio 2012	Lettera di invito	13/07/2012	Scadenza presentazione Domande	22/09/2011	Scadenza presentazione Offerte	ore 12:00 del 23 luglio 2012	
importo	€ 1.745.120,26	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 1.646.286,57 € 98.833,69	Ribasso	26,9669%	importo aggiudicato	€ 1.202.334,12 € 98.833,69	€ 1.301.167,81
Decreto Commissione Verbale	Decreto n. 384 del 23 Luglio 23/07/2012 ore 14:30	Aggiudicataria	URANIA COSTRUZIONI S.r.l.	Aggiud.Provvisoria Aggiud. Definitiva	prot. 165 del 30 luglio 2012 prot. n. 3191 del 23 agosto 2012			
Decreto approv lavori	decreto n. 429 del 23 agosto 2012	verbale 106	24-set-12	Contratto	26-set-12	CUG effettivo consegna Lav	Agenzia Delle Entrate DP. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio al n. 21647 in data 10 ottobre 2012	

	N. progressivo richiesta invito	Denominazione imprese	OG6	Percentuali di partecipazione in A.T.I.	Note prequalifica	Inviti	offerta	data offerta	Ribasso
1	ATI	A.T.I. Trombi Costruzioni S.r.l. - Corcarini Giovanni (Impresa Individuale)							27,2251
2	ATI	AMATA COSTRUZIONI SRL -Nuova Costruzione Siciliana Coop. A R.L.							26,9272
3	singola	Angelo Russello S.p.A.							26,8765
4	AVVALIMENTO	archas srl -C.6G.BUILDING SRL							27,0762
5	ATI	ATI Edil Vincent srl (CAPOGRUPPO) - Mangiapane Conglomerati srl (MANDANTE)							26,8717
6	ATI	C. & P. s.r.l.-Battistella S.p.a.							26,9254
7	CONSORZIO	C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI) SOC.COOP.							26,8103
8	ATI	CA.TU.FRA. S.R.L. - Costruzioni Camardo Srl							–
9	ATI	Cantieri Riuniti Srl- Somet Srl							27,2789
10	singola	CEVIG SRL							24,933
11	ATI	CLAFC SOC. COOP. - Trasporti E Movimenti Terra S.r.l.							27,1512
12	singola	CO.GE.TA. S.R.L.							–
13	ATI	CO.GRE. S.R.L. - Ares S.r.l.							
14	singola	COMER COSTRUZIONI MERIDIONALI SPA							26,7935
15	CONSORZIO	CONSCOOP - TRINACRIA DI BELMONTE SOC COOP							26,7708
16	CONSORZIO	Consorzio Artek - Gioda Costruzioni Srl (CONSORZIATA)							–
17	CONSORZIO	CONSORZIO CIRO MENOTTI SCpA- EDILAP SOC COOP A.R.L. (CONSORZIATA)							26,9402
18	CONSORZIO	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC Società Cooperativa, in forma abbreviata CCC - Società Cooperativa- KRONOS (CONSORZIATA)							non produce le autodichiarazioni
19	CONSORZIO	Consorzio Emiliano Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro							26,6756
20	CONSORZIO	Consorzio Stabile Aedars Scarl - FRACLA SRL (CONSORZIATA)							non produce le autodichiarazioni
21	CONSORZIO	CONSORZIO STABILE CFC SRL							26,8739
22	ATI	CONSORZIO STABILE DINAMICO (CONSORZIATA) INZIONERIA E COSTRUZIONI S.R.L.) ALIA SRL				escluso in prequalifica			
23	CONSORZIO	consorzio stabile grandi opere s.c.a.r.l. - TEKNA S.R.L. UNIPERSONALE							–
24	CONSORZIO	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI- COSTRUBO SOCIETA' COOPERATIVA (CONSORZIATA)							Il Consorzio Stabile Infrastrutture
25	CONSORZIO	Consorzio stabile Novus S.r.l. -CNT SRL (CONSORZIATA)							–
26	CONSORZIO	CONSORZIO STABILE TEKTON SOC. CONS. A R.L.- GIAMBRONE FRANCESCO (CONSORZIATA)							Il consorzio produce una polizza
27	CONSORZIO	Consorzio Stabile Vitruvio S.c.ar.l. - SIAR SRL (CONSORZIATA)							24,7889
28	singola	COSPIN SRL							–
29	singola	COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L.							–
30	ATI	CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.- Sfs Societa' Forestale Siciliana Srl							26,9531
31	singola	D.L.M. Costruzioni Srl							–
32	ATI	DEMETRA LAVORI SRL -Geodesia Srl							27,0914
33	ATI	Dicnarco Costruzioni srl - Elle Costruzioni s.r.l.							26,7845
34	singola	DIVA SRL							27,1234
35	singola	DUE ESSE GROUP SRL (GIA' HERMES COSTRUZIONI S.R.L.)							l'impresa non produce le
36	singola	EFFESER SRL							30,1149
37	ATI	ELLEZETA COSTRUZIONI SRL - FERRARO IGNAZIO							–
38	singola	FAVELLATO CLAUDIO SpA							27,3312
39	ATI/COOPTAZIONE	FRESTA ROSARIO ANTONIO - DONZUSO S.R.L. - G.F. COSTRUZIONI S.R.L. -							26,8402
40	ATI	GANGEMI CARMELO - PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L.							26,7988
41	AVVALIMENTO	GENCO GIUSEPPE - LOPRETE GROUP S.R.L. (AUSILIARIA)							l'impresa ausiliaria LO PRETE GROUP
42	ATI	Geraci Giuseppe Costruzioni S.r.l. - M.CO. S.R.L. - CO.GER. S.R.L.							26,8586

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

SR177	Lavori di consolidamento del costone roccioso zona Crociffisello nel Comune di Erice		Decreto Approv Bando	non prevista	pubblicazione Bando	00/01/1900	Data scadenza Prequalifica	00/01/1900	
CARLENTINI	CUP	J15D12000320001	CIG	43661694A3	Resp. Proced.	geom. Francesco Ingallisi	Diret. del Lavori	–	
	avviso/bando di gara	Decreto n. 352 del 13 luglio 2012	lettere di invito	13/07/2012	scadenza presentazione domande	22/09/2011	scadenza presentazione Offerte	ore 12:00 del 23 luglio 2012	
	importo	€ 1.745.120,26	importo soggetto a ribasso / oneri sicurezza	€ 1.646.286,57 € 98.833,69	Ribasso	26,9669%	importo aggiudicato	€ 1.202.334,12 € 98.833,69	€ 1.301.167,81
	Decreto Commissione Verbale	Decreto n. 384 del 23 Luglio 23/07/2012 ore 14:30	Aggiudicatarie	URANIA COSTRUZIONI S.r.l.	Aggiud.Provvisoria	prot. 165 del 30 luglio 2012			
					Aggiud. Definitiva	prot. n. 3191 del 23 agosto 2012			
	Verbali aggiudic.	decreto n. 429 del 23 agosto 2012	verbale 106	24-set-12	Contratto	26-set-12	Data effettiva consegna Lav	Agenzia Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio al n. 21647 in data 10 ottobre 2012	

	n. progressivo richiesta invito	Denominazione Impresa	OG8	Percentuali di partecipazione in A.T.I.	note prequalifica	inviti	offerta	data offerta	Ribasso
43	singola	GIOVANNINI COSTRUTTORI SAS DI GIOVANNINI FRANCESCO E C.							–
44	singola	GIRARDELLO S.p.A.							27,1227
45	singola	I.C.O.P. Srl							26,854
46	singola	IMPRESA COSTRUZIONI MODERNE I.C.M. Srl							26,8836
47	singola	IMPRESA PREVEDELLO ISIDORO S.r.l.							26,6731
48	singola	infrastrutture s.r.l.							24,64
49	singola	LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & C.							26,5015
50	singola	Leenker srl							26,9227
51	singola	MA.GE.CO. SRL							26,9512
52	ATI	MAMMANA Michelangelo-Cait Di Mammoliti Giuseppe							26,8511
53	AVVALIMENTO	ME.GI.N. Costruzioni s.r.l. - CONSORZIO STABILE AGORA'							26,5856
54	ATI	medi appalti srl-Saicon Srl							27,1176
55	AVVALIMENTO	MESSINA COSTRUZIONI s.r.l. - CONSORZIO STABILE EBG							non produce le dichiarazioni di
56	singola	messina noleggi srl							26,7989
57	ATI	ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL -Costruzionini Bruno Teodoro Spa							–
58	ATI	RTI SUPRAMA APPALTI SRL - TERRAMARE SRL					esclusa in prequalifica		
59	singola	SA.MA. Costruzioni Generali S.R.L.							–
60	multiple	Si.Ma.Co. srl - Tiozzo F.lli e Nipote srl							26,5217
61	singola	SOCIETA' A RESPONABILITA' LIMITATA (GSC SRL UNIPERSONALE)							25,6872
62	singola	SOCIETA' LAVORI PUBBLICI SRL							26,9414
63	singola	T.M.G. SCAVI SRL							23,653
64	ATI	TECNO APPALTI SRL - Arcadia Srl							l'impresa non produce le
65	singola	torsten costruzioni srl							26,8476
66	CONSORZIO	tpl consorzio stabile s.r.l.							–
67	CONSORZIO	UNIFICACOOP							–
68	singola	URANIA COSTRUZIONI S.r.l.							26,9669
69	CONSORZIO	valori s.c.a.r.l. consorzio stabile - dionigi srl							26,5971
70	singola	VENTURA S.P.A.							26,3716

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ME115_2	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli	Decreto Approv. Bando	Decreto n. 351 del 12 luglio 2012	pubblicazione Bando	sito ucomidrogeo: GUCE: 12-07-2012 GUCE GU/S 135-	Data scadenza Prequalifica	30/07/2012 ore 10:00	
Sant'Angelo di Brolo	CUP J85D12000540001		CIG 4418323378	Resp. Proced.	Ing. Vittorio Ricciardi	Diret. dei Lavori	00/01/1900	
	Decreto Affidamento Diretto Decreto n. 430 del 28 agosto 2012		lettera di invito prot. n. 174 del 28 agosto 2012	scadenza presentazione preventivi 22/09/2011		sedenza presentazione Offerte	lunedì 10 settembre 2012 ore 10:00	
	importo € 2.197.542,99		importo soggetto a ribasso (meno sicurezza) € 2.159.366,45 € 38.176,54	Ribasso 27,36%		Importo aggiudicato	€ 1.568.548,67 € 38.176,54	€ 1.606.725,21
	Decreto Commissione Verbale Decreto n. 450 del 10 settembre 2012 lunedì 10 settembre 2012 ore 12:00		Aggiud'cataria AVENI SRL con GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL	Aggiud. Provvisoria Aggiud. Definitiva	PROT. 201 Del 25 SETTEMBRE 2012 nota del 15 ottobre 2012			
	Decreto n. 532 del 15 ottobre 2012		verbale 106 04-nov-11	Contratto 25-ott-12		Data effettiva consegna Lav.	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 23358 serie 3 del 7 novembre 2012	

listing/a domanda	IMPRESA	PREQUALIFICA	GARA
IMPRESA SINGOLA	ADRIAMBIENTE S.R.L.		NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	AEMME S.R.L.		27,391
ATI	ALAK S.R.L. (Capogruppo) - CIESSECI S.R.L. (Mandante)		27,0729
IMPRESA SINGOLA	ALBANESE PERFORAZIONI S.R.L.		26,7061
ATI	ALKAZAN S.R.L. (Capogruppo)- COESTRA S.R.L. (Mandante)		27,0592
IMPRESA SINGOLA	AMATA COSTRUZIONI S.R.L.		28,0379
IMPRESA SINGOLA	AN.CA.MA S.R.L.		27,2377
ATI	ANGELO RUSSELLO S.P.A. (Capogruppo) - ITALCOSTRUZIONI S.R.L. (Mandante)		27,2258
IMPRESA SINGOLA	APPALTITALIA S.R.L.		NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	ARES S.R.L.		27,2044
ATI	AVENI S.R.L. (Capogruppo)- GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI S.R.L. (Mandante)		27,3607
IMPRESA SINGOLA	BONELLI COSTRUZIONI S.R.L.		27,5816
IMPRESA SINGOLA	BONINA S.R.L.		27,0239
IMPRESA SINGOLA	C. & P. S.R.L.		27,3854
IMPRESA SINGOLA	C.A.E.C. SOC COOP.		27,5167
CONSORZIO	C.F.E. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC COOP	esclusa in prequalifica	
IMPRESA SINGOLA	CA.TI.FRA. S.R.L.		27,2028
ATI	CALLARI COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo)- SCIBETTA COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante)		27,8632
IMPRESA SINGOLA	CANNIZZO COSTRUZIONI S.R.L.		27,4999
IMPRESA SINGOLA	CANTIERI EDILI S.R.L.		26,9571
IMPRESA SINGOLA	CHIOFALO GROUP S.R.L.		27,5739
ATI	CIANCIO PARATORE RICCARDO (Capogruppo) - TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.R.L. (Mandante)		27,5731
IMPRESA SINGOLA	CIVIESSE S.R.L.		27,2139
IMPRESA SINGOLA	CO.ANT S.R.L. "soc. Unipersonale"		27,3677
ATI	CO.E.PE. S.R.L. (Capogruppo) - CAMERI COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante)		27,1973
IMPRESA SINGOLA	CO.E.ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.		27,0643
IMPRESA SINGOLA	CO.GI.MAR. S.R.L.		27,1156
IMPRESA SINGOLA	CO.GE.TA. S.R.L.		NO OFFERTA
ATI	CO.GRE. S.R.L. (Capogruppo) - ARCURI FRANCESCO (Mandante)		NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	CO.MIN. S.R.L.		27,7546
IMPRESA SINGOLA	COLNISA COSTRUZIONI S.R.L.		27,1777
IMPRESA SINGOLA	COMEL S.R.L.		27,3844
IMPRESA SINGOLA	COMER COSTRUZIONI MERIDIONALI S.P.A.		27,3379
IMPRESA SINGOLA	CONSCOOP		NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.		27,1473
IMPRESA SINGOLA	CONSORES S.R.L.		27,1327
CONSORZIO	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.		27,4222
CONSORZIO	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC SOC. COOP.		27,3335
CONSORZIO	CONSORZIO STABILE AEDARS S.C.AR.L.		27,1481
CONSORZIO	CONSORZIO STABILE CFC S.R.L.		27,1197
CONSORZIO	CONSORZIO STABILE DINAMICO		27,9733
CONSORZIO	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.C.A.R.L.		26,9789
CONSORZIO	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI		27,3169
CONSORZIO	CONSORZIO STABILE TEKTON SOC. CONS. A R.L.		27,3541
CONSORZIO	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L.		27,1478
IMPRESA SINGOLA	COSEDIL S.P.A.		27,7677
IMPRESA SINGOLA	COSPIN S.R.L.		27,3543
IMPRESA SINGOLA	COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L.		26,8484
IMPRESA SINGOLA	CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.		27,2341
IMPRESA SINGOLA	D.I.M. COSTRUZIONI S.R.L.		27,2553
IMPRESA SINGOLA	DB COSTRUZIONI S.R.L.		27,3126
ATI	DEMETRA LAVORI S.R.L. (Capogruppo)- GEODESIA S.R.L. (Mandante)		27,0754
IMPRESA SINGOLA	DI GIOVANNA S.R.L.		esclusa in gara
ATI	DI MARIA COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo)-PORTO COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante)		27,3135
IMPRESA SINGOLA	DI MELILLO COSTRUZIONI S.R.L.		esclusa in gara
IMPRESA SINGOLA	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.		27,2156
IMPRESA SINGOLA	DICEARCO COSTRUZIONI S.R.L.		27,0975
ATI	DIVA S.R.L. (Capogruppo)-GRUPPO VENERE S.R.L. (Mandante)-GRANATELLA DI COCO ROSOLINO & C. S.A.S. (Mandante)		27,0914

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ME115_2	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli	Decreto Approv. Bando	Decreto n. 351 del 12 luglio 2012	pubblicazione Bando	sito ucomidrogeo: GUCE: 12-07-2012 GUCE GU/S 135-	Data scadenza Prequalifica	30/07/2012 ore 10:00
Santo, Angelo di Brolo	CUP J85D12000540001	CIG	4418323378	Resp. Proced.	Ing. Vittorio Ricciardi	Dirett. dei Lavori	00/01/1900
	Decreto Approvativo n. Data Decreto n. 430 del 28 agosto 2012	lettera di invito	prot. n. 174 del 28 agosto 2012	scadenza presentazione preventivi	22/09/2011	scadenza presentazione offerte	lunedì 10 settembre 2012 ore 10:00
	importo € 2.197.542,99	importo soggetto a ribasso / oneri sicurezza	€ 2.159.366,45 / € 38.176,54	Ribasso	27,36%	importo aggiudicato	€ 1.568.548,67 / € 38.176,54 — € 1.606.725,21
	Decreto Commissariale Verbale Decreto n. 450 del 10 settembre 2012 lunedì 10 settembre 2012 ore 12:00	Aggiudicataria	AVENI SRL con GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL	Aggiud. Provvisorio	PROT. 201 Del. 25 SETTEMBRE 2012		
				Aggiud. Definitivo	nota del 15 ottobre 2012		
	Decreto approvativo decreto n. 532 del 15 ottobre 2012	verbale 106	04-nov-11	Contratto	25-ott-12	Data effettiva consegna Lav.	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 23358 serie 3 del 7 novembre 2012

IMPRESA SINGOLA	DUE ESSE GROUP S.R.L.	27,5347
ATI	EDIL ROCK S.R.L. (Capogruppo)-EDIL 3AFF S.R.L. (Mandante)	26,9825
IMPRESA SINGOLA	EDIL VINCENT S.R.L.	27,1882
IMPRESA SINGOLA	EDILMESAM S.R.L.	27,3056
IMPRESA SINGOLA	EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L.	27,1516
IMPRESA SINGOLA	EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.	27,3125
IMPRESA SINGOLA	EMMA LAVORI COOP. SOC. A R.L.	27,0448
IMPRESA SINGOLA	EMMECO S.R.L.	27,4673
IMPRESA SINGOLA	EREDI GERACI SALVATORE S.R.L.	NO OFFERTA
ATI	EURORESIDENCE S.R.L. (Capogruppo)-TERRAMARE S.R.L. (Mandante Cooptata)	27,3549
ATI	EVER GREEN S.R.L. (Capogruppo)- ITAL PROGET S.R.L. (Mandante)	27,1337
IMPRESA SINGOLA	F.LLI DESTRO S.R.L.	NO OFFERTA
ATI	FARINELLA INFRASTRUTTURE S.R.L. (Capogruppo) - LIBRIZZI COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante Cooptata)	27,1515
IMPRESA SINGOLA	FERRETTI INTERNATIONAL S.R.L.	26,88
IMPRESA SINGOLA	FONDAZIONI SPECIALI S.P.A.	26,7637
ATI	FRANCO SANTO (Capogruppo) - CO.E.S.I S.R.L. (Mandante)	27,4333
IMPRESA SINGOLA	FRESTA ROSARIO ANTONIO	27,8033
IMPRESA SINGOLA	FUNARO COSTRUZIONI S.R.L.	27,2363
IMPRESA SINGOLA	G.E.V. NEW EVOLUTION S.R.L.	26,5935
IMPRESA SINGOLA	GALLONE ANTONIO	27,0519
IMPRESA SINGOLA	GANGEMI CARMELO	26,9778
IMPRESA SINGOLA	GEO DRILLING S.R.L.	27,0099
ATI	GEO GAV S.R.L. (Capogruppo) - S.M. S.R.L. (Mandante)	27,6882
IMPRESA SINGOLA	GEO PERFORAZIONI S.R.L.	27,2223
IMPRESA SINGOLA	GEO R.A.S. S.R.L.	27,2771
IMPRESA SINGOLA	GEOBRUGG ITALIA S.R.L.	27,8824
IMPRESA SINGOLA	GEOS S.R.L.	escluso in prequalifica
IMPRESA SINGOLA	GEOTEX ITALIA S.R.L.	27,1547
ATI	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo) -DI PIAZZA S.R.L. (Mandante)	NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	GIOVANNINI COSTRUTTORI S.A.S. DI GIOVANNINI FRANCESCO E C.	26,814
IMPRESA SINGOLA	GRAMEY S.R.L.	27,4366
ATI	GRESY APPALTI S.R.L. (Capogruppo) - BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S. (Mandante)	27,1564
ATI	I.CO.M.E.T.T. SRL (Capogruppo) MESSINA NOLEGGI SRL (Mandante) IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. CANNIZZO CARMELO (Mandante)	27,1469
IMPRESA SINGOLA	IDROGEO S.R.L.	27,0213
IMPRESA SINGOLA	IMPREFER S.R.L.	27,4237
ATI	IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. S.A.S. (Capogruppo)-PROGECO SOC. COOP. (Mandante) -GENCO GIUSEPPE (Mandante Cooptata)	NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	IMPRESA COSTRUZIONI MODERNE I.C.M. S.R.L.	NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	IMPRESA ELISEO ING. RENATO S.R.L.	27,281
IMPRESA SINGOLA	IMPRESA FERRO BETON S.A.S DI SIMONE ANNA MARIA	27,1181
IMPRESA SINGOLA	IMPRESA LUIGI NOTARI S.P.A.	27,182
IMPRESA SINGOLA	IMPRESA PREVEDELLO ISIDORO S.R.L.	NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	INDUSTRIA E COSTRUZIONI S.P.A.	27,4018
IMPRESA SINGOLA	INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.	26,9162
IMPRESA SINGOLA	INJECTOSOND ITALIA S.R.L.	26,9019
IMPRESA SINGOLA	IRIDE S.R.L.	27,0809
IMPRESA SINGOLA	ITAL SYSTEM S.P.A.	NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA S.R.L.	26,7039
ATI	ITESA S.R.L. (Capogruppo)- PELLEGRINI FABRIZIO (Mandante)	NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	L. & C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L.	27,5112
IMPRESA SINGOLA	LA FERRERA GIUSEPPE	27,1727
IMPRESA SINGOLA	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	27,1727
ATI	MA.GE.CO. S.R.L. (Capogruppo) - QUINTALVI S.R.L. (Mandante)	27,3245
IMPRESA SINGOLA	MA.GI. S.R.L.	NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	MALFITANO S.R.L.	27,1769
IMPRESA SINGOLA	MAMMANA MICHELANGELO	27,4313
IMPRESA SINGOLA	MARINI ERMENEGILDO S.P.A.	NO OFFERTA
ATI	MAZZEO S.R.L. (Capogruppo) - PITASI S.R.L. (Mandante)	NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	ME.GI.N. COSTRUZIONI S.R.L.	27,3554
IMPRESA SINGOLA	MEDI APPALTI S.R.L.	27,2776
IMPRESA SINGOLA	MESSINA COSTRUZIONI S.R.L.	27,8992

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.05.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ME115_2	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli	Decreto Aprov. Bando	Decreto n. 351 del 12 luglio 2012	pubblicazione Bando	sito ucomidrogeo: GUCE: 12-07-2012 GUCE GU/S 135-	Data scadenza Prequalifica	30/07/2012 ore 10:00
Sant'Angelo di Brolo	CUP J85D12000540001	CIG	4418323378	Resp. Proced.	Ing. Vittorio Ricciardi	Diret. dei Lavori	00/01/1900
	Decreto Urgenza di lavori: Decreto n. 430 del 28 agosto 2012	lettera di invito	prot. n. 174 del 28 agosto 2012	scadenza presentazione chiarimenti	22/09/2011	scadenza presentazione Offerte	lunedì 10 settembre 2012 ore 10:00
	Importo € 2.197.542,99	Importo soggetto a ribasso / oneri sicurezza	€ 2.159.366,45 / € 38.176,54	Ribasso	27,36%	Importo aggiudicato	€ 1.568.548,67 / € 38.176,54 — € 1.600.725,21
	Decreto Commissione Verbale: Decreto n. 450 del 10 settembre 2012 lunedì 10 settembre 2012 ore 12:00	Aggiudicataria	AVENI SRL con GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL	Aggiud.Provvisoria	PROT. 201 Del 25 SETTEMBRE 2012		
				Aggiud. Definitiva	nota del 15 ottobre 2012		
	Decreto aggiudicazione definitiva: decreto n. 532 del 15 ottobre 2012	verbale 106	04-nov-11	Contratto	25-ott-12	Data effettiva consegna Lav.	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 23358 serie 3 del 7 novembre 2012

IMPRESA SINGOLA	M.CO.SRL		27,1388
ATI	MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo) - ECOL 2000 S.R.L. (Mandante)		27,3316
IMPRESA SINGOLA	MONDELLO S.P.A.		27,1212
IMPRESA SINGOLA	NUOVA COSTRUZIONE SICILIANA COOP. A R.L.		27,3101
ATI	OFFICINE SAN GIORGIO S.R.L. (Capogruppo) - G.I.GA. PROJECT S.R.L. (Mandante)		26,0466
ATI	PACOS S.R.L. (Capogruppo)- PIAZZA COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante)- VIMAN S.R.L. (Mandante)		27,3388
IMPRESA SINGOLA	PAGANONI COSTRUZIONI S.R.L.		26,9701
IMPRESA SINGOLA	PAOLO BELTRAMI S.P.A.		NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	PELORITANA APPALTI S.R.L.		27,0195
ATI	PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L.(Capogruppo) - ELICONA SCAVI S.R.L. (Mandante)		27,6155
IMPRESA SINGOLA	PIETRO DURANTE S.R.L.		NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	PISCIOTTA COSTRUZIONI S.R.L.		esclusa in gara
IMPRESA SINGOLA	PRESAL COSTRUZIONI S.R.L.		27,3696
ATI	PRESTI S.R.L. (Capogruppo)- I.CO.LI DI LI DESTRI GIACOMO & C. S.A.S (Mandante)		27,2027
ATI	RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo)- GHELLER S.R.L. (Mandante)- ARCAN COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante)		27,0769
ATI	REPIN S.R.L. (Capogruppo) - GHEA S.R.L. (Mandante)		27,385
CONSORZIO	PESZARCH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	esclusa in prequalifica	
IMPRESA SINGOLA	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.		NO OFFERTA
ATI	ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo)- COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A. (Mandante Cooptata)		27,0169
IMPRESA SINGOLA	S.A.C.A.I.M. S.P.A. CEMENTI ARMATI ING. MANTELLI IN A.S.		NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE		27,1403
IMPRESA SINGOLA	SA.MA. S.R.L.		27,3237
ATI	SARACEN S.P.A. (Capogruppo)- PROJECT S.R.L. (Mandante)- ASTONE COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante)- PROFAS COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante Cooptata)		27,1732
IMPRESA SINGOLA	SCEP S.R.L.		NO OFFERTA
ATI	SEAF S.R.L. (Capogruppo) - C.G. COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante)- EDILZETA S.R.L. (Mandante)		26,9658
ATI	SGRO' ALBERTO ALVARO DANIELE (Capogruppo)- BE.I.CO. SRL (Mandante)- LAVORI S.R.L. (Mandante)		27,1507
ATI	SI.AR. TRIVELLAZIONI DI ROSARIO SIMONETTI (Capogruppo)- DAMIGA S.R.L. (Mandante)		27,6721
IMPRESA SINGOLA	SIAP SERVICE S.R.L.		27,1111
IMPRESA SINGOLA	SIDOTI COSTRUZIONI S.R.L.		NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	SIGEO S.R.L.		NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	SOCIETA COOPERATIVA EUROMEGA COSTRUZIONI		esclusa in gara
IMPRESA SINGOLA	SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.R.L.		27,2216
ATI	SPALLINA LUCIO SRL (Capogruppo)- SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. S.N.C. (Mandante)		26,9953
IMPRESA SINGOLA	SUPREMA APPALTI S.R.L.		27,2827
IMPRESA SINGOLA	TECNOAPPALTI S.R.L.		27,1934
ATI	TECNODRILL DI POLI GIUSEPPE (Capofruppo)-SIBILIO GEOM. RAFFAELE (Mandante)		NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	TORSTEN COSTRUZIONI S.R.L.		27,1188
CONSORZIO	TPL CONSORZIO STABILE S.R.L.		NO OFFERTA
ATI	TRALICE COSTRUZIONI SRL (Capogruppo) - GEO PLANTS SRL (Mandante) - PULLARA CALOGERO (Mandante)		NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	TREVI S.P.A.		NO OFFERTA
IMPRESA SINGOLA	TRIGEO S.R.L.	esclusa in prequalifica	
ATI	TRIVELLISICILIA DI CASTELLI DOMENICO S.R.L.(Capogruppo) - D' GIORGI S.R.L. (Mandante)		esclusa in gara
IMPRESA SINGOLA	UNICOS S.R.L.		27,2168
IMPRESA SINGOLA	UNIROCK S.R.L.		26,9735
IMPRESA SINGOLA	URANIA COSTRUZIONI S.R.L.		27,1369
CONSORZIO	VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE	esclusa in prequalifica	
IMPRESA SINGOLA	VIPP LAVORI S.P.A.		26,647
		SOGLIA DI ANOMALIA	27,361

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

TP168	Lavori di consolidamento del costone roccioso zona Crocifissello nel Comune di Erice		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 331 del 10 luglio 2012	Data Lettera Invito	11/07/2012	CUP	J85D12000550001
					Data scadenza Gara	ore 12:00 del 23 luglio 2012	CIG	4426999B22
ERICE	Resp. Proced.	Ing. Giovanni Indelicato	Diret. dei Lavori	Ing. Vincenzo Corla nota DRPC TP prot. N. 56813 del 24/08/2012 acquisita al prot 3219 del 24/08/2012	Collaudatore Statico		Coordinatore della Sicurezza	
	Importo	€ 368.324,52	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 354.648,64 € 13.675,88	Decreto Commissione Verbale	6 del 24 luglio 2012 0 del 24 luglio 2012	Aggiudicataria	TECNO COSTRUZIONI Srl
	Ribasso IMPORTO AGGIUDICATO	29,03% € 251.682,79	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 265.358,67	Aggiud.Provvisoria Aggiud. Definitiva	PROT. 166 Del. 30 LUGLIO 2012 prot. n. 3190 del 23 agosto 2012		
	Decreto aggiud Def	Decreto n. 428 del 23 agosto 2012	Verbale 106, comma 3	10-set-12	Contratto	09-ott-12	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Agenzia Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio al n. 21882, in data 19 ottobre 2012

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	PROVINCIA	recapiti	MAIL	PEC	Ribasso
		ADRIAMBIENTE Srl	Recchioni Roberto	Via Fazioli 10 60123 Ancona	Ancona	773474473 fax: +39077	info@adriambiente.it	mbiente@pec.adriambier	26,7841
		ARIS Srl	PARISI STEFANO	viale aldo moro 250 92026 Favara	Agrigento	922/419099 fax: 0922/4	impresaaris@libero.it		
		CONSOLIDAMENTI SPECIALI Srl	D'Agata Marcello	via Anzalone 12 95024 Acireale	Catania	95/877738 fax: 095/76	are@consolidamentispeciali.i	nsolidamentispeciali@pec	26,5656
		CONSORES Srl	Scarbaci Salvatore	Via val di Mazara 52 90144 Palermo	Palermo	091513918 fax: 091518	consores@tin.it	CONSORES@GIGAPEC.IT	26,4926
		CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE Sca	russo mariaelisa	VIALE SHAKESPEARE 57 00144 Roma	Roma	662288632 fax: 062332	c.gop@email.it	c.gop@legal.email.it	26,7551
		EDIL COSTRUZIONI SICILIANA Srl	MICCICHE' ROSARIA	ALENTINO MAZZOLA S.N.C. 92026 F	Agrigento	922415027 fax: 092241	edil_s@libero.it	costruzionisicilianasrl@pec.it	
		ENGECO Srl	Marco Mauri	via Medici 6 20123 Milano	Milano	313355523 fax: 031649	gare@engeco.it	engeco@pec.engeco.it	26,1731
		GHELLER Srl	gheller davide	VIA MONTEGRAPPA 7 36020 Solagna	Vicenza	424558330 fax: 042481	info@gheller.it	gheller@pec.keyworld.it	
		MARTURANA COSTRUZIONI Srl	MARTURANA STEFANO	via Agrigento 41 92026 Favara	Agrigento	092235700 fax: 092252	marturanacostruzioni@pec.it	arturanacostruzioni@pec.it	
	aggiudicataria	RENZO COSTRUZIONI S.R.L.	BOLZON RENZO GIOVANN	Via Trieste 50 98066 Patti	Messina	424558332 fax: 042455	info@renzocostruzioni.it	struzionisrl@pec.key	29,0332
		SCA.CE.BIT. S.r.l.	DI MARCO GIUSEPPE	Provinciale 190 95017 Piedimonte	Catania	095644345 fax: 095644	scacebit@mail.gte.it	scacebit@pec.it	
		SICULA COSTRUZIONI SOC. COOP	FERLITO SALVATORE	PROVINCIALE 45 95010 Santa Vene	Catania	095954413 fax: 095954	costruzioni@pec.confindustr	ostruzioni@pec.confindustriact.it	
		SIDOTI COSTRUZIONI S.R.L.	SIDOTI ANTONINO	TRADA LENZI SNC 98060 Montagna	Messina	941/315219 fax: 0941/3	sidoticostruzioni@tiscali.it	idoticostruzionisrl@pec.i	26,5371
		TECNOTRAFF Srl	BONACCORSO ANGELO	via borzi 8 95121 Catania	Catania	095476719 fax: 095476	angels970@hotmail.com	tecnotraffsrl@pec.it	
		TORSTEN COSTRUZIONI Srl	CAPIZZI GIANLUCA	CORSO UMBERTO 226 95034 Bronte	Catania	957720261 fax: 095772	torstencostruzioni@libero.it	ostruzioni@pec.impresec	28,2882
								Soglia di anomalia	28,6607

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

MC053	Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello" ME-053 A - Brolo (ME).	Decreto Accordo Bonario	Decreto n. 261 del 7 giugno 2012	pubblicazione Bando	sito ucomidrogeo: 7 giugno 2012 GUCE S 110 del	Data scadenza Prequalifica	26/06/2012	
BROLO	CUP J82J12000150001	CIG	4282898738	Resp. Proced.	Ing. Giuseppe La Placa	Dirett. dei Lavori	Ing. Basilio Ridolfo DA CONFERMARE CON ATTO COMMISSARIO	
	Decreto ufficio G. tecnico	Decreto n. 330 del 10 luglio 2012	Verbale di visita	10/07/2012	Scadenza presentazione offerte(ore)	22/09/2011	Giorno di presentazione offerte	20/07/2012 ore 12:00
	Importo	€ 2.547.718,00	Importo soggetto a ribasso / oneri sicurezza	€ 2.478.942,72 / € 68.775,28	Ribasso	26,90%	Importo aggiudicato	€ 1.812.164,14 / € 68.775,28 / € 1.880.939,42
	Decreto Commissario / Verbale	Decreto n. 377 del 20 luglio 2012 / 20/07/2012 ore 14:30	Aggiudicataria	GEO PERFORAZIONI S.R.L	Aggiud. Provvisoria / Aggiud. Definitiva	prot. 167 del 30 luglio 2012 / prot. 175 del 29 agosto 2012		
	Decreto approvaz.	Decreto 431 del 29 agosto 2012	verbale 106	04-nov-11	Contratto	26-set-12	Data effettivo consegna Lav.	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffic Roma 2 Aurelio n. 23496 del 25 novembre 2011

	A. progettazione esecuzione (ATI)	Denominazione Impresa	verbale di prequalifica	ora	richiesta di invito	invito	offerta	data offerta	Ribasso
		AEMME S.r.l.							26,9212
		AMATA COSTRUZIONI S.r.l.							26,7217
		AN.CA.MA S.r.l.							26,5777
		APPALTITALIA S.r.l.							26,9618
		ARCOBALENO 3000 S.r.l.							ESCLUSA IN GARA
		ARES S.r.l.							26,8368
	ATI	AVENI S.r.l. (Capogruppo); GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI S.r.l. (Mandante); D'ALBERTI GIUSEPPE (Mandante)							26,9154
		C. & P. S.r.l.							26,9154
		C.A.E.C. Soc.Coop.							26,8321
		C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI) Soc. Coop.							26,7578
		C.G. COSTRUZIONE S.r.l.							NO OFFERTA
		CA.TI.FRA. S.r.l.							26,7974
	ATI	CALABRO INERTI S.r.l. (Capogruppo); DELTA S.r.l. (Mandante); BAFFA COSMO (Mandante)						esclusa in prequalifica	
		CANTIERI EDILI S.r.l.							26,5957
		CHIOFALO GROUP S.r.l.							27,0861
	ATI	CIESSECI S.r.l. (Capogruppo); ALAK S.r.l. (Mandante)							26,7269
		CIVIESSE S.r.l.							26,4955
		CO.ANT S.r.l. "Soc. Unipersonale"							26,9937
	ATI	CO.E.PE.S.r.l. (Capogruppo); CAMEDIL COSTRUZIONI S.r.l. (Mandante); ELIMAR S.r.l. (Mandante)							26,3973
	ATI	CO.E.S.I. S.r.l. (Capogruppo); FRANCO SANTO (Mandante); PASSARELLO GIUSEPPE (Mandante)							26,8166
		CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - S.r.l.							26,6743
		CO.GE.MAR. S.r.l.							26,7099
		CO.GE.TA. S.r.l.							26,9113
		CO.GER. S.r.l.							26,7859
		CO.MIN. S.r.l.							26,9512
		COLNISA COSTRUZIONI S.r.l.							27,0444
		COMEL S.r.l.							27,4664
		COMER COSTRUZIONI MERIDIONALI S.p.A.							26,7971
		CONSCOOP							36,1713
		CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.r.l.							26,6957
		CONSORES S.r.l.							26,9748
		CONSORZIO ARTEK							NO OFFERTA
		CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C. p A.							27,0069
		CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC Società Cooperativa							26,9133
		CONSORZIO STABILE AEDARS S.c a r.l.							26,4971
		CONSORZIO STABILE DINAMICO							26,8888
		CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.c.a.r.l.							26,7001
		CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI							ESCLUSA IN GARA
		CONSORZIO STABILE NOVUS S.r.l.							26,9669
		CONSORZIO STABILE TEKTON Soc. Cons. a r.l.							26,8935
		CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.c.ar.l.							26,8744
		CONSORZIO VENETO COOPERATIVO Soc. Coop. p a. in breve COVECO COOP. S.p.A.							25,7748
		COSEDIL S.p.A.							26,4525
		COSPIN S.r.l.							26,8617
	ATI	Costituenda ATI GREST APPALTI S.r.l. (Capogruppo); BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.a.s. di Bongiovanni Calogero (Mandante); SINISGALLI S.r.l. (Mandante)							NO OFFERTA
		COSTRUZIONI CICUTTIN S.r.l.							27,8489
		CRUSCHINA COSTRUZIONI S.r.l.							26,9531
		D.L.M. COSTRUZIONI S.r.l.							NO OFFERTA
		DAPAM S.r.l.							NO OFFERTA
	ATI	DB COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo); C.T.F. S.r.l. (Mandante)							26,7479
	ATI	DEMETRA LAVORI S.r.l. (Capogruppo); I.CO.LI. di LI DESTRI E C. S.a.s. (Mandante); GRANATELLA di COCO ROSOLINO & C. S.a.s. (Mandante)							26,9512
		DI GIOVANNA S.r.l.							26,8855
	ATI	Costituenda ATI DI MARIA COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo); PORTO COSTRUZIONI S.r.l. (Mandante); CO.I.V. di Rachieli Salvatore (Mandante)							26,8167
	ATI	DI MAULO COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo); SEICON S.r.l. (Mandante Cooptata)							ESCLUSA IN GARA
		DI NICA COSTRUZIONI S.r.l.							26,9013
		DICEARCO COSTRUZIONI S.r.l.							26,7845
	ATI	DIVA S.r.l. (Capogruppo); TECNO EDIL DESIGN S.r.l. (Mandante); GRUPPO VENERE S.r.l. (Mandante)							26,9489
		DUE ESSE GROUP S.R.L. (EX HERMES COSTRUZIONI S.r.l.)							26,6956
		EDIL VINCENT S.r.l.							NO OFFERTA
		EDILMESAM S.r.l.							26,6019
		EDILTECNICA COSTRUZIONI S.r.l.							26,9787
		EL.DA. COSTRUZIONI S.r.l.							26,6231
	ATI	EMMA LAVORI COOP. Soc. Coop. a r.l. (Capogruppo); MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. (Mandante)							26,909

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ME053	Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Iannello" ME-053 A – Brolo (ME).		Decreto Assess.Reg.le	Decreto n. 261 del 7 giugno 2012	pubblicazione Bando	sito ucomidrogeo: 7 giugno 2012 GUCE S 110 del	Data scadenza Prequalifica	26/06/2012
BROLO	CUP	J82J12000150001	CIG	4282898738	Resp. Proced.	Ing. Giuseppe La Placa	Dirett. dei Lavori	Ing. Basilio Ridolfo DA CONFERMARE CON ATTO COMMISSARIO
	Decreto ultimo di lettera	Decreto n. 330 del 10 luglio 2012	lettera di invito	10/07/2012	autorizz.preventiva cons.direttorio	21/09/2011	sistema presentazione Offerte	20/07/2012 ore 12:00
	importo	€ 2.547.718,00	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 2.478.942,72 € 68.775,28	Ribasso	26,90%	importo aggiudicato	€ 1.812.164,14 € 68.775,28 € 1.880.939,42
	Decreto Commissario Verbale	Decreto n. 377 del 20 luglio 2012 20/07/2012 ore 14:30	Aggiudicataria	GEO PERFORAZIONI S.R.L.	Aggiud.mesursaria Aggiud. Definitiva	prot. 167 del 30 luglio 2012 prot. 175 del 29 agosto 2012		
	Decreto aggiudic.	Decreto 431 del 29 agosto 2012	verbale 106	04-nov-11	Contratto	26-set-12	Data effettiva consegna Lav.	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 21496 del 25 novembre 2011

	n. progressivo ricezione invito	Denominazione impresa	verbale di prequalifica	ex31	richiesta di invito	inviti	offerta	data offerta	Ribasso
		EREDI GERACI SALVATORE S.r.l.							NO OFFERTA
	ATI	EVER GREEN S.r.l. (Capogruppo); ITAL PROGET S.r.l. (Mandante); SOCIETA' COOPERATIVA EDIL SICULA (Mandante)							NO OFFERTA
		F.LLI DESTRO S.r.l.							26,7767
	ATI	FARINELLA INFRASTRUTTURE S.r.l. (Capogruppo); LIBRIZZI COSTRUZIONI S.r.l. (Mandante Cooptata)							26,8235
		FAVELLATO CLAUDIO S.p.A.							ESCLUSA IN GARA
		FERRETTI INTERNATIONAL S.r.l.							26,28
		FIORELLO FIORETTI							NO OFFERTA
		FONDAZIONI SPECIALI S.p.A.							26,7018
		FRESTA ROSARIO ANTONIO							26,8594
		FUNARO COSTRUZIONI S.r.l.							27,1647
		G.E.V. NEW EVOLUTION S.r.l.							ESCLUSA IN GARA
		GALASSO COSTRUZIONI S.p.A.							NO OFFERTA
		GANGEMI CARMELO							26,8137
		GEO DRILLING S.r.l.							27,0235
	ATI	GEO GAV s.r.l. (Capogruppo); S.M. S.r.l. (Mandante); ZACCARIA S.r.l. (Mandante)							26,5288
		GEO PERFORAZIONI S.r.l.							26,8977
		GEO-AMBIENTE S.r.l.							26,9305
		GEOBRUGG ITALIA S.r.l.							NO OFFERTA
		GEOTEK ITALIA S.r.l.							26,5383
	ATI	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo); DI PIAZZA S.r.l. (Mandante); ALFANO S.r.l. (Mandante)							26,8586
		GUGGINO COSTRUZIONI S.a.s. di Guggino Remo Domenico e soci							26,681
		HYDROGEO S.r.l.							26,6666
	ATI	I.C.O.M.E.T.T. S.R.L. (Capogruppo); MESSINA NOLEGGI S.r.l. (Mandante); COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA S.r.l. (Mandante)							ESCLUSA IN GARA
		IDROGEO S.r.l.							26,3796
		IMPREFER S.r.l.							26,7773
	ATI	IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MANOTTA SALVATORE DI MANOTTA CALOGERO GIOSUE' & C. S.a.s. (Capogruppo); PROGECO Soc. Coop. (Mandante); GENCO GIUSEPPE (Mandante Cooptata)							27,2317
		IMPRESA COSTRUZIONI MODERNE I.C.M. S.r.l.							27,1017
		IMPRESA DI CESARE GINO S.r.l.							NO OFFERTA
		IMPRESA FERRO BETON S.a.s. DI SIMONE ANNA MARIA							26,2173
		IMPRESA LUIGI NOTARI S.p.A.							26,7326
		IMPRESA PREVEDELLO ISIDORO S.r.l.							26,6937
		INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.r.l.							26,3262
		INJECTOSOND ITALIA S.r.l.							26,0152
		IRIDE S.r.l.							26,4427
	ATI	ITALCOSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo); ANGELO RUSSELLO S.p.A. (Mandante)							26,7582
		ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA S.r.l.							26,6973
		ITALRECUPERI S.r.l.							NO OFFERTA
		L. & C. LAVORI E COSTRUZIONI S.r.l.							26,5417
		LA FERRERA GIUSEPPE							26,7773
		LA GARDENIA COSTRUZIONI Soc. Coop.							ESCLUSA IN GARA
		MALFITANO S.r.l.							26,8494
		MAMMANA MICHELANGELO							26,7556
		MARINI ERMENEGILDO S.p.A.							13,4883
	ATI	MAZZEO S.r.l. (Capogruppo); IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI PITASI S.r.l. (Mandante); SA.MO.TER. S.r.l. (Mandante)							26,8956
		ME.GI.N. COSTRUZIONI S.r.l.							26,5563
		MESSINA COSTRUZIONI S.r.l.							26,8882
		MI.CO. S.r.l.							26,7535
		MONDELLO S.p.A.							26,672
	ATI	NA.SA. COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo); LEENKER S.r.l. (Mandante); NASELLO GIUSEPPE (Mandante)							26,8558
		NUOVA COSTRUZIONE SICILIANA Coop. a r.l.							26,9137
	ATI	OFFICINE SAN GIORGIO S.r.l. (Capogruppo); GIGA PROJECT S.r.l. (Mandante);PARRELLA PELLEGRINO S.r.l. (Mandante)							26,8713
		PELORITANA APPALTI S.r.l.							26,495
	ATI	PETTINATO COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo); CEIT di GIUSEPPE MAMMOLITI (Mandante)							ESCLUSA IN GARA
	ATI	PIANO STRADA S.r.l. (Capogruppo); VIASTRADA S.a.s. di CAROLLO TINDARO & C.(Mandante); ARCURI FRANCESCO (Mandante)							26,7956
		PIETRO DURANTE S.r.l.							NO OFFERTA
		PISCIOTTA COSTRUZIONI S.r.l.							26,9192
		PRESAL COSTRUZIONI S.r.l.							26,7687
	ATI	PRESTI S.r.l. (Capogruppo); ARCHAS S.r.l. (Mandante); MEDI APPALTI s.r.l. (Mandante)							26,7482
	ATI	RENZO COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo); GHELLER S.r.l. (Mandante); ARCAN COSTRUZIONI S.r.l. (Mandante)							ESCLUSA IN GARA
		RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.r.l.							26,6666
	ATI	ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo); COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.p.A. (Mandante)							26,7474
		S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.r.l.							26,8523
		SA.MA. S.r.l.							26,7919

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ME053	Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello" ME-053 A – Brolo (ME).	Decreto Assess. Bando	Decreto n. 261 del 7 giugno 2012	pubblicazione Bando	sito ucomidrogeo: 7 giugno 2012 GUCE 5 110 del	Data scadenza Prequalifica	26/06/2012	
BROLO	CUP J82J12000150001	CIG	428289873B	Resp. Proced.	ing. Giuseppe La Placa	Dirett. dei Lavori	ing. Basilio Ridolfo DA CONFERMARE CON ATTO COMMISSARIO	
	Decreto ultima di fettera	Decreto n. 330 del 10 luglio 2012	lettere di invito	10/07/2012	scadenza presentazione chiarimenti	22/09/2011	scadenza presentazione Offerte	20/07/2012 ore 12:00
	Importo	€ 2.547.718,00	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 2.478.942,72 € 68.775,28	Ribasso	26,90%	Importo aggiudicato	€ 1.812.164,14 € 68.775,28 € 1.880.939,42
	Decreto Commissione Verbale	Decreto n. 377 del 20 luglio 2012 20/07/2012 ore 14:30	Aggiudicataria	GEO PERFORAZIONI S.R.L	Aggiud. Provvisoria Aggiud. Definitiva	prot. 167 del 30 luglio 2012 prot. 175 del 29 agosto 2012		
	Decreto aggiudic.	Decreto 431 del 29 agosto 2012	verbale 106	04-nov-11	Contratto	26-set-12	Data effettivo consegna Lav.	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 21496 del 25 novembre 2011

n. progressivo richiesta invito	Denominazione impresa	verbale d' prequalifica	cs21	richiesta di invito	Invito	offerta	data offerta	Ribasso
ATI	SARALEN S.p.A. (Capogruppo); BONINA S.r.l. (Mandante); PROJECT S.r.l. (Mandante); PROFAS COSTRUZIONI S.r.l. (Mandante Coopatata)							26,8949
	SCEP S.r.l.							25,8999
ATI	SCIBETTA COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo); PIAZZA COSTRUZIONI (Mandante); CALLARI COSTRUZIONI (Mandante)							26,8631
ATI	SEAF S.r.l. (Capogruppo); C.G. COSTRUZIONI S.r.l. (Mandante); EDILZETA S.r.l. (Mandante); IMPRESA EDILE E STRADALE RAVALLI GIOVANNI (Mandante)							26,8673
	SIDOTI COSTRUZIONI S.r.l.							26,7131
	SILGEO S.r.l.							26,8377
	SO.CO.GEN. S.p.A.							31,333
	SOCIETÀ COOPERATIVA EUROVEGA COSTRUZIONI							26,6478
	SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.r.l.							27,0414
	SUPREMA APPALTI S.r.l.							NO OFFERTA
	TECNOAPPALT S.r.l.							26,9388
ATI	TORSTEN COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo); OMNIA PROGETTI S.r.l. (Mandante); V.I.D.R. S.r.l. (Mandante)							26,8476
	TOSA APPALTI S.r.l.							33,1586
ATI	TRALICE COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo); GEO PLANTS S.r.l (Mandante); POLLARA CALOGERO (Mandante); CO.REA.L. Soc. Coop. (Mandante)							NO OFFERTA
ATI	TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.r.l. (Capogruppo); EDIL SAFF S.r.l. (Mandante; EDIL ROCK S.r.l. (Mandante)							26,7942
	TREVI S.p.A.							18,9889
	TRIGEO S.r.l.							ESCLUSA IN GARA
ATI	UNIROCK S.r.l. (Capogruppo); TROMBI COSTRUZIONI S.r.l. (Mandante Cooptata)							26,757
	URANIA COSTRUZIONI S.r.l.							26,9623
	V.I.C.T. S.r.l.						esclusa in prequalifica	
	VALORI S.c.a r.l. - CONSORZIO STABILE							26,8869

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

SR185	Consolidamento costone sottostante il Santuario		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 353 del 16 luglio 2012	Data Lettera Invito	17/07/2012	CUP	J85D12000550001
					Data scadenza Gara	30/07/2012	CIG	4426999B22
BUSCEMI	Resp. Proced.	Geom. Giuseppe Ferrante	Diret. dei Lavori	Ing. Giovanni Donetti Aldo Aprile coordinatore sicurezza: Decreto n. 535 del 15 ottobre 2012	Collaudatore Statico		Coordinatore della Sicurezza	
	Importo	€ 133.760,82	Importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 133.760,82 € 3.857,02	Decreto Commissione Verbale	0 del 30 luglio 2012 30/07/2012	Aggiudicataria	TECNO COSTRUZIONI Srl
	Ribasso IMPORTO AGGIUDICATO	26,91% € 94.948,12	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 98.805,14	Aggiud.Provvisoria Aggiud. Definitiva	PROT. 179 del 30 agosto 2012 prot. n. 184 del 7 settembre 2012		
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 449 del 7 settembre 2012	Verbale 106, comma 3	25-giu	Contratto	26-set-12	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Agenzia Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio al n. 21072 in data 11 ottobre 2012

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	TEL E FAX		P. IVA	OFFERTA	Ribasso
124	31	ARCHAS Srl	antonino terranova	via delle petunie, 1 CAP 95030 Mascalucia (Catania)	TEL: 095910496 FAX: 095910496	archas.nt@gmail.com	archas.srl@legalmail.it		
210	82	CEPI Srl	salvatore vullo	92026, 7 CAP 92026 Favara (Agrigento)	TEL: 0922437566 FAX: 0922437446	cepisrl@yahoo.it			
197	102	CO.GI.PA. Srl	MARIANO GINO	VIA SALADINO, 5 CAP 90043 Camporeale (Palermo)	TEL: 092437465 FAX: 092437465	cogipasrl@alice.it	cogipasrl@pec.it	Cauzione provvisoria non autenticata	
233	226	G.F.COSTRUZIONI Srl	rosario fresta	VIA TRAV.PIAZZA MARCONI, 9 CAP 95010 Santa Venerina (Catania)	TEL: 095958745 FAX: 095958745	rosariofresta@frestacos	g.f.costruzionisr@pec.it	26,7038	
457	298	INTEA Srl	Antonio Cinquemani	via Petrarca, 23 CAP 92100 Favara (Agrigento)	TEL: 0922438536 FAX: 0922437964	info@inteambiente.con	inteambiente@pec.it	26,8853	
103	322	LAVORI Srl 3	salvatore sardo	Via P. Togliatti, 18 CAP 93100 Caltanissetta (Caltanissetta)	TEL: 3295427720 FAX: 0934569328	info@lavorisrl.it	lavorisrl@pec.it	26,6802	
278	326	LIBRIZZI COSTRUZIONI Srl	Calogero Librizzi	CONTRADA MULINI , S.N. CAP 90027 Petralia Sottana (Palermo)	TEL: 0921641953 FAX: 0921641953	librizzicostruzioni@tisca			
85	341	MASTIN Srl	massimo spanò	vis andrea doria, 8 CAP 98066 Patti (Messina)	TEL: 094121820 FAX: 0941352076	mastin2000@virgilio.it	mastinsrl@pec.it		
26	350	MGF APPALTI Srl	GAETANO FICHERA	VIA ROCCA D'API, 42 CAP 95019 Zafferana Etnea (Catania)	TEL: 095 - 7084782 FAX: 095 - 7084782	posta@mgfappalti.it	04349120875.catania@pec.a	26,6789	
454	394	REDIAL Srl	antonio airo farulla	via valentino mazzola , 4 CAP 92026 Favara (Agrigento)	TEL: 0922/438227 FAX: 0922/438227	filippolipari@tin.it	redialsrl@pec.it		
359	436	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	SALVATORE MARRONE	VIA ITALIA, N. 18 CAP 92026 Favara (Agrigento)	TEL: 0922438207 FAX: 0922438207	sogemarsrl@alice.it	sogemarsrl@pec.it		
49	444	SOSEDIL S.p.A.	Giuseppe Causarano	Viale dei Platani, 34/B CAP 97100 Ragusa (Ragusa)	TEL: 0932-252955 FAX: 0932-252955	sosedilspa@virgilio.it			
62	452	TECNO COSTRUZIONI Srl	Carmelo Nasello	Via Liguria, 9 CAP 90024 Gangi (Palermo)	TEL: 0921.501627 FAX: 0921.501408	tecnocostru@liberc	tecnocostruzionisrl@gig	26,9089	
342	465	TROVATO MARTINO SANTO	martino santo trovato	VIALE EUROPA , 209 CAP 98040 Torregrotta (Messina)	TEL: 0909981458 FAX: 0909981458	trovatocostruzioni@vir	martinosanto.trovato@cgn.legalmail.it		
257	474	VIOLA Srl	francesco de francisci	VIA FARAG , N.67 CAP 92100 Agrigento (Agrigento)	TEL: 0922/604178 FAX: 0922/604178	defranciscifrancesc@lib			
102	481	ZEDIL Srl 3	VINCENZO ZAFFUTO	VIALE DELLA VITTORIA, 111 CAP 92020 Grotte (Agrigento)	TEL: 0922-944774 FAX: 0922-943697	zedil@email.it	zedil@pec.it		

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME059	Opere di consolidamento centro urbano	Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 397 del 1 agosto 2012	Data Lettera Invito	Prot. 173 del 01/08/2012	CUP	J49H12000450001
CASALVECCHIO SICULO				Data scadenza Gara	ORE 12:00 DEL 29 AGOSTO 2012	CIG	4475225080
	Resp. Proced. ING. DOMENICO IMBROGLIA	Diret. dei Lavori	ing. Carmelo Trimarchi Decreto n. 550 del 23 ottobre 2012	Collaudatore Statico		Coordinatore della Sicurezza	
	Importo € 838.051,94	Importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 799.080,61 € 38.971,33	Decreto Commissione Verbale	del 29 agosto 2012 30/08/2012	Aggiudicataria	ITINERA Srl 3
	Ribasso 28,29% IMPORTO AGGIUDICATO € 572.991,14	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 611.962,47	Aggiud.Provvisoria Aggiud. Definitiva	prot. 185 del 7 settembre 2012 prot. n. 190 del 13 settembre 2012		
	Decreto aggiud Def. Decreto n. 464 del 13 settembre 2012	Verbale 106, comma 3	26-set	Contratto	27-set-12	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Agenzia Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio al n. 20672 in data 08 ottobre 2012

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	TEL E FAX		P. IVA	OFFERTA	Ribasso
78	3	3B Srl	GENNARO BRUCCOLERI	VIA G. GUARINO N. 12 CAP: 92026 Favara Agrigento	TEL: 092231690 - FAX: 092231690	impresa3b@gmail.com	3bsrl@pec.it	IT01968840841	27,1117
383	19	ALONGI Srl	salvatore alongi	via palestrina N. 44 CAP: 92021 Aragona Agrigento	TEL: 092236172 - FAX: 092236172	alongisrl@libero.it	alongisrl@pec.it	02404080844	24,7725
164	28	APPALTITALIA Srl	pierpaolo patti	via tommaso fazello N. 9 CAP: 96017 Noto Siracusa	TEL: 0931573043 - FAX: 0931573681	info@appaltitalia.net	appaltitalia@leggiitaliane.it	IT01014210890	
152	56	C.A.E.C. Soc Coop	Biagio Fortunato	VIA NUNZIO DIGIACOMO N. 36 CAP: 97013 Comiso Ragusa	TEL: 0932/722777 - FAX: 0932/722772	caec.caec@tin.it	coopcaec@legalmail.it	IT00573670882	26,7863
259	107	CO.MIN. Srl	Claudio Mingoia	Viale Europa N. 6 CAP: 93014 Mussomeli Caltanissetta	TEL: 0934993918 - FAX: 0934993918	impresa.comin@libero.i	impresa.comin@legalmail.it	IT01307850857	
424	163	DI MARIA COSTRUZIONI Srl	orazio di maria	SANTA VENERINA CT PIAZZA G. LUPIS N. N. 9 CAP: 95010 Santa	TEL: 095958753 - FAX: 0957611505	dimariaorazio@inte	dimariacostruzionisrl@per.bu	04488920879	27,8229
139	180	EDIL ROCK Srl	Salvatore Giovanni Rapisa	VIA PRIMA RETTA LEVANTE N. 182 CAP: 95032 Belpasso Catania	TEL: 0957912434 - FAX: 0957912434	edilrock@edilrock.com	edilrocksrl@legalmail.it	IT04700750872	cauzione
374	190	EMMECCI Srl	santo lipira	via antonio jerone N. 25 CAP: 90024 Gangi Palermo	TEL: 0921644065 - FAX: 0921644065	emmecci.srl@alice.it	emmecci.srl@legalmail.it	IT05648090826	
437	212	FERRETTI INTERNATIONAL Srl	Alberto Ferretti	Viale Marconi N. 20 CAP: 24044 Dalmine Bergamo	TEL: 035 566610 - FAX: 035 566611	alberto.ferretti@ferrett	ferretti.international@legalm	IT02247210160	
307	260	GRILLO INFRASTRUTTURE Srl	SEBASTIANO GRILLO	via M. GANDHI N. 39 CAP: 98043 Rometta Messina	TEL: 090/9961352 - FAX: 090/9961352	grilloinfrastrutture@tisc		IT02994060834	
2	274	IMPREFER S.R.L.	antonino ferraro	VIA NAZIONALE S.S.120 C.DA CERRO N. s.n.c. CAP: 95015	TEL: 0957774118 - FAX: 0957774118	imprefer@pec.it	imprefer@pec.it	03816120871	26,8017
137	307	ITALCOSTRUZIONI Srl	Emilio Incarbone	VIA E. MORSELLI N. 38 CAP: 93012 Gela Caltanissetta	TEL: 0933934284 - FAX: 0933934284	incarbone.emilio@tisca	amministrazione@pec.italcos	01640260855	27,0175
104	312	ITINERA Srl 3	Francesco Vaccarello	VIA XXVIII OTTOBRE N. 19 CAP: 92021 Aragona Agrigento	TEL: 092234648 - FAX: 092234648	francescovaccarello	itinerasrl.ag@libero.it itinerasrl.ag@pec.it	IT02503140846	28,2937
266	333	MA.GI. Srl	Francesco Brunetto	Via Pier della Francesca N. S.N. CAP: 95039 Trecastagni Catania	TEL: 095395617 - FAX: 0957808395	ufficiogare.magi@virgili	magisrl@open.legalmail.it	IT03265150874	cauzione
357	334	MAIORANA COSTRUZIONI Srl	MAURIZIO MAIORANA	VIA MAIO MARIANO N. 25 CAP: 98057 Milazzo Messina	TEL: 090/9282031 - FAX: 090/9222769	info@maioranacostruzi		01931060832	
283	354	MONDELLO COSTRUZIONI Srl	FRANCESCO MONDELLO	VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA N. 3 CAP: 98060 Sant'Angelo di Brolo	TEL: 0941533293 - FAX: 0941054224	mondellosrl@libero.it	mondellosrl@legalmail.it	02761240833	
464	386	PROGETTO CONTRACT SPA	DOMENICO DE SIMONE	VIA GALILEO GALILEI N. 18/20 CAP: 90044 Carini Palermo	TEL: 091-8680390 - FAX: 091-8815637	info@progettocontract.		IT04368740827	
184	466	UNICOS Srl	Francesca Pulvirenti	Via Mollica N. 4/a CAP: 95021 Aci Castello Catania	TEL: 095/958127 - FAX: 095/958127	unicos.srl@tiscali.it		04486110879	
258	468	URANIA Srl	alfredo cangemi	viale Giovanni XXIII N. 2F CAP: 50033 Firenzuola Firenze	TEL: 0917725984 - FAX: 0916687212	uraniasrl@gmail.com	uraniasrl1@legalmail.it	IT02280690484	
267	480	ZACCARIA Srl	domenico zaccaria	Via Martiri della Libertà N. 52 CAP: 92021 Aragona Agrigento	0922/38766 - FAX: 0922/3	zaccariatrivellazioni@vi	zaccariasrlaragona@mypec.e	IT02355390846	27,3785

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME073	Consolidamento e messa in sicurezza versante - Località Pilieri	Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 448 del 6 settembre 2012	Data Lettera Invito	prot. 183 del 6 settembre 2012	CUP	J49h12000480001
GALATI MAMERTINO 73				Data scadenza Gara	scadenza ora 9:30 del 18 settembre GARA ore 12:00 del 18	CIG	4528988F1D
Resp. Proced.	Arch. Giuseppa Cavolo	Diret. dei Lavori	0	Collaudatore Statico		Coordinatore della Sicurezza	
importo	€ 646.701,87	Importo soggetto a ribasso	€ 629.085,71	Decreto Commissione Verbale	476 del 18 settembre 2012 18/09/2012	Aggiudicataria	ARCOBALENO 3000 SRL
		oneri sicurezza	€ 17.616,16				
Ribasso	27,70%	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 472.453,94	Aggiud.Provvisoria	prot. 195 del 19 settembre 2012		
IMPORTO	€ 454.837,78			Aggiud. Definitiva	prot. 209 del 4 ottobre 2012		
Decreto aggiud.Def	decreto n. 514 del 4 ottobre 2012	Verbale 106, comma 3	09-ott	Contratto	10-ott-12	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 21965 serie 3 del 22 ottobre 2012

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	TEL E FAX			P. IVA	Ribasso
	24	AN.CA.MA Srl	paterniti matteo natale	VIA TRAZZERA MARINA n. 635 BIS Cap: 98071 Capo d'Orlando (Messina)	tel: 0941/913155 fax: 0941/913155	paterniti.r@libero.it	ancamasrl@pec.it	IT02961160831	27,2277
	32	ARCOBALENO 3000 Srl	SOTTILE SALVATORE	VIA II° STRETTO MACEO n. S.N. Cap: 98050 Terme Vigliatore (Messina)	tel: 090/9782235 fax: 090/9783156	info@arcobaleno3000.it	arcobaleno3000@pec.it	2546370830	27,6986
	38	ASG COSTRUZIONI Srl	RUSSOTTO GIUSEPPE	VIA BERSAGLIERE URSO n. 18 Cap: 92026 Favara (Agrigento)	tel: 0922/421121 fax: 0922/421121	asgimpresaedile2011@libero.it		IT02232250841	
	57	C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI)	BOLZONI ERMAN	VIA PANSA n. 55/I Cap: 42124 Reggio Emilia (Reggio Emilia)	tel: 0522/278082 fax: 0522/230167	commcfc@tin.it	C.F.C.CONSORZIO@LEGALMA	IT00447840356	28,1548
	65	CA.TI.FRA. Srl	Calabrese Tindaro	VIA STRETTO I BARTOLELLA n. 68/1 Cap: 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)	tel: 0909764186 fax: 0909764204	incatifra@tin.it	catifrasrl@cgn.legalmail.it	01825880832	27,58
	97	CO.GE.TA. Srl	SORTINO FERDINANDO	VIA DELL'OLMO n. 26 Cap: 91100 Trapani (Trapani)	tel: 0923548560 fax: 0923548560	cogetasrl@pec.it	cogetasrl@pec.it	IT01473330817	
	123	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIO	Valbonesi Vanni	Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 Cap: 40132 Bologna (Bologna)	tel: 0544/688211 fax: 0544/451618	gare@ccc-acam.it	argento@ccc-acam-certificata	IT00281620377	
	165	DI PIAZZA Srl	Di Piazza Salvatore	Via Padre Girolamo Caruso, n. 6/D Cap: 92022 Cammarata (Agrigento)	tel: 0922.905642 fax: 0922.902635	dipiazza.s@libero.it	dipiazzasrl@pec.it	02565950843	
	new	Edil Vincent srl	Capizzi Giuseppa	Via Pietro Nenni n. 14A Cap: 95035 Maletto (Catania)	tel: 095698836 fax: 0957720171	edilvincent@tiscali.it	edilvincent@pec.impresecata	04767380878	27,303
	183	EDILTECNICA COSTRUZIONI Srl	Ficarra Salvatore	VIA GABARA n. 11 Cap: 93017 San Cataldo (Caltanissetta)	tel: 0934589459 fax: 0934589459	ediltecnica.cl00@infopec.cassae	ediltecnica.cl00@infopec.cass	01438980854	27,2018
	189	EMMA LAVORI COOP. Soc Coop a Resp	DI VITA CARMEN RITA	PIAZZA DEGLI EROI n. 2 Cap: 93017 San Cataldo (Caltanissetta)	tel: 0934556168 fax: 0934594188	emmalavori@pec.it	emmalavori@pec.it	01581970850	27,1148
	195	EREDI GERACI SALVATORE Srl	geraci michelangelo	Via Aosta n. 5 Cap: 93014 Mussomeli (Caltanissetta)	tel: 0934951018 fax: 0934991660	eredi.geraci@iol.it	gianluca.geraci@geopec.it	01427670854	28,8888
	197	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI Srl	PARISI MARIA	VIA OLANDA n. 54/B Cap: 92026 Favara (Agrigento)	tel: 0922/33205 fax: 0922/33205	essequattrosrl@libero.it	essequattro.srl@pec.it	IT02325280846	30,044
	243	GEOTEK SRL	chianetta calogero	VIA LEONARDO SCIASCIA n. S.N.C. Cap: 92100 Agrigento (Agrigento)	tel: 0922/438088 fax: 0922/422414	geoteksrl.ag@virgilio.it	geoteksrl@pec.it	IT02106000843	
	250	GIAMBRONE FRANCESCO	GIAMBRONE FRANCESCO	VIA TORINO n. 21 Cap: 92022 Cammarata (Agrigento)	tel: 0922904145 fax: 0922904145	impresagiambrone@virgilio.it	impresagiambrone@ticertifica	00594000846	27,3085
	295	INGEGNERIA E COSTRUZIONI Srl	De Domenico Rosario	Via Tommaso Cannizzaro n. 209 Cap: 98122 Messina (Messina)	tel: 0906413176 fax: 0906011223	ingecostruzioni@alice.it	rosario.dedomenico@ingpec.i	IT01826430835	26,9162
	305	ISOR COSTRUZIONI Srl	caramazza maurizio	via roma n. 43 Cap: 92026 Favara (Agrigento)	tel: 0922/080034 fax: 0922/080034	isorcostruzioni@libero.it		02488860848	27,2847
	358	NA.SA. COSTRUZIONI Srl	NASELLO SANTO	C.DA PIANO SPEDALE n. SN Cap: 90024 Gangi (Palermo)	tel: 0921645950 fax: 0921501283	nasasrl@alice.it		04321830822	
	363	NOTARO MICHELE	NOTARO MICHELE	VIA DROSI LOC. RUSSOMANNO n. 2/4 Cap: 88060 Satriano (Catanzaro)	tel: 096725704 fax: 096725444	notaro.michele@libero.it	notaro.michele@pec.it	01835910793	23,1985
	370	PACOS Srl	Palilla Calogero	Via Dante n. 148 Cap: 92028 Naro (Agrigento)	tel: 0922.951151 fax: 0922951151	pacos.srl@virgilio.it		02617190844	
	383	PRESTI S.R.L.	presti rosario	Via Salvatore Quasimodo n. 17 Cap: 98050 Terme Vigliatore (Messina)	tel: 0909781613 fax: 0909743418	prestisrl@virgilio.it	rosario.presti@postacertificat	02097900837	27,8668
							SOGLIA DI ANOMALIA		28,00802885

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

PA141	Consolidamento centro abitato		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 477 del 18 settembre 2102	Data Lettera Invito	prot. 194 del 18 settembre 2012	CUP	J15D12000480001
					Data scadenza Gara	ore 9:00 del 2 ottobre 2012 gara: ore 10:30 del 2 ottobre 2012	CIG	45520094A8
C A P A C I	Resp. Proced.	Arch. Giovan Battista Dragotta giovannidragotta@virgilio.it cell. 3296606756	Diret. dei Lavori	0	Collaudatore Statico		Coordinatore della Sicurezza	
	importo	€ 694.124,38	Importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 661.497,02 € 32.627,36	Decreto Commissione Verbale	Decreto n. 504 del 2 ottobre 2012 gara: ore 10:30 del 2 ottobre 2012	Aggiudicataria	ZACCARIA COSTRUZIONI Srl
	Ribasso IMPORTO AGGIUDICATO	29,36% € 467.256,36	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 499.883,72	Aggiud.Provvisoria Aggiud. Definitiva	prot 207 del 2 ottobre 2012 prot. 216 dell'8 ottobre 212		
	Decreto aggiud.Def	decreto n. 522 dell'8 ottobre 2012	Verbale 106, comma 3		Contratto	in attesa verbale 106, co3	REGISTRAZIONE CONTRATTO	in attesa verbale 106, co3

note	prot. ltanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	TEL E FAX			P. IVA	Ribasso
	9	ADRIAMBIENTE Srl	Roberto Recchioni	Via Fazioli, 10	CAP: 60123 Ancona (Ancona)	Tel: +390773474473 Fax: +390773414332	info@adriambiente.it	adriambiente@pec.adriam	31,1577
	34	ARIS Srl	STEFANO PARISI	viale aldo moro , 250	CAP: 92026 Favara (Agrigento)	Tel: 0922/419099 Fax: 0922/419099	impresaaris@libero.it		16,2114
	120	CONSOLIDAMENTI SPECIALI Srl	Marcello D'Agata	via Anzalone, 12	CAP: 95024 Acireale (Catania)	Tel: 095/877738 Fax: 095/7672135	gare@consolidamentispeciali.	consolidamentispeciali@p	30,6585
	122	CONSORZIO CIRO MENOTTI SCpA	erio zoli	VIA PIER TRAVERSARI, 63	CAP: 48121 Ravenna (Ravenna)	Tel: 0544/218138 Fax: 0544/33878	ccm@ciromenotti.it	ciromenotti@legalmail.it	29,8798
	125	CONSORZIO STABILE AEDARS Scarl	Alessandro Lambiase	VIA ALESSANDRIA, 112	CAP: 00198 Roma (Roma)	Tel: 0644252040 Fax: 0645439033	info@consorzioaedars.it	consorzioaedars@postece	27,9631
	128	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE Scarl	mariaelisa russo	VIALE SHAKESPEARE, 57	CAP: 00144 Roma (Roma)	Tel: 0662288632 Fax: 0623326826	c.gop@email.it	c.gop@legal.email.it	29,1717
	132	CONSORZIO STABILE VITRUVIO Scarl	paolo speziale	Località Licari, 37	CAP: 98063 Gioiosa Marea (Messina)	Tel: 0941302017 Fax: 0941303753	consorziovitruvio@gmail.com	vitruvioscarl@pec.it	27,4777
	156	DAPAM Srl	DARIO AMICI	VIA PONTE D'USCIO, 2/C	CAP: 25042 Borno (Brescia)	Tel: 0364529172 Fax: 0364527952	dapam@dapam.it	dapam@pec.dapam.it	27,6886
	191	ENGECO Srl	Mauri Marco	via Medici, 6	CAP: 20123 Milano (Milano)	Tel: 0313555523 Fax: 0316490680	gare@engeco.it	engeco@pec.engeco.it	29,317
	229	GANGEMI CARMELO	carmelo gangemi	TUSA VIA NAZIONALE , 18	CAP: 98079 Tusa (Messina)	Tel: 0921334471 Fax: 0921307142	carmelogangemi@tiscali.it		27,4901
	248	GHELLER Srl	davide gheller	VIA MONTEGRAPPA, 7	CAP: 36020 Solagna (Vicenza)	Tel: 0424558330 Fax: 0424817780	info@gheller.it	gheller@pec.keyworld.it	
	351	MI.CO. Srl	luigina lanzalaco	via leonardo da vinci, 57	CAP: 93014 Mussomeli (Caltanissetta)	Tel: 0934991083 Fax: 0934994408	mi.co.srl@virgilio.it	mi.co.srl@gigapec.it	27,6235
	395	RENZO COSTRUZIONI S.R.L.	RENZO GIOVANNI BOLZO	Via Trieste , 50	CAP: 98066 Patti (Messina)	Tel: 0424558332 Fax: 0424558700	info@renzocostruzioni.it	renzocostruzionisrl@pec.k	30,2311
	455	TECNOTRAFF Srl	ANGELO BONACCORSO	via borzì , 8	CAP: 95121 Catania (Catania)	Tel: 095476719 Fax: 095476719	angels970@hotmail.com	tecnotraffsrl@pec.it	
	470	VENTURA Spa	RAFFAELE VENTURA	VIA NAZIONALE C.DA RUSSO , 19	CAP: 98054 Furnari (Messina)	Tel: 0941802026 Fax: 0941802121	venturaspa@legalmail.it	venturaspa@legalmail.it	
	479	ZACCARIA COSTRUZIONI Srl	VALERIA PASSINI	VIA PONTICELLO, 154	CAP: 41055 Montese (Modena)	Tel: 059/970009 Fax: 059/981346	info@zaccariacostruzioni.it	zaccaria@pec.zaccariacost	29,3638
								SOGLIA DI ANOMALIA	29,59268

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

SR167	Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 482 del 20 settembre 2012	Data Lettera Invito	prot. 196 del 20 settembre2012	CUP	J25D12000350001
ROSOLINI					Data scadenza Gara	09,00 del giorno 04 ottobre 2012	CIG	4560432B87
	Resp. Proced.	Geom. Giuseppe Vindigni	Diret. dei Lavori	0	Collaudatore Statico		Coordinatore della Sicurezza	
	Importo	€ 852.583,74	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 828.901,22 € 23.682,52	Decreto Commissione Verbale	n. 512 del 4 ottobre 2012 ttobre 2012 alle ore 10,30	Aggiudicataria	UNIFICACOOP
	Ribasso IMPORTO	27,89% € 597.741,39	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 621.423,91	Aggiud.Provvisoria Aggiud. Definitiva	prot. n. 211 del 4 ottobre 2012 entro 7 giorni (11 ottobre 2012)		
	Decreto Aggiud.Def	decreto n. 534 del 15 ottobre 2012			Contratto	25-ott-12	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 23360 serie 3 del 7 novembre 2012

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	TELE FAX			P. IVA	Ribasso
	14	ALAK Srl	Pietro Laccoto	c.da lacco , 65 Cap: 98061 Brolo (Messina)	Tel: 0941/562998 Fax: 0941/470007	alakdepurazioni@tiscali.it	alaksrl@certificatasipaf.it	IT01603800838	27,3777
	26	ANGELO RUSSELLO Spa	Emanuele Caschetto	Via Ettore Romagnoli, 128 Cap: 93012 Gela (Caltanissetta)	Tel: 0933 834587 Fax: 0933 936756	ufficiogare@angelorussellospa.it	angelorussellospa@legalmail.it	01179080856	27,3023
	57	C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI)	ERMAN BOLZONI	VIA PANSA, 55/I Cap: 42124 Reggio Emilia (Reggio Emilia)	Tel: 0522/278082 Fax: 0522/230167	commcfc@tin.it	F.C.CONSORZIO@LEGALMAIL.	IT00447840356	documenti mancanti
	110	CODRA MEDITERRANEA Srl	Sergio Maria DE SIMONE	CONTRADA SCIFFRA, snc Cap: 85010 Pignola (Potenza)	Tel: 0971/486132 Fax: 0971/486160	info@codra.it	codra@pec.it	01098600768	
	117	COMETA Srl	Antonio Sgarito	via Ugo Foscolo -Favara, 142 Cap: 92026 Favara (Agrigento)	Tel: 0922/421142 Fax: 0922/421014	cometafavara@alice.it	cometafavara@pec.it	IT02536520840	
	119	CONSCOOP	mauro pasolini	VIA LUIGI GALVANI , N. 17/b Cap: 47122 Forli' (Forli-Cesena)	Tel: 0543/776211 Fax: 0543/721140	gare@conscoop.it	gare@pec.conscoop	00140990409	
	123	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIO	Vanni Valbonesi	Via Marco Emilio Lepido, 182/2 Cap: 40132 Bologna (Bologna)	Tel: 0544/688211 Fax: 0544/451618	gare@ccc-acam.it	rgento@ccc-acam-certificata.i	IT00281620377	
	150	CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERAL	Gennaro Cosentino	Via Pantusa, 32 Cap: 88900 Crotone (Crotone)	Tel: 096225190 Fax: 0962909504	info@crotonscavi.it	crotonscavi68@legalmail.it	00103240792	26,8854
	185	EFFE COSTRUZIONI Srl	santo rosario ferraro	VIA REGINA MARGHERITA 484/1° PIANO, 484/1° PIANO Cap: 98028 Santa Teresa di	Tel: 0942798320 Fax: 0942797450	info@effecostruzioni.it	effecostruzioni@pec.it	02825680834	27,3314
	189	EMMA LAVORI COOP. Soc Coop a Resp	CARMEN RITA DI VITA	PIAZZA DEGLI EROI , 2 Cap: 93017 San Cataldo (Caltanissetta)	Tel: 0934556168 Fax: 0934594188	emmalavori@pec.it	emmalavori@pec.it	01581970850	
	224	FUNARO COSTRUZIONI Srl	DOMENICO FUNARO	C.da Magazzinazzi, snc Cap: 91029 Santa Ninfa (Trapani)	Tel: 0923/21499 Fax: 0923/872404	pfunaro@libero.it	funarocostruzionisrl@pec.it	01506820818	28
	241	GEOSMAR Srl con unico socio	Filippo Steno	via Renato Lunelli, 32 Cap: 38121 Trento (Trento)	Tel: 0942/794019 Fax: 0942/795459	geosmar@libero.it	geosmar@pec.it	01864550221	
	263	HT COSTRUZIONI Srl	gabriele venusino	VIA LUIGI SPAGNA, 50 Cap: 96100 Siracusa (Siracusa)	Tel: 0931797311 Fax: 0931797338	licata@teamnetwork.it	HTCOSTRUZIONISRL@PEC.IT	01116600899	documenti mancanti
	267	I.CO.SER Srl	SANTO RESTIVO	VIA MURATA, 14 Cap: 90024 Gangi (Palermo)	Tel: 0921644502 Fax: 0921644502	ico.ser@legalmail.it	ico.ser@legalmail.it	IT05840560824	30,1111
	300	INTERCANTIERI VITTADELLO Spa	ANDREA VITTADELLO	VIA LUIGI PIEROBON, 46 Cap: 35010 Limena (Padova)	Tel: 0498657311 Fax: 049767984	info@intercantieri.com	intvit@legalmail.it	IT00222300287	
	311	ITER SOC. COOP.	MARIA FAROLFI	VIA PROVINCIALE COTIGNOLA, 17 Cap: 48022 Lugo (Ravenna)	Tel: 0545/38011 Fax: 0545/32725	iter@itercoop.com	iter@legalmail.it	IT00205320393	
	334	MAIORANA COSTRUZIONI Srl	MAURIZIO MAIORANA	VIA MAIO MARIANO , 25 Cap: 98057 Milazzo (Messina)	Tel: 090/9282031 Fax: 090/9222769	info@maioranacostruzioni.it		01931060832	
	335	MALFITANO Srl	ARMANDO LEMBO LUSCAI	VIA F.SCO CRISPI , 56 Cap: 98063 Gioiosa Marea (Messina)	Tel: 0941303016 Fax: 0941303762	malfitanosrl@libero.it	malfitanosrl@pec.it	00924651003	27,2317
	435	SILGEO S.r.l.	Filippo Infurna	VIA ANTARES, S/A Cap: 92100 Agrigento (Agrigento)	Tel: 0922/619345 Fax: 0922/520245	silgeosrl@libero.it		IT02452500842	27,5
aggiudicataria	89	UNIFICACOOP	MARIO GHERARDI	VIA DELLA COOPERAZIONE , 9 Cap: 40129 Bologna (Bologna)	Tel: 0514385414 Fax: 0514385418	ufficiogare@unifica.it	unifica@sirbopec.org	IT00591631205	27,8875
	469	VALORI Scarl CONSORZIO STABILE	Valentino Di Virgilio	via marianna dionigi, 43 Cap: 00193 Roma (Roma)	Tel: 06/3233608 Fax: 06/6878293	info@valoriscarl.it	valoriscarl@gigapec.it	08066951008	27,4078
								SOGLIA DI ANOMALIA	27,94375

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

MED63	Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato- Completamento		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 588 del 7 novembre 2012	Data Lettera Invito	prot. 228 del 7 novembre 2012	CUP	J85D12000780001
CASTROREALE					Data scadenza Gara	ore 9:30 del 19 novembre 2012	CIG	4678902014
	Resp. Proced.	Arch. Gaetano Buccheri 3334664786 tel 0909746087	Diret. dei Lavori	0	Collaudatore Statico		Coordinatore della Sicurezza	
	importo	€ 999.317,56	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 969.338,04 € 29.979,52	Decreto Commissione Verbale	decreto 625 del 19/11/2012 ore 11.00 del 17 novembre 2012	Aggiudicataria	C.N.T. SRL
	Ribasso IMPORTO AGGIUDICATO	28,1903% € 696.078,74	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 726.058,26	Aggiud.Provvisoria Aggiud. Definitiva	prot. n. 4804 del 21 novembre 2012 prot. 266 del 3 dicembre 2012		
	Decreto aggiud.Def	decreto n. 662 del 3 dicembre 2012						

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	cap e città			P. IVA	Ribasso
	I	Romeo Costruzioni srl	dario romeo	Via Umberto I, 63	CAP: 98027 Roccalumera	romeocostruzioni@teletu.it	romeocostruzioni@pec.it	TEL: 0942/790258 FAX: 0942/790258	28,5987
	381	GEO GAV Srl	Giuseppa Morrealese	Via dei Gelsomini, 1	CAP: 92026 Favara (Agrigento)	info@geogav.it	geogav@pec.it	TEL: 0922437359 FAX: 0922529533	28,2326
	I	C.N.T. S.R.L.	Tindaro Carmelo Calabrese	Via S. Andrea, 289	CAP: 98051 Barcellona Pozzo	edil.cntsrl@pec.it	edil.cntsrl@pec.it	TEL: 090 9797827 FAX: 090 9797827	28,1903
	116	GEO R.A.S. Srl	GIUSEPPE LA SPINA	Via Vittorio Emanuele Orlando, 168	CAP: 95127 Catania (Catania)	georas@inwind.it	georas@legalmail.it	TEL: 0935/75130 FAX: 0935/76388	27,8486
	I	ALKAZAN srl	Rosario Cannella	Via Albergheria, 175	CAP: 90134 Palermo (Palermo)	alkazansrl@virgilio.it	alkazansrl@pec.it	TEL: 0917732386 FAX: 0918726744	27,8169
	II	spallina lucio srl	lucio spallina	via militare, 8	CAP: 90024 Gangi (Palermo)	lucio.spallina@alice.it	spallinaluciosrl@pec.it	TEL: 0921644191 FAX: 0921644191	27,8014
	I	MONDELLO S.p.A.	Nunzio Adesini	VIA BORROMINI, 8	CAP: 93012 Gela (Caltanissetta)	c.bellanti@mondellospa.it	gareigcgela@pec.it	TEL: 0933901188 FAX: 0933922662	27,77
	348	ESSE I Srl	FILIPPO DONZUSO	VIA ARCHIMEDE, 2	CAP: 94017 Regalbuto (Enna)	consorzioimpresereg@tiscali.it	esseiregalbuto@pec.it	TEL: 093571362 FAX: 093572950	27,7281
	I	COGEMAT SRL	MATTEO RIGIRELLO	VIA DELLE CAMPANULE , 4	CAP: 91100 Trapani (Trapani)	cogemat.srl@libero.it	cogematsrl@pec.it	TEL: 0923 542226 FAX: 0923 542887	27,466
	52	I.GE.M. Srl	Francesco Gravina	Viale Europa, centro La Meridiana, s	CAP: 81054 San Prisco (Caserta)	igem@igem.it	igem@pec.igem.it	TEL: 0823799377 FAX: 0823798194	26,6592
	430	CO.STR.A. Srl	FRANCESCA MARIA FEDERICA MAUGERI	VIA ARCHIMEDE , 2	CAP: 94017 Regalbuto (Enna)	gruppomon@tiscali.it	costra@pec.it	TEL: 093571362 FAX: 093572950	
	439	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI Scrl	Vincenzo Geraci	Via Luigi Russo, 11/C	CAP: 93100 Caltanissetta	consorzio_impregemi@alice.it	impregemiscrl@splmail.it	TEL: 0934/963058 FAX: 0934/963058	
	468	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE	Maria Ramuglia	VIA SAN MICHELE , 01	CAP: 88046 Lamezia Terme	csinfra.meridionali@yahoo.it	consorziostabileinfrastrutturemeridionali@pec.it	TEL: 0908966221 FAX: 0908966221	
	435	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI II	Gaetano De Lorenzo	Via Ducezio , n.15	CAP: 98124 Messina (Messina)	costr.gen.serv.ing@pec.it	costr.gen.serv.ing@pec.it	TEL: 335453432 FAX: 1782233176	
	80	ECOL 2000 Srl	giuseppe micali	VIA ORATORIO DELLA PACE, 3	CAP: 98122 Messina (Messina)	ecol2000@hotmail.it	ecol2000srl@pec.it	TEL: 090662536 FAX: 090662536	
	81	F.LLI SCUTTARI DI SCUTTARI BENITO &	BENITO SCUTTARI	VIA MAESTRI DEL LAVORO , 50	CAP: 30015 Chioggia (Venezia)	ufficiogare@scuttari.it		TEL: 0415544140 FAX: 0415544069	
	48	GEOMERID SRL	ANTONIO CUSUMANO	CONTRADA BONDIFE', SN	CAP: 96010 Melilli (Siracusa)	geomerid@geomerid.it	geomerid@legalmail.it	TEL: 0931496104 FAX: 0931496284	
	401	GEOTEK ITALIA Srl	adriano agrò	MONTE DE' CENCI, 20	CAP: 00186 Roma (Roma)	geotekitalia@pec.it	geotekitalia@pec.it	TEL: 0922556338 FAX: 0922403921	
	180	I.CO.M.E.T.T.	Linda Schipani	Agglomerato ASI Capannone 8/10 L	CAP: 98129 Messina (Messina)	icomett@pec.it	icomett@pec.it	TEL: 090730032 FAX: 0902936884	
	395	NUOVA COSTRUZIONE SICILIANA COOF	SALVATORE BRUNO	via pio la torre, 18	CAP: 94017 Regalbuto (Enna)	ncs.concettamilitello@alice.it	nuovacostruzionesiciliana@pec.cgn.it	TEL: 093577670 FAX: 093577670	
	201	RCT Srl	Daniele Attala	viale primo maggio , 6bis	CAP: 20068 Peschiera	rct@rctsrl.it	rctsrl@legalmail.it	TEL: 0295420020 FAX: 0295350316	
	I	PIETRO DURANTESRL	davide durante	via ex casello ferroviario SS 119 , via	CAP: 91029 Santa Ninfa (Trapani)	ufficiogare@gruppodurante.it	pietrodurantesrl@postacert.vodafone.it	TEL: 092461153 FAX: 092462413	
	I	TRIVELSICILIA DI CASTELLI DOMENICO	GIOACCHINO CASTELLI	VIA S. BENEDETTO DA NORCIA , 33	CAP: 91026 Mazara del Vallo	trivelsicilia@libero.it	trivelsicilia@pec.it	TEL: 0923908296 FAX: 0923908296	

N. OFFERTE 10
SOGLIA DI ANOMALI 28,21145

Dott. Maurizio Croce

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ME089_3	Opere di consolidamento località Mili San Pietro	Decreto Approv Specif Tecn	decreto n. 517 del 5 ottobre 2012	Data Lettera Invito	prot. 214 del 5 ottobre 2012	CUP	J49H12000530001
MESSINA MILI SAN PIETRO				Data scadenza Gara	ore 9:00 del 16 ottobre	CIG	4600201DF1
	Resp. Proced. Geom. Marco Mancuso	Diret. dei Lavori	0	Collaudatore Statico		Coordinatore della Sicurezza	
	importo € 321.727,76	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 305.953,55 € 15.774,21	Decreto Commissione Verbale	ETO N. 538 DEL 16 OTTOBRE 2012 16/10/2012	Aggiudicataria	EDIL SICULA
	Ribasso 28,29% IMPORTO € 219.390,90	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 235.174,11	Aggiud. Provvisoria Aggiud. Definitiva	4754 DEL 17/11/2012 DECRETO N. 623 DEL 17/11/2012 prot. 4923 del 26 novembre 2012		
	Decreto Aggiud Def. decreto n. 643 del 26 novembre 2012			Contratto	18-dic-12		

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	TEL E FAX			P. IVA	Ribasso
		GRUPPO VENERE Srl	SALVATORE GRASSO	Via Nazionale, s.n. CAP 93010 Vallelunga Pratameno	TEL: 0934815591 FAX: 0934815591	gruppoveneresrl@libero.it	gruppoveneresrl@pec.it	01846410858	30,1311
		ALFANO Srl	Francesco Alfano	VIA GIORGIO LA PIRA, 1/G CAP 92012 Cianciana (Agrigento)	TEL: 0922/987367 FAX: 0922/987367	alfanosrl@alice.it		IT02520270840	29,8998
		GRANATELLA DI COCO ROSOLINO & C	rosolino coco	Via N.Paganini , 2 CAP 93010 Vallelunga Pratameno	TEL: 0934814199 FAX: 0934814199	granatellasas@alice.it		IT01737550853	29,7511
		ARCAN COSTRUZIONI Srl	andrea aragona	VIA GIACOMO MATTEOTTI, 65 CAP 98051 Barcellona Pozzo di Gotto	TEL: 0909795019 FAX: 0909795019	arcan.costruzioni@alice.it	arcan.costruzionisrl@pec.it	02592490839	29,5862
		PROJECT Srl	ROSSELLA BRUNO	C/DA PIANA, 112 CAP 98061 Brolo (Messina)	TEL: 0941563628 FAX: 0941563628	impresaprojectsrl@yahoo.it	vincenzo.murasia@geopec.it	02613730833	28,5272
		EDIL SICULA	Cono Calio	Via Meucci, snc CAP 98061 Brolo (Messina)	TEL: 0941562873 FAX: 0941562873	edilsicula@hotmail.it	edilsicula@pec.it	1526090830	28,2898
		SA.CO.REST S.R.L. 3	GIUSEPPE SAIEVA	VIA LIGABUE, 2 CAP 92026 Favara (Agrigento)	TEL: 0922419059 FAX: 0922419059	sacorest@libero.it	sacorest@pec.buffetti.it	02525120842	28,1149
		BE.I.CO. Srl	ROSARIA BENTIVEGNA	Via Monsignor Domenico Orlando , 14 CAP 95126 Catania (Catania)	TEL: 095496433 FAX: 095496433	sara.benti@tiscali.it	beico@pec.it	IT03202100875	28,0251
		PASSARELLO GIUSEPPE	Giuseppe Passarello	Bivio Madonnuzza, 74 CAP 90026 Petralia Soprana (Palermo)	TEL: 0921680352 FAX: 0921680352	peppucciopassarello@alice.it	peppucciopassarello@pec.it	03541510826	27,923
		C.T.F. Srl	Francesco Calabrese	VIA S. ANDREA , 159 CAP 98051 Barcellona Pozzo di Gotto	TEL: 090/9763988 FAX: 090/9216676	ctfcostruzioni@alice.it	ctfsrl@cgn.legalmail.it	02746580832	27,9216
		B.O.N.O. COSTRUZIONI Srl	giuseppe bono	CONTRADA BONAGRAZIA , SNC CAP 90040 Montelepre (Palermo)	TEL: 0918984288 FAX: 0918784988	bonocostruzionisrl@libero.it	bonocostruzioni@pec.it	04446360820	27,9132
		EDILZETA Srl	giorgio zaccaria	via cornelia, 28 CAP 97015 Modica (Ragusa)	TEL: 0932762044 FAX: 0932763844	info@edilzeta.org	edilzeta@gigapec.it	07662361000	27,7954
		IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. FILIPP	Rosario Colombrita	VIA LORENZO GEMMELLARO , 1 CAP 95030 Sant'Agata Li Battiati	TEL: 095/7252680 FAX: 095/7250273	rosario@colombrita.it	impresa@pec.colombrita.it	IT00137980876	27,5776
		PULLARA CALOGERO	calogero pullara	VIA PIETRO MANCINI, 5 CAP 92026 Favara (Agrigento)	TEL: 0922661638 FAX: 0922661638	calogero.pullara@alice.it	calogero.pullara@pec.it	IT02279850842	27,4845
		C.S.T. COSTRUZIONI Srl	MATTEO CASTIGLIONE	MUSSOMELI, VIA DURAZZO, 16 CAP 93014 Mussomeli	TEL: 0934 992738 FAX: 0934 992738	cst2002@cstcostruzioni.191.it	cstcostruzioni@spimail.it	IT01663030854	
		CO.GEN. Srl	Roberto Roggio	Via Carlo Forlanini, 2/D CAP 96100 Siracusa (Siracusa)	TEL: 0931441552 FAX: 093135124	mariocapriotti@cogensrl.com		00984690891	
		CO.IND. Srl	SANTI SMIDILE	VIA NUOVA PANORAMICA , 1405/B PAL. G CAP 98168 Messina	TEL: 3357511469 FAX: 090312486	coindsrl@virgilio.it	coindsrl@pec.it	01710340835	
		DI CARMINE COSTRUZIONI Sas	Gianluigi Di Carmine	S.S. 16 BIS, 90 CAP 65010 Spoltore (Pescara)	TEL: 085 4213165 FAX: 085 4213522	info@dicarmine.it	dicarmine.costruzioni@legalmail.it	IT00433300688	
		FIN.PAR. 2000 ESCO Spa	Carlo Di Cavolo	VIA ELVIA RECINA , N° 6 CAP 00183 Roma (Roma)	TEL: 065/622130 FAX: 06/99334122	finpargare@libero.it	finpar2000spa@legalmail.it	IT06195151003	
		IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI AL	VINICIO MENTUCCI	VIA MARCHE, 38 CAP 60019 Senigallia (Ancona)	TEL: 0717921151 FAX: 0717928103	info@mentuccialdo.it	info@pec.mentuccialdo.it	IT00982160426	
		LOTO Srl	carmelo calabrese	VIA ING. S. CUTRONI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 28 CAP 98051	TEL: 0909797487 FAX: 0909797487	proingegneria@tin.it		02948810839	
		MATINA GEOM. GIOVANNI	GIOVANNI MATINA	VIA UGO LA MALFA, 32 CAP 92026 Favara (Agrigento)	TEL: 0922415835 FAX: 0922415835	impresamatina@libero.it	giovannimatina@pec.it	02064150846	
		PRIMA COSTRUZIONI SRL	benedetto versaci	VIA NAZIONALE , 219 CAP 98070 Capri Leone (Messina)	TEL: 0941958830 FAX: 0941920276	info@primacostruzioni.biz	primacostruzioni@pec.it	03001830839	
		R.I.A.M. Srl	LAURA TROISI	Via Aldo Moro, 51 CAP 92028 Naro (Agrigento)	TEL: 0922957880 FAX: 0922957880	lacona.alberto@libero.it	02087.AG@POSTEPEC.CASSAEDILE.I	IT00240840843	
		S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. - SOC	SALVATORE CAPIZZI	VIA G. VERDI, 21 CAP 95035 Maletto (Catania)	TEL: 0957720718 FAX: 0957720718	scscostruzioniedili@libero.it		IT03643290871	
		SCANCARELLO GAETANO	GAETANO SCANCARELLO	VIA UGO BETTI , 3 CAP 90147 Palermo (Palermo)	TEL: 0916726501 FAX: 0918040233	info@edilescancarello.it	mailgpec@edilescancarello.it	02468550823	
		SUD COSTRUZIONI Srl	MARIA MARGA NICOLOSI	VIA LICCIARDI , 7/A CAP 95126 Catania (Catania)	TEL: 095382127 FAX: 0957265262	sudcostruzionisrl10@tiscali.it	udcostruzioni@pec.impresecatania.	04794530875	
		VIMAN Srl	Angelo Mancino	Via Toscana , 6 CAP 93014 Mussomeli (Caltanissetta)	TEL: 0934951558 FAX: 0934951558	viman.srl@virgilio.it	viman.srl@legalmail.it	01526680853	

N. OFFERTE 14
SOGLIA DI ANOMALIA 29,2882

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME092	Regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area Nord_Ovest dell'Abitato di Mistretta		Decreto Approv Specif Tecn	DECRETO N. 626 DEL 20/11/2012	Data Lettera Invito	PROT. N. 231 DEL 20 NOVEMBRE 2012	CUP	J85D12000780001
MISTRETTA					Data scadenza Gara	ORE 12:00 del 3 dicembre 2012	CIG	47106138D0
	Resp. Proced.	geom. Rosario Mazzurco	Diret. dei Lavori	0	Collaudatore Statico		Coordinatore della Sicurezza	
	Importo	€ 490.472,88	importo soggetto a ribasso	€ 472.722,61	Decreto Commissione	n. 664 del 3 dicembre 2012	Aggiudicataria	GEODESIA S.r.l.
			oneri sicurezza	€ 17.750,27	Verbale	ore 9:30 del 4 dicembre 2012		
	Ribasso	29,7512%	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 349.832,23	Aggiud.Provvisoria	prot. 268/12 del 5 dicembre 2012		
	IMPORTO AGGIUDICATO	€ 332.081,96			Aggiud. Definitiva	prot. 5410 del 18/12/2012		
	Decreto aggiud Def	Decreto n. 710 del 18/12/2012			Contratto		REGISTRAZIONE CONTRATTO	

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	cap e città			P. IVA	Ribasso
OLD		MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI Srl	Contrada Ciperone	s.n.c.	98037	Letojanni	Messina		27,7812
new		Dell'Orso S.r.l.	VIA ABBADIA	7	60021	Camerano	Ancona		
new		Dicearco Costruzioni srl	Via Contesse	1	98125	Messina	Messina		28,4646
new		EDILCUFFARO DI CUFFARO GERLANDO	VIA PRIMA	48	92100	Agrigento	Agrigento		28,8756
new		EDILTURCI S.R.L.	VIA DELLA LIBERAZIONE	21	47025	Mercato Saraceno	Forlì-Cesena		
new		GIRARDELLO S.p.A.	Via Ponte Fornaci	56	45014	Porto Viro	Rovigo		
new		GUGGINO COSTRUZIONI S.A.S. di Guggino Remo Domenico e soci	via Ugo Foscolo	n,4	90022	Caltavuturo	Palermo		29,1717
new		Isgrò Costruzioni S.r.l.	C.da Granatari	10	98040	Meri'	Messina		28,8731
new		MAZZEO SRL	Via Trieste	1	98051	Barcellona Pozzo di Gotto	Messina		28,8888
new		PAGANONI COSTRUZIONI S.R.L.	VIA MERIGGIO	4	23100	Sondrio	Sondrio		
new		PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL	VIA PASCOLI	78/C	90043	Camporeale	Palermo		
new		GEODESIA SRL Società a Responsabilità Limitata (	Via Nazionale	85	93010	Valielunga Pratameno	Caltanissetta		29,7512
new		tpl consorzio stabile s.r.l.	VIA SAN BARTOLOMEO D	20	16149	Genova	Genova		
new		GEA srl	via porta agrigento	245 d	92015	Raffadali	Agrigento		
new		ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL in ATI con COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.p.A. (Mandante)							29,2526
new		SCII SRL							contratto non sottoscritto

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

AG001	Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la Via delle Torri (PAI 067-1AG-205) nell'ambito dei lavori inerenti agli "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento		Decreto Approv Specif Tecn	decreto n. 642 del 23.11.2012	Data Lettera Invito	prot. 256 del 23.11.2012	CUP	J43810000690001
AGRIGENTO					Data scadenza Gara	ore 9:30 del 5 dicembre 2012	CIG	4731638F2F
	Resp. Proced.	Ing. Domenico Armenio	Diret. dei Lavori		Collaudatore Statico		Coordinatore della Sicurezza	
	Importo	€ 486.976,74	Importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 472.746,33 € 14.230,41	Decreto Commissione Verbale	decreto n. 666 del 5 dicembre 2012 ore 12:00 del 5 dicembre 2012	Aggiudicataria	CO.GE.MA.LA. S.r.l.
	Ribasso IMPORTO AGGIUDICATO	29,8866% € 331.458,51	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 345.688,94	Aggiud.Provvisoria Aggiud. Definitiva	prot. n. 269/12 del 05/12/2012 prot. 280/12 del 10/12/2012		
	Decreto aggiud.Def	decreto n. 680 del 10/12/2012			Contratto	11-dic-12	REGISTRAZIONE CONTRATTO	In corso di registrazione

note	prot. Istanza	Denominazione impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	cap e città			P. IVA	Ribasso
OLD	426	AMTECO Spa	gianbattista verzeletti	VIA TRINO , 202	CAP: 13100 Vercelli (Vercelli)	info@amtecospa.com	amtecospa@pec.keyworld.it	01707810022	
OLD	182	GEO PLANTS Srl	cristina vullo	c.da San Pietro II Traversa, Casella F	CAP: 92100 Agrigento (Agrigento)	info@geoplants.it	geoplants@pec.it	IT02614170849	28,3588
OLD	199	ISAF COSTRUZIONI Srl	NUNZIATO GERARDO VEC	Via Giovanni Verga , 3	CAP: 95013 Fiumefreddo di Sicilia (Catania)	impr.isaf@alice.it	impr.isaf@arubapec.it	IT04638320871	29,8475
OLD	112	TEK INFRASTRUTTURE Srl	GIUSEPPE TRIPOLI	VIA DI MARCO, 4	CAP: 90040 San Cipirello (Palermo)	tekinfrastrutturesrl@pec.it	tekinfrastrutturesrl@pec.it	IT05436080823	28,3735
OLD	98	TRAINITO COSTRUZIONI SRL	GERMANO TRAINITO	S.S. 117/ BIS , KM 89+300	CAP: 93012 Gela (Caltanissetta)	g.trainito@trainitocostruzioni.it	trainitocostruzioni@pec.it	02811870837	
new	I	CO.GE.MA.LA. S.r.l.	GIOVANNI CUFFARO	Via Perugia , 13	CAP: 92100 Agrigento (Agrigento)	cogemala@gmail.com	cogemalasrl@pec.it	IT01939140842	29,8866
new	II	Albanese Perforazioni srl	Gennaro Albanese	C.da Pesco Farese, sn	CAP: 86025 Ripalimosani (Campobasso)	tecnico@albaneseperforazioni.it	albaneseperforazioni@legalmail.it	IT01565570700	
new	II	ALPI SRL	Eliana Di Giovanni	Via di Prosecco, 2	CAP: 34151 Trieste (Trieste)	alpi@alpi.ts.it	certificata@pec.alpi.ts.it	IT00832250328	
new	II	CO.E.PE.SRL	GIUSEPPA PEPE	c/da Roccabianca ss 118 km 1,000, s	CAP: 90030 Bolognetta (Palermo)	coepe@libero.it	coepe@pec.it	IT04968320822	27,8996
new	II	CO.I.V. di Rachieli Salvatore	salvatore rachieli	VIA LAGHI SILANI, 147	CAP: 88836 Cotronei (Crotone)	salvatore.rachieli@hotmail.it	salvatore.rachieli@postacertificata.gov.it	IT02667840793	
new	II	CO.MAT. Società Cooperativa	Calogero Di Caro	Via Atenea, 331	CAP: 92100 Agrigento (Agrigento)	info@comatcoop.com	comat@arubapec.it	IT02527420844	28,2887
new	II	COMEL SRL	FRANCESCO MIGLIORE	VIA PANEPINTO, 90	CAP: 92022 Cammarata (Agrigento)	comelsrl@alice.it	comelsrl@pec.it	IT02478210848	
new	II	EDILPALI S.r.l.	Marco Roberto Borella	Viale Andrea Doria, 23	CAP: 95124 Catania (Catania)	edilpalict@tin.it	edilpalict@pec.it	IT00475950879	
new	II	EDILSAFF S.R.L.	FILIPPO SCANNELLA	VIA VITALIANO BRANCATI , S.N.C.	CAP: 93014 Mussomeli (Caltanissetta)	edilsaff@virgilio.it	edilsaffsrl@spimail.it	IT02307580841	28,2667
new	II	FONDAZIONI SPECIALI SPA	ARMANDO VANIN	via f.lli canvelli , 6	CAP: 43015 Noceto (Parma)	s.tronchini@italterra.com	fondazionispeciali.spa@legalmail.it	IT01600720344	
new	II	Gallone Antonio	Antonio Gallone	via pergusa , 298/b	CAP: 94100 Enna (Enna)	agallone@tiscali.it	antonio.gallone@geopec.it	IT00095900866	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ME89_01	Opere di consolidamento località Galati" – Galati S. Anna		Decreto Approv Specif Tecn	DECRETO N. 646 DEL 27 NOVEMBRE 2012	Data Lettera Invito	PROT. 259 DEL 27 NOVEMBRE 2012	CUP	J45D12000520001
					Data scadenza Gara	ORE 12:00 del 11.12.2012	CIG	4738438ABA
MESSINA S. ANNA	Resp. Proced.	Ing. Antonio Amanto	Diret. dei Lavori		Collaudatore Statico		Coordinatore della Sicurezza	
	Importo	€ 670.000,00	Importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 634.678,86 € 35.321,14	Decreto Commissione Verbale	reto n. 688 del 11/10/2012 0 DEL 12 NOVEMBRE 2012	Aggiudicataria	C. & P. SRL
	Ribasso IMPORTO AGGIUDICATO	28,9554% € 450.905,06	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 486.226,20	Aggiud. Provvisoria Aggiud. Definitiva	prot. n. 283/12 del 13/12/2012		
	Decreto Aggiud.Def	0			Contratto		REGISTRAZIONE CONTRATTO	

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	cap e città			P. IVA	Ribasso
OLD	100	AMATA COSTRUZIONI Srl	ANTONIO NOCIFORA AMA	CONTRADA PIRATO, 19	cap: 98076 Sant'Agata di Militello (Messina)	ufficiogare.amata@tiscali.it		02115870830	
OLD	150	BLU COSTUZIONI Srl	Massimiliano Gaeta	Via Aurelio Saffi, 31	cap: 96013 Carlentini (Siracusa)	inistrazione@gruppoblucostruzi	gruppoblucostruzioni@pec.it	IT01347190892	27,3174
aggiudicataria	43	C. & P. Srl	ANTONINO RIZZO	VIA SANT'ANDREA, 329	cap: 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)	cp3003@virgilio.it	cpsrl@pec.it	02710410834	28,9554
OLD	193	CIVIESSE Srl	CARMELO SALAMONE	via Salvatore La Rosa, 390	cap: 92021 Aragona (Agrigento)	civiessesrl@virgilio.it	civiessesrl@arubapec.it	02581640840	28,432
OLD	126	COLNISA COSTRUZIONI Srl	Nicola Colombrita	Via Lorenzo Gemmellaro, 1	cap: 95030 Sant'Agata Li Battiati (Catania)	impresa@colombrita.it	impresa@pec.colombrita.it	IT02043450879	29,3076
OLD	425	COMER COSTRUZIONI MERIDIONALI Sr	SEBASTIANA CONIGLIO	VIA ALESSANDRO VOLTA , 139	cap: 95010 Santa Venerina (Catania)	comerspa@pec.confindustriact.it	omerspa@pec.confindustriact.	02468520875	
OLD	436	CONSORZIO STABILE CFC Srl (TERMINI	salvatore ferlito	PIAZZALE DI PORTA PIA, 121/A	cap: 00198 Roma (Roma)	orziostabilecfc@pec.confindustri	rziostabilecfc@pec.confindust	04083070872	
OLD	404	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO Spa	Francesco Bruno	via campidoglio , 73	cap: 98076 Sant'Agata di Militello (Messina)	info@costruzionibruno.it	info@pec.costruzionibruno.it	02669810836	29,2695
OLD	30	CRUSCHINA COSTRUZIONI Srl	SALVATORE CRUSCHINA	Via Rosso di San Secondo, 39	cap: 93014 Mussomeli (Caltanissetta)	cruschina.costruzioni@pec.it	cruschina.costruzioni@pec.it	01385120850	28,4341
OLD	27	D.L.M. COSTRUZIONI Srl	Luca Fabio Calabrese	Via Sant'Andrea, 215/E	cap: 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)	dlmcostruzionisrl@pec.it	dlmcostruzionisrl@pec.it	03036160830	28,3402
OLD	163	DI NICA COSTRUZIONI Srl	GIUSEPPE DI NICA	S.S. 115 KM. 198,450, S.N.	cap: 92100 Agrigento (Agrigento)	impresadinica@virgilio.it	impresadinica@pec.it	02389540846	28,3912
OLD	173	GEO DRILLING Srl	CARMELINDA FANGANO	C/DA BURRIONE SP.16, SNC	cap: 96016 Lentini (Siracusa)	geodrilling.linda@tiscali.it	geodrilling.srl@legalmail.it	01413760891	28,5676
OLD	135	IMPRESA COSTRUZIONI MODERNE I.C.	Antonietta Patti	C.DA MINAGA SS. 189, 83	cap: 92100 Agrigento (Agrigento)	presacostruzionimoderne@virgili	sacostruzionimoderne@poste	01649200845	28,7575
OLD	264	IMPRESIM Srl	STEFANIA SIMONAZZI	VIA RUGGIERO, 30	cap: 86170 Isernia (Isernia)	Impresimappalti@libero.it	impresim@pec.team-service.it	IT06242761218	
OLD	179	INJECTOSOND ITALIA Srl	Massimo Poggio	Via Ilva, 4/48	cap: 16128 Genova (Genova)	info@injectosond.it	info@pec.injectosond.it	IT03530780109	30,5223
OLD	177	IRIDE Srl	gaetano mancuso	Via G. D'Annunzio, 32	cap: 98061 Brolo (Messina)	info@iridesrlonline.it	iride@pec.it	01547760833	
OLD	370	ITALRECUPERI Srl	CATANIA DAGOSTINO	Viale Principe Umberto, 81	cap: 98122 Messina (Messina)	acquisitarecuperisrl@pec.it	italrecuperi@pec.it	IT03102220837	Cauzione provv
OLD	23	LUPO' COSTRUZIONI Srl	GIUSEPPE LUPO'	VIA MADDALENA, 36	cap: 98123 Messina (Messina)	giuseppelupo3@virgilio.it	lupocostruzionisrl@pec.it	IT02552840833	29,2135
OLD	223	MAMMANA MICHELANGELO	Michelangelo MAMMANA	Via Santa Lucia, 5	cap: 98070 Castel di Lucio (Messina)	info@mammanamichelangelo.it	impresamammana@pec.it	01936500832	28,6867
OLD	20	MESSINA COSTRUZIONI Srl	Sebastiano Messina	Via Palermo, 140/Bis	cap: 93014 Mussomeli (Caltanissetta)	messina.srl@alice.it		01303330854	
OLD	232	PRESAL COSTRUZIONI Srl	calogero presti danisi	via Michelangelo, n. 15	cap: 98076 Sant'Agata di Militello (Messina)	presalcostruzioni@virgilio.it	presalcostruzioni@pec.it	01848890834	28,5766
OLD	320	SOCIETA' LAVORI PUBBLICI SRL	PAOLO CAPIZZI	VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA , 1	cap: 95035 Maletto (Catania)	capizziant@tiscali.it		03172280871	
OLD	118	SUPREMA APPALTI Srl	giuseppina cuttone	via Ettore Maiorana, senza numero	cap: 98040 Torregrotta (Messina)	supremaappalti@virgilio.it	rancesco.conti@cgn.legalmail.	03095530832	28,3307
OLD	456	TECNOAPPALT Srl	Giuseppe Capizzi	VIA UMBERTO, 311	cap: 95129 Catania (Catania)	tecnoappaltisrl@live.it		IT04778150872	28,4051
OLD	369	VIPP LAVORI Spa	Stefano Rettondini	Via Lungo Bussè, 3080	cap: 37050 Angiari (Verona)	vippspa@vippspa.com	lavorispa@pec.vipplavorispa.	IT01295420234	
							SOGLIA DI ANOMALIA		28,97652

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

me128	Muri e barriere paramassi – Zona Batana-Pagliara-S.Leone"		Decreto Approv Specif Tecn	decreto n. 645 del 27 novembre 2012	Data Lettera Invito	prot,. 258 del 27 novembre 2012	CUP	J15D12000550001
TORTORICI 128					Data scadenza Gara	ORE 9:30 DEL 10 DICEMBRE 2012	CIG	473615186F
	Resp. Proced.	Geom. Carmelo Buttafarro	Diret. dei Lavori		Collaudatore Statico		Coordinatore della Sicurezza	
	importo	€ 341.694,73	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 322.108,66 € 19.586,07	Decreto Commissione Verbale	677 del 10 dicembre 2012 00 DEL 10 DICEMBRE 2012	Aggiudicataria	AVENI S.r.l.
	Ribasso IMPORTO AGGIUDICATO	28,8412% € 229.208,66	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 248.794,73	Aggiud.Provvisoria Aggiud. Definitiva	prot. n. 281/12 del 11/12/2012		
	Decreto aggiudicativo	0			Contratto		REGISTRAZIONE CONTRATTO	

note	prot. istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	cap e città			P. IVA	Ribasso
	296	ARES Srl	renato crifò	via iside, 12 int. 8	CAP: 00184, Roma (Roma)	ares.srl@gigapec.it	ares.srl@gigapec.it	IT07847991002	28,3666
aggiudicataria	207	AVENI Srl	antonino aveni	via moleti, 20	CAP: 98051, Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)	avenisrl@virgilio.it	aveni@PEC.ENYA.it	IT02675130831	28,8412
	167	BCS COSTRUZIONI Srl	Carmelo Bellardita	C.da Cice' , sn	CAP: 98073, Mistretta (Messina)	bcscostruzioni@gmail.com	bcscostruzionipec.it	02942960838	29,9001
	218	BONGIOVANNI COSTRUZIONI Sas	Calogero Bongiovanni	Via Largo R9, 04	CAP: 92025, Casteltermini (Agrigento)	impresabongiovanni@alice.it	ongiovannicostruzioni@pec.i	02409690845	
	110	BONINA Srl	marisa bonina	VIA KENNEDY , 35	CAP: 98061, Brolo (Messina)	bonina.marisa@libero.it		IT01810170835	
	151	CALLARI COSTRUZIONI Srl	Vincenzo Callari	VIA LIGURIA, 2	CAP: 93014, Mussomeli (Caltanissetta)	callaricostruzioni@tiscali.it		01384160857	28,3198
	294	CIANCIO PARATORE RICCARDO	RICCARDO CIANCIO PARA	CONTRADA SANTA VENERA 16, 16	CAP: 98078, Tortorici (Messina)	riccardocianciopa@tiscali.it	truzioniciancio@cgn.legalma	IT01444320830	28,2469
	225	CO.GER. Srl	vincenzo geraci	Via Toscana, 4	CAP: 93014, Mussomeli (Caltanissetta)	cogersrl@hotmail.it	cogersrl@spimail.it	01515010856	
	157	COGEP Srl	GIUSEPPE MONTALBANO	S.S 115 KM 195, s.n.c.	CAP: 92100, Agrigento (Agrigento)	cogep.srl@virgilio.it	cogep.srl@pec.it	02492780842	
	56	COSTRUBO Soc Coop	emanuele bonfiglio	via nazionale giampilieri marina, 16	CAP: 98141, Messina (Messina)	info@costrubo.it	osocietacooperativa@pec.cos	02748200835	29,3331
	58	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. CANNI	carmelo cannizzo	via N. Panoramica dello stretto, 480	CAP: 98168, Messina (Messina)	cannizzo.carmelo@tiscali.it	zzo.carmelo@postacertificata.	01522410834	
	II	IMPRESA FERRO BETON S.A.S DI SIMO	AnnaMaria Simone	viale del consiglio d'europa, 30	CAP: 81055, Santa Maria Capua Vetere (Caserta)	ferrobetonsas@virgilio.it	ferrobeton@pec.it	IT01399371218	
	II	Scep Srl	Giuseppe Scalzo	C/DA BABBAURRA (BIGINI), S.N.C.	CAP: 93017, San Cataldo (Caltanissetta)	scepsrl@alice.it		01788410858	
	II	TAO.MAR SRL	Emanuela Taormina	PIAZZA TOMMASO NATALE, 57	CAP: 90147, Palermo (Palermo)	tao.mar@libero.it	tao.marsrl@pec.it	IT05616490826	28,1212
	III	bonelli costruzioni s.r.l.	calogero bonelli	via principe galletti , 1	CAP: 93017, San Cataldo (Caltanissetta)	bonellicostruzioni@libero.it	bonellicostruzioni@pec.it	IT01646100857	
	III	CIESSECI SRL		Via S. Giovanni , 51	CAP: 94014, Nicosia (Enna)	ciessecisrl@alice.it	ciesseci-srl@legalmail.it	IT00647770866	28,2869
	III	COSIAM S.r.l.	Fausto Rechichi	VIA CICERONE , 104/B	CAP: 93012, Gela (Caltanissetta)	info@cosiam.it	cosiamsrl@legalmail.it	IT01439050855	
	III	F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.	GAETANA CANNAROZZO	VIA UMBRIA, 8	CAP: 93013, Mazzarino (Caltanissetta)	faecostruzionisrl@yahoo.it	faecostruzioni.srl@pec.it	IT01761250859	27,8748
	III	FRAMICH s.r.l.	Giuseppe Cipria	Via Maugeri , 10	CAP: 95028, Valverde (Catania)	ufficiogare@framich.it	framich@impresapec.it	IT04715450872	
	III	IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI PIT	Paolo Pitasi	via S. SPERATO TRAV. LABBOCCETTA, 18	CAP: 89100, Reggio Calabria (Reggio Calabria)	imp.pitasi@libero.it	impresapitasisrl@arubapec.it	02040910800	
	III	PIANO STRADA SRL	annalisa altopiano	SS.118 KM. 3+000, SN	CAP: 90035, Marineo (Palermo)	pianostradasrl1@alice.it	lanostradasrl@pecsoluzioni.i	IT06006090820	27,2912
	III	PSAILA AMBIENTE SRL	Alberto Psaila	Via Diomede, n. 1	CAP: 93012, Gela (Caltanissetta)	psailambiente@tiscali.it	ilaambientesrl@cgn.legalma	IT01734850850	32,4811
	III	R.C. SRL	ANGELO ARMAN	Traversa Via Jonica contrada Spalla, s.n.	CAP: 96010, Melilli (Siracusa)	r.c.srl@pec.it	r.c.srl@pec.it	IT01360760894	29,3131
	III	SI.AR. TRIVELLAZIONI DI ROSARIO SIM	Rosario Simonetti	VIA v.f. 40, 25	CAP: 90126, Palermo (Palermo)	info@siartrivellazioni.com	imonetti-1696@postacertifica	IT04332060823	27,6307
	III	SICE SRL	Pietro Tirone	via de nicola, 40	CAP: 92021, Aragona (Agrigento)	sicecostruzionisrl@virgilio.it	sicecostruzionisrl@pec.it	IT02182210845	27,889
Calcolo Soglia di	anomalia						SOGLIA DI ANOMALIA		29,1625

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

GARE INDAGINI

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME99	Realizzazione del Piano di Indagini preliminari per la mitigazione del rischio idrogeologico in località San Leonardo del Comune di Piraino (ME) Intervento ME099		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 066 del 19 mag 2011	Data Lettera Invito	19/05/2011	Data scadenza Gara	30/05/2011	
Piraino	CUP	J62J11000100001	CIG	249679111	Resp. Proced.	Geom. Carmelo Leone			
	importo	€ 19.342,20	importo soggetto a ribasso	€ 18.652,90	Ribasso	29,06%	importo aggiudicato	€ 13.224,55	€ 13.913,85
			oneri sicurezza	€ 689,30				€ 689,30	
	Verbale	31/05/2011	Aggiudicataria	GEOMERID SRL	Aggiud.Provvisoria	prot U/9 del 31 mag 2011	Aggiud. Definitiva	prot U/12 del 7 giu 2011	
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 79 del 7 giu 2011	Contratto	09-giu-11	Registrazione Contratto	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 12369 serie 3 del 16/06/2011			

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	indirizzo	cap	Città	settore	INVITO	OFFERTA	Ribasso
		D.I.M.M.S. CONTROL s.r.l. Via Campo di Fiume, 13 83100 Arcella di Montefredane AV Fax: 0825 248705 geo@dimms.it	Via Campo di Fiume, 13	83100	Arcella di Montefredane	A B C	prot. U/04 del 19 mag 2011		
		SIDERCEM s.r.l. (Caltanissetta) Contrada Calderaio zona industriale - C.P. 287 93100 Caltanissetta Fax 0934 575422 info@sidercem.it	Contrada Calderaio zona industriale - C.P. 287	93100	Caltanissetta	A B C	prot. U/05 del 19 mag 2011		
		TECNO IN S.p.a. II trav. Strettola S. Anna alle Paludi, 11 80142 Napoli Fax: 081 5633970 tecnoin@tecnoinonline.it	II trav. Strettola S. Anna alle Paludi, 11	80142	Napoli	A C	prot. U/06 del 19 mag 2011	prot. E/1027 del 27 mag 2011	3,00%
		LOGOS S.r.l. Via S.Bartolomeo, 15 3043 Cassino FR Fax: 0776 312424 info@logos-lab.it	Via S.Bartolomeo, 15	3043	Cassino	A B C	prot. U/07 del 19 mag 2011		
aggiudicataria	927	**GEOMERID s.r.l.** C.da Bondifè 96010 Melilli SR Fax: 0931 496284 geomerid@geomerid.it	C.da Bondifé	96010	Melilli	C	prot. U/08 del 19 mag 2011	prot. E/925 del 27 mag 2011	29,06%

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME049	Realizzazione del Piano di Indagini preliminari Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Cappuccini – Comune di Alcara Li Fusi		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 080 del 08 giu 2011	Data Lettera Invito	09/06/2011	Data scadenza Gara	20/06/2011	
Alcara Li Fusi	CUP	J22D110001170001	CIG	2700520897	Resp. Proced.	Ing. Basilio Sanseverino			
	importo	€ 19.936,19	importo soggetto a ribasso	€ 19.569,69	Ribasso	31,11%	importo aggiudicato	€ 13.481,56	€ 13.848,06
			oneri sicurezza	€ 366,50				366,50	
	Verbale	20/06/2011	Aggiudicataria	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL (Mandante)	Aggiud.Provvisoria	Prot. U/32 del 20 giu 2011	Aggiud. Definitiva	prot. U/44 del 27 giu 2011	
	Decreto aggiud.Def	Decreto 104 del 27 giu 2011	Contratto	28/06/11	Registrazione Contratto	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 14399 serie 3 del12/07/2011			

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	indirizzo	cap	Città	settore	INVITO	OFFERTA	Ribasso
		GEOLAB SUD s.r.l.	Via Collemeroni, 2	3040	San Vittore del Lazio	A B C	prot. U/21 del 9 giu 2011		
ammessa	927	GEOMERID s.r.l.	C.da Bondifà	96010	Melilli	C	prot. U/18 del 9 giu 2011	prot. E/1191 del 17 giu 2011	12,65
		GEOSTUDI S.r.l.	Via San Salvador, 3	00040	Pomezia	A C	prot. U/22 del 9 giu 2011		
fuori tempo max	668	GIA Exploring sas	Via Cerrani snc	66010	Pretoro	C	prot. U/20 del 9 giu 2011	prot. E/1197 del 21 giu 2011 (fuori tempo)	
		GT Geo-Testing Srl	Via Monteruscello, 20/C	80078	Pozzuoli	A C	prot. U/23 del 9 giu 2011		
		I.GE.M. INDAGINI GEOLOGICHE MERIDIONALI s.r.l.	Viale Consiglio d'Europa/Complesso La Meridiana	81054	San Prisco	C	prot. U/24 del 9 giu 2011		
aggiudicataria	253	S.G.M. Srl Via Vittorio Emanuele n.436/d 95047 Paternò (CT)	Via Vittorio Emanuele n.436/d	95047	Paternò	A C	prot. U/25 del 9 giu 2011	prot. E/1189 del 17 giu 2011	31,11
		SERVIZI GEOTECNICI Srl	Via dei Castelli Romani, 24	00040	Pomezia	A C	prot. U/27 del 9 giu 2011		
ammessa		SIDERCEM s.r.l. (Caltanissetta)	Contrada Calderaio zona industriale - C.P. 287	93100	Caltanissetta	A B C	prot. U/19 del 9 giu 2011	prot. E/1190 del 17 giu 2011	26,532
		TRIVEL SONDAGGI Srl	Strada Prov. Cardito-Crispano, 27	80020	Crispano	C	prot. U/26 del 9 giu 2011		

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

EN044	Realizzazione Piano indagini preliminari "lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante C.da Urga		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 098 del 21 giu 2011	Data Lettera Invito	23/06/2011	Data scadenza Gara	05/07/2011
Gagliano Castelferrato	CUP	J82J11000160001	CIG	28512638a7	Resp. Proced.	Geom. Michele Corrente		
	importo	€ 22.300,26	importo soggetto a ribasso	€ 21.396,56	Ribasso	28,05%	importo aggiudicato	€ 12.719,89
			oneri sicurezza	€ 903,70				903,70 € 13.623,59
	Verbale	05/07/2011	Aggiudicataria	GIA EXPLORING SAS DI SARDO ANNA MARINA & C.	Aggiud.Provvisoria	prot U/58 del 5 lug 2011	Aggiud. Definitiva	prot. U/191 del 21 lug 2011
	Decreto aggiud.Def	Decreto 141 del 22 lug 2011	Contratto	26/07/2011	Registrazione Contratto	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 16994 serie 3 del 10 ago 2011		

note	prot. Istanza	Denominazione impresa	indirizzo	cap	Città	settore	INVITO	OFFERTA	Ribasso
		ELLETIPI srl	via Annibale Zucchini 69	44100	Ferrara	A B C	prot. U/43 del 23 giu 2011	prot. E/1202 del 27 giu 2011 impossibilità di partecipazione	
	927	GEOMERID s.r.l.	C.da Bondifà	96010	Melilli	C	prot- U/34 del 23 giu 2011	prot. E/1212 del 1 lug 2011	12,5
		GEOTEC sas	via Sicilia 25/2	53100	Belverde di Monteriggioni	A B C	prot. U/38 del 23 giu 2011		
		GEOTER Srl	Viale Piramide Cestia, 31	153	Roma	C	prot. U/39 del 23 giu 2011	prot. E/1218 del 5 lug 2011 impossibilità a partecipare:	
aggiudicataria	668	GIA Exploring sas Via Cerrani snc 66010 Pretoro (CH)	Via Cerrani snc	66010	Pretoro	C	prot. U/35 del 23 giu 2011	prot. E/1213 del 1 lug 2011	28,05
		ICHNOGEO DI CHETONI ROBERTO & C. S.A.S.	Via I. Alpi, 18/20 - Fraz. S. Miniato Basso	56028	S. Miniato	A C	prot. U/42 del 23 giu 2011		
	253	S.G.M. Srl	Via Vittorio Emanuele n.436/d	95047	Paternò	A C	prot. U/36 del 23 giu 2011	prot. E/1210 del 1 lug 2011	14,88
		SIDERCEM s.r.l. (Caltanissetta)	Contrada Calderaio zona industriale - C.P. 287	93100	Caltanissetta	A B C	prot. U/37 del 23 giu 2011	prot. E/1211 del 1 lug 2011	6,1287
		SONDEDILE srl	viale Crispi 17	64100	Teramo	C	prot. U/40 del 23 giu 2011		
		TECNOSOIL s.n.c.	Via Fontevecchia, 4	65010	Spoltore	C	prot. U/41 del 23 giu 2011		

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

EN044	Realizzazione del Piano di Indagini preliminari INTEGRATIVE intervento "Lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante - C.da Urga" da realizzare nel comune di Gagliano Castelferrato - Intervento EN 044	Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 314 del 11 novembre 2011	Data Lettera Invito	11/11/2011	Data scadenza Gara	22/11/2011
Gagliano Castelferrato_integrative	CUP J85D11000810001	CIG	3545884C08	Resp. Proced.	Geom. Michele Corrente		
	importo € 39.628,81	importo soggetto a ribasso	€ 35.145,51	Ribasso	31,00%	importo aggiudicato	€ 24.250,40
		oneri sicurezza	€ 4.483,30				€ 4.483,30 € 28.733,70
	Verbale 24/11/2011	Aggiudicataria Revocata	GIA Exploring	Aggiud.Provvisoria	prot. 797 del24 novembre 2011	revoca provvedimento di aggiudicazione provvisoria	Decreto n. 347 del 30 novembre 2011
	Aggiudicataria GEOMERID SRL			Aggiud.Provvisoria	prot. 808 del 30 novembre 2011	Aggiud. Definitiva	prot. 815 del 2 dicembre 2011
	Decreto aggiud.Def Decreto n. 361 del 2 dicembre 2011	Contratto	05/12/2011	Registrazione Contratto	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 25202 serie 3 del 19 dicembre 2011		

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	indirizzo	cap	Città	settore	INVITO	OFFERTA	Ribasso
		GEO PLANTS Srl	C.da S. Pietro II TRAV 92100	92100	Agrigento	C	prot. 606 del 11 novembre 2011	PROT. 1902 DEL 18 NOVEMBRE 2011	25,212
		GEOMERID s.r.l.	C.da Bondifà	96010	Melilli	C	prot. 607 del 11 novembre 2011	PROT. 1901 DEL 17 NOVEMBRE 2011	31
		GEOPROGETTI s.a.s. di Paolo Cestari & C.	Via Duca d'Este, 6	41036	Medolla	C	prot. 608 del 11 novembre 2011		
		GEOTEC sas	via Sicilia 25/2	53100	Belverde di Monteriggioni	A B C	prot. 609 del 11 novembre 2011		
		GEOTECHNA s.r.l.	Via degli Avieri, 26	36040	Torri di Quartesolo	A C	prot. 610 del 11 novembre 2011		
		GEOTECNICA VENETA s.r.l.	Via Dosa, 26/a - Loc. Olmo	30030	Martellago	A C	prot. 611 del 11 novembre 2011	PROT. 1890 DEL 16 NOVEMBRE 2011	rinuncia
		GEOTER Srl	Viale Piramide Cestia, 31	153	Roma	C	prot. 612 del 11 novembre 2011		
		GIA Exploring sas	Via Corrani snc	65011	Pretoro	C	prot. 613 del 11 novembre 2011	PROT. 1903 DEL 18 NOVEMBRE 2011	31,01
		S.G.M. Srl	Via Vittorio Emanuele n.436/d	95047	Paternò	A C	prot. 614 del 11 novembre 2011	PROT. 1905 DEL 18 NOVEMBRE 2011	18,27
		SIDERCEM s.r.l. (Caltanissetta)	Contrada Calderaio zona Industriale - C.P. 287	93100	Caltanissetta	A B C	prot. 615 del 11 novembre 2011		

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME081	Realizzazione Piano Indagini Preliminari intervento: "Opere di Consolidamento versante e sistemazione - zona Ronco Marurà"		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 106 del 28 giu 2011	Data Lettera Invito	28/06/2011	Data scadenza Gara	11/07/2011
Librizzi	CUP	J42D1100190001	CIG	288914010C	Resp. Proced.	Geom. Santo di Perna_Ing. Giuseppe La Placa		
	importo	€ 19.603,65	importo soggetto a ribasso	€ 19.458,35	Ribasso	28,32%	importo aggiudicato	€ 13.948,52
			oneri sicurezza	€ 145,30				145,30
								€ 14.093,82
	Verbale	11/07/2011	Aggiudicataria	GIA EXPLORING SAS DI SARDO ANNA MARINA & C.	Aggiud.Provvisoria	prot. 155 del 11 lug 2011	Aggiud. Definitiva	prot. U/195 del 21 lug 2011
	Decreto aggiud.Def	Decreto 142 del 22 lug 2011	Contratto	26/07/2011	Registrazione Contratto	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 16993 serie 3 del 10 ago 2011		

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	indirizzo	cap	Città	settore	INVITO	OFFERTA	Ribasso
	927	GEOMERID s.r.l.	C.da Bondifà	96010	Melilli	C	prot. U/48 del 28 lug 2011	prot. E/1215 del 1 lug 2011	15,2
		GEOPROGETTI s.a.s. di Paolo Cestari & C.	Via Duca d'Este, 6	41036	Medolla	C	prot. U/52 del 28 lug 2011		
		GEOTECHNA s.r.l.	Via degli Avieri, 26	36040	Torri di Quartesolo	A C	prot. U/53 del 28 lug 2011	prot. E/1204 del 30 giu 2011 impossibilità a partecipare	Impossibilità a partecipare
		GEOTECNICA VENETA s.r.l.	Via Dosa, 26/a - Loc. Olmo	30030	Martellago	A C	prot. U/54 del 28 lug 2011	prot. E/1226 del 11 lug 2011: impossibilità a partecipare	Impossibilità a partecipare
	668	GIA Exploring sas Via Cerrani snc 66010 Pretoro (CH)	**Via Cerrani snc**	**66010**	**Pretoro**	**C**	**prot. U/49 del 28 lug 2011**	**prot. E/1223 del 8 luglio 2011**	**28,316**
		Istituto Sperimentale Modelli Geotecnici ISMGEO s.r.l.	Via Pastrengo, 9	24068	Seriate	A B C	prot. U/55 del 28 lug 2011	prot. E/1216 del 4 lug 2011: impossibilità a partecipare	Impossibilità a partecipare
		PROVE PENETROMETRICHE s.r.l.	Via per Modena, 12	41051	Castelnuovo Rangone	C	prot. U/57 del 28 lug 2011		
	253	S.G.M. Srl	Via Vittorio Emanuele n.436/d	95047	Paternò	A C	prot. U/50 del 28 lug 2011	prot. E/1224 del 8 luglio 2011	12,95
		SIDERCEM s.r.l. (Caltanissetta)	Contrada Calderaio zona industriale - C.P. 287	93100	Caltanissetta	A B C	prot. U/51 del 28 lug 2011	prot. E/1214 del 1 lug 2011	5,8609
		SIGMA s.r.l.	Via P. Gobetti, 8	50010	Campi Bisenzio	A C	prot. U/56 del 28 lug 2011		

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME091	Realizzazione Piano indagini Preliminari intervento: "Opere di consolidamento del centro abitato"		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 116 del 05 lug 2011	Data Lettera Invito	06/07/2011	Data scadenza Gara	18/07/2011	
Mirto	CUP	J72J11000180001	CIG	2941580C98	Resp. Proced.	Ing. Nastasi			
	importo	€ 19.947,73	importo soggetto a ribasso	€ 19.640,05	Ribasso	14,88%	importo aggiudicato	€ 16.717,61	€ 17.025,29
			oneri sicurezza	€ 307,68				307,68	
	Verbale	18/07/2011	Aggiudicataria	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL	Aggiud.Provvisoria	prot. U/190 del 18 lug 2011	Aggiud. Definitiva	prot. U/201 del 21 lug 2011	
	Decreto aggiud.Def	Decreto 144 del 22 lug 201	Contratto	26/07/2011	Registrazione Contratto	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 16996 serie 3 del 10 ago 2011			

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	indirizzo	cap	Città	settore	INVITO	OFFERTA	Ribasso
	927	GEOMERID s.r.l.	C.da Bondifà	96010	Melilli	C	prot. U/59 del 6 luglio	prot. E/1275 18 lug 2011	10
	668	GIA Exploring sas	Via Cerrani snc	66010	Pretoro	C	prot.U/60 del 6 luglio	prot. E/1258 15 lug 2011	non produce casellario giudiziario per tutti i soggetti richiesti
		I.G. Srl	Via L. Palmieri, 104/a	80056	Ercolano	C	prot.U/63 del 6 luglio		
		LAND SERVICE Soc. Coop.	Via Vittorio Veneto, 26	39100	Bolzano	C	prot.U/64 del 6 luglio	prot. E/1222 DEL 6 GIUGNO: IMPOSSIBILITà A PARTECIPARE	rinuncia
Aggiudicataria	253	S.G.M. Srl Via Vittorio Emanuele n.436/d 95047 Paternò (CT)	Via Vittorio Emanuele n.436/d	95047	Paternò	A C	prot.U/61 del 6 luglio	Prot. E/1256 15 lug 2011	14,88
		SIDERCEM s.r.l. (Caltanissetta)	Contrada Calderaio zona industriale - C.P. 287	93100	Caltanissetta	A B C	prot.U/62 del 6 luglio	prot. E/1259 15 lug 2011	7,3713
		SO.RI.GE. S.r.l.	Strada Provinciale per Mulazzano, 172		Lesignano de' Bagni	C	prot.U/65 del 6 luglio	Rinuncia alla presentazione dell'offerta_Mirto	rinuncia
Rinuncia		SONGEO Srl	Via Edison 1/1	48022	Lugo	C	prot.U/66 del 6 luglio	PROT. 1220 DEL 6 LUGLIO RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE DI TUTTE LE	rinuncia
		SONGEO s.r.l.	Via G. Calvino, 30		Ferrara	C	prot.U/67 del 6 luglio		
		VICENZETTO s.r.l.	Via Municipio, 18	35040	Villa Estense	A C	prot.U/68 del 6 luglio		

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME125	MURI E PARATIE MONTEVALLE E OPERE IDRAULICHE ZONA LEMBO- PELLIZZA		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 220 del 9 set 2011	Data Lettera Invito	12/09/2011	Data scadenza Gara	22/09/2011
Tortorici_125_INDAGINI	CUP	J14C11000120001	CIG	324068168E	Resp. Proced.	arch. Giampiero di Magro		
	importo	€ 39.801,55	importo soggetto a ribasso	€ 39.131,94	Ribasso	32,50%	importo aggiudicato	€ 26.414,06
			oneri sicurezza	€ 669,61				€ 669,61 € 27.083,67
	Verbale	23/09/2011	Aggiudicataria	GEOMERID SRL	Aggiud.Provvisoria	prot. 509 del 23 settembre 2011	Aggiud. Definitiva	prot. 515 del 3 ottobre 2011
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 250 del 3 ottobre 2011	Contratto	04/10/2011	Registrazione Contratto	Serie 3 N. 20792 registrato il 24.10.2011		

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	indirizzo	cap	Città	settore	INVITO	OFFERTA	Ribasso
		ELLETIPI srl	via Annibale Zucchini 69	44100	Ferrara	A B C	prot. U/343 del 12 set 2011	prot. 1650 del 21 settembre 2011	rinuncia a partecipare
		GEOMERID s.r.l.	C.da Bondifà	96010	Melilli	C	prot. U/344 del 12 set 2011	prot. 1627 del 19 settembre 2011	32,5000%
		GEOPROGETTI s.a.s. di Paolo Cestari & C.	Via Duca d'Este, 6	41036	Medolla	C	prot. U/345 del 12 set 2011		
		GEOTEC sas	via Sicilia 25/2	53100	Belverde di Monteriggioni	A B C	prot. U/346 del 12 set 2011		
		GEOTECNICA VENETA s.r.l.	Via Dosa, 26/a - Loc. Olmo	30030	Martellago	A C	prot. U/347 del 12 set 2011	prot. 1642del 20 settembre 2011	rinuncia a partecipare
		GEOTER Srl	Viale Piramide Cestia, 31	153	Roma	C	prot. U/348 del 12 set 2011	prot. 1649 del 21 settembre 2011	rinuncia a partecipare
		ICHNOGEO DI CHETONI ROBERTO & C. S.A.S.	Via I. Alpi, 18/20 - Fraz. S. Miniato Basso	56028	S. Miniato	A C	prot. U/349 del 12 set 2011		
		SIDERCEM s.r.l. (Caltanissetta)	Contrada Calderaio zona industriale - C.P. 287	93100	Caltanissetta	A B C	prot. U/350 del 12 set 2011		
		TRIVEL SONDAGGI Srl	Strada Prov. Cardito-Crispano, 27	80020	Crispano	C	prot. U/351 del 12 set 2011		
		GEOTECHNA s.r.l.	Via degli Avieri, 26	36040	Torri di Quartesolo	A C	prot. U/352 del 12 set 2011		
		GIA Exploring sas Via Cerrani snc 66010 Pretoro (CH)	**Via Cerrani snc**	**66010**	**Pretoro**	**C**	non invitata	prot. 1640 del 20 settembre 2011	23,9150%
		GEOTEC SPA	via G. Barbato 20 Zona ind. S. Giovanni in Golfo	86100	Campobasso		non invitata	prot. 1646 del 21 settembre 2011	31,7000%

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME126	Piano di Indagini preliminari intervento ME126 – Tortorici (ME) – Muri su pali e raccolta acque – Zona S.Antonio-Sciortino		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 307 del 4 novembre 2011	Data Lettera Invito	04/11/2011	Data scadenza Gara	16/11/2011
Tortorici 126 indagini	CUP	J19H11000210001	CIG	3512363DA0	Resp. Proced.	arch. Giampiero di Magro		
	importo	€ 22.004,08	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 21.291,15 € 712,93	Ribasso	36,11%	importo aggiudicato	€ 13.602,92 € 712,93 € 14.315,85
	Verbale	17/11/2011	Aggiudicataria	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL (Mandante)	Aggiud.Provvisoria	prot. 691 del 17 novembre 2011	Aggiud. Definitiva	prot. 800 del 24 novembre 2011
	Decreto aggiud.Def	decreto n. 334 del 24 novembre 2011	Contratto	30/11/2011	Registrazione Contratto	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 25123 serie 3 del 16 dicembre 2011		

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Indirizzo	Città	Codice Fiscale	P. IVA	INVITO	OFFERTA	Ribasso
		D.I.M.M.S. CONTROL s.r.l.	Via Campo di Fiume, 13 83100 Arcella di Montefredane AV	Arcella di Montefredane			prot. 584 del 4 novembre 2011		
		GEO PLANTS Srl	C.da S. Pietro II TRAV 92100 Agrigento	Agrigento			prot. 585 del 4 novembre 2011	prot. 1891 del 16 novembre 2011	15,31%
		GEOLAB SUD s.r.l.	Via Collemeroni, 2 03040 San Vittore del Lazio (FR)	San Vittore del Lazio			prot. 586 del 4 novembre 2011		
		GEOMERID s.r.l.	C.da Bondifà 96010 Melilli SR Fax: 0931 496284	Melilli			prot. 587 del 4 novembre 2011	prot. 1887 del 15 novembre 2011	25,50%
		GEOSTUDI S.r.l.	Pomezia	Pomezia			prot. 588 del 4 novembre 2011	prot. 1888 del 15 novembre 2011	29,31%
		GIA Exploring sas	Pretoro	Pretoro			prot. 589 del 4 novembre 2011	prot. 1885 del 15 novembre 2011	24,75%
		S.G.M. Srl	Paternò	Paternò			prot. 590 del 4 novembre 2011	prot. 1892 del 16 novembre 2011	36,11%
		SIDERCEM s.r.l. (Caltanissetta)	Caltanissetta	Caltanissetta			prot. 591 del 4 novembre 2011	rinuncia all'offerta prot. 1897 del 16 novembre 2011	
		SONGEO s.r.l.	Ferrara	Ferrara			prot. 592 del 4 novembre 2011		
		VICENZETTO s.r.l.	Villa Estense	Villa Estense			prot. 593 del 4 novembre 2011	rinuncia all'offerta prot. 1896 del 16 novembre 2011	

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME128	"muri e barriere paramassi – zona Batana-Pagliara-S.Leone".		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 219 del 9 set 2011	Data Lettera Invito	12/09/2011	Data scadenza Gara	21/09/2011
Tortorici_128_INDAGINI	CUP	J14C11000110001	CIG	324073424C	Resp. Proced.	arch. Giampiero di Magro		
	importo	€ 19.967,96	importo soggetto a ribasso	€ 18.256,00	Ribasso	32,50%	importo aggiudicato	€ 12.322,80 / € 14.034,76
			oneri sicurezza	€ 1.711,96				€ 1.711,96
	Verbale	23/09/2011	Aggiudicataria	GEOMERID s.r.l.	Aggiud.Provvisoria	prot. 510 del 23 settembre 2011	Aggiud. Definitiva	prot. 518 del 3 ottobre 2011
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 251 del 3 ottobre 2011	Contratto	04/10/2011	Registrazione Contratto	Serie 3 N. 20790 registrato il 24.10.2011		

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	indirizzo	cap	Città	settore	INVITO	OFFERTA	Ribasso
		GEOMERID s.r.l.	C.da Bondifà	96010	Melilli	C	prot. U/353 del 12 settembre	prot. 1626 del 19 settembre 2011	32,50%
		I.G. Srl	Via L. Palmieri, 104/a	80056	Ercolano	C	prot. U/354 del 12 settembre		
		Istituto Sperimentale Modelli Geotecnici ISMGEO s.r.l.	Via Pastrengo, 9	24068	Seriate	A B C	prot. U/355 del 12 settembre		
		LAND SERVICE Soc. Coop.	Via Vittorio Veneto, 26	39100	Bolzano	C	prot. U/356 del 12 settembre		
		PROVE PENETROMETRICHE s.r.l.	Via per Modena, 12	41051	Castelnuovo Rangone	C	prot. U/357 del 12 settembre		
		SIDERCEM s.r.l. (Caltanissetta)	Contrada Calderaio zona industriale - C.P. 287	93100	Caltanissetta	A B C	prot. U/358 del 12 settembre		
		SIGMA s.r.l.	Via P. Gobetti, 8	50010	Campi Bisenzio	A C	prot. U/359 del 12 settembre		
		SO.RI.GE. S.r.l.	Strada Provinciale per Mulazzano, 172		Lesignano de' Bagni	C	prot. U/360 del 12 settembre		
		SONDEDILE srl	viale Crispi 17	64100	Teramo	C	prot. U/361 del 12 settembre	prot. 1638 del 20 settembre 2011	24,66%
		TECNOSOIL s.n.c.	Via Fontevecchia, 4	65010	Spoltore	C	prot. U/362 del 12 settembre		
		GIA Exploring sas Via Cerrani snc 66010 Pretoro (CH)	Via Cerrani snc	66010	Pretoro	C	non invitata	prot. 1639 del 20 settembre 2011	22,6190%
		GEOTEC SPA	Via G. Barbato 20 Zona ind. S. Giovanni in Golfo	86100	Campobasso		non invitata	prot. 1647 del 21 settembre 2011	31,7000%

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME99	Piano di indagini integrative preliminari per la mitigazione del rischio idrogeologico in località San Leonardo del Comune di Piraino (ME) Intervento ME099		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 306 del 4 novembre 2011	Data Lettera Invito	04/11/2011	Data scadenza Gara	14/11/2011
Piraino integrative	CUP	J69H11000400001	CIG	3504608DFF	Resp. Proced.	Geom. Carmelo Leone		
	importo	€ 2.541,10	importo soggetto a ribasso	€ 2.399,90	Ribasso	1,21%	importo aggiudicato	€ 2.370,86 / € 2.512,06
			oneri sicurezza	€ 141,20				€ 141,20
	Verbale	14/11/2011	Aggiudicataria	GEO PLANTS	Aggiud.Provvisoria	prot. 796 del 24 novembre 2011	Aggiud. Definitiva	prot. 820 del 12 dicembre 2011
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 366 del 12 dicembre 201	Contratto	14/12/2011				

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	indirizzo	cap	Città	settore	INVITO	OFFERTA	Ribasso
		GEO PLANTS s.r.l.	C.da S. Pietro II TRAV 92100	92100	Agrigento	C	579/DCI/RM		1,21%
		GEOMERID s.r.l.	C.da Bondifà	96010	Melilli	C	580/DCI/RM		
	rinuncia all'aggiudicazoine	GIA Exploring sas Via Cerrani snc 66010 Pretoro (CH)	Via Cerrani snc	66010	Pretoro	C	581/DCI/RM		2,83%
		S.G.M. Srl Via Vittorio Emanuele n.436/d 95047 Paternò (CT)	Via Vittorio Emanuele n.436/d	95047	Paternò	A C	582/DCI/RM		
	927	SIDERCEM s.r.l.	Contrada Calderaio zona industriale - C.P. 287	93100	Caltanissetta	A B C	583/DCI/RM		

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

CT036	"Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato"		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 170 del 3 ago 2011	Data Lettera Invito	17/08/2011	Data scadenza Gara	08/09/2011	
Ramaccia	CUP	J12J11000100001	CIG	Z78012855D	Resp. Procedi	Geom. Salvatore Sottosanti	Diret. dei Lavori		
	importo	€ 19.995,10	importo soggetto a ribasso	€ 19.375,80	Ribasso	21,78%	importo aggiudicato	€ 15.156,00	€ 15.775,30
			oneri sicurezza	€ 619,30				€ 619,30	
	Verbale	08/09/2011	Aggiudicataria	LGEM. INDAGINI GEOLOGICHE MERIDIONALI s.r.l.	Aggiud.Provvisoria	prot. 342 del 9 set 2011	Aggiud. Definitiva	prot. 364 del 14 settembre 2011	
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 224 del 14 settembre 2011	Contratto	22/09/2011	Registrazione Contratto	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 19138 serie 3 del 3 ottobre 2011			

note	prot. istanza	Denominazione impresa	Indirizzo	cap	Città	settore	INVITO	OFFERTA	Ribasso
		D.I.M.M.S. CONTROL s.r.l. Via Campo di Fiume, 13 83100 Arcella di Montefredane AV Fax: 0825 248705	Via Campo di Fiume, 13	83100	Arcella di Montefredane	A B C	prot. 261 del 17 ago 2011		
		SIDERCEM s.r.l. (Caltanissetta) Contrada Calderaio zona industriale - C.P. 287 93100 Caltanissetta	Contrada Calderaio zona industriale - C.P. 287	93100	Caltanissetta	A B C	prot. 264 del 17 ago 2011		
		TECNO IN S.p.a. II trav. Strettola S. Anna alle Paludi, 11 80142 Napoli Fax: 081 5633970	II trav. Strettola S. Anna alle Paludi, 11	80142	Napoli	A C	prot. 265 del 17 ago 2011	prot. E/1478 del 1 set 2011	9,95%
		LOGOS S.r.l. Via S.Bartolomeo, 15 3043 Cassino FR Fax: 0776 312424 info@logos-lab.it	Via S.Bartolomeo, 15	3043	Cassino	A B C	prot. 263 del 17 ago 2011		
	927	GEOMERID s.r.l. C.da Bondifà 96010 Melilli SR Fax: 0931 496284 geomerid@geomerid.it	C.da Bondifà	96010	Melilli	C	prot. 262 del 17 ago 2011	prot. E/1576 del 5 set 2011	20,21%
		GEOLAB SUD s.r.l. Via Collemeroni, 2 03040 San Vittore del Lazio (FR) Fax: 0776 343039 info@geolabsud.it	Via Collemeroni, 2	3040	San Vittore del Lazio	A B C	prot. 266 del 17 ago 2011		
		GEOSTUDI S.r.l. Via San Salvador, 3 00040 Pomezia (RM) Fax: 06 91603317 geostudi@fastwebnet.it	Via San Salvador, 3	40	Pomezia	A C	prot. 267 del 17 ago 2011	prot. E/1578 del 5 set 2011	17,00%
		GT Geo-Testing Srl Via Monteruscello, 20/C 80078 Pozzuoli (NA) Fax 081 524 88 19 gt@geotesting.it	Via Monteruscello, 20/C	80078	Pozzuoli	A C	prot. 268 del 17 ago 2011		
aggiudicataria		MERIDIONALI s.r.l. Viale Consiglio d'Europa/Complesso La Meridiana 81054 San Prisco (CE) Fax: 0823 758194 igem@pec.igeweb.it igem@igem.it	Viale Consiglio d'Europa/Complesso La Meridiana	81054	San Prisco	C	prot. 269 del 17 ago 2011	prot. E/1488 del 2 set 2011	21,78%
		SERVIZI GEOTECNICI Srl Via dei Castelli Romani, 24 00040 Pomezia (RM) Fax: 06 83762511 info@servizigeotecnici.it	Via dei Castelli Romani, 24	40	Pomezia	A C	prot. 270 del 17 ago 2011		
		GIA Exploring sas	Via Cerrani snc	66010	Pretoro	C	ha richiesto credenziali via mail tramite annuncio su sito	prot. E/1505 del 6 set 2011	16,84%

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ME109	Realizzazione del Piano di Indagini preliminari intervento ME_109 San Pier Niceto "Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante consolidamento dell'area a protezione del serbatoio del Centro Abitato". CUP: J95D11000230001 CIG: 3538653CD2		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 313 del 11 novembre 2011	Data Lettera Invito	11/11/2011	CUP	J95D11000230001
					Data scadenza Gara	22/11/2011	CIG	3538653CD2
San Pier Niceto	Resp. Proced.	Geom. Francesco Maio con supporto dell'Arch. Giampiero di Magro						
	importo	€ 38.881,15	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 35.576,65 € 3.304,50	Verbale	24/11/2011	Aggiudicataria	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL (Mandante)
	Ribasso	31,13%	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 27.806,14	Aggiud. Provvisoria	prot. 798 del 24 novembre 2011	Aggiud. Definitiva	prot. 807 del 29 novembre 2011
	IMPORTO AGGIUDICATO	€ 24.501,64						
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 345 del 30 novembre 2011	Contratto	30/11/2011	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 25201 serie 3 del 19 dicembre 2011		

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	indirizzo	cap	Città	settore	INVITO	OFFERTA	Ribasso
		ELLETIPI srl	via Annibale Zucchini 69	44100	Ferrara	A B C	prot. 596 del 11 novembre 2011		
		GEO PLANTS Srl	C.da S. Pietro II TRAV 92100	92100	Agrigento	C	prot. 597 del 11 novembre 2011	PROT. 1904 DEL 17 NOVEMBRE 2011	10,111
		GEOMERID s.r.l.	C.da Bondifà	96010	Melilli	C	prot. 598 del 11 novembre 2011	PROT. 1900 DEL 17 NOVEMBRE 2011	19,5
		GT Geo-Testing Srl	Via Monteruscello, 20/C	80078	Pozzuoli	A C	prot. 599 del 11 novembre 2011	PROT. 1899 DEL 17 NOVEMBRE 2011	26,6586
		I.GE.M. INDAGINI GEOLOGICHE MERIDIONALI s.r.l.	Viale Consiglio d'Europa/Complesso La Meridiana	81054	San Prisco	C	prot. 600 del 11 novembre 2011		
		LOGOS S.r.l.	Via S.Bartolomeo, 15	3043	Cassino	A B C	prot. 601 del 11 novembre 2011		
		S.G.M. Srl	Via Vittorio Emanuele n.436/d	95047	Paternò	A C	prot. 602 del 11 novembre 2011	PROT. 1906 DEL 17 NOVEMBRE 2011	31,13
		SERVIZI GEOTECNICI Srl	Via dei Castelli Romani, 24	40	Pomezia	A C	prot. 603 del 11 novembre 2011		
		SIDERCEM s.r.l. (Caltanissetta)	Contrada Calderaio zona industriale - C.P. 287	93100	Caltanissetta	A B C	prot. 604 del 11 novembre 2011		
		TECNO IN S.p.a.	II trav. Strettola S. Anna alle Paludi, 11	80142	Napoli	A C	prot. 605 del 11 novembre 2011	PROT. 1910 DEL 18 NOVEMBRE 2011	17,8

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME092	Realizzazione del Piano di Indagini preliminari relativi all'intervento ME_092 Mistretta "Regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area Nord_Ovest dell'Abitato di Mistretta		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 380 del 18 novembre 2011	Data Lettera Invito	18/11/2011	CUP	J85D11000850001
Mistretta					Data scadenza Gara	28/11/2011	CIG	3578151F99
	Resp. Proced.	Geom. Rosario Mazzurco con supporto dell'Arch. Giampiero di Magro						
	importo	€ 17.620,25	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 17.332,75 € 287,50	nota apertura plichi Verbale	provazione indagini 28/11/2011	Aggiudicataria	GEO RAS
	Ribasso IMPORTO AGGIUDICATO	40,72% € 10.274,85	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 10.562,35	Aggiud. Provvisoria	prot. 806 del 29 novembre 2011	Aggiud. Definitiva	prot. 821 del 12 dicembre 2011
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 367 del 12 dicembre 2011	Contratto	15/12/2011	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 25308 serie 3 del 20 dicembre 2011		

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	indirizzo	cap	Città	settore	INVITO	OFFERTA	Ribasso
		GEO PLANTS Srl	C.da S. Pietro II TRAV 92100	92100	Agrigento	C	PROT. 696 DEL 18 NOVEMBRE 2011		30,121
		GEOMERID s.r.l.	C.da Bondifà	96010	Melilli	C	PROT. 697 DEL 18 NOVEMBRE 2011		24
		GEOPROGETTI s.a.s. di Paolo Cestari & C.	Via Duca d'Este, 6	41036	Medolla	C	PROT. 698 DEL 18 NOVEMBRE 2011		
		GEOTEC sas	via Sicilia 25/2	53100	Belverde di Monteriggioni	A B C	PROT. 699 DEL 18 NOVEMBRE 2011		
		GEOTECHNA s.r.l.	Via degli Avieri, 26	36040	Torri di Quartesolo	A C	PROT. 700 DEL 18 NOVEMBRE 2011		
		GEOTECNICA VENETA s.r.l.	Via Dosa, 26/a - Loc. Olmo	30030	Martellago	A C	PROT. 701 DEL 18 NOVEMBRE 2011		
		GEOTER Srl	Viale Piramide Cestia, 31	153	Roma	C	PROT. 702 DEL 18 NOVEMBRE 2011		
		GIA Exploring sas	Via Cerrani snc	66010	Pretoro	C	PROT. 703 DEL 18 NOVEMBRE 2011		23,653
		S.G.M. Srl	Via Vittorio Emanuele n.436/d	95047	Paternò	A C	PROT. 704 DEL 18 NOVEMBRE 2011		39,11
		SIDERCEM s.r.l. (Caltanissetta)	Contrada Calderaio zona industriale - C.P. 287	93100	Caltanissetta	A B C	PROT. 705 DEL 18 NOVEMBRE 2011		

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME071	PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO A MONTE DELLA VIA SAN FILIPPO DI FRAGALÀ IN CORRISPONDENZA DEL QUARTIERE SERRO		Decreto Approv Specif Tecn	decreto n. 41 del 26 gennaio 2	Data Lettera Invito	26/01/2012	Data scadenza Gara	06/02/2012	
Frazzanò	CUP	J92J11000240001	CIG	383068389A	Resp. Proced.	ing. Fabio Marino			
	importo	€ 22.500,95	importo soggetto a ribasso	€ 21.091,65	Ribasso	50,11%	importo aggiudicato	€ 10.522,39	€ 11.931,69
			oneri sicurezza	€ 1.409,30				€ 1.409,30	
	Decreto Commissione	all'art.6 del decreto commissar	Aggiudicataria	GEO PLANTS Srl	Aggiud.Provvisoria	prot. 30 del 6 febbraio 2012	Aggiud. Definitiva	prot. n. 47 del 13 febbraio 2012	
	Verbale	06/02/2012							
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 61 del 13 febbraio 2012	Contratto	16/02/2012	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 4066 serie 3 del 22 febbraio 2012			

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	INVITO	OFFERTA	Ribasso
	232	GEO PLANTS SRL	cristina vullo	c.da San Pietro II Traversa Casella Postale 135 Agrigento 92100	Agrigento	IT02614170849		50,1111	
	234	GEO R.A.S. s.r.l.	GIUSEPPE LA SPINA	Via Vittorio Emanuele Orlando 168 95127	Catania	IT02498140876	02498140876	44	
	235	GEOMERID SRL	ANTONIO CUSUMANO	CONTRADA BONDIFE' SN 96010	Melilli	01081020891	01081020891		
	238	Geo Gav s.r.l.	Giuseppa Morrealese	Via dei Gelsomini	Favara	02380030847	info@geogav.it	48,9236	
	269	I.GE.M. srl	Francesco Gravina	Viale Europa, centro La Meridiana snc 81054	San Prisco	IT01601430612	01601430612	22,1111	
	393	RCT srl	Daniele Attala	viale primo maggio 6bis 20068	Peschiera Borromeo	00687660159	00687660159		
	404	S.G.M. Società Geognostica Mediterranea srl	Corrado zocco	VIA UMBERTO	Catania	IT03917900874	sgm1961@libero.it	46,1819	
							numero offerte pervenute	5	

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME132	Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio zona via annunziata		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto Commissariale n. 93 del 5 marzo 2012	Data Lettera Invito	05/03/2012	Data scadenza Gara	15/03/2012
UCRIA	CUP	J45D12000030001	CIG	400686164B	Resp. Proced.	Geom. Domenico Rigoli		
	importo	€ 39.929,60	importo soggetto a ribasso	€ 38.757,30	Ribasso	35,12%	importo aggiudicato	€ 25.145,81 / € 1.172,30 — € 26.318,11
			oneri sicurezza	€ 1.172,30				
	Verbale	15/03/2012	Aggiudicataria	S.G.M. Società Geognostica Mediterranea s.r.l.	Aggiud.Provvisoria	prot. n. 84 del 15 marzo 2012	Aggiud. Definitiva	prot. 93 del 26 marzo 2012
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 129 del 26 marzo 2012	Contratto	04/04/2012	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 8122 serie 3 del 10 aprile 2012		

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	codifce fiscale	OFFERTA	Ribasso
		GEO PLANTS SRL	cristina vullo	c.da San Pietro II Traversa Casella Postale 135 Agrigento 92100	Agrigento	IT02614170849		30,9	
		GEO R.A.S. s.r.l.	GIUSEPPE LA SPINA	Via Vittorio Emanuele Orlando 168 95127	Catania	IT02498140876	02498140876	28,75	
		GEOMERID SRL	ANTONIO CUSUMANO	CONTRADA BONDIFE' SN 96010	Melilli	01081020891	01081020891		
		GIA Exploring s.a.s. di Sardo Anna Marisa & C.	Angelo Giamberardino	Via Cerrani snc 66010	Pretoro	02199370699	02199370699	30,5691	
		I.GE.M. s.r.l.	Francesco Gravina	Viale Europa, centro La Meridiana snc 81054	San Prisco	IT01601430612	01601430612	30,8378	
		RCT s.r.l.	Daniele Attala	viale primo maggio 6bis 20068	Peschiera Borromeo	00687660159	00687660159		
		S.G.M. Società Geognostica Mediterranea srl	zocco Corrado	VIA UMBERTO	Catania	IT03917900874	sgm1961@libero.it	35,1198	
							numero offerte pervenute	5	

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

PA 181	realizzazione del Piano di Indagini preliminari intervento PA181_ Cefalù– "Messa in sicurezza movimenti franosi".		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto Commissariale n. 132 del 30 marzo 20122	Data Lettera Invito	05/03/2012	Data scadenza Gara	15/03/2012
c e f a l ù	CUP	J82J12000130001	CIG	411080686B	Resp. Proced.	ing. Giuseppe Morganti		
	Importo	€ 39.978,40	importo soggetto a ribasso	€ 39.359,10	Ribasso	35,12%	importo aggiudicato	€ 25.145,81 / € 619,30 — € 25.765,11
			oneri sicurezza	€ 619,30				
	Verbale	15/03/2012	Aggiudicataria	S.G.M. Società Geognostica Mediterranea s.r.l.	Aggiud.Provvisoria	prot. n. 98 del 17 aprile 2012	Aggiud. Definitiva	prot. n. 102 del 2 maggio 2012
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 196 del 2 maggio 2012	Contratto	10/05/2012	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 10675 serie 3 del 15 maggio 2012		

note	prot. istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	C.F.	OFFERTA	Ribasso
	234	GEO PLANTS Srl	cristina vullo	c.da San Pietro II Traversa Casella Postale 135 Agrigento 92100	Agrigento	IT02614170849		36,8111	
	235	GEO R.A.S. Srl	GIUSEPPE LA SPINA	Via Vittorio Emanuele Orlando 168 95127	Catania	IT02498140876	02498140876	rinuncia espressa	
	239	GEOMERID SRL	ANTONIO CUSUMANO	CONTRADA BONDIFE' SN 96010	Melilli	01081020891	01081020891	Cauzione provvisoria non autenticata	
	249	GIA EXPLORING Sas di SARDO ANNA MARISA & C.	Angelo Giamberardino	Via Cerrani snc 66010	Pretoro	02199370699	02199370699	31,5871	
	232	GEO GAV Srl	Giuseppa Morrealese	Via dei Gelsomini	Favara	02380030847	info@geogav.it	30,0985	
	269	I.GE.M. Srl	Francesco Gravina	Viale Europa, centro La Meridiana snc 81054	San Prisco	IT01601430612	01601430612	30,8642	
	393	RCT Srl	Daniele Attala	viale primo maggio 6bis 20068	Peschiera Borromeo	00687660159	00687660159	Cauzione provvisoria non autenticata	
	404	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA Srl	Corrado Zocco	VIA UMBERTO 196 95129	Catania	IT03917900874			

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME091	realizzazione del Piano di Indagini preliminari Aree interessate da fenomeni di dissesto		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 233 del 21 maggio 2012	Data Lettera Invito	21/05/2012	Data scadenza Gara	01/06/2012	
Mirto Integrative	CUP	J45D12000100001	CIG	42617413ED	Resp. Proced.	ing. Pino La Placa			
	importo	€ 19.462,40	importo soggetto a ribasso	€ 18.843,10	Ribasso	38,20%	importo aggiudicato	€ 24.324,63	€ 24.943,93
			oneri sicurezza	€ 619,30				€ 619,30	
	Verbale	22/05/2012	Aggiudicataria	GEOMERID SRL	Aggiud.Provvisoria	prot. n. 117 del 22 maggio 2012	Aggiud. Definitiva	prot. n. 123 del 30 maggio 2012	
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 250 del 30 maggio 2012	Contratto	08/06/2012	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 13287 serie 3 del 18 giugno 2012			

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	C.F.	OFFERTA	Ribasso
	234	GEO PLANTS Srl	cristina vullo	c.da San Pietro II Traversa Casella Postale 135 Agrigento 92100	Agrigento	IT02614170849		33	
	235	GEO R.A.S. Srl	GIUSEPPE LA SPINA	Via Vittorio Emanuele Orlando 168 95127	Catania	IT02498140876	02498140876	29,56	
aggiudicatar	239	GEOMERID SRL	ANTONIO CUSUMANO	CONTRADA BONDIFE' SN 96010	Melilli	1081020891	01081020891	38,2	
	249	GIA EXPLORING Sas di SARDO ANNA MARISA & C.	Angelo Giamberardino	Via Cerrani snc 66010	Pretoro	02199370699	02199370699	31,578	
	232	GEO GAV Srl	Giuseppa Morrealese	Via dei Gelsomini	Favara	02380030847	info@geogav.it	32,1234	
	269	I.GE.M. Srl	Francesco Gravina	Viale Europa, centro La Meridiana snc 81054	San Prisco	IT01601430612	01601430612	28,756	
	393	RCT Srl	Daniele Attala	viale primo maggio 6bis 20068	Peschiera Borromeo	00687660159	00687660159	Cauzione provvisoria non autenticata	
	404	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA Srl	Corrado Zocco	VIA UMBERTO 196 95129	Catania	IT03917900874		29,8888	

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME099	Piano di indagini preliminari per "lavori di consolidamento strada comunale in C.da San Costantino" nell'ambito dell'intervento : "Opere di consolidamento – Zona Roda, S. Costantino, Policara, S.Leonardo, Calami, Torre delle Ciavole" Codice ME - 99 Piraino	Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 221 del 15 maggio 2012	Data Lettera Invito	15/05/2012	Data scadenza Gara	28/05/2012	
PIRAINO S. Costantino	CUP	J65D12000040001	CIG	422876359E	Resp. Proced.	Geom. Carmelo Leone		
	Importo	€ 17.859,55	Importo soggetto a ribasso	€ 17.587,85	Ribasso	39,21%	importo aggiudicato	€ 10.691,39 / € 271,70 / € 10.963,09
			oneri sicurezza	€ 271,70				
	Decreto Commissione	Decreto n. 221 del 15 maggio 20	Aggiudicataria	GEO GAV Srl	Aggiud Provvisoria	prot. n. 121 del 28 maggio 2012	Aggiud. Definitiva	prot. n. 125 del 4 giugno 2012
	Verbale	28/05/2012						
	Decreto aggiud Def	Decreto n. 256 del 4 giugno 2012	Contratto	08/06/2012	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 13814 serie 3 del 25 giugno 2012		

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	C.F.	OFFERTA	Ribasso
	234	GEO PLANTS Srl	cristina vullo	c.da San Pietro II Traversa Casella Postale 135 Agrigento 92100	Agrigento	IT02614170849			
	235	GEO R.A.S. Srl	GIUSEPPE LA SPINA	Via Vittorio Emanuele Orlando 168 95127	Catania	IT02498140876	02498140876		29,56
	239	GEOMERID SRL	ANTONIO CUSUMANO	CONTRADA BONDIFE' SN 96010	Melilli	01081020891	01081020891		
	249	GIA EXPLORING Sas di SARDO ANNA MARISA & C.	Angelo Giamberardino	Via Cerrani snc 66010	Pretoro	02199370699	02199370699		
	232	GEO GAV Srl	Giuseppa Morrealese	Via dei Gelsomini	Favara	02380030847	info@geogav.it		39,2115
	269	I.GE.M. Srl	Francesco Gravina	Viale Europa, centro La Meridiana snc 81054	San Prisco	IT01601430612	01601430612		28,9856
	393	RCT Srl	Daniele Attala	viale primo maggio 6bis 20068	Peschiera Borromeo	00687660159	00687660159		
	404	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA Srl	Corrado Zocco	VIA UMBERTO 196 95129	Catania	IT03917900874			32,9856

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

PA 179	realizzazione del Piano di Indagini preliminari Aree interessate da fenomeni di dissesto		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 233 del 21 maggio 2012	Data Lettera Invito	21/05/2012	Data scadenza Gara	01/06/2012	
ALTOFONTE	CUP	J45D12000100001	CIG	42617413ED	Resp. Proced.	ing. Pino La Placa			
	importo	€ 19.462,40	importo soggetto a ribasso	€ 18.843,10	Ribasso	35,12%	importo aggiudicato	€ 12.225,40	€ 12.844,70
			oneri sicurezza	€ 619,30				€ 619,30	
	Decreto Commissione	Decreto n. 233 del 21 maggio 20	Aggiudicataria	GEO R.A.S. Srl	Aggiud.Provvisoria	prot. n. 124 del 1 giugno 2012	Aggiud. Definitiva	prot. n. 147 del 18 giugno 2012	
	Verbale	01/06/2012							
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 285 del 18 giugno 2012	Contratto	03/07/2012					

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	C.F.	OFFERTA	Ribasso
	234	GEO PLANTS Srl	cristina vullo	c.da San Pietro II Traversa Casella Postale 135 Agrigento 92100	Agrigento	IT02614170849			
	235	GEO R.A.S. Srl	GIUSEPPE LA SPINA	Via Vittorio Emanuele Orlando 168 95127	Catania	IT02498140876	02498140876	35,12	
	239	GEOMERID SRL	ANTONIO CUSUMANO	CONTRADA BONDIFE' SN 96010	Melilli	01081020891	01081020891		
	249	GIA EXPLORING Sas di SARDO ANNA MARISA & C.	Angelo Giamberardino	Via Cerrani snc 66010	Pretoro	02199370699	02199370699	20,2345	
	232	GEO GAV Srl	Giuseppa Morrealese	Via dei Gelsomini	Favara	02380030847	info@geogav.it	Cauzione provvisoria non conforme: In particolare	
	269	I.GE.M. Srl	Francesco Gravina	Viale Europa, centro La Meridiana snc 81054	San Prisco	IT01601430612	01601430612	25,6563	
	393	RCT Srl	Daniele Attala	viale primo maggio 6bis 20068	Peschiera Borromeo	00687660159	00687660159		
	404	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA Srl	Corrado Zocco	VIA UMBERTO 196 95129	Catania	IT03917900874		32,7985	

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

SR187	Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 434 del 31 agosto 2012	Data Lettera Invito	31/08/2012	Data scadenza Gara	martedì 11 settembre ore 10:00	
ROSOLINI	CUP	J25D12000260001	CIG	Z400630C7C	Resp. Proced.	Geom. Giuseppe Vindigni			
	Importo	€ 31.912,40	Importo soggetto a ribasso	€ 30.106,10	Ribasso	36,12%	importo aggiudicato	€ 19.232,77	€ 21.039,07
			oneri sicurezza	€ 1.806,30				€ 1.806,30	
	Verbale	martedì 11 settembre ore 12:00	Aggiudicataria	S.G.M. Società Geognostica Mediterranea s.r.l.	Aggiud.Provvisoria	prot. 189 del 12 settembre 2012	Aggiud. Definitiva	prot. 198 del 21 settembre 2012	
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 485 del 21 settembre 2012	Contratto	26-set-12					

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	C.F.	OFFERTA	Ribasso
	234	GEO PLANTS Srl	cristina vullo	c.da San Pietro II Traversa Casella Postale 135 Agrigento 92100	Agrigento	IT02614170849			
	235	GEO R.A.S. Srl	GIUSEPPE LA SPINA	Via Vittorio Emanuele Orlando 168 95127	Catania	IT02498140876	02498140876	31	
	239	GEOMERID SRL	ANTONIO CUSUMANO	CONTRADA BONDIFE' SN 96010	Melilli	01081020891	01081020891		
	249	GIA EXPLORING Sas di SARDO ANNA MARISA & C.	Angelo Giamberardino	Via Cerrani snc 66010	Pretoro	02199370699	02199370699	32,8275	
	232	GEO GAV Srl	Giuseppa Morrealese	Via dei Gelsomini	Favara	02380030847	info@geogav.it	32,1212	
	269	I.GE.M. Srl	Francesco Gravina	Viale Europa, centro La Meridiana snc 81054	San Prisco	IT01601430612	01601430612		
	393	RCT Srl	Daniele Attala	viale primo maggio 6bis 20068	Peschiera Borromeo	00687660159	00687660159		
	404	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA Srl	Corrado Zocco	VIA UMBERTO 196 95129	Catania	IT03917900874		36,1167	
							offerte presentate	4	

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME119	Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Faranò		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 437 del 3 settembre 2012	Data Lettera Invito	prot. n. 181 del 3 settembre 2012	Data scadenza Gara	ore 10:00 del 13 settembre 2012 GARA: ore 12:00 del 13 settembre 2012
SINAGRA	CUP	J65D12000380001	CIG	Z4B0631169	Resp. Proced.	Ing. Cappotto		
	importo	€ 36.229,80	importo soggetto a ribasso	€ 34.981,50	Ribasso	36,11%	importo aggiudicato	€ 22.349,30 / € 1.248,30 — € 23.597,60
			oneri sicurezza	€ 1.248,30				
	Verbale	13/09/2012	Aggiudicataria	GEO PLANTS Srl	Aggiud.Provvisoria	prot. 191 del 13 settembre 2012	Aggiud. Definitiva	prot. 199 del 24 settembre 2012
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 486 del 24 settembre 2012	Contratto	26-set-12				

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	C.F.	OFFERTA	Ribasso
	234	GEO PLANTS Srl	cristina vullo	c.da San Pietro II Traversa Casella Postale 135 Agrigento 92100	Agrigento	IT02614170849		36,1111	
	235	GEO R.A.S. Srl	GIUSEPPE LA SPINA	Via Vittorio Emanuele Orlando 168 95127	Catania	IT02498140876	02498140876	29,999	
	239	GEOMERID SRL	ANTONIO CUSUMANO	CONTRADA BONDIFE' SN 96010	Melilli	01081020891	01081020891	CAUZIONE	
	249	GIA EXPLORING Sas di SARDO ANNA MARISA & C.	Angelo Giamberardino	Via Cerrani snc 66010	Pretoro	02199370699	02199370699	32,5298	
	232	GEO GAV Srl	Giuseppa Morrealese	Via dei Gelsomini	Favara	02380030847	info@geogav.it	32,1212	
	269	I.GE.M. Srl	Francesco Gravina	Viale Europa, centro La Meridiana snc 81054	San Prisco	IT01601430612	01601430612	30,1032	
	393	RCT Srl	Daniele Attala	viale primo maggio 6bis 20068	Peschiera Borromeo	00687660159	00687660159		
	404	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA Srl	Corrado Zocco	VIA UMBERTO 196 95129	Catania	IT03917900874		30,8888	
							offerte presentate	6	

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

SR162	Messa in sicurezza costone centro abitato – Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei caduti		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 438 del 3 settembre 2012	Data Lettera Invito	prot. 182 del 3 settembre 2012	Data scadenza Gara	ore 9:30 del 14 settembre 2012 gara: ore 11:00 del 14 settembre 2012
c a l e n t i n i	CUP	J15D12000450001	CIG	Z6205EE8F0	Resp. Proced.	Geom. Francesco Ingalisi		
	importo	€ 30.158,55	importo soggetto a ribasso	€ 29.384,25	Ribasso	35,10%	importo aggiudicato	€ 19.070,38 / € 774,30 — € 19.844,68
			oneri sicurezza	€ 774,30				
	Verbale	14 settembre 2012	Aggiudicataria	GEOMERID SRL	Aggiud.Provvisoria	prot. n. 197 del 21 settembre 2012		
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 484 del 21 settembre 2012	Contratto	27-set-12		Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma ufficio Roma 2 Aurelio n. 20321 serie 3 del 3 ottobre 2012		

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	C.F.	OFFERTA	Ribasso
	234	GEO PLANTS Srl	cristina vullo	c.da San Pietro II Traversa Casella Postale 135 Agrigento 92100	Agrigento	IT02614170849		33,1112	
	235	GEO R.A.S. Srl	GIUSEPPE LA SPINA	Via Vittorio Emanuele Orlando 168 95127	Catania	IT02498140876	02498140876	30,5	
	239	GEOMERID SRL	ANTONIO CUSUMANO	CONTRADA BONDIFE' SN 96010	Melilli	1081020891	01081020891	35,1	
	249	GIA EXPLORING Sas di SARDO ANNA MARISA & C.	Angelo Giamberardino	Via Cerrani snc 66010	Pretoro	02199370699	02199370699	32,9189	
	232	GEO GAV Srl	Giuseppa Morrealese	Via dei Gelsomini	Favara	02380030847	info@geogav.it	32,1212	
	269	I.GE.M. Srl	Francesco Gravina	Viale Europa, centro La Meridiana snc 81054	San Prisco	IT01601430612	01601430612	22,1032	
	393	RCT Srl	Daniele Attala	viale primo maggio 6bis 20068	Peschiera Borromeo	00687660159	00687660159		
	404	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA Srl	Corrado Zocco	VIA UMBERTO 196 95129	Catania	IT03917900874		30,5181	
							offerte presentate	7	

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

SR186	Regimazione acque e consolidamento scarpata		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 451 del 10 settembre 2012	Data Lettera Invito	prot. 187 del 11 settembre 2012	Data scadenza Gara	scadenza ora 10:00 del 25 settembre GARA ore 12:00 del 25 settembre	
PortoPaolo di Capopassero	CUP	J65D12000350001	CIG	4525658320	Resp. Proced.	Geom. Mario Poidomani			
	importo	€ 14.899,30	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 13.093,00 € 1.806,30	Ribasso	39,40%	importo aggiudicato	€ 7.934,36 € 1.806,30	€ 9.740,66
	Decreto Commissione Verbale	nota 25/09/2012	Aggiudicataria	GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI SRL	Aggiud.Provvisoria	prot. 208 del 4 ottobre 2012	Aggiud. Definitiva	decreto n. 511 del 4 ottobre 2012	
	Decreto aggiud.Def	09-ott-12	Contratto	16-ott-12	Data prevista consegna	19/10/2012	Data effettiva consegna Lav	-	

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	C.F.	OFFERTA	Ribasso
	234	GEO PLANTS Srl	cristina vullo	c.da San Pietro II Traversa Casella Postale 135 Cap 92100 Agrigento	IT02614170849	Tel: 0922437950 Fax: 0922437950	info@geoplants.it	geoplants@pec.it	
	235	GEO R.A.S. Srl	GIUSEPPE LA SPINA	Via Vittorio Emanuele Orlando 168 Cap 95127 Catania	IT02498140876	Tel: 0935/75130 Fax: 0935/76388	georas@inwind.it	georas@legalmail.it	22,395
aggiudicataria	new	GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI SRL	Salvatore Palmeri	IUNCIA, S.N.C. Cap: 90024 Gangi (Pal	IT05486400822	Tel: 0921 502006 Fax: 0921 502006	geo.servicessrl@libero.it		39,4
	239	GEOMERID SRL	ANTONIO CUSUMANO	CONTRADA BONDIFE' SN Cap: 96010 Melilli	01081020891	Tel: 0931496104 Fax: 0931496284	geomerid@geomerid.it	geomerid@legalmail.it	
	249	GIA EXPLORING Sas di SARDO ANNA MARISA & C.	Angelo Giamberardino	Via Cerrani snc Cap 66010 Pretoro	02199370699	Tel: 0871898023 Fax: 0871898874	info@giaexploring.it	giamberardino@postecert.it	
	232	GEO GAV Srl	Giuseppa Morrealese	Via dei Gelsomini Favara (Agrigento)	2380030847	Tel: 0922437359 Fax: 0922529533	info@geogav.it	geogav@pec.it	37,3737
	269	I.GE.M. Srl	Francesco Gravina	Viale Europa, centro La Meridiana snc Cap 81054 San Prisco	IT01601430612	Tel: 0823799377 Fax: 0823798194	igem@igem.it	igem@pec.igem.it	28,4381
	393	RCT Srl	Daniele Attala	viale primo maggio 6bis 20068 Peschiera Borromeo	00687660159	Tel: 0295420020 Fax: 0295350316	rct@rctsrl.it	rctsrl@legalmail.it	
	404	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA Srl	Corrado Zocco	VIA UMBERTO 196 Cap: 95129 Catania	IT03917900874	Tel: 095/854989 Fax: 095/854989	sgm1961@libero.it	sgmsrl@mypec.eu	
	new	TRIVELSICILIA DI CASTELLI DOMENICO S.R.L.	GIOACCHINO CASTELLI	VIA S. BENEDETTO DA NORCIA , 33 C	01735740811				41,3912
								offerte presentate	5

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME099	Piano di indagini preliminari afferente lavori di consolidamento strada statale 113 in località Torre delle Ciavole" nell'ambito dell'intervento : "Opere di consolidamento – Zona Roda, S. Costantino, Policara, S.Leonardo, Calami, Torre delle Ciavole" Codice ME - 99 Piraino"		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 450 del 10 settembre 2012	Data Lettera Invito	prot. 186 del 10 settembre 2012	Data scadenza Gara	ore 10:00 lunedì 24 settembre 2012 Gara ore 12:00 del 24 settembre 2012
Piraino Torre delle Ciavole	CUP	J65D12000040001	CIG	4532238BAD	Resp. Proced.	Geom. Carmelo Leone		
	importo	€ 14.861,05	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 13.144,75 € 1.716,30	Ribasso	41,39%	importo aggiudicato	€ 7.703,98 € 1.716,30 **€ 9.420,28**
	Decreto Commissione	nota						
	Verbale	24/09/2012	Aggiudicataria	TRIVELSICILIA DI CASTELLI DOMENICO S.R.L.	Aggiud.Provvisoria	prot. 4011 del 11 ottobre 2012	Aggiud. Definitiva	prot. 4011 del 11 ottobre 2012
	Decreto aggiud.Def	decreto n. 529 dell'11 ottobre 2012	Contratto	16-ott-12			Registrazione	non necessita di registrazione

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	C.F.	OFFERTA	Ribasso
	234	GEO PLANTS Srl	cristina vullo	c.da San Pietro II Traversa Casella Postale 135 Cap 92100 Agrigento	IT02614170849	Tel: 0922437950 Fax: 0922437950	info@geoplants.it	geoplants@pec.it	NO OFFERTA
	235	GEO R.A.S. Srl	GIUSEPPE LA SPINA	Via Vittorio Emanuele Orlando 168 Cap 95127 Catania	IT02498140876	Tel: 0935/75130 Fax: 0935/76388	georas@inwind.it	georas@legalmail.it	22,395
	new	GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI SRL	Salvatore Palmeri	JUNCIA, S.N.C. Cap: 90024 Gangi (Pal	IT05486400822	Tel: 0921 502006 Fax: 0921 502006	geo.servicessrl@libero.it		39,33
	239	GEOMERID SRL	ANTONIO CUSUMANO	CONTRADA BONDIFE' SN Cap: 96010 Melilli	01081020891	Tel: 0931496104 Fax: 0931496284	geomerid@geomerid.it	geomerid@legalmail.it	NO OFFERTA
	249	GIA EXPLORING Sas di SARDO ANNA MARISA & C.	Angelo Giamberardino	Via Cerrani snc Cap 66010 Pretoro	02199370699	Tel: 0871898023 Fax: 0871898874	info@giaexploring.it	giamberardino@postecert	NO OFFERTA
	232	GEO GAV Srl	Giuseppa Morrealese	Via dei Gelsomini Favara (Agrigento)	02380030847	Tel: 0922437359 Fax: 0922529533	info@geogav.it	geogav@pec.it	37,3737
	269	I.GE.M. Srl	Francesco Gravina	Viale Europa, centro La Meridiana snc Cap 81054 San Prisco	IT01601430612	Tel: 0823799377 Fax: 0823798194	igem@igem.it	igem@pec.igem.it	28,4381
	393	RCT Srl	Daniele Attala	viale primo maggio 6bis 20068 Peschiera Borromeo	00687660159	Tel: 0295420020 Fax: 0295350316	rct@rctsrl.it	rctsrl@legalmail.it	NO OFFERTA
	404	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA Srl	Corrado Zocco	VIA UMBERTO 196 Cap: 95129 Catania	IT03917900874	Tel: 095/854989 Fax: 095/854989	sgm1961@libero.it	sgmsrl@mypec.eu	NO OFFERTA
	new	TRIVELSICILIA DI CASTELLI DOMENICO S.R.L.	GIOACCHINO CASTELLI	VIA S. BENEDETTO DA NORCIA , 33 C	01735740811				41,3912
								offerte presentate	5

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME079	Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 473 del 17 settembre 2012	Data Lettera Invito	prot. n. 193 del 17/09/2012	Data scadenza Gara	28/09/2012 ore 9:30
LIBRIZZI	CUP	J49H12000540001	CIG	ZE80663783	Resp. Proced.	Geom. Carmelo CILONA		
	importo	€ 26.897,80	importo soggetto a ribasso	€ 26.278,50	Ribasso	35,61%	importo aggiudicato	€ 16.920,12
			oneri sicurezza	€ 619,30				€ 619,30 € 17.539,42
	Decreto Commissione	nota	Aggiudicataria	GEO GAV Srl	Aggiud.Provvisoria	prot. n. 215 dell'8 ottobre 2012	Decreto aggiud.Def	decreto n. 521 dell'8 ottobre 2012
	Verbale	28/09/2012 ore 10:00						
			Contratto	10-ott-12				

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	C.F.	OFFERTA	Ribasso
	234	GEO PLANTS Srl	cristina vullo	c.da San Pietro II Traversa Casella Postale 135 Cap 92100 Agrigento	IT02614170849	Tel: 0922437950 Fax: 0922437950	info@geoplants.it	geoplants@pec.it	31,5
	235	GEO R.A.S. Srl	GIUSEPPE LA SPINA	Via Vittorio Emanuele Orlando 168 Cap 95127 Catania	IT02498140876	Tel: 0935/75130 Fax: 0935/76388	georas@inwind.it	georas@legalmail.it	30,89
	new	GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI SRL	Salvatore Palmeri	IUNCIA, S.N.C. Cap: 90024 Gangi (Pal	IT05486400822	Tel: 0921 502006 Fax: 0921 502006	geo.servicessrl@libero.it		
	239	GEOMERID SRL	ANTONIO CUSUMANO	CONTRADA BONDIFE' SN Cap: 96010 Melilli	01081020891	Tel: 0931496104 Fax: 0931496284	geomerid@geomerid.it	geomerid@legalmail.it	
	249	GIA EXPLORING Sas di SARDO ANNA MARISA & C.	Angelo Giamberardino	Via Cerrani snc Cap 70010 Pretoro	02199370699	Tel: 0871898023 Fax: 0871898874	info@giaexploring.it	giamberardino@postecert.it	
	232	GEO GAV Srl	Giuseppa Morrealese	Via dei Gelsomini Favara (Agrigento)	2380030847	Tel: 0922437359 Fax: 0922529533	info@geogav.it	geogav@pec.it	35,6123
	269	I.GE.M. Srl	Francesco Gravina	Viale Europa, centro La Meridiana snc Cap 81054 San Prisco	IT01601430612	Tel: 0823799377 Fax: 0823798194	igem@igem.it	igem@pec.igem.it	24,6444
	393	RCT Srl	Daniele Attala	viale primo maggio 6bis 20068 Peschiera Borromeo	687700159	Tel: 0295420020 Fax: 0295350316	rct@rctsrl.it	rctsrl@legalmail.it	
	404	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA Srl	Corrado Zocco	VIA UMBERTO 196 Cap: 95129 Catania	IT03917900874	Tel: 095/854989 Fax: 095/854989	sgm1961@libero.it	sgmsrl@mypec.eu	33,1212
	new	TRIVELSICILIA DI CASTELLI DOMENICO S.R.L.	GIOACCHINO CASTELLI	VIA S. BENEDETTO DA NORCIA , 33 C	01735740811				
								offerte presentate	5

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

PA142	Barriere paramassi - Zona Industriale		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 589 del 7 novembre 2012	Data Lettera Invito	prot. 229 del 7 novembre 2012	Data scadenza Gara	ore 12:00 del 19 novembre 2012
CARINI	CUP	J25D12000430001	CIG	ZCB0712E9F	Resp. Proced.	Ing. Antonino Cracchiolo		
	importo	€ 29.437,25	Importo soggetto a ribasso	€ 28.221,52	Ribasso	35,60%	importo aggiudicato	€ 18.174,66 / € 1.215,73 / € 19.390,39
			oneri sicurezza	€ 1.215,73				
	Decreto Commissione	nota	Aggiudicataria	GED RAS Srl	Aggiud.Provvisoria	prot. 231 del 21 novembre 2012	Aggiud. Definitiva	-
	Verbale	ore 11:20 del 21 novembre 201						
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 633 del 3 dicembre 2012	Contratto	-	Data prevista consegna	-	Data effettiva consegna Lav	-

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Rappresentante Legale	Indirizzo	Città	P. IVA	C.F.	OFFERTA	Ribasso
		ALBANESE PERFORAZIONI							8,151
	234	GEO PLANTS Srl	cristina vullo	c.da San Pietro II Traversa Casella Postale 135 Cap 92100 Agrigento	IT02614170849	Tel: 0922437950 Fax: 0922437950	info@geoplants.it	geoplants@pec.it	31,122
	235	GEO R.A.S. Srl	GIUSEPPE LA SPINA	Via Vittorio Emanuele Orlando 168 Cap 95127 Catania	IT02498140876	Tel: 0935/75130 Fax: 0935/76388	georas@inwind.it	georas@legalmail.it	35,6
	new	GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI SRL	Salvatore Palmeri	C.DA JUNCIA, S.N.C. Cap: 90024 Gangi (Palermo)	IT05486400822	Tel: 0921 502006 Fax: 0921 502006	geo.servicessrl@libero.it		25,1
	239	GEOMERID SRL	ANTONIO CUSUMANO	CONTRADA BONDIFE' SN Cap: 96010 Melilli	01081D20891	Tel: 0931496104 Fax: 0931496284	geomerid@geomerid.it	geomerid@legalmail.it	
	249	GIA EXPLORING Sas di SARDO ANNA MARISA & C.	Angelo Giamberardino	Via Cerrani snc Cap 70010 Pretoro	02199370699	Tel: 0871898023 Fax: 0871898874	info@giaexploring.it	giamberardino@postecert.it	
	232	GEO GAV Srl	Giuseppa Morrealese	Via dei Gelsomini Favara (Agrigento)	2380030847	Tel: 0922437359 Fax: 0922529533	info@geogav.it	geogav@pec.it	
	269	I.GE.M. Srl	Francesco Gravina	Viale Europa, centro La Meridiana snc Cap 81054 San Prisco	IT01601430612	Tel: 0823799377 Fax: 0823798194	igem@igem.it	igem@pec.igem.it	28,5816
	393	RCT Srl	Daniele Attala	viale primo maggio 6bis 20068 Peschiera Borromeo	687700159	Tel: 0295420020 Fax: 0295350316	rct@rctsrl.it	rctsrl@legalmail.it	
	404	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA Srl	Corrado Zocco	VIA UMBERTO 196 Cap: 95129 Catania	IT03917900874	Tel: 095/854989 Fax: 095/854989	sgm1961@libero.it	sgmsrl@mypec.eu	

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

GARE PROFESSIONISTI

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ME125	Servizio: PD PE DL e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di "MURI E PARATIE MONTEVALLE E OPERE IDRAULICHE ZONA LEMBO- PELLIZZA"	Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 121 del 07 lug 2011	Data Lettera Invito	11/07/2011	Data scadenza Gara	27/07/2011
Tortorici 1125	CUP J14C11000120001	CIG	296279609B	Resp. Procedi	Arch. Di Magro		
	Importo € 99.488,68	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 18.652,90	Ribasso	64,89%	importo aggiudicato	€ 34.932,47
	Decreto Commissione Verbale Decreto 154 del 27 luglio 2011 29/07/2011	Aggiudicataria	Mario Saitta	Aggiud.Provvisoria	prot. PA/1325 del 29 lug 2011	Aggiud. Definitiva	prot. 1468 del 9 ago 2011
	Decreto aggiud.Def. Decreto n. 200 del 3 maggio 2012	Contratto	23/08/2011	registrazione	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 18091 serie 3 del 20 settembre 2011		

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Indirizzo	Città	Codice Fiscale	P. IVA	INVITO	OFFERTA	Ribasso
	85	SALVATORE ZACCARO salvatore.zaccaro@ingpec.eu	MESSINA	VIA SETAIOLI 3, 98121	ZCCSVT68B06H175M	02684570837	prot. U/130 del 11 lug 2011	prot. E/1303 del 19 lug 2011	28,75
	127	GIUSEPPE LIUZZO Fax: 092 19 94 864 liuzzogiuseppe@libero.it	MISTRETTA	VIA NAZIONALE 250, 98073	LZZGPP62S11F251R	01617940836	prot. U/131 del 11 lug 2011	prot. E/1346 del 22 lug 2011	60,35
	128	MARIO SAITTA Fax: 0921 994864 siasprogetti@tiscali.it	MISTRETTA	VIA DI BERNARDO AMATO 2, 98073	STTMRA64D15F251Q	01839760830	prot. U/132 del 11 lug 2011	prot. E/1348 del 22 lug 2011	64,588
	129	FELICE TESTAGROSSA Fax: 092 19 94 864 testagrossafelice@virgilio.it	MISTRETTA	VIA LIBERTA' 2, 98073	TSTFLC71M15F251S	02555480835	prot. U/133 del 11 lug 2011	prot. E/1345 del 22 lug 2011	62,689
	130	ENRICO VITALI Fax: 091 409881 enrico.vitali@ordineingpa.it	BUCCHERI	VIA SABAUDA 116, 96010	GMBVTI68B28Z133T	01311360893	prot. U/134 del 11 lug 2011		
	147	ENRICO VITALI enrico.vitali@ordineingpa.it	PALERMO	VIA PETRALIA SOTTANA 3, 90100	VTLNRC61C08G273I	?	prot. U/135 del 11 lug 2011	prot. E/1376 del 26 lug 2011	9,54
	183	VITO GAMBILONGHI Fax: 093 18 73 702 vito.gambilonghi@ordineingegnerisiracusa.it	CARINI	VIA SVIZZERA 58, 90044	DMRMRA78P27G273P	05990890823	prot. U/136 del 11 lug 2011		
	295	S.T.I. Fax: 0942792668 giuseppe.garufi@ingpec.eu	FURCI SICULO	VIA FUCESI D'AMERICA 5 98023	02766470831	02766470831	prot. U/137 del 11 lug 2011	prot. E/1339 del 22 lug 2011	54
	302	LITOS PROGETTI S.R.L. Fax: 0934679270 alfonsogaetano.ippolito@archiworldpec.it info@litosprogetti.191.it	SANTA CATERINA VILLARMOSA	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 13/A 93018	01673260855	01673260855	prot. U/138 del 11 lug 2011	prot. E/1371 del 26 lug 2011	51,2
	323	SALVATORE SPARACINO Fax: 091542177 salvatore.sparacino@ordineingpa.it	PALERMO	VIA DELL'ARSENALE 4/A 90142	SPRSVT50R02I538V	00777860826	prot. U/139 del 11 lug 2011	prot. E/1319 del 22 lug 2011	10
	326	SUD PROGETTI SRL Fax: 091344549 sp@pec.sudprogetti.it	PALERMO	VIA GENERALE EMANUELE DI MARIA 83 90141	04953590827	04953590827	prot. U/140 del 11 lug 2011	prot. E/1367 del 26 lug 2011	42,33
	384	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SE. LO. Fax: 0941 42 21 26 info@seloweb.eu	TORTORICI	VIA SAN SALVATORE 12, 98078	02626360834	02626360834	prot. U/141 del 11 lug 2011	prot. E/1342 del 22 lug 2011	36,11
	387	MAURIZIO VELLA Fax: 091 62 55 939 maurizio.vella@ingpec.eu ptfmvella@gmail.com	CANICATTI'	VIA VITTORIO EMANUELE 175, 92024	VLLMRZ55B22B602M	01884780840	prot. U/142 dpl 11 lug 2011	prot. E/1372 del 26 lug 2011	5,195
	391	FILIPPO GULLO Fax: 090 59 631 filippo.gullo@ingpec.eu	MESSINA	VIA UCCELLIERA IS. 438/A 1, 98121	GLLFPP67M28F158N		prot. U/143 del 11 lug 2011	prot. E/1370 del 26 lug 2011	51,33
	411	ALESSANDRO DI TOMMASO alessandro.ditommaso@ordineingegnerimessina.it	NIZZA DI SICILIA	VIA UMBERTO I 358, 98026	DTMLSN73R10F158J		prot. U/144 del 11 lug 2011		

numero offerte pervenute 12

Dott. Maurizio Croce

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ME126	Servizio: PD PE DL e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di "Muri su pali e raccolta acque – Zona S.Antonio-Sciortino"		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 119 del 07 lug 2011	Data Lettera Invito	11/07/2011	Data scadenza Gara	26/07/2011
Tortorici 126	CUP	J14C11000100001	CIG	2962626450	Resp. Proced.	Arch. Di Magro		
	Importo	€ 58.872,65	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 18.652,90	Ribasso	51,00%	importo aggiudicato	€ 28.847,60
	Decreto Commissione Verbale	Decreto 153 del 27 luglio 2011 28/07/2011	Aggiudicataria	Giuseppe Puglisi cell: 337 88 29 30	Aggiud.Provvisoria	prot. U/231 del 28 lug 2011	Aggiud. Definitiva	prot. 272 del 2 settembre 2011
			Contratto	02/09/2011	registrazione	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 18547 del 26 settembre 2011		

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Indirizzo	Città	Codice Fiscale	P. IVA	INVITO	OFFERTA	Ribasso
aggiudicataria		GIUSEPPE PUGLISI Fax: 090 57 26 244 giuseppe.puglisi2@ingpec.eu	MESSINA	VIA BONER 36, 98121	PGLGPP48S28F158M	00404340838	prot. U/145 del 11 lug 2011	prot. E/1296 del 19 lug 2011	51
		DOMENICO TRIOLO Fax:0902939633 domenico.triolo@ingpec.eu	SANTA TERESA DI RIVA	VIA ROMA 11 98028	TRLDNC62M14D824I	03097880839	prot. U/146 del 11 lug 2011	prot. E/1325 del 21 lug 2011	27,69
		FILIPPO RUSSO Fax: 0942 75 11 39 filippo.russo2@ingpec.eu	SANTA TERESA DI RIVA	VIA F. CRISPI 136 98028	RSSFPP47L08I311M	00313930836	prot. U/147 del 11 lug 2011	prot. E/1289 del 19 lug 2011	37,77
		CARMELO FRANCESCO DE CARO Fax:095437553 carmelofrancesco.decaro@ordineingegneri catania.it	CATANIA	VIA GUSTAVO VIGLIASINDI 12 95126	DCRCML48E15C351Y	00410190870	prot. U/148 del 11 lug 2011	prot. E/1307 del 20 lug 2011	42,24
		ANTONIO CHILLEMI Fax:0942791703 ing.chillemi_a@virgilio.it	SANTA TERESA DI RIVA	VIA DELLE COLLINE 99 98028	CHLNTN68R18F158G	02069680839	prot. U/149 del 11 lug 2011	prot. E/1318 del 120 lug 2011	18,36
		STUDIO APPLICAZIONI IDRAULICHE SRL Fax: 091586442 cesare.arici@ordineingpa.it	PALERMO	VIA ALFONSO BORRELLI 50 90139	04997110822	04997110822	prot. U/150 del 11 lug 2011	prot. E/1375 del 26 lug 2011	28,66
		SUSANNA DI BELLA susannadibella@ingpec.eu	CAPO D'ORLANDO	VIA FRANCESCO CRISPI 47 98071	DBLSNN82C66F158J	02892670833	prot. U/151 del 11 lug 2011	prot. E/1338 del 22 lug 2011	23
		TEAM PROJECT SRL Fax: 035200716 info@teamprojectsrl.it	BREMBILLA	VIA LIBERTA' 5 24012	01852730983	02746590161	prot. U/152 del 11 lug 2011	prot. E/1288 del 19 lug 2011	40,55
		MASSIMO BOVO Fax: 093161224 arch.maxbovo@tin.it	SIRACUSA	VIA TRIESTE 9 96100	BVOMSM67D17D960P	01228270896	prot. U/153 del 11 lug 2011	prot. E/1326 del 21 lug 2011	10
		ALESSIO CIPRIANI Fax: 0521877112 gruppocipriani@pec.it	SISSA	VIA GRAMIGNA 14 43018	CPRLSS74B02G337Y	02424380349	prot. U/154 del 11 lug 2011	prot. E/1366 del 26 lug 2011	6,71

numero offerte pervenute 10

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ME128	Servizio: PD PE DL e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di ""Muri e barriere paramassi – Zona Batana-Pagliara-S.Leone"		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 122 del 07 lug 2011	Data Lettera Invito	11/07/2011	Data scadenza Gara	25/07/2011
Tortorici 128	CUP	J14C11000110001	CIG	29627277A8	Resp. Proced.	Arch. Di Magro		
	importo	€ 58.329,72	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 58.329,72	Ribasso	55,85%	importo aggiudicato	**€ 25.752,57**
	Decreto Commissione Verbale	Decreto 152 del 27 luglio 2011 28/07/2011	Aggiudicataria	Daniele Bisignani	Aggiud.Provvisoria	prot. U/230 del 28 lug 2011	Aggiud. Definitiva	prot. 1467 del 9 ago 2011
	Decreto aggiud.Def	Decreto 181 del 9 ago 2011	Contratto	23/08/2011	registrazione	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 18090 serie 3 del 20 settembre		

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Indirizzo	Città	Codice Fiscale	P. IVA	INVITO	OFFERTA	Ribasso
	3	Fax: 091 51 55 00 mario.lupo@ordineingpa.it	VIA BRIGATA VERONA 21, 90144	PALERMO	LPU MRA 52P28 G273P	02415560826	prot. U/120 del 11 lug 2011	prot. E/1341 del 22 lug 2011	20,07%
	140	ANTONIO MINUTELLA Fax: 0921 64 46 17 antonio.minutella@ordineingpa.it	CONTRADA SPIRITO SANTO snc, 90024	GANGI	MNTNTN62L10D977A	03573560822	prot. U/121 del 11 lug 2011	prot. E/1340 del 22 lug 2011	51,10%
fuori tempo max	165	ATTILIO SANTINI attilio.santini@ingpec.eu	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI 298, 92100	AGRIGENTO	SNTTL51C07A089T	01507280848	prot. U/122 del 11 lug 2011	prot. E/1382 del 27 lug 2011	fuori tempo
	261	PIETRO MANDANICI pietro.mandanici@ingpec.eu	VIA BENEDETTINA SUPERIORE 50, 98050	TERME VIGLIATORE	MNDPTR50P30F158D		prot. U/123 del 11 lug 2011	prot. E/1328 del 21 lug 2011	34,19%
	331	FRANCESCO CONA francesco.cona@ingpec.eu	VIA BADEN POWELL II° TRAV. N. 3 93015	NISCEMI	CNOFNC76H19F899Q	01845500857	prot. U/124 del 11 lug 2011	prot. E/1306 del 202 lug 2011	23,00%
codice errato sul plico	338	FRANCESCO RUSSO Fax: 0942751139 francesco.russo9@ingpec.eu	VIA F. CRISPI 136 98028	SANTA TERESA DI RIVA	RSSFNC81R19F158O	03003610833	prot. U/125 del 11 lug 2011	prot. E/1291 del 19 lug 2011	37,77%
	379	ROSARIO ALICO' Fax: 0942 79 46 15 rosario.alico@pec.edaweb.it	VIA FABBRICA 35, 98027	ROCCALUMERA	LCARSR74C31F158H	02581430838	prot. U/126 del 11 lug 2011	prot. E/1327 del 21 lug 2011	38,18%
	386	GIOVANNA VELLA Fax: 091 34 82 58 giovanna.vella@archiworldpec.it	VIA DEGLI ORTI 13, 90143	PALERMO	VLLGNN83R51G273U	05652150821	prot. U/127 del 11 lug 2011	prot. E/1330 del 21 lug 2011	4,90%
aggiudicataria	423	DANIELE BISIGNANI daniele.bisignani@ntcingegneria.it	VIA GALLIANO 6/O, 95036	RANDAZZO	BSGDNL67T06Z133X	03332990872	prot. U/128 del 11 lug 2011	prot. E/1280 del 19 lug 2011	55,85%
	441	STUDIO MALLANDRINO SRL Fax: 091 61 20 259 studiomalandrino@legalmail.it	VIA PIANO DI GALLO 34, 90151	PALERMO	05132040824	05132040824	prot. U/129 del 11 lug 2011	prot. E/1268 del 18 lug 2011	33,33%

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME061_DL	Affidamento del servizio di Direzione dei lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Consolidamento via Durante e via S. Lucia"		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto 156 del 28 lug 2011	Data Lettera Invito	28/07/2011	CUP	G59D11000030002
Castel di Lucio DL					Data scadenza Gara	04/08/2011	CIG	308132342D
	Resp. Proced.	Ing. Giuseppe La Placa						
	importo	€ 89.030,85	Importo soggetto a ribasso	€ 89.030,85	Decreto Commissione	5 del 4 agosto 2011	Aggiudicataria	STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGG. G. MINEO E P. SCAVAGLIERI
			oneri sicurezza		Verbale	04/08/2011		
	Ribasso	63,20%	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 32.763,35	Aggiud.Provvisoria	prot. 244 del 4 ago 2011	Aggiud. Definitiva	prot. 1563 de 25 ago 2011
	IMPORTO AGGIUDICATO	€ 32.763,35						
	Decreto aggiud.Def	Decreto n. 199 del 25 ago 2011			Contratto	08-set-11	REGISTRAZIONE CONTRATTO	Ag. Delle Entrate Dir. Provinciale Roma uffio Roma 2 Aurelio n. 18548 serie 3 del 26 settembre 2011

note	prot. Istanza	Denominazione Impresa	Indirizzo	Città	Codice Fiscale	P. IVA	INVITO	OFFERTA	%Ribasso
ammessa	295	S.T.I. - STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Fax: 0942792668 giuseppe.garufi@ingpec.eu	VIA FUCESI D'AMERICA 5 98023	FURCI SICULO	02766470831	02766470831	prot. U/232 del 28 lug 2011	prot. 1407 del 2 ago 2011	50,00
ammessa	572	GIOVANNI DI BELLA Fax: 0941902797 susannadibella@ingpec.eu	VIA MESSINA 59 98071	CAPO D'ORLANDO	DBLGNN52H27E876R	01342550835	prot. U/233 del 28 lug 2011	prot. 1422 del 3 ago 2011	25,12
ammessa	610	GIOVANNI AMATO Fax: 0933 24872 giovanni.amato@ordineingegneriacatania.it	VIA MADONNA DELLA VIA 96 95041	CALTAGIRONE	MTAGNN55E08B428Y	02026250874	prot. U/234 del 28 lug 2011	prot. 1424 del 3 ago 2011	49,13
ammessa	936	Maurizio Schillaci 095 7465268 Maurizio.schillaci@geopec.it	PIAZZA UNITA' D'ITALIA 11 90144	PALERMO	05713430824	05713430824	prot. U/235 del 28 lug 2011	prot. 1410 del 2 ago 2011	49,46
ammessa	619	STUDIO TETA INGEGNERIA S.R.L. Fax: 091 7302316 paolo.tripoli@ordineingpa.it	PIAZZA UNITA' D'ITALIA 11 90144 PALERMO Fax: 091 7302316 paolo.tripoli@ordineingpa.it				prot. U/236 del 28 lug 2011	prot. 1415 del 2 ago 2011	58,27
ammessa	1114	Vincenzo Gugliotta Fax: 0931 857576 Vincenzo.gugliotta@ordineingegnerisiracusa.it	Via Dante Alighieri 136	Rosolini SR			prot. U/237 del 28 lug 2011	prot. 1408 del 2 ago 2011	20,23
aggiudicataria	769	STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGG. G.MINEO E P. SCAVAGLIERI Fax: 095 325264 studio@studiomineoscavaglieri.it	Viale regina Margherita 35/b 95125 Fax: 095 325264 studio@studiomineoscavaglieri.it	Catania			prot. U/238 del 28 lug 2011	prot. 1416 del 2 ago 2011	63,20
ammessa	756	SITEC ENGINEERING SRL Fax: 0165 23 53 02 corrado.trasino@ingpec.eu	VIA FEDERICO CHABOD 44 11100				prot. U/239 del 28 lug 2011	prot. 1419 del 3 ago 2011	25,00
ammessa	806	GALIPO' CONO Fax: 0941 957159 cono.galipo@ingpec.eu	VIA CONSOLARE ANTICA 544 98071	CAPO D'ORLANDO ME			prot. U/240 del 28 lug 2011	prot. 1430 del 4 ago 2011	12,47
ammessa	1107	Gaetano Saitta Fax: 095 7919750 Gaetano.saitta@ordineingegneriacatania.it	Via della Fiaccola, 14	Catania	GLPCNO54L18B666N	00763240835	prot. U/241 del 28 lug 2011	prot. 1423 del 3 ago 2011	53,37

numero offerte pervenute 10

Dott. Maurizio Croce

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

SR177_DL	Direzione Lavori - Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR)		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 544 del 18 ottobre 2012	Data Lettera Invito	prot. n. 4150/2012 del 18 ottobre 2012	Data scadenza Gara	ore 09,30 del giorno 31 Ottobre 2012
CARLENTINI 177-DL	CUP	J15D12000320001	CIG	46338126A0	Resp. Proced.	Geom. Francesco Ingalisi		
	importo	€ 63.460,01	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 63.460,01	DECRETO COMMISSIONE Verbale	00/01/1900 31 Ottobre 2012 alle ore 10,30	PROFESSIONISTA INCARICATO	ING. lanza antonio
	Ribasso	50,85%	IMPORTO AGGIUDICATO	€ 31.189,14	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 31.189,14	Aggiud.Provvisoria	PROT. N. 223 DEL 31 OTTOBRE 2012
	Aggiud. Definitiva	prot. 4893 del 22 ottobre 2012	Decreto aggiud.Def	DECRETO N. 637/12 del 22/11/2012	Contratto	11-dic-12		

note	ID_Fornitore	Ragione sociale	indirizzo	E-mail	PEC	tel	fax	ribasso
	10000987652	Castaldo Salvatore	via Giovanni XXIII, 170, Agrigento	info@studio-castaldo.it	salvatore.castaldo2@ingpec.eu	0922 29050	0922 29050	
	10000990305	dott. ing. giovanni saitta	piazza roma , 9, Catania	saittag@tin.it	giovanni.saitta@ingpec.eu	095 447301	095 7260444	
	10000895589	ing. maurizio vella	via vittorio emanuele, 175, Canicatti' (Ag)	ptfmvella@gmail.com	maurizio.vella@ingpec.eu	+393386418169	09221901511	5,68
AGGIUDICATARIO	10000905447	lanza antonio	via casella, 18, Canicatti' (Ag)	studiolan@virgilio.it	antonio.lanza@ingpec.eu	0922854011	0922854011	50,85
	10000884008	Nicola Rustica	via Trento is.71, 15, Messina	n.rustica@gmail.com	nicola.rustica@ingpec.eu	0902938916	0902938916	

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

ME115_2-DL	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli		Decreto Approv Specif Tecn	Decreto n. 548 del 22 ottobre 2012	Data Lettera Invito	prot. n. 218 del 22 ottobre 2012	Data scadenza Gara	ore 09,30 del giorno 05 novembre 2012
Sant'Angelo di Brolo DL	CUP	J85D12000540001	CIG	4641745924	Resp. Proced.	Ing. Vittorio Ricciardi		
	importo	€ 98.943,81	importo soggetto a ribasso oneri sicurezza	€ 98.943,81	Verbale	05 novembre 2012 alle ore 11:00	PROFESSIONISTA INCARICATO	Studio Ing.Orlando
	Ribasso	43,50%	IMPORTO AGGIUDICATO	€ 55.903,25	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 55.903,25	Aggiud.Provvisoria	PROT. N. 225 DEL 5 OTTOBRE 2012
	Aggiud. Definitiva	prot. 4894/12 del 22/11/2012	Decreto aggiud.Def	DECRETO N. 638/12 del 22/11/2012	Contratto	11-dic-12		

note	ID_Fornitore	Denominazione Impresa	Indirizzo	E-mail	PEC	Telefono	Fax	%Ribasso
	10000898660	Agostino La Rosa	Via Longo is.390, pal. C, s.n.c., Messina	ago.larosa@inwind.it	agostino.larosa@ingpec.eu	3201926381	090364154	56,00
	10000894195	Antonio Pio D'Arrigo	via Gagini, 6, Messina	a.darrigo@tiscali.it	antoniop.darrigo@ingpec.eu	090364154	090364154	17,00
	10000878653	BETA studio srl	Via Guido Rossa, 29/A, Ponte San Nicolo' (Padova)	info@betastudio.it	betastudio@legalmail.it	0498961120	0498961090	
	10000884016	C&C ENGINEERING SRL	Via Nazionale, 96, Terme Vigliatore (Messina)	carmelocalliri@virgilio.it	cecengineeringsrl@postecert.it	0909782254	0909743501	32,16
	10000894863	CASCONE Engineering s.r.l.	VIA MINEO, 33, Catania	studio.cascone@tiscali.it	santimaria.cascone@ordingegnericatania.it	095/506364	095/431373	50,21
	10000894398	Domenico Mangano	Via P. Mafalda , 24, Messina	mangano.domenico@alice.it	domenico.mangano@ingpec.eu	09048869	09048869	27,87
	10000899952	Dott. Ing. Ottavio Filippo Liotta	Viale delle Alpi, 40, Palermo	ottavioliotta@yahoo.it	ottaviofilippo.liotta@ordineingpa.it	091206190	091206190	
	10000879514	F.a.L.co. Engineering & Consulting s.n.c. di Francesco Fasci e Domenico Licordari	via Ravagnese Arangea, 5, Reggio Calabria	ing.licordari@falcosnc.it	info@pec.falcosnc.it	0965640101	0965640101	34,04
	10000879438	f.lli giunta project s.r.l.	via nazionale , 203, Terme Vigliatore (Messina)	studioarchitettogiunta@tin.it	giuntaproject@gigapec.it	0909782233	0909782233	37,32
	10000886013	GIAMBERARDINO S.R.L.	Via cerrani, snc, Pretoro (Chieti)	info@giaexploring.it	giamberardino@postecert.it	0871898023	0871898874	26,92
	10000898446	Ing. Arch. Giuseppe Lumera	Via Morillo, 1, Naro (Agrigento)	glumera@gmail.com	giuseppe.lumera@ingpec.eu	0922956791	0922953149	52,11
	10000882502	Ing. Francesco Mammoliti	VIA DOGALI IS. 222 , 1/A, Messina	mammoliti.francesco@tiscali.it	francesco.mammoliti@ingpec.eu	3473465837	0902922581	41,54
	10000900579	Ing. Pietro Spina	Via Francesco Lo Jacono , 81, Palermo	ing.spinapietro@inwind.it	pietro.spina@ordineingpa.it	091303506	091303506	50,70
	10000882965	Ing. Raffaele De Leonardis	C.da Citola - vill. Annunziata, 19, Messina	studiotecnicodeleonardis@hotmail.it	raffaele.deleonardis@ingpec.eu	090360426	090360426	
	10000879126	Ing. Salvatore Lombardo	V. GAGINI, 12, Trabia (Palermo)	sal_lo@libero.it	ingsalvatorelombardo@pec.it	0918147548	0918147548	53,05
	10000893295	Ingegnere Serenella Bellino	CORSO SICILIA , 111, Catania	serenella.bellino@ordineingegnericatania.it	serenella.bellino@ordineingegnericatania.it	095317549	095317549	27,10
	10000987882	Romeo Antonino	Via Iove, 6, Carolei (Cosenza)	antonino_romeo@virgilio.it	antonino.romeo@ingpec.eu	3403396117	0984-624473	48,35
	10000904080	STIGE & Partners S.r.l.	Via Filangeri, 48, Napoli	segreteria@studiostige.it	andre.parisi@odcecnapoli.it	081413062	081413062	
	10000892693	STUDIO TECNICO ING. ANTONINO BUTERA	VIA NORVEGIA, 8, Aragona (Agrigento)	antonino.butera@ingpec.eu	antonino.butera@ingpec.eu	0922699014	0922699014	
aggiudicatario	10000878434	Studio Ing.Orlando	via minerva, 21/c, Agrigento	studio_ing_orlando@libero.it		092220484	092220484	43,50
							soglia di anomalia	47,735417

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

Allegato 3

QUADRO RIEPILOGATIVO

degli interventi di cui all'elenco "A" dell'AdP

Il Commissario Straordinario Delegato
(*Dott. Maurizio Croce*)

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
per l'attuazione degli interventi infrastrutturali di cui all'Accordo di Programma siglato
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010
Ex D.P.C.M. 16 dicembre 2010

ELENCO INTERVENTI A

REGIONE SICILIANA

PROV.	COD.	COMUNE	FRAZIONE / LOCALITA'	CUP	TITOLO	IMPORTO A.d.P.	IMPORTO provvisorio	STATO DI FATTO	Sito	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	AFFIDAMENTO LAVORI: Impresa	AFFIDAMENTO LAVORI: Data inizio lavori	STATO DI ATTUAZIONE (FINANZIAMENTO): n. e data	STATO DI ATTUAZIONE (FINANZIAMENTO): Servizio	RUP	Numero R.U.P. in elenco
AG	001	Agrigento	A	-	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Interventi di messa in sicurezza del centro abitato	€ 1.000.000,00	€ 2.800.000,00	Lo progettazione è affidata al Comune di Porto Empedocle. Il progetto di parte, di cui alla nota prot. 1349 del 21/03/2011 e nel seguito precisato, è stato approvato dalla Commissione, nella seduta del 15/04/2011 e nel seguito precisato. Con nota acquisita agli atti con prot. n. 1455 del 05/04/2012, il RUP, ha richiesto di rimodulare il progetto originario, in quanto, a seguito di sopralluoghi congiunti effettuati con i tecnici della Commissione, è emersa la necessità di realizzare un ulteriore tratto stradale, nell'ambito dell'area ritenuta di 3ª fascia, ha richiesto un ridimensionamento per lo stralcio dello stesso dei lavori e precisamente gli interventi da stesso ne scaturi. Con nota acquisita agli atti con prot. n. 1455 del 05/04/2012, il RUP, ha, altresì, comunicato di aver affidato l'incarico per la redazione della perizia di variante, nonché del progetto esecutivo, alla Commissione che, a seguito dell'esame della perizia di variante, nella seduta del 24/05/2012 è stata necessaria nominare la perizia peraltro, nonché del progetto esecutivo, nonché del sopralluogo alla nuova stazione appaltante. Con nota acquisita agli atti con prot. n. 2800 del 27/07/2012 il RUP ha trasmesso copia del verbale di gara, con Decreto Commissariale n. 486 del 30/12/2013 è stato formalizzato il progetto esecutivo. A seguito della presentazione di gara, con Decreto Commissariale n. 486 del 30/12/2013 è stato disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori di costruzione originale per il ribasso offerto pari al 20,00% sull'importo a base d'asta. Con nota acquisita agli atti con prot. n. 2800 del 27/07/2012 il RUP ha trasmesso copia del verbale

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Siciliana programmazione 2007-2013 - Delibera CIPE n. 166/2007"
Ex D.P.C.M. 16 dicembre 2009

ELENCO INTERVENTI 4

REGIONE SICILIANA

PROV	CAT	COMUNE	PRIOR ARTT.89	STATO	TITOLO	IMPORTO COMPLESSIVO	STATO PROGETTUALE	SOA	AFFIDAMENTO PROG.	AFFIDAMENTO ESECUZIONE		QUOTE FINANZIAMENTO		ELIP	Numero ELIP Scaduto
										IMPRESA	SOCIETÀ TECNICA	n. / data	importo		
AG	035	Siculiana	A	COMITATO 24 FEB 2011 COMPLETO 24 MAG 2011	Opere di consolidamento pareti Costa di Vinlor	€ 800.000,00	€ 800.000,00	Fabbisogno dell'intervento è stato redatto dai professionisti incaricati dal Comune di Siculiana. In sede di Conferenza di Servizi del 10/08/2004, convocata dallo stesso Comune, sono stati esaminati gli elaborati progettuali e, a seguito di tale esame, è stata richiesta la revisione del progetto, in adempimento alle prescrizioni formulate in sede di CdS, da parte del progettista, di cui, tra l'altro, l'esecuzione di indagini integrative. Assessorato Territorio e Ambiente Autorità d'ambito ATO ATO 4 con n. 5 del 27/01/1786 del 13/05/2011, il Commissario ha chiesto al Comune l'integrazione del progetto alle prescrizioni formulate, di elaborati integrativi e di ulteriori indagini geologiche e geotecniche, così come richiesto dal Comune con nota prot. n. 4081 del 28/10/2011 e successiva integrazione del 14/02/2012. A seguito della CdS del 25.08.2011, TUTC, con nota acquisita al prot. n. 3081 del 08.08.2012, comunica l'impossibilità di rilasciare il progetto. Con nota prot. n. 4081 del 28/10/2011, il Comune ha richiesto, tra l'altro, la revisione del progetto. Il Geom. Croce di Agrigento, con nota acquisita al prot. n. 3303 del 13 settembre 2012, comunica la rinuncia all'incarico.	ATTESA AFFIDAMENTO PROGETTO	IN ng							
CL	030	Serradifalco	A	COMITATO 24 FEB 2011 COMPLETO 15 SETT 2011	Progetto per la messa a norma della rete e relativo "kit" antincendio da cavità sotterranee e messa in sicurezza (363.259.082 nel comune di Serradifalco (CL)	€ 1.700.000,00	€ -	Ad oggi della richiesta del 15/06/2012 il Consiglio, su proposta del Commissario, dispone la revoca del Provvedimento e contro-deduzioni inoltrate il Commissario della Protezione Civile Regionale, con nota prot. n. 1/2012 del 13/01/2012, ha richiesto la revoca del Provvedimento e formale nulla osta a 3 (LA PROVE 2009-2013). Il Comune si riserva la possibilità di richiedere il progetto a seguito dell'avvenuta riconfigurazione. Il Commissario, con nota prot. n. 2321 del 21 aprile 2011, ha chiesto integrazioni documentali. Con nota prot. n. 2340 del 17/04/2012 il Commissario rifiuta e annulla il provvedimento precedentemente emesso, in quanto non ha ricevuto le integrazioni richieste. Con nota acquisita agli atti al prot.n.2760 del 18/07/2012, il Commissario ha richiesto gli elaborati integrativi, così come richiesto dal Comune con nota prot. n. 4081 del 28/10/2011. PATTERSON SRL (all'ATI: ECOTRANSMARE S.R.L.(MANDATARIA) CON LA QUALE CI HA DATO PAI con 2 atti non prot. n. 2627 del 30/05/2012	IN ISTANTE AVVOCATO	INVITALIA						Arch. Gianmarco Di Maggio	D.S. n. 288 del 10.08.2012
CT	022	Biancavilla	A	-	Consolidamento Piana	€ 1.092.500,00	€ 1.092.500,00	Con nota prot. n. 339 del 10/01/2012 il Commissario invitava il Comune di Biancavilla a trasmettere il progetto esecutivo. Il Comune trasmetteva il Progetto esecutivo con nota acquisita agli atti al n.2282 del 14/06/2012 (collaudo e consegna entro 180 giorni dalla consegna dei lavori). A seguito di incontri e verifiche, il 15/11/2012 il RUP con nota acquisita al protocollo con n. 3377 del 27/06/2012, trasmetteva copia del Verbale di Validazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. per l'esecuzione avente ad oggetto: Piano stralcio dell'intervento è stato stralciato dal giudizio Decreto n°296/47 Servizio 07-2000/prot. n. 2376 del 25/06/2010). Avviato dalla Comunità dei Comuni del 18/07/2012, trasmette copia dei seguenti documenti a corredo del progetto esecutivo: Relazione generale, Computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari, Quadro economico, Capitolato speciale d'appalto, Schema di contratto, Piano di sicurezza e coordinamento, Cronoprogramma, Piano particellare di esproprio, Relazione geologica, Relazione geotecnica, Relazione idrologica e idraulica, Relazione sulle strutture, Elaborati grafici, Piano di manutenzione dell'opera. A seguito del Consiglio del 21/01/2013 l'Assessore diventa il commissario dell'ATO, che, quale ente competente, trasmetterà tutta la documentazione. Nel corso del Consiglio del 21/01/2013 l'Assessore comunica di aver trasmesso tutto la copertura finanziaria necessaria. A seguito della rimozione dell'Assessore, la Progettazione verrà affidata ad INVITALIA con copertura finanziaria necessaria. Con nota protocollo n. 1295 del 12/03/2013 la Commissione trasmetteva all'Ufficio del Commissario il progetto esecutivo.	PRESENTAZIONE ATTI DI GARA	COMUNE	-	-	-	€ -		Geom. Santo Sallia (UTC)	Decreto Commissariale n. 329 del 12/07/2013
CT	023	Calatabiano	A	COMITATO 21 OTT 2010 COMPLETO 24 FEB 2011	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapilla - Pasteria	€ 250.000,00	€ 250.000,00		PROGETTO ESECUTIVO ACQUISITO A ATTESA PARERI	INVITALIA	-	-	-	€ -	Dott. Gaetano Cani	Decreto Commissariale n. 336 del 19/07/2013
CT	024	Castel di Iudica	A	-	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	La progettazione è stata affidata ad Ennesse, che con nota prot. n. 666 del 23/03/2012 il Comune ha richiesto la presentazione preliminare di taluni studi (quadro di sintesi, in data 18/07/2012, il Comune ha trasmesso la documentazione richiesta, che è stata ritenuta gli elaborati di sintesi versioni ed integrazioni). 6.00 di CT, con nota acquisita al prot. n. 2778 del 16/07/2012, chiede integrazioni al progetto esecutivo, che il Comune trasmetteva con nota prot. n. 3727 del 08.10.2012. Il Comune con nota prot. n. 3727 del 08.10.2012, trasmetteva all'UC copia del progetto esecutivo modificato ed integrato a quanto richiesto. Con nota prot. n.3144 del 14/08/2012 l'ATI (Sez. 3 comunica di aver avuto esperienze e precisa che il progetto esecutivo è stato redatto dal Dott. Geol. Giuseppe Nicolosi, identificato nell'elenco Nicci per assenza di adeguata relazione idraulica per la definizione delle interferenze con le opere di mitigazione. La relazione idraulica mancante è stata trasmessa con nota prot. n. 3347 del 19/09/2012. L'intervento viene finanziato con Ordinanza n. 640 del 21/01/2013 e con Decreto n. 324 del 05/12/2012 viene approvato il Bando di gara e viene avviata alle procedure di affidamento.	AFFIDAMENTO LAVORI	COMUNE	-	-	n. 146 del 11/10/2013	€ 3.000.000,00	Geom. Domenico Tarantola	Decreto Commissariale n. 394 del 16 giugno 2014
CT	025	Giarre	A	-	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Fra S. Maria la Strada	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	Il Comune, con nota prot. 3823 del 17/12/2011 (da loro data Approvazione per Presa Forma del 13/12/2011, trasmette i 2 progetti redigenti ed integrati con le modifiche richieste, la conferma l'inserimento di un progetto qualificato per l'acquisizione del parere di compatibilità ambientale. L'ATI Sez. 3 con nota prot. n. 1872 del 19/06/2012 comunica il Comune che non può rilasciare il parere di compatibilità e resta in attesa/invia per un/non intervento. Nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2012 vengono esposti tutti i pareri degli enti competenti, tranne quello della Soprintendenza, che viene richiesto dal RUP. Assegnatario/a, contestato, in data dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, con nota di richiesta del Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA con nota prot. n. 34191 del 18.06.2012. La pubblicazione sono state effettuate sulla GURS n. 43 parte II del 12/10/2012	PROGETTO ESECUTIVO ACQUISITO A ATTESA PARERI	COMUNE	-	-	-	€ -	Geom. Sebastiano Di Mauro Capo Servizio Progettazione della SUA Area	Decreto Commissariale n. 394 del 23/04/2013

Pagina 2 di 17

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO
per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Siciliana (articolo 2, comma 240, della legge 9 dicembre 1998, n. 191)

EL.E.P.C.M. 19 dicembre 2010

ELENCO INTERVENTI 4

PROV	LOT.	CONTAM.	PUNTO ATTRAVER.	COMPAR.	TITOLO	IMPORTO SUAP	IMPORTO Aggiudicato	LAVORI ESEGUITI	SAL	AMMINISTRATORE / RESPONS.	AFFIDAMENTO Ditta/Ati	ARTICOLAZIONE IMPRESA	INSEDIAMENTO		RUP	Identificativo RUP Gl-presidio
													n. e data	importo		
CT	016	Giarre	A	-	Realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - Zona Cisternazzo	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	PROPOSIZIONE ATTI DI GARA	COMUNE	-	-		€ -	Geom. Sebastiano D'Urso Capo Servizio Progettazione Unità STA Area	Decreto Commissariale n. 797 del 26/06/2012
CT	017	Giarre/Riposto	A	-	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento dell'versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante a via N.Bubbi	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	PROPOSIZIONE ATTI DI GARA	COMUNE	-	-	D.C. n. 684 del 10/12/2012	€ 500.000,00	Geom. Michele Sutba UTC	Decreto Commissariale n. 125 del 10/07/2012
CT	011	Misterbianco	A	-	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fras. Poggio Lupo	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	LAVORI ULTIMATI	DIRPC CT (Dott. Aldo Bonina, Arch. Fabio Burgi, Arch. Paolo Licandri)	sino al	Fase Fase	07/11/2011 Decreto Commissariale n. 1 901 del 13/7/2011	€ 500.000,00	Dott. Aldo Bonina(DIRPC)	nota n. 53813 del 14.12.2010
CT	013	Paulmonte Ennes	A	-	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fras. Presa	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	LAVORI ULTIMATI	DIRPC CT	SECONDO sal	MICHAE s.r.l.	25/01/2013 Decreto n. 203 del 07/02/2013	€ 500.000,00	Dott. Aldo Bonina (DIRPC)	Prot. N. 53711 del 30/10/2010
CT	014	Raddusa	A	-	Opere di consolidamento del versante	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	ATTESA ADEMPIMENTO PROGETTO	COMUNE	-	-		€ -	Geom. Roberto Antonio La Mazza	Decreto Commissariale n. 342 del 25/04/2012

Pagina 3 di 17

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
per il rischio degli eventi dell'area metropolitana di Catania
nella Regione Siciliana e per gli interventi urgenti di protezione civile
D.P.C.M. 16 dicembre 2008
ELENCO INTERVENTI 4

SEZIONE ATTUATIVA

PROV	COD	CUP/CUI	TIPOLOGIA ATTUAZIONE	COMPLESSO	STRUTTURA	IMPORTO CUP	IMPORTO Rimodulato	STATO INTERVENTI	SAL	AFFIDAMENTO TIPOLOGIA	AFFIDAMENTO RIDUZIONE	AFFIDAMENTI Impresa	AFFIDAMENTI Data stipula	CONTRATTO n. e data	FINANZIAMENTI Importo	RUP	Numero data Decreto
CT	036	Ramacca	A	-	Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato	€ 1.200.000,00	1.200.000,00 €	Lo progettazione è stata affidata ad Invitalia. A seguito di espletamento della procedura di gara, con Decreto n. 234 del 14/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'Ati Mauro E. Adagio Federazione alla progettazione. A seguito della rescissione della rinuncia, con nota acquisita al prot. n. 89 del 14/01/2014 la Ditta Mauro E. Adagio Federazione ha trasmesso il progetto definitivo. Con Decreto n. 135 del 26/03/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in data 02/04/2013 e il relativo decreto per l'occupazione anticipata d'urgenza in data 08/04/2013 e il contratto è stato firmato in data 10/05/2013 e i lavori hanno avuto inizio in data 08/08/2013. Con Decreto n. 458 del 13/05/2014 è stata disposta la perizia di variante n. 1 migliorativa ed in diminuzione. A seguito di comunicazione del RUP di inserire nel cronoprogramma della perizia suppletiva del Comune di Ramacca il progetto di variante, il Commissario, con nota prot. n. 4355 del 05/07/2022 ha richiesto al RUP di trasmettere il progetto di adeguamento tecnico-economico del progetto originario, necessario per l'inserimento nella perizia suppletiva, nonché copia della perizia n. 1 del 2014 e di ogni altro elaborato utile. Dopo alcune richieste di integrazione, successivamente acquisite al prot. n. 4355 del 05/07/2022 la relazione integrativa sono state diffuse dal RUP ed il Dott. Direttore Area come necessità e l'urgenza di intervenire con urgenza e celebrazione il pendio nel minore danni", il Comune ha chiesto di utilizzare le economie del ribasso d'asta per la realizzazione delle predette opere. Il RUP, con nota assunta al prot. n. 4830 del 13/03/2017 ha trasmesso copia della perizia di variante e suppletiva n. 2 di cui 1 (Comune). A seguito dell'espletamento della procedura di gara, con Decreto n. 3319 del 29/12/2017 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'Ati Ing. Giuseppe Cultrera con sede in Catania (CT)	IN VITALIA	INVITALIA	-	CUP: 1.200.000,00	-	-	-	-	Ing. Domenico Indelicato
CT	037	Randazzo	A	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 960.000,00	960.000,00 €	La consegna dei lavori è avvenuta il 29/03/2011 e la data di ultimazione degli stessi come da contratto risulterà avvenuta entro il 18/04/2012. A seguito del verbale di sopralluogo del 20/04/2012 con il quale il Direttore dei lavori propone l'istituzione di una perizia di variante e suppletiva necessaria ad un importo di circa 1.000.000,00 € per la realizzazione del 2° lotto funzionale al completamento dell'intervento e la risoluzione del contratto di appalto. Con Decreto Commissariale n. 1268 del 24/05/2012 è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto. I lavori sono ripresi in data 07/09/2012.	LA VORI ULTIMATI	COMUNE	-	CUP: 960.000	Lettera Dott. 29 dicembre 2011	187 - 13/6/2011	-	-	Ing. Domenico Indelicato	Decreto Commissariale n. 363 del 5 dicembre 2011
EN	042	Centuripe	A	COMITATO DEL 24 FEB 2011	Completamento consolidamento pendici ed Ed di M. Calvario	€ 770.000,00	770.000,00 €	Lo progettazione è stata affidata dal Comune di Centuripe ad un professionista esterno. Con nota acquisita al prot. n. 1430 del 28/04/2012, il Comune ha trasmesso il progetto definitivo. A seguito della nota del 28/04/2012 il Commissario, con nota prot. n. 6587 del 09/10/2012, invita il RUP a porre in essere le attività necessarie volte all'espletamento del progetto definitivo e successivamente a quello esecutivo, al fine di poter indire la gara d'appalto entro il 28/12/2012, al fine di evitare la perdita del finanziamento. Con nota del 22/11/2012 il RUP ha trasmesso la documentazione relativa alla verifica preventiva finale della procedura di cui al dell'appalto. Con Decreto Commissariale n. 682 del 13/12/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva.	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	COMUNE	-	-	-	-	-	Geom. Salvatore Di Benedetto	D.C. n. 381 del 14/07/2015
EN	044	Gagliano Castelferrato	A	-	Lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante - C.da Grigia	€ 800.000,00	800.000,00 €	Lo progettazione dell'intervento è stata affidata ad INVITALIA S.p.A. A seguito di espletamento della procedura di gara, con Decreto n. 141 del 13/07/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della stessa progettazione alla raggruppamento. A seguito sia della consegna della relativa della relativa progettazione che dei necessari sopralluoghi effettuati dal progettista, il Comune ha richiesto la rimodulazione del progetto. Come d'intervento il risultato essere notevolmente più esteso del previsto. Alla luce della criticità emerse, con nota del Commissario n. 2445 del 09/02/2015, viene sospeso il completamento della procedura di gara, con Decreto n. 361 del 02/12/2015. Il Progetto esecutivo è stato trasmesso da INVITALIA con nota acquisita al prot. n. 779 del 29/01/2016. Il progetto è stato approvato con Decreto Commissariale n. 1 del 04/01/2017 e gli importi dovuti nel progetto esecutivo risultano superiori a quelli concessi nel Decreto di Programma, la problematica è stata discussa in sede di Comitato del 18/05/2017 che ne ha rinviato la decisione a successiva riunione. A seguito della sottoscrizione del Contratto pertanto inviato la procedura di gara, il Comune trasmetta la nota prot. n. 42960 del 19/07/2022 dell'Ati Sig. 3 in cui viene richiesta la proroga dei termini per la consegna dei lavori in considerazione della Pec Pta Srl, rientrata dal Consorzio, con nota prot. n. 6587 del 07.08.22 di consenso di mandato a Consorzio dei Mandanti.	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	INVITALIA	Ati COSTRUZIONI SRL VERMEER SRL	-	-	-	-	Geom. Michele Cernaia	Decreto Commissariale n. 80 del 14.6.2021
EN	047	Regalbuto	A	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00	1.500.000,00 €	Il progetto dell'intervento è stato redatto dai professionisti esterni incaricati dall'Amministrazione Comunale di Regalbuto (EN). A seguito di richiesta del Commissario, di data 17/12/2013 l'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ha espresso parere favorevole alla predisposizione, relativo agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente. Con Decreto della dirigente, presidente l'istituzione del nuovo Cronoprogramma dei professionisti precedentemente incaricati dal Comune. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3561 del 03/05/2013, il progetto di progettazione ha intervento gli elaborati integrativi richiesti dal RUP con precedente richiesta dell'ANAS. Il Comune con nota prot. n. 4948 del 26/10/2012 ha richiesto il rinvio di interfer e	ACQUISTI FABER PRIMA TRAZIONE	COMUNE	-	-	-	-	Arch. Vito Falzacuda (Responsabile area tecnica)	Decreto Commissariale n. 355 del 17/07/2013

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 30 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A

Anagrafica Intervento																			
												Stato procedurale Intervento							
PROV	COD	COMUNE	FONTE ATTUAT.	COMITATI	TITOLO	IMPORTO A/P	IMPORTO Finanziato	LUOGO DI DETTAGLIO	SAL	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INTERVENTO	AFFIDAMENTO LAVORI		DECRETO DI FINANZIAMENTO		RUP	Nominativo RUP Incarico		
												Impresa	Data stipula Contr.	n. e data	Importo				
EN	175	Barrafranca	A	COMITATO DEL 24 Marzo 2011	Mitigazione rischio idrogeologico Ussna e monte dell'intervento già finanziato con Accordo di Programma del 30 marzo 2010)	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	La progettazione degli interventi è stata affidata dal Comune di Barrafranca a tecnici professionisti esterni. Con nota acquisita al prot. n. 425 del 05/04/2011, il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 1.930.000,00 e quindi per un importo superiore a quanto stanziato dall'APQ (€ 1.500.000,00). Il Comune ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 743 del 25/05/2011, una stralcio funzionale esecutivo di importo pari a quello dell'Accordo di Programma, che però risulta redatto in assia di normativa obsoleta, così come evidenziato dal Commissario con nota prot. 1436 del 15/08/2011. Il progetto esecutivo, rimodulato ai sensi della vigente normativa, è stato trasmesso dal Comune, con nota acquisita al prot. n. 2137 del 18/10/2011, e finanziato dal Commissario con Decreto n. 152 del 06/12/2011. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 10 del 16/01/2012, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori, della durata di 357 giorni naturali e consecutivi, giorni in data 23/02/2012. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3977 del 04/06/2012, il D.L. comunica che in data 22/05/2012 sono stati sospesi i lavori. In riscontro alla nota prot. n. 3107 del 05/08/2012 in cui il Commissario chiede di notiziare in merito allo stato di avanzamento dell'intervento, il R.U.P ha collocato, con nota acquisita al prot. n. 3180 del 13/08/2012, in OIL a produrre apposita perizia di variante al fine di consentire la ripresa dei lavori. In data 17/10/2012 l'OIL, con nota assunta al prot.n. 4135 in pari data, ha trasmesso la Perizia di Variante in corso d'opera del 1° Stralcio Funzionale In data 11/12/2012 si è tenuta la Conferenza dei Servizi al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi necessari alla realizzazione degli interventi previsti nella perizia di variante e suppletiva.	SOSPENSIONE LAVORI	COMUNE		SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.r.l.	19/03/2012	302 - 5/12/2013	€ 1.500.000,00	Arch. Francesco Costa	Decreto Commissariale n. 135 del 28.11.2013
ME	049	Alcara Li Fusi	A	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	Consolidamento area, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Crapazzini	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	La progettazione è stata affidata dal Comune in data 08.03.2011. A seguito di procedura di gara, con Decreto n.104 del 27.09.2011, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari ed oggi concluse. Il progetto esecutivo è stato consegnato in data 10.10.2012 e finanziato con Decreto n. 191 del 20.12.2011. A seguito dell'espletamento della procedura di gara, con Decreto n. 18 del 18/01/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. La consegna dei lavori è avvenuta in data 13.04.2012. Con nota acquisita al prot. n. 2868 del 26/07/2012 il Comune ha chiesto di poter riutilizzare le economie per estendere l'area di intervento. Con nota acquisita al prot. n. 4215 del 13/10/2012, il D.L. certifica l'ultimazione lavori, avvenuta in data 13/10/2012. Con nota prot. n. 5266 del 11/12/2012 il D.L. ha trasmesso al Collaudatore amministrativo e statico la relazione e strutture ultimate e tabulato con le prove di carico sui pali di fondazione.	LAVORI ULTIMATI	INVITALIA	S.G.M. Srl	M.MA srl	13/04/2012	391 - 10/12/2013	€ 834.921,87	Ing. Basilio Sansavarino (UTC)	Decreto Commissariale n. 77 del 30 mag 2011
ME	051	Alì Terme	A	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	Interventi urgenti di consolidamento centro abitato	€ 900.000,00	€ 1.321.310,50	La progettazione è stata affidata al DRPC di Messina che ha trasmesso il progetto in data 24/11/2011. In sede di Conferenza Servizi del 18/11/2011, il DRPC comunica che - a seguito delle prescrizioni dettate dal GC di Me sul progetto, delle indagini geognostiche e delle nuova normativa sismica - il progetto generale ha un costo pari a circa 3.071.000 euro. Il Commissario invita l'DRPC a valutare l'opportunità di redigere uno stralcio funzionale ricentrato sull'impianto previsto in A/P di euro 900.000. Con nota prot. n. 5045 del 31/12/2013 il DRPC trasmette lo stralcio funzionale del progetto esecutivo, riapprezzando l'impossibilità di rimodulare il progetto per un importo inferiore ad euro 1.321.310,50; Con nota prot. n. 123 del 10/01/12, il Commissario trasmette la documentazione relativa allo stralcio funzionale all'Comitato di indirizzo e Controllo, che, nel corso dell'incontro del 18/05/2012 dispone l'inserimento dei fondi per l'intervento pari a € 421.050,50, come richiesto dallo stralcio funzionale presentato dal DRPC. Con nota acquisita al prot.n. 3091 del 02/04/2012, il DRPC trasmette la documentazione inerente il piano di indagini per "Adeguamento del tombino di convogliamento acque", il MATTM invita RFI ed ANAS ad interfacciarsi con il Commissario per la problematica dei combini, ed l'Commissario, non avendo avuto riscontro, collocita gli stessi direttamente con nota prot. n. 2409 del 26/06/2012 e nota prot.n. 4720 del 15/11/2012. Con nota acquisita al prot. n. 3042 del 30/11/2012, la Direzione Commerciale ed Esercizio di rete di RFI comunica l'avvenuto inoltro delle richieste all'ufficio RFI competente.	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	DRPC	-	-	-	-	€ -	Ing. Bruno Manfrè (DRPC ME)	CONVENZIONE DRPC ME
ME	052	Basicò	A	COMITATO 11 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011	Drenaggi e opere di convogliamento - C.da Badiazza	€ 300.000,00	€ 1.300.000,00	La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterno con Determina Sindacale n.23 del 28.04.2012. A seguito dell'acquisizione e della validazione del progetto esecutivo trasmesso, con Decreto n. 63 del 14.02.2012, e il finanziamento l'intervento, e con il successivo Decreto n. 128 del 26.10.2012 e il disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il contratto è stato firmato in data 04/04/2013. I lavori sono stati avviati in data 30/05/2013 e l'ultimazione dovrà avvenire entro il 29/05/2013.	AVVIATI LA VORI	Dott. Ing. Renato Ciona (Figura esterna)	-	- (Co.Ge.Ar) Soc.	30/05/2013	69 - 14/02/2012	€ 1.291.603,12	Arch. Giuseppe Trifilò (UTC)	Decreto Commissariale n. 124 del 15/11/2013
ME	053	Brolo	A		Opere di consolidamento e regimazione idraulica - C.da Jannello	€ 3.630.000,00	€ 3.630.000,00	La progettazione esecutiva è stata affidata dal Comune all'UTC con Delibera di G.M. n. 174 del 06.12.2010. Con nota 9225 del 16.04.2011 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo. Con atto n. 313/L.PP. del 13.01.2012 l'UTC nomina un nuovo progettista, che ritiene di dover apportare modifiche al progetto, e chiede la nomina di un ingegnere Geotecnico di supporto alla progettazione. L'Ufficio del Commissario nomina il R.U.P con Decreto Commissariale n.47 del 06.12.2012, e l'ingegnere Geotecnico da affiancare al progettista, con nota prot.n.343 del 06.02.2012. Il progetto rimodulato è stato trasmesso dal Comune il 16.04.2012. In sede di Conferenza Servizi del 14.04.2012 sono stati acquisiti i pareri degli enti coinvolti e si è provveduto a finanziare l'intervento con Decreto n. 237 del 24/05/2012 . Con D. C. n. 291 del 07/05/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n.431 del 29/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'impresa GEO PERFORAZIONI Srl. Il contratto è stato stipulato in data 26/09/2012 ed i lavori avviati in data 22/10/2012.	AVVIATI LA VORI	UTC	-	Geo Perforazioni srl	4 31 - 29/08/2012	237 - 14/05/2012	€ 3.630.000,00	Ing. Le Piana Giuseppe	Decreto Commissariale n. 47 del 06 febbraio 2012
ME	056	Capri Leone	A		Opere di risagomature e protezione versanti - Frazione Rocca	€ 550.000,00	€ 550.000,00	La progettazione è affidata dal Comune a professionisti esterni con Determina Sindacale n. 44 del 12.10.2010. Il progetto, dopo varie modifiche e integrazioni, viene trasmesso nella versione definitiva con nota assunta al prot. n. 134 del 18/01/2012 e, a seguito dell'acquisizione pareri, viene finanziato con Decreto Commissariale n. 96 del 08/03/2012. Con Decreto n. 99 del 13/09/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n. 287 del 20/06/2013 sono stati aggiudicati i lavori. Il contratto è stato sottoscritto in data 26/06/2013 ed i lavori consegnati il 19/07/2012 con data di conclusione prevista il 15/01/2013. Il RUP, con nota acquisita al prot. con n. 3438 del 12/08/2012, tra l'altro, ha comunicato che i lavori sono concretamente iniziati solo in data 11.09.12 ma che diversos comunque terminare indiscutibilmente entro il 15.01.2013. Con nota acquisita al prot. n. 5258 del 31/12/2012, il R.U.P trasmette la Relazione di Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 stessi necessaria durante la svolgimento dei lavori.	AVVIATI LA VORI	Ing. Salvatore Russo (Figura Esterna)	-	CONSORZIO SICILIANO ROMAGNOLO FRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - EUROEDILE COSTRUZIONI	19/07/2012	Decreto n. 96 del 08/03/2012	€ 516.898,04	Ing. Domenico Imbroglia	Decreto Commissariale n. 139 del 28.11.2013

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.07.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A

PROV	COD	COMUNE	RANGE ATTUATIVO	COMPARTO	TITOLO	IMPORTO AMF	IMPORTO Rimodulato	STATO DI FATTO	SAL	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI		DECRETO DI FINANZIAMENTO		BUP	Nomina RUP Branca
												Impresa	stato inizio lavori	n° e data	importo		
ME	057	Capri Leone	A		Opere di consolidamento con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali - Capribuoni Centro	€ 600.000,00	€ 600.000,00	Le progettazione è stata affidata dal Comune a professionisti esterni con Determina Sindacale n. 41 del 12.10.2010. Lo stesso Comune ha provveduto ad affidare la realizzazione delle indagini preliminari con Determina Sindacale n. 58 del 07.12.2010. A seguito del completamento delle indagini, in data 30.03.2011 è stato trasmesso il progetto esecutivo che, a seguito di approvazione e validazione, è stato finanziato con Decreto n. 252 del 03.10.2011. A seguito di espletamento delle procedure di Gara svolate con Decreto n. 268 del 10/10/2011, con Decreto n. 302 del 03.11.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva alla Ba.Ma. Costruzioni Srl e i lavori sono stati avviati in data 17/12/2011. In data 03/07/2012 il D.L. ordina all'impresa Ba.Ma. Costruzioni Srl di sospendere i lavori e di riprenderli quando verrà approvata la perizia di Variante e Suppletiva. Il RUP, con nota acquisita al prot con n. 1801 del 03.09.2012, trasmette al Commissario copia dell'autorizzazione a redigere la PVS trasmessa al DL. Con nota acquisita al prot. n. 3347 del 06/09/2012, il RUP trasmette gli elaborati della PVS. In data 10/09/2012 è stato sottoscritto il Verbale Ripresa Lavori e con D.C. n. 678 del 10/12/2012 l'Ufficio del Commissario ha preso atto della PVS e della rimodulazione del quadro economico. Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 3346 del 06/09/2012, ha chiesto il finanziamento delle opere di completamento per una spesa pari ad € 70.000.	AVVIATI LAVORI	Ing. Amalfi Maurizio (Figura Esterna)	TRIGILIA	R.O.M.O. COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Palermo 15.847%.	17/12/2011	252 - 03/10/2011	€ 373.816,18	Geom. Gaetano Giuffrè (UTC)	Decreto Commissariale n.219 del 21 settembre 2011
ME	058	Caronia	A	COMITATO 18 MAG 2012	Consolidamento centro abitato	€ 3.000.000,00	€ 3.653.083,35	La progettazione è stata affidata all'Ufficio del Commissario OPCM 3865/10. Il progetto, trasmesso in data 30.11.2011, a seguito di validazioni e approvazioni, è stato finanziato con Decreto n. 30 del 01.08.2011. A seguito dell'espletamento della procedure di gara, con Decreto n. 58 del 31.05.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori che hanno avuto inizio il 05/04/2011. Con Decreto n. 92 del 02/03/2012 il Commissario ha preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 con conseguente rimodulazione del Quadro economico dell'intervento. In data 13.01.2012 i lavori sono stati sospesi in attesa di ricevere per un ulteriore finanziamento da parte del Comitato di Indirizzo e Controllo per la realizzazione di lavori complementari. In seda di Comitato del 18.09.2012 l'importo dell'intervento è stato incrementato di € 750.000 per lavori indispensabili a garantire la funzionalità delle opere già realizzate. Con nota acquisita al prot. n. 3548 del 10/09/2012 il DIPC ha trasmesso il progetto di completamento dell'intervento. Il Commissario, con nota prot.n. 1750 del 17.07.2012, ha autorizzato il RUP a procedere all'adozione della procedura di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti. Al fine di procedere all'emissione del Decreto di finanziamento, propedeutico al contratto aggiuntivo dei lavori, con nota acquisita agli atti al prot. n. 3046 del 06/08/2012, il RUP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia del progetto e del verbale di validazione completo di tutti gli atti e corredo necessari. In data 16/08/2012 è stato sottoscritto dall'Impresa Presti e dal DL il Verbale di Ripresa Lavori principali ed oggi conclusi. Con D.C. n. 490 del 24/08/2012 sono finanziati i lavori complementari di completamento del consolidamento Centro abitato.	AVVIATI LAVORI	DIPC	1	PRESTI COSTRUZIONI SRL	01/04/2011	71 - 8/3/2011	€ 3.000.000,00	Ing. Bruno Manfrè (DIPC ME)	nota in entrata prot.n. 10 880 del 15 ottobre 2010
ME	059	Casalvecchio Siculo	A	COMITATO 24 FEB 2011	Consolidamento centro abitato	€ 1.363.853,00	€ 1.363.853,00	Il Comune ha affidato la progettazione a professionisti esterni con Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 28.08.2007. Lo stesso Comune, con nota prot.n. 54 del 11.01.2013, ha chiesto l'autorizzazione alla nomina di due consulenze esterne (Progettazione/Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e Studio Geologico) a causa di mancanza di professionisti all'interno dell'Amministrazione. Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 689 del 01.03.2013 e 1324 del 25.04.2012, ha trasmesso i preventivi inerenti la consulenza esterna, ed il Commissario le ha autorizzate rispettivamente con nota prot. n. 1231 del 31/04/2012 e 1478 del 03.05.2012. A seguito della Conferenza dei servizi del 11/06/2012 e successive integrazioni sono state acquisite tutte le necessarie autorizzazioni e pareri utili per l'approvazione definitiva. Con nota prot.n.1286 del 22.06.2012 il Comune ha trasmesso copia del progetto esecutivo (con Verifica, Validazione e Delibera di G.M. di approvazione della stessa) finanziato Con Decreto n. 196 del 25.06.2012. Con Decreto n. 197 del 1/08/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n. 464 del 13/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva Con Decreto Commissariale n. 634 del 11/11/2012 il Commissario ha disposto l'occupazione anticipata d'urgenza ed individuato il dirigente dell'UTC quale responsabile della attività espropriative. La Consegna dei Lavori ha avuto luogo giorno 30/11/2012.	AVVIATI LAVORI	Ing. Carmelo Trimarchi (Figura Esterna)	-	ITINERA s.r.l.	30/11/2012	-	€ -	Ing. Domenico Imbroglia	Decreto Commissariale n.394 del01 agosto 2012
ME	061	Castel di Lucio	A	-	Consolidamento via Buranno e via S. Lucia	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	La progettazione è stata redatta dai progettisti esterni incaricati dal Comune con Determina n. 51 del 3/12/2010. Il progetto è stato acquisito in data 01.02.2011 e, a seguito della validazione, è stato finanziato con Decreto n.33 del 07.03.2011, come rimodulato dal Decreto 51 del 14/06/2011. A seguito di espletamento di procedure di gara è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori con Decreto n. 163 del 01.08.2011. I lavori sono stati avviati 23/08/2011 e sono stati sospesi in date 25/01/2013 per permettere l'acquisizione di indagini integrative nelle more della redazione di una perizia di variante. I lavori sono stati ripresi in data 16.04.2012. Con nota prot. 1966 del 01/08/2012 il D.L. chiede al RUP l'autorizzazione a redigere una perizia di variante e suppletiva, corredata dal RUP con nota acquisita al prot. n. 2054 del 07/08/2012 a condizione che non comporti modifiche sostanziali che alterino la sostanza del progetto e di trovare copertura nelle somme già impegnate per l'esecuzione dell'opera con D.C. n° 238 del 12/05/ 2011. Il DL ha trasmesso, con nota acquisita al prot.n. 2756 del 19.07.2012, copia della perizia di variante approvata dal RUP con nota acquisita al pron. n. 2836 del 23/07/2012. Con Decreto n. 457 del 12/09/2012 si è preso atto della PVS con conseguente rimodulazione del Quadro Economico.	AVVIATI LAVORI	S.T.I. Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura (Figura esterna)	-	TORSTEN COSTRUZIONI SRL	23/09/2013 sospesi il 25/01/2013 *ripresa lavori il 16/04/2012	12 - 7/3/2011 come modificato dal Decr. n. 91 del 14/04/2011	€ 1.500.000,00	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto Commissariale n. 69 del 23.3.11

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO
per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 10.03.2010
ex D.P.C.M. 19 Ottobre 2010

ELENCO INTERVENTI 4

Pagina 7 di 17

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.05.2006"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A

Progettazione Definitiva										Dati procedurali significativi									
PROV	COD	COMUNE	LONGF. ATTUATA	COMITATO	TITOLO	IMPORTO AMF	IMPORTO Rendicontato	STATO DELL'ARTE	SAL	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI		DECRETO DI FINANZIAMENTO		RUP	Nomina RUP Importo
												Impresa	Data inizio lavori	n. e data	Importo		
ME	073	Galati Mamertino	A	-	Consolidamento e messa in sicurezza versante - Località Pileri	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterno con Determina Sindacale n.54 del 26/10/2010. Con nota prot. 1770 del 3/02/2011 il Commissario ha trasmesso la documentazione dell'intervento all'ARTA al fine di provvedere al finanziamento su fondi europei PO FESR 2007-2013 destinato alla Regione Sicilia. Con nota acquisita al prot. n.1334 del 25/01/2012 l'ARTA comunica che l'intervento non possiede i requisiti necessari per l'ammissibilità al finanziamento e restituisce tutta la documentazione perché il Commissario a Tecla carico della realizzazione dell'intervento. Con Decreto n. 153 del 05.04.2012 il Vi è acquisito il progetto definitivo ed esecutivo e con Decreto n. 349 del 11/07/2012 vi è acquisito lo studio geologico e le indagini geognostiche effettuati dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune. Con D.C. n. 406 del 02.08.2012 è stato finanziato l'intervento, con Decreto n. 448 del 2/08/2012 sono state avviate le procedure di affidamento lavori e con D.C. n. 514 del 04/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. In data 19/10/2013 è avvenuta la consegna dei lavori.	AVVIATI LAVORI	Comune Ing. Mario Saitta	-	AFFIDAMENTO DIRETTO	-	406 - 02/08/2012	€ 1.100.000,00	Arch. Giuseppe Cerrito	D.C. n. 362 del 07/08/2012
ME	078	Letojanni	A	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di difesa costiera	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	Il progetto è stato affidato dal Comune a progettista esterno con Delibera di Giunta n. 194 del 31.10.2002. Con Decreto Commissariale n. 120 del 23.03.2012 si è acquisito il progetto definitivo ed esecutivo e con Decreto 327 del 10/07/2012 si è acquisito lo studio geologico dei professionisti precedentemente incaricati dal Comune. Durante la conferenza dei servizi del 14.05.2012 il Commissario ha preso atto di quanto richiesto dalle amministrazioni presentied ha disposto che il progettista integrasse gli elaborati progettuali con quanto richiesto. Con nota prot. n.2347 del 13/06/2012 il Commissario ha trasmesso al progettista il parere con prescrizioni della Soprintendenza del Mare per le opportune modifiche e integrazioni. Il Progettista, con nota acquisita al prot. n. 2683 del 12/07/2012 ha trasmesso le integrazioni progettuali richiesta, inoltrate dal Commissario, con nota prot.n. 2896 del 26/07/2012 all'ARTA Serv. 2 per il parere di competenza. Il RUP con nota acquisita al prot. n. 3391 del 10/09/2012 ha trasmesso gli atti di validazione del progetto. Con Decreto n. 686 del 11/12/2012 è stato finanziato l'intervento.	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	Ing. Sascaro Agostino e Geom. Sascaro Sabrina (Figura Esterna)	-	-	-	686 - 11/12/2013	€ 2.900.000,00	Arch. Pietro Bonsignore (UTC)	Decreto Commissariale n. 124 del 26 marzo 2012
ME	079	Librizzi	A	-	Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque Contrada Nasidi e via Fratelli	€ 2.150.000,00	€ 2.150.000,00	A seguito della rinuncia da parte del DRPC di Messina la progettazione è stata affidata tal INVITALIA . Il 03/11/2011. La realizzazione delle indagini preliminari alla progettazione è stata affidata dal DRPC ed i risultati sono stati trasmessi in data 23.02.2012. L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dell'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM), che, in data 16/02/2012, ha trasmesso i verbali di restituzione dei voli aerei effettuati. A seguito dell'acquisizione della relazione geologica redatta dal Dott. Basile, Rubino e seguito delle indagini geognostiche e geofisiche effettuate dal DRPC e secondo quanto discusso nel tavolo tecnico del 31/03/2011, il geologo della CGIAM, con nota acquisita al prot.n. 1157 del 04.04.2012, ha richiesto integrazioni alla relazione. Con nota acquisita al prot. n.2041 del 07/06/2012 il geologo ha trasmesso la relazione finale di sintesi della campagna di indagini geognostiche e geotecniche e del monitoraggio strumentale di Contrada Nasidi a Librizzi. Con nota acquisita agli atti al prot. n.3383 del 03/09/2012, lo CGIAM ha trasmesso agli Uffici del Commissario le specifiche tecniche ed i relativi allegati riguardanti le indagini effettuate. Con D.C. n. 473 del 17/08/2012 sono state finanziate le indagini ed avviate le procedure per l'affidamento delle stesse. A seguito della procedura di gara, con Decreto Commissariale n. 521 del 08/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della realizzazione del Piano di indagini Preliminari di cui l'Affidataria ha trasmesso i risultati con nota acquisita al prot. n. 4781 del 19/11/2012.	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	RTP SAV SA	-	-	-	€ -	Geom. Clara Carmelo (UTC)	D.C. n. 339 del 11.07.2012
ME	080	Librizzi	A	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di contenimento Librizzi centro	€ 150.000,00	€ -	INTERVENTO REVOCATO con nota prot. n. 4781 del 19/11/2012. Le risorse resesi disponibili della revisione delle opere, pari a € 150.000, sono state destinate all'intervento 5P131 Saponara.	INTERVENTO REVOCATO			-	-	-	-	Geom. G. Adorno	
ME	081	Librizzi	A	-	Opere di consolidamento versante e sistemazione - Zona Rocca Menardi	€ 500.000,00	€ 500.000,00	La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 143 del 23.07.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione, ad oggi concluse. L'intervento è stato inserito nell'Accordo Quadro con l'Centro di Geomorfologia integrata per l'Area del Mediterraneo al fine di ottenere un rilievo topografico e una restituzione aerofotogrammetrica adeguata. Con note assunte al prot. n. 498 del 16/01/2012, 1503 del 03/05/2012 e 2761 del 16/07/2012 lo CGIAM ha trasmesso i prodotti di restituzione dei rilievi effettuati. Con nota acquisita al prot. n. 3724 del 27/09/2012 INVITALIA ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito delle CdS tenutasi in data 10/10/2012, ed al parere espresso dall'ARTA (Serv. 3) con nota acquisita al prot n. 4204 del 30/10/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri. L'intervento è stato finanziato con Decreto n. 707 del 17/12/2012, e con Decreto n. 708 del 18/12/2013 sono state avviate le procedure di gara.	AFFIDAMENTO LAVORI	INVITALIA	GEA EXPLORING SAS	-	-	-	€ -	Geom. Santo di Perna (UTC)	Decreto Commissariale n. 75 del 17 maggio
ME	087	Messina	A	-	Opere di consolidamento località Giampilieri	€ 24.000.000,00	€ 24.000.000,00	La gestione dell'intervento è stata trasferita al Commissario di cui all'OPCM 3815 del 10 ottobre 2009	LAVORI ULTIMATI			Trasferito nell' OPCM 3815 del 10 ottobre 2009 (Eventi alluvionali Giampilieri ME)					
ME	088	Messina	A	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di salvaguardia centro abitato	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	La progettazione è affidata all'Comune che incarica un progettista esterno con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 11.02.2011 Con nota acquisita al prot. n. 2951 del 20.12.2011 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della Conferenza dei servizi del 20.01.2012 è stato richiesto al Comune di rimodulare il progetto in ottemperanza alle indicazioni dell'ARTA Serv. 3. Il Progetto rimodulato è stato trasmesso con nota acquisita al prot. n. 1289 del 16.04.2012 e finanziato con Decreto n. 190 del 26.04.2012. A seguito dell'espletamento della procedura di gara, con Decreto n. 382 del 30.07.2012, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il Contratto è stato sottoscritto il 24/07/2012, i lavori cominceranno il 31.07.2012 e dovranno concludersi entro il 17/07/2013. Con D.C. n. 831 del 09.08.2013, funzionari dell'UTC sono stati incaricati del perfezionamento del procedimento espropriativo.	AVVIATI LAVORI	Comune	SIGEO	Petrinum Costruzioni srl	31/07/2013	183 - 25/04/2012	€ 3.000.000,00	Ing. Salvatore Bartolotta	Decreto Commissariale n. 203 del 04.05.2012

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 19 dicembre 2019

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A

PROV	COD	COMUNE	FASE ATTUALE	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AAP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAL	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO ESECUZIONE	AFFIDAMENTO LAVORI: Impresa	AFFIDAMENTO LAVORI: data inizio lavori	DECRETO DI FINANZIAMENTO: n. e data	DECRETO DI FINANZIAMENTO: importo	RUP	Nomina RUP: Estremi
ME	89_1	Messina	A	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento località Gotoi Sant'Anna	€ 900.000,00	€ 900.000,00	Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 444, trasmette la documentazione amministrativa. Con nota acquisita al prot. n. 3079 del 07.08.2012, il Progettista trasmette all'Ufficio del Commissario copia del Progetto esecutivo. A seguito delle CdS tenutesi in data 22.08.2012 sono stati acquisiti tutti i pareri. Con Decreto Commissariale n. 591 del 08/11/2012 è stato finanziato l'intervento, e con Decreto n. 648 del 29/11/2013 è approvato lo schema lettera d'invito alla Procedura di gara.		Comune				D.C. n. 593 del 08/11/2012	€ 900.000,00	Ing. Antonino Amaco (R/TC)	D. C. n. 379 del 20.07.2012
ME	89_2	Messina	A	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento località MAT San Marco	€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00	Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 445, ha trasmesso la documentazione amministrativa. Con nota prot.n. 484 del 14/02/2012 il Commissario, in riscontro alla richiesta del Comune, ha nominato un tecnico interno a supporto della progettazione. Con nota prot.n. 2678 del 03.08.2012, il Geologo incaricato ha trasmesso copia della documentazione integrativa allo studio geologico. In data 12/12/2012 il RUP ha trasmesso copia del progetto elaborato dal progettista in data 30/11/2012.	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	Comune						Ing. Antonino Amaco (R/TC)	D.C. 381 del 20.07.2012
ME	89_3	Messina	A	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento località MAE San Pietro	€ 510.000,00	€ 510.000,00	Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 445, ha trasmesso la documentazione amministrativa. Il Comune ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 3760 del 17.09.201, copia del progetto esecutivo aggiornato. A seguito della conferenza dei servizi del 31/05/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento. In data 20/07/2013 con Decreto n.383 si è provveduto a finanziare il progetto. Il RUP, con nota acquisita al protocollo n. 2839 del 23/07/2012 ha trasmesso ai Commissario il Verbale di Verifica e Validazione e l'Attestazione ex art. 106 comma 1. Con D. C. n. 517 del25 ottobre 2012 è stato approvato lo schema lettera di invito e dato avvio alla Procedura di gara. Con Decrete n. 643 del 26/11/2012 è stato disposto l'aggiudicazione definitiva a favore delle Edil Scale Soc. Coop.	AFFIDAMENTO LAVORI	Comune		ESE SICILIA Soc Coop. - Via Mauro ani		n.383 del 20/07/2012	€ 505.354,78	Geom. Marco Manzuso (R/TC)	D.C. n. 324 del 17.05.2013
ME	89_4	Messina	A	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento località Santa Margherita	€ 650.000,00	€ 650.000,00	Nel corso del comitati del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 441, ha trasmesso la documentazione amministrativa. A seguito del tavolo tecnico del 22/10/2012, il Commissario, con nota prot.n. 4384 del 26/10/2012, ha invitato il Comune a trasmettere con urgenza il progetto esecutivo ed il DRPC a trasmettere, entro 45 giorni, il progetto del rifonamento del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio in località Santa Margherita . A seguito delle CdS tenutesi giorno 29/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto. Il DRPC in data 10/12/2012, con nota assunta al prot.n. 5191, trasmette copia del progetto esecutivo di riflorture massi. Il progetto primo stralcio è stato finanziato con Decreto n. 699 del 13/12/12	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	Comune					€	Ing. Salvatore Bartolotta	D.C. n. 650 del 27/11/2013
ME	89_5	Messina	A	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento località Santa Stefano	€ 550.000,00	€ 550.000,00	Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 442, ha trasmesso la documentazione amministrativa. A seguito del tavolo tecnico del 22/10/2012, il Commissario, con nota prot.n. 4386 del 26/10/2012, ha invitato il RUP a trasmettere il progetto entro 15 gg. In data 29/11/2012, con nota prot.n. 5006, il Commissario ausiliario il Comune di Messina a procedere alla redazione delle attività connesse alla progettazione esecutiva dell'intervento.	PROGETTAZIONE IN CORSO	Comune					€	Geom. Domenico Currò (R/TC)	D. C. 380 del 20.07.2012
ME	091	Mirto	A	-	Consolidamento centro abitato	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	La progettazione è stata affidata ed inviata in data 08.03.2011. Con Decreto n. 544 del 27.07.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione ad oggi sinclusa. In riferimento all'Accordo Quadro del 29.11.2011 stipulato con la CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 1257 del 12 aprile 2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche inerenti ulteriori indagini da effettuare sul sito di cui il RUP ha preso atto in data 27.04.2012. Con Decreto Commissariale n. 206 del 06/05/2012 sono state approvate le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini integrative preliminari alla progettazione e dato avvio alle procedure di gara per l'affidamento delle stesse. Con Decreto Commissariale n. 150 del 30/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di indagini preliminari integrative. Le attività sono state avviate il 18/06/2012 e sono state completate in data 18/07/2013, con la trasmissione della relazione sulle indagini integrative effettuate acquisita al prot.n. 3754 in pari data. Con nota acquisita al prot. n. 3421 del 11/09/2012, la CGIAM ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia della relazione geologico-tecnica.	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL GEOMARIS (Indagini preliminari integrative)				€	Ing. Giuseppe Natoli (R/TC)	Decreto Commissariale n. 93 del 14 giugno 2013

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma vigente il 29.05.2009"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A

Individuazione Programma								Stato di attuazione				Stato di attuazione dei Appalti							
PROV	COD	COMUNE	FONTE ATTUAZ	COMPRESO	TITOLO	IMPORTO SAP	IMPORTO Rimodulato	STATO ONERATO	SAL	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO (MANCINI)	AFFIDAMENTO LAVORI		DECRETO DI FINANZIAMENTO		RUP	Numero RUP Incarico
												Progetto	Data decisi Lavori	n. e data	Importo		
ME	092	Mistretta	A		Regimentazione e rigiratina degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord-ovest dell'abitato di Mistretta – Sarrenia Santa Domenica	€ 800.000,00	€ 800.000,00	Con nota prot.n. 748 del 10.03.2012 la progettazione è stata affidata al Comune. In virtù dell'accordo quadro stipulato, lo CGIAM con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012, ha restituito i dati del rilievo senza effettuarlo. Con nota acquisita al prot.n. 1526 del 07.05.2012, il Comune ha comunicato che il progetto sarebbe stato redatto da personale interno dell'UTC che vanta affidamento, per la progettazione specialistica, da un supporto tecnico nella qualità di corrispettivo, incarico già autorizzato con nota del Commissario prot.n. 1174 del 04.04.2012 purché eseguito ai sensi delle norme vigenti. Il Comune con nota prot.n. 3304 del 05.09.2012 ha trasmesso il progetto esecutivo. Con nota prot. 3339 del 06/09/2012 il Commissario ha revocato allo CGIAM l'incarico. A seguito della GdS tenutasi in data 25/09/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri/nulla osta degli Enti interessati per l'approvazione del progetto. Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3910 del 08/10/2013, ha trasmesso copia del Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo. L'intervento è stato finanziato con D.C.n. 186 del 07/11/2012 e con D.C. n. 626 del 20/11/2012 sono stato evviate le procedure di gara.	AFFIDAMENTO LAVORI	Geom. Lucio Pani (UTC)	680 RAS (MP)				586 - 07/11/2012	€ 778.679,50	Geom. Rosario Mazzotta (UTC)	Decreto Commissariale n. 326 del 18.11.2011
ME	095	Naso	A	COMITATO 24 FEB 2011	Consolidamento del versante, opere di drenaggio in località Ospitina	€ 600.000,00	€ 1.650.000,00	La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterni con Determina Sindacale n. 37 del 01.06.2011. Con nota acquisita al prot.n. 1295 del 26.04.2012 il Comune ha comunicato di 'aver affidare incarichi professionali relativi alle competenze geotecniche, geologiche e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,a tali incarichi sono autorizzati dal Commissario con nota prot. n. 1318 del 30/04/2012, purchè conformi nei rispetti delle norme vigenti. Con nota acquisita al prot. n. 3481 del 12/09/2012 l'Comune ha informato che le indagini geognostiche e prove di laboratorio propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo erano in corso e che le stesse sarebbero state portate a termine rapidamente al fine di ed completare la progettazione esecutiva entro il mese di settembre. In data 11/10/2012 il Commissario, con nota prot.n. 4069, ha invitato l'Amministrazione a trasmettere entro 20 giorni il progetto esecutivo.	PROGETTAZIONE IN CORSO	UTC	-	-	-	-	€ -	Arch. Maria Sibani Migliore (UTC)	Decreto Commissariale n. 364 del 11/07/2013
ME	099	Piraino	A		Opere di consolidamento – Zona Rodo - S.Costantino, Policaro, San Leonardo, Caldeni, Portiera, Torre delle Clavole	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	La progettazione è stata affidata ed invitalia in data 08.03.2011. SAN LEONARDO: - Invitalia ha trasmesso il progetto in data 17.02.2012; A seguito della Conferenza dei Servizi del 27.02.2012 sono stati acquisiti tutti i pareri. Con nota assunta al prot. n.3953 del 31/05/2012 Invitalia ha trasmesso al Commissario il progetto esecutivo con le integrazioni richieste dal parere del GC. Il Progetto consegnato prevedeva, come concordato, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo da parte di RPI. A seguito di rinuncia da parte di RPI al riutilizzo, il Commissario, con nota prot. n. 7623 del 11/07/2012, ha chiesto ad INVITALIA di rimodulare e trasmettere, il Quadro Economico dell'intervento in funzione del mancato riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dalla riprofilatura degli argini del torrente Garofalo. Con nota prot.n. 3192 del 17.08.2012 il RUP ha invitato il GdL a predisporre una variante al progetto, prevedendo la sistemazione dei materiali provenienti dagli scavi nel tratto finale del Torrente Garofalo o, in alternativa, nella medesima area d'intervento. Con Decreto Commissariale n. 493 del 25/09/2012 è stata finanziata il progetto esecutivo dei lavori "Opere di consolidamento lo sostenuto San Leonardo", e con D. C. n. 680 del 08/11/2012 è avvenuta l'approvazione schema lettera di invito alla procedura di gara dello stesso.	AFFIDAMENTO LAVORI	INVITALIA	DECRETO DEL 6001 PLANTS (Integrativo) 6001 GAV Srl S.Costantino) TRIBUSICILIA (Torre delle Clavole)	-	-	Decreto n.493 del 25/09/2012	€ 668.652,86	Geom. Carmelo Leone (UTC)	Decreto n. 89 del 14 giugno 2011
ME	100	Raccuja	A	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento – Zona Centro abitato	€ 5.000.000,00	€ -	Con nota prot.n. 425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad IAF (a seguito di rinuncia del DPCF di Messina precedentemente incaricato). Il DPC, con nota acquisita al prot.n. 854 del 23.01.2012, ha trasmesso copia del piano delle indagini geognostiche e del cronoprogra ammatico generale dell'intervento ed ha tenuto effettuare, in vista dell'incontro precedentemente confermato per il riprimento all'Accordo Quadro del 28.11.2011 stipulato con lo CGIAM, la stessa ha trasmesso, con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012, la restituzione dei dati da rilievo parzialmente effettuati, e con nota acquisita al prot. n. 1750 del 12 aprile 2012 la stessa ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini preliminari alla progettazione da realizzare. Nel Civico del Comitato del 18/01/2013 è stato deciso di sospendere ogni attività.	INTERVENTO REVOCATO	INVITALIA	-	-	-	-	-	-	Ing. Marco Calogero	Decreto Commissariale n. 173 del 18.04.2012
ME	107	San Fratello	A		Opere di consolidamento centro abitato	€ 18.000.000,00	€ 18.000.000,00	La gestione dell'intervento è stata trasferita al Commissario di cui all'OPCM 3815 del 10 ottobre 2009	LAVORI ULTIMATI	-	Trasferito nell' OPCM 3865 del marzo 2010 (Eventi alluvionali S. Fratello ME)						-	-
ME	109	San Pier Niceto	A		Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante consolidamento dell'area e protezione del versante del centro abitato	€ 600.000,00	€ 600.000,00	Con nota prot.n. 421 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia. A seguito di espletamento della procedura di gara, con Decreto n. 345 del 30.11.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la redazione delle indagini preliminari, ad oggi circolare. Con nota acquisita al prot. n. 4819 del 26/10/2012 Invitalia ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della CdS del 13/11/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari.	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE	INVITALIA	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL (Mandante) (MP)	-	-	-	-	€ -	Geom. Francesco Maio (UTC)	Decreto Commissariale N. 301 del 11 ott 2011
ME	113	Santa Marina Salina	A		Opere di consolidamento versante e sistemazione e protezione del centro abitato - Fraz. Lingua e zona del Faro	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	In data 27.10.2010 la progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria. A seguito della riunione del 21/09/2011, è stata data priorità agli interventi di difesa costiera da via terra a Ponte Lingua. Con nota prot.n. 3334 del 20.06.2012, il Provv. Interr. OO.PP. ha comunicato essere in corso la rimodulazione delle scelte progettuali.	ATTESA ADEGUAMENTO PROGETTO	Provv. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria	-	-	-	-	€ -	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)	Nota in uscita prot.n.460 del 27.10.2010

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 26.07.2010"
Ex D.P.C.M. 16 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A

PROV	COD	COMUNE	PORZ. ATTUATA	COMITATO	TITOLO	IMPORTO AAP	IMPORTO Rimodulato	STATO INTERVENTO	CUP	AVANZAMENTO PROGETT.	AVANZAMENTO DETTAGLIO	AFFIDAMENTO LAVORI: Impresa	AFFIDAMENTO LAVORI: Data inizio lavori	DECRETO DI FINANZIAMENTO: n. e data	DECRETO DI FINANZIAMENTO: importo	RUP	Numero RUP Elenco
ME	115_1	Sant'Angelo di Brolo	A	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barbe	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato sospeso, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi. In data 19.10.2011 le progettazione è stata affidata al DIPIC di Messina. A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 295 del 26/10/2011, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 16/11/2011. I lavori sono stati avviati il 29/11/2011. Con nota prot.n. 265/65 del 08.08.2013 il RUP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia della Perizia di Variante e Suppletiva, per l'autorizzazione di competenza. In data 08.08.2013 è stato sottoscritto Verbale di Sospensione Lavori. Il Commissario, data l'urgenza delle attività previste nell'ambito della PCS ai lavori, ha convocato il 13.08.2013 un tavolo tecnico, in base agli esiti delle quali, con nota prot. n. 3456 del 12/09/2012 sono state richieste integrazioni alla PCS presentata, successivamente acquisite all'prot.n. 4017 del 22/10/2012. In data 19/11/2012, con D.C. n. 624, è disposta l'occupazione anticipata d'urgenza degli immobili siti nel Comune.	SOSPENSIONE LAVORI	ORIPIC	5.6.M. Srl	A.T.I. MINARELLI COSTRUZIONI S.R.L. (Mandataria) - Emmanuele - AN.CA.MA. S.R.L. (Mandante)	29/11/2011	351 - 377/2011	€ 3.000.000,00	Ing. Bruno Manfrè (DIPIC)	Decreto Commissariale n. 170 del 17/04/2012
ME	115_2	Sant'Angelo di Brolo	A	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Canelli	€ 2.500.000,00	€ 2.930.300,00	L'intervento originariamente proposto per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato sospeso, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi. Lo progettazione è stata affidata al DIPIC di Messina. Con nota acquisita al prot.n. 555 del 21/03/2012 il DIPIC ha trasmesso il progetto esecutivo i Brolo. A seguito della riunione del 09/04/2012 si è ritenuto di stralciare una quota parte del finanziamento relativo all'intervento ME115_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello stralcio dell'intervento ME115_2 A seguito delle Conferenze dei Servizi del 18/04/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri degli Enti e a seguito di validazione del RUP il progetto è stato finanziato con Decreto n. 301 del 28.06.2012. Con Decreto n. 532 del 15/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il Contratto è stato stipulato in data 25/10/2012 Con Decreto Commissariale n. 638 del 22/11/2012 è stato disposto l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.	CONTRATTO STIPULATO	ORIPIC	GEOMARE	GIUSEPPA FRANCAVILLA	-	n. 301 del 28/06/2012	€ 2.930.000,00	Geom. Vittorio Ricciardi (Comune)	Decreto Commissariale n. 171 del 17/04/2012
ME	115_3	Sant'Angelo di Brolo	A	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano	€ 2.500.000,00	€ 2.070.300,00	L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato sospeso, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi. Con nota prot.n.425 del 16.03.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia. In data 21.03.2012 il DIPIC ha trasmesso copia dei risultati delle indagini geognostiche e geotecniche effettuate propedeutiche alla progettazione. In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM , con nota acquisita ai prott. n. 753 del 07/08/2012, e 2781 del 18/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati. A seguito della riunione del 03/04/2012 si è ritenuto di stralciare una quota parte del finanziamento relativo all'intervento ME115_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello stralcio dell'intervento ME115_2 Con nota prot. 2394 del 26/06/2012 il Commissario, a seguito di richiesta di CGIAM, ha chiesto al DIPIC di voler fornire integrazioni allo studio geologico già effettuato, ad oggi non pervenute. A seguito di reiterate richieste, il Commissario, con nota prot. 3312 del 06/09/2012, ha invitato il Dott. Geol. Filippo Capparra a fornire supporto al gruppo di progettazione per lo stesura del progetto esecutivo. Il Dott. Geol. Filippo Capparra, con nota prot.n. 4868 del 20/11/2012 ha trasmesso all'Ufficio del Commissario le integrazioni geologiche richieste/gli.	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	METEAIR	-	-	-	€ -	Geom. Tindaro Pino Scaffidi (Comune)	Decreto Commissariale n. 172 del 17/04/2012
ME	117_3	Scaletta Zanclea	A	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scaletta Superiore, della fraz. Divieto e nella zona Guidomanni Superiore Codice PAI 052-052-024 codice PAI 052-052-024	€ 1.800.000,00	€ -	Nel corso della riunione del 19 settembre 2012 il Commis sario ha ritenuto il finanziamento dell'intervento ME118 eccessivamente ravvisato nel corso della riunione del 24 febbraio, l'intervento sta trova copertura finanziaria con altri fondi € 8 ME117_3 .Si procede pertanto alla revoca del relativo finanziamento.	INTERVENTO REVOCATO	-	-	-	-	-	-	-	-
ME	119	Sinagra	A	-	Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Feranò	€ 3.000.000,00	€ 3.000.300,00	La progettazione è stata affidata ad INVITALIA in data 08.01.2013. In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM , con nota acquisita ai prott. n. 753 del 07/08/2013, e 2781 del 18/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati. Con nota acquisita al prot. n. 3305 del 29/08/2012, la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari, eseguite dal RUP in data 10/09/2012. Con D.C. n. 437 del 01/09/2012 sono state finanziate e approvate le specifiche tecniche offerenti il piano di indagini preliminari A seguito delle procedure di gara, con nota prot. n. 199/DCI/RM 2012 del 24/09/2013 il Commissario ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei piano di indagini preliminari ad oggi conclusa.	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	SGI PLANTS Srl	-	-	-	€ -	Ing. Cappotto (UTC)	Decreto Commissariale n.17 del 23.01.2013
ME	120	Sinagra	A	-	Opere di regimentazione idraulica e consolidamento con paratie - Zona Martorel	€ 1.900.000,00	€ 1.900.300,00	In data 26.02.2013 la progettazione è stata affidata al Comune. Con nota prot. 975 del 28/06/2013 è stato collocato il Comune alla trasmissione del progetto esecutivo. In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM , con nota acquisita al prott. n. 753 del 07/03/2013, ha restituito i dati dei rilievi effettuati	PROGETTAZIONE IN CORSO	Comune	-	-	-	-	€ -	Dott. Giuseppe Lombardo	Decreto Commissariale 18 del 13-02-2013
ME	111	Sinagra	A	-	Drenaggi e gabbioni - Cda Mulinazzo	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	In data 26.02.2013 l'incarico di progettazione è stato affidato al Comune. Il comune, con nota prot. 1218 del 25/07/2013, ha richiesto autorizzazione per conferimento incarico di revisione dello studio geologico. L'Ufficio del Commissario ha richiesto al Comune con nota prot.n. 594 del 13.02.2013, apposita relazione attestante gli adempimenti posti in essere sino ad oggi al fine di realizzare i lavori il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2946 del 31/07/2013, ha trasmesso al RUP copia delle specifiche tecniche relative alle indagini geognostiche per lo convalida di competenza. Le indagini sono state affidate dalla stesso Comune.	PROGETTAZIONE IN CORSO	Comune	SGM srl	-	-	-	€ -	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto Commissariale n. 26 de 23.2.2013

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.01.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A

PROV	COD	COMUNE	FONTE ATTUALE	COMITATO	TITOLO	IMPORTO AAP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAL	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI: Impresa	AFFIDAMENTO LAVORI: Data inizio lavori	DECRETO DI FINANZIAMENTO: n. e data	DECRETO DI FINANZIAMENTO: importo	RUP	Nomina RUP (carica)
ME	125	Tortorici	A	-	Muri e paratie monolivelle e opere strauttive – Zona Lembo-Pellizzo	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	A seguito di procedura di gara, la progettazione è stata affidata, con Decreto Commissariale n. 182 del 08.08.2011 ad un professionista esterno. Con Decreto n. 250 del 03.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alla progettazione è stata affidata alla ditta Geomerid, che ad oggi ha completato le attività. Con nota prot.n. 115 del 26.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della progettazione. Con nota acquisita al prot. n.948 del 21/03/2012 il progettista ha trasmesso copia del progetto esecutivo. In sede di Conferenza di Servizi del 29/05/2012 sono stati acquisiti i pareri degli Enti con prescrizioni ed il progetto elaborato in ottemperanza alle stesse è stato acquisito al prot. n. 2351 in data 27/06/2012. A seguito di validazione del progetto da parte del RUP, il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 592 del 08/11/2012.	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	Ing. Mario Saitta (Figura Esterna)	GEOMERID s.r.l.	-	-	n. 592 del 08/11/2012	€ 1.452.338,14	Geom. Calenni R. Carmelo (UTC)	D. C. n. 143 del 01.04.2013
ME	126	Tortorici	A	-	Muri sx pali e raccolta acque – Zona S.Antonio-Scortino	€ 500.000,00	€ 500.000,00	A seguito di procedura di gara la progettazione è stata affidata in data 25.08.2011 a professionista esterno. Con Decreto n. 184 del 14.11.2011, è stata affidata la realizzazione del piano di indagini preliminari ad oggi completata. Con nota prot.n. 624 del 24.02.2012 è stata trasmesso al progettista lo studio geologico esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della progettazione. Con nota acquisita al prot.n. 1369 del 28.04.2012 il progettista ha trasmesso copia del progetto esecutivo. In sede di Conferenza di Servizi del 11.07.2012 il RUP si è impegnato a portare a termine il procedimento finalizzato alla procedura espropriativa. Con nota acquisita al prot. n. 2832 del 12/07/2012, l'ARTA Serv. 3 ha richiesto documentazione integrativa al fine di poter esprimere il parere di propria competenza. In data 19/09/2012 il RUP ha trasmesso il Verbale di Verifica e di Validazione del progetto esecutivo. Con Decreto n. 573 del 06/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento.	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	Ing. Giuseppe Puglisi (Figura Esterna)	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL	-	-	573 - 06/11/2012	€ 479.375,06	Geom. Calenni R. Carmelo (UTC)	D. C. n. 144 del 02.04.2013
ME	128	Tortorici	A	-	Muri e barriere paramassi – Zona Botana-Pogliero-S.Leone	€ 500.000,00	€ 500.000,00	A seguito di procedura di gara la progettazione è stata affidatacon Decreto Commissariale n. 181 del 09.08.2011 a professionista esterno. Con Decreto n. 251 del 03.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alla progettazione è stata affidata alla ditta Geomerid, che ad oggi ha completato le attività. In data 30.01.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della progettazione. Con nota acquisita al prot. n.1048 del 07/04/2012 il progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della Conferenza di Servizi del 25/06/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 3758 del 17/07/2012 ha trasmesso il verbale di verifica e validazione e l'istanzazione del Direttore dei lavori in merito alla immediata eseguibilità degli stessi. Con Decreto n. 574 del 06/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento,e con Decreto n. 645 del 27/11/2012 è stata approvata lo schema lettera d'invito alla Procedura di gara	AFFIDAMENTO LAVORI	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)	GEOMERID s.r.l.	-	-	574 - 06/11/2012	€ 476.038,45	Geom. Sutteforo Carmelo (UTC)	Decreto Commissariale n. 145 del 02.04.2012
ME	132	Ucria	A	-	Consolidamento mediante paratia a protezione del fabbricato(opere di drenaggio – Zona via Annunziata	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	La progettazione è stata affidata a INVITALIA in data 09.05.2011. In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CDIAM ha trasmesso le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari. Con Decreto Commissariale n. 129 del 16.03.2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di indagini preliminari ed il contratto è stato firmato in data 04/04/2012. In data 28/10/2012, con nota acquisita al prot.n. 4240, la CDIAM ha trasmesso la Relazione Geologica dell'intervento.	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	I.G.M. srl	-	-	-	€ -	Ing. Sidoti Pinto Benedetto	Decreto Commissariale n. 563 del 26/10/2012
ME	177_Int	Brolo	A	AdP Integrativo	Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da Leonardo Alto	€ 600.000,00	€ 600.000,00	L'intervento è stato inserito nell'AdP Integrativo. In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CDIAM, con nota assunta al prot. n. 498 del 16/02/2012, ha trasmesso i prodotti di restituzione dei rilievi effettuati. Con nota prot. n. 3336 del 19/04/2012 l'Commissione ha affidato la progettazione a INVITALIA	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	-	-	-	-	€ -	Arch. Maria Messina (UTC)	D.C. n. 357 del 17.07.2012
ME	178	Capri Leone	A	AdP Integrativo	Protezione e ripristinomto tratrale (2° lotto)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Il progetto è stato inserito nell'AdP Integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune. Il Comune con nota prot. n. 1278 del 18/04/2012 ha trasmesso la documentazione relativa al conferimento degli incarichi per la studio geologico e per la progettazione ed il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3043 del 06/08/2012 il progettista incaricato ha trasmesso progetto esecutivo dell'intervento. A seguito della CdS tenutasi giorno 30/10/2012 tutti i pareri si intendono acquisiti con esito positivo.	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE	pH3 Engineering s.r.l	-	-	-	-	€ -	Arch. Giampiero Di Magio	D.C. n. 376 del 19.07.2012
PA	136	Belmonte Mezzagno	A	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 24 MAR 2011	Opere di consolidamento del canale di gronda, regimazione corsi d'acqua e revisione canale a protezione del centro urbano	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	La progettazione è stata affidata al DRPC di Palermo con nota prot. n. 894 del 24/11/2010. In riscontro alla nota di sollecito alla trasmissione del progetto da parte del Commissario prot. 976 del 18/06/2011, il DRPC di Pa, con nota acquisita al prot. n. 1984 del 1/10/2011, ha rappresentato la necessità di un maggior tempo per la redazione della progettazione per la complessa situazione riscontrata e la difficoltà tecniche connesse alla buona riuscita dell'intervento. A seguito della nota del Commissario prot. n. 3298 del 03/09/2012, con cui sollecitava il DRPC di Pa a trasmettere il progetto esecutivo, con nota acquisita agli atti al prot. n. 3571 del 20/09/2012, il DRPC di Pa ha comunicato di star provvedendo alla redazione del piano particellare di esproprio, e successivamente alla convocazione della CdS per acquisire i pareri propedeutici alla validazione del progetto,per poi trasmettere tutti gli atti all'Ufficio del Commissario per il seguito di competenza.	PROGETTAZIONE IN CORSO	DRPC Pa	-	-	-	-	€ -	Ing. Foti DRPC Pa	n.894/UC del 24/11/2010

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 19 dicembre 2008

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A

Programmazione Ambientale					Fase 2					Stato progettuale/ Affidamento									
PROV	COD	COMUNE	FORZA ATTUATIV	CONTRATTO	TITOLO	IMPORTO RAP	IMPORTO Rimodulato	STATO DI FATTO	SAL	AFFIDAMENTO PROGET	AFFIDAMENTO (SUBAPPA)	AFFIDAMENTO LAVORI		DECRETO DI FINANZIAMENTO		RUP	Numero RUP trasmesso
												Impresa	Data inizio lavori	N. e data	Importo		
PA	137_1	Bivio	A	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di sistemazione idraulica burrone San Domenico Malpasso e consolidamento del centro urbano	€ 1.310.000,00	€ 1.310.000,00	La progettazione è stata redatta dal Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 29/03/2011. A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 67 del 24/05/2011. A seguito dell'espletamento di gara con Decreto Commissariale n. 300 del 27/10/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della CEF di GIUSEPPE MAMMOLITI. La consegna dei lavori è avvenuta il 06/11/2011. A seguito della richiesta avanzata dalla D.L. di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, autorizzata dal RUP con nota prot. n.1934 del 31/05/2012, in classe 3b, ha trasmesso la perizia asseverata al prot. n. 3863 del 24/07/2012 ed approvata dal RUP in data 25/08/2012 Con Decreto Commissariale n. 443 del 06/09/2012 si è provveduto a prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva n. 3 e della rimodulazione del quadro economico di impegno delle somme. I lavori sono ultimati in data 31/01/2013.	LAVORI ULTIMATI	Comune		-	CEF di GIUSEPPE MAMMOLITI	06/12/2011	n. 67 del 24/05/201	€ 1.310.000,00	Ing. Giuseppe La Placa	D.C. n.25 del 23/02/2011
PA	137_2	Bivio	A	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento del centro urbano a monte e a valle del quartiere Macelli	€ 690.000,00	€ 690.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 29/03/2011. A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 67 del 10/06/2011 A seguito dell'espletamento della procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 158 del 28/07/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori svolati in data 07/09/2011. Con nota acquisita al prot. n.488 del 16./02/2012 la D.L. ha evidenziato la necessità di effettuare nuovi lavori da inserire in una perizia di variante e suppletiva, la cui stesura è stata autorizzata dal RUP con nota prot. n.549 del 22/02/2012. La PVS è stata trasmessa dalla DL con nota acquisita al prot. n. 843 del 16/03/2012, approvata dal RUP in data 29/03/2012 e ratificata dal Commissario con Decreto n. 146 del 02/04/2012. I lavori sono ultimati in data 29/03/2012	LAVORI ULTIMATI	Comune	€	-	Arcobaleno SNC	07/09/2011	n. 67 del 10/6/2011	€ 690.000,00	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto Commissariale n. 24 del 31/01/2011
PA	141	Capaci	A	COMITATO 24 FEB 2011	Consolidamento centro abitato	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	Facendo seguito alle determinazioni del Comitato del 24/02/2011 che hanno determinato il passaggio dell'intervento in A, l'ARTA, con nota acquisita al prot. n.518 del 18/04/2011 ha trasmesso tutta la documentazione tecnico-amministrativa dell'intervento. La progettazione è stata effettuata da progettisti esterni incaricati dal Comune. In data 07/11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha fornito indicazioni per la definizioni delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. Con Decreto Commissariale n.185 del 23/08/2012 il Commissario ha acquisito il progetto i struttura esecutiva. A seguito della conferenza dei servizi del 30/05/2012 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento. Con nota acquisita al prot. n. 2902 del 27/07/2012 il RUP ha trasmesso gli atti di approvazione e validazione del progetto. Con Decreto Commissariale n. 420 del 23/08/2012 è stato finanziato l'intervento. Con Decreto Commissariale n. 522 del 08/10/2012, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed è in corso di stipula il Contratto.	AFFIDAMENTO LAVORI	Dott Ing Carlo Barbuzza.		-	DACCARA COSTRUZIONI Srl	-	n. 410 del 02/08/2012	€ 1.200.000,00	Arch. Giovan Battista Dragotta [Comune]	Decreto Commissariale n.197 del 31/05/2012
PA	142	Carini	A	-	Barriere paramassi - Zone Industriale	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Con nota prot. n. 520 del 18/04/2011 la progettazione è stata affidata ad INVITALIA, mentre con nota prot. n. 2759 del 05/12/2011, i rilievi propedeutici alla progettazione sono stati affidati al Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo "CIGAM". Con nota acquisita al prot. n. 3313 del 17/08/2012 la CIGAM ha trasmesso le specifiche tecniche sui rilevati allegati riguardanti il programma operativo per l'esecuzione del piano di indagini preliminari. Con Decreto Commissariale n. 589 del07/11/2012 sono state approvate le specifiche tecniche afferenti il Piano di Indagini Preliminari e con Decreto Commissariale n. 663 del 18/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle stesse	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	GEO R.A.S. S.r.l.		-	-	-	€ -	Ing. Antonino Cracchiolo	D.C. n. 179 del 09/08/2011
PA	143	Castelbuono	A	-	Opere di drenaggio e consolidamento – C.da Licca	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	La progettazione è affidata al GC di Palermo. Con nota prot. n.978 del 28/06/2011 è stato sollecitato il GC alla trasmissione del progetto esecutivo. Con nota del 02/11/2011 il GC Pa ha chiesto al Dott.Antonio Rubino di poter acquisire lo studio geologico-tecnico eseguito per conto della Procura della Repubblica e di poterlo utilizzare a supporto della progettazione esecutiva. A tutt'oggi è in corso una campagna di monitoraggio finanziata dal DRPC di PA di cui si resta in attesa dei risultati. Il Commissario, facendo seguito alla nota prot. n. 3961 del 05/10/2012 , con la quale concedeva al GC di Pa 20 giorni per la trasmissione del progetto esecutivo PA 143 A-Castelbuono "Opere di drenaggio e consolidamento a Da Licca" , con nota prot. n. 4369 del 29/10/2012 ha revocato tutti gli incarichi finalizzati alla realizzazione delle opere, compreso quello di RUP. Il Commissario con nota prot. n. 4370 del 29 ottobre 2012 ha affidato la progettazione a INVITALIA, che ha comunicato il CdS con nota acquisita al prot. n. 4438 del 31/10/2012. Il Commissario, con nota prot. n. 5232 del 10/12/2012 ha chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, di poter acquisire copia della consulenza tecnica all'fine di ottenere dati e informazioni utili alla realizzazione dell'intervento.	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA		-	-	-	-	€ -	Ing. Sanil Sottile	D.C. n. 576 del 06/12/2012
PA	149	Mistretta	A	-	Opere di regimazione idraulica - C.da piano Stoppa	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	La Progettazione esecutiva è stata eseguita da progettisti esterni incaricati dal Comune di Mistretta che con nota acquisita al prot. n. 1630 del 06/09/2011, ha trasmesso il progetto. Con nota prot. n.4767 del 07/02/2012 il comune ha trasmesso all'ARTA copia del progetto esecutivo per l'emissione del parere di competenza, penne pel acquisito al prot. 1011 del 26/02/2013 con esito negativo. Il Commissario, in riscontro alla nota acquisita al prot. n. 2266 del 30/06/2012 con cui il RUP ha trasmesso unitamente alla validazione a alla Deliberazione di G.M. n. 41 del 19/06/2012 di approvazione amministrativa, il progetto esecutivo l° lotto funzionale, tenuto le giustificazioni e/o chiarimenti sulle procedure dell'affidamento dell'incarico professionale e senza le modifiche alle soluzioni progettuali delle opere richieste dall'ARTA Serv.3, ha ritenuto che sarebbe proceduto ad evitare nuove procedure per il conferimento dell'incarico di progettazione dell'intervento. Con nota prot. n.4291 del 23/05/2012 il Commissario ha trasmesso alla CIGAM l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011 aggiungendo l'intervento - PA 149 Mistretti. Con nota prot. n. 4927 del 26/12/2012, il Commissario ha invitato il Comune a trasmettere il progetto preliminare dell'intervento, per poter procedere ad avviare nuove procedure per l'affidamento dell'incarico di progettazione, richiesta reiterata con nota prot. n. 5229 del 31/12/2012.	PROGETTAZIONE IN CORSO	Ing. Paolino Rizzolo	€	-	-	-	-	€ -	Irene Gullo	Determinazione Dirigenziale n.5 del 28/02/2011

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A

PROV	COD	COMUNE	PONTE ATTUATO	COMUNE 2	TITOLO	IMPORTO AAP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAI	AVVIAMENTO PROGET.	AVVIAMENTO Delega PA	AGGIUDICAZIONE LAVORI Impresa	AGGIUDICAZIONE LAVORI Data stipula	FINANZIAMENTO n. e data	FINANZIAMENTO importo	RUP	Numero ELCO Importo
PA	154	Polizzi Generosa	A		Opera di consolidamento – Zone via G.Borgese	€ 500.000,00	€ 500.000,00	La progettazione è stata affidata al Genio Civile di Palermo. A seguito dell'espletamento della procedura di gara con Decreto Commissariale n. 168 del 03./08/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. I lavori sono stati avviati 14/08/2013 e sono stati completati in data 23/04/2012. Il Collaudatore Statico ha prodotto il Certificato di Collaudo Statico delle opere redatto in data 06/05/2013 Il GC PA, con nota acquisita al protocollo con n. 2921 del 30/05/2012, ha trasmesso la Perizia di Assestamento Finale, la cui presa d'atto è avvenuta con Decreto Commissariale n.263 del 07./06/2011. Il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori è stato redatto dalla D.L in data 12/07/2013.	LAVORI ULTIMATI	GC Pa		CONSOLIDAMENTI SPECIALITAL	40.800,00	n. 35 del 31/03/2011	€ 500.000,00	Ing. Vincenzo Di Rosa (Ing. Capo GC PA)	n. 463/SIC del 16 novembre 2010
PA	156	Termini Imerese	A		Risagomatura argini e opere di pulitura – Zona foce Fiume Torto	€ 800.000,00	€ 800.000,00	La Progettazione è stata affidata all'U.P.A.C. di Palermo che ha trasmesso il progetto con nota acquisita al prot. n. 3218 del 13/07/2011 e successiva integrazione con nota acquisita al prot. 1779 del 19/09/2011 . A seguito della riunione di tutti i pareri necessari il Commissario ha finanziato l'intervento con Decreto n.108 del 15/03/2012. Con Decreto Commissariale n. 215 del 11/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed in data 28/06/2012 sono stati consegnati i lavori. Con D.C. n. 808 del 15/11/2012 si presa atto perizia di variante e si è avuta una rimodulazione e riduzione dell'importo di spesa I lavori sono stati ultimati	AVVIATI LAVORI	DRPC Pa		84.000 srl	41.088,00	n.108 del 15/03/2012	€ 800.000,00	Ing. Calogero Foti (DRPC Pa)	D.C. n.116 del 20 marzo 2012
PA	157	Valledolmo	A		Opere di consolidamento - C.da Renella	€ 500.000,00	€ 500.000,00	La Progettazione è stata affidata al Comune. A seguito dell'espletamento della procedure di gara il Comune ha provveduto ad affidare i lavori. Con nota acquisita al prot. n. 1266 del 26/03/2011 il Comune ha comunicato la fine dei lavori in data 04/07/2011 e l'avvenuto collaudo statico in data 07./07/2011.	LAVORI ULTIMATI	Comune		CO.GEN.AP. Srl	40.616,20	D.C. n. 02 del 23/11/2010	€ 500.000,00	Geom. Orazio Pizzolanti (Capo UTC)	determina sindacale n° 127 del 10 agosto 2010
PA	179	Altofonte	A	Adf Integrativo	Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto	€ 600.000,00	€ 600.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune che ha provveduto all'affidamento a progettisti esterni. Le indagini preliminari alla progettazione sono invece state affidate dal Commissario alla CDIAM che con nota assunta al prot. n. 1259 del 11/04/2012 ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini preliminari. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 295 del 18/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini preliminari ed in data 03/07/2012 è stata sottoscritta il contratto. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2691 del 13/07/2012 il RUP, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 10/01/2012, nel quale è emersa la problematica inerente la presenza di una falda vegetazione che non consentiva l'esecuzione di un sondaggio rilevo, ha chiesto all'Impresa aggiudicataria di trasmettere un atto aggiuntivo al contratto principale per l'esecuzione di suddette ulteriori lavorazioni. l'Impresa, con nota acquisita agli atti al prot.n. 3040 del 03.08.2012, ha trasmesso copia degli elaborati tecnici e degli elaborati relativi al piano di indagini preliminari.	PROGETTAZIONE IN CORSO	ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-GEO	CDIAM (GEO-RAS Srl indagini integrative preliminari)				€	Ing. Giuseppe La Placa	D.C. n.111 del 10/05/2012
PA	180	Cefalù	A	Adf Integrativo	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita-	€ 90.000,00	€ 90.000,00	A seguito della convenzione stipulata in data 28/11/2011 il Commissario ha incaricato la CDIAM di predisporre le specifiche tecniche per la realizzazione delle indagini geologiche. Il Commissario, con nota prot. n. 2711 del 01/12/2011 ha affidato la progettazione ad INVITALIA. Le attività di indagine hanno avuto inizio in data 14/05/2012 e sono state completate in data 20/06/2012. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3283 del 01/08/2012 invitalia ha trasmesso gli elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS del 23/06/2012. In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della necessità di avviare la procedura di deroga ex art. 16 della L.R. 78/76 e ss.mm.ii, propedeutici in fine della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento, il RUP, con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012, ha invitato il Comune ad attivarsi per la definizione degli adempimenti di propria competenza. A seguito della nota prot. n. 3191 del 06/08/2012, con la quale il RUP chiedeva al GdL di procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, in relazione alla natura dell'entità del dissesto, con nota prot. n. 3662 del 24/09/2012 il RUP, ha trasmesso alla Soprintendenza BB.CC.AA di Pa le verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte. Il RUP, facendo seguito all'incontro tenutosi in data 24/10/201 3 presso gli Uffici della Soprintendenza del BB.CC.AA di Pa, con nota prot. n. 4114 del 25/10/2012 ha comunicato che il progetto era in fase di rimodulazione secondo le indicazioni concertate, ed avrebbe provveduto a consegnare le tavole e gli elaborati progettuali revisionati nel più breve tempo possibile per il parere di competenza.	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	INVITALIA						€	Ing. Giuseppe Morganti	D.C. n.130 del 27/05/2012
PA	181	Cefalù	A	Adf Integrativo	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita- Proprietà Greco	€ 400.000,00	€ 400.000,00	Il Commissario con nota prot. n. 2721 del 01/12/2011 ha affidato la progettazione ad INVITALIA In virtù della convenzione stipulata in data 28/11/2011 il Commissario ha affidato alla CDIAM la redazione delle indagini geologiche, trasmesse con nota acquisita agli atti al prot. n. 953 del 21/03/2012. Con Decreto Commissariale n. 196 del 02/05/2012 è stato disposto l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini preliminari. Le attività di indagine hanno avuto inizio in data 14/05/2012 e sono state completate in data 20/06/2012. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3283 del 01/08/2012 invitalia ha trasmesso gli elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS del 23/06/2012. In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della necessità di avviare la procedura di deroga ex art. 16 della L.R. 78/78 e ss.mm.ii, propedeutici in fine della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento, il RUP con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012 ha invitato il Comune ad attivarsi per la definizione degli adempimenti di propria competenza. A seguito della prot. n. 3191 del 06/08/2012 con la quale il RUP chiedeva al GdL di procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, in relazione alla natura dell'entità del dissesto, con nota prot. n. 3662 del 24/09/2012 il RUP, ha trasmesso alla Soprintendenza BB.CC.AA di Pa le verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte. Il RUP, facendo seguito all'incontro tenutosi in data 24/10/201 3 presso gli Uffici della Soprintendenza del BB.CC.AA di Pa, con nota prot. n. 4114 del 25/10/2012 ha comunicato che il progetto era in fase di rimodulazione secondo le indicazioni concertate, ed avrebbe provveduto a consegnare le tavole e gli elaborati progettuali revisionati nel più breve tempo possibile per il parere di competenza.	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	INVITALIA	GEO PLANTS srl					€	Ing. Giuseppe Morganti	D.C. n.138 del 27/05/2012

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia e per il superamento della crisi di cui all'O.P.C.M. n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. e all'O.P.C.M. n. 3920 del 15 aprile 2011"
P.I. O.P.C.M. 3906 del 13 novembre 2010

ELENCO INTERVENTI A

Pagina 15 di 17

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A

Individuazione Intervento												Stato procedurale dell'intervento							
PROV	COD	COMUNE	FONTE ATTUALE	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO ITER/ATE	SAL	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO ESECUZIONE	AFFIDAMENTO LAVORI		DECRETO DI FINANZIAMENTO		RUP	Nominativo RUP Triennale
												Impresa	Data inizio lavori	n. e data	Importo		
SR	177	Carlentini	A	COMITATO 24 MAR 2011 COMITATO 15 SET 2011	Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune che con nota acquisita al prot. n. 459 del 21/04/2011 ha trasmesso gli elaborati progettuali. Con nota acquisita al prot. n. 3313 del 12/08/2011, il Comune ha trasmesso varianti tecniche ritenute necessarie, ma che non hanno modificato gli obiettivi di riduzione del rischio idraulico dell'area oggetto di intervento. A seguito dell'accoglimento dell'istanza di variante tecnica nel corso del cantiere del 15/09/2011, il Commissario, con nota prot. 3823 del 21 set 2011, ha autorizzato il comune a procedere alle modifiche progettuali richieste. Con nota prot. n. 630 del 25/02/2012 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo rimodulato. In sede di Conferenza dei Servizi del 09/03/2012 sono stati espressi tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento, che è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 247 del 28/05/2012. Con D.C. n. 429 del 23/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il contratto è stato stipulato in data 26/09/2012. Con Decreto Commissariale n. 637 del 12/11/2012 è stato affidato l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.	CONTRATTO STIPULATO	COMUNE	-	Gravina Costruzioni srl	-	Decreto n. 247 del 28/05/2012	€ 2.500.000,00	Geom. Francesco Ingallsi	Decreto Commissariale n. 191 del 26/04/2012
SR	184	Avola	A	AdP Integrativo	Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	L'intervento è inserito dell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune il quale, con nota prot. n. 2958 del 20/10/2011, è stato invitato a trasmettere il progetto esecutivo entro 60 giorni. Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 231 del 25/01/2012, ha rappresentato di essere in attesa dell'ultimo parere necessario per l'approvazione della progettazione definitiva generale di un intervento più ampio, e che provvederà alla trasmissione del progetto definitivo generale approvato con l'individuazione delle opere oggetto del primo stralcio, per un importo pari a 2.000.000,00. Al fine di pervenire all'acquisizione della progettazione esecutiva di una stralcio funzionale di un importo complessivo di € 2.000.000,00, il Commissario, con nota prot. n. 5312 del 12/12/2012, ha convocato un tavolo tecnico l'08/01/2013.	PROGETTAZIONE IN CORSO	COMUNE	-	-	-	-	€ -	Arch. Gaetano Brex (Dirigente Area 4 del Comune di Avola)	Decreto Commissariale n. 358 del 17/07/2012
SR	185	Buscemi	A	AdP Integrativo	Consolidamento costone sottostante il Santuario	€ 200.000,00	€ 200.000,00	La Progettazione è stata affidata al Comune. L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata dell'area di intervento. Tali rilievi sono stati trasmessi dallo CGIAM con nota acquisita al prot. n. 898 del 26/01/2012. Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 1265 del 13/04/2012 ha trasmesso il progetto esecutivo. In sede di Conferenza di Servizi del 20/04/2012 sono stati acquisiti gli assensi da parte degli enti interessati all'approvazione del progetto, ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 1308 del 25/06/2012 ha trasmesso il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo. Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012, il Commissario comunica alla CGIAM la revoca dell'incarico conferito per DR.185 . Con Decreto n. 219 del 09/07/2013 è stato finanziato il progetto. Con Decreto Commissariale n. 449 del 07/09/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed in data 26/09/2013 è stato stipulato il contratto. I lavori sono stati avviati in data 13/10/2014 e la data di ultimazione è prevista per il 28/02/2015.	AVVIATI LA VORI	COMUNE	-	TECNO COSTRUZIONI S.r.l.	43.305,00	n.319 del 08/03/2012	€ 200.000,00	Geom. Giuseppe Ferraris	Decreto Commissariale n. 170 del 19/04/2012
SR	186	Portopalo di Capo Passero	A	AdP Integrativo	Regimazione acque e consolidamento scarpata	€ 600.000,00	€ 600.000,00	L'intervento è inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata all' INVITALIA con nota prot. n. 532 del 26/01/2013 L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM)al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata. Lo CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 713 del 07/02/2012, ha trasmesso la restituzione parziale degli elaborati Con nota acquisita al protocollo n. 3415 del 28/06/2012 lo CGIAM, a seguito della presa d'atto del RUP, ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini. Il RUP, con nota protocollo n. 3023 del 01/06/2012, ha trasmesso la determinazione di modifica della presa d'atto delle specifiche tecniche delle indagini preliminari a supporto della progettazione esecutiva, approvato e finanziato con Decreto n. 412 del 11/09/2012 Con Decreto n. 513 del 4/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per il passo di indagini preliminari e in data 09/10/2013 è stata sottoscritto il contratto. I risultati delle indagini eseguite sono stata acquisita al prot. n. 4362 del 26/10/2012.	PROGETTAZIONE IN CORSO	INVITALIA	GEO SERVICES PROGLADION S SONDAGGI Srl	-	-	-	€ -	Geom. Mario Poidomani	Decreto Commissariale n. 313 del 06/07/2012
SR	187	Rosolini	A	AdP Integrativo	Intervento di sistemazione della voragine del serrino abitato	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune. Con nota prot. n. 330 del 18/01/2012 il Comune ha riferito che per la definizione progettazione esecutiva aveva necessità di avvalersi di consulenze specifiche (indagini idrauliche, idrogeologiche e geotecniche, coordinamento della sicurezza) e ha chiesto autorizzazione. Il Commissario, con nota prot. n. 189 del 19/01/2012, ha comunicato al Comune di aver già incaricato la CGIAM per la realizzazione delle indagini geologiche, autorizzando il conferimento delle altre consulenze specifiche richieste. Con Decreto Commissariale n. 481 del 11/09/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini ed in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto. Con nota acquisita al prot. n. 4427 del 15/10/2012l'impresa ha trasmesso il verbale di consegna delle aree ed un parziale avvio dei lavori in quanto ancora in attesa della mappatura dei sottoservizi già richiesta al comune. Con nota acquisita al prot. n. 4508 del 08/11/2012 l'impresa ha comunicato di non essere ancora in possesso della mappatura dei sottoservizi, pertanto, ha chiesto la sospensione dei lavori. A seguito della risoluzione delle problematiche incontrate, l'impresa ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 5135 del 05/12/2012, gli elaborati tecnici delle indagini effettuate.	PROGETTAZIONE IN CORSO	COMUNE	S.G.M. Società Geognostica Mediterranea Srl	-	-	-	€ -	Geom. Giuseppe Vindigni	Decreto Commissariale n. 196 del 02/05/2012

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI A

PROV	COD	COMUNE	FONTE ATTUATIV	COMPLETAMENTO	TITOLO	IMPORTO A.P.	IMPORTO Rimodulato	STATO DI FATTO	SM	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI		DECRETO FINANZIAMENTO		SOP	tecnico RUP
												impresa	data inizio lavori	n. e data	importo		
SR	188	Siracusa	A	AdP Integrativo	Lavori di ripristino e consolidamento della falesia	€ 3.466.002,61	€ 3.466.002,61	L'intervento è stato inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune di Siracusa, che ha trasmesso il progetto con nota acquisita al prot. n. 1158 del 04/04/2011. In sede di CdS del 17.04.2012 e/4 invitato il Comune a trasmettere entro 45 giorni il progetto esecutivo rivisitato tenendo conto di tutte le prescrizioni impartite dagli enti; tale documentazione è stata trasmessa dal Comune con nota acquisita al prot. n.1893 del 28/09/2012. In sede di ulteriore CdS del 12/06/2012 L'ARTA Serv.3 VIA/VAS ha posto l'attenzione sull'inadeguatezza della scogliera soffolta più piccola con la protezione di posidonia presente nel sito ed il Commissario ha invitato i progettisti a rideterminarne la soddisfa barriera soffolta loro Punta Castellaccio in modo tale da limitare quanto più possibile l'interferenza della stessa con la posidonia), ed a presentare il progetto definitivo rielaborato entro il 18 giugno 2012. Il Comune,a con nota acquisita al prot. n. 2122 del 15/06/2012, ha trasmesso le integrazioni richieste dall'ARTA, inviate poi all'Serv.1 VIA/VAS del Commissario con nota prot. n.2230 del 20/06/2012 per l'rilascio entro 15 gg. dei pareri di competenza. Con nota prot. n. 2927 del 20/07/2012 il Commissario ha sollecitato l'ARTA Serv. 1 VIA/VAS a ricevere entro il giorno di completarlo ancora non prodotto. Con nota protocollo n. 3138 del 13/08/2012 la Signa sri trasmette all'ARTA (Serv. 1) la documentazione integrativa allo studio di impatto ambientale L'ARTA (Serv. 1) con DDG n. 489 del 26/09/2012 ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo. Con nota protocollo n. 3960 del 09/10/2012 il Commissario, a seguito della visita ricognitiva del Nucleo Tecnico di Valutazione degli Investimenti Pubblici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico, e della riunione del 08/10/2012, ha chiesto, al Comune di trasmettere, entro il 31.10.2012, la	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE	COMUNE		-	-	-	-	€	-	Ing. Emanuele Fontanelli (UTC)	Decreto Commissariale n. 182 del 15/07/2012
TP	168	Erice	A	-	Consolidamento cessione rocciosa – Zona Crocifisiello	€ 500.000,00	€ 500.000,00	La progettazione è stata affidata al DRPC di TP. Con nota prot. 3541 del 23/08/2011, il DRPC TP trasmette gli elaborati progettuali, successivamente integrati dalla trasmissione avvenuta con nota prot. n. 3106 del 14/10/2011. In sede di Conferenza dei Servizi del 28/02/2012 vengono acquisiti tutti i pareri necessari ed il DRPC TP, con nota acquisita agli atti di questo Ufficio con nota n. 2833 del 11/05/2012 , trasmette la verifica del progetto esecutivo, il rapporto conclusivo sulla verifica e la validazione della stessa. Con Decreto Commissariale n. 221 del 16/05/2012 si è finanziato il progetto esecutivo. Con Decreto Commissariale n. 428 del 25/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Con nota Acquisita al prot. n. 3219 del 24.08.12 il RUP ha disposto il verbale gruppo di lavoro relativo all'Ufficio della Direzione Lavori. Il contratto è stato stipulato in data 09/10/2012 ed i lavori sono stati consegnati in data 28/11/2012	AVVIATI LAVORI		€	-	Ferrus Costruzioni srl	-	Decreto n. 221 del 16/05/2012	€ 500.000,00	Ing. Giovanni Indelicato (DRPC TP)	Decreto Commissariale n. 107 del 15/03/2012
TP	169	Mazara del Vallo	A	-	Opere di protezione consolidamento e ripristino funzionalità infrastrutture – Zona Tonnarella	€ 800.000,00	€ 800.000,00	La progettazione è stata affidata al Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria che ha trasmesso il progetto esecutivo con nota acquisita al prot. n. 3328 del 23/08/2011. A seguito delle Conferenze dei Servizi del 20.10.2011 (nella quale è stata esposta il progetto generale dell'intervento che però prevedeva un importo delle opere da realizzare superiore a quanto stanziato dall'APQ) e del 29.11.2011 (nella quale è stato discusso uno stralcio funzionale il cui importo risultava conforme alle somme stanziate dall'APQ) sono stati acquisiti tutti i pareri, di cui alcuni con prescrizioni, necessari alla realizzazione dell'intervento, della Struttura Funzionale; In virtù della Convenzione stipulata con il Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria le procedure di affidamento dei lavori sono espletate dallo stesso Ente, che tra l'altro, con verbale del 1/11/2011, ha dichiarato la somma urgenza ai sensi dell'Art. 176 del DPR 207/2010. Con Decreto Commissariale n. 156 del 11/05/2012 viene approvato e finanziato il progetto esecutivo. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1805 del 23/05/2012 il Comune comunica l'avvenuta consegna dei lavori da parte dell'Ufficio Opere Marittime in data 30.04.2012, nelle more della stipula del contratto di appalto. Con nota acquisita al prot n. 4033 del 08/11/2012 il RUP trasmette la Perizia di Variante e Suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b del D.Lgs. 163/2006 munito del Decreto-Dirigenziale di approvazione in linea tecnica.	AVVIATI LAVORI	Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria Uff. 4 OO.MM.Sicilia	€	-	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	-	Decreto n. 216 - 11/05/2012	€ 800.000,00	Ing. Pietro Viviano	prot. N. 515/UC del 04/11/2010
TP	172	San Vito Lo Capo	A	-	Collocazione rete paramassi – Zona Makari	€ 450.000,00	€ 450.000,00	La progettazione è stata affidata al DRPC di TP che ha trasmesso il progetto esecutivo con nota acquisita agli atti al prot. n. 1546 del 21/08/2011. Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 62 del 14/02/2012. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 332 del 13/09/2012 viene disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Con Decreto Commissariale n. 134 del 18 marzo 2013 è autorizzata l'occupazione anticipata d'urgenza; Il Contratto è stato sottoscritto in data 30/05/2012. In data 20/08/2012 sono stati avviati i lavori. Il RUP con nota n. 4571 del 07/11/2012 trasmette la perizia n. 111 del 29/10/2012 relativa all'approvazione della 1° perizia di variante e suppletiva, ai sensi del comma 3 art. 161 del D.P.R. 207/2010 e la relazione generale dell'intervento. Con Decreto Commissariale n. 695 del 14/12/2012 il Commissario prende atto della Perizia redatta dalla D.L. e sottoscritta dal RUP ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b del D. Lgs 163/2006 e la rimodulazione dell' impegno.	AVVIATI LAVORI	DRPC TP	€	-	Tordaro Costruzioni srl	-	Decreto n. 62 del 14 febbraio 2012	€ 450.000,00	Ing. Giovanni Indelicato (DRPC TP)	Decreto Commissariale n. 70 del 15 febbraio 2013
TP	189	Mazara del Vallo	A	AdP Integrativo	Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	Il Commissario, con nota prot. n. 2738 del 05/12/2011, comunica al Provveditorato Interregionale OOPP Sicilia Calabria - Ufficio IV - l'avvenuto inserimento dell'intervento nell'AdP integrativo del maggio 2011 invitandolo a trasmettere il progetto esecutivo entro 60 giorni. Il Provveditorato - ufficio IV OO.MM per la Sicilia - con nota assunta al prot. n.2976 del 09.12.2011 conferma la propria disponibilità a redigere la progettazione dell'intervento. Il Commissario con nota prot. n. 3299 del 03/09/2012, non avendo ancora ricevuto il progetto esecutivo, sollecita il Provveditorato alla trasmissione dello stesso. Il Provveditorato con nota 2681 del 21/09/2012 trasmette il Progetto preliminare chiedendo l'autorizzazione a poter effettuare determinate indagini propedeutiche al completamento della progettazione esecutiva.	PROGETTAZIONE IN CORSO	Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria Uff. 4 OO.MM.Sicilia	€	-	-	-	-	€	-	0	-

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

Allegato 4

STATO DELL'ARTE DEGLI INTERVENTI IN FASE DI ATTUAZIONE

e

SCHEDE LAVORI

degli interventi di cui all'elenco "A" dell'AdP

Il Commissario Straordinario Delegato
(*Dott. Maurizio Croce*)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.01.2010"
Ex D.P.C.M. 15 dicembre 2010

Prov.	Cod.	Identificativo	Oggetto	Importo A/P	Decreto Finanziamento	Importo finanziato Ecredo Finanziamento	Resp. Proced.	Aggiudicataria	Importo contrattuale al netto di IVA	Importo contratt.sulle eventuali perizie di atto aggiuntivo al netto di IVA	Contratto			avanzamento lavori		
											sottoscrizione	Registrazione	sal n.	importo al netto di IVA	%	
AG	1	Agrigento	Interventi di messa in sicurezza del centro abitato - Lavori di messa in sicurezza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la via delle Torri (PAI 087-Iag-205)	€ 2.000.000,00	Decreto n.639 del 22/11/2012	€ 683.300,00	Ing. Domenico Armenio Dirig. Capo; GC Agli	CO.RE.MA.LA. S.r.l.	€ 345.688,94		;	;				
AG	6	Favara	Opere di consolidamento tra la via De Gasperi e Da Prelà nel Comune di Favara (AG)"	€ 1.500.000,00	Decreto n. 175 del 18/04/2012	€ 1.500.000,00	Ing. Domenico Armenio Dirig. Capo; GC Agl	Ditta Costruzioni soc. cons.	€ 741.355,97		01/ott/12	Agenzia Roma 2 Aurelio n. 15515 serie 3 il 16/07/2012	SAL n. 1 a tutto il 22/10/2012	€ 152.229,93	20,53%	
AG	11	Ribera	Opere di consolidamento centro urbano - Messa in Sicurezza della periferia sud-orientale tra la via M.Amari e G. Pirè	€ 939.021,00	Decreto n. 033 del 08/03/2011	€ 939.021,43	Arch. Gerlando Falzarano	COSTRUZIONI CATTOPAVERO s.r.l.	€ 576.330,07	€ 139.541,22	21/set/12	Agenzia Roma 2 n. 15535 serie 3	STATO CONSISTENZA LAVORI	€ 119.541,22	100,00%	
AG	11	Ribera	Opere di consolidamento centro urbano - Messa in Sicurezza della periferia sud-orientale tra la via M.Amari e G. Pirè	€ 939.021,00	Decreto n. 033 del 08/03/2011	€ 939.021,43	Arch. Gerlando Falzarano	G. & P. s.r.l.	€ 492.789,81		26/dic/12	Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio serie 3 n. 14758 del 06/07/2012	SAL n. 2 a tutto il 18/10/2012	€ 360.481,63	73,15%	
CT	24	Castel di Judica	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti	€ 3.000.000,00	Decreto n. 640 del 22/11/2012	€ 3.000.000,00	Geom. Domenico Tarondo	SARA IN CORSO			;	;				
CT	27	Grammichele	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B.Buozzi	€ 700.000,00	Decreto n.684 del 10/12/2012	€ 700.000,00	Geom. Michele Judica UTC	SARA IN CORSO			;	;				
CT	31	Misterbianco	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fras. Poggio Lupo	€ 500.000,00	Decreto n. 130 del 13/7/2011	€ 500.000,00	DRPC CT Dott. Aldo Bonica	POZZO PIPPO	€ 246.620,17	€ 251.071,93	15/nov/11	Agenzia Roma 2 n. 23604 serie 3	SAL n. 3 a tutto il 25/05/2012	€ 251.055,54	100,00%	
CT	33	Piedimonte Etneo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica frazione Presa nel comune di Piedimonte Eneo (CT)"	€ 500.000,00	Decreto n. 265 del 7/10/11	€ 500.000,00	Dott. Aldo Bonica DRPC Catania)	ARCHIAS s.r.l.	€ 254.976,42	€ 286.071,37	18/nov/12	Agenzia Roma 2 n. 1912 serie 3 il 26/01/2012	SAL n. 3 a tutto il 09/08/2012	€ 286.071,36	100,00%	
CT	36	Ramacca	Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato	€ 1.200.000,00	Decreto n. 89 del 01/03/2012	€ 1.200.000,00	Geom. Salvatore Sottosanti AUTC Comunal	GE.A.S.I. Srl	€ 662.538,54	€ 660.074,32	10/mag/12	Agenzia Roma 2 n. 10854 serie 3 il 13/05/2011	SAL n. 2 a tutto il 01/10/2012	€ 641.290,83	97,15%	
CT	37	Randazzo	Mitigazione del rischio geomorfologico di un'area del Centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata"	€ 960.000,00	Decreto n. 267 del 23/8/2011	€ 960.000,00	Ing. Domenico Imbonella	CONTEP s.r.l.	€ 469.101,00	€ 561.035,78	29/nov/11	Agenzia Roma 2 n. 25124 serie 3 il 16/12/2011	SAL n.4 a tutto il 07/09/2012	€ 560.974,48	99,99%	
EN	175	Barrafranca	"Mitigazione Bivio Carena - Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca 1° Stralcio Funzionale"	€ 1.500.000,00	Decreto n. 352 del 01/12/2011	€ 1.500.000,00	Arch. Francesco Costa	SOCIETA' LAVORI PUBBLICI s.r.l.	€ 813.032,78		26/nov/12	Agenzia Roma 2 n. 2497 serie 3 il 03/02/2012				

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 26.02.2010" Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

Prov.	Cod.	Identificativo	Oggetto	Importo aggiudicato IvaBP	Decreto Finanziamento	Importo finanziato Decreto Finanziamento	Resp. Proced.	Aggiudicataria	Importo contrattuale al netto di IVA	Importo contrattuale dopo eventuali perizie e atti aggiuntivi al netto di IVA	Contratto			avanzamento lavori		
											Sottoscrizione	Registrazione	Sal n.	Importo al netto di IVA	%
ME	49	Alcara Li Fusi	Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque -C.da Cappuccini, Comune di Alcara Li Fusi	€ 1.200.000,00	Decreto n. 397 del 20/12/2011	€ 852.311,69	Ing. Rosita Santacroce	SA.MA. S.r.l.	€ 462.560,63		01-mar-12	Agenzia Roma 2 n. 5314 serie 3 il 07/03/2012	SAL n. 3 a tutto il 26/10/2012	€ 461.439,19	99,76%
ME	52	Basicò	Drenaggi ed opere di consolidamento in C.da Badizzia	€ 1.300.000,00	Decreto n. 65 del 14/02/2012	€ 1.291.603,12	Arch. Giuseppe Trifilò UTC Comune	C.G.U. di U. Owiri Giacomo & C. s.a.s.	€ 609.951,30		06-set-12	Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio n. 8118 serie 3 del 10 aprile 2012	SAL n. 2 a tutto il 26/11/2012	€ 501.514,51	73,90%
ME	53	Brolo	"Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello"	€ 3.630.000,00	Decreto n. 217 del 24/05/2012	€ 3.630.000,00	Ing. Giuseppe La Placa	GEO PERFORAZIONI s.r.l.	€ 1.880.939,42		26-set-12	Agenzia delle Entrate ufficio Roma 2 Aurelio n. 20435 serie 3 del 04/10/2012	SAL n. 1 a tutto il 16/11/2012	€ 483.912,36	25,73%
ME	56	Casalvecchio Siculo	Opere di risagomatura e protezione versanti Fraz. Rocca	€.550.000,00	Decreto n. 96 del 08/03/2012	€ 516.698,04	Ing. Domenica Imbesi	CONSORZIO SIRUENO ROMANZOLO FRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - COOP. LA NUOVA COSTRUZIONI	€ 263.163,91		26-dic-12	Agenzia Roma 2 n. 14556 serie 3 del 04/07/2012	SAL n. 1 a tutto il 29/10/2012	€ 120.824,70	45,91%
ME	57	Casalvecchio	Opere di consolidamento con strandi in acciaio, ricostruzione muri perimetrali Capri Leone Centro	€.600.000,00	Decreto n. 252 del 3/10/2011	€ 373.816,18	Geom. Gaetano Giuffrè	B.D.M.G. COSTRUZIONI s.r.l.	€ 273.436,80	€ 301.371,61	15-nov-11	Agenzia Roma 2 n. 23601 serie 3	SAL n. 2 a tutto il 04/10/2012	€ 301.371,26	100,00%
ME	58	Casalvecchio	Consolidamento centro abitato	€ 3.000.000,00	Decreto 030 del 1 marzo 2011	€ 3.000.000,00	Ing. Bruno Manfrè (DRPC MEI)	PRESAL COSTRUZIONI SRL	€ 2.074.261,79	€ 2.148.400,92	14-dic-11	Palermo n. 30330 serie 3T	SAL n. 8 A tutto il 27/08/2012	€ 2.148.367,92	100,00%
ME	59	Casalvecchio Siculo	Consolidamento centro abitato	€ 1.363.853,00	Decreto n. 296 del 25/06/2012	€ 1.363.853,00	€ 1.363.853,00	ITINERA S.r.l.	€ 611.962,47		27-set-12	Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio n. 20672 serie 3 del 08/10/2012			
ME	61	Castel di Lucio	Consolidamento via Durante e via S. Lucia	€ 1.500.000,00	Decreto n. 032 del 1 marzo 2011 e successivo Decreto 91 del 24 giugno 2011	€ 1.500.000,00	Ing. Giuseppe La Placa	TOMSTEN COSTRUZIONI SRL	€ 775.825,46	€ 814.016,79	10-mag-11	Agenzia Roma 2 n. 17625 serie 3	SAL n. 1 a tutto il 30/06/2012	€ 183.559,28	22,55%
ME	62	Castel Umberto	Opere di contenimento a valle della sede stradale - Contrada Sferanda inferiore	€ 300.000,00	Decreto n. 702 del 17/12/2012	€ 300.000,00	Ing. Bruno Manfrè (DRPC)	GARA IN CORSO			-	-			
ME	63	Castroreale	Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato- Completamento	€ 1.650.000,00	Decreto n. 588 del 07/11/2012	€ 1.585.394,53	Arch. Gaetano Bacchelli (UTC)	C.M.T. s.r.l.			-	-			
ME	65	Ficarra	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Gremia	€ 1.072.980,80	Decreto n. 1 del 23/11/2010	€ 1.016.980,80	Ing. Fabio Marino	ERRETECNICA COSTRUZIONI s.r.l.	€ 520.423,97	€ 600.334,31	28-mar-11	Patti n. 11 serie 1	SAL n. 3 a tutto il 03/02/2012	€ 600.293,36	99,99%

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

Prov.	Cod.	Identificativo	Oggetto	Importo A/P	Decreto Finanziamento	Importo finanziato Decreto Finanziamento	Resp. Proced.	Aggiudicataria	importo contrattuale al netto di IVA	importo contrattuale dopo eventuali perizie e atti aggiuntivi al netto di IVA	Contratto			avanzamento lavori		
											sottoscrizione	Registrazione	sal n.	importo al netto di IVA	%
ME	66	Fiumara	Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rocca Bresina e in località San Nicito	€ 1.450.000,00	Decreto n. 44 del 7/04/2011	€ 1.358.580,64	Ing. Fabio Marino	RENDO COSTRUZIONI	€ 845.016,73		01-set-11	Agenzia Roma 2 n. 18089 serie 3	SAL n. 3 a tutto il 16/05/2012	€ 346.312,15	53,69%
ME	72	Galati Marmorito	Disgaggiamento massi, messa in sicurezza versante Contrada Galati	€ 500.000,00	Decreto n. 15 del 17/01/2012	€ 500.000,00	Arch. Giuseppa Cassio	SMAS COSTRUZIONI s.r.l.	€ 237.403,66		05-apr-12	Ag. Delle Entrate Roma 2 Aurelio n. 8127 serie 3			
ME	73	Galati Marmorito	Consolidamento e messa in sicurezza versante - Località Pilieri	€ 1.100.000,00	Decreto n. 406 del 02/08/2012	€ 1.100.000,00	Arch. Giuseppa Cassio	ARCOBALENO 3000 SRL	€ 472.453,94		11-ott-12	in Corso di registrazione			
ME	81	Librizzi	Opere di consolidamento versante e sistemazione – Zona Ronco Marurà	€ 500.000,00	Decreto n. 707 del 17/12/2012	€ 500.000,00	Geom. Santo di Pasa (UTC)	GARA IN CORSO	-	-	-	-			
ME	88	Messina	"Opere di salvaguardia centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" - Comune di Messina	€ 3.000.000,00	Decreto n. 392 del 26/04/2012	€ 3.000.000,00	Ing. Salvatore Bartolotta	A.T.I. SETTIMO COSTRUZIONI E CORI DI GIUSEPPE MAMMOLITI	€ 1.581.253,65		26-lug-12	Agenzia Roma 2 n. 17210 serie 3 del 01/08/2012			
ME	089_1	Messina	Opere di consolidamento località Gaiati S. Anna	€ 900.000,00	Decreto n. 593 del 08/11/2012	€ 900.000,00	Ing. Antonino Amato (UTC)	GARA IN CORSO	-	-	-	-			
ME	89_3	Messina	Opere di consolidamento località Mili San Pietro	€ 510.000,00	Decreto n. 383 del 20/07/2012	€ 509.354,78	Geom. Mario Manzoni (UTC)	EDIL SICULA soc coop	€ 235.174,11		18-dic-12	In corso di registrazione			
ME	92	Mistretta	Regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord-ovest dell'abitato di Mistretta – fiumara Santa Domenica	€ 800.000,00	Decreto n. 586 del 7/11/2012	€ 778.679,50	Geom. Rosaria Manzella (UTC)	GISONDA s.r.l.	-	-	-	-			
ME	99	Piraino	Opere di consolidamento – Zona Roda - S.Costantino, Policarà, San Leone ecc. Galati, Torre Faro e delle Correnti - SAN LEONARDO	€ 1.100.000,00	Decreto n. 493 del 25/09/2012	€ 668.852,86	Geom. Carmelo Leone (UTC)	GARA IN CORSO	-	-	-	-			
ME	115_1	Sant'Agata di Militello	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barita	€ 3.000.000,00	Decreto n. 151 del 27/7/2011	€ 3.000.000,00	Ing. Bruno Mantia (RUP) - Ing.	A.T.I. MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGR.) - A.M.A. S.R.L. (Mandante)	€ 1.590.801,39		15-nov-11	Agenzia Roma 2 n. 13496 serie 3	SAL n. 3 a tutto il 08/08/2012	€ 1.216.968,52	76,50%
ME	115_2	Sant'Agata di Militello	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Canelli	€ 2.930.000,00	Decreto n. 301 del 28/06/2012	€ 2.930.000,00	Geom. Vittorio Riccardi (Comune)	ATI AVENI srl - EUROLOTTA TRIVELLAZIONI srl	€ 1.606.725,21		25-ott-12	Agenzia Roma 2 n. 13358 serie 3 del 07/11/2012			
ME	128	Tortorici	Muri e barriere paramassi – Zona Badiana-Pagliara-S.Leone	€ 500.000,00	Decreto n. 574 del 04/12/2012	€ 476.038,45	Geom. Bartolomeo Carmela (UTC)	GARA IN CORSO	-	-	-	-			

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 10.01.2010"
Ex D.P.C.M. 19 dicembre 2008

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

Prov.	Cod	Identificativo	Capitolo	Importo fabb	Decreto Finanziamento	Importo finanziato Decreto Finanziamento	Resp. Proced.	Aggiudicatario	Importo contrattuale al netto di IVA	Importo eventuali perizie e atti aggiuntivi al netto di IVA	Contratto			Avanzamento lavori		
											sottoscrizione	Registrazione	sal n.	Importo al netto di IVA	%	
ME	130	Tusa	Prosecuzione della Barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni - zona Castel di Tusa (Isola Europa Unita) - I LAVORI SONO STATI SOSPESI PER SALVAGUARDIA ZONA PIAZZETTA ANDREA FERLITO, MENTRE L'IMPORTO DELL'ADP è RIFERITO AI LAVORI PRINCIPALI	€ 1.500.000,00	Decreto n. 11 del 27/01/2011	€ 280.000,00	Ing. Pietro Viviani	Impresa Cavagnini Carmelo	€ 198.120,79		24-mar-11	Agenzia delle Entrate di Palermo n. 4465 sez 3-A del 18/05/2011	Stato Finale	€ 198.120,79	100,00%	
PA	137_1	Biv1.1 - BS	Sistemazione idraulica del burrone S. Domenica-Malpasso e consolidamento del centro urbano	€ 1.310.000,00	Decreto n. 067 del 24/5/2011	€ 1.310.000,00	Ing. Giuseppe la Placa	CEFI di GIUSEPPE MAMMOLITI	€ 719.748,63	€ 754.443,78	15-nov-11	Agenzia Roma 2 n. 23499 serie 3	SAL n. 4 A tutto il 31/10/2012	€ 754.288,92	99,98%	
PA	137_2	Biv1.2	Finanziamento dei lavori di "Lavori di Consolidamento del centro urbano a monte e a valle del quartiere Macelli	€ 690.000,00	Decreto n. 87 del 10/06/2011	€ 690.000,00	Ing. Giuseppe La Placa	ARCOBALENO 3000 SRL	€ 356.606,98	€ 364.449,87	10-ago-11	Agenzia Roma 2 n. 17924 serie 3	SAL n. 2 A tutto il 28/03/2012	€ 364.449,87	100,00%	
PA	141	Caltavuturo	Consolidamento centro abitato" – "Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato – zona Balata Raffo Rosso"	€ 1.200.000,00	Decreto n. 410 del 01/08/2012	€ 1.200.000,00	Arch. Giovan Battista Quagliata (Comune)	SACCHERA COSTRUZIONI Srl	€ 499.883,72		In corso Istruttoria					
PA	154	Polizzi Generosa	Opere di consolidamento – Zona via Borgese" nel comune di Polizzi Generosa (PA)	€ 500.000,00	Decreto n. 039 del 31/3/2011	€ 500.000,00	Ing. Vincenzo Di Rosa	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	€ 287.752,44		10-ago-11	Agenzia Roma 2 n. 17823 serie 3	STATO FINALE	€ 287.514,20	100,00%	
PA	156	Termini Imerese	"Risagomatura argini e opera di pulitura - Zona foce Fiume Torto"	€ 800.000,00	Decreto n. 108 del 13/03/2012	€ 800.000,00	Ing. Calogero Evoli	SILBEO s.r.l.	€ 313.193,85	€ 343.690,02	05-dic-12	Agenzia Roma 2 n. 13817 serie 3 del 15/06/2012	SAL n. 2 a tutto il 26/10/2013	€ 326.837,94	95,10%	
PA	157	Valledolmo	Opere di Consolidamento centrale Nicchia (strada comunale "Nicchia-stazione nord Parco eolico")	€ 500.000,00	Decreto n. 2 del 31/12/2010	€ 500.000,00	Geom. Orazio Prestifilippo	CO.GENAR S.r.l.	€ 281.762,98	€ 302.383,64	Contratto Principale: 30/03/2011, Atto Aggiuntivo: 17/06/2011	Contratto Principale Registrato a Termini Imerese al n. 145 del 14/04/2011, Atto Aggiuntivo Registrato a Caltanisetta al n. 2181 serie 3 il 17/06/2011	SAL n. 2 a tutto il 10/06/2011	€ 302.180,35	99,93%	
SR	161	Avola	Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica c/da Cavagrande del Cassibile	€ 600.000,00	Decreto n. 218 del 24/05/2012	€ 600.000,00	Dott. Geol. Gaetano Matino (ADPC SR)	CONSORZIO STABILE VITROVEO scarl	€ 340.976,61		11-dic-12	In corso di sottoscrizione				
SR	167	Rosolini	Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristaio-Masicugno	€ 1.500.000,00	Decreto n. 427 del 22/08/2012	€ 1.315.000,00	Geom. Vincenzo Giuliano	UNIPEA SOC COOPERATIVA	€ 621.423,91		25-set-12	Agenzia Roma 2 n. 23360 serie 3 del 07/11/2012				
SR	177	Carlentini	"Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR)	€ 2.500.000,00	Decreto n. 247 del 28/05/2012	€ 2.500.000,00	Geom. Francesco Inguglia	SIRAMA COSTRUZIONI S.r.l.	€ 1.301.167,81		26-set-12	Agenzia Roma 2 n. 21647 serie 3 del 10/10/2012				

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex O.P.C.M. 10 dicembre 2010

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Prov.	Cod.	Identificativo	Oggetto	Importo ADP	Decreto finanziamento	Importo finanziato Decreto Finanziamento	Resp. Proced.	Aggiudicataria	Importo contrattuale al netto di IVA	Importo contrattuale Rideterminato a seguito eventuali perizie di atti aggiuntivi al netto di IVA	Contratto		Avanzamento lavori		
											sottoscr. dover	Registrazione	sal n.	importo al netto di IVA	%
SR	185	Buscemi	Consolidamento costone sottostante il Santuario	€ 200.000,00	Decreto n. 319 del 09/07/2012	€ 200.000,00	Geom. Giuseppe Ferrante	TECNO COSTRUZIONI s.r.l.	€ 98.805,14		26-set-12	Agenzia Roma 2 n. 21073 serie 3 del 11/10/2012	SAL n. 1 a tutto il 20/11/2012	€ 42.130,94	42,64%
TP	168	Erice	Lavori di consolidamento del costone roccioso pon Cosolfinello nel Comune di Erice	€ 500.000,00	Decreto n. 221 del 16/05/2012	€ 500.000,00	Ing. Giovanni Indelicato (DRRC TP)	MENZA COSTRUZIONI s.r.l.	€ 265.358,67		02-ott-12	Agenzia Roma 2 n. 21882 serie 3 del 19/10/2012			
TP	169	Mazzara del Vallo	Opere di protezione consolidamento e risistino funzionalità infrastruttura – Zona Tonnarella	€ 800.000,00	Decreto n. 216 del 11/05/2012	€ 800.000,00	Ing. Enrico Violoni	CONSORZIO STABILI VITRUVIO s.a.a.r.l.	€ 561.500,00		24-lug-12	Agenzia delle Entrate di Patti serie 3 n. 992 del 24/08/2012	Sal n. 2 a tutto il 12/11/2012	€ 493.904,45	87,96%
TP	172	San Vito Lo Capo	Lavori di costruzione di reti pararenasi in località Makari	€ 450.000,00	Decreto n. 62 del 14/02/2012	€ 450.000,00	Ing. Giovanni Indelicato	TERRITEK COSTRUZIONI SRL	€ 251.264,49		10-mag-12	Agenzia Roma 2 n. 10780 serie 3 del 16/05/2012			

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

AG 001	Agrigento	*Interventi di messa in sicurezza del centro abitato - Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la via delle Torri (PAI 067-1ag-205)*

CUP	J43B10000690001	CIG	4731638F2F

Decreto finanziamento	Decreto n.639 del 22/11/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 642 del 23/11/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 680 del 10/12/2012	Sottoscrizione Contratto	-	Registrazione Contratto	-	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	-

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 683.300,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			€ 683.300,00
a1	importo a base d'asta		€ 472.746,33	a1	importo del contratto al netto del ribasso	29,8866%	€ 331.458,53
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 14.230,41	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 14.230,41
	Somma a disposizione di cui:	€ 196.323,26			Somma a disposizione di cui:	€ 0,00	
b1	IVA sui lavori 21% di a.1		€ 102.265,12	b1	IVA sui lavori 21% di a.1		
b2	Incentivi per la progettazione 2%		€ 9.739,53	b2	Incentivi per la progettazione 2%		
b3	Rimborso delle spese personale ufficio direzione (1%)		€ 4.869,77	b3	Rimborso delle spese personale ufficio direzione (1%)		
b4	Spese per pubblicità e pubblicazione bando		€ 4.000,00	b4	Spese per pubblicità e pubblicazione bando		
b5	Assicurazione Prog. E D.L. (1%)		€ 4.869,77	b5	Assicurazione Prog. E D.L. (1%)		
b6	Assicurazione RUP per verifica progetto		€ 1.000,00	b6	Assicurazione RUP per verifica progetto		
b7	Contributo AVCP		€ 225,00	b7	Contributo AVCP		
b8	Prove di laboratorio sui materiali		€ 4.000,00	b8	Prove di laboratorio sui materiali		
b9	Spese di produzione di progetto		€ 1.500,00	b9	Spese di produzione di progetto		
b10	Oneri di accesso a discarica		€ 500,00	b10	Oneri di accesso a discarica		
b11	Collaudo statico		€ 5.000,00	b11	Collaudo statico		
b12	Prove su tiranti pilota		€ 4.000,00	b12	Prove su tiranti pilota		
b13	Per ripristino sottoservizi (Enel, Rete iderica, ecc.)		€ 30.000,00	b13	Per ripristino sottoservizi (Enel, Rete iderica, ecc.)		
b14	Imprevisti 5%		€ 24.348,84	b14	Imprevisti 5%		
b15	Arrotondamento		€ 5,23	b15	Arrotondamento		
	totale		€ 683.300,00		Totale		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Domenico Armenio (Ing. Capo GC AG)	Nota di Incarico	n.1344/UC del 01/08/2011	Supporto al RUP		Decreto di nomina	
				Progettista	GC Ag	Nota di Incarico	n.124997 del 26/07/2011
Coord Sicurezza Fase Progett	GC Ag	Nota di Incarico	n.124997 del 26/07/2011	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Genio Civile AG	Nota di Incarico	n.124997 del 26/07/2011
Direttore Lavori	Genio Civile AG	Nota di Incarico	n.124997 del 26/07/2011	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	CO.GE.MA.LA. S.r.l.

TEMPISTICA

Data della consegna	12/12/2012	Data con cui viene resa in sito dai lavori				Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	11/05/2013	Nuova scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		totale gg previsti	150	giorni impiegati in più		Giorni impiegati in più	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre 5ve	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

AG 006	Favara	*Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis nel Comune di Favara (AG)"*

CUP	J25D12000050001	CIG	4204847080

Decreto finanziamento	Decreto n. 175 del 18/04/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 206 del 08/05/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 251 del 30/05/2012	Sottoscrizione Contratto	03/07/2012	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 Aurelio n. 15515 serie 3 il 16/07/2012	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	Decreto n. 581 del 6/11/2012

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 1.500.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato				€ 1.192.811,88
a1	importo a base d'asta		€ 961.677,77	a1	importo del contratto al netto del ribasso	26,0561%	€ 711.102,05	
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 30.253,92	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 30.253,92	
	Somma a disposizione di cui:	€ 508.068,31			Somma a disposizione di cui:	€ 1.644.267,79		
b1	IVA 21% sui Lavori		€ 208.305,65	b1	IVA 21% sui Lavori		€ 155.684,75	
b2	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)		€ 19.838,63	b2	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)		€ 19.838,63	
b3	Spese di cui all'art.90 comma 5 (Polizze assicurative progettazione)		€ 9.919,32	b3	Spese di cui all'art.90 comma 5 (Polizze assicurative progettazione)		€ 9.919,32	
b4	Rimborso oneri trasferta e minute spese personale Uff. Direzione Lavori ex art. 206 del DPR 207/2010 (1%)		€ 9.919,32	b4	Rimborso oneri trasferta e minute spese personale Uff. Direzione Lavori ex art. 206 del DPR 207/2010 (1%)		€ 9.919,32	
b5	Per collaudo statico e amministrativo		€ 10.000,00	b5	Per collaudo statico e amministrativo		€ 10.642,19	
b6	Per indagini geognostiche (IVA inclusa)		€ 30.800,00	b6	Per indagini geognostiche (IVA inclusa)		€ 30.800,00	
b7	Indennità di esproprio		€ 158.294,50	b7	Indennità di esproprio		€ 158.294,50	
b8	Per spese di pubblicazione, bando di gara e procedure urbanistiche		€ 12.500,00	b8	Per spese di pubblicazione, bando di gara e procedure urbanistiche		€ 0,00	
b9	Prove di laboratorio sui materiali		€ 4.000,00	b9	Prove di laboratorio sui materiali		€ 4.000,00	
b10	Oneri accesso a discarica		€ 15.000,00	b10	Oneri accesso a discarica		€ 15.000,00	
b11	Contributo Autorità di vigilanza		€ 375,00	b11	Contributo Autorità di vigilanza		€ 0,00	
b12	Oneri per frazionamento particelle oggetto di esproprio		€ 3.000,00	b12	Imprevisti		€ 34.357,20	
b13	Imprevisti		€ 26.115,89	b13	Compenso procedure frazionamento		€ 3.000,00	
	totale		€ 1.500.000,00		Totale		€ 1.192.811,88	

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Domenico Armenio (Ing. Capo GC Ag)	Nota di nomina	n.89975 del 03/11/2010	Supporto al RUP		Decreto di nomina	
				Progettista	Genio Civile	Nota di nomina	n. 369/UC del 12/10/2010
Coord Sicurezza fase Progetti	Genio Civile	Nota di nomina	n. 369/UC del 12/10/2010	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Genio Civile	Nota di nomina	n. 369/UC del 12/10/2010
Direttore Lavori	Ing. Angelo Valerio Zambito Genio Civile AG	Nota di nomina	n. 369/UC del 12/10/2010	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore STATICO	Ing. Pietro Agnello			Nota di nomina	Prot n. 4246 del 23/10/2012		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 568 del 31/10/2012		
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Ing. Pietro Agnello			Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 568 del 31/10/2012		

AFFIDATARIA

Affidataria	**Bollita Costruzioni soc. coop.**

SUBAPPALTI AUTORIZZATI (prot. 4718 del 15/11/2012)

Subappaltatore:	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.p.A. - CONSORZIATA ESECUTIVA "EMMA LAVORI Coop s.c.a.r.l.

TEMPISTICA

Data della consegna	21/08/2013	Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	21/08/2013	Nuova Scadenza	
Ipotesi Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		Giorni da previsti	365	giorni impiegati in più		giorni residuali in più	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	22/10/2012	per lavori a tutto il:	22/10/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 152.229,93						
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	14/11/2012			importo oltre IVA	€ 151.468,78	Decreto di liquidazione SAL n. 1		importo oltre IVA		Percentuale di avanzamento al SAL n.1	20,53%

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE


Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

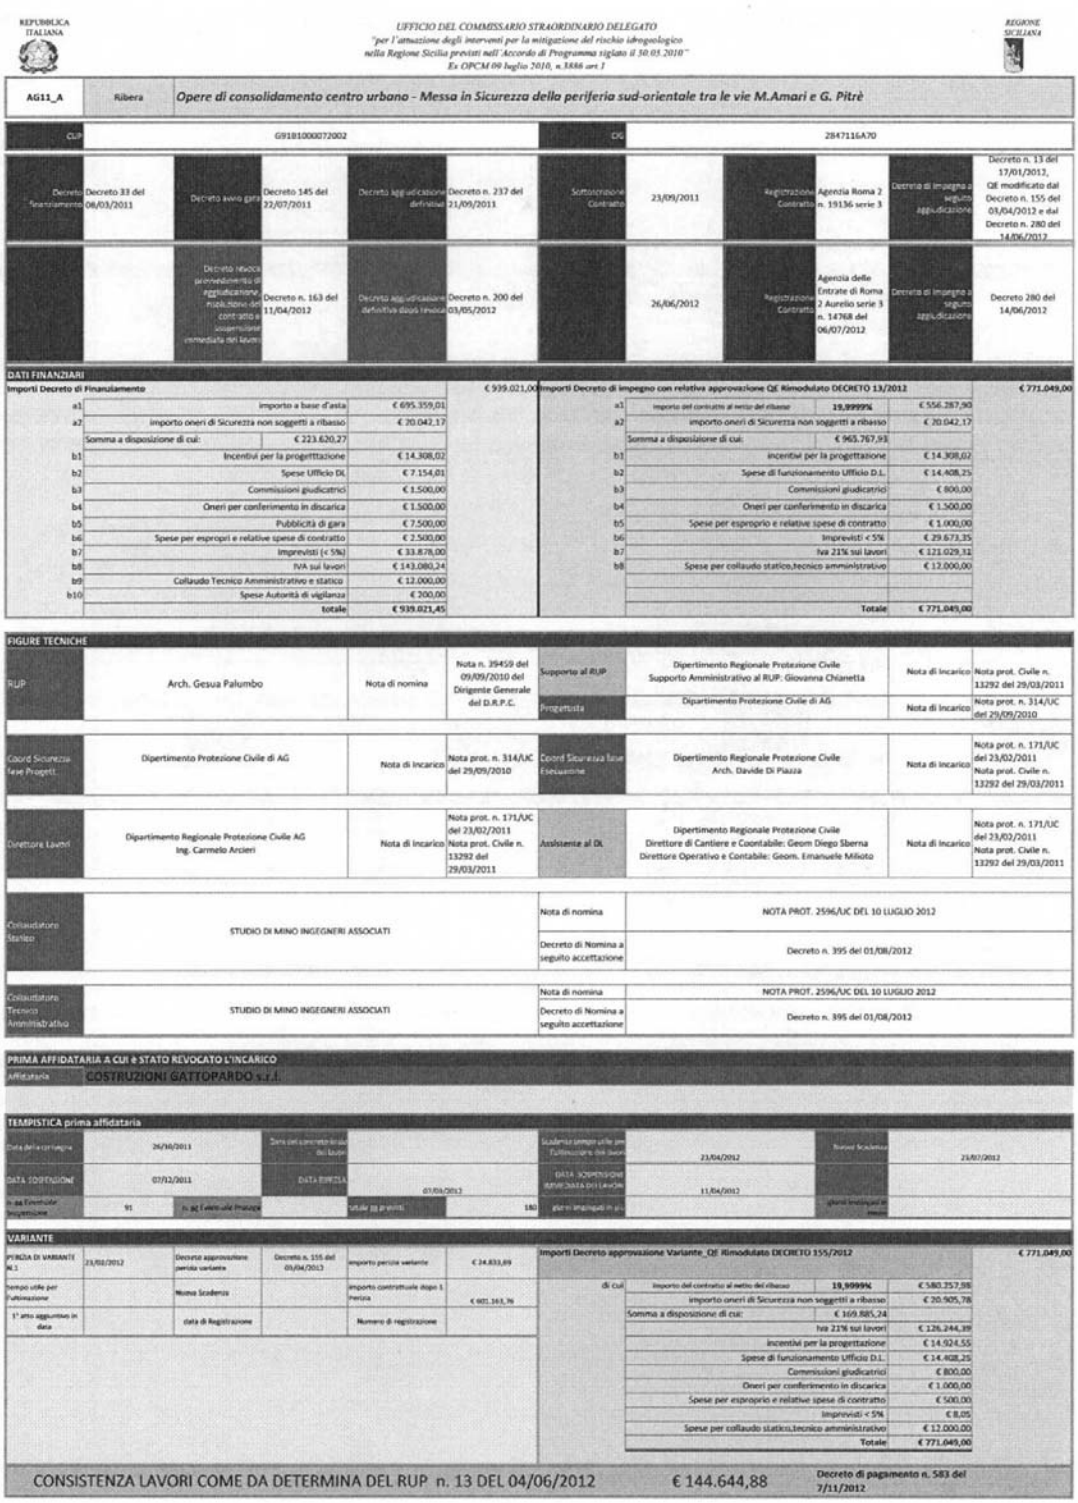

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.05.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

AG11_A	Ribera	*Opere di consolidamento centro urbano - Messa in Sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M.Amari e G. Pitrè*

CUP	G91B10000720002	CIG	2B47116A70

Decreto finanziamento	Decreto 33 del 08/03/2011	Decreto avvio gara	Decreto 145 del 22/07/2011	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 237 del 21/09/2011	Sottoscrizione Contratto	23/09/2011	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 19136 serie 3	Determ di impegno a seguito aggiudicazione	Decreto n. 13 del 17/01/2012, QE modificato dal Decreto n. 155 del 03/04/2012 e dal Decreto n. 280 del 14/06/2012
		Decreto revoca provvedimento di aggiudicazione, risoluzione del contratto e sospensione immediata dei lavori	Decreto n. 163 del 11/04/2012	Decreto Aggiudicazione definitiva dopo revoca	Decreto n. 200 del 03/05/2012		26/06/2012	Registrazione Contratto	Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio serie 3 n. 14768 del 06/07/2012	Determ di impegno a seguito aggiudicazione	Decreto 280 del 14/06/2012

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 939.021,00
a1	importo a base d'asta	€ 695.359,01	
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.042,17	
	Somma a disposizione di cui: € 223.620,27		
b1	Incentivi per la progetttazione	€ 14.308,02	
b2	Spese Ufficio DL	€ 7.154,01	
b3	Commissioni giudicatrici	€ 1.500,00	
b4	Oneri per conferimento in discarica	€ 1.500,00	
b5	Pubblicità di gara	€ 7.500,00	
b6	Spese per espropri e relative spese di contratto	€ 2.500,00	
b7	Imprevisti (< 5%)	€ 33.878,00	
b8	IVA sui lavori	€ 143.080,24	
b9	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico	€ 12.000,00	
b10	Spese Autorità di vigilanza	€ 200,00	
	totale	€ 939.021,45	

Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato DECRETO 13/2012			€ 771.049,00
a1	importo del contratto al netto del ribasso	19,9999%	€ 556.287,90
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 20.042,17
	Somma a disposizione di cui:	€ 965.767,93	
b1	incentivi per la progettazione		€ 14.308,02
b2	Spese di funzionamento Ufficio D.L.		€ 14.408,25
b3	Commissioni giudicatrici		€ 800,00
b4	Oneri per conferimento in discarica		€ 1.500,00
b5	Spese per esproprio e relative spese di contratto		€ 1.000,00
b6	Imprevisti < 5%		€ 29.673,35
b7	Iva 21% sui lavori		€ 121.029,32
b8	Spese per collaudo statico,tecnico amministrativo		€ 12.000,00
	Totale		€ 771.049,00

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Gesua Palumbo	Nota di nomina	Nota n. 39459 del 09/09/2010 del Dirigente Generale del D.R.P.C.	Supporto al RUP	Dipertimento Regionale Protezione Civile Supporto Amministrativo al RUP: Giovanna Chianetta	Nota di incarico	Nota prot. Civile n. 13292 del 29/03/2011
				Progettista	Dipartimento Protezione Civile di AG	Nota di Incarico	Nota prot. n. 314/UC del 29/09/2010
Coord Sicurezza fase Progett	Dipertimento Protezione Civile di AG	Nota di incarico	Nota prot. n. 314/UC del 29/09/2010	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Dipertimento Regionale Protezione Civile Arch. Davide Di Piazza	Nota di incarico	Nota prot. n. 171/UC del 23/02/2011 Nota prot. Civile n. 13292 del 29/03/2011
Direttore Lavori	Dipartimento Regionale Protezione Civile AG Ing. Carmelo Arcieri	Nota di incarico	Nota prot. n. 171/UC del 23/02/2011 Nota prot. Civile n. 13292 del 29/03/2011	Assistente al DL	Dipertimento Regionale Protezione Civile Direttore di Cantiere e Coontabile: Geom Diego Sberna Direttore Operativo e Contabile: Geom. Emanuele Milioto	Nota di incarico	Nota prot. n. 171/UC del 23/02/2011 Nota prot. Civile n. 13292 del 29/03/2011
Collaudatore Statico	STUDIO DI MINO INGEGNERI ASSOCIATI			Nota di nomina	NOTA PROT. 2596/UC DEL 10 LUGLIO 2012		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 395 del 01/08/2012		
Collaudatore Tecnico Amministrativo	STUDIO DI MINO INGEGNERI ASSOCIATI			Nota di nomina	NOTA PROT. 2596/UC DEL 10 LUGLIO 2012		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 395 del 01/08/2012		

PRIMA AFFIDATARIA A CUI è STATO REVOCATO L'INCARICO

Affidataria: COSTRUZIONI GATTOPARDO s.r.l.

TEMPISTICA prima affidataria


Data della consegna	26/10/2011	Data del verbale di inizio lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	23/04/2012	Nuova Scadenza	23/07/2012
DATA SOSPENSIONE	07/12/2011	DATA RIPRESA	07/04/2012	DATA SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' DI LAVORI	11/04/2012		
n. gg Eventuale sospensione	91	n. gg Eventuale Proroga		totale gg previsti	180	giorni impiegati in corso	

VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE N.1	23/03/2012	Decreto approvazione perizia variante	Decreto n. 155 del 03/04/2012	importo perizia variante	€ 24.833,89
tempo utile per l'ultimazione		Nuova Scadenza		importo contrattuale dopo 1 perizia	€ 601.163,76
1° atto aggiuntivo in data		data di Registrazione		Numero di registrazione	

Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato DECRETO 155/2012			€ 771.049,00
di cui	importo del contratto al netto del ribasso	19,9999%	€ 580.257,98
	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 20.905,78
	Somma a disposizione di cui:	€ 169.885,24	
	Iva 21% sui lavori		€ 126.244,39
	incentivi per la progettazione		€ 14.924,55
	Spese di funzionamento Ufficio D.L.		€ 14.408,25
	Commissioni giudicatrici		€ 800,00
	Oneri per conferimento in discarica		€ 1.000,00
	Spese per esproprio e relative spese di contratto		€ 500,00
	Imprevisti < 5%		€ 8,05
	Spese per collaudo statico,tecnico amministrativo		€ 12.000,00
	Totale		€ 771.049,00

CONSISTENZA LAVORI COME DA DETERMINA DEL RUP n. 13 DEL 04/06/2012 — € 144.644,88 — Decreto di pagamento n. 583 del 7/11/2012

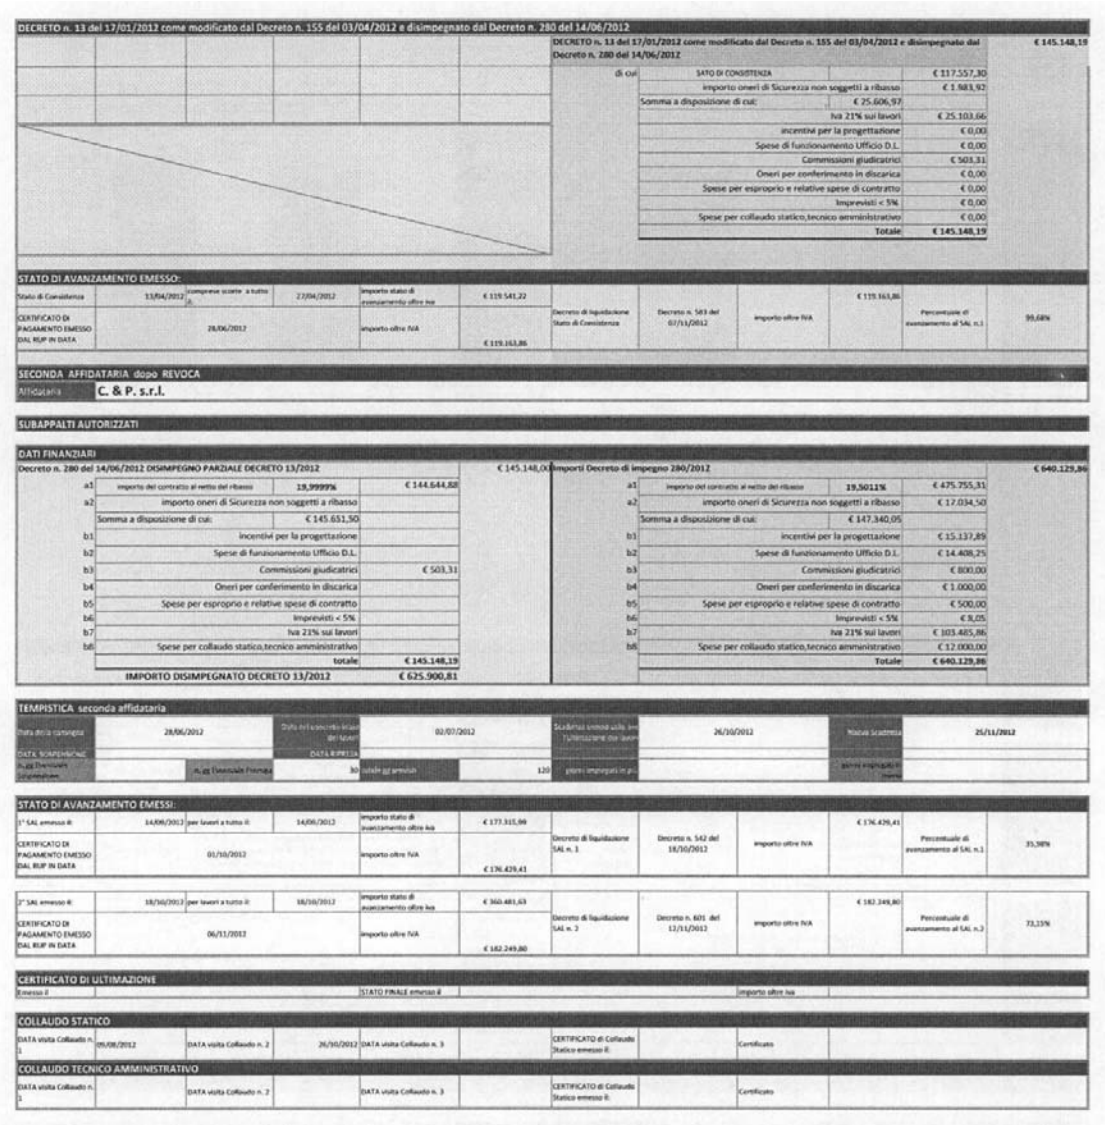

DECRETO n. 13 del 17/01/2012 come modificato dal Decreto n. 155 del 03/04/2012 e disimpegnato dal Decreto n. 280 del 14/06/2012

DECRETO n. 13 del 17/01/2012 come modificato dal Decreto n. 155 del 03/04/2012 e disimpegnato dal Decreto n. 280 del 14/06/2012 € 145.148,19

di cui

SATO DI CONSISTENZA		€ 117.557,30
importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.983,92
Somma a disposizione di cui:	€ 25.606,97	
Iva 21% sui lavori		€ 25.103,66
incentivi per la progettazione		€ 0,00
Spese di funzionamento Ufficio D.L.		€ 0,00
Commissioni giudicatrici		€ 503,31
Oneri per conferimento in discarica		€ 0,00
Spese per esproprio e relative spese di contratto		€ 0,00
Imprevisti < 5%		€ 0,00
Spese per collaudo statico,tecnico amministrativo		€ 0,00
Totale		€ 145.148,19

STATO DI AVANZAMENTO EMESSO:

Stato di Consistenza	13/04/2012	Comprese ritenute a tutto il	27/04/2012	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 119.541,22				€ 119.163,86		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	28/06/2012			importo oltre IVA	€ 119.163,86	Decreto di liquidazione Stato di Consistenza	Decreto n. 503 del 07/11/2012	importo oltre IVA		Percentuale di avanzamento al SAL n.1	99,68%

SECONDA AFFIDATARIA dopo REVOCA

Affidataria: **C. & P. s.r.l.**

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

DATI FINANZIARI

Decreto n. 280 del 14/06/2012 DISIMPEGNO PARZIALE DECRETO 13/2012 € 145.148,00

a1	importo del contratto al netto del ribasso	19,9999%	€ 144.644,68
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		
	Somma a disposizione di cui:	€ 145.651,50	
b1	incentivi per la progettazione		
b2	Spese di funzionamento Ufficio D.L.		
b3	Commissioni giudicatrici		€ 503,31
b4	Oneri per conferimento in discarica		
b5	Spese per esproprio e relative spese di contratto		
b6	Imprevisti < 5%		
b7	Iva 21% sui lavori		
b8	Spese per collaudo statico,tecnico amministrativo		
	totale		€ 145.148,19
	IMPORTO DISIMPEGNATO DECRETO 13/2012		€ 625.900,81

Importi Decreto di impegno 280/2012 € 640.129,86

a1	importo del contratto al netto del ribasso	19,5011%	€ 475.755,31
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.034,50
	Somma a disposizione di cui:	€ 147.340,05	
b1	incentivi per la progettazione		€ 15.137,89
b2	Spese di funzionamento Ufficio D.L.		€ 14.408,25
b3	Commissioni giudicatrici		€ 800,00
b4	Oneri per conferimento in discarica		€ 1.000,00
b5	Spese per esproprio e relative spese di contratto		€ 500,00
b6	Imprevisti < 5%		€ 8,05
b7	Iva 21% sui lavori		€ 103.485,86
b8	Spese per collaudo statico,tecnico amministrativo		€ 12.000,00
	Totale		€ 640.129,86

TEMPISTICA seconda affidataria

Data della consegna	28/06/2012		Data effettiva inizio dei lavori	02/07/2012	Scadenza prevista alla fine lavori	26/10/2012		Nuova Scadenza	25/11/2012		
DATA SOSPENSIONE			DATA RIPRESA								
n. gg lavorativi giornalieri		n. gg lavorativi Previsti	80	totale gg previsti	120	giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno			

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	14/08/2012	per lavori a tutto il:	14/08/2012	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 173.315,99				€ 176.429,41		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	01/10/2012			importo oltre IVA	€ 176.429,41	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 542 del 18/10/2012	importo oltre IVA		Percentuale di avanzamento al SAL n.1	35,98%
2° SAL emesso il:	18/10/2012	per lavori a tutto il:	18/10/2012	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 360.481,63				€ 182.249,80		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	06/11/2012			importo oltre IVA	€ 182.249,80	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 601 del 12/11/2012	importo oltre IVA		Percentuale di avanzamento al SAL n.2	73,15%

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre Iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1	05/08/2012	DATA visita Collaudo n. 2	26/10/2012	DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	Certificato

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	Certificato

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n 3886 art.1

REGIONE SICILIANA

CT 024	Castel di Iudica	*Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti*

CUP	J45D12000530001	CIG	4774249AE6

Decreto finanziamento	Decreto n. 640 del 22/11/2012	Decreto aviso gara	Decreto n. 674 del 07/12/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	-	Sottoscrizione Contratto	-	Registrazione Contratto	-	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	-

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento — € 3.000.000,00

a1	importo a base d'asta		€ 1.878.504,60
a2	importo oneri di Sicurezza inclusi non soggetti a ribasso		€ 69.441,25
a3	importo oneri di Sicurezza esclusi non soggetti a ribasso		€ 38.633,75
	Somma a disposizione di cui:	€ 1.013.420,40	
b1	Rilievi planoaltimetrici, acc su manuf, indagini geognostiche		€ 41.419,43
b2	Imprevisti art. 42 c. 3b DPR 207/2010		€ 62.253,81
b3	Espropriazioni		€ 10.000,00
b4	Accantonamenti art. 133 D lgs. 163/2006		€ 19.865,80
b5	Competenze tecniche		€ 189.680,03
b6	Incentivi 2% (art. 92 c 5 D Lgs 163/2006)		€ 26.222,85
b7	Oneri polizza responsabilità UTC		€ 3.973,16
b8	Spese commissione giudicatrice		€ 4.000,00
b9	Pubblicità di gara		€ 20.000,00
b10	Spese di laboratorio compreso IVA		€ 40.000,00
b11	Oneri accesso a discarica		€ 173.223,60
b12	IVA sui lavori 21%		€ 417.181,72
b13	Contributo AVCP		€ 600,00
b14	Spese per autorizzazioni N.O. ecc		€ 5.000,00
	totale		**€ 3.000.000,00**

Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato

a1	importo del contratto al netto del ribasso		€ 1.878.504,60
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 69.441,25
a3	importo oneri di Sicurezza esclusi non soggetti a ribasso		€ 38.633,75
	Somma a disposizione di cui:	€ 0,00	
b1	Rilievi planoaltimetrici, acc su manuf, indagini geognostiche		
b2	Imprevisti art. 42 c. 3b DPR 207/2010		
b3	Espropriazioni		
b4	Accantonamenti art. 133 D lgs. 163/2006		
b5	Competenze tecniche		
b6	Incentivi 2% (art. 92 c 5 D Lgs 163/2006)		
b7	Oneri polizza responsabilità UTC		
b8	Spese commissione giudicatrice		
b9	Pubblicità di gara		
b10	Spese di laboratorio compreso IVA		
b11	Oneri accesso a discarica		
b12	IVA sui lavori 21%		
b13	Contributo AVCP		
b14	Spese per autorizzazioni N.O. ecc		
	Totale		

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Domenico Faranda	Decreto di nomina	Decreto n. 96 del 16 giugno 2011	Supporto al RUP	Ing. Federica Bottini	Decreto di nomina	Decreto n. 96 del 16 giugno 2011
				Progettista	COMUNE	Decreto di nomina	
Coord Sicurezza Fase Progett.	Ing. Lorenzo Moschetto	Determina di nomina	Determina U.T.C. n° 858 del 08/07/2011	Coord Sicurezza Fase Esecutiva		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	GARA IN CORSO

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del completamento dei lavori		Tempistica lavori utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
N. gg Contratto Originario		N. gg Suppletivi Proposti		Scarto di tempo		Certificato ultimazione lavori	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

CT 027	Grammichele	*Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B.Buozzi*

CUP	J95D12000450001	CIG	480802323

Decreto finanziamento	Decreto n.684 del 10/12/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 701 del 17/12/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	-	Sottoscrizione Contratto	-	Registrazione Contratto	-	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	-

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 700.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
a1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 417.193,15		a1	importo del contratto al netto del ribasso	€ 417.193,15
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.129,75		a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.129,75
	Somma a disposizione di cui:	€ 270.677,10			Somma a disposizione di cui:	€ 0,00
b1	Accertamenti e indagini di laboratorio	€ 2.500,00		b1	Accertamenti e indagini di laboratorio	
b2	Spese tecniche per relazione geologica	€ 10.848,68		b2	Spese tecniche per relazione geologica	
b3	Imprevisti (art. 42, c. 3b DPR 207/2010)	€ 53.230,80		b3	Imprevisti (art. 42, c. 3b DPR 207/2010)	
b4	Spese per espropri	€ 18.240,00		b4	Spese per espropri	
b5	Competenze tecniche interne 2%	€ 8.586,46		b5	Competenze tecniche interne 2%	
b6	Competenze tecniche esterne (fraz.-catasto- conservatoria)	€ 5.000,00		b6	Competenze tecniche esterne (fraz.-catasto- conservatoria)	
b7	Spese per gara	€ 4.000,00		b7	Spese per gara	
b8	Oneri di accesso in discarica	€ 36.300,00		b8	Oneri di accesso in discarica	
b9	Spese tecniche per collaudo statico	€ 5.020,60		b9	Spese tecniche per collaudo statico	
b10	IVA sui lavori 21%	€ 90.157,81		b10	IVA sui lavori 21%	
b11	Spese per monitoraggio	€ 36.992,75		b11	Spese per monitoraggio	
	totale	€ 700.000,00			Totale	

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Michele Iudica UTC	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.325 del 10/07/2012	Supporto al RUP	Ing.Rossella Zumbè	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.325 del 10/07/2012
				Progettista	COMUNE Ing. Biagio Ventura UTC	Determina di nomina	Determina Sindacale n. 42 del 03/11/2003 Determina Dirigenziale n. 677 del 24/11/2003
Coord Sicurezza fase Progett.	Comune Geom. Michele Iudica UTC	Decreto di nomina	Determina Sindacale n. 42 del 03/11/2003 Determina Dirigenziale n. 677 del 24/11/2003	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	GARA IN CORSO

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del contratto (Gg Naz)		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuovi Scadenza	
N. gg Contrattuali Originari		n. gg Eventuali Proroga		totale gg previsti		giorni impiegati in più	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre lus	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

CT 31 A	Misterbianco	*Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo*

CUP	I12J11000100001	CIG	2940704983

Decreto finanziamento	Decreto n. 130 del 13/07/2011	Decreto avvio gara	Decreto n. 180 del 09/08/2011	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 249 del 03/10/2011	Sottoscrizione Contratto	15/11/2011	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 23604 serie 3	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	Decreto n. 381 del 21/11/2011 così come rimodulato con decreto n. 371 del 18/07/2012

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 500.000,00
a1	importo a base d'asta	€ 328.661,33	
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.984,01	
	Somma a disposizione di cui:	€ 161.354,66	
b1	Incentivi spese di progettazione	€ 6.772,91	
b2	Indagini geognostiche	€ 25.520,57	
b3	Oneri per conferimento in discarica	€ 4.000,00	
b4	Spese di pubblicazione bando	€ 12.000,00	
b5	Collaudo Statico	€ 2.507,31	
b6	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94	€ 16.932,27	
b7	IVA 20% di A	€ 67.729,07	
b8	Polizza Assicurativa RUP, DL e Progettazione	€ 2.281,08	
b9	Per Espropri frazionamenti e costi derivati	€ 20.000,00	
b10	Contributi Autorità di Vigilanza	€ 225,00	
b11	Spese a supporto della D.L.	€ 3.386,45	
	totale	€ 500.000,00	

Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			€ 387.388,21
a1	Importo del contratto al netto del ribasso	28,0000%	€ 236.636,16
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.984,01
	Somma a disposizione di cui:	€ 140.768,04	
b1	Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L. 109/94)		€ 6.772,91
b2	Indagini Geognostiche		€ 19.168,05
b3	Oneri per conferimento in discarica		€ 8.200,00
b4	Spese pubblicazione bando di gara e comm. Giudicatrice		€ 2.000,00
b5	Collaudo Statico		€ 2.507,31
b6	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94		€ 24.662,00
b7	IVA 21%dIA		€ 51.790,24
b8	Polizza assicurativa RUP DI, Proget.		€ 2.281,08
b9	Per espropri frazionamenti e costi derivati		€ 20.000,00
b10	Spese a supporto della D.L.		€ 3.386,45
b11	Totale		€ 387.388,21

FIGURE TECNICHE

RUP	DRPC CT Dott. Aldo Bonina	Nota di nomina	Nota della Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 53823 del 14/12/2011	Supporto al RUP	DRPC CT Ing. Gioacchino Marino, Geom. Antonio Sciuto	Decreto di nomina	(Nominativi indicati nella nota della Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 35317 del 08/09/2011
				Progettista	DRPC di Catania Dott. Aldo Bonina, Arch. Fabio Borzì. Arch. Paolo Licandri	Nota di nomina	n. 305 del 28/09/2010 (Nominativi indicati nella nota della Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 35317 del 08/09/2011
Coord Sicurezza fase Progett.	DRPC di Catania	Nota di nomina	n. 305 del 28/09/2010 (Nominativi indicati nella nota della Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 35317 del 08/09/2011	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	DRPC CT Arch. Fabio Borzì Arch. Paolo Licandri	Decreto di nomina	(Nominativi indicati nella nota della Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 35317 del 08/09/2011	Assistente al DL	DRPC CT Geom. Antonio Sciuto	Decreto di nomina	(Nominativi indicati nella nota della Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 35317 del 08/09/2011

Collaudatore Statico	ING. GIOVANNA BARATTA	Nota di nomina	NOTA PROT. 298/UC DEL 31 GENNAIO 2012
		Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 149 del 02/04/2012, come modificato dal Decreto n. 494 del 26/09/2012
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina	
		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	PIZZO PIPPO

SUBAPPALTI AUTORIZZATI


TEMPISTICA

Data Bella consegna	07/11/2011	Data ordine inizio dei lavori		giorni tempo utile per l'ultimazione dei lavori	05/06/2012	Nuova Scadenza	25/06/2012
N. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga	20	totale gg previsti	180	giorni impiegati in più	0

VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE N.1	12/07/2012	Decreto presa atto perizia variante	Decreto n. 371 del 18/07/2012	importo perizia variante	4.451,76
tempo utile per l'ultimazione	30	Nuova Scadenza	04/06/2012	importo contrattuale dopo 1 Perizia	€ 251.071,93
1° atto aggiuntivo in data	16/05/2012	data di Registrazione	30/07/2012	Numero di registrazione	Agenzia delle Entrate di PATTI serie 3 n. 893


Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato			€ 387.388,21
di cui	importo del contratto al netto del ribasso	28,0000%	€ 240.901,64
	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.170,29
	Somma a disposizione di cui:	€ 136.316,28	
	Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L. 109/94)		€ 6.895,12
	Indagini Geognostiche		€ 19.168,05
	Oneri per conferimento in discarica		€ 18.208,78
	Spese pubblicazione bando di gara e comm. Giudicatrice		€ 2.000,00
	Collaudo Statico		€ 13.870,97
	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94		€ 61,80
	IVA 21%dIA		€ 52.725,11
	Polizza assicurativa RUP DI, Proget.		€ 0,00
	Per espropri frazionamenti e costi derivati		€ 20.000,00
	Spese a supporto della D.L.		€ 3.386,45
	Totale		€ 387.388,21

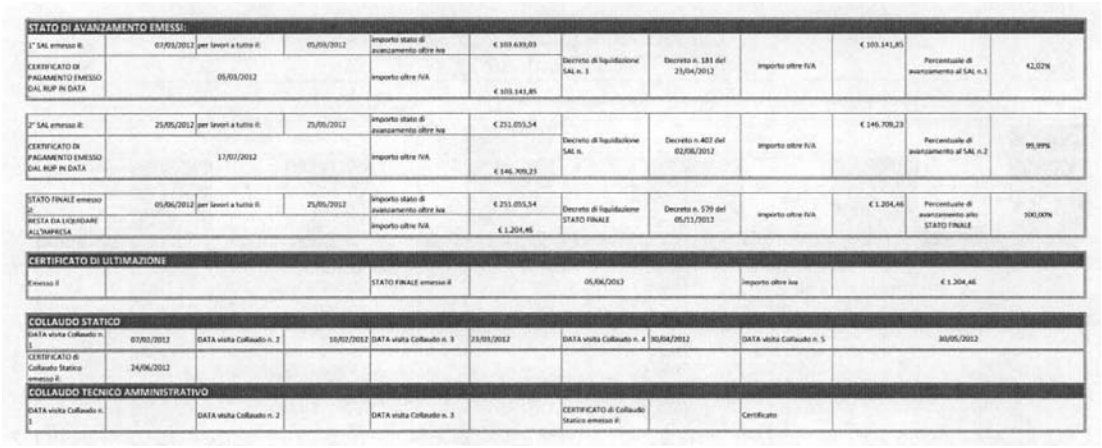

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:											
1° SAL emesso il:	07/01/2012	per lavori a tutto il:	05/03/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 103.633,03				€ 103.141,85		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	05/03/2012			importo oltre IVA	€ 103.141,85	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 181 del 23/04/2012	importo oltre IVA		Percentuale di avanzamento al SAL n.1	42,02%
2° SAL emesso il:	25/05/2012	per lavori a tutto il:	25/05/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 251.055,54				€ 146.709,23		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	17/07/2012			importo oltre IVA	€ 146.709,23	Decreto di liquidazione SAL n.	Decreto n. 407 del 02/08/2012	importo oltre IVA		Percentuale di avanzamento al SAL n.2	99,99%
STATO FINALE emesso il	05/06/2012	per lavori a tutto il:	25/05/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 251.055,54	Decreto di liquidazione STATO FINALE	Decreto n. 579 del 05/11/2012	importo oltre IVA	€ 1.204,46	Percentuale di avanzamento allo STATO FINALE	100,00%
RESTA DA LIQUIDARE ALL'IMPRESA				importo oltre IVA	€ 1.204,46						

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE			
Emesso il		STATO FINALE emesso il	05/06/2012	importo oltre iva	€ 1.204,46

COLLAUDO STATICO									
DATA visita Collaudo n. 1	07/01/2012	DATA visita Collaudo n. 2	10/02/2012	DATA visita Collaudo n. 3	23/03/2012	DATA visita Collaudo n. 4	30/04/2012	DATA visita Collaudo n. 5	30/05/2012
CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il	24/06/2012								
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO									
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

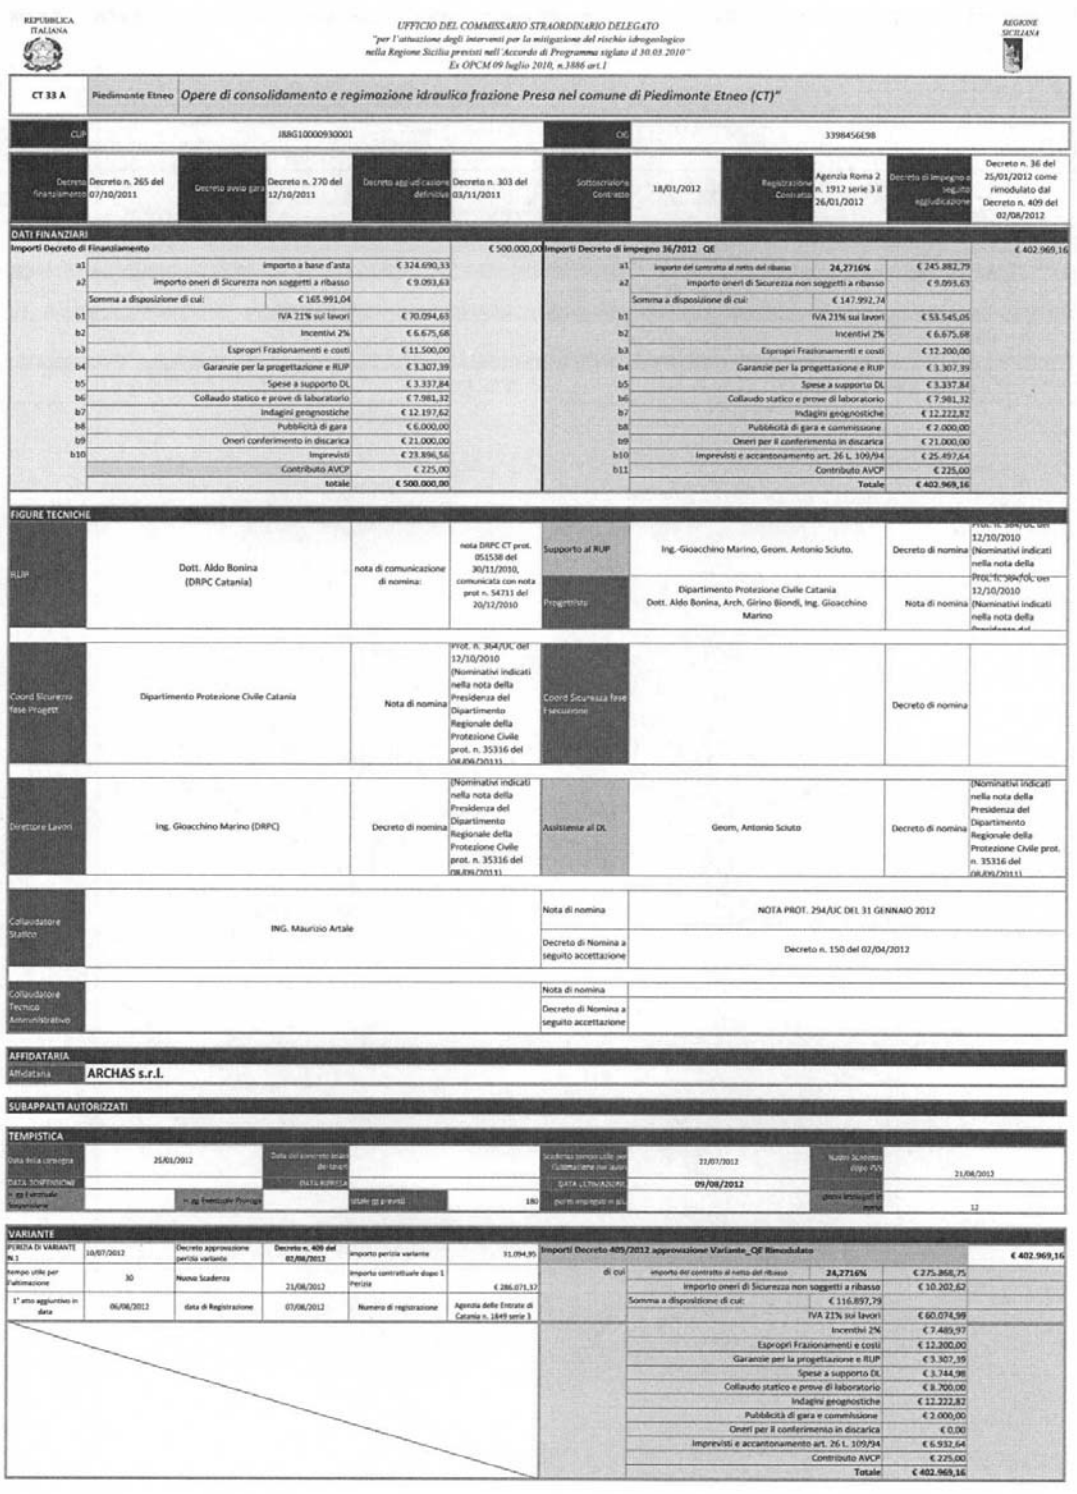

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

CT 33 A	Piedimonte Etneo	*Opere di consolidamento e regimozione idraulica frazione Presa nel comune di Piedimonte Etneo (CT)"*

CUP	J88G10000930001	CIG	3398456E9B

Decreto finanziamento	Decreto n. 265 del 07/10/2011	Decreto avvio gara	Decreto n. 270 del 12/10/2011	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 303 del 03/11/2011	Sottoscrizione Contratto	18/01/2012	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 1912 serie 3 il 26/01/2012	Decreto di impegno e reg.ne aggiudicazione	Decreto n. 36 del 25/01/2012 come rimodulato dal Decreto n. 409 del 02/08/2012

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento € 500.000,00

a1	importo a base d'asta		€ 324.690,33
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.093,63
	Somma a disposizione di cui:	€ 165.991,04	
b1	IVA 21% sui lavori		€ 70.094,63
b2	Incentivi 2%		€ 6.675,68
b3	Espropri Frazionamenti e costi		€ 11.500,00
b4	Garanzie per la progettazione e RUP		€ 3.307,39
b5	Spese a supporto DL		€ 3.337,84
b6	Collaudo statico e prove di laboratorio		€ 7.981,32
b7	Indagini geognostiche		€ 12.197,62
b8	Pubblicità di gara		€ 6.000,00
b9	Oneri conferimento in discarica		€ 21.000,00
b10	Imprevisti		€ 23.896,56
	Contributo AVCP		€ 225,00
	totale		€ 500.000,00

Importi Decreto di impegno 36/2012 QE € 402.969,16

a1	importo del contratto al netto del ribasso	24,2716%	€ 245.882,79
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.093,63
	Somma a disposizione di cui:	€ 147.992,74	
b1	IVA 21% sui lavori		€ 53.545,05
b2	Incentivi 2%		€ 6.675,68
b3	Espropri Frazionamenti e costi		€ 12.200,00
b4	Garanzie per la progettazione e RUP		€ 3.307,39
b5	Spese a supporto DL		€ 3.337,84
b6	Collaudo statico e prove di laboratorio		€ 7.981,32
b7	Indagini geognostiche		€ 12.222,82
b8	Pubblicità di gara e commissione		€ 2.000,00
b9	Oneri per il conferimento in discarica		€ 21.000,00
b10	Imprevisti e accantonamento art. 26 L 109/94		€ 25.497,64
b11	Contributo AVCP		€ 225,00
	Totale		€ 402.969,16

FIGURE TECNICHE

RUP	Dott. Aldo Bonina (DRPC Catania)	nota di comunicazione di nomina:	nota DRPC CT prot. 051538 del 30/11/2010, comunicata con nota prot n. 54711 del 20/12/2010	Supporto al RUP	Ing. Gioacchino Marino, Geom. Antonio Sciuto.	Decreto di nomina	Prot. n. 364/UC del 12/10/2010 (Nominativi indicati nella nota della
				Progettista	Dipartimento Protezione Civile Catania Dott. Aldo Bonina, Arch. Girino Biondi, Ing. Gioacchino Marino	Nota di nomina	Prot. n. 364/UC del 12/10/2010 (Nominativi indicati nella nota della
Coord Sicurezza fase Progett	Dipartimento Protezione Civile Catania	Nota di nomina	Prot. n. 364/UC del 12/10/2010 (Nominativi indicati nella nota della Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 35316 del 08/09/2011)	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Ing. Gioacchino Marino (DRPC)	Decreto di nomina	(Nominativi indicati nella nota della Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 35316 del 08/09/2011)	Assistente al DL	Geom. Antonio Sciuto	Decreto di nomina	(Nominativi indicati nella nota della Presidenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 35316 del 08/09/2011)
Collaudatore Statico	ING. Maurizio Artale			Nota di nomina	NOTA PROT. 294/UC DEL 31 GENNAIO 2012		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 150 del 02/04/2012		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	ARCHAS s.r.l.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA


Data della consegna	25/01/2012	Data del sopralluogo		Scadenza temporale per Costituzione RUP (gg)	22/07/2012	Nuova Scadenza (gg)	21/08/2013
DATA SOTTOSCRIZIONE		DATA RIPRESA		DATA ULTIMAZIONE	09/08/2012		
n. gg Contratto Originario		n. gg Esecuzione Proroga		totale gg previsti	180	giorni impiegati in più	12

VARIANTE


PERIZIA DI VARIANTE N 1	10/07/2012	Decreto approvazione perizia variante	Decreto n. 409 del 02/08/2012	importo perizia variante	31.094,95
tempo utile per l'ultimazione	30	Nuova Scadenza	21/08/2012	importo contrattuale dopo 1 Perizia	€ 286.071,37
1° atto aggiuntivo in data	06/08/2012	data di Registrazione	07/08/2012	Numero di registrazione	Agenzia delle Entrate di Catania n. 1649 serie 3

Importi Decreto 409/2012 approvazione Variante_QE Rimodulato € 402.969,16

di cui	importo del contratto al netto del ribasso	24,2716%	€ 275.868,75
	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.202,62
	Somma a disposizione di cui:	€ 116.897,79	
	IVA 21% sui lavori		€ 60.074,99
	Incentivi 2%		€ 7.489,97
	Espropri Frazionamenti e costi		€ 12.200,00
	Garanzie per la progettazione e RUP		€ 3.307,39
	Spese a supporto DL		€ 3.744,98
	Collaudo statico e prove di laboratorio		€ 8.700,00
	Indagini geognostiche		€ 12.222,82
	Pubblicità di gara e commissione		€ 2.000,00
	Oneri per il conferimento in discarica		€ 0,00
	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94		€ 6.932,64
	Contributo AVCP		€ 225,00
	Totale		€ 402.969,16

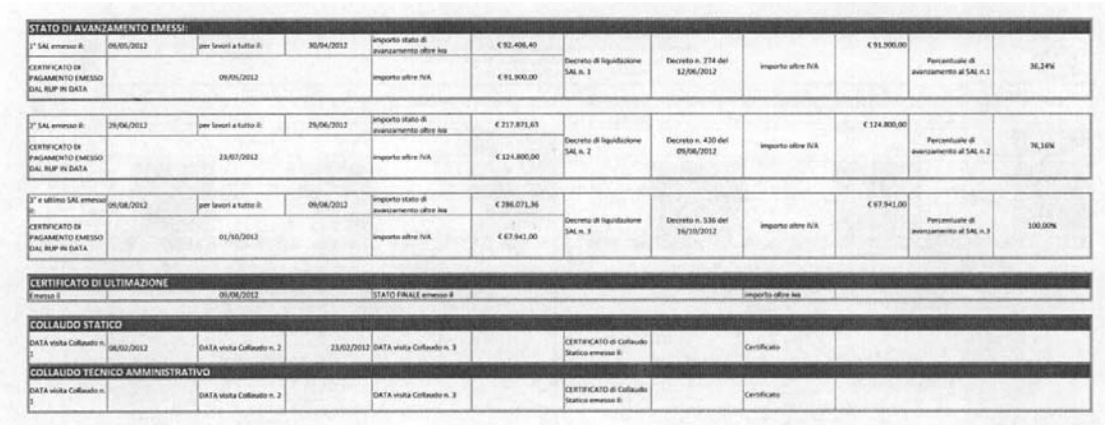

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI											
1° SAL emesso il:	06/05/2012	per lavori a tutto il:	30/04/2012	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 92.406,40				€ 91.900,00		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	09/05/2012			importo oltre IVA	€ 91.900,00	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 274 del 12/06/2012	importo oltre IVA		Percentuale di avanzamento al SAL n.1	36,24%
2° SAL emesso il:	29/06/2012	per lavori a tutto il:	29/06/2012	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 217.871,63				€ 124.800,00		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	23/07/2012			importo oltre IVA	€ 124.800,00	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 420 del 09/08/2012	importo oltre IVA		Percentuale di avanzamento al SAL n.2	76,16%
3° e ultimo SAL emesso il:	09/08/2012	per lavori a tutto il:	09/08/2012	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 286.071,36				€ 67.941,00		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	01/10/2012			importo oltre IVA	€ 67.941,00	Decreto di liquidazione SAL n. 3	Decreto n. 536 del 16/10/2012	importo oltre IVA		Percentuale di avanzamento al SAL n.3	100,00%
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE											
Emesso il	09/08/2012			STATO FINALE emesso il				importo oltre Iva			
COLLAUDO STATICO											
DATA visita Collaudo n. 1	08/02/2012	DATA visita Collaudo n. 2	23/02/2012	DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato			
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO											
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato			

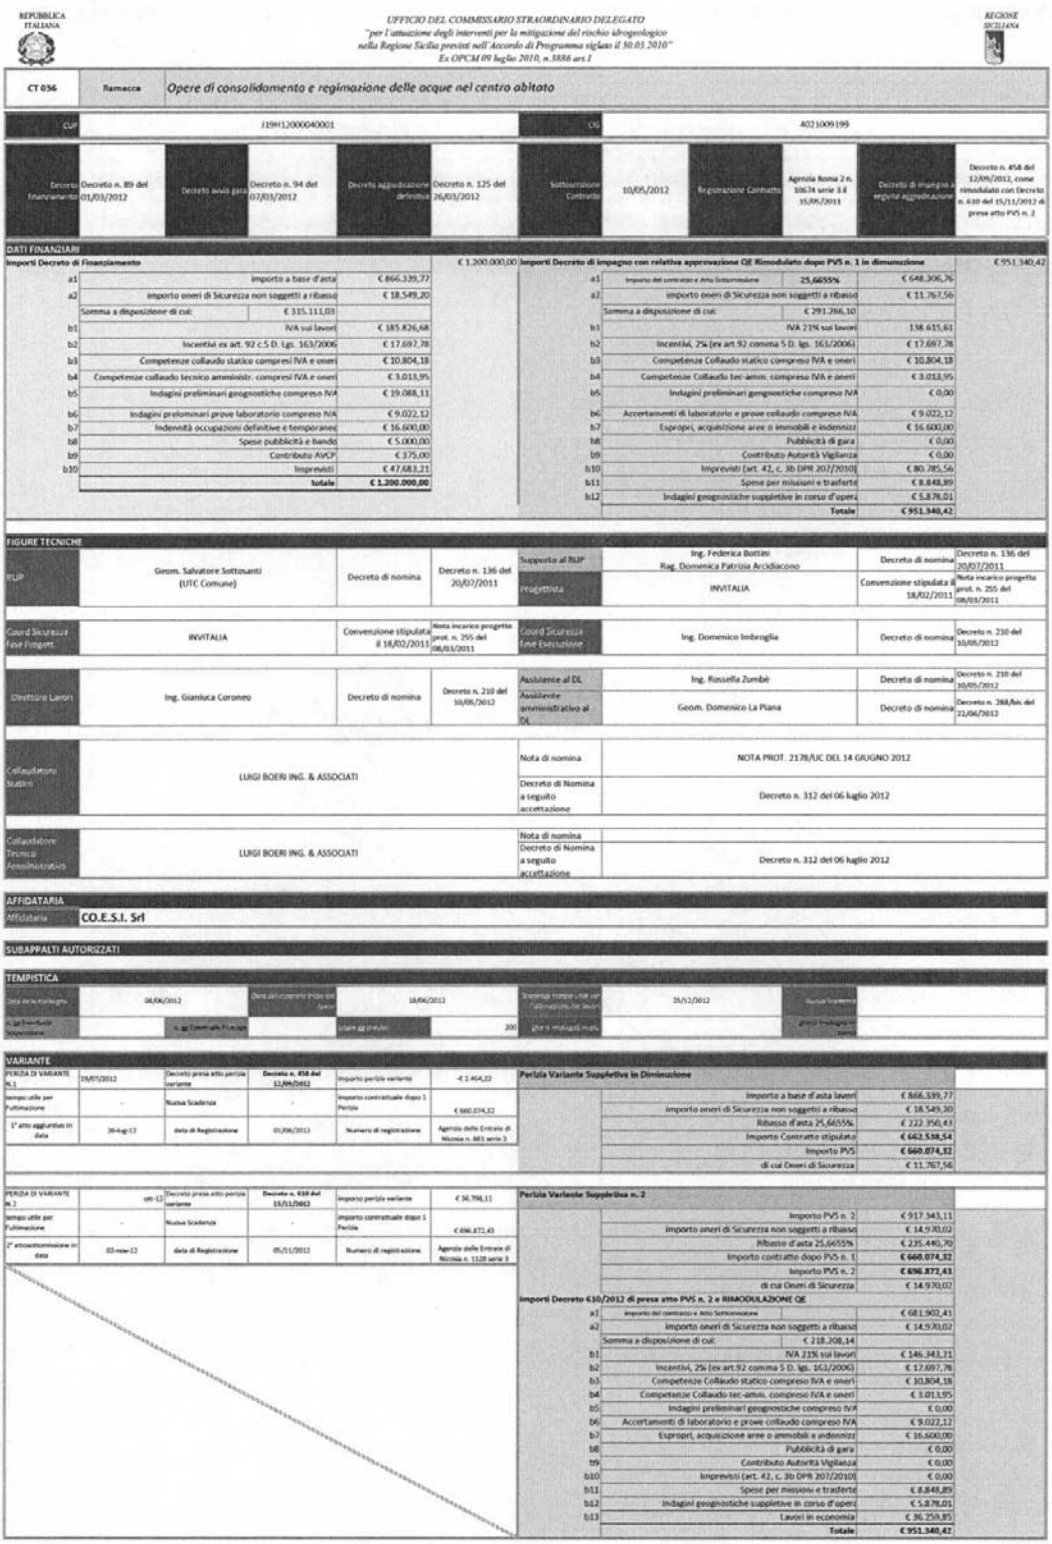

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

CT 036	Ramacca	*Opere di consolidamento e regimazione delle acque nel centro abitato*

CUP	J19H12000040001	CIG	4021009199

Decreto finanziamento	Decreto n. 89 del 01/03/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 94 del 07/03/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 125 del 26/03/2012	Sottoscrizione Contratto	10/05/2012	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 10674 serie 1 il 15/06/2011	Decreti di impegno e seguiti aggiudicazione	Decreto n. 458 del 12/09/2012, come rimodulato con Decreto n. 610 del 15/11/2012 di presa atto PVS n. 2

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento € 1.200.000,00

a1	importo a base d'asta	€ 866.339,77
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.549,20
	Somma a disposizione di cui: € 315.111,03	
b1	IVA sui lavori	€ 185.826,68
b2	Incentivi ex art. 92 c.5 D. Lgs. 163/2006	€ 17.697,78
b3	Competenze collaudo statico compresi IVA e oneri	€ 10.804,18
b4	Competenze collaudo tecnico amministr. compresi IVA e oneri	€ 3.013,95
b5	Indagini preliminari geognostiche compreso IVA	€ 19.088,11
b6	Indagini preliminari prove laboratorio compreso IVA	€ 9.022,12
b7	Indennità occupazioni definitive e temporanee	€ 16.600,00
b8	Spese pubblicità e bando	€ 5.000,00
b9	Contributo AVCP	€ 375,00
b10	Imprevisti	€ 47.683,21
	totale	**€ 1.200.000,00**

Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato dopo PVS n. 1 in diminuzione € 951.340,42

a1	Importo del contratto e Atto Sottomissione	25,6655%	€ 648.306,76
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 11.767,56
	Somma a disposizione di cui:	€ 291.266,10	
b1	IVA 21% sui lavori		138.615,61
b2	Incentivi, 2% (ex art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006)		€ 17.697,78
b3	Competenze Collaudo statico compreso IVA e oneri		€ 10.804,18
b4	Competenze Collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri		€ 3.013,95
b5	Indagini preliminari geognostiche compreso IVA		€ 0,00
b6	Accertamenti di laboratorio e prove collaudo comprese IVA		€ 9.022,12
b7	Espropri, acquisizione aree o immobili e indennizz		€ 16.600,00
b8	Pubblicità di gara		€ 0,00
b9	Contributo Autorità Vigilanza		€ 0,00
b10	Imprevisti (art. 42, c. 3b DPR 207/2010)		€ 80.785,56
b11	Spese per missioni e trasferte		€ 8.848,89
b12	Indagini geognostiche suppletive in corso d'opera		€ 5.878,01
	Totale		**€ 951.340,42**

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Salvatore Sottosanti (UTC Comune)	Decreto di nomina	Decreto n. 136 del 20/07/2011	Supporto al RUP	Ing. Federica Bottini Rag. Domenica Patrizia Arcidiacono	Decreto di nomina	Decreto n. 136 del 20/07/2011
				Progettista	INVITALIA	Convenzione stipulata il 18/02/2011	Nota incarico progetto prot. n. 255 del 08/03/2011
Coord Sicurezza fase Progett.	INVITALIA	Convenzione stipulata il 18/02/2011	Nota incarico progetto prot. n. 255 del 08/03/2011	Coord Sicurezza fase Esecutiva	Ing. Domenico Imbroglia	Decreto di nomina	Decreto n. 210 del 10/05/2012
Direttore Lavori	Ing. Gianluca Coroneo	Decreto di nomina	Decreto n. 210 del 10/05/2012	Assistente al DL	Ing. Rossella Zumbè	Decreto di nomina	Decreto n. 210 del 10/05/2012
				Assistente amministrativo al DL	Geom. Domenico La Piana	Decreto di nomina	Decreto n. 288/bis del 22/06/2012
Collaudatore statico	LUIGI BOERI ING. & ASSOCIATI			Nota di nomina	NOTA PROT. 2178/UC DEL 14 GIUGNO 2012		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 312 del 06 luglio 2012		
Collaudatore Tecnico Amministrativo	LUIGI BOERI ING. & ASSOCIATI			Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 312 del 06 luglio 2012		

AFFIDATARIA

Affidataria	**CO.E.S.I. Srl**

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della Consegna	04/06/2012	Data del verbale Fine dei lavori	18/06/2013	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	25/12/2012	Nuova Scadenza	
n. gg Sospensioni Precedenti		n. gg Sospensioni Presenti		Totale gg previsti	200	gg di ritardo/gg di anticipo	

VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE n.1	19/07/2012	Decreto presa atto perizia variante	Decreto n. 458 del 12/09/2012	Importo perizia variante	-€ 2.464,22	
tempo utile per l'ultimazione	-	Nuova Scadenza	-	Importo contrattuale dopo 1 Perizia	€ 660.074,32	
1° atto aggiuntivo in data	30-Aug-13	data di Registrazione	01/08/2013	Numero di registrazione	Agenzia delle Entrate di Nicosia n. 881 serie 3	

Perizia Variante Suppletiva in Diminuzione

Importo a base d'asta lavori	€ 866.339,77
Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.549,30
Ribasso d'asta 25,6655%	€ 222.350,43
Importo Contratto stipulato	**€ 662.538,54**
Importo PVS	**€ 660.074,32**
di cui Oneri di Sicurezza	€ 11.767,56


PERIZIA DI VARIANTE n.2	ott-13	Decreto presa atto perizia variante	Decreto n. 610 del 15/11/2012	Importo perizia variante	€ 36.798,11	
tempo utile per l'ultimazione	-	Nuova Scadenza	-	Importo contrattuale dopo 1 Perizia	€ 696.872,43	
2° attoaddizionale in data	02-nov-13	data di Registrazione	05/11/2012	Numero di registrazione	Agenzia delle Entrate di Nicosia n. 1128 serie 3	

Perizia Variante Suppletiva n. 2

Importo PVS n. 2	€ 917.343,11
Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.970,02
Ribasso d'asta 25,6655%	€ 235.440,70
Importo contratto dopo PVS n. 1	**€ 660.074,32**
Importo PVS n. 2	**€ 696.872,43**
di cui Oneri di Sicurezza	€ 14.970,02

Importi Decreto 610/2012 di presa atto PVS n. 2 e RIMODULAZIONE QE

a1	Importo del contratto e Atto Sottomissione		€ 681.902,41
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 14.970,02
	Somma a disposizione di cui:	€ 218.208,14	
b1	IVA 21% sui lavori		€ 146.343,21
b2	Incentivi, 2% (ex art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006)		€ 17.697,78
b3	Competenze Collaudo statico compreso IVA e oneri		€ 10.804,18
b4	Competenze Collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri		€ 3.013,95
b5	Indagini preliminari geognostiche compreso IVA		€ 0,00
b6	Accertamenti di laboratorio e prove collaudo compreso IVA		€ 9.022,12
b7	Espropri, acquisizione aree o immobili e indennizz		€ 16.600,00
b8	Pubblicità di gara		€ 0,00
b9	Contributo Autorità Vigilanza		€ 0,00
b10	Imprevisti (art. 42, c. 3b DPR 207/2010)		€ 0,00
b11	Spese per missioni e trasferte		€ 8.848,89
b12	Indagini geognostiche suppletive in corso d'opera		€ 5.878,01
b13	Lavori in economia		€ 36.259,85
	Totale		**€ 951.340,42**

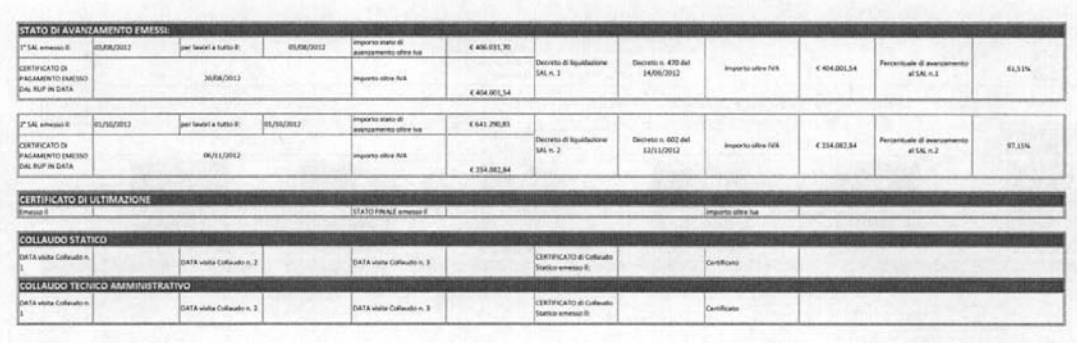

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:											
1° SAL emesso il:	05/08/2012	per lavori a tutto il:	05/08/2012	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 406.031,70						
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	30/08/2012			importo oltre IVA	€ 404.001,54	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 470 del 14/09/2012	Importo oltre IVA	€ 404.001,54	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	61,51%
2° SAL emesso il:	01/10/2012	per lavori a tutto il:	01/10/2012	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 641.290,83						
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	06/11/2012			importo oltre IVA	€ 334.082,84	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 602 del 12/11/2012	Importo oltre IVA	€ 334.082,84	Percentuale di avanzamento al SAL n.2	97,15%
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE											
Emesso il:				STATO FINALE emesso il				Importo oltre Iva			
COLLAUDO STATICO											
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato			
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO											
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato			

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

CT 37 A	Randazzo	*Mitigazione del rischio geomorfologico di un'area del Centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata*

CUP	I29H11000140001	CIG	322431119C

Decreto finanziamento	Decreto n. 197 del 23/08/2011	Decreto aveo gara	Decreto n. 206 del 30/08/2011	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 333 del 24/11/2011	Sottoscrizione Contratto	29/11/2011	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 25124 serie 3 il 16/12/2011	Decreto di impegno e seguito aggiudicazione	Decreto n. 83 del 27/02/2012 come rimodulato con Decreto n. 553 del 24/10/2012 dopo approvazione PVS con Decreto n. 236 del 24/05/2012

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento € 960.000,00

a1	importo a base d'asta		€ 555.474,34
a3	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 44.929,68
	Somma a disposizione di cui:	€ 359.595,98	
b1	spese di progettazione, DL, Sicurezza, cons geot. Ecc.		€ 119.075,62
b2	Competenze RUP		€ 3.002,07
b3	Spese di Pubblicità di Gara		€ 12.000,00
b4	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94		€ 31.128,53
b5	Contributo AVCP		€ 375,00
b6	IVA 20% sui lavori		€ 120.080,80
b7	Spese per piano di Monitoraggio		€ 0,00
b8	Oneri Conferimento in Discarica		€ 25.513,92
b9	Spese indagini geognostiche		€ 27.174,70
b10	Relazione geologica		€ 14.745,39
b11	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA		€ 6.500,00
	totale		€ 960.000,00

Importi Decreto di Impegno 83/2012 con relativa approvazione QE € 765.181,07

a1	importo del contratto al netto del ribasso	23,6380%	€ 424.171,32
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 44.929,68
	Somme a disposizione di cui:	€ 296.080,07	
b1	spese di progettazione e coord sicurezza		€ 3.639,00
b2	DL, Coord Sic, Misure e contabilità		€ 42.592,25
b3	Competenze RUP		€ 3.002,02
b4	Competenze supporto al RUP		€ 1.350,91
b5	Spese publicità e commissioni		€ 10.957,99
b6	Imprevisti e accantonamento art. 42 D.P.R. 207/2010		€ 56.401,28
b7	Contributo Stazione appaltante		€ 375,00
b8	IVA sui Lavori		€ 98.511,21
b9	Piano monitoraggio		€ 0,00
b10	Oneri conferimento in discarica		€ 25.513,92
b11	Spese indagini geognostiche		€ 27.401,15
b12	Relazione geologica		€ 14.866,29
b13	Collaudo Tecnico amministrativo e statico		€ 6.500,00
b14	Spese indennità esproprio		€ 4.969,04
	Totale		€ 765.181,07

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Domenico Imbroglia (in sostituzione dell'ex RUP Geom. Patroniti Vincenzo, già sostituto dell'Arch. Aldo Meli, entrambi Nominati dal Comune)	Decreto di Nomina	Decreto n. 363 del 05/12/2011	Supporto al RUP	Ing. Marco Calogero	Decreto di nomina	Decreto n. 363 del 05/12/2011
				Progettista	Ing. Romano Antonino	Determina di Nomina	Determina Sindacale n. 24 del 16/05/2007
Coord Sicurezza fase Progett	Ing. Romano Antonino	Determina di Nomina	Determina Sindacale n. 24 del 16/05/2007	Coord Sicurezza fase Esecutiva	Ing. Antonino Romano	Decreto di nomina	Decreto n. 374 del 13/12/2011
Direttore Lavori	Ing. Antonino Romano	Decreto di nomina	Decreto n. 374 del 13/12/2011	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore statico	ING. Clemente Francesco			Nota di nomina	NOTA PROT. 1339/UC DEL 20 aprile 2012		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 219 del 14/05/2012		
Collaudatore Tecnico Amministrativo	ING. Clemente Francesco			Nota di nomina	NOTA PROT. 1339/UC DEL 20 aprile 2012		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 219 del 14/05/2012		

AFFIDATARIA

Affidataria	COTESP s.r.l.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI


TEMPISTICA

Data Verb. consegna	30/11/2011	Data del Concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	18/04/2012	Nuova Scadenza dopo sospensione	30/05/2012
DATA SOSPENSIONE	20/12/2011	DATA RIPRESA	11/01/2012	Nuova Scadenza dopo proroga	09/06/2012	Nuova Scadenza dopo Perizia	09/09/2012
DATA FINE LAVORI	07/09/2012	DATA ULTIMA CONCESSA NEL CERTIFICATO FINE LAVORI (Ggg proroga)	07/10/2012				
n. gg Contrattuali Originarie	23	n. gg Contrattuali Proroga	30	totale gg previsti	120	giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno	

VARIANTE

						Importi Decreto n. 553 del 24/10/2012 QE Rimodulato		€ 867.429,47
PERIZIA DI VARIANTE N.1	apr-12	Decreto approvazione perizia variante e Decreto rimodulazione QE	Decreto n. 236 del 24/05/2012 Decreto n. 553 del 24/10/2012	importo perizia variante	91.934,23			
Tempo utile per l'ultimazione	120	Nuova Scadenza	09/09/2012	importo contrattuale dopo 1 Perizia	€ 561.035,78	di cui	importo lavori esclusa sicurezza	€ 514.686,87
1° atto sottomissione in data	17-mag-12	data di Registrazione	18/05/2012	Numero di registrazione	1949 Agenzia delle entrate di Agrigento		importo Sicurezza	46.348,91
						Somme a disposizione di cui:	€ 306.393,69	
							spese di progettazione e coord sicurezza	€ 12.290,88
							DL, Coord Sic, Misure e contabilità	€ 63.852,24
							Competenze RUP	€ 3.833,53
							Competenze supporto al RUP	€ 1.380,07
							Spese publicità e commissioni	€ 1.205,98
							Imprevisti e accantonamento art. 42 D.P.R. 207/2010	€ 15.000,00
							Contributo Stazione appaltante	€ 375,00
							IVA sui Lavori	€ 117.817,51
							Piano monitoraggio	€ 0,00
							Oneri conferimento in discarica	€ 25.513,92
							Spese indagini geognostiche	€ 27.401,15
							Relazione geologica	€ 19.138,36
							Collaudo Tecnico amministrativo e statico	€ 6.500,00
							Spese indennità esproprio	€ 12.085,05
							Totale	€ 867.429,47

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:											
1° SAL emesso il:	21/02/2012	per lavori a tutto il:	15/02/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 116.332,03	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 177 del 20/04/2012	importo oltre IVA	€ 115.750,37	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	24,80%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	26/03/2012			importo oltre IVA	€ 115.750,37						
2° SAL emesso il:	21/05/2012	per lavori a tutto il:	18/05/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 275.584,04	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 316 del 06/07/2012	importo oltre IVA	€ 158.455,75	Percentuale di avanzamento al SAL n.2	58,75%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	26/06/2012			importo oltre IVA	€ 158.455,75						
3° SAL emesso il:	07/08/2012	per lavori a tutto il:	03/08/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 476.829,46	Decreto di liquidazione SAL n. 3	Decreto n. 560 del 06/11/2012	importo oltre IVA	€ 200.239,19	Percentuale di avanzamento al SAL n.3	84,99%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	12/10/2012			importo oltre IVA	€ 200.239,19						
4° SAL emesso il:	31/10/2012	per lavori a tutto il:	07/09/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 560.974,48	Decreto di liquidazione SAL n. 4		importo oltre IVA		Percentuale di avanzamento al SAL n.3	99,99%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	12/10/2012			importo oltre IVA	€ 83.724,30						
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE											
Emesso il	11/09/2012 (data fine lavori 07/09/2012)			STATO FINALE emesso il				importo oltre iva			
COLLAUDO STATICO											
DATA visita Collaudo n. 1	30/10/2012	DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato			
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO											
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato			

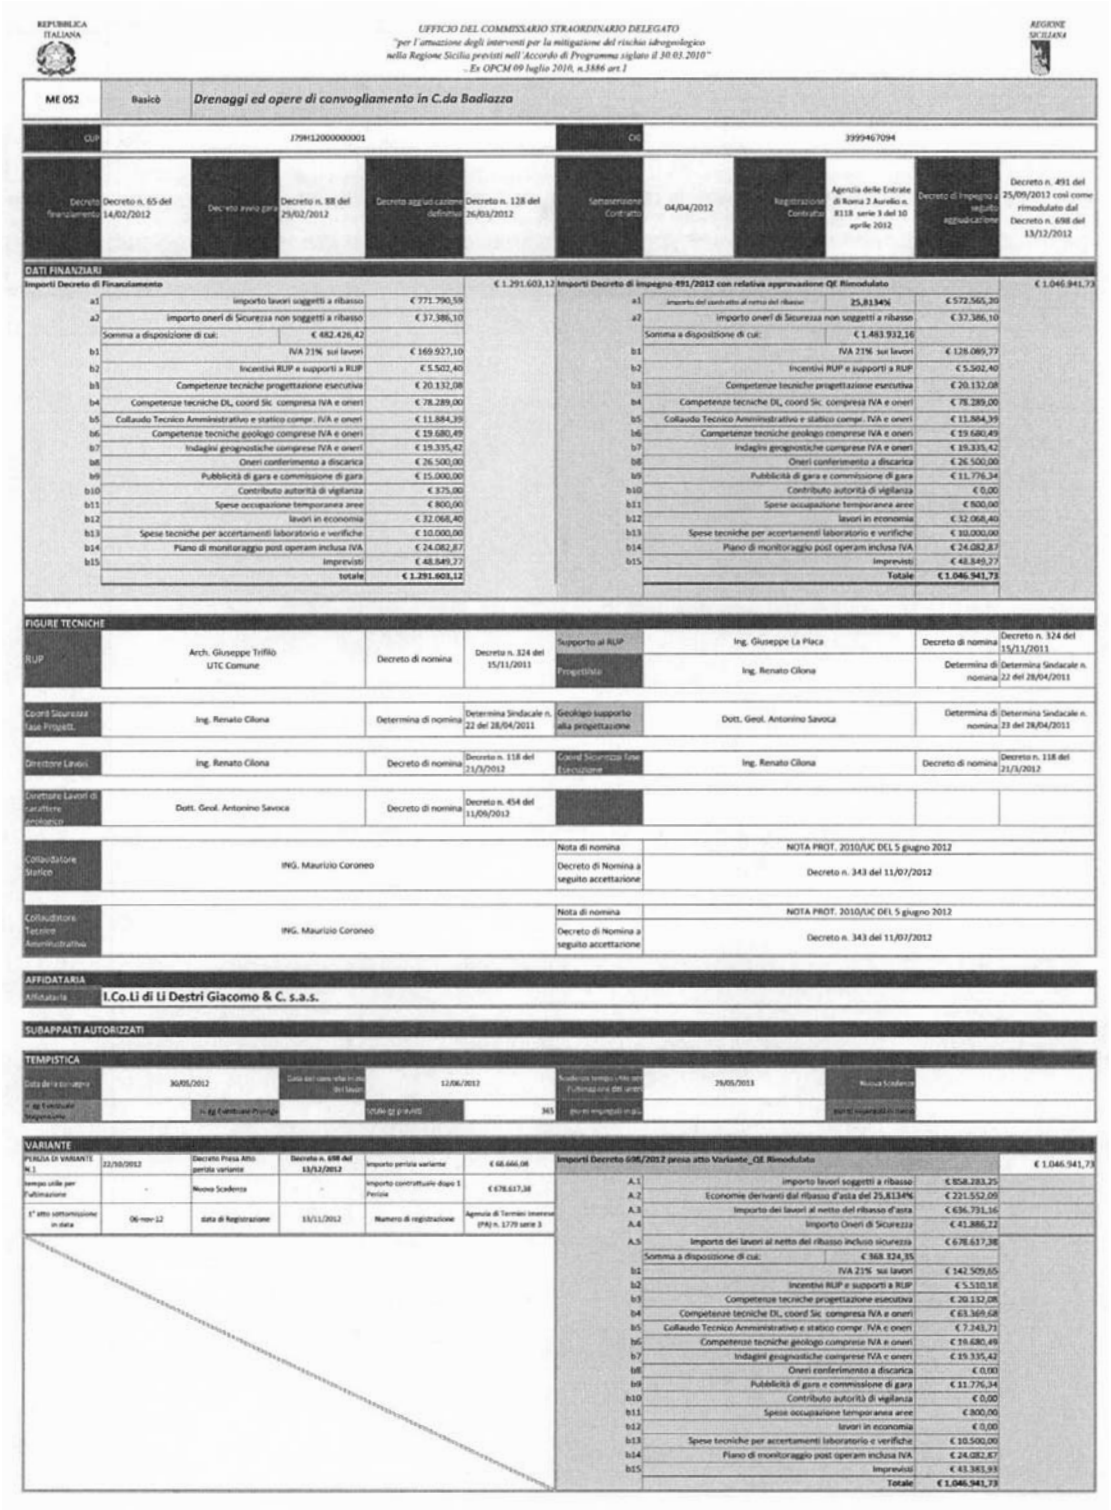

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.01.2010"
...Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ME 052	Basicò	*Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza*

CUP	J79H12000000001	CIG	3939467094

Decreto finanziamento	Decreto n. 65 del 14/02/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 88 del 29/02/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 128 del 26/03/2012	Sottoscrizione Contratto	04/04/2012	Registrazione Contratto	Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio n. 8118 serie 3 del 10 aprile 2012	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	Decreto n. 491 del 25/09/2012 così come rimodulato dal Decreto n. 698 del 13/12/2012

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento		€ 1.291.603,12
a1	importo lavori soggetti a ribasso	€ 771.790,59
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.386,10
	Somma a disposizione di cui: € 482.426,42	
b1	IVA 21% sui lavori	€ 169.927,10
b2	Incentivi RUP e supporti a RUP	€ 5.502,40
b3	Competenze tecniche progettazione esecutiva	€ 20.132,08
b4	Competenze tecniche DL, coord Sic compresa IVA e oneri	€ 78.289,00
b5	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA e oneri	€ 11.884,39
b6	Competenze tecniche geologo comprese IVA e oneri	€ 19.680,49
b7	Indagini geognostiche comprese IVA e oneri	€ 19.335,42
b8	Oneri conferimento a discarica	€ 26.500,00
b9	Pubblicità di gara e commissione di gara	€ 15.000,00
b10	Contributo autorità di vigilanza	€ 375,00
b11	Spese occupazione temporanea aree	€ 800,00
b12	lavori in economia	€ 32.068,40
b13	Spese tecniche per accertamenti laboratorio e verifiche	€ 10.000,00
b14	Piano di monitoraggio post operam inclusa IVA	€ 24.082,87
b15	imprevisti	€ 48.849,77
	totale	**€ 1.291.603,12**

Importi Decreto di impegno 491/2012 con relativa approvazione QE Rimodulato			€ 1.046.941,73
a1	importo del contratto al netto del ribasso	25,8134%	€ 572.565,20
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 37.386,10
	Somma a disposizione di cui:	€ 1.483.932,16	
b1	IVA 21% sui lavori		€ 128.089,77
b2	Incentivi RUP e supporti a RUP		€ 5.502,40
b3	Competenze tecniche progettazione esecutiva		€ 20.132,08
b4	Competenze tecniche DL, coord Sic compresa IVA e oneri		€ 78.289,00
b5	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA e oneri		€ 11.884,39
b6	Competenze tecniche geologo comprese IVA e oneri		€ 19.680,49
b7	Indagini geognostiche comprese IVA e oneri		€ 19.335,42
b8	Oneri conferimento a discarica		€ 26.500,00
b9	Pubblicità di gara e commissione di gara		€ 11.776,34
b10	Contributo autorità di vigilanza		€ 0,00
b11	Spese occupazione temporanea aree		€ 800,00
b12	lavori in economia		€ 32.068,40
b13	Spese tecniche per accertamenti laboratorio e verifiche		€ 10.000,00
b14	Piano di monitoraggio post operam inclusa IVA		€ 24.082,87
b15	Imprevisti		€ 48.849,77
	Totale		**€ 1.046.941,73**

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Giuseppe Triffiò UTC Comune	Decreto di nomina	Decreto n. 324 del 15/11/2011	Supporto al RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di nomina	Decreto n. 324 del 15/11/2011
				Progettista	Ing. Renato Cilona	Determina di nomina	Determina Sindacale n. 22 del 28/04/2011
Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Renato Cilona	Determina di nomina	Determina Sindacale n. 22 del 28/04/2011	Geologo supporto alla progettazione	Dott. Geol. Antonino Savoca	Determina di nomina	Determina Sindacale n. 23 del 28/04/2011
Direttore Lavori	Ing. Renato Cilona	Decreto di nomina	Decreto n. 118 del 21/3/2012	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Renato Cilona	Decreto di nomina	Decreto n. 118 del 21/3/2012
Direttore Lavori di carattere geologico	Dott. Geol. Antonino Savoca	Decreto di nomina	Decreto n. 454 del 11/09/2012				
Collaudatore Statico	ING. Maurizio Coroneo			Nota di nomina	NOTA PROT. 2010/UC DEL 5 giugno 2012		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 343 del 11/07/2012		
Collaudatore Tecnico Amministrativo	ING. Maurizio Coroneo			Nota di nomina	NOTA PROT. 2010/UC DEL 5 giugno 2012		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 343 del 11/07/2012		

AFFIDATARIA

Affidataria	I.Co.Li di Li Destri Giacomo & C. s.a.s.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI


TEMPISTICA

Data del verbale di consegna	30/05/2012	Data del verbale di ultimazione dei lavori	12/06/2012	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	29/05/2013	Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		totale gg previsti	365	giorni impiegati in cui	giorni impiegati in meno


VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE N.1	22/10/2012	Decreto Presa Atto perizia variante	Decreto n. 698 del 13/12/2012	importo perizia variante	€ 68.666,08
tempo utile per l'ultimazione	-	Nuova Scadenza	-	importo contrattuale dopo 1 Perizia	€ 678.617,38
1° atto sottomissione in data	06-nov-12	data di Registrazione	13/11/2012	Numero di registrazione	Agenzia di Termini Imerese (PA) n. 1779 serie 3

Importi Decreto 698/2012 presa atto Variante_QE Rimodulato			€ 1.046.941,73
A.1	importo lavori soggetti a ribasso		€ 858.283,25
A.2	Economie derivanti dal ribasso d'asta del 25,8134%		€ 221.552,09
A.3	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 636.731,16
A.4	Importo Oneri di Sicurezza		€ 41.886,22
A.5	Importo dei lavori al netto del ribasso incluso sicurezza		€ 678.617,38
	Somma a disposizione di cui:	€ 368.324,35	
b1	IVA 21% sui lavori		€ 142.509,65
b2	Incentivi RUP e supporti a RUP		€ 5.510,18
b3	Competenze tecniche progettazione esecutiva		€ 20.132,08
b4	Competenze tecniche DL, coord Sic compresa IVA e oneri		€ 63.369,68
b5	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA e oneri		€ 7.343,71
b6	Competenze tecniche geologo comprese IVA e oneri		€ 19.680,49
b7	Indagini geognostiche comprese IVA e oneri		€ 19.335,42
b8	Oneri conferimento a discarica		€ 0,00
b9	Pubblicità di gara e commissione di gara		€ 11.776,34
b10	Contributo autorità di vigilanza		€ 0,00
b11	Spese occupazione temporanea aree		€ 800,00
b12	lavori in economia		€ 0,00
b13	Spese tecniche per accertamenti laboratorio e verifiche		€ 10.500,00
b14	Piano di monitoraggio post operam inclusa IVA		€ 24.082,87
b15	Imprevisti		€ 43.363,93
	Totale		**€ 1.046.941,73**

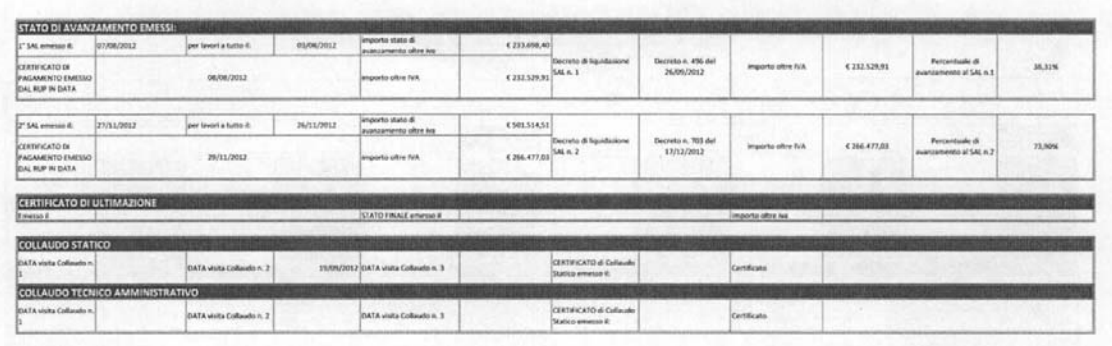

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:										
1° SAL emesso il:	07/08/2012	per lavori a tutto il:	03/08/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 233.698,40					
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	08/08/2012			importo oltre IVA	€ 232.529,91	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 496 del 26/09/2012	importo oltre IVA	€ 232.529,91	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	38,31%
2° SAL emesso il:	27/11/2012	per lavori a tutto il:	26/11/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 501.514,51					
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	29/11/2012			importo oltre IVA	€ 266.477,03	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 703 del 17/12/2012	importo oltre IVA	€ 266.477,03	Percentuale di avanzamento al SAL n.2	73,90%
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE										
Emesso il				STATO FINALE emesso il				importo oltre iva		
COLLAUDO STATICO										
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2	19/09/2012	DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato		
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO										
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato		

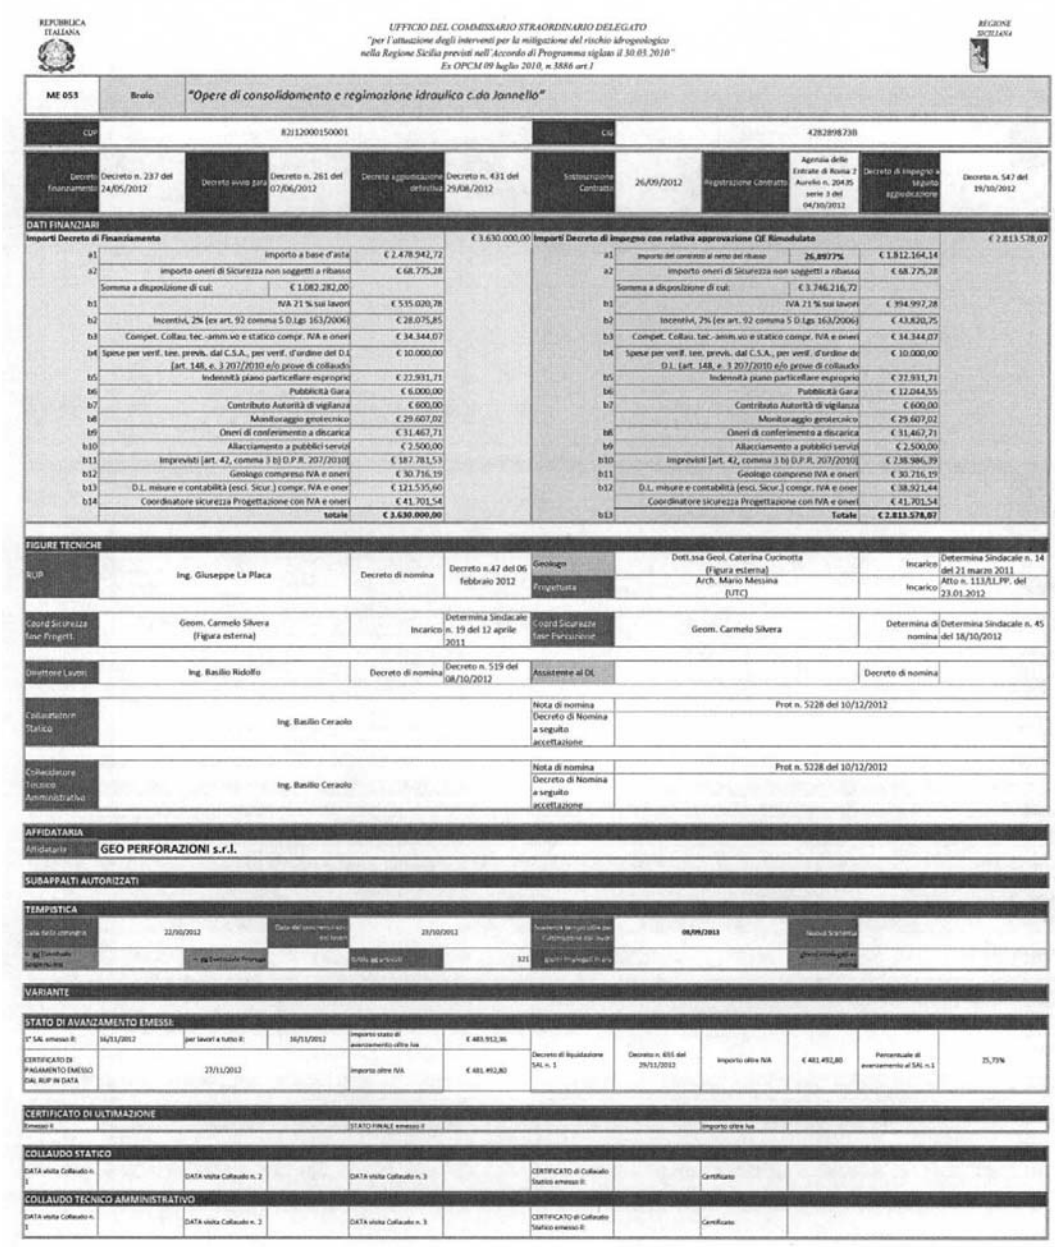

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.05.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ME 053	Bralo	*"Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello"*

CUP	B21I2000150001	CIG	4282898738

Decreto finanziamento	Decreto n. 237 del 24/05/2012	Decreto invio para	Decreto n. 261 del 07/06/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 431 del 29/08/2012	Sottoscrizione Contratto	26/09/2012	Registrazione Contratto	Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio n. 20435 serie 3 del 04/10/2012	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	Decreto n. 547 del 19/10/2012

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 3.630.000,00
a1	importo a base d'asta		€ 2.478.942,72
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 68.775,28
	Somma a disposizione di cui:	€ 1.082.282,00	
b1	IVA 21 % sui lavori		€ 535.020,78
b2	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)		€ 28.075,85
b3	Compet. Collau. tec.-amm.vo e statico compr. IVA e oneri		€ 34.344,07
b4	Spese per verif. tec. previs. dal C.S.A., per verif. d'ordine del D.L (art. 148, c. 3 207/2010 e/o prove di collaudo		€ 10.000,00
b5	Indennità piano particellare esproprio		€ 22.931,71
b6	Pubblicità Gara		€ 6.000,00
b7	Contributo Autorità di vigilanza		€ 600,00
b8	Monitoraggio geotecnico		€ 29.607,02
b9	Oneri di conferimento a discarica		€ 31.467,71
b10	Allacciamento a pubblici servizi		€ 2.500,00
b11	Imprevisti [art. 42, comma 3 b) D.P.R. 207/2010]		€ 187.781,53
b12	Geologo compreso IVA e oneri		€ 30.716,19
b13	D.L. misure e contabilità (escl. Sicur.) compr. IVA e oneri		€ 121.535,60
b14	Coordinatore sicurezza Progettazione con IVA e oneri		€ 41.701,54
	totale		**€ 3.630.000,00**

Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			€ 2.813.578,07
a1	Importo del contratto al netto del ribasso	**26,8977%**	€ 1.812.164,14
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 68.775,28
	Somma a disposizione di cui:	€ 3.746.216,72	
b1	IVA 21 % sui lavori		€ 394.997,28
b2	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)		€ 43.820,75
b3	Compet. Collau. tec.-amm.vo e statico compr. IVA e oneri		€ 34.344,07
b4	Spese per verif. tec. previs. dal C.S.A., per verif. d'ordine del D.L (art. 148, c. 3 207/2010 e/o prove di collaudo		€ 10.000,00
b5	Indennità piano particellare esproprio		€ 22.931,71
b6	Pubblicità Gara		€ 12.044,55
b7	Contributo Autorità di vigilanza		€ 600,00
b8	Monitoraggio geotecnico		€ 29.607,02
b9	Oneri di conferimento a discarica		€ 31.467,71
b10	Allacciamento a pubblici servizi		€ 2.500,00
b11	Imprevisti [art. 42, comma 3 b) D.P.R. 207/2010]		€ 238.986,39
b12	Geologo compreso IVA e oneri		€ 30.716,19
b13	D.L. misure e contabilità (escl. Sicur.) compr. IVA e oneri		€ 38.921,44
b14	Coordinatore sicurezza Progettazione con IVA e oneri		€ 41.701,54
	Totale		**€ 2.813.578,07**

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di nomina	Decreto n.47 del 06 febbraio 2012	Geologo	Dott.ssa Geol. Caterina Cucinotta (Figura esterna)	Incarico	Determina Sindacale n. 14 del 21 marzo 2011
				Progettista	Arch. Mario Messina (UTC)	Incarico	Atto n. 113/61 PP. del 23.01.2012
Coord.Sicurezza fase Progett.	Geom. Carmelo Silvera (Figura esterna)	Incarico	Determina Sindacale n. 19 del 12 aprile 2011	Coord.Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Carmelo Silvera	Determina di nomina	Determina Sindacale n. 45 del 18/10/2012
Direttore Lavori	Ing. Basilio Ridolfo	Decreto di nomina	Decreto n. 519 del 08/10/2012	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico	Ing. Basilio Ceraolo			Nota di nomina / Decreto di Nomina a seguito accettazione	Prot n. 5228 del 10/12/2012		
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Ing. Basilio Ceraolo			Nota di nomina / Decreto di Nomina a seguito accettazione	Prot n. 5228 del 10/12/2012		

AFFIDATARIA

Affidataria	**GEO PERFORAZIONI s.r.l.**

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data fine consegna	22/10/2012	Data del verbale di inizio lavori	23/10/2012	Assenza temporanea per Condizioni dei luoghi	08/09/2013	Nuova Scadenza	
n. gg Contrattuali (giorni n.ro)		n. gg Contrattuali Proroga		Tempo di ultimazione	121	giorni impiegati in atto	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	16/11/2012	per lavori a tutto il:	16/11/2012	Importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 483.912,36					
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	27/11/2012			Importo oltre IVA	€ 481.492,80	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 655 del 29/11/2012	Importo oltre IVA	€ 481.492,80	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	25,79%

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il	Importo oltre Iva

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	Certificato

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	Certificato

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.5886 art.1

REGIONE SICILIANA

ME 056	Capri Leone	*Opere di risagomatura e protezione versanti Fraz. Rocca*

CUP	J25D12000020001	CIG	40437532BA

Decreto finanziamento	Decreto n. 96 del 08/03/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 99 del 13/03/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 287 del 20/06/2012	Sottoscrizione Contratto	26/06/2012	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 14556 serie 3 del 04/07/2012	Decreto di impegno e seguito aggiudicazione	Decreto n. 641 del 23/11/2012

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 516.698,04	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			€ 386.810,69
a1	importo lavori soggetti a ribasso		€ 324.382,74	a1	importo dei contratti al netto del ribasso	25,6724%	€ 241.105,91
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 22.058,00	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 22.058,00
	Somma a disposizione di cui:	€ 170.257,30			Somma a disposizione di cui:	€ 123.646,78	
b1	IVA 21% sui lavori		€ 72.752,56	b1	Prog. e coordinam. sic., oneri comprensivi IVA (D.C. 560/12)		€ 0,00
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006		€ 2.355,80	b2	D.L. Sicurezza, Mis. E Cont., IVA e oneri previd. (D.C. 303/12)		€ 18.814,92
b3	Comp. Tec. Prog+rilievi+coord sic prog+IVA+oneri		€ 23.766,23	b3	Ufficio del RUP		€ 6.928,21
b4	Comp. Tec. D.L. mis e contab+coord sic esec+IVA+oneri		€ 18.814,55	b4	Spese pubblicita' gara e commissioni giudicatrici		€ 1.000,30
b5	Competenze geologiche e indagini comp IVA ed Oneri		€ 5.924,16	b5	Contributo AVCP (D. C. 527/12)		€ 0,00
b6	Pubblicità di gara		€ 11.000,00	b6	IVA sui lavori (21 %)		€ 55.264,42
b7	Contributo AVCP Stazione appaltante		€ 225,00	b7	Spese indagini geognostiche (compresa IVA)		€ 1.074,36
b8	Imprevisti		€ 34.644,00	b8	Rel. Geologica compresi IVA ed oneri		€ 5.920,57
b9	Commissione di gara		€ 775,00	b9	Imprevisti e accantonamento art. 42 D.P.R. 207/2010		€ 34.644,00
	totale		€ 516.698,04		Totale		€ 386.810,69

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Domenico Imbroglia (in sostituzione del Geom Giuffè del Comune)	Decreto di nomina	Decreto n. 339 del 28/11/2011	Supporto al RUP	Dott. Francesco Barranco	Decreto di nomina	Decreto n. 34 del 23/01/2012
				Progettista	Ing. Salvatore Russo	Determina Sindacale	Determina n. 44 del 12/10/2010
				Supporto alla Progettazione/Oneri	Dott. Geol. Salvatore Armeli	Determina Sindacale	Determina n. 16 del 23/02/2011

Coord Sicurezza fase Progett.	Geom Biagio Contiguglia	Determina Sindacale	Determina n. 35 del 16/08/2010	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. RUSSO Salvatore	Decreto di nomina	Decreto n. 303 del 28/06/2012
Direttore Lavori	Ing. RUSSO Salvatore	Decreto di nomina	Decreto n. 303 del 28/06/2012	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO FRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - consorziata EUROVEGA COSTRUZIONI

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data del verbale consegna	15/03/2012	Data nel verbale di ripresa dei lavori		11/06/2012	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	15/01/2013	Motivi Sospensioni	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		totale gg previsti	180	giorni impiegati in gu.	Giorni impiegati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	23/11/2012	per lavori a tutto il:	23/11/2012	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 130.824,70	Decreto di liquidazione SAL n. 1		importo oltre IVA		Percentuale di avanzamento al SAL n.1	45,91%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA				importo oltre IVA	€ 130.220,58						

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE


Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre Iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

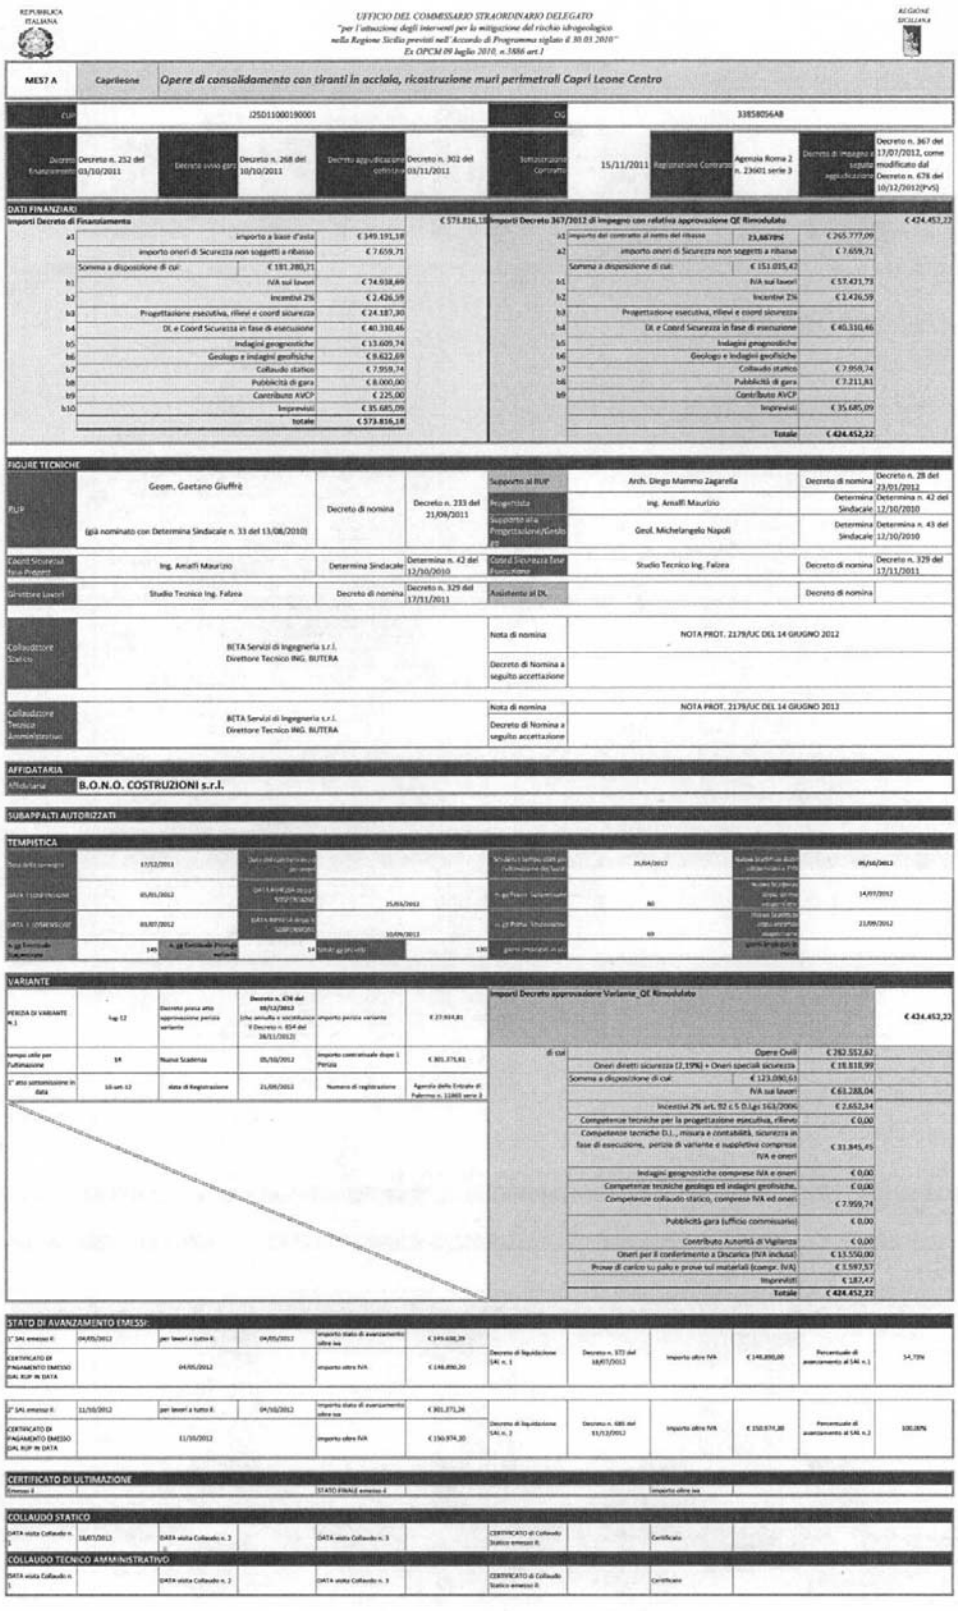

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

MES7 A	Capileone	*Opere di consolidamento con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali Capri Leone Centro*

CUP	J25D11000190001	CIG	33858056AB

Decreto Finanziamento	Decreto n. 252 del 03/10/2011	Decreto avvio gara	Decreto n. 268 del 10/10/2011	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 302 del 08/11/2011	Sottoscrizione Contratto	15/11/2011	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 23601 serie 3	Decreto di impegno e seguita approvazione	Decreto n. 367 del 17/07/2012, come modificato dal Decreto n. 678 del 10/12/2012(PVS)

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento € 573.816,18

a1	importo a base d'asta	€ 349.191,18
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.659,71
	Somma a disposizione di cui: € 191.280,71	
b1	IVA sui lavori	€ 74.938,69
b2	Incentivi 2%	€ 2.426,59
b3	Progettazione esecutiva, rilievi e coord sicurezza	€ 24.187,30
b4	DL e Coord Sicurezza in fase di esecuzione	€ 40.310,46
b5	Indagini geognostiche	€ 13.609,74
b6	Geologo e indagini geofisiche	€ 9.622,69
b7	Collaudo statico	€ 7.959,74
b8	Pubblicità di gara	€ 8.000,00
b9	Contributo AVCP	€ 225,00
b10	Imprevisti	€ 35.685,09
	totale	€ 573.816,18

Importi Decreto 367/2012 di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato € 424.452,22

a1	Importo del contratto al netto del ribasso	23,887%	€ 265.777,09
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 7.659,71
	Somma a disposizione di cui:	€ 151.015,42	
b1	IVA sui lavori		€ 57.431,73
b2	Incentivi 2%		€ 2.426,59
b3	Progettazione esecutiva, rilievi e coord sicurezza		
b4	DL e Coord Sicurezza in fase di esecuzione		€ 40.310,46
b5	Indagini geognostiche		
b6	Geologo e indagini geofisiche		
b7	Collaudo statico		€ 7.959,74
b8	Pubblicità di gara		€ 3.211,81
b9	Contributo AVCP		
	Imprevisti		€ 35.685,09
	Totale		€ 424.452,22

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Gaetano Giuffrè (già nominato con Determina Sindacale n. 33 del 13/08/2010)	Decreto di nomina	Decreto n. 233 del 21/09/2011	Supporto al RUP	Arch. Diego Mammo Zagarella	Decreto di nomina	Decreto n. 28 del 23/01/2012
				Progettista	Ing. Amalfi Maurizio	Determina Sindacale	Determina n. 42 del 12/10/2010
				Supporto al Progettazione/Geologo	Geol. Michelangelo Napoli	Determina Sindacale	Determina n. 43 del 12/10/2010
Coord Sicurezza fase Progett	Ing. Amalfi Maurizio	Determina Sindacale	Determina n. 42 del 12/10/2010	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Studio Tecnico Ing. Falzea	Decreto di nomina	Decreto n. 329 del 17/11/2011
Direttore Lavori	Studio Tecnico Ing. Falzea	Decreto di nomina	Decreto n. 329 del 17/11/2011	Assistente al DL		Decreto di nomina	

Collaudatore Statico	BETA Servizi di Ingegneria s.r.l. Direttore Tecnico ING. BUTERA	Nota di nomina	NOTA PROT. 2179/UC DEL 14 GIUGNO 2012
		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo	BETA Servizi di Ingegneria s.r.l. Direttore Tecnico ING. BUTERA	Nota di nomina	NOTA PROT. 2179/UC DEL 14 GIUGNO 2013
		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	B.O.N.O. COSTRUZIONI s.r.l.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	17/12/2011	Data della consegna in via d'urgenza		Stralcio I lotto con gli ultimazione dei lavori	25/04/2012	Nuova scadenza dopo ultimazione I lotto	05/10/2012
DATA ESECUZIONE	05/01/2012	Gg 1.644 (04.2012 - 9/07/2016)	25/01/2012	n. gg Perizia Suppletiva	60	Nuova Scadenza dopo perizia suppletiva	14/07/2012
DATA 1 CONSEGUENZE	03/07/2012	DATA RIPRESA dopo 1 SOSPENSIONE	10/09/2012	n. gg Perizia Suppletiva	69	Nuova Scadenza dopo ulteriore sospensione	21/09/2012
n. gg Contrattuali Originarie	540	n. gg Contrattuali Perizia variante	54	totale gg previsti	180	giorni impiegati in più	

VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE n. 1	Gg 12	Decreto presa atto approvazione perizia variante	Decreto n. 678 del 10/12/2012 (che annulla e sostituisce il Decreto n. 654 del 28/11/2012)	importo perizia variante	€ 27.934,81
tempo utile per l'ultimazione	54	Nuova Scadenza	05/10/2012	importo contrattuale dopo 1 Perizia	€ 301.375,61
1° atto sottomissione in data	10-set-12	data di Registrazione	21/09/2012	Numero di registrazione	Agenzia delle Entrate di Palermo n. 11865 serie 3

Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato € 424.452,22

di cui	Opere Civili	€ 282.552,62
	Oneri diretti sicurezza (2,19%) + Oneri speciali sicurezza	€ 10.818,99
	Somma a disposizione di cui: € 123.080,61	
	IVA sui lavori	€ 63.288,04
	Incentivi 2% art. 92 c.5 D.Lgs 163/2006	€ 2.652,34
	Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, rilievi	€ 0,00
	Competenze tecniche D.L., misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, perizia di variante e suppletiva comprese IVA e oneri	€ 31.845,45
	Indagini geognostiche comprese IVA e oneri	€ 0,00
	Competenze tecniche geologo ed indagini geofisiche,	€ 0,00
	Competenze collaudo statico, compresa IVA ed oneri	€ 7.959,74
	Pubblicità gara (ufficio commissario)	€ 0,00
	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 0,00
	Oneri per il conferimento a Discarica (IVA inclusa)	€ 13.550,00
	Prove di carico su palo e prove sui materiali (compr. IVA)	€ 3.587,57
	Imprevisti	€ 187,47
	Totale	€ 424.452,22

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	04/05/2012	per lavori a tutto il:	04/05/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 349.638,39	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 372 del 18/07/2012	importo oltre IVA	€ 148.890,20	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	54,73%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	04/05/2012			importo oltre IVA	€ 148.890,20						

2° SAL emesso il:	11/10/2012	per lavori a tutto il:	04/10/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 301.375,26	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 680 del 31/12/2012	importo oltre IVA	€ 150.974,20	Percentuale di avanzamento al SAL n.2	100,00%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	11/10/2012			importo oltre IVA	€ 150.974,20						

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1	18/07/2012	DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

MES8	Caronia	*Consolidamento centro abitato*

CUP	J33B10000520001	CIG	1285753CED

Decreto finanziamento PROGETTO PRINCIPALE	Decreto 030 del 1 marzo 2011	Decreto avvio gara	Decreto n. 031 del 1 marzo 2011	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 038 del 31 marzo 2011	Sottoscrizione Contratto	12/04/2011	Registrazione Contratto	Palermo n. 30330 serie 3T	Decreto di impegno a seguito Aggiudicazione	Decreto n. 71 del 26 maggio 2011, come rimodulato dal Decreto n. 92 del 02/03/2012
Decreto finanziamento PROGETTO COMPLETAMENTO	Decreto 490 del 24 settembre 2011					Sottoscrizione Contratto	27/09/2012	Registrazione Contratto	Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio serie 3 n. 20436 del 4/10/2012	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	

DATI FINANZIARI PROGETTO PRINCIPALE

Importi Decreto di Finanziamento			€ 3.000.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			€ 2.903.083,51
a1	importo a base d'asta		€ 2.107.109,03	a1	importo del contratto al netto del ribasso	6,7793%	€ 1.964.261,79
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 110.000,00	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 110.000,00
	Somme a disposizione di cui:	€ 782.890,97			Somme a disposizione di cui:	€ 828.821,52	
b1	spese di progettazione		€ 44.342,18	b1	spese di progettazione		€ 44.342,18
b2	Attività di consulenza Geotecnica		€ 20.000,00	b2	Attività di consulenza Geotecnica		€ 20.000,00
b3	Accertamento e indagini compreso IVA		€ 42.000,00	b3	Accertamento e indagini compreso IVA		€ 42.000,00
b4	Rilievi Topografici		€ 20.000,00	b4	Rilievi Topografici		€ 19.000,00
b5	Rilievi aerofotogrammetrici		€ 20.000,00	b5	Rilievi aerofotogrammetrici		€ 15.400,00
b6	Oneri per conferimento in discarica		€ 3.000,00	b6	Oneri per conferimento in discarica		€ 3.000,00
b7	Contributo Stazione appaltante		€ 500,00	b7	Contributo Stazione appaltante		€ 500,00
b8	Spese espletamento gare		€ 500,00		Spese espletamento gare		€ 0,00
b9	Espropri.		€ 15.000,00	b8	Espropri.		€ 62.685,19
b10	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94		€ 87.784,80	b9	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94		€ 59.475,82
b11	IVA 20% di A1+B2+B4+B5		€ 455.421,81	b10	IVA 20% di A1+B2+B4+B5		€ 426.132,35
b12	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA		€ 30.000,00	b11	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA		€ 24.115,39
b13	Spese per la gestione lavori 2% di A		€ 44.342,18	b12	Spese per la gestione lavori 1% di A		€ 22.171,09
	totale		€ 3.000.000,00	b13	Spese Struttura Commissariale		€ 90.000,00
					Totale		€ 2.903.083,51

DATI FINANZIARI PROGETTO COMPLETAMENTO

Importi Decreto di Finanziamento			€ 750.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			€ 488.809,03
a1	importo a base d'asta		€ 496.549,63	a1	importo del contratto al netto del ribasso	6,7793%	€ 462.887,04
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 25.921,99	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 25.921,99
	Somme a disposizione di cui:	€ 227.528,38			Somme a disposizione di cui:	€ 488.809,03	
b1	IVA sui lavori		€ 109.719,04	b1	IVA sui lavori		
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006		€ 10.449,43	b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006		
b3	Rilievi topografici		€ 28.952,62	b3	Rilievi topografici		
b4	IVA rilievi topografici		€ 6.074,38	b4	IVA rilievi topografici		
b5	Espropriazioni		€ 53.000,00	b5	Espropriazioni		
b6	Collaudo statico e tec. amm IVA e oneri inclusi		€ 10.000,00	b6	Collaudo statico e tec. amm IVA e oneri inclusi		
b7	Accertamenti e prove di laboratorio compresa IVA		€ 1.000,00	b7	Accertamenti e prove di laboratorio compresa IVA		
b8	Imprevisti e lavori in economia		€ 4.332,91	b8	Imprevisti e lavori in economia		
b9	Oneri conferimento a discarica		€ 4.000,00	b9			
	totale		€ 750.000,00		Totale		€ 488.809,01

FIGURE TECNICHE

RUP PROGETTO PRINCIPALE	Ing. Bruno Manfrè (DRPC ME)	nota di comunicazione di nomina:	nota DRPC ME prot. 10190 del 15 ottobre 2010	Progettista	Ufficio del Commissario Delegato ex OPCM 3865/2010 Ing. C. Marletta, Arch. F. Benedetti	nota di comunicazione di nomina:	nota prot. Commissario n. 535 del 9 novembre 2010
RUP PROGETTO COMPLETAMENTO	Ing. Bruno Manfrè (DRPC ME)	Decreto nomina	Decreto n. 539 del 16/10/2012	Progettista COMPLETAMENTO	Ufficio del Commissario Delegato ex OPCM 3865/2010 Ing. C. Marletta, Arch. F. Benedetti	nota di comunicazione di nomina:	nota prot. Commissario n. 535 del 9 novembre 2010
Coord Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione PROGETTO PRINCIPALE	Ufficio del Commissario Delegato ex OPCM 3865/2010 Ing. Antonio Ferraro	nota di comunicazione di nomina:	nota prot. Commissario n. 355/UC del 28 marzo 2011
Direttore Lavori PROGETTO PRINCIPALE	Ufficio del Commissario Delegato ex OPCM 3865/2010 Ing. Concetta Marletta e Arch. Francesco Benedetti	nota di comunicazione di nomina:	nota prot. Commissario n. 355/UC del 28 marzo 2011	Assistente all DL PROGETTO PRINCIPALE	Ufficio del Commissario Delegato ex OPCM 3865/2010 Ing. Cinzia La Rocca, Vincenzo Nicolosi, Erminia Raciti, Geom. Mario Di Bella	nota di comunicazione di nomina:	nota prot. Commissario n. 355/UC del 28 marzo 2011
Direttore Lavori PROGETTO COMPLETAMENTO	Ing. Concetta Marletta e Arch. Francesco Benedetti del DRPC di MESSINA	Decreto nomina	Decreto n. 539 del 16/10/2012	Coord Sicurezza fase Esecuzione PROGETTO COMPLETAMENTO	Ing. Antonio Ferraro del DRPC di MESSINA	Decreto nomina	Decreto n. 561 del 26/10/2012
Collaudatore Statico	Ing.	Luigi Boeri		nota di nomina:	nota prot. Commissario n. 1217/UC del 25 luglio 2011		
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Ing.	Luigi Boeri		nota di nomina:	nota prot. Commissario n. 1217/UC del 25 luglio 2011		

AFFIDATARIA

Affidataria	PRESAL COSTRUZIONI SRL

SUBAPPALTI/NOLI AUTORIZZATI CONTRATTO PRINCIPALE

Subappaltatore NOLO A CALDO	C.C.L. SOC. COOP.

TEMPISTICA CONTRATTO PRINCIPALE

Data della consegna	01/04/2011	Data del concreto inizio dei lavori	04/04/2011	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	27/10/2011	Nuova Scadenza dopo proroga PVS (n. 1 giorni)	27/12/2011
				Proroga concessa da RUP (non richiesta impresa)	20	Nuova scadenza dopo proroga DUP	16/01/2012
DATA SOSPENSIONE	13/01/2012	DATA RIPRESA	04/09/2012			Nuova Scadenza dopo sospensione	07/09/2012
						Nuova Scadenza dopo il PVS del 07/09/2012	07/10/2012
n. gg Eventuale Sospensione	235	n. gg Proroga da perizia di variante I (non richiesta richiesta proroga imprevisti)	80	n. gg Proroga da perizia di variante II	30	totale gg previsti	210	giorni impiegati in più	

TEMPISTICA CONTRATTO COMPLETAMENTO

Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza dopo proroga PVS (Giorni) e RUP (Giorni)	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Proroga da perizia di variante I		n. gg Proroga da perizia di variante II		totale gg previsti	120	giorni impiegati in più	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

MESB	Caronia	*Consolidamento centro abitato*

VARIANTI CONTRATTO PRINCIPALE

PERIZIA DI VARIANTE N.1	08/09/2011	Verbale di Validazione RUP della perizia variante	23/02/2012	Importo perizia variante	€ 2.296.353,87
Tempo utile per l'ultimazione	60	Nuova Scadenza	27/12/2011	Importo contrattuale dopo 1 Perizia	€ 2.148.400,92
1° atto di sottomissione	15-dic-11	data di Registrazione	30/12/2011	Numero di registrazione	5 Agata di Militello n. 1829 serie 3

Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato			**€ 2.903.083,31**
di cui	Lavori	€ 2.296.353,87	
a1	Importo Sicurezza sui lavori (4,961416%)	€ 113.931,67	
a2	Lavori al netto degli oneri di sicurezza	€ 2.182.422,20	
a3	A detrarre il ribasso d'asta (6,779396)	€ 147.952,95	
a4	Lavori al netto del ribasso	€ 2.034.469,25	
a5	Importo Sicurezza sui lavori non soggetta a ribasso	€ 113.931,67	
a6	Importo totale dei lavori	€ 2.148.400,92	
	Somme a disposizione di cui: € 754.682,40		
b1	spese di progettazione	€ 45.927,08	
b2	Attività di consulenza Geologica (escluso IVA)	€ 20.960,00	
b3	Accertamento e indagini compreso IVA	€ 28.490,35	
b4	Rilievi Topografici (escluso IVA)	€ 19.000,00	
b5	Rilievi aerofotogrammetrici (escluso IVA)	€ 15.400,00	
b6	Oneri per conferimento in discarica	€ 0,00	
b7	Contributo Stazione appaltante	€ 600,00	
b8	Oneri commissione di gara	€ 494,50	
b9	Espropri	€ 35.000,00	
b10	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94	€ 0,00	
b11	IVA 20% di A6 al SAL 3	€ 172.660,00	
b12	IVA 21% di A6 SAL 4,5,6	€ 269.871,19	
b13	IVA 20% di B2 e B4	€ 7.992,00	
b14	IVA 21% di B5	€ 3.234,00	
b15	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA	€ 31.331,21	
b16	Somme necessarie per la gestione dei lavori (1% di A6)	€ 0,00	
b17	Accertamenti e prove di laboratorio compreso IVA	€ 13.000,00	
b18	Economie di progetto	€ 722,07	
b19	Spese Struttura Commissariale	€ 90.000,00	
	Totale	**€ 2.903.083,31**	

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI PROGETTO PRINCIPALE:

1° SAL emesso il:	26/05/2011	per lavori a tutto il:	13/05/2011	Importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 259.049,91	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 134 del 19 luglio 2011	Importo oltre IVA	€ 257.700,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	12,49%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA		06/06/2011		Importo oltre IVA	€ 257.700,00						
2° SAL emesso il:	20/06/2011	per lavori a tutto il:	10/06/2011	Importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 453.689,35	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 149 del 26 luglio 2011	Importo oltre IVA	€ 392.700,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.2	31,51%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA		28/06/2011		Importo oltre IVA	€ 392.700,00						
3° SAL emesso il:	22/07/2011	per lavori a tutto il:	18/07/2011	Importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 867.707,02	Decreto di liquidazione SAL n. 3	Decreto n. 216 del 20 settembre 2011	Importo oltre IVA	€ 212.900,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.3	41,83%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA		27/07/2011		Importo oltre IVA	€ 212.900,00						
4° SAL emesso il:	14/09/2011	per lavori a tutto il:	04/09/2011	Importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 1.195.286,13	Decreto di liquidazione SAL n. 4	Decreto n. 287 del 21 ottobre 2011	Importo oltre IVA	€ 326.000,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.4	57,62%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA		29/09/2011		Importo oltre IVA	€ 326.000,00						
5° SAL emesso il:	07/11/2011	per lavori a tutto il:	14/10/2011	Importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 1.478.521,63	Decreto di liquidazione SAL n. 5 e 6	Decreto n. 368 del 13 dicembre 2011	Importo oltre IVA	€ 281.800,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.5	71,28%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA		10/11/2011		Importo oltre IVA	€ 281.800,00						
6° SAL emesso il:	28/11/2011	per lavori a tutto il:	14/11/2011	Importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 1.697.675,31	Decreto di liquidazione SAL n. 5 e 6	Decreto n. 368 del 13 dicembre 2011	Importo oltre IVA	€ 218.000,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.6	81,84%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA		30/11/2011		Importo oltre IVA	€ 218.000,00						
7° SAL emesso il:	30/01/2012	per lavori a tutto il:	05/01/2012	Importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 2.037.939,38	Decreto di liquidazione SAL n. 7	Decreto n. 92 del 02 marzo 2012	Importo oltre IVA	€ 339.400,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.7	96,72%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA		31/01/2012		Importo oltre IVA	€ 339.400,00						
8° SAL emesso il:	Senza Data	per lavori a tutto il:	27/09/2012	Importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 2.148.367,92	Decreto di liquidazione SAL n. 8	Decreto n. 600 del 9 novembre 2012	Importo oltre IVA	€ 70.100,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.8	100,00%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA		09/10/2012		Importo oltre IVA	€ 70.100,00						

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1	04/11/2011	DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato			

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1	04/11/2011	DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato			

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ME 059	Casalvecchio Siculo	*Consolidamento centro abitato*

CUP	J49H12004500l	CIG	4475225080

Decreto finanziamento	Decreto n. 296 del 25/06/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 397 del 01/08/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 464 del 13/09/2012	Sottoscrizione Contratto	27/09/2012	Registrazione Contratto	Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio n. 20672 serie 3 del 08/10/2012	Decreto di impegno e visto di aggiudicazione	

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento € 1.363.853,00

a1	importo a base d'asta		€ 799.080,61
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 38.971,33
	Somma a disposizione di cui:	€ 525.801,06	
b1	IVA sui lavori		€ 175.990,91
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006		€ 4.190,26
	Attività di supporto al RUP (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006) (supp. RUP - 9%)		€ 1.508,49
b3	Competenze tec. Progettazione esecutiva e c.s. in progettaz.		€ 46.899,60
b4	Competenze tec. D.L. misura e cont. Sicur. IVA e oneri		€ 52.432,23
b5	Competenze tec. C.s. esecuzione IVA e oneri		€ 42.731,90
b6	Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri		€ 22.827,11
b7	Competenza collaudo tecnico amm. compresa IVA e oneri		€ 9.540,41
b8	Consulenza geologica compr. IVA e oneri		€ 11.616,82
b9	Indagini geognostiche compr. IVA e oneri		€ 16.985,14
b10	Pubblicità Gara		€ 14.000,00
b11	Espropri ed occupazione aree		€ 7.535,05
b12	Oneri di accesso a discarica		€ 7.500,00
b13	Contributo Autorità di vigilanza		€ 250,00
b14	Monitoraggio		€ 50.000,00
b15	Prove di in corso d'opera e di collaudo		€ 19.626,20
b16	Imprevisti (circa 5%)		€ 42.166,94
	totale		€ 1.363.853,00

Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato € 611.962,47

a1	Importo del contratto al netto del ribasso	28,2937%	€ 572.991,14
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 38.971,33
	Somma a disposizione di cui:	€ 0,00	
b1	IVA sui lavori		
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006		
	) al RUP (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006) (supp. RUP - 9%)		
b3	Competenze tec. Progettazione esecutiva e c.s. in progettaz.		
b4	Competenze tec. D.L. misura e cont. Sicur. IVA e oneri		
b5	Competenze tec. C.s. esecuzione IVA e oneri		
b6	Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri		
b7	Competenza collaudo tecnico amm. compresa IVA e oneri		
b8	Consulenza geologica compr. IVA e oneri		
b9	Indagini geognostiche compr. IVA e oneri		
b10	Pubblicità Gara		
b11	Espropri ed occupazione aree		
b12	Oneri di accesso a discarica		
b13	Contributo Autorità di vigilanza		
b14	Monitoraggio		
b15	Prove di in corso d'opera e di collaudo		
b16	Imprevisti (circa 5%)		
	Totale		€ 611.962,47

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Domenico Imbroglia	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.394 del 01/08/2012	Supporto al RUP	Ing. Gianluca Coroneo	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 22 del 20/01/2012
				Progettista	Ing. Carmelo Trimarchi (Figura Esterna)	Determina di nomina	Determina del RUP n. 57 del 07/05/2012
Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Carmelo Trimarchi (Figura Esterna)	Determina di nomina	Determina del RUP n. 57 del 07/05/2012	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Carmelo Trimarchi (Figura Esterna)	Decreto di nomina	Decreto n. 550 del 23/10/2012
Direttore Lavori	Ing. Carmelo Trimarchi (Figura Esterna)	Decreto di nomina	Decreto n. 550 del 23/10/2012	Redazione verbali di consistenza ed esecuzione frazionamenti		Decreto di nomina	Decreto n. 550 del 23/10/2012
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	ITINERA s.r.l.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	10/11/2012	Data ed esecutività atto dei lavori		La ditenza termina alla pubblicazione del collaudo	30/08/2013	Nuovo Scadenza	
n. gg Contrattuali Originari		n. gg Contrattuali Proroga		totale gg previsti (GIORNI)	243	giorni impiegati in più	giorni assegnati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	Certificato

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	Certificato

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma vigente il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ME61	Castel Di Lucio	*Consolidamento via Durante e via S. Lucio*

CUP	G59D11000030002	CIG	2746936B49

Decreto finanziamento	Decreto n. 032 del 1 marzo 2011 e successivo Decreto 91 del 14 giugno 2011	Decreto avvio gara	Decreto n. 111 del 30 giugno 2011	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 163 del 1 agosto 2011	Sottoscrizione Contratto	10/08/2011	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 17625 serie 3	Decreto di impegno e seguenti Aggiudicazione e PVS	Decreto n. 166 del 3 agosto 2011, successivo Decreto n. 238 del 22 settembre 2011 e ultimo Decreto 457 del 12/09/2012

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di ri-Finanziamento 91/2011			€ 1.500.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato				€ 1.239.256,58
a1	Importo a base d'asta	€ 911.444,40		a1	Importo del contratto al netto del ribasso	17,3566%	€ 753.248,64	
a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.576,82		a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 22.576,82	
	Somma a disposizione di cui:	€ 565.978,78			Somma a disposizione di cui:	€ 463.431,12		
b1	Accertamenti e Indagini	€ 19.500,00		b1	Accertamenti e Indagini		€ 19.500,00	
b2	Competenze Tecniche di Progettazione esclusa IVA	€ 67.818,21		b2	Competenze Tecniche di Progettazione esclusa IVA		€ 67.818,21	
b3	Studio Geologico escluso IVA	€ 6.902,72		b3	Studio Geologico escluso IVA		€ 6.902,72	
b4	Commissioni giudicatrici affidamento incarichi	€ 3.600,00		b4	Commissioni giudicatrici affidamento incarichi		€ 3.600,00	
b5	Direzione Lavori	€ 89.030,85		b5	Direzione Lavori, misure e contabilità e Coord. Sicurezza		€ 52.763,35	
b6	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00		b6	Contributo Autorità di Vigilanza		€ 375,00	
b7	Pubblicità di Gara	€ 10.027,04		b7	Pubblicità di Gara		€ 10.027,04	
b8	Espropri	€ 22.606,23		b8	Espropri		€ 22.606,23	
b9	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94	€ 93.402,12		b9	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94		€ 85.643,86	
b10	IVA e altre imposte	€ 50.143,67		b10	IVA e altre imposte		€ 35.502,66	
b11	IVA (20%) sui lavori	€ 186.804,24		b11	IVA (21%) sui lavori		€ 162.923,35	
b12	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA	€ 9.417,35		b12	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA		€ 9.417,35	
b13	RUP	€ 4.670,11		b13	RUP		€ 4.670,11	
b14	Supporto al RUP	€ 1.681,24		b14	Supporto al RUP		€ 1.681,24	
	totale	€ 1.500.000,00			Totale		€ 1.239.256,58	

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di nomina	Decreto n. 69 del 25 maggio 2011	Supporto al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Decreto di nomina	Decreto n. 69 del 25 maggio 2011
				Progettista	S.T.I. Studio Tecnico Associato di Ingneria e Architettura	Determina Sindacale	Determina n. 51 del 3 dicembre 2010
Coord Sicurezza fase Progett.	S.T.I. Studio Tecnico Associato di Ingneria e Architettura	Determina Sindacale	Determina n. 51 del 3 dicembre 2010	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Studio Tecnico Associato Ingg. Mineo e Scavaglieri	Decreto di nomina	Decreto n. 199 del 25 agosto 2011
Direttore Lavori	Studio Tecnico Associato Ingg. Mineo e Scavaglieri	Decreto di nomina	Decreto n. 199 del 25 agosto 2011	Assistente al DL	Ing. Mario Saitta	Nomina	Nominato dal DL in sede di Consegna lavori in data 23/09/2011

Collaudatore Statico	ING. Marcello D'Alia	Nota di nomina	NOTA PROT. 1406/UC DEL 24 aprile 2012
		Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 298 del 26/06/2012
Collaudatore Tecnico Amministrativo	ING. Marcello D'Alia	Nota di nomina	NOTA PROT. 1406/UC DEL 24 aprile 2012
		Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 298 del 26/06/2012


AFFIDATARIA

Affidataria	TORSTEN COSTRUZIONI SRL

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data Verbale consegna	23/09/2011	Data del Verbale inizio effettivo lavori			Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	22/09/2012	Studio Scadenza dopo Sospensioni	13/12/2012
DATA SOSPENSIONE	25/01/2012	DATA RIPRESA	16/04/2012		Proroga concessa RUP	13	Nuova Scadenza dopo PVS	15/01/2013
							Nuova Scadenza dopo proroga RUP	28/01/2013
n. gg. Effettivi Sospensione	82	n. gg Settimane Proroga	13	totale gg perduti	303	giorni impiegati > gg		giorni impiegati in meno	

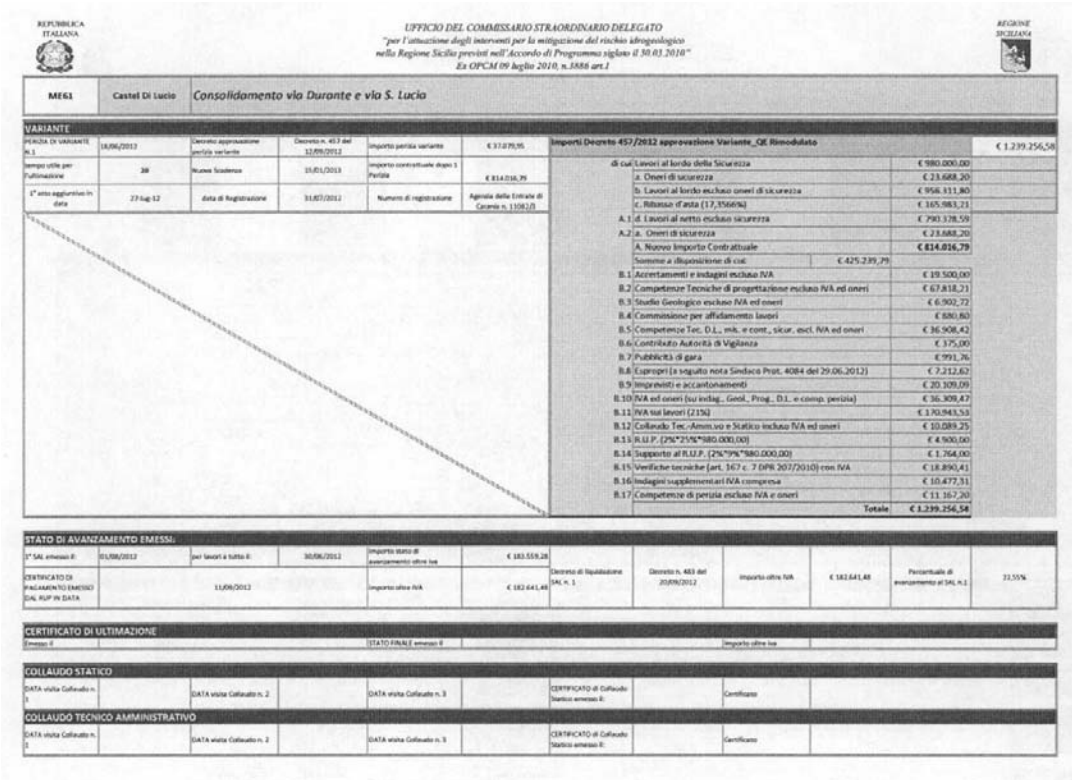

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3888 art.1

REGIONE SICILIANA

ME61	Castel Di Lucio	*Consolidamento via Durante e via S. Lucia*

VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE N.1	18/06/2012	Decreto approvazione perizia variante	Decreto n. 457 del 12/09/2012	importo perizia variante	€ 37.079,95
tempo utile per l'ultimazione	20	Nuova Scadenza	15/01/2013	importo contrattuale dopo 1 Perizia	€ 814.016,79
1° atto aggiuntivo in data	27-Lug-12	data di Registrazione	31/07/2012	Numero di registrazione	Agenzia delle Entrate di Cefalù n. 1158/3

Importi Decreto 457/2012 approvazione Variante_QE Rimodulato € 1.239.256,58

di cui	Lavori al lordo della Sicurezza		€ 980.000,00
	a. Oneri di sicurezza		€ 23.668,20
	b. Lavori al lordo escluso oneri di sicurezza		€ 956.111,80
	c. Ribasso d'asta (17,3566%)		€ 165.983,21
A.1	d. Lavori al netto escluso sicurezza		€ 790.128,59
A.2	a. Oneri di sicurezza		€ 23.668,20
	A. Nuovo Importo Contrattuale		**€ 814.016,79**
	Somme a disposizione di cui:	€ 425.239,79	
B.1	Accertamenti e indagini escluso IVA		€ 19.500,00
B.2	Competenze Tecniche di progettazione escluso IVA ed oneri		€ 67.818,21
B.3	Studio Geologico escluso IVA ed oneri		€ 6.902,72
B.4	Commissione per affidamento lavori		€ 880,80
B.5	Competenze Tec. D.L., mis. e cont., sicur. escl. IVA ed oneri		€ 36.908,42
B.6	Contributo Autorità di Vigilanza		€ 375,00
B.7	Pubblicità di gara		€ 991,76
B.8	Espropri (a seguito nota Sindaco Prot. 4084 del 29.06.2012)		€ 7.212,62
B.9	Imprevisti e accantonamenti		€ 20.109,09
B.10	IVA ed oneri (su indag., Geol., Prog., D.L. e comp. perizia)		€ 36.309,47
B.11	IVA sui lavori (21%)		€ 170.943,53
B.12	Collaudo Tec.-Amm.vo e Statico incluso IVA ed oneri		€ 10.089,25
B.13	R.U.P. (2%*25%*880.000,00)		€ 4.900,00
B.14	Supporto al R.U.P. (2%*9%*880.000,00)		€ 1.764,00
B.15	Verifiche tecniche (art. 167 c. 7 DPR 207/2010) con IVA		€ 18.890,41
B.16	Indagini supplementari IVA compresa		€ 10.477,31
B.17	Competenze di perizia escluso IVA e oneri		€ 11.167,20
		Totale	**€ 1.239.256,58**

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	01/08/2012	per lavori a tutto il:	30/06/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 183.559,28						
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	11/09/2012			importo oltre IVA	€ 182.641,48	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 483 del 20/09/2012	importo oltre IVA	€ 182.641,48	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	22,55%

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE


Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

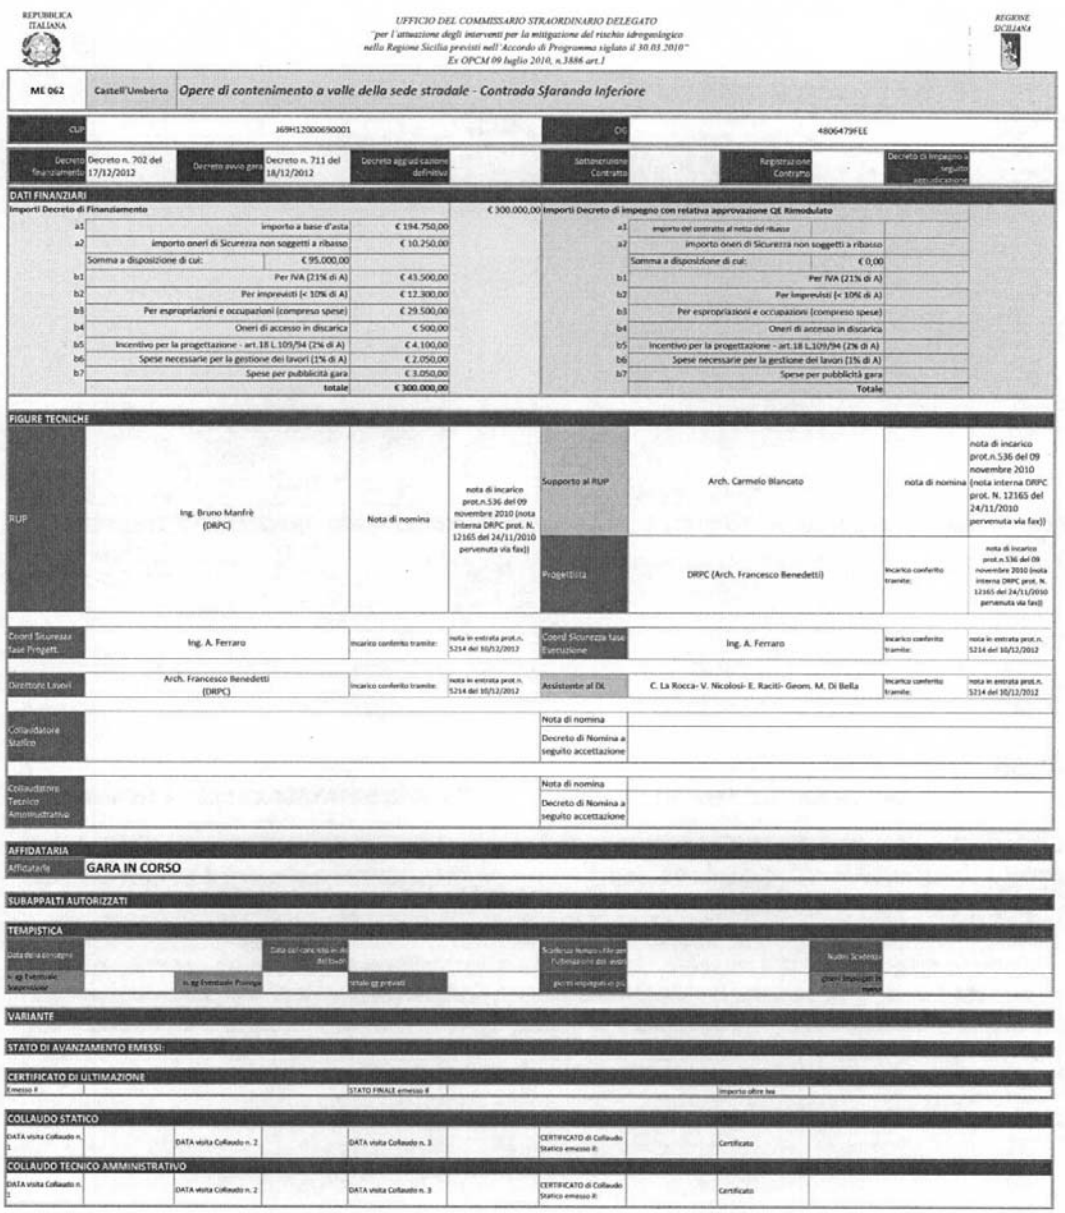

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.01.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ME 062	Castell'Umberto	*Opere di contenimento a valle della sede stradale - Contrada Sfaranda Inferiore*

CUP	J69H12000690001			CIG	4806479FEE		
Decreto finanziamento	Decreto n. 702 del 17/12/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 711 del 18/12/2012	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di impegno a seguito approvazione	

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento — € 300.000,00

a1	importo a base d'asta	€ 194.750,00		a1	importo del contratto al netto del ribasso		
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.250,00		a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		
	Somma a disposizione di cui:	€ 95.000,00			Somma a disposizione di cui:	€ 0,00	
b1	Per IVA (21% di A)	€ 43.500,00		b1	Per IVA (21% di A)		
b2	Per imprevisti (< 10% di A)	€ 12.300,00		b2	Per imprevisti (< 10% di A)		
b3	Per espropriazioni e occupazioni (compreso spese)	€ 29.500,00		b3	Per espropriazioni e occupazioni (compreso spese)		
b4	Oneri di accesso in discarica	€ 500,00		b4	Oneri di accesso in discarica		
b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)	€ 4.100,00		b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)		
b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)	€ 2.050,00		b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)		
b7	Spese per pubblicità gara	€ 3.050,00		b7	Spese per pubblicità gara		
	Totale	€ 300.000,00			Totale		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Bruno Manfrè (DRPC)	Nota di nomina	nota di incarico prot.n.536 del 09 novembre 2010 (nota interna DRPC prot. N. 12165 del 24/11/2010 pervenuta via fax))	Supporto al RUP	Arch. Carmelo Biancato	nota di nomina	nota di incarico prot.n.536 del 09 novembre 2010 (nota interna DRPC prot. N. 12165 del 24/11/2010 pervenuta via fax))
				Progettista	DRPC (Arch. Francesco Benedetti)	Incarico conferito tramite:	nota di incarico prot.n.536 del 09 novembre 2010 (nota interna DRPC prot. N. 12165 del 24/11/2010 pervenuta via fax))
Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. A. Ferraro	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 5214 del 30/12/2012	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. A. Ferraro	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 5214 del 30/12/2012
Direttore Lavori	Arch. Francesco Benedetti (DRPC)	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 5214 del 30/12/2012	Assistente al DL	C. La Rocca- V. Nicolosi- E. Raciti- Geom. M. Di Bella	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 5214 del 30/12/2012
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	GARA IN CORSO

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data del verbale di consegna		Data del verbale di definitiva		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Giorni Sospensioni	
n. gg Eventuale sospensione		n. gg Eventuale Proroga		Totale gg previsti		giorni impiegati in più		Giorni Recuperati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE


Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre Iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

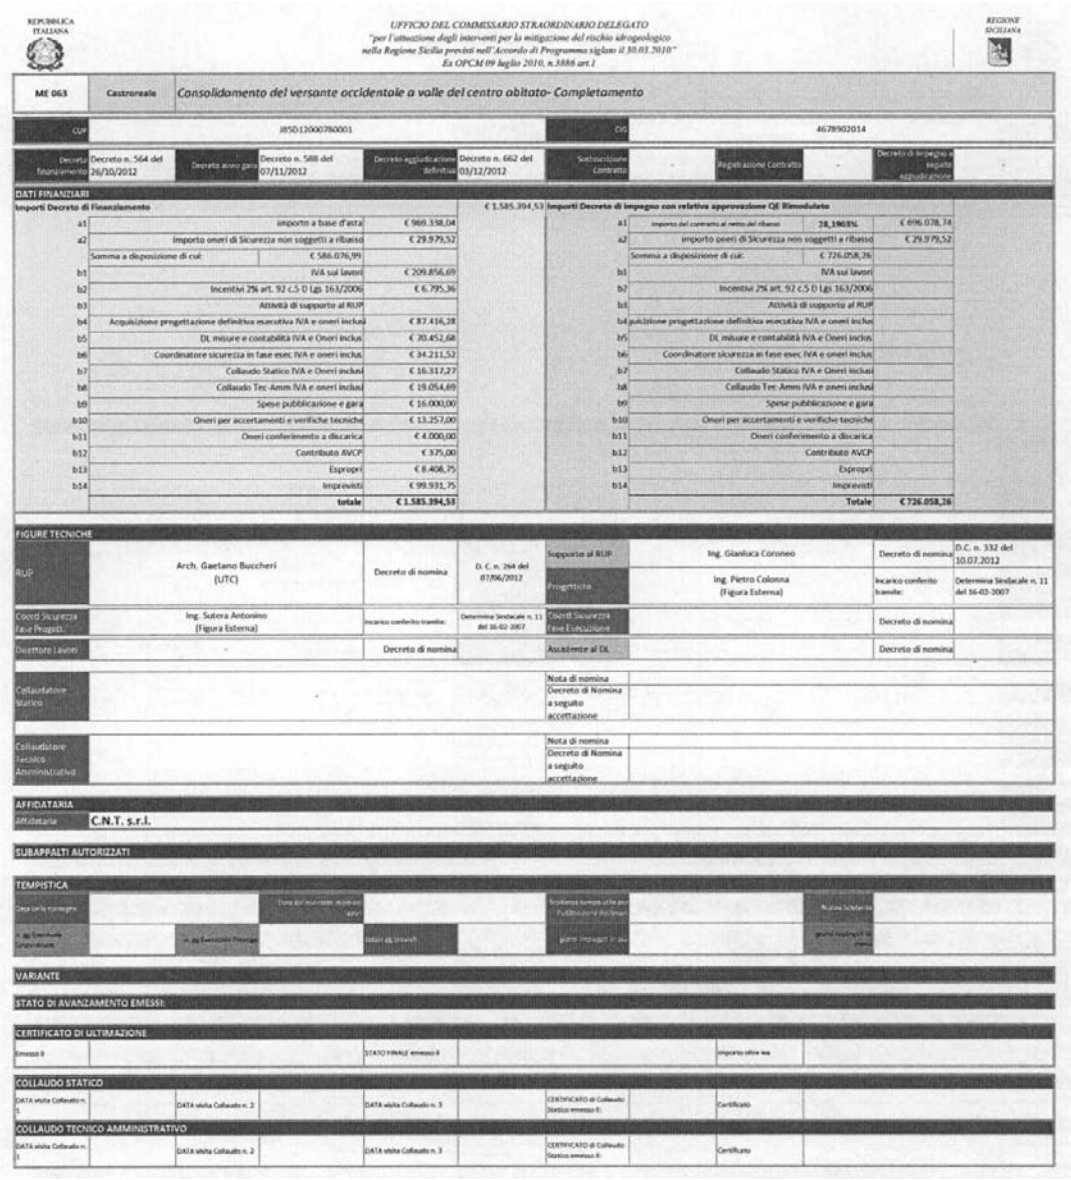

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ME 063	Castroreale	*Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato- Completamento*

CUP	J85D12000780001	CIG	4678902014

Decreto finanziamento	Decreto n. 564 del 26/10/2012	Decreto aggiudicazione provvisoria	Decreto n. 588 del 07/11/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 662 del 03/12/2012	Sottoscrizione Contratto	-	Registrazione Contratto	-	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	-

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento € 1.585.394,53

a1	importo a base d'asta	€ 969.338,04
a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.979,52
	Somma a disposizione di cui:	€ 586.076,99
b1	IVA sui lavori	€ 209.856,69
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006	€ 6.795,36
b3	Attività di supporto al RUP	
b4	Acquisizione progettazione definitiva esecutiva IVA e oneri inclusi	€ 37.416,28
b5	DL misure e contabilità IVA e Oneri inclusi	€ 20.452,68
b6	Coordinatore sicurezza in fase esec IVA e oneri inclusi	€ 34.211,52
b7	Collaudo Statico IVA e Oneri inclusi	€ 16.317,27
b8	Collaudo Tec Amm IVA e oneri inclusi	€ 19.054,69
b9	Spese pubblicazione e gara	€ 16.000,00
b10	Oneri per accertamenti e verifiche tecniche	€ 13.257,00
b11	Oneri conferimento a discarica	€ 4.000,00
b12	Contributo AVCP	€ 375,00
b13	Espropri	€ 8.408,75
b14	Imprevisti	€ 99.931,75
	totale	**€ 1.585.394,53**

Importi Decreto di impegno con relative approvazione QE Rimodulato

a1	Importo del contratto al netto del ribasso	28,190%	€ 696.078,74
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 29.979,52
	Somma a disposizione di cui:	€ 726.058,26	
b1	IVA sui lavori		
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006		
b3	Attività di supporto al RUP		
b4	quisizione progettazione definitiva esecutiva IVA e oneri inclusi		
b5	DL misure e contabilità IVA e Oneri inclusi		
b6	Coordinatore sicurezza in fase esec IVA e oneri inclusi		
b7	Collaudo Statico IVA e Oneri inclusi		
b8	Collaudo Tec Amm IVA e oneri inclusi		
b9	Spese pubblicazione e gara		
b10	Oneri per accertamenti e verifiche tecniche		
b11	Oneri conferimento a discarica		
b12	Contributo AVCP		
b13	Espropri		
b14	Imprevisti		
	Totale		**€ 726.058,26**

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Gaetano Buccheri (UTC)	Decreto di nomina	D. C. n. 264 del 07/06/2012	Supporto al RUP	Ing. Gianluca Coroneo	Decreto di nomina	D.C. n. 332 del 10.07.2012
				Progettista	Ing. Pietro Colonna (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 11 del 16-02-2007
Coord Sicurezza Fase Progett.	Ing. Sutera Antonino (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 11 del 16-02-2007	Coordi Sicurezza Fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	C.N.T. s.r.l.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del verbale di inizio dei lavori		Residuo tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Ritardo Subappalto			
N. gg Esecuzione Contrattuale		N. gg Esecuzione Prevista		Ritardi gg Imputati		gg Imputati in aumento		gg Imputati in diminuz.	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE


Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre 4/5	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

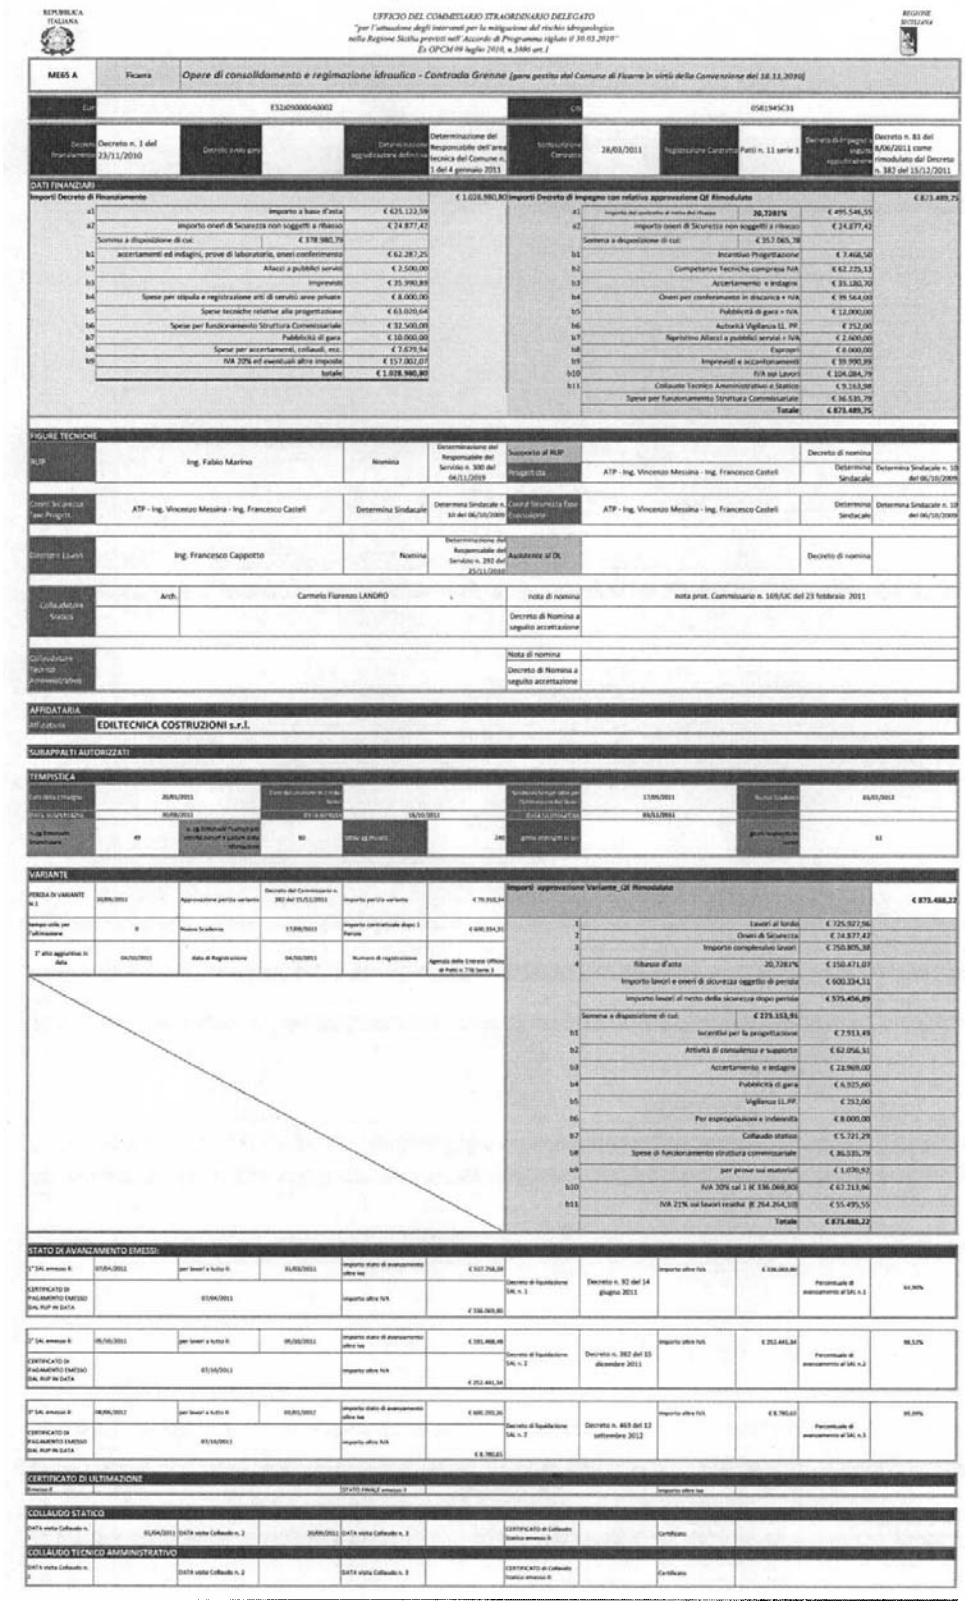

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma vigente il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

ME65 A	Ficarra	*Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Grenne [gara gestita dal Comune di Ficarra in virtù della Convenzione del 18.11.2010]*	
Cup	E32D09000040002	CIG	0581945C31

Decreto finanziamento	Decreto n. 1 del 23/11/2010	Decreto avvio gara		Determinazione aggiudicazione definitiva	Determinazione del Responsabile dell'area tecnica del Comune n. 1 del 4 gennaio 2013	Sottoscrizione Contratto	28/03/2011	Registrazione Contratto	Patti n. 11 serie 3	Decreto di impegno e inizio applicazione	Decreto n. 81 del 8/08/2011 come rimodulato dal Decreto n. 382 del 15/12/2011

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento € 1.028.980,80

a1	importo a base d'asta	€ 625.122,56
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.877,42
	Somma a disposizione di cui: € 378.980,79	
b1	accertamenti ed indagini, prove di laboratorio, oneri conferimento	€ 62.287,25
b7	Allacci a pubblici servizi	€ 2.500,00
b3	Imprevisti	€ 35.990,89
b4	Spese per stipula e registrazione atti di servitù aree private	€ 8.000,00
b5	Spese tecniche relative alla progettazione	€ 63.020,64
b6	Spese per funzionamento Struttura Commissariale	€ 32.500,00
b7	Pubblicità di gara	€ 10.000,00
b8	Spese per accertamenti, collaudi, ecc.	€ 7.679,94
b9	IVA 20% ed eventuali altre imposte	€ 157.002,07
	totale:	€ 1.028.980,80

Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato € 873.489,75

a1		20,7281%	€ 495.544,55
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 24.877,42
	Somma a disposizione di cui:	€ 353.065,78	
b1	Incentivo Progettazione		€ 7.468,50
b2	Competenze Tecniche comprese IVA		€ 62.225,13
b3	Accertamento e indagini		€ 35.180,70
b4	Oneri per conferimento in discarica + IVA		€ 99.564,00
b5	Pubblicità di gara + IVA		€ 12.000,00
b6	Autorità Vigilanza LL.PP.		€ 752,00
b7	Ripristino Allacci a pubblici servizi + IVA		€ 2.600,00
b8	Espropri		€ 0.000,00
b9	Imprevisti e accantonamenti		€ 39.990,89
b10	IVA sui Lavori		€ 104.084,79
b11	Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico		€ 9.163,98
	Spese per funzionamento Struttura Commissariale		€ 36.535,79
	Totale		€ 873.489,75

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Fabio Marino	Nomina	Determinazione del Responsabile del Servizio n. 300 del 04/11/2010	Supporto al RUP		Decreto di nomina	
				Progettista	ATP - Ing. Vincenzo Messina - Ing. Francesco Castelli	Determina Sindacale	Determina Sindacale n. 10 del 06/10/2009
Coord. Sicurezza per Progett.	ATP - Ing. Vincenzo Messina - Ing. Francesco Castelli	Determina Sindacale	Determina Sindacale n. 10 del 06/10/2009	Coord Sicurezza Fase Esecutiva	ATP - Ing. Vincenzo Messina - Ing. Francesco Castelli	Determina Sindacale	Determina Sindacale n. 10 del 06/10/2009
Direttori Lavori	Ing. Francesco Cappotto	Nomina	Determinazione del Responsabile del Servizio n. 292 del 23/11/2010	Assistente al DL		Decreto di nomina	

Collaudatore Statico	Arch.	Carmelo Fiorenzo LANDRO	nota di nomina	nota prot. Commissario n. 169/UC del 23 febbraio 2011
			Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo			Nota di nomina	
			Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	EDILTECNICA COSTRUZIONI s.r.l.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	20/01/2011	Data dell'ultimazione dei lavori da Verbale		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	17/09/2011	Nuova Scadenza	03/01/2013
Data sospensione	30/08/2011	07/10/2011	38/09/2011	Data ripresa lavori	03/11/2011		
N. gg. Effettivi Tempo per ultimazione lavori	49	N. gg. Effettivi Tempo per ultimazione lavori e giorni della sospensione	92	Giorni gg. Penali	240	giorni recuperati in sospensione	61

VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE N.1	30/09/2011	Approvazione perizia variante	Decreto del Commissario n. 382 del 15/11/2011	Importo perizia variante	€ 79.350,34
tempo utile per l'ultimazione	0	Nuova Scadenza	17/09/2013	Importo contrattuale dopo 1 Perizia	€ 600.334,31
1° atto aggiuntivo in data	04/10/2011	data di Registrazione	04/10/2011	Numero di registrazione	Agenzia delle Entrate Ufficio di Patti n. 716 Serie 3

Importi approvazione Variante_QE Rimodulato € 873.488,22

1	Lavori al lordo	€ 725.927,56
2	Oneri di Sicurezza	€ 24.877,42
3	Importo complessivo lavori	€ 750.805,38
4	ribasso d'asta 20,7281%	€ 150.471,07
	Importo lavori e oneri di sicurezza oggetto di perizia	€ 600.334,31
	Importo lavori al netto della sicurezza dopo perizia	€ 575.456,89
	Somma a disposizione di cui: € 275.153,91	
b1	Incentivi per la progettazione	€ 7.913,49
b2	Attività di consulenza e supporto	€ 62.056,31
b3	Accertamento e indagine	€ 23.969,00
b4	Pubblicità di gara	€ 6.925,00
b5	Vigilanza LL.PP.	€ 752,00
b6	Per espropriazioni e indennità	€ 8.000,00
b7	Collaudo statico	€ 5.721,29
b8	Spese di funzionamento struttura commissariale	€ 36.535,79
b9	per prove sui materiali	€ 1.070,92
b10	IVA 10% sui l (€ 136.069,80)	€ 67.213,96
b11	IVA 21% sui lavori residui (€ 264.264,10)	€ 55.495,55
	Totale	€ 873.488,22

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	07/04/2011	per lavori a tutto il:	31/03/2011	Importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 317.756,00					
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	07/04/2011			Importo oltre IVA	€ 336.069,80	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 92 del 14 giugno 2011	Importo oltre IVA	€ 336.069,80	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	44,90%
2° SAL emesso il:	05/10/2011	per lavori a tutto il:	08/09/2011	Importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 185.468,49						
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	07/10/2011			Importo oltre IVA	€ 252.441,34	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 382 del 15 dicembre 2011	Importo oltre IVA	€ 252.441,34	Percentuale di avanzamento al SAL n.2	90,52%
3° SAL emesso il:	08/06/2012	per lavori a tutto il:	03/01/2012	Importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 600.293,26						
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	07/10/2011			Importo oltre IVA	€ 8.780,65	Decreto di liquidazione SAL n. 3	Decreto n. 469 del 13 settembre 2012	Importo oltre IVA	€ 8.780,65	Percentuale di avanzamento al SAL n.3	99,99%

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE


Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre Iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1	01/04/2011	DATA visita Collaudo n. 2	20/09/2011	DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	Certificato

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	Certificato

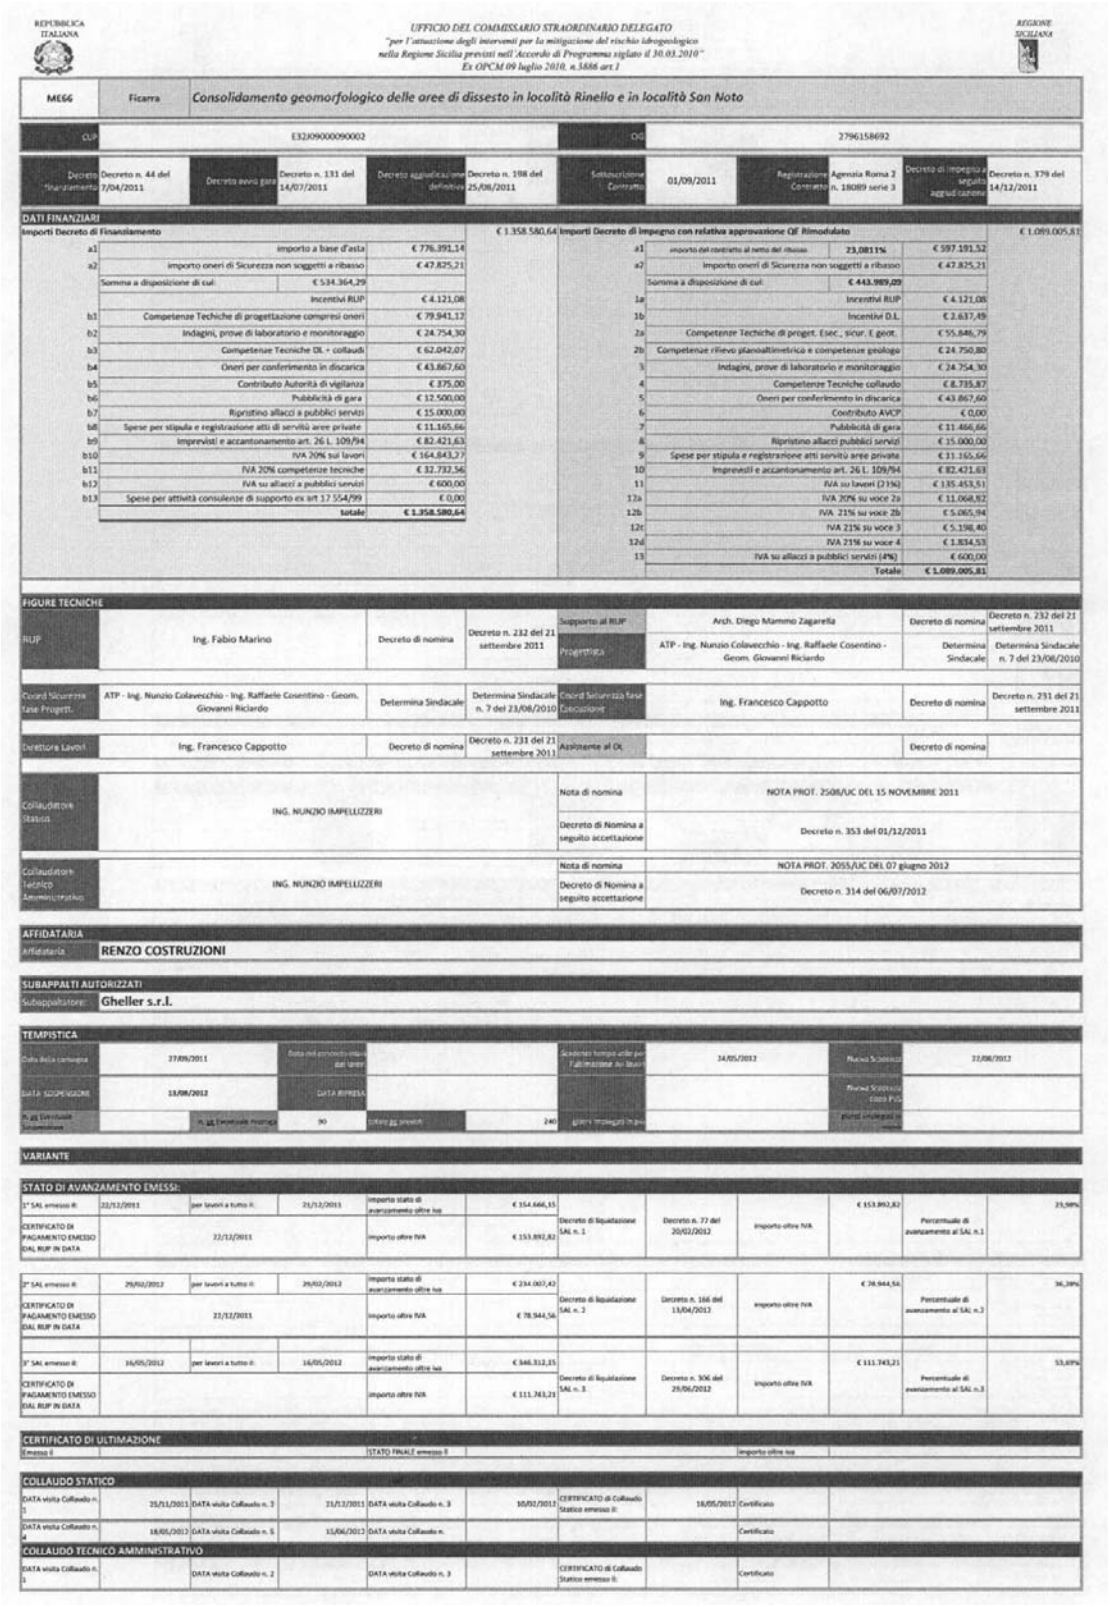

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ME66	Ficarra	*Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto*

CUP	E32J09000090002	CIG	2796158692

Decreto finanziamento	Decreto n. 44 del 7/04/2011	Decreto avvio gara	Decreto n. 131 del 14/07/2011	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 198 del 25/08/2011	Sottoscrizione Contratto	01/09/2011	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 18089 serie 3	Decreto di impegno a seguito agg.ne definitiva	Decreto n. 379 del 14/12/2011

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento € 1.358.580,64

a1	importo a base d'asta	€ 776.391,14
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 47.825,21
	Somma a disposizione di cui: € 534.364,29	
	Incentivi RUP	€ 4.121,08
b1	Competenze Tecniche di progettazione compresi oneri	€ 79.941,12
b2	Indagini, prove di laboratorio e monitoraggio	€ 24.754,30
b3	Competenze Tecniche DL + collaudi	€ 62.042,07
b4	Oneri per conferimento in discarica	€ 43.867,60
b5	Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00
b6	Pubblicità di gara	€ 12.500,00
b7	Ripristino allacci a pubblici servizi	€ 15.000,00
b8	Spese per stipula e registrazione atti di servitù aree private	€ 11.165,66
b9	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94	€ 82.421,63
b10	IVA 20% sui lavori	€ 164.843,27
b11	IVA 20% competenze tecniche	€ 32.732,56
b12	IVA su allacci a pubblici servizi	€ 600,00
b13	Spese per attività consulenze di supporto ex art 17 554/99	€ 0,00
	totale	**€ 1.358.580,64**

Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato € 1.089.005,81

a1	importo del contratto al netto del ribasso	**23,0811%**	€ 597.191,52
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 47.825,21
	Somma a disposizione di cui:	**€ 443.989,09**	
1a	Incentivi RUP		€ 4.121,08
1b	Incentivi D.L.		€ 2.637,49
2a	Competenze Tecniche di progett. Esec., sicur. E geot.		€ 55.846,79
2b	Competenze rilievo planoaltimetrico e competenze geologo		€ 24.750,80
3	Indagini, prove di laboratorio e monitoraggio		€ 24.754,30
4	Competenze Tecniche collaudo		€ 8.735,87
5	Oneri per conferimento in discarica		€ 43.867,60
6	Contributo AVCP		€ 0,00
7	Pubblicità di gara		€ 11.466,66
8	Ripristino allacci pubblici servizi		€ 15.000,00
9	Spese per stipula e registrazione atti servitù aree private		€ 11.165,66
10	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94		€ 82.421,63
11	IVA su lavori (21%)		€ 135.453,51
12a	IVA 20% su voce 2a		€ 11.068,82
12b	IVA 21% su voce 2b		€ 5.065,94
12c	IVA 21% su voce 3		€ 5.198,40
12d	IVA 21% su voce 4		€ 1.834,53
13	IVA su allacci a pubblici servizi (4%)		€ 600,00
	Totale		**€ 1.089.005,81**

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Fabio Marino	Decreto di nomina	Decreto n. 232 del 21 settembre 2011	Supporto al RUP	Arch. Diego Mammo Zagarella	Decreto di nomina	Decreto n. 232 del 21 settembre 2011
				Progettista	ATP - Ing. Nunzio Colavecchio - Ing. Raffaele Cosentino - Geom. Giovanni Riciardo	Determina Sindacale	Determina Sindacale n. 7 del 23/08/2010
Coord Sicurezza fase Progett.	ATP - Ing. Nunzio Colavecchio - Ing. Raffaele Cosentino - Geom. Giovanni Riciardo	Determina Sindacale	Determina Sindacale n. 7 del 23/08/2010	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Francesco Cappotto	Decreto di nomina	Decreto n. 231 del 21 settembre 2011
Direttore Lavori	Ing. Francesco Cappotto	Decreto di nomina	Decreto n. 231 del 21 settembre 2011	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico	ING. NUNZIO IMPELLIZZERI			Nota di nomina	NOTA PROT. 2506/UC DEL 15 NOVEMBRE 2011		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 353 del 01/12/2011		
Collaudatore Tecnico Amministrativo	ING. NUNZIO IMPELLIZZERI			Nota di nomina	NOTA PROT. 2055/UC DEL 07 giugno 2012		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 314 del 06/07/2012		

AFFIDATARIA

Affidataria	**RENZO COSTRUZIONI**

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	**Gheller s.r.l.**

TEMPISTICA

Data della consegna	27/09/2011	Data del consenso inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	24/05/2013	Nuova Scadenza	22/08/2013
DATA SOSPENSIONE	13/08/2012	DATA RIPRESA				Nuova Scadenza con PUA	
n. gg Contrattuali Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	90	Giorni gg previsti	240	giorni impiegati in più	giorni risparmiati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	22/12/2011	per lavori a tutto il:	21/12/2011	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 154.666,55	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 77 del 20/02/2012	importo oltre IVA	€ 153.892,82	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	23,98%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	22/12/2011			importo oltre IVA	€ 153.892,82						
2° SAL emesso il:	29/02/2012	per lavori a tutto il:	29/02/2012	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 234.007,42	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 166 del 13/04/2013	importo oltre IVA	€ 78.944,56	Percentuale di avanzamento al SAL n.2	36,39%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	22/12/2011			importo oltre IVA	€ 78.944,56						
3° SAL emesso il:	16/05/2012	per lavori a tutto il:	16/05/2012	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 346.312,15	Decreto di liquidazione SAL n. 3	Decreto n. 306 del 29/06/2012	importo oltre IVA	€ 111.743,23	Percentuale di avanzamento al SAL n.3	53,69%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA				importo oltre IVA	€ 111.743,23						

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre Iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1	25/11/2011	DATA visita Collaudo n. 2	21/12/2011	DATA visita Collaudo n. 3	10/02/2012	CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	16/05/2012	Certificato	
DATA visita Collaudo n. 4	18/05/2012	DATA visita Collaudo n. 5	15/06/2012	DATA visita Collaudo n.				Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma vigilato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ME 072	Galati Mamertino	*Disgoggiamento massi, messa in sicurezza versante Contrada Galini*

CUP	J43B10000600001	CIG	38685931EB

Decreto finanziamento	Decreto n. 15 del 17/01/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 52 del 08/02/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 103 del 14/03/2012	Sottoscrizione Contratto	04/04/2012	Registrazione Contratto	Ag. Delle Entrate Roma 2 Aurelio n. 8127 serie 3	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	-

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento € 500.000,00

a1	importo lavori a base d'asta		€ 308.913,01
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 7.634,16
	Somma a disposizione di cui:	€ 183.452,83	
b1	Incentivi per progettazione (RUP)		€ 1.582,74
b2	Competenze tecniche compreso IVA e oneri		€ 59.361,18
b3	Competenze geologo compresi sondaggi compreso IVA		€ 11.315,01
b4	Polizza Assicurativa Progettista, RUP, DL		€ 0,00
b5	Spese di pubblicazione bando		€ 4.000,00
b6	Espropri (occupazioni temporanee)		€ 7.732,68
b7	Imprevisti		€ 12.421,74
b8	IVA sui lavori		€ 66.474,91
b9	Collaudo statico paratia compresi IVA e oneri		€ 2.756,83
b10	Contributo AVCP		€ 225,00
b11	Piano di monitoraggio		€ 17.582,74
	totale		€ 500.000,00

Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato € 237.403,66

a1	importo del contratto al netto del ribasso	25,6200%	€ 229.769,50
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 7.634,16
	Somma a disposizione di cui:	€ 0,00	
b1	spese di progetttazione		
b2	Attività di consulenza Geotecnica		
b3	Accertamento e indagini compreso IVA		
b4	Rilievi Topografici		
b5	Rilievi aerofotogrammetrici		
b6	Oneri per conferimento in discarica		
b7	Contributo Stazione appaltante		
	Spese espletamento gare		
b8	Espropri		
b9	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94		
b10	IVA 20% di A1+B2+B4+B5		
b13	Spese Struttura Commissariale		
	Totale		€ 237.403,66

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Giuseppa Cavolo	Decreto di nomina	Decreto n. 14 del 17/01/2012	Supporto al RUP		Decreto di nomina	
				Progettista	Arch. Felice Testagrossa	Determina di nomina	Determina Sindacale n. 72 del 5-10-10
				Supporto alla Progettazione/Geologo	Dott. Geol. Michele orifici	Determina di nomina	Determina Sindacale n. 63 del 28-5-10
Coord Sicurezza fase Progett	Arch. Felice Testagrossa	Determina di nomina	Determina Sindacale n. 72 del 5-10-10	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Arch. Felice Testagrossa	Determina di nomina	Determina Sindacale n. 72 del 5-10-10	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico	ING. Luciano Taranto			Nota di nomina	NOTA PROT. 1827/UC DEL 24 maggio 2012		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	D&D COSTRUZIONI s.r.l.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	22/05/2012	Data del verbale di inizio dei lavori		Studio/Integrazione/Valutazione del piano	19/09/2012	Nuova Scadenza dopo prima sospensione	16/11/2012
DATA 1 SOSPENSIONE	12/09/2012	DATA RIPRESA DOPO 1 SOSPENSIONE	09/11/2012				
DATA 2 SOSPENSIONE	30/11/2012	DATA RIPRESA DOPO 2 SOSPENSIONE					
n. gg Contrattuali Sospensione	58	n. gg Eventuale Proroga		GIORNI DI PENALI	120	giorni impiegati in più		giorni lavorativi di penale	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ME 073	Galati Mamertino	*Consolidamento e messa in sicurezza versante - Località Pilieri*

CUP	J49H12000480001	CIG	4528988F1D

Decreto finanziamento	Decreto n. 406 del 02/08/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 448 del 06/09/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 514 del 4 ottobre 2012	Sottoscrizione Contratto	11/10/12	Registrazione Contratto	In Corso di registrazione	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			**€ 1.100.000,00**
a1	importo lavori a base d'asta		€ 629.085,71
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 17.616,16
	Somma a disposizione di cui:	€ 453.298,13	
b1	IVA 21% di A		€ 135.807,39
b2	Spese tecniche Progettazione e coord. Sic in fase di progettazione comprensivi di IVA ed oneri		€ 49.459,46
b3	Competenze D.LL., contabilita', ufficio direzione lavori, direttore operativo, cordinatore sicurezza in fase di esecuzione.		€ 91.614,03
b4	Competenze tecniche Direttore Operativo compreso IVA ed oneri		€ 0,00
b5	Competenze collaudo statico		€ 9.053,99
b6	Competenze collaudo tec-amm		€ 4.243,49
b7	Spese per Indagini geologiche e geotecniche e redazione relazione geologica comprensive di IVA ed oneri		€ 24.862,47
b8	Spese per prove di laboratorio		€ 5.000,00
b9	Spese per piano di monitoraggio		€ 21.978,60
b10	Spese per espropri (occupazione temporanea)		€ 12.000,00
b11	Incentivi per competenze ex art. 92 comma 5 Dlgs 163/2006 - RUP (25% del2%A)		€ 3.233,51
b12	Oneri di conferimento a discarica		€ 9.000,00
b13	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 10.000,00
b14	Spese per pubblicità Bando e Commissione di Gara		€ 12.000,00
b15	Contributo Autorità di Vigilanza		€ 375,00
b16	Imprevisti comprensivi di IVA (10% su A)		€ 64.670,19
	totale		**€ 1.100.000,00**

Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato				**€ 944.907,87**
a1	importo dei contratto al netto del ribasso	**27,6986%**	€ 454.837,78	
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 17.616,16	
	Somma a disposizione di cui:	€ 472.453,94		
b1	IVA 21% di A			
b2	Spese tecniche Progettazione e coord. Sic in fase di progettazione comprensivi di IVA ed oneri			
b3	Competenze D.LL., contabilita', ufficio direzione lavori, direttore operativo, cordinatore sicurezza in fase di esecuzione.			
b4	Competenze tecniche Direttore Operativo compreso IVA ed oneri			
b5	Competenze collaudo statico			
b6	Competenze collaudo tec-amm			
b7	Spese per Indagini geologiche e geotecniche e redazione relazione geologica comprensive di IVA ed oneri			
b8	Spese per prove di laboratorio			
b9	Spese per piano di monitoraggio			
b10	Spese per espropri (occupazione temporanea)			
	Incentivi per competenze ex art. 92 comma 5 Dlgs 163/2006 - RUP (25% del2%A)			
	Oneri di conferimento a discarica			
	Allacciamenti ai pubblici servizi			
b10	Spese per pubblicità Bando e Commissione di Gara			
	Contributo Autorità di Vigilanza			
	Imprevisti comprensivi di IVA (10% su A)			
	Totale		**€ 472.453,94**	

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Giuseppe Cavolo	Decreto di nomina	Decreto n. 262 del 07/06/2012	Supporto al RUP	Ing. Giuseppe Morganti	Decreto di nomina	Decreto n. 348 del 11/07/2012
				Progettista	Comune Ing. Mario Saitta	Determina di nomina n.	Determina Sindacale 54 del 26/10/2010
				Supporto alla Progettazione/Geologo		Determina di nomina	
Coord Sicurezza fase Progetti		Determina di nomina		Coord Sicurezza fase Esecutiva	Ing. Mario Saitta	Decreto di nomina	D.C. n. 527 del 10/10/2012
Direttore Lavori	Ing. Mario Saitta	Decreto di nomina	D.C. n. 527 del 10/10/2012	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	**ARCOBALENO 3000 SRL**

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	19/10/2012	Data inizio lavori effettivi		Sospensioni prima della ripresa / Ultimazione dei lavori	18/06/2013	Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		Utile gg previsti	240	giorni impiegati in g.	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	Certificato

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	Certificato

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ME 081	Librizzi	*Opere di consolidamento versante e sistemazione – Zona Ronco Marurà*

CUP	149H12000820001	CIG	480658141E

Decreto finanziamento	Decreto n. 707 del 17/12/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 709 del 18/12/2012	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	-	Registrazione Contratto	-	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	-

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 500.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
a1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 327.756,24		importo del contratto al netto del ribasso		
a2	oneri per la sicurezza diretti	€ 10.136,79		a2	oneri per la sicurezza diretti	
	Oneri per la sicurezza indiretti	€ 7.000,00			Oneri per la sicurezza indiretti	
	Somma a disposizione di cui: € 155.106,97				Somma a disposizione di cui: € 0,00	
b1	IVA 21% sui Lavori	€ 72.427,54		b1	IVA 21% sui Lavori	
b2	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006) (solo attività di RUP - 25%)	€ 6.897,86		b2	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006) (solo attività di RUP - 25%)	
b3	spese tecniche IVA e oneri inclusi(DL, Mis e cont CSE)	€ 27.847,26		b3	spese tecniche IVA e oneri inclusi(DL, Mis e cont CSE)	
b4	collaudo statico IVA e oneri incl.	€ 3.742,76		b4	collaudo statico IVA e oneri incl.	
b5	spese pubblicazione e gara	€ 5.000,00		b5	spese pubblicazione e gara	
b6	indagini geognostiche IVA inclusa	€ 13.435,72		b6	indagini geognostiche IVA inclusa	
b7	Contributo Autorità di vigilanza	€ 225,00		b7	Contributo Autorità di vigilanza	
b8	indennità occupazioni definitive e temporanee- spese di frazionamento	€ 3.200,00		b8	indennità occupazioni definitive e temporanee- spese di frazionamento	
b9	Imprevisti (circa 6,475%)	€ 22.330,83		b10	Imprevisti (circa 6,475%)	
	totale	€ 500.000,00		b13	Totale	

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Santo di Perna (UTC)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 75 del 27 mag 11	Supporto al RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 75 del 27 mag 11
				Progettista	INVITALIA Ing. Calogero, Ing. Morganti	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 354 del 08.03.2011
Coord Sicurezza Fase Progett		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	GARA IN CORSO

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del ciore vio si dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
N. gg Eventuale sospensione		N. gg Eventuale Proroga		Giorni gg previsti		Giorni impiegati in più	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ME 088	Messina	*"Opere di salvaguardia centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" - Comune di Messina*

CUP	J45D12000090001	CIG	42207058F0

Decreto finanziamento	Decreto n. 192 del 26/04/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 217 del 14/05/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 382 del 20/07/2012	Sottoscrizione Contratto	24/07/2012	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 17110 serie 3 del 01/08/2012	Decreto di impegno e seguito approvazione	

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 3.000.000,00
a1	importo a base d'asta		€ 2.068.916,14
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 63.982,10
	Somma a disposizione di cui:	€ 867.096,75	
b1	IVA sui lavori		€ 447.909,68
b2	Espropri		€ 23.271,21
b3	Incentivi, 2% su A art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006 [Direz. Lav., Coordinatore sicurezza]		€ 42.658,06
b4	Competenze Tecniche (oneri compresi)		€ 216.517,02
b5	Indagini geognostiche		€ 32.710,66
b6	Monitoraggio inclinometrico e piezometrico		€ 21.148,38
b7	Spese di pubblicazione Gara		€ 30.000,00
b8	Imprevisti e arrotondamenti		€ 61.881,74
	totale		€ 3.000.000,00

Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			
a1	importo del contratto al netto del ribasso	26,6637%	€ 1.517.266,55
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 63.987,10
	Somma a disposizione di cui:	€ 0,00	
b1	spese di progettazione		
b2	Attività di consulenza Geotecnica		
b3	Accertamento e indagini compreso IVA		
b4	Rilievi Topografici		
b5	Rilievi aerofotogrammetrici		
b6	Oneri per conferimento in discarica		
b7	Contributo Stazione appaltante		
	Spese espletamento gare		
b13	Spese Struttura Commissariale		
	Totale		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Salvatore Bartolotta	Decreto di nomina	Decreto n. 203 del 04/05/2012	Supporto al RUP	Dott. Angelo Nicastro	Decreto di nomina	Decreto n. 203 del 04/05/2012
				Progettista	Ing. Antonino Sutera	Determina di nomina	Deliberazione Giunta Comunale prot.n. 97 del 22.02.2011
Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Antonino Sutera	Determina di nomina	Deliberazione Giunta Comunale prot.n. 97 del 22.02.2011	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Antonino Sutera	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 328 del 10/07/2012
Direttore Lavori	Ing. Antonino Sutera	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 328 del 10/07/2012	Assistente geologo al DL	Dott. Geol Vincenzo Pinnizzotto	Decreto di nomina	Decreto n. 585 del 07/11/2012
Collaudatore Statico	Ing. Salvatore Sparacino			Nota di nomina	Prot. n. 2984 del 01/08/2012		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 407 del 02/08/2012		
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Ing. Salvatore Sparacino			Nota di nomina	Prot. n. 2984 del 01/08/2012		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 407 del 02/08/2012		

AFFIDATARIA

Affidataria	A.T.I. PETTINATO COSTRUZIONI E CEIT DI GIUSEPPE MAMMOLITI

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	31/07/2012	Data del concordato n. (tra i lavori)		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	26/07/2013	Giorni Sfavorevoli	
n. gg Festività sopravvenute		n. gg Eventuale Proroga		totale gg previsti	360	giorni impiegati per varie	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:		per lavori a tutto il:		importo stato di avanzamento oltre iva		Decreto di liquidazione SAL n. 1		importo oltre IVA		Percentuale di avanzamento al SAL n.1	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA				importo oltre IVA							

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1	08/10/2012	DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ME 089_1	Messina	*Opere di consolidamento località Galati S. Anna*

CUP	J45D12000520001	CIG	4738438ABA

Decreto finanziamento	Decreto n. 593 del 08/11/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 646 del 27/11/2012	Decreto agg.ne definitivo		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 900.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			
a1	importo a base d'asta	€ 634.678,86		a1	importo del contratto al netto del ribasso		€ 634.678,86
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.321,14		a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 35.321,14
	Somma a disposizione di cui: € 230.000,00				Somma a disposizione di cui:	€ 670.000,00	
b1	IVA 21% sui Lavori	€ 140.700,00		b1	IVA sui lavori		
b2	Competenze ex art., 92 d.lgs 163/2006 (2% DI A)	€ 13.400,00		b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006		
b3	Indagini grognostiche compreso IVA ed oneri	€ 18.018,62		b3	Spese a supporto della DL art. 8 convenzione stipulata		
b4	Competenze tec. Geologo compreso IVA ed oneri	€ 6.306,59		b4	Caratterizzazione del materiale da conferire a discarica		
b5	Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	€ 8.000,00		b5	Pubblicità di gara		
b6	Oneri di conferimento a discarica	€ 4.200,00		b6	Contributo Stazione appaltante AVCP		
b7	Espropri	€ 20.000,00		b7	Imprevisti		
b8	Pubblicità Gara	€ 5.000,00			Espropri.		
b9	Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00		b8	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA		
	Imprevisti	€ 13.999,79					
	totale	€ 900.000,00		b13	Totale		€ 670.000,00

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Antonino Amato (UTC)	Decreto di nomina	D. C. n. 379 del 20.07.2012	Supporto al RUP	Ing. Alberto Peligra	Decreto di nomina	D. C. n. 379 del 20.07.2012
				Progettista	Comune Geom. Currò	Incarico conferito tramite:	Incarico interno con nota n. 57 del 13/02/2012
Coord Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina		Supporto alla progettazione	Comune Ing. Salvatore Bartolotta	Incarico conferito tramite:	Incarico interno con nota n. 74 del 01/03/2013
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	GARA IN CORSO

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del verbale di inizio dei lavori		Residuo tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Contrattuali		n. gg Eventuale Proroga		Data di presunta ultimazione		per gg impiegati in più		giorni impiegati in più	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE


Il messo il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

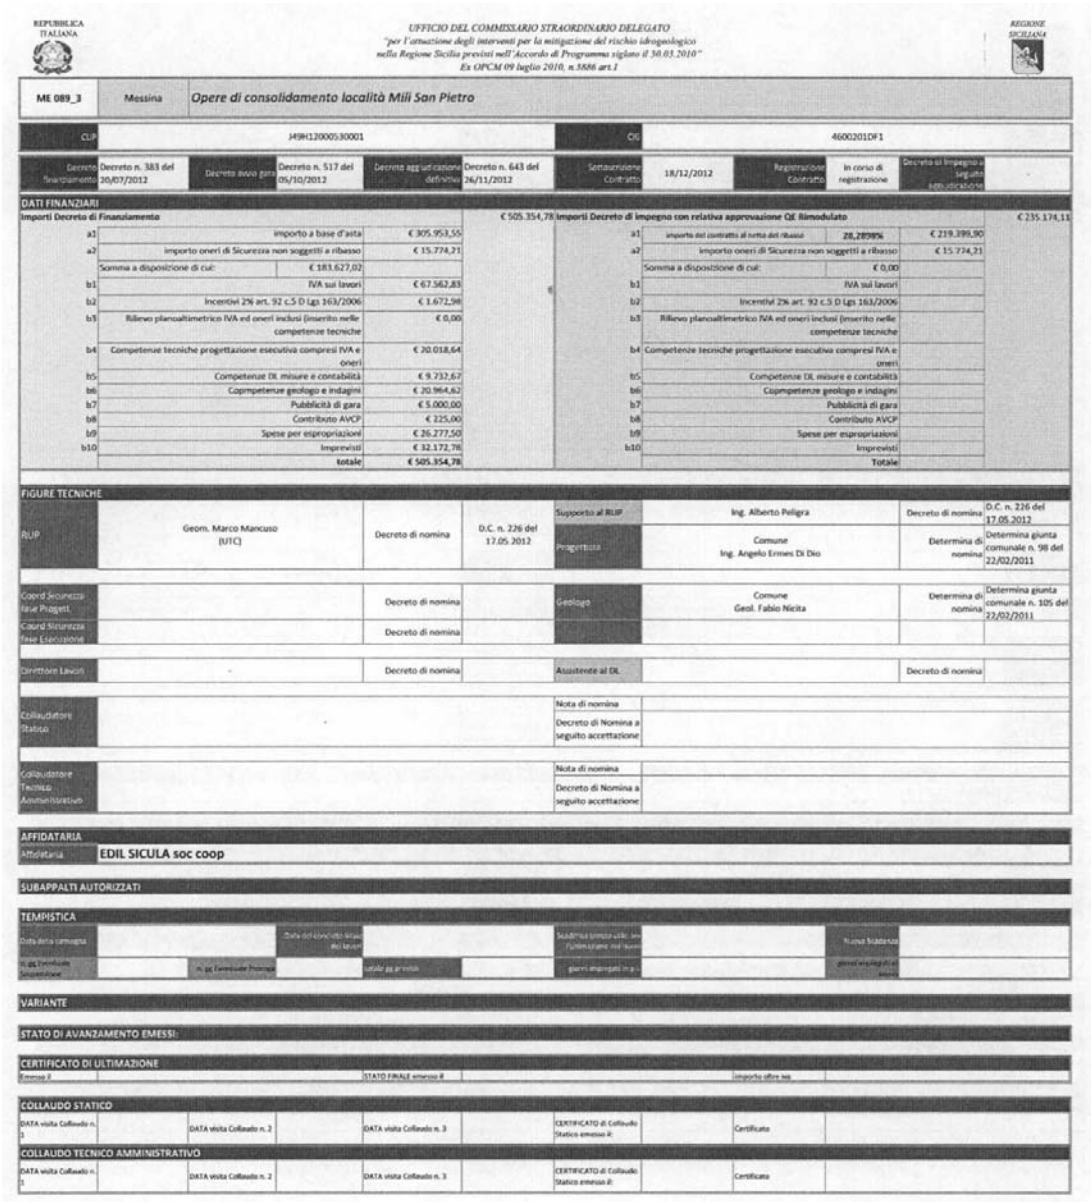

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ME 089_3	Messina	*Opere di consolidamento località Mili San Pietro*

CUP	J49H12000530001	CIG	46002201DF1

Decreto finanziamento	Decreto n. 383 del 20/07/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 517 del 05/10/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 643 del 26/11/2012	Sottoscrizione Contratto	18/12/2012	Registrazione Contratto	In corso di registrazione	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	-

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 505.354,78	**Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato**			€ 235.174,11
a1	importo a base d'asta	€ 305.953,55		a1	importo del contratto al netto del ribasso	28,2898%	€ 219.399,90
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.774,21		a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 15.774,21
	Somma a disposizione di cui:	€ 183.627,02			Somma a disposizione di cui:	€ 0,00	
b1	IVA sui lavori	€ 67.562,83		b1	IVA sui lavori		
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006	€ 1.672,98		b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006		
b3	Rilievo plancaltimetrico IVA ed oneri inclusi (inserito nelle competenze tecniche	€ 0,00		b3	Rilievo plancaltimetrico IVA ed oneri inclusi (inserito nelle competenze tecniche		
b4	Competenze tecniche progettazione esecutiva compresi IVA e oneri	€ 20.018,64		b4	Competenze tecniche progettazione esecutiva compresi IVA e oneri		
b5	Competenze DL misure e contabilità	€ 9.732,67		b5	Competenze DL misure e contabilità		
b6	Copmpetenze geologo e indagini	€ 20.964,62		b6	Copmpetenze geologo e indagini		
b7	Pubblicità di gara	€ 5.000,00		b7	Pubblicità di gara		
b8	Contributo AVCP	€ 225,00		b8	Contributo AVCP		
b9	Spese per espropriazioni	€ 26.277,50		b9	Spese per espropriazioni		
b10	Imprevisti	€ 32.172,78		b10	Imprevisti		
	totale	**€ 505.354,78**			**Totale**		

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Marco Mancuso (UTC)	Decreto di nomina	D.C. n. 226 del 17.05.2012	Supporto al RUP	Ing. Alberto Poligra	Decreto di nomina	D.C. n. 226 del 17.05.2012
				Progettista	Comune Ing. Angelo Ermes Di Dio	Determina di nomina	Determina giunta comunale n. 98 del 22/02/2011
Coord Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina		Geologo	Comune Geol. Fabio Nicita	Determina di nomina	Determina giunta comunale n. 105 del 22/02/2011
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina					
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	EDIL SICULA soc coop

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del verbale di inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Penale Giornaliera	
n. gg Termine Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		totale gg previsti		giorni impiegati in gara	giorni risparmiati in gara

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre soglia	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma vigilato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3888 art.1

REGIONE SICILIANA

ME 092	Mistretta	*Regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord-ovest dell'abitato di Mistretta – Torrente Santa Domenica*

CUP	I81I12000270001	CIG	47106138D0

Decreto finanziamento	Decreto n. 586 del 7/11/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 626 del 20/11/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 710 del 18/12/2012	Sottoscrizione Contratto	-	Registrazione Contratto	-	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	-

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 778.679,50	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			
a1	importo dei lavori		€ 485.592,88	a1			
b1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso		€ 12.870,27	b1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso		
b2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		€ 4.880,00	b2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		
	Totale Oneri di Sicurezza		€ 17.750,27		Totale Oneri di Sicurezza		€ 17.750,27
A1	importo dei lavori da appaltare		€ 490.472,88	A1	importo del contratto al netto del ribasso	29,7512%	€ 332.081,96
A2	Importo dei lavori a base di gara		€ 472.722,61	A2	Importo contratto		€ 349.832,23
	Somma a disposizione di cui:	€ 288.206,61			Somma a disposizione di cui:	€ 0,00	
c1	IVA sui lavori		€ 102.999,30	c1	IVA sui lavori		
c2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D.Lgs 163/2006 (cooprogettazione)		€ 2.136,61	c2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D.Lgs 163/2006 (cooprogettazione)		
c3	Competenze tecniche progettazione geotecnica e coord sic progettazione		€ 18.398,86	c3	Competenze tecniche progettazione geotecnica e coord sic progettazione		
c4	Per competenze tecniche DL , misure e contabilità coord sic ececuzione e competenze geotecniche esec		€ 66.549,48	c4	Per competenze tecniche DL , misure e contabilità coord sic ececuzione e competenze geotecniche esec		
c5	Collaudo statico		€ 6.097,40	c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti		€ 46.950,56	c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche		€ 0,00	c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica		€ 8.032,90	c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)		€ 5.000,00	c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP		€ 2.427,96	c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP		€ 1.363,54	c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP		€ 0,00	c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica		€ 9.000,00	c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi		€ 9.000,00	c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara		€ 10.000,00	c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP		€ 250,00	c16	Contributo AVCP		
	totale		€ 778.679,50		totale		€ 699.664,46

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Rosario Mazzurco (UTC)	Decreto di nomina	Decreto n.326 del 16.11.2011	Supporto al RUP	Arch. Di Magro	Decreto di nomina	Decreto n.326 del 16.11.2011
				Progettista	Geom. Lucio Pani (UTC)	Incarico conferito tramite	nota prot.n. 746 del 07.03.2012
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezze fase Progett.	Ing. Sebastiano Azzolina	Incarico conferito tramite	Determina Dirigenziale n. 313 del 04.05.2012	Coord Sicurezza fase Esecutiva		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	GEODESIA s.r.l.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del verbale di inizio dei lavori		Giorni tra consegna e inizio dei lavori		Ritardi Riscontrati	
n. gg Contrattuali		n. gg Contrattuali Prorogati		totale gg permessi		giorni impiegati in più	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre 5uo	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ME 099	Piraino	*Opere di consolidamento – Zona Roda - S.Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole - SAN LEONARDO*

CUP	J69H11000400001	CIG	4731070A76

Decreto finanziamento	Decreto n. 493 del 25/09/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 660 del 1/12/2012	Decreto agg.ud.cazione definitivo		Sottoscrizione Contratto	-	Registrazione Contratto	-	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	-

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 668.652,86	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			
a1	importo a base d'asta		€ 501.706,86	a1	importo del contratto al netto del ribasso		€ 501.706,86
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.016,54	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.016,54
	Somma a disposizione di cui:	€ 157.929,46			Somma a disposizione di cui:	€ 510.723,40	
b1	IVA sui lavori		€ 107.251,91	b1	IVA sui lavori		
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006		€ 10.214,47	b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006		
b3	Collaudo statico compresi IVA e oneri		€ 2.201,91	b3	Collaudo statico compresi IVA e oneri		
b4	Indagini geognostiche		€ 0,00	b4	Indagini geognostiche		
b5	Indagini geognostiche integrative		€ 0,00	b5	Indagini geognostiche integrative		
b6	Rimborso oneri trasferte e spese DL DPR 207/2010		€ 5.107,23	b6	Rimborso oneri trasferte e spese DL DPR 207/2010		
b7	Spese per pubblicazione bando e procedure urbanistiche		€ 7.242,77	b7	Spese per pubblicazione bando e procedure urbanistiche		
b8	Contributo AVCP		€ 375,00	b8	Contributo AVCP		
b9	Oneri per frazionamenti		€ 0,00	b9	Oneri per frazionamenti		
b10	Imprevisti		€ 25.536,17	b10	Imprevisti		
	totale		€ 668.652,86		Totale		€ 510.723,40

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Carmelo Leone (UTC)	Decreto di nomina	Decreto n. 89 del 14 giugno 2011	Supporto al RUP	Ing. Adriano Grassi (IAP) INVITALIA	Decreto di nomina	Decreto n. 26 del 23 gennaio 2012
				Progettista	Ing. Calogero, Morganti, Peligra e Geol. Sabatini	Incarico conferito tramite:	Nota in entrata prot.n. 646 del 09.05.2011
Coord Sicurezza fase Progett.	INVITALIA Ing. Calogero, Morganti, Peligra e Geol. Sabatini	Incarico conferito tramite:	Nota in entrata prot.n. 646 del 09.05.2011	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	GARA IN CORSO

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data Ariz.Consegna		Data del verbale di inizio lavori		Scade tra tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		Totale gg previsti		giorni impiegati in gg	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE


Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo altre Iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

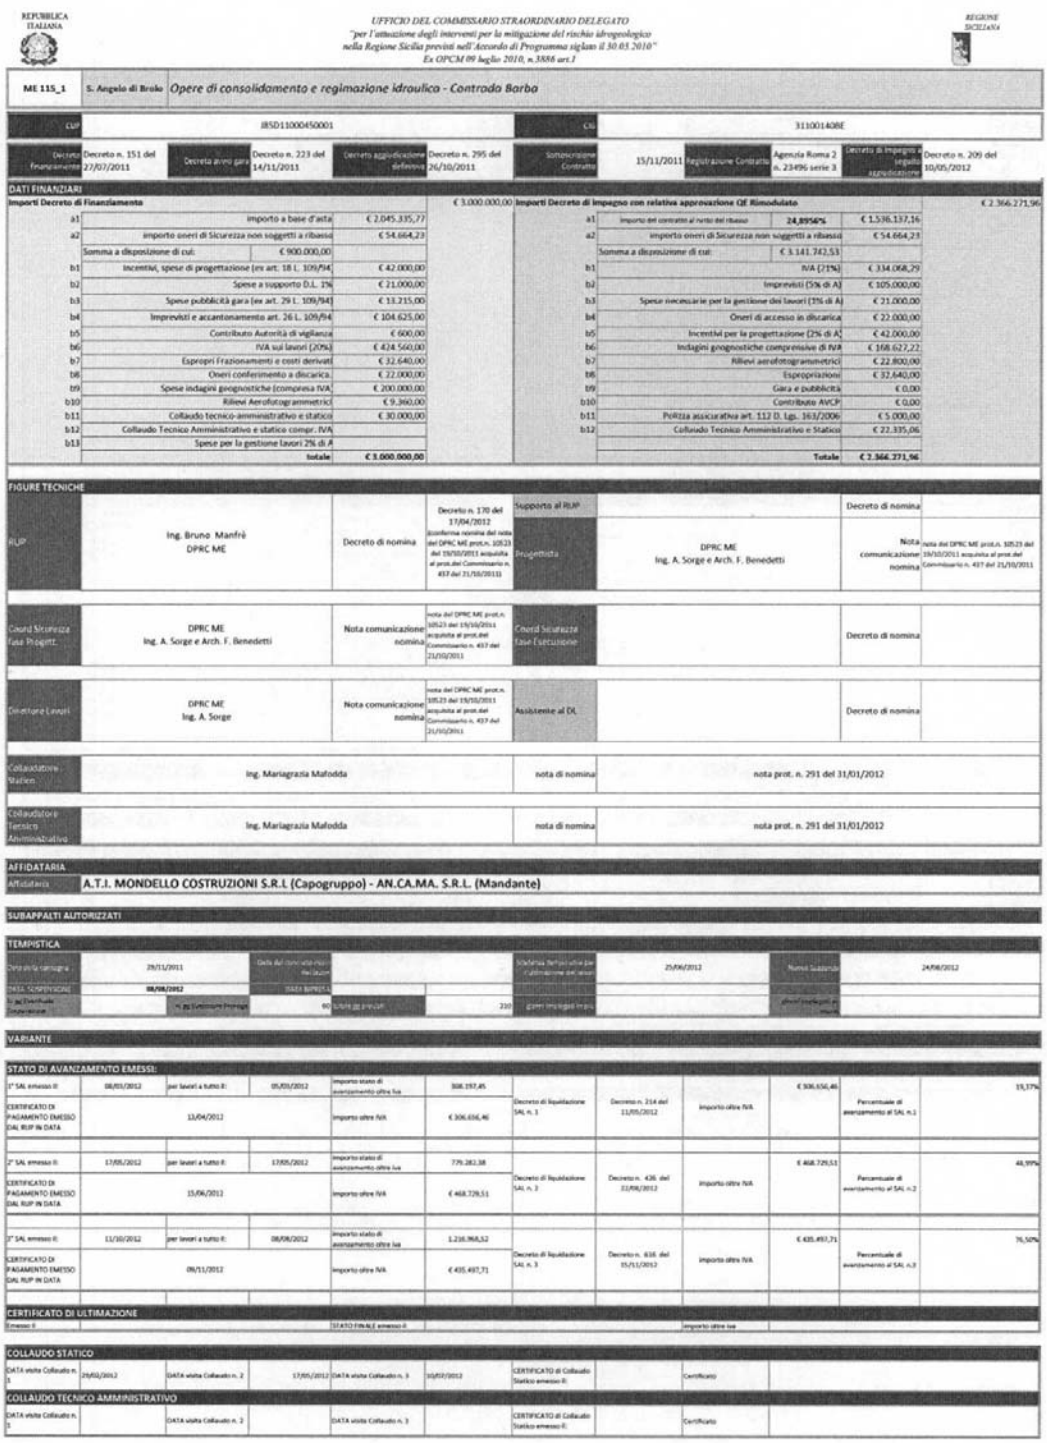

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.05.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ME 115_1	S. Angelo di Brolo	*Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba*

CUP	I85D11000450001			CIG	3110014D8E				
Decreto finanziamento	Decreto n. 151 del 27/07/2011	Decreta aveni gara	Decreto n. 223 del 14/11/2011	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 295 del 26/10/2011	Sottoscrizione Contratto	15/11/2011	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 23496 serie 3
Decreto di impegno e vistato per registrazione	Decreto n. 209 del 10/05/2012								

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento € 3.000.000,00

a1	importo a base d'asta	€ 2.045.335,77	
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 54.664,23	
	Somma a disposizione di cui:	€ 900.000,00	
b1	Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L. 109/94	€ 42.000,00	
b2	Spese a supporto D.L. 1%	€ 21.000,00	
b3	Spese pubblicità gara (ex art. 29 L. 109/94)	€ 13.215,00	
b4	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94	€ 104.625,00	
b5	Contributo Autorità di vigilanza	€ 600,00	
b6	IVA sui lavori (20%)	€ 424.560,00	
b7	Espropri Frazionamenti e costi derivati	€ 32.640,00	
b8	Oneri conferimento a discarica	€ 22.000,00	
b9	Spese indagini geognostiche (compresa IVA)	€ 200.000,00	
b10	Rilievi Aerofotogrammetrici	€ 9.360,00	
b11	Collaudo tecnico-amministrativo e statico	€ 30.000,00	
b12	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA		
b13	Spese per la gestione lavori 2% di A		
	totale	€ 3.000.000,00	

Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato € 2.366.271,96

a1	importo del contratto al netto del ribasso	24,8956%	€ 1.536.137,16	
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 54.664,23	
	Somma a disposizione di cui:	€ 3.141.742,53		
b1	IVA (21%)		€ 334.068,29	
b2	Imprevisti (5% di A)		€ 105.000,00	
b3	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)		€ 21.000,00	
b4	Oneri di accesso in discarica		€ 22.000,00	
b5	Incentivi per la progettazione (2% di A)		€ 42.000,00	
b6	Indagini geognostiche comprensive di IVA		€ 168.627,22	
b7	Rilievi aerofotogrammetrici		€ 22.800,00	
b8	Espropriazioni		€ 32.640,00	
b9	Gara e pubblicità		€ 0,00	
b10	Contributo AVCP		€ 0,00	
b11	Polizza assicurativa art. 112 D. Lgs. 163/2006		€ 5.000,00	
b12	Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico		€ 22.335,06	
	Totale		€ 2.366.271,96	

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Bruno Manfrè DPRC ME	Decreto di nomina	Decreto n. 170 del 17/04/2012 (conferma nomina del nota del DPRC ME prot.n. 10523 del 19/10/2011 acquisita al prot.del Commissario n. 437 del 21/10/2011)	Supporto al RUP		Decreto di nomina	
				Progettista	DPRC ME Ing. A. Sorge e Arch. F. Benedetti	Nota comunicazione nomina	nota del DPRC ME prot.n. 10523 del 19/10/2011 acquisita al prot.del Commissario n. 437 del 21/10/2011
Coord Sicurezza fase Progett.	DPRC ME Ing. A. Sorge e Arch. F. Benedetti	Nota comunicazione nomina	nota del DPRC ME prot.n. 10523 del 19/10/2011 acquisita al prot.del Commissario n. 437 del 21/10/2011	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	DPRC ME Ing. A. Sorge	Nota comunicazione nomina	nota del DPRC ME prot.n. 10523 del 19/10/2011 acquisita al prot.del Commissario n. 437 del 21/10/2011	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico	Ing. Mariagrazia Mafodda			nota di nomina	nota prot. n. 291 del 31/01/2012		
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Ing. Mariagrazia Mafodda			nota di nomina	nota prot. n. 291 del 31/01/2012		

AFFIDATARIA

Affidataria	A.T.I. MONDELLO COSTRUZIONI S.R.l. (Capogruppo) - AN.CA.MA. S.R.L. (Mandante)

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	29/11/2011	Data del concreto inizio dei lavori			Scadenza Termine utile per l'ultimazione dei lavori	25/06/2012	Nuova Scadenza	24/08/2012	
DATA SOSPENSIONE	08/08/2012	DATA RIPRESA							
N. gg Eventuale Proroga		60	GIORNI previsti	210	giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno		

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	08/03/2012	per lavori a tutto il:	05/03/2012	Importo stato di avanzamento oltre Iva	308.197,45					
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	13/04/2012			Importo oltre IVA	€ 306.656,46	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 214 del 11/05/2012	Importo oltre IVA	€ 306.656,46	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	19,37%
2° SAL emesso il:	17/05/2012	per lavori a tutto il:	17/05/2012	Importo stato di avanzamento oltre Iva	779.282,38					
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	15/06/2012			Importo oltre IVA	€ 468.729,51	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 426 del 31/08/2012	Importo oltre IVA	€ 468.729,51	Percentuale di avanzamento al SAL n.2	48,99%
3° SAL emesso il:	11/10/2012	per lavori a tutto il:	08/08/2012	Importo stato di avanzamento oltre Iva	1.216.968,52					
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	09/11/2012			Importo oltre IVA	€ 435.497,71	Decreto di liquidazione SAL n. 3	Decreto n. 616 del 05/11/2012	Importo oltre IVA	€ 435.497,71	Percentuale di avanzamento al SAL n.3	76,50%

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE


Emesso il	STATO FINALE emesso il		Importo oltre Iva

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1	29/02/2012	DATA visita Collaudo n. 2	17/05/2012	DATA visita Collaudo n. 3	10/07/2012	CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato

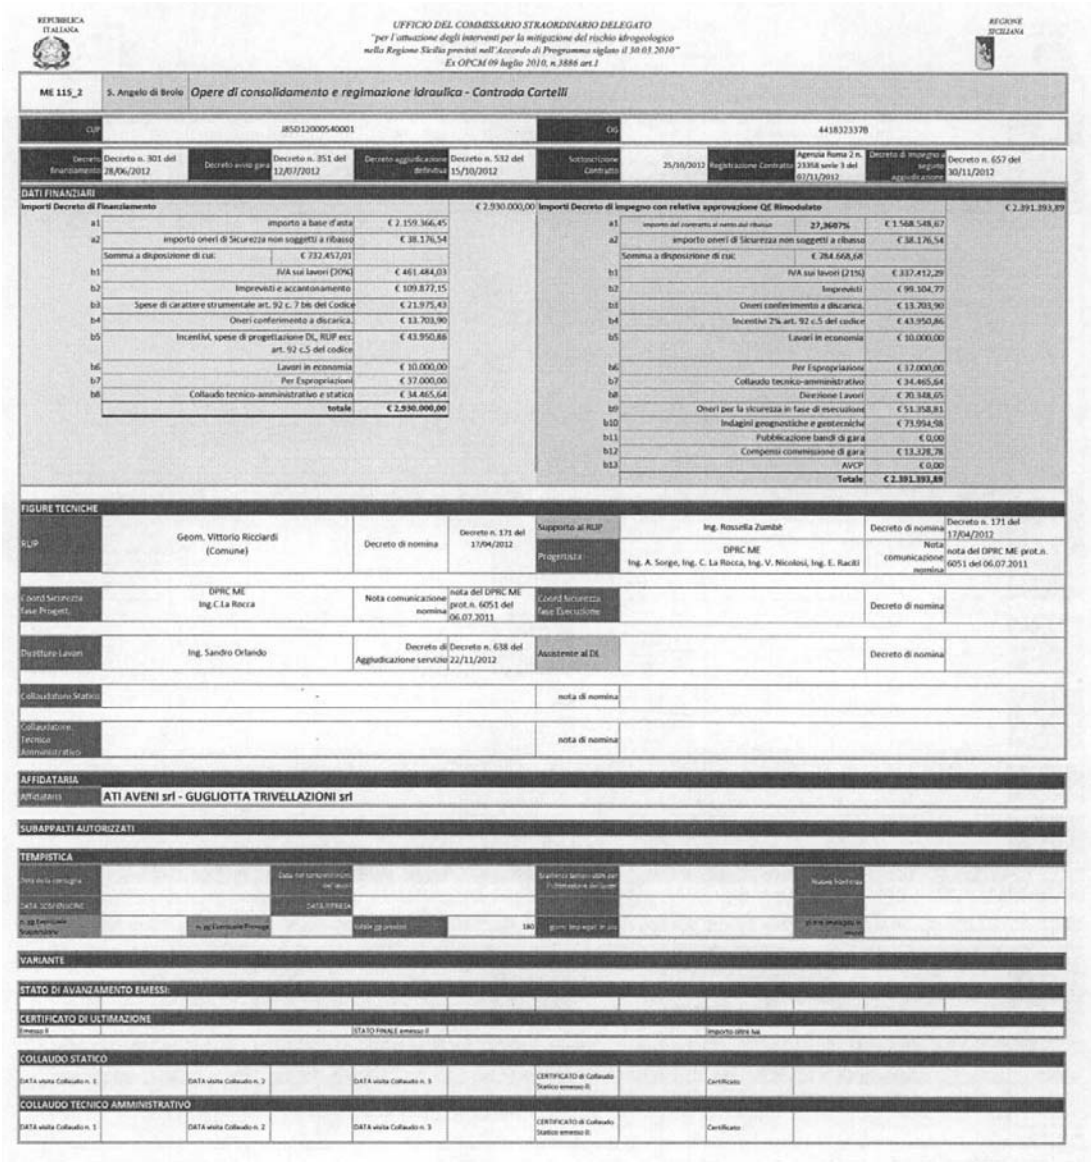

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ME 115_2	S. Angelo di Brolo	*Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cortelli*

CUP	J85D12000540001	CIG	4418323378

Decreto finanziamento	Decreto n. 301 del 28/06/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 351 del 12/07/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 532 del 15/10/2012	Sottoscrizione Contratto	25/10/2012	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 23358 serie 3 del 07/11/2012	Decreto di impegno e seguito Aggiudicazione	Decreto n. 657 del 30/11/2012

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento € 2.930.000,00

a1	importo a base d'asta		€ 2.159.366,45
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 38.176,54
	Somma a disposizione di cui:	€ 732.457,01	
b1	IVA sui lavori (20%)		€ 461.484,03
b2	Imprevisti e accantonamento		€ 109.872,15
b3	Spese di carattere strumentale art. 92 c. 7 bis del Codice		€ 21.975,43
b4	Oneri conferimento a discarica		€ 13.703,90
b5	Incentivi, spese di progettazione DL, RUP ecc art. 92 c.5 del codice		€ 43.950,86
b6	Lavori in economia		€ 10.000,00
b7	Per Espropriazioni		€ 37.000,00
b8	Collaudo tecnico-amministrativo e statico		€ 34.465,64
	totale		**€ 2.930.000,00**

Importi Decreto di impegno con relative approvazione QE Rimodulato € 2.391.393,89

a1	importo del contratto al netto del ribasso	27,3607%	€ 1.568.548,67
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 38.176,54
	Somma a disposizione di cui:	€ 284.668,68	
b1	IVA sui lavori (21%)		€ 337.412,29
b2	Imprevisti		€ 99.104,77
b3	Oneri conferimento a discarica		€ 13.703,90
b4	Incentivi 2% art. 92 c.5 del codice		€ 43.950,86
b5	Lavori in economia		€ 10.000,00
b6	Per Espropriazioni		€ 17.000,00
b7	Collaudo tecnico-amministrativo		€ 34.465,64
b8	Direzione Lavori		€ 20.348,65
b9	Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione		€ 51.358,81
b10	Indagini geognostiche e geotecniche		€ 73.994,98
b11	Pubblicazione bandi di gara		€ 0,00
b12	Compensi commissione di gara		€ 13.328,78
b13	AVCP		€ 0,00
	Totale		**€ 2.391.393,89**

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Vittorio Ricciardi (Comune)	Decreto di nomina	Decreto n. 171 del 17/04/2012	Supporto al RUP	Ing. Rossella Zumbè	Decreto di nomina	Decreto n. 171 del 17/04/2012
				Progettista	DPRC ME Ing. A. Sorge, Ing. C. La Rocca, Ing. V. Nicolosi, Ing. E. Raciti	Nota comunicazione nomina	nota del DPRC ME prot.n. 6051 del 06.07.2011
Coord Sicurezza fase Progett.	DPRC ME Ing.C.La Rocca	Nota comunicazione nomina	nota del DPRC ME prot.n. 6051 del 06.07.2011	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Ing. Sandro Orlando	Decreto di Aggiudicazione servizio	Decreto n. 638 del 22/11/2012	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				nota di nomina			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				nota di nomina			

AFFIDATARIA

Affidataria	ATI AVENI srl - GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI srl

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del consegna lavori		Giorni lavori utili per l'ottenimento del ribasso		Numero Varianti			
DATA ULTIMAZIONE		DATA FINALE							
n. gg Eventuale Proroga			totale gg previsti	180	giorni lavorativi in più		giorni sospesi in più		

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre 5/6	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

EN 175	Barrafranca	*"Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca 1° Stralcio Funzionale".*

CUP	I25C11002140001	CIG	37002452C5

Decreto finanziamento	Decreto n. 352 del 01/12/2011	Decreto avvio gara	Decreto n. 377 del 14/12/2011	Decreto aggiudicazione definitivo	Decreto n. 10 del 16/01/2012	Sottoscrizione Contratto	26/01/2012	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 2497 serie 3 il 01/02/2012	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	Decreto n. 245 del 28/05/2012

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 1.500.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			€ 1.210.270,93
a1	Importo a base d'asta		€ 1.074.384,05	a1	importo del contratto al netto del ribasso	24,8434%	€ 807.416,80
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.615,98	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.615,98
	Somma a disposizione di cui:	€ 419.999,84			Somma a disposizione di cui:	€ 397.238,15	
b1	IVA 21% sui lavori		€ 226.800,00	b1	IVA 21% sui lavori		€ 170.736,88
b2	Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006		€ 13.342,40	b2	Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006		€ 13.342,40
b3	Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contab.comprese IVA ed oneri		€ 81.051,12	b3	Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contab.comprese IVA ed oneri		€ 68.148,14
b4	Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri		€ 16.030,00	b4	geologo indagini geognostiche eanalisi comprese IVA ed oneri		€ 16.030,00
b5	Competenze coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione comprese IVA ed oneri		€ 31.754,51	b5	e per la sicurezza in fase diesecuzione comprese IVA ed oneri		€ 11.077,45
b6	Competenze collaudo statico comprese IVA ed oneri		€ 12.451,59	b6	Competenze collaudo statico comprese IVA ed oneri		€ 6.000,00
b7	Competenze collaudo tecnico-amministrativo comprese IVA ed oneri		€ 2.704,49	b7	tenze collaudo tecnico-amministrativo compreseIVA ed oneri		€ 5.000,00
b8	Pubblicità gara		€ 6.000,00	b8	Pubblicità gara		€ 5.000,00
b9	Accantonamento art. 133 comma 3 e 4 del codice		€ 2.000,00	b9	Accantonamento art. 133 comma 3 e 4 del codice		€ 5.000,00
b10	Rimborso spese sopralluogo archeologo		€ 1.500,00	b10	Rimborso spese sopralluogo archeologo		€ 15.000,00
b11	Allacciamenti		€ 1.000,00	b11	Allacciamenti		€ 600,00
b12	Oneri conferimento a discarica		€ 4.000,00	b12	Oneri conferimento a discarica		€ 81.303,28
b13	Contributo Autorità di Vigilanza		€ 600,00	Contributo Autorità di Vigilanza			
b14	Imprevisti		€ 20.765,73		Imprevisti		
	totale		€ 1.500.000,00		Totale		€ 1.210.270,93

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Francesco Costa	Decreto di nomina	Decreto n. 335 del 28/11/2011	Supporto al RUP	Geom. Piero Nicolicchia Geom. Giuseppe Ferrante	Decreto di nomina	Decreto n. 31 del 23/01/2012
				Progettista	Arch. Salvatore La Terra	Determina Sindacale di nomina	Determina n. 4 del 29/01/2010
Coord Sicurezza Fase Progett.	Arch. Salvatore La Terra	Determina Sindacale di nomina	Determina n. 4 del 29/01/2010	Geologo supporto alla progettazione	Dott. Geol. Pallilo Salvatore	Determina Sindacale di nomina	Determina n. 7 del 01/02/2010
Direttore Lavori	Arch. La Terra Salvatore	Decreto di nomina	Decreto n. 45 del 01/02/2012	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Arch. La Terra Salvatore	Decreto di nomina	Decreto n. 45 del 01/02/2012

Collaudatore Statico	ING. Clemente Francesco	Nota di nomina	NOTA PROT. 1341/UC DEL 20 aprile 2012
		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

Collaudatore Tecnico Amministrativo	ING. Clemente Francesco	Nota di nomina	NOTA PROT. 1341/UC DEL 20 aprile 2012
		Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 718 del 14/05/2012

AFFIDATARIA

Affidataria: SOCIETA' LAVORI PUBBLICI s.r.l.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data del verbale di consegna	23/01/2012	Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	15/03/2013	Nuova Scadenza	
DATA SOSPENSIONE	22/05/2012	DATA RIPRESA				Nuovo periodo	
n. gg Effettivi Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		totale gg previsti	357	giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre 5/6	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ME 049	Alcara Li Fusi	*Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque -C.da Cappuccini. Comune di Alcara Li Fusi*

CUP	I22D11000170001	CIG	3741508612

Decreto finanziamento	Decreto n. 392 del 20/12/2011	Decreto avvio gara	Decreto n. 395 del 21/12/2011	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 18 del 18/01/2012	Sottoscrizione Contratto	01/03/2012	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 3314 serie 3 il 07/03/2012	Decreto di impegno e seguito approvazione	Decreto n. 366 del 17/07/2012

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 834.921,87
a1	importo a base d'asta		€ 583.522,82
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 23.706,54
	Somma a disposizione di cui:	€ 227.692,51	
b1	IVA sui lavori al 21%		€ 127.518,17
b2	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma D.Lgs 163/2006)		€ 12.144,59
b3	Competenza collaudo statico compresa IVA oneri		€ 6.135,88
b4	Competenza collaudo tecn-amm. compresa IVA oneri		€ 2.295,93
b5	Indagini preliminari geognostiche compreso IVA		€ 0,00
b6	Prove di laboratorio compreso IVA		€ 0,00
b7	Indennità Occup. costituzione servitù		€ 6.000,00
b8	Pubblicità Gara		€ 8.500,00
b9	Contributo Autorità di vigilanza		€ 375,00
b10	Imprevisti [art. 42, comma b) D.P.R. 207/2010]		€ 60.732,94
b11	Prove di laboratorio in corso d'opera		€ 4.000,00
	totale		**€ 834.921,87**

Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			€ 677.774,45
a1	importo del contratto al netto del ribasso	24,7923%	€ 438.854,09
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 23.706,54
	Somma a disposizione di cui:	€ 215.213,82	
b1	IVA sui lavori al 21%		€ 97.137,73
b2	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma D.Lgs 163/2006)		€ 12.144,59
b3	Competenza collaudo statico compresa IVA oneri		€ 6.135,88
b4	Competenza collaudo tecn-amm. compresa IVA oneri		€ 2.295,93
b5	Indagini preliminari geognostiche compreso IVA		€ 13.679,24
b6	Prove di laboratorio compreso IVA		€ 3.076,62
b7	Indennità Occup. costituzione servitù		€ 6.000,00
b8	Pubblicità Gara		€ 1.448,60
b9	Contributo Autorità di vigilanza		
b10	Imprevisti [art. 42, comma b) D.P.R. 207/2010]		€ 60.732,94
b11	Prove di laboratorio in corso d'opera		€ 6.500,00
b13	Spese Struttura Commissariale		€ 6.072,29
	Totale		**€ 677.774,45**

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Basilio Sanseverino	Decreto di nomina	Decreto n. 77 del 30/05/2011	Supporto al RUP	Geom. Salvatore Bontempo	Decreto di nomina	Decreto n. 77 del 30/05/2011
				Progettista	INVITALIA	Convenzione stipulata il 18/02/2011	Nota incarico progetto prot. n. 253 del 08/03/2011
Coord Sicurezza fase Progett.	INVITALIA	Convenzione stipulata il 18/02/2011	Nota incarico progetto prot. n. 253 del 08/03/2011	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Adriano Grassi	Incarico conferito tramite:	decreto commissariale n. 101 del 13/03/2012
Direttore Lavori	Arch. Fabio Pulizzi	Incarico conferito tramite:	decreto commissariale n. 101 del 13/03/2012	Assistente al DL	Ing. Rossella Zumbè Dott. Geol. Gianluca Sabatini	Incarico conferito tramite:	decreto commissariale n. 101 del 13/03/2012
Collaudatore Statico	ING. Luciano Taranto			Nota di nomina	NOTA PROT. 1405/UC DEL 24 aprile 2012		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo	ING. Luciano Taranto			Nota di nomina	NOTA PROT. 1405/UC DEL 24 aprile 2012		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	SA.MA. S.r.l.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	13/04/2012	Data del subentro in caso di fallimento		Scadenza termini utili per l'ultimazione dei lavori	11/06/2012	Natura Sospensione	14/10/2012
						Prot Data	13/10/2012
n. gg Contrattuali Sospensione	14	n. gg Contrattuali Proroga	50	totale gg previsti	120	giorni impiegati in più	1

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	06/08/2012	per lavori a tutto il:	01/08/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 201.377,73						
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	23/08/2012			importo oltre IVA	€ 200.370,84	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 442 del 05/09/2012	importo oltre IVA	€ 200.370,84	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	43,54%

2° SAL emesso il:	11/10/2012	per lavori a tutto il:	28/09/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 416.623,52						
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	23/10/2012			importo oltre IVA	€ 214.169,56	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 569 del 31/10/2012	importo oltre IVA	€ 214.169,56	Percentuale di avanzamento al SAL n.2	90,07%

3° SAL emesso il:	26/10/2012	per lavori a tutto il:	26/10/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 461.439,19						
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA				importo oltre IVA		Decreto di liquidazione SAL n. 3		importo oltre IVA		Percentuale di avanzamento al SAL n.2	99,76%

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il	19/10/2012	STATO FINALE emesso il		importo oltre iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1	01/08/2012	DATA visita Collaudo n. 2	25/09/2012	DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ME 128	Tortorici	*Muri e barriere paramassi – Zona Batana-Pagliara-S.Leone*

CUP	J15D12000550001	CIG	4736151B6F

Decreto finanziamento	Decreto n. 574 del 06/11/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 645 del 27/11/2012	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	-	Registrazione Contratto	-	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	-

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento				€ 476.038,45	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato				
a1	Importo a base d'asta		€ 322.108,66		a1	importo del contratto al netto del ribasso		€ 322.108,66	
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 19.586,07		a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 19.586,07	
	Somma a disposizione di cui:	€ 134.343,72				Somma a disposizione di cui:	€ 0,00		
b1	Imprevisti < 5%	(di a)	€ 7.193,47		b1	Imprevisti < 5%	(di a)		
b2	Oneri di conferimento a discarica		€ 4.000,00		b2	Oneri di conferimento a discarica			
b3	Indagini geognostiche (IVA compresa) (Finanziato con D.C. n.219 del 9.9.2011)		€ 0,00		b3	Indagini geognostiche (IVA compresa) (Finanziato con D.C. n.219 del 9.9.2011)			
b4	Incentivi ai sensi dell'art. 92, comma 5 d.Lgs. 163/06 (Geologo, RUP e supp. al RUP)		€ 2.912,01		b4	Incentivi ai sensi dell'art. 92, comma 5 d.Lgs. 163/06 (Geologo, RUP e supp. al RUP)			
b5	Spese tecniche (Finanziato con D.C. n.181/2011)				b5	Spese tecniche (Finanziato con D.C. n.181/2011)			
			€ 23.752,57						
			€ 1.030,10						
			€ 5.624,36						
	Totale b.5 (compreso oneri ed iva)		€ 32.407,03			Totale b.5 (compreso oneri ed iva)			
b6	Spese di pubb.ne, bando di gara, esito gara, tassa AVCP		€ 9.354,13		b6	Spese di pubb.ne, bando di gara, esito gara, tassa AVCP			
b7	Collaudo				b7	Collaudo			
			€ 3.420,32						
			€ 0,00						
			€ 216,80						
			€ 1.353,64						
	Totale b.7		€ 6.821,18			Totale b.7			
b8	IVA				b8	IVA			
			€ 71.755,89						
	Totale b.8		€ 71.755,89			Totale b.8			
	totale		€ 476.038,45			Totale		€ 341.694,73	

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Buttafarro Carmelo (UTC)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 145 del 02.04.2012	Supporto al RUP	Ing. Giampiero Di Magro	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 145 del 02.04.2012
				Progettista	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011
Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011
Direttore Lavori	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	GARA IN CORSO

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data dell'ordine di inizio dei lavori		Data dell'ordine di inizio dei lavori		Tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Scadenza	
n. gg Contratto Originario		n. gg Contratto Proroga		totale gg previsti		giorni impiegati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE


Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

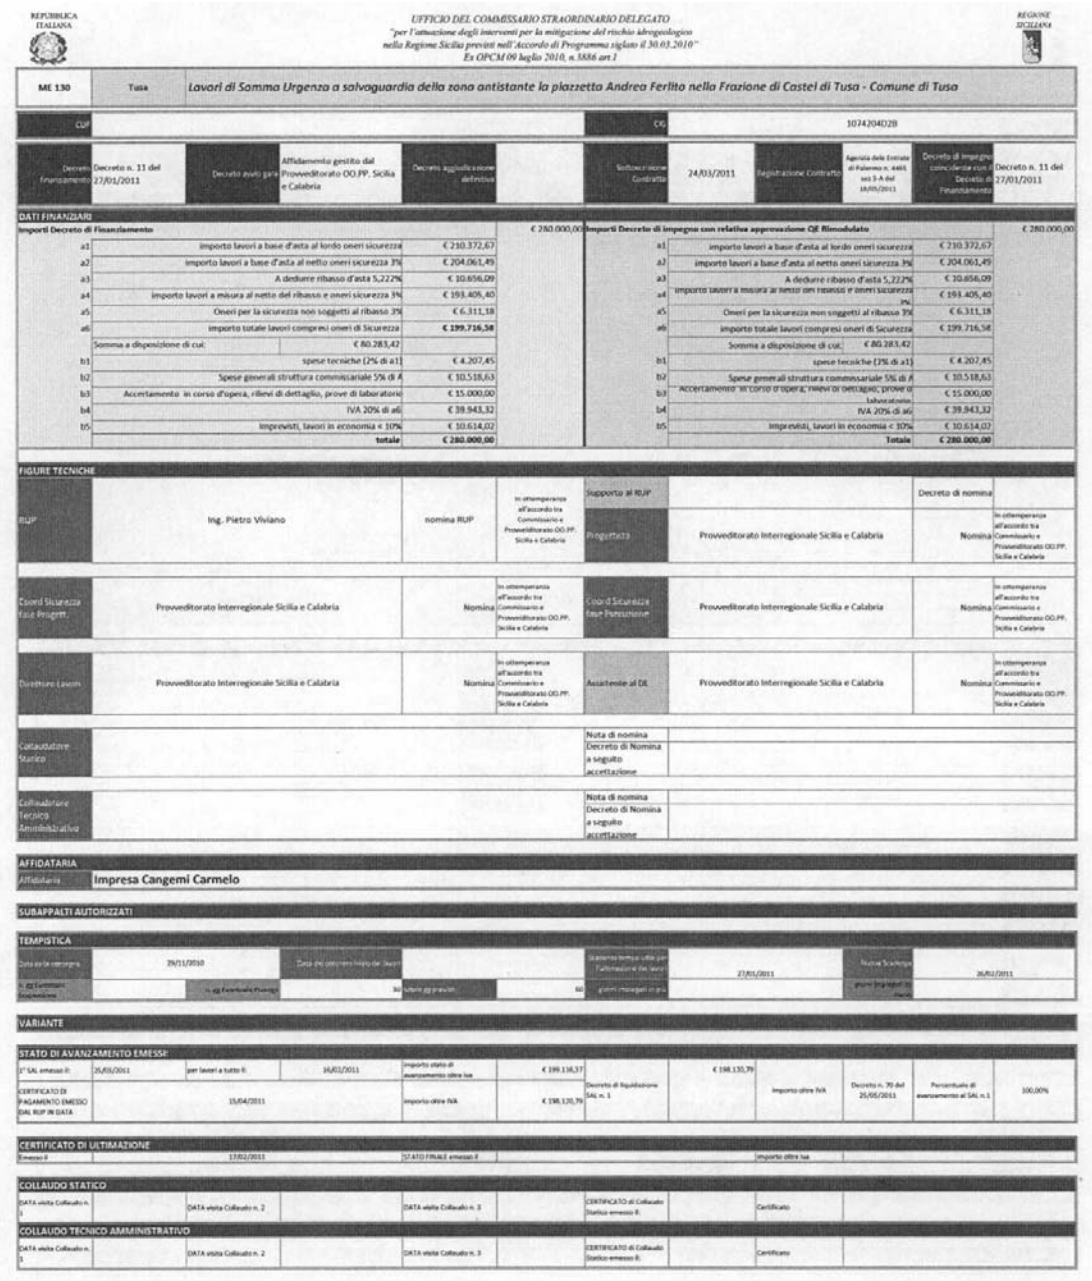

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n. 3886 art 1

REGIONE SICILIANA

ME 130	Tusa	*Lavori di Somma Urgenza a salvaguardia della zona antistante la piazzetta Andrea Ferlito nella Frazione di Castel di Tusa - Comune di Tusa*

CUP		CIG	1074204D2B

Decreto finanziamento	Decreto n. 11 del 27/01/2011	Decreto avvio gara	Affidamento gestito dal Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	24/03/2011	Registrazione Contratto	Agenzia delle Entrate di Palermo n. 4465 serie 3-A del 18/05/2011	Decreto di impegno coincidente con il Decreto di Finanziamento	Decreto n. 11 del 27/01/2011

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento				€ 280.000,00	**Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato**				€ 280.000,00
a1	importo lavori a base d'asta al lordo oneri sicurezza		€ 210.372,67		a1	importo lavori a base d'asta al lordo oneri sicurezza		€ 210.372,67	
a2	importo lavori a base d'asta al netto oneri sicurezza 3%		€ 204.061,49		a2	importo lavori a base d'asta al netto oneri sicurezza 3%		€ 204.061,49	
a3	A dedurre ribasso d'asta 5,222%		€ 10.656,09		a3	A dedurre ribasso d'asta 5,222%		€ 10.656,09	
a4	importo lavori a misura al netto del ribasso e oneri sicurezza 3%		€ 193.405,40		a4	importo lavori a misura al netto del ribasso e oneri sicurezza 3%		€ 193.405,40	
a5	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 3%		€ 6.311,18		a5	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 3%		€ 6.311,18	
a6	importo totale lavori compresi oneri di Sicurezza		**€ 199.716,58**		a6	importo totale lavori compresi oneri di Sicurezza		€ 199.716,58	
	Somma a disposizione di cui:	€ 80.283,42				Somma a disposizione di cui:	€ 80.283,42		
b1	spese tecniche (2% di a1)		€ 4.207,45		b1	spese tecniche (2% di a1)		€ 4.207,45	
b2	Spese generali struttura commissariale 5% di A		€ 10.518,63		b2	Spese generali struttura commissariale 5% di A		€ 10.518,63	
b3	Accertamento in corso d'opera, rilievi di dettaglio, prove di laboratorio		€ 15.000,00		b3	Accertamento in corso d'opera, rilievi di dettaglio, prove di laboratorio		€ 15.000,00	
b4	IVA 20% di a6		€ 39.943,32		b4	IVA 20% di a6		€ 39.943,32	
b5	Imprevisti, lavori in economia < 10%		€ 10.614,02		b5	Imprevisti, lavori in economia < 10%		€ 10.614,02	
	totale		**€ 280.000,00**			**Totale**		**€ 280.000,00**	

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Pietro Viviano	nomina RUP	In ottemperanza all'accordo tra Commissario e Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria	Supporto al RUP		Decreto di nomina	
				Progettista	Provveditorato Interregionale Sicilia e Calabria	Nomina	In ottemperanza all'accordo tra Commissario e Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria
Coord Sicurezza fase Progett.	Provveditorato Interregionale Sicilia e Calabria	Nomina	In ottemperanza all'accordo tra Commissario e Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Provveditorato Interregionale Sicilia e Calabria	Nomina	In ottemperanza all'accordo tra Commissario e Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria
Direttore Lavori	Provveditorato Interregionale Sicilia e Calabria	Nomina	In ottemperanza all'accordo tra Commissario e Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria	Assistente al DL	Provveditorato Interregionale Sicilia e Calabria	Nomina	In ottemperanza all'accordo tra Commissario e Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	**Impresa Cangemi Carmelo**

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data ex lettera ordinaria	29/11/2010	Data dei presunti inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	27/01/2011	Nuova Scadenza	26/02/2011
n. gg Eventuali Sospensioni		n. gg Eventuale Proroga		su	gg naturali	60	giorni impegnati in più

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI

1° SAL emesso il:	26/01/2011	per lavori a tutto il:	16/01/2011	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 199.138,37	Decreto di liquidazione SAL n. 1	€ 198.120,79	Importo oltre IVA	Decreto n. 70 del 25/05/2011	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	100,00%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA		15/04/2011		importo oltre IVA	€ 198.120,79						

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE


Emesso il	17/02/2011	STATO FINALE emesso il		Importo oltre Iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

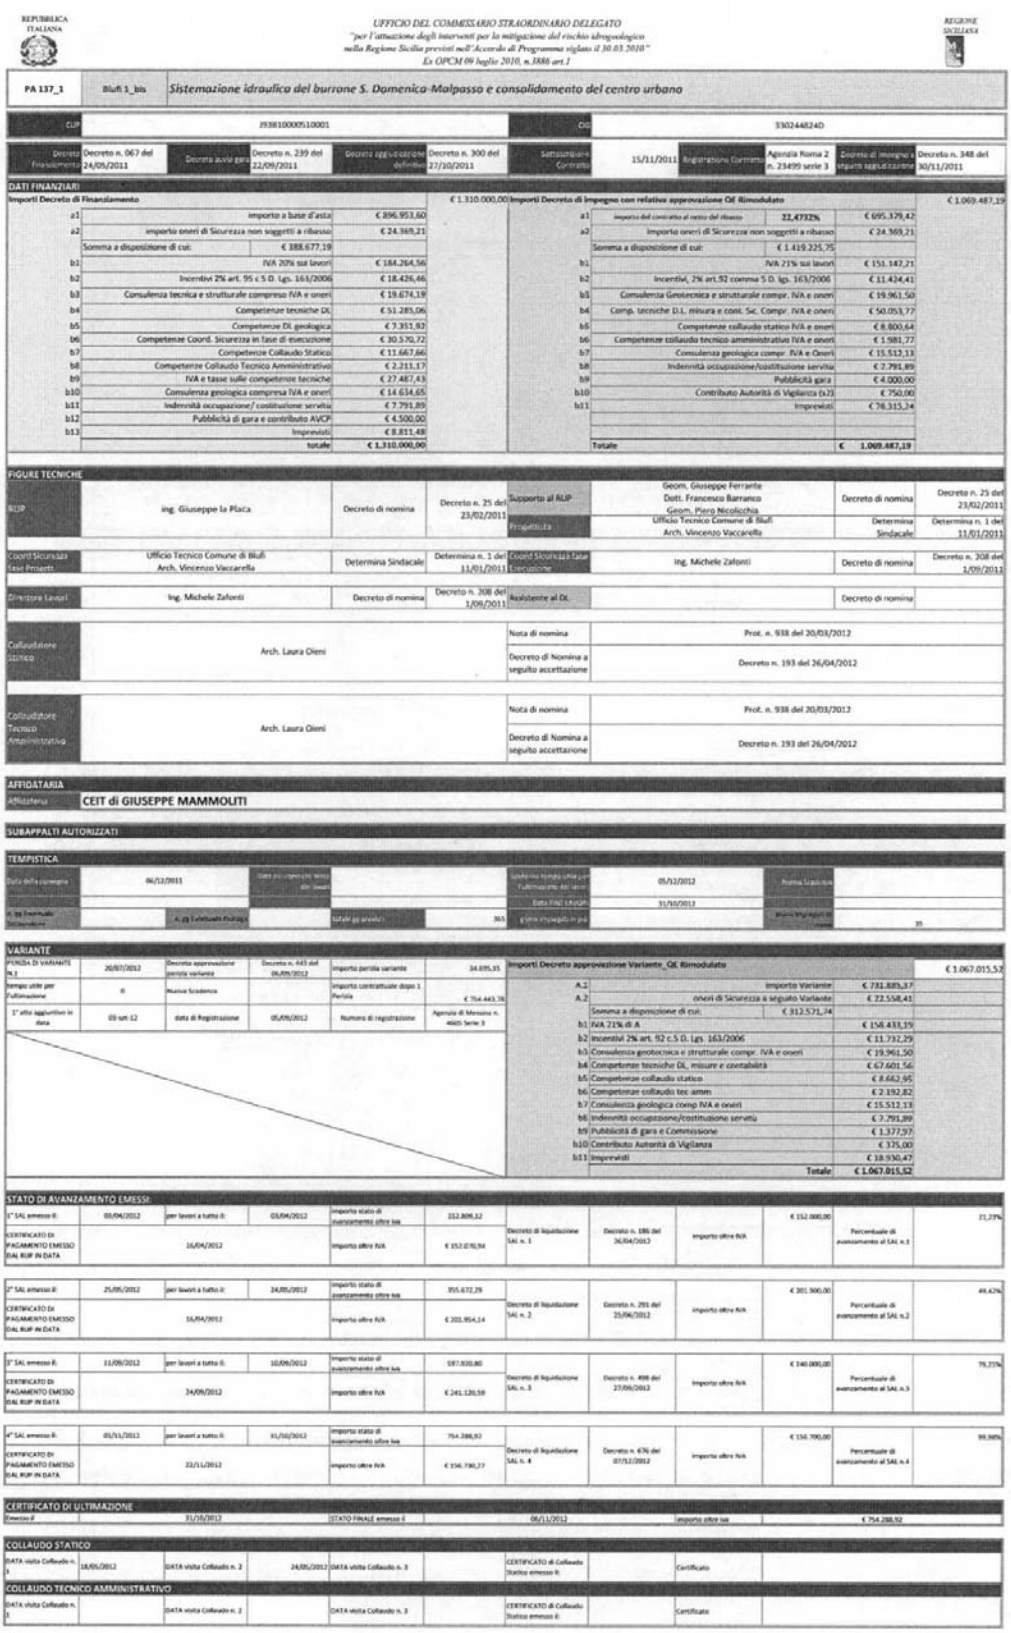

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma vigliato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

PA 137_1	Bluffi 1_bis	*Sistemazione idraulica del burrone S. Domenico-Malpasso e consolidamento del centro urbano*

CUP	J93B10000510001	CIG	3302448240

Decreto finanziamento	Decreto n. 067 del 24/05/2011	Decreto avvio gara	Decreto n. 239 del 22/09/2011	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 300 del 27/10/2011	Sottoscrizione Contratto	15/11/2011	Registrazione Corte dei Conti	Agenzia Roma 2 n. 23499 serie 3	Decreto di impegno e seguito aggiudicazione	Decreto n. 348 del 30/11/2011

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 1.310.000,00
a1	importo a base d'asta		€ 896.953,60
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 24.369,21
	Somma a disposizione di cui:	€ 388.677,19	
b1	IVA 20% sui lavori		€ 184.264,56
b2	Incentivi 2% art. 95 c 5 D. Lgs. 163/2006		€ 18.426,46
b3	Consulenza tecnica e strutturale compreso IVA e oneri		€ 19.674,19
b4	Competenze tecniche DL		€ 51.285,06
b5	Competenze DL geologica		€ 7.351,92
b6	Competenze Coord. Sicurezza in fase di esecuzione		€ 30.570,72
b7	Competenze Collaudo Statico		€ 11.667,66
b8	Competenze Collaudo Tecnico Amministrativo		€ 2.211,17
b9	IVA e tasse sulle competenze tecniche		€ 27.487,43
b10	Consulenza geologica compresa IVA e oneri		€ 14.634,65
b11	Indennità occupazione/ costituzione servitù		€ 7.791,85
b12	Pubblicità di gara e contributo AVCP		€ 4.500,00
b13	Imprevisti		€ 8.811,48
	totale		€ 1.310.000,00

Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato				€ 1.069.487,19
a1	importo del contratto al netto del ribasso	22,4732%		€ 695.379,42
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso			€ 24.369,21
	Somma a disposizione di cui:	€ 1.419.225,75		
b1	IVA 21% sui lavori			€ 151.147,21
b2	Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006			€ 11.424,41
b3	Consulenza Geotecnica e strutturale compr. IVA e oneri			€ 19.961,50
b4	Comp. tecniche D.L. misura e cont. Sic. Compr. IVA e oneri			€ 50.053,77
b5	Competenze collaudo statico IVA e oneri			€ 8.800,64
b6	Competenze collaudo tecnico-amministrativo IVA e oneri			€ 1.981,77
b7	Consulenza geologica compr. IVA e Oneri			€ 15.512,13
b8	Indennità occupazione/costituzione servitù			€ 7.791,89
b9	Pubblicità gara			€ 4.000,00
b10	Contributo Autorità di Vigilanza (x2)			€ 750,00
b11	Imprevisti			€ 78.315,24
	Totale			€ 1.069.487,19

FIGURE TECNICHE

RUP	ing. Giuseppe la Placa	Decreto di nomina	Decreto n. 25 del 23/02/2011	Supporto al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante Dott. Francesco Barranco Geom. Piero Nicolicchia	Decreto di nomina	Decreto n. 25 del 23/02/2011
				Progettista	Ufficio Tecnico Comune di Bluffi Arch. Vincenzo Vaccarella	Determina Sindacale	Determina n. 1 del 11/01/2011
Coord Sicurezza Fase Prosetti	Ufficio Tecnico Comune di Bluffi Arch. Vincenzo Vaccarella	Determina Sindacale	Determina n. 1 del 11/01/2011	Coord Sicurezza Fase Esecuzione	ing. Michele Zafonti	Decreto di nomina	Decreto n. 208 del 1/09/2011
Direttore Lavori	Ing. Michele Zafonti	Decreto di nomina	Decreto n. 208 del 1/09/2011	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico	Arch. Laura Oieni			Nota di nomina	Prot. n. 938 del 20/03/2012		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 193 del 26/04/2012		
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Arch. Laura Oieni			Nota di nomina	Prot. n. 938 del 20/03/2012		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 193 del 26/04/2012		

AFFIDATARIA

Affidatario	CEIT di GIUSEPPE MAMMOLITI

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	06/12/2011	Data presunta fine lavori da verbali		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	05/11/2012	Proroga Scadenza	
				Data FINE LAVORI	31/10/2012		
n. gg (normale)		n. gg Eventuali Proroghe		totale gg previsti	365	giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno	35

VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE N.1	20/07/2012	Decreto approvazione perizia variante	Decreto n. 443 del 06/09/2012	importo perizia variante	34.695,35
tempo utile per l'ultimazione	0	Nuova Scadenza		importo contrattuale dopo 1 Perizia	€ 764.443,76
1° atto aggiuntivo in data	03-set-12	data di Registrazione	05/09/2012	Numero di registrazione	Agenzia di Messina n. 4665 Serie 3

Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato				€ 1.067.015,52
A.1	importo Variante			€ 731.885,37
A.2	oneri di Sicurezza a seguito Variante			€ 22.558,41
	Somma a disposizione di cui:	€ 312.571,74		
b1	IVA 21% di A			€ 158.433,19
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D. Lgs. 163/2006			€ 11.732,29
b3	Consulenza geotecnica e strutturale compr. IVA e oneri			€ 19.961,50
b4	Competenze tecniche DL, misure e contabilità			€ 67.601,56
b5	Competenze collaudo statico			€ 8.662,95
b6	Competenze collaudo tec amm			€ 2.192,82
b7	Consulenza geologica comp IVA e oneri			€ 15.512,13
b8	Indennità occupazione/costituzione servitù			€ 7.791,89
b9	Pubblicità di gara e Commissione			€ 1.377,97
b10	Contributo Autorità di Vigilanza			€ 375,00
b11	Imprevisti			€ 18.930,47
			Totale	€ 1.067.015,52

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	03/04/2012	per lavori a tutto il:	03/04/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	152.809,12						
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	16/04/2012			importo oltre IVA	€ 152.070,94	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 186 del 26/04/2013	importo oltre IVA	€ 152.000,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	21,27%
2° SAL emesso il:	25/05/2012	per lavori a tutto il:	24/05/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	355.672,29						
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	16/04/2012			importo oltre IVA	€ 201.954,14	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 291 del 25/06/2012	importo oltre IVA	€ 201.900,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.2	49,42%
3° SAL emesso il:	11/09/2012	per lavori a tutto il:	10/09/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	597.830,80						
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	24/09/2012			importo oltre IVA	€ 241.120,59	Decreto di liquidazione SAL n. 3	Decreto n. 408 del 27/09/2012	importo oltre IVA	€ 140.000,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.3	79,25%
4° SAL emesso il:	01/11/2012	per lavori a tutto il:	31/10/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	754.288,92						
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	22/11/2012			importo oltre IVA	€ 156.730,27	Decreto di liquidazione SAL n. 4	Decreto n. 476 del 07/12/2012	importo oltre IVA	€ 156.790,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.4	99,96%

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE


Emesso il	31/10/2012	STATO FINALE emesso il	06/11/2012	importo oltre iva	€ 754.288,92

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1	18/05/2012	DATA visita Collaudo n. 2	24/05/2012	DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

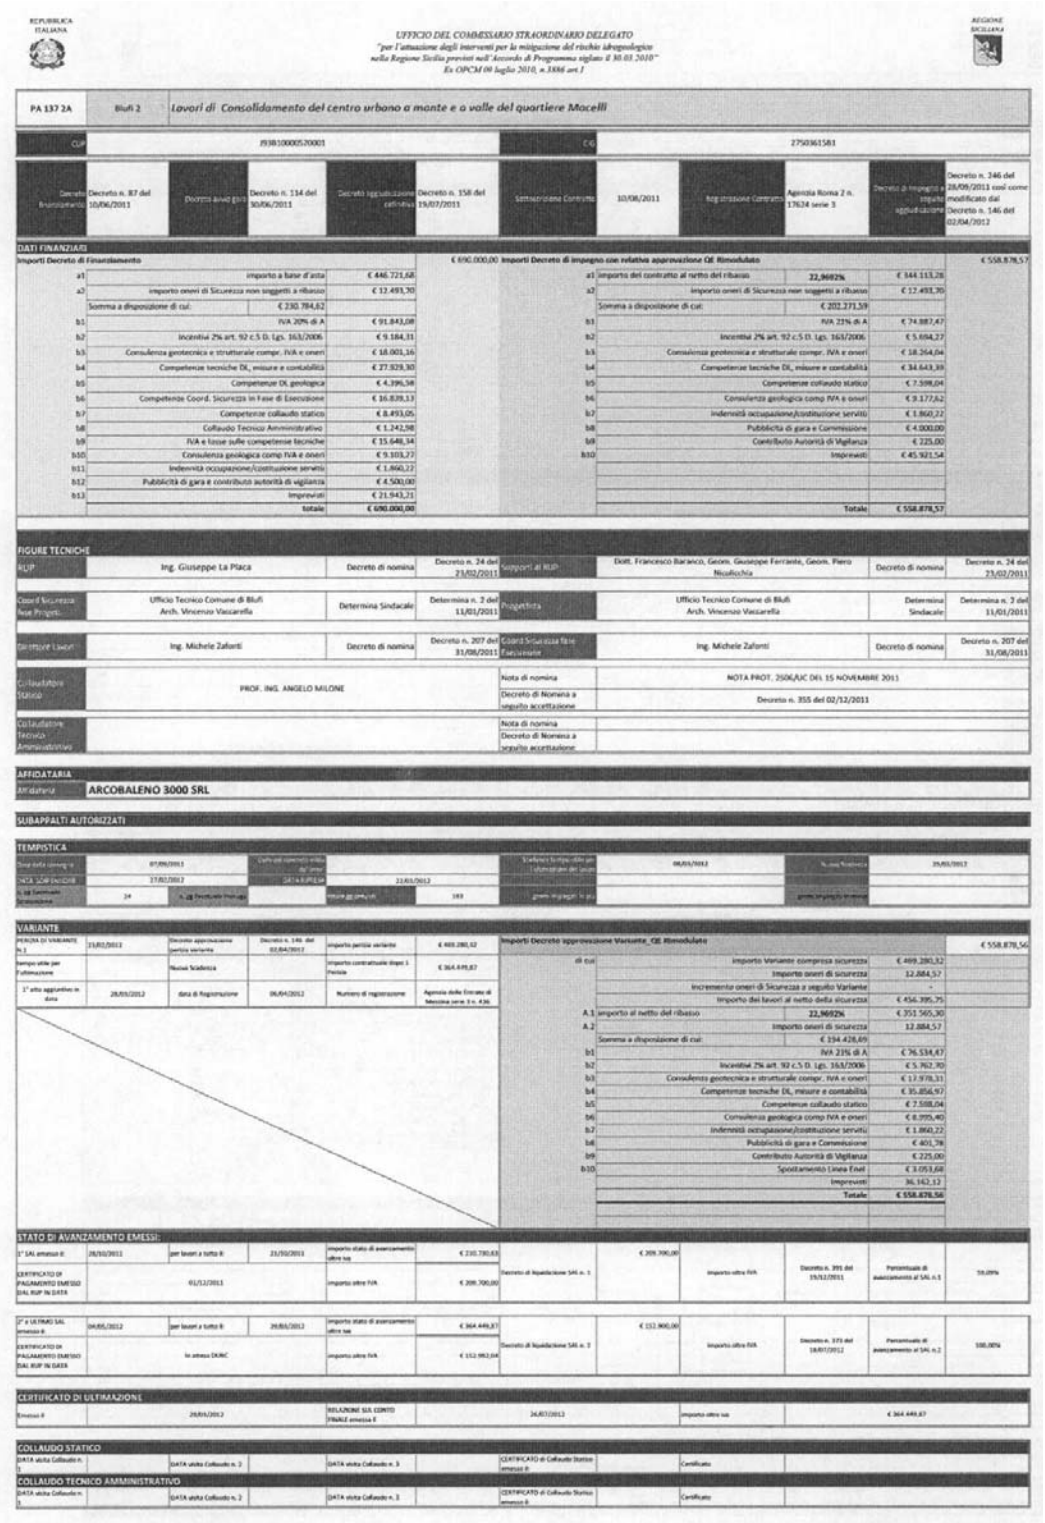

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 08 luglio 2010, n.3886 art.1

PA 137 2A	Blufi 2	*Lavori di Consolidamento del centro urbano a monte e a valle del quartiere Macelli*

CUP	J93B10000520001	CIG	2750361581

Decreto finanziamento	Decreto n. 87 del 10/06/2011	Decreto avvio gara	Decreto n. 114 del 30/06/2011	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 158 del 19/07/2011	Sottoscrizione Contratto	10/08/2011	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 17624 serie 3	Decreto di impegno e importo aggiudicazione	Decreto n. 146 del 28/09/2011 così come modificato dal Decreto n. 146 del 02/04/2012

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 690.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			€ 558.878,57
a1	importo a base d'asta		€ 446.721,68	a1	importo del contratto al netto del ribasso	22,9602%	€ 344.113,28
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.493,70	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.493,70
	Somma a disposizione di cui:	€ 230.784,62			Somma a disposizione di cui:	€ 202.271,59	
b1	IVA 20% di A		€ 91.843,08	b1	IVA 21% di A		€ 74.887,47
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D. Lgs. 163/2006		€ 9.184,31	b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D. Lgs. 163/2006		€ 5.694,27
b3	Consulenza geotecnica e strutturale compr. IVA e oneri		€ 18.001,16	b3	Consulenza geotecnica e strutturale compr. IVA e oneri		€ 18.264,04
b4	Competenze tecniche DL, misure e contabilità		€ 27.929,30	b4	Competenze tecniche DL, misure e contabilità		€ 34.643,39
b5	Competenze DL geologica		€ 4.396,58	b5	Competenze collaudo statico		€ 7.598,04
b6	Competenze Coord. Sicurezza in Fase di Esecuzione		€ 16.839,13	b6	Consulenza geologica comp IVA e oneri		€ 9.177,62
b7	Competenze collaudo statico		€ 8.493,05	b7	Indennità occupazione/costituzione servitù		€ 1.860,22
b8	Collaudo Tecnico Amministrativo		€ 1.242,58	b8	Pubblicità di gara e Commissione		€ 4.000,00
b9	IVA e tasse sulle competenze tecniche		€ 15.648,34	b9	Contributo Autorità di Vigilanza		€ 225,00
b10	Consulenza geologica comp IVA e oneri		€ 9.103,27	b10	Imprevisti		€ 45.921,54
b11	Indennità occupazione/costituzione servitù		€ 1.860,22				
b12	Pubblicità di gara e contributo autorità di vigilanza		€ 4.500,00				
b13	Imprevisti		€ 21.943,21				
	totale		€ 690.000,00		Totale		€ 558.878,57

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di nomina	Decreto n. 24 del 23/02/2011	Supporti al RUP	Dott. Francesco Barlanco, Geom. Giuseppe Ferrante, Geom. Piero Nicoloschia	Decreto di nomina	Decreto n. 24 del 23/02/2011
Coord Sicurezza fase Progett.	Ufficio Tecnico Comune di Blufi Arch. Vincenzo Vaccarella	Determina Sindacale	Determina n. 2 del 11/01/2011	Progettista	Ufficio Tecnico Comune di Blufi Arch. Vincenzo Vaccarella	Determina Sindacale	Determina n. 2 del 11/01/2011
Direttore Lavori	Ing. Michele Zaforti	Decreto di nomina	Decreto n. 207 del 31/08/2011	Coord Sicurezza fase Esecutiva	Ing. Michele Zaforti	Decreto di nomina	Decreto n. 207 del 31/08/2011
Collaudatore Statico	PROF. ING. ANGELO MILONE			Nota di nomina	NOTA PROT. 2506/AIC DEL 15 NOVEMBRE 2011		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 355 del 02/12/2011		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	ARCOBALENO 3000 SRL

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	07/06/2011	Data del contratto e/o del verbale di inizio		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	08/03/2012	Nuova Scadenza	19/03/2012
DATA SOSPENSIONE	17/02/2012	DATA RIPRESA	22/03/2012				
n. gg Sospensioni temporanee	34	n. gg Proroghe richieste	183	giorni residui per il rispetto del tempo utile		giorni residui per il rispetto di proroga	

VARIANTE

						Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato			€ 558.878,56
PERIZIA DI VARIANTE n.1	23/02/2012	Decreto approvazione perizia variante	Decreto n. 146 del 02/04/2012	importo perizia variante	€ 469.280,32	di cui	importo Variante compresa sicurezza	€ 469.280,32	
tempo utile per l'ultimazione		Nuova Scadenza		importo contrattuale dopo 1 Perizia	€ 364.449,87		Importo oneri di sicurezza	12.884,57	
1° atto aggiuntivo in data	28/03/2012	data di Registrazione	06/04/2012	Numero di registrazione	Agenzia delle Entrate di Messina serie 3 n. 436		Incremento oneri di Sicurezza a seguito Variante	-	
							Importo dei lavori al netto della sicurezza	€ 456.395,75	
						A.1	importo al netto del ribasso 22,9602%	€ 351.565,30	
						A.2	Importo oneri di sicurezza	12.884,57	
						Somma a disposizione di cui:	€ 194.428,69		
						b1	IVA 21% di A	€ 76.534,47	
						b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D. Lgs. 163/2006	€ 5.762,70	
						b3	Consulenza geotecnica e strutturale compr. IVA e oneri	€ 13.978,31	
						b4	Competenze tecniche DL, misure e contabilità	€ 35.456,97	
						b5	Competenze collaudo statico	€ 7.598,04	
						b6	Consulenza geologica comp IVA e oneri	€ 8.995,40	
						b7	Indennità occupazione/costituzione servitù	€ 1.860,22	
						b8	Pubblicità di gara e Commissione	€ 401,78	
						b9	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00	
						b10	Spostamento Linea Enel	€ 3.053,68	
							Imprevisti	36.162,12	
							Totale	€ 558.878,56	

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	28/10/2011	per lavori a tutto il:	23/10/2011	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 210.780,63	Decreto di liquidazione SAL n. 1	€ 209.700,00	importo oltre IVA	Decreto n. 391 del 19/12/2011	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	59,09%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	01/12/2011			importo oltre IVA	€ 209.700,00						
2° e ULTIMO SAL emesso il:	04/05/2012	per lavori a tutto il:	29/03/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 364.449,87	Decreto di liquidazione SAL n. 2	€ 152.900,00	importo oltre IVA	Decreto n. 373 del 18/07/2012	Percentuale di avanzamento al SAL n.2	100,00%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	In attesa DURC			importo oltre IVA	€ 152.900,00						

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il	29/03/2012	RELAZIONE SUL CONTO FINALE emessa il	26/07/2012	importo oltre iva	€ 364.449,87

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	Certificato

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	Certificato

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma vigilato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

PA 141	Capaci	*Consolidamento centro abitato" – "Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato – zona Balata Raffo Rosso"*

CUP	J15D12000480001	CIG	45520094A8

Decreto finanziamento	Decreto n. 410 del 02/08/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 477 del 18/09/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 522 dell'8 ottobre 2012	Sottoscrizione Contratto	In corso di stipula	Registrazione Contratto	-	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	-

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 1.200.000,00
a1	Importo a base d'asta	€ 661.497,02	
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.283,67	
a3	Oneri Speciali per la sicurezza	€ 10.343,69	
	Somma a disposizione di cui:	€ 505.875,62	
b1	I.V.A. sui lavori (21% su A)	€ 145.766,12	
b2	Spese per pubblicità bando di gara Commissione Aggiudicatrice AVCP	€ 7.500,00	
b3	Indennità di espropriazione e occupazione temporanea	€ 11.714,80	
b4	Oneri di pubblicazione in GURS	€ 2.000,00	
b5	Incentivi per competenze ex art. 92 comma 5 Dlgs 163/2006 2% A	€ 13.882,49	
b6	Competenze progettazione	€ 95.950,09	
b7	D.L. - Misura e cont. - Coord. in fase di esecuzione	€ 61.538,68	
b8	Piano Particellare d'esproprio	€ 13.576,20	
b9	Collaudo Statico	€ 12.467,07	
b10	Collaudo tecnico amministrativo	€ 4.032,54	
b11	Monitoraggio	€ 124.099,90	
b12	Imprevisti	€ 13.347,73	
	totale	**€ 1.200.000,00**	

Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			
a1	importo a base d'asta	29,3638%	€ 467.256,36
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 22.283,67
	Oneri Speciali per la sicurezza		€ 10.343,69
	Somma a disposizione di cui:	€ 0,00	
b1	I.V.A. sui lavori (21% su A)		
b2	Spese per pubblicità bando di gara Commissione Aggiudicatrice AVCP		
b3	Indennità di espropriazione e occupazione temporanea		
b4	Oneri di pubblicazione in GURS		
b5	Incentivi per competenze ex art. 92 comma 5 Dlgs 163/2006 2% A		
b6	Competenze progettazione		
b7	D.L. - Misura e cont. - Coord. in fase di esecuzione		
b8	Piano Particellare d'esproprio		
b9	Collaudo Statico		
b10	Collaudo tecnico amministrativo		
b11	Monitoraggio		
b12	Imprevisti		
b13	Totale	**€ 499.883,72**	

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Giovan Battista Dragotta (Comune)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.197 del 02/05/2012	Supporto al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 347 del 11/07/2012
				Progettista	Dott Ing Carlo Barbuzza	Delibera di nomina	Delibera di Giunta Municipale n.376 del 26-06-1990
Coord Sicurezza fase Progett		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL	-	Decreto di nomina	
Collaudatore Statico	-			Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	ZACCARIA COSTRUZIONI Srl

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del verbale di sospensione		Sospensione totale per motivazione non sanabile		N.ro gg. Residui	
N. gg Eventuale Sospensione		N. gg Eventuale Proroga		totale gg previsti		giorni impiegati in p.r.		giorni impiegati in var.	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE


Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

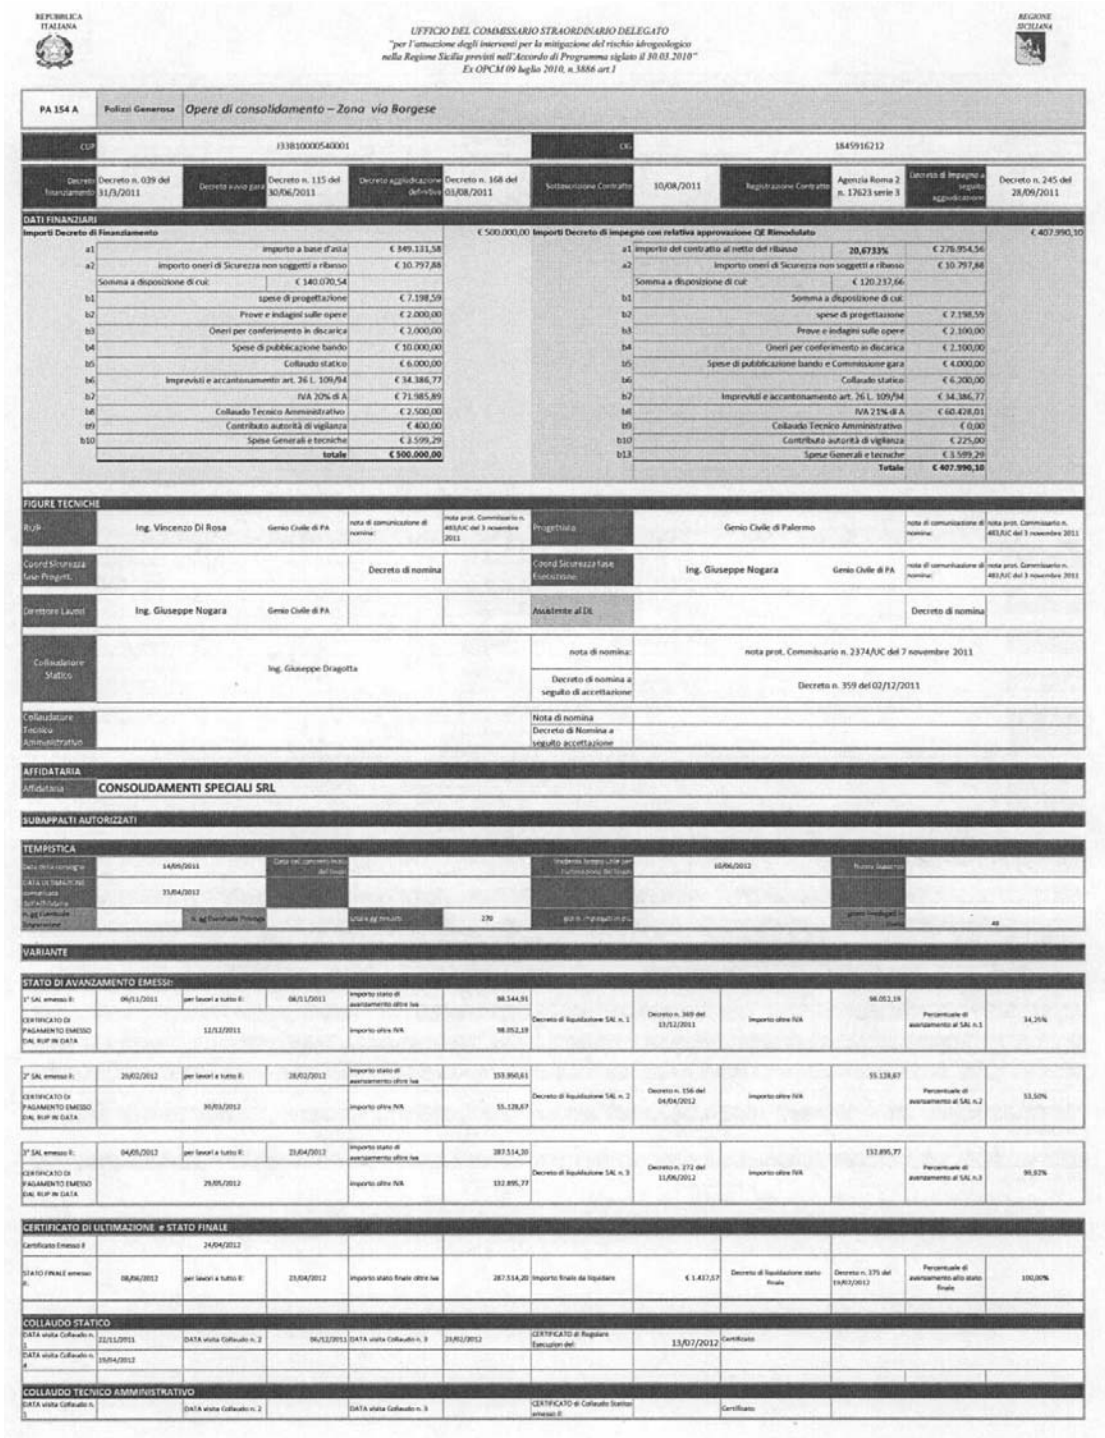

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

PA 154 A	Polizzi Generosa	*Opere di consolidamento – Zona via Borgese*

CUP	I33B10000540001	CIG	1845916212

Decreti finanziamento	Decreto n. 029 del 31/3/2011	Decreto avvio gara	Decreto n. 115 del 30/06/2011	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 168 del 03/08/2011	Sottoscrizione Contratto	10/08/2011	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 17623 serie 3	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	Decreto n. 245 del 28/09/2011

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 500.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato				€ 407.990,10
a1	importo a base d'asta	€ 349.131,58		a1	importo del contratto al netto del ribasso	20,6733%	€ 276.954,56	
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.797,88		a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.797,88	
	Somma a disposizione di cui:	€ 140.070,54			Somma a disposizione di cui:	€ 120.237,66		
b1	spese di progettazione	€ 7.198,59		b1	Somma a disposizione di cui:			
b2	Prove e indagini sulle opere	€ 2.000,00		b2	spese di progettazione		€ 7.198,59	
b3	Oneri per conferimento in discarica	€ 2.000,00		b3	Prove e indagini sulle opere		€ 2.100,00	
b4	Spese di pubblicazione bando	€ 10.000,00		b4	Oneri per conferimento in discarica		€ 2.100,00	
b5	Collaudo statico	€ 6.000,00		b5	Spese di pubblicazione bando e Commissione gara		€ 4.000,00	
b6	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94	€ 34.386,77		b6	Collaudo statico		€ 6.200,00	
b7	IVA 20% di A	€ 71.985,89		b7	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94		€ 34.386,77	
b8	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 2.500,00		b8	IVA 21% di A		€ 60.428,01	
b9	Contributo autorità di vigilanza	€ 400,00		b9	Collaudo Tecnico Amministrativo		€ 0,00	
b10	Spese Generali e tecniche	€ 3.599,29		b10	Contributo autorità di vigilanza		€ 225,00	
	totale	**€ 500.000,00**		b13	Spese Generali e tecniche		€ 3.599,29	
					Totale		**€ 407.990,10**	

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Vincenzo Di Rosa	Genio Civile di PA	nota di comunicazione di nomina:	nota prot. Commissario n. 483/UC del 3 novembre 2011	Progettista	Genio Civile di Palermo		nota di comunicazione di nomina:	nota prot. Commissario n. 483/UC del 3 novembre 2011
Coord.Sicurezza fase Progett.			Decreto di nomina		Coord.Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Giuseppe Nogara	Genio Civile di PA	nota di comunicazione di nomina:	nota prot. Commissario n. 483/UC del 3 novembre 2011
Direttore Lavori	Ing. Giuseppe Nogara	Genio Civile di PA			Assistente al DL			Decreto di nomina	

Collaudatore Statico	Ing. Giuseppe Dragotta	nota di nomina:	nota prot. Commissario n. 2374/UC del 7 novembre 2011
		Decreto di nomina a seguito di accettazione	Decreto n. 359 del 02/12/2011
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina	
		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	14/09/2011	Data del verbale di inizio lavori		Tempo utile per l'ultimazione dei lavori	10/06/2012	Proroga concessa	
DATA ULTIMAZIONE comunicata dall'Affidataria	31/04/2012						
n. gg Contratto Originario		n. gg Eventuale Proroga		Giorni gg. Sospesi	270	giorni impiegati in più	48

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	06/11/2011	per lavori a tutto il:	06/11/2011	importo stato di avanzamento oltre Iva	98.144,91	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 369 del 13/12/2011	Importo oltre IVA	98.052,19	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	34,25%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	12/12/2011			importo oltre IVA	98.052,19						

2° SAL emesso il:	29/02/2012	per lavori a tutto il:	28/02/2012	importo stato di avanzamento oltre Iva	153.950,61	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 156 del 04/04/2012	Importo oltre IVA	55.128,67	Percentuale di avanzamento al SAL n.2	53,50%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	30/03/2012			importo oltre IVA	55.128,67						

3° SAL emesso il:	04/05/2012	per lavori a tutto il:	23/04/2012	importo stato di avanzamento oltre Iva	287.514,20	Decreto di liquidazione SAL n. 3	Decreto n. 272 del 11/06/2012	Importo oltre IVA	133.895,77	Percentuale di avanzamento al SAL n.3	90,83%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	29/05/2012			importo oltre IVA	133.895,77						

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE e STATO FINALE


Certificato Emesso il	24/04/2012										
STATO FINALE emesso il:	08/06/2012	per lavori a tutto il:	23/04/2012	importo stato finale oltre Iva	287.514,20	Importo finale da liquidare	€ 1.437,57	Decreto di liquidazione stato finale	Decreto n. 375 del 19/07/2012	Percentuale di avanzamento allo stato finale	100,00%

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1	21/11/2011	DATA visita Collaudo n. 2	06/12/2011	DATA visita Collaudo n. 3	23/02/2012	CERTIFICATO di Regolare Esecuzione del:	13/07/2012	Certificato			
DATA visita Collaudo n. 4	19/04/2012										

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato			

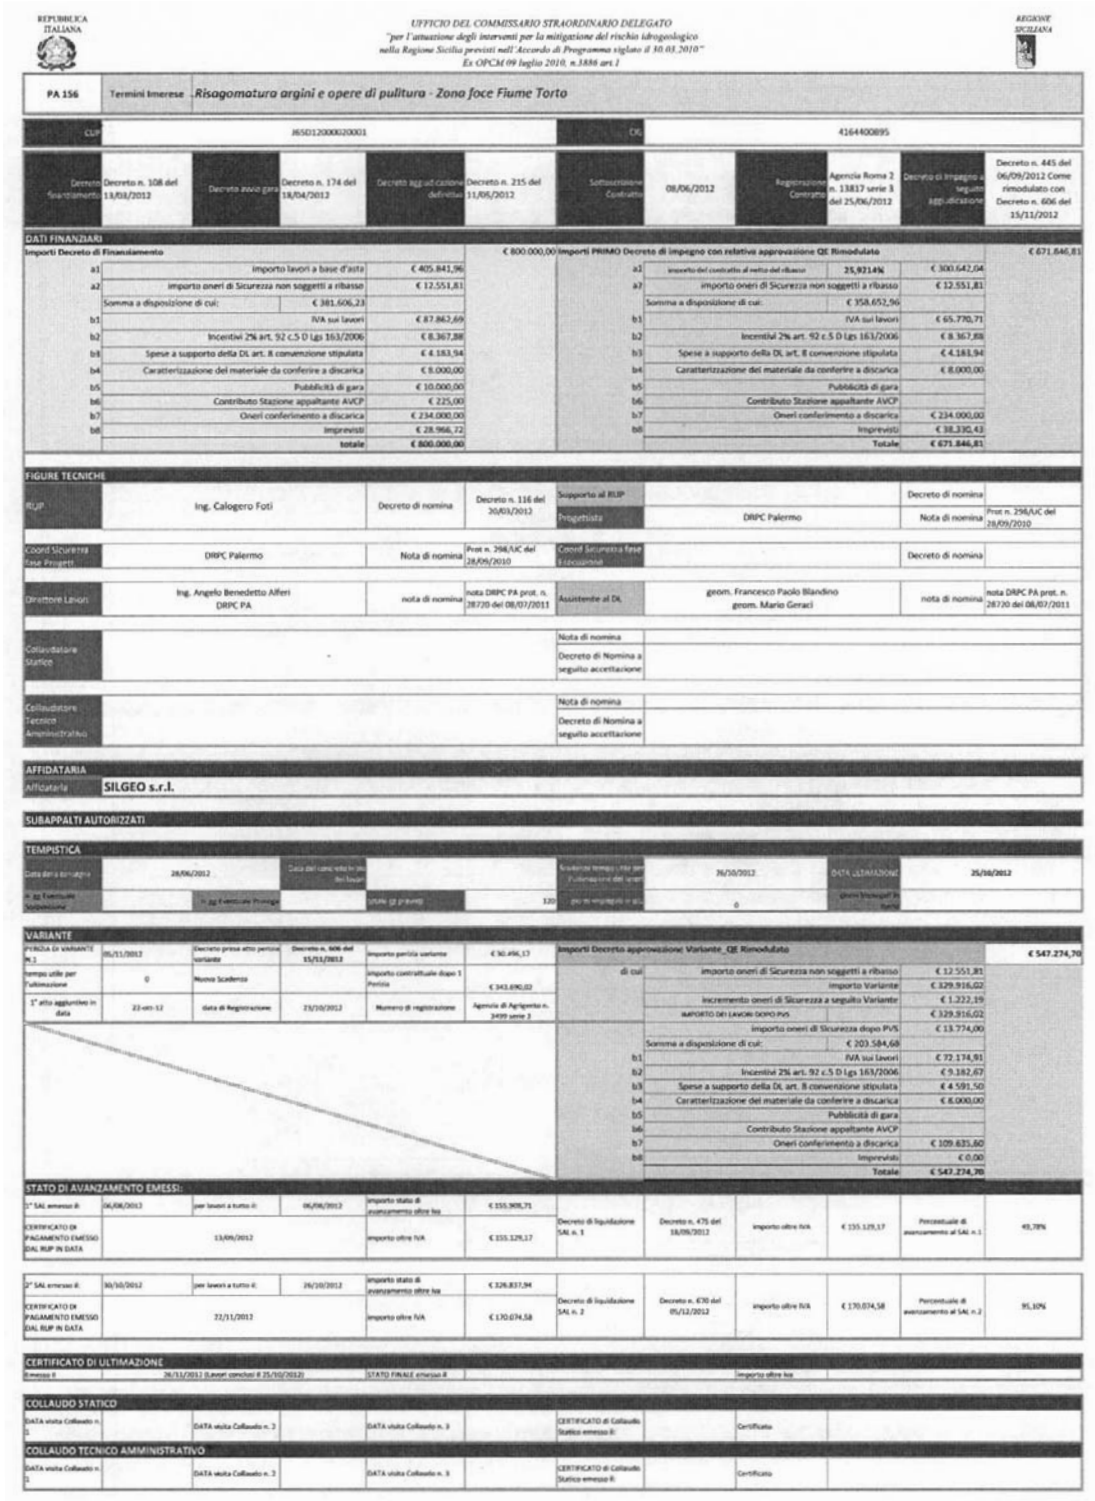

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma vigilato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

PA 156	Termini Imerese	*Risagomatura argini e opere di pulitura - Zona foce Fiume Torto*

CUP	J65D12000020001	CIG	4164400895

Decreto finanziamento	Decreto n. 108 del 13/03/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 174 del 18/04/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 215 del 11/05/2012	Sottoscrizione Contratto	08/06/2012	Registrazione Contratto	Agenzia Entrate Roma 2 n. 13817 serie 3 del 25/06/2012	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	Decreto n. 445 del 06/09/2012 Come rimodulato con Decreto n. 606 del 15/11/2012

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 800.000,00	Importi PRIMO Decreto di impegno con relativi approvazione QE Rimodulato				€ 671.846,81
a1	importo lavori a base d'asta		€ 405.841,96	a1	importo del contratto al netto del ribasso	25,9214%	€ 300.642,04	
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.551,81	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.551,81	
	Somma a disposizione di cui:	€ 381.606,23			Somma a disposizione di cui:	€ 358.652,96		
b1	IVA sui lavori		€ 87.862,69	b1	IVA sui lavori		€ 65.770,71	
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006		€ 8.367,88	b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006		€ 8.367,88	
b3	Spese a supporto della DL art. 8 convenzione stipulata		€ 4.183,94	b3	Spese a supporto della DL art. 8 convenzione stipulata		€ 4.183,94	
b4	Caratterizzazione del materiale da conferire a discarica		€ 8.000,00	b4	Caratterizzazione del materiale da conferire a discarica		€ 8.000,00	
b5	Pubblicità di gara		€ 10.000,00	b5	Pubblicità di gara			
b6	Contributo Stazione appaltante AVCP		€ 225,00	b6	Contributo Stazione appaltante AVCP			
b7	Oneri conferimento a discarica		€ 234.000,00	b7	Oneri conferimento a discarica		€ 234.000,00	
b8	Imprevisti		€ 28.966,72	b8	Imprevisti		€ 38.330,43	
	totale		€ 800.000,00		Totale		€ 671.846,81	

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Calogero Foti	Decreto di nomina	Decreto n. 116 del 30/03/2012	Supporto al RUP		Decreto di nomina	
				Progettista	DRPC Palermo	Nota di nomina	Prot n. 298/UC del 28/09/2010
Coord Sicurezza fase Progett.	DRPC Palermo	Nota di nomina	Prot n. 298/UC del 28/09/2010	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Ing. Angelo Benedetto Alferi DRPC PA	nota di nomina	nota DRPC PA prot. n. 28720 del 08/07/2011	Assistente al DL	geom. Francesco Paolo Blandino geom. Mario Geraci	nota di nomina	nota DRPC PA prot. n. 28720 del 08/07/2011
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	SILGEO s.r.l.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data del verbale	28/06/2012	Data del consegna dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	26/10/2012	DATA ULTIMAZIONE	25/10/2012
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga		Utile gg previsti	120	gg di sospensioni e proroghe	0	giorni impiegati in più rispetto

VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE N. 1	05/11/2012	Decreto presa atto perizia variante	Decreto n. 606 del 15/11/2012	importo perizia variante	€ 30.496,17	Importi Decreto approvazione Variante QE Rimodulato			€ 547.274,70
tempo utile per l'ultimazione	0	Nuova Scadenza		importo contrattuale dopo 1 Perizia	€ 343.690,02	di cui:	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.551,81
							importo Variante		€ 329.916,02
1° atto aggiuntivo in data	22-ott-12	data di Registrazione	23/10/2012	Numero di registrazione	Agenzia di Agrigento n. 3499 serie 3		incremento oneri di Sicurezza a seguito Variante		€ 1.222,19
							IMPORTO DEI LAVORI DOPO PVS		€ 329.916,02
							importo oneri di Sicurezza dopo PVS		€ 13.774,00
						Somma a disposizione di cui:	€ 203.584,68		
						b1	IVA sui lavori		€ 72.174,91
						b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006		€ 9.182,67
						b3	Spese a supporto della DL art. 8 convenzione stipulata		€ 4.591,50
						b4	Caratterizzazione del materiale da conferire a discarica		€ 8.000,00
						b5	Pubblicità di gara		
						b6	Contributo Stazione appaltante AVCP		
						b7	Oneri conferimento a discarica		€ 109.635,60
						b8	Imprevisti		€ 0,00
							Totale		€ 547.274,70

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	06/08/2012	per lavori a tutto il:	06/08/2012	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 155.909,71	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 475 del 18/09/2012	importo oltre IVA	€ 155.129,17	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	49,78%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	13/09/2012			importo oltre IVA	€ 155.129,17						

2° SAL emesso il:	30/10/2012	per lavori a tutto il:	26/10/2012	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 326.837,94	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 670 del 05/12/2012	importo oltre IVA	€ 170.074,58	Percentuale di avanzamento al SAL n.2	95,10%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	22/11/2012			importo oltre IVA	€ 170.074,58						

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE


Emesso il	26/11/2012 (Lavori conclusi il 25/10/2012)	STATO FINALE emesso il		importo oltre Iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

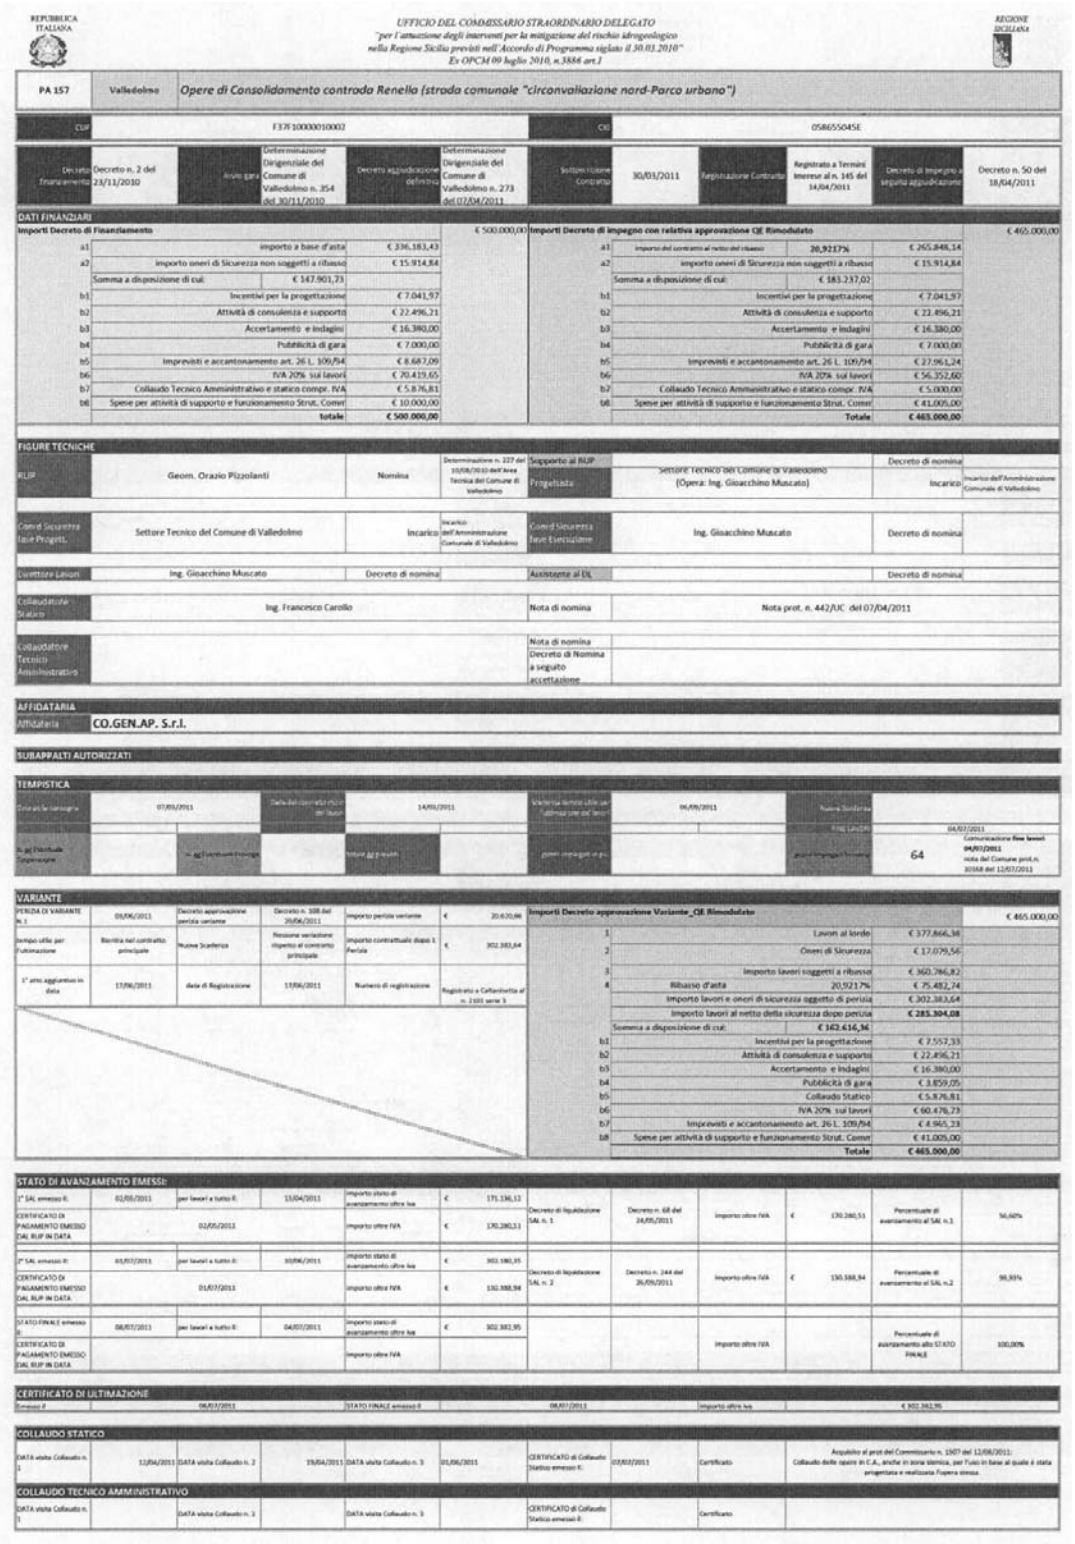

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

PA 157	Valledolmo	*Opere di Consolidamento contrada Renella (strada comunale "circonvallazione nord-Parco urbano")*

CUP	F37F10000010002	CIG	0586550456

Decreto finanziamento	Decreto n. 2 del 23/11/2010	Avvio gara	Determinazione Dirigenziale del Comune di Valledolmo n. 354 del 30/11/2010	Decreto aggiudicazione definitiva	Determinazione Dirigenziale del Comune di Valledolmo n. 273 del 07/04/2011	Sottoscrizione Contratto	30/03/2011	Registrazione Contratto	Registrato a Termini Imerese al n. 345 del 14/04/2011	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	Decreto n. 50 del 18/04/2011

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento € 500.000,00

a1	importo a base d'asta		€ 336.183,43
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 15.914,84
	Somma a disposizione di cui:	€ 147.901,73	
b1	Incentivi per la progettazione		€ 7.041,97
b2	Attività di consulenza e supporto		€ 22.496,21
b3	Accertamento e indagini		€ 16.380,00
b4	Pubblicità di gara		€ 7.000,00
b5	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94		€ 8.687,09
b6	IVA 20% sui lavori		€ 70.419,65
b7	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA		€ 5.876,81
b8	Spese per attività di supporto e funzionamento Strut. Comm		€ 10.000,00
	totale		**€ 500.000,00**

Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato € 465.000,00

a1	Importo del contratto al netto del ribasso	20,921%	€ 265.848,14
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 15.914,84
	Somma a disposizione di cui:	€ 183.237,02	
b1	Incentivi per la progettazione		€ 7.041,97
b2	Attività di consulenza e supporto		€ 22.496,21
b3	Accertamento e indagini		€ 16.380,00
b4	Pubblicità di gara		€ 7.000,00
b5	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94		€ 27.961,24
b6	IVA 20% sui lavori		€ 56.352,60
b7	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA		€ 5.000,00
b8	Spese per attività di supporto e funzionamento Strut. Comm		€ 41.005,00
	Totale		**€ 465.000,00**

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Orazio Pizzolanti	Nomina	Determinazione n. 227 del 10/08/2010 dell'Area Tecnica del Comune di Valledolmo	Supporto al RUP		Decreto di nomina	
				Progettista	Settore Tecnico del Comune di Valledolmo (Opera: Ing. Gioacchino Muscato)	Incarico	Incarico dell'Amministrazione Comunale di Valledolmo
Coord Sicurezza fase Progett.	Settore Tecnico del Comune di Valledolmo	Incarico	Incarico dell'Amministrazione Comunale di Valledolmo	Coord Sicurezza fase Esecutiva	Ing. Gioacchino Muscato	Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Ing. Gioacchino Muscato	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico	Ing. Francesco Carollo			Nota di nomina	Nota prot. n. 442/UC del 07/04/2011		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	CO.GEN.AP. S.r.l.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data di consegna	07/03/2011	Data del verbale di fine lavori	14/05/2011	Validità lavori utili per l'ultimazione dei lavori	06/09/2011	Nuova Scadenza			
						Proj. Lavori	04/07/2011		
N. gg. Naturali Consecutivi		N. gg. Naturali Proroga		Totale gg. naturali		giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno	64	Comunicazione fine lavori 04/07/2011 nota del Comune prot.n. 10368 del 12/07/2011

VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE N. 1	03/06/2011	Decreto approvazione perizia variante	Decreto n. 308 del 20/06/2011	importo perizia variante	€ 20.670,66	
Tempo utile per l'ultimazione	Rientra nel contratto principale	Nuova Scadenza	Revisione variazione rispetto al contratto principale	importo contrattuale dopo 1 Perizia	€ 302.383,64	
1° atto aggiuntivo in data	17/06/2011	data di Registrazione	17/06/2011	Numero di registrazione	Registrato a Cefalù/Petilia al n. 2101 serie 3	

Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato € 465.000,00

1	Lavori al lordo		€ 377.866,38
2	Oneri di Sicurezza		€ 17.079,56
3	Importo lavori soggetti a ribasso		€ 360.786,82
4	Ribasso d'asta	20,921%	€ 75.482,74
	Importo lavori e oneri di sicurezza oggetto di perizia		€ 302.383,64
	Importo lavori al netto della sicurezza dopo perizia		**€ 285.304,08**
	Somma a disposizione di cui:	**€ 162.616,36**	
b1	Incentivi per la progettazione		€ 7.557,33
b2	Attività di consulenza e supporto		€ 22.496,21
b3	Accertamento e indagini		€ 16.380,00
b4	Pubblicità di gara		€ 3.859,05
b5	Collaudo Statico		€ 5.876,81
b6	IVA 20% sui lavori		€ 60.476,73
b7	Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94		€ 4.965,23
b8	Spese per attività di supporto e funzionamento Strut. Comm		€ 41.005,00
	Totale		**€ 465.000,00**

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	02/05/2011	per lavori a tutto il:	15/04/2011	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 171.136,12	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 68 del 24/05/2011	Importo oltre IVA	€ 170.280,51	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	56,60%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA		02/05/2011		importo oltre IVA	€ 170.280,51						
2° SAL emesso il:	01/07/2011	per lavori a tutto il:	30/06/2011	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 302.180,35	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 244 del 26/09/2011	Importo oltre IVA	€ 130.388,94	Percentuale di avanzamento al SAL n.2	99,93%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA		01/07/2011		importo oltre IVA	€ 130.388,94						
STATO FINALE emesso il:	08/07/2011	per lavori a tutto il:	04/07/2011	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 302.382,95			Importo oltre IVA		Percentuale di avanzamento allo STATO FINALE	100,00%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA				importo oltre IVA							

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il	08/07/2011	STATO FINALE emesso il	08/07/2011	Importo oltre Iva	€ 302.382,95

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1	12/04/2011	DATA visita Collaudo n. 2	19/04/2011	DATA visita Collaudo n. 3	01/06/2011	CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	02/02/2011	Certificato	Acquisito al prot del Commissario n. 1507 del 12/08/2011: Collaudo delle opere in C.A., anche in zona sismica, per l'uso in base al quale è stata progettata e realizzata l'opera stessa.

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.01.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

SR 161	Avola	*Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica c/da Cavagrande del Cassibile*

CUP	I65D12000240001	CIG	43566250AF

Decreto finanziamento	Decreto n. 238 del 24/05/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 288 del 20/06/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 661 del 03/12/2012	Sottoscrizione Contratto	11/12/2012	Registrazione Contratto	In corso di registrazione	Decreto di impegno e seguito approvazione	

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento € 600.000,00

a1	importo a base d'asta		€ 433.232,35
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 21.972,90
	Somma a disposizione di cui:	€ 144.794,75	
b1	IVA sui Lavori		€ 95.593,10
b2	Incentivi,(ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)		€ 9.104,11
b3	Spese Accessorie (art. 8 della Convenzione) 1% (su A)		€ 4.552,05
b4	Pubblicità – Spese di Gara – Spese Osservatorio		€ 15.000,00
b5	Oneri conferimento a discarica		€ 3.350,00
b6	IVA su oneri conferimento a discarica		€ 703,50
b7	Imprevisti		€ 16.491,99
	totale		€ 600.000,00

Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato € 340.976,61

a1	importo del contratto al netto del ribasso	26,3666%	€ 319.003,71
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 21.972,90
	Somma a disposizione di cui:	€ 0,00	
b1	spese di progettazione		
b2	Attività di consulenza Geotecnica		
b3	Accertamento e indagini compreso IVA		
b4	Rilievi Topografici		
b5	Rilievi aerofotogrammetrici		
b6	Oneri per conferimento in discarica		
b7	Contributo Stazione appaltante		
b13	Spese Struttura Commissariale		
	Totale		€ 340.976,61

FIGURE TECNICHE

RUP	Dott. Geol. Gaetano Marino (DRPC SR)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 169 del 16/04/2012	Supporto al RUP	Ing. Alberto Peligra	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 169 del 16/04/2012
				Progettista	Ing. Davide Di Grazia (DRPC SR)	Nota di nomina	prot. N. 45374 del 25/09/2008
Coord Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Ing. Davide Di Grazia (DRPC SR)	Nota di nomina	prot. N. 45374 del 25/09/2008	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	CONSORZIO STABILE VITRUVIO scarl

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del Consegna in dei lavori		Scadenza termine utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale sospensione		n. gg Eventuale Proroga		Totale gg previsti		giorni impiegati in corso d'opera	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE


Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

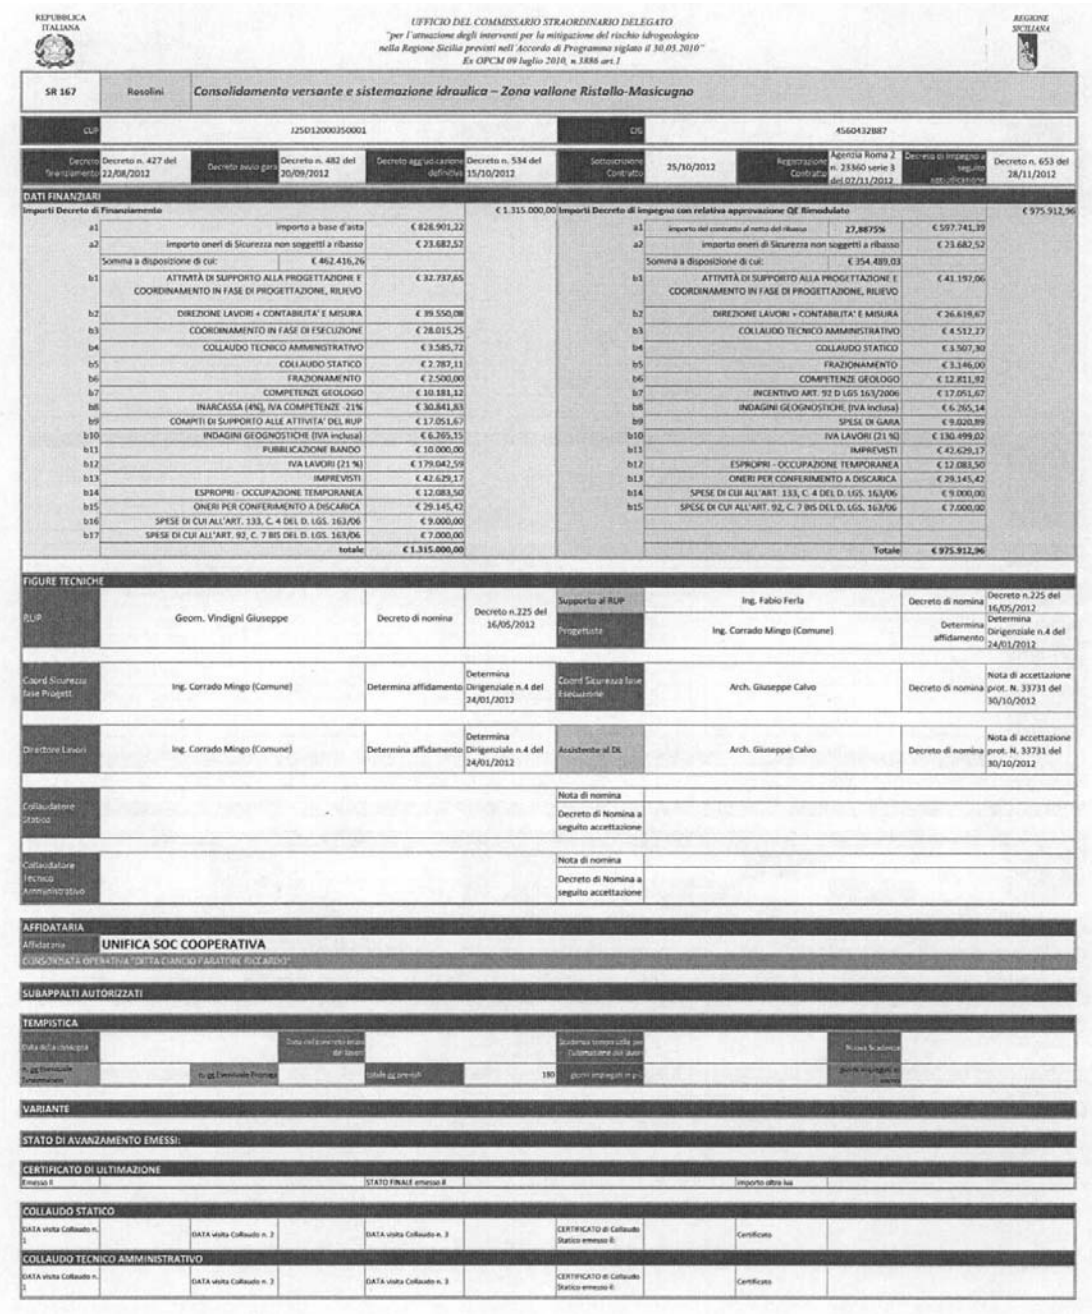

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

SR 167	Rosolini	*Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno*

CUP	I25D12000350001	CIG	4560432887

Decreto finanziamento	Decreto n. 427 del 22/08/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 482 del 20/09/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 534 del 15/10/2012	Sottoscrizione Contratto	25/10/2012	Registrazione Contratto	Agenzia Entrate Roma 2 n. 23360 serie 3 del 07/11/2012	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	Decreto n. 653 del 28/11/2012

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 1.315.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato				€ 975.912,96
a1	importo a base d'asta		€ 826.901,22	a1	importo del contratto al netto del ribasso	27,8875%	€ 597.741,39	
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 23.682,52	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 23.682,52	
	Somma a disposizione di cui:	€ 462.416,26			Somma a disposizione di cui:	€ 354.489,03		
b1	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVO		€ 32.737,65	b1	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVO		€ 41.197,06	
b2	DIREZIONE LAVORI + CONTABILITA' E MISURA		€ 39.550,08	b2	DIREZIONE LAVORI + CONTABILITA' E MISURA		€ 26.619,67	
b3	COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE		€ 28.015,25	b3	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		€ 4.512,27	
b4	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		€ 3.585,72	b4	COLLAUDO STATICO		€ 3.507,30	
b5	COLLAUDO STATICO		€ 2.787,11	b5	FRAZIONAMENTO		€ 3.146,00	
b6	FRAZIONAMENTO		€ 2.500,00	b6	COMPETENZE GEOLOGO		€ 12.811,92	
b7	COMPETENZE GEOLOGO		€ 10.181,12	b7	INCENTIVO ART. 92 D LGS 163/2006		€ 17.051,67	
b8	INARCASSA (4%), IVA COMPETENZE -21%		€ 30.841,83	b8	INDAGINI GEOGNOSTICHE (IVA inclusa)		€ 6.265,14	
b9	COMPITI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL RUP		€ 17.051,67	b9	SPESE DI GARA		€ 9.020,89	
b10	INDAGINI GEOGNOSTICHE (IVA inclusa)		€ 6.265,15	b10	IVA LAVORI (21 %)		€ 130.499,02	
b11	PUBBLICAZIONE BANDO		€ 10.000,00	b11	IMPREVISTI		€ 42.629,17	
b12	IVA LAVORI (21 %)		€ 179.042,59	b12	ESPROPRI - OCCUPAZIONE TEMPORANEA		€ 12.083,50	
b13	IMPREVISTI		€ 42.629,17	b13	ONERI PER CONFERIMENTO A DISCARICA		€ 29.145,42	
b14	ESPROPRI - OCCUPAZIONE TEMPORANEA		€ 12.083,50	b14	SPESE DI CUI ALL'ART. 133, C. 4 DEL D. LGS. 163/06		€ 9.000,00	
b15	ONERI PER CONFERIMENTO A DISCARICA		€ 29.145,42	b15	SPESE DI CUI ALL'ART. 92, C. 7 BIS DEL D. LGS. 163/06		€ 7.000,00	
b16	SPESE DI CUI ALL'ART. 133, C. 4 DEL D. LGS. 163/06		€ 9.000,00					
b17	SPESE DI CUI ALL'ART. 92, C. 7 BIS DEL D. LGS. 163/06		€ 7.000,00					
	totale		€ 1.315.000,00		Totale		€ 975.912,96	

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Vindigni Giuseppe	Decreto di nomina	Decreto n.225 del 16/05/2012	Supporto al RUP	Ing. Fabio Ferla	Decreto di nomina	Decreto n.225 del 16/05/2012
				Progettista	Ing. Corrado Mingo (Comune)	Determina affidamento	Determina Dirigenziale n.4 del 24/01/2012
Coord Sicurezza fase Progett	Ing. Corrado Mingo (Comune)	Determina affidamento	Determina Dirigenziale n.4 del 24/01/2012	Coord Sicurezza fase Esecutiva	Arch. Giuseppe Calvo	Decreto di nomina	Nota di accettazione prot. N. 33731 del 30/10/2012
Direttore Lavori	Ing. Corrado Mingo (Comune)	Determina affidamento	Determina Dirigenziale n.4 del 24/01/2012	Assistente al DL	Arch. Giuseppe Calvo	Decreto di nomina	Nota di accettazione prot. N. 33731 del 30/10/2012
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria: UNIFICA SOC COOPERATIVA

CONSORZIATA OPERATIVA "DITTA CIANCIO FARATORE RICCARDO"

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna		Data inizio effettivo lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Giornate Lavorative		n. gg Giornate Proroga		totale gg previsti	180	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre lus	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

SR 177	Carlentini	*"Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR)*

CUP	J15D12000320001	CIG	43661694A3

Decreto finanziamento	Decreto n. 247 del 28/05/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 289 del 25/06/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 429 del 23/08/2012	Sottoscrizione Contratto	26/09/2012	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 21647 serie 3 del 10/10/2012	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	-

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento € 2.500.000,00

a1	importo a base d'asta		€ 1.646.286,57
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 98.833,69
	Somma a disposizione di cui:	€ 754.879,74	
b1	I.V.A. sui lavori 10%		€ 174.512,03
b2	Incentivi (i.b.a. x 2%x28%)(ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)		€ 9.772,67
b3	RUP (25% x 2%)		€ 8.725,60
b4	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità		€ 83.697,84
b5	C.S.P.		€ 34.780,44
b6	Collaudo Amministrativo		€ 8.043,78
b7	Onorario per la redazione dei calcoli		€ 16.299,77
b8	Collaudo statico		€ 9.960,68
b9	Indagini geognostiche e di Laboratorio		€ 12.978,36
b10	Onorario per Supporto al RUP		€ 9.573,84
b11	Spese per ripristino allacci e sottoservizi ed opere esistenti		€ 97.000,00
b12	Bando di gara ed autorizzazioni		€ 15.000,00
b13	Contributo AVCP		€ 600,00
b14	Occupazione temporanea		€ 14.110,00
b15	Oneri per indagini calcestruzzo e ferri		€ 30.500,00
b16	Assicurazione – Progettisti interni		€ 3.000,00
b17	Imprevisti		€ 86.824,73
b18	Spese per commissione giudicatrice		€ 5.000,00
b19	Oneri per il conferimento in discarica		€ 135.000,00
	totale		**€ 2.500.000,00**

Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato

a1	importo del contratto al netto del ribasso	**26,9669%**	€ 1.202.334,12
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 98.833,69
	Somma a disposizione di cui:	€ 1.301.167,81	
b1	I.V.A. sui lavori 10%		
b2	Incentivi (i.b.a. x 2%x28%)(ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)		
b3	RUP (25% x 2%)		
b4	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità		
b5	C.S.P.		
b6	Collaudo Amministrativo		
b7	Onorario per la redazione dei calcoli		
b8	Collaudo statico		
b9	Indagini geognostiche e di Laboratorio		
b10	Onorario per Supporto al RUP		
b11	Spese per ripristino allacci e sottoservizi ed opere esistenti		
b12	Bando di gara ed autorizzazioni		
b13	Contributo AVCP		
b14	Occupazione temporanea		
b15	Oneri per indagini calcestruzzo e ferri		
b16	Assicurazione – Progettisti interni		
b17	Imprevisti		
b18	Spese per commissione giudicatrice		
b19	Oneri per il conferimento in discarica		
b13	Totale		**€ 1.301.167,81**

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Francesco Ingalisi	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 191 del 26/04/2012	Supporto al RUP	Ing. Diego Li Calzi	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 191 del 26/04/2012
				Progettista	Geom. Santi di Stefano Geom. Francesco Incontro (Comune)	Determina di incarico	Determina Sindacale n. 70 del 18/11/2011
Coord Sicurezza fase Progett.	Arch. Daniele Lentini	Determina di incarico	Determina Sindacale n.1 del 23/01/2012	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Ing. Antonio Lanza	Decreto di Aggiudicazione servizio	Decreto n. 637 del 22/11/2012	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	**URANIA COSTRUZIONI S.r.l.**

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del riscontro in ordine dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg. naturali Sospensioni		n. gg. naturali Proroga		totale gg. previsti	540	giorni impiegati a gg.		giorni per gg. di Proroga	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE


Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre 5ek	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

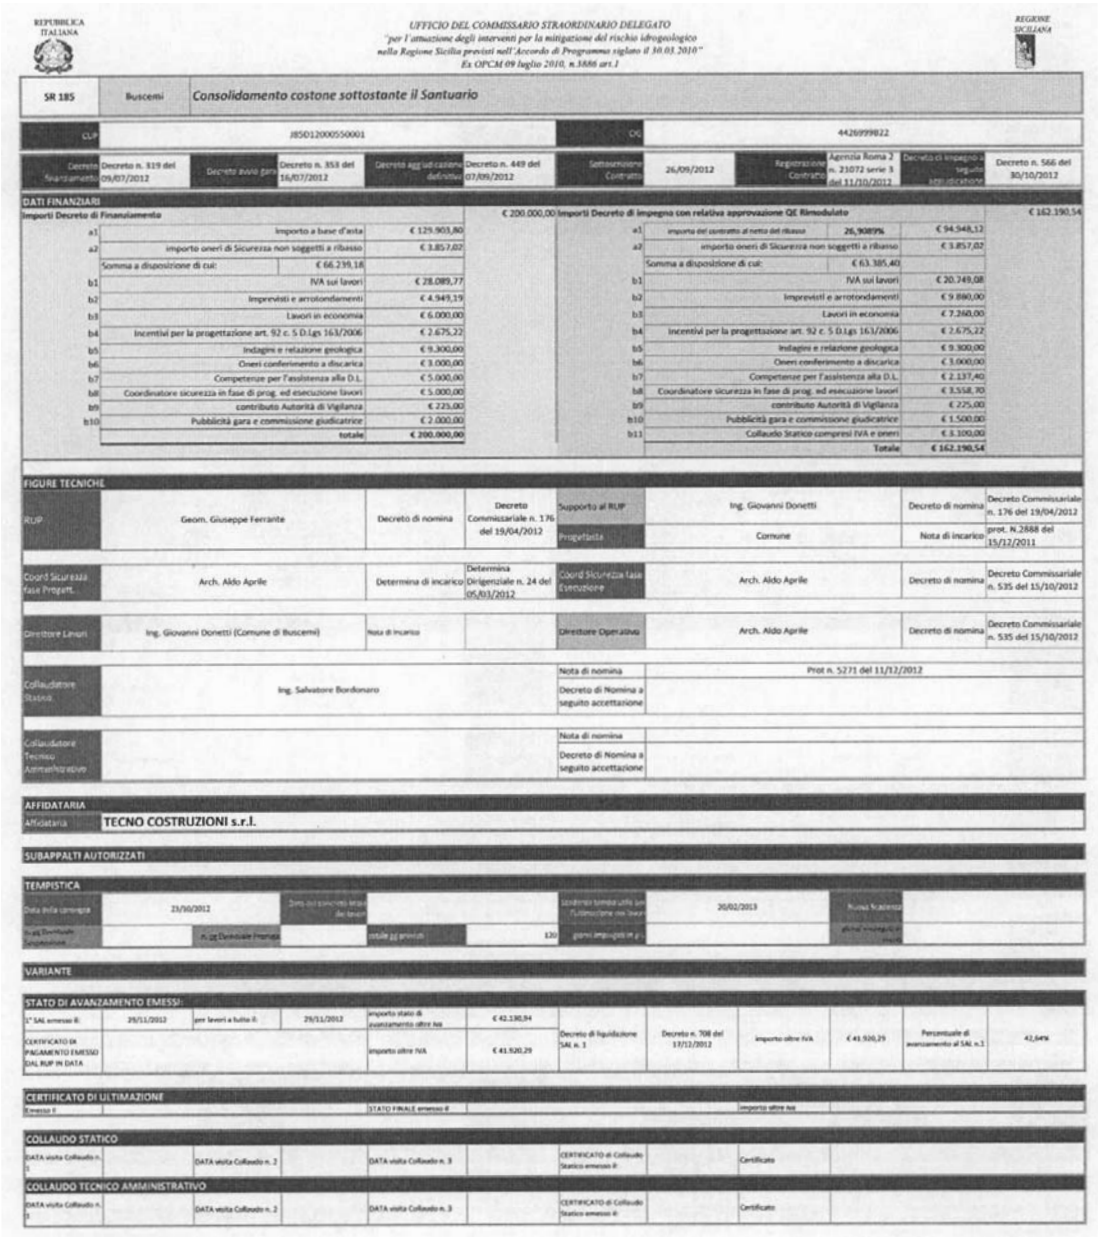

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

SR 185	Buscemi	*Consolidamento costone sottostante il Santuario*

CUP	J85D12000550001	CIG	4426999822

Decreto finanziamento	Decreto n. 819 del 09/07/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 353 del 16/07/2012	Decreto agg.ne definitiva	Decreto n. 449 del 07/09/2012	Sottoscrizione Contratto	26/09/2012	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 21072 serie 3 del 11/10/2012	Decreto di impegno a seguito approvazione	Decreto n. 566 del 30/10/2012

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 200.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			€ 162.190,54
a1	Importo a base d'asta	€ 129.903,80		a1	importo del contratto al netto del ribasso	26,9089%	€ 94.948,12
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.857,02		a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.857,02
	Somma a disposizione di cui:	€ 66.239,18			Somma a disposizione di cui:	€ 63.385,40	
b1	IVA sui lavori		€ 28.089,77	b1	IVA sui lavori		€ 20.749,08
b2	Imprevisti e arrotondamenti		€ 4.949,19	b2	Imprevisti e arrotondamenti		€ 9.880,00
b3	Lavori in economia		€ 6.000,00	b3	Lavori in economia		€ 7.260,00
b4	Incentivi per la progettazione art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006		€ 2.675,22	b4	Incentivi per la progettazione art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006		€ 2.675,22
b5	Indagini e relazione geologica		€ 9.300,00	b5	Indagini e relazione geologica		€ 9.300,00
b6	Oneri conferimento a discarica		€ 3.000,00	b6	Oneri conferimento a discarica		€ 3.000,00
b7	Competenze per l'assistenza alla D.L.		€ 5.000,00	b7	Competenze per l'assistenza alla D.L.		€ 2.137,40
b8	Coordinatore sicurezza in fase di prog. ed esecuzione lavori		€ 5.000,00	b8	Coordinatore sicurezza in fase di prog. ed esecuzione lavori		€ 3.558,70
b9	contributo Autorità di Vigilanza		€ 225,00	b9	contributo Autorità di Vigilanza		€ 225,00
b10	Pubblicità gara e commissione giudicatrice		€ 2.000,00	b10	Pubblicità gara e commissione giudicatrice		€ 1.500,00
	totale		€ 200.000,00	b11	Collaudo Statico compresi IVA e oneri		€ 3.100,00
					Totale		€ 162.190,54

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 176 del 19/04/2012	Supporto al RUP	Ing. Giovanni Donetti	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 176 del 19/04/2012
				Progettista	Comune	Nota di incarico	prot. N.2888 del 15/12/2011
Coord Sicurezza Fase Progett.	Arch. Aldo Aprile	Determina di incarico	Determina Dirigenziale n. 24 del 05/03/2012	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Aldo Aprile	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 535 del 15/10/2012
Direttore Lavori	Ing. Giovanni Donetti (Comune di Buscemi)	Nota di incarico		Direttore Operativo	Arch. Aldo Aprile	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 535 del 15/10/2012
Collaudatore Statico	Ing. Salvatore Bordonaro			Nota di nomina	Prot n. 5271 del 11/12/2012		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	TECNO COSTRUZIONI s.r.l.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	23/10/2012	Data ultimazione lavori da verbale		Lavori sospesi con verbale del		Lavori ripresi con verbale del	20/02/2013	Nuova fine lavori	
Prot. Domanda Proroga		Prot. Determinazione Proroga		totale gg proroghe	120	giorni impiegati in precedenza		giorni impiegati in questo	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	29/11/2012	per lavori a tutto il:	29/11/2012	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 42.130,94	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 708 del 17/12/2012	importo oltre IVA	€ 41.920,29	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	42,64%
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA				importo oltre IVA	€ 41.920,29						

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre Iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	Certificato

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	Certificato

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

TP	168	*Lavori di consolidamento del costone roccioso zona Crocifissello nel Comune di Erice*

CUP	I52I12000070001	CIG	4405430307

Decreto finanziamento	Decreto n. 223 del 16/05/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 331 del 10/07/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 428 del 23/08/2012	Sottoscrizione Contratto	09/10/2012	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 21882 serie 3 del 19/10/2012	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	-

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 500.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato				€ 265.358,67
a1	importo a base d'asta		€ 354.648,64	a1	importo del contratto al netto del ribasso	29,0332%	€ 251.682,79	
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 13.675,88	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 13.675,88	
	Somma a disposizione di cui:	€ 131.675,49			Somma a disposizione di cui:	€ 0,00		
b1	IVA sui lavori		€ 77.348,15	b1	spese di progettazione			
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006		€ 7.366,49	b2	Attività di consulenza Geotecnica			
b3	Per spese di pubblicazione, bando di gara e procedure urbanistiche		€ 3.683,25	b3	Accertamento e indagini compreso IVA			
b4	Imprevisti		€ 20.052,60	b4	Rilievi Topografici			
b5	Contributo Stazione appaltante AVCP		€ 225,00	b5	Rilievi aerofotogrammetrici			
b6	Studio geologico ed indagine geostrutturale		€ 19.000,00	b6	Oneri per conferimento in discarica			
b7	Per IVA Tassa Ordine, ecc, voce B.6		€ 4.000,00	b7	Contributo Stazione appaltante			
	totale		**€ 500.000,00**	b13	Spese Struttura Commissariale			
					Totale		€ 265.358,67	

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giovanni Indelicato (DRPC TP)	Decreto di nomina	Dcereto Commissariale n.107 del 15/03/2012	Supporto al RUP	Ass. Amm.vo Antonina Minaudo	Nota di incarico	nota prot. N. 982 del 23/03/2012 confermata con nota prot. N. 56813 del 24/08/2012
				Progettista	DRPC TP Arch. Maria Di Girolamo Ing. Gioacchino Lo Buglio	Nota di incarico	nota prot. N. 478 del 01 nov 2011

Coord Sicurezza fase Progett.	DRPC TP Arch. Maria Di Girolamo Ing. Gioacchino Lo Buglio	Nota di incarico	nota prot. N. 478 del 01 nov 2011	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	

Direttore Lavori	Arch. Vincenzo Loria	Nota di incarico	nota DRPC TP prot. N. 56813 del 24/08/2012 acquisita al prot 3219 del 24/08/2012	Assistente al DL	Funz. Dir. Geom. Pasquale Amodeo	Nota di incarico	nota prot. N. 982 del 23/03/2012 confermata con nota prot. N. 56813 del 24/08/2012
	Precedentemente incaricato Arch. Vincenzo Grammatico	Nota di incarico	nota prot. N. 982 del 23/03/2012		Funz. Dir.Giovanni Basciano	Nota di incarico	nota prot. N. 982 del 23/03/2012 confermata con nota prot. N. 56813 del 24/08/2012

Collaudatore Statico	Ing. Antonio Minutella	Nota di nomina	prot. n. 5288 del 12/12/2012
		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina	
		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	RENZO COSTRUZIONI s.r.l.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	26/11/2012	Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	26/02/2013	Nuova Scadenza	
n. gg Effettivo Appaltante		n. gg Derogati Proroga		totale gg previsti	90	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre 1/10	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

TP 169	Mazzara del Vallo	*Opere di protezione consolidamento e ripristino funzionalità infrastrutture – Zona Tonnarella*

CUP	D97D10000080002	CIG	4007689196

Decreto finanziamento	Decreto n. 216 del 11/05/2012	Gara PROVV OO.PP.	Effettuata dal Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria a seguito di nota del Commissario prot. 5 del 04/01/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Gara effettuata dal Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria - Ufficio 4 Opere Marittime	Sottoscrizione Contratto	24/07/2012	Registrazione Contratto	Agenzia delle Entrate di Patti serie 3 n. 952 del 24/08/2012	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	Decreto n. 603 del 13/11/2012

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento			€ 800.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato				€ 741.500,00
a1	importo a base d'asta		€ 600.000,00	a1	importo del contratto al netto del ribasso	9,7500%	€ 541.500,00	
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 20.000,00	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 20.000,00	
	Somma a disposizione di cui:	€ 180.000,00			Somma a disposizione di cui:	€ 180.000,00		
b1	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)		€ 12.400,00	b1	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)		€ 12.400,00	
b2	Oneri per conferimento in discarica		€ 1.000,00	b2	Oneri per conferimento in discarica		€ 1.000,00	
b3	roduzione progetto e gestione lavori ed assicurazione dipendenti		€ 6.200,00	b3	uzione progetto e gestione lavori ed assicurazione dipendenti		€ 6.200,00	
b4	Spese per pubblicazione e gara ed autorità di vigilanza		€ 500,00	b4	Spese per pubblicazione e gara ed autorità di vigilanza		€ 5.000,00	
b5	Spese indagini geologiche		€ 13.000,00	b5	Spese indagini geologiche		€ 14.286,75	
b6	Spese rilevi ed indagini biocenotiche e sedimentologiche		€ 7.200,00	b6	Spese rilevi ed indagini biocenotiche e sedimentologiche		€ 7.260,00	
b7	Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche collaudi e C.S.E.		€ 5.000,00	b7	Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche collaudi e C.S.E.		€ 12.000,00	
b8	IVA 21% sui Lavori		€ 130.200,00		IVA 21% sui Lavori		€ 117.915,00	
b9	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 4.500,00	b8	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 3.938,25	
	totale		€ 800.000,00	b13	Totale		€ 741.500,00	

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Pietro Viviano	Nota di Incarico	prot. N. 515/UC del 04/11/2010	Supporto al RUP		Decreto di nomina	
				Progettista	Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria Uff. 4 OO.MM Sicilia	Nota di Incarico	prot. N. 303 del 28/09/2010
Coord Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Ing. Leonardo Tallo	Nota di Incarico	prot. N. 303 del 28/09/2010	Assistente al DL	funzionario Provveditorato OO.PP. Ufficio genio civile OO.MM.	Nota di Incarico	prot. N. 303 del 28/09/2010
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	CONSORZIO STABILE VITRUVIO s.c.a.r.l.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data Area Consegna	26/04/2012	Data del riscontro di avvio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	23/09/2012	Giorni Sospensi	
Data Verbale Consegna	26/11/2012						
N. gg Esecuzione Progetto	n. gg Esecuzione Progetto		totale gg previsti	150	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	27/07/2012	per lavori a tutto il:	25/07/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 209.889,81						
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	04/09/2012			importo oltre IVA	€ 208.800,00	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Decreto n. 630 del 20/11/2012	importo oltre IVA	€ 208.800,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.1	17,38%
2° SAL emesso il:	28/11/2012	per lavori a tutto il:	12/11/2012	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 493.904,45						
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	07/12/2012			importo oltre IVA	€ 282.600,00	Decreto di liquidazione SAL n. 2	Decreto n. 704 del 17/012/2012	importo oltre IVA	€ 282.600,00	Percentuale di avanzamento al SAL n.2	67,96%

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE


Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre iva	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato

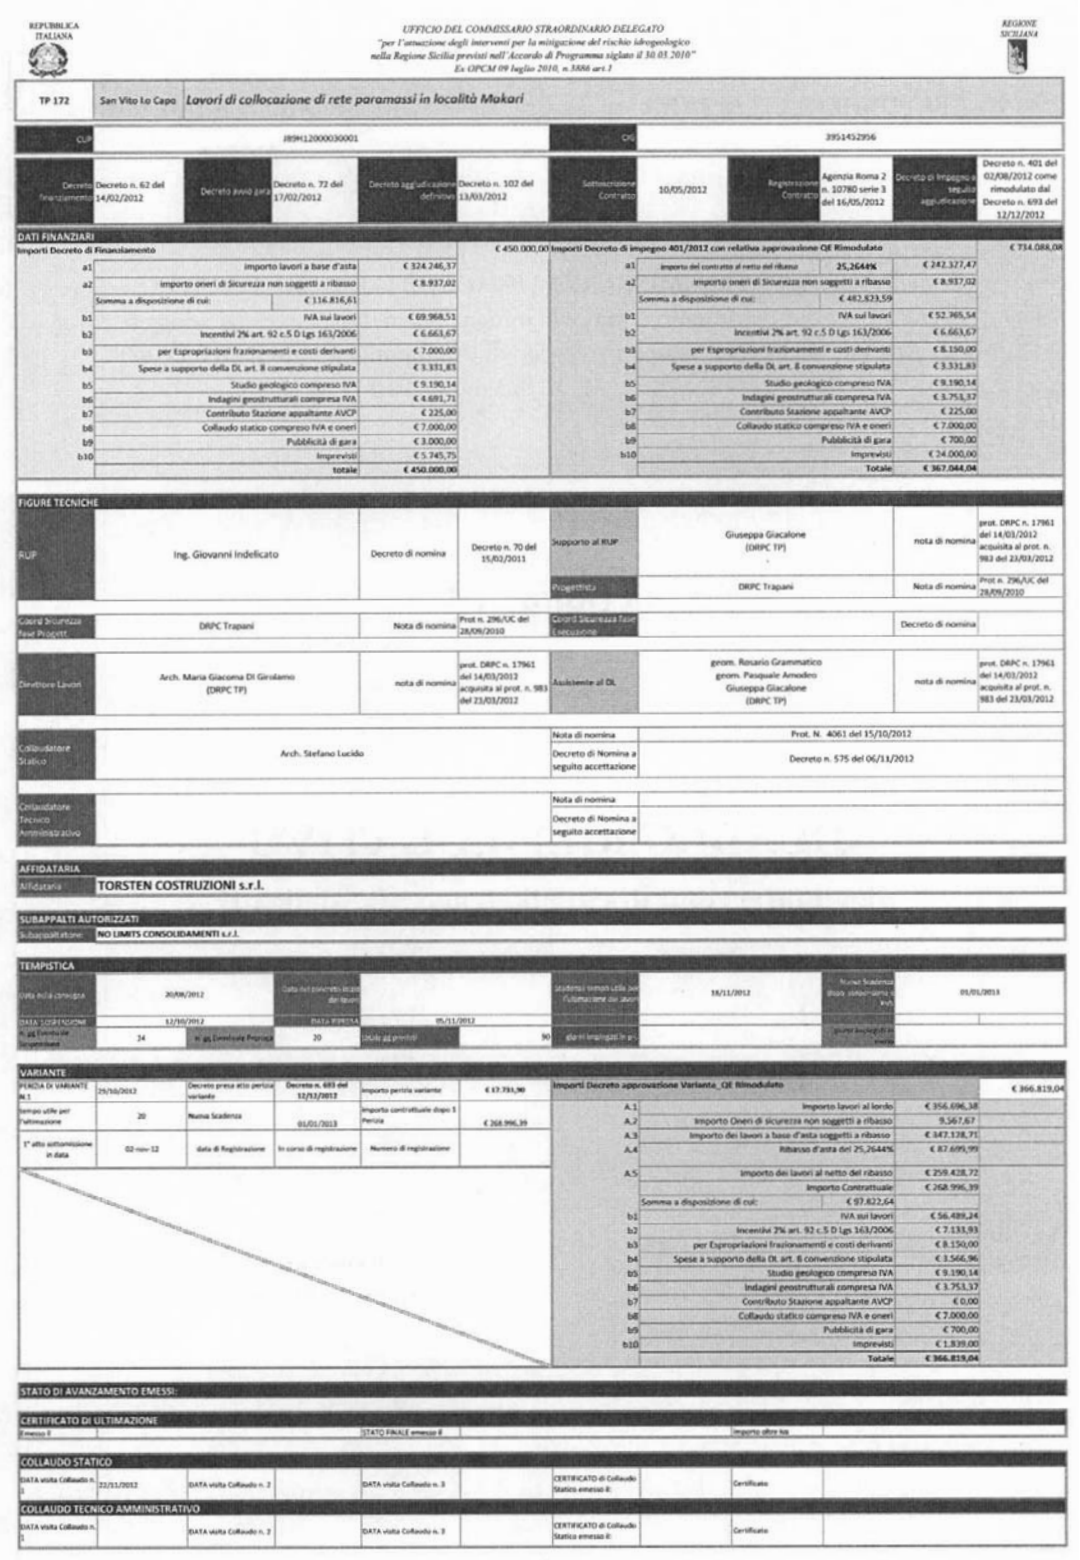

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

TP 172	San Vito Lo Capo	*Lavori di collocazione di rete paramassi in località Makari*

CUP	J89H12000030001	CIG	3951452956

Decreto finanziamento	Decreto n. 62 del 14/02/2012	Decreto avvio gara	Decreto n. 72 del 17/02/2012	Decreto aggiudicazione definitiva	Decreto n. 102 del 13/03/2012	Sottoscrizione Contratto	10/05/2012	Registrazione Contratto	Agenzia Roma 2 n. 10780 serie 3 del 16/05/2012	Decreto di impegno e seguito approvazione	Decreto n. 401 del 02/08/2012 come rimodulato dal Decreto n. 693 del 12/12/2012

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento € 450.000,00

a1	importo lavori a base d'asta		€ 324.246,37
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 8.937,02
	Somma a disposizione di cui:	€ 116.816,61	
b1	IVA sui lavori		€ 69.968,51
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006		€ 6.663,67
b3	per Espropriazioni frazionamenti e costi derivanti		€ 7.000,00
b4	Spese a supporto della DL art. 8 convenzione stipulata		€ 3.331,83
b5	Studio geologico compreso IVA		€ 9.190,14
b6	Indagini geostrutturali compresa IVA		€ 4.691,71
b7	Contributo Stazione appaltante AVCP		€ 225,00
b8	Collaudo statico compreso IVA e oneri		€ 7.000,00
b9	Pubblicità di gara		€ 3.000,00
b10	Imprevisti		€ 5.745,75
	totale		€ 450.000,00

Importi Decreto di impegno 401/2012 con relativa approvazione QE Rimodulato € 734.088,08

a1	Importo del contratto al netto del ribasso	25,2644%	€ 242.327,47
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 8.937,02
	Somma a disposizione di cui:	€ 482.823,59	
b1	IVA sui lavori		€ 52.965,54
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006		€ 6.663,67
b3	per Espropriazioni frazionamenti e costi derivanti		€ 8.150,00
b4	Spese a supporto della DL art. 8 convenzione stipulata		€ 3.331,83
b5	Studio geologico compreso IVA		€ 9.190,14
b6	Indagini geostrutturali compresa IVA		€ 3.751,37
b7	Contributo Stazione appaltante AVCP		€ 225,00
b8	Collaudo statico compreso IVA e oneri		€ 7.000,00
b9	Pubblicità di gara		€ 700,00
b10	Imprevisti		€ 24.000,00
	Totale		€ 367.044,04

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giovanni Indelicato	Decreto di nomina	Decreto n. 70 del 15/02/2011	Supporto al RUP	Giuseppa Giacalone (DRPC TP)	nota di nomina	prot. DRPC n. 17961 del 14/03/2012 acquisita al prot. n. 983 del 23/03/2012
				Progettista	DRPC Trapani	Nota di nomina	Prot n. 296/UC del 28/09/2010
Coord Sicurezza Fase Progett.	DRPC Trapani	Nota di nomina	Prot n. 296/UC del 28/09/2010	Coord Sicurezza Fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Arch. Maria Giacoma Di Girolamo (DRPC TP)	nota di nomina	prot. DRPC n. 17961 del 14/03/2012 acquisita al prot. n. 983 del 23/03/2012	Assistente al DL	geom. Rosario Grammatico geom. Pasquale Armodeo Giuseppa Giacalone (DRPC TP)	nota di nomina	prot. DRPC n. 17961 del 14/03/2012 acquisita al prot. n. 983 del 23/03/2012
Collaudatore Statico	Arch. Stefano Lucido			Nota di nomina	Prot. N. 4061 del 15/10/2012		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	Decreto n. 575 del 06/11/2012		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	TORSTEN COSTRUZIONI s.r.l.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	NO LIMITS CONSOLIDAMENTI s.r.l.

TEMPISTICA

Data Inizio consegna	20/08/2012	Data del verbale di inizio dei lavori		Giorni utili per l'ultimazione dei lavori	18/11/2012	Nuova Scadenza (Data comprensiva di IVA)	01/01/2013
DATA SOSPENSIONE	12/10/2012	DATA RIPRESA	05/11/2012				
n. gg Eventuale Sospensione	24	n. gg Contrattuali Proroga	20	Giorni gg previsti	90	gg di lavorabili in p.r.	

VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE N.1	25/10/2012	Decreto presa atto perizia variante	Decreto n. 693 del 12/12/2012	Importo perizia variante	€ 17.731,90
tempo utile per l'ultimazione	20	Nuova Scadenza	01/01/2013	Importo contrattuale dopo 1 Perizia	€ 268.996,39
1° atto sottomissione in data	02-nov-12	data di Registrazione	In corso di registrazione	Numero di registrazione	

Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato € 366.819,04

A.1	Importo lavori al lordo		€ 356.696,38
A.2	Importo Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		9.567,67
A.3	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 347.128,71
A.4	Ribasso d'asta del 25,2644%		€ 87.699,99
A.5	Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 259.428,72
	Importo Contrattuale		€ 268.996,39
	Somma a disposizione di cui:	€ 97.822,64	
b1	IVA sui lavori		€ 56.489,24
b2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006		€ 7.133,93
b3	per Espropriazioni frazionamenti e costi derivanti		€ 8.150,00
b4	Spese a supporto della DL art. 8 convenzione stipulata		€ 3.566,96
b5	Studio geologico compreso IVA		€ 9.190,14
b6	Indagini geostrutturali compresa IVA		€ 3.753,37
b7	Contributo Stazione appaltante AVCP		€ 0,00
b8	Collaudo statico compreso IVA e oneri		€ 7.000,00
b9	Pubblicità di gara		€ 700,00
b10	Imprevisti		€ 1.839,00
	Totale		€ 366.819,04

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre tot	

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1	22/11/2012	DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:		Certificato	

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

Allegato 5

QUADRO RIEPILOGATIVO

degli interventi di cui all'elenco "B" dell'AdP

Il Commissario Straordinario Delegato
(*Dott. Maurizio Croce*)

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV	COD	COMUNE	ENTE BENEF.	FONDI ATTUALI	TITOLO	COD. PAI DISSESTO	IMPORTO ASP	IMPORTO rimodulato	IMP FIN	Decreto di Finanziamento		Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI:	
										n.	data			Impresa	data inizio lavori
AG	002	Caltabellotta	COMUNE	B	Interventi di consolidamento del centro abitato "Consolidamento a Monte e a Valle della Via Colonello Vito- 2°stralcio funzionale esecutivo"	061-1CB-042	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	624	18-ago-11	Emesso nuovo Decreto di Finanziamento nell'agosto del 2011, il Primo Decreto è stato annullato a seguito di un rilievo della Corte dei Conti relativo ai certificati emessi per l'approvazione tecnica. I lavori sono stati aggiudicati in data 02.04.2012 all'impresa Anzalone Luigi & Co. - San Cataldo che ha offerto un ribasso del 24,7985% e i lavori sono stati consegnati il 2/05/2012. E' ancora in corso di stipula il contratto.	Avviati Lavori	Anzalone Luigi & Co.	02/05/2012
AG	003	Cammarata	COMUNE	B	Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia		€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	159	9-mar-12	La Progettazione è affidata al Genio Civile di Agrigento. Il 20/1/2011 affidate indagini geognostiche. Nel corso del comitato del 24 febbraio l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera B. I lavori sonostati aggiudicati all'impresa Panepinto Costruzioni s.r.l. con un ribasso del 26,508?%	Affidamento Lavori	Panepinto Costruzioni s.r.l.	
AG	004	Cattolica Eraclea	Commissario	B*	Mitigazione Rischio Idrogeologico - Crolli Costone Raccioso Eraclea Minoa		€ 1.480.000,00	€ 1.480.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
AG	005	Cianciana	COMUNE	B	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del versante ovest del centro abitato	063-1CI-092	€ 942.838,00	€ 855.618,05	€ 855.618,05	194	1-apr-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 194 del 1/4/2011 per un importo di euro 855.618,05. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 06/09/2011 con un ribasso del 23,2603% alla Torsteen Costruzioni.Contratto sottoscritto il 30/03/2012. Lavori avviati in data 31/05/2012	Avviati Lavori	Torsten Costruzioni	31/05/2012
AG	008	Montallegro	COMUNE	B	Consolidamento della parete Est del Monte Lupo sovrastante il centro abitato	064-1MO-001	€ 2.407.326,00	€ 1.435.536,03	€ 1.435.536,03	236	13-apr-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 236 del 13/4/2011 per un importo di euro 1.435.536,03. A seguito di procedura di gara i lavori sono stati affidati alla BCS COSTRUZIONI S.R.L. C/da Cicè Mistretta. Il Contratto è stato stipulato in data 06/06/2012 e i lavori avviati in data 19/06/2012.	Avviati Lavori	BCS COSTRUZIONI S.R.L.	19/06/2012
AG	009	Ravanusa	COMUNE	B	Consolidamento zona Est Centro abitato 1° stralcio	072-1RV-086	€ 1.000.000,00	€ 996.908,73	€ 996.908,73	28	2-feb-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 28 del 2/2/2011 per un importo di euro 996.908,73. Lavori aggiudicati con un Ribasso pari a al 22,597%. Sono in corso le attività necessarie per la stipula del contratto	Affidamento Lavori	Leenker Srl	
AG	012	Sambuca di Sicilia	COMUNE	B	Opere di consolidamento delle cavità sotterranee con sostegni metallici e in c.a.- chiodature - Quartiere "Sanzano"	059-1SA-032	€ 1.025.000,00	€ 1.025.000,00	€ 991.047,67	55	6-feb-12	Nel corso del comitato del 20 ottobre 2010 l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera B. L'intervento è stato finanziato e sono completate le procedure di affidamento. Lavori aggiudicati ca ATI DAMIGA srl. con un ribasso pari a al 26,6066%.	Affidamento Lavori	ATI DAMIGA s.r.l.	
AG	013	San Giovanni Gemini	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato Viale Alessi	063-1SG-023	€ 2.500.000,00	€ 2.474.826,76	€ 2.474.826,76	55	10-feb-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 55 del 10/2/2011 per un importo di euro 2.474.826,76. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 27/02/2012 con un ribasso del 53,1111%. Contratto in corso di stipula.	Affidamento Lavori	Idea Costruzioni Srl	
AG	014	Santo Stefano di Quisquina	Commissario	B*	Opere di consolidamento e rifacimento regimazione idrica zona a valle villa comunale		€ 2.360.195,11	€ 2.360.195,11				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
AG	174	Cattolica Eraclea	Commissario	B*	Crolli costone raccioso Eraclea Minoa	063-1CE-001	€ 1.170.000,00	€ 1.170.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
AG	174_int	Naro	COMUNE		Area Via Vannelle	068-1NA-074	€ 1.067.000,00	€ 1.067.000,00	€ 996.000,00	211	5-apr-12	l'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di gara	Affidamento Lavori		
AG	175_int	Palma di Montechiaro	COMUNE		Lavori di rinaturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano	011-SMB-017	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.782.329,33	160	9-mar-12	L'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori		
CL	016	Acquaviva Platani	COMUNE	B	Consolidamento della parete roccioso a monte della Via Marino Mistretta	063-2AQ-017	€ 1.000.000,00	€ 986.525,06	€ 986.525,06	185	29-mar-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 185 del 29/3/2011 per un importo di euro 986.525,06. Il contratto è stato stipulato in data 2/05/2012 ed i lavori sono avviati il 26/07/2012	Avviati Lavori		
CL	017	Butera	Commissario	B*	Consolidamento centro abitato	075-2BT-194	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
CL	018	Butera	Commissario	B*	Opere di consolidamento pendici del centro Storico	075-2BT-178	€ 800.000,00	€ 800.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario		

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV	COD	COMUNE	ENTE BENEF.	FONDI ATTUALI	TITOLO	COD. PAI OSSESTO	IMPORTO AdP	IMPORTO rimodulato	IMP FIN	Decreto di Finanziamento		Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI:	
										n.	data			Impresa	Data inizio lavori
CL	019	Caltanissetta	Commissario	B*	Consolidamento, bonifica e canalizzazione del versante sud della Collina S. Anna, Centro Storico e quartiere	072-2CL-286	€ 4.160.000,00	€ 4.160.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
CT	021	Acicatena	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Vampolieri		€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00				Progetto ancora non pervenuto	Progetto ancora non pervenuto		
CT	028	Licodia Eubea	Commissario	B*	Consolidamento Via Duca degli Abruzzi	078-3LE-039	€ 880.000,00	€ 880.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario		
CT	029	Maniace	COMUNE	B	Consolidamento Sponda sinistra T.te Martello		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00				Progetto ancora non pervenuto. in attesa procedure ambientali.	Progetto ancora non pervenuto		
CT	030	Maniace	COMUNE	B	Opere di regimazione idraulica e consolidamento delle scarpate - C/da Galatese-		€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00				Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto		
CT	032	Motta Sant'Anastasia	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato: Area Nord Est	095-3MO-028	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.426.994,01	440	9-ago-12	l'intervento è stato finanziatoe le pèrocedure di gara sono state avviate nel mese di dicembre 2012	Affidamento Lavori		
CT	035	Raddusa	COMUNE	B	Trincea drenante a monte del centro abitato e paratie di pali		€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.389.815,78	158	9-mar-12	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 158 del 9/3/2012 per un importo di euro 2.389.815,78.	Intervento finanziato		
CT	038	Santa Venerina	Commissario	B*	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Badia-T. Fago	095-3SV-005	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
CT	039	Sant'Agata Li Battiati	Commissario	B*	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Leucotio - Via Einaudi	095-3SL-001b	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
CT	040	Trecastagni	COMUNE	B	Interventi di consolidamento del centro abitato	095-3TR-001	€ 460.000,00	€ 446.849,79	€ 446.849,79	251	18-apr-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 251 del 18/4/2011 per un importo di euro 446.849,79. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 12/12/2011 con un ribasso del 24,0415%. Il contratto è stato sottoscritto in data 24/04/2012 e i lavori sono stati avviati il 03/05/2012	Avviati Lavori	ATI Conticello Luigi-Rinaudo Costruzioni	03/05/2012
CT	176_Int	Sant'alfio	COMUNE		Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	095-3SF-002/003	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00				Progetto non pervenuto	Progetto ancora non pervenuto		
EN	041	Barrafranca	COMUNE	B	Mitigazione del rischio zona Bivio Catena	Rischio Idraulico	€ 1.500.000,00	€ 1.608.973,06	€ 1.608.973,06	289	3-mag-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 289 del 3/5/2011 per un importo di euro 1.608.973,06.	Intervento finanziato		
EN	043	Gagliano Castelferrato	COMUNE	B	Consolidamento centro abitato	094-4GA-011/009	€ 1.560.000,00	€ 1.557.285,46	€ 1.557.285,46	235	13-apr-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 235 del 13/4/2011 per un importo di euro 1.557.285,46. La gara è stata indetta in data 19/09/2011. a seguito dell'espletamento delle procedure i lavori sono stati affidati al CONSORZIO ESSEGI con il quale è stato stipulato il contratto in data 16/04/2012	Contratto stipulato		
EN	45_1	Leonforte	COMUNE	B	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza Monte Cernigliere - Zona soprastante scuola Verga	094-4LE-158	€ 200.000,00	€ 400.000,00				Progetto ancora non pervenuto Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ è stato suddiviso in 2 stralci (scuola Verga / via Trieste) e si è deciso di accogliere la richiesta del Comune di finanziare solo lo stralcio relativo alla scuola Verga.	Progetto ancora non pervenuto		
EN	45_2	Leonforte		B	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza Monte Cernigliere - Zona soprastante lo via Trieste		€ 200.000,00	€ -				Progetto ancora non pervenuto Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ è stato suddiviso in 2 stralci (scuola Verga / via Trieste) e si è deciso di accogliere la richiesta del Comune di finanziare solo lo stralcio relativo alla scuola Verga.	Progetto ancora non pervenuto		
EN	046	Piazza Armerina	COMUNE	B	Interventi nel quartiere Itria	077-4PA-051	€ 1.130.000,00	€ 1.130.000,00	€ 1.130.000,00	27	2-feb-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 27 del 2/2/2011 per un importo di euro 1.130.000. I lavori sono stati affidati alla Consorzio Galile S.c.a.r.l.- Esec. Kimissa costr. S.r.l.. I lavori hanno avuto inizio il 5 settembre 2011	Avviati Lavori	Consorzio Galile S.c.a.r.l.- Esec. Kimissa costr. S.r.l.	05/09/2011

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV	COD	COMUNE	ENTE BENEF.	FONDI ATTUALI	TITOLO	COD. PAI DISSESTO	IMPORTO ADP	IMPORTO rimodulato	IMP. FIN	Decreto di Finanziamento		Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI	
										n.	data			impresa	data inizio lavori
ME	048	Alcara Li Fusi	COMUNE	B	Consolidamento costone roccioso sovrastante Centro Abitato	017-SAF-429/430	€ 1.880.000,00	€ 1.880.000,00	€ 1.880.000,00	485	19-lug-10	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 485 del 19/7/2010 per un importo di euro 1.880.000,00. I lavori sono stati aggiudicati in data 31/11/2011 all'impresa Sidati Costruzioni Srl- che ha offerto un ribasso del 53,731% . I lavori sono stati consegnati in data 07/03/2012	Avviati Lavori	Sidati Costruzioni Srl-	07/03/2012
ME	050	Alì	COMUNE	B	Opere di salvaguardia centro abitato 1° stralcio	102-E008 102-E009	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 843.098,81	161	12-mar-12	Intervento finanziato con D.D.G 161 del 12/03/2012	Intervento finanziato		
ME	054	Capizzi	COMUNE	B	Interventi di consolidamento del centro abitato	094-SCA-044	€ 1.200.000,00	€ 1.192.623,56	€ 1.192.623,56	142	16-mar-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 142 del 16/3/2010 per un importo di euro 1.192.623,56. I lavori sono stati aggiudicati in data 07/03/2012 all'impresa Torsten Costruzioni che ha offerto un ribasso del 23,4255% . Il contratto è stato firmato in data 26/03/2012. I lavori sono iniziati in data 09/05/2012.	Avviati Lavori	Torsten Costruzioni	09/05/2012
ME	055	Capo d'Orlando	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitatato	102-E04	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00				Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto		
ME	060	Castel di Lucio	COMUNE	B	Completamento degli interventi di mitigazione per il rischio idrogeologico in località Calvario per la S.P. 176 e per il Centro Abitato - Via S. D'Acquisto	024-SCT-047 024-SCT-046	€ 1.000.000,00	€ 999.676,87	€ 999.676,87	646	22-set-10	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 646 del 22/9/2010 per un importo di euro 999.676,87. in data 19/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati allo "PI.SA.NI srl - Mussomeli" con un ribasso del 21,8864%. I lavori hanno avuto inizio il 5 luglio 2011 e sono stati completati in data 12/07/2012 con certificato di ultimazione del 16/07/2012.	LAVORI ULTIMATI	PI.SA.NI srl - Mussomeli	05/07/2011
ME	064	Cesarò	COMUNE	B	Consolidamento e sistemazione idraulica a salvaguardia del Centro Abitato in zona Castello	094-SCE-073	€ 1.000.000,00	€ 965.547,00	€ 965.547,00	2	12-gen-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 2 del 12/1/2011 per un importo di euro 965.547,00. I lavori sono stati assegnati alla B.C.S. Costr. S.r.l. - Mistretta (ME). I lavori hanno avuto inizio il 7 settembre 2011	Avviati Lavori	B.C.S. Costr. S.r.l. - Mistretta (ME)	07/09/2011
ME	065	Ficarra	Commissario	B*	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada grenne		€ 1.028.981,00	€ 1.028.981,00				La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto in data 21.10.2010. Il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n.1 del 23.11.10. I lavori sono stati appaltati dal Comune, e iniziati in data 20.01.11. A seguito del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento transita alla lettera B (coperture finanziarie regionale). I lavori sono stati conclusi in data 03/11/2011.	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	EDILTECNICA COSTRUZIONI s.r.l.	20/01/2011
ME	067	Fondachelli Fantina	COMUNE	B	Opere di salvaguardia centro abitato	009-SFO-004	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 927.337,42	298	30-mag-12	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 298 del 30/05/2012 per un importo pari a € 927.337,42	Predisposizione atti di gara		
ME	068	Forza D'Agrò	Commissario	B*	Opere di consolidamento del centro abitato	097-SFZ-015	€ 1.250.000,00	€ 414.163,28				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario		
ME	069	Frazzanò	COMUNE	B	Lavori di consolidamento del centro abitato a valle della via S. Filippo di Fragalà - Zona Piazzale S.Lorenzo	016i-SFN-029	€ 1.165.000,00	€ 1.165.000,00	€ 1.165.000,00	54	6-feb-12	L'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori		
ME	070	Frazzanò	COMUNE	B	Opere di consolidamento ad est del centro abitato		€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	848	22-nov-11	Aggiudicazione UREGA Messina	Affidamento Lavori		
ME	074	Giardini Naxos	COMUNE	B	Consolidamento versante - Località Orto Grande		€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	9	18-gen-12	L'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori		
ME	075	Gualtieri Sicaminò	COMUNE	B	Interventi urgenti di consolidamento centro abitato	005-SGU-011	€ 1.651.000,00	€ 1.651.041,00	€ 1.651.041,00	273	22-apr-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 271 del 22/4/2011 per un importo di euro 1.651.041,00. La gara è stata indetta in data 14/11/2011. in corso di aggiudicazione	Affidamento Lavori		
ME	076	Itala	COMUNE	B	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Frazione Borgo	102-SIT-015 102-SIT-016	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.498.168,30	10	18-gen-12	L'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori		
ME	077	Leni	COMUNE	B	Opere di difesa costiera a difesa del centro abitato		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	792	26-ott-11	A seguito di espletamento di procedure di gara il contratto è stato stipulato il 15/06/2012. I lavori sonostati consegnati in data 28/09/2012	Avviati Lavori	Chiofalo Costruzioni r.r.l.	28/09/2012
ME	082	Limina	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato	098-SLM-016	€ 1.666.000,00	€ 1.666.000,00	€ 1.666.000,00	301	30-mag-12	L'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori		

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV	COD	COMUNE	ENTE BENEF.	FONDI ATTUALI	TITOLO	COD. PAI DISSESTO	IMPORTO AdP	IMPORTO rimodulato	IMP.FIN	Decreto di Finanziamento		Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI:	
										n.	data			impresa	data inizio lavori
ME	083	Longi	COMUNE	B	Interventi di consolidamento del centro abitato	016I-SLO-024	€ 1.503.100,00	€ 1.474.985,06	€ 1.474.985,06	153	18-mar-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 153 del 18/3/2011 per un importo di euro 1.474.985,06. Lavori aggiudicati in data 15/11/2011 alla DEMETRA LAVORI SRL con un ribasso del 24,16354% e consegnati in data 08/02/2012. Il Contratto è stato stipulato in data 17/04/2012	Avviati Lavori	Demetra Lavori Srl	08/02/2013
ME	084	Malfa	COMUNE	B	Messa in sicurezza e consolidamento del costone in località Torricella della	103-5MA-010	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 998.000,00	846	22-nov-11	Intervento finanziato	Affidamento Lavori		
ME	085	Malvagna	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato	096-5MV-010	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	288	3-mag-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 288 del 3/5/2011 per un importo di euro 1.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla MICHELANGELO MAMMANA con un ribasso d'asta pari al 23,44 e consegnanti in data 30/12/2011. Sono in corso le attività necessarie per la sottoscrizione del Contratto	Avviati Lavori	MICHELANGELO MAMMANA - Castel di Lucio (ME)	IN CORSO STIPULA
ME	086	Mandanici	COMUNE	B	Opere di salvaguardia centro abitato	100-5MN-032	€ 1.170.000,00	€ 1.149.942,49	€ 1.149.942,49	74	22-feb-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 74 del 22/2/2011 per un importo di euro 1.149.942,49. I lavori sono stati affidati alla ATIFIN.PAR 2000 s.p.a. ROMA con un ribasso d'asta pari al 22,832. I lavori sono sin corso.	Avviati Lavori	ATIFIN.PAR 2000 s.p.a. ROMA	20/10/2011
ME	090	Militello Rosmarino	COMUNE	B	Consolidamento all'interno del centro abitato in c/da Ramisi	017-5MR-046/047	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.441.161,25	584	29-ott-12	Intervento finanziato	Intervento finanziato		
ME	093	Monforte San Giorgio	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato	004-5MF-020	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	360	6-giu-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 360 del 6/6/2011 per un importo di euro 1.200.000,00.A seguito di espletamento di procedure di gara il contratto è stato stipulato in data 22/11/2012	Contratto stipulato	Consorzio Cooperativo Costruzioni Bologna	
ME	094	Motta Camastra	COMUNE	B	Completamento consolidamento del Centro Abitato per le zone Nord di Rocca Moncusa	096-5MO-008	€ 1.000.000,00	€ 993.521,35	€ 993.521,35	425	10-giu-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 425 del 17/6/2011 per un importo di euro 993.521,35. A seguito di procedure di gara il contratto è stato stipulato in data 22/02/2012 e i lvoori conseganti il 12/03/2012	Avviati Lavori	VERTICAL PROJECT s.r.l - Cesarò (ME)	12/03/2013
ME	096	Novara di Sicilia	COMUNE	B	Consolidamento del centro abitato	010-5NO-153	€ 400.000,00	€ 399.110,40	€ 399.110,40	196	1-apr-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 196 del 1/4/2011 per un importo di euro 399.110,40. I lavori sono stati affidati alla Chiofalo Group con un ribasso d'asta pari a 23,9471%	Avviati Lavori	CHIOFALO GROUP srl- San Filippo	25/11/2011
ME	097	Pagliara	COMUNE	B	Interventi di consolidamento del centro abitato	100-E-5PG-E02	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 911.521,64	163	12-mar-12	Intervento finanziato	Intervento finanziato		
ME	098	Patti	COMUNE	B	Consolidamento frazione Sorrentino	013-5PT-033	€ 1.300.000,00	€ 1.085.544,63	€ 1.085.544,63	154	18-mar-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 154 del 18/3/2011 per un importo di euro 1.085.544,63. La gara è stata aggiudicata in data 04/11/201. il contrattot è stato stipulato il 12/09/2012 e i lavori conseganti il 24/07/2012	Avviati Lavori	ATI CO.I.V di Rachieli S. - G.F. Costruzioni s.r.l. - eura infrastruttur a s.r.l. -Patti sorrentino s.r.l.	24/07/2012
ME	101	Reitano	COMUNE	B	Opere di consolidamento centro abitato		€ 980.000,00	€ 980.000,00	€ 966.114,00	849	22-nov-11	L'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori		
ME	102	Roccalumera	COMUNE	B	Consolidamento del centro abitato	100-E-5RC-E02	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	89	1-mar-11	I lavori sono stati consegnati il 12/10/2012 ed è in corso la stipula del contratto	Avviati Lavori	Consorzio ARTEK RomaGlada Costruzioni	12/10/2012
ME	103	Roccavaldina	COMUNE	B	Consolidamento centro abitato	004-5RV-001	€ 1.885.000,00	€ 1.885.000,00	€ 1.885.000,00	726	14-ott-10	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 726 del 14/10/2010 per un importo di euro 1.885.000,00. lavori sono stati affidati alla Sidoti Costruzione con un ribasso d'asta pari a 47,731%. Il Contratto è stata stipulato in data 26/03/2012 e i lavori sono stati avviati il 14/06/2012	Avviati Lavori	SIDOTI COSTRUZIONI srl- Montagnareale (ME)	14/06/2012
ME	104	Roccella Valdemone	COMUNE	B	Opere di salvaguardia centro abitato	096-5RL-021	€ 875.000,00	€ 875.000,00	€ 875.000,00	361	6-giu-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 361 del 6/6/2011 per un importo di euro 875.000,00. Aggiudicazione avvenuta il 21/11/2011	Affidamento Lavori		
ME	105	Rometta	Commissario	B*	Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare		€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV	COD	COMUNE	ENTE BENEF.	FONDI ATTUALI	TITOLO	COD PAI DISSESTO	IMPORTO ADP	IMPORTO rimodulato	IMP FIN	Decreto di Finanziamento		Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI	
										n.	data			importo	data inizio lavori
ME	106	S. Alessio Siculo	Commissario	B*	Barriera saffolta e radente a protezione del centro abitato		€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 4.748.406,18	461	28-ago-12	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Intervento finanziato Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
ME	108	San Pier Niceto	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato	004-SSC-013	€ 1.550.000,00	€ 1.550.000,00	€ 1.436.316,66	619	6-nov-12	Intervento finanziato	Intervento finanziato		
ME	110	San Piero Patti	COMUNE	B	Opere di consolidamento e regimazione idraulica del centro abitato	012-SST-122	€ 1.850.000,00	€ 1.850.000,00				Il Comune con nota del 10 feb 2011 chiede di trasferire l'intervento, 84P4 GP1, dalla lettera A alla lettera B, cioè di inserirla nel PO FESR 2007/2013; Il Comitato di Indirizzo e Controllo ha accolto l'istanze del Comune nel corso della	Istruttoria Progetto		
ME	111	Santa Lucia del Mela	COMUNE	B	Consolidamento centro abitato	007-SSL-002	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	572	31-ago-10	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 572 del 31/8/2010 per un importo di euro 1.300.000,00. in data 20/4/2011 I lavori sono stati aggiudicati alla "UNICOS S.r.l. - Aci Castello" con un ribasso del 21,380E%. I lavori hanno avuto inizio il 18 agosto 2011	Avviati Lavori	UNICOS srl Aci Castello	18/08/2011
ME	112	Santa Lucia del Mela	COMUNE	B	Consolidamento ed eliminazione rischio idrogeologica perimetro	007-SSL-001	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	88	1-mar-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 88 del 1/3/2011 per un importo di euro 1.200.000,00. I lavori sono stati affidati alla CIOFALO COSTR. S.R.L.-S.Filippo del Mela (ME) con un ribasso d'asta pari al 23,2012.I lavori hanno avuto inizio il 21/11/	Avviati Lavori	CIOFALO COSTR. S.R.L.-S.Filippo del	21/11/2011
ME	114	Sant'Agata di Militello	COMUNE	B	Intervento di difesa idraulica del centro abitato		€ 1.710.000,00	€ 1.710.000,00	€ 1.698.113,43	881	25-nov-11	l'intervento è stato finanziato e sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori		
ME	116	Savoca	COMUNE	B	Consolidamento centro abitato	098-SSX-009	€ 1.200.000,00	€ 1.195.875,88	€ 1.195.875,88	73	22-feb-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 73 del 22/2/2011 per un importo di euro 1.195.875,88. I lavori sono stati affidati alla Cadore Asfalti s.p.a. Belluno con un ribasso d'asta pari al 22,1. Il contratto è stato stipulato in data 09/03/2012	Contratto stipulato	Cadore Asfalti s.p.a. Belluno	
ME	117_1	Scaletta Zanclea	COMUNE	B	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scaletta Superiore, della fraz. Divieto e della c/da Consolidamento Erosione Codice	102-SSZ-016	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00				Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto		
ME	117_3	Scaletta Zanclea	COMUNE	B	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scaletta Superiore, della fraz.	102-SSZ-024	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00				Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto		
ME	118	Scaletta Zanclea	COMUNE	B	Sistemazione idraulica a monte del centro abitato - Zona Torrente Divieto Codice PAI 102-SSZ-020	102-E005	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00				Nel corso della riunione del 15 settembre 2011 il Comitato decide di riaccendere il finanziamento dell'intervento ME118 erroneamente revocato nel corso della riunione del 24 febbraio. L'intervento che riceve copertura finanziaria con altri fondi è il ME117_3	Progetto ancora non pervenuto		
ME	122	Spadafora	COMUNE	B	Consolidamento centro abitato	003-SSO-014	€ 1.330.000,00	€ 1.327.891,32	€ 1.327.891,32	571	31-ago-10	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 571 del 31/8/2010 per un importo di euro 1.327.891,32. I lavori sono stati affidati alla ATI Imp. Rubino s.r.l. Castell'Umberto - Imp- Trovato Torregrotte con un ribasso d'asta pari al 22,2222. Lo	Avviati Lavori	ATI Imp. Rubino s.r.l. Castell'Umbe	29/11/2011
ME	123	Spadafora	COMUNE	B	Consolidamento dell'area – Fraz. S. Martino	003-SSO-039	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	847	22-nov-11	lavori sono stati affidati alla PMP costruzioni srl con un ribasso d'asta pari a 26,178%.	Affidamento Lavori	PMP costruzioni srl	
ME	124	Terme Vigliatore	Commissario	B*	Ripascimento scogliere – Zona Terme Marchesana		€ 3.823.875,00	€ 3.823.875,00	€ 3.707.641,48	289	23-mag-12	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Intervento finanziato Ente Beneficiario Commissario		
ME	127	Tortorici	Commissario	B*	Muri e paratie mantevalle e opere idrauliche – Zona S.Paolo		€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Istruttoria Progetto		
ME	129	Tortorici	COMUNE	B	Opere di consolidamento, regimazione idraulica e drenaggi – Zona via Zappulla		€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 3.897.104,56	393	9-lug-12	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n.393 del 06/07/2012.	Affidamento Lavori		
ME	130	Tusa	Commissario	B*	Preservazione della barriera saffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.114.839,18	290	24-mag-12	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Intervento finanziato Ente		
ME	131	Ucria	Commissario	B*	Consolidamento del Centro Urbano in località Vasile-Belvedere	014-SUC-111 / 014-SUC-112	€ 1.261.000,00	€ 1.261.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario		
ME	133	Valdina	COMUNE	B	Protezione, Consolidamento e sistemazione idrogeologica dell'abitato di Valdina Centro - versante Est	003-SVA-009A	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	211	6-apr-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 211 del 6/4/2011 per un importo di euro 2.000.000,00. I lavori sono stati affidati allo ATIN ASC srl con un ribasso d'asta pari al 24,3987.	Contratto stipulato	ATIN ASC srl	
ME	134	Venetico	COMUNE	B	Consolidamento del centro abitato	003-SVE-013	€ 1.554.100,81	€ 1.554.100,81	€ 1.554.100,81	492	6-lug-11	[illegible] euro 1.554.100,81. In fase di espletamento le procedure per l'indizione della gara.	Affidamento Lavori		

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV	COD	COMUNE	ENTE BENEF.	FONDI ATTUALI	TITOLO	COD. PAI DISSESTO	IMPORTO AdP	IMPORTO rimodulato	IMP FIN	Decreto di Finanziamento n.	Decreto di Finanziamento data	Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI: impresa	AFFIDAMENTO LAVORI: data inizio lavori
ME	176	Giardini Naxos		B	Erosione costiere		€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00				Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto		
PA	135	Altofonte	COMUNE	B	Consolidamento centro abitato	028-6AO-017	€ 800.000,00	€ 789.270,00	€ 789.270,00	143	16-mar-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 143 del 10/3/2011 per un importo di euro 789.270,00. I lavori sono stati affidati alla Ditta Geom. Carmelo Congemi con un ribasso d'asta pari al 23,8727.Il Contratto è stato stipulato in data 29/01/2012 e	Avviati Lavori	Geom. Carmelo Congemi	11/04/2012
PA	138	Caltavuturo	COMUNE	B	Consolidamento centro abitato	030-6CL-179	€ 811.000,00	€ 793.690,51	€ 793.690,51	252	18-apr-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 252 del 18/4/2011 per un importo di euro 793.690,51. I lavori sono stati affidati alla Torsten Costruzioni con un ribasso d'asta pari al 23,2553.Il Contratto è stato stipulato in data 22/03/2012 e la consegna lavori è avvenuta il02/02/2012	Avviati Lavori	Torsten Costruzioni Srl	02/02/2012
PA	139	Campofelice di Roccella	COMUNE	B	Opere di consolidamento - C/da Belvedere		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00				Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto		
PA	140	Camporeale	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00				L'intervento transita, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato del 15 settembre 2011 dalla lettera A alla lettera B. Progetto ancora non pervenuto	Progetto ancora non pervenuto		
PA	144	Castronovo di Sicilia	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato:versante Est a difesa della Scuola Elementare di Via Mazzini,ecc.	063-6CS-010	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	186	29-mar-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 186 del 29/3/2011 per un importo di euro 1.600.000,00. lavori sono stati affidati a SCF Costruzioni s.r.l. con un ribasso d'asta pari al 23,0625% .Il Contratto è stato stipulato in data 17/05/2012 e la consegna lavori è avvenuta il 22/06/2012	Avviati Lavori	CF Costruzioni s.r.l.	22/06/2012
PA	145	Castronovo di Sicilia	COMUNE	B	Opere di consolidamento centro urbano	063-6CS-003	€ 1.344.000,00	€ 1.344.000,00	€ 1.291.335,45	359	22-giu-12	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 359 del 22/06/2012 sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori		
PA	146	Geraci Siculo	COMUNE	B	Progetto di consolidamento della zona nord orientale	026-6GE-108	€ 1.057.000,00	€ 1.057.000,00	€ 1.057.000,00	909	2-dic-10	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 909 del 2/12/2010 per un importo di euro 1.057.000,00. In data 20/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "Costruzioni San Giuseppe di Lonza Vincenzo s.a.s" con un ribasso del 22,4650%. In data 24/5/2011 riapertura gara a seguito ricorso della seconda classificata. nuova aggiudicazione alla Impresa Di Maria Costruzioni srl con un ribasso del 22,4622%. Lavori avviati il 13/04/2012e contratto firmato il 29/05/2012	Avviati Lavori	Di Maria Costruzioni srl	13/04/2012
PA	147	Marineo	COMUNE	B	Consolidamento centro abitato	037-6MA-008	€ 2.257.528,00	€ 2.257.528,00	€ 2.257.528,00	290	3-mag-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 290 del 3/5/2011 per un importo di euro 2.257.528,00.I lavori sono stati aggiudicati con un ribasso del 23,9653. I lavori sono stati avviati il 29/12/2011	Avviati Lavori	ATI Costr. San Giuseppe di Lonza Vincenzo e C.	29/12/2011
PA	148	Mezzojuso	Commissario	B*	Opere di consolidamento – Zona Collina Brigna		€ 2.144.000,00	€ 2.144.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
PA	150	Palermo	Genio Civile PA	B	Opere di regimazione idraulica - C.da Belmonte Chiavelli		€ 4.300.000,00	€ 4.300.000,00	€ 4.206.186,56	880	25-nov-11	In data 28/9/2010 affidata la progettazione al Genio Civile di Palermo. in corso di stipula contratto.	Affidamento Lavori	I.C.M. - Impresa Costruzioni Moderne - Agrigento	
PA	151	Partinico	Commissario	B*	Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò-terzo stralcio	042A-6PN-005	€ 950.000,00	€ 950.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
PA	152	Petralia Sottana	Commissario	B*	Opere di consolidamento - Quartiere Casale e Scavorello		€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	360	22-giu-12	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Intervento finanziato Ente Beneficiario Commissario		
PA	153	Polizzi Generosa	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato	030-6PO-130	€ 920.000,00	€ 908.469,01	€ 908.469,01	753	25-ott-10	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 753 del 25/10/2010 per un importo di euro 908.469,01. I lavori sono stati aggiudicati alla QUADRIFOGLIO s.r.l. -Polizzi Generosa con un ribasso offerto pari a 21,7273%. I lavori hanno avuto inizio il 10 giugno 2011	Avviati Lavori	QUADRIFOGLIO s.r.l. - Polizzi Generosa	10/06/2011

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV	COD	COMUNE	ENTE BENEF.	FONDI ATTUALI	TITOLO	COD PAI DISSESTO	IMPORTO AdP	IMPORTO rimodulato	IMP FIN	Decreto di Finanziamento		Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI:	
										n.	data			Impresa	data inizio lavori
PA	155	Termini Imerese	COMUNE	B	Intervento di monitoraggio del centro abitato	033-6TI-014	€ 198.625,00	€ 198.196,38	€ 198.196,38	754	25-ott-10	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 754 del 25/10/2010 per un importo di euro 198.196,38. In data 20/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "Bellino Costruzioni S.r.l. - Commarata" con un ribasso del 21,8288% pari ad euro 24.464,55 (lavori a base d'oste euro 112.074,65; oneri per la sicurezza euro 2.000,00).	Affidamento Lavori	Bellino Costruzioni srl Commarata	
PA	182	Corleone	COMUNE		Messa in sicurezza costone roccioso Contrada S. Giovanni	057-6CO-050	€ 1.578.183,23	€ 1.578.183,23	€ 1.538.432,67	358	12-giu-12	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 358 del 22/06/2012 e sono in corso le procedure di gara	Affidamento Lavori		
PA	183	Pollina	COMUNE		consolidamento della rupe S. Pietro	026-6PL-015	€ 800.000,00	€ 800.000,00				Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto		
RG	158_1	Modica	Commissario	B*	Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanto e Monserrato	083-7MO-003	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
RG	158_2	Modica	COMUNE	B	Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanto e Monserrato	083-7MO-002	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 999.095,22	804	28-ott-11	L'intervento previsto in APQ è stato suddiviso in 2 stralci e lo stralcio da 1000.000,00 è stato finanziato con decreto n.804 del 20/11/2011. Sono in corso le procedure di affidamento	Affidamento Lavori		
RG	160	Ragusa	COMUNE	B	Opere di consolidamento del centro abitato	082-7RG-060	€ 1.692.234,00	€ 1.674.051,32	€ 1.674.051,32	106	7-mar-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 106 del 7/3/2011 per un importo di euro 1.674.051,32. I lavori sono stati affidati alla "PRESAL COSTR. S.R.L.- S.Agata di Militello (ME)" con un ribasso del 23,2118% pari ad euro 24.464,55 (lavori a base d'asta euro 112.074,65; oneri per la sicurezza euro 2.000,00).	Affidamento Lavori	PRESAL COSTR. S.R.L.- S.Agata di Militello (ME)	
SR	164	Portopalo di Capo Passero	COMUNE	B	Opere di salvaguardia e difesa del centro abitato	085-8PO-001	€ 719.000,00	€ 719.000,00				Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto		
SR	166	Rosolini	Commissario	B*	Opere di consolidamento del centro abitato	086-8RO-006/007	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
TP	170	Poggioreale	COMUNE	B	Consolidamento versante orientale dell'abitato	057-9PO-006	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	493	7-lug-11	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 493 del 7/7/2011 per un importo di euro 1.500.000,00. I lavori sono stati affidati alla Spallina Costruzioni con un ribasso del 24,1644%	Affidamento Lavori	Spallina Costruzioni	
TP	171	Salemi	COMUNE	B	Sistemazione del costone roccioso Monte Rose a monte della via Marsala – Zona C.da Monte Rose		€ 1.500.000,00	€ 1.650.000,00	€ 1.650.000,00	12	18-gen-12	In Ottemperanza alle determinazioni del "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 il finanziamento relativo all'intervento viene aumentato, attraverso l'utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla mancata realizzazione dell'intervento ME79A_Librizzi pari a € 150,000€, passando da 1.500.000,00 a 1.650.000,00 euro. Nella stessa seduta del Comitato si stabilisce di far transitare l'intervento dalla lettera A alla Lettera B.	Intervento finanziato		
TP	173	Trapani	GENIO CIVILE TP	B	Opere di regimazione idraulica – Zona Salinagrande		€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	959	23-dic-11	L'intervento transita, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato del 24 feb 2011 dalla lettera A alla lettera B. Pertanto Con nota prot. 510 del 15 apr 2011 si comunica all'ARTA l'avvenuta variazione e si trasmette tutta la documentazione. In data 28/9/2010 affidato la progettazione al Genio Civile di Trapani.L'intervento è stato finanziato	Intervento finanziato		
TP	190	San Vito Lo Capo	Commissario	B*	Erosione costiera	R4 EC	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00				Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Relazione annuale anno 2012

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 10.12.2010

30/04/2013

Commissario Straordinario Delegato
Prof. Ing. Pier Gino Megale
REGIONE TOSCANA

1. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Pier Gino MEGALE



e. mail: pgmegale@lni.unipi.it
www.adbarno.it/commissario/
tel.: 335 455685

Nato a Pisa, 1946.
Ingegnere civile, sez. idraulica.
Professore associato di Idraulica agraria nell'Università di Pisa.
Membro esperto nel Comitato tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Arno.
Già membro della Segreteria tecnica della Direzione generale per la qualità della vita e successivamente della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. LA MISSIONE

Nell'ambito dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico di cui all'art. 2, comma 240, della Legge 191 del 2009 (Finanziaria 2010), il commissario straordinario delegato attua gli interventi di difesa del suolo individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta della regione, sentiti le autorità di bacino di rilievo nazionale e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Non compete quindi al commissario né l'individuazione degli interventi, né la destinazione delle risorse.

Non compete al commissario straordinario delegato la gestione degli stati di emergenza, affidati a commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile.

A compimento dell'**Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico**, sottoscritto in data 3 novembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana, il commissario straordinario delegato attua gli interventi, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi.

Per l'espletamento dei propri compiti il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi il commissario è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi.

I provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

3. LA CONTABILITÀ SPECIALE

Quale strumento gestionale per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse di più amministrazioni, enti ed organismi pubblici può essere adottata una contabilità speciale, intestata al funzionario responsabile, costituita dalle somme versate in tesoreria dalle amministrazioni firmatarie dell'accordo per formare fondi necessari per sua attuazione. Nella fattispecie la contabilità speciale è stata aperta a nome del commissario straordinario delegato.

Malgrado il diverso punto di vista della Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale del MiSE, è convincimento dello scrivente che la gestione della contabilità speciale debba avvenire in regime di cassa, anche alla luce del parere della Ragioneria generale dello Stato, secondo il quale per la stipula di contratti i commissari *"hanno a disposizione le risorse effettivamente* trasferite nella contabilità speciale, che rappresentano, quindi, la copertura finanziaria al momento *disponibile dell'opera delegata"*. Ciò impedisce al commissario di assumere "impegni" di spesa senza avere in cassa la somma corrispondente, ovvero aver ricevuto dai sottoscrittori dell'accordo di programma le risorse necessarie per la sua attuazione.

4. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Regione		**TOSCANA**
Decreto nomina del Commissario		*DPCM 10 dicembre 2010*
Data sottoscrizione Accordo		*3 novembre 2010*
Importo complessivo dell'Accordo		*€ 126.573.395,00*
Data sottoscrizione 1° Accordo integrativo		*3 agosto 2011*
Importo complessivo rimodulato a seguito del 1° Accordo integrativo		*€ 119.873.395,00*
Data sottoscrizione 2° Accordo integrativo		*9 novembre 2012*
Importo complessivo a seguito del 2° Accordo integrativo[1]		*€ 118.682.711,00*
Importo programmato per il periodo[2]*:*	*- 2011*	*€ 55.414.495,00*
	- 2012	*€ 46.619.200,00*
	- 2013	*€ 17.840.000,00*
Risorse trasferite alla contabilità speciale:	*- 2011*[3]	*€ 25.200.000,00*
	- 2012[4]	*€ 12.538.461,54*
Risorse impegnate[5]*:*	*- 2011*	*€ 24.470.266,00*
	- 2012	*€ 698.040,00*
Importo accantonato con obbligazioni giuridicamente vincolanti[6]*:*	*- 2011*	*€ 512.013,29*
	- 2012	*€ 16.670.054,66*
Importo pagato nel periodo:	*- 2011*	*€ 478.617,75*
	- 2012	*€ 7.953.263,81*

(1) In corso di registrazione alla Corte dei Conti. La cifra è inferiore di 38.684,00 euro rispetto a quella risultante da un corretto conteggio, che dovrebbe risultare pari a 118.721.395,00 euro.
(2) Da cronoprogramma, art. 3, DPCM 10.12.2010 (nomina), relativo all'importo previsto dall'Accordo di programma.
(3) 18.000.000,00 € in maggio, 7.200.000,00 € in novembre.
(4) 1.038.461,54 € in settembre, 11.500.000,00 € in dicembre.
(5) Riservate in contabilità speciale a seguito di atti del commissario.
(6) Contratti e analoghi

5. CRITICITÀ IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

Le tabelle che seguono forniscono un quadro sintetico della situazione toscana.

Regione Toscana		
Superficie	km^2	22 994
Comuni	n	287
Abitanti	n	3 745 786

Ripartizione geografica del territorio		
Tipologia	Toscana	Italia
Territorio montano	25,1%	35,2%
Territorio collinare	66,5%	41,6%
Territorio di pianura	8,4%	23,2%

Rischio idraulico			
Comuni soggetti	n	263	92%
Superficie totale soggetta	km^2	2 530	11%
Superficie totale soggetta a rischio idraulico molto elevato	km^2	973	4,2%

Legambiente, Protezione civile, Regione Toscana, ARPAT

Per quanto non abbia un significato diretto, si deve rilevare che la superficie soggetta ad allagamenti supera l'intera superficie di pianura.

Rischio da frana			
Numero dei fenomeni franosi (ISPRA 2009)	n	39 517	
Comuni soggetti	n	249	87%
Superficie totale soggetta	km^2	1 464	6,4%

Legambiente, Protezione civile, Regione Toscana, ISPRA

Danni provocati dalle frane		
Eventi con danni segnalati	n	3 919
Infrastrutture e trasporti		48,9%
Nuclei abitati e case sparse		18,7%
Corsi d'acqua		21,0%

Elaborazione CRESME su dati ISPRA (censimento frane 2007)

A fronte di un territorio pari al 7,6% di quello nazionale, in Toscana le aree in frana rappresentano l'8% del dato complessivo, anche se con un indice di franosità (6,4%) leggermente inferiore a quello medio nazionale pari a 6,9%. Circa la metà delle infrastrutture è minacciata da fenomeni

franosi. Un quinto delle frane incombe su corsi d'acqua, minacciando così di innescare anche fenomeni di straripamento.

Complessivamente un cittadino su otto vive in un'area soggetta a elevata criticità idrogeologica. Considerato che il costo aggiornato dei danni prodotti in Italia dal dissesto idrogeologico nel periodo 1944-2012 è stato valutato in 900 milioni di euro all'anno, l'orine di grandezza per la quota toscana può essere indicato in quasi 70 milioni di euro all'anno.

Elevata criticità idrogeologica - 2011			
Comuni soggetti	*n*	*97,6%*	*280*
Superficie totale soggetta	*km²*	*11,1%*	*2 542*
Popolazione residente	*n*	*12,8%*	*479 162*
Famiglie residenti	*n*	*12,8%*	*206 394*
Patrimonio edilizio sottoposto	*n*	*Abitazioni*	*229 701*
	n	*Edifici res.*	*92 347*
	n	*Non res.*	*12 974*

Elaborazioni CRESME su dati ISTAT e MATTM

Erosine costiera					
Sviluppo costiero	*km*	*Italia*	*7 911*	*Toscana*	*582*
Costa rocciosa	*km*	*4 138*	*52%*	*366*	*63%*
Costa armata	*km*	*592*	*8%*	*16*	*3%*
Spiagge	*km*	*3 181*	*40%*	*200*	*34%*
In erosione	*km*			*72*	*36%*
In ripascimento	*km*			*128*	*64%*

ENEA

Non deve trarre in inganno il rapporto apparentemente favorevole tra spiagge in erosione e spiagge in ripascimento, poiché il fenomeno erosivo è molto più incisivo di quello di crescita, che spesso registra tassi di pochi centimetri all'anno. Una ricerca bibliografica, effettuata per conoscere la variazione complessiva della superficie costiera della Toscana, ha riproposto da varie fonti la cifra di 214 000 m^2 come superficie perduta. Il dato fornisce la somma di fenomeni che si sono sviluppati in tempi e per lassi diversi, pertanto, pur confermando la prevalenza dei fenomeni erosivi, non consente di dare al bilancio un riferimento cronologico unico.

6. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

6.1. Ufficio del commissario e struttura operativa

L'ufficio del commissario ha sede presso l'Autorità di bacino del fiume Arno[1], in Firenze, di cui si avvale con apposita convenzione per il supporto tecnico, giuridico, amministrativo-contabile, e logistico. Buona parte della propria attività, comunque, è svolta dal commissario nel proprio ufficio dell'Università di Pisa, messogli a disposizione dal dipartimento di afferenza, dove sono conservati il protocollo e gli atti.

[1] Organismo misto stato-regione, il cui Comitato istituzionale è presieduto dal ministro dell'ambiente.

Del personale in servizio presso l'Autorità di bacino del fiume Arno, quello che affianca all'attività di istituto quella per il commissario, ricorre, se necessario, al lavoro straordinario nei limiti fissati dal DPCM 20.07.2011 e beneficia di una quota del 10% degli incentivi previsti dall'art. 92, comma 5, del D.lgs. n.163 del 2006, la cui ripartizione è stabilità dalla suddetta convenzione.

In particolare fanno parte dell'ufficio del commissario:

- il dirigente amministrativo dell'Autorità di bacino del fiume Arno, che coordina le attività dell'ufficio e provvede agli adempimenti amministrativi e alla gestione della contabilità speciale;
- il *coordinatore dell'ufficio legislativo*, che fornisce consulenza giuridica e attività di segreteria;
- un funzionario tecnico ingegnere, che segue gli interventi a prevalente rilevanza idraulica;
- un funzionario tecnico geologo, che segue gli interventi sulle frane;
- un tecnico informatico, che provvede degli adempimenti informatici e alla gestione del sito web.

Per gli aspetti legati agli appalti e ai contratti l'ufficio si avvale della consulenza del responsabile del Servizio gestione gare di appalto della Provincia di Massa Carrara.

L'Autorità di bacino ospita nel proprio spazio informatico il sito web del commissario, che dà notizie sull'Accordo di programma e sull'andamento della gestione commissariale. Il sito fornisce inoltre informazioni, strumenti e recapiti utili ai responsabili del procedimento per rendere più agevole il loro compito. www.adbarno.it/commissario/

È fatto ampio ricorso a strumenti informatici e ad archivi condivisi, raccolti in un unico spazio accessibile per via telematica (VPN) a tutti gli operatori, indipendentemente dall'ubicazione del posto di lavoro.

6.2. Attuazione degli interventi

Per l'attuazione degli interventi il commissario ricorre all'istituto dell'avvalimento, utilizzando di preferenza i soggetti competenti in via ordinaria, pur conservando la titolarità e l'esercizio della propria funzione; approva tutti gli atti che producono spesa e provvede direttamente ai pagamenti, con la snellezza e semplicità amministrativa tipica della contabilità speciale di cui è titolare. Questa procedura inoltre affranca la gestione dei finanziamenti dai vincoli del patto di stabilità interno.

Il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 9 dell'Accordo di programma (ReNDiS) è effettuato direttamente dall'ufficio del commissario.

6.3. Costi di gestione

Il DPCM 20.07.2011 dà facoltà ai commissari di gravare sul quadro economico di ciascun intervento una somma non superiore all'1,5% dell'importo dell'intervento, per sostenere le spese legate all'espletamento del proprio incarico, senza incidere sulla quota a copertura dei compensi.

In relazione all'entità dell'Accordo di programma il costo della gestione commissariale, inclusi i compensi del commissario, è stato stimato a suo tempo nello 0,8% dell'importo complessivo degli interventi. Prudenzialmente sul quadro economico di ciascuno di essi viene fatta gravare una quota dell'1%.

Dopo due anni di attività, l'incidenza dei costi della gestione commissariale, compresi i compensi del commissario, può essere stimata in circa lo 0,5 % dell'importo degli interventi.

Tale quota non tiene conto del rimborso del trattamento economico corrisposto al commissario dall'Università di Pisa, ai sensi dell'art. 17 del DL 195 del 2009. In attesa di sapere se il rimborso debba gravare, come gli altri costi di gestione, sulle risorse destinate all'attuazione dell'accordo di programma, una cifra pari al rimborso per gli anni 2010-2012 è stata accantonata dal commissario nella contabilità speciale.

7. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE


Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente				
Data	*Importo corrente (per l'anno 2012)*	*Importo cumulato (anno 2012 + precedente periodo)*	*Speso*	*Residuo*
18.09.2012 *10.12.2012*	*1.038.461,54* *11.500.000,00* ***12.538.461,54***	***30.538.461,54***	***2.751.826,32***	***27.786.635,22***

Risorse economiche provenienti dalla Regione Toscana				
Data	*Importo corrente (per l'anno 2012)*	*Importo cumulato (anno 2012 + precedente periodo)*	*Speso*	*Residuo*
14.11.2011	***0.00*** (1)	***7.200.000,00***	***5.680.055,24***	***1.519.944,76***

(1) Con decreti dirigenziali 6314 e 6489 del 21 dicembre 2012 la Regione Toscana ha stabilito di trasferire alla contabilità speciale del commissario rispettivamente 5.582.711,00 euro e 2.000.000,00 di euro. Ad oggi tali fondi non sono ancora stati accreditati.

8. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ E RELATIVO STATO DELLA SPESA

Descrizione attività	*Importo speso corrente (per l'anno 2012)*	*Importo speso cumulato (anno 2012 + precedente periodo)*
struttura commissariale compensi compresi	***66.331,51***	***94.723,17***
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	***7.886.932,30***	***8.337.158,39***

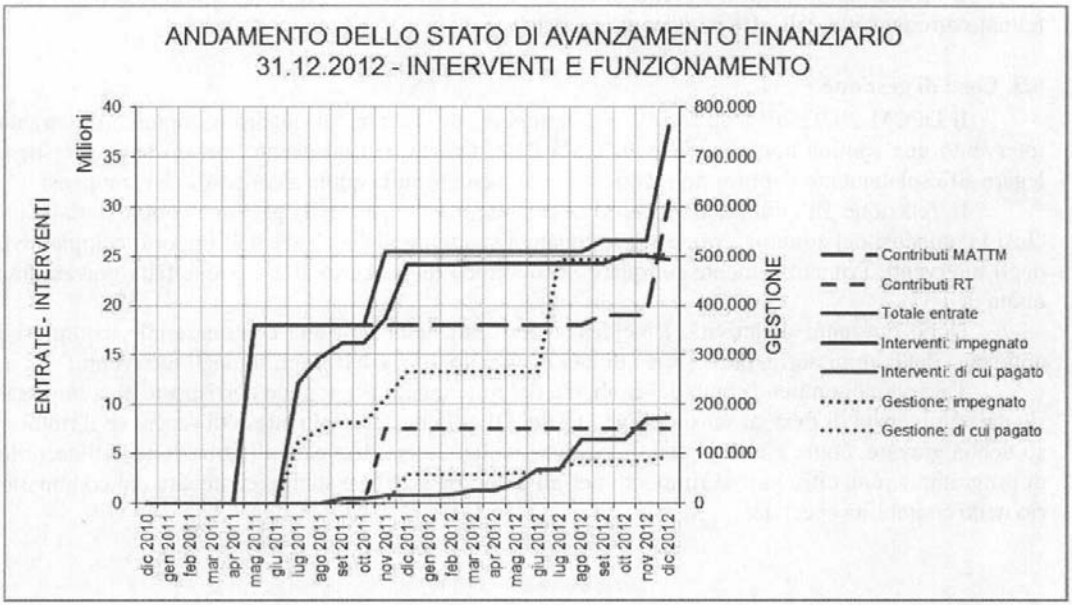

9. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

Il Commissario straordinario delegato

COMMISSARIO DELEGATO: Prof. Ing. Pier Gino Megale D.P.C.M. del 10 dicembre 2010

Attuazione dell'accordo di programma del 3 novembre 2010 tra Ministero dell'Ambente e la Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico

RENDICONTO N. 1 Esercizio finanziario 2012

CS RISCHIO IDROGEOL TOSCANA

Contabilità speciale n. 5588 aperta il 28 aprile 2011

FONDI RICEVUTI ENTRATE	
Giacenza di cassa al 01/01/12	€ 24.721.382,25
1) Fondi Comunitari	€ 0,00
2) Fondi Statali	€ 12.538.461,54
3) Fondi Regionali	€ 0,00
4) Fondi di Enti Locali	€ 0,00
5) Tariffe e proventi per servizi	€ 0,00
6) Accensione prestiti	€ 0,00
7) Altro	€ 0,00
Totale al 31/12/12	€ 37.259.843,79

IMPORTI EROGATI USCITE	
Tipologie di spesa:	
1) Redditi da lavoro dipendente	13.462,16
2) Consumi intermedi	19.715,68
3) Interessi passivi	0,00
4) Trasferimenti a Regioni	5.810,72
5) Trasferimenti a Enti Locali	151.213,37
6) Investimenti diretti	7.705.124,83
7) Trasferimento in c/capitale	0,00
8) Rimborso prestiti	0,00
9) Versamenti erariali	45.001,71
10) Versamenti previdenziali	12.935,34
11) Altro	0,00
Totale uscite	7.953.263,81
12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	0,00
Disponibilità di cassa	29.306.579,98
Totale a pareggio	37.259.843,79

Firenze, li _____

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Ing. Pier Gino Megale)

IL DIRETTORE
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI _____

10. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

10.1. *DGR 1172/2011 e 2° Atto integrativo all'accordo di programma*

Agli inizi la Regione Toscana ha manifestato una forte propensione a gestire la propria quota di cofinanziamento dell'Accordo di programma direttamente, al di fuori della contabilità speciale del commissario (vedi relazione annuale 2011).

L'Accordo di programma, così come il primo atto integrativo, prevede che 20.138.684,00 euro di finanziamento regionale gravino su fondi FAS 2007-2013, linea 3.4.1.

Malgrado le perplessità del commissario, manifestate in tutte le sedi, la Regione Toscana ha convenuto col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di gestire direttamente, tramite l'agenzia regionale ARTEA, la parte finanziaria relativa a tale quota di finanziamento. Il meccanismo riservato agli interventi gestiti tramite ARTEA comporta la diretta individuazione da parte della regione della stazione appaltante, che riveste il ruolo di ente attuatore in sostituzione del commissario e provvede alla nomina del responsabile del procedimento.

Questa procedura è stata avviata alla fine del 2011 con la Delibera GR n. 1172 del 19.12.2011, che ha individuato, tra quelli previsti dall'accordo, 17 interventi da finanziare con fondi FAS per un totale di 6.279.000,00 euro.

Successivamente, a seguito delle richieste del commissario sostenute dal parere negativo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato sulla legittimità della procedura avviata con la DGR 1172/2011, la procedura stessa è stata ratificata tramite un secondo atto integrativo all'Accordo di programma, sottoscritto in data 9 novembre 2012. L'atto integrativo prevede che le risorse PAR-FAS stanziate dalla regione per il finanziamento dell'accordo siano gestite dalla Regione Toscana tramite ARTEA, come sopra indicato. Tali risorse coprono il finanziamento di 42 interventi, compresi i 17 previsti dalla DGR 1172/2011 e le procedure relative sono state avviate. Alla data attuale l'atto integrativo è ancora in corso di registrazione presso la Corde dei conti, in attesa di chiarimenti.

10.2. Modalità di attuazione degli interventi e descrizione delle attività

È parso utile ricordare che l'attuazione di un intervento passa attraverso tre fasi:

- la progettazione, che culmina con l'approvazione del progetto, normalmente l'esecutivo, dopo aver raccolto tutti i pareri, prescrizioni e approvazioni richieste;
- *l'affidamento*, che si conclude col contratto d'appalto;
- l'*esecuzione* dei lavori e il loro collaudo.

Per redigere un progetto è sempre necessario disporre di adeguate risorse, perché, per quanto un'amministrazione possa essere dotata di una struttura operativa robusta, alcune attività come rilievi, sondaggi, indagini e prove e certe prestazioni specialistiche non possono che essere necessariamente affidate all'esterno. Laddove, poi, l'amministrazione non possieda le competenze necessarie, il contributo esterno diventa predominante. Quindi anche la sola progettazione non può essere avviata senza un adeguato finanziamento.

Il tempo per disporre di un progetto "cantierabile" dipende dall'entità delle attività propedeutiche, dalla complessità del progetto e dai tempi di approvazione, che per progetti di complessità ordinaria sono i più lunghi. A questi si aggiungono i tempi per l'affidamento delle prestazioni esterne. In pratica si oscilla complessivamente tra i 4 e gli 8 mesi.

I tempi minimi di appalto sono fissati dalla legge, ma nella pratica possono variare in funzione del numero dei concorrenti e dal criterio di aggiudicazione prescelto. Ottimisticamente possono essere valutati in non meno di 4, 5 mesi. Quindi la firma del contratto di appalto, anche per lavori di modesta entità, non può avvenire prima di 8 mesi dall'inizio della progettazione, ma casi più articolati si può superare abbondantemente un anno, sempre che siano disponibili le risorse necessarie.

Il tempo di esecuzione dei lavori dipende, ovviamente, dalla loro entità, salvo imprevisti.

Come accennato al punto 6.2 il commissario attua gli interventi avvalendosi di preferenza e ove possibile dei soggetti competenti in via ordinaria. Questa scelta, condivisa fin dagli inizi con la Regione Toscana, avrebbe permesso di avviare più opere contemporaneamente, ripartendo gli interventi tra più soggetti diversi. Purtroppo il flusso finanziario insufficiente a garantire copertura a tutti gli interventi previsti dal cronoprogramma non lo ha permesso. Di tale circostanza, ai sensi dell'art. 3 del DPCM di nomina, è stata data formale comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota 3 marzo 2012, prot. n. 280/2012.

L'avvalimento, disposto con ordinanza e perfezionato con apposita convenzione con l'ente avvalso, è disciplinato dal Regolamento di avvalimento approvato con decreto commissariale 21 novembre 2011, n. 5, e modificato e integrato con decreti 30 marzo 2012, n. 23, 5 luglio 2012, n. 50 e 29 ottobre 2012, n. 78. Il regolamento definisce il ruolo e gli impegni dell'ente avvalso, il processo di realizzazione degli interventi, i limiti di spesa per la progettazione e le attività tecniche, le procedure dei pagamenti e il supporto tecnico e amministrativo fornito dal commissario. Il quadro riassuntivo del processo di attuazione degli interventi è riportato in allegato.

Di norma l'avvalimento riguarda la progettazione e la realizzazione dell'intervento, compreso *l'appalto*. Tutti gli atti che producono spesa sono approvati dal commissario che, assumendone così la titolarità, provvede direttamente ai pagamenti.

Nella prima fase operativa della gestione commissariale, cioè a partire dall'accreditamento in contabilità speciale della prima tranche dei finanziamenti (maggio 2011), con l'ordinanza di avvalimento venivano accantonate per intero le risorse previste per ciascun intervento, avviando con residui di cassa insufficienti a garantire anche la copertura dei lavori, i progetti di altri interventi, in attesa di ulteriori trasferimenti.

Purtroppo l'incertezza sui tempi di trasferimento delle risorse, e non solo, ha rallentato l'attività di progettazione, per cui il proposito di disporre di progetti esecutivi all'atto dei successivi trasferimenti non è stato sempre rispettato. Ha contribuito anche il fatto che gli accrediti sono avvenuti senza alcun preavviso, cosa che ha impedito un minimo di programmazione.

L'inaspettato trasferimento di risorse tanto statali che regionali (ciò è ascrivibile anche agli effetti del patto di stabilità) verificatosi a fine anno, ha fornito una significativa disponibilità di cassa, che ha indotto ad avviare nuovi interventi e a modificare le procedure.

A *partire dall'inizio del 2013* l'ordinanza di avvalimento, individua l'ente avvalso, nomina il responsabile del procedimento (RUP), approva il progetto presentato dall'ente, generalmente il preliminare, e, sulla base del quadro economico, accantona e mette a disposizione la somma necessaria per redigere il progetto esecutivo. Nella fase che segue approva i disciplinari e i contratti delle attività affidate all'esterno dell'ente, verificandone la congruenza con le previsioni di spesa, e paga le conseguenti fatture su liquidazione del RUP. Successivamente approva il progetto esecutivo, verificato, validato e ratificato in linea tecnica dall'ente in avvalimento

Soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo, in funzione delle disponibilità di cassa, il commissario *autorizza l'avvio della gara di appalto* e accantona le somme necessarie previste dal quadro economico. Questa procedura rende più elastica la gestione dei finanziamenti e mette in competizione gli enti avvalsi, in quanto le risorse per la realizzazione delle opere sono destinate agli interventi che per primi possono andare in gara. Questa sollecitazione è avvertita soprattutto dalle amministrazioni comunali, più sensibili ai disagi del territorio.

Conclusasi positivamente la procedura di gara, il commissario approva il contratto di appalto e il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, paga gli stat*i d'avanzamento* certificati dal RUP, approva eventuali *varianti in corso d'opera*, nomina se necessario il collaudatore e approva il collaudo o il conto finale e il certificato di regolare esecuzione.

Rispetto al trasferimento delle risorse agli enti appaltatori, la gestione di una contabilità speciale ha il vantaggio già accennato in precedenza di non dover sottostare ai vincoli del patto di stabilità. In più il pagamento diretto delle spese da parte del commissario è molto rapido, non più di 15 giorni dalla liquidazione, cosa che spinge le imprese a una maggiore produttività e riduce il conten-

zioso; ne sia prova il fatto che ad oggi nessuna delle imprese appaltatrici ha posto riserve in contabilità.

Si deve rilevare che non vi è alcun rapporto tra la natura o la dimensione dell'ente avvalso e l'efficienza operativa. Anzi molto spesso le amministrazioni più piccole sono più disponibili ad accettare l'avvalimento si dimostrano più efficienti e dinamiche di quelle di maggiori dimensioni, appesantite da meccanismi burocratici articolati in compartimenti stagni.

Nella tabella che segue sono riportati, con riferimento alla data di stesura della presente relazione e limitatamente a quelli attuati dal commissario, il numero degli interventi affidati in avvalimento e il loro valore complessivo distinti per tipologia di ente avvalso.


Enti in avvalimento	n. interventi	importo complessivo
Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti	15	10.934.000,00
Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti	6	6.060.000,00
Unioni di comuni		
Consorzi di bonifica	2	1.803.000,00
Province	19	32.951.800,00
Uffici del genio civile (Regione Toscana)	1	1.500.000,00
Totale	43	53.248.800,00

Salta all'occhio lo scarso coinvolgimento degli Uffici regionali del genio civile, di cui ci si sarebbe aspettata una maggiore disponibilità proprio in relazione alla straordinarietà del Piano. C'è da dire, però, che le emergenze prodotte dalle alluvioni in Lunigiana, all'Isola d'Elba e nel grossetano hanno costretto gli apparati regionali a mobilitare tutte le risorse tecniche disponibili. Le ripetute emergenze della Lunigiana giustificano, anche se solo in parte, i forti ritardi nella stesura dei progetti degli interventi affidati alla Provincia di Massa Carrara, per far fronte ai quali è in corso una ridistribuzione degli avvalimenti.


10.3. Livello di attuazione globale degli interventi

A seguito della suddivisione in lotti di alcuni interventi e dei nuovi accordi sanciti dal Secondo atto integrativo, il numero complessivo degli interventi al 31.12.2012 è 86, di cui 42, finanziati con fondi PAR-FAS, sono gestiti attraverso ARTEA. Per essi il commissario esercita la funzione di impulso e controllo, ma non quella di soggetto attuatore che è affidata direttamente agli enti appaltatori. Gli interventi attuati dal commissario tramite contabilità speciale sono quindi 44.

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	n. interventi al dicembre 2012	n. interventi al dicembre 2011
Attuati tramite ARTEA	42	17
Attesa di avvio	10	42
In corso di progettazione indagini comprese.	21	19
Progettazione ultimata		
In corso di appalto	3	3
In esecuzione	3	4
Lavori ultimati (collaudati e non)	7	2
Totale interventi finanziati	86	87

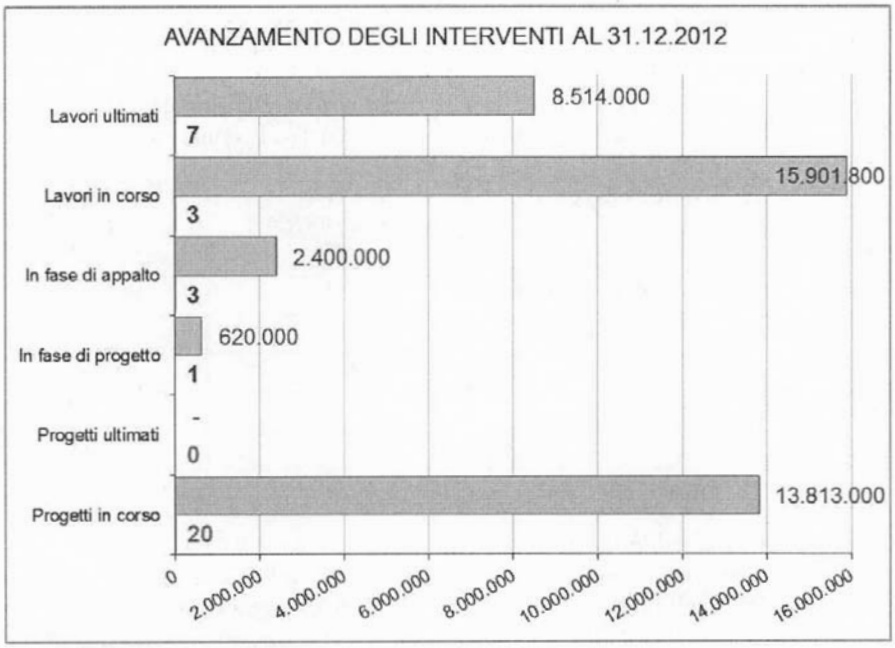

Gli importi indicati nel grafico precedente e in quello che segue fanno riferimento alle somme previste per ciascun intervento dall'Accordo di programma.

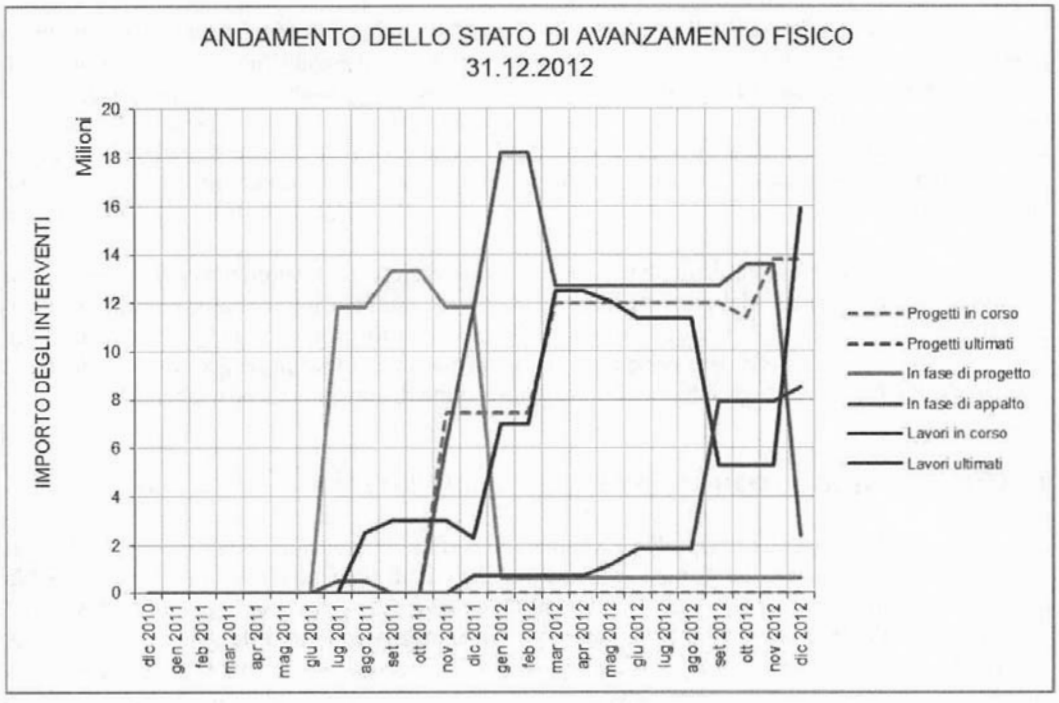

Il trasferimento degli interventi ad ARTEA è avvenuto a seguito di provvedimenti assunti alla fine del 2011 per i primi 17 e del 2012 per i restanti 25. L'attività degli interventi ARTEA 2011

in realtà ha avuto inizio soltanto nel 2012 e quella degli interventi ARTEA 2012 soltanto nel 2013.

Mentre gli interventi attuati dal commissario sono modulati in base alla disponibilità di cassa, quelli gestiti tramite ARTEA sono totalmente finanziati.

Nella tabella che segue è riportata la fase di attuazione alla fine del 2012 degli interventi ARTEA e la fase di attuazione dell'Accordo di programma nel suo complesso.

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	n. interventi tramite ARTEA	n. interventi TOTALE
Attesa di avvio	25	35
In corso di progettazione indagini comprese.	3	24
In corso di appalto	2	5
In esecuzione	7	10
Lavori ultimati (collaudati e non)	5	12
Totale interventi finanziati	42	86

10.4. Ulteriori ri*flessioni sull'attuazione degli interventi tramite ARTEA*

Con la gestione tramite ARTEA, che ricorre alla contabilità ordinaria ovvero in regime di competenza, una parte degli interventi inseriti nell'Accordo di programma perde i benefici della gestione commissariale (attuazione diretta, deroghe, ecc.) ed in particolare quelli economici. Col meccanismo dell'avvalimento il finanziamento delle opere non incide sul bilancio dell'ente appaltatore (patto di stabilità), bensì sulla contabilità speciale del commissario, che operando in regime di cassa non solo garantisce la copertura finanziaria, ma anche la tempestività dei pagamenti, che si riverbera positivamente anche sull'economia delle imprese.

Col meccanismo ARTEA, per esempio, l'accesso alla prima tranche del finanziamento è condizionato alla presentazione di un progetto esecutivo, il cui finanziamento deve essere anticipato dall'ente attuatore. Quando l'amministrazione non è in grado di produrre in proprio il progetto e non ha le risorse per anticiparne la spesa, è costretta a ricorrere a compromessi che il Codice dei contratti vorrebbe impedire. Il trasferimento delle risorse da ARTEA all'ente attuatore, oltre ad avvenire in tempi lunghi, spesso è insufficiente a coprire la spesa da giustificare per ottenere l'acconto successivo, per cui la stazione appaltante deve ricorrere ad anticipazioni di cassa o addirittura al credito.

È evidente che queste difficoltà sono più sentite dalle piccole amministrazioni, che magari non sono tenute al rispetto del patto di stabilità, ma per le quali l'entità del costo dell'intervento è rilevante rispetto al bilancio. Per questa ragione il commissario, preso atto della volontà dei sottoscrittori dell'accordo di procedere per questa strada, aveva suggerito, senza successo, di orientare il finanziamento PAR-FAS sugli interventi di maggiore entità di competenza provinciale.

11. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2013

La tabella che segue riporta la previsione dello stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2013. Sostanzialmente restano in dietro due interventi. Il primo è quello indicato come *"Interventi per la sicurezza idraulica dei territori di fondovalle del fiume Arno"*(n.1). In pratica si tratta di un contributo all'Accordo di programma per la sicurezza dell'Arno del 18 febbraio 2005 tra MATTM e Regione Toscana (Accordo 200 milioni). Gli interventi, da gestire tramite il commissario, devono essere individuati dal Comitato di controllo di tale accordo nell'ambito del programma relativo. L'articolazione degli interventi già programmati e la necessità di aggiornare la program-

mazione con nuovi interventi non ancora ben identificati, non ha ancora reso possibile definire la destinazione dei fondi.

Il secondo intervento è quello di difesa dall'erosione della spiaggia di Marina di Massa (n.89). Per quanto si tratti di un lotto di completamento in fase avanzata di progettazione, la sua realizzazione è pregiudicata dal trovarsi in parte in un'area SIN ed essere legato alla bonifica del sito.

La previsione è articolata in interventi attuati direttamente dal commissario e interventi realizzati con procedure ordinarie tramite ARTEA. Di questi, per quelli lanciati alla fine dell'anno 2012, la previsione deve considerarsi meno attendibile perché ancora in fase di progettazione. Ovviamente la previsione prescinde da "incidenti di percorso" quali, ad esempio, ricorsi in fase di affidamento.

Si precisa inoltre che il numero degli interventi sale da 86 a 91 per la ripartizione in lotti di opere individuate con un'unica voce in fase di stesura dell'Accordo di programma.

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2013		
	Contabilità speciale	ARTEA	Totale
Attesa di avvio	1		1
Esecuzione studi ed indagini			
In corso di progettazione	1		1
Progettazione ultimata	3		3
Lavori in corso di appalto	4	1	5
In esecuzione	20	21	41
Lavori ultimati (collaudati e non)	21	19	40
Totale interventi finanziati	50	41	91

NATURA O PROVENIENZA DEL FINANZIAMENTO	Importo		
	MATTM	Regione Toscana	Totale
Accordo di programma	60.300.000,00	59.573.395,00	119.873.395,00
Interventi in attesa di avvio			- 11.218.000,00
Interventi in corso di progett.			- 22.000.000,00
Progetti ultimati			- 13.118.200,00
Fabbisogno 2013			73.537.195,00
Trasferiti alla contabilità spec.	30.538.461,54	(1) 7.501.553,09	38.040.014,63
In corso di trasferimento		7.582.711,00	7.582.711,00
Interventi ARTEA 2011		6.279.000,00	6.279.000,00
Interventi ARTEA 20112		13.807.395,00	13.807.395,00
CIPE delibera 6/2012	13.500.000,00		13.500.000,00
Totale disponibile	44.038.461,54	35.170.659,09	79.209.120,63
Esubero di cassa			5.671.925,63

(1) La cifra tiene conto 301.553,09 euro anticipati dalla Regione Toscana per il progetto dell'intervento di Follonica, che vengono acquisiti come contributo al finanziamento dell'Accordo di programma

Per valutare la concreta praticabilità della previsione in relazione alle disponibilità finanziarie, ferma restando la gestione delle risorse in regime di cassa, è stata stilata la tabella che precede. Le cifre esposte sono desunte dal Primo atto integrativo, pur tenendo presente nella sostanza il Secondo atto integrativo all'accordo di programma del 9 novembre 2012, già in attuazione da parte della Regione Toscana, che ha apportato inspiegabilmente qualche modifica agli importi degli interventi, per altro non significativa ai fini della loro attuazione, riducendo di qualche decina di migliaia di euro il contributo regionale.

Detratti dall'importo complessivo dell'accordo i finanziamenti relativi agli interventi che non sarà possibile appaltare nel corso dell'anno o già ultimati, il fabbisogno per 2013 risulta di circa 73,5 milioni di euro. D'altro canto la somma dei finanziamenti già disponibili, o perché trasferiti o in corso di trasferimento alla contabilità speciale ivi compresi i fondi CIPE, o perché impegnati a favore di ARTEA assommano a circa 79,2 milioni di euro, con un esubero di 5,7 milioni di euro. In realtà tale esubero rappresenta un volano indispensabile per la gestione dei fondi CIPE, la cui erogazione, prevista per stati di avanzamento della spesa, si protrarrà per tempi inconciliabili con l'urgenza del Piano e la dinamica dei cantieri.

12. CRITICITÀ

Premesso che il commissario ha a disposizione le risorse effettivamente trasferite nella contabilità speciale, l'erogazione, avvenuta soltanto a dicembre 2012 senza alcun preavviso, di nuovi finanziamenti oltre quelli già "impegnati" ha sicuramente rallentato l'attuazione degli interventi. Si deve anche riconoscere, però, che ragioni diverse, non soltanto finanziarie, tra le quali anche la lentezza di alcuni enti avvalsi, hanno impedito di dare un più incisivo impulso all'attuazione dell'accordo al momento dei nuovi trasferimenti, come avvenuto invece in settembre in occasione dell'accredito da parte del ministero.

Alcune di queste difficoltà sono state superate; altre permangono a causa di situazioni oggettivamente complicate (interventi 14, 26, 80). Si sta cercando di migliorare i risultati sia attivando, ora che è possibile, tutti gli interventi attuabili, sia individuando nuovi enti di cui valersi, per una ridistribuzione degli avvalimenti.

Sicuramente costituisce un problema l'impiego dei fondi CIPE ex delibera n. 6 del gennaio 2012 sia per le modalità, sia per i tempi di trasferimento, anche in considerazione del fatto che le risorse assegnate, non impegnate entro il termine del **31 dicembre 2013**, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti saranno revocate. Malgrado il diverso parere della Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale del MiSE, permangono fondati dubbi sulla possibilità dei commissari, dotati di contabilità speciale, di operare in regime di competenza, impegnando risorse non disponibili in cassa. Per altro il commissario non può prescindere dai tempi di realizzazione dei lavori, evidentemente inconciliabili con quelli burocratici, e da altri obblighi di legge, in particolare quelli sulla programmazione della spesa (art. 9, DL 78 del 2009) e sui tempi di pagamento (DLgs 231 del 2002 come modifica to dal DLgs 192 del 2012), che possono produrre danno erariale oltre che ingiusti disagi alle imprese.

La disponibilità di cassa, di cui al punto precedente, consentirà di avviare alcuni interventi il cui numero complessivo dipenderà dalla tempestività con cui, a fronte della rendicontazione, verranno accreditati alla contabilità speciale gli acconti che seguono l'anticipo.

La prossima scadenza del mandato dei commissari (quella dello scrivente cade il 9 dicembre del 2013) suggerisce di predisporre per tempo il trasferimento delle competenze, tenendo conto che ciò avverrà con attività in corso e con impegni assunti, da gestire senza provocare interruzioni delle attività di cantiere o delle procedure di affidamento. A tutto ciò si aggiungono gli adempimenti legati alla contabilità speciale. La preoccupazione nasce dalla lettura dei numerosi emendamenti pre-

sentati nel corso del 2012 nelle commissioni parlamentari e in aula al fine di superare le gestioni commissariali, ritenute da alcuni parlamentari inefficienti e inefficaci. Le disposizioni proposte per il trasferimento delle competenze non sembrano tener conto con sufficiente attenzione dei problemi in ballo.

Sull'argomento non è possibile incidere, salvo segnalando ancora una volta questa preoccupazione.

13. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Le scarse disponibilità finanziarie iniziali non hanno permesso di dare corso al programma a suo tempo delineato. Sostanzialmente le risorse trasferite a maggio e a novembre del 2011, pari a 25,5 milioni di euro, e quelle trasferite a settembre del 2012, pari a 1 milione di euro, sono state tempestivamente impegnate. La maggior parte degli interventi finanziati sono in corso o ultimati. Fanno eccezione 4 interventi, di cui tre (2.400.000 euro complessivamente) in fase di appalto e uno (620.000 euro) in fase di ultimazione della progettazione per oggettive difficoltà del sito (San Gimignano) e per la necessità di conciliare l'intervento con altri cantieri limitrofi.

Le risorse trasferite, o in via di trasferimento, a dicembre del 2012, pari a 19 milioni di euro, saranno impegnate nel corso del 2013 man mano che si renderanno disponibili i progetti esecutivi, per i quali sono già stati formalizzati gli avvalimenti o sono in corso i contatti relativi. Fa eccezione un sono intervento da 70.000 euro per il quale non è ancora stato individuato l'ente avvalso.

Gli interventi PAR-FAS gestiti tramite ARTEA ai sensi del Secondo atto integrativo sono stati affidati agli enti attuatori, che operano nel rispetto delle procedure ordinarie stabilite dalla Regione Toscana.

Firenze 30 aprile 2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Prof. Ing. Pier Gino Megale

Il Commissario straordinario delegato
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FASI DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Fasi del processo di attuazione		Atto	Rif.	Attività	Verifiche	C	M
n.	descrizione						
1	Individuazione dell'ente avvalso.	Ordinan.	2.2	Nomina del RUP Approvazione dei cronoprogrammi di progettazione e dei lavori Approvazione del progetto, se disponibile Accantonamento delle somme necessarie alla progettazione	 Cronoprogrammi Progetto (come 3)	2 2 2 4	a
2	Convenzione di avvalimento	Conven.	2.4	Sono definiti i rapporti tra Commissario, ente avvalso ed altri soggetti pubblici o privati, coinvolti nell'attuazione dell'intervento		4	
3	Approvazione del progetto preliminare	Decreto	2.5	Approvazione da parte del Commissario	Localizzazione Compatibilità economica Quadro economico	2 2, 4 2, 4	
4	Avvio del progetto definitivo		2.8	Comunicazione da parte del RUP al Commissario dell'inizio dell'attività progettuale e di eventuali affidamenti a soggetti esterni		2 2, 4	a
5	Poteri di deroga	Decreto	2.6	Sono delegati dal Commissario al RUP in forma circostanziata		1, 2	
6	Approvazione del progetto definitivo		2.8	Approvazione in linea tecnica da parte dell'ente avvalso Comunicazione del RUP al Commissario		2	b
7	Approvazione del progetto esecutivo (definitivo in caso di appalto integrato *)	Decreto	2.9	Approvazione da parte del Commissario	Cronoprogramma Quadro economico Schema di contratto Validazione Facsimile bando o avvisi Lavorazioni ai fini del collaudo in corso d'opera	2 2, 4 3 2 3 2 *	

Fasi del processo di attuazione		Atto	Rif.	Attività	Verifiche	C	M
n.	descrizione						
8	Avvio delle procedure di affidamento	(Decreto)	2.10	Comunicazione al Commissario della nomina del direttore dei lavori	Disponibilità finanziaria Stato giuridico del DLL ai fini del collaudo in corso d'opera	4 2 *	
9	Approvazione e del quadro economico a seguito di aggiudicazione Approvazione del contratto	Decreto	2.11 2,12 2.16	Rimodulazione delle somme a disposizione per imprevisti	Quadro economico Cronoprogramma Economia di gara Entità del ribasso ai fini del collaudo in corso d'opera	2 2 2, 4 2, 4 *	c c
10	Inizio dei lavori		2.13	Comunicazione del RUP	Rispetto cronoprogramma	2	d
11	Nomina del collaudatore in corso d'opera		2.16	Nomina da parte del Commissario entro 30 gg. dalla consegna dei lavori			
12	Controlli e verifiche		2.17	Verifiche bimestrali			e
13	Sospensione e proroghe		2.14	Trasmissione da parte del RUP del verbale di sospensione o della concessione di proroga e segnalazione della ripresa dei lavori.	Aggiornamento del cronoprogramma	2	f
14	Varianti in corso d'opera al disotto del 5% dell'importo contrattuale		2.15	Trasmissione da parte del RUP della variate su supporto digitale		2	e, h
15	Varianti in corso d'opera al disopra del 5% dell'importo contrattuale	Decreto	2.15	Individuazione delle risorse Approvazione preventiva da parte del Commissario Trasmissione da parte del RUP della variate su supporto digitale		4 3 2	e, h
16	Ultimazione dei lavori		2.13	Trasmissione da parte del RUP del certificato	Rispetto cronoprogramma	2	
17	Nomina del collaudatore		2.16	Nomina da parte del Commissario entro 30 gg. dall'ultimazione			
18	Conto finale e collaudo	Decreto	2.16	Approvazione da parte del Commissario	Quadro economico finale Economie residue	2 4	g g

M: adempimenti legati al monitoraggio di cui al paragrafo 7 del Regolamento.
C: numero identificativo del contatto competente, di cui al punto 6.2 del Regolamento, a cui rivolgersi per informazioni e chiarimenti e a cui inviare, oltre che al Commissario, le segnalazioni, notizie ed atti trasmessi per via telematica.

SCARICATO

Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Umbria

(nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/11/2011)

Prot. n.

C.a. Ing. Luciani

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA [illegible]
000053 | 13 FEB. 2013
O.P.C.M. 07-11-2011

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ispettorato Generale
per l'emergenza idrogeologica
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA


RACCOMANDATA A/R

Oggetto: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria, sottoscritto in data 3/11/2010, modificato in data 14/07/2011. Gestione commissariale. Relazione al 31/12/2012

In ottemperanza a quanto stabilito dagli articoli 2 e 5 del DPCM di nomina del 7/11/2011, allego alla presente nota la relazione concernente lo stato di avanzamento dell'Accordo di programma in oggetto indicato alla data del 31/12/2012.

Cordiali saluti.

Il Commissario straordinario delegato
Dott. Vincenzo Santoro



Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Umbria

Dott. Vincenzo Santoro

nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2011

Oggetto: Legge 28 Febbraio 2010, n. 26, art. 17 – Attuazione Accordi di Programma per gli interventi nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico – Situazione al 31 DICEMBRE 2012

RELAZIONE

L'ACCORDO DI PROGRAMMA

L'Accordo di programma in oggetto indicato, previsto dall'articolo 2, comma 240 della legge n. 191/2009, è stato sottoscritto tra la Regione Umbria e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (MATTM) in data 3/11/2010 ed è stato modificato con apposito atto integrativo in data 14/07/2011.

Il costo degli interventi, elencati in dettaglio nell'Allegato 1 alla presente nota, ammonta complessivamente ad € 45.648.450,33 ed è finanziato nel modo seguente:

- € 21.600.000,00 con risorse a carico del MATTM;
- € 24.048.450,33 con risorse a carico della Regione Umbria.

Per gli interventi previsti nel citato Allegato 1 individuati come "Interventi programmati da finanziare", dell'ammontare complessivo di € 2.400.000,00, la copertura finanziaria dovrà derivare da eventuali economie provenienti dall' attuazione dell'Accordo e da ulteriori stanziamenti resi disponibili da parte dei soggetti sottoscrittori.

Le risorse del MATTM, pari ad euro 21.600.000,00, derivano:
- per € 9.507.842,95 dal proprio Bilancio;
- per € 12.092.157,05 dalla legge n. 191/2009 art. 2, comma 240 (FAS statali).

Le risorse della Regione Umbria derivano:
- per € 8.048.450,33 da economie di APQ a suo tempo sottoscritti con il Ministero dell'Ambiente (APQ anno 2001)
- per € 16.000.000,00 da fondi FAS 2007/2013 (FAS regionali).

GLI INTERVENTI PRIORITARI

L'attuazione dell'Accordo ha preso avvio con l'individuazione, nell'ambito della totalità degli interventi previsti nell'Accordo stesso, di quelli prioritari, immediatamente cantierabili.
Tale individuazione è stata effettuata anche in relazione all'assicurazione, da parte del MATTM, dell'immediato trasferimento di una prima tranche di finanziamenti dell'importo di € 9.507.842,95 derivante dal bilancio del MATTM.

Di seguito si riepilogano gli interventi prioritari, suddivisi in relazione alla natura del rischio, tra "rischio frane" e "rischio idraulico", i cui dettagli (costo, descrizione, localizzazione...) possono essere riscontrati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma

Rischio frane

- Mitigazione rischio idrogeologico nel Comune di Baschi;
- Mitigazione rischio idrogeologico, crolli rupe nel Comune di Fabro;
- Ripristino dei danni causati da dissesto idrogeologico nel Comune di Ferentillo;
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico eseguite nei Comuni di Todi e Orvieto.

Rischio idraulico

- Intervento di messa in sicurezza del bacino del Torrente Tresa nel Comune di Città della Pieve;
- Intervento di messa in sicurezza zona industriale La Paciana e abitati, nei comuni di Foligno e Spello;
- Intervento di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni-Narni, 3° stralcio, I° lotto;
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua classificati e non classificati

Per quanto attiene agli interventi per la mitigazione del "*rischio frane*", tutte le situazioni ricomprese nell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sono classificate a rischio R4 e hanno subito, seppur in misura diversa, significativi aggravamenti in seguito ai fenomeni pluviometrici più importanti che hanno interessato la regione (ad esempio nei mesi di dicembre 2009 - gennaio 2010 e novembre – dicembre 2010); in due dei luoghi già individuati nell'AP con il Ministero dell'Ambiente, di seguito descritti, gli aggravamenti hanno comportato l'attivazione da parte delle competenti Amministrazioni Comunali di misure urgenti a tutela della privata e pubblica utilità.

La situazione di rischio idrogeologica connessa al rischio di crolli in **località Carnaiola in Comune di Fabro**, già nota, con DGR 202 del 08/02/2010 "Programma degli interventi per la prevenzione e mitigazione dei Rischi idraulici e idrogeologici" era stata individuata tra le situazioni a maggior rischio per le quali richiedere inserimento nel piano straordinario di intervento, ha subito nel 2011 un aggravamento a causa di ulteriori crolli parietali con la conseguente dichiarazione di inagibilità una civile abitazione.

Al riguardo, per gli interventi nei Comuni di Fabro, Ferentillo e Baschi il Commissario è Soggetto Attuatore. I lavori nel Comune di Ferentillo verranno consegnati in data 6/02/2013 e contestualmente prenderanno avvio, mentre per quelli nei Comuni di Baschi e Fabro è fissata per il giorno 13/02/2013 la Conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti.

In data 14 giugno 2012 un nuovo episodio di crollo ha interessato l'abitato dei **Cesi, in località S. Onofrio**. Il dissesto ha interessato l'area contigua al cantiere dell'intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico (VIII stralcio), ovvero l'area ove sono previsti gli interventi già ricompresi nell'Accordo di Programma (IX stralcio).

Stante la situazione di rischio con DGC *n.* 240 del 27.06.2012 è stata approvata la procedura di Somma Urgenza dando attuazione all'Ordinanza sindacale contingibile ed urgente prot. 94616 del 18.06.2012 e quindi sono stati affidati i lavori.

Il comune di Terni con nota prot. n. 108826 del 17.07.2012, acquisita al prot. del Commissario Straordinario n. 89 del 24.07.2012, ha richiesto di ammettere a finanziamento la somma occorrente per l'attuazione dei lavori di somma urgenza (che consistono in una anticipazione di alcuni dei lavori già previsti nell'intervento inserito nell'AP) **per un importo di € 510.000,00 come anticipazione dell'intervento globale dell'importo di € 1.500.000,00.**

Nella riunione del 12/12/2012 il Commissario Straordinario delegato ha ritenuto ammissibile la richiesta del Comune di Terni. Ne consegue che entro il mese di Febbraio 2013 verrà predisposta l'ordinanza commissariale che individua il Comune di Terni quale Ente Attuatore dell'intervento di somma urgenza nel Comune di Terni, località Cesi ed assegna allo stesso il relativo finanziamento.

Nella medesima riunione del 12/12/2012 il Commissario Straordinario ha individuato i **Comuni di Todi ed Orvieto** quali Enti Attuatori per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ciascuno dell'importo di **€ 500.000,00.** L'assegnazione di detti finanziamenti è prevista per il mese di febbraio 2013

Tutti gli interventi inseriti nell'AP sono stati selezionati in base alla necessità di intervenire in situazioni classificate a rischio R4, ovvero a rischio di perdita di vite umane, ove il prolungato ritardo nel trasferimento delle risorse e la conseguente posticipazione dell'attuazione degli interventi di mitigazione aumenta la probabilità di verificarsi di nuovi episodi di dissesto a seguito di eventi ad esempio pluviometrici ma anche sismici.

Per quanto attiene agli interventi per la mitigazione del "*rischio idraulico*", la priorità è derivata dalla necessità di mitigazione del rischio nelle aree del territorio regionale, dove per popolazione, infrastrutture e beni culturali, era prioritariamente necessario intervenire.

Altresì, **nel Novembre 2012** e precisamente nei giorni 11 12 e 13 si sono verificate precipitazioni intense che hanno interessato il territorio regionale, in particolare i settori sud occidentali della Regione.

Tale evento ha determinato situazioni di forte criticità nella maggior parte dei corsi d'acqua del territorio regionale ed in particolare nelle aree interessate dal Bacino del Fiume Nestore e dal Bacino del Fiume Paglia.

Per fronteggiare detta situazione è stato destinato, con l'ordinanza commissariale n. 12 del 22/11/2012, all'intervento previsto nell'Accordo, denominato "**Manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua classificati e non classificati**", l'importo di **€ 1.485.000,00.** L'assegnazione è stata effettuata alle Province, alle Comunità Montane, e ai Consorzi, quali Soggetti attuatori, i quali hanno proceduto all'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino dell'officiosità idraulica su alcuni bacini idrografici del territorio regionale interessato dagli eventi alluvionali sopra citati. Alla data del 31/12/2012 detti interventi risultano quasi tutti conclusi è si è nella fase del collaudo.

Il finanziamento suddetto verrà integrato con le ulteriori risorse disponibili o che si renderanno disponibili e, precisamente:

- con l'importo accreditato in Contabilità Speciale in data 10/12/2012 pari ad **€ 1.200.000,00** (risorse MATTM)
- con il finanziamento derivante dall'ex art. 33, comma 3, della L. 183/2011 (Piano Centro Nord) per un importo pari ad **€ 2.455.207,46** (risorse MATTM, Piano Centro Nord, quota parte del finanziamento di € 5.000.000,00).

Con specifico riferimento alla somma di **€ 5.000.000,00 richiesta** dalla Regione a valere sulle risorse del Piano Centro Nord, la stessa, oltre a finanziare l'intervento sopra illustrato, verrà destinata nel modo seguente:

- **€ 600.000,00** per l'intervento nel Comune di S. Giustino per la messa in sicurezza dell'abitato, zona industriale ed artigianale;
- **€ 1.944.792,54** per l'attuazione del 1° Stralcio dell'intervento di messa in sicurezza della Città di Foligno.

IL CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Va rilevato che l'incertezza in merito ai tempi di trasferimento delle risorse da parte del MATTM, anche di quelle ritenute immediatamente disponibili, quantificate in € 9.507.842,95 (l'ultima tranche di detto finanziamento, dell'importo di € 1.246.536,23, è stata accreditata in C.S. solo in data 10/12/2012) non ha consentito il rispetto dei tempi e delle fasi di cui al cronoprogramma a suo tempo trasmesso allo stesso Ministero.

LA GESTIONE COMMISSARIALE

Con specifico riferimento alla gestione commissariale, l'attività ha preso avvio con la individuazione da parte della Regione Umbria (Deliberazione della Giunta regionale n. 651 del 20/06/2011, modificata ed integrata con deliberazione n. 1292 del 23/10/2012) di un pool, costituito da dirigenti e funzionari regionali, avente la funzione di supportare il Commissario nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti e, precisamente nello svolgimento delle attività tecnico amministrative, giuridiche ed economico finanziarie connesse con la progettazione e la realizzazione degli interventi ricomprendendo, le spese relative alla suddetta attività di supporto nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'articolo 92 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. e i..

La gestione commissariale è effettuata attraverso gli incontri del Commissario con gli Amministratori ed i funzionari dei Comuni interessati alla realizzazione degli interventi.
A seguito delle risultanze di tali incontri sono state emanate, alla data del 31/12/2012, le ordinanze commissariali riepilogate, con riferimento a ciascun intervento, nella Tabella B allegata alla presente relazione. Nella Tabella C, per completezza di argomento, sono riepilogati gli atti amministrativi (ordinanze commissariali, determinazioni dirigenziali e deliberazioni di Giunta regionale) emanati per organizzare l'attività commissariale.

LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Di seguito si illustra, in dettaglio e schematicamente, lo stato di attuazione degli interventi prioritari, come sopra illustrati.
L'avvio delle attività relative a ciascun intervento è stato preceduto da apposite riunioni tenute dal Commissario straordinario con gli Enti e gli Amministratori interessati, volte a definire in modo condiviso le fasi e i relativi tempi di attuazione. Con specifico riferimento alla quantificazione delle **Spese Tecniche** da finanziare, è stato concordato il "riconoscimento" delle stesse nella misura massima del 10% dell'importo assegnato all'intervento dall'A.P., omnicomprensiva di tutti gli oneri connessi alla progettazione e all'attuazione, IVA compresa (redazione progetto preliminare, redazione progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, incentivo per la progettazione, collaudo..).
Si sottolinea che l'applicazione del criterio suddetto determina una riduzione, rispetto agli importi calcolati in base alla tariffe vigenti, del 30% circa e che, in relazione agli affidamenti, tale importo viene ulteriormente ribassato in sede di ogni singola gara.

Si riepilogano schematicamente, per ciascun intervento, le fasi attuate e quelle da attuare.


RISCHIO FRANE – MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI BASCHI

29/06/2011	31/03/2012			
Attestazione di conformità del progetto esecutivo al finanziamento (Comune di Baschi)	Verifica progetto esecutivo (RUP/Commissario	Approvazione progetto esecutivo (Commissario straordinario)	Aggiudicazione definitiva lavori (Commissario straordinario	Inizio lavori

% AVANZAMENTO DEI LAVORI


5

RISCHIO FRANE – MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO, CROLLI RUPE NEL COMUNE DI FABRO

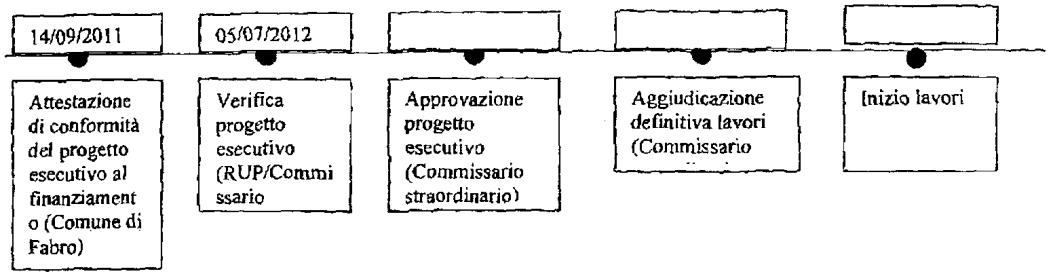

% AVANZAMENTO DEI LAVORI


RISCHIO FRANE – RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI FERENTILLO

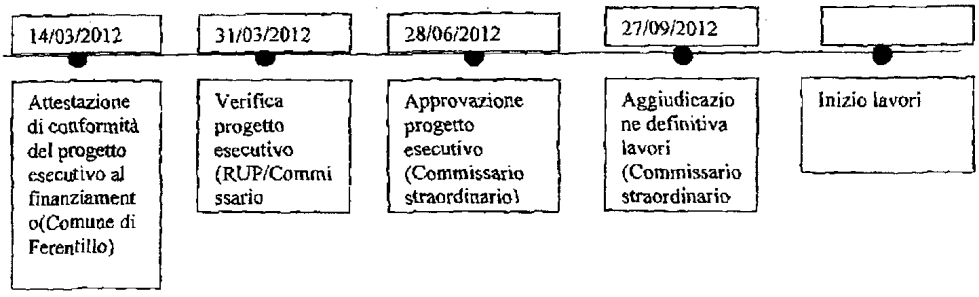


% AVANZAMENTO DEI LAVORI

6

RISCHIO IDRAULICO – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO DEL TORRENTE TRESA NEL COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE

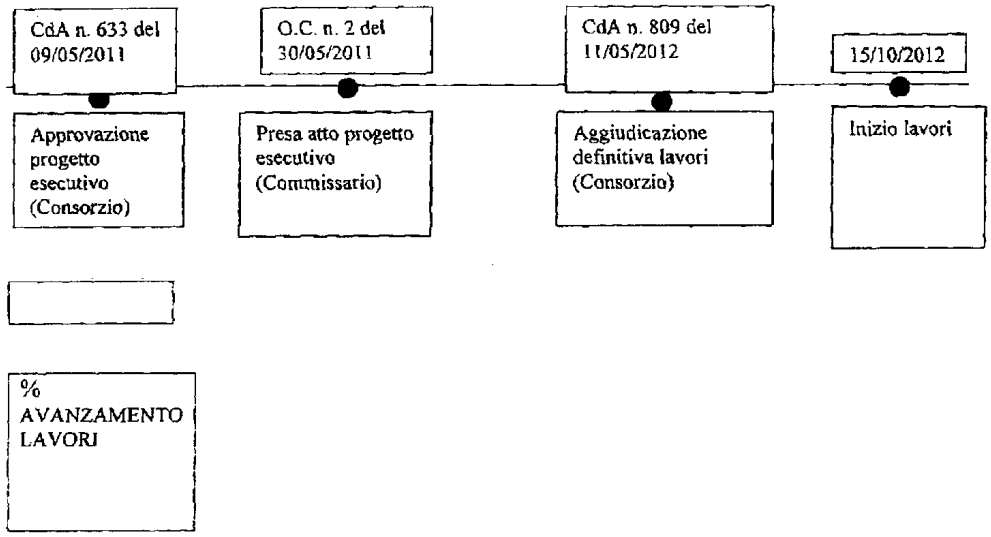


RISCHIO IDRAULICO – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA INDUSTRIALE LA PACIANA E ABITATI, NEI COMUNI DI FOLIGNO E SPELLO

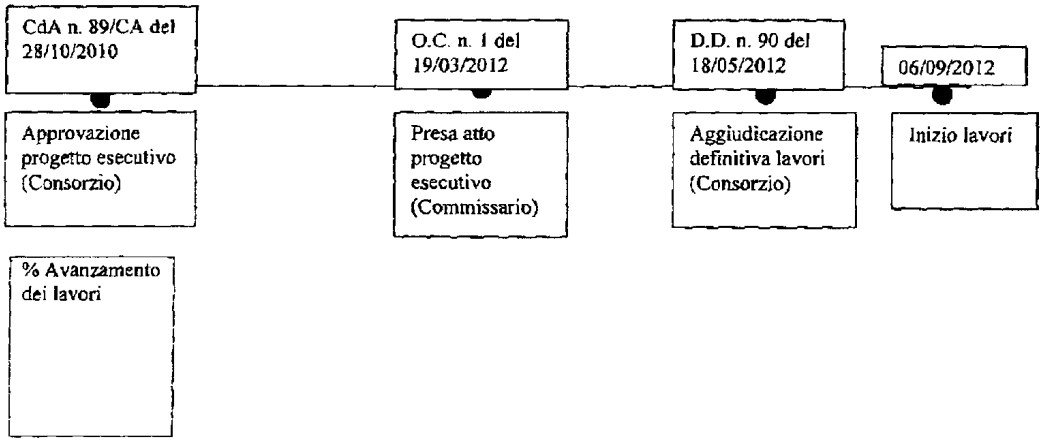


7

RISCHIO IDRAULICO – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CITTA' DI TERNI E ZONA INDUSTRIALE TERNI-NARNI, 3° STRALCIO, I° LOTTO

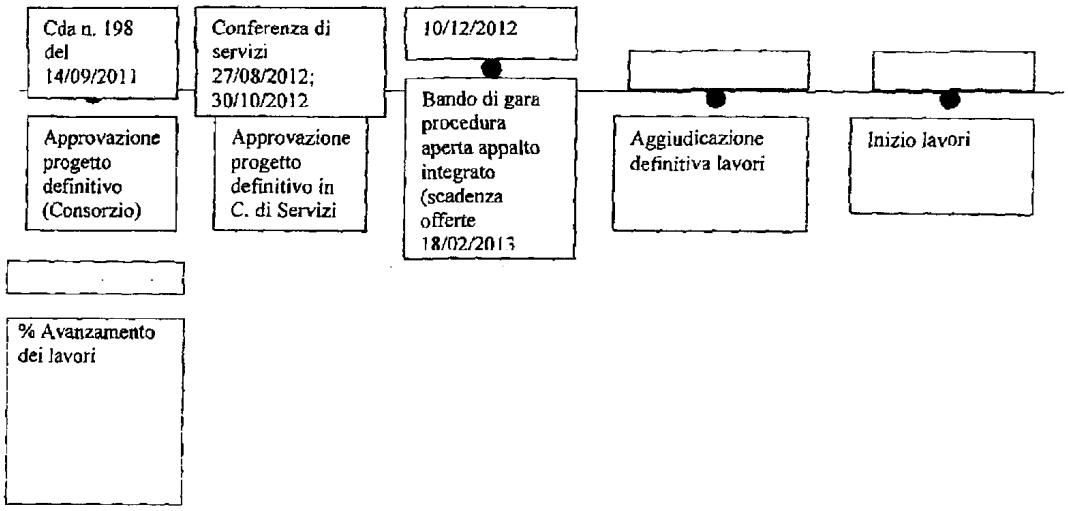


RISCHIO IDRAULICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA CLASSIFICATI E NON CLASSIFICATI (*)

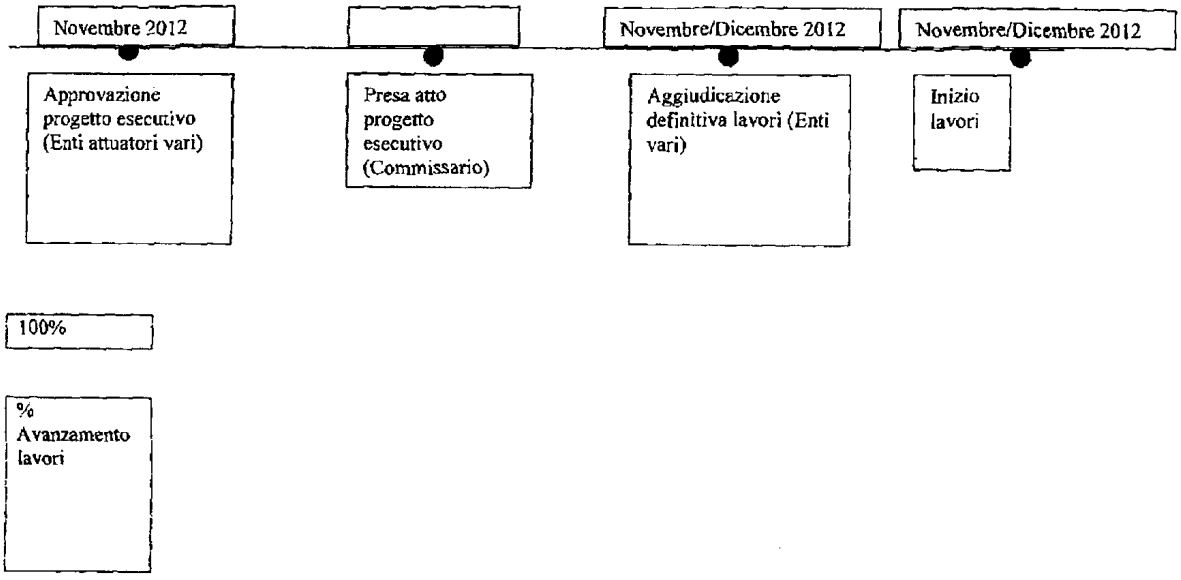

(*) Tutti i progetti risultano conclusi ed è in corso la fase di collaudo. Le liquidazioni agli Enti attuatori verranno effettuate a seguito del collaudo delle opere.

RISCHIO IDRAULICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ESEGUITE NEI COMUNI DI TODI E ORVIETO

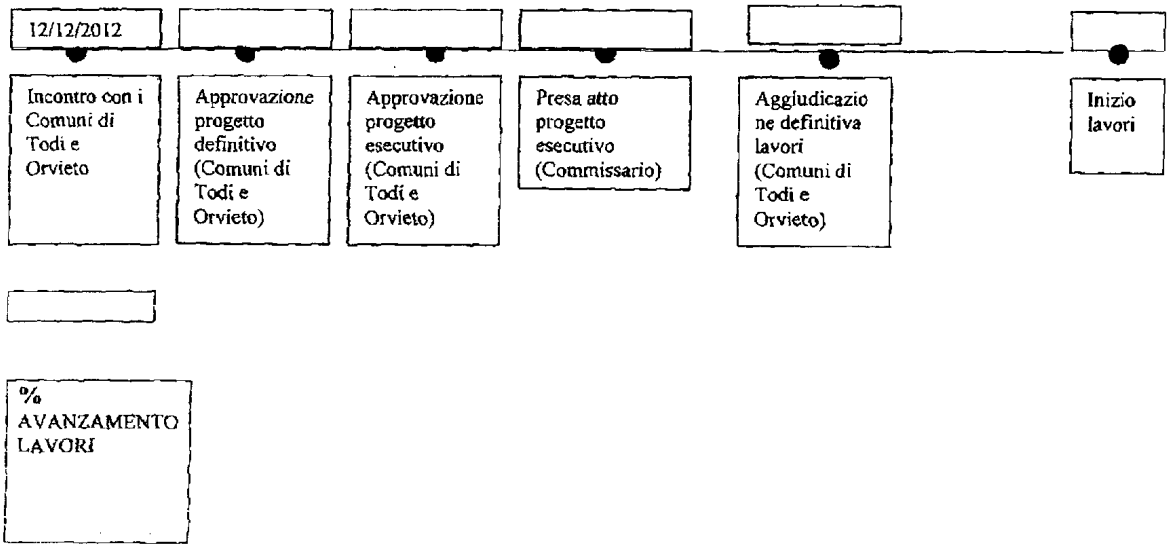

IL BILANCIO RELATIVO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE

Alla data del 31/12/2012 nella contabilità speciale intestata al Commissario (C.S. 5606 accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia) risulta accreditato l'importo complessivo di € 17.137.781,85 (€ 9.892.458,33 da parte del MATTM ed € 7.245.323,52 da parte della Regione Umbria).

Con nota del 27/11/2012 il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ha comunicato al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e al Ministero dell'Ambiente - Gabinetto del Ministro – di avere accolto le proposte delle Regioni in merito al riparto dell'importo di € 130 milioni derivante dalla legge n. 183/2011, ex art. 33, comma 3 (Piano Centro Nord). In tale riparto la Regione Umbria risulta assegnataria di **€ 5.000.000,00**. Il Commissario non ha ricevuto alcuna comunicazione formale da parte del MATTM riguardo a detto finanziamento, ma ha comunque proceduto ad esaminare la proposta di destinazione delle risorse in argomento, come illustrato nel paragrafo relativo agli "INTERVENTI PRIORITARI" della presente relazione.

Gli "impegni" assunti dal Commissario attraverso l'emanazione delle ordinanze di destinazione delle risorse ammontano ad € 11.536.068,11, mentre gli ordinativi emessi risultano pari € 2.588.486,08 (Tabella A allegata alla presente relazione).
Si sottolinea che detti importi relativi agli "impegni assunti" e agli "ordinativi/i emessi" ricomprendono anche gli impegni e le erogazioni a suo tempo effettuate dalla Regione agli Enti attuatori (prima della stipula dell'Accordo di Programma e per anticipazioni per spese di progettazione). Tale evidenziazione si ritiene necessaria ai fini di una immediata visione dell'avanzamento finanziario di ciascun intervento.

Altresì, gli stessi ricomprendono anche l'ammontare destinato alle spese funzionali alla struttura commissariale.
Nella stessa Tabella A sono evidenziati anche gli importi Totali, al netto dell'anticipazione regionale, che risultano pari ad € 11.287.941,30 (Totale impegni) e ad € 2.340.359,27 (Totale ordinativi).

La Tabella D allegata alla presente nota riepiloga la situazione finanziaria relativa alla contabilità speciale n. 5606, dalla quale emerge che gli accrediti effettuati ammontano ad € 17.137.781,85, mentre gli ordinativi emessi risultano pari ad € 2.340.359,27 (al netto, ovviamente, delle anticipazioni a suo tempo effettuate dalla Regione

La forte criticità riscontrata nella gestione dell'Accordo, rappresentata dalla incertezza sui tempi di trasferimento delle risorse da parte del MATTM non ha consentito di dare corso alla realizzazione delle opere secondo le previsioni a suo tempo effettuate.
Altresì, l'incertezza sopra evidenziata non ha permesso l'utilizzo "elastico" delle risorse del cofinanziamento regionale (€ 7.245.323,52), poiché specificatamente destinate agli interventi derivanti da APQ a suo tempo stipulati dalla Regione Umbria con il Ministero dell'Ambiente.

Va infine rilevata la problematica connessa la messa a disposizione del Commissario delle risorse del cofinanziamento regionale, rappresentate dal FAS 2007/2013, in considerazione del fatto che le disposizioni attuative del PAR FAS 2007/2013 sono in contrasto con quelle derivanti dai DPCM emanati per l'attuazione dell'Accordo di Programma (DPCM del 20/07/2011, DPCM del 7/11/2011, DPCM) e per l'istituzione della contabilità speciale.

Con nota del 18/12/2012, prot. n. 185804, è stato richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – un parere in merito alla possibilità di imputare le tipologie di spese previste dai DPCM sopra citati (spese a supporto dell'attività commissariale, spese per incentivi alla progettazione, spese per compenso al Commissario Straordinario delegato) agli interventi finanziati con le risorse del FAS regionale. A tutt'oggi il MISE non ha fornito alcuna risposta.

In relazione a quanto sopra esposto, tenuto conto che gli Accordi sottoscritti dalla maggior parte delle regioni con il MATTM prevedono, quale cofinanziamento regionale, i fondi FAS 2007/2013, si rinnova la richiesta a suo tempo formulata di definire, per l'utilizzo di dette risorse, modalità procedurali uniformi, al fine di pervenire alla semplificazione e alla velocizzazione della spesa.

Il Commissario Straordinario Delegato
F.to *Dott. Vincenzo Santoro*

Perugia,

Allegati alla nota: Tabelle A, B, C, D

"IMPEGNI" ASSUNTI E ORDINATIVI EMESSI DAL COMMISSARIO AL 31 DICEMBRE 2012

TABELLA A

IMPEGNI (ripartiti per fonti di finanziamento)							Estremi ordinanze commissariali di "impegno"	PAGAMENTI (ripartiti per fonti di finanziamento)			ESTREMI ORDINANZE/ORDINATIVI DI PAGAMENTO		
INTERVENTO	COMUNE DI UBICAZIONE DELL'INTERVENTO	Creditore	MATTM/altre fonti	APQ/risorse reg	ALTRE FONTI/risorse reg/L183	TOTALE	Num/data	MATTM/altre fonti	APQ/risorse reg	ALTRE FONTI/risorse reg L183	ORDINANZA Num/data	ORDINATIVO Num/data	TOTALE ORDINATIVO
Intervento di messa in sicurezza del bacino del torrente Tresa	CITTA' DELLA PIEVE	Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia	€ 1.844.792,54	€ 1.807.599,15	€ 1.347.608,31	€ 5.000.000,00	2 del 30/05/2011; DD Reg	€ 701.057,36	€ 836.808,23	€ 512.018,86	6 /2011;DD reg; Ord n. 14/2012	ORD. N.1 /2011;Mandato reg;Ord n.5/2012	€ 2.049.884,45
Interventi di impermeabilizzazione , regimazione acque superficiali e drenaggi profondi	BASCHI	Comune di Baschi	€ 1.500.000,00	€ -	€ -	€ 1.500.000,00	Ord.n.3 /2011	€ -	€ -	€ -			€ -
Interventi di consolidamento a presidio delle abitazioni prossime al ciglio della rupe soggetto a crolli, protezione versanti dall'erosione, regimazione acque superficiali	FABRO	Comune di Fabro	€ 1.500.000,00	€ -	€ -	€ 1.500.000,00	4 del 29/07/2011	€ -	€ -	€ -			€ -
Ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici	FERENTILLO	Comune di Ferentillo	€ 1.000.000,00	€ -	€ -	€ 1.000.000,00	Ord. N. 5 /2011	€ 375,00	€ -	€ -	11 del 22/10/2012	Ord.vo n. 3/2012	€ 375,00
Intervento di messa in sicurezza zona industriale La Paciana e abitati nei comuni di Foligno e Spello	FOLIGNO E SPELLO	Consorzio Bonificazione Umbra	€ -	€ 676.558,54	€ 304.709,57	€ 981.268,11	1 del 19/03/2012; DD Reg	€ -	€ 255.321,72	€ 213.104,93	1 del 19/03/2012;D D Reg;Ord 13 del 14/12/2012	Ord.vo 1 /2012;mandato Reg; Ord.vo n.4/2012	€ 468.426,65
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua classificati e non classificati	COMUNI VARI	Province, Comunità Montane, Consorzi	€ 1.485.000,00	€ -	€ -	€ 1.485.000,00	12 del 22/11/2012	€ -	€ -	€ -			€ -
			€ 7.329.792,54	€ 2.484.157,69	€ 1.652.317,88	€ 11.466.268,11		€ 701.432,36	€ 1.092.129,95	€ 725.123,77			€ 2.518.686,08
Commissario	DPCM 20/07/2011	SPESE FUNZIONALI(ART1, C.5)	€ 28.450,00	€ 14.832,10	€ 16.517,90	€ 69.800,00	9 del 13/09/2012	€ 28.450,00	€ 14.832,10	€ 16.517,90	dd 9535 del 29/11/2012		€ 69.800,00
TOTALE GENERALE			€ 7.358.242,54	€ 2.508.989,79	€ 1.668.835,78	€ 11.536.068,11		€ 729.882,36	€ 1.116.962,05	€ 741.641,67			€ 2.588.486,08
Anticipazione Regione				€ 150.000,00	€ 98.126,81				€ 150.000,00	€ 98.126,81			
TOTALE DEFINITIVO			€ 7.358.242,54	€ 2.358.989,79	€ 1.570.708,97	€ 11.287.941,30		€ 729.882,36	€ 966.962,05	€ 643.514,86			€ 2.340.359,27

/02/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO
Dott. Vincenzo Santoro

ORDINANZE COMMISSARIALI (LAVORI)

TABELLA B)

DESCRIZIONE LAVORI	SOGGETTO ATTUATORE	RIF. ORDINANZE
Intervento di messa in sicurezza della Città di Terni e Zona industriale Terni-Narni 3° Stralcio, 1° Lotto	Consorzio di Bonifica Tevere Nera	**ORD n. 2 del 22/05/2012** - Individuazione **Soggetto attuatore** dell'intervento;
Intervento di messa in sicurezza del bacino del Torrente Tresa	Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia	- **ORD n. 2 del 30/05/2011** - Individuazione **Soggetto attuatore** dell'intervento e approvazione progetto esecutivo.**ORD n. 6 del 20/09/2011** - Liquidazione al Consorzio per la Bonifica Val di chiana Romana e Val di Paglia dell'importo di € 1.350.000,00 (I° Acconto).**ORD N. 14 DEL 14/12/2012.** Liquidazione del 2° Acconto al Consorzio per la Bonifica Val di chiana Romana e Val di Paglia dell'importo di € 549.884,45
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua classificati e non classificati	Province di Perugia e Terni, Comunità Montana Alta Umbria, Comunità Montana Associazione dei Comuni Trasimeno e Medio Tevere, Consorzio Bonifica Val dichiana Romana e Val di Paglia, Consorzio bonificazione Umbra	**ORD n. 12 del 22/11/2012** - Individuazione **Soggetti attuatori** degli interventi e assegnazione finanziamenti
Intervento di messa in sicurezza zona industriale La Paciana e abitati nei Comuni di Foligno e Spello	Consorzio della Bonificazione Umbra	**ORD N. 1 del 19/03/2012** - Individuazione **Soggetto attuatore** dell'intervento, presa d'atto progetto esecutivo, e liquidazione a favore del Soggetto attuatore del 1° Acconto di € 196.253,62. **ORD. N. 13 DEL 14/12/2012.** Liquidazione del 2° Acconto al Consorzio della Bonificazione Umbra di € 174.046,20.
Mitigazione rischio idrogeologico nel Comune di Baschi - Loc. Civitella del Lago	Comune di Baschi per progettazione, Commissario per realizzazione lavori	**ORD n 3 del 29/07/2011**. Determinazioni per le fasi di realizzazione dell'intervento (Individuazione Soggetto attuatore per la progettazione definitiva ed esecutiva).**ORD N. 16 DEL 28/12/2012**. Indizone procedura per l'affidamento dell'incarico di collaudatore statico e collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera.

Mitigazione del rischio idrogeologico in località Carnaiola, nel Comune di Fabro	Comune di Fabro per progettazione, Commissario per esecuzione dei lavori	**ORD. n 4 del 29/07/2011**. Determinazioni per le fasi di realizzazione dell'intervento (Individuazione Soggetto attuatore per la progettazione definitiva ed esecutiva). **ORD. N. 15 DEL 28/12/2012.** Indizione procedura per l'affidamento dell'incarico di collaudatore statico e collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera
Ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici in località Matterella nel Comune di Ferentillo	Comune di Ferentillo per progettazione, Commissario per esecuzione dei lavori.	**ORD.n 5 del 29/07/2011**. Determinazioni per le fasi di realizzazione dell'intervento (Individuazione Soggetto attuatore per la progettazione definitiva ed esecutiva). **ORD N. 4 DEL 4/05/2012** - Indizione procedura per l'affidamento dell'incarico di collaudatore statico e collaudatore in corso d'opera. **ORD N. 5 DEL 28/06/2012.** Approvazione progetto esecutivo.**ORD N. 7 DEL 10/07/2012**. Indizione procedura negoziata e approvazione lettera d'invito.**ORD N. 8 DEL 28/08/2012**. Affidamento definitivo dell'incarico di collaudatore statico e collaudatore in corso d'opera.**ORD N. 10 DEL 27/09/2012**. Aggiudicazione definitiva dei lavori. **ORD. N. 11 DEL 22/10/2012**. Liquidazione contribuzione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per il quadrimestre maggio-agosto 2012. **ORD N. 18 DEL 28/12/2012**. Ridefinizione quadro economico dopo la gara ed erogazione di € 53.409,07 al Comune di Ferentillo
Messa in sicurezza della Città di Terni. Zona industriale Terni Nami 3° Stralcio 1° lotto.	Consorzio Tevere Nera	**ORD. N. 2 DEL 22/05/2011**. Individuazione Soggetto Attuatore.

ATTI VARI

TABELLA C

DESCRIZIONE	RIF. ATTI AMMINISTRATIVI
Individuazione pool di supporto al Commissario Straordinario Delegato	DGR n. 651 del 20/06/2011
Modifica ed integrazione pool di supporto all'attività del Commissario straordinario delegato	DGR n. 1292 del 23/10/2012
Trasferimento di risorse finanziarie dal Bilancio Regionale alla Contabilità Speciale n. 5606 denominata "CS RISCHIO IDROGEOLO UMBRIA" e intestata al Commissario straordinario delegato Dott. Vincenzo Santoro.	ORD. N. 1 DEL 30/05/2011
Utilizzo della quota dell'1% delle risorse assegnate per gli interventi dell'Accordo di Programma. Autorizzaizone alla prestazione di lavoro straordinario per il personale degli Uffici regionali che supporta l'attività commissariale.	ORD. N. 6 DEL 28/06/2012
Determinazione dell'importo dell'1% da accantonare per le spese del Commissario straordinario delegato funzionali all'espletamento dell'incarico e modalità di utilizzo.	ORD. N. 9 DEL 13/09/2012
Determinazione del compenso spettante al Commissario Straordinario delegato.	ORD N. 17 DEL 28/12/2012

SITUAZIONE FINANZIARIA C.S. 5606 : RISORSE ACCREDITATE ED ORDINATIVI EMESSI - SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012 **TABELLA D**

NUMERO	DATA	IMPORTO	TIPO DI ACCREDITO	CAPITOLO	FONTE	ANNO FINANZIARIO
1	27/05/2011	939.125,00	regolare accredito	8582	MATTM	2011
2	27/05/2011	1.498.530,00	regolare accredito	8631	MATTM	2011
5	15/12/2011	442.987,00	regolare accredito	8582	MATTM	2011
6	15/12/2011	293.621,00	regolare accredito	8631	MATTM	2011
1	18/09/2012	384.615,38	regolare accredito	8531	MATTM	2012
2	18/10/2012	4.529.559,00	regolare accredito	8551	MATTM	2012
3	18/10/2012	137.477,00	regolare accredito	8582	MATTM	2012
4	18/10/2012	420.007,72	regolare accredito	8631	MATTM	2012
5	10/12/2012	1.246.536,23	regolare accredito	8551	MATTM	2012
TOTALE		**9.892.458,33**				
DD 4285	15/06/2011	7.245.323,52	Somme girate dai capitoli regionali		APQ e L. 183/89	2011
TOTALE RISORSE ACCREDITATE IN CONTABILITA' SPECIALE (Regione e MATTM)		**17.137.781,85**				
TOTALE RISORSE LIQUIDATE (Ordinativi emessi)		**2.340.359,27**				
DISPONIBILITA' DI CASSA		**14.797.422,58**				

Sezione Economico-finanziaria: Roberta Cenci

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2011

Data 28 GEN 2013 Protocollo n. 34073/63.13 Class. C.100.06 Allegati n° vari

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E T.T.M.
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche.
Comitato d'Indirizzo e Controllo per il Veneto
Via Cristoforo Colombo 44
00100 ROMA

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E T.T.M.
Ispettorato Generale – Divisione I
Via Cristoforo Colombo 44
00100 ROMA

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO
Dott. Luca Zaia
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
30123 Venezia

ALL'ASSESSPRE REGIONALE ALL'AMBIENTE
Arch. Maurizio Conte
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
30123 Venezia

Anticipata via e-mail

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della regione Veneto - **Relazione annuale al Parlamento ai sensi dell'art.2 c.3 del DPCM 21/01/2011**

1. **Premessa.**

Pare utile fare un quadro di situazione al fine di fornire maggiori elementi di valutazione.
Il piano d'interventi previsti nell'Accordo di Programma tra Ministero A.T.T.M. e Regione del Veneto, che – pur essendo stato definito nel corso del 2010 - è stato sottoposto a nuova

Sede: via Paolucci, 34 – 30175 Venezia Marghera
e-mail: vincenzo.olonzi@regione.veneto.it
commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
Tel. 041-279 5000 Fax

valutazione in occasione della rimodulazione formalizzata nell'ottobre del 2011, scaturisce da scelte tecniche e decisioni politiche prese in un contesto di eventi antecedenti ed, in parte, successivi alla grande alluvione che colpì la regione tra il 31 ottobre ed il 2 novembre 2010. Quell'evento per la sua gravità, sebbene il territorio fosse naturalmente e notoriamente esposto a rischio idraulico, ha scosso notevolmente l'opinione pubblica, sensibilizzando e sollecitando anche i livelli di governo politico della regione sulla necessità di dare risposte concrete ai temi di difesa del territorio.

2. Sistema di gestione dell'assetto idrogeologico nel Veneto

E' bene soffermarsi brevemente ad analizzare l'attuale sistema di gestione dell'assetto idrogeologico e delle sue implicazioni di protezione civile nell'ambito della regione Veneto.
La Regione del Veneto supporta gli Enti territoriali minori con le sue strutture di difesa del territorio. Nell'ambito della Segreteria Generale per l'Ambiente è istituita la Direzione per la Difesa del Suolo. Essa, oltre ad individuare le priorità d'intervento ed impiegare le risorse economiche messe a disposizione dal bilancio regionale per tale funzione, coordina l'azione sul territorio delle Unità Provinciali del Genio Civile che dispongono, al loro interno, di tutte le competenze tecniche nel settore dell'ingegneria idraulica. La Direzione di Difesa del Suolo nella sua azione si raccorda con gli altri Enti Pubblici territoriali che operano nello stesso settore (Magistrato alla Acque, Autorità di Bacino etc.). Le Unità provinciali del Genio Civile, inoltre, controllano l'assetto idrico del territorio anche mediante caselli idraulici distaccati e monitorizzano costantemente, mediante una apposita rete telematica, i livelli delle acque e l'intensità delle precipitazioni sull'area alpina e prealpina della regione, attuando anche, all'emergenza, predisposizioni di presidio ed allarme di protezione civile.
L'azione sinergica, dunque, di queste strutture regionali, accompagnata, per la parte preventiva di propria competenza tecnica dall' A.R.P.A.V., va ad integrarsi con le attività proprie dell'Unità regionale di Protezione Civile, offrendo ad essa supporto di conoscenza in campo preventivo e tecnico in campo operativo per la gestione delle emergenze. Proprio recentemente, a testimonianza dell'attenzione e dell'importanza che i temi della difesa del territorio della gestione delle emergenze godono nell'attività amministrativa della Regione, l'Unità di Protezione Civile è stata sottratta alla competenza della Segreteria Generale per l'Ambiente e portata nell'area di diretta responsabilità della presidenza della Regione.

3. Episodi più gravi di dissesto idrogeologico dal 2010

Tra il 31 ottobre ed il 2 novembre 2010 in Veneto eccezionali precipitazioni, sempre più frequenti nell'ultimo decennio, provocarono l'allagamento di 140 km quadrati di territorio. La città di Vicenza e decine di Comuni grandi e piccoli subiscono danni e devastazioni enormi.
Precedenti del genere avvennero:

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011

— nel 1882, la prima grande alluvione del Veneto post unitario;
— nel 1951 la rotta del fiume Po a Occhiobello provocò l'alluvione in Polesine;
— nel 1966 Venezia diventò l'immagine mondiale della tragedia.

L'alluvione del 2010 fu originata da una perturbazione di origine atlantica che si spinse fino alle coste africane, convogliando un intenso e persistente flusso di correnti sciroccali caldo-umide sul Veneto. Si determinano precipitazioni in tutta la Regione, con quantitativi estremi sulle zone prealpine e pedemontane. Arrivarono piogge persistenti, che superarono diffusamente i 300 mm complessivi, con punte massime locali anche superiori a 500 mm. Venti di scirocco, sia sulla costa sia in quota sciolsero la neve preesistente in montagna, specie sulle Prealpi occidentali, la cui acqua si aggiunse a quella meteorica. Si manifestarono profonda sofferenza idraulica e diffuse situazioni di dissesto geologico sull'intero territorio regionale. Si segnalò un alto Adriatico meno salato, meno ossigenato e più torbido nei mesi successivi per l'eccezionale apporto di acqua e materiale causato dalle piene dei fiumi di novembre.
Con una piovosità al massimo storico, l'evento in argomento si colloca tra i 2 o 3 più intensi ed abbondanti che hanno colpito le zone prealpine e pedemontane del Veneto negli ultimi 50 anni. In particolare, sulle zone centro-occidentali, Prealpi e area pedemontana di Vicenza e Verona, i valori massimi registrati nelle 24 e 48 ore, in alcuni casi, superarono i massimi storici, che appartenevano agli eventi dell' ottobre 1992 e del novembre 1966.

Numerosi erano stati gli allarmi pluvio ed idro verificatisi nel 2011 ed almeno 12 significativi quelli verificatisi nel 2012. Le schede relative ad ogni episodio, elaborate da ARPAV, sono consultabili nell'area ambiente del sito web della Regione del Veneto.
L'episodio più grave tra il 10 ed il 14 di novembre del 2012. Il Veneto è stato interessato da una perturbazione tipicamente autunnale, particolarmente intensa nella prima metà di domenica 11 e fino al primo pomeriggio. Si sono avute precipitazioni diffuse, con rovesci anche di forte intensità e quantitativi molto abbondanti (>100 mm/24h) sulle zone montane, pedemontane e pianura settentrionale. In particolare, sulle Dolomiti meridionali e sulla maggior parte delle Prealpi vicentine, bellunesi e trevigiane e parte della pedemontana trevigiana, i quantitativi sono stati superiori a 150 mm, con locali massimi superiori a 200 mm registrati nelle stazioni di Valpore-Seren del Grappa, Valstagna, Cansiglio-Tramedere, Col Indes-Tambre, Castana-Arsiero, Feltre, Quero, Soffranco. La caratteristica più importante di questo evento è stata, oltre che l'abbondanza delle precipitazioni, anche e soprattutto la loro intensità: i quantitativi sono perlopiù caduti in un periodo di 12-18 ore, e per molte stazioni la maggior parte di tali quantitativi si è concentrata in 12 ore. Pertanto, le precipitazioni intense e concentrate in un intervallo temporale breve hanno favorito l'innesco di fenomeni franosi che hanno generalmente interessato i depositi di copertura sciolti (coerenti e non coerenti) e fenomeni di trasporto solido. I fenomeni che riguardano la movimentazione di depositi di copertura sciolti sono stati più diffusi nell'area pedemontana trevigiana e vicentina, mentre nel bellunese sono

Sede: via Paolucci, 34 - 30175 Venezia Marghera
e-mail: vincenzo.alonzi@regione.veneto.it
commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
Tel. 041 279 6857 3720

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2014

stati più rilevanti per numero i fenomeni di trasporto solido, che in alcuni bacini più importanti si son valutati come debris-flow.

Le precipitazioni significative sono iniziate in serata sulle Prealpi e sulla zone pedemontane occidentali, durante la notte si sono estese anche alle altre zone montane e pedemontane e a gran parte della pianura (tranne costa e zone sud orientali). La fase più intensa si è verificata nella prima metà di domenica fino al primo pomeriggio. Nelle prime ore di domenica 11 i rovesci più intensi hanno insistito sulla provincia di Treviso, probabilmente favoriti da fenomeni di convergenza tra i venti da nordest (prevalenti sulla pianura interna) e quelli di scirocco (prevalenti sulla costa e pianura limitrofa). In seguito (dalle 8 circa) si è avuta una ulteriore intensificazione delle piogge sulle zone montane e pedemontane, in particolare del Veronese orientale, del Vicentino, del Bellunese centro meridionale e del Trevigiano. In questa fase, che ha corrisposto ad un marcata intensificazione dei venti di scirocco sia in quota che sulla costa e parte della pianura, si sono verificati frequenti rovesci, localmente temporaleschi, con intensità anche di 20-30 mm/h sulle aree sopra indicate: in alcune zone tali rovesci intensi hanno perdurato per più ore. Nel primo pomeriggio i fenomeni più intensi si son spostati verso est (sul Bellunese). Dalle 15 circa si è assistito ad un generale diradamento e ad una significativa attenuazione dei fenomeni, che son risultati sparsi e discontinui; la zona dove le precipitazioni son risultate più frequenti fino a fine giornata (anche se con entità nettamente inferiore) è il Bellunese. Nella giornata di lunedì 13 si sono verificate ancora delle precipitazioni sparse e molto discontinue, con quantitativi cumulati comunque di modesta entità e un po' più significativi sul Bellunese orientale (valori tra i 5 e i 25 mm in 24h).

Per il bacino del fiume Alpone la piena fluviale è risultata significativa per la stazione di S. Bonifacio, dove si è registrato uno dei più elevati livelli idrometrici degli ultimi 25 anni, secondo solo a quello dell'evento del 2010, superando di quasi 1.60 m la soglia di criticità elevata (4,50). La soglia è stata superata anche nella stazione di San Vito sul fiume Chiampo di quasi un 1 metro.

Nel sottobacino Agno-Guà la piena è risultata significativa raggiungendo sul fiume Agno, nella stazione di Ponte Brogliano, il terzo livello di guardia degli ultimi 14 anni (superando il livello di criticità "elevata") e il terzo livello degli ultimi 27 anni nella stazione di Lonigo sul fiume Guà (superato il livello di criticità "moderata"). Per il bacino del Fratta-Gorzone la piena non è risultata particolarmente significativa, superando il livello idrometrico di criticità "moderata" alla stazione di Valli Mocenighe sul fiume Fratta. I tempi di propagazione della piena, con 30 ore di ritardo del picco tra Ponte Brogliano e Carmignano, son risultati in linea con i valori medi di propagazione.

Per il bacino del Fiume Bacchiglione la piena è stata significativa. Nella sezione di Vicenza (Ponte degli Angeli) è stato raggiunto il secondo livello degli ultimi 17 anni (superando il livello di criticità "elevata"); nella stazione di Montegalda il livello raggiunto, pur risultando il massimo strumentale registrato in 14 anni, è stato ampiamente superato nel 2010 e, pertanto, si colloca alla seconda posizione nella serie storica. Anche sul fiume Tesina a Bolzano Vicentino è

Sede: Via Paolucci, 34 – 30175 Venezia Marghera
e-mail: vincenzo.alonzi@regione.veneto.it
commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
Tel. 041-279 5685-1720

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011

stato raggiunto il quarto livello in 16 anni di serie storica, superando il livello di criticità "elevata". I tempi di propagazione della piena son risultati in linea con i tempi medi di propagazione tra Bolzano Vicentino e Montegalda (ritardo del picco di 12 ore e 30 minuti), mentre la propagazione è stata più rapida rispetto alla tempistica media tra Montegalda e Bovolenta.

Per il bacino del fiume Brenta la piena fluviale non è risultata molto significativa; il valore del picco di piena transitato nella sezione di Enego è stato superato in quasi tutti gli anni di osservazione. Nonostante nelle sezioni di Barziza e Limena i livelli raggiunti siano stati superati solo nel corso di altri 4 eventi, rispettivamente in 27 e 16 anni di serie storica, a Limena risulta superato solo il livello di criticità ordinaria (3.00 m), mentre a Barziza risulta superato quello di elevata (3.20 m)

Per il bacino del torrente Muson dei Sassi la piena è risultata significativa. Il livello del colmo di piena raggiunto a Castelfranco Veneto si colloca al terzo posto nei 13 anni di serie storica e ha superato il livello di criticità elevata (2.90 m).

Per il bacino del fiume Piave la piena fluviale è risultata significativa. A Belluno il livello idrometrico in corrispondenza del picco di piena ha quasi raggiunto il livello di massima piena registrata in 22 anni di osservazione, mentre il livello del colmo di piena raggiunto a Segusino è il più elevato registrato in 17 anni di osservazione, superando di poco il livello raggiunto nel 2002. Alla sezione di Ponte di Piave il livello raggiunto è stato superato solo nel 2002, nell'ambito dei 13 anni di serie storica considerata; nella stessa sezione è stato ampiamente superato in livello di criticità moderata (7.00 m). Il tempo di propagazione della piena, da Belluno a Ponte di Piave è risultato essere di 13 ore.

Nel bacino del Monticano la piena fluviale è risultata molto significativa. Tutte le sezioni monitorate (Vazzola, Fontanelle, Oderzo e Gorgo) hanno registrato picchi di piena superiori ai massimi valori registrati nelle relative serie storiche. A Vazzola il picco di piena è risultato di 0.60 m superiore al massimo valore della serie storica (19 anni), superando di quasi 1 metro il terzo livello di guardia (3.80 m) corrispondente ad una criticità idraulica "elevata". A Fontanelle e Oderzo i picchi di piena hanno superato di circa 0.6 m e 0.5 m i massimi valori di piena registrati negli ultimi 20 e 17 anni.. Il tempo di propagazione della piena tra le sezioni di Vazzola e Gorgo al Monticano, è risultato pari a 6 ore.

Per il bacino del Fiume Livenza la piena è risultata significativa; a Meduna di Livenza si è mantenuto inferiore al livello di massima piena registrato negli ultimi 18 anni, così come a Cessalto, stazione quest'ultima in cui è stato superato (4.55 m) di poco il secondo livello di guardia (4.50 m). A La Salute di Livenza il picco di piena è stato condizionato dall'andamento della marea, e si è mantenuto inferiore anch'esso al livello di massima piena registrato negli ultimi 20 anni.

Per il bacino del torrente Meschio la piena fluviale è risultata significativa, infatti per la sezione di Cordignano, (la sola per cui è disponibile una serie storica) il livello idrometrico al colmo è risultato inferiore solo alla piena del 2 novembre 2010. Per la sezione di Vittorio Veneto il

Sede: via Paolucci, 34 - 30175 Venezia Marghera
e-mail: vincenzo.alonzi@regione.veneto.it
commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
Tel. 041 279 3685-4720

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011

valore al picco sia risultato maggiore rispetto a quello dell'evento del novembre 2010, mentre a Borgo Campion le due piene (2 novembre 2010 e quella in argomento) hanno fatto registrare valori al colmo pressoché identici, pari rispettivamente a 1.60 e 1.58 m.
Per il bacino del Fiume Tagliamento la piena fluviale è stata significativa, in particolare per le stazioni della porzione terminale del fiume (Madrisio e Latisana). A Venzone (UD) il picco di piena (3.93 m) è risultato il terzo valore massimo negli ultimi 18 anni di osservazione. A Madrisio (UD) il livello del picco è risultato il massimo registrato negli ultimi 17 anni. A Latisana il picco (8,73 m) è stato di poco inferiore alla massima piena storica (8,99 m in 16 anni di osservazione); tale livello ha inoltre superato di 0.8 m il terzo livello di guardia (7.90 m) che definisce una condizione di criticità idraulica "elevata". I tempi di propagazione della piena sono stati dell'ordine di 6.00 ore da Venzone a Madrisio, e di 4.30 ore da Madrisio a Latisana.

A seguito dell'evento sono state raccolte, molte segnalazioni di dissesti idrogeologici:

- Comune di Lusiana (VI) strada comunale Marzari-Ronco, dissesto che ha interrotto l'unica via di accesso alla contrada Ronco con aggravamento della situazione in vari tratti della strada comunale Velo-Marc. Allagamenti in corrispondenza della Calle dell'Onfesa e Aggravamento del dissesto lungo la s.c. della Misciaia;
- Comune di Valdastico (VI) crollo del muro di sostegno a valle della strada provinciale in località Forni. Comune di Valli del Pasubio (VI) ed aggravamento dei dissesti lungo la s.c. di Cavrega;
- In provincia di Belluno sono stati segnalati due dissesti più rilevanti che hanno mobilizzato materiali sciolti interessando la viabilità provinciale e isolando due contrade. I dissesti più rilevanti: dissesto di Cilladon – Quero, colata detritica presso Sanzan e Case Masetti, che ha interessato Km 45+350 della S.R. 348 Feltrina e Km 47+300 della linea ferroviaria Treviso-Calalzo e la SR 348 Feltrina;
- Provincia di Treviso località Piai in Comune di Tarzo: strada comunale divelta da medio-ampio fenomeno franoso e danneggiata in altra zona adiacente. Sono state isolate due abitazioni in Comune di Vittorio Veneto (unica possibilità di accesso da Tarzo). Strada comunale in direzione Praderadego in Comune di Follina: interruzione della viabilità per fenomeno franoso di medie dimensioni che ha provocato la caduta di grossi alberi sulla sede stradale nonché l'invasione della stessa con materiale detritico. Frana che ha interessato un tratto di versante sovrastante la SP per una lunghezza di circa ml. 20, con conseguente riversamento di consistenti quantità di materiali e alberature sulla sede stradale e blocco temporaneo della circolazione. SP 86 in comune di Refrontolo al km. 12+130: erosione/crollo di un tratto di circa ml 10 di banchina e scarpata stradale; al km. 7+300 in comune di Refrontolo frana che ha interessato circa ml 12 di banchina e scarpata stradale. SP 152: da Guia a Col S. Martino (Comune di Valdobbiadene). In comune di Cison di V. loc. Rolle al km. 16+250, frana che ha interessato un tratto di circa ml. 50 di rilevato

Sede: via Paolucci, 34 – 30175 Venezia Marghera
e-mail: vincenzo.alonzi@regione.veneto.it
commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
tel. 041 279 2057 - 4725



stradale a causa del cedimento di un pari tratto di muro di sostegno e che ha reso necessaria la chiusura della strada alla circolazione.

4. Il "Piano di mitigazione del rischio idraulico e geologico"

Il Commissario per il superamento dell' emergenza alluvione, nell'ambito delle predisposizioni di protezione civile sancite con OPCM 3906, ha provveduto a predisporre un piano strategico per la "pianificazione di azioni e interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, al fine della ridurre definitivamente gli effetti dei fenomeni alluvionali ed in coerenza con gli altri progetti di regolazione delle acque, predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio". Il Commissario si è avvalso di un soggetto attuatore per la pianificazione degli interventi, nella persona dell'ing. Roberto Casarin, Segretario delle Autorità di Bacino dell'Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e di un Comitato tecnico scientifico sul rischio idraulico e geologico, composto dal prof. ing. Luigi D'Alpaos, dal prof. ing. Marco Marani e dal prof. ing. Alberto Mazzucato.

Il piano in questione prevede interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del valore totale di € 2,7 miliardi circa, ripartiti per provincia come indicato dal successivo prospetto.

Prospetto riassuntivo degli interventi previsti

importo complessivo	*Provincia*	*importo da finanziare*
148.854.000	Provincia di Verona	130.578.000
807.184.000	Provincia di Vicenza	718.802.000
859.358.000	Provincia di Padova	814.480.000
587.356.000	Provincia di Venezia	582.719.000
151.254.000	Provincia di Treviso	121.104.000
166.466.000	Provincia di Belluno	151.166.000
11.500.000	Provincia di Rovigo	11.500.000
2.731.972.000	*Totale per tutte le Province*	*2.532.349.000*

Gli importi sono aggiornati al 30 marzo 2011, data di redazione del piano.
In particolare: € 2.607.434.000 sono destinati al dissesto idraulico, € 112.075.000 al dissesto Geologico e € 12.463.000 per il dissesto idraulico - forestale.

Sede: via Paolucci, 34 - 30175 Venezia Marghera
e-mail: vincenzo.alonzi@regione.veneto.it
commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
Tel. 041 279 3685/4728

Gli interventi sono stati classificati assegnando a ciascuno una priorità sulla base dei seguenti criteri:

- interventi di somma urgenza (finalizzati ad eliminare le situazioni più critiche per la salvaguardia della pubblica incolumità) per 40.874.000 euro;
- interventi indifferibili (interventi o attività che vanno immediatamente attuati, necessari al ripristino della condizione di sicurezza dei territori colpi presente prima dell'evento alluvionale) per 75.423.000 euro;
- interventi molto urgenti (interventi selezionati nella prima fase di breve periodo per i quali va prontamente organizzata la progettazione, l'appalto e la cantierizzazione) per 1.259.068.000 euro;
- interventi urgenti (interventi a cui dare attuazione, solo a conclusione delle verifiche previste nella seconda fase di medio e lungo periodo) per 833.252.000 euro;
- interventi necessari (interventi a cui dare attuazione reperendo le corrispondenti risorse economiche) per 523.355.000 euro.

Il Piano analizza i bacini idrografici dell' Adige e del Brenta - Bacchiglione, considera le principali criticità presenti nei bacini del Piave, del Livenza e del bacino scolante in laguna di Venezia; riporta, infine, alcuni interventi nei bacini del Tagliamento, Lemene, Sile e Fissero Tartaro, Canal - Bianco e Po.
Per quanto riguarda le problematiche di carattere idraulico è stata individuata, sulla base degli elementi fondamentali, un'onda di piena di riferimento per dimensionare gli interventi.
Si è potuto così verificare la capacità di portata in corrispondenza di sezioni significative di ciascun sistema idrografico e, conseguentemente, sono state individuate le opere da realizzare e le criticità residue.

Gli interventi individuati rispondono ad alcuni fondamentali requisiti:

- opere inserite in un contesto pianificatorio già definito;
- interventi, con una accertata validità sotto il profilo tecnico, che possono essere anche eseguiti per successivi stralci funzionali, in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie;
- opere con un modesto impatto nei riguardi del sistema ambientale;
- nel settore geologico, interventi che rivestono carattere di priorità a fronte di fenomeni violenti e improvvisi.

Nell'ambito del Piano sono evidenziate anche le criticità residuali, quelle cioè non ancora superabili attraverso la programmazione di breve periodo.
Gli interventi strutturali individuati per mitigare la condizione di rischio idraulico rientrano tra le seguenti tipologie:

- interventi di manutenzione straordinaria sui corpi arginali quali rinforzi, risagomature, rialzi, ecc.;
- interventi di adeguamento degli alvei alle portate massime da definire in funzione dell' evento di progetto assegnato a ciascuna classe di opere;
- interventi di moderazione dei colmi di piena fino a ridurli a valori compatibili con lo stato attuale degli alvei dei fiumi;
- una combinazione delle due azioni precedenti.

Il Piano sottolinea, inoltre, la necessità di intervenire in modo esteso e radicale per la messa in sicurezza della vasta e imponente rete di corpi arginali che caratterizza tutto il territorio della pianura veneta.

È importante evidenziare che gli interventi previsti rispondono alle esigenze evidenziate dagli eventi alluvionali del 2010, ma non esauriscono gli interventi necessari per porre in condizioni di sufficiente sicurezza tutto il territorio del Veneto. Per i fiumi Livenza e Tagliamento, infatti, gli interventi per la laminazione delle piene devono essere realizzati nei bacini montani o in prossimità delle sezioni di chiusura, interessando pertanto la Regione Friuli Venezia Giulia con la quale è opportuno coordinarsi. Tali interventi sono ampiamente descritti negli strumenti di pianificazione già esistenti.

Il Piano contiene anche azioni non strutturali da realizzare per completare l'azione di presidio del territorio, che riguardano i seguenti ambiti:

- aggiornare i rilievi topografici degli alvei;
- predisporre un sistema per la previsione delle piene;
- adeguare la rete di monitoraggio idrometrico e pluviometrico;
- indagini geotecniche sui corpi arginali e nei terreni di fondazione;
- adozione di norme transitorie per evitare interventi territoriali nelle aree interessate dall' evento;
- difesa dall'antropizzazione dei territori dove sono state individuate le future opere di mitigazione.

5. **Attività svolta nel 2012 ed analisi della relativa documentazione amministrativa.**

Con le risorse economiche pervenute alla fine del 2011 (3,5 mil di euro circa) è stato avviato il piano d'interventi. Sono stati adottati i seguenti atti commissariali:

- Decreto d'impegno della spesa nr. 1 del 16 gennaio 2012. E' stato completato, consentendo di fatto l'avvio della fase di affidamento del primo stralcio funzionale dello "scolmatore di piena Limenella – Fossetta per la difesa idraulica della zona Padova - nord (bacino Montà – Portello)", codice PD048/A10. Il primo stralcio funzionale di tale opera, del valore di € 18,5 milioni, ritenuta di primaria importanza dagli organi tecnici regionali per la difesa idraulica di area dell'importante capoluogo veneto particolarmente esposta a rischio, molto popolosa

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011

e ricca di attività industriali, è cofinanziato con risorse proprie, inoltre, dalla Regione del Veneto (€ 7,5 milioni) dal Comune di Padova (€ 4 milioni) e dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione (€ 3,5 milioni), individuato quale Ente realizzatore e Stazione appaltante. Con il medesimo Decreto commissariale d'impegno della spesa si prendeva atto del Quadro Economico dell'intervento. Sono state avviate, quindi:

- la verifica strutturale delle opere civili in conformità alle nuove norme tecniche di cui al DM 14.01.2008, attività conclusa alla fine di marzo;
- la verifica di eventuale aggiornamento dei prezzi, conclusa nel mese di marzo;
- la predisposizione degli atti per l'affidamento del completamento di una necessaria attività di bonifica bellica (BCM) e contestuale bonifica ambientale del tratto ricadente della cosiddetta "Cava Morandi", con la previsione di avviare la prima nel prossimo mese di maggio;
- la predisposizione del bando di gara tipo EU con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con definizione dei criteri di valutazione;
- la richiesta di concessione per l'attraversamento dell'autostrada a della tangenziale;

- Con Decreto commissariale nr 2 del 7 febbraio 2012 sono state individuate le risorse umane e le figure professionali necessarie al funzionamento a pieno regime della struttura di gestione commissariale.

Si è corso ad una procedura pubblica di legge per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata continuativa per una figura - di alto profilo professionale – per il coordinamento amministrativo di struttura complessa, immediatamente necessaria, in grado di affiancare il Commissario nelle attività di raccordo con le Direzioni ed Unità regionali di cui si avvale e gli Enti realizzatori .

- Con Decreti nr. 3, 4 e 5 dell'8, 15 e 16 febbraio 2012 sono stati stabiliti i criteri di selezione e nominata la Commissione di valutazione dei candidati.
- Con Decreto nr 6 del 27 febbraio 2012 è stato approvato l'esito della procedura comparativa condotta dalla Commissione.

Gli atti amministrativi adottati sono stati, come previsto dalla legislazione in materia, sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità della Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti di Roma.

Con ulteriori 1,3 milioni di euro circa di risorse trasferite dal Ministeri il 28 settembre 2012 sono stati finanziati ancora due degli interventi previsti con i seguenti atti:

- Decreto nr 13 del 28 settembre 2012 ad oggetto "impegno di spesa per la realizzazione di opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè (BL) COD BL001A/10 , importo del progetto € 300.000,00;

Sede: via Paolucci, 34 - 30175 Venezia Marghera
e-mail: vincenzo.alonzi@regione.veneto.it
commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
Tel. 041 279 5085 - 4726

- Decreto nr 14 del 28 settembre 2012 ad oggetto "impegno di spesa per la realizzazione di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della SP 10 in Campo S.Martino (PD)", COD PD012A/10, importo € 1.000.000,00.

Sono stati adottati inoltre i seguenti atti commissariali:

- Decreto nr. 15 del 18 ottobre 2012 ad oggetto "Indirizzi operativi e schema di disciplinare per la regolamentazione dei rapporti con i soggetti che realizzano gli interventi approvati dal Commissario Straordinario Delegato". Il disciplinare verrà sottoposto a visto per accettazione dell'Ente di cui il Commissario si avvale per l'esecuzione di ciascun intervento;
- Decreto nr. 17 del 14 novembre 2012 ad oggetto "individuazione del Consorzio di Bonifica Bacchiglione quale Ente di cui si avvale il Commissario per la realizzazione dell'opera: scolmatore di piena Limenella-Fossetta- Brenta per la difesa idraulica della zona nord di Padova (bacino Montà-Portello)";
- Decreto nr. 18 del 18 dicembre 2012 ad oggetto: "Individuazione del Genio Civile di Padova quale Ente di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell'opera: lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il pronte della S.P. 10)";
- Decreto nr. 19 del 20 dicembre 2012 ad oggetto: "Individuazione della Provincia di Belluno quale Ente di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell'opera: opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè".
- Decreto nr. 20 del 20 dicembre 2012: si è reso necessario procedere all'assunzione a tempo determinato di una unità di personale con qualifica di assistente amministrativo Cat. C1 per l'esecuzione delle incombenze di segreteria della struttura commissariale. L'assunzione si è resa necessaria visto che specifica richiesta di supporto, rivolta alla regione del Veneto con atto nr. 553834 datato 5 dicembre 2012, non aveva avuto esito. La persona cui è stato affidato l'incarico con contratto a tempo determinato per mesi 6 prorogabili decorrente dal 1 gennaio 2013, è stata prescelta perché collocata in posizione utile nella graduatoria di selezione già effettuata, per figure professionali di medesima qualifica, dal Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.

Tutti i provvedimenti del Commissario sono consultabili e scaricabili in formato .pdf nello spazio web dedicato nell'area Difesa del Suolo del sito istituzionale della Regione del Veneto al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Ambiente/Acqua_e+difesa+del+suolo/Difesa+del+suolo/Commissario+Straordinario+Delegato+per+il+Rischio+Idrogeologico+nel+Veneto.htm.

Sede: Via Paolucci 34 - 30175 Venezia Marghera
e-mail: vincenzo.alonzi@regione.veneto.it
commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
Tel. 041 279 5685-4720

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/04/2011

Le risorse di cassa sino ad ora trasferite al Commissario, hanno consentito procedere al finanziamento delle seguenti tre opere di cui si forniscono sintetiche notizie in ordine allo stato di avanzamento delle relative procedure:

- **COD. PD48A/10 "Scolmatore di piena Limenella – Fossetta per la difesa idraulica della zona nord di Padova" importo € 3.500.00,00.** L'opera, come in precedenza segnalato, è in fase di affidamento con procedura di gara EU. La commissione appositamente nominata sta ultimando la valutazione delle 13 offerte pervenute da altrettante imprese. Le proposte progettuali migliorative che meritano adeguato ed attento studio hanno reso più impegnativo il lavoro della commissione. Si prevede entro il mese di febbraio 2013 il termine dei lavori della commissione e la conseguente aggiudicazione dell'opera. Al momento non si segnalano problematiche degne di nota. All'opera è stato imposto cronoprogramma che prevede cadenze di: 42 mesi dal finanziamento (luglio 2015) per il termine dei lavori di esecuzione e 54 mesi dal finanziamento (luglio 2016) per la rendicontazione ed il collaudo. (Scheda di monitoraggio e crono programma il allegato "A"
- **COD. BL001A/10 "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè (BL)" importo € 300.000,00.** La progettazione definitivo/esecutiva (fasi accorpate come da deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 41 del 3.04.2005) è stata terminata e, in conferenza di servizi, sono stati acquisiti i pareri favorevoli al progetto della Soprintendenza per i beni Ambientali ed Architettonici, della Regione del Veneto, della Provincia di Belluno (Ente che realizzerà l'opera) e del Comune di Arsiè. Il progetto sarà a breve approvato da questo Commissario dopo l'esame tecnico della Direzione di Difesa del Suolo della Regione del Veneto, organo di cui egli si avvale. Il bando di gara è in corso di pubblicazione e si prevede l'aggiudicazione dell'opera per la fine di gennaio del 2013. La consegna dei lavori, a causa della stagione invernale in corso che non consente l'attivazione del cantiere, è prevista per la fine del mese di aprile 2013 quando le condizioni meteorologiche saranno favorevoli. Al momento non si segnalano problematiche degne di nota. All'opera è stato imposto cronoprogramma che prevede cadenze di: 12 mesi dal finanziamento (settembre 2013) per l'ultimazione dei lavori e 15 mesi dal finanziamento (dicembre 2013) per rendicontazione e collaudo. Scheda di monitoraggio e cronoprogramma dell'opera in allegato "B".
- **COD PD012A/10 " Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della SP 10 in Campo S.Martino (PD)" importo € 1.000.000,00.** Il progetto definitivo andrà in Commissione TRD per la fine di gennaio 2013. Al momento non si segnalano problematiche degne di nota. All'opera in questione è stato imposto cronoprogramma che prevede cadenze di: 10 mesi dal finanziamento (luglio 2013) per il completamento delle procedure di appalto e consegna dei lavori, 17 mesi dal finanziamento (febbraio 2014) per l'ultimazione dei lavori e 24 mesi (ottobre 2014) dal finanziamento per la rendicontazione e collaudo. Scheda di monitoraggio e cronoprogramma della fase di progettazione in allegato "C".

Sede: via Paolucci, 34 – 30175 Venezia Marghera
e-mail: vincenzo.ahanzi@regione.veneto.it
commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
Tel. 041 279 5680 - 4728

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011

Utilizzando un fondo di rotazione sui capitoli di bilancio della Direzione Difesa del Suolo della regione del Veneto, come già comunicato nelle precedenti relazioni, si stanno portando avanti le progettazioni dei 16 interventi segnalati quali prioritari cui dovrebbero essere destinate le risorse FSC di cui si è parlato in premessa.
Lo stato di avanzamento delle progettazioni ed il relativo impegno di risorse sul fondo di rotazione è illustrato nel prospetto in allegato "D".

6. **Bilancio della gestione commissariale.**
La contabilità speciale nr. 5596 intestata a questo Commissario, alla data del 31 marzo 2012, presenta (Situazione contabile in all. "E"):
- accrediti provenienti dal Ministero A.T.T.M. per € 5.458.305,60;
- impegni di spesa per € 5.100.132,64;
- pagamenti per € 203.850,05;
- disponibilità di cassa per € 5.254.455,55.

Gli impegni di gestione commissariale sono stati regolati, nel periodo in esame, con i seguenti atti:
- Decreto nr.16 del 8 ottobre 2012 ad oggetto "Liquidazione del terzo acconto 2012 degli emolumenti del Commissario e liquidazione del primo acconto 2012 dei compensi per co.co.co in corso";
- Ordine di pagamento nr. 3/2012 a beneficio della Regione del Veneto ad oggetto: "rimborso del secondo acconto 2012 degli emolumenti del Commissario";
- Decreto nr. 20 del 20 dicembre 2012 ad oggetto: "Contratto di assunzione a tempo determinato (mesi 6 dal 1 gennaio 2013) di una unità di personale per la struttura commissariale con mansioni di assistente amministrativo di livello C1 ed impegno di spesa per € 20.000 destinato alla relativa retribuzione".

Nessun accredito è, anche nel 2012, ancora pervenuto dalla Regione del Veneto per la quota-parte di finanziamento di competenza a causa delle note problematiche connesse al rispetto del patto di stabilità interno.

7. **Problematiche di finanziamento del piano d'interventi e di erogazione delle risorse.**

Esigui trasferimenti di cassa sono pervenuti da parte di codesto Ministero (circa 12% delle risorse necessarie a coprire il fabbisogno della fase attuativa dell'Accordo di Programma rimodulato), mentre nulla ancora è stato trasferito degli stanziamenti di competenza della Regione del Veneto. L'attività operativa di questo Commissario è, quindi, forzatamente limitata agli interventi che è stato possibile finanziare con le risorse a disposizione.

Sede: via Paolucci, 34 – 30175 Venezia Marghera
e-mail: vincenzo.alonzi@regione.veneto.it
commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
Tel. 041-27[illegible]

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2013

Con nota nr. 266408 del 7 giugno 2012, questo Commissario ha sollecitato sul punto gli Assessori al Bilancio ed all'Ambiente della Regione del Veneto che non hanno ancora fatto conoscere i tempi con cui le risorse saranno messe a disposizione del Commissario.
Si ritiene, quindi, che gli obiettivi praticabili con le risorse trasferite siano stati, sino ad ora, interamente conseguiti.

Il meccanismo con cui dovrebbero essere trasferite le risorse di cui alla delibera CIPE 8/2012 è incompatibile con le tipicità della gestione commissariale che opera per cassa e non per competenza. E' assolutamente necessaria l'individuazione di correttivo che possa consentire di superare l'ostacolo che impedisce ai Commissari di operare per competenza. Le soluzioni praticabili appaiono:

- che il Ministero dell'Ambiente e T.T.M. interessi il MEF affinchè modifichi i propri orientamenti in materia, sempre che la cosa sia possibile in relazione ai ripetuti pareri negativi espressi dalla Corte dei Conti;
- che si faccia pervenire ai Commissari un Decreto ministeriale di preciso impegno al trasferimento della totalità dei fondi di cui alla medesima delibera del CIPE, che possa essere utilizzato dai Commissari stessi come presupposto logico-giuridico per avviare tutti gli interventi previsti contemporaneamente, impegnando in termini di cassa le risorse necessarie a sostenere le spese di progettazione e poter approvare, anche senza effettiva disponibilità di cassa, i contratti da stipulare a seguito di gara.

Nelle more di adeguata soluzione i commissari riusciranno a spendere e/o a ottenere obbligazioni giuridicamente valide solo per la prima tranche del 20% delle risorse. La parte rimanente verrà persa poiché non sarà possibile, entro il termine imposto del 31 dicembre 2013, aver stipulato obbligazioni giuridicamente valide per tutti gli interventi finanziati con la delibera CIPE 8/2012.

IL COMMISSARIOSTRAORDINARIO DELEGATO
(Dott. Vincenzo Alonzi)

Sede: via Paolucci, 34 - 30175 Venezia Marghera
e-mail: vincenzo.alonzi@regione.veneto.it
commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
Tel. 041-279 5085-4720

Allegato A

Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.1.2011

PIANO STRAORDINARIO EX L. 191/2009, ART. 2, COMMA 240 – AdP MATTM – REGIONE DEL VENETO

MONITORAGGIO AL 31/12/2012

TITOLO INTERVENTO:			
FONTE FINANZIAMENTO € 18.500.000,00= Legge n. 191/2009 (art. 2, comma 240)		IMPORTO FINANZIAMENTO € 3.500.000,00	
CODICE INTERV.PD 048*/10	PROV. PD	COMUNE : PD	PRIORITA'

ENTE RESPONSABILE				
CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE (PADOVA)		TEL.049 8751133	FAX 049 655991	e.mail:bonifica @baccbrenta.it
Rup: Ing.Francesco Veronese	Ruolo Direttore	cel	Fax 049 655991	e.mail:veronese @baccbrenta.it

STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO				
FASE		PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO
PROGETTISTA		Prof.Ing. Vincenzo Bixio-prof.D'Alpaos	Prof.Ing. Vincenzo Bixio-prof.D'Alpaos	Nordest Ingegneria – Consorzio di bonifica Bacchiglione
ENTE DI APPARTENENZA		Liberi professionisti	Liberi professionisti	Soc. di Ingegneria – Consorzio di bonifica Bacchiglione
PROGETTAZIONE				
AUTORIZZAZIONI/PARERI NECESSARI ↓				
AUT.NE PAESAGGISTICA			DGR 2230 DEL 18/07/2006	DGR 2230 DEL 18/07/2006
VALUT.NE DI INCIDENZA			DGR 2230 DEL 18/07/2006	DGR 2230 DEL 18/07/2006
V.I.A.			DGR 2230 DEL 18/07/2006	DGR 2230 DEL 18/07/2006
VARIANTE URBANISTICA			DGR 2230 DEL 18/07/2006	DGR 2230 DEL 18/07/2006
AUTORITÀ DI BACINO				
CONSORZIO DI BONIFICA				
PARCO				
ARPAV				
PROVINCIA				
ESPROPRI			DGR 2230 DEL 18/07/2006	DGR 2230 DEL 18/07/2006
OMOLOGAZIONE G.C.				
CONFORMITA' URBANISTICA				
AUT.NE ARCHEOLOGICA				
AUT.NE MONUMENTALE				
CONFERENZA DI SERVIZI			DGR 2230 DEL 18/07/2006	DGR 2230 DEL 18/07/2006
VALIDAZIONE DEL PROGETTO				

PER OGNI FASE O PARERE INDICARE LA DATA DI ULTIMAZIONE O RILASCIO OPPURE PORRE "IN CORSO"

	APPROVAZIONE		DGR 2230 DEL 18/07/2006-D.D. Difesa Suolo 82 del 27/04/2009 – Decreto del Commissario Straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto n. 8 del 12/4/2012	

QUADRO ECONOMICO							
PROGETTO		PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO	
TIPO DI GARA		Aperta/Bando tipo UE - Offerta Economicamente più vantaggiosa					
IMPORTO DEL PROGETTO				12.975.103,53			
A) A BASE DI GARA							
di cui	*Lavori*		%	12.690.121,53	%		%
	Oneri per la sicurezza		%	284.982,00	%		%
B) SOMME A DISPOSIZIONE			%	5.524.896,47	%		%
di cui	*Imprevisti e economie*		%	76.334,38	%		%
	Rilievi ed indagini		%	18.000,00	%		%
	Espropri		%	800.000,00	%		%
	Progettazione e sicurezza	Nota: Nel quadro di spesa le voci Progettazione e D.L. sono uniche	%	1.297.510,35	%		%
	Direz. lavori e sicurezza	Nota: Nel quadro di spesa le voci Progettazione e D.L. sono uniche	%		%		%
	Altro		%	510.000,00	%		%
	I.V.A.		%	2.823.051,74	%		%
TEMPO CONTRATTUALE				24 MESI			MESI

TEMPI PREVISTI			
	FASI DI ATTUAZIONE	DATA MESE/ANNO	MESI DAL FINANZIAMENTO
PRELIMIN.	INIZIO ATTIVITÀ		
	APPROVAZIONE		
DEFINIT.	ULTIMAZIONE		
	APPROVAZIONE	DGR 2230 DEL 18/07/2006-D.D. Difesa Suolo 82 del 27/04/2009 - Decreto del Commissario Straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto n. 8 del 12/4/2012	
ESECUT.	ULTIMAZIONE		
	APPROVAZIONE		

BANDO DI GARA	10/07/2012	6
CONTRATTO	16/07/2013	18
CONSEGNA DEI LAVORI	16/07/2013	18
ULTIMAZIONE	16/07/2015	42
COLLAUDO	16/07/2016	54

STATO DELL'INTERVENTO ALLA DATA DEL 31/12/2012	
PROGETTAZIONE	100%
GARA D'APPALTO	In corso
LAVORI IN CORSO (%)	0%
RENDICONTAZIONE	0%
COLLAUDO	0%

NOTE:

Eventuale ritardo rispetto alla data prevista per l'appalto e motivazioni:
Nell'incertezza circa l'effettiva completa entrata in vigore del DPR 207/2010, in effetti rinviata con il D.L. 6 giugno 2012 n. 73, si è preferito differire di qualche settimana la stesura definitiva del bando di gara.

Proroghe:

Perizie:

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE - PADOVA Via Venezia, 11

RESPONSABILE DEL PROGETTO	
DATA 11.01.2013	FIRMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il primo impegno del Commissario straordinario delegato è quello di redigere e presentare ai soggetti responsabili dell'Accordo di programma un cronoprogramma di attuazione degli interventi e, qualora non sia possibile rispettarne i tempi stabiliti, comunicare tempestivamente le circostanze del ritardo al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il presente modello ha lo scopo di raccogliere informazioni utili per l'approntamento di un realistico cronoprogramma.

Nella colonna in giallo della sezione **Stato di avanzamento del progetto** vanno indicati con una crocetta tutti i pareri, le autorizzazione e le fasi del processo che portano all'approvazione del progetto da affidare, indipendentemente dalla fase progettuale a cui si riferiscono e dal fatto che siano state avviate o meno le pratiche relative, aggiungendo eventuali ulteriori soggetti interessati. Per quelle già avviate, la fase progettuale a cui si riferiscono si dedurrà dalla data o dalla notazione *"in corso"*, riportate nelle colonne successive. La casella è lasciata in bianco qualora l'attività relativa non abbia ancora avuto inizio. Ovviamente non sarà riportata alcuna notazione per quei pareri o autorizzazioni che sono stati raccolti o sono in discussione in sede di conferenza di servizi.

La sezione **Quadro economico** va compilata, con le aggregazioni ivi indicate, con riferimento alla fase di progettazione più avanzata, anche quando questa non si possa considerare formalmente ultimata.

In fine, per quanto riguarda il riquadro **Tempi previsti**, l'indicazione delle date deve essere fatta con accortezza, tenendo conto del fatto che il Piano straordinario giustifica le procedure di urgenza ammesse dalla normativa. Qualora il soggetto che compila il questionario fosse nelle condizioni di non poter avviare alcune fasi del processo di attuazione senza il finanziamento necessario, il tempo sarà indicato in mesi a partire dal momento dell'accertamento del finanziamento.

SCHEDA MONITORAGGIO

Da inviare periodicamente agli indirizzi:
con le seguenti scadenze:
30 aprile e 31 ottobre

Regione del Veneto
Segreteria Regionale Ambiente e LL.PP.
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Via Paolucci, 38 30175 Marghera (VE)
Fax 041/2795012

Dipartimento della ProtezioneCivile
Ufficio Opere Pubbliche d'Emergenza
Via Ulpiano 11 - 00193 Roma
Fax numero 06 68 20 360

Data Aggiornamento	31/12/2012

Tipo di Provvedimento:		
	Numero	Data
Legge ☐		
Ordinanza ☐	195	18/10/2006
Decreto X☐	82	27/04/2009

SEZIONE INTERVENTO

Regione	Provincia	Comune	Località
VENETO			

Codice intervento (*) 3258 / VEN / ____ / ____ / ____

Titolo dell'intervento (**)

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLO SCOLMATORE DI PIENA LIMENELLA FOSSETTA PER LA DIFESA IDRAULICA DELLA ZONA DI PADOVA NORD.

Finanziamento DPC	Altri Finanziamenti(1)	Note
7.500.000,00	11.000.000,00	Comune di Padova e Consorzio di bonifica Bacchiglione

Livello di progettazione (2): Progetto Esecutivo approvato — Data Approvazione: 27/11/09

SEZIONE DATI PROGETTUALI D'APPALTO

ENTE ATTUATORE: Consorzio di bonifica Bacchiglione

Responsabile del procedimento:

Nome: Francesco Cognome: Veronese Tel/Fax: 049/ 8751133 049/655991 E-mail: bonifica@bacchbrenta.it

Progetto elaborato da:	Direttore lavori:
Nordest Ingegneria s.r.l.	
Responsabile della sicurezza:	Ing. Capo:

Quadro economico del progetto

	Importo totale lavori: 18.500.000,00	Importo imprevisti: 116.014,38	Spesa di gara:
Di cui	Importo lavori a corpo: 9.743.485,99	Importo rilievi e sondaggi: 864.352,38	Importo IVA lavori: 2.823.051,74
	Importo lavori a misura: 2.686.617,54	Importo spese generali: 1.297.510,35	Importo IVA altre voci:
	Importo lavori in economia:	Oneri espropri: 800.000,00	
	Oneri per la sicurezza: 284.982,00	Competenze professionali:	

Data gara appalto: ____ Impresa aggiudicataria: ____

Classifica e categoria ai sensi DPR 25 gennaio 2000, n. 34: ____ / ____

Quadro economico a seguito della gara di appalto

Importo netto lavori	Importo imprevisti	Spesa di gara
Importo IVA lavori appaltati	Importo rilievi e sondaggi	Oneri espropri
Competenze professionali	Importo spese generali	Importo IVA altre voci

Timbro

CONSORZIO BONIFICA BACCHIGLIONE PADOVA Via Roma

Responsabile del procedimento
firma

(*) Codice dell'intervento: inserire soggetto attuatore, n. stralcio Piano Straordinario, n. intervento
(**)(2) Vedere note per la compilazione delle schede di monitoraggio

SCHEDA MONITORAGGIO

Da inviare periodicamente agli indirizzi:
con le seguenti scadenze:
30 aprile e 31 ottobre

Regione del Veneto
Segreteria Regionale Ambiente e LL.PP.
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Via Paolucci, 38 30175
Marghera (VE)
Fax 041/2795012

Dipartimento della ProtezioneCivile
Ufficio Opere Pubbliche d'Emergenza
Via Ulpiano 11 - 00193 Roma
Fax numero 06 68 20 360

Data aggiornamento		Tipo di Provvedimento:		Numero	Data
	31/12/2012	Legge	☐		
		Ordinanza	☐		
		Decreto	X☐	195 82	18/10/2006 27/04/2009

SEZIONE INTERVENTO

Regione	Provincia	Comune	Località
VENETO			

Codice intervento (*) 3258 / VEN / ____ / ____ / ____

Titolo dell'intervento (**)

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLO SCOLMATORE DI PIENA LIMENELLA FOSSETTA PER LA DIFESA IDRAULICA DELLA ZONA DI PADOVA NORD.

SEZIONE STATO DI ATTUAZIONE FISICO AMMINISTRATIVO INTERVENTO

Data affidamento lavori	Durata lavori contrattuale in gg. (3)
Data inizio lavori	**N. Repertorio**
Data contratto	

Stato avanzamento Fisico = Importo lavori eseguiti (4) / Importo contrattuale lavori = _____ = ☐ %

Sospensioni

Data Sospensione	Causa	Data Ripresa

Proroghe

Data proroga	Causa ed estremi atto autorizzativo	N. Giorni prorogati

Perizie

Tipologia (5)	Causa	Data	Aumento tempo utile esecuzione gg.	Variazione importo contrattuale	Note

Timbro

Responsabile del procedimento

(*) Codice dell'intervento: inserire soggetto attuatore, n. stralcio Piano Straordinario, n. intervento
(**) (3) Vedere note per la compilazione delle schede di monitoraggio
(4) Riportare l'importo lavori contabilizzato
(5) Specificare se si tratta di perizia di variante, suppletiva o di variante e suppletiva

SCHEDA MONITORAGGIO

Da inviare periodicamente agli indirizzi:
con le seguenti scadenze:
30 aprile e 31 ottobre

Regione del Veneto
Segreteria Regionale Ambiente e LL.PP.
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Via Paolucci, 38 30175
Marghera (VE)
Fax 041/2795012

Dipartimento della ProtezioneCivile
Ufficio Opere Pubbliche d'Emergenza
Via Ulpiano 11 - 00193 Roma
Fax numero 06 68 20 360

		Tipo di Provvedimento:		
			Numero	Data
Data aggiornamento	31/12/2012	Legge ☐		
		Ordinanza ☐		
		Decreto X☐	**195**	**18/10/2006**
			82	**27/04/2009**

SEZIONE INTERVENTO

Regione	Provincia	Comune	Località
VENETO			

Codice intervento (*) 3258 / VEN / ____ / ____ / ____

Titolo dell'intervento (**)


REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLO SCOLMATORE DI PIENA LIMENELLA FOSSETTA PER LA DIFESA IDRAULICA DELLA ZONA DI PADOVA NORD.

SEZIONE PAGAMENTI

Data	Nr. Mandato	Descrizione	Importo (6)	IVA	Note
4/08/97	2065	Pubbl. bando progett. definit.	€ 2.707,74	€541,55	4/08/97
21/10/97	2716	Pubbl. bando progett. definit.	€ 2.905,96	€581,19	21/10/97
6/12/97	3152	Implem. Num mod idrolog ba	€18.875,99	€3.615,20	6/12/97
19/03/98	655	Comp. Comm. aggiud. Prog definit	€ 981,27	€ 0,00	19/03/98
19/03/98	656	Comp. Comm. aggiud. Prog definit	€ 981,27	€ 0,00	19/03/98
19/03/98	657	Comp. Comm. aggiud. Prog definit	€ 981,27	€ 0,00	19/03/98
17/04/98	999	Comp. Comm.. Prog definit	€ 1.032,91	€ 0,00	17/04/98
17/04/98	1000	Comp. Comm.. Prog definit	€ 1.187,85	€ 0,00	17/04/98
26/08/98	2321	Spese Progettazione	€6.766,04	€1.353,21	26/08/98
26/08/98	2322	Spese Progettazione	€ 6.766,04	€1.353,21	26/08/98
11/12/98	3368	Spese mod matemat idrolog	€ 18.875,99	€3.615,20	11/12/98
17/06/02	1703	Spese SIA	€ 10.957,15	€2.191,43	17/06/02
15/10/02	3821	Acconto progettaz definit	€ 52.046,46	€10.409,29	15/10/02
15/10/02	3822	Acconto progettaz definit	€ 54.128,32	€ 10.825,66	15/10/02
1/08/03	2617	Spese SIA	€ 25.822,84	€ 5.164,57	1/08/03
15/10/03	3817/ 3818	Spese SIA	€ 13.696,44	€ 2.739,29	15/10/03
04/11/03	3995	Spese consulenze esterne	€ 2.100,00	€ 420,00	04/11/03
3/12/03	4394	Spese pubblicaz annuncio VIA	€ 1.428,00	€ 285,60	3/12/03
3/12/03	4395	Spese pubblicaz VIA	€ 1.000,00	€ 200,00	3/12/03
3/12/03	4396	Versam spese VIA	€ 14.977,25	€ 0,00	3/12/03
15/12/03	4697	Spese noleggio schermo proiettore	€ 100,00	€ 20,00	15/12/03
14/07/04	2679	Spese Elaborati VIA	€ 2.103,50	€ 420,70	14/07/04
24/08/04	3237/3 238	Spese SIA	€ 2.739,29	€ 547,86	24/08/04

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE - PADOVA - Via Vescovado 17

1/03/07	819	Cople copisteria	€ 47,66	€ 9,53	1/03/07
5/03/07	841	Spese Acconto Consulenza esterna computaz.	€ 6.120,00	€ 1.224,00	5/03/07
14/04/07	1358	Spese consulenza esterna per lavori di ricerca e ispez.	€ 4.900,00	€ 980,00	14/04/07
10/05/07	1775	Spese consulenza esterna-rep. Atti	€ 2.600,00	520,00	10/05/07
7/07/07	2654	Spese Progettazione Esec. ing. Bixio	€ 12.288,00	€ 2.400,00	7/07/07
7/07/07	2655	Spese Indag. Geotecniche Nord Est ingegneria	€ 10.200,00	€ 2.040,00	7/07/07
25/07/07	3056	Spese Supporto progettaz. Nord Est	€ 12.240,00	€ 2.488,00	25/07/07
27/09/07	4000	Spese indagini geotecniche Analis. Laborat.	€ 4.896,00	€ 979,20	27/09/07
24/10/07	4536	Spese consulenz prog manuf. Idrovore – arch. Cartamantiglia	€ 3.072,00	€ 600,00	24/10/07
27/12/07	5654	Spese invio comunicaz. Indennità espropri ditte	€ 496,47		27/12/07
12/05/08	2298	Spese professionisti - consulenza Progettaz. Esecut.	€ 6.988,80	€ 1.747,20	
24/05/08	2531	Spese professionisti -- consul. Computaz. stima opere	€ 3.494,40	€ 873,60	
24/05/08	2532	Spese per progettaz. Strutturale. Prog Esecut.	€ 16.793,28	€ 4.198,32	
24/05/08	2533	Spese Progettazione Esecutiva	€ 19.584,00	€ 4.896,00	
24/05/08	2534	Spese Supp. Progettaz. Eseutiva	€ 19.584,00	€ 4.896,00	
9/04/08	1379	Indennizzi per espropri aree	€ 4.025,00		
9/04/08	1380	Indennizzi per espropri aree	€ 4.025,00		
9/04/08	1381	Indennizzi per espropri aree	€ 5.175,00		
9/04/08	1382	Indennizzi per espropri aree	€ 5.175,00		
10/04/08	1398	Spese notifiche	€ 105,17		
17/04/08	1438	Indennizzi per espropri aree	€ 22.576,68		
17/04/08	1439	Indennizzi per espropri aree	€ 1.700,00		
17/04/08	1440	Indennizzi per espropri aree	€ 9.713,29		
17/04/08	1441	Indennizzi per espropri aree	€ 2.000,00		
17/04/08	1442	Indennizzi per espropri aree	€ 9.713,29		
17/04/08	1443	Indennizzi per espropri aree	€ 2.000,00		
17/04/08	1444	Indennizzi per espropri aree	€ 9.713,29		
17/04/08	1445	Indennizzi per espropri aree	€ 2.000,00		
17/04/08	1446	Indennizzi per espropri aree	€ 19.426,58		
10/05/08	2269	Indennizzi per espropri aree	€ 498,53		
10/05/08	2270	Indennizzi per espropri aree	€ 498,53		
10/05/08	2271	Indennizzi per espropri aree	€ 1.750,00		
10/05/08	2272	Indennizzi per espropri aree	€ 1.750,00		
10/05/08	2273	Indennizzi per espropri aree	€ 11.132,28		
10/05/08	2274	Indennizzi per espropri aree	€ 7.421,52		
10/05/08	2275	Indennizzi per espropri aree	€ 7.421,52		
10/05/08	2276	Indennizzi per espropri aree	€ 1.700,00		
10/05/08	2277	Indennizzi per espropri aree	€ 2.508,00		
10/05/08	2278	Indennizzi per espropri aree	€ 2.508,00		
10/05/08	2279	Indennizzi per espropri aree	€ 850,00		
10/05/08	2280	Indennizzi per espropri aree	€ 850,00		
10/05/08	2281	Indennizzi per espropri aree	€ 17.201,28		
10/05/08	2282	Indennizzi per espropri aree	€ 1.700,00		
10/05/08	2283	Indennizzi per espropri aree	€ 1.864,05		
10/05/08	2284	Indennizzi per espropri aree	€ 932,02		
10/05/08	2285	Indennizzi per espropri aree	3.728,10		
10/05/08	2286	Indennizzi per espropri aree	€ 850,00		
10/05/08	2287	Indennizzi per espropri aree	€ 425,00		
10/05/08	2288	Indennizzi per espropri aree	€ 425,00		
12/05/08	2290	Spese consulenze catastali Abano S.	€ 177,00	€ 35,40	
12/05/08	2292	Spese consulenze catastali Abano S.	€ 747,21	€ 186,80	
12/05/08	2294	Spese consulenze catastali Abano S.	€ 53,76	€ 13,44	
17/05/08	2405	Indennizzi per espropri aree	€ 1.687,76		
17/05/08	2406	Indennizzi per espropri aree	€ 1.333,33		
17/05/08	2407	Indennizzi per espropri aree	€ 1.687,76		
17/05/08	2408	Indennizzi per espropri aree	€ 1.333,33		
17/05/08	2409	Indennizzi per espropri aree	€ 3.375,52		



17/05/08	2410	Indennizzi per espropri aree	€ 2.666,68		
17/05/08	2411	Indennizzi per espropri aree	€ 1.687,76		
17/05/08	2412	Indennizzi per espropri aree	€ 1.333,33		
17/05/08	2413	Indennizzi per espropri aree	€ 1.687,76		
17/05/08	2414	Indennizzi per espropri aree	€ 1.333,33		
17/05/08	2415	Indennizzi per espropri aree	€ 493,32		
17/05/08	2416	Indennizzi per espropri aree	€ 100,00		
17/05/08	2417	Indennizzi per espropri aree	€ 2.974,65		
17/05/08	2418	Indennizzi per espropri aree	€ 566,65		
17/05/08	2419	Indennizzi per espropri aree	€ 1.496,00		
17/05/08	2420	Indennizzi per espropri aree	€ 2.974,65		
17/05/08	2421	Indennizzi per espropri aree	€ 566,65		
17/05/08	2422	Indennizzi per espropri aree	€ 991,56		
17/05/08	2423	Indennizzi per espropri aree	€ 188,90		
17/05/08	2424	Indennizzi per espropri aree	€ 991,56		
17/05/08	2425	Indennizzi per espropri aree	€ 188,90		
17/05/08	2426	Indennizzi per espropri aree	€ 991,56		
17/05/08	2427	Indennizzi per espropri aree	€ 188,90		
23/05/08	2519	Indennizzi per espropri aree	€ 1.700,00		
23/05/08	2520	Indennizzi per espropri aree	€ 16.473,00		
23/05/08	2521	Indennizzi per espropri aree	€ 2.641,75		
23/05/08	2522	Indennizzi per espropri aree	€ 698,25		
23/05/08	2523	Indennizzi per espropri aree	€ 2.349,11		
23/05/08	2524	Indennizzi per espropri aree	€ 620,89		
23/05/08	2525	Indennizzi per espropri aree	€ 3.962,64		
23/05/08	2526	Indennizzi per espropri aree	€ 1.047,35		
23/05/08	2527	Indennizzi per espropri aree	€ 2.641,75		
23/05/08	2528	Indennizzi per espropri aree	€ 698,25		
23/05/08	2529	Indennizzi per espropri aree	€ 2.641,75		
23/05/08	2530	Indennizzi per espropri aree	€ 698,25		
30/06/08	3144	Indennizzi per espropri aree	€ 374,48		
2/09/08	4308	Spese Consulenza esterna progettaz esecutiva	€ 9.996,00	€ 1.999,20	
19/09/08	4678	Spese Acconto Consulenza esterna progettaz esecutiva	€ 3.120,00	€ 624,00	
19/09/08	4679	Spese Acconto Consulenza esterna progett. progettaz esecutiva	€ 3.120,00	€ 624,00	
14/10/08	5068	Spese Consulenza esterna progett. Revisione progetto	€ 5.610,00	€ 1.122,00	
10/11/08	5582	Spese Consulenza esterna progett Coord. sicurezza	€ 4.080,00	€ 816,00	
5/12/08	6118	Spese Consulenza esterna progett Variante progetto	€ 6.528,00	€ 1.305,60	
10/07/08	3201	Indennizzi per espropri aree	€ 4.048,00		
10/07/08	3202	Indennizzi per espropri aree	€ 1.700,00		
18/07/08	3404	Indennizzi per espropri aree	€ 140.000,00		
30/07/08	3766	Indennizzi per espropri aree	€ 1.739,19		
30/07/08	3767	Indennizzi per espropri aree	€ 2.470,81		
30/07/08	3768	Indennizzi per espropri aree	€ 1.956,59		
30/07/08	3769	Indennizzi per espropri aree	€ 2.781,41		
30/07/08	3770	Indennizzi per espropri aree	€ 144,93		
30/07/08	3771	Indennizzi per espropri aree	€ 205,07		
30/07/08	3772	Indennizzi per espropri aree	€ 144,93		
30/07/08	3773	Indennizzi per espropri aree	€ 205,07		
30/07/08	3774	Indennizzi per espropri aree	€ 144,93		
30/07/08	3775	Indennizzi per espropri aree	€ 205,07		
30/07/08	3776	Indennizzi per espropri aree	€ 2.391,39		
30/07/08	3777	Indennizzi per espropri aree	€ 3.398,61		
30/07/08	3778	Indennizzi per espropri aree	€ 73,00		
30/07/08	3779	Indennizzi per espropri aree	€ 103,00		
30/07/08	3782	Spese Consulenza esterna Visure ipotecarie	€ 830,01	€ 166,00	
05/08/08	3920	Indennizzi per espropri aree - cassa DD.PP.	€ 66.447,00		

05/08/08	3921	Indennizzi per espropri aree - cassa DD.PP.	€ 20.223,00		
05/08/08	3922	Indennizzi per espropri aree - cassa DD.PP.	€ 66.447,00		
05/08/08	3923	Indennizzi per espropri aree - cassa DD.PP.	€ 20.223,00		
05/08/08	3924	Indennizzi per espropri aree - cassa DD.PP.	€ 16.882,00		
05/08/08	3925	Indennizzi per espropri aree - cassa DD.PP.	€ 4.000,00		
06/08/08	3932	Indennizzi per espropri aree	€ 1.666,73		
06/08/08	3993	Indennizzi per espropri aree	€ 2.369,27		
30/08/08	4300	Indennizzi per espropri aree	€ 84,00		
30/08/08	4301	Indennizzi per espropri aree	€ 84,00		
30/08/08	4302	Indennizzi per espropri aree	€ 210,00		
30/08/08	4303	Indennizzi per espropri aree	€ 328,55		
26/09/08	4918	Indennizzi per espropri aree	€ 84,00		
31/10/08	5518	Indennizzi per espropri aree	€ 137,41		
31/10/08	5519	Indennizzi per espropri aree	€ 115,98		
10/11/08	5581	Indennizzi per espropri aree	€ 1.728,00		
31/01/09	146	Economo consorziale	€ 106,62		
31/01/09	147	Economo consorziale	€ 106,62		
7/03/09	1080	Spese consulenze esterne ass DL	€ 1.664,00	€ 332,80	
7/03/09	1081	Spese profess. Contabilizzaz lavori	€ 1.514,70	€ 302,94	
25/03/09	1274	Spese consul esterne caratteriz amb.	€ 3.541,00	€ 708,20	
2/04/09	1364	Spese consulenze esterne ass DL	€ 1456,00	€ 291,20	
2/04/09	1365	Spese profess. acc Contabiliz lavori	€ 1.514,70	€ 302,94	
24/04/09	1691	Spese Consulenze ester CME	€ 1.040,00	€ 208,00	
24/04/09	1692	Spese Consulenze ester CME	€ 2.080,00	€ 416,00	
24/04/09	1693	Spese per cons attiv geologica lavori	€ 4.025,00	€ 805,00	
24/04/09	1694	Spese profess. acc Contabiliz lavori	€ 1.514,70	€ 302,94	
24/04/09	1695	Spese consulenze esterne ass DL	€ 1.560,00	€ 312,00	
24/04/09	1696	Spese profess. CSE lav bon bellica	€ 2.040,00	€ 408,00	
26/05/09	2280	Spese profess. acc Contabiliz lavori	€ 1.514,70	€ 302,94	
26/05/09	2281	Spese consulenze esterne ass DL	€ 1.560,00	€ 312,00	
02/04/09	1367	Spese per lavori complem lav giardin	€ 5.700,00	€ 1.140,00	
2/04/09	1368	Spese smaltim ramaglie lavori	€ 450,00	€ 90,00	
7/05/09	1909	Indennizzi aree lavori	€ 33.396,84		
25/05/09	2256	Sogelma bonif bellica - sal n. 1	€ 22.213,93	€ 4.442,79	
25/05/09	2257	Sogelma bonif bellica - sal n. 1	€ 44.985,75	€ 8.997,15	
22/08/09	4171	Spese incarico progettaz. definitiva Pizzeghello	€ 1.040,00	€ 208,00	
22/08/09	4175	Spese incarico progettaz. definitiva Renico s.r.l.	€ 2.550,00	€ 510,00	
26/10/09	5408	Sogelma bonif bellica – sal n. 2 (parte)	€ 2.851,77	€ 570,35	
26/10/09	5408	Sogelma bonif bellica – sal n. 2 (saldo)	€ 5.060,67	€ 1.012,13	
02/04/09	1362	Spese progettaz Vinca- Matteraglia	€ 9.180,00	€ 1.836,00	
02/04/09	1363	Spese affidam. Progettaz definitiva fotoInserimento	€ 1.020,00	€ 204,00	
02/04/09	1366	Spese consulenza geotecnica	€ 19.176,00	€ 4.080,00	
24/04/09	1690	Spese progettaz definitiva fotoinserimento	€ 1.020,00	€ 204,00	
23/06/09	2825	Spese progettaz. Definitiva test campioni –geologia tecnica	€ 1.384,00	€ 276,80	
31/03/10	1654	Spese Infopus . pubblicaz BUR	€ 132,00		
12/04/10	1731	Spese professionisti - Progettazione Esecutiva	€ 8.160,00	€ 1.632,00	
12/04/10	1733	Spese professionisti – supporto Progettaz. Esecut.	€ 8.160,00	€ 1.632,00	
06/07/10	3183	Spese esproprio – Immob. Progresso	€ 3.376,40		
17/06/2011	2604	Spese professionisti – prog. sicurezza	€ 3.144,00	€ 600,00	
19/08/2011	3438	Spese profess. Nord-est Ingegneria prog. Esecutiva	€ 2.059,20	€ 411,84	
27/07/2011	3188	Spese profess. Nord-est Ingegneria prog. Esecutiva	€ 18.532,80	€ 3.706,56	
27/07/2011	3187	Consulenza Ing. Bixio Vincenzo	€ 10.816,00	€ 2.163,20	
03/12/2011	4402	Collabor progettaz. CME geom . Maragotto	€ 520,00	€ 104,00	

06/12/2011	4449	Collaboraz progettaz CME O.E. geom. Maragotto	€ 1.040,00	€ 208,00	
06/12/2011	4453	Collabor progettaz CME O.C. PSO srl	€ 4.160,00	€ 873,60	
24/5/2012	1296	Spese progettaz. Opere strutt. -SiSt. srl	€ 7.800,00	€ 1.638,00	
14/09/2012	2242	Spese dis. Bonif bell. –Centro copie Berchet	€ 73,76	€ 15,49	
12/07/2012	1750	Spese Goodea SRL Concess pubblic.	€ 1.144,45	0,00	
22/08/2012	2139	Spese concess pubblicità Manzoni & C	€ 800,00	€ 168,00	
22/08/2012	2140	Spese PIEMME pubblicità	€ 692,60	€ 145,44	
29/10/2012	2682	Centro Copie Berchet –stampe	€ 853,25	€ 179,18	
08/11/2012	2782	Autorità di Vigilanza	€ 800,00	€ 0,00	

Stato avanzamento Della spesa = Spese totali liquidate / Importo totale intervento = € 1.364.460,95 / € 18.500.000,00 = 7,4 %

SEZIONE QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO

Importo netto lavori	Importo imprevisti	Spesa di gara
Importo IVA lavori appaltati	Importo rilievi e sondaggi	Oneri espropri: € 402.096,01
Oneri per la sicurezza	Importo spese generali	Importo IVA altre voci
	Competenze professionali	

Data di ultimazione lavori _____ Data collaudo _____

Timbro

Responsabile del procedimento firma

(*) Codice dell'intervento: inserire soggetto attuatore, n. stralcio Piano Straordinario, n. intervento
(**) Vedere note per la compilazione delle schede di monitoraggio
(6) Indicare importo al netto delle ritenute a garanzia

SCHEDA MONITORAGGIO

Da inviare periodicamente agli indirizzi:
con le seguenti scadenze:
30 aprile e 31 ottobre

Regione del Veneto
Segreteria Regionale Ambiente e LL.PP.
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Via Paolucci, 38 30175
Marghera (VE)
Fax 041/2795012

Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio Opere Pubbliche d'Emergenza
Via Ulpiano 11 - 00193 Roma
Fax numero 06 68 20 360

Data aggiornamento	31/12/2012	Tipo di Provvedimento:		Numero	Data
		Legge	☐		
		Ordinanza	☐		
		Decreto	X☐	195 82	18/10/2006 27/04/2009

SEZIONE INTERVENTO

Regione	Provincia	Comune	Località
VENETO			

Codice intervento (*) 3258/VEN/ / / / /

Titolo dell'intervento (**)

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLO SCOLMATORE DI PIENA LIMENELLA FOSSETTA PER LA DIFESA IDRAULICA DELLA ZONA DI PADOVA NORD.

SEZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE

Ex ante (previsioni)

Cronoprogramma delle attività (da aggiornare in caso di sospensioni e proroghe)

Fase 1	Descrizione lavori:					
	Durata da		a		Lavori previsti	
Fase 2	Descrizione lavori:					
	Durata da		a		Lavori previsti	
Fase 3	Descrizione lavori:					
	Durata da		a		Lavori previsti	
Fase 4	Descrizione lavori:					
	Durata da		a		Lavori previsti	

Lavori in itinere (descrizione in riferimento al Cronoprogramma)

Lavori eseguiti %

Variazione tempi di realizzazione (dall'ultima rilevazione)

Eventuale scostamento dalle previsioni del cronoprogramma gg.

Eventuale scostamento dalle previsioni del cronoprogramma %

In caso di sospensione dei lavori		In caso di proroghe	
Nuovo termine ultimazione lavori		Nuovo termine ultimazione lavori	

SEZIONE MONITORAGGIO FISICO

Da compilare per i soli interventi inseriti nel programma operativo Protezione Civile 1997-1999

Indicatori di realizzazione

Indicatore (cfr. Note)	unità di misura	Da contratto	Da collaudo
MISURA			
Indicatore (cfr. Note)	unità di misura	Da contratto	Da collaudo

Indicatori di risultato

Indicatore (cfr. Note)	unità di misura	Ex ante	Ex post
MISURA			
Indicatore (cfr. Note)	unità di misura	Ex ante	Ex post

Timbro

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA VISCOVADO PADOVA

Responsabile del procedimento

firma

(*) Codice dell'intervento: inserire soggetto attuatore, n. stralcio Piano Straordinario, n. intervento
(**) Vedere note per la compilazione delle schede dimonitoraggio

Allegato B

Il Commissario Straordinario delegato

PIANO STRAORDINARIO EX L. 191/2009, ART. 2, COMMA 240– AdP MATTM– REGIONE DEL VENETO

TITOLO INTERVENTO			
Opere di consolidamento a valle dell'abitato di Rivai			
CODICE INTERV.	PROV. BELLUNO	COMUNE ARSIE'	PRIORITA'

ENTE RESPONSABILE				
Provincia di Belluno		Tel. 0437959240	Fax 0437959178	e.mail protocollo@provincia.belluno.it
Ing. Luca Soppelsa	Ruolo Dirigente Settore Tecnico	Cel. 3297606650	Fax 0437959178	e.maill soppelsa@provincia.belluno.it

STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO				
FASE		PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO
PROGETTISTA		Dott. Mario Gaio	Dott. Mario Gaio	Dott. Mario Gaio
ENTE DI APPARTENENZA		Prov. di Belluno	Prov. di Belluno	Prov. di Belluno
PROGETTAZIONE		20/12/07	14/11/12	14/11/12
AUTORIZZAZIONI/PARERI NECESSARI ↓				
AUT.NE PAESAGGISTICA	X		16/11/12	16/11/12
VALUT.NE DI INCIDENZA	X		Non necessaria	Non necessaria
V.I.A.			"	"
VARIANTE URBANISTICA			"	"
AUTORITÀ DI BACINO			"	"
CONSORZIO DI BONIFICA			"	"
PARCO			"	"
ARPAV			"	"
PROVINCIA	X	08/01/08	23/11/12	23/11/12
ESPROPRI	X		07/12/12	07/12/12
OMOLOGAZIONE G.C.	X		20/11/12	20/11/12
DEPOSITO G.C.			non necess.	non.necess.
SERVIZI FORESTALI REGIONALI	X		16/11/12	16/11/12
SOPRINTENDENZA BBAAAA	X		16/11/12	16/11/12
CONFERENZA DI SERVIZI	X		16/12/12	16/11/12
VALIDAZIONE DEL PROGETTO		21/12/07	14/11/12	14/11/12
APPROVAZIONE		08/01/08	23/11/12	23/11/12

CORSO PER OGNI FASE O PARERE INDICARE LA DATA DI ULTIMAZIONE O RILASCIO OPPURE PORRE "IN

QUADRO ECONOMICO							
PROGETTO		PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO	
TIPO DI GARA DI APPALTO						Procedura negoziata art.122 c.7 D.Lsg 163/06	
IMPORTO DEL PROGETTO		300000		300000		300000	
A) A BASE DI GARA			%	230000	76,70%	230000	76,70 %
di cui	*Lavori*	225000	75,00%	222000	74,00%	222000	74,00 %
di cui	*Oneri per la sicurezza*	5000	1,67 %	8000	2,67 %	8000	2,67 %
di cui	*Progetto esecutivo*		%		%		%
B) SOMME A DISPOSIZIONE			%	70000	23,30%		23,30 %
di cui	*Imprevisti e economie*	2075	0,69 %	675	0,22 %	675	0,22 %
di cui	*Rilievi ed indagini*	8500	2,83 %	12000	4,00 %	12000	4,00 %
di cui	*Espropri*	3500	1,17 %	4000	1,33 %	4000	1,33 %
di cui	*Progettazione e sicurezza*		%		%		%
di cui	*Direz. lavori e sicurezza*		%		%		%
di cui	Assicurazione/tasse/ incentivo/oneri commisariali	7625	2,54 %	5025	1,67 %	5025	1,67 %
di cui	*I.V.A. (21%)*	48300	16,10%	48300	16,10%	48300	16,10 %
TEMPO CONTRATTUALE			MESI		MESI		4 MESI

TEMPI PREVISTI				
FASI DI ATTUAZIONE		DATA MESE/ANNO	MESI DAL FINANZIAMENTO	
PRELIMIN.	INIZIO ATTIVITÀ	01/12/07		
PRELIMIN.	ULTIMAZIONE	21/12/07		
PRELIMIN.	APPROVAZIONE	08/01/08		
DEFINIT.	INIZIO ATTIVITÀ	01/05/12		Accorpamento delle fasi progettuali definitiva ed esecutiva
DEFINIT.	ULTIMAZIONE	30/05/12		
DEFINIT.	APPROVAZIONE	23/11/12		
ESECUT.	INIZIO ATTIVITÀ	01/07/12		Approvazione prog. Esecutivo con Delibera Commissariale n. 23.11.2012 n. 204
ESECUT.	ULTIMAZIONE	14/11/12		
ESECUT.	APPROVAZIONE	23/11/12		
BANDO DI GARA		20/12/12		Bando In corso di pubblicazione
AGGIUDICAZIONE		31/01/12		
CONTRATTO		28/02/13		
CONSEGNA DEI LAVORI		01/04/13		
ULTIMAZIONE		30/09/13		
COLLAUDO		31/12/13		

NOTE

timbro

RESPONSABILE DEL PROGETTO

DATA 0 DIC 2012 FIRMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il primo impegno del Commissario straordinario Delegato è quello di redigere e presentare ai soggetti responsabili dell'Accordo di programma un cronoprogramma di attuazione degli interventi e, qualora non sia possibile rispettarne i tempi stabiliti, comunicare tempestivamente le circostanze del ritardo al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il presente modello ha lo scopo di raccogliere informazioni utili per l'approntamento di un realistico cronoprogramma.

Nella colonna in giallo della sezione **Stato di avanzamento del progetto** vanno indicati con una crocetta tutti i pareri, le autorizzazione e le fasi del processo che porta all'approvazione del progetto da affidare, indipendentemente dalla fase progettuale a cui si riferiscono e dal fatto che siano state avviate o meno le pratiche relative, aggiungendo eventuali ulteriori soggetti interessati. Per quelle già avviate, la fase progettuale a cui si riferiscono si dedurrà dalla data o dalla notazione *"in corso"*, riportate nelle colonne successive. La casella è lasciata in bianco qualora l'attività relativa non abbia ancora avuto inizio. Ovviamente non sarà riportata alcuna notazione per quei pareri o autorizzazioni che sono stati raccolti o sono in discussione in sede di conferenza di servizi.

La sezione **Quadro economico** va compilata, con le aggregazioni ivi indicate, con riferimento alla fase di progettazione più avanzata, anche quando questa non si possa considerare formalmente ultimata.

In fine, per quanto riguarda il riquadro **Tempi previsti**, l'indicazione delle date deve essere fatta con accortezza, tenendo conto del fatto che il Piano straordinario giustifica le procedure di urgenza ammesse dalla normativa. Qualora il soggetto che compila il questionario fosse nelle condizioni di non poter avviare alcune fasi del processo di attuazione senza il finanziamento necessario, il tempo sarà indicato in mesi a partire dal momento dell'accertamento del finanziamento.

Allegato C

Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.1.2011

PIANO STRAORDINARIO EX L. 191/2009, ART. 2, COMMA 240 – AdP MATTM – REGIONE DEL VENETO

MONITORAGGIO AL 30/11/2012

TITOLO INTERVENTO: Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10 Primo lotto funzionale			
FONTE FINANZIAMENTO L.191/09		IMPORTO FINANZIAMENTO € 1.900.000,00 di cui € 1.000.000,00 Sezione attuativa - € 900.000,00 Sezione programmatica (€ 100.000,00 da finanziare con Prog. Triennale)	
CODICE INTERV. PD012A/10	PROV. PD	COMUNE Campo San Martino	PRIORITA'

ENTE RESPONSABILE				
Regione Veneto – U.P. Genio Civile di Padova				
RUP: Ing. Marco Dorigo	Responsabile Servizio Tecnico			

STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO				
FASE		PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO
PROGETTISTA		U. P. Genio Civile di Padova	U. P. Genio Civile di Padova	
ENTE DI APPARTENENZA		Regione Veneto	Regione Veneto	
PER OGNI FASE O PARERE INDICARE LA DATA DI ULTIMAZIONE O RILASCIO OPPURE PORRE "IN CORSO"	PROGETTAZIONE	X		
	AUTORIZZAZIONI/PARERI NECESSARI ↓			
	AUT.NE PAESAGGISTICA	X		
	VALUT.NE DI INCIDENZA	X		
	V.I.A.			
	VARIANTE URBANISTICA			
	AUTORITÀ DI BACINO			
	CONSORZIO DI BONIFICA			
	PARCO			
	ARPAV			
	PROVINCIA			
	ESPROPRI			
	OMOLOGAZIONE G.C.			
	CONFORMITA' URBANISTICA	X		
	AUT.NE ARCHEOLOGICA			
	AUT.NE MONUMENTALE			
	CONFERENZA DI SERVIZI			
	VALIDAZIONE DEL PROGETTO			
	APPROVAZIONE			

QUADRO ECONOMICO							
PROGETTO		PRELIMINARE		DEFINITIVO presunto		ESECUTIVO	
TIPO DI GARA							
IMPORTO DEL PROGETTO		2.000.000,00		1.000.000,00			
A) A BASE DI GARA							
di cui	*Lavori*	1.478.538,06	%	780.000,00	%		%
	Oneri per la sicurezza	45.000,00	%	10.000,00	%		%
B) SOMME A DISPOSIZIONE			%		%		%
di cui	*Imprevisti e economie*	11.283,57	%	10.141,00	%		%
	Rilievi ed indagini (IVA compresa)	55.000,00	%	9.559,00	%		%
	Espropri	40.000,00	%	10.000,00	%		%
	Progettazione e sicurezza	13.407,13	%	7.200,00	%		%
	Direz. lavori e sicurezza	17.063,63	%	7.200,00	%		%
	Altro (compensazione ambientale)	35.000,00	%		%		%
	I.V.A.	304.707,61	%	165.900,00	%		%
TEMPO CONTRATTUALE			MESI		MESI		MESI

TEMPI PREVISTI			
FASI DI ATTUAZIONE		DATA MESE/ANNO	MESI DAL FINANZIAMENTO
PRELIMIN.	INIZIO ATTIVITÀ		
	APPROVAZIONE		
DEFINIT.	ULTIMAZIONE		4 mesi dal finanziamento
	APPROVAZIONE		8 mesi dal finanziamento
ESECUT.	ULTIMAZIONE		9 mesi dal finanziamento
	APPROVAZIONE		10 mesi dal finanziamento
BANDO DI GARA			
CONTRATTO			
CONSEGNA DEI LAVORI			
ULTIMAZIONE			
COLLAUDO			

STATO DELL'INTERVENTO ALLA DATA DEL _____	
PROGETTAZIONE	
GARA D'APPALTO	
LAVORI IN CORSO (%)	
RENDICONTAZIONE	
COLLAUDO	

NOTE:

Eventuale ritardo rispetto alla data prevista per l'appalto e motivazioni:

.....

Proroghe:

.....

Perizie:

.....

REGIONE VENETO * PADOVA * UFFICIO GENIO CIVILE timbro

RESPONSABILE DEL PROGETTO	Il Dirigente Ing. Gianni Carlo Silvestri
DATA 10 DIC 2012	FIRMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il primo impegno del Commissario straordinario delegato è quello di redigere e presentare ai soggetti responsabili dell'Accordo di programma un cronoprogramma di attuazione degli interventi e, qualora non sia possibile rispettarne i tempi stabiliti, comunicare tempestivamente le circostanze del ritardo al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il presente modello ha lo scopo di raccogliere informazioni utili per l'approntamento di un realistico cronoprogramma.

Nella colonna in giallo della sezione **Stato di avanzamento del progetto** vanno indicati con una crocetta tutti i pareri, le autorizzazione e le fasi del processo che portano all'approvazione del progetto da affidare, indipendentemente dalla fase progettuale a cui si riferiscono e dal fatto che siano state avviate o meno le pratiche relative, aggiungendo eventuali ulteriori soggetti interessati. Per quelle già avviate, la fase progettuale a cui si riferiscono si dedurrà dalla data o dalla notazione *"in corso"*, riportate nelle colonne successive. La casella è lasciata in bianco qualora l'attività relativa non abbia ancora avuto inizio. Ovviamente non sarà riportata alcuna notazione per quei pareri o autorizzazioni che sono stati raccolti o sono in discussione in sede di conferenza di servizi.

La sezione **Quadro economico** va compilata, con le aggregazioni ivi indicate, con riferimento alla fase di progettazione più avanzata, anche quando questa non si possa considerare formalmente ultimata.

In fine, per quanto riguarda il riquadro **Tempi previsti**, l'indicazione delle date deve essere fatta con accortezza, tenendo conto del fatto che il Piano straordinario giustifica le procedure di urgenza ammesse dalla normativa. Qualora il soggetto che compila il questionario fosse nelle condizioni di non poter avviare alcune fasi del processo di attuazione senza il finanziamento necessario, il tempo sarà indicato in mesi a partire dal momento dell'accertamento del finanziamento.

Allegato D

N	Codice	Ente proponente	Pr	Comune	Titolo intervento	SEZIONE ATTUATIVA	SEZIONE PROGRAMM	Prioritari	STATO DI FATTO A GENNAIO 2013	PROG	IMPEGNATI DAL FONDO DI ROTAZIONE
1	BL001A/10	Provincia di Belluno	BL	Arsiè	Opere di consolidamento a monte dell'abitato	€ 300.000,00	€ 0,00	SI	Dr impegno Commissario n. 13 del 28/09/2012	Esecutivo approvato dalla Provincia	
2	BL004A/10	GC BL	BL	Selva di Cadore	Realizzazione di una briglia selettiva in loc. l'Aiva a difesa degli abitati sottostanti - T. Fiorentina in comune di Selva di Cadore	€ 2.500.000,00	€ 0,00	SI		Definitivo in procedura di VIA	€ 22.651,20
3	PD011A/101	GC PD	PD	Bovolenta	Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD)	€ 1.200.000,00	€ 2.200.000,00	SI		Preliminare ...	€ 109.283,75
4	PD012A/101	GC PD	PD	Campo San Martino	Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10	€ 1.000.000,00	€ 900.000,00	SI	Dr impegno Commissario n. 14 del 28/09/2012	Definitivo in CTRD a fine gennaio	€ 9.559,00
5	RO018A/10	GC RO	RO	Rosolina	Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo	€ 1.980.000,00	€ 0,00	SI		Approvazione Definitivo prevista per Aprile	€ 25.168,00
6	TV021A/10	GC TV	TV	vari	Interventi di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e affluenti in comuni vari	€ 1.000.000,00	€ 0,00	SI		Definitivo approvato, pronto per appalto	€ 24.386,65
7	TV023A/101	GC TV	TV	vari	Interventi di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari	€ 1.200.000,00	€ 800.000,00	SI		Definitivo andrà in CTRD a fine gennaio	
8	TV083A/10	GC TV	TV	Quinto di Treviso	Ripristino officiosità del fiume Sile	€ 200.000,00	€ 0,00	SI		Definitivo approvato da CTRD	€ 14.520,00
9	VE024A/10	GC VE	VE	Vigonovo	Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3276/2002	€ 2.000.000,00	€ 0,00	SI		Esecutivo da modificare dopo conclusione di primo stralcio (previsto per ottobre 2014)	€ 16.000,00
10	VE026A/10	GC VE	VE	vari	Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene in comuni vari	€ 600.000,00	€ 0,00	SI		Definitivo/Esecutivo previsto per aprile	
11	VR037A/10	GC VR	VR	Arcole	Rilacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Giglia presso l'obelisco Napoleonico	€ 2.570.000,00	€ 0,00	SI		Presi accordi con Modena per la redazione dell'Esecutivo. Preventivo service di circa 50 mila euro. Progetto disponibile in tre mesi a partire dal finanziamento.	€ 28.158,02
12	VI038A/10	GC VI	VI	Longare	Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del Fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio completamento	€ 1.038.000,00	€ 0,00	SI		Esecutivo. In grado di appaltare entro 30 gg	
13	VI039A/10	GC VI	VI	vari	Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del Canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza	€ 950.000,00	€ 0,00	SI		Lavori non complessi. Preliminare/definitivo in un paio di mesi.	
14	BL055A/10	SF BL	BL	Livinallongo del Col di Lana	Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale	€ 300.000,00	€ 0,00	SI		Gestione interna	
15	TV057A/10	Consorzio di Bonifica Piave	TV	San Vendemmiano	Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua "Le Fosse"	€ 300.000,00	€ 0,00	SI		Esecutivo pronto.	
16	TV058A/10	SF TV - VE	TV	Vittorio Veneto	Dissesto idrogeologico in località Perdonanza e località Formeniga - Lavori di sistemazione frane	€ 150.000,00	€ 0,00	SI		Gestione interna	
						€ 17.288.000,00	€ 3.900.000,00				€ 249.726,62

Allegato E

SCHEMA RIEPILOGATIVO MOVIMENTI FINANZIARI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO Dott. Vincenzo ALONZI codice fiscale 90151360279 — **31.12.2012**

CONTABILITA' SPECIALE N. 5596 aperta il 9.5.2011 — **Esercizio finanziario 2011-2012**

06/08/2012

DATA DI ACCREDITO	TOTALE ACCREDITI	PROVENIENZA	IMPEGNI	ORD.ZE/ DECRETI	CAUSALE	IMPORTO PAGAMENTI	BENEFICIARIO	N° ord.	DATA	ORD.ZE/ DECRETI	CAUSALE	DISPONIBILITA' RESIDUA	N. ELENCO	SPESA 2011
	0,00	SALDO INIZIALE												
23/06/2011	457.772,76	MINISTERO AMBIENTE												
			174.434,88	1 del 26/10/2011	Acconto e spese 2011 emolumenti									
						109.444,59	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario	1	20/12/2011	Disposiz 10.12.2011	Acconto compenso 2011		1	
						109.444,59						**5.348.861,01**		**109.444,59**
totale accrediti	**457.772,76**	**totale impegnato**	**174.434,88**		**totale pagamenti**	**109.444,59**	**TOTALI AL 31.12.2011**				**residuo cassa**	**5.348.861,01**	**totale 2011**	**109.444,59**
15/12/2011	3.669.753,63	MINISTERO AMBIENTE												**SPESA 2012**
			3.500.000,00	1 del 16/11/2012	Consorzio Bacchiglione Progetto Scolmatore									
			24.000,00	7 del 7/3/2012	Impegno straordinari									
						40.188,05	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario	1	maggio 2012	Disposiz 15.5.2012	Saldo compenso 2011		1	
						40.188,05						**5.308.672,96**		**40.188,05**
			38.000,00	9 del 10/5/2012	Impegno cococo									
			24.802,24	11 del 17/5/2012	Economie 2011 su emolumenti e spese									
			68.500,00	10 del 17/5/2012	Impegno emolumenti e spese 2012									
						26.217,59	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario	2	agosto 2012	Disposiz 6.8.2012	Primo acconto compenso 2012	**5.282.455,37**	2	**26.217,59**
						26.217,59								
18/09/2012	1.330.779,21	MINISTERO AMBIENTE												
			300.000,00	13 del 28/9/2012	Provincia Belluno Consolidamento abitato Arsiè									
			1.000.000,00	14 del 28/9/2012	Genio Civile PD Lavori fiume Brenta Roggia Contarina									
						15.918,01	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario e cococo	3	ottobre 2012	Disposiz 15.10.2012	Secondo acconto compenso 2012 Commissario			
						12.081,81					Primo acconto cococo			
						27.999,82						**5.254.455,55**	3	27.999,8
			20.000,00	20 del 20/12/2012	Impegno contratto a tempo determinato									
totale accrediti	**5.458.305,60**	**totale impegnato**	**5.100.132,64**		**totale pagamenti**	**203.850,05**	**TOTALI AL 31.12.2012**				**residuo cassa**	**5.254.455,55**	**totale 2012**	**94.405,46**
		resto da impegnare	**358.172,96**											

€ 34,60



170270000790
