



Il Commissario Straordinario Delegato



18) **Convenzione con l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero UOS di Capo Granitola del Consiglio Nazionale Delle Ricerche** stipulata in data 18 aprile 2012 per il "Progetto di ricerca finalizzato all'individuazione di sabbie relitte sulla piattaforma Siciliana nell'area prospiciente il golfo di Gela".

19) **Convenzione con l'Azienda Regionale Foreste Demaniali** stipulata in data 06.09.12.

Contenuti: supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, funzioni di stazione appaltante, direzione lavori e collaudi, assistenza tecnico-amministrativa.

Infine, in virtù del predetto art. 4 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2010, nel corso del 2011 il Commissario Straordinario Delegato ha sottoscritto, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nello svolgimento delle proprie attività, ***l'Accordo con il Soggetto Attuatore dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque in Sicilia*** (gennaio 2011) e ***l'Accordo con il Soggetto Attuatore per l'Emergenza Isola di Lampedusa*** (giugno 2011) "per l'interscambio di risorse tecnologiche e operative, finalizzato alla migliore esecuzione delle attività istituzionali di competenza".

4 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SVOLTE

4.1 ISTRUTTORIA PRELIMINARE E RIPARTIZIONE ANNUALE DELLE RISORSE

In primo luogo, a seguito di una serie di incontri effettuati con i singoli Comuni, con tutte le Amministrazioni e gli Enti convenzionati di cui al precedente paragrafo si è proceduto ad una istruttoria preliminare della documentazione tecnico – amministrativa relativa ai singoli interventi, ed in particolare in ordine alle seguenti priorità:

- stato e livello della progettazione disponibile;
- eventuali incarichi esterni affidati;
- importo aggiornato degli interventi (suddiviso ove possibile tra lavori, somme a disposizione ed IVA);
- vincoli e livello/stato delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere;
- presenza o meno del RUP dell'intervento, ed eventuale nomina;
- disponibilità o meno delle aree di intervento (occupazione dei suoli);
- eventuali lavori già affidati;
- eventuale previsione di affidamento interno alle Amministrazioni di attività di progettazione e gestione dell'intervento (ex comma 5, art. 92 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii.);
- eventuale previsione di quota del finanziamento da destinare alla struttura commissariale per la gestione degli interventi;
- predisposizione di note in risposta dovute all'analisi di dati trasmessi.

Pag. 14 di 45



Il Commissario Straordinario Delegato



In particolare, nell'ambito dell'attività propedeutica al finanziamento degli interventi, la struttura Commissariale ha effettuato un'azione di coordinamento tra gli Enti incaricati della progettazione esecutiva e le Amministrazioni Comunali interessate, che in sintesi sono consistite:

- Coordinare e presenziare Conferenze dei Servizi (n. 25 nel corso del 2011 e n. 47 nel corso del 2012);
- Coordinare e presenziare tavoli tecnici (n. 18 nel corso del 2011 e n. 8 nel corso del 2012);
- Convocare gli Enti coinvolti nella progettazione di diversi interventi al fine di porre in essere iniziative utili al superamento di tutte le problematiche tecnico-amministrative;
- Promuovere azioni necessarie ad incentivare la progettazione esecutiva degli interventi inseriti nell'AdP.

4.2 ALBO PROFESSIONISTI

In data 20 aprile 2011, con Decreto Commissariale n° 55, è stato emanato il Bando per la istituzione presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato dell'albo dei professionisti a cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. .

L'elenco ha validità per il triennio 2011/2013. Così come stabilito dal Bando di cui sopra, è previsto un aggiornamento dello stesso ogni anno.

Con tale inserimento si possono affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..

I suddetti ELENCHI sono stati suddivisi in ragione delle classi e categorie di cui alla tabella dell'art.14 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e ss.mm.ii.

Le modalità di aggiornamento dell'elenco è regolamentato dallo stesso bando il quale prevede che:

- *“Entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, i Professionisti iscritti dovranno presentare, pena la cancellazione dall'Elenco dei Professionisti, una richiesta di conferma dell'iscrizione, corredata da una autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati”;*
- *“Le nuove domande pervenute entro il 30 maggio di ogni anno verranno inserite in coda all'elenco in ordine di arrivo; le conferme dell'iscrizione, da effettuarsi entro la stessa data, saranno inserite in ordine numerico progressivo secondo l'ordine di presentazione;*



Il Commissario Straordinario Delegato



In data 17 maggio 2012 si è pertanto provveduto alla pubblicazione dell'avviso sul sito www.ucomidrogeosicilia.it relativo alla istanza e/o al rinnovo dell'iscrizione da effettuare mediante collegamento on line al sito dedicato al Commissario <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor>;

Inoltre, al fine di dare maggiore pubblicità all'obbligo di conferma della propria istanza, il predetto avviso è stato, trasmesso in data **18 maggio 2012** ai tutti professionisti già inseriti nell'elenco pubblicato in data 20 luglio 2011 mediante *e-mail* certificata e/o fax pena la cancellazione dall'Elenco;

Le istanze pervenute ammontano a n. **316**, di cui 243 rinnovi di iscrizioni e 73 nuove iscrizioni;

Con Decreto n. 515 del 04 ottobre 2012 è stato approvato l'**Aggiornamento dell'Elenco Professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a € 100.000 (euro centomila/00), con le modalità di cui all'art.91, comma2, del d.lgs. n. 163/2006**, per l'anno 2012-2013.

4.3 ALBO IMPRESE

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, è stato istituito l'albo delle imprese per la partecipazione alle gare *a procedura ristretta semplificata*, da utilizzare anche *per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara*.

L'Albo di Fiducia ha validità annuale, e prevede un aggiornamento trimestrale limitatamente agli affidamenti per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

Occorre evidenziare che, al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi previsti dall'AdP, il Commissario ha direttamente provveduto alla predisposizione ed all'affidamento delle procedure di gara relative agli interventi, individuando un numero congruo di soggetti, iscritti agli Albo di Fiducia, da invitare tra coloro che hanno dichiarato di possedere idonei requisiti.

In particolare, si rappresenta che il Commissario ha provveduto:

- **per l'anno 2011**: ad istituire l'Albo di Fiducia con il Decreto Commissariale n° 54 del 20 aprile 2011.

Al fine di consentire la massima partecipazione e garantire nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, il Bando è stato pubblicato sul sito web www.ucomidrogeosicilia.it nonché per estratto sulla G.U.R.I. – Serie speciale n.51 del 02.05.2011, sulla G.U.R.S. del 20 maggio 2011 e su il Sole 24ore del 04.05.2011, su La Repubblica del 04.05.2011, su La Sicilia del 04.04.2011 e su Il Giornale di Sicilia del 04.05.2011.



Il Commissario Straordinario Delegato



Entro i termini previsti sono pervenute n. **492** istanze di ammissione all'Albo delle imprese 2011.

- **per l'anno 2012:** si è provveduto ad istituire, con Decreto Commissariale n. 323 del 15 novembre 2011, l'Albo di Fiducia Imprese.

Avendo attivato nel corso del 2011 la piattaforma e-procurement, di cui al successivo punto, i soggetti interessati hanno presentato domanda per l'inserimento nel suddetto elenco, entro il 15 dicembre 2011 secondo le modalità previste nel Bando pubblicato sul sito www.ucomidrogeosicilia.it.

Entro i termini previsti sono pervenute n. **481** istanze di ammissione all'Elenco delle imprese 2012. Il cui elenco è stato pubblicato sul sito della Struttura Commissariale www.ucomidrogeosicilia.it in data 26 gennaio 2012.

In data 30 ottobre 2012 è stato aggiornato l'Elenco Imprese 2012 limitatamente ai cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara, mediante l'integrazione con le domande ammissibili pervenute nel corso del **terzo** trimestre, entro il 26 ottobre 2012. Il numero delle istanze ammonta complessivamente a **610** imprese.

Per le procedure ristrette semplificate, l'Elenco imprese istituito non può per legge essere integrato e l'elenco a cui si deve far riferimento rimane quello pubblicato il 26 gennaio 2012 con 481 iscritte.

- **per l'anno 2013:** si è provveduto ad istituire, con Decreto Commissariale n. 651 del 27 novembre 2012, l'Albo di Fiducia Imprese.

I soggetti interessati hanno presentato domanda per l'inserimento nel suddetto elenco, entro le ore 24:00 del 15 dicembre 2012 secondo le modalità previste nel Bando pubblicato sul sito www.ucomidrogeosicilia.it.

Entro i termini previsti sono pervenute più di **520** istanze di ammissione all'Elenco delle imprese 2013. Allo stato sono in corso le verifiche al fine di poter procedere con la pubblicazione sul sito della Struttura Commissariale www.ucomidrogeosicilia.it.

4.4 E-PROCUREMENT

Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto, secondo quanto previsto dall'art. 85 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., si è provveduto, all'individuazione di una soluzione tecnologica in modalità Software as a Service (SaaS)/Application Service Provider (ASP), che consenta l'esecuzione di gare telematiche, la gestione di Elenchi di Operatori Economici, la fornitura di servizi di Help Desk Tecnico e Informativo, la formazione degli utenti. Con Decreto



Il Commissario Straordinario Delegato



Commissariale n. 129 del 12.07.11, è stata disposto l'affidamento della suddetta fornitura e la gestione del relativo servizio di e-procurement all'Impresa I-FABER S.p.A.

La finalità del suddetto servizio è quella di conseguire celermente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, gli obiettivi previsti dall'Accordo di Programma.

Il Bando di gara relativo all'"Affidamento di una soluzione tecnologica in modalità Software as a Service (SaaS)/Application Service Provider (ASP) che consenta l'esecuzione di gare telematiche, la gestione di Elenchi di Operatori Economici, la fornitura di servizi di Help Desk Tecnico e Informativo e la formazione degli utenti" è stato pubblicato integralmente sul sito web del Commissario www.ucomidrogeosicilia.it in data 28 aprile 2011, nonché sulla GUCE N. GU/S S85 03/05/2011 - 139625-2011-IT, sulla G.U.R.I. Serie 5 Speciale – Contratti pubblici n. 51 del 02-05-2011, sulla G.U.R.S. n. 19 del 13.05.2011, sui quotidiani a tiratura nazionale "La Repubblica" e "Il Sole 24ore" del 03.05.2011 e sui quotidiani a tiratura Regionale "La Sicilia" e il "Giornale di Sicilia" del 03.05.2011.

La piattaforma e-Procurement sviluppata da i-Faber per il Commissario Straordinario Delegato è composta da due moduli, perfettamente integrati tra di loro: la piattaforma per la gestione dell'Elenco Fornitori e la piattaforma per la gestione delle gare telematiche.

Il processo di gestione dell'Elenco Fornitori è un sistema di Vendor Management che, mediante un insieme di attività, organizza le informazioni sui Operatori Economici e le utilizza al fine di ottenere le migliori performance tecnico/economiche.

Mediante la piattaforma per la gestione delle gare telematiche possono essere gestite in modo interamente telematico tutte le tipologie di gare previste ai sensi del D.lgs 163/2006.

La Piattaforma elettronica è pienamente funzionante dal 1 gennaio 2012 e si precisa, a tal proposito, che tutte le gare del 2012, di cui al punto successivo, sono state espletate mediante procedure telematiche.



Il Commissario Straordinario Delegato



4.5 GARE

L'attività della Struttura Commissariale in qualità di Stazione Appaltante riguarda essenzialmente l'affidamento delle procedure di gara, mediante la predisposizione di bandi di gara e lettere di invito, predisposizione degli eventuali chiarimenti richiesti dalle imprese, ricezione delle eventuali richieste di prequalifica e di ricezione delle offerte, verifica delle domande di prequalifica, la valutazione delle offerte, predisposizione degli atti normativi necessari per l'affidamento dei lavori e del relativo contratto.

Altre attività complementari a quella sopra riportata sono:

- supporto ai Responsabili del Procedimento per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- ottemperanza agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicità dei Bandi di Gara pre/post informazione.

E' opportuno precisare che, a seguito del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 15 aprile 2011, Il Commissario ha provveduto a comunicare che per tutti i progetti non ancora approvati in linea tecnica alla data dell'8 giugno 2011, le fasi di progettazione, approvazione ed attuazione da porre in essere vengono disciplinate dalle disposizioni di cui al **Decreto Legislativo 163/2006 "codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"** e il relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Da marzo 2011 ad oggi sono state attivate **81** procedure di affidamento lavori e/o servizi, di cui:

- **N. 43** procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 122 e 123 comma 7 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., di cui **6** tuttora in corso ed **4** in fase di avvio;
- **N. 6** procedure ristrette ai sensi dell'art. 55 comma 6 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. (di cui una in corso: la scadenza per la prequalifica è fissata per il 28 dicembre 2012)
- **N. 26** procedure espletate, ai sensi del comma 11 dell'art.125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., attraverso consultazione di almeno cinque operatori economici ricavabili dall'elenco dei laboratori presenti sul sito www.clp.it per la realizzazione di **indagini preliminari** da espletare in situ e propedeutiche alla progettazione;
- **N. 6** procedure di **Affidamento del servizio di progettazione** definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, **Direzione lavori** a professionisti esterni mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del d.lgs. 163/2006;

-



Il Commissario Straordinario Delegato



Si riportano qui di seguito alcune tabelle riepilogative delle Gare effettuate nel corso dell'intero periodo di attività:

1. Gare per l'affidamento dei Lavori per la realizzazione degli interventi inseriti in AdP:

PROCEDURA NEGOZIATA E RISTRETTA SENZA BANDO EUROPEO			
N. GARE EFFETTUATE		43*	
N. DI INVITI ALLE IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO		832	
OFFERTE RICEVUTE DI CUI:		66,5663%**	
A) VALIDE	403**	91,1765%**	442**
B) NON AMMESSE	39**	8,8235%**	
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA		€ 25.618.003,25	
VALORE OFFERTO MINIMO RIBASSO		4,1312	
VALORE OFFERTO MASSIMO RIBASSO		32,4811	
MEDIA RIBASSI		24,14136	

* (6 gare in corso; 4 gare in fase di avvio)

** i valori sono riferiti solo alle gare completate e non tengono conto delle gare in corso ne di quelle in fase di avvio

GARE PROCEDURA CON BANDO EUROPEO			
N. GARE EFFETTUATE		6*	
RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE		656	
INVITI		636	
OFFERTE RICEVUTE DI CUI:		83,4906%	
B) VALIDE	500	94,1620%	531
B) NON AMMESSE*	31	5,8380%	
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA		€ 12.616.566,11	
MEDIA RIBASSI		26,4235%	
VALORE OFFERTO MINIMO RIBASSO		7,5319	
VALORE OFFERTO MASSIMO RIBASSO		40,3944	

* (1 gara in corso)

2. Gare per l'affidamento della realizzazione del Piano di Indagini preliminari propedeutiche alla progettazione degli interventi inseriti in AdP:



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

GARE INDAGINI			
N. GARE EFFETTUATE			26
IMPRESE INVITATE			250
OFFERTE RICEVUTE DI CUI:			52,0000%
A)	46,8927%	124	95,3846%
B)	16,1616%	6	4,6154%
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA			€ 665.057,33
MEDIA RIBASSI			27,7323%
VALORE OFFERTO MINIMO RIBASSO			1,211
VALORE OFFERTO MASSIMO RIBASSO			50,1111

3. Gare per l'affidamento dei servizi di Progettazione e Direzione Lavori degli interventi inseriti in AdP:

GARE PROFESSIONISTI			
N. GARE EFFETTUATE			6
PROFESSIONISTI INVITATI			70
OFFERTE RICEVUTE DI CUI:			84,2857%
A) VALIDE		58	98,3051%
B) NON AMMESSE*		1	1,6949%
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA			€ 468.125,72
MEDIA RIBASSI			36,5755
VALORE OFFERTO MINIMO RIBASSO			4,895
VALORE OFFERTO MASSIMO RIBASSO			64,888

Conclusioni:

Dall'analisi delle tabelle sopra riportate si evince che: relativamente alle 43 procedure di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi, senza Bando Europeo, delle imprese invitate, **il 70% hanno presentato offerta, con una media di ribassi pari al 25%**, in linea con la media dei ribassi nazionali, in considerazione anche della crisi economica che ha colpito l'intero Paese.

La percentuale di partecipazione risulta maggiore nel caso di procedure Ristrette con emanazione di Bando di Gara, ai sensi dell'art. 55 comma 6 del D.lgs 163/2006, dove ben 477 imprese hanno presentato domanda di partecipazione per le 4 gare indette, raggiungendo quasi il 85% di offerte presentate.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

E' bene sottolineare inoltre che il ricorso a procedure telematiche, dal 1 gennaio 2012, ha permesso una notevole riduzione dei tempi intercorrenti tra l'emanazione del Bando e l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa miglior classificata.

Basti pensare che usufruendo delle procedure tradizionali nel 2011, per la valutazione delle 109 domande di prequalifica e delle 90 offerte, presentate dalle imprese ritenute idonee, nella procedura di Gara relativa all'affidamento alle "OPERE DI CONSOLIDAMENTO E REGIMAZIONE IDRAULICA CONTRADA BARBA NEL COMUNE DI S.ANGELO DI BROLO (ME)" - Intervento ME 115_1A e la predisposizione della atto di aggiudicazione sono stati necessari circa 70 giorni.

Con il ricorso alle piattaforma telematica per 4 le procedure indette con bando europeo, i giorni necessari per disporre l'aggiudicazione sono solo 45. E' evidente che il risparmio di tempo si traduce in un risparmio economico per l'amministrazione.

Relativamente all'affidamento della realizzazione del Piano di indagini preliminare la percentuale di partecipazione alle gare si attesta invece a circa il 52%.

È doveroso tuttavia sottolineare che tale valore è condizionato dalle gare espletate nel corso del 2011, periodo nel quale le imprese invitate non erano individuate tra quelle iscritte all'Elenco di Fiducia del Commissario, ma selezionate attraverso la consultazione di almeno cinque operatori economici ricavabili dall'elenco dei laboratori presenti sul sito www.clp.it del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dotati di iscrizione nel settore "C" (Prove geotecniche in situ) dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture ai sensi del D.M. 14.01.2008. La scelta randomica dei laboratori, se da un lato ha garantito il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, dall'altro ha comportato l'individuazione di imprese impossibilitate, per ragioni di convenienza economica, a svolgere le proprie attività nel territorio della Regione Siciliana, e costrette pertanto a rinunciare alla partecipazione.

E' opportuno infine evidenziare che nel corso del 2012 si è registrato l'aumento, rispetto ai valori del 2011, della percentuale di offerte valide presentate dalle Imprese iscritte all'Elenco imprese per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma.

OFFERTE RICEVUTE NEL CORSO DEL 2011 PER AFFIDAMENTO LAVORI				OFFERTE RICEVUTE NEL CORSO DEL 2012 PER AFFIDAMENTO LAVORI			
A)	Offerte VALIDE	160	87%	A)	Offerte VALIDE	243	94,19%
B)	NON AMMESSE	24	13%	B)	NON AMMESSE	15	5,81



Il Commissario Straordinario Delegato



In particolare si rappresenta che a fronte di 184 offerte pervenute nel corso dello scorso anno ben 24, pari al circa 13%, non hanno superato la prima fase di valutazione della documentazione amministrativa richiesta in fase di gara, nello specifico:

- 16 presentavano una cauzione non autenticata da pubblico ufficiale a ciò deputato;
- 2 presentavano documentazione non conforme a quanto richiesto;
- 6 sono giunte oltre i termini fissati per la presentazione del plico;

Nel corso del 2012 la percentuale delle offerte valide si attesta al 95%.

Ciò può essere in parte attribuito al ricorso alle procedure telematiche per l'affidamento di servizi e lavori, che garantisce un servizio di assistenza alle imprese anche nell'ipotesi di partecipazione a gare.

In parte l'incremento di offerte ritenute conformi a quanto richiesto dalla stazione appaltante può essere attribuito al consolidato rapporto con le imprese iscritte all'Albo, oramai indirizzate al rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

In allegato (Allegato 2) viene riportato un quadro riepilogativo di tutte le Gare espletate dal Commissario, distinte in "Lavori", "Indagini" e "Progettazione e Direzione Lavori".

5 STATO DELL'ARTE

Si riporta qui di seguito un esame analitico e dettagliato dello stato dell'arte degli interventi rientranti nell'accordo di Programma e nel successivo atto integrativo dettagliato come segue:

- 1) Interventi lettera A;
- 2) Interventi lettera B.

Allo stato attuale ed a seguito delle revoche e della suddivisione in più stralci di alcuni Progetti, gli interventi sono 201 divisi in 94 ricadenti nella lettera A (fondi Ministeriali) e 107 nella lettera B (fondi regionali - PO FESR 2007-2013, Linea d'intervento 2.3.1).

5.1 INTERVENTI LETTERA A (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo)

Gli interventi che trovano copertura finanziaria con fondi ministeriali sono 94, ripartiti secondo i vari stati di avanzamento lavori, ed in particolare:

- n. 39 interventi per i quali sono in corso le attività di progettazione, , intendendo tutte le fasi propedeutiche la realizzazione degli interventi, pertanto sono inclusi quelli per i quali sono state già affidate le attività di indagini geognostiche o si è in attesa di acquisire le necessarie autorizzazioni e pareri;
- n. 45 interventi per i quali sono in corso le procedure di gara o gli interventi sono in fase di realizzazione;



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

- n. 10 interventi, tra cui quelli di Giampileri e San Fratello, già ultimati.

Interventi A			
N. Interventi	Stato	%	€
39	In fase di Progettazione	35,16%	€ 58.137.013,11
45	In fase di Attuazione Intervento	35,40%	€ 58.538.457,31
10	Interventi Ultimati	29,12%	€ 48.160.000,00
4	Economie derivanti da Revoche A	0,32%	€ 525.906,19
94	TOTALE INTERVENTI	100,00%	€ 165.361.376,61

Analizzando le singole voci singolarmente si evince che:

Economie derivanti da revoche

Nell'ambito degli interventi A sono presenti economie residue, pari ad € 525.906,19, derivanti dalla revoca dell'intervento di Serradifalco (CL 020), decisa nel corso della seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 15 settembre 2011, pari originariamente ad € 1.600.000,00, decurtate della quota parte delle economie utilizzate per l'incremento del finanziamento dell'intervento di Caronia (ME 058), pari ad € 653.083,40 e della quota parte delle economie utilizzate per l'incremento del finanziamento dell'intervento di Ali Terme (ME 051) pari ad € 421.050,50, così come deciso in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo del 18 maggio 2012.

Interventi in fase di progettazione

Interventi in fase di Progettazione A			
N. Interventi	Stato	%	€
22	PROGETTAZIONE IN CORSO	22,87%	€ 37.820.000,00
4	ATTESA ADEGUAMENTO PROGETTO	3,39%	€ 5.600.000,00
7	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	3,18%	€ 5.251.010,50
6	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE	5,72%	€ 9.466.002,61
39	TOTALE in fase di Progettazione	35,16%	€ 58.137.013,11

Gli interventi che risultano in fase di progettazione sono così suddivisi:

- n. 22 interventi per i quali è in corso la redazione del progetto esecutivo;
- n. 4 interventi per i quali il progetto esecutivo è già stato redatto ma, a seguito delle relative istruttorie e/o delle conferenze dei servizi, si è in attesa degli adeguamenti prescritti;
- n. 7 interventi per i quali interventi per i quali si è in attesa di pareri;



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

- n. 6 interventi per i quali è stata già svolta la conferenza dei servizi e sono stati acquisiti i pareri.

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di progettazione:



Interventi in fase di attuazione

Interventi in fase di Attuazione A			
N. Interventi	Stato	%	€
9	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	5,45%	€ 9.012.500,00
4	CONTRATTO STIPULATO	4,55%	€ 7.530.000,00
10	AFFIDAMENTO LAVORI	6,33%	€ 10.460.000,00
19	AVVIATI LAVORI	16,05%	€ 26.535.957,31
3	SOSPENSIONE LAVORI	3,02%	€ 5.000.000,00
45	TOTALE in fase di attuazione intervento	35,40%	€ 58.538.457,31



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato




REGIONE SICILIANA

Gli interventi che risultano in fase di attuazione sono così suddivisi:

- n. 9 interventi per i quali sono in fase di predisposizione i relativi atti di gara;
- n. 4 interventi per i quali sono state già espletate le procedure di gara per la realizzazione, è già stato stipulato il relativo contratto e si è in attesa di consegnare i lavori;
- n. 10 interventi per i quali sono in corso le procedure di gara per la realizzazione degli interventi;
- n. 19 interventi per i quali i lavori sono in corso di realizzazione;
- n. 3 interventi per i quali i lavori sono stati sospesi al fine di valutare l'opportunità di una perizia di variante.

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di attuazione:

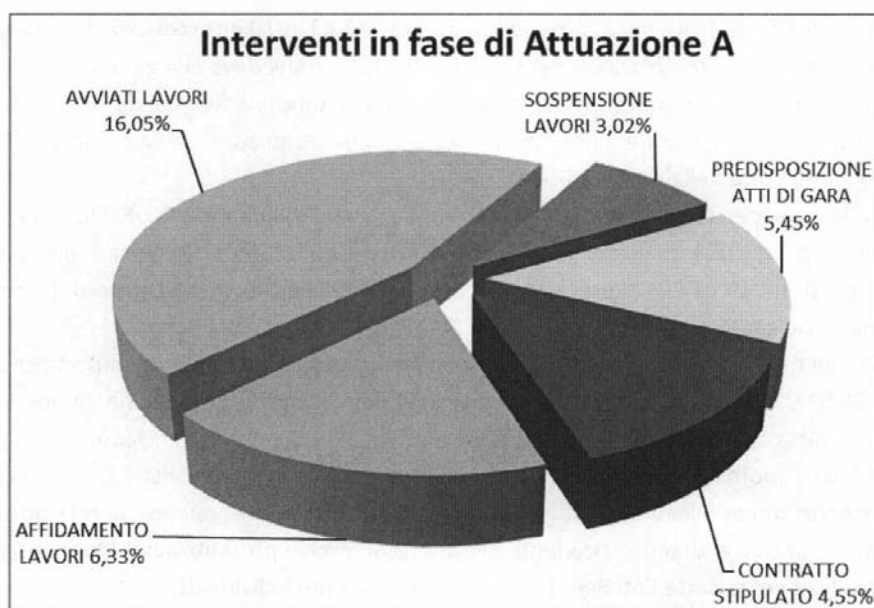

Interventi ultimati

Interventi Ultimati A			
N. Interventi	Stato	%	€
10	LAVORI ULTIMATI (Giampileri, SanFratello, Alcara Li Fusi, Valledolmo, Polizzi Generosa, Blufi_1, Blufi_2, Misterbianco, Randazzo, Piedimonte Etneo)	29,12%	€ 48.160.000,00
10	TOTALE interventi ultimati	29,12%	€ 48.160.000,00

Pag. 26 di 45



Il Commissario Straordinario Delegato



Gli interventi ultimati si riferiscono alle opere realizzate nei Comuni di San Fratello, Giampileri ed Alcara Li Fusi ricadenti nella provincia di Messina, alle opere ricadenti nei comuni Valledolmo, Polizzi Generosa e Blufi ricadenti nella provincia di Palermo, Misterbianco, Randazzo e Piedimonte Etneo ricadenti nella provincia di Catania.

In allegato vengono riportati i seguenti documenti riepilogativi:

- Quadro riepilogativo degli interventi identificati con la lettera A (**Allegato 3**);
- Stato dell'arte degli interventi identificati con la lettera A in fase di attuazione e relative schede lavori (**Allegato 4**).

5.2 INTERVENTI LETTERA B (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo)

Il complemento di Programmazione del suddetto PO FESR prevedeva che gli unici Enti beneficiari di tali risorse fossero le Amministrazioni locali che erano le uniche a fungere da stazioni appaltanti, sotto il controllo di gestione della Direzione Generale Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della regione Sicilia.

La rimodulazione del complemento di Programmazione del suddetto PO FESR, approvata con Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011, adottata dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 20 del 19.01.2012, prevede anche quale Ente Beneficiario l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato.

In virtù di tale rimodulazione, la Regione ha già indicato 23 interventi, per un importo complessivo pari a € 39.522.214,39, corrispondenti circa al 25% degli interventi di propria competenza per i quali il Commissario Straordinario è stato individuato quale soggetto beneficiario.

Stante infatti l'approssimarsi delle date di scadenza del Programma PO FESR, la Regione ha ritenuto opportuno avvalersi degli uffici del Commissario al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, prioritari e urgenti, ricadenti nella lettera B che presentavano ritardi e criticità di difficile risoluzione da parte Enti Beneficiari precedentemente individuati.

Si riportano di seguito gli interventi ricadenti nella lettera B per i quali il Commissario Straordinario Delegato è stato individuato quale Soggetto Beneficiario, che vengono pertanto individuati con la Lettera B*.

- con nota prot. N. 13607 del 02.03.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
ME	124	Terme Vigliatore	Fondi Regionali	Ripascimento scogliere – Zona Terme Marchesana	€ 3.823.875,00

Pag. 27 di 45



Il Commissario Straordinario Delegato



- con nota prot. N. 13611 del 02.03.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
ME	130	Tusa	Fondi Regionali	Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni – Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)	€ 1.500.000,00

- con nota prot. N. 18003 del 21.03.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
ME	106	S. Alessio Siculo	Fondi Regionali	Barriera soffolta e radente a protezione del centro abitato	€ 5.000.000

- con nota prot. N. 31329 del 29.05.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
CL	106	Caltanissetta	Fondi Regionali	Consolidamento, bonifica e canalizzazione del versante sud della colline Sant'Anna, centro storico e quartiere Saccara, con opere di ingegneria naturalistica, rimodellamento e inerbimento dei versanti dell'abitato	€ 4.160.000

- con nota prot. N. 35347 del 15.06.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
AG	4	Cattolica Eraclea	Regione	Mitigazione Rischio Idrogeologico - Crolli Costone Roccioso Eraclea Minoa	€ 1.480.000,00
AG	14	Santo Stefano di Quisquina	Regione	Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale	€ 2.360.195,11
AG	174	Cattolica Eraclea	Regione	Crolli costone roccioso Eraclea Minoa (Loc. Zagarella)	€ 1.170.000,00
CL	17	Butera	Regione	Consolidamento centro abitato	€ 1.200.000,00
CL	18	Butera	Regione	Opere di consolidamento pendici del centro Storico	€ 800.000,00
CT	28	Licodia Eubea	Regione	Consolidamento Via Duca degli Abruzzi	€ 880.000,00



REPUBBLICA ITALIANA

Il Commissario Straordinario Delegato



REGIONE SICILIANA

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
CT	38	Santa Venerina	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Badia-T. Fago	€ 1.000.000,00
CT	39	Sant'Agata Li Battiati	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Leucatia - Via Einaudi	€ 1.000.000,00
ME	65	Ficarra	Regione	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada grenne	€ 1.028.981,00
ME	68	Forza D'Agrò	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 414.163,28
ME	105	Rometta	Regione	Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare	€ 1.000.000,00
ME	127	Tortorici	Regione	Muri e paratie montevalle e opere idrauliche - Zona S.Paolo	€ 2.300.000,00
PA	148	Mezzojuso	Regione	Opere di consolidamento - Zona Collina Brigna	€ 2.144.000,00
PA	151	Partinico	Regione	Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò-terzo stralcio	€ 950.000,00
RG	158_1	Modica	Regione	Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e Monserrato	€ 2.000.000,00
SR	166	Rosolini	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00
TP	190	San Vito Lo Capo	Regione	Consolidamento del tratto di costa	€ 1.350.000,00

- con nota prot. N. 36531 del 21.06.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
PA	152	Petralia Sottana	Regione	Opere di consolidamento - Quartiere Casale e Scavarello	€ 1.200.000,00

- con nota prot. N. 40645 del 10.07.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
ME	131	Ucria	Regione	Consolidamento del Centro Urbano in località Vasile-Belvedere	€ 1.261.000,00

Si precisa che per gli interventi sopra elencati alla Struttura Commissariale compete:

- l'istruttoria e l'iter autorizzativo propedeutico all'emissione del Decreto di Finanziamento che rimane a carico della Regione;
- la funzione di Stazione Appaltante.

Pag. 29 di 45
